	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MA-GP-FR-038
		VERSIÓN	1
		FECHA	6/11/2025

FECHA 31/05/2026 (Día / Mes / Año)

DEPENDENCIA: DE CONCESIONES **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 362.771.442,00 **MES** MAYO DE 2026

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : ICCU No. 1596 de 2025

OBJETO:
"MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONTRATISTA: V&M INGENIERIA SAS NIT:900.062.688-7
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1608 DEL 2025 INTERVENTOR: GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS

PLAZO INICIAL: 11 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 11 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2 DE FEBRERO DE 2026 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACT 31 DE DICIEMBRE DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 5.329.960.965,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IV $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 5.329.960.965,00

No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA				
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
		GENERAL	PARTICUALR	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%
1	MANTENIMIENTO RUTINARIO															
1		MANUAL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL INVIAS		MANTENIMIENTO RUTINARIO	KM/MES	2.860,00	1.264.449,66	3.616.326.016,00	2.860,00	1.264.449,66	3.616.326.016,00	281,66	356.144.890,09	1.014,58	1.282.885.332,00	24,07%
SUBTOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO								$ 3.616.326.016			$ 3.616.326.016		$ 356.144.890		$ 1.282.885.332,00	24,07%
2	MANTENIMIENTO POR MONTO AGOTABLE															
2,1				FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	6.175,00	$ 9.045,00	$ 55.852.875,00	6.175,00	$ 9.045,00	$ 55.852.875,00					
2,2				MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	617,50	$ 1.377.381,00	$ 850.532.767,50	617,50	$ 1.377.381,00	$ 850.532.767,50					
2,3				RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	3000,00	$ 3.192,00	$ 9.576.000,00	3000,00	$ 3.192,00	$ 9.576.000,00					
2,4				RIEGO DE IMPRIMACION	M2	1.000,00	$ 7.206,00	$ 7.206.000,00	1.000,00	$ 7.206,00	$ 7.206.000,00					
2,5				SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFALTICO SIN RUTEO	M	2.500,00	$ 15.294,00	$ 38.235.000,00	2.500,00	$ 15.294,00	$ 38.235.000,00					
2,6				SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UND	25,00	$ 797.667,00	$ 19.941.675,00	25,00	$ 797.667,00	$ 19.941.675,00					
2,7				SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UND	25,00	$ 624.736,00	$ 15.618.400,00	25,00	$ 624.736,00	$ 15.618.400,00					
2,8				SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UND	25,00	$ 672.687,00	$ 16.817.175,00	25,00	$ 672.687,00	$ 16.817.175,00					
2,9				SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	UND	25,00	$ 687.879,00	$ 17.196.975,00	25,00	$ 687.879,00	$ 17.196.975,00					
2.10				DEFENSA METALICA	M	180,00	$ 250.527,00	$ 45.094.860,00	180,00	$ 250.527,00	$ 45.094.860,00					
2.11				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFARROS (EN DEFENSAS METÁLICAS)	UN	60,00	$ 16.490,00	$ 989.400,00	60,00	$ 16.490,00	$ 989.400,00					
2.12				TOPE DEFENSA METALICA	UN	60,00	$ 135.740,00	$ 8.144.400,00	60,00	$ 135.740,00	$ 8.144.400,00					
2.13				SECCION FINAL DEFENSA METALICA	UN	60,00	$ 117.891,00	$ 7.073.460,00	60,00	$ 117.891,00	$ 7.073.460,00					
2.14				SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	1.875,00	$ 21.936,00	$ 41.130.000,00	1.875,00	$ 21.936,00	$ 41.130.000,00					
2.15				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x3.0 CM	UN	358,75	$ 23.380,00	$ 8.387.575,00	358,75	$ 23.380,00	$ 8.387.575,00					
2.16				RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	225,00	$ 129.120,00	$ 29.052.000,00	225,00	$ 129.120,00	$ 29.052.000,00					
2.17				EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTACION MENOR DE 5 KM)	M3	112,50	$ 29.762,00	$ 3.348.225,00	112,50	$ 29.762,00	$ 3.348.225,00					
2.18				EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	112,50	$ 67.138,00	$ 7.553.025,00	112,50	$ 67.138,00	$ 7.553.025,00					
2.19				RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (|INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	15,00	$ 14.338,00	$ 215.070,00	15,00	$ 14.338,00	$ 215.070,00					
2.20				LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	M	12.900,00	$ 6.530,00	$ 84.237.000,00	12.900,00	$ 6.530,00	$ 84.237.000,00					
2.21				SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO PREVENTIVA DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL SP-75. REFLECTIVO TIPO IX (75X60cm).	UN	75,00	$ 600.865,00	$ 45.064.875,00	75,00	$ 600.865,00	$ 45.064.875,00					
2.22				SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	UN	25,00	$ 644.272,00	$ 16.106.800,00	25,00	$ 644.272,00	$ 16.106.800,00					
2.23				DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	10,50	$ 87.838,00	$ 922.299,00	10,50	$ 87.838,00	$ 922.299,00					
2.24				RESALTOS EN CAUCHO ANCLADOS, LONGITUD 1M, ANCHO 30CM, ANCHO 4.5CM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	150,00	$ 291.274,00	$ 43.691.100,00	150,00	$ 291.274,00	$ 43.691.100,00					
2.25				AFIRMADO	M3	1.800,00	$ 126.951,00	$ 228.511.800,00	1.800,00	$ 126.951,00	$ 228.511.800,00		-		$ -	
					SUBTOTAL MANTENIMIENTO POR MONTO AGOTABLE			$ 1.600.498.757,00			$ 1.600.498.757,00		$ -		$ -	
					SUBTOTAL			$ 1.600.498.757,00			$ 1.600.498.757,00		$ -		$ -	
					TOTAL			$ 5.216.824.773			$ 5.216.824.773		$ 356.144.890		$ 1.282.885.332	24,07%
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO							$ 58.975.000,00			$ 58.975.000		$ 3.940.675		$ 11.352.911	0,21%
	PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL							$ 54.161.192,00			$ 54.161.192		$ 2.685.877		$ 14.916.640	0,28%
					VALOR TOTAL			$ 5.329.960.965,00			$ 5.329.960.965,00		$ 362.771.442		$ 1.309.154.883	24,56%

	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MA-GP-FR-038
		VERSIÓN	1
		FECHA	6/11/2025

FECHA: 31/05/2026 (Día / Mes / Año)

AIU ..... 33 %
Utilidad ..... 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 723.265.203,00	20%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 72.554.288,00	10%
Valor Amortizado Acumulado	$ 261.830.976,00	
Valor Saldo por Amortizar	$ 461.434.227,00	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	AIU	TOTAL PRESENTE MES
FEBERRO	$ 193.118.540,00	$ 63.729.119,00	$ 256.847.659,00
MARZO	$ 200.301.843,00	$ 66.099.608,00	$ 266.401.451,00
ABRIL	$ 318.146.113,00	$ 104.988.218,00	$ 423.134.331,00
MAYO	$ 272.760.483,00	$ 90.010.959,00	$ 362.771.442,00
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 272.760.483,00	$ 90.010.959,00	$ 362.771.442

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA INCLUYENDO AIU	VR. ACUMULADO
MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 356.144.890	$ 1.282.885.332
PMT	$ 3.940.675	$ 11.352.911
PAGA	$ 2.685.877	$ 14.916.640
MONTO AGOTABLE	$ -	$ -
TOTAL	$ 362.771.442	$ 1.309.154.883

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

			% ejecución
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 5.329.960.965,00		
VALOR ADICIÓN No. Xx	$ -		
ANTICIPO		$ 723.265.203,00	13,6%
ACTA 1		$ 256.847.659,00	4,82%
AMORTIZACION ACTA 1		$ 51.369.532,00	0,96%
ACTA 2		$ 266.401.451,00	5,00%
AMORTIZACION ACTA 2		$ 53.280.290,00	1,00%
ACTA 3		$ 423.134.331,00	7,94%
AMORTIZACION ACTA 3		$ 84.626.867,00	1,59%
ACTA 4		$ 362.771.442,00	6,81%
AMORTIZACION ACTA 4		$ 72.554.288,00	1,36%
ACTA 5			
AMORTIZACION ACTA 5			
SALDO A FAVOR DEL ICCU		$ 3.559.371.856,00	66,78%
SUMAS IGUALES	**$ 5.329.960.965,00**	**$ 5.329.960.965,00**	100%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 362.771.442
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 290.217.154

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 290.217.154
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
2. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre:YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista:V&M INGENIERIA SAS

Firma:
Nombre: MARIA YESSICA SARMINETO MEZA
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor: GS Vías y Estructuras S.A.S.

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Dirección Administrativa y Financiera).
Copias: Dirección Técnica (Concesiones, Construcciones o Caminos), Contratista, Interventor y Supervisor.

AREA TECNICA - MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: "MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."


FECHA: 31/05/2026 **CONTRATO:** ICCU-CTO-1596-2025

CONTRATISTA: V&M INGENIERIA SAS INTERVENTORIA: GS Vías y Estructuras S.A.S

CORREDOR VIAL RIONEGRO (Zipaquira - Pacho - La Palma) **ACTIVIDAD** Roceria - Limpieza de señales - Limpieza de alcantarillas- Limpieza de cunetas

No. ITEM PRESUPUESTO: 1 **DESCRIPCION DEL ITEM:** MANTENIMIENTO RUTINARIO **UND** KM/MES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		LONGITUD	UNIDAD	TOTAL
	Inicio	Fin			
ALTO DEL ÁGUILA - PACHO	PR 30 +000	PR 36 +800	6,8	KM	6,8
PACHO – PUENTE CAPITÁN	PR 36 +800	PR 43 +050	6,25	KM	6,25
PUENTE CAPITÁN – GUANACAS	PR 43 +050	PR 61 +050	18	KM	18
GUANACAS – CHARO LARGO	PR 61 +050	PR 68 +750	7,7	KM	7,7
CHARCO LARGO – LA PALMA	PR 68 +750	PR 76 +000	7,25	KM	7,25
Localizalicion del corredor					
			TOTAL		46,00

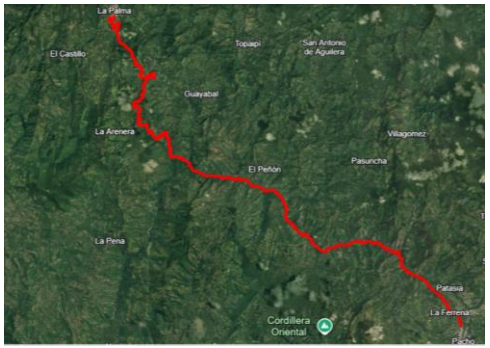

FOTOS





Elaboro
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: ING. ISAIAS VARGAS GONZALEZ
Elaboro **DIRECTOR DE OBRA**

Aprobó
LA INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: ING. ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ
Aprobo **DIRECTORA DE INTERVENTORIA**

AREA TECNICA - MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: "MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."


FECHA: 31/05/2026 **CONTRATO:** ICCU-CTO-1596-2025

CONTRATISTA: V&M INGENIERIA SAS INTERVENTORIA: GS Vías y Estructuras S.A.S


CORREDOR VIAL AMOLADERO (Guasca- Gacheta- Ubala- Gachala) **ACTIVIDAD** Roceria - Limpieza de señales - Limpieza de alcantarillas- Limpieza de cunetas

No. ITEM PRESUPUESTO: 1 **DESCRIPCION DEL ITEM:** MANTENIMIENTO RUTINARIO **UND** KM/MES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		LONGITUD	UNIDAD	TOTAL
	Inicio	Fin			
RAMAL - UBALÁ	PR 65+000	PR 72+500	7,5	KM	7,5
SAN ROQUE - JUNÍN	PR 0+000	PR 8+410	8,41	KM	8,41
GUASCA - SUEVA - SAN ROQUE- GACHETA	PR 0+000	PR 45+000	45	KM	45
UBALÁ - GACHALÁ	PR 0+000	PR 20+000	20	KM	20
Localización del corredor					
			TOTAL		80,91

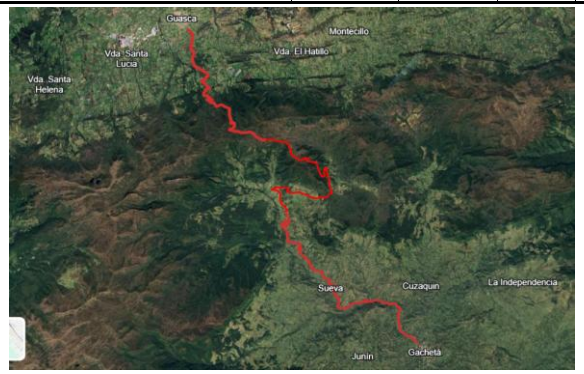

FOTOS

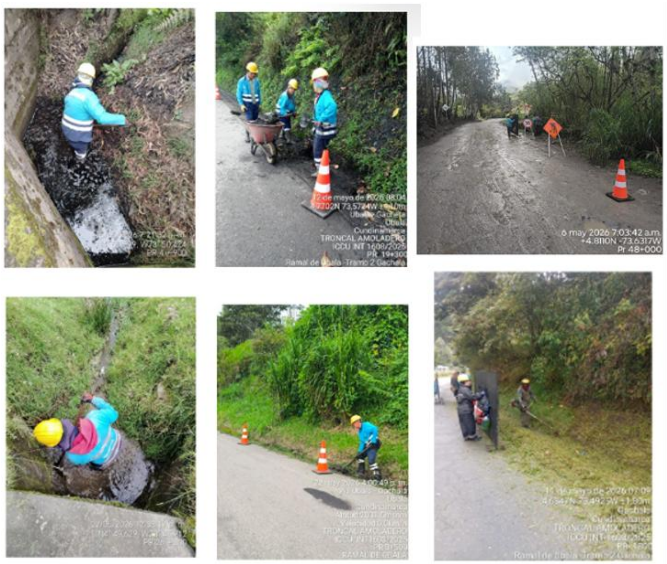

Elaboro
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: ING. ISAIAS VARGAS GONZALEZ
Elaboro **DIRECTOR DE OBRA**

Aprobó
LA INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: ING. ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ
Aprobo **DIRECTORA DE INTERVENTORIA**

AREA TECNICA - MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: "MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."


FECHA: 31/05/2026 **CONTRATO:** ICCU-CTO-1596-2025

CONTRATISTA: V&M INGENIERIA SAS INTERVENTORIA: GS Vías y Estructuras S.A.S

CORREDOR VIAL EL CARBON (Ubate- Guacheta- Lenguazaque- Villapinzon) **ACTIVIDAD** Roceria - Limpieza de señales - Limpieza de alcantarillas- Limpieza de cunetas

No. ITEM PRESUPUESTO: 1 **DESCRIPCION DEL ITEM:** MANTENIMIENTO RUTINARIO **UND** KM/MES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		LONGITUD	UNIDAD	TOTAL
	Inicio	Fin			
LENGUAZAQUE – VILLAPINZÓN	PR 28 +580	PR 46 +500	17,92	KM	17,92
UBATÉ – EL BOQUERÓN	PR 0+000	PR 14+200	14,2	KM	14,2
EL BOQUERÓN LENGUAZAQUE	PR 14+200	PR 16+080	1,88	KM	1,88
			TOTAL		34,00

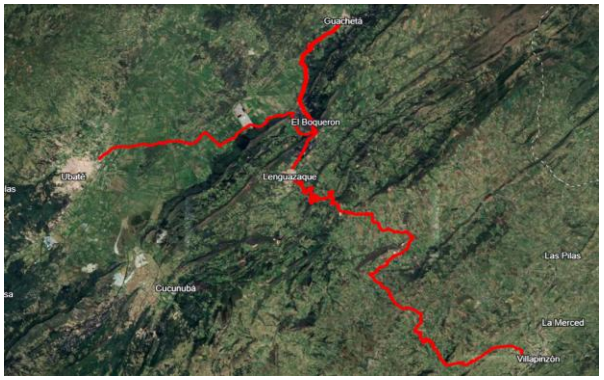

Localización del corredor

FOTOS










Elaboro
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: ING. ISAIAS VARGAS GONZALEZ
Elaboro **DIRECTOR DE OBRA**

Aprobó
LA INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: ING. ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ
Aprobo **DIRECTORA DE INTERVENTORIA**

AREA TECNICA - MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: "MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."


FECHA: 31/05/2026 **CONTRATO:** ICCU-CTO-1596-2025

CONTRATISTA: V&M INGENIERIA SAS INTERVENTORIA: GS Vias y Estructuras S.A.S

CORREDOR VIAL SAN MIGUEL (Chusaca- Sibate- Fusagasuga- Pasca) **ACTIVIDAD** Roceria - Limpieza de señales - Limpieza de alcantarillas- Limpieza de cunetas

No. ITEM PRESUPUESTO: 1 **DESCRIPCION DEL ITEM:** MANTENIMIENTO RUTINARIO **UND** KM/MES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		LONGITUD	UNIDAD	TOTAL
	Incio	fin			
Chusaca - Sibate - Fusagasuga	PR 6+600	PR 36+600	30	KM	30

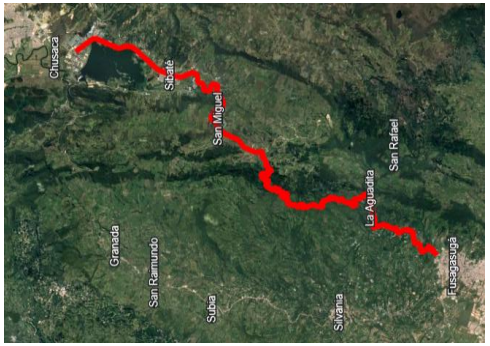

Localizacion del corredor

TOTAL 30,00

FOTOS









Elaboro
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: ING. ISAIAS VARGAS GONZALEZ
Elaboro **DIRECTOR DE OBRA**

Aprobó
LA INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: ING. ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ
Aprobo **DIRECTORA DE INTERVENTORIA**

AREA TECNICA - MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: "MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."


FECHA: 31/05/2026 **CONTRATO:** ICCU-CTO-1596-2025

CONTRATISTA: V&M INGENIERIA SAS INTERVENTORIA: GS Vias y Estructuras S.A.S

CORREDOR VIAL TEQUEDAMA (Chusaca- El Colegio- Viota el Portillo) **ACTIVIDAD** Roceria - Limpieza de señales - Limpieza de alcantarillas- Limpieza de cunetas

No. ITEM PRESUPUESTO: 1 **DESCRIPCION DEL I** MANTENIMIENTO RUTINARIO **UND** KM/MES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		LONGITUD	UNIDAD	TOTAL
	Incio	fin			
TRAMO 1					
Chusacá- Viotá el portillo	PR 1+050	PR 11+550	10,5	KM	10,5
Ramal - Pin la Victoria	PR 0+000	PR 6+000	6	KM	6
TRAMO 2					
Ramal Via Santardecito	PR 0+000	PR 1+500	1,5	KM	1,5
Chusacá- Viotá el portillo	PR 16+800	PR 29+100	12,3	KM	12,3
Ramal Pin la Victoria	PR 6+000	PR 9+800	3,8	KM	3,8
TRAMO 3					
Chusacá- Viotá el portillo	PR 36+390	PR 48+740	12,35	KM	12,35
Ramal Colegio Rio Bogota	PR 0+000	PR 3+220	3,22	KM	3,22
Ramal Av Medina	PR 0+000	PR 1+300	1,3	KM	1,3
Chusacá- Viotá el portillo	PR 30+460	PR 33+050	2,59	KM	2,59
TRAMO 4					
Chusacá- Viotá el portillo	PR 48+740	PR 71+540	22,8	KM	22,8
Chusacá- Viotá el portillo	PR 48+740	PR 63+130	14,39	KM	14,39



Localizacion del corredor

	TOTAL	90,75

FOTOS










Elaboro
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: ING. ISAIAS VARGAS GONZALEZ
Elaboro **DIRECTOR DE OBRA**

Aprobó
LA INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: ING. ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ
Aprobo **DIRECTORA DE INTERVENTORIA**

AREA TECNICA - MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: "MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: 31/05/2026 **CONTRATO:** ICCU-CTO-1596-2025


CONTRATISTA: V&M INGENIERIA SAS INTERVENTORIA: GS Vias y Estructuras S.A.S

CORREDOR VIAL RIO NEGRO, AMOLADERO, EL CARBON, SAN MIGUEL, TEQUENDAMA **ACTIVIDAD** PAGA

No. ITEM PRESUPUESTO: **DESCRIPCION DEL ITEM:** PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL **UND** GBL

LOCALIZACIÓN	UND	VALOR			TOTAL
PAGA mes de mayo	GBL	$ 2.685.877			$ 2.685.877,00
Observacion: los soportes de cada uno de los items aca relacionados se encuentran dentro del informe mensual ambiental.					
	TOTAL				**$ 2.685.877,00**

FOTOS

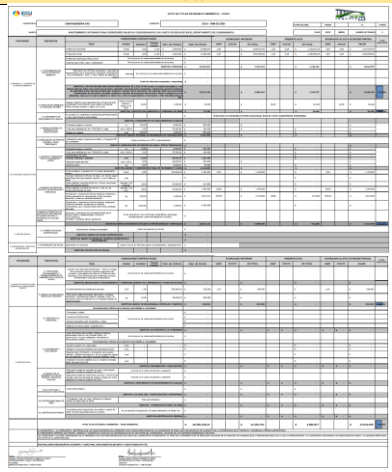

Elaboro
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: ING. ISAIAS VARGAS GONZALEZ
Elaboro **DIRECTOR DE OBRA**

Aprobó
LA INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: ING. ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ
Aprobo **DIRECTORA DE INTERVENTORIA**

AREA TECNICA - MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: "MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: 31/05/2026 **CONTRATO:** ICCU-CTO-1596-2025

CONTRATIST V&M INGENIERIA SAS INTERVENTORIA: GS Vias y Estructuras S.A.S

CORREDOR ' RIO NEGRO, AMOLADERO, EL CARBON, SAN MIGUEL, TEQUENDAMA **ACTIVIDAD** PMT

No. ITEM PRESUPUESTO: **DESCRIPCION DEL ITEM:** PLAN DE MANEJO DE TRAFICO **UND** GBL

LOCALIZACIÓN	valor del mes según el % de ejecucion	% de ejecución		TOTAL
Durante el periodo de este corte se realizo la correcta implementacion del plan de manejo de trafico en los cinco corredores viales	$ 3.940.675,18	0,067		$ 3.940.675,18
Observación: El 6,7% que se cobra en esta memoria es porque es el % de obra ejecutada para ese periodo del mes de mayo.				
		TOTAL		$ 3.940.675,18

FOTOS








Elaboro
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: ING. ISAIAS VARGAS GONZALEZ
Elaboro **DIRECTOR DE OBRA**

Aprobó
LA INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: ING. ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ
Aprobo **DIRECTORA DE INTERVENTORIA**
