comunicaciones se solicitó y reiteró la remisión de la información correspondiente para su revisión y validación; sin embargo, a la fecha de corte del presente informe, el contratista no ha efectuado la entrega de las actas de vecindad levantadas, situación que impide a la interventoría adelantar el proceso de verificación, validación y seguimiento de dichos soportes conforme a las obligaciones contractuales establecidas.

### 4.4 PROYECTO RECUPERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA. CÓDIGO PGS-6.4-21.

Durante el período reportado no se realizaron actividades en el marco de este proyecto, en razón a que no se contó con programación por parte del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) ni de la empresa contratista de obra relacionada con las acciones a desarrollar. En consecuencia, no se registraron avances ni actividades asociadas al componente, quedando su ejecución sujeta a la definición y comunicación de la programación correspondiente por parte de las entidades responsables**.**



### 4.5 PROYECTO CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PGS-6.5-22

- El día 22 de mayo de 2026 se llevó a cabo una reunión con los veedores ciudadanos del municipio de Puerto Rico, Caquetá, en la que participaron tres (3) representantes de la veeduría ciudadana, la directora territorial Caquetá del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), profesionales de las áreas técnica y social de la empresa contratista, así como representantes de las áreas técnica, ambiental y social de la interventoría. El espacio permitió el intercambio de información sobre el estado y avance del proyecto, así como la atención de inquietudes y observaciones formuladas por la comunidad en ejercicio de sus labores de seguimiento y control social.

- Según comunicado de fecha 15 de mayo de 2026, el presidente del Concejo Municipal de San Vicente del Caguán, Caquetá, mediante oficio sin nomenclatura, convocó a la interventoría, al contratista de obra, a la comunidad en general y al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) para participar e intervenir en la sesión programada para el día 28 de mayo de 2026. En la fecha señalada, todas las partes convocadas asistieron y participaron activamente en el desarrollo de la sesión, atendiendo los temas relacionados con el proyecto y las inquietudes presentadas por la comunidad.

- El día 29 de mayo de 2026 se atendió la convocatoria realizada por la Gerencia Departamental Colegiada del Caquetá de la Contraloría General de la República, mediante oficio No. 2026EE0102101, para participar en la Mesa de Diálogo Interinstitucional No. 16, desarrollada en el marco del Plan Operativo 036 de Seguimiento de Control Fiscal Participativo. La jornada tuvo como propósito efectuar seguimiento al avance físico y financiero del Contrato No. 991 de 2021. La actividad se llevó a cabo de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams, constituyéndose en un espacio de diálogo entre las entidades participantes y la ciudadanía para socializar avances, resolver inquietudes y fortalecer los mecanismos de seguimiento y control social al proyecto.


Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119
consorciointerviasvision@gmail.com
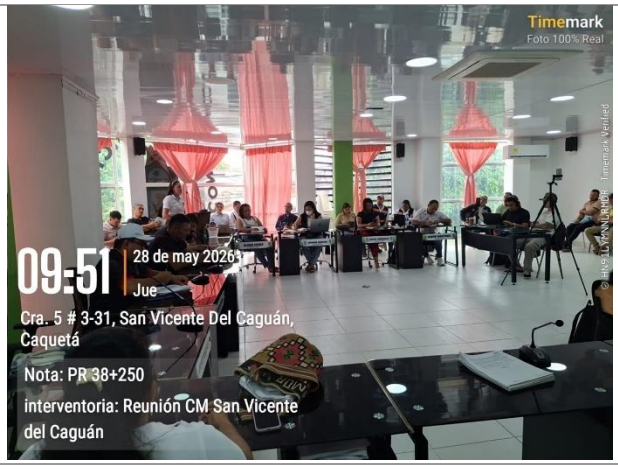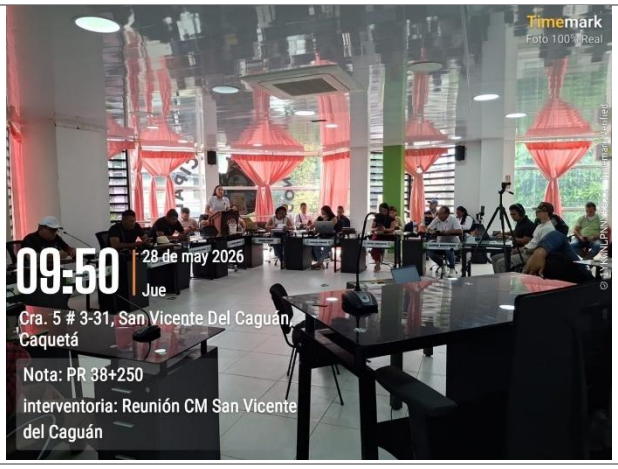
| REUNIÓN CON VEEDORES CIUDADANOS-MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETÁ | REUNIÓN CON VEEDORES CIUDADANOS-MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETÁ |
|---|---|
|  |  |
| REUNIÓN EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ | REUNIÓN EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ |
|  |  |

## 4.6 PROYECTO CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA. CÓDIGO PGS-6.6-23.

A continuación, se relaciona el personal vinculado de manera directa al proyecto y se realiza distribución con enfoque diferencial**:**

**CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE:**

**TOTAL, CONTRATO 991/2021: 1.006**

- MANO DE OBRA CONTRATADA:
  - Activos: 231
  - Retiros: 775



*Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119*
*consorciointerviasvision@gmail.com*

| MANO DE OBRA CONTRATADA: 974 | | |
|---|---|---|
| **Activos: 231** | Calificado: 138 | No calificado: 93 |
| **Retiros: 775** | Calificado: 446 | No calificado: 329 |

**Mano de obra**

**Contratada a través de sub contratista**: 135

- Activos: 49
- Retirados: 86

**Grupo Poblacionales:**

- Población en condición especial: 1- reincorporado a la vida civil
- Primer empleo: 28
- Madres cabezas de familia: 29

Al proyecto se han vinculado un total de 68 mujeres de las cuales 29 son madres cabezas de familia.

| ENFOQUE DIFERENCIAL MUJERES/ACTIVAS | |
|---|---|
| CONTRATISTA | **INTERVENTORÍA** |
| **52** | 17 |

Con corte a 31 de mayo de 2026, el proyecto se actualizo la base de datos de los proveedores de bienes y servicios contratados en la zona de incidencia del proyecto, los cuales se relacionan a continuación:

| Empleos Indirecto Zona Incidencia | | | |
|---|---|---|---|
| **Ítems** | **Nombre de La Empresa – Persona independiente** | **Servicio Contratado** | **Municipio** |
| **1** | Compra Yá | Papelería, Cafetería y Aseo | |
| **2** | Electrificadora del Caquetá | Servicio de Energía | |
| **3** | Mario Posada | Arriendos | |
| **4** | Agua Rica S.A. | Agua | |
| **5** | Anyela Quesada | Aseo | |
| **6** | Biomax | Combustible | |
| **7** | Terpel | Combustible | |
| **8** | Lavadero Central | Lavado de vehículo | |
| **9** | Euta | Internet | |



Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119
consorciointerviasvision@gmail.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| **10** | Gas Caquetá | Gas | Puerto Rico |
| **11** | Hotel Casa Quinta | Hospedaje | |
| **12** | Caes Soluciones Integrales SAS y/o Construminerales Agregados Transporte Y Obras S.A.S | Agregador | |
| **13** | Juvenal Charris | Agregados | |
| **14** | Alberto Gómez Cabrera/ Petrotec | Agregados | |
| **15** | Mercacentro | Cafetería y Aseo | |
| **16** | D1 | Varios | |
| **17** | Asoare | Agregados | |
| **18** | Restaurante El Roble | Refrigerio | |
| **19** | William Cano | Papelería | |
| **20** | Faiber Carrillo | Almuerzos | |
| **21** | Apetos | Refrigerio | |
| **22** | Berly Andrade | Refrigerio | |
| **23** | José Yesid Peña Pacheco | Refrigerio | |
| **24** | Hotel Casa Quinta | Salón | |
| **25** | Ferretería La Quinta | Ferretería y Herramientas | |
| **26** | Guerrero Guevara Leonel | Recarga baterías | |
| **27** | Servientrega | Envió encomiendas | |
| **28** | Leonardo Hernández Parra | Arriendo | |
| **29** | Lavadero Las Damas | Lavado de vehículo | |
| **30** | Nelly Yoana Saldarriaga - Amarreto | Refrigerios | |
| **31** | Cantera Monte Cristo | Agregados | |
| **32** | Ferre centro | Ferretería | San Vicente del Caguán |
| **33** | Cafetería Don Julio | Refrigerios | |
| **34** | Agua Fress | Suministro de Hidratación | |
| **35** | Yenifer Moreno | Refrigerio | |
| **36** | E.D.S - Terpel | Combustible | |
| **37** | Iglesia La Alianza | Salón de eventos | |



Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119
consorciointerviasvision@gmail.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| **38** | Almacén Burbujas | Papelería | |
| **39** | Dismovar Zomac | Papelería - Restaurante | |
| **40** | Planeta Escolar | Papelería | |
| **41** | Éxito Creativo | Litografía | |
| **42** | Café las Brisas | Refrigerio | |
| **43** | Centro Comercial Caguán Plaza | Papelería | |
| **44** | Restaurante San Terra | Almuerzos | |
| **45** | Parroquia Nuestra Señora de la Mercedes | Salón de eventos | |
| **46** | Restaurante La Casa Colonial | Almuerzos | |
| **47** | Restaurante Casita San | Refrigerio | |
| **48** | Café con Aroma | Desayunos | |
| **49** | Diocesis de San Vicente del Caguán - Aldea de Animadores | Alquiler Salón de evento | |
| **50** | Papelería Medellín | Papelería | Neiva |
| **51** | Panamericana | Papelería | |
| **52** | Papelería Cartagena | Papelería | |
| **53** | Bosques De Cantabria | Administración | |
| **54** | Diana Charry | Arriendos | |
| **55** | Ceibas Empresas Públicas de Neiva | Agua | |
| **56** | Leidy González | Aseo | |
| **57** | Kike | Papelería | |
| **58** | Estación De Servicio Terpel Sede Oriente | Combustible | |
| **59** | Claro SAS | Internet | |
| **60** | Hielo Foca | Suministro de Hidratación | |
| **61** | La Montañita | Suministro de Hidratación | |
| **62** | Grupo Nova | Suministro de Dotación | |
| **63** | Argos | Cemento | |
| **64** | Pavco | Geotextiles | |
| **65** | Ferretería Industriales | Ferretería y Herramientas | |
| **66** | Ecolsa | Filtros | |



*Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119*
*consorciointerviasvision@gmail.com*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **67** | Motoriza | Filtros | |
| **68** | Cantera el Progreso | Agregados | |
| **69** | Cantera El Lago | Agregados | |
| **70** | Infercal | Asfalto | |
| **71** | Humberto Quintero | Emulsión | |
| **72** | Comercializadora Internacional de llantas. | Llantas | |
| **73** | Jhonny Fabián Molano | Alquiler de Ventiladores | |
| **74** | Jhon Fredy Pérez Cárdenas | Alquiler de Proyector Video Beam | |
| **75** | Ermel Gutiérrez | Almuerzos | |
| **76** | Jonathan García Ramos | Compra tanques de Almacenamiento | |
| **77** | Miriam Liceth Lizcano | Refrigerios | |
| **78** | Karen Licet Sánchez | Estampados | |
| **79** | Yamabat Granada Puentes Y/O Sándwich Donde Legui | Refrigerios | |
| **80** | Emisora INRAI Cristalina Stereo | Cuñas radiales | |
| **81** | Johan James Guzmán Morales | Ferretería | Florencia |
| **82** | Distribuidora Jaramillo | Suministro de madera | |
| **83** | Maderas el Chorro | Panadería | |
| **84** | Panadería y pastelería SÚPER | Litografía | |
| **85** | AC publicidad | Cuñas radiales | |
| **86** | Emisora INRAI | Cuñas radiales | |
| **87** | Emisora Linda Estéreo | Cuñas radiales | |
| **88** | Dotaciones R - Karen Michel Rojas Henao | Gorras Acrílicas con Bordado Frente y los dos laterales | |
| **89** | Autonet | Taller de servicios mantenimiento eléctrico | |
| **90** | Mayerly Polania Rodríguez | Refrigerios | |
| **91** | Hotel Caquetá Real | Alquiler salón de evento | |
| **92** | Emisora Comunitaria El Paujil Stereo 107.1 | Emisión Radial | El Paujil |



*Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119*
*consorciointerviasvision@gmail.com*

## 4.7 PROYECTOS PRODUCTIVOS. CÓDIGO PGS-6.7-24.

Desde la Interventoría se remitió el comunicado C-245-4642-1078-26, mediante el cual se solicitó la remisión de los soportes documentales citados en el comunicado CVNSO-0991-258-2026 relacionado con la no viabilidad de la Obra con Participación Comunitaria (OPC) denominada "Flora Gaita". De igual manera, mediante oficio C-245-4643-1081-26, la Interventoría emitió observaciones técnicas a la encuesta correspondiente a la Obra con Participación Comunitaria (OPC) de la vereda Ceibas Afuera, Ruta 3001, la cual había sido remitida previamente por el Contratista a través del comunicado CVNSO-0991-268-2026. Lo anterior, con el propósito de garantizar la adecuada revisión, validación y cumplimiento de los criterios técnicos establecidos para la formulación y evaluación de las iniciativas comunitarias propuestas.

No obstante, se observa que el avance del Contratista en la gestión, estructuración y materialización de las actividades asociadas a las Obras con Participación Comunitaria (OPC) continúa siendo limitado frente a las metas y expectativas planteadas en el Plan de Gestión Social. En términos generales, no se evidencia un progreso significativo que permita consolidar de manera efectiva este componente, por lo que se recomienda fortalecer la planeación, priorización y ejecución de las actividades programadas, así como el seguimiento permanente a los compromisos adquiridos, con el fin de garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales y los objetivos establecidos para este componente social.

## 4.8 PROYECTO PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL. PGS-6.8- 25.

Se llevó a cabo una jornada de capacitación en arqueología preventiva dirigida a doce (12) personas que ingresaron recientemente a laborar con el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente (CVNSO) en los departamentos de Huila y Caquetá, con el fin de facilitar su proceso de inducción y fortalecer sus conocimientos sobre los lineamientos y procedimientos aplicables durante la ejecución del proyecto.

Durante la actividad se socializaron los principios y alcances de la arqueología preventiva, haciendo énfasis en la identificación, manejo y reporte oportuno de hallazgos fortuitos que puedan presentarse durante el desarrollo de las obras. De igual manera, se destacó la importancia de la protección, conservación y preservación del patrimonio arqueológico presente en el área de influencia del proyecto, promoviendo la responsabilidad individual y colectiva frente al cumplimiento de la normatividad vigente en esta materia.

Asimismo, se brindaron orientaciones relacionadas con las funciones y responsabilidades de cada colaborador, los lineamientos operativos establecidos para la ejecución de las actividades, los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, las disposiciones contractuales aplicables y los mecanismos de articulación con los diferentes componentes técnicos, ambientales, prediales, sociales y administrativos del contrato. También se resolvieron inquietudes de los participantes, permitiendo una mejor comprensión de los procedimientos internos y de los canales de comunicación establecidos por el proyecto.

Estas jornadas permiten el fortalecimiento de las competencias técnicas y operativas del personal recientemente vinculado, contribuyendo a una adecuada apropiación de los lineamientos institucionales y contractuales, así como al desarrollo eficiente, seguro y responsable de sus actividades dentro de la ejecución del proyecto vial.


Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119
consorciointerviasvision@gmail.com

### 4.9 PROYECTO GESTIÓN SOCIO PREDIAL. CÓDIGO PGS-6.9-26.

Durante el periodo objeto de reporte, no se presentaron actividades en este proyecto.

**OBSERVACIONES GENERALES:** Durante el mes de mayo de 2026, la gestión social del proyecto se ejecutó en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) y las obligaciones contractuales vigentes, registrando avances relevantes en los componentes de atención a la comunidad, participación ciudadana, divulgación de información, vinculación de mano de obra local y relacionamiento institucional a lo largo del corredor vial Neiva – San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia. En este periodo se mantuvieron operativos los diferentes mecanismos de atención y comunicación con la ciudadanía, tales como el Servicio de Atención al Usuario (SAU), los buzones satélites y el sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), permitiendo una gestión eficiente de los requerimientos presentados y un adecuado nivel de respuesta y cierre de solicitudes. De igual manera, se desarrollaron espacios de participación comunitaria, seguimiento ciudadano y articulación con entidades e instituciones del territorio fortaleciendo la transparencia, el acceso a la información y el control social sobre la ejecución del proyecto.

Asimismo, se destaca la vinculación de mano de obra local y de población con enfoque diferencial, contribuyendo al fortalecimiento de las dinámicas socioeconómicas en las áreas de influencia. De manera complementaria, se realizaron jornadas de capacitación dirigidas al personal vinculado al proyecto en temas de arqueología preventiva y seguridad vial, orientadas al fortalecimiento de capacidades, la promoción de buenas prácticas y el cumplimiento de los lineamientos técnicos y operativos establecidos.

No obstante, los resultados obtenidos, se identifican oportunidades de mejora relacionadas con la planificación y oportunidad en la ejecución de las Obras con Participación Comunitaria (OPC), el fortalecimiento de los procesos de revisión y validación de material informativo previo a su divulgación, así como la continuidad en la gestión y seguimiento de iniciativas estratégicas del componente social. En este sentido, se recomienda fortalecer los procesos de planeación, coordinación interinstitucional, seguimiento a compromisos y acciones de sensibilización dirigidas a las comunidades e instituciones con incidencia en el área de influencia del proyecto, promoviendo una participación activa e informada de los diferentes actores y contribuyendo a la consolidación de los resultados alcanzados y al mejoramiento continuo de la gestión social.

**MARIA ISABEL ARDILA CUBILLOS**
RP 2320 secretaria De Salud Del Caquetá
TP 137526 COLPSIC


Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119
consorciointerviasvision@gmail.com

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

# INFORME CONSOLIDADO MENSUAL PREDIAL
# MES-05-2026

## 1. DATOS DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA** | No 991 DE 2021<br>OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1 | | |
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | No 985 DE 2021<br>OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1 | | |
| **UNIDAD EJECUTORA** | GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE | | |
| **DIRECCIÓN TERRITORIAL** | **CAQUETA** | | |
| **VALOR BOLSA PREDIAL** | **1.031.878.397** | **No INFORME** | **055** |
| **VALOR EJECUTADO** | **74.375.000** | **MES** | **Mayo** |
| **VALOR POR EJECUTAR** | **957.503.397** | **AÑO** | **2026** |

## 2. AVANCES PREDIALES

| TRAMO (ABSCISAS INI-FINAL) | PREDIOS REQUERIDOS | No. MEJORAS REQUERIDAS | PERMISOS DE INTERVENCION | FICHAS APROBADAS | ESTUDIO DE TÍTULOS O DIAGNÓSTICOS APROBADOS | AVALÚOS APROBADOS | PREDIOS ADQUIRIDOS | MEJORAS ADQUIRIDAS | BALDÍOS ADJUDICADOS | VALOR GESTIÓN Y ADQUISICIÓN ACUMULADO MES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10+500 - 13+610 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+500- 20+500 | 24 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+160 – 38+555,3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **31** | **6** | **17** | **3** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| TRAMO (ABCSISAS INICIAL Y FINAL) | LONGITUD disponible (Km) | ESCRITURA A FAVOR DE INVIAS MES MARZO | TOTAL ESCRITURAS ACUMULADAS | MEJORAS A NOMBRE DE INVIAS MES MARZO | TOTAL MEJORAS ADQUIRIDAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Tramo 1 PR10+500 – PR13+500 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tramo 1 PR13+500 – PR20+500 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tramo 4 PR3+460-PR7+333 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **8** | **0** | 0 | 0 | 0 |

## 3. NIVELES DE CUMPLIMIENTO

Los niveles de cumplimiento serán medidos de acuerdo con la cantidad de predios proyectados en la metafísica del proyecto.

| DESCRIPCIÓN | diciembre de 2026 | |
|---|---|---|
| | CANT | % |
| Predios y mejoras | 0 | 0% |
| Fichas aprobadas por interventoría | 0 | 0% |
| Estudio de Títulos por interventoría | 0 | 0% |
| Avalúos aprobados por interventoría | 0 | 0% |

| Tramo 10+500 – 13+500 | Alcance | Ejecución año 2026 |
|---|---|---|
| # de predios totales a disponer | 5 | 0 |
| # de Mejoras totales a requerir | 3 | 0 |
| Longitud de predios requerido (m) | 3.000 | 0 |
| Área de predios requerida (m2) | | |
| Área de construcción requerida (m2) | | |
| Área de mejoras requeridas (m2) | | |

| Tramo 13+500 – 20+500 | Alcance | Ejecución año 2026 |
|---|---|---|
| # de predios totales a disponer | 24 | 0 |
| # de Mejoras totales a requerir | 4 | 0 |
| Longitud de predios requerido (m) | 7.000 | 0 |
| Área de predios requerida (m2) | | |
| Área de construcción requerida (m2) | | |
| Área de mejoras requeridas (m2) | | |

| Tramo 3+460 - 7+333 | Alcance | Ejecución año 2026 |
|---|---|---|
| # de predios totales a disponer | 2 | 0 |
| # de Mejoras totales a requerir | 0 | 0 |
| Longitud de predios requerido (m) | 3.800 | 0 |
| Área de predios requerida (m2) | | |
| Área de construcción requerida (m2) | | |
| Área de mejoras requeridas (m2) | | |

Se continua con la subsanación de observaciones por parte del contratista en aquellos que no tienen la obra ejecutada de conformidad con el diseño geométrico vigente.

## 4. TRASLADO DE RECURSOS.

A la fecha no se presenta traslado de recursos a la bolsa predial.

## 5. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES PREDIALES

Se presenta el avance en gestiones documentales por parte del contratista, avanza con la elaboración de insumos que no requieren actualización de diseño. Presenta una nueva lonja para elaboración de avalúos, sin embargo, se solicitó por parte interventoría motivar la presentación de cara al inicio del proceso de elaboración de avalúos al contar con una lonja aprobada a la fecha.

**SEGUIMIENTO A PREACTA PREDIALES PAGADAS Y EN TRÁMITES**

| **COMPONENTE PREDIAL - PROYECTO NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA** | | |
|---|---|---|
| **PAGOS EN DESARROLLO DE LA GESTION ADELANTADA EN EL PROYECTO** | | |
| PRE-ACTA No 52 | $ 74.375.000,00 | N/A |
| PRE-ACTA No 53 | $ 0 | |
| PRE-ACTA No 54 | $ 0 | |
| PRE-ACTA No 55 | $ 0 | |
| PRE-ACTA No 56 | $ 0 | |
| PRE-ACTA No 57 | $ 0 | |
| PRE-ACTA No 58 | $ 0 | |
| PRE-ACTA No 59 | $ 0 | |
| **TOTAL** | **$ 74.375.000,00** | |

El acumulado de las pre-actas prediales que cuentan con concepto de no objeción a la fecha suman $ 74.375.000,00.

**INTERVENTORÍA CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030**
**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN PREDIAL**

**MAYO DE 2026**

## INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de sus compromisos, la interventoría CONSORCIO INTERVÍAS VISIÓN 2030 presenta el informe mensual de actividades de vigilancia y control realizadas a la gestión predial del Contrato de Obra No 991-2021 “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" - MODULO 1” de acuerdo con lo establecido en el apéndice técnico F del citado contrato, el cual fija los parámetros, procedimientos y requisitos para desarrollar los procesos de Gestión y Adquisición Predial en los proyectos de competencia del Instituto Nacional de Vías (INVIAS).

## OBJETIVO

Informar las actividades realizadas por el área predial de la interventoría CONSORCIO INTERVÍAS VISIÓN 2030 entre el 01 y el 31 de mayo de 2026 dentro del contrato de interventoría N° 985-2021 “INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1”

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2026 se registra el siguiente avance de la gestión predial:



*Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119*
*consorciointerviasvision@gmail.com*

## 1. AVANCE DE LA GESTIÓN PREDIAL

| UNIDAD FUNCIONAL / TRAMO /TRAYECTO | Ruta 3001 Tramo 1 | Ruta 3001 Tramo 1 | Ruta 6503 Tramo 4 |
|---|---|---|---|
| Fecha inicio de obra o contrato | 29/06/2021 | 29/06/2021 | 29/06/2021 |
| Fecha Fin obra (entrega del Tramo) | 31/08/2030 | 31/08/2030 | 31/08/2030 |
| Longitud Proyecto (km) | 54 | 54 | 54 |
| Longitud efectiva predial total (km) | 3 | 7 | 3.8 |
| Predios requeridos | 5 | 24 | 2 |
| Predios con oferta notificada e inscrita | 0 | 0 | 0 |
| Predios disponibles o permisos de intervención | 5 | 10 | 2 |
| Longitud efectiva predial disponible (km) | 1.830,73 I - 3.098,42 D | 3.125,04 I - 3149,43 D | 3+460- 7+333 |
| Predios adquiridos por enajenación voluntaria | 0 | 0 | 0 |
| Predios adquiridos por expropiación judicial | 0 | 0 | 0 |
| Predios en expropiación | 0 | 0 | 0 |
| Total predios adquiridos | 0 | 0 | 0 |
| Predios faltantes por adquirir | 5 | 24 | 2 |
| Mejoras requeridas | 3 | 4 | 0 |



*Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119*
*consorciointerviasvision@gmail.com*

## 2. TRAZABILIDAD PREDIAL

| MES | INFORME No. | Predios total requeridos | Estudios de Títulos | Ficha Predial | Remisión avalúo | Avalúo | Ofertado | Oferta registrada | Promesa | Escritura | Disponible | Longitud Disponible | Adquirido | Longitud Adquirida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | … | | | | | | | | | | | | | |
| nov-24 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| dic-24 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| ene-25 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| feb-25 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| mar-25 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| abr-25 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| may-25 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| jun-25 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| jul-25 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| ago-25 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| sep-25 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| oct-25 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| nov-25 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Dic-25 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| ene-26 | 18 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| feb-26 | 19 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| mar-26 | 20 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Abr-26 | 21 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| may-26 | 22 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |



*Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119*
*consorciointerviasvision@gmail.com*

## 3. SEGUIMIENTO CRONOGRAMA PREDIAL

| ACTIVIDADES | | Requerimiento Total Proyectado | Cantidad Total Ejecutada | Prog. Diciembre 2026 (%) | Ejecutado diciembre 2026 (%) | Justificación y/o observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reconocimiento Predial | Elaboración de Levantamiento Predial | 1 | 1 | 100% | 100% | Actividad realizada al 100% |
| | Elaboración de la Tira Topográfica | 4 | 4 | 100% | 100% | Actividad realizada al 100% |
| | Elaboración de Inventario de Construcciones, mejoras, especies y cultivos | 37 | 17 | 43,24% | 45.95% | |
| Investigación Catastral | Elaboración de Relación entre ubicación de predios y Títulos de Propiedad según IGAC | 1 | 1 | 100% | 100% | Actividad realizada al 100% |
| | Elaboración de Sábana Predial | 1 | 1 | 100% | 100% | |
| | Elaboración de Tira Predial | 4 | 4 | 100% | 100% | |
| Insumos Primarios | Consecución de Permisos de Intervención | 37 | 17 | 100% | 45.95% | |
| | Elaboración de Planos Topográficos | 37 | 16 | 100% | 43.24% | |
| | Elaboración de Fichas Prediales | 37 | 16 | 100% | 43.24% | |



Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119
consorciointerviasvision@gmail.com

| ACTIVIDADES | | Requerimiento Total Proyectado | Cantidad Total Ejecutada | Prog. Diciembre 2026 (%) | Ejecutado diciembre 2026 (%) | Justificación y/o observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Elaboración de Estudios de Títulos | 31 | 14 | 100% | 45.16% | |
| | Elaboración de Diagnósticos Jurídicos | 6 | 2 | 100% | 33.33% | |
| | Elaboración de Avalúo comercial (propiedad con terreno, valoración componentes resolución 2684/ 2015, mejoras sn terreno) | 37 | 0 | 72.97% | 0% | |

Para el periodo evaluado se realizó la revisión de insumos técnico-jurídicos de los predios presentados, sin embargo, nuevamente se presenta el cuello de botella por parte del área técnica, problema que consiste en diseño que no han sido aprobados, pero ya ejecutados, diferencia entre los diseños aprobados y las modificaciones presentadas. Se procederá a oficiar al contratista alertando la situación en busca de continuar con una gestión predial normal.

## 4. SEGUIMIENTO RECURSOS Y PREACTAS

Para el periodo actual la pre-acta predial tiene un valor de cero pesos, con un acumulado de pre-actas por un valor $74.375.000,00.

**JULIÁN CAMILO ALZATE ACUÑA**
Profesional Técnico Predial Interventoría
M.P. 25222-408958 CND
**CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030**



*Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119*
*consorciointerviasvision@gmail.com*

Bogotá D.C., mayo de 2026

**SEÑORES**
**CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE.**
Atn. MENZEN RAFAEL AMIN AVENDAÑO
REPRESENTANTE LEGAL
CRA 2 No. 11-41 ED GRUPO AREA P22 BRR BOCAGRANDE
4441188 - 3147931569
CARTAGENA – BOLIVAR.

**REFERENCIA: Contrato de Interventoría No 985-2021** "INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1"

**Contrato de Obra No 991-2021** "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1"

**Asunto: Concepto jurídico** respecto del comunicado CVNSO-0991-199-2026 del 24/03/2026-insumos primarios entrega No. 4 del **Predio: 004-ID-01-MCNF-** Consecutivo anterior: C-245-4209-1783-25 del 29 de noviembre del 2025 y C-245-4225-1822-25 del 4 de diciembre de 2025.

Respetado ingeniero.

Dándole cumplimiento a lo establecido en el literal B del Apéndice Técnico F. respecto al insumo primario del del **Predio: 004-ID-01-MCNF.** Desde el componente jurídico ***no se tienen observaciones adicionales en la elaboración del estudio de títulos***. Por tal motivo, se aprueba el documento y se remite para lo pertinente.

No obstante, se recomienda migrar en el expediente digital las respuestas emitidas por la URT y la SAE, o en su defecto, las indagaciones o reiteraciones posteriores que hubiese efectuado a esas entidades el contratista, en consideración a las verificaciones enunciadas en el punto 7.4 del mencionado estudio de títulos.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

**SNHEYDER FIGUEROA BARRIOS**
Abogado predial de Interventoría.
**CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030.**



*Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119*
*consorciointerviasvision@gmail.com*

Bogotá D.C., mayo de 2026

**Señores**
**CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE.**
Atn. MENZEN RAFAEL AMIN AVENDAÑO
REPRESENTANTE LEGAL
CRA 2 No. 11-41 ED GRUPO AREA P22 BRR BOCAGRANDE
4441188 - 3147931569
CARTAGENA – BOLIVAR.

**REFERENCIA: Contrato de Interventoría No 985-2021** "INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1"

**Contrato de Obra No 991-2021** "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1"

**Asunto: Concepto jurídico** respecto del comunicado CVNSO-0991-200-2026 del 24/03/2026-insumos primarios entrega **No. 3**. **Predios: 002-D-01-MCNF y Mejora: 002-D01-MCNF-MJ01-** Consecutivo anterior: C-245-4158-1692-25 del 13 de noviembre del 2025.

Respetado ingeniero.

Dándole cumplimiento a lo establecido en el literal B del Apéndice Técnico F. respecto al insumo primario del del **Predios: 002-D-01-MCNF y Mejora: 002-D01-MCNF-MJ01.** Desde el componente jurídico ***no se tienen observaciones adicionales en la elaboración del estudio de títulos***. Por tal motivo, se aprueba el documento y se remite para lo pertinente.

No obstante, se recomienda migrar en el expediente digital las respuestas emitidas por la URT y la SAE, o en su defecto, las indagaciones o reiteraciones posteriores que hubiese efectuado a esas entidades el contratista, en consideración a las verificaciones enunciadas en el punto 7.4 del mencionado estudio de títulos.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

**SNHEYDER FIGUEROA BARRIOS**
Abogado predial de Interventoría.
**CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030.**



*Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119*
*consorciointerviasvision@gmail.com*

Bogotá D.C., mayo de 2026

**Señores**
**CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE.**
Atn. MENZEN RAFAEL AMIN AVENDAÑO
REPRESENTANTE LEGAL
CRA 2 No. 11-41 ED GRUPO AREA P22 BRR BOCAGRANDE
4441188 - 3147931569
CARTAGENA – BOLIVAR.

**REFERENCIA: Contrato de Interventoría No 985-2021** "INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1"

**Contrato de Obra No 991-2021** "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1"

**Asunto: Concepto jurídico** respecto del comunicado CVNSO-0991-228-2026 del 15/04/2026-insumos primarios entrega **No. 7**. **Predio: 013-D-01-MCNF-** Consecutivo anterior C-245-4436-0440-26 del 26 de febrero del 2026.

Respetado ingeniero.

Dándole cumplimiento a lo establecido en el literal B del Apéndice Técnico F. respecto al insumo primario del del **Predio: 013-D-01-MCNF.** Desde el componente jurídico ***se tienen las recomendaciones al estudio de títulos***:

- Se evidenció que el folio de matrícula inmobiliaria (FMI) cargado en Drive corresponde al 10 de febrero de 2025, mientras que el relacionado en los documentos objeto de estudio data del 19 de diciembre de 2025. Si bien se aporta consulta VUR de fecha 13 de mayo de 2026, se recomienda allegar el folio de matrícula inmobiliaria actualizado, en concordancia con la fecha de suscripción del análisis de títulos (13 de mayo de 2026), para efectos de verificación y cumplimiento del Apéndice Predial F.

- Se recomienda migrar en el expediente digital las respuestas emitidas por la URT y la SAE, o en su defecto, las indagaciones o reiteraciones posteriores que hubiese efectuado a esas entidades el contratista, en consideración a las verificaciones enunciadas en el punto 7.4 del mencionado estudio de títulos.

- En cuanto al estudio de títulos no se tienen observaciones adicionales que ameriten ajustes.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

**SNHEYDER FIGUEROA BARRIOS**
Abogado predial **CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030.**



*Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119*
*consorciointerviasvision@gmail.com*

## 5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC.

En este periodo no se presentó este programa.

# 5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS.

# MATRIZ DE RIESGOS

## LICITACION PUBLICA

## LP-DT-065-2020

## MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | A QUIEN SE ASIGNA | | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | INVIAS | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| 1 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Economico | **DESABASTECIMIENTO DEL MERCADO.** Posible salida del mercado y/o escazes de insumos o materias primas necesarias para la elaboración de las obras objeto del contrato. | Demora en la entrega de las obras. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | | X | El contratista deberá ubicar fuentes de suminsitros alternas que faciliten la continuidad en la ejecución de las obras. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si el insumo es materia prima básica puede afectarla, mientras se acuerda solución alterna. | Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | mensual |
| 2 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Economico | **Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato** en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc, regulados y no regulados por el Gobierno. Riesgo que asume el CONTRATISTA, cuando el ajuste sobrepase los establecidos contractualmente con el INVIAS. Riesgo que asume INVIAS hasta en los ajustes estipulados contractualmente. | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual - generación de solicitudes de reconocimiento económico | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | X | X | Aplicar la fórmula de ajustes determinada por el INVIAS. Vigilar los precios durante la etapa de la ejecución contractual | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | si | Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | mensual |
| 3 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Economico | **Riesgos de la salud:** Riesgo de generación y propagación de virus y/o enfermedades infecciosas tales como el COVID 19 | Impacto negativo en el avance previsto para el cumplimiento del objeto contractual. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | | X | Tanto en el proceso de selección de personal así como en la ejecución de las obras, El Contratista deberá implementar todas las medidas necesarias para evitar la propagación de enfermedades infecciosas y/o virus (como el COVID 19), tanto en los frentes de obra, como en su equipo administrativo y/o directivo, operativo así como en la comunidad aledaña a los frentes de obra. El Contratista deberá garantizar la presencia permanente de la totalidad del personal requerido en los frentes de trabajo y en las labores administrativas de la ejecución del mismo, y dando estricto cumplimiento en la continuidad del proyecto conforme al cumplimiento de sus obligaciones contractuales. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | si | Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | La Interventoría deberá verificar la implementación y cumplimiento de las medidas de Bioseguridad en los frentes de obra. | diario |
| 4 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Economico | **Riesgo de limitación en la movilidad:** por causa de salubridad pública en los Departamentos, Municipios, Veredas, corregimientos o sectores necesarios para acceder al proyecto o donde se desarrolle el mismo. | Atraso en el cronograma previsto para la ejecución de las obras | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | X | X | El Contratista deberá garantizar la presencia del personal y de los materiales y/o insumos necesarios para la ejecución de la obra, garantizando la existencia de los transportes necesarios para ellos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación por parte del Interventor de la gestión del Contratista en la planeación e implementación de las formas de acceso a los frentes de obra | mensual |
| 5 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Economico | **Riesgos laborales:** Riesgo de demandas laborales y/o civiles y/o administrativas provenientes de personas vinculadas por cualquier medio por el Contratista para el cumplimiento del objeto contractual cuyas causas se atribuyan a enfermedades, enfermedades infecciosas y/o muerte | Impacto económico al Contratista | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | | X | El Contratista deberá implementar todas las medidas necesarias para evitar la propagación de enfermedades infecciosas y/o virus (como el COVID 19), tanto en los frentes de obra, como en su equipo adminsitrativo y/o directivo, así como en la comunidad aledaña a los frentes de obra. El Contratista será el único responsable de cualquier consecuencia económica que por este efecto se derive. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación de la gestión del Contratista para la implementción de las medidas de bioseguridad que eviten la propagación de virus y/o enfermedades infecciosas. | semanal |
| 6 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Economico | **Riesgo Financiero de alteración del PAC:** Riesgo de alteración del PAC por circunstancias no imputables al INSTITUTO o por circunstancias de fuerza mayor o por estados de excepción decretados en el país. | Impacto económico a los flujos financieros del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | X | X | EL INSTITUTO deberá efectuar los trámites admnisitrativos que garanticen la disponibilidad de los recursos para la totalidad del plazo del contrato, así como los trámites para contar con el PAC de manera oportuna. Así mismo, se hará monitoreo constante a cualquier circunstancia que impacte la disponibilidad del PAC con el fin de adoptar las medidas que puedan superarlas. Así mismo, el Contratista deberá procesar las cuentas y sus facturas de manera oportuna dando estricto cumplimiento al cronograma de ejecución de obra. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación de las condiciones presupuestales del contrato | mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Sociales o Politicos | **Orden público:** Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas (INVIAS como órgano del Estado en armonía con los demás Entes). | Pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos, Interferencia en el desarrollo del proyecto. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar atrasos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio de la presentación del evento | A la terminación de la ocurrencia del evento | A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, de las Territoriales de INVIAS, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto. | Cuando se presente el evento |
| 8 | General | Interno | Ejecucion | Riesgo Operacional | **Accidentalidad:** Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del CONTRATISTA. | Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la via y trabajadores de la obra, Inconformidad con la obra por parte de la comunidad. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | | X | El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Inspecciones diarias del Interventor. Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Diario |
| 9 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | **Riesgos de estudios y diseños:** Por Ajuste y/o Actualizacion y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o complementación y/o unificación y/o adaptación y/o adecuaciones de estudios y diseños y/o elaboración de estudios realizados por el Contratista: Ocurre cuando se presentan afectaciones que pudieran modificar lo previsto en los estudios y diseños existentes originados por ejemplo en cambios en la naturaleza, en la geología del terreno, intervención Municipal, etc. | Retrasos en el cronograma de ejecución, variación de algunas obras del contrato y por ende de cantidades de obra. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | | X | Realizar una interventoría adecuada durante la etapa de Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto. Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | al inicio de la Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios | al final de la Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios | la Interventoría debe efectuar seguimiento continuo a través de sus Especialistas, al Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que los cambios que se requieran impacten lo menos posible al proyecto. | Semanal en la etapa de Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios |
| 10 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | **Riesgo de operación:** Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras. | Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | | X | Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos , ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas. | diario |
| 11 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | **Riesgo de Variación de cantidades de obra debidamente justificadas:** Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras. INVIAS asume las variaciones de las cantidades de obra técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias. | Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra, para ceñirse al presupuesto contractual. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Medio | X | X | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la ejecución de la obra . | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Análisis y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario. | mensual |
| 12 | Especifico | Interno | Ejecucion | Riesgo Operacional - Social | **Riesgo Expropiación Predial:** Se refiere al caso en el que se requiera recurrir al proceso de expropiacion. El contratista prestará la colaboración requerida en el proceso de expropiación | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por dificultad en gestión predial que afecta la ejecución del proyecto | 3 | 2 | 5 | Riesgo Bajo | X | X | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada a los diseños. Seguimiento constante a la actividad de expropiación en caso que se ejecute, diligencia en la gestión administrativa, legal y financiera para la menor demora posible. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Puede afectarla en cuanto depende de procesos legales | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio de la etapa de adquisición de predios | Al final de la etapa de adquisición de predios | Comites Técnicos, Seguimiento constante al proceso de expropiación, informes de los responsables de la gestión predial, requerimientos escritos-Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | semanal |
| 13 | Especifico | Interno | Ejecucion | Riesgo Operacional | **Riesgo de Adquisición Predial:** Mayor adquisicion predial por cambios requeridos justificados técnicamente. INVIAS asume el riesgo del costo predial con cargo al contrato; el Contratista efectua la gestion de la adquisicion predial. | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por gestión Y costo predial para las nuevas adquisiciones requeridas | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada a los diseños. Analizar los cambios de las condiciones técnicas tratando de ajustarlos para que no impacte negativamente el proyecto. Diligencia en la gestión administrativa, legal y financiera para la menor demora posible en la adquisición. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Puede demorar la ejecución en cuanto depende de terceros. | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio de la etapa de adquisición de predios | Al final de la etapa de adquisición de predios | Comites Técnicos, Seguimiento constante al proceso de adquisición predial, informes de los responsables de la gestión predial, requerimientos escritos-Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | semanal |
| 14 | Especifico | Interno | Ejecucion | Riesgo Operacional | **Riesgo de Logistica:** Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o propuestas y/o proyectadas por el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo. Le corresponde al Contratista verificar en la región del proyecto las fuentes de materiales a emplear. | Impacto económico al Contratista | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | | X | Disponer y asegurar las fuentes de los suministros e los insumos reuqeridos para la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | En la planeación del proyecto y en la etapa precontractual | A la terminación de la ejecución del contrato | Comites Técnicos, Seguimiento a la ejecución de la obra, suministro de materiales acorde con las especificaciones técnicas contractuales, verificación de pagos con precios contractuales, sin reajustes por distancias de acarreo de materiales. informes de interventoría. | mensual |
| 15 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo de la Naturaleza | **Riesgo Técnico:** Inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológica. El riesgo puede surgir en taludes, en excavaciones a cielo abierto, efectos de erosión de márgenes de los ríos, los cualespueden requerir de tratamiento especial de refuerzo, soporte, drenajes, tratamiento de taludes, contenciones y/o de las actividades necesarias para dar estabilidad a sitios y obras. Pueden estar asociados con mayores inversiones, mayores cantidades de obra y mayores plazos. EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA asumirá los riesgos geológico, geotécnico e hidrogeológicos identificados, y los que debio identificar en el ajuste y/o elaboracion de estudios y diseños y los que se presenten durante la ejecución del contrato. El INVIAS asume el Riesgo por concepto de mayores cantidades de obra que sean necesarias, siempre y cuando no sean de responsabilidad del Contratista. | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, Aumento de costos por necesidad de mayores cantidades de obra, ítems nuevos y eventuales mayores plazos | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | X | X | Monitoreo del corredor vial por parte de Especialistas en Geotecnia para recomendar medidas preventivas, correctivas ó de mitigación de las inestabilidades observadas. Análisis e implementación de medidas pertinentes con este fin, contemplando de ser necesario la elaboración de estudios respectivos. En las emergencias que se presenten, atención inmediata de las mismas dando prioridad a las obras de transitabilidad y seguridad vial; recomendación de especialistas para solución definitiva, provisional ó de mitigación, análisis e implementación. En todos los casos, adoptar las medidas contractuales a que haya lugar, en cuanto a mayores cantidades de obra y plazos si fuere necesario. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | En emergencias de gran magnitud puede afectarse la ejecución del contrato. | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Visitas y recomendaciones de Especialistas, Análisis de Contratista e Interventor y si es necesario participación del INVIAS, Comités Técnicos, Seguimiento a implementación de medidas preventivas, correctivas ó de mitigación, Informes respectivos, requerimientos escritos-Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Al inicio del contrato, cuando se detecten nuevos sitios inestables, cuando se presenten emergencias. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | **Riesgo de Interferencia:** Interferencia con las de redes de servicios públicos existentes: Ocurre por la presencia de redes existentes, que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las obras. El Contratista deberá realizar todas las gestiones que correspondan. EL INVIAS asumirá los costos que corrrespondan. | Posibles prórrogas contractuales | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | X | X | En la ejecución contractual solicitar a las Entidades encargadas de Servicios Públicos informar con el mayor detalle posible sobre la existencia de redes de servicios que puedan interferir con el proyecto. En caso de detección de una red no referenciada, gestionar de inmediato lo pertinente con la Empresa de Servicios, para la menor afectación al proyecto. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Fase precontractual, y cuando se detecte la existencia de redes de servicio público que interfieran con el proyecto | cuando se solucione la interferencia de las redes de servicio público existentes | Seguimiento permanente a la Gestión para solucionar la interferencia de redes de servicios públicos existentes. Informes de resultados, requerimientos escritos. | Cuando se presenta la interferencia, segurimiento semanal |
| 17 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | **Riesgo Financiero:** Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconomicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto. | Impacto económico al Contratista | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | | X | Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Inicio del contracto | A la terminación de la ejecución del contrato | Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato. | Mensual |
| 18 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | **Expedición y/o modificación de normas:** Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación pública, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas. | Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | | Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Fase precontractual, y cuando se expida la nueva nomatividad que pueda afectar el contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos. | Mensual |
| 19 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Ambiental | **Gestion Ambiental:** Demora en la obtención de licencias y/o permisos ambientales. | Retraso en la Ejecucion de la obra. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | | X | Seguimiento por parte del Contratista y del Interventor a la gestión documentada del contratista para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones ambientales. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | Una vez obtenida la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales | Verificación de la gestión realizada y sus resultados, por parte de Especialista Ambiental del Interventor. Comites Técnicos, Seguimiento a informes ambientales por parte de la Supervisión ambiental, requerimientos escritos-Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | semanal |
| 20 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Ambiental | **Pasivos Ambientales:** Pasivos ambientales existentes así como los generados en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental. | Impacto Negativo por efectos en la Ejecución del Proyecto | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | | X | Seguimiento por parte del Contratista y del Interventor a los procesos constructivos, para evitar que se generen pasivos ambientales por esta causa, acompañamiento de Especialistas Ambientales del proyecto cuando sea necesario. Una vez causados, exigir el cumplimiento de las medidas compensatorias de los mismos impuestas por la autoridad ambiental. Seguimiento por parte de la Subdirección del Medio Ambiente. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Comites Técnicos, Seguimiento por parte del Especialista Ambiental de la Interventoría. Seguimiento a informes ambientales por parte e la supervisió ambiental, requerimientos escritos-Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | semanal |
| 21 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Ambiental | **Ambiental:** Riesgos derivados de las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de los permisos y autorizaciones ambientales, tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo, control y seguimiento. También riesgos de las condiciones ambientales o ecologicas exigidas, y de la ejecución de actividades como la explotacion minera, ocupacion de cauces e intervenciones forestales sin los debidos permisos de las autoridades ambientales. | Genera incumplimiento ambiental que puede afectar la ejecución del proyecto y ocasiona sanciones de las entidades ambientales competentes. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | | X | Aplicación de la normatividad ambiental y exigencia de la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales al contratista. Verificación de cumplimiento del contratista de las obligaciones que emanan de los mismos. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Constratista-Interventoria | Al inicio de la ejecución del contrato | A la liquidación del contrato con el cierre ambiental | Verificación del Cumplimiento de las normas ambientales y de las obligaciones ambientales del contratista. Visitas e Informes de los Especialistas Ambientales del Proyecto. Informes de Interventoría Ambiental. Requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | mensual |
| 22 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social | **Social**: Riesgo asociado al proceso de consulta previa que realice el Contratista que estén en cabeza de éste. Así mismo es el riesgo asocidado a cualquier alteración en la ejecución del proyecto que se genere por efectos de la comunidad aledaña al mismo. | Inconformidad de la comunidad en proceso de consulta previa por la socialización del proyecto y ejecución de la obra, puede generar atrasos en la ejecución de la obra. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | | X | Seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos que así lo requieran. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la comunidad. Seguimiento al proceso en conjunto con el Ministerio del Interior. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la liquidación del contrato con el cierre ambiental | Visitas de seguimiento y control para garantizar el Seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Seguimiento al proceso en conjunto con el Ministerio del Interior. | semanal mientras se resuelve la consulta previa |
| 23 | General | Externo | Ejecución | Riesgo de la naturaleza | **Fuerza mayor asegurable**. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del contratista. Riesgo que asume el CONTRATISTA. Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a cargo de INVIAS. | Demora en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes del Contratista | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | | X | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del contratista, tales como ubicación de campamentos y oficinas, maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de seguridad industrial para protección del personal en dichos eventos, etc. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Etapa precontractual | Una vez instalado el contratista en el proyecto e implementado el plan de seguridad industrial con las debidas revisiones. | Revisiones de expertos del contratista en los tratamientos y controles a ser implementados | Determinadas por los expertos del contratista en esta materia |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | General | Externo | Ejecución | Riesgo político-social, Riesgo de la naturaleza | **Fuerza mayor no asegurable.** Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros, (INVIAS como órgano del Estado en armonía con los demás Entes). Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente. | Interferencia en la ejecución del proyecto, pérdidas de bienes de la nación ó del contratista, cambios en las obras por necesidad de ajustar diseños | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | **X** | X | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de aparición de hallazgos arqueológicos o yacimientos mineros en la región del proyecto, para advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendiente a mitigar el impacto. Ante la aparición del evento efectuar los ajustes de diseño para las modificaciones a que hubiere lugar en la ejecución del proyecto. En caso de guerra tratar y acordar con INVIAS el tratamiento contractual al proyecto | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Etapa precontractual | A la terminación de la ejecución del contrato | Revisión de la información obtenida, para tomar las medidas a que haya lugar | En la etapa precontractual y en la contractual cuando se presente el evento. |

Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente proceso.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

# EVALUACIÓN MATRIZ DE RIEGO CONTRATO DE OBRA 991 DE 2021

## CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

**CONTRATO de Interventoría 985-2021 OBJETO**: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1.

**Contrato de Obra No 991-2021** "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1"

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**

**DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CAQUETA**

**2026**

**EVALUACIÓN MATRIZ DE RIESGO**
**CONTRATO No.991 DE 2021**
**PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DE 2026**

***Desabastecimiento del mercado.*** *Posible salida del mercado y/o escasez de insumos o materias primas necesarias para la elaboración de las obras objeto del contrato.*

**Riesgo que permanece inactivo.**

***Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc., regulados y no regulados por el Gobierno.*** *Riesgo que asume el CONTRATISTA, cuando el ajuste sobrepase los establecidos contractualmente con el INVIAS. Riesgo que asume INVIAS hasta en los ajustes estipulados contractualmente.*

**Riesgo que permanece inactivo.**

***Riesgos de la salud:*** *Riesgo de generación y propagación de virus y/o enfermedades infecciosas tales como el COVID 19*

**Riesgo que permanece inactivo.**

***Riesgo de limitación en la movilidad:*** *por causa de salubridad pública en los Departamentos, Municipios, Veredas, corregimientos o sectores necesarios para acceder al proyecto o donde se desarrolle el mismo.*

**Riesgo que permanece inactivo.**

***Riesgos laborales:*** *Riesgo de demandas laborales y/o civiles y/o administrativas provenientes de personas vinculadas por cualquier medio por el Contratista para el cumplimiento del objeto contractual cuyas causas se atribuyan a enfermedades, enfermedades infecciosas y/o muerte.*

**Riesgo que permanece inactivo.**

***Riesgo Financiero de alteración del PAC:*** *Riesgo de alteración del PAC por circunstancias no imputables al INSTITUTO o por circunstancias de fuerza mayor o por estados de excepción decretados en el país.*

Persiste la solicitud del contratista por demoras en el trámite y pago de facturas, dejando constancia en toda la correspondencia con la siguiente nota.

*"se deja expresa, clara e inequívoca constancia de que la Entidad Contratante persiste en un incumplimiento grave, reiterado y sistemático de su obligación de pago, toda vez que desde mediados de julio de la vigencia 2025 ha efectuado pagos tardíos respecto de la totalidad de las facturas radicadas y, adicionalmente, en lo corrido de la vigencia 2026 no ha realizado pago alguno a favor del Contratista por las actividades ejecutadas dentro del Contrato No. 991 de 2021.*
*Como consecuencia de dicha situación, el Contratista se ha visto obligado a asumir con recursos propios la financiación del Proyecto por la suma de VEINTINUEVE MIL TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($29.037.599.199)., valor que no incluye los intereses moratorios causados como consecuencia del pago tardío e injustificado de las obligaciones a cargo de la Entidad.*
*Se resalta de manera categórica que las actividades correspondientes a la vigencia 2026 han sido ejecutadas de manera integral por el Contratista, sin que a la fecha exista pago alguno por parte de la Entidad, circunstancia que evidencia una cesación total de pagos y agrava sustancialmente la afectación financiera advertida de Manera reiterada por este Contratista."*
**Riesgo activo durante este periodo.**

***Orden público:*** *Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas (INVIAS como órgano del Estado en armonía con los demás Entes.*

*Durante el periodo del mes de mayo de 2026, se persisten amenazas extorsivas al contratista, mediante mensajes de WhatsApp, que representa un factor de riesgo para la continuidad de las actividades que adelanta el contratista en el corredor vial del proyecto 135, particularmente en el tramo Balsillas – Minas Blancas.*
*Cabe destacar que, si bien el riesgo de seguridad por orden* ***público*** *se mantiene activo,* ***hasta la fecha no ha generado retrasos ni suspensiones*** *en la ejecución de las*

*actividades del proyecto, sin embargo, ha afectado la atención de emergencias en la ruta 3002.*

**Riesgo activo durante este periodo.**

***Accidentalidad:*** *Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del CONTRATISTA.*

***El riego permanece inactivo****, se hacen las recomendaciones y solicitudes al contratista por parte de la interventoría para el aseguramiento y señalización en todas las áreas de intervención del proyecto con el fin de prevenir accidentes.*

***Riesgos de estudios y diseños: Por Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o complementación y/o unificación y/o adaptación y/o adecuaciones de estudios y diseños y/o elaboración de estudios realizados por el Contratista:*** *Ocurre cuando se presentan afectaciones que pudieran modificar lo previsto en los estudios y diseños existentes originados por ejemplo en cambios en la naturaleza, en la geología del terreno, intervención Municipal, etc.*

Se están atendiendo en su medida los cambios y/o ajustes de acuerdo con el avance de las obras.

Se presenta una posible controversia en el marco del Proyecto 135 – Ruta Nacional 3001, específicamente en los tramos PR12+950 y PR15+000 a PR15+450. El contratista sostiene que dichos sectores deben ser considerados como sitios atípicos adicionales, lo cual implicaría la elaboración de nuevos diseños y el consecuente reconocimiento económico por tales actividades.

Por su parte, la interventoría reitera que estos tramos deben ser ajustados conforme a los Estudios y Diseños Fase III previamente aprobados, en tanto constituyen la base técnica y contractual vigente. En este sentido, la discusión se centra en determinar si corresponde reconocer la elaboración de diseños adicionales o si, por el contrario, el contratista debe ceñirse a los estudios existentes, garantizando la continuidad del proyecto bajo el marco normativo y contractual aplicable.

**El riesgo permanece inactivo.**

***Riesgo de operación:*** *Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras.*

**El riesgo permanece inactivo.**

***Riesgo de Variación de cantidades de obra debidamente justificadas:*** *Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras. INVIAS asume las variaciones de las cantidades de obra técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias.*

**El riesgo permanece inactivo.**

***Riesgo Expropiación Predial:*** *Se refiere al caso en el que se requiera recurrir al proceso de expropiación. El contratista prestará la colaboración requerida en el proceso de expropiación.*

**El riesgo permanece inactivo.**

***Riesgo de Adquisición Predial:*** *Mayor adquisición predial por cambios requeridos justificados técnicamente. INVIAS asume el riesgo del costo predial con cargo al contrato; el Contratista efectúa la gestión de la adquisición predial.*

- En el tramo comprendido entre PR10+500 al PR13+500 se tiene un total de (10) gestiones prediales diez - (6) predios con titularidad y (4) Mejoratarios.
- En el tramo comprendido entre los PR13+500 al PR20+500 Se tienen aproximadamente 24 Predios identificados.
- Ruta 6504 (Vía Minas Blancas-Puerto Rico):
  En la ruta 6504 hasta la fecha se han evidenciado dos (2) requerimientos prediales. PR9+060 y PR23+740

**El riesgo permanece inactivo**

***Riesgo de Logística: Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o propuestas y/o proyectadas por el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.*** *Hace referencia al riesgo técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo. Le corresponde al Contratista verificar en la región del proyecto las fuentes de materiales a emplear.*

**Riesgo Inactivo.** El contratista cuenta con los proveedores que se ajustan a sus requerimientos.

***Riesgo Técnico:*** *Inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológica. El riesgo puede surgir en taludes, en excavaciones a cielo abierto, efectos de erosión de márgenes de los ríos, los cuales pueden requerir de tratamiento especial de refuerzo, soporte, drenajes, tratamiento de taludes, contenciones y/o de las actividades necesarias para dar estabilidad a sitios y obras. Pueden estar asociados con mayores inversiones, mayores cantidades de obra y mayores plazos. EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA asumirá los riesgos geológicos, geotécnico e hidrogeológicos identificados, y los que debió identificar en el ajuste y/o elaboración de estudios y diseños y los que se presenten durante la ejecución del contrato. El INVIAS asume el Riesgo por concepto de mayores cantidades de obra que sean necesarias, siempre y cuando no sean de responsabilidad del Contratista.*

**En el periodo el riesgo se activa** debido a las fuertes precipitaciones que afectan la estabilidad de las laderas, genera procesos de remoción de masas, hundimientos y por ende afecta la transitabilidad de la ruta 3002.

***Riesgo de Interferencia:*** *Interferencia con las de redes de servicios públicos existentes: Ocurre por la presencia de redes existentes, que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las obras. El Contratista deberá realizar todas las gestiones que correspondan. EL INVIAS asumirá los costos que correspondan.*

**El riesgo permanece inactivo.**

***Riesgo Financiero:*** *Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconómicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto.*

**El riesgo Permanece inactivo.**

***Gestión Ambiental:*** *Demora en la obtención de licencias y/o permisos ambientales.*

Es importante recalcar lo estipulado en la cláusula décima primera (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA), numeral 5, del contrato 991 de 2021, establece lo siguiente:

> *"(…)5.* ***Abstenerse de adelantar intervención alguna*** *a los recursos* ***sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente*** *(cuando aplique intervenciones) …"*
>
> El apéndice D. Gestión Ambiental, es muy claro en mencionar lo siguiente, con respecto a este tema:
>
> *"(…) El contratista en* ***ningún caso puede adelantar actividades constructivas sin contar con los permisos y/o autorizaciones ambientales que lo requieran****, por lo tanto, la interventoría debe verificar el estado de los mismos previo al inicio de la obra y de ser* ***necesario ordenar la suspensión inmediata y adelantar las acciones pertinentes****… (Negrita Cursiva Fuera de Texto Original).*

A la fecha el CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE, ha adelantado la solicitud para la obtención de los permisos requeridos.

Para el tramo del PR13+500 al PR 20+500 del corredor vial Neiva – Balsillas, se tiene la siguiente trazabilidad:

| Permisos Ambientales con la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM | | | |
|---|---|---|---|
| **Permiso** | **Ubicación** | **Acto Administrativo** | **Estado** |
| Aprovechamiento forestal | Ruta 3001 | Resolución No. 1916 del 27 de junio de 2025 | Con el comunicado CVNSO-0991-262-2026 del 05 de mayo de 2026, se solicita prórroga del permiso |
| Aprovechamiento forestal | PR10+500 al PR13+500 Ruta 3001 | Resolución 2330 del 07 de septiembre de 2022 | Se tiene concepto favorable de la visita a la compensación ambiental a través del ACTA NO. 5359 de 27 de noviembre de 2025<br>Pendiente acto administrativo |
| Concesión de aguas | Quebrada la Cruz | Resolución No. 2181 del 26 de agosto de 2022 | Sin novedad |
| Emisiones atmosféricas | Predio el Guayabo | Resolución No. 3784 del 01 de diciembre de 2023 | Sin novedad |
| Recolección de especímenes silvestres | Ruta 3001 | Resolución No. 3220 del 24 de septiembre de 2024 | Sin novedad |
| Concesión de aguas | PR15+080 Ruta 3001 | Resolución No. 4206 del 25 de noviembre de 2024 | Con el oficio 13634 2026 – S del 08 de mayo de 2026, la Corporación realiza un requerimiento relacionado con las obras de captación |

| Tramite Permisos Ambientales con la CAM | | |
|---|---|---|
| **Permiso** | **Ubicación** | **Estado** |
| Gestor RCD | Predio las Nieves | Mediante comunicado CVNSO-0991-434-2025 del 02 de julio de 2025, el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente solicita pronunciamiento a la CAM frente al tramite |
| Ocupación de cauce | PR13+973 Ruta 3001 | Pendiente radicar solicitud permiso |
| Ocupación de cauce | PR13+551 Ruta 3001 | |
| Ocupación de cauce | PR16+188 Ruta 3001 | |

Avance en la ejecución de los Estudios y Diseños en Fase III para la atención de los puntos con condiciones especiales, atípicos o no considerados inicialmente en los corredores viales:

- Falla geológica PR30 - PR32 RUTA 6504

- Hundimiento PR52+00 RUTA 6504

- Perdida de banca PR23+100 RUTA 3001

- Deslizamiento PR40+270 RUTA 3001

- Perdida de banca PR01+380 RUTA 3002

- Muro de contención PR72+120 RUTA 3002

- Perdida de banca PR07+850 RUTA 3002

- Perdida de banca PR16+000 RUTA 3002

Para el tramo el corredor vial Florencia- Puerto Rico- San Vicente del Caguán- Mina Blanca, se tiene la siguiente trazabilidad:

## CORPOAMAZONIA

| Permisos Ambientales con la Corporación Autónoma Regional de la Amazonia- CORPOAMAZONIA | | | |
|---|---|---|---|
| **Permiso** | **Ubicación** | **Acto Administrativo** | **Estado** |
| Ocupación de cauce | PR38+200 Ruta 6503 | Resolución No. 1883 del 23 de noviembre de 2023 | En cumplimiento al numeral 5 del articulo 4, el 05 de mayo de 2026, se remite el informe de las medidas de manejo ambiental |
| Ocupación de cauce | PR42+600 Ruta 6503 | Resolución No. 0790 del 31 de mayo de 2023, se prorroga con la Resolución No. 0690 | Con la Resolución No. 0415 del 27 de marzo de 2026, se prorroga el permiso |
| Emisiones Atmosféricas | PR5+300 Ruta 6504 | Resolución No. 1382 del 26 de julio de 2022 | El 12 de mayo de 2026, se remite a la Corporación soporte de pago por servicio de seguimiento ambiental |
| Ocupación de cauce | PR4+817 Ruta 6504 | Resolución No. 0050 del 26 de enero de 2023 | El 16 de abril de 2026, el Contratista informa sobre la finalización de las obras autorizadas a través de este permiso. |
| Ocupación de cauce | PR0+000 al PR7+000 y del PR38+000 al PR49+000 de la ruta 6504 | Resolución No. 1881 del 23 de noviembre de 2023 | El 8 de mayo de 2026, se remite el informe de las medidas de manejo ambiental implementadas, en cumplimiento al numeral 5 del artículo cuarto. |
| Concesión de aguas | Quebrada Arenoso y las Ceibas | Resolución No. 1366 del 22 de julio de 2022 | El 20 de marzo de 2026, se realizó visita de seguimiento por parte de la Corporación |

| Permisos Ambientales con la Corporación Autónoma Regional de la Amazonia- CORPOAMAZONIA | | | |
|---|---|---|---|
| **Permiso** | **Ubicación** | **Acto Administrativo** | **Estado** |
| Ocupación de cauce | Batea PR38+200 ruta 6503 | Resolución No. 1556 del 31 de octubre de 2024 | Sin novedad |
| Ocupación de cauce | PR9+300 Ruta 6504 Puente Águila | Resolución No. 0702 del 18 de junio de 2025 | El 29 y 30 de abril de 2026 se realizó visita de seguimiento por la Corporación |
| Ocupación de cauce | PR5+660 al PR7+500 | Resolución No. 0904 del 17 de julio de 2025 | Sin novedad |
| Aprovechamiento forestal | PR38+200 Vía la Montañita Paujil | CT-DTC-0070 del 2 de mayo de 2025 | Pendiente compensación ambiental |
| Ocupación de cauce | Puente Riecito PR23+400 Ruta 6504 | Resolución No. 0686 del 16 de junio de 2025, se resuelve recurso de reposición con la Resolución No. 0928 del 24 de julio de 2025 | Se realizo visita de seguimiento por la Corporación los días 29 y 30 de abril de 2026 |
| Concesión de aguas | Quebrada el Águila | Resolución DTC-0453 del 5 de mayo de 2025 | El 29 y 30 de abril de 2026, se realizó visita de seguimiento por parte de la Corporación |
| Recolección especímenes | Puerto Rico – San Vicente | Resolución No. 0315 del 10 de marzo de 2026 | Sin novedad |

| Tramite Permisos Ambientales con la Corporación Autónoma Regional de la Amazonia - CORPOAMAZONIA | | |
|---|---|---|
| **Permiso** | **Ubicación** | **Estado** |
| Licencia Ambiental | Autorización temporal 593959 | Sin novedad |
| Aprovechamiento Forestal | PR0+000 al PR7+000 y del PR38+000 al PR49+000 de la ruta 6504 | Pendiente pronunciamiento de la Corporación. |

*Con base a los anteriores cuadros en donde se establecen los tramites y permisos con la CAM, se presenta la negación a solicitud de permisos de ocupación de cause en la ruta 3001 mediante resolución 004794 de 2025, lo cual genera atraso en la ejecución de las obras, presentando un* ***riesgo activo.***

***Pasivos Ambientales****: Pasivos ambientales existentes, así como los generados en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental.*

**Riesgo que permanece inactivo.**

***Ambiental:*** *Riesgos derivados de las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de los permisos y autorizaciones ambientales, tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo, control y seguimiento. También riesgos de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas, y de la ejecución de actividades como la explotación minera, ocupación de cauces e intervenciones forestales sin los debidos permisos de las autoridades ambientales.*

**Riesgo que permanece inactivo**

***Social:*** *Riesgo asociado al proceso de consulta previa que realice el Contratista que estén en cabeza de éste. Así mismo es el riesgo asociado a cualquier alteración en la ejecución del proyecto que se genere por efectos de la comunidad aledaña al mismo.*

**Riesgo que permanece inactivo.**

***Fuerza mayor asegurable.*** *Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria,*

*personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del contratista. Riesgo que asume el CONTRATISTA. Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a cargo de INVIAS.*

**Riesgo que permanece inactivo.**

***Fuerza mayor no asegurable.*** *Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros, (INVIAS como órgano del Estado en armonía con los demás Entes). Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente.*

**Riesgo que permanece inactivo.**

## 5.60 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES**CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA.**

En este periodo no se presentó.

## **SEGUIMIENTO ESTADO DEL TRÁMITE CERTIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD DE LOS PLANOS CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIG) DE LA ENTIDAD.**

No Aplica para este periodo.

# 6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

# 6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 2 |

FECHA: 31/05/2026 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

## CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** MAYO **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 985 DE 2021 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

**CONTRATO DE OBRA No.** 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

| EQUIPOS Y VEHÍCULOS | DESCRIPCIÓN | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camioneta WLF668 | DUSTER 2000 CC 4X4 | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I |
| Camioneta IMQ033 | DUSTER 2000 CC 4X4 | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I |
| Camioneta WCZ002 | NISSAN 2488 CC 4X4 | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I |
| Computador | HP 255 G7 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Computador | ASUS NOTE BOOK PC | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Computador | LENOVO E490 | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I |
| Computador | LENOVO THINKBOOK 14-IML | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I |
| Computador | LENOVO IDEAPAD SLIM 3 | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I |
| Computador | ASUS ALL IN 1 | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I |
| Computador | LENOVO EDEAPAD 3 RYZEN 5 | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I |
| Computador | ASUS S510U | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I |
| Computador | LENOVO IDEAPAD SLIM 3 | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | | | | | | | | | | | | |
| Computador | LENOVO IDEAPAD SLIM 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I |
| Computador | LENOVO THINKBOOK 14-IML | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I |
| Computador | ASUS VIBOOK 1415 | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I |
| Computador | HP ALLIN ONE 22DD0XXX | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I |
| Computador | ACER ASPIRE 5 | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I |
| Computador | LENOVO IDEAPAD SLIM 3 | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I |
| Computador | ASUS X542U | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I |
| Computador | Lenovo ThinkBook 15-IML | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I |
| Computador | HP PROBOOK 450 G10 | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I |
| Computador | LENOVO E490 | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I |
| Celular | REDMI NOT 8 PRO | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Celular | SAMSUNG A14 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Celular | IPHONE 11 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Celular | IPHONE 16 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Celular | SAMSUNG A53 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Celular | IPHONE 13 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Celular | REDMI NOTE 13 PRO | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Celular | IPHONE 16E | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Celular | HUAWEI AQM - LX1 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Celular | REDMI 12 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celular | IPHONE 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Celular | IPHONE 14 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celular | IPHONE 17 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Celular | REDMI NOTE 13 PRO | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Celular | SAMSUNG FE S20 | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | | | | | |
| Celular | TECNO SPARK | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | | | | | |
| Celular | MOTOROLA G70 | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | | | | | |
| Celular | IPHONE 11 | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | | | | | |
| Celular | SAMSUNG FE S20 | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | | | | | |
| Celular | IPHONE 11 | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | | | | | |
| Celular | IPHONE 15 PRO | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | | | | | |
| Celular | MOTO G22 | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | | | | | |
| Estación Total | GEOMAX - 2104383 | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | | | | | |
| Nivel Automatico | SOKKIA - WS059736 | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | | | | | |
| Estación Total | TOPCON - 274737 | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | | | | | |
| Nivel Automatico | TOPCON AT-B4 - RX6893 | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | | | | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

**RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:**

ESTACION TOTAL TOPCON 18/09/2026
NIVEL AUTOMATICO SOKKIA 18/09/2026
ESTACION TOTAL GEOMAX 16/07/2026
NIVEL AUTOMATICO TOPCON AT-B4 16/07/2026
CAMIONETA IMQ033 DUSTER 2000 CC 4X4 **SOAT**: 30/11/2026 **TÉCNICO MECÁNICA**: 27/11/2026
CAMIONETA WFL-668 CC **SOAT**:8/11/2026 **TÉCNICO MECÁNICA**:15/10/2026
CAMIONETA WCZ002 2488 CC **SOAT**:25/07/2026 **TÉCNICO MECÁNICA**:20/06/2026

**EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.**

**NOTAS:**

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: WILSON ANDRES PARRA MORALES
Director de Interventoría
Matricula No.: 15202138865BYC

Firma
Nombre: KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No. : 19202-426785

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# 6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: jun-26 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 985 DE 2021

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** may-26

**PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

**CONTRATO DE OBRA No.:** 991 DE 2021

**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

**NOMBRE ARL:** COLPATRIA

**NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACA - COMFAMILIAR $ 0,97089

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILSON ANDRES PARRA MORALES | 7182325 | DIRECTOR | $ 11.211.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | CIV2030 | $ 11.211.000 | $ 780.300 | V | NUEVA EPS S.A | 9504480070 | $ 448.500 | PORVENIR | 9504480070 | $ 1.906.000 | $ 448.500 | | | |
| 2 | HECTOR ORLANDO GUIO GARCIA | 7171395 | RESIDENTE | $ 6.883.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | CIV2030 | $ 6.883.000 | $ 479.100 | V | NUEVA EPS S.A | 9504480070 | $ 275.400 | PORVENIR | 9504480070 | $ 1.101.300 | $ 275.400 | | | |
| 3 | RAFAEL MERCADO OCHOA | 73190143 | RESIDENTE | $ 6.883.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | CIV2030 | $ 6.883.000 | $ 479.100 | V | SURA | 9504480070 | $ 275.400 | COLFONDOS | 9504480070 | $ 1.101.300 | $ 275.400 | | | |
| 4 | YUDY PAOLA GÓMEZ SIERRA | 1057590973 | ING. AUXILIAR RESIDENTE | $ 5.890.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | CIV2030 | $ 5.890.000 | $ 410.000 | V | NUEVA EPS S.A | 9504480070 | $ 235.600 | PORVENIR | 9504480070 | $ 942.400 | $ 235.600 | | | |
| 5 | ANDRES FERNANDO CASTIBLANCO | 1057600966 | ING. AUXILIAR RESIDENTE | $ 5.890.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | CIV2030 | $ 5.890.000 | $ 410.000 | V | SALUD TOTAL | 9504480070 | $ 235.600 | COLPENSIONES | 9504480070 | $ 942.400 | $ 235.600 | | | |
| 6 | MARIA ISABEL ARDILA CUBILLOS | 40093358 | PROFESIONAL SOCIAL | $ 5.960.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | CIV2030 | $ 5.960.000 | $ 414.900 | V | NUEVA EPS S.A | 9504480070 | $ 238.400 | PORVENIR | 9504480070 | $ 953.600 | $ 238.400 | | | |
| 7 | YENY PATRICIA CUELLAR SANCHEZ | 34319819 | PROFESIONAL AMBIENTAL | $ 5.960.000 | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | 40% | CIV2030 | $ 2.384.000 | $ 166.000 | V | SANITAS | 9504480070 | $ 95.400 | SKANDIA | 9504480070 | $ 381.500 | $ 95.400 | | | |
| 8 | JOSE LUIS MARTINEZ CASTELLANOS | 1049659007 | TOPOGRAFO | $ 3.264.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | CIV2030 | $ 3.264.000 | $ 227.200 | V | NUEVA EPS S.A | 9504480070 | $ 130.600 | PORVENIR | 9504480070 | $ 522.300 | $ 130.600 | | | |
| 9 | JULIAN ROLANDO SIERRA RODRIGUEZ | 1057605462 | INSPECTOR | $ 3.264.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | CIV2030 | $ 3.264.000 | $ 227.200 | V | NUEVA EPS S.A | 9504480070 | $ 130.600 | PROTECCIÓN | 9504480070 | $ 522.300 | $ 130.600 | | | |
| 10 | MARCO AURELIO MURCIA FIGUEROA | 1083912902 | TOPOGRAFO | $ 3.264.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | CIV2030 | $ 3.264.000 | $ 227.200 | V | SANITAS | 9504480070 | $ 130.600 | PORVENIR | 9504480070 | $ 522.300 | $ 130.600 | | | |
| 11 | SEBASTIAN CAPERA HURTADO | 1006419095 | INSPECTOR | $ 3.264.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | 63% | CIV2030 | $ 1.972.200 | $ 137.300 | V | ASMET SALUD | 9504480070 | $ 78.900 | PORVENIR | 9504480070 | $ 315.600 | $ 78.900 | | | |
| 12 | DIEGO ALEJANDRO GONZALES | 1053859390 | INSPECTOR | $ 3.264.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 37% | CIV2030 | $ 1.196.800 | $ 83.300 | V | NUEVA EPS S.A | 9504480070 | $ 47.900 | PORVENIR | 9504480070 | $ 191.500 | $ 47.900 | | | |
| 13 | NOHORA ORJUELA MORENO | 1117519701 | INSPECTOR SST | $ 3.264.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | CIV2030 | $ 3.264.000 | $ 227.200 | V | NUEVA EPS S.A | 9504480070 | $ 130.600 | COLFONDOS | 9504480070 | $ 522.300 | $ 130.600 | | | |
| 14 | ANA MIREYA PERAFAN MIÑOZ | 36297317 | INSPECTOR SST | $ 3.264.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | CIV2030 | $ 3.264.000 | $ 227.200 | V | SANITAS | 9504480070 | $ 130.600 | PORVENIR | 9504480070 | $ 522.300 | $ 130.600 | | | |
| 15 | JANETH RIVERA LOPEZ | 40670540 | CADENERA | $ 1.987.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | CIV2030 | $ 1.987.000 | $ 138.300 | V | ASMET SALUD | 9504480070 | $ 79.500 | PORVENIR | 9504480070 | $ 318.000 | $ 79.500 | | | |
| 16 | OCHOA QUIJANO JAIME DE JESUS | 1002528639 | CADENERO | $ 1.987.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | CIV2030 | $ 1.987.000 | $ 138.300 | V | NUEVA EPS S.A | 9504480070 | $ 79.500 | PORVENIR | 9504480070 | $ 318.000 | $ 79.500 | | | |
| 17 | LESLIE DAYANA FIGUEROA ACOSTA | 1193224040 | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | $ 1.561.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | CIV2030 | $ 1.561.000 | $ 121.900 | V | SANITAS | 9504480070 | $ 70.100 | PORVENIR | 9504480070 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 18 | KAREN GISELA NIETO TOVAR | 1116202569 | CAMPAMENTERA | $ 1.561.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | CIV2030 | $ 1.561.000 | $ 121.900 | V | ASMET SALUD | 9504480070 | $ 70.100 | COLPENSIONES | 9504480070 | $ 280.200 | $ 62.500 | | | |
| 19 | JERSON ALEJANDRO RONDON CIFUENTES | 1115951945 | CONDUCTOR | $ 1.703.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | CIV2030 | $ 1.703.000 | $ 121.900 | V | ASMET SALUD | 9504480070 | $ 70.100 | PORVENIR | 9504480070 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 20 | JONIER FAVIAN MENA MENA | 1115947814 | CONDUCTOR | $ 1.703.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | CIV2030 | $ 1.703.000 | $ 121.900 | V | ASMET SALUD | 9504480070 | $ 70.100 | PROTECCIÓN | 9504480070 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 21 | OSORIO ORTEGA MARIO ANDRES | 1006519582 | CONDUCTOR | $ 1.703.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | CIV2030 | $ 1.703.000 | $ 121.900 | V | NUEVA EPS S.A | 9504480070 | $ 70.100 | PORVENIR | 9504480070 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 22 | JULIAN CAMILO ALZATE ACUÑA | 1031136362 | PROFESIONAL TÉCNICO PREDIAL | $ 6.457.000 | | | | X | X | X | | | | X | X | X | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | 30% | CIV2030 | $ 1.937.100 | $ 134.900 | V | SANITAS | 9504480070 | $ 77.500 | PORVENIR | 9504480070 | $ 310.000 | $ 77.500 | | | |
| 23 | CARLOS YIDY VILLAREAL | 79795367 | ESP. EN GEOLOGÍA | $ 9.934.000 | | | | | | | | | | | X | X | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | 20% | INDEPENDIENTE | $ 1.986.800 | $ 13.600 | I | SANITAS | 88243418 | $ 325.000 | COLPENSIONES | 88243418 | $ 416.000 | $ 15.600 | | | |
| 24 | MALENA JUDYTH RODRIGUEZ | 20475377 | ESP. EN ESTRUCTURAS | $ 9.934.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | 20% | INDEPENDIENTE | $ 1.986.800 | $ 55.000 | I | SANITAS | 85413007 | $ 420.800 | COLFONDOS | 85413007 | $ - | $ 420.800 | | | |
| 25 | HECTOR YESID SANCHEZ | 80755119 | ESP. DISEÑO GEOMETRICO | $ 9.934.000 | | | | X | X | X | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10% | INDEPENDIENTE | $ 993.400 | $ 42.700 | I | SURA | 950494144 5 | $ 218.900 | COLPENSIONES | 950494144 5 | $ 280.200 | $ - | | | |
| 26 | DIANA MARCELA NIÑO SANTAMARIA | 53082087 | ESP. SOSTENIBILIDAD | $ 7.805.000 | | | | X | X | | | | | | X | X | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | 20% | INDEPENDIENTE | $ 1.561.000 | $ 12.600 | I | SALUD TOTAL | 37156153 | $ 300.000 | COLFONDOS | 37156153 | $ 384.000 | $ - | | | |
| 27 | SNEYDER FIGUEROA | | ABOGADO | $ 8.515.000 | | | | X | X | | | | | | X | X | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | 20% | INDEPENDIENTE | $ 1.703.000 | $ - | I | SALUD TOTAL | 6022260065 | $ 218.900 | COLFONDOS | 6022260065 | $ 280.200 | $ - | | | |
| | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES** | | | $ 87.058.100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha 4/06/2026 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: WILSON ANDRES PARRA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 15202138865 BYC

Firma
Nombre: KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No.: 19202-426785
RESOLUCIÓN NÚMERO 0815 DEL 17 DE MARZO DE 2026

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

**ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No. 60**

PERIODO: **MAYO DE 2026**

# 9. PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901481479 | 5 | CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CRA 18 116 24 | PUERTO RICO-CAQUETA | 2145198 | Si |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-05 | 2026-06 | 358381159 | 9505916009 | E | 2026/06/19 | 2026/06/02 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $25,656,400 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (14 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $52,528,715 | $8,517,400 | | | $52,528,715 | $2,101,700 | | | $52,528,715 | $2,101,700 | | | $52,528,715 | | $3,656,500 | | $0 | $0 | | $16,377,300 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL (14 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $52,528,715 | $8,517,400 | | | $52,528,715 | $2,101,700 | | | $52,528,715 | $2,101,700 | | | $52,528,715 | | $3,656,500 | | $0 | $0 | | $16,377,300 |
| Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (14 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $52,528,715 | $8,517,400 | | | $52,528,715 | $2,101,700 | | | $52,528,715 | $2,101,700 | | | $52,528,715 | | $3,656,500 | | $0 | $0 | | $16,377,300 |
| 1 | CC | 40093358 | ARDILA CUBILLOS MARIA ISABEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $5,960,000 | $953,600 | EPS037 | 30 | $5,960,000 | $238,400 | CCF13 | 30 | $5,960,000 | $238,400 | 14-4 | 30 | $5,960,000 | 6.960% | $414,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,845,300 |
| 2 | CC | 1006419095 | CAPERA HURTADO SEBASTIAN | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 19 | $1,972,200 | $315,600 | ESSC62 | 19 | $1,972,200 | $78,900 | CCF13 | 19 | $1,972,200 | $78,900 | 14-4 | 19 | $1,972,200 | 6.960% | $137,300 | 19 | $0 | $0 | Si | $610,700 |
| 3 | CC | 34319819 | CUELLAR SANCHEZ YENY PATRICIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230901 | 30 | $2,384,000 | $381,500 | EPS005 | 30 | $2,384,000 | $95,400 | CCF13 | 30 | $2,384,000 | $95,400 | 14-4 | 30 | $2,384,000 | 6.960% | $166,000 | 30 | $0 | $0 | Si | $738,300 |
| 4 | CC | 1193224040 | FIGUEROA ACOSTA LESLIE DAYANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS005 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF13 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-4 | 30 | $1,750,905 | 6.960% | $121,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $542,300 |
| 5 | CC | 1057590973 | GOMEZ SIERRA YUDY PAOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $5,890,000 | $942,400 | EPS037 | 30 | $5,890,000 | $235,600 | CCF13 | 30 | $5,890,000 | $235,600 | 14-4 | 30 | $5,890,000 | 6.960% | $410,000 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,823,600 |
| 6 | CC | 1053859390 | GONZALEZ ROJAS DIEGO ALEJANDRO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 11 | $1,196,800 | $191,500 | EPS037 | 11 | $1,196,800 | $47,900 | CCF13 | 11 | $1,196,800 | $47,900 | 14-4 | 11 | $1,196,800 | 6.960% | $83,300 | 11 | $0 | $0 | Si | $370,600 |
| 7 | CC | 1115947814 | MENA MENA JONIER FAVIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | ESSC62 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF13 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-4 | 30 | $1,750,905 | 6.960% | $121,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $542,300 |
| 8 | CC | 73190143 | MERCADO OCHOA RAFAEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $6,883,000 | $1,101,300 | EPS010 | 30 | $6,883,000 | $275,400 | CCF13 | 30 | $6,883,000 | $275,400 | 14-4 | 30 | $6,883,000 | 6.960% | $479,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $2,131,200 |
| 9 | CC | 1083912902 | MURCIA FIGUEROA MARCO AURELIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $3,264,000 | $522,300 | EPS005 | 30 | $3,264,000 | $130,600 | CCF13 | 30 | $3,264,000 | $130,600 | 14-4 | 30 | $3,264,000 | 6.960% | $227,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,010,700 |
| 10 | CC | 1117519701 | ORJUELA MORENO NOHORA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $3,264,000 | $522,300 | EPS037 | 30 | $3,264,000 | $130,600 | CCF13 | 30 | $3,264,000 | $130,600 | 14-4 | 30 | $3,264,000 | 6.960% | $227,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,010,700 |
| 11 | CC | 7182325 | PARRA MORALES WILSON ANDRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $11,211,000 | $1,906,000 | EPS037 | 30 | $11,211,000 | $448,500 | CCF13 | 30 | $11,211,000 | $448,500 | 14-4 | 30 | $11,211,000 | 6.960% | $780,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $3,583,300 |
| 12 | CC | 40670540 | RIVERA LOPEZ JANETH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,987,000 | $318,000 | ESSC62 | 30 | $1,987,000 | $79,500 | CCF13 | 30 | $1,987,000 | $79,500 | 14-4 | 30 | $1,987,000 | 6.960% | $138,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $615,300 |
| 13 | CC | 1115951945 | RONDON CIFUENTES JERSON ALEJANDRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | ESSC62 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF13 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-4 | 30 | $1,750,905 | 6.960% | $121,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $542,300 |
| 14 | CC | 1057412035 | VARGAS ROMERO MARILUZ | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $3,264,000 | $522,300 | EPS037 | 30 | $3,264,000 | $130,600 | CCF13 | 30 | $3,264,000 | $130,600 | 14-4 | 30 | $3,264,000 | 6.960% | $227,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,010,700 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: SECUNDARIA (9 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $29,990,910 | $4,799,000 | | | $29,990,910 | $1,200,000 | | | $29,801,005 | $1,192,400 | | | $29,990,910 | | $2,087,700 | | $0 | $0 | | $9,279,100 |

# Planilla Resumen

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Centro de Trabajo: NEIVA (9 Afiliados)** | | | | | | $29,990,910 | $4,799,000 | | | $29,990,910 | $1,200,000 | | | $29,801,005 | $1,192,400 | | | $29,990,910 | | $2,087,700 | | $0 | $0 | | $9,279,100 |
| Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (9 Afiliados) | | | | | | $29,990,910 | $4,799,000 | | | $29,990,910 | $1,200,000 | | | $29,801,005 | $1,192,400 | | | $29,990,910 | | $2,087,700 | | $0 | $0 | | $9,279,100 |
| 15 | CC | 1031136362 | ALZATE ACUÑA JULIAN CAMILO | 230301 | 30 | $1,937,100 | $310,000 | EPS005 | 30 | $1,937,100 | $77,500 | CCF32 | 30 | $1,937,100 | $77,500 | 14-4 | 30 | $1,937,100 | 6.960% | $134,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $599,900 |
| 16 | CC | 1057600966 | CASTIBLANCO MORALES ANDRES FERNANDO | 231001 | 30 | $5,890,000 | $942,400 | EPS002 | 30 | $5,890,000 | $235,600 | CCF32 | 30 | $5,890,000 | $235,600 | 14-4 | 30 | $5,890,000 | 6.960% | $410,000 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,823,600 |
| 17 | CC | 7171395 | GUIO GARCIA HECTOR ORLANDO | 230301 | 30 | $6,883,000 | $1,101,300 | EPS037 | 30 | $6,883,000 | $275,400 | CCF32 | 30 | $6,883,000 | $275,400 | 14-4 | 30 | $6,883,000 | 6.960% | $479,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $2,131,200 |
| 18 | CC | 1049653007 | MARTINEZ CASTELLANOS JOSE LUIS | 230301 | 30 | $3,264,000 | $522,300 | EPS005 | 30 | $3,264,000 | $130,600 | CCF32 | 30 | $3,264,000 | $130,600 | 14-4 | 30 | $3,264,000 | 6.960% | $227,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,010,700 |
| 19 | CC | 1116202569 | NIETO TOVAR KAREN GISELA | 25-14 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS005 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF32 | 30 | $1,561,000 | $62,500 | 14-4 | 30 | $1,750,905 | 6.960% | $121,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $534,700 |
| 20 | CC | 1002528639 | OCHOA QUIJANO JAIME DE JESUS | 230301 | 30 | $1,987,000 | $318,000 | EPS041 | 30 | $1,987,000 | $79,500 | CCF32 | 30 | $1,987,000 | $79,500 | 14-4 | 30 | $1,987,000 | 6.960% | $138,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $615,300 |
| 21 | CC | 1006519582 | OSORIO ORTEGA MARIO ANDRES | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS037 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF32 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-4 | 30 | $1,750,905 | 6.960% | $121,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $542,300 |
| 22 | CC | 36297317 | PERAFAN MUÑOZ ANA MIREYA | 230301 | 30 | $3,264,000 | $522,300 | EPS005 | 30 | $3,264,000 | $130,600 | CCF32 | 30 | $3,264,000 | $130,600 | 14-4 | 30 | $3,264,000 | 6.960% | $227,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,010,700 |
| 23 | CC | 1057605462 | SIERRA RODRIGUEZ JULIAN ROLANDO | 230201 | 30 | $3,264,000 | $522,300 | EPS037 | 30 | $3,264,000 | $130,600 | CCF32 | 30 | $3,264,000 | $130,600 | 14-4 | 30 | $3,264,000 | 6.960% | $227,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,010,700 |
| **Total** | | **Afiliados( 23)** | | | | $82,519,625 | $13,316,400 | | | $82,519,625 | $3,301,700 | | | $82,329,720 | $3,294,100 | | | $82,519,625 | | $5,744,200 | | $0 | $0 | | $25,656,400 |

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

# Planilla Resumen

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 23 | $13,316,400 | $0 | $0 | $13,316,400 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 3 | $2,566,000 | $0 | $0 | $2,566,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 4 | $3,662,100 | $0 | $0 | $3,662,100 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 13 | $5,904,300 | $0 | $0 | $5,904,300 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 2 | $802,500 | $0 | $0 | $802,500 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | $381,500 | $0 | $0 | $381,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 23 | $5,744,200 | $0 | $0 | $5,744,200 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 23 | $5,744,200 | $0 | $0 | $5,744,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 23 | $3,294,100 | $0 | $0 | $3,294,100 |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 14 | $2,101,700 | $0 | $0 | $2,101,700 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 9 | $1,192,400 | $0 | $0 | $1,192,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 6) | | | | 23 | $3,301,700 | $0 | $0 | $3,301,700 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 4 | $298,600 | $0 | $0 | $298,600 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $275,400 | $0 | $0 | $275,400 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 9 | $1,707,700 | $0 | $0 | $1,707,700 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $79,500 | $0 | $0 | $79,500 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $235,600 | $0 | $0 | $235,600 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 7 | $704,900 | $0 | $0 | $704,900 |
| **TOTAL** | | | | **23** | **$25,656,400** | **$0** | **$0** | **$25,656,400** |

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 79795367 | TEOFILO CARLOS YIDI VILLARREAL | AV CALLE 80 # 75-26 OFI 201 | 3193962597 | eyhingenieria_admon@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 88243418 | 03/06/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-05 | 2026-05 | I | $2,600,000 | $770.200 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 325.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 416.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 416.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 13.600 | | | | 13.600 | 0 | 0 | 13.600 | | | 136 | 13.600 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 15.600 | 0 | 0 | 15.600 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 325.000 | 325.000 |
| Pensión | 1 | 416.000 | 416.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 13.600 | 13.600 |
| CCF | 1 | 15.600 | 15.600 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 4 | 770.200 | 770.200 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 79795367 | TEOFILO CARLOS YIDI VILLARREAL | AV CALLE 80 # 75-26 OFI 201 | 3193962597 | eyhingenieria_admon@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 88243418 | 03/06/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-05 | 2026-05 | I | $2,600,000 | $770.200 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | RIESGOS LABORALES | | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo y Número de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Excenvado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Días | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Días | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC 79795367 | YIDI VILLARREAL TEOFILO CARLOS | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 2.600.000 | 30 | 416.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.600.000 | 30 | 325.000 | 14-11 | 2.600.000 | 30 | 1 | 13.600 | CCF24 | 2.600.000 | 30 | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

**CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

La empresa **CONSULOBRAS S.A.S**, identificada con **NI** número **800060834**, aportó por **MALENA JUDITH AMORTEGUI RODRIGUEZ** identificado(a) con **CC** número **20475377** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2026 y 06 - 2026 de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | COTIZANTE | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECIÓN | DÍAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACIÓN Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS001 | ALIANSALUD EPS S.A. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $10,520,000 | 0.04000 | $420,800 | $0 | $0 | Junio - 2026 | 85413007 | 04/06/2026 | Si |
| CCF24 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $10,520,000 | 0.04000 | $420,800 | $0 | $0 | Mayo - 2026 | 85413007 | 04/06/2026 | Si |
| 14-25 | Riesgos Profesionales Colmena | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $10,520,000 | 0.00522 | $55,000 | $0 | $0 | Mayo - 2026 | 85413007 | 04/06/2026 | Si |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PAGADA

El presente certificado se expide a los **4** días del mes **Junio** de **2026**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 80755119 | | SANCHEZ MONTERO HECTOR YESID | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 137C No. 103C-58 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3118083360 | No |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-05 | 2026-05 | 360831528 | 9504941445 | I | 2026/06/04 | 2026/06/03 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $541,800 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | | $42,700 | | $0 | $0 | | $541,800 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | | $42,700 | | $0 | $0 | | $541,800 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | | $42,700 | | $0 | $0 | | $541,800 |
| 1 | CC | 80755119 | SANCHEZ HECTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS008 | 30 | $1,750,905 | $218,900 | | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 30 | $1,750,905 | 2.436% | $42,700 | 0 | $0 | $0 | No | $541,800 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | | $42,700 | | $0 | $0 | | $541,800 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $280,200 | $0 | $0 | $280,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $280,200 | $0 | $0 | $280,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $42,700 | $0 | $0 | $42,700 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 1 | $42,700 | $0 | $0 | $42,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $218,900 | $0 | $0 | $218,900 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $218,900 | $0 | $0 | $218,900 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$541,800** | **$0** | **$0** | **$541,800** |

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-53082087 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Período pensión:** | 2026-05 | 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | 0 | 384.000 | 0 | 384.000 |
| **Período salud:** | 2026-05 | EPS001 | 830113831 | ALIANSALUD EPS | 1 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| **Planilla Nro.:** | 37156153 Tipo I | 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | 0 | 12.600 | 0 | 12.600 |
| **Clase de aportante:** | I | SINCCF | 0 | SIN CCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Fecha transacción:** | 2026-05-21 | PASENA | 899999034 | SENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Banco:** | BANCO DE BOGOTA | PAICBF | 899999239 | ICBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Transacción:** | 325661445 | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **GRAN TOTAL** | | | | | $ 696.600 |

PAGADO

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 19708603 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | SNHEYDER FIGUEROA BARRIOS FIGUEROA BARRIOS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BARRANCABERMEJA | DEPARTAMENTO: | SANTANDER |
| DIRECCIÓN: | CALLE 59 # 15-30 | TELÉFONO: | 5744444 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | NO | | |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **6022260065** | | | TIPO DE PLANILLA: | | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | mayo | AÑO 2026 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | mayo | AÑO 2026 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2026/06/02 | | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 358676475 | | |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 280.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 280.200 | $ 0 | $ 280.200 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 280.200** | **$ 0** | **$ 280.200** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 218.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 218.900 | $ 0 | $ 0 | $ 218.900 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 218.900** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 218.900** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 19708603 | FIGUEROA BARRIOS SNHEYDER | INDEPEND | | $ 1.750.905 | | | | NO | 01 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 30 | $ 1.750.905 | $ 280.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 280.200 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ 0 | $ 218.900 | | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | | | | |

**TOTAL PAGADO: $ 499.100**

Planilla Pagada

# 6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 5/06/2026 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

**MES INFORME MENSUAL:** mayo-26 **PROYECTO:** INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

**CONTRATO DE OBRA No:** 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 127125 | C-2401-0600-135-51102D-2401017-02 ADQUIS. DE BYS - PUENTE CONSTRUIDO - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD | 11 | NACIÓN | Contrato Principal | $ 442.826.389,00 | $ - | |
| 2025 | 347425 | C-2401-0600-132-51102D-2401017-02 ADQUIS. DE BYS - PUENTE CONSTRUIDO - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD | 11 | NACIÓN | Adicional | $ 1.200.000.000,00 | $ - | |
| 2026 | 158726 | C-2401-0600-135-51102D-2401008-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD | 11 | NACIÓN | Contrato Principal | $ 1.414.581.018,00 | $ 1.255.502.318,00 | |
| 2026 | 158726 | C-2401-0600-135-51102D-2401017-02 ADQUIS. DE BYS - PUENTE CONSTRUIDO - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD | 11 | NACIÓN | Contrato Principal | $ 442.826.389,00 | $ - | |
| 2026 | 158726 | C-2401-0600-135-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD | 11 | NACIÓN | Contrato Principal | $ 31.481.482,00 | $ - | $ 486.095.517,00 |
| 2026 | 244226 | C-2401-0600-132-51102D-2401008-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD | 11 | NACIÓN | Contrato Principal | $ 1.345.947.145,00 | $ 1.345.947.145,00 | |
| 2026 | 244226 | C-2401-0600-132-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD | 11 | NACIÓN | Contrato Principal | $ 16.234.568,00 | $ 16.234.568,00 | |
| 2026 | 244226 | C-2401-0600-132-51102D-2401017-02 ADQUIS. DE BYS - PUENTE CONSTRUIDO - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD | 11 | NACIÓN | Contrato Principal | $ 98.929.398,00 | $ 98.929.398,00 | |
| | | | TOTAL | | | $ 4.992.826.389 | $ 2.716.613.429,00 | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 34.699.975.248,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | dic-25 | $ 44.622.474,00 | $ 8.478.270,00 | **$ 53.100.744,00** | | $ 53.100.744 | | No. 127125 de (06/03/2025) | $ 37.370.412 | $ 21.822.408.862 | | PROYECTO 135 |
| 55 | dic-25 | $ 239.235.504,00 | $ 45.454.746,00 | **$ 284.690.250,00** | | $ 284.690.250 | | No. 347425 de (07/05/2025) | $ 200.348.198 | $ 21.537.718.612 | | PROYECTO 132 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 56 | ene-26 | $ 31.403.708,00 | $ 5.966.704,00 | **$ 37.370.412,00** | | $ 37.370.412 | | No. 127125 de (06/03/2025) | $ - | $ 21.500.348.200 | INVIAS-CP-R26-4174 | PROYECTO 135 |
| 56 | ene-26 | $ 168.359.830,00 | $ 31.988.368,00 | **$ 200.348.198,00** | | $ 200.348.198 | | No. 347425 de (07/05/2025) | $ - | $ 21.300.000.002 | INVIAS-CP-R26-4174 | PROYECTO 132 |
| | | | | | | | | No. 244226 de (05/02/2026) | $ 1.461.111.111 | | | PROYECTO 132 |
| | | | | | | | | No. 158726 de (27/01/2026) | $ 1.888.888.889 | | | PROYECTO 135 |
| 56 | ene-26 | $ 43.187.946,00 | $ 8.205.710,00 | **$ 51.393.656,00** | | $ 51.393.656 | | No. 158726 de (27/01/2026) | $ 1.837.495.233 | $ 21.248.606.346 | INVIAS-CP-R26-4174 | PROYECTO 135 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | feb-26 | $ 246.078.366,00 | $ 46.754.890,00 | **$ 292.833.256,00** | | $ 292.833.256 | | No. 158726 de (27/01/2026) | $ 1.544.661.977 | $ 20.955.773.090 | INVIAS-CP-R26-4176 | PROYECTO 135 |
| 58 | mar-26 | $ 242.991.310,00 | $ 46.168.349,00 | **$ 289.159.659,00** | | $ 289.159.659 | | No. 158726 de (27/01/2026) | $ 1.255.502.318 | $ 20.666.613.431 | | PROYECTO 135 |
| 59 | abr-26 | $ 247.982.294,00 | $ 47.116.636,00 | **$ 295.098.930,00** | | $ 295.098.930 | | No. 158726 de (27/01/2026) | $ 960.403.388 | $ 20.371.514.501 | | PROYECTO 135 |
| 60 | may-26 | $ 243.119.446,00 | $ 46.192.695,00 | **$ 289.312.141,00** | | $ 289.312.141 | | No. 158726 de (27/01/2026) | $ 671.091.247 | $ 20.082.202.360 | | PROYECTO 135 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | **$ 12.283.842.759,00** | **$ 2.333.930.129,00** | **$ 14.617.772.888,00** | **$ 980.381.756** | **$ 13.637.391.132** | **$ -** | | **$ 2.132.202.358** | **$ 20.082.202.360** | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) | $ 10.375.813.419 | $ 1.971.404.553 | $ 12.347.217.972 |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) | $ 1.908.029.340 | $ 362.525.576 | $ 2.270.554.916 |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL** | $ 12.283.842.759 | $ 2.333.930.129 | $ 14.617.772.888 |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: WILSON ANDRES PARRA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 15202138865 BYC

Firma
Nombre: KAREN DANIELA GALLEGO SANCHI
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matricula No.: 19202-426785
RESOLUCIÓN NÚMERO 0815 DEL 17 DE MARZO DE 2026

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

# 6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 23/04/2026
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

**OBJETO DEL CONTRATO:**

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1.

**FECHA DE INICIO:** 29 DE JUNIO DE 2021

**PLAZO INICIAL:** CIENTO CATORCE (114) MESES.

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31 DE AGOSTO DE 2030
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 33,499,975,248.00

**VALOR ACUMULADO:** $ 34,699,975,248.00
(Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $1,019,997,524.70 | 12 | 5 | 2021 | 31 | 12 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $2,252,303,164.80 | 12 | 5 | 2021 | 31 | 12 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $2,039,995,049.40 | 12 | 5 | 2021 | 31 | 12 | 2028 |
| Calidad del servicio | 30% | $3,059,992,574.10 | 31 | 12 | 2025 | 31 | 12 | 2030 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 21-44-101352030

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/06/2021

**OBSERVACIONES:**

Tramite contractual realizado Anexo 0 = Contrato y Aclaración No. 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 23/04/2026
(Día / Mes / Año)

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $1,019,997,524.70 | 12 | 5 | 2021 | 31 | 12 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $2,252,303,164.80 | 12 | 5 | 2021 | 31 | 12 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $2,039,995,049.40 | 12 | 5 | 2021 | 31 | 12 | 2028 |
| Calidad del servicio | 30% | $3,059,992,574.10 | 31 | 12 | 2025 | 31 | 12 | 2030 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 21-44-101352030

**Certificado de modificación o anexo No.:** 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 21/07/2023

**OBSERVACIONES:**

Tramite contractual realizado Anexo 4 = Orden de inicio y modificatoria 01 (Traslado de vigencias $300.000.000) al contrato de interventoría

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 1,119,997,524.70 | 12 | 5 | 2021 | 31 | 12 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $2,252,303,164.80 | 12 | 5 | 2021 | 31 | 12 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 2,239,995,049.40 | 12 | 5 | 2021 | 31 | 12 | 2028 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 3,359,992,574.10 | 31 | 12 | 2025 | 31 | 12 | 2030 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 21-44-101352030

**Certificado de modificación o anexo No.:** 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 7/09/2023

**OBSERVACIONES:**

Tramite contractual realizado Anexo 8 = Modificatoria 02 (Traslado de vigencias $1.000.000.000) al contrato de interventoría

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 23/04/2026
(Día / Mes / Año)

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 1,219,997,525.00 | 12 | 5 | 2021 | 31 | 12 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $2,252,303,164.80 | 12 | 5 | 2021 | 31 | 12 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 2,439,995,050.00 | 12 | 5 | 2021 | 31 | 12 | 2028 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 3,659,992,575.00 | 31 | 12 | 2025 | 31 | 12 | 2030 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 21-44-101352030

**Certificado de modificación o anexo No.:** 10
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 26/11/2024

**OBSERVACIONES:**

Tramite contractual realizado Anexo 10 = Modificatoria 03 (Traslado de vigencias $1.000.000.000) al contrato de interventoría

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 1,399,997,525.00 | 12 | 5 | 2021 | 31 | 12 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $2,252,303,164.80 | 12 | 5 | 2021 | 31 | 12 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 2,679,995,050.00 | 12 | 5 | 2021 | 31 | 12 | 2028 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 4,019,992,575.00 | 31 | 12 | 2025 | 31 | 12 | 2030 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 21-44-101352030

**Certificado de modificación o anexo No.:** 11
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 18/06/2025

**OBSERVACIONES:**

Tramite contractual realizado Anexo 11 = Modificatoria 04 que ampara la Adición No. 1 del 06/05/2025 $1.200.000.000 al Contrato No. 985 de 2021.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 23/04/2026
(Día / Mes / Año)

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 2,153,768,595.00 | 1 | 1 | 2026 | 2 | 3 | 2031 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $ 233,000,000.01 | 1 | 1 | 2026 | 31 | 8 | 2030 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 4,307,537,190.00 | 1 | 1 | 2026 | 31 | 8 | 2033 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 6,461,305,785.00 | 31 | 8 | 2030 | 31 | 8 | 2035 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 21-44-101488312

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 23/04/2026

**OBSERVACIONES:**

Tramite contractual realizado Anexo 1 = Segundo periodo de ejecución contractual - Contrato No. 985 de 2021. Se incorporó notas aclaratorias sobre la vigencia de los amparos existentes (cumplimiento, anticipo y calidad del servicio), sin modificar las sumas aseguradas ni agregar nuevas coberturas.

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: WILSON ANDRES PARRA MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202138865BYC

Firma
Nombre: KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No. : 19202-426785

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

# 6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MINFRA-MN1-IN-15-FR-15 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 2 |

FECHA: 31/05/2026 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN OPERATIVA (GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE) **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 985 DE 2021 (Indicar número y año)

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

**FECHA DE INICIO:** 29 DE JUNIO DE 2021 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** (114) MESES. **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31-ago-30 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**CONTRATO DE OBRA No:** 991 DE 2021 (Indicar número y año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

**1. PLAN DE CALIDAD**

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: 6/07/2021

**OBSERVACIONES:**

**2. AUDITORIAS DE CALIDAD**

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI X NO ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 2 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: 5/12/2023
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI X NO ____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 2 FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: 2026

**OBSERVACIONES:**

**3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)**

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: N/A

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 40 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 40

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI X NO ____

**OBSERVACIONES:**
Se realiza verificación del cumplimiento de las especificaciones generales de construcción INVIAS 2013, mediante ensayos de calidad de los materiales utilizados en cada una de las actividades ejecutadas.

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

**4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES**

**No. de No Conformidades reportadas en el mes:** 0
**No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0
**No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:** 0
**No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0
**No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:** 0

**OBSERVACIONES:**

**5. QUEJAS Y RECLAMOS**

**No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:** 0
**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0
**No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:** 0
**No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0
**No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:** 0
**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

| | FECHA | 31/05/2026 (Día / Mes / Año) |
|---|---|---|

**OBSERVACIONES:**

Se hace seguimiento a quejas presentadas ante el Consorcio Vias Nacionales del Sur y Oriente para el correspondiente periodo, con el fin de dar cumplimiento con los requerimientos solicitados.

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

**6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG** (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

| Título indicador de Gestión: | Valor del IG mes | Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG) |
|---|---|---|
| IG1: Índice de gestión 1 = | | |
| IG2: Índice de gestión 2 = | | |
| IG3: Índice de gestión 3 = | | |
| IG4: Índice de gestión 4 = | | |
| IG5: Índice de gestión 5 = | | |
| IGn: Índice de gestión n = | | |

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

**OBSERVACIONES:**

**7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO** (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

| No. | Tipo de Equipo | Marca | Serie | Fecha de Calibración | No. y Fecha Certificado de Calibración | Fecha de Vencimiento Calibración | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTACION TOTAL | TOPCON | 274737 | 18/03/2026 | C26CEY 190 18/03/2026 | 18/09/2026 | PUERTO RICO |
| 2 | NIVEL AUTOMATICO | SOKKIA | WS059736 | 18/03/2026 | C26CEY 191 18/03/2026 | 18/09/2026 | PUERTO RICO |
| 3 | ESTACION TOTAL | GEOMAX | 2108528 | 16/01/2026 | 6175 16/01/2026 | 16/07/2026 | NEIVA |
| 4 | NIVEL AUTOMATICO | TOPCON AT-B4 | RX6893 | 16/01/2026 | 6174 16/01/2026 | 16/07/2026 | NEIVA |

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: WILSON ANDRES PARRA MORALES
Director de Interventoría
Matrícula No. : 15202138865BYC

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No. : 19202-426785

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INCOLTOP SAS
www.equiposdetopografia.com

**APLICAMOS PROCEDIMIENTOS**
Gestion En Laboratorios De Ensayo Y Calibracion
**NORMA ISO / IEC 17025 : 2017**
Formato No: FT - L - 002 V3

Nit 900.710.142-9
CRA 71B No 68B 15 TEL 7164430 www.incoltop.com

# CERTIFICADO DE CALIBRACION No C26CEY 190

**PROPIETARIO** WILSON ANDRES PARRA
**INSTRUMENTO** ESTACIÓN TOTAL **MARCA:** TOPCON
**MODELO** GTS 235 W **NUMERO DE SERIE** 274737
**IDENTIFICACION CLIENTE** 7 182 325
**FECHA DE VERIFICACION Y EXPEDICION** 18 /MAR/2026
**NORMA ISO / IEC 17025 : 2017** **VENCE** 18 /SEP/2026
**Instrumento Nuevo?** SI NO X
**)/**

**cualquier reclamacion del ajuste se debe hacer maximo 5 dias de fecha de expedicion**

**PATRONES UTILIZADOS**
Estacion total South NTS 332 R10 SN 297863 Certificado D197
Nivel Automatico TOPCON ATB2 JZ29924 Certificado D198

**ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN FABRICANTE**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Precision Angular (DIN 18723)** | | 5 " | | **Minima distancia Focal** | 0.5 | m |
| **Precision en Distancia** | | 2 mm+ 2ppm xD | | **Medicion con un Prisma** | 3000 | m |
| **Aumento del Telescopio** | | | 30X | **Compensador** | | X Y |
| **Apertura de Objetivo** | | | 30mm | **Exactitud del Compensador** | | 0.3" |
| **Lectura en Pantalla** | | | 1" | **Medicion sin Prisma** | N/A | m |
| | | | | | | |
| **AJUSTES EFECTUADOS** | | | | | | |
| | | | | | | |
| CODIGOs: | 1: correcto | 2: falla corregida | | 3: no corregida | 4: no aplica | |
| | | | | | | |
| **Limpieza exterior** | | 1 | | Ajuste del nivel Circular | | 2 |
| Mantenimiento Interno | | 1 | | Ajuste del sistema de enfoque | | 1 |
| **Tornillo de movimiento Fino H** | | 1 | | Ajuste del reticulo | | 1 |
| Chequeo del Teclado | | 1 | | Ajuste de mirillas de punteria | | 2 |
| **Ajuste Compensador X Y** | | 1 | | | | |

CALIBRADO Q.C 2025 INCOLTOPSAS

Reviso
**Alexander Piza**
**Ingeniero Topografico**

Aprobo
**Maria Claudia Fernandez**
**Ingeniera Industrial**

Especialista Tecnologica
Gestion En Laboratorios De Ensayo Y Calibracion
**NORMA ISO / IEC 17025**

este documento puede ser verificado citando el numero del certificado

TEL 7164430 - 3005611444 - 3124126637
Email: gerencia@equiposdetopografia.com

**APLICAMOS PROCEDIMIENTOS**
Gestion En Laboratorios De Ensayo Y Calibracion
**NORMA ISO / IEC 17025 : 2017**
Formato No: FT - L - 002 V2

INCOLTOP SAS
www.equiposdetopografia.com

Nit 900.710.142-9
CRA 71B No 68B 15 TEL 7164430 www.incoltop.com

# CERTIFICADO No C26CEY 191

**PROPIETARIO** DIANA LISSETH ALVAREZ
**INSTRUMENTO** NIVEL **MARCA:** SOKKIA
**MODELO** B 40 A **NUMERO DE SERIE** WS059736
**IDENTIFICACION CLIENTE** 1057579679
**FECHA DE VERIFICACION Y EXPEDICION** 18/MAR/2026
**NORMA ISO / IEC 17025 : 2017** **VENCE** 18/SEP/2026
**Instrumento Nuevo?** SI NO X
**@**

**PATRONES UTILIZADOS**
Estacion total Topcon GTS 252 SN KB1406 , Nivel Automatico TOPCON ATB2 WZ6935 Certificado Trazable al NIST

**ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN FABRICANTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Desviación Estándar doble KM de niv** | | 2mm | **Minima distancia Focal** | | 0.5 m |
| **Tipo de imagen** | | Directa | **Relación de Estadia** | | 100 |
| **Magnificación** | | 24X | **Rango del Compensador** | | 15'+/- |
| **Apertura de Objetivo o Diametro** | | 30mm | **Exactitud del Compensador** | | 0.3" |

**AJUSTES EFECTUADOS**

CODIGOs: 1: correcto 2: falla corregida 3: no corregida 4: no aplica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Limpieza exterior** | 1 | Ajuste del nivel Circular | 2 |
| Mantenimiento Interno | 1 | Ajuste del sistema de enfoque | 1 |
| **Tornillo de movimiento Fino H** | 1 | Ajuste del reticulo | 1 |
| Chequeo del Teclado | 1 | Ajuste de mirillas de punteria | 2 |
| **Ajuste Compensador** | 1 | | |

CALIBRADO Q.C 2025 INCOLTOP SAS

| Reviso | Aprobo | Especialista Tecnologica |
|---|---|---|
| **Alexander Piza** | **Maria Claudia Fernandez** | Gestion En Laboratorios De Ensayo Y Calibracion |
| **Ingeniero Topografico** | **Ingeniera Industrial** | **NORMA ISO / IEC 17025** |

este documento puede ser verificado citando el numero del certificado

TEL 7164430 - 3005611444 - 3124126637
Email: gerencia@equiposdetopografia.com



Miguel R. Ariza A.

RUT. 79.599.336-8

Régimen Simplificado

MANTENIMIENTO, REPARACION Y AJUSTE DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN, TOPOGRÁFICOS Y GEODÉSICOS

HOJA DE AJUSTE Y VERIFICACION

No. 6175

Bogotá D.C. 16 de enero del 2026

Señores:
**ANDRES FERNANDO CASTIBLANCO MORALES**
**CC./NIT.1057600966**
Ciudad.

**REF.: CERTIFICADO** de Patronamiento y Ajuste Estación marca **GEOMAX** modelo **ZIPP-10RPRO** S/No. **2108528**
**SISTEMA DE NIVELACIÓN Y PENDULAR**.

| | ERROR | EXACTO | AJUSTADO |
|---|---|---|---|
| NIVELACIÓN | | X | |
| SISTEMA PENDULAR | | X | |
| NIVEL CIRCULAR | | X | |
| **MEDICIÓN ANGULAR** | | X | |

Precisión mostrada en pantalla por lectura 1" precisión Angular 2"

| | AV LECTURA | AV AJUSTE | AH ERROR | AH AJUSTE | |
|---|---|---|---|---|---|
| VISTA A1 | 089º34'40" | 089º34'47" | 000º00'00" | 000º00'00" | LECTURA A1 |
| VISTA A2 | 270º25'10" | 270º25'13" | 179º59'55" | 180º00'00" | LECTURA A2 |
| LECTURA PROMEDIO | 359º59'50" | 360º00'00" | 179º59'55" | 180º00'00" | PROMEDIO A1/A2 |
| ERROR PROMEDIO | 000º00'10" | 000º00'00" | 000º00'05" | 000º00'00" | ERROR TOTAL |

**ESTADO DEL DISTANCIOMETRO**

| | ERROR | EXACTO | AJUSTADO |
|---|---|---|---|
| EDM ± (2+2ppm x D) mm | | X | |
| NO PRISMA | | X | |

**INSPECCIÓN OPTOMECÁNICA**

| ESTADO | ERROR | EXACTO | AJUSTADO |
|---|---|---|---|
| ANILLO DE ENFOQUE DEL TELESCOPIO | | X | |
| OCULAR DEL TELESCOPIO | | X | |
| ANILLO DE ENFOQUE DEL RETÍCULO | | X | |
| RETÍCULO | | X | |
| FRENO Y MOVIMIENTO H Y V | | X | |
| PLOMADA LÁSER Y/O ÓPTICA | | X | |
| VISOR ÓPTICO | | X | |
| TECLADO Y PANTALLA | | X | |
| OBJETIVO | | X | |
| PARALELIDAD VERTICAL | | X | |
| TORNILLOS DE NIVELACIÓN | | X | |

## PATRÓN INDIRECTO DE AJUSTE.

Colimador Nikon AE-5W precisión de ajuste 2mm al infinito.

Se recomienda ajustar en un periodo no mayor a Seis (6) meses a partir de la fecha de expedición, nuevo **AJUSTE** (**16/julio/2026**), **O CUANDO EL EQUIPO LO REQUIERA.**

Atentamente.

Miguel Ariza A.
Técnico.
Nit. 79599336-8

Miguel R. Ariza
NIT. 79.599.336-8
Régimen Simplificado
20 Años
Cel.: 315 227 1713
topomec@yahoo.es Bogotá, D.C.

Nota: Los resultados obtenidos y observados hacen referencia al instante en que se realiza el ajuste, garantizando el buen funcionamiento del equipo, pero no garantiza el mismo resultado después de la entrega y retiro del equipo de nuestro establecimiento.



Miguel R. Ariza A.

RUT. 79.599.336-8
Régimen Simplificado

MANTENIMIENTO, REPARACION Y AJUSTE DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN, TOPOGRÁFICOS Y GEODÉSICOS

HOJA DE AJUSTE Y VERIFICACION
No. 6174

Bogotá D.C. 16 de enero del 2026

Señores:
**ANDRES FERNANDO CASTIBLANCO MORALES**
**CC./NIT.1057600966**
Ciudad.

**REF.: CERTIFICADO** de Patronamiento y Ajuste nivel automático marca **TOPCON** modelo **AT-B4** S/No. **RX6893**
El equipo fue sometido a la inspección y pruebas técnicas según las normas establecidas por el fabricante.


**SISTEMA DE NIVELACIÓN Y PENDULAR**

| | ERROR | EXACTO | AJUSTADO |
|---|---|---|---|
| COMPENSADOR | | X | |
| SISTEMA PENDULAR | | X | |
| NIVEL CIRCULAR | | X | |

**LECTURA Y AJUSTE DE MEDICIÓN**

SISTEMA DE COLIMACIÓN Desviación Estándar X
1Km en doble lectura de Nivelación +/- 2.0mm

| LECTURA A1 | LECTURA A2 | A1-A2 | A2-B2 | B4 |
|---|---|---|---|---|
| B 1555mm | B 1555mm | 0mm | - | |
| C 1555mm | C 1552mm | 3mm | | ERROR |
| | **AJUSTE** | | | |
| B 1555m | B 1555mm | 0mm | - | |
| C 1552m | C 1552mm | 0mm | - | ERROR |




**ESTADO DE NIVELACIÓN**

| | ERROR | EXACTO | AJUSTADO |
|---|---|---|---|
| NIVELACIÓN | | X | |
| COLIMACIÓN | | X | |

INSPECCIÓN OPTOMECÁNICA

| ESTADO | ERROR | EXACTO | AJUSTADO |
|---|---|---|---|
| ANILLO DE ENFOQUE DEL TELESCOPIO | | X | |
| OCULAR DEL TELESCOPIO | | X | |
| ANILLO DE ENFOQUE DEL RETÍCULO | | X | |
| RETÍCULO | | X | |
| TORNILLO TANGENTE HORIZONTAL | | X | |
| VISOR ÓPTICO | | X | |
| OBJETIVO | | X | |
| BASE | | X | |
| AUMENTOS | | X | |

## PATRÓN INDIRECTO DE AJUSTE.

Colimador Nikon AE-5W precisión de ajuste 2mm al infinito.
Se recomienda ajustar en un periodo no mayor a Seis (6) meses a partir de la fecha de expedición, nuevo AJUSTE (**16/julio/2026**), **O CUANDO EL EQUIPO LO REQUIERA.**

Atentamente.

Miguel Ariza A.
Técnico.
Nit. 79599336-8

Miguel R. Ariza
NIT. 79 599.336-8
Régimen Simplificado
20 Años
Cel.: 315 227 1713
topomec@yahoo.es Bogotá, D.C.

**Nota: Los resultados obtenidos y observados hacen referencia al instante en que se realiza el ajuste, garantizando el buen funcionamiento del equipo, pero no garantiza el mismo resultado después de la entrega y retiro del equipo de nuestro establecimiento.**

# 6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- **Seguimiento a la inversión del Anticipo**
- **Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado**

# Seguimiento a la inversión del Anticipo

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-3-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

FECHA: 01/08/2022
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA - HUILA

**DATOS GENERALES**

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** Diez (10)
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 985-2021 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

**OBJETO DEL CONTRATO:**
"INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1".

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO

**JUSTIFICACIÓN:**
Se realiza la respectiva modificacion por que en el mes inmediatamente anterior no se uso lo que se proyecto y se corre ese rubro para los meses anteriores

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES 4 | VR. MES 5 | VR. MES 6 | VR. MES 7 | VR. MES 8 | VR. MES 9 | VR. MES 10 | VR. MES 11 | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL DE INTERVENTORIA | 13.071.600 | 18.182.797 | 64.562.762 | 74.725.100 | 79.886.600 | 80.586.600 | 81.382.400 | 89.198.700 | 83.948.700 | 85.348.800 | 66.050.000 | 736.944.059 | 75,17% |
| 2 | Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | 3.350.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 11.150.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 134.500.000 | 13,72% |
| 3 | Equipo completo de topografia | - | - | - | 2.900.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 37.900.000 | 3,87% |
| 4 | Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | - | - | 1.025.000 | - | - | 825.000 | 100.000 | 1.075.000 | - | 3.325.000 | 1.540.669 | 7.890.669 | 0,80% |
| 5 | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | 660.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.460.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 35.120.000 | 3,58% |
| 6 | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | - | 120.000 | 270.000 | 140.000 | 360.000 | 220.000 | 880.000 | 50.000 | 110.000 | 240.000 | | 2.390.000 | 0,24% |
| 7 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | 43.488 | 637.824 | 572.592 | 637.824 | 724.800 | 724.800 | 724.800 | 724.800 | 724.800 | 724.800 | | 6.240.528 | 0,64% |
| 8 | Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 | - | - | - | - | - | - | 67.500 | 13.500 | 135.000 | 40.500 | - | 256.500 | 0,03% |
| 9 | Viaticos Director y/o Especialistas | 600.000 | 400.000 | 1.600.000 | - | 1.500.000 | 1.300.000 | 2.500.000 | 600.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | | 15.500.000 | 1,58% |
| 10 | Veeduría Técnica Comunitaria | - | - | - | - | - | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - | - | 600,000 | 0,06% |
| 11 | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | - | - | - | - | - | 880.000 | 544.000 | 896.000 | 720.000 | - | - | 3.040.000 | 0,31% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL** | **17.725.088** | **26.340.621** | **80.030.354** | **92.012.924** | **106.471.400** | **108.536.400** | **110.398.700** | **116.758.000** | **111.838.500** | **118.679.100** | **91.590.669** | **980.381.756** | **100%** |

**NOTAS:**
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. **No aplica para compra ni alquiler de vehículos.**

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.

4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: **JORGE ENRIQUE ALTARO DE LOS RIOS**
Representante Legal o su Apoderado
Interventor : CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula No.: 25202-44184 CND

Firma: Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Nombre: **CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No.: 25202-72334 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-3-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 de 2<br>1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 22/04/2026
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA - HUILA

## DATOS GENERALES

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☑ (Indique si corresponde)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 985-2021 (Indicar número y año)

**CUENTA BANCARIA No.:** 496500007950 **BANCO** DAVIVIENDA SUCURSAL: OFICINA BOGOTÁ

**ANTICIPO OTORGADO:** 50 **%**

**VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:** **$ 980,381,756.00 (M/CTE)**

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

"INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1".

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ

## DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | CE - 92<br>Transferencia Electronica | agosto de 2022 | CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030<br>901,481,479-5 | $ 66,050,000.00 | 1 | REEMBOLSO No. 92 SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ACTIVO DEL CONSORCIO DEL MES DE MAYO 2022 |
| CE | CE - 93<br>Transferencia Electronica | agosto de 2022 | CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030<br>901,481,479-5 | $ 15,000,000.00 | 2 | REEMBOLSO No. 93 SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN ALQUILER VEHICULO DE CAMPO MES DE MAYO 2022 |
| CE | CE - 94<br>Transferencia Electronica | agosto de 2022 | CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030<br>901,481,479-5 | $ 5,000,000.00 | 3 | REEMBOLSO No. 94 SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN Equipo completo de topografia MES DE MAYO 2022 |
| CE | CE - 95<br>Transferencia Electronica | agosto de 2022 | CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030<br>901,481,479-5 | $ 1,540,669.00 | 4 | REEMBOLSO No. 95 SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos correspondiente al mes de MAYO 2022 |
| CE | CE - 96<br>Transferencia Electronica | agosto de 2022 | CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030<br>901,481,479-5 | $ 4,000,000.00 | 5 | REEMBOLSO No. 96 SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) correspondiente al mes de MAYO 2022 |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

**NOTA:**

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

## SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

| ITEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ITEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL DE INTERVENTORIA | $ 736,944,059 | $ 670,894,059 | $ 66,050,000 | $ 736,944,059 | $ 0 |
| 2 | Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | $ 134,500,000 | $ 119,500,000 | $ 15,000,000 | $ 134,500,000 | $ 0 |
| 3 | Equipo completo de topografia | $ 37,900,000 | $ 32,900,000 | $ 5,000,000 | $ 37,900,000 | $ 0 |
| 4 | Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | $ 7,890,669 | $ 6,350,000 | $ 1,540,669 | $ 7,890,669 | $ 0 |
| 5 | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | $ 35,120,000 | $ 31,120,000 | $ 4,000,000 | $ 35,120,000 | $ 0 |
| 6 | Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | $ 2,390,000 | $ 2,390,000 | $ 0 | $ 2,390,000 | $ 0 |
| 7 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | $ 6,240,528 | $ 6,240,528 | $ 0 | $ 6,240,528 | $ 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 | $ 256,500 | $ 256,500 | $ 0 | $ 256,500 | $ 0 |
| 9 | Viaticos Director y/o Especialistas | $ 15,500,000 | $ 15,500,000 | $ 0 | $ 15,500,000 | $ 0 |
| 10 | Veeduría Técnica Comunitaria | $ 600,000 | $ 600,000 | $ 0 | $ 600,000 | $ 0 |
| 11 | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | $ 3,040,000 | $ 3,040,000 | $ 0 | $ 3,040,000 | $ 0 |
| | **TOTALES** | $ 980,381,756 | $ 888,791,087 | $ 91,590,669 | $ 980,381,756 | $ 0 |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (AGOSTO-SEPTIEMBRE 22):** $ 1,000.00
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ 468,445.00
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8944 | $ 74,982 | $ - | sep-21 | 6/10/2021 | $ 74,982 |
| 9956 | $ 80,887 | $ - | oct-21 | 11/11/2021 | $ 155,869 |
| 10762 | $ 68,893 | $ - | nov-21 | 10/12/2021 | $ 224,762 |
| 11731 | $ 57,052 | $ - | dic-21 | 25/01/2022 | $ 281,814 |
| 12234 | $ 46,688 | $ - | ene-22 | 16/02/2022 | $ 328,502 |
| 13078 | $ 40,775 | $ - | feb-22 | 16/03/2022 | $ 369,277 |
| 13985 | $ 36,344 | $ - | mar-22 | 12/04/2022 | $ 405,621 |
| 15067 | $ 26,414 | $ - | abr-22 | 16/05/2022 | $ 432,035 |
| 16372 | $ 18,488 | $ - | may-22 | 21/06/2022 | $ 450,523 |
| 17843 | $ 9,134 | $ - | jun-22 | 28/07/2022 | $ 459,657 |
| 19152 | $ 7,788 | $ - | jul-22 | 25/08/2022 | $ 467,445 |
| 174895 | $ 1,000 | $ - | ago-22 sep-22 | 20/04/2026 | $ 468,445 |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)


**NOTA:**
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre: **JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS**
Representante Legal o su Apoderado
Interventor : CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula No.: 25202-44184 CND

Firma:
Nombre: **KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ**
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No. : 19202-426785

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

# Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado

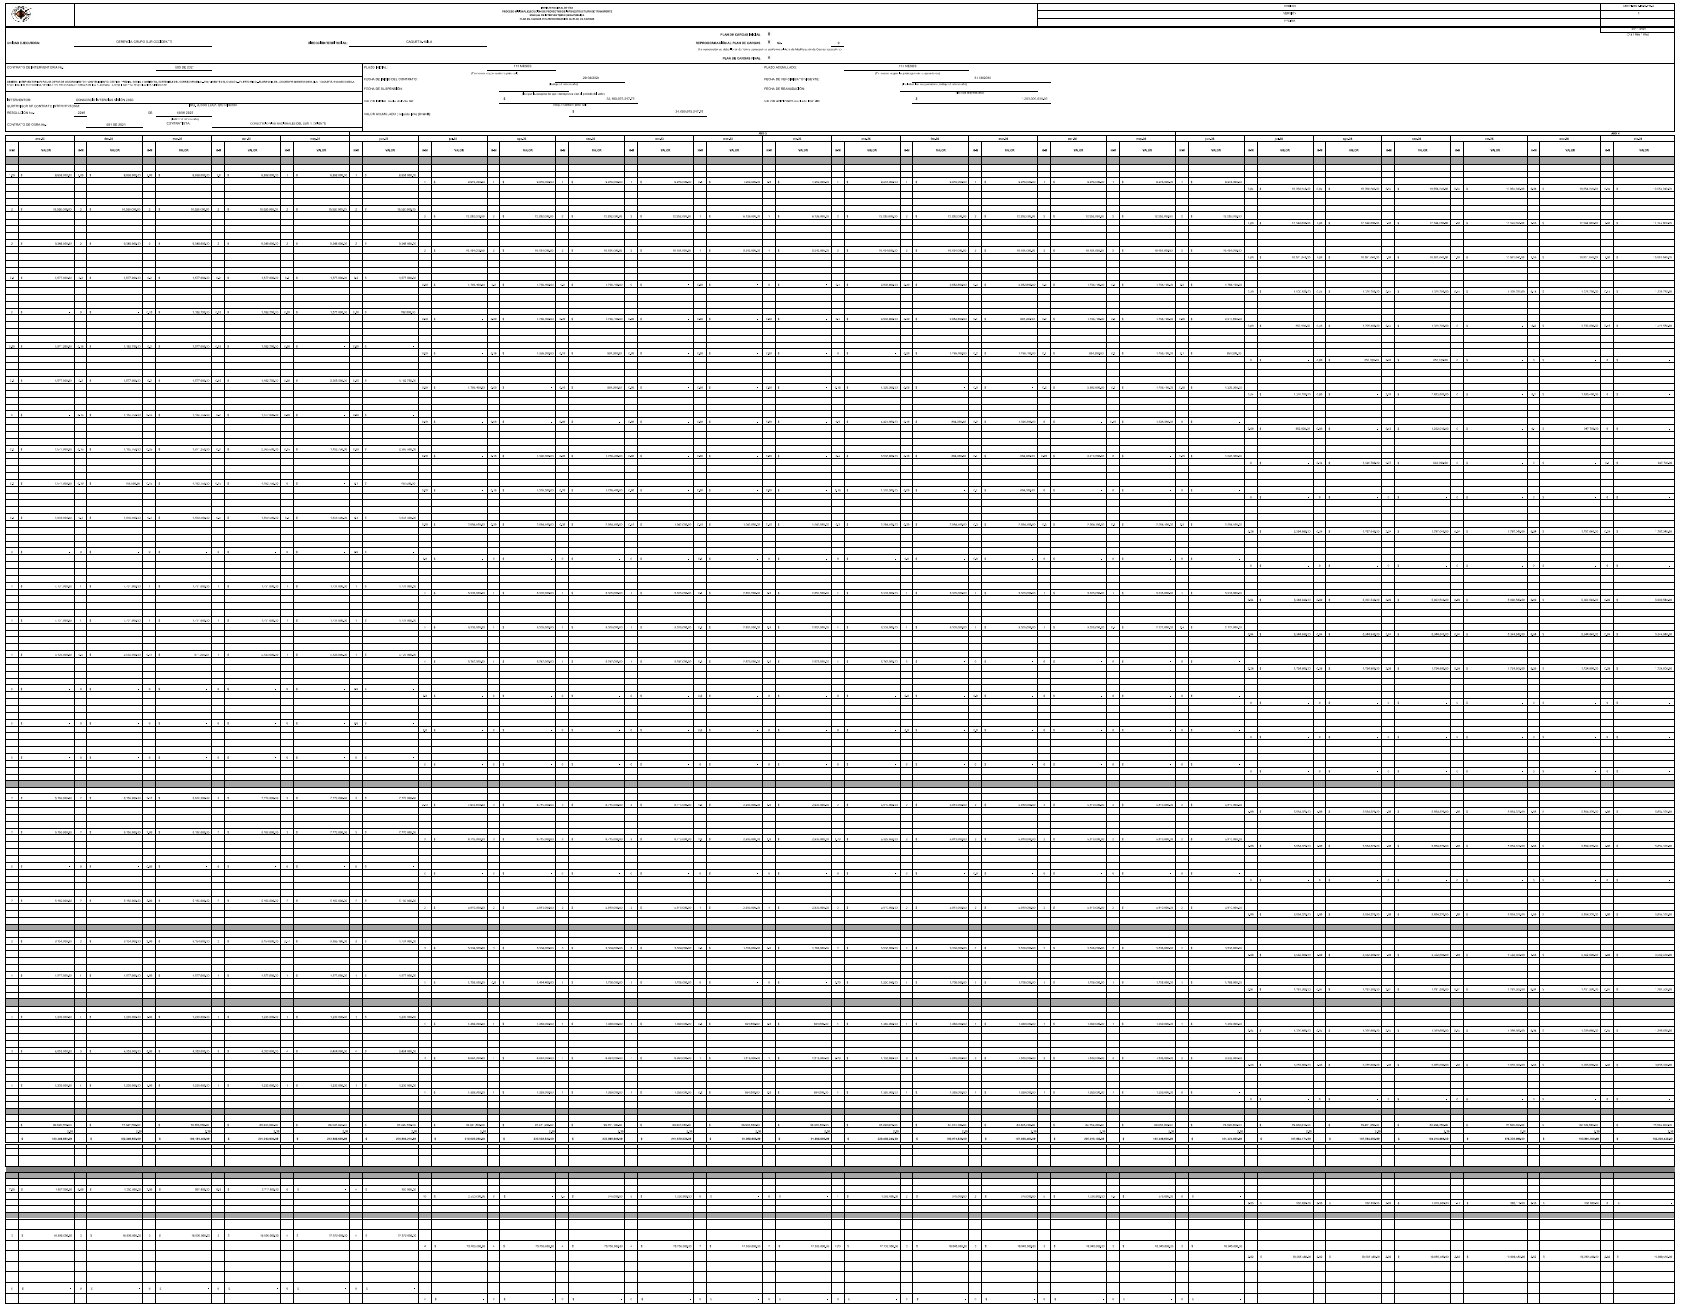

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEJ-1-MN-1-IN-0-FR-2 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| | 20/ /2025 (Día / Mes / Año) |

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ-HUILA

PLAN DE CARGAS INICIAL ▪

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ▪ No. 9

(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme el Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ▪

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 895 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVÍAS VISIÓN 2030

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JESUS EDUARDO RINCON

RESOLUCIÓN No.: 2248 DE 19/06/2025 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 881 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

PLAZO INICIAL: 111 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Incluye la suspensión que corresponde con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 33,499,975,247.76 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 31,899,975,247.78

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)


FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 1,200,000,000.00

| ene-25 H-M | ene-25 VALOR | feb-25 H-M | feb-25 VALOR | mar-25 H-M | mar-25 VALOR | abr-25 H-M | abr-25 VALOR | may-25 H-M | may-25 VALOR | jun-25 H-M | jun-25 VALOR | jul-25 H-M | jul-25 VALOR | ago-25 H-M | ago-25 VALOR | sep-25 H-M | sep-25 VALOR | oct-25 H-M | oct-25 VALOR | nov-25 H-M | nov-25 VALOR | dic-25 H-M | dic-25 VALOR | ene-26 H-M | ene-26 VALOR | feb-26 H-M | feb-26 VALOR | mar-26 H-M | mar-26 VALOR | abr-26 H-M | abr-26 VALOR | may-26 H-M | may-26 VALOR | jun-26 H-M | jun-26 VALOR | jul-26 H-M | jul-26 VALOR | ago-26 H-M | ago-26 VALOR | sep-26 H-M | sep-26 VALOR | oct-26 H-M | oct-26 VALOR | nov-26 H-M | nov-26 VALOR | dic-26 H-M | dic-26 VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,63 | $ 6.557.000,00 | 0,63 | $ 6.557.000,00 | 0,63 | $ 6.557.000,00 | 0,63 | $ 6.557.000,00 | 0,64 | $ 6.656.000,00 | 0,64 | $ 6.656.000,00 |
| 0,94 | $ 10.054.240,00 | 0,94 | $ 10.054.240,00 | 0,94 | $ 10.054.240,00 | 0,94 | $ 10.054.240,00 | 1,00 | $ 10.696.000,00 | 1,00 | $ 10.696.000,00 | 1 | $ 11.211.000,00 | 1 | $ 11.211.000,00 | 1 | $ 11.211.000,00 | 1 | $ 11.211.000,00 | 1 | $ 11.211.000,00 | 1 | $ 11.211.000,00 | 1 | $ 11.211.000,00 | 1 | $ 11.211.000,00 | 1 | $ 11.211.000,00 | 1 | $ 11.211.000,00 | 1,00 | $ 11.211.000,00 | 1,00 | $ 11.211.000,00 | 1,70 | $ 8.245.000,00 | 1,70 | $ 8.245.000,00 | 1,70 | $ 8.245.000,00 | 1,71 | $ 8.293.500,00 | 1,71 | $ 8.293.500,00 | 1,71 | $ 8.293.500,00 |

[illegible]

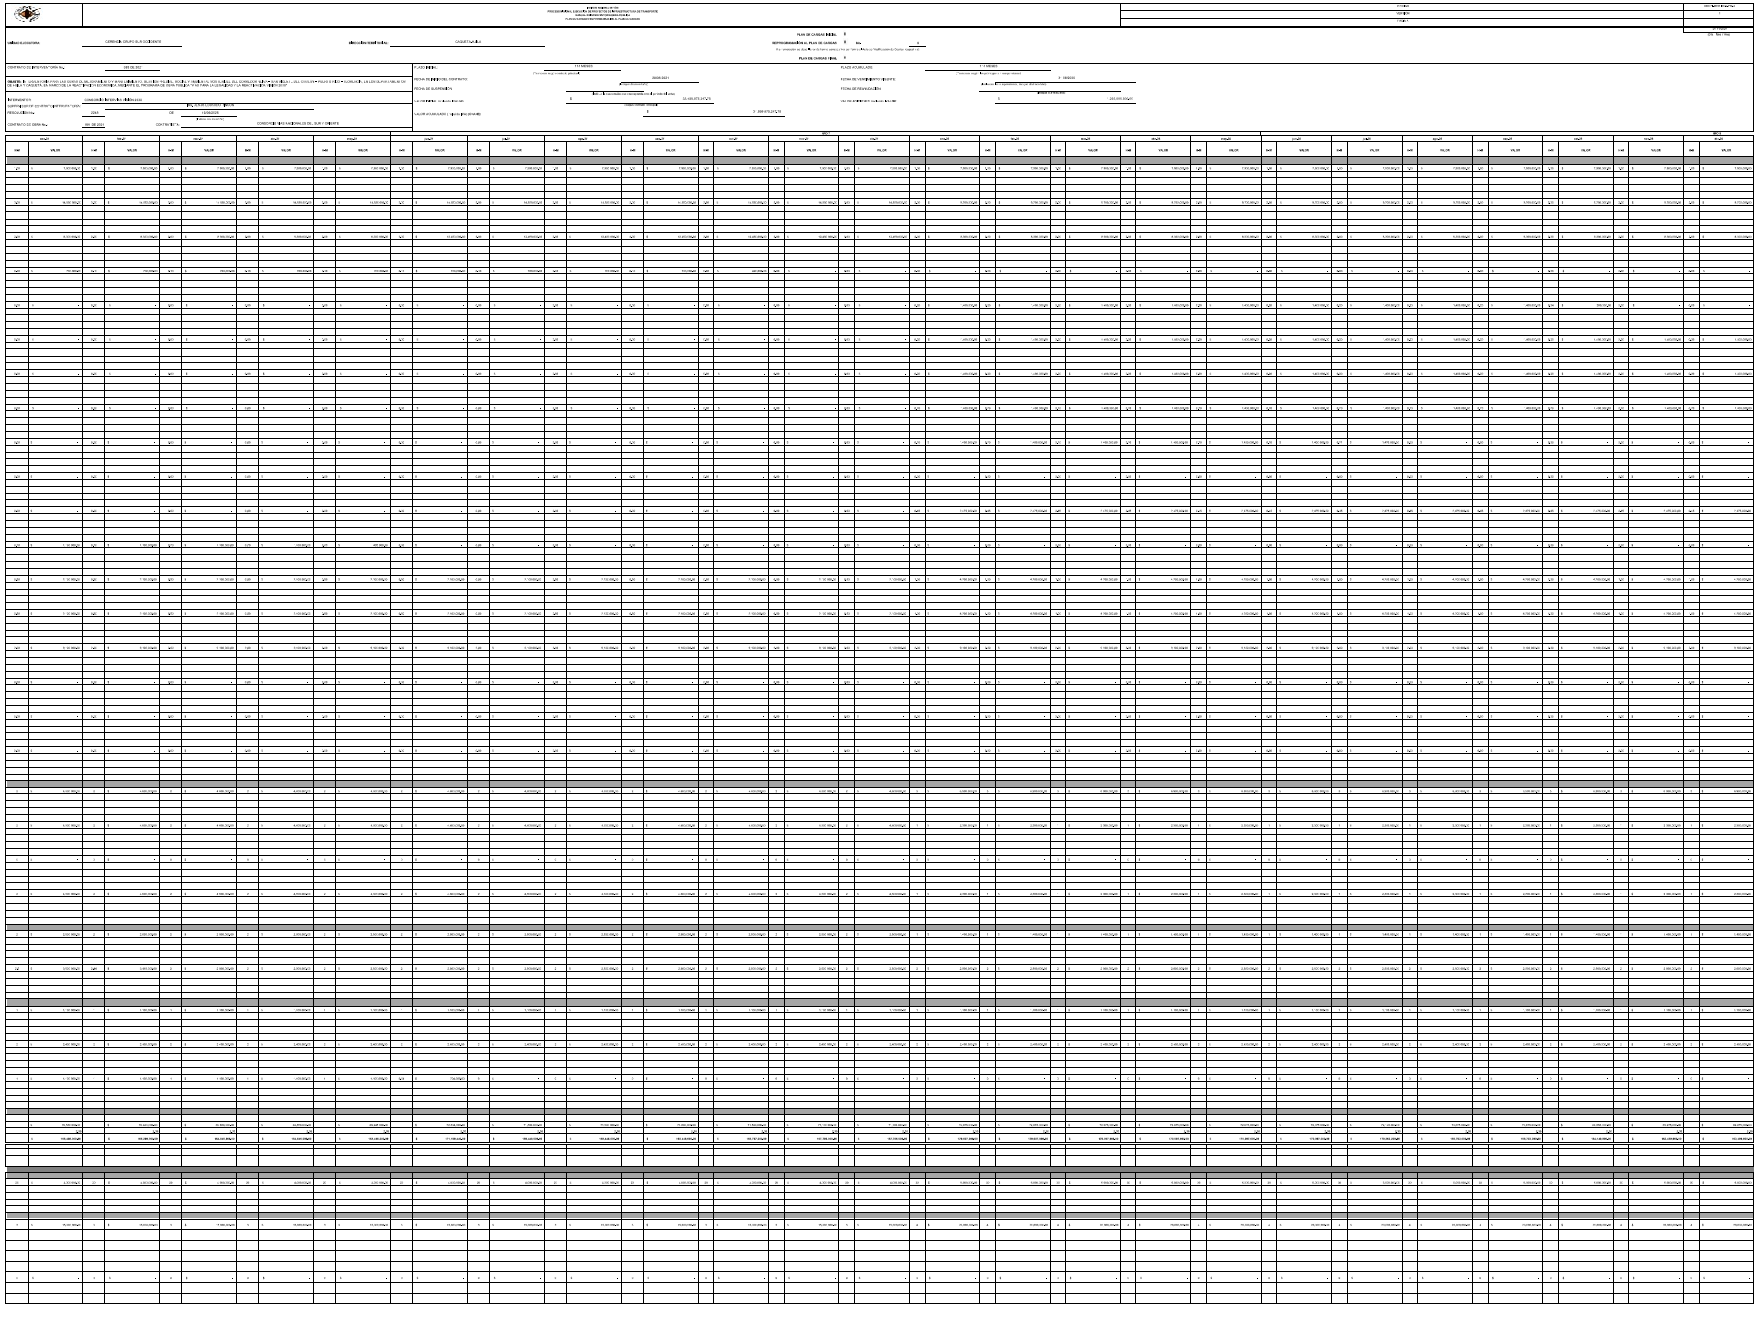

# 7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


- En cumplimiento al seguimiento realizado a la **reprogramación al programa de inversiones No.11** el cual contiene el ajuste de acuerdo con el acta de modificación de cantidades de obra N°12 y la actualización del valor básico a ejecutar en la vigencia del año 2026 de acuerdo con el Plan de Intervención; se presenta a continuación el seguimiento correspondiente al contrato de obra, con base en los avances físicos y financieros reportados

| | VALORES MAYO 2026 | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| INVERSIÓN PROGRAMADA | $ 2,833,294,148.00 | 0.85% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA | $ 93,735,215,241.00 | 28.34% |
| INVERSIÓN EJECUTADA | $ 3,300,360,175.00 | 0.99% |
| INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA | $ 96,562,691,715.00 | 28.85% |


- El valor **básico de obra** presenta un porcentaje ejecutado de **28.85%** con respecto al porcentaje programado a corte de 31 de mayo de 2026 el cual fue de **28.34%.**
- El contrato presenta un avance financiero a corte de 31 de mayo de 2026 de **$2,827,476,474** el cual corresponde a **0.51% con respecto al valor básico de obra** del contrato, calculado con respecto a la reprogramación No. 11 al programa de inversiones.
- Las provisiones y otros conceptos del total del contrato presentan el siguiente avance:

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|
| AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | 47.720% |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA | 0.000% |
| IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 | 30.701% |
| AJUSTES ESTUDIOS Y DISEÑOS | 90.000% |
| IVA - AJUSTES ESTUDIOS Y DISEÑOS | 90.000% |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS ATÍPICOS | 69.782% |
| IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS ATÍPICOS | 69.782% |
| GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL | 6.028% |
| PROVISION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) | 1.982% |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS | 43.225% |
| VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO | 30.789% |

- Las provisiones y otros conceptos del total del contrato presentan los siguientes valores ejecutados:

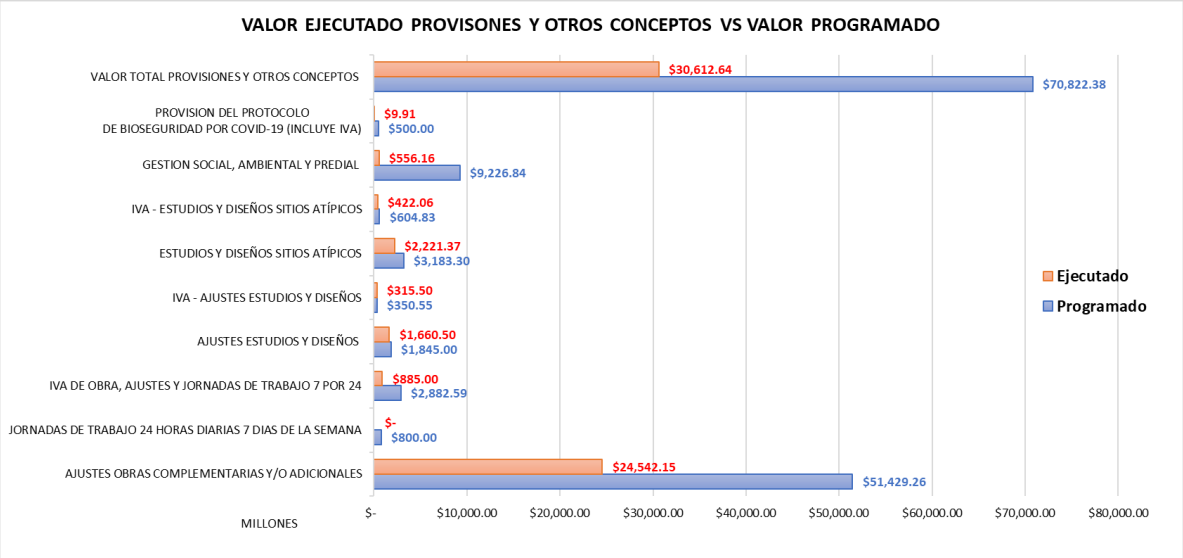


- A corte del **31 de mayo de 2026** se presenta un porcentaje de ejecución total del contrato del 30.789%. como se muestra a continuación:

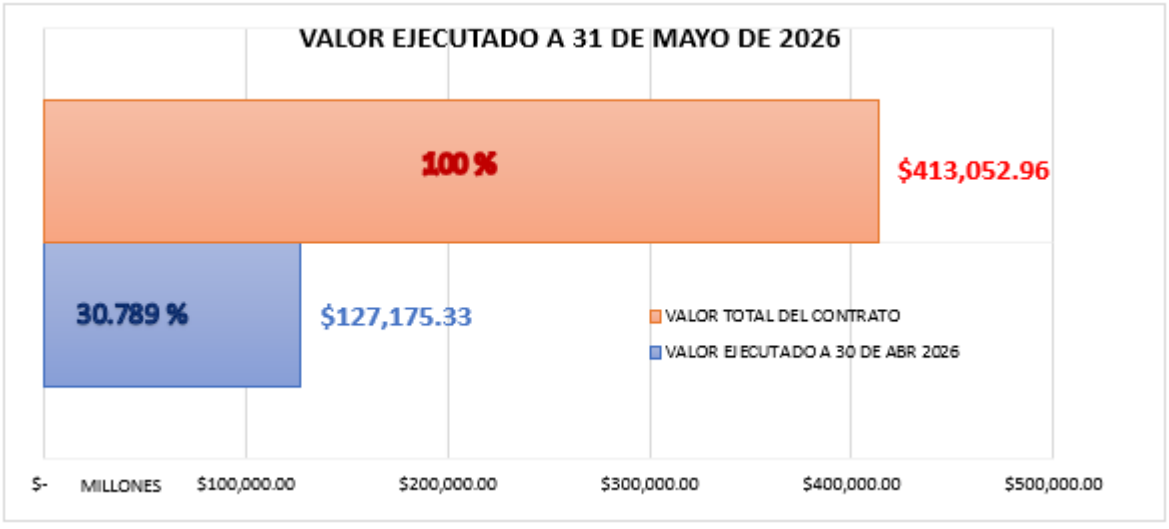


- Los estudios y diseños fase III de los sectores priorizados para la ejecución del contrato presentan el siguiente avance:

| ESTADO ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES PRIORIZADOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PR INCIAL | PR FINAL | RUTA | LONGITUD Km | AVANCE % |
| 1 | | PR10+500 | PR13+500 | Ruta 3001 | 3,0 km | 100% |
| 2 | | PR13+500 | PR18+500 | Ruta 3001 | 5,0 km | 90% |
| 3 | | PR00+000 | PR49+000 | Ruta 6504 | 49,0 km | 100% |
| | | | **Total** | | **57,00 km** | |

- Los estudios y diseños fase III de los sectores atípicos incluidos en la bolsa de estudios y diseños presentan el siguiente avance:

| PUNTOS CRITICOS RUTA 6503 | | |
|---|---|---|
| **SECTORES** | | AVANCE EYD |
| **1** | PR38+295 Puente Las Delicias | 100% |
| **2** | PR42+600 Box Culvert (emergencia) | 100% |
| **3** | PR52+800 Perdida de banca | 100% |
| **4** | PR54+570 Muro desplazado | 50% |
| | | |

| PUNTOS CRITICOS RUTA 6504 | | |
|---|---|---|
| **SECTORES** | | AVANCE EYD |
| **1** | PR04+800 Box culvert | 100% |
| **2** | PR09+060 Puente militar El Águila | 100% |
| **3** | PR16+400 Estabilizacion taludes | 65% |
| **3** | PR23+470 Puente militar Riecito | 100% |
| **4** | PR30 A PR32 Falla geológica | 72% |
| **5** | PR36+820 Falla a desnivel | 70% |
| **6** | PR 52+000 Hundimiento de calzada | 85% |

| **PUNTOS CRITICOS RUTA 3001** | | |
|---|---|---|
| **SECTORES** | | AVANCE EYD |
| **1** | PR23+100 Perdida de banca | 60% |
| **2** | PR40+270 Deslizamiento | 60% |

| **PUNTOS CRITICOS RUTA 3002** | | |
|---|---|---|
| **SECTORES** | | AVANCE EYD |
| **1** | PR01+380 Perdida de banca y hundimiento vía | 87% |
| **2** | PR12+800 Pontón | 100% |
| **3** | PR12+950 Perdida de banca | 100% |
| **4** | PR72+100 Muro de contención | 87% |
| **5** | PR7+850 Perdida de banca | 10% |
| **6** | PR16+000 Perdida de banca | 17% |
| **7** | PR16+700 Obra hidráulica | 0% |
| **8** | PR58+500 Deslizamiento | 0% |

- Mediante el comunicado C-245-4649-1099-26 del 12 de mayo de 2026, Se realiza la entrega del acta de costos de interventoría N° 59 correspondiente al mes de abril de 2026.CTO DE INTERVENTORÍA 985 DE 2021.

- Mediante el oficio C-245-4679-1202-26 del 22 de mayo de 2026, Se realiza la radicación del acta de obra No. 59 correspondiente al mes de abril de 2026 CTO DE OBRA 991 DE 2021.

# 8 ANEXOS

## 8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO (NO SE REQUIERE ANEXAR LOS DOCUMENTOS).

**Tabla 3. Correspondencia Enviada Interventor al Contratista**

| ASUNTO | RADICADO | FECHA DE RECIBO |
|---|---|---|
| RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-249-2026 – Remisión de cotizaciones refrigerios – Actividad de Seguridad Vial Ruta 3001 | C-245-4608-1013-26 | 5/2/2026 |
| alcance al comunicado C-245-4601-0995-26. Respuesta al comunicado CVNSO-0991-232-2026. Informe Mensual Ambiental de marzo de 2026 | C-245-4609-1014-26 | 5/2/2026 |
| Reiteración de atención a sitios de emergencia por derrumbe ubicado en PR37+010 y PR 34+500. | C-245-4610-1015-26 | 5/2/2026 |
| Solicitud de atención, actividades contractuales ruta nacional 3002. | C-245-4612-1021-26 | 5/4/2026 |
| Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-248-2026 con asunto "Respuesta a comunicados C-245-4534-0775-y C-245-4558-0849 referente a presuntos retrasos en actividades Puente Las Delicias – Programación Vigencia 2026" | C-245-4613-1022-26 | 5/4/2026 |
| Respuesta a comunicado CVNSO-0991-198-2026 con asunto "Subsanación Observaciones al informe Gestión Predial. Atención a la comunicación con consecutivo C-245-4477-0602-26 del 13 de marzo del 2026 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-162-2026 fechado 09/03/2026. Con asunto "Remisión del Informe Gestión Predial mes de febrero de 2026, con sus anexos". | C-245-4615-1029-26 | 5/5/2026 |
| Respuesta a comunicado CVNSO-0991-223-2026 con asunto "Remisión del Informe Gestión Predial mes de marzo de 2026, con sus anexos". | C-245-4616-1030-26 | 5/5/2026 |
| Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-254-2026 con asunto "RESPUESTA A COMUNICADO C-245-4544-0805-26, ASUNTO: REQUERIMIENTO DE REPORTE DE AVANCES EN TRÁMITES DE PERMISOS Y PROVISIÓN DE INSUMOS PARA LA REUBICACIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN SOBRE EL SECTOR QUEBRADA LAS DECILIAS – ACTAS ACTAEL_1 Y ACTAPE_1." | C-245-4622-1041-26 | 5/5/2026 |
| Respuesta a oficio CVNSO-0991-168-2026 con asunto "Respuesta comunicado C-245-4413-0355-26 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-070-2026"Respuesta comunicado C-245-4246-1865-25 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-797-2025"Remisión Implantación estructura para los estudios y diseños del SITIO crítico | C-245-4623-1044-26 | 5/5/2026 |

| | | |
|---|---|---|
| K23+100, VÍA NACIONAL 3001"". Volumen VIII – Estudio y Diseño Estructuras" | | |
| Respuesta comunicado CVNSO-0991-199-2026 fechado 24/03/2026 "Subsanación a la Entrega No. 4 Insumos Primarios, – Predio: 004-ID-01-MCNF. Gestión Predial del Contrato. Atención a las comunicaciones con consecutivos; C-245-4209-1783-25 del 29 de noviembre del 2025 y C-245-4225-1822-25 del 4 de diciembre de 2025." | C-245-4624-1045-26 | 5/5/2026 |
| Respuesta comunicado CVNSO-0991-200-2026 fechado 24/03/2026 "Subsanación a la Entrega No. 3 Insumos Primarios, – Predio: 002-D-01-MCNF y Mejora: 002-D01-MCNF-MJ01. Gestión Predial del Contrato. Atención a la comunicación con consecutivo C-245-4158-1692-25 del 13 de noviembre del 2025" | C-245-4625-1046-26 | 5/6/2026 |
| Respuesta comunicado CVNSO-0991-216-2026 fechado 07/04/2026 "Entrega No. 9 Insumos Primarios, – Predio: 005-ID-01-MCNF y Mejora 005-ID-01-MCNF-MJ-03. Gestión Predial del Contrato." | C-245-4626-1047-26 | 5/6/2026 |
| Respuesta comunicado CVNSO-0991-216-2026 fechado 07/04/2026 "Subsanación a la Entrega No. 7 Insumos Primarios, – Predio: 013-D-01-MCNF. Gestión Predial del Contrato. Atención a la comunicación con consecutivo C-245-4436-0440-26 del 26 de febrero del 2026. | C-245-4627-1048-26 | 5/6/2026 |
| Solicitud de entrega del Informe de Calidad correspondiente al mes de abril de 2026. | C-245-4629-1059-26 | 5/7/2026 |
| RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-243-2026 ACTA PERMISO - CONSTRUCCIÓN OBRA DE ARTE RUTA 6503 Y 6504 | C-245-4630-1060-26 | 5/7/2026 |
| REQUERIMIENTO DE ATENCIÓN DE PQRS RADICADA POR EL SEÑOR ALEXANDER MEDINA RUBIANO | C-245-4631-1061-26 | 5/7/2026 |
| SOLICITUD ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL, MES DE ABRIL DE 2026. | C-245-4632-1063-26 | 5/7/2026 |
| Recomendaciones especialistas hidráulico y geotecnia de la interventoría punto crítico PR12+800 RN 3002. | C-245-4633-1064-26 | 5/7/2026 |
| RESPUESTA Y PRECISIONES DE LA INTERVENTORÍA FRENTE A LAS MANIFESTACIONES REITERADAS SOBRE SUPUESTO INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO, INCLUIDAS EN LOS COMUNICADOS CVNSO-0991-232, 233, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 248, 249, 250, 253, 254, 255, 260, 263, 265, 267 Y DEMÁS DE LA VIGENCIA 2026. | C-245-4634-1065-26 | 5/7/2026 |
| REQUERIMIENTO DE ATENCIÓN DE PQRS RADICADA POR EL SEÑOR JOSÉ JESÚS BORRAY MONTIEL | C-245-4635-1067-26 | 5/7/2026 |
| RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-263-2026 - "RESPUESTA A COMUNICADO C-245-4584-0940-26, ASUNTO: SOLICITUD DE | C-245-4636-1068-26 | 5/7/2026 |

| | | |
|---|---|---|
| INFORMACIÓN – ACTAS DE VECINDAD DE INICIO RUTA NACIONAL 6503 VIGENCIA 2026" | | |
| Respuesta a oficio CVNSO-0991-225-2026 con asunto "Remisión Volumen VIII Diseño Estructural Sitio Crítico K40+270 de la Ruta Nacional 3002." | C-245-4638-1070-26 | 5/7/2026 |
| Respuesta a los comunicados CVNSO-0991-138-2026, CVNSO-0991-085-2026, CVNSO-0991-086-2026, CVNSO-0991-087-2026 y CVNSO-0991-099-2026 | C-245-4639-1071-26 | 5/7/2026 |
| RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-246-2026 - RESPUESTA A COMUNICADO C-245-4526-0752-26, ASUNTO: RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-194-2026 - COTIZACIONES MATERIAL PEDAGÓGICO – SEGURIDAD VIAL RUTA CAQUETÁ -NEIVA. | C-245-4640-1073-26 | 5/8/2026 |
| ALCANCE AL COMUNICADO C-245-4636-1068-26 – RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-263-2026 – ACTAS DE VECINDAD RUTA NACIONAL 6503 VIGENCIA 2026 | C-245-4641-1074-26 | 5/8/2026 |
| SOLICITUD DE REMISIÓN DE SOPORTES DOCUMENTALES CITADOS EN COMUNICADO CVNSO-0991-258-2026-NO VIABILIDAD OPC FLORA GAITA | C-245-4642-1078-26 | 5/8/2026 |
| OBSERVACIONES TÉCNICAS – ENCUESTA OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) VEREDA CEIBAS AFUERA RUTA 3001. | C-245-4643-1081-26 | 5/9/2026 |
| RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-255-2026 REMISIÓN DE COTIZACIONES PARA IMPRESIÓN DE VOLANTES N° 21 Y 22 – RUTA 3001 | C-245-4644-1082-26 | 5/9/2026 |
| Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-211-2026 con asunto "Respuesta comunicado C-245-3971-1354-25 "Alcance a comunicado C-245-2913-1478-24 con asunto "Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-469-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2837-1296-24 realizadas al "Volumen IV. Estudio de Fundaciones – Geotécnico del Sitio Critico PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503"""""". | C-245-4645-1090-26 | 5/11/2026 |
| Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-273-2026 con asunto "Respuesta al oficio C-245-4521-0738-26 con asunto "Requerimiento Técnico: Extracción de núcleos (INV E-418) por baja resistencia en concreto Ruta 6503 y acciones correctivas"". | C-245-4646-1092-26 | 5/11/2026 |
| Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-273-2026 con asunto "Respuesta al oficio C-245-4521-0738-26 con asunto "Requerimiento Técnico: Extracción de núcleos (INV E-418) por baja resistencia en concreto Ruta 6503 y acciones correctivas"". | C-245-4648-1094-26" | 5/11/2026 |
| Respuesta a oficio CVNSO-0991-078-2026 con asunto "Remisión Volumen de Hidráulica Punto Crítico PR16+000 RN3002." | C-245-4650-1104-26 | 5/12/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Respuesta a oficio CVNSO-0991-075-2026 con asunto "Respuesta comunicado C-245-4056-1515-25 "Remisión Volumen Geotecnia – Fundaciones Punto Crítico PR16+000 RN3002"." | C-245-4651-1105-26 | 5/12/2026 |
| Respuesta oficio CVNSO-0991-277-2026 con asunto entrega Acta de obra No. 59 abril de 2026. | C-245-4653-1107-26 | 5/12/2026 |
| RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-276-2026 RESPUESTA A COMUNICADO C-245-4550-0823-26, REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y LEVANTAMIENTO DE ACTA DE VECINDAD– RUTA NACIONAL 6504 - PR 8+250 Y PR 7+980. | C-245-4655-1109-26 | 5/12/2026 |
| RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-281-2026 RESPUESTA A COMUNICADO C-245-4564-0876-26, LEVANTAMIENTO DE ACTA DE VECINDAD DE SEGUIMIENTO – RUTA NACIONAL 6504 - PR 9+030 MI | C-245-4656-1110-26 | 5/12/2026 |
| Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-253-2026 con asunto "Remisión concepto resistencia de concreto para rellenos de terraplén Puente La Esmeralda." | C-245-4657-1111-26 | 5/12/2026 |
| Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-272-2026 con asunto "Respuesta al oficio C-245-4600-0993-26 con asunto "Requerimiento Técnico: Extracción de núcleos (INV E-418) por baja resistencia en concreto Ruta 6503 - 6504 y acciones correctivas"". | C-245-4658-1112-26 | 5/12/2026 |
| Reiteración solicitud de entrega del Informe de Calidad correspondiente al mes de abril de 2026. | C-245-4659-1116-26 | 5/13/2026 |
| Requerimiento Técnico: Extracción de núcleos (INV E-418) por baja resistencia en concreto Ruta 6503 y acciones correctivas. | C-245-4660-1117-26 | 5/13/2026 |
| Respuesta a oficio CVNSO-0991-206-2026 con asunto "Respuesta comunicado C-245-4308-0030-26 "Respuesta a su oficio CVNSO-991-777-25 "Remisión Volumen de Cantidades para el sitio critico PR12+950 de la Ruta nacional 3002 y respuesta comunicado C-245-4138-1662-25". | C-245-4663-1122-26 | 5/13/2026 |
| Respuesta a oficio CVNSO-0991-205-2026 con asunto "Respuesta comunicado C-245-4269-1912-25 "Respuesta a su oficio CVNSO-991-774-25 "Remisión Volumen de Cantidades para el sitio critico PR12+800 de la Ruta Nacional 3002 y respuesta comunicado C-245-4138-1662-25" | C-245-4664-1123-26 | 5/13/2026 |
| Respuesta a oficio CVNSO-0991-077-2026 con asunto "Remisión Volumen de Geología para el Sitio Critico Ubicado en el PR16+000 de la ruta nacional 3002". | C-245-4665-1124-26 | 5/13/2026 |
| Requerimiento de implementación inmediata de sistema de acceso seguro para control de riesgo en actividades operativas – Ruta 3001 Neiva – Balsillas | C-245-4667-1130-26 | 5/14/2026 |

| | | |
|---|---|---|
| Respuesta a oficio CVNSO-0991-296-2026 con asunto Alcance comunicación CVNSO-0991-229-2026 "Respuesta comunicación C-245-4498-0669-26 Resultados reunión CAM – Solicitud de permisos de ocupación de cauce ruta 3001" | C-245-4669-1146-2 | 5/15/2026 |
| INVITACIÓN Y SOLICITUD DE REMISIÓN DE PRESENTACIÓN – MESA DE DIÁLOGO NO. 16 CONTRATO 991 DE 2021, CONVOCADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | C-245-4670-1159-26 | 5/16/2026 |
| TRASLADO DE CONVOCATORIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y PRESENTACIÓN DE AVANCES CONTRACTUALES | C-245-4672-1161-26 | 5/16/2026 |
| Respuesta a comunicado CVNSO-0991-282-2026 con asunto "Respuesta a comunicado C-245-4629-1059-26 con asunto: "Solicitud de entrega del Informe de Calidad correspondiente al mes de abril de 2026"" | C-245-4673-1162-26 | 5/16/2026 |
| RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-295-2026 - REMISIÓN DE COTIZACIONES LOGÍSTICA VEEDURÍA CIUDADANA – RUTA 6504 | C-245-4674-1177-26 | 5/19/2026 |
| Respuesta oficio CVNSO-0991-299-2026 con asunto "Respuesta a Comunicado C-245-4653-1107-26 con asunto: "Respuesta oficio CVNSO-0991-277-2026 con asunto entrega Acta de obra No. 59 abril de 2026" | C-245-4675-1178-26 | 5/19/2026 |
| Respuesta a comunicado CVNSO-0991-186-2026 con asunto Entrega de informe mensual de seguridad y salud en el trabajo correspondiente al mes de febrero-2026 | C-245-4676-1181-26 | 5/20/2026 |
| Requerimiento Técnico: Extracción de núcleos (INV E-418) por baja resistencia en concreto Rutas 6503 - 6504 y acciones correctivas. | C-245-4677-1182-26 | 5/20/2026 |
| Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-189-2026 "Ajuste diseño geométrico entre el PR8 al PR12 de la Ruta 6504 para mitigar intervenciones prediales e interferencias ambientales". | C-245-4678-1201-26 | 5/22/2026 |
| Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-294-2026 con asunto "Respuesta a comunicados: i). 2026S-VBOG-017381, ii) 2026S-VBOG-027261 y iii) C-245-4634-1065-26 -Estado de Cesación de Pagos de la Entidad (Incumplimiento Contractual y toma de medidas)." Y respuesta a 2026S-VBOG-032908 del 19 de mayo de 2026 | C-245-4681-1210-26 | 5/22/2026 |
| Aplicación de criterios normativos y contractuales para aceptación de concreto y trámite de pago de elementos estructurales. | C-245-4683-1213-26 | 5/25/2026 |
| Respuesta a oficio CVNSO-0991-313-2026, con asunto Respuesta a comunicado C-245-4646-1092-26. "Observaciones paquete N°2 de Ítems No Previstos de actividades ambientales." | C-245-4685-1226-26 | 5/25/2026 |

| | | |
|---|---|---|
| RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-305-2026 CUYO ASUNTO ES "RESPUESTA A COMUNICADO C-245-4559-0854-26, Asunto: RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-220-2026, " Respuesta a los siguientes Comunicados: i) C-245-4453-0541-26 de asunto: "REPORTE TÉCNICO DE EVENTO EN EL PR 38+295 (PUENTE QUEBRADA LAS DELICIAS) Y SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE TRÁNSITO – PMT." ii) DERECHO PETICIÓN – INT.1503 (PQRSF N° 185) y iii) C-245-4536-0788-26 de asunto: "SOLICITUD DE INFORMACIÓN – SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE EVENTO REPORTADO EL 07 DE MARZO DE 2026, ATENCIÓN REQUERIDA MEDIANTE COMUNICADO C-245-4453-0541-26 CUYO ASUNTO DICE "REPORTE TÉCNICO DE EVENTO EN EL PR 38+295 (PUENTE QUEBRADA LAS DELICIAS) Y SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE TRÁNSITO – PMT" | C-245-4687-1242-26 | 5/26/2026 |
| Respuesta al comunicado CVNSO-0991-316-2026. Cantera Cerro Alto, Ruta 3001 | C-245-4690-1252-26 | 5/27/2026 |
| Respuesta a comunicado CVNSO-0991-278-2026 con asunto "Remisión del Informe Gestión Predial mes de abril de 2026, con sus anexos". | C-245-4692-1274-26 | 5/28/2026 |
| Respuesta a comunicado CVNSO-0991-279-2026 con asunto "Presentación Hoja de Vida - Profesional Jurídico Predial". | C-245-4693-1275-26 | 5/29/2026 |
| Respuesta a comunicaciones CVNSO-0991-283-2026 del 11 de mayo de 2026 y CVNSO-0991-301-2026 del 19 de mayo de 2026, relacionadas con la presentación de la Lonja de Profesionales Avaluadores "CORPORACIÓN LONJA INMOBILIARIA DE BOGOTÁ D.C.", para la elaboración de avalúos comerciales e informes de sector. Traslado de pronunciamiento INVIAS radicado 2026S-VBOG-033611". | C-245-4694-1276-26 | 5/29/2026 |
| Respuesta a su oficio CVNSO-0991-081-2026 Remisión Volumen de Estructura Punto Crítico PR16+000 RN3002 | C-245-4695-1277-26 | 5/29/2026 |
| Reiteración comunicado C-245-4223-1812-25 con asunto "Reiteración a comunicado C-245-4128-1638-25 con asunto Informe inspección visual del pavimento flexible instalado entre el PR 10+500 a PR 12+500, RN 3001." | C-245-4696-1278-26 | 5/29/2026 |

**Tabla 4. Correspondencia Recibida Por Parte Del Contratista**

| CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR PARTE DEL CONTRATISTA | | |
|---|---|---|
| **FECHA DE RECIBO** | **REFERENCIA** | **ASUNTO** |
| 5/5/2026 | CVNSO-0991-260-2026 | Entrega de informe mensual de seguridad y salud en el trabajo correspondiente al mes de Marzo 2026 |
| 5/5/2026 | CVNSO-0991-262-2026 | Solicitud de prórroga del permiso de aprovechamiento forestal – Resolución No. 1916 de 2025 y Resolución No. 4248 de 2025 - Expediente PAF-00478-24 |
| 5/5/2026 | CVNSO-0991-265-2026 | RESPUESTA A COMUNICADO C-245-4591-0966-26, ASUNTO: SOLICITUD DE FIRMA DE FORMATOS – INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 18 (ENERO – MARZO DE 2026) |
| 5/5/2026 | CVNSO-0991-263-2026 | RESPUESTA A COMUNICADO C-245-4584-0940-26, ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – ACTAS DE VECINDAD DE INICIO RUTA NACIONAL 6503 VIGENCIA 2026 |
| 5/6/2026 | CVNSO-0991-268-2026 | REMISIÓN ENCUESTA OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) VEREDA CEIBAS AFUERA RUTA 3001. |
| 5/6/2026 | CVNSO-0991-267-2026 | Respuesta a comunicado C-245-4572-0917-26 con asunto: ": Respuesta a comunicado CVNSO-0991-224-2026 con asunto "Entrega Acta de ajustes definitiva 57 febrero de 2026." |
| 5/6/2026 | CVNSO-0991-266-2026 | Entrega acto administrativo Resolución No. 0415 del 27 de marzo de 2026, mediante el cual se prorroga la Resolución DTC-0690. Expediente AU-06-18-256-X-002-018-23. |
| 5/6/2026 | CVNSO-0991-264-2026 | Entrega informe de cumplimiento numeral 5 artículo cuarto de la Resolución No. 1883 de 2023, Expediente AU-06-18-410-X-002-050-23. |

| | | |
|---|---|---|
| 5/6/2026 | CVNSO-0991-261-2026 | Solicitud copia Simple Escrituras Públicas, Predios Requeridos por Utilidad Pública que se encuentran contiguos al corredor vial Ruta 3001 Neiva-Balsillas. |
| 5/8/2026 | CVNSO-0991-269-2026 | Respuesta a los comunicados: i) C-245-4576-0925-26, con asunto "Solicitud de atención de manera inmediata, al derrumbe presentado en PR37+010 ruta 3001", ii) C-245-4578-0929-26 con asunto "Reiteración de atención a sitios de emergencia por derrumbe ubicado en PR37+010 solicitado mediante oficio C-245-4576-0925-2 de 18 de abril de 2026", iii) C-245-4582-0938-26 con asunto: "Reiteración de atención a sitios de emergencia por derrumbe ubicado en PR37+010 solicitado mediante oficio C-245-4576-0925-2 de 18 de abril de 2026", iv) C-245-4589-0963-26 con asunto: "Reiteración de atención a sitios de emergencia por derrumbe ubicado en PR37+010 y ahora también se solicita atención en PR 34+500. Estos se vienen solicitando mediante los oficio C-245-4576-0925-2 de 18 de abril de 2026, C-245-4576-0929-2 de fecha 20 de abril de 2026, C-245-4576-0938-2 de fecha 21 de abril de 2026", v) C-245-4610-1015-26 con asunto: "Reiteración de atención a sitios de emergencia por derrumbe ubicado en PR37+010 y PR 34+500" y vi) C-245-4612-1021-26 con asunto: "Solicitud de atención, actividades contractuales ruta nacional 3002" |
| 5/8/2026 | CVNSO-0991-272-2026 | Respuesta al oficio C-245-4600-0993-26 con asunto "Requerimiento Técnico: Extracción de núcleos (INV E-418) por baja resistencia en concreto Ruta 6503 - 6504 y acciones correctivas." |

| | | |
|---|---|---|
| 5/8/2026 | CVNSO-0991-273-2026 | Respuesta al oficio C-245-4521-0738-26 con asunto "Requerimiento Técnico: Extracción de núcleos (INV E-418) por baja resistencia en concreto Ruta 6503 y acciones correctivas." |
| 5/8/2026 | CVNSO-0991-274-2026 | Respuesta al oficio C-245-4545-0811-26 con asunto Respuesta a oficio CVNSO-0991-139-2026, con asunto "Respuesta al oficio C-245-4386-0263-26 con asunto "Respuesta al oficio CVNSO-0991-016-2026 con asunto "Respuesta a los comunicados: i) C-245-4190-1742-25 con asunto "Alcance a comunicado C-245-4185-1732-25 con asunto "No conformidad mezcla densa en caliente 19 (MDC 19), instalada los días 9,10 y 15 de octubre de 2025 RN 3001." y ii) C-245-4185-1732-25con asunto: "No Conformidad mezcla densa en caliente 19 (MDC 19), instalada los días 9,10 y15 de octubre de 2025 RN 3001." |
| 5/8/2026 | CVNSO-0991-276-2026 | RESPUESTA A COMUNICADO C-245-4550-0823-26, ASUNTO: REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y LEVANTAMIENTO DE ACTA DE VECINDAD– RUTA NACIONAL 6504 - PR 8+250 Y PR 7+980. |
| 5/8/2026 | CVNSO-0991-277-2026 | Entrega Acta de obra No. 59 abril de 2026. |
| 5/9/2026 | CVNSO-0991-278-2026 | Remisión del Informe Gestión Predial mes de abril de 2026, con sus anexos |
| 5/9/2026 | CVNSO-0991- 280-2026 | INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL, MES DE ABRIL DE 2026 |
| 5/9/2026 | CVNSO-0991-281-2026 | RESPUESTA A COMUNICADO C-245-4564-0876-26, ASUNTO: LEVANTAMIENTO DE ACTA DE VECINDAD DE SEGUIMIENTO – RUTA NACIONAL 6504 - PR 9+030 MI |

| | | |
|---|---|---|
| 5/9/2026 | CVNSO-0991-279-2026 | Presentación Hoja de Vida - Profesional Jurídico Predial. |
| 5/12/2026 | CVNSO-0991-283-2026 | Presentación de La Lonja de Profesionales Avaluadores "CORPORACIÓN LONJA INMOBILIARIA DE BOGOTÁ D.C", para elaboración de los avalúos comerciales y estudios de informe de sector. |
| 5/12/2026 | CVNSO-0991-284-2026 | Entrega del Informe Técnico y solicitud modificación Línea de Compra para el Punto Crítico PR38 – Puente Las Delicias en la Ruta 6503. |
| 5/12/2026 | CVNSO-0991-275-2026 | Entrega informe de cumplimiento numeral 5 artículo cuarto de la Resolución No. 1881 de 2023, Expediente AU-06-18-592-X-002-049-23. |
| 5/12/2026 | CVNSO-0991-285-2026 | Respuesta a Oficios DTC-1527 y DTC-1481Entrega soporte de pago visitas de seguimiento con facturas FVC-7426 de permiso de ocupación de cauce Expediente: AU-06-18-256-X-002-018-23 Item: 0153 Oficio: DTC-1263 RECURSO HIDRICO y FVC-7458 de permiso de emisiones atmosféricas seguimiento Expediente: PE-06-18-592-X-006-026-22 Item: 161 Oficio: DTC-1333 RECURSO AIRE |
| 5/12/2026 | CVNSO-0991-286-2026 | Solicitud información de los predios que se encuentren en trámite ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT). |
| 5/12/2026 | CVNSO-0991-287-2026 | Solicitud de Información sobre titularidad y/o presuntos baldíos de los predios afectados por el Proyecto corredor Neiva – San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia, en los departamentos de Huila y Caquetá, |

| | | |
|---|---|---|
| 5/12/2026 | CVNSO-0991-288-2026 | Solicitud de información de predios con extinción de dominio afectados por el Proyecto corredor Neiva – San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia, en los departamentos de Huila y Caquetá. |
| 5/13/2026 | CVNSO-0991-292-2026 | Entrega Acta de ajustes definitiva 58 marzo de 2026. |
| 5/14/2026 | CVNSO-0991-290-2026 | Respuesta a PQRS 186 – Solicitud Residentes Condominio Bosques de Cantabria. |
| 5/14/2026 | CVNSO-0991-294-2026 | Respuesta a comunicados: i). 2026S-VBOG-017381, ii) 2026S-VBOG-027261 y iii) C-245-4634-1065-26 -Estado de Cesación de Pagos de la Entidad (Incumplimiento Contractual y toma de medidas). |
| 5/14/2026 | CVNSO-0991-282-2026 | Respuesta a comunicado C-245-4629-1059-26 con asunto: "Solicitud de entrega del Informe de Calidad correspondiente al mes de abril de 2026." |
| 5/14/2026 | CVNSO-0991-293-2026 | Respuesta a PQRS 191 – Oficio Remisorio Propuesta de Tanque de almacenamiento de Agua de la Vereda Platanillal. |
| 5/15/2026 | CVNSO-0991-295-2026 | Remisión de cotizaciones Logística Veeduría Ciudadana – Ruta 6504 |
| 5/15/2026 | CVNSO-0991-297-2026 | Invitación Reunión Trimestral de Veeduría - Puerto Rico Ruta 6504. |
| 5/15/2026 | CVNSO-0991-296-2026 | Alcance comunicación CVNSO-0991-229-2026 "Respuesta comunicación C-245-4498-0669-26 Resultados reunión CAM – Solicitud de permisos de ocupación de cauce ruta 3001" |

| | | |
|---|---|---|
| 5/15/2026 | CVNSO-0991-298-2026 | Respuesta a Comunicados: i) C-245-4590-0964-26 con asunto "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-180-2026 con asunto "Alcance a comunicado CVNSO 0991-868-2025 "Presentación del paquete de APUs de Ítems No. 7 No Previstos" y ii) C-245-4622-1041-26 con asunto: "RESPUESTA A COMUNICADO C-245-4544-0805-26, ASUNTO: REQUERIMIENTO DE REPORTE DE AVANCES EN TRÁMITES DE PERMISOS Y PROVISIÓN DE INSUMOS PARA LA REUBICACIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN SOBRE EL SECTOR QUEBRADA LAS DECILIAS – ACTAS ACTAEL_1 Y ACTAPE_1." |
| 5/16/2026 | CVNSO-0991-299-2026 | Respuesta a Comunicado C-245-4653-1107-26 con asunto: "Respuesta oficio CVNSO-0991-277-2026 con asunto entrega Acta de obra No. 59 abril de 2026" |
| 5/19/2026 | CVNSO-0991-300-2026 | Remisión informe ambiental PAGA correspondiente al mes de abril de 2026. |
| 5/19/2026 | CVNSO-0991-302-2026 | Subsanación a la Entrega No. 7 Insumos Primarios, – Predio: 013-D-01-MCNF. Gestión Predial del Contrato. Atención a la comunicación con consecutivo C-245-4627-1048-26 del 6 de mayo del 2026. |
| 5/19/2026 | CVNSO-0991-301-2026 | Alcance a la Comunicación CVNSO-0991-283-2026 del 11 de mayo de 2026 con asunto "Presentación de La Lonja de Profesionales Avaluadores "CORPORACIÓN LONJA INMOBILIARIA DE BOGOTA D.C", para elaboración de los avalúos comerciales y estudios de informe de sector." |

| | | |
|---|---|---|
| 5/20/2026 | CVNSO-0991-303-2026 | Respuesta a Comunicado C-245-4675-1178-26 con asunto: Respuesta oficio CVNSO-0991-299-2026 con asunto "Respuesta a Comunicado C-245-4653-1107-26 con asunto: "Respuesta oficio CVNSO-0991-277-2026 con asunto entrega Acta de obra No. 59 abril de 2026" |
| 5/20/2026 | CVNSO-0991-304-2026 | Entrega de informe mensual de seguridad y salud en el trabajo correspondiente al mes de abril 2026 |
| 5/20/2026 | CVNSO-0991-305-2026 | RESPUESTA A COMUNICADO C-245-4559-0854-26, Asunto: RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-220-2026, " Respuesta a los siguientes Comunicados: i) C-245-4453-0541-26 de asunto: "REPORTE TÉCNICO DE EVENTO EN EL PR 38+295 (PUENTE QUEBRADA LAS DELICIAS) Y SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE TRÁNSITO – PMT." ii) DERECHO PETICIÓN – INT.1503 (PQRSF N° 185) y iii) C-245-4536-0788-26 de asunto: "SOLICITUD DE INFORMACIÓN – SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE EVENTO REPORTADO EL 07 DE MARZO DE 2026, ATENCIÓN REQUERIDA MEDIANTE COMUNICADO C-245-4453-0541-26 CUYO ASUNTO DICE "REPORTE TÉCNICO DE EVENTO EN EL PR 38+295 (PUENTE QUEBRADA LAS DELICIAS) Y SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE TRÁNSITO – PMT". |
| 5/21/2026 | CVNSO-0991-308-2026 | Entrega No. 10 Insumos Primarios, – Predio: 019-ID-01-MCNF y 020-ID-01-MCNF. Gestión Predial del Contrato |
| 5/21/2026 | CVNSO-0991-309-2026 | Respuesta al oficio C-245-4660-1117-26 con asunto "Requerimiento Técnico: Extracción de núcleos (INV E-418) por baja resistencia en concreto Ruta 6503 y acciones correctivas." |



| | | |
|---|---|---|
| 5/22/2026 | CVNSO-0991-311-2026 | Subsanación Parcial a la Entrega No. 8 Insumos Primarios, – Predio: 001-I-03-MCNF y 002-D-03-MCNF. Gestión Predial del Contrato. Atención a la comunicación con consecutivo C-245-4530-0763-26 del 31 de marzo del 2026. |
| 5/22/2026 | CVNSO-0991-312-2026 | Respuesta al oficio C-245-4673-1162-26 con asunto "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-282-2026 con asunto "Respuesta a comunicado C-245-4629-1059-26 con asunto: "Solicitud de entrega del Informe de Calidad correspondiente al mes de abril de 2026". |
| 5/22/2026 | CVNSO-0991-313-2026 | Respuesta a comunicado C-245-4646-1092-26. "Observaciones paquete N°2 de Ítems No previstos de actividades ambientales." |
| 5/22/2026 | CVNSO-0991-310-2026 | Solicitud de Certificados de Antecedentes Registrales y/o Carencia Registral - Proyecto del Corredor Neiva – San Vicente Del Caguán – Puerto Rico – Florencia, en los Departamentos del Huila y Caquetá. Predios 011-I-01-MCNF, 012-D-01-MCNF y 014-I-01-MCNF |
| 5/23/2026 | CVNSO-0991-314-2026 | Remisión Informe de Sostenibilidad No 58 correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de marzo al 24 de abril de 2026. |
| 5/25/2026 | CVNSO-0991-315-2026 | Acta Permiso Construcción Obra De Arte Ruta 6504 |
| 5/25/2026 | CVNSO-0991-316-2026 | Presentación de nuevo proveedor de materiales - Cantera Cerro Alto R3001 |
| 5/28/2026 | CVNSO-0991-317-2026 | RESPUESTA A COMUNICADO C-245-4635-1067-26, ASUNTO: REQUERIMIENTO DE ATENCIÓN DE PQRS RADICADA POR EL SEÑOR JOSÉ JESÚS BORRAY MONTIEL |

| | | |
|---|---|---|
| 5/28/2026 | CVNSO-0991-318-2026 | RESPUESTA A COMUNICADO C-245-4631-1061-26, ASUNTO: REQUERIMIENTO DE ATENCIÓN DE PQRS RADICADA POR EL SEÑOR ALEXANDER MEDINA RUBIANO |

## 8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

**Fotografía 1. PR15+620 RUTA-3001 Instalación de concreto de 28Mpa para construcción de placa superior box Culvert, margen derecho.**




**Fotografía 2. PR15+620 RUTA-3001 Suministro e instalación de concreto de 28Mpa para construcción de placa superior box Culvert, margen derecho.**



**Fotografía 3. PR15+620 RUTA-3001 Suministro e instalación de concreto de 28Mpa para construcción de placa superior box Culvert, margen derecho.**




**Fotografía 4. PR15+620 RUTA-3001 Suministro e instalación de concreto de 28Mpa para construcción de box Culvert, margen derecho.**



**Fotografía 5. PR15+620 RUTA-3001 Suministro e instalación de concreto de 28Mpa para construcción de box Culvert, margen derecho.**




**Fotografía 6. PR15+960 RUTA-3001 Limpieza y remoción de material proveniente del talud.**



**Fotografía 7. PR15+960 RUTA-3001 Suministro e instalación de acero de refuerzo para construcción de descole de alcantarilla, margen derecho.**




**Fotografía 8. PR16+013 RUTA-3001 Limpieza y retiro de material proveniente de los taludes, alcantarilla.**



**Fotografía 9. PR16+013 RUTA-3001 Limpieza y retiro de material proveniente de los taludes, alcantarilla.**




**Fotografía 10. PR15+620 RUTA-3001 Terminado de losa superior de box Culvert 1,5 X 1,5.**



**Fotografía 11. PR15+540 a PR15+600 RUTA-3001 Instalación de material granular drenaje y geotextil no tejido para construcción de filtro longitudinal.**




**Fotografía 12. PR15+745 RUTA-3001 Instalación de acero de refuerzo para construcción de poceta, margen izquierdo.**



**Fotografía 13. PR16+013 RUTA-3001 Limpieza de obras de drenaje, margen derecho.**




**Fotografía 14. PR16+013 RUTA-3001 Limpieza de obras de drenaje, margen izquierdo.**



**Fotografía 15. PR15+969 RUTA-3001 Instalación de acero de refuerzo para construcción de cabezal descole de alcantarilla, margen derecho.**




**Fotografía 16. PR16+120 RUTA-3001 Instalación de concreto para construcción de cunetas, costado izquierdo de la vía.**



**Fotografía 17. PR15+745 RUTA-3001 Instalación de formaleta para construcción de poceta de encole alcantarilla, margen izquierdo.**




**Fotografía 18. PR15+620 RUTA-3001 Instalación de concreto de 28Mpa para la construcción de losa superior de box Culvert.**



**Fotografía 19. PR16+960 RUTA-3001 Instalación de concreto de 14Mpa para solado de poceta, margen izquierdo.**




**Fotografía 20. PR15+745 RUTA-3001 Instalación de formaleta para construcción de poceta, margen izquierdo.**



**Fotografía 21. PR15+620 RUTA-3001 Suministro e instalación de concreto de 28Mpa para construcción de box Culvert, margen derecho.**




**Fotografía 22. PR15+800 RUTA-3001 Estado de la vía.**



**Fotografía 23. PR15+620 RUTA-3001 Instalación de material drenante para construcción de filtro longitudinal de box Culvert, margen derecho.**




**Fotografía 24. PR14+920 a PR14+960 RUTA-3001 Nivelación talud, margen izquierdo.**



**Fotografía 25. PR15+960 RUTA-3001 Verificación de instalación de acero de refuerzo para construcción de descole alcantarilla, margen izquierdo.**




**Fotografía 26. PR15+620 RUTA-3001 Instalación de material drenante para construcción de filtro longitudinal de box Culvert, margen derecho.**



**Fotografía 27. PR15+620 RUTA-3001 Instalación de material drenante para construcción de filtro longitudinal de box Culvert, margen derecho.**




**Fotografía 28. PR15+750 RUTA-3001 Instalación de formaleta para construcción de poceta, margen izquierdo.**



**Fotografía 29. PR15+960 RUTA-3001 Instalación de acero de refuerzo para construcción de poceta de encole de alcantarilla.**




**Fotografía 30. PR16+130 RUTA-3001 Construcción de cunetas a predio, costado izquierdo de la vía.**



**Fotografía 31. PR15+960 RUTA-3001 Estado de poceta de encole de alcantarilla.**




**Fotografía 32. PR15+803 RUTA-3001 Excavación mecánica para construcción de box Culvert, margen derecho.**



**Fotografía 33. PR15+560 RUTA-3001Instalación de material granular drenante para construcción de filtro longitudinal, costado izquierdo.**




**Fotografía 34. PR15+745 RUTA-3001 Terminado de poceta de encole de alcantarilla, costado izquierdo de la vía.**



**Fotografía 35. PR15+960 RUTA-3001 Suministro de cinta de PVC para la construcción de encole de alcantarilla.**




**Fotografía 36. PR15+960 RUTA-3001 Instalación de concreto de 28Mpa para construcción de losa de poceta de encole alcantarilla, costado izquierdo.**



**Fotografía 37. PR15+960 RUTA-3001 Instalación de acero de refuerzo para construcción de cabezal descole de alcantarilla, margen derecho.**




**Fotografía 38. PR15+960 RUTA-3001 Instalación de acero de refuerzo para construcción de cabezal descole de alcantarilla, margen derecho.**



**Fotografía 39. PR15+803 RUTA-3001 Instalación de material para habilitar tránsito.**




**Fotografía 40. PR16+700 RUTA-3001 Estado actual de alcantarilla.**



**Fotografía 41. PR15+802 RUTA-3001 Instalación de concreto de 14Mpa para construcción de solado de box Culvert, margen derecho.**




**Fotografía 42. PR15+802 RUTA-3001 Instalación de material granular para nivelación de terreno para construcción de box Culvert, margen derecho.**



**Fotografía 43. PR35+500 RUTA-3001 Intervención a talud, costado derecho de la vía.**




**Fotografía 44. PR34+500 RUTA-3001 Intervención a talud, costado izquierdo de la vía.**



**Fotografía 45. PR16+130 RUTA-3001 Adecuación de terreno para construcción de cunetas, margen izquierdo.**




**Fotografía 46. PR16+704 RUTA-3001 Limpieza y retiro de material de obras de drenaje.**



**Fotografía 47. PR15+802 RUTA-3001 Instalación de material granular para nivelación de terreno para construcción de box Culvert, margen derecho.**




**Fotografía 48. PR16+127 RUTA-3001 Suministro e instalación de concreto de 17,5Mpa para construcción de cunetas, margen izquierdo.**



**Fotografía 49. PR16+704 RUTA-3001 Limpieza y remoción de material proveniente de los taludes para limpieza de obras de drenaje.**




**Fotografía 50. PR16+626 RUTA-3001 Limpieza y remoción de material proveniente de los taludes para limpieza de obras de drenaje.**



**Fotografía 51. PR15+960 RUTA-3001 Instalación de formaleta para construcción de cabezal descole e alcantarilla, margen derecho.**




**Fotografía 52. PR16+626 RUTA-3001 Limpieza de obras de drenaje.**



**Fotografía 53. PR15+960 RUTA-3001 Instalación de formaleta para construcción de cabezal descole de alcantarilla, margen derecho.**




**Fotografía 54. PR13+620 RUTA-3001 Retiro de formaleta para construcción de losa superior de box Culvert, margen derecho.**



**Fotografía 55. PR16+117 RUTA-3001 Instalación de acero de refuerzo para construcción de cunetas, margen izquierdo.**





**Fotografía 56.PR31+215 RUTA-3001 Remoción de derrumbes**



**Fotografía 57. PR15+960 RUTA-3001Suministro e instalación de concreto de 28Mpa para construcción de cabezal descole de alcantarilla, margen derecho**




**Fotografía 58. PR15+802 RUTA-3001 Instalación de acero para construcción de box Culvert, margen derecho.**

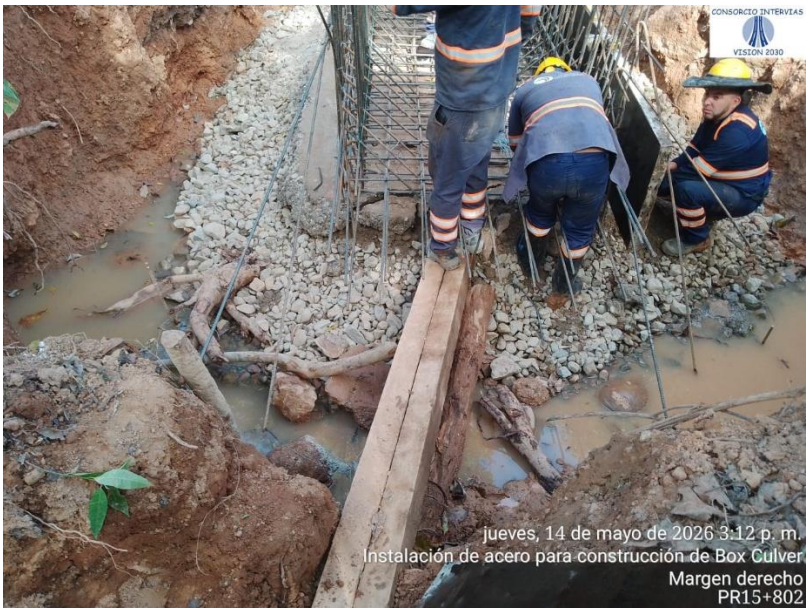

**Fotografía 59. PR15+802 RUTA-3001 Instalación de acero para construcción de box Culvert, margen derecho.**




**Fotografía 60. PR16+128 RUTA-3001 Suministro e instalación de concreto de 15,5Mpa para construcción de cunetas, margen izquierdo.**



**Fotografía 61. PR15+960 RUTA-3001 Retiro formaleta para construcción de cabezal descole de alcantarilla, margen derecho.**




**Fotografía 62. PR15+802 RUTA-3001 Suministro e instalación de acero de refuerzo para la construcción de box Culvert cuerpo de descole, costado izquierdo.**



**Fotografía 63.PR16+127 RUTA-3001 Construcción de cunetas, costado izquierdo de la vía.**




**Fotografía 64. PR15+802 RUTA-3001 Instalación de acero para construcción de box Culvert, ,margen derecho.**



**Fotografía 65. PR15+802 RUTA-3001 Instalación de acero para construcción de box Culvert, margen derecho.**




**Fotografía 66. PR15+802 RUTA-3001 Instalación de acero para construcción de box Culvert, margen derecho.**



**Fotografía 67. PR15+802 RUTA-3001 Suministro e instalación de concreto de 28Mpa para construcción de losa inferior de box Culvert, margen derecho.**




**Fotografía 68. PR15+802 RUTA-3001 Instalación de acero para construcción de box Culvert, margen derecho.**



**Fotografía 69. PR15+802 RUTA-3001 Suministro e instalación de concreto de 28Mpa para construcción de losa inferior de box Culvert, margen derecho.**




**Fotografía 70. PR15+960 RUTA-3001 Retiro de formaleta para construcción de cabezal descole de alcantarilla, margen derecho.**



**Fotografía 71. PR15+801 RUTA-3001 Terminados de placa inferior de box Culvert de 1x1 para cuerpo de descole, costado derecho.**




**Fotografía 72. PR15+620 RUTA-3001 Instalación de solado de limpieza para construcción de encole de box culvert**



**Fotografía 73. PR15+620 RUTA-3001 Levantamiento topográfico, margen derecho.**




**Fotografía 74. PR15+620 RUTA-3001 Levantamiento topográfico, margen derecho.**



**Fotografía 75. PR15+802 RUTA-3001 Suministro e instalación de concreto de 28Mpa para loza inferior de box Culvert, margen derecho.**




**Fotografía 76. PR15+620 RUTA-3001 Adecuación de terreno para instalación de solado, margen derecho.**



**Fotografía 77. PR15+620 RUTA-3001 adecuación de terreno para instalación de solado, margen derecho.**




**Fotografía 78. PR15+802 RUTA-3001 Instalación de acero para construcción de box Culvert, margen derecho.**



**Fotografía 79. PR16+626 RUTA-3001 Limpieza de obras de drenaje box Culvert.**




**Fotografía 80. PR15+802 RUTA-3001 Instalación de formaleta para construcción de box Culvert, margen derecho.**



**Fotografía 81. PR16+760 RUTA-3001 Limpieza de obras de drenaje, margen derecho.**





**Fotografía 82. PR15+802 RUTA-3001 Suministro e instalación de concreto de 28Mpa para construcción de box Culvert, margen derecho.**



**Fotografía 83. PR10+900 RUTA-3001 Limpieza de talud, margen derecho.**




**Fotografía 84. PR15+802 RUTA-3001 Suministro e instalación de concreto de 28Mpa para construcción de box Culvert, margen derecho.**

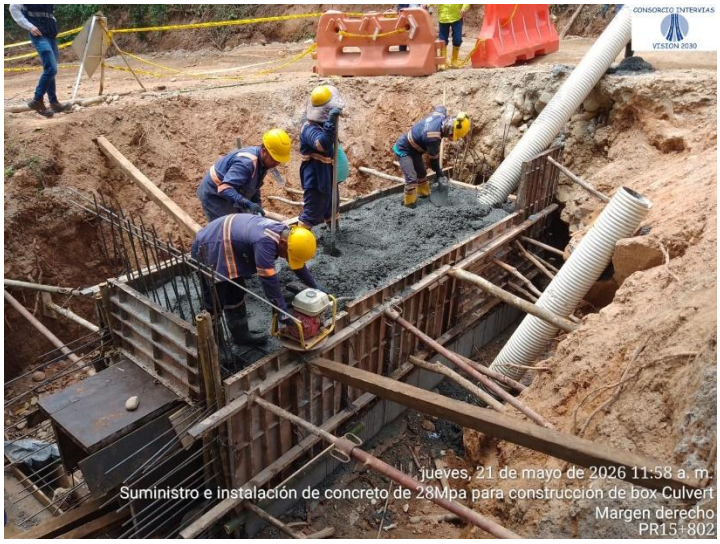

**Fotografía 85. PR15+802 RUTA-3001 Suministro e instalación de concreto de 28Mpa para construcción de box Culvert, margen derecho.**




**Fotografía 86. PR15+802 RUTA-3001 Instalación de formaleta para construcción de box Culvert, margen derecho.**



**Fotografía 87.PR15+802 RUTA-3001 Instalación de concreto de 28Mpa para construcción de muros y losa superior de box Culvert.**




**Fotografía 88. PR10+990 RUTA-3001 Limpieza y retiro de vegetación de superficie de talud para instalación de malla de alta resistencia.**



**Fotografía 89. PR10+900 RUTA-3001 Instalación de malla de alta resistencia para estabilización de talud.**




**Fotografía 90. PR10+900 RUTA-3001 Instalación de malla de alta resistencia para estabilización de talud.**



**Fotografía 91. PR15+802 RUTA-3001 Construcción de filtro longitudinal de box Culvert.**




**Fotografía 92. PR15+802 RUTA-3001Construcción de filtro longitudinal de box Culvert.**



**Fotografía 93. PR16+626 RUTA-3001Limpieza de obras de drenaje.**




**Fotografía 94.PR16+626 RUTA-3001 Limpieza en obras de drenaje.**



**Fotografía 95. PR10+900 RUTA-3001Instalación de malla de alta resistencia para estabilización de talud.**




**Fotografía 96. PR15+620 RUTA-3001Instalación de acero de refuerzo para descole de box Culvert.**



**Fotografía 97. PR15+802 RUTA-3001 Instalación de acero de refuerzo para construcción de descole de box Culvert.**




**Fotografía 98. PR16+626 RUTA-3001Limpieza de obras de drenaje, margen izquierdo.**



**Fotografía 99.PR15+802 RUTA-3001 Instalación de acero de refuerzo para construcción de descole de box Culvert, margen derecho.**




**Fotografía 100. PR15+802 RUTA-3001 Instalación de acero de refuerzo para construcción de solera descole de box Culvert, margen derecho.**



**Fotografía 101. PR10+990 a PR11+005 RUTA-3001 Suministro e instalación de malla de alta resistencia para estabilización de talud, costado derecho de la vía.**




**Fotografía 102. PR36+525 RUTA-3002 Derrumbes**



**Fotografía 103. PR36+525 RUTA-3002 Derrumbes.**




**Fotografía 104. PR36+525 RUTA-3002 Derrumbes.**



**Fotografía 105. PR25+565 RUTA-3002 Derrumbes.**




**Fotografía 106. PR27+762 RUTA-3002 Derrumbes.**



**Fotografía 107. PR27+762 RUTA-3002 Derrumbes.**




**Fotografía 108.PR28+625 RUTA-3002 Derrumbes.**



**Fotografía 109. PR28+583 RUTA-3002 Derrumbes.**




**Fotografía 110. PR16+620RUTA-3001Levantamiento topográfico.**



**Fotografía 111. PR15+802 RUTA-3001 Instalación de acero de refuerzo para construcción de descole de box Culvert, margen derecho.**




**Fotografía 112. PR16+626 RUTA-3001 Limpiezas de obras de drenaje, margen izquierdo.**



**Fotografía 113. PR15+802 RUTA-3001 Instalación de acero de refuerzo para construcción de descole de box Culvert, margen derecho.**




**Fotografía 114. PR1+990 a PR10+11005 RUTA-3001 Instalación de malla de alta resistencia para estabilización de talud.**



**Fotografía 115. PR15+802 RUTA-3001 Instalación de acero de refuerzo para construcción de solera descole de box Culvert, margen derecho.**




**Fotografía 116. PR15+802 RUTA-3001 Visita recorrido en campo.**



**Fotografía 117. PR10+990 a PR11+005 RUTA-3001 Instalación de malla de alta resistencia para estabilización de talud.**




**Fotografía 118. PR15+802 RUTA-3001 Verificación de nivel para la construcción de descole de box Culvert, margen derecho.**



**Fotografía 119. PR15+802 RUTA-3001 Suministro e instalación de concreto de 28Mpa para la construcción de descole de box Culvert, margen derecho.**




**Fotografía 120. PR15+620 RUTA-3001Suministro e instalación de concreto de 28Mpa para construcción de encole de box Culvert, margen derecho.**



**Fotografía 121. PR11+500 RUTA-3001 Excavación manual para construcción de zanjas de coronación, margen derecho.**




**Fotografía 122. PR15+802 RUTA-3001 Instalación de formaleta para construcción de cabezal descole de box Culvert, margen derecho.**



**Fotografía 123. PR15+802 RUTA-3001 Instalación de filtro transversal contra cuerpo medio de box Culvert.**




**Fotografía 124. PR15+802 RUTA-3001 Instalación de formaleta para construcción de cabezal descole de box Culvert, margen derecho.**



**Fotografía 1. PR08+235 Ruta 6504, Excavación para construcción de filtro.**




**Fotografía 2. PR08+230 Ruta 6504, Excavación para construcción de filtro.**



**Fotografía 3. PR08+100 Ruta 6504, Verificación niveles excavación para construcción de filtro.**




**Fotografía 4. PR08+200 Ruta 6504, Instalación de geotextil - construcción de filtro.**



**Fotografía 5. PR08+100 Ruta 6504, Instalación de geotextil y manguera - construcción de filtro.**




**Fotografía 6. PR08+098 Ruta 6504, Instalación de geotextil y manguera - construcción de filtro.**



**Fotografía 7. PR08+050 Ruta 6504, Instalación de material granular drenante - construcción de filtro.**




**Fotografía 8. PR08+098 Ruta 6504, Instalación de material granular drenante - construcción de filtro.**



**Fotografía 9. PR08+030 Ruta 6504, Instalación de material granular drenante - construcción de filtro.**




**Fotografía 10. PR08+030 Ruta 6504, Verificación niveles terminado - construcción de filtro.**



**Fotografía 11. PR09+844 Ruta 6504, Demolición de estructuras existentes – Aletas.**




**Fotografía 12. PR09+872 Ruta 6504, Demolición de estructuras existentes – Alcantarilla.**



**Fotografía 13. PR09+900 Ruta 6504, Demolición de estructuras existentes - Cuneta.**




**Fotografía 14. PR05+740 Ruta 6504, Demolición de estructuras existentes – Box Culvert.**



**Fotografía 15. PR06+875 Ruta 6504, Demolición de estructuras existentes – Caja.**




**Fotografía 16. PR00+455 Ruta 6504, Demolición de estructuras existentes – Box Culvert.**



**Fotografía 17. PR00+455 Ruta 6504, Demolición de estructuras existentes – Box Culvert.**




**Fotografía 18. PR09+872 Ruta 6504, Excavación descole – Alcantarilla.**



**Fotografía 19. PR06+875 Ruta 6504, Excavación descole – Alcantarilla.**




**Fotografía 20. PR08+265 Ruta 6504, Excavación para muro de contención.**



**Fotografía 21. PR08+280 Ruta 6504, Excavación para muro de contención.**




**Fotografía 22. PR08+253 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 14 MPa solado zarpa - muro de contención**



**Fotografía 23. PR09+812 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 14 MPa placa tubería – Alcantarilla.**




**Fotografía 24. PR09+872 Ruta 6504, Suministro e instalación tubería 36" – Alcantarilla.**



**Fotografía 25. PR09+872 Ruta 6504, Suministro e instalación tubería 36" – Alcantarilla.**




**Fotografía 26. PR09+872 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 14 MPa atraque tubería – Alcantarilla.**



**Fotografía 27. PR08+253 Ruta 6504, Armado acero de refuerzo - Muro.**




**Fotografía 28. PR08+098 Ruta 6504, Armado acero de refuerzo placa solera y aletas – Alcantarilla.**



**Fotografía 29. PR00+455 Ruta 6504, Armado acero de refuerzo placa – Box Culvert.**




**Fotografía 30. PR08+098 Ruta 6504, Encofrado caja – Alcantarilla.**



**Fotografía 31. PR08+098 Ruta 6504, Encofrado muro y aletas – Alcantarilla.**




**Fotografía 32. PR08+098 Ruta 6504, Encofrado caja – Alcantarilla.**



**Fotografía 33. PR07+858 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 28 MPa muros caja – Alcantarilla.**




**Fotografía 34. PR07+858 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 28 MPa muro y aletas - Alcantarilla.**



**Fotografía 35. PR08+098 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 28 MPa muros caja – Alcantarilla.**




**Fotografía 36. PR08+253 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 28 MPa zarpa – Muro de contención.**



**Fotografía 37. PR06+875 Ruta 6504, Lleno estructuras – Muro de contención.**




**Fotografía 38. PR09+844 Ruta 6504, Excavación a nivel de subrasante.**



**Fotografía 39. PR09+950 Ruta 6504, Excavación a nivel de subrasante.**




**Fotografía 40. PR09+925 Ruta 6504, Excavación a nivel de subrasante.**



**Fotografía 41. PR10+000 Ruta 6504, Excavación a nivel de subrasante.**




**Fotografía 42. PR09+920 Ruta 6504, Excavación - Mejoramiento de fallo.**



**Fotografía 43. PR09+950 Ruta 6504, Excavación - Mejoramiento de fallo.**




**Fotografía 44. PR09+900 Ruta 6504, Suministro e instalación de geotextil y crudo - Mejoramiento de fallo.**



**Fotografía 45. PR09+900 Ruta 6504, Suministro e instalación de subbase granular.**




**Fotografía 46. PR07+930 Ruta 6504, Suministro e instalación de subbase granular - Estructura de vía.**



**Fotografía 47. PR09+845 Ruta 6504, Suministro e instalación de subbase granular - Estructura de vía.**




**Fotografía 48. PR08+000 Ruta 6504, Suministro e instalación de subbase granular - Estructura de vía.**



**Fotografía 49. PR07+750 Ruta 6504, Instalación de subbase granular - Estructura de vía.**




**Fotografía 50. PR08+090 Ruta 6504, Instalación de subbase granular - Estructura de vía.**



**Fotografía 51. PR06+800 Ruta 6504, Replanteo de bordes de via para cereo SBG – Estructura de vía.**




**Fotografía 52. PR05+630 Ruta 6504, Suministro e instalación de base granular - Estructura de vía.**



**Fotografía 53. PR07+280 Ruta 6504, Suministro e instalación de base granular - Estructura de vía.**




**Fotografía 54. PR06+000 Ruta 6504, Suministro e instalación de base granular - Estructura de vía.**



**Fotografía 55. PR05+630 Ruta 6504, Suministro e instalación de base granular - Estructura de vía**




**Fotografía 56. PR06+080 Ruta 6504, Suministro e instalación de base granular - Estructura de vía.**



**Fotografía 57. PR05+900 Ruta 6504, Suministro e instalación de base granular - Estructura de vía.**




**Fotografía 58. PR05+625 Ruta 6504, Verificación de niveles base granular – Estructura de vía.**



**Fotografía 59. PR06+180 Ruta 6504, Verificación de niveles base granular – Estructura de vía**




**Fotografía 60. PR06+180 Ruta 6504, Ensayo de densidades base granular – Estructura de vía.**



**Fotografía 61. PR06+180 Ruta 6504, Sopleteo base granular para imprimación.**




**Fotografía 62. PR05+620 Ruta 6504, Replanteo de alineamiento para instalación MDC-19.**



**Fotografía 63. PR05+700 Ruta 6504, Replanteo de alineamiento para instalación MDC-19.**




**Fotografía 64. PR05+700 Ruta 6504, Imprimación para instalación de mezcla asfáltica.**



**Fotografía 65. PR05+445 Ruta 6504, Imprimación para instalación de mezcla asfáltica.**




**Fotografía 66. PR05+622 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19.**



**Fotografía 67. PR06+180 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19**




**Fotografía 68. PR6+525 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19.**

