REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-23:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 4"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**

Donde CAUCA - POPAYÁN - Calle 5 No. 12-62 Casa lote entre cras 12 y 13 - HOGAR INFANTIL DUENDECILLOS



Foto No.17 Fecha: 09-01-2021

SOLDADURA ESTRUCTURA METALICA



Foto No.18 Fecha: 09-01-2021

SOLDADURA ESTRUCTURA METALICA



Foto No.19 Fecha: 09-01-2021

SOLDADURA ESTRUCTURA METALICA



Foto No.20 Fecha: 09-01-2021

ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PATIO

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-23:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
(ICBF)

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 4"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**
Donde CAUCA - POPAYÁN - Calle 5 No. 12-62 Casa lote entre cras 12 y 13 - HOGAR INFANTIL DUENDECILLOS



Foto No.1 Fecha: 19-01-2021

FACHADA



Foto No.2 Fecha: 19-01-2021

FACHADA

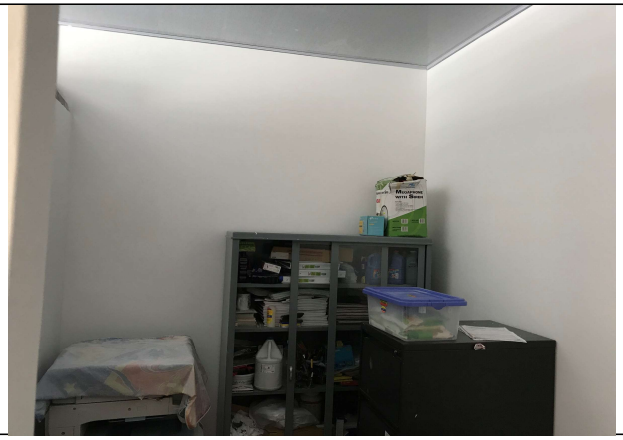


Foto No.3 Fecha: 19-01-2021

ZONA ADMINISTRATIVA, PINTURA MUROS, CIELO RASO



Foto No.4 Fecha: 19-01-2021

ZONA ADMINISTRATIVA, PINTURA MUROS, CIELO RASO

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-23:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 4"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**

Donde CAUCA - POPAYÁN - Calle 5 No. 12-62 Casa lote entre cras 12 y 13 - HOGAR INFANTIL DUENDECILLOS



Foto No.5 Fecha: 19-01-2021

ZONA ADMINISTRATIVA, PINTURA MUROS, CIELO RASO Y LAMPARA



Foto No.6 Fecha: 19-01-2021

ENCHAPE BAÑOS



Foto No.7 Fecha: 19-01-2021

BAÑOS PRIMER PISO



Foto No.8 Fecha: 19-01-2021

COCINA

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-23:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 4"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**

Donde CAUCA - POPAYÁN - Calle 5 No. 12-62 Casa lote entre cras 12 y 13 - HOGAR INFANTIL DUENDECILLOS



Foto No.9 Fecha: 19-01-2021

ESTRUCTURA Y CUBIERTA PATIO



Foto No.10 Fecha: 19-01-2021

PINTURA SOBRE MUROS, CIELO RASO Y LAMPARAS SALON



Foto No.11 Fecha: 19-01-2021

HALL SEGUNDO PISO

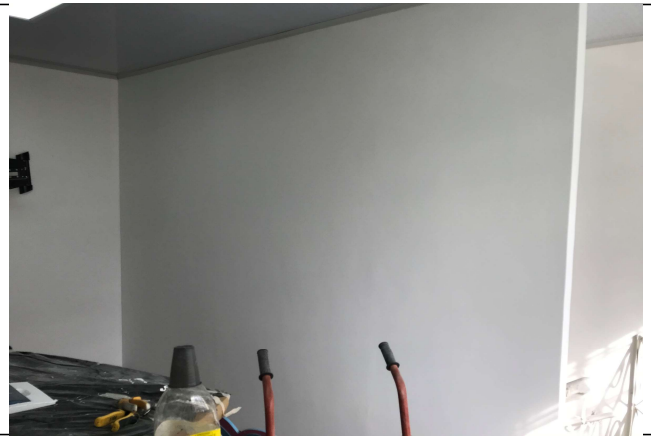


Foto No.12 Fecha: 19-01-2021

MURO EN PANEL YESO SEGUNDO PISO

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-23:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 4"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**

Donde CAUCA - POPAYÁN - Calle 5 No. 12-62 Casa lote entre cras 12 y 13 - HOGAR INFANTIL DUENDECILLOS



Foto No.13 Fecha: 19-01-2021

PINTURA SOBRE MUROS, CIELO RASO Y LAMPARAS SALON



Foto No.14 Fecha: 19-01-2021

PINTURA SOBRE MUROS, CIELO RASO Y LAMPARAS SALON



Foto No.15 Fecha: 19-01-2021

BAÑO SEGUNDO PISO



Foto No.16 Fecha: 19-01-2021

PINTURA SOBRE MUROS CIELO RASO Y LAMPARA HALL SEGUNDO PISO

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**

Donde NARIÑO - CONSACA - CALLE 3 No- 2 -02 - HOGAR INFANTIL EL PARAISO



Foto No. 1 Fecha: 05 de enero de 2021

Remates de la mampostería Costado Norte



Foto No.2 05 de enero de 2021

Remates de la mampostería Costado Norte



Foto No.3 Fecha: 05 de enero de 2021

Encofrado para fundición de columnetas sobre el Costdo Norte



Foto No.4 Fecha: 06 de enero de 2021

Columnetas terminadas sobre el Costdo Norte

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**

Donde NARIÑO - CONSACA - CALLE 3 No- 2 -02 - HOGAR INFANTIL EL PARAISO



Foto No.5 Fecha: 06 de enero de 2021

Armado de refuerzo para viga cinta Costado Oriental



Foto No.6 Fecha: 06 de enero de 2021

Encofrado para vida cinta Costado Cccidental



Fotos No.7 Fecha: 06 de enero de 2021

Union del refuerzo entre columneta y viga cinta entre los costados Norte y Occidental



Foto No.8 Fecha: 07 de enero de 2021

Producción de concreto para fundición de viga cinta

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**

Donde NARIÑO - CONSACA - CALLE 3 No- 2 -02 - HOGAR INFANTIL EL PARAISO



Foto No.9 Fecha: 07 de enero de 2021

Transporte y ascenso de concreto para fundición de viga cinta sobre el costado occidental



Foto No.10 Fecha: 08 de enero de 2021

Pañete sobre muro ubicado en el Costado Sur lado izquierdo



Fotos No.11 Fecha: 08 de enero de 2021

Pañete sobre muro ubicado en el Costado Occidental



Foto No.12 Fecha: 08 de enero de 2021

Pañete sobre muro ubicado en el Costado Sur lado izquierdo

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**

Donde NARIÑO - CONSACA - CALLE 3 No- 2 -02 - HOGAR INFANTIL EL PARAISO



Foto No. 1 Fecha: 05 de enero de 2021

Remates de la mampostería Costado Norte



Foto No.2 05 de enero de 2021

Remates de la mampostería Costado Norte



Foto No.3 Fecha: 05 de enero de 2021

Encofrado para fundición de columnetas sobre el Costdo Norte



Foto No.4 Fecha: 06 de enero de 2021

Columnetas terminadas sobre el Costdo Norte

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**

Donde NARIÑO - CONSACA - CALLE 3 No- 2 -02 - HOGAR INFANTIL EL PARAISO



Foto No.5 Fecha: 06 de enero de 2021

Armado de refuerzo para viga cinta Costado Oriental



Foto No.6 Fecha: 06 de enero de 2021

Encofrado para vida cinta Costado Cccidental



Fotos No.7 Fecha: 06 de enero de 2021

Union del refuerzo entre columneta y viga cinta entre los costados Norte y Occidental



Foto No.8 Fecha: 07 de enero de 2021

Producción de concreto para fundición de viga cinta

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**

Donde NARIÑO - CONSACA - CALLE 3 No- 2 -02 - HOGAR INFANTIL EL PARAISO



Foto No.9 Fecha: 07 de enero de 2021

Transporte y ascenso de concreto para fundición de viga cinta sobre el costado occidental



Foto No.10 Fecha: 08 de enero de 2021

Pañete sobre muro ubicado en el Costado Sur lado izquierdo



Fotos No.11 Fecha: 08 de enero de 2021

Pañete sobre muro ubicado en el Costado Occidental



Foto No.12 Fecha: 08 de enero de 2021

Pañete sobre muro ubicado en el Costado Sur lado izquierdo

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**
Donde NARIÑO - PASTO - DIAGONAL 1° No- 5 E 71 (D 1 4E 71) - HOGAR INFANTIL JONGOVITO



Foto No. 1 Fecha: 05 de enero de 2021

Cambio de clarboyas Salón 2 Segundo nivel



Foto No. 2 Fecha: 05 de enero de 2021

Mantenimiento de canal existente Salón 1 Segundo nivel



Foto No. 3 Fecha: 05 de enero de 2021

Cambio de tejas de asbesto cemento Salón 2 segundo nivel



Foto No. 4 Fecha: 06 de enero de 2021

Remates con pintura vinilo en muros interiores Salón lúdico segundo nivel

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**

Donde NARIÑO - PASTO - DIAGONAL 1° No- 5 E 71 (D 1 4E 71) - HOGAR INFANTIL JONGOVITO



Foto No. 5 Fecha: 07 de enero de 2021

Remates pintura tipo 1 sobre muros internos Salón lúdico segundo nivel



Foto No. 6 07 de enero de 2021

Remates pintura tipo esmalte sobre ventanas Salon 2 segundo nivel



Foto No. 7 Fecha: 08 enero de 2021

Pañete sobre muro en patio primer nivel



Foto No. 8 Fecha: 08 de enero de 2021

Pañete sobre muro alto en patio primer nivel

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**

Donde NARIÑO - PASTO - DIAGONAL 1° No- 5 E 71 (D 1 4E 71) - HOGAR INFANTIL JONGOVITO



Foto No. 9 Fecha: 08 de enero de 2021

Remates pintura tipo esmalte sobre ventanas Salon principal primer nivel



Foto No. 10 Fecha: 09 de enero de 2021

Remates pintura tipo esmalte sobre divisiones para bañosl primer nivel

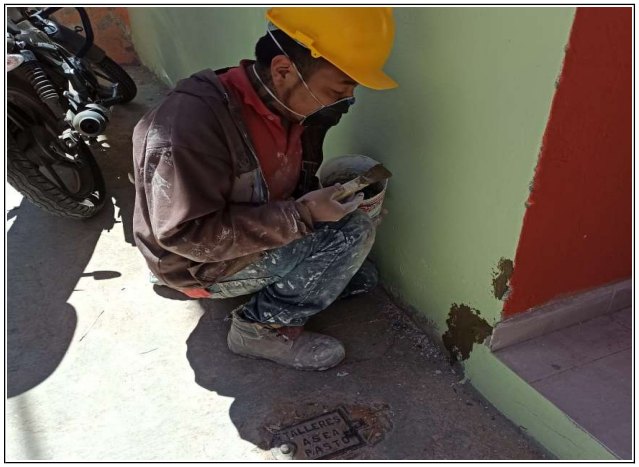


Foto No. 11 Fecha: 09 de enero de 2021

Resanes en muros de fachada



Foto No. 12 Fecha: 09 de enero de 2021

Aplicación de pintura tipo Koraza en la fachada

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**

Donde NARIÑO - PASTO - DIAGONAL 1° No- 5 E 71 (D 1 4E 71) - HOGAR INFANTIL JONGOVITO



Foto No. 1 Fecha: 05 de enero de 2021

Cambio de clarboyas Salón 2 Segundo nivel



Foto No. 2 Fecha: 05 de enero de 2021

Mantenimiento de canal existente Salón 1 Segundo nivel



Foto No. 3 Fecha: 05 de enero de 2021

Cambio de tejas de asbesto cemento Salón 2 segundo nivel



Foto No. 4 Fecha: 06 de enero de 2021

Remates con pintura vinilo en muros interiores Salón lúdico segundo nivel

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**

Donde NARIÑO - PASTO - DIAGONAL 1° No- 5 E 71 (D 1 4E 71) - HOGAR INFANTIL JONGOVITO



Foto No. 5 Fecha: 07 de enero de 2021

Remates pintura tipo 1 sobre muros internos Salón lúdico segundo nivel



Foto No. 6 07 de enero de 2021

Remates pintura tipo esmalte sobre ventanas Salon 2 segundo nivel



Foto No. 7 Fecha: 08 enero de 2021

Pañete sobre muro en patio primer nivel



Foto No. 8 Fecha: 08 de enero de 2021

Pañete sobre muro alto en patio primer nivel

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**

Donde NARIÑO - PASTO - DIAGONAL 1° No- 5 E 71 (D 1 4E 71) - HOGAR INFANTIL JONGOVITO



Foto No. 9 Fecha: 08 de enero de 2021

Remates pintura tipo esmalte sobre ventanas Salon principal primer nivel



Foto No. 10 Fecha: 09 de enero de 2021

Remates pintura tipo esmalte sobre divisiones para bañosl primer nivel

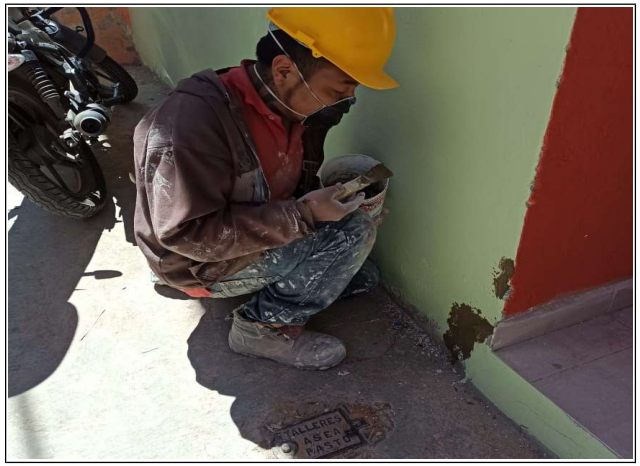


Foto No. 11 Fecha: 09 de enero de 2021

Resanes en muros de fachada



Foto No. 12 Fecha: 09 de enero de 2021

Aplicación de pintura tipo Koraza en la fachada

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**

Donde NARIÑO - SANDONÁ - Calle 6 No. 1 SUR 52 (C 6 6 51) - HOGAR INFANTIL LAS MERCEDES



Foto No.1 Fecha: 05 de enero de 2021

Salón de Comedor terminado

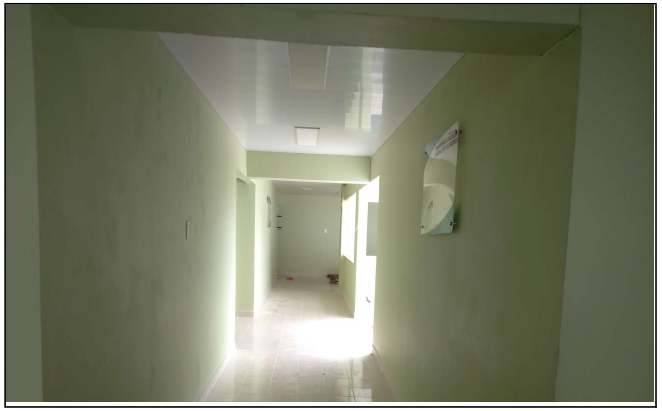


Foto No.2 Fecha: 05 de enero de 2021

Hall principal terminado



Foto No.3 Fecha: 05 de enero de 2021

Enchape dilatación entre el Hall Principal y los Salones



Foto No.4 Fecha: 06 de enero de 2021

Instalación cielo falso en prolongaciones exteriores de las Salas 2 y 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**

Donde NARIÑO - SANDONÁ - Calle 6 No. 1 SUR 52 (C 6 6 51) - HOGAR INFANTIL LAS MERCEDES



Foto No.5 Fecha: 06 de enero de 2021

Salidas para lámparas Sala 2



Foto No.6 Fecha: 07 de enero de 2021

Retiro temporal de puertas para adecuación y pintura



Foto No.7 Fecha: 07 de enero de 2021

Pintura de puerta metálicas



Foto No.8 Fecha: 07 de enero de 2021

Secado protegido del agua de la pintura tipo esmalte aplicada en las puertas metalicas

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**

Donde NARIÑO - SANDONÁ - Calle 6 No. 1 SUR 52 (C 6 6 51) - HOGAR INFANTIL LAS MERCEDES



Foto No.9 Fecha: 08 de enero de 2021

Pañete sobre muro divisorio entre patio general y patio del Salón Lúdico



Foto No.10 Fecha: 08 de enero de 2021

Pintura de fondo sobre el patio del área cocina



Foto No.11 Fecha: 09 de enero de 2021

Cambio de cubierta en patio del área de Cocina



Foto No.12 Fecha: 09 de enero de 2021

Cambio de cubierta translúcida en corredor externo ubicado entre la parte lateral del Salón múltiple y la parte posterior de laSala 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**
Donde NARIÑO - SANDONÁ - Calle 6 No. 1 SUR 52 (C 6 6 51) - HOGAR INFANTIL LAS MERCEDES



Foto No.1 Fecha: 05 de enero de 2021

Salón de Comedor terminado



Foto No.2 Fecha: 05 de enero de 2021

Hall principal terminado



Foto No.3 Fecha: 05 de enero de 2021

Enchape dilatación entre el Hall Principal y los Salones



Foto No.4 Fecha: 06 de enero de 2021

Instalación cielo falso en prolongaciones exteriores de las Salas 2 y 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**

Donde NARIÑO - SANDONÁ - Calle 6 No. 1 SUR 52 (C 6 6 51) - HOGAR INFANTIL LAS MERCEDES



Foto No.5 Fecha: 06 de enero de 2021

Salidas para lámparas Sala 2



Foto No.6 Fecha: 07 de enero de 2021

Retiro temporal de puertas para adecuación y pintura



Foto No.7 Fecha: 07 de enero de 2021

Pintura de puerta metálicas



Foto No.8 Fecha: 07 de enero de 2021

Secado protegido del agua de la pintura tipo esmalte aplicada en las puertas metalicas

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**

Donde NARIÑO - SANDONÁ - Calle 6 No. 1 SUR 52 (C 6 6 51) - HOGAR INFANTIL LAS MERCEDES



Foto No.9 Fecha: 08 de enero de 2021

Pañete sobre muro divisorio entre patio general y patio del Salón Lúdico



Foto No.10 Fecha: 08 de enero de 2021

Pintura de fondo sobre el patio del área cocina



Foto No.11 Fecha: 09 de enero de 2021

Cambio de cubierta en patio del área de Cocina



Foto No.12 Fecha: 09 de enero de 2021

Cambio de cubierta translúcida en corredor externo ubicado entre la parte lateral del Salón múltiple y la parte posterior de laSala 3

Anexo No. 11 Bitácora de Obra

POPAYAN – DUENDECILLOS

hace el retiro del escombro se finalizan actividades a las 5pm

24-12-20 Se inician actividades a las 7am. Se continua con el retiro del escombro se labora hasta las 12m.

26-12-20 El contratista realiza actividades de limpieza en el Hogar infantil

28-12-20 Continua la instalacion de vigas metalicas y la cubierta de UPVC

29-12-20 Llega a la obra ladrillo para los nuevos baños, se inicia el armado de la estructura metalica de la cubierta del patio

30-12-20 Se evalua el carlo raso del jardin el cual se encuentra en mal estado

31-12-20 Continua el armado y soldado de la estructura metalica de la cubierta del patio

4-1-21 Inicia la construccion de los muros de los baños y continua el armado y soldadura de la estructura metalica

5-1-21 Se inicia el montaje de la estructura metalica de la cubierta

CS Escaneado con CamScanner

Marden

6-01-21- Se inician actividades a las 7am se continua con la instalación de la estructura metalica del patio las lluvias continuan afectando los trabajos y los toques de queda que se estan comenzando aplicar en la ciudad por el Covid. 19. ya que se puede laborar hasta las 3pm.

7-01-21- Se continuan las actividades de los trabajos en la estructura de metalica del patio. Se finalizan actividades a las 6pm

8-01-21: Se inician labores a las 7am Se continua con el armado de La estructura y la mamposteria de los bomos se finalizan actividades a las 6pm

9-01-21 Se inician labores a las 7am se continua con el armado de la estructura las lluvias continuan afectando los trabajos se finalizan actividades a las 6pm

10-01-21- Se inician actividades a las

Escaneado con CamScanner

Jam se continua con el armado de la estructura se finalizan actividades a las 6pm
11-01-21 se inician actividades a las 7am se continua con el Armado de la estructura metalica y se comienza con el armado de los ocho postes del segundo paso se finalizan actividades a las 6pm
12-01-21- se inician actividades a las 7am se continua con el armado de la estructura metalica se continua con la instalacion del ocho postes del segundo paso se finalizan actividades a las 6pm
13-01-21- se inician actividades a las 7am se continua con el armado de la estructura metalica se continua con la instalacion de las correas y la cubierta. se finalizan actividades a las 6pm
14-01-21- se inician actividades a las 7am se continua con la instalacion

Escaneado con CamScanner

de la Cubierta. - el Vecino presenta una inconformidad de que la canal esta instalada sobre el muro que es de su propiedad (Costado) al cual se solicita la aclaración sobre el tema a la Directora del jardin ya que este se instala guardando el paramento del muro del jardin - esta aclaración queda pendiente para que la realice la interventoría. - Se funde la tapa de la caja de cimentes con Los pantes de los muros de los baños se finalizan actividades a las 8 am

15-01-21 - Se inician actividades el las 7am Se continuan rematando la Cubierta se continua con los pantes y la instalación de las actas rasas del segundo piso y se comienza el 1er piso Así Como el muro detras es caleta y superboard se finalizan actividades a las 9 am

Escaneado con CamScanner

Marden

16-01-21- Se inician actividades a las 7am Se continua con la instalación del primer y Segundo paso del cuarto rojo Se comienza con la instalación de los tomacorrientes. Se continua con el muro de Superboard de la estafera Se comienza con la pintura. de las cajas del segundo paso- la interventora le Comunica al contratista el día 15-01-2021 - que el muro del patio hace la reclamación de la Canal pertenece a él y que toca realizar el movimiento de la canal - lo cual implica desmontar La cubierta - la Canal realizar los cortes de las pechines - Correas volverlas a Soldar - lo cual implica el tiempo para realizar estas actividades se finalizan actividades a las 5pm

19-01-21- Se inician actividades a las 8am Se continua con la instala-

Escaneado con CamScanner

ación del acero bajo en el 1er - y 2do piso y la pintura se continua con el enchape del piso del patio y la cocina

18-01-21 - Se continua con actividades de pintura y estuco sobre muros, instalación de aparatos sanitarios remates de enchape y cielo raso, se instalan lamparas

Observaciones: Quedan pendientes algunos detalles puntuales en el puerte de obra

Nota = se solicita al contratista la entrega al fiscal impartal de todos los elementos desmontados

Escaneado con CamScanner

POPAYAN – HI FJC

Continuan actividades de estucos y pintura sobre muros

31-12-20 Continuan actividades de estucos y pintura sobre muros, se continua con el enchape del baño y del piso de la zona administrativa, se inicia la instalacion del cielo raso en la zona administrativa

4-1-21 No se labora en el frente de obra.

5-1-21 Continuan con actividades de enchape de piso en la zona administrativa, se continua la instalacion del cielo raso de la oficina

6-1-21 Se inician actividades a la 7am se continua con los arreglos de la cintura del area de la oficina. remates de enchape de pared y de piso resanes de donde se demolieron los muros. Se realiza la instalacion del cielo raso y las lamparas. Se comienza a llenar el material de que a terebor

Se finalizan actividades a las 6 pm

7-01-21 - Se inician actividades a las 7am Se comienza con las instalaciones del cableado de PVC de las aulas y las lamparas - Se continua remarcando los enchapes de la oficina - Estucos y pinturas Se finalizan actividades a las 7pm

8-01-21 - Se inician actividades a las 7am Se continua con las instalaciones del cableado y lamparas - y resanes se finalizan actividades a las 7pm

9-01-21 Se inician actividades a las 7am Se continua con la instalacion del cableado y las lamparas se comienza a realizar el Asco del enchape de las aulas se finalizan actividades a las 6 pm

10-01-21 - Se inician actividades a las 7am Se continua con la instalacion

Escaneado con CamScanner

del cielo raso y las lámparas
Se realiza instalación de los
aparatos sanitarios se finalizan
actividades a las 6pm
11-01-21- Se inician actividades a las
7am se continua con la instalación
del cielo raso y las lámparas se
finalizan actividades a las 6pm.
12-01-21- Se inician actividades a las 7am
se continua con la instalación
del cielo raso y de las lámparas
se finalizan actividades a las 6pm
13-01-21- Se inician actividades a las
7am se continua con la instalación
del cielo raso y de las lámparas
se finalizan actividades a las 6pm
14-01-21- Se inician actividades a
las 7am. Se continua con la
instalación de cielo raso de
las lámparas el ASEO de los
muros de las aulas y se
esta realizando el remate de
la pintura se labora hasta las

11.am
15-01-21 Se inician labores a las 7am. Se continua con la instalacion de las lamparas del Asco y el remates de la pintura se finalizan actividades a las 10am
16-01-21: Se inician actividades a las 8am se continua con los remates de la pintura se finalizan actividades a las 4pm
El dia 19 de Enero la supervisora realiza la observacion de que las cosas que se desmontaron de los jardines deben ser entregadas al jardin.
El 19-01-21 se solicita que los desmontes se deben entregar al jardin.
17-01-21 Continuan actividades de pintura, algunos remates de pintura, remates del cielo raso
18-01-21 Continuan remates de pintura y el cielo raso, se retiran algunas pinturas

CS Escaneado con CamScanner

en la zona administrativa, se instala los planches sobre las calletas menos, quedan pendientes algunos remates puntuales

Observaciones: En el frente de obra quedan pendiente unos detalles puntuales

Escaneado con CamScanner

CORINTO

30-12-12 Se continua con estucos y pinturas sobre muros, se instalan los juegos de niños y continuan enchapes de piso y guardaescoba

31-12-12 continuan enchapes de piso y guardaescoba

1-01-21 Se comienza a laborar a las 7am se continua con la instalación del piso guardaescoba Estuco Pintura se finalizan actividades a las 6pm

2-01-21 Se inician actividades a las 7am. Se continuan con la instalación del enchape guardaescoba - Estuco - pintura de muros y rejas se finalizan actividades a las 6pm

3-01-21 Se inician actividades a las 7am se continua con la instalacion del enchape - guardaescoba - Estuco - pintura de muros rejas y puertas - Se finalizan actividad a las 6pm

4-01-21 Se inician actividades a las

Escaneado con CamScanner
Libro Medio Oficio 80 H.

7am Se continua con la instalacion del enchape guardaescobas retanqueo estuco pintura de rejas puertas se deja la aclaracion que al momento de aplicar la pintura se despacha por lo cual toca realizar retoques amplios se finalizan actividades a las 6 pm

5-01-21- Se continua con la instalacion del enchape el guardaescobas los retanqueo - se realiza un relleno de recebo en la losa del patio para que de los niveles se alisten la losa para comenzar la fundida de la losa - estas actividades no se habian podido realizar por las lluvias - se finalizan actividades a las 6:30 pm

6-01-21- Se comienzan actividades a las 7am - se continua afinando la losa - se continuan con las enchapes se finalizan actividades a las 7 pm

2-02-21 Se comienzan actividades a

Marden

Escaneado con CamScanner

Libro Medio Oficio 80 H.

[illegible] 7am - Se comienza a realizar la instalación de los mantos se continuan con la instalación del enchape y la pintura y los rejones se finalizan actividades a las 7pm.

8-01-21 - Se inician actividades a las 7am se continua con la instalación del manto asfaltico se continua con la instalación del enchape - se realiza la mampostería y los zarcetes se finalizan actividades a las 8pm.

9-01-21, Se inician actividades a las 7am, se continua con la instalación del manto - enchapes guardaescobas - Pintura y estuco en muros se finalizan actividades a las 7pm.

10-01-21 - Se inician actividades a las 7am se continua con la instalación del enchape y la pintura estuco se realiza el

Escaneado con CamScanner

Cambio de la cubierta plastica y de las tanques se instalaron se finalizan actividades hasta las 7pm

11-02-21 se inician actividades a las 7am se continua con el remate de enchapes-guardaescobas-pintura de rejas y muros-puertas se finalizan actividades a las 8pm

12-02-21 - Se inician labores a la 7am se continua con el enchape y las guardaescobas las resanes de estuco y pintura de puertas rejas muros se finalizan actividades a las 8 pm.

13-02-21 se inician actividades a las 7am se continua con la instalacion de enchape guardaescobas se instalan la puerta principal y las rejas se continua con la pintura y resanes se finalizan actividades a las 8 pm

14-02-21 - se inician actividades a las 7am se continua con la

Escaneado con CamScanner

Marden

instalacion del enchape y el guardaescoba: la pintura de rejas - puertas - muros se finalizan actividades a la 7am
15-01-21 Se inician actividades a las 7am se continua con la instalacion del enchape de guardaescoba y el pre-pintura de rejas y muros y techos se finalizan actividades a las 8am
16-01-21 - Se inician actividades a las 7am. se continua con la instalacion de guardaescobas enchape pintura de rejas-techo muros se instala el cercano se finalizan actividades a las 11am
17-01-21 se inician actividades a las 7am - se continua con el enchape guardaescoba y pinturas. s
19-01-21 se solicita por parte de la interventoria que se entregue lo desmontado del jardin

Escaneado con CamScanner

18-04-21 Continuan con remates de pintura y enchapes, quedan algunos remates pendientes

Observaciones = Quedan pendientes algunos remates puntuales en el frente de obra

Escaneado con CamScanner

PASTO

Viernes 01/Enero/2021

Dia festivo, no se trabaja

Fredy Portilla.
Residente interventoría

Sabado 02/Ene/2021

No se trabaja.

Fredy Portilla
Residente interventoría

Lunes 04/Enero/2021
Clima: Soleado

SST y Ambiental:
Cumplimiento a protocolo de bioseguridad, control de temperatura, autoreporte estado de salud, orden y aseo en obra, capacitación seguridad plan de emergencias - evacuación, utilización de casillas y extintor.
Jhon Jaime - Res. SST

Se trabajó en los remates con pintura vinilo tipo 1 en los muros interiores del segundo nivel. Se continuó con los remates en puertas de madera, ventanas y puertas metálicas con pintura tipo esmalte en el primer y segundo nivel

Fredy Portilla
Residente Interventoría

Martes 05/Enero/2021
Clima: Soleado.

SST y Ambiental
Cumplimiento de protocolo de bioseguridad capacitación seguridad en riesgo ~~de chire~~. locativo (superficies y áreas), manejo adecuado de residuos.
Jhon Jaime

Se continuó con los remates con pintura vinilo tipo 1 en muros interiores del segundo nivel. se continua con remates en puertas y ventanas metalicas y puertas de madera con pintura tipo esmalte. se realizo el cambio de claraboyas en el salón 2 del segundo nivel. se inició el mantenimiento al canal existente del segundo nivel. se realizó el cambio de dos tejas averiadas en el segundo nivel

Fredy Portilla
Residente Interventoría

RESIDENTE OBRA

Miércoles 06/ Enero/ 2021
Clima: soleado

SST y Ambiental
Cumplimiento a protocolo de bioseguridad, autoreporte estado de salud, control de temperatura, lavado de manos y limpieza y desinfección en obra.
Jhon Jairo - Resp. SST

Se continuó con los remates con pintura vinilo tipo 1 en muros interiores del primer nivel. se continua con remates de ventanas y puertas metalicas y de madera con pintura tipo esmalte. Se continua con el mantenimiento del canal existente sobre el segundo nivel
Se realiza cambio de 2 tejas translucidas en el salón lúdico ubicado en el segundo nivel

Fredy Portilla
Residente interventoría

RESIDENTE OBRA

Jueves 07/ Enero /2021
Clima: Soleado.

SST y Ambiental
Cumplimiento protocolo de bioseguridad, manejo adecuado de residuos, orden y aseo en obra.
Jhon Jairo

Scanned by CamScanner

Se continuó con los remates con pintura vinilo tipo 1 sobre los muros del primer nivel. Se continua con los remates en ventanas y puertas metálicas y de madera con pintura tipo esmalte. Se termina el mantenimiento de la canal existente del segundo nivel. Se realiza aseo y limpieza general en pisos del primer y segundo nivel. Este material sobrante se lleva a antejardín para disposición final a sitio autorizado.

Fredy Portilla
Residente interventoría

Viernes 08/Enero/2021
Clima: soleado

SST y Ambiental:
Cumplimiento a protocolo de bioseguridad, reposición de Elementos Protección Personal, Insperciones, Orden y aseo, manejo adecuado de residuos.

Res SST

Se continua con los remates con pintura vinilo tipo 1 sobre los muros del primer nivel. Se continua con los remates en ventanas y puertas Metalicas y de Madera con Pintura tipo esmalte. se empaneta Muro sobre Ventana en Patio.

Fredy Portilla
Residente interventoría

Sabado 09/Enero/2021
Clima: Soleado.

SST y Ambiental.
Cumplimiento protocolo de bioseguridad, control de temperatura, lavado de manos, limpieza y desinfección.

Res. SST

Scanned by CamScanner

Se continuó con los remates en Puertas de madera y Metalicas. Asi mismo se hace el procedimiento con las ventanas. Se continúa con actividades de aseo y limpieza Sobre el Piso del primer y segundo nivel se inicia el resane de los muros de la fachada.
Se realiza limpieza de vidrios y ventanas del primer y segundo nivel.

Fredy Portilla
Residente interventoría.

Lunes 11/Enero/2021
Clima: Lluvioso

SST y Ambiental
Complimento a protocolo de bioseguridad, capacitacion de seguridad en riesgo psicosocial (estrés laboral, condiciones de la tarea, acoso laboral, agotamiento, etc.)

Se continúa con los remates con pintura tipo 1 sobre los muros interiores de centro Infantil. Se realizó la instalación de las divisiones de baño existentes que se hicieron mantenimiento previamente. Se trabaja en el resane y aplicación de Pintura tipo Koraza sobre los muros de la fachada.

Fredy Portilla
Residente interventoría

Martes 12/Enero/2021
Clima: Lluvioso

SST y Ambiental
Complimento a protocolo de bioseguridad, control de temperatura, autoreporte estado de salud, limpieza y desinfección de EPP, herramientas, areas y superficies. Capacitación

Scanned by CamScanner

seguridad en estilos de vida saludable (evitar consumo de cigarrillo, alcohol, uso del tiempo libre, actividad física y alimentación)

Se continuó con los remates con pintura vinilo tipo 1 en muros interiores del centro infantil. Se continua con la aplicación de la pintura tipo coraza sobre los muros de la fachada. Se realizó la instalación de los espejos sobre las paredes de los baños, encima de los lavamanos. Se instala vidrio sobre ventana salón 2 primer nivel.

Fredy Portilla
Residente interventoría

Miércoles 13/Enero/2021
Clima: Lluvioso

SST y Ambiental
Cumplimiento a protocolo de seguridad, control de temperatura, aseo y orden, limpieza y desinfección EPP y herramienta menor.

Se continuó con los remates con pintura vinilo tipo 1 en muros interiores del centro infantil. se continúa con la aplicación de pintura tipo coraza sobre los muros de la fachada. Se realizó el resane de orificios grandes que tienen los muros existentes. se realiza el lijado y la aplicación de la pintura vinilo tipo 1 sobre estos resanes grandes. Se trabaja en actividades de aseo y limpieza de pisos, muros y ventanas del primer y segundo nivel del centro infantil. Se solicita al contratista aplicar pintura sobre el bajante ubicado en el patio.

Fredy Portilla

Scanned by CamScanner

Jueves 14/ Enero / 2021
Clima: Lluvioso.

SST y Ambiental.
Cumplimiento a protocolo de bioseguridad, manejo adecuado de residuos

Se continua con los remates con pintura vinilo tipo 1 sobre los muros interiores del centro infantil. se continúa con la aplicación de la Pintura tipo coraza sobre los muros de la fachada. Se resana y se aplica vinilo tipo1 sobre el cuarto de gas. se trabaja en aseo y limpieza de Pisos, Paredes y ventanas del centro infantil.

Fredy Portilla
Residente de interventoría

Viernes 15/ Enero/2021
Clima: Lluvioso.

SST y Ambiental
Control de temperatura, autoreporte de salud, lavado de manos, manejo adecuado de residuos.

Se continua con los remates con pintura vinilo tipo 1 sobre los muros interiores del centro infantil. Se continua con la aplicación de la Pintura tipo coraza sobre los muros de la fachada. Se realiza la aplicación de Pintura vinilo tipo 1 a los muros del Patio que estaban pendientes por aplicar una mano.

Fredy Portilla
Residente interventoría.

Scanned by CamScanner

Sabado 16/Enero/2021
Clima: Lluvioso.

Se termina los remates con pintura vinilo tipo1 sobre los muros interiores del centro infantil. Se terminó la aplicacion de la pintura tipo Koraza sobre los muros de la fachada. Se trabaja en aseo general y limpieza de pisos, paredes, ventanas y puertas de los salones y espacios del centro infantil.

Fredy Portilla
Residente de interventoría

RESIDENTE OBRA

Lunes, 18/Enero/2021
Clima: Soleado.

Se termina con las actividades de aseo y limpieza sobre pisos, paredes, ventanas y puertas de este Centro de Desarrollo Infantil.

Fredy Portilla
Residente interventoría

RESIDENTE OBRA

Scanned by CamScanner

SANDONA

Lunes 04/Enero/2021
Clima: Lluvioso

SST y Ambiental
Cumplimiento a protocolo de bioseguridad, autoreporte estado de salud, control de temperatura. Enfermedad Coronavirus - Res SST || Jhon Jairo Criollo - Gestion en procesos

Se trabajó en los remates generales del enchape sobre el piso de los diferentes espacios de este Centro de Desarrollo Infantil. se trabaja en los remates de los muros con pintura tipo Koraza para muros perimetrales y con vinilo tipo 1 para muros interiores.

Fredy Portilla
Residente interventoría

Martes 05/Enero/2021
Clima: Lluvioso.

SST y Ambiental
Cumplimiento a protocolo de bioseguridad, inspecciones, orden y aseo, manejo adecuado de residuos.
Res. SST

Se continúo con los remates generales del enchape sobre el piso de los diferentes espacios de este centro Infantil. Se trabaja en los remates de muros interiores y exteriores aplicando pintura tipo Koraza para los segundos y tipo 1 para los primeros.

Se realiza aseo y limpieza general

Fredy Portilla
Residente interventoría

Scanned by CamScanner

Miércoles 06/Enero/2021
Clima: soleado.

SST y Ambiental
Complimiento a protocolo de bioseguridad, control de temperatura, autoreporte estado de salud, orden y aseo, capacitación seguridad plan de emergencias - evacuación, utilización camilla y extintor.
Res. SST

Se continua con los remates generales del enchape sobre el piso de los diferentes espacios del Centro Infantil. Se trabaja en remates con pintura tipo Koraza sobre los muros exteriores y con pintura tipo 1 sobre muros interiores. Se realiza los remates en el cielo falso del corredor exterior de las salas 2 y 3. Se realizó instalaciones electricas para la conexión de las lámparas.

Fredy Portilla
Residente interventoría

Jueves 07/Enero/2021
Clima: Soleado.

SST y Ambiental.
Complimiento de protocolo bioseguridad, capacitación de seguridad en riesgo psicolocativo (superficies, áreas orden y aseo, iluminación, escaleras, etc.)
Res. SST

Se trabaja en remates con Pintura Koraza para muros exteriores y vinilo tipo 1 para muros interiores.

Se realizó el retiro, la preparación y la aplicación de la Pintura tipo esmalte sobre las puertas

Scanned by CamScanner

metálicas de los salones.
Fredy Portilla.
Residente de interventoría

Viernes 08/ Enero / 2021
Clima: Lluvioso

SST y Ambiental
Cumplimiento a protocolo de bioseguridad, reposición elementos protección personal, orden y aseo, adecuada utilización de EPP, manejo adecuado de residuos.
Res. SST

Se trabaja en remates con pintura tipo koraza para muros exteriores y con pintura tipo 1 para muros interiores. Se continua con la preparación y aplicación de pintura tipo esmalte sobre las puertas de los salones. Se inicio la colocación del pañete sobre el muro divisorio entre el patio general y el patio lateral del salón Lúdico.

Fredy Portilla
Residente interventoría

Sabado 09/ Enero / 2021
Clima: Soleado
SST y Ambiental
Cumplimiento protocolo de bioseguridad, control de temperatura, limpieza y desinfección, lavado de manos.

Se trabaja en remates con pintura tipo koraza sobre muros exteriores y con vinilo tipo 1 para muros interiores. Se continua con la colocación del pañete sobre el muro divisorio entre el patio general y el patio lateral del salón lúdico. Se realizo el cambio de cubierta translúcida en el patio del area de cocina y en el corredor exterior ubicado en la parte posterior de la sala 2 y la parte anterior del salón

Scanned by CamScanner

Multiple.

Se trabaja en la limpieza de Pisos, Paredes y ventanas de los diferentes salones de este Centro infantil.

Fredy Portilla
Residente interventoría

RESIDENTE OBRA

Lunes 11/Enero/2021
Clima: Lluvioso.

SST y Ambiental.
Cumplimiento protocolo de bioseguridad, lavado de manos, distanciamiento social, uso de EPP.

Se trabaja en remates con pintura tipo koraza sobre muros Perimetrales y exteriores y con vinilo tipo 1 sobre muros internos de los diferentes salones. Se realiza el cambio de canal sobre las fachadas principal y posterior del salón Múltiple. Se continúa con la limpieza de Pisos, Paredes y ventanas de los diferentes salones de este centro infantil.

Fredy Portilla
Residente interventoría

RESIDENTE OBRA

Martes 12/Enero/2021
Clima: Soleado

SST y Ambiental
Cumplimiento protocolo bioseguridad, autoreporte de estado de salud, desinfección de herramienta menor áreas y superficies.

Scanned by CamScanner

se trabaja en remates con pintura tipo toraza sobre los muros perimetrales y exteriores y con pintura tipo 1 sobre los muros interiores.

Se continua con las actividades de aseo y limpieza sobre Pisos, Paredes y ventanas de este centro infantil. se realiza la instalación y ensayo de funcionamiento para lamparas faltantes en el salón multiple y sala 3.

Fredy Portilla
Residente interventoría

RESIDENTE OBRA

Miercoles 13/Enero/2021
Clima: Lluvioso.

SST y Ambiental
Protocolo de bioseguridad cumplimiento, control temperatura, lavado de manos, capacitación de seguridad en riesgo psicosocial (estrés laboral, condiciones de la tarea, agoso laboral, agotamiento, etc.)
Yu Yu - Res. SST

Se continua con los remates con pintura tipo Toraza sobre los muros perimetrales y exteriores y con pintura vinilo tipo 1 sobre muros interiores. se continua con las actividades de aseo y limpieza de Pisos, Paredes, ventanas de los diferentes salones y espacios del centro infantil.

Se realiza mantenimiento a la viga canal existente porque se encuentra colmatada y obstruida con hojas y otros vegetales. Se realiza el resanes con mortero de algunos orificios grandes ubicados en los muros exteriores de la fachada y en el area de tanques.

Fredy Portilla
Residente interventoría

RESIDENTE OBRA

Scanned by CamScanner

Jueves 14/ Enero /2021
Clima: Lluvioso.

SST y Ambental
Cumplimiento protocolo de bioseguridad, manejo y disposición adecuada de escombros y residuos, aseo y orden en obra. Ing Jau - Res SST

Se continua con los remates con pintura tipo forazo sobre los muros perimetrales y exteriores y con pintura vinilo tipo 1 sobre los muros interiores. se continúa con las actividades de aseo y limpieza de pisos, paredes y ventanas de los diferentes salones y espacios del centro infantil.

Freddy Portilla
Residente interventoría

RESIDENTE OBRA

Viernes 15/Enero /2021
Clima: Lluvioso.

SST y Ambiental
Control temperatura, limpieza y desinfección, lavado de manos, capacitación seguridad en estilos de vida saludable (evitar consumo cigarrillo, y alcohol, uso adecuado de tiempo libre, actividad fisica y alimentación)
Ing Jau - Res. SST

Se continúa con los remates con pintura tipo Forazo sobre los muros perimetrales y exteriores y con pintura vinilo tipo 1 sobre los muros interiores.

Se continua con las actividades de aseo y limpieza de pisos, paredes y ventanas de los salones y espacios del centro infantil.

Scanned by CamScanner

Se instalan tapas ciegas sobre algunos orificios grandes donde existian alguna salida electrica sin uso actual.

Fredy Portilla
Residente de interventoría

Sabado 16 / Enero / 2021
Clima: Lluvioso.

Se termina los remates con pintura tipo Fuerza sobre muros perimetrales y exteriores y con vinilo tipo 1 sobre los muros interiores. Se continúa con las actividades de aseo y limpieza sobre los pisos, paredes y ventanas de los diferentes salones y espacios del centro infantil.

Fredy Portilla
Residente interventoría

Lunes 18 / Enero / 2021
Clima: Soleado.

Se termina las actividades de aseo y limpieza sobre los pisos, Paredes y ventanas de todos los salones del centro de Desarrollo infantil.

Fredy Portilla
Residente interventoría

Scanned by CamScanner

CONSACA

Se solicita al contratista realizar la recolección y disposición de empaques de cemento vacíos.

Fredy Portilla
Residente interventoría

JUEVES 31/DIC/20.

CUADRILLA: SOLDADO PERSONAL: MAESTRO - 2 AYUDANTES

SE CONTINUA FIGURACIÓN ACERO: TAMPOSTERIA COSTADO ORIENTAL OTROS 4m. SE HACE RECOGIDA MATERIAL Y ASEO.

SE INICIA TAMPOSTERIA 9m COSTADO ORIENTAL.

Se solicita al contratista abastecerse de materiales, puesto que en esta temporada suelen cerrar las ferreterías y se escasean los materiales.

El contratista se encuentra al día con el pago de mano de obra a los trabajadores.

Fredy Portilla
Residente interventoría

VIERNES 1/ENE/2021

NO SE TRABAJA - FESTIVO.

Fredy Portilla
Residente interventoría

SABADO 2/ENE/2021

NO SE TRABAJO, PERSONAL TRABAJA 1 HORA EXTRA PARA REPOSICIO

Fredy Portilla
Residente interventoría

Scanned by CamScanner

Lunes 04/Enero/2021
Clima: Lluvioso.

SST y Ambiental
Cumplimiento a protocolo de bioseguridad, trabajo seguro en andamios, no se supera los 1,5m para trabajos en altura, adecuado uso de EPP del personal.
Yu Zu - Res. SST

Se trabajó en la construcción de la mampostería del costado Norte utilizando andamios. se trabaja en el encofrado de columnetas del costado occidental. se trabaja también en el figurado de acero para columetas y viga cinta.

Fredy Portilla
Residente de interventoría

Martes 05/Enero/2021
Clima: Lluvioso.

SST y Ambiental
Complimento a protocolo de bioseguridad, inspecciones, orden y aseo, manejo adecuado de residuos.
Yu Zu - Res. SST

Se trabajó en la construcción de la mampostería del costado Norte utilizando andamios. se trabaja en la fundición de columnetas sobre el costado occidental. Se trabajó tambien el el figurado de acero para columnetes y viga cinta. Se realiza aseo general.

Fredy Portilla
Residente interventoría

Scanned by CamScanner

Miércoles 06/Enero/2021
Clima: Soleado.

SST y Ambiental
Cumplimiento a protocolo de bioseguridad, control de temperatura, autoreporte estado de salud, orden y aseo, capacitación de seguridad plan emergencias - evacuación, utilización de camilla y extintor.
Res. SST

Se continuo con la construcción de la mampostería sobre el costado Norte. se realiza fundición de columnetas sobre el costado occidental.
Se trabaja en el armado del refuerzo de la viga cinta sobre el costado oriental. se trabaja en el encofrado de la viga cinta sobre el costado occidental.

Fredy Portilla
Residente interventoría

Jueves 07/Enero/2021
Clima: Soleado.

SST y Ambiental
Cumplimiento protocolo de bioseguridad, capacitación en riesgo locativo/superfies y áreas, orden y aseo, iluminación, estaleras, etc)
Res. SST

Se continua con la construcción de la mampostería sobre el costado Norte.

Se realiza fundición de la viga cinta previa-

Scanned by CamScanner

mente encofrada sobre el costado occidental. Se trabaja en el armado del refuerzo de la viga cinta sobre el costado oriental.

Freddy Portilla
Residente interventoría

Viernes 08/Enero/2021
Clima: Lluvioso.

SST y Ambiental
Complimento a protocolo de bioseguridad, reposición EPP, orden y aseo, manejo adecuado de residuos.
Yu Zu - Res. SST

Se trabaja en la colocación del Pañete sobre el costado Norte del C.D.I.

Se trabaja en la construcción de la mampostería sobre el costado Norte del lote se trabaja en el armado del refuerzo (sobre) para la viga cinta del costado oriental.

Freddy Portilla
Residente de interventoría

Sabado 09/Enero/2021
Clima: Lluvioso.
SST y Ambiental
Complimiento protocolo de bioseguridad, control de temperatura, limpieza y desinfección, lavado de manos.
Yu Zu

Se trabaja en la colocación del Pañete sobre los muros de los costados oriental, occidental y sur del

Scanned by CamScanner

Centro de Desarrollo infantil.

Se trabaja en la mampostería del costado norte y en el armado del refuerzo de la viga cinta sobre el costado oriental.

Fredy Portilla
Residente interventoría

Lunes 11/Enero/2021
Clima: Lluvioso.

SST y Ambiental
Cumplimiento protocolo de bioseguridad, lavado de manos, distanciamento social, uso de EPP.

Se realiza la fundición de la viga cinta sobre el costado oriental del Centro de Desarrollo Infantil.

Se trabajo en la preparación de las superficies del muros para posterior aplicación de pintura tipo Foraza sobre el costado sur de centro infantil. Inicia la aplicación de la pintura Foraza sobre los muros del costado Sur.

Fredy Portilla.
Residente interventoría

Martes 12/Enero/2021
Clima: Lluvioso.

SST y Ambiental
Cumplimiento protocolo bioseguridad, autoreporte de estado de salud, desinfección de herramienta menor áreas y superficies.

Scanned by CamScanner

Se continua con la preparación de la superficie de los muros en todos los costados del centro de Desarrollo infantil.

Se trabaja en la aplicación de la pintura tipo toraja en los costados Norte, sur izquierdo, sur derecho, oriental y occidental.

Fredy Portilla
Residente interventoría

Miércoles 13/Enero/2021
Clima: Soleado.

SST y Ambiental
Protocolo de bioseguridad cumplimiento, control (temperatura, lavado de manos, capacitación de seguridad en riesgo psicosocial (estrés, laboral, condiciones de la tarea, acoso laboral, agotamiento, etc.)
Yu Zu - Res. SST

Se continua con la preparación de las superficie de los muros en todos los costados del centro de desarrollo Infantil.

Se trabaja también en la aplicación de la Pintura toraja sobre todos los costados del CDI.

Fredy Portilla
Residente Interventoría

Jueves 14/Eneo/2021
Clima: Soleado

SST y Ambiental
Cumplimiento protocolo de bioseguridad, manejo y disposición

Scanned by CamScanner

adecuada de escombros y residuos, aseo y arden en obra Jhon Zuñiga - Res. SST

Se continúa con la aplicación de la Pintura tipo koraza sobre elos costados Norte, sur izquierdo, sur derecho, occidental y oriental del Centro de Desarrollo infantil.

Se retoma tambien la demolición de la placa de acceso existente que se encuentra deteriorada.

Se realiza desalojo y limpieza, utilizando carretas para llevarlo hasta Punto de acopio donde finalmente será llevado a sitio autorizado para la disposición final.

Fredy Portilla
Residente Interventoría

Viernes 15/Enero/2021
Clima Lluvioso.

SST y Ambiental
Control temperatura, limpieza y desinfeccion, lavado de manos, capacitación seguridad en estilos de vida saludable (evitar consumo cigarrillo, alcohol, uso adecuado de tiempo libre, actividad fisica y alimentación)
Jhon Zuñiga - Res. SST

Se Continúa con la aplicación de la Pintura tipo koraza sobre los costados Norte, surI, surD, oriental y occidental del Centro infantil.

Se Continúa con la demolición de la placa de acceso existente. Se realiza conformación con recebo para reperfilamiento sobre el area de esta placa en un tramo ya demolido. Se realiza la reposición en concreto de la losa de acceso parte recta.

Scanned by CamScanner

Se realiza el desalojo de Material sobrante hasta sitio autorizado. Se emplea retrocargador y volquetas.

Fredy Portilla
Residente interventoría

RESIDENTE OBRA

Sabado 16/ Enero /2021
Clima: Lluvioso.

Se termina la aplicación de Pintura tipo koraza sobre los muros de todos los costados del centro infantil.

Se termina el encofrado y fundición de la placa de Acceso. Se realiza aseo y limpieza en el area de influencia del muro. Se coloca la estructura para cielo falso en el salón de Psicología.

Fredy Portilla
Residente Interventoría

RESIDENTE OBRA

Lunes, 18 / Enero / 2021
Clima: Lluvioso.

Se realiza el corte para dilataciones en la placa de concreto fundida dias antes. Se termina el aseo y limpieza del area de influencia del muro y del area de acceso la cual fue utilizada como Punto de acopio de agregados y sobrantes. Se termina la instalación del cielo falso en PVC en el salón de Psicología. Se realiza la instalación y ensayo de funcionamiento de dos lámparas en este mismo salón.

Fredy Portilla
Residente interventoría

Scanned by CamScanner
