
INFORME INTERVENTORÍA N°09

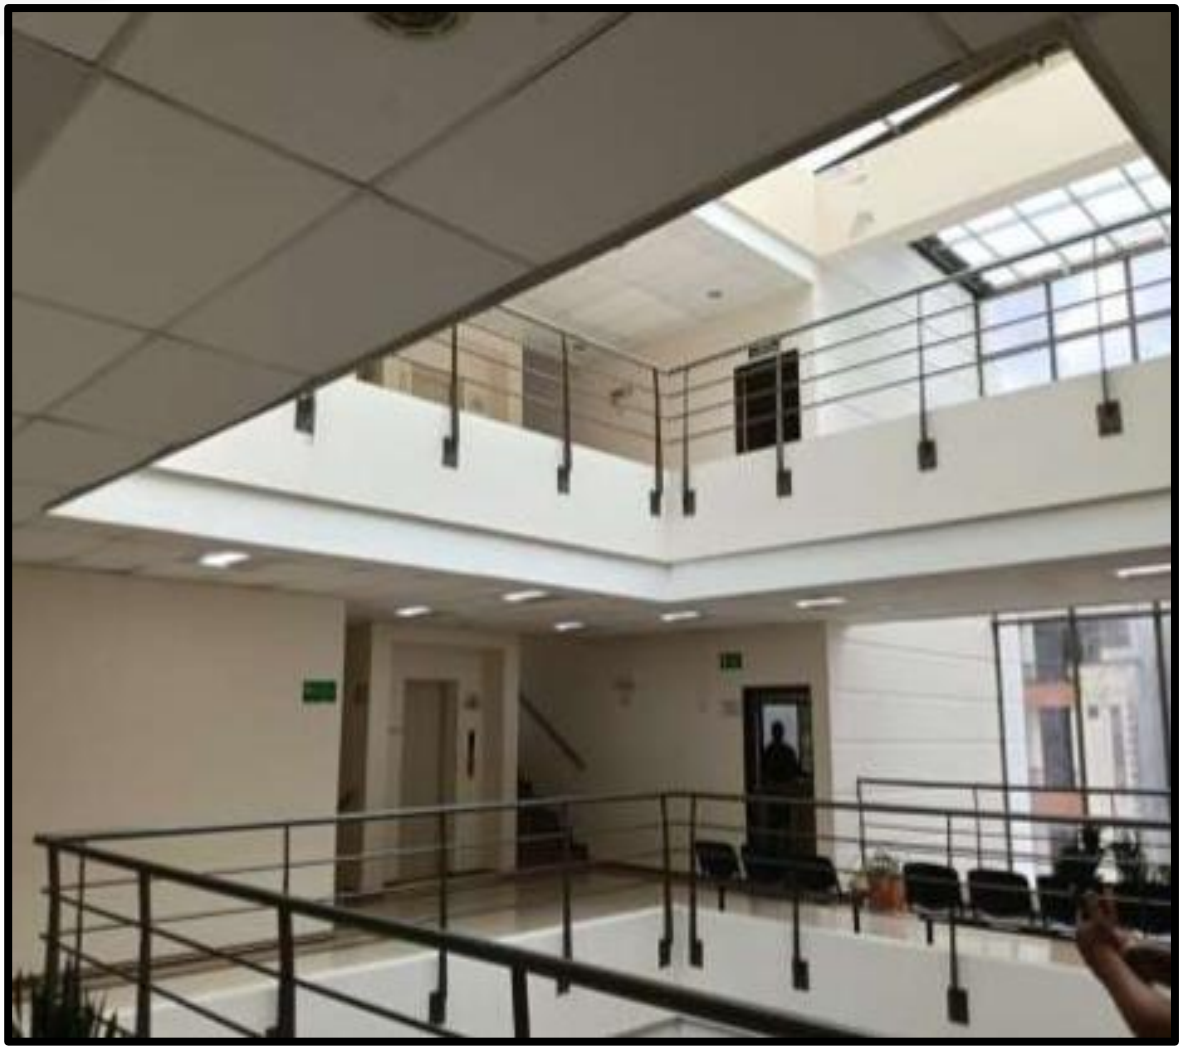

INTERVENTOR:
ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.

Entre los suscritos **LUIS HUMBERTO PAZ TIMANÁ** en nombre y representación de la **NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO** quien se denominará el Contratante, por una parte; y por otra parte el **ING. ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO** identificado con cedula de ciudadanía No 9.731.335 de Armenia-Quindío, quien se denominará el Contratista, celebraron el día 01 de noviembre de 2024 el Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.6973355 cuyo objeto es **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO".**

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4
2 DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO 5
3 INFORMACION GENERAL 7
3.1 Información general del contrato de interventoría 7
3.2 Información general del contrato de obra 8
4 ASPECTOS TÉCNICOS DE LA OBRA 8
4.1 Aspecto de diseño 8
5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 12
6 SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA 14
6.1 Avance de los contratos de obra e interventoría 14
6.1.1 Contrato de obra 14
6.1.2 Contrato de interventoría. 15
7. AVANCE EN TIEMPO DE LOS CONTRATOS 16
7.1 Para el contrato de obra: 16
7.2 Para el contrato de interventoría: 16
8. PROGRAMACIÓN DE OBRA 17
9. ACTIVIDADES Y CANTIDADES INICIALES 22
10. ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS EN EL MES 28
11. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA 39
11.1 CAPÍTULO 1 PRELIMINARES ..... **¡Error! Marcador no definido.**
12. PMA: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 41
13. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 42
13.1 Actas de inicio 42
13.2 Socialización del proyecto: 42
13.3 Comités de obra: 43
14. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL 43
14.1 Clausula 8 Forma de pago contrato de obra 43
14.2 Clausula 8 Forma de pago contrato de interventoría 44
15. PERSONAL Y EQUIPO UTILIZADO EN OBRA 44
16. CONTROL DE CALIDAD 45
16.1 Metodología de medición y cuantificación de obra ejecutada 45
17. CONTROL DE PÓLIZAS Y RESERVAS PRESUPUÉSTALES 45
17.1 Pólizas contratista de obra 45
17.2 Pólizas contratista de interventoría. 46
18. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 48
19. ACTIVIDADES RELEVANTES 49
20. ESTADO DEL TIEMPO 49
21. INCONVENIENTES ENCONTRADOS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA 49
22. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 49
23. ANEXOS 51

LISTA DE TABLAS

TABLA 1. *INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.* 7
TABLA 2. *INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.* 8
TABLA 3. *AVANCE TÉCNICO AL CONTRATO DE OBRA.* 15

TABLA 4. *AVANCE TÉCNICO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.* 16
TABLA 5. *AVANCE EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA.* 16
TABLA 6. *AVANCE EN TIEMPO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.* 17
TABLA 7. *PROGRAMACIÓN AL CONTRATO DE OBRA.* 21
TABLA 8. *CANTIDADES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA.* 28
TABLA 9. *CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA.* 38
TABLA 10. PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ANEXO 0 46
TABLA 11. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0 . 46
TABLA 12. PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES. ANEXO 0 47
TABLA 13. PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES. ANEXO 0 47
TABLA 14. PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES. ANEXO 2 48

LISTA DE IMÁGENES

IMAGEN 1: *LOCALIZACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.* 6
IMAGEN 2:LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL ÁREA A INTERVENIR EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 6
IMAGEN 3: PLANOS ESTRUCTURALES 9
IMAGEN 4: PLANOS PLANTA PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA. 9
IMAGEN 5: *PLANO PERFIL PALACIO DE JUSTICIA MOCOA.* 10
IMAGEN 6: PROTECCIÓN ARQUITECTÓNICOS. 10
IMAGEN 7: *PLANO DE FACHADA PRINCIPAL.* 11
IMAGEN 8: MODELO. 11
IMAGEN 9 PLANO POR PLANTA EN CADA PISO 12
IMAGEN 10: LUMINARIA TIPO BALA 72X83. 39
IMAGEN 23: LUMINARIA TIPO BALA GS 15W 5000K. 40
IMAGEN 12: LUMINARIA DE EMERGENCIA 185X50X108. 40
IMAGEN 13: ILUMINACIÓN 1F/15AMP EN TECHO. ..... **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
IMAGEN 14: ILUMINACIÓN 1F/15AMP EMERGENCIA. ..... **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
IMAGEN 15: REPELLO DE PISO Y PARED CON MORTERO. ..... **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
IMAGEN 16: CERÁMICA DE PISO. ..... **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
IMAGEN 17: ESTUCO PLÁSTICO PARA MUROS Y RESANES. 41
IMAGEN 18: PINTURA VINILO TIPO 1 ..... **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
IMAGEN 19: PINTURA VINILO TIPO 1 ..... **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
IMAGEN 20: SELLADO DE JUNTAS. ..... **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
IMAGEN 21: *REGISTRO FOTOGRÁFICO – SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO* 43

LISTA DE GRAFICOS

GRÁFICO 1: *PROGRAMADO VS EJECUTADO CONTRATO DE OBRA MES 9* 15

INTRODUCCIÓN

La Nación - Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Distrito Pasto en nombre y representación de **LUIS HUMBERTO PAZ TIMANÁ**, busca solucionar el deterioro actual que vive la infraestructura física del palacio de justicia de mocoa no permite prestar una atencion de manera integral, organizada, coordinada y de cumplimiento en infraestructura de calidad, que satisfaga las necesidades de sus usuarios y personal del palacio de justicia. Por tal razón,contrató con el **ING. ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO**, la realización de la interventoria del contrato **N° CO1.PCCNTR.6973355**, cuyo objeto es: **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO".**Este proyecto comprende actividades preliminares, instalaciones hidrosanitarias,red electrica, muros, repellos, enchapes, estucos, pintura,carpinteria,cubierta y cielos rasos,aparatos sanitarios,varios y aseo, con el fin de garantizar la seguridad de los servidores judiciales, usuarios y visitantes, asegurando un entorno libre de riesgos, eficiencia en la administración de justicia, un espacio físico adecuado y funcional facilita la labor de los servidores judiciales, permitiendo unaatención más eficiente y oportuna a los usuarios.

Por lo tanto, el presente informe contiene toda la informacion necesaria para que la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Distrito Pasto pueda verificar el cumplimiento de estas obligaciones, tanto en lo relativo a la ejecucion fisica como la ejecucion financiera, soportada con datos obtenidos en campo. En los anexos a este informe, se registran todos los controles realizados al proyecto de acuerdo a las especificaciones técnicas.

También se presenta un resumen de las actividades ejecutadas, los problemas presentados, las acciones correctivas tomadas y la manera como se superaron, junto a registro fotográfico de los trabajos. Para finalizar se formulan las conclusiones y recomendaciones, para el periodo comprendido en este informe entre el 1 septiembre al 5 de septiembre del 2025.

2 DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO

2.1. Descripción del Proyecto

El desarrollo de las actividades del contrato de la obra nos lleva a solucionar el inconveniente, que radica en el actual deterioro que se encuentra la infraestructura física del palacio de justicia municipio de Mocoa Departamento del Putumayo, dado que no cuenta con instalaciones apropiadas, generando incumpliendo con la normatividad y regulaciones vigentes en materia de seguridad, salud ocupacional y accesibilidad, como también, la preservación de la imagen institucional, un edificio bien mantenido y restaurado refleja la imagen de la institución y su compromiso con la justicia y el servicio a la comunidad.

Para el efecto la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Distrito Pasto, presentó el proyecto **"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA";** que fue viabilizado y aprobado, para financiar su ejecución. Los estudios y diseños del proyecto fueron aportados por la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Distrito Pasto, siendo beneficiario directo palacio de justicia del municipio de Mocoa departamento del Putumayo.

2.2. Localización del proyecto

La ejecución de las actividades contractuales se encuentra localizadas en el Municipio de Mocoa que se encuentra localizado está ubicado en la parte norte del Departamento del Putumayo, específicamente en el palacio de justicia, Calle 7 No 6 - 42, Barrio Centro.



Imagen 1: *Localización General del Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo.*
Fuente: *www.googlemaps.com*

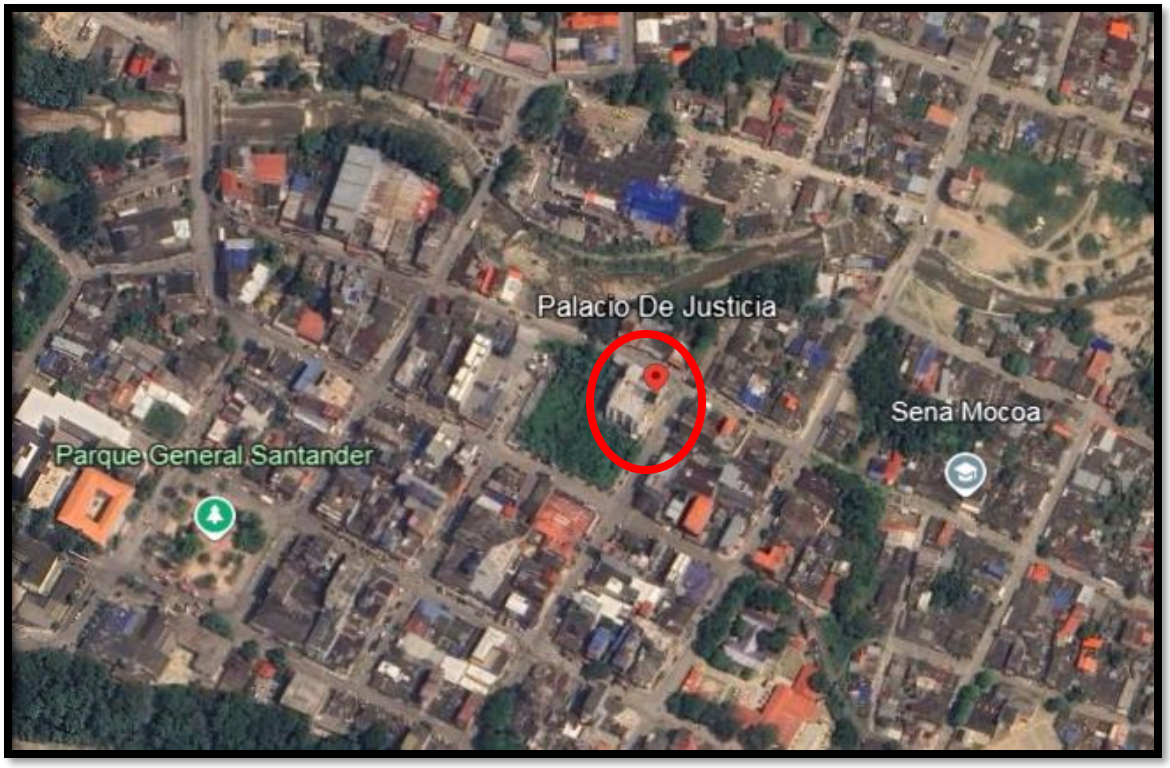


Imagen 2:*Localización especifica del área a intervenir en el municipio de Mocoa departamento del Putumayo.*
Fuente: *www.earth.google.com*

3 INFORMACION GENERAL

3.1 Información general del contrato de interventoría

CONTRATO No	01.PCCNTR.6973355 DEL 01/11/2024
OBJETO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
FECHA DEL CONTRATO	01 DE NOVIEMBRE DEL 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUARETA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO
VALOR INICIAL	TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($33.336.660.00) M/CTE
ADICION N°1	VEINTISEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS DIESCISIETE PESOS ($ 26.113.717.00) M/CTE.
VALOR INICIAL + ADICION N°1.	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($ 59.450.377.00) M/CTE.
FECHA DE INICIACIÓN	14 DE NOVIEMBRE DEL 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	31 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE REINICIO	13 DE ENERO DEL 2025
FECHA DE TERMINACION N°2	21 DE ENERO DEL 2025
PRORROGA N°1	DIESIOCHO (18) DIAS
FECHA DE TERMINACION N°3	8 DE FEBRERO DEL 2025
PRORROGA N°2	CUARENTA Y UN (41) DIAS
FECHA DE TERMINACION N°4	21 DE MARZO DEL 2025
FECHA DE SUSPENSION	6 DE MARZO DEL 2025
FECHA DE REINICIO	20 DE MARZO DEL 2025
FECHA DE TERMINACION N°5	5 DE ABRIL DEL 2025
PRORROGA N°3	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACION N°6	6 DE JUNIO DEL 2025
FECHA DE SUSPENSION N°3	5 de junio 2025
AMPLIACION DE LA SUSPENSION N°3	5 de julio 2025
FECHA DE TERMINACIÓN N°7	6 de agosto de 2025
FECHA DE PRORROGA 4	5 de agosto 2025
PRÓRROGA 4	30 días
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	5 de septiembre de 2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL	100%

***TABLA 1**. Información general del contrato de interventoría.*
***Fuente:** Elaboración Propia.*

3.2 Información general del contrato de obra

CONTRATO No	O1.PCCNTR.6947019 DEL 29 DE OCTUBRE 2024
OBJETO	"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S
FECHA DEL CONTRATO	29 DE OCTUBRE DEL 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (2) MESES
VALOR INICIAL	NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($955.501.990.00) M/CTE
FECHA DE INICIACIÓN	14 DE NOVIEMBRE DEL 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	13 DE ENERO DEL 2025
FECHA SUSPENSION N°1	31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE REINICIO	13 DE ENERO 2025
FECHA TERMINACION N°2	21 DE ENERO 2025
PRORROGA N°1	DOS (2) MESES
FECHA TERMINACION N°3	21 DE MARZO 2025
FECHA DE SUSPENSION	6 DE MARZO DEL 2025
FECHA DE REINICIO	20 DE MARZO DEL 2025
FECHA DE TERMINACION N°4	5 DE ABRIL DEL 2025
PRORROGA N°2	DOS (2) MESES
FECHA TERMINACION N°5	6 DE JUNIO 2025
FECHA DE SUSPENSION N°3	5 de junio 2025
AMPLIACION DE LA SUSPENSION N°3	5 de julio 2025
FECHA DE TERMINACIÓN N°7	6 de agosto de 2025
FECHA DE PRORROGA 4	5 de agosto 2025
PRÓRROGA 4	30 días
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	5 de septiembre de 2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL	100%

TABLA 2. *Información general del contrato de obra.*
Fuente: *Elaboración Propia.*

4 ASPECTOS TÉCNICOS DE LA OBRA

4.1 Aspecto de diseño

El proyecto consiste en realizar el mantenimiento de las áreas del palacio de justicia del municipio de Mocoa, departamento del putumayo.

El contratista de obra efectuó una revisión detallada de los estudios y diseños suministrados por la entidad una vez revisada la información técnica del proyecto, el contratista de obra encontró algunas inconsistencias en los planos arquitectónicos, eléctricos y sanitarios.

La interventoría reviso detenidamente las observaciones presentadas por el contratista de obra donde efectivamente se evidencias inconsistencias que se tienen en consideración en comité con supervisión.

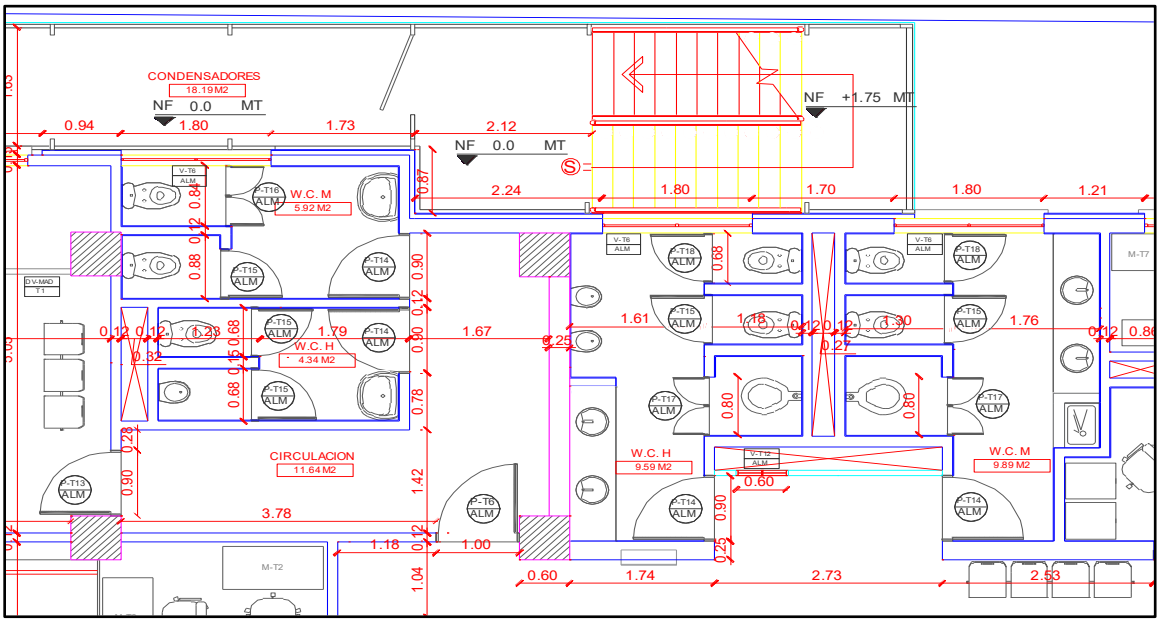


Imagen 3: *Planos estructurales*
Fuente: *Documentos otorgados por la entidad.*

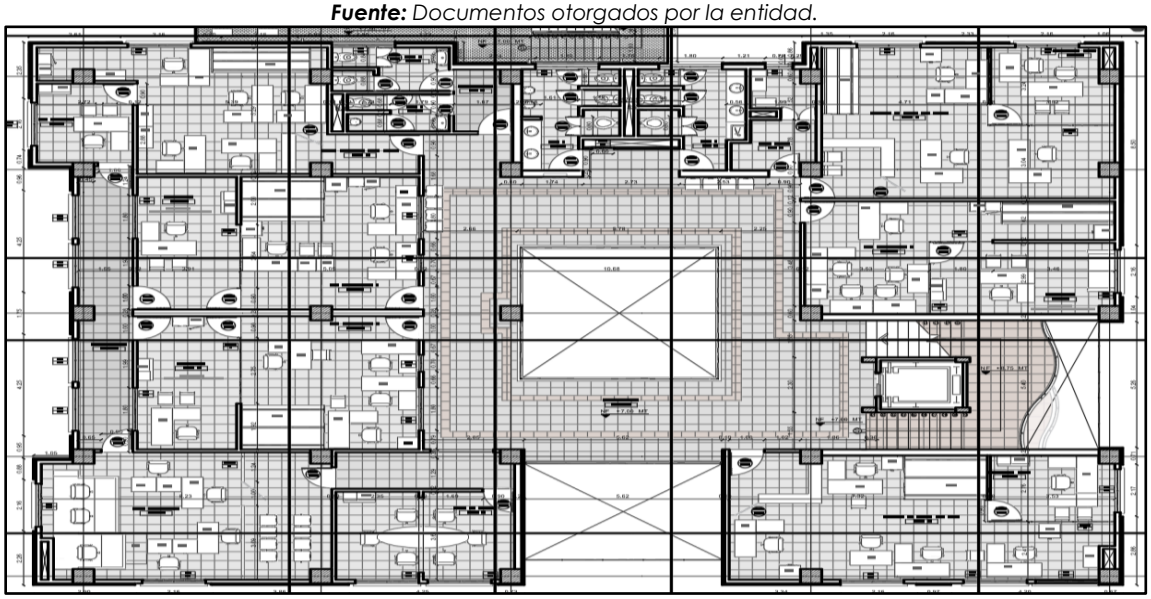


Imagen 4: Planos planta palacio de justicia de Mocoa.
Fuente: *Documentos otorgados por la entidad.*

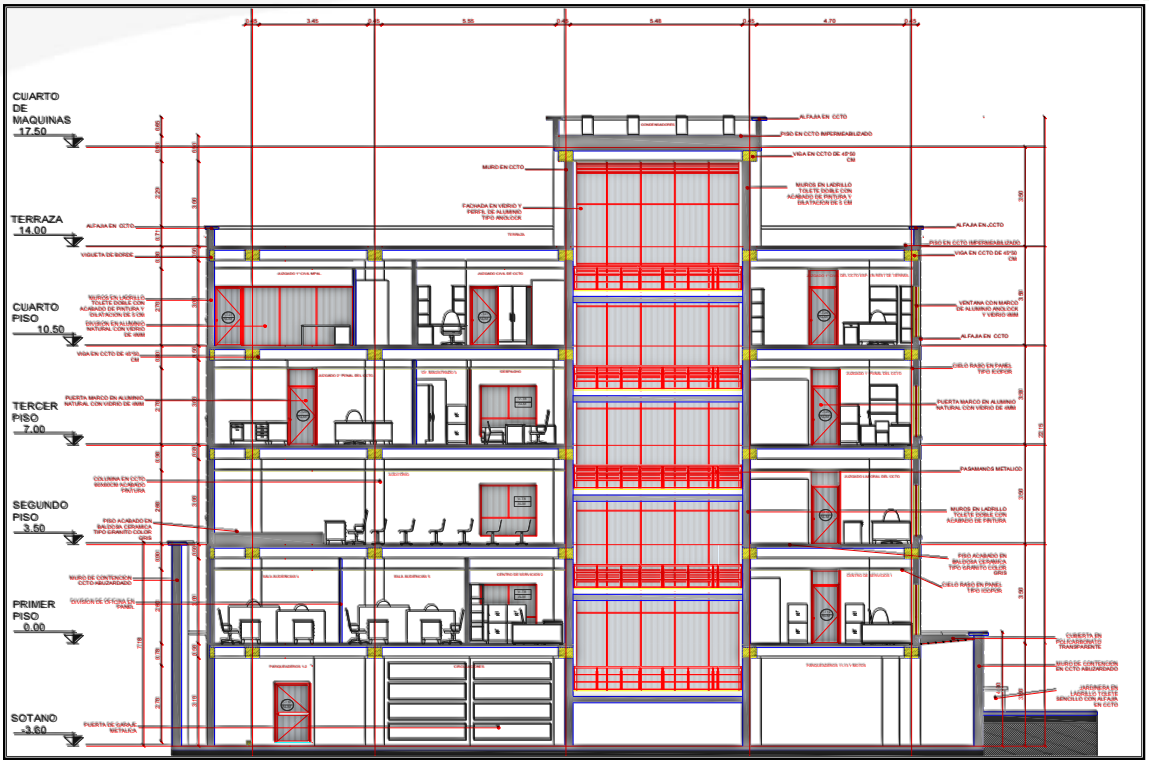


Imagen 5: *Plano perfil palacio de justicia Mocoa.*
Fuente: *Documentos otorgados por la entidad.*

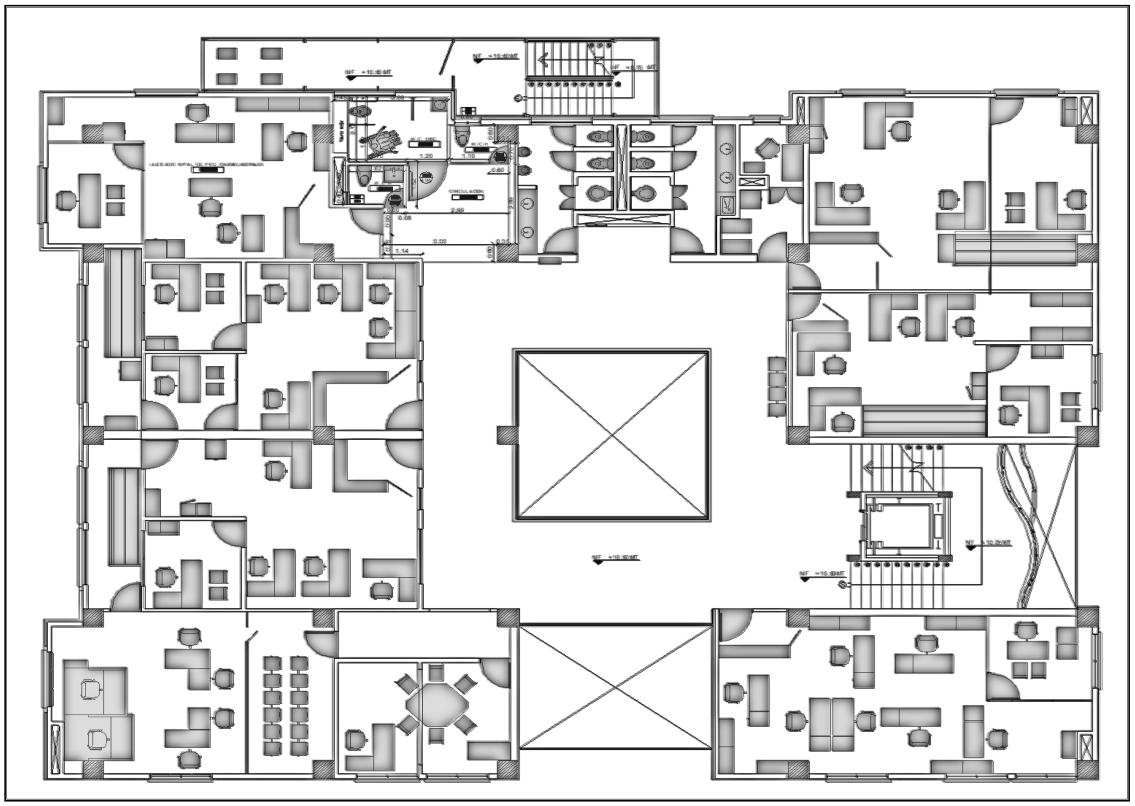


Imagen 6: Protección arquitectónicos.
Fuente: Documentos otorgados por la entidad.

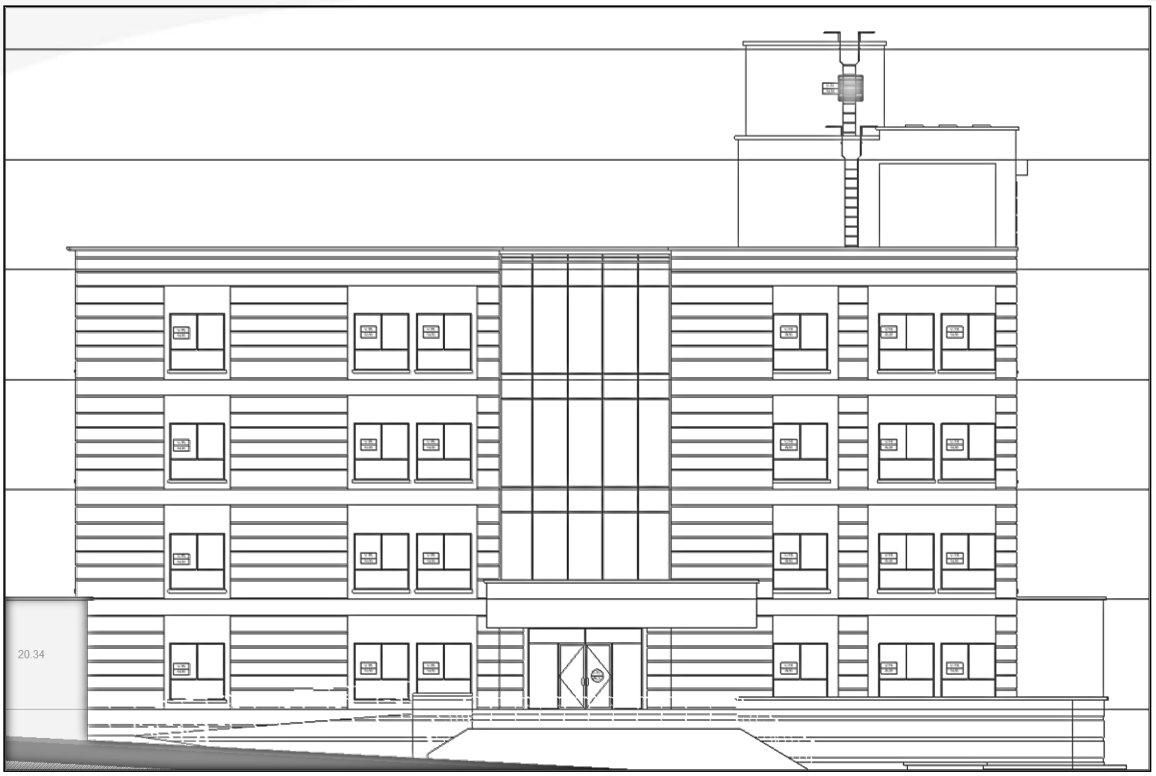


Imagen 7: *Plano de fachada principal.*
Fuente: *Documentos otorgados por la entidad.*



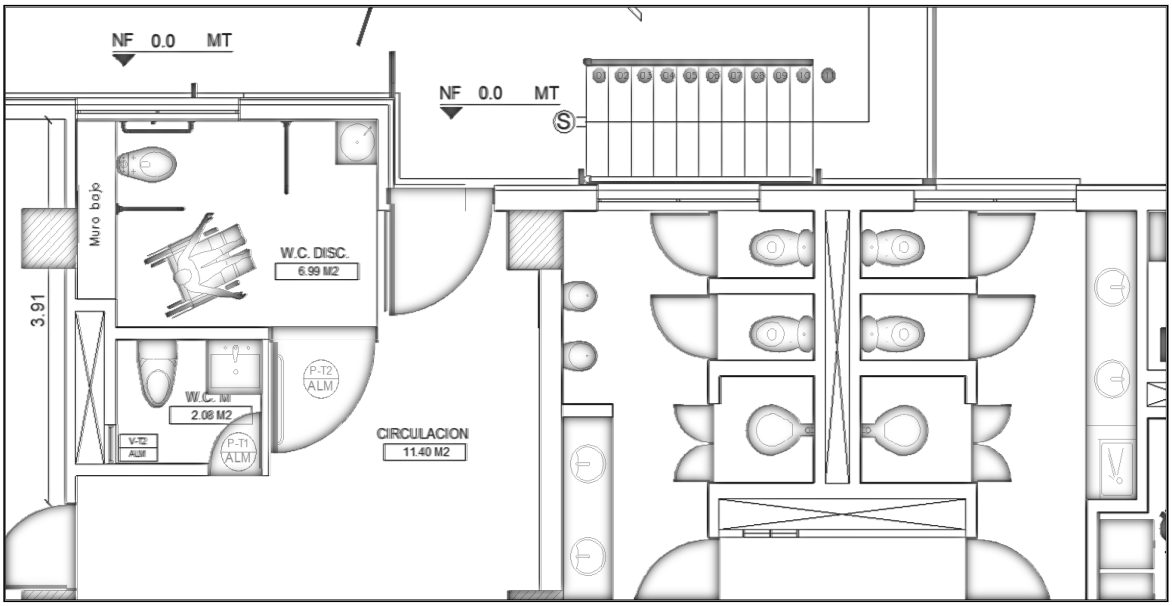


Imagen 8: *Modelo.*
Fuente: *Documentos otorgados por la entidad.*


PRIMER PISO

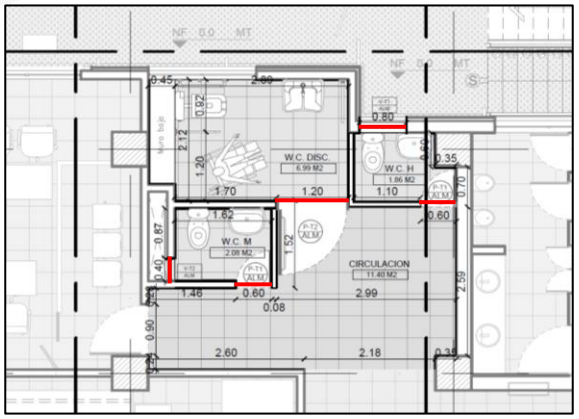

SEGUNDO PISO

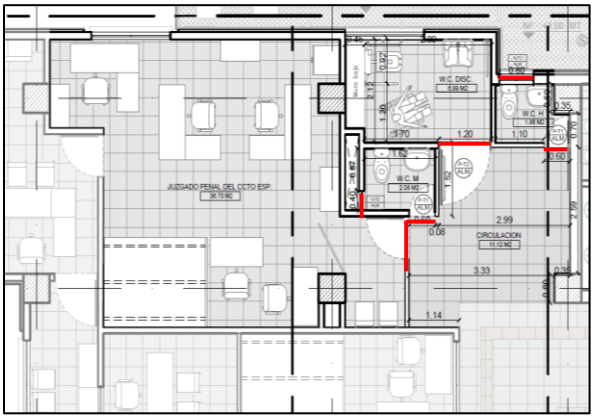

TERCER PISO

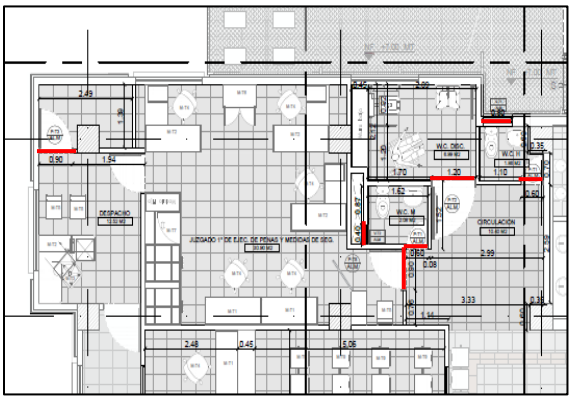

CUARTO PISO

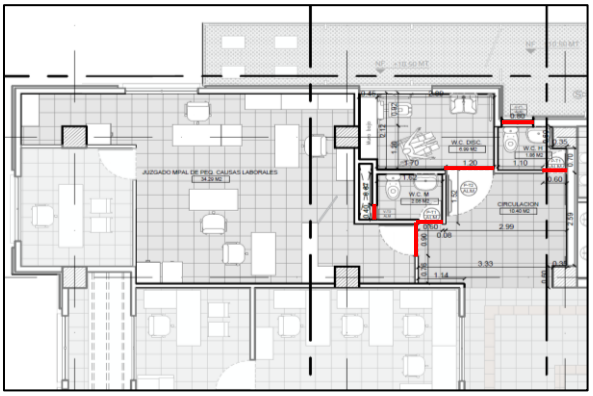


Imagen 9 *Plano por planta en cada piso*
Fuente: Documentos otorgados por la entidad

5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

Se desarrolló revisión y aprobación de la documentación requerida para el avance del contrato de obra según las obligaciones contractuales tales como equipo mínimo requerido, análisis de precios unitarios, cronograma, plan de manejo ambiental (PMA), plan de seguridad y salud en el trabajo (SST), etc. Se viene desarrollando un plan de trabajo según la propuesta presentada inicialmente por la interventoría, haciendo énfasis en el estricto seguimiento al desarrollo del contrato de obra, garantizando la calidad de los trabajos efectuados.

Se ha verificado el seguimiento técnico mediante la supervisión, inspección y control de calidad de los trabajos de obra, informes y documentos que se

generan del proyecto garantizando el correcto cumplimiento de las obligaciones técnicas contractuales.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 5 de septiembre del 2025, se realizaron las siguientes actividades principales:

- ✓ Socialización del proyecto.
- ✓ Firma acta de inicio de obra y de interventoría.
- ✓ Control técnico a las actividades ejecutadas de acuerdo a las especificaciones y normas técnicas.
- ✓ Control administrativo, realizando las actas, oficios y documentación pertinente a la ejecución del contrato para su buen desarrollo.
- ✓ Ejecución del informe mensual N.08
- ✓ Seguimiento y control a los procesos constructivos entregados por el contratista.
- ✓ Verificación de afiliaciones y pagos a seguridad social y riesgos profesionales.
- ✓ Solicitudes de certificados de calidad de los materiales utilizados en obra.
- ✓ Comunicación permanente con la entidad contratante para informar del avance y actividades adelantadas referentes al proyecto.
- ✓ Reuniones con el contratista, antes y durante la suscripción del acta de inicio, para definir las directrices a seguir durante la ejecución del proyecto.
- ✓ Control técnico, económico y financiero del proyecto en desarrollo.
- ✓ Revisión de estudios, diseños, planos y memorias de cálculo del proyecto, se emiten observaciones a los mismos.
- ✓ Suscripción de documentos contractuales.
- ✓ Revisión y localización de sitios de obra.
- ✓ Solicitud al contratista, de toda la documentación pertinente.
- ✓ Control de dotación del personal en obra.
- ✓ Seguimiento y control al programa de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST), y al Plan manejo ambiental (PMA) durante la ejecución del proyecto.
- ✓ Solicitar al contratista los informes mensuales de los diferentes planes de seguimiento y control.
- ✓ Las demás inherentes a sus obligaciones.

6 SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA

6.1 Avance de los contratos de obra e interventoría

6.1.1 Contrato de obra

Se resalta de forma relevante, que, a la fecha de ejecución con respecto a la programación de obra inicial, se evidencian avances significativos para la obra; las actividades desarrolladas en el marco del contrato de obra No, CO1.PCCNTR.6947019 del 29 de octubre 2024 corresponden a ***Capítulo 5 Repellos,*** ítem 5.1 Repello de piso y pared con mortero 1:4 espesor 2cm. Incluye aditivo impermeabilizante. ***Capítulo 6 Enchapes, subcapítulo 6.1 Pisos***, ítem 6.1.1 Enchape cerámica de piso estructurado 20.6x92.6cm, uso comercial moderado. ***subcapítulo 6.2 Pared***, ítem 6.2.1 Enchape cerámica de pared color marfil caras diferenciadas 30.1x75.3cm. ***Capítulo 8 pintura*** ítem 8.1 Pintura de muros en mampostería 3 manos, vinilo tipo 1, lavable. ítem 8.3 Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial ancho 10cm, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, para pavimento rígido. ítem 8.4 Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial, números con circunferencias de 66 y 40cm para carros y motos. imprimación en negro y pintura tráfico vehicular, incluye micro esferas, para pavimento rígido. ítem 8.5 Aplicación de pintura en frio base solvente para flechas de ingreso y salida, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, sobre pavimento rígido.

De acuerdo con la evaluación del periodo No 08 de ejecución, la obra presenta un porcentaje ejecutado acumulado del 4.37% que corresponde a una inversión de $ 62.630.438 un porcentaje programado acumulado de 100.00% que corresponde a una inversión de $ 1.433.190.807 con respecto del valor contratado.

DESCRIPCIÓN OBRA	VALOR
Valor Inicial costo de la obra:	$ 955.501.990
Adicional N°1	$ 440.931.461
Adicional N°2	$ 36.757.356
Valor inicial + adicional N°1	$ 1.433.190.807
Valor programado para el periodo No. 9:	$ 343.041.274
Porcentaje programado para el periodo No. 9:	24,56%
Valor ejecutado periodo No. 09 (01/09/2025 - 05/09/2025):	$ 62.630.438
Porcentaje ejecutado periodo No. 01 (05/09/2025 - 05/09/2025):	4.37%
Valor programado acumulado:	$ 1.433.190.807
Porcentaje programado acumulado:	100,00%
Valor ejecutado acumulado:	$ 1.433.190.807
Porcentaje de ejecución acumulado:	100,00%
Déficit (-) / Superávit (+) de avance en obra:	0.0 %

TABLA 3. *Avance técnico al contrato de Obra.*
Fuente: *Elaboración Propia.*

PROGRAMADO VS EJECUTADO OBRA

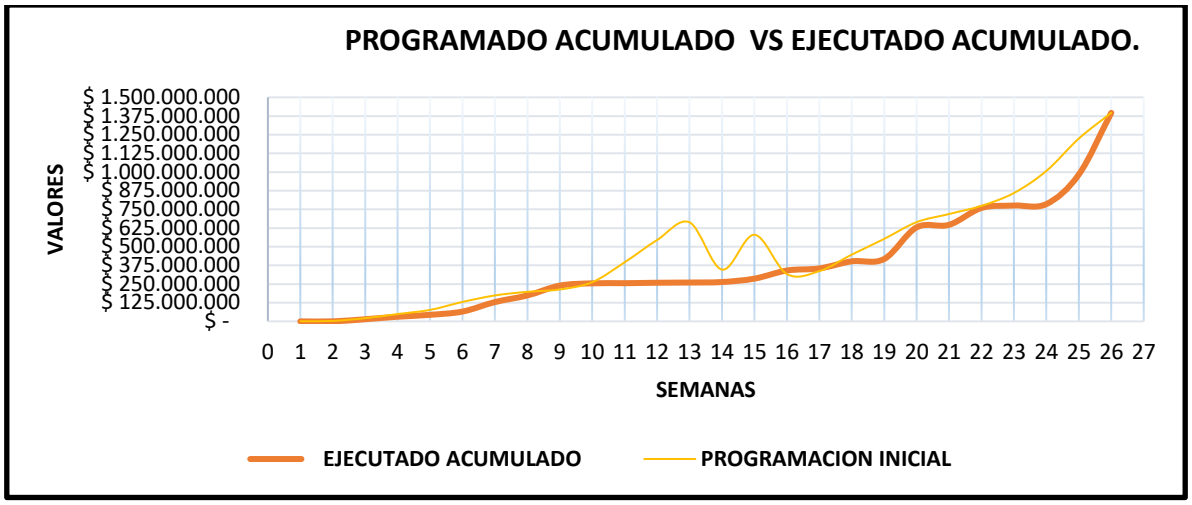


Gráfico 1: *Programado vs ejecutado contrato de obra Mes 9*
Fuente: *Elaboración Propia.*

6.1.2 Contrato de interventoría.

La Interventoría ha cumplido sus funciones desde la suscripción del acta de inicio, verificando que las actividades pactadas por el contratista de obra se cumplan a cabalidad de acuerdo con las especificaciones técnicas, normatividad vigente y acatando recomendaciones por parte de Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Distrito Pasto.

Básicamente durante el periodo comprendido entre la firma del contrato y la presente fecha, se realizaron las actividades técnicas de revisión general del proyecto, estimación de cantidades de obra, revisión de documentos contractuales, acompañamiento en la revisión de los diseños, y el seguimiento y control a la ejecución de la obra, entre otros, a fin de garantizar todas las herramientas e insumos que permitan el normal y adecuado desarrollo del proyecto.

De acuerdo con la evaluación del periodo de ejecución desde el 1 septiembre al 5 de septiembre del 2025, la interventoría presenta un porcentaje ejecutado del 100% que corresponde a una inversión de $ 109.445.337,00 respecto del valor contratado.

GENERAL INTERVENTORIA	
DESCRIPCIÓN	**VALOR**
Valor Inicial Costo de la Interventoría:	$ 33.336.660,00
Valor adición N°1	$ 26.113.717.00
Valor adición N°2	$ 33.336.660,00
Valor adición N°3	$ 16.668.300,00
Valor Inicial + Valor adiciones.	$ 109.455.337,00
Porcentaje de ejecución presente mes:	100.00%
Valor ejecutado periodo No. 08 (05/08/2025 – 31/08/2025):	$ 109.455.337,00
Porcentaje de ejecución acumulado:	100.00%
Valor ejecutado acumulado:	$ 109.455.337,00

TABLA 4. *Avance técnico al contrato de Interventoría.*
Fuente: *Elaboración Propia.*

7. AVANCE EN TIEMPO DE LOS CONTRATOS

7.1 Para el contrato de obra:

El tiempo acumulado de labores es de treinta (30) días respecto del plazo total pactado de dos (2) meses iniciales, prorroga uno de sesenta (60) días, prorroga de sesenta (60) días y prorroga de treinta (30) días de ejecución, contados desde el 1 septiembre al 5 de septiembre del 2025, que corresponden al 100.00% de avance en tiempo con respecto al plazo del contrato.

Plazo inicial	Cuarenta y cinco (45) días
Prorroga N°1	Sesenta (60) días
Prorroga N°2	Sesenta (60) días
Prorroga N°3	Treinta (30) días
Avance en tiempo	195 días
Porcentaje de avance en tiempo	100,00%

TABLA 5. *Avance en tiempo al contrato de Obra.*
Fuente: *Elaboración Propia.*

7.2 Para el contrato de interventoría:

El tiempo acumulado de labores es de treinta (30) días respecto del plazo total pactado de dos (2) meses iniciales, prorroga uno de dieciocho (18) días, prorroga de cuarenta y un (41) meses, prorroga de sesenta (60) días y prorroga de treinta (30) días de ejecución, contados desde el 1 septiembre

al 5 de septiembre del 2025, que corresponden al 100.00% de avance en tiempo con respecto al plazo del contrato.

Plazo inicial	Cuarenta y cinco (45) días
Prorroga N°1	Dieciocho (18) días
Prorroga N°2	Cuarenta y un (41) días
Prorroga N°3	Sesenta (60) días
Prorroga N°4	treinta (30) días
Avance en tiempo	194 días
Porcentaje de avance en tiempo	100,00%

TABLA 6. *Avance en tiempo al contrato de Interventoría.*
Fuente: *Elaboración Propia.*

8. PROGRAMACIÓN DE OBRA

El control de la programación y el presupuesto del contrato se realizó con base en el cronograma y el flujo de caja presentado por el contratista, del que se extrae los capítulos principales y los diversos ítems del proyecto, para efectuar el seguimiento y control de las actividades proyectadas vs las actividades ejecutadas, con el fin de evitar que se genere un incumplimiento de los plazos iniciales y el valor presupuestado de la construcción. A continuación, se presentan los datos iniciales proyectados para la ejecución de la obra:

REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA.			
CRONOGRAMA			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**INICIO**	**FINAL**
1	**PRELIMINARES**		
1.1	**INICIALES**		
1.1.1	Localización y replanteo arquitectónico, incluye planos récord	14/11/2024	17/11/2024
1.1.2	Instalación y desinstalación de muro una cara drywall, provisional para cerrar las obras, incluye puerta con marco para ingreso de trabajadores	14/11/2024	15/12/2024
1.1.3	Señalización de obra en lona de 60x40cm impresión full color, incluye marco y anclaje	28/11/2024	04/12/2024
1.2	**DESMONTES Y RETIROS**		
1.2.1	Desmonte de marcos y puertas, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	21/11/2024	15/12/2024
1.2.2	Desmonte de marco, ventana y vidrio, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	21/11/2024	15/12/2024
1.2.3	Desmonte de cielo raso en fibra mineral y/o panel yeso y/o fibrocemento, incluye estructura soporte, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	21/11/2024	15/12/2024
1.2.4	Desmonte de Tasas sanitarias, orinales y lavamanos, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	21/11/2024	15/12/2024

1.2.5	Desmonte de instalaciones hidrosanitarias, incluye tuberías y accesorios, regatas y sellos provisionales, cargue a volqueta	21/11/2024	15/12/2024
1.2.6	Rasqueteo, cepillo y limpieza manual de superficies, con el fin de retirar impurezas y capas de pintura existentes.	28/11/2024	15/12/2024
1.2.7	Retiro de luminarias ubicadas en cielos rasos y pared, incluye trasiego a punto de acopio	21/11/2024	15/12/2024
1.2.8	Retiro de redes eléctricas en piso, techo y pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	21/11/2024	15/12/2024
1.3	**DEMOLICIONES**		
1.3.1	Demolición muro E ≤ 15CM en mampostería maciza o hueca, incluye cortes con pulidora, trasiegos y cargue a volqueta.	21/11/2024	15/12/2024
1.3.2	Demolición de enchape de pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	21/11/2024	15/12/2024
1.3.3	Demolición de enchapes de piso, incluye trasiego y cargue a volqueta	21/11/2024	15/12/2024
1.3.4	Demolición repello de piso, incluye picado Eprom = 0.03m, incluye trasiego y cargue a volqueta	21/11/2024	15/12/2024
1.3.5	Demolición repello de pared, muros mampostería eprom= 0.02m, incluye trasiegos y cargue a volqueta	21/11/2024	15/12/2024
1.3.6	Cargue, transporte y retiro del material sobrante proveniente de las obras de mantenimiento, hasta el botadero.	28/11/2024	18/12/2024
1.3.7	Demolición de mesones en concreto, recubierto con granito incluye salpicadero	21/11/2024	15/12/2024
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**		
2.1	**RED SUMINISTRO AGUA POTABLE**		
2.1.1	Instalaciones PVC 1/2" RDE 13.5	02/12/2024	18/12/2024
2.1.2	Instalaciones PVC 3/4" RDE 21	02/12/2024	18/12/2024
2.1.3	Instalaciones PVC RDE 21 1"	02/12/2024	18/12/2024
2.1.4	Instalaciones PVC RDE 21 2"	02/12/2024	18/12/2024
2.1.5	Punto hidráulico PVC 1/2"	02/12/2024	18/12/2024
2.1.6	Punto hidráulico PVC 3/4"	02/12/2024	18/12/2024
2.1.7	Punto hidráulico PVC 1/2" incluye válvula control paso 1/2" y tapa PVC Blanca 15x15cm	02/12/2024	18/12/2024
2.2	**RED SANITARIA, PLUVIAL, VENTILACION**		
2.2.1	Instalaciones sanitarias PVC 2"	02/12/2024	18/12/2024
2.2.2	Instalaciones sanitarias PVC 4"	02/12/2024	18/12/2024
2.2.3	Instalaciones ventilación PVC 2"	02/12/2024	18/12/2024
2.2.4	Instalaciones ventilación PVC 3"	02/12/2024	18/12/2024
2.2.5	Punto sanitario 4" WC	02/12/2024	18/12/2024
2.2.6	Punto sanitario 2"	02/12/2024	18/12/2024
2.2.7	Suministro e instalación de rejilla de piso en acero inoxidable cuadrada de 10cm salida a tubería 2"	02/12/2024	18/12/2024
2.2.8	Suministro e instalación de tubería de conexión de desagües de aires acondicionados	02/12/2024	18/12/2024
3	**RED ELECTRICA**		
3.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
3.1.1	S.I.P. Salida toma doble GFCI 1F/20AMP en tubería PVC SCH40 1/2", caja galvanizada y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	09/12/2024	18/12/2024

3.1.2	S.I.P. Salida sensor de movimiento tipo interruptor 360° 1F/15AMP En muro, Tubería PVC SCH40 D:1/2", Cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	09/12/2024	18/12/2024
3.1.3	S.I.P Luminaria de sobreponer 400x120 para uso interior, fabricada en lámina de acero COLD ROLLED, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate y difusor lamina acrílico opalizado L11. Producto para instalación de sobreponer, en temperatura de color 5000K flujo lumínico de 4400Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 28.56W.	09/12/2024	18/12/2024
3.1.4	S.I.P. Luminaria tipo bala 72x83 para incrustar, Producto tipo DOWNLIGHT de uso interior fabricado en aluminio inyectado, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate en temperatura de color 6500K flujo lumínico de 550Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 6.00W.	09/12/2024	18/12/2024
3.1.5	S.I.P Luminaria tipo bala GS 15W 5000K	09/12/2024	18/12/2024
3.1.6	S.I.P Letrero lumínico de emergencia SALIDA 90E 300X185X45 2.6W 120-277V SOBREPONER	09/12/2024	18/12/2024
3.1.7	S.I.P Luminaria de emergencia 185X50X108 SOBREPONER 2-BL 2W	09/12/2024	18/12/2024
3.1.8	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP en techo, Tubería D:1/2" SCH40, Caja octogonal y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	09/12/2024	18/12/2024
3.1.9	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP emergencia, Tubería D:1/2 EMT, Caja RADWELL 5800 y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, incluye fijación, Libre de halogenuros, incluye aparato	09/12/2024	18/12/2024
3.1.10	S.I.A. Tablero de circuitos para baños, incluye 6 protecciones de 20A	09/12/2024	18/12/2024
4	**MUROS**		
4.1	Suministro e instalación de muro doble cara en lámina de fibrocemento 8mm. Estructura base 6. incluye estuco y dos manos de pintura	16/12/2024	29/12/2024
4.2	Carteras en lámina de fibrocemento 8mm dos caras, en marco ventana y puertas	16/12/2024	29/12/2024
5	**REPELLOS**		
5.1	Repello de piso y pared con mortero 1:4 espesor 2cm. Incluye aditivo impermeabilizante.	16/12/2024	29/12/2024
5.2	Impermeabilización de losa de entrepiso y muros laterales de terraza, con recubrimiento impermeabilizante acrílico de alto desempeño con tecnología DFX y fibras para impermeabilizar cubiertas	16/12/2024	29/12/2024
6	**ENCHAPES**		
6.1	**PISOS**		
6.1.1	Enchape cerámica de piso estructurado 20.6x92.6cm, uso comercial moderado	16/12/2024	29/12/2024
6.1.2	Enchape cerámica de piso 60x60cm color gris, uso exteriores tráfico comercial	16/12/2024	29/12/2024

6.1.3	Acabado para uniones entre muro y losa de piso en media caña con mortero 1-4 H: 0,07m	23/12/2024	29/12/2024
6.2	**PARED**		
6.2.1	Enchape cerámica de pared color marfil caras diferenciadas 30.1x75.3cm	16/12/2024	29/12/2024
6.2.2	Guarda canto flecha 8 milímetros cromo aluminio mate	23/12/2024	29/12/2024
6.2.3	Suministro e instalación de espejo E= 3mm flotante biselado en sus cuatro lados sobre soporte metálico	26/12/2024	29/12/2024
6.2.4	Mesón en granito artificial verde uva tuba incluye solapa inferior en aglomerado ancho 50cm con melamina, ancho de mesón 0.60m	19/12/2024	29/12/2024
7	**ESTUCOS**		
7.1	Estuco acrílico para exteriores, incluye juntas, filos y dilataciones	02/12/2024	25/12/2024
7.2	Estuco plástico para muros y resanes incluye juntas, filos y dilataciones	02/12/2024	25/12/2024
8	**PINTURA**		
8.1	Pintura de muros en mampostería 3 manos, vinilo tipo 1, lavable	09/12/2024	31/12/2024
8.2	Pintura para exteriores (3 manos) para paredes.	09/12/2024	31/12/2024
8.3	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial ancho 10cm, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, para pavimento rígido	12/12/2024	25/12/2024
8.4	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial, números con circunferencias de 66 y 40cm para carros y motos. imprimación en negro y pintura tráfico vehicular, incluye micro esferas, para pavimento rígido	12/12/2024	25/12/2024
8.5	Aplicación de pintura en frio base solvente para flechas de ingreso y salida, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, sobre pavimento rígido	12/12/2024	25/12/2024
9	**CARPINTERIAS**		
9.1	Suministro e instalación de puerta de dos hojas batientes elaborada en tubular aluminio estriado ANOLOC, incluye chapa pomo de alcoba metálica pasador y argolla para candado. Medidas de cada hoja 0.9mx2.10m (ver plano A-022, P-T3)	19/12/2024	25/12/2024
9.2	Sellado de juntas entre muros y marcos de ventanearía con sellador de juntas de poliuretano.	19/12/2024	25/12/2024
10	**CUBIERTAS Y CIELO RASO**		
10.2	Limpieza, lavado, cambio de amarras y ganchos, aplicación de sellante en amarras de policarbonato alveolar	09/12/2024	22/12/2024
10.3	Suministro e instalación de cielo raso desmontable, láminas de fibra mineral 0,60m x 0,60m, incluye estructura	09/12/2024	22/12/2024
11	**APARATOS SANITARIOS Y DOTACION BAÑOS**		
11.1	Kit Taza sanitaria entrada superior con fluxómetro con sensor, blanco institucional (Incluye Taza Sanitaria para Fluxómetro, asiento sanitario, sensor, sistema conexión entrada superior)	19/12/2024	31/12/2024
11.2	Taza sanitaria alongado, blanco institucional ultra ahorradora (Sanitario con push)	19/12/2024	31/12/2024

11.3	Barra de seguridad Fija Recta en acero inoxidable (baño para personas con movilidad reducida), incluye anclajes	19/12/2024	31/12/2024
11.4	Barra de seguridad abatible (baño para personas con movilidad reducida) incluye anclajes	19/12/2024	31/12/2024
11.5	Lavamanos blanco institucional, para personas con movilidad reducida, incluye anclajes	19/12/2024	31/12/2024
11.6	Lavamanos blanco institucional, para incrustar en mesones	19/12/2024	31/12/2024
11.7	Suministro e instalación de brazo de soporte para lavamanos	19/12/2024	31/12/2024
11.8	Suministro e instalación de grifería para lavamanos y desagüe tipo botella sencillo incluye acople	19/12/2024	31/12/2024
11.9	Construcción lava traperos 70x50x50cm, enchapado.	19/12/2024	31/12/2024
11.10	Kit Orinal arrecife o similar para fluxómetro	19/12/2024	31/12/2024
11.11	Dispensador De Papel Higiénico Acero Inoxidable Diámetro De 26 Cm	19/12/2024	31/12/2024
11.12	Papelera metálica en acero inoxidable según especificaciones	19/12/2024	31/12/2024
11.13	Dispensador de jabón para empotrar en pared, en acero inoxidable, 1.2Litros	19/12/2024	31/12/2024
11.14	Suministro e instalación de divisiones sanitarias a piso en acero inoxidable AISI SAE 304 para baños de uso institucional. Batería completa con tres (3) cubículos para unidades sanitarias. Incluye tornillería y accesorios.	19/12/2024	31/12/2024
11.15	Dispensador De Toallas De Papel En Z Acero Inoxidable De 27x27x10 Cm	19/12/2024	31/12/2024
12	**SEÑALIZACIÓN**		
12.1	Suministro e instalación de placa de señalización de 0,65 x 0,50 m con planimetría salidas de emergencia, en acrílico de 2.4 con impresión full color y regletas en MDF para su instalación.	26/12/2024	31/12/2024
12.2	Suministro e instalación Franjas Guías longitudinales de ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	26/12/2024	31/12/2024
12.3	Suministro e instalación de Punto alerta ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	26/12/2024	31/12/2024
12.4	Suministro e Instalación de Loseta alerta en policarbonato, 20 x 20 cm., Altura total: 5mm, Peso 150 gr, incluye anclaje	26/12/2024	31/12/2024
12.5	Suministro e instalación de letreros luminosos informativos en parqueadero doble cara, ubicado en sótano 1.50x0.40m	26/12/2024	31/12/2024
12.6	Suministro e instalación de letras en acero inoxidable de la frase: PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA y Escudo de la Rama judicial diámetro 50cm, tamaño de letra 30cm cada una, según diseño	26/12/2024	31/12/2024
13	**VARIOS Y ASEO GENERAL**		
13.1	Brigada de aseo	30/12/2024	31/12/2024

TABLA 7. *Programación al contrato de obra.*
Fuente: *Elaboración Propia.*

9. ACTIVIDADES Y CANTIDADES INICIALES

Las actividades para realizarse en condiciones iniciales en la etapa de ejecución se especifican en la siguiente tabla:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1.1	**INICIALES**				
1.1.1	Localización y replanteo arquitectónico, incluye planos récord	M2	332,00	4.020	1.334.640
1.1.2	Instalación y desinstalación de muro una cara drywall, provisional para cerrar las obras, incluye puerta con marco para ingreso de trabajadores	M2	53,00	80.367	4.259.451
1.1.3	Señalización de obra en lona de 60x40cm impresión full color, incluye marco y anclaje	Und	9,00	63.143	568.287
		Sub Total			6.162.378
1.2	**DESMONTES Y RETIROS**				
1.2.1	Desmonte de marcos y puertas, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	57,00	27.472	1.565.904
1.2.2	Desmonte de marco, ventana y vidrio, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	1,00	28.472	28.472
1.2.3	Desmonte de cielo raso en fibra mineral y/o panel yeso y/o fibrocemento, incluye estructura soporte, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	M2	250,00	30.983	7.745.750
1.2.4	Desmonte de Tasas sanitarias, orinales y lavamanos, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	Und	48,00	55.750	2.676.000
1.2.5	Desmonte de instalaciones hidrosanitarias, incluye tuberías y accesorios, regatas y sellos provisionales, cargue a volqueta	Und	72,00	60.060	4.324.320
1.2.6	Rasqueteo, cepillo y limpieza manual de superficies, con el fin de retirar impurezas y capas de pintura existentes.	M2	1017,00	5.059	5.145.003
1.2.7	Retiro de luminarias ubicadas en cielos rasos y pared, incluye trasiego a punto de acopio	UND	46,00	22.534	1.036.564
1.2.8	Retiro de redes eléctricas en piso, techo y pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	GL	1,00	2.323.710	2.323.710
		Sub Total			24.845.723
1.3	**DEMOLICIONES**				
1.3.1	Demolición muro E ≤ 15CM en mampostería maciza o hueca, incluye cortes con pulidora, trasiegos y cargue a volqueta.	M2	220,00	18.665	4.106.300
1.3.2	Demolición de enchape de pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	704,36	15.356	10.816.214

1.3.3	Demolición de enchapes de piso, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	283,00	14.544	4.115.952
1.3.4	Demolición repello de piso, incluye picado Eprom = 0.03m, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	835,00	13.482	11.257.470
1.3.5	Demolición repello de pared, muros mampostería eprom= 0.02m, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	291,80	15.728,5 333333	4.589.649
1.3.6	Cargue, transporte y retiro del material sobrante proveniente de las obras de mantenimiento, hasta el botadero.	M3	234,00	41.793	9.779.562
1.3.7	Demolición de mesones en concreto, recubierto con granito incluye salpicadero	M2	11,00	39.245	431.695
		Sub Total			45.096.842
	TOTAL PRELIMINARES				76.104.943
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
2.1	RED SUMINISTRO AGUA POTABLE				
2.1.1	Instalaciones PVC 1/2" RDE 13.5	ML	95,00	7.881	748.695
2.1.2	Instalaciones PVC 3/4" RDE 21	ML	28,00	11.381	318.668
2.1.3	Instalaciones PVC RDE 21 1"	ML	50,21	12.524	628.830
2.1.4	Instalaciones PVC RDE 21 2"	ML	6,00	28.037	168.222
2.1.5	Punto hidráulico PVC 1/2"	UND	60,00	25.150	1.509.000
2.1.6	Punto hidráulico PVC 3/4"	UND	8,00	27.387	219.096
2.1.7	Punto hidráulico PVC 1/2" incluye válvula control paso 1/2" y tapa PVC Blanca 15x15cm	UND	18,00	62.356	1.122.408
		Sub Total			4.714.919
2.2	**RED SANITARIA, PLUVIAL, VENTILACION**				
2.2.1	Instalaciones sanitarias PVC 2"	ML	58,00	26.100	1.513.800
2.2.2	Instalaciones sanitarias PVC 4"	ML	119,00	43.702	5.200.538
2.2.3	Instalaciones ventilación PVC 2"	ML	183,00	21.009	3.844.647
2.2.4	Instalaciones ventilación PVC 3"	ML	35,00	32.923	1.152.305
2.2.5	Punto sanitario 4" WC	UND	32,00	47.820	1.530.240
2.2.6	Punto sanitario 2"	UND	44,00	35.262	1.551.528
2.2.7	Suministro e instalación de rejilla de piso en acero inoxidable cuadrada de 10cm salida a tubería 2"	UND	24,00	50.333	1.207.992
2.2.8	Suministro e instalación de tubería de conexión de desagües de aires acondicionados	ML	36,00	21.009	756.324
		Sub Total			16.757.374
	TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				21.472.293
3	**RED ELECTRICA**				
3.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
3.1.1	S.I.P. Salida toma doble GFCI 1F/20AMP en tubería PVC SCH40 1/2", caja galvanizada y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	16,00	178.052	2.848.832

3.1.2	S.I.P. Salida sensor de movimiento tipo interruptor 360° 1F/15AMP En muro, Tubería PVC SCH40 D:1/2", Cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	32,00	144.299	4.617.568
3.1.3	S.I.P Luminaria de sobreponer 400x120 para uso interior, fabricada en lámina de acero COLD ROLLED, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate y difusor lamina acrílico opalizado L11. Producto para instalación de sobreponer, en temperatura de color 5000K flujo lumínico de 4400Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 28.56W.	Und	4,00	441.238	1.764.952
3.1.4	S.I.P. Luminaria tipo bala 72x83 para incrustar, Producto tipo DOWNLIGHT de uso interior fabricado en aluminio inyectado, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate en temperatura de color 6500K flujo lumínico de 550Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 6.00W.	Und	40,00	67.839	2.713.560
3.1.5	S.I.P Luminaria tipo bala GS 15W 5000K	Und	12,00	150.791	1.809.492
3.1.6	S.I.P Letrero lumínico de emergencia SALIDA 90E 300X185X45 2.6W 120-277V SOBREPONER	UND	20,00	111.758	2.235.160
3.1.7	S.I.P Luminaria de emergencia 185X50X108 SOBREPONER 2-BL 2W	UND	40,00	117.027	4.681.080
3.1.8	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP en techo, Tubería D:1/2" SCH40, Caja octogonal y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	66,00	127.969	8.445.954
3.1.9	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP emergencia, Tubería D:1/2 EMT, Caja RADWELL 5800 y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, incluye fijación, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	45,00	185.338	8.340.210
3.1.10	S.I.A. Tablero de circuitos para baños, incluye 6 protecciones de 20A	UND	4,00	860.000	3.440.000
		Sub Total			40.896.808
	TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS				40.896.808
4	**MUROS**				
4.1	Suministro e instalación de muro doble cara en lámina de fibrocemento 8mm. Estructura base 6. incluye estuco y dos manos de pintura	M2	84,00	178.468	14.991.312
4.2	Carteras en lámina de fibrocemento 8mm dos caras, en marco ventana y puertas	ML	163,80	71.565	11.722.347
		Sub Total			26.713.659
	TOTAL MAMPOSTERIA				26.713.659
5	**REPELLOS**				

5.1	Repello de piso y pared con mortero 1:4 espesor 2cm. Incluye aditivo impermeabilizante.	M2	1374,87	46.194	63.510.837
5.2	Impermeabilización de losa de entrepiso y muros laterales de terraza, con recubrimiento impermeabilizante acrílico de alto desempeño con tecnología DFX y fibras para impermeabilizar cubiertas	M2	660,00	53.308	35.183.280
		Sub Total			98.694.117
	TOTAL REPELLOS				98.694.117
6	ENCHAPES				
6.1	PISOS				
6.1.1	Enchape cerámica de piso estructurado 20.6x92.6cm, uso comercial moderado	M2	258,00	137.958	35.593.164
6.1.2	Enchape cerámica de piso 60x60cm color gris, uso exteriores tráfico comercial	M2	88,00	104.329	9.180.952
6.1.3	Acabado para uniones entre muro y losa de piso en media caña con mortero 1-4 H: 0,07m	ML	85,00	28.430	2.416.550
		Sub Total			47.190.666
6.2	PARED				
6.2.1	Enchape cerámica de pared color marfil caras diferenciadas 30.1x75.3cm	M2	457,00	118.370	54.095.090
6.2.2	Guarda canto flecha 8 milímetros cromo aluminio mate	ML	31,00	13.512	418.872
6.2.3	Suministro e instalación de espejo E= 3mm flotante biselado en sus cuatro lados sobre soporte metálico	M2	20,00	376.443	7.528.860
6.2.4	Mesón en granito artificial verde uva tuba incluye solapa inferior en aglomerado ancho 50cm con melamina, ancho de mesón 0.60m	ML	17,00	1.193.000	20.281.000
		Sub Total			82.323.822
	TOTAL ENCHAPES				129.514.488
7	ESTUCOS				
7.1	Estuco acrílico para exteriores, incluye juntas, filos y dilataciones	M2	320,00	22.628	7.240.960
7.2	Estuco plástico para muros y resanes incluye juntas, filos y dilataciones	M2	973,00	17.313	16.845.549
		Sub Total			24.086.509
	TOTAL ESTUCOS				24.086.509
8	PINTURA				
8.1	Pintura de muros en mampostería 3 manos, vinilo tipo 1, lavable	M2	5137,00	13.301	68.327.237
8.2	Pintura para exteriores (3 manos) para paredes.	M2	1280,00	28.775	36.832.000
8.3	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial ancho 10cm, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, para pavimento rígido	ML	173,52	15.000	2.602.800

8.4	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial, números con circunferencias de 66 y 40cm para carros y motos. imprimación en negro y pintura tráfico vehicular, incluye micro esferas, para pavimento rígido	Und	42,00	32.000	1.344.000
8.5	Aplicación de pintura en frio base solvente para flechas de ingreso y salida, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, sobre pavimento rígido	M2	27,00	62.000	1.674.000
		Sub Total			110.780.037
	TOTAL PINTURA				110.780.037
9	CARPINTERIAS				
9.1	Suministro e instalación de puerta de dos hojas batientes elaborada en tubular aluminio estriado ANOLOC, incluye chapa pomo de alcoba metálica pasador y argolla para candado. Medidas de cada hoja 0.9mx2.10m (ver plano A-022, P-T3)	UND	1,00	2.469.971	2.469.971
9.2	Sellado de juntas entre muros y marcos de ventanería con sellador de juntas de poliuretano.	ML	367,00	11.494	4.218.298
		Sub Total			6.688.269
	TOTAL CARPINTERIAS				6.688.269
10	CUBIERTAS Y CIELO RASO				
10.2	Limpieza, lavado, cambio de amarras y ganchos, aplicación de sellante en amarras de policarbonato alveolar	M2	33,00	34.060	1.123.980
10.3	Suministro e instalación de cielo raso desmontable, láminas de fibra mineral 0,60m x 0,60m, incluye estructura	M2	220,00	92.868	20.430.960
		Sub Total			21.554.940
TOTAL CUBIERTAS Y CIELO RASO					21.554.940
11	APARATOS SANITARIOS Y DOTACION BAÑOS				
11.1	Kit Taza sanitaria entrada superior con fluxómetro con sensor, blanco institucional (Incluye Taza Sanitaria para Fluxómetro, asiento sanitario, sensor, sistema conexión entrada superior)	UND	4	3.931.160	15.724.640
11.2	Taza sanitaria alongado, blanco institucional ultra ahorradora (Sanitario con push)	UND	28	1.278.084	35.786.352
11.3	Barra de seguridad Fija Recta en acero inoxidable (baño para personas con movilidad reducida), incluye anclajes	UND	4	482.550	1.930.200
11.4	Barra de seguridad abatible (baño para personas con movilidad reducida) incluye anclajes	UND	4	667.550	2.670.200

11.5	Lavamanos blanco institucional, para personas con movilidad reducida, incluye anclajes	UND	4	575.674	2.302.696
11.6	Lavamanos blanco institucional, para incrustar en mesones	UND	20	341.287	6.825.740
11.7	Suministro e instalación de brazo de soporte para lavamanos	Juego	4	300.000	1.200.000
11.8	Suministro e instalación de grifería para lavamanos y desagüe tipo botella sencillo incluye acople	UND	24	64.635	1.551.240
11.9	Construcción lava traperos 70x50x50cm, enchapado.	UND	4	647.450	2.589.800
11.10	Kit Orinal arrecife o similar para fluxómetro	UND	8	1.336.000	10.688.000
11.11	Dispensador De Papel Higiénico Acero Inoxidable Diámetro De 26 Cm	UND	16	163.813	2.621.008
11.12	Papelera metálica en acero inoxidable según especificaciones	UND	32	551.813	17.658.016
11.13	Dispensador de jabón para empotrar en pared, en acero inoxidable, 1.2Litros	UND	16	263.643	4.218.288
11.14	Suministro e instalación de divisiones sanitarias a piso en acero inoxidable AISI SAE 304 para baños de uso institucional. Batería completa con tres (3) cubículos para unidades sanitarias. Incluye tornillería y accesorios.	UND	8,00	8.760.190	70.081.520
11.15	Dispensador De Toallas De Papel En Z Acero Inoxidable De 27x27x10 Cm	UND	16,00	193.813	3.101.008
		Sub Total			178.948.708
TOTAL APARATOS SANITARIOS				178.948.708	
12	SEÑALIZACIÓN				
12.1	Suministro e instalación de placa de señalización de 0,65 x 0,50 m con planimetría salidas de emergencia, en acrílico de 2.4 con impresión full color y regletas en MDF para su instalación.	UND	5,00	238.429	1.192.145

12.2	Suministro e instalación Franjas Guías longitudinales de ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	600,00	11.158	6.694.800
12.3	Suministro e instalación de Punto alerta ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	2100,00	5.886	12.360.600
12.4	Suministro e Instalación de Loseta alerta en policarbonato, 20 x 20 cm., Altura total: 5mm, Peso 150 gr, incluye anclaje	UND	15,00	45.015	675.225
12.5	Suministro e instalación de letreros luminosos informativos en parqueadero doble cara, ubicado en sótano 1.50x0.40m	UND	3,00	600.000	1.800.000
12.6	Suministro e instalación de letras en acero inoxidable de la frase: PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA y Escudo de la Rama judicial diámetro 50cm, tamaño de letra 30cm cada una, según diseño	UND	1,00	6.000.000	6.000.000
		Sub Total			28.722.770
		TOTAL SEÑALIZACIÓN		28.722.770	
13	VARIOS Y ASEO GENERAL				
13.1	Brigada de aseo	Persona/ mes	6,00	2.397.504	14.385.024
		Sub Total			14.385.024
		TOTAL VARIOS Y ASEO		14.385.024	
TOTAL COSTO DIRECTO:					778.562.565
ADMINISTRACIÓN (18.73%)					145.824.768
IMPREVISTOS (3%)					23.356.877
UTILIDAD (5%)					38.928.128
IVA (19%)					7.396.344
TOTAL PRESUPUESTO:					994.068.682

TABLA 8. *Cantidades iniciales del contrato de obra.*
Fuente: *Elaboración Propia.*

10. ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS EN EL MES

En este periodo se registró un avance por debajo de lo programado inicialmente de actividades físicas, por lo tanto, se informa de un avance acumulado ejecutado del 100.00% que corresponde a una inversión de $ 1.433.190.807 un porcentaje programado acumulado de 100.00% que

corresponde a una inversión de $ 1.433.190.807 con respecto del valor contratado.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT EJECUTADAS	VR TOTAL EJECUTADAS
1	**PRELIMINARES**						
1.1	**INICIALES**						
1.1.1	Localización y replanteo arquitectónico, incluye planos récord	M2	332,00	4.020	1.334.640	306,00	1.182.384
1.1.2	Instalación y desinstalación de muro una cara drywall, provisional para cerrar las obras, incluye puerta con marco para ingreso de trabajadores	M2	53,00	80.367	4.259.451	22,00	1.699.478
1.1.3	Señalización de obra en lona de 60x40cm impresión full color, incluye marco y anclaje	UND	9,00	63.143	568.287	9,00	546.237
				Sub Total	**6.162.378**		**3.428.099**
1.2	**DESMONTES Y RETIROS**						
1.2.1	Desmonte de marcos y puertas, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	57,00	27.472	1.565.904	55,00	1.452.330
1.2.2	Desmonte de marco, ventana y vidrio, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	1,00	28.472	28.472	1,00	27.367
1.2.3	Desmonte de cielo raso en fibra mineral y/o panel yeso y/o fibrocemento, incluye estructura soporte, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	M2	250,00	30.983	7.745.750	250,00	7.445.250
1.2.4	Desmonte de Tasas sanitarias, orinales y lavamanos, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	UND	48,00	55.750	2.676.000	60,00	3.215.220
1.2.5	Desmonte de instalaciones hidrosanitarias, incluye tuberías y accesorios, regatas y sellos provisionales, cargue a volqueta	UND	72,00	60.060	4.324.320	70,00	4.041.100
1.2.6	Rasqueteo, cepillo y limpieza manual de superficies, con el fin de retirar impurezas y capas de pintura existentes.	M2	1017,00	5.059	5.145.003	1.911,00	9.293.193
1.2.7	Retiro de luminarias ubicadas en cielos rasos y pared, incluye trasiego a punto de acopio	UND	46,00	22.534	1.036.564	79,00	1.711.140
1.2.8	Retiro de redes eléctricas en piso, techo y pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	GL	1,00	2.323.710	2.323.710	1,00	2.233.550
				Sub Total	**24.845.723**		**35.163.581**
1.3	**DEMOLICIONES**						

1.3.1	Demolición muro E ≤ 15CM en mampostería maciza o hueca, incluye cortes con pulidora, trasiegos y cargue a volqueta.	M2	220,00	18.665	4.106.300	192,00	3.444.672
1.3.2	Demolición de enchape de pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	704,36	15.356	10.816.214	726,00	10.715.760
1.3.3	Demolición de enchapes de piso, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	283,00	14.544	4.115.952	226,00	3.159.480
1.3.4	Demolición repello de piso, incluye picado Eprom = 0.03m, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	835,00	13.482	11.257.470	274,00	3.550.766
1.3.5	Demolición repello de pared, muros mampostería eprom= 0.02m, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	291,80	15.728,53	4.589.649	723,00	10.931.037
1.3.6	Cargue, transporte y retiro del material sobrante proveniente de las obras de mantenimiento, hasta el botadero.	M3	234,00	41.793	9.779.562	259,00	10.404.289
1.3.7	Demolición de mesones en concreto, recubierto con granito incluye salpicadero	M2	11,00	39.245	431.695	11,00	414.942
				Sub Total	**45.096.842**		**42.620.946**
				TOTAL PRELIMINARES	**76.104.943**		**81.212.626**
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**						
2.1	**RED SUMINISTRO AGUA POTABLE**						
2.1.1	Instalaciones PVC 1/2" RDE 13.5	ML	95,00	7.881	748.695	159,00	1.204.425
2.1.2	Instalaciones PVC 3/4" RDE 21	ML	28,00	11.381	318.668	28,00	306.292
2.1.3	Instalaciones PVC RDE 21 1"	ML	50,21	12.524	628.830	50,20	604.308
2.1.4	Instalaciones PVC RDE 21 2"	ML	6,00	28.037	168.222	6,00	161.694
2.1.5	Punto hidráulico PVC 1/2"	UND	60,00	25.150	1.509.000	68,00	1.643.832
2.1.6	Punto hidráulico PVC 3/4"	UND	8,00	27.387	219.096	8,00	210.592
2.1.7	Punto hidráulico PVC 1/2" incluye válvula control paso 1/2" y tapa PVC Blanca 15x15cm	UND	18,00	62.356	1.122.408	18,00	1.078.866
				Sub Total	**4.714.919**		**5.210.009**
2.2	**RED SANITARIA, PLUVIAL, VENTILACION**						
2.2.1	Instalaciones sanitarias PVC 2"	ML	58,00	26.100	1.513.800	66,00	1.655.742
2.2.2	Instalaciones sanitarias PVC 4"	ML	119,00	43.702	5.200.538	78,00	3.276.468
2.2.3	Instalaciones ventilación PVC 2"	ML	183,00	21.009	3.844.647	30,00	605.820
2.2.4	Instalaciones ventilación PVC 3"	ML	35,00	32.923	1.152.305	0,00	-
2.2.5	Punto sanitario 4" WC	UND	32,00	47.820	1.530.240	34,00	1.562.810
2.2.6	Punto sanitario 2"	UND	44,00	35.262	1.551.528	40,00	1.355.760
2.2.7	Suministro e instalación de rejilla de piso en acero inoxidable cuadrada de 10cm salida a tubería 2"	UND	24,00	50.333	1.207.992	28,00	1.354.640

2.2.8	Suministro e instalación de tubería de conexión de desagües de aires acondicionados	ML	36,00	21.009	756.324	3,00	60.582
				Sub Total	**16.757.374**		**9.871.822**
				TOTAL, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	**21.472.293**		**15.081.831**
3	**RED ELECTRICA**						
3.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						
3.1.1	S.I.P. Salida toma doble GFCI 1F/20AMP en tubería PVC SCH40 1/2", caja galvanizada y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	16,00	178.052	2.848.832	17,00	2.909.448
3.1.2	S.I.P. Salida sensor de movimiento tipo interruptor 360° 1F/15AMP En muro, Tubería PVC SCH40 D:1/2", Cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	32,00	144.299	4.617.568	-	-
3.1.3	S.I.P Luminaria de sobreponer 400x120 para uso interior, fabricada en lámina de acero COLD ROLLED, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate y difusor lamina acrílico opalizado L11. Producto para instalación de sobreponer, en temperatura de color 5000K flujo lumínico de 4400Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 28.56W.	UND	4,00	441.238	1.764.952	4,00	1.696.472
3.1.4	S.I.P. Luminaria tipo bala 72x83 para incrustar, Producto tipo DOWNLIGHT de uso interior fabricado en aluminio inyectado, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate en temperatura de color 6500K flujo lumínico de 550Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 6.00W.	UND	40,00	67.839	2.713.560	43,00	2.803.901
3.1.5	S.I.P Luminaria tipo bala GS 15W 5000K	UND	12,00	150.791	1.809.492	11,00	1.594.340
3.1.6	S.I.P Letrero lumínico de emergencia SALIDA 90E 300X185X45 2.6W 120-277V SOBREPONER	UND	20,00	111.758	2.235.160	0,00	-
3.1.7	S.I.P Luminaria de emergencia 185X50X108 SOBREPONER 2-BL 2W	UND	40,00	117.027	4.681.080	17,00	1.912.262
3.1.8	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP en techo, Tubería D:1/2" SCH40, Caja octogonal y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	66,00	127.969	8.445.954	59,00	7.257.236

3.1.9	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP emergencia, Tubería D:1/2 EMT, Caja RADWELL 5800 y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, incluye fijación, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	45,00	185.338	8.340.210	17,00	3.028.499
3.1.10	S.I.A. Tablero de circuitos para baños, incluye 6 protecciones de 20A	UND	4,00	860.000	3.440.000	5,00	4.133.160
				Sub Total	**40.896.808**		**25.335.318**
				TOTAL, INSTALACIONES ELECTRICAS	**40.896.808**		**25.335.318**
4	**MUROS**						
4.1	Suministro e instalación de muro doble cara en lámina de fibrocemento 8mm. Estructura base 6. incluye estuco y dos manos de pintura	M2	84,00	178.468	14.991.312	95,00	16.296.585
4.2	Carteras en lámina de fibrocemento 8mm dos caras, en marco ventana y puertas	ML	163,80	71.565	11.722.347	76,00	5.227.888
				Sub Total	**26.713.659**		**21.524.473**
				TOTAL, MAMPOSTERIA	**26.713.659**		**21.524.473**
5	**REPELLOS**						
5.1	Repello de piso y pared con mortero 1:4 espesor 2cm. Incluye aditivo impermeabilizante.	M2	1374,87	46.194	63.510.837	454.00	20.158.508
5.2	Impermeabilización de losa de entrepiso y muros laterales de terraza, con recubrimiento impermeabilizante acrílico de alto desempeño con tecnología DFX y fibras para impermeabilizar cubiertas	M2	660,00	53.308	35.183.280		
				Sub Total	**98.694.117**		**20.158.508**
				TOTAL, REPELLOS	**98.694.117**		**20.158.508**
6	**ENCHAPES**						
6.1	**PISOS**						
6.1.1	Enchape cerámica de piso estructurado 20.6x92.6cm, uso comercial moderado	M2	258,00	137.958	35.593.164	189,00	25.062.345
6.1.2	Enchape cerámica de piso 60x60cm color gris, uso exteriores tráfico comercial	M2	88,00	104.329	9.180.952	85,00	8.523.885
6.1.3	Acabado para uniones entre muro y losa de piso en media caña con mortero 1-4 H: 0,07m	ML	85,00	28.430	2.416.550	0,00	-
				Sub Total	**7.190.666**		**33.586.230**
6.2	**PARED**						
6.2.1	Enchape cerámica de pared color marfil caras diferenciadas 30.1x75.3cm	M2	457,00	118.370	54.095.090	499,00	56.774.723
6.2.2	Guarda canto flecha 8 milímetros cromo aluminio mate	ML	31,00	13.512	418.872	210,00	2.727.480
6.2.3	Suministro e instalación de espejo E= 3mm flotante biselado en sus cuatro lados sobre soporte metálico	M2	20,00	376.443	7.528.860	0,00	-

6.2.4	Mesón en granito artificial verde uva tuba incluye solapa inferior en aglomerado ancho 50cm con melamina, ancho de mesón 0.60m	ML	17,00	1.193.000	20.281.000	16,00	18.347.392
				Sub Total	**2.323.822**		**77.849.595**
				TOTAL, ENCHAPES	**129.514.488**		**111.435.825**
7	**ESTUCOS**						
7.1	Estuco acrílico para exteriores, incluye juntas, filos y dilataciones	M2	320,00	22.628	7.240.960	319,00	6.938.250
7.2	Estuco plástico para muros y resanes incluye juntas, filos y dilataciones	M2	973,00	17.313	16.845.549	1.748,00	29.088.468
				Sub Total	**24.086.509**		**36.026.718**
				TOTAL, ESTUCOS	**24.086.509**		**36.026.718**
8	**PINTURA**						
8.1	Pintura de muros en mampostería 3 manos, vinilo tipo 1, lavable	M2	5137,00	13.301	68.327.237	5426,00	69.371.410
8.2	Pintura para exteriores (3 manos) para paredes.	M2	1280,00	28.775	36.832.000	1053,00	29.124.927
8.3	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial ancho 10cm, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, para pavimento rígido	ML	173,52	15.000	2.602.800	369,00	5.320.242
8.4	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial, números con circunferencias de 66 y 40cm para carros y motos. imprimación en negro y pintura tráfico vehicular, incluye micro esferas, para pavimento rígido	UND	42,00	32.000	1.344.000	39,00	1.199.562
8.5	Aplicación de pintura en frio base solvente para flechas de ingreso y salida, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, sobre pavimento rígido	M2	27,00	62.000	1.674.000	2,00	119.188
				Sub Total	**110.780.037**		**105.135.329**
				TOTAL, PINTURA	**110.780.037**		**105.135.329**
9	**CARPINTERIAS**						
9.1	Suministro e instalación de puerta de dos hojas batientes elaborada en tubular aluminio estriado ANOLOC, incluye chapa pomo de alcoba metálica pasador y argolla para candado. Medidas de cada hoja 0.9mx2.10m (ver plano A-022, P-T3)	UND	1,00	2.469.971	2.469.971		-
9.2	Sellado de juntas entre muros y marcos de ventanería con sellador de juntas de poliuretano.	ML	367,00	11.494	4.218.298	238,00	2.629.424
				Sub Total	**6.688.269**		**2.629.424**
				TOTAL, CARPINTERIAS	**6.688.269**		**2.629.424**

10	**CUBIERTAS Y CIELO RASO**						
10.2	Limpieza, lavado, cambio de amarras y ganchos, aplicación de sellante en amarras de policarbonato alveolar	M2	33,00	34.060	1.123.980	79,00	2.586.302
10.3	Suministro e instalación de cielo raso desmontable, láminas de fibra mineral 0,60m x 0,60m, incluye estructura	M2	220,00	92.868	20.430.960	219,00	19.549.035
				Sub Total	**21.554.940**		**22.135.337**
				TOTAL, CUBIERTAS Y CIELO RASO	**21.554.940**		**22.135.337**
11	**APARATOS SANITARIOS Y DOTACION BAÑOS**						
11.1	Kit Taza sanitaria entrada superior con fluxómetro con sensor, blanco institucional (Incluye Taza Sanitaria para Fluxómetro, asiento sanitario, sensor, sistema conexión entrada superior)	UND	4	3.931.160	15.724.640	4,00	15.114.524
11.2	Taza sanitaria alongado, blanco institucional ultra ahorradora (Sanitario con push)	UND	28	1.278.084	35.786.352	29,00	35.626.326
11.3	Barra de seguridad Fija Recta en acero inoxidable (baño para personas con movilidad reducida), incluye anclajes	UND	4	482.550	1.930.200	4,00	1.855.308
11.4	Barra de seguridad abatible (baño para personas con movilidad reducida) incluye anclajes	UND	4	667.550	2.670.200	4,00	2.566.596
11.5	Lavamanos blanco institucional, para personas con movilidad reducida, incluye anclajes	UND	4	575.674	2.302.696	4,00	2.213.352
11.6	Lavamanos blanco institucional, para incrustar en mesones	UND	20	341.287	6.825.740	22,00	7.216.990
11.7	Suministro e instalación de brazo de soporte para lavamanos	JUEGO	4	300.000	1.200.000	4,00	1.153.440
11.8	Suministro e instalación de grifería para lavamanos y desagüe tipo botella sencillo incluye acople	UND	24	64.635	1.551.240	26,00	1.615.302
11.9	Construcción lava traperos 70x50x50cm, enchapado.	UND	4	647.450	2.589.800	4,00	2.489.316
11.10	Kit Orinal arrecife o similar para fluxómetro	UND	8	1.336.000	10.688.000	7,00	8.989.141
11.11	Dispensador De Papel Higiénico Acero Inoxidable Diámetro De 26 Cm	UND	16	163.813	2.621.008	17,00	2.676.769
11.12	Papelera metálica en acero inoxidable según especificaciones	UND	32	551.813	17.658.016	33,00	17.503.299
11.13	Dispensador de jabón para empotrar en pared, en acero inoxidable, 1.2Litros	UND	16	263.643	4.218.288	17,00	4.308.038
11.14	Suministro e instalación de divisiones sanitarias a piso en acero inoxidable AISI SAE 304 para baños de uso institucional. Batería completa con tres (3) cubículos para unidades	UND	8,00	8.760.190	70.081.520	7,00	58.942.065

	sanitarias. Incluye tornillería y accesorios.						
11.15	Dispensador De Toallas De Papel En Z Acero Inoxidable De 27x27x10 Cm	UND	16,00	193.813	3.101.008	17,00	3.166.981
				Sub Total	**178.948.708**		**165.437.447**
				TOTAL, APARATOS SANITARIOS	**178.948.708**		**165.437.447**
12	**SEÑALIZACIÓN**						
12.1	Suministro e instalación de placa de señalización de 0,65 x 0,50 m con planimetría salidas de emergencia, en acrílico de 2.4 con impresión full color y regletas en MDF para su instalación.	UND	5,00	238.429	1.192.145	0,00	-
12.2	Suministro e instalación Franjas Guías longitudinales de ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	600,00	11.158	6.694.800	558,00	5.984.550
12.3	Suministro e instalación de Punto alerta ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	2100,00	5.886	12.360.600	1708,00	9.663.864
12.4	Suministro e Instalación de Loseta alerta en policarbonato, 20 x 20 cm., Altura total: 5mm, Peso 150 gr, incluye anclaje	UND	15,00	45.015	675.225	9,00	389.412
12.5	Suministro e instalación de letreros luminosos informativos en parqueadero doble cara, ubicado en sótano 1.50x0.40m	UND	3,00	600.000	1.800.000	0,00	-
12.6	Suministro e instalación de letras en acero inoxidable de la frase: PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA y Escudo de la Rama judicial diámetro 50cm, tamaño de letra 30cm cada una, según diseño	UND	1,00	6.000.000	6.000.000	0,00	-
				Sub Total	**28.722.770**		**16.037.826**
				TOTAL, SEÑALIZACIÓN	**28.722.770**		**16.037.826**
13	**VARIOS Y ASEO GENERAL**						
13.1	Brigada de aseo	PERSONA/MES	6,00	2.397.504	14.385.024	7,00	16.131.367
				Sub Total	**14.385.024**		**16.131.367**
				TOTAL, VARIOS Y ASEO	**14.385.024**		**16.131.367**
14	**ÍTEMS NO PREVISTOS**						
14.1	Demolición de estructura de concreto, incluye trasiegos y cargue a volqueta	ML	80,10	39.294	3.147.449	80,10	3.147.449
14.2	Demolición losa de piso y contrapiso Eprom = 0.08m, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	205,51	29.863	6.137.145	205,51	6.137.145
14.3	Retiro de manto asfaltico	M2	610,98	15.729	9.610.104	0,00	-
14.4	Retiro de redes eléctricas en piso, techo y pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	UND	14,00	98.932	1.385.048	14,00	1.385.048

14.5	Desmonte luminaria 60x60 oficinas y balas circulares corredores y zonas comunes, incluye trasiego interno.	UND	446,00	10.974	4.894.404	0,00	-
14.6	Suministro e instalación de cielo raso en PVC. Incluye estructura.	M2	63,93	100.521	6.426.308	63,93	6.426.308
14.7	Reparación de grietas y aberturas Superficiales en losa de terraza con aditivo sellador	ML	25,00	130.348	3.258.700	10,00	1.303.480
14.8	Repello de piso con mortero 1:4 espesor 3cm. Incluye aditivo impermeabilizante.	M2	493,67	55.923	27.607.507	240,04	13.423.757
14.9	Reposición de losa de piso en concreto 3000 PSI Eprom = 0.08m	M2	245,12	69.658	17.074.569	245,12	17.074.569
14.10	Reposición de tapa Pluvial con herraje y refuerzo	UND	1,00	264.537	264.537	1,00	264.537
14.11	Suministro e instalación de acrílico para puertas	M2	3,55	138.757	492.587	0,00	-
14.12	Suministro e instalación de cubierta en teja UPVC, Incluye estructura metalica de soporte	M2	44,24	162.791	7.201.874	44,24	7.201.874
14.13	Suministro e instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o superior 3mm	M2	575,70	103.741	59.723.694		
14.14	Pintura esmalte sintético para barandas metálicas	ML	27,60	56.206	1.551.286		
14.15	Suministro e instalación de mueble Recibidor en madera estilo melamina RH antihumedad 15mm según diseño	UND	1,00	2.637.642	2.637.642		
14.16	Suministro e instalación de mueble en melamina RH antihumedad 15mm para lavamanos	UND	4,00	593.255	2.373.020	4,00	2.373.020
14.17	Suministro e instalación de Mueble de trabajo COWORKING abatible en melamina e=7cm. Incluye estructura de soporte.	ML	6,50	414.548	2.694.562		
14.18	Suministro e instalación de puerta en aluminio	M2	20,31	734.259	14.912.800	20,31	14.912.800
14.19	Mantenimiento, reparación e instalación de Puerta de Acceso principal en vidrio templado 10mm color bronce. Incluye accesorios, estructura de soporte, y cerraduras en acero inoxidable.	UND	1,00	5.161.294	5.161.294		
14.20	Suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable AISI SAE 304 para baños de uso institucional. División orinales. Incluye tornillería y accesorios.	UND	4,00	1.240.316	4.961.264	3,00	3.720.948
14.21	Suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable AISI SAE 304 para baños de uso institucional. Batería con dos (2) cubículos para unidades sanitarias. Incluye tornillería y accesorios.	UND	2,00	4.959.058	9.918.116	1,00	4.959.058

14.22	Suministro e instalación de luminaria de incrustar 2810x33x30, en temperatura de color 5000K flujo lumínico de 4497Lm con sistema de control ON/OFF - CINTA, con potencia máxima de 48.20W.	UND	8,00	452.357	3.618.856	7,00	3.166.499
14.23	Suministro e instalación de luminaria de incrustar/sobreponer 2000x33x30, en temperatura de color 4000K flujo lumínico de 2998Lm con sistema de control ON/OFF - CINTA, con potencia máxima de 32.13W.	UND	12,00	424.401	5.092.812		
14.24	Suministro e instalación de luminaria de incrustar 605x605x70, en temperatura de color 5000K flujo lumínico de 6400Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 45.22W.	UND	139,00	438.739	60.984.721		
14.25	Suministro e instalación de luminaria de incrustar 605x605x70, en temperatura de color 5000K flujo lumínico de 4400Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 28.56W.	UND	75,00	429.660	32.224.500		
14.26	Suministro e instalación de luminaria de incrustar 605x605x70, en temperatura de color 5000K flujo lumínico de 2200Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 14.28W.	UND	103,00	418.264	43.081.192		
14.27	S.I.P. Salida sensor de movimiento 360° 1F/15AMP En techo, Tubería PVC SCH40 D:1/2", Cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	26,00	195.815	5.091.190	24,00	4.699.560
14.28	S.I.P. Salida toma doble en tubería PVC SCH40 1/2", caja y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	19,00	124.420	2.363.980	19,00	2.363.980
14.29	S.I.P. Salida interruptor sencillo en tubería PVC SCH40 1/2", caja y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	3,00	122.818	368.454	3,00	368.454
14.30	Suministro e instalación de Acometida Eléctrica, Tubería D:1/2 EMT, cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, incluye fijación, Libre de halogenuros.	ML	89,00	52.474	4.670.186	89,00	4.670.186
14.31	Suministro e instalación de tapete piso lamina en caucho para gimnasio	M2	72,06	110.386	7.954.415	50,44	5.567.870
14.32	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados.	M3	1,00	4.653.417	4.653.417	1,00	4.653.417

14.33	Resanes de humedades con aditivo impermeabilizante	M2	32,26	48.170	1.553.964	32,26	1.553.964
14.34	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada	ML	9,10	139.586	1.270.233	9,10	1.270.233
14.35	Suministro e instalación de bajante aguas lluvias tubería 4"	ML	10,00	51.756	517.560	10,00	517.560
14.36	Suministro e instalación de cinta asfáltica para resane de filtraciones	ML	20,00	35.817	716.340	20,00	716.340
14.37	Suministro e instalación de flanche en lamina galvanizada	ML	10,00	32.696	326.960	10,00	326.960
14.38	Suministro e instalación de Topes para zona de parqueo	UND	2,00	60.578	121.156	2,00	121.156
14.39	Retiro e instalación de Topes para zona de parqueo	UND	14,00	24.886	348.404	14,00	348.404
14.40	Suministro e instalación de placa de señalización con base en madera y ranura para intercambio de lamina en aluminio dorada sublimada interna. 0,30m x 0,18m. Incluye desmonte de placa actual.	UND	37,00	105.345	3.897.765		
14.41	Suministro e instalación de placa de señalización ovalada de 0,13m x 0,07m, con base en MDF color a elección y numeración de oficina (3 números) en lamina flexibras dorada. Incluye desmonte de placa actual.	UND	37,00	26.494	980.278		
14.42	Suministro e instalación de placa de señalización en acrílico 0,30m x 0,15m, impresión full color. Incluye dilatadores.	UND	16,00	51.868	829.888		
14.43	Suministro e instalación de ducha	UND	2,00	131.653	263.306		
14.44	Base en concreto para soporte de banderas, incluye mástil metálico.	GL	1,00	423.525	423.525	1,00	423.525
14.45	Recorrido de cielo raso, incluye ajuste de estructura y reemplazo de paneles en panel yeso de 0,60m x 0,60m en espacios libres por retiro de luminarias existentes	UND	134,00	39.393	5.278.662		
				Sub Total	**378.065.674**		**113.128.358**
				TOTAL, COSTO DIRECTO:	1.122.486.534		1.093.696.972
				ADMINISTRACIÓN (18.73%)	210.241.728		204.849.443
				IMPREVISTOS (3%)	33.674.596		32.810.909
				UTILIDAD (5%)	56.124.327		54.684.849
				IVA (19%)	10.663.622		10.390.121
				TOTAL, PRESUPUESTO:	**1.433.190.807**		**1.433.190.807**

TABLA 9. *Cantidades ejecutadas del contrato de obra.*
Fuente: *Elaboración Propia.*

11. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las obras se vienen ejecutando se efectúan de acuerdo con las especificaciones técnicas indicadas en el proyecto y a los diseños y planos suministrados por la entidad. A continuación, se resume las actividades que se llevaron a cabo entre el 1 septiembre al 5 de septiembre del 2025.

ítem 3.1.4 S.I.P. Luminaria tipo bala 72x83 para incrustar, Producto tipo DOWNLIGHT de uso interior fabricado en aluminio inyectado, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate en temperatura de color 6500K flujo lumínico de 550Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 6.00W:
Se refiere al suministro, transporte e instalación de luminaria para uso interior, Luminaria tipo bala 72x83 para incrustar, Producto tipo DOWNLIGHT de uso interior fabricado en aluminio inyectado, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate (RAL 9006) en temperatura de color 6500K flujo lumínico de 550Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 6.00W.

	
Foto 1: Luminaria tipo bala 72x83.	***Foto 2: Luminaria tipo bala 72x83.***

Imagen 10: *Luminaria tipo bala 72x83.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 3.1.5 S.I.P Luminaria tipo bala GS 15W 5000K:
Se refiere al suministro, transporte e instalación de luminaria para uso interior, Luminaria tipo bala GS 15W 5000K GS CL15WN143 5

	
Foto 1: Luminaria tipo bala GS 15W 5000K.	***Foto 2: Luminaria tipo bala GS 15W 5000K.***

Imagen 11: *Luminaria tipo bala GS 15W 5000K.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 3.1.7 S.I.P Luminaria de emergencia 185X50X108 SOBREPONER 2-BL 2W:

Esta actividad corresponde al suministro e instalación de luminaria de emergencia con carcasa en termo plástico inyectado ABS, 5VA retardante a la llama, instalación de sobreponer, 2 cabezales direccionales con lentes, 400Lm, voltaje de operación 120v-277v, potencia total 4W, batería con 500 ciclos de recarga, interruptor de prueba e indicador de tasa de carga, batería de níquel cadmio 3.6v 900mA, 90 minutos de autonomía. 35000 horas de vida útil y 3 años de garantía.

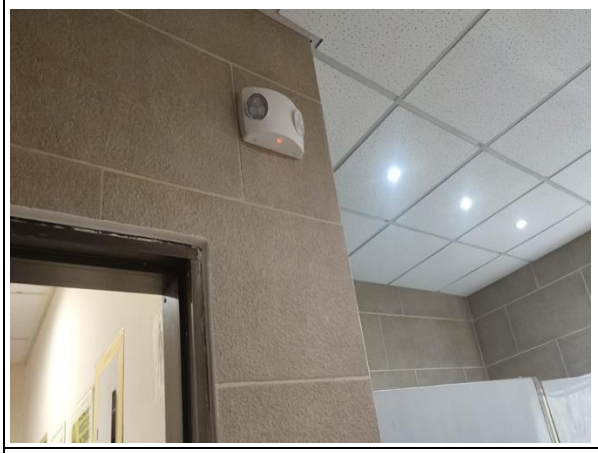
	
Foto 1: Luminaria de emergencia 185X50X108.	***Foto 2: Luminaria de emergencia 185X50X108.***

Imagen 12: *Luminaria de emergencia 185X50X108.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 7.1 Estuco acrílico para exteriores incluye juntas, filos y dilataciones:

Esta actividad se refiere al suministro, transporte y aplicación de estuco sobre muros exteriores, una vez seco el pañete se aplica estuco o en este caso en muros que ya cuentan con este tipo de recubrimiento y que requieren un retoque por el paso del tiempo o por situaciones ocasionadas por la humedad, este estuco se aplica para sellar todas las juntas o grietas e

imperfecciones, incluye filos; finalmente se pule la superficie con una lija dejando la superficie lista para las capas de pintura.

	
Foto 1: Estuco platico para muros y resanes.	***Foto 2: Estuco plastico para muros y resanes.***

Imagen 13: *Estuco plástico para muros y resanes.*
Fuente: *Elaboración propia.*

12. PMA: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Para la Interventoría es primordial realizar el seguimiento y control al cumplimiento de la normatividad ambiental y a los programas contractualmente estipulados en el proyecto para este caso en específico el PMA plan de manejo ambiental donde es prioridad minimizar el impacto ambiental que la ejecución del proyecto pueda ocasionar sobre la comunidad particular y el medio ambiente.

En este orden de ideas, el contratista, entiende que la ejecución de cualquier proyecto, de obra o actividad - POA interactúa con el ambiente a través de las actividades a ejecutarse lo cual, se define como elemento, de las actividades, productos o servicios de la organización que pueden interactuar con el medio ambiente; ejemplo de estos incluyen: emisión, consumo o reutilización de materiales pétreos o la generación de ruido. Por este motivo realiza el análisis de impactos, inicialmente identifican las actividades que interactúan con el medio ambiente y que pueden generar un efecto ya sea, positivo o negativo; posteriormente se caracteriza el ambiente receptor del impacto en componentes y elementos; y finalmente se identifican y evalúan los impactos potenciales asociados a la realización de las diferentes actividades del proyecto. Para la evaluación de impactos tomó como base la metodología propuesta por CONESA (1997), con algunas adaptaciones a la condición del entorno y a las condiciones particulares del proyecto.

13. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante este período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

13.1 Actas de inicio

El día 14 de noviembre del 2024, se reunieron en San Juan de Pasto, el representante legal de Constructora De Infraestructura Colombiana COINCO S.A.S Contratista de obra, el Interventor de obra, director ejecutivo de Administración Judicial Pasto y la supervisora con el fin de suscribir acta de inicio para la ejecución del contrato de obra. (Ver ***Anexo*** acta de inicio de obra).

El día 14 de noviembre del 2024, se reunieron en San Juan de Pasto, el Interventor de obra, director ejecutivo de Administración Judicial Pasto y la supervisora del contrato, con el fin de dejar constancia del inicio de las labores del contrato de interventoría. (Ver ***Anexo*** acta de inicio de interventoría).

13.2 Socialización del proyecto:

El día 12 de noviembre del 2024, se desarrolló socialización del Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.6947019 del 12 de noviembre 2024 en las instalaciones del palacio de justicia de Mocoa dirigida por el Contratista de obra y el contratista de Interventoría, se procedió a proporcionar la información del proyecto, su alcance, recibir inquietudes y concluir con acuerdos para el libre y normal desarrollo de la obra. (Ver **Anexo** acta de socialización).

Registro fotográfico – Socialización del proyecto.



Foto 1: *socialización del proyecto*

Imagen 14: *Registro fotográfico – socialización del proyecto*
Fuente: *Elaboración Propia.*

13.3 Comités de obra:

El 7 de mayo del 2025, de manera virtual se desarrolló comité técnico entre contratista de obra, el contratista de interventoría, Supervisora; donde los temas a tratar fueron los avaneces de obra y el cumplimiento de las obligaciones (Ver **Anexo** acta de comité técnico).

14. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

14.1 Clausula 8 Forma de pago contrato de obra

Pagos parciales: El 90% del valor del contrato se pagará mediante pagos parciales por cantidades de obras ejecutadas por el contratista, previa presentación de: a) Informe de ejecución, con sus respectivos anexos, b) Factura de venta electrónica o su equivalente, c) certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato y d) Planilla de pago a aportes de seguridad social en salud (Salud, Pensión, Riesgos Laborales) aportes parafiscales en el caso que tenga personal a cargo. No obstante, lo anterior, si a criterio de la supervisión se requiere de otro requisito, el mismo deberá ser cumplido por el contratista.

Pago final: Equivalente hasta el 10% del total de contrato, al finalizar la ejecución del contrato, previa presentación de: a) Informe de ejecución, con sus respectivos anexos, b) Factura de venta electrónica o su equivalente, c) Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato y d) Planilla de pago a aportes de seguridad social en salud (Salud,

pensión, riesgos laborales) aportes parafiscales en el caso que tenga personal a cargo y e) Suscripción del acta de liquidación. No obstante, lo anterior, si a criterio de la supervisión se requiere otro requisito, el mismo deberá ser cumplido por el contratista.

14.2 Clausula 8 Forma de pago contrato de interventoría

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, realizará el pago de forma mensual durante el periodo contratado, una vez se verifique el cumplimiento cabal de las obligaciones a cargo del contratista, previa presentación de los siguientes documentos: a) La factura o cuenta de cobro según corresponda. b) Certificación emitida por el supervisor del contrato de haberse cumplido con el objeto contractual. c) Certificación expedida por el Revisor Fiscal, por el Representante Legal o contratista persona natural según corresponda, de conformidad con el Art. 50 de la ley 789 de 2002, que acredite estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones) y Parafiscales (ICBF, Cajas de Compensación Familiar y Sena, cuando a ello hubiere lugar), allegando la planilla de pago por estos conceptos. PARÁGRAFO 1: El pago se realizará dentro de los 45 días siguientes a la radicación de la factura y/o cuenta de cobro, conforme los recursos que la Dirección General del Tesoro-Ministerio de Hacienda y Crédito Público sitúe a la Entidad. En caso de no cumplir con los requisitos de pago, se aplicará lo establecido en el artículo 11 de la ley 2024 de 2020. PARÁGRAFO 2: En caso de estar obligado a facturar electrónicamente, el contratista deberá presentar factura conforme a la financiación de cada rubro y PCI que corresponda, acatando las directrices de la DIAN y SIIF Nación. PARÁGRAFO 3: La Entidad descontará de cada pago el valor correspondiente a los impuestos, tasas, contribuciones o retenciones que apliquen, según los parámetros legalmente establecidos y conforme a los lineamientos del SIIF Nación.

15. PERSONAL Y EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

La Interventoría mediante el control diario de Obra relaciona la cantidad de equipos utilizados por el Contratista durante el presente periodo y el personal en cada uno de los frentes de obra, dicha información se anexa.

El contratista de obra ha cumplido con los requisitos de ley en lo referente a la Afiliación a EPS, ARL Y PENSIONES del personal de obra. El contratista en obra cuenta con personal discriminado así: Un (01) Ing. director de obra, Un (01) Ing. Residente de obra, Un (1) profesional en salud y seguridad industrial, Un (01) Maestros, dos (02) oficial, dos (2) eléctricos, seis (6) ayudantes de obra, Equipo de obra, Una (01) Pulidora, Un (01) Taladro, volqueta y herramienta menor.

16. CONTROL DE CALIDAD

Durante el desarrollo de todas las actividades se ha comprobado el respectivo proceso de calidad de acuerdo con el tipo de proyecto a realizar riéndose a la norma técnica colombianas ICONTEC NTC 382, NTC 1339, NTC539, normas american SOCIETY FOR TESTING materiales ASTM, ensayos para concretos NSR 2010 y Resolución número 5194 del 2010.

Durante el presente periodo el contratista de interventoría verifico que se realicen los ensayos correspondientes y entrega de certificados de calidad de los materiales utilizados para la construcción con el fin de validar el cumplimiento del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas y de esta forma comprobar, aceptar o rechazarlos una vez obtenidos los resultados del laboratorio.

Adicionalmente se solicitó los respectivos certificados de calidad y especificaciones técnicas de los materiales a utilizar dando cumplimiento a las especificaciones técnicas (Ver **Anexos** control de calidad).

16.1 Metodología de medición y cuantificación de obra ejecutada

El proceso de medición y cuantificación de la obra ejecutada se realizó a través de la toma continua de medidas convencionales por medio de cinta métrica, cubicación convencional y cuantificación numérica, que luego fueron comparadas con las carteras topográficas de campo.

17. CONTROL DE PÓLIZAS Y RESERVAS PRESUPUÉSTALES

17.1 Pólizas contratista de obra

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

ANEXO 0: Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal.

COMPAÑÍA ASEGURADORA	PÓLIZA No.	AMPARO Y PORCENTAJE	FECHA DE INICIO DEL AMPARO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101454743	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/10/2024	29/06/2025	191.100.398,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101454743	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	29/12/2024	29/12/2029	191.100.398,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101454743	ESTABLILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	29/10/2024	29/12/2027	191.100.398,00

TABLA 10. *Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal Anexo 0*
Fuente: *Elaboración propia.*

La póliza de seguro de garantía única de cumplimiento en favor de las entidades estatales, está debidamente aprobada. Cabe añadir que la póliza se encuentra vigente; **se anexa póliza.**

Aclaración por parte de la seguradora desde la fecha de finalización del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo.

ANEXO 0: Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual

COMPAÑÍA ASEGURADORA	PÓLIZA No.	AMPARO Y PORCENTAJE	FECHA DE INICIO DEL AMPARO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-40-101242689	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	29/10/2024	29/12/2024	260.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-40-101242689	CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	29/10/2024	29/12/2024	260.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-40-101242689	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29/10/2024	29/12/2024	260.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-40-101242689	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL.	29/10/2024	29/12/2024	260.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-40-101242689	GASTOS MEDICOS	29/10/2024	29/12/2024	260.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-40-101242689	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.	29/10/2024	29/12/2024	260.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-40-101242689	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.	29/10/2024	29/12/2024	260.000.000,00

TABLA 11. *Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual Anexo 0*
Fuente: *Elaboración propia.*

17.2 Pólizas contratista de interventoría.

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

ANEXO 0: Póliza de seguro de cumplimiento entidades estatales.

COMPAÑÍA ASEGURADORA	PÓLIZA No.	AMPARO Y PORCENTAJE	FECHA DE INICIO DEL AMPARO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101239016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/11/2024	01/07/2025	6.667.332,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15-44-101285819	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	01/11/2024	31/12/2027	6.667.332,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15-44-101285819	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2024	31/12/2029	6.667.332,00

TABLA 12. *Póliza de seguro de cumplimiento entidades estatales. Anexo 0*
Fuente: *Elaboración propia.*

Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO
NIT 860.009.578-6
Oficina Bogotá
Cod. Suc 11
Fecha de Emisión 01 noviembre del 2024.

La póliza de seguro de garantía única de cumplimiento en favor de las entidades estatales, está debidamente aprobada. Cabe añadir que la póliza se encuentra vigente; **se anexa póliza.**

ANEXO 1: Póliza de seguro de cumplimiento entidades estatales.

COMPAÑÍA ASEGURADORA	PÓLIZA No.	AMPARO Y PORCENTAJE	FECHA DE INICIO DEL AMPARO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101239016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/11/2024	01/07/2025	6.667.332,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15-44-101285819	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	01/11/2024	31/12/2027	6.667.332,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15-44-101285819	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2024	31/12/2029	6.667.332,00

TABLA 13. *Póliza de seguro de cumplimiento entidades estatales. Anexo 0*
Fuente: *Elaboración propia.*

Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO
NIT 860.009.578-6
Oficina Bogotá
Cod. Suc 11

Fecha de Emisión 01 noviembre del 2024.

La póliza de seguro de garantía única de cumplimiento en favor de las entidades estatales, está debidamente aprobada. Cabe añadir que la póliza se encuentra vigente; **se anexa póliza.**

ANEXO 2: Póliza de seguro de cumplimiento entidades estatales.

COMPAÑÍA ASEGURADORA	PÓLIZA No.	AMPARO Y PORCENTAJE	FECHA DE INICIO DEL AMPARO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101239016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/11/2024	03/08/2025	6.667.332,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101239016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	01/11/2024	03/02/2028	6.667.332,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101239016	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2024	31/12/2029	6.667.332,00

TABLA 14. *Póliza de seguro de cumplimiento entidades estatales. Anexo 2*
Fuente: *Elaboración propia.*

Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO
NIT 860.009.578-6
Oficina Bogotá
Cod. Suc 11
Fecha de Emisión 29 ENERO del 2025.

La póliza de seguro de garantía única de cumplimiento en favor de las entidades estatales, está debidamente aprobada. Cabe añadir que la póliza se encuentra vigente; **se anexa póliza.**

18. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cumpliendo con los requerimientos dados por la Interventoría, el personal empleado por el contratista debe cumplir con los requisitos de la ley 100, (Afiliación a ARP, EPS, Pensión, Caja de compensación, Sena e ICBF),para este periodo el contratista de obra realizó la entrega de afiliaciones y los soportes de los pagos de seguridad social y parafiscal, correspondiente a los meses laborados, por otra parte, el contratista de obra entrego al personal la dotación y los elementos de seguridad necesarios para la ejecución de este tipo de trabajos. Al respecto, **Ver Anexo** de los pagos de seguridad social y parafiscales.

19. ACTIVIDADES RELEVANTES

Durante el presente mes se ha trabajado en las siguientes actividades.

- Verificación de equipos y personal aprobados por la interventoría
- Elaboración de informe mensual.
- Elaboración de formatos, tiempo, personal y equipo.
- Revisión de cantidades ejecutadas durante el mes.
- Seguimiento fotográfico de las obras
- Revisión de la bitácora
- Seguimiento y control de afiliaciones al personal.
- Todo lo anterior en concordancia con las especificaciones técnicas, documentos contractuales y normativa legal.

20. ESTADO DEL TIEMPO

Para el periodo del 1 septiembre al 5 de septiembre del 2025, el estado del tiempo se comporta con estado variable como se presenta ver anexo estado del clima.

21. INCONVENIENTES ENCONTRADOS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA

Durante el mes se presentaron algunos inconvenientes que afectaron al desarrollo normal de las actividades, Durante el periodo de mayo de 2025, se registraron lluvias constantes y prolongadas que afectaron las actividades en fachadas y exteriores. Estos eventos fueron debidamente documentados en el libro de bitácora.

22. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Con corte al primer mes de labores, se registra un porcentaje programado acumulado del 100.00% que representa una inversión del orden de $ 1.433.190.807, además el porcentaje ejecutado acumulado es del 100,00% que representa una ejecución del orden de $ 1.433.190.807; situación que expone y evidencia un avance porcentual con un déficit de 0,00% que representa una ejecución del orden de $ 00,00 Por lo que se sugiere al contratista de obra

contemplar las medidas necesarias para cumplir con la programación inicialmente propuesta.

- El contratista de obra, a la fecha presenta los informes mensuales en el plazo estipulado para tal fin, correspondiente a los cinco (05) primeros días de cada mes, situación que viene presentando inconvenientes a la interventoría en el normal desarrollo de sus labores de seguimiento y control, por lo que se coloca en conocimiento de la supervisión y del contratista de obra, en aras de que se corrija oportunamente, so pena de incurrir en incumplimiento por la no entrega de informes en los tiempos programados y con la calidad requerida.

- Durante el periodo comprendido desde el 1 septiembre al 5 de septiembre del 2025, no se realizó intervenciones que generen impactos o afectaciones ambientales, de igual forma se efectúa un manejo adecuado de los residuos propios generados por las actividades realizadas dentro del proyecto. Se recalcó al contratista de manera verbal, se mantenga un constante aseo y acopio de material sobrante que no genere daño al medio ambiente, el mínimo impacto urbano y mayores condiciones de seguridad industrial. Fue función primordial de la interventoría asegurar que se minimice el impacto ambiental que el proyecto pueda ocasionar sobre las instalaciones y en el entorno donde se desarrollarán las actividades constructivas, es decir, sobre el medioambiente.


- La interventoría en cumplimiento de sus obligaciones de vigilancia, control y seguimiento durante la ejecución del contrato de obra recomendó al contratista realizar la señalización correspondiente a las áreas de trabajo.

- Respecto del seguimiento al Plan de Salud y seguridad en el Trabajo, se informa que los mismos se vienen desarrollando por parte del personal SST de la firma contratista y se cumplen a cabalidad, se anexan al presente informe de interventoría No. 06 el informe mensual SST con sus soportes.

- La interventoría recomendó y vigiló que el contratista de obra cumpla con las especificaciones del contrato como el suministro de los elementos de protección personal, seguridad industrial, dotación de implementos de seguridad, señalización y aseo de los sitios de obra, velando de esta manera porque se cumplan todas las

normativas vigentes sobre seguridad industrial, y exigiendo al contratista el cumplimiento de las mismas con el personal a su cargo durante el desarrollo de la obra.

- Se realiza diligenciamiento del libro de Bitácora en conjunto con el contratista.
- Se llevó un registro fotográfico, con el fin de evidenciar visualmente la evolución del proyecto.



ING. ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
Contratista de Interventoría

23. ANEXOS

- Anexo 2 Informes semanales.
- Anexo 3 Copia de actas de comité técnico.
- Anexo 4 Control diario de equipo contratista de obra.
- Anexo 5 Control diario del personal contratista de obra
- Anexo 6 Estado general del tiempo
- Anexo 7 Aportes de seguridad social y parafiscales contratistas de obra.
- Anexo 8 Pólizas contratista de interventoría.
- Anexo 9 Control diario del equipo de interventoría.
- Anexo 10 Control diario del personal de interventoría.
- Anexo 11 Aportes de seguridad social y parafiscales contratistas de interventoría.
- Anexo 12 Bitácora de obra.
- Anexo 13 Informe seguridad y salud en el trabajo.
- Anexo 14 Informe ambiental.

ANEXO 3 COPIA DE ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

Mocoa – Putumayo, 31 de agosto de 2025

SEÑOR:
ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
INTERVENTOR

REF: CONTRATO No. CO1. PCCNTR. 6947019 - MANTENIMIENTO PALACIO DE JUSTICIA MOCOA OBJETO: Contratar: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA"

Asunto: JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS ACTA PARCIAL No. 4

Considerando la especial naturaleza de los contratos de obra pública a precios unitarios, en los que generalmente se presentan riesgos inherentes del negocio jurídico, se acostumbra incluir un porcentaje de imprevistos (I) como componente del A.I.U.

En el proyecto "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA" este porcentaje corresponde al 3% del total de los costos directos y tiene un valor actualizado según el modificatorio No. 2 de treinta y tres millones seiscientos setenta y cuatro mil quinientos noventa y seis pesos m/cte **($ 33.674.596).**

Para la presente acta de Avance de Obra No. 4 el valor por concepto de imprevistos corresponde a diez millones doscientos sesenta y nueve mil quinientos cinco pesos m/cte **($ 10'269.505)**

Así las cosas, se presenta el siguiente cuadro resumen:

Detalle	Valor en Pesos	Valor en letras
Acta de Avance No. 1	$ 5'304.887	cinco millones trescientos cuatro mil ochocientos ochenta y siete pesos m/cte
Acta de Avance No. 2	$ 9'264.870	nueve millones doscientos sesenta y cuatro mil ochocientos setenta pesos m/cte
Acta de Avance No. 3	$ 7.971.647	Siete millones novecientos setenta y un mil seiscientos cuarenta y siete pesos m/cte
Acta de Avance No. 4	$ 10'269.505	diez millones doscientos sesenta y nueve mil quinientos cinco pesos m/cte
Acumulado	$ 32.810.909	Treinta y dos millones ochocientos diez mil novecientos nueve pesos m/cte

(601) 536 2099
317 681 6442
Calle 93 #11a - 28 /Of 302
Bogotá D.C. - Colombia

Este porcentaje de imprevistos ha sido concebido para atender aquellos riesgos normales y del día a día presentes en este contrato, como los enunciados a continuación:

La ejecución de actividades internas debe coordinarse con el personal de las instalaciones para habilitar espacios, lo que ha limitado el avance del proyecto.

Igualmente, las reuniones y audiencias programadas en el Palacio de Justicia han requerido la suspensión parcial de actividades, conforme a solicitudes expresas de la coordinación del edificio, motivo por el cual el rendimiento normal del personal mano de obra ha disminuido considerablemente y se ha visto la necesidad de trabajar en horario extendido y fines de semana para compensar el trabajo atrasado.

Las continuas y fuertes lluvias presentes en el Municipio de Mocoa, en especial desde el mes de abril de 2025 han afectado el desarrollo de las actividades de fachada y cubierta, lo que conlleva inicialmente a un atraso en las actividades contractuales y por otro lado han ocasionado un desbalance financiero debido al pago de alquiler de equipos necesarios para trabajos en alturas como la plataforma colgantes, que se encuentran debidamente contratadas y de las cuales se está pagando un canon de arrendamiento.

El reporte del clima ha sido consignado en la bitácora diariamente, donde se puede evidenciar los periodos prolongados de lluvia, así mismo se adjunta reporte diario del clima durante el mes de mayo se presenta más del 50% de lluvias, en los días de junio se presenta más del 80% de lluvias y agosto para el mes de agosto se registró más del 40% de lluvias, de este modo en este último mes, presentándose una leve mejoría en el estado del clima, se nos permitió culminar actividades en exteriores.

Se cuantifica a continuación las actividades descritas anteriormente:

Saldo por cobrar imprevistos acta de Avance No. 3	**$ 4’403.932**

EQUIPO	CANT	ALQUILER DÍA	TOTAL DÍAS	TOTAL
Plataforma colgante	1	$ 180.000,00	15	$ 2.700.000,00
Andamios y equipos de alturas	1	$ 1.080.000,00	1	$ 1.080.000,00
Alquiler de Pluma	8	$ 320.000,00	1	$ 2.560.000,00
Gastos administrativos personal en alturas (mensual)	4	$ 270.000,00	1	$ 1.080.000,00
TOTAL				**$ 7.420.000,00**

Se realizó una estimación de las pérdidas que tuvo el contratista al momento de la ejecución de las actividades descritas anteriormente durante el mes de mayo, junio y agosto, se llega

a la conclusión de que el valor corresponde a **$ 11’823.932** (once millones ochocientos veintitrés mil novecientos treinta y dos mil moneda corriente) y se puede cobrar en la presente acta No. 4 un valor de diez millones doscientos sesenta y nueve mil quinientos cinco pesos moneda corriente **$ 10’269.505**, quedando un saldo a favor del contratista de **$ 1’554.427** (un millón quinientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos veinte siete pesos moneda corriente) para cobrar en el acta final.

EDUARDO MANRIQUE PINZÓN
Representante legal
CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA
COINCO - CONTRATISTA DE OBRA

(601) 536 2099
317 681 6442
Calle 93 #11a - 28 /Of 302
Bogotá D.C. - Colombia

ANEXO 4
CONTROL DIARIO DE EQUIPO CONTRATISTA DE OBRA.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia **ANEXO PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA**	CÓDIGO	FT-SID-007	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	2 DE 2	

FECHA 5 9 2025

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO

INTERVENTOR ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

MES SEPTIEMBRE **CONTRATO No.** No. CO1.PCCNTR.6973355 **MUNICIPIO** MOCOA, PUTUMAYO

CONTRATISTA CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S

DIA / PROFESIONAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HERRAMIENTA MENOR	X	X	X	X	X																										
PULIDORA	X	X	X	X	X																										
TALADRO	X	X	X	X	X																										
H																															

Firma

Nombre: Allan Edward Sanchez Quiceno

Director de Interventoría

Matrícula No.: 63202-094726 QND

ANEXO 5
CONTROL DIARIO DEL PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

CÓDIGO	FT-SID-007		
VERSIÓN	1		
PAGINA	2	DE	2

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FECHA 5 9 2025

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO

INTERVENTOR ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

MES SEPTIEMBRE **CONTRATO No.** No. CO1.PCCNTR.6973355 **MUNICIPIO** MOCOA, PUTUMAYO

CONTRATISTA CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S

PROFESIONAL / DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DIRECTOR DE OBRA	X	X	X	X	X																										
RESIDENTE DE OBRA	X	X	X	X	X																										
RESIDENTE SST	X	X	X	X	X																										
MAESTRO	X	X	X	X	X																										
OFICIAL 1	X	X	X	X	X																										
OFICIAL 2	X	X	X	X	X																										
AUXILIAR 1	X	X	X	X	X																										
AUXILIAR 2	X	X	X	X	X																										
AUXILIAR 3	X	X	X	X	X																										
AUXILIAR 4	X	X	X	X	X																										
ELECTRISISTA 1	X	X	X	X	X																										
ELECTRISISTA 2	X	X	X	X	X																										

Firma
Nombre: Allan Edward Sanchez Quiceno
Director de Interventoría
Matrícula No.: 63202-094726 QND

ANEXO 7 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

CÓDIGO	FT-SID-007			
VERSIÓN	1			
FECHA		DE		

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FECHA 5 9 2025

OBJETO: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO**

INTERVENTOR ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

MES SEPTIEMBRE

CONTRATO No: **No. CO1.PCCNTR.6973355**

CONTRATISTA CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Clase de tiempo																															
Seco	X	X																													
Lluvias moderadas			X	X	X																										
Lluvias intensas			X	X																											

Firma
Nombre ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
Residente de Interventoría

ANEXO 8
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CONTRATISTAS DE OBRA.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900628905-1	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO	CR 11 # 92 - 20	6019278571	administrativo@coincosas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	MOCOA PUTUMAY	020	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	Y	26/08/2025	88565025	$201.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	198.200				198.200	22	2.800	201.000			1.982	201.000	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	22	0	0	0
ICBF				
0	22	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	198.200	201.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	198.200	201.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900628905-1	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO		CR 11 # 92 - 20	6019278571	administrativo@coincosas.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	MOCOA PUTUMAYO	020	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	Y	26/08/2025	88565025	$201.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1085249647	ARTEAGA POTOSI MARLON FERNANDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	87574554	FAJARDO BARCO NORBERTO DAVID	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900628905-1	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO	CR 11 # 92 - 20	6019278571	administrativo@coincosas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	MOCOA PUTUMAY	020	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-06	Y	29/07/2025	88024951	$403.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	396.400				396.400	27	6.700	403.100			3.964	403.100	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	27	0	0	0
ICBF				
0	27	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	396.400	403.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	396.400	403.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900628905-1	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO		CR 11 # 92 - 20	6019278571	administrativo@coincosas.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	MOCOA PUTUMAY	020	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-06	Y	29/07/2025	88024951	$403.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1085249647	ARTEAGA POTOSI MARLON FERNANDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1124313123	MUÑOZ BECERRA LUIS ALFREDO	59	0			N		X																0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1124862736	ARANZAZU SARASTY MAYERLY CAROLINA	59	0			N		X																0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	87574554	FAJARDO BARCO NORBERTO DAVID	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900628905-1	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO	CR 11 # 92 - 20	6019278571	administrativo@coincosas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	ADMINISTRATIVO	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	08/07/2025	87636788	$3.124.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	6	300	0	57.300	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	297.000	0		0		0	6	1.200	0	298.200	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	6	300	0	57.300	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	57.000	0		0		0	6	300	0	57.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	6	900	0	228.700	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.187.800	0	0	30.000	30.000	6	4.500	400	1.252.700	2
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	227.800	0	0	0	0	6	900	0	228.700	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	6	900	0	228.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	244.600				244.600	6	1.000	245.600			2.446	245.600	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	468.000	6	1.800	469.800	5

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900628905-1	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO	CR 11 # 92 - 20	6019278571	administrativo@coincosas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	ADMINISTRATIVO	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	08/07/2025	87636788	$3.124.300	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	6	0	0	0
ICBF				
0	6	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	468.000	470.100
Pensión	4	1.931.200	1.938.800
Riesgos Laborales	1	244.600	245.600
CCF	1	468.000	469.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	3.111.800	3.124.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900628905-1	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO		CR 11 # 92 - 20	6019278571	administrativo@coincosas.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	ADMINISTRATIVO	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	08/07/2025	87636788	$3.124.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002344647	CASTELLAR VILLEGAS AMER STIVEN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1110561121	ECHEVERRY ROJAS JESUS DAVID	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	14395424	CAICEDO ORTIZ DANIEL FRANCOI	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	51919139	PINZON BARRETO ANGELICA MARIA	1	0			S																	230901	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	80189742	MANRIQUE PINZON EDUARDO	1	0			S																	230301	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS008	6.000.000	240.000	14-11	6.000.000	1	31.400	CCF24	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900628905-1	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO	CR 11 # 92 - 20	6019278571	administrativo@coincosas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	ADMINISTRATIVO	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	03/09/2025	89246074	$3.114.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	1	100	0	57.100	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	297.000	0		0		0	1	200	0	297.200	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	1	100	0	57.100	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	57.000	0		0		0	1	100	0	57.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	1	200	0	228.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.187.800	0	0	30.000	30.000	1	800	200	1.248.800	2
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	227.800	0	0	0	0	1	200	0	228.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	1	200	0	228.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	244.600				244.600	1	200	244.800			2.446	244.800	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	468.000	1	300	468.300	5

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900628905-1	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO	CR 11 # 92 - 20	6019278571	administrativo@coincosas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	ADMINISTRATIVO	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	03/09/2025	89246074	$3.114.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	468.000	468.500
Pensión	4	1.931.200	1.932.800
Riesgos Laborales	1	244.600	244.800
CCF	1	468.000	468.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	3.111.800	3.114.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900628905-1	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO		CR 11 # 92 - 20	6019278571	administrativo@coincosas.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	ADMINISTRATIVO	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	03/09/2025	89246074	$3.114.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002344647	CASTELLAR VILLEGAS AMER STIVEN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1110561121	ECHEVERRY ROJAS JESUS DAVID	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	14395424	CAICEDO ORTIZ DANIEL FRANCOI	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	51919139	PINZON BARRETO ANGELICA MARIA	1	0			S																	230901	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	80189742	MANRIQUE PINZON EDUARDO	1	0			S																	230301	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS008	6.000.000	240.000	14-11	6.000.000	1	31.400	CCF24	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085249647		ARTEAGA POTOSI MARLON FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 5 CASA 18 LAS BRISAS	PASTO-NARIÑO	7360636	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1685890733	9488233730	I	2025/07/10	2025/08/08	NEQUI	29	$696,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1085249647	ARTEAGA MARLON																		230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$684,000
Total	**Afiliados(1)**																						$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$684,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085249647		ARTEAGA POTOSI MARLON FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 5 CASA 18 LAS BRISAS	PASTO-NARIÑO	7360636	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1685890733	9488233730	I	2025/07/10	2025/08/08	NEQUI	29	$696,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,000	$7,000	$0	$391,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$384,000	$7,000	$0	$391,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$5,500	$0	$305,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$300,000	$5,500	$0	$305,500
TOTAL				1	$684,000	$12,500	$0	$696,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085249647		ARTEAGA POTOSI MARLON FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 5 CASA 18 LAS BRISAS	PASTO-NARIÑO	7360636	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1733070275	9489493611	I	2025/08/13	2025/08/28	NEQUI	15	$690,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1085249647	ARTEAGA MARLON																		230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$684,000
Total	**Afiliados(1)**																						$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$684,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085249647		ARTEAGA POTOSI MARLON FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 5 CASA 18 LAS BRISAS	PASTO-NARIÑO	7360636	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1733070275	9489493611	I	2025/08/13	2025/08/28	NEQUI	15	$690,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,000	$3,700	$0	$387,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$384,000	$3,700	$0	$387,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$2,900	$0	$302,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$300,000	$2,900	$0	$302,900
TOTAL				1	$684,000	$6,600	$0	$690,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085249647		ARTEAGA POTOSI MARLON FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 5 CASA 18 LAS BRISAS	PASTO-NARIÑO	7360636	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08		9490882707	I	2025/09/10				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1085249647	ARTEAGA MARLON																		230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$684,000
Total	**Afiliados(1)**																						$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$684,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085249647		ARTEAGA POTOSI MARLON FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 5 CASA 18 LAS BRISAS	PASTO-NARIÑO	7360636	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08		9490882707	I	2025/09/10				

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,000	$0	$384,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$384,000	$0	$384,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$300,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$300,000	$0	$300,000
TOTAL				**1**	**$684,000**	**$0**	**$684,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1124313123		MUÑOZ BECERRA LUIS ALFREDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	B villa del Norte cll 27n9 84	MOCOA-PUTUMAYO	4204224	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1697702583	9487918934	I	2025/07/09	2025/09/01	NEQUI	54	$472,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1124313123	MUÑOZ BECERRA LUIS ALFREDO	X	X																230301	30	$1,600,000	$276,000	ESSC18	30	$1,600,000	$180,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$456,000
Total	**Afiliados(1)**																						$1,600,000	$276,000			$1,600,000	$180,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$456,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1124313123		MUÑOZ BECERRA LUIS ALFREDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	B villa del Norte cll 27n9 84	MOCOA-PUTUMAYO	4204224	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1697702583	9487918934	I	2025/07/09	2025/09/01	NEQUI	54	$472,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$276,000	$9,500	$0	$285,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$276,000	$9,500	$0	$285,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$180,000	$7,400	$0	$187,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$180,000	$7,400	$0	$187,400
TOTAL				1	$456,000	$16,900	$0	$472,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1124313123		MUÑOZ BECERRA LUIS ALFREDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	B villa del Norte cll 27n9 84	MOCOA-PUTUMAYO	4204224	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1697602495	9487908999	I	2025/08/09	2025/09/13	NEQUI	35	$472,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1124313123	MUÑOZ BECERRA LUIS ALFREDO	X	X																230301	30	$1,600,000	$276,000	ESSC18	30	$1,600,000	$180,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$456,000
Total	**Afiliados(1)**																						$1,600,000	$276,000			$1,600,000	$180,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$456,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1124313123		MUÑOZ BECERRA LUIS ALFREDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	B villa del Norte cll 27n9 84	MOCOA-PUTUMAYO	4204224	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1697602445	9487908999	I	2025/08/09	2025/09/13	NEQUI	35	$472,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$276,000	$9,500	$0	$285,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$276,000	$9,500	$0	$285,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$180,000	$7,400	$0	$187,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$180,000	$7,400	$0	$187,400
TOTAL				1	$456,000	$16,900	$0	$472,900

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900628905-1	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO	CR 11 # 92 - 20	6019278571	administrativo@coincosas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	COINCO CTO 829	016	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	08/07/2025	87757748	$4.272.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	267.700	0		0		0	6	1.000	0	268.700	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	53.200	0		0		0	6	200	0	53.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	228.000	0		0		0	6	900	0	228.900	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	269.400	0	0	0	0	6	1.100	0	270.500	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.939.700	0	0	0	0	6	7.300	0	1.947.000	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	951.100				951.100	6	3.600	954.700			9.511	954.700	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	547.000	6	2.100	549.100	9

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	6	0	0	0
ICBF				
0	6	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	548.900	551.000
Pensión	2	2.209.100	2.217.500
Riesgos Laborales	1	951.100	954.700
CCF	1	547.000	549.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	4.256.100	4.272.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900628905-1	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO		CR 11 # 92 - 20	6019278571	administrativo@coincosas.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	COINCO CTO 829	016	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	08/07/2025	87757748	$4.272.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1007847271	CORTES RODRIGUEZ BRAYAN DAVID	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1069744765	GARCIA FRANCO CARLOS JOSE	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1069747876	GOMEZ MENDEZ GERMAN ANDRES	1	0			S																	230301	1.281.150	205.000	0	0	0	0	EPS005	1.281.150	51.300	14-11	1.281.150	5	89.200	CCF24	1.281.150	51.300	0	0	0	0	0
4	CC	1069747876	GOMEZ MENDEZ GERMAN ANDRES	1	0			S									X								230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS005	94.900	0	14-11	94.900	5	0	CCF24	94.900	0	0	0	0	0	0
5	CC	1069747876	GOMEZ MENDEZ GERMAN ANDRES	1	0			S										X							230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-11	47.450	5	0	CCF24	47.450	0	0	0	0	0	0
6	CC	1069758297	REYES MANCHOLA JHONATAN SMITD	1	0			S	X																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1072394310	ROMERO ROZO BRAYAN ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	1106897512	BEJARANO RUBIANO EDNA TATIANA	1	0			S																	230301	2.156.600	345.100	0	0	0	0	EPS002	2.156.600	86.300	14-11	2.156.600	5	150.100	CCF24	2.156.600	86.300	0	0	0	0	0
9	CC	1121878266	MORA DAZA JOHAN ESTIVEN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
10	CC	11245213	CUBILLOS MONROY WILSON ADRIAN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
11	CC	11605636	MARTINEZ PABON NELSON ANTONIO	1	0			S																	230201	1.683.200	269.400	0	0	0	0	EPS002	1.683.200	67.400	14-11	1.683.200	5	117.200	CCF24	1.683.200	67.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900628905-1	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO	CR 11 # 92 - 20	6019278571	administrativo@coincosas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	COINCO CTO 829	016	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	03/09/2025	89246444	$4.214.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	324.700	0		0		0	1	300	0	325.000	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	1	100	0	57.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	165.300	0		0		0	1	200	0	165.500	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	269.400	0	0	0	0	1	200	0	269.600	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.939.700	0	0	0	0	1	1.300	0	1.941.000	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	908.200				908.200	1	600	908.800			9.082	908.800	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	547.000	1	400	547.400	9

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	547.000	547.600
Pensión	2	2.209.100	2.210.600
Riesgos Laborales	1	908.200	908.800
CCF	1	547.000	547.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	4.211.300	4.214.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900628905-1	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO		CR 11 # 92 - 20	6019278571	administrativo@coincosas.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	COINCO CTO 829	016	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	03/09/2025	89246444	$4.214.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1007847271	CORTES RODRIGUEZ BRAYAN DAVID	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1028783238	RAMIREZ RODRIGUEZ TOMAS LEONARDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1028784117	RAMIREZ RODRIGUEZ DANIEL FELIPE	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1069744765	GARCIA FRANCO CARLOS JOSE	1	0			S																	230301	806.650	129.100	0	0	0	0	EPS002	806.650	32.300	14-11	806.650	5	56.200	CCF24	806.650	32.300	0	0	0	0	0
5	CC	1069744765	GARCIA FRANCO CARLOS JOSE	1	0			S												L					230301	616.850	98.700	0	0	0	0	EPS002	616.850	24.700	14-11	616.850	5	0	CCF24	616.850	24.700	0	0	0	0	0
6	CC	1069747876	GOMEZ MENDEZ GERMAN ANDRES	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1106897512	BEJARANO RUBIANO EDNA TATIANA	1	0			S																	230301	2.156.600	345.100	0	0	0	0	EPS002	2.156.600	86.300	14-11	2.156.600	5	150.100	CCF24	2.156.600	86.300	0	0	0	0	0
8	CC	1121878266	MORA DAZA JOHAN ESTIVEN	1	0			S																	230301	1.281.150	205.000	0	0	0	0	EPS017	1.281.150	51.300	14-11	1.281.150	5	89.200	CCF24	1.281.150	51.300	0	0	0	0	0
9	CC	1121878266	MORA DAZA JOHAN ESTIVEN	1	0			S										X							230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS017	142.350	0	14-11	142.350	5	0	CCF24	142.350	0	0	0	0	0	0
10	CC	11245213	CUBILLOS MONROY WILSON ADRIAN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
11	CC	11605636	MARTINEZ PABON NELSON ANTONIO	1	0			S																	230201	1.683.200	269.400	0	0	0	0	EPS002	1.683.200	67.400	14-11	1.683.200	5	117.200	CCF24	1.683.200	67.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO 9
PÓLIZAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

ANEXO 10
CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE INTERVENTORÍA.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	CÓDIGO		
		VERSIÓN		
	ANEXO EQUIPO DE INTERVENTORIA	PAGINA	2 DE 2	

		FECHA	5 / 9 / 2025
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO	INTERVENTOR	ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

SEPTIEMBRE **CONTRATO No.** CO1.PCCNTR.6973355 **MUNICIPIO** MOCOA

CONTRATISTA ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

DIA / MAQUINA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
COMISION TOPOGRAFICA	A	A	A	A	A																										
HERRAMIENTA MENOR	A	A	A	A	A																										

CONVENCIONES
ACTIVO = **A**
REPARACION = **R**
INACTIVO = **I**

Firma
Nombre: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
Matricula No.: 63202-094726 QND

ANEXO 11
CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

CÓDIGO				
VERSIÓN	1			
PAGINA	2	DE	2	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANEXO PERSONAL DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO

FECHA 5 9 2025

INTERVENTOR ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MES SEPTIEMBRE **CONTRATO No.** No. CO1.PCCNTR.6973355 **MUNICIPIO** MOCOA PUTUMAYO

CONTRATISTA ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

DIA / PROFESIONAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	X	X																													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	X	X	X	X	X																										
PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD INDUSTRIAL	X	X																													
PROFESIONAL AMBIENTAL	X	X	X	X	X																										

Firma

Nombre: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

Matricula No.: 63202-094726 QND

ANEXO 12 APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CONTRATISTAS DE INTERVENTORÍA.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	CÓDIGO		
		VERSIÓN		
	ANEXO CONTROL DE APORTES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE LA INTERVENTORÍA	PÁGINA	1 DE 1	
	SEGÚN RELACIÓN DE NÓMINA DEL FORMULARIO N° 9 MES	FECHA	5 9 2025	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	SUELDO MENSUAL (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL-SEPTIEMBRE ARP	EPS	PENSIÓN	TOTAL MES	TOTAL ACUMULADO
1	ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO	9.731.335	$ 3.000.000,00	$ 208.800	$ 255.000	$ 360.000		
2	FHANOR BRAVO GARCIA	1.124.856.458	$ 2.500.000,00	$ 174.000	$ 212.500	$ 300.000		
3	Erika Daniela Arias Revelo	1.124.857.971	$ 1.300.000,00	$ 90.480	$ 110.500	$ 156.000		
4	JAVIER ARTURO VILLOTA ROSERO	1.123.304.080	$ 2.000.000,00	$ 139.200	$ 170.000	$ 240.000		
TOTA	**TOTAL NÓMINA**		**$ 8.800.000**	**$ 612.480**	**$ 748.000**	**$ 1.056.000**	**$ 2.416.480**	**$ 2.416.480**
2. APORTES PARAFISCALES				**CAJA**	**SENA**	**ICBF**		
BASE APORTES PROYECTO			**$ 8.800.000**	**4%**	**2%**	**3%**		
TOTAL APORTES MENSUALES PAGADOS POR PARAFISCALES				$ 352.000	$ 176.000	$ 264.000	**$ 792.000**	**$ 792.000**
TOTAL PAGOS SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES							**$ 3.208.480**	**$ 3.208.480**

Firma

Nombre: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

Matricula No.: 63202-094726 QND

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9731335		SANCHEZ QUICENO ALLAN EDWARD	A - 200 O MAS COTIZANTES	INTERVENTORIA	BARRIO PRADO NORTE	MOCOA-PUTUMAYO	3185311222	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1889448226	9494176615	E	2025/09/08	2025/10/30	BANCOLOMBIA	52	$2,506,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INTERVENTORIA (3 Afiliados)						$5,460,001	$873,700			$5,460,001	$682,600			$5,460,001	$218,500			$5,460,001	$380,200		$5,460,001	$273,300
Centro de Trabajo: RAMA JUDICIAL (3 Afiliados)						$5,460,001	$873,700			$5,460,001	$682,600			$5,460,001	$218,500			$5,460,001	$380,200		$5,460,001	$273,300
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (3 Afiliados)						$5,460,001	$873,700			$5,460,001	$682,600			$5,460,001	$218,500			$5,460,001	$380,200		$5,460,001	$273,300
1	CC	1124857971	ARIAS ERIKA	230301	26	$1,560,000	$249,600	ESSC18	26	$1,560,000	$195,000	CCF63	26	$1,560,000	$62,400	14-23	26	$1,560,000	$108,600	26	$1,560,000	$78,000
2	CC	1124856458	BRAVO FHANOR	230301	26	$2,166,667	$346,700	EPS037	26	$2,166,667	$270,900	CCF63	26	$2,166,667	$86,700	14-23	26	$2,166,667	$150,900	26	$2,166,667	$108,500
3	CC	1123304080	VILLOTA JAVIER	25-14	26	$1,733,334	$277,400	ESSC18	26	$1,733,334	$216,700	CCF63	26	$1,733,334	$69,400	14-23	26	$1,733,334	$120,700	26	$1,733,334	$86,800
Total			**Afiliados(3)**			$5,460,001	$873,700			$5,460,001	$682,600			$5,460,001	$218,500			$5,460,001	$380,200		$5,460,001	$273,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9731335		SANCHEZ QUICENO ALLAN EDWARD	A - 200 O MAS COTIZANTES	INTERVENTORIA	BARRIO PRADO NORTE	MOCOA-PUTUMAYO	3185311222	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1889448226	9494176615	E	2025/09/08	2025/10/30	BANCOLOMBIA	52	$2,506,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$873,700	$28,200	$0	$901,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$277,400	$9,000	$0	$286,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$596,300	$19,200	$0	$615,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$380,200	$12,300	$0	$392,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$380,200	$12,300	$0	$392,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$218,500	$7,100	$0	$225,600
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	$218,500	$7,100	$0	$225,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$682,600	$22,100	$0	$704,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$411,700	$13,300	$0	$425,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$270,900	$8,800	$0	$279,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$164,000	$5,300	$0	$169,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$164,000	$5,300	$0	$169,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$109,300	$3,600	$0	$112,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$109,300	$3,600	$0	$112,900
TOTAL				**3**	**$2,428,300**	**$78,600**	**$0**	**$2,506,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9731335		SANCHEZ QUICENO ALLAN EDWARD	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio Dorado	MOCOA-PUTUMAYO	4210117	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1796673460	9490724971	I	2025/09/08	2025/09/23	BANCOLOMBIA	15	$680,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: EMPLEADOR ALLAN SANCHEZ (1 Afiliados)																							$1,900,000	$304,000			$1,900,000	$237,500			$0	$0			$1,900,000		$132,300		$0	$0		$673,800
Centro de Trabajo: EMPRESA (1 Afiliados)																							$1,900,000	$304,000			$1,900,000	$237,500			$0	$0			$1,900,000		$132,300		$0	$0		$673,800
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																							$1,900,000	$304,000			$1,900,000	$237,500			$0	$0			$1,900,000		$132,300		$0	$0		$673,800
1	CC	9731335 SANCHEZ ALLAN																			25-14	30	$1,900,000	$304,000	EPS037	30	$1,900,000	$237,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,900,000	6.960%	$132,300	0	$0	$0	No	$673,800
Total		**Afiliados(1)**																					$1,900,000	$304,000			$1,900,000	$237,500			$0	$0			$1,900,000		$132,300		$0	$0		$673,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9731335		SANCHEZ QUICENO ALLAN EDWARD	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio Dorado	MOCOA-PUTUMAYO	4210117	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1796673460	9490724971	I	2025/09/08	2025/09/23	BANCOLOMBIA	15	$680,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$304,000	$2,900	$0	$306,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$304,000	$2,900	$0	$306,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$132,300	$1,300	$0	$133,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$132,300	$1,300	$0	$133,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$237,500	$2,300	$0	$239,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$237,500	$2,300	$0	$239,800
TOTAL				**1**	**$673,800**	**$6,500**	**$0**	**$680,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9731335		SANCHEZ QUICENO ALLAN EDWARD	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio Dorado	MOCOA-PUTUMAYO	4210117	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1889334196	9494173377	N	2025/09/08	2025/10/30	BANCOLOMBIA	52	$146,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: EMPLEADOR ALLAN SANCHEZ (1 Afiliados)						$400,000	$64,000			$400,000	$50,000			$0	$0			$400,000	$27,800		$0	$0
Centro de Trabajo: EMPRESA (1 Afiliados)						$400,000	$64,000			$400,000	$50,000			$0	$0			$400,000	$27,800		$0	$0
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)						$400,000	$64,000			$400,000	$50,000			$0	$0			$400,000	$27,800		$0	$0
1	CC	9731335	SANCHEZ ALLAN	25-14	30	($1,900,000)	($304,000)	EPS037	30	($1,900,000)	($237,500)		0	$0	$0	14-23	30	($1,900,000)	($132,300)	0	$0	$0
2	CC	9731335	SANCHEZ ALLAN	25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS037	30	$2,300,000	$287,500		0	$0	$0	14-23	30	$2,300,000	$160,100	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$400,000	$64,000			$400,000	$50,000			$0	$0			$400,000	$27,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9731335		SANCHEZ QUICENO ALLAN EDWARD	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio Dorado	MOCOA-PUTUMAYO	4210117	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1889334196	9494173377	N	2025/09/08	2025/10/30	BANCOLOMBIA	52	$146,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$64,000	$2,100	$0	$66,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$64,000	$2,100	$0	$66,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$27,800	$900	$0	$28,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$27,800	$900	$0	$28,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$50,000	$1,700	$0	$51,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$50,000	$1,700	$0	$51,700
TOTAL				1	$141,800	$4,700	$0	$146,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9731335		SANCHEZ QUICENO ALLAN EDWARD	A - 200 O MAS COTIZANTES	INTERVENTORIA	BARRIO PRADO NORTE	MOCOA-PUTUMAYO	3185311222	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1889458272	9494176545	E	2025/10/08	2025/10/30	BANCOLOMBIA	22	$474,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO							PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.		Identificación	Nombres	Codigo	Días		IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INTERVENTORIA (3 Afiliados)							$1,050,001	$168,100			$1,050,001	$131,300			$1,050,001	$42,100			$1,050,001	$73,300		$1,050,001	$52,800
Centro de Trabajo: RAMA JUDICIAL (3 Afiliados)							$1,050,001	$168,100			$1,050,001	$131,300			$1,050,001	$42,100			$1,050,001	$73,300		$1,050,001	$52,800
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (3 Afiliados)							$1,050,001	$168,100			$1,050,001	$131,300			$1,050,001	$42,100			$1,050,001	$73,300		$1,050,001	$52,800
1	CC	1124857971	ARIAS ERIKA	230301	5		$300,000	$48,000	ESSC18	5	$300,000	$37,500	CCF63	5	$300,000	$12,000	14-23	5	$300,000	$20,900	5	$300,000	$15,000
2	CC	1124856458	BRAVO FHANOR	230301	5		$416,667	$66,700	EPS037	5	$416,667	$52,100	CCF63	5	$416,667	$16,700	14-23	5	$416,667	$29,100	5	$416,667	$21,000
3	CC	1123304080	VILLOTA JAVIER	25-14	5		$333,334	$53,400	ESSC18	5	$333,334	$41,700	CCF63	5	$333,334	$13,400	14-23	5	$333,334	$23,300	5	$333,334	$16,800
Total			**Afiliados(3)**				$1,050,001	$168,100			$1,050,001	$131,300			$1,050,001	$42,100			$1,050,001	$73,300		$1,050,001	$52,800

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9731335		SANCHEZ QUICENO ALLAN EDWARD	A - 200 O MAS COTIZANTES	INTERVENTORIA	BARRIO PRADO NORTE	MOCOA-PUTUMAYO	3185311222	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1889458272	9494176545	E	2025/10/08	2025/10/30	BANCOLOMBIA	22	$474,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$168,100	$2,400	$0	$170,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$53,400	$800	$0	$54,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$114,700	$1,600	$0	$116,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$73,300	$1,000	$0	$74,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$73,300	$1,000	$0	$74,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$42,100	$600	$0	$42,700
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	$42,100	$600	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$131,300	$1,900	$0	$133,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$79,200	$1,100	$0	$80,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,100	$800	$0	$52,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$31,700	$500	$0	$32,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$31,700	$500	$0	$32,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$21,100	$300	$0	$21,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$21,100	$300	$0	$21,400
TOTAL				**3**	**$467,600**	**$6,700**	**$0**	**$474,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9731335		SANCHEZ QUICENO ALLAN EDWARD	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio Dorado	MOCOA-PUTUMAYO	4210117	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1859134245	9493295160	I	2025/10/08	2025/10/17	BANCOLOMBIA	9	$507,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: EMPLEADOR ALLAN SANCHEZ (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: EMPRESA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC	9731335	SANCHEZ ALLAN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9731335		SANCHEZ QUICENO ALLAN EDWARD	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio Dorado	MOCOA-PUTUMAYO	4210117	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1859134245	9493295160	I	2025/10/08	2025/10/17	BANCOLOMBIA	9	$507,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,300	$0	$229,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$1,300	$0	$229,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$600	$0	$99,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$600	$0	$99,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$1,000	$0	$179,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$1,000	$0	$179,000
TOTAL				**1**	**$504,900**	**$2,900**	**$0**	**$507,800**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9731335		SANCHEZ QUICENO ALLAN EDWARD	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio Dorado	MOCOA-PUTUMAYO	4210117	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1889339111	9494173595	N	2025/10/08	2025/10/30	BANCOLOMBIA	22	$315,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: EMPLEADOR ALLAN SANCHEZ (1 Afiliados)						$876,500	$140,200			$876,500	$109,500			$0	$0			$876,500	$61,000		$0	$0
Centro de Trabajo: EMPRESA (1 Afiliados)						$876,500	$140,200			$876,500	$109,500			$0	$0			$876,500	$61,000		$0	$0
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)						$876,500	$140,200			$876,500	$109,500			$0	$0			$876,500	$61,000		$0	$0
1	CC	9731335	SANCHEZ ALLAN	25-14	30	($1,423,500)	($227,800)	EPS037	30	($1,423,500)	($178,000)		0	$0	$0	14-23	30	($1,423,500)	($99,100)	0	$0	$0
2	CC	9731335	SANCHEZ ALLAN	25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS037	30	$2,300,000	$287,500		0	$0	$0	14-23	30	$2,300,000	$160,100	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$876,500	$140,200			$876,500	$109,500			$0	$0			$876,500	$61,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9731335		SANCHEZ QUICENO ALLAN EDWARD	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio Dorado	MOCOA-PUTUMAYO	4210117	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1889339111	9494173595	N	2025/10/08	2025/10/30	BANCOLOMBIA	22	$315,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,200	$1,900	$0	$142,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$140,200	$1,900	$0	$142,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$61,000	$900	$0	$61,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$61,000	$900	$0	$61,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$109,500	$1,500	$0	$111,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$109,500	$1,500	$0	$111,000
TOTAL				**1**	**$310,700**	**$4,300**	**$0**	**$315,000**

ANEXO 13
BITÁCORA DE OBRA.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

Lunes 26 de mayo 2025
Personal: 1 maestro, 5 ayudantes, 1 eléctrico, 3 oficiales en exteriores
Director, Residente y Hsg de Obra.
Clima: lluvias moderadas en la mañana, tarde sombreada.
Actividades:

Se continua con actividades eléctricas a nivel de sótano, se continuan con enchapes de baños en sótano, se continuan algunas actividades para la instalación de mampo en la terraza.
Se realizan actividades de resane de pinturas en diferentes sectores del edificio.

RESIDENTE OBRA Residente Inter.

Martes 27 de mayo de 2025
Personal: 1 maestro, 5 ayudntes, 1 electrico, 3 oficiales en exteriores
Director, Residente y Hsg de Obra.
Clima: mañana nublada, tarde lluvias moderadas
Actividades:

Se continua actividades eléctricas, cableado y tuberias en sótano, pega de enchapes en baños de sótano, se realizan resanes de Pintura y estuco.

RESIDENTE OBRA Residente Inter.

miércoles 28 de mayo de 2025
Personal: 1 maestro, 5 ayudantes, 1 electrico, 3 oficiales enest.
Director, Residente y Hsq de obra.
Clima: lluvias moderadas toda la mañana y media tarde, resto nublado
Actividades:

se realizan enchapes en baños de sótano, se realizan actividades eléctricas en bodega de sótano, se realizan resanes de estuco y pintura, se realiza fraguado en pericos de baños.

Residente de obra

Residente Inter

jueves 29 de mayo de 2025
Personal: 1 maestro, 5 ayudantes, 1 electrico, 3 oficiales, en exteriores
Director, Residente y Hsq de Obra.
Clima: Dia soleado.
Actividades:

Se continuan actividades en terraza, demoliciones de piso, retiro de manto existente, se continuan trabajos con temas eléctrico en sótano, fraguado de enchapes.
Se realizan resanes de estuco y pintura.

Residente de obra

Residente Inter

Viernes 30 de mayo de 2025
Personal: 1 Maestro, 5 ayudantes, 1 electrico, 3 oficiales en exteriores
Director, Residente y Hsq Obra.
Clima: lluvias moderadas en la tarde, mañana nublada.
Actividades:

Se realizan actividades de demolición y retiro de escombros en terraza, se continuan actividades electricas a nivel de sótano, se continuan enchapes de piso y pared,

Se realiza resane de estucos y pinturas. internas y externas.

Residente de obra

Residente Inter

Sábado 31 de mayo de 2025
Personal: 1 maestro, 5 ayudantes, 1 electrico, 3 oficiales en exteriores
Director, Residente y Hsq Obra.
Clima: mañana lluvia moderadas, tarde nublada.
Actividades:

Se desarrollan actividades electricas en sótano, recolección de escombros en terraza, resanes de pintura y estuco, tanto en interiores como en algunas zonas exteriores.

Residente de obra

Residente Inter

Domingo 1 de junio de 2025
Personal: 1 maestro, 5 ayudantes, 1 electrico, 3 oficiales en exteriores
Director, Residente y Hsq Obra.
Clima: Lluvias intensas todo el día.
Actividades:

no se desarrollan actividades en obra.

Residente de obra

Residente Inter

Lunes 2 de junio de 2025
Personal: 1 maestro, 5 ayudantes, 1 electricos, 3 oficiales en exteriores
Director, Residente y Hsq Obra.
Clima: Lluvias intensas todo el día.
Actividades:

Se realizan enchapes y fraguado en paredes y pisos en baños, se adelantan actividades electricas,

Se realizan actividades de resanes y retoques de pintura en todo el edificio.

Residente de obra

Residente Inter

Powered by CamScanner

martes 3 de junio de 2025
Personal: 1 maestro, 5 ayudantes, 1 electrico, 3 oficiales en exteriores
Director de Obra, Residente y Hsq Obra.
Clima: lluvias intensas todo el día.
Actividades:

se desarrollan actividades de enchapes en Piso 3, se realizan actividades electricas en baños de sotano, se realizan retoques de estuco y Pintura.

Residente de obra

Residente Inter

miercoles 4 de junio de 2025
Personal: 1 maestro, 5 ayudantes, 1 electrico, 3 oficiales en exteriores
Director, Residente y Hsq Obra.
Clima: lluvias intensas todo el día.
Actividades:

se desarrollan, actividades de cielo raso en sotano, en zona de baños, se desarrollan actividades electricas, se realiza resanes de estuco y pintura.

Residente de obra

Residente Inter

jueves 5 de junio de 2025
Personal: 1 maestro, 3 ayudantes, 1 electrico, 3 oficiales en exterior, Director de Obra, Residente y Hog Obra.
Clima: Día nublado todo el día.
Actividades:

Se desarrollan algunas actividades de desalojo en terraza, se realizan enchapes en piso frio, fraguado de enchapes, instación de aparatos sanitarios, algunas actividades electricas en sótano,

Se suspende obra, por momentos de lluvias, por la temporada alta de lluvias para la zona.

Residente de obra

Residente Inter

Martes 5 de agosto de 2025
Personal: 1 maestro, 3 ayudantes, 1 electrico, 3 oficiales en exteriores Director de Obra, Residente y Hog Obra.
Clima: Día soleado
Actividades:

Se reinician actividades, se desarrollan actividades a nivel de terraza, así mismo enchapes en tercer piso, actividades electricas y algunas resanes de estuco y pintura.

Residente de obra

Residente Inter

miercoles 6 de agosto de 2025
Personal: 1 maestro, 5 ayudantes, 1 electrico, 3 oficiales en exteriores
Director, Residente, Hsg Obra.
Clima: mañana y media tarde lluvia moderadas, resto nublado.
Actividades:

se realiza cambios de luminarias en Piso uno, enchapes en piso tres, se retira sobrantes de la terraza.

se realizan resanes de estuco y pintura.

Residente de obra

Residente Inter

jueves 7 de agosto de 2025
Personal: 1 maestro, 5 ayudantes, 1 electrico, 3 oficiales en exteriores
Director, Residente, Hsg de Obra
Clima: Dia soleado.
Actividades:

Se realiza cambios de luminarias en corredores de piso uno se realizan demoliciones, retiro de manto asfaltico viejo y se instala del nuevo manto, tambien se realizan repellos de piso en la terraza.

Residente de obra

Residente Inter

viernes 8 de agosto de 2025
Personal: 1 maestro, 5 ayudantes, 1 electrico, 3 oficiales en exteriores
Director, Residente y Hsq de Obra.
Clima: mañana y media tarde soleado, resto nublado
Actividades:

Se realizan actividades de cambio de manto asfaltico en terraza, resanes de pintura en el sótano, se instalan luminarias en corredores de piso uno y se inicia con oficinas.

Residente de obra

Residente Instr

sábado 9 de agosto de 2025
personal: 1 maestro, 5 ayudantes, 1 electrico, 3 oficiales en exteriores.
Director, Residente y Hsq de Obra.
Clima: mañana soleada, tarde nublada.
Actividades:

Se continua con cambio de luminarias en piso uno dentro de las oficinas, salas de audiencia, etc.
Se realizan resanes de pintura.

Se realizan fundiciones de repello de mortero impermeabilizado al nivel de zoteas.

Residente de obra

Residente Instr.

Powered by CamScanner

Domingo 10 de agosto de 2025
Personal: 1 maestro, 3 ayudantes, 1 electrica, 3 oficiales en exteriores
Director, Residente y Hsg de Obra.
Clima: lluvias moderadas en la mañana (3H) resto nublado.
Actividades:

no se desarrollan actividades en obra.

Residente de obra

Residente Inter

Lunes 11 de agosto de 2025
personal: 1 maestro, 3 ayudantes, 1 electrico, 3 oficiales en exteriores
Director, Residente y Hsg Obra.
Clima: mañana soleada, tarde nublada.
Actividades:

Se termina el cambio de luminarias en piso uno

Se realizan resanes de estuco y pintura.

Se activan escombros y se trabaja en terraza con el cambio del manto asfaltico.

Residente de obra

Residente Inter

martes 12 de agosto de 2025
Personal: 1 maestro, 3 ayudantes, 1 electrico, 3 oficiales en exteriores, Director, Residente y Hsg Obra.
Clima: mañana nublada tarde soleada.
Actividades:

Se inicia cambio de luminarias en corredores del segundo piso.

Se instalan luminarias faltantes a nivel de sótano. así mismo se termina de instalar espejos y demas accesorios de baños.

Se realizan trabajos a nivel de terraza.

Residente de obra

Residente Inter

miercoles 13 de agosto de 2025
Personal: 1 maestro, 3 ayudantes, 1 electrico, 3 oficiales en exteriores Director, Residente y Hsg de Obra.
Clima: lluvias moderadas todo el dia.
Actividades:

Se continua con cambio de luminarias en el segundo piso.

Se realizan retoques de pintura en interiores y exteriores.

no se desarrollan actividades en terraza por mal clima.

Residente de obra

Residente Inter

Powered by CamScanner

Jueves 14 de agosto de 2025
Personal: 1 maestro, 5 ayudantes, 1 electrico, 3 oficiales en exteriores
Prechr, Residente y Hsq de Obra.
Clima: Vientos moderados todo el día.
Actividades:

Se realiza cambio de luminarias en salas de audiencia en piso dos y de los lugares que se van habilitando.

Se realizan resanes de pintura en interiores,

no se desarrollan actividades en exteriores por mal clima.

Residente de obra

Residente Inter

Viernes 15 de agosto de 2025
Personal: 1 maestro, 5 ayudantes, 1 electrico, 3 oficiales, en exteriores
Prechr, Residente y Hsq de Obra.
Clima: mañana soleada, tarde nublada.
Actividades:

Se continua con cambio de luminarias en el piso dos en oficinas y demás.

Se realizan actividades a nivel de terraza, se instala manto asfaltico.

Residente de obra

Residente Inter

sábado 16 de agosto de 2025
Personal: 1 maestro, 5 ayudantes, 1 electrico, Director, Residente, y Hsg de Obra.
Clima: lluvias moderadas todo el día.
Actividades:

Se realiza cambio de lamparas en oficinas en piso dos y se culmina la actividad.

Se realizan resanes de pintura y cualquer detalle que haya quedado.

no se realizan actividades en exteriore Por mal clima.

Residente de obra Residente Inter

Domingo 17 de agosto de 2025
Personal: 1 maestro, 5 ayudantes, 1 electrico, Director, Residente y Hsg de obra.
Clima: día completamente nublado.
Actividades:

no se desarrollan actividades en obra.

Residente de obra Residente Inter

Powered by CamScanner

Lunes 18 de agosto de 2025
Personal: 1 maestro, 5 ayudantes, 1 electrico, Director, Residente y Hsg Obra.
Clima: Dia soleado.
Actividades:

Se realizan actividades en terraza, retiro de sobrantes, sello de juntas, e instalación de manto asfaltico.

Se inicia cambio de luminarias en corredores de piso tres.

Se realizar resanes e instalación de accesorios faltantes en baños de piso tres.

Residente de obra

Residente Inter.

Martes 19 de agosto de 2025
Personal: 1 maestro, 5 ayudantes, 1 electrico, Director, Residente y Hsg Obra.
Clima: Dia nublado.
Actividades:

Se continua con cambio de luminarias en piso tres, se culminan corredores y zonas comunes.

Se realizan repellos impermeabilizados a nivel de terraza.

Residente de obra

Residente Inter.

miercoles 20 de agosto de 2025
Personal: 1 maestro, 5 ayudantes, 1 electrico, Director, Residente y Hsg de Obra.
Clima: lluvias moderadas en la mañana, tarde nublada.
Actividades:

Se realiza cambios de luminarias en oficinas de piso tres.

Se realizan resanes en interiores, ajuste de cielo razos existentes.

no se desarrollan actividades en exteriores por mal clima.

Residente de obra

Residente Inter

jueves 21 de agosto de 2025
Personal: 1 maestro, 5 ayudantes, 1 electrico, Director, Residente y Hsg de Obra.
Clima: lluvias moderadas la mayor parte del dia.
Actividades:

Se continua cambio de luminarias en piso tres y en los lugares habilitados.

Se instala divisiones en acero faltantes y se culmina esa actividad.

no se desarrollan actividades en exteriores por mal clima.

Residente de obra

Residente Inter

Powered by CamScanner

viernes 22 de agosto de 2025
Personal: 1 maestro, 3 ayudantes, 1 electrico, Director Residente y Asg Obra.
Clima: Día soleado.
Actividades:

Se culmina cambio de luminarias en piso tres.

Se desarrollan actividades en terraza, desalojos, repellos impermeabilizados, instalación de manto asfaltico.

Residente de obra

Residente Inter

sábado 23 de agosto de 2025
Personal: 1 maestro, 3 ayudantes, 1 electrico, Director, Residente y Asg de Obra.
Clima: mañana lluvias moderadas, tarde soleada.
Actividades

Se inicia cambio de luminarias en piso cuatro.

Se realizan resanes de pintura en piso cuatro.

Se realizan desalojos a nivel de terraza.

Residente de obra

Residente Inter

Powered by CamScanner

Domingo 24 de agosto de 2025
Personal: 1 maestro, 3 ayudantes, 1 electrico, Director, Residente, Hsg de Obra.
Clima: llovio intenso la mayor parte del día.
Actividades:

no se desarrollan actividades en obra.

Residente de obra

Residente Inter

Lunes 25 de agosto de 2025
Personal: 1 maestro, 3 ayudantes, 1 electrico, Director, Residente y Hsg de Obra.
Clima: lluvia moderada en la mañana, tarde soleada.
Actividades:

Se continua con cambio de luminarias en Piso cuatro,

Se continuan actividades a nivel de terraza.

Se realizan resanes de pintura en Piso cuatro.

Residente de obra

Residente Inter

martes 26 de agosto de 2025
Personal: 1 maestro, 3 ayudantes, 1 electrico, Dicetor, Residente y Hsg Obra.
Clima: lluvias moderadas en la mañana. tarde nublado
Actividades:

Se continua con cambio de luminarias en piso cuatro.
Se instala recibidor en RH en oficinas de Piso cuatro.
Se realiza resanes de pintura.

no hay trabajo en exteriores por mal clima.

Residente de obra

Residente Inter

miercoles 27 de agosto de 2025
personal: 1 maestro, 3 ayudantes, 1 electrico, Dicetor, Residente y Hsg Obra.
clima: lluvias moderadas en la mañana, tarde nublado.
Actividades:

Se continua con cambio de luminarias en piso cuatro.

Se realiza cambio de cielo raso en oficina de piso cuatro. así mismo,

Se realizan resanes de pintura en piso cuatro.

Residente de obra

Residente Inter

Powered by CamScanner

Jueves 28 de agosto de 2025
personal: 1 maestro, 5 ayudantes, 1 electrico, Director, Residente y Ing Obra.
clima: llovizno moderadoo la mayor parte del día.
Actividades

se realiza cambio de luminarias en Piso cuatro.

se realiza cambio de cielo raso en oficinas.

se continua con resanes de estuco y pintura.

no se realizan actividades en exteriores por mal clima.

Residente de obra

Residente Inter

Viernes 29 de agosto de 2025
personal: 1 maestro, 5 ayudante, 1 electrico, Director, Residente y Ing Obra.
clima: llovizna moderada en la mañana, tarde nublada.
Actividades:

se continua con cambio de luminarias en cuarto Piso.

se realizan retoques de estuco y pintura en Piso cuatro.

se desarrollan algunas actividades para finalizar en terraza.

Residente de obra

Residente Inter

Sábado 30 de agosto de 2025
Personal: 1 maestro, 5 ayudantes, 1 electrico, Director, Residente, y Hsg obra.
Clima: lluvias moderadas en la mañana, todo nublado.
Actividades:

Se ultima cambios de luminarias en todo el edificio.

Se continua con resanes de estuco y pintura en piso cuarto.

Se desarrollan ultimas actividades en terraza.

Residente de obra

Residente Inter

Domingo 31 de agosto de 2025.
Personal: 1 maestro, 5 ayudantes, 1 electrico, Director, Residente y Hsg Obra.
Clima: lluvias moderadas la mayor Parte del día.
Actividades:

no se desarrollan actividades en obra.

Residente de obra

Residente Inter

Powered by CamScanner

lunes 1 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Personal: 1 oficial, 1 electrico, Director, Residente y Hsg de Obra.
clima: Dia soleado.
Actividades.

Se realiza cambio e instalación de cielo raso faltante en piso cuatro.

Se continuan con algunos ajustes finales electricos en todo el edificio, revisión de sensores, luminarias etc.

Se empieza jornada de aseo general.

RESIDENTE DE OBRA.

Residente Inter

martes 2 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Personal: 1 oficial, 1 electrico, Director, Residente y Hsg de Obra.
clima: Dia nublado.
Actividades:

Se realiza cambio de cielo rasos deteriorados en piso cuatro, se hacen remates.

Se continua con aseo general.

RESIDENTE DE OBRA

Residente de Inter

miercoles 3 de septiembre de 2025
Personal: 1 oficial, 1 electrico, Director, Residente y Hsg Obra

clima: lluvias moderadas en la mañana y tarde nublada.
Actividades:

Se cambian y ajusta cielo raso en piso tres para entregarse todos los espacios a satisfacción.

Se revisan puertas que cierren y ajusten bien.

Se continua con jornada de aseo.

Residente OBRA.

Residente Inter

jueves 4 de SEPTIEMBRE de 2025
Personal: 1 oficial, 1 electrico, Director, Residente y Hsg Obra

clima: Día soleado.
Actividades:

Se realiza remates de tapete de gimnasio y se culminan actividades de cambio de cubierta.

Se continua con aseo general.

Se hace revisión general para que todas la obra quede en completo orden.

Residente OBRA

Residente Inter

viernes 5 de septiembre de 2025
Personal: 1 oficial, 1 electrico, Director, Residente y Hsq Obra.

clima: Día soleado.
Actividades:

Se culmina asco general en todo el edificio; Para entrega a satisfacción.

Se realiza recorrido general para verificar que toda la parte electrica intervenida se encuentra en normal y completo funcionamiento.

Se verifican pinturas que todo se encuentre limpio y todas las superficies de acuerdo con lo especificado.

Se verifican puertas, divisiones en acero y demas, que cumplan con su propósito y normal funcionamiento.

Se verifica el normal fncionamiento de los muebles en RH instalados.

y se hace una inspección general a todo el edificio.

culmina OBRA

Ing Alfredo Muñoz
Residente OBRA

Residente Inter.

ANEXO 14
INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

INFORME No. 09

INFORME SEGUIMIENTO MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Contrato de obra N°CO1.PCCNTR.6947019: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO".

ELABORÓ:

ERIKA DANIELA ARIAS REVELO

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PERIODO COMPRENDIDO: PERIODO 9 DE 1 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

MOCOA PUTUMAYO

2025

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán - Mocoa - Putumayo

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN. 3
2. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA 3
3. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL 4
4. EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES. 4
5. ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 4
6. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 4
7. TRABAJO EN ALTURAS. 4
8. SEÑALIZACIÓN COMPLEMENTARIA 5
9. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5
10. INSPECCION DEL ESTADO Y USO ADECUADO DE LOS EPP 5
11. CAPACITACIONES Y CHALAS PREOPERACIONALES ENSEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .. 6
12. INDUCCIONES CONCIENTIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO. 6
13. PAUSAS ACTIVAS 6
14. AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL 7
15. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES. 8

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán - Mocoa - Putumayo

1. INTRODUCCIÓN.

El presente documento es el informe N°09 de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se relaciona las actividades de SST, del contrato Contrato de obra N°CO1.PCCNTR.6947019: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO". Dentro de las actividades realizadas en obra durante el periodo ejecutado se realiza por medio de inspecciones de seguridad correspondientes a la interventoría, de esta manera se determinan las condiciones laborales teniendo en cuenta el riesgo al cual labora el personal. Dentro de las actividades de inspección de SST, se hace la verificación documental y operativa con el fin de verificar la garantía de un trabajo seguro.

El cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido un compromiso para el contratista COINCO primando siempre la promoción y prevención de accidentes y enfermedades laborales mejorando las condiciones de trabajo con el proceso PHVA, Planear, Hacer, Verificar y Actuar, haciendo evaluación y corrección para tener como resultado un plan de mejora activo.

Realizar controles de factores de riesgo en las condiciones de trabajo evidenciadas permite implementar de manera adecuada un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde a las actividades que el contratista programe, realizando diferentes actividades que permiten incrementar la seguridad la seguridad física y la salud mental de los colaboradores afianzando su desarrollo laboral dentro de la programación de las actividades de obra.

A continuación, se presenta información general del contrato de obra, así como también se especifican las actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a la normatividad (Decreto 1443 de 2014, Decreto 1072 de 2015, Resolución 312 de 2019), en la ejecución de las actividades en relación a la inspección y seguimiento diario.

2. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

En la siguiente tabla se relaciona al personal que ingresó a dar inicio en las actividades del presente contrato.

	Personal Administrativo						
NOMBRE	**CARGO**	**C.C**	**INGRESO**	**EGRESO**	**EPS**	**F. P**	**ARL**
Marlon Arteaga	director Obra	1085249647	11/02/2025		SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA
Luis Alberto Muñoz	Residente	1124313123	11/02/2025		EMSSANAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA
Mayerli Carolina Aránzazu	Residente SST	1.124.862.736	11/02/2025		COLPENSIONES	NUEVA EPS	AXA COLPATRIA
	Personal Operativo						
NOMBRE	**CARGO**	**C.C**	**INGRESO**	**EGRESO**	**EPS**	**F. P**	**ARL**

Yeison García	Maestro	23419583	11/02/2025	05/06/2025	COOSALUD		AXA COLPATRIA
Silvio Meneses	Aux de obra	18182206	11/02/2025	05/06/2025		PORVENIR	AXA COLPATRIA
Moises Perez	Auxiliar de Obra	4970647	11/02/2025	05/06/2025		SALUD TOTAL	AXA COLPATRIA
Raul Guillermo Diaz Morales	Oficial	5447111	11/02/2025	05/06/2025			AXA COLPATRIA
Jhoefry Jose Bustamante	ayudante	5626299	11/02/2025	05/06/2025	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA
Yovani Benavides	Oficial	98380300	11/02/2025		SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA
Edgar Diaz	Oficial	98332547	22/04/2025	05/06/2025	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA
	PERSONAL ELECTRICISTA						
NOMBRE	**CARGO**	**C.C**	**INGRESO**		**EPS**	**F. P**	**ARL**
Darwin Jiménez	OFICIAL	15571872		05/06/2025			AXA COLPATRIA

3. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Se anexan para el periodo del informe la consolidación del cumplimiento de pago de planillas de parte del contratista, la cual es revisada previamente.

4. EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES.

En este periodo no se registraron ingresos por lo tanto el contratista no reporta la realización de exámenes de ingreso.

5. ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Durante el transcurso de los periodos en operación de la obra se observó que el personal es dotado de todos los elementos básicos para realizar las actividades requeridas, se realizó de parte de la interventoría la inspección de los EPP entregados y en caso de cambios realizar la respectiva reposición, de igual manera se observó el adecuado uso de elementos de seguridad. No se anexa registro fotográfico en este periodo.

Anexo 1: Entrega de elementos de protección personal

6. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

Durante este periodo no se identificaron accidentes o incidentes dentro del grupo que comprende el personal del presente contrato de igual manera se evidencia el control y verificación de las condiciones inseguras a las que se enfrentan.

7. TRABAJO EN ALTURAS.

Para dar cumplimiento al presente contrato están programadas actividades en las cuales se realizarán trabajos de alto riesgo en alturas, hasta el momento no se han dado inicio a dichas actividades, es por eso que de parte de la interventoría se vienen realizando sugerencias para la preparación del proceso de inicio de estas.

8. SEÑALIZACIÓN COMPLEMENTARIA

La señalización reglamentaria ha sido permanente para la regulación de velocidad. Interventoría recomienda realizar seguimiento a esta, garantizando su funcionalidad y visibilidad.

9. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se verificó que durante este mes que se continuara realizando las actividades de sensibilización y cultura de auto cuidado donde el componente SST realiza charlas de manera eventual antes de iniciar la jornada laboral en donde se busca informar sobre los riesgos inherentes en sus labores diarias, La Interventoría SST recomienda continuar realizando esta actividad que refuerza los conocimientos y cuidados individuales y grupales dentro de las actividades de obra programadas. Se verificó el uso adecuado de los EPP y la dotación.

10. INSPECCION DEL ESTADO Y USO ADECUADO DE LOS EPP

Se verificó que el componente SST continúa dando cumplimiento en la entrega de elementos de protección personal contra lluvias como es el traje impermeable al personal que estaba pendiente, de esta manera se subsana los compromisos con el personal y se contrarresta la posibilidad de enfrentar accidentes o enfermedades laborales. *Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Titulo IV, Capitulo II De Los Equipos Y Elementos De Protección, Artículo 176 a 201*).

En este periodo se pudo observar el mal uso de los EPP y se evidencia falta de entrega de los mismos en solicitud a la necesidad de las actividades a realizar, se hace de parte de la interventoría la sugerencia de realizar inspección y mejora al mismo.

Ver Anexo 4: Seguimiento EPP





Ilustración 1. Inspección del uso adecuado de los EPP.

11. CAPACITACIONES Y CHALAS PREOPERACIONALES ENSEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La realización de capacitaciones del personal es de vital importancia ya que de esta manera se previenen accidentes y enfermedades laborales, que se pueden dar paso por las actividades y procesos del proyecto teniendo en cuenta los estándares establecidos por el SG-SST. *Decreto 1072, artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en seguridad y salud en el trabajo – SST. El empleador o contratante debe definir los requisitos de conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo necesarios para sus trabajadores.*

Anexo 5: charlas preoperacionales

- Manipulación de herramientas eléctricas
- Importancia de conservar la bioseguridad
- Reforzar el uso de los elementos de protección personal
- El cuidado
- En casa te esperan



Ilustración 2. Charlas y Capacitaciones

12. INDUCCIONES CONCIENTIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO.

La interventoría verificó que los estándares y normas de seguridad terminaran con éxito se observó la no realización de notificación de riesgos laborales, con el propósito de brindar una efectiva orientación de los riesgos, su clasificación, las funciones que desempeñará los fines y objetivos de la empresa, su estructura y demás temas relacionados con el Sistema de Gestión, de igual manera se realiza evaluaciones del conocimiento adquirido en esta actividad de vital importancia para la realización de actividades.

13. PAUSAS ACTIVAS

Se continua realizando actividades de pausas activas, dinámicas y calentamiento o calistenia, antes, durante y al finalizar la jornada laboral estas actividades fortalecen a los trabajadores debido que por medio de ellas se puede recuperar energías, fortalecer el

desempeño laboral y aumentar la eficiencia en el desarrollo de las actividades propuestas en el día a día para continuar con el proyecto, estas actividades ayudan a minimizar las enfermedades osteomusculares y reducir el estrés laboral.

De esta manera se evidenciaron las practicas de alternativas saludables dentro de los horarios laborales que afianzan la motivación y evitan el estrés laboral.



Ilustración 3. Pausas activas preoperacionales.

14. AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL

Se verificó la documentación de COINCO y el cumplimiento de sus obligaciones legales y que realice las respectivas afiliaciones y aportes al Sistema General de seguridad Social - SGSS de los empleados vinculados al proyecto. Para este periodo se realizó el retiro del personal teniendo en cuenta los términos de la suspeción para verificar se anexa planilla de seguridad social.

15. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

Durante la ejecución de este periodo de obra se pudo observar la colaboración y compromiso de parte del componente SST y la alta dirección con un avance positivo de mejora continua en los procesos de atención, cuidado y prevención dirigida al bienestar de los trabajadores, colaboradores y demás personal perteneciente al proyecto, de la misma manera se observó el cuidado preventivo a los equipos, maquinarias, herramientas e instalaciones, de esta manera el contratista COINCO da cumplimiento al SG-SST en su Decreto 1072 de 2015 como regulador de seguridad y salud en el trabajo de igual manera se vio el cumplimiento en la aplicación del protocolo de bioseguridad.

La interventoría realizó de manera continua el acompañamiento en los procesos y actividades programados por el contratista de igual manera se realizó sugerencias y recomendaciones con el fin de mejorar las condiciones de trabajo, se realizó identificación de riesgos y peligros presentes en obra logrando de la mano del componente SST mitigarlos implementando de manera adecuada el plan de emergencia.

ERIKA DANIELA ARIAS REVELO
Profesional SST

ANEXO 15
INFORME AMBIENTAL.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.6947019

OBJETO:
REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA



CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:
ING. ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

1 **DE** SEPTIEMBRE **AL** 5 **DE** SEPTIEMBRE **2025**

MOCOA – PUTUMAYO

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galan – Mocoa – Putumayo

INTRODUCCION

Las políticas ambientales y las normas legales establecidas en Colombia, determinan claramente la compatibilidad que debe existir entre la ejecución de los proyectos de infraestructura civil que se desarrollan y la conservación del Ambiente basados en criterios de Desarrollo Sostenible, razón por lo cual las entidades contratistas, elaboran un Plan De Manejo Ambiental (PMA), dónde se identifican, evalúan, valoran los posibles impactos y alteraciones al ambiente que se pueden generar durante la ejecución de éste tipo de proyectos para así establecer las medidas requeridas para prevenir, controlar, mitigar o compensar éstos impactos.

Mediante el presente informe ambiental tiene como objetivo evaluar y mitigar los impactos ambientales asociados con la ejecución de las obras de mantenimiento correctivo y preventivo en el Palacio de Justicia. Este documento se elabora con el fin de presentar un trabajo detallado durante el periodo comprendido entre 5 agost - 31 agost del año 2025 de componente ambiental que hace parte del Proyecto denominado; REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA.

La interventoría desde la parte ambiental hace la supervisión y control de todas las actividades ejecutadas por el contratista de obra para mitigar los impactos ambientales generados por la construcción del proyecto antes en mención, es claro que toda obra genera un impacto al ambiente, una de las herramientas fundamentales para la verificación de este, se lo realiza mediante la revisión del Plan De Manejo Ambiental (PMA), herramienta con la cual se tendrá un control de las afectaciones realizadas al entorno, teniendo como medio, el registro de seguimiento ambiental, que nos ayudara a la verificación de información, documentos, soportes que permitan evaluar el cumplimiento del contratista y de esa manera tomar las acciones necesarias que garanticen el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el componente ambiental, por parte de interventoría se realizara la respectiva revisión y aprobación del PMA, los informes de avance de cumplimiento de acuerdo al cronograma presentado y a lo exigido en los pliegos de condiciones del mismo.

1. PROBLEMÁTICA

La infraestructura física del Palacio de Justicia es fundamental para garantizar la adecuada prestación de los servicios judiciales, ofreciendo un entorno seguro, funcional y digno tanto para los ciudadanos como para los servidores públicos. Sin embargo, con el paso del tiempo y debido al uso continuo de las instalaciones, surgen diversas problemáticas que comprometen la operatividad, seguridad y conservación del edificio, lo que hace necesaria la implementación de un contrato para realizar obras de mantenimiento correctivo y preventivo.

Entre los principales problemas que justifican este contrato se encuentra el deterioro de elementos estructurales, causado por factores como el desgaste natural, la exposición a condiciones climáticas adversas y el uso intensivo de los espacios. Este deterioro se manifiesta en grietas, filtraciones, corrosión de materiales metálicos y debilitamiento de techos, paredes y pisos. Asimismo, los sistemas eléctricos, hidráulicos y de ventilación pueden presentar fallas debido a su antigüedad o falta de mantenimiento, generando riesgos para los usuarios y posibles interrupciones en el servicio.

Además, estas deficiencias afectan la imagen institucional, ya que un edificio en mal estado transmite una percepción de descuido y falta de compromiso con la justicia. Por otra parte, la falta de cumplimiento con normativas de seguridad, accesibilidad y sostenibilidad puede derivar en sanciones legales y en un impacto negativo sobre el entorno ambiental.

En este contexto, el contrato se plantea como una solución al deterioro actual que vive la infraestructura física del palacio de justicia del municipio de Mocoa, departamento del Putumayo, para prevenir daños mayores y garantizar la sostenibilidad de la infraestructura a largo plazo, preservando así su funcionalidad y su rol como símbolo del sistema de justicia.

2. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.1 Descripción del proyecto

El desarrollo de las actividades como reparación de techos, paredes y pisos, mantenimiento de sistemas eléctricos e hidráulicos, pintura y acabados y otros trabajos correctivos y preventivos necesarios del contrato de la obra nos lleva a solucionar el inconveniente, que radica en el actual deterioro que se encuentra la infraestructura física del palacio de justicia municipio de Mocoa Departamento del Putumayo, dado que no cuenta con instalaciones apropiadas, generando incumpliendo con la normatividad y regulaciones vigentes en materia de seguridad, salud ocupacional y accesibilidad, como también, la preservación de la imagen institucional, un edificio bien mantenido y restaurado refleja la imagen de la institución y su compromiso con la justicia y el servicio a la comunidad.

Para el efecto, el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Distrito Pasto, presentó el proyecto "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA"; que fue viabilizado y aprobado, para financiar su ejecución.

2.2 Localización del proyecto

La ejecución de las actividades contractuales se encuentra localizadas en el Departamento del Putumayo ubicado al suroeste del país, en la región Amazónica.

En el municipio de Mocoa que se encuentra localizado está ubicado en la parte norte del Departamento del Putumayo, específicamente en el palacio de justicia, Calle 7 No 6 - 42, Barrio Centro.



Ilustración 1: *Localización General del Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo.*
***Fuente**: www.googlemaps.com*

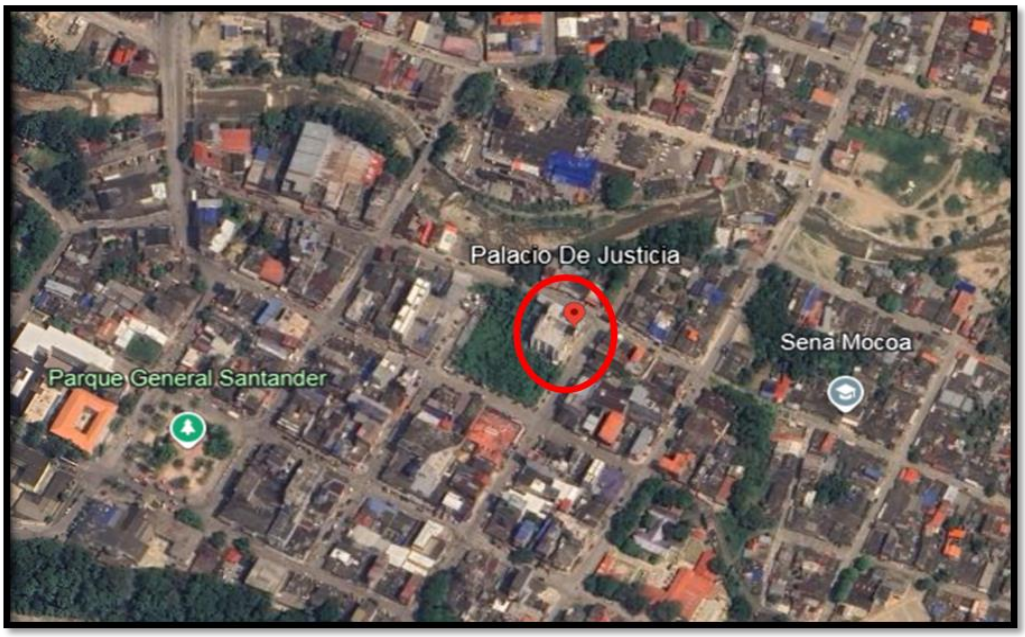


***Ilustración 2**: Localización especifica del área a intervenir en el municipio de Mocoa, Putumayo.*
***Fuente**: www.earth.google.com*

3. REVISIÓN PRELIMINAR DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

De acuerdo a las funciones de la interventoría sobre el componente ambiental, es encargada de la recepción, revisión y seguimiento del PMA, la documentación e informes de cumplimiento ambiental, y todo aquello en el que se involucre este componente, todo esto se debe hacer de acuerdo al cronograma y pliegos de obra, y según los requerimientos de la autoridad ambiental Corpoamazonia como de la supervisión del proyecto que está a cargo. Si la documentación mencionada anteriormente tiene comentarios, observaciones o inconsistencias, el responsable en este caso el profesional ambiental deberá ajustar y subsanarlas dentro del término previsto para su entrega. Con base a lo anterior interventoría hace revisión del Plan de manejo Ambiental, presentado por el contratista de obra mediante oficio RM-001 de 8 noviembre 2024. Una vez realizada la revisión respectiva del PMA, se evidencian que el documento contiene 36 folios dentro de los cuales se encuentran los requisitos, lineamientos ambientales y las tres fases del proyecto como Fase 1 caracterización y diagnóstico, fase 2 ejecución de la obra y fase 3 cierre del proyecto.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES INFORMADO POR INTERVENTORÍA


De acuerdo con la actividad establecida en el contrato de obra CONTRATO N°. CO1.PCCNTR.6947019 DEL 29 DE OCTUBRE 2024, para el presente periodo informado de ejecución del contrato, se realizó verificación seguimiento a las siguientes actividades:

- Programar y coordinar con el Contratista de obra ambiental, las actividades de seguimiento del PMA y la ejecución del contrato e informar previo a su realización.
- Cumplir con la entrega del informe mensual requeridos en los cuales se presente el estado de ejecución, avance del contrato además de las conclusiones y recomendaciones, de acuerdo con la metodología, los formatos y listas de chequeo para tal fin.
- Verificación de la legalidad ambiental de los materiales adquiridos por el contratista de obra, en aras de velar por su calidad, oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas correspondientes; Igualmente se solicitará de manera oportuna la

certificación y/o acreditación de la calidad y legalidad de los materiales al Contratista de obra.

- Verificación del cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad ambiental vigente.
- Control y seguimiento diario de todas las actividades que está ejecutando el contratista de obra, quedando éstas plasmadas en la Bitácora de obra.
- Toma registro fotográfico del estado de avance de la obra en cada visita realizada.
- Elaboración del informe mensual de interventoría.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
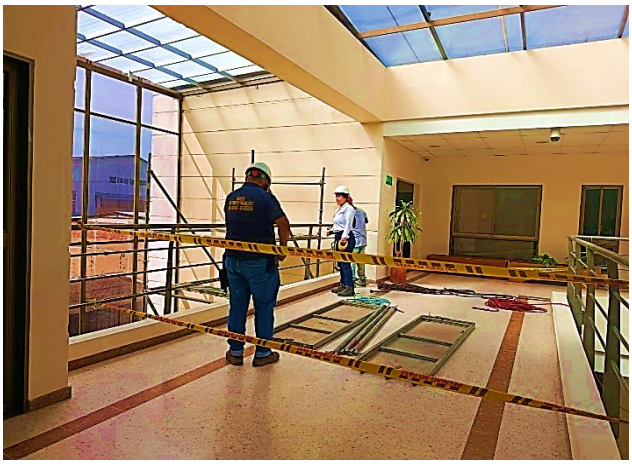
<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto 1: Cerramiento del área a intervenir</td><td>Foto 2: Cerramiento del área a intervenir</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto 3: Retiro de escombros</td><td>Foto 4: Cargue de escombros para disposición final</td></tr>
</table>

5. DESARROLLO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

De acuerdo con el avance en la ejecución técnica de las obras correspondientes al periodo informado, se relaciona el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental establecidas en las fichas de manejo ambiental, prestándole particular atención a las medidas formuladas para mitigar los impactos ambientales negativos que la actividad puede causar sobre el ambiente y la comunidad.

A continuación, se presentan los componentes contemplados dentro del Plan de Manejo Ambiental, el cual se va a desarrollar durante la ejecución de las obras del CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.6947019 DEL 29 DE OCTUBRE 2024 cuyo objeto es "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA".

5.1 Componente Biótico

Dado que el presente programa trata de actividades de "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA", no se ve la necesidad de utilización o intervención de áreas circundantes en las que pueda resultar vegetación, fauna y/o floras afectadas.

5.2 Componente Físico

5.2.1 Control De Emisiones Atmosféricas

La contaminación atmosférica generada durante el desarrollo de un programa procede de tres fuentes principales: emisiones difusas de material particulado, gases de combustión y ruido generado por la operación de maquinaria y demolición de estructuras.
El adecuado control a estas fuentes minimiza los efectos adversos al medio ambiente y disminuye los efectos negativos que éstos pueden ocasionar sobre la salud humana. Así mismo, el control de los niveles de ruido por debajo de los límites permisibles permite reducir los problemas de salud ocupacional que estas actividades puedan generar, así como atenuar las incomodidades producidas a la comunidad.

PLAN DE MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS		
IMPACTOS ASOCIADOS	**MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL**	**SEGUIMIENTO Y MONITOREO**
Aumento de las concentraciones de material particulado, humos, gases y ruido en la atmósfera del Palacio de Justicia y alrededores. Afectación a la salud de los trabajadores y de la comunidad cercana al proyecto. Afectación a la calidad del aire en la zona.	**Emisiones atmosféricas (material particulado y gases)** Cuando se requiera realizar algún tipo de demolición, debido a la magnitud de las actividades, el frente de obra debe estar protegido para el control del material particulado con cerramiento perimetral. Mantener control sobre los materiales de construcción que se encuentren en el frente de obra, mantenerlos debidamente cubiertos y protegidos del aire y el agua. Controlar las actividades de construcción que generan gran cantidad de polvo, regando las áreas de trabajo con agua por lo menos 2 veces al día; realizar esta misma operación a los materiales que se encuentren almacenados temporalmente en el frente de obra (que lo permitan) y que sean susceptibles de generar material particulado. Conservar con una humedad suficiente los materiales generados en excavaciones y demoliciones, para evitar	Verificación de la cobertura y humedecimiento de las zonas de acopio de material sobrante y de insumos de la construcción. Inspección de seguridad para vehículos de carga.

	que se levante material particulado y cubrirlos, mientras se utilizan, con material plástico o cualquier otro material para impedir las emisiones de partículas al aire □ Inspeccionar que los vehículos que cargan y descargan materiales dentro de las obras estén acondicionados con carpas y lonas para cubrir los materiales. Verificar que cuenten con certificados vigentes de revisión tecno mecánica y de gases. □ Solicitar el apagado de los vehículos mientras se encuentren estacionados en el lugar de la obra.	
	Ruido □ Cuando se requiera usar equipos muy sonoros, a más de 80 decibeles se debe trabajar solo en jornada diurna y por períodos cortos de tiempo siguiendo los parámetros legales aplicables al área donde se desarrolla la obra. □ Programar ciclos de trabajo de máximo 2 horas de ruido continuo, cuando el ruido continuo supere el nivel de ruido del ambiente se debe contar con 32 horas de descanso después de las horas de operación o utilizar equipos insonorizados.	

	□ Advertir previamente a la comunidad sobre la utilización de equipos sonoros, con el fin de que tomen las medidas pertinentes. □ Suministrar elementos de control auditivo al personal de la obra. □ Cuando se requiera realizar trabajos que generen ruido durante las horas de la noche es necesario tramitar permiso de ruido nocturno con la autoridad competente. □ Prohibir a los vehículos que en la obra accionen las bocinas, salvo la alarma de reversa.	

5.2.2 Prevención De La Contaminación De Cuerpos De Agua Y Redes De Servicios Públicos.

El agua resultante de las obras de construcción tiene un alto contenido de partículas minerales suspendidas y en ocasiones puede estar mezclada con restos de cemento, concreto u otras sustancias. Estos materiales provocan taponamientos en los conductos en alcantarillas, impiden un tratamiento efectivo en las plantas de tratamiento y generan contaminación en los cuerpos de agua que actúan como sus receptores.

PLAN DE MANEJO DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS		
IMPACTOS ASOCIADOS	**MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL**	**SEGUIMIENTO Y MONITOREO**
□ Alteración de las características del agua. □ Contaminación de redes de alcantarillado	□ No realizar vertimientos de residuos líquidos a las calles, calzadas, canales y cuerpos de agua. □ No eliminar el material sobrante con agua ni dirigirlo a los canales de desagüe.	□ Informe de clasificación de cuerpos hídricos y manejo de aguas. □ Inspecciones de seguridad en las actividades laborales.

	En caso de derrame de mezcla de concreto, ésta se deberá recoger y disponer de manera inmediata, siguiendo los protocolos establecidos. Se prohíben los vertimientos de aceites, pinturas y demás materiales o productos químicos a la red de alcantarillado o su disposición sobre el suelo. Se prohíbe el lavado de vehículos y el descargue de mezclas de concreto en las estructuras de alcantarillado, lo mismo que el vertimiento de cualquier sustancia perjudicial que se genere en la obra. En caso de utilizar concreto mezclado en planta, se recomienda extremar las medidas de precaución en el transporte de la mezcla a los frentes de trabajo, con el fin de evitar vertimientos accidentales.	Control de vertimientos provenientes de obra. Manejo de aguas residuales con empresas autorizadas por autoridades ambientales

5.2.3 Disposición De Residuos Sólidos

Una adecuada clasificación de los residuos sólidos permitirá recuperar, reciclar o reutilizar algunos de los materiales, minimizando así la cantidad de desechos no aprovechados. De esta forma, se reducen costos de disposición final, se optimiza el uso de los materiales y se logra un menor impacto ambiental.

Debido al impacto y a las características de los diferentes elementos resultantes de las obras, se elabora el Plan de Gestión Integral de Residuos PGIR.

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS		
IMPACTOS ASOCIADOS	**MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL**	**SEGUIMIENTO Y MONITOREO**
Modificación de las características del suelo y/o del agua. Afectación de la calidad el aire en la zona. Generación y aporte de sólidos en las redes de alcantarillado. Deterioro del paisaje. Generación de focos de contaminación. Inconformidades por parte de la comunidad aledaña. Afectación a la salud de los trabajadores y de la comunidad cercana al proyecto.	**Residuos no peligrosos:** Realizar la clasificación y separación adecuada de los residuos sólidos. El almacenamiento de los residuos debe hacerse en recipientes tipo caneca plástica con tapa. Los recipientes deben estar rotulados con el nombre de acuerdo con el tipo de residuos. Las etiquetas de los recipientes deben contener información clara y entendible para todos, además de ser resistentes al agua o a otros agentes. Las canecas deben ubicarse en sitios estratégicos o puntos ecológicos. Capacitar y sensibilizar a todo el personal de la obra, sobre la gestión integral de los residuos. Los recipientes no deben tener sobrecarga de residuos. Identificar a las empresas gestoras encargadas de la recolección periódica, transporte y disposición final de los residuos no aprovechables. Identificar empresas o asociaciones de recicladores y realizar la entrega de residuos aprovechables. Al finalizar la jornada, se debe realizar una limpieza general de la zona donde se realicen las obras con el objeto de recoger todos los residuos presentes en el área.	Inspección de seguridad para centros de acopio. Tabla de identificación de residuos sólidos. Certificados y licencias ambientales de los gestores de transporte, tratamiento y disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos. Actas y/o certificados de disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos.

	Residuos Especiales y/o Peligrosos Realizar el manejo adecuado de los residuos especiales y/o peligrosos. Para los residuos peligrosos se deben seguir todos los lineamientos establecidos en la normatividad ambiental vigente para su etiquetado, rotulado, almacenamiento y transporte. Separar los residuos de construcción y demolición RCD como escombros, sobrantes de concreto, morteros, cordones, tuberías, etc., de los demás residuos. Los lugares o zonas de almacenamiento temporal del material reciclable de construcción y demolición deben estar provistos de canales perimetrales estructuras para el control de sedimentos. Los RCD no pueden obstaculizar el tráfico peatonal y vehicular, deben estar apilados, bien protegidos de agentes externos y ubicados en zonas seguras. Se prohíbe: o depositar RCD en zonas verdes, humedales o cerca de cuerpos de agua, o quemar residuos o desechos peligrosos a	

	cielo abierto, □ ingresar residuos o desechos peligrosos en rellenos sanitarios, sino existen celdas de seguridad dentro de éste, autorizadas para la disposición final de este tipo de residuos, la disposición o enterramiento de residuos o desechos peligrosos en sitios no autorizados para esta finalidad por la autoridad ambiental competente, □ El abandono de residuos o desechos peligrosos en vías, suelos, humedales, parques, cuerpos de agua o en cualquier otro sitio. □ Contratar la disposición de los residuos especiales y/o peligrosos con gestores autorizados. □ El manejo, transporte y disposición final de escombros y materiales de construcción, deberá seguir los criterios establecidos por las autoridades competentes.	

5.2.4 Manejo De Movilidad Y Señalización

Las zonas diseñadas para el almacenamiento temporal de los materiales de trabajo y para los trabajos de los desechos deben mantenerse correctamente identificados con cinta de demarcación y con soportes.

Cuando se programe la entrada de vehículos para la descarga o carga de material o la recolección de desechos, es necesario llevar a cabo el control del tráfico con el fin de evitar cualquier incidente de tráfico y crear traumas para los peatones.

Señalar los caminos temporales de paso para peatones y/o vehículos de los cuales es necesario realizar un registro fotográfico e incluirlo en los reportes de administración mensuales.

5.2.5 Uso Y Almacenamiento Adecuado De Materiales De Construcción

Establecer un sistema de manejo adecuado para el transporte, cargue, descargue y manipulación de los materiales de construcción (arenas, grava, triturados, recebos, ladrillos, triturados de arcilla y otros) se evitan pérdidas del mismo y por lo tanto se generan múltiples ventajas de orden financiero, logístico y ambiental. Al mismo tiempo, se reduce la cantidad de escombros y residuos generados, y el aporte de sedimentos y otros contaminantes a las redes de servicios públicos y fuentes de agua.

PLAN DE MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					
IMPACTOS ASOCIADOS Contaminación o alteración de las características del agua, el suelo o el aire. Ocupación del espacio público.					
MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL Almacenamiento de Materiales de Construcción.					
Material	**Alm. en Cubierto**	**Alm. en áreas seguras**	**Alm. sobre estibas**	**Alm. Ligados**	**Requerimientos especiales**
Arena y grava	X				Cubrir con lona grava
Cemento	X		X		Evitar que se humedezcan
Ladrillos, adobes, tejas y adoquine			X	X	almacenar en los embalajes originales hasta el momento de uso, lejos del tráfico de vehículos

Metales	X	X			
Prefabricados				X	
Baldosas	X	X			Envolver con plástico para prevenir que se rayen
Tubería			X	X	Usar separadores es para prevenir que se rueden.
Madera	X	X			Proteger de roturas causadas por mal manejo.
Pinturas		X			Proteger del robo
Material impermeabilizante	X	X			Almacenar Envuelto en Plástico.
Aceites y combustibles		X	X		Almacenar en tanques o toneles cerrados según las cantidades.
Manejo de los materiales: □ Todos los materiales deben provenir de fuentes legales, es decir, deben contar con permisos ambientales y mineros, aspectos que deberán ser certificados por los proveedores.					

Garantizar que el transporte de los materiales se realice en volquetas con cajón totalmente cubierto para impedir el derrame o dispersión de los materiales y de material particulado en el recorrido. La cubierta debe ser de material resistente como lona y estar sujeta firmemente a las paredes exteriores del contenedor. Evitar el escurrimiento del material húmedo durante el transporte. Para ello, asegurarse que el contenedor del vehículo esté construido con una estructura continua que en su contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios. Adecuar los horarios y las vías para la circulación de vehículos de carga a los establecidos por la autoridad local. Demarcar los sitios de almacenamiento con la señalización establecida. Se sugiere el uso de carretillas planas para el traslado del material, para evitar fisuras y daños en el material. Cuando se requiera realizar mezclas de concreto en el sitio de la obra, hacerlo sobre una plataforma metálica o sobre un geotextil de un calibre que garantice que no haya contacto con el suelo, de tal forma que el lugar permanezca en óptimas condiciones. No hacer la mezcla directamente sobre el suelo o sobre las zonas duras existentes. Utilizar formaletas de madera sólo para la fundición de obras de concreto. Se exceptúan los casos en que se requieren formas especiales. En el caso de derrames de mezcla de concreto, es necesario recogerla y disponerla de manera inmediata. Siempre y cuando sea posible (por calidad), mantener húmedo el material de playa que sea necesario (material de recebo), tal como en la construcción de pisos, andenes, etc.
SEGUIMIENTO Y MONITOREO Mapa de identificación de puntos de almacenamientos de materiales de construcción. Inspección de seguridad para centros de acopio.

5.2.6 Protección Del Suelo

En la ejecución de proyectos de obra civil, el suelo puede resultar uno de los recursos más afectado debido la necesidad de su uso para disposición o almacenamiento de materiales de construcción y/o residuos los cuales, debido a un mal manejo o eventos no deseados pueden generar derrames o vertimientos directos lo que conlleva a su contaminación y afectación.

Es por esto qué se deben tomar medidas preventivas para la protección de este recurso y, en caso de alguna afectación producto de las actividades del proyecto,

para su rehabilitación o restitución con el fin de que el suelo afectado vuelva a sus condiciones iniciales o mejores.

PLAN DE PROTECCIÓN DEL SUELO		
IMPACTOS ASOCIADOS	**MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL**	**SEGUIMIENTO Y MONITOREO**
Modificación de las características del suelo. Deterioro del paisaje. Generación de focos de contaminación. Inconformidades por parte de la comunidad aledaña. Afectación a la salud de los trabajadores y de la comunidad cercana al proyecto.	No realizar vertimientos de residuos líquidos a las calles, parques, zonas verdes, separadores, canales, entre otros. Realizar el manejo adecuado de los residuos, aprovechables y no aprovechables, no peligrosos, peligrosos y especiales. Identificar empresas o asociaciones de recicladores y realizar la entrega de residuos aprovechables. Identificar gestores de residuos peligrosos y especiales, así como programas pos consumo, cercanos al lugar de la obra para la gestión adecuada de estos residuos. Al finalizar la jornada, se debe realizar una limpieza general de la zona donde se realicen las obras con el objeto de recoger todos los residuos presentes en el área. En caso de derrames o vertimientos al suelo, realizar su recolección	Plan de intervención y recuperación de suelos. Inspección de seguridad para centros de acopio.

	inmediatamente y reportar el evento. Dependiendo de las características del material o producto derramado, en caso de que sea contaminante o peligroso, establecer el plan de intervención y recuperación del suelo.	

6. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

6.1 Componente Biótico

No hay la necesidad de utilización o intervención de áreas circundantes en las que pueda resultar vegetación, fauna y/o floras afectadas.

6.2 Componente Físico

6.2.1 Control De Emisiones Atmosféricas

Acciones de manejo	Método de verificación	Estado
Cuando se realice demolición, debe estar protegido con cerramiento perimetral para el control del material particulado.	Registro fotográfico	N/A
Los materiales de construcción mantenerlos debidamente cubiertos y protegidos del aire y el agua.	Registro fotográfico	Cumple
los materiales generados en demoliciones, cubrirlos con material plástico o cualquier otro material para impedir las emisiones de partículas al aire.	Registro fotográfico	Cumple
Inspeccionar los vehículos que cargan y descargan materiales estén con carpas y lonas para cubrir los materiales. Verificar que cuenten	Registro fotográfico y actas de inspecciones	Cumple

con certificados vigentes de revisión tecno mecánica y de gases.		
Advertir a la comunidad sobre la utilización de equipos sonoros, con el fin de que tomen las medidas pertinentes.	Registro fotográfico	Cumple
Suministrar elementos de control auditivo al personal de la obra.	Registro fotográfico	Cumple
Prohibir a los vehículos que en la obra accionen las bocinas.	Registro fotográfico	Cumple

6.2.2 Prevención De La Contaminación De Cuerpos De Agua Y Redes De Servicios Públicos

Acciones de manejo	Método de verificación	Estado
En caso de derrame de mezcla de concreto, ésta se deberá recoger y disponer de manera inmediata, siguiendo los protocolos establecidos	Registro fotográfico	N/A
Se prohíben los vertimientos de aceites, pinturas y demás materiales o productos químicos a la red de alcantarillado o su disposición sobre el suelo.	Registro fotográfico	Cumple
Se prohíbe el lavado de vehículos y el descargue de mezclas de concreto en las estructuras de alcantarillado, lo mismo que el vertimiento de cualquier sustancia perjudicial que se genere en la obra.	Registro fotográfico	Cumple
Utilizar concreto mezclado en planta, se recomienda extremar las medidas de precaución en el transporte de la mezcla a los frentes de trabajo, con el fin de evitar vertimientos accidentales	Registro fotográfico	N/A

6.2.3 Disposición De Residuos Sólidos

Acciones de manejo	Método de verificación	Estado
Realizar la clasificación y separación adecuada de los residuos sólidos.	Registro fotográfico	Cumple
Punto ecológico	Registro fotográfico	Cumple
Capacitar y sensibilizar a todo el personal de la obra, sobre la gestión integral de los residuos.	Registro fotográfico y listados de asistencia	Cumple
Empresas gestoras encargadas de la recolección periódica, transporte y disposición final de los residuos no aprovechables.	Registro fotográfico y Certificado de empresa recolectora	N/A
Realizar una limpieza general de la zona donde se realicen las obras con el objeto de recoger todos los residuos presentes en el área.	Registro fotográfico	Cumple
Realizar el manejo adecuado de los residuos especiales y/o peligrosos.	Registro fotográfico	N/A
Separar los residuos de construcción y demolición RCD como escombros, sobrantes de concreto, morteros, cordones, tuberías de los demás residuos.	Registro fotográfico	Cumple
El manejo, transporte y disposición final de escombros y materiales de construcción, deberá seguir los criterios establecidos por las autoridades competentes	Registro fotográfico	Cumple

6.2.4 Manejo De Movilidad Y Señalización

Las áreas destinadas para el acopio temporal de los materiales de obra y para los residuos están debidamente señalizadas con cinta de demarcación
y con soportes tubulares.

Cuando se programa el ingreso de vehículos para cargue o descargue de material o para recolección de residuos, se realiza el control del tráfico tratando de no generar traumatismos para los transeúntes.

6.2.5 Uso Y Almacenamiento Adecuado De Materiales De Construcción

Acciones de manejo	Método de verificación	Estado
Los materiales deben provenir de fuentes legales, es decir, deben contar con permisos ambientales y mineros, aspectos que deberán ser certificados por los proveedores	Certificados de la empresa	cumple
Demarcar los sitios de almacenamiento con la señalización establecida.	Registro fotográfico	cumple
Utilizar formaletas de madera sólo para la fundición de obras de concreto.	Registro fotográfico	N/A
En el caso de derrames de mezcla de concreto, es necesario recogerla y disponerla de manera inmediata.	Registro fotográfico	N/A
No hacer la mezcla directamente sobre el suelo o sobre las zonas duras existentes.	Registro fotográfico	Cumple

6.2.6 Protección Del Suelo

Acciones de manejo	Método de verificación	Estado
No realizar vertimientos de residuos líquidos a las calles, parques, zonas verdes, separadores, canales, entre otros.	Registro fotográfico	Cumple
En caso de derrames o vertimientos al suelo, realizar su recolección inmediatamente y reportar el evento. Dependiendo de las características del material o producto derramado, en caso de que sea contaminante o peligroso, establecer el plan de intervención y recuperación del suelo.	Registro fotográfico	Cumple

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El cumplimiento de las medidas de mitigación propuestas garantizará la ejecución ambientalmente responsable del proyecto, minimizando los impactos negativos y promoviendo un entorno sostenible.
De acuerdo con la revisión al informe ambiental del mes informado, el contratista deberá tener en cuenta las observaciones y recomendaciones entregadas por la interventoría en el presente documento para poder realizar la trazabilidad correspondiente:

- Se recomienda involucrar a todos los actores del proyecto en la implementación de estas medidas
- Realizar capacitaciones sobre buenas prácticas ambientales.
- Se debe tener en cuenta las Notas realizadas sobre el cumplimiento de las actividades para el cumplimiento de las obligaciones dispuestas por Corpoamazonia en cada uno de los actos administrativos que se tienen para el contrato de obra.
- Se recomienda realizar un cronograma de actividades para el desarrollo de todas las acciones de manejo para poder realizar un efectivo seguimiento y control de los componentes.
- Dentro de la documentación de procedencia de materiales se deben presentar los requisitos y documentos mínimos exigidos por la normatividad ambiental vigente, teniendo en cuenta el tipo de material comprado para el proyecto.
- Se recomienda al profesional ambiental de obra entregar documentación de legalidad de todos los servicios adquiridos para el desarrollo de la obra, dándole cumplimiento a la compra de madera, agua utilizada, mantenimiento de unidades sanitarias, entrega y disposición de residuos sólidos.

De esta manera la interventoría solicita de manera oportuna al contratista de obra se realice el envío de los requisitos legales de los proveedores de materiales, los permisos ambientales que haya lugar, así como la documentación que permita verificar la legalidad de los materiales de las empresas con las que los han contratado (madera, agua, disposición final de RCD, material de rio, triturado y/o concreto premezclado); y/o informar el estado en el que se encuentra el cumplimiento de esta obligación para tener conocimiento y poder realizar un

correcto seguimiento y control a las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato de obra.



Javier Villota Rosero
TP:52238-431006
Profesional Ambiental de Interventoría

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.6947019

"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO"



INFORME DE OBRA No 9 FINAL

Periodo comprendido entre el 1 al 5 de SEPTIEMBRE del 2025.

(601) 536 2099
317 681 6442
Calle 93 #11a - 28 /Of 302
Bogotá D.C. - Colombia

EDUARDO MANRIQUE

Representante Legal – Constructora De Infraestructura Colombiana Coinco S.A.S.

1. INTRODUCCIÓN

El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO en desarrollo de sus funciones legales, suscribió con la – CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S, mediante el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.6947019, la ejecución de todos los trabajos necesarios para "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO"

Este informe de obra No 9 Final contiene la información de avance de obra y administrativo del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.6947019, durante el periodo comprendido entre el 1 al 5 de septiembre del 2025**,** cuya "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA-PUTUMAYO" la ejerce el Ing. ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO, mediante contrato de Interventoría No. O1.PCCNTR.6973355 del 1 de noviembre de 2024, suscrito con El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO.

Las actividades descritas en el presente **informe No 9 final** corresponden a actividades finales ejecutadas en todas las áreas interiores y exteriores del edificio del palacio de justicia de Mocoa, Putumayo.

El contrato tiene contemplado la ejecución de obras de mantenimiento del sótano, cuatro pisos de edificación áreas internas y externar incluida la azotea.

2. INFORME EJECUTIVO

GENERALIDADES

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6947019
Clase de contrato:	OBRA
Contratista o conveniente:	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S R/L. EDUARDO MANRIQUE
Objeto:	“REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO”
Valor inicial del contrato:	$ 955.501.990
Valor adicional No.1	$ 440.931.461
Valor total del contrato	$ 1.396.433.451
Fecha de inicio	14/11/2024
Fecha de terminación N° 01:	31/12/2024
Fecha de suspensión N° 01	23/12/2024
Fecha de reinicio N° 01	14/01/2025
Fecha de terminación N° 02	22/01/2025
Tiempo de adición N° 01	DOS MESES
Fecha de terminación según adición N° 01	22/03/2025
Fecha de suspensión No. 2	06/03/2025
Tiempo de suspensión No. 2	Dos semanas
Fecha de reinicio No. 2	21/03/2025
Fecha de terminación según reinicio No. 2	6/04/2025
Fecha modificatorio No. 1	5/04/2025
Fecha de terminación según modificatorio 1	5/06/2025
Fecha de suspensión No. 3	6/06/2025
Tiempo de suspensión No. 3	2 meses
Fecha de reinicio No. 3	5/08/2025
Fecha de terminación final	5/09/2025

3. AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA

La evaluación del periodo N° 9 Final de ejecución del contrato de obra, permite concluir que a la fecha se presenta un valor ejecutado acumulado de $ 1.433.190.807 equivalente a un 100,0% del valor total del contrato.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato de obra:	$ 955.501.990
Valor adicional	$ 440.931.461
Valor acumulado programado para el mes 01:	$ 505.585.098
Porcentaje acumulado programado para el mes 01:	52,91 %
Valor acumulado ejecutado para el mes 01:	$ 65.550.646
Porcentaje acumulado ejecutado para el mes 01:	6,87%
Valor acumulado programado para el mes 02:	$ 213.473.942
Porcentaje acumulado programado para el mes 02:	22,34 %
Valor acumulado ejecutado para el mes 02:	$ 239.479.805
Porcentaje acumulado ejecutado para el mes 02:	25,07%
Valor acumulado programado para el mes 03:	$ 662.898.411
Porcentaje acumulado programado para el mes 03:	69.38%
Valor acumulado ejecutado para el mes 03:	$ 260.045.112
Porcentaje acumulado ejecutado para el mes 03:	27,93 %
Valor ejecutado para el mes 03:	$ 20.565.307
Porcentaje ejecutado para el mes 03:	2,86%
Valor acumulado programado para el mes 04:	$ 794.057.816
Porcentaje acumulado programado para el mes 04:	83.10%
Valor acumulado ejecutado para el mes 04:	$ 339.534.394
Porcentaje acumulado ejecutado para el mes 04:	36,25 %
Valor ejecutado para el mes 04:	$ 79.489.282
Porcentaje ejecutado para el mes 04:	8,32%

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor acumulado programado para el mes 05:	$ 790.539.244
Porcentaje acumulado programado para el mes 05:	56.63%
Valor acumulado ejecutado para el mes 05:	$ 629.487.560
Porcentaje acumulado ejecutado para el mes 05:	51,82 %
Valor ejecutado para el mes 05:	$ 289.953.166
Porcentaje ejecutado para el mes 05:	15,57%
Valor acumulado programado para el mes 06:	$ 1.007.525.733
Porcentaje acumulado programado para el mes 06:	72.16%
Valor acumulado ejecutado para el mes 06:	$ 971.855.975
Porcentaje acumulado ejecutado para el mes 06:	69,61 %
Valor ejecutado para el mes 06:	$ 342.368.415
Porcentaje ejecutado para el mes 06:	17,79%
Valor acumulado programado para el mes 07 según mod. No.2:	$ 837.525.733
Porcentaje acumulado programado para el mes 07 según mod. No.2:	58.46%
Valor acumulado ejecutado para el mes 07 según mod. No.2:	$ 1.003.155.618
Porcentaje acumulado ejecutado para el mes 07 según mod. No.2:	71,86 %
Valor ejecutado para el mes 07 según mod. No.2:	$ 31.299.643
Porcentaje ejecutado para el mes 07 según mod. No.2:	2,25%
Valor acumulado programado para el mes 08 según mod. No.2:	$ 1.333.572.474
Porcentaje acumulado programado para el mes 08 según mod. No.2:	93.07%
Valor acumulado ejecutado para el mes 08 según mod. No.2:	$ 1.398.412.976
Porcentaje acumulado ejecutado para el mes 08 según mod. No.2:	99,83 %
Valor ejecutado para el mes 08 según mod. No.2:	$ 395.257.358
Porcentaje ejecutado para el mes 08 según mod. No.2:	27,97%
Valor acumulado programado para el mes 09 según mod. No.2:	$ 1.433.190.807
Porcentaje acumulado programado para el mes 09 según mod. No.2:	100.00%
Valor acumulado ejecutado para el mes 09 según mod. No.2:	$ 1.433.190.807
Porcentaje acumulado ejecutado para el mes 09 según mod. No.2:	100,00 %
Valor ejecutado para el mes 09 según mod. No.2:	$ 34.709.389
Porcentaje ejecutado para el mes 09 según mod. No.2:	0,17%

4. AVANCE EN TIEMPO DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA.

El tiempo acumulado de labores para la fecha de 5 de septiembre de 2025, contados desde el día 14 de noviembre de 2024, que corresponden al 100.00% de avance en tiempo con respecto al plazo del contrato inicial y actualizados de acuerdo a los nuevos indicadores según el modificatorio número 2.

Plazo inicial:	Dos (2) meses
Porcentaje de avance en tiempo ejecutado acumulado mes 1:	66,67%
Porcentaje de avance en tiempo ejecutado acumulado mes 2:	57,14%
Porcentaje de avance en tiempo ejecutado acumulado mes 3:	83,81%
Porcentaje de avance en tiempo ejecutado acumulado mes 4:	96,19%
Porcentaje de avance en tiempo ejecutado acumulado mes 5: según modificatorio No. 1	85,43%
Porcentaje de avance en tiempo ejecutado acumulado mes 6: según modificatorio No. 1	94,01%
Porcentaje de avance en tiempo ejecutado acumulado mes 7: según modificatorio No. 2	83,58%
Porcentaje de avance en tiempo ejecutado acumulado mes 8: según modificatorio No. 2	99,83%
Porcentaje de avance en tiempo ejecutado acumulado mes 9: según modificatorio No. 2	100,00%

5. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN

El Consejo Superior De La Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional De Administración Judicial Distrito Pasto, ve la necesidad de ejecutar este proyecto, debido a la necesidad de una remodelación en las unidades sanitarias y el mantenimiento general y preventivo del Palacio de Justicia de Mocoa Putumayo.

Para el desarrollo de este proyecto se ejecutan actividades en los siguientes capítulos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
1.	Preliminares
2.	Instalaciones Hidrosanitarias
3.	Red Eléctrica
4.	Muros
5.	Repellos
6.	Enchapes
7.	Estucos
8.	Pintura
9.	Carpinterías
10.	Cubiertas y Cielo Raso
11.	Aparatos Sanitarios y Dotaciones Baños
12.	Señalización
13.	Varios y Aseo General
14.	Ítems no Previstos

El mantenimiento preventivo del Palacio de Justicia de Mocoa es esencial para asegurar la durabilidad, funcionalidad y seguridad del inmueble, de este modo:

Aumento de la vida útil de la edificación: Al realizar mantenimientos preventivos de manera regular, se evita el deterioro prematuro de los materiales y componentes de la edificación, lo que extiende su vida útil y reduce la necesidad de reparaciones costosas o incluso renovaciones completas.

Mejora la seguridad: El mantenimiento preventivo permite identificar y corregir posibles fallos estructurales, eléctricos, de fontanería, entre otros, que podrían poner en riesgo la seguridad de las personas dentro del edificio. Esto ayuda a prevenir accidentes y garantizar un entorno seguro.

Reducción de costos: Si se realizan inspecciones regulares, es posible detectar problemas pequeños antes de que se conviertan en grandes reparaciones. La reparación temprana de pequeños fallos es menos costosa que esperar a que se agraven y requieran trabajos más complejos.

Conservación del valor de la propiedad: Un edificio bien mantenido conserva mejor su valor a lo largo del tiempo.

Cumplimiento normativo: Muchas normativas locales requieren que los edificios mantengan ciertos estándares de seguridad y funcionalidad.

Eficiencia energética: Al mantener adecuadamente los sistemas de climatización, electricidad y fontanería, es posible mejorar la eficiencia energética del edificio, lo que reduce los costos operativos y contribuye a un menor impacto ambiental.

Comodidad y bienestar de los ocupantes: Un mantenimiento adecuado garantiza que los sistemas de climatización, ventilación, y otros servicios básicos estén funcionando correctamente, lo que mejora la calidad de vida y el bienestar de las personas que trabajan en el edificio.

6. LOCALIZACIÓN

Se observa a continuación que el Palacio de Justicia de Mocoa está ubicado en la esquina entre la calle 10 y la carrera 5.



7. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Entre los suscritos: LUIS HUMBERTO PAZ TIMANÁ, mayor de edad y vecino de Pasto, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 12.990.134, quien obra en nombre y representación de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO- NIT No. 800.165.872-6, actuando en su calidad de Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Pasto, designado para ejercer el cargo mediante Resolución de Nombramiento No. 1389 del 18 de agosto de 2021, proferida por la Dirección Ejecutiva Nacional de Administración Judicial; debidamente facultado para contratar, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 3º del artículo 103 de la Ley 270 de 1996, el Acuerdo No. PCSJA19-11339 del 16 de julio de 2019 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura y de conformidad con la Resolución No. 7025 del 31 de diciembre de 2019, expedida por la Dirección Ejecutiva Nacional de Administración Judicial; quien en este documento se denominará LA DIRECCIÓN SECCIONAL, por una parte; y por la otra, la sociedad “CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.”, con NIT. No. 900.628.905-1, representada legalmente por el señor EDUARDO

MANRIQUE PINZON, quien se identifica con cédula de ciudadanía No. 80.189.742 y que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato.

7.1. ASPECTOS TÉCNICOS

7.1.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, las actividades realizadas en obra durante el mes No 9. Periodo comprendido entre el 1 al 5 de septiembre del 2025:

14 ITEM NO PREVISTOS

Siendo este el nuevo capítulo más amplio, se ejecutan todas las actividades, de acuerdo con las especificaciones técnicas y los detalles constructivos disponibles, de este modo se cumple con el objeto contractual y se realiza un barrido general de todas las actividades descritas en este capítulo.

Este capitulo se centro en rematar las actividades finales, lo que permitieron culminar la obra, de acuerdo con el objeto del contrato y recibido a satisfacción por parte de la entidad contratante y la interventoría.

a. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Minuta del contrato de obra: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.6947019

Acta de inicio: suscrita el día 14 de noviembre del 2024. Donde se establece fecha de inicio el 14 de noviembre de 2024 y fecha de terminación el 31 de diciembre de 2024.

Suspensión N° 1: se suspenden actividades por fiestas de fin de año el 23 de diciembre de 2024.

Reinicio suspensión N° 1: Se reinician actividades del contrato el 14 de enero de 2025.

Adición en tiempo N° 1: se adiciona dos meses a la ejecución del contrato.

Fecha de terminación según adición en tiempo N° 1: la obra finaliza el 22 de marzo de 2025.

Fecha de suspensión No. 2: la obra se suspende por segunda vez el 6 de marzo de 2025.

Tiempo de suspensión No. 2: la duración de la suspensión dos se realiza por dos semanas.

Fecha de reinicio No. 2: la obra se reinicia nuevamente el 21 de marzo de 2025.

Fecha de terminación según reinicio No. 2: la nueva fecha de terminación es el 6 de abril de 2025.

Fecha de modificatorio No. 1: 5 de abril de 2025.

Fecha de terminación según modificatorio 1: 5 de junio de 2025.

Fecha de suspensión No. 3: 6 de junio de 2025.

Fecha de reinicio No.3: 5 de agosto de 2025

Fecha de terminación final: 5 de septiembre de 2025

b. CONTROL DE POLIZAS

ANEXO 0

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL ANEXO 0 – Suscripción del Contrato.

NOMBRE	No. Póliza	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	21-44-101454743	$ 191.100.398.00	29/10/2024 a 29/06/2025
Estabilidad y calidad de la obra.	21-44-101454743	$ 191.100.398.00	29/12/2024 a 29/12/2029
Pagos salarios, prestaciones legales.	21-44-101454743	$ 191.100.398.00	29/10/2024 a 29/12/2027

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE Anexo No 0 – Suscripción del contrato.

NOMBRE	No. Póliza	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Responsabilidad Civil Patronal	21-40-101242689	$ 260.000.000.00	29/10/2024 a 29/12/2024
Gastos Médicos	21-40-101242689	$ 260.000.000.00	29/10/2024 a 29/12/2024
Daños Emergentes y Lucro Cesante	21-40-101242689	$ 260.000.000.00	29/10/2024 a 29/12/2024
Prejuicios Extrapatrimoniales	21-40-101242689	$ 260.000.000.00	29/10/2024 a 29/12/2024

ANEXO 1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL ANEXO 1 – Acta de inicio.

NOMBRE	No. Póliza	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	21-44-101454743	$ 191.100.398.00	29/10/2024 a 29/06/2025
Estabilidad y calidad de la obra.	21-44-101454743	$ 191.100.398.00	29/12/2024 a 29/12/2029
Pagos salarios, prestaciones legales.	21-44-101454743	$ 191.100.398.00	29/10/2027 a 29/06/2025

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE Anexo No 1 – Acta de inicio.

NOMBRE	No. Póliza	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Responsabilidad Civil Patronal	21-40-101242689	$ 260.000.000.00	29/10/2024 a 29/12/2024
Gastos Médicos	21-40-101242689	$ 260.000.000.00	29/10/2024 a 29/12/2024
Daños Emergentes y Lucro Cesante	21-40-101242689	$ 260.000.000.00	29/10/2024 a 29/12/2024
Prejuicios Extrapatrimoniales	21-40-101242689	$ 260.000.000.00	29/10/2024 a 29/12/2024

ANEXO 2

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE Anexo No 0 – Prorroga del contrato.

NOMBRE	No. Póliza	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Responsabilidad Civil Patronal	21-40-101242689	$ 260.000.000.00	29/10/2024 a 21/03/2025
Gastos Médicos	21-40-101242689	$ 260.000.000.00	29/10/2024 a 21/03/2025
Daños Emergentes y Lucro Cesante	21-40-101242689	$ 260.000.000.00	29/10/2024 a 21/03/2025

NOMBRE	No. Póliza	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Prejuicios Extrapatrimoniales	21-40-101242689	$ 260.000.000.00	29/10/2024 a 21/03/2025

ANEXO 3

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL ANEXO 3 – Prorroga del contrato.

NOMBRE	No. Póliza	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	21-44-101454743	$ 191.100.398.00	29/10/2024 a 21/09/2025
Estabilidad y calidad de la obra.	21-44-101454743	$ 191.100.398.00	29/12/2024 a 29/12/2029
Pagos salarios, prestaciones legales.	21-44-101454743	$ 191.100.398.00	29/10/2024 a 21/03/2028

c. ASPECTOS FINANCIEROS

En el desarrollo de actividades durante este periodo no se presenta actas parciales.

d. RESUMEN DE IMPREVISTOS A LA FECHA

En el desarrollo de actividades durante este periodo no se presenta imprevistos.

e. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Se envían el material producto de las demoliciones a la escombrera autorizadas por la autoridad ambiental para la zona.

f. INFORMES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Se anexa al presente informe de obra, el informe de seguridad en el trabajo.

CONCLUSIONES, COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES INFORME 9 FINAL


- En el informe de obra No 9, se registra la finalización de la totalidad de las actividades ejecutadas teniendo en cuenta algunas actividades pendientes que se registran en el cuadro siguiente y que en general son actividades referentes a garantía de material o instalación o dificultad para terminar debido a las condiciones climáticas presentes en la ejecución final.

ACTIVIDADES PENDIENTES	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIÓN
Instalación de cubierta en teja UPVC área de gimnasio	13/09/2025	Se retrasa la instalación debido a las fuertes lluvias presentes en la región al finalizar el proyecto.
Instalación de muebles de trabajo COWORKING	27/09/2025	Sin dificultad externa.
Instalación de señalización especial Podo táctil	04/10/2025	Se estaban realizando trabajos de cielo raso en cuarto piso.
Suministro e instalación de letras y escudo en acero inoxidable	04/10/2025	Por cambio en la especificación el proveedor no entregó a tiempo el material.
Suministro e instalación de espejos biselados 5 mm zonas húmedas	04/10/2025	Se solicita garantía de material debido a que se generaron manchas en los espejos instalados y se vio la necesidad del cambio total del material.
Instalación y reparación de cielo raso en piso 4	27/09/2025	Debido a las fuertes lluvias y los respectivos trabajos de impermeabilización de losa cubierta se generaron filtraciones que dañaron cielo raso de cuarto piso.
Resanes y pintura en áreas afectadas por filtraciones	27/09/2025	Debido a las fuertes lluvias y los respectivos trabajos de impermeabilización de losa cubierta se generaron filtraciones que dañaron estucos y pintura de cuarto piso.
Reparación de piso flotante Oficina Coordinación	04/10/2025	Se solicita garantía de material debido a que se levantaron algunas laminas de piso y filtraciones externas generaron humedad fuerte, por lo que se vio la necesidad del cambio total del material.

- Se finaliza con fraguado de pisos y paredes en baterías sanitarias de los pisos 3 y sótano.
- Así mismo, se realiza resane de paredes, tanto en oficinas como en corredores.
- Se realiza resanes y pinturas en exteriores.
- Se realiza instalación de luminarias, tomacorrientes, sensores de movimiento y demás accesorios requeridos según el contrato de obra en la totalidad del edificio.
- Se desarrollan actividades no previstas una vez se aprueba el modificatorio. No. 2.

- Se desarrollan con normalidad las actividades contractuales, con forme a las especificaciones técnicas del proyecto.

- La obra finaliza a completa satisfacción de interventoría y la entidad contratante.



LUIS ALFREDO MUÑOZ BECERRA
Residente de Obra
COINCO S.A.S

(601) 536 2099
317 681 6442
Calle 93 #11a - 28 /Of 302
Bogotá D.C. - Colombia

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cambio de cubierta en zona de gimnasio



Cambio de cubierta en zona de gimnasio

(601) 536 2099
317 681 6442
Calle 93 #11a - 28 /Of 302
Bogotá D.C. - Colombia



Resanes internos de pintura




Resanes internos de pintura

(601) 536 2099
317 681 6442
Calle 93 #11a - 28 /Of 302
Bogotá D.C. - Colombia



Remates zona de gimnasio

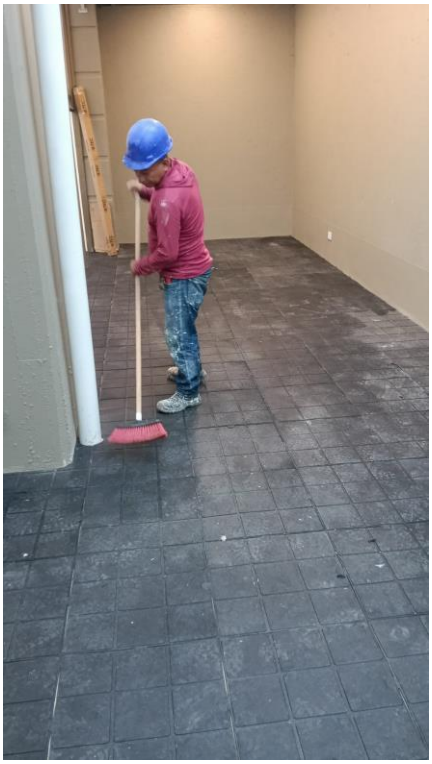

Aseo general

(601) 536 2099
317 681 6442
Calle 93 #11a - 28 /Of 302
Bogotá D.C. - Colombia
