# INFORME DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR

| | ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA<br>DEPARTAMENTO CASANARE<br>INFORME DE SUPERVISIÓN | **CÓDIGO:** F-CT-010 |
|---|---|---|
| | | **VERSIÓN:** 0 |
| | | **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 27/ 05/ 2016 |
| | | **RESPONSABLES:** Todos las dependencias |

| **INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN** | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | **No. 110.2010.186.2026** | **CONVENIO** | |
| **INFORME PARCIAL** | | **INFORME FINAL** | ***X*** |
| **PERIODO DE SEGUIMIENTO** | 28 DE JULIO DE 2026 AL 11 DE AGOSTO DE 2026. | **FECHA DE SEGUIMIENTO** | 19 DE AGOSTO DE 2026 |
| | | | |

| **1. INFORMACIÓN GENERAL** | |
|---|---|
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | MINIMA CUANTIA |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA PUBLICA |
| SECRETARIA QUE GENERA EL PROCESO | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS |
| No CONTRATO / CONVENIO | 110.2010.186.2026 |
| CONTRATISTA | CONTRATISTA: C&C INGENIARK S.A.S |
| NIT / CC | 900557241-4 |
| REPRESENTANTE LEGAL | RICHARD ARMANDO VARGAS VARGAS |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | 74810428 DE SABANALARGA |
| VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO | CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (48.985.489.00) |
| FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS | El municipio cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: un único pago equivalente al cien por ciento (100%) del valor total del contrato, previa presentación del informe de ejecución por parte del contratista, aprobación por parte de la supervisión, factura o documento equivalente, soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales, cuando a ello haya lugar, correspondientes al periodo objeto de pago, así como la suscripción del acta de recibo final a satisfacción. La liquidación del contrato se adelantará posteriormente, en los términos y plazos previstos en la normativa aplicable.<br><br>La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación |

| | |
|---|---|
| | de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.<br><br>La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.<br><br>El contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | 28 DE JULIO DE 2026 |
| PLAZO DEL CONTRATO / CONVENIO | QUINCE (15) DÍAS |
| FECHA DE TERMINANCION | 11 DE AGOSTO DE 2026 |
| FECHA DE RECIBO | 12 DE AGOSTO DE 2026 |

| 2. GARANTIAS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COMPAÑÍA DE SEGUROS** | **RIESGO** | **POLIZA No.** | **VIGENCIA** | **MODIFICACIÓN** | **VIGENCIA** | **VR. ASEGURADO** |
| SEGUROS MUNDIAL | CUMPLIMIENTO | COQ-100009780 | 17/07/2026-11/02/2027 | Anexo 3 | 12/08/2026-22/02/2027 | $ 4.898.548,90 |
| SEGUROS MUNDIAL | ESTABILIDAD DE LA OBRA | COQ-100009780 | 17/07/2026-11/07/2028 | Anexo 3 | 12/08/2026-12/08/2028 | $ 4.898.548,90 |
| SEGUROS MUNDIAL | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | COQ-100009780 | 17/07/2026-11/08/2029 | Anexo 3 | 12/08/2026-22/08/2029 | $ 2.449.274,45 |
| SEGUROS MUNDIAL | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | COQ-100002431 | 17/07/2026-11/08/2026 | Anexo 1 Y 2 | 28/07/2026-22/08/2026 | $ 350.181.000,00 |

## 3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GENERAL | PARTICULAR | | | | | |
| **1. PUNTO CRITICO CAÑO BLANCO** | | | | | | | | |
| 1 | 1.1 | | | Estabilización de talud mediante terraceo y conformación de enrocado con material pétreo del sitio de intervención. | M3 | 190.00 | 133,366.00 | 33,954,900.00 |
| 2 | 1.2 | | | Geodren vial con tubería de drenaje Ø 100 mm, H=1.00 m | M | 41.00 | 86,445.00 | 4,749,563.00 |
| 3 | 1.3 | | | Movilización y desmovilización de equipo pesado | KM | 177.40 | 43,250.00 | 10,281,217.00 |
| | | | | | | | **SUBTOTAL** | **48,985,489.00** |
| | | | | | | | **SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU)** | **48,985,489.00** |
| | | | | | | | **VALOR TOTAL** | **48,985,489.00** |

## 4. VALOR A PAGAR POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

| No. | FECHA | CODIGO | RUBRO | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL | LIQUIDACION |
| 000006 | 17/08/2026 | 2.3.4.45.03.001.32.04.02.05.04 | Realizar la construcción de infraestructura (diques, muros de contención, gaviones, barreras contra el viento, sistemas de drenaje mejorado, etc.) para la reducción del riesgo de desastres en la ribera del río Upía y de las principales quebradas del municipio (Piñalera, Quinchalera, Botijera, San Pedro y La Nuya), asi como en áreas propensas a | $ 44.235.926,00 | $ 44.235.926,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | inundaciones, deslizamientos de tierra erosión e infraestructura vial y de servicios públicos | | |
| 000007 | 17/08/2026 | 2.3.4.45.03.001.32.03.03.03.02 | Adquisición de equipos, suministros, servicios y/o mecanismos de protección financiera destinados a la prevención, mitigación y manejo de emergencias. | $ 4.749.563,00 | $ 4.749.563,00 |

## 5. EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA


| ITEM | DESCRIPCION | SATISFACTORIO | SOBRESA-LIENTE | POR MEJORAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **1. PUNTO CRITICO CAÑO BLANCO** | | | |
| 1,1 | Estabilización de talud mediante terraceo y conformación de enrocado con material pétreo del sitio de intervención. | x | | |
| 1,2 | Geodren vial con tubería de drenaje Ø 100 mm, H=1.00 m | x | | |
| 1,3 | Movilización y desmovilización de equipo pesado | x | | |

Observaciones: Se realiza validación por sistema del pago de seguridad social, de los periodos correspondientes a julio y agosto de 2026, se anexa soporte

## 6. REGISTRO FOTOGRAFICO


**1.1 Estabilización de talud mediante terraceo y conformación de enrocado con material pétreo del sitio de intervención.**




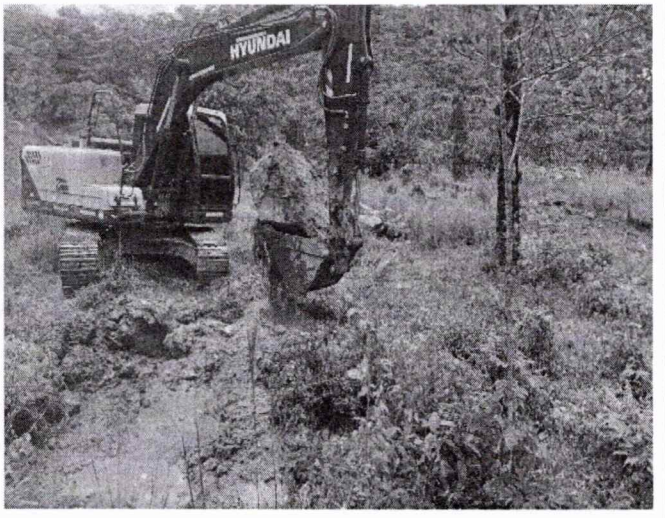





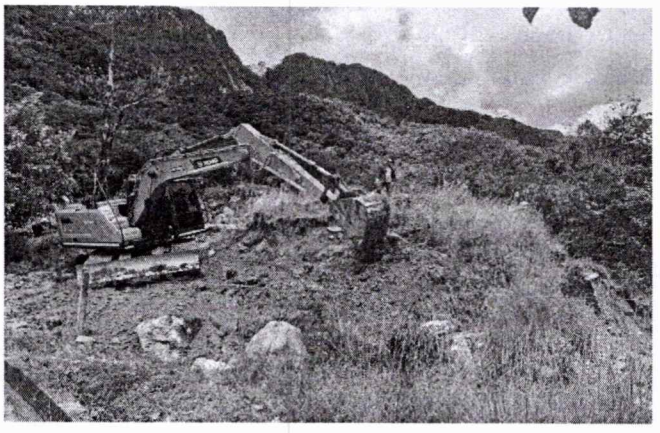



| | | |
|---|---|---|
| | **ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA**<br>**DEPARTAMENTO CASANARE**<br>**INFORME DE SUPERVISIÓN** | **CÓDIGO:** F-CT-010 |
| | | **VERSIÓN:** 0 |
| | | **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 27/ 05/ 2016 |
| | | **RESPONSABLES:** Todos las dependencias |

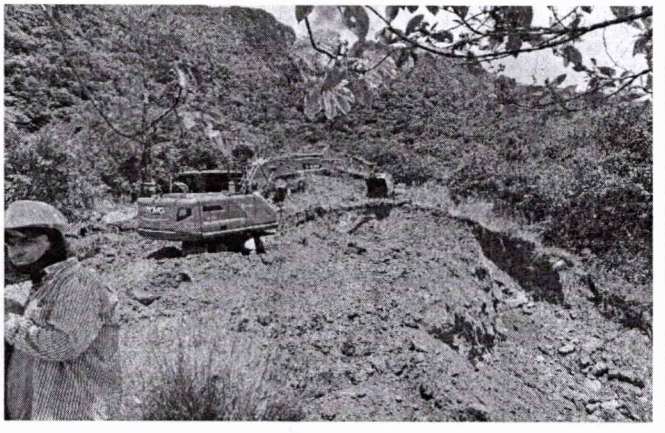


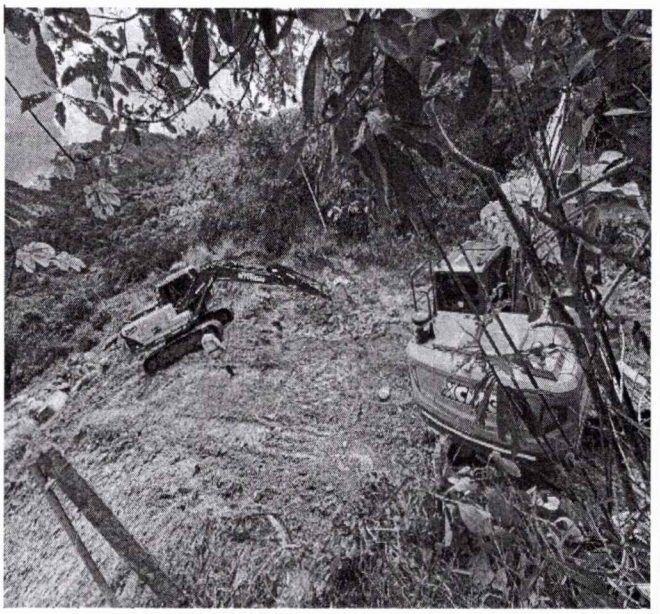

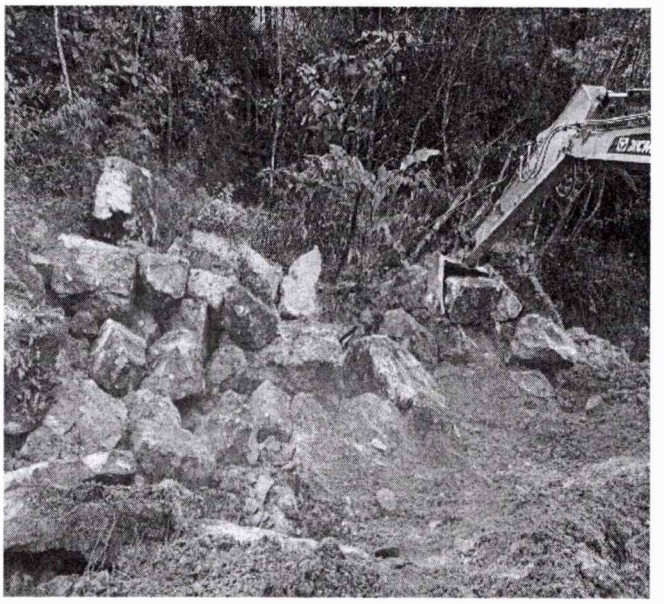


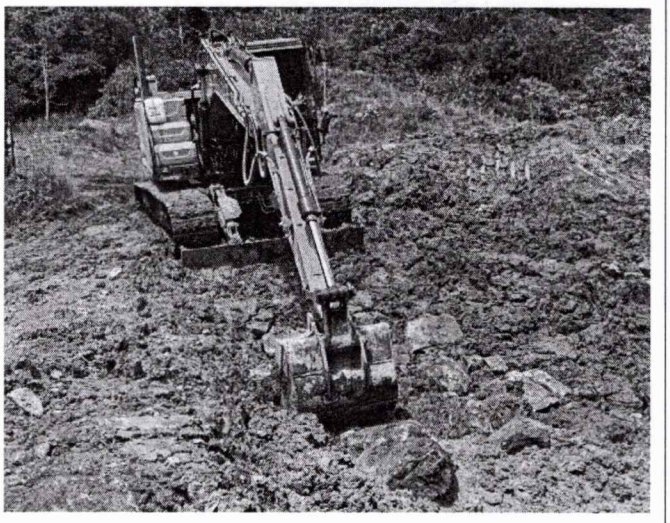

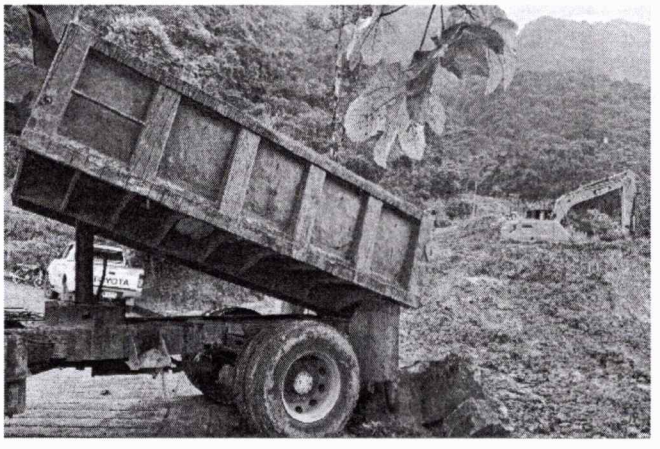


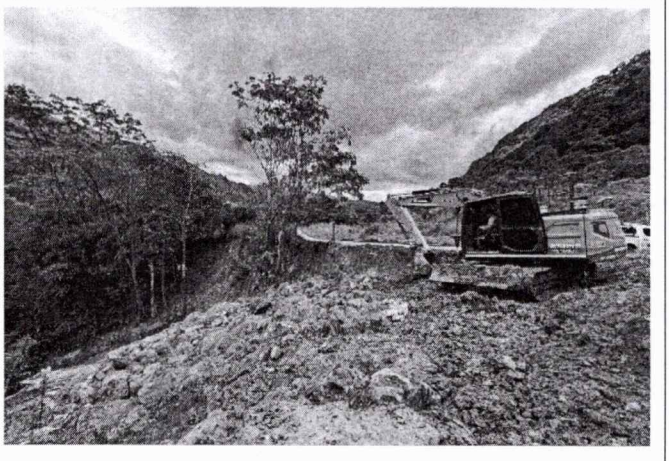


## 1.2 Geodren vial con tubería de drenaje Ø 100 mm, H=1.00 m

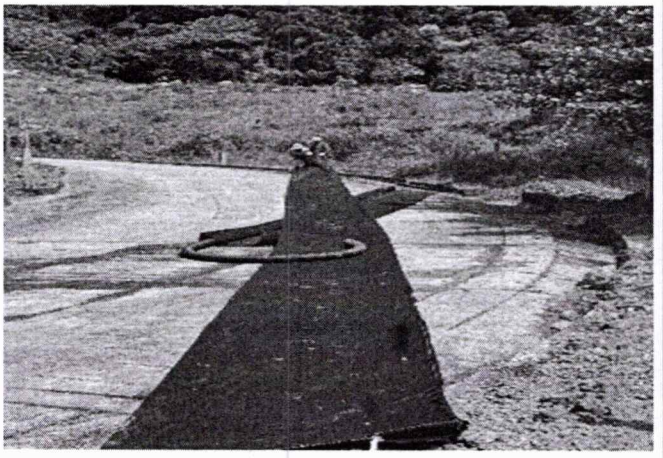




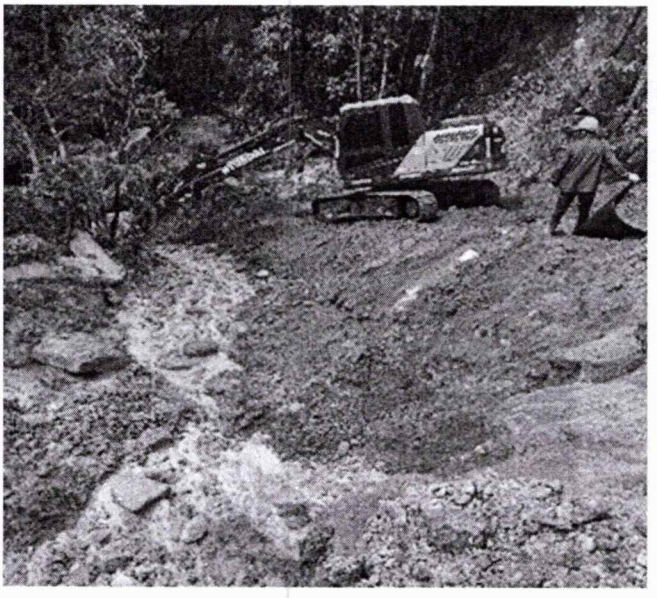

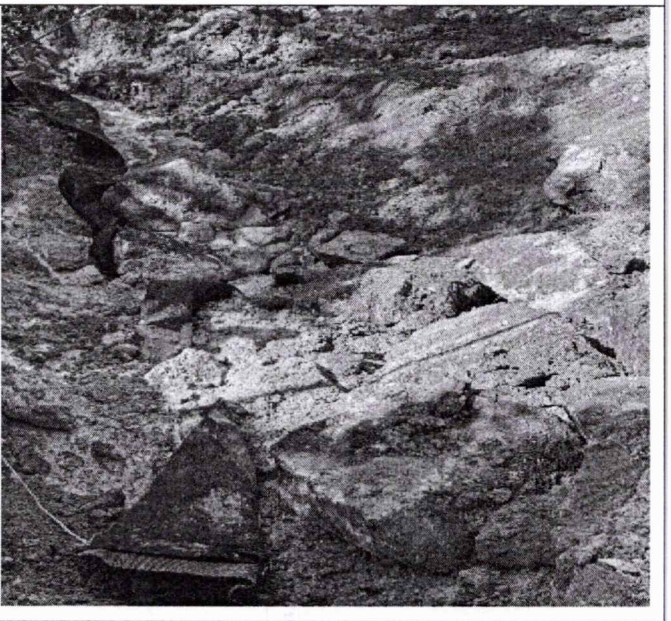



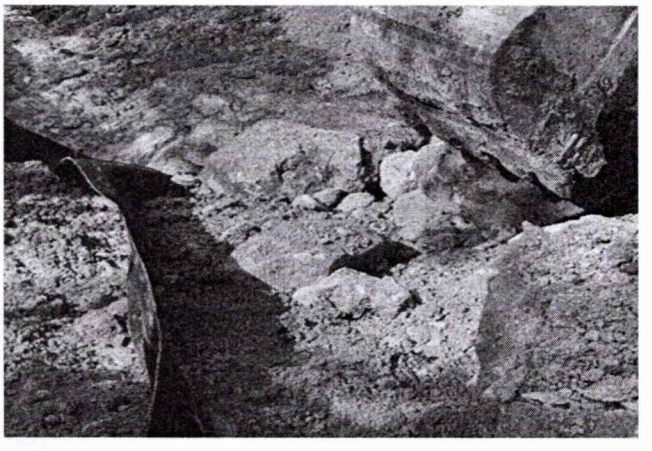


| | ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA<br>DEPARTAMENTO CASANARE<br>INFORME DE SUPERVISIÓN | **CÓDIGO:** F-CT-010 |
|---|---|---|
| | | **VERSIÓN:** 0 |
| | | **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 27/ 05/ 2016 |
| | | **RESPONSABLES:** Todos las dependencias |

## 1.3 Movilización y desmovilización de equipo pesado





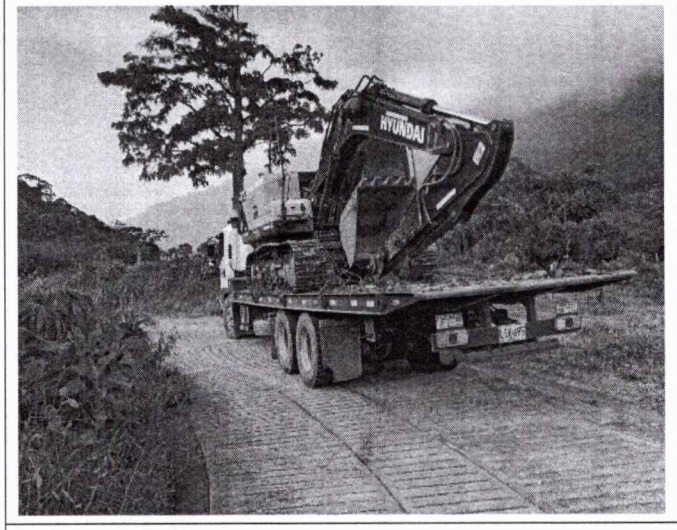








**7. DATOS DEL SUPERVISOR**

| | ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA<br>DEPARTAMENTO CASANARE<br>INFORME DE SUPERVISIÓN | **CÓDIGO:** F-CT-010 |
|---|---|---|
| | | **VERSIÓN:** 0 |
| | | **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 27/ 05/ 2016 |
| | | **RESPONSABLES:** Todos las dependencias |

| | |
|---|---|
| Nombre del Supervisor | Mónica Yulieth Rodríguez Torres |
| Cargo | Secretaria de Planeación y Obras Publicas |
| Firma | Mónica Rodríguez T |
| Nombre de quien elaboró el informe | Yimer Fernando Caro Gaitan |
| Cargo | Profesional de Apoyo S.P.O.P |
| Firma | |
