Anexo No. 13- Informe SST Interventoría.

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SECRETARIA DE EDUCACIÓN – SED
OCTUBRE DE 2025



INFORME SST N°9 DE INTERVENTORÍA LOTE 11
PERIODO: 08 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2026

BOGOTÁ Secretaría de Educación

INFORME SST N° 9

DE INTERVENTORÍA- LOTE 11

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8169112 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ELSA TORRES ARENALES

INTERVENTORÍA


INTERVENTORIA ELSA TORRES ARENALES	***INFORME MENSUAL COMPONENTE SST DE INTERVENTORÍA***
ARCHIVO:	***VERSIÓN: 01***
ELABORO:  ***ANGIE TATIANA CANTOR*** *Interventoría SST* ***REVISO:***  ***ANA MILENA RODRIGUEZ ARIAS*** *Especialista SST*	***APROBÓ:***  ***ELKIN SALAZAR PEREZ*** *Director de Interventoría*
FECHA:	**DEL 08 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2026**

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 8
2. OBJETIVOS GENERALES 9
3. LOCALIZACIÓN DE PROYECTO 9
3.1 UBICACIÓN GENERAL. 11
4. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DE INTERVENTORÍA ETA 12
5. DATOS DEL PROYECTO 14
5.1 DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 14
5.2 DATOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA. 15
6. NOVEDADES DE PERSONAL RETIRADO DE INTERVENTORÍA ETA 16
7. REPORTE DE ACTIVIDADES Y ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD INTERVENTORÍA ETA 16
8. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES DE INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES 18
9. CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA EN CUMPLIMIENTO DEL PG-SST OFERTADO 18
10. REUNIÓN COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ETA 20
11. REUNIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL DE INTERVENTORÍA ETA 21
12. REUNIÓN BRIGADA DE EMERGENCIA DE INTERVENTORÍA ETA 21
12.1 EQUIPO DE EMERGENCIA DE INTERVENTORIA ELSA TORRES ARENALES 21
13. SEÑALIZACIÓN RUTA DE EVACUACIÓN Y PUNTO DE ENCUENTRO INTERVENTORÍA ETA 27
14. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE INTERVENTORIA ETA 27
15. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 28
16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES INTERVENTORIA ETA 34

LISTADO DE ANEXOS

Anexo No. 1 Relación de personal MOC de Interventoría

Anexo No. 2 Soporte de planillas de pago de SS de Interventoría

Anexo No. 3 Acta seguimiento planilla SS

Anexo No. 4 Reunión del COPASST

Anexo No. 5 Reunión del Comité de Convivencia Laboral

Anexo No. 6 Reunión Brigadista de Emergencia

Anexo No. 7 Plan de trabajo en SG-SST de Interventoría

Anexo No. 8 Entrega de EPP

Lista de Tablas

Tabla 1 Dirección de los Colegios a Intervenir. 10
Tabla 2 Control de personal de interventoría. 11
Tabla 3 Contrato de *Interventoría.* 13
Tabla 4 Contrato de Obra LOTE 11. 14
Tabla 5 Retiro de Novedades de Interventoría. 15
Tabla 6 Accidentalidad Laboral. 15
Tabla 7 Indicador de Accidentalidad Laboral. 16
Tabla 8 *Capacitaciones de Interventoría.* 17

Lista de Ilustraciones

Ilustración 1 *Localización del proyecto Georreferenciación localidad de Barrios Unidos y Suba.* 11
Ilustración 2 *Localización hospital universitario Mederi Georreferenciación localidad de Barrios Unidos.* 21
Ilustración 3 *Localización hospital de Suba Georreferenciación localidad de Suba.* 22

1. INTRODUCCIÓN

ELSA TORRES ARENALES INTERVENTORIA, comprometido con la seguridad y salud en el trabajo propósito de generar la mejora continua del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, presenta por medio de este informe el consolidado de actividades del componente SST, dentro del marco del **CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8169112 BOGOTA D.C.** en mejora este informe contiene las actividades que fueron ejecutadas al interior, Durante el periodo de su intervención con el objeto contractual y con los pliegos de condiciones iniciales descritos en el Contrato No. CO1.PCCNTR.8169112 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 cuyo objeto es la **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. (LOTE 04)".**

2. OBJETIVOS GENERALES

Verificar, constatar y garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en las actividades desarrolladas en obra bajo a los lineamientos legales (Resolución 0312 del 2019, decreto 1072 del 2015 y demás) y contractuales establecidos por la secretaria de Educación.
Verificar el cumplimiento de los requisitos legales expuestos en el decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312 de 2019 y los demás requisitos que apliquen según lo estipulado en el **CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8169112**

Garantizar la implementación de las actividades definidas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, del personal contratista y subcontratista, cumpliendo lo definido en el plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo.
Identificación de peligros, evaluación y valoración de los Riesgos, generando las medidas de prevención y control correspondientes para mitigar las causantes de las condiciones inseguras en el desarrollo de las actividades del proceso constructivo ejecutado por el **CONSORCIO COLEGIO MECBOG.**

3. LOCALIZACIÓN DE PROYECTO

La intervención abarca, la interventoría integral contrato de ejecución **N° CO1.PCCNTR.8169112 Bogotá D.C,** para la ejecución de las obras productos de los diagnósticos elaborados por la secretaria distrital de educación en las zonas o predios priorizados correspondientes a la cuidad de Bogotá. D.C de atención de emergencia se encuentran ubicados de la localidad de Barrios Unidos y Suba.

La Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos ha dividido el Grupo Zona norte en siete (07) sedes de las Instituciones Educativas y un grupo de colegios distritales priorizados por emergencia por intervenir en la Zona Norte, en las Localidades de Suba y Barrios Unidos, con el contratista lote 11 con el fin de garantizar una intervención y operación eficiente y eficaz de los recursos económicos priorizados por la SED.

A continuación, se relaciona el listado de los siete Colegios Distritales a intervenir, en las de localidades de Suba y Barrios Unidos, de la ciudad de Bogotá D.C. a intervenir.

Tabla 1 Dirección de los Colegios a Intervenir.

GRUPO	Zona	CPF	Localidad	Colegio	Sede Educativa	SEDE	Dirección
GRUPO 11	NORTE	1217	BARRIOS UNIDOS	REPUBLICA DE PANAMA	Avenida Chile	B	KR 62 # 70 C - 31
GRUPO 11	NORTE	1219	BARRIOS UNIDOS	RAFAEL BERNAL JIMENEZ	Gloria Gaitán A	B	CARRERA 54 No 78-85
GRUPO 11	NORTE	1206	BARRIOS UNIDOS	JUAN FRANCISCO BERBEO	Policarpa Salavarrieta	B	CL 77 # 22 - 66
GRUPO 11	NORTE	1156	SUBA	GONZALO ARANGO	Gloria Lara de Echeverry - Gonzalo Arango	A	CALLE 130 C No 97-71
GRUPO 11	NORTE	1101	SUBA	ALVARO GOMEZ HURTADO	Álvaro Gómez Hurtado	A	CARRERA 100 A No 130-18
GRUPO 11	NORTE	1170	SUBA	JAIME NIÑO DIEZ	Jaime Niño Diez	-	CARRERA 109 B N 145-17
GRUPO 11	NORTE	1113	SUBA	LA GAITANA	La Gaitana	A	TRANSVERSAL 116 C No 136-88

Fuente: Equipo de interventoría - 2025

3.1 UBICACIÓN GENERAL.

Las localidades de Suba y Barrios Unidos determinadas como la Zona Norte para este contrato, se encuentran ubicadas en el extremo norte de la ciudad de Bogotá y limitan por el norte con la localidad de Usaquén por el sur con las localidades de Teusaquillo, Chapinero y Engativá.

Ilustración 1 Localización del proyecto Georreferenciación localidad de Barrios Unidos y Suba.



Fuente: Equipo de interventoría – 2026

4. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DE INTERVENTORÍA ETA

A continuación, se describe el personal profesional y técnico de la interventoría ELSA TORRES ARENALES, adscrito al proyecto Construcción y conservación de establecimientos educativos secretaria de Educación - SED.

Tabla 2 control de personal de interventoría.

Fuente: Equipo de interventoría - 2025

CARGO PROFESIONAL	CANT.	NOMBRE PROFESIONAL	N°. DOCUMENTO ID
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA.	1	ELKIN SALAZAR PEREZ	5.472.355
PROFESIONAL DE APOYO	1	DANIEL FELIPE TALERO ROJAS	1.030.634.359
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	ADRIANA PAOLA MENDEZ NAVARRO	39.582.366
SST INTERVENTORIA	1	ANGIE TATIANA CANTOR HERNÁNDEZ	1.014.196.926
APOYO TECNICO INTERVENTOR	1	ADRIANA GARCIA AVILA	1.049.639.326
ASESOR COSTOS, PRESUPUESTOS, PROGRAMACION DE OBRA	1	FREDY ALEXANDER LEON TARAZONA	79.995.695
ASESOR JURIDICO	1	ANY CAROLINA SAENZ PEÑALOZA	53.529.244
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	ERIKA PAOLA RUIZ BELTRÁN	52.266.454
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1	JUAN RICARDO TORRES SALAZAR	93.401.974
ESPECIALISTA HIDROSANITARIO	1	IVAN COTES DURAN	79.957.556
ESPECIALISTA ELECTRICO.	1	DIEGO ANDRÉS GUTIÉRREZ OCHOA	1.026.559.359

5. DATOS DEL PROYECTO

5.1 DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Tabla 3 Contrato de interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.8169112 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INTERVENTORÍA	ELSA TORRES ARENALES
NIT	63.323.375-2
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
UBICACIÓN	LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, CHAPINERO, SUBA Y USAQUEN – ZONA NORTE LOTE 4.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 796.278.928,00 (Incluido AIU).
ADICION No. 1	$ 37.571.611 (Incluido AIU).
ADICION No. 2	$ 128.714.983 (Incluido AIU).
VALOR TOTAL ADICIONES	$ 166.286.594,00 (Incluido AIU).
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 962.565.522,00 (Incluido AIU).
FECHA DE INICIO	8/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	17/08/2026
PLAZO DEL CONTRATO INICIAL	SIETE (7) MESES
ADICION No. 1	0 MESES
ADICION No. 2	TRES (3) MESES Y DIEZ (10) DIAS
PLAZO DEL CONTRATO FINAL	DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DIAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	ING. ELKIN SALAZAR PÉREZ Correo electrónico: interventorianortel4@gmail.com Cra. 49A No. 94-76 Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL	ELSA TORRES ARENALES etorresare@yahoo.es Cra. 49A No. 94-76 Bogotá D.C.

Fuente: Equipo de interventoría - 2025

5.2 DATOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA

Tabla 4 Contrato de Obra LOTE 11.

CONTRATO DE OBRA No.	CO1.PCCNTR.8155160
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIO MECBOG MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE 1130664687-1 35% CVL INGENIERIA S.A.S 900525406-5 65%
NIT	901973159-5
OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 11
UBICACIÓN	LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS Y SUBA – ZONA NORTE LOTE 11.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.499.103.832,00 (Incluido AIU).
ADICION No. 1	$ 1.164.923.219,00 (Incluido AIU).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 3.664.027.051,00 (Incluido AIU).
FECHA DE INICIO	8/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	07/05/2026
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	17/08/206
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	SIETE (7) MESES
PRÓRROGA	TRES (03) MESES, DIEZ (10) DIAS
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES, DIEZ (10) DIAS
DIRECTOR DE OBRA	ANDRÉS MAURICIO ROSERO RIASCOS
REPRESENTANTE LEGAL	MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE

Fuente: Equipo de interventoría - 2025

6. NOVEDADES DE PERSONAL RETIRADO DE INTERVENTORÍA ETA

Durante el período comprendido entre el 08 de junio y el 07 de julio de 2026, esta Interventoría no reporta retiros de personal profesional adscrito al contrato.

Ver anexo 1. Relación de personal MOC de interventoría (N/A).

7. REPORTE DE ACTIVIDADES Y ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD INTERVENTORÍA ETA

La interventoría ELSA TORRES ARENALES ejecutó y concluyó sus actividades manteniendo en cero los indicadores de accidentalidad, frecuencia y severidad; así mismo, no se presentaron casos de enfermedad, registrando una incidencia y prevalencia en cero.


Tabla 6 Accidentalidad Laboral.

PERIODO DE GESTIÓN MES DEL 08 DE JUNIO 2026 AL 07 DE JULIO 2026

REPORTE GENERAL DE ACCIDENTALIDAD POR PARTE DE INTERVENTORIA ETA-SST

Año	2026											
Mes	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
No. de Accidentes en la Interventoría ETA						0	0					
Accidentes Acumulados						0	0					

INFORMACION DE ACCIDENTE							
No.	NOMBRE DE TRABAJADOR	CEDULA	OBRA/ADMON	FECHA DE AT	DIAS DE INCAPACIDAD	ETA	DESCRIPCION ACCIDENTE



Fuente: Equipo de interventoría – 2026

Tabla 7 Indicador de Accidentalidad Laboral.

Índice	Formula	Resultado
Frecuencia de accidentalidad	$AT = \frac{No\ de\ AT\ durante\ el\ mes}{No\ de\ trabajadores\ en\ el\ mes} x100 = \frac{0}{3} x100\%$	0
Proporción de accidentes de trabajo mortales	$AT = \frac{No\ de\ AT\ mortales\ en\ el\ año}{Total\ de\ AT\ ocurridos\ en\ el\ año} x100 = \frac{0}{0} x100\%$	0
Ausentismo por causa médica	En el mes se perdió 23,07% de días programados de trabajo por incapacidad médica	23,07%

Fuente: Equipo de interventoría – 2026

En el periodo del presente informe, se presentaron 6 días perdidos por incapacidad médica general, generando un índice de ausentismo del 23,07%. El comportamiento del indicador estuvo asociado a los eventos de salud registrados en el período, por lo que se continuará realizando seguimiento y control para prevenir la recurrencia de casos.

8. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES DE INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES

A continuación, la Interventoría presenta las planillas de pago de seguridad social del personal de interventoría ELSA TORRES ARENALES asociado al contrato.

Ver anexo 2. Soporte de planillas de pago de SS de Interventoría.

9. CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA EN CUMPLIMIENTO DEL PG-SST OFERTADO

En cumplimiento al PG-SST para el periodo reportado se ejecutaron las siguientes capacitaciones a los colaboradores de Interventoría ELSA TORRES ARENALES.


Tabla 8 Capacitaciones de Interventoría.


TEMA A TRATAR	FECHA
Socialización cartilla "Pausas Activas"	23 de junio de 2026
Campaña de NO discriminación	23 de junio de 2026
Capacitación Riesgo Químico	25 de junio de 2026
Socialización folleto "Factor Riesgo Psicosocial"	25 de junio de 2026
Pieza visual Relaciones sociales	06 de julio de 2026
Brigada de Emergencia Sesión de la 1 a la 4	07 de julio de 2026

Fuente: Equipo de interventoría - 2026


Socialización Campaña de NO discriminación








Socialización cartilla "Pausas Activas"





Fuente: Equipo de interventoría – 2026

10. REUNIÓN COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ETA

Durante el período comprendido entre el 08 de junio y el 07 de julio de 2026, en el marco del informe mensual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la interventoría ELSA TORRES ARENALES llevó a cabo la reunión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), en la cual se destacó la importancia de la realización de pausas activas durante la jornada laboral como una estrategia para promover el bienestar y prevenir riesgos asociados a la actividad laboral.

En este contexto, se realizó la socialización y divulgación del Manual de Pausas Saludables de SURA, con el fin de fomentar su implementación periódica por parte de todos los colaboradores.

Ver anexo 4 Reunión del COPASST

11. REUNIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL DE INTERVENTORÍA ETA

Durante el período reportado, no se llevaron a cabo reuniones del Comité de Convivencia Laboral, debido a que no se presentaron situaciones, casos o requerimientos que ameritaran su convocatoria. En consecuencia, no se generan actas ni soportes asociados a reuniones para el presente período.

Teniendo en cuenta que los registros de estadísticas de casos de acoso sexual se deben hacer mínimo cada 6 meses.

Ver anexo 5 Reunión del Comité de Convivencia Laboral (N/A).

12. REUNIÓN BRIGADA DE EMERGENCIA DE INTERVENTORÍA ETA

Durante el periodo evaluado, la interventoría deja constancia que, en las instituciones educativas donde actualmente se desarrollan obras, la Interventoría se acoge al plan y a la brigada de emergencias establecidos por cada colegio, en articulación con el Contratista.

En este contexto, se realizó la socialización y divulgación de las cuatro (4) sesiones para el proceso de formación de la Brigada de Emergencias.

Sesión 1.

- ¿Qué es una Brigada de Emergencia?
- Funciones
- Responsabilidad Legal del Brigadista
- Valoración Primaria (ABC)

Sesión 2.

- Manejo de columna
- Camillaje y Traslado de Lesionados
- Manejo Inicial de Heridos

Sesión 3.

- Búsqueda
- Rescate
- Evacuación

Sesión 4.

- Tipos de fuego (Clase A, Clase B, Clase C, Clase D, Clase K)
- Manejo y prevención de extintores
- Uso correcto método PASS
- Recomendaciones
- Técnicas de extracción rápida y arrastre
- Recomendaciones generales
- Importancia de la actuación oportuna

Ver anexo 6 Reunión Brigadista de Emergencia.

12.1 EQUIPO DE EMERGENCIA DE INTERVENTORIA ELSA TORRES ARENALES

La Interventoría ELSA TORRES ARENALES se encuentra bajo la cobertura del Plan de Emergencia que dispone el contratista en cada uno de los frentes de obra, y la identificación de las rutas de evacuación con los planos que se tienen en cada una de las IED.

- **Plan de emergencia**

La interventoría ELSA TORRES ARENALES, Completamente adaptado a los requisitos legislativos y normativos vigentes, planificando específicamente a través de charlas de seguridad en plan de emergencia para la prevención en el sitio de obra, garantizando la seguridad necesaria de los colaboradores para hacer frente a cualquier tipo de emergencia, a continuación se relacionan los equipos de emergencia con los que cuenta el contratista en cada uno de sus frentes y los planos de evacuación de cada colegio.

IED GONZALO ARANGO











NICOLAS DE BUENAVENTURA

Fuente: Equipo de interventoría – 2026

Hospital Universitario Méderi Barrios Unidos - Ubicado en la Calle 66A # 52-25, Bogotá.

Ilustración 2 Localización hospital universitario Méderi Georreferenciación localidad de Barrios Unidos.



Fuente: Equipo de interventoría - 2026

Hospital de Suba (Centro de Servicios Especializado) - Ubicado en la Av. Cra. 104 # 152 C -50,

Ilustración 3 Localización hospital de Suba Georreferenciación localidad de Suba.



Fuente: Equipo de interventoría - 2026

13. SEÑALIZACIÓN RUTA DE EVACUACIÓN Y PUNTO DE ENCUENTRO INTERVENTORÍA ETA

Para la atención de situaciones de emergencia, esta interventoría ELSA TORRES ARENALES, se acoge al Plan de Emergencias del Contratista en los Colegios que actualmente se encuentran en intervención, cumpliendo con los lineamientos y procedimientos allí establecidos.

- **Rutas de evacuación:**

Las rutas de evacuación son los caminos o recorridos designados para que las personas puedan abandonar de manera segura un lugar de trabajo, edificio o área en caso de emergencia. Estas rutas deben ser planificadas, señalizadas y mantenidas de forma adecuada para asegurar una evacuación rápida y sin obstrucciones.

- **Punto de encuentro:**

El punto de encuentro es el lugar seguro donde las personas deben reunirse una vez que han evacuado el edificio o área en caso de emergencia. Esté lugar debe estar ubicado a una distancia segura del lugar de peligro, como un incendio o un área con riesgo de colapso, y ser fácil de localizar.

14. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE INTERVENTORIA ETA

Durante el período evaluado entre el 08 de junio al 07 de julio la Interventoría realizó seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista en obra, verificando el cumplimiento de las especificaciones dentro del cronograma de ejecución y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Entre las actividades objeto de seguimiento se encuentran:

- Revisar y verificar afiliación vigente de los trabajadores a:
  EPS, ARL, AFP, CCF.
- Validar certificados de aptitud médica ocupacional.
- Verificar procedimientos seguros de trabajo.

- Confirmar permisos de trabajo para actividades de alto riesgo (Trabajo en alturas, Trabajos en caliente, etc).
- Verificar que el personal autorizado corresponde al reportado por el Contratista.
- Realización de inspecciones de seguridad en las áreas de trabajo.
- Evaluar condiciones de orden y aseo.
- Verificar señalización, delimitación y control de áreas de trabajo.
- Hacer seguimiento al reporte oportuno de incidentes y accidentes de trabajo.
- Supervisión del cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del personal en obra.
- Seguimiento a la implementación de medidas de prevención de riesgos y uso adecuado de elementos de protección personal.
- Revisión de la gestión ambiental y disposición de residuos generados durante la ejecución de la obra.
- Verificación de la asistencia del personal, equipos y maquinaria requeridos para el desarrollo de las actividades.
- Seguimiento al diligenciamiento y cumplimiento de los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y permisos de trabajo aplicables.
- Control de las condiciones de orden y aseo en los frentes de trabajo.
- Verificación de la señalización y demarcación de áreas de riesgo.
- Verificación de la afiliación y cobertura de seguridad social del personal vinculado a la obra.
- Seguimiento al cierre de observaciones, requerimientos y compromisos establecidos por la interventoría.
- Registro fotográfico y documental del avance de las actividades ejecutadas.

La interventoría realizó las verificaciones correspondientes y emitió las observaciones y recomendaciones necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de la obra y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

15. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

SEGUIMIENTO SUBA Y EMERGENCIAS	
Supervisión actividades en andamios y escaleras	
	
	










Socialización SST para actividades en alturas	
	
Uso de EPP	
	









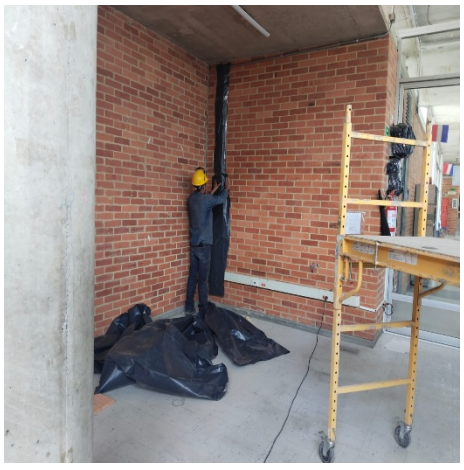







Orden y Aseo - Señalización

















Actividades Silviculturales Tala y Poda	
	
	


























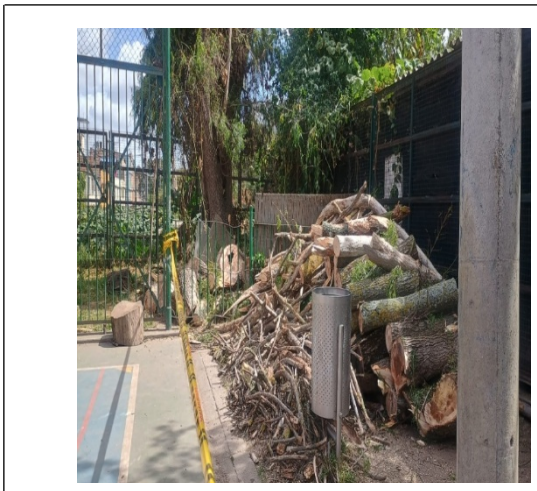







Fuente: Equipo de interventoría – 2026

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES INTERVENTORIA ETA

La Interventoría durante la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.8169112 BOGOTA D.C; realizó seguimiento al plan de seguridad y salud en el trabajo del contratista, evidenciando en otras, las siguientes actividades:

Conclusiones

- Durante el período evaluado, se realizó el seguimiento al cumplimiento de los requisitos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) por parte del Contratista, evidenciándose la ejecución de las actividades programadas y la implementación de los controles establecidos para la prevención de riesgos laborales.
- En el marco de las obligaciones contractuales establecidas, la Interventoría realizó el seguimiento al cumplimiento por parte del contratista respecto a la afiliación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales), así como a los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, ICBF, SENA y Fondo para la Industria de la Construcción – FIC, cuando aplica).
- Se verificó que el personal contratista desarrolló las actividades programadas aplicando las medidas de prevención y control definidas para los riesgos asociados a las labores ejecutadas, contribuyendo a la reducción de condiciones y actos inseguros.
- Las inspecciones y visitas de seguimiento permitieron identificar condiciones seguras de trabajo en las áreas intervenidas, así como oportunidades de mejora relacionadas con el fortalecimiento de los controles operacionales y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
- Se recomienda continuar fortaleciendo las inspecciones de seguridad, las capacitaciones al personal, el reporte oportuno de condiciones inseguras y el seguimiento a los planes de acción derivados de las inspecciones y observaciones de interventoría.
- En términos generales, el desempeño del contratista en materia de SST fue satisfactorio durante el período evaluado, evidenciándose compromiso con el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la entidad contratante y con la mejora continua de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Recomendaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Continuar fortaleciendo las actividades de inspección y seguimiento en campo para garantizar el cumplimiento permanente de los estándares de SST y la identificación temprana de actos y condiciones inseguras.
- Reforzar las actividades de sensibilización al personal respecto al uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y al cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro.
- Orden y Aseo: Mantener despejadas las zonas de tránsito y salidas de emergencia, garantizando un entorno ordenado.
- Garantizar que todo trabajador que ingrese al proyecto cuente previamente con las afiliaciones vigentes al Sistema de Seguridad Social Integral y con las inducciones correspondientes antes del inicio de sus labores.
- Mantener la cultura de reporte oportuno de incidentes, actos y condiciones inseguras, promoviendo la mejora continua del desempeño en SST dentro del contrato.

ANEXO 1 Relación de personal MOC de interventoría.

PERSONAL MOC DE INTERVENTORÍA

NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACION	CARGO	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA	COLEGIO	FECHA DE INGRESO
Elkin Salazar Perez	5472355	Director de interventoria	Elsa Torres Arenales	Todas las sedes	23 de septiembre de 2025
Daniel Felipe Talero Rojas	1.030.634.359	Profesional de apoyo	Elsa Torres Arenales	Todas las sedes	23 de septiembre de 2025
Adriana Paola Mendez Navarro	39.582.366	Residente tecnica de interventoria	Elsa Torres Arenales	Todas las sedes	10 de noviembre de 2025
Adriana Garcia Avila	1.049.639.326	Apoyo técnico interventoria	Elsa Torres Arenales	Todas las sedes	11 de mayo de 2026
Angie Tatiana Cantor Hernández	1.014.196.926	Inspector. SST interventoria	Elsa Torres Arenales	Todas las sedes	10 de noviembre de 2025
Erika Paola Ruiz Beltrán	52.266.454	Especialista Ambiental de interventoría	Elsa Torres Arenales	Todas las sedes	10 de noviembre de 2025
Juan Ricardo Torres Salazar	93.401.974	Especialista estructural interventoria	Elsa Torres Arenales	Todas las sedes	10 de noviembre de 2025
Diego Andres Gutierrez Ochoa	1.026.559.359	Especialista en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos	Elsa Torres Arenales	Todas las sedes	10 de noviembre de 2025
Ivan Cotes Duran	79.957.556	Especialista en Redes Hidrosanitarias, de gas y red contra incendio	Elsa Torres Arenales	Todas las sedes	10 de noviembre de 2025
Jennifer Tatiana Caraballo Ordoñez	1.013.100.238	Apoyo técnico interventoria	Elsa Torres Arenales	Todas las sedes	17 de febrero de 2026

ANEXO 2 planillas de seguridad social

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 5472355

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ELSA TORRES ARENALES		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	63323375
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	Teléfono	7446234
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e ingeniería
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	0013 - CONT.NO.CO1.PCCNTR.
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**6026357667**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	junio / 2026	Periodo Cotización Salud	julio / 2026
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2026/07/07
Número Autorización	460914016		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	ELKIN	Apellidos	SALAZAR PEREZ
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	5472355
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 5.000.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 5.000.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 800.000
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 800.000**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS005-SANITAS S.A
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 5.000.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 200.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 200.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 5.000.000
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 348.000**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	$ 5.000.000	$ 200.000

TOTAL PAGADO:	**$ 1.548.000**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 63323375

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ELSA TORRES ARENALES		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	63323375
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	Teléfono	7446234
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e ingeniería
Tipo Aportante	15-CONTRATANTE	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	000 - BOGOTA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**6023369400**	Tipo de Planilla	Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
Periodo Cotización Otros	junio / 2026	Periodo Cotización Salud	junio / 2026
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2026/07/07
Número Autorización	460804865		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	ELSA	Apellidos	TORRES ARENALES
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	63323375
Tipo cotizante	INDEPENDIENTE CONTRATO	Subtipo Cotizante	PENS VEJ ACT
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 21.900.000	Tipo de Salario	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

SALUD			
Dias	30	Administradora	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS
Tarifa	12,500 %	IBC	$ 21.900.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 2.737.500
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 2.737.500**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 21.900.000
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 1.524.300**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF24-COMPENSAR	30	0,600 %	$ 21.900.000	$ 131.400

TOTAL PAGADO:	**$ 4.393.200**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 52266454

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ELSA TORRES ARENALES		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	63323375
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	Teléfono	7446234
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e ingeniería
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	0013 - CONT.NO.CO1.PCCNTR.
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**6026357667**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	junio / 2026	Periodo Cotización Salud	julio / 2026
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2026/07/07
Número Autorización	460914016		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	ERIKA PAOLA	Apellidos	RUIZ BELTRAN
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	52266454
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 4.000.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	25-14 COLPENSIONES
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 4.000.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 640.000
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 640.000**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS008-COMPENSAR
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 4.000.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 160.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 160.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 4.000.000
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 278.400**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	$ 4.000.000	$ 160.000

TOTAL PAGADO:	**$ 1.238.400**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1013100238

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ELSA TORRES ARENALES		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	63323375
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	Teléfono	7446234
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e ingeniería
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	0013 - CONT.NO.CO1.PCCNTR.
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**6026357667**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	junio / 2026	Periodo Cotización Salud	julio / 2026
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2026/07/07
Número Autorización	460914016		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	JENNIFER TATIANA	Apellidos	CARABALLO ORDONEZ
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1013100238
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 1.750.905	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.750.905
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 280.200
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 280.200**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS002-SALUD TOTAL
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 1.750.905
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 70.100
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 70.100**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 1.750.905
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 121.900**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	$ 1.750.905	$ 70.100

TOTAL PAGADO:	**$ 542.300**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1049639326

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ELSA TORRES ARENALES		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	63323375
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	Teléfono	7446234
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e ingeniería
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	0013 - CONT.NO.CO1.PCCNTR.
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**6026357667**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	junio / 2026	Periodo Cotización Salud	julio / 2026
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2026/07/07
Número Autorización	460914016		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	ADRIANA	Apellidos	GARCIA AVILA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1049639326
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 2.200.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 2.200.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 352.000
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 352.000**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS005-SANITAS S.A
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 2.200.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 88.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 88.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 2.200.000
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 153.200**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	$ 2.200.000	$ 88.000

TOTAL PAGADO:	**$ 681.200**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 39582366

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ELSA TORRES ARENALES		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	63323375
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	Teléfono	7446234
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e ingeniería
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	0013 - CONT.NO.CO1.PCCNTR.
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**6026357667**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	junio / 2026	Periodo Cotización Salud	julio / 2026
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2026/07/07
Número Autorización	460914016		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	ADRIANA PAOLA	Apellidos	MENDEZ NAVARRO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	39582366
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 4.000.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230201- PROTECCION
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 4.000.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 640.000
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 640.000**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS002-SALUD TOTAL
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 4.000.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 160.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 160.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 4.000.000
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 278.400**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	$ 4.000.000	$ 160.000

TOTAL PAGADO:	**$ 1.238.400**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1014196926

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63323375
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ELSA TORRES ARENALES
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	TELÉFONO:	7446234
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	0013 - CONT.NO.CO1.PCCNTR.8169112 SED LOTE NO.4

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6026357667**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: junio	AÑO:	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES:	julio AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			460914016

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																							PENSIÓN										SALUD						ARP													
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																		CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
2	CC 1014196926	CANTOR HERNANDEZ ANGIE TATIANA	DEPEND		$ 2.100.000	FIJO														10-15						230201-PROTECCION	6	$ 420.000	$ 67.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 67.200	EPS017-FAMISANAR	6	$ 420.000	$ 16.800	$ 0	$ 16.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	6	$ 420.000		$ 0	6	$ 420.000	CCF21-CAFAM	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1014196926	CANTOR HERNANDEZ ANGIE TATIANA	DEPEND		$ 2.100.000	FIJO																				230201-PROTECCION	24	$ 1.680.000	$ 268.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 268.800	EPS017-FAMISANAR	24	$ 1.680.000	$ 67.200	$ 0	$ 67.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	24	$ 1.680.000		$ 117.000	24	$ 1.680.000	CCF21-CAFAM	$ 67.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 604.200

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1030634359

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63323375
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ELSA TORRES ARENALES
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	TELÉFONO:	7446234
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	0013 - CONT.NO.CO1.PCCNTR.8169112 SED LOTE NO.4

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6026357667**	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: junio	AÑO: 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES: julio	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:					460914016

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																								PENSIÓN										SALUD						ARP												
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																		CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
4	CC 1030634359	TALERO ROJAS DANIEL FELIPE	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO																			230301-PORVENIR	26	$ 1.993.334	$ 319.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 319.000	EPS017-FAMISANAR	26	$ 1.993.334	$ 79.800	$ 0	$ 79.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	26	$ 1.993.334		$ 138.800	26	$ 1.993.334	CCF21-CAFAM	$ 79.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1030634359	TALERO ROJAS DANIEL FELIPE	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO														09-12					230301-PORVENIR	4	$ 306.667	$ 49.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 49.100	EPS017-FAMISANAR	4	$ 306.667	$ 12.300	$ 0	$ 12.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	4	$ 306.667		$ 0	4	$ 306.667	CCF21-CAFAM	$ 12.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 691.100**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

ANEXO 3 Acta seguimiento planilla SS de Interventoría

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

Bogotá. D.C 07 de julio del 2026

La interventoría ELSA TORRES ARENALES de acuerdo a la revisión y seguimiento, cumple con toda la documentación presentada en cuanto a los pagos de seguridad social y para fiscales para el contrato N° CO1.PCCNTR.8169112 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025, correspondiente al informe número 9, al corte de julio del 2026.

Atentamente,

ELKIN SALAZAR PÉREZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Proyectó: Ing. Angie Tatiana Cantor
Revisó: Ing. Elkin Salazar Pérez
Aprobó: Ing. Elsa Torres Arenales.
Copia: Archivo.
Anexos: (0) folios.

ANEXO 4 Acta Reunión COPASST

NIT 63323375-2

CONTROL DE ASISTENCIA

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE AGOSTO DE 2019 CODIGO-FH-003

Fecha:	23 de junio de 2026			**Lugar:**	I.E.D Gonzalo Arango
Charla:	**X**	**Capacitación:** ____		**Entrenamiento:** ____	
Duración:	**Min: 30**	**Proyecto:**	ELSA TORRES ARENALES (COLEGIO GONZALO ARANGO)		
	Hora:				
Temas:	1	Socialización cartilla “Pausas Activas”			

ASISTENTES

	Nombre	Cargo	C.C.	Calif.	Firma recibí y entendí la capacitación
1	Adriana Paola Méndez Navarro	Residente	39582366	N/A	
2	Adriana García Ávila	Inspector Técnico	1049639326	N/A	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Observaciones:

EXPOSITOR

INTERNO ■

EXTERNO ☐

NOMBRE: Angie Tatiana Cantor

FIRMA: Angie Cantor H.

CARGO: Inspector SST

La calificación está ponderada de 1 a 5 (donde 5 es la mayor puntuación y 1 la menor).

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA

AVISO PARROQUIAL PAUSAS ACTIVAS

Cordial saludo,

Con el fin de promover el bienestar integral y el autocuidado en nuestra jornada laboral, compartimos adjunto cartilla de pausas activas, la cual incluye pausas físicas y psicoactivas diseñadas para ayudarnos a cuidar tanto el cuerpo como la mente.

Les recordamos la importancia de realizar estas pausas cada 2 horas, ya que contribuyen a prevenir molestias musculoesqueléticas, reducir el estrés, mejorar la concentración y favorecer un mejor desempeño en nuestras actividades diarias.

Los invitamos a revisar la cartilla y a incorporar estas pausas de manera consciente y constante en su rutina de trabajo. Cuidarnos es una responsabilidad compartida y una inversión en nuestra salud y calidad de vida.

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA

ANEXO 5 Acta Reunión de Convivencia Laboral y Comité de etica

	CONVOCATORIA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (COCOLA)	**Código:** CP-01 **Versión:** 02 **Fecha de elaboración:** enero 15 de 2018

En cumplimiento a la Ley 1010 de 2006, así como lo dispuesto en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). El periodo de los miembros del Comité es de dos (2) años y el empleador proporcionará los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones de los miembros al Comité, así como la capacitación requerida.

En reunión programada el día 15 de mayo de 2026, siendo las 09:00 horas, se reunieron en las instalaciones de la IED Colegio Gonzalo Arango, se realiza una charla de sensibilización dirigida a todo el equipo de trabajo sobre la prevención del acoso sexual en el entorno laboral, con el propósito de promover relaciones basadas en el respeto, la dignidad y la convivencia sana entre los colaboradores.

Durante la actividad se socializaron los conceptos básicos relacionados con el acoso sexual, las conductas que pueden constituirlo, las rutas de atención y los mecanismos de prevención establecidos por la organización.

Adicionalmente, se informó a los trabajadores sobre la conformación y funciones del Comité de Ética, destacando su papel en la promoción de principios éticos, la prevención de conductas inapropiadas y la atención de situaciones que puedan afectar la convivencia y el ambiente laboral. Se brindó un espacio para resolver inquietudes y reforzar el compromiso institucional en la construcción de un entorno de trabajo seguro, respetuoso e inclusivo.

con el fin de realizar la elección del comité de Ética, donde se eligieron a las siguientes personas:

1. ADRIANA GARCIA AVILA Principal
2. ADRIANA PAOLA MENDEZ NAVARRO Suplente



Firma integrante Principal



Firma integrante Suplente

BRIGADA DE EMERGENCIA

PREPARADOS PARA PROTEGER, CAPACITADOS PARA ACTUAR

Nuestra misión:
Proteger la vida, la salud y los bienes en caso de emer

1. CONCEPTOS GENERALES

igada de emergencia es un grupo de personas rganizadas y capacitadas para actuar antes, durante y después de una emergencia.



Objetivos principales

evenir y reducir los riesgos.

sponder de manera oportuna y organizada.

indar atención inicial a las personas afectadas.

oteger los recursos y el medio ambiente.

oyar a los organismos de socorro.

La prevención y la preparación salvan vidas.

2. RESPONSABILIDAD LEGAL

Ser parte de la brigada implica asumir responsabilidades legales y éticas frente a la organización y a las personas.

Marco legal de referencia

- Constitución Política de Colombia.
- Ley 9 de 1979 - Código Sanitario Nacional.
- Resolución 0312 de 2019 – Estándares Mínimos del SG-SST.
- Decreto 1072 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.
- Demás normas aplicables.



Responsabilidades del brigadista

- Conocer y cumplir los procedimientos de emergencia.
- Actuar con responsabilidad, solidaridad y respeto.
- Participar en las capacitaciones y simulacros.
- Informar condiciones o actos que puedan generar emergencias.

El cumplimiento de nuestras funciones puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

3. VALORACIÓN PRIMARIA (AB

Es la evaluación inicial que se realiza a una persona p identificar y tratar las condiciones que comprometen su

A VÍA AÉREA

Verifica y asegúrate de que la vía aérea esté libre.

- Habla a la persona y observa su respuesta.
- Si no responde, abre la vía aérea con maniobra frente-mentón.



B RESPIRACIÓN

Verifica si la persona respira normalmente.

- Observa el movimiento del pecho.
- Escucha y siente la respiración durante 5 a 10 segundos.
- Si no respira, solicita ayuda y prepara para RCP.



C CIRCULACIÓN

Verifica la circulación y controla el sangrado.

- Revisa pulso (carotídeo o radial).
- Si hay sangrado, aplica presión directa.
- Previene el shock y mantén a la persona abrigada.



Si en cualquiera de los pasos A, B o C hay alteración que comprometa la vida, actúa de inmediato.

TU ACCIÓN PUEDE SALVAR VIDAS. PREPÁRATE, ACTÚA Y CUIDA.

PREVENIR ALERTAR ATENDER

ATENCIÓN INICIAL DE EMERGENCIAS

Actuar con conocimiento, calma y seguridad salva vidas

Tu preparación hace la diferencia

1. MANEJO DE COLUMNA



- Asume lesión de columna ante caídas, golpes o accidentes.
- Evita movimientos innecesarios.
- Mantén alineados cabeza, cuello y tronco.
- Estabiliza la cabeza manualmente.
- Moviliza solo si es necesario y estás capacitado.

Inmoviliza para proteger, no para curar.

2. CAMILLAJE Y TRASLADO



- Verifica la condición de la víctima.
- Coordina y comunica cada maniobra.
- Usa correctamente la camilla y elementos de inmovilización.
- Mantén rutas seguras y libres de obstáculos.

Un traslado seguro evita lesiones adicionales.

3. MANEJO DE HERIDOS



- Evalúa la escena antes de intervenir.
- Usa elementos de protección personal.
- Identifica heridas, fracturas y otras lesiones.
- Mantén la calma y brinda confianza.
- Solicita ayuda especializada si es necesario.

Atiende con calma, cuida y tranquiliza a la persona.

4. MANEJO Y CONTROL DE HEMORRAGIAS



- Aplica presión directa sobre la herida con apósitos limpios o vendajes.
- Mantén la presión hasta controlar el sangrado.
- Eleva la extremidad afectada si es posible y seguro.
- Vigila el estado de la persona.
- Activa los servicios de emergencia ante sangrados severos.

El control oportuno del sangrado puede salvar vidas.

5. RECUERDA

- Tu seguridad y la de la víctima es primero.
- Trabaja en equipo y sigue los protocolos.
- La preparación y la práctica hacen la diferencia.
- Actúa, comunica y solicita ayuda a tiempo.

Preparados hoy, protegidos siempre.

CADA ACCIÓN CORRECTA MARCA LA DIFERENCIA. PREPÁRATE, ACTÚA Y CUIDA.

BÚSQUEDA, RESCATE Y EVACUACIÓN

Actuar rápido y en equipo salva vidas

Nuestro compromiso:
Proteger la vida, la salud y la integridad de todos.

1. BÚSQUEDA

Localizar personas que puedan estar en riesgo o atrapadas.



CLAVES

- Evalúa la zona antes de ingresar.
- Usa EPP y equipos adecuados.
- Comunica los hallazgos al equipo.
- Mantén contacto visual o verbal.
- Marca las áreas ya revisadas.

La observación y la comunicación son clave para una búsqueda efectiva.

2. RESCATE

Extraer a la persona de la zona de peligro de forma segura.



CLAVES

- Prioriza tu seguridad y la del equipo.
- Inmoviliza a la persona si es necesario.
- Usa técnicas correctas de levantamiento.
- Mantén comunicación constante.
- No expongas al rescatado a más riesgos.

La técnica correcta protege vidas, incluida la tuya.

3. EVACUACIÓN

Trasladar a las personas a un lugar seguro de manera ordenada.



CLAVES

- Sigue las rutas de evacuación señalizadas.
- No corras, empujes ni regreses.
- Ayuda a personas con movilidad reducida.
- Dirígete al punto de encuentro.
- Reporta novedades al coordinador.

La calma y el orden garantizan una evacuación segura.

RECUERDA

- Conoce tu entorno y los riesgos.
- Participa en los simulacros.
- Atiende las instrucciones del líder de emergencia.
- Tu preparación hace la diferencia.

PREPARADOS HOY, SEGUROS SIEMPRE | JUNTOS PROTEGEMOS LO MÁS IMPORTANTE: LA VIDA.

BRIGADA DE EMERGENCIA

PREPARADOS PARA ACTUAR, CAPACITADOS PARA SALVAR VIDAS

NUESTRO COMPROMISO:
Proteger la vida, los bienes y el medio ambiente.

1. TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN RÁPIDA Y ARRASTRE

Permiten retirar a una persona de una zona de peligro de la forma más rápida y segura posible.

EXTRACCIÓN RÁPIDA

Se utiliza cuando la víctima puede caminar con ayuda.

- Asegura tu propia seguridad.
- Comunícate con la víctima e indícale lo que harás.
- Coloca un brazo de la víctima sobre tu hombro.
- Sujeta su muñeca y camina inclinando su peso hacia ti.



ARRASTRE

Se utiliza cuando la víctima no puede caminar.

- Revisa el entorno y asegúrate de que sea seguro.
- Toma a la víctima por la ropa o los tobillos.
- Arrastra en línea recta hasta un lugar seguro.
- Evita tirones bruscos.



Evalúa a la víctima al llegar a un lugar seguro y solicita ayuda especializada.

2. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL MANEJO DE EXTINTORES

El uso correcto del extintor puede controlar un conato de incendio.
Recuerda la regla PASS.

P — PREPARA
Verifica que el extintor sea el adecuado y retira el seguro.




A — APUNTA
Dirige la boquilla o manguera a la base del fuego.



S — PRESIONA
Presiona la manija de descarga.



S — SWEEPEA
Realiza un movimiento de barrido de lado a lado hasta apagar el fuego.



RECOMENDACIONES IMPORTANTES

- Conoce la ubicación de los extintores.
- No arriesgues tu vida, actúa solo si el fuego es incipiente.
- Realiza inspecciones periódicas.
- Si el fuego crece, evacúa y llama a emergencias.

3. TIPOS DE FUEGO

Identificar el tipo de fuego es clave para usar el extintor adecuado.

A	**FUEGOS CLASE A** Materiales sólidos comunes: madera, papel, telas, cartón, plásticos, etc.	**Usar extintor:** Agua a presión, espuma o PQS (multiuso).
B	**FUEGOS CLASE B** Líquidos inflamables: gasolina, aceites, pinturas, solventes, alcoholes, etc.	**Usar extintor:** PQS (polvo químico seco) o CO_2 (dióxido de carbono).
C	**FUEGOS CLASE C** Equipos eléctricos energizados: tableros, cables, motores, etc.	**Usar extintor:** CO_2 (dióxido de carbono) o PQS.
D	**FUEGOS CLASE D** Metales combustibles: magnesio, sodio, titanio, potasio, etc.	**Usar extintor:** Agentes especiales para fuegos clase D.
K	**FUEGOS CLASE K** Aceites y grasas de origen vegetal o animal en cocinas industriales.	**Usar extintor:** Agentes químicos húmedos o espuma especial para clase K.

RECUERDA

- Mantén la calma.
- Actúa con seguridad.
- Protege tu vida y la de los demás.

La preparación y el entrenamiento hacen la diferencia.

TRABAJO EN EQUIPO, CONOCIMIENTO Y PREVENCIÓN PARA UN ENTORNO MÁS SEGURO.

ANEXO 6 Acta Reunión Brigada de emergencia

NIT 63323375-2

CONTROL DE ASISTENCIA

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE AGOSTO DE 2019 CODIGO-FH-003

Fecha:	07 de julio de 2026			**Lugar:**	Virginia Gutierrez
Charla:	**X**		**Capacitación:** ____		**Entrenamiento:** ____
Duración:	**Min: 20** **Hora:**		**Proyecto:**	ELSA TORRES ARENALES (COLEGIO GONZALO ARANGO)	
Temas:	1	Brigada de emergencia Sesión de la 1 a la 4. - Qué es Brigada de Emergencia - Manejo de columna - Búsqueda - Tipos de fuego			

ASISTENTES

	Nombre	Cargo	C.C.	Calif.	Firma recibí y entendí la capacitación
1	Adriana Paola Méndez Navarro	Residente	39582366	N/A	
2	Adriana García Ávila	Inspector Técnico	1049639326	N/A	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Observaciones:

EXPOSITOR

INTERNO ■

EXTERNO ☐

NOMBRE: Angie Tatiana Cantor

FIRMA: Angie Cantor H.

CARGO: Inspector SST

La calificación está ponderada de 1 a 5 (donde 5 es la mayor puntuación y 1 la menor).

ANEXO 7 Plan de trabajo SG-SST de Interventoría/ CAPACITACIONES

	PLAN DE TRABAJO 2025	**Versión:** 01 **Codigo:** PA-02 **Fecha de elaboración:** Enero 09 de 2025

OBJETIVO

Cumplir con las actividades planificadas como parte de la implementación del SG-SST, a fin de prevenir, mitigar y controlar los riesgos presentes en los entornos laborales.

ALCANCE

Aplica a todos los empleados que desarrollen actividades para la organización

METAS	INDICADORES
Cumplir con el 100 % de las actividades del plan de trabajo programadas	N°de actividades realizadas x 100 N° de actividades programadas

CRONOGRAMA

ACTIVIDADES	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		RESPONSABLE	OBSERVACIONES O COMENTARIOS
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		
BATERIA RIESGO PSICOSOCIAL																										Este año 2024 no se aplico bateria de riesgo psicosocial, teniendo en cuenta que el riesgo no fue alto, sin embargo se establece durante el año addantar varias actividades encaminadas a la prevencion psicosocial como campañas y capacitaciones.
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO						P	E																			Se entregan elementos ergonómicos y botiltos al personal de oficina de acuerdo a recomendaciones informe del PVE (carpeta 3,1,2)
ESTUDIO DE ILUMINACIÓN													P	E												Se realizó el 23 de julio del 2024, la recomendaciones fueron documentadas en la matriz de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
AUTOEVALUACION DEL DESEMPEÑO (UNO A UNO)											P															No se pudo ejecutar el 2024, se implemento un formato de google para rendición de cuentas.
ACTUALIZACIÓN PERFILES DE CARGO															P											Esta actividad no se realizó este año, se reprogram para el año 2025.
GESTION DEL CONOCIMIENTO																			P							
CURSO 50 HORAS																	P									Asunque se gestiono a través de la ARL para varios cargos entre ellos miembros del Copasst y CCL, se requiere volver a programar, ya que se ha presentado alta rotación del personal, asi como del COPASST Y CCL.
SEGUIMIENTO A ESTANDARES MINIMOS			P	E	P	E	P	E					P	E			P	E								S realiza seguimiento permanente yd e acuerdoa los resultados obtenidos se adiuntra plàn de trabajo con apoyo de Sandra Casas la profesional asignada por ARL, personal de apoyo Sandra Gómez y la líder del SG-SST Andrea Vélez
SST IDENTIFICACION Y ACTUALIZACION DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES SST															P	E										Se actualiza de manera semestral, sin embargo de manera permanente se revisa para conocer legislación que haya salido y que aplique a la organización.
EVALUAR LA PERTINENCIA DE LA POLITICA, OBJETIVOS E INDICADORES									P	E													P	E		Se evaluan de manera semestral y de acuerdo a los resultados se actualizan anualmente.
ELABORACION ANUAL DE PRESUPUESTO						P	E																			
AFILIACIONES Y PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			CONTABILIDAD	
REUNIONES COPASST	P		P		P		P		P		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	COPASST	Se sube el ultimo soprte al drive y se tiene registro carpeta fisico, sin embargo a la fecha de realizar la cualizacion de este plan de trabajo, no se cuenta con el COPASST funcionando ya que la mayoria de los integrantes salieron de la compañia.
REUNIONES COMITÉ DE CONVIVENCIA	P						P				P	E	P	E					P	E			P	E	COCOLA	Se evidencia las actas de reunión trimestarl durante l 2024, pero se debe volver a conformar CCL, ya que los integrantes ya no estan en la compañia.
RENDICION DE CUENTAS																							P	E	LÍDER SST Y SST OBRAS	Se esta diseño un formato y se envio vía email a todos los trabajadores a la fecha de actualización de este plan de trabajo, aun no se habian enviado todas las encuestas
REVISION GERENCIAL																							P	E	GERENCIA Y LÍDER SST	Actualizada diciembre 2024, se viene realizando durante el año y en el mes de Diciembre se realiza el cierre final con
AUDITORIAS																									ARL	Se revisan los documentos asociados a auditoria, como procedimiento, formatos y se programe auditoria para el año 2025
VERIFICACION DE ENTREGA Y REPOSICION DE EPP	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P		P	E	P	E	P	E	LÍDER SST Y SST OBRAS	REGISTROS DE ENTREGA EN LA CARPETA DE CADA COLABORADOR
RE-INDUCCION SST									P	E															LÍDER SST	REALIZADA 19 DE JULIO DE 2024
REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS (ACCIÓN DERIVADA DE A.T.)																									LÍDER SST Y SST OBRAS	Se debe fortalecer para el 2025, no se han reportado este año.
ACTUALIZACIÓN ANUAL DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES											P	E														SE REVISAN LOS CONTROLES DE LA MATRIZ DE PELIGROS Y SE COLOCAN EN EL PLAN DE TRABAJO ANUAL Y CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES
GESTIÓN DEL CAMBIO: IDENTIFICAR Y EVALUAR CAMBIOS ORGANIZACIONALES																										Se hace seguimietno permanente a los cambios presentados que afecte el sistem,a de Gestión el unico que se ha presentado hasta el momento es e cambio de líder de SST.
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS SST									P	E					P	E							P			Se hace seguimiento permante de la matriz de acciones y se alimenta con las actividades que requieren seguimiento como el estudio higiieco realizado,
ACTUALIZACIÓN DE MATRIZ DE EPP											P	E														Se hace seguimiento a la entrega de EPP.
COORDINACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO Y PERIÓDICOS	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P		P		P		P			Este requisito se ha incumplido de manera parcial, se rquiere fortalecer los controles de manera rigurosa se deben realizar los es
ACTUALIZACIÓN DE PROFESIOGRAMA																			P							Se programa para el año 2025
SEGUIMIENTO A RESTRICCIONES MÉDICO LABORALES																										Se hace de manera permanente pero este segundo semtre del año 2024, no se ha podido hacer rigurosamente, ya que no se han practicado todos los examenes medicos de ingreso requeridos.
INSPECCIÓN BOTIQUIN																			P	E			P	E	LÍDER SST	
INSPECCIÓN USO DE EPP																			P	E			P	E	LÍDER SST	
INSPECCIÓN EXTINTOR																			P	E			P	E	LÍDER SST	
INSPECCIÓN LOCATIVA																			P	E			P	E	LÍDER SST	
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE EMERGENCIA																										Se programa para el año 2025, en el 2024 se revisó pero no resultó ninguna actualización.
REALIZACIÓN DE SIMULACROS																			P	E					LÍDER SST	Realizado el 02 octubre de 2024, se cuenta con informe
EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES									P																	Se realizó evaluación de proveedores y se les envio el resultado por correo electronico con base en los resultados presentados, adicional se vesta organizando los documentos de los proveedores que no la tiene completa.
SOLICITAR CUSTODIA DE HISTORAS CLINICAS DIAGNOSTICO DE SALUD									P	E																
REUNIONES COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL																					P					Esta actividad no se ha podido adenatar se programa para el año 2025


NOTA: LA PRIORIDAD DE LAS CAPACITACIONES SE ESTABLECERÁ A PARTIR DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PELIGROS (MATRIZ DE PELIGROS)

Evaluación del Programa de Gestión																										
Monitoreo del cumplimiento del objetivo y metas planteados: Monitoreo de los indicadores de gestión																										
Revisión del Programa de Gestión																										
Análisis del seguimiento de la conformidad del plan de acción																										
Análisis del seguimiento del cumplimiento de objetivos.																										
Ajustes al Programa de Gestión																										
Ajustes al Programa de Gestión, según revisión al Plan de acción																										

RECURSOS NECESARIOS	AUTORIDAD
Recursos humanos, financieros y tecnológicos.	RECURSOS HUMANOS, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MONITOREO DEL PROGRAMA INDICADORES MENSUALES DE CUMPLIMIENTO

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES	5	5	6	6	9	7	6	6	5	11	5	12	83
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES	3	4	5	4	7	7	6	6	3	9	2	10	66
ACTIVIDADES REPROGRAMADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES	60%	80%	83%	67%	78%	100%	100%	100%	60%	82%	40%	83%	80%




ANÁLISIS TENDENCIAL

RESULTADOS	ACCIONES	FECHA	RESPONSABLE

CAPACITACIÓN COBERTURA

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
PERSONAS PROGRAMADAS													
PERSONAS ASISTENTES													
APLAZADAS													
MES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
PORCENTAJE DE COBERTURA MES	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!




ANÁLISIS TENDENCIAL

RESULTADOS	ACCIONES	FECHA	RESPONSABLE

EVALUACIÓN CAPACITACIONES

	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	TOTAL
Nº DE EVALUACIONES APLICADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
NºDE EVALUACIONES APROBADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
TOTAL	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0



ANÁLISIS TENDENCIAL

RESULTADOS	ACCIONES	FECHA	RESPONSABLE

Elaborado por:	Revisado y aprobado por:
Asesor de Seguridad y Salud en el Trabajo	Representante Legal
Firma: _____	Firma: _____
Andrea Orjuela Ramos	Elsa Torres Arenales

NIT 63323375-2

CONTROL DE ASISTENCIA

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE AGOSTO DE 2019 CODIGO-FH-003

Fecha:	23 de junio de 2026			**Lugar:**	I.E.D Gonzalo Arango
Charla:	**X**		**Capacitación:** ____		**Entrenamiento:** ____
Duración:	**Min: 30**		**Proyecto:**	ELSA TORRES ARENALES (COLEGIO GONZALO ARANGO)	
	Hora:				
Temas:	1	Campaña de NO discriminación			

ASISTENTES

	Nombre	Cargo	C.C.	Calif.	Firma recibí y entendí la capacitación
1	Adriana Paola Méndez Navarro	Residente	39582366	N/A	
2	Adriana García Ávila	Inspector Técnico	1049639326	N/A	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Observaciones:

EXPOSITOR

INTERNO ■

EXTERNO ☐

NOMBRE: Angie Tatiana Cantor

FIRMA: Angie Cantor H.

CARGO: Inspector SST

La calificación está ponderada de 1 a 5 (donde 5 es la mayor puntuación y 1 la menor).

NIT 63323375-2

CONTROL DE ASISTENCIA

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE AGOSTO DE 2019 CODIGO-FH-003

Fecha:	25 de junio de 2026			**Lugar:**	Virginia Gutierrez
Charla:	**X**		**Capacitación: ____**		**Entrenamiento: ____**
Duración:	**Min: 20** **Hora:**	**Proyecto:**	ELSA TORRES ARENALES (COLEGIO GONZALO ARANGO)		
Temas:	1	Capacitación Riesgo Químico			

ASISTENTES

	Nombre	Cargo	C.C.	Calif.	Firma recibí y entendí la capacitación
1	Adriana Paola Méndez Navarro	Residente	39582366	N/A	
2	Adriana García Ávila	Inspector Técnico	1049639326	N/A	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Observaciones:

EXPOSITOR

INTERNO ■

EXTERNO ☐

NOMBRE: Angie Tatiana Cantor

FIRMA: Angie Cantor H.

CARGO: Inspector SST

La calificación está ponderada de 1 a 5 (donde 5 es la mayor puntuación y 1 la menor).

NIT 63323375-2

CONTROL DE ASISTENCIA

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE AGOSTO DE 2019 CODIGO-FH-003

Fecha:	25 de junio de 2026			**Lugar:**	Virginia Gutierrez
Charla:	**X**	**Capacitación:** ____		**Entrenamiento:** ____	
Duración:	**Min: 20** **Hora:**	**Proyecto:**	ELSA TORRES ARENALES (COLEGIO GONZALO ARANGO)		
Temas:	1	Socialización folleto “Factor de Riesgo Psicosocial”			

ASISTENTES

	Nombre	Cargo	C.C.	Calif.	Firma recibí y entendí la capacitación
1	Adriana Paola Méndez Navarro	Residente	39582366	N/A	
2	Adriana García Ávila	Inspector Técnico	1049639326	N/A	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Observaciones:

EXPOSITOR

INTERNO ■

EXTERNO □

NOMBRE: Angie Tatiana Cantor

FIRMA: Angie Cantor H.

CARGO: Inspector SST

La calificación está ponderada de 1 a 5 (donde 5 es la mayor puntuación y 1 la menor).

NIT 63323375-2

CONTROL DE ASISTENCIA

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE AGOSTO DE 2019 CODIGO-FH-003

Fecha:	06 de julio de 2026			**Lugar:**	Virginia Gutierrez
Charla:	**X**	**Capacitación:** ____		**Entrenamiento:** ____	
Duración:	**Min: 20** **Hora:**	**Proyecto:**	ELSA TORRES ARENALES (COLEGIO GONZALO ARANGO)		
Temas:	1	Socialización flayer Relaciones Sociales			

ASISTENTES

	Nombre	Cargo	C.C.	Calif.	Firma recibí y entendí la capacitación
1	Adriana Paola Méndez Navarro	Residente	39582366	N/A	
2	Adriana García Ávila	Inspector Técnico	1049639326	N/A	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Observaciones:

EXPOSITOR

INTERNO ■

EXTERNO □

NOMBRE: Angie Tatiana Cantor

FIRMA: Angie Cantor H.

CARGO: Inspector SST

La calificación está ponderada de 1 a 5 (donde 5 es la mayor puntuación y 1 la menor).

ANEXO 8 EPP COLEGIOS ETA.

ELSA TORRES ARENALES NIT: 63.323.375 - 2	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	**Código:** PR-04 **Versión:** 01 **Fecha elaboración:** Junio 17 de 2019

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	ELKIN SALAZAR PEREZ	CEDULA N°.	5472355	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DOTACION Y EPI ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CASCO DIELECTRICO CON BARBUQUEJO	1	19/11/2025	
2	PROTECTOR TIPO LLAVERO	1	19/11/2025	
3	GAFA LENTE CLARO CO N ANTIFON	1	19/11/2025	
4	GUANTE POLIURETANO	1	19/11/2025	
5	BOTA DIELECTRICA NEGRA TALLA 42	1	19/11/2025	
6	CHAQUETA TALLA XL	1	19/11/2025	
7	CARNET	1	19/11/2025	
	Stickers Casco	2	19/12/2025	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	LINA MARTINEZ
CARGO	RECURSOS HUMANOS

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano - Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa ELSA TORRES ARENALES.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA N° 5472355

ELSA TORRES ARENALES NIT: 63.323.375 - 2	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	**Código:** PR-04 **Versión:** 01 **Fecha elaboración:** Junio 17 de 2019

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	FREDY ENRIQUE MEDINA MEDINA	CEDULA N°.	52847740	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DOTACION Y EPI ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CASCO DIELECTRICO CON BARBUQUEJO	1	19/11/2025	
2	PROTECTOR TIPO LLAVERO	1	19/11/2025	
3	GAFA LENTE CLARO CO N ANTIFON	1	19/11/2025	
4	GUANTE POLIURETANO	1	19/11/2025	
5	BOTA DIELECTRICA NEGRA TALLA 40 **(NO HAY 39 1/2)**	1	19/11/2025	
6	CHAQUETA TALLA M	1	19/11/2025	
7	CARNET	1	19/11/2025	
	STICKERS CASCO	2		

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	LINA MARTINEZ
CARGO	RECURSOS HUMANOS

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano - Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa ELSA TORRES ARENALES.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA N°: 1090986

ELSA TORRES ARENALES NIT: 63.323.375 - 2	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	**Código:** PR-04 **Versión:** 01 **Fecha elaboración:** Junio 17 de 2019

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CLAUDIA CAROLINA ROJAS GARCIA	CEDULA N°.	52420651	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DOTACION Y EPI ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CASCO DIELECTRICO CON BARBUQUEJO	1	19/11/2025	✓
2	PROTECTOR TIPO LLAVERO	1	19/11/2025	✓
3	GAFA LENTE CLARO CO N ANTIFON	1	19/11/2025	✓
4	GUANTE POLIURETANO	1	19/11/2025	✓
5	BOTA DIELECTRICA NEGRA TALLA 40	1	19/11/2025	✓
6	CHAQUETA TALLA L	1	19/11/2025	
7	CARNET	1	19/11/2025	
	STICKERS CASCO	2	19/12/25	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	LINA MARTINEZ
CARGO	RECURSOS HUMANOS

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano - Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa ELSA TORRES ARENALES.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA N°: 52420651 Bta.

ELSA TORRES ARENALES NIT: 63.323.375 - 2	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	**Código:** PR-04 **Versión:** 01 **Fecha elaboración:** Junio 17 de 2019

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	DANIEL FELIPE TALERO ROJAS	CEDULA N°.	1030634359	CARGO	PROFESIONAL DE APOYO INTERVENTORIA

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DOTACION Y EPI ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CASCO DIELECTRICO CON BARBUQUEJO	1	19/11/2025	
2	PROTECTOR TIPO LLAVERO	1	19/11/2025	
3	GAFA LENTE CLARO CO N ANTIFON	1	19/11/2025	
4	GUANTE POLIURETANO	1	19/11/2025	
5	BOTA DIELECTRICA NEGRA TALLA	1	19/11/2025	
6	CHAQUETA TALLA M	1	19/11/2025	
7	CARNET	1	19/11/2025	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	LINA MARTINEZ
CARGO	RECURSOS HUMANOS

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano - Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa ELSA TORRES ARENALES.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA N°: 1030634359

ELSA TORRES ARENALES NIT: 63.323.375 - 2	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	**Código:** PR-04 **Versión:** 01 **Fecha elaboración:** Junio 17 de 2019

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	ADRIANA PAOLA MENDEZ NAVARRO	CEDULA N°.	39582366	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DOTACION Y EPI ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CASCO DIELECTRICO CON BARBUQUEJO	1	19/11/2025	
2	PROTECTOR TIPO LLAVERO	1	19/11/2025	
3	GAFA LENTE CLARO CO N ANTIFON	1	19/11/2025	
4	GUANTE POLIURETANO	1	19/11/2025	
5	BOTA DIELECTRICA NEGRA TALLA 38	1	19/11/2025	
6	CHAQUETA TALLA M	1	19/11/2025	
7	CARNET	1	19/11/2025	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	LINA MARTINEZ
CARGO	RECURSOS HUMANOS

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano - Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa ELSA TORRES ARENALES.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA N°: 39.582366

ELSA TORRES ARENALES NIT: 63.323.375 - 2	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	Código: PR-04 Versión: 01 Fecha elaboración: Junio 17 de 2019

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	EDWARD YEZID RODRIGUEZ CORTES	CEDULA N°.	79799899	CARGO	INSPECTOR DE SST INTERVENTORIA

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DOTACION Y EPI ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CASCO DIELECTRICO CON BARBUQUEJO	1	19/11/2025	
2	PROTECTOR TIPO LLAVERO	1	19/11/2025	
3	GAFA LENTE CLARO CO N ANTIFON	1	19/11/2025	
4	GUANTE POLIURETANO	1	19/11/2025	
5	BOTA DIELECTRICA NEGRA TALLA 39	1	19/11/2025	
6	CHAQUETA TALLA L	1	19/11/2025	Edward Rodriguez
7	CARNET	1	19/11/2025	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	LINA MARTINEZ
CARGO	RECURSOS HUMANOS

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano - Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa ELSA TORRES ARENALES.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA N° 79799899

ELSA TORRES ARENALES NIT: 63.323.375 - 2	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	Código: PR-04 Versión: 01 Fecha elaboración: Junio 17 de 2019

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	ANGIE TATIANA CANTOR HERNANDEZ	CEDULA N°.	1014196926	CARGO	INSPECTOR DE SST INTERVENTORIA

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DOTACION Y EPI ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CASCO DIELECTRICO CON BARBUQUEJO	1	19/11/2025	Angie C.
2	PROTECTOR TIPO LLAVERO	1	19/11/2025	Angie C.
3	GAFA LENTE CLARD CO N ANTIFON	1	19/11/2025	Angie C.
4	GUANTE POLIURETANO	1	19/11/2025	Angie C.
5	BOTA DIELECTRICA NEGRA TALLA 35	1	19/11/2025	Angie C.
6	CHAQUETA TALLA M	1	19/11/2025	Angie C.
7	CARNET	1	19/11/2025	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	LINA MARTINEZ
CARGO	RECURSOS HUMANOS

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano - Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa ELSA TORRES ARENALES.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

X Angie Cantor

CEDULA N°: X 1014.196.926

ELSA TORRES ARENALES NIT: 63.323.375 - 2	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	**Código:** PR-04 **Versión:** 01 **Fecha elaboración:** Junio 17 de 2019

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	EDUUIN SILVA SAMBONI	CEDULA N°.	1084255585	CARGO	INSPECTOR SST INTERVENTORIA

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DOTACION Y EPI ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CASCO DIELECTRICO CON BARBUQUEJO	1	19/11/2025	
2	PROTECTOR TIPO LLAVERO	1	19/11/2025	
3	GAFA LENTE CLARO CO N ANTIFON	1	19/11/2025	
4	GUANTE POLIURETANO	1	19/11/2025	
5	BOTA DIELECTRICA NEGRA TALLA 41	1	19/11/2025	
6	CHAQUETA TALLA L	1	19/11/2025	
7	CARNET	1	19/11/2025	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	LINA MARTINEZ
CARGO	RECURSOS HUMANOS

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano - Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa ELSA TORRES ARENALES.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA N°: 1084255585

ELSA TORRES ARENALES NIT: 63.323.375 - 2	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	**Código:** PR-04 **Versión:** 01 **Fecha elaboración:** Junio 17 de 2019

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	LAURA CRISTINA PACHECO RAMIREZ	CEDULA N°.	37713904	CARGO	INSPECTOR SST INTERVENTORIA

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DOTACION Y EPI ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CASCO DIELECTRICO CON BARBUQUEJO	1	19/11/2025	LAURA PACHECO
2	PROTECTOR TIPO LLAVERO	1	19/11/2025	LAURA PACHECO
3	GAFA LENTE CLARO CO N ANTIFON	1	19/11/2025	LAURA PACHECO
4	GUANTE POLIURETANO	1	19/11/2025	LAURA PACHECO
5	BOTA DIELECTRICA NEGRA TALLA 39	1	19/11/2025	LAURA PACHECO
6	CHAQUETA TALLA L	1	19/11/2025	LAURA PACHECO
7	CARNET	1	19/11/2025	LAURA PACHECO

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	LINA MARTINEZ
CARGO	RECURSOS HUMANOS

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano - Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa ELSA TORRES ARENALES.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:



CEDULA N°: 37713904

ELSA TORRES ARENALES NIT: 63.323.375 - 2	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	**Código:** PR-04 **Versión:** 01 **Fecha elaboración:** Junio 17 de 2019

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	EDWIN ALEXANDER PEDRAZA	CEDULA N°.	1012379852	CARGO	INSPECTOR TECNICO INTERVENTORIA

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DOTACION Y EPI ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CASCO DIELECTRICO CON BARBUQUEJO	1	19/11/2025	
2	PROTECTOR TIPO LLAVERO	1	19/11/2025	
3	GAFA LENTE CLARO CO N ANTIFON	1	19/11/2025	
4	GUANTE POLIURETANO	1	19/11/2025	
5	BOTA DIELECTRICA NEGRA TALLA	1	19/11/2025	
6	CHAQUETA TALLA L	1	19/11/2025	
7	CARNET	1	19/11/2025	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	LINA MARTINEZ
CARGO	RECURSOS HUMANOS

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano - Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa ELSA TORRES ARENALES.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA N°: 1012379852

ELSA TORRES ARENALES NIT: 63.323.375 - 2	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	**Código:** PR-04 **Versión:** 01 **Fecha elaboración:** Junio 17 de 2019

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	EDUARDO ENCISO ROJAS	CEDULA N°.	1012379862	CARGO	INSPECTOR TECNICO INTERVENTORIA

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DOTACION Y EPI ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CASCO DIELECTRICO CON BARBUQUEJO	1	19/11/2025	
2	PROTECTOR TIPO LLAVERO	1	19/11/2025	
3	GAFA LENTE CLARO CO N ANTIFON	1	19/11/2025	
4	GUANTE POLIURETANO	1 Z	19/11/2025	
5	BOTA DIELECTRICA NEGRA TALLA 39	1	19/11/2025	
6	CHAQUETA TALLA M	1	19/11/2025	
7	CARNET	1	19/11/2025	
	STOCKEO			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	LINA MARTINEZ
CARGO	RECURSOS HUMANOS

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano - Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa ELSA TORRES ARENALES.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA N°: 1012342901

ELSA TORRES ARENALES NIT: 63.323.375 - 2	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	**Código:** PR-04 **Versión:** 01 **Fecha elaboración:** Junio 17 de 2019

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	JESUS DAVID COCA FONSECA	CEDULA N°.	1023871050	CARGO	INSPECTOR TECNICO INTERVENTORIA

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DOTACION Y EPI ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CASCO DIELECTRICO CON BARBUQUEJO	1	19/11/2025	Jesus Coca
2	PROTECTOR TIPO LLAVERO	1	19/11/2025	Jesus Coca
3	GAFA LENTE CLARO CO N ANTIFON	1	19/11/2025	Jesus Coca
4	GUANTE POLIURETANO	1	19/11/2025	Jesus Coca
5	BOTA DIELECTRICA NEGRA TALLA 40	1	19/11/2025	Jesus Coca
6	CHAQUETA TALLA L	1	19/11/2025	Jesus Coca
7	CARNET	1	19/11/2025	Jesus Coca

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	LINA MARTINEZ
CARGO	RECURSOS HUMANOS

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano - Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa ELSA TORRES ARENALES.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

X Jesus David Coca F.

CEDULA N°: 1023871050

ELSA TORRES ARENALES NIT: 63.323.375 - 2	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	**Código:** PR-04 **Versión:** 01 **Fecha elaboración:** Junio 17 de 2019

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL	CEDULA N°.	1105671697	CARGO	INSPECTOR TECNICO INTERVENTORIA

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DOTACION Y EPI ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CASCO DIELECTRICO CON BARBUQUEJO	1	19/11/2025	Jairo A.D.
2	PROTECTOR TIPO LLAVERO	1	19/11/2025	Jairo A.D.
3	GAFA LENTE CLARO CO N ANTIFON	1	19/11/2025	Jairo A.D.
4	GUANTE POLIURETANO	1	19/11/2025	Jairo A.D.
5	BOTA DIELECTRICA NEGRA TALLA 42	1	19/11/2025	Jairo A.D.
6	CHAQUETA TALLA XL	1	19/11/2025	Jairo A.D.
7	CARNET	1	19/11/2025	Jairo A.D.
	Stickers	2		

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	LINA MARTINEZ
CARGO	RECURSOS HUMANOS

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyan a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano - Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa ELSA TORRES ARENALES.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

X Jairo Andres Duarte

CEDULA N°: 1105671697

ELSA TORRES ARENALES NIT: 63.323.375 - 2	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	**Código:** PR-04 **Versión:** 01 **Fecha elaboración:** Junio 17 de 2019

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	SARA ANGELICA VERA ARANGO	CEDULA N°.	1026259160	CARGO	INSPECTOR TECNICO INTERVENTORIA

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DOTACION Y EPI ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CASCO DIELECTRICO CON BARBUQUEJO	1	19/11/2025	
2	PROTECTOR TIPO LLAVERO	1	19/11/2025	
3	GAFA LENTE CLARO CO N ANTIFON	1	19/11/2025	
4	GUANTE POLIURETANO	1	19/11/2025	
5	BOTA DIELECTRICA NEGRA TALLA 35	1	19/11/2025	
6	CHAQUETA TALLA M	1	19/11/2025	
7	CARNET	1	19/11/2025	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	LINA MARTINEZ
CARGO	RECURSOS HUMANOS

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano - Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa ELSA TORRES ARENALES.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA N°: 1026259160

ELSA TORRES ARENALES NIT: 63.323.375 - 2	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	**Código:** PR-04 **Versión:** 01 **Fecha elaboración:** Junio 17 de 2019

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	JAIME ALEJANDRO MORENO DIAZ	CEDULA N°.	80112810	CARGO	INSPECTOR TECNICO INTERVENTORIA

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DOTACION Y EPI ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CASCO DIELECTRICO CON BARBUQUEJO	1	19/11/2025	
2	PROTECTOR TIPO LLAVERO	1	19/11/2025	
3	GAFA LENTE CLARO CO N ANTIFON	1	19/11/2025	
4	GUANTE POLIURETANO	1	19/11/2025	
5	BOTA DIELECTRICA NEGRA TALLA 40	1	19/11/2025	
6	CHAQUETA TALLA M	1	19/11/2025	
7	CARNET	1	19/11/2025	
	Stickers	2		

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	LINA MARTINEZ
CARGO	RECURSOS HUMANOS

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano - Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa ELSA TORRES ARENALES.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA N°: 80.112.810 Bta.

ELSA TORRES ARENALES NIT: 63.323.375 - 2	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	**Código:** PR-04 **Versión:** 01 **Fecha elaboración:** Junio 17 de 2019

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	ERIKA PAOLA RUIZ BELTRAN	CEDULA N°.	52.266.454	CARGO	ESPECIALISTA AMBIENTAL INTERVENTORIA

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DOTACION Y EPI ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CASCO DIELECTRICO CON BARBUQUEJO	1	19/11/2025	
2	PROTECTOR TIPO LLAVERO	1	19/11/2025	
3	GAFA LENTE CLARO CO N ANTIFON	1	19/11/2025	
4	GUANTE POLIURETANO	1	19/11/2025	
5	BOTA DIELECTRICA NEGRA TALLA	1	19/11/2025	
6	CHAQUETA TALLA S	1	19/11/2025	
7	CARNET	1	19/11/2025	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	LINA MARTINEZ
CARGO	RECURSOS HUMANOS

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion indivudual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano - Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa ELSA TORRES ARENALES.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA N°: 52266454 B. Fe

Anexo No. 14- Informe ambiental Interventoría.

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SECRETARIA DE EDUCACIÓN – SED
JUNIO DE 2026



INFORME AMBIENTAL No.9 DE INTERVENTORÍA LOTE 11
PERIODO: 8 DE JUNIO DE 2026 AL 07 DE JULIO DE 2026

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

INFORME AMBIENTAL No.8 DE INTERVENTORÍA


LOTE 11

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8169112 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ELSA TORRES ARENALES

INTERVENTORÍA

ELSA TORRES ARENALES	***INFORME No. 9 DE INTERVENTORÍA***
ARCHIVO:	***VERSIÓN: 01***
 ***ELABORÓ: ERIKA RUIZ BELTRAN*** ***Especialista ambiental de Interventoría***	 ***APROBÓ: Ing. ELKIN SALAZAR PÉREZ*** ***Director de Interventoría***
FECHA: 08-JUNIO -26 AL 07-JULIO-26	

Contenido

1. INTRODUCCIÓN. 8
2. OBJETIVOS 8
3. LOCALIZACION DEL PROYECTO. 8
3.1 UBICACIÓN GENERAL. 9
4.2 GENERALIDADES DE LA LOCALIDADES (11) DE SUBA, (12) BARRIOS UNIDOS. 10
4. DATOS DEL PROYECTO 11
4.1 DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 11
4.2 DATOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA. 12
5. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR INTERVENTORIA 13
5.1 REVISION DOCUMENTAL 13
5.2 ATENCION DE EMERGENCIAS SILVICULTURALES 14
6. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEO CONTRATISTA. 16
7. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 08-junio -26 al 07-julio-26 22
8. SEGUIMIENTO DECRETO 507 DE 2023 25
9. CORRESPONDECIA 27
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 28

LISTADO DE ANEXOS

Anexo No. 1 CERTIFICACIÓN DE PROTECCIÓN A LOS SUMIDEROS ALEDAÑOS

Anexo No. 2 CERTIFICACIÓN DE NO INTERVENCIÓN DE LAS ZONAS VERDES ALEDAÑAS AL PROYECTO

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización del proyecto Georreferenciación localidades de Suba y Barrios Unidos. Fuente (Autor 2023). 10

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Colegios a Intervenir lote 11 8
Tabla 2 Contrato interventoría 11
Tabla 3 Contrato Obra LOTE 11. 12
Tabla 4 Actividades para circularidad y retiro de tejas de asbesto. 14
Tabla 5 obligaciones componente ambiental 16
Tabla 6 Ingreso materiales 25
Tabla 7 Disposición RCD 26
Tabla 8 Correspondencia 27

1. INTRODUCCIÓN.

El presente informe recopila las actividades seguimiento ambiental realizadas en el periodo comprendido del entre al 8 de junio de 2026 al 7 de julio de 2026; bajo el Contrato de Consultoría modalidad Interventoría, adjudicó el contrato de Interventoría a la ingeniera Elsa Torres Arenales con el contrato No. CO1.PCCNTR.8169112 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 cuyo objeto es la "*INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".*

En el seguimiento a los contratos de obra suscritos entre La Secretaría de Educación del Distrito (SED) y Lote 11 la firma Consorcio COLEGIOS MECBOG contrato número CO1.PCCNTR.8155160

2. OBJETIVOS

Describir el seguimiento por parte de la interventoría a las actividades ambientales realizadas por los contratistas de obra.

3. LOCALIZACION DEL PROYECTO.

La Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos signo al CONSORCIO COLEGIO MECBOG la intervención de 7 Instituciones Educativas

Tabla 1 Colegios a Intervenir lote 11

GRUPO	Zona	CPF	Localidad	Colegio	Sede Educativa	SEDE	Dirección
GRUPO 11	NORTE	1217	BARRIOS UNIDOS	REPUBLICA DE PANAMA	Avenida Chile	B	KR 62 # 70 C - 31
GRUPO 11	NORTE	1219	BARRIOS UNIDOS	RAFAEL BERNAL JIMENEZ	Gloria Gaitán A	B	CARRERA 54 No 78-85
GRUPO 11	NORTE	1206	BARRIOS UNIDOS	JUAN FRANCISCO BERBEO	Policarpa Salavarrieta	B	CL 77 # 22 - 66

GRUPO 11	NORTE	1156	SUBA	GONZALO ARANGO	Gloria Lara de Echeverry - Gonzalo Arango	A	CALLE 130 C No 97-71
GRUPO 11	NORTE	1101	SUBA	ALVARO GOMEZ HURTADO	Álvaro Gómez Hurtado	A	CARRERA 100 A No 130-18
GRUPO 11	NORTE	1170	SUBA	JAIME NIÑO DIEZ	Jaime Niño Diez	-	CARRERA 109 B N 145-17
GRUPO 11	NORTE	1113	SUBA	LA GAITANA	La Gaitana	A	TRANSVERSAL 116 C No 136-88
GRUPO 11	NORTE	1160	SUBA	COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA	SEDE UNICA	UNICA	CARRERA 100 A No 130 - 18
GRUPO 11	NORTE	1160	SUBA	LA GAITANA– LA GAITANA	SEDE A	A	CARRERA 103B #153-1

Atención de emergencias silviculturales

- DILE
- Colegio Republica Dominicana

3.1 UBICACIÓN GENERAL.

Las localidades de Suba y Barrios Unidos determinadas como la Zona Norte para este contrato, se encuentran ubicadas en el extremo norte de la ciudad de Bogotá y limitan por el norte con la localidad de Usaquén por el sur con las localidades de Teusaquillo y Engativá.



Ilustración 1 Localización del proyecto Georreferenciación localidades de Suba y Barrios Unidos. Fuente (Autor 2023).

4.2 GENERALIDADES DE LA LOCALIDADES (11) DE SUBA, (12) BARRIOS UNIDOS.

LOCALIDAD DE SUBA.

Suba, la localidad número 11 de Bogotá, es la más poblada y una de las más extensas de la ciudad, ubicada en el noroccidente. Se caracteriza por su particular mezcla de entornos urbanos y rurales, destacándose por su riqueza natural, con áreas como los Cerros de Suba y La Conejera, y una red importante de humedales. Además, posee un importante legado histórico, con una fuerte presencia de la comunidad indígena Muisca, y un notable desarrollo comercial e industrial, que incluye cultivos de flores de exportación.

- Ubicación: Extremo noroccidental de Bogotá, limitando con los municipios de Chía y Cota, y las localidades de Usaquén y Engativá.
- Extensión: Aproximadamente 100,6 km², con una proporción significativa de suelo rural.

- Topografía: Combina una zona plana en el occidente con zonas montañosas en los cerros de Suba.

LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.

Barrios Unidos es la localidad número 12 de Bogotá, ubicada en el noroccidente de la ciudad. Su economía es mixta, con fuerte actividad comercial y de servicios, especialmente en los sectores automotriz y de muebles, conviviendo con una marcada vocación residencial. La localidad tiene un terreno relativamente plano, está delimitada por importantes avenidas y en ella se encuentran zonas de gran valor ambiental y recreativo como el Parque Metropolitano Simón Bolívar y el Humedal El Salitre.

- Localización: Noroccidente de Bogotá.
- Límites: Al norte con Suba (Av. Calle 100), al sur con Teusaquillo (Calle 63), al oriente con Chapinero (Av. Caracas) y al occidente con Engativá (Av. Carrera 68).
- Topografía: Terreno relativamente plano.

4. DATOS DEL PROYECTO

4.1 DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Tabla 2 Contrato interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.8169112 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INTERVENTORÍA	ELSA TORRES ARENALES
NIT	63.323.375-2
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA

	FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
UBICACIÓN	LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, CHAPINERO, SUBA Y USAQUEN – ZONA NORTE LOTE 4.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 796.278.928,00 (Incluido AIU).
ADICION No. 1	$ 166.286.594,00 (Incluido AIU).
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 962.565.522,00 (Incluido AIU).
FECHA DE INICIO	8/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	17/08/2026
PLAZO DEL CONTRATO INICIAL	SIETE (7) MESES
ADICION No. 1	TRES (3) MESES Y DIEZ (10) DIAS
PLAZO DEL CONTRATO FINAL	DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DIAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	ING. ELKIN SALAZAR PÉREZ Correo electrónico: interventorianortel4@gmail.com Cra. 49A No. 94-76 Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL	ELSA TORRES ARENALES etorresare@yahoo.es Cra. 49A No. 94-76 Bogotá D.C.

Fuente: Propia

4.2 DATOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA.

Tabla 3 Contrato Obra LOTE 11.

CONTRATO DE OBRA No.	**CO1.PCCNTR.8155160**
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIO MECBOG MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE 1130664687-1 35% CVL INGENIERIA S.A.S 900525406-5 65%
NIT	901973159-5

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 11
UBICACIÓN	LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS Y SUBA – ZONA NORTE LOTE 11.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.499.103.832,00 (Incluido AIU).
ADICION No. 1	$ 1.174.923.219,00 (Incluido AIU).
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 3.674.027.051,00 (Incluido AIU).
FECHA DE INICIO	8/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	17/08/2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	SIETE (7) MESES
ADICION No. 1	TRES (3) MESES Y DIEZ (10) DIAS
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DIAS
DIRECTOR DE OBRA	ANDRÉS MAURICIO ROSERO RIASCOS
REPRESENTANTE LEGAL	MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE

Fuente: Propia

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR INTERVENTORIA

5.1 REVISION DOCUMENTAL

En desarrollo del periodo comprendido en entre el 8 de junio de 2026 y el 7 de julio de 2026 el CONSORCIO COLEGIO MECBOG remitió para su revisión el informe de seguimiento ambiental No.8. para revisión y concepto.

Los cargues al aplicativo de la secretaria de ambiente de los meses de marzo, abril y mayo de 2026.

5.2 ATENCION DE EMERGENCIAS SILVICULTURALES

Tabla 4 Emergencia Silviculturales

No	COLEGIO	DIRECCION	EXPEDIENTE	ACTIVIDAD A EJECUTAR	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	República Dominicana	Transversal 126 No. 134 - 88	Acta de emergencia DHL-20251615-00003 del 19 de febrero del 2026	Tala de cinco (5) y la poda de uno (1) árboles de las especies Sauce lloron – (Salix humboldtiana),	 

2	DILE	Carrera 58 No. 167 - 20	Acta de emergencia VA-20260617-00091	TALA de un (1) árbol de la especie Jazmín del Cabo; La PODA de tres (3) árboles de las especies Guayacán de Manizales, Sauce llorón y Sauco y el Tratamiento integral de dos (2) de la especie Urapán	 

6. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEO CONTRATISTA.

Tabla 5 obligaciones componente ambiental

OBLIGACION		OBSERVACION	CUMPLE/ NO CUMPLE
GENERALES DEL CONTRATISTA			
13	Respetar la política medioambiental de la SED, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales y manejo del ruido, ubicada en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_ institucional/transparencia-politicas lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales	El contratista reconoce y aplica la política ambiental	CUMPLE
5. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA			
	Obligaciones Relacionadas con la Gestión Ambiental		
	Ambiental		
	Realizar la adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la SED mediante el uso racional del agua y la energía, así como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato con la SED. Como soporte de cumplimiento de esta obligación se debe presentar un acta y listado de asistencia de la socialización de los lineamientos ambientales de la SED.	Se dio aval al documento PIGA mediante comunicado INT-COLEGIOSNORTE-L11-039 del 4 de noviembre de 2025	CUMPLE
	Realizar, en caso de requerirse, el trámite de manejo silvicultural para el arbolado presente en el predio, hasta la obtención del permiso requerido (poda, tala, traslado y/o demás) y la compensación requerida por la Secretaría Distrital de Ambiente.	N/A	N/A
	Implementar ciclo parqueaderos en las sedes señaladas por la SED sobre las cuales se realice la intervención por lote, conforme al numeral. 8.2 "FACTORES DE SOSTENIBILIDAD TÉCNICO	EL contratista presento propuesta técnica para la instalación del Ciclo parqueadero para el	CUMPLE PARCIALMENTE

	AMBIENTAL AGREGADO" del presente estudio previo.	colegio Álvaro Gómez Hurtado sede A -MECBOG-2026-189 el cual debe ser instalado y presentar informe final	
	Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación del PIGA de la SED en la ejecución del contrato.		CUMPLE
	En caso de que sea necesaria la intervención, adecuación o construcción del cuarto de almacenamiento de residuos sólidos, el Contratista deberá cumplir con los requisitos establecidos para los sistemas de recolección, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 2981 de 2013, o en las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan	Los colegios en intervención durante el periodo no se ha realizado intervención al cuarto de almacenamiento de residuos solidos	N/A
	Garantizar la Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), cumpliendo con lo dispuesto en las Resoluciones 472 de 2017 y 1257 de 2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Decreto 507 de 2023, así como con las demás normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan, y con los lineamientos internos de la SED. El Contratista deberá entregar y actualizar, según lo exija la normativa, el Plan de Manejo de Residuos de Construcción y Demolición (PMRCD), los formatos RCD y cargar la información mensualmente en el aplicativo web de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), desde la apertura hasta el cierre del PIN de obra asignado. Los reportes mensuales deberán ser revisados y avalados por la Interventoría antes de su remisión a la SED.	INT-COLEGIOSNORTE-L11-029 del 1/11/ 2025 se realizan aval al PMRCD INT-COLEGIOSNORTE-SED-013 del 4/11/ 2025 se remite PMRCD a la SED. Se cuenta con PIN 27903 *Se dio respuesta al requerimiento de la secretaria de ambiente E-2026-98030*	CUMPLE
	a) En caso de realizar cambios de cubierta que involucren tejas de asbesto-cemento, el contratista de obra deberá: b) Implementar un protocolo de bioseguridad y salud en el trabajo (incluyendo trabajo en alturas, uso de andamios certificados, etc.).	En el periodo anterior no se realizo cambio de cubiertas, Dentro del PIGA se adjuntó protocolo de	N/A

	c) Realizar un manejo adecuado de los residuos (acopio temporal, embalaje). d) Disponer de los residuos mediante un gestor autorizado y certificar su disposición final. e) Entregar un informe de actividades con registro fotográfico que documente todas las acciones realizadas, desde la manipulación, embalaje, carga, transporte hasta la disposición final de los residuos.	bioseguridad y manejo de residuos con contenido de asbesto-cemento	
	Uso Eficiente del Agua		
	Implementar al 100% sistemas ahorradores de agua de alta eficiencia en cada uno de los puntos hidráulicos (excepto en pocetas, lavaderos y lava traperos), dando cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de 1997 y al Acuerdo Distrital 407 de 2009.	Durante el periodo se ha realizado intervenciones a puntos hidráulicos, sanitarios y sistemas ahorradores de agua	N/A
	Inventariar y reportar mensualmente la sustitución e implementación de sistemas ahorradores de agua.		
	Implementar un sistema de recolección, almacenamiento y/o aprovechamiento de aguas lluvias, con el fin de reutilizarlas en cisternas, riego de jardines, zonas verdes y/o limpieza de exteriores.		
	Implementar al 100% sistemas sanitarios ahorradores de agua de alta eficiencia dando cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de 1997 y al Acuerdo Distrital 407 de 2009. Deberá reportar a la entidad mensualmente la instalación/implementación y/o reposición de dispositivos ahorradores en el formato establecido por la Entidad.		
	Uso Eficiente de la Energía		
	Garantizar que la infraestructura intervenida permita el máximo aprovechamiento de la luz natural.	Durante el periodo se ha realizado intervenciones a puntos hidráulicos, sanitarios y sistemas	SI
	Implementar al 100% bombillos ahorradores y luminarias con tecnología LED, dando cumplimiento al Decreto 2331 de 2007 y a la Resolución 40283 DE 2019. Deberá reportar a la entidad mensualmente la instalación/implementación y/o reposición de dispositivos ahorradores en el formato establecido por la Entidad		
	En concordancia con la necesidad, condiciones técnicas y disponibilidad presupuestal, implementar algún tipo de energía alternativa sostenible, bien sea un sistema de energía solar fotovoltaico (el cual debe dar cumplimiento a la normatividad vigente y a lineamiento interno de la SED), o luminarias solares		

	exteriores como método alterno de suministro de energía que sea eficiente y amigable con el medio ambiente	ahorradores de energía	
	Informe Ambiental		
	El Contratista de obra deberá presentar un informe ambiental mensual, el cual deberá incluir, como mínimo y sin limitarse a, los siguientes aspectos: a) Resumen de actividades de gestión ambiental realizadas. b) Resumen de actividades de obra realizadas en el periodo. c) Cuadro de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales. d) Registro fotográfico de las actividades ambientales más relevantes de obra. e) Registro de cargue de reportes mensuales RCD generado en el aplicativo web de la SDA, con sus respectivos soportes. f) Verificación y seguimiento a protección de sumideros aledaños. g) Seguimiento y gestión de permisos ambientales. h) Formato diligenciado de los sistemas ahorradores de agua y energía instalados en el periodo.	El informe No 8 correspondiente al periodo del 8 mayo al 7 de junio de 2026 se aprobó mediante comunicado **INT-COLEGIOSNORTE-L11- 423**	CUMPLE
	Forestal En caso de requerir intervención de vegetación y/o tratamientos silviculturales, previa obtención del permiso por parte de la Autoridad Competente, el contratista deberá dar cumplimiento a las siguientes condiciones:		*La intervenciones forestales sen encuentran en el marco de los permisos tramitados por la SED*
a	Presentar el inventario forestal actualizado de acuerdo con los requisitos establecidos en la lista de chequeo de la SDA, incluyendo: Formato 1, Formato 2, plano de localización georreferenciada indicando los tratamientos propuestos por color según el tratamiento (debe incluir coordenadas, grilla, norte, convenciones, debe permitir ver la superposición de la vegetación existente con el proyecto, original recibo de pago cancelado por el servicio de evaluación	N/A	N/A
b	Elaborar el Plan de Manejo de Avifauna: El Plan de Manejo de Avifauna, es un documento con información secundaria y complementa la solicitud	N/A	N/A

	de permiso silvicultural. Este documento contiene las labores de manejo que se harán para la protección de aves u otras especies antes de iniciar la poda, tala o traslado de un individuo arbóreo, se recomienda tener como guía los documentos de la Secretaría Distrital de Ambiente Informe Técnico 2019IE134093, el Protocolo de manejo del Jardín Botánico y el Manual de Control y Seguimiento Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -SST del IDU		
c	El inventario forestal y plan de manejo de avifauna serán entregados a la interventoría, quien deberá revisar dichos documentos y emitir las observaciones pertinentes. Así mismo, se obliga a presentar a la SED la información requerida para solicitar los permisos necesarios ante la Secretaría Distrital de Ambiente, de forma oportuna, con el fin de que no se presenten retrasos en las obras por efecto de la expedición del concepto respectivo. Una vez obtenido el permiso correspondiente el contratista deberá ejecutar los tratamientos silviculturales aprobados, de acuerdo con las normas ambientales vigentes al momento de la ejecución.	N/A	N/A
d	Si se realiza el traslado o siembra de árboles en espacio público, el contratista de obra debe solicitar al JBB la aprobación de los sitios de traslado o siembra, y por tanto, el contratista estará a cargo del mantenimiento de los mismos hasta la terminación del contrato. Finalizada la siembra y/o traslado, deberá presentar el plano de localización georreferenciada de los árboles, a la Interventoría para revisión y aprobación y posterior entrega a la SED. (Decreto 383 de 2018)	N/A	N/A
e	se requiere la prórroga del permiso otorgado por la Autoridad Ambiental Competente - AAC, el contratista deberá verificar dentro de los alcances definidos e informar en un periodo no mayor a quince (15) días a la SED.	N/A	N/A
f	El contratista deberá cancelar el valor por seguimiento y el valor IVP (Individuo Vegetal Plantado) como medida de compensación por la tala del arbolado urbano, que defina la Autoridad Ambiental Competente en la Resolución aprobatoria de los tratamientos a la vegetación y presentar los recibos de pago a la SED.	N/A	N/A

g	El contratista debe realizar el mantenimiento de los individuos vegetales arbóreos y de jardinería plantados y los árboles bloqueados y trasladados desde el momento de su plantación y durante la ejecución de las obras.	N/A	N/A
h	El contratista debe implementar las medidas de manejo ambiental para las actividades que se adelanten en zonas sensibles	N/A	N/A
i	El contratista no podrá adelantar obras de ningún tipo en sectores de áreas protegidas del Distrito Capital.	N/A	N/A
j	El contratista debe presentar un capítulo forestal en el informe mensual que contenga: i) Relación tratamientos silviculturales autorizados y ejecutados. Indicar destino final de productos y residuos resultantes de los tratamientos ejecutados. Presentar las certificaciones o actas de recibo del material, ii) Reporte de funciones realizadas por el profesional forestal cuando aplique, iii) Reporte de actividades realizadas en cuanto a manejo de vegetación, zonas verdes y avifauna cuando aplique, iv) Reporte de pagos de actos administrativos cuando aplique, v) Reporte de ejecución del plan de manejo de avifauna cuando aplique. Vi) Reporte de uso final de la madera comercial obtenida de los tratamientos silviculturales (cuando apliqué) y presentación de salvoconducto de movilización de la misma en caso de retirarla del sitio de aprovechamiento	N/A	N/A
K	Una vez ejecutados todos los tratamientos silviculturales autorizados, el contratista debe remitir a la interventoría el informe final de seguimiento a la Resolución de Autorización, donde se presente el estado de cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas por la Autoridad Ambiental Competente –AAC-, con registro fotográfico donde aplique, el listado de tratamientos ejecutados versus autorizados, certificaciones de disposición final de los residuos vegetales, certificación de destino final de madera comercial cuando aplique y salvoconducto de movilización si éste fue requerido. Registro de actividades de mantenimiento de árboles trasladados y/o plantados (con registro fotográfico). Planos récord, en medio impreso y magnético (dos copias), los cuales deberán estar georreferenciados a una escala acorde, donde se evidencien	N/A	N/A

	claramente los detalles y los siguientes aspectos: ubicación de los árboles plantados como parte del diseño paisajístico, ubicación de los árboles trasladados, ubicación de los árboles conceptuados para permanencia, memoria técnica ejecutiva del manejo de la vegetación y de la implementación del diseño paisajístico y el informe de actividades realizadas, para evaluación y aprobación y posteriormente remitir a la SED para el trámite ante la AAC del cierre del expediente, en este informe se debe consolidar la información reportada mensualmente durante el contrato. Se debe presentar el formato de ejecución de actividades silviculturales disponible en la página web de la SDA (adjunto).		

7. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 08-junio -26 al 07-julio-26

7.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME.

Para este INFORME No. 9, se llevaron a cabo las siguientes actividades para los siguientes frentes de obra del lote 11 Consorcio COLEGIO MECBOG:

- **GONZALO ARANGO SEDE A**

  - Montaje estructura módulos
  - Acabados módulos
  - Instalaciones eléctricas

	
Estructura modulos	Cubierta modulos

- **NICOLAS DE BUENAVENTURA**
  - Demolición muros de mampostería
  - Ejecución muros de mampostería
  - Adecuaciones electicas

	
Demonte muro de mampostería	Ejecución muro de mampostería

- **LA GAITANA**
  - Desmonte de adoquin
  - Excavaciones
- **VIRGINA GUITIERREZ**

- Instalación cerramiento de obra
- Instalación estructura y cubierta

- **DILE**

  - Atención emergencia Silvicultura actividad ejecutada el 2 de julio de 2026





- **REPUBLICA DOMINICANA**

  - Atención emergencia Silvicultura actividad ejecutada el 26 de junio de 2026





En desarrollo del contrato se atendieron emergencias en los siguientes colegios

- La Toscana

8. SEGUIMIENTO DECRETO 507 DE 2023

8.1 CIRCULARIDAD

Tabla 6 Ingreso materiales

MES	PROVEDOR	MATERIAL	CANTIDAD	ACUMULADA
Octubre 2025	Realización diagnostico no se ejecutaron actividades de obra			
Noviembre 2025		0	0	
Diciembre 2025	Reciclados industriales y granulados reciclados de Colombia	Subbase granular - prefabricado	68.20 TON	
Diciembre 2025	Reutilización material de excavación	Obra	18.411 TON	86.611
Enero 2026	No se efectuó uso de materiales de circularidad	N/A	N/A	86.611
Febrero2026	No se efectuó uso de materiales de circularidad	N/A	N/A	86.611
Marzo 2026	No se efectuó uso de materiales de circularidad	N/A	N/A	86.611
Abril 2026	Granulados Reciclados de Colombia SAS	Subbase granular	58 ton	144.611
Abril 2026	Reutilización material de excavación	Obra	21.097	165.708

Mayo 2026	No se efectuó uso de materiales de circularidad	N/A	N/A	165.708
Junio 2026	No se efectuó uso de materiales de circularidad	N/A	N/A	165.708

El % de circularidad es 31% dando cumplimento a las metas establecidas en el decreto 507 de 2023 de acuerdo con la cantidad estimada de material requerido para el proyecto de 533 toneladas

8.2 DISPOSICIÓN DE RCD

Tabla 7 Disposición RCD

MES	**GESTOR**	**CANTIDAD GENERADO/CANTIDAD APROVECHADO**	**% DE CUMPLIMIENTO REUTILIZACION**
Octubre 2025	Realización diagnostico no se ejecutaron actividades de obra		
Noviembre 2025	N/A	0	0
Diciembre 2025	N/A	0	0
8 de enero 2026 al 7 de febrero 2026	Maat	55.1530/51.4190	93.23%
8 de febrero 2026 al 7 de marzo 2026	Maat	66.46/58.3420	87.79%
8 de marzo 2026 al 7 de abril 2026	Granulados Reciclados industriales de Colombia	169.6146/156.0910	92.03%
8 de abril 2026 al 7 de mayo 2026	Granulados Reciclados industriales de Colombia	225.0336/209.96	93.30%

8 de abril 2026 al 7 de mayo 2026 Página 17 de 47 8 de mayo 2026 al 7 de junio 2026	Granulados Reciclados industriales de Colombia	226.7166/ 210.1890	92.71%

9. CORRESPONDECIA

Tabla 8 Correspondencia

OFICIO	FECHA	ASUNTO
INT-COLEGIOSNORTE-L11- 376	11/06/26	RESPUESTA A SU COMUNICADO MECBOG-2026-267 APROBACION INFORME AMBIENTAL NO. 7 PERIODO DEL OCHO (8) DE ABRIL DEL 2026 AL SIETE (7) DE MAYO DEL 2026.
INT-COLEGIOSNORTE-L11- 386	17-06-26	: REITERACION COMUNICADO INT-COLEGIOSNORTE-L11-366, SOLICITUD DE PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN DE OBRA Y PERSONAL ASIGNADO – EMERGENCIAS SILVICULTURALES DE LA IED REPUBLICA DOMINICANA SEDE A Y DILE SUBA.
INT-COLEGIOSNORTE-L11-36	02/07/2026	SOLICITUD DE PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN DE OBRA Y PERSONAL ASIGNADO – EMERGENCIAS SILVICULTURALES DE LA IED REPUBLICA DOMINICANA SEDE A Y DILE SUBA.

INT-COLEGIOSNORTE-SED-22	04/07/2026	RESPUESTA AL COMUNICADO SECRETARIA DE AMBIENTE E-2026-98030. ASUNTO RESPUESTA AL RADICADO SDA NO. 2025ER26370 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2025 INSCRIPCIÓN COMO GENERADOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN PIN-GRN-27903
INT-COLEGIOSNORTE-L11-409	07/07/2026	REQUERIMIENTO INSTALACION DE CICLO PARQUEADERO, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 8155160 LOTE 11-CONSORCIO COLEGIO MECBOG.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La interventoría realiza acompañamiento a las actividades realizadas por el contratista.
2. Se realizó retiro de RCD y seguimiento al cumplimiento de las metas de circularidad
3. Se cuenta con un % de cumplimiento de circularidad del 31% superior a lo exigido por el decreto 507 de 2023 y de aprovechamiento de RCD del 92.71% superior al 50% establecido en el decreto.

ANEXO

Anexo No. 1

CERTIFICACIÓN DE PROTECCIÓN A LOS SUMIDEROS ALEDAÑOS

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

CERTIFICACIÓN DE PROTECCIÓN A LOS SUMIDEROS ALEDAÑOS

ELSA TORRES ARENALES EN DESARROLLO CO1.PCCNTR.8169112 " INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. (LOTE 04)"

Por medio de la presente certificamos como interventores del contrato de obra **CO1.PCCNTR.8154791** suscrito entre el **CONSORCIO COLEGIO MECBOG** y la **Secretaria de educación de Bogotá** - cuyo objeto es **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 11**

Que en el perdido comprendido entre el 8 de junio de 2026 y 7 de julio de 2026 en el área directa de influencia de los colegios intervenido no se encuentran sumideros que requieren protección

Dado en Bogotá el dia siete (7) de junio de 2026

Cordialmente,

ERIKA RUIZ BELTRAN
ASESOR AMBIETAL INTERVENTORIA

ELSA TORRES ARENALES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: elsaresa@yahoo.es, coordinacionproyectos@gmail.com
Telefonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

Anexo No. 2

CERTIFICACIÓN DE NO INTERVENCIÓN DE LAS ZONAS VERDES ALEDAÑAS AL PROYECTO

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

CERTIFICACIÓN DE NO INTERVENCIÓN DE LAS ZONAS VERDES ALEDAÑAS AL PROYECTO

ELSA TORRES ARENALES EN DESARROLLO CO1.PCCNTR.8169112 " INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. (LOTE 04)"

Por medio de la presente certificamos como interventores del contrato de obra **CO1.PCCNTR.8154791** suscrito entre el **CONSORCIO COLEGIO MECBOG** y la **Secretaria de educación de Bogotá** - cuyo objeto es **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 11**

Que en el perdido comprendido entre el 8 de junio de 2026 y 7 de julio de 2026 en el área directa de influencia de los colegios intervenido no se encuentran sumideros que requieren protección

Dado en Bogotá el día siete (7) de junio de 2026

Cordialmente,

ERIKA RUIZ BELTRAN
ASESOR AMBIETAL INTERVENTORIA

ELSA TORRES ARENALES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: [illegible] [illegible]
Telefonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

Anexo No. 15

FECHA: 14/06/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME	
DIAS RESTANTES 64 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			SEMANAL No, 31 DE INTERVENTORIA	
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			LOTE	0 4
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155160		CONSORCIO COLEGIO MECBOG	
14 de junio de 2026	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169112		ELSA TORRES ARENALES	

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169112	CO1.PCCNTR.8155160	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796.278.928,00	$ 2.499.103.832,00
INICIO	8 de octubre de 2025	8 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIÓNES	$ 166.286.594,00	$ 1.164.923.219,00
TERMINACIÓN INICIAL	7 de mayo de 2026	7 de mayo de 2026	PRÓRROGAS - ADICION	102	102	TOTAL	**$ 962.565.522,00**	**$ 3.664.027.051,00**
TERMINACION FINAL	17 de agosto de 2026	17 de agosto de 2026	TOTAL	313	313			

MODIFICACIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	30/12/2025	$ 37.571.611,00	0	
2	7/5/2026	$ 128.714.983,00	3 meses 10 dias	
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	7/5/2026	$ 1.164.923.219,00	3 meses 10 dias	
2				
3				
4				

COLEGIO	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR (31/05/2026)	ACTUAL	ACUMULADO EJECUTADO	PROGRAMADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR TOTAL FRENTE (INCLUYE AIU)	FECHA INICIO	FECHA FIN
RAFAEL BERNAL JIMENEZ	B	GLORIA GAITÁN A	100,00%		100,00%		100,00%	$ 152.191.367,21	$ 152.191.367,21	10/11/2025	6/3/2026
GONZALO ARANGO	A	GLORIA LAURA	82,58%	1,00%	83,58%	1,56%	87,00%	$ 743.904.093,30	$ 890.050.362,89	24/12/2025	7/5/2026
JAIME NIÑO DIEZ	A	LOMBARDIA	100,00%		100,00%		100,00%	$ 67.566.917,94	$ 67.566.917,94	5/3/2026	7/5/2026
JUAN FRANCISCO BERBEO	B	POLICARPA SALAVARRIETA	100,00%		100,00%		100,00%	$ 554.734.871,99	$ 554.734.871,99	28/11/2025	7/5/2026
LA GAITANA	A	SEDE A	100,00%		100,00%		100,00%	$ 454.098.351,43	$ 454.098.351,43	24/11/2025	13/4/2026
ALVARO GOMEZ HURTADO	A	SEDE A	100,00%		100,00%		100,00%	$ 16.737.980,82	$ 16.737.980,82	10/11/2025	6/4/2026
REPUBLICA DE PANAMA	B	AVENIDA CHILE	100,00%		100,00%		100,00%	$ 49.221.389,32	$ 49.221.389,32	10/11/2025	25/3/2026
NICOLAS DE BUENAVENTURA	A		2,24%	2,48%	4,72%	2,48%	10,70%	$ 41.953.306,86	$ 392.086.980,00	7/5/2026	17/8/2026
VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA			3,00%	1,00%	4,00%	0,10%	1,44%	$ 6.808.841,84	$ 472.836.239,00	7/5/2026	17/8/2026
EMERGENCIAS					51,572%			$ 315.041.738,40	$ 614.502.590,40		
TOTAL FRENTES DE OBRA				63,68%		64,96%		$ 2.402.258.859,12	$ 3.664.027.051,00		

EMERGENCIAS

COLEGIO	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR (3/05/2026)	EJECUCION SEMANAL	ACUMULADO EJECUTADO	PROGRAMADO SEMANAL	ACUMULADO PROGRAMADO	VALOR FRENTE ACUMULADO	VALOR TOTAL FRENTE (INCLUYE AIU)	FECHA INICIO	FECHA FIN
LA GAITANA	A		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	$ 153.749.316,02	$ 153.749.316,02	17/3/2026	6/6/2026
ALVARO GOMEZ HURTADO	A		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	$ 21.857.148,84	$ 21.857.148,84	17/3/2026	6/4/2026
TOMAS CARRASQUILLA	A		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	$ 9.559.345,86	$ 9.559.345,86	2/12/2025	11/12/2025
BILBAO IED	A		100,00%	3,00%	100,00%	0,00%	100,00%	$ 12.820.108,91	$ 12.820.108,91	28/12/2025	24/4/2026
ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO	A		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	$ 61.907.659,68	$ 61.907.659,68	29/12/2025	18/3/2026
JORGE ELIECER GAITAN	B		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	$ 7.283.231,16	$ 7.283.231,16	9/1/2026	10/4/2026
DIRECCION LOCAL USAQUEN			100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	$ 11.554.317,89	$ 11.554.317,89	11/3/2026	14/4/2026
REPUBLICA DE PANAMA	C		100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	$ 496.039,40	$ 496.039,40	6/3/2026	7/4/2026
AQUILEO PARRA			100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	$ 35.275.422,64	$ 35.275.422,64	18/4/2026	5/5/2026
FRIEDRICH NAUMANN	B		100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	$ 539.148,00	$ 539.148,00	20/5/2026	20/5/2026
	A										

PERSONAL DEL PROYECTO

PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
PROFESIONAL DE APOYO	1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1
ESPECIALISTA REDES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS, VOZ Y DATOS	1
ESPECIALISTA REDES HIDROSANITÁRIAS, GAS Y RED C. INCENDIO	1
PROFESIONAL SST	1
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTO	1
ASESOR JURIDICO	1
INSPECTOR SST	1
INSPECTOR TECNICO	1
PERSONAL CONTRATISTA	**CANTIDAD**
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1
ESPECIALISTA REDES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS, VOZ Y DATOS	1
ESPECIALISTA REDES HIDROSANITÁRIAS, GAS Y RED C. INCENDIO	1
PROFESIONAL SST	1
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTO	1
ASESOR JURIDICO	1
INSPECTOR SST OBRA	2
INSPECTOR DE OBRA	2
PERSONAL OPERATIVO	11

EMERGENCIAS

OBRAS DE EMERGENCIAS	TERMINADAS	EN EJECUCION	TOTAL
TOMAS CARRASQUILLA SEDE A	1	100,00%	100,00%
BILBAO IED	1	97,00%	97,00%
ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO	1	100,00%	100,00%
JORGE ELIECER GAITAN	1	100,00%	100,00%
DIRECCION LOCAL USAQUEN	1	100,00%	100,00%
REPUBLICA DE PANAMA	1	100,00%	100,00%
AQUILEO PARRA	1	90,00%	90,00%
LA GAITANA	1	100,00%	100,00%
ALVARO GOMEZ HURTADO	1	100,00%	100,00%
TOMAS CARRASQUILLA	1	100,00%	100,00%
DELIA ZAPATA OLIVELLA			
FRIEDRICH NAUMANN	1	100,00%	100,00%

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

No ACTA	VALOR	No ACTA OBRA			VALOR	No ACTA INTERV.	VALOR	No ACTA	VALOR	No ACTA	VALOR
1	$ -	12				1	$ -	23		34	
2	$ -	13				2	$ -	24		35	
3	$ -	14				3	$ -	25		36	
4	$ -	15				4	$ -	26		37	
5	$ -	16				5	$ -	27		38	
6		17				6		28		39	
7		18				7		29		40	
8		19				8		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20				9		31			
10		TOTAL OBRA				10		32			
11											
12	$ -										
13		$ -				11		33		$ -	

AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	64%	0%	80%
META	36%	100%	20%

AVANCE FISICO

TERMINADAS	6	67%
EN EJECUCION	2	22%
POR INICIAR	1	11%
TOTAL	9	100%

CONTRACTUAL


PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO:		**64,96%**
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMULADO:		**63,68%**
VALOR TOTAL FRENTES PROGRAMADO :	**$**	**2.117.656.843,13**
VALOR TOTAL FRENTES EJECUTADO:	**$**	**2.075.874.927,03**


AVANCE - ATRASO


-1,28%

EMERGENCIAS

VALOR ASIGNADO	**$**	**610.878.745,00**	100%
VALOR EJECUTADO	**$**	**315.041.738,40**	51,57%
VALOR POR EJECUTAR	**$**	**295.837.006,60**	48,43%

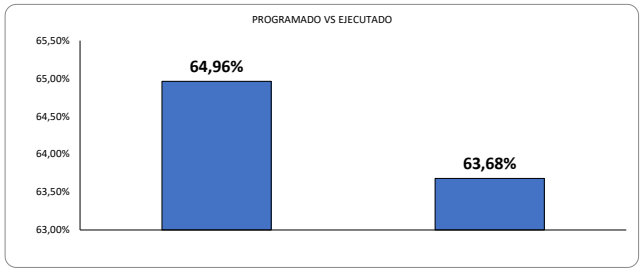


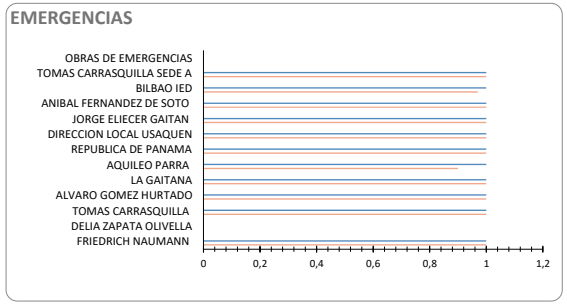

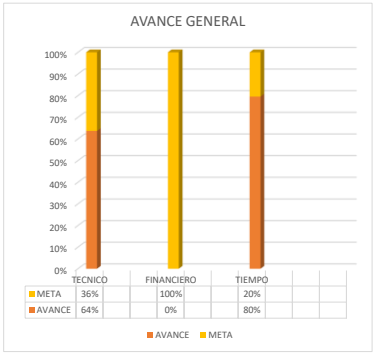

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

1. La interventoría en acompañamiento de la Ing. ambiental y la SST realizó visita el 9 de junio a la emergencia forestal de la IED Republico Dominicana Sede A, asi mismo se solictó al contratista el presupuesto y programacion de las dos emergencias silviculturales asiganadas a este grupo, en la Direccion Local de Suba y en el colegio REPUBLICA DOMINICANA SEDE A .
2. La interventoría en acompañamiento del contratista realizó visita el 11 de junio a la emergencia presentada en el salon ludico de la IED Nicolas de Buenaventura Sede A, asi mismo se solictó al contratista el presupuesto y programacion de la emergencia.
3. La Interventoría mediante oficio INT-COLEGIOSNORTE-L11-375 , APROBACIÓN DE FLUJO DE FONDOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA MODIFICATORIO NO.1 PARA LAS IED NICOLÁS DE BUENAVENTURA Y VIRGINIA GUTIÉRREZ DE PINEDA.
4. La Interventoría mediante oficio INT-COLEGIOSNORTE-L11-377 , APROBACIÓN OBSERVACIONES CORTE N°6.
5. La Interventoría mediante oficio INT-COLEGIOSNORTE-L11-378 , APROBACIÓN OBSERVACIONES INFORME MENSUAL N°7.

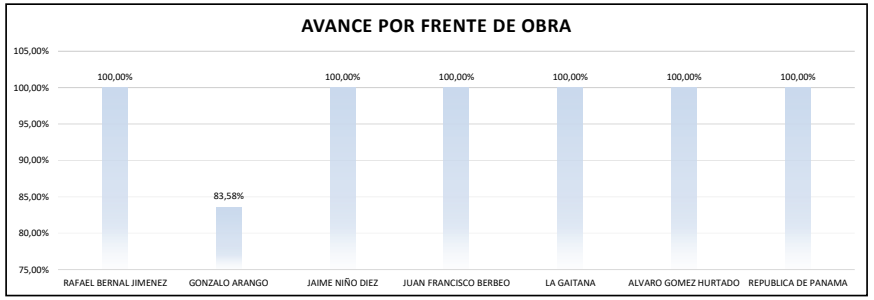

DIRECTOR INTERVENTORIA
ELKIN SALAZAR PÉREZ

RESIDENTE INTERVENTORIA
ADRIANA PAOLA MENDEZ NAVARRO

FECHA:	24/05/2026		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME SEMANAL No, 31 DE INTERVENTORIA	
DIAS RESTANTES	64	Dias			
REGISTRO FOTOGRAFICO				LOTE	0 4

24/05/2026	ACTIVDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
RAFAEL BERNAL JIMENEZ SEDE B	1.Se realiza entrea el 19 de Febrero del 2026 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
GONZALO ARANGO SEDE A	1. Instalacion de barandas 2.Desmonte de adoquin 3.Excavacion 4.Ingreso material electrico				
JAIME NIÑO DIEZ SEDE A	1.Se realiza entrea el 7 de mayo del 2026 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
JUAN FRANCISCO BERBEO SEDE B	1.Se realiza entrea el 22 de mayo del 2026 de las areas intervenidas al rector de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
LA GAITANA SEDE A	1.Se realiza entrea el 17 de Abril del 2026 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				

FECHA:	24/05/2026		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME SEMANAL No, 31 DE INTERVENTORIA	
DIAS RESTANTES	64	Dias			
REGISTRO FOTOGRAFICO				LOTE	0 4

24/05/2026	ACTIVDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
ALVARO GOMEZ HURTADO SEDE A	1.Se realiza entrea el 06 de Abril del 2026 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
REPUBLICA DE PANAMA SEDE B	1.Se realiza entrea el 10 de Febrero del 2026 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
NICOLAS DE BUENAVENTURA SEDE A	1.Instalacion parales para apuntalamiento 2.Demoilicion de muro 3.Instalacion de acero 4.Demolicion de viga cinta				
VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA	1.Cerramiento en lona 2.Cerramiento enteja de zinc 3.Ingreso de material estructura metalica para la primera cubierta				
TOMAS CARRASQUILLA	1.Se realiza entrea el 11 de Diciembre del 2025 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				

FECHA:	24/05/2026		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME SEMANAL No, 31 DE INTERVENTORIA	
DIAS RESTANTES	64	Dias			
REGISTRO FOTOGRAFICO				LOTE	0 4

24/05/2026	ACTIVDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
BILBAO IED	1.Se realiza entrega el 24 de abril del 2026 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO	1.Se realiza entrega el 18 de Marzo del 2026 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
JORGE ELIECER GAITAN	1.Se realiza entrega el 10 de Abri del 2026 las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
DIRECCION LOCAL USAQUEN	1.Se realiza entrega el 14 de Abri del 2026 las areas intervenidas al director de la direccion local en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
REPUBLICA DE PANAMA SEDE C	1.Se realiza entrea el 07 de Abril del 2026 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				

FECHA:	24/05/2026	
DIAS RESTANTES	64	Dias
REGISTRO FOTOGRAFICO		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME
SEMANAL No, 31 DE INTERVENTORIA

LOTE 0 4

24/05/2026	ACTIVDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
AQUILEO PARRA SEDE A	1.Se realiza entrea el 05 de mayo del 2026 de las areas intervenidas al rector de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
FRIEDRICH NAUMANN SEDE B	1.Se realiza entrea el 20 de mayo del 2026 de las areas intervenidas al rector de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				

FECHA:	21/06/2026
DIAS RESTANTES	57 Dias
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL No, 32 DE INTERVENTORIA

LOTE 0 4

CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155160	CONSORCIO COLEGIO MECBOG
21 de junio de 2026	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169112	ELSA TORRES ARENALES

FECHAS		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169112	CO1.PCCNTR.8155160
INICIO	8 de octubre de 2025	8 de octubre de 2025
TERMINACIÓN INICIAL	7 de mayo de 2026	7 de mayo de 2026
TERMINACION FINAL	17 de agosto de 2026	17 de agosto de 2026

PLAZOS EN DIAS		
ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	211	211
SUSPENSIONES		
PRÓRROGAS - ADICION	102	102
TOTAL	313	313

VALOR CONTRATO		
ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	$ 796.278.928,00	$ 2.499.103.832,00
ADICIÓNES	$ 166.286.594,00	$ 1.164.923.219,00
TOTAL	**$ 962.565.522,00**	**$ 3.664.027.051,00**

MODIFICACIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	30/12/2025	$ 37.571.611,00	0	
2	7/5/2026	$ 128.714.983,00	3 meses 10 dias	
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	7/5/2026	$ 1.164.923.219,00	3 meses 10 dias	
2				
3				
4				

COLEGIO	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR (14/06/2026)	ACTUAL	ACUMULADO EJECUTADO	PROGRAMADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR TOTAL FRENTE (INCLUYE AIU)	FECHA INICIO	FECHA FIN
RAFAEL BERNAL JIMENEZ	B	GLORIA GAITÁN A	100,00%		100,00%		100,00%	$ 152.191.367,21	$ 152.191.367,21	10/11/2025	6/3/2026
GONZALO ARANGO	A	GLORIA LAURA	83,58%	1,00%	84,58%	0,80%	87,80%	$ 752.804.596,93	$ 890.050.362,89	24/12/2025	7/5/2026
JAIME NIÑO DIEZ	A	LOMBARDIA	100,00%		100,00%		100,00%	$ 67.566.917,94	$ 67.566.917,94	5/3/2026	7/5/2026
JUAN FRANCISCO BERBEO	B	POLICARPA SALAVARRIETA	100,00%		100,00%		100,00%	$ 554.734.871,99	$ 554.734.871,99	28/11/2025	7/5/2026
LA GAITANA	A	SEDE A	100,00%		100,00%		100,00%	$ 454.098.351,43	$ 454.098.351,43	24/11/2025	13/4/2026
ALVARO GOMEZ HURTADO	A	SEDE A	100,00%		100,00%		100,00%	$ 16.737.980,82	$ 16.737.980,82	10/11/2025	6/4/2026
REPUBLICA DE PANAMA	B	AVENIDA CHILE	100,00%		100,00%		100,00%	$ 49.221.389,32	$ 49.221.389,32	10/11/2025	25/3/2026
NICOLAS DE BUENAVENTURA	A		4,72%	1,00%	5,72%	2,23%	12,93%	$ 50.696.846,51	$ 392.086.980,00	7/5/2026	17/8/2026
VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA			4,00%	23,45%	27,45%	25,38%	26,82%	$ 126.814.679,30	$ 472.836.239,00	7/5/2026	17/8/2026
EMERGENCIAS					51,572%			$ 315.041.738,40	$ 614.502.590,40		
TOTAL FRENTES DE OBRA				67,48%		69,13%		$ 2.539.908.739,86	$ 3.664.027.051,00		

EMERGENCIAS

COLEGIO	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR (3/05/2026)	EJECUCION SEMANAL	ACUMULADO EJECUTADO	PROGRAMADO SEMANAL	ACUMULADO PROGRAMADO	VALOR FRENTE ACUMULADO	VALOR TOTAL FRENTE (INCLUYE AIU)	FECHA INICIO	FECHA FIN
LA GAITANA	A		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	$ 153.749.316,02	$ 153.749.316,02	17/3/2026	6/6/2026
ALVARO GOMEZ HURTADO	A		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	$ 21.857.148,84	$ 21.857.148,84	17/3/2026	6/4/2026
TOMAS CARRASQUILLA	A		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	$ 9.559.345,86	$ 9.559.345,86	2/12/2025	11/12/2025
BILBAO IED	A		100,00%	3,00%	100,00%	0,00%	100,00%	$ 12.820.108,91	$ 12.820.108,91	28/12/2025	24/4/2026
ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO	A		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	$ 61.907.659,68	$ 61.907.659,68	29/12/2025	18/3/2026
JORGE ELIECER GAITAN	B		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	$ 7.283.231,16	$ 7.283.231,16	9/1/2026	10/4/2026
DIRECCION LOCAL USAQUEN			100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	$ 11.554.317,89	$ 11.554.317,89	11/3/2026	14/4/2026
REPUBLICA DE PANAMA	C		100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	$ 496.039,40	$ 496.039,40	6/3/2026	7/4/2026
AQUILEO PARRA			100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	$ 35.275.422,64	$ 35.275.422,64	18/4/2026	5/5/2026
FRIEDRICH NAUMANN	B		100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	$ 539.148,00	$ 539.148,00	20/5/2026	20/5/2026
	A										

PERSONAL DEL PROYECTO	
PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
PROFESIONAL DE APOYO	1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1
ESPECIALISTA REDES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS, VOZ Y DATOS	1
ESPECIALISTA REDES HIDROSANITÁRIAS, GAS Y RED C. INCENDIO	1
PROFESIONAL SST	1
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTO	1
ASESOR JURIDICO	1
INSPECTOR SST	1
INSPECTOR TECNICO	1
PERSONAL CONTRATISTA	**CANTIDAD**
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1
ESPECIALISTA REDES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS, VOZ Y DATOS	1
ESPECIALISTA REDES HIDROSANITÁRIAS, GAS Y RED C. INCENDIO	1
PROFESIONAL SST	1
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTO	1
ASESOR JURIDICO	1
INSPECTOR SST OBRA	2
INSPECTOR DE OBRA	2
PERSONAL OPERATIVO	11

EMERGENCIAS

OBRAS DE EMERGENCIAS	TERMINADAS	EN EJECUCION	TOTAL
TOMAS CARRASQUILLA SEDE A	1	100,00%	100,00%
BILBAO IED	1	97,00%	97,00%
ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO	1	100,00%	100,00%
JORGE ELIECER GAITAN	1	100,00%	100,00%
DIRECCION LOCAL USAQUEN	1	100,00%	100,00%
REPUBLICA DE PANAMA	1	100,00%	100,00%
AQUILEO PARRA	1	90,00%	90,00%
LA GAITANA	1	100,00%	100,00%
ALVARO GOMEZ HURTADO	1	100,00%	100,00%
TOMAS CARRASQUILLA	1	100,00%	100,00%
DELIA ZAPATA OLIVELLA			
FRIEDRICH NAUMANN	1	100,00%	100,00%

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA			VALOR	No ACTA INTERV	VALOR	No ACTA	VALOR	No ACTA	VALOR
1	$ -	12				1	$ -	23		34	
2	$ -	13				2	$ -	24		35	
3	$ -	14				3	$ -	25		36	
4	$ -	15				4	$ -	26		37	
5	$ -	16				5	$ -	27		38	
6		17				6		28		39	
7		18				7		29		40	
8		19				8		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20				9		31			
10		TOTAL OBRA				10		32			
11											
12	$ -										
13		$ -				11		33		$ -	

AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	67%	0%	82%
META	33%	100%	18%

AVANCE FISICO

TERMINADAS	6	67%
EN EJECUCION	2	22%
POR INICIAR	1	11%
TOTAL	9	100%

CONTRACTUAL


PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO:	69,13%	
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMULADO:	67,48%	
VALOR TOTAL FRENTES PROGRAMADO :	$	2.253.526.623,14
VALOR TOTAL FRENTES EJECUTADO:	$	2.199.576.398,50


AVANCE - ATRASO


-1,66%

EMERGENCIAS

VALOR ASIGNADO	$	610.878.745,00	100%
VALOR EJECUTADO	$	315.041.738,40	51,57%
VALOR POR EJECUTAR	$	295.837.006,60	48,43%

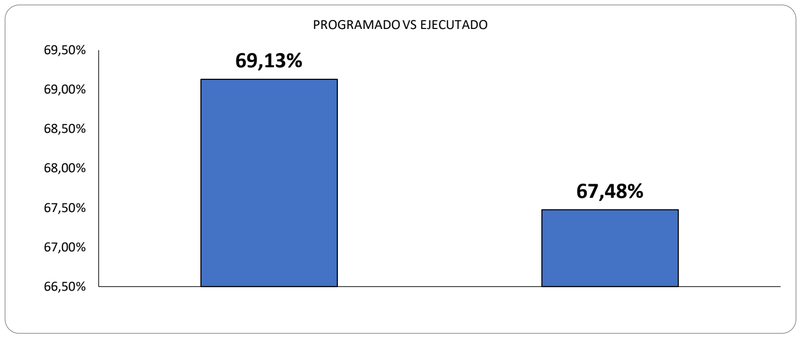


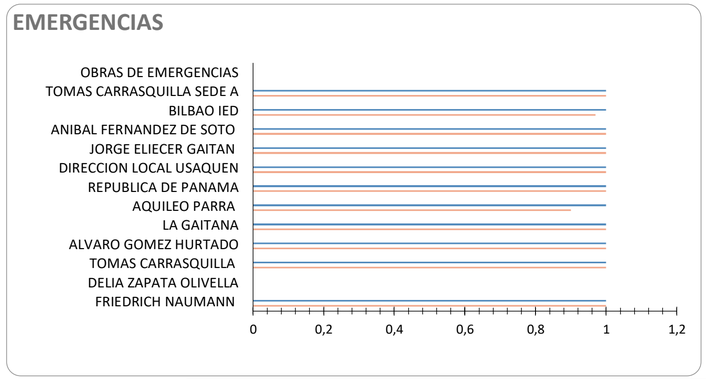

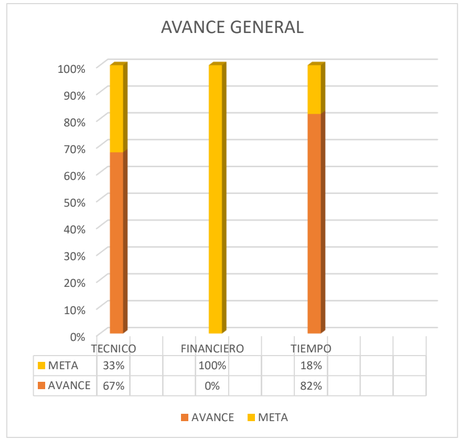

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

1.La interventoría el 17 de junio en acompañamiento del contratista, supervisor de la SED y rectora de la IED Gonzalo Arango realizaron reunión técnica para verificación de avance y fecha de entrega de la obra.
2. La Interventoría mediante oficio INT-COLEGIOSNORTE-L11-388 , APROBO NP-61 Y NP-62.
3. La Interventoría mediante oficio INT-COLEGIOSNORTE-L11-389 , SOLICITUD DE PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN Y PERSONAL DE OBRA EMERGENCIA NICOLÁS DE BUENAVENTURA SEDE A

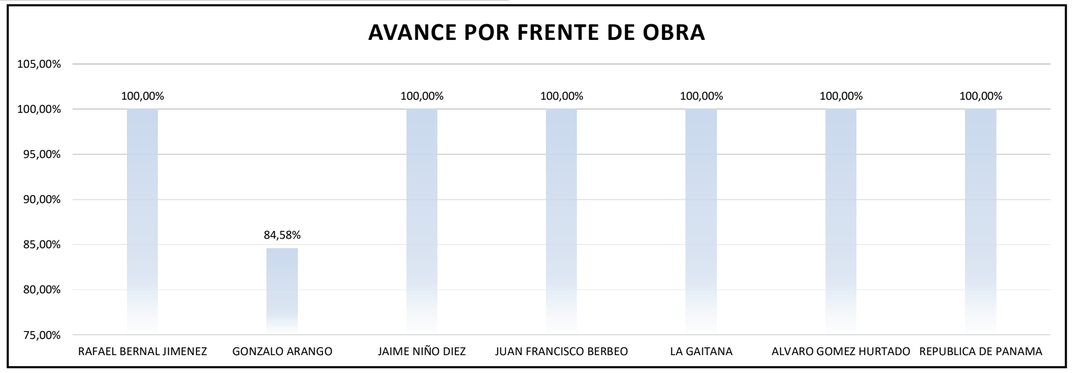

DIRECTOR INTERVENTORIA
ELKIN SALAZAR PÉREZ

RESIDENTE INTERVENTORIA
ADRIANA PAOLA MENDEZ NAVARRO


FECHA:	24/05/2026	
DIAS RESTANTES	57	Dias
REGISTRO FOTOGRAFICO		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL No, 32 DE INTERVENTORIA		
LOTE	0	4

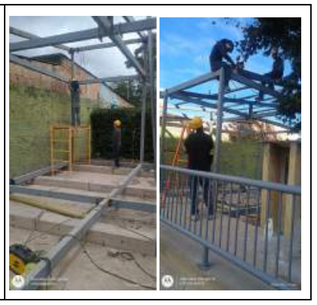24/05/2026	ACTIVDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
RAFAEL BERNAL JIMENEZ SEDE B	1.Se realiza entrea el 19 de Febrero del 2026 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
GONZALO ARANGO SEDE A	1. Instalacion de red electrica 2. Instalacion cajas electricas 3. Pintura de estructura módulos 4.Lleno y solados de nicho electrico 5. instalación tablero eléctrico 6. soldadura de estructura				
JAIME NIÑO DIEZ SEDE A	1.Se realiza entrea el 7 de mayo del 2026 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
JUAN FRANCISCO BERBEO SEDE B	1.Se realiza entrea el 22 de mayo del 2026 de las areas intervenidas al rector de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
LA GAITANA SEDE A	1.Se realiza entrea el 17 de Abril del 2026 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				

FECHA:	24/05/2026	
DIAS RESTANTES	57	Dias
REGISTRO FOTOGRAFICO		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ELSA TORRES ARENALES

INFORME
SEMANAL No, 32 DE INTERVENTORIA

LOTE	0	4

24/05/2026	ACTIVDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
ALVARO GOMEZ HURTADO SEDE A	1.Se realiza entrea el 06 de Abril del 2026 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
REPUBLICA DE PANAMA SEDE B	1.Se realiza entrea el 10 de Febrero del 2026 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
NICOLAS DE BUENAVENTURA SEDE A	1.Instalacion parales para apuntalamiento 2.Demoilicion de enchape 3.Instalacion de acero 4.Construccion de muro				
VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA	1.Instalacion cubierta tensomembrana				
TOMAS CARRASQUILLA	1.Se realiza entrea el 11 de Diciembre del 2025 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				

FECHA:	24/05/2026	
DIAS RESTANTES	57	Dias
REGISTRO FOTOGRAFICO		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ELSA TORRES ARENALES

INFORME
SEMANAL No, 32 DE INTERVENTORIA

LOTE	0	4

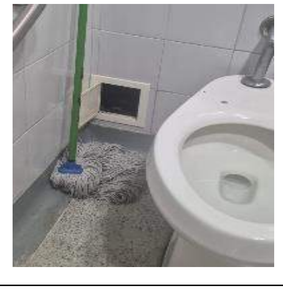24/05/2026	ACTIVDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
BILBAO IED	1.Se realiza entrega el 24 de abril del 2026 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO	1.Se realiza entrega el 18 de Marzo del 2026 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
JORGE ELIECER GAITAN	1.Se realiza entrega el 10 de Abri del 2026 las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
DIRECCION LOCAL USAQUEN	1.Se realiza entrega el 14 de Abri del 2026 las areas intervenidas al director de la direccion local en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
REPUBLICA DE PANAMA SEDE C	1.Se realiza entrea el 07 de Abril del 2026 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				

FECHA:	24/05/2026		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME SEMANAL No, 32 DE INTERVENTORIA	
DIAS RESTANTES	57	Dias		LOTE	0 4
REGISTRO FOTOGRAFICO					

24/05/2026	ACTIVDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
AQUILEO PARRA SEDE A	1.Se realiza entrea el 05 de mayo del 2026 de las areas intervenidas al rector de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
FRIEDRICH NAUMANN SEDE B	1.Se realiza entrea el 20 de mayo del 2026 de las areas intervenidas al rector de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				

FECHA:	28/06/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME SEMANAL No, 33 DE INTERVENTORIA
DIAS RESTANTES	50 Dias		
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			LOTE 0 4

CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155160	CONSORCIO COLEGIO MECBOG
28 de junio de 2026	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169112	ELSA TORRES ARENALES

FECHAS

DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169112	CO1.PCCNTR.8155160
INICIO	8 de octubre de 2025	8 de octubre de 2025
TERMINACIÓN INICIAL	7 de mayo de 2026	7 de mayo de 2026
TERMINACION FINAL	17 de agosto de 2026	17 de agosto de 2026

PLAZOS EN DIAS

ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	211	211
SUSPENSIONES		
PRÓRROGAS - ADICION	102	102
TOTAL	313	313

VALOR CONTRATO

ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	$ 796.278.928,00	$ 2.499.103.832,00
ADICIÓNES	$ 166.286.594,00	$ 1.164.923.219,00
TOTAL	**$ 962.565.522,00**	**$ 3.664.027.051,00**

MODIFICACIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	30/12/2025	$ 37.571.611,00	0	
2	7/5/2026	$ 128.714.983,00	3 meses 10 dias	
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	7/5/2026	$ 1.164.923.219,00	3 meses 10 dias	
2				
3				
4				

COLEGIO	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR (28/06/2026)	ACTUAL	ACUMULADO EJECUTADO	PROGRAMADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR TOTAL FRENTE (INCLUYE AIU)	FECHA INICIO	FECHA FIN
RAFAEL BERNAL JIMENEZ	B	GLORIA GAITÁN A	100,00%		100,00%		100,00%	$ 152.191.367,21	$ 152.191.367,21	10/11/2025	6/3/2026
GONZALO ARANGO	A	GLORIA LAURA	84,58%	1,00%	85,58%	2,20%	90,00%	$ 761.705.100,56	$ 890.050.362,89	24/12/2025	7/5/2026
JAIME NIÑO DIEZ	A	LOMBARDIA	100,00%		100,00%		100,00%	$ 67.566.917,94	$ 67.566.917,94	5/3/2026	7/5/2026
JUAN FRANCISCO BERBEO	B	POLICARPA SALAVARRIETA	100,00%		100,00%		100,00%	$ 554.734.871,99	$ 554.734.871,99	28/11/2025	7/5/2026
LA GAITANA	A	SEDE A	100,00%		100,00%		100,00%	$ 454.098.351,43	$ 454.098.351,43	24/11/2025	13/4/2026
ALVARO GOMEZ HURTADO	A	SEDE A	100,00%		100,00%		100,00%	$ 16.737.980,82	$ 16.737.980,82	10/11/2025	6/4/2026
REPUBLICA DE PANAMA	B	AVENIDA CHILE	100,00%		100,00%		100,00%	$ 49.221.389,32	$ 49.221.389,32	10/11/2025	25/3/2026
NICOLAS DE BUENAVENTURA	A		5,72%	0,37%	6,09%	2,20%	15,13%	$ 59.322.760,07	$ 392.086.980,00	7/5/2026	17/8/2026
VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA			27,45%	19,45%	46,90%	18,01%	44,83%	$ 211.972.485,94	$ 472.836.239,00	7/5/2026	17/8/2026
EMERGENCIAS					51,572%			$ 315.041.738,40	$ 614.502.590,40		
TOTAL FRENTES DE OBRA				70,61%		72,61%		$ 2.642.592.963,69	$ 3.664.027.051,00		

EMERGENCIAS

COLEGIO	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR (28/06/2026)	EJECUCION SEMANAL	ACUMULADO EJECUTADO	PROGRAMADO SEMANAL	ACUMULADO PROGRAMADO	VALOR FRENTE ACUMULADO	VALOR TOTAL FRENTE (INCLUYE AIU)	FECHA INICIO	FECHA FIN
LA GAITANA	A		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	$ 153.749.316,02	$ 153.749.316,02	17/3/2026	6/6/2026
ALVARO GOMEZ HURTADO	A		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	$ 21.857.148,84	$ 21.857.148,84	17/3/2026	6/4/2026
TOMAS CARRASQUILLA	A		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	$ 9.559.345,86	$ 9.559.345,86	2/12/2025	11/12/2025
BILBAO IED	A		100,00%	3,00%	100,00%	0,00%	100,00%	$ 12.820.108,91	$ 12.820.108,91	28/12/2025	24/4/2026
ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO	A		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	$ 61.907.659,68	$ 61.907.659,68	29/12/2025	18/3/2026
JORGE ELIECER GAITAN	B		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	$ 7.283.231,16	$ 7.283.231,16	9/1/2026	10/4/2026
DIRECCION LOCAL USAQUEN			100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	$ 11.554.317,89	$ 11.554.317,89	11/3/2026	14/4/2026
REPUBLICA DE PANAMA	C		100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	$ 496.039,40	$ 496.039,40	6/3/2026	7/4/2026
AQUILEO PARRA			100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	$ 35.275.422,64	$ 35.275.422,64	18/4/2026	5/5/2026
FRIEDRICH NAUMANN	B		100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	$ 539.148,00	$ 539.148,00	20/5/2026	20/5/2026
REPUBLICA DOMINICANA	A		90,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%	$ 11.757.254,40	$ 13.063.616,00	26/6/2026	26/6/2026

PERSONAL DEL PROYECTO	
PERSONAL INTERVENTORIA	**CANTIDAD**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
PROFESIONAL DE APOYO	1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1
ESPECIALISTA REDES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS, VOZ Y DATOS	1
ESPECIALISTA REDES HIDROSANITÁRIAS, GAS Y RED C. INCENDIO	1
PROFESIONAL SST	1
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTO	1
ASESOR JURIDICO	1
INSPECTOR SST	1
INSPECTOR TECNICO	1
PERSONAL CONTRATISTA	**CANTIDAD**
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1
ESPECIALISTA REDES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS, VOZ Y DATOS	1
ESPECIALISTA REDES HIDROSANITÁRIAS, GAS Y RED C. INCENDIO	1
PROFESIONAL SST	1
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTO	1
ASESOR JURIDICO	1
INSPECTOR SST OBRA	2
INSPECTOR DE OBRA	2
PERSONAL OPERATIVO	11

EMERGENCIAS

OBRAS DE EMERGENCIAS	TERMINADAS	EN EJECUCION	TOTAL
TOMAS CARRASQUILLA SEDE A	1	100,00%	100,00%
BILBAO IED	1	97,00%	97,00%
ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO	1	100,00%	100,00%
JORGE ELIECER GAITAN	1	100,00%	100,00%
DIRECCION LOCAL USAQUEN	1	100,00%	100,00%
REPUBLICA DE PANAMA	1	100,00%	100,00%
AQUILEO PARRA	1	90,00%	90,00%
LA GAITANA	1	100,00%	100,00%
ALVARO GOMEZ HURTADO	1	100,00%	100,00%
TOMAS CARRASQUILLA	1	100,00%	100,00%

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

No ACTA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERV	VALOR	No ACTA	VALOR	No ACTA	VALOR
1	$ -	12		1	$ -	23		34	
2	$ -	13		2	$ -	24		35	
3	$ -	14		3	$ -	25		36	
4	$ -	15		4	$ -	26		37	
5	$ -	16		5	$ -	27		38	
6		17		6		28		39	
7		18		7		29		40	
8		19		8		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		31			
10		TOTAL OBRA		10		32			

AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	71%	0%	84%
META	29%	100%	16%

AVANCE FISICO

TERMINADAS	6	67%
EN EJECUCION	3	33%
POR INICIAR	0	0%
TOTAL	9	100%

DELIA ZAPATA OLIVELLA				11									
FRIEDRICH NAUMANN	1	100,00%	100,00%	12	$ -								
REPUBLICA DOMINICANA		90,00%	90,00%	13									
						$ -		11		33		$ -	

CONTRACTUAL


PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO:	**72,61%**
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMULADO:	**70,61%**
VALOR TOTAL FRENTES PROGRAMADO :	**$ 2.366.891.451,33**
VALOR TOTAL FRENTES EJECUTADO:	**$ 2.301.894.272,44**


AVANCE - ATRASO


-1,99%

EMERGENCIAS

VALOR ASIGNADO	**$ 610.878.745,00**	100%
VALOR EJECUTADO	**$ 315.041.738,40**	51,57%
VALOR POR EJECUTAR	**$ 295.837.006,60**	48,43%

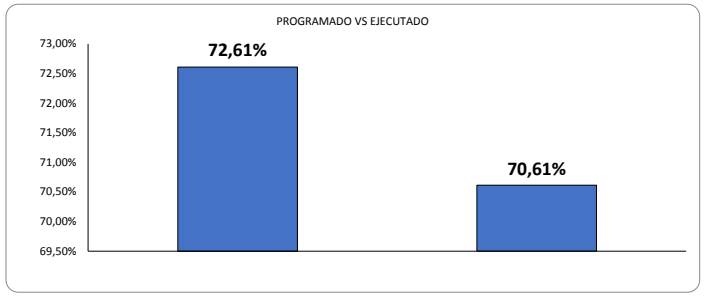

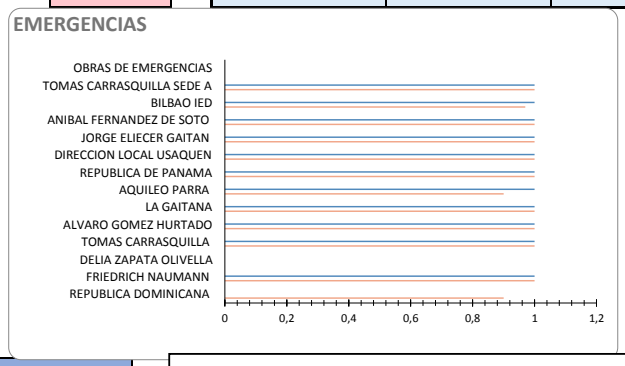

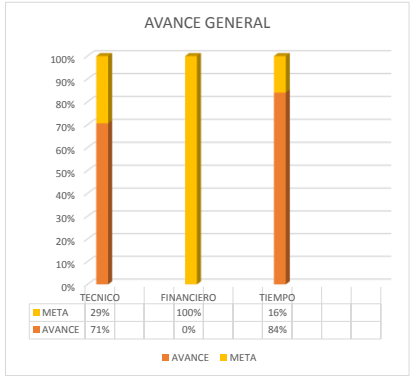


OBSERVACIONES INTERVENTORIA

1.La interventoría el 23 de junio del 2026 en acompañamiento del contratista, realizaron visita a la planta de TITAN donde se está realizando la construcción de las placas alveolares, donde el personal de producción nos informa que está esperando que de la resistencia para tensarlas y así realizar el despacho el 26 de junio, en caso de no cumplir con la resistencia se entregará a partir de la semana del 30.

2. El 26 de junio 2026, se realizo intervencion de la emergencia Republica Dominicana Sede A.

3. La Interventoría mediante oficio INT-COLEGIOSNORTE-L11-398 , aprobación de presupuesto, programación y personal de obra de la emergencia prioritaria de la IED Nicolás de Buenaventura Sede A.

4. La Interventoría mediante oficio INT-COLEGIOSNORTE-L11-399 , respuesta oficio mecbog-2026–293, aprobación de presupuesto, programación y personal de obra de la emergencia prioritaria de la IED Republica Dominicana Sede A y Dirección Local de Suba.

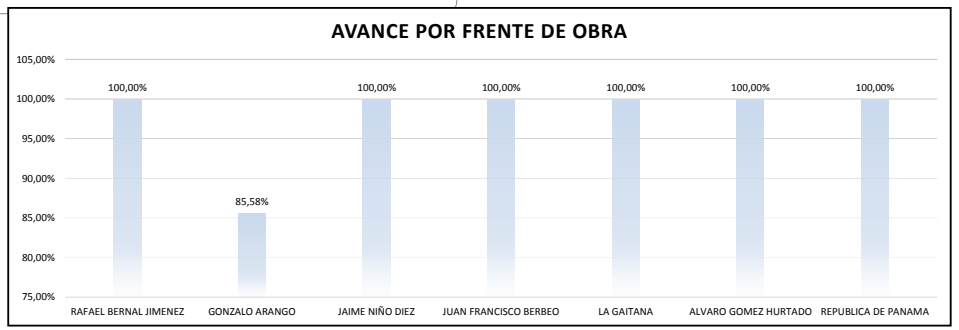

DIRECTOR INTERVENTORIA
ELKIN SALAZAR PÉREZ

RESIDENTE INTERVENTORIA
ADRIANA PAOLA MENDEZ NAVARRO

FECHA: 28/06/2026 DIAS RESTANTES 50 Dias REGISTRO FOTOGRAFICO	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		INFORME SEMANAL No, 33 DE INTERVENTORIA	LOTE 0 4

24/05/2026	ACTIVDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
RAFAEL BERNAL JIMENEZ SEDE B	1.Se realiza entrea el 19 de Febrero del 2026 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.	   
GONZALO ARANGO SEDE A	1. Instalacion de red electrica, soldadura exotermica en cajas de puesta a tierra. 2. Instalacion sistema a tierra y varilla de cobre. 3. Instalacion de paneles aulas.	        
JAIME NIÑO DIEZ SEDE A	1.Se realiza entrea el 7 de mayo del 2026 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.	   

FECHA:	28/06/2026		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME SEMANAL No, 33 DE INTERVENTORIA		
DIAS RESTANTES	50	Dias				
REGISTRO FOTOGRAFICO				LOTE	0	4

24/05/2026	ACTIVDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
JUAN FRANCISCO BERBEO SEDE B	1.Se realiza entrea el 22 de mayo del 2026 de las areas intervenidas al rector de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
LA GAITANA SEDE A	1.Se realiza entrea el 17 de Abril del 2026 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
ALVARO GOMEZ HURTADO SEDE A	1.Se realiza entrea el 06 de Abril del 2026 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
REPUBLICA DE PANAMA SEDE B	1.Se realiza entrea el 10 de Febrero del 2026 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
NICOLAS DE BUENAVENTURA SEDE A	1.Instalacion parales para apuntalamiento 2.Demoilicion de muro 3.Instalacion de acero 4.Construccion de muro				

FECHA:	28/06/2026		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME SEMANAL No, 33 DE INTERVENTORIA		
DIAS RESTANTES	50	Dias				
REGISTRO FOTOGRAFICO				LOTE	0	4

24/05/2026	ACTIVDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA	1.Instalacion cubierta tensomembrana 2.Destronque de piso 3.Perforacion de placa bajo cubierta 4.Raspado bajo placa				
TOMAS CARRASQUILLA	1.Se realiza entrea el 11 de Diciembre del 2025 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
BILBAO IED	1.Se realiza entrega el 24 de abril del 2026 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO	1.Se realiza entrega el 18 de Marzo del 2026 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
JORGE ELIECER GAITAN	1.Se realiza entrega el 10 de Abri del 2026 las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				

FECHA:	28/06/2026		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME SEMANAL No, 33 DE INTERVENTORIA	
DIAS RESTANTES	50	Dias			
REGISTRO FOTOGRAFICO				LOTE	0 4

24/05/2026	ACTIVDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DIRECCION LOCAL USAQUEN	1.Se realiza entrega el 14 de Abri del 2026 las areas intervenidas al director de la direccion local en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
REPUBLICA DE PANAMA SEDE C	1.Se realiza entrea el 07 de Abril del 2026 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
AQUILEO PARRA SEDE A	1.Se realiza entrea el 05 de mayo del 2026 de las areas intervenidas al rector de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
FRIEDRICH NAUMANN SEDE B	1.Se realiza entrea el 20 de mayo del 2026 de las areas intervenidas al rector de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
REPUBLICA DOMINICANA SEDE A	1.Tala de arboles.				

FECHA:	05/07/2026
DIAS RESTANTES	43 Dias
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL No, 34 DE INTERVENTORIA

LOTE 0 4

CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155160		CONSORCIO COLEGIO MECBOG
5 de julio de 2026	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169112		ELSA TORRES ARENALES

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169112	CO1.PCCNTR.8155160	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796.278.928,00	$ 2.499.103.832,00
INICIO	8 de octubre de 2025	8 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIÓNES	$ 166.286.594,00	$ 1.164.923.219,00
TERMINACIÓN INICIAL	7 de mayo de 2026	7 de mayo de 2026	PRÓRROGAS - ADICION	102	102	TOTAL	**$ 962.565.522,00**	**$ 3.664.027.051,00**
TERMINACION FINAL	17 de agosto de 2026	17 de agosto de 2026	TOTAL	313	313			

MODIFICACIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	30/12/2025	$ 37.571.611,00	0	
2	7/5/2026	$ 128.714.983,00	3 meses 10 dias	
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	7/5/2026	$ 1.164.923.219,00	3 meses 10 dias	
2				
3				
4				

COLEGIO	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR (05/07/2026)	ACTUAL	ACUMULADO EJECUTADO	PROGRAMADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR TOTAL FRENTE (INCLUYE AIU)	FECHA INICIO	FECHA FIN
RAFAEL BERNAL JIMENEZ	B	GLORIA GAITÁN A	100,00%		100,00%		100,00%	$ 152.191.367,21	$ 152.191.367,21	10/11/2025	6/3/2026
GONZALO ARANGO	A	GLORIA LAURA	85,58%	6,78%	92,36%	5,00%	95,00%	$ 822.050.515,17	$ 890.050.362,89	24/12/2025	7/5/2026
JAIME NIÑO DIEZ	A	LOMBARDIA	100,00%		100,00%		100,00%	$ 67.566.917,94	$ 67.566.917,94	5/3/2026	7/5/2026
JUAN FRANCISCO BERBEO	B	POLICARPA SALAVARRIETA	100,00%		100,00%		100,00%	$ 554.734.871,99	$ 554.734.871,99	28/11/2025	7/5/2026
LA GAITANA	A	SEDE A	100,00%		100,00%		100,00%	$ 454.098.351,43	$ 454.098.351,43	24/11/2025	13/4/2026
ALVARO GOMEZ HURTADO	A	SEDE A	100,00%		100,00%		100,00%	$ 16.737.980,82	$ 16.737.980,82	10/11/2025	6/4/2026
REPUBLICA DE PANAMA	B	AVENIDA CHILE	100,00%		100,00%		100,00%	$ 49.221.389,32	$ 49.221.389,32	10/11/2025	25/3/2026
NICOLAS DE BUENAVENTURA	A		6,09%	5,09%	11,18%	7,17%	22,30%	$ 87.435.396,54	$ 392.086.980,00	7/5/2026	17/8/2026
VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA			46,90%	1,00%	47,90%	0,70%	45,53%	$ 215.282.339,62	$ 472.836.239,00	7/5/2026	17/8/2026
EMERGENCIAS					66,593%			$ 406.803.449,40	$ 614.502.590,40		
TOTAL FRENTES DE OBRA				73,22%		74,94%		$ 2.826.122.579,43	$ 3.664.027.051,00		

EMERGENCIAS

COLEGIO	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR (05/07/2026)	EJECUCION SEMANAL	ACUMULADO EJECUTADO	PROGRAMADO SEMANAL	ACUMULADO PROGRAMADO	VALOR FRENTE ACUMULADO	VALOR TOTAL FRENTE (INCLUYE AIU)	FECHA INICIO	FECHA FIN
LA GAITANA	A		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	$ 153.749.316,02	$ 153.749.316,02	17/3/2026	6/6/2026
ALVARO GOMEZ HURTADO	A		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	$ 21.857.148,84	$ 21.857.148,84	17/3/2026	6/4/2026
TOMAS CARRASQUILLA	A		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	$ 9.559.345,86	$ 9.559.345,86	2/12/2025	11/12/2025
BILBAO IED	A		100,00%	3,00%	100,00%	0,00%	100,00%	$ 12.820.108,91	$ 12.820.108,91	28/12/2025	24/4/2026
ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO	A		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	$ 61.907.659,68	$ 61.907.659,68	29/12/2025	18/3/2026
JORGE ELIECER GAITAN	B		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	$ 7.283.231,16	$ 7.283.231,16	9/1/2026	10/4/2026
DIRECCION LOCAL USAQUEN			100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	$ 11.554.317,89	$ 11.554.317,89	11/3/2026	14/4/2026
REPUBLICA DE PANAMA	C		100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	$ 496.039,40	$ 496.039,40	6/3/2026	7/4/2026
AQUILEO PARRA			100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	$ 35.275.422,64	$ 35.275.422,64	18/4/2026	5/5/2026
FRIEDRICH NAUMANN	B		100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	$ 539.148,00	$ 539.148,00	20/5/2026	20/5/2026
REPUBLICA DOMINICANA	A		90,00%	7,00%	97,00%	100,00%	100,00%	$ 12.671.707,52	$ 13.063.616,00	26/6/2026	26/6/2026
DIRECCION LOCAL DE SUBA			0,00%	98,00%	0,00%	98,00%	0,00%	$ -	$ 11.191.491,00		
NICOLAS DE BUENAVENTURA	A			30,70%	0,00%	30,00%	0,00%	$ -	$ 30.001.337,00		
DELIA ZAPATA OLIVELLA	A			98,00%		98,00%			$ 37.505.267,00		

PERSONAL DEL PROYECTO

PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
PROFESIONAL DE APOYO	1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1
ESPECIALISTA REDES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS, VOZ Y DATOS	1
ESPECIALISTA REDES HIDROSANITÁRIAS, GAS Y RED C. INCENDIO	1
PROFESIONAL SST	1
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTO	1
ASESOR JURIDICO	1
INSPECTOR SST	1
INSPECTOR TECNICO	1

PERSONAL CONTRATISTA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1
ESPECIALISTA REDES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS, VOZ Y DATOS	1
ESPECIALISTA REDES HIDROSANITÁRIAS, GAS Y RED C. INCENDIO	1
PROFESIONAL SST	1
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTO	1
ASESOR JURIDICO	1
INSPECTOR SST OBRA	2
INSPECTOR DE OBRA	2
PERSONAL OPERATIVO	11

EMERGENCIAS

OBRAS DE EMERGENCIAS	TERMINADAS	EN EJECUCION	TOTAL
TOMAS CARRASQUILLA SEDE A	1	100,00%	100,00%
BILBAO IED	1	97,00%	97,00%
ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO	1	100,00%	100,00%
JORGE ELIECER GAITAN	1	100,00%	100,00%
DIRECCION LOCAL USAQUEN	1	100,00%	100,00%
REPUBLICA DE PANAMA	1	100,00%	100,00%
AQUILEO PARRA	1	90,00%	90,00%
LA GAITANA	1	100,00%	100,00%
ALVARO GOMEZ HURTADO	1	100,00%	100,00%
FRIEDRICH NAUMANN	1	100,00%	100,00%
REPUBLICA DOMINICANA		97,00%	97,00%
DIRECCION LOCAL DE SUBA	1	98,00%	98,00%
NICOLAS DE BUENAVENTURA		30,70%	30,70%
DELIA ZAPATA OLIVELLA	1	98,00%	98,00%

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

No ACTA	VALOR	No ACTA OBRA			VALOR	No ACTA INTERV	VALOR	No ACTA	VALOR	No ACTA	VALOR
1	$ -	12				1	$ -	23		34	
2	$ -	13				2	$ -	24		35	
3	$ -	14				3	$ -	25		36	
4	$ -	15				4	$ -	26		37	
5	$ -	16				5	$ -	27		38	
6		17				6		28		39	
7		18				7		29		40	
8		19				8		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20				9		31			
10		TOTAL OBRA				10		32			
11											
12	$ -										
13											
14											
		$ -				11		33		$ -	

AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	73%	0%	86%
META	27%	100%	14%

AVANCE FISICO


TERMINADAS	6	67%
EN EJECUCION	3	33%
POR INICIAR	0	0%
TOTAL	9	100%


CONTRACTUAL		
PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO:	74,94%	
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMULADO:	73,22%	
VALOR TOTAL FRENTES PROGRAMADO :	$	2.442.816.459,61
VALOR TOTAL FRENTES EJECUTADO:	$	2.386.925.276,72


AVANCE - ATRASO

-1,71%

EMERGENCIAS			
VALOR ASIGNADO	$	610.878.745,00	100%
VALOR EJECUTADO	$	406.803.449,40	66,59%
VALOR POR EJECUTAR	$	204.075.295,60	33,41%

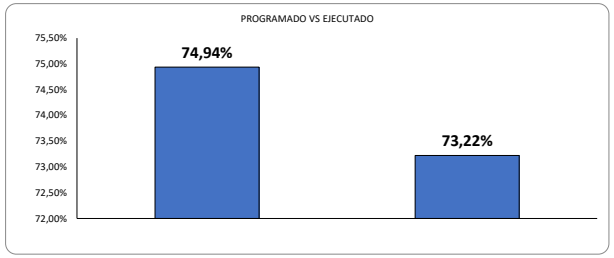


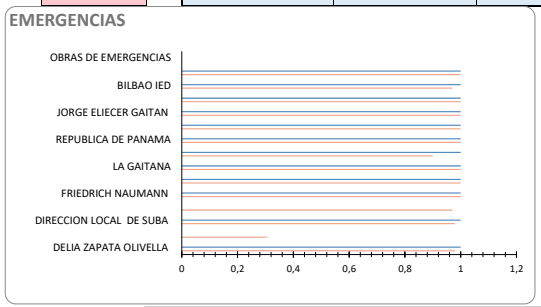

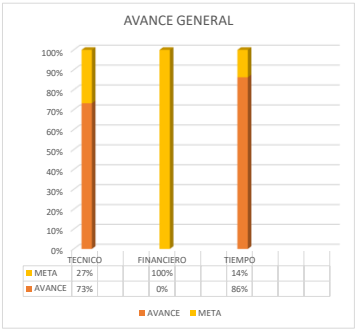

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

1. El 30 de junio de 2026, la interventoría, en acompañamiento del contratista, realizó una visita de socialización del plan de trabajo que se ejecutará al finalizar la jornada de receso escolar, en el marco de la atención de la emergencia presentada en el Colegio Friedrich Naumann, Sede B.
2. El 3 de julio de 2026, la interventoría, en acompañamiento del contratista, realizó una visita de inspeccion a la emergencia presentada en el Colegio Heladia Mejia, Sede B
3. El 3 de julio de 2026, la interventoría, en acompañamiento del contratista, la supervisión de la SED y el almacenista del colegio, realizó la verificación y el trazado del área por donde se ejecutará el cerramiento, con el fin de dar inicio a las actividades durante la jornada de receso escolar, en el marco de la atención de la emergencia presentada en el Colegio Friedrich Naumann, Sede B.
4. La Interventoría mediante oficio INT-COLEGIOSNORTE-L11-405 , Respuesta oficio mecbog-2025 – 281, observaciones corte de obra N°7.

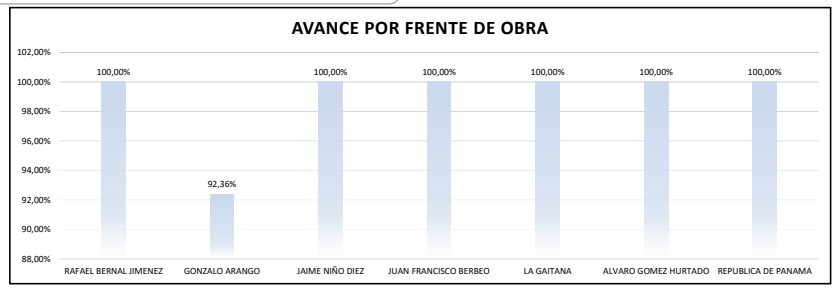

DIRECTOR INTERVENTORIA
ELKIN SALAZAR PÉREZ

RESIDENTE INTERVENTORIA
ADRIANA PAOLA MENDEZ NAVARRO

FECHA:	28/06/2026		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME SEMANAL No, 34 DE INTERVENTORIA	
DIAS RESTANTES	43	Dias			
REGISTRO FOTOGRAFICO				LOTE	0 4

24/05/2026	ACTIVDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
RAFAEL BERNAL JIMENEZ SEDE B	1.Se realiza entrea el 19 de Febrero del 2026 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
GONZALO ARANGO SEDE A	1. Instalacion de red electrica 2. Instalacion placas alveolares 3. Instalacion de paneles aulas				
JAIME NIÑO DIEZ SEDE A	1.Se realiza entrea el 7 de mayo del 2026 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
JUAN FRANCISCO BERBEO SEDE B	1.Se realiza entrea el 22 de mayo del 2026 de las areas intervenidas al rector de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
LA GAITANA SEDE A	1.Se realiza entrea el 17 de Abril del 2026 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				

FECHA:	28/06/2026		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME SEMANAL No, 34 DE INTERVENTORIA	
DIAS RESTANTES	43	Dias			
REGISTRO FOTOGRAFICO				LOTE	0 4

24/05/2026	ACTIVDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
ALVARO GOMEZ HURTADO SEDE A	1.Se realiza entrea el 06 de Abril del 2026 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
REPUBLICA DE PANAMA SEDE B	1.Se realiza entrea el 10 de Febrero del 2026 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
NICOLAS DE BUENAVENTURA SEDE A	1.Instalacion parales para apuntalamiento 2.Demoilicion de muro 3.Instalacion de acero 4.Construccion de muro				
VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA	1. Desmonte de lamparas 2. Aplicacion de sika en fisuras bajo placa 3. Destronque de piso 4. Pintura bajo placa				
TOMAS CARRASQUILLA	1.Se realiza entrea el 11 de Diciembre del 2025 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				

FECHA:	28/06/2026		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME SEMANAL No, 34 DE INTERVENTORIA	
DIAS RESTANTES	43	Dias			
REGISTRO FOTOGRAFICO				LOTE	0 4

24/05/2026	ACTIVDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
BILBAO IED	1.Se realiza entrega el 24 de abril del 2026 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO	1.Se realiza entrega el 18 de Marzo del 2026 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
JORGE ELIECER GAITAN	1.Se realiza entrega el 10 de Abri del 2026 las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
DIRECCION LOCAL USAQUEN	1.Se realiza entrega el 14 de Abri del 2026 las areas intervenidas al director de la direccion local en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
REPUBLICA DE PANAMA SEDE C	1.Se realiza entrea el 07 de Abril del 2026 de las areas intervenidas a la rectora de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				

FECHA:	28/06/2026		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME SEMANAL No, 34 DE INTERVENTORIA	
DIAS RESTANTES	43	Dias			
REGISTRO FOTOGRAFICO				LOTE	0 4

24/05/2026	ACTIVDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
AQUILEO PARRA SEDE A	1.Se realiza entrea el 05 de mayo del 2026 de las areas intervenidas al rector de la institucion educativa en acompañamiento de la supervision de la SED, contratista e interventoria.				
FRIEDRICH NAUMANN SEDE B	1. Demolicion de placa 2. Excavacion 3. Construccion cajas de inspeccion 4. Instalacion tuberia PVC				
REPUBLICA DOMINICANA SEDE A	1.Tala de arboles.				
DIRECCION LOCAL DE SUBA	1.Poda de arboles				
NICOLAS DE BUENAVENTURA SEDE A	1.Desmonte de piso en madera 2.Demolicion de piso 3.Aseo y limpieza				

FECHA:	28/06/2026		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME SEMANAL No, 34 DE INTERVENTORIA	
DIAS RESTANTES	43	Dias			
REGISTRO FOTOGRAFICO				LOTE	0 4

24/05/2026	ACTIVDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DELIA ZAPATA OLIVELLA SEDE A	1.Instalacion estructura lucarnas 2.Instalacion policarbonato				

Anexo No. 16

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA
NIT. 63323375-2

INT-COLEGIOSNORTE-L11-321

Bogotá, 15 de abril de 2026

Señores
CONSORCIO COLEGIO MECBOG
Ing. MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
Representante Legal
Calle 60 No 45 – 53 Nicolás de Federman
Bogotá D.C

REF: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8169112, CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 4"

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO MECBOG-2026– 204 APROBACION NP 15, NP 56, NP 58 Y NP 59

Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y en atención al comunicado de la referencia, una vez revisado el contenido de la información suministrada por el contratista y teniendo en cuenta la atención de las observaciones emitidas, esta interventoría se permite indicar:

1. NP 15: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PREFABRICADA EN CONCRETO PARA INSPECCIÓN 30 X 30 CON TAPA.
    a. Cumple con lo requerido para su ejecución en campo.

2. NP 56: CONEXIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICA AÉREA 3FX6 + 1NX6 + 1TX8 A ACOMETIDA AÉREA TRENZADA A UNA ALTURA DE 8M.
    a. Cumple con lo requerido para su ejecución en campo.

3. NP 58: INSTALACION DE TANQUE ELEVADO EXISTENTE DE 500L A 1000L (INCLUYE CONEXION)
    a. Cumple con lo requerido para su ejecución en campo.

4. NP 59: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 14 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.
    a. Cumple con lo requerido para su ejecución en campo

Es importante mencionar que esta interventoría aprueba el desglose del APU NP presentado, sin embargo, es la entidad contratante quien da el aval final.

Atentamente,

ELKIN SALAZAR PÉREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Proyectó: Ing. Adriana Méndez
Revisó: Ing. Elkin Salazar Pérez
Aprobó: Ing. Elsa Torres Arenales.
Copia: Archivo.
Anexos: (0) folios.

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Código:** **Versión: 0** **Fecha:** **Página: 1 de 1**

A. DATOS GENERALES			
FECHA DE ELABORACIÓN (DD/MM/AA)	**24/3/2026**		
CONTRATO No.	**CO1.PCCNTR.8155160**		
OBJETO	**ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.**		
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		**ITEMS NO PREVISTOS**	

B. DATOS ESPECIFICOS			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**
NP-56	**CONEXIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICA AÉREA 3FX6 + 1NX6 + 1TX8 A ACOMETIDA AÉREA TRENZADA A UNA ALTURA DE 8M**	**UND**	**567,852.00**

1. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Cód.	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR	%	$ 318,265	5%	$ 15,913.00
HER001	TORRE DE TRES ANDAMIO CERTIFICADO JOBSITE SERIES 6' SAFECLIMB 7M	H	$ 6,000.00	11.000	$ 66,000.00
				SUB-TOTAL	$ 81,913.00

2. MATERIALES

Cód.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANTIDAD	VR. UNITARIO
MAT001	CONECTOR DENTADO PEQUEÑO	UND	$ 6,247.00	4.0000	$ 24,988.00
				SUB-TOTAL	$ 24,988.00

3. TRANSPORTE

Cód.	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR.UNITARIO
				SUB-TOTAL	$ -

4. MANO DE OBRA

Cód.	CUADRILLA	UNIDAD	H/C	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
MAN001	CUADRILLA INSTALACIONES (OICA+I)	HC	$ 28,933.20	11.0000	$ 318,265.00
					$ -
					$ -
				SUB-TOTAL	$ 318,265.00

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 425,166.00**
PORCENTAJE AIU	33.56%	**$ 142,686.00**
TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTO		**$ 567,852.00**

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN:

JUSTIFICACIÓN: En la Dirección Local de Educación de Usaquén (DILE) se requiere efectuar la reposición de la acometida eléctrica aérea, para lo cual es necesario realizar la conexión de una acometida trifásica conformada por conductores 3F x 6 AWG + 1N x 6 AWG + 1T x 8 AWG a la red aérea trenzada existente, ubicada a una altura aproximada de ocho (8) metros; dicha conexión implica la instalación de cuatro (4) conectores dentados tipo perforación en la acometida existente que se encuentra en la parte superior del poste, garantizando una derivación segura y conforme a las buenas prácticas de instalación eléctrica, incluyendo condiciones de trabajo en altura y uso de accesorios especializados; no obstante, dentro del paquete de referencia contractual no existe un ítem que contemple de manera específica esta actividad ni los insumos, equipos y mano de obra requeridos para su ejecución, por lo cual se justifica su inclusión como actividad no prevista, siendo esta indispensable para garantizar el correcto funcionamiento de la nueva acometida y el cumplimiento de la normatividad vigente (RETIE y NTC 2050).

CONTRATISTA

Firma	
Nombre	Martin Ernesto Riascos Caipe
Representante Legal del Contratista o su Apoderado	
Nombre de la Empresa	Consorcio Colegio MECBOG
NIT ó Cédula	901.973.159-5

APROBACIÓN INTERVENTORÍA

Firma	
Nombre	Elsa Torres Arenales
Representante Legal del Contratista o su Apoderado	
Nombre de la Empresa	Elsa Torres Arenales
NIT ó Cédula	63.323.375-2

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Firma	
Nombre	

NOTAS

La información para ítem no previsto debe ser certificada por los responsables de estructurar y aprobar los APU, teniendo en cuenta que:

a) Se verifique que no tenga equivalencia técnica con ninguno de lo ítems o actividades contractuales.
b) Para estructurar los APU se debe tener en cuenta en primera instancia los insumos contractuales.
c) La descripción del ítem debe contener la especificación particular y/o norma técnica que lo regula.
d) El Contraista de obra deberá entregar a la Interventoría y/o Supervisión todos los documentos que soporten el análisis de precios unitarios.
e) Se debe indicar en el espacio "Observaciones de la Interventoría o Supervisor" la fecha en la cual se evidenció la necesidad de la actividad no prevista.
f) En los anexos o soportes de cotizaciones debe ser visible la vigencia en la cual se expidió dicha cotización.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
ACTIVIDADES NO PREVISTAS

ACTIVIDAD NO PREVISTA NP-56

CONEXIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICA AÉREA 3FX6 + 1NX6 + 1TX8 A ACOMETIDA AÉREA TRENZADA A UNA ALTURA DE 8M

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD (UND)

DESCRIPCIÓN

La actividad consiste en la conexión de una acometida eléctrica trifásica aérea a una red existente tipo cable trenzado, mediante el uso de conectores de perforación (dentados), garantizando una derivación segura, continua y conforme a normativa eléctrica vigente.

Incluye trabajos en altura, instalación de conectores, aseguramiento de conductores y verificación del correcto funcionamiento del sistema.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Se realizará inicialmente la verificación de ausencia de tensión o implementación de condiciones seguras de trabajo conforme a protocolo eléctrico.

Posteriormente se instalará el sistema de acceso en altura y se procederá a ubicar el punto de conexión sobre la red aérea trenzada existente.

Se instalarán los conectores dentados tipo perforación, garantizando el contacto eléctrico adecuado sin necesidad de retirar el aislamiento del conductor.

Se realizará la conexión de las tres fases (3F), neutro (N) y tierra (T), asegurando el correcto apriete y fijación mecánica.

Finalmente, se efectuarán pruebas de continuidad, verificación de tensión y correcto funcionamiento del sistema.

MATERIALES

Los materiales mínimos requeridos son:
Conectores dentados tipo perforación (IPC).

EQUIPOS

Los equipos mínimos requeridos son:

Herramienta menor.
TORRE DE TRES ANDAMIO CERTIFICADO JOBSITE SERIES 6’ SAFECLIMB 7M.

DESPERDICIOS:						**MANO DE OBRA:**					
Incluidos:	SI	X	NO				**Incluida:**	SI	X	NO	

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:

Se deben tener en cuenta todas las normas vigentes que rijan dentro del territorio nacional (Colombia) para la actividad.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de pago será por unidad (UND) de conexión instalada y aprobada por la interventoría. El precio unitario incluye materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte interno, desperdicios y todos los costos directos e indirectos necesarios para su correcta ejecución.

OTROS

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA
NIT. 63323375-2

INT-COLEGIOSNORTE-L11-321

Bogotá, 15 de abril de 2026

Señores
CONSORCIO COLEGIO MECBOG
Ing. MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
Representante Legal
Calle 60 No 45 – 53 Nicolás de Federman
Bogotá D.C

REF: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8169112, CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 4"

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO MECBOG-2026– 204 APROBACION NP 15, NP 56, NP 58 Y NP 59

Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y en atención al comunicado de la referencia, una vez revisado el contenido de la información suministrada por el contratista y teniendo en cuenta la atención de las observaciones emitidas, esta interventoría se permite indicar:

1. NP 15: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PREFABRICADA EN CONCRETO PARA INSPECCIÓN 30 X 30 CON TAPA.
    a. Cumple con lo requerido para su ejecución en campo.

2. NP 56: CONEXIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICA AÉREA 3FX6 + 1NX6 + 1TX8 A ACOMETIDA AÉREA TRENZADA A UNA ALTURA DE 8M.
    a. Cumple con lo requerido para su ejecución en campo.

3. NP 58: INSTALACION DE TANQUE ELEVADO EXISTENTE DE 500L A 1000L (INCLUYE CONEXION)
    a. Cumple con lo requerido para su ejecución en campo.

4. NP 59: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 14 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.
    a. Cumple con lo requerido para su ejecución en campo

Es importante mencionar que esta interventoría aprueba el desglose del APU NP presentado, sin embargo, es la entidad contratante quien da el aval final.

Atentamente,

ELKIN SALAZAR PÉREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Proyectó: Ing. Adriana Méndez
Revisó: Ing. Elkin Salazar Pérez
Aprobó: Ing. Elsa Torres Arenales.
Copia: Archivo.
Anexos: (0) folios.

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Código:** **Versión: 0** **Fecha:** **Página: 1 de 1**

A. DATOS GENERALES			
FECHA DE ELABORACIÓN (DD/MM/AA)	**24/3/2026**		
CONTRATO No.	**CO1.PCCNTR.8155160**		
OBJETO	**ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.**		
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		**ITEMS NO PREVISTOS**	

B. DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO
NP-59	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 14 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.**	**M**	**110,493.00**

1. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Cód.	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR	%	$ 25,135	5%	$ 1,257.00
HER001	VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA	H	$ 10,000.00	0.4986	$ 4,985.75
				SUB-TOTAL	$ 6,242.75

2. MATERIALES

Cód.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANTIDAD	VR. UNITARIO
MAT001	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	M3	$ 579,490.00	0.0294	$ 17,037.00
MAT002	TABLA BURRA 30X2.3X300 CM	UND	$ 35,700.00	0.4083	$ 14,578.00
MAT003	REPISAS PINO 8CMX4CMX300CM	UND	$ 28,560.00	0.1531	$ 4,373.00
MAT004	PUNTILLA CON CABEZA DE 2"	KG	$ 9,600.00	0.8477	$ 8,138.00
MAT005	ALAMBRE NEGRO No 18	KG	$ 4,998.00	1.2250	$ 6,123.00
MAT006	DESENCOFRANTE EMULSIONADO (20 KG)	UND	$ 179,900.00	0.0061	$ 1,102.00
				SUB-TOTAL	$ 51,351.00

3. TRANSPORTE

Cód.	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR.UNITARIO
				SUB-TOTAL	$ -

4. MANO DE OBRA


Cód.	CUADRILLA	UNIDAD	H/C	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
MAN001	CUADRILLA ALBAÑILERIA (OA + A)	HC	$ 25,331.65	0.9923	$ 25,135.00
					$ -
					$ -
				SUB-TOTAL	$ 25,135.00

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 82,729.00**
PORCENTAJE AIU	33.56%	**$ 27,764.00**
TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTO		**$ 110,493.00**

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN:

JUSTIFICACIÓN: En la IED Juan Francisco Berbeo se requiere efectuar una viga de sección de 14cm de base por 20cm de alto para efectuar el confinamiento de los muros en mampostería, dentro del presupuesto contractual se cuenta únicamente con una viga de 12x20 que compete al ítem contractual 2.2.7, se toma como base este ítem contractual y se prorratean los rendimientos para la elaboración de este ítem no previsto teniendo en cuenta la relación de los consumos de concreto entre ambos ítems

CONTRATISTA

Firma	
Nombre	Martin Ernesto Riascos Caipe
Representante Legal del Contratista o su Apoderado	
Nombre de la Empresa	Consorcio Colegio MECBOG
NIT ó Cédula	901.973.159-5

APROBACIÓN INTERVENTORÍA

Firma	
Nombre	Elsa Torres Arenales
Representante Legal del Contratista o su Apoderado	
Nombre de la Empresa	Elsa Torres Arenales
NIT ó Cédula	63.323.375-2

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Firma	
Nombre	

NOTAS

La información para ítem no previsto debe ser certificada por los responsables de estructurar y aprobar los APU, teniendo en cuenta que:

a) Se verifique que no tenga equivalencia técnica con ninguno de lo ítems o actividades contractuales.
b) Para estructurar los APU se debe tener en cuenta en primera instancia los insumos contractuales.
c) La descripción del ítem debe contener la especificación particular y/o norma técnica que lo regula.
d) El Contraista de obra deberá entregar a la Interventoría y/o Supervisión todos los documentos que soporten el análisis de precios unitarios.
e) Se debe indicar en el espacio "Observaciones de la Interventoría o Supervisor" la fecha en la cual se evidenció la necesidad de la actividad no prevista.
f) En los anexos o soportes de cotizaciones debe ser visible la vigencia en la cual se expidió dicha cotización.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
ACTIVIDADES NO PREVISTAS

ACTIVIDAD NO PREVISTA NP-59

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 14 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.

UNIDAD DE MEDIDA

METRO LINEAL(M)

DESCRIPCIÓN

La actividad consiste en la construcción de viga cinta de confinamiento en concreto de 3000 PSI, con sección de 14 cm de base por 20 cm de altura, ejecutada en sitio, incluyendo formaleta, vaciado, vibrado, curado y desencofrado, destinada al confinamiento de muros en mampostería.

No incluye acero de refuerzo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Se realiza el replanteo de la viga conforme a alineación del muro.

Se instala la formaleta, asegurando dimensiones, nivel y estabilidad.

Se aplica desmoldante y se procede al vaciado del concreto.

Se ejecuta vibrado mecánico para evitar vacíos.

Se realiza acabado superficial y curado.

Finalmente, se desencofra y se verifica alineación y calidad del elemento.

MATERIALES

Los materiales mínimos requeridos son:
CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI
TABLA BURRA 30X2.3X300 CM
REPISAS PINO 8CMX4CMX300CM
PUNTILLA CON CABEZA DE 2"
ALAMBRE NEGRO No 18
DESENCOFRANTE EMULSIONADO (20 KG)

EQUIPOS

Los equipos mínimos requeridos son:
Herramienta menor.
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA

DESPERDICIOS:						**MANO DE OBRA:**					
Incluidos:	SI	X	NO				**Incluida:**	SI	X	NO	

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:

Se deben tener en cuenta todas las normas vigentes que rijan dentro del territorio nacional (Colombia) para la actividad.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de pago será por metro lineal (M) de viga construida, aprobada y recibida por la interventoría. El precio unitario incluye materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte interno, desperdicios y todos los costos directos e indirectos necesarios para su correcta ejecución.

OTROS

Radicado Nº I-2026-81185
Fecha: 30-06-2026 - 15:51
Folios: 1 Anexos:
Radicador: OSCAR JULIAN OLEA SALGADO - 4300
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: HA8ZX

PARA: **WALTER HERIBERTO PEÑA FONSECA**
Apoyo a la Supervisión del Contrato No CO1.PCCNTR.8169112

DE: **MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE**
Contratista DCCEE

ASUNTO: Alcance a la respuesta I-2026-61122 revisión ítems no previstos Contrato de Obra No. CO.1.PCCNTR 8155160 de 2025, cuyo objeto corresponde a: *"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"* - LOTE 11

En atención a la solicitud referenciada en el asunto y una vez revisados los análisis de precios unitarios de actividades no previstas, allegados por el contratista de obra los cuales fueron aprobados por la interventoría ELSA TORRES ARENALES quien ejerce la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato de obra y revisados por la supervisión del contrato de interventoría y una vez aclaradas las observaciones realizadas por el Grupo de Estudios Previos, se llevó a cabo la revisión, concluyendo lo siguiente:

Actividades de obra con las cuales la SED está de acuerdo con el valor unitario, por cuanto se encuentran dentro de los precios actuales de mercado:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO AVALADO COSTO DIRECTO	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU CONTRACTUAL DE 33.56%
NP-56	CONEXIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICA AÉREA 3FX6 + 1NX6 + 1TX8 A ACOMETIDA AÉREA TRENZADA A UNA ALTURA DE 8M	UN	$ 352,407.00	$ 470,675.00
NP-59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 14 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	$ 80,805.00	$ 107,923.00

* Se adjuntan análisis de precios unitarios, soportes y documentación correspondiente

El presente documento se constituye en una herramienta de referencia que puede ser empleada para la planeación y desarrollo de los presupuestos acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos que la SED implementa.

El análisis se realizó teniendo en cuenta la información revisada y suministrada por el supervisor del contrato o quien este designe con relación a los análisis de precios unitarios, así como la verificación y aprobación por parte del supervisor del contrato de obra, por tal motivo se tomó como cierta y veraz la documentación recibida en esta área. Igualmente, será responsabilidad del interventor del Contrato verificar la pertinencia de la ejecución de las actividades y cantidades y calidad de los insumos, así como la documentación allegada, sean acordes con las condiciones contractuales, la realidad del proyecto y estén enmarcadas dentro de los principios de economía y eficiencia de los recursos contratados.

Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorrogar o adicionar recursos en los cuales deba incurrir el contratista para la debida ejecución del contrato, por lo tanto, el presente documento tiene como alcance la revisión, análisis y determinación del costo directo de las actividades no previstas, de acuerdo con las condiciones contractuales y valores actuales de mercado.

Cordialmente,



MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE
Contratista DCCEE

Responsable viabilidad No previstos: Oscar Julián Olea S. – Contratista – DCCEE
