□□C□□D□□□OC□□D□□□□□□□□O□

INFORME TECNICO No. 06



COMPONENTE TECNICO□

□

AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S

□


CONTRATO DE INTERVENTORÍA 652 - 2025 CINT (143627)

□

CONTRATO 652 - 2025 CINT (143627) OBJETO: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".*

	AHLA SHUGL INTERNATIONAL SAS **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** **No. 6** **DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026**	

RESPONSABLES DEL INFORME:

Control Interno	
Elaboró:  **ING. MISAEL PULIDO GUZMAN** **Residente de Interventoría** **AHLA SHUGL INTERNATIONAL SAS**	**Aprobó:**  **ING. SANTIAGO CARRILLO VARGAS** **Director de Interventoria** **AHLA SHUGL INTERNATIONAL SAS**

INFORME TECNICO No. 06

CONTROL DE MODIFICACIONES

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
□□□	□□ □□O□□□□□	□r□ □r□□□□r□□□□
□□□	□	□
□□□	□	□

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
2. ASPECTOS GENERALES
3. ALCANCE
4. LISTADO DE TRAMOS
5. LOCALIZACIÓN GENERAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO OBJETO DE ESTUDIO
6. METODOLOGIA
7. APROBACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA
8. APROBACION HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA
9. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA
10. INFORME LEGAL CONTRATO DE OBRA Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA
11. INFORME TÉCNICO
12. CRONOGRAMA DEL CONTRATO DE OBRA, APROBADO POR LA INTERVENTORÍA
13. AREA FINANCIERA CONTRATO DE OBRA No 613 del 2025.
14. AREA FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORIA No 652 DEL 2025
15. CALIDAD
16. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
17. CORRESPONDENCIA ENVIADA
18. APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

19. ACTAS DE SEGUMIENTO DESARROLLADAS EN EL PERIODO

20. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

21. CONCLUSIONES

TABLA DE ILUSTRACIONES

Índice de ilustraciones no encontrado.

1. INTRODUCCIÓN

[illegible] *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".*

[illegible] **01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026.**

[illegible]

2. ASPECTOS GENERALES

2.1. INFORMACION Y DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

NÚMERO DEL CONTRATO	CO□□R□□O□D□□□□□R□□□□OR□□□□o□□□□D□□□□□□□
OBJETO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, □DM□□□□R□□□□□□□ □□□C□□R□□□ □□R□D□C□□□ □M□□□□□□□□ □OC□□□□□□□□□□□□□CO□□R□□O□D□□O□R□□□□□□□C□□□□□□ R□□□□□□□□□□D□□□ □ROC□□O□D□□ □□C□□□C□□ □□□□□□C□□ C□□O□O□□□□O□□□□□□□C□□□R□□MO□□O□□□O□□□□□□□□OR□ □□□□□□□□M□□D□□□R□C□O□□□□□□□R□O□□□□□□□C□□□□D□D□□□ □□R□□ □□□ CO□□□R□CC□□□ □□O□ CO□□□R□□C□□□ □□ □□O□ M□□□□□□M□□□□O□□O□R□□□□□□□□□C□□ □□D□□□□M□□□□□□□□ □OC□□□ □□ □□□RM□D□□□ □□□□C□O□ □□□□□CO□ □□ O□R□□□ COM□□□M□□□R□□□□□□□□□□OC□□D□D□D□□□□□□□□□□□O□ DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".□
NOMBRE CONTRATISTA	□□□□□□□□□□□□R□□□□O□□□□□□□□□□ □
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	□□□□□□□□□□□□□
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	OC□O□□□□□M□□□□□
FECHA DE INICIACIÓN:	□□D□□D□C□□M□R□D□□□□□□□
FECHA DE TERMINACIÓN	□□D□□□□O□□O□D□□□□□□□□
ENTIDAD CONTRATANTE:	□O□DO□D□□D□□□RRO□□O□□OC□□D□□□□□□□□□O□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□R□□□O□□□□□□□□□□

□
□
□
□

2.3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	CO□□R□□O□D□□O□R□□□o□□□□D□□□□□□□
OBJETO	"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE □R□C□O□□ □□□□R□O□□□ □□□□ □C□□□D□D□□□ □□R□□ □□□ CO□□□R□CC□□ □□ □□O□ CO□□□R□□C□□ □□O□ M□□□□□M□□□□O□□O□R□□□□□□□C□□ □□D□□□□M□□□□□□□ □OC□□□ □□ □□ □□RM□D□□□ □□□□C□O□ □□□□CO□ □□ O□R□□□ COM□□□M□□□□R□□□□□□□□□OC□□D□D□D□□□□□□□□□□O□ DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".□
NOMBRE CONTRATISTA	CO□□ORC□O□COCO□ □
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	□□□□□□□□□□□□□□□
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	OC□O□□□□M□□□□□
FECHA DE INICIACIÓN:	□□D□D□C□M□R□D□□□□□□
FECHA DE TERMINACIÓN	□□D□□□O□□O□D□□□□□□□
ENTIDAD CONTRATANTE:	□O□DO□D□□D□□□RRO□□O□OC□□D□□□□□□□□O□
PIN AMBIENTAL No	□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□R□□□□O□□□□□□□□□□□
□

3. ALCANCE

□□□□□do□□□□c□□□□□□□□doc□□ □□□o□□c□co□o□c□do□□□r□d□r□□□□□□c□co□□□roc□□o□ □□□□c□□d□d□□□□□□c□□r□c□□□□or□o□ □□o□□□□□□□□ □□r□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □d□□ □□d□□□□□□□□□□□□d□□□r□d□□d□□o□doc□□ □□o□d□□Co□r□o□□□odo□c□o□□□ co□r□□□□d□□□r□□□r□□□r□□d□c□□do□□c□o□□□ □□o□d□□□c□□d□d□□□□□□□□c□□□ □

D□□□□□co□□□□□□□□ □□o□□□□□□□□□□r□do□□

- □ □□d□o□□d□□o□□
- □ M□□□□□□ □□o□r□□□r□o□□□□□□□ □□o□□□□□□□□□□r□do□□

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

4. LISTADO DE TRAMOS

[illegible]

CIV	PK-ID	EJE VIAL	DESDE	HASTA	BARRIO	TIPO DE PAVIMENTO	TIPO DE MALLA VIAL	TIPO DE INTERVENCIÓN	ÁREA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

AHLA SHUGL INTERNATIONAL SAS

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
No. 6
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

CIV	PK-ID	EJE VIAL	DESDE	HASTA	BARRIO	TIPO DE PAVIMENTO	TIPO DE MALLA VIAL	TIPO DE INTERVENCIÓN	ÁREA

Teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal en el proyecto de inversión No. 2824 “Una nueva visión de infraestructura en pro de la comunidad de Tunjuelito 2025” para la vigencia 2025, se

CIV	PK-ID	EJE VIAL	DESDE	HASTA	BARRIO	TIPO DE PAVIMENTO	TIPO DE MALLA VIAL	TIPO DE INTERVENCIÓN	ÁREA

CIV	PK-ID	EJE VIAL	DESDE	HASTA	BARRIO	TIPO DE PAVIMENTO	TIPO DE MALLA VIAL	TIPO DE INTERVENCIÓN	ÁREA
[illegible]	[illegible]	C[illegible]r	Cr[illegible]	Cr[illegible]	[illegible]	[illegible]	R[illegible]	M[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	C[illegible]r	Cr[illegible]	Cr[illegible]	[illegible]	[illegible]	R[illegible]	M[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Cr[illegible]	C[illegible]	C[illegible]	[illegible]	[illegible]	R[illegible]	R[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	C[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R[illegible]	R[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	D[illegible]	C[illegible]	[illegible]	[illegible]	R[illegible]	R[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

CIV	PK-ID	EJE VIAL	DESDE	HASTA	BARRIO	TIPO DE PAVIMENTO	TIPO DE MALLA VIAL	TIPO DE INTERVENCIÓN	ÁREA
[illegible]	[illegible]	Cr[illegible]	D[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Cr[illegible]	D[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]


[illegible]

5. LOCALIZACIÓN GENERAL


[illegible]

[illegible]

Ilustración 1 Mapa de Colombia con la localización del proyecto a nivel local.

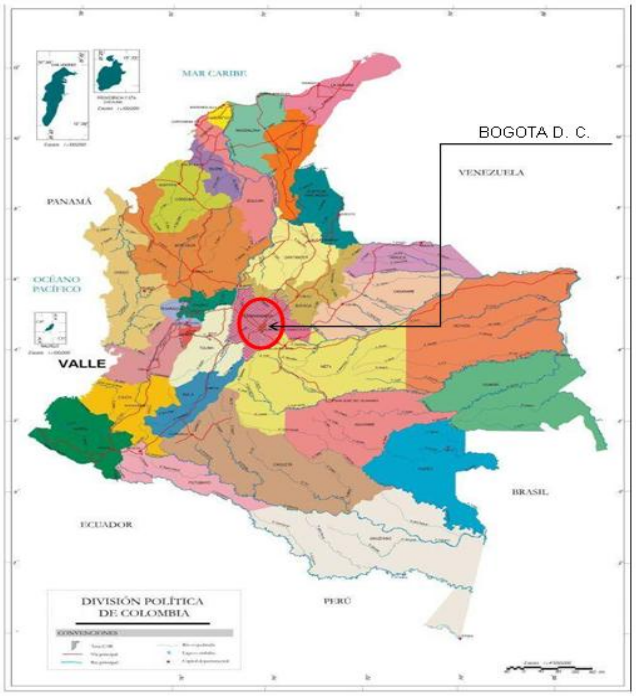

5.1 LOCALIDAD DE TUNJUELITO

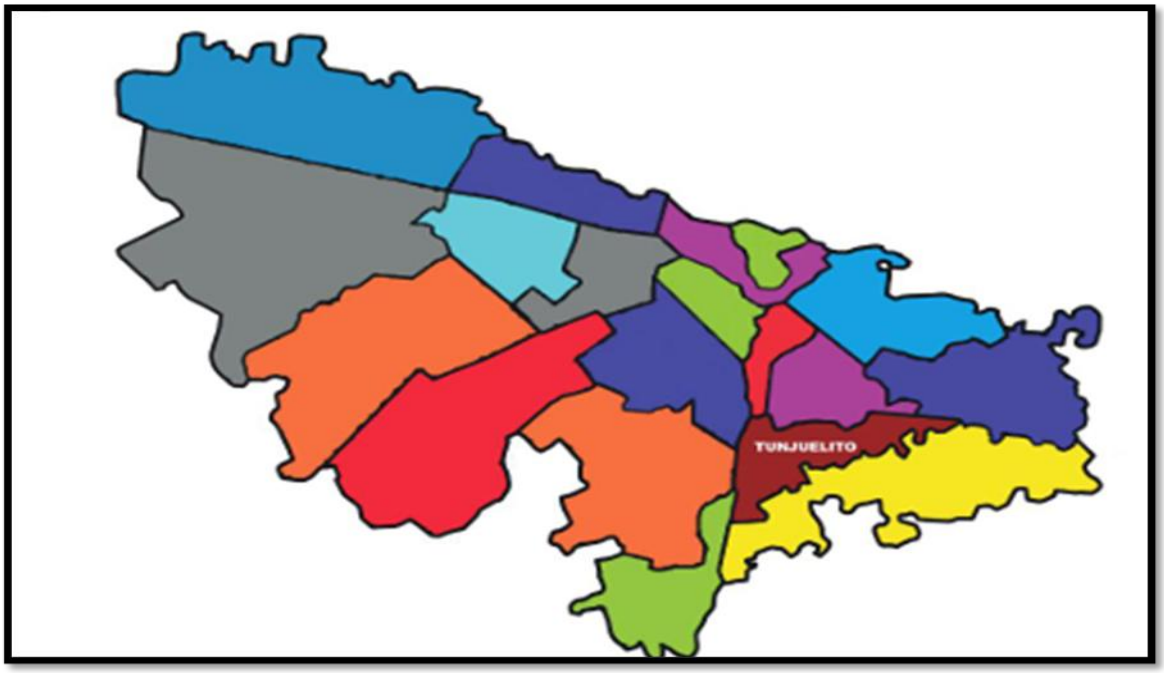

Fuente:

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO OBJETO DE ESTUDIO

[illegible]
inversión No. 2914 “Tunjuelito se moviliza con seguridad” para la vigencia 2025, se [illegible]

6. METODOLOGIA

[illegible]

[illegible] CONSORCIO COCO.

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

7. APROBACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA

CONSORCIO COCO,

INFORME TECNICO MENSUAL No 1

PERSONAL CONTRACTUAL COSORCIO COCO				
No.	**CARGO**	**NOMBRE**	**CEDULA**	**DEDICACIÓN**

	AHLA SHUGL INTERNATIONAL SAS **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** **No. 6** **DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026**	

PERSONAL CONTRACTUAL COSORCIO COCO				
No.	**CARGO**	**NOMBRE**	**CEDULA**	**DEDICACIÓN**
□□	D□R□C□OR□D□□ O□R□□□	M□R□O□□ □□D□R□ □□□□□M□R□□□□□C□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□ □
□□	□□ □□R□□□D□□□□□ D□□O□R□□□	□□□□O□□□□□□R□O□ □□R□□□D□□□□□□O□	□□□□□□□□□□□□	□□□□ □
□□	□□□□C□□□□□□□ □□□□□O□□C□□□□ □□□□□□□ □□□□M□□□O□□	□O□□□M□□□ □□□□□□D□□□□ □R□□□□O□	□□□□□□□□□□□□□□	□□□ □
□□	□□□□C□□□□□□□ □□DR□□□□CO□	□OR□ □□□□□□C□R□□□□RR□□ □□R□□□D□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□ □
□□	□□□□C□□□□□□□ □□□□R□□□□□O□□□ □R□□□□OR□□□	C□R□O□□□□DR□□□M□□O□□ □□□ □ □□□	□□□□□□□□□□□□□□	□□□ □
□□	□□□□C□□□□□□□ □OR□□□□□□□	□□ □□□□R□C□RDO□ □□□□□□D□□□□ □□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□ □
□□	□RO□□□□O□□□□ □M□□□□□□□	□□R□□□□D□□□D□□□RM□D□□□ MO□C□D□□	□□□□□□□□□□□□□□	□□□ □
□□	□RO□□□□O□□□□ □□□□RD□D□□□ □□□□D□□□□□□ □R□□□□O□	□□R□□M□□□□□R□C□□□□□□RR□□ O□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□	□□□ □
□□	□RO□□□□O□□□□ □OC□□□□	M□R□□□□M□□□R□□□ □□□□□ □□□RODR□□ □□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□ □
□□□	□□ □□□C□OR□□□	□OR□ □□□□DR□□□□□□ □□ □R□□O□□	□□□□□□□□□□□□□□	□□□□ □
□□□	□□□ □□□C□OR□□□	□O□□M□□□□R□D□ □□□R□□□O□OC□M□O□	□□□□□□□□□□□□□□	□□□□ □
□□□	□O□O□R□□O□	C□□□R□□□□□□R□O□□ M□R□□□□□C□□□RO□	□□□□□□□□□□□□	□□□□ □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□R□□□□O□□□□□□□□□□□□

8. APROBACION HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA

[illegible] **INTERVENTORIA AHLA SHUGL INTERNATIONAL SAS** [illegible]

[illegible]

[illegible] **INFORME TECNICO MENSUAL No 1** [illegible]

[illegible]

PERSONAL CONTRACTUAL AHLA SHUGL INTERNATIONAL SAS				
No.	**CARGO**	**NOMBRE**	**CEDULA**	**DEDICACIÓN**
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PERSONAL CONTRACTUAL AHLA SHUGL INTERNATIONAL SAS				
No.	**CARGO**	**NOMBRE**	**CEDULA**	**DEDICACIÓN**
□□	□□□□C□□□□□□□□□□□ □R□□□□□O□	□□□R□□□□□□□□□□ R□M□R□□□□□DR□□□□	□□□□□□□□□□	□□□ □
□□	R□□□D□□□□□ □M□□□□□□□□□	□D□□□R□□□□ C□□□D□□□O□ □□□□R□□□	□□□□□□□□□□	□□□ □□□□□□□□□□r□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□d□□ o□r□□
□□□	R□□□D□□□□□□□□□	D□□□□M□RC□□□□ M□□DO□□□□□O□	□□□□□□□□□□	□□□ □□□□□□□□□□r□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□d□□ o□r□□
□□□	□RO□□□□O□□□□ □OC□□□□	M□R□□□DR□□□□□ □□□□RR□□□ □□R□O□□	□□□□□□□□□□	□□□ □□□□□□□□□□r□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□d□□ o□r□□
□□□	□□□□C□OR□	O□C□R□M□□R□C□O□ □□□□□□□R□□□	□□□□□□□□□□□□	□□ □□□□□□□□□□r□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□d□□ o□r□□
□□□	CO□D□C□OR□	□□□□O□□□M□□□ M□D□□□□O□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□ □□□□□□□□□□r□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□d□□ o□r□□
□□□	C□D□□□RO□□□	□□□DR□□M□□□□□ MO□□□□□□□R□□	□□□□□□□□□□	□□□ □□□□□□□□□□r□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□d□□ o□r□□
□□□	□O□O□R□□O□ □□□□C□OR□	□D□□RDO□ □□M□□R□O□CR□□□ □□□□□□□□RO□□	□□□□□□□□□□□□	□□□ □□□□□□□□□□r□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□d□□ o□r□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□R□□□□O□□□□□□□□□□□□□□

9. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

GARANTÍAS Y VIGENCIAS DE LAS MISMAS, ADICIONES, SUSPENSIONES Y/O PRÓRROGAS

- **INTERVENTORÍA**

□

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□d□□□□□r□□□□□Co□□r□□o□d□□□□□□r□□□□or□□□C□□ □□□□□□□□□□□□□D□□□□□□□
□□c□□□□r□□□□c□□□□□□d□□□□□d□□d□□ □□□□□□□□□d□□□□□□□□CO□□□□□□□co□□□□□□c□□□□□□□
d□□cr□□□□d□□□c□□rdo□co□□□□□□c□□□□□□c□□□co□□□□□c□□d□□□□c□o□co□□r□c□□□□□

□

Amparo	Amparos según pólizas No 21-46-101124523 anexo 2

	Valor Asegurado	Desde	Hasta	Cumple
Cumplimiento del contrato.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Calidad del Servicio.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

- **CONTRATISTA**

[illegible]

Amparo	Amparos según pólizas No 82590 anexo 1			
	Valor Asegurado	Desde	Hasta	Cumple
Cumplimiento del contrato.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Estabilidad y Calidad de la Obra.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Responsabilidad Civil Extracontractual.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

10. INFORME LEGAL CONTRATO DE OBRA Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- **ACTA DE INICIO**

[illegible]

- **OBRA**

- **INTERVENTORÍA**

- **SUSPENSIONES**

- **REINICIOS**

11. INFORME TÉCNICO

PLAZO DE EJECUCIÓN	

11.1 INFORMACIÓN TECNICA


11.2 ACTA DE INCLUSIÓN EXCLUSIÓN.

SEGMENTOS DE EXCLUSIÓN.

CIV	EJE VIAL	DESDE	HASTA	BARRIO
6001167	CRA. 24C	CL.48 SUR	CL. 48C SUR	TUNAL ORIENTAL
6002092	DG. 52 SUR	CRA. 33	CRA. 35	FÁTIMA
6001390	CLL. 53 SUR	CRA. 15	CRA. 17	SAN CARLOS
6000789	CLL. 49a SUR	CRA. 31	CRA. 33	SAMORE
6000931	CLL. 53b SUR	CRA. 32	CRA. 33	SAN VICENTE F.
6001008	CR 26	CL 48A S	CL 48B S	SAMORÉ

12. CRONOGRAMA DEL CONTRATO DE OBRA, APROBADO POR LA INTERVENTORÍA

% PROGRAMADO: 72
% EJECUTADO: 78

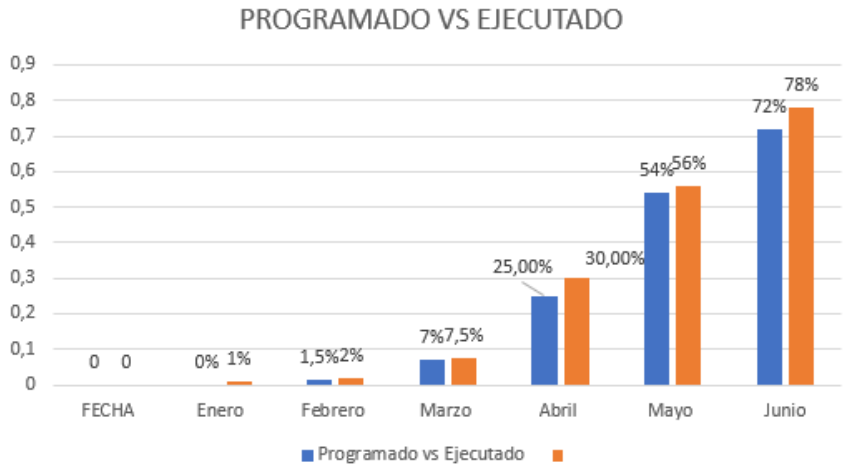

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE CADA SEGMENTO.

- **CIV 6000528 (ESPACIO PUBLICO): TERMINADO AL 100%**
- **CIV 6000580 (ESPACIO PUBLICO): TERMINADO AL 100%**

- **CIV 6001200 (ESPACIO PUBLICO): TERMINADO AL 100%**
- **CIV 6001013 (VIA): TERMINADO AL 100%**
- **CIV 6000857 (VIA): TERMINADO AL 100%**
- **CIV 6000372 (VIA): EN EJECUCION AL 95%**
- **CIV 6000389 (VIA): EN EJECUCION AL 95%**
- **CIV 6000557 (VIA): EN EJECUCION AL 90%**
- **CIV 6000786 (VIA): EN EJECUCION AL 90%**
- **CIV 6000830 (VIA): EN EJECUCION AL 30%**

13. AREA FINANCIERA CONTRATO DE OBRA No 613 del 2025.

CONSORCIO COCO

TRANSPORTE DE MATERIALES				$ 901.107.567,80
Giro	Proveedor	Nit	Valor	Saldo
1	SEFCA TRANSPORTE	901717887	$ 30.000.000	$ 871.107.568
	CONCREMOVIL	830512347	$ 25.000.000	$ 846.107.568
2	NV INVERSIONES SAS	901743193	$ 100.000.000	$ 746.107.568
	PROCOM INGENIERIA SAS	901359599	$ 224.500.000	$ 521.607.568
3	G Y J FERRETERIAS SA	800130426	$ 20.768.550	$ 500.839.018
	PROESTECH COLOMBIA SAS	900765717	$ 52.114.500	$ 448.724.518
	SYNDRA SAS	901697099	$ 44.215.821	$ 404.508.697
	CONSTRUCCIONES CIVILES BURGOS SAS	901454513	$ 13.518.838	$ 390.989.859
	INNOVAR CONSTRUCCIONES	901798937	$ 17.434.527	$ 373.555.332
	ML CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SASUCTURA SAS	901012697	$ 200.000.000	$ 173.555.332
4	INNOVAR CONSTRUCCIONES	901798937	$ 27.576.704	$ 145.978.628
	JULIAN BENAVIDES GIL	80851640	$ 931.340	$ 145.047.288
	ARK INGENIERIA	901447769	$ 41.037.211	$ 104.010.077

COMPRA DE MATERIALES				$ 801.873.393,60
Giro	Proveedor	Nit	Valor	Saldo
1	PREFABRICADOS CONCRETARTE SA	830087188	$ 10.000.000	$ 791.873.394
	C&T ARCILLAS Y PREFABRICADOS EN CONCRETO SAS	900434625	$ 25.000.000	$ 766.873.394
	E SECURITY LTDA	830081105	$ 30.000.000	$ 736.873.394
	FERRETERIA FORERO S A	860030360	$ 30.000.000	$ 706.873.394
	EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO S A E S P EMAS	800249174	$ 10.000.000	$ 696.873.394
	DOTACIONES DOTAPROTEC	901988792	$ 4.247.727	$ 692.625.667
	CREACIONES Y PREFABRICADOS TINTAN SAS	901279839	$ 25.000.000	$ 667.625.667
	POLIMIX CONCRETO COLOMBIA SAS	830106474	$ 20.000.000	$ 647.625.667
	PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES PREFACON SAS	830103395	$ 10.000.000	$ 637.625.667
	SYNDRA SAS	901697099	$ 200.000.000	$ 437.625.667
2	ML CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SASUCTURA SAS	901012697	$ 200.000.000	$ 237.625.667
	MADERAS DEL VALLE M&E S.A.S	901344118	$ 1.888.814	$ 235.736.853
	COMPANIA PAPELERA NACIONAL SAS	900009495	$ 3.416.171	$ 232.320.682
	DITRAING JYF	901402752	$ 7.898.572	$ 224.422.110
	SOLUCIONES MOBILIARIAS	901470419	$ 323.680	$ 224.098.430
	COLEMPLAST LTDA	900266572	$ 19.211.126	$ 204.887.304
	ACIERTO Y EDITORES	830050475	$ 249.900	$ 204.637.404

Página 1

PLAN DE INVERSIÓN							
DESCRIPCIÓN	VALOR	GIROS					
		1	2	3	4	5	6
Pago de mano de obra, salarios y honorarios	$ 300.702.522,60	$ 300.702.522,60					
Transporte y/o instalación de material granular	$ 902.107.567,80	$ 55.000.000,00	$ 324.500.000,00	$ 348.052.236,00	$ 27.576.704,00	$ 127.112.708,00	$ 18.865.920
Compra de materiales y accesorios	$ 801.873.393,60	$ 364.247.727,00	$ 273.087.598,00	$ 18.471.472,00	$ 17.559.984,00	$ 87.509.749,40	
TOTAL	$ 2.004.683.484,00	$ 719.950.249,60	$ 597.587.598,00	$ 366.523.708,00	$ 45.136.688,00	$ 214.622.457,40	$ 18.865.919,80

RENDIMIENTO FINANCIERO

[illegible] **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO** [illegible]

[illegible] **CONSORCIO COCO** [illegible]

CONTROL DE PAGOS CONSORCIO COCO COP 613 DEL 2025			
ACTAS	VALOR COBRADO	AMORTIZACIÓN DEL 30%	VALOR NETO A PAGAR
1	$ 147.690.799	$ 44.307.240	$ 103.383.559
2	$ 459.546.247	$ 137.863.874	$ 321.682.373
3	$ 1.086.683.907	$ 326.005.172	$ 760.678.735
4	$ 1.740.874.303	$ 522.262.291	$ 1.218.612.012

NOTA: CON EL INFORME No 06, EL CONSORCIO COCO ADJUNTA ACTA DE COBRO No 5 POR VALOR DE $ 144.438.690 PARA SU REVISION, RADICACIÓN Y TRAMITE PERTINENTE.

14. AREA FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORIA No 652 DEL 2025

[illegible]

PROCENTAJE (%) DEL VALOR TOTAL	NUMERO DE PAGOS	REQUISITOS
40 %	Pagos mensuales (8 meses) mes vencido.	• Cumplimiento de la programación de actividades. • Aprobación informe mensual de actividades de la interventoría de los componentes.
50 %	Pagos de acuerdo con el porcentaje de obra.	• Contra avance registrado en la obra.
10 %	Pago contra liquidación.	• Suscripción acta de liquidación del contrato de interventoría. • Suscripción acta de liquidación contrato de obra.

AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.

- **ACTA No 1 por valor de $ 31.839.738**
- **ACTA No 2 por valor de $ 31.839.738**
- **ACTA No 3 por valor de $ 60.291.158**
- **ACTA No 4 por valor de $ 82.755.110**
- **ACTA No 5 por valor de $ 113.406.478**

CONTROL DE PAGOS INTERVENTORÍA CIN 652 DEL 2025				
ACTAS	**VALOR COBRADO**		**VALOR PAGADO POR EL FDLT**	
1	$	31.839.738,00	$	29.106.337,00
2	$	31.839.738,00	$	29.106.337,00
3	$	60.291.158,00	$	55.115.238,00
4	$	82.755.110,00	$	55.115.238,00
5	$	113.406.478,00	$	103.670.675,00

NOTA: CON ESTE INFORME No 06 SE ADJUNTA LA FACTURA No 6 POR VALOR DE $ 38.607.253 PARA SU RADICACIÓN Y TRAMITE PERTINENTE

15. CALIDAD

15.1 RESULTADOS DE LABORATORIO CONTRATO DE OBRA.

[illegible] **CONSORCIO COCO,** [illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

15.2 ANÁLISIS ENSAYOS DE LABORATORIO

[illegible] **AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.** [illegible]

15.3 CERTIFICADOS DE CALIDAD

[illegible] **CONSORCIO COCO** [illegible]

16. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

[illegible] **01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026.** [illegible]

[illegible]

CORRESPONDENCIA RECIBIDA – DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026.			
FECHA	**OFICIO**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

17. CORRESPONDENCIA ENVIADA

01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026.

CORRESPONDENCIA ENVIADA - DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026.			
FECHA	**OFICIO**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**

18. APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

FDLT-CTO-613-2025/50 **CONSORCIO COCO** **AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO

□ □□□□□□□	□□□□□□□□ □R□□□□□R□ □□□□O□□□□ □□□ □□□□□□ □□M□□□□□RO□□ □□□□□□D□DO□ M□□□□□□□□ □□□□□□C□□□□□ □□M□D□C□M□□□□O□□□COM□□C□□C□□□□	□ M□□	□ □□□□□□□□□□□□□
□ □□□□□□□	M□□□□O□ D□□ □□□□□□□ □□□C□□□□□ MO□O□OM□□□ CO□□ COM□□□□□□□□□□ □□ O□□R□DOR□□	□ □R□	□ □□□□□□□□□□□□□
□ □□□□□□□	□□M□D□RO□ □□□□R□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□M□ □□R□□□□R□C□DO□□□□C□□ □□□□□M□□□□RO□ □□□□□□□□□C□□□□□□C□□□□□□O□R□□□□□□□□ □□□□□□	□ □□□	□ □□□□□□□□□□□□□
□ □□□□□□□	□□R□□□DO□□R□C□C□□DO□□□□R□□□□□□ □R□□□□□R□ □□R□□□ □□□□ □□□□□□□ro□□ □□□□□d□do□□ □□□□□c□□□□□ □□□ □d□c□□ □□□□o□□ Co□ □□c□□c□□□co□□□□□ro□co□ □□c□□dor□□	□ M□□	□ □□□□□□□□□□□□□
□ □□□□□□□	□□O□□□□□□□□□DO□CO□□R□□□□□□C□□□□□ □□□ □□□□□O□□ M□□ODO□ □□R□□ □□C□□□ □□□□□DO□□O□□□□□D□□□□□D□□□□□□□□M□□ □□R□□ □□□□R□CO□□ □□□R□□□□□□C□□□□□ □R□□□□□R□□□□ □□□C□□□□□□M□□□□□RO□□□□□□□□□CO□□□□	□ □ M□□	□ □ □□□□□□□□□□□□□
□ □□□□□□□	□□□□M□□DO□D□□CO□CR□□O□□□□C□□□□□ □□□□O□D□□MO□D□□□□D□□MO□D□□□□□□□□ □O□□O□□□□□□DOR□□□□□D□R□C□DOR□□	□ M□□	□ □□□□□□□□□□□□□
□ □□□□□□□	M□□C□□□□ □□□□□□□C□□ □□□ C□□□□□□□□ MCC□□□□□□□CO□□C□M□□□O□□□□□□□□CO□ MOD□□□C□DO□ CO□□ C□□C□O□ □□□M□□□□□RO□□□□□□□D□DO□□□□□□□C□□□□ □□COM□□C□□C□□□M□C□□□C□□□	□ □ M□□	□ □ □□□□□□□□□□□□□

19. ACTAS DE SEGUIMIENTO DESARROLLADAS EN EL PERIODO

OBJETO	FECHA

20. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026 **CONTRATISTA CONSORCIO COCO**

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]


CIV 6000528 ESPACIO PUBLICO – KR 55A ENTRE DG 52B SUR Y TV 44 BARRIO VENECIA.

- **ESPACIO PÚBLICO TERMINADO EN CONCRETO DE ACUERDO CON LOS DISEÑOS, DIMENSIONES, NIVELES, PENDIENTES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO.**

	
ESPACIO PÚBLICO TERMINADO EN CONCRETO	**ESPACIO PÚBLICO TERMINADO EN CONCRETO**

CIV 6000580 ESPACIO PUBLICO – KR 54B ENTRE DG 52B SUR Y TV 44 BARRIO VENECIA

- **ESPACIO PÚBLICO TERMINADO EN CONCRETO DE ACUERDO CON LOS DISEÑOS, DIMENSIONES, NIVELES, PENDIENTES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO.**

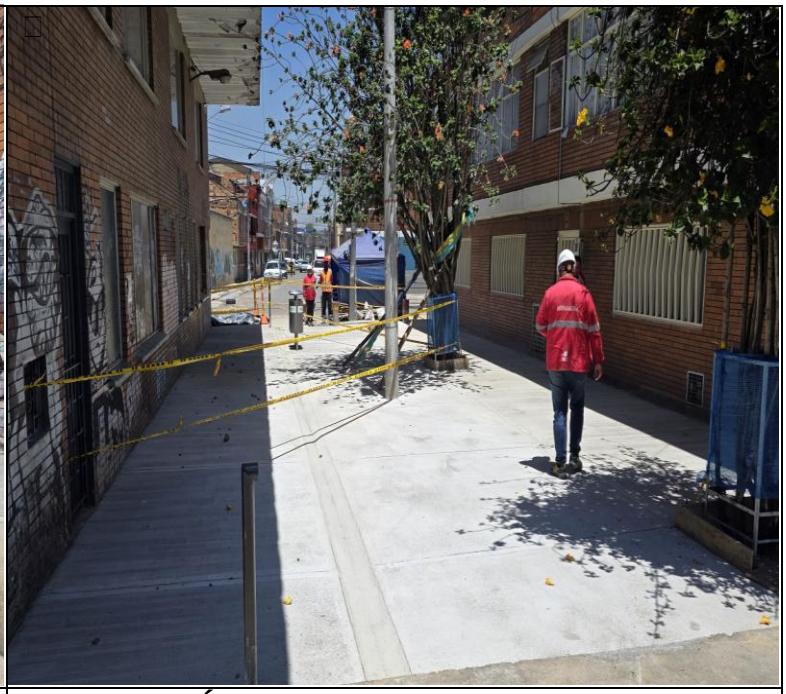	
ESPACIO PÚBLICO TERMINADO EN CONCRETO	**ESPACIO PÚBLICO TERMINADO EN CONCRETO**

CIV 6001200 ESPACIO PUBLICO – KR 25 ENTRE CL 52B SUR Y CL 54 SUR BARRIO TUNAL ORIENTAL

- **ESPACIO PUBLICO TERMINADO EN CONCRETO ESTAMPADO DE ACUERDO CON LOS DISEÑOS, DIMENSIONES, NIVELES, PENDIENTES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO.**

	
CONCRETO CONFORMADO CONCRETO CONFORMADO	CONCRETO CONFORMADO CONCRETO CONFORMADO

CIV 6001013 VIA – CL 46C SUR ENTRE KR 26 Y KR 27 BARRIO SAMORE.

- **VÍA TERMINADA EN PAVIMENTO FLEXIBLE, ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN DE NIVELES, ESPESORES, PENDIENTES Y ACABADO FINAL, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE DE RODADURA UNIFORME, SEGURA Y FUNCIONAL.**

	
RM D M O	RM D M O

CIV 6000857 VIA – CL 53A SUR ENTRE KR 33A Y KR 34 BARRIO SAN VICENTE FERRER.

- **VÍA TERMINADA EN PAVIMENTO FLEXIBLE, ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN DE NIVELES, ESPESORES, PENDIENTES Y ACABADO FINAL, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE DE RODADURA UNIFORME, SEGURA Y FUNCIONAL.**



RM D M O



RM D M O

	AHLA SHUGL INTERNATIONAL SAS **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** **No. 6** **DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026**	

CIV 6001206 ESPACIO PUBLICO – KR 25 ENTRE CL 52B SUR Y CL 54 SUR BARRIO TUNAL ORIENTAL

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]



[illegible]



[illegible]

[illegible]

CIV 6000372 VIA – CL 50ª SUR ENTRE TV 44 Y KR 38 BARRIO FATIMA.

- [illegible]



[illegible]



[illegible]

CIV 6000389 VIA – KR 38 ENTRE CL 50ª SUR Y CL 50B SUR BARRIO FATIMA.

- [illegible]



[illegible] CONDICIONES [illegible]



[illegible] CONDICIONES [illegible]

CIV 6000557 VIA – CL 50ª SUR ENTRE KR 36A Y KR 37 BARRIO FATIMA.

- □D□□ o□c□□□d□□r□□□□d□□□□□□□□r□□□□□r d□ □□□o□□□□□□□□o□□□□□ □□o□□ d□□□d□□d□□c□rdo□□□□□□□c□c□o□□□d□□ro□c□o□□

- □□□□□c□□d□□□ □□c□□d□□□ □□r□□□r□□□r□R□□ □□□□□cor□or□do□□□d□□o□ □□□do□□□co□□c□□ □□o□□□□do□□c□c□o□□□□□□□cd□□□□□d□□□o□co□□□□□ d□co□or□ □r□□□□□□□□r□□□r□c□r□d□□□□□ □□o□

□

	
□□□□□C□O□D□M□R□□R□□□R□ □□□□□□□□DO□	D□MO□C□□R□□□D□□□□□□□□□□ □□D□□□□□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□


CIV 6000786 VIA – CL 49ª SUR ENTRE KR 31 Y KR 33 BARRIO SAMORE

- [illegible]

- [illegible]



[illegible]

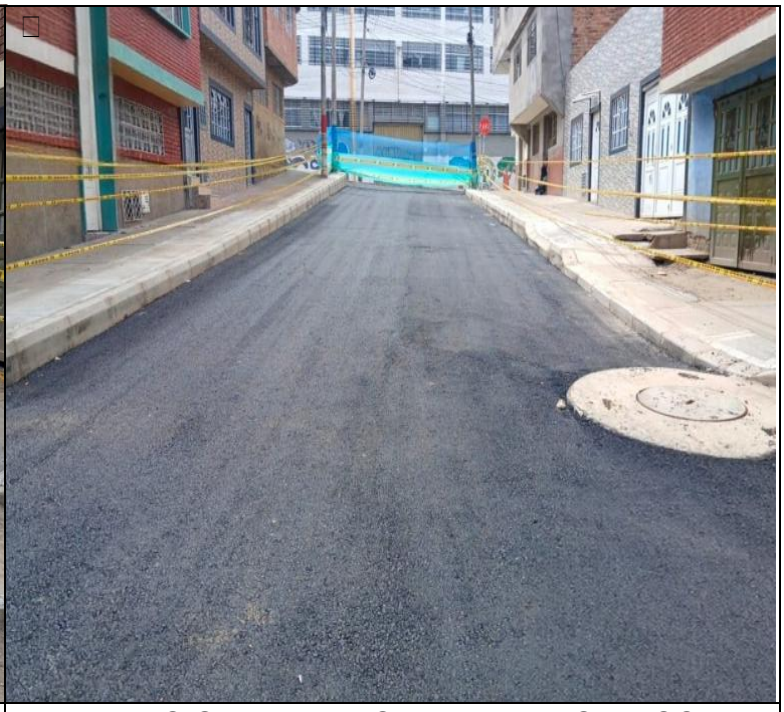

[illegible]

CIV 6000830 VIA – KR 34 ENTRE CL 54 SUR Y CL 54ª SUR BARRION SAN VICENTE FERRER.

- Co r cc d c rc o d ro cc r d d dr r co r o c r



CO R CC D C RC MO D RO CC



CO R CC D C RC MO D RO CC

21. CONCLUSIONES

- D r co o c co r r d ro c o co o c c r r c o r o d co d ro o d r o o r c o r or do or D

- D c rdo co c d d d o r ro r d d c orc c c do d c r r or o do c c c c ro r do ro do

- od c d d r d dr ro do ro c d do c o d r d c d d or o d d co r do co odo o o d c d d ro do r co r o

- **CONSORCIO COCO** **$ 144.438.690** **$ 43.331.607** **$ 101.107.083.**
- **CONSORCIO COCO**

ANEXOS

- **ANEXO 1:**
- **ANEXO 2:**
- **ANEXO 3:**
- **ANEXO 4:**
- **ANEXO 5:**
- **ANEXO 6:**

ANEXO 1: ACTA DE COBRO No 6 CIN 652 DEL 2025.

ACTA DE PAGO PARCIAL INTERVENTORÍA

DATOS DEL CONTRATO	
NO. CONTRATO	652-2025
OBJETO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"
CONTRATISTA	AHLA SHUGL INTERNATIONAL SAS
VALOR	$ 636.794.760,00
ANTICIPO	NO APLICA
PLAZO	8 MESES
FECHA DE INICIO	17 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE AGOSTO DE 2026
APOYO A LA SUPERVISIÓN	VALENTINA MARTÍNEZ MUÑOZ - DIEGO CABALLERO ROJAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No.		CONTRATO INICIAL
VALOR VARIABLE	50,00%	$ 318.397.380
VALOR FIJO GLOBAL	40,00%	$ 254.717.904
LIQUIDACION	10,00%	$ 63.679.476
VALOR TOTAL CONTRATO INTERVENTORÍA (IVA incluido)	**100,00%**	**$ 636.794.760**

VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA	$ 6.795.537.201

INTERVENTORÍA FRENTE:	VALOR FACTURADO CONTRATO DE OBRA	% DE FACTURACIÓN	VALOR VARIABLE DE FACTURACIÓN INTERVENTORÍA		
			SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
ACTA DE PAGO No. Xxx	$ 144.438.690	2,13%	$ 5.686.987	$ 1.080.528	$ 6.767.515

		VALOR PROGRAMADO		VALOR PRESENTE ACTA			VALOR ACUMULADO		
Acta	Periodo	Valor fijo (40%)	Valor Variable (50%)	Valor fijo (40%)	Valor Variable (50%)	Vr. Total.	Valor fijo (40%)	Valor Variable (50%)	Vr. Total.
1	17 DIC DEL 2025 AL 16 ENERO DE 2026	$ 31.839.738		$ 31.839.738		$ 31.839.738	$ 31.839.738	$ -	$ 31.839.738
2	16 ENERO A 17 FEB DE 2025	$ 31.839.738	$ -	$ 31.839.738		$ 31.839.738	$ 63.679.476	$ -	$ 95.519.214
3	17 DE FEB AL 16 DE MAR 2026	$ 31.839.738	$ 28.451.420	$ 31.839.738	$ 28.451.420	$ 60.291.158	$ 95.519.214	$ 28.451.420	$ 123.970.634
4	17 DE MARZ AL 16 DE ABRIL 2026	$ 31.839.738	$ 50.915.372	$ 31.839.738	$ 50.915.372	$ 82.755.110	$ 127.358.952	$ 79.366.792	$ 206.725.744
5	17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO 2026	$ 31.839.738	$ 81.566.740	$ 31.839.738	$ 81.566.740	$ 113.406.478	$ 159.198.690	$ 160.933.532	$ 320.132.222
6	17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2026	$ 31.839.738	$ 6.767.515	$ 31.839.738	$ 6.767.515	$ 38.607.253	$ 191.038.428	$ 167.701.047	$ 358.739.475
7		$ 31.839.738							
8		$ 31.839.738							
	LIQUIDACIÓN 10%	$ 63.679.476							
	TOTAL VALOR FIJO	**$ 318.397.380**		**$ 191.038.428**		**$ 358.739.475**	**$ 191.038.428**		**$ 358.739.475**
	TOTAL VALOR VARIABLE		**$ 167.701.047**		**$ 167.701.047**			**$ 167.701.047**	
			$ 486.098.427						

APROBADO APOYO A LA SUPERVISIÓN

NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Valentina Martinez

FIRMA

APROBADO CONTRATISTA

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

ANEXO 2: ACTAS DE COMITE.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Seguimiento al COP 613-2025 Compté N° 22		
Fecha:	3 Junio 2026	**Hora de inicio:** 2:00pm	**Modalidad:** X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Lugar:	FDLT	**Hora de finalización:** 3:00pm	
Dependencia:	Infraestructura	**Nombre del Responsable:** Diego Caballero	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1014264950	Valentina Martine Munoz	—	FDLT / Infraestructura			X						X	Valentina.martinez@gobo...	Valentina M
CC	30.321.513	Angela P. Castro	Consorcio Coco	Coco			X							gerente.proyectos.proco@gmail.com	
CC	98.388.477	Javier H. Castro	Consorcio Coco	Coco			X						X	direccion.tunjuelito.vias@gmail.com	
CC	1081145002	Hernan David Bermudez	Consorcio Coco	Coco			X						X	ambiental.tunjuelito.vias@gmail.com	David B.
CC	79.792.630	Misael Polido Guzman	Interventoria	Interventoria										cinfraestructura@gmail.com	
CC	1026579185	Diego Caballero R.	FDLT	FDLT			X						X	diego.caballero@gob	
CC	52328935	Martha Liliana Triana	Consorcio Coco	Contratista.			X							social.tunjuelito@gmail.com	M.
CC	1026586965	SANDRA P. SIERRA O	CONSORCIO COCO	CONTRATISTA			X							GESTORSOCIAL.TUNJUELITO.VIAS@Gmail.com	SANDRA SIERRA
	79516952	SANTIAGO CARRILLO VARGAS	INTERVENTORIA	Interventoria			X						X	ing.santiagocarrillo@hotmail.com	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; esta página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3347000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://guia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Scanned with CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento al COP 613-2025, en las instalaciones de la alcaldía local, en conjunto contratista, apoyo a la supervisión del FDLT e interventoría

se verifican compromisos del acta anterior se continua con el compromiso N° 1, referente al presupuesto y programación, acta N°3 se cumplio con este compromiso.

Se realiza la presentación por parte del contratista, la cual se anexa a la presente acta.

Por parte del área social se informa, que se continua con las actividades descritas en el plan de gestión social, se programa reunión extraordinaria para el día viernes 5 de junio, se continua con la adecuada instalación de vallas informativas y PSI, se envio aprobación del informe mensual N°5.

Por parte del área SST se cumple con las observaciones brindadas en campo, pendiente entrega planillas para el informe N°5 por parte del área ambiental pendiente entrega de observaciones del informe N°5.

El contratista remite oficio para la adición y prorroga N°1, solicitud de la misma. que esta en revisión por parte de la interventoría

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Realizar Bacheo para los CIV 6000833, 6000870, 6000721	contratista	30 junio 2026

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Scanned with CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Personal contratado

Interventoría

Directo = 15
Indirecto = 1
Mujeres = 8
Menores 28 años = 0

Contratista

Directo = 53
Indirecto = 15
Mujeres = 10
Menores 28 años = 3

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Scanned with CamScanner



CONTRATO DE OBRA
No. 613-2025

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
COMITÉ No 22


Scanned with CamScanner

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATISTA – COP 613 DEL 2025	
Empresa	CONSORCIO COCO
NIT	902.010.258-8
Objeto	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTEMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO.
Valor Total del contrato	$6.795.537.201
Acta de Iniciación	17 de diciembre de 2025
Fecha de inicio de obra	17 de diciembre de 2025
Fecha de terminación de la obra	16 de agosto de 2026
Tiempo estimado de duración de la obra	8 meses

Scanned with CamScanner


AVANCE DE OBRA

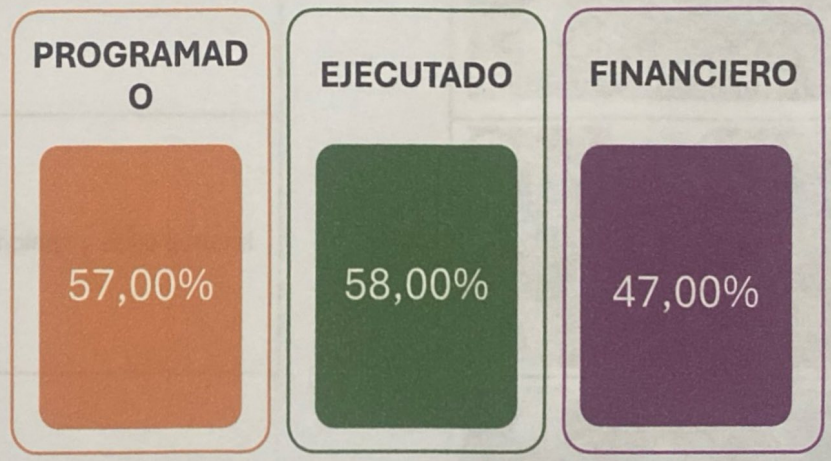

Scanned with CamScanner

ACTIVIDADES

CIV 6001200	INICIO: 24/02/2026 FIN: 26/05/2026
	Retiro de material RCD
	Limpieza y aseo general
	Limpieza y aseo general

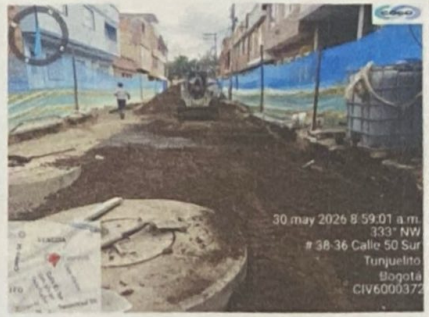CIV 6000372	INICIO: 18/02/2026
	Instalación de geomalla multiaxial
	Instalación y compactación de AR-BG 38 estabilizada con cemento y aditivo iónico
	Instalación y compactación de AR-BG 38 estabilizada con cemento y aditivo iónico

Scanned with CamScanner

ACTIVIDADES

CIV 6000389	INICIO: 30/03/2026
	Instalación y compactación de AR-BG 38 estabilizada con cemento y aditivo iónico .
	Excavación manual para instalación de bordillo
	Instalación de bordillo A-80

CIV 6000557	INICIO: 15/04/2026
	Instalación y compactación de AR-BG 38 estabilizada con cemento y aditivo iónico
	Instalación de bordillo A-80
	Instalación de bordillo A-80

Scanned with CamScanner

ACTIVIDADES

CIV 6000786	INICIO: 20/04/2026
	Instalación de malla multiaxial
	Excavación para sardinel
	Descargue de sardinel A-10

CIV 6000830	INICIO: 14/05/2026
	Excavación para red residual e instalación de tubos Novafort de 8" y domiciliarias de A.N.
	Excavación para red residual e instalación de tubos Novafort de 8" y domiciliarias de A.N.
	Excavación para red residual e instalación de tubos Novafort de 8" y domiciliarias de A.N.

Scanned with CamScanner

Componente Social

- Se atiende PQR`S de los tramos 6000372, 6000389, 6000857 donde la comunidad manifiesta su inconformidad con los tiempos, se programa reunió extraordinaria para el viernes 5 de junio.
- Se realiza actualización de las vallas informativas y puntos satélite de información en los segmentos viales en ejecución.
- Se realiza acercamiento con la comunidad, del tramo 6000857, quienes tienen pregunta con respecto a rampas de acceso.
- A la fecha se tienen 5 PQRS recibidas y 4 cerradas, no se tienen actas de compromiso.
- Se cumple con la contratación de 44.4% MONC local y 13.8% personal femenino.





Scanned with CamScanner

Componente SST

Se realizó inducción al personal de nuevo ingreso en punto crea.

Se realizó entrega de dotación y EPP al personal de nuevo ingreso en punto crea.

Se realizó reposición de EPP en el frente de obra CIV 6000857.

Se realizó inspección de actividades en obra en el frente de obra CIV 6001200.


Se realizó instalación de señalización de áreas que representan riesgos en el frente de obra CIV 6000857.

Se realizó instalación de señalización en el frente de obra CIV 6000830.







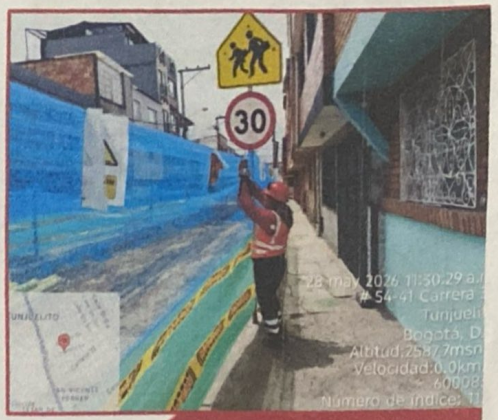

Scanned with CamScanner

Componente Ambiental

Cumplimiento de la normatividad ambiental vigente referente a la disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), la circularidad de residuos y la correcta disposición de vertimientos provenientes de los baños.



Inspección actividades ambientales CIV 6001200.



Inspección de frentes de obra CIV´S 6001200-6000372.



Mantenimiento a cerramiento en el frente de obra CIV 6000857.



Orden y aseo en los frentes de obra CIV´S 6001013-6000786.



Protección de sumideros en los frentes de obra CIV´S 6000372-6000389.





Scanned with CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Seguimiento al COP 613-2025 Comité No 23			
Fecha:	10 de junio de 2026	**Hora de inicio: 9:00 am**	**Modalidad:**	**Presencial**
Lugar:	Virtual	**Hora de finalización: 10:00 am**		**Virtual X**
Dependencia:	Infraestructura	**Nombre del responsable: Diego Caballero**		**Telefónica**
				Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
CC	1014264950	Valentina Martínez Muñoz	N/A	FDLT/Infraestructura			X						X	valentinamartinez@gobiernobogota.gov.co	
CC	79518952	Santiago Carrillo Vargas	N/A	Interventoría			X						X	cintunjuelito@gmail.com	
CC	79797630	Misael Pulido Guzmán	N/A	Interventoría			X						X	cintunjuelito@gmail.com	
CC	1081145002	Hernán David Bermúdez	N/A	Contratista			X						X	ambientaltunjuelitovias@gmail.com	
CC	52328935	Martha Liliana Triana	N/A	Contratista			X						X	contratotunjuelito@gmail.com	
CC	37327329	Edna Ruth Casadiego	N/A	Interventoría			X						X	cintunjuelito@gmail.com	
CC	52843440	Marcela Mendoza	N/A	Interventoría			X						X	cintunjuelito@gmail.com	
CC	80229640	Erikson hernian Gutiérrez	N/A	Contratista			X						X	Sss.tunjuelitovias@gmail.com	
CC	52281375	Adriana Gutiérrez	N/A	Interventoría			X						X	cintunjuelito@gmail.com	
CC	98588497	Javier Castro	N/A	Contratista			X						X	contratotunjuelito@gmail.com	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento al COP 613-2025 de manera virtual, en conjunto contratista, apoyo a la supervisión del FDLT e interventoría, se realiza lectura del acta anterior.

Referente a los compromisos, del comité anterior se continua con el compromiso de bacheos el cual tiene fecha de 30 de junio, por parte del contratista se esta realizando el avance y verificación para los mismos, por parte de la Ing. Valentina solicita realizar recorrido el día de mañana 9 am para verificar estos bacheos y sus alcances.

Se realiza la presentación del comité por parte del contratista referente a las diferentes áreas, la cual se anexa a la presente acta.

Por parte del área ambiental y SST de la interventoría se informa que se recibieron dos cambios de hojas de vida, por parte del área SST fue aprobada la del área social se enviaron observaciones, se encuentra pendiente planilla de seguridad social de los informes No 4 y No 5, durante los recorridos de obra se encuentra la adecuada instalación de cerramientos, kit de emergencias menores, carpa y unidades sanitarias.

Por parte de área social se informa que se continua con la atención a la comunidad, se tienen instalados los PSI y vallas informativas en cada frente de obra en ejecución, se programan veedurías ciudadanas y capacitaciones sociales para la siguiente semana, se realizó reunión extraordinaria en el CIV 6000372.

Personal contratado por parte del contratista:
Directo: 53
Indirecta: 15
Mujeres: 10
Menores de 28 años: 3


Personal contratado por parte de la interventoría:
Directa: 15
Indirecta: 1
Mujeres: 8
Menores de 28 años: 0


La Ing. Valentina solicita realizar el cargue del SECOP de las cuentas del mes de abril de parte de la interventoría y el contratista; el Ing. Santiago de la interventoría manifiesta que se subirá la información el día de hoy.


COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Realizar bacheo para los CIV 6000833, 6000870, 6000721	Contratista	30 de junio de 2026
2	Entrega de planillas de seguridad social del informe No 4	Contratista	12 de junio de 2026
3	Entrega de planillas de seguridad social del informe No 5	Contratista	17 de junio de 2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO

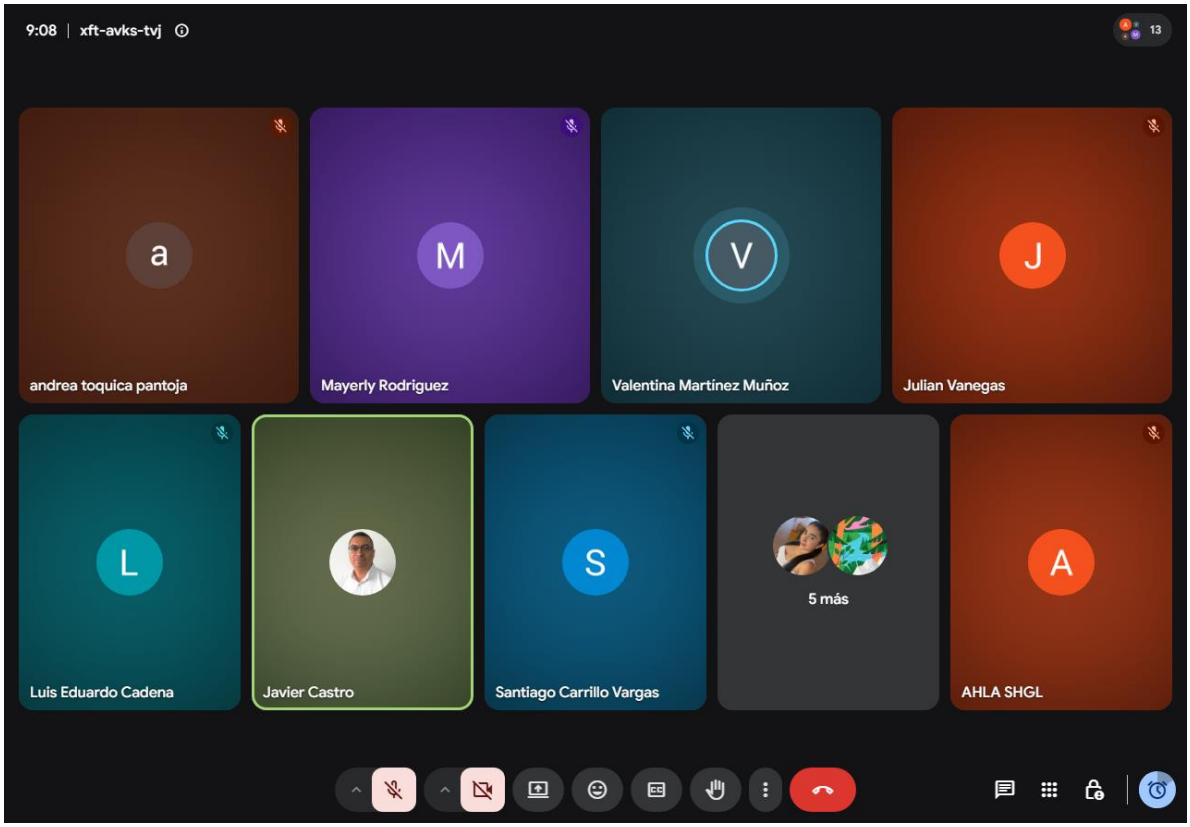

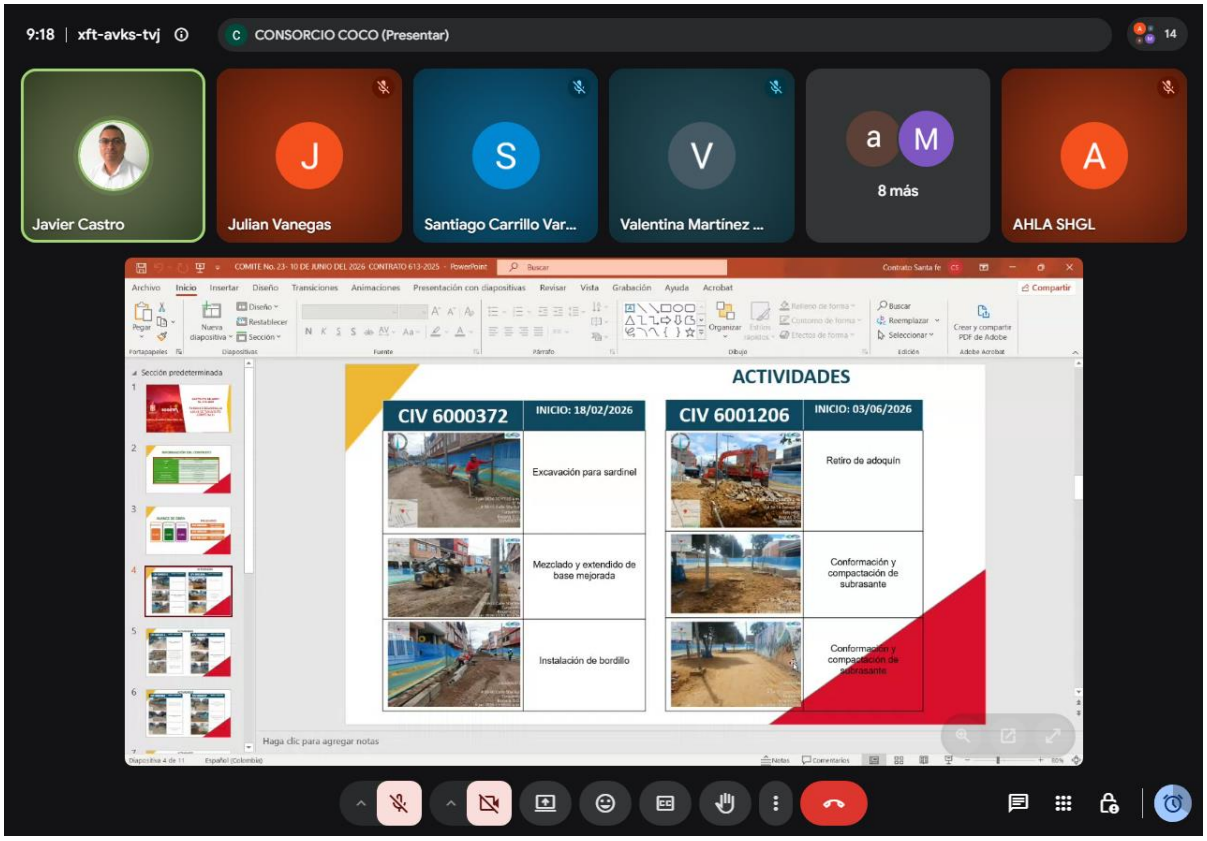
9:18 | xft-avks-tvj
CONSORCIO COCO (Presentar)
14
Javier Castro
Julian Vanegas
Santiago Carrillo Var...
Valentina Martínez ...
8 más
AHLA SHGL
ACTIVIDADES
CIV 6000372
INICIO: 18/02/2026
CIV 6001206
INICIO: 03/06/2026
Excavación para sardinel
Mezclado y extendido de base mejorada
Instalación de bordillo
Retiro de adoquín
Conformación y compactación de subrasante
Haga clic para agregar notas

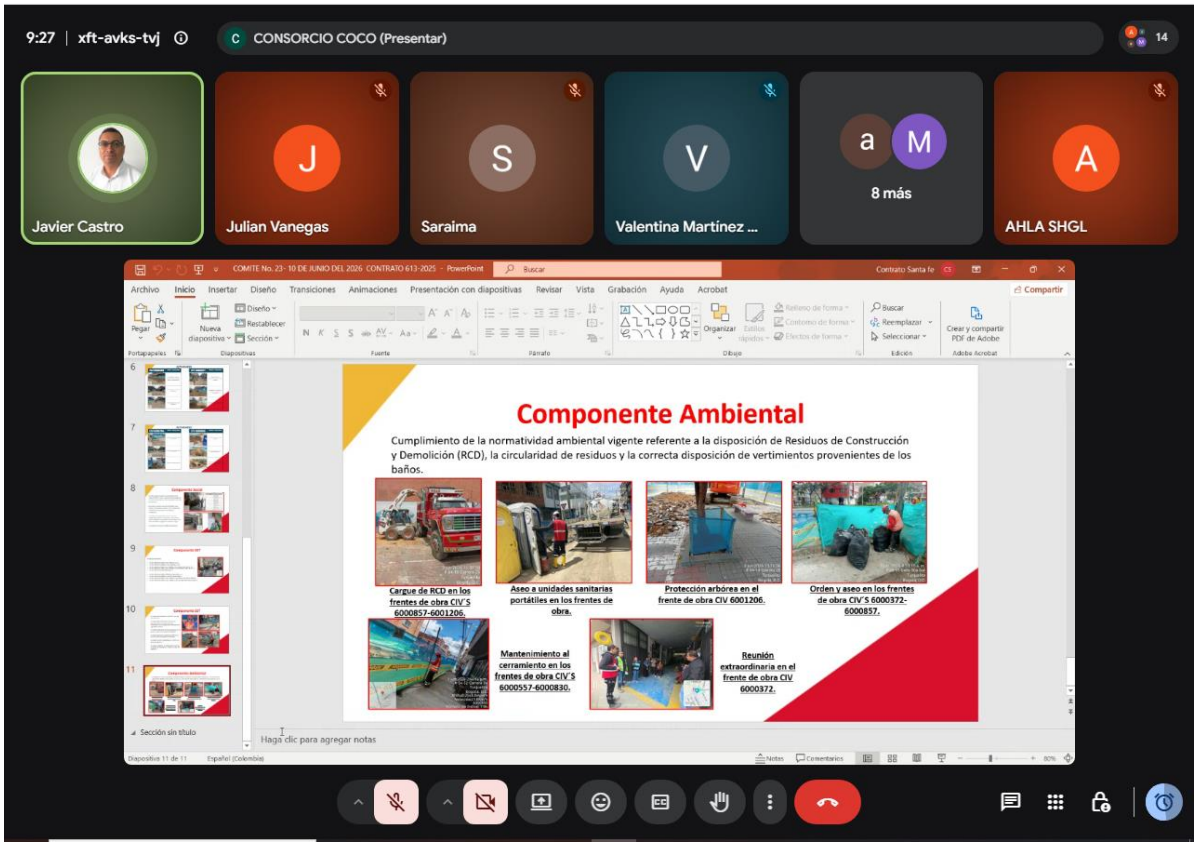
9:27 | xft-avks-tvj
CONSORCIO COCO (Presentar)
14
Javier Castro
Julian Vanegas
Saraima
Valentina Martínez ...
8 más
AHLA SHGL
Componente Ambiental
Cumplimiento de la normatividad ambiental vigente referente a la disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), la circularidad de residuos y la correcta disposición de vertimientos provenientes de los baños.
Cargue de RCD en los frentes de obra CIV´S 6000857-6001206.
Aseo a unidades sanitarias portátiles en los frentes de obra.
Protección arbórea en el frente de obra CIV 6001206.
Orden y aseo en los frentes de obra CIV´S 6000372-6000857.
Mantenimiento al cerramiento en los frentes de obra CIV´S 6000557-6000830.
Reunión extraordinaria en el frente de obra CIV 6000372.
Haga clic para agregar notas



CONTRATO DE OBRA No. 613-2025

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO COMITÉ No 23

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATISTA – COP 613 DEL 2025	
Empresa	CO□□ORC□O□COCO
NIT	□□□□□□□□□□□□□□
Objeto	□□□C□□□R□□□MO□□O□□□O□□□□□□□□OR□□□□□□□□M□□D□□□R□C□O□□□□□□R□O□□□ □□□□□C□□□□D□D□□□□□R□□□□□CO□□□□R□CC□□□□□□O□CO□□□R□□C□□□□□O□ M□□□□□□M□□□□O□□□O□R□□□□□□□□□C□□□D□□□□□M□□□□□□□□□□OC□□□□□ □□□□M□D□□□□□□□□□C□O□□□□□□CO□□□O□R□□□COM□□□M□□□R□□□□□□□□□ □OC□□□D□D□D□□□□□□□□□□□O□
Valor Total del contrato	□□□□□□□□□□□□□□□
Acta de Iniciación	□□d□d□c□□ □r□d□□□□□□
Fecha de inicio de obra	□□d□d□c□□ □r□d□□□□□□
Fecha de terminación de la obra	□□d□□□o□o□d□□□□□□
Tiempo estimado de duración de la obra	□□□ □□□□

AVANCE DE OBRA


PROGRAMADO	EJECUTADO	FINANCIERO
57,00%	58,00%	47,00%

FINALIZADOS

CIV 6000580	INICIO: 09/02/2026 FIN: 17/03/2026
CIV 6000528	INICIO: 19/02/2026 FIN: 05/03/2026
CIV 6001200	INICIO: 24/02/2026 FIN: 26/05/2026

ACTIVIDADES

CIV 6000372	INICIO: 18/02/2026
	□□c□□□c□□□□□□r□□□□rd□□□□
	M□□c□□do□□□□□□□□d□do□d□□ □□□□□□□ □□or□d□
	□□□□□□□c□□□d□□□ord□□o

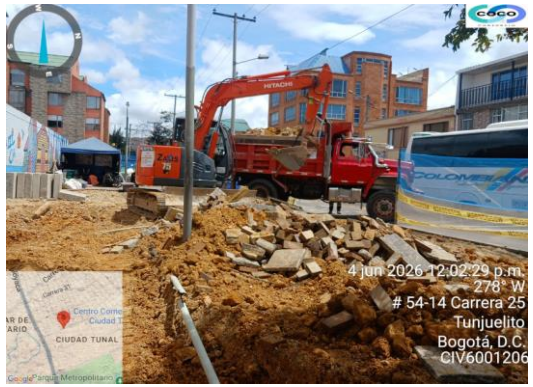CIV 6001206	INICIO: 03/06/2026
	R□□ro□d□□□do□□□□
	Co□□or□ □c□□□□□□ co□ □□c□□c□□□d□□ □□□r□□□□□□
	Co□□or□ □c□□□□□□ co□ □□c□□c□□□d□□ □□□r□□□□□□

ACTIVIDADES

CIV 6000389	INICIO: 30/03/2026
	□ □□ □c□□c□□□□□ □□□r□□□□ □r□□□□□r□□□□□□□ □□or□d□□□ c□r□o□□□co□ □□c□□c□□□
	Co□ □□c□□c□□□□d□□□□□□□□ □ □□or□d□
	Co□ □□c□□c□□□□d□□□□□□□□ □ □□or□d□

CIV 6000557	INICIO: 15/04/2026
	□□ □o□□□□□do□□□ □□c□□□c□□□□□r□□□ord□□o□ □□rd□□□□
	□or□ □□□□□□□□□□□□□d□d□d□□ □o□ □ro□□□□r□□ □□□□ □□□c□□r□□□
	□□□□□□□c□□□d□□□ord□□o□□□□□

ACTIVIDADES

CIV 6000786	INICIO: 20/04/2026
	□□□□□□□c□□□□□□□□ □o□□□□□do□ d□□□□rd□□□□
	□□□□□□□c□□□□□□□□ □o□□□□□do□ d□□□□rd□□□□
	C□r□o□d□□□□□□□□ □□or□d□

CIV 6000830	INICIO: 14/05/2026
	Co□□r□cc□□□□o□o□r□d□ r□□d□□□
	□□c□o□□□□□c□o□□r□cc□□□□ d□□□o□o□r□d□□□□
	Co□□r□cc□□□d□c□□□□□□□ d□□□o□o□□□□o□d□□□□r□d□ □□□□

Componente Social

- Se lleva acabo la reunión extraordinaria en el tramo 6000372, donde se presenta la participación de diez (10) ciudadanos de la comunidad y siete (7) profesionales.

- A la fecha se cuenta con cinco (5) PQR`S de las cuales se encuentras cerradas y dos (2) Derecho de Peticiones atendidas en los términos establecidos.

- Se realiza el levantamiento de dos actas de compromiso, donde se le informa al ciudadano que al terminar las actividades constructivas en el tramo 6000857, se pagara el medidor de agua.


- Se mantiene los Puntos Satélites Actualizados



Tabla 5. Consolidado PQR'S

No	NOMBRE DEL CIUDADANO	MEDIO DE REGISTO /PRESENCIAL/VIRTUAL/TELEFONICO	TIPO DE SOLICITUD	DESCRIPCION	FECHA APERTURA	FECHA DE CIERRE
1	Roberto Ortega	Virtual	Solicitud	De acuerdo a la notificación remitida por el ciudadano por vía virtual el sábado 28 de febrero del 2026, donde manifiesta el incumplimiento del levantamiento del acta de vecindad. El área social le aclara al ciudadano que el día sábado solo se realizaría dicha acta dependiendo de la disponibilidad del componente de actas. Aun así, se le informa que lo mas seguro es que el día domingo 01 de marzo del presente año le realizarían el levantamiento de acta. El día 01 de marzo del 2026, el Componente social se comunica telefónicamente con el ciudadano, quien manifiesta que le están realizando el acta	28 de febrero del 2026	03 de marzo 2026
2	Tatiana Sanabria	Virtual	Queja	Ciudadana por vía correo electrónico manifiesta su queja por le no inicio de obra, programado para el día 09 de marzo, se responde a la ciudadana que el incumplimiento es por motivos que no reciben los materiales en los botaderos, por motivos de fuertes lluvias durante la semana, estos se encuentran cerrados. De igual importancia se le aclara que el inicio de obra se programo para el 16 de marzo del 2026	11 de marzo del 2026	16 de marzo del 2026
3	Jorge Carlio	Presencial	Queja	Ciudadano manifiesta que romperá la [illegible] y el cerramiento que queda frente a su restaurante o al lado de su restaurante, se hace acercamiento con policía se levanta el acta de atención ciudadana.	30 de marzo del 2026	30 de marzo del 2026
4	Dayra Oliveros	Virtual	Queja	Ciudadana manifiesta que la red de acueducto frente a su predio presenta una fuga y no tiene servicio de agua, así presenta una fuga de agua en el tramo que se está interviniendo. Para el día 29 de abril se dio respuesta al ciudadano con el número de oficio,	22 de abril del 2026	04 de mayo del 2026
TOTAL						4

Fuente: Elaboración propia

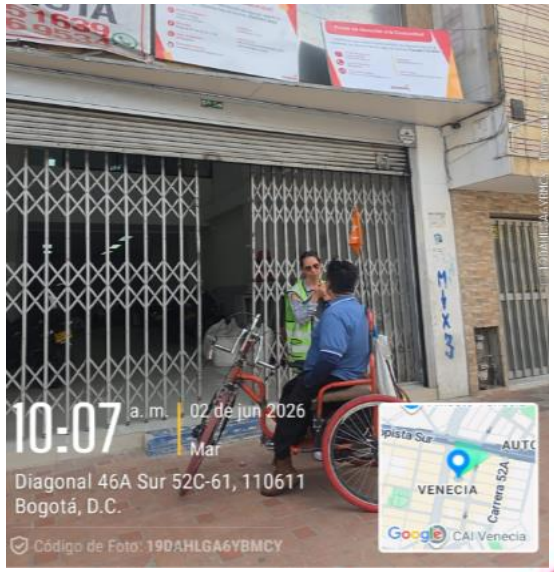




Componente SST

TOTAL DE EMPLEOS:

- TOTAL EMPLEOS DIRECTOS CONTRATO: **53**
- TOTAL EMPLEOS INDIRECTOS CONTRATO: **15**
- TOTAL EMPLOS DIRECTOS E INDIRECTOS MUJER CONTRATO: **10**
- TOTAL EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS JÓVENES CONTRATO: **3**
- TOTAL EMPLEOS DISCAPACIDAD: **1**

- TOTAL EMPLEOS DIRECTOS INTERVENTORIA: **15**
- TOTAL EMPLEOS INDIRECTOS INTERVENTORIA: **1**
- TOTAL EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS MUJER INTERVENTORIA: **8**
- TOTAL EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS JOVENES INTERVENTORIA: **0**

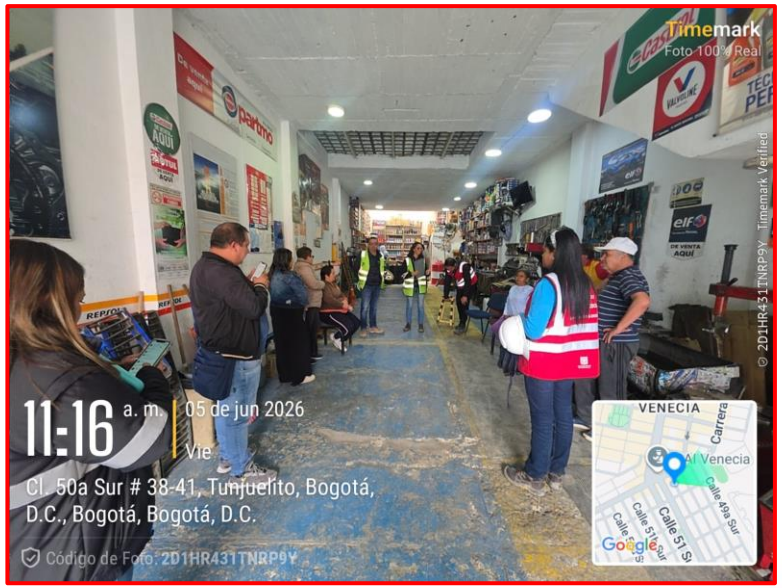

Componente SST

Se realizó desmantelamiento del frente de obra CIV 6001200.

Se realizó apertura del frente de obra CIV 6001206 donde se instaló carteleras informativas, kit de emergencias, señalización de seguridad industrial.

Se realizó señalización de áreas peligrosas en los frentes de obra CIV´S 6000372-6000857.

Se realizó reposición de dotación y EPP en los frentes de obra CIV 6000372-6000830.

Se realizó reunión extraordinaria en el frente de obra CIV 6000372.

Se realizó instalación de señalización preventiva de acopio de materiales en el frente de obra CIV 6000372.









Componente Ambiental

Cumplimiento de la normatividad ambiental vigente referente a la disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), la circularidad de residuos y la correcta disposición de vertimientos provenientes de los baños.



Cargue de RCD en los frentes de obra CIV´S 6000857-6001206.



Aseo a unidades sanitarias portátiles en los frentes de obra.



Protección arbórea en el frente de obra CIV 6001206.



Orden y aseo en los frentes de obra CIV´S 6000372-6000857.



Mantenimiento al cerramiento en los frentes de obra CIV´S 6000557-6000830.



Reunión extraordinaria en el frente de obra CIV 6000372.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Seguimiento al COP 613-2025 Comité Nº 24				
Fecha:	18 junio de 2026	**Hora de inicio: :**	1:40 pm	**Modalidad:**	X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Lugar:	Alcaldía local	**Hora de finalización:**	2:30 pm		
Dependencia:	Infraestructura.	**Nombre del Responsable:**	Diego Caballero		

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO- TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
	79797530	Misael Polido Guzman		Interventoría										3227822292	
	80'128761	Luis Eduardo Cadena		Consorcio Coco										3015384752	
	3032193			Cons Coco										3107223807	
CC	91'477.482	Mario Santamaría		Consorcio CoCo										3108185814	
	1014264950	Valentina Martínez M		FDLT / Infraestr											Valentina M
CC	1068869160	Sarahi Sierra Ortiz		Consorcio Coco										3128937518	Sarahi Sierra
CC	1081145002	Hernan David Bermudez		Consorcio CoCo										3127010017.	David Bermudez
CC	53134703	Mayerly Venegas.		Consorcio COC										300392 6406	Mayerly
	37827.379	Edna Caballero		Interventoría										3123430763	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gau.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Seguimiento al COP 613-2025 Comité N° 24				
Fecha:	18 junio de 2026	**Hora de inicio: :** 1:00 pm	**Modalidad:**	X Presencial	
Lugar:	Alcaldía local	**Hora de finalización:** 2:30 pm		Virtual	
Dependencia:	Infraestructura	**Nombre del Responsable:** Diego Caballero		Telefónica	
				Mixta	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
cc	52281375	Adriana Gutierrez	—	Interventoría			X						X	cinturelito 6 gmail.com	
cc	1024597185	Diego Caballero R	—	FDLT			X						X	diego.caballero@gobiernobog.gov.co	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

Se da inicio al comité de seguimiento al CDP 613-2025, en contento contratista, apoyo a la supervisión del fondo e interventoría, en las instalaciones de la alcaldía local.

Se realiza verificación de los compromisos anteriores, se generan nuevas fechas

El contratista realiza la presentación por áreas de las actividades realizadas, se anexa a la presente acta.

Por parte del área social se informa que se realizaron veeduría ciudadana, el día de mañana, se continua con la atención a la comunidad en el PAC, se tienen instaladas vallas y POI en cada frente de obra.

Por parte del área ambiental y SST se recomienda por parte de la interventoría dar cumplimiento a la implementación del PMT

El ing Diego pregunta por los diseños de demarcación, El ing Misael informa que estan radicados, está pendiente respuesta. por parte de la entidad.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Realizar bacheo para los CIV 6000833, 6000870, 6000721	contratista	30 junio 2026
2	Entrega informe N°4 y N°5 de planillas	contratista	23 junio 2026

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Personal contratado contratista

Directo= 53
Indirecto= 15
Mujeres= 10
Menores > 28 años = 3

Interventoría

Directo= 15
Indirecto= 1
Mujeres= 8
Menores 28 años = 0

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO

CONTRATO DE OBRA No. 613-2025

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO COMITÉ No 24

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATISTA – COP 613 DEL 2025	
Empresa	CONSORCIO COCO
NIT	902.010.258-8
Objeto	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTEMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO.
Valor Total del contrato	$6.795.537.201
Acta de Iniciación	17 de diciembre de 2025
Fecha de inicio de obra	17 de diciembre de 2025
Fecha de terminación de la obra	16 de agosto de 2026
Tiempo estimado de duración de la obra	8 meses

AVANCE DE OBRA

PROGRAMADO	EJECUTADO	FINANCIERO
62,00%	64,00%	51,00%

FINALIZADOS

CIV 6000580	INICIO: 09/02/2026 FIN: 17/03/2026
CIV 6000528	INICIO: 19/02/2026 FIN: 05/03/2026
CIV 6001200	INICIO: 24/02/2026 FIN: 26/05/2026


ACTIVIDADES

CIV 6000372	INICIO: 18/02/2026
	Emboquillado de bordillo y compactación de bordes para reparación de andenes
	Mezclado, extendido y compactación de basa mejorada
	Humectación de material granular

CIV 6001206	INICIO: 03/06/2026
	Retiro de sardinel existente, instalación de bordillo A-80.
	Instalación de bordillo
	Instalación de bordillo

ACTIVIDADES

CIV 6000389	INICIO: 30/03/2026
	Demolición de pozo de la red pluvial y de la red residual
	Construcción de pozos de inspección en la intersección calle 50Asur con KR 38
	Construcción de pozos de inspección en la intersección calle 50Asur con KR 38

CIV 6000557	INICIO: 15/04/2026
	Excavación para bordillo sardinel
	Instalación de bordillo A80 y A85
	Instalación de bordillo A80 y A85

ACTIVIDADES


CIV 6000786	INICIO: 20/04/2026
	Ceréo de base mejorada
	Limpieza manual del área de trabajo
	Limpieza manual del área de trabajo

CIV 6000830	INICIO: 14/05/2026
	Se continúa construcción de pozo red residual
	Inicio construcción cárcamo
	Se continúa construcción de Cárcamo

Componente Social

- Se realiza la entrega del volante de reunión a veeduría en el Colegio Ciudad Bogotá. Dicha reunión se llevara acabo el día viernes a las 10:30 de la mañana.
- A la fecha se cuenta con cinco (5) PQR`S de las cuales se encuentras cerradas, dos (2) Derecho de Peticiones atendidas en los términos establecidos, se atiende un Derecho de petición del señor Edgar Patiño.
- Se realiza recorrido de obra, se realiza un refuerzo a los predios que tienen bajantes de aguas lluvias para ubicarlos en escorrentía CIV 6000557 y 600857
- Se mantiene los Puntos Satélites actualizados con el comité de veeduría segmento 6001206





Componente SST

TOTAL DE EMPLEOS:

- TOTAL EMPLEOS DIRECTOS CONTRATO: **53**
- TOTAL EMPLEOS INDIRECTOS CONTRATO: **15**
- TOTAL EMPLOS DIRECTOS E INDIRECTOS MUJER CONTRATO: **10**
- TOTAL EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS JÓVENES CONTRATO: **3**
- TOTAL EMPLEOS DISCAPACIDAD: **1**

- TOTAL EMPLEOS DIRECTOS INTERVENTORIA: **15**
- TOTAL EMPLEOS INDIRECTOS INTERVENTORIA: **1**
- TOTAL EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS MUJER INTERVENTORIA: **8**
- TOTAL EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS JOVENES INTERVENTORIA: **0**



Componente SST

Se realizó capacitación sobre accidentes e incidentes de trabajo en los frentes de obra.

Se realizó inspección de botiquín y extintor en los frentes de obra CIV'S 6000372-6000389-6000557-6000857-6000830-6001206.


Se realizó inspección de maquinaria en el frente de obra CIV 6000372.

Se realizó inspección de dotación el frente de obra CIV 6000372.

Se realizó reposición de EPP en el frente de obra CIV 6000372.

Se realizó instalación de señalización de áreas peligrosas en el frente de obra CIV 6000372.









Componente Ambiental

Cumplimiento de la normatividad ambiental vigente referente a la disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), la circularidad de residuos y la correcta disposición de vertimientos provenientes de los baños.



Capacitación sobre control de contaminación atmosférica



Inspección de kit de derrames en los frentes de obra CIV'S 6000372-6000389-6001206-6000557.



Cargue de RCD en el frente de obra CIV 6000372.



Instalación de protección de sumideros en los frentes de obra CIV'S 6001206-6000557.



Jornada de orden y aseo en el frente de obra CIV 6000557.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F019
Versión: 6
Vigencia: 23 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70105

Objeto de la reunión:	Seguimiento al COP 613-2025 Comité N° 25		
Fecha:	23 Junio 2026	**Hora de inicio::** 8:00am	**Modalidad:** X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Lugar:	FDLT - Alcaldía local	**Hora de finalización:** 12:00am	
Dependencia:	Infraestructura	**Nombre del Responsable:** Diego Caballero	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO- TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	53134703	Maritza Venegas	—	Contratista			X						X	Socialyurelito285@gmail	
CC	1081145002	David Bermudez	—	Contratista			X						X	ombientalyurelitovias @gmail.com	David Bermudez
CC	1067816960	SARAITH SIERRA CHATE	—	CONTRATISTA			X							SST.YURIJUELITOVIAL @Gmail.com	SARAITH SIERRA
CC	91'427.482	Mario Santamaria	—	C.Coco			X							consorciococo@ gmail.com	
CC	1014264950	Valentina Martinez M.	—	FDLT/Infra			X						X	Valentina.martinez @Gobierno	Valentina M.
CC	80128761	Luis Eduardo Cadena	—	C.coco			X						X	consorciococo@ gmail.com	
CC	79'799.630	Misael Polido G.	—	Laboratorio			X						X	contratistas@gmail.	Misael Polido G.
CC	37377379	Edna Casudiego	—	Interventoria			X							contratistas@ gmail.com	
CC	79518950	Santiago Camillov	—	INTERVENTORIA			X						X	Ingsantiagocamilo @hotmail.com	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionado con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; esta página web en www.gobiernobogota.gov.co y en el teléfono de atención en 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en los demandados cruce para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver IAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaa.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Scanned with CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité recosc?do dando seguim?ento al coe 613 2025 en conjunta contratista, apoyo a la supervis?ón del FDLT e interventoria.

Se realiza verificación de los compromisos del comité anterior, se cumple con la entrega de planilla para el informe N°4, se genera nueva fecha para planilla del informe N°5, se realizara revisión tecnica para los bacheos

TRAMOS EN EJECUCIÓN

Tunal Oriental CIV 6001200 pendiente instalar mob?l?ario (sillas concreto) CIV 6001206 excavación manual y mecanica, instalación de bordillos y material estabilizado.

Samore CIV 6001013 se encuentran realizando remates

Por parte del área ambiental de la interventoría se solicita entrega de certificados de RCD y material faltantes para el mes de mayo

San Vicente CIV 6000857 se encuentran haciendo remates CIV 6000786, se realizan frantas de ajustes en andenes, vía con instalación de material estabilizado CIV 6000830 construcción de cacamo de protección para tubería de red pluvial

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Planilla seguridad social informe N°5	contratista	26 junio
2	Entrega de presupuesto ajustado	contratista	1 julio

NOTA 1: Es una de act una reunión virtual se puede anexar elemento de evidencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formulación.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Scanned with CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Fatima CIV 6000557 demolición de crestas de ajuste en andenes instalación segunda capa de material estabilizado en vía. CIV 6000372 instalación de concreto en cintas de ajuste en anderes vía instalación segunda capa estabilizado CIV 6000384 instalación de concreto en cintas de ajuste en andenes vía instalación de segunda capa estabilizado.

Por parte del área ambiental y SST, de acuerdo a los recorridos realizados por los frentes en ejecución se evidencia en buenas condiciones los elementos de emergencia, cerramientos perimetrales en buenas condiciones.

Se realiza recorrido técnico para verificación de los segmentos para ejecución de bacheo: CIV 6000033 intersección CIV 6000721 y para intervención total el CIV 6000859, 6000617, 6000670.

Por parte del área social se verifica durante recorrido de obra la adecuada instalación de vallas informativas y POI se tienen a la fecha no se tienen PQRS abiertas, se realizan capacitaciones y veedurías ciudadanas.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: En caso de no ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formulación.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Scanned with CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Personal contratado

Contratista

Directo = 38
Indirecto = 12
Femenino = 7
Menores 28 años = 3

Interventoría

Directo = 15
Indirecto = 1
Femenino = 8
Menores 28 años = 0


COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:


No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA


NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar cualquier elemento de evidencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formulación.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Scanned with CamScanner



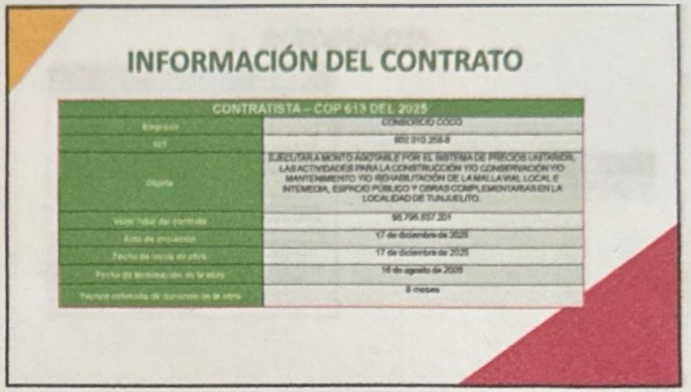

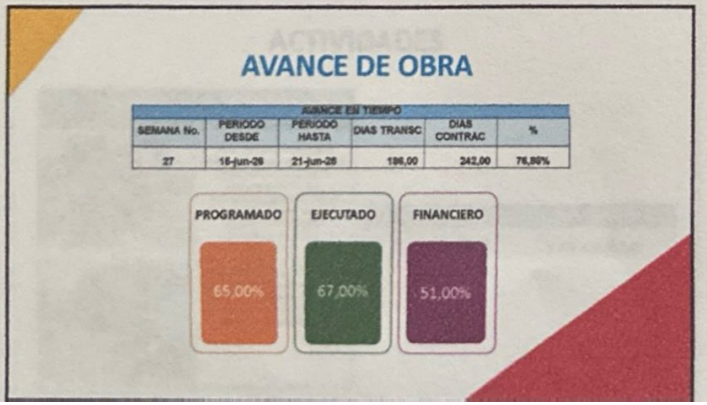

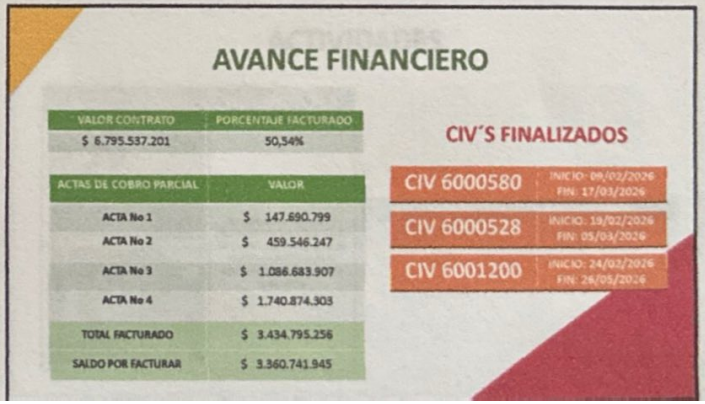

Scanned with CamScanner

ACTIVIDADES

CIV 6000372	ACTIVIDADES





FACTURADO	POR FACTURAR
$ 579.895.516,00	$ 965.008.578,00

ACTIVIDADES

CIV 6001206	ACTIVIDADES





Durante la jornada se registró el arribo de un viaje de mezcla asfáltica tipo A-80 al proyecto. No obstante, el frente de obra no presentó actividades de ejecución durante el día. Las condiciones climáticas se mantuvieron ligeramente nubladas, sin generar afectaciones sobre el área de intervención.

FACTURADO	POR FACTURAR
$ 94.594.827	$251.377.561,00

ACTIVIDADES

CIV 6000389	ACTIVIDADES





Se realizó la colocación de concreto hidráulico de 3.000 psi en las franjas de ajuste de anclenes previamente intervenidas, garantizando el adecuado vertimiento, nivelación, acabado superficial y cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para este tipo de estructura peatonal. Asimismo, se verificaron las condiciones necesarias para asegurar la correcta resistencia y durabilidad del elemento construido.

FACTURADO	POR FACTURAR
$ 287.402.511,00	$ 438.652.757,00

ACTIVIDADES

CIV 6000557	ACTIVIDADES





Se ejecutaron labores de instalación de bordillos tipo A-80 y A-85, adicionalmente se realizaron cortes para la conformación de franjas de separación

FACTURADO	POR FACTURAR
$ 462.395.418	$ 909.390.517,00

Scanned with CamScanner

Componente Ambiental

Cumplimiento de la normatividad ambiental vigente referente a la disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), la circularidad de residuos y la correcta disposición de vertimientos provenientes de los baños.



Acompañamiento a reunión de vecindario en el frente de obra CIV 6001266.



Acompañamiento a reunión de vecindario en el frente de obra CIV 6000837.



Ajuste de cerramiento en el frente de obra CIV 6000372.



Cargue de RCD en el frente de obra CIV 6001206.



Protección de sumideros en los frentes de obra CIV'S 6000837-6000327-6000372.



Orden y aseo en los frentes de obra CIV'S 6000780-6000372.

Scanned with CamScanner

ANEXO 3: INFORMES SEMANALES.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORIA
NO. CONTRATO	C-613-2025	INT-652-2025
OBJETO	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".
CONTRATISTA	Consorcio COCO	AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.
VALOR INICIAL	$6.795.537.201	$ 636.794.760
ADICIÓNES	-	-
VALOR TOTAL	$6.795.537.201	$ 636.794.760
PLAZO	8 Meses	8 Meses
FECHA DE INICIO	17 de diciembre de 2025	17 de diciembre del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	16 de agosto de 2026	16 de agosto del 2026
PRÓRROGAS	-	-
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	16 de agosto de 2026	16 de agosto del 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.	FDLT
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	12	15
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	5	1

SEMANA N. 24 **DEL** 1/6/2026 **AL** 6/6/2026

AVANCES DE OBRA

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Avance físico general	61,00%	47,00%	Aavance físico general	61,00%	47,00%
Avance financiero general	62,00%	47,00%	Avance financiero general	62,00%	47,00%

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITIFICIACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
DOCUMENTACION INCIAL	GLB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	
CRONOGRAMA DEL PROYECTO	GLB	100%	100%	100%	200%	100%	100%	100%	200%	0%	0%	
DOCUMENTOS TECNICOS	GLB	100%	100%	100%	300%	100%	100%	100%	300%	0%	0%	
DOCUMENTOS AMBIENTAL	GLB	100%	100%	100%	400%	100%	100%	100%	400%	0%	0%	
DOCUMENTOS SOCIAL	GLB	100%	100%	100%	500%	100%	100%	100%	500%	0%	0%	
DOCUMENTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	100%	100%	100%	600%	100%	100%	100%	600%	0%	0%	
DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000580)	**UNIDAD**	**PROGRAMADO**				**EJECUTADO**				**VARIACIÓN**		**NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITIFICIACIÓN DE RETRASOS**
		SEMANAL		**ACUMULADO**		**SEMANAL**		**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**	
DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	**M2**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	**M2**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	**M3**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE..	**M3**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	**M3**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE C - Gr1 (SBGC_Gr1). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACIÓN MECANICA CON EXCAVADORA MEDIANA SOBRE ORUGAS Y RODILLO VIBROCOMPACTADOR TANDEM (2,5 - 3,0 TON), TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 21 KM)	**M3**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	**M2**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 90 KN/M Y 110 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	**M2**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
ESTABILIZACIÓN DE SUB BASE Y BASES GRANULARES CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	**M3**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	**ML**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	**ML**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	**M2**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	**UN**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000528)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE..	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE C - Gr1 (SBGC_Gr1). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACIÓN MECANICA CON EXCAVADORA MEDIANA SOBRE ORUGAS Y RODILLO VIBROCOMPACTADOR TANDEM (2,5 - 3,0 TON), TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 21 KM)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 90 KN/M Y 110 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ESTABILIZACIÓN DE SUB BASE Y BASES GRANULARES CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000372)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se presenta represamiento en la red de aguas residuales en la transversal 44 desde la calle 50 a sur hasta el pozo inspeccionado en la calle 49 a sur, lo anterior esta generando imprevistos en la ejecución del segmento, la tubería a reponer se encuentra trabajando a flujo lleno, obligando a realizar bombeo continuo a lo largo de toda la semana de intervención. Incrementando los costos de ejecución para el tramo intervenido, en el recorrido realizado con los representantes del EAAB se solicito la colaboración para bajar los niveles de la red.
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6001013)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6001200)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACION		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Demolicón de andenes	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
COMPACTACIÓN DE SUBRASANTES	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
INSTALACIÓN DE SUBBASE	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
INSTALACIÓN DE BASE	M3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
CONCRETO ESTAMPADO	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
ASFALTO	ML	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000857)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000557)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000830)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (NCLLUYE CARGUE)	UND	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6001206)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (NCLLUYE CARGUE)	UND	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000786)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (NCLLUYE CARGUE)	UND	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000931)	UNIDAD	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000870)	UNIDAD	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000389)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (NCLLUYE CARGUE)	UND	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6001303)	UNIDAD	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

		INIICIO	FIN			
CIV	6000580	9/2/2026	6/4/2026	Estado	Ejecutado	Se finaliza con limpieza el segmento de espacio público
	6000528	17/2/2026	6/4/2026	Estado	Ejecutado	Se finaliza con limpieza el segmento de espacio público
	6000372	18/2/2026		Estado	En ejecución	Continua instalación de bordillo prefabricado tipo A-80 y bajo rampa A-85, inicio de demolición de andén para cinta de ajuste y continua estabilizacion de AR-BG38
	60001013	16/3/2026		Estado	En ejecución	Excavaciones para reposición de tubería conectante de sumidero a pozo en intersección y construcción de carcamo de protección
	6001200	24/2/2026		Estado	Ejecutado	Se finaliza con limpieza el segmento de espacio público
	6000857	24/3/2026		Estado	En ejecución	Se finaliza el céreo de la capa final de AR-BG38 estabilizada con cemento y aditivo ionico
	6000557	15/4/2026		Estado	En ejecución	Instalación de prefabricado, bordillo A-80 y bajo rampa A-85 y continuación de instalación de material granular AR-BG38 estabilizado con cemento y aditivo ionico
	6000830	14/5/2026		Estado	En ejecución	Continua la instalación de las acometidas domiciliarias, llenos con material seleccionado conexiones sillas Y con la red principal sanitaria de 8"
	6001206	3/06/2026		Estado	En ejecución	Demolición de adoquines e inicio de excavación de caja para estructura de espacio publico
	6000786	20/4/2026		Estado	En ejecución	Instalación de prefabricado, bordillo A-80 y bajo rampa A-85 y continuación de instalación de material granular AR-BG38 estabilizado con cemento y aditivo ionico
	6000931			Estado	Por ejecutar	
	6000870			Estado	Por ejecutar	
	6000389	30/3/2026		Estado	En ejecución	Instalación de prefabricado, bordillo A-80 y bajo rampa A-85 y continuación de instalación de material granular AR-BG38 estabilizado con cemento y aditivo ionico
	6001303			Estado	Por ejecutar	

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

Se realizo la entrega de 60 ladrillos al colegio ciudad Bogotá para mejoras de estudiantes en condición reducida.
Se realizo la socialización de actualización de PMT para los CIV 6000786-6000830-6000870-6000857
Se realizo Comité integral con el fondo de desarrollo local, interventoría y contratista.
Se levanto acta de compromiso con los ciudadanos del CIV 6000557 debido a que de forma reiterativa se encuentran desechos dentro del tramo en ejecución.
Se levanto acta de compromiso con los propietarios de la tienda ubicada en la calle 50 a sur # 36-04 en el CIV 6000557 debido a que los tubos de la carpa ocupaban el espacio a ser demolido para instalación del sardinel, posteriormente se realizo el retiro por parte de los propietarios.
Se realizo PQR con señor cesar bocanegra.
Remitieron aprobación de informe # 5 con numero de radicado INT-652-2025-090
Reunión extraordinaria en el CIV 6000372-6000389 por solicitud e la comunidad.
Se realizó la actualización de la cuenta regresiva de las vallas informativas correspondientes a todos los CIV abiertos.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

Se realizó desmantelamiento del frente de obra CIV 6001200.
Se realizó apertura del frente de obra CIV 6001206.
Se realizó señalización de áreas peligrosas en los frentes de obra CIV´S 6000372-6000857.
Se realizó reposición de dotación y EPP en los frentes de obra CIV 6000372-6000830.
Se realizó reunión extraordinaria en el frente de obra CIV 6000372.
Se realizó instalación de señalización preventiva de acopio de materiales en el frente de obra CIV 6000372.

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Se realizó desmantelamiento del frente de obra CIV 6001200.
Se realizó apertura del frente de obra CIV 6001206.
Se realizó cargue de RCD en los frentes de obra CIV´S 6000857-6001206.
Se realizó aseo a unidades sanitarias portátiles en los frentes de obra.
Se realizó instalación de protección arbórea en el frente de obra CIV 6001206.
Se realizó jornada de orden y aseo en los frentes de obra CIV´S 6000372-6000857.
Se realizó mantenimiento al cerramiento en los frentes de obra CIV´S 6000557-6000830.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

No Aplica

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)

SST













AMBIENTAL



Se realizó desmantelamiento del frente de obra CIV 6001200.
















SOCIAL

















TÉCNICO



Compactación de base mejorada en el CIV 6000389



Retiro de adoquín y tableta en el CIV 6001206



Instalación y emboquillado de bordillo, mezclado, extendido y compactado de base mejorada en el CIV 6000372



Instalación y emboquillado de bordillo, mezclado, extendido y compactado de base mejorada en el CIV 6000372



Excavación para bordillo sardinel en el CIV 6000557



Construcción pozo red residual en el CIV 6000830



Se continúa excavación manual para ducto descole del sumidero costado sur occidental de la intersección calle 48C sur con la KR 26 en el CIV 6001013



Formaleta y fundida de hombros en rampas vehículares en el CIV 6000557

Nota: Las fotografías deberán contar con la fecha y ubicación del sector

APROBADO CONTRATISTA	APROBADO INTERVENTORÍA
JOTAM MAESTRE DIAB	SANTIAGO CARILLO VARGAS
FIRMA	FIRMA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORÍA
NO. CONTRATO	IDU-1614-2024	1617-2024-2025
OBJETO	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".
CONTRATISTA	Consorcio CICO	AVALI SALUD, INTERNACIONAL S.A.S.
VALOR INICIAL ADICIONES	$6.799.567.201	$ 636.756.760
VALOR TOTAL	$6.799.567.201	$ 636.756.760
PLAZO	8 MESES	8 MESES
FECHA DE INICIO	07 de diciembre de 2024	07 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	06 de agosto de 2025	06 de agosto del 2025
PRÓRROGAS	-	-
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	06 de agosto de 2025	06 de agosto del 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	AVALI SALUD, INTERNACIONAL S.A.S.	YOLI
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	12	13
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	5	1

SEMANA N. 25 **DEL** 9/6/2026 **AL** 13/6/2026

AVANCES DE OBRA

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Avance físico general	62,00%	47,00%	Avance físico general	62,00%	47,00%
Avance financiero general	$0,00	$7.436	Avance financiero general	$0,00	$7.436

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
DOCUMENTACION INICIAL	**GLB**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	
PROVISIONALES DEL PROYECTO	**GLB**	100%	100%	100%	200%	100%	100%	100%	200%	0%	0%	
DOCUMENTOS TECNICOS	**GLB**	100%	100%	100%	300%	100%	100%	100%	300%	0%	0%	
DOCUMENTO AMBIENTAL	**GLB**	100%	100%	100%	400%	100%	100%	100%	400%	0%	0%	
SOCIALES	**GLB**	100%	100%	100%	500%	100%	100%	100%	500%	0%	0%	
DOCUMENTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**GLB**	100%	100%	100%	600%	100%	100%	100%	600%	0%	0%	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CV 6000868)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 25 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ANDEN CONCRETO GRAVA N COMÚN DE 3000 PSI (210KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M(INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON +4" A 12" (15 - 30cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE C - M.V.(INSC_04.5). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION MECANICA CON INCLINACION MEDIANA SOBRE ORUGAS Y RODILLO VIBROCOMPACTADOR TANDEM(1,5 - 5,0 TON), TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 15 KM)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL- ENTRE 90 KN/M Y 110 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ESTABILIZACIÓN DE SUB BASE Y BASES GRANULARES CON ASFALTO POTENCIALIZADOR FLUIDIZANTE + CEMENTO 5%	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CAÑUELA TIPO A (20) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:3)	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CV 6000839)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 25 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ANDEN CONCRETO GRAVA N COMÚN DE 3000 PSI (210KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M(INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON +4" A 12" (15 - 30cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE C - M.V.(INSC_04.5). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION MECANICA CON INCLINACION MEDIANA SOBRE ORUGAS Y RODILLO VIBROCOMPACTADOR TANDEM(1,5 - 5,0 TON), TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 15 KM)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL- ENTRE 90 KN/M Y 110 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ESTABILIZACIÓN DE SUB BASE Y BASES GRANULARES CON ASFALTO POTENCIALIZADOR FLUIDIZANTE + CEMENTO 5%	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CAÑUELA TIPO A (20) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:3)	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CV 6000870)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) . NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD DM - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø = 36" (INCLUIR MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 25 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO(R) RIT UND U.M. NORMA NTC 5722 1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CV 6003314)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) . NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD DM - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø = 36" (INCLUIR MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 25 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO(R) RIT UND U.M. NORMA NTC 5722 1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

DESCRIPCIÓN META-FISICA (CV 4000004)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) . NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 KM) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DESCRIPCIÓN META-FISICA (CV 4000004)	**UNIDAD**	**PROGRAMADO**				**EJECUTADO**				**VARIACIÓN**		**NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS**
		SEMANAL		**ACUMULADO**		**SEMANAL**		**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**	
REPLANTEO GENERAL	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) . NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 KM) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DESCRIPCIÓN META-FISICA (CV 4001208)	**UNIDAD**	**PROGRAMADO**				**EJECUTADO**				**VARIACIÓN**		**NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS**
		SEMANAL		**ACUMULADO**		**SEMANAL**		**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Demolición de andenes	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 KM) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
COMPACTACIÓN DE SUBRASANTES.	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
INSTALACIÓN DE SUBBASE	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
INSTAALACIÓN DE MAM	M3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
CONCRETO ESTAMPADO	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ASFALTO	ML	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
DESCRIPCIÓN META-FISICA (CV 4000014)	**UNIDAD**	**PROGRAMADO**				**EJECUTADO**				**VARIACIÓN**		**NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS**
		SEMANAL		**ACUMULADO**		**SEMANAL**		**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) . NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 KM) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	
DESCRIPCIÓN META-FISICA (CV 4000017)	**UNIDAD**	**PROGRAMADO**				**EJECUTADO**				**VARIACIÓN**		**NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS**
		SEMANAL		**ACUMULADO**		**SEMANAL**		**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) . NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 KM) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	4%	0%	4%	4%	0%	
DESCRIPCIÓN META-FISICA (CV 4000016)	**UNIDAD**	**PROGRAMADO**				**EJECUTADO**				**VARIACIÓN**		**NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS**
		SEMANAL		**ACUMULADO**		**SEMANAL**		**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) . NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 KM) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	

DESCRIPCIÓN META-FISICA (CIV 4001204)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M2 - 2M2 (INCLUYE CARGUE)	M3	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUIR MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (5K M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
TUBERIA PVC U.M. EXT.CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	

DESCRIPCIÓN META-FISICA (CIV 4002256)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M2 - 2M2 (INCLUYE CARGUE)	M3	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUIR MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	75%	75%	76%	76%	75%	75%	76%	76%	76%	76%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (5K M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
TUBERIA PVC U.M. EXT.CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	

DESCRIPCIÓN META-FISICA (CIV 4000237)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M2 - 2M2 (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUIR MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (5K M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TUBERIA PVC U.M. EXT.CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

DESCRIPCIÓN META-FISICA (CIV 4000237)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M2 - 2M2 (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUIR MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (5K M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TUBERIA PVC U.M. EXT.CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

DESCRIPCIÓN META-FISICA (CIV 4000304)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M2 - 2M2 (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUIR MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (5K M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TUBERIA PVC U.M. EXT.CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

DESCRIPCIÓN META-FISICA (CIV 4000812)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M2 - 2M2 (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUIR MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (5K M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TUBERIA PVC U.M. EXT.CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

DESCRIPCIÓN META-FISICA (CIV 4001350)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M2 - 2M2 (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUIR MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (5K M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TUBERIA PVC U.M. EXT.CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

		INICIO	FIN			
CIV	6000080	9/2/2026	6/6/2026	Estado	Ejecutado	Se finaliza con limpieza el segmento de espacio público
	6000028	17/2/2026	6/6/2026	Estado	Ejecutado	Se finaliza con limpieza el segmento de espacio público
	6000372	19/2/2026		Estado	En ejecución	Finaliza instalación de bordillo prefabricado tipo A-80y bajo rampa A-85, inicio de demolición de anden para cinta de ajuste y continua establecimiento de AM-001B
	60000214	19/2/2026		Estado	Ejecutado	Construcción de cercama de protección de tubería 16" entre sumidero y paso sobre la intersección costado sur
	6000200	23/2/2026	26/2/2026	Estado	Ejecutado	Se finaliza con limpieza el segmento de espacio público
	6000017	25/2/2026		Estado	En ejecución	Se realiza programación para instalación de mezcla asfáltica
	6000017	25/2/2026		Estado	En ejecución	Instalación de prefabricado, bordillo A-80y bajo rampa A-85 y continuación de instalación de material granular AM-001B establecido con cemento y adhesivo mix
	6000019	26/2/2026		Estado	En ejecución	Continua la instalacion de las acometidas domiciliarias, construcción de pozo e inicio de la construcción del cerrama de protección de la tubería pluvial 16"
	6001200	3/3/2026		Estado	En ejecución	Demolición de adoquines e inicio de excavación de cajá para estructura de espacio publico
	6000700	20/3/2026		Estado	En ejecución	Instalación de prefabricado, bordillo A-80y bajo rampa A-85 y continuación de instalación de material granular AM-001B establecido con cemento y adhesivo mix
	6000222			Estado	Por ejecutar	
	6000070			Estado	Por ejecutar	
	6000403			Estado	Por ejecutar	
	6000309	30/3/2026		Estado	En ejecución	Inicio de demolición para construcción de cinta de ajuste sobre andén en los dos costados del segmento vial
	600030			Estado	Por ejecutar	
	6000047			Estado	Por ejecutar	

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

Se efectuó recorrida de obra en todos los segmentos abiertos, con el fin de verificar el avance de las actividades ejecutadas.
Se realiza la actualización del punto satélite del 6001226
Se realiza limpieza en todos los puntos satélites instalados
Se envió a interventoría para revisión y aprobación volante N° 13 comité de vendedor.
Se realizó la actualización de la cuenta regresiva de las vallas informativas correspondientes a todos los CIV abiertos.
Se realiza socializamiento con la comunidad del CIV 6000011,6000017,6000372.
Se entrega 2 volantes de invitación a comité de vendedor para el CIV 6001200
Reconocimiento de los nuevos CIV de la adición.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

Se realizó capacitación sobre accidentes e incidentes de trabajo en los frentes de obra.
Se realizó inspección de botiquín y extintor en los frentes de obra CIV´S 6000372- 6000309-6000017-6000017-6000030-6001200.
Se realizó inspección de maquinaria en el frente de obra CIV 6000372.
Se realizó inspección de dotación en el frente de obra CIV 6000372.
Se realizó reposición de EPP en el frente de obra CIV 6000372.
Se realizó instalación de señalización de área peligrosa en el frente de obra CIV 6000372.

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Se realizó capacitación sobre control de contaminación atmosférica en los frentes de obra.
Se realizó inspección de kit de derrames en los frentes de obra CIV´S 6000372- 6000309- 6001200- 6000017.
Se realizó cargue de RCD en el frente de obra CIV 6000372.
Se realizó instalación de protección de sumideros en los frentes de obra CIV´S 6001200- 6000017.
Se realizó jornada de orden y aseo en el frente de obra CIV 6000017.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (declaración sin notificados mediante comunicación a la entidad)

No Aplica

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)

SST













AMBIENTAL



Se realizó capacitación sobre control de contaminación atmosférica en los frentes de obra.









SOCIAL

















TÉCNICO



Retiro de sardinel existente, instalación de bordillo A-60 en el CIV 6001206



Construcción de pozos de inspección en la intersección calle 59Asur con KR 38 en el CIV 6000389



Construcción muros del cárcamo en el CIV 6001013



Fundida de concreto para losa de cárcamo ducto descole sumidero costado sur occidental intersección Calle 48Csur cc KR 26 en el CIV 6001013



Construcción mamposteria de pozo inspección red residual y colocación primera hilada del cárcamo en el CIV 6000830



Mezlado, extendido y compactación de base mejorada en el CIV 6000372



Instalación de bordillo A60 y A65 en el CIV 6000557



Se realiza jornada de orden y aseo en el CIV 6000857

Nota: las fotografías deberán cortar con la fecha y ubicación del sector

APROBADO CONTRATISTA	APROBADO INTERVENTORIA
JOTAM MAURTRE DIAB	SANTIAGO CARILLO VARGAS
FIRMA	FIRMA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORÍA
NO. CONTRATO	IDU-1614-2024	1617-2024-2025
OBJETO	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".
CONTRATISTA	Consorcio CICO	AVALA SAGAL INTERNATIONAL S.A.S.
VALOR INICIAL ADICIONES	$6.795.567.201	$ 636.756.760
VALOR TOTAL	$6.795.567.201	$ 636.756.760
PLAZO	8 MESES	8 MESES
FECHA DE INICIO	27 de diciembre de 2024	27 de diciembre del 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	26 de agosto de 2025	26 de agosto del 2025
PRÓRROGAS	-	-
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	26 de agosto de 2025	26 de agosto del 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	AVALA SAGAL INTERNATIONAL S.A.S.	IDU
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	54	15
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	15	1

SEMANA N. 26 **DEL** 16/9/2026 **AL** 22/9/2026

AVANCES DE OBRA

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Avance físico general	62,00%	62,00%	Avance físico general	66,00%	66,00%
Avance financiero general	10,00%	10,00%	Avance financiero general	10,00%	10,00%

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
DOCUMENTACION INICIAL	**GLB**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	
PROVISIONALES DE PROYECTO	**GLB**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	
DOCUMENTOS TECNICOS	**GLB**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	
DOCUMENTO AMBIENTAL	**GLB**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	
DOCUMENTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**GLB**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000068)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 25 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ANDEN CONCRETO GRAVA N COMÚN DE 3000 PSI (210KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M(INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON +4" A 12" (15 - 30cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE C - M.O.(MEC_M.O). INCLUYE (SUMINISTRO, ESTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACIÓN MECANICA CON MOTONIVELADORA MEDIANA SOBRE ORUGAS Y RODILLO VIBROCOMPACTADOR TANDEM(13 - 0,9 TON), TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 15 KM)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL- ENTRE 90 KN/M Y 110 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ESTABILIZACIÓN DE SUB BASE Y BASES GRANULARES CON ASFITVO POTENCIALIZADOR FUNSOLUDANTE + CEMENTO 5%	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CAÑUELA TIPO A (20) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:3)	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CASILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000239)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 25 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ANDEN CONCRETO GRAVA N COMÚN DE 3000 PSI (210KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M(INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON +4" A 12" (15 - 30cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE C - M.O.(MEC_M.O). INCLUYE (SUMINISTRO, ESTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACIÓN MECANICA CON MOTONIVELADORA MEDIANA SOBRE ORUGAS Y RODILLO VIBROCOMPACTADOR TANDEM(13 - 0,9 TON), TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 15 KM)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL- ENTRE 90 KN/M Y 110 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ESTABILIZACIÓN DE SUB BASE Y BASES GRANULARES CON ASFITVO POTENCIALIZADOR FUNSOLUDANTE + CEMENTO 5%	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CAÑUELA TIPO A (20) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:3)	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CASILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000237)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø = 36" (INCLUIR MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 25 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO(R) RIT UND U.M. NORMA NTC 5722 1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6003014)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø = 36" (INCLUIR MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 25 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO(R) RIT UND U.M. NORMA NTC 5722 1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

DESCRIPCIÓN META-FISICA (CV 4000004)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) . NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 KM) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DESCRIPCIÓN META-FISICA (CV 4000004)	**UNIDAD**	**PROGRAMADO**				**EJECUTADO**				**VARIACIÓN**		**NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS**
		SEMANAL		**ACUMULADO**		**SEMANAL**		**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**	
REPLANTEO GENERAL	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) . NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 KM) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DESCRIPCIÓN META-FISICA (CV 4001208)	**UNIDAD**	**PROGRAMADO**				**EJECUTADO**				**VARIACIÓN**		**NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS**
		SEMANAL		**ACUMULADO**		**SEMANAL**		**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Demolición de andenes	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 KM) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
COMPACTACIÓN DE SUBRASANTES.	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
INSTALACIÓN DE SUBBASE	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
INSTAALACIÓN DE MAM	M3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
CONCRETO ESTAMPADO	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ASFALTO	ML	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
DESCRIPCIÓN META-FISICA (CV 4000014)	**UNIDAD**	**PROGRAMADO**				**EJECUTADO**				**VARIACIÓN**		**NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS**
		SEMANAL		**ACUMULADO**		**SEMANAL**		**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) . NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 KM) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	
DESCRIPCIÓN META-FISICA (CV 4000017)	**UNIDAD**	**PROGRAMADO**				**EJECUTADO**				**VARIACIÓN**		**NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS**
		SEMANAL		**ACUMULADO**		**SEMANAL**		**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) . NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 KM) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	4%	0%	4%	4%	0%	
DESCRIPCIÓN META-FISICA (CV 4000016)	**UNIDAD**	**PROGRAMADO**				**EJECUTADO**				**VARIACIÓN**		**NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS**
		SEMANAL		**ACUMULADO**		**SEMANAL**		**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) . NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 KM) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	

DESCRIPCIÓN META-FISICA (CIV 4001204)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M2 - 2M2 (INCLUYE CARGUE)	M3	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUIR MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (5K M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
TUBERIA PVC U.M. EXT.CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	

DESCRIPCIÓN META-FISICA (CIV 4002256)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M2 - 2M2 (INCLUYE CARGUE)	M3	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUIR MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	75%	75%	76%	76%	75%	75%	76%	76%	76%	76%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (5K M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
TUBERIA PVC U.M. EXT.CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	

DESCRIPCIÓN META-FISICA (CIV 4000237)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M2 - 2M2 (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUIR MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (5K M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TUBERIA PVC U.M. EXT.CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

DESCRIPCIÓN META-FISICA (CIV 4000237)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M2 - 2M2 (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUIR MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (5K M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TUBERIA PVC U.M. EXT.CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

DESCRIPCIÓN META-FISICA (CIV 4000304)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M2 - 2M2 (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUIR MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (5K M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TUBERIA PVC U.M. EXT.CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

DESCRIPCIÓN META-FISICA (CIV 4000812)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M2 - 2M2 (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUIR MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (5K M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TUBERIA PVC U.M. EXT.CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

DESCRIPCIÓN META-FISICA (CIV 4001350)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M2 - 2M2 (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUIR MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (5K M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TUBERIA PVC U.M. EXT.CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

		INICIO	FIN			
CIV	6000360	9/1/2026	9/1/2026	Estado	Ejecutado	Se finaliza con limpieza y el segmento de espacio público
	6000328	17/1/2026	9/2/2026	Estado	Ejecutado	Se finaliza con limpieza y el segmento de espacio público
	6000372	19/1/2026		Estado	En ejecución	Se registró el arribo de un viaje de mezcla asfáltica tipo A-80 al proyecto. No obstante, el frente de obra no presentó actividades de ejecución durante el día. Las condiciones climáticas se mantuvieron ligeramente nubladas, sin generar afectaciones sobre el área de intervención. Asimismo, se realizaron labores de extensión, nivelación y compactación de material granular, con el fin de garantizar las condiciones de soporte, estabilidad y densidad requeridas para la conformación de la estructura proyectada, en cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato.
	6000372	19/1/2026		Estado	En ejecución	Se ejecuta la instalación del anillo de cargue de 1.20 m de diámetro para el pozo de regresión existente de la red de drenaje pluvial, garantizando su adecuada ubicación, nivelación y ajuste estructural, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y a los requerimientos de funcionalidad y resistencia de la infraestructura hidráulica.
	6000393	20/1/2026	20/1/2026	Estado	Ejecutado	Se finaliza con limpieza y el segmento de espacio público
	6000417	21/1/2026		Estado	En ejecución	Durante la semana se realizaron las actividades de toma de medidas para la determinación del volumen de mezcla asfáltica requerida para la ejecución de los trabajos programados. Estas labores se desarrollaron bajo condiciones climáticas favorables, con tiempo estable, lo que permitió su normal desarrollo y una adecuada verificación de las cantidades de obra.
	6000317	21/1/2026		Estado	En ejecución	Se realizaron cortes para la conformación de franjas de regresión en andenes, con el fin de demarcar las áreas de intervención y garantizar una adecuada transición entre las estructuras existentes y las nuevas obras. De igual manera, se llevó a cabo la demolición de concreto en las franjas de ajuste de andenes, retirando el material resultante para permitir la posterior reconstrucción de las zonas intervenidas de acuerdo con
	6000393	22/1/2026		Estado	En ejecución	Durante la semana se dio continuidad a las actividades de construcción del cárcamo destinado al alojamiento del ducto de la red pluvial, ejecutando las labores programadas conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Las trabajos se desarrollaron bajo condiciones climáticas favorables, sin tiempo adverso, permitiendo el normal avance de la obra
	6000206	3/2/2026		Estado	En ejecución	Durante la semana se registró el arribo de un viaje de mezcla asfáltica tipo A-80 al proyecto. No obstante, el frente de obra no presentó actividades de ejecución durante el día. Las condiciones climáticas se mantuvieron ligeramente nubladas, sin generar afectaciones sobre el área de intervención.
	6000706	29/1/2026		Estado	En ejecución	Durante la semana se realizaron jornadas de aseo y organización en el frente de obra
	6005222			Estado	Por ejecutar	
	6000870			Estado	Por ejecutar	
	6006441			Estado	Por ejecutar	
	6006870			Estado	Por ejecutar	
	6002007	30/1/2026		Estado	En ejecución	Durante la semana se realizó localización de concreto hidráulico de 3.000psi en las franjas de ajuste de andenes previamente intervenidos, garantizando el adecuado vertimiento, nivelación, acabado superficial y cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para este tipo de estructura peatonal. Asimismo, se verificaron las condiciones necesarias para asegurar la correcta resistencia y durabilidad del elemento
	6005303			Estado	Por ejecutar	

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

Se efectuó recorrido de obra en todos los segmentos abiertos, con el fin de verificar el avance de las actividades ejecutadas.
Se realizo acercamiento con la comunidad del CIV 6000706, 6005303
Se entrego 03 volantes de invitación a comité de vendaduria para el CIV 6001206
Se entrego 03 volantes de invitación a comité de vendaduria para el CIV 6000017
Se realizo limpieza en todos los puntos aledaños
Se realizo comité de vendaduria en CIV6001206 y contamos con la participación de 01 participantes
Se realizo comité de vendaduria en CIV6000017 y contamos con la participación de 08 participantes
Se realiza capacitación de liderazgo positivo y sentido de pertenencia para todos los CIV abiertos.
Se levantó acta de compromiso con la señora Claudia Cadena por reposición del contador dañado a daño del retiro en obra
Se levantó acta de compromiso con el señor Edgar Patiño para autorización de ingreso vehicular.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

Se realizó inducción al personal de nuevo ingreso en instalaciones del punto cinco.
Se realizó entrega de dotación y EPP al personal de nuevo ingreso en instalaciones del punto cinco.
Se realizó reposición de dotación y EPP en los frentes de obra CIV´S 6000357- 6000786.
Se realizó acompañamiento en actividades de obra en el frente de obra CIV 6000372.
Se realizó instalación de señalización de zonas peligrosas CIV 6000017.
Se realizó acompañamiento a manejo de vendaduria en el frente de obra CIV 6000357.
Se realizó acompañamiento a manejo de vendaduria en el frente de obra CIV 6001206.

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Se realizo instalación de protección de sumideros en los frentes de obra CIV´S 6000357- 6000367- 6000372.
Se realizó instalación de protección de materiales en los frentes de obra CIV´S 6000786- 6000372.
Se realizó jornada de aseo y zaso en los frentes de obra CIV´S 6000786-6000372.
Se realizó quite de encerramiento en el frente de obra CIV 6000372.
Se realizó cargue de RCD en el frente de obra CIV 6001206.
Se realizó acompañamiento a manejo de vendaduria en el frente de obra CIV 6000357.
Se realizó acompañamiento a manejo de vendaduria en el frente de obra CIV 6001206.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (debación servalidados mediante comunicación a la entidad)

No Aplica

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)

SST















AMBIENTAL



Se realizó instalación de protección de sumideros en los frentes de obra CIV´S 6000357- 6000367- 6000372.









RCD





SOCIAL

















TÉCNICO



toma de medidas para la determinación del volumen de mezcla asfáltica CIV 6000857



Construcción del cárcamo destinado al alojamiento del ducto de la red pluvial CIV 6000830



Demolicion de anden existente en adoquin CIV 6000372



Demolición de la franja de andén existent CIV 6000372



Corte y demolicion de anden existente en concreto en el CIV 6000389



Compactacion de base en zona de anden en el CIV 6000372



Demolicion de anden en concreto en el CIV 6000557



Vaciado de concreto en anden en el CIV 6000389

Nota: las fotografías deberán cortar con la fecha y ubicación del sector

APROBADO CONTRATISTA

MARLO WALDIR SANTAMARIA SANCHEZ

FIRMA

APROBADO INTERVENTORIA

SANTIAGO CARILLO VARGAS

FIRMA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORÍA
NO. CONTRATO	IDU-1614-2024	IDU-1616-2024
OBJETO	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".
CONTRATISTA	Consorcio CIDCO	AVALA SAGAL INTERNATIONAL S.A.S.
VALOR INICIAL ADICIONES	$6.785.567.201	$ 636.756.760
VALOR TOTAL	$6.785.567.201	$ 636.756.760
PLAZO	8 MESES	8 MESES
FECHA DE INICIO	27 de diciembre de 2024	27 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	26 de agosto de 2025	26 de agosto del 2025
PRÓRROGAS	0	0
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	26 de agosto de 2025	26 de agosto del 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	AVALA SAGAL INTERNATIONAL S.A.S.	IDU
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	54	15
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	15	1

SEMANA N. 28 **DEL** 30/6/2026 **AL** 5/7/2026

AVANCES DE OBRA

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Avance físico general	72,00%	72,00%	Avance físico general	78,00%	78,00%
Avance financiero general	72,00%	72,00%	Avance financiero general	80,00%	74,00%

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
DOCUMENTACION INICIAL	**GLB**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	
PROVISIONALES DE PROYECTO	**GLB**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	
DOCUMENTOS TECNICOS	**GLB**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	
PUESTA EN MARCHA AMBIENTAL	**GLB**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	
SEÑALIZACION	**GLB**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	
DOCUMENTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**GLB**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000068)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 25 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ANDEN CONCRETO GRAVA N COMÚN DE 3000 PSI (210KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M(INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON +4" A 12" (15 - 30cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE C - M.O.(INCL.SUM.SITIO). INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACIÓN MECANICA CON MOTONIVELADORA MEDIANA SOBRE CAPAS Y RODILLO VIBROCOMPACTADOR TANDEM(13 - 8,5 TON), TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 15 KMS	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL- ENTRE 90 KN/M Y 110 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ESTABILIZACIÓN DE SUB BASE Y BASES GRANULARES CON ASFALTO POTENCIALIZADOR FLUIDIZANTE + CEMENTO 5%	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CAÑUELA TIPO A (20) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:3)	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CASILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000239)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 25 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ANDEN CONCRETO GRAVA N COMÚN DE 3000 PSI (210KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M(INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON +4" A 12" (15 - 30cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE C - M.O.(INCL.SUM.SITIO). INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACIÓN MECANICA CON MOTONIVELADORA MEDIANA SOBRE CAPAS Y RODILLO VIBROCOMPACTADOR TANDEM(13 - 8,5 TON), TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 15 KMS	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL- ENTRE 90 KN/M Y 110 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ESTABILIZACIÓN DE SUB BASE Y BASES GRANULARES CON ASFALTO POTENCIALIZADOR FLUIDIZANTE + CEMENTO 5%	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CAÑUELA TIPO A (20) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:3)	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CASILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000317)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD DM - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø = 36" (INCLUIR MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 25 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO(R) RT UND U.M. NORMA NTC 5722 1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6003314)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD DM - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø = 36" (INCLUIR MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 25 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO(R) RT UND U.M. NORMA NTC 5722 1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

DESCRIPCIÓN META-FISICA (CV 4000004)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) . NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 KM) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DESCRIPCIÓN META-FISICA (CV 4000004)	**UNIDAD**	**PROGRAMADO**				**EJECUTADO**				**VARIACIÓN**		**NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS**
		SEMANAL		**ACUMULADO**		**SEMANAL**		**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**	
REPLANTEO GENERAL	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) . NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 KM) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DESCRIPCIÓN META-FISICA (CV 4001208)	**UNIDAD**	**PROGRAMADO**				**EJECUTADO**				**VARIACIÓN**		**NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS**
		SEMANAL		**ACUMULADO**		**SEMANAL**		**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Demolición de andenes	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 KM) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
COMPACTACIÓN DE SUBRASANTES.	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
INSTALACIÓN DE SUBBASE	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
INSTAALACIÓN DE MAM	M3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
CONCRETO ESTAMPADO	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ASFALTO	ML	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
DESCRIPCIÓN META-FISICA (CV 4000014)	**UNIDAD**	**PROGRAMADO**				**EJECUTADO**				**VARIACIÓN**		**NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS**
		SEMANAL		**ACUMULADO**		**SEMANAL**		**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) . NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 KM) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	
DESCRIPCIÓN META-FISICA (CV 4000017)	**UNIDAD**	**PROGRAMADO**				**EJECUTADO**				**VARIACIÓN**		**NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS**
		SEMANAL		**ACUMULADO**		**SEMANAL**		**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) . NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 KM) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	4%	0%	4%	4%	0%	
DESCRIPCIÓN META-FISICA (CV 4000016)	**UNIDAD**	**PROGRAMADO**				**EJECUTADO**				**VARIACIÓN**		**NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS**
		SEMANAL		**ACUMULADO**		**SEMANAL**		**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) . NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 KM) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	

DESCRIPCIÓN META-FISICA (CIV 4001204)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M2 - 2M2 (INCLUYE CARGUE)	M3	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUIR MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (5K M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
TUBERIA PVC U.M. EXT.CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	

DESCRIPCIÓN META-FISICA (CIV 4002256)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M2 - 2M2 (INCLUYE CARGUE)	M3	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUIR MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	75%	75%	76%	76%	75%	75%	76%	76%	76%	76%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (5K M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
TUBERIA PVC U.M. EXT.CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	

DESCRIPCIÓN META-FISICA (CIV 4000237)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M2 - 2M2 (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUIR MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (5K M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TUBERIA PVC U.M. EXT.CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

DESCRIPCIÓN META-FISICA (CIV 4000237)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M2 - 2M2 (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUIR MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (5K M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TUBERIA PVC U.M. EXT.CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

DESCRIPCIÓN META-FISICA (CIV 4000304)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M2 - 2M2 (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUIR MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (5K M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TUBERIA PVC U.M. EXT.CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

DESCRIPCIÓN META-FISICA (CIV 4000812)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M2 - 2M2 (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUIR MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (5K M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TUBERIA PVC U.M. EXT.CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

DESCRIPCIÓN META-FISICA (CIV 4001350)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M2 - 2M2 (INCLUYE CARGUE)	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUIR MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (5K M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TUBERIA PVC U.M. EXT.CORRUGADO(INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

		INICIO	FIN			
CIV	6000360	9/1/2026	6/8/2026	Iniciado	Ejecutado	Se finaliza con limpieza el segmento de espacio público
	6000528	17/2/2026	6/8/2026	Iniciado	Ejecutado	Se finaliza con limpieza el segmento de espacio público
	6000572	16/2/2026		Iniciado	En ejecución	Se ejecutan labores de remate y ajuste final de pases de inspección y sumideros, consistentes en la adecuación de cotas, conformación de acabados y aseguramiento de la correcta instalación de marcos y tapas, de acuerdo con los niveles de diseño establecidos. Estas actividades garantizan la adecuada funcionalidad de la red de drenaje y su correcta integración con la estructura vial y las superficies terminadas.
	6000523	16/2/2026	20/8/2026	Iniciado	En ejecución	Se finaliza con limpieza el segmento de espacio público
	6000 260	24/2/2026	20/8/2026	Iniciado	Ejecutado	Se finaliza con limpieza el segmento de espacio público
	6000 817	24/2/2026	20/8/2026	Iniciado	En ejecución	Se finaliza con limpieza el segmento de espacio público
	6000 817	25/8/2026		Iniciado	En ejecución	Se realizan la aplicación concreto de 3.000PSI para franja de ajuste en andenes.
	6000 892	16/2/2026		Iniciado	En ejecución	Durante la semana se realizo Jornada de socialización concreto de 3.000PSI para franja de ajuste en andenes.
	6002 270	2/3/2026		Iniciado	En ejecución	Se realiza excavación manual para la retiro, instalación domiciliaria A-Bl y posteriormente se realiza la instalación de cajas de redes secas y humedad, se continua instalación y embonquillado de bustillo A -Bl.
	6000 786	20/8/2026	1/7/2026	Iniciado	Ejecutado	Durante la semana se realizo la instalacion de mezcla asfaltica y posteriormente se realizaron jornadas de aseo en el frente
	6000 911			Iniciado	Por ejecutar	
	6000 870			Iniciado	Por ejecutar	
	6000 889	30/3/2026		Iniciado	En ejecución	Se realizan jornadas de limpieza y aseo en el frente de obra
	6001 303			Iniciado	Por ejecutar	

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

Se efectuó recorrido de obra en todos los segmentos abiertos, con el fin de verificar el avance de las actividades ejecutadas.
Se realiza actualización de la cuenta regresiva de la valla informativa.
Se radica informe N°6 con numerale radicado ONI con observaciones.
Se atendió reunión por parte de contratista para revisar tramo de ejecución del CIV 6001013.
Se entrega once (11) volantes de primera visita de actas de vecindad para el CIV 6000672.
Se asiste el día 2 junio al punto PAC el representante de las comunidades de Turquesita el señor Marino Giraldo para dialogar sobre el avance en las obras del CIV 6000570 6000589.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

Se realizó inspección de dotación y EPP en los frentes de obra CIV´s 6000857- 6000830- 6000572- 6000567.
Se realizó charla de 5 minutos en el frente de obra CIV 6000572.
Se realizó inspección de kit de emergencia botiquín y extintor en el frente de obra CIV 6000857.
Se realizó mesa de trabajo en el frente de obra CIV 6000013, en conjunto con la contratista, el Fondo de Desarrollo Local de la alcaldía de Tuquesita FDLT y la Interventoría.
Se realizó desmantelamiento del frente de obra CIV 6001013.

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Se realizó jornada de orden y aseo en los frentes de obra CIV´s 6001286- 6001013- 6000857- 6000786.
Se realizó inspección de kit de derrames en el frente de obra CIV 6000857.
Se realizó mantenimiento a protección de sumideros en el frente de obra CIV 6000857.
Se realizó desmantelamiento del frente de obra CIV 6001013.
Se realizó mesa de trabajo en el frente de obra CIV 6000013, en conjunto con la contratista, el Fondo de Desarrollo Local de la alcaldía de Tuquesita FDLT y la Interventoría.
Se realizó instalación de protección de materiales en el frente de obra CIV 6000830.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (debación ser notificados mediante comunicación a la entidad)

No Aplica

4. REGISTRO FOTOGRAFICO: (TODAS LAS ÁREAS)

SST











AMBIENTAL



Se realizó jornada de orden y aseo en los frentes de obra CIV´s 6001286- 6001013- 6000857- 6000786.











SOCIAL

















TÉCNICO



Instalacion de mezcla asfáltica CIV 6000857



Nivelacion de mezcla asfáltica CIV 6000857



Instalacion de bordillo A-80 CIV 6000857



Vaciado de concreto 3000 PSI CIV 6000857



Demolicion de sumideros existentes CIV 6000830



Vaciado de concreto 3000 PSI CIV 6000557



Instalacion de aceros para carcamo en el CIV 6000830



Instalación de concreto para carcamo en el CIV 6000830

Nota: las fotografías deberán cortar con la fecha y ubicación del sector

APROBADO CONTRATISTA

MAURO WALDIR SANTAMARIA SANCHEZ

FIRMA

APROBADO INTERVENTORIA

SANTIAGO CARILLO VARGAS

FIRMA

ANEXO 4: ACTA DE FIJACION DE NO PREVISTOS COP 613 DEL 2025.

FORMATO

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS

ACTA No 1 **DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS**

CONTRATO No. 613 **DE** 2025

OBJETO

"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

CONTRATISTA / CONSULTOR CONSORCIO COCO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 652 **DE** 2025

INTERVENTOR AHLA SHUGL INTERNATIONAL SAS

APOYO A LA SUPERVISIÓN No. 652-2025-CINT (143627) DIEGO CABALLERO ROJAS; VALENTINA MARTÍNEZ MUÑOZ

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Valor Total incluido AIU	Fecha de No Objeción
NP-01	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$ 58.299	$ 77.538	
NP-02	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)	UN	$ 1.128.464	$ 1.500.857	
NP-03	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	$ 85.050	$ 113.117	
NP-04	HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$ 92.358	$ 122.836	
NP-05	SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5cmx15cmx8.5cm). SUMIN. E INSTAL.	UN	$ 73.970	$ 98.380	
NP-06	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	UN	$ 634.048	$ 843.284	
NP-07	GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	$ 55.288	$ 73.533	
NP-08	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 191.532	$ 254.738	**ACTA DE REUNION 18 DE MARZO DE 2026**
NP-09	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	$ 172.045	$ 228.820	
NP-10	MANEJO DE AGUAS (INCLUYE MOTOBOMBA CON COMBUSTIBLE Y OPERADOR)	HR	$ 11.984	$ 15.939	
NP-11	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA)	UN	$ 5.086.921	$ 6.765.605	
NP-12	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 195.225	$ 259.649	
NP-13	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	$ 25.096	$ 33.378	
NP-14	ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE	M2	$ 50.954	$ 67.769	
NP-15	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)	M3	$ 1.556.717	$ 2.070.434	
NP-16	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3	$ 1.257.690	$ 1.672.728	

FORMATO

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

dieciocho (18) días del mes de marzo de 2026

(Nombre) JOTAM MAESTRE DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista CONSORCIO COCO

(Nombre) NAYDU LISBETH LOPEZ OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor AHLA SHUGL INTERNATIONAL SAS

Firmado digitalmente por Claudia Collante

(Nombre) CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSÁN
ALCALDESA LOCAL DE TUNJUELITO

(Nombre) DIEGO CABALLERO ROJAS
APOYO A LA SUPERVISIÓN 652-2025-CINT (143627)

(Nombre) VALENTINA MARTINEZ MUÑOZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN 652-2025-CINT (143627)

FORMATO

LISTA DE CHEQUEO NO OBJECIÓN APU NO PREVISTOS EN CONTRATO DE OBRA

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011, la Ley 1882 de 2018 y el Anexo Técnico del proceso licitatorio FDLT-LP-255-2025 (141472) en lo referido a la aprobación de ítems no previstos, a continuación, se relacionan los documentos entregados por la interventoría como soporte y evidencia a la validación de los precios de los ítems no previstos (NP´s) requeridos para la ejecución del contrato. Lo anterior, de acuerdo con comunicación con radicado INT-652-2025-059 del 16 de marzo de 2026, respecto del Contrato de Obra N° 613 de 2025, conforme a los puntos detallados a continuación:

1. Información General del Contrato

Nombre contratista de obra	N° de contrato	Fecha de terminación del contrato
CONSORCIO COCO	613-2025	16 de agosto de 2026
Nombre contratista interventor de obra	**N° de contrato**	**Fecha de terminación del contrato**
AHLA SHUGL INTERNATIONAL SAS	652-2025	16 de agosto de 2026

REVISÓ	NOMBRE COMPLETO	FECHA REVISIÓN
Profesional Apoyo a la Supervisión 652-2025-CINT (143627)	Valentina Martinez Muñoz	18 de marzo de 2026
Profesional Apoyo a la Supervisión 652-2025-CINT (143627)	Diego Caballero Rojas	18 de marzo de 2026

2. Requisitos de No Objeción

Los siguientes requisitos, son de obligatorio cumplimiento previo inicio de la revisión y análisis de precio no previsto:

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS			
VALIDADOS POR EL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN	**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES / ACLARACIONES**
los ítems no previstos comprenden: trabajos de campo, análisis de laboratorio, actividades de obra y conservación que no fueron contempladas inicialmente, y su ejecución es necesaria para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.	X		
Las actividades no previstas cuentan con respaldo en diseños aprobados y/o normas aplicables.	X		
Los ítems no previstos coinciden y/o tienen equivalencia técnica con alguno de los ítems contractuales.		X	
Los APU cuentan con justificación técnica de la necesidad los precios no previstos, sustentada por parte de la interventoría y revisada por el supervisor y sus respectivos profesionales y/o apoyos a la supervisión.	X		
Los APU no han sido aprobados con anterioridad.		X	
VALIDADOS POR EL PROFESIONAL REVISIÓN NP´S	**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES / ACLARACIONES**
Los ítems no previstos corresponden a una actividad de obra como tal y en ningún caso es un insumo individual del grupo de las herramientas, equipos, materiales o mano de obra	X		

La descripción de los ítems no previstos indica claramente el alcance técnico de forma tal que con ella se evidencie la necesidad de los equipos, insumos y mano de obra descritos en el(los) APU.	X		
Los ítems no previstos contienen la especificación general, particular o norma técnica que los regula.	X		
Formato de acta de fijación debidamente firmado por el contratista de obra y el interventor/supervisor.	X		

De los dieciséis (16) no previstos recibidos por el apoyo a la supervisión para la validación, dieciséis (16) tienen concepto de no objeción, cumpliendo con los requerimientos del FDLT, así:

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario
NP-01	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$ 58.299
NP-02	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)	UN	$ 1.128.464
NP-03	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	$ 85.050
NP-04	HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIÁMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 92.358
NP-05	SEGREGADOR BICICLETA (TACHÓN PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5cmx15cmx8.5cm). SUMIN. E INSTAL.	UN	$ 73.970
NP-06	DEMOLICIÓN DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIÁMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	UN	$ 634.048
NP-07	GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	$ 55.288
NP-08	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 191.532
NP-09	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	$ 172.045
NP-10	MANEJO DE AGUAS (INCLUYE MOTOBOMBA CON COMBUSTIBLE Y OPERADOR)	HR	$ 11.984
NP-11	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA)	UN	$ 5.086.921
NP-12	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 195.225
NP-13	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2	$ 25.096

NP-14	ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE)	M2	$ 50.954
NP-15	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)	M3	$ 1.556.717
NP-16	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3	$ 1.257.690

Para constancia de lo anterior, se firma la presente lista de chequeo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella y en cumplimiento de las funciones u obligaciones a cargo de los mismos.

Dado en Bogotá D.C., a los Dieciocho (18) días del mes de marzo del dos mil veintiséis (2026):

JOTAM MAESTRE DIAB
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO COCO

NAYDU LISBETH LOPEZ OROZCOY
REPRESENTANTE LEGAL
AHLA SHUGL INTERNATIONAL SAS.

DIEGO CABALLERO ROJAS
APOYO A LA SUPERVISIÓN 652-2025-CINT (143627)


VALENTINA MARTINEZ MUÑOZ.
APOYO A LA SUPERVISIÓN 652-2025-CINT (143627)

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Identificación de ítems no contractuales necesarios para ejecución del Contrato de Obra No. 613-2025		
Fecha:	17 de marzo de 2026	**Hora de inicio: 10:00am**	**Modalidad:** X **Presencial** / **Virtual** / **Telefónica** / **Mixta**
Lugar:	FDLT Fondo Desarrollo Local Tunjuelito	**Hora de finalización: 11:30am**	
Dependencia:	FDLT Fondo Desarrollo Local Tunjuelito	**Nombre del responsable: Diego Caballero Rojas**	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
CC	79.518.952	Santiago Carrillo Vargas	NO APLICA	AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S. / Director de interventoría									X	cintunjuelito@gmail.com	
CC	1.024.547.185	Diego Caballero Rojas	NO APLICA	FDLT Fondo Desarrollo Local Tunjuelito			X						X	diego.caballero@gobiernobogota.gov.co	
CC	30.321.513	Angela Patricia Castro	NO APLICA	CONSORCIO COCO/ Directora de obra									X	consorciodc2025@gmail.com	
CC	1.014.264.950	Valentina Martinez Muñoz	NO APLICA	FDLT Fondo Desarrollo Local Tunjuelito			x						x	valentina.martinez@gobiernobogota.gov.co	
---	CIERRE DE ACTA	CIERRE DE ACTA	CIERRE DE ACTA	CIERRE DE ACTA										CIERRE DE ACTA	CIERRE DE ACTA
---	----------	----------	----------	----------	--	--	--	----	--	---	---	---	---	----------	----------
---	----------	----------	----------	----------	--	--	--	----	--	---	---	---	---	----------	----------
---	----------	----------	----------	----------	--	--	--	----	--	---	---	---	---	----------	----------
---	----------	----------	----------	----------	--	--	--	----	--	---	---	---	---	----------	----------

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

En la ciudad de Bogotá D.C., a los diecisiete (17) días del mes de marzo del dos mil veintiséis (2026), se reunieron los representantes del Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito (FDLT), la interventoría AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S. y el contratista Consorcio COCO, con el fin de analizar y dejar constancia del proceso de identificación y validación técnica de ítems no contractuales necesarios para la ejecución del Contrato de Obra No. 613 de 2025.

En cumplimiento de lo establecido en el Anexo 1 – Anexo Técnico de obra, numeral 5. Forma de pago – ítems no previstos, del proceso de contratación, y con base en los recorridos técnicos realizados en los frentes de obra, se identificaron una serie de condiciones técnicas y operativas no previstas en los diseños iniciales, que requieren la incorporación de nuevas actividades para garantizar el cumplimiento de los estándares constructivos, normativos y funcionales de la infraestructura.

El contratista, con base en las observaciones de campo y los requerimientos normativos, se ve en la necesidad de incluir 16 nuevos ítems no previstos.

La interventoría validó que estas actividades no solo responden a condiciones verificadas en campo, sino que además se alinean con lo establecido en las prácticas de diseño y construcción del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). A continuación, se detallan los ítems aprobados técnicamente como necesarios:

NP-01	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN
NP-02	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)
NP-03	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)
NP-04	HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIÁMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
NP-05	SEGREGADOR BICICLETA (TACHÓN PLÁSTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5cmx15cmx8.5cm). SUMIN. E INSTAL.
NP-06	DEMOLICIÓN DE POZO, DIÁMETRO INTERIOR D=1.20M, DIÁMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).
NP-07	GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
NP-08	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibro compactador)
NP-09	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN
NP-10	MANEJO DE AGUAS (INCLUYE MOTOBOMBA CON COMBUSTIBLE Y OPERADOR)
NP-11	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA)
NP-12	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibro compactador)
NP-13	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN MÉTODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
NP-14	ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE)

NP-15	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)
NP-16	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBRO COMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

Cada uno de estos ítems fue evaluado frente a los criterios del Anexo Técnico, el análisis de precios unitarios y la coherencia funcional. Las actividades propuestas no están contenidas en el presupuesto contractual inicial, pero son esenciales para evitar fallos estructurales, mejorar la operación de entrega a entidades competentes.

Con la presente acta, se formaliza la trazabilidad institucional del proceso de revisión y validación de ítems no previstos, y de manera expresa se deja constancia de la no objeción por parte del Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito a la inclusión de los ítems NP-01 al NP-16, en cumplimiento de los lineamientos establecidos contractualmente para la incorporación de actividades complementarias. Los ítems propuestos fueron entregados a la interventoría mediante el comunicado **FDLT-CTO-613-2025/050** del 14 de marzo de 2026. La interventoría aprobó al contratista de obra los NP´s mediante el comunicado **INT-652-2025-059** del 16 de marzo de 2026. Así las cosas, la no objeción se sustenta en el análisis técnico integral realizado por las partes intervinientes, dentro del marco de sus respectivas competencias, y reconoce que las actividades contempladas resultan necesarias para garantizar la adecuada ejecución del proyecto, así como la funcionalidad, estabilidad estructural y durabilidad de las obras previstas en el Contrato de Obra No. 613 del 2025.

Como soporte, se anexa a la presente el Acta de Fijación de Precios No Previstos N° 1.

CIERRE DE ACTA

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	En cumplimiento con el anexo técnico, se radicará a la entidad los correspondientes soportes completos No Previstos revisados en esta acta.	Interventoría	18 de marzo de 2026
	CIERRE DE ACTA	CIERRE DE ACTA	CIERRE DE ACTA
----	----------	----------	----------
----	----------	----------	----------
----	----------	----------	----------
----	----------	----------	----------
----	----------	----------	----------
----	----------	----------	----------
----	----------	----------	----------
----	----------	----------	----------
----	----------	----------	----------
----	----------	----------	----------
----	----------	----------	----------
----	----------	----------	----------
----	----------	----------	----------
----	----------	----------	----------
----	----------	----------	----------
----	----------	----------	----------
----	----------	----------	----------
----	----------	----------	----------
----	----------	----------	----------
----	----------	----------	----------
----	----------	----------	----------
----	----------	----------	----------
----	----------	----------	----------
----	----------	----------	----------
----	----------	----------	----------
----	----------	----------	----------

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

FORMATO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA

BOGOTÁ

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	FDLT-LP-255-2025 - CTO 613-2025
OBJETO	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO COCO	JOTAM MAESTRE DIAB	REPRESENTANTE LEGAL	
INTERVENTOR	AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.	ING. NAYDU LISBETH LOPEZ OROZCO	REPRESENTANTE LEGAL	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	**9. NO PREVISTOS**	**CAPÍTULO**	**EXCAVACIONES**
SUBCAPÍTULO	**N.A.**	**SUBCAPÍTULO**	**FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS**
ÍTEM	**NP-01**	**CÓDIGO**	**6015**

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	1,00	18/03/2026

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092 (Contractual)	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000,00	0,094	188,00
6026 (Contractual)	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	HR	$ 157.602,00	0,162	25.531,52
				SUBTOTAL	25.719,52

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vario Unitario
9159	ALQUILER ENTIBADO DESLIZANTE E2, RANGO PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN: 3.0 M < H <= 4.8 M. INCL. ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2/MES	$ 228.300,00	0,100	22.830,00
				SUBTOTAL	22.830,00

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
				SUBTOTAL	0,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	JR	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6087 (Contractual)	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	$ 79.411,00	100,00%	$ 79.411,00	0,050	$ 4.008
6088 (Contractual)	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	0,050	$ 5.741
					SUBTOTAL	9.749,12
					TOTAL COSTO DIRECTO	58.299,00

5. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	**27,00%**	15.741,00
IMPREVISTOS	**1,00%**	583,00
UTILIDAD	**5,00%**	2.915,00
	TOTAL COSTO INDIRECTO	19.239,00
	PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO	77.538,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

LOS CODIGOS IDU RELACIONADOS EN EL PRESENTE APU CORRESPONDEN A LOS REGISTRADOS EN EL VISOR DE REFERENCIA 1A. Visor_BPR_2024-I_Fase-II_MO_2025_27-03-2025 (CONTRACTUAL) Y 1A. Visor_BPR_2025-I_Fase-II_MO_2026_11-03-2026

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área Interna, el consultor externo, el contratista constructor o el Interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

CONSORCIO COCO

JUSTIFICACION TECNICA ITEM NP-1

NP-01	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2

El suministro e instalación de entibado tipo EC3 continuo metálico con parales metálicos se requiere para garantizar la estabilidad de las excavaciones durante la ejecución de redes y obras asociadas, especialmente en zonas con profundidad significativa o condiciones de suelo inestables. Este sistema permite prevenir deslizamientos y colapsos de las paredes de la excavación, asegurando condiciones seguras para el personal y las estructuras existentes.

Su utilización responde a las condiciones reales encontradas en obra que no fueron previstas inicialmente, siendo indispensable para cumplir con los criterios de seguridad industrial y garantizar la correcta ejecución de los trabajos, conforme a las buenas prácticas constructivas y a la normatividad aplicable.

Para la estructuración del análisis de precios unitarios del ítem, se tomó como base la información contenida en el visor más reciente del IDU.

Precios de referencia

Clic para ir al inicio | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (JR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APUs en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 19/01/2026
Fecha del último ajuste parcial: 11/03/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Antiguo	EXCAVACIONES	FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y A	6015	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES	M2	$ 58.299	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026

FORMATO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA

BOGOTÁ

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	FDLT-LP-255-2025 - CTO 613-2025
OBJETO	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO COCO	JOTAM MAESTRE DIAB	REPRESENTANTE LEGAL	
INTERVENTOR	AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.	ING. NAYDU LISBETH LOPEZ OROZCO	REPRESENTANTE LEGAL	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	**9. NO PREVISTOS**	**CAPÍTULO**	**REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE**
SUBCAPÍTULO	**N.A.**	**SUBCAPÍTULO**	**REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE**
ÍTEM	**NP-02**	**CÓDIGO**	**3879**

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)	UN	1,00	18/03/2026

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092 (Contractual)	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000,00	0,200	400,00
6026 (Contractual)	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	HR	$ 157.602,00	0,100	15.760,20
				SUBTOTAL	16.160,00

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Varlo Unitario
7084	PLACA FONDO POZO D=1.70m, e=0.20m - EAAB	UN	$ 1.088.510,00	1,000	1.088.510,00
				SUBTOTAL	1.088.510,00

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
				SUBTOTAL	0,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	JR	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6087 (Contractual)	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	$ 79.411,00	100,00%	$ 79.411,00	0,123	$ 9.781
6088 (Contractual)	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	0,123	$ 14.012
					SUBTOTAL	23.794,00
					TOTAL COSTO DIRECTO	1.128.464,00

5. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	**27,00%**	304.685,00
IMPREVISTOS	**1,00%**	11.285,00
UTILIDAD	**5,00%**	56.423,00
	TOTAL COSTO INDIRECTO	372.393,00
	PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO	1.500.857,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

LOS CODIGOS IDU RELACIONADOS EN EL PRESENTE APU CORRESPONDEN A LOS REGISTRADOS EN EL VISOR DE REFERENCIA 1A. Visor_BPR_2024-I_Fase-II_MO_2025_27-03-2025 (CONTRACTUAL) Y 1A. Visor_BPR_2025-I_Fase-II_MO_2026_11-03-2026

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área Interna, el consultor externo, el contratista constructor o el Interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

CONSORCIO COCO


JUSTIFICACION TECNICA ITEM NP-2

NP-02	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)	UN

El suministro e instalación de placa fondo prefabricada de diámetro 1,70 m para pozo de inspección se requiere para garantizar una base estable y adecuada en la construcción, reposición o adecuación de pozos de inspección de la red sanitaria. Este elemento permite una correcta distribución de cargas, asegura la estanqueidad de la estructura y facilita el adecuado funcionamiento hidráulico del pozo.

Su incorporación responde a las condiciones encontradas en obra que no fueron previstas inicialmente, siendo necesaria para asegurar la estabilidad, durabilidad y correcto desempeño de los pozos de inspección, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

Para la estructuración del análisis de precios unitarios del ítem, se tomó como base la información contenida en el visor más reciente del IDU.



Precios de referencia

Clic para ir al inicio | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (JR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APUs en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 19/01/2026
Fecha del último ajuste parcial: 11/03/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3879	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. IN	UN	$ 1.128.464	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026

FORMATO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA

BOGOTÁ

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	FDLT-LP-255-2025 - CTO 613-2025
OBJETO	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO COCO	JOTAM MAESTRE DIAB	REPRESENTANTE LEGAL	
INTERVENTOR	AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.	ING. NAYDU LISBETH LOPEZ OROZCO	REPRESENTANTE LEGAL	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	**9. NO PREVISTOS**	**CAPÍTULO**	**ANDENES Y SARDINELES**
SUBCAPÍTULO	**N.A.**	**SUBCAPÍTULO**	**SARDINELES Y BORDILLOS**
ÍTEM	**NP-03**	**CÓDIGO**	**4049**

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	1,00	18/03/2026

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092 (Contractual)	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000,00	0,500	1.000,00
				SUBTOTAL	1.000,00

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Varlo Unitario
366 (Contractual)	MORTERO 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2)	M3	$ 555.767,00	0,001	555,77
6863	CAÑUELA PREFABRICADA A120 (800x300x225mm)	UN	$ 48.510,00	1,250	60.637,50
				SUBTOTAL	61.193,27

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
				SUBTOTAL	0,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	JR	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6087 (Contractual)	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) (2)	$ 79.411,00	100,00%	$ 158.822,00	0,084	$ 13.317
6088 (Contractual)	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	0,084	$ 9.539
					SUBTOTAL	22.856,55
					TOTAL COSTO DIRECTO	85.050,00

5. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	**27,00%**	22.963,00
IMPREVISTOS	**1,00%**	851,00
UTILIDAD	**5,00%**	4.253,00
	TOTAL COSTO INDIRECTO	28.067,00
	PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO	113.117,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

LOS CODIGOS IDU RELACIONADOS EN EL PRESENTE APU CORRESPONDEN A LOS REGISTRADOS EN EL VISOR DE REFERENCIA 1A. Visor_BPR_2024-I_Fase-II_MO_2025_27-03-2025 (CONTRACTUAL) Y 1A. Visor_BPR_2025-I_Fase-II_MO_2026_11-03-2026

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área Interna, el consultor externo, el contratista constructor o el Interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

CONSORCIO COCO


JUSTIFICACION TECNICA ITEM NP-3

NP-03	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML

El ítem correspondiente al suministro e instalación de cañuela tipo A120 se hace necesario para garantizar el adecuado manejo y conducción de las aguas superficiales en las zonas intervenidas, especialmente en áreas de espacio público y bordes de calzada. Este elemento permite encauzar eficientemente las escorrentías, evitando empozamientos, erosión de la estructura del pavimento y afectaciones a las zonas peatonales, contribuyendo a la conservación de la infraestructura vial y al correcto funcionamiento del sistema de drenaje.

La instalación de la cañuela tipo A120, asentada sobre una cama de mortero de 3 cm con resistencia de 2000 psi, asegura la correcta nivelación, alineación y adherencia del elemento prefabricado, garantizando su estabilidad y durabilidad frente a cargas y condiciones ambientales. Su incorporación obedece a las condiciones reales encontradas en obra, no previstas inicialmente, y es necesaria para dar continuidad hidráulica al sistema de drenaje y cumplir con los criterios técnicos y de calidad exigidos para el espacio público.

Para la estructuración del análisis de precios unitarios del ítem, se tomó como base la información contenida en el visor más reciente del IDU.



Precios de referencia

Clic para ir al inicio | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (JR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APUs en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 19/01/2026
Fecha del último ajuste parcial: 11/03/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4049	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLU	ML	$ 85.050	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026

FORMATO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA

BOGOTÁ

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	FDLT-LP-255-2025 - CTO 613-2025
OBJETO	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO COCO	JOTAM MAESTRE DIAB	REPRESENTANTE LEGAL	
INTERVENTOR	AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.	ING. NAYDU LISBETH LOPEZ OROZCO	REPRESENTANTE LEGAL	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	**9. NO PREVISTOS**	**CAPÍTULO**	**SEÑALIZACIÓN**
SUBCAPÍTULO	**N.A.**	**SUBCAPÍTULO**	**SEÑALES DE TRANSITO**
ÍTEM	**NP-04**	**CÓDIGO**	**5189**

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	1,00	18/03/2026

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092 (Contractual)	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000,00	0,340	680,00
			SUBTOTAL		680,00

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Varlo Unitario
8303	HITO DE 75cm DE ALTURA Y 8cm DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. NO INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE	UN	$ 52.920,00	1,000	52.920,00
			SUBTOTAL		52.920,00

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
				SUBTOTAL	0,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	JR	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6087 (Contractual)	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	$ 79.411,00	100,00%	$ 79.411,00	0,201	$ 15.933
6088 (Contractual)	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	0,201	$ 22.825
				SUBTOTAL		38.757,81
				TOTAL COSTO DIRECTO		92.358,00

5. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	**27,00%**	24.936,66
IMPREVISTOS	**1,00%**	923,58
UTILIDAD	**5,00%**	4.617,90
	TOTAL COSTO INDIRECTO	30.478,14
	PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO	122.836,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

LOS CODIGOS IDU RELACIONADOS EN EL PRESENTE APU CORRESPONDEN A LOS REGISTRADOS EN EL VISOR DE REFERENCIA 1A. Visor_BPR_2024-I_Fase-II_MO_2025_27-03-2025 (CONTRACTUAL) Y 1A. Visor_BPR_2025-I_Fase-II_MO_2026_11-03-2026

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área Interna, el consultor externo, el contratista constructor o el Interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.


CONSORCIO COCO

JUSTIFICACION TECNICA ITEM NP-4

NP-04	HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN

Suministro e instalación de hitos de señalización de 75 cm de altura y 8 cm de diámetro, fabricados en material flexible y provistos de bandas reflectivas color amarillo, utilizados para la canalización, delimitación y advertencia visual del tránsito vehicular. Incluye anclaje al pavimento, alineación, nivelación y todas las actividades necesarias para garantizar su correcta fijación, visibilidad diurna y nocturna, de acuerdo con la normatividad vigente de señalización vial.

Para la estructuración del análisis de precios unitarios del ítem, se tomó como base la información contenida en el visor más reciente del IDU.



Precios de referencia

Clic para ir al inicio | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (JR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APUs en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 19/01/2026
Fecha del último ajuste parcial: 11/03/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	5189	HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON RE	UN	$ 92.358	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026

FORMATO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA

BOGOTÁ

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	FDLT-LP-255-2025 - CTO 613-2025
OBJETO	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO COCO	JOTAM MAESTRE DIAB	REPRESENTANTE LEGAL	
INTERVENTOR	AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.	ING. NAYDU LISBETH LOPEZ OROZCO	REPRESENTANTE LEGAL	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	**9. NO PREVISTOS**	**CAPÍTULO**	**SEÑALIZACIÓN**
SUBCAPÍTULO	**N.A.**	**SUBCAPÍTULO**	**DEMARCACION DE PAVIMENTOS**
ÍTEM	**NP-05**	**CÓDIGO**	**4832**

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5cmx15cmx8.5cm). SUMIN. E INSTAL.	UN	1,00	18/03/2026

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092 (Contractual)	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000,00	1,000	2.000,00
7697	PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELÉCTRICA GENERADA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE	HR	$ 12.624,00	0,160	2.019,84
7701	TALADRO ROTOPERCUTOR - POTENCIA DE 860 A 1030 WATTS	HR	$ 3.363,00	0,160	538,08
				SUBTOTAL	4.557,92

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Varlo Unitario
7587	PEGANTE EPOXICO DE DOS COMPONENTES	KG	$ 153.769,00	0,050	7.688,45
7926	TACHÓN PLÁSTICO REFLECTIVO ALTA RESISTENCIA DE L:40cm x Ancho:15cm x Alto:8cm INCLUYE TORNILLOS DE ANCLAJE	UN	$ 34.323,00	1,000	34.323,00
				SUBTOTAL	42.011,45

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Valor unitario
9172	TRANSPORTE DE EQUIPO DE HASTA 1 TONELADA POR VIAJE DIURNO (UN TRAYECTO) - INCLUYE ESCOLTA	VIAJE	$ 720.000,00	0,030	21.600,00
				SUBTOTAL	21.600,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	JR	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6087 (Contractual)	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	$ 79.411,00	100,00%	$ 79.411,00	0,030	$ 2.385
6088 (Contractual)	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	0,030	$ 3.416
					SUBTOTAL	5.800,72
					TOTAL COSTO DIRECTO	73.970,00

5. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	**27,00%**	19.971,90
IMPREVISTOS	**1,00%**	739,70
UTILIDAD	**5,00%**	3.698,50
	TOTAL COSTO INDIRECTO	24.410,10
	PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO	98.380,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

LOS CODIGOS IDU RELACIONADOS EN EL PRESENTE APU CORRESPONDEN A LOS REGISTRADOS EN EL VISOR DE REFERENCIA 1A. Visor_BPR_2024-I_Fase-II_MO_2025_27-03-2025 (CONTRACTUAL) Y 1A. Visor_BPR_2025-I_Fase-II_MO_2026_11-03-2026

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área Interna, el consultor externo, el contratista constructor o el Interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

CONSORCIO COCO


JUSTIFICACION TECNICA ITEM NP-5

NP-05	SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5cmx15cmx8.5cm). SUMIN. E INSTAL.	UN

La inclusión de segregadores de bicicleta se originó por la necesidad de dar continuidad funcional a las secciones viales intervenidos, ya que durante la ejecución se pueden presentar ajustes en anchos, alineamientos y distribución de la vía que requerían un elemento que delimitara físicamente los espacios definidos.

Se evidenció que, sin un elemento de confinamiento, las franjas destinadas a la circulación ciclista perdían su funcionalidad al ser ocupadas parcialmente por otros usuarios, afectando la eficiencia operativa del corredor. En este sentido, el segregador permite materializar en obra la geometría proyectada, asegurando que cada componente de la vía cumpla su propósito.

Para la estructuración del análisis de precios unitarios del ítem, se tomó como base la información contenida en el visor más reciente del IDU.



Precios de referencia

Clic para ir al inicio | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (JR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APUs en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 19/01/2026
Fecha del último ajuste parcial: 11/03/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4832	SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO A	UN	$ 73.970	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026

FORMATO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA

BOGOTÁ

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	FDLT-LP-255-2025 - CTO 613-2025
OBJETO	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO COCO	JOTAM MAESTRE DIAB	REPRESENTANTE LEGAL	
INTERVENTOR	AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.	ING. NAYDU LISBETH LOPEZ OROZCO	REPRESENTANTE LEGAL	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	**9. NO PREVISTOS**	**CAPÍTULO**	**DEMOLICIONES**
SUBCAPÍTULO	**N.A.**	**SUBCAPÍTULO**	**DEMOLICIONES**
ÍTEM	**NP-06**	**CÓDIGO**	**7512**

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	UN	1,00	18/03/2026

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092 (Contractual)	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000,00	0,670	1.340,00
6026 (Contractual)	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	HR	$ 157.602,00	2,500	394.005,00
7439 (Contractual)	MARTILLO DEMOLEDOR NEUMÁTICO - GOLPES POR MINUTO DE 1100 A 1680 - CONSUMO DE AIRE DE 57 A 85 CFM	HR	$ 5.950,00	2,500	14.875,00
				SUBTOTAL	410.220,00

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Varlo Unitario
				SUBTOTAL	0,00

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Valor unitario
9172	TRANSPORTE DE EQUIPO DE HASTA 1 TONELADA POR VIAJE DIURNO (UN TRAYECTO) - INCLUYE ESCOLTA	VIAJE	$ 720.000,00	0,200	144.000,00
				SUBTOTAL	144.000,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	JR	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6087 (Contractual)	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) (2)	$ 79.411,00	100,00%	$ 158.822,00	0,503	$ 79.828
					SUBTOTAL	79.827,72
					TOTAL COSTO DIRECTO	634.048,00

5. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	**27,00%**	171.192,96
IMPREVISTOS	**1,00%**	6.340,48
UTILIDAD	**5,00%**	31.702,40
	TOTAL COSTO INDIRECTO	209.236,00
	PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO	843.284,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

LOS CODIGOS IDU RELACIONADOS EN EL PRESENTE APU CORRESPONDEN A LOS REGISTRADOS EN EL VISOR DE REFERENCIA 1A. Visor_BPR_2024-I_Fase-II_MO_2025_27-03-2025 (CONTRACTUAL) Y 1A. Visor_BPR_2025-I_Fase-II_MO_2026_11-03-2026

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área Interna, el consultor externo, el contratista constructor o el Interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.


JUSTIFICACION TECNICA ITEM NP-6

NP-06	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	UN

La demolición del pozo con las dimensiones indicadas se hace necesaria debido a que, en algunos segmentos del proyecto, se requiere reformar y reforzar estructuras existentes que presentan condiciones que no permiten su adecuación sin intervención previa. Esta actividad es indispensable para garantizar la correcta ejecución de las obras proyectadas y la estabilidad de las nuevas estructuras asociadas a la red.

El ítem incluye el cargue, retiro, transporte y disposición final de los escombros en sitio autorizado, asegurando el cumplimiento de las condiciones técnicas, ambientales y de seguridad durante la ejecución de los trabajos. Su incorporación obedece a situaciones encontradas en obra que no fueron previstas inicialmente y resulta necesaria para la correcta continuidad del proyecto.

Para la estructuración del análisis de precios unitarios del ítem, se tomó como base la información contenida en el visor más reciente del IDU.



Precios de referencia

Clic para ir al inicio | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (JR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APUs en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 19/01/2026
Fecha del último ajuste parcial: 11/03/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Nuevo - Tinta	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	7512	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, D	UN	$ 634.048	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026

FORMATO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA

BOGOTÁ

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	FDLT-LP-255-2025 - CTO 613-2025
OBJETO	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO COCO	JOTAM MAESTRE DIAB	REPRESENTANTE LEGAL	
INTERVENTOR	AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.	ING. NAYDU LISBETH LOPEZ OROZCO	REPRESENTANTE LEGAL	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	**9. NO PREVISTOS**	**CAPÍTULO**	**N/A**
SUBCAPÍTULO	**N.A.**	**SUBCAPÍTULO**	**N/A**
ÍTEM	**NP-07**	**CÓDIGO**	**N/A**

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	1,00	18/03/2026

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092 (Contractual)	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 317,64	1,000	317,64
				SUBTOTAL	317,64

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Varlo Unitario
COTIZACION	GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m	M2	$ 50.000,00	1,020	51.000,00
				SUBTOTAL	51.000,00

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Valor unitario
				SUBTOTAL	0,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	JR	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6087 (Contractual)	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) (2)	$ 79.411,00	100,00%	$ 158.822,00	0,025	$ 3.971
					SUBTOTAL	3.970,55
					TOTAL COSTO DIRECTO	55.288,00

5. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	**27,00%**	14.928,00
IMPREVISTOS	**1,00%**	553,00
UTILIDAD	**5,00%**	2.764,00
	TOTAL COSTO INDIRECTO	18.245,00
	PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO	73.533,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

LOS CODIGOS IDU RELACIONADOS EN EL PRESENTE APU CORRESPONDEN A LOS REGISTRADOS EN EL VISOR DE REFERENCIA 1A. Visor_BPR_2024-I_Fase-II_MO_2025_27-03-2025 (CONTRACTUAL) Y 1A. Visor_BPR_2025-I_Fase-II_MO_2026_11-03-2026

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área Interna, el consultor externo, el contratista constructor o el Interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

CONSORCIO COCO

JUSTIFICACION TECNICA ITEM NP-7

NP-07	GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2

Ítem necesario para reforzar la estructura del suelo, mejorando su capacidad de soporte y distribución de cargas. Hace parte integral de los diseños aprobados por la interventoría, en los cuales, con base en los ensayos y estudios geotécnicos realizados en la zona, se determinó que esta solución es la más adecuada para las condiciones reales del terreno, garantizando la estabilidad, el adecuado desempeño estructural y la durabilidad de la intervención.

Dado que este ítem no se encuentra contemplado dentro del visor de precios de referencia del IDU, fue necesario realizar un proceso de análisis de mercado mediante la solicitud de tres (3) cotizaciones a proveedores de este material. Con base en este ejercicio, se seleccionó la oferta económicamente más favorable y que cumple con las especificaciones técnicas requeridas, la cual fue utilizada como insumo para la estructuración del Análisis de Precios Unitarios (APU).

NP-03 GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (m^2)			
PROPUESTA ECONOMICA			
	1	**2**	**3**
NOMBRE	FERRESTAR DE COLOMBIA	PROBILT	GEOMATRIX
PRESENTACION	GEOMALLA MULTIDIRECCIONAL	GEOMALLA MULTIDIRECCIONAL	GEOMALLA MULTIDIRECCIONAL
COSTO CON IVA	$ 50.000,00	$ 61.107,00	$ 60.601,00
SE PRESENTAN 3 COTIZACIONES DE LAS CUALES LA MAS ECONOMICA ES LA DE FERRESTAR COLOMBIA			

FERRESTAR DE COLOMBIA LTDA
Nit. 900.171.128-8
Tel. 601- 6054845
Cel. 3174209242

Fecha:	10□03□202□	No cotizacion:	LC009□
Cliente:	CONSORCIO COCO □ □□□ 902010258-8	Asesor comercial:	LUIS CARLOS
Señor(a):	EDGAR M□□□□ □□	Validez de la oferta:	30 DIAS

ITEM	IMAGEN				VALOR $
		1	ROLLO GEOMALLA TRIAXIAL ROLLODE 4.87 MTS X 100 MTS	$ 20.462.184,00	$ 20.462.184,0
					$ 0,0
					$ 0,0
					$ 0,0

OBSERVACIONES :		
	□□□□O□□□	$ 20.462.184,0
	□□□□□□	$ 3.887.815,0
	□O□□□	$ 24.349.999,0

□□□□or□co□ □rc□□□□□□□□C□r□o□□C□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□

PROBILT
INGENIERÍA EN EVOLUCIÓN

COTIZACIÓN PROFORMA No: CPF-938

ProBilt S.A.S	**NIT.901.102.084**	**Fecha de emisión:**	13 de Marzo de 2026
Av carrera 45 No. 108A 50 piso 6 Edificio Bosch		**Empresa:**	CONSORCIO COCO NIT: 902010258-8
Bogotá D.C.			
PBX: +57 311 2415328		**En atención a:**	EDGAR MARTINEZ
		Cargo:	DIR COMPRAS
Disponibilidad:	Inmediata	**Dirección:**	CR 48 20 114 OF 620
Validéz de la oferta:	15 días		
Forma de pago:	Anticipado	**Coreo electrónico:**	
Tiempo de entrega:	3 días hábiles	**PBX:**	
Sitio de entrega:	Bogotá	**Celular:**	321 375 18 59

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	$ /unidad	TOTAL $
PROGrid TX 160 Geomalla Multidireccional (Rollo de 4,87m x 100m)	m2	487	$ 51.350,00	$ 25.007.450
		SUBTOTAL		$ 25.007.450
		IVA 19%		$ 4.751.416
		TOTAL $		**$ 29.758.866**

Notas

Consignar a nombre de:

PROBILT SAS NIT,901,102,084-5
Cuenta Corriente Banlombia No.
CCTE No. 17288966558
Enviar copia de consignación al siguiente correo electrónico:
admonprobilt@gmail.com



Ing. Pedro Luis Garzón B.
Director Comercial
PROBILT SAS
Cel 320 8437518
gcomercial@probilt.com.co

GRACIAS POR SU INTERÉS!

GEOMATRIX S.A.S.
NIT 800.021.390-1 IVA RÉGIMEN COMÚN
Calle 15 No. 72 - 72 Teléfono: 57 (1) 4249999 Fax: 57 (1) 4110980
BOGOTÁ D. C. COLOMBIA
E-MAIL: geomatrix@geomatrix.com.co - http://www.geomatrix.com

COTIZACIÓN PROFORMA No. CN □□□□CO□□ORC□□COCO

□□□□	□□	0□	□0□6

EMPRESA:	CO□□ORC□□COCO	**NIT/CC:**	□0□0□0□□□□
CONTACTO:	EDGAR MARTÍNEZ	**DIRECCIÓN:**	CR 48 20 114 OF 620
TELÉFONO:	3213751859	**CELULAR:**	3213751859
LOCALIZACIÓN:	ANTIOQUIA - MEDELLÍN	**E-MAIL:**	

En atención a su solicitud relacionamos los precios y condiciones para el suministro de materiales:

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
FORTGRID BX-300 FORTGRID BX – 300: geomalla biaxial elaborada con el exclusivo Multifilamento G5 de Poliéster de Alta Tenacidad (PET). Ancho: 4,15 m ; Longitud: 20 m. Se oferta 1 rollo completo.	83,00	m2	$ 50.925,00	$ 4.226.775,00

SON:	CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS.	**TOTAL:**	$4.226.775,00
		I.V.A.:	$803.087,25
		TOTAL CON I.V.A.:	$5.029.862,25

OBSERVACIONES:
El costo del flete es asumido por Geomatrix para entrega en la ciudad de Bogotá.

FORMA DE PAGO: ANTICIADO O CRÉDITO A 30 DÍAS CON PREVIO ESTUDIO.
FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO: Orden de compra dirigida a GEOMATRIX S.A.S. NIT: 800.021.390-1
DISPONIBILIDAD: De acuerdo a verificación de inventario
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 días

**NOTA: Somos Grandes Contribuyentes, somos régimen común.
Favor no efectuar retención a título de renta, somos autoretenedores en el impuesto de renta y complementarios Resolución DIAN No. 007241 de 2009/07/10.
Favor no efectuar retención a título de impuesto sobre las ventas, somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas Resolución DIAN No. 008207 de 2009/08/04, la cual entra en vigencia a partir del 1 de Septiembre de 2009.**

**Si efectúa pago por consignación bancaria hacerlo a nombre de Geomatrix S.A. NIT. 800.021.390-1 en:
Davivienda Cuenta de Ahorros No. 007200654270
Bancolombia Cuenta Corriente No. 03135192667
Favor enviar consignación al Fax: 57 (1) 4110980**

Adrián Armando Romero Sáenz
Ing. Civil – Asesor Especialista en Geosintéticos
Cel: 57 300 4055998
aaromero@geomatrix.com.co

FORMATO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA

BOGOTÁ

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	FDLT-LP-255-2025 - CTO 613-2025
OBJETO	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO COCO	JOTAM MAESTRE DIAB	REPRESENTANTE LEGAL	
INTERVENTOR	AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.	ING. NAYDU LISBETH LOPEZ OROZCO	REPRESENTANTE LEGAL	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	**9. NO PREVISTOS**	**CAPÍTULO**	**RELLENOS Y CAPAS GRANULARES**
SUBCAPÍTULO	**N.A.**	**SUBCAPÍTULO**	**CAPAS GRANULARES**
ÍTEM	**NP-08**	**CÓDIGO**	**8617**

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	1,00	18/03/2026

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092 (Contractual)	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000,00	0,018	36,00
6013 (Contractual)	MOTONIVELADORA - MASA DE 16 A 18 TONELADAS - POTENCIA DE 93 A 122 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	$ 297.048,00	0,040	11.881,92
6062 (Contractual)	VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO LISO - MASA DE 10 A 13 TONELADAS - AMPLITUD DE COMPACTACIÓN MÁXIMA 2mm - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	$ 184.305,00	0,040	7.372,20
6567 (Contractual)	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA	HR	$ 107.100,00	0,040	4.284,00
				SUBTOTAL	23.574,12

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Varlo Unitario
11969	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50)	M3	$ 92.716,00	1,300	120.530,80
				SUBTOTAL	120.530,80

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Valor unitario
7462 (Contractual)	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	$ 1.760,00	22,000	38.720,00
				SUBTOTAL	38.720,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	JR	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6087 (Contractual)	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) (2)	$ 79.411,00	100,00%	$ 158.822,00	0,032	$ 5.073
6088 (Contractual)	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	0,032	$ 3.634
					SUBTOTAL	8.707,26
					TOTAL COSTO DIRECTO	191.532,00

5. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	**27,00%**	51.714,00
IMPREVISTOS	**1,00%**	1.915,00
UTILIDAD	**5,00%**	9.577,00
}		
	TOTAL COSTO INDIRECTO	63.206,00
	PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO	254.738,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

LOS CODIGOS IDU RELACIONADOS EN EL PRESENTE APU CORRESPONDEN A LOS REGISTRADOS EN EL VISOR DE REFERENCIA 1A. Visor_BPR_2024-I_Fase-II_MO_2025_27-03-2025 (CONTRACTUAL) Y 1A. Visor_BPR_2025-I_Fase-II_MO_2026_11-03-2026

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área Interna, el consultor externo, el contratista constructor o el Interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

Bogotá D.C, 24 de marzo de 2026

Señores:

AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.
Atn Ing Santiago Carrillo Vargas.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA FDLT-CTO-613-2025

OBJETO: "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

ASUNTO: ALCANCE MATERIALES SUGERIDOS DISEÑOS DE PAVIMENTOS

Respetados señores,

En atención al informe de estudios y diseños de pavimentos elaborado para los segmentos viales objeto del Contrato COP-613-2025, y en calidad de alcance técnico al mismo, se presenta el siguiente concepto dirigido a la interventoría, con el fin de complementar los criterios asociados al uso de materiales reciclados dentro de la estructura proyectada.

A partir del análisis de la exploración geotécnica, los ensayos de caracterización y la evaluación granulométrica de los materiales existentes en la estructura, se evidencia que dichos materiales no cumplen con los rangos establecidos por las especificaciones del IDU para su utilización directa como capas granulares estructurales, particularmente por la presencia de contenidos de finos superiores a los límites permisibles y desviaciones en la gradación . Esta condición implica que su reutilización sin procesamiento comprometería la capacidad estructural, el comportamiento hidráulico y la durabilidad del pavimento.

En este contexto, y considerando que el diseño contempla el uso de materiales reciclados dentro de las capas granulares, se considera técnicamente recomendable y procedente la utilización de Base Granular Reciclada tipo AR-BG-38, en reemplazo de materiales reciclados sin control o bases convencionales que no garanticen uniformidad y desempeño estructural.

La AR-BG-38 se caracteriza por presentar una gradación controlada conforme a las especificaciones IDU para bases granulares, contenido de finos dentro de rangos admisibles, alta capacidad de compactación y un comportamiento mecánico homogéneo,

lo cual permite desarrollar módulos resilientes adecuados para el diseño estructural bajo metodología AASHTO. Así mismo, al provenir de procesos de reciclaje controlado (trituración, clasificación y ajuste granulométrico), se minimizan las heterogeneidades propias de los materiales existentes en sitio.

Desde el punto de vista estructural, la incorporación de la AR-BG-38 permite incrementar la capacidad portante de la estructura de pavimento, optimizar la distribución de esfuerzos hacia las capas inferiores y reducir la susceptibilidad a deformaciones permanentes. Este aspecto cobra especial relevancia considerando que la subrasante identificada corresponde a suelos finos de comportamiento arcilloso, con alta sensibilidad a la humedad y potencial de variación volumétrica, lo cual exige capas superiores con adecuada rigidez y estabilidad
.

Adicionalmente, la AR-BG-38 presenta un comportamiento favorable frente al drenaje, permitiendo reducir la acumulación de humedad dentro de la estructura y mitigar fenómenos como pérdida de soporte, bombeo y deterioro prematuro, condiciones coherentes con el régimen climático del área de estudio caracterizado por alta humedad relativa y presencia significativa de días de lluvia.

En complemento, el uso de este material se alinea con los lineamientos de sostenibilidad del proyecto, permitiendo el aprovechamiento de materiales reciclados bajo un esquema técnico controlado que garantiza cumplimiento normativo y desempeño estructural.

En consecuencia, este concepto concluye que, para las capas de base granular contempladas dentro de las alternativas de diseño, es técnicamente viable y recomendable la utilización de la Base Granular Reciclada tipo AR-BG-38, en la medida en que garantiza condiciones adecuadas de soporte, estabilidad, durabilidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas vigentes, constituyéndose en una solución óptima frente a las condiciones geotécnicas y estructurales identificadas en los segmentos viales objeto de intervención.

Se remite el presente concepto para su conocimiento y validación por parte de la interventoría.

Atentamente,

JOSÉ MIGUEL ALDANA ARÉVALO

ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

CONTRATO DE OBRA 613-2025

CONSORCIO COCO
E-mail: consorciococo2025@gmail.com; Tel 601-4770190


CONSORCIO COCO

JUSTIFICACION TECNICA ITEM NP-8

NP-08	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibro compactador)	M3

El suministro y colocación de agregados reciclados para subbase granular (AR_SBG50) se hace necesario para la conformación de la estructura, conforme a los diseños de pavimentos establecidos para el proyecto. Este material cumple la función de soporte estructural inferior, permitiendo una adecuada distribución de cargas hacia la subrasante y contribuyendo a la estabilidad del paquete estructural del pavimento. El extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibrocompactador garantizan el cumplimiento de los parámetros técnicos de densidad y desempeño requeridos. Adicionalmente, el uso de agregados reciclados contribuye al cumplimiento de la estrategia de recircularidad y aprovechamiento de materiales, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 507 de 2023, promoviendo criterios de sostenibilidad y reducción del impacto ambiental en la ejecución del proyecto.

Para la estructuración del análisis de precios unitarios del ítem, se tomó como base la información contenida en el visor más reciente del IDU.



Precios de referencia

Clic para ir al inicio | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (JR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APUs en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 19/01/2026
Fecha del último ajuste parcial: 11/03/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Nuevo DTE	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	8617	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_	M3	$ 191.532	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026

FORMATO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA

BOGOTÁ

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	FDLT-LP-255-2025 - CTO 613-2025
OBJETO	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO COCO	JOTAM MAESTRE DIAB	REPRESENTANTE LEGAL	
INTERVENTOR	AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.	ING. NAYDU LISBETH LOPEZ OROZCO	REPRESENTANTE LEGAL	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	**9. NO PREVISTOS**	**CAPÍTULO**	**RELLENOS Y CAPAS GRANULARES**
SUBCAPÍTULO	**N.A.**	**SUBCAPÍTULO**	**CAPAS GRANULARES**
ÍTEM	**NP-09**	**CÓDIGO**	**4907**

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	1,00	18/03/2026

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092 (Contractual)	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000,00	0,500	1.000,00
5661 (Contractual)	VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA - VIBRACIONES POR MINUTO DE 5320 A 5880 - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	$ 57.341,00	0,083	4.759,30
				SUBTOTAL	5.759,30

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Varlo Unitario
6098 (Contractual)	AGUA	LT	$ 30,00	10,000	300,00
7976	SUBBASE GRANULAR PEA (SBG_PEA)	M3	$ 69.020,00	1,300	89.726,00
				SUBTOTAL	90.026,00

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Valor unitario
7462 (Contractual)	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	$ 1.760,00	26,250	46.200,00
				SUBTOTAL	46.200,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	JR	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6087 (Contractual)	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) (2)	$ 79.411,00	100,00%	$ 158.822,00	0,110	$ 17.514
6088 (Contractual)	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	0,110	$ 12.545
					SUBTOTAL	30.059,48
					TOTAL COSTO DIRECTO	172.045,00

5. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	**27,00%**	46.451,90
IMPREVISTOS	**1,00%**	1.720,50
UTILIDAD	**5,00%**	8.602,30
	TOTAL COSTO INDIRECTO	56.775,00
	PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO	228.820,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

LOS CODIGOS IDU RELACIONADOS EN EL PRESENTE APU CORRESPONDEN A LOS REGISTRADOS EN EL VISOR DE REFERENCIA 1A. Visor_BPR_2024-I_Fase-II_MO_2025_27-03-2025 (CONTRACTUAL) Y 1A. Visor_BPR_2025-I_Fase-II_MO_2026_11-03-2026

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área Interna, el consultor externo, el contratista constructor o el Interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

CONSORCIO COCO


JUSTIFICACION TECNICA ITEM NP-9

NP-09	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3

El suministro y colocación de subbase granular peatonal (SBG_PEA) se hace necesario para la conformación de la estructura de soporte en zonas de tránsito peatonal, tales como andenes y senderos, garantizando una superficie estable y uniforme para la ejecución de los acabados finales. Este material permite una adecuada distribución de cargas y asegura el correcto comportamiento estructural de las áreas peatonales, de acuerdo con los diseños del proyecto.

El extendido manual, nivelación, humedecimiento y compactación permiten ajustar el material a las condiciones geométricas del espacio intervenido y cumplir con los parámetros técnicos exigidos. Su incorporación responde a condiciones reales encontradas en obra que no fueron previstas inicialmente y es indispensable para garantizar la funcionalidad, seguridad y durabilidad del espacio público peatonal.

Para la estructuración del análisis de precios unitarios del ítem, se tomó como base la información contenida en el visor más reciente del IDU.



Precios de referencia

Clic para ir al inicio | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (JR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APUs en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 19/01/2026
Fecha del último ajuste parcial: 11/03/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4907	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, E	M3	$ 172.045	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026

FORMATO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA

BOGOTÁ

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	FDLT-LP-255-2025 - CTO 613-2025
OBJETO	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO COCO	JOTAM MAESTRE DIAB	REPRESENTANTE LEGAL	
INTERVENTOR	AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.	ING. NAYDU LISBETH LOPEZ OROZCO	REPRESENTANTE LEGAL	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	**9. NO PREVISTOS**	**CAPÍTULO**	**REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE**
SUBCAPÍTULO	**N.A.**	**SUBCAPÍTULO**	**REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE**
ÍTEM	**NP-10**	**CÓDIGO**	**7901**

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
MANEJO DE AGUAS (INCLUYE MOTOBOMBA CON COMBUSTIBLE Y OPERADOR)	HR	1,00	18/03/2026

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092 (Contractual)	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000,00	0,050	100,00
7436	MOTOBOMBA SUMERGIBLE Ø 2" O 3" - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	$ 68.508,00	0,125	8.563,50
			SUBTOTAL		8.663,50

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Varlo Unitario
			SUBTOTAL		0,00

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Valor unitario
			SUBTOTAL		0,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	JR	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6087 (Contractual)	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	$ 79.411,00	100,00%	$ 79.411,00	0,042	$ 3.321
					SUBTOTAL	3.320,69
					TOTAL COSTO DIRECTO	11.984,00

5. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	**27,00%**	3.236,00
IMPREVISTOS	**1,00%**	120,00
UTILIDAD	**5,00%**	599,00
	TOTAL COSTO INDIRECTO	3.955,00
	PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO	15.939,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

LOS CODIGOS IDU RELACIONADOS EN EL PRESENTE APU CORRESPONDEN A LOS REGISTRADOS EN EL VISOR DE REFERENCIA 1A. Visor_BPR_2024-I_Fase-II_MO_2025_27-03-2025 (CONTRACTUAL) Y 1A. Visor_BPR_2025-I_Fase-II_MO_2026_11-03-2026

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área Interna, el consultor externo, el contratista constructor o el Interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

CONSORCIO COCO


JUSTIFICACION TECNICA ITEM NP-10

NP-10	MANEJO DE AGUAS (INCLUYE MOTOBOMBA CON COMBUSTIBLE Y OPERADOR)	HR

Durante la ejecución se presentaron infiltraciones y acumulaciones de agua (lluvias y nivel freático), lo que obligó a implementar sistemas de bombeo para mantener condiciones secas de trabajo. Adicionalmente, debido al cambio de tubería y a las precipitaciones recurrentes en la zona, se hace necesario realizar el bombeo continuo de agua con el fin de garantizar condiciones adecuadas para la correcta ejecución de actividades como excavaciones, instalación y reemplazo de tuberías.

Este manejo es indispensable para evitar inestabilidad de taludes, pérdida de capacidad portante del suelo, afectaciones en la instalación de redes y riesgos para el personal en obra, asegurando así la calidad constructiva, la seguridad y el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.

Para la estructuración del análisis de precios unitarios del ítem, se tomó como base la información contenida en el visor más reciente del IDU.



Precios de referencia

Clic para ir al inicio | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (JR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APUs en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 19/01/2026
Fecha del último ajuste parcial: 11/03/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Nuevo - DTM	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7901	MANEJO DE AGUAS (INCLUYE MOTOBOMBA CON COMBU	HR	$ 11.984	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026

FORMATO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA

BOGOTÁ

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	FDLT-LP-255-2025 - CTO 613-2025
OBJETO	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO COCO	JOTAM MAESTRE DIAB	REPRESENTANTE LEGAL	
INTERVENTOR	AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.	ING. NAYDU LISBETH LOPEZ OROZCO	REPRESENTANTE LEGAL	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	**9. NO PREVISTOS**	**CAPÍTULO**	**REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE**
SUBCAPÍTULO	**N.A.**	**SUBCAPÍTULO**	**REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE**
ÍTEM	**NP-11**	**CÓDIGO**	**3712**

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA)	UN	1,00	18/03/2026

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092 (Contractual)	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000,00	1,004	2.007,80
6026 (Contractual)	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	HR	$ 157.602,00	3,000	472.806,00
				SUBTOTAL	474.813,80

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Varlo Unitario
7091	SUMIDERO LATERAL SL-100	UN	$ 1.851.353,00	1,000	1.851.353,00
7096	TAPA SUMIDERO LATERAL SL-100	UN	$ 1.881.348,00	1,000	1.881.348,00
7104 (Contractual)	REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45	UN	$ 350.035,00	1,000	350.035,00
				SUBTOTAL	4.082.736,00

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Valor unitario
				SUBTOTAL	0,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	JR	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6087 (Contractual)	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	$ 79.411,00	100,00%	$ 79.411,00	2,740	$ 217.617
6088 (Contractual)	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	2,740	$ 311.754
					SUBTOTAL	529.370,96
					TOTAL COSTO DIRECTO	5.086.921,00

5. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	**27,00%**	1.373.469,00
IMPREVISTOS	**1,00%**	50.869,00
UTILIDAD	**5,00%**	254.346,00
	TOTAL COSTO INDIRECTO	1.678.684,00
	PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO	6.765.605,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

LOS CODIGOS IDU RELACIONADOS EN EL PRESENTE APU CORRESPONDEN A LOS REGISTRADOS EN EL VISOR DE REFERENCIA 1A. Visor_BPR_2024-I_Fase-II_MO_2025_27-03-2025 (CONTRACTUAL) Y 1A. Visor_BPR_2025-I_Fase-II_MO_2026_11-03-2026

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área Interna, el consultor externo, el contratista constructor o el Interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.


CONSORCIO COCO

JUSTIFICACION TECNICA ITEM NP-11

NP-11	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA)	UN

Este ítem es esencial para la recolección y drenaje eficiente de aguas pluviales, cumpliendo con las especificaciones técnicas de la EAAB. El sumidero prefabricado, incluye tapa y rejilla, garantizando una instalación rápida y eficaz. Su implementación asegura un sistema de drenaje confiable que previene la acumulación de agua en la vía, optimizando la funcionalidad del proyecto y cumpliendo con las normativas vigentes en cuanto a seguridad y gestión de aguas superficiales.

Para la estructuración del análisis de precios unitarios del ítem, se tomó como base la información contenida en el visor más reciente del IDU.



Precios de referencia

Clic para ir al inicio | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (JR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APUs en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 19/01/2026
Fecha del último ajuste parcial: 11/03/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3712	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO. IN	UN	$ 5.086.921	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026

FORMATO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA

BOGOTÁ

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	FDLT-LP-255-2025 - CTO 613-2025
OBJETO	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO COCO	JOTAM MAESTRE DIAB	REPRESENTANTE LEGAL	
INTERVENTOR	AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.	ING. NAYDU LISBETH LOPEZ OROZCO	REPRESENTANTE LEGAL	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	**9. NO PREVISTOS**	**CAPÍTULO**	**RELLENOS Y CAPAS GRANULARES**
SUBCAPÍTULO	**N.A.**	**SUBCAPÍTULO**	**CAPAS GRANULARES**
ÍTEM	**NP-12**	**CÓDIGO**	**N/A**

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	1,00	18/03/2026

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092 (Contractual)	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000,00	0,018	36,00
6013 (Contractual)	MOTONIVELADORA - MASA DE 16 A 18 TONELADAS - POTENCIA DE 93 A 122 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	$ 297.048,00	0,027	8.106,36
6062 (Contractual)	VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO LISO - MASA DE 10 A 13 TONELADAS - AMPLITUD DE COMPACTACIÓN MÁXIMA 2mm - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	$ 184.305,00	0,027	5.029,63
6567 (Contractual)	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA	HR	$ 107.100,00	0,027	2.922,73
				SUBTOTAL	16.094,71

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Varlo Unitario
12245	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38)	M3	$ 107.701,00	1,300	140.011,30
				SUBTOTAL	140.011,30

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Valor unitario
7462 (Contractual)	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	$ 1.760,00	18,000	31.680,00
				SUBTOTAL	31.680,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	JR	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6087 (Contractual)	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) (2)	$ 79.411,00	100,00%	$ 158.822,00	0,027	$ 4.334
6088 (Contractual)	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	0,027	$ 3.105
					SUBTOTAL	7.438,77
					TOTAL COSTO DIRECTO	195.225,00

5. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	**27,00%**	52.710,46
IMPREVISTOS	**1,00%**	1.952,25
UTILIDAD	**5,00%**	9.761,25
	TOTAL COSTO INDIRECTO	64.424,00
	PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO	259.649,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

LOS CODIGOS IDU RELACIONADOS EN EL PRESENTE APU CORRESPONDEN A LOS REGISTRADOS EN EL VISOR DE REFERENCIA 1A. Visor_BPR_2024-I_Fase-II_MO_2025_27-03-2025 (CONTRACTUAL) Y 1A. Visor_BPR_2025-I_Fase-II_MO_2026_11-03-2026

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área Interna, el consultor externo, el contratista constructor o el Interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

CONSORCIO COCO

JUSTIFICACION TECNICA ITEM NP-13


NP-12	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3

Suministro y conformación de base granular en material reciclado tipo AR_BG38, utilizado como parte del paquete estructural de pavimento conforme a los diseños aprobados por la Interventoría. Incluye suministro del material, transporte interno, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación mediante vibro compactador hasta alcanzar la densidad especificada en las normas técnicas vigentes. Este material hace parte de la estrategia de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición (RCD), contribuyendo al cumplimiento de los criterios de economía circular y metas de recircularidad establecidas en la normativa vigente, garantizando desempeño estructural y estabilidad de la capa granular.

Teniendo en cuenta que el material AR_BG38 no se encuentra contemplado dentro de los Análisis de Precios Unitarios (APU) del visor del IDU, para la estructuración del presente ítem se tomó como referencia el APU correspondiente a la base granular convencional tipo BGA_38. De este análisis se conservaron los componentes asociados a equipos, rendimientos y mano de obra, en razón a que las actividades constructivas (extendido, nivelación, humedecimiento y compactación) mantienen condiciones de ejecución equivalentes.

La variación se realizó específicamente en el componente de materiales, sustituyendo el agregado convencional por material reciclado tipo AR_BG38, ajustando su costo conforme a condiciones reales de suministro.

APU BASE



PRECIO DEL INSUMO.



FORMATO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA

BOGOTÁ

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	FDLT-LP-255-2025 - CTO 613-2025			
OBJETO	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C			
Responsables	**Compañía**	**Nombre Responsable**	**Cargo**	**Firma Responsables**
CONTRATISTA	CONSORCIO COCO	JOTAM MAESTRE DIAB	REPRESENTANTE LEGAL	
INTERVENTOR	AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.	ING. NAYDU LISBETH LOPEZ OROZCO	REPRESENTANTE LEGAL	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		**BASE IDU**	
CAPÍTULO	**9. NO PREVISTOS**	**CAPÍTULO**	**GEOSINTETICOS**
SUBCAPÍTULO	**N.A.**	**SUBCAPÍTULO**	**GEOTEXTILES**
ÍTEM	**NP-13**	**CÓDIGO**	**4033**

Descripción	**U.M.**	**Cantidad**	**Fecha**
GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	1,00	18/03/2026

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	**Descripción**	**U.M.**	**Tarifa**	**Rendimiento**	**Vr. Unitario**
6092 (Contractual)	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000,00	0,100	200,00
				SUBTOTAL	200,00

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	**Descripción**	**U.M.**	**Vr. Unitario**	**Cantidad**	**Varlo Unitario**
6958	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M, Y RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 2400 N	M2	$ 19.656,00	1,150	22.604,40
				SUBTOTAL	22.604,40

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	**Descripción**	**U.M.**	**Vr. Unitario**	**Cantidad**	**Valor unitario**
				SUBTOTAL	0,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	**Descripción**	**JR**	**Prestaciones**	**Vr. Unitario**	**Rendimiento**	**Valor unitario**
6087 (Contractual)	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	$ 79.411,00	100,00%	$ 79.411,00	0,012	$ 942
6088 (Contractual)	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	0,012	$ 1.350
					SUBTOTAL	2.291,65
					TOTAL COSTO DIRECTO	25.096,00

5. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	**Porcentaje**	**Valor Total**
ADMINISTRACIÓN	**27,00%**	6.775,92
IMPREVISTOS	**1,00%**	250,96
UTILIDAD	**5,00%**	1.254,80
	TOTAL COSTO INDIRECTO	8.282,00
	PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO	33.378,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

LOS CODIGOS IDU RELACIONADOS EN EL PRESENTE APU CORRESPONDEN A LOS REGISTRADOS EN EL VISOR DE REFERENCIA 1A. Visor_BPR_2024-I_Fase-II_MO_2025_27-03-2025 (CONTRACTUAL) Y 1A. Visor_BPR_2025-I_Fase-II_MO_2026_11-03-2026

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área Interna, el consultor externo, el contratista constructor o el Interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

CONSORCIO COCO

JUSTIFICACION TECNICA ITEM NP-14

NP-13	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2

La implementación de este elemento tiene como finalidad principal evitar la contaminación de las capas granulares por migración de finos provenientes de la subrasante, así como mejorar la distribución de cargas y contribuir a la estabilidad y desempeño estructural. Su uso resulta fundamental en condiciones donde las características del suelo presentan baja capacidad de soporte o susceptibilidad a deformaciones, permitiendo mantener la integridad y funcionalidad de las capas superiores.

Este ítem hace parte de las soluciones definidas en los estudios y diseños aprobados por la Interventoría, en concordancia con las recomendaciones geotécnicas derivadas de la caracterización del suelo en la zona de intervención, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la durabilidad de la estructura.

Para la estructuración del análisis de precios unitarios del ítem, se tomó como base la información contenida en el visor más reciente del IDU.



Precios de referencia

Clic para ir al inicio | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades

Análisis de Precios Unitarios - APU

Fecha de publicación: 19/01/2026
Fecha del último ajuste parcial: 21/03/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Artículo	GEOSINTÉTICOS	GEOTEXTILES	4033	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN MÉTO	M2	$ 25.086	Actualización 2025-I Fase II + M.D. 2026

FORMATO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA

BOGOTÁ

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	FDLT-LP-255-2025 - CTO 613-2025			
OBJETO	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C			
Responsables	**Compañía**	**Nombre Responsable**	**Cargo**	**Firma Responsables**
CONTRATISTA	CONSORCIO COCO	JOTAM MAESTRE DIAB	REPRESENTANTE LEGAL	
INTERVENTOR	AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.	ING. NAYDU LISBETH LOPEZ OROZCO	REPRESENTANTE LEGAL	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		**BASE IDU**	
CAPÍTULO	**9. NO PREVISTOS**	**CAPÍTULO**	**ANDENES Y SARDINELES**
SUBCAPÍTULO	**N.A.**	**SUBCAPÍTULO**	**PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS**
ÍTEM	**NP-14**	**CÓDIGO**	**10271**

Descripción	**U.M.**	**Cantidad**	**Fecha**
ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE)	M2	1,00	18/03/2026

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	**Descripción**	**U.M.**	**Tarifa**	**Rendimiento**	**Vr. Unitario**
6092 (Contractual)	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000,00	0,300	600,00
7968	MOLDE PARA ESTAMPADO DE CONCRETO	UN	$ 380.000,00	0,006	2.090,00
				SUBTOTAL	2.690,00

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	**Descripción**	**U.M.**	**Vr. Unitario**	**Cantidad**	**Varlo Unitario**
7971	SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE (0.25 L/m2)	M2	$ 7.000,00	1,029	7.203,00
7970	DESMOLDANTE EN POLVO COLOR (0.2 Kg/m2)	M2	$ 4.355,00	1,029	4.481,30
7969	COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO (4 Kg/m2)	M2	$ 10.577,00	1,029	10.883,73
				SUBTOTAL	22.568,03

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	**Descripción**	**U.M.**	**Vr. Unitario**	**Cantidad**	**Valor unitario**
				SUBTOTAL	0,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	**Descripción**	**JR**	**Prestaciones**	**Vr. Unitario**	**Rendimiento**	**Valor unitario**
6087 (Contractual)	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) (3)	$ 79.411,00	100,00%	$ 238.233,00	0,073	$ 17.391
6088 (Contractual)	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	0,073	$ 8.305
					SUBTOTAL	25.695,71
					TOTAL COSTO DIRECTO	50.954,00

5. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	**Porcentaje**	**Valor Total**
ADMINISTRACIÓN	**27,00%**	13.757,58
IMPREVISTOS	**1,00%**	509,54
UTILIDAD	**5,00%**	2.547,70
	TOTAL COSTO INDIRECTO	16.815,00
	PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO	67.769,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

LOS CODIGOS IDU RELACIONADOS EN EL PRESENTE APU CORRESPONDEN A LOS REGISTRADOS EN EL VISOR DE REFERENCIA 1A. Visor_BPR_2024-I_Fase-II_MO_2025_27-03-2025 (CONTRACTUAL) Y 1A. Visor_BPR_2025-I_Fase-II_MO_2026_11-03-2026

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área Interna, el consultor externo, el contratista constructor o el Interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.


NP-14	ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE)	M2

La implementación de este ítem obedece a la necesidad de disponer de una superficie de tránsito con acabado estampado que garantice condiciones adecuadas de estética, integración con el entorno urbano y mejoramiento de la adherencia superficial, contribuyendo a la seguridad y funcionalidad del espacio.

Su ejecución se realiza conforme a los diseños aprobados por la Interventoría y a las especificaciones técnicas del proyecto, asegurando el cumplimiento de los requisitos de calidad, resistencia mecánica y durabilidad establecidos en la normativa vigente aplicable a este tipo de soluciones constructivas.

Asimismo, el ítem responde a las condiciones reales identificadas en obra, permitiendo una solución técnica eficiente y coherente con los criterios de diseño definidos.

Para la elaboración del Análisis de Precios Unitarios (APU), se adoptaron como referencia los insumos, rendimientos, cuadrillas tipo y equipos establecidos en el visor IDU, garantizando consistencia técnica, trazabilidad en la estructuración de costos y alineación con parámetros oficiales del sector.



Precios de referencia | Clic para ir al inicio | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades


Análisis de Precios Unitarios - APU

lota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (JR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APUs en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 19/01/2026
Fecha del último ajuste parcial: 11/03/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
emanda-De	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	10271	ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACC	M2	$ 50,954	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026

ubdirección General de Desarrollo Urbano - SGDU
irección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación - DTINI

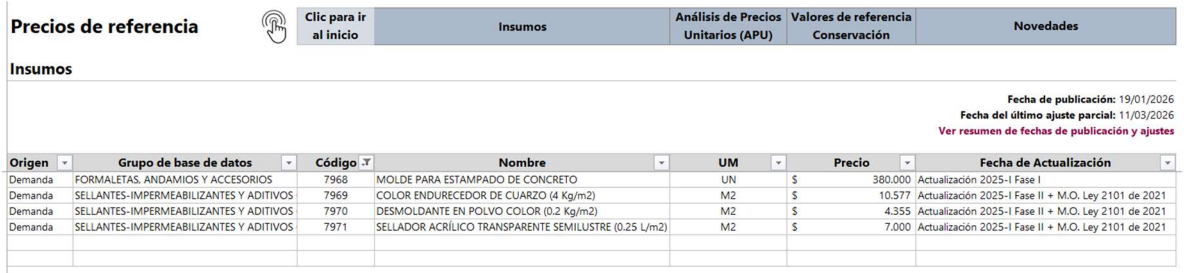

Precios de referencia | Clic para ir al inicio | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades

Insumos

Fecha de publicación: 19/01/2026
Fecha del último ajuste parcial: 11/03/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	7968	MOLDE PARA ESTAMPADO DE CONCRETO	UN	$ 380.000	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS	7969	COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO (4 Kg/m2)	M2	$ 10.577	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS	7970	DESMOLDANTE EN POLVO COLOR (0.2 Kg/m2)	M2	$ 4.355	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS	7971	SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE (0.25 L/m2)	M2	$ 7.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

FORMATO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA

BOGOTÁ

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	FDLT-LP-255-2025 - CTO 613-2025
OBJETO	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO COCO	JOTAM MAESTRE DIAB	REPRESENTANTE LEGAL	
INTERVENTOR	AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.	ING. NAYDU LISBETH LOPEZ OROZCO	REPRESENTANTE LEGAL	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	**9. NO PREVISTOS**	**CAPÍTULO**	**PAVIMENTOS**
SUBCAPÍTULO	**N.A.**	**SUBCAPÍTULO**	**PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO**
ÍTEM	**NP-15**	**CÓDIGO**	**9998**

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)	M3	1,00	18/03/2026

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092 (Contractual)	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000,00	0,130	260,00
6062 (Contractual)	VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO LISO - MASA DE 10 A 13 TONELADAS - AMPLITUD DE COMPACTACIÓN MÀXIMA 2mm - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	$ 184.305,00	0,066	12.164,13
1505 (Contractual)	COMPACTADOR DE LLANTAS - MASA SIN LASTRES DE 9 A 11 TONELADAS - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	$ 182.521,00	0,066	12.046,39
6507 (Contractual)	TERMINADORA DE ASFALTO - ANCHO DE PAVIMENTACIÓN ESTÁNDAR DE 2 A 6m - VOLUMEN DE LA TOLVA DE 5 A 8 M3 - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	$ 212.704,00	0,066	14.038,46
				SUBTOTAL	38.508,98

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Varlo Unitario
13251	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO	M3	$ 1.167.251,00	1,250	1.459.063,75
				SUBTOTAL	1.459.063,75

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Valor unitario
6878 (Contractual)	TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS	M3-KM	$ 1.782,00	18,000	32.076,00
				SUBTOTAL	32.076,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	JR	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6087 (Contractual)	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) (6)	$ 79.411,00	100,00%	$ 476.466,00	0,046	$ 21.851
6088 (Contractual)	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	0,046	$ 5.217
					SUBTOTAL	27.068,65
					TOTAL COSTO DIRECTO	1.556.717,00

5. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	**27,00%**	420.313,59
IMPREVISTOS	**1,00%**	15.567,17
UTILIDAD	**5,00%**	77.835,85
	TOTAL COSTO INDIRECTO	513.717,00
	PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO	2.070.434,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

LOS CODIGOS IDU RELACIONADOS EN EL PRESENTE APU CORRESPONDEN A LOS REGISTRADOS EN EL VISOR DE REFERENCIA 1A. Visor_BPR_2024-I_Fase-II_MO_2025_27-03-2025 (CONTRACTUAL) Y 1A. Visor_BPR_2025-I_Fase-II_MO_2026_11-03-2026

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área Interna, el consultor externo, el contratista constructor o el Interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

CONSORCIO COCO

JUSTIFICACION TECNICA ITEM NP-15


NP-15	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)	M3

La utilización de la mezcla asfáltica en caliente tipo MCCh25-A con cemento asfáltico modificado con caucho se justifica por la necesidad de garantizar un pavimento con alto desempeño estructural, mayor durabilidad y adecuado comportamiento frente a las condiciones de carga y clima a las que estará sometida la vía.

Este tipo de ligante presenta mayor resistencia al envejecimiento y a la oxidación, lo que contribuye a prolongar la vida útil del pavimento y disminuir la frecuencia de intervenciones de mantenimiento. También ofrece beneficios desde el punto de vista ambiental y al incorporar materiales reciclados.

En conjunto, la implementación de esta mezcla asfáltica permite cumplir con los requisitos técnicos y de calidad exigidos por la normativa vigente, optimizando el desempeño del pavimento y reduciendo los costos de mantenimiento a largo plazo.

Para la estructuración del análisis de precios unitarios del ítem, se tomó como base la información contenida en el visor más reciente del IDU.



Precios de referencia

Clic para ir al inicio | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (JR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APUs en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 19/01/2026
Fecha del último ajuste parcial: 11/03/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Demanda	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	9998	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMEN	M3	$ 1.556.717	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026

FORMATO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA

BOGOTÁ

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	FDLT-LP-255-2025 - CTO 613-2025
OBJETO	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO COCO	JOTAM MAESTRE DIAB	REPRESENTANTE LEGAL	
INTERVENTOR	AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.	ING. NAYDU LISBETH LOPEZ OROZCO	REPRESENTANTE LEGAL	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	**9. NO PREVISTOS**	**CAPÍTULO**	**PAVIMENTOS**
SUBCAPÍTULO	**N.A.**	**SUBCAPÍTULO**	**PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO**
ÍTEM	**NP-16**	**CÓDIGO**	**8618**

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	1,00	18/03/2026

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092 (Contractual)	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000,00	0,130	260,00
6062 (Contractual)	VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO LISO - MASA DE 10 A 13 TONELADAS - AMPLITUD DE COMPACTACIÓN MÁXIMA 2mm - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	$ 184.305,00	0,066	12.164,13
1505 (Contractual)	COMPACTADOR DE LLANTAS - MASA SIN LASTRES DE 9 A 11 TONELADAS - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	$ 182.521,00	0,066	12.046,39
6507 (Contractual)	TERMINADORA DE ASFALTO - ANCHO DE PAVIMENTACIÓN ESTÁNDAR DE 2 A 6m - VOLUMEN DE LA TOLVA DE 5 A 8 M3 - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	$ 212.704,00	0,066	14.038,46
				SUBTOTAL	38.508,98

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Varlo Unitario
13249	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14	M3	$ 923.064,00	1,250	1.153.830,00
				SUBTOTAL	1.153.830,00

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Valor unitario
6878 (Contractual)	TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS	M3-KM	$ 1.782,00	18,000	32.076,00
				SUBTOTAL	32.076,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	JR	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6087 (Contractual)	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) (6)	$ 79.411,00	100,00%	$ 476.466,00	0,056	$ 26.862
6088 (Contractual)	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	0,056	$ 6.414
					SUBTOTAL	33.275,10
					TOTAL COSTO DIRECTO	1.257.690,00

5. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	**27,00%**	339.576,30
IMPREVISTOS	**1,00%**	12.576,90
UTILIDAD	**5,00%**	62.884,50
	TOTAL COSTO INDIRECTO	415.038,00
	PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO	1.672.728,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

LOS CODIGOS IDU RELACIONADOS EN EL PRESENTE APU CORRESPONDEN A LOS REGISTRADOS EN EL VISOR DE REFERENCIA 1A. Visor_BPR_2024-I_Fase-II_MO_2025_27-03-2025 (CONTRACTUAL) Y 1A. Visor_BPR_2025-I_Fase-II_MO_2026_11-03-2026

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área Interna, el consultor externo, el contratista constructor o el Interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

CONSORCIO COCO


JUSTIFICACION TECNICA ITEM NP-16

NP-16	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3

La mezcla MD-19, por su gradación densa, ofrece una estructura homogénea con adecuada distribución de vacíos, lo que permite una alta estabilidad, resistencia al desgaste y buena capacidad de impermeabilización, protegiendo las capas inferiores del ingreso de agua y agentes externos.

En consecuencia, la implementación de esta mezcla asfáltica como capa de rodadura responde directamente a las especificaciones del diseño del pavimento, permitiendo cumplir con los requisitos técnicos, funcionales y de calidad exigidos, y asegurando un adecuado desempeño y vida útil de la infraestructura vial.

Para la estructuración del análisis de precios unitarios del ítem, se tomó como base la información contenida en el visor más reciente del IDU.



Precios de referencia

Clic para ir al inicio | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (JR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APUs en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 19/01/2026
Fecha del último ajuste parcial: 11/03/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Nuevo DTE	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	8618	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEM	M3	$ 1.257.690	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026

Bogotá D.C, 14 de marzo de 2026

Señores:
AHLA SHUGL INTERNATIONAL SAS
Ing. Santiago Carrillo Vargas
Director de Interventoría
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA FDLT-CTO-613-2025

OBJETO: "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

ASUNTO: No previstos y acta de fijación



Cordial saludo

Adjunto se envía la siguiente información:
1. no previstos y acta de fijación de los no previstos, para su revisión y aprobación.
Se trabajo con el visor de 11 de marzo de 2026.
https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio



Ítem	Descripción	JUSTIFICACIÓN	
NP-01	entibado tipo ec3 continuo metálico con parales metálicos. incluye suministro e instalación	El suministro e instalación de entibado tipo EC3 continuo metálico con parales metálicos se requiere para garantizar la estabilidad de las excavaciones durante la ejecución de redes y obras asociadas, especialmente en zonas con profundidad significativa o condiciones de suelo inestables. Este sistema permite prevenir deslizamientos y colapsos de las paredes de la excavación, asegurando condiciones seguras para el personal y las estructuras existentes. Se aplicará para el segmento 6000389	


NP-02	placa fondo d=1.70m pozo inspec. (prefabricada. incl. sumin, inst.)	El suministro e instalación de placa fondo prefabricada de diámetro 1,70 m para pozo de inspección se requiere para garantizar una base estable y adecuada en la construcción, reposición o adecuación de pozos de inspección de la red sanitaria. Este elemento permite una correcta distribución de cargas, asegura la estanqueidad de la estructura y facilita el adecuado funcionamiento hidráulico del pozo. Se aplicará para los segmentos 6000372, 6000857 y 6000389	
NP-03	cañuela tipo a120 (suministro e instalación. incluye 3cm mortero 2000 psi)	El ítem correspondiente al suministro e instalación de cañuela tipo A120 se hace necesario para garantizar el adecuado manejo y conducción de las aguas superficiales en las zonas intervenidas, especialmente en áreas de espacio público y bordes de calzada. Este elemento permite encauzar eficientemente las escorrentías, evitando empozamientos, erosión de la estructura del pavimento y afectaciones a las zonas peatonales, contribuyendo a la conservación de la infraestructura vial y al correcto funcionamiento del sistema de drenaje. Se instala en el segmento 6000580	

NP-04	hito de 75cm de altura y 8 cm de diámetro con reflectivos de color amarillo. suministro e instalación.	Suministro e instalación de hitos de señalización de 75 cm de altura y 8 cm de diámetro, fabricados en material flexible y provistos de bandas reflectivas color amarillo, utilizados para la canalización, delimitación y advertencia visual del tránsito vehicular. Incluye anclaje al pavimento, alineación, nivelación y todas las actividades necesarias para garantizar su correcta fijación, visibilidad diurna y nocturna, de acuerdo con la normatividad vigente de señalización vial. Los hitos se deben instalar en el segmento 6000857	
NP-05	segregadora bicicleta (tachón plástico o caucho alta resistencia como polipropileno de alto impacto, con estructura de refuerzo, elementos reflectivos de alta eficiencia. tipo transmilenio 40.5cmx15cmx8.5cm). sumin. e instal.	La inclusión de segregadores de bicicleta se originó por la necesidad de dar continuidad funcional a las secciones viales intervenidos, ya que durante la ejecución se pueden presentar ajustes en anchos, alineamientos y distribución de la vía que requerían un elemento que delimitara físicamente los espacios definidos. Se deben instalar en el segmento 6000857	
NP-06	demolición de pozo, diámetro interior d=1.20m, diámetro exterior d=1.70m, h=1.50m (incluye cargue, retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado).	La demolición del pozo con las dimensiones indicadas se hace necesaria debido a que, en algunos segmentos del proyecto, se requiere reformar y reforzar estructuras existentes que presentan condiciones que no permiten su adecuación sin intervención previa. Esta actividad es indispensable para garantizar la correcta ejecución de las obras proyectadas y la estabilidad de las nuevas estructuras asociadas a la	

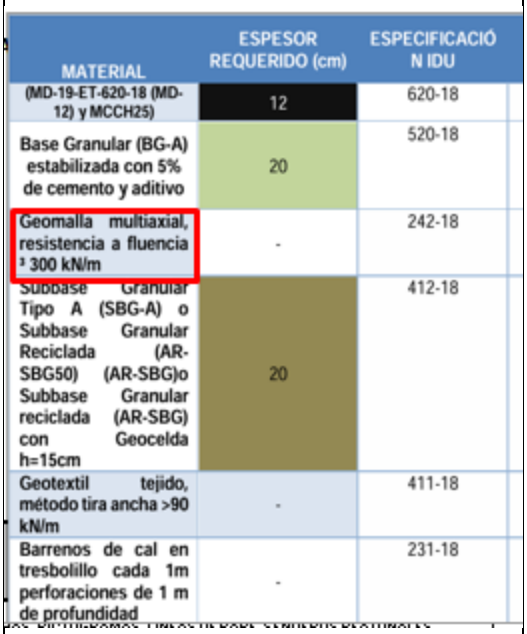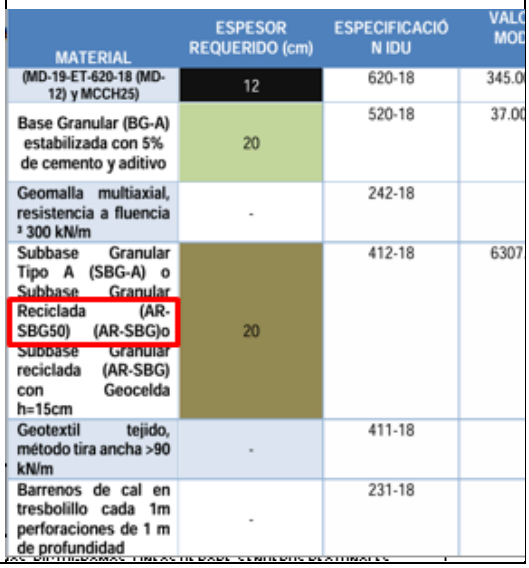
		red. Se aplicará para el segmento 6000372	
NP-07	geomalla multiaxial rest. 300 kn/m (suministro e instalación)	Ítem necesario para reforzar la estructura del suelo, mejorando su capacidad de soporte y distribución de cargas. Hace parte integral de los diseños aprobados por la interventoría, en los cuales, con base en los ensayos y estudios geotécnicos realizados en la zona, se determinó que esta solución es la más adecuada para las condiciones reales del terreno, garantizando la estabilidad, el adecuado desempeño estructural y la durabilidad de la intervención. La geomalla se instala en todos los segmentos de vías de acuerdo a la estructura aprobada	
NP-08	agregados reciclados para subbase granular (ar_sbg50) (suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibrocompactador)	El suministro y colocación de agregados reciclados para subbase granular (AR_SBG50), se coloca, en todos los segmentos de vías, esta se hace necesaria para la conformación de la estructura, conforme a los diseños de pavimentos establecidos para el proyecto. Este material cumple la función de soporte estructural inferior, permitiendo una adecuada distribución de cargas hacia la subrasante y contribuyendo a la estabilidad del paquete estructural del pavimento	

NP-09	subbase granular peatonal sbg_pea. suministro, extendido manual, nivelación, humedecimiento y compactación	El suministro y colocación de subbase granular peatonal (SBG_PEA), se utiliza en los segmentos de espacio público, se hace necesario para la conformación de la estructura de soporte en zonas de tránsito peatonal, tales como andenes y senderos, garantizando una superficie estable y uniforme para la ejecución de los acabados finales. Este material permite una adecuada distribución de cargas y asegura el correcto comportamiento estructural de las áreas peatonales, de acuerdo con los diseños aprobados del proyecto.	
NP-10	manejo de aguas (incluye motobomba con combustible y operador)	Durante la ejecución se presentaron infiltraciones y acumulaciones de agua en el segmento 6000372 (lluvias y nivel freático), lo que obligó a implementar sistemas de bombeo para mantener condiciones secas de trabajo. Adicionalmente, debido al cambio de tubería y a las precipitaciones recurrentes en la zona, se hace necesario realizar el bombeo continuo de agua con el fin de garantizar condiciones adecuadas para la correcta ejecución de actividades como excavaciones, instalación y reemplazo de tuberías	
NP-11	sumidero lateral sl-100, h=0.85m (prefabricado. incluye suministro e instalación. incluye sobretapa y tapa)	Este ítem es esencial para la recolección y drenaje eficiente de aguas pluviales, cumpliendo con las especificaciones técnicas de la EAAB. El sumidero prefabricado, incluye tapa y rejilla, garantizando una instalación rápida y eficaz. Su implementación asegura un sistema de drenaje confiable que	

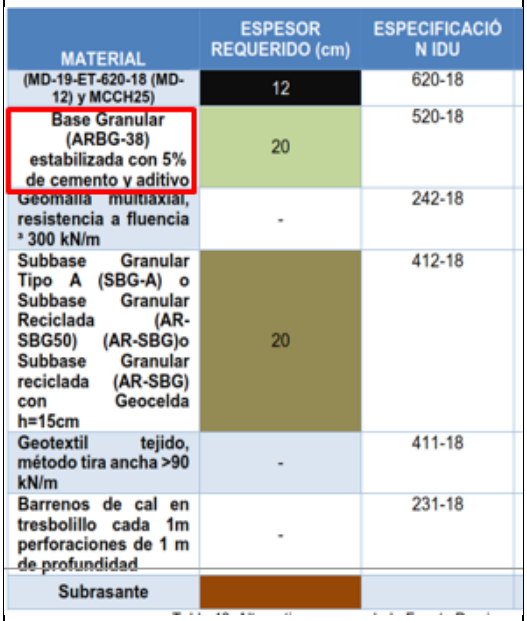		previene la acumulación de agua en la vía, optimizando la funcionalidad del proyecto y cumpliendo con las normativas vigentes en cuanto a seguridad y gestión de aguas superficiales. Se implementa en los segmentos 6000372 y 6000857 para garantizar el drenaje en las vías.	
NP-12	agregados reciclados para base granular (ar_bg38) (suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibrocompactador)	Suministro y conformación de base granular en material reciclado tipo AR_BG38, se utilizará en todos los segmentos de vías, como parte del paquete estructural de pavimento conforme a los diseños aprobados por la Interventoría. Incluye suministro del material, transporte interno, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación mediante vibro compactador hasta alcanzar la densidad especificada en las normas técnicas vigentes. Este material hace parte de la estrategia de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición (RCD), contribuyendo al cumplimiento de los criterios de economía circular y metas de recircularidad establecidas en la normativa vigente, garantizando desempeño estructural y estabilidad de la capa granular.	De acuerdo a alcance emitido por el especialista el 24 de marzo de 2026. 
NP-13	geotextil tejido con resistencia a la tensión método tira ancha sentido longitudinal de 60 kn/m. para separación subrasante/capas granulares. (incluye suministro e instalación).	La implementación del geotextil se realizará en todos los segmentos de espacio público, de acuerdo a el esquema del diseño aprobado, tiene como finalidad principal evitar la contaminación de las capas granulares por migración de finos provenientes de la subrasante, así como mejorar la distribución de cargas y contribuir a la estabilidad y desempeño estructural. Su uso resulta fundamental en condiciones	

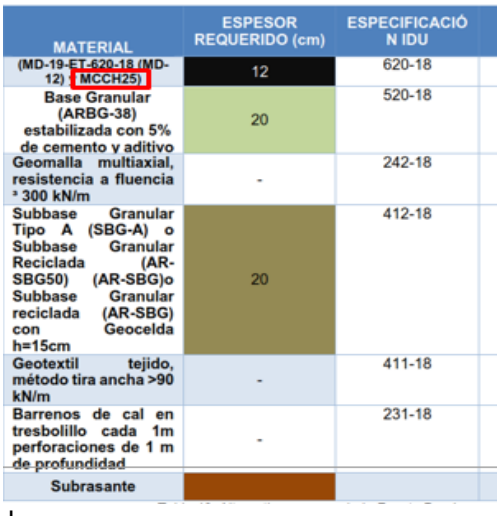		donde las características del suelo presentan baja capacidad de soporte o susceptibilidad a deformaciones, permitiendo mantener la integridad y funcionalidad de las capas superiores. Este ítem hace parte de las soluciones definidas en los estudios y diseños aprobados por la Interventoría	
NP-14	Estampado para concreto MR de pompeyanos, accesos vehiculares a predios y vías (acabado y curado, suministro y mano de obra. incluye juego de moldes, color endurecedor de cuarzo, desmoldante en polvo color, sellador acrílico transparente semilustre)	La implementación de este ítem obedece a la necesidad de continuar con la estética del segmento del espacio público del colegio 6001206 con el fin de disponer de una superficie de tránsito con acabado estampado que garantice condiciones adecuadas de estética, integración con el entorno urbano y mejoramiento de la adherencia superficial, contribuyendo a la seguridad y funcionalidad del espacio. Su ejecución se realiza conforme a los diseños aprobados por la Interventoría y a las especificaciones técnicas del proyecto	
NP-15	mezcla asfáltica en caliente mcch25-a con cemento asfáltico modificado con caucho (suministro, extendido, nivelación y compactación mecánica)	La utilización de la mezcla asfáltica en caliente tipo MCCh25-A, será para todos los segmentos acorde al diseño aprobado de pavimentos, esta mezcla con cemento asfáltico modificado con caucho se justifica por la necesidad de garantizar un pavimento con alto desempeño estructural, mayor durabilidad y adecuado comportamiento frente a las condiciones de carga y clima a las que estará sometida la vía	

MATERIAL	ESPESOR REQUERIDO (cm)	ESPECIFICACIÓN IDU
(MD-19-ET-620-18 (MD-12) MCCH25)	12	620-18
Base Granular (ARBG-38) estabilizada con 5% de cemento y aditivo	20	520-18
Geomalla multiaxial, resistencia a fluencia ³ 300 kN/m	-	242-18
Subbase Granular Tipo A (SBG-A) o Subbase Granular Reciclada (AR-SBG50) (AR-SBG)o Subbase Granular reciclada (AR-SBG) con Geoceldah=15cm	20	412-18
Geotextil tejido, método tira ancha >90 kN/m	-	411-18
Barrenos de cal en tresbolillo cada 1m perforaciones de 1 m de profundidad	-	231-18
Subrasante		

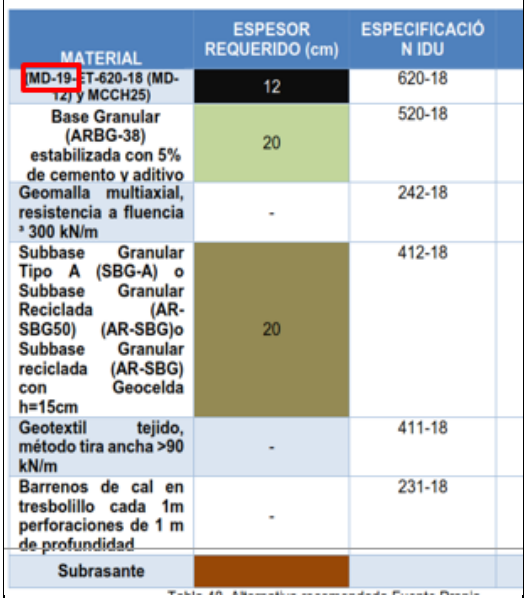NP-16	mezcla asfáltica en caliente densa md19 con cemento asfáltico ca 14. (suministro, extendido, nivelación manual y compactación mecánica con vibrocompactador tándem pequeño, incluye operario y combustible).	La mezcla MD-19, se utilizará como rodadura en todos los segmentos de vía, de acuerdo al diseño de pavimentos aprobados, por su gradación densa, ofrece una estructura homogénea con adecuada distribución de vacíos, lo que permite una alta estabilidad, resistencia al desgaste y buena capacidad de impermeabilización, protegiendo las capas inferiores del ingreso de agua y agentes externos. En consecuencia, la implementación de esta mezcla asfáltica como capa de rodadura responde directamente a las especificaciones del diseño del pavimento	

MATERIAL	ESPESOR REQUERIDO (cm)	ESPECIFICACIÓN IDU
[illegible]MD-19-[illegible]ET-620-18 (MD-12) y MCCH25)	12	620-18
Base Granular (ARBG-38) estabilizada con 5% de cemento y aditivo	20	520-18
Geomalla multiaxial, resistencia a fluencia ³ 300 kN/m	-	242-18
Subbase Granular Tipo A (SBG-A) o Subbase Granular Reciclada (AR-SBG50) (AR-SBG)o Subbase Granular reciclada (AR-SBG) con Geocelda h=15cm	20	412-18
Geotextil tejido, método tira ancha >90 kN/m	-	411-18
Barrenos de cal en tresbolillo cada 1m perforaciones de 1 m de profundidad	-	231-18
Subrasante		

Tabla 40. Alternativa recomendada Fuente: Propia

Cordialmente,

CONSORCIO

JOTAM MAESTRE DIAB
Representante Legal
CONSORCIO COCO

INT-652-2025-059

Bogotá D.C., 16 de marzo de 2026

Señores:
Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito
Doctora
CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE
Alcaldesa Local de Tunjuelito
Att. Ing. Diego Caballero Rojas – Ing. Valentina Martínez Muñoz
Apoyo a la Supervisión.
Ciudad

REF. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 652-2025-CINT (143627)
Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"

ASUNTO: ENTREGA DE APU DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS No 1 COP 613 DEL 2025 – CONTRATISTA.

Apreciados señores:

Por medio de la presente y bajo el oficio FDLT-CTO-613-2025/050, enviados por el contratista CONSORCIO COCO, donde relaciona cada una de las actividades que no quedaron establecidas dentro el contrato inicial y que serán no previstos (NP) para la ejecución del contrato, una vez revisados y avalados por esta interventoría y manifiesta lo siguiente:

Una vez revisada la documentación entregada por el contratista de obra y siguiendo las funciones de la interventoría, procedemos a establecer los lineamientos para definir los precios de las actividades que no quedaron establecidas en el contrato inicial.

El Contratista en la planeación de sus actividades y en la ejecución de las mismas puede identificar una actividad que no esté contemplada dentro del presupuesto contractual, por lo que es responsable de informar a la Interventoría sobre el asunto. El Interventor del contrato es responsable de revisar la necesidad de incluir o no la nueva actividad y establecer los requerimientos técnicos para las cotizaciones. El Supervisor verificará que la información aprobada por el Interventor, cumpla técnicamente con los requerimientos de los precios y económicamente que sea un precio justo para las partes. Así mismo, se encargará de sustituir dichos elementos dentro los elementos o bienes solicitados en la propuesta

La definición NP: sigla que se usará en este documento para actividad No Prevista la sigla APU: se usará en este documento para actividad Análisis de precios unitarios.

Este procedimiento se puede requerir en cualquier etapa del proyecto, y estará sujeto a la disponibilidad presupuestal y verificación de la necesidad.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
NP-01	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$ 58.299
NP-02	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)	UN	$ 1.128.464
NP-03	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	$ 85.050
NP-04	HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$ 92.358
NP-05	SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5cmx15cmx8.5cm). SUMIN. E INSTAL.	UN	$ 73.970
NP-06	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	UN	$ 634.048
NP-07	GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	$ 55.288
NP-08	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibro compactador)	M3	$ 191.532

NP-09	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	$ 172.045
NP-10	MANEJO DE AGUAS (INCLUYE MOTOBOMBA CON COMBUSTIBLE Y OPERADOR)	HR	$ 11.984
NP-11	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA)	UN	$ 5.086.921
NP-12	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibro compactador)	M3	$ 195.225
NP-13	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	$ 25.096
NP-14	ESTAMPADO DE CONCRETO (INCLUYE JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, SELLADOR Y ENDURECEDOR)	M2	$ 50.954
NP-15	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)	M3	$ 1.556.717
NP-16	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3	$ 1.257.690

Se anexa:

- ✓ OFICIO FDLT-CTO-613-2025/050 EMITIDO POR EL CONSORCIO COCO
- ✓ ACTA DE FIJACIÓN DE NO PREVISTOS No 1
- ✓ APU°S DE NO PREVISTOS
- ✓ PRECIOS DE REFERENCIA IDU
- ✓ COTIZACIONES

Cordialmente,

ING. SANTIAGO CARRILLO VARGAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
AHLA SHUGL INTERNATIONAL SAS
FOLIOS: (44)
EXCEL: (2)

ANEXO 5: CORRESPONDENCIA ENVIADA CIN 652 DEL 2025.

AHLA SHUGL INTERNATIONAL SAS	**AHLA SHUGL INTERNATIONAL SAS** **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6** **DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito

CORRESPONDENCIA RECIBIDA – DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026.			
FECHA	**OFICIO**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ANEXO 6: ACTA PARCIAL DE COBRO No 5 – COP 613 DEL 2025.

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.	[illegible]	CORRESPONDIENTE AL PERIODO	[illegible] FECHA INICIO PERIODO	AL [illegible] FECHA INICIO PERIODO
SABANA	[illegible]			
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C			
CONTRATISTA	CONSORCIO COCO			
INTERVENTOR	AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.			
SUPERVISOR DEL CONTRATO	AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.			
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN				
No. CONTRATO :	COP 613-2025			
VALOR :	$ 6.795.537.201,00			

							OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 01		OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 02		OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 03		OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 04		OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 05		ACUMULADO OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
N°	CODIGO IDU	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR ACUMULADO
1			DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS					$ 40.261.698,00		$ 4.788.586,00		$ 539.064,00		$ 16.785.978,00		$ -		$ 62.375.326,00
ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO QUE NO INCLUYEN IVA								$ 8.658.647,00		$ 947.098,00		$ 539.064,00		$ 1.136.845,00		$ -		$ 11.281.654,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9,00	$ 2.425.788,00	1,00	$ 269.532,00	2,00	$ 539.064,00	1,00	$ 269.532,00		$ -	13,00	$ 3.503.916,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	18,00	$ 167.616,00	2,00	$ 18.624,00	0,00	$ -	2,00	$ 18.624,00		$ -	22,00	$ 204.864,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	19,00	$ 2.560.535,00	2,00	$ 269.530,00	0,00	$ -	3,00	$ 404.295,00		$ -	24,00	$ 3.234.360,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	18,00	$ 989.676,00	2,00	$ 109.964,00	0,00	$ -	3,00	$ 164.946,00		$ -	23,00	$ 1.264.586,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	18,00	$ 2.515.032,00	2,00	$ 279.448,00	0,00	$ -	2,00	$ 279.448,00		$ -	22,00	$ 3.073.928,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
			ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO QUE INCLUYEN IVA					$ 31.603.051,00		$ 3.841.488,00		$ -		$ 15.649.133,00		$ -		$ 51.093.672,00
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4880,78	$ 31.603.051,00	593,28	$ 3.841.488,00	0,00	$ -	379,11	$ 2.454.737,00		$ -	5853,17	$ 37.899.276,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	437,48	$ 5.187.200,00		$ -	437,48	$ 5.187.200,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	437,48	$ 8.007.196,00		$ -	437,48	$ 8.007.196,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2			CAPITULO 02: RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE					$ 24.435.724,00		$ 150.909.011,00		$ 575.433.655,00		$ 746.957.451,00		$ 15.813.831,00		$ 1.513.549.672,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	619,60	$ 676.603,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4.045,88	$ 4.418.102,00		$ -	4665,48	$ 5.094.705,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	20,56	$ 65.813,00	237,47	$ 760.141,00	258,03	$ 825.954,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	92,94	$ 4.342.900,00	204,65	$ 9.562.885,00	138,11	$ 6.453.756,00	36,56	$ 1.708.235,00	6,72	$ 314.012,00	478,98	$ 22.381.788,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	247,84	$ 1.713.814,00	494,73	$ 3.421.058,00	586,96	$ 4.058.796,00	493,52	$ 3.412.704,00	22,42	$ 155.034,00	1845,47	$ 12.761.406,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	79,59	$ 4.447.486,00		$ -	79,59	$ 4.447.486,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	322,19	$ 17.702.407,00	909,19	$ 49.954.535,00	754,76	$ 41.469.318,00	974,52	$ 53.544.235,00		$ -	2960,66	$ 162.670.495,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	686,61	$ 1.451.494,00	1238,82	$ 2.618.855,00	688,95	$ 1.456.431,00		$ -	2614,37	$ 5.526.780,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	39,48	$ 8.754.690,00		$ -	39,48	$ 8.754.690,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	686,61	$ 60.922.905,00	1262,26	$ 111.999.886,00	1.158,46	$ 102.789.765,00		$ -	3107,32	$ 275.712.556,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	630,53	$ 9.995.082,00	0,00	$ -		$ -	630,53	$ 9.995.082,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	686,61	$ 25.596.134,00	631,73	$ 23.550.412,00	1.193,36	$ 44.487.103,00	56,04	$ 2.089.115,00	2567,74	$ 95.722.764,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	425,74	$ 241.784.273,00	11,21	$ 6.366.361,00	436,95	$ 248.150.634,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.364,65	$ 5.238.891,00	1.596,55	$ 6.129.168,00	2961,20	$ 11.368.059,00

No. CONTRATO :	COP 613-2025																	
VALOR :	$ 6.795.537.201,00																	
							OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO OBRA EJECUTADA	
							ACTA DE CORTE No. 01		ACTA DE CORTE No. 02		ACTA DE CORTE No. 03		ACTA DE CORTE No. 04		ACTA DE CORTE No. 05		ACUMULADO	
N°	CODIGO IDU	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR ACUMULADO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.364,65	$ 6.383.833,00		$ -	1364,65	$ 6.383.833,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	1595,00	$ 176.290.565,00	1.141,00	$ 126.111.307,00		$ -	2736,00	$ 302.401.872,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	1595,00	$ 198.996.985,00	1.141,00	$ 142.354.583,00		$ -	2736,00	$ 341.351.568,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
3			CAPITULO 03: RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO RIGIDO					$ -		$ -		$ -		$ 7.880.906,00		$ -		$ 7.880.906,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	28,50	$ 6.427.046,00		$ -	28,50	$ 6.427.046,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	472,80	$ 1.453.860,00		$ -	472,80	$ 1.453.860,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4			CAPITULO 04: MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO VIA PAVIMENTO FLEXIBLE					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

No. CONTRATO :	COP 613-2025
VALOR :	$ 6.795.537.201,00

Nº	CODIGO IDU	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	VALOR UNITARIO	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 01 CANTIDAD	VALOR CORTE	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 02 CANTIDAD	VALOR CORTE	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 03 CANTIDAD	VALOR CORTE	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 04 CANTIDAD	VALOR CORTE	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 05 CANTIDAD	VALOR CORTE	ACUMULADO OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	VALOR ACUMULADO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
5			CAPITULO 05: MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO VIA PAVIMENTO RIGIDO					$ -		$ -		$ -		$ 760.236,00	$ -	$ -		$ 760.236,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	247,23	$ 760.236,00		$ -	247,23	$ 760.236,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6			CAPITULO 06: ESPACIO PUBLICO EN CONCRETO					$ 72.594.910,00		$ 62.741.286,00		$ 133.147.186,00		$ 101.138.035,00		$ 100.477.567,00		$ 470.098.986,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	849,60	$ 8.455.219,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	192,84	$ 1.919.144,00	1042,44	$ 10.374.364,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	259,77	$ 2.008.022,00	210,00	$ 1.623.300,00	0,00	$ -	670,00	$ 5.179.100,00		$ -	1139,77	$ 8.810.422,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	68,27	$ 3.815.132,00	90,00	$ 5.029.470,00	10,40	$ 581.183,00	1,61	$ 89.860,00		$ -	170,28	$ 9.515.645,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	88,75	$ 4.876.280,00	195,00	$ 10.714.080,00	13,52	$ 742.843,00	4,68	$ 257.166,00		$ -	301,95	$ 16.590.369,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	182,87	$ 18.471.333,00	0,00	$ -	0,00	$ -	650,38	$ 65.693.270,00	192,84	$ 19.478.383,00	1026,09	$ 103.642.986,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	112,22	$ 993.035,00	0,00	$ -	0,00	$ -	102,32	$ 905.392,00	10,12	$ 89.552,00	224,66	$ 1.987.978,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12,13	$ 2.689.828,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	12,13	$ 2.689.828,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	55,00	$ 5.435.265,00	0,00	$ -	55,23	$ 5.457.994,00	110,23	$ 10.893.260,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	120,00	$ 9.982.800,00	274,10	$ 22.802.379,00	167,39	$ 13.925.174,00	561,49	$ 46.710.353,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	284,25	$ 876.059,00	600,00	$ 1.849.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	884,25	$ 2.725.259,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	2,69	$ 2.391.695,00	2,15	$ 1.913.723,00	2,37	$ 2.108.174,00	7,21	$ 6.413.593,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	55,90	$ 4.297.145,00	83,08	$ 6.386.526,00	138,98	$ 10.683.671,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	178,01	$ 6.636.035,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	178,01	$ 6.636.035,00

No. CONTRATO : COP 613-2025


VALOR : $ 6.795.537.201,00

Nº	CODIGO IDU	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	VALOR UNITARIO	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 01 CANTIDAD	VALOR CORTE	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 02 CANTIDAD	VALOR CORTE	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 03 CANTIDAD	VALOR CORTE	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 04 CANTIDAD	VALOR CORTE	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 05 CANTIDAD	VALOR CORTE	ACUMULADO OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	VALOR ACUMULADO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	26,76	$ 15.197.486,00	76,64	$ 43.525.236,00	200,76	$ 114.013.400,00	0,00	$ -	90,00	$ 51.112.620,00	394,16	$ 223.848.742,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6,00	$ 19.206,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	6,00	$ 19.206,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8,11	$ 8.557.275,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	8,11	$ 8.557.275,00
7		CAPITULO 07: REDES						$ 490.498,00		$ 71.536.356,00		$ 104.139.377,00		$ 107.803.878,00		$ 6.978.063,00		$ 290.948.172,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	33,97	$ 1.898.346,00	101,99	$ 5.699.284,00	33,53	$ 1.873.869,00		$ -	169,49	$ 9.471.499,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	628,55	$ 8.205.092,00		$ -	628,55	$ 8.205.092,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	6,00	$ 1.366.818,00	2,00	$ 455.606,00	7,00	$ 1.594.621,00		$ -	15,00	$ 3.417.045,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	247,22	$ 13.583.256,00	121,89	$ 6.697.278,00	103,50	$ 5.686.753,00	37,88	$ 2.081.279,00	510,49	$ 28.048.566,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	39,72	$ 8.001.389,00	9,54	$ 1.920.741,00	44,42	$ 8.946.288,00		$ -	93,68	$ 18.868.418,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	141,00	$ 17.052.057,00	162,14	$ 19.608.578,00	156,64	$ 18.943.082,00		$ -	459,77	$ 55.603.717,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 9.138.148,00	5,00	$ 11.422.685,00	2,00	$ 4.569.074,00	11,00	$ 25.129.907,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	4,45	$ 3.966.957,00	4,34	$ 3.868.897,00		$ -	8,79	$ 7.835.854,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 163.855,00	2,00	$ 327.710,00	2,00	$ 327.710,00	5,00	$ 819.275,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	89,81	$ 6.921.118,00	169,80	$ 13.085.467,00	52,90	$ 4.076.686,00		$ -	312,51	$ 24.083.271,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	116,74	$ 12.509.391,00	146,00	$ 15.644.776,00	76,30	$ 8.176.003,00		$ -	339,04	$ 36.330.170,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	15,30	$ 3.257.141,00	81,30	$ 17.307.551,00		$ -	96,60	$ 20.564.692,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	41,34	$ 11.741.015,00	0,00	$ -		$ -	41,34	$ 11.741.015,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	43,00	$ 12.336.012,00		$ -	43,00	$ 12.336.012,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	14,00	$ 3.238.396,00	17,00	$ 3.932.338,00	16,00	$ 3.701.024,00		$ -	47,00	$ 10.871.758,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	22,00	$ 5.885.462,00	33,00	$ 8.828.193,00	5,00	$ 1.337.605,00		$ -	60,00	$ 16.051.260,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	$ 490.498,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	1,00	$ 490.498,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	156,20	$ 1.080.123,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	156,20	$ 1.080.123,00
8		CAPITULO 08: SEÑALIZACIÓN						$ -		$ -		$ -		$ -	$ -	$ -		$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -


No. CONTRATO :	COP 613-2025
VALOR :	$ 6.795.537.201,00

							OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO OBRA EJECUTADA	
							ACTA DE CORTE No. 01		ACTA DE CORTE No. 02		ACTA DE CORTE No. 03		ACTA DE CORTE No. 04		ACTA DE CORTE No. 05		ACUMULADO	
Nº	CODIGO IDU	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR ACUMULADO
9			CAPITULO 09: NO PREVISTOS					$ -		$ 133.883.817,00		$ 188.491.006,00		$ 624.679.479,00		$ 9.887.067,00		$ 956.941.369,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]		[illegible]	[illegible]	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 4.502.571,00	3,00	$ 4.502.571,00		$ -	6,00	$ 9.005.142,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]		[illegible]	[illegible]	$ -	20,10	$ 2.273.652,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	20,10	$ 2.273.652,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	$ -	0,00	$ -	0,60	$ 505.970,00	0,00	$ -		$ -	0,60	$ 505.970,00
[illegible]	CO[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]		[illegible]	[illegible]	$ -	686,61	$ 50.488.493,00	631,73	$ 46.453.296,00	1.199,17	$ 88.178.259,00	56,04	$ 4.120.789,00	2573,55	$ 189.240.837,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]		[illegible]	[illegible]	$ -	137,32	$ 34.980.622,00	252,45	$ 64.309.067,00	243,63	$ 62.061.360,00	11,21	$ 2.855.613,00	644,61	$ 164.206.662,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]		[illegible]	[illegible]	$ -	27,16	$ 6.214.751,00	90,00	$ 20.593.800,00	0,00	$ -		$ -	117,16	$ 26.808.551,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]R		[illegible]	[illegible]	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	66,00	$ 1.051.974,00		$ -	66,00	$ 1.051.974,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 81.187.260,00		$ -	12,00	$ 81.187.260,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]		[illegible]	[illegible]	$ -	76,64	$ 19.899.499,00	200,76	$ 52.126.302,00	349,91	$ 90.853.314,00	11,21	$ 2.910.665,00	638,51	$ 165.789.780,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]		[illegible]	[illegible]	$ -	600,00	$ 20.026.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	600,00	$ 20.026.800,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]		[illegible]	[illegible]	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	316,06	$ 21.419.070,00		$ -	316,06	$ 21.419.070,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]		[illegible]	[illegible]	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	82,38	$ 170.562.353,00		$ -	82,38	$ 170.562.353,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]		[illegible]	[illegible]	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	62,69	$ 104.863.318,00		$ -	62,69	$ 104.863.318,00

		Acta 01	Acta 02	Acta 03	Acta 04	Acta 05	Acumulado
E. SUBTOTAL OBRAS INICIALES (INCLUYE AIU):		$ 97.521.132,00	$ 419.070.470,00	$ 1.001.211.224,00	$ 1.589.219.985,00	$ 133.156.528,00	$ 3.240.179.341,00
A. SUBTOTAL ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO QUE NO INCLUYEN I.V.A..:		$ 8.658.647,00	$ 947.098,00	$ 539.064,00	$ 1.136.845,00	$ -	$ 11.281.654,00
B. IVA (19%):		$ 1.645.143,00	$ 179.949,00	$ 102.422,00	$ 216.001,00	$ -	$ 2.143.514,00
C. ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO QUE INCLUYEN IVA:		$ 31.603.051,00	$ 3.841.488,00	$ -	$ 15.649.133,00	$ -	$ 51.093.672,00
D. SUBTOTAL DIAGNOSTICOS (A+B+C)		$ 41.906.841,00	$ 4.968.535,00	$ 641.486,00	$ 17.001.979,00	$ -	$ 64.518.840,00
ADMINISTRACION	27,00%	$ 19.797.523,04	$ 85.074.456,00	$ 203.253.406,00	$ 322.623.606,00	$ 27.031.776,00	$ 657.780.768,00
IMPREVISTO	1,00%	$ 733.241,59	$ 3.150.906,00	$ 7.527.904,00	$ 11.949.022,00	$ 1.001.177,00	$ 24.362.251,00
UTILIDAD	5,00%	$ 3.666.207,97	$ 15.754.529,00	$ 37.639.520,00	$ 59.745.112,00	$ 5.005.885,00	$ 121.811.253,00
SUBTOTAL A.I.U	33,00%	$ 24.196.972,60	$ 103.979.891,00	$ 248.420.830,00	$ 394.317.740,00	$ 33.038.838,00	$ 803.954.272,00
K. VALOR PROPUESTO COSTO DIRECTO PARA PROVISIÓN PARA AJUSES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES (DEBE PROPONERSE DE TAL FORMA QUE EL VALOR TOTAL CONTRATO PROPUESTO A EJECUTAR SEA IGUAL AL PRESUPUESTO OFICIAL), este rubro se encuentra en la versión 1 del pliego tipo y, aunque en las versiones posteriores se omitió, en las respuestas sobre su obligatoriedad la Agencia respondió que no era obligatorio pero si aconsejable):		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE						
COMPONENTES	11,27%	$ 8.262.826,00	$ 35.507.242,00	$ 84.831.197,00	$ 134.652.339,00	$ 11.282.162,00	$ 274.535.767,00
G. COSTO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST (PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE CALCULADO SOBRE EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LAS OBRAS):	3,53%	$ 2.590.909,00	$ 11.133.726,00	$ 26.599.849,00	$ 42.221.871,00	$ 3.537.659,00	$ 86.084.013,00
H. COSTO COMPONENTE SOCIAL (PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE CALCULADO SOBRE EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LAS OBRAS):	3,27%	$ 2.394.327,00	$ 10.288.968,00	$ 24.581.618,00	$ 39.018.338,00	$ 3.269.243,00	$ 79.552.493,00
I. COSTO COMPONENTE PMT (PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE CALCULADO SOBRE EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LAS OBRAS):	4,47%	$ 3.277.590,00	$ 14.084.549,00	$ 33.649.731,00	$ 53.412.130,00	$ 4.475.261,00	$ 108.899.261,00
F. SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU DE TODAS LAS OBRAS INCLUYENDO LAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (K)) Y DIAGNOSTICOS (INCLUYE IVA) NO INCLUYE COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (D+E + A.I.U. DEL "K"):		$ 139.427.973,00	$ 424.039.005,00	$ 1.001.852.710,00	$ 1.606.221.964,00	$ 133.156.528,00	$ 3.304.698.181,00
J. VALOR PROPUESTA ECONÓMICA: TOTAL OBRAS SIN INCLUIR EL COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (CON ESTE VALOR SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE ACUERDO A LOS MÉTODOS ESTIPULADOS EN EL NUMERAL 4.1.4 DEL PLIEGO TIPO) = F + G + H + I:		$ 147.690.799,00	$ 459.546.247,00	$ 1.086.683.907,00	$ 1.740.874.303,00	$ 144.438.690,00	$ 3.579.233.948,00
L. VALOR TOTAL CONTRATO PROPUESTO A EJECUTAR (J+K):		**$ 147.690.799,00**	**$ 459.546.247,00**	**$ 1.086.683.907,00**	**$ 1.740.874.303,00**	**$ 144.438.690,00**	$ 3.579.233.948,00
VALOR AMORTIZACIÓN	30%	$ 44.307.240,00	$ 137.863.874,00	$ 326.005.172,00	$ 522.262.291,00	$ 43.331.607,00	$ 1.073.770.184,00
VALOR TOTAL MENOS AMORTIZACIÓN		$ 103.383.559,00	$ 321.682.373,00	$ 760.678.735,00	**$ 1.218.612.012,00**	**$ 101.107.083,00**	**$ 2.505.463.764,0**
						$ 3.470.024.291,00	$ 3.216.303.253,00



JOTAM MAESTRE DIAB
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO COCO



NAYDU LISBETH LÓPEZ OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.	[illegible]	CORRESPONDIENTE AL PERIODO [illegible]	AL [illegible]	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO / BOGOTÁ
		FECHA INICIO PERIODO	FECHA INICIO PERIODO	
SABANA	C[illegible]			

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA	CONSORCIO COCO
INTERVENTOR	AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
No. CONTRATO :	COP 613-2025
VALOR :	$ 6.795.537.201,00

							OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO OBRA EJECUTADA	
							ACTA DE CORTE No. 01		ACTA DE CORTE No. 02		ACTA DE CORTE No. 03		ACTA DE CORTE No. 04		ACTA DE CORTE No. 05		ACUMULADO	
Nº	CODIGO IDU	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR ACUMULADO
1			DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS					$ 2.941.398,00		$ -		$ 539.064,00		$ 1.508.000,00		$ -		$ 4.988.462,00
ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO QUE NO INCLUYEN IVA								$ 947.098,00		$ -		$ 539.064,00		$ -		$ -		$ 1.486.162,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	$ 269.532,00	0,00	$ -	2,00	$ 539.064,00	0,00	$ -		$ -	3,00	$ 808.596,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,00	$ 18.624,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	2,00	$ 18.624,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,00	$ 269.530,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	2,00	$ 269.530,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,00	$ 109.964,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	2,00	$ 109.964,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,00	$ 279.448,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	2,00	$ 279.448,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO QUE INCLUYEN IVA								$ 1.994.300,00		$ -		$ -		$ 1.508.000,00		$ -		$ 3.502.300,00
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	308,00	$ 1.994.300,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	308,00	$ 1.994.300,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	50,00	$ 592.850,00		$ -	50,00	$ 592.850,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	50,00	$ 915.150,00		$ -	50,00	$ 915.150,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2			CAPITULO 02: RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE					$ -		$ -		$ 16.168.692,00		$ 139.922.460,00		$ 10.496.123,00		$ 166.587.275,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	306,68	$ 334.895,00		$ -	306,68	$ 334.895,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	46,00	$ 2.149.581,00	0,00	$ -	6,72	$ 314.233,00	52,73	$ 2.463.814,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	170,67	$ 1.180.194,00	0,00	$ -	22,42	$ 155.005,00	193,09	$ 1.335.199,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	221,87	$ 12.190.595,00	71,24	$ 3.914.353,00		$ -	293,12	$ 16.104.948,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	306,68	$ 648.322,00	0,00	$ -		$ -	306,68	$ 648.322,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	306,68	$ 27.211.716,00		$ -	306,68	$ 27.211.716,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	305,64	$ 11.393.954,00	56,04	$ 2.089.089,00	361,68	$ 13.483.043,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	61,13	$ 34.715.692,00	11,21	$ 6.365.145,00	72,34	$ 41.080.837,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	409,65	$ 1.572.651,00	409,65	$ 1.572.651,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	265,00	$ 29.289.655,00		$ -	265,00	$ 29.289.655,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	265,00	$ 33.062.195,00		$ -	265,00	$ 33.062.195,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

No. CONTRATO :			COP 613-2025													
VALOR :			$ 6.795.537.201,00													
							OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO OBRA EJECUTADA	
							ACTA DE CORTE No. 01		ACTA DE CORTE No. 02		ACTA DE CORTE No. 03		ACTA DE CORTE No. 04		ACTA DE CORTE No. 05		ACUMULADO	
Nº	CODIGO IDU	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR ACUMULADO
3		CAPITULO 03: RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO RIGIDO						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4		CAPITULO 04: MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO VIA PAVIMENTO FLEXIBLE						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

	No. CONTRATO :	COP 613-2025
	VALOR :	$ 6.795.537.201,00

Nº	CODIGO IDU	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	VALOR UNITARIO	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 01 CANTIDAD	VALOR CORTE	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 02 CANTIDAD	VALOR CORTE	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 03 CANTIDAD	VALOR CORTE	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 04 CANTIDAD	VALOR CORTE	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 05 CANTIDAD	VALOR CORTE	ACUMULADO OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	VALOR ACUMULADO
5			CAPITULO 05: MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO VIA PAVIMENTO RIGIDO					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6			CAPITULO 06: ESPACIO PUBLICO EN CONCRETO					$ -		$ -		$ -		$ 843.644,00		$ 12.275.003,00		$ 13.118.647,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	48,35	$ 481.179,00	48,35	$ 481.179,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	88,00	$ 680.240,00		$ -	88,00	$ 680.240,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	48,35	$ 4.883.737,00	48,35	$ 4.883.737,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,117	$ 89.525,00	10,12	$ 89.525,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	65,34	$ 5.435.635,00	65,34	$ 5.435.635,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,18	$ 163.404,00	0,252	$ 224.160,00	0,44	$ 387.564,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	15,1	$ 1.160.767,00	15,10	$ 1.160.767,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7			CAPITULO 07: REDES					$ -		$ -		$ 25.224.130,00		$ 10.486.053,00		$ 6.978.204,00		$ 42.688.387,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	24,16	$ 1.349.910,00	10,92	$ 610.354,00		$ -	35,08	$ 1.960.264,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	64,90	$ 847.205,00		$ -	64,90	$ 847.205,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 455.606,00	0,00	$ -		$ -	2,00	$ 455.606,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	31,40	$ 1.725.395,00	17,61	$ 967.554,00	37,88	$ 2.081.420,00	86,90	$ 4.774.369,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 1.611.360,00	4,19	$ 843.889,00		$ -	12,19	$ 2.455.249,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	77,20	$ 9.336.928,00	0,00	$ -		$ -	77,20	$ 9.336.928,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 4.569.074,00	2,00	$ 4.569.074,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 327.710,00	2,00	$ 327.710,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	36,60	$ 2.820.542,00	0,00	$ -		$ -	36,60	$ 2.820.542,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	50,00	$ 5.357.800,00	0,00	$ -		$ -	50,00	$ 5.357.800,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	14,90	$ 3.171.987,00		$ -	14,90	$ 3.171.987,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	14,10	$ 4.045.064,00		$ -	14,10	$ 4.045.064,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 693.942,00	0,00	$ -		$ -	3,00	$ 693.942,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	7,00	$ 1.872.647,00	0,00	$ -		$ -	7,00	$ 1.872.647,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

No. CONTRATO :	COP 613-2025
VALOR :	$ 6.795.537.201,00

Nº	CODIGO IDU	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	VALOR UNITARIO	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 01 CANTIDAD	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 01 VALOR CORTE	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 02 CANTIDAD	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 02 VALOR CORTE	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 03 CANTIDAD	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 03 VALOR CORTE	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 04 CANTIDAD	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 04 VALOR CORTE	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 05 CANTIDAD	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 05 VALOR CORTE	ACUMULADO OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO OBRA EJECUTADA ACUMULADO VALOR ACUMULADO
8			CAPITULO 08: SEÑALIZACIÓN					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9			CAPITULO 09: NO PREVISTOS					$ -		$ -		$ -		$ 67.449.284,00		$ 9.885.916,00		$ 77.335.200,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	305,64	$ 22.474.626,00	56,04	$ 4.120.738,00	361,68	$ 26.595.364,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	61,13	$ 15.571.624,00	11,21	$ 2.855.068,00	72,34	$ 18.426.692,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 13.531.210,00		$ -	2,00	$ 13.531.210,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	61,13	$ 15.871.824,00	11,21	$ 2.910.110,00	72,34	$ 18.781.934,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

			Acta 01	Acta 02	Acta 03	Acta 04	Acta 05	Acumulado
E. SUBTOTAL OBRAS INICIALES (INCLUYE AIU):			$ -	$ -	$ 41.392.822,00	$ 218.701.441,00	$ 39.635.246,00	$ 299.729.509,00
A. SUBTOTAL ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO QUE NO INCLUYEN I.V.A.:			$ 947.098,00	$ -	$ 539.064,00	$ -	$ -	$ 1.486.162,00
B. IVA (19%):			$ 179.949,00	$ -	$ 102.422,00	$ -	$ -	$ 282.371,00
C. ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO QUE INCLUYEN IVA:			$ 1.994.300,00	$ -	$ -	$ 1.508.000,00	$ -	$ 3.502.300,00
D. SUBTOTAL DIAGNOSTICOS (A+B+C)			$ 3.121.347,00	$ -	$ 641.486,00	$ 1.508.000,00	$ -	$ 5.270.833,00
ADMINISTRACION	27,00%		$ -	$ -	$ 8.403.054,00	$ 44.398.037,00	$ 8.046.253,00	$ 60.847.344,00
IMPREVISTO	1,00%		$ -	$ -	$ 311.224,00	$ 1.644.372,00	$ 298.009,00	$ 2.253.605,00
UTILIDAD	5,00%		$ -	$ -	$ 1.556.121,00	$ 8.221.859,00	$ 1.490.047,00	$ 11.268.027,00
SUBTOTAL A.I.U	33,00%		$ -	$ -	$ 10.270.399,00	$ 54.264.268,00	$ 9.834.309,00	$ 74.368.976,00
K. VALOR PROPUESTO COSTO DIRECTO PARA PROVISIÓN PARA AJUSES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES (DEBE PROPONERSE DE TAL FORMA QUE EL VALOR TOTAL CONTRATO PROPUESTO A EJECUTAR SEA IGUAL AL PRESUPUESTO OFICIAL), este rubro se encuentra en la versión 1 del pliego tipo y, aunque en las versiones posteriores se omitió, en las respuestas sobre su obligatoriedad la Agencia respondió que no era obligatorio pero si aconsejable):			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE							
COMPONENTES	11,27%		$ -	$ -	$ 3.507.155,00	$ 18.530.261,00	$ 3.358.238,00	$ 25.395.653,00
G. COSTO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST (PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE CALCULADO SOBRE EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LAS OBRAS):	3,53%		$ -	$ -	$ 1.099.711,00	$ 5.810.388,00	$ 1.053.016,00	$ 7.963.114,00
H. COSTO COMPONENTE SOCIAL (PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE CALCULADO SOBRE EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LAS OBRAS):	3,27%		$ -	$ -	$ 1.016.272,00	$ 5.369.531,00	$ 973.120,00	$ 7.358.923,00
I. COSTO COMPONENTE PMT (PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE CALCULADO SOBRE EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LAS OBRAS):	4,47%		$ -	$ -	$ 1.391.172,00	$ 7.350.342,00	$ 1.332.102,00	$ 10.073.616,00
F. SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU DE TODAS LAS OBRAS INCLUYENDO LAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (K)) Y DIAGNOSTICOS (INCLUYE IVA) NO INCLUYE COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (D+E + A.I.U. DEL "K"):			$ 3.121.347,00	$ -	$ 42.034.308,00	$ 220.209.441,00	$ 39.635.246,00	$ 305.000.342,00
ICA: TOTAL OBRAS SIN INCLUIR EL COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (CON ESTE VALOR SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE ACUERDO A LOS MÉTODOS ESTIPULADOS EN EL NUMERAL 4.1.4			$ 3.121.347,00	$ -	$ 45.541.463,00	$ 238.739.702,00	$ 42.993.484,00	$ 330.395.995,00
L. VALOR TOTAL CONTRATO PROPUESTO A EJECUTAR (J+K):			$ 3.121.347,00	$ -	$ 45.541.463,00	$ 238.739.702,00	$ 42.993.484,00	$ 330.395.995,00

JOTAM MAESTRE DIAB
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO COCO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | BOGOTÁ

CO□□□□□□□□□□

□□□C□□□R□□MO□□O□□□O□□□□□□ORM□□□□□□M□D□□R□C□O□□□□□R□O□□□□□□C□□□D□D□□□□□R□□□□CO□□□R□CC□O□□□□O□CO□□□R□□C□□□□O□M□□□□□M□□□□O□□□O□R□□□□□□□C□□□D□□□□M□□□□□□□□OC□□□□□□□RM□D□□□□□□C□O□□□□CO□□□O□R□□□COM□□□M□□□R□□□□□□□OC□□D□D□□□□□□□□□O□D□□□□□C□□D□D□D□□□O□O□□□D□C

□O□DO□D□□D□□□RRO□□O□OC□□D□□□□□□□O

MEMORIAS DE CÁLCULO

□□□R□□□□ORM□□□□□□□□□□□□□□R□□□O□□□□□□□


□OM□ | □ | D□ | □□

2003	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3		DIR:	Cr□□□□□□□□C□□□□□□□R□□C□□□□□□□r	CIV:	□□□□□□□	
FECHA	□□□□□□O□D□□□□□□	COR□□	□□□					

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (UND)	TOTAL (M2)
CORTE No. 5								
	Cra. 38 Entre Cll 50A SUR CRUCE							
	K0+000			□□□	□□□	□□□		□□□
	K0+006							
	D□□C□□□□O□□O□O□□D□□□□□CC□O□□D□□□□	□□□		□□□		□□□□		□□□□
		CORTE No. 5						6,72
CORTE No. 6								
		CORTE No. 6						0,00
CORTE No. 7								
		CORTE No. 7						0,00
TOTAL ACUMULADO								6,72

ESQUEMA / OBSERVACIONES



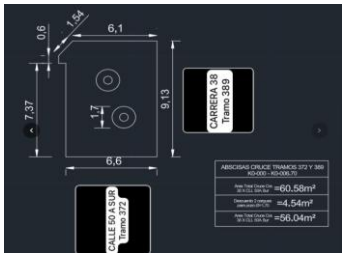

RESIDENTE DE OBRA
NELSON ALBERTO HERNANDEZ NIÑO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MISAEL PULIDO GUZMÁN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | BOGOTÁ

CO□□□□□□□□□□

□□□C□□□R□□MO□□O□□□O□□□□□□□OR□□□□□□□M□D□□□R□C□O□□□□□□R□O□□□□□□□C□□□D□D□□□□R□□□□CO□□□R□CC□O□□□□O□ CO□□□R□□C□□□□□O□M□□□□□□M□□□□O□□□O□R□□□□□□□□C□□□D□□□M□□□□□□□□□OC□□□□□□□RM□D□□□□□□□□C□O□□□□□CO□□□ O□R□□□COM□□□M□□□□R□□□□□□□□OC□□D□D□D□□□□□□□□□O□D□□□□C□□D□D□D□□O□□□D□C

□O□DO□D□□D□□□RRO□□O□□OC□□□D□□□□□□□□□O

CONSORCIO

MEMORIAS DE CÁLCULO

□□□R□□□□OR□□□□□□□□□□□□□□R□□□O□□□□□□□□

□O□□ | □ | D□ | □□


2004	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	DIR:	Cr□□□□□□□r□C□□□□□□R□C□□□□□□r	CIV:	□□□□□□□

FECHA	□□□□□□O□D□□□□□□	COR□□	□□□

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (Ø)	TOTAL (m3)
CORTE No. 5								
	Cr□□□□□□r□C□□□□□R□CR□C□							
	□□□□□□			□□□	□□□	□□□		□□□□
	□□□□□□							
	D□□C□□□□O□□O□□D□□□□CC□O□□D□□□□	□□□		□□□		□□□□		□□□□
	TOTAL CORTE No. 5							22,42
CORTE No. 6								
	TOTAL CORTE No. 6							0,00
CORTE No. 7								
	TOTAL CORTE No. 7							0,00
	TOTAL ACUMULADO							22,42

ESQUEMA / OBSERVACIONES



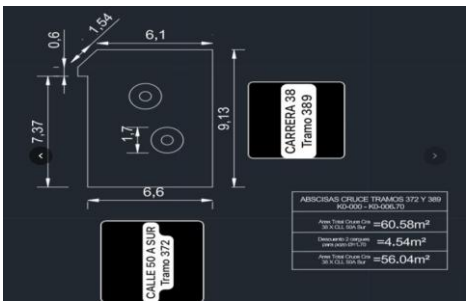

RESIDENTE DE OBRA
NELSON ALBERTO HERNANDEZ NIÑO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MISAEL PULIDO GUZMÁN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | BOGOTÁ

CONSORCIO

MEMORIAS DE CÁLCULO


2011	**GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 90 KN/M Y 110 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).**	**M2**	**DIR:**	Cr	**CIV:**			

FECHA		COR	

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (UND)	TOTAL (M2)
CORTE No. 5								
	Cra. 38 Entre Cll 50A SUR CRUCE							
	TOTAL CORTE No. 5							**56,04**
CORTE No. 6								
	TOTAL CORTE No. 6							**0,00**
CORTE No. 7								
	TOTAL CORTE No. 7							**0,00**
TOTAL ACUMULADO								**56,04**

ESQUEMA / OBSERVACIONES



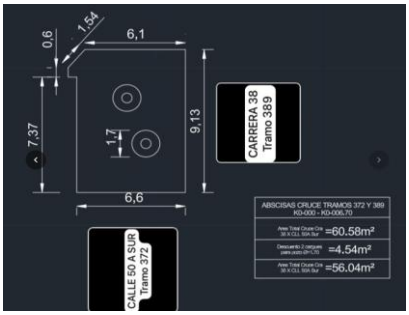

RESIDENTE DE OBRA
NELSON ALBERTO HERNANDEZ NIÑO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MISAEL PULIDO GUZMÁN

CO□□□□□□□□□□

□□□C□□□R□□MO□□□O□□□O□□□□□□□ORO□□□□□□□M□□D□□□R□C□O□□□□□□R□O□□□□□□C□□□D□□D□□□□□R□□□□CO□□□R□CC□O□□□O□CO□□□R□□C□□□□O□M□□□□□M□□□□O□□□O□R□□□□□□□□C□□□D□□□□M□□□□□□□□□OC□□□□□□□□RM□D□□□□□□□□C□O□□□□□CO□□□O□R□□□COM□□□M□□□□R□□□□□□□□□□OC□□D□D□D□□□□□□□□□□□O□D□□□□□C□□D□D□D□□□O□O□□□D□C

□O□DO□D□□D□□□RRO□□O□□OC□□D□□□□□□□□O

MEMORIAS DE CÁLCULO

□□□R□□□□ORO□□□□□□□□□□□□□□□□R□□□□O□□□□□□□□□

□O□□ | □ | D□ | □□


2017	**ESTABILIZACIÓN DE SUB BASE Y BASES GRANULARES CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%**	**M3**	**DIR:**	Cr□□□□□□□□C□□□□□□R□□C□□□□□□□r	**CIV:** □□□□□□□

FECHA	□□□□□□O□D□□□□□□	COR□□	□□□

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (UND)	TOTAL (M3)
CORTE No. 5								
	Cra. 38 Entre Cll 50A SUR CRUCE							
	□□□□□□			□□□	□□□	□□□		□□□□
	□□□□□□							
	D□□C□□□□O□□O□O□□D□□□□□□CC O□□D□□□□	□□□		□□□		□□□□		□□□□
		TOTAL CORTE No. 5						**11,21**
CORTE No. 6								
		TOTAL CORTE No. 6						**0,00**
CORTE No. 7								
		TOTAL CORTE No. 7						**0,00**
TOTAL ACUMULADO								**11,21**

ESQUEMA / OBSERVACIONES



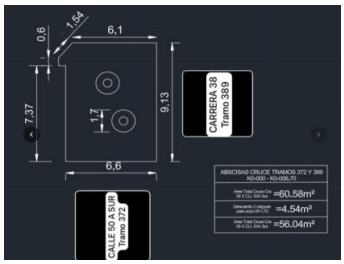

RESIDENTE DE OBRA
NELSON ALBERTO HERNANDEZ NIÑO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MISAEL PULIDO GUZMÁN

CO□□□□□□□□□

□□□C□□□R□□MO□□O□□□O□□□□□□OR□□□□□□□M□D□□R□C□O□□□□□□R□O□□□□□□C□□□D□D□□□□R□□□□CO□□□R□CC□O□□□O□ CO□□□R□□C□□□□O□M□□□□□M□□□O□□O□R□□□□□□□C□□□D□□□□M□□□□□□□□OC□□□□□□□RM□D□□□□□□C□O□□□□CO□□ O□R□□□COM□□□M□□□R□□□□□□□OC□□D□D□D□□□□□□□□O□D□□□□C□□D□D□D□□O□O□□□D□C

□O□DO□D□□D□□□RRO□□O□□OC□□□D□□□□□□□□□O

MEMORIAS DE CÁLCULO

□□□R□□□□OR□□□□□□□□□□□□□□□R□□□O□□□□□□□

□O□□ | □□ | D□ | □□

2018	**IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)**	**M2**	**DIR:**	Cr□□□□□□□□C□□□□□□□R□C□□□□□□□r	**CIV:** □□□□□□□

FECHA	□□□□□□O□D□□□□□□	COR□□	□□□

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA	TOTAL (m3)	ESQUEMA / OBSERVACIONES
	CORTE No. 5								
	Cra. 38 Entre Cll 50A SUR Y Cll 50 B Sur VIA			□□□□	□□□			□□□□□	
	AREA CURVA SEGMENTO VIAL			□□□	□□□			□□□□	
	DESCUENTO SUMIDERO IZQUIERDO			□□□	□□□□			□□□□	
	K0+3,50								
	Cra. 38 Entre Cll 50A SUR CRUCE								
	□□□□□□			□□□	□□□			□□□□	
	□□□□□□								
	D□□C□□□□O□□O□□D□□□□CC□O□□D□□□□	□□□		□□□□				□□□□	
		TOTAL CORTE No. 4						**409,65**	
	CORTE No. 6								
		TOTAL CORTE No. 5						**0,00**	
	CORTE No. 7								
		TOTAL CORTE No. 6						**0,00**	
	TOTAL ACUMULADO							**409,65**	



RESIDENTE DE OBRA
NELSON ALBERTO HERNANDEZ NIÑO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MISAEL PULIDO GUZMÁN

CO□□□□□□□□□

□□□C□□□R□□MO□□O□□□O□□□□□□□OR□□□□□□□M□□D□□□R□C□O□□□□□□R□O□□□□□□C□□□D□□D□□□□□R□□□□CO□□□R□CC□O□□□O□ CO□□□R□□C□□□□O□M□□□□□□M□□□□O□□□O□R□□□□□□□□C□□□D□□□□M□□□□□□□□□OC□□□□□□□□RM□D□□□□□□□C□O□□□□□CO□□□ O□R□□□COM□□□M□□□□R□□□□□□□□OC□□D□D□D□□□□□□□□□□O□D□□□□C□□D□D□D□□□O□O□□□D□C

□O□DO□D□□D□□□RRO□□O□□OC□□□D□□□□□□□□□O

MEMORIAS DE CÁLCULO

□□□R□□□□OR□□□□□□□□□□□□□□□□R□□□O□□□□□□□□

□O□□ | □ | D□ | □□

6001	**DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.**	**M2**	**DIR:**	Cr□□□□□□□□C□□□□□□□R□□C□□□□□□□r	**CIV:** □□□□□□□

FECHA	□□□□□□O□D□□□□□□	COR□□	□□□

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (UND)	TOTAL (M3)	ESQUEMA / OBSERVACIONES
	CORTE No. 5								
	Cra. 38 Entre Cll 50A SUR - ANDEN ORIENTE								
	□□□□□□			□□□□	□□□			□□□□	
	□□□□□□□□								
	Cra. 38 Entre Cll 50A SUR - ANDEN OCCIDENTE								
	K0+000			□□□□	□□□			□□□□	
	K0+43,70								
	LINEA DE CORTE EXTREMO SUR			□□□□	□□□			□□□	
		TOTAL CORTE No. 5						**48,35**	
	CORTE No. 6								
		TOTAL CORTE No. 6						**0,00**	
	CORTE No. 7								
		TOTAL CORTE No. 7						**0,00**	
	TOTAL ACUMULADO							**48,35**	



RESIDENTE DE OBRA
NELSON ALBERTO HERNANDEZ NIÑO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MISAEL PULIDO GUZMÁN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | BOGOTÁ

CO□□□□□□□□□

□□□C□□□R□□MO□□O□□□O□□□□□□□ORD□□□□□□□M□D□□R□C□O□□□□□□R□O□□□□□□C□□□D□D□□□□□R□□□□CO□□□R□CC□O□□□□O□CO□□□R□□C□□□□O□M□□□□□M□□□□O□□O□R□□□□□□□C□□□D□□□□M□□□□□□□□OC□□□□□□□RM□D□□□□□□□C□O□□□□□CO□□□O□R□□□COM□□□M□□□□R□□□□□□□OC□□D□D□D□□□□□□□□□O□D□□□□□C□□D□D□D□□□O□O□□□D□C

□O□DO□D□□D□□□RRO□□O□□OC□□□D□□□□□□□□O

MEMORIAS DE CÁLCULO

□□□R□□□□OR□□□□□□□□□□□□□□□R□□□O□□□□□□□□

□O□□ | □ | D□ | □□

6007	**ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)**	**M2**	**DIR:**	Cr□□□□□□□□C□□□□□□□R□□C□□□□□□□r	**CIV:** □□□□□□□

FECHA	□□□□□□O□D□□□□□□	COR□□	□□□

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (UND)	TOTAL (M3)
	CORTE No. 5							
	Cra. 38 Entre Cll 50A SUR - ANDEN ORIENTE							
	□□□□□□			□□□□	□□□			□□□□
	□□□□□□□□							
	Cr□□□□□□□C□□□□□□□R□□□D□□□OCCD□□□□							
	□□□□□□			□□□□	□□□			□□□□
	□□□□□□□□							
	□□□□D□□COR□□□□□R□MO□□R			□□□□	□□□			□□□
		TOTAL CORTE No. 5						**48,35**
	CORTE No. 6							
		TOTAL CORTE No. 6						**0,00**
	CORTE No. 7							
		TOTAL CORTE No. 7						**0,00**
	TOTAL ACUMULADO							**48,35**

ESQUEMA / OBSERVACIONES



RESIDENTE DE OBRA
NELSON ALBERTO HERNANDEZ NIÑO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MISAEL PULIDO GUZMÁN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | BOGOTÁ

CONSORCIO

MEMORIAS DE CÁLCULO

6008	MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	DIR:		CIV:

FECHA COR

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (KG / m2)	AREA (UND)	TOTAL (ML)	ESQUEMA / OBSERVACIONES
	CORTE No. 5								
	ANDEN IZQUIERDO Cra. 38 Entre Cll 50A SUR Y Cll 50 B Sur								
	K0+11,85								
	K0+14,25								
	K0+18,55								
	K0+20,95								
	K0+26,65								
	K0+32,10								
	ANDEN DERECHO Cra. 38 Entre Cll 50A SUR Y Cll 50 B Sur								
	k0+22,70								
	k0+25,40								
	k0+30,30								
	k0+32,45								
			CORTE No. 5					**10,12**	
	CORTE No. 6								
			CORTE No. 6					**0,00**	
	CORTE No. 7								
			CORTE No. 7					**0,00**	
	TOTAL ACUMULADO							**10,12**	



RESIDENTE DE OBRA
NELSON ALBERTO HERNANDEZ NIÑO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MISAEL PULIDO GUZMÁN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | BOGOTÁ

CONSORCIO

MEMORIAS DE CÁLCULO

6013	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	DIR:	Cr	CIV:			
FECHA		COR						

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (UND)	TOTAL (ML)	ESQUEMA / OBSERVACIONES
	CORTE No. 5								
	ANDEN IZQUIERDO Cra. 38 Entre Cll 50A SUR Y Cll 50 B Sur								
	K0+000								
	K0+3,75								
	K0+4,95								
	K0+11,45								
	K0+14,65								
	K0+18,15								
	K0+12,35								
	K0+26,25								
	K0+32,50								
	K0+45,00								
	ANDEN DERECHO Cra. 38 Entre Cll 50A SUR Y Cll 50 B Sur								
	K0+5,40								
	K0+22,30								
	K0+25,80								
	K0+29,90								
	K0+32,45								
	K0+44,00								
				TOTAL CORTE No. 5				**65,34**	
	CORTE No. 6								
				TOTAL CORTE No. 6				**0,00**	
	CORTE No. 7								
				TOTAL CORTE No. 7				**0,00**	
	TOTAL ACUMULADO							**65,34**	



RESIDENTE DE OBRA
NELSON ALBERTO HERNANDEZ NIÑO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MISAEL PULIDO GUZMÁN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | BOGOTÁ

CO□□□□□□□□□□

□□□C□□□R□□MO□□O□□□O□□□□□□□OR□□□□□□□M□D□□R□C□O□□□□□R□O□□□□□□C□□□D□D□□□□R□□□□CO□□□R□CC□O□□□O□ CO□□□R□□C□□□□O□M□□□□□M□□□□O□□O□R□□□□□□□C□□□D□□□M□□□□□□□□OC□□□□□□RM□D□□□□□C□O□□□□□CO□□□ O□R□□□COM□□□M□□□R□□□□□□□OC□□D□D□D□□□□□□□□□O□D□□□□C□□D□D□D□□□O□O□□□D□C

□O□DO□D□□D□□□RRO□□O□□OC□□□D□□□□□□□□□O

MEMORIAS DE CÁLCULO

□□□R□□□□OR□□□□□□□□□□□□□□□□R□□□O□□□□□□□□

□O□□ | □ | D□ | □□

6015	**CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA PIEZA REMATE TIPO HOMBROS PARA RAMPA (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., BOMBEO CON AUTOBOMBA, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO).**	**M3**	**DIR:**	Cr□□□□□□□□C□□□□□□□R□□C□□□□□□□r	**CIV:** □□□□□□□

FECHA	□□□□□□O□D□□□□□□	COR□□	□□□

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (UND)	TOTAL (M2)
CORTE No. 5								
	Cra. 38 Entre Cll 50A SUR ANDEN COSTADO NORTE							
	K0+000		□□□	□□□	□□□	□□□		□□□
	K0+006							
		CORTE No. 5						**0,25**
CORTE No. 6								
		CORTE No. 6						**0,00**
CORTE No. 7								
		CORTE No. 7						**0,00**
TOTAL ACUMULADO								**0,25**

ESQUEMA / OBSERVACIONES



RESIDENTE DE OBRA
NELSON ALBERTO HERNANDEZ NIÑO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MISAEL PULIDO GUZMÁN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | BOGOTÁ

CO□□□□□□□□□□

□□□C□□□R□□MO□□O□□□O□□□□□□□OR□□□□□□□M□D□□R□C□O□□□□□R□O□□□□□□C□□□D□D□□□□R□□□□CO□□□R□CC□O□□□O□ CO□□□R□□C□□□□O□M□□□□□M□□□□O□□O□R□□□□□□□C□□□D□□□□M□□□□□□□□OC□□□□□□RM□D□□□□□□C□O□□□□CO□□□ O□R□□□COM□□□M□□□□R□□□□□□□□OC□□D□D□D□□□□□□□□□O□D□□□□□C□□D□D□D□□O□O□□□D□C

CONSORCIO

□O□DO□D□□D□□□RRO□□O□□OC□□D□□□□□□□□□O

MEMORIAS DE CÁLCULO

□□□R□□□□OR□□□□□□□□□□□□□□□□□□R□□□O□□□□□□□□□

□O□□ | □ | D□ | □□

6016	**SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)**	**ML**	**DIR:**	Cr□□□□□□□r□□C□□□□□□□R□□C□□□□□□□r	**CIV:**	□□□□□□□□

FECHA	□□□□□□O□D□□□□□□□	COR□□	□□□

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (UND)	TOTAL (ML)	ESQUEMA / OBSERVACIONES
	CORTE No. 5								
	Cra. 38 Entre Cll 50A SUR Y Cll 50 B Sur ANDEN DERECHO								
	K0+11,85			□□□				□□□	
	K0+14,25								
	K0+18,55			□□□				□□□	
	K0+20,95								
	K0+26,65			□□□				□□□	
	K0+32,10								
	Cra. 38 Entre Cll 50A SUR Y Cll 50 B Sur ANDEN IZQUIERDO								
	k0+22,70			□□□				□□□	
	k0+25,40								
	k0+30,30			□□□				□□□	
	k0+32,45								
		CORTE No. 5						**15,10**	
	CORTE No. 6								
		CORTE No. 6						**0,00**	
	CORTE No. 7								
		CORTE No. 7						**0,00**	
	TOTAL ACUMULADO							**15,10**	



RESIDENTE DE OBRA
NELSON ALBERTO HERNANDEZ NIÑO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MISAEL PULIDO GUZMÁN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | BOGOTÁ

CO□□□□□□□□□□

□□□C□□□R□□MO□□O□□□O□□□□□□□ORD□□□□□□M□□D□□□R□C□O□□□□□□R□O□□□□□□C□□□D□□D□□□□□R□□□□CO□□□R□CC□O□□□O□ CO□□□R□□C□□□□O□□M□□□□□M□□□□O□□O□R□□□□□□□□C□□□D□□□□M□□□□□□□□OC□□□□□□□RM□D□□□□□□□C□O□□□□CO□□□ O□R□□□COM□□□M□□□□R□□□□□□□□OC□□D□D□D□□□□□□□□□O□D□□□□□C□□D□D□D□□□O□O□□□D□C

□O□DO□D□□D□□□RRO□□O□□OC□□D□□□□□□□□O

CONSORCIO COCO

MEMORIAS DE CÁLCULO

□□□R□□□□ORD□□□□□□□□□□□□□□□□R□□□□O□□□□□□□□□

□O□□ | □□ | D□ | □□

7005	**TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.**	**M3**	**DIR:**	Cr□□□□□□□r□□C□□□□□□□R□□C□□□□□□r	**CIV:** □□□□□□□

FECHA	□□□□□□□O□D□□□□□□□	COR□□	□□□

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (Ø)	TOTAL (m3)	ESQUEMA / OBSERVACIONES
	CORTE No. 5								
	DEMOLICION DE PAVIMENTO								
	Cr□□□□□□□r□□C□□□□□□□R□CR□C□								
	K0+000			□□□	□□□	□□□		□□□	
	□□□□□□								
	DESCUENTO POZOS DE INSPECCION D=1,70	□□□		□□□		□□□□		□□□□	
	EXCAVACION								
	Cr□□□□□□□r□□C□□□□□□□R□CR□C□								
	□□□□□□			□□□	□□□	□□□		□□□□	
	K0+006								
	D□□C□□□□O□□O□□D□□□□□CC□O□□D□□□□	□□□		□□□		□□□□		□□□□	
	□□□□O□□□							□□□□	
	□□□□□□□□□□	□□□						□□□□	
		TOTAL CORTE No. 5						**37,88**	
	CORTE No. 6								
		TOTAL CORTE No. 6						**0,00**	
	CORTE No. 7								
		TOTAL CORTE No. 7						**0,00**	
	TOTAL ACUMULADO							**37,88**	



RESIDENTE DE OBRA
NELSON ALBERTO HERNANDEZ NIÑO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MISAEL PULIDO GUZMÁN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | BOGOTÁ

CONSORCIO COCO

MEMORIAS DE CÁLCULO

7012	**PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)**	**UN**	**DIR:**		**CIV:**	

FECHA

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA	TOTAL (m3)
	CORTE No. 5							
	Cra. 38 Entre Cll 50A SUR CRUCE							
		TOTAL CORTE No. 5						**2,00**
	CORTE No. 6							
		TOTAL CORTE No. 6						**0,00**
	CORTE No. 7							
		TOTAL CORTE No. 7						**0,00**
	TOTAL ACUMULADO							**2,00**

ESQUEMA / OBSERVACIONES



RESIDENTE DE OBRA
NELSON ALBERTO HERNANDEZ NIÑO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MISAEL PULIDO GUZMÁN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | BOGOTÁ

CONSORCIO

MEMORIAS DE CÁLCULO

7014	**NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)**	**UN**	**DIR:**		**CIV:**	

FECHA

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA	TOTAL (m3)
	CORTE No. 5							
	Cra. 38 Entre Cll 50A SUR CRUCE							
	TOTAL CORTE No. 5							**2,00**
	CORTE No. 6							
	TOTAL CORTE No. 6							**0,00**
	CORTE No. 7							
	TOTAL CORTE No. 7							**0,00**
	TOTAL ACUMULADO							**2,00**

ESQUEMA / OBSERVACIONES



RESIDENTE DE OBRA
NELSON ALBERTO HERNANDEZ NIÑO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MISAEL PULIDO GUZMÁN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | BOGOTÁ

CONSORCIO

MEMORIAS DE CÁLCULO

NP-07	**GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**M2**	**DIR:**		**CIV:**	
FECHA		COR				

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (UND)	TOTAL (M2)
CORTE No. 5								
	Cra. 38 Entre Cll 50A SUR CRUCE							
	TOTAL CORTE No. 5							**56,04**
CORTE No. 6								
	TOTAL CORTE No. 6							**0,00**
CORTE No. 7								
	TOTAL CORTE No. 7							**0,00**
TOTAL ACUMULADO								**56,04**

ESQUEMA / OBSERVACIONES



RESIDENTE DE OBRA
NELSON ALBERTO HERNANDEZ NIÑO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MISAEL PULIDO GUZMÁN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | BOGOTÁ

CONSORCIO

MEMORIAS DE CÁLCULO

NP-12	**AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)**	**M3**	**DIR:**	**CIV:**	

FECHA		COR	

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA	TOTAL (m3)
CORTE No. 5								
	Cra. 38 Entre Cll 50A SUR CRUCE							
	TOTAL CORTE No. 5							**11,21**
CORTE No. 6								
	TOTAL CORTE No. 6							**0,00**
CORTE No. 7								
	TOTAL CORTE No. 7							**0,00**
TOTAL ACUMULADO								**11,21**

ESQUEMA / OBSERVACIONES



RESIDENTE DE OBRA
NELSON ALBERTO HERNANDEZ NIÑO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MISAEL PULIDO GUZMÁN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | BOGOTÁ

CONSORCIO COCO

MEMORIAS DE CÁLCULO

NP-08	**AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)**	**M3**	**DIR:**	Cr	**CIV:**	

FECHA		COR	

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA	TOTAL (m3)
CORTE No. 5								
	Cra. 38 Entre Cll 50A SUR CRUCE							
	TOTAL CORTE No. 5							**11,21**
CORTE No. 6								
	TOTAL CORTE No. 6							**0,00**
CORTE No. 7								
	TOTAL CORTE No. 7							**0,00**
TOTAL ACUMULADO								**11,21**

ESQUEMA / OBSERVACIONES



RESIDENTE DE OBRA
NELSON ALBERTO HERNANDEZ NIÑO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MISAEL PULIDO GUZMÁN

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.	[illegible]	CORRESPONDIENTE AL PERIODO	[illegible]	AL	[illegible]
SABANA	C[illegible]		FECHA INICIO PERIODO		FECHA INICIO PERIODO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | BOGOTÁ

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA	CONSORCIO COCO
INTERVENTOR	AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
No. CONTRATO :	COP 613-2025
VALOR :	$ 6.795.537.201,00

							OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO OBRA EJECUTADA	
							ACTA DE CORTE No. 01		ACTA DE CORTE No. 02		ACTA DE CORTE No. 03		ACTA DE CORTE No. 04		ACTA DE CORTE No. 05		ACUMULADO	
Nº	CODIGO IDU	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR ACUMULADO
1		DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS						$ 4.957.713,00		$ -		$ -		$ 7.041.756,00		$ -		$ 11.999.469,00
ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO QUE NO INCLUYEN IVA								$ 947.098,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 947.098,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	$ 269.532,00	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	1,00	$ 269.532,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,00	$ 18.624,00	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	2,00	$ 18.624,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,00	$ 269.530,00	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	2,00	$ 269.530,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,00	$ 109.964,00	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	2,00	$ 109.964,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,00	$ 279.448,00	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	2,00	$ 279.448,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO QUE INCLUYEN IVA								$ 4.010.615,00		$ -		$ -		$ 7.041.756,00		$ -		$ 11.052.371,00
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	619,40	$ 4.010.615,00	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	619,40	$ 4.010.615,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	233,48	$ 2.768.372,00		$ -	233,48	$ 2.768.372,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	233,48	$ 4.273.384,00		$ -	233,48	$ 4.273.384,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
2		CAPITULO 02: RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE						$ 24.435.724,00		$ -		$ -		$ 243.796.207,00		$ 2.624.956,00		$ 270.856.887,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	619,60	$ 676.603,00	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	619,60	$ 676.603,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	99,80	$ 319.460,00	99,80	$ 319.460,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	92,94	$ 4.342.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	92,94	$ 4.342.900,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	247,84	$ 1.713.814,00	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	247,84	$ 1.713.814,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	322,19	$ 17.702.407,00	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	322,19	$ 17.702.407,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	610,51	$ 1.290.609,00		$ -	610,51	$ 1.290.609,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	610,51	$ 54.170.162,00		$ -	610,51	$ 54.170.162,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 22.759.038,00		$ -	610,51	$ 22.759.038,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 69.342.788,00		$ -	122,10	$ 69.342.788,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	600,55	$ 2.305.496,00	600,55	$ 2.305.496,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	409,00	$ 45.205.543,00		$ -	409,00	$ 45.205.543,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	409,00	$ 51.028.067,00		$ -	409,00	$ 51.028.067,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -

No. CONTRATO :	COP 613-2025
VALOR :	$ 6.795.537.201,00

							OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO OBRA EJECUTADA	
							ACTA DE CORTE No. 01		ACTA DE CORTE No. 02		ACTA DE CORTE No. 03		ACTA DE CORTE No. 04		ACTA DE CORTE No. 05		ACUMULADO	
Nº	CODIGO IDU	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INCIALES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR ACUMULADO
3		CAPITULO 03: RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO RIGIDO						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
4		CAPITULO 04: MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO VIA PAVIMENTO FLEXIBLE						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -

No. CONTRATO :	COP 613-2025
VALOR :	$ 6.795.537.201,00

Nº	CODIGO IDU	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INCIALES	VALOR UNITARIO	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 01 CANTIDAD	VALOR CORTE	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 02 CANTIDAD	VALOR CORTE	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 03 CANTIDAD	VALOR CORTE	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 04 CANTIDAD	VALOR CORTE	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 05 CANTIDAD	VALOR CORTE	ACUMULADO OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	VALOR ACUMULADO
5			CAPITULO 05: MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO VIA PAVIMENTO RIGIDO					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
6			CAPITULO 06: ESPACIO PUBLICO EN CONCRETO					$ -		$ 1.623.300,00		$ 2.189.791,00		$ -		$ 15.123.893,00		$ 18.936.984,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	12,75	$ 126.888,00	12,75	$ 126.888,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	210,00	$ 1.623.300,00	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	210,00	$ 1.623.300,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	12,75	$ 1.287.852,00	12,75	$ 1.287.852,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -	102,05	$ 8.489.540,00	102,05	$ 8.489.540,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	2,46	$ 2.189.791,00	[illegible]	$ -	0,63	$ 560.401,00	3,09	$ 2.750.192,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -	60,61	$ 4.659.212,00	60,61	$ 4.659.212,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
7			CAPITULO 07: REDES					$ -		$ 71.080.750,00		$ 29.644.875,00		$ 11.224.573,00		$ -		$ 111.950.198,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	33,97	$ 1.898.346,00	37,87	$ 2.116.289,00	11,94	$ 667.243,00		$ -	83,78	$ 4.681.878,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	206,55	$ 2.696.304,00		$ -	206,55	$ 2.696.304,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	4,00	$ 911.212,00	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	4,00	$ 911.212,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	247,22	$ 13.583.256,00	49,23	$ 2.704.893,00	25,46	$ 1.398.874,00		$ -	321,91	$ 17.687.023,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	39,72	$ 8.001.389,00	[illegible]	$ -	5,23	$ 1.053.427,00		$ -	44,95	$ 9.054.816,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	141,00	$ 17.052.057,00	[illegible]	$ -	3,65	$ 441.420,00		$ -	144,65	$ 17.493.477,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 6.853.611,00	[illegible]	$ -		$ -	3,00	$ 6.853.611,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	3,15	$ 2.808.071,00	[illegible]	$ -		$ -	3,15	$ 2.808.071,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 163.855,00	[illegible]	$ -		$ -	1,00	$ 163.855,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	89,81	$ 6.921.118,00	[illegible]	$ -	7,50	$ 577.980,00		$ -	97,31	$ 7.499.098,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	116,74	$ 12.509.391,00	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	116,74	$ 12.509.391,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	15,30	$ 3.257.141,00	[illegible]	$ -		$ -	15,30	$ 3.257.141,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	41,34	$ 11.741.015,00	[illegible]	$ -		$ -	41,34	$ 11.741.015,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	15,30	$ 4.389.325,00		$ -	15,30	$ 4.389.325,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	14,00	$ 3.238.396,00	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	14,00	$ 3.238.396,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	22,00	$ 5.885.462,00	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	22,00	$ 5.885.462,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	[illegible]	$ 1.080.123,00	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	156,20	$ 1.080.123,00

No. CONTRATO :	COP 613-2025
VALOR :	$ 6.795.537.201,00

Nº	CODIGO IDU	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	VALOR UNITARIO	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 01		OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 02		OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 03		OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 04		OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 05		ACUMULADO OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
							CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR ACUMULADO
8	CAPITULO 08: SEÑALIZACIÓN							$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
9	CAPITULO 09: NO PREVISTOS							$ -		$ -		$ 3.507.684,00		$ 135.813.355,00		$ -		$ 139.321.039,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	#¡VALOR!	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 3.001.714,00	[illegible]	$ -		$ -	2,00	$ 3.001.714,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 505.970,00	[illegible]	$ -		$ -	0,60	$ 505.970,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	610,51	$ 44.892.308,00		$ -	610,51	$ 44.892.308,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	122,10	$ 31.103.510,00		$ -	122,10	$ 31.103.510,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	66,00	$ 1.051.974,00		$ -	66,00	$ 1.051.974,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	4,00	$ 27.062.420,00		$ -	4,00	$ 27.062.420,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	122,10	$ 31.703.143,00		$ -	122,10	$ 31.703.143,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -

Concepto	%	Acta No. 01	Acta No. 02	Acta No. 03	Acta No. 04	Acta No. 05	Acumulado
E. SUBTOTAL OBRAS INICIALES (INCLUYE AIU):		$ 24.435.724,00	$ 72.704.050,00	$ 35.342.350,00	$ 390.834.135,00	$ 17.748.849,00	$ 541.065.108,00
A. SUBTOTAL ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO QUE NO INCLUYEN I.V.A.:		$ 947.098,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 947.098,00
B. IVA (19%):		$ 179.949,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 179.949,00
C. ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO QUE INCLUYEN IVA:		$ 4.010.615,00	$ -	$ -	$ 7.041.756,00	$ -	$ 11.052.371,00
D. SUBTOTAL DIAGNOSTICOS (A+B+C)		$ 5.137.662,00	$ -	$ -	$ 7.041.756,00	$ -	$ 12.179.418,00
ADMINISTRACION	27,00%	$ 4.960.635,70	$ 14.759.468,80	$ 7.174.762,78	$ 79.342.268,01	$ 3.603.149,80	$ 109.840.285,08
IMPREVISTO	1,00%	$ 183.727,25	$ 546.646,99	$ 265.731,95	$ 2.938.602,52	$ 133.449,99	$ 4.068.158,71
UTILIDAD	5,00%	$ 918.636,24	$ 2.733.234,96	$ 1.328.659,77	$ 14.693.012,59	$ 667.249,96	$ 20.340.793,53
SUBTOTAL A.I.U	33,00%	$ 6.062.999,19	$ 18.039.350,75	$ 8.769.154,51	$ 96.973.883,12	$ 4.403.849,75	$ 134.249.237,32
K. VALOR PROPUESTO COSTO DIRECTO PARA PROVISIÓN PARA AJUSES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES (DEBE PROPONERSE DE TAL FORMA QUE EL VALOR TOTAL CONTRATO PROPUESTO A EJECUTAR SEA IGUAL AL PRESUPUESTO OFICIAL), este rubro se encuentra en la versión 1 del pliego tipo y, aunque en las versiones posteriores se omitió, en las respuestas sobre su obligatoriedad la Agencia respondió que no era obligatorio pero si aconsejable):		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE						
COMPONENTES	11,27%	$ 2.070.404,00	$ 6.160.110,00	$ 2.994.507,00	$ 33.114.818,00	$ 1.503.835,00	$ 45.843.674,00
G. COSTO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST (PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE CALCULADO SOBRE EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LAS OBRAS):	3,53%	$ 649.200,00	$ 1.931.577,00	$ 938.964,00	$ 10.383.552,00	$ 471.546,00	$ 14.374.839,00
H. COSTO COMPONENTE SOCIAL (PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE CALCULADO SOBRE EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LAS OBRAS):	3,27%	$ 599.943,00	$ 1.785.021,00	$ 867.721,00	$ 9.595.713,00	$ 435.768,00	$ 13.284.165,00
I. COSTO COMPONENTE PMT (PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE CALCULADO SOBRE EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LAS OBRAS):	4,47%	$ 821.261,00	$ 2.443.512,00	$ 1.187.822,00	$ 13.135.553,00	$ 596.521,00	$ 18.184.669,00
F. SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU DE TODAS LAS OBRAS INCLUYENDO LAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (K)) Y DIAGNOSTICOS (INCLUYE IVA) NO INCLUYE COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (D+E + A.I.U. DEL "K"):		$ 29.573.386,00	$ 72.704.050,00	$ 35.342.350,00	$ 397.875.891,00	$ 17.748.849,00	$ 553.244.526,00
J. VALOR TOTAL OBRAS SIN INCLUIR EL COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (CON ESTE VALOR SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE ACUERDO A LOS MÉTODOS ESTIPULADOS EN EL NUMERAL 4.1.4		$ 31.643.790,00	$ 78.864.160,00	$ 38.336.857,00	$ 430.990.709,00	$ 19.252.684,00	$ 599.088.200,00
L. VALOR TOTAL CONTRATO PROPUESTO A EJECUTAR (J+K):		$ 31.643.790,00	$ 78.864.160,00	$ 38.336.857,00	$ 430.990.709,00	$ 19.252.684,00	$ 599.088.200,00

JOTAM MAESTRE DIAB
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO COCO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | BOGOTÁ

CONSORCIO

MEMORIAS DE CÁLCULO

2002	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	DIR:		CIV:		

FECHA

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (UND)	TOTAL (M2)	ESQUEMA / OBSERVACIONES
	CORTE No. 5								
	Cll 50a sur Tv. 44 Kr 38 VIA								
	K0+000								
	TOTAL CORTE No. 5							**99,80**	
	CORTE No. 6								
	TOTAL CORTE No. 6							**0,00**	
	CORTE No. 7								
	TOTAL CORTE No. 7							**0,00**	
	TOTAL ACUMULADO							**99,80**	



RESIDENTE DE OBRA
NELSON ALBERTO HERNANDEZ NIÑO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MISAEL PULIDO GUZMÁN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | BOGOTÁ

CO□□□□□□□□□

□□□C□□□R□□MO□□O□□□O□□□□□□OR□□□□□□□M□D□□R□C□O□□□□□□R□O□□□□□□C□□□D□D□□□□R□□□□CO□□□R□CC□O□□□O□ CO□□□R□□C□□□□O□M□□□□□M□□□□O□□O□R□□□□□□□C□□□D□□□□M□□□□□□□□OC□□□□□□□RM□D□□□□□□□C□O□□□□CO□□ O□R□□□COM□□□M□□□□R□□□□□□OC□□D□D□D□□□□□□□□O□D□□□□C□□D□D□D□□O□O□□□D□C

CONSORCIO

□O□DO□D□□D□□□RRO□□O□□OC□□□D□□□□□□□□□□O

MEMORIAS DE CÁLCULO

□□□R□□□□OR□□□□□□□□□□□□□□R□□□O□□□□□□□

□O□□ | □ | D□ | □□

2018	**IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)**	**M2**	**DIR:**	C□□□□□□r□□□□□□r□□	**CIV:** □□□□□□□

FECHA	□□□□□□O□D□□□□□□	COR□□	□□□

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (UND)	TOTAL (ML)	ESQUEMA / OBSERVACIONES
	CORTE No. 5								
	Cll 50a sur Tv. 44 Kr 38 VIA								
	K0+000			□□□□□	□□□			□□□□□	
	TAPA CAMARA ETB								
	K0+1,20						□□□	□□□	
	SUMIDERO								
	K0+3,50			□□□	□□□			□□□	
	SUMIDERO								
	K0+2,50			□□□	□□□			□□□	
	POZO								
	□□□□□						□□□	□□□	
			TOTAL CORTE No. 5					**600,55**	
	CORTE No. 6								
			TOTAL CORTE No. 6					**0,00**	
	CORTE No. 7								
			TOTAL CORTE No. 7					**0,00**	
	TOTAL ACUMULADO							**600,55**	



RESIDENTE DE OBRA
NELSON ALBERTO HERNANDEZ NIÑO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MISAEL PULIDO GUZMÁN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | BOGOTÁ

CONSORCIO COCO

MEMORIAS DE CÁLCULO

6001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	DIR:		CIV:

FECHA

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (UND)	TOTAL (M3)
	CORTE No. 5							
	Cll 50a sur Tv. 44 Kr 38 ANDEN IZQUIERDO							
	K0+000							
	K0+100							
	Cll 50a sur Tv. 44 Kr 38 ANDEN DERECHO							
	K0+038,90							
	K0+103,70							
				TOTAL CORTE No. 5				**12,75**
	CORTE No. 6							
				TOTAL CORTE No. 6				**0,00**
	CORTE No. 7							
				TOTAL CORTE No. 7				**0,00**
	TOTAL ACUMULADO							**12,75**

ESQUEMA / OBSERVACIONES



RESIDENTE DE OBRA
NELSON ALBERTO HERNANDEZ NIÑO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MISAEL PULIDO GUZMÁN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | BOGOTÁ

CO□□□□□□□□□

□□□C□□□R□□MO□□O□□□O□□□□□□□OR□□□□□□□M□D□□R□C□O□□□□□R□O□□□□□□C□□□D□D□□□□R□□□□CO□□□R□CC□O□□□O□ CO□□□R□□C□□□□O□M□□□□□M□□□□O□□□O□R□□□□□□□C□□□D□□□□M□□□□□□□□OC□□□□□□□RM□D□□□□□□□C□O□□□□□CO□□□ O□R□□□COM□□□M□□□□R□□□□□□□OC□□D□D□D□□□□□□□□□□O□D□□□□C□□D□D□D□□□O□□□D□C

□O□DO□D□□D□□□RRO□□O□□OC□□□D□□□□□□□□O

MEMORIAS DE CÁLCULO

□□□R□□□□OR□□□□□□□□□□□□□□□R□□□O□□□□□□□□

□O□□ | □ | D□ | □□

6007	**ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)**	**M2**	**DIR:**	C□□□□□□r□□□□□□r□□	**CIV:** □□□□□□□

FECHA	□□□□□□O□D□□□□□□	COR□□	□□□

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (UND)	TOTAL (M3)	ESQUEMA / OBSERVACIONES
	CORTE No. 5								
	C□□□□□□r□□□□□□r□□□□□D□□□□RDO□								
	□□□□□□			□□□□	□□□			□□□	
	□□□□□□								
	C□□□□□□r□□□□□□r□□□□□D□□□D□R□C□O								
	□□□□□□□□			□□□□	□□□			□□□	
	□□□□□□□□								
		TOTAL CORTE No. 5						**12,75**	
	CORTE No. 6								
		TOTAL CORTE No. 6						**0,00**	
	CORTE No. 7								
		TOTAL CORTE No. 7						**0,00**	
	TOTAL ACUMULADO							**12,75**	



RESIDENTE DE OBRA
NELSON ALBERTO HERNANDEZ NIÑO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MISAEL PULIDO GUZMÁN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | BOGOTÁ

CONSORCIO

MEMORIAS DE CÁLCULO

6013	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	DIR:		CIV:	

FECHA		COR	

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (UND)	TOTAL (ML)	ESQUEMA / OBSERVACIONES
	CORTE No. 5								
	Cll 50a sur Tv. 44 Kr 38 ANDEN DERECHO								
	K0+038,60								
	K0+051,20								
	K0+052,70								
	K0+058,45								
	K0+065,65								
	K0+063,65								
	K0+067,60								
	K0+069,40								
	K0+073,20								
	K0+082,00								
	K0+091,00								
	K0+101,10								
	Cll 50a sur Tv. 44 Kr 38 VIA ANDEN INQUIERDO								
	K0+006,00								
	K0+012,50								
	K0+015,65								
	K0+014,60								
	K0+012,00								
	K0+024,10								
	K0+037,30								
	K0+043,85								
	K0+050,25								
	K0+051,25								
	K0+055,30								
	K0+056,65								
	K0+060,20								
	K0+060,50								
	K0+061,70								
	K0+074,65								
	K0+077,50								
	K0+074,65								
	K0+077,50								
	K0+082,00								
	K0+091,85								
		TOTAL CORTE No. 5						**102,05**	
	CORTE No. 6								
		TOTAL CORTE No. 6						**0,00**	
	CORTE No. 7								
		TOTAL CORTE No. 7						**0,00**	
	TOTAL ACUMULADO							**102,05**	



RESIDENTE DE OBRA
NELSON ALBERTO HERNANDEZ NIÑO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MISAEL PULIDO GUZMÁN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | BOGOTÁ

CONSORCIO

MEMORIAS DE CÁLCULO

6015	CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA PIEZA REMATE TIPO HOMBROS PARA RAMPA (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., BOMBEO CON AUTOBOMBA, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO).	M3	DIR:		CIV:		

FECHA		COR	

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (UND)	TOTAL (ML)
	CORTE No. 5							
	Cll 50a sur Tv. 44 Kr 38 ANDEN DERECHO							
	K0+038,20							
	K0+091,00							
	Cll 50a sur Tv. 44 Kr 38 ANDEN INQUIERDO							
	K0+012,50							
	K0+097,85							
	TOTAL CORTE No. 5							**0,63**
	CORTE No. 6							
	TOTAL CORTE No. 6							**0,00**
	CORTE No. 7							
	TOTAL CORTE No. 7							**0,00**
	TOTAL ACUMULADO							**0,63**

ESQUEMA / OBSERVACIONES



RESIDENTE DE OBRA
NELSON ALBERTO HERNANDEZ NIÑO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MISAEL PULIDO GUZMÁN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | BOGOTÁ

CONSORCIO

MEMORIAS DE CÁLCULO

6016	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML	DIR:		CIV:	

FECHA		COR	

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (UND)	TOTAL (ML)	ESQUEMA / OBSERVACIONES
	CORTE No. 5								
	Cll 50a sur Tv. 44 Kr 38 ANDEN IZQUIERDO								
	K0+004,10								
	K0+010,31								
	K0+035,20								
	K0+038,20								
	K0+056,60								
	K0+052,40								
	K0+058,85								
	K0+063,26								
	K0+065,65								
	K0+067,60								
	K0+069,80								
	K0+072,80								
	K0+082,40								
	K0+090,60								
	K0+012,91								
	K0+015,15								
	K0+030,65								
	K0+037,30								
	K0+044,25								
	K0+050,25								
	K0+051,65								
	K0+054,90								
	K0+074,65								
	K0+077,10								
	K0+082,40								
	K0+091,45								
			TOTAL CORTE No. 5					**60,61**	
	CORTE No. 6								
			TOTAL CORTE No. 6					**0,00**	
	CORTE No. 7								
			TOTAL CORTE No. 7					**0,00**	
	TOTAL ACUMULADO							**60,61**	



RESIDENTE DE OBRA
NELSON ALBERTO HERNANDEZ NIÑO

PERFORACIONES EN SECO DE 5" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHOY

124763

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MISAEL PULIDO GUZMÁN

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.	[illegible]	CORRESPONDIENTE AL PERIODO [illegible] FECHA INICIO PERIODO	AL [illegible] FECHA INICIO PERIODO	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO — BOGOTÁ
SABANA	C[illegible]			

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA	CONSORCIO COCO
INTERVENTOR	AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
No. CONTRATO :	COP 613-2025
VALOR :	$ 6.795.537.201,00

							OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 01		OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 02		OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 03		OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 04		OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 05		ACUMULADO OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
Nº	CODIGO IDU	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR ACUMULADO
1		DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO QUE NO INCLUYEN IVA								$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO QUE INCLUYEN IVA								$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
2		CAPITULO 02: RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE						$ -		$ -		$ -		$ 655.200,00		$ -		$ 655.200,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	600,00	$ 655.200,00		$ -	600,00	$ 655.200,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -

No. CONTRATO :	COP 613-2025
VALOR :	$ 6.795.537.201,00

							OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO OBRA EJECUTADA	
							ACTA DE CORTE No. 01		ACTA DE CORTE No. 02		ACTA DE CORTE No. 03		ACTA DE CORTE No. 04		ACTA DE CORTE No. 05		ACUMULADO	
Nº	CODIGO IDU	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR ACUMULADO
3		CAPITULO 03: RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO RIGIDO						$ -		$ -		$ -		$ 1.453.860,00		$ -		$ 1.453.860,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	472,80	$ 1.453.860,00		$ -	472,80	$ 1.453.860,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
4		CAPITULO 04: MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO VIA PAVIMENTO FLEXIBLE						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -

No. CONTRATO :	COP 613-2025
VALOR :	$ 6.795.537.201,00

Nº	CODIGO IDU	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	VALOR UNITARIO	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 01 CANTIDAD	VALOR CORTE	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 02 CANTIDAD	VALOR CORTE	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 03 CANTIDAD	VALOR CORTE	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 04 CANTIDAD	VALOR CORTE	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 05 CANTIDAD	VALOR CORTE	ACUMULADO OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	VALOR ACUMULADO
5	CAPITULO 05: MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO VIA PAVIMENTO RIGIDO							$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
6	CAPITULO 06: ESPACIO PUBLICO EN CONCRETO							$ 7.671.800,00		$ 17.592.750,00		$ 16.742.091,00		$ 57.739.382,00		$ 51.112.620,00		$ 150.858.643,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	600,00	$ 5.971.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	600,00	$ 5.971.200,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	220,00	$ 1.700.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	220,00	$ 1.700.600,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	90,00	$ 5.029.470,00	10,40	$ 581.183,00	[illegible]	$ -		$ -	100,40	$ 5.610.653,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	195,00	$ 10.714.080,00	13,52	$ 742.843,00	[illegible]	$ -		$ -	208,52	$ 11.456.923,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	472,80	$ 47.756.582,00		$ -	472,80	$ 47.756.582,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	55,00	$ 5.435.265,00	[illegible]	$ -		$ -	55,00	$ 5.435.265,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	120,00	$ 9.982.800,00	120,00	$ 9.982.800,00		$ -	240,00	$ 19.965.600,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	600,00	$ 1.849.200,00	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	600,00	$ 1.849.200,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	[illegible]	$ 51.112.620,00	90,00	$ 51.112.620,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -

No. CONTRATO :			COP 613-2025															
VALOR :			$ 6.795.537.201,00															
							OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO OBRA EJECUTADA	
							ACTA DE CORTE No. 01		ACTA DE CORTE No. 02		ACTA DE CORTE No. 03		ACTA DE CORTE No. 04		ACTA DE CORTE No. 05		ACUMULADO	
Nº	CODIGO IDU	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR ACUMULADO
7		CAPITULO 07: REDES						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
8		CAPITULO 08: SEÑALIZACIÓN						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -

No. CONTRATO :	COP 613-2025
VALOR :	$ 6.795.537.201,00

							OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
							ACTA DE CORTE No. 01		ACTA DE CORTE No. 02		ACTA DE CORTE No. 03		ACTA DE CORTE No. 04		ACTA DE CORTE No. 05			
Nº	CODIGO IDU	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR ACUMULADO
9			CAPITULO 09: NO PREVISTOS					$ -		$ 20.026.800,00		$ 20.593.800,00		$ 21.419.070,00		$ -		$ 62.039.670,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	CO1	[illegible]	[illegible]	M2		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	90,00	$ 20.593.800,00	[illegible]	$ -		$ -	90,00	$ 20.593.800,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	[illegible]	$ 20.026.800,00	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	600,00	$ 20.026.800,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	316,06	$ 21.419.070,00		$ -	316,06	$ 21.419.070,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -

E. SUBTOTAL OBRAS INICIALES (INCLUYE AIU):		$ 7.671.800,00	$ 37.619.550,00	$ 37.335.891,00	$ 81.267.512,00	$ 51.112.620,00	$ 215.007.373,00			
A. SUBTOTAL ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO QUE NO INCLUYEN I.V.A.:		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
B. IVA (19%):		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
C. ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO QUE INCLUYEN IVA		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
D. SUBTOTAL DIAGNOSTICOS (A+B+C)		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
ADMINISTRACION	27,00%	$ 1.557.433,08	$ 7.637.051,50	$ 7.579.467,00	$ 16.497.916,00	$ 10.376.246,00	$ 43.648.113,32			
IMPREVISTO	1,00%	$ 57.682,71	$ 282.853,76	$ 280.721,00	$ 611.034,00	$ 384.305,00	$ 1.616.596,79			
UTILIDAD	5,00%	$ 288.413,53	$ 1.414.268,80	$ 1.403.605,00	$ 3.055.170,00	$ 1.921.527,00	$ 8.082.983,95			
SUBTOTAL AIU	33,00%	$ 1.903.529,32	$ 9.334.174,06	$ 9.263.793,00	$ 20.164.120,00	$ 12.682.078,00	$ 53.347.694,05			
K. VALOR PROPUESTO COSTO DIRECTO PARA PROVISIÓN PARA ASUSES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES (DEBE PROPONERSE DE TA, FORMA QUE EL VALOR TOTAL CONTRATO PROPUESTO A EJECUTAR SEA IGUAL AL PRESUPUESTO OFICIAL), este rubro se encuentra en la versión 1 del pliego tipo y, aunque en las versiones posteriores se omitió, en las respuestas sobre su obligatoriedad la Agencia respondió que no es obligatorio pero si aconsejable):		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE								
COMPONENTES	11,27%	$ 650.021,00	$ 3.187.451,00	$ 3.163.417,00	$ 6.885.480,00	$ 4.330.695,00	$ 18.217.268,00			
G. COSTO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST (PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE CALCULADO SOBRE EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LAS OBRAS):	3,53%	$ 203.822,00	$ 999.464,00	$ 991.928,00	$ 2.159.088,00	$ 1.357.943,00	$ 5.712.245,00			
H. COSTO COMPONENTE SOCIAL (PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE CALCULADO SOBRE EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LAS OBRAS):	3,27%	$ 188.357,00	$ 923.631,00	$ 916.666,00	$ 1.995.270,00	$ 1.254.911,00	$ 5.278.835,00			
I. COSTO COMPONENTE PMT (PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE CALCULADO SOBRE EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LAS OBRAS):	6,47%	$ 257.842,00	$ 1.264.356,00	$ 1.254.823,00	$ 2.731.322,00	$ 1.717.845,00	$ 7.226.188,00			
F. SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU DE TODAS LAS OBRAS INCLUYENDO LAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (K) Y DIAGNOSTICOS (INCLUYE IVA) NO INCLUYE COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (CHE + A.I.U. DEL "K"):		$ 7.671.800,00	$ 37.619.550,00	$ 37.335.891,00	$ 81.267.512,00	$ 51.112.620,00	$ 215.007.373,00			
RCA TOTAL OBRAS SIN INCLUIR EL COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (CON ESTE VALOR SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE ACUERDO A LOS MÉTODOS ESTIPULADOS EN EL NUMERAL 4.1.4 D		$ 8.321.821,00	$ 40.807.001,00	$ 40.499.368,00	$ 88.153.192,00	$ 55.443.315,00	$ 233.224.641,00			
L. VALOR TOTAL CONTRATO PROPUESTO A EJECUTAR (J+K):		$ 8.321.821,00	$ 40.807.001,00	$ 40.499.368,00	$ 88.153.192,00	$ 55.443.315,00	$ 233.224.641,00			

JOTAM MAESTRE DIAB
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO COCO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | BOGOTÁ

CONSORCIO COCO

MEMORIAS DE CÁLCULO

6019	ESTABILIZACIÓN DE SUB BASE Y BASES GRANULARES CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	M3	DIR:		CIV:	

FECHA		COR	

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (m3)	TOTAL (m2)	ESQUEMA / OBSERVACIONES
	CORTE No. 5								
	Kr25-Cll52BSur-Cll54Sur VIA								
		TOTAL CORTE No. 5						**90,00**	
	CORTE No. 6								
		TOTAL CORTE No. 6						**0,00**	
	CORTE No. 7								
		TOTAL CORTE No. 7						**0,00**	
	TOTAL ACUMULADO							**90,00**	



RESIDENTE DE OBRA
NELSON ALBERTO HERNANDEZ NIÑO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MISAEL PULIDO GUZMÁN

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.	[illegible]	CORRESPONDIENTE AL PERIODO	[illegible] FECHA INICIO PERIODO	AL [illegible] FECHA INICIO PERIODO
SABANA	C[illegible]			
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C			
CONTRATISTA	CONSORCIO COCO			
INTERVENTOR	AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.			
SUPERVISOR DEL CONTRATO				
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN				
No. CONTRATO :	COP 613-2025			
VALOR :	$ 6.795.537.201,00			

							OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 01		OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 02		OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 03		OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 04		OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 05		ACUMULADO OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
Nº	CODIGO IDU	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR ACUMULADO
1			DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS					$ 4.958.361,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 4.958.361,00
ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO QUE NO INCLUYEN IVA								$ 947.098,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 947.098,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	$ 269.532,00	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	1,00	$ 269.532,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,00	$ 18.624,00	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	2,00	$ 18.624,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,00	$ 269.530,00	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	2,00	$ 269.530,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,00	$ 109.964,00	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	2,00	$ 109.964,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,00	$ 279.448,00	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	2,00	$ 279.448,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO QUE INCLUYEN IVA								$ 4.011.263,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 4.011.263,00
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	619,50	$ 4.011.263,00	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	619,50	$ 4.011.263,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
2			CAPITULO 02: RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE					$ -		$ 29.517.739,00		$ 209.753.105,00		$ 85.382.706,00		$ -		$ 324.653.550,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 728.022,00		$ -	666,69	$ 728.022,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	94,79	$ 4.429.347,00	0,00	$ -	[illegible]	$ 203.267,00		$ -	99,14	$ 4.632.614,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	233,82	$ 1.616.865,00	72,96	$ 504.518,00	[illegible]	$ 142.933,00		$ -	327,45	$ 2.264.316,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 1.155.102,00		$ -	20,67	$ 1.155.102,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	427,19	$ 23.471.527,00	94,85	$ 5.211.329,00	[illegible]	$ 3.320.324,00		$ -	582,47	$ 32.003.180,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	94,76	$ 200.323,00	[illegible]	$ 82.361,00		$ -	133,72	$ 282.684,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	631,73	$ 56.053.403,00	[illegible]	$ 3.255.504,00		$ -	668,42	$ 59.308.907,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	631,73	$ 23.550.412,00	[illegible]	$ 1.235.799,00		$ -	664,88	$ 24.786.211,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 69.694.897,00		$ -	122,72	$ 69.694.897,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 2.508.172,00		$ -	653,34	$ 2.508.172,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 3.056.325,00		$ -	653,34	$ 3.056.325,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	528,00	$ 58.358.256,00	[illegible]	$ -		$ -	528,00	$ 58.358.256,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	528,00	$ 65.874.864,00	[illegible]	$ -		$ -	528,00	$ 65.874.864,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -

No. CONTRATO :			COP 613-2025															
VALOR :			$ 6.795.537.201,00															
							OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO OBRA EJECUTADA	
							ACTA DE CORTE No. 01		ACTA DE CORTE No. 02		ACTA DE CORTE No. 03		ACTA DE CORTE No. 04		ACTA DE CORTE No. 05		ACUMULADO	
Nº	CODIGO IDU	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR ACUMULADO
3		CAPITULO 03: RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO RIGIDO						$ -		$ -		$ -		$ 6.427.046,00		$ -		$ 6.427.046,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 6.427.046,00		$ -	28,50	$ 6.427.046,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
4		CAPITULO 04: MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO VIA PAVIMENTO FLEXIBLE						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
5		CAPITULO 05: MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO VIA PAVIMENTO RIGIDO						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -

No. CONTRATO :			COP 613-2025															
VALOR :			$ 6.795.537.201,00															
							OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO OBRA EJECUTADA	
							ACTA DE CORTE No. 01		ACTA DE CORTE No. 02		ACTA DE CORTE No. 03		ACTA DE CORTE No. 04		ACTA DE CORTE No. 05		ACUMULADO	
Nº	CODIGO IDU	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR ACUMULADO
6			CAPITULO 06: ESPACIO PUBLICO EN CONCRETO					$ -		$ -		$ 71.956.526,00		$ 38.209.565,00		$ 647.574,00		$ 110.813.665,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	211,00	$ 1.631.030,00		$ -	211,00	$ 1.631.030,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	177,58	$ 17.936.688,00		$ -	177,58	$ 17.936.688,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 905.392,00		$ -	102,32	$ 905.392,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 12.819.579,00		$ -	154,10	$ 12.819.579,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,23	$ 201.904,00	[illegible]	$ 619.731,00	0,73	$ 647.574,00	1,65	$ 1.469.209,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 4.297.145,00		$ -	55,90	$ 4.297.145,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	126,35	$ 71.754.622,00	[illegible]	$ -		$ -	126,35	$ 71.754.622,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
7			CAPITULO 07: REDES					$ -		$ 455.606,00		$ 49.270.372,00		$ 18.653.615,00		$ -		$ 68.379.593,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	39,96	$ 2.233.085,00	10,67	$ 596.272,00		$ -	50,63	$ 2.829.357,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	229,20	$ 2.991.977,00		$ -	229,20	$ 2.991.977,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	2,00	$ 455.606,00	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	2,00	$ 455.606,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	41,26	$ 2.266.989,00	[illegible]	$ 3.320.324,00		$ -	101,69	$ 5.587.313,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	1,54	$ 309.381,00	10,24	$ 2.061.963,00		$ -	11,77	$ 2.371.344,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	84,93	$ 10.271.651,00	[illegible]	$ -		$ -	84,93	$ 10.271.651,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.284.537,00	1,00	$ 2.284.537,00		$ -	2,00	$ 4.569.074,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	1,30	$ 1.158.886,00	[illegible]	$ -		$ -	1,30	$ 1.158.886,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 163.855,00		$ -	1,00	$ 163.855,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	133,20	$ 10.264.925,00	[illegible]	$ -		$ -	133,20	$ 10.264.925,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	96,00	$ 10.286.976,00	[illegible]	$ -		$ -	96,00	$ 10.286.976,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	14,40	$ 3.065.544,00		$ -	14,40	$ 3.065.544,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	13,60	$ 3.901.622,00		$ -	13,60	$ 3.901.622,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	14,00	$ 3.238.396,00	[illegible]	$ -		$ -	14,00	$ 3.238.396,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	26,00	$ 6.955.546,00	1,00	$ 267.521,00		$ -	27,00	$ 7.223.067,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -

No. CONTRATO :	COP 613-2025
VALOR :	$ 6.795.537.201,00

							OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 01		OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 02		OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 03		OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 04		OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 05		ACUMULADO OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
Nº	CODIGO IDU	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR ACUMULADO
8			CAPITULO 08: SEÑALIZACIÓN					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
9			CAPITULO 09: NO PREVISTOS					$ -		$ -		$ 113.564.160,00		$ 147.051.705,00		$ -		$ 260.246.865,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.500.857,00	[illegible]	$ -		$ -	1,00	$ 1.500.857,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	CO1	[illegible]	[illegible]	M2		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	601,73	$ 66.653.296,00	38,56	$ 2.864.836,00		$ -	670,69	$ 69.518.132,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	126,35	$ 32.185.931,00	7,79	$ 1.984.409,00		$ -	134,14	$ 34.169.763,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 19.551.210,00		$ -	2,00	$ 19.551.210,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	126,35	$ 32.805.825,00	7,79	$ 2.022.666,00		$ -	134,14	$ 34.828.490,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 75.177.459,00		$ -	86,16	$ 75.177.459,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 51.720.750,00		$ -	60,50	$ 51.720.750,00

			E. SUBTOTAL OBRAS INICIALES (INCLUYE AIU):					$ -		$ 29.973.505,00		$ 633.925.327,00		$ 295.974.272,00		$ 647.578,00		$ 775.520.856,00
			A. SUBTOTAL ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO QUE NO INCLUYEN I.V.A.:					$ 507.098,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 507.098,00
			B. IVA (19%):					$ 179.605,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 179.605,00
			C. ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO QUE INCLUYEN IVA					$ 4.011.263,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 4.011.263,00
			D. SUBTOTAL DIAGNOSTICOS (A+B+C)					$ 5.138.310,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 5.138.310,00
			ADMINISTRACION		27,00%			$ -		$ 8.092.814,00		$ 171.157.948,00		$ 79.913.533,00		$ 174.846,00		$ 209.339.141,00
			IMPREVISTO		1,50%			$ -		$ 449.600,00		$ 9.508.774,00		$ 4.439.640,00		$ 9.714,00		$ 11.630.508,00
			UTILIDAD		5,00%			$ -		$ 1.498.669,00		$ 31.695.913,00		$ 14.798.801,00		$ 32.381,00		$ 38.776.361,00
			SUBTOTAL A.I.U		33,00%			$ -		$ 10.041.083,00		$ 212.362.635,00		$ 99.151.974,00		$ 216.941,00		$ 259.746.010,00
			K. VALOR PROPUESTO COSTO DIRECTO PARA PROVISIÓN PARA AIU/SSS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES (SERÁ PROPONERSE DE T.AL FORMA QUE EL VALOR TOTAL CONTRATO PROPUESTO A.E.JECUTAR SEA IGUAL AL PRESUPUESTO OFICIAL), este rubro se encuentra en la versión 1 del pliego tipo y aunque en las versiones posteriores se omitió, en las respuestas sobre su obligatoriedad la Agencia respondió que no era obligatorio pero sí aconsejable)					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
					PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE													
			COMPONENTES		11,27%			$ -		$ 2.589.995,00		$ 37.613.137,00		$ 25.077.477,00		$ 54.998,00		$ 65.285.325,00
			G. COSTO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST (PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE CALCULADO SOBRE EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LAS OBRAS):		3,53%			$ -		$ 791.021,00		$ 11.754.093,00		$ 7.861.167,00		$ 17.235,00		$ 20.470.916,00
			H. COSTO COMPONENTE SOCIAL (PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE CALCULADO SOBRE EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LAS OBRAS):		3,27%			$ -		$ 733.002,00		$ 10.889.221,00		$ 7.283.725,00		$ 15.970,00		$ 18.917.727,00
			I. COSTO COMPONENTE PMT (PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE CALCULADO SOBRE EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LAS OBRAS):		4,47%			$ -		$ 1.027.971,00		$ 14.919.999,00		$ 9.957.009,00		$ 21.790,00		$ 25.956.411,00
			F. SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU DE TODAS LAS OBRAS INCLUYENDO LAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (H2) Y DIAGNOSTICOS (INCLUYE IVA) NO INCLUYE COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (D+E + A.I.U. DEL "K")					$ 5.138.310,00		$ 29.973.505,00		$ 633.925.327,00		$ 295.974.272,00		$ 647.578,00		$ 775.658.809,00
			CA: TOTAL OBRAS SIN INCLUIR EL COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (CON ESTE VALOR SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE ACUERDO A LOS MÉTODOS ESTIPULADOS EN EL NUMERAL 4.1.2					$ 5.138.310,00		$ 32.512.564,00		$ 683.538.664,00		$ 323.051.705,00		$ 702.442,00		$ 840.943.809,00
			L. VALOR TOTAL CONTRATO PROPUESTO A.E.JECUTAR (J+K):					$ 5.138.310,00		$ 32.512.564,00		$ 683.538.664,00		$ 323.051.705,00		$ 702.442,00		$ 840.943.809,00

JOTAIR MAESTRE DIAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO COCO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO / BOGOTÁ	[illegible]	COCO CONSORCIO
MEMORIAS DE CÁLCULO	[illegible]	[illegible]

6015	**CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA PIEZA REMATE TIPO HOMBROS PARA RAMPA (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., BOMBEO CON AUTOBOMBA, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO).**	M3	DIR: [illegible]	CIV:	[illegible]
FECHA	[illegible]	CORTE [illegible]			

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (UND)	TOTAL (m2)
	CORTE No. 5							
	Cll 53a sur - Cr33A-Cr34 ANDEN IZQUIERDO							
	K0+8,10		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	K0+10.55		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	K0+25,85		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	K0+30,41		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	K0+35,27		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	K0+38,02		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	K0+48,10		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	K0+52,5		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	K0+57,57		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	K0+63,90		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	K0+80,32		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	K0+82,57		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	K0+85,74		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	K0+98,10		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	Cll 53a sur - Cr33A-Cr34 ANDEN DERECHO							
	K0+15,00		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	K0+18,27		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	K0+26,16		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	K0+29,56		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	K0+32,06		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	K0+24,93		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	K0+41,43		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	K0+47,67		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	K0+71,63		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	K0+77,75		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	K0+86,36		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	K0+40.30		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
		TOTAL CORTE No. 5						0,73
	CORTE No. 6							
		TOTAL CORTE No. 6						0,00
	CORTE No. 7							
	[illegible]					[illegible]		
		TOTAL CORTE No. 7						0,00
	TOTAL ACUMULADO							0,73

ESQUEMA / OBSERVACIONES



RESIDENTE DE OBRA
NELSON ALBERTO HERNANDEZ NIÑO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MISAEL PULIDO GUZMÁN

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.	[illegible]	CORRESPONDIENTE AL PERIODO	[illegible]	AL	[illegible]
SABANA	[illegible]		FECHA INICIO PERIODO		FECHA INICIO PERIODO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | BOGOTÁ

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA	CONSORCIO COCO
INTERVENTOR	AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
No. CONTRATO :	COP 613-2025
VALOR :	$ 6.795.537.201,00

							OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO OBRA EJECUTADA	
							ACTA DE CORTE No. 01		ACTA DE CORTE No. 02		ACTA DE CORTE No. 03		ACTA DE CORTE No. 04		ACTA DE CORTE No. 05		ACUMULADO	
Nº	CODIGO IDU	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR ACUMULADO
1			DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS					$ 2.554.926,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 2.554.926,00
ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO QUE NO INCLUYEN IVA								$ 1.081.863,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 1.081.863,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	$ 269.532,00	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	1,00	$ 269.532,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,00	$ 18.624,00	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	2,00	$ 18.624,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3,00	$ 404.295,00	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	3,00	$ 404.295,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,00	$ 109.964,00	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	2,00	$ 109.964,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,00	$ 279.448,00	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	2,00	$ 279.448,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
			ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO QUE INCLUYEN IVA					$ 1.473.063,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 1.473.063,00
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	227,50	$ 1.473.063,00	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	227,50	$ 1.473.063,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
2			CAPITULO 02: RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE					$ -		$ -		$ 8.068.272,00		$ 97.217.477,00		$ 124.839,00		$ 105.410.588,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 225.880,00		$ -	206,85	$ 225.880,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	39,00	$ 124.839,00	39,00	$ 124.839,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	22,75	$ 1.063.226,00	[illegible]	$ -	0,00	$ -	22,75	$ 1.063.226,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	84,81	$ 586.451,00	[illegible]	$ 316.065,00		$ -	130,52	$ 902.516,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 1.032.718,00		$ -	18,48	$ 1.032.718,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	108,86	$ 5.981.314,00	[illegible]	$ 7.512.043,00		$ -	245,58	$ 13.493.357,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	206,85	$ 437.281,00	[illegible]	$ -		$ -	206,85	$ 437.281,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 18.152.383,00		$ -	204,58	$ 18.152.383,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 7.626.538,00		$ -	204,58	$ 7.626.538,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 29.289.655,00		$ -	265,00	$ 29.289.655,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 33.062.195,00		$ -	265,00	$ 33.062.195,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -

No. CONTRATO :			COP 613-2025															
VALOR :			$ 6.795.537.201,00															
							OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO OBRA EJECUTADA	
							ACTA DE CORTE No. 01		ACTA DE CORTE No. 02		ACTA DE CORTE No. 03		ACTA DE CORTE No. 04		ACTA DE CORTE No. 05		ACUMULADO	
Nº	CODIGO IDU	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR ACUMULADO
3		CAPITULO 03: RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO RIGIDO						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
4		CAPITULO 04: MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO VIA PAVIMENTO FLEXIBLE						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -

No. CONTRATO : COP 613-2025

VALOR : $ 6.795.537.201,00

							OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO OBRA EJECUTADA	
							ACTA DE CORTE No. 01		ACTA DE CORTE No. 02		ACTA DE CORTE No. 03		ACTA DE CORTE No. 04		ACTA DE CORTE No. 05		ACUMULADO	
Nº	CODIGO IDU	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR ACUMULADO
5		CAPITULO 05: MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO VIA PAVIMENTO RIGIDO						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
6		CAPITULO 06: ESPACIO PUBLICO EN CONCRETO						$ -		$ -		$ -		$ 834.357,00		$ 6.697.022,00		$ 7.531.379,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 541.100,00		$ -	70,00	$ 541.100,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	55,23	$ 5.457.994,00	55,23	$ 5.457.994,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 293.257,00	0,76	$ 672.481,00	1,09	$ 965.738,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	7,37	$ 566.547,00	7,37	$ 566.547,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
7		CAPITULO 07: REDES						$ -		$ -		$ -		$ 15.073.274,00		$ -		$ 15.073.274,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 770.186,00		$ -	59,00	$ 770.186,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 227.803,00		$ -	1,00	$ 227.803,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 1.405.576,00		$ -	6,98	$ 1.405.576,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 2.572.494,00		$ -	21,27	$ 2.572.494,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 2.284.537,00		$ -	1,00	$ 2.284.537,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 1.515.467,00		$ -	1,70	$ 1.515.467,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 1.695.408,00		$ -	22,00	$ 1.695.408,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 3.300.405,00		$ -	30,80	$ 3.300.405,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 231.314,00		$ -	1,00	$ 231.314,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 1.070.084,00		$ -	4,00	$ 1.070.084,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -

No. CONTRATO :	COP 613-2025
VALOR :	$ 6.795.537.201,00

Nº	CODIGO IDU	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	VALOR UNITARIO	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 01 CANTIDAD	VALOR CORTE	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 02 CANTIDAD	VALOR CORTE	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 03 CANTIDAD	VALOR CORTE	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 04 CANTIDAD	VALOR CORTE	OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 05 CANTIDAD	VALOR CORTE	ACUMULADO OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	VALOR ACUMULADO
8		CAPITULO 08: SEÑALIZACIÓN						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
9		CAPITULO 09: NO PREVISTOS						$ -		$ -		$ -		$ 36.656.888,00		$ -		$ 36.656.888,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 1.500.857,00		$ -	1,00	$ 1.500.857,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 15.043.396,00		$ -	204,58	$ 15.043.396,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 9.960.307,00		$ -	39,10	$ 9.960.307,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 10.152.328,00		$ -	39,10	$ 10.152.328,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -

		Acta No. 01	Acta No. 02	Acta No. 03	Acta No. 04	Acta No. 05	Acumulado
E. SUBTOTAL OBRAS INICIALES (INCLUYE AIU):		$ -	$ -	$ 8.068.272,00	$ 149.781.996,00	$ 6.821.861,00	$ 164.672.129,00
A. SUBTOTAL ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO QUE NO INCLUYEN I.V.A.:		$ 1.081.863,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.081.863,00
B. IVA (19%):		$ 205.554,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 205.554,00
C. ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO QUE INCLUYEN IVA:		$ 1.473.063,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.473.063,00
D. SUBTOTAL DIAGNOSTICOS (A+B+C)		$ 2.760.480,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.760.480,00
ADMINISTRACION	27,00%	$ -	$ -	$ 1.637.920,00	$ 30.406.871,00	$ 1.384.889,00	$ 33.429.680,00
IMPREVISTO	1,00%	$ -	$ -	$ 60.664,00	$ 1.126.180,00	$ 51.292,00	$ 1.238.136,00
UTILIDAD	5,00%	$ -	$ -	$ 303.318,00	$ 5.630.902,00	$ 256.461,00	$ 6.190.682,00
SUBTOTAL A.I.U	33,00%	$ -	$ -	$ 2.001.902,00	$ 37.163.953,00	$ 1.692.642,00	$ 40.858.498,00
K. VALOR PROPUESTO COSTO DIRECTO PARA PROVISIÓN PARA AJUSES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES (DEBE PROPONERSE DE TAL FORMA QUE EL VALOR TOTAL CONTRATO PROPUESTO A EJECUTAR SEA IGUAL AL PRESUPUESTO OFICIAL), este rubro se encuentra en la versión 1 del pliego tipo y, aunque en las versiones posteriores se omitió, en las respuestas sobre su obligatoriedad la Agencia respondió que no era obligatorio pero si aconsejable):		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE						
COMPONENTES	11,27%	$ -	$ -	$ 683.613,00	$ 12.690.815,00	$ 578.007,00	$ 13.952.434,00
G. COSTO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST (PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE CALCULADO SOBRE EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LAS OBRAS):	3,53%	$ -	$ -	$ 214.355,00	$ 3.979.359,00	$ 181.241,00	$ 4.374.955,00
H. COSTO COMPONENTE SOCIAL (PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE CALCULADO SOBRE EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LAS OBRAS):	3,27%	$ -	$ -	$ 198.091,00	$ 3.677.430,00	$ 167.490,00	$ 4.043.010,00
I. COSTO COMPONENTE PMT (PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE CALCULADO SOBRE EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LAS OBRAS):	4,47%	$ -	$ -	$ 271.167,00	$ 5.034.026,00	$ 229.276,00	$ 5.534.469,00
F. SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU DE TODAS LAS OBRAS INCLUYENDO LAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (K)) Y DIAGNOSTICOS (INCLUYE IVA) NO INCLUYE COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (D+E + A.I.U. DEL "K"):		$ 2.760.480,00	$ -	$ 8.068.272,00	$ 149.781.996,00	$ 6.821.861,00	$ 167.432.609,00
ICA: TOTAL OBRAS SIN INCLUIR EL COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (CON ESTE VALOR SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE ACUERDO A LOS MÉTODOS ESTIPULADOS EN EL NUMERAL 4.1.4 D		$ 2.760.480,00	$ -	$ 8.751.885,00	$ 162.472.811,00	$ 7.399.868,00	$ 181.385.043,00
L. VALOR TOTAL CONTRATO PROPUESTO A EJECUTAR (J+K):		$ 2.760.480,00	$ -	$ 8.751.885,00	$ 162.472.811,00	$ 7.399.868,00	$ 181.385.043,00

JOTAM MAESTRE DIAB
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO COCO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | BOGOTÁ

CO□□□□□□□□□□

□□□C□□□R□□MO□□O□□□O□□□□□□□ORD□□□□□□□M□D□□□R□C□O□□□□□□R□O□□□□□□C□□□D□D□□□□□R□□□□CO□□□R□CC□O□□□O□ CO□□□R□□C□□□□□O□M□□□□□M□□□□O□□□O□R□□□□□□□□C□□□D□□□□M□□□□□□□□□OC□□□□□□□□RM□D□□□□□□□□C□O□□□□□CO□□□ O□R□□□COM□□□M□□□□R□□□□□□□□□OC□□D□D□D□□□□□□□□□□□O□D□□□□□C□□D□D□D□□□O□O□□□D□C

□O□DO□D□□D□□□RRO□□O□□OC□□D□□□□□□□□O

MEMORIAS DE CÁLCULO

□□□R□□□□OR□□□□□□□□□□□□□□□□□□R□□□□O□□□□□□□□□

□O□□ | □ | D□ | □□

2002	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	DIR:	Cr□□□□d□□d□D□□□□□r□□□□□e□□□□□□r□	CIV: □□□□□□□

FECHA	□□□□□□O□D□□□□□□	COR□□	□□□

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (UND)	TOTAL (m2)
CORTE No. 5								
	Cra. 34 desde Dg 54 Sur hasta clle 52 g Sur			□□□□				□□□□
TOTAL CORTE No. 5								39,00
CORTE No. 6								
TOTAL CORTE No. 6								0,00
CORTE No. 7								
TOTAL CORTE No. 7								0,00
TOTAL ACUMULADO								39,00

ESQUEMA / OBSERVACIONES



RESIDENTE DE OBRA
NELSON ALBERTO HERNANDEZ NIÑO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MISAEL PULIDO GUZMÁN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | BOGOTÁ

CONSORCIO COCO

MEMORIAS DE CÁLCULO

6012	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	DIR:		CIV:	

FECHA		COR	

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (UND)	TOTAL (m2)
	CORTE No. 5							
	Cra. 34 desde Dg 54 Sur hasta clle 52 g Sur ANDEN DERECHO							
	K0+000							
	K0+1980							
	K0+2282							
	K0+2361							
	Cra. 34 desde Dg 54 Sur hasta clle 52 g Sur ANDEN DERECHO							
	K0+2977							
	K0+3375							
	K0+035							
	K0+085							
		TOTAL CORTE No. 5						**55,23**
	CORTE No. 6							
		TOTAL CORTE No. 6						**0,00**
	CORTE No. 7							
		TOTAL CORTE No. 7						**0,00**
	TOTAL ACUMULADO							**55,23**

ESQUEMA / OBSERVACIONES



RESIDENTE DE OBRA
NELSON ALBERTO HERNANDEZ NIÑO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MISAEL PULIDO GUZMÁN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | BOGOTÁ

CO□□□□□□□□□□

□□□C□□□R□□MO□□O□□O□□□□□□ORD□□□□□M□□D□□R□C□O□□□□□R□O□□□□□C□□D□□D□□□□R□□□CO□□□R□CC□O□□□O□ CO□□□R□□C□□□O□M□□□□□M□□□□O□□O□R□□□□□□□C□□□D□□□□M□□□□□□□OC□□□□□□RM□D□□□□□□□C□O□□□□□CO□□ O□R□□□COM□□□M□□□R□□□□□□□OC□□D□D□D□□□□□□□□O□D□□□□□C□□D□D□D□□□O□O□□□D□C

CONSORCIO

□O□DO□D□□D□□□RRO□□O□□OC□□D□□□□□□□□O

MEMORIAS DE CÁLCULO

□□□R□□□□ORD□□□□□□□□□□□□□□R□□□□O□□□□□□□

□O□□ | □ | D□ | □□

6015	**CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA PIEZA REMATE TIPO HOMBROS PARA RAMPA (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., BOMBEO CON AUTOBOMBA, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO).**	**M3**	**DIR:** Cr□□□□d□□d□□D□□□□□r□□□□□e□□□□□□r□	**CIV:** □□□□□□□
FECHA	□□□□□□O□D□□□□□□	COR□□	□□□	

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (UND)	TOTAL (m3)	ESQUEMA / OBSERVACIONES
	CORTE No. 5								
	Cra. 34 desde Dg 54 Sur hasta clle 52 g Sur ANDEN DERECHO								
	K0+19,80		□□□	□□□	□□□	□□□		□□□	
	K0+20,40								
	K0+22,42		□□□	□□□	□□□	□□□		□□□	
	K0+22,82								
	Cra. 34 desde Dg 54 Sur hasta clle 52 g Sur ANDEN IZQUIERDO								
	K0+23,62		□□□	□□□	□□□	□□□		□□□	
	K0+24,02								
	K0+29,37		□□□	□□□	□□□	□□□		□□□	
	K0+29,77								
		TOTAL CORTE No. 5						**0,76**	
	CORTE No. 6								
		TOTAL CORTE No. 6						**0,00**	
	CORTE No. 7								
		TOTAL CORTE No. 7						**0,00**	
	TOTAL ACUMULADO							**0,76**	



RESIDENTE DE OBRA
NELSON ALBERTO HERNANDEZ NIÑO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MISAEL PULIDO GUZMÁN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | BOGOTÁ

CONSORCIO COCO

MEMORIAS DE CÁLCULO

6016	**SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)**	**ML**	**DIR:**		**CIV:**			
FECHA		COR						

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (UND)	TOTAL (m3)
	CORTE No. 5							
	Cra. 34 desde Dg 54 Sur hasta clle 52 g Sur ANDEN DERECHO							
	K0+20,40							
	K0+22,42							
	Cra. 34 desde Dg 54 Sur hasta clle 52 g Sur ANDEN IZQUIERDO							
	K0+24,02							
	K0+29,37							
		TOTAL CORTE No. 5						**7,37**
	CORTE No. 6							
		TOTAL CORTE No. 6						**0,00**
	CORTE No. 7							
		TOTAL CORTE No. 7						**0,00**
	TOTAL ACUMULADO							**7,37**

ESQUEMA / OBSERVACIONES



RESIDENTE DE OBRA
NELSON ALBERTO HERNANDEZ NIÑO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MISAEL PULIDO GUZMÁN

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. [illegible]

SABANA C[illegible]

CORRESPONDIENTE AL PERIODO [illegible] (FECHA INICIO PERIODO) AL [illegible] (FECHA INICIO PERIODO)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | BOGOTÁ

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA	CONSORCIO COCO
INTERVENTOR	AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
No. CONTRATO :	COP 613-2025
VALOR :	$ 6.795.537.201,00

							OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 01		OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 02		OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 03		OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 04		OBRA EJECUTADA ACTA DE CORTE No. 05		ACUMULADO OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
Nº	CODIGO IDU	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR ACUMULADO
1			DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS					$ 5.331.321,00		$ -		$ -		$ 3.166.800,00		$ -		$ 8.498.121,00
ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO QUE NO INCLUYEN IVA								$ 947.098,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 947.098,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	$ 269.532,00	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	1,00	$ 269.532,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,00	$ 18.624,00	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	2,00	$ 18.624,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,00	$ 269.530,00	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	2,00	$ 269.530,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,00	$ 109.964,00	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	2,00	$ 109.964,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,00	$ 279.448,00	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	2,00	$ 279.448,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO QUE INCLUYEN IVA								$ 4.384.223,00		$ -		$ -		$ 3.166.800,00		$ -		$ 7.551.023,00
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	677,10	$ 4.384.223,00	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	677,10	$ 4.384.223,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	105,00	$ 1.244.985,00		$ -	105,00	$ 1.244.985,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	105,00	$ 1.921.815,00		$ -	105,00	$ 1.921.815,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
2			CAPITULO 02: RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE					$ -		$ -		$ 211.328.218,00		$ 75.764.127,00		$ 2.566.864,00		$ 289.659.209,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	631,05	$ 689.107,00		$ -	631,05	$ 689.107,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	98,67	$ 315.843,00	98,67	$ 315.843,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	69,36	$ 3.240.949,00	[illegible]	$ -		$ -	69,36	$ 3.240.949,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	258,52	$ 1.787.633,00	76,74	$ 530.649,00		$ -	335,25	$ 2.318.282,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,89	$ 608.678,00		$ -	10,89	$ 608.678,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	329,17	$ 18.086.081,00	156,05	$ 8.574.010,00		$ -	485,22	$ 26.660.091,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	630,53	$ 1.332.930,00	[illegible]	$ -		$ -	630,53	$ 1.332.930,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	630,53	$ 55.946.483,00	[illegible]	$ -		$ -	630,53	$ 55.946.483,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	630,53	$ 9.995.082,00	[illegible]	$ -		$ -	630,53	$ 9.995.082,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 65.361.683,00		$ -	115,09	$ 65.361.683,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	586,36	$ 2.251.021,00	586,36	$ 2.251.021,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	514,00	$ 56.810.878,00	[illegible]	$ -		$ -	514,00	$ 56.810.878,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	514,00	$ 64.128.182,00	[illegible]	$ -		$ -	514,00	$ 64.128.182,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -

No. CONTRATO :			COP 613-2025															
VALOR :			$ 6.795.537.201,00															
							OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO OBRA EJECUTADA	
							ACTA DE CORTE No. 01		ACTA DE CORTE No. 02		ACTA DE CORTE No. 03		ACTA DE CORTE No. 04		ACTA DE CORTE No. 05		ACUMULADO	
Nº	CODIGO IDU	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR ACUMULADO
3		CAPITULO 03: RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO RIGIDO						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
4		CAPITULO 04: MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO VIA PAVIMENTO FLEXIBLE						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
5		CAPITULO 05: MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO VIA PAVIMENTO RIGIDO						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -

No. CONTRATO :			COP 613-2025															
VALOR :			$ 6.795.537.201,00															
							OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO OBRA EJECUTADA	
							ACTA DE CORTE No. 01		ACTA DE CORTE No. 02		ACTA DE CORTE No. 03		ACTA DE CORTE No. 04		ACTA DE CORTE No. 05		ACUMULADO	
Nº	CODIGO IDU	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR ACUMULADO
6		CAPITULO 06: ESPACIO PUBLICO EN CONCRETO						$ -		$ -		$ -		$ 2.460.630,00		$ 14.617.870,00		$ 17.078.500,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -	131,74	$ 1.311.076,00	131,74	$ 1.311.076,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	210,00	$ 1.623.300,00		$ -	210,00	$ 1.623.300,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	131,74	$ 13.306.794,00	131,74	$ 13.306.794,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 837.330,00		$ -	0,94	$ 837.330,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
7		CAPITULO 07: REDES						$ -		$ -		$ -		$ 36.653.462,00		$ -		$ 36.653.462,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	23,40	$ 305.464,00		$ -	23,40	$ 305.464,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 911.212,00		$ -	4,00	$ 911.212,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	11,82	$ 2.381.015,00		$ -	11,82	$ 2.381.015,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 7.341.846,00		$ -	60,71	$ 7.341.846,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 6.853.611,00		$ -	3,00	$ 6.853.611,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 2.353.431,00		$ -	2,64	$ 2.353.431,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 163.855,00		$ -	1,00	$ 163.855,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 1.803.298,00		$ -	23,40	$ 1.803.298,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 11.070.020,00		$ -	52,00	$ 11.070.020,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 3.469.710,00		$ -	15,00	$ 3.469.710,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -

No. CONTRATO :	COP 613-2025
VALOR :	$ 6.795.537.201,00

							OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO OBRA EJECUTADA	
							ACTA DE CORTE No. 01		ACTA DE CORTE No. 02		ACTA DE CORTE No. 03		ACTA DE CORTE No. 04		ACTA DE CORTE No. 05		ACUMULADO	
Nº	CODIGO IDU	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR CORTE	CANTIDAD	VALOR ACUMULADO
1			CAPITULO 08: SEÑALIZACION					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
2			CAPITULO 09: NO PREVISTOS					$ -		$ -		$ 32.123.755,00		$ 59.947.167,00		$ -		$ 92.070.972,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 8.001.714,00		$ -	2,00	$ 8.001.714,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	126,11	$ 32.123.755,00	[illegible]	$ -		$ -	126,11	$ 32.123.755,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 27.562.420,00		$ -	4,00	$ 27.562.420,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ 29.883.003,00		$ -	121,00	$ 29.883.003,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	[illegible]	$ -		$ -	0,00	$ -

E. SUBTOTAL OBRAS INICIALES (INCLUYE AIU):							$ -		$ -		$ 248.053.954,00		$ 179.825.394,00		$ 17.380.764,00		$ 445.260.112,00	
A. SUBTOTAL ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO QUE NO INCLUYEN I.V.A.:							$ 567.099,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 567.099,00	
B. IVA (19%):							$ 179.569,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 179.569,00	
C. ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO QUE INCLUYEN IVA:							$ 4.984.219,00		$ -		$ -		$ 3.166.800,00		$ -		$ 7.551.019,00	
D. SUBTOTAL DIAGNOSTICOS (A+B+C):							$ 5.511.270,00		$ -		$ -		$ 3.166.800,00		$ -		$ 8.678.070,00	
ADMINISTRACION					27,00%		$ -		$ -		$ 66.822.577,00		$ 48.493.062,00		$ 4.688.400,00		$ 120.004.039,00	
IMPREVISTO					1,00%		$ -		$ -		$ 2.493.366,00		$ 1.810.676,00		$ 129.205,00		$ 4.274.131,00	
UTILIDAD					5,00%		$ -		$ -		$ 9.152.329,00		$ 6.573.382,00		$ 689.053,00		$ 16.570.753,00	
SUBTOTAL A-I-U					33,00%		$ -		$ -		$ 80.405.372,00		$ 63.577.720,00		$ 4.365.862,00		$ 108.099.773,00	
K. VALOR PROPUESTO COSTO DIRECTO PARA PROVISIÓN PARA AJUSES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES (DEBE PROPONERSE DE TAL FORMA QUE EL VALOR TOTAL CONTRATO PROPUESTO A EJECUTAR SEA IGUAL AL PRESUPUESTO OFICIAL), este rubro se encuentra en la versión 1 del pliego tipo y, aunque en las versiones posteriores se omitió, en las respuestas sobre su obligatoriedad la Agencia respondió que no era obligatorio pero sí aconsejable):							$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
					PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE													
COMPONENTES					11,27%		$ -		$ -		$ 20.627.004,00		$ 14.812.703,00		$ 1.959.099,00		$ 36.956.077,00	
G. COSTO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST (PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE CALCULADO SOBRE EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LAS OBRAS):					3,53%		$ -		$ -		$ 6.467.911,00		$ 4.643.702,00		$ 456.164,00		$ 11.569.213,00	
H. COSTO COMPONENTE SOCIAL (PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE CALCULADO SOBRE EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LAS OBRAS):					3,27%		$ -		$ -		$ 5.977.203,00		$ 4.292.291,00		$ 421.916,00		$ 10.691.411,00	
I. COSTO COMPONENTE PMT (PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE CALCULADO SOBRE EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LAS OBRAS):					4,47%		$ -		$ -		$ 8.182.162,00		$ 5.875.709,00		$ 577.362,00		$ 14.635.233,00	
F. SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU DE TODAS LAS OBRAS INCLUYENDO LAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (H) Y DIAGNOSTICOS (INCLUYE IVA) NO INCLUYE COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (G+H + AIU. DEL "K"):							$ 5.511.270,00		$ -		$ 248.053.954,00		$ 177.992.156,00		$ 17.380.764,00		$ 449.130.113,00	
CA TOTAL OBRAS SIN INCLUIR EL COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (CON ESTE VALOR SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE ACUERDO A LOS MÉTODOS ESTIPULADOS EN EL NUMERAL 4.1.4							$ 5.511.270,00		$ -		$ 266.079.289,00		$ 192.804.859,00		$ 18.665.772,00		$ 483.056.190,00	
L. VALOR TOTAL CONTRATO PROPUESTO A EJECUTAR (J+K):							$ 5.511.270,00		$ -		$ 266.079.289,00		$ 192.804.859,00		$ 18.665.772,00		$ 483.056.190,00	

[illegible]
JOT MI MAGISTRADO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO COCO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | BOGOTÁ

CONSORCIO

MEMORIAS DE CÁLCULO

2002	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	DIR:		CIV:		
FECHA		COR					

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (UND)	TOTAL (M2)	ESQUEMA / OBSERVACIONES
	CORTE No. 5								
	Cll 50a sur #36 - 54								
	K0+000								
	k0+102,27								
	DESCUENTO POZO								
	DESCUENTO POZO								
	DESCUENTO POZO								
		TOTAL CORTE No. 5						**98,67**	
	CORTE No. 6								
		TOTAL CORTE No. 6						**0,00**	
	CORTE No. 7								
		TOTAL CORTE No. 7						**0,00**	
	TOTAL ACUMULADO							**98,67**	



RESIDENTE DE OBRA
NELSON ALBERTO HERNANDEZ NIÑO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MISAEL PULIDO GUZMÁN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | BOGOTÁ

CONSORCIO

MEMORIAS DE CÁLCULO

2018	**IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)**	**M2**	**DIR:**		**CIV:**		
FECHA		COR					

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (UND)	TOTAL (ML)	ESQUEMA / OBSERVACIONES
	CORTE No. 5								
	Cll 50a sur #36 - 54								
	K0+000								
	k0+102,27								
	DESCUENTO POZO								
	K0+001,60								
	DESCUENTO POZO								
	K0+045,85								
	TOTAL CORTE No. 5							**586,36**	
	CORTE No. 6								
	TOTAL CORTE No. 6							**0,00**	
	CORTE No. 7								
	TOTAL CORTE No. 7							**0,00**	
	TOTAL ACUMULADO							**586,36**	



RESIDENTE DE OBRA
NELSON ALBERTO HERNANDEZ NIÑO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MISAEL PULIDO GUZMÁN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | BOGOTÁ

CO□□□□□□□□□

□□□C□□□R□□MO□□O□□□O□□□□□□□OR□□□□□□□M□□D□□□R□C□O□□□□□□R□O□□□□□□C□□□D□D□□□□□R□□□□CO□□□R□CC□O□□□□O□ CO□□□R□□C□□□□O□M□□□□□□M□□□□O□□□O□R□□□□□□□□C□□□D□□□□M□□□□□□□□□OC□□□□□□□□RM□D□□□□□□□C□O□□□□□CO□□□ O□R□□□COM□□□M□□□□R□□□□□□□□OC□□D□D□D□□□□□□□□□□□□O□D□□□□□C□□D□D□D□□□O□□□D□C

□O□DO□D□□D□□□RRO□□O□□OC□□□D□□□□□□□□□O

MEMORIAS DE CÁLCULO

□□□R□□□□OR□□□□□□□□□□□□□□□□R□□□O□□□□□□□□

□O□□ | □ | D□ | □□

6001	**DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.**	**M2**	**DIR:**	C□□□□□□□r□□□□□□□	**CIV:**	□□□□□□□			

FECHA	□□□□□□O□D□□□□□□	COR□□	□□□

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (UND)	TOTAL (M3)	ESQUEMA / OBSERVACIONES
	CORTE No. 5								
	ANDEN COSTADO IZQUIERDO								
	K0+000,80			□□□□	□□□			□□□□	
	K0+038,35								
	ANDEN COSTADO IZQUIERDO								
	K0+000,00			□□□□	□□□			□□□□	
	K0+102,20								
		TOTAL CORTE No. 5						**131,74**	
	CORTE No. 6								
		TOTAL CORTE No. 6						**0,00**	
	CORTE No. 7								
		TOTAL CORTE No. 7						**0,00**	
	TOTAL ACUMULADO							**131,74**	



RESIDENTE DE OBRA
NELSON ALBERTO HERNANDEZ NIÑO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MISAEL PULIDO GUZMÁN

CO□□□□□□□□□

□□□C□□□R□□MO□□O□□□O□□□□□□□OR□□□□□□□□M□D□□R□C□O□□□□□□R□O□□□□□□C□□□D□D□□□□□R□□□□CO□□□R□CC□O□□□O□CO□□□R□□C□□□□O□M□□□□□M□□□□O□□O□R□□□□□□□C□□□D□□□□M□□□□□□□□OC□□□□□□□RM□D□□□□□□□C□O□□□□□CO□□□O□R□□□COM□□□M□□□□R□□□□□□□OC□□D□D□D□□□□□□□□□O□D□□□□□C□□D□D□D□□O□□□D□C

□O□DO□D□□D□□□RRO□□O□□OC□□□D□□□□□□□□O

MEMORIAS DE CÁLCULO

□□□R□□□□OR□□□□□□□□□□□□□□R□□□O□□□□□□□

□O□□ | □ | D□ | □□

6007	**ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)**	**M2**	**DIR:**	C□□□□□□□r□□□□□□	**CIV:**	□□□□□□□		

FECHA	□□□□□□O□D□□□□□□	COR□□	□□□

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (UND)	TOTAL (M3)
	CORTE No. 5							
	□□D□□□CO□□□DO□□□□□RDO□							
	□□□□□□□□			□□□□	□□□			□□□□
	□□□□□□□□							
	□□D□□□CO□□□DO□□□□□RDO□							
	□□□□□□□□			□□□□	□□□			□□□□
	□□□□□□□□							
		TOTAL CORTE No. 5						**131,74**
	CORTE No. 6							
		TOTAL CORTE No. 6						**0,00**
	CORTE No. 7							
		TOTAL CORTE No. 7						**0,00**
	TOTAL ACUMULADO							**131,74**

ESQUEMA / OBSERVACIONES



RESIDENTE DE OBRA
NELSON ALBERTO HERNANDEZ NIÑO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MISAEL PULIDO GUZMÁN
