CIUDAD Y FECHA	19 de Agosto de 2026
TIPO Y No. CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP-20260001
ACTA PARCIAL N°	01 según forma de pago clausula octava.
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS A TRAVÉS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	CONSUL CONSTRUCCIONES E&E SAS
NIT N°	901.482.344-4
REPRESENTANTE LEGAL	YENY ESPERANZA BAEZ GIL
C.C. No.	1.049.641.610 de Tunja
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.1.24.02.0600.9 Rehabilitación de vías urbanas participativos / 136 – ingresos corrientes destinación especifica por acto administrativo presupuesto participativo. 2.3.1.24.02.0600.10 Mantenimiento periódico o rutinario vías terciarias participativos. / 136 – ingresos corrientes destinación especifica por acto administrativo presupuesto participativo.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($446.963.367,75)
ADICIONES HASTA LA FECHA1	*SI* _____ *NO* __X___
	VALOR: N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($446.963.367,75)
DURACIÓN DEL CONTRATO INICIAL	Tres (03) meses
PRÓRROGAS HASTA LA FECHA2	*SI* _____ *NO* __X___
	Prórroga: NA
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO	Tres (03) meses
FECHA SUSCRIPCION	23 de Junio de 2026
FECHA DE INICIO	07 de Julio de 2026
SUSPENSIONES HASTA LA FECHA	*SI* _____ *NO* __X___
	FECHA DE SUSPENSION: N/A
REINICIOS HASTA LA FECHA	SI _____ NO __x____
	FECHA DE REINICIO: N/A
FECHA DE TERMINACION	06 de Octubre de 2026
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	CUMPLE
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALBA JOHANA REYES BARAJAS Profesional Universitario Sec. Infraestructura
*CUMPLIMIENTO	P

• *(T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)*

[1] *Marcar con una "x" en la casilla SI o NO según corresponda.
[2] *Marcar con una "x" en la casilla SI o NO según corresponda.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

No.	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	$446.963.367,75
	* APORTE ALCALDIA	$0,oo
	* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	$0,oo
2	VALOR ADICIONADO	$0,oo
3	VALOR TOTAL (1+2)	$446.963.367,75
4	VALOR PRESENTE ACTA	$ 187.049.516,00
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$0,oo
6	VALOR EJECUTADO (4 + 5)	$ 187.049.516,00
7	SALDO POR EJECUTAR (3-6)	$259.913.851,75

** Aplica solo para convenios.*
***Si el Contrato, Convenio u Orden de compra fue objeto de modificación (adiciones, liberaciones, devoluciones) agregar más filas para complementar la información.**

AFECTACION PRESUESTAL

N° Registró Presupuestal	Código Rubro	Nombre rubro / fuente	CPC	Saldo Anterior	Valor Presente Acta	Nuevo Saldo
2026001178	2.3.1.24.02.0600.9	Rehabilitación de vías urbanas participativos / 136 – ingresos corrientes destinación especifica por acto administrativo presupuesto participativo.	53211	$327.376.424,38	$ 137.687.540,00	$189.688.884,38
	2.3.1.24.02.0600.10	Mantenimiento periódico o rutinario vías terciarias participativos. / 136 – ingresos corrientes destinación especifica por acto administrativo presupuesto participativo.	53211	$119.586.943,37	$49.361.976,00	$ 70.224.967,37
			TOTAL	**$446.963.367,75**	**$ 187.049.516,00**	**$ 259.913.851,75**

***Diligenciar si el Contrato, Convenio u Orden de compra presenta dos o más rubros presupuestales y dos o más registros presupuestales**

En constancia se firma a los diecinueve (19) días del mes de agosto del año 2026

CONSUL CONSTRUCCIONES E&E SAS
NIT: 901.482.344-4
R/L: YENY ESPERANZA BAEZ GIL
CC: 1.049.641.610 de Tunja
CONTRATISTA

ALBA JOHANA REYES BARAJAS
CC: 1.098.72624 de Bucaramanga
Profesional Universitario Sec. Infraestructura
SUPERVISOR

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	11/06/2025	13/06/2025	18/06/2025
Cargo:	Profesional Universitario	Secretaria General	Alcaldesa Municipal
Nombre:	Yuly Katherine Neira Flórez	Julián Guillermo Camargo Amórtegui	Ingrith Rocío Bernal Mejía
Firma:			

ACTA N° 1 DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 1

CONSUL-CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 901482344-4

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS A TRAVÉS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA

CONTRATO DE OBRA N°:	CDP-20260001		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE DUITAMA	NIT: 891,855,138-1	
ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO:	JULIAN GUILLERMO CAMARGO AMÓRTEGUI	CC: 1,003,294,754	
CONTRATISTA:	CONSUL CONSTRUCCIONES E&E S.A.S	NIT: 901.482.344-4	
REPRESENTANTE LEGAL:	YENY ESPERANZA BÁEZ GIL	CC: 1,049,641,610	
SUPERVISOR:	ALBA JOHANA REYES BARAJAS	CC: 1,098,726,254	
REPERESENTANTE LEGAL:	NA	DURACIÓN DEL CONTRATO	3 MESES
FECHA DE INICIO:	07 de julio de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN:	06 de octubre de 2026		

CONDICIONES CONTRACTUALES							ACTA PARCIAL N° 1		EJECUTADO ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	ITEM CODEE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT +/-	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR
I	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE					$ 40,867,840.00		$ -		$ -		$ 40,867,840.00
1	PRELIMINARES					$ 543,780.00		$ -		$ -		$ 543,780.00
1.1	3.04.03	CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACIÓN)	KM	0.29	$ 1,908,000.00	$ 543,780.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.29	$ 543,780.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONFORMACIÓN					$ 28,130,400.00		$ -		$ -		$ 28,130,400.00
2.1	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	M3	195.36	$ 144,000.00	$ 28,130,400.00	0.00	$ -	0.00	$ -	195.36	$ 28,130,400.00
3	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE					$ 12,193,660.00		$ -		$ -		$ 12,193,660.00
3.1	3.04.09	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRR-1 O SIMILAR	M2	1953.80	$ 4,880.00	$ 9,533,080.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1,953.80	$ 9,533,080.00
3.2	ANALISIS UNITARIO ITEM DE REFERENCIA 3.06.04	INSTALACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-19, INCLUYE BARRIDO, SOPLADO Y COMPACTACIÓN. (No incluye mezcla Asfáltica)	M3	195.36	$ 116,000.00	$ 22,660,600.00	0.00	$ -	0.00	$ -	195.36	$ 22,660,600.00
II	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ARTICULADO					$ 110,614,468.00		$ 44,332,120.00		$ 44,332,120.00		$ 44,380,349.00
4	PRELIMINARES					$ 681,348.00		$ 171,720.00		$ 171,720.00		$ 509,628.00
4.1	3.04.03	CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACIÓN)	KM	0.18	$ 1,908,000.00	$ 284,292.00	0.09	$ 171,720.00	0.09	$ 171,720.00	0.06	$ 112,572.00
4.2	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	5.64	$ 70,400.00	$ 397,056.00		$ -	0.00	$ -	5.64	$ 397,056.00
5	CONFORMACIÓN ESTRUCTURA GRANULAR					$ 10,008,544.00		$ 10,008,544.00		$ 10,008,544.00		$ -
5.1	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	M3	68.74	$ 145,600.00	$ 10,008,544.00	68.74	$ 10,008,544.00	68.74	$ 10,008,544.00	0.00	$ -
6	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO					$ 99,924,576.00		$ 56,051,856.00		$ 56,051,856.00		$ 43,872,720.00
6.1	3.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA VEHICULAR PESADO 10 X 6 X 20 CM (NTC 5282)	M2	982.00	$ 95,200.00	$ 93,486,400.00	588.78	$ 56,051,856.00	588.78	$ 56,051,856.00	393.22	$ 37,434,544.00
6.2	3.08.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 50*20*60	ML	34.00	$ 76,800.00	$ 2,611,200.00		$ -	0.00	$ -	34.00	$ 2,611,200.00

6.3	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	M3	1.56	$ 887,200.00	$ 1,384,032.00		$ -	0.00	$ -	1.56	$ 1,384,032.00
6.4	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	321.44	$ 7,600.00	$ 2,442,944.00		$ -	0.00	$ -	321.44	$ 2,442,944.00
III	CONSTRUCCION ANDENES VIALES					$ 70,365,680.00		$ 43,917,912.00		$ 43,917,912.00		$ 89,447,656.00
7	PRELIMINARES					$ 13,228,000		$ 11,999,136		$ 11,999,136		$ 1,228,864
7.1	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	100.00	$ 70,400.00	$ 7,040,000.00	100.00	$ 7,040,000.00	100.00	$ 7,040,000.00	0.00	$ -
7.2	3.04.06	SUMINISTRO,EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYEACARREOLIBREHASTA5KM)(**)	M3	42.50	$ 145,600.00	$ 6,188,000.00	34.06	$ 4,959,136.00	34.06	$ 4,959,136.00	8.44	$ 1,228,864.00
8	CONSTRUCCION DE ANDENES					$ 60,137,680		$ 31,918,776		$ 31,918,776		$ 28,218,904
8.1	3.08.10	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17,5 MPa - (2500 PSI)	M3	42.50	$ 748,000.00	$ 31,790,000.00	34.11	$ 25,514,280.00	34.11	$ 25,514,280.00	8.39	$ 6,275,720.00
8.2	3.08.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 50*20*60	ML	280.00	$ 73,600.00	$ 18,400,000.00	40.10	$ 2,951,360.00	40.10	$ 2,951,360.00	209.90	$ 15,448,640.00
8.3	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	781.25	$ 7,600.00	$ 5,937,500.00	454.36	$ 3,453,136.00	454.36	$ 3,453,136.00	326.89	$ 2,484,364.00
8.4	3.08.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA PEATONAL 10 X 6 X 20 CM (NTC 3829)	M2	25.90	$ 91,200.00	$ 2,362,080.00		$ -	0.00	$ -	25.90	$ 2,362,080.00
8.5	2.08.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES DE 20 X 20 CM.	M2	20.00	$ 82,400.00	$ 1,648,000.00		$ -	0.00	$ -	20.00	$ 1,648,000.00
IV	MANTENIMIENTO VIAS RURALES					$ 110,201,432.00		$ 39,489,550.80		$ 39,489,550.80		$ 70,711,881.20
9	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS TERCIARIAS					$ 110,201,432		$ 39,489,551		$ 39,489,551		$ 70,711,881
9.1	3.04.04	SUMINISTRO,EXTENDIDAMATERIALDEAFIRMADO,SINCOMPACTARHAS TAUNDIÁMETRODE2"YUNÍNDICEPLÁSTICOMENOROIGUAL9%. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**)	M3	680.50	$ 68,000.00	$ 46,478,000.00	227.50	$ 15,470,000.00	227.50	$ 15,470,000.00	456.00	$ 31,008,000.00
9.2	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUES DE 5 KM.	M3-KM	16588.20	$ 2,760.00	$ 45,785,432.00	6,536.08	$ 18,039,580.80	6,536.08	$ 18,039,580.80	10,052.12	$ 27,743,851.20
9.3	3.11.02	ESCARIFICACION, MEZCLADO, CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE Y/O BASE	KM	1.95	$ 9,200,000.00	$ 17,940,000.00	0.65	$ 5,980,000.00	0.65	$ 5,980,000.00	1.30	$ 11,960,000.00
					COSTO DIRECTO GRUPO	$ -		$ -		$ -		$ -
					SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 355,049,340.00		$ 149,639,612.80		$ 149,639,612.80		$ 205,409,727.20
					ADMINISTRACION 20%	$ 71,009,868.00		$ 29,927,922.56		$ 29,927,922.56		$ 41,081,945.44
					IMPREVISTO 1%	$ 3,550,493.40		$ 1,496,396.13		$ 1,496,396.13		$ 2,054,097.27
					UTILIDAD 4%	$ 14,201,973.60		$ 5,985,584.51		$ 5,985,584.51		$ 8,216,389.09
					AIU	$ 88,762,335.00		$ 37,409,903.20		$ 37,409,903.20		$ 51,352,431.80
					PLAN MANEJO DE TRAFICO	$ 3,151,692.75						$ 3,151,692.75
					VALOR TOTAL	$ 446,963,367.75		$ 187,049,516.00		$ 187,049,516.00		$ 259,913,851.75

NOTAS IMPORTANTES:

VALOR DEL CONTRATO:	446,963,367.75	**VALOR DEL ANTICIPO:**	0.00
VALOR ADICIONALES AL CONTRATO:	0	**RETENCION EN GARANTIA**	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	446,963,367.75	**OTROS DESCUENTOS:**	0

PARCIAL	DESCRIPCIÓN	VALOR FACTURADO		AMORTIZACIÓN	VALOR ACTA PARCIAL DESPUES DE AMORTIZACIÓN	Saldo Por Amortizar	FACTURADO ACUMULADO	
		Valor	%	Practicada			%	Valor
1	Acta Parcial N° 1 - 19 de agosto de 2026	$ 187,049,516.00	42%	N/A	N/A	$ -	42%	$ 187,049,516.00

Se firma por quienes en ella intervinieron a los diecinueve (19) días del mes de agosto de 2026

CONSUL CONSTRUCCIONES BAE SAS
Representante legal: YENY ESPERANZA BÁEZ GIL
Cedula: 1,049,641,610 de Tunja

MUNICIPIO DE DUITAMA
Supervisor Designado: ALBA JOHANA REYES BARAJAS
Cedula: 1,098,726,254

Elaboró: Karen Cely - Residente de Obra

CONSUL-CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 901482344-4

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS A TRAVÉS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA


MEMORIA DE CANTIDADES


Duitama
Capital Cuna de Bolívar

CAPÍTULO	II	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ARTICULADO
4	PRELIMINARES	
4.1	3.04.03	CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION)

UNIDAD KM

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

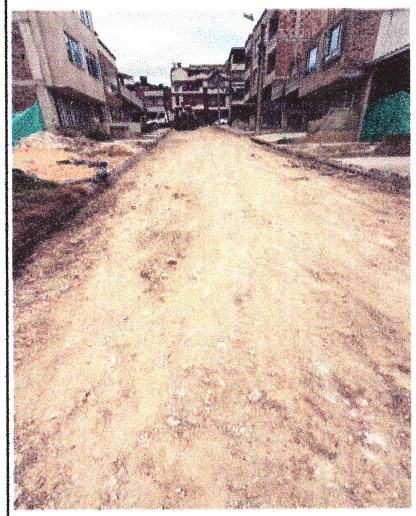

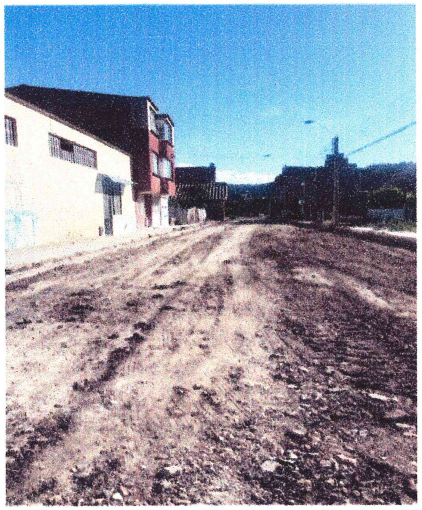

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES					Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Aréa (m2)	Alto (m)	Compactación	
Carrera 14B entre calles 3 y 3A (Barrio Las Americas)	43.81					0.04
Cra 31B - Cll 16 y Cll 17 (Barrio El Milagro)	49.01					0.05
					SUBTOTAL	0.09
					TOTAL	0.09

NOTA ACLARATORIA:

CONSUL CONSTRUCCIONES E&E SAS
KAREN CELY
Residente de Obra

CONSUL-CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 901482344-4

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS A TRAVÉS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA

MEMORIA DE CANTIDADES

Duitama
Capital Cívica de Boyacá

CAPÍTULO	II	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE		
5	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ARTICULADO			
5.1	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	UNIDAD	M3

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO







(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES					Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Aréa (m2)	Alto (m)	Compactación	
Carrera 14B entre calles 3 y 3A (Barrio Las Americas)	43.81	5.18	226.94	0.12		28.00
Cra 31B - Cll 16 y Cll 17 (Barrio El Milagro)	23.77	7.51	178.40	0.23		40.74
	25.24	7.51	189.44	0.23		
					SUBTOTAL	68.74
					TOTAL	68.74

NOTA ACLARATORIA:

CONSUL-CONSTRUCCIONES E&E SAS
KAREN CELY
Residente de Obra

CONSUL-CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 901482344-4

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS A TRAVÉS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA

MEMORIA DE CANTIDADES

Duitama
Capital Cuna de Bolívar

CAPÍTULO	II	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ARTICULADO

6	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO

6.1	3.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA VEHICULAR PESADO 10 X 8 X 20 CM (NTC 5282)	UNIDAD	M2

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO







(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES					Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Aréa (m2)	Alto (m)	Compactación	
Carrera 14B entre calles 3 y 3A (Barrio Las Americas)	43.81	5.04	220.94			220.94
Cra 31B - Cll 16 y Cll 17 (Barrio El Milagro)	49.01	7.51	367.84			367.84
					SUBTOTAL	588.78
					TOTAL	588.78

NOTA ACLARATORIA:

CONSUL-CONSTRUCCIONES E&E SAS
KAREN CELY
Residente de Obra

CONSUL-CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 9014823464

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS A TRAVÉS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA


MEMORIA DE CANTIDADES


Duitama
Capital Cívica de Progreso

CAPÍTULO	**III**	**CONSTRUCCIÓN ANDENES VIALES**
7	**PRELIMINARES**	
7.1	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN

UNIDAD M3

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO


(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES					Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Aréa (m2)	Alto (m)	Compactación	
ANDEN						
JUAN GRANDE- TRAMO 1	34.5	1.30	44.85	0.50		22.43
JUAN GRANDE- TRAMO 2			83.13	0.40		33.25
CAMILO TORRES- TRAMO 1.1	4	1.96	11.76	0.20		
CAMILO TORRES- TRAMO 1.2	15.8	2.42	38.24	0.25		9.56
CAMILO TORRES- TRAMO 2.1	7.5	1.57	11.78	0.20		2.36
CAMILO TORRES- TRAMO 2.2	7.5	1.87	14.03	0.20		2.81
CAMILO TORRES- TRAMO 2.3	7.5	1.76	13.20	0.20		
CAMILO TORRES- TRAMO 2.4	0.54	1.85	1.00	0.20		0.20
CAMILO TORRES- TRAMO 2.4	1.46	1.85	2.70	0.20		
CAMILO TORRES- TRAMO 3	9	1.80	16.20	0.20		3.24
CAMILO TORRES- TRAMO 4	24.8	1.50	37.20	0.50		18.60
CAMILO TORRES- TRAMO 5.1	15	2.10	31.50	0.20		
CAMILO TORRES- TRAMO 5.2	14	0.85	11.90	0.25		
CAMILO TORRES- TRAMO 6	14.4	1.50	21.60	0.35		7.56
BORDILLO						
JUAN GRANDE- TRAMO 1	40.1	0.20	8.02	0.3		
					SUBTOTAL	100.00
					TOTAL	**100.00**

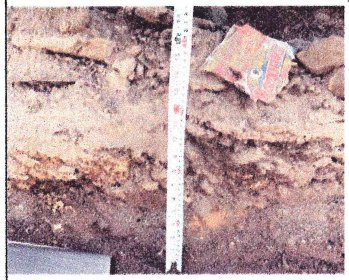NOTA ACLARATORIA:

CONSUL CONSTRUCCIONES E&E SAS
KAREN CELY
Residente de Obra

CONSUL-CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 901482244-4

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS A TRAVÉS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA

MEMORIA DE CANTIDADES

Duitama
Capital Cultura de Boyacá

CAPÍTULO	III	CONSTRUCCIÓN ANDENES VIALES
7	PRELIMINARES	
7.2	3.04.06	SUMINISTRO,EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYEACARREOLIBREHASTA5KM)(**)


UNIDAD	M3

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO







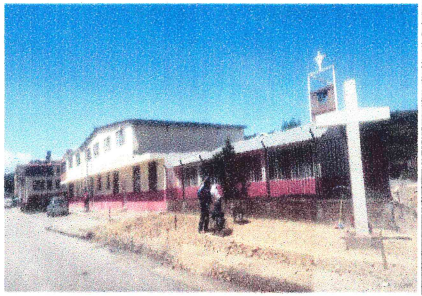

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES					Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Aréa (m2)	Alto (m)	Compactación	
JUAN GRANDE- TRAMO 1	34.5	1.31	45.20	0.10		4.52
JUAN GRANDE- TRAMO 2			83.13	0.10		8.31
CAMILO TORRES- TRAMO 1.1	6	1.96	11.76	0.10		1.18
CAMILO TORRES- TRAMO 1.2	15.8	2.42	38.24	0.10		3.82
CAMILO TORRES- TRAMO 2.1	7.6	1.58	12.01	0.10		1.20
CAMILO TORRES- TRAMO 2.2	7.5	1.88	14.10	0.10		1.41
CAMILO TORRES- TRAMO 2.3	7.5	1.77	13.28	0.10		1.33
CAMILO TORRES- TRAMO 2.4	2	1.86	3.72	0.10		0.37
CAMILO TORRES- TRAMO 3	9	1.81	16.29	0.10		1.63
CAMILO TORRES- TRAMO 4	24.8	1.51	37.45	0.10		3.74
CAMILO TORRES- TRAMO 5.1	15	2.11	31.65	0.10		3.17
CAMILO TORRES- TRAMO 5.2	14	0.86	12.04	0.10		1.20
CAMILO TORRES- TRAMO 6	14.4	1.51	21.74	0.10		2.17
					SUBTOTAL	34.06
					TOTAL	34.06

NOTA ACLARATORIA:

CONSUL CONSTRUCCIONES E.A.E SAS
KAREN CELY
Residente de Obra

CONSUL-CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 901482344-8

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS A TRAVÉS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA


MEMORIA DE CANTIDADES

Duitama
Capital Cultura de Boyacá


CAPÍTULO	III	CONSTRUCCIÓN ANDENES VIALES
8	CONSTRUCCION DE ANDENES	
8.1	3.08.10	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)

UNIDAD: M3

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

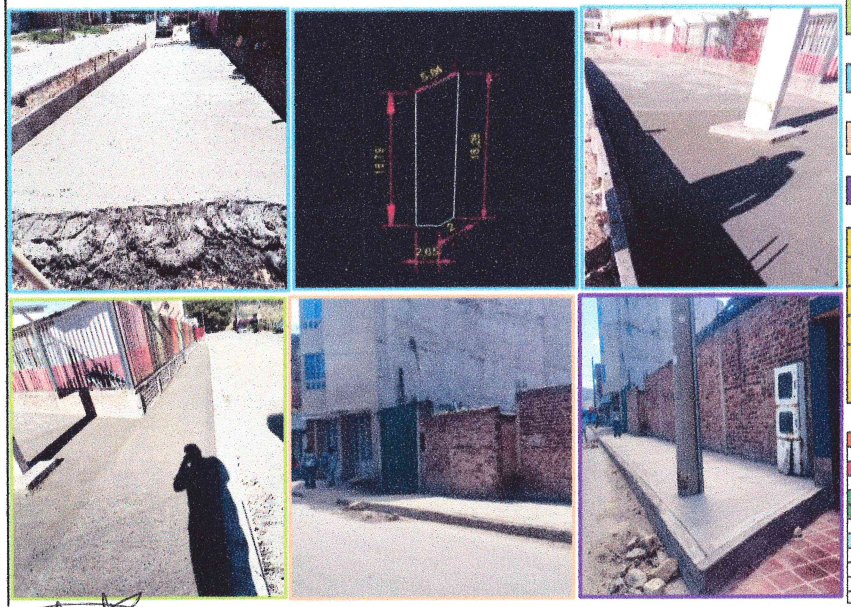

(a) LOCALIZACION	DIMENSIONES					Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Alto (m)	Compactación	
JUAN GRANDE- TRAMO 1	34.5	1.30	44.85	0.10		4.49
JUAN GRANDE- TRAMO 2			83.13	0.10		8.31
CAMILO TORRES- TRAMO 1.1	6	1.96	11.76	0.10		1.18
CAMILO TORRES- TRAMO 1.2	15.8	2.42	38.24	0.10		3.82
CAMILO TORRES- TRAMO 2.1	7.5	1.57	11.78	0.10		1.18
CAMILO TORRES- TRAMO 2.2	7.5	1.87	14.03	0.10		1.40
CAMILO TORRES- TRAMO 2.3	7.5	1.76	13.20	0.10		1.32
CAMILO TORRES- TRAMO 2.4	2	1.85	3.70	0.10		0.37
CAMILO TORRES-ESCALON	1.6	0.65	0.52	0.20		0.10
	1.57	0.30	0.47	0.20		0.09
CAMILO TORRES- TRAMO 3	9	1.80	16.20	0.10		1.62
CAMILO TORRES- TRAMO 4	24.8	1.50	37.20	0.10		3.72
CAMILO TORRES- TRAMO 5.1	15	2.10	31.50	0.10		3.15
CAMILO TORRES- TRAMO 5.2	14	0.85	11.90	0.10		1.19
CAMILO TORRES- TRAMO 6	14.4	1.50	21.60	0.10		2.16

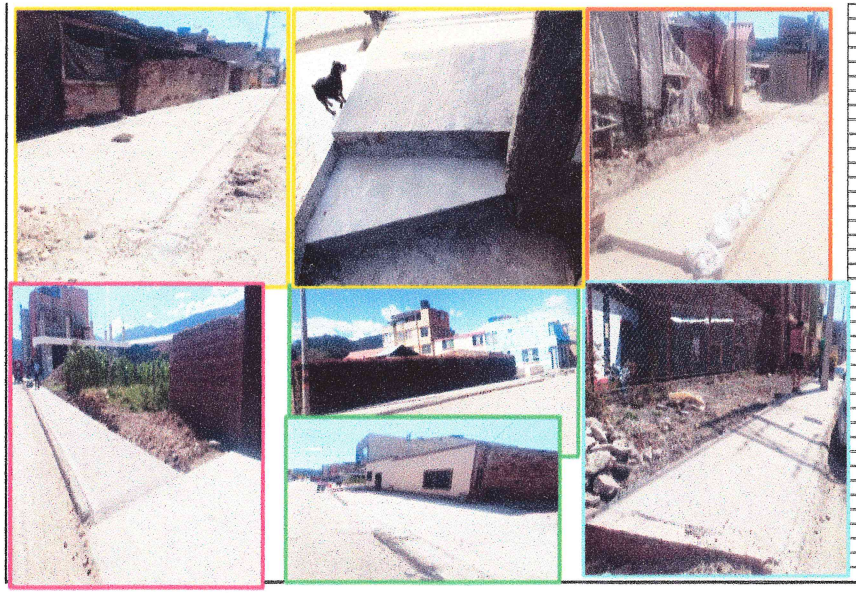

CONSUL-CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 901482344-4


MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS A TRAVÉS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA


MEMORIA DE CANTIDADES

Duitama
Capital Cívica de Boyacá

CAPÍTULO	III	**CONSTRUCCIÓN ANDENES VIALES**		
8	**CONSTRUCCION DE ANDENES**			
8.2	3.08.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 50*20*80	**UNIDAD**	ML

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

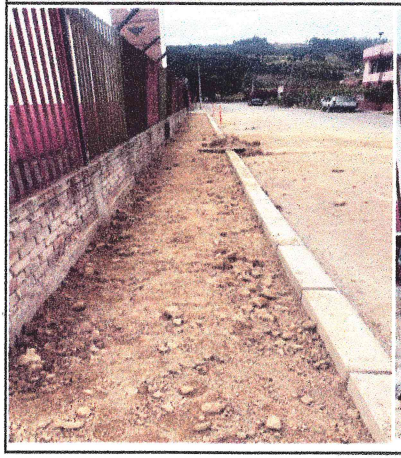

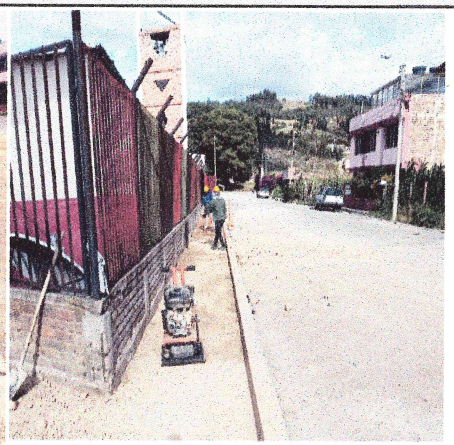

(e) LOCALIZACION	**DIMENSIONES**					**Total**
	Largo (m)	**Ancho (m)**	**Aréa (m2)**	**Alto (m)**	**Compactación**	
JUAN GRANDE- TRAMO 1	40.1					40.10
						-
					SUBTOTAL	40.10
					TOTAL	**40.10**

NOTA ACLARATORIA:

CONSUL CONSTRUCCIONES E&E SAS
KAREN CELY
Residente de Obra

CONSUL-CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901482364-6	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS A TRAVÉS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA	Duitama Capital Cívica de Boyacá
	MEMORIA DE CANTIDADES	

CAPÍTULO	III	CONSTRUCCIÓN ANDENES VIALES

8	CONSTRUCCION DE ANDENES

8.3	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	UNIDAD	KG

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO





(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES					Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Aréa (m2)	Peso (Kg)	Compactación	
JUAN GRANDE- TRAMO 1	34.5	1.30	44.85	1.34		60.10
JUAN GRANDE- TRAMO 2			83.1281	1.34		111.391654
CAMILO TORRES- TRAMO 1.1	6	1.96	11.76	1.34		15.7584
CAMILO TORRES- TRAMO 1.2	15.8	2.42	38.236	1.34		51.23624
CAMILO TORRES- TRAMO 2.1	7.5	1.57	11.775	1.34		15.7785
CAMILO TORRES- TRAMO 2.2	7.5	1.87	14.025	1.34		18.7935
CAMILO TORRES- TRAMO 2.3	7.5	1.76	13.2	1.34		17.688
CAMILO TORRES- TRAMO 2.4	2	1.85	3.7	1.34		4.958
CAMILO TORRES- TRAMO 3	9	1.8	16.2	1.34		21.708
CAMILO TORRES- TRAMO 4	24.8	1.5	37.2	1.34		49.848
CAMILO TORRES- TRAMO 5.1	15	2.1	31.5	1.34		42.21
CAMILO TORRES- TRAMO 5.2	14	0.85	11.9	1.34		15.946
CAMILO TORRES- TRAMO 6	14.4	1.5	21.6	1.34		28.944
SUBTOTAL						454.36
TOTAL						454.36

NOTA ACLARATORIA:

CONSUL CONSTRUCCIONES E&E SAS
KAREN CELY
Residente de Obra

CONSUL-CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 901462344-4


MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS A TRAVÉS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA

MEMORIA DE CANTIDADES

Duitama
Capital Histórica del Boyacá

CAPÍTULO	IV	MANTENIMIENTO VIAS RURALES		
9	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS TERCIARIAS			
9.1	3.04.04	SUMINISTRO,EXTENDIDA MATERIAL DE AFIRMADO,SIN COMPACTAR HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9%, (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**)	UNIDAD	M3

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

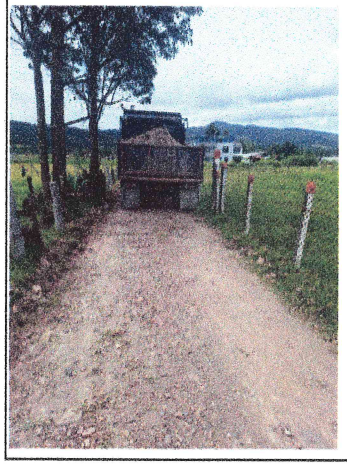



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES					Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Aréa (m2)	Alto (m)	Compactación	
VEREDA SAN LORENZO DE ABAJO SECTOR PUENTE DE BALSA						
TRAMO 1	650.00	5.00		0.07		227.50
					SUBTOTAL	227.50
					TOTAL	227.50

NOTA ACLARATORIA:


CONSUL-CONSTRUCCIONES E&E SAS
KARENICELY
Residente de Obra

CONSUL-CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901482344-4	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS A TRAVÉS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA	Duitama Capital Cívica de Boyacá
	MEMORIA DE CANTIDADES	

CAPÍTULO	IV	MANTENIMIENTO VIAS RURALES
9	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS TERCIARIAS	
9.2	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.

UNIDAD M3-KM

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

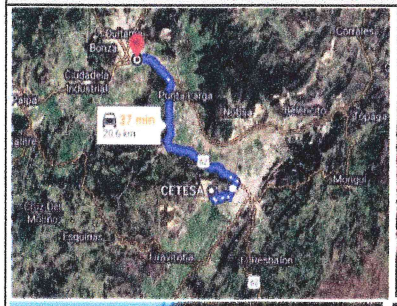







(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES					Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Distancia (km)	Factor de expansión	
VEREDA SAN LORENZO DE ABAJO SECTOR PUENTE DE BALSA						
CANTERA QUESADA SOGAMOSO A TRAMO 1	650.00	5.00	0.07	22.10	1.30	6,536.08
					SUBTOTAL	6536.08
					TOTAL	6536.08

NOTA ACLARATORIA:

CONSOR CONSTRUCCIONES E&E SAS
KAREN CELY
Residente de Obra

CONSUL-CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 901482344-6


MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS A TRAVÉS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA

MEMORIA DE CANTIDADES

Duitama
Capital Cultura del Progreso

CAPÍTULO	**IV**	**MANTENIMIENTO VIAS RURALES**		
9	**MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS TERCIARIAS**			
9.3	3.11.02	ESCARIFICACION, MEZCLADO, CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE Y/O BASE	**UNIDAD**	KM

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

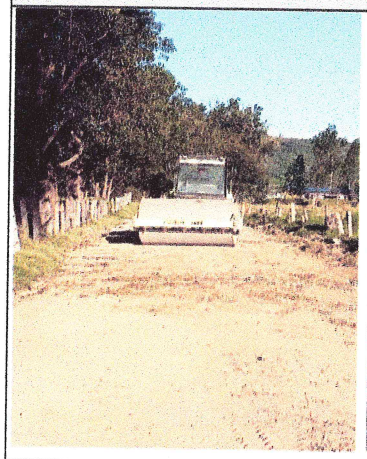





(e) LOCALIZACION	**DIMENSIONES**					**Total**
	Largo (m)	**Ancho (m)**	**Aréa (m2)**	**Alto (m)**	**Compactación**	
VEREDA SAN LORENZO DE ABAJO SECTOR PUENTE DE BALSA						
TRAMO 1	650.00					**0.650**
					SUBTOTAL	0.65
					TOTAL	**0.65**

NOTA ACLARATORIA:

CONSUL CONSTRUCCIONES E&E SAS
KAREN CELY
Residente de Obra

DEPARTAMENTO BOYACA

SECRETARIA GENERAL ALMACÉN MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACA

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada
19/08/2026

No. de Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000086

No. Programación de Compras: 2026.CEN.01.000070 **Fecha de Programación de Compras:** 19 / 08 / 2026

ENTRADA DE BIENES INMUEBLES

Proveedor	NIT	Fecha De Factura	No. de Factura
CONSUL - CONSTRUCCIONES E&E SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	901.482.344	19 / 08 / 2026	CONS 142

Teléfono	Dirección	Ciudad
3114673900	CL 12 27 69	DUITAMA

Dependencia	Bodega	Responsable
SECRETARÍA GENERAL	BODEGA DE ALMACÉN	COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PLACA O SERIAL	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	% IVA
308010003	TERRENO VIAL URBANO - - - TIPO DE OBRA- -Pavimento articulado - -LOCALIZACIÓN TRAMO: Carrera 14b entre calles 3 y 3a Barrio las Américas - -DESCRIPCIÓN DE LA OBRA - -Construcción de 220,94 m2 de pavimento articulado en adoquín de arcilla vehicular pesado apoyado sobre cama de arena y estructura granular, incluyendo actividades preliminares de perfilado y conformación previo a pavimentación, así como el suministro, extendida de 28 m3 de base granular. Dimensiones de la vía intervenida: Longitud: 43.81ml - ancho: 5 ml	BIEN-00017	31.483.260,00	31.483.260,00	0
308010003	TERRENO VIAL URBANO - - -TIPO DE OBRA - - Pavimento articulado- - LOCALIZACIÓN TRAMO: Carrera 31B entre calles 16 Y 17 Barrio El Milagro.DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. Construcción de 367,84 m2 de pavimento articulado en adoquín de arcilla vehicular pesado apoyado sobre cama de arena y estructura granular, incluyendo actividades preliminares de perfilado y conformación previa a pavimentación, así como el suministro, extendida de 28 m3 de base granular. Dimensiones de la vía intervenida: Longitud: 49 ml - ancho: 7.51 ml	BIEN-00018	51.306.890,00	51.306.890,00	0

Valor en Letras:

OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle:


MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS A TRAVES DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ***** SUMAR ENTRADA 2026000087

SUBTOTAL	**$ 82.790.150,00**
(-) DESCUENTOS	**$ 0,00**
IVA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 82.790.150,00**

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
1710010505 - VEHICULARES	891855138 - MUNICIPIO DE DUITAMA	$ 82.790.150,00	$ 0,00
24909001 - CUENTA CRUCE ALMACEN- INVENTARIOS	901482344 - CONSUL - CONSTRUCCIONES E&E SOCIEDAD POR ACCIONES SI	$ 0,00	$ 82.790.150,00
TOTALES			

Jefe de Almacén:



COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

DEPARTAMENTO BOYACA

SECRETARÍA GENERAL ALMACÉN MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACA

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Salida
28/08/2026
Salida No.
2026.CEN.01.000736

Consecutivo de Entrada 2026.CEN.01.000086

SALIDA DE BIEN INMUEBLE

Tipo de Orden
SALIDA DE ACTIVOS FIJOS

Responsable de Almacén
COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

Dependencia Destino
ALMACEN INMUEBLES

Tercero que Recibe
COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PLACA O SERIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
308010003	TERRENO VIAL URBANO - - - TIPO DE OBRA- -Pavimento articulado - -LOCALIZACIÓN TRAMO: Carrera 14b entre calles 3 y 3a Barrio las Américas - -DESCRIPCIÓN DE LA OBRA - -Construcción de 220,94 m2 de pavimento articulado en adoquín de arcilla vehicular pesado apoyado sobre cama de arena y estructura granular, incluyendo actividades preliminares de perfilado y conformación previo a pavimentación, así como el suministro, extendida de 28 m3 de base granular. Dimensiones de la vía intervenida: Longitud: 43.81ml - ancho: 5 ml	BIEN-00017	31.483.260,00	31.483.260,00
308010003	TERRENO VIAL URBANO - - -TIPO DE OBRA - - Pavimento articulado- - LOCALIZACIÓN TRAMO: Carrera 31B entre calles 16 Y 17 Barrio El Milagro.DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. Construcción de 367,84 m2 de pavimento articulado en adoquín de arcilla vehicular pesado apoyado sobre cama de arena y estructura granular, incluyendo actividades preliminares de perfilado y conformación previa a pavimentación, así como el suministro, extendida de 28 m3 de base granular. Dimensiones de la vía intervenida: Longitud: 49 ml - ancho: 7.51 ml	BIEN-00018	51.306.890,00	51.306.890,00

Valor en Letras:

OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL **$ 82.790.150,00**

Detalle:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS A TRAVES DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ***** SUMAR ENTRADA 2026000087

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
17101401 - TERRENOS DE BIENES DE BENEFICIO Y	901482344 - CONSUL - CONSTRUCCIONES E&E SOCIEDAD POR ACCIONES SI	$ 82.790.150,00	$ 0,00
17101401 - TERRENOS DE BIENES DE BENEFICIO Y	891855138 - MUNICIPIO DE DUITAMA	$ 0,00	$ 82.790.150,00
TOTALES			

Entregado por:

COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

Aprobado por:

Recibido a entera Satisfacción:

COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

DEPARTAMENTO BOYACA

SECRETARIA GENERAL ALMACÉN MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACA

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada
19/08/2026
No. de Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000087

No. Programación de Compras: 2026.CEN.01.000070 **Fecha de Programación de Compras:** 19 / 08 / 2026

ENTRADA DE BIENES INMUEBLES

Proveedor	NIT	Fecha De Factura	No. de Factura
CONSUL - CONSTRUCCIONES E&E SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	901.482.344	19 / 08 / 2026	CONS -142

Teléfono	Dirección	Ciudad
3114673900	CL 12 27 69	DUITAMA

Dependencia	Bodega	Responsable
SECRETARÍA GENERAL	BODEGA DE ALMACÉN	COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PLACA O SERIAL	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	% IVA
367020003	INFRAESTRUCTURA VIAL- ANDENES - - -TIPO DE OBRA - - Anden vial - - LOCALIZACIÓN TRAMO Carrera 46 con Calle 19 Barrio Juan Grande. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA - - Construcción de 64 m2 de anden vial en concreto de 17.5 mpa (2500psi) de espesor 10 cm confinado con sardinel prefabricado A-10, reforzado con acero de refuerzo, incluyendo actividades preliminares de excavación manual, extendida y compactación de 12.83 m3 de base granular. Dimensiones de los andenes construidos: Sección 1: Largo: 34.5 ml Ancho: 1.3ml Sección 2: Largo: 18.28 ml – Ancho: 5.64 ml	BIEN-00015	24.521.270,71	24.521.270,71	0
367020003	INFRAESTRUCTURA VIAL- ANDENES - - -TIPO DE OBRA - - ANDEN VIAL - - LOCALIZACIÓN TRAMO: Carrera 40 entre calle 21 y 22 Barrio Camilo Torres DESCRIPCIÓN DE LA OBRA - -Construcción de 200 m2 de anden vial discontinuo en concreto de 17.5 mpa (2500psi) de espesor 10 cm confinado con sardinel prefabricado A-10, reforzado con acero de refuerzo, incluyendo actividades preliminares de excavación manual, extendida y compactación de 12.83 m3 de base granular. Dimensiones de los andenes construidos: Tramo 1: Largo: 6 ml Ancho: 1.96 ml Tramo 2: Largo: 15.8 ml Ancho: 2.42 ml Tramo 3: Largo: 7.5 ml Ancho: 1.57 ml Tramo 4: Largo: 7.5 ml Ancho: 1.87 ml Tramo 5: Largo: 2 ml Ancho: 1.85 ml Tramo 6: Largo: 1.6 ml Ancho: 0.65 ml Tramo 7: Largo: 1.57 ml Ancho: 0.3 ml Tramo 8: Largo: 9 ml Ancho: 1.87 ml Tramo 9: Largo: 24.8 ml Ancho: 1.5 ml Tramo 10: Largo: 15 ml Ancho: 2.10 ml Tramo 11: Largo: 14 ml Ancho: 0.85 ml Tramo 12: Largo: 14.4 ml Ancho: 1.5 ml	BIEN-00016	30.376.119,29	30.376.119,29	0

Valor en Letras:

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS A TRAVES DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA *** SUMAR $ 49.361.976 DE MANTENIMIENTO A VIAS RURALES

SUBTOTAL	**$ 54.897.390,00**
(-) DESCUENTOS	**$ 0,00**
IVA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 54.897.390,00**

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
1710010510 - PEATONALES	891855138 - MUNICIPIO DE DUITAMA	$ 54.897.390,00	$ 0,00
24909001 - CUENTA CRUCE ALMACEN- INVENTARIOS	901482344 - CONSUL - CONSTRUCCIONES E&E SOCIEDAD POR ACCIONES SI	$ 0,00	$ 54.897.390,00
TOTALES			

Jefe de Almacén:

COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

DEPARTAMENTO BOYACA

SECRETARÍA GENERAL ALMACÉN MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACA

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Salida
19/08/2026
Salida No.
2026.CEN.01.000735

Consecutivo de Entrada 2026.CEN.01.000087

SALIDA DE BIEN INMUEBLE

Tipo de Orden
SALIDA DE ACTIVOS FIJOS

Responsable de Almacén
COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

Dependencia Destino
ALMACEN INMUEBLES

Tercero que Recibe
COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PLACA O SERIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
367020003	INFRAESTRUCTURA VIAL- ANDENES - - -TIPO DE OBRA - - Anden vial - - LOCALIZACIÓN TRAMO Carrera 46 con Calle 19 Barrio Juan Grande. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA - - Construcción de 64 m2 de anden vial en concreto de 17.5 mpa (2500psi) de espesor 10 cm confinado con sardinel prefabricado A-10, reforzado con acero de refuerzo, incluyendo actividades preliminares de excavación manual, extendida y compactación de 12.83 m3 de base granular. Dimensiones de los andenes construidos: Sección 1: Largo: 34.5 ml Ancho: 1.3ml Sección 2: Largo: 18.28 ml – Ancho: 5.64 ml	BIEN-00015	24.521.270,71	24.521.270,71
367020003	INFRAESTRUCTURA VIAL- ANDENES - - -TIPO DE OBRA - - ANDEN VIAL - - LOCALIZACIÓN TRAMO: Carrera 40 entre calle 21 y 22 Barrio Camilo Torres DESCRIPCIÓN DE LA OBRA - -Construcción de 200 m2 de anden vial discontinuo en concreto de 17.5 mpa (2500psi) de espesor 10 cm confinado con sardinel prefabricado A-10, reforzado con acero de refuerzo, incluyendo actividades preliminares de excavación manual, extendida y compactación de 12.83 m3 de base granular. Dimensiones de los andenes construidos: Tramo 1: Largo: 6 ml Ancho: 1.96 ml Tramo 2: Largo: 15.8 ml Ancho: 2.42 ml Tramo 3: Largo: 7.5 ml Ancho: 1.57 ml Tramo 4: Largo: 7.5 ml Ancho: 1.87 ml Tramo 5: Largo: 2 ml Ancho: 1.85 ml Tramo 6: Largo: 1.6 ml Ancho: 0.65 ml Tramo 7: Largo: 1.57 ml Ancho: 0.3 ml Tramo 8: Largo: 9 ml Ancho: 1.87 ml Tramo 9: Largo: 24.8 ml Ancho: 1.5 ml Tramo 10: Largo: 15 ml Ancho: 2.10 ml Tramo 11: Largo: 14 ml Ancho: 0.85 ml Tramo 12: Largo: 14.4 ml Ancho: 1.5 ml	BIEN-00016	30.376.119,29	30.376.119,29

Valor en Letras:

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL **$ 54.897.390,00**

Detalle:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS A TRAVES DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA *** SUMAR $ 49.361.976 DE MANTENIMIENTO A VIAS RURALES

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
1710010510 - PEATONALES	901482344 - CONSUL - CONSTRUCCIONES E&E SOCIEDAD POR ACCIONES SI	$ 54.897.390,00	$ 0,00
1710010510 - PEATONALES	891855138 - MUNICIPIO DE DUITAMA	$ 0,00	$ 54.897.390,00
TOTALES			

Entregado por:

COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

Aprobado por:

Recibido a entera Satisfacción:

COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO
