REPÚBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLANTICO

BARRANQUILLA

"MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA - CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO."

BARRANQUILLA



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 05

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

Calle 24 No. 8-59 OFICINA 201 Montería – Córdoba Teléfono 7/ 31024505574 3213739827
humbertojaureguiciasas@gmail.com – proyectosviales_sas@yahoo.com-
carloshumbertojaureguimartinez@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 2000-2025 **Contratista:** CONSORCIO GALAPA MLS

Contrato de Interventoría No. 2053-2025 **Interventoría:** HUMBERTO JAUREGUI & CIA S.A.S

Objeto Contrato de Obra:
MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA - CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

INFORME MENSUAL No. 4 **MES O PERIODO:** 01/04/26 - 30/04/26

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	3
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	4
1	**INTRODUCCIÓN**		5
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		7
2.1	Localización		7
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		8
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		8
2.4	Características técnicas del proyecto		12
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		14
3.1	Información general del contrato		14
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		15
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		16
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		18
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		19
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	19
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	19
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	19
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	19
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	19
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	19
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	19
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	19
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	19
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	19
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	19
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	19
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	19
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	19
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		20
5.1	Información general del contrato		20
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		21
5.3	Informes especialistas y profesionales		22
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		22
5.5	Informe matriz de riesgos.		22
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		23
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		25
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	25
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	25
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	25
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	25
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	25
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		25
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	25
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	25
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	25
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	26
7	**Conclusiones y recomendaciones**		26
8	**Anexos**		26
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		27
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		27
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		28
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		28

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: RAFAEL RODRIGUEZ MEZA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. 0137 **de fecha** 27/01/2026

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/06/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETRAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO **PERIODO MES:** 01/04/2026 - 30/04/2026

CONTRATO DE OBRA No.: 2000-2025

OBJETO:
MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA - CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

CONTRATISTA: CONSORCIO GALAPA MLS

PLAZO INICIAL: 31/12/2025
FECHA DE INICIO: 24/12/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/02/2026
FECHA DE REANUDACIÓN: 23/03/2026
FECHA DE VENCIMIENTO: 24/05/2026
PLAZO ACUMULADO: 4,23

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 2.000.000.000,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 2.000.000.000,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 416.367.682,50
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2053-2025 **INTERVENTOR:** HUMBERTO JAUREGUI & CIA S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. RAFAEL G. RODRIGUEZ MEZA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	208	
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
ETAPA DE REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O INFORMACIÓN TÉCNICA Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)		GLB	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	158,73	158,73
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
ETAPA DE REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O INFORMACIÓN TÉCNICA Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)		GLB	1,00	1,00

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 1.387.892.275,00	$ 11.297.692,00	$ 1.399.189.967,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 150.000.000,00		$ 150.000.000,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 20.000.000,00		$ 20.000.000,00
PROVISION PARA AJUSTES			$ 150.000.000,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 55.000.000,00	$ 10.450.000,00	$ 65.450.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 85.497.593,00		$ 85.497.593,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			1.870.137.560,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

85497593

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	1.033.034.588,00	7.491.472,20	1.040.526.060,20	$ 1.040.526.060,20
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	20.000.000,00	145.038,17	20.145.038,17	$ 20.145.038,17
PROVISION PARA AJUSTES				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 65.450.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				$ 1.126.121.098,37

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 539.969.456,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 562.266.528,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 104,13%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 9
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 14
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 10
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **33**

REGISTRO FOTOGRÁFICO













EXCAVACIONES DE LA EXPLANACION, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE E INSTLACION DE GEOTEXTIL K0+110-K0+080

INSTLACION DE SBG (20 CM), FORMALETEADO E INSTALACION DE PAVIMENTO RIGIDO MR 43 (30CM)

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

EL CONTRATO DE OBRA NO PRESENTA OBSERVACIONES DE MULTAS O SANCIONES.

Firma
Nombre: LUIS HUMBERTO JAUREGUI
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.17319 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCION

No PROCESO DE SELECCION: CONTRATO DE OBRA	LP-DEO-SGI-030-2025,
No PROCESO DE SELECCION: CONTRATO DE INTERVENTORIA	CMA-DEO-SGI-045-2025
ID - SECOP CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.7101200. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8671282&isFromPublicArea=True&isModal=False
ID - SECOP CONTRATO DE INTERVENTORIA	CO1.PCCNTR. Carlosjauregui05* https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractManagement/Index?prevCtxUrl=%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fProcedureReplyEdit%2fView%3fprevCtxLbl%3dAdministraci%25c3%25b3n%2bde%2bofertas%26prevCtxUrl%3dhttps%253a%252f%252fwww.secop.gov.co%253a443%252fCO1BusinessLine%252fTendering%252fProcedureReplyManagement%252fIndex%253fPerspective%253dLastModifiedProcedureReplies%26docUniqueIdentifier%3dCO1.RPL.5210326%26pPI%3dCO1.PPI.42533356
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	ING. RAFAEL RODRIGUEZ MEZA
GESTOR TECNICO	ING. LUIS GABRIEL SANDINO
GESTOR AMBIENTAL	LICED PEÑA
GESTOR SOCIAL	LINEY MARIA LARA CASTRO
GESTOR DE SOSTENIMIENTO	

El Ministerio de Transporte e INVIAS, con el propósito de dar atención según las políticas institucionales con destino a la construcción, mejoramiento y mantenimiento vial, el Ministerio de Transporte y el INVIAS, considera invertir en la infraestructura vial que permitan el cumplimiento de metas físicas y fortalezcan la presencia del Estado en las regiones del país, así como también la consolidación de la red vial nacional favoreciendo conexiones estratégicas entre las regiones de Colombia desde el punto de vista logístico, geográfico, social, de seguridad, soberanía y economía, permitiendo mayoritariamente dar atención al crecimiento, demanda del transporte de carga y de pasajeros contribuyendo al desarrollo de las regiones como base en la generación de oportunidades de crecimiento económico y mejora en la calidad de vida para la ciudadanía.

El Instituto Nacional de Vías - INVÍAS es un Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, habiéndose modificado su estructura mediante el Decreto 1292 de 2021, señalando como objeto: " la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria,

férrea, fluvial, marítima y sus infraestructuras conexas o relacionadas, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte.

El Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 "Colombia, potencia mundial de la vida", resalta que existen regiones del país que no disponen de una adecuada accesibilidad y conectividad vial, aérea o fluvial para transporte de alimentos. Se debe mejorar el acceso físico a los alimentos por medio de cadenas de suministros eficientes, digitales y el desarrollo de infraestructura de transporte.

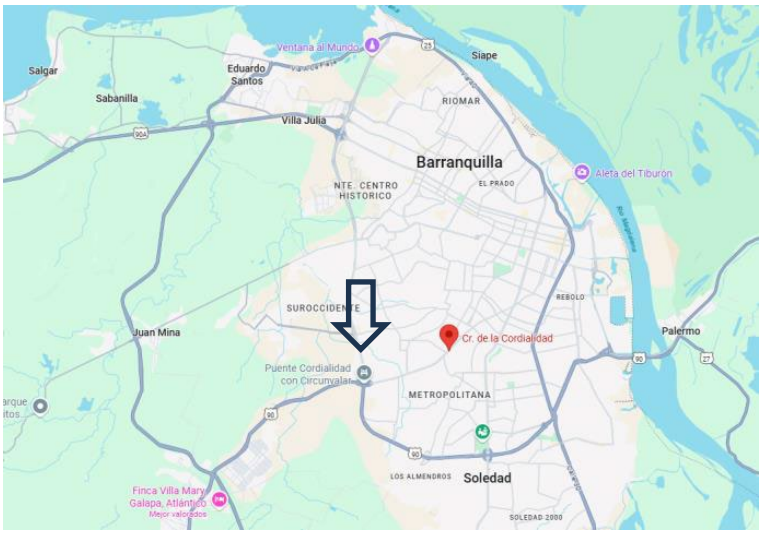
Así, el gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías realizó la priorización de recursos para la ejecución del proyecto que tiene por objeto: MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA-CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

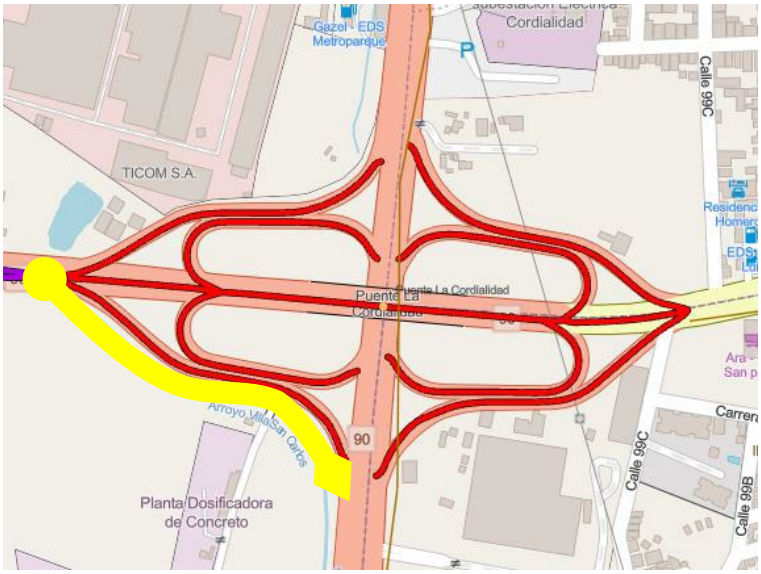
El referido puente ha sido noticia a nivel local, por el mal estado que presentan sus accesos o conectantes y orejas, lo que se ve agravado en época de lluvias, por obstrucción de particulares en el canal de escorrentía, razón por la cual se requiere su intervención urgente.

Por tanto, se estima necesario atender el sector relacionado anteriormente con obras de mantenimiento con el fin de preservar la infraestructura vial existente y garantizar la seguridad y transitabilidad de los usuarios de la vía.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO





2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO


Con el desarrollo del proyecto de MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA- CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, busca satisfacer la movilidad en condiciones de seguridad y comodidad a las comunidades de Galapa y Barranquilla, desarrollando este corredor vial para la competitividad del norte del país, donde a partir de mejorar la transitabilidad, reducir riesgo de accidentalidad y costos de operación vehicular , garantizar la calidad y estabilidad de las obras existentes, se aumentara la capacidad y nivel de servicio.




2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA





El proyecto tiene la finalidad de mejorar el nivel de servicio de la estructura de pavimento en la conectante Galapa – Barranquilla. El puente La Cordialidad está ubicado en el PR 0117+0411 de la de la ruta nacional de primer orden 9006 Sector Puente La Cordialidad, con una longitud aproximada de 426 mts, actualmente se encuentra pavimentado con múltiples patologías como pieles de cocodrilo, bacheo, descascaramientos, entre otros. El Instituto Nacional de Vías – INVIAS tiene a su cargo tanto la estructura del puente como las orejas y accesos al mismo.







Se presenta el registro fotográfico de las condiciones de la vía conectante Galapa - Barranquilla.

<table>
<tr><td colspan="2">CONECTANTE GALAPA - BARRANQUILLA</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>K0+060-06//01/2026</td><td>K0+060-02/05/2026</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
</table>

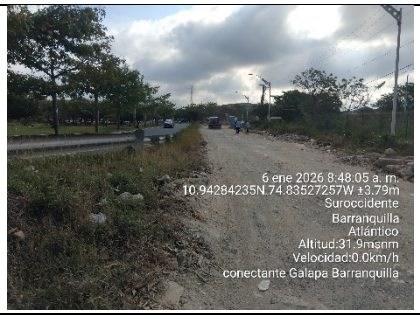K0+090-06/01/2026	K0+090-02/05/2026
	
K0+100-06/01/2026	K0+100-02/05/2026
	
K0+140-06/01/2026	K0+140-02/05/2026
	
K0+150-06/01/2026	K0+150-02/05/2026
	
K0+170-06/01/2026	K0+170-02/05/2026
	
K0+190-06/01/2026	K0+190-02/05/2026

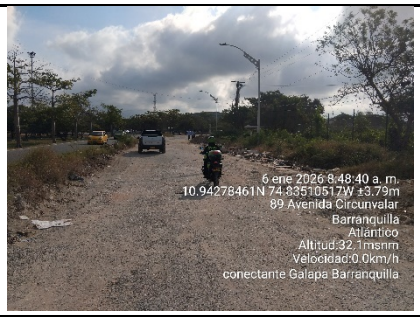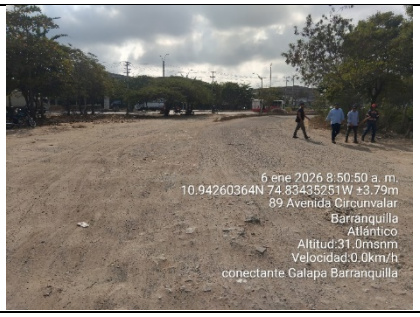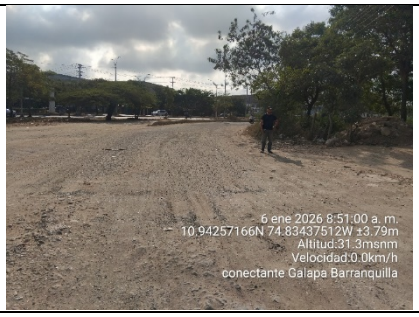	
K0+210-06/01/2026	K0+210-02/05/2026
	
K0+230-06/01/2026	K0+230-02/05/2026
	
K0+250-06/01/2026	K0+250-02/05/2026
	
K0+240-06/01/2026	K0+240-06/01/2026
	
K0+260-06/01/2026	K0+260-06/01/2026

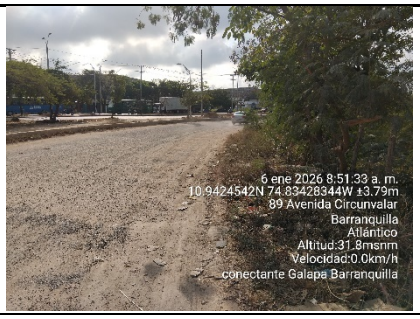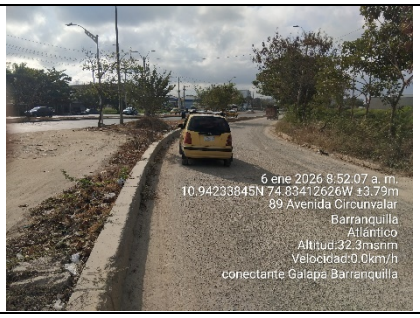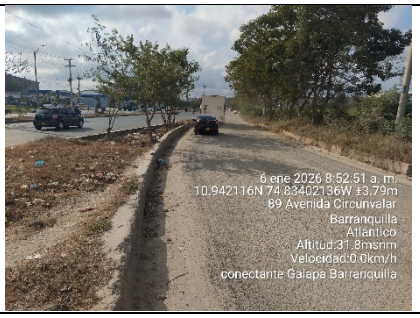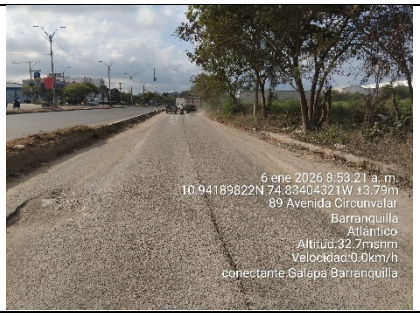	
K0+280-06/01/2026	K0+280-06/01/2026
	
K0+300-06/01/2026	K0+300-06/01/2026
	
K0+320-06/01/2026	K0+320-06/01/2026
	
K0+340-06/01/2026	K0+340-06/01/2026
	
K0+360-06/01/2026	K0+360-06/01/2026

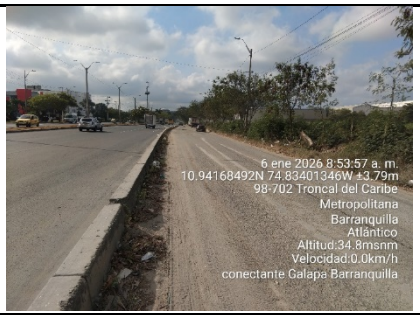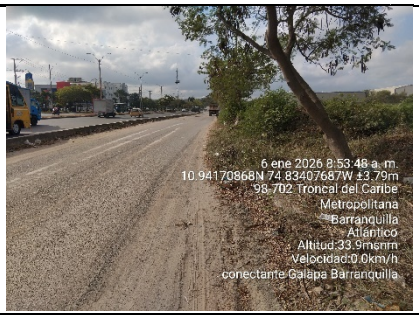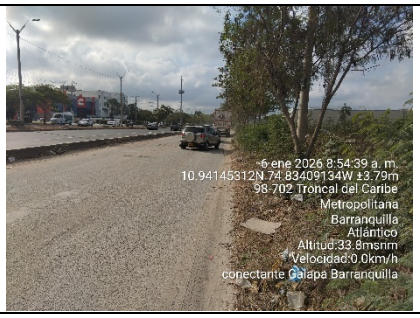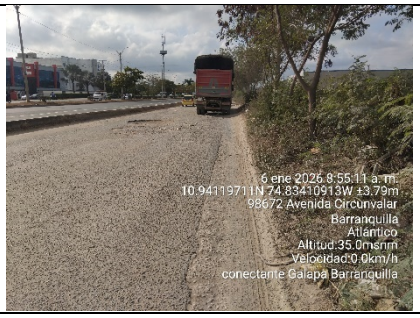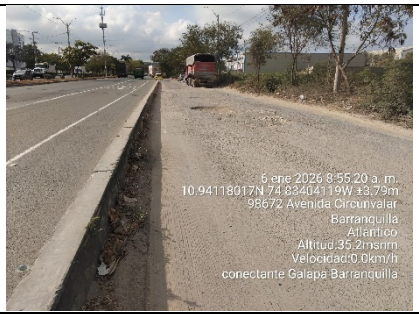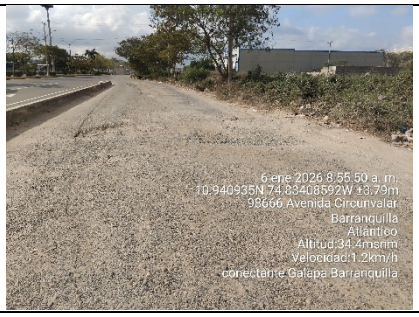	
K0+380-06/01/2026	K0+380-06/01/2026
	
K0+400-06/01/2026	K0+400-06/01/2026
	
K0+420-06/01/2026	K0+420-06/01/2026
	
K0+440-06/01/2026	K0+440-06/01/2026

2.4 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Se plantean obras de mantenimiento de la carpeta asfáltica los cuales obedecen a la priorización acorde a los alcances presupuestales del contrato, mediante el fresado de capa de rodadura y el remplazo de esta, inclusive las capas subyacentes de base y subbase cuando sea necesario, mantenimiento de las capacidades hidráulicas e implementación de señalización vertical y horizontal.

Se contempla como alcance priorizado la intervención PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA- CIRCUNVALAR, RUTA 9006, donde se busca mejorar la transitabilidad del puente y sus orejas a intervenir, para lo cual se adelantarán obras de mantenimiento periódico, señalización vertical y/o horizontal. Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

a) Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o información técnica y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial

b) Obras de mantenimiento de la estructura de pavimento (Fresado de pavimento asfaltico, excavaciones para repavimentación, suministro e instalación de mezcla asfáltica, riego de imprimación con emulsión asfáltica, base granular, subbase granular) del PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA-CIRCUNVALAR, RUTA 9006.

c) Mejora de la capacidad hidráulica mediante obras de drenaje y/o subdrenajes, y/o estructuras de protección en las entradas y salidas, cunetas, filtros y todas aquellas obras que se requieran que garanticen la transitabilidad de la vía.

d) Instalación de señalización, elementos de seguridad y demarcación vial de acuerdo con lo establecido en el Manual de Señalización Vial vigente de la Agencia Nacional de seguridad Vial. Así mismo el mantenimiento de estas, en el PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA- CIRCUNVALAR, RUTA 9006.

e) Gestión social, ambiental, sostenible para dicho corredor vial, o según aplique en la ejecución del proyecto y el insumo correspondiente.

f) Y las demás posibles resultantes de la etapa de Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o información técnica y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.
Las obras de drenaje vial son fundamentales en la vida del pavimento. Se localizará y se construirán las obras adecuadas tendientes a controlar el agua que pueda modificar las condiciones y propiedades de cada una de las capas que conforman el pavimento, según el diseño insumo del presente proceso o aplicabilidad de cartillas vigentes o todo estudio y diseño que sea suministrado por la entidad de manera oficial.

3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

LICITACION PUBLICA No:	LP-DEO-SGI-030-2025,
RESOLUCION DE ADJUDICACION:	4985 del 19 de noviembre del 2025
ID - SECOP CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.7101200
CONTRATO No:	2000-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	3 DE DICIEMBRE DE 2025.
OBJETO:	MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA - CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.
CONTRATISTA / NIT:	CONSORCIO GALAPA MLS/NIT. 902.011.763-0 (SAM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S /NIT 901.254.798-7/10% y CONSTRUCTORA ML S.A.S/NIT 901.729.748-9/90%).
REPRESENTANTE LEGAL	HUGO MAURICIO TIBATA ALBA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	($2.000.000.000). DOS MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
VALOR ADICION No 1	$ 0
VALOR TOTAL	($2.000.000.000). DOS MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
ANTICIPO	($ 416.367.682,50) CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS, CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE. EL CONTRATISTA RENUNCIA AL ANTICIPO.
MODIFICACIONES	N/A
ACLARACIONES	N/A
SUSPENSION No 1 (27/02/2026)	DESDE EL 27 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2026
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	24 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	24 DE MAYO DE 2026
PRORROGA No 1 (30/12/2026)	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA No 2 (24/03/2026)	HASTA EL 24 DE MAYO DE 2026

NUEVA FECHA DE TERMINACION	24 DE MAYO DE 2026

3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Excavación sin clasificar de la explanación y canales.
Inician actividades el día 8 de abril de 2026, desde la abscisa K0+052 hasta la abscisa K0+260, realizando excavación de altura 0.57 cm, hasta la subrasante. Esta actividad ha finalizado el día 22 de abril de 2026.

Suministro e instalación de Subbase granular clase A
Fecha de inicio; 17 de abril de 2026, a partir de la abscisa K0+052, finalizando el día 28 de abril de 2026. La capa instalada ha sido de espesor 20 cm.

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40
Actividad realizada para el mantenimiento con mezcla asfáltica de los parches ubicados sobre las orejas del Puente, sobre los cuales se desviará el tránsito. La actividad se realizo durante los dias 6 y 7 de abril de 2026.

Excavación para la repavimentación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.
Inicia a partir del día 6 de abril y continua posteriormente, el día 8 de abril, cuando se hace el cierre de la conectante, dando inicio a la rotura de pavimento a partir de la abscisa K0+052. La actividad finaliza el día 21 de abril de 2026.

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m).
Actividad simultanea con la excavación de la explanación, iniciando el día 8 de abril de 2026, desde la abscisa K0+052 hasta la abscisa K0+260, hasta el día 22 de abril de 2026.

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJON (Incluye material de sello y rajón - Nivelación y compactación).
Su inicio es a partir del día 9 de abril, finalizando el día 21 de abril de 2026. La actividad se realiza instalando el material mediante medio mecánico y acomodación manual para luego hacer un sello con Subbase granular entre K0+052 a K0+260.

GEOTEXTIL DE SEPARACION.
Fecha de inicio de la actividad, 17 de abril, y finaliza el día 21 de abril de 2026. Esta actividad se realiza con geotextil tejido, T 2400, en todo el ancho de la via, dejando traslapos longitudinales de 30 cm.

Control de la inversión mensual:

DESCRIPCION	VALOR	VALOR ACTUALIZADO (Según ultima acta de modificación)	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 1.387.892.275,00		$ 1.033.034.588	$ 1.033.034.588	$ 354.857.687,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 150.000.000,00				$ 150.000.000,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 20.000.000,00		$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00	
PROVISION PARA AJUSTES	$ 150.000.000,00				$ 150.000.000,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$65.450.000,00			$ 65.450.000,00	
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	85.497.000,00				85.497.000,00
VALOR TOTAL	1.856.839.275,00			$ 1.118.484.588,00	$ 740.354.687,00

INVERSION MENSUAL

3.3 SEGUIMIENTOS A ITEMS NO PREVISTOS

Dada una primera revisión y a espera de la revisión por parte de la entidad se hace la evaluación entre las cantidades proyectadas y las ejecutadas de cada uno de los ítems nuevos:

NP-01. REMOCION DE ALCANTARILLA. ml.

PROYECTADO	EJECUTADO
15	

NP-02. DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO. ml.

PROYECTADO	EJECUTADO
207.8	

NP-03. ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON. M3

PROYECTADO	EJECUTADO
498.77	427.2

Queda pendiente de cuantificar el reemplazo de material en las zonas donde se presentó el cambio de material de la subrasante.

NP-04 GEOTEXTIL DE SEPARACION. M2

PROYECTADO	EJECUTADO
1792.42	1664

Actividad culminada dentro de la sección de la via. Para su liquidación se deberá tener

en cuenta el traslapo transversal realizado.

NP-05 CONCRETO HIDRÁULICO PARA PAVIMENTO MR-43 (4.2 MPA) E=30CM

PROYECTADO	EJECUTADO
453.69	100.8

En este periodo se cuantifica el avance registrado en el tramo entre la K0+099 hasta la K0+147.27

NP-06 TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE IV DE 36". MI

PROYECTADO	EJECUTADO
15	0

NP-07 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOSINTETICO TEXTIL IMPERMEABLE. M2

PROYECTADO	EJECUTADO
204	0

NP-08 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODRÉN CIRCULAR DE 6" NO INCLUYE EXCAVACIÓN. MI

PROYECTADO	EJECUTADO
317.82	260

En el corte se aprecia el avance en la instalación de filtro sobre el costado derecho entre K0+052 a K0+260. Falta por recibir las actividades realizadas sobre el margen izquierdo.

NP-09 VALVULA ANTIREFLUJO DE 6". Unidad

PROYECTADO	EJECUTADO
3	0

NP-10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 6". MI

PROYECTADO	EJECUTADO
39	0

NP-11 CAJA DE INSPECCION SENCILLA. Unidad

PROYECTADO	EJECUTADO
3	0

NP-12 RELLENOS CON GRAVILLA. M3

PROYECTADO	EJECUTADO
12.26	0

NP-13 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE

PROYECTADO	EJECUTADO
45.08	0

NP-14PARCHEO CON MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-25. M3

PROYECTADO	EJECUTADO
30.33	27.2

Corresponde a las actividades realizadas para el mantenimiento de las orejas del puente por donde transitará el flujo vehicular de la conectante que será cerrada durante el proyecto. Se aprecia una menor cantidad dado que solo se ejecutaron los baches que presentaban mayor riesgo.

NP-15 REPLANTEO GENERAL.M2

PROYECTADO	EJECUTADO
1662.57	1664

Se aprecia una mayor cantidad, dado que se esta haciendo el replanteo hasta la abscisa K0+300.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORÍA

El proyecto presenta un avance en su ejecución de 36.09%, transcurridos 3.43 meses de los 4.23 meses del plazo del contrato.

Se ha realizado revisión y evaluación de documentación acorde al marco regulatorio correspondiente al MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA y su INSTRUCTIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, de los documentos enviados por el contratista de obra; mediante oficios 2026-INV-CE-068; 2026-INV-CE-070 y 2026-INV-CE-087, verificando la correspondencia de valores de mano de obra, rendimientos, valor de equipo, materiales con los dataos consignados en la propuesta original del año 2025. Par los nuevos insumos remitidas por el contratista, se han evaluado la estimación de costo para las 3 cotizaciones, y generando un precio objetivo de adquisición. Las respuestas a estos análisis han sido emitidas mediante oficio HJCIA-SIC-GAL-2053-2025-554, del 6 de abril de 2026. Se presenta a INVIAS, mediante comunicado HJCIA-SIC-GAL-2053-2025-564, del día 21 de abril, la aprobación de los APU, para su revisión.

Verificación y aprobación de amparos y vigencias dentro de la normativa de las cláusulas de contrato de obra No 2000-2025, sobre Garantías y Seguros por parte de la Interventoría al documento remitido por el contratista de obra mediante correo electrónico de fecha 6 de abril de 2026, correspondiente a la actualización de garantías según prórroga de plazo contractual No. 2. Interventoría presenta observaciones y valida su aprobación mediante comunicado HJCIA-SIC-GAL-2053-2025-556 y HJCIA-SIC-GAL-2053-2025-557

del día 7 de abril y 10 de abril respectivamente.

Mediante comunicado, HJCIA-SIC-GAL-2053-2025-558 de fecha 11 de abril de 2026, continua el requerimiento de documentación que permita el seguimiento financiero, administrativo y técnico en la etapa constructiva. Dentro de la información solicitada está el cronograma, del modo en que el contratista se compromete a ejecutar el proyecto; Programa de Inversiones, la cual corresponde a las inversiones de acuerdo con su programa de obra, utilizando el formato previsto en el Manual de Interventoría; Flujo de caja, con los ingresos y egresos esperados durante la ejecución de los trabajos.

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se anexan en el ANEXO 1, al contenido de este informe los siguientes formatos suscritos por los responsables:

4.1 Informe semanal. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3.
4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4.
4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6.
4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra. Formato MEPI- MN1-IN-15-FR-8.
4.5 Estado general del tiempo. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10.
4.6 Resumen ensayos de Laboratorio. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11.
4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad del Contrato de Obra. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14.
4.9 Otros documentos seguimiento mensual:

- **Seguimiento a la inversión del Anticipo.**
  - **Plan de Inversión del anticipo mensualizado (Formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1)**.
  - **(Formato MEPI-MN1-IN-2-FR-2). Formato de seguimiento**.
- **Seguimiento Programa de Obra.**
- **Seguimiento Programa de Inversiones.**
  - **Programa de Inversiones aprobado vigente (Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1)**
  - **Seguimiento al Programa de Obra e Inversiones realizado por la Interventoría (Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2).**
- **Actas de Comité de Obra (Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-1).**
- **Actas de Reunión (Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-2).**

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CONCURSO DE MERITOS No:	CMA-DEO-SGI-045-2025
RESOLUCION DE ADJUDICACION:	5114 del 26 de noviembre de 2025
ID - SECOP CONTRATO DE INTERVENTORIA	CO1.PCCNTR. Carlosjauregui05*
CONTRATO No:	2053-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	9 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA-CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
CONTRATISTA / NIT:	HUMBERTO JAUREGUI & CIA S.A.S./NIT. 901.793.808-4
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS HUMBERTO JAUREGUI MARTINEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	($299.999.935,00). DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE
VALOR ADICION No 1	$ 0
VALOR TOTAL	($299.999.935,00). DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE
ANTICIPO	($ 64.259.760,00) SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS. (INTERVENTORIA DESISTE DEL ANTICIPO)
MODIFICACIONES	N/A
ACLARACIONES	N/A
SUSPENSIONES (27/02/2026)	DESDE EL 27 DE FEBRERO HASTA EL 22 DE MARZO DE 2026
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	24 DE DICIMEBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	24 DE MAYO DE 2026
PRORROGA No 1 (30/12/25)	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA No 2 (24/03/2026)	HASTA EL 24 DE MAYO DE 2026

abril de 2024.

Solicitamos la realización de este dren longitudinal subsuperficial, atendiendo las recomendaciones del Manual de drenaje para carreteras INVIAS, diciembre 2009, donde se favorezca la eliminación de agua de las capas granulares y la subrasante."

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

En el periodo de febrero de 2026, finalizo la participación de los especialistas.

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC.

CONTARTISTA/INTERVENTORIA	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) MENSUAL Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado	1	2
			VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ABRIL/ACUMULADO	
CONTRATISTA	$ 1.557.892.275,00	100,00%	36,09%	% P	34,66%	
				$ P	$539.969.456	
			$562.266.528	$ E	$562.266.528	
				% E	36,09%	
INTERVENTORIA	$ 299.999.935,00	100,00%	76,63%	% P	76,63%	
				$ P	$229.879.049	
			$229.879.049	$ E	$229.879.049	
				% E	76,63%	
				% P		
				$ P		
	INDICADOR I/C			$ E		
				% E		
	EN EL MES	41%		% P		
				$ P		
	ACUMULADO	40,88%		$ E		
				% E		
				% P		
				$ P		
				$ E		
				% E		
				% P		
				$ P		
				$ E		
				% E		
				% P		
				$ P		
				$ E		
				% E		
				% P		
				$ P		
				$ E		
				% E		
				% P		
				$ P		
				$ E		
				% E		
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.557.892.275,00					
VALOR BÁSICO INTERVENTORIA	$ 299.999.935,00					

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

Desabastecimiento de materias Primas e Insumos del mercado: Constituye para este proyecto la utilización de materiales granulares y concretos asfalticos, como alternativa de construcción. En el proceso licitatorio, varios oferentes realizaron la observación sobre la

distancia de acarreo para materiales granulares y concretos asfalticos, no se encuentran dentro de las distancias que determino el INVIAS en su etapa de planeación. Sin embargo, el contratista presenta la propuesta con esta información. Al momento de dar aplicación a esta alternativa se crea la necesidad de organizar un nuevo ítem de transporte para distancias mayores de 15 km. Dado que, según los anexos técnicos, no ha sido posible la aprobación de este ítem, se dio aprobación de otra alternativa constituida por pavimento rígido.

Variación de Precios y/o Ajustes ocasionados durante la ejecución del Contrato. Para minimizar el riesgo el contrato se planteó el ítem de reajuste, basados en los índices económicos entre el periodo 2025-2026.

Limitación en la movilidad. En el marco de la realización del PMT, se ha analizado una única propuesta de limitación del tránsito, afectando de manera directa la ejecución del proyecto. Al interrumpir el tránsito por la conectante, el transito tendrá que organizarse y realizar la maniobra por toda la estructura del Puente. El material necesario para la obra tendrá que hacer los mismos recorridos y se estará viendo afectado por las demoras ocasionadas por el caos vehicular de la zona.

Deficiencia en la señalización y PMT: Previamente al inicio de los trabajos se ha realizado la instalación de señalización de acuerdo a los esquemas del PMT, indicando el inicio de obra e ingreso de maquinaria al proyecto.

Imposibilidad parcial y/o total para ejecutar las actividades de mantenimiento de los puentes en las rutas 9006, en el departamento de Atlántico. La propuesta a implementar está contenida dentro de las especificaciones generales de carreteras, permitiendo el seguimiento permanente por parte de la Interventoría y la Supervisión del proyecto a las actividades de mantenimiento de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato.

Mayores cantidades de obra debidamente justificadas. El contrato se limitó presupuestalmente originando la intervención del tramo de manera parcial.

5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA.

Revisión del cronograma

TAREA	INICIO	FIN	INICIO REAL	FIN REAL	Avance/ATRASO INICIO	Avance/ATRASO FIN
EXPLANACIONES Y EXCAVACIONE	7/04/2026	6/05/2026	8/04/2026	-1 día	23/04/2026	12 dias
Demolición de Estructura	7/04/2026	6/05/2026	8/04/2026	-1 día	23/04/2026	12 dias
Remoción de alcantarilla	29/04/2026	30/04/2026				
Demolición de bordillos de concreto	8/04/2026	22/04/2026	8/04/2026		23/04/2026	-1 dias
ESTRUCTURAS , DRENAJES Y ALCANTARILL	13/04/2026	22/05/2026				

Rellenos para estructuras con receb	4/05/2026	22/05/2026				
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE IV DE 900 MM DE DIAMETR	4/052026	22/052026				
Concreto resistencia f'c 28 Mpa (cunetas y brodillos 4000	5/05/2026	19/05/2026				
Concreto resistencia f'c 21 MPa (3000 psi	8/05/2026	22/05/2026				
Concreto resistencia f'c 14 MPa	4/05/2026	6/05/2026				
Acero de refuerzo Fy=420 MPa	28/04/2026	22/05/2026				
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOSINTETICO TEXTIL IMPERMEABLE	13/04/2026	14/05/2026				
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODRÉN CIRCULAR DE 6" NO INCLUYE EXCAVACIÓ	21/04/2026	15/05/2026	13/04/2026	8 dias	25/04/2026	20 dias
VALVULA ANTIREFLUJO	20/05/2026	22/05/2026				
TUBERIA DE PVC 6"	4/05/2026	22/05/2026				
CAJA DE INSPECCION SENCILLA	4/05/2026	22/05/2026				
RELLENOS CON GRAVILL	4/05/2026	22/05/2026				
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM	4/05/2026	22/05/2026				
TRANSPORTE	8/04/2026	22/05/2026	8/04/2026		23/04/2026	30 dias
CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA	6/04/2026	22/05/2026				
Replanteo genera	6/04/2026	7/04/2026	8/04/2026	-2 dias	23/04/2026	-20 dias
Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL 4	6/04/2026	7/04/2026	7/04/2026	2 dias	8/04/2026	2 dias
Ejecución de parcheo de pavimento mediante colocación de	6/04/2026	7/04/2026	7/04/2026	2 dias	8/04/2026	2 dias

mezcla densa en caliente tipo MDC-25.						
Excavación sin clasificar de la explanación y canales (57 cm)	8/04/2026	22/04/2026	8/04/2026		23/04/2026	1 dia
Excavaciones varias sin clasificar (para geodren y otras según memoria	21/04/2026	15/05/2026	13/04/2026	8 dias	25/04/2026	20 dias
Excavación para la repavimentación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	6/04/2026	22/04/2026	8/04/2026	2 dias	23/04/2026	1 dia
NP-03 Estabilización de subrasante con rajón	9/04/2026	22/04/2026	8/04/2026	I dia	23/04/2026	1 dia
NP-04 geotextil de separación	20/04/2026	23/04/2026	17/04/2026	3 dias	23/04/2026	
Subbase granular clase A	20/04/2026	27/04/2026	17/04/2026	3 dias	25/04/2026	2 dias
NP-05 Concreto hidráulico para pavimento MR-43 (4.2 MPa) e=30cm	28/04/2026	22/05/2026	29/04/2026	-1 dia		
DEMARCACIÓN	22/05/2026	22/05/2026				

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANEXO 2

6.1 **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-5.**

6.2 **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-7.**

6.3 **INFORMACIÓN FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-9.**

6.4 **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-13.**

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL:

- **SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. (FORMATO MEPI-MN1-IN-3-FR-1) - (FORMATO MEPI-MN1-IN-3-FR-2).**
- **PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS**

APROBADO. (FORMATO MEPI-MN1-IN-9-FR-2).

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Cuando solo restan 24 dias para finalización del contrato, se destaca el incumplimiento por parte del contratista de radicar la documentación requerida para revisar por parte de INVIAS, la viabilidad de utilizar los recursos del ítem de ajustes obras complementarias a obras. Ademas que se suspendieron las obras de excavación de la explanación, mejoramiento de la subrasante e instalación de subbase granular hasta tanto no se tenga aprobación de la modificación, situación que impide al contratista realizar la finalización de aproximadamente 24 metros en dos semanas.

- El rendimiento en la construcción de pavimento tipo MR43, se ve reducido dado que las altas temperaturas de la zona afectan el factor humano, procurando realizar las actividades en el horario desde las 6: a.m hasta las 11: a.m.

- Se teme que se constituya en ruta critica el suministro de tubería de concreto reforzado, puesto que en obra se espera la llegada del insumo desde la semana pasada. Esto implica que entre la abscisa K0+052 a K0+093, no se puedan realizar obras de pavimentación hasta tanto no se halla instalado la tubería transversal. Sin embargo dentro del cronograma estas actividades tienen fecha de inicio a partir del día 4 de mayo, de tal modo que estaremos pendiente de la programación desde la semana entrante, por si se requiere armar plan de contingencia

8. Anexos

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No		2053-2025			
CONTRATO DE OBRA No		2000-2025			
OBJETO:					
MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA - CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO					

RELACION DE CORRESPONDENCIA GENERADO ENTRE CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA

FECHA	ASUNTO	RADICADO
6/04/2026	REVISION ITEM NO PREVISTOS.	**HJCIA-SIC-GAL-2053-2025-554**
7/04/2026	REVISION GARANTIA Y SEGURO PRORROGA No 2.	**HJCIA-SIC-GAL-2053-2025-556**
10/04/2026	SUBSANACION GARANTIA Y SEGURO PRORROGA No 2	**HJCIA-SIC-GAL-2053-2025-557**
11/04/2026	INFORMACION PARA SEGUIMIENTO DE OBRA.	**HJCIA-SIC-GAL-2053-2025-558**
14/04/2026	OBSERVACIONES TECNICAS DE INTERVENTORIA AL DISEÑO GEOMETRICO Y SEÑALIZACION VIAL DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA - CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO – VERSION 3	**HJCIA-SIC-GAL-2053-2025-559**
14/04/2026	CARACTERIZACION SUBBASE Y DISEÑO CONCRETO MR43	**HJCIA-SIC-GAL-2053-2025-560**
15/04/2026	INSTALACION DE DRENAJE SUBSUPERFICIAL	**HJCIA-SIC-GAL-2053-2025-562**
20/04/2026	OBSERVACIONES AMBIENTALES	**HJCIA-SIC-GAL-2053-2025-563**
21/04/2026	CONCEPTO APROBACION DE NUEVOS ITEMS	**HJCIA-SIC-GAL-2053-2025-564**
23/04/2026	Respuesta oficio HJCIA-SIC-GAL-2053-2025-559 OBSERVACIONES TÉCNICAS DE INTERVEN	**2026-INV-CE-096**
23/04/2026	Respuesta a oficio HJCIA-SIC-GAL-2053-2025-560, caracterización de material de subl	**2026-INV-CE-097**
23/04/2026	Respuesta al Oficio HJCIA-SIC-GAL-2053-2025-562 – Instalación de Drenaje Subsuperfi	**2026-INV-CE-098**
24/04/2026	OBSERVACIONES CARACTERIZACION DE SBG.	**HJCIA-SIC-GAL-2053-2025-565**
30/04/2026	RADICADO 2026S-VATL-027039-Revisión y solicitud de atención de emergencia Puente Cordialidad	**HJCIA-SIC-GAL-2053-2025-565**

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO.

CONECTANTE GALAPA - BARRANQUILLA



K0+060. Compactación de la subrasante



K0+070. Excavación sin clasificar de la explanación

	
K0+080. Acopio de material tipo rajón	K0+100. Cargue de material de la excavación
	
K0+070. Mejoramiento de la subrasante, media calzada	K0+080. Mejoramiento de la subrasante, media calzada
	
K0+100. Excavación sin clasificar media calzada	K0+120. Excavación sin clasificar, media calzada
	
K0+140. Excavación sin clasificar, media calzada	K0+160. Equipo en obra.

	
K0+070. Excavación manual para geodren	K0+090. Mejoramiento de la calzada completa
	
K0+110. Capa de mejoramiento de calzada.	K0+130. Mejoramiento de la subrasante con rajón, media calzada
	
K0+150. Excavación sin clasificar de la explanación.	K0+080. Instalación de subbase granular.
	
K0+100. Instalación de subbase granular.	K0+120. Instalación de subbase granular.

	
K0+140. Cereo de capa de subbase granular.	K0+160. Instalación de subbase granular
	
K0+180. Instalación de subbase granular.	K0+200. Instalación de subbase granular.
	
K0+250. Capa compactada de subbase granular	K0+230. Capa compactada de subbase granular
	
K0+190. Formaleteado e instalación de juntas, media calzada	K0+170. Vaciado de concreto MR43 y alisado de capa.

	
K0+150. Amarre de acero de refuerzo, y terminado de placas	K0+100. Sección de ancho 7.4m en pavimento MR43.
	
K0+100. Toma de densidades.	K0+150. Amarre de acero de placas reforzadas
	
K0+120. Protección de concreto fresco.	K0+130. Instalación de pasadores
	
K0+140. Vibrado superficial con regla vibratoria.	K0+150. Acabado superficial mediante cepillo de texturizado

	
K0+100. Instalación de tela geotextil T-2400	K0+120. Proceso de enrasado, para dar acabado al concreto.

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD. N/A

8.4 BITÁCORA. N/A

ANEXO 1. REPORTE EJECUCION MENSUAL DEL CONTRATISTA

ANEXO 2. REPORTE DE EJECUCION MENSUAL DE INTERVENTORIA

ANEXO 1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/04/2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA- CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLANTICO — SEMANA No.: 11 del 3/04/2026 al 9/04/2026 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUIS GABRIEL SALGADO RIVAS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA- CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculosestructurales y/o información técnica y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial. Obras de mantenimiento de la estructura de pavimento (Fresado de pavimento asfaltico, excavaciones para repavimentación, suministro e instalación de mezcla asfáltica, riego de imprimación con emulsión asfáltica, base granular, subbase granular) del PUENTE LACO RDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA- CIRCUNVALAR, RUTA 9006.Mejora de la capacidad hidráulica mediante obras de drenaje y/o subdrenajes, y/o estructuras de protección en las entradas y salidas, cunetas, filtros y todas aquellas obras que se requieran que garanticen la transitabilidad de la vía.Instalación de señalización, elementos de seguridad y demarcación vial de acuerdo con lo establecido en el Manual de Señalización Vial vigente del Ministerio de Transporte. Así mismo el mantenimiento de estas, en el PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPACIRCUNVALAR, RUTA 9006.Gestión social, ambiental, sostenible para dicho corredor vial, o según aplique en la ejecución del proyecto y el insumo correspondiente. Y las demás posibles resultantes de la etapa de Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o información técnica y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El Puente la cordialidad presenta mal estado en sus accesos o conectantes y orejas, presentandose inundaciones en epoca de lluvias que impiden el transito de vehiculos y peatones, situacion que deriva en una intervencion urgente. Por consiguiente se requiere la atencion del sector con obras de mantenimiento a nivel de carpeta asfaltica los cuales obedecen a la priorización acorde a los alcances presupuestales del contrato, mediante el fresado de capa de rodadura y el remplazo de esta, inclusive las capas subyacentes de base y subbase cuando sea necesario, mantenimiento de las capacidades hidráulicas e implementación de señalización vertical y horizontal. y con el fin de preservar la infraestructura vial existente y garantizar la seguridad y transitabilidad de los usuarios de la vía.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO GALAPA MLS - NIT: 902.011.763-0
INTEGRANTES: SAM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S -NIT 901.254.798-7; (10%) - CONSTRUCTORA ML S.A.S - NIT 901.729.748-9 ; (90%).
CONTRATO No. 2000-2025
FECHA DE INICIO: 24/12/2025
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/25
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/05/2026

VALOR INICIAL:	$ 2.000.000.000,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 2.000.000.000,00
VALOR ANTICIPO:	RENUNCIA ANTICIPO
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: HUMBERTO JAUREGUI & CIA S.A.S
INTEGRANTES: HUMBERTO JAUREGUI (100%)
CONTRATO No. 2053-2025
FECHA DE INICIO: 24/12/2025
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:31/12/25
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/05/2026

VALOR INICIAL:	$ 299.999.935,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 299.999.935,00
VALOR ANTICIPO:	RENUNCIA ANTICIPO
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.000.000.000	$ 2.000.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 65.450.000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.000.000.000	$ 1.934.550.000		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 299.999.935	$ 299.999.935		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 136.289.854		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 299.999.935	$ 163.710.081		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.557.892.275,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 128.564.156,00	8,25%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 122.759.900,00	7,88%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 5.804.256,00	0,37%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 65.450.000,00	4,20%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 194.014.156,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 188.209.900,00	12,08%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (5.804.256,00)	-0,37%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 128.564.156,00	8,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 122.759.900,00	7,88%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista debera radicar las acta decostos de dicimebre y enero en ceros.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 175.099.887,00	58,37%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 163.383.481,00	54,46%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.115.908,00	6,04%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.399.502,00	2,13%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS (Renuncia)	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

	INDICADOR I/C
En el mes:	2,5
Acumulado:	

ANTICIPOS (Renuncia)	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 20%
Meta Física Ejecutada %: 17%
Avance o Atraso Físico %: -3%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2025	Vigencia 2026	Avance Físico	Tramo y/o sector 1			Total	%
Estudios y diseños	GI	1		0,2	Prog	1			1	100,0%
					Ejec	1			1	20,0%
* Excavaciones varias de la ex	M3	1380		1380	Prog	1380			1380	100,0%
					Ejec	160			160	11,6%
* Estabilizacion de subrasante	M3	530,8		530,8	Prog	530,8			530,8	100,0%
					Ejec	120			120	22,6%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA- CIRCUNVALAR, RUTA 9006, TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retrollanta	1	100%
Minicargador	1	100%
Volqueta 15 m3	1	100%
Volqueta 15 m3	1	100%
Vibrocompactador 2ton	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Material: piedra rabón Cantera los manguit	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	Disposición RCD: ROYAL	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	
EMISIONES:	SI X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: POR APROBAR AREA DE SOSTENIBILIDAD INVIAS

OBSERVACIONES:
13 abril no hay baños, la empresa alquillante los retiro, se presenta una nueva empresa para la prestacion - las amquinas no tienen kit antderrame- no hay punto ecologico- material RCD esta extendido a lo largo de la via -

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 19

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Puente de la Cordianlidad

OBSERVACIONES:
Se llevó a cabo una reunión con el COPAC en las adyacencias del Puente La Cordialidad, a las 9:30 a.m., con la participación de representantes de la interventoría, del área social y técnica, así como del contratista, de la veeduría y control de la ciudad de Barranquilla, y de miembros del gremio de taxistas del área de influencia del proyecto. Durante el encuentro, se realizó la socialización de los avances de la obra, se presentaron las actividades constructivas en ejecución y se brindó respuesta oportuna a las inquietudes manifestadas por los asistentes. La jornada se desarrolló con normalidad y finalizó sin contratiempos.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: En este proyecto no se requiere compra de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La ejecucion de actividades se inician a partir del dia 6 de abril con el mantenimiento de los parches que se encuentran sobre las orejas del puente La cordialidad. A partir del dia 8 de baril se realiza el cierre de la conectante entre Galapa - Barranquilla, realizando las siguientes actividades: Excavaciones varias de la explanacion y canales entre K0+059 - K0+140, media calzada; 160 M3. Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion; 8964 m3/km. Estabilizacion de la subrajante con rajon; 120m3. Parcheo con mezcla asfaltica MDC-25; 27,2 m3.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Excavaciones varias de la explanacion y canales entre K0+140 - K=+226, calzada completa. Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion. Estabilizacion de la subrajante con rajon.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INICIO EXCAVACION DE LA EXPLANACION K0+059



CONFORMACION DE LA EXCAVACION K0+059- K0+140



MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Realizar revision de la actualizacion de garantias y seguros del contrato según nuevas vigencias a la fecha de prorroga No 2 Revisar el presupuesto y cantidades de NP, para dar a probacion a las nuevas obras complementarias. Realizar el seguimiento en obra con personal tecnico como topografia, SISO, ambiental y social.	FIRMA NOMBRE: LUIS HUMBERTO JAUREGUI Matrícula Profesional No.: 17319 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 0904/2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA- CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLANTICO — SEMANA No.: 12 del 10/04/2026 al 16/04/2026 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUIS GABRIEL SALGADO RIVAS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA- CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculosestructurales y/o información técnica y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial. Obras de mantenimiento de la estructura de pavimento (Fresado de pavimento asfaltico, excavaciones para repavimentación, suministro e instalación de mezcla asfáltica, riego de imprimación con emulsión asfáltica, base granular, subbase granular) del PUENTE LACO RDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA- CIRCUNVALAR, RUTA 9006.Mejora de la capacidad hidráulica mediante obras de drenaje y/o subdrenajes, y/o estructuras de protección en las entradas y salidas, cunetas, filtros y todas aquellas obras que se requieran que garanticen la transitabilidad de la vía.Instalación de señalización, elementos de seguridad y demarcación vial de acuerdo con lo establecido en el Manual de Señalización Vial vigente del Ministerio de Transporte. Así mismo el mantenimiento de estas, en el PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPACIRCUNVALAR, RUTA 9006.Gestión social, ambiental, sostenible para dicho corredor vial, o según aplique en la ejecución del proyecto y el insumo correspondiente. Y las demás posibles resultantes de la etapa de Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o información técnica y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El Puente la cordialidad presenta mal estado en sus accesos o conectantes y orejas, presentandose inundaciones en epoca de lluvias que impiden el transito de vehiculos y peatones, situacion que deriva en una intervencion urgente. Por consiguiente se requiere la atencion del sector con obras de mantenimiento a nivel de carpeta asfaltica los cuales obedecen a la priorización acorde a los alcances presupuestales del contrato, mediante el fresado de capa de rodadura y el remplazo de esta, inclusive las capas subyacentes de base y subbase cuando sea necesario, mantenimiento de las capacidades hidráulicas e implementación de señalización vertical y horizontal. y con el fin de preservar la infraestructura vial existente y garantizar la seguridad y transitabilidad de los usuarios de la vía.

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO GALAPA MLS - NIT: 902.011.763-0	INTERVENTOR:	HUMBERTO JAUREGUI & CIA S.A.S
INTEGRANTES:	SAM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S -NIT 901.254.798-7; (10%) - CONSTRUCTORA ML S.A.S - NIT 901.729.748-9 ; (90%).	INTEGRANTES:	HUMBERTO JAUREGUI (100%)
CONTRATO No.	2000-2025	CONTRATO No.	2053-2025
FECHA DE INICIO:	24/12/2025	FECHA DE INICIO:	24/12/2025
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/25	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/25
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/05/2026	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/05/2026
VALOR INICIAL:	$ 2.000.000.000,00	VALOR INICIAL:	$ 299.999.935,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 2.000.000.000,00	VALOR ACUMULADO:	$ 299.999.935,00
VALOR ANTICIPO:	RENUNCIA ANTICIPO	VALOR ANTICIPO:	RENUNCIA ANTICIPO
VALOR AMORTIZADO:	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.000.000.000	$ 2.000.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 65.450.000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.000.000.000	$ 1.934.550.000		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 299.999.935	$ 299.999.935		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 136.289.854		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 299.999.935	$ 163.710.081		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.557.892.275,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 257.128.312,00	16,50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 272.425.821,00	17,49%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 15.297.509,00	0,98%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 65.450.000,00	4,20%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 322.578.312,00	20,7%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 337.875.821,00	21,69%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 15.297.509,00	0,98%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 257.128.312,00	16,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 143.103.158,00	9,19%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista debera radicar las acta decostos de dicimebre y enero en ceros.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 193.215.795,00	64,41%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 169.782.983,00	56,59%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.115.908,00	6,04%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.399.502,00	2,13%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS (Renuncia)	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

	INDICADOR I/C
En el mes:	2,6
Acumulado:	

ANTICIPOS (Renuncia)	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 39% — Avance o Atraso Físico %: 1%
Meta Física Ejecutada %: 40%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2025	Vigencia 2026	Avance Físico	Tramo y/o sector 1			Total	%
Estudios y diseños	GI	1		0,2	Prog	1			1	100,0%
					Ejec	1			1	20,0%
* Excavaciones varias de la ex	M3	947,66		947,66	Prog	947,66			947,66	100,0%
					Ejec	554			554	58,5%
* Estabilizacion de subrasante	M3	498,77		498,77	Prog	498,77			498,77	100,0%
					Ejec	307			307	61,6%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA- CIRCUNVALAR, RUTA 9006, — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retrollanta	1	100%
Minicargador	1	100%
Volqueta 15 m3	1	100%
Volqueta 15 m3	1	100%
Vibrocompactador 2ton	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Material: piedra rabón Cantera los manguit	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	Disposición RCD: ROYAL	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	
EMISIONES:	SI X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: POR APROBAR AREA DE SOSTENIBILIDAD INVIAS

OBSERVACIONES:
se tiene ya en sitio la bateria sanitaria en cumplimiento del numero de trabajadores, por parte de veolia,
se tiene en obra los puntos ecologicos, se mantiene tambien en obra kit de derrame para maquinaria, la cantera los manguitos tiene los documentos de permisos y licencias pertinentes de igualmanera la empresa royal Ingenieria para trtamientos de RCD emitidos en obra

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 19

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Puente de la Cordianlidad

OBSERVACIONES:
Se llevó a cabo una reunión con el COPAC en las adyacencias del Puente La Cordialidad, a las 9:30 a.m., con la participación de representantes de la interventoría, del área social y técnica, así como del contratista, de la veeduría y control de la ciudad de Barranquilla, y de miembros del gremio de taxistas del área de influencia del proyecto. Durante el encuentro, se realizó la socialización de los avances de la obra, se presentaron las actividades constructivas en ejecución y se brindó respuesta oportuna a las inquietudes manifestadas por los asistentes. La jornada se desarrolló con normalidad y finalizó sin contratiempos.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: En este proyecto no se requiere compra de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

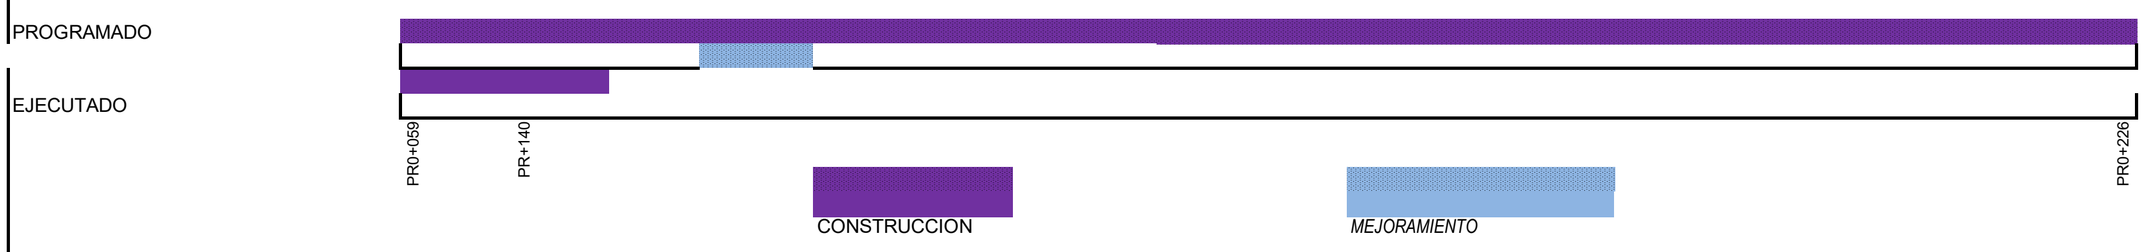
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Excavaciones sin clasificar de la explanacion y canales entre K0+059 - K0+210, media calzada L izquierdo, K0+140 - K0+210 calzada L. derecho, K0+210 - K0+270 media calzada L. Izquierdo; 722 M3. ACUMULADO K0+052-210 Calzada completa, y K0+210-K0+270 media calzada; 882 m3. Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion; 21992 m3/km. Estabilizacion de la subrajante con rajon; K0+059 - K0+210, media calzada L izquierdo, K0+140 - K0+210 calzada L. derecho,187,2 M3. ACUMULADO K0+052-210 Calzada completa; 882 m3K0+140 - K0+210 calzada L. derecho, K0+210 - K0+270 media calzada L. Izquierdo; 307 M3. SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODRÉN CIRCULAR DE 6" NO INCLUYE EXCAVACIÓN; 130ml. entre K0+060 -K0+190. GEOTEXTIL DE SEPARACION ; 560m2 entre K0+060 -K0+130.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion. Instalacion de subsase granular

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACION DE SUBABSE GRANULAR K0+060 K0+150



MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE LADO IZQUIERDO



EXCAVACION DE LA EXPLANACION K0+210 K0+270

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Realizar el seguimiento en obra con personal tecnico como topografia, SISO, ambiental y social.	FIRMA NOMBRE: LUIS HUMBERTO JAUREGUI Matrícula Profesional No.: 17319 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/04/2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA- CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLANTICO — SEMANA No.: 13 del 17/04/2026 al 23/04/2026 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: RICARDO RODRIGUEZ MEZA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUIS GABRIEL SALGADO RIVAS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA- CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculosestructurales y/o información técnica y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial. Obras de mantenimiento de la estructura de pavimento (Fresado de pavimento asfaltico, excavaciones para repavimentación, suministro e instalación de mezcla asfáltica, riego de imprimación con emulsión asfáltica, base granular, subbase granular) del PUENTE LACO RDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA- CIRCUNVALAR, RUTA 9006.Mejora de la capacidad hidráulica mediante obras de drenaje y/o subdrenajes, y/o estructuras de protección en las entradas y salidas, cunetas, filtros y todas aquellas obras que se requieran que garanticen la transitabilidad de la vía.Instalación de señalización, elementos de seguridad y demarcación vial de acuerdo con lo establecido en el Manual de Señalización Vial vigente del Ministerio de Transporte. Así mismo el mantenimiento de estas, en el PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPACIRCUNVALAR, RUTA 9006.Gestión social, ambiental, sostenible para dicho corredor vial, o según aplique en la ejecución del proyecto y el insumo correspondiente. Y las demás posibles resultantes de la etapa de Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o información técnica y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El Puente la cordialidad presenta mal estado en sus accesos o conectantes y orejas, presentandose inundaciones en epoca de lluvias que impiden el transito de vehiculos y peatones, situacion que deriva en una intervencion urgente. Por consiguiente se requiere la atencion del sector con obras de mantenimiento a nivel de carpeta asfaltica los cuales obedecen a la priorización acorde a los alcances presupuestales del contrato, mediante el fresado de capa de rodadura y el remplazo de esta, inclusive las capas subyacentes de base y subbase cuando sea necesario, mantenimiento de las capacidades hidráulicas e implementación de señalización vertical y horizontal. y con el fin de preservar la infraestructura vial existente y garantizar la seguridad y transitabilidad de los usuarios de la vía.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO GALAPA MLS - NIT: 902.011.763-0

INTEGRANTES: SAM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S -NIT 901.254.798-7; (10%) - CONSTRUCTORA ML S.A.S - NIT 901.729.748-9 ; (90%).

CONTRATO No.	2000-2025	VALOR INICIAL:	$ 2.000.000.000,00
FECHA DE INICIO:	24/12/2025	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/25	VALOR ACUMULADO:	$ 2.000.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/05/2026	VALOR ANTICIPO:	RENUNCIA ANTICIPO
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: HUMBERTO JAUREGUI & CIA S.A.S

INTEGRANTES: HUMBERTO JAUREGUI (100%)

CONTRATO No.	2053-2025	VALOR INICIAL:	$ 299.999.935,00
FECHA DE INICIO:	24/12/2025	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/25	VALOR ACUMULADO:	$ 299.999.935,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/05/2026	VALOR ANTICIPO:	RENUNCIA ANTICIPO
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.000.000.000	$ 2.000.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 65.450.000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.000.000.000	$ 1.934.550.000		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 299.999.935	$ 299.999.935		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 136.289.854		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 299.999.935	$ 163.710.081		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.557.892.275,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 385.692.468,00	24,76%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 410.269.337,00	26,33%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 24.576.869,00	1,58%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 65.450.000,00	4,20%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 451.142.468,00	29,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 475.719.337,00	30,54%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 24.576.869,00	1,58%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 128.564.156,00	8,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 136.639.823,00	8,77%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista debera radicar las acta decostos de dicimebre y enero en ceros.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 211.331.703,00	70,44%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 176.182.485,00	58,73%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.115.908,00	6,04%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.399.502,00	2,13%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS (Renuncia)	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

	INDICADOR I/C
En el mes:	2,7
Acumulado:	

ANTICIPOS (Renuncia)	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 60%
Meta Física Ejecutada %: 60%
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2025	Vigencia 2026	Avance Físico	Tramo y/o sector 1			Total	%
Estudios y diseños	GI	1		0,2	Prog	1			1	100,0%
					Ejec	1			1	20,0%
* Excavaciones varias de la ex	M3	947,66		947,66	Prog	947,66			947,66	100,0%
					Ejec	554			554	58,5%
* Estabilizacion de subrasante	M3	498,77		498,77	Prog	498,77			498,77	100,0%
					Ejec	307			307	61,6%
* Instalacion de subbase granu	M3	427,86		427,86	Prog	427,86			427,86	100,0%
					Ejec	349,94			349,94	81,8%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA- CIRCUNVALAR, RUTA 9006, TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retrollanta	1	100%
Minicargador	1	100%
Volqueta 15 m3	1	100%
Volqueta 15 m3	1	100%
Vibrocompactador 2ton	1	100%
Motoniveladora	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Material: piedra rabón Cantera los mangui	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
	Disposición RCD: ROYAL	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: EL CONSORCIO GALAPA A CUMPLIDO, CON LOS REQUIRIMIENTO BASICOS, BATERIA SANITARIA EN CUMPPLIMIENTO A LOS TRABAJADORES, PUNTOS ECOLOGICOS, KIT DE DERRAME, LOS DOCUEMNTOS DE LAS DIFERENTES PERMISOSA ZONAS DE DEPOSITOS HAN SIDO, ENVIADOS AL AREAB TECNICA MEDIANTE VIA EMAIL, COMOLAS SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL O /Y OCUPOACION DE CAUCE, LOS rcd SON DISPUESTOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO INDICADA A 1 KM DEL DESARROLLO DE LA OBRA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: POR APROBAR AREA DE SOSTENIBILIDAD INVIAS

OBSERVACIONES:
Pendiente aprobacion del PAGA por parte de INVIAS.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	20	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	20	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Puente de la Cordianlidad

OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES:
El día sabado 18 de abril, el contratista llevó a cabo una charla sobre el manejo responsable de la información, dirigida al personal de mano de obra no calificada. La actividad fue liderada por el area social y contó con la participación activa de los trabajadores, quienes recibieron orientaciones clave para el uso adecuado y confidencial de la información en el desarrollo de sus labores.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: En este proyecto no se requiere compra de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Excavaciones sin clasificar de la explanacion y canales entre K0+059 - K0+140, media calzada L derecho, K0+210 - K0+260 calzada L. derecho; 65,2 M3. .ACUMULADO K0+052-260 Calzada completa; 948,84 m3. Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion; 23617 m3/km. Estabilizacion de la subrajante con rajon; K0+059 - K0+140, media calzada L derecho, K0+210 - K0+260 calzada L. derecho; 120 M3. ACUMULADO K0+052-260 Calzada completa; 427,2 m3. . SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODRÉN CIRCULAR DE 6" NO INCLUYE EXCAVACIÓN; 148ml. entre K0+190 -K0+260. ACUMULADO K0+052-K0+260, Lado derecho; 278 ml. GEOTEXTIL DE SEPARACION ; 1104m2 entre K0+130 -K0+260.ACUMULADO K0+052-K0+260; 1664 M2. Suministro e instalacion de subbase granular, entre K0+052 -K0+260; 349,94 m3.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion. Concreto hidráulico para pavimento MR-43 (4.2 MPa) e=30cm

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CEREADO DE SUBABSE GRANULAR K0+060



CEREADO DE SBG. K0+120



INSTLACION DE SBG K0+260

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Realizar el seguimiento en obra con personal tecnico como topografia, SISO, ambiental, social, y tecnico	FIRMA NOMBRE: LUIS HUMBERTO JAUREGUI Matrícula Profesional No.: 17319 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA- CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLANTICO — SEMANA No.: 14 del 24/04/2026 al 30/04/2026 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: RICARDO RODRIGUEZ MEZA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUIS GABRIEL SALGADO RIVAS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA- CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculosestructurales y/o información técnica y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial. Obras de mantenimiento de la estructura de pavimento (Fresado de pavimento asfaltico, excavaciones para repavimentación, suministro e instalación de mezcla asfáltica, riego de imprimación con emulsión asfáltica, base granular, subbase granular) del PUENTE LACO RDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA- CIRCUNVALAR, RUTA 9006.Mejora de la capacidad hidráulica mediante obras de drenaje y/o subdrenajes, y/o estructuras de protección en las entradas y salidas, cunetas, filtros y todas aquellas obras que se requieran que garanticen la transitabilidad de la vía.Instalación de señalización, elementos de seguridad y demarcación vial de acuerdo con lo establecido en el Manual de Señalización Vial vigente del Ministerio de Transporte. Así mismo el mantenimiento de estas, en el PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPACIRCUNVALAR, RUTA 9006.Gestión social, ambiental, sostenible para dicho corredor vial, o según aplique en la ejecución del proyecto y el insumo correspondiente. Y las demás posibles resultantes de la etapa de Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o información técnica y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El Puente la cordialidad presenta mal estado en sus accesos o conectantes y orejas, presentandose inundaciones en epoca de lluvias que impiden el transito de vehiculos y peatones, situacion que deriva en una intervencion urgente. Por consiguiente se requiere la atencion del sector con obras de mantenimiento a nivel de carpeta asfaltica los cuales obedecen a la priorización acorde a los alcances presupuestales del contrato, mediante el fresado de capa de rodadura y el remplazo de esta, inclusive las capas subyacentes de base y subbase cuando sea necesario, mantenimiento de las capacidades hidráulicas e implementación de señalización vertical y horizontal. y con el fin de preservar la infraestructura vial existente y garantizar la seguridad y transitabilidad de los usuarios de la vía.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO GALAPA MLS - NIT: 902.011.763-0
INTEGRANTES: SAM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S -NIT 901.254.798-7; (10%) - CONSTRUCTORA ML S.A.S - NIT 901.729.748-9 ; (90%).
CONTRATO No. 2000-2025
FECHA DE INICIO: 24/12/2025
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/25
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/05/2026

VALOR INICIAL:	$ 2.000.000.000,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 2.000.000.000,00
VALOR ANTICIPO:	RENUNCIA ANTICIPO
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: HUMBERTO JAUREGUI & CIA S.A.S
INTEGRANTES: HUMBERTO JAUREGUI (100%)
CONTRATO No. 2053-2025
FECHA DE INICIO: 24/12/2025
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:31/12/25
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/05/2026

VALOR INICIAL:	$ 299.999.935,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 299.999.935,00
VALOR ANTICIPO:	RENUNCIA ANTICIPO
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.000.000.000	$ 2.000.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 65.450.000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.000.000.000	$ 1.934.550.000		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 299.999.935	$ 299.999.935		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 136.289.854		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 299.999.935	$ 163.710.081		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.557.892.275,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 539.969.456,00	34,66%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 562.266.528,00	36,09%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 22.297.072,00	1,43%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 65.450.000,00	4,20%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 605.419.456,00	38,9%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 627.716.528,00	40,29%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 22.297.072,00	1,43%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 128.564.156,00	8,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 158.713.732,00	10,19%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista debera radicar las acta decostos de dicimebre y enero en ceros.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 229.447.611,00	76,48%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 182.581.987,00	60,86%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.115.908,00	6,04%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.399.502,00	2,13%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS (Renuncia)	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

	INDICADOR I/C
En el mes:	2,8
Acumulado:	

ANTICIPOS (Renuncia)	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 65%
Meta Física Ejecutada %: 65%
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2025	Vigencia 2026	Avance Físico	Tramo y/o sector 1			Total	%
Estudios y diseños	GI	1		0,2	Prog	1			1	100,0%
					Ejec	1			1	20,0%
* Excavaciones varias de la ex	M3	947,66		947,66	Prog	947,66			947,66	100,0%
					Ejec	944			944	99,6%
* Estabilizacion de subrasante	M3	498,77		498,77	Prog	498,77			498,77	100,0%
					Ejec	427,2			427,2	85,7%
* Instalacion de subbase granu	M3	427,86		427,86	Prog	427,86			427,86	100,0%
					Ejec	332,8			332,8	77,8%
* Pavimento MR 43	M3			427,86	Prog	427,86			427,86	100,0%
					Ejec	100,8			100,8	23,6%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA- CIRCUNVALAR, RUTA 9006, TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retrollanta	1	100%
Minicargador		100%
Volqueta 15 m3		100%
Volqueta 15 m3		100%
Vibrocompactador 2ton		100%
Motoniveladora		100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	Material: piedra rabón Cantera los mangui	PERMISO MINERO:	SI	X (DISPONIBLE)	NO
	Disposición RCD: ROYAL	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A
EMISIONES:	SI	X	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	21	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	21	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 27

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Puente de la Cordianlidad

OBSERVACIONES: El 2 de mayo, la trabajadora social del contratista llevó a cabo una charla informativa sobre hallazgos arqueológicos, con el objetivo de socializar el protocolo de actuación que debe aplicarse en caso de presentarse este tipo de situaciones durante las excavaciones de la obra vial.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: En este proyecto no se requiere compra de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

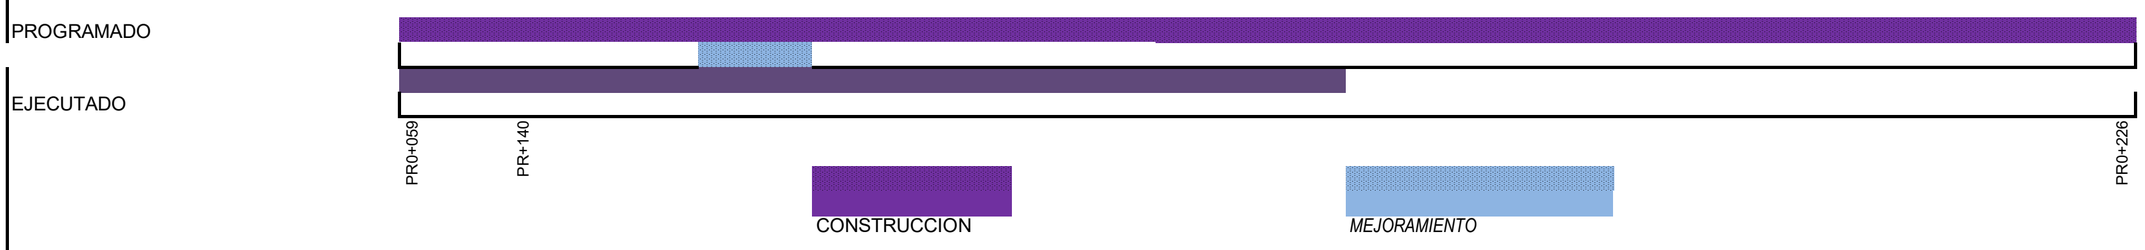
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Excavaciones sin clasificar de la explanacion y canales.ACUMULADO K0+052-260 Calzada completa; 943,87 m3. Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion; 23502 m3/km. Estabilizacion de la subrajante con rajon. ACUMULADO K0+052-260 Calzada completa; 427,2 m3. . SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODRÉN CIRCULAR DE 6" NO INCLUYE EXCAVACIÓN. ACUMULADO K0+052-K0+260, Lado derecho; 278 ml. GEOTEXTIL DE SEPARACION.ACUMULADO K0+052-K0+260; 1664 M2. Suministro e instalacion de subbase granular, entre K0+052 -K0+260; 349,94 m3. Concreto hidráulico para pavimento MR-43, entre K0+099-k0+147,27 ancho 8m, 100,8

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Concreto hidráulico para pavimento MR-43 (4.2 MPa) e=30cm, Instalacion de tuberia de concreto reforzada 36"

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



VACIADO DE CONCRETO MR 43 K0+140



ENRASADO DE CONCRETO K0+140



CURADO DEL CONCRETO K0+147

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Realizar seguimiento de la programacion, y financiero de la ejecucicon del proyecto Realizar el seguimiento en obra con personal tecnico como topografia, SISO, ambiental, social, y tecnico	FIRMA NOMBRE: LUIS HUMBERTO JAUREGUI Matrícula Profesional No.: 17319 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: abr-26 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA - CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRATO No. 2000 DE 2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO GALAPA MLS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2053 DE 205 **INTERVENTORÍA:** HUMBERTO JAUREGUI & CIAS SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
VIBRADOR DE CONCRETO	INGESOL SAS/2022	F11BAJC0029	OBRA						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
RETROCARGADOR LLANTA	CASE/2023	575SV	OBRA						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CARROTANQUE DE AGUA	CHEVROLET/1991	1000 LITROS	OBRA																												X	X	X	
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR/2000	120H	OBRA																												X	X	X	
COMPACTADOR DE RODILLO	DYNAPAC/2015	CA 250D	OBRA																												X	X	X	
MINICARGADOR CON MARTILLO	BOTCAT/2023	2 TON	OBRA						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO									3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	
TOTAL ACTIVO									3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	
TOTAL EN REPARACIÓN									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL INACTIVO									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	6	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: RIGOBERTO WALTEROS RAMOS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 1208-0973

Firma

Nombre: GABRIEL GRIMALDOS SALAZAR
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 682027-4320 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE OBRA No: 2000 DE 2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO GALAPA MLS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2026 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA - CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2053 DE 2025 **INTERVENTOR:** HUMBERTO JAUREGUI & CIAS SAS

NOMBRE ARL: SEGUROS SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR ATLANTICO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	AMERICA YUDITZA RODRIGUEZ FONSECA	1118538436	DIRECTOR DE OBRA	$ 3.985.660	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INDEPENDIENTE	$ 3.985.660	$ 121.900	V	SANITAS	9503808014	$ 498.300	PORVENIR	9503808014	$ 637.800	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	LIDYS ISABEL CASTILLO PADILLA	33.068.067	PROFESIONAL SOCIAL	$ 1.750.905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INDEPENDIENTE	$ 1.750.905	$ 121.900	V	SURA	9503808014	$ 218.900	COLPENSIONES	9503808014	$ 2.802.000	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	RIGOBERTO WALTEROS RAMOS	7.316.134	RESIDENTE DE OBRA	$ 1.750.905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INDEPENDIENTE	$ 1.750.905	$ 121.900	V	SANITAS	9504993618	$ 218.900	COLPENSIONES	9504993618	$ 280.200	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	JHONATAN JOSE CERVANTES SUAREZ	1143142556	RESIDENTE AMBIENTAL	$ 1.750.905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INDEPENDIENTE	$ 1.750.905	$ 121.900	V	SURA	9504656140	$ 218.900	PORVENIR	9504656140	$ 280.200	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma valida contada unicamente desde el correo electrónico cjalapamls@gmail.com

Firma
Nombre: AMERICA YUDITZA RODRIGUEZ FONSECA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-304200

Firma
Nombre: LUIS HUMBERTO JAUREGUI ESPINEL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17319 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118538436		RODRIGUEZ FONSECA AMERICA YUDITZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA VERGANZO CUIDADELA FORESTA	TOCANCIPA-CUNDINAMARCA	3168342	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	282874957	9503808014	I	2026/05/12	2026/05/05	NU	0	$1,136,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$3,985,660**	**$637,800**			**$3,985,660**	**$498,300**			$0	$0			$0		$0		$0	$0	$0		**$1,136,100**
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					**$3,985,660**	**$637,800**			**$3,985,660**	**$498,300**			$0	$0			$0		$0		$0	$0	$0		**$1,136,100**
Ciudad: TOCANCIPA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																					**$3,985,660**	**$637,800**			**$3,985,660**	**$498,300**			$0	$0			$0		$0		$0	$0	$0		**$1,136,100**
1	CC	1118538436	RODRIGUEZ AMERICA																	23030 1	30	$3,985,660	$637,800	EPS005	30	$3,985,660	$498,300		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$1,136,100
Total	**Afiliados(1)**																					$3,985,660	$637,800			$3,985,660	$498,300			$0	$0			$0		$0		$0	$0	$0		$1,136,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$637,800	$0	$0	$637,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$637,800	$0	$0	$637,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$498,300	$0	$0	$498,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$498,300	$0	$0	$498,300
TOTAL				**1**	**$1,136,100**	**$0**	**$0**	**$1,136,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143142556		JHONATAN JOSE CERVANTES SUAREZ	INDEPENDIENTE	Principal	calle 117 42 - 63 apto 1501	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3868933	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	304630844	9504656140	I	2026/05/14	2026/05/13	NEQUI	0	$499,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		**$499,100**
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		**$499,100**
1	CC	1143142556	CERVANTES JHONATAN																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$499,100
Total	**Afiliados(1)**																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$499,100**	**$0**	**$0**	**$499,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7316134		WALTEROS RAMOS RIGOBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 100 a # 141-10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3123288785	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	323311328	9504993618	I	2026/05/11	2026/05/20	BANCO CAJA SOCIAL	9	$502,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100
1	CC	7316134	WALTEROS RIGOBERTO																	23100 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$499,100
Total	**Afiliados(1)**																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,900	$0	$282,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$1,900	$0	$282,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,500	$0	$220,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$1,500	$0	$220,400
TOTAL				**1**	**$499,100**	**$3,400**	**$0**	**$502,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902011763	0	CONSORCIO GALAPA MLS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GALAPA MLS	puente la concordia	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3175291876	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	308809792	9504717111	Y	2026/05/15	2026/05/15	BANCO CAJA SOCIAL	0	$487,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GALAPA MLS (4 Afiliados)																								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$7,003,620		$487,600		$0	$0		$487,600
Centro de Trabajo: GALAPA MLS (4 Afiliados)																								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$7,003,620		$487,600		$0	$0		$487,600
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)																								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$7,003,620		$487,600		$0	$0		$487,600
1	CC	33068067	CASTILLO PADILLA LIDIS ISABEL																				0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
2	CC	1143142556	CERVANTES SUAREZ JHONATAN JOSE																				0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
3	CC	1118538436	RODRIGUEZ FONSECA AMERICA YUDITZA																				0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
4	CC	7316134	WALTEROS RAMOS RIGOBERTO																				0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
Total			**Afiliados(4)**																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$7,003,620		$487,600		$0	$0		$487,600

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$487,600	$0	$0	$487,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$487,600	$0	$0	$487,600
TOTAL				4	$487,600	$0	$0	$487,600

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No: 2000 DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO GALAPA MLS

MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2026

PROYECTO: MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA - CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2053 DE 2025

INTERVENTOR: HUMBERTO JAUREGUI & CIA S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	859925	C-2401-0600-99-51102D-2401023-02	16	NACION	Principal	$ 1.730.000.000	No aplica
		C-2401-0600-99-51102D-2401023-02	10	NACION	Principal	$ 270.000.000	No aplica
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 2.000.000.000,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial	dic-25	$ -	$ -	$ -	No aplica	$ -	No aplica		$ 2.000.000.000	$ 2.000.000.000				
2	Parcial	ene-26				No aplica		No aplica		$ 2.000.000.000	$ 2.000.000.000				
3	Parcial	feb-26				No aplica		No aplica		$ 2.000.000.000	$ 2.000.000.000				
4	Parcial	mar-26				No aplica		No aplica		$ 2.000.000.000	$ 2.000.000.000				
5	Parcial	abr-26	$ 1.054.795.742	$ 7.649.282	$ 1.062.445.024	No aplica	$ -	No aplica	859.925,00	$ 937.554.976	$ 937.554.976				
TOTALES			**$ 1.054.795.742**	**$ 7.649.282**	**$ 1.062.445.024**										

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
EXPLANACIONES	$ 28.244.311	$ 204.825	**$ 28.449.136**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$ 67.897.659	$ 492.388	**$ 68.390.047**
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	$ 29.850.394	$ 216.472	**$ 30.066.866**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 58.072.746	$ 421.138	**$ 58.493.884**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		$ -	**$ -**
TRANSPORTES	$ 14.688.378	$ 106.519	**$ 14.794.897**
OTROS ITEMS	$ 836.042.254	$ 6.062.902	**$ 842.105.156**
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS			**$ -**
VALOR TOTAL	**$ 1.034.795.742**	**$ 7.504.244**	**$ 1.042.299.986**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

AMERICA RODRIGUEZ

Firma
Nombre: AMERICA Y. RODRIGUEZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-304200

Firma
Nombre: LUIS HUMBERTO JAUREGUI ESPINEL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17319 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE OBRA No: 2000 DE 2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO GALAPA MLS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2026 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA - CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2053 DE 2025 **INTERVENTOR:** HUMBERTO JAUREGUI & CIA S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco																																
Lluvias moderadas																							X	X								
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: RIGOBERTO WALTEROS RAMOS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 1208-0973

Firma
Nombre: GABRIEL GRIMALDOS SALAZAR
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 682027-4320 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE OBRA No.: 2000 DE 2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO GALAPA MLS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2026 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA - CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2053 DE 2025 **INTERVENTOR:** HUMBERTO JAUREGUI & CIAS SAS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
G080GAN24	N/A	Granulometría — Tamiz 37,5 mm (1½")	INV E-213	subbase granular	1	100 – 100 %	100	SI	CUMPLE
G080GAN24	N/A	Granulometría — Tamiz 25,0 mm (1")	INV E-213	subbase granular	1	75 – 95 %	89,1	SI	CUMPLE
G080GAN24	N/A	Granulometría — Tamiz 12,5 mm (½")	INV E-213	subbase granular	1	55 – 85 %	70,7	SI	CUMPLE
G080GAN24	N/A	Granulometría — Tamiz 9,5 mm (3/8")	INV E-213	subbase granular	1	45 – 75 %	65	SI	CUMPLE
G080GAN24	N/A	Granulometría — Tamiz 4,75 mm (N° 4)	INV E-213	subbase granular	1	30 – 60 %	50,6	SI	CUMPLE
G080GAN24	N/A	Granulometría — Tamiz 2,00 mm (N° 10)	INV E-213	subbase granular	1	20 – 45 %	37,6	SI	CUMPLE
G080GAN24	N/A	Granulometría — Tamiz 0,425 mm (N° 40)	INV E-213	subbase granular	1	8 – 30 %	15	SI	CUMPLE
G080GAN24	N/A	Granulometría — Tamiz 0,075 mm (N° 200)	INV E-213	subbase granular	1	2 – 15 %	2,6	SI	CUMPLE
DGPB-0409-26-19	N/A	Desgaste en Máquina de Los Ángeles — 500 rev (Clase A)	INV E-218	subbase granular	1	≤ 50 %	21	SI	CUMPLE
DGPB-0409-26-20	N/A	Solidez en Sulfato de Sodio — pérdidas máx.	INV E-220	subbase granular	1	≤ 12 %	9	SI	CUMPLE
DGPB-0409-26-21	N/A	Solidez en Sulfato de Magnesio — pérdidas máx.	INV E-220	subbase granular	1	≤ 18 %	13	SI	CUMPLE
DGPB-0409-26-22	N/A	CBR (Clase A) — mínimo (4 días inmersión, densidad máxima)	INV E-148	subbase granular	1	≥ 40 %	62	SI	CUMPLE
Royal GLDY	5/01/2026	Ensayo Modificado de Compactación (Próctor Mod.)	INV E-142	subbase granular	1	Reportar	1938	SI	CUMPLE
01 - 28344	6/05/2026	Módulo de Rotura a 28 días — NT3 (mínimo)	INV E-414/NTC 2871	Losa No°12 a la No°24 de costado derecho	1	≥ 4,2 Mpa a los 28 dias	2,7	SI	7 DIAS DE EVOLUCION - ROTURA
02 - 28344	13/05/2026	Módulo de Rotura a 28 días — NT3 (mínimo)	INV E-414/NTC 2871	Losa No°12 a la No°24 de costado derecho	1	≥ 4,2 Mpa a los 28 dias	2,9	SI	14 DIAS DE EVOLUCION - ROTURA
03 - 28344	15/05/2026	Módulo de Rotura a 28 días — NT3 (mínimo)	INV E-414/NTC 2871	Losa 12 - 24 costado derecho	1	≥ 4,2 Mpa a los 28 dias	3,2	SI	15 DIAS DE EVOLUCION - ROTURA
03 - 28344	16/05/2026	Módulo de Rotura a 28 días — NT3 (mínimo)	INV E-414/NTC 2871	Losa 25 - 34 costado derecho	1	≥ 4,2 Mpa a los 28 dias	4,2	SI	14 DIAS DE EVOLUCION - ROTURA
03 - 28344	16/05/2026	Módulo de Rotura a 28 días — NT3 (mínimo)	INV E-414/NTC 2871	Losa 25 - 34 costado derecho	1	≥ 4,2 Mpa a los 28 dias	2,6	SI	14 DIAS DE EVOLUCION - ROTURA
04 - 28344	16/05/2026	Módulo de Rotura a 28 días — NT3 (mínimo)	INV E-414/NTC 2871	Losa 35 - 47 costado derecho	1	≥ 4,2 Mpa a los 28 dias	2,9	SI	10 DIAS DE EVOLUCION - ROTURA
01 - 28344	15/05/2026	Módulo de Rotura a 28 días — NT3 (mínimo)	INV E-414/NTC 2871	Losa 48 - 51 costado derecho	1	≥ 4,2 Mpa a los 28 dias	3,2	SI	7 DIAS DE EVOLUCION - ROTURA

02 - 28344	6/05/2026	Resistencia a Compresión a 28 días — mínimo	INV E-410/NTC 673	Losa no° 12 a la no°24 de costado derecho	1	≥ 4,3 Mpa a los 28 dias	27	SI	7 DIAS DE EVOLUCION - ROTURA
03 - 28344	13/05/2026	Resistencia a Compresión a 28 días — mínimo	INV E-410/NTC 673	Losa no° 12 a la no°24 de costado derecho	1	≥ 4,3 Mpa a los 28 dias	29,5	SI	14 DIAS DE EVOLUCION - ROTURA
03 - 28344	16/05/2026	Resistencia a Compresión a 28 días — mínimo	INV E-410/NTC 673	Losa 25 - 34 costado derecho	1	≥ 4,3 Mpa a los 28 dias	35	SI	14 DIAS DE EVOLUCION - ROTURA
03 - 28344	16/05/2026	Resistencia a Compresión a 28 días — mínimo	INV E-410/NTC 673	Losa 25 - 34 costado derecho	1	≥ 4,3 Mpa a los 28 dias	37	SI	14 DIAS DE EVOLUCION - ROTURA
03 - 28344	15/05/2026	Resistencia a Compresión a 28 días — mínimo	INV E-410/NTC 673	Losa 48 - 52 costado derecho	1	≥ 4,3 Mpa a los 28 dias	20,8	SI	7 DIAS DE EVOLUCION - ROTURA
03 - 28344	20/05/2026	Resistencia a Compresión a 28 días — mínimo	INV E-410/NTC 673	Losa 35 - 47 Costado derecho	1	≥ 4,3 Mpa a los 28 dias	25,2	SI	14 DIAS DE EVOLUCION - ROTURA

B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma válida enviada unicamente desde correo electrónico cgalapamls@gmail.com

Firma válida enviada unicamente desde correo electrónico cgalapamls@gmail.com

Firma

Nombre: AMERICA YUDITZA RODRIGUEZ FONSECA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-304200

Firma

Nombre: LUIS HUMBERTO JAUREGUI ESPINEL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17319 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS — 320 - 22 Subbase Granular							
N°	ENSAYO / PARÁMETRO	NORMA DE ENSAYO INVÍAS	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	RESULTADO OBTENIDO	UNIDAD	FRECUENCIA	ESTADO
1b.	COMPOSICIÓN — GRANULOMETRÍA (INV E-213)	SBG-38 (TMN 37,5 mm)					
1	Granulometría — Tamiz 37,5 mm (1½")	INV E-213	100 – 100 %	100	%	1 por Mes	✓ CUMPLE
2	Granulometría — Tamiz 25,0 mm (1")	INV E-213	75 – 95 %	89.1	%	1 por Mes	✓ CUMPLE
3	Granulometría — Tamiz 12,5 mm (½")	INV E-213	55 – 85 %	70.7	%	1 por Mes	✓ CUMPLE
4	Granulometría — Tamiz 9,5 mm (3/8")	INV E-213	45 – 75 %	65	%	1 por Mes	✓ CUMPLE
5	Granulometría — Tamiz 4,75 mm (N° 4)	INV E-213	30 – 60 %	50.6	%	1 por Mes	✓ CUMPLE
6	Granulometría — Tamiz 2,00 mm (N° 10)	INV E-213	20 – 45 %	37.6	%	1 por Mes	✓ CUMPLE
7	Granulometría — Tamiz 0,425 mm (N° 40)	INV E-213	8 – 30 %	15	%	1 por Mes	✓ CUMPLE
8	Granulometría — Tamiz 0,075 mm (N° 200)	INV E-213	2 – 15 %	2.6	%	1 por Mes	✓ CUMPLE
2	DUREZA (Agregado Grueso)						
1	Desgaste en Máquina de Los Ángeles — 500 rev (Clase A)	INV E-218	≤ 50 %	21	%	1/mes	✓ CUMPLE
3	DURABILIDAD						
1	Solidez en Sulfato de Sodio — pérdidas máx.	INV E-220	≤ 12 %	9	%	1/mes	✓ CUMPLE
2	Solidez en Sulfato de Magnesio — pérdidas máx.	INV E-220	≤ 18 %	13	%	1/mes	✓ CUMPLE
4	RESISTENCIA / CAPACIDAD DE SOPORTE						
1	CBR (Clase A) — mínimo (4 días inmersión, densidad máxima)	INV E-148	≥ 40 %	62.00	%	1/Mes	✓ CUMPLE

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO — ARTÍCULO 500 INVÍAS 2022										
N°	ENSAYO / PARÁMETRO	NORMA DE ENSAYO INVÍAS	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	RESULTADO OBTENIDO	UNIDAD	FECHA DE TOMA	DIAS DE EVOLUCION	FRECUENCIA	LOCALIZACION	ESTADO
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (MÓDULO DE ROTURA)										
1	Módulo de Rotura a 28 días — NT3 (mínimo)	INV E-414/NTC 2871	≥ 4,2 MPa	**2.7**	MPa	29/04/2026	7	Promedio 5 consecutivos ≥ f'r	Losa No°12 a la No°24 de costado derecho	ESPERADO EDAD
1	Módulo de Rotura a 28 días — NT3 (mínimo)	INV E-414/NTC 2871	≥ 4,2 MPa	**2.9**	MPa	29/04/2026	14	Promedio 5 consecutivos ≥ f'r	Losa No°12 a la No°24 de costado derecho	ESPERADO EDAD
1	Módulo de Rotura a 28 días — NT3 (mínimo)	INV E-414/NTC 2871	≥ 4,2 MPa	**3.2**	MPa	30/04/2026	15	Promedio 5 consecutivos ≥ f'r	Losa 12 - 24 costado derecho	ESPERADO EDAD
1	Módulo de Rotura a 28 días — NT3 (mínimo)	INV E-414/NTC 2871	≥ 4,2 MPa	**4.2**	MPa	2/05/2026	14	Promedio 5 consecutivos ≥ f'r	Losa 25 - 34 costado derecho	✓ CUMPLE
1	Módulo de Rotura a 28 días — NT3 (mínimo)	INV E-414/NTC 2871	≥ 4,2 MPa	**2.6**	MPa	2/05/2026	14	Promedio 5 consecutivos ≥ f'r	Losa 25 - 34 costado derecho	ESPERADO EDAD
1	Módulo de Rotura a 28 días — NT3 (mínimo)	INV E-414/NTC 2871	≥ 4,2 MPa	**2.9**	MPa	6/05/2026	10	Promedio 5 consecutivos ≥ f'r	Losa 35 - 47 costado derecho	ESPERADO EDAD
1	Módulo de Rotura a 28 días — NT3 (mínimo)	INV E-414/NTC 2871	≥ 4,2 MPa	**3.2**	MPa	8/05/2026	7	Promedio 5 consecutivos ≥ f'r	Losa 48 - 51 costado derecho	ESPERADO EDAD
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN										
	ENSAYO / PARÁMETRO									
1	Resistencia a Compresión a 28 días — mínimo	INV E-410/NTC 673	≥ 4.3 MPa	**27**	MPa	29/04/2026	7.00	Promedio 3 consecutivos ≥ f'c	Losa no° 12 a la no°24 de costado derecho	✓ CUMPLE
1	Resistencia a Compresión a 28 días — mínimo	INV E-410/NTC 673	≥ 4.3 MPa	**29.5**	MPa	29/04/2026	14.00	Promedio 3 consecutivos ≥ f'c	Losa no° 12 a la no°24 de costado derecho	✓ CUMPLE
1	Resistencia a Compresión a 28 días — mínimo	INV E-410/NTC 673	≥ 4.3 MPa	**35**	MPa	2/05/2026	14.00	Promedio 3 consecutivos ≥ f'c	Losa 25 - 34 costado derecho	✓ CUMPLE
1	Resistencia a Compresión a 28 días — mínimo	INV E-410/NTC 673	≥ 4.3 MPa	**37**	MPa	2/05/2026	14.00	Promedio 3 consecutivos ≥ f'c	Losa 25 - 34 costado derecho	✓ CUMPLE
1	Resistencia a Compresión a 28 días — mínimo	INV E-410/NTC 673	≥ 4.3 MPa	**20.8**	MPa	8/05/2026	7.00	Promedio 3 consecutivos ≥ f'c	Losa 48 - 52 costado derecho	✓ CUMPLE
1	Resistencia a Compresión a 28 días — mínimo	INV E-410/NTC 673	≥ 4.3 MPa	**25.2**	MPa	6/05/2026	14.00	Promedio 3 consecutivos ≥ f'c	Losa 35 - 47 Costado derecho	✓ CUMPLE

ENSAYOS A LA SUB BASE

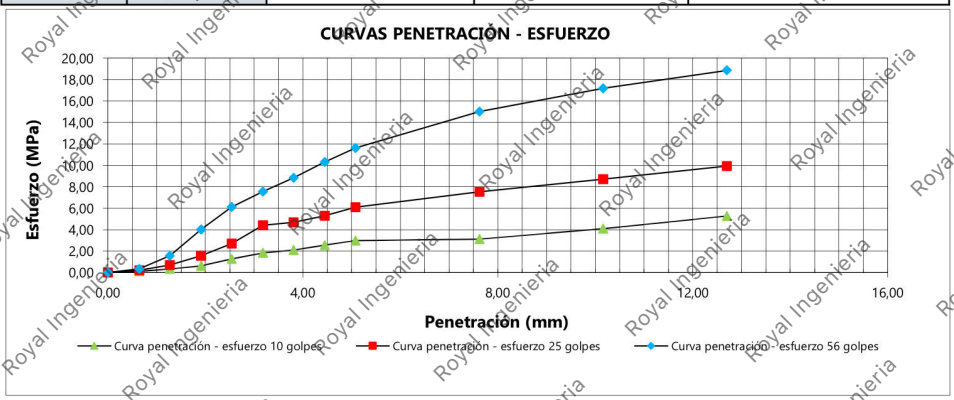
INFORME DE ENSAYO

CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA INALTERADA.

INV E 148:2013

NÚMERO DE INFORME: DGPB -0409-26-11
PÁGINAS: 2 DE 3

Tiempo de inmersión (horas)		96		**Material retenido Tamiz 3/4" (%)**		21	
Condición de ensayo de la probeta		Con inmersión previa		**Sobrecarga de saturación y penetración (kg)**		4,45	
Sobrecargas utilizadas:		5		**Material sustituido para realizar el ensayo (%)**		21	
Muestra N°		1		2		3	
N° de golpes		56		25		10	
Expansión %		0,88		0,96		1,13	
Penetración mm		**Carga kN**	**Esfuerzo MPa**	**Carga kN**	**Esfuerzo MPa**	**Carga kN**	**Esfuerzo MPa**
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,64		0,65	0,33	0,44	0,23	0,20	0,10
1,27		3,04	1,57	1,36	0,70	0,65	0,34
1,91		7,77	4,02	3,03	1,56	1,21	0,63
2,54		11,81	6,10	5,20	2,69	2,47	1,28
3,18		14,58	7,54	8,50	4,39	3,53	1,82
3,81		17,09	8,83	9,07	4,69	4,07	2,10
4,45		19,94	10,31	10,26	5,30	4,94	2,55
5,08		22,49	11,62	11,80	6,10	5,77	2,98
7,62		29,02	15,00	14,58	7,53	6,01	3,11
10,16		33,23	17,17	16,85	8,71	7,94	4,10
12,70		36,48	18,85	19,22	9,93	10,20	5,27
Hum. Penetración %		8,9		10,6		11,9	
CBR corregido (%)	**2,54 (mm)**	101		62		26	
	5,08 (mm)	118		62		29	



INFORME DE ENSAYO

CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA INALTERADA.

INV E 148:2013

NÚMERO DE INFORME: DGPB -0409-26-11

PÁGINAS: 3 DE 3

Determinación de la masa unitaria				
N° de golpes		**56**	**25**	**10**
M_{mws} masa húmeda+ Molde.	g	12542	12198	11540
M_m masa del molde.	g	7880	7749	7325
Masa material húmedo.	g	4662	4449	4215
V_m Volumen del molde.	cm^3	2107	2117	2117
M_{sac} Masa material seco.	g	4457	4253	4030
ρ_d Densidad seca.	kN/m^3	20,74	19,70	18,66

Humedad de compactación				
W_{ac} Contenido de agua	%	4,6	4,6	4,6

Densidad vs. CBR				
ρd Densidad seca.	kg/m^3	2115	2009	1903
CBR corregido a 2,54 mm		101	62	26
CBR corregido a 5,08 mm		118	62	29

* Profundidad de muestreo	NO SUMINISTRADO


Clasificación "Los métodos INV E 180:2013 y INV E 181:2013 No cuentan con alcance de acreditación ONAC"	
INV-E-123:2013	N/A
INV-E-125:2013	DGPB 0409-26-2
INV-E-126:2013	DGPB 0409-26-2
INV-E-180:2013 (AASHTO)	N/A
INV-E-181:2013 (SUCS)	N/A


Método usado para preparación y compactación
INV E 142:2013 Método C

Valores de CBR por interpolación

Nota: Interpolación realizada teniendo en cuenta el valor de densidad seca máxima según INV E 142:2013

Compactación %	Densidad seca kg/m^3	CBR Corregido a 5,08 (mm)
100	2115	115
98	2073	97
95	2009	70

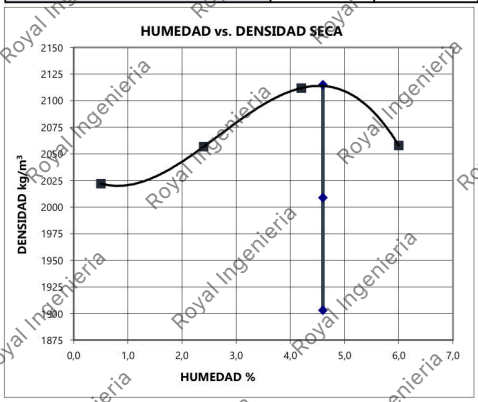

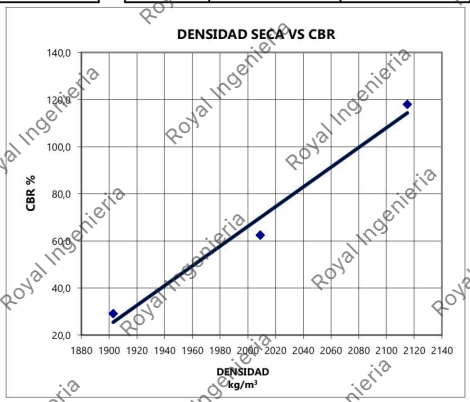

Nota: * La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO

RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37,5 mm (1½") POR MEDIO DE LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES.
INV E 218:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-0061-25-1
PÁGINAS: 2 DE 2

Tamaño máximo nominal.		1 1/2"	
Gradación empleada.		A	
Nº de esferas.		12	
Estado de la muestra.		**SECA**	**HUMEDA**
Masa muestra antes del ensayo.	g	5007	
Masa muestra seca y después de lavado tamiz N° 12 después del ensayo a 100 Revoluciones.	g		
Masa muestra seca y después de lavado tamiz Nº 12 después del ensayo a 500 Revoluciones.	g	3968	
Porcentaje de desgaste a 100 Revoluciones.	%		
Porcentaje desgaste a 500 Revoluciones.	%	**21**	
Relación húmedo / Seco, 500 Revoluciones.			

GRADACIÓN UTILIZADA (masa fracciones)					
Pasa	Retiene	A	B	C	D
1 1/2"	1"	1250 ± 25			
1"	3/4"	1250 ± 25			
3/4"	1/2"	1250 ± 10	2500 ± 10		
1/2"	3/8"	1250 ± 10	2500 ± 10		
3/8"	1/4"			2500 ± 10	
1/4"	No. 4			2500 ± 10	
3/8"	No. 8				5000 ± 10

OBSERVACIONES:

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

INFORME DE ENSAYO
SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO. INV E 220:2013

NÚMERO DE INFORME: DGPB-0077-25-14
PÁGINAS: 2 DE 2

EXÁMEN CUANTITATIVO

Los valores de % retenido para las fracciones fina y gruesa, son tomados de los resultados de ensayo previamente ejecutados bajo la INV E 123:2013 ó INV E 213:2013, según corresponda.

FRACCION FINA

Tipo de solución	Sulfato de Sodio	Preparación de la solución	Reciente	Preparación de partículas mayores a 2 ½"	Trituración

Tamiz alterno		Retenido C/tamaño	Retenido C/fracción	Tamiz empleado para determinar la pérdida	Masa fracción antes del ensayo	Masa retenida tamiz designado	Pasa Tamiz designado	Porcentaje de perdida
Pasa	Retenido	%	%		(g)	(g)	%	%
3/8"	No. 4	50.5	50.5	4,75 mm / No. 4	100	84.1	15.9	8.0
No. 4	No. 8	39.5	39.5	2,36 mm / No. 8	100	84.3	15.7	6.0
No. 8	No. 16	8.2	8.2	1,18 mm / No. 16	100	82.4	17.6	1.0
No. 16	No. 30	0.9	0.9	600 mm / No. 30				
No. 30	No. 50	0.9	0.9	300 mm / No.50				
TOTALES		100						**15.0**

FRACCION GRUESA

Tamiz alterno		Retenido C/tamaño	Retenido C/fracción	Tamiz empleado para determinar la pérdida	Masa fracción antes del ensayo		Masa retenida tamiz designado	Pasa Tamiz designado	Porcentaje de perdida
Pasa	Retenido	%	%		(g)		(g)	%	%
4"	3 ½"			75 mm (3")					
3 ½"	3"			63 mm (2 ½")					
3"	2 ½"			50 mm (2")					
2 ½"	2"			31,5 mm (1 1/4")					
2"	1 ½"								
1 ½"	1"	8.8	20.9	16 mm (5/8")	1000	1500.0	1426.0	4.9	1.0
1"	3/4"	12.1			500				
3/4"	1/2"	25.2	40.1	8,0 mm (5/16")	500	1003.0	917.4	8.5	3.0
1/2"	3/8"	14.9			503				
3/8"	No. 4	39.0	39.0	4,0 mm (No. 5)	302		260.7	13.5	5.0
TOTALES		100							**9.0**

EXAMEN CUALITATIVO

Tamiz alterno		No. inicial partículas	Partículas con Cambios Físicos							
Pasa	Retenido		Rotura	%	Desintegración	%	Agrietamiento	%	Exfoliación	%
4"	3 ½"									
3 ½"	3"									
3"	2 ½"									
2 ½"	1 ½"									
1 ½"	3/4	131.0			**37.0**	**28.2**				

OBSERVACIONES:

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

INFORME DE ENSAYO

SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO. INV E 220:2013

NÚMERO DE INFORME: DGPB-0077-25-15
PÁGINAS: 2 DE 2

EXAMEN CUANTITATIVO

Los valores de % retenido para las fracciones fina y gruesa, son tomados de los resultados de ensayo previamente ejecutados bajo la INV E 123:2013 ó INV E 213:2013, según corresponda.

FRACCION FINA

Tipo de solución	Sulfato de Magnesio	Preparación de la solución	Reciente	Preparación de partículas mayores a 2 ½"	Trituración

Tamiz alterno		Retenido C/tamaño %	Retenido C/fracción %	Tamiz empleado para determinar la pérdida	Masa fracción antes del ensayo (g)	Masa retenida tamiz designado (g)	Pasa Tamiz designado %	Porcentaje de perdida %
Pasa	Retenido							
3/8"	No. 4	50.5	50.5	4,75 mm / No. 4	100	79	21	10.0
No. 4	No. 8	39.5	39.5	2,36 mm / No. 8	100	80	20	8.0
No. 8	No. 16	8.2	8.2	1,18 mm / No. 16	100	80	20	2.0
No. 16	No. 30	0.9	0.9	600 mm / No. 30				
No. 30	No. 50	0.9	0.9	300 mm / No.50				
TOTALES		100						**20.0**

FRACCION GRUESA

Tamiz alterno		Retenido C/tamaño %	Retenido C/fracción %	Tamiz empleado para determinar la pérdida	Masa fracción antes del ensayo (g)		Masa retenida tamiz designado (g)	Pasa Tamiz designado %	Porcentaje de perdida %
Pasa	Retenido								
4"	3 ½"			75 mm (3")					
3 ½"	3"			63 mm (2 ½")					
3"	2 ½"			50 mm (2")					
2 ½"	2"			31,5 mm (1 1/4")					
2"	1 ½"								
1 ½"	1"	8.8	20.9	16 mm (5/8")	1000	1500	1388	7.5	2.0
1"	3/4"	12.1			500				
3/4"	1/2"	25.2	40.1	8,0 mm (5/16")	500	1000	881	11.9	5.0
1/2"	3/8"	14.9			500				
3/8"	No. 4	39.0	39.0	4,0 mm (No. 5)	301		254	15.4	6.0
TOTALES		100							**13.0**

EXAMEN CUALITATIVO

Tamiz alterno		No. inicial partículas	Partículas con Cambios Físicos									
Pasa	Retenido		Rotura	%	Desintegración	%	Agrietamiento	%	Exfoliación	%
4"	3 ½"											
3 ½"	3"											
3"	2 ½"											
2 ½"	1 ½"											
1 ½"	3/4	128			**45**	**35**						

OBSERVACIONES:

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

INFORME DE ENSAYO

PRESENCIA DE IMPUREZAS ORGÁNICAS EN ARENAS USADAS PARA LA PREPARACIÓN DE MORTEROS O CONCRETOS.
INV E 212:2013

NÚMERO DE INFORME: DGPB -0409-26-12
PÁGINAS: 2 DE 2

CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA N° 1

TABLA 1. ESCALA DE VIDRIOS DE COLOR NORMALIZADO

COLOR ESTANDAR GARDNER N°	PLACA ORGANICA N°
5	1
8	2
11	3 (ESTANDAR)
14	4
16	5

OBSERVACIONES:


****FIN DEL INFORME DE ENSAYO****

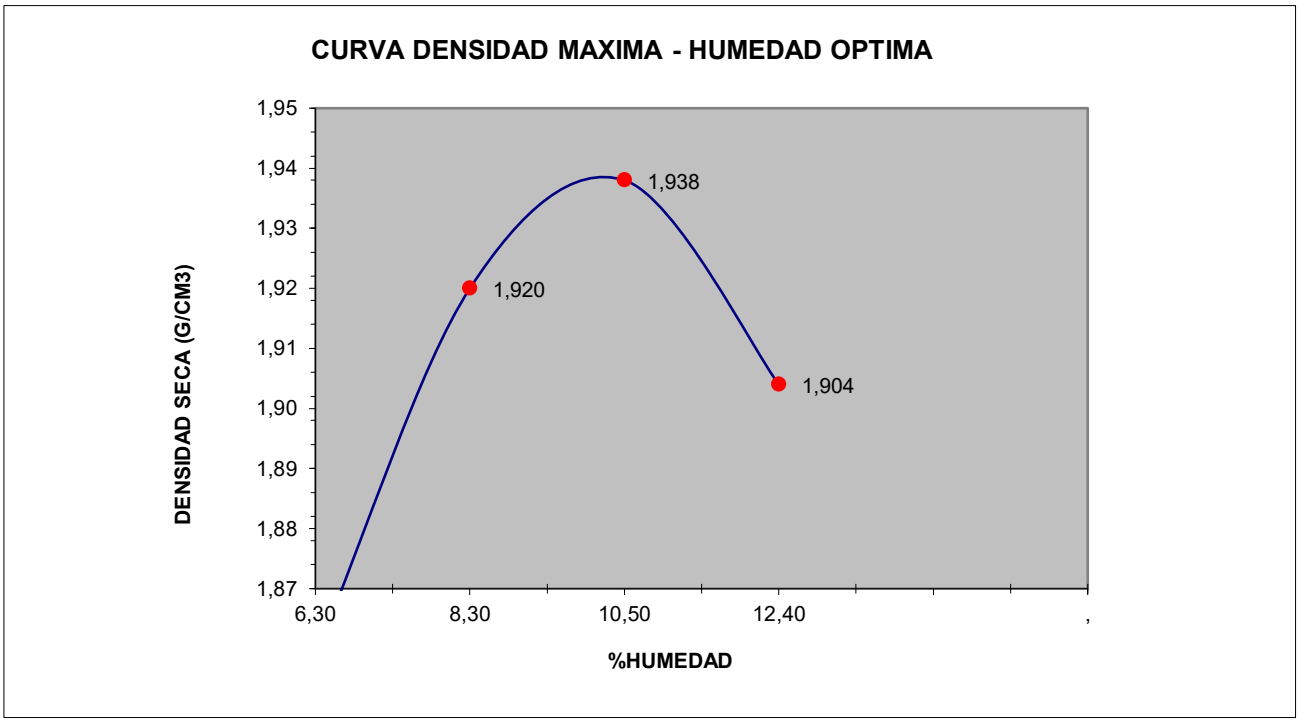ROYAL Ingeniería	ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO	Codigo: FM-001
		Vigencia: 15/11/2025
		Version: 1

Muestra	Subbase Royal	**Fecha**	05/01/2026
Proyecto	-	**Muestra**	1
Ubicación	Barranquilla	**Origen**	Royal GLDY
Cliente	Varios		

NORMA: Especificaciones técnicas INV Articulo 320-2013 / 2022

Ensayo	1	2	3	4	5	6
Calculo Humedad de Compactación						
Peso capsula + muestra humeda (g)	499	531	528	533		
Peso capsula + muestra seca (g)	473	493	482	479		
Peso de la capsula	49	44	49	45		
% Humedad (horno)	6	8	11	12		
No. de capas	5	5	5	5		
No. de golpes	56	56	56	56		
Peso de la muestra húmeda y molde (g)	10.075	10.296	10.423	10.420		
Peso del molde (g)	5.940	5.940	5.940	5.940		
Peso de la muestra húmeda (g)	4.136	4.356	4.484	4.481		
Peso de la muestra seca (g)	3.892	4.021	4.057	3.988		
Volumen del molde (cm3)	2.094	2.094	2.094	2.094		
Densidad de la muestra seca (g/cm3)	1,859	1,920	1,938	1,904		
Densidad Maxima	1,938	g/cm3				
Humedad Optima	10,50	%				



ELABORADO:	HOLLMAN PERTUZ	**REVISADO:**	

INCOSUELOS Ingenieros Civiles SAS
ESTUDIO CONSULTORIA INTERVENTORIA CONSTRUCCION


ANALISIS GRANULOMETRICO Y LÍMITES DE CONSISTENCIA

INV E - 123 / 125 / 126 - 13

PROYECTO: CARACTERIZACIÓN DE MATERIAL
LOCALIZACIÓN: BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
EMPRESA: ROYAL INGENIERÍA
MUESTRA: R290, SUBBASE **REF INTERNA:** 123-24
DESCRIPCIÓN: GRAVA MAL GRADADA CON ARENA, DE COLOR AMARRILLO
EJECUTO: W.H. **CALCULO:** R.C. **INFORME No.** G080GAL24

TAMIZ No.	TAMIZ (mm)	PESO RETENIDO	% RETENIDO	% RETENIDO TOTAL	% PASA
2"	50	0.0	0.0	0.0	100.0
1 1/2"	37.5	0.0	0.0	0.0	100.0
1"	25	184.0	10.9	10.9	89.1
1/2"	12.5	309.9	18.4	29.3	70.7
3/8"	9.5	95.7	5.7	35.0	65.0
No. 4	4.75	242.4	14.4	49.4	50.6
10	2	220.8	13.1	62.5	37.5
40	0.425	379.1	22.5	85.0	15.0
200	0.075	207.3	12.3	97.4	2.6
FONDO		44.5			
TOTAL		1,683			

Humedad natural (%)	6.90
Límite Líquido (%)	NL
Límite Plástico (%)	NP
Indice de Plasticidad	NP
% de finos	2.6
% de arena	47.9
% de grava	49.4
Clasificacion USC	GP
Clasificacion AASHTO	A-1-a
% pasa T200 / % pasa T40 < 2/3	1/6
Límite Líquido < 25 %	NL
Indice de Plasticidad < 6 %	NP

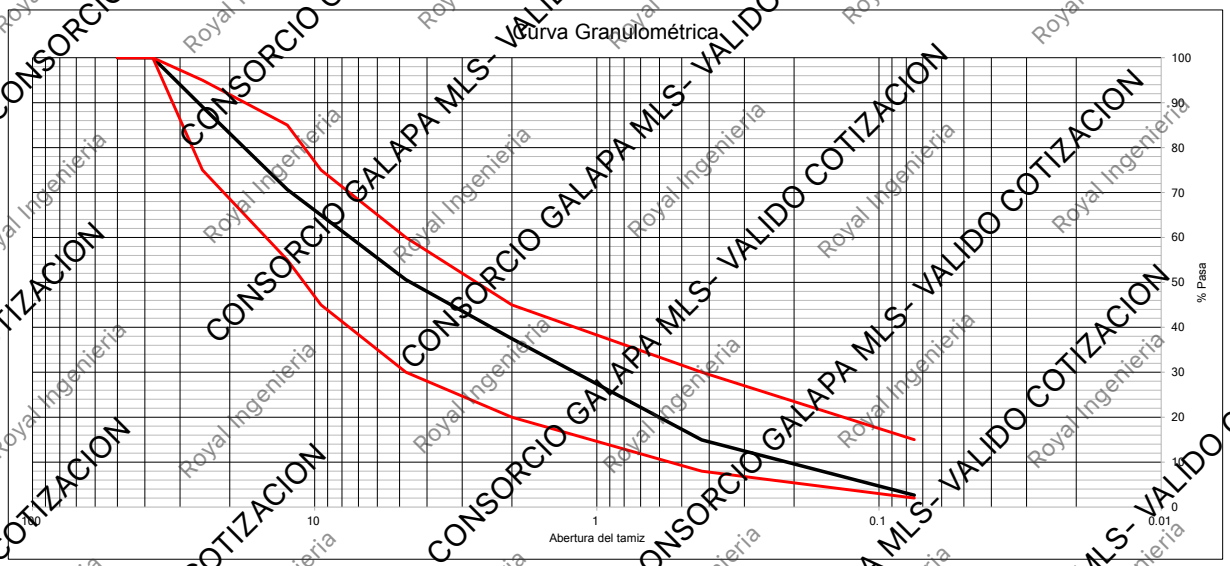

Franja granulométrica según especificación
Curva granulométrica material ensayado

OBSERVACIONES:
Muestra suministrada por el cliente.
Franja granulometrica SBG-38, del artículo 320-22 de INVIAS

REVISO:

RICHARD CANTILLO SUÁREZ

ENSAYOS AL CONCRETO

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Barranquilla 07 de Mayo de 2026

Estimado (a)
ING. RIGOBERTO WALTEROS R.

CONSORCIO GALAPA MLS
OBRA: PUENTE LA CORDIALIDAD - GALAPA

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP1-10192226-BAQ_CON-1 con referencia: 01 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

– Ensayo de Compresión

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Concrelab



Diana Alba
JEFE SUCURSAL CARIBE
concrelab.caribe@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-10192226-BAQ_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO GALAPA MLS
***OBRA:** PUENTE LA CORDIALIDAD - GALAPA
***DIRIGIDO A:** ING. RIGOBERTO WALTEROS R.
***DIRECCIÓN:** PUENTE LA CORDIALIDAD- GALAPA CON CIRCUNVALAR BARRANQUILLA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-05-07
REFERENCIA: 01 - 28344
DIGITÓ: DANIEL HOYOS
LABORATORISTA: HERNÁNDEZ HANSEL

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diam. Prom. (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
563542	1	No especificado	Grouting	Losa no° 12 a la no°24 de costado derecho	2026-04-29	2026-04-30	2026-05-06	7	152	18.146	4,3	489,6	275,3	27,0	627,9	4-Transversal	Sin información

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

Diana Alba
Jefe sucursal Caribe

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Barranquilla 14 de Mayo de 2026

Estimado (a)
ING. RIGOBERTO WALTEROS R.

CONSORCIO GALAPA MLS
OBRA: PUENTE LA CORDIALIDAD - GALAPA

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP1-10480426-BAQ_CON-1 con referencia: 02 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

– Ensayo de Compresión

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Concrelab



Diana Alba
JEFE SUCURSAL CARIBE
concrelab.caribe@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-10480426-BAQ_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO GALAPA MLS
***OBRA:** PUENTE LA CORDIALIDAD - GALAPA
***DIRIGIDO A:** ING. RIGOBERTO WALTEROS R.
***DIRECCIÓN:** PUENTE LA CORDIALIDAD- GALAPA CON CIRCUNVALAR BARRANQUILLA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-05-14
REFERENCIA: 02 - 28344
DIGITÓ: DANIEL HOYOS
LABORATORISTA: HERNÁNDEZ HANSEL

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diam. Prom. (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
563542	2	No especificado	Grouting	Losa no° 12 a la no°24 de costado derecho	2026-04-29	2026-04-30	2026-05-13	14	152	18.146	4,3	535,8	300,8	29,5	686,0	5-Fractura extremos	Sin información

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

Diana Alba
Jefe sucursal Caribe

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Barranquilla 22 de Mayo de 2026

Estimado (a)
ING. RIGOBERTO WALTEROS R.

CONSORCIO GALAPA MLS
OBRA: PUENTE LA CORDIALIDAD - GALAPA

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP1-10776626-BAQ_CON-1 con referencia: 03 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

– Ensayo de Compresión

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Concrelab

Diana Alba
JEFE SUCURSAL CARIBE
concrelab.caribe@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-10776626-BAQ_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO GALAPA MLS
***OBRA:** PUENTE LA CORDIALIDAD - GALAPA
***DIRIGIDO A:** ING. RIGOBERTO WALTEROS R.
***DIRECCIÓN:** PUENTE LA CORDIALIDAD- GALAPA CON CIRCUNVALAR BARRANQUILLA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-05-22
REFERENCIA: 03 - 28344
DIGITÓ: DANIEL HOYOS
LABORATORISTA: LONDOÑO FRANCISCO

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. Prom. (mm)	Área (mm^2)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm^2)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
563544	7	No especificado	Concreto	Losa 25 - 34 costado derecho	2026-05-02	2026-05-14	2026-05-16	14	152	18.146	4,3	634,5	356,9	35,0	814,0	5-Fractura extremos	Sin información
563544	8	No especificado	Concreto	Losa 25 - 34 costado derecho	2026-05-02	2026-05-14	2026-05-16	14	152	18.146	4,3	671,2	377,3	37,0	860,5	3-Columnar	Sin información
563544	12	No especificado	Concreto	Losa 48 - 52 costado derecho	2026-05-08	2026-05-14	2026-05-15	7	152	18.146	4,3	378,0	212,1	20,8	483,7	5-Fractura extremos	Sin información

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

Diana Alba
Jefe sucursal Caribe

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Barranquilla 22 de Mayo de 2026

Estimado (a)
ING. RIGOBERTO WALTEROS R.

CONSORCIO GALAPA MLS
OBRA: PUENTE LA CORDIALIDAD - GALAPA

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP1-10780726-BAQ_CON-1 con referencia: 04 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

– Ensayo de Compresión

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Concrelab



Diana Alba
JEFE SUCURSAL CARIBE
concrelab.caribe@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-10780726-BAQ_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO GALAPA MLS
***OBRA:** PUENTE LA CORDIALIDAD - GALAPA
***DIRIGIDO A:** ING. RIGOBERTO WALTEROS R.
***DIRECCIÓN:** PUENTE LA CORDIALIDAD- GALAPA CON CIRCUNVALAR BARRANQUILLA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-05-22
REFERENCIA: 04 - 28344
DIGITÓ: DANIEL HOYOS
LABORATORISTA: LONDOÑO FRANCISCO

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. Prom. (mm)	Área (mm^2)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm^2)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
563544	9	No especificado	Concreto	Losa 35 - 47 Costado derecho	2026-05-06	2026-05-14	2026-05-20	14	152	18.146	4,3	456,9	257,0	25,2	586,0	2-Cónica y dividida	Sin información

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

Diana Alba
Jefe sucursal Caribe

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Barranquilla 07 de Mayo de 2026

Estimado (a)
ING. RIGOBERTO WALTEROS R.

CONSORCIO GALAPA MLS
OBRA: PUENTE LA CORDIALIDAD - GALAPA

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP3-246826-BAQ_CON-1 con referencia: 01 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

– Ensayo de Flexión

Estos ensayos fueron realizados a las muestras enviadas a nuestro laboratorio, se describen a continuación:

• Vigueta de Concreto

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Concrelab

Diana Alba
JEFE SUCURSAL CARIBE
concrelab.caribe@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
ENSAYO RESISTENCIA DEL CONCRETO A LA FLEXIÓN (UTILIZANDO UNA VIGA SIMPLE CON CARGA EN LOS TERCIOS MEDIOS)
NTC 2871:2018

N° DE INFORME: DCP3-246826-BAQ_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO GALAPA MLS
***OBRA:** PUENTE LA CORDIALIDAD - GALAPA
***DIRIGIDO A:** ING. RIGOBERTO WALTEROS R.
***DIRECCIÓN:** PUENTE LA CORDIALIDAD- GALAPA CON CIRCUNVALAR BARRANQUILLA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-05-07
REFERENCIA: 01 - 28344
DIGITÓ: DANIEL HOYOS
LABORATORISTA: NATERA ALBERT

CONVERSIONES
De kN a kg-fuerza Multiplique por: 101,972
De kg/cm^2 a lbf/in^2 Multiplique por: 14,223
De MPa a kg/cm^2 Multiplique por: 10,197

Orden de Trabajo	* Vigueta N°	* Localización	* Obtención del especimen	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Luz (mm)	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de rotura	* Edad (Días)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (N)	Resistencia (MPa)	% Resistencia	Condición de humedad	Tipo de nivelado	Observaciones
563542	1	Losa No°12 a la No°24 de costado derecho	Fundido	521	152	151	451,00	2026-04-29	2026-04-30	2026-05-06	7	4,30	20.407	2,7	61,63	Húmedo	Cuñas de cuero	Sin información

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

Diana Alba
Jefe sucursal Caribe

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Barranquilla 14 de Mayo de 2026

Estimado (a)
ING. RIGOBERTO WALTEROS R.

CONSORCIO GALAPA MLS
OBRA: PUENTE LA CORDIALIDAD - GALAPA

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP3-252426-BAQ_CON-1 con referencia: 02 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

– Ensayo de Flexión

Estos ensayos fueron realizados a las muestras enviadas a nuestro laboratorio, se describen a continuación:

• Vigueta de Concreto

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Concrelab

Diana Alba
JEFE SUCURSAL CARIBE
concrelab.caribe@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
ENSAYO RESISTENCIA DEL CONCRETO A LA FLEXIÓN (UTILIZANDO UNA VIGA SIMPLE CON CARGA EN LOS TERCIOS MEDIOS)
NTC 2871:2018

N° DE INFORME: DCP3-252426-BAQ_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO GALAPA MLS
***OBRA:** PUENTE LA CORDIALIDAD - GALAPA
***DIRIGIDO A:** ING. RIGOBERTO WALTEROS R.
***DIRECCIÓN:** PUENTE LA CORDIALIDAD- GALAPA CON CIRCUNVALAR BARRANQUILLA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-05-14
REFERENCIA: 02 - 28344
DIGITÓ: DANIEL HOYOS
LABORATORISTA: NATERA ALBERT

CONVERSIONES
De kN a kg-fuerza Multiplique por: 101,972
De kg/cm^2 a lbf/in^2 Multiplique por: 14,223
De MPa a kg/cm^2 Multiplique por: 10,197

Orden de Trabajo	* Vigueta N°	* Localización	* Obtención del especimen	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Luz (mm)	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de rotura	* Edad (Días)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (N)	Resistencia (MPa)	% Resistencia	Condición de humedad	Tipo de nivelado	Observaciones
563542	2	Losa No°12 a la No°24 de costado derecho	Fundida	520	151	150	450,00	2026-04-29	2026-04-30	2026-05-13	14	4,30	21.846	2,9	67,44	Húmedo	Cuñas de cuero	BAJO A 14 DÍAS

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

Diana Alba
Jefe sucursal Caribe

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Barranquilla 22 de Mayo de 2026

Estimado (a)
ING. RIGOBERTO WALTEROS R.

CONSORCIO GALAPA MLS
OBRA: PUENTE LA CORDIALIDAD - GALAPA

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP3-255326-BAQ_CON-1 con referencia: 03 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

– Ensayo de Flexión

Estos ensayos fueron realizados a las muestras enviadas a nuestro laboratorio, se describen a continuación:

• Vigueta de Concreto

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Concrelab

Diana Alba
JEFE SUCURSAL CARIBE
concrelab.caribe@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
ENSAYO RESISTENCIA DEL CONCRETO A LA FLEXIÓN (UTILIZANDO UNA VIGA SIMPLE CON CARGA EN LOS TERCIOS MEDIOS)
NTC 2871:2018

N° DE INFORME: DCP3-255326-BAQ_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO GALAPA MLS
***OBRA:** PUENTE LA CORDIALIDAD - GALAPA
***DIRIGIDO A:** ING. RIGOBERTO WALTEROS R.
***DIRECCIÓN:** PUENTE LA CORDIALIDAD- GALAPA CON CIRCUNVALAR BARRANQUILLA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-05-22
REFERENCIA: 03 - 28344
DIGITÓ: DANIEL HOYOS
LABORATORISTA: NATERA ALBERT

CONVERSIONES
De kN a kg-fuerza Multiplique por: 101,972
De kg/cm^2 a lbf/in^2 Multiplique por: 14,223
De MPa a kg/cm^2 Multiplique por: 10,197

Orden de Trabajo	* Vigueta N°	* Localización	* Obtención del especimen	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Luz (mm)	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de rotura	* Edad (Días)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (N)	Resistencia (MPa)	% Resistencia	Condición de humedad	Tipo de nivelado	Observaciones
563544	5	Losa 12 - 24 costado derecho	Fundido	506	153	152	452,00	2026-04-30	2026-05-14	2026-05-15	15	4,30	25.521	3,2	75,58	Húmedo	Cuñas de cuero	BAJO A 15 DÍAS
563544	7	Losa 25 - 34 costado derecho	Fundido	516	148	149	449,00	2026-05-02	2026-05-14	2026-05-16	14	4,30	30.255	4,2	96,51	Húmedo	Cuñas de cuero	Sin información
563544	8	Losa 25 - 34 costado derecho	Fundido	523	153	154	454,00	2026-05-02	2026-05-14	2026-05-16	14	4,30	20.931	2,6	60,47	Húmedo	Cuñas de cuero	Bajo a 14 días
563544	9	Losa 35 - 47 costado derecho	Fundido	521	149	154	454,00	2026-05-06	2026-05-14	2026-05-16	10	4,30	22.695	2,9	67,44	Húmedo	Cuñas de cuero	Sin información
563544	12	Losa 48 - 51 costado derecho	Fundido	524	162	146	446,00	2026-05-08	2026-05-14	2026-05-15	7	4,30	25.047	3,2	75,58	Húmedo	Cuñas de cuero	Sin información

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:



Diana Alba
Jefe sucursal Caribe

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE OBRA No. 2000 DE 2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO GALAPA MLS

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA - CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

FECHA DE INICIO: 24/12/2025

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 24 DE MAYO DE 2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.000.000.000,00

VALOR ACUMULADO: $ 2.000.000.000,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 65.450.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 65.450.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2053 DE 2025 **INTERVENTOR:** HUMBERTO JAUREGUI & CIAS SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 200.000.000	3	12	2025	30	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 600.000.000	3	12	2025	30	6	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 400.000.000	3	12	2025	31	12	2028
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 19.635.000	31	12	2025	31	12	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 600.000.000	31	12	2025	31	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100421485

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 18/12/2025

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	No aplica	$ 284.700.000	3	12	2025	31	12	2025
Otros	No aplica	No aplica	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100111852 **OTRAS PÓLIZAS No.** No aplica

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 18/12/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 200.000.000	28	2	2026	24	11	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 600.000.000	28	2	2026	24	11	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 400.000.000	28	2	2026	24	5	2029
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 19.635.000	24	5	2026	24	5	2031
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 600.000.000	24	5	2026	24	5	2031

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100421485

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: Sin aprobación en SECOP II

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	No aplica	$ 284.700.000	3	12	2025	24	5	2026
Otros	No aplica	No aplica	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100111852 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)


Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: Sin aprobación en SECOP II

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: LUIS HUMBERTO JAUREGUI ESPINEL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17319 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2026 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE OBRA No. 2000 DE 2025 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA - CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRATISTA: CONSORCIO GALAPA MLS

FECHA DE INICIO: 24/12/2025 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 **FECHA DE VENCIMIENTO:** HASTA EL 24 DE MAYO DE 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2053 DE 2025 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: HUMBERTO JAUREGUI & CIAS SAS

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI x NO ---------- APROBADO: SI -------- N -------- VERSIÓN No. ---------- FECHA DE VERSIÓN: ----------

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ---------- NO No aplica

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ---------- NO No aplica

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: No aplica

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: No aplica

FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: No aplica

FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: No aplica

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI x NO ---------- APROBADO: SI -------- NO ----- FECHA DE APROBACIÓN: ----------

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: **19**

No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: **19**

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI -- x NO --------

OBSERVACIONES:
se presenta anexo con ensayos y analisis de los mismos al presente formato

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: No aplica

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: No aplica

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: No aplica

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: No aplica

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: No aplica

OBSERVACIONES:
En el periodo del informe no se conto con no conformidades.

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: No aplica

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: No aplica

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: No aplica

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: No aplica

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: No aplica

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: No aplica

OBSERVACIONES:
En el periodo del informe no se conto con no conformidades.

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	**Cumplimiento de ensayos de laboratorio**	**(Ensayos realizados / Ensayos requeridos por norma) × 100 = (19 / 19) × 100 = 100%**
IG2: Índice de gestión 2 =	**Conformidad de resultados**	**(Ensayos que cumplen criterio / Total ensayos realizados) × 100 = (19 / 19) × 100 = 100%** **Comentario: El 100% de los resultados obtenidos satisface los criterios de aceptación establecidos en la norma.**
IG3: Índice de gestión 3 =	**Trazabilidad de materiales**	**(Materiales con certificación de fuente aprobada / Total materiales utilizados) × 100 = 100%**
IG4: Índice de gestión 4 =	**No aplica**	
IG5: Índice de gestión 5 =	**No aplica**	
IGn: Índice de gestión n =	**No aplica**	

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

En el periodo del informe no se conto con no conformidades.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

No aplica, en el periodo del informe el laboratorio reporta que no ha requerido calibraciones.

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: AMERICA Y. RODRIGUEZ
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-304200

Firma
Nombre: WENDY CAROLINA GONZALEZ
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-347712 CND

Firma
Nombre: LUIS HUMBERTO JAUREGUI ESPINEL
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17319 CND

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 15/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLANTICO
PROGRAMA DE INVERSIONES
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 3 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 2000 de 2025
OBJETO: MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA - CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
CONTRATISTA: CONSORCIO GALAPA MLS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2053 DE 2025 **INTERVENTOR:** HUMBERTO JAUREGUI & CIA S.A.S

PLAZO INICIAL: Hasta 31 de diciembre de 2025 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/12/2025 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/02/2026 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.000.000,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.000.000,00

PLAZO ACUMULADO: 4,23 MESES. (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/05/2026. (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 23/03/2026. (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 dic-25	2 ene-26	3 feb-26	4 mar-26	5 abr-26	6 may-26	7	8	9	10	
EXPLANACIONES	$18.081.770	1,30%	0,00%	% P	1,30%		1,30%		2,06%	0,12%					
	$32.978.758	2,17%	$0	$ P	$ 18.081.770,00		$ 18.081.770,00		$ 31.187.937,00	$ 1.790.821,00					
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$163.414.500	11,77%	0,00%	% P	11,76%		11,77%		16,94%	1,94%					
	$286.375.886	18,88%	$0	$ P	$ 163.414.500,00		$ 163.414.500,00		$ 256.883.186,00	$ 29.492.700,00					
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	$757.684.680	54,59%	0,00%	% P	54,51%		54,59%		16,51%	40,15%					
	$859.403.747	56,66%	$0	$ P	$ 757.684.680,00		$ 757.684.680,00		$ 250.407.631,00	$ 608.996.116,00					
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$338.174.040	24,37%	0,00%	% P	24,33%		24,37%		2,20%	17,55%					
	$299.579.010	19,75%	$0	$ P	$ 338.174.040,00		$ 338.174.040,00		$ 33.394.378,00	$ 266.184.632,00					
				$ E											
				% E											
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$107.542.135	7,75%	0,00%	% P	7,74%		7,75%			1,42%					
	$21.560.344	1,42%	$0	$ P	$ 107.542.135,00		$ 107.542.135,00			$ 21.560.344,00					
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES	$2.995.150	0,22%	0,00%	% P	0,22%		0,22%		0,50%	0,47%					
	$14.710.542	0,97%	$0	$ P	$ 2.995.150,00		$ 2.995.150,00		$ 7.578.158,00	$ 7.132.384,00					
				$ E											
				% E											
OTROS ITEMS	$0	0,00%	0,00%	% P					0,15%						
	$2.211.458	0,15%	$0	$ P					$ 2.211.458,00						
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.387.892.275,00	100%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 1.516.819.745,00	100%													

SUSPENSIÓN No. 1 27 Feb 2026 a 22 Mar 2026

PRORROGA No.1

PRORROGA No.1

ACTA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 1

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	41,91%	67,38%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.387.892.275	$0	$1.387.892.275	$0	$581.662.748	$935.156.997				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	100,00%	100,00%	200,00%	0,00%	38,35%	100,00%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.387.892.275	$1.387.892.275	$2.775.784.550	$0	$581.662.748	$1.516.819.745				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0				

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYENDO IVA)	$ 150.000.000,00 / $ 150.000.000,00	$ -	%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DÍAS DE LA SEMANA	$ 20.000.000,00 / $ 20.000.000,00	$ -	%
PROVISION PARA AJUSTES	$ 279.862.440,00 / $ 150.000.000,00	$ -	%
TOTAL ETAPA DE REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O INFORMACIÓN TÉCNICA Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 65.450.000,00 / $ 65.450.000,00	$ -	%
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL(Incluye PAGA e IVA)	$ 85.497.593,00 / $ 85.497.593,00	$ -	%
VALOR IVA (19% SOBRE LA UTILIDAD)	$ 11.297.692,00 / $ 12.232.662,00	$ -	%
		$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 612.107.725,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 483.180.255,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 2.000.000.000,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 2.000.000.000,00**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: HUGO MAURICIO TIEATA ALBA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 01108-0966

Aprueba Firma:
Nombre: CARLOS HUMBERTO JAUREGUI MARTINEZ
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: N/A

Revisó Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MESA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202090758 BLV

Revisó Firma:
Nombre: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MESA
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 13202090758 BLV

Revisó Firma:
Nombre: LUIS GABRIEL SALGADO RIVAS
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 25202-130285CND

Oriioinal: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLANTICO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 5 **DE** 01 A 30 DE ABRIL DE 2026 (Indicar mes y año)
VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.054.795.742,00
SEGUIMIENTO No. 3 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2000 de 2025
OBJETO:
MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA - CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
CONTRATISTA: CONSORCIO GALAPA MLS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2053 DE 2025
INTERVENTOR: HUMBERTO JAUREGUI & CIA S.A.S

PLAZO INICIAL: Hasta 31 de diciembre de 2025 (En meses, según contrato original)
PLAZO ACUMULADO: 4,23 MESES (En meses, según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/12/2025 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/05/2026 (Incluidas las suspensiones. indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/02/2026 (Indique la suspensión vige correspondiente al periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 23/03/2026 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 2.000.000,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 2.000.000,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA pesos Miles de	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado / $ Valor Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA pesos Miles de	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26				
EXPLANACIONES	$18.081.770	1,30%	2,36%	% P	1,30%		1,30%		2,06%	0,12%				%
	$32.978.758	2,17%	$32.770.183	$ P	$ 18.081.770,00		$ 18.081.770,00		$ 31.187.937,00	$ 1.790.821,00				
				$ E					- $ 32.770.183,00					
				% E					2,16%					
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$163.414.500	11,77%	20,29%	% P	11,76%		11,77%		15,94%	1,94%				
	$286.375.886	18,88%	$281.667.376	$ P	$ 163.414.500,00		$ 163.414.500,00		$ 256.883.186,00	$ 29.402.700,00				
				$ E					- $ 281.667.376,00					
				% E					18,57%					
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	$757.684.680	54,59%	44,19%	% P	54,51%		54,59%		16,51%	40,15%				
	$859.403.747	56,66%	$613.369.893	$ P	$ 757.684.680,00		$ 757.684.680,00		$ 250.407.631,00	$ 608.996.116,00				
				$ E					- $ 613.369.893,00					
				% E					40,44%					
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$338.174.040	24,37%	6,49%	% P	24,33%		24,37%		2,20%	17,55%				
	$299.579.010	19,75%	$90.088.456	$ P	$ 338.174.040,00		$ 338.174.040,00		$ 33.394.378,00	$ 266.184.632,00				
				$ E					- $ 90.088.456,00					
				% E					5,94%					
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$107.542.135	7,75%	0,00%	% P	7,74%		7,75%		0,00%	1,42%				
	$21.560.344	1,42%	$0	$ P	$ 107.542.135,00		$ 107.542.135,00		$ -	$ 21.560.344,00				%
				$ E					- $ -					
				% E					0,00%					
TRANSPORTES	$2.995.150	0,22%	1,06%	% P	0,22%		0,22%		0,50%	0,47%				
	$14.710.542	0,97%	$14.688.378	$ P	$ 2.995.150,00		$ 2.995.150,00		$ 7.578.458,00	$ 7.132.384,00				
				$ E					- $ 14.688.378,00					
				% E					0,67%					
OTROS ITEMS	$0	0,00%	0,16%	% P					0,15%					
	$2.211.458	0,15%	$2.211.458	$ P					$ 2.211.458,00					
				$ E					- $ 2.211.458,00					
				% E					0,15%					
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 1.387.892.275,00**	**100%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 1.516.819.745,00**	**100%**												

PRORROGA No.1
PRORROGA No.2
ACTA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 1

SUSPENSIÓN No. 1
27 Feb 2026 a 22 Mar 2026

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	38,35%	67,38%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.387.892.275	$0	$1.387.892.275	$0	$581.662.748	$935.156.997			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	38,35%	100,00%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.387.892.275	$1.387.892.275	$1.387.892.275	$0	$581.662.748	$1.516.819.745			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,22%	0,00%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$1.034.795.744	$0			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,22%	74,56%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$1.034.795.744	$1.034.795.744			

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYENDO IVA)	$ 150.000.000,00 / $ 150.000.000,00	$ -	%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ 20.000.000,00 / $ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00	1,00%
PROVISION PARA AJUSTES	$ 279.862.440,00 / $ 150.000.000,00	$ -	%
TOTAL ETAPA DE REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O INFORMACIÓN TÉCNICA Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 65.450.000,00 / $ 65.450.000,00		0,00%
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL(Incluye PAGA e IVA)	$ 85.497.593,00 / $ 85.497.593,00	$ -	%
VALOR IVA (19% SOBRE LA UTILIDAD)	$ 11.297.692,00 / $ 12.232.662,00	$ 7.649.282,00	0,40%
		$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 612.107.725,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 483.180.255,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 2.000.000.000,00**	**$ 27.649.282,00**	**1,40%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 2.000.000.000,00**		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: HUGO MAURICIO TIBATA ALBA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 01108-0966

Aprueba Firma:
Nombre: CARLOS HUMBERTO JAUREGUI MARTINEZ
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: N/A

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 9
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No. 2000-2025
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO GALAPA MLS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA- CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2053-2025
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: HUMBERTO JAUREGUI & CIA S.A.S

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
N/A

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
Presentaciòn
Revisiòn de compromisos
Seguimiento Tècnico
Seguimiento Ambiental
Seguimiento social

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA
PRESENTACION DE ASISTENTES. Se realiza la presentación de cada uno de los asistentes a la reunión virtual, mediante la herramienta Teams, se anuncian: Ing. Humberto Jáuregui, Director de Interventoría; Ing. Gabriel Grimaldos S., Residente de Interventoría; por INVIAS se anuncian: Ing. Luis Gabriel Salgado R., Apoyo de la Gestoría Técnica; Ing. Emanuel A. Arregoces L., Apoyo a la Supervisión INVIAS; Ing. Diana M. Vanegas J., Supervisor INVIAS, e Ing., Liceth Peña; Apoyo profesional social-ambiental, por parte del contratista de obra se anuncian: Ing. Mauricio Tibatá, Representante Legal; Ing. América Rodríguez, Director; Lidis I. Castillo P., Profesional Social; Ing. Julian Cervantes; Residente ambiental; Ing. Rigoberto Walteros, Residente,
REVISION DE COMPROMISOS: Fecha de aviso de instalación de valla. Se confirma la instlacion de la valla el dia 21 de febrero de 2026. **Actividad parcheo en orejas**. En la reunión anterior, se planteo el problema del suministro de la mezcla. Finalmente se resuelve el suministro con la Planta Universal; y se realiza la actividad entre el 6 y el 7 de abril en horarios desde el día hasta tarde de la noche. **Entrega para revision de APU complementarios**. Esta actividad está programada para la entrega el 10 de abril del 26, actividad que ya prácticamente está por parte de Interventoría haciendo el oficio para entregarle a Envías. **Informe ejecutivo de las actividades realizadas hasta el 30 de marzo**. Interventoria informe que de acuerdo a la solicitud de la Supervision, dado que tenía una reunión con los gremios. Esta actividad se entregó el día 30 de marzo. **Enviar correo a Envías sobre la socialización de inicio de obra.** Esta actividad se realizó el mismo día 30 de marzo, informando en las plataformas dee INVIAS , la realizacion de reunion de socializacion el dia 1 de abril de 2026. Entrega o verificación del esquema del alcance de las actividades ejecutadas hasta el momento. Interventoria comparte un documento, donde mediante el planp del proyecto y registro fotografico se informa el avance de las obras realizadas hasta el momento. Gestoria da aprobacion del esquema. Dentro de la informacion esta la realizacion del item Excavaciones varias de la explanacion a partir de la abscisa K0+052 margen derecha, aproximadamente 40 metros lineales, demolicion de cunetas sobre el lado derecho, y la realizacion del cerramiento parcialmente hasta donde se esta trabajando, y acopio de material de rajon y proceder con sun instalacion. Dentro de la informacion se reporta el equipo con que cuenta el contratista en obra, mini cargador, una retrollanta, dos volquetas capacidad 15 m3, y 12 personas trabajando en el sitio. **Reunion de Socializacion de inicio de obra** . Gestoria solicita informacion del desarrollo de la reunion de socializacion realizada el dia 1 de abril

Reunion de Socialización de Inicio de obra. Gestoria solicita información del desenlace de la reunión de socialización realizada el día 1 de abril de 2026. Interventoria informa los pormenores y la asistencia de la comunidad de Barranquilla, personal del departamento de Atlántico, del municipio, del área metropolitana, de movilidad, acciones comunales. la presentacion estuvo a cargo del Ing., residente del contratista informando el alcance del proyecto. La comunidad encamino su atencion al desarrollo de mejoramiento del puente, y las vias de acceso a la entrada del puente, originando por parte de la Supervision todas las respuesta a estas inquietudes. De parte del gremio de taxistas solicitan la generacion de rampas sobre el costado derecho de la via y la inclusion de los comederos de varios perrros y gatos que estan en el sector. El contratista informa sobre la presentacion exclusivamente sobre el alcance del proyecto, la implemtecion de la estructura a realizar junto con el desarrollo del PMT. Gestoria hace referencia al gemio de los taxistas, sobre la solicitud con este proyecto. El contratista responde que se comento en la reunion sobre el tiempo que llevan desarrollando esta actividad en el sector por parte de personas pensionadas cerca de 40 años, y que han estado desarrolando actividades de mantenimiento del tramo vial, para cuando se haga la obra se haga una rampa y tener acceso a la caseta donde hoy día trabajan. Por parte de la Supervision indico a l gremio que habria que realizar consultas, sobre los derechos a estar en ese sitio. El contratista informa que en general la comunidad, sabe que es necesaria la intervención y estan a favor, indicando ademas que a futuro lo que expresan es reformas el puente a varios carriles para evitar los trancones.

SEGUIMIENTO TECNICO: Gestoria solicita se disipen dudas en este comite sobre la longitud de la intervencion y realizar la tarea de falicitarle al director de INVIAS, el valor de la adicion para dar cumplimiento el un 100% la meta fisica. Interventoria informa que de acuerdo a la revision de los analisis unitarios y la memoria de cantidades verificadas con el contratista el presupuesto alcanza para 221 m de intervencion, entre el cruce de la via La cordialidad hasta al frente de la caseta de los taxistas, con la estructura de pavimento rigido aprobada por los especialistas, la cual tiene una estructura de 30 centímetros de material rajón para mejorar el CBR de esa subrazante, 20 centímetros de subbase granular y después vienen 30 centímetros de pavimento Rígido tipo MR43. Adicional a eso, hay que hacer obras de drenaje transversal y obras de drenaje lateral, como son geodrenes, cunetas y alcantarillas. Gestoria indaga sobre la alcantarilla existente. interventoria informa que esa alcantarilla se va a retirar. Es una alcantarilla de 24 pulgadas y se va a cambiar por una alcantarilla de 36 pulgadas. Esto atendiendo la normatividad vigente que nos indica que hay que colocar la mínimo diámetro de 36" para facilitar el proceso de limpieza. Interviene la Ing. Maria Clara Mejía, Planta Central INVIAS, hace referencia al alcance de la intervencion los cuales consumirían todos los dos mil millones del contrato, indicando que la unica manera de terminar el contrato seria adicionarle al contrato, que serían algo así como mil millones aproximadamente, preguntando si con eso se terminaria?.
Interventoria expone que se debe evaluar que alternativa continuar continuar esos últimos metros que nos faltan, que son mas o menor 250 m. El contratista indica que se debera continuar con la misma estructura, ya que esto obedece al estudio de todo el tramo, se tendria que analizar si podríamos intervenir ese tramo que queda faltando, que está en unas condiciones menos deterioradas que en los que estamos interviniendo en este momento, mediante parcheos. De parte de Gestoria se solicita dar celeridad a estos procesos, porque en caso tal, todo lo que requeramos de adición, cambios de bolsa, debera ir a comité. donde se deberan entregar soportes y realizar el tramite administrativo dentro de una fechas especificas que toman tiempo.
Reunion con Gremios del 8/04/2026. Supervision hace un resumen de las decisiones tomadas en la reunio con los gremios, donde se generaron compromisos a corto plazo, mediano plazo, y largo plazo. Dentro de los compormisos esta la de la socializaran el PMT que aprobó el distrito de Barranquilla en Galapagos, y abrir el espacio en una mesa para socializarlo con ellos y que las observaciones que ellos iban a dar es respecto a lo que está allí, que se puede mejorar o ajustar en el PMT. El otro tema que ha quedado dentro del compromiso, es el tema de los niños, es que la señora de Villacordialidad, que hablo de la cantidad de niños que pasaban por allí, dandole prioridad a ellos en la medida posible. Actividades realizadas en la semana del 7 de abril al 11 de abril. Se realiza el replanteo entre K0+052 a K0+278, Excavaciones varias de la explanacion, retiro de sobrantes, acopio de material tipo rajon, y cierre de entorno del proyecto.
Aprobacion de polizas. Interventoria mediante el documento HJCIA-SIC-GAL-2053-2025-556 del dia 7 de abril, realiza la revision de la actualizacion de garantias y seguros de las polizas enviadas por el contratista. Mediante correo el contratista subsana las observaciones el dia 7 de abril de 2026.
Entrega de documentacion de equipos y relacion de personal de obra. Atendiendo la recomendacion hecha por la interventoria, se recibe documentacion de equipo y personal que esta en obra.

SEGUIMIENTO AMBIENTAL: Se reporta visita de inspeccion del dia martes 7 de abril, evidenciando que la empresa no cuenta con kit de derrame, baños , puntos ecologicos , los RCD los depositan en la planta de recuperacion Royal Ingenieria, que tiene establecimiento a 1 km de la obra en mencion. Se recuerda los compromisos que tiene pendiente de las comunicaciones ante las autoridades ambientales, barranquilla Verde y toda aquella que se concentre del area, de igual forma todos los documentos de tramitees y permisos ambientales correspondientes. Se solicita la gestion ante Bienestar Animal para el retiro de los perros del area existente, solicitud que fue elevada a la Secretaria de Gobierno.

SEGUIMIENTO SOCIAL: En el marco del seguimiento al componente social, se evidenció el cumplimiento de la actividad correspondiente a la socialización de inicio de obra.

No obstante, se encuentran pendientes las siguientes actividades: Instalación del buzón de sugerencias, Instalación del pendón del Punto de Atención a la Comunidad (SAU), y entrega del acta de socialización de inicio de obra, así como del acta de conformación del Comité de Participación Comunitaria. COPACO

Se requiere al contratista dar cumplimiento a los compromisos pendientes y remitir los respectivos soportes, con el fin de continuar con el proceso de verificación por parte de la interventoría.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**

Presupuesto de alternativas	jueves, 16 de abril de 2026	CONTRATISTA/INTERVENTORIA
Radicado PMT-Secretaria Galapa	jueves, 16 de abril de 2026	CONTRATISTA
Oficio a Bienestar Animal	jueves, 16 de abril de 2026	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 16/04/2026
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Ing., EMANUEL A. ARREGOCES	PROFESIONAL TECNICO	INVIAS	ASISTENCIA VIRTUAL
Ing., LUIS GABRIEL SALGADO RIVAS	GESTORIA TECNICA	INVIAS	ASISTENCIA VIRTUAL
Ing. DIANA M. VANEGAS JARAMILLO	SUPERVISOR	INVIAS	ASISTENCIA VIRTUAL
Ing.,MAURICIO TIBATA	DIRECTOR CONTRATO DE OBR/	CONSORCIO GALAPA MLS	ASISTENCIA VIRTUAL
Ing., AMERICA RODRIGUEZ	RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO GALAPA MLS	ASISTENCIA VIRTUAL
Ing., RIGOBERTO WALTEROS	RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO GALAPA MLS	ASISTENCIA VIRTUAL
PROF. LIDIS CASTILLO	PROFESIONAL SOCIAL	CONSORCIO GALAPA MLS	ASISTENCIA VIRTUAL
Ing., LUIS HUMBERTO JAUREGUI	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	HUMBERTO JAUREGUI	ASISTENCIA VIRTUAL
Ing. GABRIEL GRIMALDOS SALAZAR	RESIDENTTE DE INTERVENTOR	HUMBERTO JAUREGUI	ASISTENCIA VIRTUAL
Ing., MARIA CLARA MEJIA UMAÑA	COORDINADORA ZONA NORTE	INVIAS	ASISTENCIA VIRTUAL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 10
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No. 2000-2025
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO GALAPA MLS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA- CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2053-2025
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: HUMBERTO JAUREGUI & CIA S.A.S

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
N/A

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
Presentaciòn
Revisiòn de compromisos
Seguimiento Tècnico
Seguimiento Ambiental
Seguimiento social

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA
PRESENTACION DE ASISTENTES. Se realiza la presentación de cada uno de los asistentes a la reunión virtual, mediante la herramienta Teams, se anuncian: Ing. Humberto Jáuregui, Director de Interventoría; Ing. Gabriel Grimaldos S., Residente de Interventoría; por INVIAS se anuncian: Ing. Luis Gabriel Salgado R., Apoyo de la Gestoría Técnica; Ing. Emanuel A. Arregoces L., Apoyo a la Supervisión INVIAS; Ing. Rafael G. Rodriguez., Supervisor INVIAS, por parte del contratista de obra se anuncian: Ing. Mauricio Tibatá, Representante Legal; Ing. América Rodríguez, Director; Lidis I. Castillo P., Profesional Social; Ing. Jonathan Cervantes; Residente ambiental; Ing. Rigoberto Walteros, Residente,
REVISION DE COMPROMISOS: Presupuesto de alternativas . Interventoria informa del alcance de implementacion de la alternativa en concreto rígido. LLegando a 208 m, desde la K0+052 a K0+260. Dentro de esta evaluacion, se informa que el presupuesto no contempla el valor del ítem de provisión para ajustes, obras complementarias y adicionales, que es más o menos $ 150,000,000,00. En el momento de dar aprobacion de invertir en obra esta suma. En algún momento habíamos hablado que ese dinero lo podíamos invertir en el proyecto. alcanzaria para una ejecucion adicional de aproximadamente 32 m, llegando al abscisado K0+292. Interventoria indica que se debe habilitar el proceso modificatorio, el cual estaba pendiente, dado que la territorial no contaba con la Supervision, quedando como compromiso de hacer entrega de la modificacion del contrato por parte del contratista de obra. Interventoria solicita celeridad de parte de la Supervision, dado el avance de obra que tiene SBG hasta la abscisa K0+260, y se requiere dar continuidad a la parte constructiva dentro del plazo restante. De parte de la Gestoria solicita una presentacion para sustentarlo ante el comite, dado que son movimientos de la bolsa, y lograr radicar esta semana y llevar a comite la siguiente semana. Interventoria continua informando que hace parte de este compromiso, documentar hasta dónde nos alcanza la supuesta adición que para este contrato es el 50%, que es más o menos 1000 millones de pesos. Para esta evaluación, se consideraron los siguientes items: Excavación sin clasificar de la explanación, Sub base grangular, señalización, transporte proveniente de la excavación, estabilidad de la subrasante, geotextil de separación, concreto MR 43 y el suministro de instalación de Geodren. LLegando a una distancia de 258 ml, llegando ala abscisa K0+450. Interventoria solicita al INVIAS, la respuesta si esta asegurado este recurso para continuar con la gestion de solicitud del adicional. **Radicar el PMT ante la Secretaría de Tránsito de Galapa**. Esta actividad fue cumplida mediante el documento enviado por el contratista mediante

Radicar el PMT ante la Secretaría de Tránsito de Galapa. Esta actividad fue cumplida mediante el documento enviado por el contratista mediante el oficio 2026 INV-CE 085, radicado el 15/04/2026.

SEGUIMIENTO TECNICO: Tiempo que ha transcurrido ha sido 3.19 meses de un tiempo total de 4.23 meses. Llevamos transcurridos el 75% del tiempo. El avance financiero hasta el día de 22/04/2026: $ 381.294.699 ejecutado acumulado,25.14%, Programación $ 385,692,468.
25 42%. Interventoria solicita aprobacion de los APU complementarios.
Aprobacion de utilizacion de bolsas de ajustes de obras complementarias. Solicitud de adicion. Dentro de la reunion Gestoria informa que no existe aprobacion de adicion. Informando que la a propuesta, no la tuvieron en cuenta. Conclusión, no tenemos adición para ese proyecto
Interventoria solicita acelerar los procesos de aprobacion de APU, y utilizacion de los recursos del item de ajustes a obras complementarias, para que no tener las angustias al final del contrato, tener que realizar las obras que faltan de este presupuesto.
Temporada de Lluvias. La zona ha empezado a presenciar lluvias desde el dia 21 de abril, Eso sí, fue el 21, esta lloviznita de una vez hizo que el cauce del arroyo aumentara y el agua se estaba devolviendo por los descoles de las cunetas. Frente a esto interventoria solicita la intervencion del INVIAS, ante la entidad de la ADI para que empiecen a hacer una limpieza de ese arroyo. En estos momentos, ese arroyo está colmatado.
El contratista realiza presentacion de las actividades realizadas en las últimas 2 semanas. Excavación en la vía, replanteo de la vía. Dentro de la excvacion se levanto primero una capa de relleno que tenía encima la carpeta asfáltica, y posteriormente seguir excavando para encontrar el nivel de subrasante de diseño. Mejoramiento de la sub rasante, instalando de rajon con el sello,demolicion de bordillo, y demolicion de cuneta.
Instalacion de geotextil e instalación de la sub base. Se programa para la siguiente semana la instalacion de concreto MR43.

SEGUIMIENTO AMBIENTAL: El area ambiental repporta las actividades realizadas: Charlas ambientales. limpieza RCDs en las orejas del puente.
Se cuenta con Kit de derrame y el punto ecologico en campamento movil.
En campo no se tiene almacenamiento de material pétreo, ya que el material que va llegando, enseguida se extiende.
Dentro del componente SST, se generro entrega de dotaciones y elementos de protección.
Se hizo lo que fue el encerramiento perimetral y de seguridad y las señalizaciones.

SEGUIMIENTO SOCIAL: El contratista informa las actividades realizadas: Apertura del punto de atención a la comunidad en la estación de los taxis. Allí se se ubicó el buzón de sugerencias. Participacion de la veedora del proyecto y la comunidad en comite realizado el dia sabado 18 de abril donde se socializaron las actividades realizadas.

OTROS: Por parte de la Supervision se indica que se ha realizado verificacion de los documentos que hacen falta por firmar; tanto en el contrato de interventoría como en el contrato de obra, conluyendo: Acta del mes de febrero del acta de interventoría la va a firmar completamente el ingeniero Rafael. Teniendo en cuenta que el contrato de interventoría se suspendió en el mes de febrero 26. Y hasta ese momento, él todavía estaba en el cargo de director territorial. Cuando reanudó la interventoría y el contrato de obra, 24 de marzo, ya estaba la ingeniera Diana. Entonces la ingeniera Diana era responsable de firmar. Luego el acta del mes de marzo, que serían 7 días aproximadamente, y el acta de modificación de costos la va a firmar también la ingeniera Diana. Los Apus se encuentran en proceso de revision, proponiendo una mesa técnica donde el contratista y la interventoría le expliquen cada NP.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Mesa de trabajo	16/24/2026	CONTRATISTA/INTERVENTORIA/IN
Radicacion solicitud modificatorio del contratista de obra	viernes, 24 de abril de 2026	CONTRATISTA
Aprobacion Plan de Cargas/modificatorio/acta de costos Febrero	viernes, 24 de abril de 2026	INVIAS
Solicitud a ADI. Limpieza del arroyo		INVIAS
Informe Semanales	viernes, 24 de abril de 2026	INTERVENTORIA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 30/04/2026
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Ing., EMANUEL A. ARREGOCES	PROFESIONAL TECNICO	INVIAS	ASISTENCIA VIRTUAL
Ing., LUIS GABRIEL SALGADO RIVAS	GESTORIA TECNICA	INVIAS	ASISTENCIA VIRTUAL
Ing. RAFAEL G. RODRIGUEZ MEZA	SUPERVISOR	INVIAS	ASISTENCIA VIRTUAL
Ing.,MAURICIO TIBATA	DIRECTOR CONTRATO DE OBR/	CONSORCIO GALAPA MLS	ASISTENCIA VIRTUAL
Ing., AMERICA RODRIGUEZ	RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO GALAPA MLS	ASISTENCIA VIRTUAL
Ing., RIGOBERTO WALTEROS	RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO GALAPA MLS	ASISTENCIA VIRTUAL
PROF. LIDIS CASTILLO	PROFESIONAL SOCIAL	CONSORCIO GALAPA MLS	ASISTENCIA VIRTUAL
Ing., LUIS HUMBERTO JAUREGUI	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	HUMBERTO JAUREGUI	ASISTENCIA VIRTUAL
Ing. GABRIEL GRIMALDOS SALAZAR	RESIDENTTE DE INTERVENTOR	HUMBERTO JAUREGUI	ASISTENCIA VIRTUAL
Ing., JONATHAN CERVANTES	PROFESIONAL AMBIENTAL	CONSORCIO GALAPA MLS	ASISTENCIA VIRTUAL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 11
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No. 2000-2025
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO GALAPA MLS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA- CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2053-2025
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: HUMBERTO JAUREGUI & CIA S.A.S

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
N/A

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
Presentaciòn
Revisiòn de compromisos
Seguimiento Tècnico
Seguimiento Ambiental
Seguimiento social

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA
PRESENTACION DE ASISTENTES. Se realiza la presentación de cada uno de los asistentes a la reunión virtual, mediante la herramienta Teams, se anuncian: por parte del contratista de obra se anuncian: Ing. Mauricio Tibatá, Representante Legal; Lidis I. Castillo P., Profesional Social; Ing. Jonathan Cervantes; Residente ambiental; Ing. Rigoberto Walteros,Ingeniero Residente; por parte Interventoria, Ing. Humberto Jáuregui, Director de Interventoría; Ing. Gabriel Grimaldos S., Residente de Interventoría; Ing. ella I. Ponton; ing., Ambiental, Prof. Social; Tilsa Padilla, por INVIAS se anuncian: Ing. Luis Gabriel Salgado R., Apoyo de la Gestoría Técnica; Ing. Emanuel A. Arregoces L., Apoyo a la Supervisión INVIAS; Ing. Rafael G. Rodriguez., Supervisor INVIAS,
REVISION DE COMPROMISOS: Mesa de trabajo con INVIAS Territorial Atlantico . Interventoria comenta la realizacion de reunión en las instalaciones de envías el día 24 de abril del 2006 donde se evaluaron los APU complementarios, y el día 29 se recibieron observaciones por partes del ingeniero Emanuel. Comenta ademas que el mismo día 29 junto con el contratista de interventoría se realizó la verificación de esas observaciones y en estos momentos se están diligenciando los formatos por los ajustes realizados. **Radicacion solicitud modificatorio del contratista de obra:** Actividad programada para el dia 024/04/2026 con el fin de documentar el modificatorio para sacar el dinero de las bolsas y poder ejecutar mayor cantidad de obra. Hasta el momento de la reunion no se ha obtenido informacion. Se solicita al contratista pronunciarse al respecto. El contratista indica en su intervencion se requiere aprobacion APU-NP, indicando que se esataria radiando el dia 4/05/2026. **Aprobación del plan de cargas, el modificatorio y el acta de febrero de interventoría.** Se informa por parte de interventoria la gestion realizada el dia 27/04/2026 subsanando las observaciones realizadas por la Supervision, indicando que hasta el momenyo no se ha recibido observaciones. Supervion indica que el plan de cargas y modificatorio esta aprobado, quedando pendiente el acta de marzo, para que la ing, Diana Vanegas firma todo el paquete. On respecto al informe de Febrero, se indica que se realizaron las obervaciones solicitadas, comprometiendose a entregar acta de costos el dia 4/05/2026. **Solicitud que se haga de parte del Invías a la empresa de Barranquilla encargada de hacer el mantenimiento de los arroyos**, en este caso la ADI. Se genera el compromiso por parte de la Supervision de realizar la solicitud el dia 4/05/2026. **Entrega de informes semanales**. Interventoria informa que el día 29/04/2026 se hace entrega del informe No 13 que es el correspondiente de la semana pasada, del 17 al 23

al 23.

SEGUIMIENTO TECNICO: Tiempo que ha transcurrido ha sido 3.43 meses de un tiempo total de 4.23 meses. Llevamos transcurridos el 81,16% del tiempo. El avance financiero hasta el día de 29/04/2026: $ 521.000,000 ejecutado acumulado,30,34%, Programación $ 521,970,474, representando el 34,41%.
Instalacion de Tuberia de concreto reforazado de 36". Interventoria informa la situación que pronto se nos va a convertir en ruta crítica, aunque la fecha de inicio tiene el 4 de mayo y su finalización el 22 de mayo, la tarea que se llama tubería de concreto reforzado, no se podra hacer dentro de las fechas estipuladas si no tenemos ese insumo. Se requiere la instalación a partir de mañana porque si no, el contratista se va a bloquear con la actividad de concreto hidráulico para el pavimento MR43. El contratista informa el arribo de la tuberia el dia 2/05/2026, indicando que revisariamos ese tema para generar el plan de contigencia
Validación del PMT. Actualmente el PMT esta aprobado hasta el dia 6 de mayo, debiendose ampliar hasta por lo menos el dia 25 de mayo, quees la fecha hasta que se encuentra vigente el contrato.El contratista informa que se radico la solicituld de amplicion del PMT, y lo solicitaran por un mes adicional. El contratista recalca que una vez fundida las ultimas losas , se requeriran 28 dias adiconales para el fraguado, y considerando que esas fechas el contrato de obra ha finalizado y no seria atribuible al contratista pagar un mes adicional de PMT. Gestoria y Supervision dan claridad sobre realizar las obras en los tiempos que tiene el proyecto,recurriendo a tomar las medidas técnicas del caso para que todo se haga dentro del proceso. Gestoria afirma que dedemos implemtar mecanismos técnicos que nos permiten ejecutar el contrato dentro del tiempo y no supeditarnos a los 28 días de un concreto que se fragué completamente. Interventoria junto con el contratista verificar las condiciones tecnicas y finacieras para habilitar este nuevo item que se implementara para los siguientes tramos.
Actividades realizadas en la semana: El contratista hace balance de la actividades realizadas en la semana; como la ejecusion del cereo de subbase con motoniveladora, humectación con agua de camotanche para lograr una mayor compactación. Formaletear para instalar el concreto de MDR 43, amarrado de las patrullas de acero para alistar para los tramos que tienen acero de refuerzo, e instlacion de concreto MR43. Dentro de las actividades de instalacion de concreto MR43 , se realiza el acabado, el microtestorizado, el rastrillado, aplicacion del antisol para protección,y cotes de inducción de junta de las placas de concreto.
Gestoria expresa la radicacion de oficio sobre subsanacion a observaciones tecnicas sobre el oficio del filtro, donde requiere radicar el oficio donde se subsano. interventoria informa que en campo, se realizaron los ajustes. Gestori complementa con el documento de los materiales granularesen el cual se solicita ajustarse al artículo 320. El contratista informa que dieron respuesta al tema del filtro y en campo se subsano. Respecto a lo de los granulares, nosotros subsanamos, sin embargo recibimos una réplica que también vamos a dar respuesta.

SEGUIMIENTO AMBIENTAL: Por el area de sostenibilidad esta pendiente la revision, aprobacion del PAGA, por parte del contratista queda pendiente el envio de manera formal el envio de la documentacion actualizada al dia del carro tanque en obra, en relacion al desmonte de la valla publicitaria que se encuentra en obstruccion, ese movimiento en costo corresponde al area social.

SEGUIMIENTO SOCIAL: En seguimiento a las actividades pendientes del componente social, el contratista informó que respecto a la queja presentada por la señora encargada del transporte escolar, la Trabajadora Social realizó seguimiento telefónico, mediante el cual la ciudadana manifestó que actualmente no se han vuelto a presentar inconvenientes relacionados con el tráfico vehicular, debido a que la movilidad en el sector se encuentra fluyendo de manera adecuada.
De igual forma, se informó que ya fue instalado el Punto de Atención al Ciudadano – PAC, así como el buzón destinado para la recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS).
Por otra parte, se indicó la necesidad de reubicar la valla informativa ubicada en el sector, debido a que esta se encuentra inclinada y sostenida parcialmente por unos árboles. Según lo manifestado, esta situación obedece a los fuertes vientos que han impactado la estructura, ocasionando su desplazamiento y apoyo sobre la vegetación existente, representando un posible riesgo para la comunidad del sector.

OTROS: Interventoria solicita presentacion de plan de contingencia para realizar prontamente actividades alternas y lograr el cumplimiento dentro del plazo contractual.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Radicacion solicitud modificatorio del contratista de obra	lunes, 4 de mayo de 2026	CONTRATISTA
Radicacion acta de Marzo	lunes, 4 de mayo de 2026	INTERVENTORIA
Solicitud a ADI. Limpieza del arroyo	lunes, 4 de mayo de 2026	INVIAS
Llegada tuberia de concreto reforzada 36"	sábado, 2 de mayo de 2026	CONTRATISTA
Actualizacion PMT a 6/06/2026	lunes, 4 de mayo de 2026	CONTRATISTA
Plan de contingencia	lunes, 4 de mayo de 2026	CONTRATISTA
Radicacion oficios a Gestoria-SBG y Geodren	jueves, 7 de mayo de 2026	INTERVENTORI/CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 7/05/2026
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Ing., EMANUEL A. ARREGOCES	PROFESIONAL TECNICO	INVIAS	ASISTENCIA VIRTUAL
Ing., LUIS GABRIEL SALGADO RIVAS	GESTORIA TECNICA	INVIAS	ASISTENCIA VIRTUAL
Ing. RAFAEL G. RODRIGUEZ MEZA	SUPERVISOR	INVIAS	ASISTENCIA VIRTUAL
Ing.,MAURICIO TIBATA	DIRECTOR CONTRATO DE OBR/	CONSORCIO GALAPA MLS	ASISTENCIA VIRTUAL
Ing., AMERICA RODRIGUEZ	RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO GALAPA MLS	ASISTENCIA VIRTUAL
Ing., RIGOBERTO WALTEROS	RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO GALAPA MLS	ASISTENCIA VIRTUAL
PROF. LIDIS CASTILLO	PROFESIONAL SOCIAL	CONSORCIO GALAPA MLS	ASISTENCIA VIRTUAL
Ing., LUIS HUMBERTO JAUREGUI	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	HUMBERTO JAUREGUI	ASISTENCIA VIRTUAL
Ing. GABRIEL GRIMALDOS SALAZAR	RESIDENTTE DE INTERVENTOR	HUMBERTO JAUREGUI	ASISTENCIA VIRTUAL
Ing., JONATHAN CERVANTES	PROFESIONAL AMBIENTAL	CONSORCIO GALAPA MLS	ASISTENCIA VIRTUAL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 / 4 / 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA- CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPART

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2053-2025 **INTERVENTORÍA:** HUMBERTO JAUREGUI & CIA S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 2000-2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO GALAPA MLS

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHICULO	Camioneta doble cabina nissan placa ZZL085 módelo 2015	A	I	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: LUIS HUMBERTO JAUREGUI
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17319 CND

Firma
Nombre: RAFAEL RODRIGUEZ MEZA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202090758BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2053-2025

INTERVENTOR: HUMBERTO JAUREGUI & CIA S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

PROYECTO: PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA- CIRCUNVALAR RUTA 9006

CONTRATO DE OBRA No.: 2000-2025

CONTRATISTA: CONSORCIO GALAPA MLS

NOMBRE ARL: ARL SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAC/DR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 31)	DÍAS TRABAJ % no cotización en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	LUIS HUMBERTO JAUREGUI ESPINEL	19058590	Director de interventoría	$ 7.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,50	HUMBERTO JAUREGUI CIA SAS	$ 3.900.000,00	$ 271.500	V	sanitas EPS	89385597	$ 156.000		89385597		$ 156.000			El director ya se encuentra pensionado
2	GABRIEL GRIMALDOS SALAZAR	91259414	Residente de interventoría	$ 6.100.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00	HUMBERTO JAUREGUI CIA SAS	$ 6.100.000,00	$ 424.600	V	sanitas EPS	89385597	$ 244.000	Colpensiones	89385597	$ 976.000	$ 244.000			
3	KAREN ALEJANDRA HOYOS FLORIAN	22551944	Profesional social	$ 4.450.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,65	HUMBERTO JAUREGUI CIA SAS	$ 2.729.334,00	$ 190.000	V	Proteger EPS	89385597	$ 109.200	Colpensiones	89385597	$ 436.700	$ 109.200			retirada
4	TIRSA COROMOTO PADILLA	1140906628	Profesional social		X X X X X	0,15	HUMBERTO JAUREGUI CIA SAS	$ 830.667,00	$ 57.900		Salud total EPS	89385597	$ 33.300	Porvenir	89385597	$ 133.000	$ 33.300			ingreso
5	ELLA INES PONTON VALEST	49787896	Profesional ambiental	$ 4.450.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,80	HUMBERTO JAUREGUI CIA SAS	$ 3.560.000,00	$ 247.800	V	Nueva EPS	89385597	$ 142.400	Porvenir	89385597	$ 569.600	$ 142.400			
6	SAID DUVAN LOPEZ IZQUIERDO	1048066809	Inspector SST	$ 2.480.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00	HUMBERTO JAUREGUI CIA SAS	$ 2.480.000,00	$ 172.700	V	EPS Sura	89385597	$ 99.200	Colpensiones	89385597	$ 396.800	$ 99.200			ingreso
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 25.280.000																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 28/05/2026 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

No hubo oersonal de Interventoria vinculado en este periodo.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe s /a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma:
Nombre: LUIS HUMBERTO JAUREGUI
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17319 CND

Firma:
Nombre: RAFAEL RODRIGUEZ MEZA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1320209075BBLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901793808-4	HUMBERTO JAUREGUI CIA SAS	CL 24 8-59 BRR CENTRO	6047830654	CARLOSHUMBERTOJAUREGUIMARTINEz@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	006	GALAPA	CÓRDOBA	MONTERÍA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		89385597	28/05/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$19,600,001	$5,638,200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	Proteger EPS	901543211-6	109,200	0		0		0	49	3,900	0	113,100	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	33,300	0		0		0	49	1,200	0	34,500	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	400,000	0		0		0	49	14,200	0	414,200	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	99,200	0		0		0	49	3,600	0	102,800	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	142,400	0		0		0	49	5,100	0	147,500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	702,600	0	0	0	0	49	25,000	0	727,600	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1,809,500	0	0	0	0	49	64,200	0	1,873,700	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1,364,500				1,364,500	49	48,400	1,412,900			13,645	1,412,900	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF16	Comfacor	891080005-1	784,100	49	27,800	811,900	6

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901793808-4	HUMBERTO JAUREGUI CIA SAS		CL 24 8-59 BRR CENTRO	6047830654	CARLOSHUMBERTOJAUREGUIMARTINEz@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	006	GALAPA	CÓRDOBA	MONTERÍA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		89385597	28/05/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$19,600,001	$5,638,200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Bolsillo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	Nig	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Tex	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1048066809	LOPEZ IZQUIERDO SAID DUVAN	1	0			S	X																25-14	2.480.000	30	396.800	0	0	0	0	EPS010	2.480.000	30	99.200	14-11	2.480.000	30	5	172.700	CCF16	2.480.000	30	99.200	0	0	0	0	0
2	CC 1140906628	COROMOTO PADILLA TIRSA	1	0			S	X																230301	830.667	7	133.000	0	0	0	0	EPS002	830.667	7	33.300	14-11	830.667	7	5	57.900	CCF16	830.667	7	33.300	0	0	0	0	0
3	CC 19058590	JAUREGUI ESPINEL LUIS HUMBERTO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS005	3.900.000	30	156.000	14-11	3.900.000	30	5	271.500	CCF16	3.900.000	30	156.000	0	0	0	0	0
4	CC 22551944	HOYOS FLORIAN KAREN ALEJANDRA	1	0			S		X															25-14	2.729.334	23	436.700	0	0	0	0	CCFC55	2.729.334	23	109.200	14-11	2.729.334	23	5	190.000	CCF16	2.729.334	23	109.200	0	0	0	0	0
5	CC 49787896	PONTON VALEST ELLA INES	1	0			S																	230301	3.560.000	30	569.600	0	0	0	0	EPS037	3.560.000	30	142.400	14-11	3.560.000	30	5	247.800	CCF16	3.560.000	30	142.400	0	0	0	0	0
6	CC 91259414	GRIMALDOS SALAZAR GABRIEL	1	0			S																	25-14	6.100.000	30	976.000	0	0	0	0	EPS005	6.100.000	30	244.000	14-11	6.100.000	30	5	424.600	CCF16	6.100.000	30	244.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONTRATO 2053 DE 2025	"INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA-CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO".	HUMBERTO JAUREGUI & CIA S.A.S.

HUMBERTO JAUREGUI & CIA S.A.S.

901.793.808-4

CERTIFICA:

CARLOS HUMBERTO JAUREGUI MARTINEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.011.082.919 expedida en Montería, en mi condición de representante legal de HUMBERTO JAUREGUI & CIA S.A.S. identificada con NIT 901.793.808-4, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante el mes de abril de 2026, como documento integrante del acta de recibo parcial de interventoría No. 5 del Contrato INVIAS No. 2053 del 2025. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide en la ciudad de Montería, a los 28 días del mes de mayo de 2026



CARLOS HUMBERTO JAUREGUI MARTINEZ
Representante legal HUMBERTO JAUREGUI & CIA S.A.S
Matrícula Profesional No.: 17319 CND

EL SUSCRITO DIRECTOR ENCARGADO DE LA TERRITORIAL ATLANTICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS "INVIAS"

C E R T I F I C A:

Que ha verificado las planillas de pago de la seguridad social y aportes parafiscales de HUMBERTO JAUREGUI & CIA S.A.S y sus proveedores, identificado con el Número de identificación Tributario – NIT # 901,793,808-4, los cuales hacen parte de la documentación aportada por el contratista, en la presentación del Acta de Costos número 5, ejecutada entre el 1 y el 30 de abril de 2026, la cual se encuentra acorde con el personal que el Interventor tuvo en obra durante el periodo mencionado.

La presente constancia se expide como requisito para el trámite y pago del Acta de Costos.

Expedida en Barranquilla a los ocho (24) días del mes de junio de 2026,

Cordialmente,

RAFAEL RODRIGUEZ MEZA
Director Territorial Atlántico (E)

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
En su condición de administradora del
FONDO ESPECIAL DE RETIRO PROGRAMADO
NIT 900.394.960-0

CERTIFICA QUE:

LUIS HUMBERTO JAUREGUI ESPINEL, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía **19.058.590** se le aprobó la **SOLICITUD POR VEJEZ NORMAL** a partir del 18 de Noviembre de 2010 y actualmente se encuentra bajo la modalidad de Retiro Programado con una mesada pensional por $1,750,905.00.

La presente certificación se expide el 01 de abril de 2026.

Cordialmente,



Gerente de Clientes

Tenga en cuenta:

En los Fondos privados como Porvenir la pensión es para toda la vida. Cuando fallece el pensionado, la mesada no termina pasa a sus beneficiarios de ley como hijos y esposa(o).

La afiliación a la EPS en calidad de pensionado el pagador es el Fondo de Pensiones Porvenir S.A. NIT 800.224.808.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 30 / 4 / 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2053-2025 **INTERVENTOR:** HUMBERTO JAUREGUI & CIA S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA- CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRATO DE OBRA No: 2000-2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO GALAPA MLS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	866725	C-2401-0600-99-51102D-2401023-02	16	NACION	PRINCIPAL	$ 270.000.000,00	$ 113.083.422,70
2025	866725	C-2401-0600-99-51102D-2401023-02	16	NACION	PRINCIPAL	$ 29.999.935,00	$ 29.999.935,00
			TOTAL			$ 299.999.935,00	$ 143.083.357,70

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 299.999.935,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	Diciembre de 2025	$ -	$ -	$ -				Registro 866725 de fecha 2025-12-17	$ 270.000.000,00	$ 299.999.935,00		
2	Enero de 2026	$ 26.576.180,00	$ 5.049.474,20	$ 31.625.654,20				Registro 866725 de fecha 2025-12-17	$ 238.374.345,80	$ 268.374.280,80		
3	Del 1 al 26 de Febrero 2026	$ 87.953.110,00	$ 16.711.090,90	$ 104.664.200,90				Registro 866725 de fecha 2025-12-17	$ 133.710.144,90	$ 163.710.079,90		
4	Del 23 al 31 de marzo 2026	$ 17.333.380,00	$ 3.293.342,20	$ 20.626.722,20				Registro 866725 de fecha 2025-12-17	$ 113.083.422,70	$ 143.083.357,70		
5	Del 1 al 30 de abril 2026	$ 61.313.000,00	$ 11.649.470,00	$ 72.962.470,00				Registro 866725 de fecha 2025-12-17	$ 40.120.952,70	$ 70.120.887,70		
TOTALES		**$ 193.175.670,00**	**$ 36.703.377,30**	**$ 229.879.047,30**	$ -	$ -			**$ 40.120.952,70**	**$ 70.120.887,70**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 168.128.170,00	$ 31.944.352,30	$ 200.072.522,30
* SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 25.047.500,00	$ 4.759.025,00	$ 29.806.525,00
* IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (INCLUYE ADMINIS		$ -	$ -
VALOR TOTAL	**$ 193.175.670,00**	**$ 36.703.377,30**	**$ 229.879.047,30**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: LUIS HUMBERTO JAUREGUI
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17319 CND

Firma
Nombre: RAFAEL RODRIGUEZ MEZA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:13202090758BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA	30	4	2026
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2053-2025

INTERVENTOR: HUMBERTO JAUREGUI & CIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA- CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

FECHA DE INICIO: 24/12/2025

PLAZO INICIAL: 31/12/2025

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/05/2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 299.999.935,00

VALOR ACUMULADO: $ 299.999.935,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: RAFAEL RODRIGUEZ MEZA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 29.999.994,00	9	12	2025	1/07/2026		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 75.630.236,00	9	12	2025	19/08/2025		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 59.999.987,00	9	12	2025	31	12	2028
Calidad del servicio	30%	$ 89.999.981,00	31	12	2025	31	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101487565

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT: 860009578-6

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

	FECHA	30	4	2026
SUBDIRECCION GESTION		(Día / Mes / Año)		

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 29.999.994,00	9	12	2025	24/11/2026		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 75.630.236,00	9	12	2025	24/11/2026		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 59.999.987,00	9	12	2025	24	5	2029
Calidad del servicio	30%	$ 89.999.981,00	31	12	2025	31	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101487565

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT: 860009578-6

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:
ESTE ANEXO AMPARA LAS GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGUN SUSPENSION No. 01 DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2026 Y PRORROGA No. 02 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NÚMERO 2053 DE 2025

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: LUIS HUMBERTO JAUREGUI
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17319 CND

Firma
Nombre: RAFAEL RODRIGUEZ MEZA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202090758BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101487565**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	**03**	**2026**	**09**	**12**	**2025**	**00:00**	**24**	**05**	**2031**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
HUMBERTO JAUREGUI & CIA SAS	**NIT: 901.793.808-4**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 42 NRO. 15 D - 57	MONTERIA, CORDOBA	3213739827

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO NUMERO 2053 DE 2025, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPACIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.
NOTA:
EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL INTERVENTOR, SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO.
LA CALIDAD DEL SERVICIO, CON UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD EN EL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**09/12/2025**	**24/11/2026**	**$29,999,994.00**	**$29,999,994.00**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**09/12/2025**	**24/11/2026**	**$75,630,236.00**	**$75,630,236.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**09/12/2025**	**24/05/2029**	**$59,999,987.00**	**$59,999,987.00**
CALIDAD DEL SERVICIO	**31/12/2025**	**31/12/2030**	**$89,999,981.00**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN SUSPENSION No. 01 DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2026 Y PRORROGA No. 02 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NMERO 2053 DE 2025, SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****113,901.00	$ *******8,000.00	$ ******23,161.00	$ **********145,062.00	$ ******255,630,198.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROBERTO RUIZ GALVIS	963374	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101487565

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101487565	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	03	2026	09	12	2025	00:00	24	05	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	HUMBERTO JAUREGUI & CIA SAS		**NIT: 901.793.808-4**
DIRECCIÓN: CL 42 NRO. 15 D - 57	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3213739827

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101487565

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	25/04/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **TERRITORIAL:** ATLANTICO **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** **No.** 3

(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2053-2025

PLAZO INICIAL: 31/12/2025 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 4,26 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA- CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/12/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/05/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/02/2026 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 23/03/2026 (Indique día/mes/año)

INTERVENTOR: HUMBERTO JAUREGUI & CIA S.A.S

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 299.999.935,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: RAFAEL RODRIGUEZ MEZA

RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 299.999.935,00

CONTRATO DE OBRA No.: 2000-2025 CONTRATISTA: CONSORCIO GALAPA MLS

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				2025		2026																TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	dic		ene		feb		mar		abr		may		MES		MES		MES		MES		
							H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																								
	1	Director de Interventoría	$ 7.800.000,00		1,50	$ 11.700.000	0,00	$ -	0,46	$ 3.610.000	0,46	$ 3.588.000	0,13	$ 1.014.000	0,50	$ 3.900.000	0,42	$ 3.276.000		$ 15.388.000,0							1,97	$ 15.388.000
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 6.100.000,00		1,50	$ 9.150.000	0,00	$ -	1,00	$ 6.100.000	0,93	$ 5.673.000	0,27	$ 1.647.000	1,00	$ 6.100.000	0,80	$ 4.880.000		$ 24.400.000,0							4,000	$ 24.400.000
	1	**MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforme esta bolsa los especialistas de amarillo)**				$ 28.500.000					0,50	$ 14.400.000								$ 14.400.000,0							0,50	$ 14.400.000
	1	Especialista en Pavimentos y/o Vias	$ 7.200.000,00																	$ -								$ -
	1	Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 7.200.000,00																	$ -								$ -
	1	Especialista En Estructuras	$ 7.200.000,00																	$ -								$ -
		Especialista Hidraulico								$ -	0,33	$ 2.375.000	0,17	$ 1.225.000						$ 3.600.000,0							0,50	$ 3.600.000
		Especialista Transito								$ -	0,33	$ 2.375.000	0,17	$ 1.225.000						$ 3.600.000,0							0,50	$ 3.600.000
	1	Profesional Ambiental	$ 4.450.000,00		1,50	$ 6.675.000				$ -	0,57	$ 2.536.500	0,16	$ 712.000	0,80	$ 3.560.000	0,80	$ 3.560.000		$ 10.368.500,0							2,33	$ 10.368.500
	1	Profesional Social	$ 4.450.000,00		1,50	$ 6.675.000				$ -	1,00	$ 4.450.000	0,16	$ 712.000	0,80	$ 3.560.000	0,81	$ 3.582.250		$ 12.304.250,0							2,77	$ 12.304.250
	1	Profesional de aseguramiento o gestión de la calidad	$ 4.450.000,00		1,50	$ 6.675.000				$ -		$ -		$ -	0,25	$ 1.112.500	0,25	$ 1.112.500		$ 2.225.000,0							0,50	$ 2.225.000
		PERSONAL TÉCNICO																		$ -								
	1	Inspector SST	$ 2.480.000,00		1,5	$ 3.720.000,00				$ -		$ -		$ -	1,00	$ 2.480.000	0,80	$ 1.984.000		$ 4.464.000,0							1,80	$ 4.464.000
		PROVISIÓN JORNADAS																										
		PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA				$ 5.000.000,00				$ -		$ -		$ -													0,00	$ -
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 78.095.000	$ -		$ 9.710.000,00		$ 35.397.500,00		$ 6.535.000,16		$ 20.712.500,00		$ 18.394.750,00										$ 90.749.750,16
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36										
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 184.304.200	$ -		$ 22.915.600,00		$ 83.538.100,00		$ 15.422.600,38		$ 48.881.500,00		$ 43.411.610,00										$ 214.169.410

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2025		2026																TOTAL	
							dic		ene		feb		mar		abr		may		MES		MES		MES		MES		
							H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																								
		VIÁTICOS																								
	1	Viáticos Director y/o Especialistas	Dia	$ 210.000,00	25,0	$ 5.250.000		$ -		$ -		$ -		$ -	2	$ 420.000,00	2	$ 420.000,00									4	$ 840.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA				$ -																						
	1	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta		$ 5.850.000,00	1,5	$ 8.775.000			0,25	$ 1.462.500,00	0,25	$ 1.462.500,00	0,2	$ 1.345.500,00	1	$ 5.850.000,00	0,8	$ 4.680.000,00									2,53	$ 14.800.500,00
	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)		$ 6.800.000,00	1,5	$ 10.200.000				$ -	0,25	$ 1.700.000,00		$ -	0,9	$ 6.120.000,00	0,8	$ 5.440.000,00									1,95	$ 13.260.000,00
	1	Ensayos de laboratorios (suelos, pavimentos concreto, etc)		$ 630.000,00	1,5	$ 945.000				$ -		$ -		$ -	0,9	$ 567.000,00	0,98	$ 618.875,33									1,88	$ 1.185.875,33
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)		$ 1.500.000,00	1,5	$ 2.250.000			1	$ 1.500.000,00	0,5	$ 750.000,00	0,2	$ 345.000,00	1	$ 1.500.000,00	0,8	$ 1.200.000,00									3,53	$ 5.295.000,00
		OTROS COSTOS				$ -																						
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.		$ 750.000,00	1,5	$ 1.125.000			0,5	$ 375.000,00	0,3	$ 225.000,00	0,2	$ 112.500,00	0,3	$ 225.000,00	0,3	$ 225.000,00									1,55	$ 1.162.500,00
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)		$ 750.000,00	1,5	$ 1.125.000			0,5	$ 375.000,00	0,3	$ 225.000,00	0,2	$ 112.500,00	0,3	$ 225.000,00	0,3	$ 225.000,00									1,55	$ 1.162.500,00
	1	Veeduria ciudadana		$ 150.000,00	1,5	$ 225.000				$ -		$ -		$ -	1	$ 150.000,00	0,5	$ 75.000,00									1,5	$ 225.000,00
		Ajuste al peso y/o valor remanente																										
*	**SUBTOTAL OTROS COSTOS= SUMATORIA DE (9) = (B)**					$ 29.895.000,00	$ -		$ 3.712.500,00		$ 4.362.500,00		$ 1.915.500,00		$ 15.057.000,00		$ 12.883.875,33										$ 37.931.375,33
*	**SUBTOTAL COSTOS = (A) + (B) = (C)**					$ 214.199.200,00	$ -		$ 26.628.100,00		$ 87.900.600,00		$ 17.338.100,38		$ 63.938.500,00		$ 56.295.485,33										$ 252.100.785,71
*	**PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL = (D)**					$ 37.901.586,00																						$ -
*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS Y PROVISIONES = (C) + (D) = (E)**					$ 252.100.786,00	$ -		$ 26.628.100,00		$ 87.900.600,00		$ 17.338.100,38		$ 63.938.500,00		$ 56.295.485,33										$ 252.100.785,71
*	**IVA = 19% * (E) = (F)**					$ 47.899.149,00	$ -		$ 5.059.339,01		$ 16.701.114,00		$ 3.294.239,07		$ 12.148.315,00		$ 10.696.142,21										$ 47.899.149,29
*	**COSTO TOTAL = (E) + (F)**					$ 299.999.935,00	$ -		$ 31.687.439,01		$ 104.601.714,00		$ 20.632.339,45		$ 76.086.815,00		$ 66.991.627,54										$ 299.999.935,00
							ACUMULADO		$ -		$ 31.687.439,01		$ 136.289.153,01		$ 156.921.492,46		$ 233.008.307,46		$ 299.999.935,00								

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES; Aprobacion de prorroga al contrato de obra por dos (02) meses a partir del dia 25 de marzo de 2026.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (varios, diligenciar). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, adjuntar o modificación del contrato debe indicarse el plazo y valores de la adición, adjuntar o modificación y la fecha de suscripción.

Dado que el contrato de obra No 2000 de 2025 se prorroga hasta el dia 24 de mayo de 2026, se requiere prorrogar el contrato de Interventoria No 2053 de 2025 por un termino de dos(02) meses, garantizando el acompañamiento y seguimiento que realiza la Interventoria a la etapa constructiva y de liquidacion del contrato de obra.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la ultima Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma

Nombre: CARLOS HUMBERTO JAUREGUI MARTINEZ
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. N/A

Firma:

Nombre: RAFAEL RODRIGUEZ MEZA
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 1320290758BLV

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.
