

Id		Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Nombres de los recursos	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	Nivel de esquema	Hito
1			**1**	**PROYECTO LP-002-SG-2025 MEDICINA LEGAL CARTAGENA**		186.63 días	**lun 15/12/25**	**sáb 19/09/26**		COP 1,252,531,960.01	**1**	**No**
2			**1.1**	**FASE ADMINISTRATIVA Y PREPARACIÓN**		11 días	**lun 15/12/25**	**sáb 27/12/25**		COP 0.00	**2**	**No**
3			1.1.1	Documentos y trámites iniciales		5 días	lun 15/12/25	vie 19/12/25		COP 0.00	3	No
4			1.1.2	Compras y contratación de materiales		11 días	lun 15/12/25	sáb 27/12/25		COP 0.00	3	No
5			1.1.3	HITO: FIN FASE ADMINISTRATIVA - INICIO OBRA		0 días	sáb 27/12/25	sáb 27/12/25	3;4	COP 0.00	2	Sí
6			1.3	HITO APROBACION MODIFICATORIO Y NO PREVISTOS		0 días	lun 13/04/26	lun 13/04/26		COP 0.00	2	Sí
7			**1.2**	**FASE 1: IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA Y OBRAS DE EXTERI**		25 días	**lun 26/01/26**	**mié 25/02/26**		COP 152,892,507.00	**2**	**No**
12			**1.3**	**FASE 2: IMPERMEABILIZACIÓN FACHADAS**		53.5 días	**mié 4/03/26**	**vie 15/05/26**		COP 155,985,585.00	**2**	**No**
36			**1.4**	**FASE 3: PRIMER PISO - OBRA CIVIL Y SISTEMAS**		48.5 días	**lun 13/04/26**	**mié 17/06/26**		COP 157,144,911.97	**2**	**No**
122			**1.6**	**FASE 4: SEGUNDO PISO**		61 días	**vie 27/03/26**	**vie 19/06/26**		COP 157,573,622.97	**2**	**No**
204			1.8	RUTA CRITICA ENTREGA DE LA MORGUE		57 días	sáb 4/04/26	lun 22/06/26		COP 0.00	2	No
205			**1.8**	**FASE 5: PLAN DE CHOQUE MORGUE**		28 días	**lun 22/06/26**	**mié 29/07/26**		COP 250,408,949.07	**2**	**No**
306			**1.9**	**FASE 6: SISTEMAS HVAC MORGUE (Paralelo Plan Choque)**		67.13 días	**lun 22/06/26**	**sáb 19/09/26**		COP 378,526,384.00	**2**	**No**
307			**1.9.1**	**Cap XIV - Sistema Extracción Sala Necropsias**		10 días	**vie 31/07/26**	**vie 14/08/26**		COP 54,658,794.00	**3**	**No**
328			1.9.2	HITO: SISTEMA EXTRACCIÓN NECROPSIAS COMPLETADO	Oficial H\	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	308	COP 0.00	3	Sí
329			**1.9.3**	**Cap XV - Sistema AC Sala Necropsias y Rayos X**		9 días	**vie 14/08/26**	**jue 27/08/26**		COP 112,944,603.00	**3**	**No**
347			1.9.4	HITO: SISTEMA AC NECROPSIAS COMPLETADO		0 días	jue 27/08/26	jue 27/08/26	330	COP 0.00	3	Sí
348			**1.9.5**	**Cap XVI - SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SALA DE SÉPT**		22 días	**jue 13/08/26**	**vie 11/09/26**		COP 72,401,497.00	**3**	**No**
349			1.9.5.1	16.1 Sistema de aire acondicionado área sépticos, de expa	Oficial H\	17 días	vie 21/08/26	vie 11/09/26	359	COP 45,828,520.00	4	No
350			1.9.5.2	16.2 Desmonte, retiro y disposición final en botadero aut	Oficial H\	1 día	jue 13/08/26	vie 14/08/26	347FC-10 días	COP 633,380.00	4	No
351			1.9.5.3	16.3 Ducto ó figura TDC CALIBRE 22	Oficial H\	1 día	vie 14/08/26	mar 18/08/26	350	COP 1,028,736.00	4	No

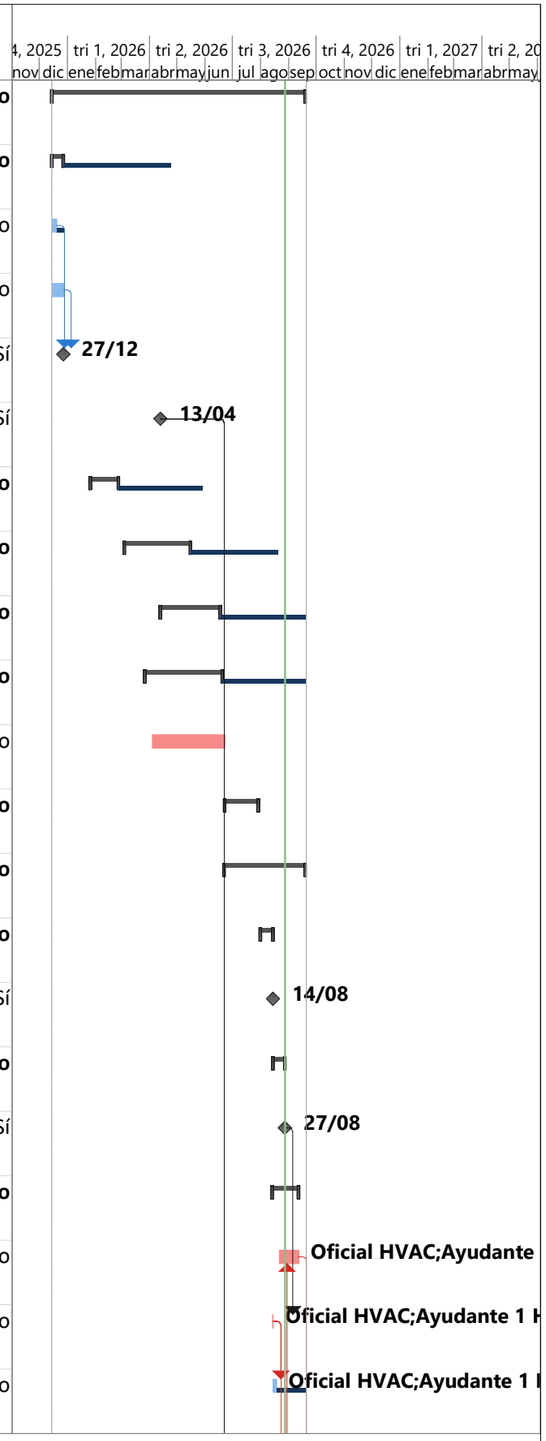

Proyecto: Programacion medici
Fecha: vie 28/08/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Hito de línea base
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	Resumen de línea base
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Línea base	Margen de demora


Id		Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Nombres de los recursos	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	Nivel de esquema	Hito
352			1.9.5.4	16.4 Ducto ó figura TDC CALIBRE 24	Oficial H\	1 día	vie 14/08/26	mar 18/08/26	350	COP 226,116.00	4	No
353			1.9.5.5	16.5 Ducto ó figura TDC CALIBRE 22	Oficial H\	1 día	vie 14/08/26	mar 18/08/26	350	COP 13,108,356.00	4	No
354			1.9.5.6	16.6 Dampers regulación de caudal en la ducteria de 12"X	Oficial H\	1 día	mar 18/08/2(	mié 19/08/26	353	COP 286,625.00	4	No
355			1.9.5.7	16.7 Dampers regulación de caudal en la ducteria de 12"X	Oficial H\	1 día	mar 18/08/2(	mié 19/08/26	353	COP 264,971.00	4	No
356			1.9.5.8	16.8 Rejilla para toma de aire 14"X14"	Oficial H\	1 día	mié 19/08/2(	jue 20/08/26	355	COP 330,027.00	4	No
357			1.9.5.9	16.9 Rejilla difusora de aire 12"X10"	Oficial H\	1 día	mié 19/08/2(	jue 20/08/26	355	COP 723,364.00	4	No
358			1.9.5.10	16.10 Controlador electrónico ubicado en el laboratorio q	Oficial H\	1 día	jue 20/08/26	vie 21/08/26	357	COP 1,248,088.00	4	No
359			1.9.5.11	16.11 Suministro e instalación de tablero fuerza y control	Oficial H\	1 día	jue 20/08/26	vie 21/08/26	357	COP 8,723,314.00	4	No
360			1.9.6	HITO: SISTEMA AC SEPTICOS COMPLETADO		0 días	vie 11/09/26	vie 11/09/26	349	COP 0.00	3	Sí
361			**1.9.7**	**Cap XVII - SISTEMA AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE I**		6 días	**vie 11/09/26**	**sáb 19/09/26**		COP 50,899,418.00	**3**	**No**
362			1.9.7.1	17.1 Sistema de aire acondicionado tipo paquete para áre	Oficial H\	1 día	jue 17/09/26	vie 18/09/26	373FC-2 días	COP 21,775,929.00	4	No
363			1.9.7.2	17.2 Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo cost	Oficial H\	1 día	vie 11/09/26	lun 14/09/26	360	COP 11,316,096.00	4	No
364			1.9.7.3	17.3 Ducto ó figura TDC CALIBRE 24 Fabricado a todo cost	Oficial H\	1 día	lun 14/09/26	mar 15/09/26	363	COP 879,279.00	4	No
365			1.9.7.4	17.4 Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo cost	Oficial H\	1 día	lun 14/09/26	mar 15/09/26	363	COP 6,190,057.00	4	No
366			1.9.7.5	17.5 Dampers regulación de caudal en la ducteria de 16"X	Oficial H\	1 día	mar 15/09/2(	mié 16/09/26	365	COP 705,232.00	4	No
367			1.9.7.6	17.6 Dampers regulación de caudal en la ducteria de 12"X	Oficial H\	1 día	mar 15/09/2(	mié 16/09/26	365	COP 456,536.00	4	No
368			1.9.7.7	17.7 Rejilla para toma de aire 14"X14"	Oficial H\	2 días	mié 16/09/2(	vie 18/09/26	367	COP 330,027.00	4	No
369			1.9.7.8	17.8 Rejilla para toma de aire 12"X12"	Oficial H\	1 día	mié 16/09/2(	jue 17/09/26	367	COP 229,681.00	4	No
370			1.9.7.9	17.9 Rejilla difusora de aire 14"X14"	Oficial H\	2 días	mié 16/09/2(	vie 18/09/26	367	COP 565,046.00	4	No
371			1.9.7.10	17.10 Rejilla difusora de aire 10"X10"	Oficial H\	1 día	mié 16/09/2(	jue 17/09/26	367	COP 585,030.00	4	No
372			1.9.7.11	17.11 Controlador electrónico ubicado en el laboratorio q	Oficial H\	1 día	jue 17/09/26	vie 18/09/26	371	COP 1,248,088.00	4	No

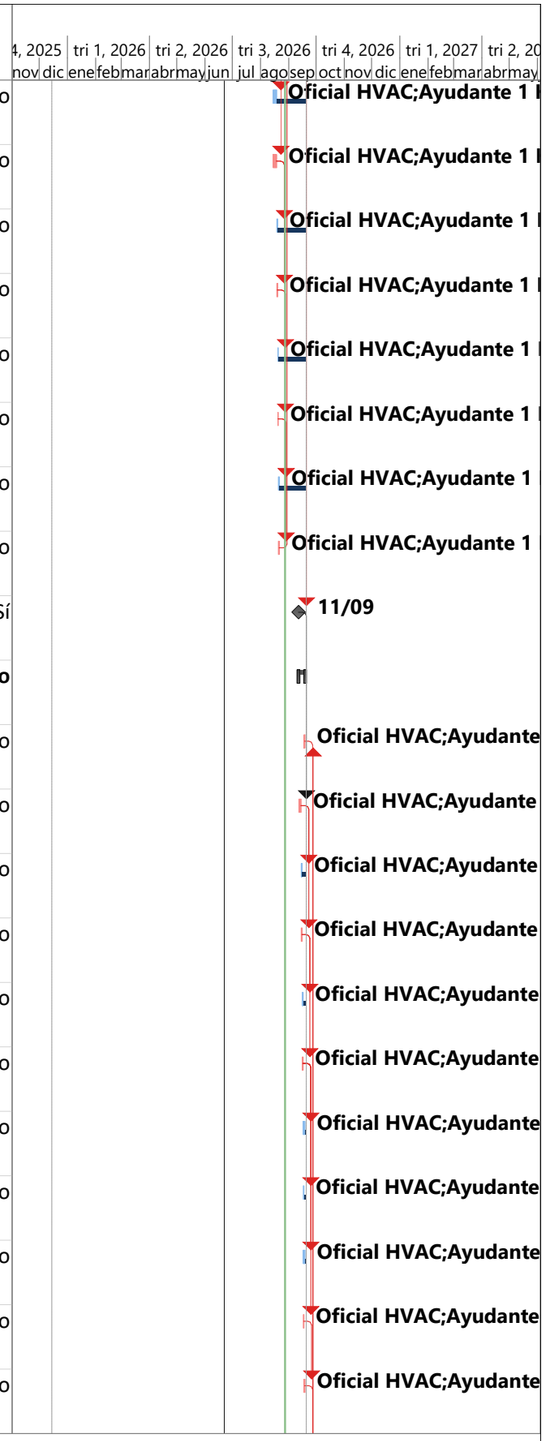

Proyecto: Programacion medici
Fecha: vie 28/08/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Hito de línea base
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	Resumen de línea base
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Línea base	Margen de demora


Id		Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Nombres de los recursos	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	Nivel de esquema	Hito
373			1.9.7.12	17.12 Suministro e instalación de tablero fuerza y control	Oficial H	1 día	vie 18/09/26	sáb 19/09/26	372	COP 6,618,417.00	4	No
374			1.9.8	HITO: SISTEMA AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE PARA		1 día	vie 18/09/26	sáb 19/09/26	362	COP 0.00	3	No
375			**1.10.9**	**NO PREVISTOS MORGUE**		**32 días**	**lun 22/06/26**	**lun 3/08/26**		COP 87,622,072.00	**3**	**No**
376			1.10.9.1	NP-3 Desmonte de grifería existente para ducha Ø1/2"		3 días	lun 22/06/26	mié 24/06/26	6FC+51 días	COP 78,316.00	4	No
377			1.10.9.2	NP-4 Desmonte de divisiones en vidrio templado para duc		3 días	jue 25/06/26	mar 30/06/26	376	COP 281,934.00	4	No
378			1.10.9.3	NP-8 Desmonte de puertas en madera en área de morgue		3 días	mar 30/06/2	vie 3/07/26	377	COP 250,611.00	4	No
379			1.10.9.4	NP-10 Demolicion manual placa de contrapiso. incluye car		5 días	lun 22/06/26	vie 26/06/26	6FC+51 días	COP 1,051,228.00	4	No
380			1.10.9.5	NP-15 Placa de concreto e=18cm Incluye suministro y vaci		10 días	sáb 27/06/26	vie 10/07/26	379	COP 4,717,351.00	4	No
381			1.10.9.6	NP-34 Suministro e instalación de puerta técnica estanca		6 días	lun 22/06/26	mar 30/06/26	6FC+51 días	COP 44,670,560.00	4	No
382			1.10.9.7	NP-35 Suministro, fabricación e instalación de portón met		17 días	sáb 11/07/26	lun 3/08/26	381;380	COP 22,282,983.00	4	No
383			1.10.9.8	NP-36 Suministro e instalación de divisiones en vidrio tem		5 días	mar 30/06/2	lun 6/07/26	377	COP 3,830,344.00	4	No
384			1.10.9.9	NP-37 Perta en aluminio 2.3x0.9, marco en aluminio, enta		4 días	vie 3/07/26	mié 8/07/26	378	COP 3,905,253.00	4	No
385			1.10.9.10	NP-38 Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC Ø3		4 días	lun 22/06/26	jue 25/06/26	6FC+51 días	COP 978,082.00	4	No
386			1.10.9.11	NP-39 Suministro e instalación de válvula flotador mecáni		2 días	lun 22/06/26	mar 23/06/26	6FC+51 días	COP 2,023,360.00	4	No
387			1.10.9.12	NP-41 Suministro e instalación de grifería para ducha agua		2 días	jue 25/06/26	vie 26/06/26	376	COP 2,123,536.00	4	No
388			1.10.9.13	NP-43 Suministro e instalación punto sanitario Ø3" para ca		2 días	vie 26/06/26	mar 30/06/26	385	COP 450,432.00	4	No
389			1.10.9.14	NP-44 Suministro e instalación de punto sanitario en tube		2 días	mar 30/06/2	jue 2/07/26	388	COP 978,082.00	4	No
390			**1.9.9**	**Pruebas Integrales HVAC y Entrega Morgue**		0 días	**sáb 19/09/2**	**sáb 19/09/26**		COP 0.00	**3**	**Sí**
391			1.9.9.1	Pruebas presión caudal renovación aire		0 días	sáb 19/09/26	sáb 19/09/26	374	COP 0.00	4	Sí
392			1.9.9.2	Balanceo sistema HVAC completo morgue		0 días	sáb 19/09/26	sáb 19/09/26	374	COP 0.00	4	Sí
393			1.9.9.3	Pruebas hidráulicas y eléctricas		0 días	sáb 19/09/26	sáb 19/09/26	374	COP 0.00	4	Sí

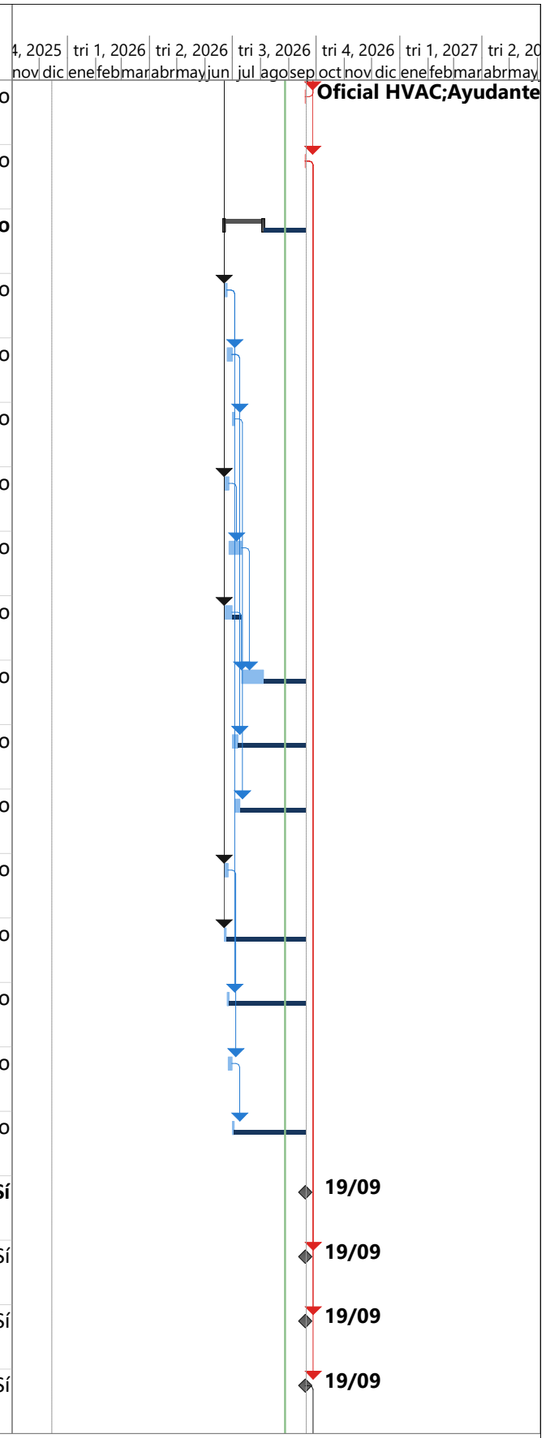

Proyecto: Programacion medici
Fecha: vie 28/08/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Hito de línea base
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	Resumen de línea base
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Línea base	Margen de demora

Id		Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Nombres de los recursos	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	Nivel de esquema	Hito
394			1.10	HITO: MORGUE OPERATIVA - ENTREGA		0 días	sáb 19/09/26	sáb 19/09/26	393	COP 0.00	2	Sí
395			1.11	HITO: PROYECTO COMPLETADO - ENTREGA FINAL		0 días	sáb 19/09/26	sáb 19/09/26	394	COP 0.00	2	Sí



Proyecto: Programacion medici
Fecha: vie 28/08/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Hito de línea base
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	Resumen de línea base
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Línea base	Margen de demora
