	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Consultoría No. 4227 DE 2024 **Consultoría:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

Contrato de Interventoría No. 4262 DE 2024 **Interventoría:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Objeto Contrato de Consultoría: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** 01 al 31 de Enero de 2025

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	x		1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	x		2
1	**INTRODUCCIÓN**				9
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**				10
2.1	Localización				10
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto				10
2.3	Inventario y estado inicial de la vía				11
2.4	Características técnicas del proyecto				11
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**				12
3.1	Información general del contrato				12
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes				13
3.3	Seguimiento Items no previstos				13
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría				13
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORÍA**				
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	x		23
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Consultoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-4		x	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Consultoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-6		x	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Consultoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	x		44
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10		x	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11		x	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	x		46
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Consultoría	MEPI-MN-1IN-15-FR-14		x	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	x		63
		MEPI-MN-IN-3-FR-2		x	
	• Seguimiento Programa de Consultoría		x		65
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	x		73
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	x		75
	• Actas de Comité de Consultoría	MEPI-MN-IN-14-FR-1		x	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	x		49
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				16
5.1	Información general del contrato				16
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor				16
5.3	Informes especialistas y profesionales		x		77
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		x		97
5.5	Informe matriz de riesgos.			x	
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Consultoría e Interventoría				
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.				
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5		x	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	x		99
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	x		122
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	x		124
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15		x	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	x		127
		MEPI-MN-IN-3-FR-2		x	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2		x	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3		x	
7	**Conclusiones y recomendaciones**				18
8	**Anexos**				
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		x		19
8.2	Registro fotográfico y video del avance de la Consultoría		x		22
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas			x	
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente			x	

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 4854 de fecha 15 de Octubre de 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MEPI-MN1-IN-15-FR-2
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **PERIODO MES:** DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4227 de 2024

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

PLAZO INICIAL: 1 MES
FECHA DE INICIO: 02 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO ACUMULADO: 13,13 meses

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 8.700.000.000,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 8.700.000.000,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 4.350.000.000,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 96.222.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4262 DE 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JANNIER SALAS QUEJADA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	8.700.000.000,00		8.700.000.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			8.700.000.000,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS	96.222.000,00	0,00	96.222.000,00	96.222.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				96.222.000,00


INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 8.700.000.000,00
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 192.444.000,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 2,21%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 5
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 5

REGISTRO FOTOGRÁFICO

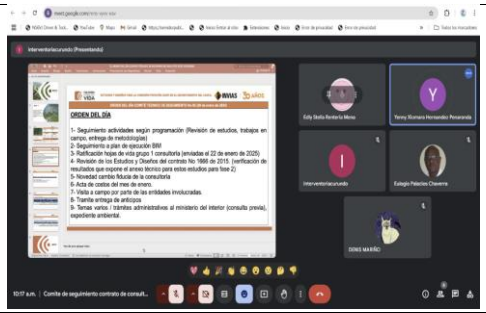

Comité tecnico de seguimiento contrato de consultoría

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No se encuentra en proceso de Multa o Sanción

Firma
Nombre José Octavio Niño Brijaldo
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 01193-0243

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial

INFORME MENSUAL No. 02 DE INTERVENTORÍA.
ENERO DE 2025

INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - UPTC

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 4262 DE 2024 INVIAS – UPTC
ENERO 2025

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. interventoriacurundo@gmail.com

INFORME MENSUAL No. 02 DE INTERVENTORÍA.
ENERO DE 2025

INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
INTERVENTOR

GERMAN EDUARDO PEÑA VASQUEZ
GERENTE DE INTERVENTORÍA

ING. JANNIER SALAS QUEJADA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DEPENDENCIA	No. DE COPIAS
Copia 1 Instituto Nacional de Vías INVIAS Territorial Choco	1
Copia 2 Instituto Nacional de Vías Planta Central	1
Copia 3 Oficina Coordinación Convenios U.P.T.C. Tunja.	1

Contrato No 4262 de 2024

Título Documento	INFORME MENSUAL	No. 02
Responsable de elaboración	Nombre	Ing. Denis Yineth Pino Mariño
Cargo: Ingeniero Residente de estudios	Firma	
Responsable por revisión	Nombre	Ing. José Octavio Niño Brijaldo
Cargo: Ingeniero director de Interventoría	Firma	
Responsable Aprobación	Nombre	Ing. Germán Eduardo Peña Vásquez.
Gerente de Convenio	Firma	
Fecha:	31-ENERO DE 2025	

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. INTRODUCCIÓN. 6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 7
2.1. Localización 7
2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto..... 7
2.3. Inventario y estado inicial de la vía..... 8
2.4. Características técnicas del proyecto 8
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA..... 9
3.1. Información general del contrato 9
3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 10
3.3. Seguimiento Ítems no previstos. 10
3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría..... 10
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORÍA 11
4.1. Informe semanal 11
4.2 Maquinaria y equipo contrato de consultoría. 11
4.9. Otros documentos seguimiento mensual: 12
- Seguimiento a la inversión del anticipo:..... 12
- Seguimiento programa de consultoría: 12
- Seguimiento Programa de inversiones, ... 12
- Actas de comité de obra:..... 12
- Actas de reunión: 12

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 13
5.1 Información general del contrato. 13
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor. 13
5.3 Informes especialistas y profesionales. 14
5.5 Informe matriz de riesgos..... 14
5.6 Información otros programas y aplicativos. 14
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14
6.1. Control diario del equipo de la Interventoría. 14
6.2. Control diario del personal de Interventoría. 14
6.4. Revisión y verificación de pago de aportes legales 15
6.5. Seguimiento a las garantías contractuales. 15

6.6. Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría. 15
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 15
8. ANEXOS..... 16
8.1. Relación de la correspondencia generada entre Consultor e Interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo. 16
8.2 Registro fotográfico y video de avance de la consultoría..... 19
8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales, y de sostenibilidad adelantada..... 19
8.4 Copia de bitácora del mes correspondiente 19

LISTADO DE IMAGENES

Pág.

Imagen 1: Localización del proyecto 7

1. INTRODUCCIÓN.

El Gobierno Nacional a través del programa "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA (…)", ha priorizado un conjunto de proyectos de infraestructura vial de carácter regional con impacto en todo el territorio colombiano, dirigidos a mejorar vías secundarias y terciarias, generando conexiones y fortaleciendo la comunicación entre las diversas poblaciones y regiones del país; frente a lo cual se debe adelantar la coordinación interinstitucional entre el Instituto y las entidades regionales para la estructuración de los proyectos que permita la ejecución de los mismos. Entre esos está el proyecto denominado como "**NOVITA-CURUNDO-SAN JOSE DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO**". el INVIAS identificó la necesidad de contratar los: **ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA**

El objetivo de esta fase es materializar en campo el proyecto definitivo y diseñar todos sus componentes de tal manera que se pueda dar inicio a su construcción, para el mejoramiento de la conexión existente Curundó-San José del Palmar – Cruce El Cairo, con el propósito de contar con los estudios necesarios para la continuidad del proyecto, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba (UTCH), suscribieron el Contrato interadministrativo No 4227 de 2024, cuyo objeto es la elaboración de "ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA", conforme a los estudios previos y la propuesta presentada por la Universidad y aprobada por el INVÍAS.

Así mismo el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) suscribió el contrato interadministrativo No 4262 de 2024 con la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA",

Se presenta en este informe las actividades desarrolladas en el mes de enero de 2025 en donde se describe las acciones de la consultoría y de la interventoría.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1. Localización

El proyecto se localiza entre los Departamento de Chocó Y Valle del Cauca, el corredor se traza desde el cruce El Cairo – San Jose del Palmar hasta llegar a Curundó comprende una longitud aproximada de 51 km los cuales se describen a continuación:

Tramo 1 (K54+000 – K70+000) 16 km
Tramo 2 (K70+000 – K88+000) 18 km
Tramo 3 (K88+000 – K105+000) 17 km

Imagen 1: Localización del proyecto



2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

En el ámbito local la zona de influencia directa e inmediata de la obra está relacionada de manera parcial con las cuencas económicas de los municipios de El Cairo y San José del Palmar en el departamento de Chocó y Valle del Cauca.

En el contexto regional la zona de influencia del proyecto abarca el área sur oriental del Departamento de Chocó, permitiendo que el Municipio de San José del Palmar quede integrado a la Capital del Departamento por una conexión directa, dentro de esta conectividad se incluye los municipios de Novita, Condoto, Istmina, Unión Panamericana (Las Ánimas), Cértegui y Quibdó.

Dentro del marco nacional la red vial en la zona de influencia se extiende a los municipios del Occidente desde el Corregimiento de Curundó hasta Cartago.

El municipio de El Cairo en el departamento del Valle del Cauca tiene una extensión total de 283 km², dista 252 km de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.

Según las proyecciones del DANE, para el año 2015 el municipio cuenta con 9.976 habitantes, de los cuales 2.812 (28%) habitan en la cabecera municipal y 7164 (72%) habitan en la zona rural del municipio.

Las actividades económicas de mayor importancia son la agricultura y el comercio. Los principales cultivos son café, plátano, caña, yuca, fríjol, tomate, aguacate, mora, lulo, granadillas y hortalizas. Las actividades comerciales más destacadas en el municipio guardan relación con los productos de origen agrícola.

El Municipio de San José del Palmar actualmente su economía está consolidada principalmente en la Agricultura, y sus productos bandera son el Chontaduro, Borojo y Cacao. El sector maderero ha representado por muchas décadas la economía del municipio, pero en los últimos años se ha recortado esta labor debido a la campaña existente de la preservación y conservación de bosques y cuencas hidrográficas. El 90% de la actividad económica es de subsistencia, con pocos excedentes para comercialización o acumulación.

2.3. Inventario y estado inicial de la vía

No aplica

2.4. Características técnicas del proyecto

Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera, vigilancia, control y verificación de las actividades que se ejecutarán para la vía de conexión CURUNDO – SAN JOSE DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO, EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA. a nivel fase III
Las principales actividades de vigilancia a desarrollar en el proyecto de Interventoría como resultado del presente Convenio Interadministrativo son las siguientes:
Para los tramos 1 a 3 a nivel fase III.

1- Volumen I. Estudios Topográficos
2- Volumen II. Estudio de Tránsito, capacidad y niveles de servicio
3- Volumen III. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico
4- Volumen IV. Estudio de Seguridad Vial
5- Volumen V. Estudio de Geología y Geomorfología local
6- Volumen VI. Estudio de Hidrología de detalle
7- Volumen VII. Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes
8- Volumen VIII. Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones de Puentes y otras estructuras
9- Volumen IX. Estudio de Hidráulica, Hidrología y Socavación

10- Volumen X. Estudio y Diseño de Pavimientos
11- Volumen XI. Estudio y Diseño de Estructuras
12- Volumen XI. Estudio de Urbanismo y Paisajismo
13- Volumen XIII. Estudio de Redes Hidrosanitarias y Secas
14- Volumen XIV. Estudio de Riesgos
15- Volumen XV. Estudio de Cantidades de Obra, Análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones de obra
16- Volumen XVI. Evaluación socioeconómica y financiera del proyecto
17- Volumen XVII. Estudio componentes Ambiental, Social, Predial y Sostenibilidad
18- Volumen XVII. Volumen Técnico BIM (VTB-EIR)
19- Volumen XIX. Informe final ejecutivo

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.

3.1. Información general del contrato.

TIPO DE CONTRATO:	CONSULTORÍA
CONTRATO No. Y FECHA:	**4227 de 2024**
CONSULTOR:	**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA**
OBJETO:	**ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA**
VALOR INICIAL:	**$8.700.000.000**
PLAZO TOTAL CONTRATO:	**1 mes.**
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:	**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA Y PEDAGOGICA DE COLOMBIA** **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4262 DE 2024**
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	**891800330-1**
SUPERVISOR:	**ING. JANNIER SALAS QUEJADA** **Resolución de designación No. 4854 de fecha 15 de octubre de 2024**
FECHA DE INICIO:	**02 DE DICIEMBRE DE 2024**
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	**31 DE DICIEMBRE DE 2024**
PRORROGA No 01	**12 MESES HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025**
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN	**31 DE DICIEMBRE DE 2025**

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes.

La consultoría realizo las siguientes actividades.

- Revisión información secundaria del proyecto
- Respuestas a observaciones recibidas por parte de interventoría para volumen XVII de los componentes ambiental y social, predial y de sostenibilidad.
- Elaboración de oficios a entidades gubernamentales y privadas
- Análisis de posibles conflictos de interés con otros proyectos e infraestructura existentes.
- Elaboración de plan de calidad de estudios y diseños
- Elaboración del mapa de localización.
- Reunión para la socialización del plan de ejecución BIM
- Socialización del Plan de Ejecución BIM con los profesionales de grupo 1 de consultoría
- Respuestas a observaciones recibidas por parte de interventoría el Plan de Ejecución BIM
- Recopilación de estudios y diseños existentes de utilidad para el proyecto
- Ajustes realizados según las observaciones del Plan de Ejecución BIM (BEP), oficio DC-009-2024
- Revisión y envió de información secundaria a profesionales de la consultoría
- Comité de seguimiento contrato consultoría
- Remisión de oficios a entidades gubernamentales y privadas
- Se envía hojas de vida de algunos profesionales de su equipo para revisión y aprobación por parte de la interventoría.

3.3. Seguimiento Ítems no previstos. No aplica para este periodo

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

La interventoría realizo las siguientes actividades

- Revisión de cronograma de actividades y flujo de caja para el desarrollo de contrato 4227 de 2024.
- Observaciones al Plan de Ejecución BIM (BEP)
- Revisión hojas de vida de algunos profesionales especialistas de la consultoría

- Comité técnico de seguimiento mensual
- Mesa de trabajo consultoría e interventoría con el fin de revisar los estudios y diseños del contrato 1666 de 2015
- Solicitud plan de contingencia por atraso presentado por la consultoría

A continuación, se presenta cuadro de seguimiento actas de costos y amortización del anticipo.

CONTRATO 4227 DE 2024 - ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA						
Acta No	**PERIODO**	**VALOR BASICO**	**VALOR TOTAL ACTA**	**ANTICIPO AMORTIZADO**	**VALOR REAL AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**	**SALDO ANTICIPO**
ANTICIPO			$ 4.350.000.000,00			
1	dic-24	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 48.111.000,00	$ 48.111.000,00	$ 4.301.889.000,00
2	ene-25	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 48.111.000,00	$ 48.111.000,00	$ 4.253.778.000,00
TOTALES		**$ 192.444.000,00**	**$ 192.444.000,00**	**$ 96.222.000,00**	**$ 96.222.000,00**	**$ 4.253.778.000,00**

En el mes enero de 2025 la consultoría lleva un avance financiero ejecutado de 2.21% y un porcentaje programado de 8.41%. se presenta un atraso de 6.2 por lo cual la interventoría solicito un plan de contingencia.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

4.1. Informe semanal

Para el contrato 4262 de 2024 se presentarán los informes semanales del mes de diciembre de 2024 y enero de 2025 en el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-3**

4.2 Maquinaria y equipo contrato de consultoría.

Para este periodo no aplica el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-4**. No se presenta

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social de consultoría

El control diario del personal del consultor se presentará en el mes de febrero de 2025 en el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-6**, con sus respectivos soportes teniendo en cuenta que la Universidad tecnológica de Chocó inicio proceso de constitución de nuevo contrato de encargo para la vigencia 2025 con Fiduagraria

4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de consultoría

La información financiera del contrato de consultoría 4227 de 2024 se expone en el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-9.**

4.5 Estado general del tiempo.

El control del estado general del tiempo para el contrato 4227 contemplado en el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-10** no se presenta para este mes.

4.6 Resumen ensayos de laboratorio.

Ya que no se realizaron ensayos de laboratorio durante el presente periodo no se presenta el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-11**.

4.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de consultoría

Se presenta formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-13**. Con las pólizas

4.8 Seguimiento al plan de calidad contrato de consultoría

Para el contrato 4227 de 2024 no se presenta el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-14**, puesto que las actividades fueron netamente administrativas.

4.9. Otros documentos seguimiento mensual:

- **Seguimiento a la inversión del anticipo:** Se anexa en el presente informe el formato **MEPI-MN1-IN-3-FR-1** y el formato **MEPI-MN1-IN-3-FR-2** se presentará tan pronto se empiecen a realizar pagos por parte de la UTCH.

- **Seguimiento programa de consultoría:** Con respecto al contrato 4227 de 2024 se tiene que para el mes de enero de 2024 un porcentaje ejecutado de 2.21% y un porcentaje programado de 8.41%.

- **Seguimiento Programa de inversiones,** estas se pueden ver plasmadas en los formatos **MEPI-MN-IN-6-FR-1**, y el formato **MEPI-MN-IN-6-FR-2**

- **Actas de comité de obra:** No aplica para este proyecto

- **Actas de reunión:** Se presentan actas de reunión

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato.

Se firmo el 08 de noviembre del año 2024 el contrato interadministrativo 4262 de 2024 a continuación se presenta la información del contrato:

CONTRATO	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4262 DE 2024**
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA
INTERVENTORIA **ENTIDAD CONTRATANTE**	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC NIT. 891800330 – 1 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT. 800215807 -2
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.375.000.000
FECHA DE INICIO	02 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA No 1	12 MESES HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor.

El contrato interadministrativo 4262 de 2024, durante el periodo del 01 al 31 de enero de 2025 realizo las siguientes actividades:

- Revisión y aprobación hojas de vida de los profesionales especialistas de la consultoría para el desarrollo del contrato 4227 de 2024.
- Revisión de cronograma de actividades y flujo de caja para el desarrollo de contrato 4227 de 2024.
- Observaciones al Plan de Ejecución BIM (BEP) presentado por el consultor
- Revisión hojas de vida de algunos profesionales especialistas de la consultoría
- Comité técnico de seguimiento mensual
- Mesa de trabajo consultoría e interventoría con el fin de revisar los estudios y diseños del contrato 1666 de 2015
- Solicitud plan de contingencia por atraso presentado por la consultoría

5.3 Informes especialistas y profesionales.

Se presentan los informes de los siguientes profesionales
- Director de interventoría
- Coordinador de interventoría
- Residente de interventoría

5.4 Informe del programa anual de caja – PAC.

Se presenta programa mensual anual PAC para el mes de enero de 2025

5.5 Informe matriz de riesgos

No aplica

5.6 Información otros programas y aplicativos.

El Pliego de condiciones no exige y el INVIAS no ha solicitado otros programas y aplicativos, por lo tanto, no aplica.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. Control diario del equipo de la Interventoría.

Para el presente periodo no se utilizó equipo por parte de la interventoría.

6.2. Control diario del personal de Interventoría.
Se presenta formato de control diario de interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-7

6.3. Información financiera Contrato de Interventoría.

Información financiera Contrato de Interventoría. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9. En el cual el Interventor y el Supervisor del Contrato de Interventoría deben llevar el control financiero y presupuestal e indicar las acciones que conlleven de forma proactiva a la ejecución del contrato, con el fin de que se ejecuten los recursos asignados para cada vigencia.

A la fecha se han presentado las siguientes actas de costos:
En el mes de diciembre de 2024 se presenta un acta de costos por un valor de $ 45.222.400
En el mes de enero de 2025 se presento un acta de costos por un valor de $ 6.159.800

CONTRATO 2442 DE 2024 - INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA						
Acta No	**PERIODO**	**VALOR BASICO**	**VALOR TOTAL ACTA**	**ANTICIPO AMORTIZADO**	**VALOR REAL AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**	**SALDO ANTICIPO**
ANTICIPO			$	1.187.500.000,00		
1	dic-24	$ 45.222.400,00	$ 45.222.400,00	$ 22.611.200,00	$ 22.611.200,00	$ 1.164.888.800,00
2	ene-25	$ 6.159.800,00	$ 6.159.800,00	$ 3.079.900,00	$ 3.079.900,00	$ 1.161.808.900,00
		$ 51.382.200,00	**$ 51.382.200,00**	**$ 25.691.100,00**	**$ 25.691.100,00**	**$ 1.161.808.900,00**

6.4. Revisión y verificación de pago de aportes legales

Se presentará formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-7** con el control de aportes legales del personal de la interventoría

6.5. Seguimiento a las garantías contractuales.

Se realiza seguimiento y control mensual a las garantías contractuales por lo cual se presenta el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-13**

6.6. Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría.

No se presenta seguimiento a plan de calidad de contrato de consultoría ya que se realizaron actividades netamente administrativas.

6.7. Otros Documentos.

No se presentan otros documentos

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El día 27 de enero de 2025 la consultoría envía el Plan de ejecución BIM ajustado, el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
- Se solicita al consultor plan de contingencia puesto que no se ha cumplido con la programación
- Se solicita al consultor informe diagnóstico de los estudios y diseños del contrato 1666 de 2015 insumo para el contrato actual.

8. ANEXOS

8.1. Relación de la correspondencia generada entre Consultor e Interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

A continuación, se presenta la correspondencia enviada y recibida en el periodo.

CORRESPONDENCIA ENVIADA


INFORMACION DEL EMISOR DEL DOCUMENTO			INFORMACION DEL DESTINATARIO		
No. Consecutivo	**fecha del documento**	**Asunto**	**INVIAS**	**CONSULTORÍA**	**OTRO**
C4262-005-2024	03/12/2024	Aprobación hojas de vida		**X**	
C4262-006-2024	04/12/2024	Concepto solicitud de Prorroga No 01 al contrato interadministrativo 4227 de 2024 cuyo objeto es “Estudios y diseños para los estudios y Diseños a nivel de fase III (Definitivos) de la conexión Curundo – San José del Palmar- Cruce El Cairo en los departamentos de Chocó y Valle del Cauca.		**X**	
C4262-007-2024	03/12/2024	Solicitud de Prorroga No 01 al contrato de interventoría 4262 de 2024	**X**		
C4262-008-2024	05/12/2024	Envió de documentos para anticipo del contrato interadministrativo de consultoría No 4227 de 2024.	**X**		
C4262-009-2024	23/12/2024	Observaciones de la interventoría a entrega del Plan de Ejecución BIM (BEP), oficio DC-009-2024		**X**	

C4262-010-2025	30/12/2024	Respuesta a comunicación DC-015-2024- Entrega de la propuesta de desarrollo del Volumen XVII de los estudios ambiental y social, predial y sostenibilidad.		X	
C4262-011-2025	29/12/2024	Propuesta de desarrollo del Volumen XVII de los estudios ambiental y social, predial y sostenibilidad.	X		
C4262-012-2025	21/01/2025	Reiteración observaciones de la interventoría a entrega del Plan de Ejecución BIM (BEP), oficio DC-009-2024		X	
C4262-013-2025	21/01/2025	Solicitud informe de diagnostico de los Estudios y Diseños a fase 2 realizados a través del contrato 1666-2015 insumo del actual contrato.		X	
C4262-014-2025	22/01/2025	Solicitud de entrega de informes semanales		X	
C4262-015-2025	02/01/2025	Solicitud contratación de personal			X
C4262-016-2025	28/01/2025	Solicitud de información actividades en campo y plan de contingencia sobre actividades programadas		X	
C4262-017-2025	30/01/2025	Relación de personal aprobado por la interventoría para ser ratificado por el INVIAS		X	

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Fecha de radicación	Consecutivos Externo / Numero de Radicado	Fecha del documento	REMITENTE		Dirigido a:
			Empresa	Asunto	
16/12/2024	2024S-VBOG-095386	16/12/2024	INVIAS	Aprobación hojas de vida profesionales del contrato interventoría N° 4262 de 2024 proyecto Conexión - Curundo - San José del Palmar - Crucero - El Cairo	UPTC - Convenio 4262 de 2024
16/12/2024	DC - 009 - 2024	16/12/2024	UTCH	Entrega de plan de ejecución BIM (BEP)	UPTC - Convenio 4262 de 2024
26/12/2024	DC – 015-2024	26/12/2024	UTCH	Entrega de la propuesta de desarrollo del volumen XVII de los estudios ambiental y social, predial y de sostenibilidad.	UPTC - Convenio 4262 de 2024
13/01/2025	DC – 019-2025	13/01/2025	UTCH	Entrega hojas de vida profesionales consultoría	UPTC - Convenio 4262 de 2024
14/01/2024	2025S-VBOG-001345	14/01/2024	INVIAS	Trámite de la prórroga No 1 del Contrato Interadministrativo No 4262 de 2024 y cumplimiento de obligaciones contractuales.	UPTC - Convenio 4262 de 2024
27/01/2025	DC – 020-2025	27/01/2025	UTCH	Respuesta a las observaciones realizadas por la Interventoría sobre la Entrega del Plan de Ejecución BIM (BEP).	UPTC - Convenio 4262 de 2024
31/01/2025	2025S-VBOG-005334	31/01/2025	INVIAS	RATIFICACIÓN HOJAS DE VIDA CTO INTERADMINISTRATIVO No 4227-2024	UPTC - Convenio 4262 de 2024

8.2 Registro fotográfico y video de avance de la consultoría

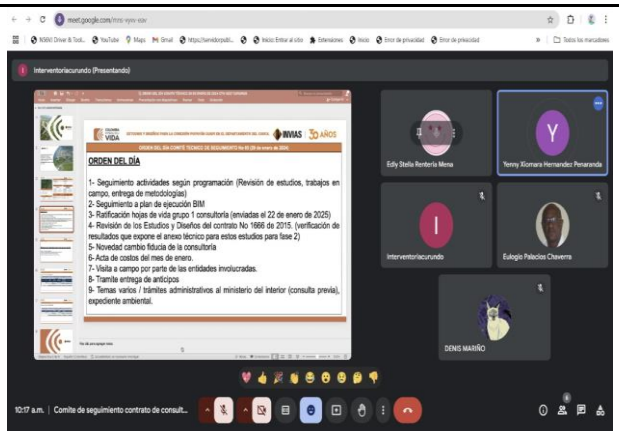	
Reunión de seguimiento programación consultoría	Asistencia a comité técnico consultoría e interventoría

8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales, y de sostenibilidad adelantada.

No se presenta para el mes de enero de 2025

8.4 Copia de bitácora del mes correspondiente

No se presenta copia de bitácora para el mes de enero de 2025

MEPI-MN1-IN-15-FR-3
INFORME SEMANAL

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ — SEMANA No.: 5 del 30-dic al 5-ene — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DARBIN ANTONIO MOSQUERA MOSQUERA

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORÍA: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VOLÚMENES O PRODUCTOS TÉCNICOS ENTREGABLES DE FASE III: 1. Entregable estudios topográficos; 2 entregable estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio; 3 entregable estudio de trazado y diseño geométrico; 4 entregable estudio de seguridad vial; 5 entregable estudio de geología y geomorfología local; 6 entregable estudio de hidrogeología de detalle; 7 entregable estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y puentes de materiales; 8 entregable estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; 9 entregable hidráulica, hidrología, y socavación; 10 entregable estudio y diseño de pavimentos; 11 entregable estudio y diseño de estructuras; 12 entregable estudio de urbanismo y paisajismo; 13 estudio redes hidrosanitarias y secas; 14 entregable estudio de riesgos; 15 entregable estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones; 16 entregable evaluación socioeconómica y financiera del proyecto; 17 entregable ambiental, social, predial y sostenibilidad; 18 entregable volumen técnico de BIM; 19 entregable informe final.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA, lo cual incluye el desarrollo de 19 volúmenes.

CONTRATO DE CONSULTORÍA:

CONSULTORÍA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4227 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 8.700.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 4.350.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4262 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 1.187.500.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.350.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.350.000.000
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.187.500.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.187.500.000

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORÍA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA (A):	$ 8.700.000.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 140.571.578,95	1,62%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 80.619.368,44	0,93%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (59.952.210,51)	-0,69%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 140.571.578,95	1,62%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 80.619.368,44	0,93%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (59.952.210,51)	-0,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.944.315,79	0,26%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.154.842,11	0,23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 48.111.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 54.318.731,96	2,29%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 45.222.400,00	1,90%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.784.324,35	0,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 22.611.200,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.350.000.000,00
Amortizado $	$ 48.111.000
Saldo $	$ 4.301.889.000,00

	INDICADOR I/C
En el mes:	**$ -**
Acumulado:	$ -

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.187.500.000,00
Amortizado $	$ 22.611.200
Saldo $	$ 1.164.888.800,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 1,62% Avance o Atraso Físico % -0,69%
Meta Física Ejecutada % 0,23%

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL

Meta Física (Programa de consultoría) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	TRAMO 1					Total	%
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	UND		2024	2024	Prog	$ 1.430.754.000,00					$ 1.430.754.000,00	16,445%
					Ejec	$ 20.154.842,11					$ 20.154.842,11	0,232%

GRUPO 2 -COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
	Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	TRAMO 1					Total	%
1	VOLUMEN I. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.	UND		2025	2025	Prog	$ 69.000.000,00					$ 69.000.000,00	0,79%
						Ejec							
2	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO.	UND		2025	2025	Prog	$ 60.000.000,00					$ 60.000.000,00	0,69%
						Ejec							
3	VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO.	UND		2025	2025	Prog	$ 165.000.000,00					$ 165.000.000,00	1,90%
						Ejec							
4	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL.	UND		2025	2025	Prog	$ 42.000.000,00					$ 42.000.000,00	0,48%
						Ejec							
5	VOLUMEN V. ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA LOCAL.	UND		2025	2025	Prog	$ 106.000.000,00					$ 106.000.000,00	1,22%
						Ejec							
6	VOLUMEN VI. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	UND		2025	2025	Prog	$ 125.000.000,00					$ 125.000.000,00	1,44%
						Ejec							
	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES.	UND		2025	2025	Prog	$ 368.000.000,00					$ 368.000.000,00	4,23%
						Ejec							
	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 235.000.000,00					$ 235.000.000,00	2,70%
						Ejec							
	VOLUMEN IX. HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN.	UND		2025	2025	Prog	$ 190.000.000,00					$ 190.000.000,00	2,18%
						Ejec							
	VOLUMEN X. ESTUDIO Y DISEÑOS DE PAVIMENTO.	UND		2025	2025	Prog	$ 73.000.000,00					$ 73.000.000,00	0,84%
						Ejec							
	VOLUMEN XI. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 481.000.000,00					$ 481.000.000,00	5,53%
						Ejec							
7	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.	UND		2025	2025	Prog	$ 57.000.000,00					$ 57.000.000,00	0,66%
						Ejec							
	VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 47.000.000,00					$ 47.000.000,00	0,54%
						Ejec							
	VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE RIESGOS	UND		2025	2025	Prog	$ 93.000.000,00					$ 93.000.000,00	1,07%
						Ejec							
8	VOLUMEN XV. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE OBRA	UND		2025	2025	Prog	$ 56.000.000,00					$ 56.000.000,00	0,64%
						Ejec							
9	VOLUMEN XVI. EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL	UND		2025	2025	Prog	$ 54.000.000,00					$ 54.000.000,00	0,62%
						Ejec							
10	VOLUMEN XVII. AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD.	UND		2025	2025	Prog	$ 423.000.000,00					$ 423.000.000,00	4,86%
						Ejec							
11	VOLUMEN XVIII. VOLUMEN TÉCNICO BIM	UND		2025	2025	Prog	$ 46.000.000,00					$ 46.000.000,00	0,53%
						Ejec							
	COSTO TOTAL ENTREGABLES											**$ 2.690.000.000,00**	30,9%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4:

GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS												
Meta Física (Programa de consultoría) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**							
Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**TRAMO 1**					**Total**	**%**
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		2025	2025	Prog	$ 4.579.246.000,00					$ 4.579.246.000,00	52,635%
					Ejec							

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONS	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


El día 26 de diciembre se realizo la reunión virtual con todas las áreas que comprenden el volumen en donde se expuso por parte de la consultoría la propuesta de desarrollo del volumen XVII, para esta reunión se deja acta que corresponde al acta de reunión No 02 con los compromisos y acuerdos. Así mismo la consultoría envía la propuesta, la misma es revisada por la interventoría en donde se mencionan ajustes y se envía la versión ajustada al INVIAS para que desde la subdirección de planificación e infraestructura se comparta a las áreas ambiental, social, predial y de sostenibilidad para su revisión y comentarios.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La consultoría envía el 16 de diciembre de 2024 en comunicación DC-009-2024 el Plan de ejecución BIM
Se realiza una reunión con la consultoría, interventoría y con el área BIM del INVIAS para definir los lineamientos para la entrega de este documento el día 16 de diciembre de 2024
El día 23 de diciembre de 2024 la interventoría envía en comunicación C4262-009-2024 observaciones al plan de ejecución BIM y reitera estas observaciones el 21 de enero de 2025.
Se realiza reunión presencial en las instalaciones del INVIAS Bogotá con el área ambiental y social con el fin de discutir lineamientos para la ejecución elaboración y entrega del Volumen XVII de los estudios ambiental y social, predial y sostenibilidad el día 19 de diciembre de 2024, de esta reunión se acuerda una reunión virtual para el día 26 de diciembre con el área de sostenibilidad, ambiental, social, predial del INVIAS en donde el consultor expondrá una propuesta para el desarrollo de este volumen y que todas las partes que revisan este documento estén de acuerdo con su ejecución para no tener retrocesos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

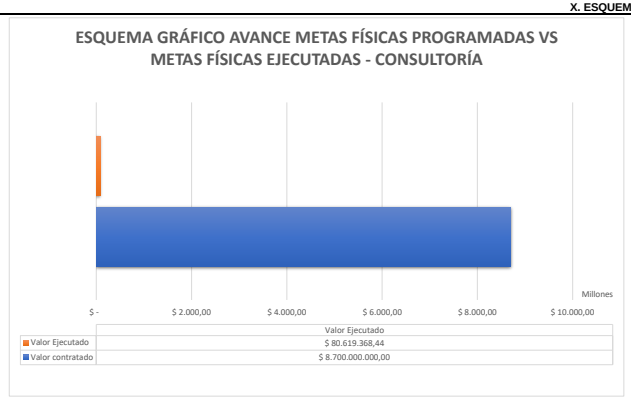

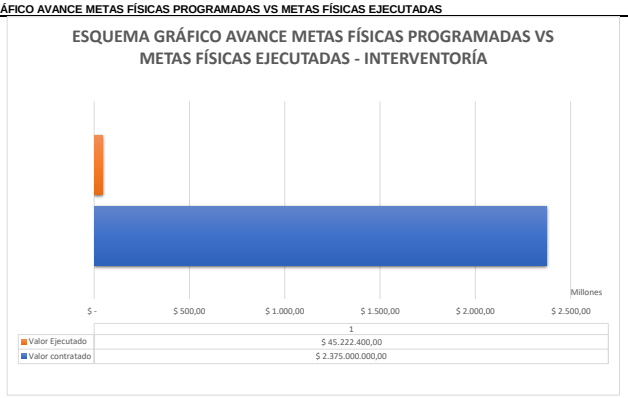

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONSULTOR	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: Jose Octavio Niño Brijaldo
	Matrícula Profesional No.: 01193-0243

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ — SEMANA No.: 6 del 6-ene al 12-ene Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DARBIN ANTONIO MOSQUERA MOSQUERA

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORÍA: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VOLÚMENES O PRODUCTOS TÉCNICOS ENTREGABLES DE FASE III: 1. Entregable estudios topográficos; 2 entregable estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio; 3 entregable estudio de trazado y diseño geométrico; 4 entregable estudio de seguridad vial; 5 entregable estudio de geología y geomorfología local; 6 entregable estudio de hidrogeología de detalle; 7 entregable estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y puentes de materiales; 8 entregable estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; 9 entregable hidráulica, hidrología, y socavación; 10 entregable estudio y diseño de pavimentos; 11 entregable estudio y diseño de estructuras; 12 entregable estudio de urbanismo y paisajismo; 13 estudio redes hidrosanitarias y secas; 14 entregable estudio de riesgos; 15 entregable estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones; 16 entregable evaluación socioeconómica y financiera del proyecto; 17 entregable ambiental, social, predial y sostenibilidad; 18 entregable volumen técnico de BIM; 19 entregable informe final.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA, lo cual incluye el desarrollo de 19 volúmenes.

CONTRATO DE CONSULTORÍA:

CONSULTORÍA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4227 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 8.700.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 4.350.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4262 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 1.187.500.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024			
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.187.500.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.187.500.000			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORÍA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA (A):	$ 8.700.000.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 193.665.894,74	2,23%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 100.774.210,55	1,16%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (92.891.684,19)	-1,07%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 193.665.894,74	2,23%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 100.774.210,55	1,16%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (92.891.684,19)	-1,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 53.094.315,79	0,61%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.154.842,11	0,23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 48.111.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 68.506.215,00	2,88%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 45.222.400,00	1,90%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14.187.483,00	0,60%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 22.611.200,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.350.000.000,00
Amortizado $	$ 48.111.000
Saldo $	$ 4.301.889.000,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	$ -
Acumulado:	$ -

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.187.500.000,00
Amortizado $	$ 22.611.200
Saldo $	$ 1.164.888.800,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 2,23% Avance o Atraso Físico % -1,07%
Meta Física Ejecutada % 0,23%

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL

Meta Física (Programa de consultoría) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	TRAMO 1					Total	%
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	UND		2024	2024	Prog	$ 1.430.754.000,00					$ 1.430.754.000,00	16,445%
					Ejec	$ 20.154.842,11					$ 20.154.842,11	0,232%

GRUPO 2 -COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
	Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	TRAMO 1					Total	%
1	VOLUMEN I. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.	UND		2025	2025	Prog	$ 69.000.000,00					$ 69.000.000,00	0,79%
						Ejec							
2	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO.	UND		2025	2025	Prog	$ 60.000.000,00					$ 60.000.000,00	0,69%
						Ejec							
3	VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO.	UND		2025	2025	Prog	$ 165.000.000,00					$ 165.000.000,00	1,90%
						Ejec							
4	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL.	UND		2025	2025	Prog	$ 42.000.000,00					$ 42.000.000,00	0,48%
						Ejec							
5	VOLUMEN V. ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA LOCAL.	UND		2025	2025	Prog	$ 106.000.000,00					$ 106.000.000,00	1,22%
						Ejec							
6	VOLUMEN VI. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	UND		2025	2025	Prog	$ 125.000.000,00					$ 125.000.000,00	1,44%
						Ejec							
	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES.	UND		2025	2025	Prog	$ 368.000.000,00					$ 368.000.000,00	4,23%
						Ejec							
	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 235.000.000,00					$ 235.000.000,00	2,70%
						Ejec							
	VOLUMEN IX. HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN.	UND		2025	2025	Prog	$ 190.000.000,00					$ 190.000.000,00	2,18%
						Ejec							
	VOLUMEN X. ESTUDIO Y DISEÑOS DE PAVIMENTO.	UND		2025	2025	Prog	$ 73.000.000,00					$ 73.000.000,00	0,84%
						Ejec							
	VOLUMEN XI. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 481.000.000,00					$ 481.000.000,00	5,53%
						Ejec							
7	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.	UND		2025	2025	Prog	$ 57.000.000,00					$ 57.000.000,00	0,66%
						Ejec							
	VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 47.000.000,00					$ 47.000.000,00	0,54%
						Ejec							
	VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE RIESGOS	UND		2025	2025	Prog	$ 93.000.000,00					$ 93.000.000,00	1,07%
						Ejec							
8	VOLUMEN XV. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE OBRA	UND		2025	2025	Prog	$ 56.000.000,00					$ 56.000.000,00	0,64%
						Ejec							
9	VOLUMEN XVI. EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL	UND		2025	2025	Prog	$ 54.000.000,00					$ 54.000.000,00	0,62%
						Ejec							
10	VOLUMEN XVII. AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD.	UND		2025	2025	Prog	$ 423.000.000,00					$ 423.000.000,00	4,86%
						Ejec							
11	VOLUMEN XVIII. VOLUMEN TÉCNICO BIM	UND		2025	2025	Prog	$ 46.000.000,00					$ 46.000.000,00	0,53%
						Ejec							
	COSTO TOTAL ENTREGABLES											**$ 2.690.000.000,00**	30,9%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4:

GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS												
Meta Física (Programa de consultoría) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**							
Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**TRAMO 1**					**Total**	**%**
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		2025	2025	Prog	$ 4.579.246.000,00					$ 4.579.246.000,00	52,635%
					Ejec							

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONS	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La consultoría envía el 16 de diciembre de 2024 en comunicación DC-009-2024 el Plan de ejecución BIM
Se realiza una reunión con la consultoría, interventoría y con el área BIM del INVIAS para definir los lineamientos para la entrega de este documento el día 16 de diciembre de 2024
El día 23 de diciembre de 2024 la interventoría envía en comunicación C4262-009-2024 observaciones al plan de ejecución BIM y reitera estas observaciones el 21 de enero de 2025.
Se realiza reunión presencial en las instalaciones del INVIAS Bogotá con el área ambiental y social con el fin de discutir lineamientos para la ejecución elaboración y entrega del Volumen XVII de los estudios ambiental y social, predial y sostenibilidad el día 19 de diciembre de 2024, de esta reunión se acuerda una reunión virtual para el día 26 de diciembre con el área de sostenibilidad, ambiental, social, predial del INVIAS en donde el consultor expondrá una propuesta para el desarrollo de este volumen y que todas las partes que revisan este documento estén de acuerdo con su ejecución para no tener retrocesos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

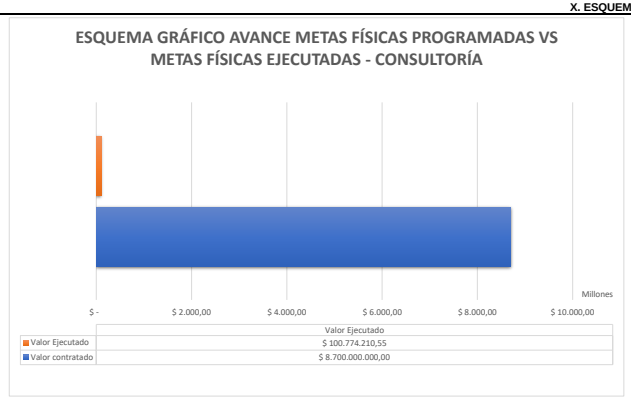


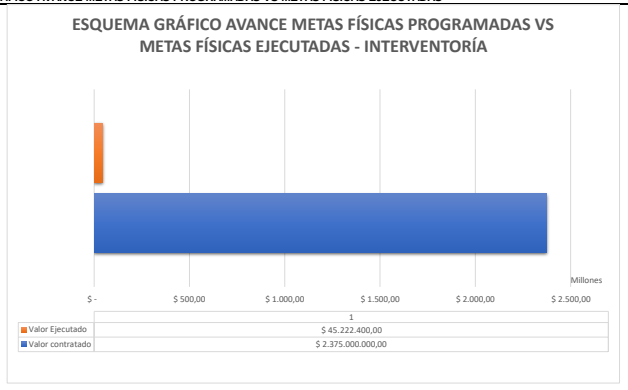

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

FECHA: 12/01/2025 (Día / Mes / Año)

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

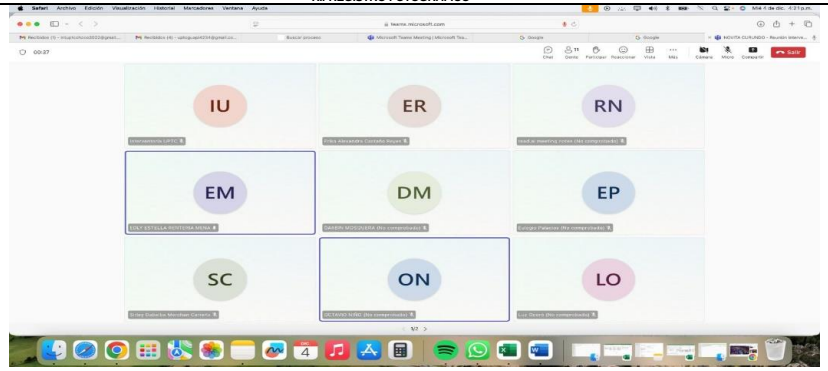

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONSULTOR	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: Jose Octavio Niño Brijaldo
	Matrícula Profesional No.: 01193-0243

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ — SEMANA No.: 7 del 13-ene al 19-ene Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DARBIN ANTONIO MOSQUERA MOSQUERA

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORÍA: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VOLÚMENES O PRODUCTOS TÉCNICOS ENTREGABLES DE FASE III: 1. Entregable estudios topográficos; 2 entregable estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio; 3 entregable estudio de trazado y diseño geométrico; 4 entregable estudio de seguridad vial; 5 entregable estudio de geología y geomorfología local; 6 entregable estudio de hidrogeología de detalle; 7 entregable estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y puentes de materiales; 8 entregable estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; 9 entregable hidráulica, hidrología, y socavación; 10 entregable estudio y diseño de pavimentos; 11 entregable estudio y diseño de estructuras; 12 entregable estudio de urbanismo y paisajismo; 13 estudio redes hidrosanitarias y secas; 14 entregable estudio de riesgos; 15 entregable estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones; 16 entregable evaluación socioeconómica y financiera del proyecto; 17 entregable ambiental, social, predial y sostenibilidad; 18 entregable volumen técnico de BIM; 19 entregable informe final.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA, lo cual incluye el desarrollo de 19 volúmenes.

CONTRATO DE CONSULTORÍA:

CONSULTORÍA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4227 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 8.700.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 4.350.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4262 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 1.187.500.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.350.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.350.000.000
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.187.500.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.187.500.000

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORÍA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA (A):	$ 8.700.000.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 242.654.662,14	2,79%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 120.929.052,66	1,39%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (121.725.609,48)	-1,40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 242.654.662,14	2,79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 120.929.052,66	1,39%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (121.725.609,48)	-1,40%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 53.094.315,79	0,61%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.154.842,11	0,23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 48.111.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 98.454.032,00	4,15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 45.222.400,00	1,90%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.947.816,00	1,26%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 22.611.200,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.350.000.000,00
Amortizado $	$ 48.111.000
Saldo $	$ 4.301.889.000,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	$ -
Acumulado:	$ -

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.187.500.000,00
Amortizado $	$ 22.611.200
Saldo $	$ 1.164.888.800,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 2,79%
Meta Física Ejecutada % 0,23%
Avance o Atraso Físico % -1,40%

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL

Meta Física (Programa de consultoría) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	TRAMO 1					Total	%
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	UND		2024	2024	Prog	$ 1.430.754.000,00					$ 1.430.754.000,00	16,445%
					Ejec	$ 20.154.842,11					$ 20.154.842,11	0,232%

GRUPO 2 -COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
	Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	TRAMO 1					Total	%
1	VOLUMEN I. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.	UND		2025	2025	Prog	$ 69.000.000,00					$ 69.000.000,00	0,79%
						Ejec							
2	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO.	UND		2025	2025	Prog	$ 60.000.000,00					$ 60.000.000,00	0,69%
						Ejec							
3	VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO.	UND		2025	2025	Prog	$ 165.000.000,00					$ 165.000.000,00	1,90%
						Ejec							
4	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL.	UND		2025	2025	Prog	$ 42.000.000,00					$ 42.000.000,00	0,48%
						Ejec							
5	VOLUMEN V. ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA LOCAL.	UND		2025	2025	Prog	$ 106.000.000,00					$ 106.000.000,00	1,22%
						Ejec							
6	VOLUMEN VI. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	UND		2025	2025	Prog	$ 125.000.000,00					$ 125.000.000,00	1,44%
						Ejec							
	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES.	UND		2025	2025	Prog	$ 368.000.000,00					$ 368.000.000,00	4,23%
						Ejec							
	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 235.000.000,00					$ 235.000.000,00	2,70%
						Ejec							
	VOLUMEN IX. HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN.	UND		2025	2025	Prog	$ 190.000.000,00					$ 190.000.000,00	2,18%
						Ejec							
	VOLUMEN X. ESTUDIO Y DISEÑOS DE PAVIMENTO.	UND		2025	2025	Prog	$ 73.000.000,00					$ 73.000.000,00	0,84%
						Ejec							
	VOLUMEN XI. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 481.000.000,00					$ 481.000.000,00	5,53%
						Ejec							
7	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.	UND		2025	2025	Prog	$ 57.000.000,00					$ 57.000.000,00	0,66%
						Ejec							
	VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 47.000.000,00					$ 47.000.000,00	0,54%
						Ejec							
	VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE RIESGOS	UND		2025	2025	Prog	$ 93.000.000,00					$ 93.000.000,00	1,07%
						Ejec							
8	VOLUMEN XV. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE OBRA	UND		2025	2025	Prog	$ 56.000.000,00					$ 56.000.000,00	0,64%
						Ejec							
9	VOLUMEN XVI. EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL	UND		2025	2025	Prog	$ 54.000.000,00					$ 54.000.000,00	0,62%
						Ejec							
10	VOLUMEN XVII. AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD.	UND		2025	2025	Prog	$ 423.000.000,00					$ 423.000.000,00	4,86%
						Ejec							
11	VOLUMEN XVIII. VOLUMEN TÉCNICO BIM	UND		2025	2025	Prog	$ 46.000.000,00					$ 46.000.000,00	0,53%
						Ejec							
	COSTO TOTAL ENTREGABLES											**$ 2.690.000.000,00**	30,9%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4:

GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS												
Meta Física (Programa de consultoría) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**							
Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**TRAMO 1**					**Total**	**%**
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		2025	2025	Prog	$ 4.579.246.000,00					$ 4.579.246.000,00	52,635%
					Ejec							

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONS	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


La consultoría envía el 16 de diciembre de 2024 en comunicación DC-009-2024 el Plan de ejecución BIM
Se realiza una reunión con la consultoría, interventoría y con el área BIM del INVIAS para definir los lineamientos para la entrega de este documento el día 16 de diciembre de 2024
El día 23 de diciembre de 2024 la interventoría envía en comunicación C4262-009-2024 observaciones al plan de ejecución BIM y reitera estas observaciones el 21 de enero de 2025.
Se realiza reunión presencial en las instalaciones del INVIAS Bogotá con el área ambiental y social con el fin de discutir lineamientos para la ejecución elaboración y entrega del Volumen XVII de los estudios ambiental y social, predial y sostenibilidad el día 19 de diciembre de 2024, de esta reunión se acuerda una reunión virtual para el día 26 de diciembre con el área de sostenibilidad, ambiental, social, predial del INVIAS en donde el consultor expondrá una propuesta para el desarrollo de este volumen y que todas las partes que revisan este documento estén de acuerdo con su ejecución para no tener retrocesos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión hojas de vida profesionales especialistas de la consultoría

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

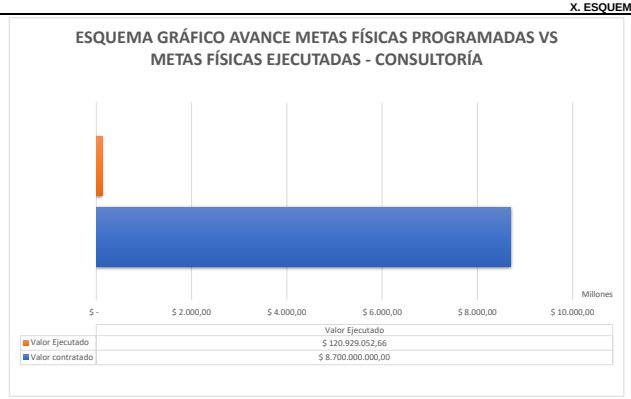

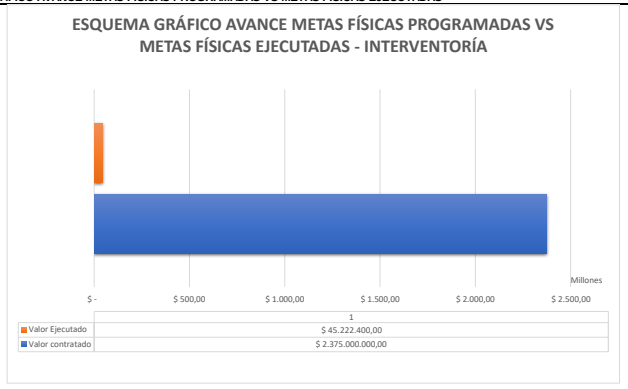

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONSULTOR	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: Jose Octavio Niño Brijaldo
	Matrícula Profesional No.: 01193-0243

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ — SEMANA No.: 8 del 20-ene al 26-ene Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DARBIN ANTONIO MOSQUERA MOSQUERA

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORÍA: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VOLÚMENES O PRODUCTOS TÉCNICOS ENTREGABLES DE FASE III: 1. Entregable estudios topográficos; 2 entregable estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio; 3 entregable estudio de trazado y diseño geométrico; 4 entregable estudio de seguridad vial; 5 entregable estudio de geología y geomorfología local; 6 entregable estudio de hidrogeología de detalle; 7 entregable estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y puentes de materiales; 8 entregable estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; 9 entregable hidráulica, hidrología, y socavación; 10 entregable estudio y diseño de pavimentos; 11 entregable estudio y diseño de estructuras; 12 entregable estudio de urbanismo y paisajismo; 13 estudio redes hidrosanitarias y secas; 14 entregable estudio de riesgos; 15 entregable estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones; 16 entregable evaluación socioeconómica y financiera del proyecto; 17 entregable ambiental, social, predial y sostenibilidad; 18 entregable volumen técnico de BIM; 19 entregable informe final.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA, lo cual incluye el desarrollo de 19 volúmenes.

CONTRATO DE CONSULTORÍA:

CONSULTORÍA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4227 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 8.700.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 4.350.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4262 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 1.187.500.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.350.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.350.000.000
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.187.500.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.187.500.000

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORÍA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA (A):	$ 8.700.000.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 482.315.971,00	5,54%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 150.178.346,00	1,73%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (332.137.625,00)	-3,82%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 482.315.971,00	5,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 150.178.346,00	1,73%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (332.137.625,00)	-3,82%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 53.094.315,79	0,61%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.154.842,11	0,23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 48.111.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 128.462.516,00	5,41%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 55.550.547,36	2,34%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 30.008.483,00	1,26%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 22.611.200,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.350.000.000,00
Amortizado $	$ 48.111.000
Saldo $	$ 4.301.889.000,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	**$ -**
Acumulado:	$ -

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.187.500.000,00
Amortizado $	$ 22.611.200
Saldo $	$ 1.164.888.800,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 5,54% Avance o Atraso Físico % -3,82%
Meta Física Ejecutada % 0,23%

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL

Meta Física (Programa de consultoría) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	TRAMO 1					Total	%
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	UND		2024	2024	Prog	$ 1.430.754.000,00					$ 1.430.754.000,00	16,445%
					Ejec	$ 20.154.842,11					$ 20.154.842,11	0,232%

GRUPO 2 -COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
	Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	TRAMO 1					Total	%
1	VOLUMEN I. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.	UND		2025	2025	Prog	$ 69.000.000,00					$ 69.000.000,00	0,79%
						Ejec							
2	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO.	UND		2025	2025	Prog	$ 60.000.000,00					$ 60.000.000,00	0,69%
						Ejec							
3	VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO.	UND		2025	2025	Prog	$ 165.000.000,00					$ 165.000.000,00	1,90%
						Ejec							
4	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL.	UND		2025	2025	Prog	$ 42.000.000,00					$ 42.000.000,00	0,48%
						Ejec							
5	VOLUMEN V. ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA LOCAL.	UND		2025	2025	Prog	$ 106.000.000,00					$ 106.000.000,00	1,22%
						Ejec							
6	VOLUMEN VI. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	UND		2025	2025	Prog	$ 125.000.000,00					$ 125.000.000,00	1,44%
						Ejec							
	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES.	UND		2025	2025	Prog	$ 368.000.000,00					$ 368.000.000,00	4,23%
						Ejec							
	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 235.000.000,00					$ 235.000.000,00	2,70%
						Ejec							
	VOLUMEN IX. HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN.	UND		2025	2025	Prog	$ 190.000.000,00					$ 190.000.000,00	2,18%
						Ejec							
	VOLUMEN X. ESTUDIO Y DISEÑOS DE PAVIMENTO.	UND		2025	2025	Prog	$ 73.000.000,00					$ 73.000.000,00	0,84%
						Ejec							
	VOLUMEN XI. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 481.000.000,00					$ 481.000.000,00	5,53%
						Ejec							
7	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.	UND		2025	2025	Prog	$ 57.000.000,00					$ 57.000.000,00	0,66%
						Ejec							
	VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 47.000.000,00					$ 47.000.000,00	0,54%
						Ejec							
	VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE RIESGOS	UND		2025	2025	Prog	$ 93.000.000,00					$ 93.000.000,00	1,07%
						Ejec							
8	VOLUMEN XV. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE OBRA	UND		2025	2025	Prog	$ 56.000.000,00					$ 56.000.000,00	0,64%
						Ejec							
9	VOLUMEN XVI. EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL	UND		2025	2025	Prog	$ 54.000.000,00					$ 54.000.000,00	0,62%
						Ejec							
10	VOLUMEN XVII. AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD.	UND		2025	2025	Prog	$ 423.000.000,00					$ 423.000.000,00	4,86%
						Ejec							
11	VOLUMEN XVIII. VOLUMEN TÉCNICO BIM	UND		2025	2025	Prog	$ 46.000.000,00					$ 46.000.000,00	0,53%
						Ejec							
	COSTO TOTAL ENTREGABLES											**$ 2.690.000.000,00**	30,9%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4:

GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS												
Meta Física (Programa de consultoría) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**							
Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**TRAMO 1**					**Total**	**%**
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		2025	2025	Prog	$ 4.579.246.000,00					$ 4.579.246.000,00	52,635%
					Ejec							

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONS	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La consultoría envía el 16 de diciembre de 2024 en comunicación DC-009-2024 el Plan de ejecución BIM
Se realiza una reunión con la consultoría, interventoría y con el área BIM del INVIAS para definir los lineamientos para la entrega de este documento el día 16 de diciembre de 2024
El día 23 de diciembre de 2024 la interventoría envía en comunicación C4262-009-2024 observaciones al plan de ejecución BIM y reitera estas observaciones el 21 de enero de 2025.
Se realiza reunión presencial en las instalaciones del INVIAS Bogotá con el área ambiental y social con el fin de discutir lineamientos para la ejecución elaboración y entrega del Volumen XVII de los estudios ambiental y social, predial y sostenibilidad el día 19 de diciembre de 2024, de esta reunión se acuerda una reunión virtual para el día 26 de diciembre con el área de sostenibilidad, ambiental, social, predial del INVIAS en donde el consultor expondrá una propuesta para el desarrollo de este volumen y que todas las partes que revisan este documento estén de acuerdo con su ejecución para no tener retrocesos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

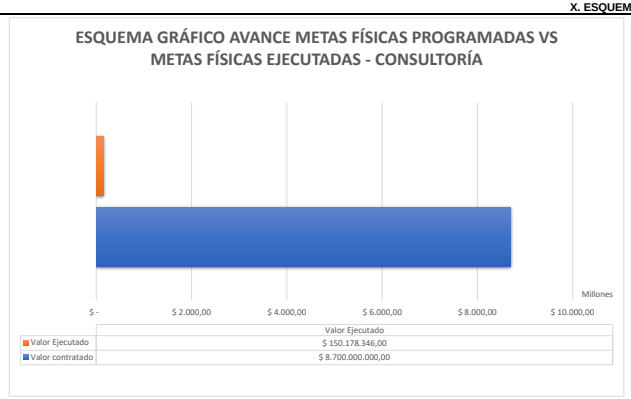

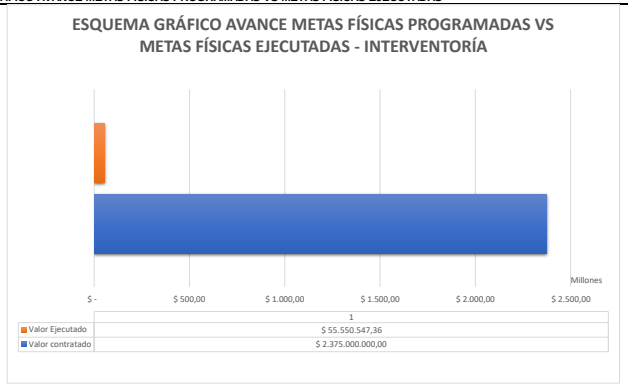

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

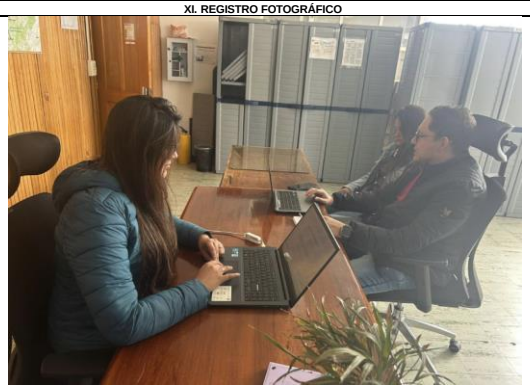

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONSULTOR	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: Jose Octavio Niño Brijaldo
	Matrícula Profesional No.: 01193-0243

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/02/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ — SEMANA No.: 9 del 27-ene al 2-feb — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DARBIN ANTONIO MOSQUERA MOSQUERA

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORÍA: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VOLÚMENES O PRODUCTOS TÉCNICOS ENTREGABLES DE FASE III: 1. Entregable estudios topográficos; 2 entregable estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio; 3 entregable estudio de trazado y diseño geométrico; 4 entregable estudio de seguridad vial; 5 entregable estudio de geología y geomorfología local; 6 entregable estudio de hidrogeología de detalle; 7 entregable estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y puentes de materiales; 8 entregable estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; 9 entregable hidráulica, hidrología, y socavación; 10 entregable estudio y diseño de pavimentos; 11 entregable estudio y diseño de estructuras; 12 entregable estudio de urbanismo y paisajismo; 13 estudio redes hidrosanitarias y secas; 14 entregable estudio de riesgos; 15 entregable estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones; 16 entregable evaluación socioeconómica y financiera del proyecto; 17 entregable ambiental, social, predial y sostenibilidad; 18 entregable volumen técnico de BIM; 19 entregable informe final.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA, lo cual incluye el desarrollo de 19 volúmenes.

CONTRATO DE CONSULTORÍA:

CONSULTORÍA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4227 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 8.700.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 4.350.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4262 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 1.187.500.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.350.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.350.000.000
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.187.500.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.187.500.000

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORÍA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA (A):	$ 8.700.000.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 731.577.280,00	8,41%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 179.427.640,00	2,06%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (552.149.640,00)	-6,35%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 731.577.280,00	8,41%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 179.427.640,00	2,06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (552.149.640,00)	-6,35%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 53.094.315,79	0,61%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.154.842,11	0,23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 48.111.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 182.896.896,00	7,70%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 55.550.547,36	2,34%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 30.008.483,00	1,26%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 22.611.200,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.350.000.000,00
Amortizado $	$ 48.111.000
Saldo $	$ 4.301.889.000,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	**$ -**
Acumulado:	$ -

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.187.500.000,00
Amortizado $	$ 22.611.200
Saldo $	$ 1.164.888.800,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8,41% Avance o Atraso Físico % -6,35%
Meta Física Ejecutada % 0,23%

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL

Meta Física (Programa de consultoría) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	TRAMO 1					Total	%
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	UND		2024	2024	Prog	$ 1.430.754.000,00					$ 1.430.754.000,00	16,445%
					Ejec	$ 20.154.842,11					$ 20.154.842,11	0,232%

GRUPO 2 -COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
	Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	TRAMO 1					Total	%
1	VOLUMEN I. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.	UND		2025	2025	Prog	$ 69.000.000,00					$ 69.000.000,00	0,79%
						Ejec							
2	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO.	UND		2025	2025	Prog	$ 60.000.000,00					$ 60.000.000,00	0,69%
						Ejec							
3	VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO.	UND		2025	2025	Prog	$ 165.000.000,00					$ 165.000.000,00	1,90%
						Ejec							
4	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL.	UND		2025	2025	Prog	$ 42.000.000,00					$ 42.000.000,00	0,48%
						Ejec							
5	VOLUMEN V. ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA LOCAL.	UND		2025	2025	Prog	$ 106.000.000,00					$ 106.000.000,00	1,22%
						Ejec							
6	VOLUMEN VI. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	UND		2025	2025	Prog	$ 125.000.000,00					$ 125.000.000,00	1,44%
						Ejec							
	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES.	UND		2025	2025	Prog	$ 368.000.000,00					$ 368.000.000,00	4,23%
						Ejec							
	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 235.000.000,00					$ 235.000.000,00	2,70%
						Ejec							
	VOLUMEN IX. HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN.	UND		2025	2025	Prog	$ 190.000.000,00					$ 190.000.000,00	2,18%
						Ejec							
	VOLUMEN X. ESTUDIO Y DISEÑOS DE PAVIMENTO.	UND		2025	2025	Prog	$ 73.000.000,00					$ 73.000.000,00	0,84%
						Ejec							
	VOLUMEN XI. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 481.000.000,00					$ 481.000.000,00	5,53%
						Ejec							
7	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.	UND		2025	2025	Prog	$ 57.000.000,00					$ 57.000.000,00	0,66%
						Ejec							
	VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 47.000.000,00					$ 47.000.000,00	0,54%
						Ejec							
	VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE RIESGOS	UND		2025	2025	Prog	$ 93.000.000,00					$ 93.000.000,00	1,07%
						Ejec							
8	VOLUMEN XV. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE OBRA	UND		2025	2025	Prog	$ 56.000.000,00					$ 56.000.000,00	0,64%
						Ejec							
9	VOLUMEN XVI. EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL	UND		2025	2025	Prog	$ 54.000.000,00					$ 54.000.000,00	0,62%
						Ejec							
10	VOLUMEN XVII. AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD.	UND		2025	2025	Prog	$ 423.000.000,00					$ 423.000.000,00	4,86%
						Ejec							
11	VOLUMEN XVIII. VOLUMEN TÉCNICO BIM	UND		2025	2025	Prog	$ 46.000.000,00					$ 46.000.000,00	0,53%
						Ejec							
	COSTO TOTAL ENTREGABLES											**$ 2.690.000.000,00**	30,9%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4:

GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS												
Meta Física (Programa de consultoría) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**							
Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**TRAMO 1**					**Total**	**%**
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		2025	2025	Prog	$ 4.579.246.000,00					$ 4.579.246.000,00	52,635%
					Ejec							

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONS	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


La consultoría envía el 16 de diciembre de 2024 en comunicación DC-009-2024 el Plan de ejecución BIM
Se realiza una reunión con la consultoría, interventoría y con el área BIM del INVIAS para definir los lineamientos para la entrega de este documento el día 16 de diciembre de 2024
El día 23 de diciembre de 2024 la interventoría envía en comunicación C4262-009-2024 observaciones al plan de ejecución BIM y reitera estas observaciones el 21 de enero de 2025.
Se realiza reunión presencial en las instalaciones del INVIAS Bogotá con el área ambiental y social con el fin de discutir lineamientos para la ejecución elaboración y entrega del Volumen XVII de los estudios ambiental y social, predial y sostenibilidad el día 19 de diciembre de 2024, de esta reunión se acuerda una reunión virtual para el día 26 de diciembre con el área de sostenibilidad, ambiental, social, predial del INVIAS en donde el consultor expondrá una propuesta para el desarrollo de este volumen y que todas las partes que revisan este documento estén de acuerdo con su ejecución para no tener retrocesos.
El día 27 de enero la consultoría envía ajustado el Plan de ejecución BIM, se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
Se realizo comite tecnico de seguimiento el 29 de enero de 2024 en donde se trataron temas de la entrega de la información de los estudios y diseños del contrato 1666 de 2015 para que la consultoría realice la revisión de esta información especifique por medio de un diagnostico que información hay y que información falta y plantee un presupuesto de las actividades que hacen falta para

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Solicitud plan de contingencia por atraso presentado

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

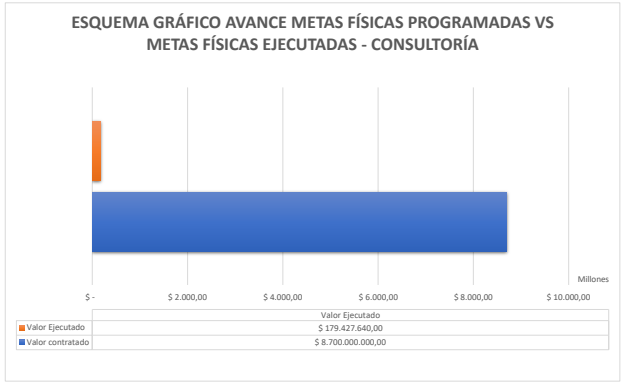


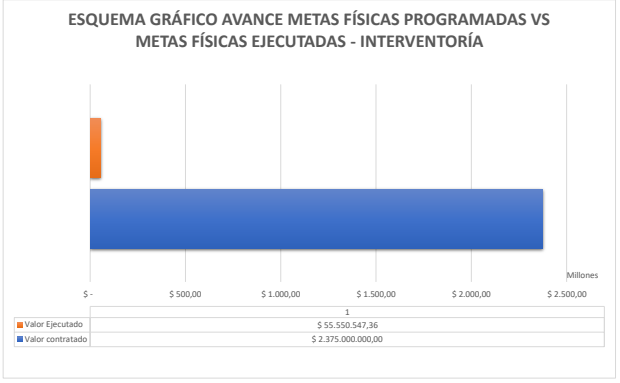

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

FECHA: 2/02/2025 (Día / Mes / Año)

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONSULTOR	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: Jose Octavio Niño Brijaldo
	Matrícula Profesional No.: 01193-0243

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-15-FR-9
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4227 - 2024

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2025

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO CONSULTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1124124	C-2402-0600-16-51102A-2402006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-MEDELLÍN (CHOCO), VÍA E	10	NACIÓN	Contrato Principal	$ 3,200,000,000.00	$ -
2024	1124124	C-2402-0600-16-51102A-2402015-02 ADQUIS. DE BYS - PUENTE CONSTRUIDO EN VÍA SECUNDARIA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-MEDELLÍN (CH	10	NACIÓN	Contrato Principal	$ 5,500,000,000.00	$ -
							$ -
							$ -
				TOTAL		$ 8.700.000.000.00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 8.700.000.000

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 4,350,000,000.00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4,350,000,000.00			RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $3,200,000,000
								RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4,350,000,000.00			RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $5,500,000,000
1	**DICIEMBRE 2024.**	$ 96,222,000.00	$ -	$ 96,222,000.00	$ 48,111,000.00	$ 48,111,000.00	$ 4,301,889,000.00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4,301,889,000.00	$ 8,603,778,000.00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
2	**ENERO 2025.**	$ 96,222,000.00	$ -	$ 192,444,000.00	$ 48,111,000.00	$ 48,111,000.00	$ 4,253,778,000.00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4,253,778,000.00	$ 8,507,556,000.00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
TOTALES		**$ 192,444,000.00**		**$ 288,666,000.00**	**$ 96,222,000.00**	**$ 96,222,000.00**	**$ 4,301,889,000.00**		**$ 4,301,889,000.00**	**$ 8,507,556,000.00**		

Todas las Actas aprobadas por el Interventor del Contrato de Consultoria deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA N°1 DICIEMBRE 2024	$ 96,222,000.00		$ 96,222,000.00
ACTA N°2 ENERO 2025	$ 96,222,000.00		$ 96,222,000.00
			$ -
VALOR TOTAL	**$ 192,444,000.00**		**$ 192,444,000.00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma:
Nombre: EDLY STELLA RENTERÍA MENA
Directora de consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Firma:
Nombre: JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No. 4227 - 2024 **CONTRATISTA:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCÓ

OBJETO DEL CONTRATO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

FECHA DE INICIO: 02/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 8,700,000,000.00

VALOR ACUMULADO: $ 8,700,000,000.00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8,700,000,000.00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8,700,000,000.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4262 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	8.92%	$ 870,000,000.00	7	11	2024	1	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	44.62%	$ 4,350,000,000.00	7	11	2024	1	5	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	17.85%	$ 1,740,000,000.00	7	11	2024	1	1	2028
Calidad de Estudios y Diseños	26.77%	$ 2,610,000,000.00	31	12	2024	31	12	2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3002762

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 02/12/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	8.92%	$ 870,000,000.00	2 / 12 / 2024	1 / 5 / 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	44.62%	$ 4,350,000,000.00	2 / 12 / 2024	1 / 5 / 2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	17.85%	$ 1,740,000,000.00	2 / 12 / 2024	1 / 1 / 2028
Calidad de Estudios y Diseños	26.77%	$ 2,610,000,000.00	31 / 12 / 2024	31 / 12 / 2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3002762

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 04/12/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: EDLY STELLA RENTERIA MENA
Directora de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Firma

Nombre: JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN-IN-14-FR-2
ACTAS DE REUNIÓN

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/12/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Consultoría)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 4227-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CORDOBA

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA:
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4262
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Reunión tecnica de seguimiento contrato de consultoría 4227 de 2024

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1- Metodología BIM
2- Programación recorrido inicial
3- Programación reunión con el equipo de sostenibilidad del INVIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/12/2024
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se reunieron vía virtual por parte de la consultoría UTCH la ingeniera Edly Stella Rentería directora , Eulorgio Pacaios Chaverra coordinador de la consultoría, Luz Yaneth Ocoró Coordinadora de la consultoría, Elvis Ferney Mosquera Telles BIM consultoria, por parte del INVIAS Marcela Paola Julio Jimenez profesial área BIM, Laura Camila Vera Meneses profesial área BIM, Jannier Salas QuejadaSupervisor contrato de interventoría, Darbin Mosquera Gestor técnico y por parte de la interventoría UPTC Jose Octavio Niño director, Diego fernando Borda Coordinador y Milton Carabuena Coordinador BIM
La consultoría en cabeza de la directora Edly Stella manifiesta que se cuenta con el apoyo de las alcaldias de San Jose del Palmar y de Novita con el fin de que realicen ellos acompañamiento al recorrido inicial el cual esta comprendido entre el Punto denominado Curundo- San Jose del Palmar - Cruce El Cairo, se pregunta a las demas partes la disponibilidad de tiempo para realizar el recorrido inicial con el fin de concretar una fecha, El Ingeniero Darbin Mosquera manifiesta que tiene disponibilidad de tiempo inmediato tan solo seria que la interventoría y el supervisor del contrato de interventoría confirmen su disponibilidad, a lo anterior el coordinador Diego Borda de intervntoría propone que se ralice este recorrido los días 20 y 21 de diciembre, por o anterior la fecha definida para ralizar el recorrido es el día 20 y 21 de diciembre los próximos días se confirmara los representantes que asistiran al recorrido por cada entidad.
La consultoría solicita al ingeniero Darbin Mosquera un espacio de trabajo con el fin de tratar temas concernientes a los docuemntos de requerimientos técnicos, así como la revisión de los perfiles de los profesionales de la consultoría, al respecto el ingeniero Darbin manifiesta que la reunión se realizará el próximo viernes 13 de diciembre a las 9:00 am
La consultoría solicita ala Subdirección de planificación de infraestructura se realice una mesa de trabajo con el equipo ambiental, social, predial y sostenibilidad del INVIAS para solicitar aclaraciones respecto al alcance de los requerimientos técnicos para estas áreas, dicha reunión según el ingeniero Darbin queda agendada para el próximo jueves 19 de diciembre de 2024 en las instalaciones de la Subdirección de Planificación de infraestructura en el INVIAS Bogotá a las 8:00 am
Desarrollo de entrega preliminar BEP "Plan de ejecución BIM" como lo mencionan los profesionales BIM del INVIAS dentro de las obligaciones del consultor esta presentar este plan de ejecución BIM a más tardar a los 15 días de impartida la orden de inicio del contrato, por lo anterior el equipo consultor en cabeza del ing Elvis Ferney Mosquera Telles (BIM consultoria) solicito se realice una mesa previa para realizar la revisión de este documento de manera conjunta (profesionales BIM del invias, consultoría e interventoría) ya que por las particularidades del proyecto es bueno conocer las precisiones de cada una de las entidades. Por lo anterior de mutuo acuerdo entre las entidades se propone mesa de trabajo para el día lunes 16 de diembre de 2024 a las 9:00 am donde ademas por obvias razones el consultor debe hacer entrega de este documento.
COMPROMISOS: La interventoría se compromete a realizar la progamación de las siguientes reuniones 1- reunion virtual día 13 de diciembre a las 9.00 donde participara consultoría e interventoría y Gestor Técnico con el fin de tratar temas relacionador a los requerimientos tecnicos del contrato de consultoría y anexo técnico de la consultoría 2- La consultoría UTCH se compromete a hacer entrega de documento preliminar "Paln de ejecución BIM" BEP"" para el día lunes 16 de diciembre, adicionalmente el día 16 de diciembre a las 9: 00 am se realizara en compañia de los profesionales BIM de consultoría, interventoría e INVIAS una reunión de revisión de esta entrega preliminar, esta reunión virtual la programara la interventoría. 3- Se realizará reunión presencial en las instalaciones del INVIAS con la subdirección de sostenibilidad , consultoría e interventoría con el fin de tratar los temas concernientes al desarrollo de avance de los volúmenes ambiental, social, predial y de sostenibilidad a las 8:30 am 4- Se concerta recorrido en la zona del proyecto los días 20 y 21 de diciembre en la zona municipio de San Jose del Palmar

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/12/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Progamación reuniones		Interventoría UPTC
Paln de ejecución BIM" BEP"	lunes, 16 de diciembre de 2024	Consultoría UTCH
Reunión temas requerimientos tecnicos y perfiles	viernes, 13 de diciembre de 2024	INVIAS, Consultoría, Interventoría
Recorrido inicial	20 y 21 de diciembre de 2024	INVIAS, Consultoría, Interventoría



FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 13/12/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
DARBIN MOSQUERA MOSQUERA	GESTOR TÉCNICO	INVIAS	
YANIER SALAS QUEJADA	SUPERVISOR INTERVENTORÍA	INVIAS	
MARCELA PAOLA JULIO JIMENEZ	PROFESIONAL BIM	INVIAS	
LAURA CAMILA VERA MENESES	PROFESIONAL BIM	INVIAS	
EDLY STELLA RENTERÍA MENA	DIRECTORA CONSULTORÍA	UTCH	
EULOGIO PALACIOS CHAVERRA	COORDINADOR CONSULTORÍA	UTCH	
JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	DIRECTOR INTERVENTORÍA	UPTC	
DIEGO FERNADO BORDA Cruz	COORDINADOR INTERVENTORÍA	UPTC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 26/12/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Consultoría)

ACTA DE REUNIÓN No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 4227-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CORDOBA

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA:
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4262-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Reunión tecnica de seguimiento contrato de consultoría 4227 de 2024 - Revisión documento de metodología para el desarrollo del VOLUMEN XVII. AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD entre el INVIAS, la Consultoría e Interventoría

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1- Revisón Metodología para el desarrollo del Volumen XVII Ambaiental, Social, Predial y Sostenibilidad

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se reunen de forma virtual por parte de INVIAS el ingeniero Darbin Antonio Mosquera Gestor Técnico del proyecto,Lina Alejandra Rodriguez Rojas componente ambiental del INVIAS, Indira Carmenza Vargas del área de sostenibilidad INVIAS, Edgar Enrique Garcia componente social INVIAS, Darbin Antonio Mosquera Gestor tecnico INVIAS, Sandra Johana Mantilla componente de sostenibilidad INVIAS , Eulogio Palacios Chaverra Coordinador tecnico de Consultoría, Luz Yanerh Ocoró Coordinadora ambiental de la consultoría, Diego Fernando Borda Coordinador interventoría, Yully Deisy Suarez Especialista ambiental interventoría
La ingeniera Lina Rodríguez del INVIAS confirma la recepción del documento remitido sobre la metodología para la entrega de volúmenes. Menciona que, junto con sus compañeros, realizará observaciones al respecto. Destaca que el informe es sucinto y ejecutivo, abordando los aspectos ambiental, social, predial y de sostenibilidad. En cuanto al componente ambiental, señala que, al tratarse de una vía existente, el documento debe seguir la guía de 2022, donde los contenidos se organizan en programas y subprogramas, no en programas y proyectos. También menciona la inclusión de antecedentes de estudios previos.
Luz Yaneth Ocoró, de la consultoría, explica la construcción del documento antes de recibir observaciones. Señala que se basó en el anexo técnico entregado por el INVIAS, extrayendo una introducción preliminar sujeta a ajustes. Luego, condensó los requerimientos técnicos de los volúmenes ambiental y social, predial y sostenibilidad, organizándolos en un solo volumen, como establece el contrato. Los antecedentes incluidos son preliminares, tomados textualmente del anexo técnico, pues la consultoría debe basarse en estudios previos. Estos serán ampliados conforme avancen los especialistas. No se incluyeron trámites y permisos ambientales, pero se reconoce su importancia. La ingeniera Lina Rodríguez Rojas reafirma que el componente ambiental y social siempre van unidos. Destaca que el documento PAGA consolidará los componentes ambiental, social, predial y sostenibilidad. Menciona que los antecedentes se basan en estudios previos y que la actualización dependerá de la información primaria y secundaria recopilada. Pregunta si se realizarán monitoreos, dado que la guía establece que estos se harán según el análisis de la zona. También resalta la importancia de evaluar la complejidad del proyecto y su área de influencia, ya que de ello dependerá la estructura de programas y subprogramas. Señala que el documento no menciona permisos ambientales, pero estos deben considerarse junto con la línea base, los programas y subprogramas. También menciona la necesidad de incluir la GDB del proyecto, el plan de contingencias y los formatos de anexos. Aunque no tiene reparos sobre la metodología propuesta, enfatiza que el documento debe ajustarse a la Guía de Manejo Ambiental 2022, que detalla los programas, subprogramas

detalla los programas, subprogramas y soportes a presentar. Finalmente, indica que hará observaciones más adelante cuando se presenten avances del documento.

El documento tiene un único capítulo de conclusiones y recomendaciones, con subítems para cada componente. Se añadieron anexos y fuentes consultadas. Finalmente, los estudios se agruparon en componentes para evitar redundancias: ambiental y social, predial y sostenibilidad. Esto se debe a que los requerimientos técnicos los agrupan y el componente social está directamente ligado al ambiental.

Edgar Enrique García Medina señala que, desde el componente social, no tiene observaciones al documento revisado, ya que cumple con los requisitos mínimos requeridos para la consultoría. Coincide con la ingeniera Lina en que debe ajustarse al instrumento PAGA y la normativa vigente. Destaca que el documento abarca aspectos clave como socializaciones, consultas previas y el tema del ICANH. Finalmente, menciona que cualquier ajuste dependerá de posibles cambios normativos al inicio de la consultoría.

Indira Vargas, Sandra Mantilla y Alejandro Archila, del área de sostenibilidad del INVIAS, destacan que, al tratarse de fase 3, el proyecto debe desarrollar la metodología AIKA según la resolución 2119 de 2022. Explican que, aunque generalmente los volúmenes se presentan por separado, la sostenibilidad debe abordarse de manera transversal, pues va más allá de los requisitos normativos.

Señalan que al desarrollar la metodología, los criterios de sostenibilidad impactarán otros volúmenes del proyecto. También enfatizan la importancia de incluir los lineamientos de infraestructura verde vial, adoptados este año por el Ministerio de Transporte
Mencionan que no recibieron el documento inicialmente, pero tras revisarlo, confirman que el capítulo de sostenibilidad está correctamente separado e incluye las dimensiones técnica, ambiental, social y de gobernanza, económica y financiera. En general, consideran que el enfoque es adecuado.

La ingeniera Luz Yaneth Ocoró plantea inquietudes sobre el componente de sostenibilidad dentro del volumen, basándose en los requerimientos recibidos.

1-Estructuración y entrega del volumen de sostenibilidad: Inicialmente, los requerimientos entregados hacían referencia a criterios anteriores a la metodología AIKA y los lineamientos de infraestructura verde vial, pero en diciembre se recibió un documento actualizado que integra la política de sostenibilidad de INVIAS con la metodología AIKA. Esto genera dudas sobre cómo estructurar y entregar el volumen, ya que el requerimiento indica que debe ser transversal a los demás y el último en entregarse, incorporando criterios de los otros volúmenes. Pregunta si debe presentarse con avances independientes o de manera completa.

2-Propuestas de ajustes a la metodología AIKA: Según los requerimientos, se debe describir los criterios de sostenibilidad evaluados y, en caso de ajustes o mejoras, presentarlos por aparte con justificación y previa aprobación de la interventoría. Pregunta si es obligatorio proponer ajustes o si solo aplica si se identifica una necesidad real.

3-Diagnóstico de sostenibilidad: Se requiere un diagnóstico, pero no está claro sobre qué debe basarse, dado que en el contrato anterior este componente no se desarrolló. Pregunta si debe ser un capítulo o subcapítulo del volumen o si debe presentarse como un documento independiente.

La ingeniera Sandra Mantilla (INVIAS) responde a las inquietudes de Luz Yaneth Ocoró (Consultoría) sobre sostenibilidad:

Avances en la incorporación de sostenibilidad: Se deben presentar avances dentro del volumen de sostenibilidad a medida que se desarrollan los estudios. Aunque los volúmenes no se elaboran simultáneamente, se puede hacer seguimiento a la integración de criterios de sostenibilidad en cada uno. Para ello, se sugiere una matriz de verificación y reuniones entre profesionales para evidenciar la incorporación de estos criterios.

Diagnóstico de sostenibilidad: Debe realizarse con base en los criterios definidos en el documento proporcionado por INVIAS. No se trata de evaluar un evento pasado, sino de analizar el contexto actual a partir de fuentes secundarias. Cada dimensión (técnica, ambiental, social, gobernanza, económica) debe diagnosticarse considerando aspectos como actores involucrados y antecedentes en el territorio para determinar si el criterio aplica o no.
Luz Yaneth Ocoró (Consultoría) menciona que el diagnóstico se haría previo a la identificación de los criterios aplicables al proyecto.

Sandra Mantilla (INVIAS) responde que el diagnóstico también debe incluir la justificación de criterios que no apliquen, con base en la información disponible. No es un documento independiente, sino parte del volumen de sostenibilidad. Su función es evaluar, tras consultar diversas fuentes, qué criterios pueden aplicarse al proyecto y cuáles no, evitando un simple listado sin sustento.

El INVIAS consulta si la consultoría cuenta con un especialista en Sostenibilidad para coordinar una reunión con el especialista de Sostenibilidad del instituto. El objetivo es ofrecer una capacitación sobre la implementación de la metodología AIKA y fortalecer las bases conceptuales para el desarrollo del documento. Aunque el perfil del especialista ya debe incluir experiencia en AIKA, la actualización de conceptos sería valiosa.

El ingeniero Diego Borda propone programar la capacitación sobre la metodología AIKA para la semana del 13 al 17 de enero del próximo año y pregunta si puede ser virtual. La ingeniera Sandra del INVIAS confirma que puede realizarse virtualmente y que el ingeniero Manuel Monroy estaría disponible a partir del 16 de enero. La consultoría sugiere posponerla hasta la última semana de enero para garantizar que todas las entidades cuenten con el personal contratado para revisar el volumen. La interventoría indica que se coordinará con la subdirección de sostenibilidad para agendar la reunión entre el 20 y el 24 de enero.

La ingeniera Luz Yaneth Ocoro solicita a los profesionales de sostenibilidad del INVIAS que indiquen cualquier aspecto que deba abordarse, aclararse o profundizarse en el documento.

El ingeniero Diego Borda realiza una retroalimentación y destaca que la consultoría de la UTCH ha elaborado un documento borrador que ha sido revisado por funcionarios de la Subdirección de Sostenibilidad en las áreas ambiental, social y predial, con una estructura aceptable para el volumen.

FECHA 26/12/2024
(Día / Mes / Año)

Recomienda evitar reprocesos en etapas avanzadas del proyecto que puedan generar modificaciones significativas en el documento, ya que en esta fase 3 es fundamental respetar el plan de ejecución, incluyendo la plataforma BIM. Cualquier cambio posterior afectaría el cronograma. Aunque hay una prórroga de un año para el estudio, el tiempo puede ser limitado debido a imprevistos, por lo que sugiere consolidar la estructura del documento desde ahora.

La ingeniera Indira Carmenza Vargas recomienda incluir la evaluación de la complejidad del proyecto, ya que esta permitirá clasificarlo como de baja, media o alta complejidad y, con base en ello, generar mapas de sensibilidad para determinar los criterios de sostenibilidad aplicables. Sugiere que esta evaluación se ubique entre los apartados 7.1 y 7.2 del documento.

La ingeniera Luz Yaneth Ocoró aclara que la evaluación de complejidad se inicia desde la parte ambiental, pero su desarrollo completo y documentado conforme a la guía y normatividad tomará más tiempo. Aunque se incluirá en la propuesta, se desarrollará progresivamente a medida que se identifiquen los primeros criterios.

Indira Vargas explica que la evaluación debe seguir la guía de manejo y confirma que sostenibilidad se basará en la evaluación documentada por el área ambiental. Además, enfatiza que el desarrollo de sostenibilidad es transversal a los demás volúmenes del estudio y debe integrarse en todas las dimensiones técnicas del proyecto. Una vez finalizada la evaluación de complejidad, se podrá definir con precisión los criterios de sostenibilidad aplicables y los alcances sostenibles del proyecto.

La ingeniera Alejandra Muñoz, del área de Sostenibilidad, concluye que la consultoría debe modificar la propuesta de contenido del volumen y remitirla nuevamente a la Subdirección de Sostenibilidad para revisión y observaciones de todas las áreas.

Aclara que el documento presentado es un borrador y que aún falta la revisión tanto por parte de la interventoría como de Sostenibilidad. Menciona que la tabla de contenido enviada previamente era una propuesta de la consultoría sobre la mejor forma de estructurar el documento y que se remitió con antelación para facilitar la revisión.

El proceso acordado es que, tras la revisión de Sostenibilidad, la consultoría ajustará la propuesta según los comentarios recibidos, luego la enviará a la interventoría para su aprobación y, posteriormente, se hará la remisión final a Sostenibilidad.

La ingeniera Luz Yaneth Ocoró remitira el documento ajustado a la interventoría y la interventoría enviara al área de sostenibilidad, Alejandra Muñoz Gomes del INVIAS comenta que se debe enviar este documento antes del 30 de diciembre de 2024 para trasladarla a la subdirección de sostenibilidad.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Reunión de capacitación metodología AIKA con sostenibilidad	Ultima semana de enero	INVIAS, Consultoría, Interventoría
Envio a Sostenibilidad estructura propuesta por la UTCH para el desarrollo del Volumen XVII Ambiental, Social, Predial y Sostenibilidad	ultima semana de diciembre de 2024	Consultoría - Interventoría

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 20/01/2025
(Día / Mes / Año)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	



FECHA: 26/12/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
DARBIN MOSQUERA MOSQUERA	GESTOR TÉCNICO	INVIAS	
EDGAR ENRIQUE GARCIA MEDINA	PROFESIONAL SOCIAL	INVIAS	
LINA ALEJANDRA RODRIGUEZ	PROFESIONAL AMBIENTAL INVIAS	INVIAS	
ALEJANDRA MUÑOZ	PROFESIONAL DE SOSTENIBILIDAD	INVIAS	
INDIRA CARMENZA VARGAS	PROFESIONAL DE SOSTENIBILIDAD	INVIAS	
EDLY STELLA RENTERÍA MENA	DIRECTORA CONSULTORÍA	UTCH	
LUZ YANETH OCORÓ	COORDINADOR AMBIENTAL CONSULTORÍA	UTCH	
EULOGIO PALACIOS CHAVERRA	COORDINADOR CONSULTORÍA	UTCH	
JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	DIRECTOR INTERVENTORÍA	UPTC	
DIEGO FERNADO BORDA CRUZ	COORDINADOR INTERVENTORÍA	UPTC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/01/2025 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Consultoría)

ACTA DE REUNIÓN No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 4227-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CORDOBA

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA:
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4262-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Reunión tecnica de seguimiento contrato de consultoría 4227 de 2024

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1- Estado de avance del contrato de consultoría e interventoría
2- Hojas de vida grupo 1 contratos de ineterventoría y consultoría
3- Descuenstos contractuales
4-Anticipo

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se reune por parte del INVIAS el ingeniero Cesar Augusto Rodriguez y la ingeniera Yenny Xiomara Hernadez profesionales de la subdirección de planificación de infraestructura, por parte de la interventoría Diego Fernando Borda coordinador tecnico de interventoría y Denis Pino residente de estudios de interventoría. de forma virtual.
La interventoría comenta al INVIAS que el Ministerio de Educacion emitio un decreto donde exige que todos los recursos de la UTCH sean manejados por fiducia, teniendo en cuenta esto la UTCH abre cuenta en el banco de bogotá para el anticipo con la fiducia fidubogota, esta fiduciaria renuncio a manejar los recursos de la UTCH, por tanto la UTCH esta cambiando la fiduciaria con el banco agrario. Están haciendo las consultas si existe una afectación o no por el cambio de fiducia respecto al cambio de la cuenta. La ingeniera Yenny Xiomara pregunta que si en el momento de firma de los contratos se hizo la consulta al interior del INVIAS, la interventoría contesta que al ser un caso atipico se le expuso esta situación a la subdirección financiera del INVIAS con copia de la resolución del ministerio.

FECHA: 22/01/2025 (Día / Mes / Año)

la ingeniera Xiomara pregunta por el tramo objeto estudio de la consultoría, la interventoría Curundó - San José del Palmar - Cruce el cairo hacen parte del departamento del Chocó y Valle del Cauca el cual consta de 53 km, 10 kilómetros dentro del Departamento del Valle y 43 dentro del Departamento del Chocó. la interventoría comenta que se le solicito a la consultoría realizar un informe disganostico de los Estudios y Diseños realizados en el marco del contrato 1666 de 20215 cuyo objeto es “ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II (FACTIBILIDAD) PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y/O PAVIMENTACION CARRETERA CARTAGO - ANSERMANUEVO - SAN JOSE DEL PALMAR, para el tramo CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO.” Este informe es necesario para analizar el estado actual de los mismos y proceder con la planificación adecuada de esta etapa. respecto a estos estudios la interventoría comenta que los archivos estan en revisión por parte de la interventoría Faltan varios soportes es una vía existente, es un mejoramiento, son estudios y diseños de mejoramiento. Ahí la parte ambiental toca hacer es un PAGA, entonces ya existen lineamientos del año 2022, que hace como que todo sea un poco más fácil de llevar. Por otro lado se le reitero a la consultoría las observaciones para el ajuste del plan de ejecución BIM y se va a enviar al finalizar esta semana o la proxima solicitud de plan de contingencia. Asi mismo la interventoría comenta que la consultoría duce tener problemas financieros por la demora en la entrega del anticipo.
La ingeniera Xiomara pregunta al ingeniero Cesar si sabe algo del desembolso del anticipo, El ingeniero Cesar comenta que estan haciendo lo posible a ver si empiezan en el mes de febrero, pero no danmayor información en estos desembolsos. Respecto al avance en las metodologías la interventoría comenta que estas las va a empezar a presentar la consultoría en el mes de febrero, asi mismo que esta pendiente una visita en campo en San Jose del Palmar para hacer un recorrido ya tuvimos una reunión presencial en la subdirección con el alcalde de Nóvita, con un representante del municipio de San José del Palmar, en razón a que el corredor se llama Nóvita-Cartago, pero la comunidad está muy interesada en saber si ya se finalizan todos los estudios y diseños hasta Nóvita, porque ese es el objetivo, ¿no? No obstante en el momento el objeto del contrato es llegar hasta estos 53 kilómetros y ya mirar de pronto el instituto cómo acude con qué alternativa para hacer otro contrato para los otros kilómetros restantes. Asi mismo la interventoría comenta que respecto a las socializaciones las comunidades que se encuentran son la comunidad etnica afrodescendiente en Curundó, en San Jose del Palmar y Cruce el Cairo no hay comunidades indigenas por tanto las socializaciones se realizarán en las cabeceras municipales. La ingeniera Yenny pregunta que si estas socializaciones ya se han realizado, se responde que no por falta de recursos por parte de la consultoría.
La interventoría comenta que se realizo el año pasado en el mes de octubre una solictud para que se especificaran los descuentos contractuales a la subdirección financiera del INVIAS, esta misma envio un memorando a la subdirección de planificación e infraestructura dando respuesta y desglosando los descuentos aplicables, la interventoría solicita a la ingeniera yenny que por favor se envie de forma oficial esa respuesta a la UTCH y a la UPTC para presentar ante las áreas financieras de las universidades y que sean soporte para los cierres financieros ante la DIAN.
La ingeniera Yenny pregunta por las hojas de vida del personal de interventoría del grupo 1, la interventoría responde que el personal para el grupo 1 en el caso de la interventoría es un director con una dedicación del 50%, un ingeniero coordinador de estudios con una dedicación del 100%, un residente de estudios con una dedicación del 100%, un residente de campo con dedicación de 100% contratato tan pronto inien las actividades en campo, un profesional SIG y un tecnico en ingeniería de zona. menciona que las hojas de vida del director, coordinador y residente ya fueron aprobados por medio de un memorando por parte del INVIAS. La ingeniera Yenny solicita se envie las hojas de vida del personal de interventoría y consultoría.
La ingeniera Yenny expone respecto a los informes semanales, que desde el área tecnica del INVIAS se armo unas plantillas que es alimentado con la información semanal que envía la interventoría. Pregunta que si la interventoría tiene ese formato para ser diligenciado, ademas comenta que se debe realizar un informe ejecutivo anexo del informe semanal que contenga lo que transcurre en la semana con los temas relevantes del proyecto con el fin de que si el director o el viceministro solicita información de algun contrato se cuente con el informe. comenta que enviara un modelo en deonde se encuetra desagregado la información social, ambiental, técnica y predial, solicita la ingeniera yenny que cunado se envie los informes semanales se envien en pdf firmado y en excel para tomar la información más rapido y retroalimentar en el drive que les envian en la dirección técnica. La interventoría le pide a la ingeniera Yenny compartir el modelo del informe semanal el ejecutivo y la presentenciaón y pregunta desde que fecha se empezaria a llenar y el plazo para enviar esta información. La ingeniera Yenny responde que el plazo maximo para entrega de los semanales el el día martes, que los semanales se lleves de domingo a domingo, se entregue por parte de la interventoría el semanal los dias martes para retroalimentar en el drive tecnico del INVIAS esa información los jueves. Este proximo martes y en adelante se solicita enviar la información el informe semanal contractual, el informe semanal de seguimiento formato tecnico del INVIAS, informe ejecutivo y presentación.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/01/2025 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Enviar hojas de vida consultoría e interventoría	jueves, 23 de enero de 2025	UPTC - Interventoría
Confirmar fecha para reunión presencial en las instalaciones del INVIAS Bogotá	miércoles, 29 de enero de 2025	INVIAS
Solicictud plan de contingencia a la consultoría	miércoles, 29 de enero de 2025	UPTC - Interventoría



FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 29/01/2025 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
YENNY XIOMARA HERNANDEZ P.	GESTOR TÉCNICO	INVIAS	
CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ	GESTOR TÉCNICO	INVIAS	
JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	DIRECTOR INTERVENTORÍA	UPTC INTERVENTORÍA	
DIEGO FERNADO BORDA CRUZ	COORDINADOR INTERVENTORÍA	UPTC INTERVENTORÍA	
DENIS YINETH PINO M	RESIDENTE DE ESTUDIOS	UPTC INTERVENTORÍA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/01/2025 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Consultoría)

ACTA DE REUNIÓN No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 4227-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CORDOBA

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA:
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4262-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Reunión tecnica de seguimiento contrato de consultoría 4227 de 2024

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÒN
1- Seguimiento actividades según programación (Revisión de estudios, trabajos en campo, entrega de metodologías)
2- Seguimiento a plan de ejecución BIM
3- Ratificación hojas de vida grupo 1 consultoría (enviadas el 22 de enero de 2025)
4- Revisión de los Estudios y Diseños del contrato No 1666 de 2015 (verificación de resultados que expone el anexo técnico para estos estudios para fase 2)
5- Novedad cambio fiducia de la consultoría
6- Acta de costos del mes de enero
7- Visita a campo por parte de las entidades involucradas
8- Tramite entrega de anticipos
9- Temas varios / tramites administrativos al ministerio del interior (consulta previa) expediente ambiental

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se reune de forma virtual por parte del INVIAS la ingeniera Yenny Xiomara Hernadez gestor tecnico, por parte de la interventoría Jose Octavio Niño director de interventoría, Diego Fernando Borda coordinador tecnico de interventoría y Denis Pino residente de estudios de interventoría, por parte de la consultoría la ingeniera Edly Stella Rentería directora de consultoría, Eulogio Palacios Chaverra Coordinador Técnico y Marcela Mosquera residente de Estudios consultoría.
La interventoría realiza un resumen del alcance del proyecto, fechas de inicio, valor contractual y nuevo plazo contractual. Ademas menciona el porcentaje de avance programado que es del 5,54% Vs el ejecutado que es del 1,73% teniendo en cuenta lo facturado en el acta de costos de diciembre

1- La interventoría pregunta por la contratación del personal de consultoría del grupo 1 en el mes de enero de 2025, por las metodologías programadas para el mes de enero de 2025 y por los trabajos en campo, La consultoría responde que hasta hace poco se pudo reincorporar los recursos a la universidad, que al renunciar la fiducia se presentan varios impaces, pero que estan haciendo las gestiones con fiduagraria con el fin de cambiar las cuentas. Respecto a los trabajos en campo la consultoría comenta que es necesario realizar la visita en campo con todas las entidades involucradas, por otro lados los trabajos de topografia, georefenciación y exploración geotecnica son actividades que necesitan recursos y hasta que no se tenga dineros del anticipo es muy dificil programar estas actividades pues se necesita un musculo financiero para la logistica de estas actividades. Realizaran un plan de contingencia para disminuir el atraso

2- El plan de ejecución BIM fue entregado por la consultoría en el mes de diciembre de 2024 al cual la interventoría le realizó observaciones. Este documento fue enviado ajustado por parte de la consultoría el día 27 de enero de 2025 y se encuentra nuevamente en revisión por parte de la interventoría. Esta pendiente programar una reunión con el equipo BIM del INVIAS para definir que sotfwar se va a utilizar por parte de la consultoría y el manejo conjunto de los permisos para las tres entidades

3- Ratificación hojas de vida del personal del grupo 1 de la consultoría, la interventoría comenta que se envío el día 22 de enero una carpeta con las hojas de vida del personal de consultoría, El INVIAS comenta que realizará la ratificación de aprobación de estas hojas de vída.

4- Revisión de la información de los Estudios y Diseños del contrato 1666 de 2015, este contrato fue contratado por el INVIAS con un consultor privado, en el mes de diciembre de 2024 se recibio por parte del estructurador de este proyecto la información pero se comenta que al revisar esta información la misma se encuentra incompleta. La consultoría comenta que al revisar esta información encuentra lo siguiente: 1- La base de la topografía no se encuentra en medio magnetico 2- La información del estudio de transito si se encuentra. 3- Diseño geometrico si esta la información, 4- Geología no hay información de geologia, la información entregada por parte del estructurador es información del tramo Novita - Curundó pero no del tramo de interes Curundo- Cruce el Cairo 5- El volumen de fundaciones, estabilidad de taludes tiene los siguientes ensayos: 29 apiques a 1,60 de profundidad, 7 trincheras de 2,5m, 35 sondeos hasta 3 m de profundidad, 43 perforaciones con SPT a 20 m de profundidad, 78 lineas sismiscas de 110m, 17 correcciones de SPT, 13 granulometrias, 45 humedades,26 limites,23 carga puntual, 7 compresion simple en roca, 2 corte directo en roca, 3 desgaste. Dada esta información la consultoría manifiesta que para un proyecto de gran importancia se realizaron muy poquitos ensayos, estos se ven en diferentes volumenes pero son repetitivos. 6- se encuentra el volumen de hidraulica 7- se encuentra el volumen de Puentes con algunos anexos 8- No hay informe ambiental, el que compartieron es del tramo Novita - Curundo pero no esta el informe ambiental del tramo Curundo - Cruce el Cairo 9- No hay volumen de señalización 10- No hay volumen predial 11- si hay volumen de Evaluación economica. La consultoría comenta que dado este resumen y teniendo en cuenta que el contrato dice que esta información es insumo para el desarrollo del mismo, falta mucha información. Teniendo en cuenta que el INVIAS se iba a comunicar con el consultor anterior es vital que se solicite la información faltante, la interventoría le comenta a la ingeniera Yenny que lo mas conveniente es oficiar al consultor anterior para que entregue la información faltante con el fin de saber si la información que entrego el gestor Darbin Mosquera es la unica que hay o si faltan complementos, ya teniendo la información oficial se tomaran decisiones.

El ingeniero Eulogio Palacios Chaverra comenta que si bien la consultoría va a realizar un plan de contingencia es necesario contar con la información del contrato anterior completa por que la falta de esta información generaria retrocesos pues esta información es la base para la construcción de las metodologias, para revisar la información y proyectar lo faltante. La ingeniera Stella recomienda que cuando se solicite la información al consultor, el INVIAS la revise porque el Instituto tiene claro el alcance, sabe lo que contrato y puede dar certeza de que la información entregada es lo que hay, para entregar tanto a la consultoría como a la interventoría de forma oficial. La ingeniera Yenny indica que realizara las indagaciones del caso para confirmar la información oficial.

La interventoría comenta al INVIAS que se realizó una reunión con el área de sostenbilidad, área ambiental y área social del INVIAS con el fin de definir la metodología para la presentación del VOLUMEN XVII. AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD. de esta reunión quedo el compromiso de enviar la metodologia a la interventoría para que fuera revisada y aprobada y a su vez enviarla a la subdirección de infraestructura para que se compartiera a las demas subdirecciones (ambiental, social, predial y sostenibilidad) con el fin de que se aprobara por parte de ellos o se realizaran observaciones segun el caso del desarrollo de este volumen. La ingeniera Yenny solicita se envie nuevamente ese correo para que ella pueda reenviar a las partes involucradas este memorando para que sostenibilidad ratifique quienes son los profesionales que haran seguimiento a este volumen y agregarlos a futuras reuniones

6- La interventoría solicita a la consultoría se confirmen fechas de los contratos de personal del grupo 1 para ir aterrizando el acta de costos del mes de enero. La consultoría manifiesta que el día viernes 31 de enero confirmara esta información.

7- La interventoría resalta que la consultoría ya hizo una visita a campo, sin embargo la visita oficial donde asista las partes involucradas esta pendiente, esta visita se programara cuando las condiciones tanto logisticas como economicas se presten. Asi mismo cuando se cuente con la información del alcance del contrato puesto que en el mes de diciembre se realizo una reunión con los alcaldes de San Jose del Palmar, Novita, La subdirección de planificación e infraestructura con el acompañamiento de la ingeniera Sirley Merchan la consultoría y la interventoría en donde se expuso por parte de los alcaldes que la necesidad y la expectativa es el proyecto Novita- Cartago y el objeto de este contrato es inferior (San Jose del Palmar - Cruce el Cairo) en esa reunión el alcalde de Novita le expreso a la ingeniera Sirley que ese tramo vial que hace falta en una longitud aproximada de 50km algunos tramos ya estan aperturados y que significaria que el instituto contemple sacar otro proyecto o se le informe a la comunidad que el proyecto va completo o solo a la mitad. La consultoría informa que el acalde de Novita en esa reunión quedo de enviar a la subdirección una información sobre un puente a fase 3 que esta en el corredor y tambien un link donde ellos tienen un proyecto de 8,446 km desde Curundo a Novita que tambien esta viabilizado y que la misma esta ha espera de que se le asignen recursos. La consultoría comenta que la vía estuvo cerrada por un punto critico, la ingeniera Stella comenta que al realizarce la socialización del proyecto se debe buscar la forma de exponer el proyecto en donde se informe los avances que el INVIAS y la gobernación ha hecho en los puntos criticos y exponer el alcance de este proyecto y sobre todo dar a entender que si la vía se cierra no es responsabilidad de la consultoría por que es una etapa de Estudios y Diseños puesto que se conoce que en anteriores proyectos cuando la vía se cierra se debe trasladar los enfermos en helicoptero y estos costos las comunidades y actores de la zona lo han retribuido al contratista, por ende si llega a pasar en este proyecto la consultoría no cuenta con los recursos para asumir esto.

9- La interventoría pregunta que si se debe hacer consulta al Ministerio de Interior si por el objeto de este proyecto se debe o no hacer consulta previa, la Consultoria comenta que si se debe hacer, porque en el territorio hay un consejo comunitario juridicción de novita, el secretario de San Jose del Palmar dice que tambien en la zona hay un consejo comunitario, la consultoría esta realizando las averiguaciones pertinentes, asi mismo menciona que a traves de las iniciativas PDET es posible que no se necesite consulta previa sino socialización. Se realizara la consulta ante el Ministerio de forma oficial

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Estudios y Diseños 1666 de 2015 definitivos		INVIAS
Programar reunión presencial con subdirección de planificación de infraestructura		INVIAS





FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 6/02/2025
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
YENNY XIOMARA HERNANDEZ P.	GESTOR TÉCNICO	INVIAS	
EDLY STELLA RENTERIA MENA	DIRECTORA DE COSNULTORÍA	UTCH CONSULTORIA	
EULOGIO PALACIOS CHAVERRA	COORDINADOR CONSULTORÍA	UTCH CONSULTORIA	
JHOANA MARCELA MOSQUERA	RESIDENTE DE ESTUDIOS	UTCH CONSULTORIA	
JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	DIRECTOR INTERVENTORÍA	UPTC INTERVENTORÍA	
DIEGO FERNADO BORDA CRUZ	COORDINADOR INTERVENTORÍA	UPTC INTERVENTORÍA	
DENIS YINETH PINO M	RESIDENTE DE ESTUDIOS	UPTC INTERVENTORÍA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

MEPI-MN-IN-3-FR-1
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE CONSULTORÍA	CÓDIGO			MEPI-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN			1
		PÁGINA			

FECHA: 02/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Planificación de Infraestructura **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Chocó

DATOS GENERALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 4227 de 2024 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

JUSTIFICACIÓN:
Del Registro Presupuestal No. 1124124 de fecha 2024-11-14 Valor $8.700.000.000,00 para un valor total de anticipo de $ 4.350.000.000 equivalente al 50% como se estipula en la cláusula septima "Forma de pago" del contrato interadminsitrativo No 4227 de 2024.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VR. MES 5	VR. MES 6	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Pago de salarios personal consultoria	96,222,000.00	96,222,000.00	117,630,000.00	117,630,000.00	117,630,000.00	117,630,000.00	$ 662,964,000.00	15.24%
2	Viaticos personal de consultoria	6,400,000.00	37,850,000.00	37,850,000.00	37,850,000.00	37,850,000.00	3,750,000.00	$ 161,550,000.00	3.71%
3	Adquisición de información secundaria		15,000,000.00					$ 15,000,000.00	0.34%
4	Levantamiento topografico		30,000,000.00	50,200,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	40,000,000.00	$ 220,200,000.00	5.06%
5	Gestiones ambientales, sociales, arqueológicas, prediales y de sostenibilidad (s/comprobante) (adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago a autoridades ambientales, costos de gestiones arqueológicas, monitoreo, muestreos ambientales etc.)		80,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100,000,000.00	$ 680,000,000.00	15.63%
6	Toma de muestras para laboratorio(en suelo, en roca, Apiques) y ensayos de laboratorio y/o ensayos de investigación y/o Diagnóstico y/o Redes (S/comprobante) (Incluye la comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructural de puentes, subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, pavimentos, mezlas de suelo cemento, muros, obras hidraulicas, concretos, vibraciones ambientales, lineas sismicas, inspección de redes, batimetrías, entre otros)		1,136,590,400.00	304,647,600.00	305,047,600.00	307,547,600.00	329,852,800.00	$ 2,383,686,000.00	54.80%
7	Toma de información de transito		15,000,000.00	15,000,000.00				$ 30,000,000.00	0.69%
8	Metodologias grupo 2			58,500,000.00	63,500,000.00	12,500,000.00		$ 134,500,000.00	3.09%
9	Dotacion de oficina		50,000,000.00					$ 50,000,000.00	1.15%
10	Campamento	1,100,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	$ 12,100,000.00	0.28%
TOTAL		**$ 103,722,000.00**	**$ 1,462,862,400.00**	**$ 686,027,600.00**	**$ 776,227,600.00**	**$ 727,727,600.00**	**$ 593,432,800.00**	**$ 4,350,000,000.00**	**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. No aplica para compra ni alquiler de vehículos.

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.

4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: Edly Stella Renteria Mena
Directora de Consultoria
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL


Firma:
Nombre: José Octavio Niño Brijaldo
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE CONSULTORÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**1**	**ESTUDIOS Y DISEÑOS CONEXIÓN CURUNDÓ SAN JOSÉ DEL PALMAR CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA**	**14,25 mss**	**lun 2/12/24**	**mié 31/12/25**
2	1.1	**INICIO**	**0 mss**	**lun 2/12/24**	**lun 2/12/24**
3	**1.2**	**GRUPO No. 1 PERSONAL**	**14,25 mss**	**lun 2/12/24**	**mié 31/12/25**
4	1.2.1	Director de Consultoría - Ejecución de los Estudios	14,15 mss	lun 2/12/24	lun 29/12/25
5	1.2.2	Ingeniero Residente de Estudios	14,15 mss	mié 4/12/24	mié 31/12/25
6	1.2.3	Ingeniero Residente de Campo	7,5 mss	lun 13/01/25	mié 6/08/25
7	1.2.4	Coordinador ambiental y social	14,15 mss	lun 2/12/24	lun 29/12/25
8	1.2.5	Coordinador técnico	14,15 mss	lun 2/12/24	lun 29/12/25
9	1.2.6	Coordinador BIM SIG	14,15 mss	lun 2/12/24	lun 29/12/25
10	1.2.7	Ingeniero Auxiliar	14,15 mss	lun 2/12/24	lun 29/12/25
11	1.2.8	Técnicos de la zona	7,5 mss	lun 13/01/25	mié 6/08/25
12	**1.3**	**APROPIACIÓN Y PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR**	**2 mss**	**lun 2/12/24**	**vie 24/01/25**
13	1.3.1	Reunión de socialización con grupos de interés	0,1 mss	jue 12/12/24	vie 13/12/24
14	1.3.2	Apropiación de los estudios y diseños y/o documentación técnica previa	1 ms	lun 2/12/24	vie 27/12/24
15	1.3.3	Elaboración de cronograma de actividades	0,5 mss	lun 2/12/24	vie 13/12/24
16	1.3.4	Elaboración de metodología general	1 ms	lun 2/12/24	vie 27/12/24
17	1.3.5	Elaboración de metodologías particulares	1 ms	lun 2/12/24	vie 27/12/24

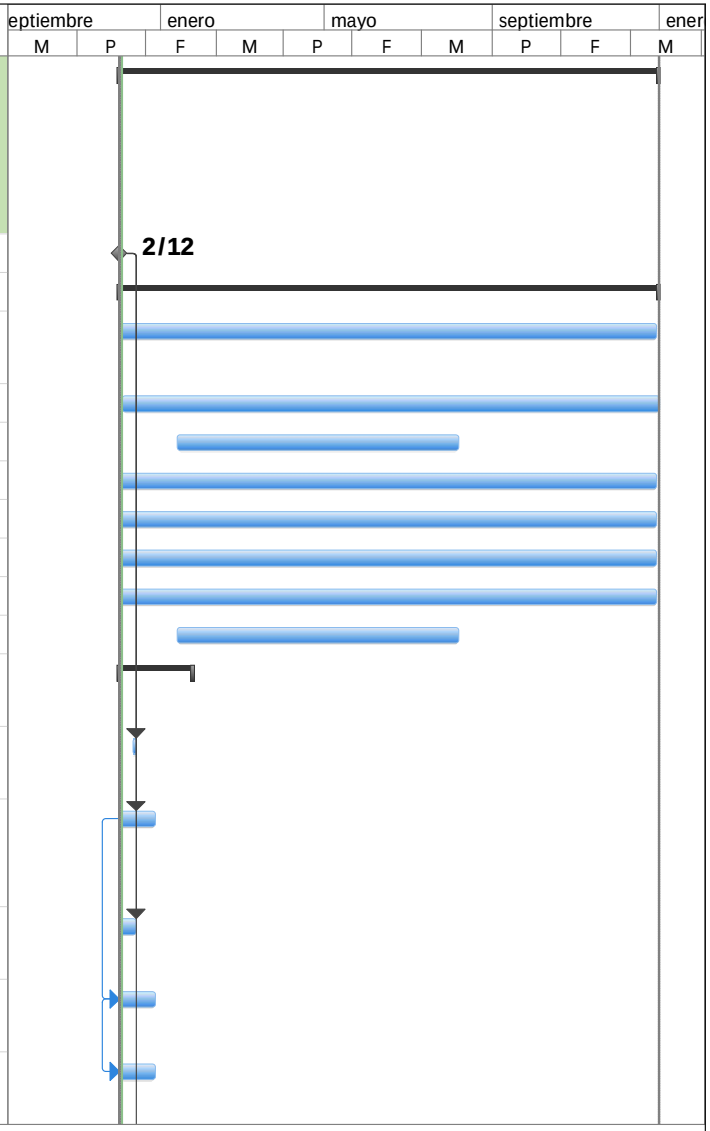


Proyecto: Programación Curun
Fecha: mié 4/12/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
18	1.3.6	Elaboración de plan de calidad de estudios y diseños	2 mss	lun 2/12/24	vie 24/01/25
19	1.3.7	Solicitud de información a empresas de servicios públicos información base y guía para la presentación de productos en formato digital	1 ms	lun 2/12/24	vie 27/12/24
20	**1.4**	**RECOPILACION DE INFORMACIÓN SECUNDARIA**	**1 ms**	**lun 2/12/24**	**vie 27/12/24**
21	1.4.1	Recopilación de estudios y diseños existentes de utilidad para el proyecto	1 ms	lun 2/12/24	vie 27/12/24
22	1.4.2	Solicitudes a entidades gubernamentales y privadas	1 ms	lun 2/12/24	vie 27/12/24
23	1.4.3	Adquisición de cartografía y demás información técnica	1 ms	lun 2/12/24	vie 27/12/24
24	1.4.4	Análisis de posibles conflictos de intereses con otros proyectos e infraestructura existentes	0,5 mss	lun 2/12/24	vie 13/12/24
25	**1.5**	**GRUPO No. 2 ELABORACIÓN DE VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES**	**13 mss**	**jue 2/01/25**	**lun 29/12/25**
26	1.5.1	Volumen 1. Estudios topográficos	3 mss	jue 2/01/25	lun 24/03/25
27	1.5.2	Volumen 2. Estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio	2 mss	lun 13/01/25	mié 5/03/25
28	1.5.3	Volumen 3. Estudio de trazado y diseño geométrico	3 mss	jue 2/01/25	lun 24/03/25
29	1.5.4	Volumen 4. Estudio de seguridad vial	2 mss	mar 25/03/25	lun 19/05/25

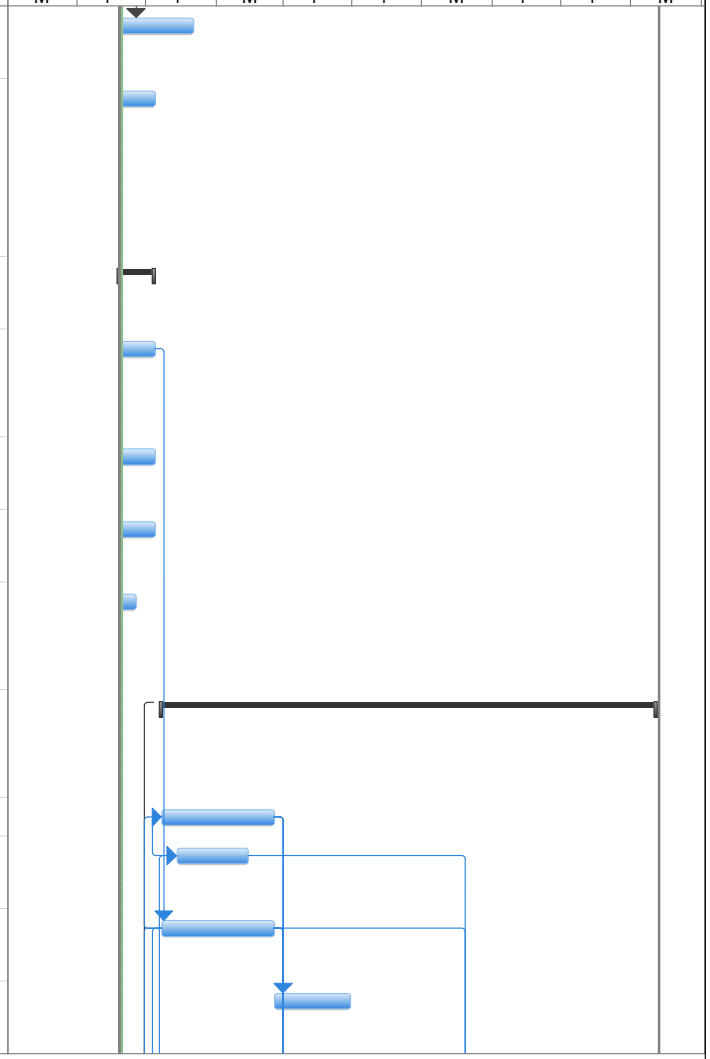


Proyecto: Programación Curun
Fecha: mié 4/12/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
30	1.5.5	Volumen 5. Estudio de geología y geomorfología local	6 mss	mar 25/03/25	lun 8/09/25
31	1.5.6	Volumen 6. Estudio de hidrogeología de detalle	6 mss	mar 25/03/25	lun 8/09/25
32	1.5.7	Volumen 7. Estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y fuentes de materiales	4 mss	sáb 1/02/25	mié 21/05/25
33	1.5.8	Volumen 8. Estudio de suelos para diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras	3 mss	mar 20/05/25	lun 11/08/25
34	1.5.9	Volumen 9. Estudio de hidráulica, hidrología y socavación	3 mss	mar 25/03/25	lun 16/06/25
35	1.5.10	Volumen 10. Estudio de diseño de pavimentos	2 mss	mar 12/08/25	lun 6/10/25
36	1.5.11	Volumen 11. Estudio de diseño de estructuras	6 mss	mar 25/03/25	lun 8/09/25
37	1.5.12	Volumen 12. Estudio de urbanismo y paisajismo	2 mss	mar 25/03/25	lun 19/05/25
38	1.5.13	Volumen 13. Estudio de redes hidrosanitarias y secas	2 mss	mar 25/03/25	lun 19/05/25
39	1.5.14	Volumen 14. Estudio de riesgos	6 mss	mar 25/03/25	lun 8/09/25
40	1.5.15	Volumen 15. Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones	2 mss	mar 9/09/25	lun 3/11/25

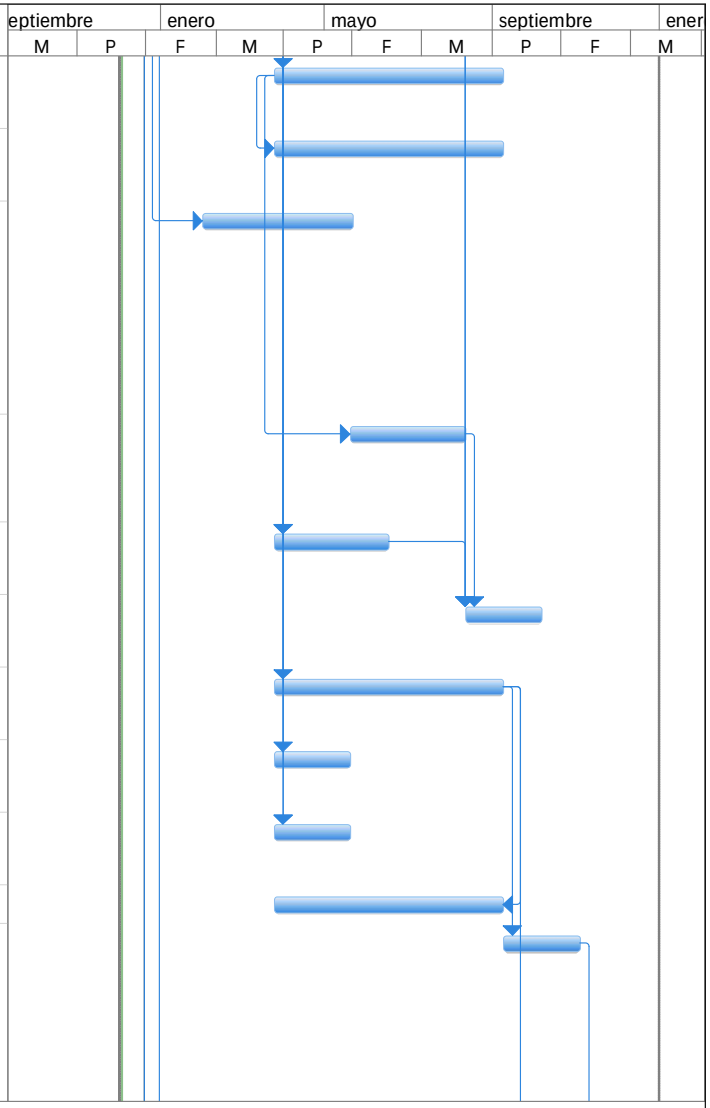


Proyecto: Programación Curun
Fecha: mié 4/12/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
41	1.5.16	Volumen 16. Evaluación socioeconómica y financiera del proyecto	4 mss	mié 12/02/25	lun 2/06/25
42	1.5.17	Volumen 17. Ambiental, social, predial, y sostenibilidad	11 mss	jue 2/01/25	lun 3/11/25
43	1.5.18	Volumen 18. Técnico BIM	4 mss	mar 20/05/25	lun 8/09/25
44	1.5.19	Volumen 19. Informe final ejecutivo	2 mss	mar 4/11/25	lun 29/12/25
45	**1.6**	**GRUPO No. 3 OTROS COSTOS DIRECTOS**	**14,25 mss**	**lun 2/12/24**	**mié 31/12/25**
46	1.6.1	Viáticos Director (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	13,75 mss	jue 12/12/24	lun 29/12/25
47	1.6.2	Viáticos Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	13,75 mss	lun 16/12/24	mié 31/12/25
48	1.6.3	Transportes Aéreos Director (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	13,75 mss	lun 16/12/24	mié 31/12/25
49	1.6.4	Transportes Aéreos Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	13,75 mss	lun 2/12/24	mié 17/12/25
50	1.6.5	Adquisición de informaciòn secundaria (fotografia aèrea, planchas catastrales, Registro 1 y 2 del IGAC, implica tota la informaciòn jurìdica que se requiera) S/Comprobante Pago	13 mss	lun 6/01/25	mié 31/12/25

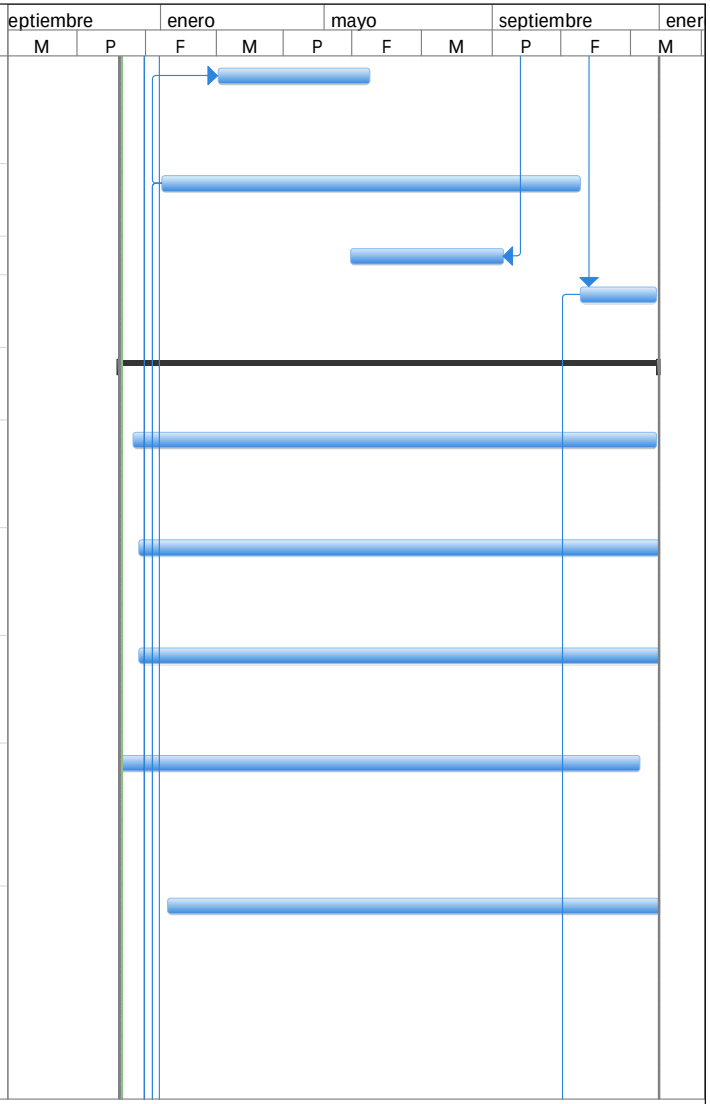


Proyecto: Programación Curun
Fecha: mié 4/12/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
51	1.6.6	Levantamiento Topografico y Materialización del Eje (Incluye personal, equipos, transporte)	3 mss	lun 13/01/25	mié 2/04/25
52	1.6.7	Levantamiento topográfico detallado (incluye personal, equipos, materiales, viaticos, desplazamiento, transporte)	3 mss	jue 3/04/25	mié 25/06/25
53	1.6.8	Georeferenciación (incluye par de puntos con gps de precisiòn milimètrica materializdos en campo con mojones en concreto y plantina de bronce, estimando ubicar en cada punto un par de mojones de concreto). incluye equipo, material, transportes y personal.	3 mss	lun 13/01/25	mié 2/04/25
54	1.6.9	Alquiler de Vehìculo (4X4 de 2000 CC o superior, Modelo 2014 o superior, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	13,05 mss	jue 2/01/25	mar 30/12/25
55	1.6.10	Alquiler de Vehìculo (4X4 de 2000 CC o superior, Modelo 2014 o superior, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	7,5 mss	jue 23/01/25	lun 18/08/25
56	1.6.11	Campamento (incluye arrendamiento y/o alquiler, dotación y servicios, en el sitio del proyecto)	13,05 mss	vie 3/01/25	mié 31/12/25

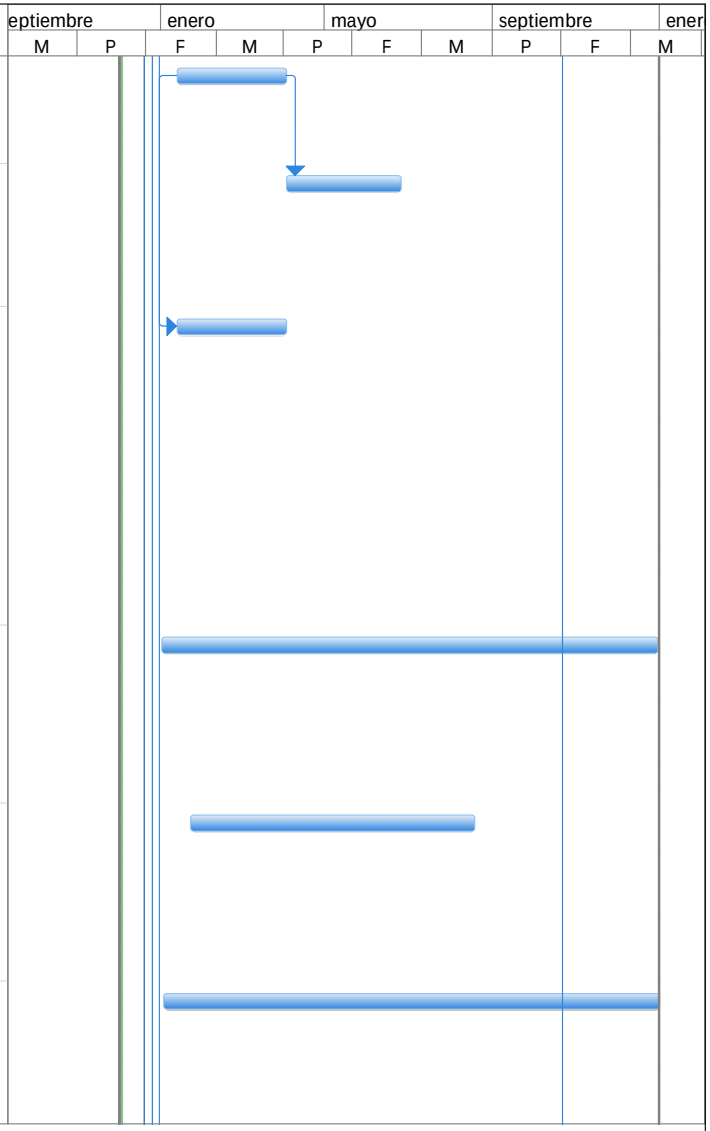


Proyecto: Programación Curun
Fecha: mié 4/12/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
57	1.6.12	Campamento (incluye arrendamiento y/o alquiler, dotación y servicios, en el sitio del proyecto)	7,5 mss	jue 23/01/25	lun 18/08/25
58	1.6.13	Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	4 mss	jue 23/01/25	lun 12/05/25
59	1.6.14	Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal)	4 mss	jue 23/01/25	lun 12/05/25
60	1.6.15	Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal)	4 mss	jue 23/01/25	lun 12/05/25
61	1.6.16	Ensayos de Laboratorio y/o ensayos de investigación y/o Diagnóstico y/o Redes (S/comprobante) (Incluye la comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructura	6 mss	jue 23/01/25	lun 7/07/25
62	1.6.17	Edición de Informes Finales de todos los volúmenes (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y dos copias en archivos magnéticos)	2 mss	mar 4/11/25	lun 29/12/25

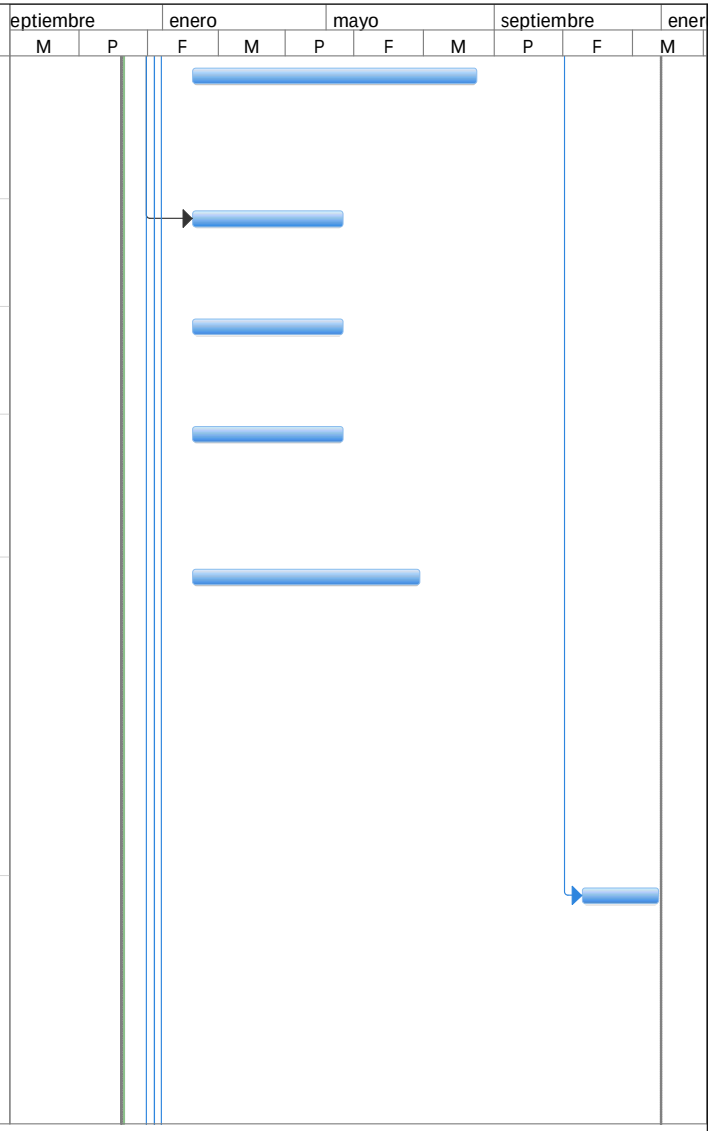


Proyecto: Programación Curun
Fecha: mié 4/12/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
63	1.6.18	Estudios complementarios (Aprobados por la Interventoría)	6 mss	jue 2/01/25	lun 16/06/25
64	1.6.19	Toma de información de Tránsito	2 mss	lun 13/01/25	mié 5/03/25
65	1.6.20	Gestiones Ambientales, Arqueologica, Sociales, (S/comprobante) (Adquisición de información, monitoreo, muestreos, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago a autoridades ambientales, etc)	3 mss	lun 20/01/25	mié 9/04/25
66	1.6.21	Lineamientos consultas previas (Socializaciones componente social). (S/comprobante)	10 mss	sáb 1/02/25	mié 5/11/25
67	1.6.22	**FIN**	**0 mss**	**mié 31/12/25**	**mié 31/12/25**

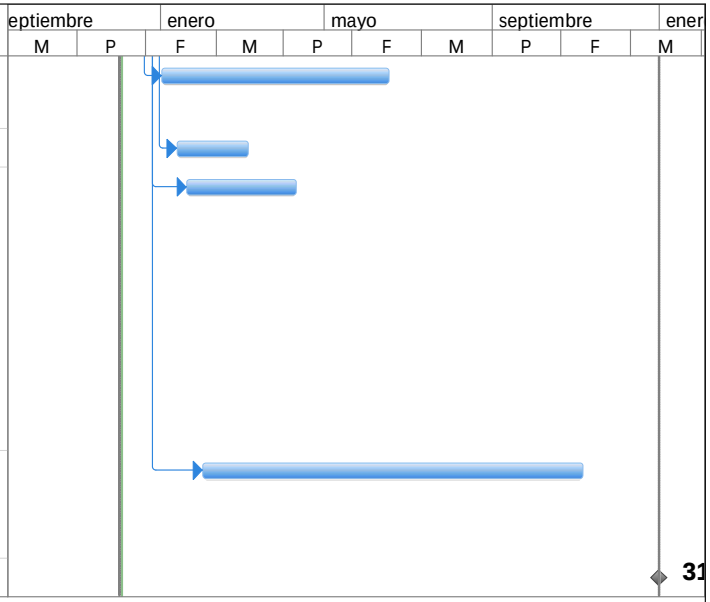

Proyecto: Programación Curun
Fecha: mié 4/12/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

MEPI-MN-IN-6-FR-1
PROGRAMA DE INVERSIONES

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 6
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 4227 DE 2024

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 de 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 1.095 (En meses segun contrato principa)

PLAZO ACUMULADO: 37 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CON 02/12/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) $ 8.700.000.000,00 (Según contrato principal)

,OR ADICIONES (Incluido IVA) $

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) $ 8.700.000.000,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL consultoría PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA Miles de pesos	(%) consultoría PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL consultoría PROGRAMADA / VALOR consultoría EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ajustado / % Ejecutado	DICIEMBRE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 254,568,000.00	2.93%	2.21%	% P	1.16%		1.24%	1.34%	1.34%	1.68%	1.34%	1.68%	1.34%	1.14%	1.16%	0.93%	0.93%	1.16%	
	$ 1,430,754,000.00	16.45%	$ 192,444,000.00	$ P	$ 100,774,210.53		$ 107,902,723.26	$ 116,997,174.87	$ 116,997,174.87	$ 146,246,468.59	$ 116,997,174.87	$ 146,246,468.59	$ 116,997,174.87	$ 99,805,271.65	$ 100,774,210.53	$ 80,619,368.42	$ 80,619,368.42	$ 100,774,210.53	
				$ E	$ 96,222,000.00		$ 96,222,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	1.11%		1.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES																			
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS	$ 69,000,000.00	0.79%	0.00%	% P	0.04%		0.48%	0.00%	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$ 69,000,000.00	0.79%	$ -	$ P	$ -		$ 3,450,000.00	$ 41,400,000.00	$ -	$ 24,150,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO	$ 60,000,000.00	0.69%	0.00%	% P	0.00%		0.41%	0.00%	0.00%	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$ 60,000,000.00	0.69%	$ -	$ P	$ -		$ 3,000,000.00	$ 36,000,000.00	$ -	$ 21,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	$ 165,000,000.00	1.90%	0.00%	% P	0.00%		1.14%	0.00%	0.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$ 165,000,000.00	1.90%	$ -	$ P	$ -		$ 6,250,000.00	$ 99,000,000.00	$ -	$ 57,750,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	$ 42,000,000.00	0.48%	0.00%	% P	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.31%	0.00%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$ 42,000,000.00	0.48%	$ -	$ P	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 27,300,000.00	$ -	$ 14,700,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	$ 106,000,000.00	1.22%	0.00%	% P	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$ 106,000,000.00	1.22%	$ -	$ P	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 5,300,000.00	$ -	$ -	$ 43,600,000.00	$ -	$ -	$ 37,100,000.00	$ -	$ -	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	$ 125,000,000.00	1.44%	0.00%	% P	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$ 125,000,000.00	1.44%	$ -	$ P	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 6,250,000.00	$ -	$ -	$ 75,000,000.00	$ -	$ -	$ 43,750,000.00	$ -	$ -	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES	$ 368,000,000.00	4.23%	0.00%	% P	0.00%		0.21%	0.00%	2.54%	0.00%	1.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$ 368,000,000.00	4.23%	$ -	$ P	$ -		$ -	$ 18,400,000.00	$ -	$ 220,800,000.00	$ -	$ 128,800,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E															
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	$ 235,000,000.00	2.70%	0.00%	% P															
	$ 235,000,000.00	2.70%	$ -	$ P	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,750,000.00	$ 141,000,000.00	$ -	$ 82,250,000.00	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E															
ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	$ 190,000,000.00	2.18%	0.00%	% P															
	$ 190,000,000.00	2.18%	$ -	$ P	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 9,500,000.00	$ 114,000,000.00	$ -	$ 66,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E															
ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS	$ 73,000,000.00	0.84%	0.00%	% P															
	$ 73,000,000.00	0.84%	$ -	$ P	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,650,000.00	$ 43,800,000.00	$ -	$ 25,550,000.00	$ -	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E															
ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	$ 481,000,000.00	5.53%	0.00%	% P															
	$ 481,000,000.00	5.53%	$ -	$ P	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 24,050,000.00	$ -	$ -	$ 288,600,000.00	$ -	$ -	$ 168,350,000.00	$ -	$ -	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E															
ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	$ 57,000,000.00	0.66%	0.00%	% P															
	$ 57,000,000.00	0.66%	$ -	$ P	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 2,850,000.00	$ 34,200,000.00	$ 19,950,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E															
ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS SECAS	$ 47,000,000.00	0.54%	0.00%	% P															
	$ 47,000,000.00	0.54%	$ -	$ P	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 2,350,000.00	$ 28,200,000.00	$ 16,450,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E															
ESTUDIO DE RIESGOS	$ 93,000,000.00	1.07%	0.00%	% P															
	$ 93,000,000.00	1.07%	$ -	$ P	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 4,650,000.00	$ -	$ -	$ 55,800,000.00	$ -	$ -	$ 32,550,000.00	$ -	$ -	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E															
ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	$ 56,000,000.00	0.64%	0.00%	% P															
	$ 56,000,000.00	0.64%	$ -	$ P	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,800,000.00	$ 33,600,000.00	$ -	$ -	$ 19,600,000.00	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E															
EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	$ 54,000,000.00	0.62%	0.00%	% P															
	$ 54,000,000.00	0.62%	$ -	$ P	$ -		$ -	$ 2,700,000.00	$ -	$ 32,400,000.00	$ -	$ -	$ 18,900,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E															
AMBIENTAL , SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	$ 423,000,000.00	4.86%	0.00%	% P	0.24%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.47%	
	$ 423,000,000.00	4.86%	$ -	$ P	$ 21,150,000.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 253,980,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 148,050,000.00	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
VOLUMEN TECNICO BIM	$ 46,000,000.00	0.53%	0.00%	% P															
	$ 46,000,000.00	0.53%	$ -	$ P	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,300,000.00	$ -	$ -	$ 27,600,000.00	$ -	$ 16,100,000.00	$ -	$ -	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E															
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 5,755,432,000.00	66.15%	0.00%	% P	0.46%		1.43%	8.95%	10.48%	8.18%	5.57%	5.85%	1.15%	1.04%	1.13%	0.92%	1.70%	2.00%	
	$ 4,579,246,000.00	52.64%	$ -	$ P	$ 39,797,368.42		$ 447,252,894.74	$ 778,748,061.40	$ 909,610,076.75	$ 711,748,061.40	$ 484,473,686.40	$ 509,789,451.75	$ 100,357,894.74	$ 90,607,894.74	$ 98,347,368.42	$ 80,357,894.74	$ 147,474,561.40	$ 181,680,701.75	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
VALOR BÁSICO DE consultoría (A)	$ 8,700,000,000.00	100.00%	2.21%																
VALOR BÁSICO DE consultoría ACTUALIZADO (A')	$ 8,700,000,000.00	100.00%	$ 192,444,000.00																

REPROGRAMACIÓN

INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA MES	%	1.62%		6.79%	12.54%	11.80%	14.03%	6.91%	9.18%	7.01%	2.18%	2.29%	2.78%	2.62%	4.95%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 140,571,578.95		$ 591,005,701.35	$ 1,093,245,236.27	$ 1,026,607,251.62	$ 1,298,344,529.99	$ 780,170,861.27	$ 846,685,920.34	$ 1,180,555,069.61	$ 220,866,166.39	$ 327,971,578.95	$ 492,427,263.16	$ 253,643,929.82	$ 450,104,912.28
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA	%	1.62%		8.41%	20.97%	32.78%	47.68%	54.64%	63.38%	70.34%	72.52%	74.81%	77.59%	80.21%	85.15%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 140,571,578.95		$ 731,577,280.30	$ 1,824,822,516.57	$ 2,851,429,768.19	$ 4,147,774,298.18	$ 4,927,945,159.45	$ 5,774,631,079.79	$ 6,955,186,149.40	$ 7,175,052,315.79	$ 7,503,023,894.74	$ 7,995,451,157.90	$ 8,249,095,087.72	$ 8,700,000,000.00
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA MES	%	1.11%		1.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 96,222,000.00		$ 96,222,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA	%	1.11%		2.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 96,222,000.00		$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de consultoría aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la consultoría (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la consultoría programada se calcula con respecto al Valor Básico de consultoría (A) o el Valor Básico de consultoría Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de consultoría que no se puedan agrupar por GPP, se debe

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

Aprueba Firma:
Nombre: EDAY STELLA RENTERÍA MENA
Directora de consultoría
Matrícula Profesional No.: 0820251733 ATL

Aprueba Firma:
Nombre: JOSE OCTAVIO NIÑO BRUALDO
Director de interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC BYC

Revisó Firma:
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: YENNY XIOMARA HERNANDEZ PEÑARANDA
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN-IN-6-FR-2
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA consultoría PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSION	1
PAGINA	

FECHA: 02/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 1 **DE** este 25 **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 192,444,000.00
(indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 1
¡La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra!

CONTRATO No: 4227 DE 2024

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 de 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 1 mes (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 13 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTR: ######## (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: ######## (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** $ 8,709,000,000.00 (Según contrato principal)
ALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(I** $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **/C=A+B** $ 8,709,000,000.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL consultoría PROGRAMADA Miles de pesos	(%) consultoría PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL consultoría PROGRAMADA	% Programado $ Valor programado % Valor Ejecutado % Ejecutado	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
	VALOR ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA	VALOR consultoría EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos															
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 254,568,000.00	2.93%	2.21%	%P	1.48%	1.24%	1.24%	1.24%	1.48%	1.24%	1.48%	1.24%	1.24%	1.48%	0.93%	0.93%	1.10%	
	$ 1,430,754,000.00	16.45%	$ 192,444,000.00	$ P	$ 100,774,218.59	$ 107,203,723.26	$ 116,397,174.87	$ 116,397,174.87	$ 146,246,469.59	$ 116,697,174.87	$ 146,246,469.59	$ 116,697,174.87	$ 98,898,271.65	$ 100,774,218.59	$ 80,619,388.42	$ 80,619,388.42	$ 100,774,218.59	
				$ E	$ 96,222,000.00	$ 96,222,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	1.11%	1.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLÚMENES TÉCNICOS ENTREGABLES																		
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS	$ 69,000,000.00	0.79%	0.00%	%P		0.08%	0.69%		0.28%									
	$ 69,000,000.00	0.79%	$ -	$ P		$ 1,450,000.00	$ 41,400,000.00		$ 24,150,000.00									
				$ E		$ -	$ -		$ -									
				% E		0.00%	0.00%		0.00%									
ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO	$ 60,000,000.00	0.69%	0.00%	%P		0.02%	0.63%		0.24%									
	$ 60,000,000.00	0.69%	$ -	$ P		$ 350,000.00	$ 36,000,000.00		$ 21,000,000.00									
				$ E		$ -	$ -		$ -									
				% E		0.00%	0.00%		0.00%									
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	$ 165,000,000.00	1.90%	0.00%	%P		0.09%	1.14%		0.66%									
	$ 165,000,000.00	1.90%	$ -	$ P		$ 9,240,000.00	$ 99,000,000.00		$ 57,750,000.00									
				$ E		$ -	$ -		$ -									
				% E					0.00%		0.00%							
ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	$ 42,000,000.00	0.48%	0.00%	%P					0.31%		0.17%							
	$ 42,000,000.00	0.48%	$ -	$ P					$ 27,300,000.00		$ 14,700,000.00							
				$ E					$ -		$ -							
				% E					0.00%		0.00%	0.00%						
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	$ 106,000,000.00	1.22%	0.00%	%P					0.00%			0.43%						
	$ 106,000,000.00	1.22%	$ -	$ P					$ 5,300,000.00			$ 43,600,000.00				$ 37,100,000.00		
				$ E					$ -			$ -				$ -		
				% E					0.00%			0.00%				0.00%		
ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	$ 125,000,000.00	1.44%	0.00%	%P					0.87%			0.86%				0.58%		
	$ 125,000,000.00	1.44%	$ -	$ P					$ 6,250,000.00			$ 75,000,000.00				$ 43,750,000.00		
				$ E					$ -			$ -				$ -		
				% E					0.00%			0.00%				0.00%		
ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES	$ 368,000,000.00	4.23%	0.00%	%P			0.21%		2.54%		1.48%							
	$ 368,000,000.00	4.23%	$ -	$ P			$ 16,560,000.00		$ 220,800,000.00		$ 129,600,000.00							
				$ E			$ -		$ -		$ -							
				% E														
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	$ 235,000,000.00	2.70%	0.00%	%P							0.14%	1.62%		0.95%				
	$ 235,000,000.00	2.70%	$ -	$ P							$ 11,750,000.00	$ 141,000,000.00		$ 82,250,000.00				
				$ E							$ -	$ -		$ -				
				% E														
ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	$ 190,000,000.00	2.18%	0.00%	%P					0.11%	1.31%		0.65%						
	$ 190,000,000.00	2.18%	$ -	$ P					$ 9,500,000.00	$ 114,000,000.00		$ 66,500,000.00						
				$ E					$ -	$ -		$ -						
				% E														
ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS	$ 73,000,000.00	0.84%	0.00%	%P									0.08%	0.50%		0.00%		
	$ 73,000,000.00	0.84%	$ -	$ P									$ 3,650,000.00	$ 43,800,000.00		$ 25,550,000.00		
				$ E									$ -	$ -		$ -		
				% E														
ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	$ 481,000,000.00	5.53%	0.00%	%P					0.28%			3.42%				1.94%		
	$ 481,000,000.00	5.53%	$ -	$ P					$ 24,050,000.00			$ 288,600,000.00				$ 168,350,000.00		
				$ E					$ -			$ -				$ -		
				% E														
ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	$ 57,000,000.00	0.66%	0.00%	%P					0.03%	0.39%	0.23%							
	$ 57,000,000.00	0.66%	$ -	$ P					$ 2,850,000.00	$ 34,200,000.00	$ 19,950,000.00							
				$ E					$ -	$ -	$ -							
				% E														
ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS SECAS	$ 47,000,000.00	0.54%	0.00%	%P					0.03%	0.32%	0.19%							
	$ 47,000,000.00	0.54%	$ -	$ P					$ 2,350,000.00	$ 28,200,000.00	$ 16,450,000.00							
				$ E					$ -	$ -	$ -							
				% E														
ESTUDIO DE RIESGOS	$ 93,000,000.00	1.07%	0.00%	%P					0.05%			0.64%				0.37%		
	$ 93,000,000.00	1.07%	$ -	$ P					$ 4,650,000.00			$ 55,800,000.00				$ 32,550,000.00		
				$ E					$ -			$ -				$ -		
				% E														
ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, AVÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	$ 56,000,000.00	0.64%	0.00%	%P										0.03%		0.39%		0.23%
	$ 56,000,000.00	0.64%	$ -	$ P										$ 2,800,000.00		$ 22,400,000.00		$ 29,680,000.00
				$ E										$ -		$ -		$ -
				% E														
EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	$ 54,000,000.00	0.62%	0.00%	%P			0.03%		0.37%			0.22%						
	$ 54,000,000.00	0.62%	$ -	$ P			$ 2,700,000.00		$ 32,400,000.00			$ 18,900,000.00						
				$ E			$ -		$ -			$ -						
				% E														
AMBIENTAL , SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	$ 423,000,000.00	4.86%	0.00%	%P		0.24%						2.92%						1.70%
	$ 423,000,000.00	4.86%	$ -	$ P		$ 21,150,000.00						$ 253,800,000.00						$ 148,950,000.00
				$ E		$ -						$ -						$ -
				% E		0.00%						0.00%						0.00%
VOLUMEN TECNICO BIM	$ 46,000,000.00	0.53%	0.00%	%P						0.03%				0.32%		0.19%		
	$ 46,000,000.00	0.53%	$ -	$ P						$ 2,300,000.00				$ 27,600,000.00		$ 16,100,000.00		
				$ E						$ -				$ -		$ -		
				% E														
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 5,755,432,000.00	66.15%	0.00%	%P	0.46%	5.14%	8.09%	10.46%	8.18%	9.97%	5.80%	1.15%	1.06%	1.13%	0.93%	1.13%	2.09%	
	$ 4,578,246,000.00	52.64%	$ -	$ P	$ 39,797,368.42	$ 447,224,000.00	$ 776,746,081.46	$ 909,810,876.75	$ 711,748,561.46	$ 484,473,686.49	$ 505,785,451.75	$ 100,357,894.74	$ 95,607,894.74	$ 96,347,368.42	$ 80,357,894.74	$ 97,474,561.40	$ 181,660,751.75	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%													
VALOR BÁSICO DE consultoría (A)	**$ 8,709,000,000.00**	**100.00%**	**2.21%**															
VALOR BÁSICO DE consultoría ACTUALIZADO (A')	**$ 8,709,000,000.00**	**100.00%**	**$ 192,444,000.00**															

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra (A)".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir imprevisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan acotar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE VALOR	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN CONSULTORIA PROGRAMADA MES	%	1.62%	6.79%	12.57%	11.80%	14.90%	8.97%	8.73%	13.57%	2.54%	3.77%	5.66%	2.92%	5.17%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 140,571,578.95	$ 591,055,701.39	$ 1,093,245,236.27	$ 1,026,607,251.92	$ 1,296,344,529.99	$ 780,170,861.27	$ 846,885,920.54	$ 1,180,555,069.61	$ 220,666,166.39	$ 327,971,578.95	$ 492,427,263.16	$ 253,643,929.92	$ 450,104,912.28				
INVERSIÓN CONSULTORIA PROGRAMADA ACUMULADA	%	1.62%	8.41%	20.97%	32.78%	47.68%	56.64%	65.36%	78.94%	81.48%	85.25%	91.91%	94.83%	100.00%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 140,571,578.95	$ 731,577,280.35	$ 1,824,822,516.57	$ 2,851,429,768.19	$ 4,147,774,298.18	$ 4,927,945,159.45	$ 5,774,831,079.79	$ 6,955,386,149.40	$ 7,175,852,315.79	$ 7,503,823,894.74	$ 7,996,251,157.90	$ 8,249,895,087.82	$ 8,700,000,000.00				
INVERSIÓN CONSULTORIA EJECUTADA MES	%	1.11%	1.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 96,222,000.00	$ 96,222,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				
INVERSIÓN CONSULTORIA EJECUTADA ACUMULADA	%	1.11%	2.21%	#¡DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 96,222,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Consultor y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba. Firma:
Nombre: EDNA TERESA DEVENDRA MENA
Directora de consultoría
Matrícula Profesional No.: 080251733ATL

Aprueba. Firma:
Nombre: JOSE OCTAVIO NIÑO BRAJALDO
Director de interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-9243

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 279 DE 2025.

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	279 del 28 de enero 2025.
CONTRATISTA	JOSÉE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
CC.	74322702
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR DE INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.
VALOR DEL CONTRATO	$ 16´384.000, oo
PLAZO DE EJECUCIÓN**	28 de enero al 31de marzo de 2025.
PRORROGA	N/A
LUGAR DE EJECUCIÓN	Tunja.
ORDENADOR DEL GASTO	CARLOS MAURICIO MORENO TÉLLEZ, Vicerrector de Investigaciones y Extensión
SUPERVISOR	OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO Resolución 5451 del 14 de noviembre 2024.
DEPENDENCIA	Contrato Interadministrativo N.º 4262 de 2024, UPTC - INVIAS.
ACTIVIDAD	DIRECTOR
PERIODO DEL INFORME	28 al 31 de enero de 2025.
NUMERO DEL PAGO	1 de 3
VALOR DEL PAGO	$ 1´024.000, oo

INTRODUCCIÓN

la Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4227 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA. Para la realización de la interventoría del contrato anteriormente mencionado, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4262 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.

En el presente informe se describen las actividades realizadas como director en el periodo comprendido entre el 28 al 31 de marzo de 2025.



ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Participación en reunión periódica virtual 29 de enero en cumplimiento de compromisos adquiridas, con el propósito de informar el avance del contrato 4227-2024, Estudios y Diseños a nivel fase III (definitivos) de la conexión Curundo- San José del Palmar- Cruce el Cairo en el departamento del choco y Valle del Cauca, en el cual la consultoría manifiesta sobre el cambio de Fiducia que regula los recursos de la UTCH, dificultad financiera de la consultoría para contratar personal, programar socializaciones entre otros por la falta del desembolso que estaba proyectado para el mes de diciembre y no fue efectivo, además informa sobre la problemática administrativa de la universidad, otro punto tratado fue sobre la posible deficiencia en los estudios fase 2 proporcionados por el Instituto Nacional de Vías, la cual requiere algunos ajustes; La interventoría solicita un plan de contingencia para contrarrestar el atraso de lo programado, en dicha reunión participaron, ingeniera Jenny Xiomara Hernández gestora del contrato del Invias, Edly Estella Rentería, Eulogio palacios , Luz Yaneth Osorio , Marcela Palacios, por la interventoría ingeniera Denis Pino, Diego Borda y el suscrito.
2. Se participa en reunión virtual 15 de enero , citada por el Instituto nacional de vías subdirección de planificación e infraestructura con la participación de la ingeniera Jenny Xiomara Hernández subdirectora encargada el Gestor encargado Fredy Davison Sierra, por parte de la interventoría el ingeniero Camilo Hernández Diego Fernando Borda Denis Pino y el suscrito los demás tratados verificación de aprobación de la póliza de la prórroga, diagnóstico de revisión de estudios y diseños fase dos por parte de la Consultoría , preocupación de la Consultoría por falta de flujo de caja para inicios de actividades de campo, y programación del consultor para enero entrega el plan BIM, actualización de licencias y permisos frente a las autoridades ambientales. , revisión de requerimientos fase tres.
3. Se realizó reunión virtual con la directora de Consultoría y la gestora del contrato Xiomara Hernández, con el fin de analizar los requerimientos técnicos y aclarar los perfiles de los profesionales, verificación de pólizas y la documentación requerida para hacer efectiva los desembolsos respectivos.
4. Se coordina y se revisa con el equipo de profesionales de la interventoría, los documentos soportes para presentar las actas de costos del mes de enero, tanto de la interventoría como la consultoría y ser enviados al gestor de contrato del instituto nacional de vías INVIAS. Dentro de las fechas preestablecidas.
5. Se mantiene informado al supervisor del contrato de prestación de servicios y/o a la Gerencia de la UPTC, sobre las necesidades profesionales y técnicas de elementos, muebles y equipos de oficina que se requieran para el normal funcionamiento de la Interventoría.
6. Se realiza la verificación del personal ofrecido en la propuesta por la consultoría esté desempeñando el cargo para el cual fue propuesto según lo establecido en los estudios previos dispuestos por el INVIAS.
7. Se firma y aprueban todas las actas de acuerdo al Manual de Interventoría Versión Vigente del INVIAS, entre otras actas de mensual de costos de consultoría e interventoría, Actas de modificación de cantidades de consultoría e interventoría, entre otras.
8. Se coordina, se revisa y se presentan los informes semanales y la presentación en power point mensual vía e-mail, debidamente revisados, aprobados a las diferentes dependencias.
9. Se asistencia al comité técnico en las instalaciones de la Universidad pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC. Se contó con la participación del Gerente del contrato de interventoría, el coordinador Ingeniero Diego Fernando Borda, los especialistas Ambiental y de Sostenibilidad, Ingeniera Yully Suarez, Ing. Miguel Barreto coordinador ambiental, ing Camilo Hernández residente de estudios, y el equipo de apoyo de la parte administrativa y financiera del contrato de interventoría, con el propósito de revisar documentación existente, requerimientos técnicos, hojas de vida etc.
10. Se mantiene comunicación con el Gestor del contrato, por parte del INVIAS , con el propósito de coordina el proceder y entrega según fechas dispuestas por la administración financiera para la entrega de informes, documentos y actas respectivas pendientes.
11. Se realizan labores coordinación para verificación en los diferentes requisitos precontractuales a que haya lugar, de acuerdo al Manual de Interventoría versión vigente, especialmente en lo relacionado con el instructivo para seguimiento de la ejecución del Contrato de interventoría.

12. Se verifica que el personal ofrecido en la propuesta por el contratista esté desempeñando el cargo para el cual fue propuesto. En caso de requerir un cambio, se debe cumplir lo establecido en los estudios previos dispuestos por el INVIAS.
13. Asesorar y suministrar la información técnica-financiera y en general cualquier información que las comisiones de seguimiento de gestores técnicos y de proyectos, de control y evaluación enviada por el Instituto Nacional de Vías y /o de las entidades de control que lo requieran
14. Rendir informes periódicos al Instituto Nacional de Vías –INVIAS- con base en las pruebas, verificaciones y cuantificaciones de los estudios que realice el consultor, sugiriendo las medidas que se deben tomar para mitigar los posibles efectos negativos del proyecto.
15. Se estudió las sugerencias y consultas del contratista, resolviéndolas oportunamente y emitir conceptos técnicos, financieros y legales según el caso, con los correspondientes soportes, documentos y justificaciones remitidas al gestor técnico del contrato y a la unidad ejecutoria pertinente para su trámite, para lo cual puede contar con los especialistas de la interventoría.
16. Se realiza seguimiento y se supervisa las labores o actividades de los diferentes profesionales que conforman el equipo de trabajo de la interventoría y se expone las diferentes situaciones en el desarrollo de los contratos, tanto consultoría como interventoría, para proponer entre todos las mejores alternativas o soluciones a las circunstancias expuestas según sea el caso.
17. Solicitud de revisión de la documentación y estudios existentes a la unidad ejecutora sobre los diseños anteriores desarrollados por los departamentos del Choco y Valle del Cauca por parte del Gestor Técnico del proyecto INVIAS, con el fin de realizar un diagnóstico de los mismos
18. Coordinar con la consultoría la realización de socializaciones y divulgaciones de los estudios y diseños con la comunidad, entes territoriales y nacionales, entre otros actores e interesados según sea necesario, y realizar el seguimiento y acompañamiento correspondiente al desarrollo de las mismas.

En general se ha prestado asesoría y acompañamiento antes las situaciones técnicas y competentes en el área de dirección de interventoría, atendiendo oportunamente las solicitudes presentadas, en cumplimiento con las funciones contempladas en el contrato de prestación de servicios durante el desarrollo del periodo del 28 al 31 de enero de 2025.

REGISTRO FOTOGRÁFICO MES DE ENERO DE 2025

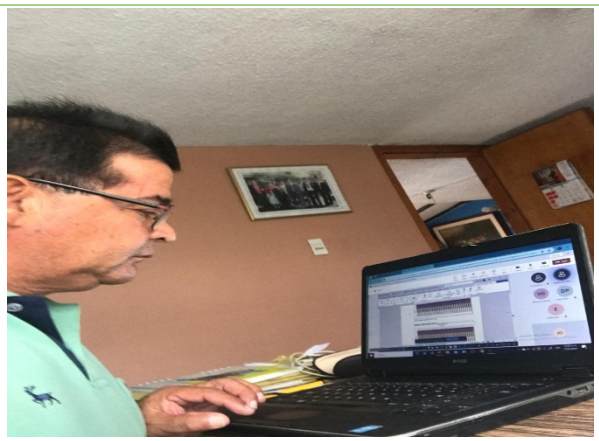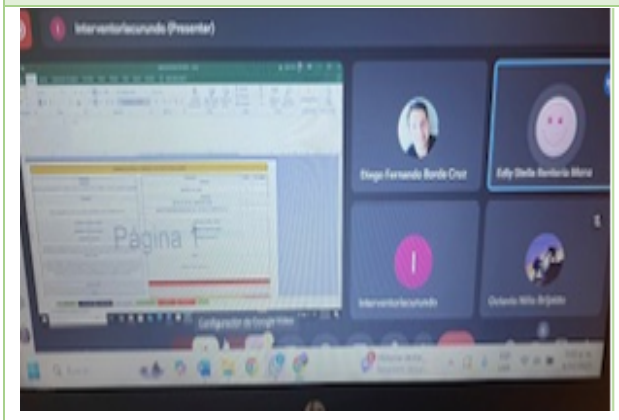	
FOTO 1 Participación en comité de seguimiento mensual con el gerente del contrato ing. German Peña, el Coordinador Ing. Diego Borda, con el objeto de analizar y tomar acciones encaminadas al cumplimiento del contrato 4227 por parte del UTCH.	**FOTO2.** Se participa en la reunión virtual con la Ing. Jenny Siomara H. subdirectora Planificación e infraestructura encargada, Ing. Cesar Augusto Rodríguez gestor del INVIAS, Al igual con la ingeniería Edly Stella y Eulogio Palacios, temas actualización pólizas, flujo de caja, metodología Bim, licencias.
	
Foto 3 Se participa en reunión virtual citada por la subdirectora Encargada Jenny Xiomara Hernández, para hacer seguimiento al contrato 4227-2024 contó con la participación del equipo de interventoría.	

PRESENTADO POR:

JOSÉ OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de interventoría del contrato 4262 de 2024

V° B°:

OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO
Supervisor del contrato interventoría 4262 de 2024

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 283 DE 2024.

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	283 de enero 2024
CONTRATISTA	Diego Fernando Borda Cruz.
CC.	1.099.207.738 de Barbosa Santander.
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO COORDINADOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INTERVENTORIA, INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO*	$ 25.744.000
PLAZO DE EJECUCIÓN**	Del 28 de enero al 31 de marzo de 2025.
PRORROGA	N.A.
LUGAR DE EJECUCIÓN	TUNJA.
ORDENADOR DEL GASTO	Carlos Mauricio Moreno Téllez, Vicerrector de Investigaciones y Extensión
SUPERVISOR	Oscar Javier Gutiérrez Junco Supervisor del contrato No.4262 de 2024.
DEPENDENCIA	Contrato Interadministrativo No 4262 de 2024, UPTC - INVIAS.
ACTIVIDAD	Coordinador de estudios y diseños.
PERIODO DEL INFORME	Del 28 al 31 de enero 2025.
NUMERO DEL PAGO	1 DE 3
VALOR DEL PAGO	$ 1.609.000

INTRODUCCIÓN

La Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4227 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA Para la realización de la interventoría del contrato anteriormente mencionado, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4262 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

A continuación, se describen las actividades desarrolladas del 28 al 31 de enero 2025.

1. Se realizo reuniones de seguimiento con el equipo de la consultoría Universidad Tecnológica de Chocó, gestor técnico del proyecto por parte de INVIAS y el supervisor del contrato de interventoría por parte de la dirección territorial de Chocó.

2. Se realizo el trámite ante el INVIAS, acta de costos de interventoría y consultoría correspondiente al mes de enero de 2025.

3. Se realizo informes de seguimiento ante la sub dirección de Planificación de Infraestructura INVIAS.

4. Se realizo seguimiento del trámite de solicitud de anticipos de los contratos interadministrativos de consultoría e Interventoría No 4221 y 4262 de 2024.

5. Se continua con la revisión de los estudios y diseños fase II del contrato 1666 de 2015, insumo inicial para el desarrollo de los estudios del contrato No 4221 de 2024.

6. Se represento a la UPTC ante el INVIAS para adelantar los trámites internos administrativos que sean necesarios para la consecución del objeto del Contrato Interadministrativo No 4262 de 2024.

7. Se hizo seguimiento a los procesos administrativos, técnicos acordes del seguimiento a las actividades realizadas por el consultor.

8. Se realizo el apoyo en el desarrollo del Contrato interadministrativo, de la Interventoría, igualmente deberá tramitar adecuadamente correspondencia, utilizando los formatos y procedimientos establecidos y cumplir con las disposiciones que apliquen a sus actividades contenidas en el manual de interventoría de Invias vigente, resoluciones y decretos que se relacionen con el ejercicio de esta.

9. Se vigilo el avance de los profesionales contratados por la UPTC para el buen funcionamiento y cumplimiento en los cronogramas establecidos.

10. Se programo reuniones internas y externas con las entidades involucradas en el proceso de los estudios y diseños de la conexión Conexión Curundo – San José Del Palmar – Crucero El Cairo En Los Departamentos Del Choco Y Valle Del Cauca.

ESTADO DEL PROYECTO:

A continuación, se presenta la trazabilidad de tramites durante la ejecución de la consultoría contrato de consultoría No 4227 de 2024 ejecutado por la Universidad Tecnológica Diego Luis Córdoba.

- Tanto el contrato interadministrativo de consultoría como de interventoría, por directriz del INVIAS se ordenó orden de inicio el pasado 02 de diciembre de 2024.

- El Instituto Nacional de Vías INVIAS suscribió minutas de prórroga para los dos contratos interadministrativo de consultoría como de interventoría, con nuevo plazo comprendido desde el 31 de diciembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025 sin adición de valor.

- Se radico ante el INVIAS la factura No 1 por un valor de $48,111,000.00 correspondiente al acta No 1 de costos de consultoría contrato interadministrativo No 4227 de 2024.

- Se radico ante el INVIAS la factura No 1 por un valor de $22.611.200,00 correspondiente al acta No 1 de costos de interventoría contrato interadministrativo No 4262 de 2024.

- El 09 de diciembre de 2024 se realizó la aprobación y registro de la cuenta del anticipo por parte de INVIAS, el anticipo a entregar por parte del INVIAS para el contrato interadministrativo de consultoría No 4227 de 2024, tiene un valor de $4.350.000.000.

- El 09 de diciembre de 2024 se realizó la aprobación y registro de la cuenta del anticipo por parte de INVIAS, el anticipo a entregar por parte del INVIAS para el contrato interadministrativo de interventoría No 4262 de 2024, tiene un valor de $1.187.500.000.

Actas de costos de interventoría tramitadas ante el Instituto Nacional de Vías:

1. Valor acta de costos de interventoría del mes de diciembre 2024 correspondiente al periodo del 02 al 31 de diciembre fue de $45.222.400,00.

2. Valor acta de costos de interventoría del mes de enero 2025 correspondiente al periodo del 28 al 31 de enero 2025 fue de $7.880.120,00.

Total ejecutado acumulado a 31 de enero de 2025 actas de costos de interventoría: **$ 53.102.520,00**

Las actas de costos expuestas anteriormente fueron aprobadas por el supervisor del contrato de interventoría y de la sub dirección de planificación de infraestructura del INVIAS.

Valor acumulado actas mes de enero de 2025: $ 53.102.520,00
Valor anticipo acumulado amortizado a enero de 2025 (50%): $ 26.551.260,00

Nota: Los contratos de consultoría e interventoría actualmente siguen en estado activo.

INVERSIÓN:

• Recursos comprometidos Consultoría	$ 8,700,000,000.00
• Recursos comprometidos en Interventoría:	$ 2,375,000,000.00
• **Inversión Total del Proyecto:**	**$ 11,075,000,000.00**

NECESIDADES DEL PROYECTO:

- Actualmente se encuentra en estado de pago por parte de INVIAS del acta de costos del mes de diciembre de 2024.

BENEFICIOS:

- Estudios y diseños para la conexión del corredor Curundo – San José del Palmar – Cruce el Cairo que beneficia comunidades indígenas y comunidades afro dándoles la posibilidad de conectar el departamento del Choco con el departamento del valle del Cauca.
- Con la ejecución de este proyecto en etapa definitiva se busca que se implemente una vía para conectar a los departamentos de Chocó y Valle del Cauca.

- El proyecto dará en su ejecución la oportunidad de explorar otras fuentes de ingreso ya que pueden comercializar los productos que se desarrollan en la región.
- Se aumentará el turismo como nueva fuente de ingresos a las comunidades
- Disminución de tiempos y costos de viaje
- Accesibilidad a centros de salud para adultos mayores y mujeres gestantes

GESTIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS:

- Se han realizado comités de seguimiento con la Universidad Tecnología del Choco UTCH, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC y el Instituto Nacional de Vías INVIAS para socializar el estado de avance de la consultoría, resolver inquietudes y gestionar actividades en beneficio del desarrollo de los estudios y diseños.

- Para el correcto ejercicio de la Interventoría objeto del Contrato interadministrativo, se han impartido instrucciones a todo el personal del equipo de interventoría para que apliquen estrictamente el Manual de Interventoría Versión 2022 del Invías, las especificaciones técnicas vigentes del Invías y todo lo pactado en el Contrato Interadministrativo.

- Se ha exigido tanto al director de Interventoría la presentación oportuna de los informes semanales al Gestor del Proyecto de Invías tanto de la Territorial Choco como de la Subdirección de Planificación de Infraestructura.

- Se ha exigido tanto al director de Interventoría la presentación oportuna de los informes mensuales con la información actualizada, la cual es complementada por los especialistas.

- Se ha dado respuesta a la correspondencia interna y externa.

- La Consultoría ejercida por la Universidad Tecnológica de Choco Diego Luis Córdoba, está realizando los trabajos logísticos para el desarrollo con las comunidades territoriales para desarrollar las socializaciones.

- Durante el mes de enero de 2025 la interventoría ha adelantado tareas de seguimiento, revisión de las entregas preliminares y finales por parte de la Consultoría.

- Participación en reunión periódica virtual 29 de enero en cumplimiento de compromisos adquiridas, con el propósito de informar el avance del contrato 4227-2024, Estudios y Diseños a nivel fase III (definitivos) de la conexión Curundo- San José del Palmar- Cruce el Cairo en el departamento del choco y Valle del Cauca, en el cual la consultoría manifiesta sobre el cambio de Fiducia que regula los recursos de la UTCH, dificultad financiera de la consultoría para contratar personal, programar socializaciones entre otros por la falta del desembolso que estaba proyectado para el mes de diciembre y no fue efectivo, además informa sobre la problemática administrativa de la universidad, otro punto tratado fue sobre la posible deficiencia en los estudios fase 2 proporcionados por el Instituto Nacional de Vías, la cual requiere algunos ajustes; La interventoría solicita un plan de contingencia para contrarrestar el atraso de lo programado, en dicha reunión participaron, ingeniera Jenny Xiomara Hernández gestora del contrato del Invias, Edly Estella Rentería, Eulogio palacios , Luz Yaneth Osorio , Marcela Palacios, por la interventoría ingeniera Denis Pino, Diego Borda y el suscrito.

- Se participa en reunión virtual 15 de enero, citada por el Instituto nacional de vías subdirección de planificación e infraestructura con la participación de la ingeniera Jenny Xiomara Hernández

subdirectora encargada el Gestor encargado Fredy Davison Sierra, por parte de la interventoría el ingeniero Diego Fernando Borda, Denis Pino y el suscrito los demás tratados verificación de aprobación de la póliza de la prórroga, diagnóstico de revisión de estudios y diseños fase dos por parte de la Consultoría , preocupación de la Consultoría por falta de flujo de caja para inicios de actividades de campo, y programación del consultor para enero entrega el plan BIM, actualización de licencias y permisos frente a las autoridades ambientales. , revisión de requerimientos fase tres.

- Se concilio las actas de costos correspondientes al mes de enero de 2025 de los contratos de consultoría e interventoría.

ENTREGABLES:

1. Copia de los informes de supervisión de contratistas de la UPTC que prestan sus servicios al contrato interadministrativo No 4262 de 2024.
2. Informe de estado de las Actas de Costos mensuales de Interventoría.
3. Copia de la presentación del estado de avance del Contrato interadministrativo No 4262 de 2024.
4. Apoyar la respuesta a los requerimientos que el INVIAS y la Universidad realicen sobre la ejecución del Contrato y dar trámite a los mismos de manera oportuna y eficiente, resumen de la correspondencia del mes que llegue al Contrato interadministrativo No 4262 de 2024.
5. Copia de registro fotográfico de las reuniones a las que asista.
6. Informe del área pertinente de acuerdo a la revisión a realizar por parte de los profesionales especialistas y administrativos a los estudios y diseños entregados por la Universidad Tecnológica del Choco.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE EL MES DE ENERO 2025.

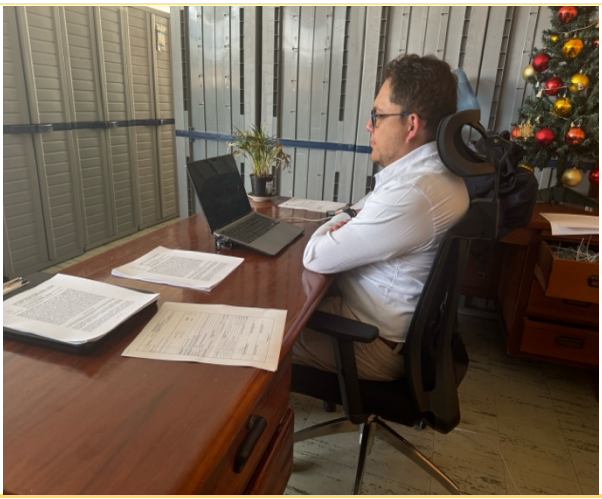


FOTO 1. Asistencia a reunión semanal de seguimiento compromisos de la consultoría.



FOTO 2. Elaboración de informes de seguimiento.



Foto3. Revisión acta de costos de enero de 2025 y elaboración de acta de costos de interventoría.

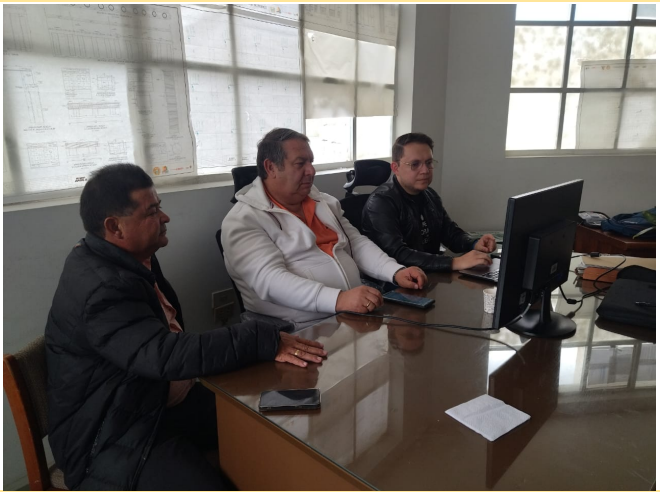


Foto 4. Asistencia a reunión de seguimiento virtual con el grupo consultor para seguimiento de compromisos pactados en el desarrollo del proyecto. Componente BIM.

PRESENTADO POR:

DIEGO FERNANDO BORDA CRUZ
CC. 1.099.207.738
Coordinador de estudios y diseños.
Contratista

Vo. Bo:

OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO
Supervisor del contrato

Vo. Bo:

JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de Interventoría.

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 285 de 2025

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	285 DEL 28 DE ENERO DE 2025
CONTRATISTA	DENIS YINETH PINO MARIÑO
CC.	1.049.629.730 de Tunja.
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESIDENTE DE ESTUDIOS DE INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO-SAN JOSE DEL PALMAR-CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO	$18.720.000
ADICIÓN No 01	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN**	28 de enero al 31 de marzo de 2025
PRORROGA No 01	N/A
LUGAR DE EJECUCIÓN	Tunja.
ORDENADOR DEL GASTO	Carlos Mauricio Moreno Téllez, Vicerrector de Investigación y Extensión.
SUPERVISOR	Oscar Javier Gutiérrez Junco, Supervisor del Contrato
DEPENDENCIA	Contrato Interadministrativo N.º 4262 DE 2024, UPTC - INVIAS.
ACTIVIDAD	RESIDENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
PERIODO DEL INFORME	28 al 31 de enero de 2025
NUMERO DEL PAGO	1 DE 3
VALOR DEL PAGO	$1.170.000

INTRODUCCIÓN

la Universidad Tecnológica Del Chocó, Diego Luis Córdoba, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4227 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: Estudios y Diseños a nivel de fase III (DEFINITIVOS) de la conexión Curundo-San José del Palmar – Cruce El Cairo en los departamentos del Chocó y Valle del Cauca. Para la realización de la interventoría del contrato anteriormente mencionado, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4262 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo

objeto es: INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO-SAN JOSE DEL PALMAR- CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

En el presente informe se describen las actividades realizadas como Residente de estudios y diseños en el periodo comprendido entre el 28 al 31 de enero de 2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Elaboración y actualización de archivo de correspondencia enviada y recibida
- Revisión informes semanales de la consultoría contrato 4227 de 2024
- Seguimiento a programación de consultoría
- Elaboración Acta de costos del mes de enero de 2025
- Elaboración de informes semanales
- Asistencia a reunión virtual del 15 de enero de 2025 con el gestor técnico del contrato para revisar el avance de los contratos de interventoría y consultoría
- Asistencia a reunión virtual el 22 de enero de 2025 con el fin de actualizar y poner en contexto a la nueva gestora del proyecto.
- Asistencia a comité técnico virtual con la consultoría con el fin de revisar el avance físico y financiero del proyecto, el envío del acta de costos del mes de enero y solicitud de plan de contingencia para disminuir el atraso.
- Revisión informes mensuales del personal de la interventoría
- Verificación del pago de seguridad social del personal de interventoría
- Mesas de trabajo virtuales con la residente de estudios de la consultoría

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

TIPO DE CONTRATO:	CONSULTORÍA
CONTRATO No. Y FECHA:	4227 de 2024
CONSULTOR:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA
VALOR INICIAL:	$8.700.000.000
PLAZO TOTAL CONTRATO:	1 mes.
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA Y PEDAGOGICA DE COLOMBIA

	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4262 DE 2024
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	891800330-1
SUPERVISOR:	ING. JANNIER SALAS QUEJADA Resolución de designación No. 4854 de fecha 15 de octubre de 2024
FECHA DE INICIO:	02 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA No 01	12 MESES HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4262 DE 2024**
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA
INTERVENTORIA ENTIDAD CONTRATANTE	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC NIT. 891800330 – 1 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT. 800215807 -2
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.375.000.000
FECHA DE INICIO	02 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA No 1	12 MESES HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025

El contrato se firma el 11/06/2024, con fecha de inicio el día 02/12/2024 y fecha de terminación 31/12/2024. Posteriormente entre las partes se firma prorroga No.1

presentado fecha de terminación hasta el 31/12/2025. Actualmente, el Consultor manifiesta que la fiducia para el manejo de las cuentas conjuntas de actas y anticipo renuncio y que se encuentra en un nuevo proceso con el Banco Agrario para solucionar este impase.

1. TRABAJOS DE CAMPO:

El consultor tiene dentro de su programación las siguientes actividades de campo

Actividad	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Levantamiento topográfico y materialización del eje	13 de enero de 2025	31 de marzo de 2025
Levantamiento topográfico detallado	01 de abril de 2025	23 de junio de 2025
Georeferenciación	13 de enero de 2025	31 de marzo de 2025
Plan de exploración geotécnico	20 de enero de 2025	11 de mayo de 2025
Toma de información de tránsito	13 de enero de 2025	02 de marzo de 2025
Gestiones ambientales, sociales, arqueológicas, prediales y de sostenibilidad.	20 de enero de 2025	31 de diciembre de 2025

A la fecha el consultor no ha iniciado con las actividades de campo, sin embargo, la interventoría alerta a la consultoría que la no ejecución de estas actividades puede generar retrasos y solicita se contemple un plan de contingencia.

2. ENTREGABLES

METODOLOGÍAS

El consultor tiene dentro de su programación la entrega de las siguientes metodologías en la última semana del mes de enero de 2025

1. Volumen I. Estudios topográficos
2. Volumen II. Estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio
3. Volumen III. Estudio de trazado y diseño geométrico

4. Volumen XVII. Ambiental, social, predial y sostenibilidad

Las metodologías programadas no han sido entregadas según programación por tanto la interventoría solicito Plan de contingencia para disminuir el atraso.

3. ACTUACIONES CONSULTOR E INTERVENTOR

Componente BIM

- El día 27 de enero de 2025 la consultoría envía el Plan de ejecución BIM ajustado, el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría.

Componente Técnico

- Se solicita al consultor plan de contingencia puesto que no se a cumplido con la programación
- Se solicita al consultor informe diagnostico de los estudios y diseños del contrato 1666 de 2015 insumo para el contrato actual.
- Se propone reunión presencial para la segunda semana del mes de febrero de 2025.

Componente administrativo

La consultoría informa que cambiaran los números de cuenta de actas y de anticipo del contrato 4227 de 2025 y que se encuentra haciendo las gestiones para la legalización del contrato con la nueva fiducia con el banco agrario.

4. AVANCE FINANCIERO

A continuación, se presenta el avance financiero programa y ejecutado del contrato de consultoría

Avance financiero contrato 4227 de 2024

% Programado	**8.41%**
% Ejecutado	2.21%

Así mismo se relaciona el valor de cada acta de costos tramitada por la consultoría al INVIAS el valor del anticipo amortizado y su saldo

CONTRATO 4227 DE 2024 - ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA						
Acta No	**PERIODO**	**VALOR BASICO**	**VALOR TOTAL ACTA**	**ANTICIPO AMORTIZADO**	**VALOR REAL AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**	**SALDO ANTICIPO**
ANTICIPO			$	4.350.000.000,00		
1	dic-24	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 48.111.000,00	$ 48.111.000,00	$ 4.301.889.000,00
2	ene-25	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 48.111.000,00	$ 48.111.000,00	$ 4.253.778.000,00
TOTALES		**$ 192.444.000,00**	**$ 192.444.000,00**	**$ 96.222.000,00**	**$ 96.222.000,00**	**$ 4.253.778.000,00**

A continuación, se relaciona el valor de las actas de interventoría tramitadas ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS en donde se expone además la amortización por acta y el saldo a amortizar

CONTRATO 2442 DE 2024 - INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA						
Acta No	**PERIODO**	**VALOR BASICO**	**VALOR TOTAL ACTA**	**ANTICIPO AMORTIZADO**	**VALOR REAL AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**	**SALDO ANTICIPO**
ANTICIPO			$	1.187.500.000,00		
1	dic-24	$ 45.222.400,00	$ 45.222.400,00	$ 22.611.200,00	$ 22.611.200,00	$ 1.164.888.800,00
2	ene-25	$ 7.880.120,00	$ 7.880.120,00	$ 3.940.060,00	$ 3.940.060,00	$ 1.160.948.740,00
		$ 53.102.520,00	**$ 53.102.520,00**	**$ 26.551.260,00**	**$ 26.551.260,00**	**$ 1.160.948.740,00**

ENTREGABLES:

- Relación correspondencia enviada y recibida
- Acta de costos del mes de enero de 2025 con sus soportes
- Actas de reunión
- Informes semanales
- Oficios de seguimiento de programación a la consultoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



Foto 1: Comité de seguimiento interventoría

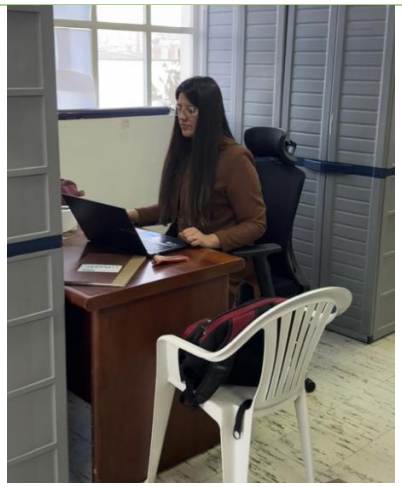


Foto 2 Reunión inicial con el área ambiental del INVIAS

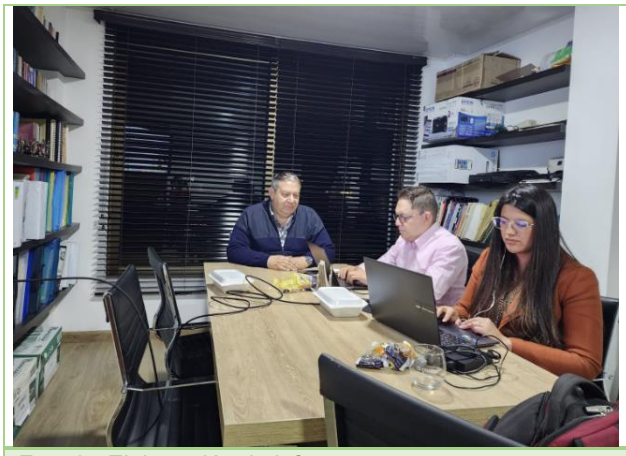


Foto 3: Elaboración de informes y actas

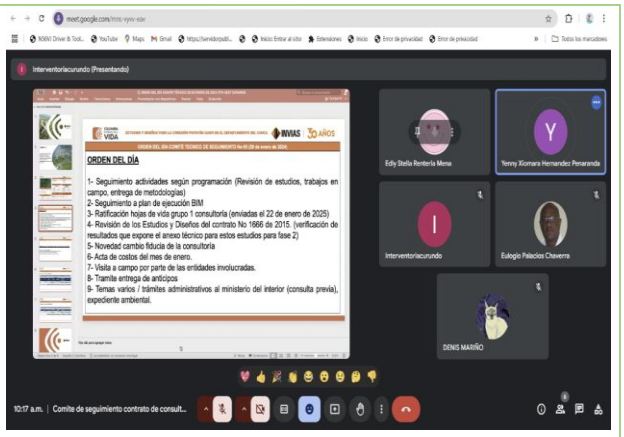


Foto 4 Reunión inicial con alcaldes de Curundo y San José del Palmar, interventoría y consultoría

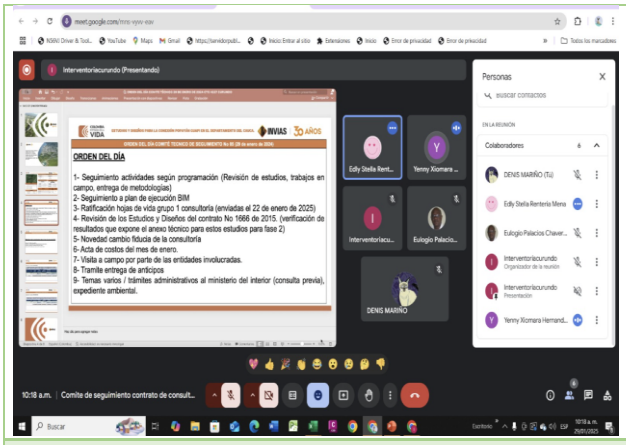


Foto 5: Mesa de trabajo interventoría y consultoría

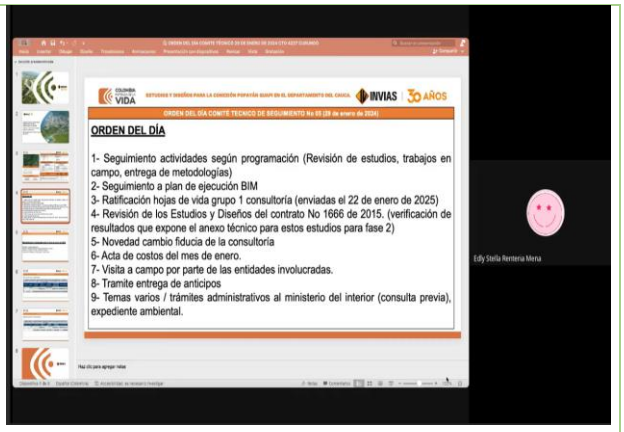


Foto 6 Mesa de trabajo ambiental interventoría

PRESENTADO POR:

DENIS YINETH PINO MARIÑO
Residente de estudios y diseños
Contratista

Vo. Bo:

JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDDO
Director Contrato N.º 4262 de 2024
Interventoría UPTC

OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO
Supervisor del contrato
UPTC

PLAN ANUAL DE CAJA
PAC

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4262 DE 2024
INTERVENTOR UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

PROYECTO INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA
SECTOR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4262 DE 2024 INTERVENTORIA UPTC

CONTRATO		SUB TOTAL COSTOS BASICOS	PROVISIÓN PARA AJUSTES	SUB TOTAL COSTOS BASICOS	VALOR CONTRATO	VIGENCIA 2024	VIGENCIA 2025	VIGENCIA 2026	TOTAL VIGENCIAS
CONTRATO No 4262 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	2.375.000.000,00	-	2.375.000.000,00	$ 2.375.000.000	2.375.000.000,00			2.375.000.000,00
TOTAL		**$ 2.375.000.000**	**$ -**	**$ 2.375.000.000**	**$ 2.375.000.000**	**$ 2.375.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.375.000.000**

PLAN ANUAL DE CAJA (PAC) AÑO 2025

PPTO VIGENTE	TOTAL RECURSOS	COMPONENTE DEL PAGO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR TOTAL EJECUTADO ENERO 2025	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	SALDO RECURSOS 2024
2.024	2.375.000.000,00	GRUPO 1 A GRUPO 3	93.343.133,33	93.343.133,33	234.443.133,33	93.343.133,33	280.303.133,33	190.943.133,33	93.343.133,33	202.343.133,33	491.543.133,33	122.543.133,33	340.943.133,33	93.343.133,33	7.880.120,00	53.102.520,00	2.321.897.480,00
TOTAL		VALOR TOTAL	93.343.133,33	93.343.133,33	234.443.133,33	93.343.133,33	280.303.133,33	190.943.133,33	93.343.133,33	202.343.133,33	491.543.133,33	122.543.133,33	340.943.133,33	93.343.133,33	7.880.120,00	53.102.520,00	2.321.897.480,00

MEPI-MN1-IN-15-FR-7
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31-dic-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCION TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 DE 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CORREDOR SOSTENIBLE ÁNIMAS - NUQUÍ EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 4227 DE 2024 **CONSULTOR :** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

NOMBRE ARL: POSITIVA. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	74.322.702	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 10.240.000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	50%		40%	$ 192.430	V	SANITAS	9479703009	$ 940.200,00	COLPENSIONES	9479703009	$ 691.300,00	N/A	N/A	N/A	
2	DIEGO FERNANDO BORDA CRUZ	1.099.207.738	INGENIERO COORDINADOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (INTERVENTORÍA)	$ 8.045.000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100%		40%	$ 302.363	V	SANITAS	9479321197 9481712977	$ 594.200,00	PORVENIR	9479321197 9481712977	$ 760.500,00	N/A	N/A	N/A	
3	DENIS YINETH PINO MARIÑO	1.049.629.730	INGENIERO RESIDENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (INTERVENTORÍA)	$ 5.850.000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100%		40%	$ 219.866	V	NUEVA EPS	9477707728 9481604260	$ 399.900,00	COLFONDOS	9477707728 9481604260	$ 511.800,00	N/A	N/A	N/A	
4																																						$ -												
5																																						$ -												
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$24.135.000																																													

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoria diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Firma
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-181087 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO** identificado con **CC** No. **74322702**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - NI. 891800330	**Fecha de inicio de cobertura:** 28/01/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 28/11/2024 **Fecha fin de Contrato:** 26/01/2025 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202501012594894.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 17 días del mes de febrero de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_09
MIS_4_1_3_FR15 v_010

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74322702		NIÑO BRIJALDO JOSE OCTAVIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CORINTO SECTOR MONTESILLO	PAIPA-BOYACA	7852521	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1170084117	9479703009	I	2025/01/03	2025/01/03	BANCO FALABELLA	0	$1,631,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																														
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	74322702	NIÑO BRIJALDO JOSE OCTAVIO	Independiente	0	No	No													X																

Total **Afiliados(1)**

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 3.780.000	No		COLPENSIONES	30	$ 5.530.000	16%	SIN RIESGO	$ 884.800	$ 0	$ 0	$ 27.700	$ 27.700	$ 0	$ 940.200		SANITAS	30	$ 5.530.000	12,5%	$ 691.300	$
																					$ 940.200						$ 691.300	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 691.300			0	$ 0	0%	$ 0		0	$ 0	0%	1	$ 0	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 691.300						$ 0						$ 0				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74322702		NIÑO BRIJALDO JOSE OCTAVIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CORINTO SECTOR MONTESILLO	PAIPA-BOYACA	7852521	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1170084117	9479703009	I	2025/01/03	2025/01/03	BANCO FALABELLA	0	$1,631,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$940,200	$0	$0	$940,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$940,200	$0	$0	$940,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$691,300	$0	$0	$691,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$691,300	$0	$0	$691,300
TOTAL				1	$1,631,500	$0	$0	$1,631,500

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **DIEGO FERNANDO BORDA CRUZ** identificado con **CC** No. **1099207738**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - NI. 891800330	**Fecha de inicio de cobertura:** 28/01/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 05/12/2024 **Fecha fin de Contrato:** 04/01/2025 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202501012594707.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 17 días del mes de febrero de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_09
MIS_4_1_3_FR15 v_010

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1099207738		BORDA CRUZ DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 3a # 3a - 09	TUNJA-BOYACA	7442112	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1267178125	9481712977	N	2025/01/13	2025/02/14	BANCOLOMBIA	32	$979,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$3,366,100	$538,600			$3,366,100	$420,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$3,366,100	$538,600			$3,366,100	$420,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$3,366,100	$538,600			$3,366,100	$420,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1099207738	BORDA DIEGO	230301	30	($1,300,000)	($208,000)	EPS005	30	($1,300,000)	($162,500)		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC	1099207738	BORDA DIEGO	230301	30	$4,666,100	$746,600	EPS005	30	$4,666,100	$583,300		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$3,366,100	$538,600			$3,366,100	$420,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1099207738		BORDA CRUZ DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 3a # 3a - 09	TUNJA-BOYACA	7442112	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1267178125	9481712977	N	2025/01/13	2025/02/14	BANCOLOMBIA	32	$979,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$538,600	$11,100	$0	$549,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$538,600	$11,100	$0	$549,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$420,800	$8,700	$0	$429,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$420,800	$8,700	$0	$429,500
TOTAL				1	$959,400	$19,800	$0	$979,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1099207738		BORDA CRUZ DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 3a # 3a - 09	TUNJA-BOYACA	7442112	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1238487530	9479321197	I	2025/01/13	2025/02/03	BANCOLOMBIA	21	$375,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1099207738	BORDA CRUZ DIEGO FERNANDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$2,800	$0	$210,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$2,800	$0	$210,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$2,200	$0	$164,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$2,200	$0	$164,700
TOTAL				**1**	**$370,500**	**$5,000**	**$0**	**$375,500**

2025/02/02 09:04 PM

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **DENIS YINETH PINO MARINO** identificado con **CC** No. **1049629730**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - NI. 891800330	**Fecha de inicio de cobertura:** 28/01/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 05/12/2024 **Fecha fin de Contrato:** 04/01/2025 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202501012594811.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 17 días del mes de febrero de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_09
MIS_4_1_3_FR15 v_010

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049629730		PINO MARIÑO DENIS YINETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV NORTE No 78-32	TUNJA-BOYACA	7400123	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1108785366	9477707728	I	2025/01/10	2024/12/09	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049629730	PINO DENIS																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0		$377,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049629730		PINO MARIÑO DENIS YINETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV NORTE No 78-32	TUNJA-BOYACA	7400123	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1108785366	9477707728	I	2025/01/10	2024/12/09	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$0**	**$0**	**$377,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049629730		PINO MARIÑO DENIS YINETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV NORTE No 78-32	TUNJA-BOYACA	7400123	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1261501584	9481604260	N	2025/01/10	2025/02/12	BANCOLOMBIA	33	$551,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049629730	PINO DENIS								A				▫						231001	30	($1,300,000)	($208,000)	EPS037	30	($1,300,000)	($162,500)		0	$0	$0	14-23	30	($1,300,000)	($6,800)	0	$0	$0	No	($377,300)
2	CC	1049629730	PINO DENIS								C	X									231001	30	$3,159,000	$505,500	EPS037	30	$3,159,000	$394,900		0	$0	$0	14-23	30	$3,159,000	$16,500	0	$0	$0	No	$916,900
Total	**Afiliados(1)**																						$1,859,000	$297,500			$1,859,000	$232,400			$0	$0			$1,859,000	$9,700		$0	$0		$539,600

2025/02/16 05:33 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049629730		PINO MARIÑO DENIS YINETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV NORTE No 78-32	TUNJA-BOYACA	7400123	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1261501584	9481604260	N	2025/01/10	2025/02/12	BANCOLOMBIA	33	$551,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$297,500	$6,300	$0	$303,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$297,500	$6,300	$0	$303,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,700	$300	$0	$10,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,700	$300	$0	$10,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$232,400	$5,000	$0	$237,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$232,400	$5,000	$0	$237,400
TOTAL				**1**	**$539,600**	**$11,600**	**$0**	**$551,200**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31-ene-25 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 DE 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO 2025. **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CORREDOR SOSTENIBLE ÁNIMAS - NUQUÍ EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 4227 DE 2024. **CONSULTOR :** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

NOMBRE ARL: POSITIVA. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	74.322.702	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 10.240.000																										x	x	x	x	50%		40%	$ 213.811	V	SANITAS	9481376339	$ 178.800,00	COLPENSIONES	9481376339	$ 228.900,00	N/A	N/A	N/A	
2	DIEGO FERNANDO BORDA CRUZ	1.099.207.738	INGENIERO COORDINADOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (INTERVENTORÍA)	$ 8.045.000																										x	x	x	x	100%		40%	$ 335.959	V	SANITAS	9480768531	$ 178.000,00	PORVENIR	9480768531	$ 227.800,00	N/A	N/A	N/A	
3	DENIS YINETH PINO MARIÑO	1.049.629.730	INGENIERO RESIDENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (INTERVENTORÍA)	$ 5.850.000																										x	x	x	x	100%		40%	$ 244.296	V	NUEVA EPS	9479919445	$ 178.000,00	COLFONDOS	9479919445	$ 227.800,00	N/A	N/A	N/A	
4																																						$ -												
5																																						$ -												
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 24.135.000																																													

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Firma
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-181087 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO** identificado con **CC** No. **74322702**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - NI. 891800330	**Fecha de inicio de cobertura:** 28/01/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 28/01/2025 **Fecha fin de Contrato:** 26/02/2025 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202501012557120.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 15 días del mes de febrero de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_09
MIS_4_1_3_FR15 v_010

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **DENIS YINETH PINO MARINO** identificado con **CC** No. **1049629730**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - NI. 891800330	**Fecha de inicio de cobertura:** 28/01/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 28/01/2025 **Fecha fin de Contrato:** 27/04/2025 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202501012557212.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 15 días del mes de febrero de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_09
MIS_4_1_3_FR15 v_010

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049629730		PINO MARIÑO DENIS YINETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV NORTE No 78-32	TUNJA-BOYACA	7400123	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1238220672	9479919445	I	2025/02/10	2025/02/03	BANCOLOMBIA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049629730	PINO DENIS							X											231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0		$413,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049629730		PINO MARIÑO DENIS YINETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV NORTE No 78-32	TUNJA-BOYACA	7400123	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1238220672	9479919445	I	2025/02/10	2025/02/03	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$413,300**	**$0**	**$0**	**$413,300**

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **DIEGO FERNANDO BORDA CRUZ** identificado con **CC** No. **1099207738**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - NI. 891800330	**Fecha de inicio de cobertura:** 28/01/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 28/01/2025 **Fecha fin de Contrato:** 27/04/2025 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202501012557199.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 15 días del mes de febrero de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_09
MIS_4_1_3_FR15 v_010

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1099207738		BORDA CRUZ DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 3a # 3a - 09	TUNJA-BOYACA	7442112	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1238498932	9480768531	I	2025/02/11	2025/02/03	BANCOLOMBIA	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1099207738	BORDA CRUZ DIEGO FERNANDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$0**	**$0**	**$405,800**

2025/02/02 09:10 PM

MEPI-MN1-IN-15-FR-9
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31-ene-25 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 DE 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2025. **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CORREDOR SOSTENIBLE ÁNIMAS - NUQUÍ EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 4227 DE 2024 **CONSULTOR :** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1124024	C-2402-0600-16-51102A-2402006-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA SECUNDARIA MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-MEDELLÍN (CHOCO), VÍA E	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 2.300.000.000	$ -
		C-2402-0600-16-51102A-2402041-02 DQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: CARTAGO NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 75.000.000	
TOTAL						**$ 2.375.000.000**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 2.375.000.000**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 1.187.500.000,00	RP Nº 1124024 DE 14 11 2024	$ 1.112.500.000,00			RP Nº 1124024 DE 14 11 2024 $.2.300.000.000
								RP Nº 1124024 DE 14 11 2024	$ 1.187.500.000,00			RP Nº 1124024 DE 14 11 2024 $.2.300.000.000
1	**DICIEMBRE 2024.**	$ 45.222.400,00	$ -	$ 45.222.400,00	$ 22.611.200,00	$ 22.611.200,00	$ 1.164.888.800,00	RP Nº 1124024 DE 14 11 2024	$ 1.164.888.800,00	$ 2.329.777.600,00		RP Nº 1124024 DE 14 11 2024 $.2.300.000.000
2	**ENERO DE 2025.**	$ 6.159.800,00		$ 51.382.200,00	$ 3.079.900,00	$ 3.079.900,00	$ 1.161.808.900,00	RP Nº 1124024 DE 14 11 2024	$ 1.161.808.900,00	$ 2.323.617.800,00		RP Nº 1124024 DE 14 11 2024 $.2.300.000.000
TOTALES		**$ 51.382.200,00**	**$ -**	**$ 51.382.200,00**	**$ 25.691.100,00**	**$ 25.691.100,00**	**$ 1.161.808.900,00**		**$ 1.161.808.900,00**	**$ 2.323.617.800,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA Nº 1 DICIEMBRE DE 2024	$ 45.222.400,00	$ -	$ 45.222.400,00
ACTA Nº 2 ENERO DE 2025	$ 6.159.800,00	$ -	$ 6.159.800,00
	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL			$ 51.382.200,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Firma
Nombre: JANNIER SALAS OUEJADA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-181087 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-15-FR-13
SEGUIMIENTO GARANTÍAS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31-ene-25 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 DE 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

FECHA DE INICIO: 2/12/2024

PLAZO INICIAL: 1 MES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.375.000.000,00

VALOR ACUMULADO: $ 2.375.000.000,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 237.500.000,00	12	11	2024	1	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.187.500.000,00	12	11	2024	1	7	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 475.000.000,00	12	11	2024	31	12	2027
Calidad del servicio	30%	$ 712.500.000,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 83183

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 22/11/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 237.500.000,00	2	12	2024	1	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.187.500.000,00	2	12	2024	1	7	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 475.000.000,00	2	12	2024	31	12	2027
Calidad del servicio	30%	$ 712.500.000,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 83183

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 4/12/2024

OBSERVACIONES:

Anexo 2: Por orden de inicio del INVIAS de fecha 02 de diciembre de 2024.

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 237.500.000,00	12	11	2024	1	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.187.500.000,00	12	11	2024	1	7	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 475.000.000,00	12	11	2024	31	12	2028
Calidad del servicio	30%	$ 712.500.000,00	31	12	2025	31	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 83183

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

Anexo 3: Por Prorroga No 01 de 12 meses hasta el 31 de diciembre de 2025, se prorroga la vigencia de la poliza, los demas terminos y condiciones no modificados continuan vigentes

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Firma

Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-181087 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-3-FR-1
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 02/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

DATOS GENERALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4262 DE 2024 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA

JUSTIFICACIÓN:
Del Registro Presupuestal No. 1124024 de fecha 2024-11-14 Valor $2.375.000.000
para un valor total de anticipo de $ 1.187.500.000,00 equivalente al 50% como se estipula en la cláusula septima "Forma de pago" del contrato interadminsitrativo No 4262 de 2024.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2		VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Pago de salarios personal de interventoría	$ 1.013.900.000,00				$ 1.013.900.000,00	85,38%
2	Viáticos Director (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	$ 15.000.000,00				$ 15.000.000,00	1,26%
3	Viáticos Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	$ 54.000.000,00				$ 54.000.000,00	4,55%
4	Transportes Aéreos Director (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	$ 9.600.000,00				$ 9.600.000,00	0,81%
5	Transportes Aéreos Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	$ 20.800.000,00				$ 20.800.000,00	1,75%
6	Alquiler de Vehìculo (4X4 de 2000 CC o superior, Modelo 2014 o superior, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	$ 66.500.000,00				$ 66.500.000,00	5,60%
7	Campamento (incluye arrendamiento y/o alquiler, dotación y servicios, en el sitio del proyecto)	$ 7.700.000,00				$ 7.700.000,00	0,65%
	TOTAL					**$ 1.187.500.000,00**	**100,00%**

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. No aplica para compra ni alquiler de vehículos.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.
4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: Jose Octavio Niño Brijaldo
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Firma:
Nombre: Jannier Salas Quejada
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-181087 ANT

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.
