	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Consultoría No. 4227 DE 2024 **Consultoría:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

Contrato de Interventoría No. 4262 DE 2024 **Interventoría:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Objeto Contrato de Consultoría: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** 01 al 28 de febrero de 2025

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	x		1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	x		2
1	**INTRODUCCION**				9
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**				10
2.1	Localización				10
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto				10
2.3	Inventario y estado inicial de la vía				10
2.4	Características técnicas del proyecto				11
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**				12
3.1	Información general del contrato				12
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes				13
3.3	Seguimiento Items no previstos				15
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría				15
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORIA**				16
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	x		25
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Consultoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-4		x	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Consultoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-6		x	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Consultoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	x		42
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10		x	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11		x	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	x		44
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Consultoría	MEPI-MN-1IN-15-FR-14		x	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	x		47
		MEPI-MN-IN-3-FR-2		x	
	• Seguimiento Programa de Consultoría		x		49
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1		x	57
		MEPI-MN-IN-6-FR-2		x	59
	• Actas de Comité de Consultoría	MEPI-MN-IN-14-FR-1		x	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	x		61
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**				18
5.1	Información general del contrato				18
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor				18
5.3	Informes especialistas y profesionales		x		68
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		x		88
5.5	Informe matriz de riesgos.			x	
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Consultoría e Interventoría			x	
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.			x	
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**				
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5		x	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	x		90
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	x		103
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	x		105
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15		x	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	x		108
		MEPI-MN-IN-3-FR-2		x	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2		x	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3		x	
7	**Conclusiones y recomendaciones**				21
8	**Anexos**				22
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		x		22
8.2	Registro fotográfico y video del avance de la Consultoría		x		23
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas			x	
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente			x	

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 4854 de fecha 15 de Octubre de 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MEPI-MN1-IN-15-FR-2
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 28/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **PERIODO MES:** DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4227 de 2024

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CÓRDOBA

PLAZO INICIAL: 1 MES
FECHA DE INICIO: 02 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO ACUMULADO: 13,13 meses

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 8.700.000.000,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 8.700.000.000,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 4.350.000.000,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 189.783.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4262 DE 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JANNIER SALAS QUEJADA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	8.700.000.000,00		8.700.000.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			8.700.000.000,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS	185.122.000,00	0,00	185.122.000,00	185.122.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				185.122.000,00




INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 8.700.000.000,00
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 377.566.000,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 4,34%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 5
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: $

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Comités tecnicos de seguimiento contrato de consultoria

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No se encuentra en proceso de Multa o Sanción

Firma
Nombre Jose Octavio Niño Briiaido
Director de Interventoría
Matricula Profesional No. 01193-0243

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial

INFORME MENSUAL No. 03 DE INTERVENTORÍA.
FEBRERO DE 2025

INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - UPTC

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 4262 DE 2024 INVIAS – UPTC
FEBRERO 2025

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. interventoriacurundo@gmail.com

INFORME MENSUAL No. 02 DE INTERVENTORÍA.
FEBRERO DE 2025

INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
INTERVENTOR

GERMAN EDUARDO PEÑA VASQUEZ
GERENTE DE INTERVENTORÍA

ING. JANNIER SALAS QUEJADA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DEPENDENCIA	No. DE COPIAS
Copia 1 Instituto Nacional de Vías INVIAS Territorial Choco	1
Copia 2 Instituto Nacional de Vías Planta Central	1
Copia 3 Oficina Coordinación Convenios U.P.T.C. Tunja.	1

Contrato No 4262 de 2024

Título Documento	INFORME MENSUAL	No. 03
Responsable de elaboración	Nombre	Ing. Denis Yineth Pino Mariño
Cargo: Ingeniero Residente de estudios	Firma	
Responsable por revisión	Nombre	Ing. José Octavio Niño Brijaldo
Cargo: Ingeniero director de Interventoría	Firma	
Responsable Aprobación	Nombre	Ing. Germán Eduardo Peña Vásquez.
Gerente de Convenio	Firma	
Fecha:	28 - FEBRERO DE 2025	

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. INTRODUCCIÓN. 6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 7
2.1. Localización 7
2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 7
2.3. Inventario y estado inicial de la vía 8
2.4. Características técnicas del proyecto 8
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA. 9
3.1. Información general del contrato 9
3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 10
3.3. Seguimiento Ítems no previstos. 12
3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 12
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORÍA 13
4.1. Informe semanal 13
4.2 Maquinaria y equipo contrato de consultoría. 13
4.9. Otros documentos seguimiento mensual: 14
- Seguimiento a la inversión del anticipo: 14
- Seguimiento programa de consultoría: 14
- Seguimiento Programa de inversiones, ... 14
- Actas de comité de obra: 14
- Actas de reunión: 15

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 15
5.1 Información general del contrato. 15
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor. 15
5.3 Informes especialistas y profesionales. 16
5.5 Informe matriz de riesgos 16
5.6 Información otros programas y aplicativos. 16
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
6.1. Control diario del equipo de la Interventoría. 17
6.2. Control diario del personal de Interventoría. 17
6.4. Revisión y verificación de pago de aportes legales 17
6.5. Seguimiento a las garantías contractuales. 17

6.6. Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría. 18
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 18
8. ANEXOS..... 19
8.1. Relación de la correspondencia generada entre Consultor e Interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo. 19
8.2 Registro fotográfico y video de avance de la consultoría..... 20
8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales, y de sostenibilidad adelantada..... 21
8.4 Copia de bitácora del mes correspondiente 21

LISTADO DE IMAGENES

Pág.

Imagen 1: Localización del proyecto 7

1. INTRODUCCIÓN.

El Gobierno Nacional a través del programa "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA (…)", ha priorizado un conjunto de proyectos de infraestructura vial de carácter regional con impacto en todo el territorio colombiano, dirigidos a mejorar vías secundarias y terciarias, generando conexiones y fortaleciendo la comunicación entre las diversas poblaciones y regiones del país; frente a lo cual se debe adelantar la coordinación interinstitucional entre el Instituto y las entidades regionales para la estructuración de los proyectos que permita la ejecución de los mismos. Entre esos está el proyecto denominado como "**NOVITA-CURUNDO-SAN JOSE DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO**". el INVIAS identificó la necesidad de contratar los: **ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA**

El objetivo de esta fase es materializar en campo el proyecto definitivo y diseñar todos sus componentes de tal manera que se pueda dar inicio a su construcción, para el mejoramiento de la conexión existente Curundó-San José del Palmar – Cruce El Cairo, con el propósito de contar con los estudios necesarios para la continuidad del proyecto, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba (UTCH), suscribieron el Contrato interadministrativo No 4227 de 2024, cuyo objeto es la elaboración de "ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA", conforme a los estudios previos y la propuesta presentada por la Universidad y aprobada por el INVÍAS.

Así mismo el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) suscribió el contrato interadministrativo No 4262 de 2024 con la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA",

Se presenta en este informe las actividades desarrolladas en el mes de febrero de 2025 en donde se describe las acciones de la consultoría y de la interventoría.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1. Localización

El proyecto se localiza entre los Departamento de Chocó Y Valle del Cauca, el corredor se traza desde el cruce El Cairo – San Jose del Palmar hasta llegar a Curundó comprende una longitud aproximada de 51 km los cuales se describen a continuación:

Tramo 1 (K54+000 – K70+000) 16 km
Tramo 2 (K70+000 – K88+000) 18 km
Tramo 3 (K88+000 – K105+000) 17 km

Imagen 1: Localización del proyecto



2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

En el ámbito local la zona de influencia directa e inmediata de la obra está relacionada de manera parcial con las cuencas económicas de los municipios de El Cairo y San José del Palmar en el departamento de Chocó y Valle del Cauca.

En el contexto regional la zona de influencia del proyecto abarca el área sur oriental del Departamento de Chocó, permitiendo que el Municipio de San José del Palmar quede integrado a la Capital del Departamento por una conexión directa, dentro de esta conectividad se incluye los municipios de Novita, Condoto, Istmina, Unión Panamericana (Las Ánimas), Cértegui y Quibdó.

Dentro del marco nacional la red vial en la zona de influencia se extiende a los municipios del Occidente desde el Corregimiento de Curundó hasta Cartago.

El municipio de El Cairo en el departamento del Valle del Cauca tiene una extensión total de 283 km², dista 252 km de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.

Según las proyecciones del DANE, para el año 2015 el municipio cuenta con 9.976 habitantes, de los cuales 2.812 (28%) habitan en la cabecera municipal y 7164 (72%) habitan en la zona rural del municipio.

Las actividades económicas de mayor importancia son la agricultura y el comercio. Los principales cultivos son café, plátano, caña, yuca, fríjol, tomate, aguacate, mora, lulo, granadillas y hortalizas. Las actividades comerciales más destacadas en el municipio guardan relación con los productos de origen agrícola.

El Municipio de San José del Palmar actualmente su economía está consolidada principalmente en la Agricultura, y sus productos bandera son el Chontaduro, Borojo y Cacao. El sector maderero ha representado por muchas décadas la economía del municipio, pero en los últimos años se ha recortado esta labor debido a la campaña existente de la preservación y conservación de bosques y cuencas hidrográficas. El 90% de la actividad económica es de subsistencia, con pocos excedentes para comercialización o acumulación.

2.3. Inventario y estado inicial de la vía

No aplica

2.4. Características técnicas del proyecto

Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera, vigilancia, control y verificación de las actividades que se ejecutarán para la vía de conexión CURUNDO – SAN JOSE DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO, EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA. a nivel fase III
Las principales actividades de vigilancia a desarrollar en el proyecto de Interventoría como resultado del presente Convenio Interadministrativo son las siguientes:
Para los tramos 1 a 3 a nivel fase III.

1- Volumen I. Estudios Topográficos
2- Volumen II. Estudio de Tránsito, capacidad y niveles de servicio
3- Volumen III. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico
4- Volumen IV. Estudio de Seguridad Vial
5- Volumen V. Estudio de Geología y Geomorfología local
6- Volumen VI. Estudio de Hidrología de detalle
7- Volumen VII. Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes
8- Volumen VIII. Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones de Puentes y otras estructuras
9- Volumen IX. Estudio de Hidráulica, Hidrología y Socavación

10- Volumen X. Estudio y Diseño de Pavimientos
11- Volumen XI. Estudio y Diseño de Estructuras
12- Volumen XI. Estudio de Urbanismo y Paisajismo
13- Volumen XIII. Estudio de Redes Hidrosanitarias y Secas
14- Volumen XIV. Estudio de Riesgos
15- Volumen XV. Estudio de Cantidades de Obra, Análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones de obra
16- Volumen XVI. Evaluación socioeconómica y financiera del proyecto
17- Volumen XVII. Estudio componentes Ambiental, Social, Predial y Sostenibilidad
18- Volumen XVII. Volumen Técnico BIM (VTB-EIR)
19- Volumen XIX. Informe final ejecutivo

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.

3.1. Información general del contrato.

TIPO DE CONTRATO:	CONSULTORÍA
CONTRATO No. Y FECHA:	**4227 de 2024**
CONSULTOR:	**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA**
OBJETO:	**ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA**
VALOR INICIAL:	**$8.700.000.000**
PLAZO TOTAL CONTRATO:	**1 mes.**
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:	**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA Y PEDAGOGICA DE COLOMBIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4262 DE 2024**
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	**891800330-1**
SUPERVISOR:	**ING. JANNIER SALAS QUEJADA Resolución de designación No. 4854 de fecha 15 de octubre de 2024**
FECHA DE INICIO:	**02 DE DICIEMBRE DE 2024**
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	**31 DE DICIEMBRE DE 2024**
PRORROGA No 01	**12 MESES HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025**
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN	**31 DE DICIEMBRE DE 2025**

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes.

La consultoría realizo las siguientes actividades.

- Revisión de información secundaria
- Comité de seguimiento Consultoría e interventoría
- Revisión de hojas de vida de especialistas
- Reunión con especialistas de los siguientes volúmenes: (Topografía, Evaluación económica, Urbanismo, Transito, Geotecnia, Diseño Geométrico, Componente Ambiental, Social y de Sostenibilidad, Estructuras, Geología e Hidrogeología, Hidráulica, hidrología y socavación y SIG).
- Proyección y envío de oficio aclaratorio sobre personal
- Comité mensual de consultoría, interventoría e INVIAS
- Estructuración del Plan de Contingencia y Reprogramación de Actividades.
- Elaboración y entrega de metodologías particulares de los siguientes volúmenes:
  1- Volumen I: Estudios topográficos
  2- Volumen II. Estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio
  3- Volumen III. Estudio de trazado y diseño geométrico
  4- Volumen IV. Estudio de seguridad vial
  5- Volumen VII. Estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y fuentes de materiales.
  6- Volumen VIII. Estudio de suelos para diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras
  7- Volumen IX. Estudio de hidráulica, hidrología y socavación
  8- Volumen XI. Estudios de diseño de estructuras
  9- Volumen XV. Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones.
  10- Volumen XVIII. Técnico BIM

- Reunión con profesionales de consultoría para revisar información secundaria, evaluar el avance del proyecto y definir el plan de acción para las siguientes actividades.
  1- Adquisición de cartografía y demás información técnica.
  2- Reunión con especialista del SIG para revisión de información existente y verificación de criterios a tener en cuenta en la cartografía.
  3- Reunión con la Gobernación del Chocó con el fin
  4- Reunión sobre la materialización previa del proyecto vial Curundo- Sn José del Palmar- Cruce El Cairo con una longitud inicial de 51.5 Km para ser integrados en la metodología BIM
  5- Subsanaciones del Plan de Contingencia y Reprogramación de Actividades.
  6- Reunión pre-comité de seguimiento con la Interventoría.
  7- Reunión comité de seguimiento con el INVIAS e Interventoría
  8- Estructuración de la metodología general
  9- Reunión sobre la materialización previa del volumen predial y revisión de las respuestas de los oficios enviados a las entidades.

La consultoría envío las siguientes comunicaciones a las siguientes entidades con el fin de adelantar el componente ambiental del proyecto.

- El 29 de enero de 2025 la consultoría envío a CODECHOCO comunicación con asunto “Solicitud información sobre intercepción de otros proyectos licenciados”
- El 29 de enero de 2025 la consultoría envío al Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC comunicación con asunto Solicitud información sobre la cartografía y documentación técnica relacionada con el área de influencia del proyecto
- El 29 de enero de 2025 la consultoría envío al Municipio El Cairo comunicación con asunto “Solicitud de remisión del Plan de Desarrollo departamental y certificación de proyectos localizados en el área de influencia del proyecto”
- El 29 de enero de 2025 la consultoría envío al Municipio de Novita comunicación con asunto “Solicitud de remisión del Plan de Desarrollo departamental y certificación de proyectos localizados en el área de influencia del proyecto”
- El 29 de enero de 2025 la consultoría envío al Municipio de San Jose del Palmar comunicación con asunto “Solicitud de remisión del Plan de Desarrollo departamental y certificación de proyectos localizados en el área de influencia del proyecto”
- El 29 de enero de 2025 la consultoría envío a la Agencia Nacional de Tierras ANT comunicación con asunto “Solicitud de información sobre registro de titulación de predios”
- El 29 de enero de 2025 la consultoría envío a la Gobernación del chocó comunicación con asunto “Solicitud de remisión del Plan de Desarrollo Departamental y certificación de proyectos localizados en el ´rea de influencia del proyecto”
- El 29 de enero de 2025 la consultoría envío a la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos comunicación con asunto “Solicitud de información sobre la existencia de títulos colectivos adjudicados a consejos comunitarios y/o resguardos indígenas en la zona de influencia del proyecto”
- El 29 de enero de 2025 la consultoría envío a la Unidad de Restitución de Tierras URT comunicación con asunto “Solicitud de información sobre la existencia o no de tierras despojadas, abandonadas forzosamente o restituidas mediante sentencia en la zona de influencia del proyecto”
- El 29 de enero de 2025 la consultoría envío al director de Parques Nacionales y Naturales de Colombia comunicación con asunto “Solicitud de información sobre áreas protegidas en el Departamento del Chocó”
- El 29 de enero de 2025 la consultoría envío al director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia DANE comunicación con asunto “Solicitud de información estadística en los municipios del área de influencia del proyecto”

- El 29 de enero de 2025 la consultoría envío al Departamento Nacional de Planeación DNP Comunicación con asunto “Solicitud de información sobre la ejecución de proyectos de desarrollo social, económico y cultural en el área de influencia del proyecto”
- El 29 de enero de 2025 la consultoría envío al Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico -IIAP comunicación con asunto “Solicitud información sobre la existencia o no de investigaciones realizadas por el Instituto, sobre los componentes Biótico, Abiótico y Socio económico al igual de cartografía digital en el área de influencia del proyecto”
- El 29 de enero de 2025 la consultoría envío al Ministerio del Interior – Dirección Nacional de consulta previa comunicación con asunto “Solicitud de información sobre la existencia de títulos colectivos adjudicados a consejos comunitarios y/o Resguardos indígenas en la zona de influencia del proyecto”
- El 29 de enero de 2025 la consultoría envío a empresas de servicios públicos del área de influencia del proyecto comunicación con asunto “Solicitud de información predios que cuenten con servicios públicos”
- El 03 de febrero de 2025 la consultoría envío a la Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca CVC Comunicación con asunto “Solicitud de información sobre intercepción de otros proyectos licenciados”
- El 03 de febrero de 2025 la consultoría envío al instituto nacional de Vías INVIAS comunicación con asunto “Solicitud de información sobre la ejecución de proyectos de desarrollo social, económico y cultural en el área de influencia del proyecto”
- El 03 de febrero de 2025 la consultoría envío a la Agencia Nacional Minera ANM comunicación con asunto “Solicitud de información sobre la ejecución de proyectos de desarrollo social, económico, cultural en el área de influencia del proyecto”

3.3. Seguimiento Ítems no previstos. No aplica para este periodo

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

La interventoría realizo las siguientes actividades

- Revisión de cronograma de actividades y flujo de caja según plan de contingencia para el desarrollo de contrato 4227 de 2024.
- Observaciones al Plan de Ejecución BIM (BEP)
- Revisión hojas de vida de algunos profesionales especialistas de la consultoría
- Comité técnico de seguimiento mensual
- Revisión y aprobación de la metodología Volumen I: Estudios topográficos
- Revisión y aprobación de la metodología Volumen II. Estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio
- Revisión y aprobación de la metodología Volumen III. Estudio de trazado y diseño geométrico
- Revisión y aprobación de la metodología Volumen IV. Estudio de seguridad vial

- Revisión y aprobación de la metodología Volumen VII. Estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y fuentes de materiales.
- Revisión y aprobación de la metodología Volumen VIII. Estudio de suelos para diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras
- Revisión y aprobación de la metodología Volumen IX. Estudio de hidráulica, hidrología y socavación
- Revisión y aprobación de la metodología Volumen XI. Estudios de diseño de estructuras
- Revisión y aprobación de la metodología Volumen XV. Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones.
- Revisión y aprobación de la metodología Volumen XVIII. Técnico BIM

A continuación, se presenta cuadro de seguimiento actas de costos y amortización del anticipo contrato de consultoría.

CONTRATO 4227 DE 2024 - ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA						
Acta No	**PERIODO**	**VALOR BASICO**	**VALOR TOTAL ACTA**	**ANTICIPO AMORTIZADO**	**VALOR REAL AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**	**SALDO ANTICIPO**
ANTICIPO			$ 4.350.000.000,00			
1	dic-24	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 48.111.000,00	$ 48.111.000,00	$ 4.301.889.000,00
2	ene-25	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 48.111.000,00	$ 48.111.000,00	$ 4.253.778.000,00
3	feb-25	$ 185.122.000,00	$ 185.122.000,00	$ 92.561.000,00	$ 92.561.000,00	$ 4.161.217.000,00
TOTALES		**$ 377.566.000,00**	**$ 377.566.000,00**	**$ 188.783.000,00**	**$ 188.783.000,00**	**$ 4.161.217.000,00**

En el mes febrero de 2025 la consultoría lleva un avance financiero ejecutado de 4.34% y un porcentaje programado según plan de contingencia de 3.93%.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

4.1. Informe semanal

Para el contrato 4262 de 2024 se presentarán los informes semanales del mes de febrero de 2025 el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-3**

4.2 Maquinaria y equipo contrato de consultoría.

Para este periodo no aplica el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-4**. No se presenta

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social de consultoría

El control diario del personal del consultor se presentará en el mes de marzo de 2025 en el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-6**, con sus respectivos soportes teniendo en cuenta que la Universidad tecnológica de Chocó inicio proceso de constitución de nuevo contrato de encargo para la vigencia 2025 con FiduAgraria

4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de consultoría

La información financiera del contrato de consultoría 4227 de 2024 se expone en el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-9.**

4.5 Estado general del tiempo.

El control del estado general del tiempo para el contrato 4227 contemplado en el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-10** no se presenta para este mes.

4.6 Resumen ensayos de laboratorio.

Ya que no se realizaron ensayos de laboratorio durante el presente periodo no se presenta el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-11**.

4.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de consultoría

Se presenta formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-13**. Con las pólizas

4.8 Seguimiento al plan de calidad contrato de consultoría

Para el contrato 4227 de 2024 no se presenta el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-14**, puesto que las actividades fueron netamente administrativas.

4.9. Otros documentos seguimiento mensual:

- **Seguimiento a la inversión del anticipo:** Se anexa en el presente informe el formato **MEPI-MN1-IN-3-FR-1** y el formato **MEPI-MN1-IN-3-FR-2** se presentará tan pronto se empiecen a realizar pagos por parte de la UTCH.

- **Seguimiento programa de consultoría:** Con respecto al contrato 4227 de 2024 se tiene que para el mes de febrero de 2024 un porcentaje ejecutado de 4.34% y un porcentaje programado de 3.93%.

- **Seguimiento Programa de inversiones,** estas se pueden ver plasmadas en los formatos **MEPI-MN-IN-6-FR-1**, y el formato **MEPI-MN-IN-6-FR-2**

- **Actas de comité de obra:** No aplica para este proyecto

- **Actas de reunión:** Se presentan actas de reunión

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato.

Se firmo el 08 de noviembre del año 2024 el contrato interadministrativo 4262 de 2024 a continuación se presenta la información del contrato:

CONTRATO	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4262 DE 2024**
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA
INTERVENTORIA ENTIDAD CONTRATANTE	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC NIT. 891800330 – 1 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT. 800215807 -2
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.375.000.000
FECHA DE INICIO	02 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA No 1	12 MESES HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor.

El contrato interadministrativo 4262 de 2024, durante el periodo del 01 al 28 de febrero de 2025 realizo las siguientes actividades:

- Revisión de cronograma de actividades y flujo de caja según plan de contingencia para el desarrollo de contrato 4227 de 2024.
- Observaciones al Plan de Ejecución BIM (BEP)
- Revisión hojas de vida de algunos profesionales especialistas de la consultoría
- Comité técnico de seguimiento mensual
- Revisión y aprobación de la metodología Volumen I: Estudios topográficos
- Revisión y aprobación de la metodología Volumen II. Estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio

- Revisión y aprobación de la metodología Volumen III. Estudio de trazado y diseño geométrico
- Revisión y aprobación de la metodología Volumen IV. Estudio de seguridad vial
- Revisión y aprobación de la metodología Volumen VII. Estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y fuentes de materiales.
- Revisión y aprobación de la metodología Volumen VIII. Estudio de suelos para diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras
- Revisión y aprobación de la metodología Volumen IX. Estudio de hidráulica, hidrología y socavación
- Revisión y aprobación de la metodología Volumen XI. Estudios de diseño de estructuras
- Revisión y aprobación de la metodología Volumen XV. Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones.
- Revisión y aprobación de la metodología Volumen XVIII. Técnico BIM

5.3 Informes especialistas y profesionales.

Se presentan los informes de los siguientes profesionales
- Director de interventoría
- Coordinador de interventoría
- Residente de interventoría

5.4 Informe del programa anual de caja – PAC.

Se presenta programa mensual anual PAC para el mes de febrero de 2025

5.5 Informe matriz de riesgos

No aplica

5.6 Información otros programas y aplicativos.

El Pliego de condiciones no exige y el INVIAS no ha solicitado otros programas y aplicativos, por lo tanto, no aplica.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. Control diario del equipo de la Interventoría.

Para el presente periodo no se utilizó equipo por parte de la interventoría.

6.2. Control diario del personal de Interventoría.

Se presenta formato de control diario de interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-7

6.3. Información financiera Contrato de Interventoría.

Información financiera Contrato de Interventoría. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9. En el cual el Interventor y el Supervisor del Contrato de Interventoría deben llevar el control financiero y presupuestal e indicar las acciones que conlleven de forma proactiva a la ejecución del contrato, con el fin de que se ejecuten los recursos asignados para cada vigencia.

A la fecha se han presentado las siguientes actas de costos:
En el mes de diciembre de 2024 se presenta un acta de costos por un valor de $ 45.222.400
En el mes de enero de 2025 se presentó un acta de costos por un valor de $ 6.159.800
En el mes de febrero de 2025 se presentó un acta de costos por un valor de $ 84.109.000

CONTRATO 2442 DE 2024 - INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA						
Acta No	**PERIODO**	**VALOR BASICO**	**VALOR TOTAL ACTA**	**ANTICIPO AMORTIZADO**	**VALOR REAL AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**	**SALDO ANTICIPO**
ANTICIPO			$	1.187.500.000,00		
1	dic-24	$ 45.222.400,00	$ 45.222.400,00	$ 22.611.200,00	$ 22.611.200,00	$ 1.164.888.800,00
2	ene-25	$ 6.159.800,00	$ 6.159.800,00	$ 3.079.900,00	$ 3.079.900,00	$ 1.161.808.900,00
3	feb-25	$ 84.109.000,00	$ 84.109.000,00	$ 42.054.500,00	$ 42.054.500,00	$ 1.119.754.400,00
TOTALES		**$ 135.491.200,00**	**$ 135.491.200,00**	**$ 67.745.600,00**	**$ 67.745.600,00**	**$ 1.119.754.400,00**

6.4. Revisión y verificación de pago de aportes legales

Se presentará formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-7** con el control de aportes legales del personal de la interventoría

6.5. Seguimiento a las garantías contractuales.

Se realiza seguimiento y control mensual a las garantías contractuales por lo cual se presenta el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-13**

6.6. Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría.

No se presenta seguimiento a plan de calidad de contrato de consultoría ya que se realizaron actividades netamente administrativas.

6.7. Otros Documentos.
No se presentan otros documentos

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La consultoría envío plan de contingencia para disminuir el atraso, sin embargo, aclara que los trabajos en campo, socializaciones y exploración geotécnica están supeditados al anticipo y estas actividades representan un porcentaje alto en el flujo de caja.
- La consultoría envío las siguientes metodologías que fueron revisadas y aprobadas por la interventoría
- Volumen I: Estudios topográficos
- Volumen II. Estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio
- Volumen III. Estudio de trazado y diseño geométrico
- Volumen IV. Estudio de seguridad vial
- Volumen VII. Estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y fuentes de materiales.
- Volumen VIII. Estudio de suelos para diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras
- Volumen IX. Estudio de hidráulica, hidrología y socavación
- Volumen XI. Estudios de diseño de estructuras
- Volumen XV. Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones.
- Volumen XVIII. Técnico BIM
- Se realizo mesa de trabajo con los profesionales BIM de la consultoría e interventoría con el fin de revisar y retroalimentar el Plan de ejecución BIM (BEP)

8. ANEXOS

8.1. Relación de la correspondencia generada entre Consultor e Interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

A continuación, se presenta la correspondencia enviada y recibida en el periodo.





CORRESPONDENCIA ENVIADA

INFORMACION DEL EMISOR DEL DOCUMENTO			INFORMACION DEL DESTINATARIO		
			INVIAS	CONSULTORÍA	OTRO
No. Consecutivo	fecha del documento	Asunto			
C4262-018-2025	5/02/2025	Solicitud de entrega de acta de costos del mes de enero de 2025 y soportes pendientes del mes de diciembre de 2024.		X	
C4262-020-2025	17/02/2025	Observaciones de la interventoría a entrega del Plan de Ejecución BIM (BEP), oficio DC-020-2025 del 27 de enero de 2025		X	

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Fecha de radicación	Consecutivos Externo / Numero de Radicado	Fecha del documento	REMITENTE		Dirigido a:
			Empresa	Asunto	
21/02/2025	DC – 049-2025	21/02/2025	UTCH	Entrega de metodologías. VOLUMEN VII. y VOLUMEN VIII.	UPTC - Convenio 4262 de 2024
21/02/2025	DC – 051-2025	21/02/2025	UTCH	Entrega de metodología. VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	UPTC - Convenio 4262 de 2024
24/02/2025	DC – 052-2025	24/02/2025	UTCH	Entrega de Metodologías de los Volúmenes II, IV y XV	UPTC - Convenio 4262 de 2024
26/02/2025	DC – 056-2025	26/02/2025	UTCH	Entrega de Metodologías de los Volúmenes I.	UPTC - Convenio 4262 de 2024

8.2 Registro fotográfico y video de avance de la consultoría

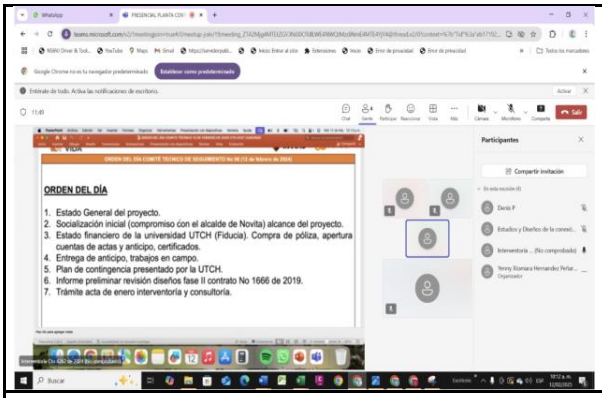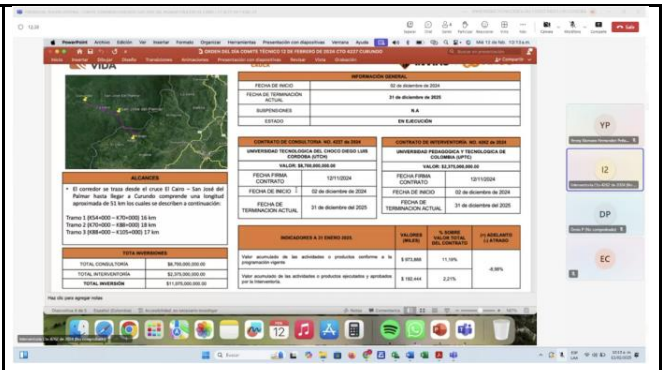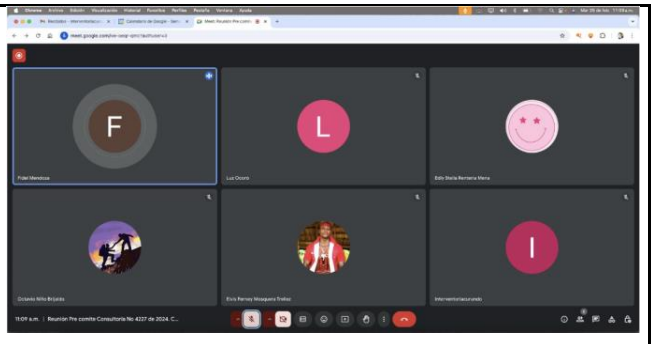	
Comité técnico de seguimiento mensual 12 de febrero de 2025	Comité técnico de seguimiento mensual 12 de febrero de 2025
	
Comité técnico de seguimiento mensual 12 de febrero de 2025	Comité técnico de seguimiento mensual 12 de febrero de 2025
	
Comité técnico de seguimiento mensual Consultoría, Interventoría e INVIAS 26/02/2025	Mesa de trabajo interventoría y consultoría Plan de ejecución BIM (BEP) 25/02/2025

8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales, y de sostenibilidad adelantada.

No se presenta para el mes de febrero de 2025

8.4 Copia de bitácora del mes correspondiente

No se presenta copia de bitácora para el mes de febrero de 2025

MEPI-MN1-IN-15-FR-3
INFORME SEMANAL

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/02/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ — SEMANA No.: 10 del 3-feb al 9-feb — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: YENNY XIOMARA HERNANDEZ P

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORÍA: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VOLÚMENES O PRODUCTOS TÉCNICOS ENTREGABLES DE FASE III: 1. Entregable estudios topográficos; 2 entregable estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio; 3 entregable estudio de trazado y diseño geométrico; 4 entregable estudio de seguridad vial; 5 entregable estudio de geología y geomorfología local; 6 entregable estudio de hidrogeología de detalle; 7 entregable estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y puentes de materiales; 8 entregable estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; 9 entregable hidráulica, hidrología, y socavación; 10 entregable estudio y diseño de pavimentos; 11 entregable estudio y diseño de estructuras; 12 entregable estudio de urbanismo y paisajismo; 13 estudio redes hidrosanitarias y secas; 14 entregable estudio de riesgos; 15 entregable estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones; 16 entregable evaluación socioeconómica y financiera del proyecto; 17 entregable ambiental, social, predial y sostenibilidad; 18 entregable volumen técnico de BIM; 19 entregable informe final.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA, lo cual incluye el desarrollo de 19 volúmenes.

CONTRATO DE CONSULTORÍA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONSULTORÍA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA			INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4227 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00	CONTRATO No.	4262 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 8.700.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 4.350.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 1.187.500.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024			
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.187.500.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.187.500.000			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORÍA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA (A):	$ 8.700.000.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 225.316.052,63	2,59%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 225.316.052,63	2,59%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 225.316.052,63	2,59%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 225.316.052,63	2,59%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.559.105,26	0,26%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.759.105,26	0,28%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: ENERO
VALOR FACTURA: $ 48.111.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En tramite acta de costos del mes de diciembre y enero en el Instituto Nacional de Vías INVIAS

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 182.896.896,00	7,70%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 55.550.547,36	2,34%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 30.008.483,00	1,26%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 22.611.200,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.350.000.000,00
Amortizado $	$ 96.222.000
Saldo $	$ 4.253.778.000,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	$ -
Acumulado:	$ -

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.187.500.000,00
Amortizado $	$ 22.611.200
Saldo $	$ 1.164.888.800,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 2,59% Avance o Atraso Físico % .....
Meta Física Ejecutada % 0,28%

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL													
Meta Física (Programa de consultoría) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**								
Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**TRAMO 1**					**Total**	**%**	
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	UND		2024	2024	Prog	$ 1.430.754.000,00					$ 1.430.754.000,00	16,445%	
					Ejec	$ 20.154.842,11					$ 20.154.842,11	0,232%	

	GRUPO 2 -COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES													
	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**								
	Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**TRAMO 1**					**Total**	**%**	
1	VOLUMEN I. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.	UND		2025	2025	Prog	$ 69.000.000,00					$ 69.000.000,00	0,79%	
						Ejec								
2	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO.	UND		2025	2025	Prog	$ 60.000.000,00					$ 60.000.000,00	0,69%	
						Ejec								
3	VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO.	UND		2025	2025	Prog	$ 165.000.000,00					$ 165.000.000,00	1,90%	
						Ejec								
4	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL.	UND		2025	2025	Prog	$ 42.000.000,00					$ 42.000.000,00	0,48%	
						Ejec								
5	VOLUMEN V. ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA LOCAL.	UND		2025	2025	Prog	$ 106.000.000,00					$ 106.000.000,00	1,22%	
						Ejec								
6	VOLUMEN VI. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	UND		2025	2025	Prog	$ 125.000.000,00					$ 125.000.000,00	1,44%	
						Ejec								
	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES.	UND		2025	2025	Prog	$ 368.000.000,00					$ 368.000.000,00	4,23%	
						Ejec								
	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 235.000.000,00					$ 235.000.000,00	2,70%	
						Ejec								
	VOLUMEN IX. HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN.	UND		2025	2025	Prog	$ 190.000.000,00					$ 190.000.000,00	2,18%	
						Ejec								
	VOLUMEN X. ESTUDIO Y DISEÑOS DE PAVIMENTO.	UND		2025	2025	Prog	$ 73.000.000,00					$ 73.000.000,00	0,84%	
						Ejec								
	VOLUMEN XI. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 481.000.000,00					$ 481.000.000,00	5,53%	
						Ejec								
7	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.	UND		2025	2025	Prog	$ 57.000.000,00					$ 57.000.000,00	0,66%	
						Ejec								
	VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 47.000.000,00					$ 47.000.000,00	0,54%	
						Ejec								
	VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE RIESGOS	UND		2025	2025	Prog	$ 93.000.000,00					$ 93.000.000,00	1,07%	
						Ejec								
8	VOLUMEN XV. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE OBRA	UND		2025	2025	Prog	$ 56.000.000,00					$ 56.000.000,00	0,64%	
						Ejec								
9	VOLUMEN XVI. EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL	UND		2025	2025	Prog	$ 54.000.000,00					$ 54.000.000,00	0,62%	
						Ejec								
10	VOLUMEN XVII. AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD.	UND		2025	2025	Prog	$ 423.000.000,00					$ 423.000.000,00	4,86%	
						Ejec								
11	VOLUMEN XVIII. VOLUMEN TÉCNICO BIM	UND		2025	2025	Prog	$ 46.000.000,00					$ 46.000.000,00	0,53%	
						Ejec								
	COSTO TOTAL ENTREGABLES											**$ 2.690.000.000,00**	30,9%	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO
TRAMO Y/O SECTOR 2: .....
TRAMO Y/O SECTOR 3: .....
TRAMO Y/O SECTOR 4: .....

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/02/2025 (Día / Mes / Año)

GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS												
Meta Física (Programa de consultoría) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**							
Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**TRAMO 1**					**Total**	**%**
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		2025	2025	Prog	$ 4.579.246.000,00					$ 4.579.246.000,00	52,635%
					Ejec							

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONS	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


La consultoría envía el 16 de diciembre de 2024 en comunicación DC-009-2024 el Plan de ejecución BIM
Se realiza una reunión con la consultoria, interventoría y con el área BIM del INVIAS para definir los lineamientos para la entrega de este documento el día 16 de diciembre de 2024
El día 23 de diciembre de 2024 la interventoría envía en comunicación C4262-009-2024 observaciones al plan de ejecución BIM y reitera estas observaciones el 21 de enero de 2025.
Se realiza reunión presencial en las instalaciones del INVIAS Bogotá con el área ambiental y social con el fin de discutir lineamientos para la ejecución elaboración y entrega del Volumen XVII de los estudios ambiental y social, predial y sostenibilidad el día 19 de diciembre de 2024, de esta reunión se acuerda una reunión virtual para el día 26 de diciembre con el área de sostenibilidad, ambiental, social, predial del INVIAS en donde el consultor expondrá una propuesta para el desarrollo de este volumen y que todas las partes que revisan este documento estén de acuerdo con su ejecución para no tener retrocesos.
El día 27 de enero la consultoría envía ajustado el Plan de ejecución BIM, se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
Se realizo comite tecnico de seguimiento el 29 de enero de 2025 en donde se trataron temas de la entrega de la información de los estudios y diseños del contrato 1666 de 2015 para que la consultoría realice la revisión de esta información especifique por medio de un diagnostico que información hay y que información falta y plantee un presupuesto de las actividades que hacen falta para
Se realizo comité técnico de seguimiento el 06 de febrero de 2025

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Solicitud plan de contingencia por atraso presentado

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

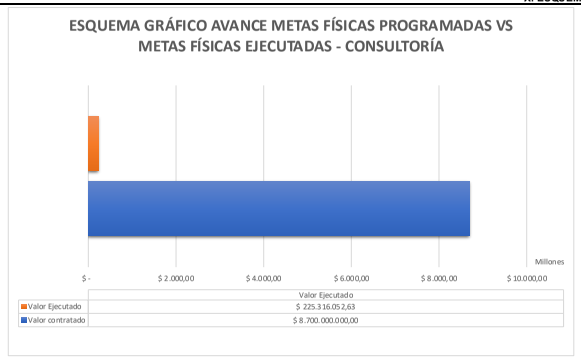

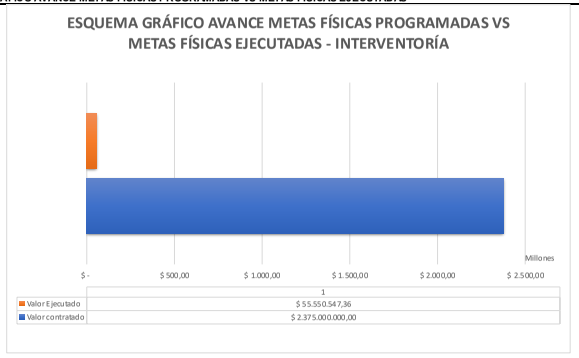


El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/02/2025 (Día / Mes / Año)

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

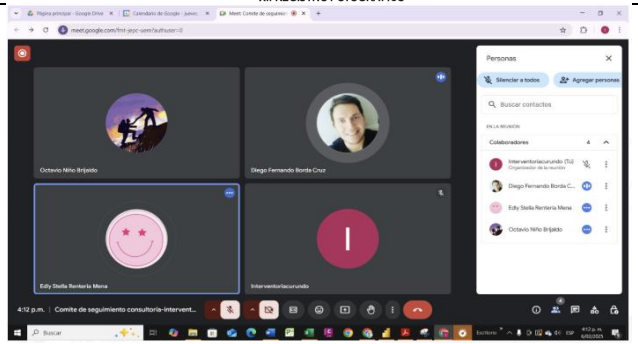

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONSULTOR	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA:
	NOMBRE: Jose Octavio Niño Brijaldo
	Matrícula Profesional No.: 01193-0243

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/02/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ — SEMANA No.: 11 del 10-feb al 16-feb — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: YENNY XIOMARA HERNANDEZ P

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORÍA: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VOLÚMENES O PRODUCTOS TÉCNICOS ENTREGABLES DE FASE III: 1. Entregable estudios topográficos; 2 entregable estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio; 3 entregable estudio de trazado y diseño geométrico; 4 entregable estudio de seguridad vial; 5 entregable estudio de geología y geomorfología local; 6 entregable estudio de hidrogeología de detalle; 7 entregable estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y puentes de materiales; 8 entregable estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; 9 entregable hidráulica, hidrología, y socavación; 10 entregable estudio y diseño de pavimentos; 11 entregable estudio y diseño de estructuras; 12 entregable estudio de urbanismo y paisajismo; 13 estudio redes hidrosanitarias y secas; 14 entregable estudio de riesgos; 15 entregable estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones; 16 entregable evaluación socioeconómica y financiera del proyecto; 17 entregable ambiental, social, predial y sostenibilidad; 18 entregable volumen técnico de BIM; 19 entregable informe final.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA, lo cual incluye el desarrollo de 19 volúmenes.

CONTRATO DE CONSULTORÍA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONSULTORÍA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA			INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4227 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00	CONTRATO No.	4262 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 8.700.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 4.350.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 1.187.500.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024			
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.187.500.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.187.500.000			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORÍA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA (A):	$ 8.700.000.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 247.875.157,89	2,85%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 247.875.157,89	2,85%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 247.875.157,89	2,85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 247.875.157,89	2,85%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.559.105,26	0,26%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.559.105,26	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ENERO
VALOR FACTURA: $ 48.111.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: En tramite acta de costos del mes de diciembre y enero en el Instituto Nacional de Vías INVIAS

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 245.480.801,05	10,34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 61.710.347,36	2,60%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 31.291.952,25	1,32%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.328.147,36	0,43%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ENERO
VALOR FACTURA: $ 3.079.900,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.350.000.000,00
Amortizado $	$ 48.111.000
Saldo $	$ 4.301.889.000,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	$ -
Acumulado:	$ -

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.187.500.000,00
Amortizado $	$ 25.691.100
Saldo $	$ 1.161.808.900,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 2,85%
Meta Física Ejecutada % 2,85%
Avance o Atraso Físico % %

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL													
Meta Física (Programa de consultoría) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**								
Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**TRAMO 1**					**Total**	**%**	
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	UND		2024	2024	Prog	$ 1.430.754.000,00					$ 1.430.754.000,00	16,445%	
					Ejec	$ 118.506.105,26					$ 118.506.105,26	1,362%	

	GRUPO 2 -COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES													
	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**								
	Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**TRAMO 1**					**Total**	**%**	
1	VOLUMEN I. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.	UND		2025	2025	Prog	$ 69.000.000,00					$ 69.000.000,00	0,79%	
						Ejec								
2	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO.	UND		2025	2025	Prog	$ 60.000.000,00					$ 60.000.000,00	0,69%	
						Ejec								
3	VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO.	UND		2025	2025	Prog	$ 165.000.000,00					$ 165.000.000,00	1,90%	
						Ejec								
4	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL.	UND		2025	2025	Prog	$ 42.000.000,00					$ 42.000.000,00	0,48%	
						Ejec								
5	VOLUMEN V. ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA LOCAL.	UND		2025	2025	Prog	$ 106.000.000,00					$ 106.000.000,00	1,22%	
						Ejec								
6	VOLUMEN VI. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	UND		2025	2025	Prog	$ 125.000.000,00					$ 125.000.000,00	1,44%	
						Ejec								
	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES.	UND		2025	2025	Prog	$ 368.000.000,00					$ 368.000.000,00	4,23%	
						Ejec								
	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 235.000.000,00					$ 235.000.000,00	2,70%	
						Ejec								
	VOLUMEN IX. HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN.	UND		2025	2025	Prog	$ 190.000.000,00					$ 190.000.000,00	2,18%	
						Ejec								
	VOLUMEN X. ESTUDIO Y DISEÑOS DE PAVIMENTO.	UND		2025	2025	Prog	$ 73.000.000,00					$ 73.000.000,00	0,84%	
						Ejec								
	VOLUMEN XI. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 481.000.000,00					$ 481.000.000,00	5,53%	
						Ejec								
7	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.	UND		2025	2025	Prog	$ 57.000.000,00					$ 57.000.000,00	0,66%	
						Ejec								
	VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 47.000.000,00					$ 47.000.000,00	0,54%	
						Ejec								
	VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE RIESGOS	UND		2025	2025	Prog	$ 93.000.000,00					$ 93.000.000,00	1,07%	
						Ejec								
8	VOLUMEN XV. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE OBRA	UND		2025	2025	Prog	$ 56.000.000,00					$ 56.000.000,00	0,64%	
						Ejec								
9	VOLUMEN XVI. EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL	UND		2025	2025	Prog	$ 54.000.000,00					$ 54.000.000,00	0,62%	
						Ejec								
10	VOLUMEN XVII. AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD.	UND		2025	2025	Prog	$ 423.000.000,00					$ 423.000.000,00	4,86%	
						Ejec								
11	VOLUMEN XVIII. VOLUMEN TÉCNICO BIM	UND		2025	2025	Prog	$ 46.000.000,00					$ 46.000.000,00	0,53%	
						Ejec								
	COSTO TOTAL ENTREGABLES											**$ 2.690.000.000,00**	30,9%	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4:

GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS

Meta Física (Programa de consultoría) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	TRAMO 1					Total	%
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		2025	2025	Prog	$ 4.579.246.000,00					$ 4.579.246.000,00	52,635%
					Ejec							

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONS	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


La consultoría envía el 16 de diciembre de 2024 en comunicación DC-009-2024 el Plan de ejecución BIM
Se realiza una reunión con la consultoria, interventoría y con el área BIM del INVIAS para definir los lineamientos para la entrega de este documento el día 16 de diciembre de 2024
El día 23 de diciembre de 2024 la interventoría envía en comunicación C4262-009-2024 observaciones al plan de ejecución BIM y reitera estas observaciones el 21 de enero de 2025.
Se realiza reunión presencial en las instalaciones del INVIAS Bogotá con el área ambiental y social con el fin de discutir lineamientos para la ejecución elaboración y entrega del Volumen XVII de los estudios ambiental y social, predial y sostenibilidad el día 19 de diciembre de 2024, de esta reunión se acuerda una reunión virtual para el día 26 de diciembre con el área de sostenibilidad, ambiental, social, predial del INVIAS en donde el consultor expondrá una propuesta para el desarrollo de este volumen y que todas las partes que revisan este documento estén de acuerdo con su ejecución para no tener retrocesos.
El día 27 de enero la consultoría envía ajustado el Plan de ejecución BIM, se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
Se realizo comite tecnico de seguimiento el 29 de enero de 2025 en donde se trataron temas de la entrega de la información de los estudios y diseños del contrato 1666 de 2015 para que la consultoría realice la revisión de esta información especifique por medio de un diagnostico que información hay y que información falta y plantee un presupuesto de las actividades que hacen falta para
Se realizo comité técnico de seguimiento el 06 de febrero de 2025
Se realizo comité técnico de seguimiento el 12 de febrero de 2025
La consultoría entrega plan de contingencia por tanto a la fecha según nueva programación no presenta atraso

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Seguimiento a Metodologias programadas por el consultor

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

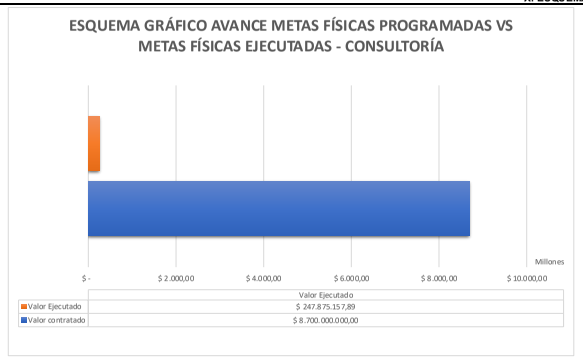


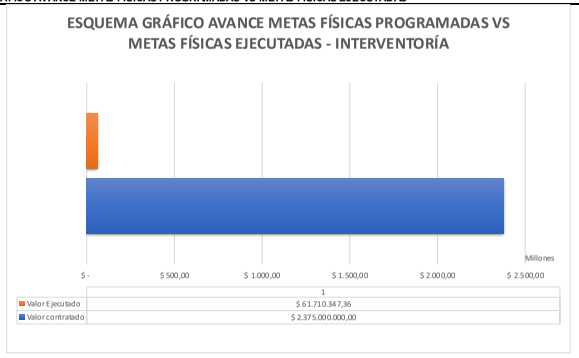


El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

FECHA: 16/02/2025 (Día / Mes / Año)

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

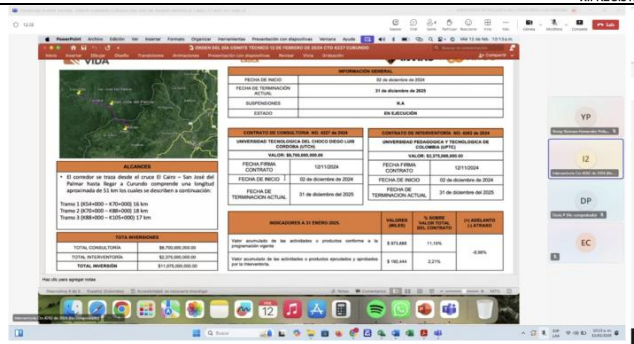



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONSULTOR	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: Jose Octavio Niño Brijaldo
	Matrícula Profesional No.: 01193-0243

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/02/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ — SEMANA No.: 12 del 17-feb al 23-feb — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: YENNY XIOMARA HERNANDEZ P

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORÍA: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VOLÚMENES O PRODUCTOS TÉCNICOS ENTREGABLES DE FASE III: 1. Entregable estudios topográficos; 2 entregable estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio; 3 entregable estudio de trazado y diseño geométrico; 4 entregable estudio de seguridad vial; 5 entregable estudio de geología y geomorfología local; 6 entregable estudio de hidrogeología de detalle; 7 entregable estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y puentes de materiales; 8 entregable estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; 9 entregable hidráulica, hidrología, y socavación; 10 entregable estudio y diseño de pavimentos; 11 entregable estudio y diseño de estructuras; 12 entregable estudio de urbanismo y paisajismo; 13 estudio redes hidrosanitarias y secas; 14 entregable estudio de riesgos; 15 entregable estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones; 16 entregable evaluación socioeconómica y financiera del proyecto; 17 entregable ambiental, social, predial y sostenibilidad; 18 entregable volumen técnico de BIM; 19 entregable informe final.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA, lo cual incluye el desarrollo de 19 volúmenes.

CONTRATO DE CONSULTORÍA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONSULTORÍA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA			INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4227 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00	CONTRATO No.	4262 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 8.700.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 4.350.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 1.187.500.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024			
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.187.500.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.187.500.000			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORÍA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA (A):	$ 8.700.000.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 270.434.263,16	3,11%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 308.834.263,15	3,55%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 38.399.999,99	0,44%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 270.434.263,16	3,11%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 308.834.263,15	3,55%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 38.399.999,99	0,44%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.559.105,26	0,26%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 60.959.105,26	0,70%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ENERO
VALOR FACTURA: $ 48.111.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: En tramite acta de costos del mes de diciembre y enero en el Instituto Nacional de Vías INVIAS

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 245.480.801,05	10,34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 72.038.494,72	3,03%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 31.291.952,25	1,32%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.328.147,36	0,43%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ENERO
VALOR FACTURA: $ 3.079.900,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.350.000.000,00
Amortizado $	$ 48.111.000
Saldo $	$ 4.301.889.000,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	$ -
Acumulado:	$ -

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.187.500.000,00
Amortizado $	$ 25.691.100
Saldo $	$ 1.161.808.900,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 3,11% Avance o Atraso Físico % %
Meta Física Ejecutada % 3,55%

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL												
Meta Física (Programa de consultoría) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**							
Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**TRAMO 1**					**Total**	**%**
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	UND		2024	2024	Prog	$ 1.430.754.000,00					$ 1.430.754.000,00	16,445%
					Ejec	$ 140.790.210,52					$ 140.790.210,52	1,618%

	GRUPO 2 -COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES												
	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**							
	Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**TRAMO 1**					**Total**	**%**
1	VOLUMEN I. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.	UND		2025	2025	Prog	$ 69.000.000,00					$ 69.000.000,00	0,79%
						Ejec						$ -	
2	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO.	UND		2025	2025	Prog	$ 60.000.000,00					$ 60.000.000,00	0,69%
						Ejec						$ -	
3	VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO.	UND		2025	2025	Prog	$ 165.000.000,00					$ 165.000.000,00	1,90%
						Ejec	$ 8.250.000,00					$ 8.250.000,00	
4	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL.	UND		2025	2025	Prog	$ 42.000.000,00					$ 42.000.000,00	0,48%
						Ejec						$ -	
5	VOLUMEN V. ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA LOCAL.	UND		2025	2025	Prog	$ 106.000.000,00					$ 106.000.000,00	1,22%
						Ejec						$ -	
6	VOLUMEN VI. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	UND		2025	2025	Prog	$ 125.000.000,00					$ 125.000.000,00	1,44%
						Ejec						$ -	
	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES.	UND		2025	2025	Prog	$ 368.000.000,00					$ 368.000.000,00	4,23%
						Ejec	$ 18.400.000,00					$ 18.400.000,00	
	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 235.000.000,00					$ 235.000.000,00	2,70%
						Ejec	$ 11.750.000,00					$ 11.750.000,00	
	VOLUMEN IX. HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN.	UND		2025	2025	Prog	$ 190.000.000,00					$ 190.000.000,00	2,18%
						Ejec						$ -	
	VOLUMEN X. ESTUDIO Y DISEÑOS DE PAVIMENTO.	UND		2025	2025	Prog	$ 73.000.000,00					$ 73.000.000,00	0,84%
						Ejec						$ -	
	VOLUMEN XI. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 481.000.000,00					$ 481.000.000,00	5,53%
						Ejec						$ -	
7	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.	UND		2025	2025	Prog	$ 57.000.000,00					$ 57.000.000,00	0,66%
						Ejec						$ -	
	VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 47.000.000,00					$ 47.000.000,00	0,54%
						Ejec						$ -	
	VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE RIESGOS	UND		2025	2025	Prog	$ 93.000.000,00					$ 93.000.000,00	1,07%
						Ejec						$ -	
8	VOLUMEN XV. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE OBRA	UND		2025	2025	Prog	$ 56.000.000,00					$ 56.000.000,00	0,64%
						Ejec						$ -	
9	VOLUMEN XVI. EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL	UND		2025	2025	Prog	$ 54.000.000,00					$ 54.000.000,00	0,62%
						Ejec						$ -	
10	VOLUMEN XVII. AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD.	UND		2025	2025	Prog	$ 423.000.000,00					$ 423.000.000,00	4,86%
						Ejec						$ -	
11	VOLUMEN XVIII. VOLUMEN TÉCNICO BIM	UND		2025	2025	Prog	$ 46.000.000,00					$ 46.000.000,00	0,53%
						Ejec						$ -	
	COSTO TOTAL ENTREGABLES					Prog						**$ 2.690.000.000,00**	30,9%
						Ejec						**$ 38.400.000,00**	14,2%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/02/2025 (Día / Mes / Año)

GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS

Meta Física (Programa de consultoría) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	TRAMO 1					Total	%
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		2025	2025	Prog	$ 4.579.246.000,00					$ 4.579.246.000,00	52,635%
					Ejec							

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONS	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


La consultoría envía el 16 de diciembre de 2024 en comunicación DC-009-2024 el Plan de ejecución BIM
Se realiza una reunión con la consultoria, interventoría y con el área BIM del INVIAS para definir los lineamientos para la entrega de este documento el día 16 de diciembre de 2024
El día 23 de diciembre de 2024 la interventoría envía en comunicación C4262-009-2024 observaciones al plan de ejecución BIM y reitera estas observaciones el 21 de enero de 2025.
Se realiza reunión presencial en las instalaciones del INVIAS Bogotá con el área ambiental y social con el fin de discutir lineamientos para la ejecución elaboración y entrega del Volumen XVII de los estudios ambiental y social, predial y sostenibilidad el día 19 de diciembre de 2024, de esta reunión se acuerda una reunión virtual para el día 26 de diciembre con el área de sostenibilidad, ambiental, social, predial del INVIAS en donde el consultor expondrá una propuesta para el desarrollo de este volumen y que todas las partes que revisan este documento estén de acuerdo con su ejecución para no tener retrocesos.
El día 27 de enero la consultoría envía ajustado el Plan de ejecución BIM, se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
Se realizo comite tecnico de seguimiento el 29 de enero de 2025 en donde se trataron temas de la entrega de la información de los estudios y diseños del contrato 1666 de 2015 para que la consultoría realice la revisión de esta información especifique por medio de un diagnostico que información hay y que información falta y plantee un presupuesto de las actividades que hacen falta para
Se realizo comité técnico de seguimiento el 06 de febrero de 2025
Se realizo comité técnico de seguimiento el 12 de febrero de 2025
La consultoría entrega plan de contingencia por tanto a la fecha según nueva programación no presenta atraso
La consultoría envia la metodología del Volumen III. Estudio de trazado y diseño Geométrico.
La consultoría envia la metodología del Volumen VII. Estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y fuentes de materiales
La consultoría envia la metodología del Volumen VIII. Estudio de suelos para diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Seguimiento a Metodologias programadas por el consultor
Revisión metodologías de los volumenes III, VII y VIII

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

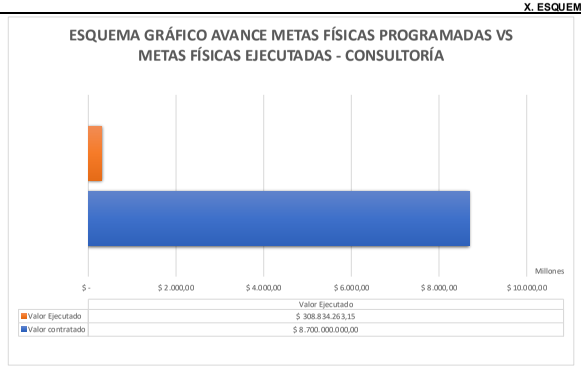

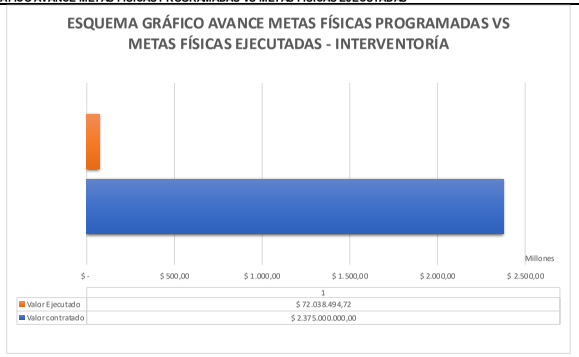

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/02/2025 (Día / Mes / Año)

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONSULTOR	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: Jose Octavio Niño Briiaido
	Matrícula Profesional No.: 01193-0243

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/03/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ — SEMANA No.: 13 del 24-feb al 2-mar — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: YENNY XIOMARA HERNANDEZ P

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORÍA: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VOLÚMENES O PRODUCTOS TÉCNICOS ENTREGABLES DE FASE III: 1. Entregable estudios topográficos; 2 entregable estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio; 3 entregable estudio de trazado y diseño geométrico; 4 entregable estudio de seguridad vial; 5 entregable estudio de geología y geomorfología local; 6 entregable estudio de hidrogeología de detalle; 7 entregable estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y puentes de materiales; 8 entregable estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; 9 entregable hidráulica, hidrología, y socavación; 10 entregable estudio y diseño de pavimentos; 11 entregable estudio y diseño de estructuras; 12 entregable estudio de urbanismo y paisajismo; 13 estudio redes hidrosanitarias y secas; 14 entregable estudio de riesgos; 15 entregable estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones; 16 entregable evaluación socioeconómica y financiera del proyecto; 17 entregable ambiental, social, predial y sostenibilidad; 18 entregable volumen técnico de BIM; 19 entregable informe final.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA, lo cual incluye el desarrollo de 19 volúmenes.

CONTRATO DE CONSULTORÍA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONSULTORÍA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA			INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4227 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00	CONTRATO No.	4262 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 8.700.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 4.350.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 1.187.500.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024			
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.187.500.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.187.500.000			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORÍA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA (A):	$ 8.700.000.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 342.243.368,42	3,93%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 378.593.368,41	4,35%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 36.349.999,99	0,42%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 342.243.368,42	3,93%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 378.593.368,41	4,35%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 36.349.999,99	0,42%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 71.809.105,26	0,83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 69.759.105,00	0,80%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: ENERO
VALOR FACTURA: $ 48.111.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En tramite acta de costos del mes de diciembre y enero en el Instituto Nacional de Vías INVIAS

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 398.983.096,00	16,80%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 135.491.200,00	5,70%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 122.210.342,00	5,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 84.109.000,00	3,54%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: ENERO
VALOR FACTURA: $ 3.079.900,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.350.000.000,00
Amortizado $	$ 48.111.000
Saldo $	$ 4.301.889.000,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	$ -
Acumulado:	$ -

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.187.500.000,00
Amortizado $	$ 25.691.100
Saldo $	$ 1.161.808.900,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 3,93% Avance o Atraso Físico % %
Meta Física Ejecutada % 4,35%

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL												
Meta Física (Programa de consultoría) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**							
Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**TRAMO 1**					**Total**	**%**
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	UND		2024	2024	Prog	$ 1.430.754.000,00					$ 1.430.754.000,00	16,445%
					Ejec	$ 288.666.000,00					$ 288.666.000,00	3,318%

	GRUPO 2 -COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES												
	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**							
	Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**TRAMO 1**					**Total**	**%**
1	VOLUMEN I. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.	UND		2025	2025	Prog	$ 69.000.000,00					$ 69.000.000,00	0,79%
						Ejec	$ 3.450.000,00					$ 3.450.000,00	0,04%
2	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO.	UND		2025	2025	Prog	$ 60.000.000,00					$ 60.000.000,00	0,69%
						Ejec	$ 3.000.000,00					$ 3.000.000,00	
3	VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO.	UND		2025	2025	Prog	$ 165.000.000,00					$ 165.000.000,00	1,90%
						Ejec	$ 8.250.000,00					$ 8.250.000,00	
4	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL.	UND		2025	2025	Prog	$ 42.000.000,00					$ 42.000.000,00	0,48%
						Ejec	$ 2.100.000,00					$ 2.100.000,00	
5	VOLUMEN V. ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA LOCAL.	UND		2025	2025	Prog	$ 106.000.000,00					$ 106.000.000,00	1,22%
						Ejec						$ -	
6	VOLUMEN VI. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	UND		2025	2025	Prog	$ 125.000.000,00					$ 125.000.000,00	1,44%
						Ejec						$ -	
	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES.	UND		2025	2025	Prog	$ 368.000.000,00					$ 368.000.000,00	4,23%
						Ejec	$ 18.400.000,00					$ 18.400.000,00	
	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 235.000.000,00					$ 235.000.000,00	2,70%
						Ejec	$ 11.750.000,00					$ 11.750.000,00	
	VOLUMEN IX. HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN.	UND		2025	2025	Prog	$ 190.000.000,00					$ 190.000.000,00	2,18%
						Ejec	$ 9.500.000,00					$ 9.500.000,00	
	VOLUMEN X. ESTUDIO Y DISEÑOS DE PAVIMENTO.	UND		2025	2025	Prog	$ 73.000.000,00					$ 73.000.000,00	0,84%
						Ejec						$ -	
	VOLUMEN XI. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 481.000.000,00					$ 481.000.000,00	5,53%
						Ejec	$ 24.050.000,00					$ 24.050.000,00	
7	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.	UND		2025	2025	Prog	$ 57.000.000,00					$ 57.000.000,00	0,66%
						Ejec						$ -	
	VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 47.000.000,00					$ 47.000.000,00	0,54%
						Ejec						$ -	
	VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE RIESGOS	UND		2025	2025	Prog	$ 93.000.000,00					$ 93.000.000,00	1,07%
						Ejec						$ -	
8	VOLUMEN XV. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE OBRA	UND		2025	2025	Prog	$ 56.000.000,00					$ 56.000.000,00	0,64%
						Ejec	$ 2.800.000,00					$ 2.800.000,00	
9	VOLUMEN XVI. EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL	UND		2025	2025	Prog	$ 54.000.000,00					$ 54.000.000,00	0,62%
						Ejec						$ -	
10	VOLUMEN XVII. AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD.	UND		2025	2025	Prog	$ 423.000.000,00					$ 423.000.000,00	4,86%
						Ejec						$ -	
11	VOLUMEN XVIII. VOLUMEN TÉCNICO BIM	UND		2025	2025	Prog	$ 46.000.000,00					$ 46.000.000,00	0,53%
						Ejec	$ 2.300.000,00					$ 2.300.000,00	
	COSTO TOTAL ENTREGABLES					Prog						**$ 2.690.000.000,00**	30,9%
						Ejec						**$ 85.600.000,00**	25,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/03/2025 (Día / Mes / Año)

GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS

Meta Física (Programa de consultoría) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	TRAMO 1					Total	%
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		2025	2025	Prog	$ 4.579.246.000,00					$ 4.579.246.000,00	52,635%
					Ejec	$ 3.300.000,00					$ 3.300.000,00	0,038%

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONS	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


La consultoría envía el 16 de diciembre de 2024 en comunicación DC-009-2024 el Plan de ejecución BIM
Se realiza una reunión con la consultoria, interventoría y con el área BIM del INVIAS para definir los lineamientos para la entrega de este documento el día 16 de diciembre de 2024
El día 23 de diciembre de 2024 la interventoría envía en comunicación C4262-009-2024 observaciones al plan de ejecución BIM y reitera estas observaciones el 21 de enero de 2025.
Se realiza reunión presencial en las instalaciones del INVIAS Bogotá con el área ambiental y social con el fin de discutir lineamientos para la ejecución elaboración y entrega del Volumen XVII de los estudios ambiental y social, predial y sostenibilidad el día 19 de diciembre de 2024, de esta reunión se acuerda una reunión virtual para el día 26 de diciembre con el área de sostenibilidad, ambiental, social, predial del INVIAS en donde el consultor expondrá una propuesta para el desarrollo de este volumen y que todas las partes que revisan este documento estén de acuerdo con su ejecución para no tener retrocesos.
El día 27 de enero la consultoría envía ajustado el Plan de ejecución BIM, se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
Se realizo comite tecnico de seguimiento el 29 de enero de 2025 en donde se trataron temas de la entrega de la información de los estudios y diseños del contrato 1666 de 2015 para que la consultoría realice la revisión de esta información especifique por medio de un diagnostico que información hay y que información falta y plantee un presupuesto de las actividades que hacen falta para
Se realizo comité técnico de seguimiento el 06 de febrero de 2025
Se realizo comité técnico de seguimiento el 12 de febrero de 2025
La consultoría entrega plan de contingencia por tanto a la fecha según nueva programación no presenta atraso
La consultoría envia la metodología del Volumen III. Estudio de trazado y diseño Geométrico.
La consultoría envia la metodología del Volumen VII. Estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y fuentes de materiales
La consultoría envia la metodología del Volumen VIII. Estudio de suelos para diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras
La consultoría envia la metodología del Volumen I. Estudios topograficos
La consultoría envia la metodología del Volumen II. Estudio de Transito, capacidad y niveles de servicio
La consultoría envia la metodología del Volumen XI. Estudio y diseño de estructuras
La consultoría envia la metodología del Volumen X. Hidraulica, Hidrología y Socavación
La consultoría envia la metodología del Volumen XV. Estudio de cantidades de obra, ánalisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones
La consultoría envia la metodología del Volumen XVIII. Volúmen Técnico BIM
Reunión profesionales BIM Consultoría e Interventoría

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Seguimiento a Metodologias programadas por el consultor
Revisión metodologías de los volumenes III, VII y VIII, I, II, XI, X, XV, XVIII

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

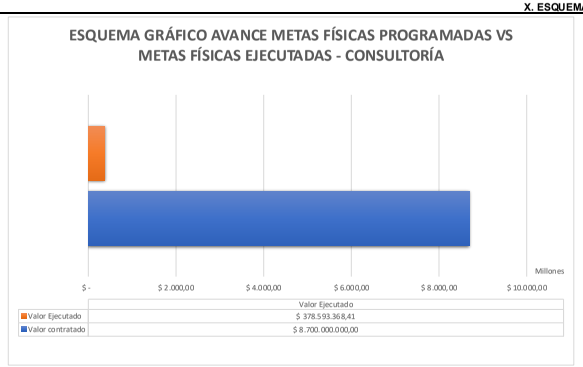

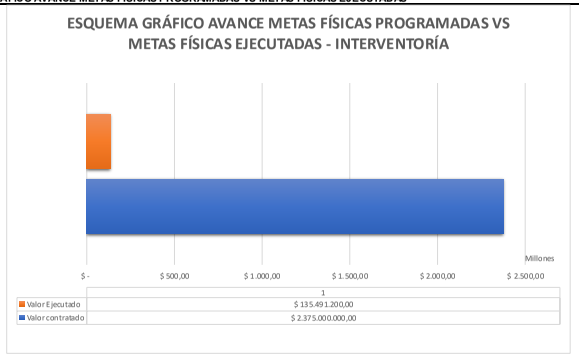



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/03/2025 (Día / Mes / Año)

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

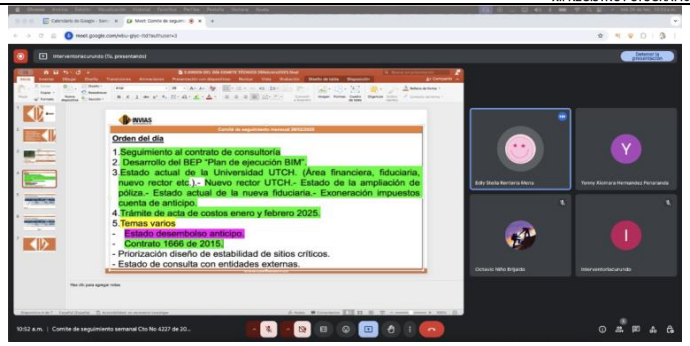

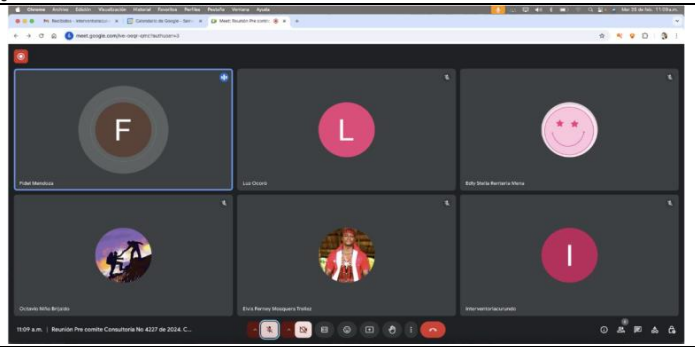

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONSULTOR	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: Jose Octavio Niño Brijaldo Matrícula Profesional No.: 01193-0243

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-15-FR-9
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4227 - 2024

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2025

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO CONSULTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1124124	C-2402-0600-16-51102A-2402006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-MEDELLÍN (CHOCO), VÍA E	10	NACIÓN	Contrato Principal	$ 3,200,000,000.00	$ -
2024	1124124	C-2402-0600-16-51102A-2402015-02 ADQUIS. DE BYS - PUENTE CONSTRUIDO EN VÍA SECUNDARIA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-MEDELLÍN (CH	10	NACIÓN	Contrato Principal	$ 5,500,000,000.00	$ -
							$ -
							$ -
		TOTAL				$ 8,700,000,000.00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 8,700,000,000

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 4,350,000,000.00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4,350,000,000.00			RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $3.200.000,000
								RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4,350,000,000.00			RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $5.500.000,000
1	**DICIEMBRE 2024.**	$ 96,222,000.00	$ -	$ 96,222,000.00	$ 48,111,000.00	$ 48,111,000.00	$ 4,301,889,000.00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4,301,889,000.00	$ 8,603,778,000.00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
2	**ENERO 2025.**	$ 96,222,000.00	$ -	$ 192,444,000.00	$ 48,111,000.00	$ 48,111,000.00	$ 4,253,778,000.00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4,253,778,000.00	$ 8,507,556,000.00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
3	**FEBRERO 2025**	$ 185,122,000.00		$ 377,566,000.00	$ 92,561,000.00	$ 92,561,000.00	$ 4,161,217,000.00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4,161,217,000.00	$ 8,322,434,000.00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
TOTALES		**$ 377,566,000.00**		**$ 377,566,000.00**	**$ 188,783,000.00**	**$ 188,783,000.00**	**$ 4,161,217,000.00**		**$ 4,161,217,000.00**	**$ 8,322,434,000.00**		

Todas las Actas aprobadas por el Interventor del Contrato de Consultoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA N°1 DICIEMBRE 2024	$ 96,222,000.00		$ 96,222,000.00
ACTA N°2 ENERO 2025	$ 96,222,000.00		$ 96,222,000.00
ACTA N°3 FEBRERO 2025	$ 185,122,000.00		$ 185,122,000.00
			$ -
VALOR TOTAL	**$ 377,566,000.00**		**$ 377,566,000.00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma:
Nombre: EDLY STELLA RENTERÍA MENA
Directora de consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Firma:
Nombre: JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28 (Día) 2 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No. 4227 - 2024 **CONTRATISTA:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCÓ

OBJETO DEL CONTRATO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

FECHA DE INICIO: 02/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 8,700,000,000.00

VALOR ACUMULADO: $ 8,700,000,000.00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8,700,000,000.00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8,700,000,000.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4262 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	8.92%	$ 870,000,000.00	7	11	2024	1	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	44.62%	$ 4,350,000,000.00	7	11	2024	1	5	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	17.85%	$ 1,740,000,000.00	7	11	2024	1	1	2028
Calidad de Estudios y Diseños	26.77%	$ 2,610,000,000.00	31	12	2024	31	12	2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3002762

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 02/12/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	28 (Día)	2 (Mes)	2025 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	8.92%	$ 870,000,000.00	23	12	2024	1	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	44.62%	$ 4,350,000,000.00	23	12	2024	1	7	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	17.85%	$ 1,740,000,000.00	23	12	2024	1	1	2029
Calidad de Estudios y Diseños	26.77%	$ 2,610,000,000.00	31	12	2025	31	12	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3002762

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 26/02/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** _____ **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma _____
Nombre: EDLY STELLA RENTERIA MENA
Directora de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Firma _____
Nombre: JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN-IN-3-FR-1
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE CONSULTORÍA	CÓDIGO			MEPI-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN			1
		PÁGINA			

FECHA: 02/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Planificación de Infraestructura **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Chocó

DATOS GENERALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 4227 de 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

JUSTIFICACIÓN:
Del Registro Presupuestal No. 1124124 de fecha 2024-11-14 Valor $8.700.000.000,00 para un valor total de anticipo de $ 4.350.000.000 equivalente al 50% como se estipula en la cláusula septima "Forma de pago" del contrato interadminsitrativo No 4227 de 2024.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VR. MES 5	VR. MES 6	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Pago de salarios personal consultoria	96,222,000.00	96,222,000.00	117,630,000.00	117,630,000.00	117,630,000.00	117,630,000.00	$ 662,964,000.00	15.24%
2	Viaticos personal de consultoria	6,400,000.00	37,850,000.00	37,850,000.00	37,850,000.00	37,850,000.00	3,750,000.00	$ 161,550,000.00	3.71%
3	Adquisición de información secundaria		15,000,000.00					$ 15,000,000.00	0.34%
4	Levantamiento topografico		30,000,000.00	50,200,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	40,000,000.00	$ 220,200,000.00	5.06%
5	Gestiones ambientales, sociales, arqueológicas, prediales y de sostenibilidad (s/comprobante) (adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago a autoridades ambientales, costos de gestiones arqueológicas, monitoreo, muestreos ambientales etc.)		80,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100,000,000.00	$ 680,000,000.00	15.63%
6	Toma de muestras para laboratorio(en suelo, en roca, Apiques) y ensayos de laboratorio y/o ensayos de investigación y/o Diagnóstico y/o Redes (S/comprobante) (Incluye la comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructural de puentes, subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, pavimentos, mezlas de suelo cemento, muros, obras hidraulicas, concretos, vibraciones ambientales, lineas sismicas, inspección de redes, batimetrías, entre otros)		1,136,590,400.00	304,647,600.00	305,047,600.00	307,547,600.00	329,852,800.00	$ 2,383,686,000.00	54.80%
7	Toma de información de transito		15,000,000.00	15,000,000.00				$ 30,000,000.00	0.69%
8	Metodologias grupo 2			58,500,000.00	63,500,000.00	12,500,000.00		$ 134,500,000.00	3.09%
9	Dotacion de oficina		50,000,000.00					$ 50,000,000.00	1.15%
10	Campamento	1,100,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	$ 12,100,000.00	0.28%
TOTAL		**$ 103,722,000.00**	**$ 1,462,862,400.00**	**$ 686,027,600.00**	**$ 776,227,600.00**	**$ 727,727,600.00**	**$ 593,432,800.00**	**$ 4,350,000,000.00**	**100%**

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. No aplica para compra ni alquiler de vehículos.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.
4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: Edly Stella Fontieria Mena
Directora de Consultoria
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL


Firma:
Nombre: José Octavio Niño Brijaldo
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE CONSULTORÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**1**	**ESTUDIOS Y DISEÑOS CONEXIÓN CURUNDÓ SAN JOSÉ DEL PALMAR CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA**	**14,25 mss**	**lun 2/12/24**	**mié 31/12/25**
2	1.1	**INICIO**	**0 mss**	**lun 2/12/24**	**lun 2/12/24**
3	**1.2**	**GRUPO No. 1 PERSONAL**	**14,25 mss**	**lun 2/12/24**	**mié 31/12/25**
4	1.2.1	Director de Consultoría - Ejecución de los Estudios	14,15 mss	lun 2/12/24	lun 29/12/25
5	1.2.2	Ingeniero Residente de Estudios	14,15 mss	mié 4/12/24	mié 31/12/25
6	1.2.3	Ingeniero Residente de Campo	7,5 mss	lun 13/01/25	mié 6/08/25
7	1.2.4	Coordinador ambiental y social	14,15 mss	lun 2/12/24	lun 29/12/25
8	1.2.5	Coordinador técnico	14,15 mss	lun 2/12/24	lun 29/12/25
9	1.2.6	Coordinador BIM SIG	14,15 mss	lun 2/12/24	lun 29/12/25
10	1.2.7	Ingeniero Auxiliar	14,15 mss	lun 2/12/24	lun 29/12/25
11	1.2.8	Técnicos de la zona	7,5 mss	lun 13/01/25	mié 6/08/25
12	**1.3**	**APROPIACIÓN Y PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR**	**2 mss**	**lun 2/12/24**	**vie 24/01/25**
13	1.3.1	Reunión de socialización con grupos de interés	0,1 mss	jue 12/12/24	vie 13/12/24
14	1.3.2	Apropiación de los estudios y diseños y/o documentación técnica previa	1 ms	lun 2/12/24	vie 27/12/24
15	1.3.3	Elaboración de cronograma de actividades	0,5 mss	lun 2/12/24	vie 13/12/24
16	1.3.4	Elaboración de metodología general	1 ms	lun 2/12/24	vie 27/12/24
17	1.3.5	Elaboración de metodologías particulares	1 ms	lun 2/12/24	vie 27/12/24

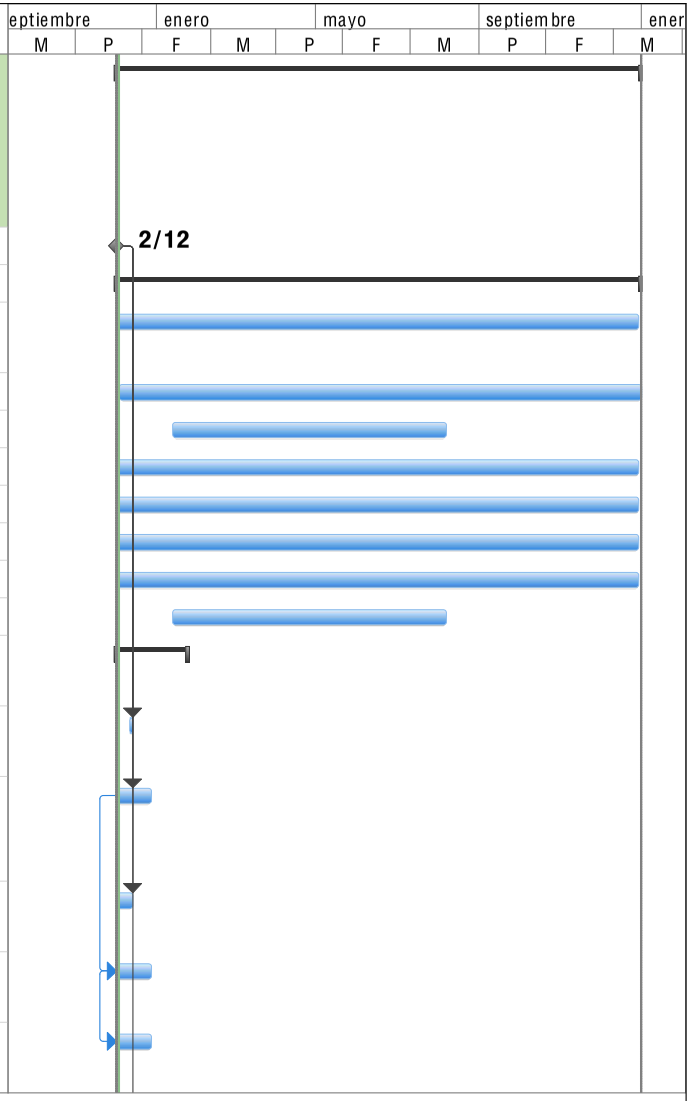


Proyecto: Programación Curun
Fecha: mié 4/12/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
18	1.3.6	Elaboración de plan de calidad de estudios y diseños	2 mss	lun 2/12/24	vie 24/01/25
19	1.3.7	Solicitud de información a empresas de servicios públicos información base y guía para la presentación de productos en formato digital	1 ms	lun 2/12/24	vie 27/12/24
20	**1.4**	**RECOPILACION DE INFORMACIÓN SECUNDARIA**	**1 ms**	**lun 2/12/24**	**vie 27/12/24**
21	1.4.1	Recopilación de estudios y diseños existentes de utilidad para el proyecto	1 ms	lun 2/12/24	vie 27/12/24
22	1.4.2	Solicitudes a entidades gubernamentales y privadas	1 ms	lun 2/12/24	vie 27/12/24
23	1.4.3	Adquisición de cartografía y demás información técnica	1 ms	lun 2/12/24	vie 27/12/24
24	1.4.4	Análisis de posibles conflictos de intereses con otros proyectos e infraestructura existentes	0,5 mss	lun 2/12/24	vie 13/12/24
25	**1.5**	**GRUPO No. 2 ELABORACIÓN DE VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES**	**13 mss**	**jue 2/01/25**	**lun 29/12/25**
26	1.5.1	Volumen 1. Estudios topográficos	3 mss	jue 2/01/25	lun 24/03/25
27	1.5.2	Volumen 2. Estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio	2 mss	lun 13/01/25	mié 5/03/25
28	1.5.3	Volumen 3. Estudio de trazado y diseño geométrico	3 mss	jue 2/01/25	lun 24/03/25
29	1.5.4	Volumen 4. Estudio de seguridad vial	2 mss	mar 25/03/25	lun 19/05/25

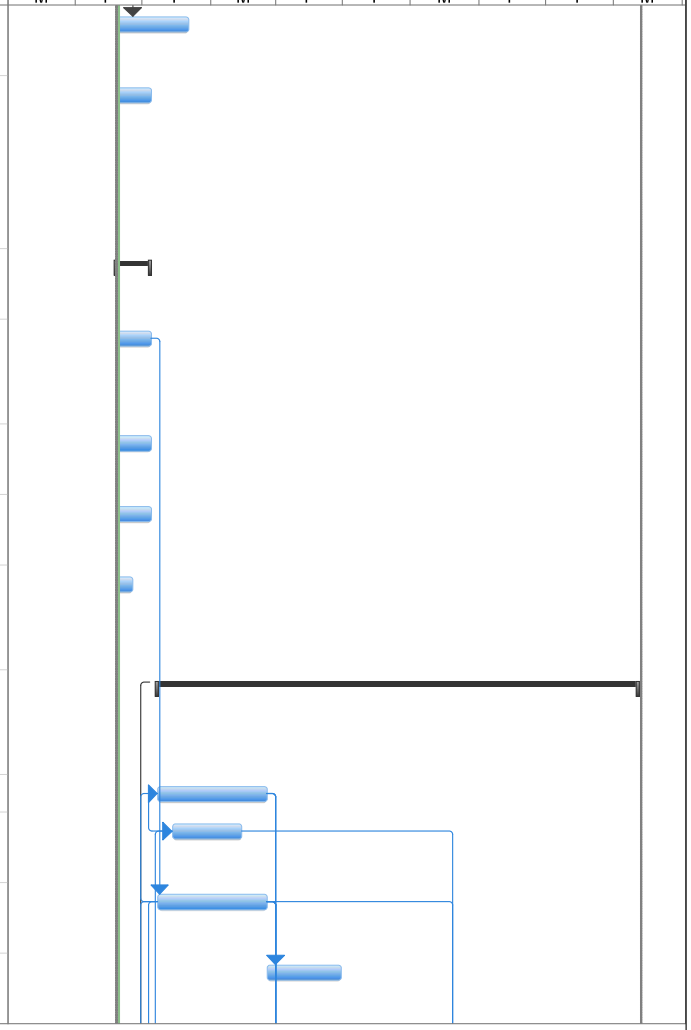


Proyecto: Programación Curun
Fecha: mié 4/12/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
30	1.5.5	Volumen 5. Estudio de geología y geomorfología local	6 mss	mar 25/03/25	lun 8/09/25
31	1.5.6	Volumen 6. Estudio de hidrogeología de detalle	6 mss	mar 25/03/25	lun 8/09/25
32	1.5.7	Volumen 7. Estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y fuentes de materiales	4 mss	sáb 1/02/25	mié 21/05/25
33	1.5.8	Volumen 8. Estudio de suelos para diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras	3 mss	mar 20/05/25	lun 11/08/25
34	1.5.9	Volumen 9. Estudio de hidráulica, hidrología y socavación	3 mss	mar 25/03/25	lun 16/06/25
35	1.5.10	Volumen 10. Estudio de diseño de pavimentos	2 mss	mar 12/08/25	lun 6/10/25
36	1.5.11	Volumen 11. Estudio de diseño de estructuras	6 mss	mar 25/03/25	lun 8/09/25
37	1.5.12	Volumen 12. Estudio de urbanismo y paisajismo	2 mss	mar 25/03/25	lun 19/05/25
38	1.5.13	Volumen 13. Estudio de redes hidrosanitarias y secas	2 mss	mar 25/03/25	lun 19/05/25
39	1.5.14	Volumen 14. Estudio de riesgos	6 mss	mar 25/03/25	lun 8/09/25
40	1.5.15	Volumen 15. Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones	2 mss	mar 9/09/25	lun 3/11/25

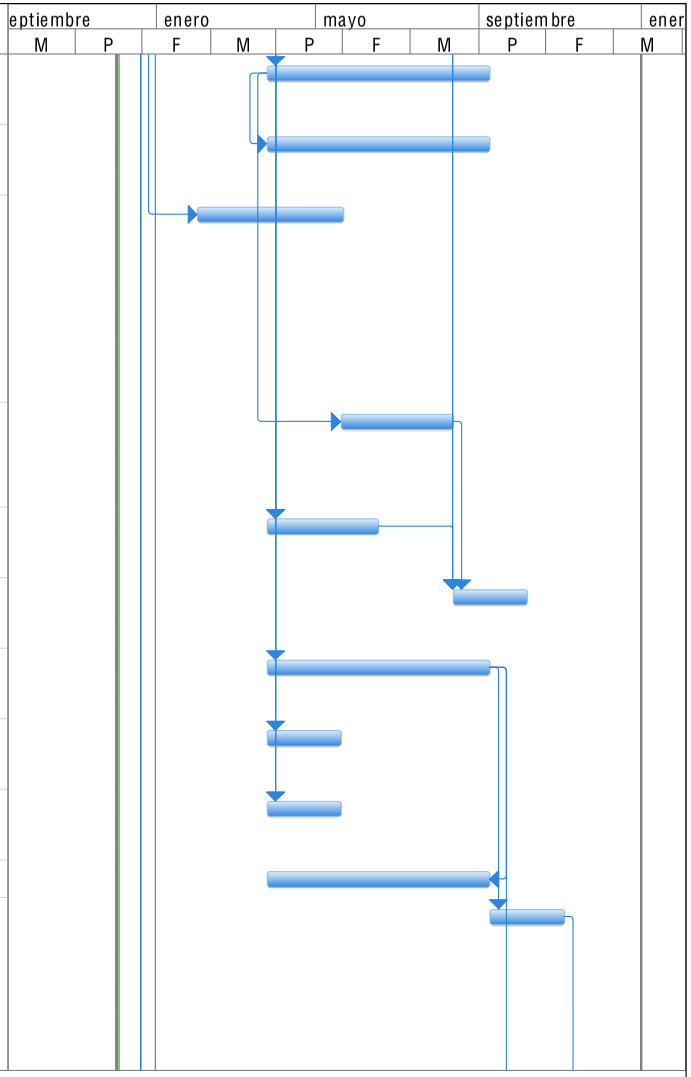


Proyecto: Programación Curun
Fecha: mié 4/12/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
41	1.5.16	Volumen 16. Evaluación socioeconómica y financiera del proyecto	4 mss	mié 12/02/25	lun 2/06/25
42	1.5.17	Volumen 17. Ambiental, social, predial, y sostenibilidad	11 mss	jue 2/01/25	lun 3/11/25
43	1.5.18	Volumen 18. Técnico BIM	4 mss	mar 20/05/25	lun 8/09/25
44	1.5.19	Volumen 19. Informe final ejecutivo	2 mss	mar 4/11/25	lun 29/12/25
45	**1.6**	**GRUPO No. 3 OTROS COSTOS DIRECTOS**	**14,25 mss**	**lun 2/12/24**	**mié 31/12/25**
46	1.6.1	Viáticos Director (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	13,75 mss	jue 12/12/24	lun 29/12/25
47	1.6.2	Viáticos Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	13,75 mss	lun 16/12/24	mié 31/12/25
48	1.6.3	Transportes Aéreos Director (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	13,75 mss	lun 16/12/24	mié 31/12/25
49	1.6.4	Transportes Aéreos Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	13,75 mss	lun 2/12/24	mié 17/12/25
50	1.6.5	Adquisición de informaciòn secundaria (fotografia aèrea, planchas catastrales, Registro 1 y 2 del IGAC, implica tota la informaciòn jurìdica que se requiera) S/Comprobante Pago	13 mss	lun 6/01/25	mié 31/12/25

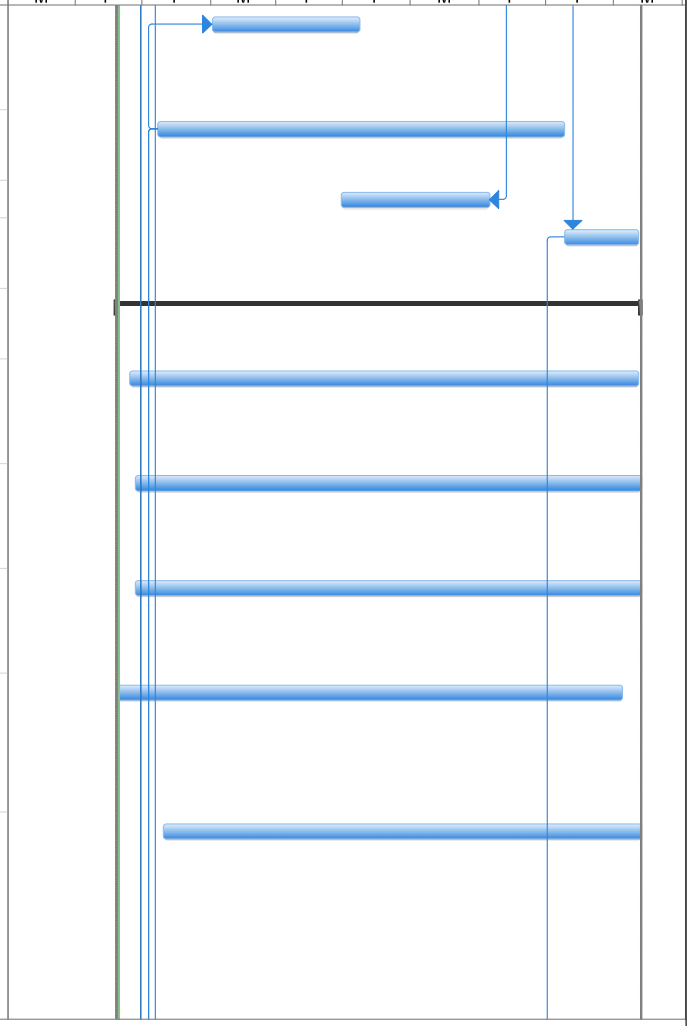


Proyecto: Programación Curun
Fecha: mié 4/12/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
51	1.6.6	Levantamiento Topografico y Materialización del Eje (Incluye personal, equipos, transporte)	3 mss	lun 13/01/25	mié 2/04/25
52	1.6.7	Levantamiento topográfico detallado (incluye personal, equipos, materiales, viaticos, desplazamiento, transporte)	3 mss	jue 3/04/25	mié 25/06/25
53	1.6.8	Georeferenciación (incluye par de puntos con gps de precisiòn milimètrica materializdos en campo con mojones en concreto y plantina de bronce, estimando ubicar en cada punto un par de mojones de concreto). incluye equipo, material, transportes y personal.	3 mss	lun 13/01/25	mié 2/04/25
54	1.6.9	Alquiler de Vehìculo (4X4 de 2000 CC o superior, Modelo 2014 o superior, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	13,05 mss	jue 2/01/25	mar 30/12/25
55	1.6.10	Alquiler de Vehìculo (4X4 de 2000 CC o superior, Modelo 2014 o superior, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	7,5 mss	jue 23/01/25	lun 18/08/25
56	1.6.11	Campamento (incluye arrendamiento y/o alquiler, dotación y servicios, en el sitio del proyecto)	13,05 mss	vie 3/01/25	mié 31/12/25

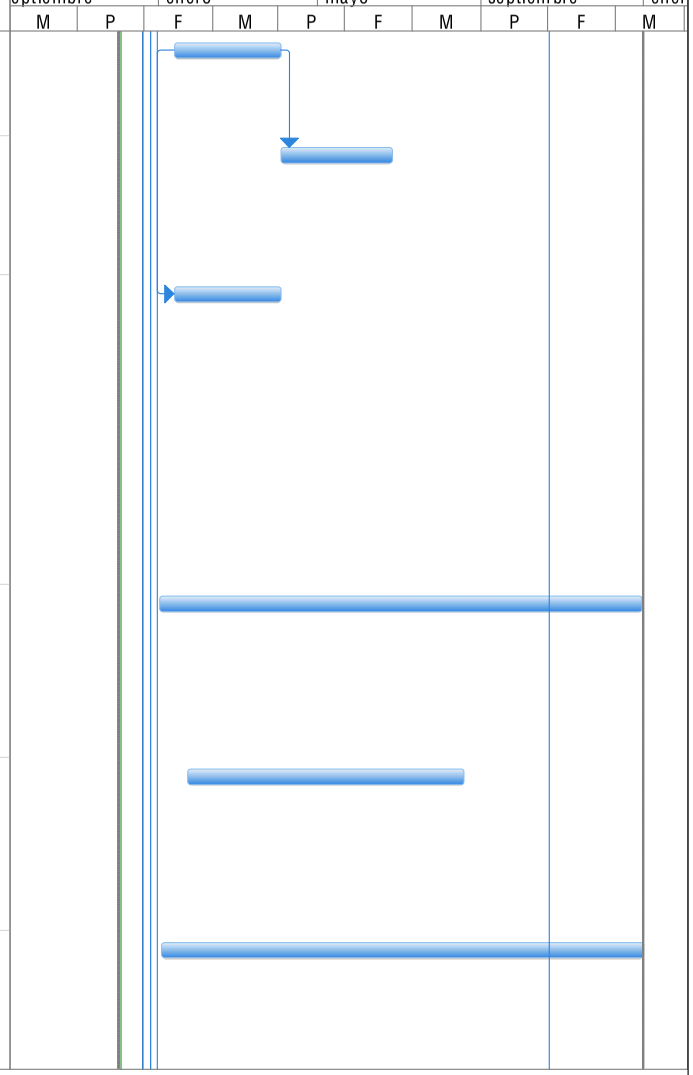


Proyecto: Programación Curun
Fecha: mié 4/12/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
57	1.6.12	Campamento (incluye arrendamiento y/o alquiler, dotación y servicios, en el sitio del proyecto)	7,5 mss	jue 23/01/25	lun 18/08/25
58	1.6.13	Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	4 mss	jue 23/01/25	lun 12/05/25
59	1.6.14	Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal)	4 mss	jue 23/01/25	lun 12/05/25
60	1.6.15	Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal)	4 mss	jue 23/01/25	lun 12/05/25
61	1.6.16	Ensayos de Laboratorio y/o ensayos de investigación y/o Diagnóstico y/o Redes (S/comprobante) (Incluye la comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructura	6 mss	jue 23/01/25	lun 7/07/25
62	1.6.17	Edición de Informes Finales de todos los volúmenes (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y dos copias en archivos magnéticos)	2 mss	mar 4/11/25	lun 29/12/25

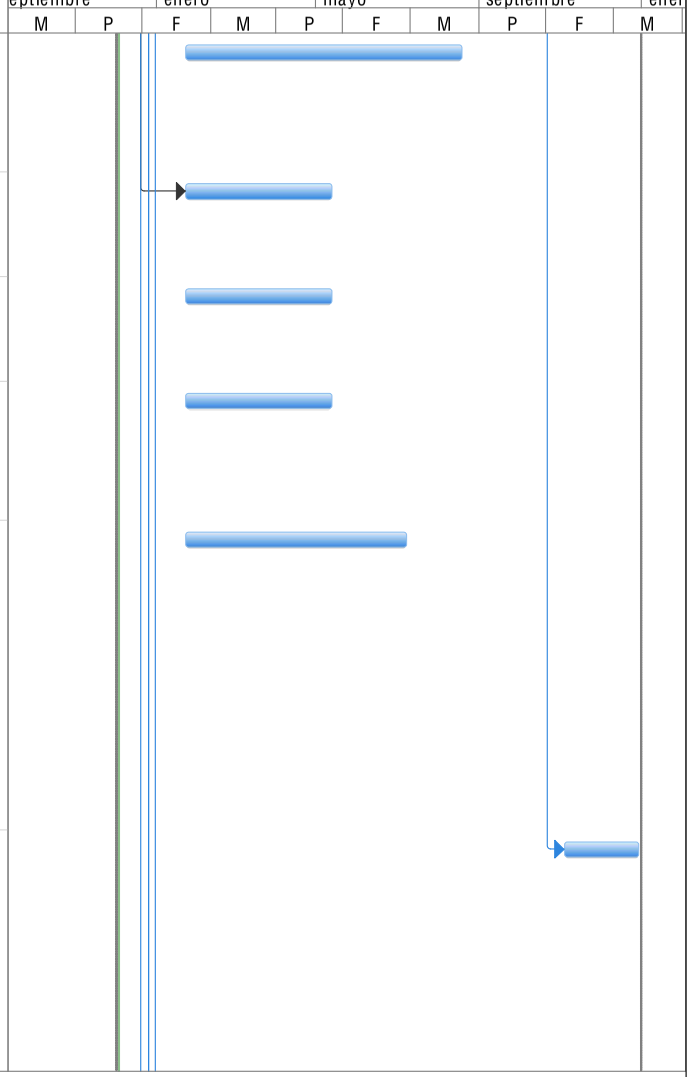


Proyecto: Programación Curun
Fecha: mié 4/12/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
63	1.6.18	Estudios complementarios (Aprobados por la Interventoría)	6 mss	jue 2/01/25	lun 16/06/25
64	1.6.19	Toma de información de Tránsito	2 mss	lun 13/01/25	mié 5/03/25
65	1.6.20	Gestiones Ambientales, Arqueologica, Sociales, (S/comprobante) (Adquisición de información, monitoreo, muestreos, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago a autoridades ambientales, etc)	3 mss	lun 20/01/25	mié 9/04/25
66	1.6.21	Lineamientos consultas previas (Socializaciones componente social). (S/comprobante)	10 mss	sáb 1/02/25	mié 5/11/25
67	1.6.22	**FIN**	**0 mss**	**mié 31/12/25**	**mié 31/12/25**

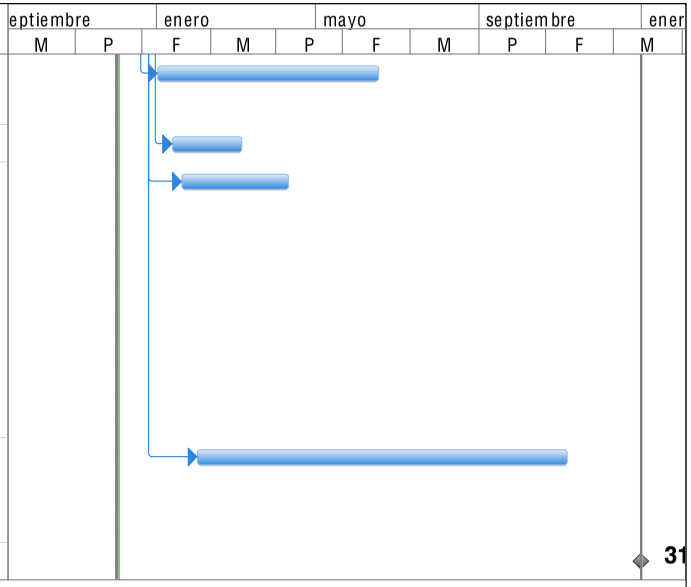

Proyecto: Programación Curun
Fecha: mié 4/12/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

MEPI-MN-IN-6-FR-1
PROGRAMA DE INVERSIONES

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA consultoría PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN 1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de

FECHA: 02/12/2024 (Día / Mes / Año)

EJ

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 6
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 627 DE 2024

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 de 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 1 Días (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 31 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CON 02/12/2024 (Indique día mes año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones. Indique día mes año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día mes año)

VALOR INICIAL (incluido IVA $ 8.700.000.000,00 (Según contrato principal)

OR ADICIONES (Incluido IVA) $

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) $ 8.700.000.000,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL con auditoría PROGRAMADA Miles de pesos	(%) consultoría PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL con auditoría PROGRAMADA	% Programado $ Valor programado % Valor Ejecutado % Ejecutado	DICIEMBRE	REPROGRAMACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
	VALOR ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA	VALOR consultoría EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos																
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 254.568.000,00	2,93%	2,21%	% P	1,18%		1,24%	1,24%	1,24%	1,68%	1,34%	1,68%	1,34%	1,34%	1,16%	0,93%	0,93%	1,16%	
	$ 1.430.754.000,00	16,46%	$ 192.444.000,00	$ P	$ 90.722.210,93		$ 107.907.221,36	$ 106.987.174,67	$ 106.987.174,67	$ 146.948.408,53	$ 116.987.174,67	$ 146.948.408,53	$ 116.987.174,67	$ 96.538.221,85	$ 100.716.210,93	$ 80.538.388,42	$ 80.538.388,42	$ 100.716.210,93	
				$ E	$ 99.222.000,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	1,11%		1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLÚMENES TECNICOS ENTREGABLES																			
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS	$ 69.000.000,00	0,79%	0,00%	% P			0,04%	0,48%	0,00%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$ 69.000.000,00	0,79%	$ -	$ P	$ -		$ 3.450.000,00	$ 41.400.000,00	$ -	$ 24.150.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO	$ 60.000.000,00	0,69%	0,00%	% P			0,03%	0,43%	0,00%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$ 60.000.000,00	0,69%	$ -	$ P	$ -		$ 3.000.000,00	$ 36.000.000,00	$ -	$ 21.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	$ 165.000.000,00	1,90%	0,00%	% P			0,09%	1,14%	0,00%	0,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$ 165.000.000,00	1,90%	$ -	$ P	$ -		$ 8.250.000,00	$ 99.000.000,00	$ -	$ 57.750.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	$ 42.000.000,00	0,48%	0,00%	% P			0,02%	0,29%	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$ 42.000.000,00	0,48%	$ -	$ P	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 27.300.000,00	$ -	$ 14.700.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	$ 106.000.000,00	1,22%	0,00%	% P			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$ 106.000.000,00	1,22%	$ -	$ P	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 5.300.000,00	$ -	$ -	$ 21.200.000,00	$ -	$ -	$ 37.100.000,00	$ -	$ -	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	$ 125.000.000,00	1,44%	0,00%	% P			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$ 125.000.000,00	1,44%	$ -	$ P	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 6.250.000,00	$ -	$ -	$ 25.000.000,00	$ -	$ -	$ 43.750.000,00	$ -	$ -	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES	$ 368.000.000,00	4,23%	0,00%	% P			0,00%	0,21%	0,00%	2,54%	0,00%	1,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$ 368.000.000,00	4,23%	$ -	$ P	$ -		$ -	$ 18.400.000,00	$ -	$ 223.900.000,00	$ -	$ 124.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E															
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	$ 235.000.000,00	2,70%	0,00%	% P															
	$ 235.000.000,00	2,70%	$ -	$ P	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.750.000,00	$ 141.000.000,00	$ -	$ 82.250.000,00	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E															
ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	$ 190.000.000,00	2,18%	0,00%	% P															
	$ 190.000.000,00	2,18%	$ -	$ P	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 9.500.000,00	$ 114.000.000,00	$ -	$ 66.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E															
ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS	$ 73.000.000,00	0,84%	0,00%	% P															
	$ 73.000.000,00	0,84%	$ -	$ P	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.650.000,00	$ 43.800.000,00	$ -	$ 25.550.000,00	$ -	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E															
ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	$ 481.000.000,00	5,53%	0,00%	% P															
	$ 481.000.000,00	5,53%	$ -	$ P	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 24.050.000,00	$ -	$ -	$ 288.600.000,00	$ -	$ -	$ 168.350.000,00	$ -	$ -	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E															
ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	$ 57.000.000,00	0,66%	0,00%	% P															
	$ 57.000.000,00	0,66%	$ -	$ P	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 2.850.000,00	$ 34.200.000,00	$ 19.950.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E															
ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS SECAS	$ 47.000.000,00	0,54%	0,00%	% P															
	$ 47.000.000,00	0,54%	$ -	$ P	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 2.350.000,00	$ 28.200.000,00	$ 16.450.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E															
ESTUDIO DE RIESGOS	$ 93.000.000,00	1,07%	0,00%	% P															
	$ 93.000.000,00	1,07%	$ -	$ P	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 4.650.000,00	$ -	$ -	$ 55.800.000,00	$ -	$ -	$ 32.550.000,00	$ -	$ -	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E															
ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	$ 96.000.000,00	0,64%	0,00%	% P															
	$ 96.000.000,00	0,64%	$ -	$ P	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.600.000,00	$ 33.600.000,00	$ -	$ 19.200.000,00	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E															
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	$ 54.000.000,00	0,62%	0,00%	% P															
	$ 54.000.000,00	0,62%	$ -	$ P	$ -		$ -	$ 2.160.000,00	$ -	$ 32.400.000,00	$ -	$ -	$ 18.900.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E															
AMBIENTAL , SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	$ 423.000.000,00	4,86%	0,00%	% P			0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,70%	
	$ 423.000.000,00	4,86%	$ -	$ P	$ -		$ 21.150.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 253.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 148.050.000,00	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
VOLUMEN TECNICO BIM	$ 46.000.000,00	0,53%	0,00%	% P															
	$ 46.000.000,00	0,53%	$ -	$ P	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.300.000,00	$ -	$ -	$ 27.600.000,00	$ -	$ 16.100.000,00	$ -	$ -	
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E															
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 5.795.432.000,00	66,59%	0,00%	% P	0,46%		75,14%	8,95%	10,46%	8,18%	5,57%	8,26%	7,16%	7,04%	7,13%	0,92%	1,72%	2,08%	
	$ 4.579.246.000,00	52,64%	$ -	$ P	$ 447.352,00		$ 779.748.061,40	$ 909.610.075,75	$ 715.748.061,40	$ 464.473.686,40	$ 809.789.491,75	$ 504.357.894,74	$ 96.547.894,74	$ 96.547.368,42	$ 80.357.894,74	$ 147.474.561,40	$ 185.895.791,75		
				$ E	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0,01%														
VALOR BÁSICO DE consultoría (A)	**$ 8.700.000.000,00**	**100,00%**	**2,21%**																
VALOR BÁSICO DE consultoría ACTUALIZADO (A*)	**$ 8.700.000.000,00**	**100,00%**	**$ 192.444.000,00**																

INVERSIÓN CONSULTORIA PROGRAMADA MES	%	1,82%		6,79%	12,34%	11,00%	14,03%	6,97%	9,16%	7,01%	2,16%	2,29%	2,76%	2,62%	4,93%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 140.971.978,95		$ 591.005.701,35	$ 1.090.345.236,27	$ 1.023.607.251,62	$ 1.294.344.529,93	$ 750.170.961,27	$ 846.655.930,34	$ 1.169.555.069,61	$ 220.966.196,39	$ 327.971.870,99	$ 492.427.283,16	$ 243.643.929,82	$ 430.194.912,39	
INVERSIÓN CONSULTORIA PROGRAMADA ACUMULADA	%	1,82%		8,61%	20,97%	32,78%	47,08%	56,04%	65,20%	72,21%	74,36%	76,65%	79,41%	82,03%	86,96%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 140.971.978,95		$ 731.977.680,30	$ 1.822.322.916,57	$ 2.845.930.168,19	$ 4.140.274.698,12	$ 4.927.945.659,40	$ 5.774.601.589,74	$ 6.944.156.659,35	$ 7.165.122.855,74	$ 7.493.094.726,73	$ 7.985.521.997,90	$ 8.229.165.927,72	$ 8.700.000.000,00	
INVERSIÓN CONSULTORIA EJECUTADA MES	%	1,11%		1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 99.222.000,00		$ 99.222.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
INVERSIÓN CONSULTORIA EJECUTADA ACUMULADA	%	2,21%		2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 99.222.000,00		$ 192.444.000,00	$ 192.444.000,00	$ 192.444.000,00	$ 192.444.000,00	$ 192.444.000,00	$ 192.444.000,00	$ 192.444.000,00	$ 192.444.000,00	$ 192.444.000,00	$ 192.444.000,00	$ 192.444.000,00	$ 192.444.000,00	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADO (B*)	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B*)	**$ -**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C*=(A+B*)	**$ -**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de consultoría aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el " Valor básico de
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la consultoría (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $ 0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la consultoría programada se calcula con respecto al Valor Básico de consultoría (A) o al Valor Básico de consultoría Actualizado (A*).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de consultoría que no se puedan agrupar por GPP, se debe

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	% Valor	% Valor
CURVAS	- - - -	———

Aprueba Firma:
Nombre: ERICK STELLA RENTERÍA MENA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820251733 ATL

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS OCTAVIO NIÑO BRUALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPNT-VC BYC

Revisó Firma:
Nombre: JENNIER SALAS QUEJADA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: YENNY XIOMARA HERNANDEZ PEÑARANDA
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN-IN-6-FR-2
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA consultoría PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MINT-INVE-FTS-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	28/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 DE Feb-25 (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 185.122.000,00

SEGUIMIENTO No. 3
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 4227 DE 2024

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN QURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CARO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4202 de 2024 INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 11 mes (En meses según acta de inicio principal)

PLAZO ACUMULADO: 15 (En meses según las prórrogas o suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 3/05/2024 (Indique día mes y año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3/03/2025 (Indicar las suspensiones, indicar día mes y año)

FECHA DE SUSPENSIÓN (Indique las suspensiones que corresponden con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN (Indique día mes y año)

VALOR INICIAL incluido IVA (A): $ 6.700.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (I): $ -

VALOR ACUMULADO incluido IVA (CH+AH+I): $ 6.700.000.000,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL consultoría PROGRAMADA Millones pesos	(%) consultoría PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL consultoría PROGRAMADA	% Programado % Valor programado % Valor Ejecutado % Ejecutado	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
	VALOR ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA Millones pesos	(%) ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA	VALOR consultoría EJECUTADA ACUMULADA Millones pesos															
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 264.956.000,00	2,95%		% P	1,16%	1,24%	1,34%	1,68%	1,34%	1,46%	1,46%	1,36%	1,16%	1,16%	0,93%	0,93%	1,16%	
	$ 1.430.764.000,00	15,45%	$ 102.464.000,00	$ P	$ 105.774.000,00	$ 107.600.721,36	$ 116.697.174,67	$ 116.697.174,67	$ 146.305.466,66	$ 116.697.174,67	$ 145.396.466,66	$ 115.697.174,66	$ 98.696.271,66	$ 80.715.210,63	$ 80.615.969,63	$ 80.615.969,63	$ 105.774.000,00	
				$ E	$ 98.000.000,00	$ 99.700.000,00	$ 108.100.000,00											
				% E	1,11%	1,11%	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLÚMENES TECNICOS ENTREGABLES																		
ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS	$ 69.000.000,00	0,75%		% P		0,04%	0,05%		0,05%									
	$ 69.000.000,00	0,75%	$ 3.450.000,00	$ P	$ -	$ 3.450.000,00	$ 41.400.000,00		$ 55.160.000,00									
				$ E	$ -	$ -	$ 3.450.000,00											
ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y ANÁLISIS DE SERVICIO	$ 60.000.000,00	0,65%		% P		0,00%	0,04%		0,06%									
	$ 60.000.000,00	0,65%	$ 3.000.000,00	$ P	$ -	$ 3.000.000,00	$ 25.000.000,00		$ 35.000.000,00									
				$ E	$ -	$ -	$ 3.000.000,00											
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	$ 165.000.000,00	1,80%		% P		0,00%	0,08%		0,09%									
	$ 165.000.000,00	1,80%	$ 9.250.000,00	$ P	$ -	$ 6.250.000,00	$ 50.000.000,00		$ 65.750.000,00									
				$ E	$ -	$ -	$ 9.250.000,00											
ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	$ 42.000.000,00	0,46%		% P					0,00%		0,00%							
	$ 42.000.000,00	0,46%	$ 2.100.000,00	$ P	$ -	$ -	$ -		$ 17.320.000,00		$ 14.700.000,00							
				$ E	$ -	$ 2.100.000,00												
				% E					0,00%		0,00%	0,00%						
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	$ 106.000.000,00	1,20%		% P					0,00%			0,00%			0,00%			
	$ 106.000.000,00	1,20%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -		$ 5.300.000,00		$ -	$ 53.000.000,00			$ 27.100.000,00			
				$ E	$ -	$ -	$ -											
				% E					0,00%			0,00%			0,00%			
ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DE TALLE	$ 125.000.000,00	1,40%		% P					0,00%			0,00%			0,00%			
	$ 125.000.000,00	1,40%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -		$ 6.250.000,00		$ -	$ 75.000.000,00			$ 40.750.000,00			
				$ E	$ -	$ -	$ -											
				% E					0,00%			0,00%			0,00%			
ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIONES DE TALUDES	$ 369.000.000,00	4,20%		% P			12,0%		4,20%		1,80%							
	$ 369.000.000,00	4,20%	$ 19.400.000,00	$ P	$ -	$ -	$ 19.400.000,00		$ 295.200.000,00		$ 129.600.000,00							
				$ E	$ -	$ -	$ 19.400.000,00											
				% P							0,10%	0,80%						
ESTUDIOS DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	$ 235.000.000,00	2,70%		$ P	$ -	$ -	$ -				$ 11.750.000,00	$ 141.000.000,00		$ 82.250.000,00				
	$ 235.000.000,00	2,70%	$ 11.750.000,00	$ E	$ -	$ -	$ 11.750.000,00											
				% E														
ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	$ 190.000.000,00	2,18%		% P					0,31%		1,31%	0,90%						
	$ 190.000.000,00	2,18%	$ 9.500.000,00	$ P	$ -	$ -	$ 9.500.000,00		$ 6.650.000,00		$ 44.650.000,00	$ 68.400.000,00						
				$ E	$ -	$ -	$ 9.500.000,00											
				% E														
ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS	$ 73.000.000,00	0,84%		% P									0,80%	0,60%		0,20%		
	$ 73.000.000,00	0,84%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -	$ -	$ 58.400.000,00	$ 43.800.000,00	$ -	$ 15.000.000,00	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -											
				% E														
ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	$ 481.000.000,00	5,55%		% P					0,80%			5,55%			1,66%			
	$ 481.000.000,00	5,55%	$ 24.000.000,00	$ P	$ -	$ -	$ -		$ 76.960.000,00		$ -	$ 388.800.000,00			$ 108.240.000,00			
				$ E	$ -	$ -	$ 24.000.000,00											
				% E					0,00%		0,00%							
ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	$ 57.000.000,00	0,66%		% P					0,00%		0,00%	0,00%						
	$ 57.000.000,00	0,66%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -		$ 2.850.000,00		$ 14.250.000,00	$ 10.800.000,00						
				$ E	$ -	$ -	$ -											
				% E														
ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS SECAS	$ 47.000.000,00	0,54%		% P					0,00%		0,00%	0,00%						
	$ 47.000.000,00	0,54%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -		$ 2.350.000,00		$ 14.450.000,00	$ -						
				$ E	$ -	$ -	$ -											
				% E														
ESTUDIO DE RIESGOS	$ 93.000.000,00	1,07%		% P					0,00%			0,00%			0,00%			
	$ 93.000.000,00	1,07%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -		$ 4.650.000,00		$ -	$ 68.000.000,00			$ 18.650.000,00			
				$ E	$ -	$ -	$ -											
				% E														
ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	$ 56.000.000,00	0,64%		% P										0,03%	0,10%		0,03%	
	$ 56.000.000,00	0,64%	$ 2.800.000,00	$ P	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	$ 30.000.000,00	$ -	$ 18.000.000,00	
				$ E	$ -	$ -	$ 2.800.000,00											
				% E														
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	$ 54.000.000,00	0,62%		% P			0,03%		0,21%				0,82%					
	$ 54.000.000,00	0,62%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ 2.700.000,00		$ 32.400.000,00		$ -	$ -	$ 10.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -											
				% E														
AMBIENTAL , SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	$ 423.000.000,00	4,85%		% P		0,24%						3,16%					1,70%	
	$ 423.000.000,00	4,85%	$ -	$ P	$ -	$ 21.150.000,00	$ -		$ -		$ -	$ 253.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 148.050.000,00	
				$ E	$ -	$ -	$ -											
				% E		0,00%						0,00%					0,00%	
VOLUMEN TECNICO BIM	$ 46.000.000,00	0,53%		% P							0,00%				0,18%			
	$ 46.000.000,00	0,53%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -		$ -		$ 2.300.000,00	$ -	$ -	$ 21.420.000,00	$ 8.100.000,00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ 2.300.000,00											
				% E														
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 5.765.452.000,00	66,18%		% P	0,46%	0,14%	8,68%	10,48%	6,80%	10,76%	8,67%	6,80%	7,16%	1,16%	0,93%	0,93%	1,70%	2,69%
	$ 4.573.264.000,00	52,64%	$ -	$ P	$ 36.301.000,00	$ 11.000.000,00	$ 703.736.000,00	$ 804.636.974,15	$ 531.760.000,00	$ 826.000.000,00	$ 665.874.000,00	$ 550.000.000,00	$ 100.000.000,00	$ 89.000.000,00	$ 71.000.000,00	$ 71.000.000,00	$ 130.000.000,00	$ 206.000.000,00
				$ E	$ -	$ -	$ 2.500.000,00											
VALOR BÁSICO DE consultoría (A)	$ 8.700.000.000,00	100,00%	5,17%															
VALOR BÁSICO DE consultoría ACTUALIZADO (A)	$ 8.700.000.000,00	100,00%	$ 370.764.000,00															

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El concepto o componente de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra presupuestado".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra sin incluir provisiones ni IVA.
5. Para los contratistas bajo cuales se tengan considerados items de otros cuentas en las metas anuales por GPP se debe diferenciar el formato con los items de obras.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		6,17%
CURVAS		

INVERSIÓN MENSUAL PROGRAMADA MES	%	1,63%	6,19%	12,67%	11,68%	14,96%	9,97%	9,71%	13,91%	2,64%	5,11%	6,96%	3,90%	6,17%
	VALOR Millón de $ Pesos	$ 146.971.976,00	$ 551.000.721,36	$ 1.140.240.226,67	$ 1.050.697.361,67	$ 1.256.364.939,99	$ 700.170.081,27	$ 846.980.696,99	$ 1.190.000.000,00	$ 260.000.116,99	$ 457.877.979,99	$ 602.421.963,15	$ 336.045.969,63	$ 536.000.000,00
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA	%	1,63%	7,81%	20,47%	32,15%	47,10%	57,08%	66,78%	79,96%	82,60%	87,71%	94,67%	98,57%	100,00%
	VALOR Millón de $ Pesos	$ 146.971.976,00	$ 551.677.200,00	$ 1.054.622.616,67	$ 2.951.420.566,15	$ 4.197.774.039,13	$ 4.927.960.138,40	$ 5.774.941.079,70	$ 6.965.155.445,40	$ 7.175.032.215,79	$ 7.783.028.594,79	$ 7.999.251.957,95	$ 8.248.000.057,73	$ 8.700.000.000,00
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA MES	%	1,11%	1,11%	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR Millón de $ Pesos	$ 98.000.000,00	$ 99.700.000,00	$ 108.100.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA	%	1,11%	2,21%	3,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR Millón de $ Pesos	$ 98.000.000,00	$ 197.700.000,00	$ 305.800.000,00	$ 305.800.000,00	$ 305.800.000,00	$ 305.800.000,00	$ 305.800.000,00	$ 305.800.000,00	$ 305.800.000,00	$ 305.800.000,00	$ 305.800.000,00	$ 305.800.000,00	$ 305.800.000,00

*Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con las relacionadas en la propuesta económica aprobada en medición contractual.
Incluye IVA, debe corresponder al valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS *	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADO (B)	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO CH+AH)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO CH+AH)	$ -		

NOTA

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Consultor y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprobó: Firma: Nombre: EDLY STELLA ARENTERIA MENA
Director de consultoría
Matrícula Profesional No.: (8302) 51703 ATL

Aprobó: Firma: Nombre: JOSE OCTAVIO NIÑO BRAVO
Director de interventoría
Matrícula Profesional No.: 011-83-5243

Original: Anexo pase/pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN-IN-14-FR-2
ACTAS DE REUNIÓN

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/02/2025 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Consultoría)

ACTA DE REUNIÓN No. 6
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 4227-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CORDOBA

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA:
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4262-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

OBJETIVOS DE LA REUNION
Reunión tecnica de seguimiento contrato de consultoría 4227 de 2024

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1-Estado General del proyecto.
2- Socialización inicial (compromiso con el alcalde de Novita) alcance del proyecto.
3- Estado financiero de la universidad UTCH (Fiducia). Compra de póliza, apertura cuentas de actas y anticipo, certificados.
4- Entrega de anticipo, trabajos en campo.
5- Plan de contingencia presentado por la UTCH.
6- Informe preliminar revisión diseños fase II contrato No 1666 de 2019.
8- Trámite acta de enero interventoría y consultoría.
9- Temas varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se reune de forma virtual la ingeniera Edly Stella Rentería directora de consultoría, Eulogio Palacios Chaverra Coordinador Técnico y Marcela Mosquera residente de Estudios consultoría y de forma presencial por parte del INVIAS la ingeniera Sirley Merchan Subdirectora de planificación e ingraestructura,la ingeniera Yenny Xiomara Hernadez gestor tecnico y por parte de la interventoría Jose Octavio Niño director de interventoría, Diego Fernando Borda coordinador tecnico de interventoría y German Eduardo Peña gerente de interventoría.
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO: El Contrato de consultoria presenta un atraso, situacion que motivo a la interventoria solicitar un plan de contingencia
SOCIALIZACION INICIAL: se requiere saber una fecha tentativa del anticipo con el fin de organizar las reuniones correspondientes, para actualizar nuevamente el plan de contingencia, dado que del anticipo dependerá de la ejecución de la socializacion.
ESTADO FINANCIERO: La interventoria solicita que la consultoria debe estar al dia con las actas mensuales, con el fin de no crear retrasos para no tener problemas de presupuesto.

ENTREGA DE ANTICIPO: aun no se ha establecido una fecha como tal, pero se procura que este se de la primera o segunda semana del mes de marzo de 2025.

PLAN DE CONTINGENCIA: la consultoria afirma que para este plan de contingencia se necesida claridad del anticipo por que existen actividades tales como la socialización que requieren de este , programacion inicial para la entrega de los volumenes de las metodologias, en general el plan de contingencia esta estructurado pero hace falta volver a ajustar la reprogramacion de las actividades

INFORME PRELIMINAR DE REVISION DE DISEÑOS FASE II CONTRATO 1666 DE 2019: La consultoria afirma que la revision ha sido muy general debido a que para estimar un avance a modo preliminar dependera de los especialistas, situacion que a hoy no se encuentra contratado sino el grupo I, independiente a esto algunos de los especialistas han estado realizando algunas apreciaciones para dicha revision, de manera general se concluye que se entregaron 16 volumenes con anexos, de estos 16 se observa que lo que corresponde a prediseños de estructuras en una inspeccion visual del corredor proyectado, el volumen 7 diseños para tuneles no se presenta por que en el anexo tecnico decia que para este caso no era necesario para el tipo de via que estaba en estudio, Esta revision general confrontando los volumenes entregados con el anexo tecnico del presente proyecto, por que se tiene que tener en cuenta la informacion anterior. Respecto a lo volmen 6 " ESTABILIDAD DE TALUDES " y volumen 13 "DISEÑO DE CIMENTACIONES" el especialista manifiesta que la informacion registradas dela informacion de campo y los laboratorios, no son suficiententes para validad la informacion de los 52 km del corredor, motivo que implica ir primero a la visita de campo levantar información para poder hacer el plano correspondiente, el especialista manifiesta que lo mas probable es que segun la infromación anterior se debe levantar mas informacion de la que estaba contemplada y esto implicaria mas recursos y mas tiempo. Con respecto a los volumenes 13, 14 y 15 "PREDISEÑOS DE CIMENTACIONES" "HIDROLOGIA HIDRAHULICA Y SOCAVACION DE OBRAS MAYORES" "PREDISEÑOS DE PUENTES" estos no fueron tenidos en cuenta en el anexo tecnico, estos estaran pendientes de revision por parte de los especialistas, para saber si estos volumenes hacen parte compleentaria de los volumenes principales que estan incluidos, por otro lado es importante que tanto el INVIAS como la INTERVENTORIA tenga presente que hay 7 volumenes de la cual es no hay informacion, los cuales son: "ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL" " ESTUDIO DE HIDROGEOLOGIA DE DETALLE" " REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS", "URBANISMO Y PAISAJISMO", "ESTUDIO DE RIESGOS" " SOSTENIBILIDAD" Y "TECNICO BIM" esto implica que la consultoria tendria que partir de cero por que no hay una informacion base correspondiente a estos volumenes. El estudio ambiental y predial tienen el mismo numero, el resumen ejecutivo aparece como volumen 12 pero se encuentra mal numerado, son cuestiones de forma pero son importantes para realizar el seguimiento. Se concluye que esto son los hallazgos en terminos generales, y se expediran nuevas observaciones cuando sea revisado por los especialistas ya que el producto de la revision estará inmerso en cada uno de los volumenes.

Una vez expuesto este tema la interventoria se solicita a la consultoria se haga llegar una lista de chequeo con todas las salvedades que se entan manisfestando, para hacer una convalidación de esa informacion, para de manera oficial infromarles a la subdirección, se tiene que tener en cuenta que este contrato dice estudios y diseños a fase III definitivos, entonces una vez revisada toda la informacion se revisara nuevamente el alcance del contrato, para hacer una redistribución de cantidades para compensar y en su defecto la solicitud formal para llevarlo a ese nivel de detalle. Finalmente el balance general conversando con la consultoria estos estudios son vibles de uso, que depronto hace falta complementarla pero la información del contrato se puede utilizar.

TRAITE ACTA DE ENERO DE INTERVENTORIA Y CONSULTORIA: La interventoria solicita a la interventoria el acta del mes de enero, teniendo conocimiento que hacen falta algunos documentos como los contratos, pero si necesitamos la sabana infromes mensuales, etc. Se solciita de manera urgente debido a que no se puede presentar la de la interventoria si esta no va de la mano con la de la consultoria.

La interventoria solicita a la consultoria, que es importante colocar en el plan de contingencia que estan haciendo una mesa se socializacion con las comunidades para poder ingresar y hacer las perforaciones y que este tiempo se use para eso, para que una vez se de luz verde con el anticipo la consultoria pueda ingresar a la zona.

FECHA 12/02/2025
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Plan de contingencia	miércoles, 12 de febrero de 2025	CONSULTORIA
Certificaciones cuentas bancarias.	Lunes, 17 de febrero de 2025	CONSULTORIA
Poliza actualizada	una vez esten activas las cuentas	CONSULTORIA
ACTA DE MES DE ENERO	miércoles, 12 de febrero de 2025	CONSULTORIA
LISTA DE CHEQUEO REVISION DE DISEÑOS FASE II CONTRATO 1666 DE 2019	Lunes, 17 de febrero de 2025	CONSULTORIA

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 26/02/2025
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
SIRLEY D. MERCHAN CARREÑO	SUBDIRECTORA DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	INVIAS	
YENNY XIOMARA HERNANDEZ P.	GESTOR TÉCNICO	INVIAS	
EDLY STELLA RENTERIA MENA	DIRECTORA DE COSNULTORÍA	UTCH CONSULTORIA	
EULOGIO PALACIOS CHAVERRA	COORDINADOR CONSULTORÍA	UTCH CONSULTORIA	
JOHANA MARCELA MOSQUERA	RESIDENTE DE ESTUDIOS	UTCH CONSULTORIA	
JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	DIRECTOR INTERVENTORÍA	UPTC INTERVENTORÍA	
DIEGO FERNADO BORDA CRUZ	COORDINADOR INTERVENTORÍA	UPTC INTERVENTORÍA	
DENIS YINETH PINO M	RESIDENTE DE ESTUDIOS	UPTC INTERVENTORÍA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/02/2025 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Consultoría)

ACTA DE REUNIÓN No. 7
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 4227-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CORDOBA

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA:
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4262-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

OBJETIVOS DE LA REUNION
Reunión tecnica de seguimiento contrato de consultoría 4227 de 2024

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1-Seguimiento al contrato
2- Desarrollo del BEP- PLAN DE EJECUCIÓN BIM
3- Estado actual de la universidad UTCH(area financiera, fiduciaria, nuevo rector, etc). Nuevo rector UTCH (Estado de la ampliación de poliza, Estado actual de la nueva fiduciaria- Exoneración de impuestos cuenta anticipo
4- Tramite acta de costos enero y febrero 2025
5- Temas varios (Estado anticipo, Priorización diseño de estabilidad de sitios criticos, Estado de consulta con entidades esxternas).

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se reunen de manera virtual la ing Edly stella Rentería Directora de consultoría, el ing. Eulogio Palacios Chaverra, coordinador consultoría,ing. Luz Yaneth Ocoró, coordinadora social y ambiental, ing. Johana Marcela Mosquera, residente de estudios ,Lleseli Mosquera Tellez, profesional auxiliar de parte de la consultoria, de parte del invias la ing. Yenny Xiomara Hernandez, gestor técnico, y por parte de la interventoria el ing. Jose Octavio Niño Brijaldo, director de interventoria, Diego Fernado Borda Cruz, coordinador interventoría y Denis Yineth Pino M, residente de estudios.
SEGUIMIENTO DEL CONTRATO: El proyectono presenta atraso de acuerdo a la reprogramación del plan de contingencia, cabe destacar que a la fecha la consultoria ha enviado varias metodologias beneficiando el avance para el mes de febrero se va a poder registrar el avance fisico, aclarando que la consultoria ha cumplico con sus compromisos segun el plan de contingencia, ya que ha presentado 7 metodologias segun lo pactado en comites anteriores, lo que ya nos va a dar un avance fisico no solamente en el acta de febrero si no en los informes mensuales, adicionalmente a esto esperamos que la consultoria siga trabajando de la manera que ha venido, para seguir avanzando en el contrato. Se da claridad que las metodologias llegaron esta semana por lo que se encuentran en revision por parte de la interventoria.
DESARROLLO DEL PLAN DE EJECUCIÓN BIM: Como es un tema especifico se informa que se hizo un comité con la consultoria esta semana con los dos profesionales BIM que quedaron con el compromiso de entregar los ultimos ajustes a mas tardar para el 03 de marzo, y ademas coordinar una mesa de trabajo con el Ing. Julian quien es el encargado de la parte del area BIM por parte del instituto Nacional de Vías.

ESTADO ACTUAL UTCH: Es bien sabido que la universidad ha pasado por situaciones bastante complejas, que han sido de indole administrativo, financiero, etc, que no es responsabilidad directa de las personas involucradas en el proyecto. La consultoria comenta que ya se esta normalizando la situación, y se estan haciendo los tramites con la fiducia para que una ves lleguen los recursos poder hacer la programación de la socialización y el trabajo de campo. Respecto a la cuenta bancaria para el anticipio esa ya se envio y ya esta notificado tesoreria y cuentas por pagar, de ese cambio de la cuenta. La interventoria comenta que respecto a la ampliación de la poliza ya fue enviada por parte de la consultoria con el debido soporte que quedo cargada en el SECOP para que el instituto haga la revision y la aprobación, respecto a la fiducia ya se tienen una nueva fiducia (fiduagraria), adicionalmente como hay un nuevo rector estan esperando que queden registradas las firmas para que pueda hacer los tramites pertinentes, referentes a pagos, tiquetes y demas, y finalmente hay un pendiente que es la solicitud de exoneracion de impuestos de la cuenta del anticipo, por parte de la interventoria este tramite ya se realizó esta pendiente por parte de la consultoria. Se esta esperando que por parte de la consultoria que a mas tardar el dia lunes ellos puedan solicitar este tramite ya que todo lo que implica el tramite del nuevo rector todo debe terner sincronia para poder expedir documentos, entonces se espera que la otra semana se pueda estar dando luz verde y se pueda tramitar ante la subdirección financiera del instituto.

TRAMITE ACTA DE COSTOS: La Ing. Yenny comenta que para la parte de cambio de cuenta de las actas de costo ya dieron el traslado de esas cuentas, adelantando la modificación del contrato, estando a puertas de recibir la notificación de si la entidad firmo, en todo caso ya esta la minuta lista, quedando solicitar el cambio de la cuenta para que ya los recursos de las actas de costos queden en esas cuentas, la interventoria afirma que ya fueron enviadas las actas de costos del mes de enero de consultoria estamos pendiente de que el supervisor Ing Yanier Salas, nos devuelva el acta o dado el caso realizar algun ajuste, pero a dia de hoy no se ha recibido. La ing. Yenny afirma que esta aun en revisión, y se espera que las dos queden en pie en el transcurso de esta semana. Interviene el Ing. Diego Borda manifestando que respecto al acta de costos del mes de febrero se van a pasar las metodologias que nos han presentado la consultoria a pesar que es en revision por parte de la interventoria, se observa que estan bien estructuradas sin embargo es importante aclarar que estas metodologias van a ser necesarias algunas modificaciones dado que tienen que estar alineadas con la metodologias BIM, de igual forma cualquier modificacion a los cronogramas que toque hacer en campo. Se solicita al equipo de consultoria el acta de costos del mes de febrero a mas tardar el dia de mañana, con sus debidos soportes.

TEMAS VARIOS:

ESTADO DESEMBOLSO DE ANTICIPO: La Ing. Yenny interviene diciendo que ya la cuenta bancaria quedo actualizada, manifiesta que ya han estado realizando pagos a contratistas el año pasado, en este momento no se sabe en que numero vamos, pero que ya la entidad empezo a dar flujo de caja, segun lo que esta en la minuta estamos dentro de los 45 dias habiles. El ing. Octavio interviene diciendo que ambas universidades estan a la espera de esto por que toca realizar visitas a estos puntos.

REVISION DEL CONTRATO 1666: El ing. Eulogio comenta que se han venido resvisando con el equipo conformado por el grupo I y con algunos especialistas, en este momento la situación esta especificamente con los estudios de suelos y estabilidad, por que la documentacion segun el especialista la información es insuficiente, para poderlos llevar a la fase III lo que va a obligar a revisar el tema de que disponibilidad financiera existe y cual falta para poder llegar a ese punto, los otros volumenes son insiertos hasta que los especialistas hagan la revisión a fondo. Respecto a la topografia se esta solicitando una información para las carteras de campo, informe topografico, etc. a lo que la Ing yenny dice que estan buscando la infromación por que hay carpetas que no abren y otras que no se encuentran, aun asi la ing se contacto con la interventoria que en su momento reviso esa información, estando a la espera de la ultima version para ser entregada.

PRIORIZACIÓN DE SITIOS CRITICOS: Esto es un tema relevante sabiento que la via que comunica a san jose del palmar actualmente hay un derrumbe, la ing, Edly manifiesta que ella tuo una reunion con el director del INVIAS la ing shirley y se toco el tema, que la proxima semana hablaban con la ing. yenny para hacer un comite para una mesa tecnica para adelantar adelantar los puntos criticos para poder inicar la contratación antes de final de año.

ESTADO DE CONSULTA CON ENTIDADES EXTERNAS: La consultoria compartio una carpeta y la interventoria esta hacindo la trazabilidad, el ministerio del interior les solicito llenar unos formatos para que puedan ampliar la respuesta.

FECHA: 26/02/2025 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
ACTA DE COSTOS MES DE FEBRERO	jueves, 27 de febrero de 2025	CONSULTORIA
AJUSTES BIM	Lunes ,03 de marzo de 2025	CONSULTORIA / INTERVENTORIA

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 6/03/2025 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
YENNY XIOMARA HERNANDEZ P.	GESTOR TÉCNICO	INVIAS	
EULOGIO PALACIOS CHAVERRA	COORDINADOR CONSULTORÍA	UTCH CONSULTORIA	
EDLY STELLA RENTERIA MENA	DIRECTORA DE COSNULTORÍA	UTCH CONSULTORIA	
JOHANA MARCELA MOSQUERA	RESIDENTE DE ESTUDIOS	UTCH CONSULTORIA	
LUZ YANETH OCORÓ	COORDINADORA SOCIAL Y AMBIENTAL	UTCH CONSULTORIA	
JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	DIRECTOR INTERVENTORÍA	UPTC INTERVENTORÍA	
DIEGO FERNADO BORDA CRUZ	COORDINADOR INTERVENTORÍA	UPTC INTERVENTORÍA	
DENIS YINETH PINO M	RESIDENTE DE ESTUDIOS	UPTC INTERVENTORÍA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 279 DE 2025.

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	279 del 28 de enero 2025.
CONTRATISTA	JOSÉE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
CC.	74322702
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR DE INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.
VALOR DEL CONTRATO	$ 16´384.000, oo
PLAZO DE EJECUCIÓN**	28 de enero al 31de marzo de 2025.
PRORROGA	N/A
LUGAR DE EJECUCIÓN	Tunja.
ORDENADOR DEL GASTO	CARLOS MAURICIO MORENO TÉLLEZ, Vicerrector de Investigaciones y Extensión
SUPERVISOR	OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO Resolución 5451 del 14 de noviembre 2024.
DEPENDENCIA	Contrato Interadministrativo N.º 4262 de 2024, UPTC - INVIAS.
ACTIVIDAD	DIRECTOR
PERIODO DEL INFORME	1 al 28 de febrero de 2025.
NUMERO DEL PAGO	2 de 3
VALOR DEL PAGO	$ 7´680.000, oo

INTRODUCCIÓN

la Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4227 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA. Para la realización de la interventoría del contrato anteriormente mencionado, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4262 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.

En el presente informe se describen las actividades realizadas como director en el periodo comprendido entre el 1 de febrero al 28 febrero de 2025.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:



1. Se participa en reunión virtual extraordinaria citada por la subdirectora de planificación e infraestructura, motivada por solicitud de la gobernadora del choco, por ocasión del derrumbe de la vía San José del Palmar – Curundo, límites del departamento del Choco y Valle del cauca, participo la gestora Jenny Xiomara Hernández, el secretario de planeación de San José del Palmar, la Secretaria de infraestructura del choco, el gerente del contrato de interventoría, Ing. Diego Borda coordinador y el suscrito, se informó sobre el estado del contrato y su inconveniente para la visita al sitio por inconvenientes presupuestales, además se recomienda que se atienda la emergencia por intermedio de la Unidad de Gestión del Riesgo, mientras los estudios arrojan o definen la solución definitiva.
2. El 12 de febrero se asistió y participo en reunión presencial con la Ing. Shirley Merchán y la gestora actual Ing. Jenny Xiomara H, en forma virtual con los directivos de la consultoría ing. Edly Stella Rentería, por la interventoría el Ing. Germán E. Peña e Ing. Diego F. Borda, con el propósito de hacer seguimiento y en especial indagar sobre las fechas reales del anticipo y actas de diciembre, prestación del plan de contingencia, diagnóstico de los estudios entregados como fase dos para actuar sobre el estado de éstos, estado de actas de enero y buscas las estrategias para entrar a terreno entre otras.
3. Se recibe el borrador del plan de contingencia de la Consultoría para contrarrestar el atraso presentado a la fecha, se analiza y se responde donde algunas recomendaciones de acuerdo a lo acordado en las diferentes reuniones virtuales de seguimiento.
4. Se hace seguimiento al proceso administrativo de la consultoría UTCH con relación al cambio de FIDUSIA, Banco popular a la nueva Fiducia Banco Agrario. Para abrir las respectivas cuentas de actas y de anticipo del contrato 4227-2024.
5. Participación en reunión virtual de preparación a la reunión semanal del día miércoles 26 de febrero con el objeto de verificar el número de metodologías entregadas por la consultoría según cronograma para el mes de febrero, La UTCH consultoría entrego 6 metodologías para revisión de la interventoría se trató el tema de la metodología BIM, con los especialistas respectivos, otro tema, el Ministerio de Educación nombró nuevo rector, nuevas firmas para la cuenta, la pólizas se actualizaron, acciones para exoneración de impuestos del anticipo, pendientes, metodología general, acta de costos de enero y febrero, relación de solicitudes a las entidades ambientales que rigen el estudio.
6. Intervención en reunión semanal de seguimiento con la participación de la gestora Ing. Xiomara Hernández, el equipo de la consultoría y la interventoría con el propósito de hacer seguimiento al avance del contrato, presentación de siete metodologías por parte de la consultoría y avance positivo sobre lo programado, anticipo y programación de visita a sitios críticos para intervención lo antes posible por parte del invias.
7. Se coordina y se revisa con el equipo de profesionales de la interventoría, los documentos soportes para presentar las actas de costos del mes de enero, tanto de la interventoría como la consultoría y ser enviados al gestor de contrato del instituto nacional de vías INVIAS. Dentro de las fechas preestablecidas.
8. Se mantiene informado al supervisor del contrato de prestación de servicios y/o a la Gerencia de la UPTC, sobre las necesidades profesionales y técnicas de elementos, muebles y equipos de oficina que se requieran para el normal funcionamiento de la Interventoría.
9. Se realiza la verificación del personal ofrecido en la propuesta por la consultoría esté desempeñando el cargo para el cual fue propuesto según lo establecido en los estudios previos dispuestos por el INVIAS.
10. Se firma y aprueban todas las actas de acuerdo al Manual de Interventoría Versión Vigente del INVIAS, entre otras actas de mensual de costos de consultoría e interventoría, Actas de modificación de cantidades de consultoría e interventoría, entre otras.
11. Se coordina, se revisa y se presentan los informes semanales y la presentación en power point mensual vía e-mail, debidamente revisados, aprobados a las diferentes dependencias.
12. Se asistencia al comité técnico en las instalaciones de la Universidad pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC. Se contó con la participación del Gerente del contrato de interventoría, el coordinador Ingeniero Diego Fernando Borda, los especialistas Ambiental y de Sostenibilidad, Ingeniera Yully Suarez,


, y el equipo de apoyo de la parte administrativa y financiera del contrato con el propósito de revisar documentación existente, requerimientos técnicos, hojas de interventoría vida etc.

13. Se mantiene comunicación con el Gestor del contrato, por parte del INVIAS, con el propósito de coordina el proceder y entrega según fechas dispuestas por la administración financiera para la entrega de informes, documentos y actas respectivas pendientes.
14. Se realizan labores coordinación para verificación en los diferentes requisitos precontractuales a que haya lugar, de acuerdo al Manual de Interventoría versión vigente, especialmente en lo relacionado con el instructivo para seguimiento de la ejecución del Contrato de interventoría.
15. Se verifica que el personal ofrecido en la propuesta por el contratista esté desempeñando el cargo para el cual fue propuesto. En caso de requerir un cambio, se debe cumplir lo establecido en los estudios previos dispuestos por el INVIAS.
16. Asesorar y suministrar la información técnica-financiera y en general cualquier información que las comisiones de seguimiento de gestores técnicos y de proyectos, de control y evaluación enviada por el Instituto Nacional de Vías y /o de las entidades de control que lo requieran
17. Rendir informes periódicos al Instituto Nacional de Vías –INVIAS- con base en las pruebas, verificaciones y cuantificaciones de los estudios que realice el consultor, sugiriendo las medidas que se deben tomar para mitigar los posibles efectos negativos del proyecto.
18. Se estudió las sugerencias y consultas del contratista, resolviéndolas oportunamente y emitir conceptos técnicos, financieros y legales según el caso, con los correspondientes soportes, documentos y justificaciones remitidas al gestor técnico del contrato y a la unidad ejecutoria pertinente para su trámite, para lo cual puede contar con los especialistas de la interventoría.
19. Se realiza seguimiento y se supervisa las labores o actividades de los diferentes profesionales que conforman el equipo de trabajo de la interventoría y se expone las diferentes situaciones en el desarrollo de los contratos, tanto consultoría como interventoría, para proponer entre todos las mejores alternativas o soluciones a las circunstancias expuestas según sea el caso.
20. Revisión de la documentación y estudios existentes a la unidad ejecutora sobre los diseños anteriores desarrollados por los departamentos del Choco por parte del Gestor Técnico del proyecto INVIAS, con el fin de realizar un diagnóstico de los mismos
21. Coordinar con la consultoría la realización de socializaciones y divulgaciones de los estudios y diseños con la comunidad, entes territoriales y nacionales, entre otros actores e interesados según sea necesario, y realizar el seguimiento y acompañamiento correspondiente al desarrollo de las mismas.

En general se ha prestado asesoría y acompañamiento antes las situaciones técnicas y competentes en el área de dirección de interventoría, atendiendo oportunamente las solicitudes presentadas, en cumplimiento con las funciones contempladas en el contrato de prestación de servicios durante el desarrollo del periodo del 1 al 28 de febrero de 2025.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

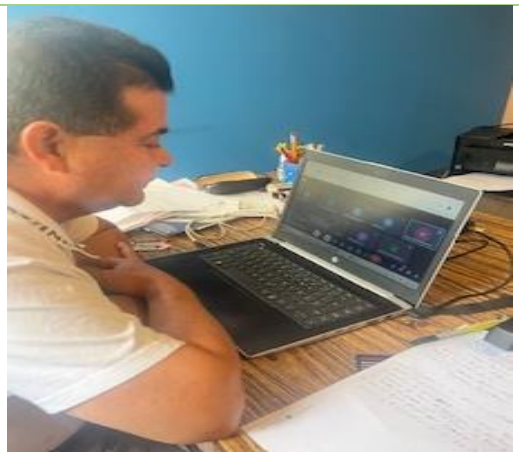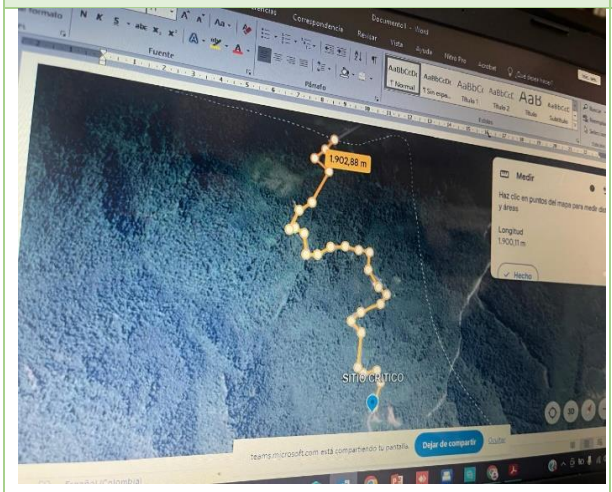	
FOTO 1 Participación en comité de seguimiento mensual, con la subdirectora de planificación e infraestructura, Ing. Sirley Merchán, con la gestora Ing., Jenny Xiomara Hernández, con el gerente del contrato ing. German Peña, el Coordinador Ing. Diego Borda, la consultoría en forma virtual, con el objeto de analizar y tomar acciones encaminadas al cumplimiento del contrato 4227 por parte del UTCH.	FOTO2. Se participa en la reunión virtual con la Ing. Jenny Siomara H. subdirectora Planificación e infraestructura encargada del INVIAS, Al igual con la ingeniería Edly Stella y Eulogio Palacios, temas actualización pólizas, flujo de caja, metodología Bim , licencias.
	
FOTO 1 Participación en reunión virtual de emergencia para dar respuesta a la solicitud de la gobernadora del choco, con respecto al derrumbe vial en San José del Palmar km 15.	**FOTO2.** Se participa en la reunión virtual con la Ing. Jenny Xiomara H. subdirectora Planificación e infraestructura encargada INVIAS, Al igual con la ingeniería Edly Stella y Eulogio Palacios, con el objeto de dar planteamientos posibles soluciones al punto crítico.

	
Foto 7 Se participa en reunión virtual citada por el gerente del proyecto, donde se contó con la participación del equipo de interventoría.	Foto 7 Se participa en reunión virtual semanal con la ingeniera Jenny Xiomara, y la consultoría con Edly Stella Rentería y Eulogio palacios, ausente supervisor invias Yanier Salas, tema tratados avance contrato, actas de enero febrero, ente otros

PRESENTADO POR:

JOSÉ OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de interventoría del contrato 4262 de 2024

V° B°:

OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO
Supervisor del contrato interventoría 4262 de 2024

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 283 DE 2024.

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	283 de enero 2024
CONTRATISTA	Diego Fernando Borda Cruz.
CC.	1.099.207.738 de Barbosa Santander.
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO COORDINADOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INTERVENTORIA, INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO*	$ 25.744.000
PLAZO DE EJECUCIÓN**	Del 28 de enero al 31 de marzo de 2025.
PRORROGA	N.A.
LUGAR DE EJECUCIÓN	TUNJA.
ORDENADOR DEL GASTO	Carlos Mauricio Moreno Téllez, Vicerrector de Investigaciones y Extensión
SUPERVISOR	Oscar Javier Gutiérrez Junco Supervisor del contrato No.4262 de 2024.
DEPENDENCIA	Contrato Interadministrativo No 4262 de 2024, UPTC - INVIAS.
ACTIVIDAD	Coordinador de estudios y diseños.
PERIODO DEL INFORME	Del 1 al 28 de febrero 2025.
NUMERO DEL PAGO	2 DE 3
VALOR DEL PAGO	$ 12.067.500

INTRODUCCIÓN.

La Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4227 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA Para la realización de la interventoría del contrato anteriormente mencionado, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4262 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

A continuación, se describen las actividades desarrolladas del 1 al 28 de febrero 2025.

1. Se realizo reuniones de seguimiento con el equipo de la consultoría Universidad Tecnológica de Chocó, gestor técnico del proyecto por parte de INVIAS y el supervisor del contrato de interventoría por parte de la dirección territorial de Chocó.

2. Se realizo el trámite ante el INVIAS, acta de costos de interventoría y consultoría correspondiente al mes de febrero de 2025.

3. Se realizo informes de seguimiento ante la sub dirección de Planificación de Infraestructura INVIAS.

4. Se continuo con el seguimiento del trámite de solicitud de anticipos de los contratos interadministrativos de consultoría e Interventoría No 4227 y 4262 de 2024.

5. Se continua con la revisión de los estudios y diseños fase II del contrato 1666 de 2015, insumo inicial para el desarrollo de los estudios del contrato No 4227 de 2024.

6. Se represento a la UPTC ante el INVIAS para adelantar los trámites internos administrativos que sean necesarios para la consecución del objeto del Contrato Interadministrativo No 4262 de 2024.

7. Se hizo seguimiento a los procesos administrativos, técnicos acordes del seguimiento a las actividades realizadas por el consultor.

8. Se realizo el apoyo en el desarrollo del Contrato interadministrativo, de la Interventoría, igualmente deberá tramitar adecuadamente correspondencia, utilizando los formatos y procedimientos establecidos y cumplir con las disposiciones que apliquen a sus actividades contenidas en el manual de interventoría de Invias vigente, resoluciones y decretos que se relacionen con el ejercicio de esta.

9. Se vigilo el avance de los profesionales contratados por la UPTC para el buen funcionamiento y cumplimiento en los cronogramas establecidos.

10. Se programo reuniones internas y externas con las entidades involucradas en el proceso de los estudios y diseños de la conexión Conexión Curundo – San José Del Palmar – Crucero El Cairo En Los Departamentos Del Choco Y Valle Del Cauca.

ESTADO DEL PROYECTO:

A continuación, se presenta la trazabilidad de tramites durante la ejecución de la consultoría contrato de consultoría No 4227 de 2024 ejecutado por la Universidad Tecnológica Diego Luis Córdoba.

- Tanto el contrato interadministrativo de consultoría como de interventoría, por directriz del INVIAS se ordenó orden de inicio el pasado 02 de diciembre de 2024.

- El Instituto Nacional de Vías INVIAS suscribió minutas de prórroga para los dos contratos interadministrativo de consultoría como de interventoría, con nuevo plazo comprendido desde el 31 de diciembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025 sin adición de valor.

- Se radico ante el INVIAS la factura No 1 por un valor de $96.222.000,00 correspondiente al acta No 1 de costos de consultoría contrato interadministrativo No 4227 de 2024 diciembre 2024.

- Se remitió al INVIAS el acta No 2 por un valor de $96.222.000,00 correspondiente al acta No 2 de costos de consultoría contrato interadministrativo No 4227 de enero 2025 aprobada por la interventoría.

- Se remitió al INVIAS el acta No 3 por un valor de $185.122.000,00 correspondiente al acta No 2 de costos de consultoría contrato interadministrativo No 4227 de febrero 2025 aprobada por la interventoría.

- El 09 de diciembre de 2024 se realizó la aprobación y registro de la cuenta del anticipo por parte de INVIAS, el anticipo a entregar por parte del INVIAS para el contrato interadministrativo de consultoría No 4227 de 2024, tiene un valor de $4.350.000.000.

- El 09 de diciembre de 2024 se realizó la aprobación y registro de la cuenta del anticipo por parte de INVIAS, el anticipo a entregar por parte del INVIAS para el contrato interadministrativo de interventoría No 4262 de 2024, tiene un valor de $1.187.500.000.

Actas de costos de interventoría tramitadas ante el Instituto Nacional de Vías:

1. Valor acta de costos de interventoría del mes de diciembre 2024 correspondiente al periodo del 02 al 31 de diciembre fue de $45.222.400,00 esta acta fue facturada y radicada en el INVIAS.

2. Valor acta de costos de interventoría del mes de enero 2025 correspondiente al periodo del 28 al 31 de enero 2025 fue de $6.159.800,00 esta acta se remitió al INVIAS territorial Chocó, nos encontramos a la espera de su revisión y visto bueno para seguir con dicho trámite en planta central INVIAS Bogotá.

3. Valor acta de costos de interventoría del mes de febrero 2025 correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero 2025 fue de $84.109.000,00 esta acta se encuentra en conciliación y envío.

Total ejecutado acumulado a 28 de febrero de 2025 actas de costos de interventoría: **$ 135.491.200,00**

Valor acumulado actas a corte de 28 de febrero de 2025 es de: $ 135.491.200,00.
Valor anticipo acumulado amortizado a febrero de 2025 (50%): $ 67.745.600,00.

Nota: Los contratos de consultoría e interventoría actualmente siguen en estado activo.

INVERSIÓN:

- Recursos comprometidos Consultoría $ 8,700,000,000.00
- Recursos comprometidos en Interventoría: $ 2,375,000,000.00
- **Inversión Total del Proyecto: $ 11,075,000,000.00**

NECESIDADES DEL PROYECTO:

- Actualmente se encuentra en estado de pago por parte de INVIAS del acta de costos del mes de diciembre de 2024.

BENEFICIOS:

- Estudios y diseños para la conexión del corredor Curundo – San José del Palmar – Cruce el Cairo que beneficia comunidades indígenas y comunidades afro dándoles la posibilidad de conectar el departamento del Choco con el departamento del valle del Cauca.
- Con la ejecución de este proyecto en etapa definitiva se busca que se implemente una vía para conectar a los departamentos de Chocó y Valle del Cauca.
- El proyecto dará en su ejecución la oportunidad de explorar otras fuentes de ingreso ya que pueden comercializar los productos que se desarrollan en la región.
- Se aumentará el turismo como nueva fuente de ingresos a las comunidades
- Disminución de tiempos y costos de viaje
- Accesibilidad a centros de salud para adultos mayores y mujeres gestantes

GESTIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS:

- Se han realizado comités de seguimiento con la Universidad Tecnología del Choco UTCH, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC y el Instituto Nacional de Vías INVIAS para socializar el estado de avance de la consultoría, resolver inquietudes y gestionar actividades en beneficio del desarrollo de los estudios y diseños.

- Para el correcto ejercicio de la Interventoría objeto del Contrato interadministrativo, se han impartido instrucciones a todo el personal del equipo de interventoría para que apliquen estrictamente el Manual de Interventoría Versión 2022 del Invías, las especificaciones técnicas vigentes del Invías y todo lo pactado en el Contrato Interadministrativo.

- Se ha exigido tanto al director de Interventoría la presentación oportuna de los informes semanales al Gestor del Proyecto de Invías tanto de la Territorial Choco como de la Subdirección de Planificación de Infraestructura.

- Se ha exigido tanto al director de Interventoría la presentación oportuna de los informes mensuales con la información actualizada, la cual es complementada por los especialistas.

- Se ha dado respuesta a la correspondencia interna y externa.

- La Consultoría ejercida por la Universidad Tecnológica de Choco Diego Luis Córdoba, está realizando los trabajos logísticos para el desarrollo con las comunidades territoriales para desarrollar las socializaciones.

- Durante el mes de febrero de 2025 la interventoría ha adelantado tareas de revisión de las metodologías presentadas por el equipo consultor.

- Se participo de manera constante en todas las reuniones de seguimiento semanal con el consultor y el equipo de la sub dirección de planificación de infraestructura INVIAS.

- Se realizo reunión de manera presencial en las instalaciones de la sub dirección de planificación de infraestructura INVIAS Bogotá, con el acompañamientos de los ingenieros Sirley Dabeiba

Merchán Carreño “Sub directora de Planificación de Infraestructura INVIAS”, Yenny Xiomara Hernández “Gestora del proyecto INVIAS”, Jannier Salas “Supervisor contrato de interventoría territorial INVIAS Chocó”, Estella Rentería “directora de consultoría UTCH, German Eduardo Peña “Gerente contrato de interventoría UPTC”, José Octavio Niño “Director de interventoría UPTC y Diego Fernando Borda Cruz “Coordinador de estudios y diseños de interventoría UPTC”, realizando seguimiento al desarrollo del contrato de consultoría y temas financieros relevantes como el estado del proceso de desembolso del anticipo para las universidades, del cual depende el inicio de los trabajos en campo.

- Se concilio el acta de costos correspondientes al mes de febrero de 2025 de los contratos de consultoría e interventoría.

ENTREGABLES:

1. Copia de los informes de supervisión de contratistas de la UPTC que prestan sus servicios al contrato interadministrativo No 4262 de 2024.
2. Informe de estado de las Actas de Costos mensuales de Interventoría.
3. Copia de la presentación del estado de avance del Contrato interadministrativo No 4262 de 2024.
4. Apoyar la respuesta a los requerimientos que el INVIAS y la Universidad realicen sobre la ejecución del Contrato y dar trámite a los mismos de manera oportuna y eficiente, resumen de la correspondencia del mes que llegue al Contrato interadministrativo No 4262 de 2024.
5. Copia de registro fotográfico de las reuniones a las que asista.
6. Informe del área pertinente de acuerdo a la revisión a realizar por parte de los profesionales especialistas y administrativos a los estudios y diseños entregados por la Universidad Tecnológica del Choco.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025.



FOTO 1. Asistencia a reunión presencial INVIAS Bogotá 12 de febrero de 2025.

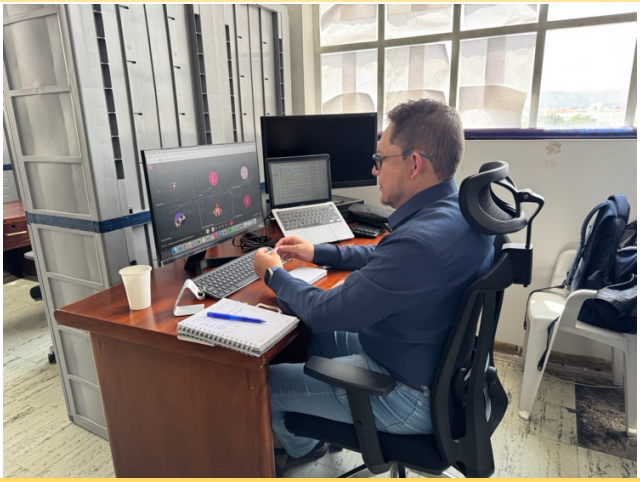


FOTO 2. Asistencia a comités de seguimiento, revisión al plan de ejecución BIM desarrollado por la consultoría.



Foto3. Revisión documentación con la Gerencia del contrato de interventoría.

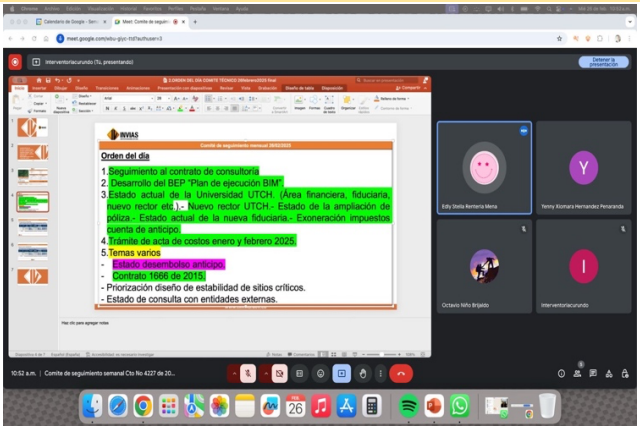


Foto 4. Asistencia y seguimiento de actividades del consultor UTCH mediante reunión virtual.

PRESENTADO POR:

DIEGO FERNANDO BORDA CRUZ
CC. 1.099.207.738
Coordinador de estudios y diseños.
Contratista

Vo. Bo:

OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO
Supervisor del contrato

Vo. Bo:

JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de Interventoría.

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 285 de 2025

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	285 DEL 28 DE ENERO DE 2025
CONTRATISTA	DENIS YINETH PINO MARIÑO
CC.	1.049.629.730 de Tunja.
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESIDENTE DE ESTUDIOS DE INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO-SAN JOSE DEL PALMAR-CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO	$18.720.000
ADICIÓN No 01	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN**	28 de enero al 31 de marzo de 2025
PRORROGA No 01	N/A
LUGAR DE EJECUCIÓN	Tunja.
ORDENADOR DEL GASTO	Carlos Mauricio Moreno Téllez, Vicerrector de Investigación y Extensión.
SUPERVISOR	Oscar Javier Gutiérrez Junco, Supervisor del Contrato
DEPENDENCIA	Contrato Interadministrativo N.º 4262 DE 2024, UPTC - INVIAS.
ACTIVIDAD	RESIDENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
PERIODO DEL INFORME	01 al 28 de febrero de 2025
NUMERO DEL PAGO	2 DE 3
VALOR DEL PAGO	$8.775.000

INTRODUCCIÓN

la Universidad Tecnológica Del Chocó, Diego Luis Córdoba, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4227 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: Estudios y Diseños a nivel de fase III (DEFINITIVOS) de la conexión Curundo-San José del Palmar – Cruce El Cairo en los departamentos del Chocó y Valle del Cauca. Para la realización de la interventoría del contrato anteriormente mencionado, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4262 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo

objeto es: INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO-SAN JOSE DEL PALMAR- CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

En el presente informe se describen las actividades realizadas como Residente de estudios y diseños en el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Elaboración y actualización de archivo de correspondencia enviada y recibida
- Revisión informes semanales de la consultoría contrato 4227 de 2024
- Seguimiento a programación de consultoría
- Elaboración Acta de costos del mes de febrero de 2025
- Elaboración de informes semanales
- Asistencia a pre comité el día 06 de febrero de 2025 consultoría e interventoría
- Asistencia pre comité el día 11 de febrero de 2025 con la consultoría para hacer seguimiento a los compromisos
- Asistencia a reunión virtual del 12 de febrero de 2025 con el gestor técnico del contrato para revisar el avance de los contratos de interventoría y consultoría.
- Asistencia a reunión virtual el 26 de febrero de 2025 con el fin de hacer seguimiento al contrato de consultoría e interventoría
- Revisión informes mensuales del personal de la interventoría
- Verificación del pago de seguridad social del personal de interventoría
- Mesas de trabajo virtuales con la residente de estudios de la consultoría

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

TIPO DE CONTRATO:	CONSULTORÍA
CONTRATO No. Y FECHA:	4227 de 2024
CONSULTOR:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA
VALOR INICIAL:	$8.700.000.000
PLAZO TOTAL CONTRATO:	1 mes.
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA Y PEDAGOGICA DE COLOMBIA

	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4262 DE 2024
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	891800330-1
SUPERVISOR:	ING. JANNIER SALAS QUEJADA Resolución de designación No. 4854 de fecha 15 de octubre de 2024
FECHA DE INICIO:	02 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA No 01	12 MESES HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4262 DE 2024**
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA
INTERVENTORIA ENTIDAD CONTRATANTE	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC NIT. 891800330 – 1 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT. 800215807 -2
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.375.000.000
FECHA DE INICIO	02 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA No 1	12 MESES HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025

El contrato se firma el 11/06/2024, con fecha de inicio el día 02/12/2024 y fecha de terminación 31/12/2024. Posteriormente entre las partes se firma prorroga No.1

presentado fecha de terminación hasta el 31/12/2025. Actualmente, el Consultor manifiesta que la fiducia para el manejo de las cuentas conjuntas de actas y anticipo renuncio y que se encuentra en un nuevo proceso con el Banco Agrario para solucionar este impase.

1. TRABAJOS DE CAMPO:

El consultor tiene dentro de su reprogramación según plan de contingencia las siguientes actividades en campo, sin embargo, el consultor aclara que estas actividades están sujetas al desembolso del anticipo.

Actividad	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Levantamiento topográfico y materialización del eje	03 de junio de 2025	06 de julio de 2025
Levantamiento topográfico detallado	03de marzo de 2025	06 de julio de 2025
Georeferenciación	02 de junio de 2025	06 de julio de 2025
Plan de exploración geotécnico	24 de marzo de 2025	02 de junio de 2025
Toma de información de tránsito	03 de marzo de 2025	05 de mayo de 2025
Gestiones ambientales, sociales, arqueológicas, prediales y de sostenibilidad.	03 de marzo de 2025	27 de octubre de 2025

2. ENTREGABLES

METODOLOGÍAS

El consultor entrego las siguientes metodologías

1- METODOLOGÍA VOLUMEN I. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS
2- METODOLOGÍA VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO
3- METODOLOGÍA VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO
4- METODOLOGÍA VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL
5- METODOLOGÍA VOLUMEN VII ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICO ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES
6- METODOLOGÍA VOLUMEN VIII ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS
7- METODOLOGÍA VOLUMEN IX. ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN

8- METODOLOGÍA VOLUMEN XI. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS
9- METODOLOGÍA VOLUMEN XV. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES
10- METODOLOGÍA VOLUMEN XVIII. VOLUMEN TECNICO BIM

3. ACTUACIONES CONSULTOR E INTERVENTOR

Componente BIM

- Se envían nuevamente observaciones del plan de ejecución BIM - BEP a la consultoría para su ajuste respectivo.

Componente Técnico

- El consultor envía plan de contingencia

Componente administrativo

La consultoría informa que cambiaran los números de cuenta de actas y de anticipo del contrato 4227 de 2025 y que se encuentra haciendo las gestiones para la legalización del contrato con la nueva fiducia con el banco agrario.

4. AVANCE FINANCIERO

A continuación, se presenta el avance financiero programado y ejecutado del contrato de consultoría

Avance financiero contrato 4227 de 2024

% Programado	**3.93%**
% Ejecutado	4.34%

Así mismo se relaciona el valor de cada acta de costos tramitada por la consultoría al INVIAS el valor del anticipo amortizado y su saldo

CONTRATO 4227 DE 2024 - ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA						
Acta No	**PERIODO**	**VALOR BASICO**	**VALOR TOTAL ACTA**	**ANTICIPO AMORTIZADO**	**VALOR REAL AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**	**SALDO ANTICIPO**
ANTICIPO			$	4.350.000.000,00		
1	dic-24	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 48.111.000,00	$ 48.111.000,00	$ 4.301.889.000,00
2	ene-25	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 48.111.000,00	$ 48.111.000,00	$ 4.253.778.000,00
3	feb-25	$ 185.122.000,00	$ 185.122.000,00	$ 92.561.000,00	$ 92.561.000,00	$ 4.161.217.000,00
TOTALES		**$ 377.566.000,00**	**$ 377.566.000,00**	**$ 188.783.000,00**	**$ 188.783.000,00**	**$ 4.161.217.000,00**

A continuación, se relaciona el valor de las actas de interventoría tramitadas ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS en donde se expone además la amortización por acta y el saldo a amortizar

CONTRATO 2442 DE 2024 - INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA						
Acta No	**PERIODO**	**VALOR BASICO**	**VALOR TOTAL ACTA**	**ANTICIPO AMORTIZADO**	**VALOR REAL AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**	**SALDO ANTICIPO**
ANTICIPO			$	1.187.500.000,00		
1	dic-24	$ 45.222.400,00	$ 45.222.400,00	$ 22.611.200,00	$ 22.611.200,00	$ 1.164.888.800,00
2	ene-25	$ 6.159.800,00	$ 6.159.800,00	$ 3.079.900,00	$ 3.079.900,00	$ 1.161.808.900,00
3	feb-25	$ 84.109.000,00	$ 84.109.000,00	$ 42.054.500,00	$ 42.054.500,00	$ 1.119.754.400,00
TOTALES		**$ 135.491.200,00**	**$ 135.491.200,00**	**$ 67.745.600,00**	**$ 67.745.600,00**	**$ 1.119.754.400,00**

ENTREGABLES:

- Relación correspondencia enviada y recibida
- Acta de costos del mes de febrero de 2025 con sus soportes
- Actas de reunión
- Informes semanales
- Oficios de seguimiento de programación a la consultoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

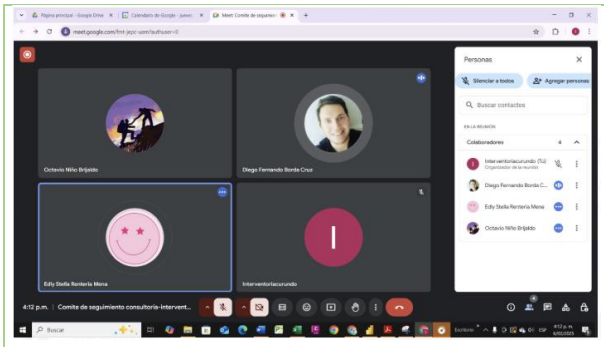


Foto 1: Comité consultoría e interventoría 06/02/2025

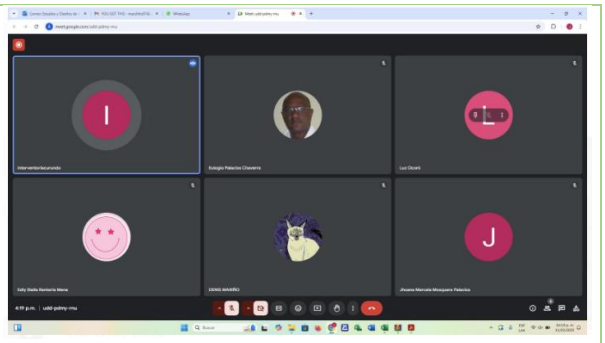


Foto 2 Comité consultoría e Interventoría 11/02/2025

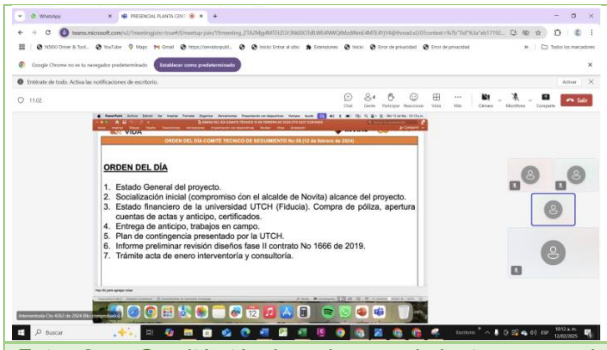


Foto 3: Comité técnico de seguimiento mensual Consultoría, Interventoría e INVIAS 12/02/2025

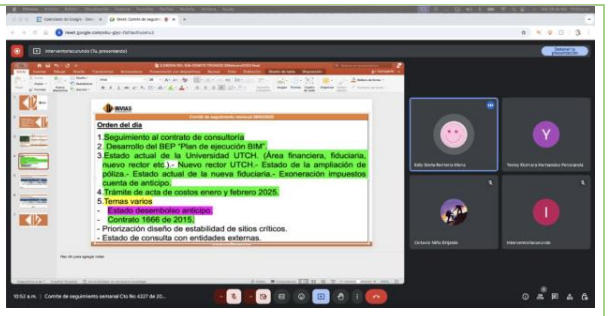


Foto 4 Comité técnico de seguimiento mensual Consultoría, Interventoría e INVIAS 26/02/2025

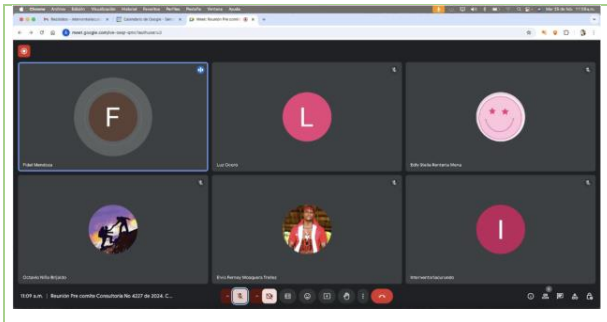


Foto 5: Mesa de trabajo interventoría y consultoría Plan de ejecución BIM (BEP) 25/02/2025



Foto 6 Mesa de trabajo Interventoría

PRESENTADO POR:

DENIS YINETH PINO MARIÑO
Residente de estudios y diseños
Contratista

Vo. Bo:

JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDDO
Director Contrato N.º 4262 de 2024
Interventoría UPTC

OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO
Supervisor del contrato
UPTC

PLAN ANUAL DE CAJA
PAC

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4262 DE 2024
INTERVENTOR UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

PROYECTO INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA
SECTOR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4262 DE 2024 INTERVENTORIA UPTC

CONTRATO		SUB TOTAL COSTOS BASICOS	PROVISIÓN PARA AJUSTES	SUB TOTAL COSTOS BASICOS	VALOR CONTRATO	VIGENCIA 2024	VIGENCIA 2025	VIGENCIA 2026	TOTAL VIGENCIAS
CONTRATO No 4262 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	2.375.000.000,00	-	2.375.000.000,00	$ 2.375.000.000	2.375.000.000,00			2.375.000.000,00
TOTAL		**$ 2.375.000.000**	**$ -**	**$ 2.375.000.000**	**$ 2.375.000.000**	**$ 2.375.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.375.000.000**

PLAN ANUAL DE CAJA (PAC) AÑO 2025

PPTO VIGENTE	TOTAL RECURSOS	COMPONENTE DEL PAGO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR TOTAL EJECUTADO febrero 2025	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	SALDO RECURSOS 2024
2.024	2.375.000.000,00	GRUPO 1 A GRUPO 3	93.343.133,33	93.343.133,33	234.443.133,33	93.343.133,33	280.303.133,33	190.943.133,33	93.343.133,33	202.343.133,33	491.543.133,33	122.543.133,33	340.943.133,33	93.343.133,33	84.109.000,00	135.491.200,00	2.239.508.800,00
TOTAL		VALOR TOTAL	93.343.133,33	93.343.133,33	234.443.133,33	93.343.133,33	280.303.133,33	190.943.133,33	93.343.133,33	202.343.133,33	491.543.133,33	122.543.133,33	340.943.133,33	93.343.133,33	84.109.000,00	135.491.200,00	2.239.508.800,00

MEPI-MN1-IN-15-FR-7
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74322702		NIÑO BRIJALDO JOSE OCTAVIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CORINTO SECTOR MONTESILLO	PAIPA-BOYACA	7852521	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1000000656	9482969190	I	2025/03/04	2025/03/11	BANCO DE BOGOTA	7	$1,525,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION														SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 3.780.000	No		COLPENSIONES	30	$ 5.330.000	16%	SIN RIESGO	$ 852.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 852.800		SANITAS	30	$ 5.330.000	12,5%	$ 666.300	$
																					$ 852.800						$ 666.300	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 666.300			0	$ 0	0%	$ 0		0	$ 0	0%	1	$ 0	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 666.300						$ 0						$ 0				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74322702		NIÑO BRIJALDO JOSE OCTAVIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CORINTO SECTOR MONTESILLO	PAIPA-BOYACA	7852521	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1000000656	9482969190	I	2025/03/04	2025/03/11	BANCO DE BOGOTA	7	$1,525,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$852,800	$3,800	$0	$856,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$852,800	$3,800	$0	$856,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$666,300	$3,000	$0	$669,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$666,300	$3,000	$0	$669,300
TOTAL				**1**	**$1,519,100**	**$6,800**	**$0**	**$1,525,900**

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO** identificado con **CC** No. **74322702**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - NI. 891800330	**Fecha de inicio de cobertura:** 03/03/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 28/01/2025 **Fecha fin de Contrato:** 27/04/2025 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202501013286512.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 10 días del mes de marzo de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_09
MIS_4_1_3_FR15 v_010

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1099207738		BORDA CRUZ DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 3a # 3a - 09	TUNJA-BOYACA	7442112	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1330232410	9483063663	I	2025/03/11	2025/03/12	BANCOLOMBIA	1	$1,376,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1099207738	BORDA CRUZ DIEGO FERNANDO	230301	30	$4,827,000	$772,400	EPS005	30	$4,827,000	$603,400		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$4,827,000	$772,400			$4,827,000	$603,400			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$772,400	$500	$0	$772,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$772,400	$500	$0	$772,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$603,400	$400	$0	$603,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$603,400	$400	$0	$603,800
TOTAL				**1**	**$1,375,800**	**$900**	**$0**	**$1,376,700**

2025/03/11 08:59 PM

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **DIEGO FERNANDO BORDA CRUZ** identificado con **CC** No. **1099207738**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - NI. 891800330	**Fecha de inicio de cobertura:** 28/01/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 28/01/2025 **Fecha fin de Contrato:** 27/04/2025 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202501012557199.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 15 días del mes de febrero de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_09
MIS_4_1_3_FR15 v_010

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049629730		PINO MARIÑO DENIS YINETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV NORTE No 78-32	TUNJA-BOYACA	7400123	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1278604494	9481825247	I	2025/03/10	2025/02/19	BANCOLOMBIA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049629730	PINO DENIS																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0		$413,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049629730		PINO MARIÑO DENIS YINETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV NORTE No 78-32	TUNJA-BOYACA	7400123	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1278604494	9481825247	I	2025/03/10	2025/02/19	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

2025/03/12 04:16 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049629730		PINO MARIÑO DENIS YINETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV NORTE No 78-32	TUNJA-BOYACA	7400123	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1312539342	9482739709	N	2025/03/10	2025/03/05	BANCOLOMBIA	0	$605,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049629730	PINO DENIS								A				▫						231001	30	($1,423,500)	($227,800)	EPS037	30	($1,423,500)	($178,000)		0	$0	$0	14-23	30	($1,423,500)	($7,500)	0	$0	$0	No	($413,300)
2	CC	1049629730	PINO DENIS								C	X									231001	30	$3,510,000	$561,600	EPS037	30	$3,510,000	$438,800		0	$0	$0	14-23	30	$3,510,000	$18,400	0	$0	$0	No	$1,018,800
Total	**Afiliados(1)**																						$2,086,500	$333,800			$2,086,500	$260,800			$0	$0			$2,086,500	$10,900		$0	$0		$605,500

2025/03/12 04:17 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049629730		PINO MARIÑO DENIS YINETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV NORTE No 78-32	TUNJA-BOYACA	7400123	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1312539342	9482739709	N	2025/03/10	2025/03/05	BANCOLOMBIA	0	$605,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$333,800	$0	$0	$333,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$333,800	$0	$0	$333,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,900	$0	$0	$10,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,900	$0	$0	$10,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$260,800	$0	$0	$260,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$260,800	$0	$0	$260,800
TOTAL				1	$605,500	$0	$0	$605,500

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **DENIS YINETH PINO MARINO** identificado con **CC** No. **1049629730**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - NI. 891800330	**Fecha de inicio de cobertura:** 28/01/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 28/01/2025 **Fecha fin de Contrato:** 27/04/2025 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal **www.positivaenlinea.gov.co**, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202501012557212.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 15 días del mes de febrero de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_09
MIS_4_1_3_FR15 v_010

MEPI-MN1-IN-15-FR-9
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 28-feb-25 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 DE 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2025. **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CORREDOR SOSTENIBLE ÁNIMAS - NUQUÍ EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 4227 DE 2024. **CONSULTOR :** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1124024	C-2402-0600-16-51102A-2402006-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA SECUNDARIA MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-MEDELLÍN (CHOCO), VÍA E	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 2.300.000.000	$ -
		C-2402-0600-16-51102A-2402041-02 DQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: CARTAGO NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 75.000.000	
		TOTAL				**$ 2.375.000.000**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2.375.000.000

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 1.187.500.000,00	RP Nº 1124024 DE 14 11 2024	$ 1.112.500.000,00			RP Nº 1124024 DE 14 11 2024 $ 2.300.000.000
								RP Nº 1124024 DE 14 11 2024	$ 1.187.500.000,00			RP Nº 1124024 DE 14 11 2024 $ 2.300.000.000
1	**DICIEMBRE 2024.**	$ 45.222.400,00	$ -	$ 45.222.400,00	$ 22.611.200,00	$ 22.611.200,00	$ 1.164.888.800,00	RP Nº 1124024 DE 14 11 2024	$ 1.164.888.800,00	$ 2.329.777.600,00		RP Nº 1124024 DE 14 11 2024 $ 2.300.000.000
2	**ENERO DE 2025.**	$ 6.159.800,00		$ 51.382.200,00	$ 3.079.900,00	$ 3.079.900,00	$ 1.161.808.900,00	RP Nº 1124024 DE 14 11 2024	$ 1.161.808.900,00	$ 2.323.617.800,00		RP Nº 1124024 DE 14 11 2024 $ 2.300.000.000
3	**FEBRERO 2025.**	$ 84.109.000,00		$ 135.491.200,00	$ 42.054.500,00	$ 42.054.500,00	$ 1.119.754.400,00	RP Nº 1124024 DE 14 11 2024	$ 1.119.754.400,00	$ 2.239.508.800,00		RP Nº 1124024 DE 14 11 2024 $ 2.300.000.000
						$ -						
TOTALES		**$ 135.491.200,00**	**$ -**	**$ 135.491.200,00**	**$ 67.745.600,00**	**$ 67.745.600,00**	**$ 1.119.754.400,00**		**$ 1.119.754.400,00**	**$ 2.239.508.800,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA Nº 1 DICIEMBRE DE 2024	$ 45.222.400,00	$ -	$ 45.222.400,00
ACTA Nº 2 ENERO DE 2025	$ 6.159.800,00	$ -	$ 6.159.800,00
ACTA Nº3 FEBRERO DE 2025	$ 84.109.000,00	$ -	$ 84.109.000,00
VALOR TOTAL			$ 135.491.200,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JOSÉ OCTAVIO NIÑO BRUALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Firma
Nombre: CANNIER SALAS QUEZADA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-181087 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-15-FR-13
SEGUIMIENTO GARANTÍAS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31-ene-25 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 DE 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

FECHA DE INICIO: 2/12/2024

PLAZO INICIAL: 1 MES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.375.000.000,00

VALOR ACUMULADO: $ 2.375.000.000,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 237.500.000,00	12	11	2024	1	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.187.500.000,00	12	11	2024	1	7	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 475.000.000,00	12	11	2024	31	12	2027
Calidad del servicio	30%	$ 712.500.000,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 83183

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 22/11/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 237.500.000,00	2	12	2024	1	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.187.500.000,00	2	12	2024	1	7	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 475.000.000,00	2	12	2024	31	12	2027
Calidad del servicio	30%	$ 712.500.000,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 83183

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 4/12/2024

OBSERVACIONES:

Anexo 2: Por orden de inicio del INVIAS de fecha 02 de diciembre de 2024.

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 237.500.000,00	12	11	2024	1	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.187.500.000,00	12	11	2024	1	7	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 475.000.000,00	12	11	2024	31	12	2028
Calidad del servicio	30%	$ 712.500.000,00	31	12	2025	31	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 83183

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

Anexo 3: Por Prorroga No 01 de 12 meses hasta el 31 de diciembre de 2025, se prorroga la vigencia de la poliza, los demas terminos y condiciones no modificados continuan vigentes

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Firma
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-181087 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-3-FR-1
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 02/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

DATOS GENERALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4262 DE 2024 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA

JUSTIFICACIÓN:
Del Registro Presupuestal No. 1124024 de fecha 2024-11-14 Valor $2.375.000.000
para un valor total de anticipo de $ 1.187.500.000,00 equivalente al 50% como se estipula en la cláusula septima "Forma de pago" del contrato interadminsitrativo No 4262 de 2024.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2		VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Pago de salarios personal de interventoría	$ 1.013.900.000,00				$ 1.013.900.000,00	85,38%
2	Viáticos Director (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	$ 15.000.000,00				$ 15.000.000,00	1,26%
3	Viáticos Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	$ 54.000.000,00				$ 54.000.000,00	4,55%
4	Transportes Aéreos Director (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	$ 9.600.000,00				$ 9.600.000,00	0,81%
5	Transportes Aéreos Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	$ 20.800.000,00				$ 20.800.000,00	1,75%
6	Alquiler de Vehìculo (4X4 de 2000 CC o superior, Modelo 2014 o superior, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	$ 66.500.000,00				$ 66.500.000,00	5,60%
7	Campamento (incluye arrendamiento y/o alquiler, dotación y servicios, en el sitio del proyecto)	$ 7.700.000,00				$ 7.700.000,00	0,65%
TOTAL						**$ 1.187.500.000,00**	**100,00%**

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. No aplica para compra ni alquiler de vehículos.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.
4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: Jose Octavio Niño Brijaldo
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Firma:
Nombre: Jannier Salas Quejada
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-181087 ANT

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.
