	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Consultoría No. 4227 DE 2024 **Consultoría:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

Contrato de Interventoría No. 4262 DE 2024 **Interventoría:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Objeto Contrato de Consultoría: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

INFORME MENSUAL No. 8 **MES O PERIODO:** 01 al 31 de julio de 2025

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	x		1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	x		2
1	**INTRODUCCION**				9
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**				10
2.1	Localización				10
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto				10
2.3	Inventario y estado inicial de la vía				11
2.4	Características técnicas del proyecto				11
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**				12
3.1	Información general del contrato				12
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes				12
3.3	Seguimiento Items no previstos				23
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría				23
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORIA**				26
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	x		40
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Consultoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-4		x	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Consultoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	x		62
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Consultoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	x		77
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10		x	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11		x	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	x		79
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Consultoría	MEPI-MN-1IN-15-FR-14		x	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	x		82
		MEPI-MN-IN-3-FR-2		x	
	• Seguimiento Programa de Consultoría		x		84
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	x		91
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	x		93
	• Actas de Comité de Consultoría	MEPI-MN-IN-14-FR-1		x	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	x		95
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**				28
5.1	Información general del contrato				28
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor				28
5.3	Informes especialistas y profesionales		x		100
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC				144
5.5	Informe matriz de riesgos.			x	
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Consultoría e Interventoría			x	
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.			x	
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5		x	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	x		146
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	x		167
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	x		169
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15		x	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	x		172
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	x		174
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2		x	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3		x	
7	**Conclusiones y recomendaciones**				32
8	**Anexos**				34
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		x		34
8.2	Registro fotográfico y video del avance de la Consultoría		x		35
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas			x	36
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente			x	

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 4854 de fecha 15 de Octubre de 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MEPI-MN1-IN-15-FR-2
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **PERIODO MES:** JULIO DE 2025

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4227 de 2024
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA
CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

PLAZO INICIAL: 1 MES
FECHA DE INICIO: 02 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO ACUMULADO: 13,13 meses

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 8.700.000.000,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 8.700.000.000,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 4.350.000.000,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 666.309.176,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4262 DE 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JANNIER SALAS QUEJADA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	8.700.000.000,00		8.700.000.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			8.700.000.000,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS	266.818.400,00	0,00	266.818.400,00	266.818.400,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				266.818.400,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 8.700.000.000,00
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 1.332.618.352,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 5
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 5

REGISTRO FOTOGRÁFICO


Visita de campo especialistas de Geotecnia, Hidrología, Hidráulica y Socavación y Geología


Visita de campo especialistas de Geotecnia, Hidrología, Hidráulica y Socavación y Geología


Encuestas de Origen y Destino - Animas del 01 al 08 de julio de 2025


Encuestas de Origen y Destino - Animas del 01 al 08 de julio de 2025


Encuestas de Origen y Destino - Animas del 01 al 08 de julio de 2025


Visita de campo especialistas de Geotecnia, Hidrología, Hidráulica y Socavación y Geología


Visita de campo especialistas de Geotecnia, Hidrología, Hidráulica y Socavación y Geología


Visita de campo especialistas de Geotecnia, Hidrología, Hidráulica y Socavación y Geología

Avance del Proyecto

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No se encuentra en proceso de Multa o Sanción

Firma
Nombre Jose Octavio Niño Brijaldo
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 01193-0243

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME MENSUAL No. 08 DE INTERVENTORÍA.
JULIO DE 2025

INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - UPTC

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 4262 DE 2024 INVIAS – UPTC
JULIO 2025

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. interventoriacurundo@gmail.com

INFORME MENSUAL No. 08 DE INTERVENTORÍA.
JULIO DE 2025

INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
INTERVENTOR

GERMAN EDUARDO PEÑA VASQUEZ
GERENTE DE INTERVENTORÍA

ING. JANNIER SALAS QUEJADA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. interventoriacurundo@gmail.com

DEPENDENCIA	No. DE COPIAS
Copia 1 Instituto Nacional de Vías INVIAS Territorial Choco	1
Copia 2 Instituto Nacional de Vías Planta Central	1
Copia 3 Oficina Coordinación Convenios U.P.T.C. Tunja.	1

Contrato No 4262 de 2024

Título Documento	INFORME MENSUAL	No. 08
Responsable de elaboración	Nombre	Ing. Denis Yineth Pino Mariño
Cargo: Ingeniero Residente de estudios	Firma	
Responsable por revisión	Nombre	Ing. José Octavio Niño Brijaldo
Cargo: Ingeniero director de Interventoría	Firma	
Responsable Aprobación	Nombre	Ing. Germán Eduardo Peña Vásquez.
Gerente de Contrato	Firma	
Fecha:	31 - JULIO DE 2025	

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. INTRODUCCIÓN. 6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 6
2.1. Localización 7
2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto..... 7
2.3. Inventario y estado inicial de la vía..... 8
2.4. Características técnicas del proyecto 8
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA. 9
3.1. Información general del contrato 9
3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 9
3.3. Seguimiento Ítems no previstos. 20
3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 20
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORÍA 23
4.1. Informe semanal 23
4.2 Maquinaria y equipo contrato de consultoría. 23
4.9. Otros documentos seguimiento mensual: 24
- Seguimiento a la inversión del anticipo:..... 24
- Seguimiento programa de consultoría: 24
- Seguimiento Programa de inversiones, ... 24
- Actas de comité de obra:..... 24
- Actas de reunión: 24

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 25
5.1 Información general del contrato. 25
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor. 25
5.3 Informes especialistas y profesionales. 27
5.5 Informe matriz de riesgos..... 27
5.6 Información otros programas y aplicativos. 27
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 27
6.1. Control diario del equipo de la Interventoría. 27
6.2. Control diario del personal de Interventoría. 27
6.4. Revisión y verificación de pago de aportes legales 28
6.5. Seguimiento a las garantías contractuales. 28

6.6. Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría. 28
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 29
8. ANEXOS..... 31
8.1. Relación de la correspondencia generada entre Consultor e Interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo. 31
8.2 Registro fotográfico y video de avance de la consultoría..... 33
8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales, y de sostenibilidad adelantada..... 35
8.4 Copia de bitácora del mes correspondiente 36

LISTADO DE IMAGENES

Pág.

Imagen 1: Localización del proyecto 7

1. INTRODUCCIÓN.

El Gobierno Nacional a través del programa "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA (…)", ha priorizado un conjunto de proyectos de infraestructura vial de carácter regional con impacto en todo el territorio colombiano, dirigidos a mejorar vías secundarias y terciarias, generando conexiones y fortaleciendo la comunicación entre las diversas poblaciones y regiones del país; frente a lo cual se debe adelantar la coordinación interinstitucional entre el Instituto y las entidades regionales para la estructuración de los proyectos que permita la ejecución de los mismos. Entre esos está el proyecto denominado como "**NOVITA-CURUNDO-SAN JOSE DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO**". el INVIAS identificó la necesidad de contratar los: **ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA**

El objetivo de esta fase es materializar en campo el proyecto definitivo y diseñar todos sus componentes de tal manera que se pueda dar inicio a su construcción, para el mejoramiento de la conexión existente Curundó-San José del Palmar – Cruce El Cairo, con el propósito de contar con los estudios necesarios para la continuidad del proyecto, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba (UTCH), suscribieron el Contrato interadministrativo No 4227 de 2024, cuyo objeto es la elaboración de "ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA", conforme a los estudios previos y la propuesta presentada por la Universidad y aprobada por el INVÍAS.

Así mismo el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) suscribió el contrato interadministrativo No 4262 de 2024 con la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA",

Se presenta en este informe las actividades desarrolladas en el mes de julio de 2025 en donde se describe las acciones de la consultoría y de la interventoría.


2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1. Localización

El proyecto se localiza entre los Departamento de Chocó Y Valle del Cauca, el corredor se traza desde el cruce El Cairo – San José del Palmar hasta llegar a Curundo comprende una longitud aproximada de 51 km los cuales se describen a continuación:

Tramo 1 (K54+000 – K70+000) 16 km
Tramo 2 (K70+000 – K88+000) 18 km
Tramo 3 (K88+000 – K105+000) 17 km

Imagen 1: Localización del proyecto

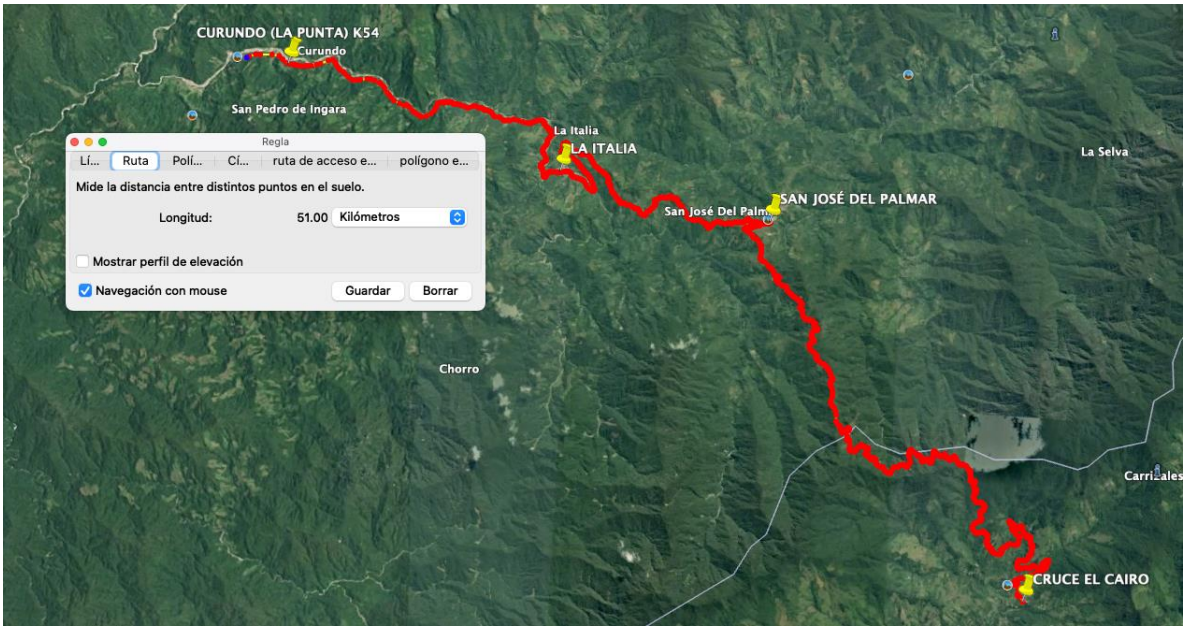

2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

En el ámbito local la zona de influencia directa e inmediata de la obra está relacionada de manera parcial con las cuencas económicas de los municipios de El Cairo y San José del Palmar en el departamento de Chocó y Valle del Cauca.

En el contexto regional la zona de influencia del proyecto abarca el área sur oriental del Departamento de Chocó, permitiendo que el Municipio de San José del Palmar quede integrado a la Capital del Departamento por una conexión directa, dentro de esta conectividad se incluye los municipios de Novita, Condoto, Istmina, Unión Panamericana (Las Ánimas), Cértegui y Quibdó.

Dentro del marco nacional la red vial en la zona de influencia se extiende a los municipios del Occidente desde el Corregimiento de Curundó hasta Cartago.

El municipio de El Cairo en el departamento del Valle del Cauca tiene una extensión total de 283 km², dista 252 km de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.

Según las proyecciones del DANE, para el año 2015 el municipio cuenta con 9.976 habitantes, de los cuales 2.812 (28%) habitan en la cabecera municipal y 7164 (72%) habitan en la zona rural del municipio.

Las actividades económicas de mayor importancia son la agricultura y el comercio. Los principales cultivos son café, plátano, caña, yuca, fríjol, tomate, aguacate, mora, lulo, granadillas y hortalizas. Las actividades comerciales más destacadas en el municipio guardan relación con los productos de origen agrícola.

El Municipio de San José del Palmar actualmente su economía está consolidada principalmente en la Agricultura, y sus productos bandera son el Chontaduro, Borojo y Cacao. El sector maderero ha representado por muchas décadas la economía del municipio, pero en los últimos años se ha recortado esta labor debido a la campaña existente de la preservación y conservación de bosques y cuencas hidrográficas. El 90% de la actividad económica es de subsistencia, con pocos excedentes para comercialización o acumulación.

2.3. Inventario y estado inicial de la vía

No aplica

2.4. Características técnicas del proyecto

Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera, vigilancia, control y verificación de las actividades que se ejecutarán para la vía de conexión CURUNDO – SAN JOSE DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO, EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA. a nivel fase III
Las principales actividades de vigilancia a desarrollar en el proyecto de Interventoría como resultado del presente Convenio Interadministrativo son las siguientes:
Para los tramos 1 a 3 a nivel fase III.

1- Volumen I. Estudios Topográficos
2- Volumen II. Estudio de Tránsito, capacidad y niveles de servicio
3- Volumen III. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico
4- Volumen IV. Estudio de Seguridad Vial
5- Volumen V. Estudio de Geología y Geomorfología local
6- Volumen VI. Estudio de Hidrología de detalle
7- Volumen VII. Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes
8- Volumen VIII. Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones de Puentes y otras estructuras
9- Volumen IX. Estudio de Hidráulica, Hidrología y Socavación
10- Volumen X. Estudio y Diseño de Pavimientos
11- Volumen XI. Estudio y Diseño de Estructuras
12- Volumen XI. Estudio de Urbanismo y Paisajismo

13- Volumen XIII. Estudio de Redes Hidrosanitarias y Secas
14- Volumen XIV. Estudio de Riesgos
15- Volumen XV. Estudio de Cantidades de Obra, Análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones de obra
16- Volumen XVI. Evaluación socioeconómica y financiera del proyecto
17- Volumen XVII. Estudio componentes Ambiental, Social, Predial y Sostenibilidad
18- Volumen XVII. Volumen Técnico BIM (VTB-EIR)
19- Volumen XIX. Informe final ejecutivo

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.

3.1. Información general del contrato.

TIPO DE CONTRATO:	CONSULTORÍA
CONTRATO No. Y FECHA:	**4227 de 2024**
CONSULTOR:	**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA**
OBJETO:	**ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA**
VALOR INICIAL:	**$8.700.000.000**
PLAZO TOTAL CONTRATO:	**1 mes.**
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:	**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA Y PEDAGOGICA DE COLOMBIA** **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4262 DE 2024**
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	**891800330-1**
SUPERVISOR:	**ING. JANNIER SALAS QUEJADA** **Resolución de designación No. 4854 de fecha 15 de octubre de 2024**
FECHA DE INICIO:	**02 DE DICIEMBRE DE 2024**
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	**31 DE DICIEMBRE DE 2024**
PRORROGA No 01	**12 MESES HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025**
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN	**31 DE DICIEMBRE DE 2025**

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes.

La consultoría realizo las siguientes actividades.

A continuación, se detallan las actividades desarrollas por el equipo consultor en el mes de julio:

- ✓ Revisión de información secundaria
- ✓ Apropiación de los estudios y diseños y/o documentación técnica previa

- ✓ Adquisición de cartografía y demás información técnica
- ✓ Gestión administrativa para la entrega mensual de la documentación requerida para la elaboración del acta de costos
- ✓ Reunión de Socialización y apoyo institucional de la Mesa Técnica MEC **– 01 de julio de 2025**, en el marco del proyecto de los estudios y diseños a nivel de fase III (definitivos) de la conexión Curundó - San José Del Palmar - Crucero El Cairo en los departamentos del Chocó y Valle del Cauca

- ✓ **Comité de seguimiento virtual realizado el 03 de julio de 2025, con la participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS:** Durante el espacio se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría

- ✓ **Reunión Técnica del Diseño Geométrico y Topografía – 01 de julio de 2025:** Se llevó a cabo una reunión técnica en la que se abordaron temas relevantes para el desarrollo del proyecto, centrados en aspectos del diseño geométrico y la topografía. Durante la jornada, se discutieron observaciones, preocupaciones y lineamientos técnicos, permitiendo un espacio de análisis y retroalimentación entre los participantes.

- ✓ **Aplicación de encuestas de origen y destino en el corredor Ánimas – Cartago – Ánimas, como parte del estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio:**

  Entre el 01 y el 08 de julio de 2025 se lleva a cabo la aplicación de encuestas de origen y destino en el corredor Ánimas – Cartago – Ánimas, como parte del estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio.

  El 01 de julio, el equipo profesional ingresó al municipio de Unión Panamericana, estableciendo como punto principal de recolección de información la cabecera municipal de Las Ánimas. A partir de esa fecha, inició la implementación de las encuestas, las cuales se están desarrollando

  en el horario comprendido entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m.

  Esta labor permitió avanzar en la consolidación de datos necesarios para el análisis de la movilidad en el área de estudio, aportando información clave para la caracterización de los patrones de viaje, los medios de transporte utilizados y los horarios de mayor demanda.

La actividad finalizó el día 8 de julio de 2025, cumpliendo con los objetivos establecidos en el cronograma de levantamiento de información.

- ✓ **Entre el 01 y el 05 de julio de 2025, se llevó a cabo una visita de campo por parte de los especialistas de la consultoría en los volúmenes de Geotecnia, Hidrología, Hidráulica, Socavación y Geología.** El propósito principal de esta actividad fue realizar una revisión detallada de las condiciones hidráulicas del corredor vial, así como de las afectaciones geológicas y los aspectos relacionados con la estabilidad de taludes.

  Como parte del recorrido, el equipo técnico inspeccionó el trayecto comprendido entre el Cruce del Cairo y el corregimiento de Curundó, en el municipio de Novita.

  Durante esta inspección se realizó una evaluación minuciosa de los puntos críticos identificados a lo largo del corredor, documentando el estado actual de la vía mediante evidencia fotográfica y observaciones técnicas en terreno.

  En el desarrollo de las actividades también se realizó la búsqueda e inspección de nacederos de agua ubicados dentro del área de influencia del proyecto, con el acompañamiento del equipo de hidráulica y de personas de la comunidad conocedoras del territorio. Esta tarea permitió abordar de forma integral aspectos geológicos y geotécnicos, además de caracterizar un total de ocho (8) puntos de agua, en los que se tomaron parámetros fisicoquímicos para determinar la posible presencia de aguas subterráneas.

  De igual forma, durante el recorrido se identificaron nuevos procesos de movimientos en masa que no habían sido evidenciados en visitas anteriores, situación que amerita una atención especial en los estudios técnicos definitivos. En complemento a lo anterior, se llevaron a cabo las siguientes actividades específicas que fortalecen el análisis del entorno:

  1. Identificación de obras de arte existentes.
  2. Localización de cuerpos de agua en el corredor.
  3. Reconocimiento de escorrentías y aguas de filtración presentes en el área de estudio.

  Estas acciones permiten avanzar en la caracterización integral del corredor, insumo fundamental para el desarrollo de los estudios y diseños a nivel de fase III, garantizando que las soluciones propuestas respondan de manera efectiva a las condiciones reales del territorio.

E**laboración y envío de invitaciones a las entidades para la socialización del proyecto, programada de manera presencial el 16 de julio de 2025 en la Universidad Tecnológica del Chocó:** Se realizó la elaboración y envío de invitaciones oficiales a las entidades gubernamentales y privadas con el fin de convocarlas a la socialización presencial del proyecto. Esta actividad tiene como objetivo informar, presentar avances y recibir aportes que contribuyan al desarrollo exitoso del proyecto, y se llevará a cabo el 16 de julio de 2025 en la Universidad Tecnológica del Chocó.

- ✓ **Reunión Técnica del Diseño Geométrico y Topografía – 07 de julio de 2025:** Se llevó a cabo una reunión técnica centrada en aspectos fundamentales del diseño geométrico y la topografía del proyecto. Durante este encuentro, el equipo técnico realizó un análisis integral de los avances y evaluó las condiciones del terreno para asegurar la adecuada planificación y desarrollo del proyecto.

  Se abordaron aspectos relacionados con la adecuación del diseño a las características geográficas y geométricas del área de intervención, así como la aplicación de criterios técnicos para garantizar la precisión y calidad en los levantamientos topográficos. La reunión también permitió identificar y establecer lineamientos generales para la implementación del diseño, con énfasis en la optimización de recursos y la mitigación de posibles riesgos asociados a las condiciones del terreno.

  Este espacio técnico fue fundamental para fortalecer la coordinación y el enfoque multidisciplinario requerido en las etapas de diseño y planificación del proyecto, asegurando el cumplimiento de las normativas y estándares aplicables.
- ✓ **Revisión y análisis de requerimientos técnicos para el levantamiento de la información del componente ambiental 07 – julio de 2025.** Durante la reunión se llevó a cabo la revisión exhaustiva y el análisis detallado de los requerimientos técnicos para el levantamiento sistemático de la información del componente ambiental, asegurando la adecuación metodológica y el cumplimiento de normativas vigentes. Se destacó la importancia de obtener datos precisos, fiables y representativos que respalden la evaluación ambiental del proyecto.
- ✓ **Comité de seguimiento virtual realizado el 10 de julio de 2025, con la participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS:** Durante el espacio se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría
- ✓ **Reunión Técnica del Diseño Geométrico con Geotecnia – 11 de julio de 2025:** Se realizó una sesión técnica conjunta entre los equipos de Diseño Geométrico y Geotecnia para coordinar aspectos críticos del proyecto. Durante el encuentro se evaluaron las características geotécnicas del terreno,

enfocándose en suelos y formaciones rocosas que impactan la estabilidad y seguridad del diseño.

Se analizaron parámetros clave para la adecuación del diseño geométrico, identificando la necesidad de ajustes en alineamientos y perfiles para asegurar la conformidad con los estándares técnicos y normativos. También

Se definieron las tareas pendientes relacionadas con la recolección de datos adicionales y se establecieron mecanismos de seguimiento conjunto para garantizar el cumplimiento de los objetivos.

- ✓ **Reunión Técnica del Volumen Topográfico – 12 de julio de 2025:** Se llevó a cabo una reunión técnica sobre diseño geométrico y topografía, en la cual se identificó como principal dificultad la falta de información topográfica, situación que ha impactado negativamente el desarrollo de la fase 3 del proyecto. Ante esto, se acordó priorizar la recolección de dicha información y se recomendó a los profesionales realizar una revisión minuciosa de los insumos disponibles, con el fin de precisar el estado actual de la documentación. Asimismo, se ajustó el formato del informe técnico para alinearlo con los estándares exigidos por la consultoría e interventoría. Durante la sesión también se abordaron posibles ajustes al cronograma y presupuesto, incluyendo la eventual modificación del contrato inicial, y se acordó avanzar en los análisis técnicos y jurídicos correspondientes.
- ✓ **Entrega del informe preliminar del volumen de Estudio de geología y geomorfología local:** Esta entrega tiene como propósito presentar los primeros resultados del análisis geológico, con base en la recopilación de información secundaria, trabajos de campo realizados y avance en la interpretación técnica del contexto geológico local.
- ✓ **Gestión administrativa:** orientada a la recolección y entrega mensual de la documentación requerida, con el fin de elaborar el acta de costos y cumplir con los trámites internos de la consultoría en el marco del proyecto.

- ✓ **Contextualización a la profesional social de la interventoría sobre los avances y actividades desarrolladas por el componente social de la Consultoría – 14 de julio de 2025:** Durante una reunión sostenida con la profesional social de la interventoría, y en respuesta a su solicitud, se brindó una contextualización general sobre los avances y actividades desarrolladas por el componente social de la Consultoría. La información presentada incluyó una descripción de las acciones ejecutadas en el marco del Plan de Gestión Social, los procesos de socialización llevados a cabo con las comunidades y actores institucionales, así como los espacios de articulación con consejos comunitarios y otras organizaciones étnico-territoriales.

  Asimismo, se expusieron los resultados preliminares de los diagnósticos sociales, los mecanismos de participación implementados, y los aspectos relevantes identificados durante las jornadas de campo.

- ✓ **Logística para el desarrollo y ejecución de la socialización del proyecto:** Se llevó a cabo la planificación y coordinación de los recursos necesarios para garantizar reuniones efectivas con comunidades y entidades. Esto incluyó la gestión de espacios, la organización de agendas, la movilización de participantes, así como la preparación de materiales informativos y equipos técnicos.

- ✓ **Reunión con los especialistas de la consultoría** con el fin de revisar los avances de cada uno de los volúmenes y definir las necesidades que deben ser atendidas para garantizar la continuidad de las actividades y entregas programadas – 14 de julio de 2025.

- ✓ **Mesa Técnica. Revisión y valoración de información preliminar de diseño geométrico para los volúmenes de Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles de servicio y del Estudio de seguridad vial – 14 de julio de 2025:** Se desarrolló la revisión de la información disponible para el estudio de tránsito y el diseño geométrico, lo que permitió identificar los sectores típicos y críticos de la vía, conforme a sus características y a los lineamientos del Manual de Diseño Geométrico del INVIAS. A partir de este análisis, se evaluó la capacidad y los niveles de servicio de la vía, seleccionando los tramos 1 y 5 como representativos para el estudio.

  Con base en lo anterior, se establecieron los parámetros de diseño aplicables a todo el corredor vial. Se define mejorar el alineamiento de la vía en sectores y evitar algunas curvas que por su radio pueden generar puntos críticos que causen accidentes.

  Asimismo, se valoró la información sobre accidentes en la zona y los subregistros, la incidencia de vivienda sobre la zona de protección de la vía, que deberá ser tratado en el componente predial, los sitios de intersección vial, los accesos y los pasos por centros poblados. Se hace revisión del preliminar al diseño geométrico, y los ajustes se desarrollan de forma inmediata, esto permite avanzar en el capítulo de seguridad vial.

- ✓ **Revisión de las respuestas a solicitudes dirigidas a entidades gubernamentales y privadas – 15 de julio de 2025:** Se desarrolló una sección de trabajo enfocada en la revisión, seguimiento y análisis detallado de las respuestas emitidas por las distintas entidades gubernamentales y privadas frente a las solicitudes enviadas por la consultoría. Esta actividad permitió identificar avances, requerimientos adicionales, observaciones técnicas y compromisos institucionales que impactan directamente en el desarrollo del proyecto. Además, se documentaron las gestiones realizadas y se establecieron acciones para dar continuidad a los procesos de articulación.

- ✓ **Gestión administrativa relacionada con el campamento ubicado en el municipio de san José del palmar 15 de julio de 2025:** Se realizo una sección administrativa orientada a la organización, seguimiento y atención de los requerimientos logísticos y operativos del campamento, el cual se encuentra ubicado directamente en la zona de influencia del proyecto. Esta gestión incluyó la identificación de necesidades básicas para su adecuado funcionamiento, tales como suministro de servicios, condiciones de habitabilidad, apoyo al personal desplazado, y coordinación para garantizar condiciones óptimas de operación durante el desarrollo de las actividades de campo.

- ✓ **Análisis desde el enfoque del Sistema de Información Geográfica (SIG), relacionado con las respuestas recibidas por parte de algunas entidades respecto al proyecto y a las áreas de interés ambiental o social, incluyendo los consejos comunitarios y otros actores - 16 de julio de 2025: Se realizó un análisis técnico desde el enfoque del Sistema de Información Geográfica (SIG), con el propósito de revisar y cruzar la información recibida por parte de diferentes entidades frente al proyecto, especialmente en lo relacionado con áreas de interés ambiental y social.**

  Este ejercicio permitió identificar zonas sensibles, territorios colectivos de consejos comunitarios y otros actores relevantes, con el fin de orientar adecuadamente los ajustes al diseño y garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos y sociales

- ✓ **El 16 de julio de 2025. Se realizó de manera presencial el Pre-Comité de Seguimiento, con la participación del equipo de la consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Chocó:** Durante el espacio se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría.

- ✓ **Socialización del proyecto – Segundo encuentro (16 de julio de 2025-Universidad Tecnológica del Chocó):** Se llevó a cabo el segundo encuentro de socialización del proyecto, en el cual participaron activamente diversas entidades gubernamentales. Durante esta sesión, se presentó el avance del proyecto, se aclararon dudas y se establecieron canales de comunicación para fortalecer la cooperación entre los involucrados. Asimismo, se abordaron temas clave relacionados con los objetivos, beneficios esperados, y posibles impactos del proyecto, buscando garantizar la transparencia y la inclusión de todas las partes interesadas en el proceso.

Este espacio permitió además recoger aportes y recomendaciones por parte de las entidades participantes, las cuales mostraron interés en colaborar en las siguientes fases del proyecto para asegurar su adecuado desarrollo y cumplimiento de las normativas vigentes.

- ✓ **Sección de trabajo dedicada al análisis de las alternativas de modificación del diagnóstico técnico-financiero – 17 de julio de 2025**: Durante esta sección de trabajo se llevó a cabo el análisis de las alternativas de modificación del diagnóstico técnico-financiero inicialmente propuesto. La actividad incluyó la revisión detallada de los aspectos técnicos, económicos y normativos que sustentan dichas alternativas, con el objetivo de identificar posibles ajustes que optimicen la viabilidad del proyecto. Este ejercicio permitió valorar el impacto de cada alternativa en términos de costos, cronograma y alcance, aportando insumos clave para la toma de decisiones en etapas posteriores.

- ✓ **Elaboración y remisión de oficios dirigidos a entidades gubernamentales y privadas:** En el marco de la gestión técnica del proyecto, se adelantó la elaboración y envío de comunicaciones oficiales, tanto reiterativas como no reiterativas, dirigidas a entidades gubernamentales y privadas, en el marco de la gestión técnica del proyecto

- ✓ Se desarrolló la redacción de comunicaciones oficiales con el objetivo de solicitar información técnica y/o administrativa relevante para el avance del proyecto. Esta actividad es clave para obtener insumos necesarios para los estudios y diseños, así como para asegurar el cumplimiento de los compromisos establecidos con las comunidades y demás actores involucrados.

- ✓ **Reunión con el componente de Biología– 22 de julio de 2025:** Se realizó una reunión para recopilar la información técnica necesaria que permita estructurar adecuadamente los documentos requeridos en la solicitud de sustracción de reserva forestal. También se realizó el ingreso a la plataforma VITAL de la ANLA para registrar la solicitud correspondiente.

- ✓ El 23 de julio de 2025. Se realizó de manera presencial el Comité de Seguimiento mensual, con la participación del equipo de la consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, en las instalaciones de esta entidad en la ciudad de Bogotá**:** Durante la jornada se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría.

- ✓ **Revisión del plan exploratorio para los nuevos tramos 5, 4 y 3 – 25 de**

julio de 2025: Se acordó realizar el levantamiento completo del eje vial, incluyendo los estudios para la patología de las estructuras existentes. Asimismo, se ajustó el plan exploratorio para los tramos 4 y 5, con base en los requerimientos técnicos identificados.

- ✓ **Reunión para la Definición del Alcance de la Metodología BIM Según los Recursos Disponibles – 25 de julio de 2025:** Se discutió el alcance del proyecto BIM en función de los recursos disponibles, se propuso priorizar volúmenes clave y reducir permisos, además de evaluar la necesidad del software. Se enfatizó la importancia de optimizar recursos y centralizar la información en una herramienta específica.

  Se acordó definir una línea de trabajo que involucre a especialistas de consultoría y se propuso organizar una mesa de trabajo para revisar el alcance y metodología, así como definir el BEP. La consultoría se encargará de enviar dos alternativas del BIM para su revisión, y se destacó la necesidad de colaboración con la interventoría y el INVÍAS para evitar retrocesos en el proyecto.

- ✓ **Reunión con especialistas de los volúmenes de estructuras, geotecnia, hidráulica y otras áreas técnicas – 26 de julio de 2025**

  Se llevó a cabo una reunión con los especialistas responsables de los diferentes volúmenes técnicos, con el objetivo de notificar la reincorporación de la metodología BIM y definir los alcances correspondientes bajo este enfoque.

  Durante el encuentro, se abordaron los avances y desafíos del proyecto, destacando la necesidad de realizar una nueva topográfica debido a la falta de información.
  Se realizó una contextualización general sobre el estado de avance de cada uno de los volúmenes técnicos, y se discutió la definición del alcance de la implementación BIM. Finalmente, se enfatizó la importancia de identificar el software utilizado por cada profesional, con el fin de optimizar la organización y articulación del trabajo colaborativo.

- ✓ **Coordinación logística para ingreso a campo de especialistas en Geotecnia, Seguridad Vial y Topografía:**

  Se coordinó el ingreso a campo de los especialistas de los volúmenes de Geotecnia, Seguridad Vial y Topografía, con el propósito de realizar trabajos detallados de topografía en los taludes identificados como puntos críticos, así como la verificación de los mojones correspondientes a la fase II. Adicionalmente, se llevará a cabo el levantamiento de información primaria relacionada con el volumen de Seguridad Vial.

- ✓ **Elaboración y envío de invitaciones a las entidades para la socialización del proyecto, programada de manera presencial el 6 de agosto de 2025 en el corregimiento de San Pedro de Ingará:** Se realizó la elaboración y envío de invitaciones oficiales a las entidades gubernamentales y privadas con el fin de convocarlas a la socialización (acercamiento) presencial del proyecto. Esta actividad tiene como objetivo informar, presentar avances y recibir aportes que contribuyan al desarrollo exitoso del proyecto, y se llevará a cabo el 6 de agosto de 2025 en el corregimiento de San Pedro de Ingará del municipio de San José del Palmar

- ✓ **Logística para el desarrollo y ejecución de la socialización del proyecto:** Se llevó a cabo la planificación y coordinación de los recursos necesarios para garantizar reuniones efectivas con comunidades y entidades. Esto incluyó la gestión de espacios, la organización de agendas, la movilización de participantes, así como la preparación de materiales informativos y equipos técnicos para la socialización (acercamiento) con el Consejo Comunitario de San Pedro de Ingará que se llevara el día 6 de agosto de 2025.

- ✓ **Coordinación logística para ingreso a campo de especialistas de la Consultoría:**
  Se coordinó el ingreso a campo de los especialistas de la consultoría, el objetivo principal de esta salida es adelantar una jornada de socialización y acercamiento con el Consejo Comunitario de San pedro de Ingará - AFROSAN, ubicado en el corregimiento de Ingará, municipio de San José del Palmar.

- ✓ Reunión para revisión de criterios del área de influencia – Componente Social – 28 de julio de 2025: Desde el componente social, se llevó a cabo una reunión técnica orientada a revisar los criterios de delimitación del área de influencia social del proyecto, con base en la Guía de Manejo Ambiental para proyectos de infraestructura en modo carretero. Se analizaron aspectos relacionados con la presencia de comunidades, dinámicas territoriales, actores sociales e institucionales, con el fin de garantizar una caracterización adecuada del entorno humano y una efectiva identificación de impactos sociales.

- ✓ **Reunión con el volumen de Geotecnia y DG – 29 de julio de 2025:** Se llevó a cabo una revisión exhaustiva del proyecto correspondiente al tramo La Italia, desarrollado por la Alcaldía de San José del Palmar. El objetivo principal de esta evaluación fue determinar con precisión la ubicación del tramo dentro del contexto general del proyecto vial en estudio, así como identificar y delimitar el sector que debería ser excluido para optimizar los recursos y el alcance del proyecto. Esta revisión incluyó un análisis técnico y territorial para asegurar la coherencia con los objetivos estratégicos del plan maestro y facilitar la toma de decisiones para futuras etapas.

- ✓ **Durante los días 30 y 31 de julio de 2025**, se llevó a cabo la reunión técnica para la revisión del presupuesto del componente de patología, en el marco de la adaptación del nuevo proyecto en el tramo de La Italia, donde se analizaron los nuevos lineamientos técnicos, los criterios de intervención y los ajustes requeridos en la programación presupuestal.

  Como resultado del análisis, se concluyó la necesidad de realizar un ajuste al presupuesto del proyecto, segmentado por tramos de intervención, con base en los cambios de diseño, volúmenes de obra y condiciones particulares de cada tramo. Asimismo, se procedió a elaborar un desglose detallado del presupuesto por tramo, que permitirá una mejor planificación, seguimiento y control de los recursos asignados al componente de patología.

Esta revisión será insumo para la actualización del cronograma general del proyecto y la definición de los próximos hitos técnicos y administrativos.

- ✓ **Reunión con especialistas del componente predial – 31 de julio de 2025**: Se llevó a cabo una reunión con los especialistas del componente predial con el objetivo de revisar el documento preliminar entregado, correspondiente al Volumen 17, Capítulo 6 del estudio. Durante el encuentro se analizaron observaciones técnicas, se discutieron aspectos clave relacionados con la caracterización predial y social, y se acordaron ajustes para garantizar la coherencia del contenido con los lineamientos del proyecto.

- ✓ **Suministro de requerimientos para el levantamiento de información en campo – Volúmenes de Seguridad Vial y Gestión Predial – 01 de agosto de 2025**: Se realizó una mesa de trabajo con el objetivo de definir los requerimientos necesarios para el levantamiento de información en campo, específicamente para los volúmenes correspondientes a Seguridad Vial y Gestión Predial. Durante la jornada se establecieron los tipos de datos a recolectar, la metodología de captura, los actores responsables y los instrumentos técnicos a utilizar. Asimismo, se acordaron lineamientos para garantizar la calidad y pertinencia de la información.

- ✓ **Mesa de trabajo sobre el Volumen XV – Estudio de Cantidades de Obra, Análisis de Precios Unitarios y Presupuesto para la Estructuración del Pliego de Condiciones – 01 de agosto de 2025:** Durante la jornada se desarrolló una mesa de trabajo enfocada en la revisión del Volumen XV. En este marco, el personal encargado realizó una evaluación detallada de los requerimientos técnicos, logísticos y administrativos necesarios para el desarrollo de las actividades programadas. Esta revisión permitió verificar la pertinencia y suficiencia de los insumos solicitados, así como identificar y ajustar aquellos aspectos que requerían mayor claridad o precisión, con el objetivo de garantizar la adecuada ejecución de las labores en campo y el cumplimiento del cronograma establecido.

- ✓ **Sección de trabajo dedicada al análisis de las alternativas de modificación del alcance del proyecto:** Durante la semana se llevaron a cabo diversas actividades enfocadas en el análisis detallado de las distintas alternativas para modificar el alcance del proyecto. Se evalúan las opciones disponibles considerando sus impactos técnicos, económicos y sociales, con el fin de identificar la mejor alternativa que permita optimizar los resultados del proyecto sin afectar sus objetivos principales. Este análisis es fundamental para la toma de decisiones informadas y para asegurar que cualquier cambio en el alcance se gestione de manera adecuada, garantizando la viabilidad y sostenibilidad del proyecto.

- ✓ **Entrega del informe preliminar del Volumen VI – Estudio de Hidrogeología de Detalle:** Se realizó la entrega del informe preliminar correspondiente al Volumen VI, el cual contiene el Estudio de Hidrogeología de Detalle. Este documento presenta los resultados obtenidos en campo, el análisis técnico de las condiciones hidrogeológicas del área de influencia del proyecto y las recomendaciones para su manejo. El informe servirá como insumo clave para la definición de medidas de mitigación, manejo de aguas subterráneas y planificación de obras asociadas al componente hidrogeológico.

- ✓ **Reprogramación de actividades del proyecto:** Se realizó la reprogramación de actividades del proyecto con el fin de ajustar los tiempos y recursos requeridos para el desarrollo adecuado de las tareas previstas. Esta decisión responde a factores técnicos, logísticos y/o administrativos identificados durante el avance del proyecto, garantizando así la continuidad y el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Revisión y Apropiación de los estudios a fase II: Durante la revisión y apropiación de los estudios en fase II, se identificó la ausencia de información primaria (nube de puntos), lo cual hizo necesario presentar un ajuste en el valor del levantamiento topográfico por kilómetro. Este ajuste corresponde a la ejecución del levantamiento sobre una franja de 200 metros de ancho.

3.3. Seguimiento Ítems no previstos. No aplica para este periodo

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

La interventoría realizo las siguientes actividades

- Se realizo de manera virtual comité técnico de seguimiento semanal los días 03 y 10 de julio de 2025 en donde se revisaron los avances técnicos y administrativos de la consultoría, se verificaron compromisos adquiridos y se definieron acciones para fortalecer la ejecución contractual.

- Se realizo comité técnico de seguimiento presencial el día 16 de julio de 2025 entre la consultoría, interventoría e INVIAS en la ciudad de Quibdó instalaciones de la UTCH

Revisión de entregables preliminares
- Vol. II Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio
- Vol. IV Estudio de seguridad vial
- Vol. V Estudio de geología y geomorfología local.
- Vol. VI Estudio de hidrogeología de detalle.

Actividades administrativas y contractuales:
- Revisión de cronograma y reprogramación de actividades según plan de contingencia No 2.
- Seguimiento al plan exploración geotécnica de los tramos 4 y 5
- Control de modificaciones del proyecto y al diagnóstico técnico-financiero.
- Análisis de alternativas de ajuste técnico, económico y social.

-Acompañamiento a recorridos en campo de los componentes Geotecnia, Hidrología e Hidráulica, Socavación y Geología El propósito principal de esta actividad fue realizar una revisión detallada de las condiciones hidráulicas del corredor vial, así como de las afectaciones geológicas y los aspectos relacionados con la estabilidad de taludes.

-Se realizo mesa de trabajo entre la consultoría e Interventoría con los especialistas pares de Diseño Geométrico con el fin de determinar los entregables del Diseño entregado en el contrato 1666 de 2025 con el fin de evaluar que sirve para esta fase y que falta, en esta reunión se solicitó a la consultoría un informe de apropiación de Estudios topográficos.

- La consultoría envía informe de apropiación de los estudios topográficos en donde concluye que la información entregada por el INVIAS no es confiable ni suficiente para Fase III debido a:
- Dentro de la revisión de la información no se encontró un informe topográfico detallado de campo.
- La información analizada no está referenciada al sistema oficial (MAGNA-SIRGAS 2018).
- No existe un modelo MDT detallado, ni se evidencia el uso de tecnologías LIDAR o escáner.
- Ausencia de redes levantadas, ni fichas técnicas de la red GNSS.
- Entregables no estructurados, ni verificables.
- Riesgo alto de reprocesos, rediseños y errores constructivos.
Por tanto, es necesario la toma actualizada de la topografía de detalle.

La consultoría presenta un atraso significativo en las actividades de campo puesto que en comunicación del 21 de junio de 2025 los representantes del consejo comunitario Mayor de Novita COCOMAN solicito:

(…) 1. Una aclaración pública y formal de parte de la UTCH sobre la exclusión cometida y la omisión en la convocatoria a nuestras autoridades.

2. La suspensión inmediata de cualquier avance relacionado con el proyecto en nuestro territorio, hasta tanto se realice una consulta previa legítima con nuestra representación legal.
3. La convocatoria formal al Consejo Comunitario, con participación de su representante legal y junta directiva debidamente reconocida, para la realización de un nuevo proceso bajo condiciones de legalidad, respeto y pertinencia cultural.
4. El traslado inmediato de esta comunicación al INVIAS, como entidad responsable del proyecto, a fin de que rinda cuentas (…)

Dadas estas exigencias del consejo comunitario se suspendieron las actividades en campo hasta tanto se realizará una nueva socialización del proyecto

-Asistencia a socialización segundo espacio con el consejo comunitario COCOMAN realizada en la UTCH el día 16 de julio de 2024 con participación de delgados de la gobernación la MEC, INVIAS alcaldías de San Jose del Palmar. Novita delegados del Cairo entre otros.

-Se realizo comité técnico mensual en el INVIAS Bogotá el 23 de julio de 2025 en donde se expuso la situación contractual con las comunidades de consejos comunitarios de COCOMAN y de San Pedro de Igara las cuales hacen parte de los tramos 1 y 2 y solicitan consulta previa. La consultoría propone realizar acercamientos con estas comunidades e intentar proponer realizar lineamientos de Consulta previa para que se permita la entrada a campo. Así mismo en este comité la consultoría se comprometió a iniciar con la toma de nueva topografía y toma de información geotécnica en los tramos 4, 5 y parte del tramo 3.

-Se solicita a la consultoría un Plan de contingencia de actividades en campo, una nueva programación flujo de caja para mitigar este atraso. Se solicito a la consultoría dados las necesidades del contrato una propuesta para la actualización de topografía de detalle en una franja de 200 m del corredor, la implementación BIM con los recursos disponibles, el presupuesto del plan de exploración geotécnico con los ensayos faltantes para completar los estudios a Fase III y el presupuesto para realizar la Patología de las estructuras existentes.

A continuación, se presenta cuadro de seguimiento actas de costos y amortización del anticipo contrato de consultoría.

CONTRATO 4227 DE 2024 - ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA						
Acta No	**PERIODO**	**VALOR BASICO**	**VALOR TOTAL ACTA**	**ANTICIPO AMORTIZADO**	**VALOR REAL AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**	**SALDO ANTICIPO**
ANTICIPO			$	4.350.000.000,00		
1	dic-24	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 48.111.000,00	$ 48.111.000,00	$ 4.301.889.000,00
2	ene-25	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 48.111.000,00	$ 48.111.000,00	$ 4.253.778.000,00
3	feb-25	$ 185.122.000,00	$ 185.122.000,00	$ 92.561.000,00	$ 92.561.000,00	$ 4.161.217.000,00
4	mar-25	$ 235.568.000,00	$ 235.568.000,00	$ 117.784.000,00	$ 117.784.000,00	$ 4.043.433.000,00
5	abr-25	$ 114.126.000,00	$ 114.126.000,00	$ 57.063.000,00	$ 57.063.000,00	$ 3.986.370.000,00
6	may-25	$ 182.492.000,00	$ 182.492.000,00	$ 91.246.000,00	$ 91.246.000,00	$ 3.895.124.000,00
7	jun-25	$ 156.047.952,00	$ 156.047.952,00	$ 78.023.976,00	$ 78.023.976,00	$ 3.817.100.024,00
8	jul-25	$ 266.818.400,00	$ 266.818.400,00	$ 133.409.200,00	$ 133.409.200,00	$ 3.683.690.824,00
TOTALES		**$ 1.332.618.352,00**	**$ 1.332.618.352,00**	**$ 666.309.176,00**	**$ 666.309.176,00**	**$ 3.683.690.824,00**
		AVANCE FINANCIERO			**15,32%**	

En el mes julio de 2025 la consultoría lleva un avance financiero ejecutado de 15.32% y un porcentaje programado de 27.65%. se presenta un atraso de 12.3%. Se le solicito a la consultoría enviar plan de contingencia, reprogramación y flujo de caja para superar este atraso.

Programado	**$2.405.550.000**	**27.65%**
Ejecutado	$1.332.618.352	15.32%

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

4.1. Informe semanal

Para el contrato 4262 de 2024 se presentarán los informes semanales del mes de julio de 2025 el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-3**

4.2 Maquinaria y equipo contrato de consultoría.

Para este periodo no aplica el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-4**. No se presenta

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social de consultoría

El control diario del personal del consultor se presentará en el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-6**, con sus respectivos soportes.

4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de consultoría

La información financiera del contrato de consultoría 4227 de 2024 se expone en el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-9.**

4.5 Estado general del tiempo.

El control del estado general del tiempo para el contrato 4227 contemplado en el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-10** no se presenta para este mes.

4.6 Resumen ensayos de laboratorio.

Ya que no se realizaron ensayos de laboratorio durante el presente periodo no se presenta el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-11**.

4.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de consultoría

Se presenta formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-13**. Con las pólizas

4.8 Seguimiento al plan de calidad contrato de consultoría

Para el contrato 4227 de 2024 no se presenta el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-14**, puesto que las actividades fueron netamente administrativas.

4.9. Otros documentos seguimiento mensual:

- **Seguimiento a la inversión del anticipo:** Se anexa en el presente informe el formato **MEPI-MN1-IN-3-FR-1** y el formato **MEPI-MN1-IN-3-FR-2** se presentará tan pronto se empiecen a realizar pagos por parte de la UTCH.

- **Seguimiento programa de consultoría:** Con respecto al contrato 4227 de 2024 se tiene que para el mes de julio de 2025 un porcentaje ejecutado de 15.32% y un porcentaje programado de 14.84% según plan de contingencia presentado por la consultoría.

- **Seguimiento Programa de inversiones,** estas se pueden ver plasmadas en los formatos **MEPI-MN-IN-6-FR-1**, y el formato **MEPI-MN-IN-6-FR-2**

- **Actas de comité de obra:** No aplica para este proyecto

- **Actas de reunión:** Se presentan actas de reunión

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato.

Se firmo el 08 de noviembre del año 2024 el contrato interadministrativo 4262 de 2024 a continuación se presenta la información del contrato:

CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4262 DE 2024
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA
INTERVENTORIA **ENTIDAD CONTRATANTE**	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC NIT. 891800330 – 1 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT. 800215807 -2
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.375.000.000
FECHA DE INICIO	02 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA No 1	12 MESES HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor.

El contrato interadministrativo 4262 de 2024, durante el periodo del 01 al 31 de julio de 2025 realizo las siguientes actividades:

- Seguimiento y revisión de actas de costos de la consultoría
- La interventoría tiene personal disponible en territorio entre los cuales está un residente de campo, un técnico de la zona y una técnica ambiental y social. Así mismo los especialistas de las diferentes áreas han asistido según pertinencia en los recorridos
- Se realizo acompañamiento a los recorridos desde el Cairo a Curundo (La Punta) en donde se revisaron las áreas de geotecnia, geología, geomorfología local e hidrogeología de detalle.
- Se realizo de manera virtual comité técnico de seguimiento semanal los días 03 y 10 de julio de 2025 en donde se revisaron los avances técnicos y administrativos de

la consultoría, se verificaron compromisos adquiridos y se definieron acciones para fortalecer la ejecución contractual.

- Se realizo comité técnico de seguimiento presencial el día 16 de julio de 2025 entre la consultoría, interventoría e INVIAS en la ciudad de Quibdó instalaciones de la UTCH
- Asistencia a socialización segundo espacio con el consejo comunitario COCOMAN realizada en la UTCH el día 16 de julio de 2024 con participación de delgados de la gobernación la MEC, INVIAS.

Revisión de entregables preliminares
- Vol. II Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio
- Vol. IV Estudio de seguridad vial
- Vol. V Estudio de geología y geomorfología local.
- Vol. VI Estudio de hidrogeología de detalle.

Actividades administrativas y contractuales:
- Revisión de cronograma y reprogramación de actividades según plan de contingencia No 2.
- Seguimiento al plan exploración geotécnica de los tramos 4 y 5
- Control de modificaciones del proyecto y al diagnóstico técnico-financiero.
- Análisis de alternativas de ajuste técnico, económico y social.

-Acompañamiento a recorridos en campo de los componentes Geotecnia, Hidrología e Hidráulica, Socavación y Geología El propósito principal de esta actividad fue realizar una revisión detallada de las condiciones hidráulicas del corredor vial, así como de las afectaciones geológicas y los aspectos relacionados con la estabilidad de taludes.

-Se realizo mesa de trabajo entre la consultoría e Interventoría con los especialistas pares de Diseño Geométrico con el fin de determinar los entregables del Diseño entregado en el contrato 1666 de 2025 con el fin de evaluar que sirve para esta fase y que falta, en esta reunión se solicitó a la consultoría un informe de apropiación de Estudios topográficos.

- La consultoría envía informe de apropiación de los estudios topográficos en donde concluye que la información entregada por el INVIAS no es confiable ni suficiente para Fase III debido a:
- Dentro de la revisión de la información no se encontró un informe topográfico detallado de campo.
- La información analizada no está referenciada al sistema oficial (MAGNA-SIRGAS 2018).
- No existe un modelo MDT detallado, ni se evidencia el uso de tecnologías LIDAR o escáner.
- Ausencia de redes levantadas, ni fichas técnicas de la red GNSS.
- Entregables no estructurados, ni verificables.
- Riesgo alto de reprocesos, rediseños y errores constructivos.
Por tanto, es necesario la toma actualizada de la topografía de detalle.

- Se solicita a la consultoría un Plan de contingencia de actividades en campo, una nueva programación flujo de caja para mitigar este atraso. Se solicito a la consultoría dados las necesidades del contrato una propuesta para la actualización de topografía de detalle en una franja de 200 m del corredor, la implementación BIM con los recursos disponibles, el presupuesto del plan de exploración geotécnico con los ensayos faltantes para completar los estudios a Fase III y el presupuesto para realizar la Patología de las estructuras existentes.

-Se realizo comité técnico mensual en el INVIAS Bogotá el 23 de julio de 2025 en donde se expuso la situación contractual con las comunidades de consejos comunitarios de COCOMAN y de San Pedro de Igara las cuales hacen parte de los tramos 1 y 2 y solicitan consulta previa. La consultoría propone realizar acercamientos con estas comunidades e intentar proponer realizar lineamientos de Consulta previa para que se permita la entrada a campo. Así mismo en este comité la consultoría se comprometió a iniciar con la toma de nueva topografía y toma de información geotécnica en los tramos 4, 5 y parte del tramo 3.

5.3 Informes especialistas y profesionales.

Se presentan los informes de los siguientes profesionales
- Director de interventoría
- Coordinador de interventoría
- Residente de interventoría
- Residente de campo de interventoría
- Técnico de la zona

5.4 Informe del programa anual de caja – PAC.

Se presenta programa mensual anual PAC para el mes de julio de 2025

5.5 Informe matriz de riesgos

No aplica

5.6 Información otros programas y aplicativos.

El Pliego de condiciones no exige y el INVIAS no ha solicitado otros programas y aplicativos, por lo tanto, no aplica.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. Control diario del equipo de la Interventoría.

Para el presente periodo no se utilizó equipo por parte de la interventoría.

6.2. Control diario del personal de Interventoría.

Se presenta formato de control diario de interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-7

6.3. Información financiera Contrato de Interventoría.

Información financiera Contrato de Interventoría. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9. En el cual el Interventor y el Supervisor del Contrato de Interventoría deben llevar el control financiero y presupuestal e indicar las acciones que conlleven de forma proactiva a la ejecución del contrato, con el fin de que se ejecuten los recursos asignados para cada vigencia.

A la fecha se han presentado las siguientes actas de costos:
En el mes de diciembre de 2024 se presenta un acta de costos por un valor de $ 45.222.400
En el mes de enero de 2025 se presentó un acta de costos por un valor de $ 6.159.800
En el mes de febrero de 2025 se presentó un acta de costos por un valor de $ 84.109.000
En el mes de marzo de 2025 se presentó un acta de costos por un valor de $114.346.000
En el mes de abril de 2025 se presentó un acta de costos por un valor de $ 35.970.200
En el mes de mayo de 2025 se presentó un acta de costos por un valor de $ 51.962.000
En el mes de junio de 2025 se presentó un acta de costos por un valor de $64.694.419
En el mes de julio de 2025 se presentó un acta de costos por un valor de $148.418.477

CONTRATO 4262 DE 2024 - INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA						
Acta No	**PERIODO**	**VALOR BASICO**	**VALOR TOTAL ACTA**	**ANTICIPO AMORTIZADO**	**VALOR REAL AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**	**SALDO ANTICIPO**
ANTICIPO			$	1.187.500.000,00		
1	dic-24	$ 45.222.400,00	$ 45.222.400,00	$ 22.611.200,00	$ 22.611.200,00	$ 1.164.888.800,00
2	ene-25	$ 6.159.800,00	$ 6.159.800,00	$ 3.079.900,00	$ 3.079.900,00	$ 1.161.808.900,00
3	feb-25	$ 84.109.000,00	$ 84.109.000,00	$ 42.054.500,00	$ 42.054.500,00	$ 1.119.754.400,00
4	mar-25	$ 114.346.000,00	$ 114.346.000,00	$ 57.173.000,00	$ 57.173.000,00	$ 1.062.581.400,00
5	abr-25	$ 35.970.200,00	$ 35.970.200,00	$ 17.985.100,00	$ 17.985.100,00	$ 1.044.596.300,00
6	may-25	$ 51.962.000,00	$ 51.962.000,00	$ 25.981.000,00	$ 25.981.000,00	$ 1.018.615.300,00
7	jun-25	$ 64.694.419,00	$ 64.694.419,00	$ 32.347.209,50	$ 32.347.209,50	$ 986.268.090,50
8	jul-25	$ 148.418.477,00	$ 148.418.477,00	$ 74.209.238,50	$ 74.209.238,50	$ 912.058.852,00
TOTALES		**$ 550.882.296,00**	**$ 550.882.296,00**	**$ 275.441.148,00**	**$ 275.441.148,00**	**$ 912.058.852,00**
		AVANCE FINANCIERO			**23,20%**	

6.4. Revisión y verificación de pago de aportes legales

Se presentará formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-7** con el control de aportes legales del personal de la interventoría

6.5. Seguimiento a las garantías contractuales.

Se realiza seguimiento y control mensual a las garantías contractuales por lo cual se presenta el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-13**

6.6. Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría.

No se presenta seguimiento a plan de calidad de contrato de consultoría ya que se realizaron actividades netamente administrativas.

6.7. Otros Documentos.
No se presentan otros documentos

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Seguimiento contractual y técnico

- Se realizó seguimiento y revisión de las actas de costos presentadas por la consultoría, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
- La interventoría mantuvo presencia permanente en el territorio con el residente de campo, técnico local y técnica ambiental y social, además del acompañamiento de especialistas por áreas, asegurando control oportuno a las actividades en ejecución.

Acompañamiento en campo y revisión técnica

- Se acompañaron recorridos entre cruce El Cairo y Curundó (La Punta), revisando aspectos de geotecnia, geología, geomorfología local e hidrogeología de detalle, así como las condiciones hidráulicas, afectaciones geológicas y estabilidad de taludes.
- Se avanzó en la verificación del plan exploratorio en los tramos 4 y 5, identificando la necesidad de fortalecer la toma de información geotécnica y topográfica.

Comités y mesas técnicas de seguimiento:

- Se llevaron a cabo comités técnicos semanales (03 y 10 de julio de 2025, modalidad virtual), en los cuales se verificaron avances, compromisos y se definieron acciones para la ejecución contractual.
- El 16 de julio de 2025 se realizó comité presencial en la UTCH – Quibdó, donde se revisaron entregables preliminares, ajustes de cronograma y aspectos de socialización.
- El 23 de julio de 2025 se adelantó comité mensual en INVÍAS – Bogotá, donde se expusieron dificultades relacionadas con las comunidades de los consejos comunitarios COCOMAN y San Pedro de Ingará (tramos 1 y 2), quienes solicitan consulta previa. La consultoría se comprometió a iniciar nueva topografía y toma de información geotécnica en tramos 4, 5 y parte del 3.
- Se desarrollaron mesas de trabajo con los especialistas de diseño geométrico, donde se solicitó a la consultoría un informe de apropiación de estudios topográficos.

Revisión de entregables:
Se revisaron los informes preliminares de los siguientes volúmenes:

- Vol. II: Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio.
- Vol. IV: Estudio de seguridad vial.
- Vol. V: Estudio de geología y geomorfología local.
- Vol. VI: Estudio de hidrogeología de detalle.
  Se identificó según el informe de apropiación de estudios topográficos revisado por la consultoría del Cto 1666 de 2015 entregada por INVÍAS no es confiable ni

suficiente para la Fase III, presentando ausencia de insumos fundamentales (MAGNA-SIRGAS, MDT detallado, LIDAR, redes GNSS, entre otros), lo que conlleva alto riesgo de reprocesos y rediseños. Por tanto es necesario toma nuevamente la topografía del corredor aumentando la necesidad de tiempos por este imprevisto

Actividades administrativas y contractuales:

- Se solicito Plan de Contingencia No. 3, propuesta con las actividades de nueva topografía, patología de estructuras existentes, implementación BIM con los recursos disponibles y plan de exploración Geotécnico con los ensayos faltantes para el desarrollo de esta área en fase III
- Se analizaron alternativas de ajuste técnico, económico y social, con el fin de mantener la viabilidad del proyecto dado el imprevisto de realizar nuevamente la topografía de detalle del corredor para avanzar en las demás áreas, así mismo implementar el BIM y realizar patología a las estructuras existentes además de completar los ensayos para los volúmenes geotécnicos para llevar el proyecto a fase III

Gestión social y participación:

- La interventoría participó en la socialización del proyecto con el consejo comunitario COCOMAN, realizada en la UTCH el 16 de julio de 2025, en la cual participaron delegados de la Gobernación, MEC e INVÍAS.
- Se hizo seguimiento a las solicitudes de consulta previa presentadas por los consejos comunitarios de COCOMAN y a la solicitud de socialización de San Pedro de Íngara, por lo cual se desarrollará nuevamente una tercera socialización a la comunidad de AFROSAN en el mes de agosto de 2025.

8. ANEXOS

8.1. Relación de la correspondencia generada entre Consultor e Interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

A continuación, se presenta la correspondencia enviada y recibida en el periodo.

CORRESPONDENCIA ENVIADA

INFORMACION DEL EMISOR DEL DOCUMENTO			INFORMACION DEL DESTINATARIO		
			INVIAS	CONSULTORÍA	OTRO
No. Consecutivo	fecha del documento	Asunto			
C4262-074-2025	1/07/2025	Requerimiento de entrega del acta de costos – mes de junio de 2025		X	
C4262-075-2025	1/07/2025	Solicitud de información sobre retraso en actividades de campo y entrega de productos		X	
C4262-076-2025	2/07/2025	APROBACIÓN HOJA DE VIDA DE INTERVENTORIA - JOSE RICARDO ACOSTA SICHACÁ		X	
C4262-078-2025	8/07/2025	Solicitud de información – Pago de actas de costos – Vigencia 2025 del contrato de la referencia			
C4262-079-2025	9/07/2025	Reiteración del acta de costos correspondiente al mes de junio		X	
C4262-080-2025	9/07/2025	Bajo rendimiento de actividades en campo e incumplimiento de programación		X	
C4262-081-2025	10/07/2025	Presentación Profesional Social de Interventoría y Solicitud de Mesas de Trabajo		X	
C4262-079-2025	15/07/2025	Solicitud de información – Descuentos actas de costos	X		


C4262-084-2025	23/07/2025	Solicitud de remisión de acta de reunión de socialización del 16 de julio de 2025	X		
C4262-085-2025	29/07/2025	Solicitud entrega de información para acta de costos No.8 de la Consultoría y presentación del Plan de Contingencia por el atraso presentado		X	
C4262-086-2025	30/07/2025	Reiteración bajo rendimiento de actividades en campo e incumplimiento de programación		x	
C4262-090-2025	31/07/2025	Aprobación Informe Preliminar VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO		x	
C4262-091-2025	31/07/2025	Aprobación Informe Preliminar VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL		x	
C4262-092-2025	31/07/2025	Aprobación Informe Preliminar VOLUMEN V. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL		x	


CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Fecha de radicación	Consecutivos Externo / Numero de Radicado	Fecha del documento	REMITENTE		Dirigido a:
			Empresa	Asunto	
07//07/2025	DC 219	07/07/2025	UTCH	SOCIALIZACION PROYECTO	UPTC - Convenio 4262 de 2024
08/07/2025	DC 230	08/07/2025	UTCH	REMISION DE DOCUMENTO	UPTC - Convenio 4262 de 2024
10/07/2025	DC 238	10/07/2025	UTCH	Respuesta a oficio C4262-075-2025 del 01 de julio de 2025	UPTC - Convenio 4262 de 2024
10/07/2025	DC 239	10/07/2025	UTCH	Entrega del Plan Exploratorio del Volumen de Geotecnia – Tramos I, IV y V	UPTC - Convenio 4262 de 2024

11/07/2025	DC240	11/07/2025	UTCH	Respuesta del oficio C4262-080-2025 del 09 de julio de 2025	UPTC - Convenio 4262 de 2024
14/07/2025	DC243	14/07/2025	UTCH	Entrega de informe preliminar.	UPTC - Convenio 4262 de 2024
08/08/2025	DC275	08/08/0205	UTCH	Socialización del proyecto	UPTC - Convenio 4262 de 2024
15/08/2025	DC304	15/08/2025	UTCH	Entrega del Plan Exploratorio del Volumen de Geotecnia – Tramos II, III, IV y	UPTC - Convenio 4262 de 2024

8.2 Registro fotográfico y video de avance de la consultoría

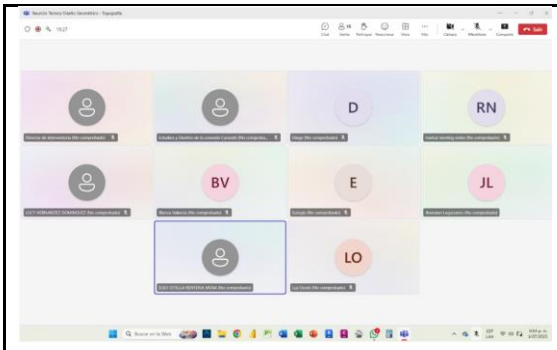

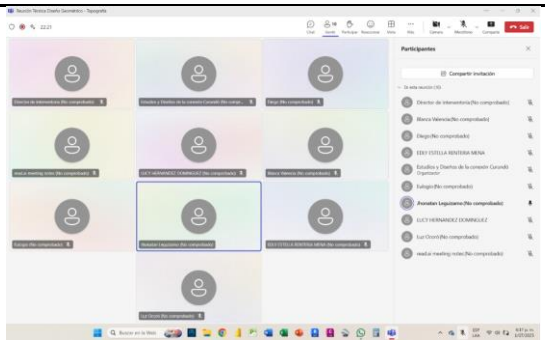

Mesa de trabajo Diseño Geométrico 01/07/2025



Encuestas de Origen y Destino - Animas del 01 al 08 de julio de 2025



Encuestas de Origen y Destino - Animas del 01 al 08 de julio de 2025



Encuestas de Origen y Destino - Animas del 01 al 08 de julio de 2025



Visita de campo especialistas de Geotecnia, Hidrología, Hidráulica y Socavación y Geología




Visita de campo especialistas de Geotecnia, Hidrología, Hidráulica y Socavación y Geología





Visita de campo especialistas de Geotecnia, Hidrología, Hidráulica y Socavación y Geología



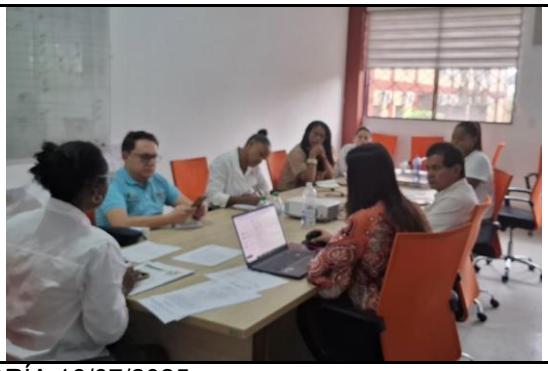

Reunión INVIAS – CONSULTORÍA- INTERVENTORÍA 16/07/2025

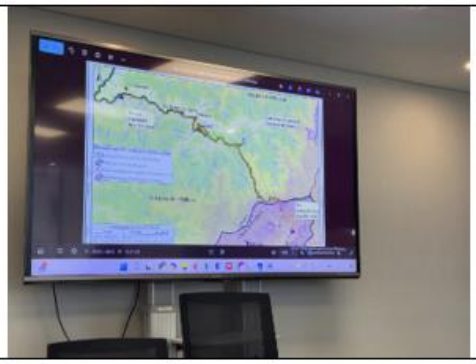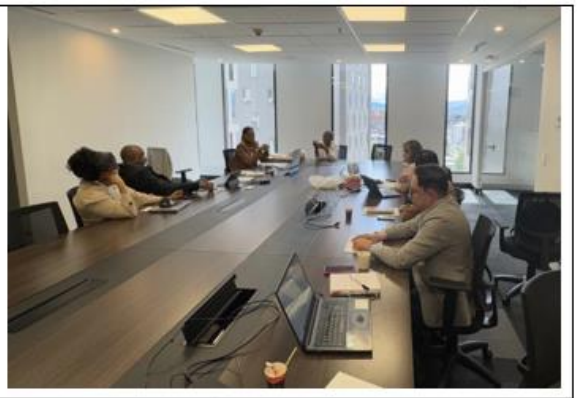	
Comité técnico de seguimiento 23/07/2025	Comité técnico de seguimiento 23/07/2025
	
Comité técnico de seguimiento 23/07/2025	Comité técnico de seguimiento 23/07/2025

8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales, y de sostenibilidad adelantada.


El día 16 de julio de 2025 se realiza socialización segundo espacio con el consejo comunitario de Novita COCOMAN de forma presencial en las instalaciones de la UTCH y de forma virtual con la MEC.





Socialización segundo espacio con la MEC y con el consejo comunitario de Novita COCOMAN



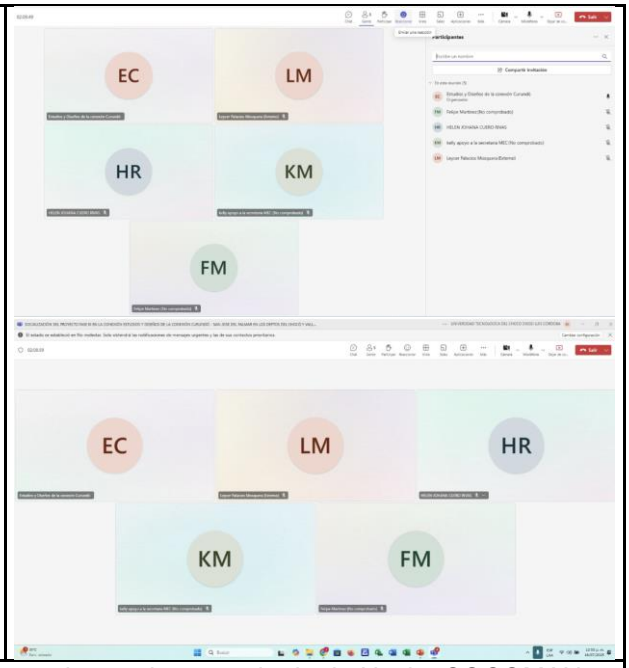

Socialización segundo espacio con la MEC y con el consejo comunitario de Novita COCOMAN

8.4 Copia de bitácora del mes correspondiente

No se presenta copia de bitácora para el mes de julio de 2025

MEPI-MN1-IN-15-FR-3
INFORME SEMANAL

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ — SEMANA No.: 31 del 30-jun al 5-jul — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: YENNY XIOMARA HERNANDEZ P

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORÍA: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VOLÚMENES O PRODUCTOS TÉCNICOS ENTREGABLES DE FASE III: 1. Entregable estudios topográficos; 2 entregable estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio; 3 entregable estudio de trazado y diseño geométrico; 4 entregable estudio de seguridad vial; 5 entregable estudio de geología y geomorfología local; 6 entregable estudio de hidrogeología de detalle; 7 entregable estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y puentes de materiales; 8 entregable estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; 9 entregable hidráulica, hidrología, y socavación; 10 entregable estudio y diseño de pavimentos; 11 entregable estudio y diseño de estructuras; 12 entregable estudio de urbanismo y paisajismo; 13 estudio redes hidrosanitarias y secas; 14 entregable estudio de riesgos; 15 entregable estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones; 16 entregable evaluación socioeconómica y financiera del proyecto; 17 entregable ambiental, social, predial y sostenibilidad; 18 entregable volumen técnico de BIM; 19 entregable informe final.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA, lo cual incluye el desarrollo de 19 volúmenes.

CONTRATO DE CONSULTORÍA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONSULTORÍA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA			INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4227 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00	CONTRATO No.	4262 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 8.700.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 4.350.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 1.187.500.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.350.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.350.000.000
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.187.500.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.187.500.000

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORÍA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA (A):	$ 8.700.000.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.024.490.000,00	23,27%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.141.152.499,47	13,12%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (883.337.500,53)	-10,15%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.024.490.000,00	23,27%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.141.152.499,47	13,12%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (883.337.500,53)	-10,15%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 132.148.605,00	1,52%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.068.435,00	0,45%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: MAYO
VALOR FACTURA: $ 182.492.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: En tramite acta de costos del mes de diciembre y enero en el Instituto Nacional de Vías INVIAS

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 493.938.952,00	20,80%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 402.463.819,00	16,95%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 31.291.952,00	1,32%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 64.694.419,00	2,72%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: MAYO
VALOR FACTURA: $ 51.962.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.350.000.000,00
Amortizado $	$ 454.876.000
Saldo $	$ 3.895.124.000,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	$ -
Acumulado:	$ -

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.187.500.000,00
Amortizado $	$ 337.769.400
Saldo $	$ 849.730.600,00

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 23,27% Avance o Atraso Físico % -10,15%
Meta Física Ejecutada % 13,12%

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL													
Meta Física (Programa de consultoría) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**								
Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**TRAMO 1**					**Total**	**%**	
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	UND		2024	2024	Prog	$ 1.430.754.000,00					$ 1.430.754.000,00	16,445%	
					Ejec	$ 735.678.000,00					$ 735.678.000,00	8,456%	

	GRUPO 2 -COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES												
	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**							
	Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**TRAMO 1**					**Total**	**%**
1	VOLUMEN I. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.	UND		2025	2025	Prog	$ 69.000.000,00					$ 69.000.000,00	0,79%
						Ejec	$ 3.450.000,00					$ 3.450.000,00	0,04%
2	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO.	UND		2025	2025	Prog	$ 60.000.000,00					$ 60.000.000,00	0,69%
						Ejec	$ 3.000.000,00					$ 3.000.000,00	
3	VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO.	UND		2025	2025	Prog	$ 165.000.000,00					$ 165.000.000,00	1,90%
						Ejec	$ 107.250.000,00					$ 107.250.000,00	
4	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL.	UND		2025	2025	Prog	$ 42.000.000,00					$ 42.000.000,00	0,48%
						Ejec	$ 2.100.000,00					$ 2.100.000,00	
5	VOLUMEN V. ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA LOCAL.	UND		2025	2025	Prog	$ 106.000.000,00					$ 106.000.000,00	1,22%
						Ejec	$ 5.300.000,00					$ 5.300.000,00	
6	VOLUMEN VI. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	UND		2025	2025	Prog	$ 125.000.000,00					$ 125.000.000,00	1,44%
						Ejec	$ 6.250.000,00					$ 6.250.000,00	
	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES.	UND		2025	2025	Prog	$ 368.000.000,00					$ 368.000.000,00	4,23%
						Ejec	$ 18.400.000,00					$ 18.400.000,00	
	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 235.000.000,00					$ 235.000.000,00	2,70%
						Ejec	$ 11.750.000,00					$ 11.750.000,00	
	VOLUMEN IX. HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN.	UND		2025	2025	Prog	$ 190.000.000,00					$ 190.000.000,00	2,18%
						Ejec	$ 9.500.000,00					$ 9.500.000,00	
	VOLUMEN X. ESTUDIO Y DISEÑOS DE PAVIMENTO.	UND		2025	2025	Prog	$ 73.000.000,00					$ 73.000.000,00	0,84%
						Ejec	$ 3.650.000,00					$ 3.650.000,00	
	VOLUMEN XI. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 481.000.000,00					$ 481.000.000,00	5,53%
						Ejec	$ 24.050.000,00					$ 24.050.000,00	
7	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.	UND		2025	2025	Prog	$ 57.000.000,00					$ 57.000.000,00	0,66%
						Ejec	$ 2.850.000,00					$ 2.850.000,00	
	VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 47.000.000,00					$ 47.000.000,00	0,54%
						Ejec	$ 2.350.000,00					$ 2.350.000,00	
	VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE RIESGOS	UND		2025	2025	Prog	$ 93.000.000,00					$ 93.000.000,00	1,07%
						Ejec	$ 4.650.000,00					$ 4.650.000,00	
8	VOLUMEN XV. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE OBRA	UND		2025	2025	Prog	$ 56.000.000,00					$ 56.000.000,00	0,64%
						Ejec	$ 2.800.000,00					$ 2.800.000,00	
9	VOLUMEN XVI. EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL	UND		2025	2025	Prog	$ 54.000.000,00					$ 54.000.000,00	0,62%
						Ejec	$ 2.700.000,00					$ 2.700.000,00	
10	VOLUMEN XVII. AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD.	UND		2025	2025	Prog	$ 423.000.000,00					$ 423.000.000,00	4,86%
						Ejec	$ 21.150.000,00					$ 21.150.000,00	
11	VOLUMEN XVIII. VOLUMEN TÉCNICO BIM	UND		2025	2025	Prog	$ 46.000.000,00					$ 46.000.000,00	0,53%
						Ejec	$ 2.300.000,00					$ 2.300.000,00	
	COSTO TOTAL ENTREGABLES					Prog						**$ 2.690.000.000,00**	30,9%
						Ejec						**$ 233.500.000,00**	11,5%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4:

GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS												
Meta Física (Programa de consultoría) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**							
Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**TRAMO 1**					**Total**	**%**
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		2025	2025	Prog	$ 4.579.246.000,00					$ 4.579.246.000,00	52,635%
					Ejec	$ 96.630.952,00					$ 96.630.952,00	1,111%

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONS	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La consultoría envía el 16 de diciembre de 2024 en comunicación DC-009-2024 el Plan de ejecución BIM
Se realiza una reunión con la consultoría, interventoría y con el área BIM del INVIAS para definir los lineamientos para la entrega de este documento el día 16 de diciembre de 2024
El día 23 de diciembre de 2024 la interventoría envía en comunicación C4262-009-2024 observaciones al plan de ejecución BIM y reitera estas observaciones el 21 de enero de 2025.
Se realiza reunión presencial en las instalaciones del INVIAS Bogotá con el área ambiental y social con el fin de discutir lineamientos para la ejecución elaboración y entrega del Volumen XVII de los estudios ambiental y social, predial y sostenibilidad el día 19 de diciembre de 2024, de esta reunión se acuerda una reunión virtual para el día 26 de diciembre con el área de sostenibilidad, ambiental, social, predial del INVIAS en donde el consultor expondrá una propuesta para el desarrollo de este volumen y que todas las partes que revisan este documento estén de acuerdo con su ejecución para no tener retrocesos.
El día 27 de enero la consultoría envía ajustado el Plan de ejecución BIM, se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
Se realizo comite tecnico de seguimiento el 29 de enero de 2025 en donde se trataron temas de la entrega de la información de los estudios y diseños del contrato 1666 de 2015 para que la consultoría realice la revisión de esta información especifique por medio de un diagnostico que información hay y que información falta y plantee un presupuesto de las actividades que hacen falta para
Se realizo comité técnico de seguimiento el 06 de febrero de 2025
Se realizo comité técnico de seguimiento el 12 de febrero de 2025
La consultoría entrega plan de contingencia por tanto a la fecha según nueva programación no presenta atraso
La consultoría envia la metodología del Volumen III. Estudio de trazado y diseño Geométrico.
La consultoría envia la metodología del Volumen VII. Estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y fuentes de materiales
La consultoría envia la metodología del Volumen VIII. Estudio de suelos para diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras
La consultoría envia la metodología del Volumen I. Estudios topograficos
La consultoría envia la metodología del Volumen II. Estudio de Transito, capacidad y niveles de servicio
La consultoría envia la metodología del Volumen XI. Estudio y diseño de estructuras
La consultoría envia la metodología del Volumen X. Hidraulica, Hidrologia y Socavación
La consultoría envia la metodología del Volumen XV. Estudio de cantidades de obra, ánalisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones
La consultoría envia la metodología del Volumen XVIII. Volúmen Técnico BIM
Reunión profesionales BIM Consultoría e Interventoría
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 06 de marzo de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 13 de marzo de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 20 de marzo de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 28 de marzo de 2025
La consultoría envia la metodología del Volumen V. Estudio de Geología y Geomorfologia local
La consultoría envia la metodología del Volumen VI. Estudio de Hidrogeología de detalle
La consultoría envia la metodología del Volumen X. Estudio y diseño de pavimentos
La consultoría envia la metodología del Volumen XII. Estudio de urbanismo y paisajismo
La consultoría envia la metodología del Volumen XIII. Estudio de redes hidrosanitarias secas
La consultoría envia la metodología del Volumen XIV. Estudios de riesgos
La consultoría envia la metodología del Volumen XVI. Evaluación socioeconomica y financiera del proyecto
La consultoría envia la metodología del Volumen XVII. Ambiental, social, predial y sostenibilidad
La consultoría envia informe preliminar del volumen III. Estudio de trazado y Diseño Geometrico
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 03 de abril de 2025
Se realizo socializaciáon del plan de ejecución Bim BEP el 07 de abril de 2025 con la consultoría, ingterventoría e invias
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 10 de abril de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 24 de abril de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento mensual presencial el día 25 de abril de 2025
Se realiza mesa de trabajo BIM entre consultoría e interventoría el 29 de abril de 2025 con los especialistas del área BIM de la interventoría y la consultoría con el fin de determinar los softwares y accesos de la consultoría, interventoría e INVIAS en el marco del Proyecto.
Comité de seguimiento virtual – 08 de mayo de 2025, con la participación del equipo de consultoría, interventoría y la gestora técnica.
La consultoría se encuengtra realizando reuniones con sus profesionales especialistas respecto a cambios generados por las modificaciones en el diseño geometrico mediante el trazada y las posibles afectaciones prediales resultantes y se encuentra realizando el diagnostico del preuspuesto del plan de exploración del componente de Geotecnica y Patología estructural.
Se realizo socialización en el Municipio de San Jose del Palmar el día 12 y 13 de mayo de 2025 con las comunidades de Novita, San Jose del Palmar, El Cairo, La Italia.
Se realizo recorrido los días 14 y 15 de mayo con el área técnica y de Diseño geometrico desde la Punta a Cruce el Cairo, se tomó georeferenciación de los puntos criticos del corredor
Se realizo recorrido los días 15 y 16 de mayo con los especialistas de estructuras y geotecnia de la consultoría e interventoría con el fin de revisar las estructuras existentes desde el punto de vista estructural y de los tramos criticos desde el punto de vista geotecnico.
Se realiza comité tecnico de seguimiento semanal el día 20 de mayo de 2025
La consultoría se encuentra realizando la logistica para iniciar con los trabajos en campo y toma de topografia
La consultoría realizo Reunión del componente social enfocada en la recuperación de la línea base del diagnóstico social
Se llevaron a cabo reuniones con líderes comunitarios del corregimiento de La Italia, del consejo menor de Curundó, así como con miembros de las comunidades de Curundó y La Italia. El propósito de estos encuentros fue socializar el papel de la consultoría y fortalecer el entendimiento de la comunidad respecto al trabajo que está desarrollando la universidad en el sector. Durante las reuniones, se explicó a los asistentes que la universidad se encuentra elaborando el diseño definitivo del proyecto vial, el cual servirá como base para la futura contratación de su ejecución.
Se realizó la inspección de los predios existentes a lo largo de la vía, incluyendo los centros poblados que se encuentran en su recorrido, así como las viviendas y fincas ubicadas en los márgenes del trazado vial.
Se dio inicio al análisis del flujo vehicular registrado en el punto de aforo ubicado en el corregimiento de Opogodó, durante el período comprendido entre el 18 y el 24 de mayo de 2025, en un horario continuo de 6:00 a. m. a 10:00 p. m. Para ello, se realizó un conteo vehicular clasificado durante 16 horas continuas a lo largo del periodo de observación. Adicionalmente, se aplicaron encuestas de origen y destino entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m., durante las mismas fechas.
Gestión de la documentación y del proceso de contratación de los profesionales de la consultoría.
Socialización con los especialistas de la consultoría en las áreas de estructuras, geotecnia, geología y patología, quienes efectuaron un recorrido en campo a lo largo del tramo de estudio. Esta actividad permitió identificar los factores determinantes que afectan el comportamiento del tramo, así como detectar los puntoscríticos que requieren atención prioritaria.
Se realizó un recorrido en campo por parte de los especialistas de la consultoría en volúmenes de tránsito, catastro predial y urbanismo.
Del 20 al 23 de mayo de 2025 se realizó la visita de campo por los especialistas de la consultoría en volúmenes de predial, urbanismo, tránsito, capacidad y análisis de servicio, con el objetivo de reconocer el estado actual de la vía, inspeccionar los predios existentes a lo largo del trazado y llevar a cabo reuniones con líderes comunitarios y miembros de las comunidades.
Se realizó un recorrido desde el Cruce del Cairo hasta el corregimiento de Curundó, en el municipio de Nóvita. Durante el trayecto se llevó a cabo una inspección minuciosa de los puntos críticos y del estado actual de la vía, tomando registros fotográficos como parte del reconocimiento.
La consultoría continua con la elaboración de informe de puntos criticos de acuerdo al diagnostivo realizado por los diferentes especialistas tanto de consultoría como de interventoría en las visitas a campo en el corredor vial, con el fin de priorizar los diseños en los puntos críticos mas representativos que puedan generar la no transitabilidad por esta vía.
Se realizó otra reunión durante los recorridos en Curundó, en la que participaron miembros del Consejo Comunitario menor. En esta ocasión, el equipo informó que el trabajo en terreno se desarrollará en coordinación directa con estas comunidades. Los representantes del Consejo manifestaron su disposición a colaborar activamente, proporcionando información y acompañando el proceso para asegurar que los datos recolectados respondan a las necesidades específicas del proyecto.
1. Se llevó a cabo una visita de campo por parte de los especialistas de la consultoría, junto con los profesionales de Biología, Ingeniería Forestal y Arqueología. El objetivo fue reconocer el estado actual de la vía, inspeccionar la flora y fauna —con especial atención a las especie protegidas o en peligro de extinción—, evaluar posibles impactos ambientales, analizar la cobertura vegetal, valorar los recursos forestales y proponer medidas de manejo o compensación ante eventuales afectaciones. Así mismo, se identificaron posibles sitios arqueológicos, con el fin de proteger el patrimonio cultural y prevenir impactos durante la ejecución del proyecto
2. Durante la visita, se llevaron a cabo reuniones, de las cuales una podría considerarse satélite. La reunión principal tuvo lugar en la alcaldía, donde participaron miembros de la UMATA (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria) y de la Secretaría de Desarrollo Económico. También asistieron
representantes de Parques Nacionales, así como el equipo de profesionales de la consultoría designados a la realización de la visita de campo. En esta reunión se abordaron temas clave relacionados con la información necesaria para el desarrollo del proyecto, así como datos que ya han sido recolectados en la zona. También se discutieron recomendaciones para el levantamiento de información programado para el mes de junio. Los asistentes compartieron estudios previos realizados en la región y se comprometieron a enviar la documentación para complementar la base de datos del proyecto

1. Se realizo actividades de seguimiento a los compromisos contractuales tales como el seguimiento al trámite de las actas de costos tanto de la consultoría como de la interventoría.
2. Se realizo seguimiento a la contratación de personal de el grupo consultor e interventor.
3. Se realizo control de los compromisos de las actas de comite semanales desarrolladas con el equipo de la consultoría.
4. Se realizo diligenciamiento parcial del informe mensual de seguimiento a presentar al comite por la salvación y dignidad del Chocó, con el fin que esten al tanto del desarrollo del contrato de consultoría.

1-La consultoría realizó una reunión para la revisión de cortes y muros, en el contexto de la elaboración del presupuesto del plan de exploración del área de geotecnia, con especial énfasis en la identificación de rutas críticas. Cabe destacar que dicho presupuesto se está formulando con base en l
información proporcionada en la Fase II del proyecto.
2- La consultoría esta revisando los diseños estructurales en cada uno de los tramos, con el propósito de realizar un análisis detallado y establecer prioridades en los puntos críticos del área del proyecto
3- Se realizó una reunión sobre el volumen del diseño geométrico con los especialistas de la interventoría y la consultoría. El objetivo principal fue analizar los tramos, con especial énfasis en los tramos 1 y 2, así como sus respectivas observaciones y comentarios. Además, se definió l
metodología para la toma de información topográfica y se discutió el documento preliminar del diseño geométrico entregado
4- Se realizo Pre-comité virtual de seguimiento mensual – 29 de mayo de 2025, con la participación del equipo de consultoría, interventoría y la gestora técnica.
5- La consultoría se encuentra realizando la preparación de insumos para el levantamiento de información en campo: Se analizaron los factores del componente social, con énfasis en el contexto socioeconómico según la guía PAGA. Asimismo, se estableció la revisión y análisis del Plan de Desarrollo 2024-2027, con el fin de identificar la información secundaria relevante que aporte al estudio de la dimensión socioeconómica dentro del proceso de caracterización. Asimismo, se acordó revisar el Plan de Desarrollo 2024-2027, con el objetivo de identificar elementos relevantes que puedan aportar al estudio

1-La consultoría se encuentra realizando la logistica para realizar las actividades programadas en campo, el ingreso de los especialistas de tránsito, geología, hidrogeología
2- La consultoría se encuentra realizando el aforo vehicular y la encuesta de origen y destino en el corredor Ansermanuevo – San José del Palmar – Ansermanuevo, durante el período comprendido entre el 1 y el 9 de junio de 2025, el equipo profesional ingresó a la vereda La Carbonera, ubicada en el corregimiento de El Cairo. Posteriormente, se llevó a cabo una reunión preliminar con el equipo de trabajo para definir los roles y responsabilidades de cada integrante, así como la distribución de horarios.
El análisis del flujo vehicular se inició el 2 de junio y se extendió hasta el 8 de junio de 2025, tomando como punto de observación la vereda La Carbonera. Durante este período, se efectuó un conteo vehicular clasificado con registro continuo de 24 horas, desde las 6:00 a. m. del día en curso hasta las 6:00 a. m. del día siguiente. Adicionalmente, se aplicaron encuestas de origen y destino entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m., durante los mismos días.
3- La consultoría se encutra realizando la Formulación y Ajuste del Presupuesto para el Plan Exploratorio: Componente de Geotecnia – 03 de junio de 2025: La sección de trabajo consistió en establecer y ajustar el presupuesto necesario para la ejecución de las actividades geotécnicas del plan exploratorio, con base en los estudios técnicos, condiciones de campo y prioridades definidas.
Para ello, se actualizó el presupuesto correspondiente al componente de Geotecnia tomando como referencia la información presentada en la Fase II del proyecto. Este ajuste implicó revisar y modificar las actividades inicialmente planteadas, considerando los nuevos requerimientos identificados durante la visita de campo realizada por los especialistas del área.
Durante dicha visita, se contrastó la información derivada del volumen de diseño geométrico —especialmente en lo referente a cortes, muros proyectados y sus respectivas medidas y longitudes— con las condiciones reales observadas en el terreno. Este análisis permitió precisar la ubicación, cantidad y profundidad de los sondeos, así como definir con mayor exactitud los estudios de laboratorio y ensayos necesarios, optimizando así el alcance y los recursos asignados en el presupuesto actualizado del plan exploratorio.
4- Se realizo comite de seguimiento técnico mensual en el INVIAS Bogotá acompañados de forma virtual por los territoriales del chocó y Valle del Cauca con el fin de revisar el informe a la procuraduría y tratar temas de seguimiento a los contratos de consultoría e inteventoría en cuanto a avance fisico y avance financiero.


1- Se llevó a cabo una reunión para revisar y coordinar la Metodología propuesta por componente de gestión social para el levantamiento de línea base y coordinación componente del volumen de evaluación económica. Durante la sesión, se presentaron los lineamientos metodológicos, se discutieron los instrumentos de recolección de información, así como la estrategia de campo y las acciones de coordinación intercomponente necesarias para garantizar la coherencia y calidad de los datos. Esta reunión permitió alinear criterios técnicos entre equipos y establecer compromisos para el desarrollo articulado de lasactividades programadas.
2-los especialistas de la consultoría encargada de los volúmenes de Geotecnia, Geología y Hidrogeología realizaron una visita de campo con el objetivo de levantar información detallada del corredor vial. Durante este recorrido se inspeccionó el tramo comprendido entre el K53+643 (Curundó - La Punta) y el K104+849 (Cruce El Cairo). el equipo de Geotecnia llevó a cabo una revisión minuciosa de los posibles cortes de taludes a lo largo del trazado de la vía. Para ello, se evaluó visualmente la inclinación de los taludes, así como la presencia de señales de deterioro. Se prestó especial atención a la inclinación de la vegetación y a la Identificación de fallas geológicas, además de realizar un análisis del tipo de roca, su grado de meteorización y el buzamiento —es decir, el ángulo de inclinación de un plano geológico respecto al plano horizontal. Asimismo, se verificaron las escorrentías en los taludes y se inspeccionaron detalladamente los puntos
críticos identificados en la visita técnica anterior.
3-en lo correspondiente al levantamiento de información hidrogeológica, se realizó la búsqueda de puntos de afloramiento de agua subterránea. En este componente se visitaron alrededor de 20 puntos, consistentes principalmente en escorrentías superficiales. Aquellos puntos con indicios de posible origen subterráneo fueron analizados mediante la toma de parámetros fisicoquímicos, con el fin de establecer o descartar su clasificación como afloramientos de agua subterránea.
4- los profesionales de Geología y Geomorfología recopilaron información a lo largo de todo el corredor relacionada con la litología, la geología estructural, la geomorfología y la morfodinámica. En total, se realizaron aproximadamente 70 estaciones de campo para el control litológico, geomorfológico y estructural.
5-La especialista del volumen de Diseño Geométrico realizó la migración de los diseños preliminares generados en el programa Topo3 al entorno de Civil 3D, con el fin de facilitar su edición, análisis y compatibilidad con otros componentes del proyecto. Este proceso se llevó a cabo por tramos, garantizando una organización secuencial y coherente del corredor vial
6-se llevó a cabo reunión con profesionales del componente social, en la cual se planificaron detalladamente los tiempos y las fechas para la ejecución de las actividades de campo, estableciendo los trayectos entre las diferentes comunidades que serán visitadas para el levantamiento de información socioeconómica en el área de influencia. Además, se definieron los materiales y recursos necesarios para asegurar una recolección de datos efectiva en cada encuentro con los actores sociales. Se estableció también el número estimado de participantes por comunidad que asistirán a los espacios interactivos de participación, fomentando la acción y el compromiso comunitario. Esta planificación busca garantizar una coordinación óptima y una ejecución eficiente que permita obtener información precisa y relevante para el desarrollo del proyecto.
7-se realizó comité de seguimiento presencial entre funcionarios del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), profesionales de la consultoría, el rector de la Universidad Tecnológica del Chocó y su equipo. Durante el encuentro, se analizaron y coordinaron los aspectos técnicos, administrativos y Financieros del proyecto, con el propósito de fortalecer la colaboración entre las entidades involucradas y garantizar un desarrollo eficiente y exitoso.


1- Revisión del Diseño Geométrico de Puentes en Planta y Perfil – Tramos 1, 2, 3, 4 y 5 – Reunión del 16 de junio de 2025: Se realizó la revisión y análisis del diseño geométrico en planta y perfil de los puentes correspondientes a los tramos 1, 2, 3, 4 y 5, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los parámetros técnicos, identificar posibles ajustes y definir acciones para optimizar el proyecto. Durante este proceso, se prestó especial atención a aspectos clave del diseño, enfocándose particularmente en los puentes y en las posibles interferencias con el alineamiento del proyecto. Como resultado de la revisión, se identificaron puntos críticos que requieren atención y seguimiento para garantizar la viabilidad y seguridad de la obra. Además, se presentaron detalles técnicos relacionados con la línea de rasante, las medidas y las diferencias de cota de los puentes, subrayando la complejidad estructural y la necesidad de verificar cuidadosamente sus alturas.
2- Revisión y Ajuste del Plan Exploratorio tras la Visita de la Comisión Geotécnica — Reunión del 17 de junio de 2025: Reunión técnica llevada a cabo el 17 de junio de 2025, posterior a la visita de campo realizada por la comisión geotécnica, se revisó de manera integral el plan exploratorio propuesto para el desarrollo del proyecto. Durante el encuentro, los especialistas presentaron sus observaciones y recomendaciones con base en las condiciones reales del terreno identificadas durante el recorrido. Entre los principales ajustes se encuentran la reubicación de varios puntos de exploración, la modificación en la cantidad y profundidad de los sondeos y calicatas, así como la inclusión de ensayos geotécnicos adicionales en zonas críticas y en la rectificación del eje. Estas modificaciones responden a la necesidad de obtener una caracterización más precisa del subsuelo, especialmente en áreas con condiciones geológicas complejas o potenciales riesgos de inestabilidad.
3-Análisis preliminar de la estructura de la matriz de integración de los criterios de sostenibilidad con las áreas de estudio del proyecto – Sección de trabajo del 19 de junio de 2025: En esta sección se realiza un análisis preliminar de los criterios de sostenibilidad que deberán ser incorporados en las diferentes áreas de estudio del proyecto, con el propósito de que los especialistas encargados de los estudios y diseños incluyan estos criterios para que en las etapas futuras del proyecto sirvan como instrumentos de verificación y evaluación de las diferentes dimensiones de la sostenibilidad

1- Entre el 01 y el 08 de julio de 2025 se lleva a cabo la aplicación de encuestas de origen y destino en el corredor Ánimas – Cartago – Ánimas, como parte del estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio. julio, el equipo profesional ingresó al municipio de Unión Panamericana, estableciendo como punto principal de recolección de información la cabecera municipal de Las Ánimas. A partir de esa fecha, se inició la implementación de las encuestas, las cuales se están desarrollando en el horario comprendido entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m.
2- Entre el 01 y el 05 de julio de 2025, se llevó a cabo una visita de campo por parte de los especialistas de la consultoría en los volúmenes de Geotecnia, Hidrología, Hidráulica, Socavación y Geología. El propósito principal de esta actividad fue realizar una revisión detallada de las condiciones hidráulicas del corredor vial, así como de las afectaciones geológicas y los aspectos relacionados con la estabilidad de taludes. Como parte del recorrido, el equipo técnico inspeccionó el trayecto comprendido entre el Cruce del Cairo y el corregimiento de Curundó, en el municipio de Novita. Durante esta inspección se realizó una evaluación minuciosa de los puntos críticos identificados a lo largo del corredor, documentando el estado actual de la vía mediante evidencia fotográfica y observaciones técnicas en terreno. En el desarrollo de las actividades también se realizó la búsqueda e inspección de nacederos de agua ubicados dentro del área de influencia del proyecto, con el acompañamiento del equipo de hidráulica y de personas de la comunidad conocedoras del territorio. Esta tarea permitió abordar de forma integral aspectos
geológicos y geotécnicos, además de caracterizar un total de ocho (8) puntos de agua, en los que se tomaron parámetros fisicoquímicos para determinar la posible presencia de aguas subterráneas. Tmbien se reviso en campo 1. Identificación de obras de arte existentes. 2. Localización de cuerpos de agua en el corredor. 3. Reconocimiento de escorrentías y aguas de filtración presentes en el área de estudio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

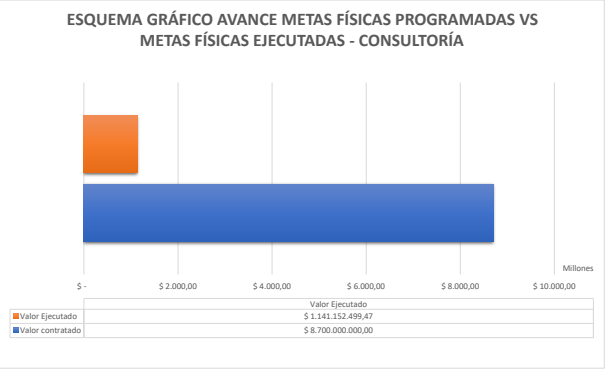

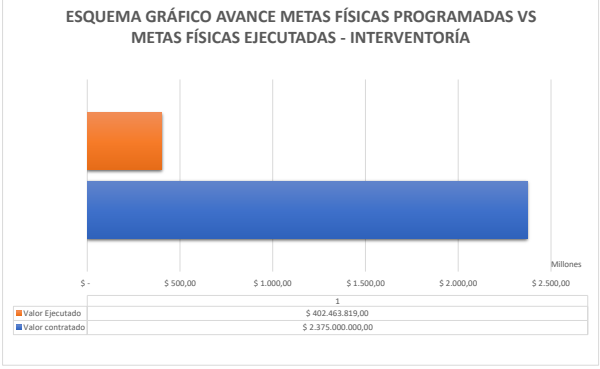


El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.


XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Encuestas de Origen y Destino - Animas del 01 al 08 de julio de 2025


Encuestas de Origen y Destino - Animas del 01 al 08 de julio de 2025


Encuestas de Origen y Destino - Animas del 01 al 08 de julio de 2025


Comité técnico de seguimiento semanal 03/07/2025


Comité técnico de seguimiento semanal 10/07/2025


Visita de campo especialistas de Geotecnia, Hidrología, Hidráulica y Socavación y Geología


Visita de campo especialistas de Geotecnia, Hidrología, Hidráulica y Socavación y Geología


Visita de campo especialistas de Geotecnia, Hidrología, Hidráulica y Socavación y Geología


Visita de campo especialistas de Geotecnia, Hidrología, Hidráulica y Socavación y Geología

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONSULTOR	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: Jose Octavio Niño Brijaldo Matrícula Profesional No.: 01193-0243

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ — SEMANA No.: 32 del 7-jul al 12-jul — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: YENNY XIOMARA HERNANDEZ P

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORÍA: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VOLÚMENES O PRODUCTOS TÉCNICOS ENTREGABLES DE FASE III: 1. Entregable estudios topográficos; 2 entregable estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio; 3 entregable estudio de trazado y diseño geométrico; 4 entregable estudio de seguridad vial; 5 entregable estudio de geología y geomorfología local; 6 entregable estudio de hidrogeología de detalle; 7 entregable estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y puentes de materiales; 8 entregable estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; 9 entregable hidráulica, hidrología, y socavación; 10 entregable estudio y diseño de pavimentos; 11 entregable estudio y diseño de estructuras; 12 entregable estudio de urbanismo y paisajismo; 13 estudio redes hidrosanitarias y secas; 14 entregable estudio de riesgos; 15 entregable estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones; 16 entregable evaluación socioeconómica y financiera del proyecto; 17 entregable ambiental, social, predial y sostenibilidad; 18 entregable volumen técnico de BIM; 19 entregable informe final.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA, lo cual incluye el desarrollo de 19 volúmenes.

CONTRATO DE CONSULTORÍA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONSULTORÍA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA			INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4227 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00	CONTRATO No.	4262 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 8.700.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 4.350.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 1.187.500.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024			
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.187.500.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.187.500.000			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORÍA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA (A):	$ 8.700.000.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.185.440.000,00	25,12%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.232.938.604,73	14,17%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (952.501.395,27)	-10,95%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.185.440.000,00	25,12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.232.938.604,73	14,17%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (952.501.395,27)	-10,95%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 132.148.605,00	1,52%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.068.435,00	0,45%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: MAYO
VALOR FACTURA: $ 182.492.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: En tramite acta de costos del mes de diciembre y enero en el Instituto Nacional de Vías INVIAS

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 493.938.952,00	20,80%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 402.463.819,00	16,95%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 31.291.952,00	1,32%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 64.694.419,00	2,72%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: MAYO
VALOR FACTURA: $ 51.962.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.350.000.000,00
Amortizado $	$ 454.876.000
Saldo $	$ 3.895.124.000,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	$ -
Acumulado:	$ -

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.187.500.000,00
Amortizado $	$ 337.769.400
Saldo $	$ 849.730.600,00

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 25,12% Avance o Atraso Físico % -10,95%
Meta Física Ejecutada % 14,17%

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL													
Meta Física (Programa de consultoría) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**								
Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**TRAMO 1**					**Total**	**%**
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	UND		2024	2024	Prog	$ 1.430.754.000,00					$ 1.430.754.000,00	16,445%
					Ejec	$ 735.678.000,00					$ 735.678.000,00	8,456%

	GRUPO 2 -COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES												
	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**							
	Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**TRAMO 1**					**Total**	**%**
1	VOLUMEN I. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.	UND		2025	2025	Prog	$ 69.000.000,00					$ 69.000.000,00	0,79%
						Ejec	$ 3.450.000,00					$ 3.450.000,00	0,04%
2	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO.	UND		2025	2025	Prog	$ 60.000.000,00					$ 60.000.000,00	0,69%
						Ejec	$ 3.000.000,00					$ 3.000.000,00	
3	VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO.	UND		2025	2025	Prog	$ 165.000.000,00					$ 165.000.000,00	1,90%
						Ejec	$ 107.250.000,00					$ 107.250.000,00	
4	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL.	UND		2025	2025	Prog	$ 42.000.000,00					$ 42.000.000,00	0,48%
						Ejec	$ 2.100.000,00					$ 2.100.000,00	
5	VOLUMEN V. ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA LOCAL.	UND		2025	2025	Prog	$ 106.000.000,00					$ 106.000.000,00	1,22%
						Ejec	$ 5.300.000,00					$ 5.300.000,00	
6	VOLUMEN VI. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	UND		2025	2025	Prog	$ 125.000.000,00					$ 125.000.000,00	1,44%
						Ejec	$ 6.250.000,00					$ 6.250.000,00	
	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES.	UND		2025	2025	Prog	$ 368.000.000,00					$ 368.000.000,00	4,23%
						Ejec	$ 18.400.000,00					$ 18.400.000,00	
	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 235.000.000,00					$ 235.000.000,00	2,70%
						Ejec	$ 11.750.000,00					$ 11.750.000,00	
	VOLUMEN IX. HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN.	UND		2025	2025	Prog	$ 190.000.000,00					$ 190.000.000,00	2,18%
						Ejec	$ 9.500.000,00					$ 9.500.000,00	
	VOLUMEN X. ESTUDIO Y DISEÑOS DE PAVIMENTO.	UND		2025	2025	Prog	$ 73.000.000,00					$ 73.000.000,00	0,84%
						Ejec	$ 3.650.000,00					$ 3.650.000,00	
	VOLUMEN XI. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 481.000.000,00					$ 481.000.000,00	5,53%
						Ejec	$ 24.050.000,00					$ 24.050.000,00	
7	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.	UND		2025	2025	Prog	$ 57.000.000,00					$ 57.000.000,00	0,66%
						Ejec	$ 2.850.000,00					$ 2.850.000,00	
	VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 47.000.000,00					$ 47.000.000,00	0,54%
						Ejec	$ 2.350.000,00					$ 2.350.000,00	
	VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE RIESGOS	UND		2025	2025	Prog	$ 93.000.000,00					$ 93.000.000,00	1,07%
						Ejec	$ 4.650.000,00					$ 4.650.000,00	
8	VOLUMEN XV. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE OBRA	UND		2025	2025	Prog	$ 56.000.000,00					$ 56.000.000,00	0,64%
						Ejec	$ 2.800.000,00					$ 2.800.000,00	
9	VOLUMEN XVI. EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL	UND		2025	2025	Prog	$ 54.000.000,00					$ 54.000.000,00	0,62%
						Ejec	$ 2.700.000,00					$ 2.700.000,00	
10	VOLUMEN XVII. AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD.	UND		2025	2025	Prog	$ 423.000.000,00					$ 423.000.000,00	4,86%
						Ejec	$ 21.150.000,00					$ 21.150.000,00	
11	VOLUMEN XVIII. VOLUMEN TÉCNICO BIM	UND		2025	2025	Prog	$ 46.000.000,00					$ 46.000.000,00	0,53%
						Ejec	$ 2.300.000,00					$ 2.300.000,00	
	COSTO TOTAL ENTREGABLES					Prog						**$ 2.690.000.000,00**	30,9%
						Ejec						**$ 233.500.000,00**	10,7%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4:

GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS

Meta Física (Programa de consultoría) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	TRAMO 1					Total	%
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		2025	2025	Prog	$ 4.579.246.000,00					$ 4.579.246.000,00	52,635%
					Ejec	$ 96.630.952,00					$ 96.630.952,00	1,111%

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONS	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La consultoría envía el 16 de diciembre de 2024 en comunicación DC-009-2024 el Plan de ejecución BIM
Se realiza una reunión con la consultoría, interventoría y con el área BIM del INVIAS para definir los lineamientos para la entrega de este documento el día 16 de diciembre de 2024
El día 23 de diciembre de 2024 la interventoría envía en comunicación C4262-009-2024 observaciones al plan de ejecución BIM y reitera estas observaciones el 21 de enero de 2025.
Se realiza reunión presencial en las instalaciones del INVIAS Bogotá con el área ambiental y social con el fin de discutir lineamientos para la ejecución elaboración y entrega del Volumen XVII de los estudios ambiental y social, predial y sostenibilidad el día 19 de diciembre de 2024, de esta reunión se acuerda una reunión virtual para el día 26 de diciembre con el área de sostenibilidad, ambiental, social, predial del INVIAS en donde el consultor expondrá una propuesta para el desarrollo de este volumen y que todas las partes que revisan este documento estén de acuerdo con su ejecución para no tener retrocesos.
El día 27 de enero la consultoría envía ajustado el Plan de ejecución BIM, se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
Se realizo comite tecnico de seguimiento el 29 de enero de 2025 en donde se trataron temas de la entrega de la información de los estudios y diseños del contrato 1666 de 2015 para que la consultoría realice la revisión de esta información especifique por medio de un diagnostico que información hay y que información falta y plantee un presupuesto de las actividades que hacen falta para
Se realizo comité técnico de seguimiento el 06 de febrero de 2025
Se realizo comité técnico de seguimiento el 12 de febrero de 2025
La consultoría entrega plan de contingencia por tanto a la fecha según nueva programación no presenta atraso
La consultoría envia la metodología del Volumen III. Estudio de trazado y diseño Geométrico.
La consultoría envia la metodología del Volumen VII. Estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y fuentes de materiales
La consultoría envia la metodología del Volumen VIII. Estudio de suelos para diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras
La consultoría envia la metodología del Volumen I. Estudios topograficos
La consultoría envia la metodología del Volumen II. Estudio de Transito, capacidad y niveles de servicio
La consultoría envia la metodología del Volumen XI. Estudio y diseño de estructuras
La consultoría envia la metodología del Volumen X. Hidraulica, Hidrologia y Socavación
La consultoría envia la metodología del Volumen XV. Estudio de cantidades de obra, ánalisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones
La consultoría envia la metodología del Volumen XVIII. Volúmen Técnico BIM
Reunión profesionales BIM Consultoría e Interventoría
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 06 de marzo de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 13 de marzo de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 20 de marzo de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 28 de marzo de 2025
La consultoría envia la metodología del Volumen V. Estudio de Geología y Geomorfologia local
La consultoría envia la metodología del Volumen VI. Estudio de Hidrogeología de detalle
La consultoría envia la metodología del Volumen X. Estudio y diseño de pavimentos
La consultoría envia la metodología del Volumen XII. Estudio de urbanismo y paisajismo
La consultoría envia la metodología del Volumen XIII. Estudio de redes hidrosanitarias secas
La consultoría envia la metodología del Volumen XIV. Estudios de riesgos
La consultoría envia la metodología del Volumen XVI. Evaluación socioeconomica y financiera del proyecto
La consultoría envia la metodología del Volumen XVII. Ambiental, social, predial y sostenibilidad
La consultoría envia informe preliminar del volumen III. Estudio de trazado y Diseño Geometrico
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 03 de abril de 2025
Se realizo socializaciáon del plan de ejecución Bim BEP el 07 de abril de 2025 con la consultoría, ingterventoría e invias
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 10 de abril de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 24 de abril de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento mensual presencial el día 25 de abril de 2025
Se realiza mesa de trabajo BIM entre consultoría e interventoría el 29 de abril de 2025 con los especialistas del área BIM de la interventoría y la consultoría con el fin de determinar los softwares y accesos de la consultoría, interventoría e INVIAS en el marco del Proyecto.
Comité de seguimiento virtual – 08 de mayo de 2025, con la participación del equipo de consultoría, interventoría y la gestora técnica.
La consultoría se encuengtra realizando reuniones con sus profesionales especialistas respecto a cambios generados por las modificaciones en el diseño geometrico mediante el trazada y las posibles afectaciones prediales resultantes y se encuentra realizando el diagnostico del preuspuesto del plan de exploración del componente de Geotecnica y Patología estructural.
Se realizo socialización en el Municipio de San Jose del Palmar el día 12 y 13 de mayo de 2025 con las comunidades de Novita, San Jose del Palmar, El Cairo, La Italia.
Se realizo recorrido los días 14 y 15 de mayo con el área técnica y de Diseño geometrico desde la Punta a Cruce el Cairo, se tomó georeferenciación de los puntos criticos del corredor
Se realizo recorrido los días 15 y 16 de mayo con los especialistas de estructuras y geotecnia de la consultoría e interventoría con el fin de revisar las estructuras existentes desde el punto de vista estructural y de los tramos criticos desde el punto de vista geotecnico.
Se realiza comité tecnico de seguimiento semanal el día 20 de mayo de 2025
La consultoría se encuentra realizando la logistica para iniciar con los trabajos en campo y toma de topografia
La consultoría realizo Reunión del componente social enfocada en la recuperación de la línea base del diagnóstico social
Se llevaron a cabo reuniones con líderes comunitarios del corregimiento de La Italia, del consejo menor de Curundó, así como con miembros de las comunidades de Curundó y La Italia. El propósito de estos encuentros fue socializar el papel de la consultoría y fortalecer el entendimiento de la comunidad respecto al trabajo que está desarrollando la universidad en el sector. Durante las reuniones, se explicó a los asistentes que la universidad se encuentra elaborando el diseño definitivo del proyecto vial, el cual servirá como base para la futura contratación de su ejecución.
Se realizó la inspección de los predios existentes a lo largo de la vía, incluyendo los centros poblados que se encuentran en su recorrido, así como las viviendas y fincas ubicadas en los márgenes del trazado vial.
Se dio inicio al análisis del flujo vehicular registrado en el punto de aforo ubicado en el corregimiento de Opogodó, durante el período comprendido entre el 18 y el 24 de mayo de 2025, en un horario continuo de 6:00 a. m. a 10:00 p. m. Para ello, se realizó un conteo vehicular clasificado durante 16 horas continuas a lo largo del periodo de observación. Adicionalmente, se aplicaron encuestas de origen y destino entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m., durante las mismas fechas.
Gestión de la documentación y del proceso de contratación de los profesionales de la consultoría.
Socialización con los especialistas de la consultoría en las áreas de estructuras, geotecnia, geología y patología, quienes efectuaron un recorrido en campo a lo largo del tramo de estudio. Esta actividad permitió identificar los factores determinantes que afectan el comportamiento del tramo, así como detectar los puntoscríticos que requieren atención prioritaria.
Se realizó un recorrido en campo por parte de los especialistas de la consultoría en volúmenes de tránsito, catastro predial y urbanismo.
Del 20 al 23 de mayo de 2025 se realizó la visita de campo por los especialistas de la consultoría en volúmenes de predial, urbanismo, tránsito, capacidad y análisis de servicio, con el objetivo de reconocer el estado actual de la vía, inspeccionar los predios existentes a lo largo del trazado y llevar a cabo reuniones con líderes comunitarios y miembros de las comunidades.
Se realizó un recorrido desde el Cruce del Cairo hasta el corregimiento de Curundó, en el municipio de Nóvita. Durante el trayecto se llevó a cabo una inspección minuciosa de los puntos críticos y del estado actual de la vía, tomando registros fotográficos como parte del reconocimiento.
La consultoría continua con la elaboración de informe de puntos criticos de acuerdo al diagnostivo realizado por los diferentes especialistas tanto de consultoría como de interventoría en las visitas a campo en el corredor vial, con el fin de priorizar los diseños en los puntos críticos mas representativos que puedan generar la no transitabilidad por esta vía.
Se realizó otra reunión durante los recorridos en Curundó, en la que participaron miembros del Consejo Comunitario menor. En esta ocasión, el equipo informó que el trabajo en terreno se desarrollará en coordinación directa con estas comunidades. Los representantes del Consejo manifestaron su disposición a colaborar activamente, proporcionando información y acompañando el proceso para asegurar que los datos recolectados respondan a las necesidades específicas del proyecto.
1. Se llevó a cabo una visita de campo por parte de los especialistas de la consultoría, junto con los profesionales de Biología, Ingeniería Forestal y Arqueología. El objetivo fue reconocer el estado actual de la vía, inspeccionar la flora y fauna —con especial atención a las especie protegidas o en peligro de extinción—, evaluar posibles impactos ambientales, analizar la cobertura vegetal, valorar los recursos forestales y proponer medidas de manejo o compensación ante eventuales afectaciones. Así mismo, se identificaron posibles sitios arqueológicos, con el fin de proteger el patrimonio cultural y prevenir impactos durante la ejecución del proyecto
2. Durante la visita, se llevaron a cabo reuniones, de las cuales una podría considerarse satélite. La reunión principal tuvo lugar en la alcaldía, donde participaron miembros de la UMATA (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria) y de la Secretaría de Desarrollo Económico. También asistieron
representantes de Parques Nacionales, así como el equipo de profesionales de la consultoría designados a la realización de la visita de campo. En esta reunión se abordaron temas clave relacionados con la información necesaria para el desarrollo del proyecto, así como datos que ya han sido recolectados en la zona. También se discutieron recomendaciones para el levantamiento de información programado para el mes de junio. Los asistentes compartieron estudios previos realizados en la región y se comprometieron a enviar la documentación para complementar la base de datos del proyecto

1. Se realizo actividades de seguimiento a los compromisos contractuales tales como el seguimiento al trámite de las actas de costos tanto de la consultoría como de la interventoría.
2. Se realizo seguimiento a la contratación de personal de el grupo consultor e interventor.
3. Se realizo control de los compromisos de las actas de comite semanales desarrolladas con el equipo de la consultoría.
4. Se realizo diligenciamiento parcial del informe mensual de seguimiento a presentar al comite por la salvación y dignidad del Chocó, con el fin que esten al tanto del desarrollo del contrato de consultoría.

1-La consultoría realizó una reunión para la revisión de cortes y muros, en el contexto de la elaboración del presupuesto del plan de exploración del área de geotecnia, con especial énfasis en la identificación de rutas críticas. Cabe destacar que dicho presupuesto se está formulando con base en l
información proporcionada en la Fase II del proyecto.
2- La consultoría esta revisando los diseños estructurales en cada uno de los tramos, con el propósito de realizar un análisis detallado y establecer prioridades en los puntos críticos del área del proyecto
3- Se realizó una reunión sobre el volumen del diseño geométrico con los especialistas de la interventoría y la consultoría. El objetivo principal fue analizar los tramos, con especial énfasis en los tramos 1 y 2, así como sus respectivas observaciones y comentarios. Además, se definió l
metodología para la toma de información topográfica y se discutió el documento preliminar del diseño geométrico entregado
4- Se realizo Pre-comité virtual de seguimiento mensual – 29 de mayo de 2025, con la participación del equipo de consultoría, interventoría y la gestora técnica. 5- La consultoría se encuentra realizando la preparación de insumos para el levantamiento de
información en campo: Se analizaron los factores del componente social, con énfasis en el contexto socioeconómico según la guía PAGA. Asimismo, se estableció la revisión y análisis del Plan de Desarrollo 2024-2027, con el fin de identificar la información secundaria relevante que aporte al estudio de la dimensión socioeconómica dentro del proceso de caracterización. Asimismo, se acordó revisar el Plan de Desarrollo 2024-2027, con el objetivo de identificar elementos relevantes que puedan aportar al estudio

1-La consultoría se encuentra realizando la logistica para realizar las actividades programadas en campo, el ingreso de los especialistas de tránsito, geología, hidrogeología
2- La consultoría se encuentra realizando el aforo vehicular y la encuesta de origen y destino en el corredor Ansermanuevo – San José del Palmar – Ansermanuevo, durante el período comprendido entre el 1 y el 9 de junio de 2025, el equipo profesional ingresó a la vereda La Carbonera, ubicada en el corregimiento de El Cairo. Posteriormente, se llevó a cabo una reunión preliminar con el equipo de trabajo para definir los roles y responsabilidades de cada integrante, así como la distribución de horarios.
El análisis del flujo vehicular se inició el 2 de junio y se extendió hasta el 8 de junio de 2025, tomando como punto de observación la vereda La Carbonera. Durante este período, se efectuó un conteo vehicular clasificado con registro continuo de 24 horas, desde las 6:00 a. m. del día en curso hasta las 6:00 a. m. del día siguiente. Adicionalmente, se aplicaron encuestas de origen y destino entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m., durante los mismos días.
3- La consultoría se encutra realizando la Formulación y Ajuste del Presupuesto para el Plan Exploratorio: Componente de Geotecnia – 03 de junio de 2025: La sección de trabajo consistió en establecer y ajustar el presupuesto necesario para la ejecución de las actividades geotécnicas del plan exploratorio, con base en los estudios técnicos, condiciones de campo y prioridades definidas.
Para ello, se actualizó el presupuesto correspondiente al componente de Geotecnia tomando como referencia la información presentada en la Fase II del proyecto. Este ajuste implicó revisar y modificar las actividades inicialmente planteadas, considerando los nuevos requerimientos identificados durante la visita de campo realizada por los especialistas del área.
Durante dicha visita, se contrastó la información derivada del volumen de diseño geométrico —especialmente en lo referente a cortes, muros proyectados y sus respectivas medidas y longitudes— con las condiciones reales observadas en el terreno. Este análisis permitió precisar la ubicación, cantidad y profundidad de los sondeos, así como definir con mayor exactitud los estudios de laboratorio y ensayos necesarios, optimizando así el alcance y los recursos asignados en el presupuesto actualizado del plan exploratorio.
4- Se realizo comite de seguimiento técnico mensual en el INVIAS Bogotá acompañados de forma virtual por los territoriales del chocó y Valle del Cauca con el fin de revisar el informe a la procuraduría y tratar temas de seguimiento a los contratos de consultoría e inteventoría en cuanto a avance fisico y avance financiero.

1- Se llevó a cabo una reunión para revisar y coordinar la Metodología propuesta por componente de gestión social para el levantamiento de línea base y coordinación componente del volumen de evaluación económica. Durante la sesión, se presentaron los lineamientos metodológicos, se discutieron los instrumentos de recolección de información, así como la estrategia de campo y las acciones de coordinación intercomponente necesarias para garantizar la coherencia y calidad de los datos. Esta reunión permitió alinear criterios técnicos entre equipos y establecer compromisos para el desarrollo articulado de lasactividades programadas.
2-los especialistas de la consultoría encargada de los volúmenes de Geotecnia, Geología y Hidrogeología realizaron una visita de campo con el objetivo de levantar información detallada del corredor vial. Durante este recorrido se inspeccionó el tramo comprendido entre el K53+643 (Curundó - La Punta) y el K104+849 (Cruce El Cairo). el equipo de Geotecnia llevó a cabo una revisión minuciosa de los posibles cortes de taludes a lo largo del trazado de la vía. Para ello, se evaluó visualmente la inclinación de los taludes, así como la presencia de señales de deterioro. Se prestó especial atención a la inclinación de la vegetación y a la Identificación de fallas geológicas, además de realizar un análisis del tipo de roca, su grado de meteorización y el buzamiento —es decir, el ángulo de inclinación de un plano geológico respecto al plano horizontal. Asimismo, se verificaron las escorrentías en los taludes y se inspeccionaron detalladamente los puntos
críticos identificados en la visita técnica anterior.
3-en lo correspondiente al levantamiento de información hidrogeológica, se realizó la búsqueda de puntos de afloramiento de agua subterránea. En este componente se visitaron alrededor de 20 puntos, consistentes principalmente en escorrentías superficiales. Aquellos puntos con indicios de posible origen subterráneo fueron analizados mediante la toma de parámetros fisicoquímicos, con el fin de establecer o descartar su clasificación como afloramientos de agua subterránea.
4- los profesionales de Geología y Geomorfología recopilaron información a lo largo de todo el corredor relacionada con la litología, la geología estructural, la geomorfología y la morfodinámica. En total, se realizaron aproximadamente 70 estaciones de campo para el control litológico, geomorfológico y estructural.
5-La especialista del volumen de Diseño Geométrico realizó la migración de los diseños preliminares generados en el programa Topo3 al entorno de Civil 3D, con el fin de facilitar su edición, análisis y compatibilidad con otros componentes del proyecto. Este proceso se llevó a cabo por tramos, garantizando una organización secuencial y coherente del corredor vial
6-se llevó a cabo reunión con profesionales del componente social, en la cual se planificaron detalladamente los tiempos y las fechas para la ejecución de las actividades de campo, estableciendo los trayectos entre las diferentes comunidades que serán visitadas para el levantamiento de información socioeconómica en el área de influencia. Además, se definieron los materiales y recursos necesarios para asegurar una recolección de datos efectiva en cada encuentro con los actores sociales. Se estableció también el número estimado de participantes por comunidad que asistirán a los espacios interactivos de participación, fomentando la acción y el compromiso comunitario. Esta planificación busca garantizar una coordinación óptima y una ejecución eficiente que permita obtener información precisa y relevante para el desarrollo del proyecto.
7-se realizó comité de seguimiento presencial entre funcionarios del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), profesionales de la consultoría, el rector de la Universidad Tecnológica del Chocó y su equipo. Durante el encuentro, se analizaron y coordinaron los aspectos técnicos, administrativos y Financieros del proyecto, con el propósito de fortalecer la colaboración entre las entidades involucradas y garantizar un desarrollo eficiente y exitoso.


1- Revisión del Diseño Geométrico de Puentes en Planta y Perfil – Tramos 1, 2, 3, 4 y 5 – Reunión del 16 de junio de 2025: Se realizó la revisión y análisis del diseño geométrico en planta y perfil de los puentes correspondientes a los tramos 1, 2, 3, 4 y 5, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los parámetros técnicos, identificar posibles ajustes y definir acciones para optimizar el proyecto. Durante este proceso, se prestó especial atención a aspectos clave del diseño, enfocándose particularmente en los puentes y en las posibles interferencias con el alineamiento del proyecto. Como resultado de la revisión, se identificaron puntos críticos que requieren atención y seguimiento para garantizar la viabilidad y seguridad de la obra. Además, se presentaron detalles técnicos relacionados con la línea de rasante, las medidas y las diferencias de cota de los puentes, subrayando la complejidad estructural y la necesidad de verificar cuidadosamente sus alturas.
2- Revisión y Ajuste del Plan Exploratorio tras la Visita de la Comisión Geotécnica — Reunión del 17 de junio de 2025: Reunión técnica llevada a cabo el 17 de junio de 2025, posterior a la visita de campo realizada por la comisión geotécnica, se revisó de manera integral el plan exploratorio propuesto para el desarrollo del proyecto. Durante el encuentro, los especialistas presentaron sus observaciones y recomendaciones con base en las condiciones reales del terreno identificadas durante el recorrido. Entre los principales ajustes se encuentran la reubicación de varios puntos de exploración, la modificación en la cantidad y profundidad de los sondeos y calicatas, así como la inclusión de ensayos geotécnicos adicionales en zonas críticas y en la rectificación del eje. Estas modificaciones responden a la necesidad de obtener una caracterización más precisa del subsuelo, especialmente en áreas con condiciones geológicas complejas o potenciales riesgos de inestabilidad.
3-Análisis preliminar de la estructura de la matriz de integración de los criterios de sostenibilidad con las áreas de estudio del proyecto – Sección de trabajo del 19 de junio de 2025: En esta sección se realiza un análisis preliminar de los criterios de sostenibilidad que deberán ser incorporados en las diferentes áreas de estudio del proyecto, con el propósito de que los especialistas encargados de los estudios y diseños incluyan estos criterios para que en las etapas futuras del proyecto sirvan como instrumentos de verificación y evaluación de las diferentes dimensiones de la sostenibilidad


1- Entre el 01 y el 08 de julio de 2025 se lleva a cabo la aplicación de encuestas de origen y destino en el corredor Ánimas – Cartago – Ánimas, como parte del estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio. julio, el equipo profesional ingresó al municipio de Unión Panamericana, estableciendo como punto principal de recolección de información la cabecera municipal de Las Ánimas. A partir de esa fecha, se inició la implementación de las encuestas, las cuales se están desarrollando en el horario comprendido entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m.
2- Entre el 01 y el 05 de julio de 2025, se llevó a cabo una visita de campo por parte de los especialistas de la consultoría en los volúmenes de Geotecnia, Hidrología, Hidráulica, Socavación y Geología. El propósito principal de esta actividad fue realizar una revisión detallada de las condiciones hidráulicas del corredor vial, así como de las afectaciones geológicas y los aspectos relacionados con la estabilidad de taludes. Como parte del recorrido, el equipo técnico inspeccionó el trayecto comprendido entre el Cruce del Cairo y el corregimiento de Curundó, en el municipio de Novita. Durante esta inspección se realizó una evaluación minuciosa de los puntos críticos identificados a lo largo del corredor, documentando el estado actual de la vía mediante evidencia fotográfica y observaciones técnicas en terreno. En el desarrollo de las actividades también se realizó la búsqueda e inspección de nacederos de agua ubicados dentro del área de influencia del proyecto, con el acompañamiento del equipo de hidráulica y de personas de la comunidad conocedoras del territorio. Esta tarea permitió abordar de forma integral aspectos
geológicos y geotécnicos, además de caracterizar un total de ocho (8) puntos de agua, en los que se tomaron parámetros fisicoquímicos para determinar la posible presencia de aguas subterráneas. Tmbien se reviso en campo 1. Identificación de obras de arte existentes. 2. Localización de cuerpos de agua en el corredor. 3. Reconocimiento de escorrentías y aguas de filtración presentes en el área de estudio.

1- Se realizo socialización segundo espacio con el consejo comunitario mayor de Novita COCOMAN dando cumplimiento a los requerimientos de la MEC y del representante legal vigente 2- La consultoría envío PLan de Exploración Geotecnica de los tramos 1, 4 y 5 los cuales se encuentran en reviisón por parte de la interventoría 3- La consultoría envía informe preliminar del volumen 5 Estudio de Geologia y Geomorfología local el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría
4-Se llevó a cabo una reunión técnica sobre diseño geométrico y topografía, en la cual se identificó como principal dificultad la falta de información topográfica, situación que ha impactado negativamente el desarrollo de la fase 3 del proyecto. Ante esto, se acordó priorizar la recolección de dicha información y se recomendó a los profesionales realizar una revisión minuciosa de los insumos disponibles, con el fin de precisar el estado actual de la documentación. Asimismo, se ajustó el formato del informe técnico para alinearlo con los estándares exigidos por la consultoría e interventoría. Durante la sesión también se abordaron posibles ajustes al cronograma y presupuesto, incluyendo la eventual modificación del contrato inicial, y se acordó avanzar en los análisis técnicos y jurídicos correspondientes.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

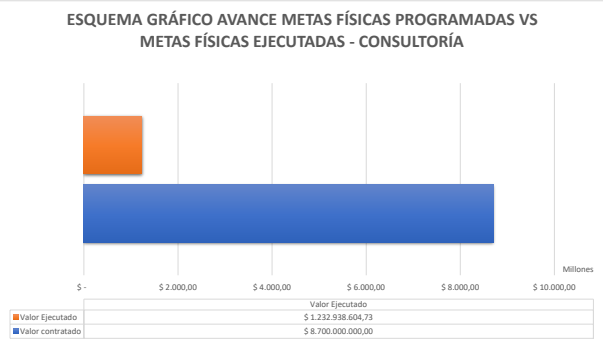

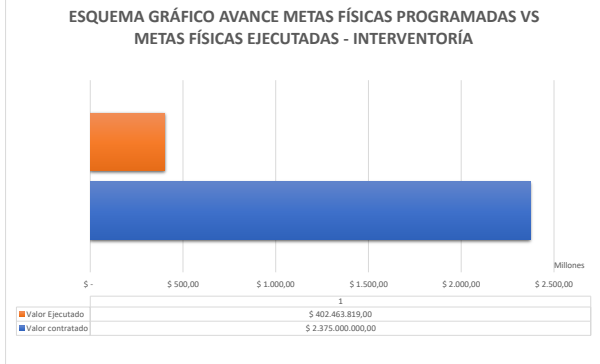


El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO






Reunión INVIAS – CONSULTORÍA- INTERVENTORÍA 16/07/2025

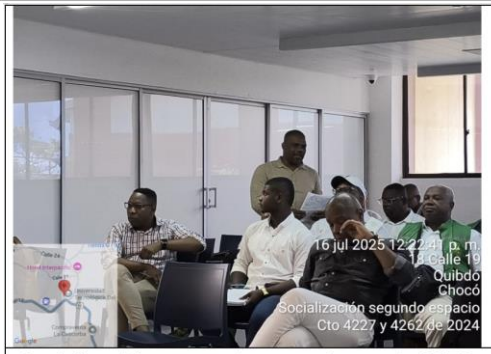



Socialización segundo espacio con la MEC y con el consejo comunitario de Novita COCOMAN



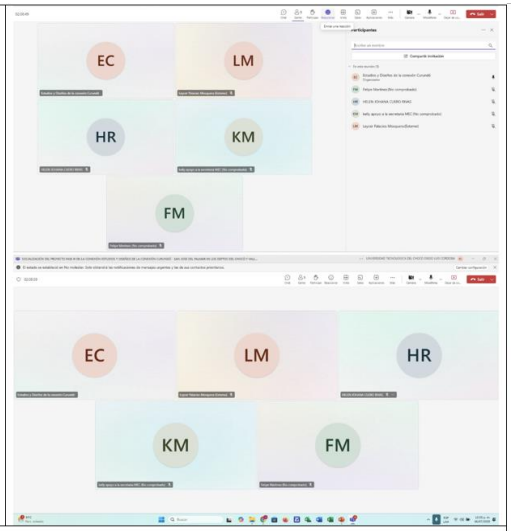

Socialización segundo espacio con la MEC y con el consejo comunitario de Novita COCOMAN

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONSULTOR	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: Jose Octavio Niño Brijaldo Matrícula Profesional No.: 01193-0243

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ — SEMANA No.: 33 del 14-jul al 19-jul — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: YENNY XIOMARA HERNANDEZ P

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORÍA: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VOLÚMENES O PRODUCTOS TÉCNICOS ENTREGABLES DE FASE III: 1. Entregable estudios topográficos; 2 entregable estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio; 3 entregable estudio de trazado y diseño geométrico; 4 entregable estudio de seguridad vial; 5 entregable estudio de geología y geomorfología local; 6 entregable estudio de hidrogeología de detalle; 7 entregable estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y puentes de materiales; 8 entregable estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; 9 entregable hidráulica, hidrología, y socavación; 10 entregable estudio y diseño de pavimentos; 11 entregable estudio y diseño de estructuras; 12 entregable estudio de urbanismo y paisajismo; 13 estudio redes hidrosanitarias y secas; 14 entregable estudio de riesgos; 15 entregable estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones; 16 entregable evaluación socioeconómica y financiera del proyecto; 17 entregable ambiental, social, predial y sostenibilidad; 18 entregable volumen técnico de BIM; 19 entregable informe final.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA, lo cual incluye el desarrollo de 19 volúmenes.

CONTRATO DE CONSULTORÍA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONSULTORÍA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA			INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4227 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00	CONTRATO No.	4262 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 8.700.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 4.350.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 1.187.500.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024			
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.187.500.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.187.500.000			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORÍA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA (A):	$ 8.700.000.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.296.800.000,00	26,40%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.274.584.183,68	14,65%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.022.215.816,32)	-11,75%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.296.800.000,00	26,40%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.274.584.183,68	14,65%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.022.215.816,32)	-11,75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 132.148.605,00	1,52%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.068.435,00	0,45%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: MAYO
VALOR FACTURA: $ 182.492.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: En tramite acta de costos del mes de diciembre y enero en el Instituto Nacional de Vías INVIAS

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 493.938.952,00	20,80%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 402.463.819,00	16,95%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 31.291.952,00	1,32%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 64.694.419,00	2,72%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: MAYO
VALOR FACTURA: $ 51.962.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.350.000.000,00
Amortizado $	$ 454.876.000
Saldo $	$ 3.895.124.000,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	$ -
Acumulado:	$ -

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.187.500.000,00
Amortizado $	$ 337.769.400
Saldo $	$ 849.730.600,00

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 26,40% Avance o Atraso Físico % -11,75%
Meta Física Ejecutada % 14,65%

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL													
Meta Física (Programa de consultoría) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**								
Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**TRAMO 1**					**Total**	**%**
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	UND		2024	2024	Prog	$ 1.430.754.000,00					$ 1.430.754.000,00	16,445%
					Ejec	$ 735.678.000,00					$ 735.678.000,00	8,456%

	GRUPO 2 -COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES												
	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**							
	Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**TRAMO 1**					**Total**	**%**
1	VOLUMEN I. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.	UND		2025	2025	Prog	$ 69.000.000,00					$ 69.000.000,00	0,79%
						Ejec	$ 3.450.000,00					$ 3.450.000,00	0,04%
2	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO.	UND		2025	2025	Prog	$ 60.000.000,00					$ 60.000.000,00	0,69%
						Ejec	$ 3.000.000,00					$ 3.000.000,00	
3	VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO.	UND		2025	2025	Prog	$ 165.000.000,00					$ 165.000.000,00	1,90%
						Ejec	$ 107.250.000,00					$ 107.250.000,00	
4	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL.	UND		2025	2025	Prog	$ 42.000.000,00					$ 42.000.000,00	0,48%
						Ejec	$ 2.100.000,00					$ 2.100.000,00	
5	VOLUMEN V. ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA LOCAL.	UND		2025	2025	Prog	$ 106.000.000,00					$ 106.000.000,00	1,22%
						Ejec	$ 5.300.000,00					$ 5.300.000,00	
6	VOLUMEN VI. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	UND		2025	2025	Prog	$ 125.000.000,00					$ 125.000.000,00	1,44%
						Ejec	$ 6.250.000,00					$ 6.250.000,00	
	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES.	UND		2025	2025	Prog	$ 368.000.000,00					$ 368.000.000,00	4,23%
						Ejec	$ 18.400.000,00					$ 18.400.000,00	
	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 235.000.000,00					$ 235.000.000,00	2,70%
						Ejec	$ 11.750.000,00					$ 11.750.000,00	
	VOLUMEN IX. HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN.	UND		2025	2025	Prog	$ 190.000.000,00					$ 190.000.000,00	2,18%
						Ejec	$ 9.500.000,00					$ 9.500.000,00	
	VOLUMEN X. ESTUDIO Y DISEÑOS DE PAVIMENTO.	UND		2025	2025	Prog	$ 73.000.000,00					$ 73.000.000,00	0,84%
						Ejec	$ 3.650.000,00					$ 3.650.000,00	
	VOLUMEN XI. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 481.000.000,00					$ 481.000.000,00	5,53%
						Ejec	$ 24.050.000,00					$ 24.050.000,00	
7	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.	UND		2025	2025	Prog	$ 57.000.000,00					$ 57.000.000,00	0,66%
						Ejec	$ 2.850.000,00					$ 2.850.000,00	
	VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 47.000.000,00					$ 47.000.000,00	0,54%
						Ejec	$ 2.350.000,00					$ 2.350.000,00	
	VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE RIESGOS	UND		2025	2025	Prog	$ 93.000.000,00					$ 93.000.000,00	1,07%
						Ejec	$ 4.650.000,00					$ 4.650.000,00	
8	VOLUMEN XV. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE OBRA	UND		2025	2025	Prog	$ 56.000.000,00					$ 56.000.000,00	0,64%
						Ejec	$ 2.800.000,00					$ 2.800.000,00	
9	VOLUMEN XVI. EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL	UND		2025	2025	Prog	$ 54.000.000,00					$ 54.000.000,00	0,62%
						Ejec	$ 2.700.000,00					$ 2.700.000,00	
10	VOLUMEN XVII. AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD.	UND		2025	2025	Prog	$ 423.000.000,00					$ 423.000.000,00	4,86%
						Ejec	$ 21.150.000,00					$ 21.150.000,00	
11	VOLUMEN XVIII. VOLUMEN TÉCNICO BIM	UND		2025	2025	Prog	$ 46.000.000,00					$ 46.000.000,00	0,53%
						Ejec	$ 2.300.000,00					$ 2.300.000,00	
	COSTO TOTAL ENTREGABLES					Prog						**$ 2.690.000.000,00**	30,9%
						Ejec						**$ 233.500.000,00**	10,2%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4:

GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS												
Meta Física (Programa de consultoría) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**							
Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**TRAMO 1**					**Total**	**%**
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		2025	2025	Prog	$ 4.579.246.000,00					$ 4.579.246.000,00	52,635%
					Ejec	$ 96.630.952,00					$ 96.630.952,00	1,111%

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONS	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La consultoría envía el 16 de diciembre de 2024 en comunicación DC-009-2024 el Plan de ejecución BIM
Se realiza una reunión con la consultoría, interventoría y con el área BIM del INVIAS para definir los lineamientos para la entrega de este documento el día 16 de diciembre de 2024
El día 23 de diciembre de 2024 la interventoría envía en comunicación C4262-009-2024 observaciones al plan de ejecución BIM y reitera estas observaciones el 21 de enero de 2025.
Se realiza reunión presencial en las instalaciones del INVIAS Bogotá con el área ambiental y social con el fin de discutir lineamientos para la ejecución elaboración y entrega del Volumen XVII de los estudios ambiental y social, predial y sostenibilidad el día 19 de diciembre de 2024, de esta reunión se acuerda una reunión virtual para el día 26 de diciembre con el área de sostenibilidad, ambiental, social, predial del INVIAS en donde el consultor expondrá una propuesta para el desarrollo de este volumen y que todas las partes que revisan este documento estén de acuerdo con su ejecución para no tener retrocesos.
El día 27 de enero la consultoría envía ajustado el Plan de ejecución BIM, se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
Se realizo comite tecnico de seguimiento el 29 de enero de 2025 en donde se trataron temas de la entrega de la información de los estudios y diseños del contrato 1666 de 2015 para que la consultoría realice la revisión de esta información especifique por medio de un diagnostico que información hay y que información falta y plantee un presupuesto de las actividades que hacen falta para
Se realizo comité técnico de seguimiento el 06 de febrero de 2025
Se realizo comité técnico de seguimiento el 12 de febrero de 2025
La consultoría entrega plan de contingencia por tanto a la fecha según nueva programación no presenta atraso
La consultoría envia la metodología del Volumen III. Estudio de trazado y diseño Geométrico.
La consultoría envia la metodología del Volumen VII. Estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y fuentes de materiales
La consultoría envia la metodología del Volumen VIII. Estudio de suelos para diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras
La consultoría envia la metodología del Volumen I. Estudios topograficos
La consultoría envia la metodología del Volumen II. Estudio de Transito, capacidad y niveles de servicio
La consultoría envia la metodología del Volumen XI. Estudio y diseño de estructuras
La consultoría envia la metodología del Volumen X. Hidraulica, Hidrologia y Socavación
La consultoría envia la metodología del Volumen XV. Estudio de cantidades de obra, ánalisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones
La consultoría envia la metodología del Volumen XVIII. Volúmen Técnico BIM
Reunión profesionales BIM Consultoría e Interventoría
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 06 de marzo de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 13 de marzo de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 20 de marzo de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 28 de marzo de 2025
La consultoría envia la metodología del Volumen V. Estudio de Geología y Geomorfologia local
La consultoría envia la metodología del Volumen VI. Estudio de Hidrogeología de detalle
La consultoría envia la metodología del Volumen X. Estudio y diseño de pavimentos
La consultoría envia la metodología del Volumen XII. Estudio de urbanismo y paisajismo
La consultoría envia la metodología del Volumen XIII. Estudio de redes hidrosanitarias secas
La consultoría envia la metodología del Volumen XIV. Estudios de riesgos
La consultoría envia la metodología del Volumen XVI. Evaluación socioeconomica y financiera del proyecto
La consultoría envia la metodología del Volumen XVII. Ambiental, social, predial y sostenibilidad
La consultoría envia informe preliminar del volumen III. Estudio de trazado y Diseño Geometrico
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 03 de abril de 2025
Se realizo socializaciáon del plan de ejecución Bim BEP el 07 de abril de 2025 con la consultoría, ingterventoría e invias
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 10 de abril de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 24 de abril de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento mensual presencial el día 25 de abril de 2025
Se realiza mesa de trabajo BIM entre consultoría e interventoría el 29 de abril de 2025 con los especialistas del área BIM de la interventoría y la consultoría con el fin de determinar los softwares y accesos de la consultoría, interventoría e INVIAS en el marco del Proyecto.
Comité de seguimiento virtual – 08 de mayo de 2025, con la participación del equipo de consultoría, interventoría y la gestora técnica.
La consultoría se encuengtra realizando reuniones con sus profesionales especialistas respecto a cambios generados por las modificaciones en el diseño geometrico mediante el trazada y las posibles afectaciones prediales resultantes y se encuentra realizando el diagnostico del preuspuesto del plan de exploración del componente de Geotecnica y Patología estructural.
Se realizo socialización en el Municipio de San Jose del Palmar el día 12 y 13 de mayo de 2025 con las comunidades de Novita, San Jose del Palmar, El Cairo, La Italia.
Se realizo recorrido los días 14 y 15 de mayo con el área técnica y de Diseño geometrico desde la Punta a Cruce el Cairo, se tomó georeferenciación de los puntos criticos del corredor
Se realizo recorrido los días 15 y 16 de mayo con los especialistas de estructuras y geotecnia de la consultoría e interventoría con el fin de revisar las estructuras existentes desde el punto de vista estructural y de los tramos criticos desde el punto de vista geotecnico.
Se realiza comité tecnico de seguimiento semanal el día 20 de mayo de 2025
La consultoría se encuentra realizando la logistica para iniciar con los trabajos en campo y toma de topografia
La consultoría realizo Reunión del componente social enfocada en la recuperación de la línea base del diagnóstico social
Se llevaron a cabo reuniones con líderes comunitarios del corregimiento de La Italia, del consejo menor de Curundó, así como con miembros de las comunidades de Curundó y La Italia. El propósito de estos encuentros fue socializar el papel de la consultoría y fortalecer el entendimiento de la comunidad respecto al trabajo que está desarrollando la universidad en el sector. Durante las reuniones, se explicó a los asistentes que la universidad se encuentra elaborando el diseño definitivo del proyecto vial, el cual servirá como base para la futura contratación de su ejecución.
Se realizó la inspección de los predios existentes a lo largo de la vía, incluyendo los centros poblados que se encuentran en su recorrido, así como las viviendas y fincas ubicadas en los márgenes del trazado vial.
Se dio inicio al análisis del flujo vehicular registrado en el punto de aforo ubicado en el corregimiento de Opogodó, durante el período comprendido entre el 18 y el 24 de mayo de 2025, en un horario continuo de 6:00 a. m. a 10:00 p. m. Para ello, se realizó un conteo vehicular clasificado durante 16 horas continuas a lo largo del periodo de observación. Adicionalmente, se aplicaron encuestas de origen y destino entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m., durante las mismas fechas.
Gestión de la documentación y del proceso de contratación de los profesionales de la consultoría.
Socialización con los especialistas de la consultoría en las áreas de estructuras, geotecnia, geología y patología, quienes efectuaron un recorrido en campo a lo largo del tramo de estudio. Esta actividad permitió identificar los factores determinantes que afectan el comportamiento del tramo, así como detectar los puntoscríticos que requieren atención prioritaria.
Se realizó un recorrido en campo por parte de los especialistas de la consultoría en volúmenes de tránsito, catastro predial y urbanismo.
Del 20 al 23 de mayo de 2025 se realizó la visita de campo por los especialistas de la consultoría en volúmenes de predial, urbanismo, tránsito, capacidad y análisis de servicio, con el objetivo de reconocer el estado actual de la vía, inspeccionar los predios existentes a lo largo del trazado y llevar a cabo reuniones con líderes comunitarios y miembros de las comunidades.
Se realizó un recorrido desde el Cruce del Cairo hasta el corregimiento de Curundó, en el municipio de Nóvita. Durante el trayecto se llevó a cabo una inspección minuciosa de los puntos críticos y del estado actual de la vía, tomando registros fotográficos como parte del reconocimiento.
La consultoría continua con la elaboración de informe de puntos criticos de acuerdo al diagnostivo realizado por los diferentes especialistas tanto de consultoría como de interventoría en las visitas a campo en el corredor vial, con el fin de priorizar los diseños en los puntos críticos mas representativos que puedan generar la no transitabilidad por esta vía.
Se realizó otra reunión durante los recorridos en Curundó, en la que participaron miembros del Consejo Comunitario menor. En esta ocasión, el equipo informó que el trabajo en terreno se desarrollará en coordinación directa con estas comunidades. Los representantes del Consejo manifestaron su disposición a colaborar activamente, proporcionando información y acompañando el proceso para asegurar que los datos recolectados respondan a las necesidades específicas del proyecto.
1. Se llevó a cabo una visita de campo por parte de los especialistas de la consultoría, junto con los profesionales de Biología, Ingeniería Forestal y Arqueología. El objetivo fue reconocer el estado actual de la vía, inspeccionar la flora y fauna —con especial atención a las especie protegidas o en peligro de extinción—, evaluar posibles impactos ambientales, analizar la cobertura vegetal, valorar los recursos forestales y proponer medidas de manejo o compensación ante eventuales afectaciones. Así mismo, se identificaron posibles sitios arqueológicos, con el fin de proteger el patrimonio cultural y prevenir impactos durante la ejecución del proyecto
2. Durante la visita, se llevaron a cabo reuniones, de las cuales una podría considerarse satélite. La reunión principal tuvo lugar en la alcaldía, donde participaron miembros de la UMATA (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria) y de la Secretaría de Desarrollo Económico. También asistieron
representantes de Parques Nacionales, así como el equipo de profesionales de la consultoría designados a la realización de la visita de campo. En esta reunión se abordaron temas clave relacionados con la información necesaria para el desarrollo del proyecto, así como datos que ya han sido recolectados en la zona. También se discutieron recomendaciones para el levantamiento de información programado para el mes de junio. Los asistentes compartieron estudios previos realizados en la región y se comprometieron a enviar la documentación para complementar la base de datos del proyecto

1. Se realizo actividades de seguimiento a los compromisos contractuales tales como el seguimiento al trámite de las actas de costos tanto de la consultoría como de la interventoría.
2. Se realizo seguimiento a la contratación de personal de el grupo consultor e interventor.
3. Se realizo control de los compromisos de las actas de comite semanales desarrolladas con el equipo de la consultoría.
4. Se realizo diligenciamiento parcial del informe mensual de seguimiento a presentar al comite por la salvación y dignidad del Chocó, con el fin que esten al tanto del desarrollo del contrato de consultoría.

1-La consultoría realizó una reunión para la revisión de cortes y muros, en el contexto de la elaboración del presupuesto del plan de exploración del área de geotecnia, con especial énfasis en la identificación de rutas críticas. Cabe destacar que dicho presupuesto se está formulando con base en l
información proporcionada en la Fase II del proyecto.
2- La consultoría esta revisando los diseños estructurales en cada uno de los tramos, con el propósito de realizar un análisis detallado y establecer prioridades en los puntos críticos del área del proyecto
3- Se realizó una reunión sobre el volumen del diseño geométrico con los especialistas de la interventoría y la consultoría. El objetivo principal fue analizar los tramos, con especial énfasis en los tramos 1 y 2, así como sus respectivas observaciones y comentarios. Además, se definió l
metodología para la toma de información topográfica y se discutió el documento preliminar del diseño geométrico entregado
4- Se realizo Pre-comité virtual de seguimiento mensual – 29 de mayo de 2025, con la participación del equipo de consultoría, interventoría y la gestora técnica.
5- La consultoría se encuentra realizando la preparación de insumos para el levantamiento de información en campo: Se analizaron los factores del componente social, con énfasis en el contexto socioeconómico según la guía PAGA. Asimismo, se estableció la revisión y análisis del Plan de Desarrollo 2024-2027, con el fin de identificar la información secundaria relevante que aporte al estudio de la dimensión socioeconómica dentro del proceso de caracterización. Asimismo, se acordó revisar el Plan de Desarrollo 2024-2027, con el objetivo de identificar elementos relevantes que puedan aportar al estudio

1-La consultoría se encuentra realizando la logistica para realizar las actividades programadas en campo, el ingreso de los especialistas de tránsito, geología, hidrogeología
2- La consultoría se encuentra realizando el aforo vehicular y la encuesta de origen y destino en el corredor Ansermanuevo – San José del Palmar – Ansermanuevo, durante el período comprendido entre el 1 y el 9 de junio de 2025, el equipo profesional ingresó a la vereda La Carbonera, ubicada en el corregimiento de El Cairo. Posteriormente, se llevó a cabo una reunión preliminar con el equipo de trabajo para definir los roles y responsabilidades de cada integrante, así como la distribución de horarios.
El análisis del flujo vehicular se inició el 2 de junio y se extendió hasta el 8 de junio de 2025, tomando como punto de observación la vereda La Carbonera. Durante este período, se efectuó un conteo vehicular clasificado con registro continuo de 24 horas, desde las 6:00 a. m. del día en curso hasta las 6:00 a. m. del día siguiente. Adicionalmente, se aplicaron encuestas de origen y destino entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m., durante los mismos días.
3- La consultoría se encutra realizando la Formulación y Ajuste del Presupuesto para el Plan Exploratorio: Componente de Geotecnia – 03 de junio de 2025: La sección de trabajo consistió en establecer y ajustar el presupuesto necesario para la ejecución de las actividades geotécnicas del plan exploratorio, con base en los estudios técnicos, condiciones de campo y prioridades definidas.
Para ello, se actualizó el presupuesto correspondiente al componente de Geotecnia tomando como referencia la información presentada en la Fase II del proyecto. Este ajuste implicó revisar y modificar las actividades inicialmente planteadas, considerando los nuevos requerimientos identificados durante la visita de campo realizada por los especialistas del área.
Durante dicha visita, se contrastó la información derivada del volumen de diseño geométrico —especialmente en lo referente a cortes, muros proyectados y sus respectivas medidas y longitudes— con las condiciones reales observadas en el terreno. Este análisis permitió precisar la ubicación, cantidad y profundidad de los sondeos, así como definir con mayor exactitud los estudios de laboratorio y ensayos necesarios, optimizando así el alcance y los recursos asignados en el presupuesto actualizado del plan exploratorio.
4- Se realizo comite de seguimiento técnico mensual en el INVIAS Bogotá acompañados de forma virtual por los territoriales del chocó y Valle del Cauca con el fin de revisar el informe a la procuraduría y tratar temas de seguimiento a los contratos de consultoría e inteventoría en cuanto a avance fisico y avance financiero.

1- Se llevó a cabo una reunión para revisar y coordinar la Metodología propuesta por componente de gestión social para el levantamiento de línea base y coordinación componente del volumen de evaluación económica. Durante la sesión, se presentaron los lineamientos metodológicos, se discutieron los instrumentos de recolección de información, así como la estrategia de campo y las acciones de coordinación intercomponente necesarias para garantizar la coherencia y calidad de los datos. Esta reunión permitió alinear criterios técnicos entre equipos y establecer compromisos para el desarrollo articulado de lasactividades programadas.
2-los especialistas de la consultoría encargada de los volúmenes de Geotecnia, Geología y Hidrogeología realizaron una visita de campo con el objetivo de levantar información detallada del corredor vial. Durante este recorrido se inspeccionó el tramo comprendido entre el K53+643 (Curundó - La Punta) y el K104+849 (Cruce El Cairo). el equipo de Geotecnia llevó a cabo una revisión minuciosa de los posibles cortes de taludes a lo largo del trazado de la vía. Para ello, se evaluó visualmente la inclinación de los taludes, así como la presencia de señales de deterioro. Se prestó especial atención a la inclinación de la vegetación y a la Identificación de fallas geológicas, además de realizar un análisis del tipo de roca, su grado de meteorización y el buzamiento —es decir, el ángulo de inclinación de un plano geológico respecto al plano horizontal. Asimismo, se verificaron las escorrentías en los taludes y se inspeccionaron detalladamente los puntos
críticos identificados en la visita técnica anterior.
3-en lo correspondiente al levantamiento de información hidrogeológica, se realizó la búsqueda de puntos de afloramiento de agua subterránea. En este componente se visitaron alrededor de 20 puntos, consistentes principalmente en escorrentías superficiales. Aquellos puntos con indicios de posible origen subterráneo fueron analizados mediante la toma de parámetros fisicoquímicos, con el fin de establecer o descartar su clasificación como afloramientos de agua subterránea.
4- los profesionales de Geología y Geomorfología recopilaron información a lo largo de todo el corredor relacionada con la litología, la geología estructural, la geomorfología y la morfodinámica. En total, se realizaron aproximadamente 70 estaciones de campo para el control litológico, geomorfológico y estructural.
5-La especialista del volumen de Diseño Geométrico realizó la migración de los diseños preliminares generados en el programa Topo3 al entorno de Civil 3D, con el fin de facilitar su edición, análisis y compatibilidad con otros componentes del proyecto. Este proceso se llevó a cabo por tramos, garantizando una organización secuencial y coherente del corredor vial
6-se llevó a cabo reunión con profesionales del componente social, en la cual se planificaron detalladamente los tiempos y las fechas para la ejecución de las actividades de campo, estableciendo los trayectos entre las diferentes comunidades que serán visitadas para el levantamiento de información socioeconómica en el área de influencia. Además, se definieron los materiales y recursos necesarios para asegurar una recolección de datos efectiva en cada encuentro con los actores sociales. Se estableció también el número estimado de participantes por comunidad que asistirán a los espacios interactivos de participación, fomentando la acción y el compromiso comunitario. Esta planificación busca garantizar una coordinación óptima y una ejecución eficiente que permita obtener información precisa y relevante para el desarrollo del proyecto.
7-se realizó comité de seguimiento presencial entre funcionarios del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), profesionales de la consultoría, el rector de la Universidad Tecnológica del Chocó y su equipo. Durante el encuentro, se analizaron y coordinaron los aspectos técnicos, administrativos y Financieros del proyecto, con el propósito de fortalecer la colaboración entre las entidades involucradas y garantizar un desarrollo eficiente y exitoso.

1- Revisión del Diseño Geométrico de Puentes en Planta y Perfil – Tramos 1, 2, 3, 4 y 5 – Reunión del 16 de junio de 2025: Se realizó la revisión y análisis del diseño geométrico en planta y perfil de los puentes correspondientes a los tramos 1, 2, 3, 4 y 5, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los parámetros técnicos, identificar posibles ajustes y definir acciones para optimizar el proyecto. Durante este proceso, se prestó especial atención a aspectos clave del diseño, enfocándose particularmente en los puentes y en las posibles interferencias con el alineamiento del proyecto. Como resultado de la revisión, se identificaron puntos críticos que requieren atención y seguimiento para garantizar la viabilidad y seguridad de la obra. Además, se presentaron detalles técnicos relacionados con la línea de rasante, las medidas y las diferencias de cota de los puentes, subrayando la complejidad estructural y la necesidad de verificar cuidadosamente sus alturas.
2- Revisión y Ajuste del Plan Exploratorio tras la Visita de la Comisión Geotécnica — Reunión del 17 de junio de 2025: Reunión técnica llevada a cabo el 17 de junio de 2025, posterior a la visita de campo realizada por la comisión geotécnica, se revisó de manera integral el plan exploratorio propuesto para el desarrollo del proyecto. Durante el encuentro, los especialistas presentaron sus observaciones y recomendaciones con base en las condiciones reales del terreno identificadas durante el recorrido. Entre los principales ajustes se encuentran la reubicación de varios puntos de exploración, la modificación en la cantidad y profundidad de los sondeos y calicatas, así como la inclusión de ensayos geotécnicos adicionales en zonas críticas y en la rectificación del eje. Estas modificaciones responden a la necesidad de obtener una caracterización más precisa del subsuelo, especialmente en áreas con condiciones geológicas complejas o potenciales riesgos de inestabilidad.
3-Análisis preliminar de la estructura de la matriz de integración de los criterios de sostenibilidad con las áreas de estudio del proyecto – Sección de trabajo del 19 de junio de 2025: En esta sección se realiza un análisis preliminar de los criterios de sostenibilidad que deberán ser incorporados en las diferentes áreas de estudio del proyecto, con el propósito de que los especialistas encargados de los estudios y diseños incluyan estos criterios para que en las etapas futuras del proyecto sirvan como instrumentos de verificación y evaluación de las diferentes dimensiones de la sostenibilidad


1- Entre el 01 y el 08 de julio de 2025 se lleva a cabo la aplicación de encuestas de origen y destino en el corredor Ánimas – Cartago – Ánimas, como parte del estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio. julio, el equipo profesional ingresó al municipio de Unión Panamericana, estableciendo como punto principal de recolección de información la cabecera municipal de Las Ánimas. A partir de esa fecha, se inició la implementación de las encuestas, las cuales se están desarrollando en el horario comprendido entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m.
2- Entre el 01 y el 05 de julio de 2025, se llevó a cabo una visita de campo por parte de los especialistas de la consultoría en los volúmenes de Geotecnia, Hidrología, Hidráulica, Socavación y Geología. El propósito principal de esta actividad fue realizar una revisión detallada de las condiciones hidráulicas del corredor vial, así como de las afectaciones geológicas y los aspectos relacionados con la estabilidad de taludes. Como parte del recorrido, el equipo técnico inspeccionó el trayecto comprendido entre el Cruce del Cairo y el corregimiento de Curundó, en el municipio de Novita. Durante esta inspección se realizó una evaluación minuciosa de los puntos críticos identificados a lo largo del corredor, documentando el estado actual de la vía mediante evidencia fotográfica y observaciones técnicas en terreno. En el desarrollo de las actividades también se realizó la búsqueda e inspección de nacederos de agua ubicados dentro del área de influencia del proyecto, con el acompañamiento del equipo de hidráulica y de personas de la comunidad conocedoras del territorio. Esta tarea permitió abordar de forma integral aspectos
geológicos y geotécnicos, además de caracterizar un total de ocho (8) puntos de agua, en los que se tomaron parámetros fisicoquímicos para determinar la posible presencia de aguas subterráneas. Tmbien se reviso en campo 1. Identificación de obras de arte existentes. 2. Localización de cuerpos de agua en el corredor. 3. Reconocimiento de escorrentías y aguas de filtración presentes en el área de estudio.


1- Se realizo socialización segundo espacio con el consejo comunitario mayor de Novita COCOMAN dando cumplimiento a los requerimientos de la MEC y del representante legal vigente
2- La consultoría envío PLan de Exploración Geotecnica de los tramos 1, 4 y 5 los cuales se encuentran en reviisón por parte de la interventoria
3- La consultoría envía informe preliminar del volumen 5 Estudio de Geologia y Geomorfología local el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría
4-Se llevó a cabo una reunión técnica sobre diseño geométrico y topografía, en la cual se identificó como principal dificultad la falta de información topográfica, situación que ha impactado negativamente el desarrollo de la fase 3 del proyecto. Ante esto, se acordó priorizar la recolección de dicha información y se recomendó a los profesionales realizar una revisión minuciosa de los insumos disponibles, con el fin de precisar el estado actual de la documentación. Asimismo, se ajustó el formato del informe técnico para alinearlo con los estándares exigidos por la consultoría e interventoría. Durante la sesión también se abordaron posibles ajustes al cronograma y presupuesto, incluyendo la eventual modificación del contrato inicial, y se acordó avanzar en los análisis técnicos y jurídicos correspondientes.

1- La consultoría envía informe de apropiación de los estudios topograficos en donde concluye que la información entregada por el INVIAS no es confiable ni suficiente para Fase III debido a:
- Dentro de la revisión de la información no se encontró un informe topográfico detallado de campo.
- La información analizada no está referenciada al sistema oficial (MAGNA-SIRGAS 2018).
- No existe un modelo MDT detallado, ni se evidencia el uso de tecnologías LIDAR o escáner.
- Ausencia de redes levantadas, ni fichas técnicas de la red GNSS.
- Entregables no estructurados, ni verificables.
- Riesgo alto de reprocesos, rediseños y errores constructivos. Por tanto es necesario la toma actualizada de la topografía de detalle.
2- Se realizo comite tecnico mensual en el INVIAS Bogotá en donde se expuso la situación contractual con las comunidades de consejos comunitarios de COCOMAN y de San Pedro de Igara las cuales hacen parte de los tramos 1 y 2 y solicitan consulta previa. La consultoría propone realizar acercamientos con estas comunidades e intentar proponer realizar lineamientos de Consulta previa para que se permita la entrada a campo. Así mismo en

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

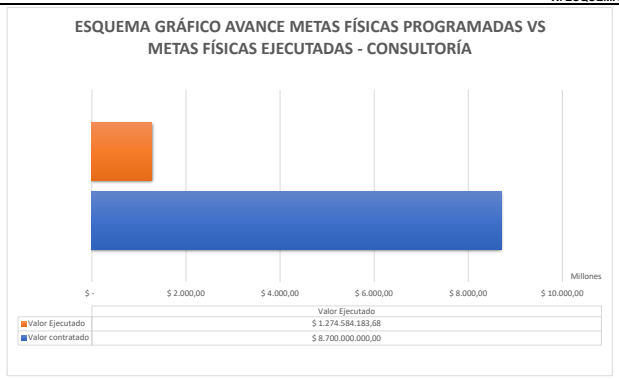

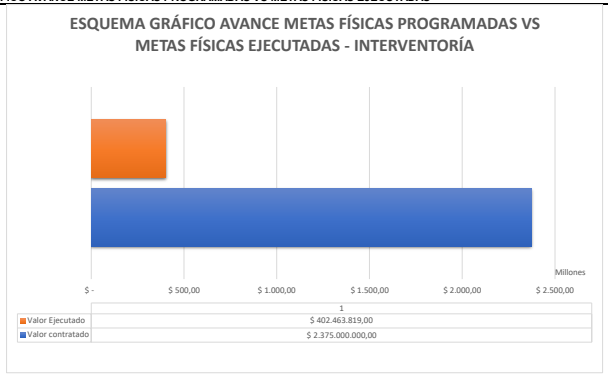


El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Comité técnico de seguimiento 23/07/2025



Comité técnico de seguimiento 23/07/2025



Comité técnico de seguimiento 23/07/2025



Comité técnico de seguimiento 23/07/2025

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONSULTOR

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: Jose Octavio Niño Brijaldo
Matrícula Profesional No.: 01193-0243

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ — SEMANA No.: 34 del 21-jul al 26-jul — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: YENNY XIOMARA HERNANDEZ P

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORÍA: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VOLÚMENES O PRODUCTOS TÉCNICOS ENTREGABLES DE FASE III: 1. Entregable estudios topográficos; 2 entregable estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio; 3 entregable estudio de trazado y diseño geométrico; 4 entregable estudio de seguridad vial; 5 entregable estudio de geología y geomorfología local; 6 entregable estudio de hidrogeología de detalle; 7 entregable estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y puentes de materiales; 8 entregable estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; 9 entregable hidráulica, hidrología, y socavación; 10 entregable estudio y diseño de pavimentos; 11 entregable estudio y diseño de estructuras; 12 entregable estudio de urbanismo y paisajismo; 13 estudio redes hidrosanitarias y secas; 14 entregable estudio de riesgos; 15 entregable estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones; 16 entregable evaluación socioeconómica y financiera del proyecto; 17 entregable ambiental, social, predial y sostenibilidad; 18 entregable volumen técnico de BIM; 19 entregable informe final.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA, lo cual incluye el desarrollo de 19 volúmenes.

CONTRATO DE CONSULTORÍA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONSULTORÍA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA			INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4227 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00	CONTRATO No.	4262 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 8.700.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 4.350.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 1.187.500.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.350.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.350.000.000
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.187.500.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.187.500.000

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORÍA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA (A):	$ 8.700.000.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.405.550.000,00	27,65%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.311.809.202,62	15,08%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.093.740.797,38)	-12,57%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.405.550.000,00	27,65%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.311.809.202,62	15,08%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.093.740.797,38)	-12,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 132.148.605,00	1,52%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.068.435,00	0,45%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: MAYO
VALOR FACTURA: $ 182.492.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: En tramite acta de costos del mes de diciembre y enero en el Instituto Nacional de Vías INVIAS

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.350.000.000,00
Amortizado $	$ 454.876.000
Saldo $	$ 3.895.124.000,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	$ -
Acumulado:	$ -

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.086.678.807,00	45,75%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 550.882.296,00	23,20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 31.291.952,00	1,32%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 148.418.477,00	6,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: MAYO
VALOR FACTURA: $ 51.962.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.187.500.000,00
Amortizado $	$ 337.769.400
Saldo $	$ 849.730.600,00

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 27,65% Avance o Atraso Físico % -12,57%
Meta Física Ejecutada % 15,08%

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL													
Meta Física (Programa de consultoria) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**								
Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**TRAMO 1**					**Total**	**%**	
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	UND		2024	2024	Prog	$ 1.430.754.000,00					$ 1.430.754.000,00	16,445%	
					Ejec	$ 735.678.000,00					$ 735.678.000,00	8,456%	

	GRUPO 2 -COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES												
	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**							
	Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**TRAMO 1**					**Total**	**%**
1	VOLUMEN I. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.	UND		2025	2025	Prog	$ 69.000.000,00					$ 69.000.000,00	0,79%
						Ejec	$ 3.450.000,00					$ 3.450.000,00	0,04%
2	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO.	UND		2025	2025	Prog	$ 60.000.000,00					$ 60.000.000,00	0,69%
						Ejec	$ 3.000.000,00					$ 3.000.000,00	
3	VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO.	UND		2025	2025	Prog	$ 165.000.000,00					$ 165.000.000,00	1,90%
						Ejec	$ 107.250.000,00					$ 107.250.000,00	
4	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL.	UND		2025	2025	Prog	$ 42.000.000,00					$ 42.000.000,00	0,48%
						Ejec	$ 2.100.000,00					$ 2.100.000,00	
5	VOLUMEN V. ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA LOCAL.	UND		2025	2025	Prog	$ 106.000.000,00					$ 106.000.000,00	1,22%
						Ejec	$ 5.300.000,00					$ 5.300.000,00	
6	VOLUMEN VI. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	UND		2025	2025	Prog	$ 125.000.000,00					$ 125.000.000,00	1,44%
						Ejec	$ 6.250.000,00					$ 6.250.000,00	
	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES.	UND		2025	2025	Prog	$ 368.000.000,00					$ 368.000.000,00	4,23%
						Ejec	$ 18.400.000,00					$ 18.400.000,00	
	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 235.000.000,00					$ 235.000.000,00	2,70%
						Ejec	$ 11.750.000,00					$ 11.750.000,00	
	VOLUMEN IX. HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN.	UND		2025	2025	Prog	$ 190.000.000,00					$ 190.000.000,00	2,18%
						Ejec	$ 9.500.000,00					$ 9.500.000,00	
	VOLUMEN X. ESTUDIO Y DISEÑOS DE PAVIMENTO.	UND		2025	2025	Prog	$ 73.000.000,00					$ 73.000.000,00	0,84%
						Ejec	$ 3.650.000,00					$ 3.650.000,00	
	VOLUMEN XI. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 481.000.000,00					$ 481.000.000,00	5,53%
						Ejec	$ 24.050.000,00					$ 24.050.000,00	
7	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.	UND		2025	2025	Prog	$ 57.000.000,00					$ 57.000.000,00	0,66%
						Ejec	$ 2.850.000,00					$ 2.850.000,00	
	VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 47.000.000,00					$ 47.000.000,00	0,54%
						Ejec	$ 2.350.000,00					$ 2.350.000,00	
	VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE RIESGOS	UND		2025	2025	Prog	$ 93.000.000,00					$ 93.000.000,00	1,07%
						Ejec	$ 4.650.000,00					$ 4.650.000,00	
8	VOLUMEN XV. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE OBRA	UND		2025	2025	Prog	$ 56.000.000,00					$ 56.000.000,00	0,64%
						Ejec	$ 2.800.000,00					$ 2.800.000,00	
9	VOLUMEN XVI. EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL	UND		2025	2025	Prog	$ 54.000.000,00					$ 54.000.000,00	0,62%
						Ejec	$ 2.700.000,00					$ 2.700.000,00	
10	VOLUMEN XVII. AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD.	UND		2025	2025	Prog	$ 423.000.000,00					$ 423.000.000,00	4,86%
						Ejec	$ 21.150.000,00					$ 21.150.000,00	
11	VOLUMEN XVIII. VOLUMEN TÉCNICO BIM	UND		2025	2025	Prog	$ 46.000.000,00					$ 46.000.000,00	0,53%
						Ejec	$ 2.300.000,00					$ 2.300.000,00	
	COSTO TOTAL ENTREGABLES					Prog						**$ 2.690.000.000,00**	30,9%
						Ejec						**$ 233.500.000,00**	9,7%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4:

GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS

Meta Física (Programa de consultoría) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	TRAMO 1					Total	%
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		2025	2025	Prog	$ 4.579.246.000,00					$ 4.579.246.000,00	52,635%
					Ejec	$ 96.630.952,00					$ 96.630.952,00	1,111%

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONS	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La consultoría envía el 16 de diciembre de 2024 en comunicación DC-009-2024 el Plan de ejecución BIM
Se realiza una reunión con la consultoría, interventoría y con el área BIM del INVIAS para definir los lineamientos para la entrega de este documento el día 16 de diciembre de 2024
El día 23 de diciembre de 2024 la interventoría envía en comunicación C4262-009-2024 observaciones al plan de ejecución BIM y reitera estas observaciones el 21 de enero de 2025.
Se realiza reunión presencial en las instalaciones del INVIAS Bogotá con el área ambiental y social con el fin de discutir lineamientos para la ejecución elaboración y entrega del Volumen XVII de los estudios ambiental y social, predial y sostenibilidad el día 19 de diciembre de 2024, de esta reunión se acuerda una reunión virtual para el día 26 de diciembre con el área de sostenibilidad, ambiental, social, predial del INVIAS en donde el consultor expondrá una propuesta para el desarrollo de este volumen y que todas las partes que revisan este documento estén de acuerdo con su ejecución para no tener retrocesos.
El día 27 de enero la consultoría envía ajustado el Plan de ejecución BIM, se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
Se realizo comite tecnico de seguimiento el 29 de enero de 2025 en donde se trataron temas de la entrega de la información de los estudios y diseños del contrato 1666 de 2015 para que la consultoría realice la revisión de esta información especifique por medio de un diagnostico que información hay y que información falta y plantee un presupuesto de las actividades que hacen falta para
Se realizo comité técnico de seguimiento el 06 de febrero de 2025
Se realizo comité técnico de seguimiento el 12 de febrero de 2025
La consultoría entrega plan de contingencia por tanto a la fecha según nueva programación no presenta atraso
La consultoría envia la metodología del Volumen III. Estudio de trazado y diseño Geométrico.
La consultoría envia la metodología del Volumen VII. Estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y fuentes de materiales
La consultoría envia la metodología del Volumen VIII. Estudio de suelos para diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras
La consultoría envia la metodología del Volumen I. Estudios topograficos
La consultoría envia la metodología del Volumen II. Estudio de Transito, capacidad y niveles de servicio
La consultoría envia la metodología del Volumen XI. Estudio y diseño de estructuras
La consultoría envia la metodología del Volumen X. Hidraulica, Hidrologia y Socavación
La consultoría envia la metodología del Volumen XV. Estudio de cantidades de obra, ánalisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones
La consultoría envia la metodología del Volumen XVIII. Volúmen Técnico BIM
Reunión profesionales BIM Consultoría e Interventoría
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 06 de marzo de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 13 de marzo de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 20 de marzo de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 28 de marzo de 2025
La consultoría envia la metodología del Volumen V. Estudio de Geología y Geomorfologia local
La consultoría envia la metodología del Volumen VI. Estudio de Hidrogeología de detalle
La consultoría envia la metodología del Volumen X. Estudio y diseño de pavimentos
La consultoría envia la metodología del Volumen XII. Estudio de urbanismo y paisajismo
La consultoría envia la metodología del Volumen XIII. Estudio de redes hidrosanitarias secas
La consultoría envia la metodología del Volumen XIV. Estudios de riesgos
La consultoría envia la metodología del Volumen XVI. Evaluación socioeconomica y financiera del proyecto
La consultoría envia la metodología del Volumen XVII. Ambiental, social, predial y sostenibilidad
La consultoría envia informe preliminar del volumen III. Estudio de trazado y Diseño Geometrico
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 03 de abril de 2025
Se realizo socializaciáon del plan de ejecución Bim BEP el 07 de abril de 2025 con la consultoría, ingterventoría e invias
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 10 de abril de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 24 de abril de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento mensual presencial el día 25 de abril de 2025
Se realiza mesa de trabajo BIM entre consultoría e interventoría el 29 de abril de 2025 con los especialistas del área BIM de la interventoría y la consultoría con el fin de determinar los softwares y accesos de la consultoría, interventoría e INVIAS en el marco del Proyecto.
Comité de seguimiento virtual – 08 de mayo de 2025, con la participación del equipo de consultoría, interventoría y la gestora técnica.
La consultoría se encuengtra realizando reuniones con sus profesionales especialistas respecto a cambios generados por las modificaciones en el diseño geometrico mediante el trazada y las posibles afectaciones prediales resultantes y se encuentra realizando el diagnostico del preuspuesto del plan de exploración del componente de Geotecnica y Patología estructural.
Se realizo socialización en el Municipio de San Jose del Palmar el día 12 y 13 de mayo de 2025 con las comunidades de Novita, San Jose del Palmar, El Cairo, La Italia.
Se realizo recorrido los días 14 y 15 de mayo con el área técnica y de Diseño geometrico desde la Punta a Cruce el Cairo, se tomó georeferenciación de los puntos criticos del corredor
Se realizo recorrido los días 15 y 16 de mayo con los especialistas de estructuras y geotecnia de la consultoría e interventoría con el fin de revisar las estructuras existentes desde el punto de vista estructural y de los tramos criticos desde el punto de vista geotecnico.
Se realiza comité tecnico de seguimiento semanal el día 20 de mayo de 2025
La consultoría se encuentra realizando la logistica para iniciar con los trabajos en campo y toma de topografia
La consultoría realizo Reunión del componente social enfocada en la recuperación de la línea base del diagnóstico social
Se llevaron a cabo reuniones con líderes comunitarios del corregimiento de La Italia, del consejo menor de Curundó, así como con miembros de las comunidades de Curundó y La Italia. El propósito de estos encuentros fue socializar el papel de la consultoría y fortalecer el entendimiento de la comunidad respecto al trabajo que está desarrollando la universidad en el sector. Durante las reuniones, se explicó a los asistentes que la universidad se encuentra elaborando el diseño definitivo del proyecto vial, el cual servirá como base para la futura contratación de su ejecución.
Se realizó la inspección de los predios existentes a lo largo de la vía, incluyendo los centros poblados que se encuentran en su recorrido, así como las viviendas y fincas ubicadas en los márgenes del trazado vial.
Se dio inicio al análisis del flujo vehicular registrado en el punto de aforo ubicado en el corregimiento de Opogodó, durante el período comprendido entre el 18 y el 24 de mayo de 2025, en un horario continuo de 6:00 a. m. a 10:00 p. m. Para ello, se realizó un conteo vehicular clasificado durante 16 horas continuas a lo largo del periodo de observación. Adicionalmente, se aplicaron encuestas de origen y destino entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m., durante las mismas fechas.
Gestión de la documentación y del proceso de contratación de los profesionales de la consultoría.
Socialización con los especialistas de la consultoría en las áreas de estructuras, geotecnia, geología y patología, quienes efectuaron un recorrido en campo a lo largo del tramo de estudio. Esta actividad permitió identificar los factores determinantes que afectan el comportamiento del tramo, así como detectar los puntoscríticos que requieren atención prioritaria.
Se realizó un recorrido en campo por parte de los especialistas de la consultoría en volúmenes de tránsito, catastro predial y urbanismo.
Del 20 al 23 de mayo de 2025 se realizó la visita de campo por los especialistas de la consultoría en volúmenes de predial, urbanismo, tránsito, capacidad y análisis de servicio, con el objetivo de reconocer el estado actual de la vía, inspeccionar los predios existentes a lo largo del trazado y llevar a cabo reuniones con líderes comunitarios y miembros de las comunidades.
Se realizó un recorrido desde el Cruce del Cairo hasta el corregimiento de Curundó, en el municipio de Nóvita. Durante el trayecto se llevó a cabo una inspección minuciosa de los puntos críticos y del estado actual de la vía, tomando registros fotográficos como parte del reconocimiento.
La consultoría continua con la elaboración de informe de puntos criticos de acuerdo al diagnostivo realizado por los diferentes especialistas tanto de consultoría como de interventoría en las visitas a campo en el corredor vial, con el fin de priorizar los diseños en los puntos críticos mas representativos que puedan generar la no transitabilidad por esta vía.
Se realizó otra reunión durante los recorridos en Curundó, en la que participaron miembros del Consejo Comunitario menor. En esta ocasión, el equipo informó que el trabajo en terreno se desarrollará en coordinación directa con estas comunidades. Los representantes del Consejo manifestaron su disposición a colaborar activamente, proporcionando información y acompañando el proceso para asegurar que los datos recolectados respondan a las necesidades específicas del proyecto.
1. Se llevó a cabo una visita de campo por parte de los especialistas de la consultoría, junto con los profesionales de Biología, Ingeniería Forestal y Arqueología. El objetivo fue reconocer el estado actual de la vía, inspeccionar la flora y fauna —con especial atención a las especie protegidas o en peligro de extinción—, evaluar posibles impactos ambientales, analizar la cobertura vegetal, valorar los recursos forestales y proponer medidas de manejo o compensación ante eventuales afectaciones. Así mismo, se identificaron posibles sitios arqueológicos, con el fin de proteger el patrimonio cultural y prevenir impactos durante la ejecución del proyecto
2. Durante la visita, se llevaron a cabo reuniones, de las cuales una podría considerarse satélite. La reunión principal tuvo lugar en la alcaldía, donde participaron miembros de la UMATA (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria) y de la Secretaría de Desarrollo Económico. También asistieron
representantes de Parques Nacionales, así como el equipo de profesionales de la consultoría designados a la realización de la visita de campo. En esta reunión se abordaron temas clave relacionados con la información necesaria para el desarrollo del proyecto, así como datos que ya han sido recolectados en la zona. También se discutieron recomendaciones para el levantamiento de información programado para el mes de junio. Los asistentes compartieron estudios previos realizados en la región y se comprometieron a enviar la documentación para complementar la base de datos del proyecto

1. Se realizo actividades de seguimiento a los compromisos contractuales tales como el seguimiento al trámite de las actas de costos tanto de la consultoría como de la interventoría.
2. Se realizo seguimiento a la contratación de personal de el grupo consultor e interventor.
3. Se realizo control de los compromisos de las actas de comite semanales desarrolladas con el equipo de la consultoría.
4. Se realizo diligenciamiento parcial del informe mensual de seguimiento a presentar al comite por la salvación y dignidad del Chocó, con el fin que esten al tanto del desarrollo del contrato de consultoría.

1-La consultoría realizó una reunión para la revisión de cortes y muros, en el contexto de la elaboración del presupuesto del plan de exploración del área de geotecnia, con especial énfasis en la identificación de rutas críticas. Cabe destacar que dicho presupuesto se está formulando con base en l
información proporcionada en la Fase II del proyecto.
2- La consultoría esta revisando los diseños estructurales en cada uno de los tramos, con el propósito de realizar un análisis detallado y establecer prioridades en los puntos críticos del área del proyecto
3- Se realizó una reunión sobre el volumen del diseño geométrico con los especialistas de la interventoría y la consultoría. El objetivo principal fue analizar los tramos, con especial énfasis en los tramos 1 y 2, así como sus respectivas observaciones y comentarios. Además, se definió l
metodología para la toma de información topográfica y se discutió el documento preliminar del diseño geométrico entregado
4- Se realizo Pre-comité virtual de seguimiento mensual – 29 de mayo de 2025, con la participación del equipo de consultoría, interventoría y la gestora técnica.
5- La consultoría se encuentra realizando la preparación de insumos para el levantamiento de información en campo: Se analizaron los factores del componente social, con énfasis en el contexto socioeconómico según la guía PAGA. Asimismo, se estableció la revisión y análisis del Plan de Desarrollo 2024-2027, con el fin de identificar la información secundaria relevante que aporte al estudio de la dimensión socioeconómica dentro del proceso de caracterización. Asimismo, se acordó revisar el Plan de Desarrollo 2024-2027, con el objetivo de identificar elementos relevantes que puedan aportar al estudio

1-La consultoría se encuentra realizando la logistica para realizar las actividades programadas en campo, el ingreso de los especialistas de tránsito, geología, hidrogeología
2- La consultoría se encuentra realizando el aforo vehicular y la encuesta de origen y destino en el corredor Ansermanuevo – San José del Palmar – Ansermanuevo, durante el período comprendido entre el 1 y el 9 de junio de 2025, el equipo profesional ingresó a la vereda La Carbonera, ubicada en el corregimiento de El Cairo. Posteriormente, se llevó a cabo una reunión preliminar con el equipo de trabajo para definir los roles y responsabilidades de cada integrante, así como la distribución de horarios.
El análisis del flujo vehicular se inició el 2 de junio y se extendió hasta el 8 de junio de 2025, tomando como punto de observación la vereda La Carbonera. Durante este período, se efectuó un conteo vehicular clasificado con registro continuo de 24 horas, desde las 6:00 a. m. del día en curso hasta las 6:00 a. m. del día siguiente. Adicionalmente, se aplicaron encuestas de origen y destino entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m., durante los mismos días.
3- La consultoría se encutra realizando la Formulación y Ajuste del Presupuesto para el Plan Exploratorio: Componente de Geotecnia – 03 de junio de 2025: La sección de trabajo consistió en establecer y ajustar el presupuesto necesario para la ejecución de las actividades geotécnicas del plan exploratorio, con base en los estudios técnicos, condiciones de campo y prioridades definidas.
Para ello, se actualizó el presupuesto correspondiente al componente de Geotecnia tomando como referencia la información presentada en la Fase II del proyecto. Este ajuste implicó revisar y modificar las actividades inicialmente planteadas, considerando los nuevos requerimientos identificados durante la visita de campo realizada por los especialistas del área.
Durante dicha visita, se contrastó la información derivada del volumen de diseño geométrico —especialmente en lo referente a cortes, muros proyectados y sus respectivas medidas y longitudes— con las condiciones reales observadas en el terreno. Este análisis permitió precisar la ubicación, cantidad y profundidad de los sondeos, así como definir con mayor exactitud los estudios de laboratorio y ensayos necesarios, optimizando así el alcance y los recursos asignados en el presupuesto actualizado del plan exploratorio.
4- Se realizo comite de seguimiento técnico mensual en el INVIAS Bogotá acompañados de forma virtual por los territoriales del chocó y Valle del Cauca con el fin de revisar el informe a la procuraduría y tratar temas de seguimiento a los contratos de consultoría e inteventoría en cuanto a avance fisico y avance financiero.

1- Se llevó a cabo una reunión para revisar y coordinar la Metodología propuesta por componente de gestión social para el levantamiento de línea base y coordinación componente del volumen de evaluación económica. Durante la sesión, se presentaron los lineamientos metodológicos, se discutieron los instrumentos de recolección de información, así como la estrategia de campo y las acciones de coordinación intercomponente necesarias para garantizar la coherencia y calidad de los datos. Esta reunión permitió alinear criterios técnicos entre equipos y establecer compromisos para el desarrollo articulado de lasactividades programadas.
2-los especialistas de la consultoría encargada de los volúmenes de Geotecnia, Geología y Hidrogeología realizaron una visita de campo con el objetivo de levantar información detallada del corredor vial. Durante este recorrido se inspeccionó el tramo comprendido entre el K53+643 (Curundó - La Punta) y el K104+849 (Cruce El Cairo). el equipo de Geotecnia llevó a cabo una revisión minuciosa de los posibles cortes de taludes a lo largo del trazado de la vía. Para ello, se evaluó visualmente la inclinación de los taludes, así como la presencia de señales de deterioro. Se prestó especial atención a la inclinación de la vegetación y a la Identificación de fallas geológicas, además de realizar un análisis del tipo de roca, su grado de meteorización y el buzamiento —es decir, el ángulo de inclinación de un plano geológico respecto al plano horizontal. Asimismo, se verificaron las escorrentías en los taludes y se inspeccionaron detalladamente los puntos
críticos identificados en la visita técnica anterior.
3-en lo correspondiente al levantamiento de información hidrogeológica, se realizó la búsqueda de puntos de afloramiento de agua subterránea. En este componente se visitaron alrededor de 20 puntos, consistentes principalmente en escorrentías superficiales. Aquellos puntos con indicios de posible origen subterráneo fueron analizados mediante la toma de parámetros fisicoquímicos, con el fin de establecer o descartar su clasificación como afloramientos de agua subterránea.
4- los profesionales de Geología y Geomorfología recopilaron información a lo largo de todo el corredor relacionada con la litología, la geología estructural, la geomorfología y la morfodinámica. En total, se realizaron aproximadamente 70 estaciones de campo para el control litológico, geomorfológico y estructural.
5-La especialista del volumen de Diseño Geométrico realizó la migración de los diseños preliminares generados en el programa Topo3 al entorno de Civil 3D, con el fin de facilitar su edición, análisis y compatibilidad con otros componentes del proyecto. Este proceso se llevó a cabo por tramos, garantizando una organización secuencial y coherente del corredor vial
6-se llevó a cabo reunión con profesionales del componente social, en la cual se planificaron detalladamente los tiempos y las fechas para la ejecución de las actividades de campo, estableciendo los trayectos entre las diferentes comunidades que serán visitadas para el levantamiento de información socioeconómica en el área de influencia. Además, se definieron los materiales y recursos necesarios para asegurar una recolección de datos efectiva en cada encuentro con los actores sociales. Se estableció también el número estimado de participantes por comunidad que asistirán a los espacios interactivos de participación, fomentando la acción y el compromiso comunitario. Esta planificación busca garantizar una coordinación óptima y una ejecución eficiente que permita obtener información precisa y relevante para el desarrollo del proyecto.
7-se realizó comité de seguimiento presencial entre funcionarios del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), profesionales de la consultoría, el rector de la Universidad Tecnológica del Chocó y su equipo. Durante el encuentro, se analizaron y coordinaron los aspectos técnicos, administrativos y Financieros del proyecto, con el propósito de fortalecer la colaboración entre las entidades involucradas y garantizar un desarrollo eficiente y exitoso.

1- Revisión del Diseño Geométrico de Puentes en Planta y Perfil – Tramos 1, 2, 3, 4 y 5 – Reunión del 16 de junio de 2025: Se realizó la revisión y análisis del diseño geométrico en planta y perfil de los puentes correspondientes a los tramos 1, 2, 3, 4 y 5, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los parámetros técnicos, identificar posibles ajustes y definir acciones para optimizar el proyecto. Durante este proceso, se prestó especial atención a aspectos clave del diseño, enfocándose particularmente en los puentes y en las posibles interferencias con el alineamiento del proyecto. Como resultado de la revisión, se identificaron puntos críticos que requieren atención y seguimiento para garantizar la viabilidad y seguridad de la obra. Además, se presentaron detalles técnicos relacionados con la línea de rasante, las medidas y las diferencias de cota de los puentes, subrayando la complejidad estructural y la necesidad de verificar cuidadosamente sus alturas.
2- Revisión y Ajuste del Plan Exploratorio tras la Visita de la Comisión Geotécnica — Reunión del 17 de junio de 2025: Reunión técnica llevada a cabo el 17 de junio de 2025, posterior a la visita de campo realizada por la comisión geotécnica, se revisó de manera integral el plan exploratorio propuesto para el desarrollo del proyecto. Durante el encuentro, los especialistas presentaron sus observaciones y recomendaciones con base en las condiciones reales del terreno identificadas durante el recorrido. Entre los principales ajustes se encuentran la reubicación de varios puntos de exploración, la modificación en la cantidad y profundidad de los sondeos y calicatas, así como la inclusión de ensayos geotécnicos adicionales en zonas críticas y en la rectificación del eje. Estas modificaciones responden a la necesidad de obtener una caracterización más precisa del subsuelo, especialmente en áreas con condiciones geológicas complejas o potenciales riesgos de inestabilidad.
3-Análisis preliminar de la estructura de la matriz de integración de los criterios de sostenibilidad con las áreas de estudio del proyecto – Sección de trabajo del 19 de junio de 2025: En esta sección se realiza un análisis preliminar de los criterios de sostenibilidad que deberán ser incorporados en las diferentes áreas de estudio del proyecto, con el propósito de que los especialistas encargados de los estudios y diseños incluyan estos criterios para que en las etapas futuras del proyecto sirvan como instrumentos de verificación y evaluación de las diferentes dimensiones de la sostenibilidad

1- Entre el 01 y el 08 de julio de 2025 se lleva a cabo la aplicación de encuestas de origen y destino en el corredor Ánimas – Cartago – Ánimas, como parte del estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio. julio, el equipo profesional ingresó al municipio de Unión Panamericana, estableciendo como punto principal de recolección de información la cabecera municipal de Las Ánimas. A partir de esa fecha, se inició la implementación de las encuestas, las cuales se están desarrollando en el horario comprendido entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m.
2- Entre el 01 y el 05 de julio de 2025, se llevó a cabo una visita de campo por parte de los especialistas de la consultoría en los volúmenes de Geotecnia, Hidrología, Hidráulica, Socavación y Geología. El propósito principal de esta actividad fue realizar una revisión detallada de las condiciones hidráulicas del corredor vial, así como de las afectaciones geológicas y los aspectos relacionados con la estabilidad de taludes. Como parte del recorrido, el equipo técnico inspeccionó el trayecto comprendido entre el Cruce del Cairo y el corregimiento de Curundó, en el municipio de Novita. Durante esta inspección se realizó una evaluación minuciosa de los puntos críticos identificados a lo largo del corredor, documentando el estado actual de la vía mediante evidencia fotográfica y observaciones técnicas en terreno. En el desarrollo de las actividades también se realizó la búsqueda e inspección de nacederos de agua ubicados dentro del área de influencia del proyecto, con el acompañamiento del equipo de hidráulica y de personas de la comunidad conocedoras del territorio. Esta tarea permitió abordar de forma integral aspectos
geológicos y geotécnicos, además de caracterizar un total de ocho (8) puntos de agua, en los que se tomaron parámetros fisicoquímicos para determinar la posible presencia de aguas subterráneas. Tmbien se reviso en campo 1. Identificación de obras de arte existentes. 2. Localización de cuerpos de agua en el corredor. 3. Reconocimiento de escorrentías y aguas de filtración presentes en el área de estudio.


1- Se realizo socialización segundo espacio con el consejo comunitario mayor de Novita COCOMAN dando cumplimiento a los requerimientos de la MEC y del representante legal vigente
2- La consultoría envío PLan de Exploración Geotecnica de los tramos 1, 4 y 5 los cuales se encuentran en reviisón por parte de la interventoria
3- La consultoría envía informe preliminar del volumen 5 Estudio de Geologia y Geomorfología local el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría
4-Se llevó a cabo una reunión técnica sobre diseño geométrico y topografía, en la cual se identificó como principal dificultad la falta de información topográfica, situación que ha impactado negativamente el desarrollo de la fase 3 del proyecto. Ante esto, se acordó priorizar la recolección de dicha información y se recomendó a los profesionales realizar una revisión minuciosa de los insumos disponibles, con el fin de precisar el estado actual de la documentación. Asimismo, se ajustó el formato del informe técnico para alinearlo con los estándares exigidos por la consultoría e interventoría. Durante la sesión también se abordaron posibles ajustes al cronograma y presupuesto, incluyendo la eventual modificación del contrato inicial, y se acordó avanzar en los análisis técnicos y jurídicos correspondientes.


1- La consultoría envía informe de apropiación de los estudios topograficos en donde concluye que la información entregada por el INVIAS no es confiable ni suficiente para Fase III debido a:
- Dentro de la revisión de la información no se encontró un informe topográfico detallado de campo.
- La información analizada no está referenciada al sistema oficial (MAGNA-SIRGAS 2018).
- No existe un modelo MDT detallado, ni se evidencia el uso de tecnologías LIDAR o escáner.
- Ausencia de redes levantadas, ni fichas técnicas de la red GNSS.
- Entregables no estructurados, ni verificables.
- Riesgo alto de reprocesos, rediseños y errores constructivos. Por tanto es necesario la toma actualizada de la topografía de detalle.
2- Se realizo comite tecnico mensual en el INVIAS Bogotá en donde se expuso la situación contractual con las comunidades de consejos comunitarios de COCOMAN y de San Pedro de Igara las cuales hacen parte de los tramos 1 y 2 y solicitan consulta previa. La consultoría propone realizar acercamientos con estas comunidades e intentar proponer realizar lineamientos de Consulta previa para que se permita la entrada a campo. Así mismo en este comite la consultoría se comprometio a iniciar con la toma de nueva topografía y toma de información geotecnica en los tramos 4, 5 y parte del tramo 3.

1- Se realizo mesa de trabajo BIM con los profesionales de la consultoría, Interventoría e INVIAS con el fin de definir el alcance según los recursos disponibles
2- La interventoría en comunicaciones C-4262-075-2025, C-4262-080-2025 , C-4262-085-2025 y C-4262-086-2025 ha advertido el atraso en las actividades en campo y solicita a la mayor brevedad un plan de contingencia que permita el desarrollo normal del proyecto.
3- La consultoría se encuentra adelantando el plan de contingencia, reprogramación y flujo de caja
4- La consultoría se encuentra definiendo el inicio de actividades en campo para la actualización de topografia en una franja de 200 m a nivel de detalle planimetrico y altimetrico.
5- La consultoría se encuentra definiendo la Exploración geotecnica e implementación BIM en los tramos 4,5 y parte del tramo 3.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

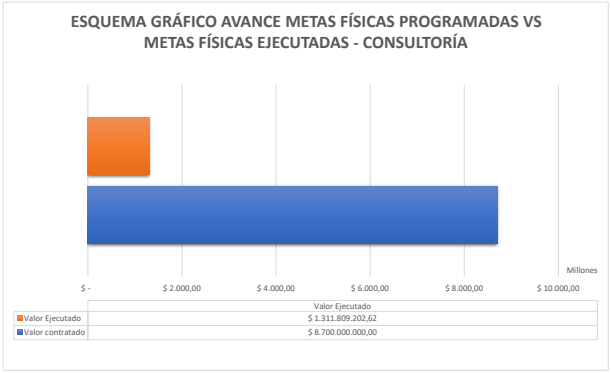


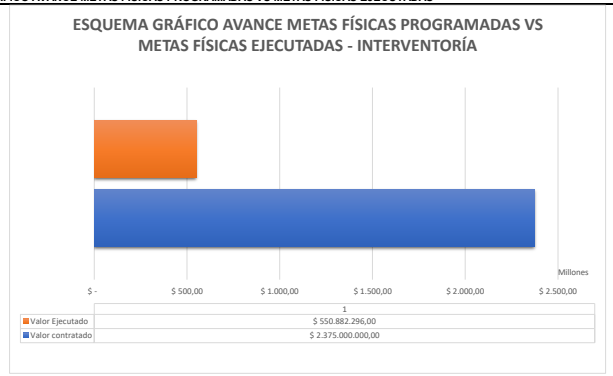

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



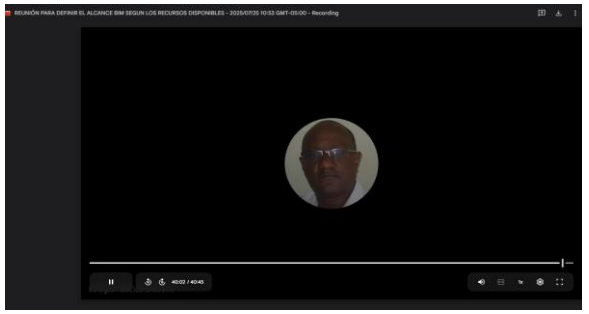

FECHA: 26/07/2025 (Día / Mes / Año)

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONSULTOR	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: Jose Octavio Niño Brijaldo Matrícula Profesional No.: 01193-0243

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-15-FR-6
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE COONSULTORÍA No: 4227 - 2024 **CONSULTOR:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCÓ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Jul-25 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4262 - 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACHOCO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	EDLY STELLA RENTERIA MENA	54.255.569	DIRECTORA	$ 10.240.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ 427.700	V	NUEVA EPS	88334117	$ 768.000	Colpensiones	88334117	$ 1.044.700	$ -	$ -	$ -	
2	JHOANA MARCELA MOSQUERA PALACIOS	1.077.476.234	RESIDENTE DE ESTUDIOS	$ 5.850.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Universidad Tecnologica del Chocó	100%	$ 458.100	V	NUEVA EPS	9488792015	$ 822.700	Colpensiones	9488792015	$ 1.119.000	$ 263.300	$ -	$ 197.500	
3	BERTONIS RENTERIA VALENCIA	11.811.142	RESIDENTE DE CAMPO	$ 5.850.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Universidad Tecnologica del Chocó	100%	$ 407.200	V	NUEVA EPS	9488792015	$ 731.300	Colpensiones	9488792015	$ 994.600	$ 234.000		$ 175.500	
4	LUZ YANETH OCORO VELASQUEZ	52.102.426	COORDINADORA AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 8.045.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Universidad Tecnologica del Chocó	100%	$ 909.900	V	NUEVA EPS	9488792015	$ 1.634.200	Colpensiones	9488792015	$ 2.222.500	$ 523.000	$ -	$ 392.200	
5	EULOGIO PALACIOS CHAVERRA	11.788.838	COORDINADOR TÉCNICO	$ 8.045.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ -	V	NUEVA EPS	88840750	$ 603.400	Colpensiones	88840750	$ 772.400		$ -		
6	LLECELI MOSQUERA TELLO	1.077.463.135	INGENIERA AUXILIAR	$ 3.890.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ 304.600	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9488792015	$ 547.100	Porvenir	9488792015	$ 700.200	$ 175.100	$ -	$ 131.300	
7	JEISON STIVEN GOMEZ GARCIA	1.112.789.406	TECNICO DE LA ZONA	$ 3.070.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Universidad Tecnologica del Chocó	100%	$ 128.300	V	NUEVA EPS	9489607337	$ 230.300	Porvenir	9489607337	$ 294.800		$ -		
8																			
9																			
10																			
N																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con Un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma:
Nombre: EDLY STELLA RENTERIA MENA
Directora de consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Firma:
Nombre: JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	54255569	EDLY STELLA RENTERIA MENA	VILLA SE ASIS QUIBDO - CHOCO	3146189837	edlyrenteria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	22/07/2025	88334117	$2.240.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	768.000	0		0		0	0	0	0	768.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	983.100	0	0	30.800	30.800	0	0		1.044.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	427.700				427.700	0	0	427.700			4.277	427.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	768.000	768.000
Pensión	1	1.044.700	1.044.700
Riesgos Laborales	1	427.700	427.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	2.240.400	2.240.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	54255569	EDLY STELLA RENTERIA MENA		VILLA SE ASIS QUIBDO - CHOCO	3146189837	edlyrenteria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	22/07/2025	88334117	$2.240.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	54255569	RENTERIA MENA EDLY STELLA	57	0			N																	25-14	6.144.000	983.100	0	0	30.800	30.800	EPS037	6.144.000	768.000	14-23	6.144.000	5	427.700		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Medellín, 04 de Julio de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO, en el centro de trabajo 0005451201 - PLANEAMIENTO FISICO, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C54256750	PINO PINO JUANA MARIA	06/04/2011		222Y2391	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C12020854	QUINTO MOSQUERA HARLEY	12/03/2012		A28M7133	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C35891192	MOSQUERA MURILLO ZULEYMA	01/10/2012		17618414	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C11807170	VALOIS CUESTA HAMLETH	18/01/2010		1779X222	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C19259580	BARRIOS MATURANA FRANKLIN	01/06/2002		207141DP	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C11800408	SANABRIA BOTERO JULIO RICARDO	01/07/2010		29144168	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C35851298	RENTERIA MORENO ELSY JOSEFA	05/04/2024		15344302	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C52102426	OCORO VELASQUEZ LUZ YANETH	01/01/2015		183Q9126	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C54255569	RENTERIA MENA EDLY STELLA	01/04/2019		22319724	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C11311855672518539349

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 04/07/2025 10:55:49 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.1.126.190, 192.230.104.6, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891680089	4	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROYECTO	CRA 22 N° 18B 10	QUIBDO-CHOCO	6726565	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1701262091	9488792015	E	2025/08/25	2025/08/14	BANCO AV VILLAS	0	$14,039,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$5,516,300						$4,110,300	
																				$480,000						$375,000	
																				$480,000						$375,000	
						$3,000,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$3,000,000	16%	SIN RIESGO	$480,000	$0	$0	$0	$0	$0	$480,000		SANITAS	30	$3,000,000	12.5%	$375,000	
																				$5,036,300						$3,735,300	
																				$5,036,300						$3,735,300	
						$6,581,250	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$6,581,250	16%	SIN RIESGO	$1,053,000	$0	$0	$33,000	$33,000	$0	$1,119,000		NUEVA E.P.S.	30	$6,581,250	12.5%	$822,700	
						$4,376,250	No	Fijo	PORVENIR	30	$4,376,250	16%	SIN RIESGO	$700,200	$0	$0	$0	$0	$0	$700,200		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$4,376,250	12.5%	$547,100	
						$13,073,125	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$13,073,125	16%	SIN RIESGO	$2,091,700	$0	$0	$65,400	$65,400	$0	$2,222,500		NUEVA E.P.S.	30	$13,073,125	12.5%	$1,634,200	
						$5,850,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$5,850,000	16%	SIN RIESGO	$936,000	$0	$0	$29,300	$29,300	$0	$994,600		NUEVA E.P.S.	30	$5,850,000	12.5%	$731,300	
																				$5,516,300						$4,110,300	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$4,110,300						$1,315,400						$2,111,200				$0		$986,500		$0		$0	
	$375,000						$120,000						$31,400				$0		$90,000		$0		$0	
	$375,000						$120,000						$31,400				$0		$90,000		$0		$0	
$0	$375,000		COMFACHOCÓ	30	$3,000,000	4%	$120,000	ARL SURA	30	$3,000,000	1.044%	2	$31,400	30	$3,000,000	0%	$0	3%	$90,000	0%	$0	0%	$0	No
	$3,735,300						$1,195,400						$2,079,800				$0		$896,500		$0		$0	
	$3,735,300						$1,195,400						$2,079,800				$0		$896,500		$0		$0	
$0	$822,700		COMFACHOCÓ	30	$6,581,250	4%	$263,300	ARL SURA	30	$6,581,250	6.96%	5	$458,100	30	$6,581,250	0%	$0	3%	$197,500	0%	$0	0%	$0	No
$0	$547,100		COMFACHOCÓ	30	$4,376,250	4%	$175,100	ARL SURA	30	$4,376,250	6.96%	5	$304,600	30	$4,376,250	0%	$0	3%	$131,300	0%	$0	0%	$0	No
$0	$1,634,200		COMFACHOCÓ	30	$13,073,125	4%	$523,000	ARL SURA	30	$13,073,125	6.96%	5	$909,900	30	$13,073,125	0%	$0	3%	$392,200	0%	$0	0%	$0	No
$0	$731,300		COMFACHOCÓ	30	$5,850,000	4%	$234,000	ARL SURA	30	$5,850,000	6.96%	5	$407,200	30	$5,850,000	0%	$0	3%	$175,500	0%	$0	0%	$0	No
	$4,110,300						$1,315,400						$2,111,200				$0		$986,500		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891680089	4	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROYECTO	CRA 22 N° 18B 10	QUIBDO-CHOCO	6726565	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1701262091	9488792015	E	2025/08/25	2025/08/14	BANCO AV VILLAS	0	$14,039,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$5,516,300	$0	$0	$5,516,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$4,336,100	$0	$0	$4,336,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$700,200	$0	$0	$700,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$2,111,200	$0	$0	$2,111,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$2,111,200	$0	$0	$2,111,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$1,315,400	$0	$0	$1,315,400
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	5	$1,315,400	$0	$0	$1,315,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$4,110,300	$0	$0	$4,110,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$3,188,200	$0	$0	$3,188,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$547,100	$0	$0	$547,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$375,000	$0	$0	$375,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$986,500	$0	$0	$986,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$986,500	$0	$0	$986,500
TOTAL				5	$14,039,700	$0	$0	$14,039,700

Medellín, 04 de Julio de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO, en el centro de trabajo 0005451201 - PLANEAMIENTO FISICO, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C54256750	PINO PINO JUANA MARIA	06/04/2011		222Y2391	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C12020854	QUINTO MOSQUERA HARLEY	12/03/2012		A28M7133	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C35891192	MOSQUERA MURILLO ZULEYMA	01/10/2012		17618414	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C11807170	VALOIS CUESTA HAMLETH	18/01/2010		1779X222	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C19259580	BARRIOS MATURANA FRANKLIN	01/06/2002		207141DP	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C11800408	SANABRIA BOTERO JULIO RICARDO	01/07/2010		29144168	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C35851298	RENTERIA MORENO ELSY JOSEFA	05/04/2024		15344302	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C52102426	OCORO VELASQUEZ LUZ YANETH	01/01/2015		183Q9126	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C54255569	RENTERIA MENA EDLY STELLA	01/04/2019		22319724	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C11311855672518539349

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 04/07/2025 10:55:49 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.1.126.190, 192.230.104.6, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11788838	EULOGIO PALACIOS CHAVERRA	Calle 29 4-23 Barrio Cristo Rey	3108323649	ingeulogio@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	08/08/2025	88840750	$1.375.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	603.400	0		0		0	0	0	0	603.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	772.400	0	0	0	0	0	0		772.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	603.400	603.400
Pensión	1	772.400	772.400
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	1.375.800	1.375.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11788838	EULOGIO PALACIOS CHAVERRA		Calle 29 4-23 Barrio Cristo Rey	3108323649	ingeulogio@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	08/08/2025	88840750	$1.375.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	11788838	PALACIOS CHAVERRA EULOGIO	3	0			N																	25-14	4.827.000	772.400	0	0	0	0	EPS037	4.827.000	603.400		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Medellín, 04 de Julio de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO, en el centro de trabajo 0005451201 - PLANEAMIENTO FISICO, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C11788838	PALACIOS CHAVERRA EULOGIO	01/06/2002		I1622521	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C11311855672518539471

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 04/07/2025 10:57:51 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.1.126.190, 192.230.104.6, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1112789406		GOMEZ GARCIA JEISON STIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 3 N° 13 - 12 Barrio El Milagroso	SAN JOSE DEL PALMAR-CHOCO	3212407750	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1661040949	9489607337	I	2025/08/04	2025/07/29	NEQUI	0	$653,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,842,000	$294,800			$1,842,000	$230,300			$0	$0			$1,842,000	$128,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,842,000	$294,800			$1,842,000	$230,300			$0	$0			$1,842,000	$128,300		$0	$0
Ciudad: SAN JOSE DEL PALMAR Depto: CHOCO (1 Afiliados)					$1,842,000	$294,800			$1,842,000	$230,300			$0	$0			$1,842,000	$128,300		$0	$0
1	CC	1112789406	GOMEZ JEISON	230301	30	$1,842,000	$294,800	EPS037	30	$1,842,000	$230,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,842,000	$128,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,842,000	$294,800			$1,842,000	$230,300			$0	$0			$1,842,000	$128,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1112789406		GOMEZ GARCIA JEISON STIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 3 N° 13 - 12 Barrio El Milagroso	SAN JOSE DEL PALMAR-CHOCO	3212407750	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1661040949	9489607337	I	2025/08/04	2025/07/29	NEQUI	0	$653,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$294,800	$0	$0	$294,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$294,800	$0	$0	$294,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$128,300	$0	$0	$128,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$128,300	$0	$0	$128,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,300	$0	$0	$230,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$230,300	$0	$0	$230,300
TOTAL				**1**	**$653,400**	**$0**	**$0**	**$653,400**

MEPI-MN1-IN-15-FR-9
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4227 - 2024

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2025

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO CONSULTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1124124	C-2402-0600-16-51102A-2402006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-MEDELLÍN (CHOCO), VÍA E	10	NACIÓN	Contrato Principal	$ 3.200.000.000,00	$ -
2024	1124124	C-2402-0600-16-51102A-2402015-02 ADQUIS. DE BYS - PUENTE CONSTRUIDO EN VÍA SECUNDARIA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-MEDELLÍN (CH	10	NACIÓN	Contrato Principal	$ 5.500.000.000,00	$ -
							$ -
							$ -
			TOTAL			$ 8.700.000.000,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 8.700.000.000

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 4.350.000.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4.350.000.000,00			RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $3.200.000,000
								RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4.350.000.000,00			RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $5.500.000,000
1	**DICIEMBRE 2024.**	$ 96.222.000,00	$ -	$ 96.222.000,00	$ 48.111.000,00	$ 48.111.000,00	$ 4.301.889.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4.301.889.000,00	$ 8.603.778.000,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
2	**ENERO 2025.**	$ 96.222.000,00	$ -	$ 192.444.000,00	$ 48.111.000,00	$ 48.111.000,00	$ 4.253.778.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4.253.778.000,00	$ 8.507.556.000,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
3	**FEBRERO 2025**	$ 185.122.000,00		$ 377.566.000,00	$ 92.561.000,00	$ 92.561.000,00	$ 4.161.217.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4.161.217.000,00	$ 8.322.434.000,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
4	**MARZO 2025**	$ 235.568.000,00		$ 613.134.000,00	$ 117.784.000,00	$ 117.784.000,00	$ 4.043.433.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2025	$ 4.043.433.000,00	$ 8.086.866.000,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
5	**ABRIL 2025**	$ 114.126.000,00		$ 727.260.000,00	$ 57.063.000,00	$ 57.063.000,00	$ 3.986.370.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2026	$ 3.986.370.000,00	$ 7.972.740.000,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
6	**MAYO 2025**	$ 182.492.000,00		$ 909.752.000,00	$ 91.246.000,00	$ 91.246.000,00	$ 3.895.124.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2027	$ 3.895.124.000,00	$ 7.790.248.000,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
7	**JUNIO 2025**	$ 156.047.952,00		$ 1.065.799.952,00	$ 78.023.976,00	$ 78.023.976,00	$ 3.817.100.024,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2028	$ 3.817.100.024,00	$ 7.634.200.048,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
8	**JULIO 2025.**	$ 266.818.400,00		$ 1.332.618.352,00	$ 133.409.200,00	$ 133.409.200,00	$ 3.683.690.824,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2029	$ 3.683.690.824,00	$ 7.367.381.648,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
TOTALES		**$ 1.332.618.352,00**		**$ 1.332.618.352,00**	**$ 666.309.176,00**	**$ 666.309.176,00**	**$ 3.683.690.824,00**		**$ 3.683.690.824,00**	**$ 7.367.381.648,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Interventor del Contrato de Consultoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA N°1 DICIEMBRE 2024	$ 96.222.000,00		$ 96.222.000,00
ACTA N°2 ENERO 2025	$ 96.222.000,00		$ 96.222.000,00
ACTA N°3 FEBRERO 2025	$ 185.122.000,00		$ 185.122.000,00
ACTA N°4 MARZO 2025	$ 235.568.000,00		$ 235.568.000,00
ACTA N°5 ABRIL 2025	$ 114.126.000,00		$ 114.126.000,00
ACTA N°6 MAYO 2025	$ 182.492.000,00		$ 182.492.000,00
ACTA N°7 JUNIO 2025	$ 156.047.952,00		$ 156.047.952,00
ACTA N°8 JULIO 2025	$ 266.818.400,00		$ 266.818.400,00
VALOR TOTAL	**$ 1.332.618.352,00**		**$ 1.332.618.352,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma:
Nombre: EDUY STELLA RENTERIA MENA
Directora de consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Firma:
Nombre: JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No. 4227 - 2024 **CONTRATISTA:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCÓ

OBJETO DEL CONTRATO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

FECHA DE INICIO: 2/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 8.700.000.000,00

VALOR ACUMULADO: $ 8.700.000.000,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.700.000.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.700.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4262 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	8,92%	$ 870.000.000,00	7	11	2024	1	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	44,62%	$ 4.350.000.000,00	7	11	2024	1	5	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	17,85%	$ 1.740.000.000,00	7	11	2024	1	1	2028
Calidad de Estudios y Diseños	26,77%	$ 2.610.000.000,00	31	12	2024	31	12	2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3002762

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 2/12/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2025 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	8,92%	$ 870.000.000,00	23 / 12 / 2024	1 / 7 / 2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	44,62%	$ 4.350.000.000,00	23 / 12 / 2024	1 / 7 / 2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	17,85%	$ 1.740.000.000,00	23 / 12 / 2024	1 / 1 / 2029
Calidad de Estudios y Diseños	26,77%	$ 2.610.000.000,00	31 / 12 / 2025	31 / 12 / 2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3002762

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 26/02/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 y 2 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 3002762 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 21/04/2025

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: EDLY STELLA RENTERIA MENA
Directora de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Firma
Nombre: JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN-IN-3-FR-1
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE CONSULTORÍA	CÓDIGO			MEPI-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN			1
		PÁGINA			

FECHA: 03/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Planificación de Infraestructura **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Chocó

DATOS GENERALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 2
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 4227 de 2024 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

JUSTIFICACIÓN:
Del Registro Presupuestal No. 1124124 de fecha 2024-11-14 Valor $8.700.000.000,00 para un valor total de anticipo de $ 4.350.000.000 equivalente al 50% como se estipula en la cláusula septima "Forma de pago" del contrato interadminsitrativo No 4227 de 2024.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1- ABRIL	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VR. MES 5	VR. MES 6	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Pago de salarios personal consultoria	300,000,000.00	176,130,000.00	181,130,000.00	130,130,000.00			$ 787,390,000.00	18.10%
2	Viaticos personal de consultoria	44,250,000.00	75,700,000.00	37,850,000.00	37,850,000.00			$ 195,650,000.00	4.50%
3	Adquisición de información secundaria	15,000,000.00	15,000,000.00					$ 30,000,000.00	0.69%
4	Levantamiento topografico	30,000,000.00	30,000,000.00	50,200,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		$ 210,200,000.00	4.83%
5	Gestiones ambientales, sociales, arqueológicas, prediales y de sostenibilidad (s/comprobante) (adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago a autoridades ambientales, costos de gestiones arqueológicas, monitoreo, muestreos ambientales etc.)		220,000,000.00	200,000,000.00	300,000,000.00	180,000,000.00		$ 900,000,000.00	20.69%
6	Toma de muestras para laboratorio(en suelo, en roca, Apiques) y ensayos de laboratorio y/o ensayos de investigación y/o Diagnóstico y/o Redes (S/comprobante) (Incluye la comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructural de puentes, subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, pavimentos, mezlas de suelo cemento, muros, obras hidraulicas, concretos, vibraciones ambientales, lineas sismicas, inspección de redes, batimetrías, entre otros)		1,136,590,400.00	440,000,000.00	200,000,000.00	150,000,000.00	67,569,600.00	$ 1,994,160,000.00	45.84%
7	Toma de información de transito	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00				$ 45,000,000.00	1.03%
8	Dotacion de oficina (compra de computadores y softwares)	120,000,000.00	50,000,000.00					$ 170,000,000.00	3.91%
9	Campamento	4,400,000.00	8,800,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00			$ 17,600,000.00	0.40%
	TOTAL	**$ 528,650,000.00**	**$ 1,727,220,400.00**	**$ 926,380,000.00**	**$ 720,180,000.00**	**$ 380,000,000.00**	**$ 67,569,600.00**	**$ 4,350,000,000.00**	**100%**

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. No aplica para compra ni alquiler de vehículos.

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.

4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: Edly Stella Renteria Mena
Directora de Consultoria
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL


Firma:
Nombre: Jose Octavio Niño Brijaldo
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE CONSULTORÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**1**	**ESTUDIOS Y DISEÑOS CONEXIÓN CURUNDÓ SAN JOSÉ DEL PALMAR CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA**	**14,3 mss**	**lun 2/12/24**	**mié 31/12/25**
2	**1.1**	**INICIO**	**0 mss**	**lun 2/12/24**	**lun 2/12/24**
3	**1.2**	**GRUPO No. 1 PERSONAL**	**14,3 mss**	**lun 2/12/24**	**mié 31/12/25**
4	1.2.1	Director de Consultoría	14,3 mss	lun 2/12/24	mié 31/12/25
5	1.2.2	Ingeniero Residente de Estudios	14,3 mss	lun 2/12/24	mié 31/12/25
6	1.2.3	Ingeniero Residente de Campo	7,5 mss	lun 5/05/25	vie 28/11/25
7	1.2.4	Coordinador ambiental y social	14,3 mss	lun 2/12/24	mié 31/12/25
8	1.2.5	Coordinador técnico	14,3 mss	lun 2/12/24	mié 31/12/25
9	1.2.6	Coordinador BIM SIG	14,3 mss	lun 2/12/24	mié 31/12/25
10	1.2.7	Ingeniero Auxiliar	14,3 mss	lun 2/12/24	mié 31/12/25
11	1.2.8	Técnicos de la zona	7,5 mss	lun 5/05/25	vie 28/11/25
12	1.3	APROPIACIÓN Y PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR	6,9 mss	lun 2/12/24	vie 6/06/25
13	1.3.1	Reunión de socialización con grupos de interés	0,15 mss	jue 20/03/25	sáb 22/03/25
14	1.3.2	Apropiación de los estudios y diseños y/o documentación técnica previa	4,25 mss	lun 16/12/24	vie 6/06/25
15	1.3.3	Elaboración de cronograma de actividades	0,5 mss	lun 2/12/24	vie 13/12/24
16	1.3.4	Elaboración de metodologías especialistas	3,5 mss	sáb 1/03/25	mié 4/06/25
17	1.3.5	Elaboración de plan de calidad de estudios y diseños (BEP)	3 mss	lun 2/12/24	jue 20/02/25
18	1.3.6	Solicitud de información a empresas de servicios públicos información base y guía para la presentación de productos en formato digital	2 mss	lun 20/01/25	mié 12/03/25

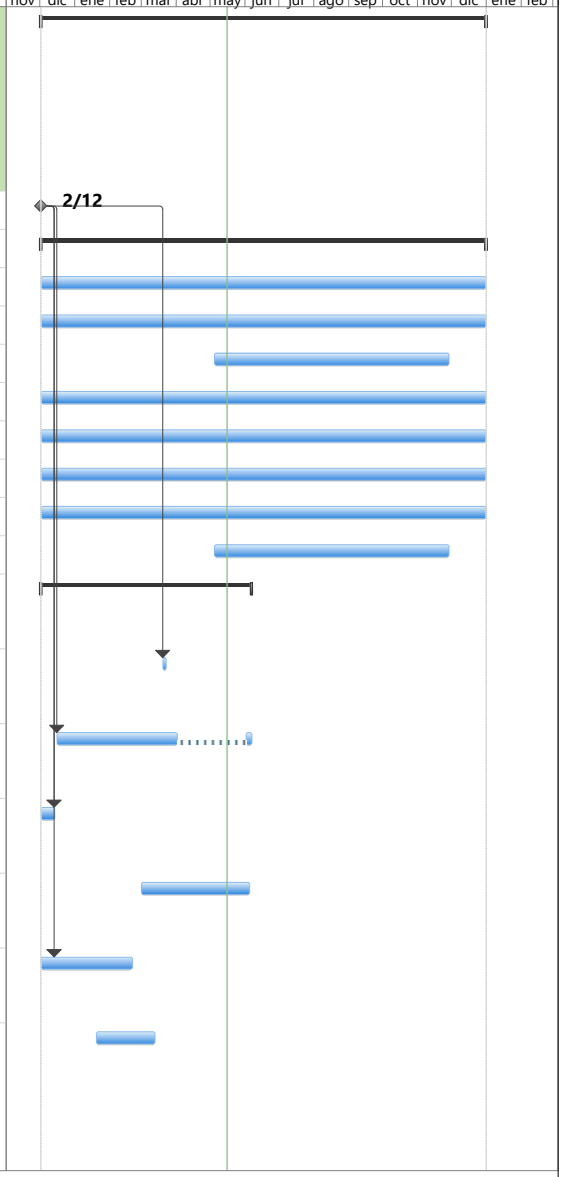

Proyecto: CURUNDO 4227-202
Fecha: 31/01/2025
EDLY STELLA RENTERÍA MENA

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
19	**1.4**	**RECOPILACION DE INFORMACIÓN SECUNDARIA**	**5,35 mss**	**lun 2/12/24**	**jue 24/04/25**
20	1.4.1	Recopilación de estudios y diseños existentes de utilidad para el proyecto	3 mss	lun 2/12/24	jue 20/02/25
21	1.4.2	Solicitudes a entidades gubernamentales y privadas	2 mss	lun 20/01/25	mié 12/03/25
22	1.4.3	Adquisición de cartografía y demás información técnica	2 mss	lun 3/03/25	jue 24/04/25
23	1.4.4	Análisis de posibles conflictos de intereses con otros proyectos e infraestructura existentes	3 mss	lun 13/01/25	mar 1/04/25
24	**1.5**	**GRUPO No. 2 ELABORACIÓN DE VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES**	**11,25 mss**	**lun 24/02/25**	**mié 31/12/25**
25	1.5.1	Volumen 1. Estudios topográficos	6,15 mss	lun 24/02/25	lun 11/08/25
26	1.5.2	Volumen 2. Estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio	2,5 mss	mié 7/05/25	lun 18/08/25
27	1.5.3	Volumen 3. Estudio de trazado y diseño geométrico	6,4 mss	lun 24/02/25	lun 18/08/25
28	1.5.4	Volumen 4. Estudio de seguridad vial	6,9 mss	lun 24/02/25	lun 1/09/25
29	1.5.5	Volumen 5. Estudio de geología y geomorfología local	5,3 mss	lun 31/03/25	lun 25/08/25
30	1.5.6	Volumen 6. Estudio de hidrogeología de detalle	6,55 mss	lun 31/03/25	lun 29/09/25
31	1.5.7	Volumen 7. Estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y fuentes de materiales	9,1 mss	vie 21/03/25	vie 28/11/25
32	1.5.8	Volumen 8. Estudio de suelos para diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras	10,1 mss	lun 24/02/25	vie 28/11/25
33	1.5.9	Volumen 9. Estudio de hidráulica, hidrología y socavación	7,5 mss	lun 31/03/25	vie 24/10/25

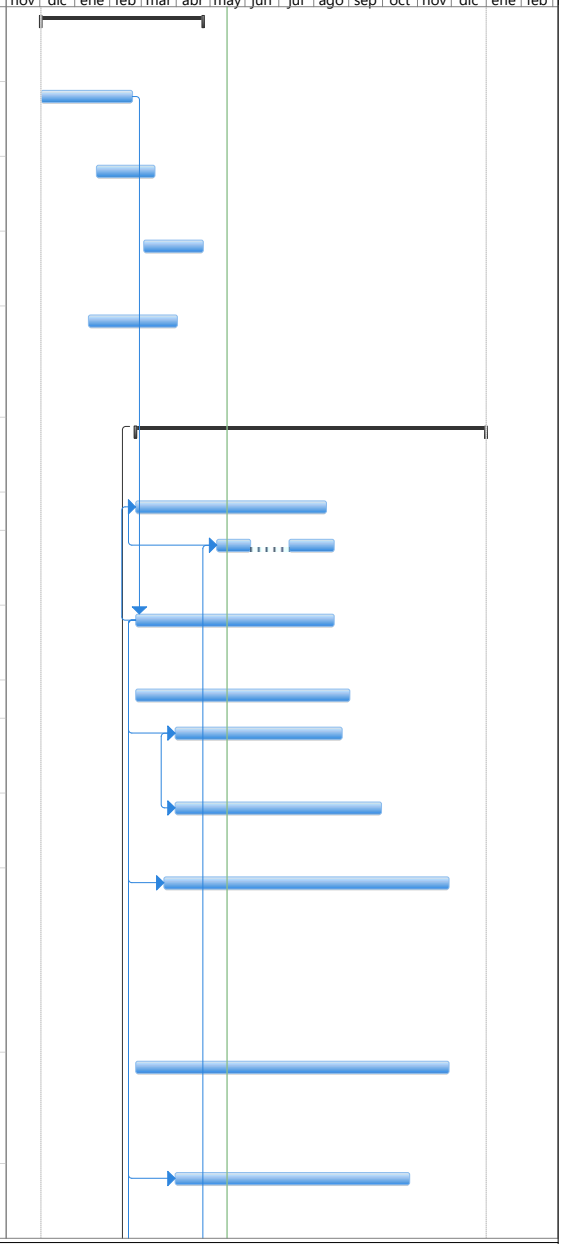

Proyecto: CURSANDO 4227-202
Fecha: 31/01/2025
EDLY STELLA RENTERÍA MENA

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
34	1.5.10	Volumen 10. Estudio de diseño de pavimentos	7,75 mss	lun 31/03/25	vie 31/10/25
35	1.5.11	Volumen 11. Estudio de diseño de estructuras	8,75 mss	lun 31/03/25	vie 28/11/25
36	1.5.12	Volumen 12. Estudio de urbanismo y paisajismo	6,75 mss	lun 31/03/25	vie 3/10/25
37	1.5.13	Volumen 13. Estudio de redes hidrosanitarias y secas	6,75 mss	lun 31/03/25	vie 3/10/25
38	1.5.14	Volumen 14. Estudio de riesgos	6,05 mss	vie 4/07/25	vie 19/12/25
39	1.5.15	Volumen 15. Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones	9,25 mss	lun 31/03/25	vie 12/12/25
40	1.5.16	Volumen 16. Evaluación socioeconómica y financiera del proyecto	8 mss	lun 12/05/25	vie 19/12/25
41	1.5.17	Volumen 17. Ambiental, social, predial, y sostenibilidad	8,75 mss	lun 31/03/25	vie 28/11/25
42	1.5.18	Volumen 18. Técnico BIM	10,85 mss	lun 24/02/25	vie 19/12/25
43	1.5.19	Volumen 19. Informe final ejecutivo	1 ms	jue 4/12/25	mié 31/12/25
44	**1.6**	**GRUPO No. 3 OTROS COSTOS DIRECTOS**	**14,3 mss**	**lun 2/12/24**	**mié 31/12/25**
45	1.6.1	Viáticos Director (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	8,95 mss	mié 23/04/25	lun 29/12/25
46	1.6.2	Viáticos Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	8,9 mss	jue 24/04/25	lun 29/12/25
47	1.6.3	Transportes Aéreos Director (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	8,95 mss	mié 23/04/25	lun 29/12/25
48	1.6.4	Transportes Aéreos Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	8,9 mss	jue 24/04/25	lun 29/12/25

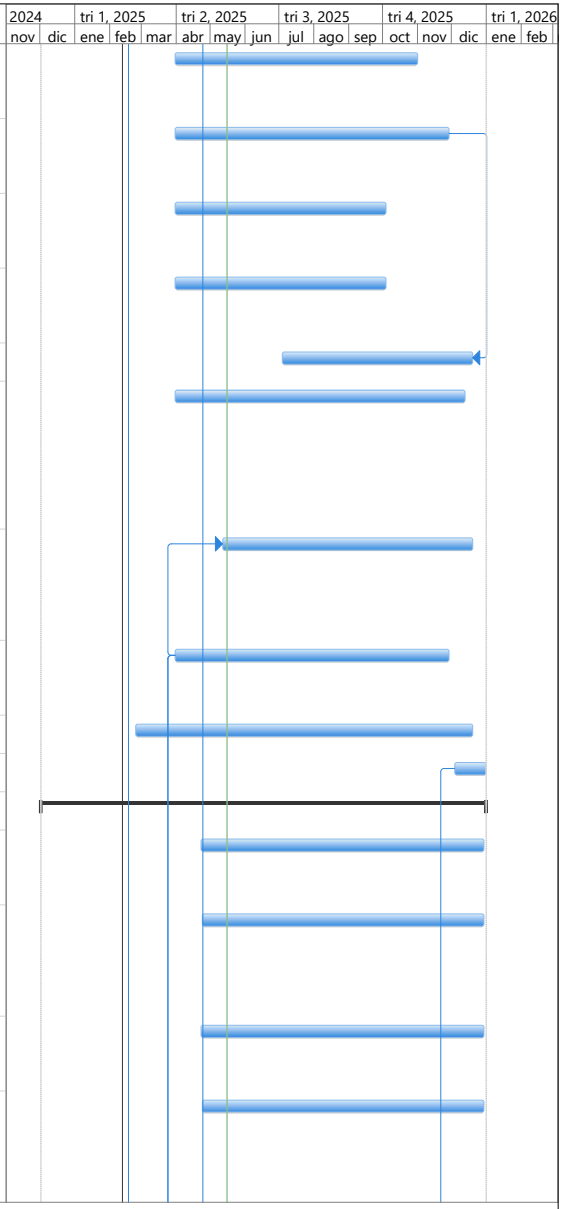

Proyecto: CURSANDO 4227-202
Fecha: 31/01/2025
EDLY STELLA RENTERÍA MENA

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
49	1.6.5	Adquisición de informaciòn secundaria (fotografia aèrea, planchas catastrales, Registro 1 y 2 del IGAC, implica tota la informaciòn jurìdica que se requiera) S/Comprobante Pago	2,1 mss	lun 5/05/25	mar 1/07/25
50	1.6.6	Levantamiento Topografico y Materialización del Eje (Incluye personal, equipos, transporte)	1,05 mss	lun 4/08/25	lun 1/09/25
51	1.6.7	Levantamiento topográfico detallado (incluye personal, equipos, materiales, viaticos, desplazamiento, transporte)	4,05 mss	lun 5/05/25	lun 25/08/25
52	1.6.8	Georeferenciación (incluye par de puntos con gps de precisiòn milimètrica materializdos en campo con mojones en concreto y plantina de bronce, estimando ubicar en cada punto un par de mojones de concreto). incluye equipo, material, transportes y personal.	1,05 mss	lun 1/09/25	lun 29/09/25
53	1.6.9	Alquiler de Vehìculo (4X4 de 2000 CC o superior, Modelo 2014 o superior, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	8,55 mss	lun 5/05/25	lun 29/12/25
54	1.6.10	Alquiler de Vehìculo (4X4 de 2000 CC o superior, Modelo 2014 o superior, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	8,55 mss	lun 5/05/25	lun 29/12/25
55	1.6.11	Campamento (incluye arrendamiento y/o alquiler, dotación y servicios, en el sitio del proyecto)	8,55 mss	lun 5/05/25	lun 29/12/25

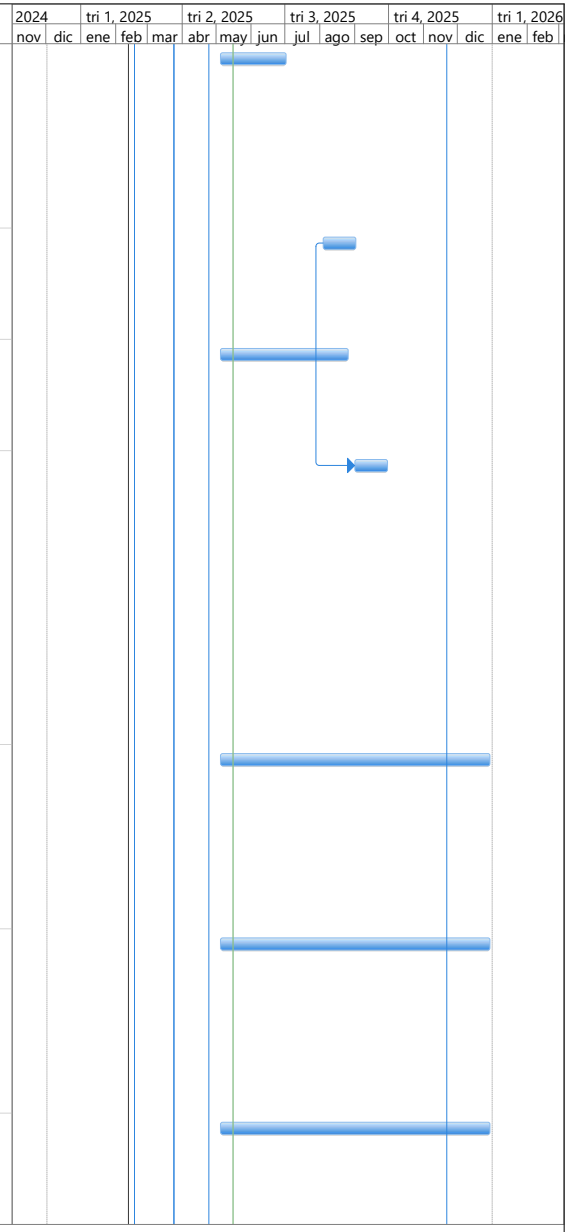

Proyecto: CURANDO 4227-202
Fecha: 31/01/2025
EDLY STELLA RENTERÍA MENA

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
56	1.6.12	Campamento (incluye arrendamiento y/o alquiler, dotación y servicios, en el sitio del proyecto)	14,3 mss	lun 2/12/24	mié 31/12/25
57	1.6.13	Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	2,3 mss	lun 7/07/25	lun 8/09/25
58	1.6.14	Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal)	2,3 mss	lun 7/07/25	lun 8/09/25
59	1.6.15	Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal)	2,3 mss	lun 7/07/25	lun 8/09/25
60	1.6.16	Ensayos de Laboratorio y/o ensayos de investigación y/o Diagnóstico y/o Redes (S/comprobante) (Incluye la comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructura	4,05 mss	lun 7/07/25	lun 27/10/25
61	1.6.17	Edición de Informes Finales de todos los volúmenes (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y dos copias en archivos magnéticos)	1 ms	jue 4/12/25	mié 31/12/25
62	1.6.18	Estudios complementarios (Aprobados por la Interventoría)	1,05 mss	lun 1/12/25	lun 29/12/25
63	1.6.19	Toma de información de Tránsito	1 ms	mié 7/05/25	mar 3/06/25

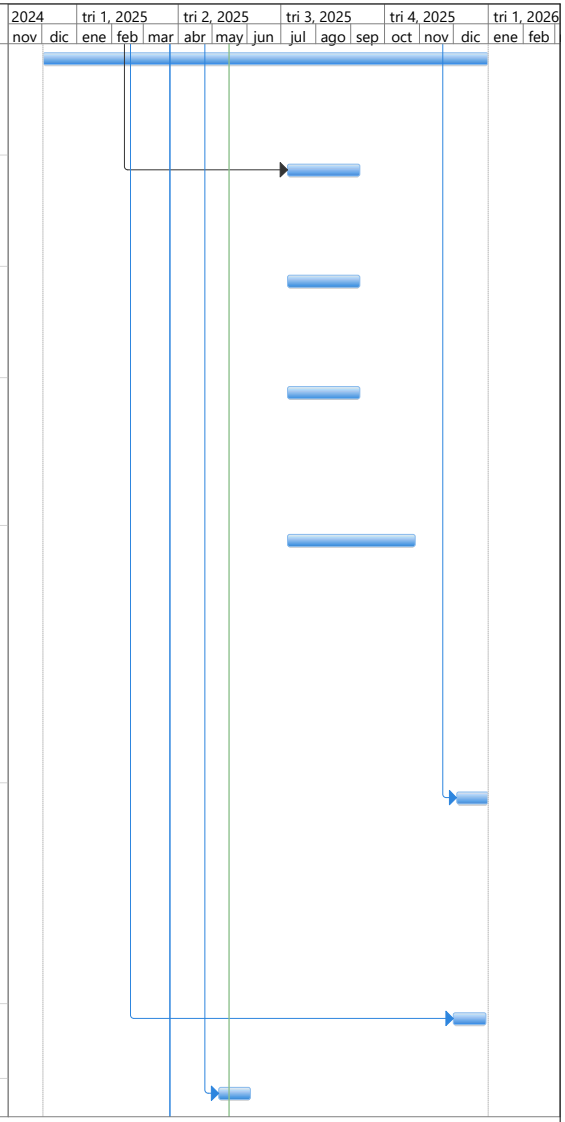

Proyecto: CURSANDO 4227-202
Fecha: 31/01/2025
EDLY STELLA RENTERÍA MENA

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
64	1.6.20	Gestiones Ambientales, Arqueologica, Sociales, (S/comprobante) (Adquisición de información, monitoreo, muestreos, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago a autoridades ambientales, etc)	7,3 mss	lun 5/05/25	lun 24/11/25
65	1.6.21	Lineamientos consultas previas (Socializaciones componente social). (S/comprobante)	8 mss	lun 28/04/25	vie 5/12/25
66	**1.6.22**	**FIN**	**0 mss**	**mié 31/12/25**	**mié 31/12/25**

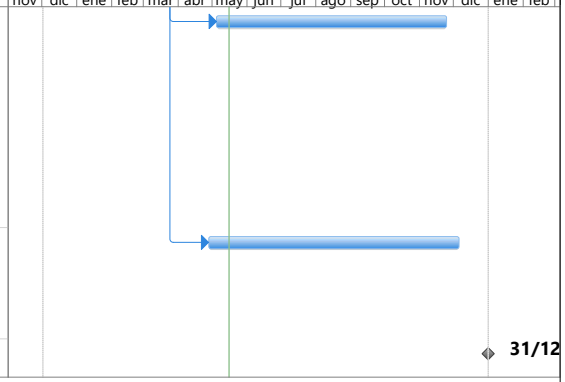

Proyecto: CURSANDO 4227-202
Fecha: 31/01/2025
EDLY STELLA RENTERÍA MENA

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

MEPI-MN-IN-6-FR-1
PROGRAMA DE INVERSIONES

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 6
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 4227 DE 2024

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 de 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 1.095 (En meses segun contrato principa)

PLAZO ACUMULADO: 37 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CON 02/12/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) $ 8,700,000,000.00 (Según contrato principal)

,OR ADICIONES (Incluido IVA) $

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) $ 8,700,000,000.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL consultoría PROGRAMADA Miles de pesos	(%) consultoría PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL consultoría PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ajustado / % Ejecutado	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
	VALOR ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA	VALOR consultoría EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos															
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 254,568,000.00	2.93%	2.21%	% P	1.16%	1.24%	1.34%	1.34%	1.68%	1.34%	1.68%	1.34%	1.14%	1.16%	0.93%	0.93%	1.16%	
	$ 1,430,754,000.00	16.45%	$ 192,444,000.00	$ P	$ 100,774,210.53	$ 107,902,723.26	$ 116,997,174.87	$ 116,997,174.87	$ 146,246,468.59	$ 116,997,174.87	$ 146,246,468.59	$ 116,997,174.87	$ 99,805,271.65	$ 100,774,210.53	$ 80,619,368.42	$ 80,619,368.42	$ 100,774,210.53	
				$ E	$ 96,222,000.00	$ 96,222,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	1.11%	1.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.11%	
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES																		
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS	$ 69,000,000.00	0.79%	0.00%	% P	0.04%	0.48%	0.00%	0.00%	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$ 69,000,000.00	0.79%	$ -	$ P	$ -	$ 3,450,000.00	$ 41,400,000.00	$ -	$ 24,150,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO	$ 60,000,000.00	0.69%	0.00%	% P	0.00%	0.41%	0.00%	0.00%	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$ 60,000,000.00	0.69%	$ -	$ P	$ -	$ 3,000,000.00	$ 36,000,000.00	$ -	$ 21,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	$ 165,000,000.00	1.90%	0.00%	% P	0.00%	1.14%	0.00%	0.00%	0.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$ 165,000,000.00	1.90%	$ -	$ P	$ -	$ 6,250,000.00	$ 99,000,000.00	$ -	$ 57,750,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	$ 42,000,000.00	0.48%	0.00%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.31%	0.00%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$ 42,000,000.00	0.48%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27,300,000.00	$ -	$ 14,700,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	$ 106,000,000.00	1.22%	0.00%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.43%	0.00%	0.00%	
	$ 106,000,000.00	1.22%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,300,000.00	$ -	$ -	$ 53,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 37,100,000.00	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	$ 125,000,000.00	1.44%	0.00%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.86%	0.00%	0.00%	0.34%	0.00%	0.00%	
	$ 125,000,000.00	1.44%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,250,000.00	$ -	$ -	$ 75,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 43,750,000.00	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES	$ 368,000,000.00	4.23%	0.00%	% P	0.00%	0.21%	0.00%	0.00%	2.54%	0.00%	1.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$ 368,000,000.00	4.23%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ 18,400,000.00	$ -	$ 220,800,000.00	$ -	$ 129,200,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	$ 235,000,000.00	2.70%	0.00%	% P														
	$ 235,000,000.00	2.70%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,750,000.00	$ 141,000,000.00	$ -	$ 82,250,000.00	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	$ 190,000,000.00	2.18%	0.00%	% P														
	$ 190,000,000.00	2.18%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,500,000.00	$ 114,000,000.00	$ -	$ 66,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS	$ 73,000,000.00	0.84%	0.00%	% P														
	$ 73,000,000.00	0.84%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,650,000.00	$ 43,800,000.00	$ -	$ 25,550,000.00	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	$ 481,000,000.00	5.53%	0.00%	% P														
	$ 481,000,000.00	5.53%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24,050,000.00	$ -	$ -	$ 288,600,000.00	$ -	$ -	$ 168,350,000.00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	$ 57,000,000.00	0.66%	0.00%	% P														
	$ 57,000,000.00	0.66%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,850,000.00	$ 34,200,000.00	$ 19,950,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS SECAS	$ 47,000,000.00	0.54%	0.00%	% P														
	$ 47,000,000.00	0.54%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,350,000.00	$ 28,200,000.00	$ 16,450,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIO DE RIESGOS	$ 93,000,000.00	1.07%	0.00%	% P														
	$ 93,000,000.00	1.07%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,650,000.00	$ -	$ -	$ 55,800,000.00	$ -	$ -	$ 32,550,000.00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	$ 56,000,000.00	0.64%	0.00%	% P														
	$ 56,000,000.00	0.64%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,800,000.00	$ 33,600,000.00	$ -	$ -	$ 19,600,000.00	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	$ 54,000,000.00	0.62%	0.00%	% P														
	$ 54,000,000.00	0.62%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ 2,700,000.00	$ -	$ 32,400,000.00	$ -	$ -	$ 18,900,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
AMBIENTAL , SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	$ 423,000,000.00	4.86%	0.00%	% P	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.47%	
	$ 423,000,000.00	4.86%	$ -	$ P	$ 21,150,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 253,980,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 148,050,000.00	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
VOLUMEN TECNICO BIM	$ 46,000,000.00	0.53%	0.00%	% P														
	$ 46,000,000.00	0.53%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,300,000.00	$ -	$ -	$ 27,600,000.00	$ -	$ 16,100,000.00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 5,755,432,000.00	66.15%	0.00%	% P	0.46%	1.14%	8.95%	10.48%	8.18%	5.57%	5.85%	1.15%	1.04%	1.13%	0.92%	1.70%	2.00%	
	$ 4,579,246,000.00	52.64%	$ -	$ P	$ 39,797,368.42	$ 447,252,894.74	$ 778,748,061.40	$ 909,610,076.75	$ 711,748,061.40	$ 484,473,686.40	$ 509,789,451.75	$ 100,357,894.74	$ 90,607,894.74	$ 98,347,368.42	$ 80,357,894.74	$ 147,474,561.40	$ 181,680,701.75	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
VALOR BÁSICO DE consultoría (A)	$ 8,700,000,000.00	100.00%	2.21%															
VALOR BÁSICO DE consultoría ACTUALIZADO (A')	$ 8,700,000,000.00	100.00%	$ 192,444,000.00															

REPROGRAMACIÓN

		DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA MES	%	1.62%	6.79%	12.54%	11.80%	14.03%	6.91%	9.18%	7.01%	2.18%	2.29%	2.78%	2.62%	4.95%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 140,571,578.95	$ 591,005,701.35	$ 1,093,245,236.27	$ 1,026,607,251.62	$ 1,298,344,529.99	$ 780,170,861.27	$ 846,685,920.34	$ 1,180,555,089.61	$ 220,866,166.39	$ 327,971,578.95	$ 492,427,263.16	$ 253,643,929.82	$ 450,104,912.28	
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA	%	1.62%	8.41%	20.97%	32.78%	47.68%	54.64%	63.38%	70.34%	72.49%	74.78%	77.56%	80.18%	85.13%	100.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 140,571,578.95	$ 731,577,280.30	$ 1,824,822,516.57	$ 2,851,429,768.19	$ 4,147,774,298.18	$ 4,927,945,159.45	$ 5,774,631,079.79	$ 6,955,186,149.40	$ 7,175,052,315.79	$ 7,503,023,894.74	$ 7,995,451,157.90	$ 8,249,095,087.72	$ 8,700,000,000.00	
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA MES	%	1.11%	1.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 96,222,000.00	$ 96,222,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA	%	1.11%	2.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 96,222,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de consultoría aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la consultoría (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la consultoría programada se calcula con respecto al Valor Básico de consultoría (A) o el Valor Básico de consultoría Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de consultoría que no se puedan agrupar por GPP, se debe

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

Aprueba Firma:
Nombre: EDWYN VILLA RENTERÍA MENA
Directora de consultoría
Matrícula Profesional No.: 0820251733 ATL

Aprueba Firma:
Nombre: JOSE OCTAVIO NIÑO BRUALDO
Director de interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC BYC

Revisó Firma:
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: YENNY XIOMARA HERNANDEZ PEÑARANDA
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN-IN-6-FR-2
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA y/o SUPERVISION PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1 de 1 | CÓDIGO: MEP-MNT-IN-6-FR-2 | VERSIÓN: 1 | PÁGINA: | FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONSULTORÍA No. 8 **DE** Jul-25 (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE CONSULTORÍA: $ 266.618.400,00

SEGUIMIENTO No. 8
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 4227 DE 2024

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIDO) DE LA CONEXION CURUNDO - SAN JOSE DEL PALMAR - CRUCERO EL CARO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 de 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 1 mes (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 13 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/12/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 8.700.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 8.700.000.000,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL consultoría PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA Miles de pesos	(%) consultoría PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL consultoría PROGRAMADA / VALOR consultoría EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 254.568.000,00	2,93%	9,70%	% P	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,46%	1,34%	
	$ 1.430.754.000,00	16,45%	$ 843.654.000,00	$ P	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 117.630.000,00	$ 117.630.000,00	$ 117.630.000,00	$ 117.630.000,00	$ 117.630.000,00	$ 117.630.000,00	$ 127.284.000,00	$ 116.980.000,00	
				$ E	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 104.139.000,00	$ 104.214.000,00	$ 104.139.000,00	$ 104.139.000,00	$ 104.139.000,00	$ 104.139.000,00	$ 104.139.000,00	$ 104.139.000,00	
				% E	1,11%	1,11%	1,11%	1,00%	1,22%	1,46%	1,46%	1,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
GRUPO 2 – COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES																		
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS	$ 69.000.000,00	0,79%	0,04%	% P				0,04%			0,48%		0,28%					
	$ 69.000.000,00	0,79%	$ 3.450.000,00	$ P	$ -	$ -	$ 3.450.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 41.400.000,00	$ -	$ 24.150.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ 3.450.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0,04%				0,00%							
ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO	$ 60.000.000,00	0,69%	0,45%	% P			0,03%				0,41%		0,24%					
	$ 60.000.000,00	0,69%	$ 39.000.000,00	$ P	$ -	$ -	$ 3.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 36.000.000,00	$ -	$ 21.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ 3.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 36.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0,03%					0,41%						
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	$ 165.000.000,00	1,90%	1,23%	% P			0,09%	1,14%			0,00%		0,66%					
	$ 165.000.000,00	1,90%	$ 107.250.000,00	$ P	$ -	$ -	$ 8.250.000,00	$ 99.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 57.750.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ 8.250.000,00	$ 99.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0,09%	1,14%										
ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	$ 42.000.000,00	0,48%	0,31%	% P			0,02%				0,29%				0,17%			
	$ 42.000.000,00	0,48%	$ 27.300.000,00	$ P	$ -	$ -	$ 2.100.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.350.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 14.700.000,00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ 2.100.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0,02%				0,00%	0,29%						
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	$ 106.000.000,00	1,22%	0,79%	% P				0,08%			0,72%		0,43%		0,00%			
	$ 106.000.000,00	1,22%	$ 68.900.000,00	$ P	$ -	$ -	$ -	$ 6.360.000,00	$ -	$ -	$ 63.600.000,00	$ -	$ 37.100.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ 6.360.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 63.600.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E				0,06%			0,00%	0,73%			0,00%			
ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	$ 125.000.000,00	1,44%	0,07%	% P				0,07%				0,88%		0,65%	0,00%			
	$ 125.000.000,00	1,44%	$ 6.250.000,00	$ P	$ -	$ -	$ -	$ 6.250.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 75.000.000,00	$ -	$ 43.750.000,00	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ 6.250.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 75.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E				0,07%				0,86%			0,00%			
ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES	$ 368.000.000,00	4,23%	0,21%	% P			0,21%							2,54%		1,46%		
	$ 368.000.000,00	4,23%	$ 18.400.000,00	$ P	$ -	$ -	$ 18.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 220.800.000,00	$ -	$ 128.800.000,00	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ 18.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0,21%											
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	$ 235.000.000,00	2,70%	0,14%	% P			0,14%							1,62%		0,95%		
	$ 235.000.000,00	2,70%	$ 11.750.000,00	$ P	$ -	$ -	$ 11.750.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 141.000.000,00	$ -	$ 82.250.000,00	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ 11.750.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0,14%											
ESTUDIOS DE HIDRAULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	$ 190.000.000,00	2,18%	0,11%	% P			0,11%					1,31%			0,76%			
	$ 190.000.000,00	2,18%	$ 9.500.000,00	$ P	$ -	$ -	$ 9.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 114.000.000,00	$ -	$ -	$ 66.500.000,00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0,11%											
ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS	$ 73.000.000,00	0,84%	0,04%	% P				0,04%						0,00%	0,00%	0,00%		
	$ 73.000.000,00	0,84%	$ 3.650.000,00	$ P	$ -	$ -	$ -	$ 3.650.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 43.800.000,00	$ 25.550.000,00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ 3.650.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E				0,04%										
ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	$ 481.000.000,00	5,53%	0,28%	% P			0,28%							3,32%		1,94%		
	$ 481.000.000,00	5,53%	$ 24.050.000,00	$ P	$ -	$ -	$ 24.050.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 288.600.000,00	$ -	$ 168.350.000,00	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ 24.050.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0,28%											
ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	$ 57.000.000,00	0,66%	0,03%	% P				0,03%				0,39%		0,23%				
	$ 57.000.000,00	0,66%	$ 2.850.000,00	$ P	$ -	$ -	$ -	$ 2.850.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 34.200.000,00	$ -	$ 19.950.000,00	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ 2.850.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E				0,03%										
ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS SECAS	$ 47.000.000,00	0,54%	0,03%	% P				0,03%				0,32%		0,19%				
	$ 47.000.000,00	0,54%	$ 2.350.000,00	$ P	$ -	$ -	$ -	$ 2.350.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.200.000,00	$ -	$ 16.450.000,00	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ 2.350.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E				0,03%										
ESTUDIO DE RIESGOS	$ 93.000.000,00	1,07%	0,05%	% P				0,05%					0,04%				0,37%	
	$ 93.000.000,00	1,07%	$ 4.650.000,00	$ P	$ -	$ -	$ -	$ 4.650.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 53.550.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 32.550.000,00	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ 4.650.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E				0,05%										
ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	$ 56.000.000,00	0,64%	0,03%	% P			0,03%					0,39%		0,00%	0,00%		0,23%	
	$ 56.000.000,00	0,64%	$ 2.800.000,00	$ P	$ -	$ -	$ 2.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.600.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.600.000,00	
				$ E	$ -	$ -	$ 2.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0,03%											
EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	$ 54.000.000,00	0,62%	0,03%	% P				0,03%						0,37%			0,23%	
	$ 54.000.000,00	0,62%	$ 2.700.000,00	$ P	$ -	$ -	$ -	$ 2.700.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32.400.000,00	$ -	$ -	$ 18.900.000,00	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ 2.700.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E				0,03%										
AMBIENTAL , SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	$ 423.000.000,00	4,86%	0,24%	% P				0,24%					2,92%			1,70%		
	$ 423.000.000,00	4,86%	$ 21.150.000,00	$ P	$ -	$ -	$ -	$ 21.150.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 253.800.000,00	$ -	$ -	$ 148.050.000,00	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ 21.150.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E				0,24%										
VOLUMEN TECNICO BIM	$ 46.000.000,00	0,53%	0,03%	% P			0,03%								0,32%	0,19%		
	$ 46.000.000,00	0,53%	$ 2.300.000,00	$ P	$ -	$ -	$ 2.300.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.600.000,00	$ -	$ 16.100.000,00	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ 2.300.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0,03%											
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 5.735.432.000,00	65,15%	1,50%	% P	0,01%	0,01%	0,01%	0,09%	0,09%	4,86%	4,78%	14,35%	12,16%	8,01%	5,53%	6,70%	2,25%	
	$ 4.579.246.000,00	52,04%	$ 130.668.352,00	$ P	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	$ 7.697.500,00	$ 423.625.000,00	$ 416.100.000,00	$ 1.235.351.500,00	$ 1.055.045.250,00	$ 696.542.750,00	$ 481.135.500,00	$ 61.033.000,00	$ 195.527.500,00	
				$ E	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00	$ 1.100.000,00	$ 8.270.500,00	$ 54.218.000,00	$ 8.110.154,00	$ 8.540.400,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0,04%	0,04%	0,04%	0,01%	0,09%	0,63%	0,13%	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
VALOR BÁSICO DE consultoría (A)	**$ 8.700.000.000,00**	**100,00%**	**15,32%**															
VALOR BÁSICO DE consultoría ACTUALIZADO (A')	**$ 8.700.000.000,00**	**100,00%**	**$ 1.332.622.352,00**															

INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA MES	%	1,12%	1,12%	2,10%	2,82%	1,20%	6,21%	7,69%	16,83%	16,46%	16,80%	8,26%	8,41%	4,46%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 97.322.000,00	$ 97.322.000,00	$ 182.922.000,00	$ 245.222.000,00	$ 104.109.500,00	$ 540.655.000,00	$ 669.930.000,00	$ 1.457.881.500,00	$ 1.425.275.250,00	$ 719.416.500,00	$ 731.864.000,00	$ 383.157.500,00	
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA	%	1,12%	2,24%	4,34%	7,16%	8,36%	14,57%	22,61%	41,44%	60,12%	78,92%	87,18%	95,60%	100,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 97.322.000,00	$ 194.644.000,00	$ 377.566.000,00	$ 622.788.000,00	$ 726.897.500,00	$ 1.267.552.500,00	$ 1.367.482.500,00	$ 3.685.364.000,00	$ 5.230.639.250,00	$ 6.866.562.500,00	$ 7.584.978.500,00	$ 8.316.842.500,00	$ 8.700.000.000,00	
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA MES	%	1,11%	1,11%	2,13%	2,71%	1,31%	2,10%	1,79%	3,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 185.122.000,00	$ 235.568.000,00	$ 114.139.000,00	$ 182.496.000,00	$ 156.047.400,00	$ 320.818.400,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA	%	1,11%	2,21%	4,34%	7,05%	8,36%	10,46%	12,25%	15,32%	15,32%	15,32%	0,00%	0,00%	0,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 96.222.000,00	$ 192.444.000,00	$ 377.566.000,00	$ 613.134.000,00	$ 727.273.000,00	$ 909.769.000,00	$ 1.065.833.952,00	$ 1.386.652.352,00	$ 1.332.622.352,00	$ 1.332.622.352,00	$ 1.332.622.352,00	$ 1.332.622.352,00	$ 1.332.622.352,00	

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE GRÁFICO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	Valor	Valor ejecutado
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL: VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADO (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Consultor y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: _____
Nombre: DIEGO STELLA RENTERIA MEJIA
Director de consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202517 3IATL

Aprueba Firma: _____
Nombre: JOSE OCTAVIO NIÑO BRUALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN-IN-14-FR-2
ACTAS DE REUNIÓN

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/07/2025 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Consultoría)

ACTA DE REUNIÓN No. 19
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 4227-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CORDOBA

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA:
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4262-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Reunión tecnica de seguimiento contrato de consultoría 4227 de 2024

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Temas financieros- administrativos pendientes

DESARROLLO DE LA REUNION

Se reúnen de manera virtual, la ing. Yenny Hernandez gestor técnico INVIAS, la ing. Stella directora de consultoría, el Ing. Eulogio coordinador consultoría,, Diego borda coordinador interventoría, ing. Octavio director de interventoría , Denis Pino Residente de interventoría

1.SEGUIMIENTO DE TRABAJOS DE CAMPO
La interventoría realiza la apertura de la reunión comentando que hace falta reprogramación y flujo de caja.
La consultora comenta que se realizó una revisión de la topografía, y la persona que proyecto el presupuesto a fase III contemplo la entrega de la información, pero no se suministraron la nube de puntos.
MOD 2. Cambio del transporte a otros transportes y se mandó el presupuesto, ayer se comenzó a trabajar en la programación y flujo de caja, pero se presentó un inconveniente con la Ing. marcela por asuntos personales.

La interventoría manifiesta que se recibió un oficio que iba remitido a la Ing. Shirley, entonces para mayor tranquilidad se solicita re remita de manera oficial a la interventoria para que se pueda realizar el pronunciamiento aun así se revisaron las propuestas y la mas óptima es la n°2.
La Ing. yenny comenta que, para agilizar, se revise la que se envió y se identifique la más optima, y luego realicen el concepto y aprobación para ser entregada al INVIAS de manera formal.
Se hace necesario modificar la propuesta por el tema de la topografía, entonces la consultoría pregunta si se debe modificar y ajustar de nuevo la propuesta.
La interventoría solicita un informe de la apropiación de la información de los estudios a fase II, que recibieron y que hace falta, y cuales son las razones por las cuales no se puede entregar la información.
La consultoría manifiesta que se va realizar un nuevo ajuste, para poder decisiones finales.
En este momento se están los especialistas hidráulicos, y se está revisando el corredor hidrogeología geotecnia, y la Ing. esp. en tránsito solicito encuestas origen y destino teniendo en cuenta que es una intersección animas Pereira, y que también comunican a novita.
Para la recopilación del tema ambiental, se deben realizar tramites con fines de elaboración de estudios ambientales que debe ser tramitado ante la ANLA por la zona de influencia se encuentra en 2 departamentos están diligenciando los formularios, hasta no tener ese permiso no se podrá levantar información respecto al componente Biótico, entonces a mas tardar el lunes se tramitará ante la ANLA.
El 100% del corredor se encuentra en zona de reserva forestal ley segunda significa que se tiene que analizar otras situaciones, por reservas naturales, etc. Se requerirán otras solicitudes de permiso, para la etapa siguiente se necesitará la sustracción de reserva forestal de todo el corredor.
El permiso de colecta lo va a realizar directamente la UTCH.
La Ing. Alejandra Muñoz pregunta si la sustracción la van a realizar la universidad, a lo que la consultoría, manifiesta que previo a la construcción se deberá realizar la sustracción de la reserva. A lo que la ing. Alejandra solicita dejar un presupuesto para aquellas actividades ambientales o tramites que se deberán realizar durante la ejecución del proyecto.
Para la parte del volumen ambiental – social – predial quedo radicado en el ican la solicitud de registro.
Del ministerio de la pertinencia de consulta previa, se radico, pero no se ha obtenido respuesta, y de hecho se radico la reiteración. En este momento se están esperando la de las corporaciones.

FECHA 3/07/2025
(Día / Mes / Año)

2.ACTAS DE COSTOS
La interventoría manifiesta que están a la espera de un soporte del mes de mayo, y adicional estamos a 3 de julio, a esperas del acta del mes de junio, teniendo en cuenta consideraciones como las afiliaciones de arl riesgo 4 y 5, asumidas por la universidad, en todas las actas se deben anexar estos pagos que estén al día.

La consultoría comenta que el personal de tesorería tiene la resolución para el pago de seguridad social, pero la información la tienen ellos.
Y respecto a los soportes de mayo estarán el día de hoy.

3. SEGUIMIENTO DE CRONOGRAMA
Se ve con un poco de preocupación que no se ha cumplido con las entregas preliminares programadas, se entiende las situaciones, pero se sabe que se podría ir alimentando esta información.
A esto la consultoría manifiesta que en el transcurso de esta semana se enviaran Tránsito y seguridad vial, y el geólogo está en espera pero se tiene dentro del radar pero como ya se habló el de topografía no se podrá entregar aun la entrega preliminar.

4. TEMAS VARIOS
La ing. Stella manifiesta que para la mesa técnica 11 de julio, donde se invite a la ART del MEC, tanto indígena como afro del choco, a la gobernación del Choco, al consejo comunitario COCOMA y su representante legal y la mesa directiva, ya que el representante legal envió oficio comentando que se le están violando lo derecho

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
INVITACION REUNION 11 DE JULIO	viernes, 4 de julio de 2025	CONSULTORIA
un informe de la apropiación de la información de los estudios a fase II	jueves, 10 de julio de 2025	CONSULTORIA
ACTA DE COSTOS MES DE JUNIO	viernes, 4 de julio de 2025	CONSULTORIA
SOPORTES PENDIENTES ACTA MES DE MAYO	viernes, 4 de julio de 2025	CONSULTORIA
Reprogramación y flujo de caja	jueves, 10 de julio de 2025	CONSULTORIA

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 10/07/2025
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ALEJANDRA MUÑOZ	PROFESIONAL ÁREA AMBIENTAL	INVIAS	
YENNY XIOMARA HERNANDEZ P.	GESTOR TÉCNICO	INVIAS	
EULOGIO PALACIOS CHAVERRA	COORDINADOR CONSULTORÍA	UTCH CONSULTORIA	
EDLY STELLA RENTERIA MENA	DIRECTORA DE CONSULTORÍA	UTCH CONSULTORIA	
JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	DIRECTOR INTERVENTORÍA	UPTC INTERVENTORÍA	
DIEGO FERNADO BORDA CRUZ	COORDINADOR INTERVENTORÍA	UPTC INTERVENTORÍA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/07/2025 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Consultoría)

ACTA DE REUNIÓN No. 20
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 4227-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CORDOBA

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA:
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4262-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Reunión tecnica de seguimiento contrato de consultoría 4227 de 2024

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Temas financieros- administrativos pendientes

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se reúnen de manera virtual, la ing. Yenny Hernandez gestor técnico INVIAS, la ing. Stella directora de consultoría, el Ing. Eulogio coordinador consultoría, , Lliceli Mosquera, Ingeniera Auxiliar de la interventoría, ing Diego borda coordinador interventoría, ing. Octavio director de interventoría y la ing Denis Pino Residente de estudios de interventoría
1.PLAN DE CONTINGENCIA La interventoría comenta que la consultoría ha presentado una programación de actividades de las cuales unas se han cumplido y otras no, se conoce lasituación debido a la no entrega del componente topografíco, pero se solicita que se comente que plan se puede usar para prever y compensar dicha actividad, ya que por otra parte es necesario que la consultoría informe con anticipación a la interventoria para hacer acompañamiento a sus actividades. La ing. Stella comenta que tenia n un plan de trabajo donde se presentaciones inconvenientes que llevaron a la no entrega de esas actividades, que era el levantamiento de la parte ambiental, dado que el permiso con la universidad no era válido, motivo que llevo a la solicitud de otros permisos el cual se encuentra en trámite.

FECHA: 10/07/2025 (Día / Mes / Año)

2. SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LAS ACTAS DE COSTOS MES DE JUNIO Y 3. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE TRABAJO REALIZADO POR LA CONSULTORIA

La consultoría manifiesta que ya se enviaron 2 preliminares y hoy se hará llegar otro.
A esto la interventoría comenta que estos no se podrán cobrar en el acta junio debido a que la interventoría deberá revisar la información con los especialistas una ves se valide se podrá tener encuentra como anexo al acta de costos.
Se tiene encuentra que para el mes de junio se tenían programadas estas entregas y para el mes de julio se tienen las siguientes.

ENTREGABLE	FECHA ENTREGA PRELIMINAR
VOLUMEN I. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS	16/06/2025
VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO	16/06/2025
VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	30/06/2025
VOLUMEN V. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	16/06/2025

ENTREGABLE	FECHA ENTREGA PRELIMINAR
VOLUMEN VI. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	28/07/2025
VOLUMEN IX. ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	28/07/2025
VOLUMEN XII. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	21/07/2025
VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS SECAS	21/07/2025
VOLUMEN XV. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	28/07/2025

4. INFORME DE APROPIACIÓN DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS FASE 2

La consultoría manifiesta que la información del levantamiento topográfico, ayer se allego una nueva información para revisar al detalle, porque ya se había hablado y se tenía la apropiación de la información, pero con la información que llego el día de ayer, toca volver a hacer la revisión, para hacer un informe ajustado, para poder plasmar un plan de contingencia.
La interventoría solicita un informe donde se indiquen todos estos inconvenientes que han llevado al no cumplimiento del cronograma.
La consultoría manifiesta que en este momento dependen de la validación respecto al tema topográfico, y además del tema ambiental dado que hasta no tener permiso de la ANLA no se podrán realizar actividades en campo. Teniendo en cuenta el panorama se evidencia que para otros volúmenes se depende de la información topográfica.
La interventoría comenta que entienden esta situación pero que existen otros programas tales como el de programación geotécnica, que sin importar cualquier modificación se pueden ir realizando, esta es una idea para que puedan avanzar.
La consultoría comenta que enviaran una Propuesta de exploración geotécnica, para revisar que ensayos, cuantos y ubicación de estas exploraciones para que la interventoría los revisan.

5. TEMAS VARIOS: La interventoría sugiere que independientemente de los estudios a fase II deberían enviar la comisión topográfica, a buscar la materialización de los mojones en campo.
A lo que la consultoría comenta que la comisión topográfica esta evaluando esa alternativa además de ejecutar la red de georreferenciación, para verificar la precisión de la información, este documento final depende de la revisión final.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
un informe de la apropiación de la información de los estudios a fase II	jueves, 10 de julio de 2025	CONSULTORIA

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 17/07/2025 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
YENNY XIOMARA HERNANDEZ P.	GESTOR TÉCNICO	INVIAS	
EULOGIO PALACIOS CHAVERRA	COORDINADOR CONSULTORÍA	UTCH CONSULTORIA	
EDLY STELLA RENTERIA MENA	DIRECTORA DE CONSULTORÍA	UTCH CONSULTORIA	
JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	DIRECTOR INTERVENTORÍA	UPTC INTERVENTORÍA	
DIEGO FERNADO BORDA CRUZ	COORDINADOR INTERVENTORÍA	UPTC INTERVENTORÍA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1432 DE 2025.

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	1432 del 21 de abril 2025.
CONTRATISTA	JOSÉ OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
CC.	74322702
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR DE INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.
PLAZO DE EJECUCIÓN**	21 de abril al 31de octubre de 2025.
PRORROGA	N.A.
VALOR DEL CONTRATO	$ 48´640.000, 00
ADICION 1	N. A.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Tunja.
ORDENADOR DEL GASTO	CARLOS MAURICIO MORENO TÉLLEZ, Vicerrector de Investigaciones y Extensión
SUPERVISOR	OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO Resolución 5451 del 14 de noviembre 2024.
DEPENDENCIA	Contrato Interadministrativo N.º 4262 de 2024, UPTC - INVIAS.
ACTIVIDAD	DIRECTOR
PERIODO DEL INFORME	DEL1 DE JULIO AL 31 DE JULIO
NUMERO DEL PAGO	4 de 7
VALOR DEL PAGO	$ 7´860.000,00

INTRODUCCIÓN

la Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4227 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA. Para la realización de la interventoría del contrato anteriormente mencionado, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4262 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.

En el presente informe se describen las actividades realizadas como director en el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 julio de 2025.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se participa en reunión de empalme con el nuevo director de interventoría y el grupo de trabajo técnico y administrativo, con el propósito de dar a conocer el estado físico, financiero y técnico, del contrato de consultoría 4227 -2024 y el de interventoría 4262 de 2024, alcances del contrato de consultoría ejercida por la Universidad Tecnológica del Choco.
2. Se discutió el alcance del proyecto BIM en función de los recursos disponibles, con un presupuesto de 24 millones para el grupo 1 y 43 millones para el volumen BIM. Se propuso priorizar volúmenes clave y reducir permisos, además de evaluar la necesidad del software. Se enfatizó la importancia de
3. Reunió julio 23. Choco. En INVIAS. Reunión citada por la ingeniera Sirley Merchán participó por la Gestora Jenny Xiomara Hernández, el profesional, Vindel, Invias, Julián Toro por parte de la Consultoría, Eulogio, palacios, Edly Estella Rentería, Luz Osorio y Yaneth Rojas. La Interventoría con Diego Borda, Denis Pino y el suscrito. La Consultoría manifestó que en el tramo uno y dos hay dificultad es con la comunidad de Cocoman y de San Pedro de Nigeria, los cuales están solicitando consulta previa como conclusión de la reunión, se definió que con el recurso existente se comenzaría el Tramo 5 y 4 totalmente terminado y el Tramo 3 tres con topografía, geotécnica y estabilización de taludes. Se deja un tiempo prudencial mientras se aclara el proyecto existente en la Italia y en el Tramo de Novita en una longitud de 6 km gramos que podrían retirarse del alcance del contrato 4227, también se terminó para hacer un replanteo para el alcance de la metodología, bien, según reunión o conclusiones que tengan los tres especialistas, envías Interventoría y Consultoría se invita a la Consultoría a hacer un plan de contingencia. Para el próximo año 20 26 se tiene proyectado una adición para culminar el Tramo restante y algunas labores de geotecnia para culminar los estudios totales a fase tres
4. Julio 16 se asistió a una reunión inicial en la oficina de Consultoría con la presencia de representantes del Invias Ani Arias Ingeniera delegada por el director operativo y la ingeniera Jeny Xiomara Hernández delegada de la subdirección de planificación e infraestructura el cuerpo técnico de la consultoría por parte de la interventoría, ingeniero Diego borda, Denis Espino y el suscrito allí se hizo exposición del Estado de los estudios de topografía a fase dos entregados por el envío como información primaria para este proyecto, el cual no está completa lo que implica que se tiene que replantear la realización de una nueva topografía para continuar con el proyecto. Además, la consultoría presenta información sobre la existencia de un proyecto aprobado por el envías a fase tres del año 2020, con fecha de actualización abril de 2025 del tramo curdo la punta al kilómetro seis de nuestro proyecto, el cual se tiene que verificar para hacer si es el caso excluido del alcance del proyecto o contrato 42 27 en segundo instancia, se participa en una reunión con leyes de la consejo comunitario de Tucumán, la otra misiones del chocó y el alcalde Novita, en el cual expusieron la inconformidad de la comunidad de Cocoman, los cuales no fueron tenido en cuenta en la socialización, por lo tanto en esta ocasión se volvió hacérsela a ellas, además solicitaron que según el ministerio del interior, ellos tienen derecho a consulta previa en este proyecto, se terminó que serán las averiguaciones y consultas para aclarar esta solicitud. Se programó una reunión el 23 de julio en enviado Bogotá.
5. Se participa en mesa técnica de trabajo en la oficina Uptc con el gerente del contrato Germán Eduardo Peña, el supervisor del cto de interventoría Ing. Oscar Gutiérrez, la coordinadora y el suscrito con el objeto de aclarar situaciones dela consultoría respecto los diferentes cambios de alcance del proyecto por la falta de mayor información del estudio topográfico fase 2 y la necesidad de realizar nuevamente la topografía del todo la vía 51 km, por otro lado se presunto el nuevo director de interventoría del curundo Ing. Ricardo acosta
6. Julio 16, se asistió a una reunión inicial en la oficina de Consultoría con la presencia de representantes del Invias, ingeniera Ani Arias de la subdirección operativa y la ingeniera Jeny Xiomara Hernández delegada de la subdirección de planificación de infraestructura, el equipo técnico de la consultoría, por parte de la interventoría, ingeniero Diego Fernando Borda, Ing. Denis Pino y el suscrito; Allí se hizo exposición del Estado de los estudios de topografía a fase dos entregados por el Invias como información primaria para este proyecto, el cual no está completa lo que implica que se tiene que replantear la realización de una nueva topografía para continuar con el proyecto. Además la consultoría presenta información sobre la

existencia de un proyecto aprobado por el envías a fase tres del año 2020, con fecha de actualización abril de 2025 del tramo Curundo - La Punta al kilómetro (6) seis de nuestro proyecto, el cual se tiene que verificar, si es el caso excluirlo del alcance del proyecto o contrato 4227-2024, en segundo instancia se participa en una reunión con parte de equipó especialista de la consultoría , con representantes del consejo comunitario de Cocoman, otros representantes de la ERG (Agencia de Renovación Territorial) del chocó y el alcalde Novita, en el cual expusieron la inconformidad de la comunidad de Cocoman, los cuales no fueron tenido en cuenta en la socialización, por lo tanto en esta ocasión se volvió hacérsela a ellas y se expone el alcance del contrato, además solicitaron que según el ministerio del interior, ellos tienen derecho a consulta previa en este proyecto, se determinó que se harán las averiguaciones y consultas para aclarar esta solicitud. Se programó una reunión el 23 de julio en enviado Bogotá para tomar decisiones al respecto y continuación del proyecto.

7. julio 15. Reunión citada por la Subdirectora de Planeación de Infraestructuras INVIAS con el objeto de informar los pormenores de la situación presentada en la consultoría del Cauca, además se trató el tema sobre las dificultades en la apropiación del tema de topografía y geotecnia entre otros, y buscar las estrategias y medidas de contingencia para resolver esta situación que atrasaría la presentación de las metas físicas dentro del plazo establecido, Al igual que preparar la reunión del día 16 de julio en Quibdó con los representantes de la comunidad MEC (Mecanismo Especial de Construcción del Choco) la municipio de Novita, los cuales presentaron su inconformidad con la socialización del contrato no. 4227-2024, ejecutada en San José del Palmar el 13 14 de mayo del presente, Además solicitaron para la comunidad una consulta previa si es procedente..
8. Participación en reunión administrativa con funcionarios y supervisor del contrato por parte de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, se abordan temas relacionados con el ingreso de facturación de invias a las cuentas internas y los procedimientos que exige el área financiera de la universidad.
9. Reunión virtual de seguimiento con la participación del Ing. Yanier Salas supervisor de interventoría por parte del INVIAS y las directivas de la consultoría, con el objeto de precisar el siguiente orden del día, plan de continencia, para presentar nuevo cronograma de trabajos en campo de acuerdo al diagnostico de los estudios de topografía fase dos, como insumo para este etapa , presentación dentro del plazo de las actas de costos del mes de junio de 2025 informe de consultoría de apropiación de estudios topográficos, y ausencia de personal en campo
10. Reunión virtual de trabajo 2 de julio con una participación de la Gestora Xiomara Hernández, Aleja Muñoz Jorge Medina, Wilmer Campaña, Fidel Carlos Ríos profesionales de la Consultoría y la Interventoría en esta reunión se hizo el planteamiento que la Consultoría ya había pasado las tres opciones o alternativas planteadas en la reunión con el Ing. del instituto, Invias. Para la Interventoría la más adecuada era la alternativa número dos, concluir los estudios y diseños a un 100%, el Tramo uno, Cuatro y Cinco, incluida toda la topografía y los tramos restantes serían para la vigencia 2026, al finalizar la Consultoría expresó que los estudios de topografía fase dos no estaban completos y nació la necesidad de hacer un nuevo ajuste al presupuesto, lo que implica una nueva reprogramación y una nueva alternativa se programó la reunión para el 11 de julio con la comunidad de Cocoman, quién manifiesta que el estudio se debe suspender, se trató el tema de las actas de costos e inconvenientes para entregarlas a tiempo.
11. La Interventoría Se participó en reunión virtual, el 1 de julio con líder comunidad de Novita sector representante consejo comunitario Felipe. Para aclarar la participación en la socialización del contrato Igualmente se participó en reunión técnica con el área de diseños geométrica y topografía donde se aclaró el alcance del contrato en fase 3 por la interventoría, el especialista en Diseño. Jonatán Leguisamon, quien revisará la propuesta y emitirá su respectivo concepto.
12. Se coordina y se revisa con el equipo de profesionales de la interventoría, los documentos soportes para presentar las actas de costos del mes de junio, tanto de la interventoría como la consultoría.
13. Se mantiene informado al supervisor del contrato de prestación de servicios y/o a la Gerencia de la UPTC, sobre las necesidades profesionales y técnicas de elementos, muebles y equipos de oficina que se requieran para el normal funcionamiento de la Interventoría.
14. Se realiza la verificación del personal ofrecido en la propuesta por la consultoría que se encuentre desempeñando el cargo para el cual fue propuesto según lo establecido en los estudios previos dispuestos por el INVIAS.

15. Se firma y aprueban todas las actas de acuerdo al Manual de Interventoría Versión Vigente del INVIAS, entre otras actas de mensual de costos de consultoría e interventoría, Actas de modificación de cantidades de consultoría e interventoría, entre otras.
16. Se coordina, se revisa y se presentan los informes semanales y la presentación en power point mensual vía e-mail, debidamente revisados, aprobados a las diferentes dependencias.
17. Se asistencia al comité técnico en las instalaciones de la Universidad pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC. Se contó con la participación del Gerente del contrato de interventoría, el coordinador Ingeniero Diego Fernando Borda, los especialistas Ambiental y de Sostenibilidad, Ingeniera Yully Suarez, Ing. Dennis Pino residente de estudios, y el equipo de apoyo de la parte administrativa y financiera del contrato de interventoría, con el propósito de revisar documentación existente, requerimientos técnicos, hojas de vida etc.
18. Se mantiene comunicación con la gestora del contrato y el supervisor de la territorial Choco Jannier Salas, por parte del INVIAS, con el propósito de coordina el proceder y entrega según fechas dispuestas por la administración financiera para la entrega de informes, documentos y actas respectivas pendientes, en especial la solicitud de pasar nuevamente por el banco Bogotá y registrar la firma para el manejo del anticipo.
19. Se realizan labores coordinación para verificación en los diferentes requisitos precontractuales a que haya lugar, de acuerdo al Manual de Interventoría versión vigente, especialmente en lo relacionado con el instructivo para seguimiento de la ejecución del Contrato de interventoría.
20. Se verifica que el personal ofrecido en la propuesta por el contratista esté desempeñando el cargo para el cual fue propuesto. En caso de requerir un cambio, se debe cumplir lo establecido en los estudios previos dispuestos por el INVIAS.
21. Asesorar y suministrar la información técnica-financiera y en general cualquier información que las comisiones de seguimiento de gestores técnicos y de proyectos, de control y evaluación enviada por el Instituto Nacional de Vías y /o de las entidades de control que lo requieran.
22. Rendir informes periódicos al Instituto Nacional de Vías –INVIAS- con base en las pruebas, verificaciones y cuantificaciones de los estudios que realice el consultor, sugiriendo las medidas que se deben tomar para mitigar los posibles efectos negativos del proyecto.
23. Se estudió las sugerencias y consultas del contratista, resolviéndolas oportunamente y emitir conceptos técnicos, financieros y legales según el caso, con los correspondientes soportes, documentos y justificaciones remitidas al gestor técnico del contrato y a la unidad ejecutoria pertinente para su trámite, para lo cual puede contar con los especialistas de la interventoría.
24. Se realiza seguimiento y se supervisa las labores o actividades de los diferentes profesionales que conforman el equipo de trabajo de la interventoría y se expone las diferentes situaciones en el desarrollo de los contratos, tanto consultoría como interventoría, para proponer entre todos las mejores alternativas o soluciones a las circunstancias expuestas según sea el caso.
25. Se revisa y se aprueban las hojas de vida de los ingenieros y profesionales faltantes por parte dela consultoría e interventoría para copar las cargos y especialistas pendientes en cada área.
26. Coordinar con la consultoría la realización de socializaciones y divulgaciones de los estudios y diseños con la comunidad, entes territoriales y nacionales, entre otros actores e interesados según sea necesario, y realizar el seguimiento y acompañamiento correspondiente al desarrollo de las mismas.

ENTREGABLES

- Revisión y aprobación actas de costos de consultoría e interventoría.
- Revisión y aprobación informes semanales, mensual, actas de reunión y oficios de solicitudes y respuestas tanto al invias como al consultor.

ESTADO FINANCIERO DE LA CONSULTORIA E INTERVENTORIA AL MES DE JULIO


CONTRATO 4227 DE 2024 - ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

Acta No	PERIODO	VALOR BASICO	VALOR TOTAL ACTA	ANTICIPO AMORTIZADO	VALOR REAL AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	SALDO ANTICIPO
ANTICIPO			$	4.350.000.000,00		
1	dic-24	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 48.111.000,00	$ 48.111.000,00	$ 4.301.889.000,00
2	ene-25	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 48.111.000,00	$ 48.111.000,00	$ 4.253.778.000,00
3	feb-25	$ 185.122.000,00	$ 185.122.000,00	$ 92.561.000,00	$ 92.561.000,00	$ 4.161.217.000,00
4	mar-25	$ 235.568.000,00	$ 235.568.000,00	$ 117.784.000,00	$ 117.784.000,00	$ 4.043.433.000,00
5	abr-25	$ 114.126.000,00	$ 114.126.000,00	$ 57.063.000,00	$ 57.063.000,00	$ 3.986.370.000,00
6	may-25	$ 182.492.000,00	$ 182.492.000,00	$ 91.246.000,00	$ 91.246.000,00	$ 3.895.124.000,00
7	jun-25	$ 156.047.952,00	$ 156.047.952,00	$ 78.023.976,00	$ 78.023.976,00	$ 3.817.100.024,00
8	jul-25	$ 266.818.400,00	$ 266.818.400,00	$ 133.409.200,00	$ 133.409.200,00	$ 3.683.690.824,00
TOTALES		**$ 1.332.618.352,00**	**$ 1.332.618.352,00**	**$ 666.309.176,00**	**$ 666.309.176,00**	**$ 3.683.690.824,00**
		AVANCE FINANCIERO			**15,32%**	

CONTRATO 4262 DE 2024 - INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

Acta No	PERIODO	VALOR BASICO	VALOR TOTAL ACTA	ANTICIPO AMORTIZADO	VALOR REAL AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	SALDO ANTICIPO
ANTICIPO			$	1.187.500.000,00		
1	dic-24	$ 45.222.400,00	$ 45.222.400,00	$ 22.611.200,00	$ 22.611.200,00	$ 1.164.888.800,00
2	ene-25	$ 6.159.800,00	$ 6.159.800,00	$ 3.079.900,00	$ 3.079.900,00	$ 1.161.808.900,00
3	feb-25	$ 84.109.000,00	$ 84.109.000,00	$ 42.054.500,00	$ 42.054.500,00	$ 1.119.754.400,00
4	mar-25	$ 114.346.000,00	$ 114.346.000,00	$ 57.173.000,00	$ 57.173.000,00	$ 1.062.581.400,00
5	abr-25	$ 35.970.200,00	$ 35.970.200,00	$ 17.985.100,00	$ 17.985.100,00	$ 1.044.596.300,00
6	may-25	$ 51.962.000,00	$ 51.962.000,00	$ 25.981.000,00	$ 25.981.000,00	$ 1.018.615.300,00
7	jun-25	$ 64.694.419,00	$ 64.694.419,00	$ 32.347.209,50	$ 32.347.209,50	$ 986.268.090,50
8	jul-25	$ 148.418.477,00	$ 148.418.477,00	$ 74.209.238,50	$ 74.209.238,50	$ 912.058.852,00
TOTALES		**$ 550.882.296,00**	**$ 550.882.296,00**	**$ 275.441.148,00**	**$ 275.441.148,00**	**$ 912.058.852,00**
		AVANCE FINANCIERO			**23,20%**	

LOCALIZACION DE LA VIA OBJETO DEL CONTRATO 4221-2024

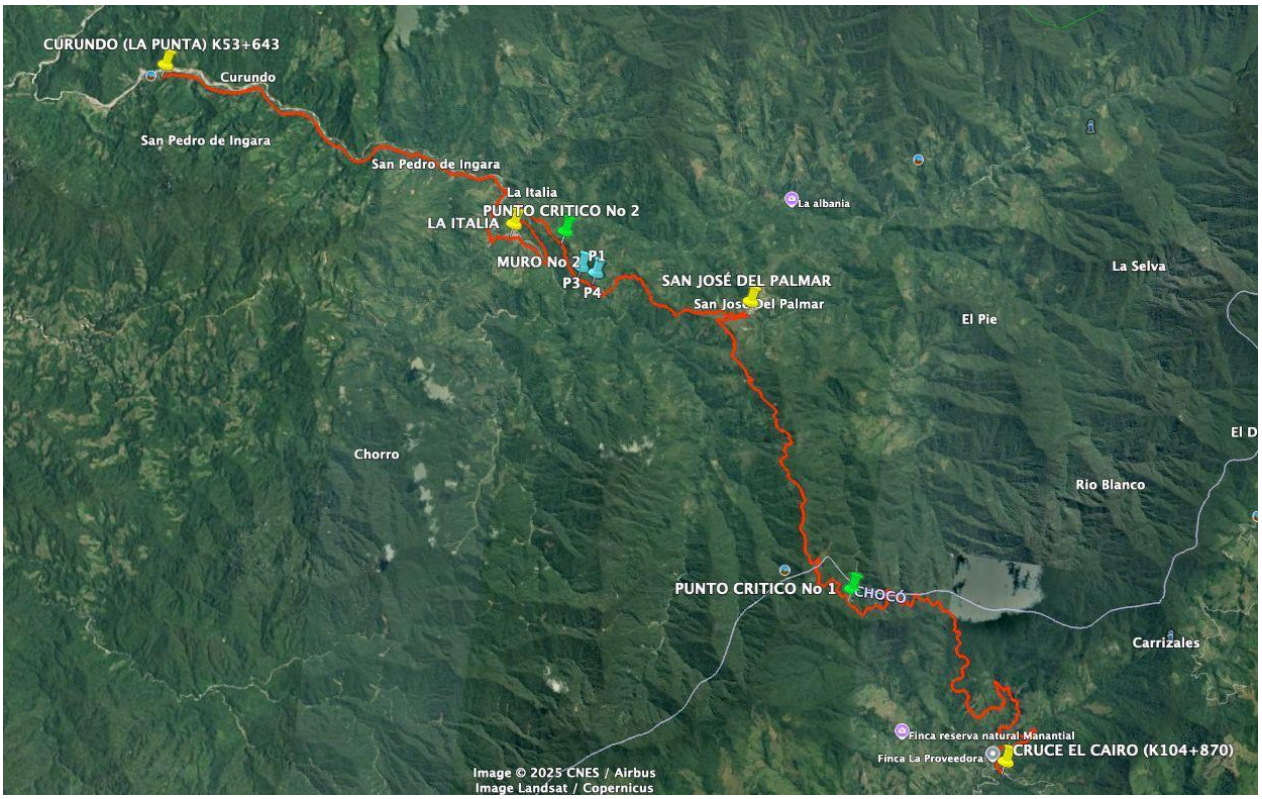

PLANTA CORREGIMIENTO DE LA ITALIA Y PROYECCION ALTERNATIVA DE LA VIA



En general se ha prestado asesoría y acompañamiento antes las situaciones técnicas y competentes en el área de dirección de interventoría, atendiendo oportunamente las solicitudes presentadas, en cumplimiento con las funciones contempladas en el contrato de prestación de servicios durante el desarrollo del periodo del 1al 31 de julio de 2025.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

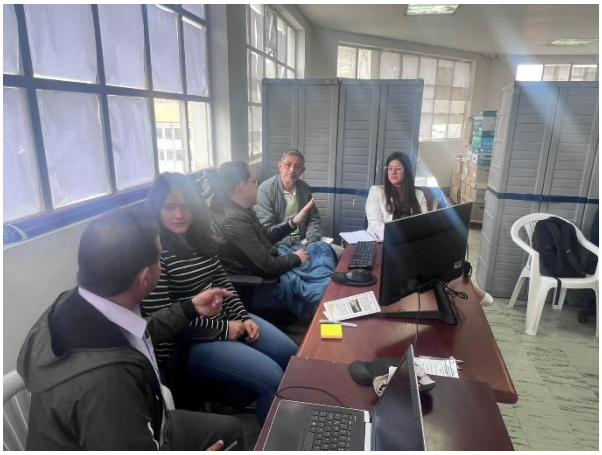


FOTO 1 Reunión con el grupo de apoyo técnico y administrativo de interventoría para realizar el empalme con el candidato a director de interventoría del contrato curundo 4262



FOTO 2 Reunión de seguimiento con el especialista hidráulico del contrato de interventoría, con el objeto de aclarar inconvenientes de tipo técnico emitidos por la consultoría en el desarrollo del contrato



FOTO 3 Participación en reunión de socialización especial con lideres de la comunidad de COCOMAN Municipio de Novita, en las instalaciones de la UTCH, para aclarar el alcance del contrato.



FOTO 4. Reunión en Quibdó UTCH, con el equipo técnico de la consultoría y representantes del Invias Ani Arias y Jenni Xiomara Hernández.



Foto 5 Se participa en mesa de trabajo con el equipo del área financiera, jurídico, administrativa y técnica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

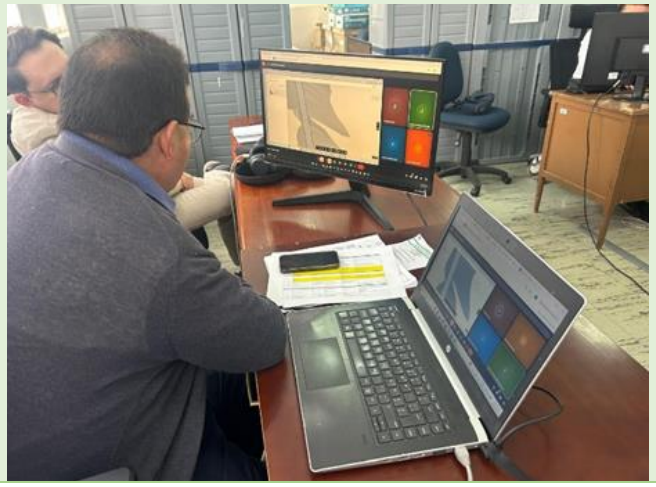


Foto 6 Se participa en reunión virtual con los especialistas de la metodología BIM de la interventoría y consultoría para ajustes del alcance del volumen y su aplicación.

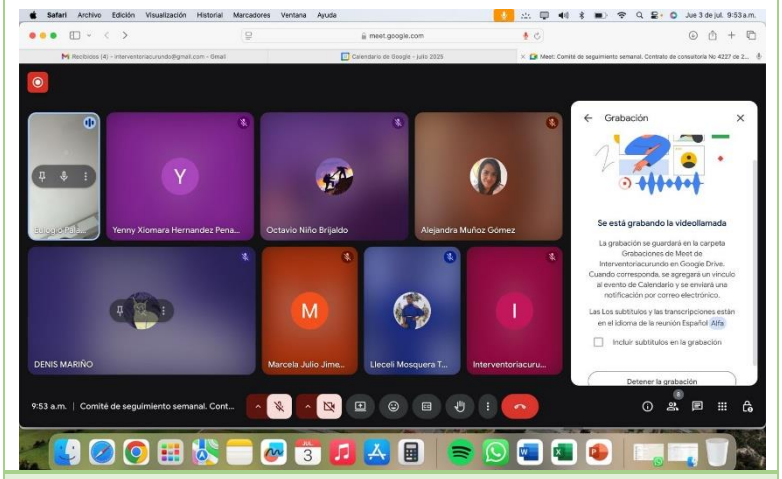


Foto 7 Mesa de trabajo virtual con la participación de la ing. Sirley Merchán, Jenny Xiomara H. ing. Eulogio Palacios, Edly Stella Rentería. por parte de la interventoría ing. German Peña y Diego Borda julio 3

PRESENTADO POR:

JOSÉ OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de interventoría del contrato 4262 de 2024

V° B°:

OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO
Supervisor del contrato interventoría 4262 de 2024

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1255 DE 2025.

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	1255 de abril 2025
CONTRATISTA	Diego Fernando Borda Cruz.
CC.	1.099.207.738 de Barbosa Santander.
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO COORDINADOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INTERVENTORIA, PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.
VALOR DEL CONTRATO*	$ 81.254.500,00
PLAZO DE EJECUCIÓN**	Del 09 de abril al 31 de octubre de 2025.
PRORROGA	N.A.
LUGAR DE EJECUCIÓN	TUNJA.
ORDENADOR DEL GASTO	Luis Ángel Lara González Vicerrector Administrativo y Financiero
SUPERVISOR	Oscar Javier Gutiérrez Junco Supervisor del contrato No.4262 de 2024.
DEPENDENCIA	Contrato Interadministrativo No 4262 de 2024, UPTC - INVIAS.
ACTIVIDAD	Coordinador de estudios y diseños.
PERIODO DEL INFORME	Del 1 al 31 de julio de 2025
NUMERO DEL PAGO	4 DE 7
VALOR DEL PAGO	$ 12.067.500,00

INTRODUCCIÓN.

La Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4227 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA Para la realización de la interventoría del contrato anteriormente mencionado, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4262 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN

CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.

En el presente informe se describen las actividades realizadas como Coordinador de estudios y diseños en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2025.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

A continuación, se describen las actividades desarrolladas del 1 al 31 de julio de 2025.

1. Se realizo reuniones de seguimiento con el equipo de la consultoría Universidad Tecnológica de Chocó, gestor técnico del proyecto por parte de INVIAS y el supervisor del contrato de interventoría por parte de la dirección territorial de Chocó.

2. Se realizo el trámite ante el INVIAS, acta de costos de interventoría y consultoría correspondiente al mes de mayo y el acta de junio de 2025 se encuentra en conciliación entre las partes.

3. Se realizo informes de seguimiento ante la sub dirección de Planificación de Infraestructura INVIAS.

4. Se continuo, con el seguimiento del buen manejo de los anticipos de los contratos interadministrativos de consultoría e Interventoría No 4227 y 4262 de 2024.

5. Se continua, con la revisión de los estudios y diseños fase II del contrato 1666 de 2015, insumo inicial para el desarrollo de los estudios del contrato No 4227 de 2024.

6. Se represento a la UPTC ante el INVIAS para adelantar los trámites internos administrativos que sean necesarios para la consecución del objeto del Contrato Interadministrativo No 4262 de 2024.

7. Se hizo seguimiento a los procesos administrativos, técnicos acordes del seguimiento a las actividades realizadas por el consultor.

8. Se realizo el apoyo en el desarrollo del Contrato interadministrativo, de la Interventoría, igualmente deberá tramitar adecuadamente correspondencia, utilizando los formatos y procedimientos establecidos y cumplir con las disposiciones que apliquen a sus actividades contenidas en el manual de interventoría de Invias vigente, resoluciones y decretos que se relacionen con el ejercicio de esta.

9. Se vigilo el avance de los profesionales contratados por la UPTC para el buen funcionamiento y cumplimiento en los cronogramas establecidos.

10. Se programo reuniones internas y externas con las entidades involucradas en el proceso de los estudios y diseños de la conexión Conexión Curundo – San José Del Palmar – Crucero El Cairo En Los Departamentos Del Choco Y Valle Del Cauca.

ESTADO DEL PROYECTO:

A continuación, se presenta la trazabilidad de tramites durante la ejecución de la consultoría contrato de consultoría No 4227 de 2024 ejecutado por la Universidad Tecnológica Diego Luis Córdoba.

- Tanto el contrato interadministrativo de consultoría como de interventoría, por directriz del INVIAS se ordenó orden de inicio el pasado 02 de diciembre de 2024.
- El Instituto Nacional de Vías INVIAS suscribió minutas de prórroga para los dos contratos interadministrativo de consultoría como de interventoría, con nuevo plazo comprendido desde el 31 de diciembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025 sin adición de valor.
- El 09 de diciembre de 2024 se realizó la aprobación y registro de la cuenta del anticipo por parte de INVIAS, el anticipo a entregar por parte del INVIAS para el contrato interadministrativo de consultoría No 4227 de 2024, tiene un valor de $4.350.000.000.
- El 09 de diciembre de 2024 se realizó la aprobación y registro de la cuenta del anticipo por parte de INVIAS, el anticipo a entregar por parte del INVIAS para el contrato interadministrativo de interventoría No 4262 de 2024, tiene un valor de $1.187.500.000.
- Actualmente la consultoría está realizando recorridos en campo con los diferentes profesionales especialistas, con el fin de tomar encuestas origen destino, conteos vehiculares en la vía ánimas – Cartago- Animas como parte del estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio. Entre el 01 al 05 de julio se llevo a cabo una visita a campo por parte de los especialistas de la consultoría en los volúmenes de Geotecnia, Hidrología, Hidráulica, Socavación y Geología.

Actas de costos de interventoría tramitadas ante el Instituto Nacional de Vías:

1. Valor acta de costos de interventoría del mes de diciembre 2024 correspondiente al periodo del 02 al 31 de diciembre fue de $45.222.400,00 esta acta fue facturada y radicada en el INVIAS.

2. Valor acta de costos de interventoría del mes de enero 2025 correspondiente al periodo del 1 al 31 de enero 2025 fue de $6.159.800,00 esta acta fue facturada y radicada en el INVIAS.

3. Valor acta de costos de interventoría del mes de febrero 2025 correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero 2025 fue de $84.109.000,00 esta acta fue facturada y radicada en el INVIAS.

4. Valor acta de costos de interventoría del mes de marzo 2025 correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo 2025 fue de $ 114.346.000,00 esta acta fue facturada y radicada en el INVIAS.

5. Valor acta de costos de interventoría del mes de abril 2025 correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril 2025 fue de $ 35.970.200,00 esta acta fue facturada y radicada en el INVIAS.

6. Valor acta de costos de interventoría del mes de mayo 2025 correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo 2025 fue de $ 51.962.000,00 esta acta fue facturada y radicada en el INVIAS.

7. Valor acta de costos de interventoría del mes de junio 2025 correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2025 fue de $ 64.694.419 esta acta fue facturada y radicada en el INVIAS.

8. Valor acta de costos de interventoría del mes de julio 2025 correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2025 fue de $ 148.418.477 esta se encuentra en conciliación con el supervisor territorial chocó

Total, ejecutado acumulado a 31 de julio de 2025 actas de costos de interventoría: **$ 550.882.296**

Valor acumulado actas a corte de 31 de julio de 2025 es de: $ 550.882.296
Valor anticipo acumulado amortizado a 30 de julio de 2025 (50%): $ 275.441.148

Actas de costos de consultoría tramitadas ante el Instituto Nacional de Vías:

1. Valor acta de costos de consultoría del mes de diciembre 2024 correspondiente al periodo del 02 al 31 de diciembre fue de $96.222.000,00 esta acta fue facturada y radicada en el INVIAS.

2. Valor acta de costos de consultoría del mes de enero 2025 correspondiente al periodo del 1 al 31 de enero 2025 fue de $96.222.000,00 esta acta fue facturada y radicada en el INVIAS.

3. Valor acta de costos de consultoría del mes de febrero 2025 correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero 2025 fue de $185.122.000,00 esta acta fue facturada y radicada en el INVIAS.

4. Valor acta de costos de consultoría del mes de marzo 2025 correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo 2025 fue de $ 235.568.000,00 esta acta fue facturada y radicada en el INVIAS.

5. Valor acta de costos de consultoría del mes de abril 2025 correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril 2025 fue de $ 114.126.000,00 esta acta fue facturada y radicada en el INVIAS.

6. Valor acta de costos de consultoría del mes de mayo 2025 correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo 2025 fue de $ 182.492.000 esta acta fue facturada y radicada en el INVIAS.

7. Valor acta de costos de consultoría del mes de junio 2025 correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio 2025 fue de $ 156.047.952 esta acta fue facturada y radicada en el INVIAS.

8. El acta de costos de consultoría del correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio 2025 se encuentra en conciliación con la interventoría.

Total, ejecutado acumulado a 30 de junio de 2025 actas de costos de consultoría: **$ 1.065.799.952**

Valor acumulado actas a corte de 30 de junio de 2025 es de: $ 1.065.799.952
Valor anticipo acumulado amortizado a 30 de junio de 2025 (50%): $ 532.899.976

Nota: Los contratos de consultoría e interventoría actualmente siguen en estado activo.

INVERSIÓN:

- Recursos comprometidos Consultoría $ 8,700,000,000.00
- Recursos comprometidos en Interventoría: $ 2,375,000,000.00
- **Inversión Total del Proyecto: $ 11,075,000,000.00**

NECESIDADES DEL PROYECTO:

- Actualmente se encuentra pendiente de pago por parte de INVIAS del acta de costos del mes de abril, mayo y junio de 2025.

BENEFICIOS:

- Estudios y diseños para la conexión del corredor Curundo – San José del Palmar – Cruce el Cairo que beneficia comunidades indígenas y comunidades afro dándoles la posibilidad de conectar el departamento del Choco con el departamento del valle del Cauca.
- Con la ejecución de este proyecto en etapa definitiva se busca que se implemente una vía para conectar a los departamentos de Chocó y Valle del Cauca.
- El proyecto dará en su ejecución la oportunidad de explorar otras fuentes de ingreso ya que pueden comercializar los productos que se desarrollan en la región.
- Se aumentará el turismo como nueva fuente de ingresos a las comunidades
- Disminución de tiempos y costos de viaje
- Accesibilidad a centros de salud para adultos mayores y mujeres gestantes

GESTIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS:

- Se han realizado comités de seguimiento con la Universidad Tecnología del Choco UTCH, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC y el Instituto Nacional de Vías INVIAS para socializar el estado de avance de la consultoría, resolver inquietudes y gestionar actividades en beneficio del desarrollo de los estudios y diseños.

- Para el correcto ejercicio de la Interventoría objeto del Contrato interadministrativo, se han impartido instrucciones a todo el personal del equipo de interventoría para que apliquen estrictamente el Manual de Interventoría Versión 2022 del Invías, las especificaciones técnicas vigentes del Invías y todo lo pactado en el Contrato Interadministrativo.

- Se ha apoyado al director de Interventoría en la presentación oportuna de los informes semanales al Gestor del Proyecto de Invías tanto de la Territorial Choco como de la Subdirección de Planificación de Infraestructura.

- Se ha apoyado al director de Interventoría en la presentación oportuna de los informes mensuales con la información actualizada, la cual es complementada por los especialistas.

- Se ha dado respuesta a la correspondencia interna y externa.

- La Consultoría ejercida por la Universidad Tecnológica de Choco Diego Luis Córdoba, realizo toma de información de encuestas de origen y destino en el

corredor Ánimas – Cartago – Ánimas, como parte del estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio el equipo profesional ingresó al municipio de Unión Panamericana, estableciendo como punto principal de recolección de información la cabecera municipal de Las Ánimas para realizar el conreo vehicular.

- Se participo de manera constante en todas las reuniones de seguimiento semanal con el consultor y el equipo de la sub dirección de planificación de infraestructura INVIAS.

- Se participo en el comité técnico mensual realizado el día 23 de julio de 2025 en el INVIAS Bogotá en la Subdirección de planificación de Infraestructura.

- Se participó en la socialización segundo espacio con el consejo comunitario mayor de Novita COCOMAN dando cumplimiento a los requerimientos de la MEC y del representante legal vigente el día 16 de julio de 2025

- Se realizo mesa de trabajo con la interventoría consultoría e INVIAS en la ciudad de Quibdó el día 16 de julio de 2025

- Se llevó a cabo una reunión técnica sobre diseño geométrico y topografía, en la cual se identificó como principal dificultad la falta de información topográfica, situación que ha impactado negativamente el desarrollo de la fase 3 del proyecto. Ante esto, se acordó priorizar la recolección de dicha información y se recomendó a los profesionales realizar una revisión minuciosa de los insumos disponibles, con el fin de precisar el estado actual de la documentación. Asimismo, se ajustó el formato del informe técnico para alinearlo con los estándares exigidos por la consultoría e interventoría. Durante la sesión también se abordaron posibles ajustes al cronograma y presupuesto, incluyendo la eventual modificación del contrato inicial, y se acordó avanzar en los análisis técnicos y jurídicos correspondientes.

- La consultoría envía informe de apropiación de los estudios topográficos en donde concluye que la información entregada por el INVIAS no es confiable ni suficiente para Fase III debido a:
  - Dentro de la revisión de la información no se encontró un informe topográfico detallado de campo.
  - La información analizada no está referenciada al sistema oficial (MAGNA-SIRGAS 2018).
  - No existe un modelo MDT detallado, ni se evidencia el uso de tecnologías LIDAR o escáner.
  - Ausencia de redes levantadas, ni fichas técnicas de la red GNSS.
  - Entregables no estructurados, ni verificables.
  - Riesgo alto de reprocesos, rediseños y errores constructivos.

Por tanto, es necesario la toma actualizada de la topografía de detalle.

- El pasado 27 de marzo de 2025 el Instituto Nacional de Vías INVIAS realizo el desembolso de los anticipos para los contratos interadministrativos así:

- Contrato interadministrativo de interventoría No 4262 de 2024, tiene un valor de $1.187.500.000.
- Contrato interadministrativo de consultoría No 4227 de 2024, tiene un valor de $4.350.000.000.

ENTREGABLES:

1. Copia de los informes de supervisión de contratistas de la UPTC que prestan sus servicios al contrato interadministrativo No 4262 de 2024.
2. Informe de estado de las Actas de Costos mensuales de Interventoría.
3. Copia de la presentación del estado de avance del Contrato interadministrativo No 4262 de 2024.
4. Apoyar la respuesta a los requerimientos que el INVIAS y la Universidad realicen sobre la ejecución del Contrato y dar trámite a los mismos de manera oportuna y eficiente, resumen de la correspondencia del mes que llegue al Contrato interadministrativo No 4262 de 2024.
5. Copia de registro fotográfico de las reuniones a las que asista.
6. Informe del área pertinente de acuerdo a la revisión a realizar por parte de los profesionales especialistas y administrativos a los estudios y diseños entregados por la Universidad Tecnológica del Choco.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE EL MES DE JUNIO 2025.

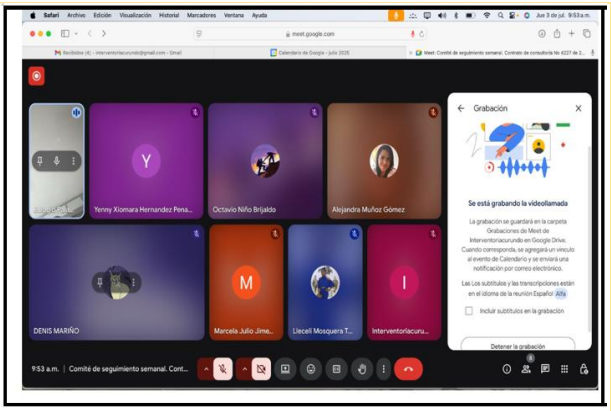


FOTO 1. Comité técnico de seguimiento semanal el 03/07/2025

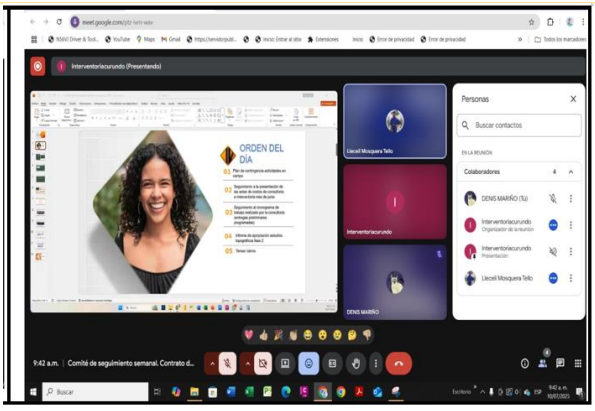


FOTO 2. Comité técnico de seguimiento semanal el 10/07/2025



Foto3. Reunión INVIAS, interventoría y consultoría 16/07/2025

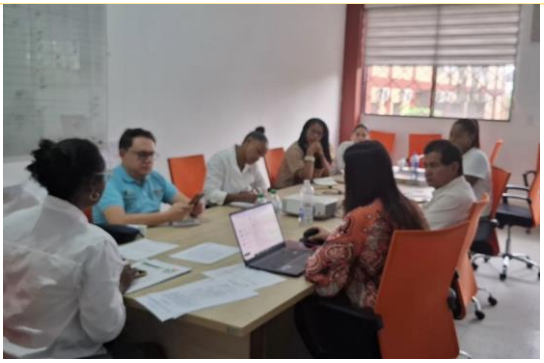


Foto 4. Reunión INVIAS, interventoría y consultoría 16/07/2025



Foto5 . Socialización segundo espacio con la MEC y con el consejo comunitario de Novita COCOMAN 16/07/2025



Foto 6. Socialización segundo espacio con la MEC y con el consejo comunitario de Novita COCOMAN 16/07/2025

	
Foto7. Comité técnico de seguimiento Mensual 23/07/2025	**Foto 8.** Comité técnico de seguimiento Mensual 23/07/2025

PRESENTADO POR:

DIEGO FERNANDO BORDA CRUZ
CC. 1.099.207.738
Coordinador de estudios y diseños.
Contratista

Vo. Bo:

JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de Interventoría.

Vo. Bo:

OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO
Supervisor del contrato

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 2031 DE 2025.

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	2031
CONTRATISTA	JHON STEVENS BEJARANO COPETE
CC.	1.077.431.927 DE QUIBDO
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESIDENTE DE CAMPO DE INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÉ DEL PALMAR-CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.
PLAZO DE EJECUCIÓN**	del 16 de junio al 31 de octubre de 2025. Ciento treinta y ocho (138) días
PRORROGA	N.A.
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($39.487.500,00)
ADICION 1	N. A.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Cruce el Cairo – San José del Palmar - Novita
ORDENADOR DEL GASTO	CARLOS MAURICIO MORENO TÉLLEZ, Vicerrector de Investigaciones y Extensión
SUPERVISOR	OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO Resolución 5451 del 14 de noviembre 2024.
DEPENDENCIA	Contrato Interadministrativo N.º 4262 de 2024, UPTC - INVIAS.
ACTIVIDAD/CARGO	RESIDENTE DE CAMPO DE INTERVENTORIA
PERIODO DEL INFORME	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025
NUMERO DEL PAGO	2 de 5
VALOR DEL PAGO	OCHO MILLONES, SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($8.775.000,00).

INTRODUCCIÓN

la Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4227 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: ***ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.*** *Para la realización de la interventoría del contrato anteriormente mencionado, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4262 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es:* ***INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.***

*En el presente informe se describen las actividades realizadas como **RESIDENTE DE CAMPO DE INTERVENTORIA** en el periodo comprendido entre el **01 al 31 de julio de 2025**.*

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1) ***Informes periódicos del estado actual del desarrollo de las actividades realizadas en campo por parte de la consultoría Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba.***

Para el 28 de junio de 2025, la ***UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO, DIEGO LUIS CORDOBA,*** *en el marco de los* ***ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVA) PARA LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA,*** *envío misiva sobre actividades de desarrollo en campo "Por medio del presente, se notifica la entrada a campo del equipo de especialistas de la consultoría de la Universidad Tecnológica del Chocó "Diego Luis Córdoba", debidamente identificados, ingresarán al sitio de trabajo entre el 01 y el 05 de julio de 2025, con el propósito de realizar actividades técnicas relacionadas con el levantamiento de información geológica, hidrogeológica y geotécnica, como parte del proyecto mencionado en la referencia. El objetivo de la visita es recopilar información técnica evaluar y verificar las condiciones del terreno, a fin de avanzar en la planificación de las siguientes etapas del proyecto. Durante la visita, el personal técnico contará con los materiales y elementos de protección personal necesarios, y cumplirá con todos los protocolos de seguridad establecidos en el área de intervención.*

A continuación, se detallan los especialistas y las fechas programadas de ingreso y salida":

ELACIÓN DE ASISTENTES DE LA CONSULTORÍA		
Nombre Completo	**ENTIDAD**	**Cargo**
Luis Emilio Pardo Aluma	Consultoría - UTCH	Apoyo - Especialista en Hidráulica
Luz Amira Tejada Flórez	Consultoría - UTCH	Estudio de Redes Hidrosanitarias Secas
Nestor Geovanni Agamez Verjan	Consultoría - UTCH	Especialista en Geología
Javinson Mosquera Borrero	Consultoría - UTCH	Especialista en Geotecnia

*La interventoría estuvo presente los días **02, 03 y 04** de **julio** de **2025**, realizando acompañamiento a los diferentes profesionales antes mencionados a continuación se describe la situación:*

Tabla 1 Relación de Actividades, zonas de ubicación y descripción.

DIA	ZONAS DE INTERVENCION	DESCRIPCION
Miércoles 02 de julio de 2025	*La punta – La Italia*	*Se realiza recorrido, donde se revisan las obras de artes, fuentes hídricas y temas de origen geológico e hidrológicos sobre los corredores.*
Jueves 03 de julio de 2025	*La Italia – Zona Las Tres Marías*	*Se realiza recorrido, donde se revisan las obras de artes, fuentes hídricas y temas de origen geológico e hidrológicos sobre los corredores.*
Jueves 04 de julio de 2025	*Las Tres Marías – El Crucero*	*Se realiza recorrido, donde se revisan las obras de artes, fuentes hídricas y temas de origen geológico e hidrológicos sobre los corredores.*

En los recorridos de manera puntal se realizaron

- *Localización identificación obras de arte y fuentes hídricas*
- *Evidencia geotécnica - Movimientos en Masa*
- *Toma de Muestras de PH de algunas Fuentes Hídricas*

2) ***Relación actualizada correspondencia, informes técnicos, resultados de laboratorio, planos y demás documentos requeridos para el control de la ejecución de actividades en campo, adelantadas por la consultoría.***

A la fecha, se tiene una correspondencia del ***28 de JUNIO de 2025****, dirigida al a los ALCALDES, donde se manifestó, como* ***Asunto:*** *Ingreso a campo para el levantamiento de información:*



ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO 4227 de 2024

DC – 200-2025

Quibdó, 28 de junio de 2025

Señor
LEÓN FABIO MARIN MONCADA
Alcalde del Municipio de San José del Palmar

Señor
ALBERTO WILLIAMS RIVAS ASPRILLA
Alcalde del Municipio de Novita

Señor
ORLIN SALAZAR RAMIREZ
Alcalde del Municipio de El Cairo

Ref. CONTRATO 4227 -2024 - ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

Asunto: Ingreso a campo para el levantamiento de información

Cordial Saludo,

Por medio del presente, se notifica la entrada a campo del equipo de especialistas de la consultoría de la Universidad Tecnológica del Chocó "Diego Luis Córdoba", debidamente identificados, ingresarán al sitio de trabajo entre el 01 y el 05 de julio de 2025, con el propósito de realizar actividades técnicas relacionadas con el levantamiento de información geológica, hidrogeológica y geotécnica, como parte del proyecto mencionado en la referencia.

El objetivo de la visita es recopilar información técnica evaluar y verificar las condiciones del terreno, a fin de avanzar en la planificación de las siguientes etapas del proyecto. Durante la visita, el personal técnico contará con los materiales y elementos de protección personal

SC CER130675

Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
Nit. 891.680.089-4
Carrera 22 #18B-10 B. Nicolás Medrano – Ciudadela Universitaria
Tel: (+57) 6046726565, Línea gratuita: 018000938824
contactenos@utch.edu.co, notificacionesjudiciales@utch.edu.co
utch.edu.co
Quibdó, Chocó (Colombia)

CamScanner

necesarios, y cumplirá con todos los protocolos de seguridad establecidos en el área de intervención.

A continuación, se detallan los especialistas y las fechas programadas de ingreso y salida:

ELACIÓN DE ASISTENTES DE LA CONSULTORÍA		
Nombre Completo	**ENTIDAD**	**Cargo**
Luis Emilio Pardo Aluma	Consultoría - UTCH	Apoyo - Especialista en Hidráulica
Luz Amira Tejada Flórez	Consultoría - UTCH	Estudio de Redes Hidrosanitarias Secas
Nestor Geovanni Agamez Verjan	Consultoría - UTCH	Especialista en Geología
Javinson Mosquera Borrero	Consultoría - UTCH	Especialista en Geotecnia

Agradecemos de antemano su colaboración para facilitar el acceso y el desarrollo adecuado de las actividades programadas.

Atentamente,

EDLY STELLA RENTERÍA MENA
Directora Consultoría

Proyectó:	*Elaboró:*	*Revisó:*	*No. Folios*
Lleceli Mosquera Tello	*Lleceli Mosquera Tello*	*Edly Stella Rentería Mena*	2

SC CER130675
Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
Nit. 891.680.089-4
Carrera 22 #18B-10 B. Nicolás Medrano – Ciudadela Universitaria
Tel: (+57) 6046726565, Línea gratuita: 018000938824
contactenos@utch.edu.co, notificacionesjudiciales@utch.edu.co
utch.edu.co
Quibdó, Chocó (Colombia)
CamScanner

Ilustración 1 Cronograma de actividades por parte de Consultoría, del 28 de junio de 2025. Fuente: Oficio emitido por la UTCH, radicado N° DC – 200-2025.

3) ***Cuadros de seguimiento de avance acorde a las actividades ejecutadas en campo por parte del consultor vs su programación.***

4) ***Relación de actas de reunión de seguimiento y socializaciones en el territorio, realizadas en los diferentes comités a desarrollarse durante la ejecución del contrato de consultoría e interventoría.***

5) ***Registro fotográfico de las reuniones y/o comités y/o visitas a campo a las que asista en el mes.***

Registro fotográfico, registrado al final del informe.

6) ***Informe mensual de actividades para la aprobación por parte del director de Interventoría y el supervisor del contrato.***

*Documento emitido en este periodo comprendido entre el **01** al **31** de **julio** de **2025**,*

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1. *Recorrido identificación de obras de artes, fuentes hídricas, geológicas e hidrogeológicas,* ***Curundo - La Italia****.*

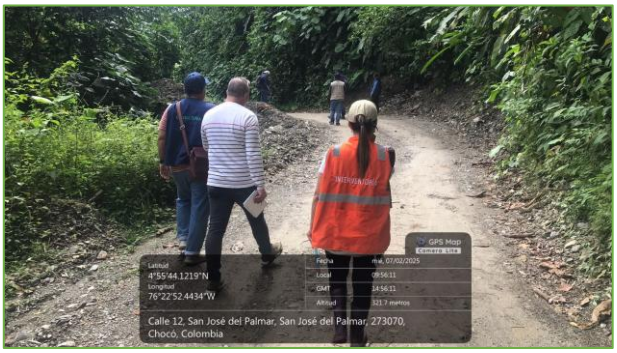


FOTO 2. *Re****corrido identificación de obras de artes, fuentes hídricas, geológicas e hidrogeológicas,*** *Curundo - La Italia.*



FOTO 3. *Recorrido identificación de obras de artes, fuentes hídricas, geológicas e hidrogeológicas,* ***La Italia – Tres Marías****.*

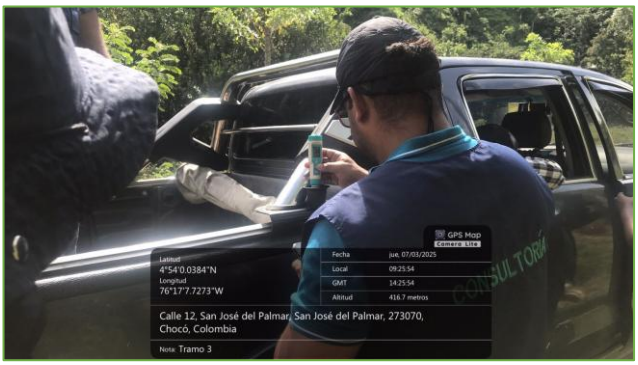


FOTO 4. *Re****corrido identificación de obras de artes, fuentes hídricas, geológicas e hidrogeológicas,*** *La Italia – Tres Marías.*

PRESENTADO POR:

JHON STEVENS BEJARANO COPETE.
Residente de Campo de Interventoría.

V° B°:

JOSÉ OCTAVIO NIÑO BRIJALDO.
Director de interventoría del contrato 4262 de 2024.

OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO.
Supervisor del Contrato.

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1254 de 2025

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	1254 DEL 09 DE ABRIL DE 2025
CONTRATISTA	DENIS YINETH PINO MARIÑO
CC.	1.049.629.730 de Tunja.
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESIDENTE DE ESTUDIOS DE INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO-SAN JOSE DEL PALMAR-CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO	$59.085.000
ADICIÓN No 01	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN**	09 de abril al 31 de octubre de 2025
PRORROGA No 01	N/A
LUGAR DE EJECUCIÓN	Tunja.
ORDENADOR DEL GASTO	Carlos Mauricio Moreno Téllez, Vicerrector de Investigación y Extensión.
SUPERVISOR	Oscar Javier Gutiérrez Junco, Supervisor del Contrato
DEPENDENCIA	Contrato Interadministrativo N.º 4262 DE 2024, UPTC - INVIAS.
ACTIVIDAD	RESIDENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
PERIODO DEL INFORME	01 al 31 de julio de 2025
NUMERO DEL PAGO	4 DE 7
VALOR DEL PAGO	$8.775.000

INTRODUCCIÓN

la Universidad Tecnológica Del Chocó, Diego Luis Córdoba, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4227 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: Estudios y Diseños a nivel de fase III (DEFINITIVOS) de la conexión Curundo-San José del Palmar – Cruce El Cairo en los departamentos del Chocó y Valle del Cauca. Para la realización de la interventoría del contrato anteriormente mencionado, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4262 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo

objeto es: INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO-SAN JOSE DEL PALMAR- CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

En el presente informe se describen las actividades realizadas como Residente de estudios y diseños en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Elaboración y actualización de archivo de correspondencia enviada y recibida
- Revisión informes semanales de la consultoría contrato 4227 de 2024
- Seguimiento a programación de consultoría
- Elaboración y tramite Acta de costos del mes de julio de 2025
- Elaboración de informes semanales mes de julio de 2025
- Asistencia comité técnico de seguimiento semanal el 03 de julio de 2025
- Asistencia comité técnico de seguimiento semanal el 10 de julio de 2025
- Reunión presencial consultoría, interventoría e INVIAS el 16/07/2025
- Asistencia a segundo espacio de socialización con la MEC y con el consejo comunitario de Novita COCOMAN el 16/07/2025
- Asistencia a comité técnico de seguimiento mensual INVIAS Bogotá el día 23/07/2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

TIPO DE CONTRATO:	CONSULTORÍA
CONTRATO No. Y FECHA:	4227 de 2024
CONSULTOR:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA
VALOR INICIAL:	$8.700.000.000
PLAZO TOTAL CONTRATO:	1 mes.
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA Y PEDAGOGICA DE COLOMBIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4262 DE 2024
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	891800330-1

SUPERVISOR:	ING. JANNIER SALAS QUEJADA Resolución de designación No. 4854 de fecha 15 de octubre de 2024
FECHA DE INICIO:	02 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA No 01	12 MESES HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4262 DE 2024**
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA
INTERVENTORIA ENTIDAD CONTRATANTE	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC NIT. 891800330 – 1 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT. 800215807 -2
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.375.000.000
FECHA DE INICIO	02 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA No 1	12 MESES HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025

El contrato se firma el 11/06/2024, con fecha de inicio el día 02/12/2024 y fecha de terminación 31/12/2024. Posteriormente entre las partes se firma prorroga No.1 presentado fecha de terminación hasta el 31/12/2025. Actualmente, el Consultor manifiesta que la fiducia para el manejo de las cuentas conjuntas de actas y anticipo

renuncio y que se encuentra en un nuevo proceso con el Banco Agrario para solucionar este impase.

1. ACTUACIONES CONSULTOR E INTERVENTOR

Componente BIM

Se realiza mesa de trabajo con los profesionales BIM del INVIAS, CONSULTORÍA e INTERVENTORÍA el día 25 de julio de 2025 con el fin de definir el alcance según los recursos disponibles.

Componente Social

Se realizo socialización segundo espacio con el consejo comunitario mayor de Novita COCOMAN dando cumplimiento a los requerimientos de la MEC y del representante legal vigente

Componente Técnico

1- Entre el 01 y el 08 de julio de 2025 se lleva a cabo la aplicación de encuestas de origen y destino en el corredor Ánimas – Cartago – Ánimas, como parte del estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio. julio, el equipo profesional ingresó al municipio de Unión Panamericana, estableciendo como punto principal de recolección de información la cabecera municipal de Las Ánimas. A partir de esa fecha, se inició la implementación de las encuestas, las cuales se están desarrollando en el horario comprendido entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m.

2- Entre el 01 y el 05 de julio de 2025, se llevó a cabo una visita de campo por parte de los especialistas de la consultoría en los volúmenes de Geotecnia, Hidrología, Hidráulica, Socavación y Geología. El propósito principal de esta actividad fue realizar una revisión detallada de las condiciones hidráulicas del corredor vial, así como de las afectaciones geológicas y los aspectos relacionados con la estabilidad de taludes. Como parte del recorrido, el equipo técnico inspeccionó el trayecto comprendido entre el Cruce del Cairo y el corregimiento de Curundó, en el municipio de Novita. Durante esta inspección se realizó una evaluación minuciosa de los puntos críticos identificados a lo largo del corredor, documentando el estado actual de la vía mediante evidencia fotográfica y observaciones técnicas en terreno. En el desarrollo de las actividades también se realizó la búsqueda e inspección de nacederos de agua ubicados dentro del área de influencia del proyecto, con el acompañamiento del equipo de hidráulica y de personas de la comunidad conocedoras del territorio. Esta tarea permitió abordar de forma

integral aspectos geológicos y geotécnicos, además de caracterizar un total de ocho (8) puntos de agua, en los que se tomaron parámetros fisicoquímicos para determinar la posible presencia de aguas subterráneas. También se revisó en campo Identificación de obras de arte existentes, Localización de cuerpos de agua en el corredor, Reconocimiento de escorrentías y aguas de filtración presentes en el área de estudio.

3- La consultoría envío Plan de Exploración Geotécnica de los tramos 1, 4 y 5 los cuales se encuentran en revisión por parte de la interventoría

4- La consultoría envía informe preliminar del volumen 5 Estudio de Geología y Geomorfología local el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría

5- Se llevó a cabo una reunión técnica sobre diseño geométrico y topografía, en la cual se identificó como principal dificultad la falta de información topográfica, situación que ha impactado negativamente el desarrollo de la fase 3 del proyecto. Ante esto, se acordó priorizar la recolección de dicha información y se recomendó a los profesionales realizar una revisión minuciosa de los insumos disponibles, con el fin de precisar el estado actual de la documentación. Asimismo, se ajustó el formato del informe técnico para alinearlo con los estándares exigidos por la consultoría e interventoría. Durante la sesión también se abordaron posibles ajustes al cronograma y presupuesto, incluyendo la eventual modificación del contrato inicial, y se acordó avanzar en los análisis técnicos y jurídicos correspondientes.

6- La consultoría envía informe de apropiación de los estudios topográficos en donde concluye que la información entregada por el INVIAS no es confiable ni suficiente para Fase III debido a:

- Dentro de la revisión de la información no se encontró un informe topográfico detallado de campo.
- La información analizada no está referenciada al sistema oficial (MAGNA-SIRGAS 2018).
- No existe un modelo MDT detallado, ni se evidencia el uso de tecnologías LIDAR o escáner.
- Ausencia de redes levantadas, ni fichas técnicas de la red GNSS.
- Entregables no estructurados, ni verificables.
- Riesgo alto de reprocesos, rediseños y errores constructivos.

Por tanto, es necesario la toma actualizada de la topografía de detalle.

7- Se realizo comité técnico mensual en el INVIAS Bogotá el día 23/07/2025 en donde se expuso la situación contractual con las comunidades de consejos comunitarios de COCOMAN y de San Pedro de Igara las cuales hacen parte de los tramos 1 y 2 y solicitan consulta previa. La consultoría propone realizar acercamientos con estas comunidades e intentar proponer realizar lineamientos de Consulta previa

para que se permita la entrada a campo. Así mismo en este comité la consultoría se comprometió a iniciar con la toma de nueva topografía y toma de información geotécnica en los tramos 4, 5 y parte del tramo 3.

2. AVANCE FINANCIERO

A continuación, se relaciona el valor de las actas de interventoría tramitadas ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS en donde se expone además la amortización por acta y el saldo a amortizar


CONTRATO 4262 DE 2024 - INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA						
Acta No	**PERIODO**	**VALOR BASICO**	**VALOR TOTAL ACTA**	**ANTICIPO AMORTIZADO**	**VALOR REAL AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**	**SALDO ANTICIPO**
ANTICIPO			$	1.187.500.000,00		
1	dic-24	$ 45.222.400,00	$ 45.222.400,00	$ 22.611.200,00	$ 22.611.200,00	$ 1.164.888.800,00
2	ene-25	$ 6.159.800,00	$ 6.159.800,00	$ 3.079.900,00	$ 3.079.900,00	$ 1.161.808.900,00
3	feb-25	$ 84.109.000,00	$ 84.109.000,00	$ 42.054.500,00	$ 42.054.500,00	$ 1.119.754.400,00
4	mar-25	$ 114.346.000,00	$ 114.346.000,00	$ 57.173.000,00	$ 57.173.000,00	$ 1.062.581.400,00
5	abr-25	$ 35.970.200,00	$ 35.970.200,00	$ 17.985.100,00	$ 17.985.100,00	$ 1.044.596.300,00
6	may-25	$ 51.962.000,00	$ 51.962.000,00	$ 25.981.000,00	$ 25.981.000,00	$ 1.018.615.300,00
7	jun-25	$ 64.694.419,00	$ 64.694.419,00	$ 32.347.209,50	$ 32.347.209,50	$ 986.268.090,50
8	jul-25	$ 148.418.477,00	$ 148.418.477,00	$ 74.209.238,50	$ 74.209.238,50	$ 912.058.852,00
TOTALES		**$ 550.882.296,00**	**$ 550.882.296,00**	**$ 275.441.148,00**	**$ 275.441.148,00**	**$ 912.058.852,00**
		AVANCE FINANCIERO			**23,20%**	

ENTREGABLES:


- Relación correspondencia enviada y recibida
- Acta de costos del mes de julio de 2025 con sus soportes
- Actas de reunión
- Informes semanales
- Informe mensual
- Oficios de seguimiento de programación a la consultoría
- Archivo digital del contrato 4262 el cual contine
  1- Documentos contractuales (Minutas, Pólizas)
  2- Actas de costos de interventoría
  3- Informes semanales de interventoría y consultoría
  4- Facturas de interventoría
  5- Hojas de vida profesionales de interventoría y Consultoría
  6- Correspondencia
  7- Actas de reunión

8- Información subida en el SECOP II
9- Actas de modificación de costos
10-Entregables (metodologías, preliminares y definitivos)

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

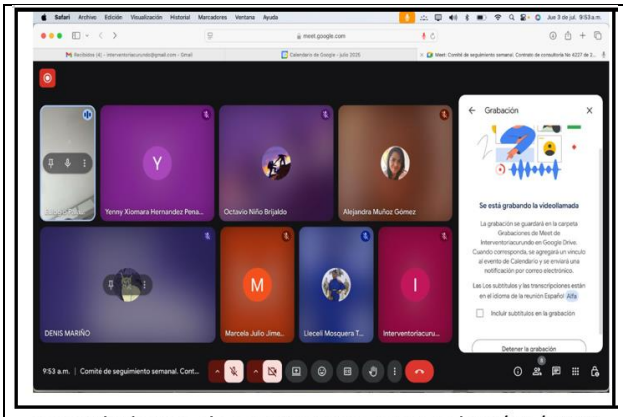

Comité técnico de seguimiento semanal 03/07/2025

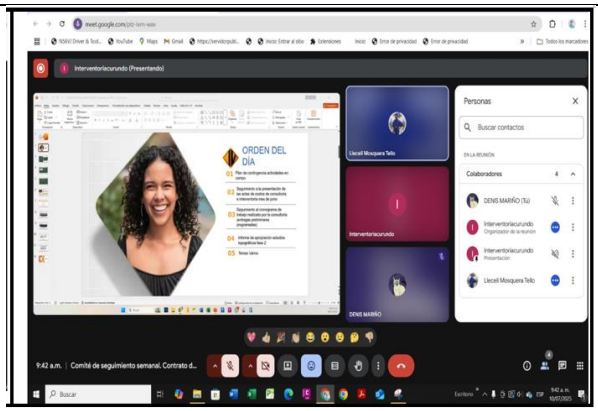

Comité técnico de seguimiento semanal 10/07/2025






Reunión INVIAS – CONSULTORÍA- INTERVENTORÍA 16/07/2025





Socialización segundo espacio con la MEC y con el consejo comunitario de Novita COCOMAN

	
Socialización segundo espacio con la MEC y con el consejo comunitario de Novita COCOMAN	

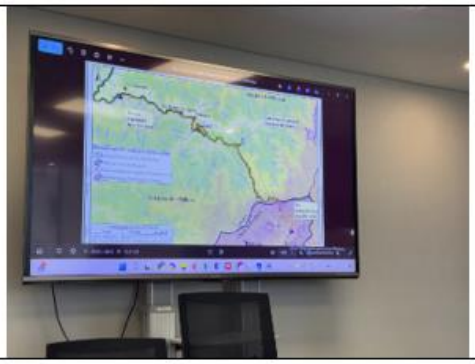	
Comité técnico de seguimiento 23/07/2025	Comité técnico de seguimiento 23/07/2025

PRESENTADO POR:

DENIS YINETH PINO MARIÑO
Residente de estudios y diseños
Contratista

Vo. Bo:

JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDDO
Director Contrato N.º 4262 de 2024
Interventoría UPTC

OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO
Supervisor del contrato
UPTC

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 2032 DE 2025

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	2032
CONTRATISTA	CARLOS ANDRES LOZANO NARANJO
CC.	11809623
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA ZONA DE INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN DE CURUNDO – SAN JOSE DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.
PLAZO DE EJECUCIÓN**	del 16 de junio al 31 de octubre de 2025. Ciento treinta y ocho (138) días
PRORROGA	N.A.
VALOR DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS M/CTE ($20.722.500,00)
ADICION 1	N. A.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Cruce el Cairo – San José del Palmar - Novita
ORDENADOR DEL GASTO	CARLOS MAURICIO MORENO TÉLLEZ, Vicerrector de Investigaciones y Extensión
SUPERVISOR	OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO Resolución 5451 del 14 de noviembre 2024.
DEPENDENCIA	Contrato Interadministrativo N.º 4262 de 2024, UPTC - INVIAS.
ACTIVIDAD/CARGO	INGENIERO CIVIL DE APOYO
PERIODO DEL INFORME	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025
NUMERO DEL PAGO	2 de 5
VALOR DEL PAGO	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL $4.605.000

INTRODUCCIÓN

la Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4227 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA. Para la realización de la interventoría del contrato anteriormente mencionado, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4262 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.

En el presente informe se describen las actividades realizadas como Acompañamiento en construcción de cartografía ambiental y social en los componentes demográficos, económicos, cultural, político organizativo y tendencia del desarrollo, en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: De acuerdo con las actividades de la minuta de contrato.

8. Apoyar las labores de seguimiento a las actividades de campo en el territorio, colaborando simultáneamente al acercamiento con la comunidad.

21. Estar disponible en el sitio de trabajo y asistir a las visitas, reuniones con las comunidades del área de influencia del proyecto, según la programación con residente de campo y director de Interventoría.

ACTIVIDAD:

Acompañamiento a los especialistas de la consultoría en toma de datos de georeferenciación, identificación de fuentes hídricas en el corredor vial; quebradas, cunetas, puentes, además de identificar los suelos presentes, así como también si han presentado algún movimiento.

FECHA:

Dia 2 y 3 de julio

PERSONAL DE LA CONSULTORÍA:

LUIS EMILIO PARDO ALUMA	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA
LUZ AMIRA TEJADA FLOREZ	ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS
NESTOR GEOVANNI AGAMEZ	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA
JAVINSON MOSQUERA BORRERO	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
BERTONIS	INGENIERO RESIDENTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO DIA 2 DE JULIO
ACTIVIDAD REALIZADA DESDE CURUNDO HASTA LA ITALIA



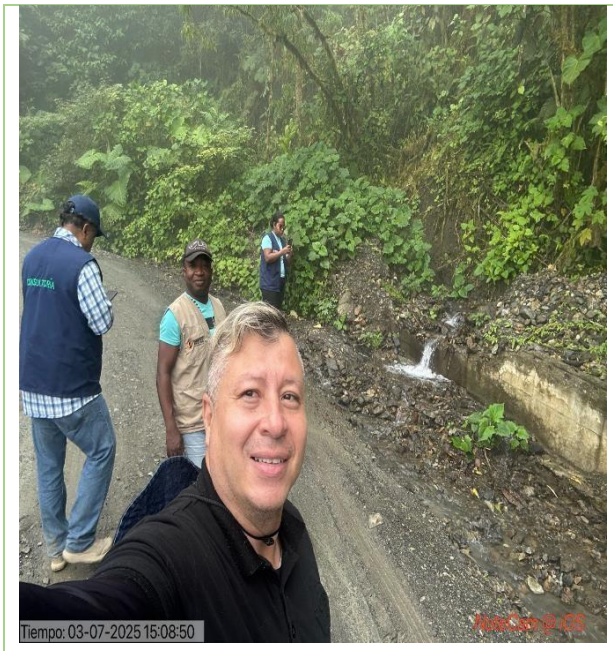
FOTO 1. Acompañamiento a los especialistas de la consultoría en toma de datos de georeferenciación, identificación de fuentes hídricas en el corredor vial; quebradas, cunetas, puentes, además de identificar los suelos presentes, así como también si han presentado algún movimiento.



FOTO 2. Acompañamiento a los especialistas de la consultoría en toma de datos de georeferenciación, identificación de fuentes hídricas en el corredor vial; quebradas, cunetas, puentes, además de identificar los suelos presentes, así como también si han presentado algún movimiento.

	
FOTO 3. Acompañamiento a los especialistas de la consultoría en toma de datos de georeferenciación, identificación de fuentes hídricas en el corredor vial; quebradas, cunetas, puentes, además de identificar los suelos presentes, así como también si han presentado algún movimiento.	**FOTO 4.** Acompañamiento a los especialistas de la consultoría en toma de datos de georeferenciación, identificación de fuentes hídricas en el corredor vial; quebradas, cunetas, puentes, además de identificar los suelos presentes, así como también si han presentado algún movimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DIA 3 DE JULIO
ACTIVIDAD REALIZADA DESDE LA ITALIA HASTA LOS LIMITES

	
FOTO 5. Acompañamiento a los especialistas de la consultoría en toma de datos de georeferenciación, identificación de fuentes hídricas en el corredor vial; quebradas, cunetas, puentes, además de identificar los suelos presentes, así como también si han presentado algún movimiento.	**FOTO 6.** Acompañamiento a los especialistas de la consultoría en toma de datos de georeferenciación, identificación de fuentes hídricas en el corredor vial; quebradas, cunetas, puentes, además de identificar los suelos presentes, así como también si han presentado algún movimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DIA 3 DE JULIO
ACTIVIDAD REALIZADA DESDE LA ITALIA HASTA LOS LIMITES

	
FOTO 7. Acompañamiento a los especialistas de la consultoría en toma de datos de georeferenciación, identificación de fuentes hídricas en el corredor vial; quebradas, cunetas, puentes, además de identificar los suelos presentes, así como también si han presentado algún movimiento.	**FOTO 8.** Acompañamiento a los especialistas de la consultoría en toma de datos de georeferenciación, identificación de fuentes hídricas en el corredor vial; quebradas, cunetas, puentes, además de identificar los suelos presentes, así como también si han presentado algún movimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DIA 3 DE JULIO
ACTIVIDAD REALIZADA DESDE LA ITALIA HASTA LOS LIMITES

	
FOTO 9. Acompañamiento a los especialistas de la consultoría en toma de datos de georeferenciación, identificación de fuentes hídricas en el corredor vial; quebradas, cunetas, puentes, además de identificar los suelos presentes, así como también si han presentado algún movimiento.	**FOTO 10.** Acompañamiento a los especialistas de la consultoría en toma de datos de georeferenciación, identificación de fuentes hídricas en el corredor vial; quebradas, cunetas, puentes, además de identificar los suelos presentes, así como también si han presentado algún movimiento.

PRESENTADO POR:

CARLOS ANDRES LOZANO NARANJO
CEDULA 11809623
INGENIRO CIVIL
Cargo INGENIERO APOYO

V° B°:

JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de interventoría del contrato 4262 de 2024

OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO
Supervisor del contrato

PLAN ANUAL DE CAJA
PAC

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4262 DE 2024
INTERVENTOR UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

PROYECTO INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA
SECTOR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4262 DE 2024 INTERVENTORIA UPTC

CONTRATO		SUB TOTAL COSTOS BASICOS	PROVISIÓN PARA AJUSTES	SUB TOTAL COSTOS BASICOS	VALOR CONTRATO	VIGENCIA 2024	VIGENCIA 2025	VIGENCIA 2026	TOTAL VIGENCIAS
CONTRATO No 4262 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	2.375.000.000,00	-	2.375.000.000,00	$ 2.375.000.000	2.375.000.000,00			2.375.000.000,00
TOTAL		**$ 2.375.000.000**	**$ -**	**$ 2.375.000.000**	**$ 2.375.000.000**	**$ 2.375.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.375.000.000**

PLAN ANUAL DE CAJA (PAC) AÑO 2025

PPTO VIGENTE	TOTAL RECURSOS	COMPONENTE DEL PAGO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR TOTAL EJECUTADO JULIO 2025	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	SALDO RECURSOS 2024
2.024	2.375.000.000,00	GRUPO 1 A GRUPO 3	93.343.133,33	93.343.133,33	234.443.133,33	93.343.133,33	280.303.133,33	190.943.133,33	93.343.133,33	202.343.133,33	491.543.133,33	122.543.133,33	340.943.133,33	93.343.133,33	148.418.477,00	550.882.296,00	1.824.117.704,00
TOTAL		VALOR TOTAL	93.343.133,33	93.343.133,33	234.443.133,33	93.343.133,33	280.303.133,33	190.943.133,33	93.343.133,33	202.343.133,33	491.543.133,33	122.543.133,33	340.943.133,33	93.343.133,33	148.418.477,00	550.882.296,00	1.824.117.704,00

MEPI-MN1-IN-15-FR-7
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31-jul-25 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 DE 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

MES Y ANO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2025. **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISENOS DEL CORREDOR SOSTENIBLE ANIMAS - NUQUI EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO.

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 4227 DE 2024. **CONSULTOR :** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

NOMBRE ARL: POSITIVA. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	74.322.702	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 5.120.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	50%		40%	$ 213.811	V	SANITAS	9489029644	$ 771.300,00	COLPENSIONES	9489029644	$ 1.049.000,00	N/A	N/A	N/A	
2	DIEGO FERNANDO BORDA CRUZ	1.099.207.738	INGENIERO COORDINADOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (INTERVENTORÍA)	$ 8.045.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		40%	$ 335.959	V	SANITAS	9489813641	$ 817.200,00	PORVENIR	9489813641	$ 1.111.400,00	N/A	N/A	N/A	
	JHON STEVENS BEJARANO COPETE	1.077.431.927	INGENIERO COORDINADOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (INTERVENTORÍA)	$ 5.850.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		40%	$ 244.296	V	SALUD TOTAL	9489812463	$ 438.800,00	PORVENIR	9489812463	$ 561.600,00	N/A	N/A	N/A	
3	DENIS YINETH PINO MARIÑO	1.049.629.730	INGENIERO RESIDENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (INTERVENTORÍA)	$ 5.850.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		40%	$ 244.296	V	NUEVA EPS	9489093710 9489881745	$ 438.800,00	COLFONDOS	9489093710 9489881745	$ 561.600,00	N/A	N/A	N/A	
4	CARLOS ANDRES LOZANO NARANJO	11.809.623	TÉCNICO EN INGENIERÍA DE LA ZONA	$ 3.070.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100		40%	$ 99.076		EPS SURA	4615315253	$ 320.000	COLPENSIONES	4615315253	$ 409.600	N/A	N/A	N/A	
5									$ -											
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 27.935.000																

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.

2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Firma
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-181087 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO** identificado con **CC** No. **74322702**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - NI. 891800330	**Fecha de inicio de cobertura:** 03/03/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 09/04/2025 **Fecha fin de Contrato:** 31/10/2025 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal **www.positivaenlinea.gov.co**, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202501015349386.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 08 días del mes de agosto de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_09
MIS_4_1_3_FR15 v_010

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74322702		NIÑO BRIJALDO JOSE OCTAVIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CORINTO SECTOR MONTESILLO	PAIPA-BOYACA	7852521	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1000000608	9489029644	I	2025/08/04	2025/07/29	BANCO DE BOGOTA	0	$1,820,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																														
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	74322702	NIÑO BRIJALDO JOSE OCTAVIO	Independiente	0	No	No																														

Total **Afiliados(1)**

							SALARIO			PENSION													SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 6.170.000	No		COLPENSIONES	30	$ 6.170.000	16%	SIN RIESGO	$ 987.200	$ 0	$ 0	$ 30.900	$ 30.900	$ 0	$ 1.049.000		SANITAS	30	$ 6.170.000	12,5%	$ 771.300	$
																					$ 1.049.000						$ 771.300	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 771.300			0	$ 0	0%	$ 0		0	$ 0	0%	1	$ 0	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 771.300						$ 0						$ 0				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74322702		NIÑO BRIJALDO JOSE OCTAVIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CORINTO SECTOR MONTESILLO	PAIPA-BOYACA	7852521	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1000000608	9489029644	I	2025/08/04	2025/07/29	BANCO DE BOGOTA	0	$1,820,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,049,000	$0	$0	$1,049,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,049,000	$0	$0	$1,049,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$771,300	$0	$0	$771,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$771,300	$0	$0	$771,300
TOTAL				1	$1,820,300	$0	$0	$1,820,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1099207738		BORDA CRUZ DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 3a # 3a - 09	TUNJA-BOYACA	7442112	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1669247757	9489813641	I	2025/08/12	2025/08/01	BANCOLOMBIA	0	$1,928,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1099207738	BORDA CRUZ DIEGO FERNANDO	230301	30	$6,537,000	$1,111,400	EPS005	30	$6,537,000	$817,200		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$6,537,000	$1,111,400			$6,537,000	$817,200			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,111,400	$0	$0	$1,111,400
PORVENIR 230301		800,224,808	8	1	$1,111,400	$0	$0	$1,111,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$817,200	$0	$0	$817,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$817,200	$0	$0	$817,200
TOTAL				**1**	**$1,928,600**	**$0**	**$0**	**$1,928,600**

Hacienda

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **DIEGO FERNANDO BORDA CRUZ** identificado con **CC** No. **1099207738**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - NI. 891800330	**Fecha de inicio de cobertura:** 28/01/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 09/04/2025 **Fecha fin de Contrato:** 31/10/2025 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal **www.positivaenlinea.gov.co**, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202501015349274.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 08 días del mes de agosto de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_09
MIS_4_1_3_FR15 v_010

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077431927		BEJARANO COPETE JHON STEVENS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 70B #94B-15	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3108449047	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1667221467	9489812463	I	2025/08/08	2025/07/31	BANCOLOMBIA	0	$1,000,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 3.510.000	No		PORVENIR	30	$ 3.510.000	16%	SIN RIESGO	$ 561.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561.600		SALUD TOTAL	30	$ 3.510.000	12,5%	$ 438.800	$
																					$ 561.600						$ 438.800	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 438.800			0	$ 0	0%	$ 0		0	$ 0	0%	5	$ 0	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 438.800						$ 0						$ 0				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077431927		BEJARANO COPETE JHON STEVENS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 70B #94B-15	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3108449047	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1667221467	9489812463	I	2025/08/08	2025/07/31	BANCOLOMBIA	0	$1,000,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$561,600	$0	$0	$561,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$561,600	$0	$0	$561,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$438,800	$0	$0	$438,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$438,800	$0	$0	$438,800
TOTAL				**1**	**$1,000,400**	**$0**	**$0**	**$1,000,400**

Hacienda

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **JHON STEVENS BEJARANO COPETE** identificado con **CC** No. **1077431927**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - NI. 891800330	**Fecha de inicio de cobertura:** 16/06/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 16/06/2025 **Fecha fin de Contrato:** 31/10/2025 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal **www.positivaenlinea.gov.co**, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202501016254626.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 08 días del mes de agosto de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_09
MIS_4_1_3_FR15 v_010

Hacienda

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **DENIS YINETH PINO MARINO** identificado con **CC** No. **1049629730**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - NI. 891800330	**Fecha de inicio de cobertura:** 28/01/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 09/04/2025 **Fecha fin de Contrato:** 31/10/2025 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal **www.positivaenlinea.gov.co**, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202501015349347.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 08 días del mes de agosto de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_09
MIS_4_1_3_FR15 v_010

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049629730		PINO MARIÑO DENIS YINETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV NORTE No 78-32	TUNJA-BOYACA	7400123	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1676339150	9489881745	N	2025/08/11	2025/08/04	BANCOLOMBIA	0	$605,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049629730	PINO DENIS								A				▫						231001	30	($1,423,500)	($227,800)	EPS037	30	($1,423,500)	($178,000)		0	$0	$0	14-23	30	($1,423,500)	($7,500)	0	$0	$0	No	($413,300)
2	CC	1049629730	PINO DENIS								C	X									231001	30	$3,510,000	$561,600	EPS037	30	$3,510,000	$438,800		0	$0	$0	14-23	30	$3,510,000	$18,400	0	$0	$0	No	$1,018,800
Total	**Afiliados(1)**																						$2,086,500	$333,800			$2,086,500	$260,800			$0	$0			$2,086,500	$10,900		$0	$0		$605,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049629730		PINO MARIÑO DENIS YINETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV NORTE No 78-32	TUNJA-BOYACA	7400123	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1676339150	9489881745	N	2025/08/11	2025/08/04	BANCOLOMBIA	0	$605,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$333,800	$0	$0	$333,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$333,800	$0	$0	$333,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,900	$0	$0	$10,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,900	$0	$0	$10,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$260,800	$0	$0	$260,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$260,800	$0	$0	$260,800
TOTAL				**1**	**$605,500**	**$0**	**$0**	**$605,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049629730		PINO MARIÑO DENIS YINETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV NORTE No 78-32	TUNJA-BOYACA	7400123	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1640871412	9489093710	I	2025/08/11	2025/07/21	BANCOLOMBIA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049629730	PINO DENIS																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0		$413,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049629730		PINO MARIÑO DENIS YINETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV NORTE No 78-32	TUNJA-BOYACA	7400123	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1640871412	9489093710	I	2025/08/11	2025/07/21	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$413,300**	**$0**	**$0**	**$413,300**

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **CARLOS ANDRES LOZANO NARANJO** identificado con **CC** No. **11809623**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - NI. 891800330	**Fecha de inicio de cobertura:** 16/06/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 16/06/2025 **Fecha fin de Contrato:** 31/10/2025 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal **www.positivaenlinea.gov.co**, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202501016254656.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 08 días del mes de agosto de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_09
MIS_4_1_3_FR15 v_010

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	11809623
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ANDRES LOZANO NARANJO
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	B/VILLA DEL PRADO	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4615315253**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/31			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9993490841

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 409.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 409.600	$ 0	$ 409.600
SUBTOTALES:										**$ 409.600**	**$ 0**	**$ 409.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 320.000
SUBTOTALES:													**$ 320.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 320.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 62.400	$ 62.400	$ 0	$ 0	$ 62.400
SUBTOTALES:									**$ 62.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 62.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 11809623	LOZANO NARANJO CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.560.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.560.000	$ 409.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 409.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.560.000	$ 320.000	$ 0	$ 320.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.560.000	11809623	$ 62.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 792.000

Planilla Pagada

MEPI-MN1-IN-15-FR-9
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	31-jul-25 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 DE 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2025. **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CORREDOR SOSTENIBLE ÁNIMAS - NUQUÍ EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 4227 DE 2024. **CONSULTOR :** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1124024	C-2402-0600-16-51102A-2402006-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA SECUNDARIA MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-MEDELLÍN (CHOCO), VÍA E	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 2.300.000.000	$ -
		C-2402-0600-16-51102A-2402041-02 DQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: CARTAGO NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 75.000.000	
TOTAL						**$ 2.375.000.000**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 2.375.000.000**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 1.187.500.000,00	RP Nº 1124024 DE 14 11 2024	$ 1.112.500.000,00			RP Nº 1124024 DE 14 11 2024 $ 2.300.000.000
								RP Nº 1124024 DE 14 11 2024	$ 1.187.500.000,00			RP Nº 1124024 DE 14 11 2024 $ 2.300.000.000
1	**DICIEMBRE 2024.**	$ 45.222.400,00	$ -	$ 45.222.400,00	$ 22.611.200,00	$ 22.611.200,00	$ 1.164.888.800,00	RP Nº 1124024 DE 14 11 2024	$ 1.164.888.800,00	$ 2.329.777.600,00		RP Nº 1124024 DE 14 11 2024 $ 2.300.000.000
2	**ENERO DE 2025.**	$ 6.159.800,00		$ 51.382.200,00	$ 3.079.900,00	$ 3.079.900,00	$ 1.161.808.900,00	RP Nº 1124024 DE 14 11 2024	$ 1.161.808.900,00	$ 2.323.617.800,00		RP Nº 1124024 DE 14 11 2024 $ 2.300.000.000
3	**FEBRERO 2025.**	$ 84.109.000,00		$ 135.491.200,00	$ 42.054.500,00	$ 42.054.500,00	$ 1.119.754.400,00	RP Nº 1124024 DE 14 11 2024	$ 1.119.754.400,00	$ 2.239.508.800,00		RP Nº 1124024 DE 14 11 2024 $ 2.300.000.000
4	**MARZO 2025.**	$ 114.346.000,00		$ 249.837.200,00	$ 57.173.000,00	$ 57.173.000,00	$ 1.062.581.400,00	RP Nº 1124024 DE 14 11 2024	$ 1.062.581.400,00	$ 2.125.162.800,00		RP Nº 1124024 DE 14 11 2024 $ 2.300.000.000
5	**ABRIL 2025.**	$ 35.970.200,00		$ 285.807.400,00	$ 17.985.100,00	$ 17.985.100,00	$ 1.044.596.300,00	RP Nº 1124024 DE 14 11 2024	$ 1.044.596.300,00	$ 2.089.192.600,00		RP Nº 1124024 DE 14 11 2024 $ 2.300.000.000
6	**MAYO 2025.**	$ 51.962.000,00		$ 337.769.400,00	$ 25.981.000,00	$ 25.981.000,00	$ 1.018.615.300,00	RP Nº 1124024 DE 14 11 2024	$ 1.018.615.300,00	$ 2.037.230.600,00		RP Nº 1124024 DE 14 11 2024 $ 2.300.000.000
7	**JUNIO 2025.**	$ 64.694.419,00		$ 402.463.819,00	$ 32.347.209,50	$ 32.347.209,50	$ 986.268.090,50	RP Nº 1124024 DE 14 11 2024	$ 986.268.090,50	$ 1.972.536.181,00		RP Nº 1124024 DE 14 11 2024 $ 2.300.000.000
8	**JULIO 2025.**	$ 148.418.477,00		$ 550.882.296,00	$ 74.209.238,50	$ 74.209.238,50	$ 912.058.852,00	RP Nº 1124024 DE 14 11 2024	$ 912.058.852,00	$ 1.824.117.704,00		RP Nº 1124024 DE 14 11 2024 $ 2.300.000.000
TOTALES		**$ 550.882.296,00**	**$ -**	**$ 550.882.296,00**	**$ 275.441.148,00**	**$ 275.441.148,00**	**$ 912.058.852,00**		**$ 912.058.852,00**	**$ 1.824.117.704,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA Nº 1 DICIEMBRE DE 2024	$ 45.222.400,00	$ -	$ 45.222.400,00
ACTA Nº 2 ENERO DE 2025	$ 6.159.800,00	$ -	$ 6.159.800,00
ACTA Nº3 FEBRERO DE 2025	$ 84.109.000,00	$ -	$ 84.109.000,00
ACTA Nº4 MARZO 2025	$ 114.346.000,00	$ -	$ 114.346.000,00
ACTA Nº5 ABRIL 2025	$ 35.970.200,00	$ -	$ 35.970.200,00
ACTA Nº6 MAYO 2025	$ 51.962.000,00	$ -	$ 51.962.000,00
ACTA Nº7 JUNIO 2025	$ 64.694.419,00	$ -	$ 64.694.419,00
ACTA Nº8 JULIO 2026	$ 148.418.477,00	$ -	$ 148.418.477,00
VALOR TOTAL			**$ 550.882.296,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Firma
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-181087 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-15-FR-13
SEGUIMIENTO GARANTÍAS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30-jun-25 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 DE 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

FECHA DE INICIO: 2/12/2024

PLAZO INICIAL: 1 MES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.375.000.000,00

VALOR ACUMULADO: $ 2.375.000.000,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 237.500.000,00	12	11	2024	1	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.187.500.000,00	12	11	2024	1	7	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 475.000.000,00	12	11	2024	31	12	2027
Calidad del servicio	30%	$ 712.500.000,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 83183

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 22/11/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 237.500.000,00	2	12	2024	1	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.187.500.000,00	2	12	2024	1	7	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 475.000.000,00	2	12	2024	31	12	2027
Calidad del servicio	30%	$ 712.500.000,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 83183

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 4/12/2024

OBSERVACIONES:

Anexo 2: Por orden de inicio del INVIAS de fecha 02 de diciembre de 2024.

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 237.500.000,00	12	11	2024	1	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.187.500.000,00	12	11	2024	1	7	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 475.000.000,00	12	11	2024	31	12	2028
Calidad del servicio	30%	$ 712.500.000,00	31	12	2025	31	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 83183

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:
Anexo 3: Por Prorroga No 01 de 12 meses hasta el 31 de diciembre de 2025, se prorroga la vigencia de la poliza, los demas terminos y condiciones no modificados continuan vigentes

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 237.500.000,00	12	11	2024	1	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.187.500.000,00	12	11	2024	1	7	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 475.000.000,00	12	11	2024	31	12	2028
Calidad del servicio	30%	$ 712.500.000,00	31	12	2025	31	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 83183

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:
Anexo 4: Por medio de la cual se aclara que la compañia tiene conocimiento del modificatorio No 01 de 2025 y modificatorio No 02 de 2025 del contrato. Los demas terminos y condiciones no modificados continuan vigentes.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Firma
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-181087 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-3-FR-1
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

DATOS GENERALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 2
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4262 DE 2024 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA

JUSTIFICACIÓN:
Del Registro Presupuestal No. 1124024 de fecha 2024-11-14 Valor $2.375.000.000
para un valor total de anticipo de $ 1.187.500.000,00 equivalente al 50% como se estipula en la cláusula septima "Forma de pago" del contrato interadminsitrativo No 4262 de 2024.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2		VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Pago de salarios personal de interventoría	$ 1.074.500.000,00				$ 1.074.500.000,00	90,48%
2	Viáticos Director (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	$ 12.000.000,00				$ 12.000.000,00	1,01%
3	Viáticos Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	$ 28.000.000,00				$ 28.000.000,00	2,36%
4	Transportes Aéreos Director (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	$ 9.600.000,00				$ 9.600.000,00	0,81%
5	Transportes Aéreos Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	$ 22.400.000,00				$ 22.400.000,00	1,89%
6	Alquiler de Vehìculo (4X4 de 2000 CC o superior, Modelo 2014 o superior, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	$ 38.000.000,00				$ 38.000.000,00	3,20%
7	Campamento (incluye arrendamiento y/o alquiler, dotación y servicios, en el sitio del proyecto)	$ 3.000.000,00				$ 3.000.000,00	0,25%
TOTAL						**$ 1.187.500.000,00**	**100,00%**

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. No aplica para compra ni alquiler de vehículos.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.
4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: Jorge Octavio Niño Brijaldo
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Firma:
Nombre: Jannier Salas Quejada
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-181087 ANT

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-3-FR-2

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☑ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262-2024 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 616005708 **BANCO** BANCO DE BOGOTÁ SUCURSAL: TUNJA

ANTICIPO OTORGADO: 50 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 1.187.500.000,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:
INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INGENIERO JANNIER SALAS QUEJADA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
EGRESO	10192	30 de mayo de 2025	GERMAN EDUARDO PEÑA VASQUEZ	$ 1.600.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	6091	10 de abril de 2025	JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	$ 1.024.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	5522	8 de abril de 2025	DIEGO FERNANDO BORDA CRUZ	$ 1.609.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	5525	8 de abril de 2025	DENIS YINETH PINO MARIÑO	$ 1.170.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	5519	8 de abril de 2025	JASMITH DANIELA SIERRA RODRIGUEZ	$ 570.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	10193	30 de mayo de 2025	GERMAN EDUARDO PEÑA VASQUEZ	$ 12.000.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	6093	10 de abril de 2025	JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	$ 7.680.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	5521	8 de abril de 2025	DIEGO FERNANDO BORDA CRUZ	$ 12.067.500	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	5524	8 de abril de 2025	DENIS YINETH PINO MARIÑO	$ 8.775.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	5518	8 de abril de 2025	JASMITH DANIELA SIERRA RODRIGUEZ	$ 4.275.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	10194	30 de mayo de 2025	GERMAN EDUARDO PEÑA VASQUEZ	$ 12.000.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	6423	23 de abril de 2025	JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	$ 7.680.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	5520	8 de abril de 2025	DIEGO FERNANDO BORDA CRUZ	$ 12.067.501	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	5523	8 de abril de 2025	DENIS YINETH PINO MARIÑO	$ 8.775.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	5517	8 de abril de 2025	JASMITH DANIELA SIERRA RODRIGUEZ	$ 4.275.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	10209	3 de junio de 2025	GERMAN EDUARDO PEÑA VASQUEZ	$ 8.800.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	10758	6 de junio de 2025	JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	$ 2.560.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	9200	21 de mayo de 2025	JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	$ 3.840.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	8808	15 de mayo de 2025	DIEGO FERNANDO BORDA CRUZ	$ 8.849.500	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	8896	16 de mayo de 2025	DENIS YINETH PINO MARIÑO	$ 6.435.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	8809	15 de mayo de 2025	JASMITH DANIELA SIERRA RODRIGUEZ	$ 3.135.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	11926	18 de junio de 2025	GERMAN EDUARDO PEÑA VASQUEZ	$ 12.000.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	11060	10 de junio de 2025	JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	$ 7.680.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	11066	10 de junio de 2025	DIEGO FERNANDO BORDA CRUZ	$ 12.067.500	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	11071	10 de junio de 2025	DENIS YINETH PINO MARIÑO	$ 8.775.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	11062	10 de junio de 2025	JASMITH DANIELA SIERRA RODRIGUEZ	$ 4.275.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	12153	20 de junio de 2025	NUBIA ESPERANZA GIL AGUILAR	$ 3.847.500	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	7910	09 de junio de 2025	JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	$ 300.000	2	Viáticos Director (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)
EGRESO	9308	21 de mayo de 2025	JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	$ 1.200.000	2	Viáticos Director (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)
EGRESO	11495	12 de junio de 2025	JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	$ 300.000	2	Viáticos Director (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)
EGRESO	11822	17 de junio de 2025	JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	$ 600.000	2	Viáticos Director (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)
EGRESO	7906	9 de mayo de 2025	GERMAN EDUARDO PEÑA VASQUEZ	$ 300.000	3	Viáticos Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje,alimentación y desplazamientos)

						FECHA	31/07/2025 (Día / Mes / Año)
EGRESO	7908	9 de mayo de 2025	DIEGO FERNANDO BORDA CRUZ	$	300.000	3	Viáticos Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje,alimentación y desplazamientos)
EGRESO	7909	9 de mayo de 2025	DENIS YINETH PINO MARIÑO	$	300.000	3	Viáticos Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje,alimentación y desplazamientos)
EGRESO	9307	21 de mayo de 2025	DIEGO FERNANDO BORDA CRUZ	$	1.200.000	3	Viáticos Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje,alimentación y desplazamientos)
EGRESO	9306	21 de mayo de 2025	DENIS YINETH PINO MARIÑO	$	1.200.000	3	Viáticos Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje,alimentación y desplazamientos)
EGRESO	11492	12 de junio de 2025	DIEGO FERNANDO BORDA CRUZ	$	300.000	3	Viáticos Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje,alimentación y desplazamientos)
EGRESO	11493	12 de junio de 2025	DENIS YINETH PINO MARIÑO	$	300.000	3	Viáticos Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje,alimentación y desplazamientos)
EGRESO	11494	12 de junio de 2025	JASMITH DANIELA SIERRA RODRIGUEZ	$	300.000	3	Viáticos Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje,alimentación y desplazamientos)
EGRESO	11496	12 de junio de 2025	GERMAN EDUARDO PEÑA VASQUEZ	$	300.000	3	Viáticos Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje,alimentación y desplazamientos)
EGRESO	11818	17 de junio de 2025	DIEGO FERNANDO BORDA CRUZ	$	600.000	3	Viáticos Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje,alimentación y desplazamientos)
EGRESO	11820	17 de junio de 2025	GERMAN EDUARDO PEÑA VASQUEZ	$	600.000	3	Viáticos Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje,alimentación y desplazamientos)
EGRESO	12052	19 de junio de 2025	JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	$	795.800	4	Transportes Aéreos Director (S/Comprobante Pago y Pasabordo)
EGRESO			DIEGO FERNANDO BORDA CRUZ	$	795.800	5	Transportes Aéreos Especialistas y otros profesionales (S/ComprobantePago y Pasabordo)
EGRESO			DENIS YINETH PINO MARIÑO	$	795.800	5	Transportes Aéreos Especialistas y otros profesionales (S/ComprobantePago y Pasabordo)

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/07/2025
(Día / Mes / Año)

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	Pago de salarios personal de interventoría	$ 1.074.500.000,00		$ 177.832.500,91	$ 177.832.500,91	$ 896.667.499,09
2	Viáticos Director (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	$ 12.000.000,00		$ 2.400.000,00	$ 2.400.000,00	$ 9.600.000,00
3	Viáticos Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje,alimentación y desplazamientos)	$ 28.000.000,00		$ 5.400.000,00	$ 5.400.000,00	$ 22.600.000,00
4	Transportes Aéreos Director (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	$ 9.600.000,00		$ 795.800,00	$ 795.800,00	$ 8.804.200,00
5	Transportes Aéreos Especialistas y otros profesionales (S/ComprobantePago y Pasabordo)	$ 22.400.000,00		$ 1.591.600,00	$ 1.591.600,00	$ 20.808.400,00
6	Alquiler de Vehículo (4X4 de 2000 CC o superior, Modelo 2014 o superior,incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona delproyecto)	$ 38.000.000,00		$ -	$ -	$ 38.000.000,00
7	Campamento (incluye arrendamiento y/o alquiler, dotación y servicios, en elsitio del proyecto)	$ 3.000.000,00		$ -	$ -	$ 3.000.000,00
	TOTALES	$ 1.187.500.000,00		$ 188.019.900,91	$ 188.019.900,91	$ 999.480.099,09

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME : JUNIO-JULIO 2025 $ 3.170.983,00
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 7.212.324,00
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
2025082016AA4B05691P	$ 4.041.341		MARZO-ABRIL-MAYO	20/08/2025	$ 4.041.341
2025082016A9F605489P	$ 3.170.983		JUNIO-JULIO	20/08/2025	$ 7.212.324

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:

Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre: José Octavio Niño Brijaldo
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:01193-0243 CPITVC

Firma:
Nombre: Jannier Salas Quejada
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:05202-181087 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.
