ACTA No. 4152.010.14.12.074	FECHA:	28-07-2026
	HORA INICIAL:	09:00 AM
	HORA FINAL:	10:00 AM
OBJETIVO: Revisar los ajustes técnicos y las cantidades de obra del Contrato No. 4152.010.26.1.853-202, C5 K80	LUGAR: Intersección C5 K80	

ASISTENTES:
Jhon Molano
Daniela Penagos
Alonso Barco
Victor Cuellar

2. ORDEN DEL DÍA

1. Recorrido de verificación por la intersección.
2. Revisión de las obras ejecutadas y elementos implementados.
3. Identificación y revisión de situaciones encontradas durante la ejecución.
4. Verificación de cajas y elementos existentes asociados a la instalación de los semáforos.
5. Levantamiento y revisión técnica con los ingenieros responsables.
6. Revisión de documentación pendiente.
7. Establecimiento de compromisos.

3. DESARROLLO


Se dio inicio a la jornada con el recorrido de inspección en la totalidad de la intersección, realizando la revisión de las obras ejecutadas y de los diferentes elementos implementados en desarrollo del Contrato No. 4152.010.26.1.853-202.

Durante el recorrido se verificaron las condiciones generales de las actividades realizadas, así como la ubicación y disposición de los elementos instalados, con el fin de revisar que las intervenciones ejecutadas correspondieran a las actividades previstas.


Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

En el desarrollo de la inspección se identificaron algunas situaciones que requirieron una revisión técnica adicional. Entre estas se evidenció la dificultad relacionada con la localización de una caja existente, la cual se encontraba oculta en el sector donde se ubica el armario.

Posteriormente, se realizó el correspondiente levantamiento y verificación técnica con los ingenieros, revisando en campo las condiciones encontradas, las actividades ejecutadas y los aspectos pendientes de documentación y soporte.

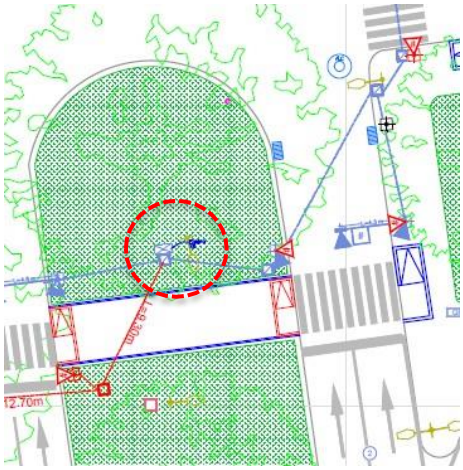

Versión inicial

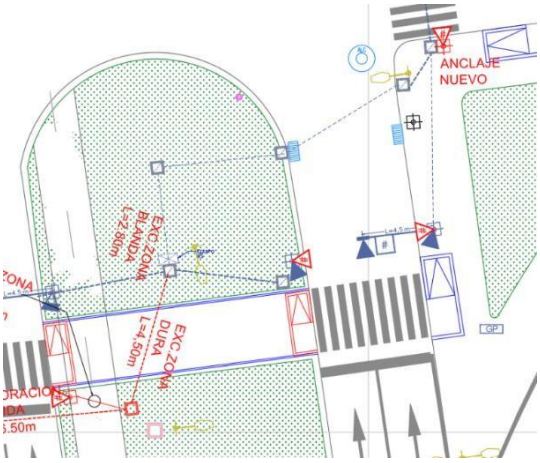

Versión actual

De acuerdo con la visita realizada y teniendo en cuenta las condiciones y problemáticas evidenciadas en campo, así como lo informado por el contratista durante el desarrollo de los trabajos de cableado para la alimentación de los semáforos instalados sobre la Calle 80 – calzada norte, se determinó la necesidad de realizar una revisión e inspección de las redes y ductos existentes asociados al área de intervención. Lo anterior, debido a la imposibilidad de realizar el paso del cable a través del ducto ubicado entre la caja localizada en el separador de la Carrera 80, costado oriental, y la caja ubicada en el andén de la misma carrera, en la esquina suroriental de la intersección, contigua al Condominio Valle de la Ferreira. De acuerdo con las verificaciones efectuadas por el contratista, se realizaron varios intentos de paso de la sonda en ambos sentidos, logrando avanzar únicamente cinco (5) metros desde la caja ubicada en el andén hacia el separador y aproximadamente un (1) metro desde la caja ubicada en el separador hacia la caja del andén, evidenciándose así una obstrucción en el recorrido existente.

Esta condición impide realizar la alimentación de los nuevos semáforos peatonales instalados sobre la Calle 80 – calzada norte, los cuales quedarían sin servicio. Adicionalmente, se verificó que no resulta posible utilizar como alternativa el recorrido a través de la Calle 5, a la altura de la esquina del Hospital

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Psiquiátrico, debido a las condiciones existentes en dicho sector, donde actualmente se cuenta con una alimentación aérea para los dispositivos semafóricos existentes.

En consecuencia, la inspección de las redes y ductos existentes permitirá verificar las condiciones actuales de la infraestructura, identificar posibles interferencias, obstrucciones o afectaciones y contar con los elementos técnicos necesarios para definir las acciones requeridas y establecer la alternativa que permita culminar las actividades de cableado y garantizar la correcta alimentación y operación de los elementos semafóricos contemplados en el contrato.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

4. COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de entrega
1	Remitir los informes semanales que se encuentran pendientes correspondientes al seguimiento y ejecución de las actividades del contrato.	Contratista	31/08/2026
2	Entregar el plano final (as-built) en el cual se refleje la condición definitiva de la obra y la totalidad de los elementos implementados.	Contratista / Supervisión	31/08/2026
3	Remitir las actas pendientes de firma correspondientes a actividades o reuniones realizadas anteriormente.	Contratista	31/08/2026
4	Complementar la información técnica que se requiera como resultado del levantamiento realizado en campo y de las condiciones encontradas durante el recorrido.	Contratista	31/08/2026
5	Realizar una revisión e inspección de las redes existentes asociadas al área de intervención.	Contratista / Supervisión	Por determinar

Firmas

Jhon Molano Sebastian Molano Gaona.
Contratista-Apoyo a la supervisión

Daniela Penagos
Contratista-Apoyo a la supervisión

Alonso Barco
Contratista-Solutraffic

Elaboró: Daniela Penagos Rodriguez-Contratista
Revisó: Jhon Sebastian Molano-Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
