vanessa 6497

Rentan

Medellín, 10 de Julio 2026 1300 1959

Radicado R:2026010386748
Fecha:2026/07/14 10:06:15 AM
Tpo:OFICIO
Responsable BEATRIZ ELENA OSPINA MON
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Ingeniero
JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO
Supervisor - Gobernación de Antioquia – SIF
Correo: juandiego.aguirre@antioquia.gov.co

Referencia: CONTRATO No. 4600018656 DE 2025 "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."

Asunto: Entrega de Informes No. 3 correspondiente al mes de Marzo de 2026 – Contrato Interadministrativo de Mandato No. 4600018656 de 2025.

En el marco de las funciones de supervisión del Contrato Interadministrativo de Mandato suscrito entre la Secretaría de Infraestructura Física y RENTAN y en cumplimiento de las actividades de seguimiento y control al contrato de referencia, me permito remitir los siguientes documentos:

- Oficio remisorio (1 folio)
- Informe Técnico (37 folios - del folio 2 al 38)
- Informe Ambiental (8 folios - del folio 39 al 46)
- Informe SST (11 folios - del folio 47 al 57)
- Informe Social (24 folios - del folio 58 al 81)
- Hojas de vida de profesionales del mandato (49 folios – del folio 82 al 130)
    - Andreina Sandoval Valero
    - Sura Paola Lópera Ruiz
    - Deisy Caterine Hernández Urrego
    - Alexander Bruno Acosta Aznate
    - Alexandra Castaño Saldarriaga

En medio digital (USB) se anexa lo siguiente:

- Carpeta "1. ANEXOS DEL MANDATO"
- Carpeta "2. INFORMES SEMANALES"
- Carpeta "3. CONTRATOS DERIVADOS"
    - Carpeta "3.1. Lote 2 – Occidente"

14 - Julio - 26

ARCHIVO SIF
2026 SEP 1 7:24:25

- Carpeta “3.2. Lote 3 - Urabá”
- Carpeta “3.3. Lote 4 – Magdalena Medio”
- Carpeta “3.4. Lote 5 - Suroeste”
- Carpeta “3.5. Lote 6 – Nordeste"
- Carpeta “3.6. Lote 7 – Bajo Cauca”
- Carpeta “3.7. Lote 8 – Norte"

Total, de folios 130

La documentación remitida corresponde a la del contrato de mandato y a los contratos derivados, y constituyen soportes documentales dentro de la ejecución del contrato interadministrativo.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

CATALINA CASTRILLÓN TORRES
Subgerente de Ejecución
Renting de Antioquia, EICE, RENTAN

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró:	ANDRES FELIPE OROZCO ARBOLEDA Apoyo técnico Renting de Antioquia, EICE, RENTAN		10/07/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Rentan	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 1 de 73

INTERVENTORÍA A LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.



CONTRATO No. 4600018656 DE 2025

Objeto del contrato:
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

MARZO
2026

INFORME MENSUAL TÉCNICO No 3

INFORME TÉCNICO MENSUAL

(Versión 1 - Periodo 01/03/2026 – 31/03/2026)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Entidad Contratante

RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN

Contratista

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Objeto Contrato

4600018656 DE 2025.

Nº de Contrato

Firma:	Firma:	Firma:
ANDRES FELIPE OROZCO ARBOLEDA Apoyo técnico Rentan	**CATALINA CASTRILLON TORRES** Supervisor Rentan	**JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO** Supervisor SIF
Elaboró	Aprobó	VoBo

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 6

2. DESCRIPCION Y ALCANCE DEL PROYECTO 6

2.1. LOCALIZACION 10

2.1.1. Lote 2 – Occidente 10

2.1.2. Lote 3 – Urabá 11

2.1.3. Lote 4 – Magdalena Medio 12

2.1.4. Lote 5 – Suroeste 12

2.1.5. Lote 6 - Nordeste 13

2.1.6. Lote 7 – Bajo Cauca 13

2.1.7. Lote 8 - Norte 14

2.2. ALCANCE DEL PROYECTO 14

2.2.1. Alcance Lote 2 – Occidente 14

2.2.2. Alcance Lote 3 – Urabá 15

2.2.3. Alcance Lote 4 – Magdalena Medio 15

2.2.4. Alcance Lote 5 – Suroeste 15

2.2.5. Alcance Lote 6 – Nordeste 16

2.2.6. Alcance Lote 7 – Bajo Cauca 16

2.2.7. Alcance Lote 8 – Norte 17

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO GENERAL 17

3.1. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 17

3.2. INFORMACION DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DE INTERVENTORIA 18

3.2.1. Lote 1 - Oriente 18

3.2.2. Lote 2 - Occidente 19

3.2.3. Lote 3 - Urabá 19

3.2.4. Lote 4 – Magdalena Medio 20

3.2.5. Lote 5 - Suroeste 20

3.2.6. Lote 6 - Nordeste 21

3.2.7. Lote 7 – Bajo Cauca 21

3.2.8. Lote 8 - Norte 22

4. SEGUIMIENTO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 22

4.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO 22

4.1.1. Resumen estado del contrato 30

4.1.2. Descripción y cantidades ejecutadas 31

4.2 ACTAS DE PAGO 62

4.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO 62

4.3.1. Información y control del personal 62

4.4. SEGUIMIENTO LEGAL 63

4.5. SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 64

4.6. SEGUIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 65

4.7. SEGUIMIENTO GESTIÓN SOCIAL 65

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 66

6. ANEXOS 67

6.1 Correspondencia enviada 67

6.2 Correspondencia recibida 68

Tabla de tablas

Tabla 1. Circuitos de intervención. 7

Tabla 2. Subregiones y valor interventoría 8

Tabla 3. Perfiles mínimos de apoyo a la supervisión 9

Tabla 4. Subregiones y kilómetros para intervenir. 10

Tabla 5. Circuitos Lote 2 - Occidente 14

Tabla 6. Circuitos Lote 3 - Urabá 15

Tabla 7. Circuitos Lote 4 – Magdalena Medio. 15

Tabla 8. Circuitos Lote 5 – Suroeste 16

Tabla 9. Circuitos Lote 6 - Nordeste 16

Tabla 10. Circuitos Lote 7 – Bajo Cauca 17

Tabla 11. Circuitos Lote 8 - Norte 17

Tabla 12. Circuitos activos a marzo de 2026 22

Tabla 13. Acta de pagos 62

Tabla 14. Talento humano contratado 62

Tabla 15. Personal retirado 63

Tabla 16. Pólizas y/o garantías 63

Tabla 17. Control de aportes y seguridad social 63

Tabla 18. Correspondencia enviada del mes de marzo 67

Tabla 19. Correspondencia recibida del mes de marzo 68

Tabla de Ilustraciones

Ilustración 1. Localización lote 2 – Occidente 11
Ilustración 2. Localización lote 3 – Urabá 11
Ilustración 3. Localización lote 4 - Magdalena Medio 12
Ilustración 4. Localización lote 5 – Suroeste 12
Ilustración 5. Localización lote 6 – Nordeste 13
Ilustración 6. Localización lote 7 - Bajo Cauca 13
Ilustración 7. Localización lote 8 – Norte 14

1. INTRODUCCION

El presente informe técnico de mandato detalla el seguimiento técnico, administrativo, ambiental, financiero y legal, en desarrollo del contrato de mandato 4600018656 DE 2025 y de objeto "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", por un valor de CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M.L ($ 58.743.460.670). El plazo para la ejecución de la interventoría está estimado en VEINTIÚN (21) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, de los cuales se tienen UN (1) MES dentro del cual se deberá realizar el desembolso de los recursos y el administrador delegado deberá celebrar los procesos de selección de contratistas y las gestiones correspondientes para el inicio de la ejecución de las interventorías, DIECINUEVE (19) MESES para la ejecución del proyecto, recibo de obras y cierre del proyecto entre el contratista de obra y la interventoría, UN (1) MES para el cierre del contrato entre el mandatario y la entidad contratante.

2. DESCRIPCION Y ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del presente Contrato de Mandato sin representación está orientado a administrar los recursos entregados por el Departamento de Antioquia a la empresa RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, para satisfacer las necesidades conforme a las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del presente proceso de contratación. En el presente mandato sin representación, la entidad ejecutora cuenta con un objeto social que le permite desarrollar las actividades a convenir, es por ello que, para suscribirlo, se verificó que el objeto social de la entidad ejecutora estuviera relacionado con el objeto contractual específico, enmarcado en la ejecución completa del proyecto.

Por tal motivo, al tratarse de un mandato sin representación, el alcance del objeto contractual está determinado porque la actuación del mandatario frente a terceros radica en su propia esfera y no, en la del mandante, pues el mandatario contratará a su propio nombre las ocho (8) interventorías requeridas, razón por la cual no obliga al mandate respecto a terceros.

El alcance de los procesos de interventoría, según la normativa, consiste en el seguimiento técnico, ambiental de seguridad industrial y de salud en el trabajo (SST), administrativo, financiero y legal que sobre el cumplimiento del contrato de obra realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen.

Las interventorías contratadas por Rentan como mandatario, deberán por su cuenta y riesgo ejercer las actividades anteriormente descritas, de acuerdo con lo exigido en el pliego de condiciones y demás documentación anexa, así como el Manual de Supervisión e Interventoría del Departamento de Antioquia.

El contrato de mandato sin representación para realizar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA se lleva a cabo, toda vez que la Secretaría de Infraestructura Física no cuenta con el personal suficiente ni especializado para realizar el seguimiento multidisciplinario que se requiere desde los componentes técnico, ambiental, administrativo, financiero y legal . Adicional a lo anterior, la complejidad y extensión del proyecto de obra exige que se contrate una interventoría integral externa que realice el seguimiento y vigilancia a todos los componentes de las obras contratadas.

El presente proceso, bajo la modalidad de contrato interadministrativo de mandato sin representación busca contratar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. Este proyecto responde a una necesidad específica y deberá contar con personal, programación y flujo de caja acorde con el plazo disponible y con los recursos asignados, los cuales fueron entregados al mandatario para su revisión y posterior presentación de una propuesta acorde a la necesidad de la Gobernación de Antioquia.

Los entregables que enmarcan el alcance de las obras a las cuales se realizará interventoría, podrán ser consultados a detalle dentro del anexo 1 – anexo técnico "Actividades por ejecutar y alcance". De forma general, se enuncia cada uno de ellos a continuación:

- Construcción de alcantarillas
- Construcción de cunetas
- Construcción de filtro para cunetas
- Construcción de bordillos
- Construcción de disipadores
- Estabilización con material granular
- Señalización vial

Tabla 1. Circuitos de intervención.

ID	CIRCUITO	LONGITUD	SUBREGIÓN
1	Cáceres - La Chilona	25	Bajo Cauca
2	La Ye - Yondó	30	Magdalena Medio
3	Caramanta - Cristales - San Roque	20.64	Nordeste
4	San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría	25.72	Nordeste-Oriente
5	Amalfi - Portachuelos - Santa Isabel	10	Nordeste
6	Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío	25	Magdalena Medio
7	El Guayabo - El Salto - Partidas a Guadalupe	10.61	Norte
8	Carolina del Príncipe - Angostura	13.62	Norte
9	Alto del Cardal - Toledo	15	Norte

ID	CIRCUITO	LONGITUD	SUBREGIÓN
10	Santa Rosa - Carolina del Príncipe	33.67	Norte
11	Entrerríos - Labores - San José de la Montana	39.95	Norte
12	Ebéjico - Heliconia - Medellín	28.76	Occidente
13	Sopetrán - Horizontes - Belmira	39.59	Occidente-Norte
14	Frontino - Nutibara	23.62	Occidente
15	La Quiebra - Santa Ana	5.33	Oriente
16	San Vicente - El Peñol	18.15	Oriente
17	Abejorral - La Frontera	25.49	Oriente
18	Abejorral - Santa Barbara	26.2	Oriente-Suroeste
19	Sonsón - Aguadas (Puente San Rafael)	19.22	Oriente
20	Titiribí - Armenia	10	Suroeste-Occidente
21	Salgar - La Quiebra - Concordia	15.93	Suroeste
22	Valparaíso - Támesis	22.51	Suroeste
23	Andes - San José - Pueblo Rico	22.39	Suroeste
24	Mutatá - Pavarando	10	Urabá
25	San Pedro de Urabá - Necoclí	58.65	Urabá
26	San Pedro de Urabá - Arboletes	30	Urabá
27	San Pedro - El Tres - Turbo	22	Urabá
28	Ebéjico - Miserenga	1	Occidente
29	Guarne - Yolombal	5	Oriente

La Administración de los recursos objeto del presente contrato se deberá destinar para desarrollar a través de ocho (8) grupos, las interventorías a los ocho (8) contratos de obras cuyo objeto es "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-(LOTE 1, ... ,8)", conforme a la distribución de subregiones del departamento como se muestra a continuación:

Tabla 2. Subregiones y valor interventoría

GRUPO	SUBREGIÓN	VALOR INTERVENTORÍA
1	ORIENTE	$8,278,217,760.00
2	OCCIDENTE	$7,853,071,898.00
3	URABA	$9,595,864,128.00
4	MAGDALENA MEDIO	$4,769,992,811.00
5	SUROESTE	$5,960,752,013.00
6	NORDESTE	$4,671,615,946.00
7	BAJO CAUCA	$1,854,347,722.00
8	NORTE	$9,498,182,082.00

TOTALES		**$52,482,044,360.00**

Nota: Las ocho (8) interventorías contratadas por RENTAN como mandatario, deberán tener en cuenta que los alcances de las obras objeto de la Interventoría que se desprende de la presente contratación, son las descritas en el Anexo 1 – Anexo Técnico Interventoría.

El mandatario EICE RENTAN como empresa encargada de la administración de los recursos, pondrá a disposición un equipo de profesionales interdisciplinarios (técnicos, administrativos, financieros y jurídicos) con la función de apoyar la supervisión de la ejecución de los contratos. Esto permitirá garantizar el correcto seguimiento de que las obras cumplan con las especificaciones técnicas requeridas con el fin brindar la durabilidad y sostenibilidad de la infraestructura en el tiempo.

Para el desarrollo de las actividades contempladas, se dispondrá de espacios locativos como oficinas dotadas con los elementos necesarios según las necesidades, donde se realizarán los procesos de asesoría, fortalecimiento y acompañamiento para el cumplimiento de la propuesta. A su vez, se contará con los recursos suficientes para facilitar las comunicaciones dentro del proyecto, facilitando el logro de los objetivos establecidos, proporcionando el acompañamiento y control de los participantes.

Reiterando la naturaleza con la que cuenta EICE RENTAN como una Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE), de orden Departamental, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, que permite dar una agilidad a los procesos de contratación y garantizar un adecuado manejo de los recursos a invertir.

Por lo tanto, se hace necesario que EICE RENTAN en su calidad de mandatario para la contratación del objeto del contrato, deberá contar internamente con un personal idóneo que lo apoye en su rol de supervisor de los contratos derivados.

A continuación, se presenta la descripción de los perfiles mínimos requeridos para el personal de apoyo:

Tabla 3. Perfiles mínimos de apoyo a la supervisión

	Profesión	Cantidad	Experiencia general y especifica	Dedicación	Meses
Equipo de supervisión y técnico	Ingeniero civil coordinador	1	Profesional especializado > 2 años de experiencia en proyectos cuyo objeto, alcance o actividades estén relacionadas con el proceso contractual.	100%	21
	Ingeniero civil de apoyo	4	Profesional Titulado en el área correspondiente	100%	19
Equipo social, ambiental, comunicacional y SISO	SISO	1	Profesional titulado en el área correspondiente	100%	19
	Ambiental	1	Profesional titulado en el área correspondiente	100%	19
	Social	1	Profesional titulado en el área correspondiente	100%	19
	Administrativo y financiero	1	Profesional titulado en el área correspondiente	100%	19
	Jurídico	1	Profesional titulado en el área correspondiente	50%	19

Equipo Técnico y de gestión de proyectos	Profesional estructurador de proyectos	1	Profesional titulado con experiencia > 2 años de estructuración o formulación de proyectos	100%	4

Las funciones de este personal serán apoyar a la supervisión de manera que se garantice que los consultores y las interventorías cumplan con las obligaciones contractuales dispuestas por EICE RENTAN y la Secretaría de Infraestructura, además, realizar las gestiones necesarias para llevar a cabo el objeto contractual y dar cumplimiento a los manuales de supervisión de la entidad.

2.1. LOCALIZACION

El proyecto está ubicado en ocho subregiones del Departamento como se menciona a continuación:

Tabla 4. Subregiones y kilómetros para intervenir.

SUBREGIÓN	TOTAL_KM
ORIENTE	99.22
OCCIDENTE	94.95
URABÁ	120.65
MAGDALENA MEDIO	55
SUROESTE	68.26
NORDESTE	54.1
BAJO CAUCA	25
NORTE	117.25
TOTAL	**634.43**

El presente contrato de mandato se desarrolla en el marco de la Interventoría técnica en 8 subregiones del Departamento de Antioquia; los cuales a sus vez suman 29 circuitos. Es de mencionar que a la fecha el Lote 1 – Oriente se declaró desierto; por lo anterior, a la fecha siete (7) de ellos están en ejecución. Los cuales son Occidente, Urabá, Magdalena Medio, Suroeste, nordeste, Bajo Cauca y Norte, como se puede observar a continuación:

2.1.1. Lote 2 – Occidente

La longitud que se va a intervenir es de 94,95 Km y representa el 14% del total de kilómetros a cargo de departamento en esta subregión.

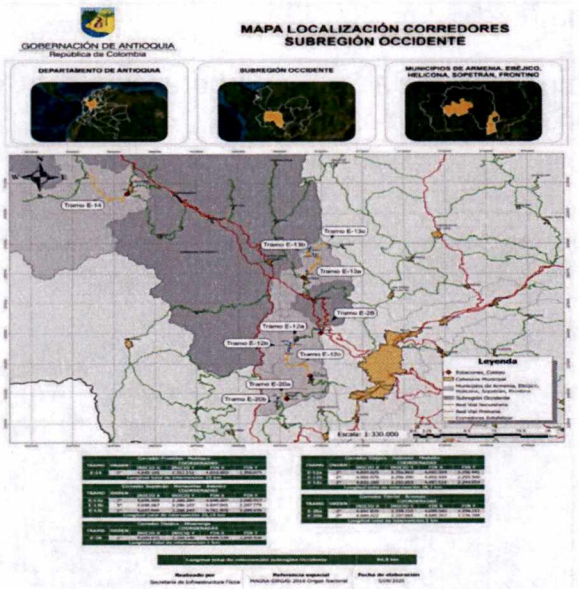


Ilustración 1. Localización lote 2 – Occidente

2.1.2. Lote 3 – Urabá

La longitud que se va a intervenir es de 120,65 Km y representa el 35% del total de kilómetros a cargo del departamento en esta subregión.

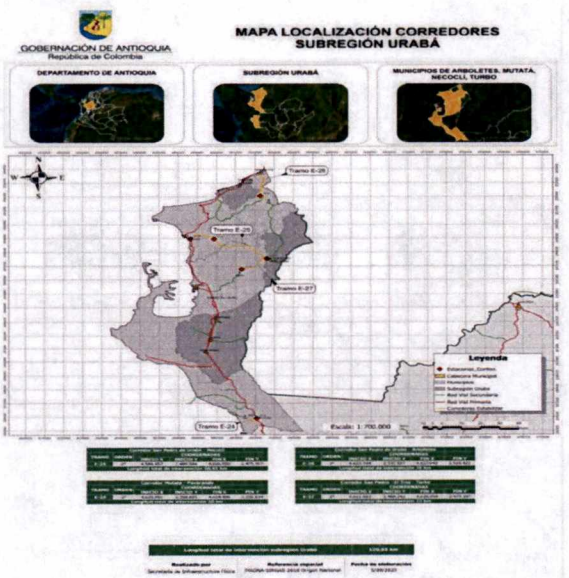


Ilustración 2. Localización lote 3 – Urabá

2.1.3. Lote 4 – Magdalena Medio

La longitud que se va a intervenir es de 55 Km y representa el 16% del total de kilómetros a cargo del departamento en esta subregión.

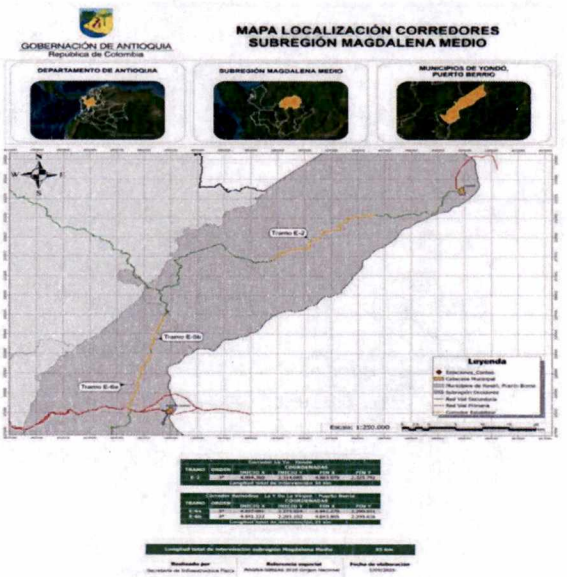


Ilustración 3. Localización lote 4 - Magdalena Medio

2.1.4. Lote 5 – Suroeste

La longitud que se va a intervenir es de 68,26 Km y representa el 7% del total de kilómetros a cargo del departamento en esta subregión.

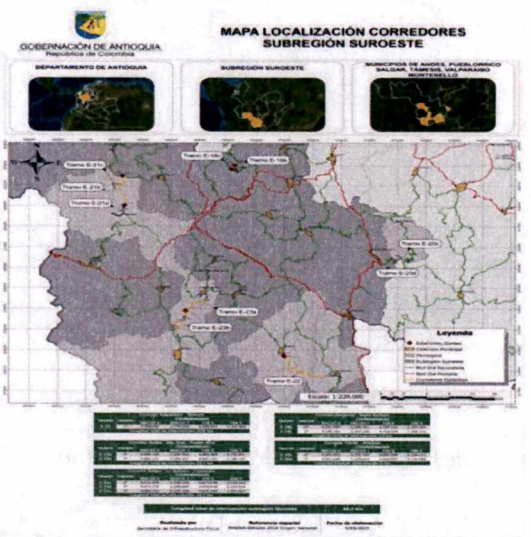


Ilustración 4. Localización lote 5 – Suroeste

2.1.5. Lote 6 - Nordeste

La longitud que se va a intervenir es de 54,1 Km y representa el 9% del total de kilómetros a cargo del departamento en esta subregión.

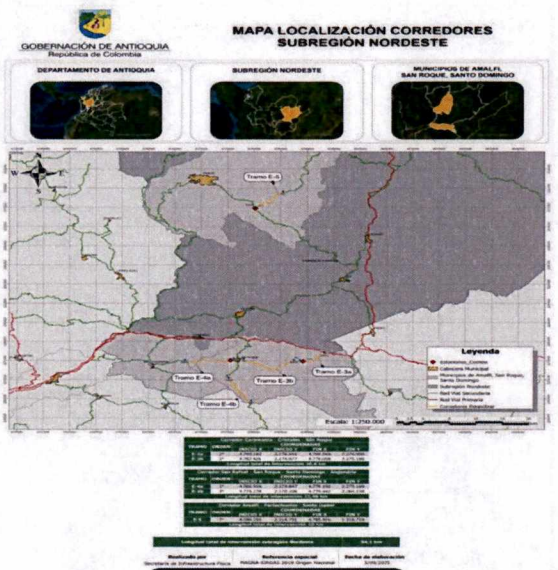


Ilustración 5. Localización lote 6 – Nordeste

2.1.6. Lote 7 – Bajo Cauca

La longitud que se va a intervenir es de 25 Km y representa el 9% del total de kilómetros a cargo del departamento en esta subregión.

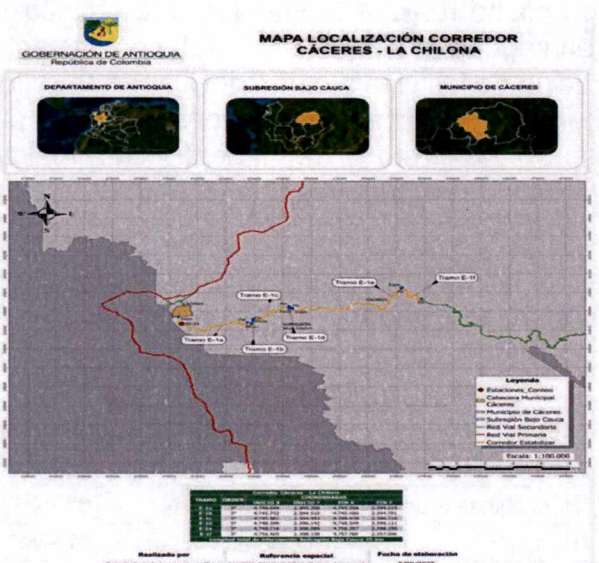


Ilustración 6. Localización lote 7 - Bajo Cauca

2.1.7. Lote 8 - Norte

La longitud que se va a intervenir es de 117,25 Km y representa el 23% del total de kilómetros a cargo del departamento en esta subregión.

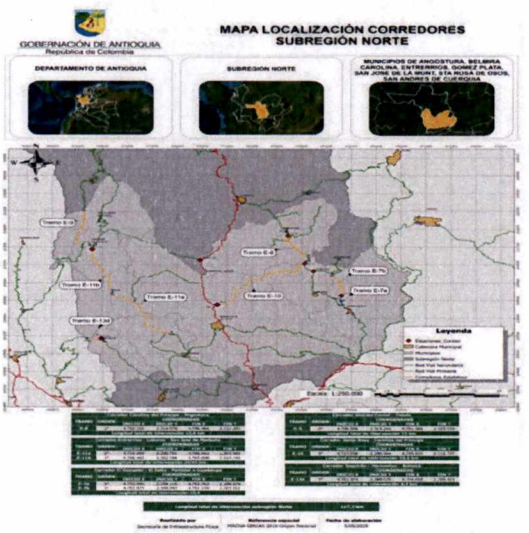


Ilustración 7. Localización lote 8 – Norte

2.2. ALCANCE DEL PROYECTO

2.2.1. Alcance Lote 2 – Occidente

El proyecto tiene como propósito realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social, ambiental y en seguridad y salud en el trabajo a las actividades de mejoramiento, mantenimiento y estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia descritas en la siguiente tabla, de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, estudios, manuales y/o lineamientos definidos por la Secretaría de Infraestructura Física en el marco del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 4600018494 de 2025.

Las intervenciones se desarrollarán sobre los segmentos específicos de las vías a continuación relacionadas, priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física atendiendo los puntos críticos que comprometan la estabilidad, drenaje, seguridad y continuidad del tránsito vehicular:

Tabla 5. Circuitos Lote 2 - Occidente

ID	CIRCUITO	SUBREGIÓN	CÓDIGO (S) EN VÍA
12	Ebéjico - Heliconia - Medellín	Occidente	62AN17
13	Sopetrán - Horizontes - Belmira	Occidente-Norte	62AN15
14	Frontino - Nutibara	Occidente	62AN08, 05284VT66
20	Titiribí - Armenia	Suroeste-Occidente	60AN08-1
28	Ebéjico - Miserenga	Occidente	62AN17

2.2.2. Alcance Lote 3 – Urabá

El proyecto tiene como propósito realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social, ambiental y en seguridad y salud en el trabajo a las actividades de mejoramiento, mantenimiento y estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia descritas en la siguiente tabla, de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, estudios, manuales y/o lineamientos definidos por la Secretaría de Infraestructura Física en el marco del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 4600018494 de 2025.

Las intervenciones se desarrollarán sobre los segmentos específicos de las vías a continuación relacionadas, priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física atendiendo los puntos críticos que comprometan la estabilidad, drenaje, seguridad y continuidad del tránsito vehicular:

Tabla 6. Circuitos Lote 3 - Urabá

ID	CIRCUITO	SUBREGIÓN	CÓDIGO (S) EN VÍA
24	Mutatá - Pavarando	Urabá	62AN06
25	San Pedro de Urabá - Necoclí	Urabá	90AN01
26	San Pedro de Urabá - Arboletes	Urabá	90AN03
27	San Pedro - El Tres - Turbo	Urabá	62AN02-2

2.2.3. Alcance Lote 4 – Magdalena Medio

El proyecto tiene como propósito realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social, ambiental y en seguridad y salud en el trabajo a las actividades de mejoramiento, mantenimiento y estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia descritas en la siguiente tabla, de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, estudios, manuales y/o lineamientos definidos por la Secretaría de Infraestructura Física en el marco del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 4600018494 de 2025.

Las intervenciones se desarrollarán sobre los segmentos específicos de las vías a continuación relacionadas, priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física atendiendo los puntos críticos que comprometan la estabilidad, drenaje, seguridad y continuidad del tránsito vehicular:

Tabla 7. Circuitos Lote 4 – Magdalena Medio.

ID	CIRCUITO	LONGITUD	SUBREGIÓN	CÓDIGO (S) EN VÍA
2	La Ye - Yondó	30	Magdalena Medio	62AN29-1
6	Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío	25	Magdalena Medio	62AN29

2.2.4. Alcance Lote 5 – Suroeste

El proyecto tiene como propósito realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social, ambiental y en seguridad y salud en el trabajo a las actividades de mejoramiento, mantenimiento y estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia descritas en

la siguiente tabla, de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, estudios, manuales y/o lineamientos definidos por la Secretaría de Infraestructura Física en el marco del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 4600018494 de 2025.

Las intervenciones se desarrollarán sobre los segmentos específicos de las vías a continuación relacionadas, priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física atendiendo los puntos críticos que comprometan la estabilidad, drenaje, seguridad y continuidad del tránsito vehicular:

Tabla 8. Circuitos Lote 5 – Suroeste

ID	CIRCUITO	SUBREGIÓN	CÓDIGO (S) EN VÍA
18	Abejorral - Santa Barbara	Oriente-Suroeste	56AN05-2
20	Titiribí - Armenia	Suroeste-Occidente	60AN08-1
21	Salgar - La Quiebra - Concordia	Suroeste	60AN05-1
22	Valparaíso - Támesis	Suroeste	25AN01-2
23	Andes - San José - Pueblo Rico	Suroeste	60AN04-1

2.2.5. Alcance Lote 6 – Nordeste

El proyecto tiene como propósito realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social, ambiental y en seguridad y salud en el trabajo a las actividades de mejoramiento, mantenimiento y estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia descritas en la siguiente tabla, de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, estudios, manuales y/o lineamientos definidos por la Secretaría de Infraestructura Física en el marco del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 4600018494 de 2025.

Las intervenciones se desarrollarán sobre los segmentos específicos de las vías a continuación relacionadas, priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física atendiendo los puntos críticos que comprometan la estabilidad, drenaje, seguridad y continuidad del tránsito vehicular:

Tabla 9. Circuitos Lote 6 - Nordeste

ID	CIRCUITO	SUBREGIÓN	CÓDIGO (S) EN VÍA
3	Caramanta - Cristales - San Roque	Nordeste	62AN25
4	San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría	Nordeste-Oriente	62AN22-1, 62AN2-1-1
5	Amalfi - Portachuelos - Santa Isabel	Nordeste	62AN21-4-1

2.2.6. Alcance Lote 7 – Bajo Cauca

El proyecto tiene como propósito realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social, ambiental y en seguridad y salud en el trabajo a las actividades de mejoramiento, mantenimiento y estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia descritas en la siguiente tabla, de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, estudios, manuales y/o lineamientos definidos por la Secretaría de Infraestructura Física en el marco del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 4600018494 de 2025.

Las intervenciones se desarrollarán sobre los segmentos específicos de las vías a continuación relacionadas, priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física atendiendo los puntos críticos que comprometan la estabilidad, drenaje, seguridad y continuidad del tránsito vehicular:

Tabla 10. Circuitos Lote 7 – Bajo Cauca

ID	CIRCUITO	SUBREGIÓN	CÓDIGO (S) EN VÍA
1	Cáceres - La Chilona	Bajo Cauca	25AN15-1

2.2.7. Alcance Lote 8 – Norte

El proyecto tiene como propósito realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social, ambiental y en seguridad y salud en el trabajo a las actividades de mejoramiento, mantenimiento y estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia descritas en la siguiente tabla, de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, estudios, manuales y/o lineamientos definidos por la Secretaría de Infraestructura Física en el marco del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 4600018494 de 2025.

Las intervenciones se desarrollarán sobre los segmentos específicos de las vías a continuación relacionadas, priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física atendiendo los puntos críticos que comprometan la estabilidad, drenaje, seguridad y continuidad del tránsito vehicular:

Tabla 11. Circuitos Lote 8 - Norte

ID	CIRCUITO	SUBREGIÓN	CÓDIGO (S) EN VÍA
7	El Guayabo - El Salto - Partidas a Guadalupe	Norte	62AN21-1-2
8	Carolina del Príncipe - Angostura	Norte	25AN09-1
9	Alto del Cardal - Toledo	Norte	62AN18-3-1
10	Santa Rosa - Carolina del Príncipe	Norte	25AN09
11	Entrerríos - Labores - San José de la Montana	Norte	62AN18-3-1
13	Sopetrán - Horizontes - Belmira	Occidente-Norte	62AN15

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO GENERAL

3.1. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO: 4600018656 DE 2025

OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATISTA: RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN - NIT: 900.285.704-4

PLAZO DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución de la interventoría está estimado en VEINTIÚN (21)MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, de los cuales se tienen UN (1) MES dentro del cual se deberá realizar el desembolso de los recursos y el administrador delegado deberá celebrar los procesos de selección de contratistas y las gestiones correspondientes para el inicio de la ejecución de las interventorías, DIECINUEVE (19) MESES para la ejecución del proyecto, recibo de obras y cierre del proyecto entre el contratista de obra y la interventoría, UN (1) MES para el cierre del contrato entre el mandatario y la entidad contratante.

FECHA DE INICIO: 03 DICIEMBRE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 03 SEPTIEMBRE 2027

VALOR INICIAL: CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M.L ($ 58.743.460.670) que corresponden a:

- Recursos a administrar correspondientes a costos directos del proyecto por CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($52.482.044.360).

-Gastos administrativos de Rentan por MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINCE PESOS ($ 1.889.662.015) dividido en:

-$1.707.353.131 Costos de personal asociados al proyecto.

-$182.308.884 Provisión ajuste de salarios

- Honorarios del 7% sobre el valor de los costos directos por TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCO PESOS ($ 3.673.743.105) - IVA sobre el valor de los honorarios por SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES ONCE MIL CIENTO NOVENTA PESOS ($ 698.011.190).

3.2. INFORMACION DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DE INTERVENTORIA

3.2.1. Lote 1 - Oriente

CONTRATO: N/A

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN ORIENTE (LOTE 1) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATANTE: N/A

CONTRATISTA: N/A

PLAZO: EL PLAZO SERÁ CATORCE (14) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

VALOR CONTRATO: OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($ 8.278.217.760) IVA INCLUIDO.

FECHA DE INICIO: SE DECLARÓ DESIERTO

FECHA DE TERMINACIÓN: N/A

3.2.2. Lote 2 - Occidente

CONTRATO: 20260072

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE (LOTE 2) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTRATANTE: RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN

CONTRATISTA: CONSORCIO TEMPORALES – NIT 902.022.661-5

PLAZO: EL PLAZO SERÁ DIECINUEVE (19) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

VALOR CONTRATO: SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($7.853.071.898) IVA INCLUIDO

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 23/12/2025

FECHA DE INICIO: 23/01/2026

FECHA DE TERMINACIÓN: 23/08/2027

3.2.3. Lote 3 - Urabá

CONTRATO: 20250429

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTRATANTE: RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN

CONTRATISTA: GRUPO INTECON S.A.S - NIT 901.616.027-1

PLAZO: EL PLAZO SERÁ DIECINUEVE (19) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

VALOR CONTRATO: NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/L ($9.595.864.128) IVA INCLUIDO

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 23/12/2025

FECHA DE INICIO: 19/01/2026

FECHA DE TERMINACIÓN: 19/08/2027

3.2.4. Lote 4 – Magdalena Medio

CONTRATO: 20260064

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN MAGDALENA MEDIO (LOTE 4) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTRATANTE: RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA – NIT 902.021.514-6

PLAZO: EL PLAZO SERÁ DIECISIETE (17) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

VALOR CONTRATO: CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/L ($4.769.992.811) IVA INCLUIDO

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 23/12/2025

FECHA DE INICIO: 20/01/2026

FECHA DE TERMINACIÓN: 20/06/2027

3.2.5. Lote 5 - Suroeste

CONTRATO: 20260029

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTRATANTE: RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN

CONTRATISTA: SANDING GROUP S.A.S NIT 901.192.745-1

PLAZO: EL PLAZO SERÁ DE TRECE (13) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

VALOR CONTRATO: CINCO MIL NOVECIENTO SESENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRECE PESOS ($5.960.752.013) IVA INCLUIDO

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 30/12/2025

FECHA DE INICIO: 14/01/2026

FECHA DE TERMINACIÓN: 14/02/2027

3.2.6. Lote 6 - Nordeste

CONTRATO: 20260028

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN NORDESTE (LOTE 6) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTRATANTE: RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN

CONTRATISTA: ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S – NIT 890.929.122-8

PLAZO: EL PLAZO SERÁ CATORCE (14) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

VALOR CONTRATO: CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($4.671.615.946) IVA INCLUIDO

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 30/12/2025

FECHA DE INICIO: 14/01/2026

FECHA DE TERMINACIÓN: 14/03/2027

3.2.7. Lote 7 – Bajo Cauca

CONTRATO: 20260058

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA (LOTE 7) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTRATANTE: RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN

CONTRATISTA: SODINCO S.A.S - NIT 800.250.173

PLAZO: EL PLAZO SERÁ DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

VALOR CONTRATO: MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VENTIDÓS PESOS M/L ($1.854.347.722) IVA INCLUIDO

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 29/12/2025

FECHA DE INICIO: 19/01/2026

FECHA DE TERMINACIÓN: 19/01/2027

3.2.8. Lote 8 - Norte

CONTRATO: 20260060

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN NORTE (LOTE 8) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTRATANTE: RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIALES 2025 - NIT 902.021.224-5

PLAZO: EL PLAZO SERÁ DE DIECINUEVE (19) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

VALOR CONTRATO: NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y DOS PESOS ($9.498.182.082) IVA INCLUIDO

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 30/12/2025

FECHA DE INICIO: 15/01/2026

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/08/2027

4. SEGUIMIENTO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO

Durante el periodo objeto del presente informe, se tienen activos doce (12) circuitos de veintinueve (29), los cuales se pueden ver a continuación:

Tabla 12. Circuitos activos a marzo de 2026

ID	CIRCUITO	LONGITUD	SUBREGIÓN	ESTADO
1	Cáceres - La Chilona	25	Bajo Cauca	Activo
2	La Ye - Yondó	30	Magdalena Medio	Inactivo
3	Caramanta - Cristales - San Roque	20.64	Nordeste	Activo
4	San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría	25.72	Nordeste-Oriente	Activo
5	Amalfi - Portachuelos - Santa Isabel	10	Nordeste	Inactivo
6	Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío	25	Magdalena Medio	Activo
7	El Guayabo - El Salto - Partidas a Guadalupe	10.61	Norte	Inactivo
8	Carolina del Príncipe - Angostura	13.62	Norte	Inactivo
9	Alto del Cardal - Toledo	15	Norte	Inactivo
10	Santa Rosa - Carolina del Príncipe	33.67	Norte	Activo
11	Entrerríos - Labores - San José de la Montana	39.95	Norte	Activo

ID	CIRCUITO	LONGITUD	SUBREGIÓN	ESTADO
12	Ebéjico - Heliconia - Medellín	28.76	Occidente	Inactivo
13	Sopetrán - Horizontes - Belmira	39.59	Occidente-Norte	Activo
14	Frontino - Nutibara	23.62	Occidente	Activo
15	La Quiebra - Santa Ana	5.33	Oriente	Inactivo
16	San Vicente - El Peñol	18.15	Oriente	Inactivo
17	Abejorral - La Frontera	25.49	Oriente	Inactivo
18	Abejorral - Santa Barbara	26.2	Oriente-Suroeste	Inactivo
19	Sonsón - Aguadas (Puente San Rafael)	19.22	Oriente	Inactivo
20	Titiribí - Armenia	10	Suroeste-Occidente	Inactivo
21	Salgar - La Quiebra - Concordia	15.93	Suroeste	Activo
22	Valparaíso - Támesis	22.51	Suroeste	Activo
23	Andes - San José - Pueblo Rico	22.39	Suroeste	Activo
24	Mutatá - Pavarando	10	Urabá	Inactivo
25	San Pedro de Urabá - Necoclí	58.65	Urabá	Activo
26	San Pedro de Urabá - Arboletes	30	Urabá	Inactivo
27	San Pedro - El Tres - Turbo	22	Urabá	Inactivo
28	Ebéjico - Miserenga	1	Occidente	Inactivo
29	Guarne - Yolombal	5	Oriente	Inactivo

Durante el periodo objeto del presente informe, se ha mantenido una asistencia constante y participación activa en los comités técnicos convocados por la Gobernación de Antioquia - SIF, así como en las sesiones de seguimiento técnico desarrolladas entre la Interventoría y el Contratista de Obra para abordar temas puntuales de cada lote y/o circuito.

Asimismo, se ha participado en las mesas técnicas conjuntas integradas por la Gobernación de Antioquia - SIF, Argos, VIVVA, Rentan, la Interventoría y el Contratista de Obra, puntualmente, para la coordinación previa a las actividades de estabilización donde se requiere llevar a cabo una etapa de alistamiento logístico para cada lote y/o circuito acorde a las características propias de los territorios; además de las estimaciones conforme a los ensayos de laboratorio.

En cuanto al componente operativo, se realiza un acompañamiento técnico permanente a las interventorías. Esta labor incluye la revisión de informes semanales, la consolidación de los mismos y envió a la Gobernación de Antioquia - SIF.

Finalmente, se han adelantado las gestiones necesarias para dar trámite oportuno a la correspondencia y requerimientos administrativos entre las interventorías y la Gobernación de Antioquia - SIF.

- **Lote 2 – Occidente**

Circuito: Sopetrán – Horizontes – Belmira

Durante el periodo reportado, la Interventoría de Occidente (Consorcio Temporales) desarrolló actividades de seguimiento técnico a las actividades que el Contratista de Obra viene realizando en el circuito: conformación y ampliación de la vía, levantamiento topográfico por interventoría, apiques, limpieza de obras de drenaje transversales.

- Programa de obra: a la fecha no se cuenta con programa de obra aprobado por la interventoría, ya que se encuentra en ajustes por observaciones emitidas por el Interventor.
- Conformación y ampliación de la vía: si bien el contratista de obra esta realizando dicha actividad, en diferentes Comités Técnicos se ha expresado esta situación, la cual esta se encuentran en proceso de validación por parte de la Secretaría de Infraestructura Física – SIF, en relación con su alcance, condiciones de ejecución y reconocimiento dentro del contrato.
- Limpieza de obras de drenaje transversales: para el circuito en mención se ha adelantado la ejecución de 1.834,09 metros de limpieza de estas obras.
- Apiques: se adelantan los apiques en el corredor.

Circuito: Frontino – Nutibara

Durante el periodo reportado, la Interventoría de Occidente (Consorcio Temporales) desarrolló actividades de seguimiento técnico a las actividades que el Contratista de Obra viene realizando en el circuito: conformación y ampliación de la vía, levantamiento topográfico por interventoría, apiques, limpieza de obras de drenaje transversales.

- Conformación y ampliación de la vía: si bien el contratista de obra esta realizando dicha actividad, en diferentes Comités Técnicos se ha expresado esta situación, la cual esta se encuentran en proceso de validación por parte de la Secretaría de Infraestructura Física – SIF, en relación con su alcance, condiciones de ejecución y reconocimiento dentro del contrato.
- Limpieza de obras de drenaje transversales: para el circuito en mención se ha adelantado la ejecución de 676,25 metros de limpieza de estas obras.
- Apiques: se adelantan los apiques en el corredor.

Como parte integral de este informe, se recomienda revisar el informe técnico mensual del Lote 2 – Occidente: *"GEP-F1310-13 Informe Mensual Técnico (mes 3)"*

- **Lote 3 – Urabá**

Circuito: San Pedro de Urabá - Necoclí

Durante el periodo reportado, la Interventoría de Urabá (Grupo Intecon S.A.S) desarrolló actividades de seguimiento técnico a las actividades que el Contratista de Obra viene

realizando en el circuito: identificación de derrumbes, levantamiento topográfico, apiques, limpieza de alcantarillas, instalación de obras de drenaje transversales.

- Programa de obra: a la fecha no se cuenta con programa de obra aprobado por la interventoría, ya que se encuentra en ajustes por observaciones emitidas por el Interventor.
- Levantamiento topográfico: Se verifican los dos primeros mojones, para garantizar azimut, y distancia. También se toma el ancho de vía cada 10 y 15 metros para obtener anchos promedios cada 100 a 200 metros. Se acompaño en el levantamiento topográfico en el primer tramo en el sector de El Bobal.
- Apiques: se acompañó la realización de 12 apiques entre el PR0+000 y PR2+750. Y se realizan 4 apiques exploratorios en K3+300, K3+550, K3+850 y K4+050.
- Limpieza de obras de drenaje transversales: se acompañó la limpieza de 10 alcantarillas colmatadas las cuales están ubicadas en las abscisas K0+342, K0+680, K0+920, K1+090, K1+300, K1+570, K1+630, K1+780, K2+250 y K2+350. Se demolieron 4 alcantarillas en mal estado K1+728, K2+250, K3+100 y K3+240. Se reemplazó la alcantarilla ubicada en la K1+310 por tubería Novafort de 36".
- Ensayos de laboratorio: Se verificó mediante los certificados emitidos por los laboratorios el cumplimiento de la normativa técnica de los materiales granulares utilizados, así mismo, el certificado de calidad de la tubería Novafort de 36".
- Se han realizado reuniones con la Administración Municipal de Necoclí, para identificar particularidades técnicas frente a redes de servicios públicos u otras obras en el sector El Bobal. Además, el Contratista de Obra está realizando actas de vecindad en el sector mencionado entre el PR0+000 y PR0+300. También se avanza en actas de vecindad en el corregimiento de Pueblo Nuevo en el tramo K0+000 a K17+000.

Frente a los demás circuitos del lote 3, las actividades son incipientes, por ejemplo, se están realizando actividades de reconocimiento de puntos críticos, identificación de pérdidas de banca y funcionamiento de obras transversales.

Como parte integral de este informe, se recomienda revisar el informe técnico mensual del Lote 3 – Urabá: *"GEP-F1310-13 Informe Mensual Técnico No. 03 Lote 3 - Marzo 2026."*

- **Lote 4 – Magdalena Medio**

Circuito: Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío

Durante el periodo reportado, la Interventoría de Magdalena Medio (Consorcio Intervial Antioquia) desarrolló actividades de seguimiento técnico a las actividades que el Contratista de Obra viene realizando en el circuito: levantamiento topográfico, apiques, ensayos de laboratorio, diagnóstico del sistema de drenaje, complementando los inventarios detallados de las obras transversales.

- Programa de obra: a la fecha no se cuenta con programa de obra aprobado por la interventoría, ya que se encuentra en ajustes por observaciones emitidas por el Interventor.
- Levantamiento topográfico: se continua con el levantamiento topográfico, con secciones transversales cada 10 m entre el K2+700 y el K14 + 000. Para un total acumulado del 56% para el circuito.
- Apiques: para la realización de apiques se el contratista de obra esta empleando un retrocargador de llantas, de este modo se tiene un rendimiento de 8 apiques diarios. Al corte del presente informe se tiene un consolidado de cuarenta y cinco (45) apiques; lo que representa un avance general del 45% para el circuito
- Ensayos de laboratorio: El laboratorio Inteinsa Pavimientos viene llevando a cabo los respectivos ensayos para la etapa 1- subrasante (hasta el K6+150) y para la etapa 2 – granulares superficiales (hasta el K11+150).
- Diagnóstico de obras transversales: según el diagnóstico realizado se identificaron 57 alcantarillas de 24" que se encuentran inoperativas, presentando condiciones de obstrucción total, sellamiento o ausencia de flujo hidráulico; por lo cual se recomienda su retiro total. Por otro lado, se identificaron 90 alcantarillas de 24" que requieren ser reemplazadas por alcantarillas de 36 pulgadas, con el fin de mejorar la capacidad hidráulica del sistema y garantizar una adecuada evacuación de las aguas superficiales. En cuanto a las alcantarillas de 36" existentes, 24 unidades requieren sustitución, debido a deterioro estructural y 29 unidades requieren limpieza, para restablecer su capacidad hidráulica.
- En el tramo, se identificaron 23 estructuras tipo box culvert, las cuales presentan buen estado estructural, requiriendo únicamente actividades de limpieza y mantenimiento para asegurar su correcto funcionamiento. Sin embargo, en el punto K0+860 se encuentra un una estructura tipo box culvert que ha perdido una de sus aletas en el descole, situación que ha generado desprotección lateral del terraplén, procesos de socavación progresiva, desbarrancamiento parcial de la banca. Pérdida gradual de material en uno de los costados de la calzada, lo que compromete la estabilidad de la vía en ese punto y se convierte en un punto crítico para el proyecto. Frente a este punto se debe realizar un análisis estructural e hidráulico para determinar la mejor solución, es de aclarar que este análisis o su intervención no esta dentro del alcance contractual ni de obra ni de interventoría.
- Se identifican dos puntos críticos en zonas de inundación. Esto es en el K3+150 y en el K9+100; para lo cual se plantea levantar la rasante de la vía.
- El día 03 de marzo de 2026, se realizó el levantamiento de acta de entorno en los 25 km de vía del tramo Remedios - La Yé - Puerto Berrío. Y el día 12 de marzo de 2026 se realizó socialización del proyecto en la vereda San Juan de Bedout.
- El Plan de Calidad del Proyecto se encuentra en subsanación por parte del Contratista de Obra, dadas las recomendaciones emitidas por la Interventoría; es de aclarar que

las actividades que se ejecuten sin contar con la aprobación previa del Plan de Calidad y de los procedimientos asociados podrán no ser tenidas en cuenta para efectos de control de calidad, seguimiento técnico y eventual recibo de las obras ejecutadas.

Como parte integral de este informe, se recomienda revisar el informe técnico mensual del Lote 4 – Magdalena Medio: *"INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 2."*

- **Lote 5 – Suroeste**

Circuito: Andes - San José - Pueblo Rico

Durante el periodo reportado, la Interventoría de Suroeste (Sading Group S.A.S) desarrolló actividades de seguimiento técnico a las actividades que el Contratista de Obra viene realizando en el circuito: levantamiento topográfico, levantamiento, inventario y limpieza de obras de drenaje transversales y ensayos de campo.

- Programa de obra: a la fecha no se cuenta con programa de obra aprobado por la interventoría, ya que se encuentra en ajustes por observaciones emitidas por el Interventor.
- Levantamiento topográfico: en el circuito se ha realizado el levantamiento de 20 Km para un avance general del 90.17%, es decir, resta un 2.2 Km. Con el levantamiento del corredor, se identifican perdidas de banca, puentes y obras de drenaje transversales.
- Levantamiento e identificación de obras transversales y puntos críticos: con un avance hasta el K14+600; frente a esta actividad, ha permitido que se identifiquen puentes, obras de drenaje transversales y la evaluación de su estado actual; además, de pérdidas de banca y presencia de fallas geotécnicas. Lo anterior, se convertirá en un insumo para el informe del diagnóstico del circuito.
- Limpieza de obras de drenaje transversales: hasta la abscisa K22+000 se han realizado actividades de limpieza en cabezales y descoles mediante la rocería, y frente a la limpieza de tubería se ha logrado limpiar hasta la abscisa K2+000, además de su intervención integral.
- Ensayos de campo: adicional a los apiques realizados, se realizaron ensayos de placa en el circuito para el diseño de la fórmula de estabilización a utilizar en el circuito.

Circuito: Valparaíso – Támesis

Durante el periodo reportado, la Interventoría de Suroeste (Sading Group S.A.S) desarrolló actividades de seguimiento técnico a las actividades que el Contratista de Obra viene realizando en el circuito: levantamiento topográfico y limpieza de obras de drenaje transversales.

- Levantamiento topográfico: en el circuito se iniciaron las labores de levantamiento hasta el K14+00 para un avance general del 62.19%, es decir, restan 8.81 Km. De manera paralela, se identifican las obras de drenaje transversal, puentes y perdidas de banca.

- Limpieza de obras de drenaje transversales: frente a esta actividad, se ha avanzado hasta el K7+000 en labores de limpieza y desmonte de vegetación; para un avance en el corredor del 31.10%.

Circuito: Salgar - La Quiebra - Concordia

Durante el periodo reportado, la Interventoría de Suroeste (Sading Group S.A.S) desarrolló actividades de seguimiento técnico a las actividades que el Contratista de Obra viene realizando en el circuito: levantamiento topográfico y apiques.

- Levantamiento topográfico: se inició con la instalación de mojones y amarre geodésico para garantizar la referencia y control de las labores en el corredor.
- Apiques: a través del laboratorio Inteinsa Pavimentos S.A.S., se vienen adelantando los apiques en el circuito para determinar la fórmula de trabajo de estabilización.

Como parte integral de este informe, se recomienda revisar el informe técnico mensual del Lote 5 – Suroeste: *"Informe_Mensual_Tecnico_#2_Suroeste_L5_Marzo_2026"*

- **Lote 6 – Nordeste**

Circuito: Caramanta - Cristales - San Roque

Durante el periodo reportado, la Interventoría de Nordeste (Arredondo Madrid Ingenieros Civiles S.A.S – AIM S.A.S) desarrolló actividades de seguimiento técnico a las actividades que el Contratista de Obra viene realizando en el circuito: levantamiento topográfico.

- Programa de obra: a la fecha no se cuenta con programa de obra aprobado por la interventoría, ya que se encuentra en ajustes por observaciones emitidas por el Interventor.
- Levantamiento topográfico: en el circuito se tiene un avance físico del 51.00% del corredor, es decir, faltan 10.11 Km.
- El Contratista de Obra no ha continuado con las obras de caracterización en la vía, por lo cual el avance en este aspecto se mantiene en el 24.30%. De manera general, el avance en las actividades de preliminares se mantiene en un avance del 25.10%.

Circuito: San Rafael - San Roque - Santo Domingo – Alejandría

Durante el periodo reportado, la Interventoría de Nordeste (Arredondo Madrid Ingenieros Civiles S.A.S – AIM S.A.S) desarrolló actividades de seguimiento técnico a las actividades que el Contratista de Obra viene realizando en el circuito: caracterización vial.

- Caracterización vial: en el tramo de San Roque – Santo Domingo, se tiene un avance físico del 51.10%, es decir, 6.41 Km de 12.58 Km.

Como parte integral de este informe, se recomienda revisar el informe técnico mensual del Lote 6 – Nordeste: *"1. 31032026_Informe Tecnico_Nordeste Lote 6".*

- **Lote 7 – Bajo Cauca**

Circuito: Cáceres – La Chilona

Durante el periodo reportado, la Interventoría de Bajo Cauca (Sodicon S.AS) desarrolló actividades de seguimiento técnico a las actividades que el Contratista de Obra viene realizando en el circuito: abscisado de la vía, apiques y limpieza de obras de drenaje transversales.

- Programa de obra: a la fecha no se cuenta con programa de obra aprobado por la interventoría, ya que se encuentra en revisión por el Interventor.
- Abscisado de la vía: el contratista ha venido realizando la identificación de los tramos viales a intervenir.
- Apiques: se avanza en los apiques para los ensayos y toma de muestra para estudios de laboratorio, los resultados aún no se han obtenido por parte del laboratorio.
- Limpieza de obras de drenaje transversales: las labores de limpieza permiten el diagnóstico de la obras de drenaje transversales en el corredor, se tienen registro de un poco más 18 obras limpiadas, específicamente en alcantarillas, incluyendo cabezotes, tubería interna, encole, descole, aletas y placa de fondo (solera).
- Se vienen adelantando la gestión social con elaboración de actas de vecindad, especialmente entre el Km20 y el Km23. Es importante mencionar, que la socialización del proyecto que fue programada para el día 25 de marzo, se tuvo que aplazar por afectaciones al orden público y bloqueos, producto del paro minero por parte del Comité por la Vida y la Formalización Minera en la región del Bajo Cauca.
- Como parte integral de este informe, se recomienda revisar el informe técnico mensual del Lote 7 – Bajo Cauca: *"Informe_Mensual_Técnico_No.3 — Bajo Cauca (Lote 7)".*

- **Lote 8 – Norte**

Circuito: Entrerríos - Labores - San José de la Montana

Durante el periodo reportado, la Interventoría de Norte (Consorcio Interviales 2025) desarrolló actividades de seguimiento técnico a las actividades que el Contratista de Obra viene realizando en el circuito: levantamiento topográfico, caracterización vial, limpieza de obras de drenaje transversales e identificación de punto crítico.

- Programa de obra: a la fecha no se cuenta con programa de obra aprobado por la interventoría, ya que se encuentra en ajustes por observaciones emitidas por el Interventor.
- Levantamiento topográfico: el avance acumulado es del 75.09%, es decir, hasta el K30+000 de 39.95 Km.
- Caracterización vial: durante el periodo informado, se culminaron los apiques en el circuito el día 20 de marzo. De manera complementaria se realizaron ensayos de

deflectometría mediante equipo Falling Weight Deflectometer (FWD), con el fin de determinar la capacidad estructural y módulo resiliente de la subrasante existente.

- Limpieza de obras de drenaje transversales: se iniciaron las actividades de mantenimiento de obras de drenaje existentes, que incluyen labores de limpieza de encoles, tuberías y descoles, desmonte de material vegetal, resane de estructuras y ejecución de obras menores. Puntualmente, se han intervenido las ubicadas en K0+003, K0+081, K0+373, K0+439, K0+537 y K0+756
- Se realizó recorrido con el Contratista de Obra, la Interventoría, la Secretaría de Infraestructura municipal y la empresa de acueducto municipal de Entrerríos; para identificar posibles interferencias de las redes existentes y evaluar posibles ajustes o reubicaciones.
- Punto crítico: Se identificó que el puente ubicado en el K4+000 presenta una afectación estructural que requiere de su atención por las entidades competentes.

Circuito: Santa Rosa - Carolina del Príncipe

Durante el periodo reportado, la Interventoría de Norte (Consorcio Interviales 2025) desarrolló actividades de seguimiento técnico a las actividades que el Contratista de Obra viene realizando en el circuito: levantamiento topográfico y caracterización vial.

- Levantamiento topográfico: el avance acumulado es del 54.94%, es decir, hasta el K18+500 para un total de 33.67 Km.
- Apiques: el contratista de obra ha realizado un avance en apiques y toma de muestras para ser analizados en laboratorio hasta el K15+000, es decir, un avance del 44.55%.

Como parte integral de este informe, se recomienda revisar el informe técnico mensual del Lote 8 – Norte: *"INFORME MENSUAL LOTE 8 No2 TÉCNICO (MARZO 2026)"*

4.1.1. Resumen estado del contrato

Actividades de interventoría realizadas por el contratista en el periodo

AVANCE FINANCIERO.

Ejecutado a la Fecha: 0.00%

Programado a la Fecha:

Cumplimiento Avancé del 0.00%

Observación: La Gobernación de Antioquia a la fecha no ha realizado ningún desembolso.

AVANCE FÍSICO.

Ejecutado a la Fecha 18.50%

Programado a la Fecha 18.50%

Cumplimiento Avancé del 18.50%

Observación: El avance físico del mandato, se calcula teniendo en cuenta el tiempo transcurrido del mandato a la fecha de corte del presente informe.

4.1.2. Descripción y cantidades ejecutadas

REGISTRO FOTOGRÁFICO[1]

- **Lote 2 – Occidente**

Circuito: Sopetrán – Horizontes - Belmira



LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES



LIMPIEZA DE OBRA TRANSVERSAL OBRA #63

[1] Las fotografías del presente informe son tomadas de los informes semanales o mensuales remitidos por los Interventores de los siete (7) lotes activos.



LIMPIEZA DE OBRA TRANSVERSAL #61




LIMPIEZA DE OBRA TRANSVERSAL



LIMPIEZA DE OBRA TRANSVERSAL.




LIMPIEZA DE OBRA TRANSVERSAL.

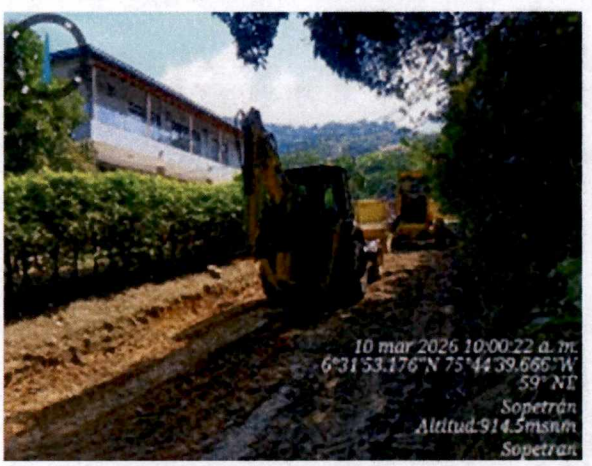
	
LIMPIEZA DE OBRA TRANSVERSAL	LIMPIEZA DE OBRA TRANSVERSAL
	
AMPLIACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL CIRCUITO	AMPLIACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL CIRCUITO



AMPLIACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL CIRCUITO.

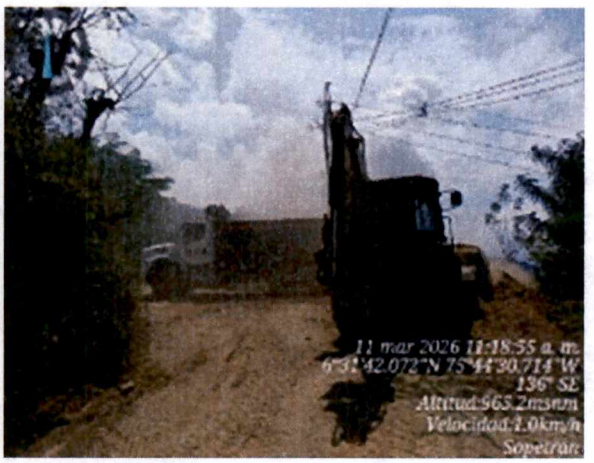

AMPLIACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL CIRCUITO.

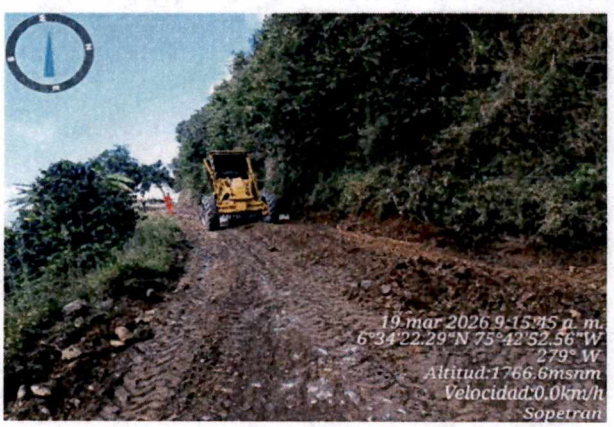

AVANCE EN CONFORMACIÓN DE LA VÍA



AVANCE EN CONFORMACIÓN DE LA VÍA



INICIO LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES FRONTINO - NUTIBARA




LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES FRONTINO - NUTIBARA




IMPLEMENTACIÓN PMT SOPETRÁN – HORIZONTES - BELMIRA




SEÑALIZACIÓN PMT SOPETRÁN – HORIZONTES - BELMIRA

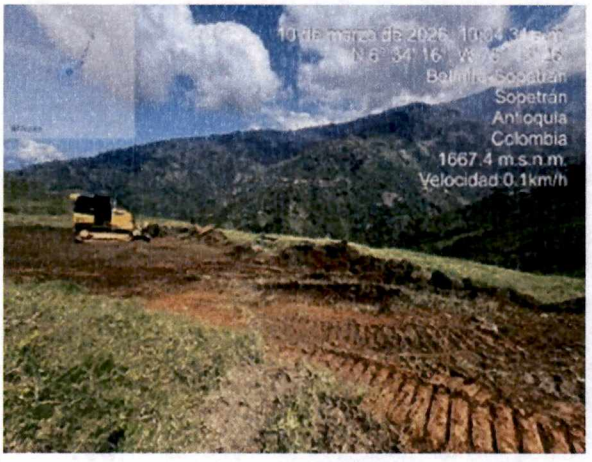

ADECUACIÓN ZONA DE DEPÓSITO SOPETRÁN – HORIZONTES - BELMIRA

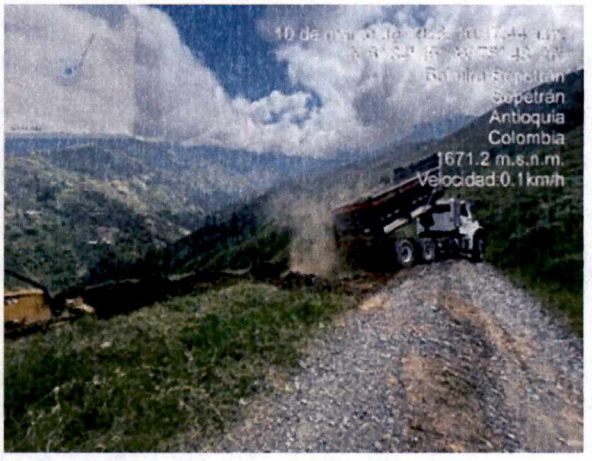

ADECUACIÓN ZONA DE DEPÓSITO SOPETRÁN – HORIZONTES - BELMIRA

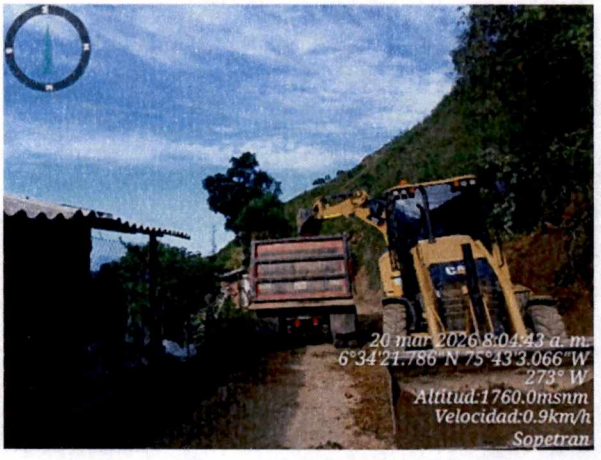


RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.




RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.




CONTINUACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SOPETRÁN – HORIZONTES - BELMIRA

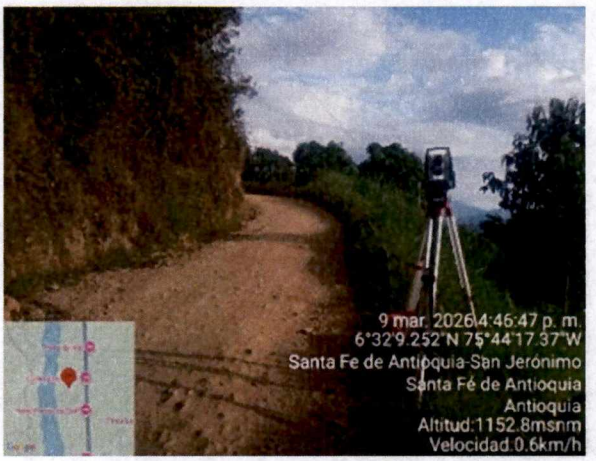

CONTINUACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SOPETRÁN – HORIZONTES - BELMIRA

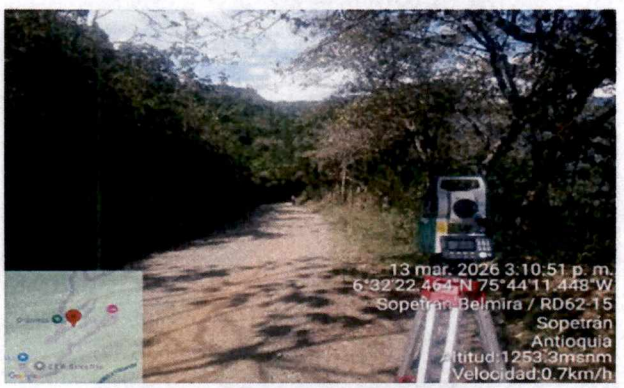

CONTINUACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SOPETRÁN – HORIZONTES - BELMIRA

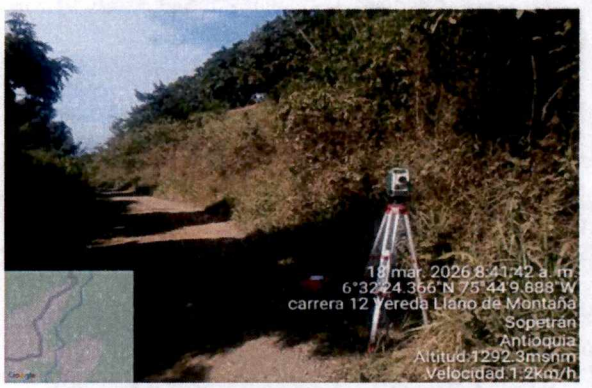

CONTINUACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SOPETRÁN – HORIZONTES - BELMIRA

Circuito: Frontino – Nutibara




SOCIALIZACIÓN FRONTINO - NUTIBARA




SOCIALIZACIÓN FRONTINO - NUTIBARA



LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES FRONTINO - NUTIBARA

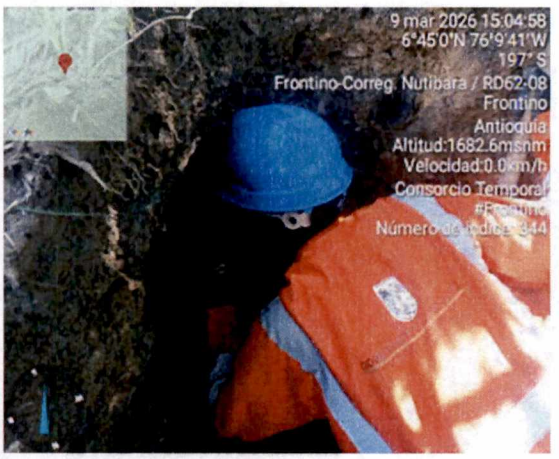


LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES FRONTINO - NUTIBARA

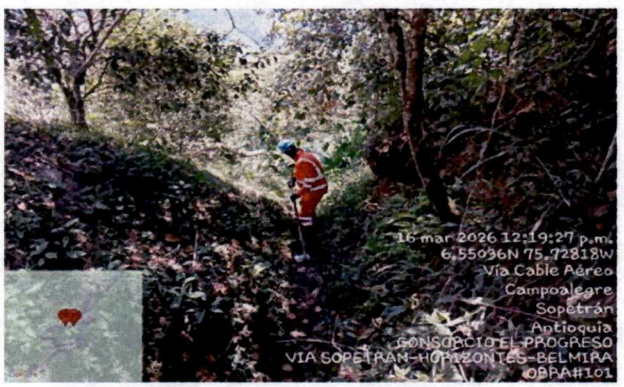

LIMPIEZA DE OBRA TRANSVERSAL # 101




LIMPIEZA DE OBRA TRANSVERSAL # 113



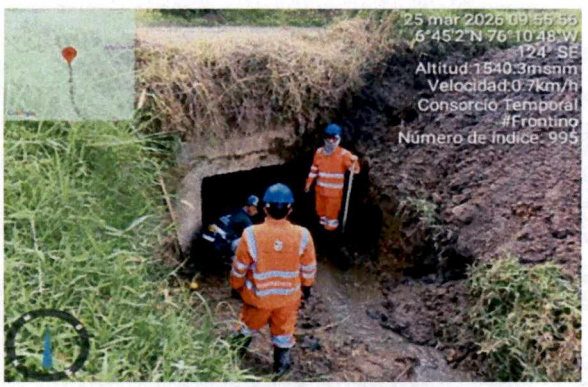


LIMPIEZA DE OBRA TRANSVERSAL





LIMPIEZA DE OBRA TRANSVERSAL

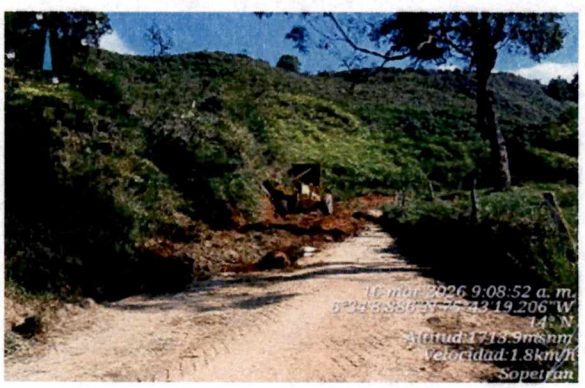	
REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA FRONTINO - NUTIBARA	CONFORMACIÓN DE LA VÍA FRONTINO - NUTIBARA
	
CONFORMACIÓN DE LA VÍA	CONFORMACIÓN DE LA VÍA

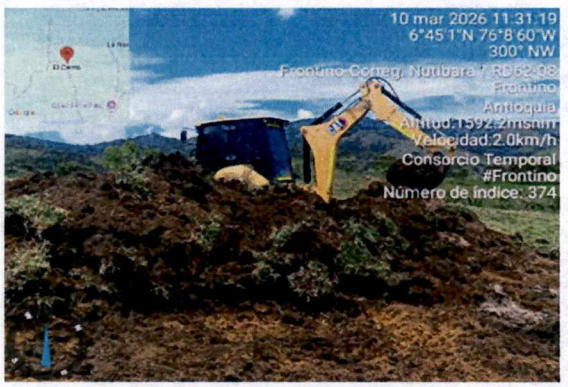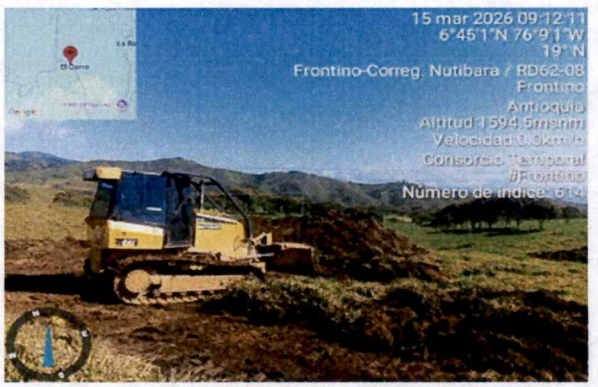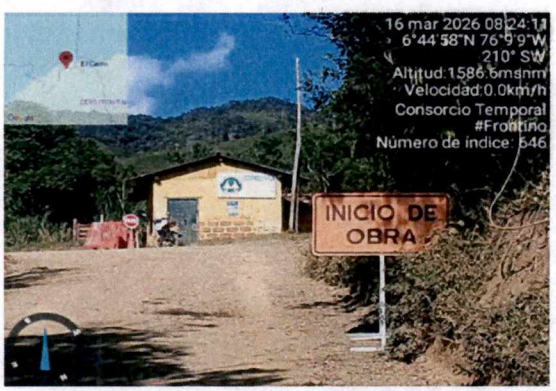	
ADECUACIÓN DE BOTADERO EN FRONTINO - NUTIBARA	ADECUACIÓN DE BOTADERO
	
IMPLEMENTACIÓN PMT FRONTINO - NUTIBARA	SEÑALIZACIÓN PMT FRONTINO - NUTIBARA.

- **Lote 3 – Urabá**

Circuito: San Pedro de Urabá - Necoclí

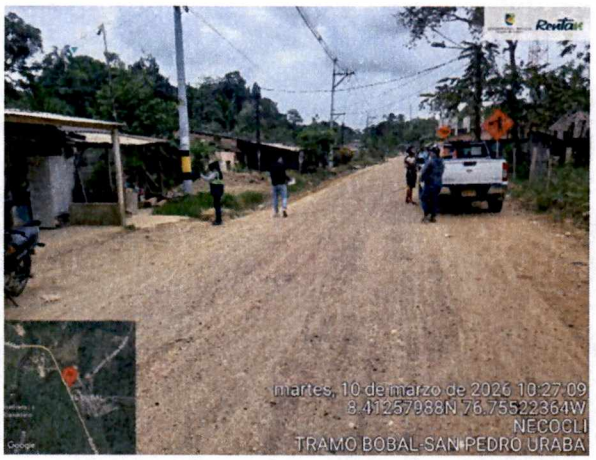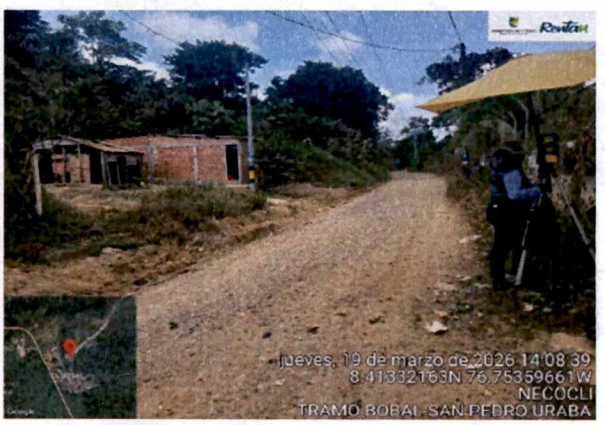	
INICIÓ DE ACTAS DE VECINDAD EN EL SECTOR EL BOBAL.	ACTAS DE VECINDAD EN EL SECTOR EL BOBAL.
	
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN EL CIRCUITO SAN PEDRO DE URABÁ - NECOCLÍ	CONTINUACIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.



LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES



LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES K1+780



LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL EN K2+250



LIMPIEZA ALCANTARILLA K2+250



INSTALACIÓN TUBERÍA 36" PARA OBRA DE DRENAJE K1+130



LLENO EN OBRA DE DRENAJE K1+130



INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT DE 36" EN K2+250



ATRAQUE CON SUB-BASE GRANULAR EN K2+250

- **Lote 4 – Magdalena Medio**

Circuito: Remedios – La Y de la Virgen – Puerto Berrio



EJECUCIÓN DE APIQUE NO. 41.



TOMA DE REGISTRO EN APIQUE REALIZADO.



ACOPIO DE MUESTRAS DE EXTRACCIÓN DE APIQUES.




ACOPIO DE MUESTRAS DE EXTRACCIÓN DE APIQUES.




REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO EN PUERTO BERRIO



REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO EN PUERTO BERRIO




INICIÓ DE DIBUJO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PRIMEROS 5 KM – CIRCUITO REMEDIOS – LA Y – PUERTO BERRIO.



INICIÓ DE DIBUJO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PRIMEROS 5 KM – CIRCUITO REMEDIOS – LA Y – PUERTO BERRIO.

Reutan	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 47 de 73

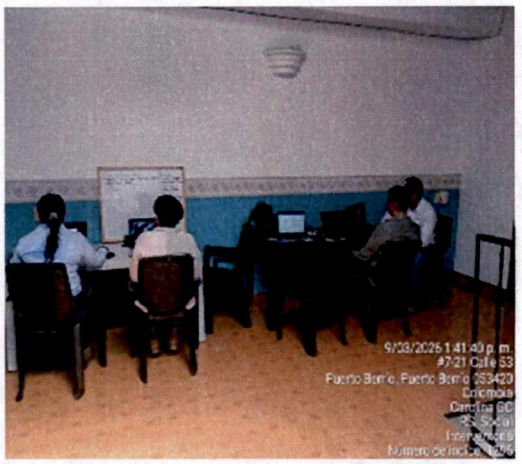

JORNADA DE TRABAJO DE INTERVENTORÍA




MESA DE TRABAJO DE INTERVENTORÍA



RECORRIDO EN CAMPO TRAMO REMEDIOS - LA Y -PUERTO BERRÍO,



LIMPIEZA DE DESCOLE EN ALCANTARILLA K0+900

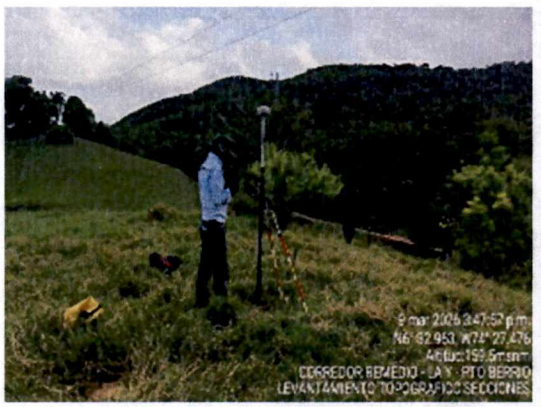

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ABSCISA K6+800.



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO



TOMA DE MUESTRAS EN APIQUE 21



ENSAYO IN SITU EN APIQUE 25

Reutan	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 49 de 73



TOMA DE MUESTRAS EN APIQUE 25.



ENSAYO DE LABORATORIO IN SITU EN APIQUE 25.



VERIFICACIÓN DE DIMENSIONES MÍNIMAS DE APIQUE



TOMA DE MUESTRAS EN APIQUE.

	
SOCIALIZACIÓN EN VEREDA SAN JUAN DE BEDOUT	SOCIALIZACIÓN EN VEREDA SAN JUAN DE BEDOUT
	
REUNIÓN CON LA COMUNIDAD DESDE EL COMPONENTE SOCIAL	REUNIÓN CON LA COMUNIDAD DESDE EL COMPONENTE SOCIAL



ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD



INSTALACIÓN DE CARTELERA INFORMATIVA DEL PROYECTO.



MESA TÉCNICA EN CAMPO SIF - INTERVENTORÍA - CONTRATISTA DE OBRA



MESA TÉCNICA EN OFICINA SIF - RENTAN - INTERVENTORÍA - CONTRATISTA DE OBRA

- **Lote 5 – Suroeste**

Circuito: Andes - San José - Pueblo Rico



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN ANDES – SAN JOSÉ - PUEBLO RICO



CONTINUACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.



INVENTARIO OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSALES



CONTINUACIÓN DE INVENTARIO DE OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL

	
LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE VÍA ANDES – SAN JOSÉ - PUEBLO RICO	CONTINUACIÓN DE LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES.

Circuito: Valparaíso – Támesis


	
APIQUE 79 EN CIRCUITO VALPARAÍSO - TÁMESIS	AVANCE EN REALIZACIÓN DE APIQUE 72



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN CIRCUITO VALPARAÍSO - TÁMESIS.



CONTINUACIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.

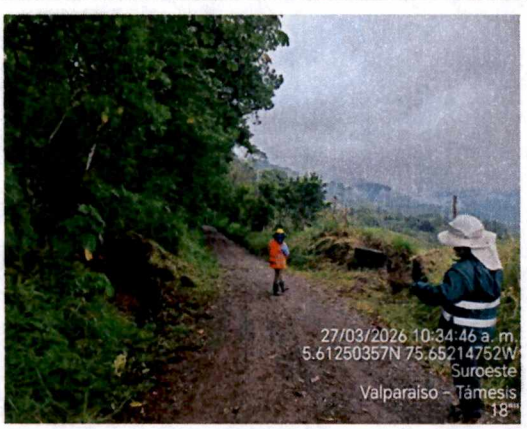

INVENTARIO DE OBRAS EXISTENTES VÍA VALPARAÍSO – TÁMESIS – TUBERÍA DE 18".



INVENTARIO DE OBRAS EXISTENTE VÍA VALPARAÍSO – TÁMESIS K6+615.


	
LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL EN VALPARAÍSO – TÁMESIS.	LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL

Circuito: Salgar - La Quiebra - Concordia

	
REALIZACIÓN APIQUE 49 – SALGAR – LA QUIEBRA - CONCORDIA.	REALIZACIÓN APIQUE 50 EN EL CIRCUITO.

- **Lote 6 – Nordeste**

Circuito: Caramanta - Cristales - San Roque

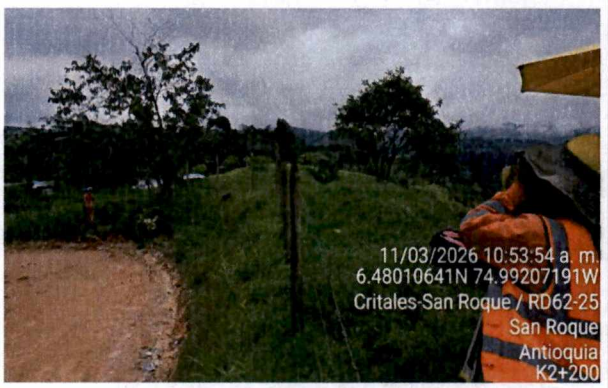

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CIRCUITO CARAMANTA – CRISTALES – SAN ROQUE – K2+200



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CIRCUITO CARAMANTA – CRISTALES – SAN ROQUE – K9+510



ACTIVIDADES DE ACTAS DE VECINDAD K13+150



ACTIVIDADES DE ACTAS DE VECINDAD

Circuito: San Rafael - San Roque - Santo Domingo – Alejandría



APIQUE SECTOR SAN RAFAEL – SAN ROQUE K5+080



REALIZACIÓN DE ENSAYO PDC K5+080



REALIZACIÓN DE ENSAYO PDC K6+040



REALIZACIÓN DE ENSAYO CBR INALTERADO K8+000

- **Lote 7 – Bajo Cauca**


Circuito: Cáceres – La Chilona



APIQUE K0+500 CÁCERES – LA CHILONA



CONTROL DE APIQUES EN CÁCERES – LA CHILONA

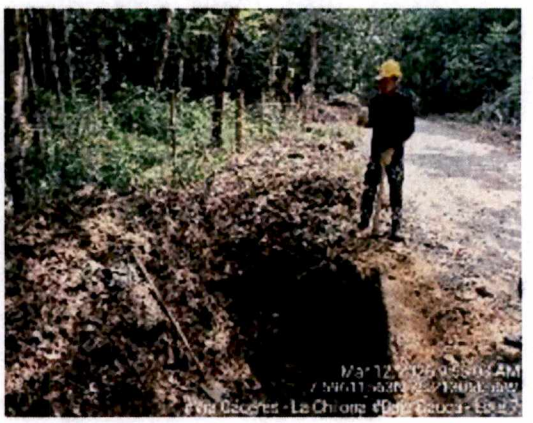	
ESTADO DE LAS OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL EN CÁCERES – LA CHILONA	ESTADO DE LAS OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSALES
	
LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSALES	LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES

- **Lote 8 – Norte**

Circuito: Entrerríos - Labores - San José de la Montana



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CONDICIÓN INICIAL DE LA VÍA K0+000 AL K26+000



CONTINUACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CONDICIÓN INICIAL DE LA VÍA K0+000 AL K26+000



EXPLORACIÓN MEDIANTE APIQUES EN EL CORREDOR COMPRENDIDO ENTRE EL K0+000 Y K12+700



CONTINUACIÓN DE APIQUES ENTRE K0+000 Y K12+700



CONTINUACIÓN APIQUES ENTRE EL K12+700 Y K39+990.



CONTINUACIÓN APIQUES ENTRE EL K12+700 Y K39+990.



ESTADO INICIAL DE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL EN EL CIRCUITO ENTRERRÍOS – LABORES – SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA.



LIMPIEZA DE OBRA TRANSVERSAL EN EL CIRCUITO ENTRERRÍOS – LABORES – SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA.




ATENCIÓN PROVISIONAL DE PUNTO CRÍTICO EN PUENTE K4+000



PUENTE EN K4+000 CON MEDIDA PREVENTIVA PARA TRÁNSITO.

Rentan	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 61 de 73

Circuito: Santa Rosa - Carolina del Príncipe

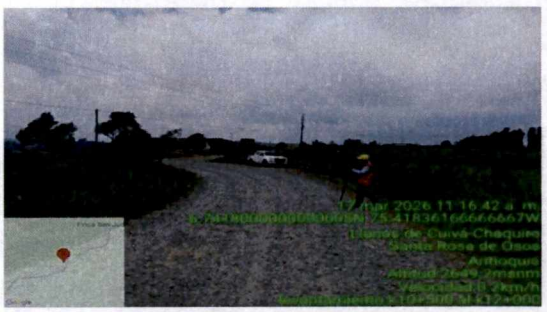	
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ENTRE EL K0+000 Y EL K0+500	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ENTRE EL K0+500 Y EL K12+000
	
REALIZACIÓN DE APIQUE 47 - K11+650.	ENSAYOS EN CAMPO EN APIQUE 64 - K15+900

4.2 ACTAS DE PAGO

Tabla 13. Acta de pagos

CONTROL FINANCIERO					
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR CONTRATO**	**VALOR PAGO/ DESEMBOLSO**	**VALOR NETO A PAGAR**	**SALDO**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
TOTALES					

4.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

4.3.1. Información y control del personal

4.3.1.1 PERSONAL ACTIVO

Tabla 14. Talento humano contratado

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	ESTADO
Sebastián Balbín Vahos	1.152.202.703	Profesional estructurador de proyectos	02-01-2026	Activo
Francisco Luis Franco Munera	70.137.673	Ingeniero civil coordinador	26-01-2026	Activo
Andres Felipe Orozco Arboleda	1.037.604.290	Ingeniero civil de apoyo	30-01-2026	Activo
María Isabel Hernández Guzmán	1.007.472.059	Profesional ambiental	30-01-2026	Activo
Deisy Caterine Hernández Urrego	1.035.428.631	Profesional social	25-03-2026	Activo
Sura Paola Lopera Ruiz	1.040.502.716	Profesional SST	25-03-2026	Activo

4.3.1.2. PERSONAL RETIRADO

Tabla 15. Personal retirado

NOMBRE	CARGO	FECHA DE RETIRO	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A

4.4. SEGUIMIENTO LEGAL

4.4.1. PÓLIZAS Y/O GARANTÍAS

Tabla 16. Pólizas y/o garantías

No. Póliza	Producto	Información del tomador	Información del beneficiario y/o asegurado
16984704	Seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales (Garantía única)	Renting de Antioquia	Departamento de Antioquia Secretaria de Infraestructura Física

Nota: Se anexa póliza y garantía – Ver Anexo 1.

4.4.2. CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL

Tabla 17. Control de aportes y seguridad social

NOMBRE	CÉDULA	PERIODO	# DE PLANILLA	APORTE SALUD	APORTE PENSIÓN	APORTE A ARL	TOTAL
Sebastián Balbín Vahos	1.152.202.703	Marzo 2026	6006097464	$475.000	$608.000	$19.900	$1.102.900
Francisco Luis Franco Munera	70.137.673	Marzo 2026	36785601	$500.000	$640.000	$ -	$1.140.000
Andres Felipe Orozco Arboleda	1.037.604.290	Marzo 2026	83774361	$329.000	$421.200	$ -	$750.200

NOMBRE	CÉDULA	PERIODO	# DE PLANILLA	APORTE SALUD	APORTE PENSIÓN	APORTE A ARL	TOTAL
María Isabel Hernández Guzmán	1.007.472.059	Marzo 2026	9501596448	$329.000	$421.100	$ -	$750.100
Deisy Caterine Hernández Urrego	1.035.428.631	Marzo 2026	9502710016	$32.200	$128.500	$55.900	$216.600
Sura Paola Lopera Ruiz	1.040.502.716	Marzo 2026	9502710016	$32.200	$128.500	$55.900	$216.600

Nota 1: La ARL de los profesionales Francisco Franco, Andres Orozco y María Isabel Hernández son causadas por RENTAN. – Ver Anexo 2.

4.5. SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante el periodo evaluado, la supervisión ejerció seguimiento y control a la gestión desarrollada por la interventoría, verificando el cumplimiento de sus obligaciones en materia de SST frente al contrato de obra. Este proceso se llevó a cabo mediante la revisión de informes, validación de soportes documentales y asesoría técnica, con el propósito de asegurar que la interventoría realizara una vigilancia efectiva sobre las condiciones de seguridad en los diferentes frentes de trabajo.

La supervisión se enfocó en evaluar la calidad y oportunidad del seguimiento realizado por la interventoría en aspectos críticos como la identificación y control de riesgos asociados a actividades de iniciación del proyecto, operación de maquinaria pesada, manejo de tránsito en zonas intervenidas, verificando la actualización de las matrices de riesgo.

Asimismo, se verificó que la interventoría exigiera al contratista el cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo; la implementación del Sistema de Gestión de SST; la realización de capacitaciones de ingreso, como la inducción al personal nuevo; la entrega de elementos de protección personal; las afiliaciones al sistema de seguridad social; la práctica de exámenes médicos ocupacionales; y la adopción de medidas preventivas y correctivas orientadas a la mitigación de los riesgos laborales que puedan presentarse en esta fase inicial en todos los lotes activos al momento.

Como resultado, se evidenció que la supervisión contribuyó al fortalecimiento del control técnico sobre el componente SST, garantizando que la interventoría cumpliera adecuadamente su rol

de vigilancia y control, y promoviendo la mejora continua en las condiciones de seguridad de las actividades ejecutadas en el marco del contrato.

En conclusión, la supervisión del componente SST permitió asegurar la correcta articulación entre contratista e interventoría, fortaleciendo el cumplimiento normativo, la gestión del riesgo y la implementación de acciones preventivas en las actividades de mejoramiento y estabilización vial.

Ver informe: Informe SST Mandato_Marzo_10_04_2026

4.6. SEGUIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

En el marco del apoyo a la interventoría en el componente ambiental, se llevaron a cabo diversas actividades orientadas al fortalecimiento del seguimiento y cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Gobernación. En este sentido, el día 4 de marzo se participó en una reunión realizada en la Gobernación, en la cual se socializaron y explicaron en detalle los lineamientos de la guía socioambiental, brindando claridad sobre los criterios, requisitos y alcances que deben ser tenidos en cuenta en la ejecución de los proyectos.

Posteriormente, el día 13 de marzo se asistió a una reunión con la Dirección Ambiental de la Gobernación, cuyo propósito fue definir y unificar el formato del informe ambiental que debe ser presentado por las diferentes interventorías. Este espacio permitió resolver inquietudes, ajustar aspectos técnicos y establecer directrices claras para la correcta elaboración y presentación de dichos informes.

De igual manera, desde la supervisión se brindó acompañamiento permanente a cada una de las interventorías durante el mes de marzo, apoyando en la atención y resolución de dudas, la revisión detallada de informes ambientales y el manejo de las diferentes situaciones que se presentaron en el desarrollo de sus actividades. Este acompañamiento contribuyó a garantizar la calidad de la información reportada, así como el adecuado cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos.

Ver informe: Informe Ambiental Mandato_ Marzo_10_04_2026

4.7. SEGUIMIENTO GESTIÓN SOCIAL

Se adelantó el seguimiento a las acciones sociales implementadas en los diferentes lotes, promoviendo el adecuado relacionamiento con las comunidades, la articulación institucional y el cumplimiento de los lineamientos establecidos para el desarrollo del proyecto.

Se realizó la revisión detallada de los informes mensuales de interventoría correspondientes a los lotes Urabá (Lote 3), Magdalena (Lote 4), Suroeste (Lote 5), Nordeste (Lote 6), Bajo Cauca (Lote 7) y Norte (Lote 8), con énfasis en la identificación de avances, cumplimiento de actividades, gestión social, relacionamiento comunitario, manejo de actores y principales hallazgos del componente social. A partir de este análisis, se consolidó el informe mensual

correspondiente al mes de marzo, integrando los aspectos más relevantes y las observaciones identificadas.

Adicionalmente, se gestionó y mantuvo comunicación constante con los profesionales sociales de cada uno de los lotes y con el equipo social de la Gobernación de Antioquia, con el propósito de resolver inquietudes, unificar criterios, realizar seguimiento a las actividades en territorio y articular acciones que contribuyan al adecuado avance del componente social dentro del proyecto.

Ver informe: Informe Social Mandato_Marzo_10_04_2026.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Predomina la fase preliminar y de diagnóstico: La mayoría de los lotes activos (2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) se encuentran concentrados en labores de alistamiento y caracterización, tales como levantamientos topográficos, ejecución de apiques y limpieza de obras de drenaje. Se destaca que, a la fecha de corte, ninguno de los lotes cuenta con un programa de obra aprobado, ya que todos se encuentran en proceso de ajuste tras las observaciones de la interventoría.

- La infraestructura de drenaje: Existe un avance significativo en la limpieza de obras de drenaje y diagnóstico de sistemas de drenaje transversal en todas las subregiones. Sin embargo, a medida que se diagnostican las obras, se avanza en actividades correspondientes a ensayos de laboratorio, y levantamiento topográfico, se identifica la necesidad de analizar presupuestalmente los corredores para definir las actuaciones a implementar frente a las mismas (e.g. reemplazo, limpieza u otra acción).

- Identificación temprana de puntos críticos: El seguimiento técnico ha permitido detectar fallas estructurales que requieren atención especializada fuera del alcance inicial. Por ejemplo, en el Lote 8 (Norte) se identificó una afectación estructural en un puente del K12+200 de Entrerríos – Labores – San José de la Montaña - (abscisa K4+000 del proyecto), en el Lote 4 (Magdalena Medio) se identificó un box culvert con socavación progresiva (K0+860) que compromete la estabilidad de la vía. De esta manera, cada lote analiza las particularidades de los circuitos conforme a la condición actual de las vías.

- Las Interventorías están en continua interacción con los Contratistas de Obra mediante Comités Técnicos de Obra, intercambio de comunicados, y participación conjunta en

Comités Técnicos de Seguimiento con la Gobernación de Antioquia – SIF. Así mismo, la comunicación entre las Interventorías, RENTAN y la SIF.

6. ANEXOS

6.1 Correspondencia enviada

Tabla 18. Correspondencia enviada del mes de marzo

ID	RADICADO	ASUNTO	DESTINATARIO
1	1300 0438	Aprobación de hojas de vida para el contrato de Interventoría No. 20260072.	CONSORCIO TEMPORALES
2	1300 0455	Aprobación de hoja de vida de Director de Interventoría para el contrato de Interventoría No. 20260072	CONSORCIO TEMPORALES
3	1300 0468	Solicitud gestión de anticipo - Lote Occidente	CONSORCIO TEMPORALES
4	1300 0469	Solicitud gestión de anticipo - Lote Nordeste	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM)
5	1300 0480	Respuesta a oficio con radicado 2026030052739 Inicio de contrato de obra 4600018656 de 2025 del cual se ejerce interventoría a través del contrato 25OO111B2823.	Juan Diego Aguirre
6	1300 0551	TRASLADO DE ACTA DE PRECIOS NO PREVISTOS OCCIDENTE	Juan Diego Aguirre
7	1300 0552	SOLICITUD DE INFORMACION DE ESTUDIO DE TRANSITO URABA	Juan Diego Aguirre
8	1300 0559	Traslado comunicado existencia de redes de acueducto y sistemas de riego en el corredor Sopetrán –Horizontes – Belmira	Juan Diego Aguirre
9	1300 0560	Respuesta a la comunicación 183-1360-0037-2026	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM)
10	1300 0561	Respuesta a la comunicación 183-1360-0150-2026	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM)
11	1300 0563	Respuesta a solicitud de Tramite comunicación Consorcio Constructor 11 San Roque E-017-2026 radicado (AIM 0045-2026), solicitud entrega de Estudios de Tránsito Lote 6 - Nordeste	Juan Diego Aguirre
12	1300 0573	Aprobación de hojas de vida para el contrato de Interventoría No. 20260072	CONSORCIO TEMPORALES
13	1300 0579	Respuesta a la comunicación con radicado 1300 0560 del 13/03/2026.	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM)

14	1300 0580	Remisión de solicitud de entrega de materiales (cemento y cal) del Contratista Suroeste L5 para ensayos de laboratorio sobre caracterización y formulación de mezclas.	Juan Diego Aguirre
15	1300 0581	Remisión de oficio de interventoría con asunto ¨ Reiteración solicitud entrega Programa de Obra ajustado – Posible incumplimiento contractual¨	Juan Diego Aguirre
16	1300 0582	Remisión solicitud de actualización del presupuesto PMA – Oficio 156457 Contratista de Obra	Juan Diego Aguirre
17	1300 0588	Remisión solicitud de datos e información para trámite de concesión de aguas superficiales – oficio 156437 contratista de obra	Juan Diego Aguirre
18	1300 0590	Traslado de Solicitud de información técnica del contrato de estabilización lote 4 Magdalena medio	Juan Diego Aguirre
19	1300 0617	Traslado : Alcance – Suspensión preventiva de actividades de campo del contrato de obra No. 25OO111B2825	Juan Diego Aguirre
20	1300 0643	Aprobación de hojas de vida para el contrato de Interventoría No. 20260072	CONSORCIO TEMPORALES
21	1300 0697	Respuesta a oficio CIA-20260064-061 Concepto Técnico de Sustentación – Metodología de Muestreo Representativo para Caracterización de Suelos (Lote 4).	Consorcio Intervial Antioquia
22	1300 0704	Respuesta a revisión de Entrega hojas de vida del personal propuesto para el contrato de Interventoría No. 20260029.	SADING GROUP S.A.S.
23	1300 0708	Respuesta a oficio 046 - Entrega programación de interventoría y solicitud activación de personal.	CONSORCIO TEMPORALES

Ver anexo 3. Correspondencia enviada

6.2 Correspondencia recibida

Tabla 19. Correspondencia recibida del mes de marzo

ID	ID RADICADO	REMITENTE	ASUNTO
1	2026030056264	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	Capacitación lineamientos Ambientales – Guía de Manejo Socioambiental
2	CIA-20260064-021	Consorcio Intervial Antioquia	Solicitud activación personal de interventoría
3	INTERURABA-RENTAN-2026-035	GRUPO INTECON S.A.S	Solicitud de piezas comunicacionales editables y material institucional – Contrato Subregión Urabá Lote 3
4	INTERURABA-RENTAN-2026-037	GRUPO INTECON S.A.S	REMISION DE FORMATOS DE CALIDAD
5	CIA-20260064-022	Consorcio Intervial Antioquia	Entrega de documentación para anticipo Lote 4-Magdalena medio-Consorcio Magdalena 787
6	INTERURABA-RENTAN-2026-034	GRUPO INTECON S.A.S	Solicitud formato Preacta Social – Contrato Subregión Urabá Lote 3

7	ISC-014-2026	SODICON S.A.S.	Certificado del interventor para la aprobación del anticipo.
8	183-1360-0150-2026	AIM SAS	Respuesta Comunicación 1300-0373 (AIM 0035-26) Información complementaria a la propuesta Técnico-Económica para servicios de ensayos de laboratorio en el proyecto de Mejoramiento y Mantenimiento Subregión Nordeste (Lote 6).
9	183-1360-0151-2026	AIM SAS	Solicitud de respuesta a la comunicación 183-1360-0037-2026 y definición de pendientes presentados en los comités de seguimiento.
10	CIA-20260064-033	Consorcio Intervial Antioquia	Entrega de informe mensual No 1 de interventoría
11	INTERURABA-RENTAN-2026-043	GRUPO INTECON S.A.S	ENTREGA DE INFORMES SOCIO-AMBIENTALES Y SST No 04
12	INTERURABA-RENTAN-2026-044	GRUPO INTECON S.A.S	ENTREGA DE INFORME TÉCNICO No 04
13	Int – 20260072 – Con - 027	CONSORCIO TEMPORALES	Rta. Solicitud gestión de anticipo lote 2 Occidente.
14	183-1360-0182-2026	AIM SAS	Tramite comunicación Consorcio Constructor 11 San Roque E-017-2026 radicado (AIM 0045-2026), solicitud entrega de Estudios de Tránsito Lote 6 - Nordeste.
15	2026030066335	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	Estructura Legal y Técnica de presentación de Informes Ambiental y Social
16	INTERURABA-RENTAN-2026-052	GRUPO INTECON S.A.S	ENTREGA DEL PLAN CALIDAD DE OBRA
17	INTERURABA-RENTAN-2026-055	GRUPO INTECON S.A.S	ENTREGA INFORME MENSUAL SST No 01 INTERVENTORÍA
18	INTERURABA-RENTAN-2026-056	GRUPO INTECON S.A.S	ENTREGA INFORME MENSUAL SOCIAL No 01 INTERVENTORÍA
19	INTERURABA-RENTAN-2026-057	GRUPO INTECON S.A.S	ENTREGA INFORME MENSUAL AMBIENTAL No 01 INTERVENTORÍA
20	INTERURABA-RENTAN-2026-060	GRUPO INTECON S.A.S	Entrega del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) de obra.
21	INTERURABA-RENTAN-2026-061	GRUPO INTECON S.A.S	ENTREGA INFORME MENSUAL TÉCNICO No 01 INTERVENTORÍA
22	Int – 20260072 – Con - 029	CONSORCIO TEMPORALES	Rta. Comunicado CTO-25OO111B2821-2026-CEP-029-26 No aprobación programación de obra
23	Int – 20260072 – Con - 030	CONSORCIO TEMPORALES	Traslado solicitud de incorporación ítems no previstos.
24	Int – 20260072 – Con - 031	CONSORCIO TEMPORALES	Traslado comunicado existencia de redes de acueducto y sistemas de riego en el corredor Sopetrán – Horizontes – Belmira.
25	INTERURABA-RENTAN-2026-063	GRUPO INTECON S.A.S	ENTREGA DE INFORME SOCIAL-AMBIENTAL-SST INTERVENT No 05

26	INTERSUROESTE-RENTAN-2026-031	Sading Group S.A.S.	INTERSUROESTE-RENTAN-2026-031
27	INTERURABA-RENTAN-2026-062	GRUPO INTECON S.A.S	ENTREGA INFORME TÉCNICO SEMANAL No 05 INTERVENTORÍA
28	183-1360-0190-2026	AIM SAS	Respuesta a la comunicación RENTAN 1300-0469 radicado (AIM 0048-2026), solicitud gestión de anticipo – Lote Nordeste.
29	INTERNORTE-RENTAN-2026-052	CONSROCIO INTERVIALES2025	Traslado de comunicado CVAN-L8-026-2026 con asunto "Solicitud certificación materiales pétreos para la ejecución del contrato de obra."
30	ISC-020-2026	SODICON S.A.S.	Aprobación de personal profesional de obra Bajo Cauca — Lote 7.
31	CIA-20260064-045	CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA	Entrega de Acta mensual No 1 de interventoría.
32	INTERURABA-RENTAN-2026-072	GRUPO INTECON S.A.S	REMISIÓN SOLICITUD DE DATOS E INFORMACIÓN PARA TRÁMITE DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES – OFICIO 156437 CONTRATISTA DE OBRA
33	INTERURABA-RENTAN-2026-073	GRUPO INTECON S.A.S	REMISIÓN SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PMA – OFICIO 156457 CONTRATISTA DE OBRA
34	INTERURABA-RENTAN-2026-074	GRUPO INTECON S.A.S	Entrega Hoja de Vida Profesional Social Lote No 03 Urabá
35	INTERSUROESTE-RENTAN-2026-034	Sading Group S.A.S.	Remisión de solicitud de entrega de materiales (cemento y cal) del Contratista Suroeste L5 para ensayos de laboratorio sobre caracterización y formulación de mezclas.
36	CIA-20260064-054	CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA	Solicitud de información técnica del contrato en referencia
37	CIA-20260064-054	CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA	Solicitud revisión alcance de la comisión de topografía del contrato de interventoría
38	ISC-022-2026	SODICON S.A.S.	Solicitud de aprobación cambio de residente de interventoría.
39	ISC-023-2026	SODICON S.A.S.	Alcance – Suspensión preventiva de actividades de campo del contrato de obra No. 25OO111B2825
40	INTERURABA-RENTAN-2026-073	GRUPO INTECON S.A.S	REMISIÓN SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PMA – OFICIO 156457 CONTRATISTA DE OBRA
41	CIA-20260064-060	Consorcio Intervial Antioquia	Sustentación técnica para el reconocimiento de honorarios del personal de interventoría – Periodo febrero de 2026.
42	INTERNORTE-RENTAN-2026-065	CONSORCIO INTERVIALES 2025.	Entrega Acta de Costos de Interventoría No. 1 – Periodo febrero de 2027
43	INTERURABA-RENTAN-2026-081	GRUPO INTECON S.A.S	Información reunión de inicio de obra – Corredor Necoclí – San Pedro de Urabá

44	INTERURABA-RENTAN-2026-085	GRUPO INTECON S.A.S	Remisión Plan de Gestión Social aprobado – Lote 3 Subregión Urabá
45	CIA-20260064-061	CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA	Concepto Técnico de Sustentación – Metodología de Muestreo Representativo para Caracterización de Suelos (Lote 4).
46	INTERURABA-RENTAN-2026-086	GRUPO INTECON S.A.S	ENTREGA DE INFORME SOCIAL-AMBIENTAL-SST INTERVENT No 06
47	NTERURABA-RENTAN-2026-087	GRUPO INTECON S.A.S	ENTREGA INFORME TÉCNICO SEMANAL No 06 INTERVENTORÍA
48	INTERSUROESTE-RENTAN-2026-041	SADING GROUP S.A.S	Justificación para vinculación grupo No. 2 de personal de interventoría – Contrato No. 20260029 para el corredor vial Valparaíso - Támesis.
49	INTERURABA-RENTAN-2026-089	GRUPO INTECON S.A.S.	Entrega de Resolución No. 2026030075514 Aprobación del PMT presentado para el Contrato de Obra No. 250011B2822 de 2025.; Objeto "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A cargo de la Gobernación de Antioquia, lote 3-Urbano, tramo El Bobal-San Pedro de Urabá.
50	CIA-20260064-058	CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA	Solicitud aclaración AIU contratista de obra LOTE 4
51	INTERURABA-RENTAN-2026-072	GRUPO INTECON S.A.S.	REMISIÓN SOLICITUD DE DATOS E INFORMACIÓN PARA TRÁMITE DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES – OFICIO 156437 CONTRATISTA DE OBRA
52	INTERURABA-RENTAN-2026-089	GRUPO INTECON S.A.S.	Entrega de Resolución No. 2026030075514 Aprobación del PMT presentado para el Contrato de Obra No. 250011B2822 de 2025.; Objeto "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A cargo de la Gobernación de Antioquia, lote 3-Urbano, tramo El Bobal-San Pedro de Urabá.
53	NTERURABA-RENTAN-2026-092	GRUPO INTECON S.A.S.	ATENCIÓN OBSERVACIONES A INFORME AMBIENTAL ACTUALIZADO MES DE FEBRERO 2026 - INTERVENTORÍA
54	NTERURABA-RENTAN-2026-094	GRUPO INTECON S.A.S.	REMISIÓN SOLICITUD CONSULTA EN EL VUR PREDIO ZONA DE DEPÓSITO – OFICIO 156930 CONTRATISTA DE OBRA
55	183-1360-0024-2026	AIM SAS	Presentación Hojas de Vida Personal Clave del Contrato de Interventoría.
56	183-1360-0229-2026	AIM SAS	Presentación Hojas de Vida de Personal Profesional para aprobación para las cuales ya fue aprobado por RENTAN su activación.
57	2026030079361	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	Fecha de entrega Formula de Trabajo e inicio de obras Contrato No.25OO111B2824 Lote 5 Suroeste.

58	2026030079493	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	Fecha de entrega Formula de Trabajo e inicio de obras contrato No.25OO111B2826 Lote 8 Norte.
59	2026030079948	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	"Fecha de entrega Formula de Trabajo e inicio de obras contrato No.25OO111B2823 Lote 4 Magdalena Medio."
60	2026030079966	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	Fecha de entrega Formula de Trabajo e inicio de obras contrato No.4600018883 Lote 6 Nordeste.
61	2026030081329	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	Fecha de entrega Fórmula de Trabajo e inicio de obras contrato No. 25OO111B2822 de 2025 Lote 3 Urabá
62	2026030081345	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	Fecha de entrega Formula de Trabajo e inicio de obras contrato No.25OO111B2825 Lote 7 Bajo Cauca.
63	INTERURABA-RENTAN-2026-095	GRUPO INTECON S.A.S.	Remisión microdiagnóstico – Corredor Necoclí - San Pedro de Urabá
64	NTERURABA-RENTAN-2026-096	GRUPO INTECON S.A.S.	Indagación estado de aprobación arte valla informativa y solicitud de piezas
65	INTERURABA-RENTAN-2026-100	GRUPO INTECON S.A.S.	ENTREGA DE INFORME SOCIAL-AMBIENTAL-SST INTERVENT No 07
66	INTERURABA-RENTAN-2026-101	GRUPO INTECON S.A.S.	ENTREGA INFORME TÉCNICO SEMANAL No 07 INTERVENTORÍA
67	NTERNORTE-RENTAN-2026-069	CONSORCIO INTERVIALES 2025	ENTREGA INFORME TÉCNICO SEMANAL No 07 INTERVENTORÍA
68	INTERURABA-RENTAN-2026-104	GRUPO INTECON S.A.S.	Remisión de plan de inversión – Componente Social
69	INTERURABA-RENTAN-2026-105	GRUPO INTECON S.A.S.	Arte de valla estabilización TRAMO SPU NECOCLI– Contrato Subregión Urabá Lote 3
70	183-1360-0230-2026	AIM SAS	Documentos de Contratista de Obra para Desembolso del Anticipo
71	183-1360-0234-2026	AIM SAS	Remisión del informe de Interventoría final del componente ambiental del mes febrero de 2026
72	INTERNORTE-RENTAN-2026-070	CONSORCIO INTERVIALES 2025.	Justificación de vinculación de personal de interventoría – Contrato No. 20260060 para Corredor vial Santa Rosa de Osos – Carolina del Principe.
73	INTERNORTE-RENTAN-2026-072	CONSORCIO INTERVIALES 2025.	Notificación de asignación de Profesional Social Liceth Karine Erazo Prieto.
74	INTERSUROESTE-RENTAN-2026-053	Sading Group S.A.S.	Notificación vinculación de personal del grupo No. 2 ya aprobado al contrato de Interventoría No. 20260029
75	INTERURABA-RENTAN-2026-107	CONSORCIO INTERVIALES 2025.	acreditación ONAC y certificado de calidad laboratorio INTEINSA Subregión Urabá Lote 3

Ver Anexo 4. Correspondencia recibida.

8. CONTROL DE VERSIONES

N°. de Versión	Fecha de Versión	Autor	Revisado por	Aprobado por	Descripción del cambio
01	5/12/2024	Directora de Ejecución	Dirección de Planeación Institucional	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Creación del documento

Observación de Archivo

EN ESTE FOLIO VA UNA USB

VER EN EL EXPEDIENTE FÍSICO

LZULUAGAA
