Ingeniera
SIRLEY DABEIBA MERCHÁN CARREÑO
SUBDIRECCION PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	JULIO 2025

Respetada Ingeniera

De conformidad con lo establecido en la resolución 970 del 2 de abril de 2024, "(…) Por la cual se Adiciona al Manual de Interventoría de Obra Pública del Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, el capítulo correspondiente a la Supervisión de Contratos y Convenios (…)" y de conformidad con lo establecido en el numeral 3.1 denominado: OBLIGACIONES Y/O FUNCIONES DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN EN ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, así:

"(…)3.1.33 Apoyar la Supervisión en la remisión al archivo de Gestión, de todos los documentos que se generen en el desarrollo del contrato o convenio e informar a este, en caso de requerirse su actualización, realizando el debido seguimiento o gestiones para mantener actualizado el mismo. De acuerdo con las políticas de seguridad y Privacidad de la Información, establecidas por la entidad (…)"

Y oficio **2024S-VBOG-005279 del 31 de enero de 2025**, mediante el cual se notifica DESIGNACIÓN como apoyo a la supervisión; dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXION CURUNDO SAN JOSE DEL PALMAR CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE CONSULTORÍA No.	4227 de 2024		
CONTRATISTA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CÓRDOBA	**NIT:**	891.680.089-4
CONFORMACION:	No Aplica		
Objeto:	ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXION CURUNDO SAN JOSE DEL PALMAR CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.		
Fecha de Inicio:	2 de diciembre 2024	**No. de Oficio:**	2024S-VBOG-091015

Valor Inicial:	$ 8.700.000.000,00
Valor Adiciones:	$ 0,00
Valor Actual:	$ 8.700.000.000,00
Anticipo Entregado:	$ 4.350.000.000,00
Anticipo Amortizado:	$ 532.899.976,00
Saldo por Amortizar:	$ 3.817.100.024,00
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2024
Prórroga 1:	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Suspensión 1	N.A
Fecha de Fin:	31 de diciembre de 2025

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. DE RP	FECHA RP	FUENTE DEL RECURSO	No. DEL RECURSO	VALOR	SALDO DE REGISTRO
1124124	14/11/2024	NACIÓN	10	$ 3.200.000.000	$ 2.763.322.024,00
		NACIÓN	10	$ 5.500.000.000	$ 1.053.778.000,00

ACTAS DE COSTO TRAMITADAS

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	AMORTIZACIÓN	VALOR FACTURADO
Acta 1 diciembre 2024	96.222.000,00	48.111.000,00	48.111.000,00
Acta 2 enero 2025	96.222.000,00	48.111.000,00	48.111.000,00
Acta 3 febrero 2025	185.122.000,00	92.561.000,00	92.561.000,00
Acta 4 marzo 2025	235.568.000,00	117.784.000,00	117.784.000,00
Acta 5 mayo 2025	114.126.000,00	57.063.000,00	57.063.000,00
Acta 6 junio 2025	182.492.000,00	91.246.000,00	91.246.000,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 26,74%
% Básico ejecutado acumulado: 13,72%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
…	…		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA PREVISORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del Contrato	$ 870.000.000	3002762 Anexo 5 – Prórroga 1	23/12/2024	01/07/2026
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 4.300.000.000		23/12/2024	01/07/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones	$ 1.740.000.000		23/12/2024	01/01/2029
Calidad de los Servicios	$ 2.610.000.000		23/12/2024	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVA

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…	…			

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	4262 de 2024		
CONTRATISTA:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA UPTC	**NIT:**	891.800.330-1
CONFORMACIÓN:	N.A		
OBJETO	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA		
Fecha de Inicio:	2 de diciembre de 2024	**No. Oficio:**	2024S-VBOG-087817
Valor Inicial:	$ 2.375.000.000,00		
Valor Adiciones:	$ 0,00		
Valor Actual:	$ 2.375.000.000,00		
Anticipo Entregado:	$ 1.187.500.000,00		
Anticipo Amortizado:	$ 201.231.909,50		
Saldo por Amortizar:	$ 986.268.090,50		
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2024		
Prórroga 1:	Hasta el 31 de diciembre de 2025		
Suspensión 1	N.A		
Fecha de Fin:	31 de diciembre de 2025		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. DE RP	FECHA RP	FUENTE DEL RECURSO	No. DEL RECURSO	VALOR	SALDO DE REGISTRO
1124024	14/11/2024	NACIÓN	10	$2.300.000.000	$ 911.268.090,50
		NACIÓN	10	$75.000.000	$ 75.000.000

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	AMORTIZACIÓN	VALOR FACTURADO
Acta 1 diciembre 2024	45.222.400	22.611.200	22.611.200
Acta 2 enero 2025	6.159.800,00	3.079.900,00	3.079.900,00
Acta 3 febrero 2025	84.109.000,00	42.054.500,00	42.054.500,00
Acta 4 marzo 2025	114.346.000,00	57.173.000,00	57.173.000,00
Acta 5 abril 2025	35.970.200,00	17.985.100,00	17.985.100,00
Acta 6 mayo 2025	51.962.000,00	25.981.000,00	25.981.000,00

Acta 7 junio 2025	64.694.419,00	32.347.209,50	32.347.209,50

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS Berkley International Seguros Colombia S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del Contrato	$ 237.500.000	83183 Anexo 4– Según Mod y y 2	12/11/2024	01/07/2026
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 1.187.500.000		12/11/2024	01/07/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones	$ 475.000.000		12/11/2024	31/12/2028
Calidad de los Servicios	$ 712.500.000		12/11/2024	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVA

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…					…

ASPECTOS TÉCNICOS:

Para el presente periodo se desarrollaron las siguientes actividades:

Componente Técnico:

Del 01 al 08 de julio de 2025 se realizó levantamiento de información geológica, hidrogeológica y geotécnica.

Entre el 01 y el 08 de julio de 2025 se llevó a cabo la aplicación de encuestas de origen y destino en el corredor Ánimas – Cartago – Ánimas, como parte del estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio. julio, el equipo profesional ingresó al municipio de Unión Panamericana, estableciendo como punto principal de recolección de información la cabecera municipal de Las Ánimas. A partir de esa fecha, se inició la implementación de las encuestas, las cuales se están desarrollando en el horario comprendido entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m.

Entre el 01 y el 05 de julio de 2025, se llevó a cabo una visita de campo por parte de los especialistas de la consultoría en los volúmenes de Geotecnia, Hidrología, Hidráulica, Socavación y Geología. El propósito principal de esta actividad fue realizar una revisión detallada de las condiciones hidráulicas del corredor vial, así como de las afectaciones geológicas y los aspectos relacionados con la estabilidad de taludes. Como parte del recorrido, el equipo técnico inspeccionó el trayecto comprendido entre el Cruce del Cairo y el corregimiento de Curundó, en el municipio de Novita. Durante esta inspección se realizó una evaluación minuciosa de los puntos críticos identificados a lo largo del corredor, documentando el estado actual de la vía mediante evidencia fotográfica y observaciones técnicas en terreno. En el desarrollo de las actividades también se realizó la búsqueda e inspección de nacederos de agua ubicados dentro del área de influencia del proyecto, con el acompañamiento del equipo de hidráulica y de personas de la comunidad conocedoras del territorio. Esta tarea permitió abordar de forma integral aspectos geológicos y geotécnicos, además de caracterizar un total de ocho (8) puntos de agua, en los que se tomaron parámetros fisicoquímicos para determinar la posible presencia de aguas subterráneas. También se revisó en campo Identificación de obras de arte existentes, Localización de cuerpos de agua en el corredor, Reconocimiento de escorrentías y aguas de filtración presentes en el área de estudio.



Encuestas de Origen y Destino - Animas del 01 al 08 de julio de 2025



Encuestas de Origen y Destino - Animas del 01 al 08 de julio de 2025



Encuestas de Origen y Destino - Animas del 01 al 08 de julio de 2025



Visita de campo especialistas de Geotecnia, Hidrología, Hidráulica y Socavación y Geología



Visita de campo especialistas de Geotecnia, Hidrología, Hidráulica y Socavación y Geología



Visita de campo especialistas de Geotecnia, Hidrología, Hidráulica y Socavación y Geología

Se realizo socialización “segundo espacio” con el consejo comunitario mayor de Novita COCOMAN dando cumplimiento a los requerimientos de la MEC y del representante legal vigente

La consultoría envío Plan de Exploración Geotécnica de los tramos 1, 4 y 5 los cuales se encuentran en revisión por parte de la interventoría

La consultoría envía informe preliminar del volumen 5 Estudio de Geología y Geomorfología local el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría

Se llevó a cabo una reunión técnica sobre diseño geométrico y topografía, en la cual se identificó como principal dificultad la falta de información topográfica, situación que ha impactado negativamente el desarrollo de la fase 3 del proyecto. Ante esto, se acordó priorizar la recolección de dicha información y se recomendó a los profesionales realizar una revisión minuciosa de los insumos disponibles, con el fin de precisar el estado actual de la documentación. Asimismo, se ajustó el formato del informe técnico para alinearlo con los estándares exigidos por la consultoría e interventoría. Durante la sesión también se abordaron posibles ajustes al cronograma y presupuesto, incluyendo la eventual modificación del contrato inicial, y se acordó avanzar en los análisis técnicos y jurídicos correspondientes



Reunión INVIAS – CONSULTORÍA- INTERVENTORÍA 16/07/2025



Socialización segundo espacio con la MEC y con el consejo comunitario de Novita COCOMAN

La consultoría envía informe de apropiación de los estudios topográficos en donde concluye que la información entregada por el INVIAS no es suficiente para Fase III debido a:


- Dentro de la revisión de la información no se encontró un informe topográfico detallado de campo.
- La información analizada no está referenciada al sistema oficial (MAGNA-SIRGAS 2018).
- No existe un modelo MDT detallado, ni se evidencia el uso de tecnologías LIDAR o escáner.
- Ausencia de redes levantadas, ni fichas técnicas de la red GNSS.

- Entregables no estructurados, ni verificables.
- Riesgo alto de reprocesos, rediseños y errores constructivos.
- Por tanto, es necesario la toma actualizada de la topografía de detalle.

Se realizo comité técnico mensual en el INVIAS- Planta Central, donde se expuso la situación contractual con las comunidades de consejos comunitarios de COCOMAN y de San Pedro de Ingará las cuales hacen parte de los tramos 1 y 2 y solicitan consulta previa. La consultoría propone realizar acercamientos con estas comunidades e intentar proponer realizar lineamientos de Consulta previa para que se permita la entrada a campo. Así mismo en este comité la consultoría se comprometió a iniciar con la toma de nueva topografía y toma de información geotécnica en los tramos 4, 5 y parte del tramo 3.




Comité técnico de seguimiento
23/07/2025



Comité técnico de seguimiento
23/07/2025



Comité técnico de seguimiento
23/07/2025

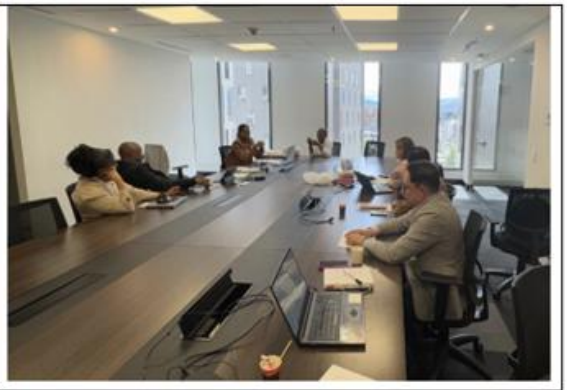

Comité técnico de seguimiento
23/07/2025

ASPECTOS JURÍDICOS.

Para el presente periodo no se adelantaron aspectos jurídicos.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
En tramite acta de costo del mes de julio.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
El 16 de julio se adelantó comisión en la ciudad de Quibdó, cuyo objeto fue "*Participación socialización al consejo comunitario de COCOMAN".*

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

No hay reporte para el presente periodo.

Cordialmente,



YENNY XIOMARA HERNANDEZ PEÑARANDA
CONTRATISTA
CC 60396934
CTO 189 DE 2025
