INFORME SEMANAL

COMPONENTE ELÉCTRICO

Proyecto: Reparaciones locativas, mantenimiento y dotación fase 3 de la Torre A del Edificio de la Alcaldía de Manizales

Periodo: Semana del 09 al 12 de junio de 2026

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Durante la presente semana se efectuó el seguimiento técnico a las actividades ejecutadas por el contratista.


- El contratista realizó los ajustes a los diseños correspondientes al piso 5, los cuales fueron verificados por parte de la Interventoría. Se formularon observaciones y recomendaciones orientadas a garantizar la correcta ejecución de las instalaciones y la compatibilidad con las condiciones existentes del proyecto. Posteriormente, el contratista realizó las modificaciones solicitadas, incorporando las recomendaciones emitidas por la Interventoría, por lo que los ajustes efectuados fueron considerados conformes para continuar con la ejecución de las actividades programadas

- Durante la semana se culminó la construcción de treinta (30) salidas de iluminación correspondientes al Ítem 08B-849, ubicadas en el piso 5, verificándose su ejecución conforme a los diseños aprobados y a las especificaciones técnicas del contrato.

Con el fin de adelantar la revisión técnica y económica de actividades no contempladas dentro de los análisis existentes, la Interventoría solicitó al contratista la presentación de los respectivos Análisis de Precios Unitarios (APU) para las siguientes actividades:


- Suministro e instalación de bandeja portacable de 200 mm.
- Desmonte y montaje de bandeja portacable existente de 300 mm.

3.REGISTRO FOTOGRÁFICO

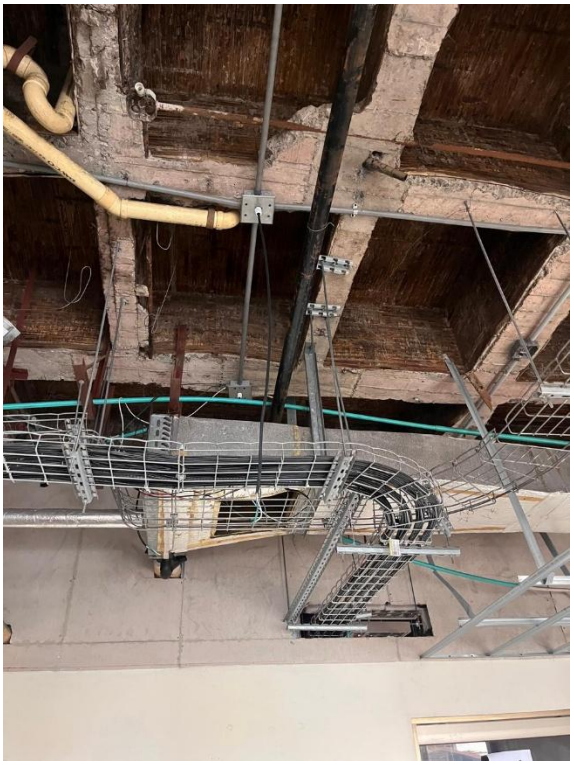






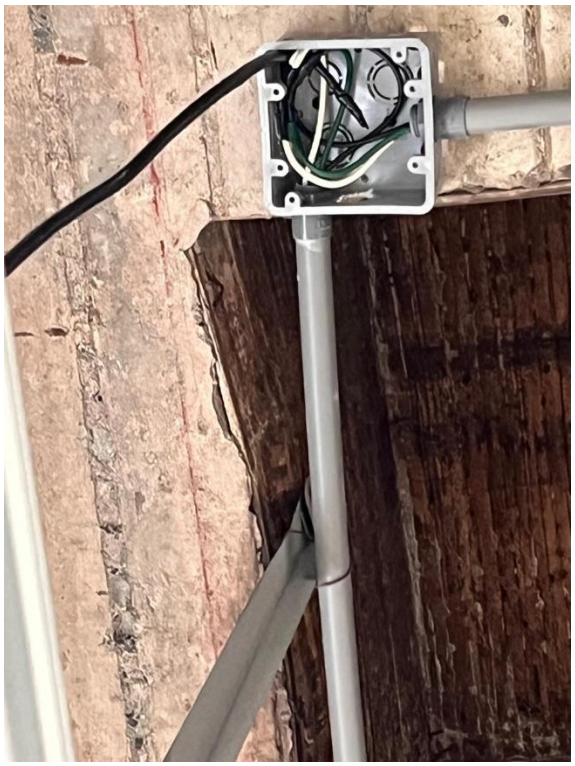



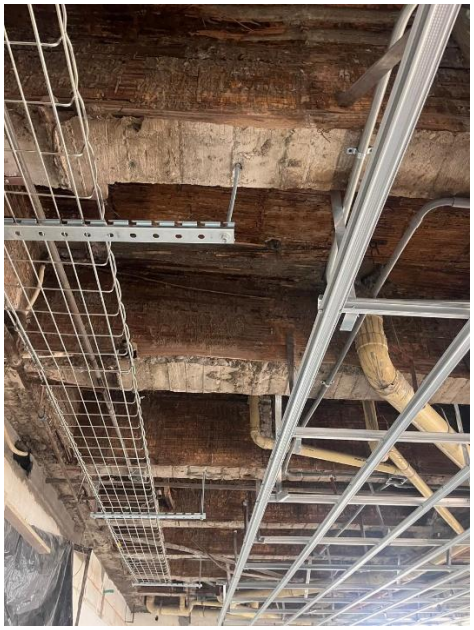

Elaborado por:

MÓNICA FERNANDA GAVIRIA G.
Especialista en Gerencia de Proyectos
Asesor- Ingeniera Electricista
Roble Ingeniería
