
INFORME MENSUAL N°.26
DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 978 DE 2023



PERIODO DEL INFORME

01 DE JULIO DEL 2026 AL 31 DE JULIO DEL 2026

REVISION Y APROBACION

Objeto de Interventoría:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	
Título de Documento:	Informe de Interventoria No 26 (01 de julio del 2026 al 31 de julio del 2026)	
Documento No:	INFM-026	
APROBACION		
	Nombre:	**ING. JIMMY ANDRES TORRES CASTRO**
Responsable por la elaboración:	Firma:	
	Fecha:	01-08-2026
	Nombre:	**ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA**
Vo Bo representante legal:	Firma:	
		01-08-2026

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 5

2 RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO 6
2.1 Generalidades del contrato 6
2.2 Localización del Proyecto y Descripción 8
2.3 Análisis de costos del contrato inicial de interventoria. 9
2.4 Análisis de costos según Modificatoria No.1 del contrato de interventoría. 10
2.5 Análisis de costos según Modificatoria de Prorroga No.2 del contrato de interventoría. 11
2.6 Acta de pago parcial No 1 con corte al 3 de diciembre del 2024 13
2.7 Acta de pago parcial No 2 con corte al 15 de agosto del 2025 14
2.8 Acta de pago parcial No 3 con corte al 14 de noviembre del 2025 15
2.9 Organigrama actualizado según Modificatoria de Prorroga No.2 del contrato de interventoría 18
2.10 Avance en Tiempo contrato de obra. 19
2.11 Avance de Ejecución contrato de obra 19
2.12 Resumen de interventoría 22
2.13 Justificación 22
2.14 Aspectos Técnicos 23

3 ASPECTOS FINANCIEROS 24
3.1 Control Presupuestal del contrato inicial. 24
3.2 Control Presupuestal del contrato según Adicional No.1. 25
3.3 Avance Financiero 25
3.4 Anticipo 27

4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURIDICOS 30
4.1 Cronología contractual 30
4.2 Control de Pólizas 30
4.3 Actas generadas 33
4.4 Comités de Obra y Reuniones 34
4.5 Relación de personal y aportes Sistema integral de Seguridad Social y Parafiscales . 34
4.6 Instalaciones administrativas 36
4.7 Equipos de topografía 36
4.8 Ensayos de laboratorio 37
4.9 Transporte 37

5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 38
5.1 Actividades Básicas 38

5.2 Funciones principales realizadas 39
5.3 Seguimiento y control Técnico de la Obra 40
5.4 Seguimiento y control de Impacto Urbano y mitigación 40
5.5 Seguimiento y control predial en la ejecución 40
5.6 Seguimiento y control compromisos laborales y sistema integral de seguridad social41
5.7 Seguimiento y control al Estado del Tiempo 41
5.8 Seguimiento y control al plan de calidad 41
5.9 Seguimiento y control de Seguridad Industrial 41
5.10 Seguimiento y control cumplimiento plan de manejo de trafico o transito 42
5.11 Seguimiento y control cumplimiento de las obligaciones del contratista 42
5.12 Seguimiento y control plan de manejo ambiental 42
5.13 Seguimiento y control a los permisos legales, ambientales y fichas. 42
5.14 Seguimiento y control programa de gerencia 43

6 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES 43

7 INCONVENIENTES O PROBLEMAS PRESENTADOS 58

8 CONCLUSIONES 59

9 ANEXOS 61
9.1 Registro Fotográfico 62
9.2 Actas de comité de obra. 63
9.3 Informes semanales 64
9.4 Afiliaciones y/o pagos del personal a la seguridad social Interventoria. 65
9.5 Correspondencia enviada y recibida. 66
9.6 Informe de inversión recursos de anticipo 67
9.7 Copia de bitácora de obra 68
9.8 Certificaciones varias 69
9.9 Informe de especialistas 70

10 CUADROS ANEXOS 71
10.1. Control estado general del tiempo. 72
10.2. Control de ensayos de laboratorio 73
10.3. Control personal que labora interventoria. 74
10.4. Control seguridad industrial 75
10.5. Control correspondencia 76
10.6. Control equipos contratista 77
10.7. Control implementación Plan De Manejo Ambiental 78

1 INTRODUCCIÓN

En el Municipio de acacias mediante proceso contractual No CM-OCA-013-2023 y resolución de adjudicación No 203 del 22 de diciembre de 2023 suscribió el contrato de interventoría 978 de 2023 cuyo objeto contractual es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS"** cuyo contratista obra como persona natural y es **JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA** identificado con cedula de ciudadanía No 9.658.796.

El objetivo del presente informe es certificar la ejecución de las labores de seguimiento financiero, administrativo, jurídico y técnico con el fin de lograr la correcta ejecución del contrato de obra No 929 de 2023 cuyo objeto contractual es "**CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS".** Lo anterior teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 32 de la ley 80 de 1993 el cual señala: " *...En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación públicos, la interventoria deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto*..." Igualmente se hizo necesario contratar esta interventoria si se tiene en cuenta lo señalado en el parágrafo 1 de artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 el cual establece: "...*En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de contar con interventoría*...".

Durante el presente período, el proyecto se ejecutó conforme al cronograma y a las condiciones establecidas en la Prórroga No. 4, mediante la cual se amplió el plazo contractual por tres (3) meses adicionales, fijándose como nueva fecha de terminación el 21 de septiembre de 2026. En este marco, las actividades se desarrollaron bajo el seguimiento y control de la Interventoría, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la programación vigente y demás obligaciones contractuales. Durante el período continuaron presentándose restricciones asociadas a las condiciones climáticas, el comportamiento hidráulico del río y a los ajustes técnicos y de cantidades relacionados con la Modificatoria No. 5, circunstancias que incidieron en el desarrollo de algunos frentes de obra.

2 RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO


2.1 Generalidades del contrato

En el siguiente cuadro se muestran los aspectos más importantes del contrato de interventoría:

PROCESO CONTRACTUAL:	OCA-CM-013-2023
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE ACACIAS
RESOLUCION DE ADJUDICACION	203 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATO DE:	INTERVENTORIA
No. DEL CONTRATO:	978 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCION	27 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
VALOR INICIAL:	SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($627.081.787,00) M/CTE
ADICIONAL No.1:	DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO ($291.652.095)
NUEVO VALOR DEL CONTRATO:	NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS ($918.733.882)
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT No 9.658.796-1
CORREO ELECTRONICO	interpuentechichimene@gmail.com
CÉDULA DE CIUDADANÍA	9.658.796 DE YOPAL
No. Y FECHA RP INICIAL:	5156 DEL 22 DE AGOSTO DEL 2023
SUPERVISOR:	IVÁN MAURICIO ROJAS NOVOA
CARGO DEL SUPERVISOR:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
CORREO ELECTRONICO	infraestructura@acacias.gov.co
APOYO A LA SUPERVISION	CRISTIAN FUENTES AMADO
CORREO ELECTRONICO	cristhian.f9393@gmail.com
PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO:	27 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	26 DE ABRIL DE 2025

FECHA SUSPENSION No:1	24 DE ABRIL DEL 2025, (TIEMPO 45 DIAS)
FECHA DE REINICIO SEGÚN SUSPENSION-1	8 DE JUNIO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSION No.1:	10 DE JUNIO DEL 2025
AMPLIACION No.1 A LA SUSPENSION No.1	8 DE JUNIO DEL 2025, (TIEMPO 30 DIAS)
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN AMPLIACION No.1 DE SUSPENSION No.1:	10 DE JULIO DEL 2025
FECHA DE REINICIO ANTICIPADO:	17 DE JUNIO DEL 2025
FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO ANTICIPADO:	20 DE JUNIO DEL 2025
PRORROGA No.1	7 MESES ADICIONALES, TOTAL DE PLAZO 18 MESES
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No.1	20 DE ENERO DEL 2026
VALOR ACTA PARCIAL 1	$85.094.998,51
% ACTA PARCIAL No 1	9,26%
AMORTIZACIÓN PARCIAL No 1	$ 25.528.499,55
VALOR NETO PARCIAL No 1	$ 59.566.498,96
VALOR ACTA PARCIAL 2	$ 229.775.343,75
% ACTA PARCIAL No 2	25,01%
AMORTIZACIÓN PARCIAL No 2	$ 68.932.603,12
VALOR NETO PARCIAL No 2	$ 160.842.740,62
VALOR ACTA PARCIAL 3	$ 158.389.721,16
% ACTA PARCIAL No 3	17,24%
AMORTIZACIÓN PARCIAL No 3	$ 47.516.916,35
VALOR NETO ACTA PARCIAL No 3	$ 110.872.804,81
VALOR ACTA PARCIAL 4	$ 212.227.526,61
% ACTA PARCIAL No 4	23,10%
AMORTIZACIÓN PARCIAL No 4	$ 46.146.517,08
VALOR NETO ACTA PARCIAL No 4	$ 166.081.009,53
PRORROGA No.2	3 MESES ADICIONALES, TOTAL DE PLAZO 21 MESES
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No.2	20 DE ABRIL DEL 2026
PRORROGA No.3	2 MESES ADICIONALES, TOTAL DE PLAZO 23 MESES
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No.3	20 DE JUNIO DEL 2026
PRORROGA No.4	3 MESES ADICIONALES, TOTAL DE PLAZO 26 MESES
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No.3	21 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

2.2 Localización del Proyecto y Descripción

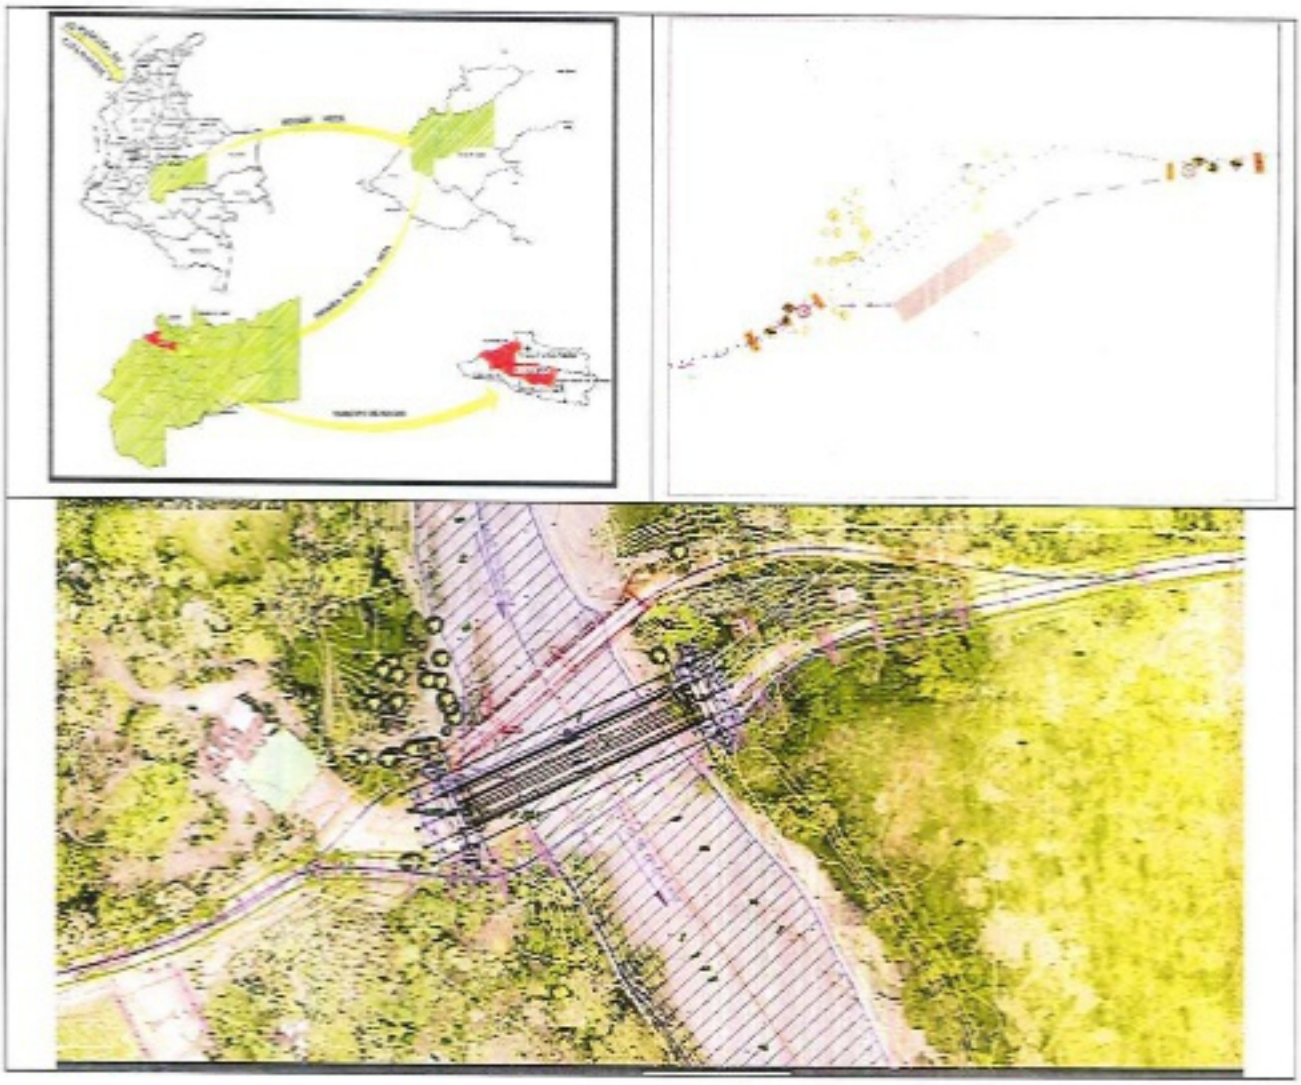

La zona para intervenir se encuentra ubicada en el Municipio de Acacias, específicamente está ubicada en la vía Terciaria que conduce a la vereda quebraditas a 34.4 Km del casco urbano del Municipio de Acacias Meta, de cuales 13.56 se encuentran en afirmado, las coordenadas de ubicación son las 03°57´39,99" N y 73°30´17.67" O

2.3 Análisis de costos del contrato inicial de interventoría.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS					
CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	TIEMPO DURACIÓN (mes)	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*(2)*(3)*(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
PERSONAL PROFESIONAL					
1	INGENIERO CIVIL O ING DE TRANSPORTE Y VÍAS	$ 7.690.568,00	11	50%	$ 42.298.124,00
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA INGENIERO CIVIL	$ 5.905.213,00	11	100%	$ 64.957.343,00
1	TECNÓLOGO EN HSEQ	$ 3.334.768,00	11	50%	$ 18.341.224,00
1	INGENIERO AMBIENTAL	$ 5.266.230,00	11	20%	$ 11.585.706,00
1	INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 5.266.230,00	11	20%	$ 11.585.706,00
PERSONAL TÉCNICO					
1	TOPOGRAFO	$ 2.302.915,00	11	40%	$ 10.132.826,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO					
1	CADENERO 1	$ 1.428.965,00	11	40%	$ 6.287.446,00
1	OPERARIO	$ 1.449.395,00	11	100%	$ 15.943.345,00
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) =	$ 181.131.720,00
				FACTOR MULTIPLICADOR	2,1
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) =	$ 380.376.612,00

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	INCIDENCIA SOBRE LA TARIFA	UTILIZACIÓN	VALOR PARCIAL ($)
(8)			(9)	(10)	(11)	(8)*(9)*(10)*(11) = (12)
OTROS COSTOS DIRECTOS						
VIÁTICOS						
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA						
1	CAMIONETA TIPO PICK UP	MES	$ 5.849.422,00	130%	11	$ 64.343.642,00
1	TOPOGRAFIA	MES	$ 3.468.149,00	40%	11	$ 15.215.856,00
1	LABORATORIO - INTERVENTORÍAS	MES	$ 9.139.887,00	22,9%	11	$ 23.023.375,00
1	ARRIENDO DE OFICINA	MES	$ 1.500.000,00	100%	11	$ 16.500.000,00
1	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	MES	$ 2.500.000,00	100%	11	$ 27.500.000,00
					SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) =	$ 146.582.873,00
					SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) =	$ 526.959.485,00
					IVA = 19% * (E) =	$ 100.122.302,15
					COSTO TOTAL = (E) + (F)	$ 627.081.787,00

2.4 Análisis de costos según Modificatoria No.1 del contrato de interventoría.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS						
CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	TIEMPO DURACIÓN (mes)	PARTICIPACIÓN (h-mes)		VALOR PARCIAL ($)
(1)		(2)	(3)	(4)		(1)*(2)*(3)*(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						
PERSONAL PROFESIONAL						
1	INGENIERO CIVIL O ING DE TRANSPORTE Y VÍAS	$ 7.890.568,00	18	50%		$ 69.215.112,00
1	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INGENIERO CIVIL	$ 5.905.213,00	18	100%		$ 106.293.834,00
1	TECNÓLOGO EN SIG	$ 3.334.768,00	18	50%		$ 30.012.912,00
1	INGENIERO AMBIENTAL	$ 5.256.230,00	18	20%		$ 18.968.428,00
1	INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 5.256.230,00	18	20%		$ 18.968.428,00
PERSONAL TÉCNICO						
1	TOPOGRAFO	$ 2.302.915,00	18	40%		$ 16.580.988,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO						
1	CADENERO 1	$ 1.428.966,00	18	40%		$ 10.288.548,00
1	OPERARIO	$ 1.449.395,00	11	100%		$ 15.943.345,00
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						
OTROS COSTOS DE PERSONAL						
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) =		$ 286.251.595,00
				FACTOR MULTIPLICADOR		2,1
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) =		$ 601.128.350,00
CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	INCIDENCIA SOBRE LA TARIFA	UTILIZACIÓN	VALOR PARCIAL ($)
(8)			(9)	(10)	(11)	(8)*(9)*(10)*(11) = (12)
OTROS COSTOS DIRECTOS						
VIÁTICOS						
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA						
1	CAMIONETA TIPO PICK UP	MES	$ 5.849.422,00	100%	11	$ 64.343.642,00
1	TOPOGRAFIA	MES	$ 3.458.149,00	40%	18	$ 24.898.673,00
1	LABORATORIO - INTERVENTORÍAS	MES	$ 9.139.887,00	22,9%	18	$ 37.674.814,00
1	ARRIENDO DE OFICINA	MES	$ 1.500.000,00	100%	11	$ 16.500.000,00
1	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	MES	$ 2.500.000,00	100%	11	$ 27.500.000,00
OTROS COSTOS						
				SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) =		$ 170.916.929,00
				SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) =		$ 772.045.279,00
				PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)		N.A
				VALOR TOTAL BÁSICO		$ 772.045.279,00
				IVA = 19% * (E) =		$ 146.688.603,01
				COSTO TOTAL = (E) + (F)		$ 918.733.882,00

2.5 Análisis de costos según Modificatoria de Prorroga No.2 del contrato de interventoría.

CONDICIONES OFERTADAS DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA LA PRORROGA No.2							
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS							
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	HONORARIOS	DEDICACION	PERSONAS	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL
A	PERSONAL PROFESIONAL						
	INGENIERO CIVIL O TRANSPORTE Y VÍAS	DIRECTOR INTERVENTORIA		20%	1	3	
	INGENIERO CIVIL O TRANSPORTE Y VÍAS	RESIDENTE INTERVENTORIA		30%	1	3	
	TECNÓLOGO EN HSEQ	PROFESIONAL SISO		50%	1	3	
	INGENIERO CIVIL - ESP. EN ESTRUCTURAS	PROFESIONAL ESTRUCTURAS		20%	1	3	
	TOPOGRAFO	TOPOGRAFO		40%	1	3	
	CADENERO	CADENERO		40%	1	3	
A+B	SUBTOTAL PERSONAL						
D	FACTOR MULTIPLICADOR						
E	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A+B+C) * D						

2.6 Análisis de costos según Modificatoria de Prorroga No.3 del contrato de interventoría.

CONDICIONES OFERTADAS DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA LA PRORROGA No.3				
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS				
DESCRIPCION	CARGO	DEDICACION	PERSONAS	TIEMPO MESES
PERSONAL PROFESIONAL				
INGENIERO CIVIL O TRANSPORTE Y VÍAS	DIRECTOR INTERVENTORIA	20%	1	2
INGENIERO CIVIL O TRANSPORTE Y VÍAS	RESIDENTE INTERVENTORIA	30%	1	2
TECNÓLOGO EN HSEQ	PROFESIONAL SISO	50%	1	2
INGENIERO CIVIL - ESP. EN ESTRUCTURAS	PROFESIONAL ESTRUCTURAS	10%	1	2

2.7 Análisis de costos según Solicitud de Modificatoria para Prorroga No.4 del contrato de interventoría.

Teniendo en cuenta que el contratista mediante oficio de fecha 27 de mayo de 2026 radicó la solicitud de Prorroga No.4 por un plazo adicional de TRES (3) MESES, sustentado en las siguientes situaciones técnicas

Es así como la Interventoría presento la solicitud de Prórroga No. 4, considerando que el Contrato de Interventoría vence el 20 de junio de 2026. Con el fin de evitar la suspensión del contrato de interventoría y de obra, así como afectaciones en la finalización del proyecto, esta Interventoría manifiesta su compromiso excepcional y voluntario de continuar con las labores de seguimiento, vigilancia y control durante el periodo adicional requerido, con recursos propios y sin costo para la Entidad.

En consecuencia, se presenta a consideración de la Entidad la propuesta del equipo de trabajo vinculado al contrato, para la ejecución de esta prórroga No.4 en la cual se propone la misma asignación de la prórroga anterior No.3.

CONDICIONES OFERTADAS DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA LA PRORROGA No.4				
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS				
DESCRIPCION	**CARGO**	**DEDICACION**	**PERSONAS**	**TIEMPO MESES**
PERSONAL PROFESIONAL				
INGENIERO CIVIL O TRANSPORTE Y VÍAS	DIRECTOR INTERVENTORIA	20%	1	3
INGENIERO CIVIL O TRANSPORTE Y VÍAS	RESIDENTE INTERVENTORIA	30%	1	3
TECNÓLOGO EN HSEQ	PROFESIONAL SISO	50%	1	3
INGENIERO CIVIL - ESP. EN ESTRUCTURAS	PROFESIONAL ESTRUCTURAS	10%	1	3

2.8 Acta de pago parcial No 1 con corte al 3 de diciembre del 2024

CONDICION CONTRACTUAL						PARCIAL No 1	
CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	TIEMPO DURACIÓN (mes)	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)	% A COBRAR	VALOR PARCIAL ($)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)=(2)*(3)*(4) = (6)	(6)	(7)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	INGENIERO CIVIL O ING DE TRANSPORTE Y VÍAS	$ 7.690.568,00	11	50%	$ 42.298.124,00	13,57%	$ 5.739.355,43
1	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INGENIERO CIVIL	$ 5.905.213,00	11	100%	$ 64.957.343,00	13,57%	$ 8.814.711,45
1	TECNÓLOGO EN HSEQ	$ 3.334.788,00	11	50%	$ 18.341.224,00	13,57%	$ 2.488.804,10
1	INGENIERO AMBIENTAL	$ 5.266.230,00	11	20%	$ 11.585.706,00	13,57%	$ 1.572.180,30
*1	INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 5.266.230,00	11	20%	$ 11.585.706,00	13,57%	$ 1.572.180,30
PERSONAL TECNICO							
1	TOPOGRAFO	$ 2.302.915,00	11	40%	$10.132.926,00	13,57%	$ 1.375.024,49
PERSONAL ADMINISTRATIVO							
1	CADENERO 1	$ 1.428.965,00	11	40%	$ 6.287.446,00	13,57%	$ 853.206,42
1	OPERARIO	$ 1.449.395,00	11	100%	$ 15.943.345,00	13,57%	$ 2.163.511,92
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)	$ 81.131.720,00		$24.579.574,40
				FACTOR MULTIPLICADOR (7)	2,1		2,10
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)	$ 80.376.612,00		$51.617.106,25
CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	INCIDENCIA SOBRE LA TARIFA	UTILIZACIÓN	VALOR PARCIAL ($)	% A COBRAR	VALOR PARCIAL ($)
(8)			(9)	(10)	(11)	(8)*(9)*(10)*(11) = (12)		
OTROS COSTOS DIRECTOS								
VIATICOS								
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA								
1	CAMIONETA TIPO PICK UP	MES	$ 5.849.422,00	100%	11	$ 64.343.642,00	13,57%	$ 8.731.432,22
1	TOPOGRAFIA	MES	$ 3.458.149,00	40%	11	$ 15.215.696,00	13,57%	$ 2.064.791,60
1	LABORATORIO - INTERVENTORIAS	MES	$ 9.139.887,00	22,9%	11	$ 23.023.375,00	13,57%	$ 3.124.272,04
1	ARRIENDO DE OFICINA	MES	$ 1.500.000,00	100%	11	$ 16.500.000,00	13,57%	$ 2.239.050,00
1	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	MES	$ 2.500.000,00	100%	11	$ 27.500.000,00	13,57%	$ 3.731.750,00
				SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)		$ 46.582.873,00		$19.891.295,86
				SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)		$ 26.959.485,00		$71.508.402,11
				IVA = 19% * (E) = (F)		$100.122.302,15		$13.596.596,40
				COSTO TOTAL = (E) + (F)		$627.081.787,00		$85.094.998,51

2.9 Acta de pago parcial No 2 con corte al 15 de agosto del 2025

CONDICIÓN CONTRACTUAL ACTUALIZADA SEGÚN ADICIONAL						PARCIAL No 2	
CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	TIEMPO DURACIÓN (mes)	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)	% A COBRAR	VALOR PARCIAL ($)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)=(2)*(3)*(4) = (6)	(6)	(7)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	INGENIERO CIVIL O ING DE TRANSPORTE Y VÍAS	$ 7.690.588,00	18	50%	$ 69.215.112,00	25,01%	$17.310.696,51
1	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INGENIERO CIVIL	$ 5.905.213,00	18	102%	$ 105.293.804,00	25,01%	$26.584.067,88
1	TECNOLOGO EN HSEQ	$ 3.334.788,00	18	50%	$ 30.012.912,00	25,01%	$ 7.508.229,29
1	INGENIERO AMBIENTAL	$ 5.296.230,00	18	20%	$ 19.958.428,00	25,01%	$ 4.741.502,84
1	INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 5.296.230,00	18	20%	$ 19.958.428,00	25,01%	$ 4.741.502,84
PERSONAL TECNICO							
1	TOPOGRAFO	$ 2.302.915,00	18	40%	$ 16.580.988,00	25,01%	$ 4.146.906,10
PERSONAL ADMINISTRATIVO							
1	CADENERO 1	$ 1.428.985,00	18	40%	$ 10.288.548,00	25,01%	$ 2.573.166,85
1	OPERARIO	$ 1.449.395,00	11	100%	$ 15.943.345,00	25,01%	$ 3.987.430,59
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (8)					$ 286.251.555,00		$71.591.523,91
FACTOR MULTIPLICADOR (7)					2,1		2,10
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)					$ 601.128.349,50		$150.342.200,21
CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	INCIDENCIA SOBRE LA TARIFA	UTILIZACIÓN	VALOR PARCIAL ($)	% A COBRAR	VALOR PARCIAL ($)
(8)			(9)	(10)	(11)	(12)=(9)*(10)*(11) = (13)		
OTROS COSTOS DIRECTOS								
VIÁTICOS								
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA								
1	CAMIONETA TIPO PICK UP	MES	$ 5.848.422,00	100%	11	$ 64.343.842,00	25,01%	$16.092.344,96
1	TOPOGRAFIA	MES	$ 3.468.149,00	40%	18,00	$ 24.898.672,80	25,01%	$ 6.227.168,07
1	LABORATORIO - INTERVENTORIAS	MES	$ 9.139.987,00	22,9%	18,00	$ 37.674.614,21	25,01%	$ 9.422.421,01
1	ARRIENDO DE OFICINA	MES	$ 1.500.000,00	100%	11	$ 16.500.000,00	25,01%	$ 4.126.860,00
1	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	MES	$ 2.500.000,00	100%	11	$ 27.500.000,00	25,01%	$ 6.877.760,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)						$ 170.916.929,00		$42.746.323,95
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)						$ 772.045.279,00		$193.088.524,16
IVA = 19% * (E) = (F)						$ 146.688.603,01		$36.686.819,59
COSTO TOTAL = (E) + (F)						$ 918.733.882,00		$229.775.343,75

2.10 Acta de pago parcial No 3 con corte al 14 de noviembre del 2025

CONDICIÓN CONTRACTUAL ACTUALIZADA SEGÚN ADICIONAL						PARCIAL No 3	
CANT.	CARDO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	TIEMPO DURACIÓN (mes)	PARTICIPACIÓN (%mes)	VALOR TOTAL ($)	% A COBRAR	VALOR PARCIAL ($)
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*(2)*(3)*(4) = (5)	(6)	(7)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	INGENIERO CIVIL O ING DE TRANSPORTE Y VÍAS	$ 7.890.588,00	18	50%	$ 68.215.112,00	17,24%	$ 11.932.685,31
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA INGENIERO CIVIL	$ 5.965.213,00	18	100%	$ 106.293.834,00	17,24%	$ 18.325.066,98
1	TECNOLOGO EN HSEQ	$ 3.334.768,00	18	50%	$ 30.012.912,00	17,24%	$ 5.174.226,09
1	INGENIERO AMBIENTAL	$ 5.266.230,00	18	20%	$ 18.958.428,00	17,24%	$ 3.268.432,96
1	INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 5.266.230,00	18	20%	$ 18.958.428,00	17,24%	$ 3.268.432,96
PERSONAL TÉCNICO							
1	TOPÓGRAFO	$ 2.302.915,00	18	40%	$ 16.580.988,00	17,24%	$ 2.858.562,33
PERSONAL ADMINISTRATIVO							
1	CADENERO 1	$ 1.428.965,00	18	40%	$ 10.288.548,00	17,24%	$ 1.773.745,68
1	OPERARIO	$ 1.449.395,00	11	100%	$ 15.943.345,00	17,24%	$ 2.748.632,68
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)	$ 288.251.595,00		$ 49.349.774,98
				FACTOR MULTIPLICADOR (7)	2,1		2,10
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)	$ 601.128.349,50		$ 103.634.527,45
CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	INCIDENCIA SOBRE LA TARIFA	UTILIZACIÓN	VALOR TOTALL ($)	% A COBRAR	VALOR PARCIAL ($)
(8)			(9)	(10)	(11)	(8)*(9)*(10)*(11) = (12)		
OTROS COSTOS DIRECTOS								
VIÁTICOS								
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA								
1	CAMIONETA TIPO PICK UP	MES	$ 6.849.422,00	100%	11	$ 64.343.642,00	17,24%	$ 11.092.843,88
1	TOPOGRAFÍA	MES	$ 3.458.149,00	40%	18,00	$ 24.868.672,80	17,24%	$ 4.292.531,19
1	LABORATORIO - INTERVENTORÍAS	MES	$ 8.139.887,00	22,9%	18,00	$ 37.674.614,21	17,24%	$ 6.495.103,40
1	ARRIENDO DE OFICINA	MES	$ 1.500.000,00	100%	11	$ 16.500.000,00	17,24%	$ 2.844.600,00
1	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	MES	$ 2.500.000,00	100%	11	$ 27.500.000,00	17,24%	$ 4.741.000,00
				SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)	$ 170.916.929,00		$ 29.466.078,56
				SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) = (C)	$ 772.045.279,00		$ 133.100.606,02
				IVA = 19% * (E) = (F)	$ 146.688.603,01		$ 25.289.115,14
				COSTO TOTAL = (E) + (F)	$ 918.733.882,00		$ 158.389.721,16


2.11 Acta de pago parcial No 4 con corte al 17 de febrero del 2026

CONDICIÓN CONTRACTUAL ACTUALIZADA SEGÚN ADICIONAL						PARCIAL No 4	
CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	TIEMPO DURACIÓN (mes)	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR TOTAL ($)	% A COBRAR	VALOR PARCIAL ($)
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*(2)*(3)*(4) = (5)	(6)	(7)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	INGENIERO CIVIL O ING DE TRANSPORTE Y VÍAS	$ 7.690.568,00	18	50%	$ 69.215.112,00	23,16%	$ 15.988.690,87
1	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INGENIERO CIVIL	$ 5.505.213,00	18	100%	$ 106.293.834,00	23,16%	$ 24.553.875,85
1	TECNÓLOGO EN HSEQ	$ 3.334.768,00	18	50%	$ 30.012.912,00	23,16%	$ 6.932.982,67
1	INGENIERO AMBIENTAL	$ 5.288.230,00	18	20%	$ 18.958.428,00	23,16%	$ 4.379.396,87
1	INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 5.288.230,00	18	20%	$ 18.958.428,00	23,16%	$ 4.379.396,87
PERSONAL TÉCNICO							
1	TOPÓGRAFO	$ 2.302.915,00	18	40%	$ 16.580.988,00	23,16%	$ 3.830.208,23
PERSONAL ADMINISTRATIVO							
1	CADENERO 1	$ 1.428.965,00	18	40%	$ 10.288.548,00	23,16%	$ 2.376.654,59
1	OPERARIO	$ 1.449.395,00	11	100%	$ 15.943.345,00	23,16%	$ 3.682.912,70
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)					**$ 286.251.595,00**		**$66.124.118,45**
FACTOR MULTIPLICADOR (7)					**2,1**		**2,10**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)					**$ 601.128.349,50**		**$138.860.648,73**
CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	INCIDENCIA SOBRE LA TARIFA	UTILIZACIÓN	VALOR TOTALL ($)	% A COBRAR	VALOR PARCIAL ($)
(8)			(9)	(10)	(11)	(8)*(9)*(10)*(11) = (12)		
OTROS COSTOS DIRECTOS								
VIÁTICOS								
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA								
1	CAMIONETA TIPO PICK UP	MES	$ 5.849.422,00	100%	11	$ 64.343.642,00	23,16%	$ 14.883.381,30
1	TOPOGRAFÍA	MES	$ 3.468.149,00	40%	18,00	$ 24.898.672,80	23,16%	$ 5.761.560,42
1	LABORATORIO - INTERVENTORÍAS	MES	$ 9.139.887,00	22,9%	18,00	$ 37.674.614,21	23,16%	$ 8.702.835,88
1	ARRIENDO DE OFICINA	MES	$ 1.500.000,00	100%	11	$ 16.500.000,00	23,16%	$ 3.821.500,30
1	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	MES	$ 2.500.000,00	100%	11	$ 27.500.000,00	23,16%	$ 6.362.500,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (E)						**$ 170.916.929,00**		**$ 39.481.810,60**
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) = (C)						**$ 772.045.279,00**		**$ 178.342.459,34**
IVA = 19% * (E) = (F)						**$ 146.688.603,01**		**$ 33.885.067,27**
COSTO TOTAL = (E) + (F)						**$ 918.733.882,00**		**$ 212.227.526,61**

2.12 Acta de pago parcial No 5 con corte al 29 de mayo del 2026

CONDICIÓN CONTRACTUAL ACTUALIZADA SEGÚN ADICIONAL						PARCIAL No 5	
CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	TIEMPO DURACIÓN (mes)	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR TOTAL ($)	% A COBRAR	VALOR PARCIAL ($)
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*(2)*(3)*(4) = (5)	(6)	(7)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	INGENIERO CIVIL O ING DE TRANSPORTE Y VÍAS	$ 7.690.568,00	18	60%	$ 89.215.112,00	3,83%	$ 2.663.015,24
1	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INGENIERO CIVIL	$ 5.905.213,00	18	100%	$ 106.293.834,00	3,83%	$ 4.074.242,66
1	TECNÓLOGO EN HSEQ	$ 3.334.768,00	18	60%	$ 30.012.912,00	3,83%	$ 1.150.364,92
1	INGENIERO AMBIENTAL	$ 5.256.230,00	18	20%	$ 18.958.428,00	3,83%	$ 726.576,55
1	INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 5.256.230,00	18	20%	$ 18.958.428,00	3,83%	$ 726.576,55
PERSONAL TÉCNICO							
1	TOPÓGRAFO	$ 2.332.615,00	18	40%	$ 16.590.988,00	3,83%	$ 635.549,27
PERSONAL ADMINISTRATIVO							
1	CADENERO 1	$ 1.428.985,00	18	40%	$ 10.288.548,00	3,83%	$ 394.360,04
1	OPERARIO	$ 1.449.395,00	11	100%	$ 15.943.345,00	3,83%	$ 611.108,41
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)					$ 286.251.595,00		$ 10.972.023,64
FACTOR MULTIPLICADOR (7)					2,1		2,10
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)					$ 601.128.349,50		$ 23041249,64
CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	INCIDENCIA SOBRE LA TARIFA	UTILIZACIÓN	VALOR TOTALL ($)	% A COBRAR	VALOR PARCIAL ($)
(8)			(9)	(10)	(11)	(8)*(9)*(10)*(11) = (12)		
OTROS COSTOS DIRECTOS								
VIÁTICOS								
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA								
1	CAMIONETA TIPO PICK UP	MES	$ 5.849.422,00	100%	11	$ 64.343.642,00	3,83%	$ 2.466.291,80
1	TOPOGRAFÍA	MES	$ 3.458.149,00	40%	18,00	$ 24.898.672,80	3,83%	$ 954.366,13
1	LABORATORIO - INTERVENTORÍAS	MES	$ 9.139.887,00	22,9%	18,00	$ 37.674.614,21	3,83%	$ 1.444.067,96
1	ARRIENDO DE OFICINA	MES	$ 1.500.000,00	100%	11	$ 16.500.000,00	3,83%	$ 632.445,00
1	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	MES	$ 2.500.000,00	100%	11	$ 27.500.000,00	3,83%	$ 1.054.075,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)						$ 170.916.929,00		$ 6.551.245,89
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) = (C)						$ 772.045.279,00		$ 29.592.495,53
IVA = 19% * (E) = (F)						$ 146.688.603,01		$ 5.622.574,15
COSTO TOTAL = (E) + (F)						$ 918.733.882,00		$ 35.215.069,68

2.13 Organigrama actualizado según Ultima Modificatoria de Prorroga No.4 del contrato de interventoría

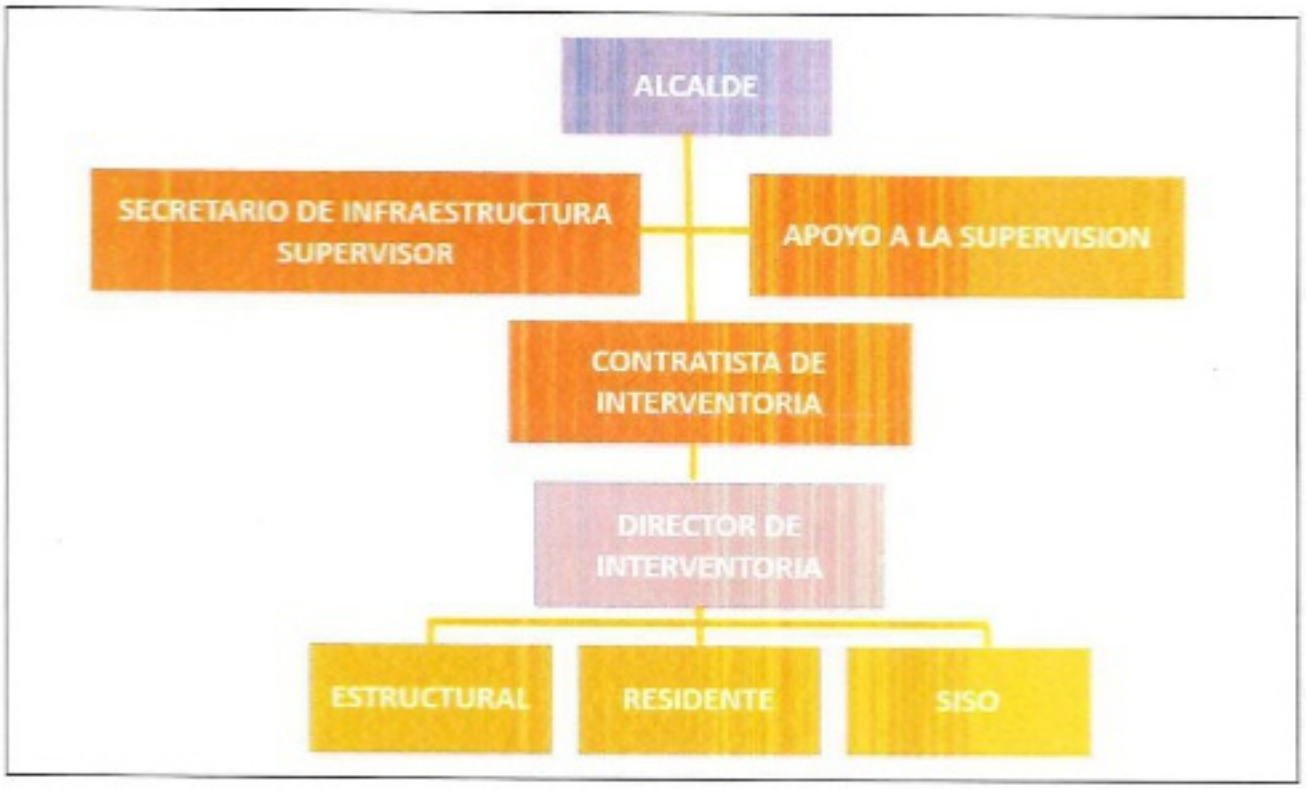


El organigrama presenta una estructura jerárquica clara que garantiza el adecuado control institucional y la ejecución técnica del proyecto mediante un equipo multidisciplinario.

Durante el presente período, el contrato de obra se encuentra en ejecución la Modificatoria de Prórroga No.4, la cual fue aprobada y se encuentra vigente a partir del 21 de junio de 2026, asegurando la continuidad del proyecto. En ese contexto, y ajustado a la normatividad vigente, la Interventoría también continúa ejecutando la Modificatoria de Prórroga No.4 aprobada por la entidad para el período prorrogado.

2.14 Avance en Tiempo contrato de obra.


PLAZO ACTUALIZADO	ACTA DE INICIO	TIEMPO DE EJECUCION AL CORTE	PORCENTAJE DE TIEMPO TRANSCURRIDO	% EJECUT
VEINTISEIS (26) MESES	27/05/2023	SETECIENTOS CUARENTA Y UN (741) DIAS	93,44%	83,56%

FECHA DE INICIO	27/05/2024
FECHA DE SUSPENSION	24/04/2025
FECHA DE REINICIO	17/06/2025
FECHA DE TERMINACION	21/09/2026
HOY	31/07/2026
DIAS TRANCURRIDOS	741,00
MESES TRANCURRIDOS	24,70
PLAZO DIAS	793,00
PLAZO MESES	26,43
AVANCE EN TIEMPO DIAS	93,44%
AVANCE EN TIEMPO MESES	93,44%

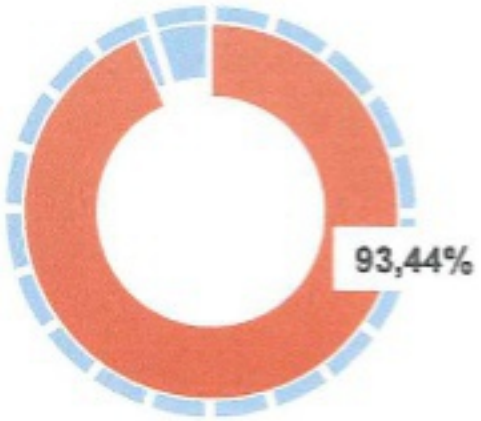

2.15 Avance de Ejecución contrato de obra


RESUMEN DE AVANCE	
DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor inicial del contrato	$13.430.269.893,00
Valor del contrato según modificatoria No.1	$16.970.259.458,00
Valor programado acumulado del contrato mes 26	$16.644.363.678,34
Porcentaje programado acumulado del contrato mes 26	98,080%
Valor ejecutado acumulado de obra mes 26	$14.145.688.205,80
Porcentaje ejecutado acumulado de obra mes 26	83,356%
Atraso (-) o avance (+) recursos	-$2.498.675.472,54
Atraso (-) o avance (+) porcentual	-14,724%

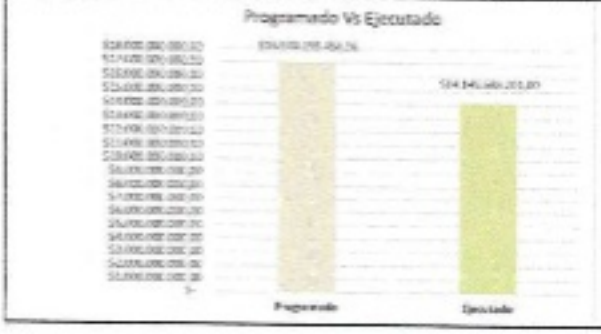





El análisis anterior se realiza con base en la reprogramación presentada con base en la Prorroga No.4 y aprobada por la Entidad con fecha 20 de junio de 2026 y los datos correspondientes a la semana No 108, la cual es más cercana a la fecha de corte del informe, así mismo se toma su avance de cantidades ejecutadas según la misma semana.

CAPITULO	VALOR CAPITULO INICIAL	%	VALOR MODIFICATORIA 1	%	VALOR PRESUPUESTO POR CAPITULO	% EJECUTADO	VALOR EJECUTADO POR CAPITULO	% EJECUTADO	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	ATRASO	ADELANTO	%
1 CONSTRUCCION PUNTO FIJO CALLE	$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]	100,00%	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ -	[illegible]
2.1 PRELIMINARES	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	100,00%	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ -	[illegible]
2.2 DEMOLICIONES Y RETIROS	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	100,00%	$ [illegible]	[illegible]	$ -	$ -	$ [illegible]	[illegible]
2.3 ESTRUCTURAS	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	100,00%	$ [illegible]	[illegible]	$ -	$ -	$ [illegible]	[illegible]
2.4 CERRAMIENTO TEMPORAL	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	100,00%	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ -	[illegible]
2.5 ACERO DE REFUERZO	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	100,00%	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ -	[illegible]
2.6 TANQUE CONTRA INCENDIO	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	100,00%	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ -	[illegible]
2.7 PUNTO DE ACCESO PUNTO FIJO CALLE 10 ESCALERA EVACUACION	$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]	100,00%	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ -	[illegible]
3.1 PRELIMINARES	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	100,00%	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ -	$ -	[illegible]
3.2 DEMOLICIONES Y RETIROS	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	100,00%	$ [illegible]	[illegible]	$ -	$ -	$ -	[illegible]
3.3 OBRA	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	100,00%	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ -	$ -	[illegible]
3.4 OBRAS DE PROTECCION	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	100,00%	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ -	$ -	[illegible]
3.5 OBRAS DE DRENAJES	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	100,00%	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ -	$ -	[illegible]
3.6 EXCAVACION	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	100,00%	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ -	$ -	[illegible]
3.7 PAVIMENTO ASFALTICO	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	100,00%	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ -	$ -	[illegible]
3.8 ANDENES Y RAMPAS PUBLICO	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	100,00%	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ -	$ -	[illegible]
[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	100,00%	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ -	[illegible]
[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	100,00%	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ -	[illegible]
[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	100,00%	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ -	[illegible]
	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ -	[illegible]

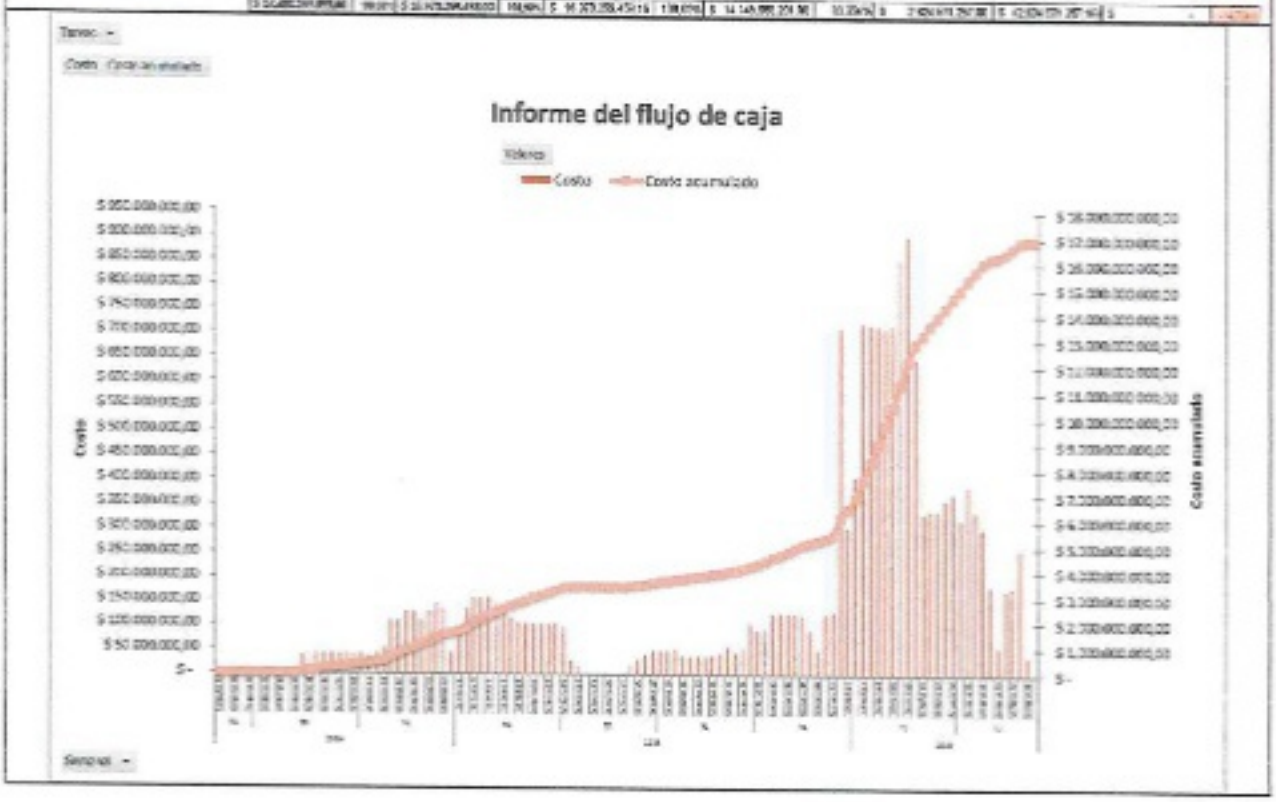

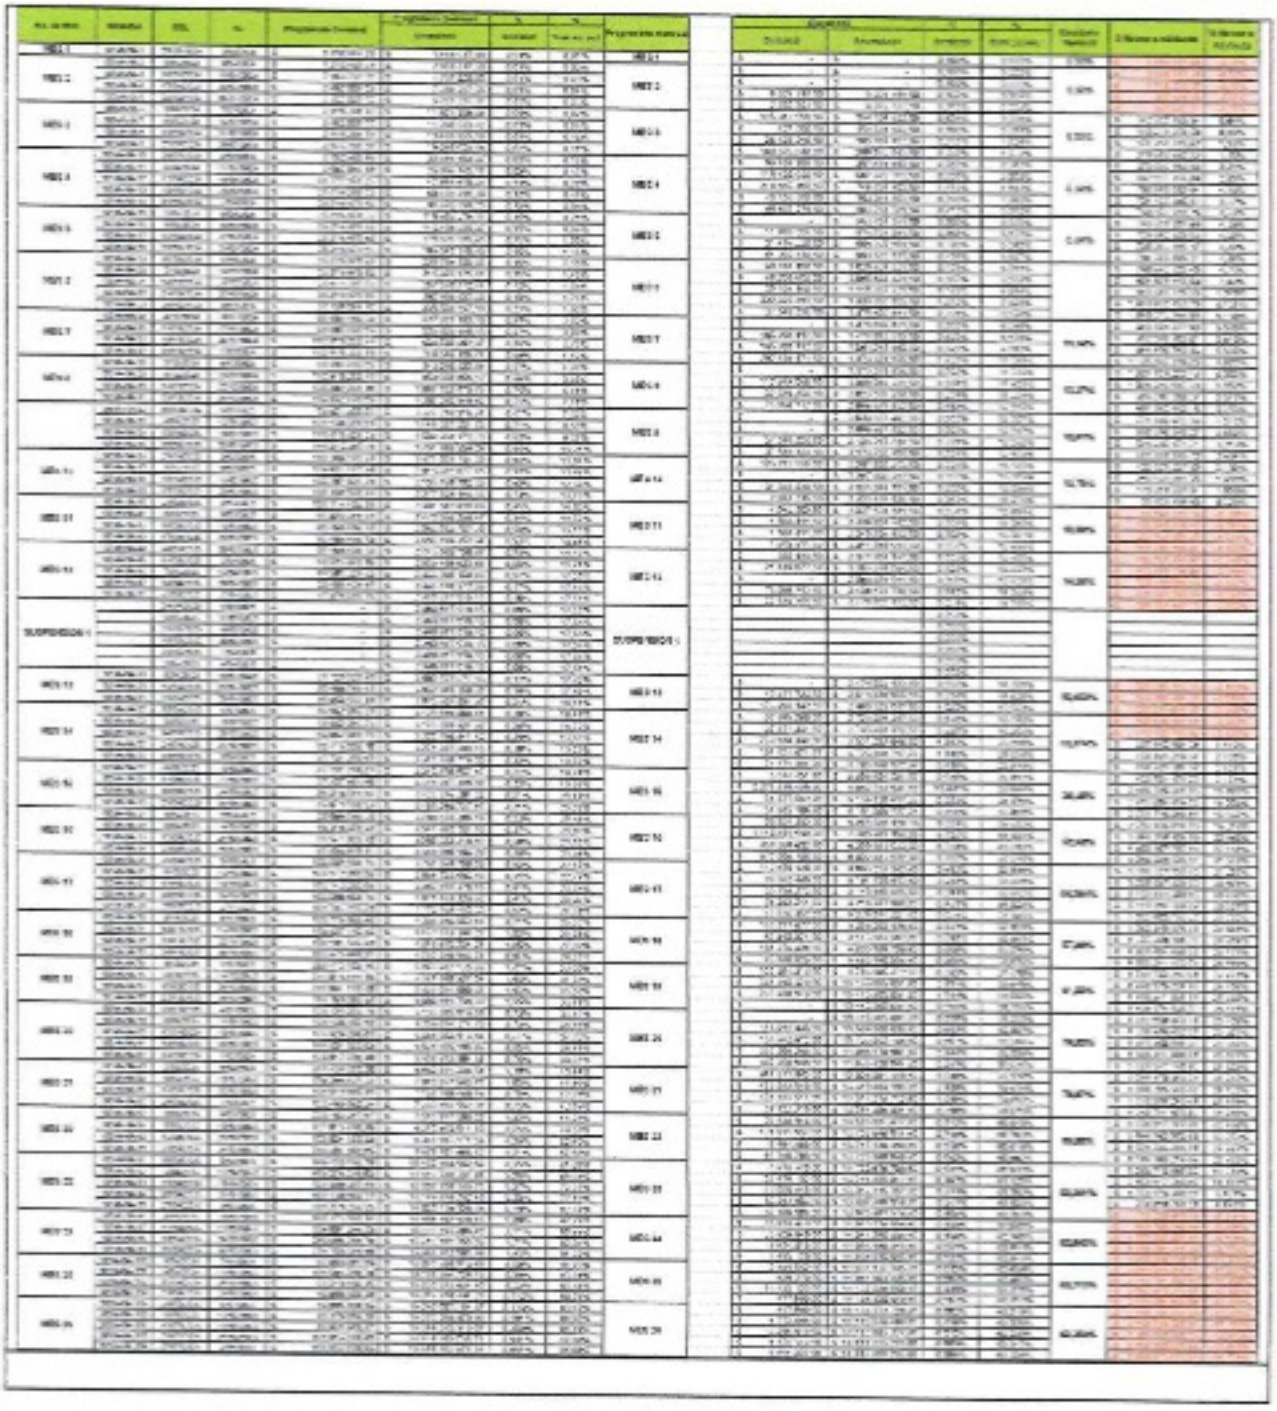

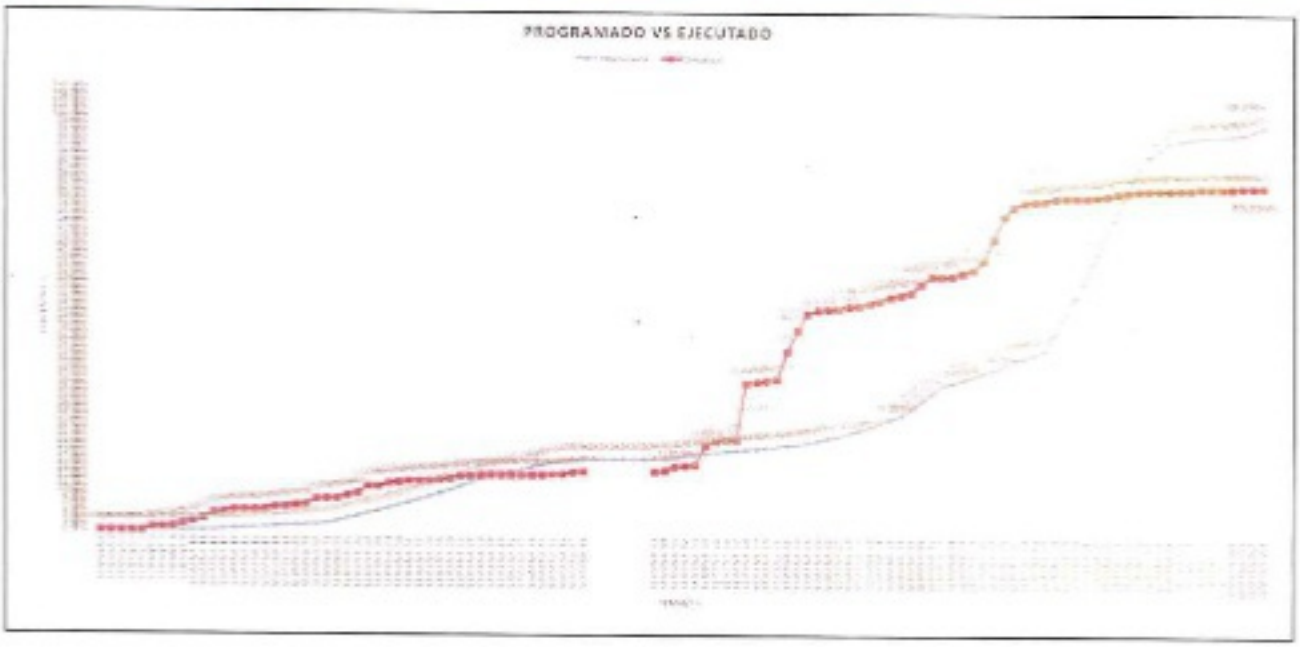

2.16 Resumen de interventoría

RESUMEN DEL CONTRATO	
DESCRIPCION	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$627.081.787,00
Plazo inicial	Once (11) meses
Valor del contrato según Modificatoria No.1	$918.733.882,00
Plazo según Modificatoria No.1	Dieciocho (18) meses
Plazo según Modificatoria-Prorroga No.2	Veintiún (21) meses
Plazo según Modificatoria-Prorroga No.3	Veintitrés (23) meses
Nuevo plazo según Modificatoria-Prorroga No.4	Veintiséis (26) meses

2.17 Justificación

Es de anotar que el concepto de Interventoría hace referencia al conjunto de funciones o actividades desempeñadas por un responsable designado o contratado para el efecto, que realiza el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista, con la finalidad de promover la ejecución satisfactoria del contrato, mantener permanentemente a la entidad contratante de su estado técnico, jurídico y financiero, evitando perjuicios a la entidad y al contratista o parte del negocio jurídico, Así mismo la interventoría se encargará de supervisar, controlar y vigilar las acciones del contratista para hacer cumplir las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales y presupuestales o financieras establecidas en los contratos o convenios celebrados.

Asi mismo corresponde al Interventor, supervisar, controlar y coordinar la ejecución de los contratos que le sean asignados, a fin de garantizar al dueño de la obra, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones pactadas en los mismos, asi como el control técnico, administrativo y financiero de acuerdo con la naturaleza del contrato buscando satisfacer el fin perseguido.

Los interventores externos responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de Interventoría, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivadas de la celebración y ejecución de los contratos, respecto de los cuales, haya ejercido funciones de Interventoría.

2.18 Aspectos Técnicos

La entidad a través de un concurso de méritos suscribió el contrato de consultoría 375 de 2022 con el Consorcio Consultorias Puentes Acacias cuyo objeto contractual fue " ESTUDIO Y DISEÑO DE SEIS PUENTES VEHICULARES UBICADOS EN LOS BARRIOS PABLO VI, LAS VEGAS, CARRERA 14 Y 11° VEREDAS SAN CRISTÓBAL, EL DIAMANTE Y QUEBRADITAS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META" quien es el responsable de los estudios y diseños, documentos técnicos, presupuestales y toda la documentación necesaria y requerida para la construcción del puente.
El municipio de Acacias a través de la secretaria de Infraestructura realizó la entrega real y material de toda la etapa de diseños, en el cual se realizó un análisis detallado de las condiciones actuales que se encuentran en el proyecto, como se evidencia a continuación.

DOCUMENTO		CASILLA DE VERIFICACION	OBSERVACIONES
Propuesta técnica económica		OK	Se recibe en medio magnético
Contrato legalizado		OK	Se recibe en medio magnético
Registro presupuestal		OK	Se recibe en medio magnético
Garantías aprobadas		OK	Se recibe en medio magnético
Licencias y/o permisos ambientales		OK	Se recibe en medio magnético
Especificaciones técnicas del proyecto		OK	Se recibe en medio magnético
Análisis de precios unitarios y presupuesto oficial		OK	Se recibe en medio magnético
Estudios y Diseños	Levantamiento topográfico y batimetría	OK	Se recibe en medio magnético
	Estudio de geología y geotecnia	OK	Se recibe en medio magnético
	Estudio de suelos	OK	Se recibe en medio magnético
	Estudio de transito	OK	Se recibe en medio magnético
	Estudio hidrológico, hidráulico y de socavación	OK	Se recibe en medio magnético
	Diseños estructurales del puente	OK	Se recibe en medio magnético
	Memorias de cálculo	OK	Se recibe en medio magnético
Plan de Manejo de Transito		OK	Se recibe en medio magnético
Plan de Manejo Ambiental		OK	Se recibe en medio magnético

Asi mismo frente a la documentación los archivos entregados fueron los siguientes:

DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACION	OBSERVACIONES
Informe de diagnostico	OK	Se recibe en medio magnético
Estudio topográfico	OK	Se recibe en medio magnético

Estudio de suelos geología y geotecnia	OK	Se recibe en medio magnético
Estudio hidrológico hidráulico y de socavación	OK	Se recibe en medio magnético
Estudio sistema de alcantarillado.	OK	Se recibe en medio magnético
Estudio de tránsito, capacidad y niveles	OK	Se recibe en medio magnético
Plan de manejo de transito	OK	Se recibe en medio magnético
Estudio y diseño de estructuras	OK	Se debe modificar especificación acero estructural
Plan de manejo ambiental	OK	Se recibe en medio magnético
Análisis de precios unitarios	OK	Se recibe en medio magnético
D memorias eléctricas	OK	Se recibe en medio magnético
Especificaciones técnicas pt1	OK	Se recibe en medio magnético
Especificaciones técnicas pt2	OK	Se recibe en medio magnético
Memorias de cálculo pt1	OK	Se recibe en medio magnético
Memorias de cálculo pt2	OK	Se recibe en medio magnético
Resolución 2235 expediente 3.37.3.023.078	OK	Se recibe en medio magnético

Igualmente, los planos entregados fueron los siguientes:

PLANO	CASILLA DE VERIFICACION	OBSERVACIONES
RAGP- QUEBRADITAS ELECTRICO-V1-E-2	OK	No hay detalle, punto de conexión y demás
RAGP- QUEBRADITAS REDES-V3-E-1 E-2	OK	No hay detalle
RAGP-DISEÑO-GEOMETR-QUEBRADIT-V3-(1 al 6)	OK	Se debe modificar diseño geométrico
RAGP-PUENTE QUEBRADIT-V12-E-1-E-2,E-3, E-4, E-5, E-6, E-7, E-8	OK	Hacen falta planos estructurales
RAGP-TOPOGRAFIA-QUEBRADIT-V6-(1 al 5)	OK	Se recibe en medio magnético, debe documentación

3 ASPECTOS FINANCIEROS

3.1 Control Presupuestal del contrato inicial.

El valor del contrato inicial se encuentra amparado de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2023000056 de fecha 10 de abril de 2023 expedido por la Alcaldía de Acacias y con el CDP 5723 de fecha 10 de abril de 2023 expedido por SPGR y el Registro Presupuestal No. 2023000071 del 27 de diciembre del 2023 con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2023.

Rubro presupuestal	Fuente de financiación	SECCION PPTAL	PRODUCTO MGA	FUENTE	Valor
8.3.24.2401.000011 PROYECTO 202335000604 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	2.3.2.02.02.05 CONSTRUCICON Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCICON	44 RECURSOS CORRIENTES SGR	PUENTE CONSTRUIDO RED TERCIARIA	ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS	$627.081.787,00
TOTAL					$627.081.787,00

Para la siguiente vigencia se expide el Registro Presupuestal No. 2025000010 del 16 de enero del 2025 con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2026.

Rubro presupuestal	Fuente de financiación	SECCION PPTAL	PRODUCTO MGA	FUENTE	Valor
6.3.24.2402.060011 PROYECTO 20235000604 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	2.3.2.02.02.005 CONSTRUCICON Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCICON	45 DISPONIBILIDAD INICIAL SGR	2402044 PUENTE CONSTRUIDO EN VIA TERCIARIA	228.1.00.02 ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS	$438.957.251,00
TOTAL					$438.957.251,00

3.2Control Presupuestal del contrato según Adicional No.1.

El valor del contrato se encuentra amparado de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2025000040 de fecha 12 de junio de 2025 expedido por la Alcaldía de Acacias y con el CDP 4625 de fecha 12 de junio de 2025 expedido por SPGR y el Registro Presupuestal No. 2025000038 del 27 de agosto de 2025.

Rubro presupuestal	Fuente de financiación	SECCION PPTAL	PRODUCTO MGA	FUENTE	Valor
6.3.24.2402.0600.11 PROYECTO:2023500060004 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	2.3.2.02.02.005 CONSTRUCICON Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCICON	44 RECURSOS CORRIENTES SGR	2402044 PUENTE CONSTRUIDO RED TERCIARIA	2.2.8.1.00.01 ASIGNACIONES DIRECTAS	$291.652.095,00
TOTAL					$291.652.095,00

3.3 Avance Financiero

Según la cláusula octava el valor del contrato el municipio pagara al contratista mediante actas parciales hasta sumar máximo el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, de acuerdo al avance de la obra objeto de la interventoría, liquidada sobre el porcentaje que le corresponda al calcular la equivalencia entre el valor del contrato de obra y el de interventoría, y con la presentación del informe mensual, acreditación de que se encuentra al día en el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, acta parcial suscrita entre el contratista y el supervisor, certificado de cumplimiento por parte de la supervisión, el informe del supervisor aprobando las actividades realizadas por el contratista y entrega de la respectiva factura o documento equivalente.

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	VALORES NETOS
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 627.081.787,00			
ANTICIPO				$ 188.124.536,10
ACTA PARCIAL No.1		$ 85.094.998,51	$ 25.528.499,55	$ 59.566.498,96
ADICIONAL No.1	$ 291.652.095,00			
ACTA PARCIAL No.2		$ 229.775.343,75	$ 68.932.603,12	$ 160.842.740,62
ACTA PARCIAL No.3		$ 158.389.721,16	$ 47.516.916,35	$ 110.872.804,81
ACTA PARCIAL No.4		$ 212.227.526,61	$ 46.146.517,08	$ 166.081.009,53
ACTA PARCIAL No.5		$ 35.215.069,68	$ 0,00	$ 35.215.069,68
VALOR FALTANTE POR FACTURAR		$ 233.246.291,97	$ 0,00	$ 233.246.291,97
SUMAS IGUALES	**$ 918.733.882,00**	**$ 953.948.951,68**	**$ 188.124.536,10**	**$ 953.948.951,68**

VALOR ACTUALIZADO		$ 918.733.882,00			
ACTA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	ACUMULADO PAGOS EFECTUADOS	
				$	%
ACTA PARCIAL No.1	$ 85.094.998,51	$25.528.499,55	$59.566.498,96	$25.528.499,55	9,26%
ACTA PARCIAL No.2	$229.775.343,75	$68.932.603,12	$160.842.740,62	$68.932.603,12	25,01%
ACTA PARCIAL No.3	$158.389.721,16	$47.516.916,35	$110.872.804,81	$47.516.916,35	17,24%
ACTA PARCIAL No.4	$212.227.526,61	$46.146.517,08	$166.081.009,53	$46.146.517,08	23,10%
ACTA PARCIAL No.5	$35.215.069,68	$00,00	$35.215.069,68	$00,00	3,83%

CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	FECHA	%
ANTICIPO	$188.124.536,00		18/07/2024	30%
PARCIAL No.1	$85.094.998,51	$25.528.499,55	02/12/2024	9,26%
PARCIAL No 2	$229.775.343,75	$68.932.603,12	15/08/2025	25,01%
PARCIAL No 3	$158.389.721,16	$47.516.916,35	14/11/2025	17,24%
PARCIAL No 4	$212.227.526,61	$46.146.517,08	17/02/2026	23,10%
PARCIAL No 5	$35.215.069,68	$00,00	29/05/2026	3,83%

El pago del acta parcial No.1 se realizó con corte del 27 de mayo del 2024 al 02 de diciembre del 2024 con un porcentaje actualizado del 9.26%, equivalente a un valor de $85.094.998,51 menos una amortización de $25.528.499,55 para un valor de desembolso neto de $59.566.498,96.

El pago del acta parcial No.2 se realizó para el periodo del 03 de diciembre de 2024 al 15 de agosto de 2025, que corresponde al 25,01% por valor de $229.775.343,75 menos una amortización de $68.932.603,12 para un pago bruto de $160.842.740,62.

El pago del acta parcial No 3 se realizó para el periodo del 16 de agosto de 2024 al 14 de noviembre de 2025, que corresponde al 17,24% por valor de $158.389.721,16 menos una amortización de $47.516.916,35 para un pago bruto de $110.872.804,81.

El pago del acta parcial No 4 se realizó para el periodo del 15 de noviembre de 2025 al 17 de febrero del 2026, que corresponde al 23,10% por valor de $212.227.526,61 menos una amortización de $46.146.517,08 para un pago bruto de $166.081.009,53.

El pago del acta parcial No 5 se realizó para el periodo del 18 de febrero de 2025 al 29 de mayo del 2026, con un porcentaje de 3,83% por valor de $35.215.069,68 para un pago bruto de $166.081.009,53, aclarando que en la presente acta no se aplica descuento por concepto de amortización del anticipo, toda vez que el valor total desembolsado por este concepto fue amortizado en su totalidad en las actas de pago anteriores.

3.4 Anticipo

Según la cláusula 6 del contrato suscrito estableció "*...Un anticipo equivalente al treinta (30%) del valor total del contrato, previa legalización de este y suscripción del acta de inicio con el supervisor, y plan de inversión del anticipo aprobado el mismo...*"

La entidad realizo el giro de recursos de anticipo por valor de $ 188.124.536,00 el cual fue girado a la cuenta DAVIVIENDA S.A. CUENTA DE AHORROS DAMAS No 0550488436755992 con fecha 18 de julio de 2024, la distribución de recursos es el siguiente:

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	**Pago de salarios y costos directos del personal**	**$ 112.874.721,66**	**60,00%**
1.1	Director de Interventoria	$ 28.943.502,26	15,4%
1.2	Residente de Interventoria	$ 39.269.666,45	20,9%
1.3	HSEQ	$ 11.088.103,60	5,9%
1.4	Ing. Ambiental	$ 7.004.085,90	3,7%
1.5	Esp. Estructuras	$ 7.004.085,90	3,7%
1.6	Topografo	$ 6.125.753,90	3,3%
1.7	Cadenero	$ 3.801.046,90	2,0%
1.8	Operario	$ 9.638.476,75	5,1%
2	**Alquiler de equipos de computo y oficina**	**$ 28.218.680,42**	**15,00%**
2.1	Equipos computo	$ 14.109.340,21	7,5%
2.2	Oficina	$ 14.109.340,21	7,5%
3	**Alquiler camioneta tipo PICK UP**	**$ 47.031.134,03**	**25,00%**
3.1	Camioneta	$ 47.031.134,03	25,00%
	TOTAL	**$ 188.124.536,10**	**100%**





MOVIMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM AFECTADO	DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN
1	31/07/2024	JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	$ 17.496.042,20	2	Reembolso por pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas meses de mayo, junio y julio de 2024
2	31/07/2024	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	$ 26.868.719,19	3	Reembolso por pago salario, prestaciones y demas meses de mayo, junio y julio de 2024
3	31/07/2024	FLOR ANGELA NARVAEZ	$ 7.586.667,20	4	Reembolso por pago salario, prestaciones y demas meses de mayo, junio y julio de 2024
4	31/07/2024	KAROL PAOLA SANTANA TORRES	$ 4.792.269,30	5	Reembolso por pago salario, prestaciones y demas meses de mayo, junio y julio de 2024
5	31/07/2024	JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	$ 4.792.269,30	6	Reembolso por pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas meses de mayo, junio y julio de 2024
6	31/07/2024	OSCAR HERNAN ALARCON ORTEGON	$ 4.191.305,90	7	Reembolso por pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas meses de mayo, junio y julio de 2024
7	31/07/2024	MICHELL VANESA TRUJILLO	$ 2.600.716,30	8	Reembolso por pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas meses de mayo, junio y julio de 2024
8	31/07/2024	PEDRO ELADIO ALFEREZ	$ 6.594.747,25	9	Reembolso por pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas meses de mayo, junio y julio de 2024
9	31/07/2024	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	$ 14.109.340,20	11	Anticipo alquiler equipos de computo personal
10	31/07/2024	SERGEY MESA	$ 14.109.340,20	12	Anticipo contrato de arrendamiento oficina
11	31/07/2024	JORGE ESTEBAN RODRIGUEZ MEDINA	$ 23.515.567,00	13	Anticipo contrato de arrendamiento vehiculo
12	31/08/2024	JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	$ 8.070.095,40	2	Pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas mes de agosto 2024
13	31/08/2024	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	$ 12.400.947,30	3	Pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas mes de agosto 2024
14	31/08/2024	FLOR ANGELA NARVAEZ	$ 3.901.606,40	4	Pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas mes de agosto 2024
15	31/08/2024	KAROL PAOLA SANTANA TORRES	$ 2.211.815,60	5	Pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas mes de agosto 2024
16	31/08/2024	JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	$ 2.211.815,60	6	Pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas mes de agosto 2024
17	31/08/2024	OSCAR HERNAN ALARCON ORTEGON	$ 1.934.448,60	7	Pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas mes de agosto 2024
18	31/08/2024	MICHELL VANESA TRUJILLO	$ 1.200.330,60	8	Pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas mes de agosto 2024
19	31/08/2024	PEDRO ELADIO ALFEREZ	$ 3.043.729,50	9	Pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas mes de agosto 2024
20	31/08/2024	JORGE ESTEBAN RODRIGUEZ MEDINA	$ 23.515.567,00	13	Anticipo 2 contrato de arrendamiento vehiculo
21	30/-09-2024	JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	$ 3.372.360,60	13	Abono salario director de interventoria
		TOTAL APROBADO	$ 188.124.536,09		

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 26

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	PAGO DE SALARIOS Y COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	$ 112.874.721,60	$ 3.372.363,60	$ 109.502.358,00	$ 112.874.721,60	$ -
2	DIRECTOR INGENIERO CIVIL O ING DE TRANSPORTE Y VIAS	$ 28.943.592,20	$ 3.372.363,60	$ 25.571.138,60	$ 28.943.592,20	$ -
3	RESIDENTE DE INTERVENTORIA INGENIERO CIVIL	$ 39.209.666,45		$ 39.209.666,45	$ 39.209.666,45	$ -
4	TECNÓLOGO EN HSEQ	$ 11.088.103,60		$ 11.088.103,60	$ 11.088.103,60	$ -
5	INGENIERO AMBIENTAL	$ 7.004.085,90		$ 7.004.085,90	$ 7.004.085,90	$ -
6	INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 7.004.085,90		$ 7.004.085,90	$ 7.004.085,90	$ -
7	TOPOGRAFO	$ 6.125.753,60		$ 6.125.753,60	$ 6.125.753,60	$ -
8	CADENERO 1	$ 3.801.046,50		$ 3.801.046,50	$ 3.801.046,50	$ -
9	OPERARIO	$ 9.638.476,75		$ 9.638.476,75	$ 9.638.476,75	$ -
10	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA	$ 28.218.680,40	$ 0,00	$ 28.218.680,40	$ 28.218.680,40	$ -
11	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	$ 14.109.340,20	$ 0,00	$ 14.109.340,20	$ 14.109.340,20	$ -
12	ARRENDO DE OFICINA	$ 14.109.340,20	$ 0,00	$ 14.109.340,20	$ 14.109.340,20	$ -
13	ALQUILER CAMIONETA TIPO PICK UP	$ 47.031.134,00	$ 0,00	$ 47.031.134,00	$ 47.031.134,00	$ -
14	CAMIONETA TIPO PICK UP	$ 47.031.134,00		$ 47.031.134,00	$ 47.031.134,00	$ -
	TOTAL	$ 188.124.536,00	$ 3.372.363,60	$ 184.752.172,40	$ 188.124.536,00	$ 0,00

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	PAGO DE SALARIOS Y COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	$ 112.874.721,60	$ 3.372.363,60	$ 109.502.358,00	$ 112.874.721,60	$ -
2	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA	$ 28.218.680,40	$ 0,00	$ 28.218.680,40	$ 28.218.680,40	$ -
3	ALQUILER CAMIONETA TIPO PICK UP	$ 47.031.134,00	$ 0,00	$ 47.031.134,00	$ 47.031.134,00	$ -
	TOTAL	$ 188.124.536,00	$ 3.372.363,60	$ 184.752.172,40	$ 188.124.536,00	$ 0,00



4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURIDICOS

4.1 Cronología contractual

Los documentos contractuales suscritos en el contrato son los siguientes:

ACTA	FECHA
Resolución de adjudicación	22 de diciembre de 2023
suscripción del contrato	27 de diciembre de 2023
Suscripción de Acta de inicio	27 de mayo de 2024
Acta de suspensión No.1	23 de abril del 2025
Acta de Ampliación No.1 a la suspensión No.1	6 de junio del 2025
Acta de Reinicio No.1	17 de junio del 2025
Acta de Adición No.1 y Prorroga No.1	21 de junio del 2025
Acta de Prorroga No.2	20 de enero del 2026
Acta de Prorroga No.3	20 de abril del 2026
Acta de Prorroga No.4	20 de junio del 2026

4.2 Control de Pólizas

A continuación, se presenta la información de las pólizas que amparas **suscripción del contrato:**

Póliza de Cumplimiento:	30-44-101056712 ANEXO 0		
Responsabilidad civil extracontractual:	30-40-101020567 ANEXO 0		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S.		
Fecha de expedición.	27 DE DICIEMBRE DEL 2023		
Fecha de aprobación entidad	30 DE DICIEMBRE DEL 2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento de Contrato	27/12/2023	27/03/2025	$125.416.357,40
Buena manejo y correcta inversión del anticipo	27/12/2023	27/03/2025	$188.124.536.,10
Salarios y Prestaciones Sociales Legales	27/12/2023	27/11/2027	$31.354.089,35
Calidad del servicio	27/11/2024	27/11/2029	$125.416.357,40
Responsabilidad civil extracontractual:	27/11/2024	27/11/2024	$232.000.000,00

A continuación, se presenta la información de las pólizas que ampara el contrato según **Acta de Inicio**:

Póliza de Cumplimiento:	30-44-101056712 ANEXO 2		
Responsabilidad civil extracontractual:	30-44-101020567 ANEXO 2		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S.		
Fecha de expedición.	28 DE MAYO DEL 2024		
Fecha de aprobación entidad	05 DE JUNIO DE 2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento de Contrato	27/05/2024	26/08/2025	$125.416.357,40
Buena manejo y correcta inversión del anticipo	27/05/2024	26/08/2025	$188.124.536.,10
Salarios y Prestaciones Sociales Legales	27/05/2024	27/04/2028	$31.354.089,35
Calidad del servicio	27/05/2024	28/04/2030	$125.416.357,40
Responsabilidad civil extracontractual:	27/11/2024	28/04/2025	$232.000.000,00

A continuación, la información de pólizas que ampara el contrato según **Suspensión No.1 y Reinicio No.1**:

Póliza de Cumplimiento:	30-44-101056712 ANEXO 4		
Responsabilidad civil extracontractual:	30-44-101020567 ANEXO 5		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S.		
Fecha de expedición.	20 DE JUNIO DEL 2025		
Fecha de aprobación entidad	20 DE JUNIO DE 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento de Contrato	27/05/2024	20/10/2025	$125.416.357,40
Buena manejo y correcta inversión del anticipo	27/05/2024	20/10/2025	$188.124.536.,10
Salarios y Prestaciones Sociales Legales	27/05/2024	20/06/2028	$31.354.089,35
Calidad del servicio	28/04/2025	28/04/2030	$125.416.357,40
Responsabilidad civil extracontractual:	27/05/2024	20/06/2025	$284.700.000,00

A continuación, la información de las pólizas que ampara el contrato según **Adición No.1 y Prorroga No.1**:

Póliza de Cumplimiento:	30-44-101056712 ANEXO 6		
Responsabilidad civil extracontractual:	30-44-101020567 ANEXO 6		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S.		
Fecha de expedición.	28 DE MAYO DEL 2024		
Fecha de aprobación entidad	05 DE JUNIO DE 2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento de Contrato	27/05/2024	20/05/2026	$183.746.776,40

Buena manejo y correcta inversión del anticipo	27/05/2024	20/05/2026	$275.620.164.,60
Salarios y Prestaciones Sociales Legales	27/05/2024	20/01/2029	$45.936.694,10
Calidad del servicio	28/04/2025	28/04/2030	$125.416.357,40
Responsabilidad civil extracontractual:	27/11/2024	28/04/2025	$183.746.776,40

A continuación, la información de las pólizas que ampara el contrato según **Prorroga No.2**:

Póliza de Cumplimiento:	30-44-101056712 ANEXO 7		
Responsabilidad civil extracontractual:	30-44-101020567 ANEXO 6		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S.		
Fecha de expedición.	22 DE ENERO DEL 2026		
Fecha de aprobación entidad	30 DE ENERO DE 2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento de Contrato	27/05/2024	20/08/2026	$183.746.776,40
Buena manejo y correcta inversión del anticipo	27/05/2024	20/08/2026	$275.620.164.,60
Salarios y Prestaciones Sociales Legales	27/05/2024	20/04/2029	$45.936.694,10
Calidad del servicio	28/04/2025	28/04/2030	$125.416.357,40
Responsabilidad civil extracontractual:	27/05/2024	20/04/2026	$183.746.776,40

A continuación, la información de las pólizas que ampara el contrato según **Prorroga No.3**:

Póliza de Cumplimiento:	30-44-101056712 ANEXO 8		
Responsabilidad civil extracontractual:	30-44-101020567 ANEXO 6		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S.		
Fecha de expedición.	21 DE ABRIL DEL 2026		
Fecha de aprobación entidad	30 DE ENERO DE 2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento de Contrato	27/05/2024	20/10/2026	$183.746.776,40
Buena manejo y correcta inversión del anticipo	27/05/2024	20/10/2026	$275.620.164.,60
Salarios y Prestaciones Sociales Legales	27/05/2024	20/06/2029	$45.936.694,10
Calidad del servicio	28/04/2025	28/04/2030	$183.746.776,40
Responsabilidad civil extracontractual:	27/05/2024	20/06/2026	$350.181.000,00

A continuación, la información de las pólizas que ampara el contrato según **Prorroga No.4**:

Póliza de Cumplimiento:	30-44-101056712 ANEXO 9		
Responsabilidad civil extracontractual:	30-44-101020567 ANEXO 10		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S.		
Fecha de expedición.	26 DE JUNIO DEL 2026		
Fecha de aprobación entidad	30 DE JUNIO DE 2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento de Contrato	27/05/2024	20/01/2027	$183.746.776,40
Buena manejo y correcta inversión del anticipo	27/05/2024	20/01/2027	$275.620.164.,60
Salarios y Prestaciones Sociales Legales	27/05/2024	20/09/2029	$45.936.694,10
Calidad del servicio	28/04/2025	28/04/2030	$183.746.776,40
Responsabilidad civil extracontractual:	27/05/2024	20/09/2026	$350.181.000,00

4.3 Actas generadas

Las actas generadas en el contrato son las siguientes:

ACTA	FECHA
Acta de vecindad	Variables
Acta de aprobación factor multiplicador	28 de diciembre del 2023
Acta aprobación personal	29 de diciembre del 2023
Acta de visita previa	23 de febrero de 2024
Acta de socialización	13 de abril de 2024
Acta de inicio	27 de mayo de 2024
Acta parcial No.1	3 de diciembre del 2024
Acta de suspensión No.1	23 de abril del 2025
Acta de Ampliación No.1 a la suspensión No.1	6 de junio del 2025
Acta de Reinicio No.1	17 de junio del 2025
Acta de Adición No.1 y Prorroga No.1	21 de junio del 2025
Acta parcial No.2	15 de agosto del 2025
Acta parcial No.3	14 de noviembre del 2025
Acta de Prorroga No.2	20 de enero del 2026
Acta parcial No.4	17 de febrero del 2026
Acta de Prorroga No.3	20 de abril del 2026
Acta de Prorroga No.4	20 de junio del 2026

4.4 Comités de Obra y Reuniones

En el periodo comprendido del presente informe mensual se realizaron los siguientes comités de obra y reuniones, los cuales se anexan al presente informe:

No DE	FECHA	LUGAR
64	10-07-2026	Realizado en la oficina de Infraestructura de la Alcaldía de Acacias
65	17-07-2026	Realizado en la oficina de Infraestructura de la Alcaldía de Acacias
66	24-07-2026	Realizado en la oficina de Infraestructura de la Alcaldía de Acacias
67	31-07-2026	Realizado en la oficina de Infraestructura de la Alcaldía de Acacias

4.5 Relación de personal y aportes Sistema integral de Seguridad Social y Parafiscales

Esta relación corresponde a las planillas de liquidación de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y demás obligaciones parafiscales de los trabajadores, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026. No obstante, a la fecha de elaboración del presente documento, no se ha efectuado el pago, debido a que el plazo para su cancelación no ha vencido.

Mes	Planilla No	Referencia de pago	Pago EPS	Pago Pensión	Pago ARL	Pago CCF	Pago Total
Julio	No vencido	No vencido	$1.160.603,91	$2.634.643,20	$1.146.069,79	$540.556,54	$5.481.873,44
Julio	No vencido	No vencido	$740,700	$948.000,00	$412,400,00	$118.500,00	$2,219,600,00

Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Tipo de Vinculación	AFILIACIÓN			
			EPS	Pensión	ARL	CCF
Jimmy Andres Torres Castro	Director Interventoria	Dependiente	SANITAS	PORVENIR	SURA	COFREM
Jorge Augusto Rodriguez Reina	Residente Interventoría	Independiente	ESP SURA	COLPENSIONES	SURA	COFREM
Jimmy Andres Torres Castro	Especialista Estructural	Dependiente	SANITAS	PORVENIR	SURA	COFREM
Flor Angela Narváez Castro	Profesional SISO	Dependiente	FOSYGA REGIME	PORVENIR	SURA	COFREM

Se aclara que al presente informe se anexa el cuadro de control de seguridad social del personal vinculado al contrato, en el cual se detallan las dedicaciones y los respectivos cálculos del IBC. Sin embargo, a la fecha no se ha generado el pago de las planillas de seguridad social correspondientes al periodo reportado debido a que el plazo legal establecido para su cancelación aún no ha vencido. una vez se realice dicho pago, los soportes serán radicados como anexo del informe ante la Entidad.

Planilla, Jorge Rodriguez, Empresa	Planilla, Jorge Rodriguez, Empresa
Pendiente por pago. No ha vencido la fecha	Pendiente por pago. No ha vencido la fecha

Planilla, Jorge Rodríguez, Independiente	Planilla, Jorge Rodríguez, Independiente
Pendiente por pago. No ha vencido la fecha	Pendiente por pago. No ha vencido la fecha

4.6 Instalaciones administrativas

La interventoría cuenta con instalaciones administrativas en la ciudad de Villavicencio ubicada en la Calle 49 No.30-16 oficina 203 barrio caudal alto dedicada al contrato suscrito, así mismo cuenta con oficina en el casco urbano del municipio de acacias el cual complementa el funcionamiento de la interventoría.



4.7 Equipos de topografía

Para el presente periodo no se cuenta con personal ni equipos destinados al control topográfico, de conformidad con la justificación técnica presentada por la Interventoría durante el trámite de la Prórroga No.3 y aprobada por la Entidad, manteniendo las mismas condiciones para el periodo de la Prórroga No.4. Lo anterior obedece a que las estructuras principales del proyecto, incluyendo cimentaciones, infraestructura, superestructura y demás elementos que requerían control topográfico especializado, ya fueron ejecutadas, verificadas y recibidas conforme a los diseños aprobados.

En consecuencia, las actividades pendientes corresponden principalmente a obras complementarias, acabados, obras de urbanismo y elementos funcionales, cuya verificación puede ser realizada por el personal técnico y residente de la Interventoría, sin que se evidencie la necesidad de mantener la vinculación del Profesional de Topografía, Cadenero o equipos topográficos especializados. No obstante, la Interventoría continúa realizando el seguimiento, análisis y control de los levantamientos, mediciones, pruebas y ensayos que sean requeridos y ejecutados por el Contratista para el desarrollo de las actividades restantes del proyecto.



4.8 Ensayos de laboratorio

La interventoría cuenta con la disponibilidad para el proyecto de la empresa de Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos INGEGAR INGENIERIA SAS identificada con Nit No 900055611-1, la cual cuenta con certificado del El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC No ECCO-0204/14 para las actividades de consultoría de laboratorio de suelos, concretos y pavimentos, estudios geotécnicos, diseños de pavimentos y cimentaciones conforme los requisitos ISO 9001:2025.

Durante el presente periodo no se requirió la realización de nuevos ensayos, en razón a que no se ejecutaron actividades constructivas que demandaran controles de calidad mediante pruebas técnicas.

4.9 Transporte

La interventoría cuenta con la disponibilidad para el proyecto de 1 (un) vehículo tipo camioneta Pick up doble cabina con las siguientes características

MARCA	NISSAN	**MODELO**	2014	**LINEA**	D22/NP300
PLACA	HBV493	**No POLIZA**	84930866-600004083		
CLASE	CAMIONETA	**SERVICIO**	PARTICULAR	**COLOR**	BLANCO



5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

5.1 Actividades Básicas

La interventoría realiza un seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista apoyando la realización de todos los objetivos contractuales, también vigila y controla para que se cumplan los pliegos de condiciones del contrato, como lo son: tiempo, calidad, cantidades y el correcto uso de los recursos, así mismo ha sostenido una comunicación fluida y coordinada entre todas las partes involucradas en la realización del proyecto, logrando con ello la organización de reuniones, se han conformado comités de trabajo, se ha pedido los informes de los procesos y se ha verificado que todo se lleve de manera adecuada y en la eventualidad de inconvenientes ha brindado prontas soluciones lo que permite monitorear y controlar los riesgos que han sido identificados, así mismo resulta claro que el objetivo general de esta interventoría es vigilar y controlar en forma eficaz y de manera permanente todas las etapas contractuales, para hacer cumplir las especificaciones técnicas, tiempos, las actividades administrativas, legales, financieras, presupuestales y sociales establecidas en el contrato.

5.2 Funciones principales realizadas

La Interventoría, implica una posición imparcial, por lo tanto, en la interpretación del contrato y en la toma de decisiones, la Interventoría ha sido consecuente con sus objetivos principales los cuales ha aplicado así:

Función de Absolver: En cuanto a este objetivo y en virtud del principio de inmediación, esta interventoría ha sido la encargada de resolver las dudas que se han presentado en el desarrollo del contrato, garantizando la comunicación entre las partes.

Función de Colaborar: La Interventoría y el Contratista han conformado un grupo de trabajo de profesionales idóneos en cuya labor en conjunto se resuelven dificultades con razones de orden técnico, jurídico, administrativo y financiero, aclarando que ello signifique, renunciar al ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades específicas o pérdida de su autonomía e independencia frente al contratista.

Función de Controlar: Este objetivo es el más importante y se ha logrado por medio de una labor de inspección, asesoría, supervisión, comprobación y evaluación, estableciendo de esta forma que la ejecución se ajusta a lo pactado. Especialmente en relación con:

- Las especificaciones técnicas del objeto contratado.
- Actividades administrativas a cargo del contratista.
- Actividades legales.
- Actividades financieras y presupuestales.
- Toda estipulación contractual.
- Proteger los intereses de la Entidad y salvaguardar su responsabilidad.
- Vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado.
- Los plazos, términos y demás condiciones contractuales, garantizando la eficiente y
- oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente.

Función de Exigir: La interventoría cuando ha encontrado que en el desarrollo de la relación contractual no se está cumpliendo estrictamente con las cláusulas pactadas, ha exigido al Contratista el debido cumplimiento de los términos y condiciones contractuales y las garantías constituidas para dicho fin.

Función de Solicitar: Esta interventoría ha pedido al Contratista oportunamente, que subsane de manera inmediata, las fallas que se han presentado en ejecución del contrato.

Función de Prevenir: Esta interventoría ha establecido que el control no está destinado exclusivamente a sancionar el incumplimiento de las obligaciones, sino a corregir los conceptos erróneos, impidiendo que se desvíe el objeto del contrato.

Función de Asegurar la calidad de los trabajos: Esta interventoría ha realizado la vigilancia en la calidad de los trabajos.

Función de Verificar: esta interventoria ha verificado el cumplimiento de la normatividad vigente, por parte del contratista en la ejecución del contrato, esta actividad se ha concretado mediante la aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado y solución de los problemas.

5.3 Seguimiento y control Técnico de la Obra

La Interventoria ha realizado presencia en las actividades realizadas por el contratista como son:

- Como Interventoría se verificó la correcta ejecución de los muros pantalla en los estribos de ambas márgenes del puente, comprobando la adecuada implantación, armado de acero, encofrado y vaciado de concreto conforme a los planos y especificaciones técnicas garantizando la adecuada ejecución de esta actividad estructural.
- Se han realizado un seguimiento a las actividades realizadas por el contratista realizando un registro fotográfico de cada una de las actividades.
- Se realizó control en la ejecución de cada una de las actividades ejecutadas conforme las especificaciones técnicas del proyecto.
- Como Interventoría se verifica y se controla la ejecución del contrato mediante un balance en el que se evidencie las condiciones actuales de las actividades ejecutadas y así poder establecer y garantizar el alcance del contrato.
- Se realiza acompañamiento en cada una de las actividades administrativas del contrato.

5.4 Seguimiento y control de Impacto Urbano y mitigación

El concepto de evaluación de impacto urbano podemos definirlo como un conjunto de aplicaciones que buscan como propósito fundamental de minimizar el manejo de los asuntos humanos de forma que sea posible un sistema de vida en armonía con el desarrollo del proyecto, siendo claro que el proyecto en ejecución corresponde a una intervención de una vía terciaria. Se puede concluir que existe relación directa que afecta el entorno rural, social y económicos, no obstante, esta interventoria requirió al contratista para que, al realizar la intervención de la vía y la construcción del puente, se deba realizar su debida señalización con cinta peligro, elementos de señalización vertical, horizontal, pendones de aviso para el aislamiento de la comunidad y con el objetivo de no tener inconvenientes de accidentes con los mismos.

5.5 Seguimiento y control predial en la ejecución

Si bien es cierto que la interventoría es responsable de velar por el cumplimiento de las metas establecidas, así como también seguir los lineamientos de seguimiento y control en materia predial aunque no exista una obligación establecida ni forma parte del proyecto como componente presupuestal, si es necesario tomar decisiones efectivas y concretas que en materia predial no

traben ni entorpezcan el cumplimiento en la ejecución del proyecto, así como generar una herramienta que coadyuve al cumplimiento de las metas planteadas por la Entidad.

5.6 Seguimiento y control compromisos laborales y sistema integral de seguridad social

Durante el presente periodo del informe, esta interventoría realizo seguimiento y control a que el contratista proporcionara un entorno de trabajo seguro, ofreciera salarios pactados en su propuesta, así como al pago de prestaciones sociales y a cumplir las leyes, reglamentos laborales establecidas en el Código del Trabajo y demás que contienen normas laborales, para ello se adjunta cuadro de control de personal de obra e interventoria el cual relaciona uno a uno el estado de vinculación a cada componente de cada trabajador junto con su número de planilla, fecha de pago y aporte realizado al sistema integral de seguridad social.

5.7 Seguimiento y control al Estado del Tiempo

Durante el presente periodo del informe, esta interventoría realizo seguimiento y control al comportamiento de las condiciones climatológicas para de esta forma analizar la incidencia de estas en la ejecución del contrato, para ello se adjunta como anexo cuadro de control estado general del tiempo el cual discrimina dia a día cual fue la condición predominante.

5.8 Seguimiento y control al plan de calidad

Durante el presente periodo del informe, esta interventoría realizo seguimiento y control al alcance del plan, a la verificación de elementos de entrada, al cumplimiento de los objetivos, al cumplimiento de las responsabilidades de la dirección, a la verificación del control de documentos, datos, registros y Gestión de los recursos.

5.9 Seguimiento y control de Seguridad Industrial.

Durante el presente periodo del informe, la interventoría realizo control al contratista, en la implementación de los elementos de protección personal (EPP), al personal durante la ejecución de los trabajos, de igual manera se hizo seguimiento al cumplimiento Decreto Único 1072 – Año 2015 el cual no modificó las normas, solo las unificó, haciendo que todas las empresas, sin importar su nivel de riesgo, implementaran el SG-SST de forma obligatoria, para ello se adjunta cuadro de control seguridad industrial el cual califica frente a la entrega de documentación básica legal, entrega de elementos de protección personal, gestión ambiental y sanitaria, medicina preventiva, gestión del peligro, señalización, manejo de cargas y maquinaria pesada, trabajo en alturas, preparación y respuestas ante emergencias y gestión en campo, asi mismo se genera cuadro de control personal de obra el cual relaciona el estado de cada trabajador al sistema integral de seguridad social.

5.10 Seguimiento y control cumplimiento plan de manejo de trafico o transito

Durante el presente periodo del informe, la interventoría realizo control al contratista, en la implementación de la señalización necesaria para el manejo del tránsito tanto vehicular como peatonal, así como al cumplimiento de alternativas de solución que permitan mitigar los conflictos en términos de movilidad en la zona de influencia adyacente a las intersecciones , como también los desvíos necesarios y los sentidos de circulación de los vehículos durante el desarrollo de la obra, es importante mencionar que se identificaron los impactos que el proyecto genero sobre la movilidad circundante en el área de influencia directa, y los puntos críticos y se establecieron las mejores condiciones de movilidad para los usuarios, con el fin de llevar a cabo los trabajos sin afectar de manera traumática la circulación del flujo vehicular y peatonal.

5.11 Seguimiento y control cumplimiento de las obligaciones del contratista

Durante el presente periodo del informe, la interventoría realizo control al cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente en la cláusula 9 obligaciones generales y especificas del contratista, de igual forma se requirió al contratista ante el incumplimiento de alguna de ellas con el objetivo de conminarlo a su cumplimiento.

5.12 Seguimiento y control plan de manejo ambiental

Durante el presente periodo del informe, la interventoría realizo control al cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente en la cláusula 9 obligaciones generales y especificas del contratista, de igual forma se requirió al contratista ante el incumplimiento de alguna de ellas con el objetivo de conminarlo a su cumplimiento, para ello se adjunta como anexo cuadro de control en la implementación del plan de manejo ambiental, como también acta de seguimiento ambiental, acta de seguimiento a la flora y fauna.

5.13 Seguimiento y control a los permisos legales, ambientales y fichas.

Durante el presente periodo del informe, esta interventoría realizo seguimiento y control al cumplimiento de las siguientes resoluciones emitidas por la corporación ambiental:

TRAMITE	RESOLUCION	EXPEDIENTE	VIGENCIA
Permiso de ocupación de cauce sobre el caño Chichimene, para la construcción de un puente vehicular, dos cabezales de descarga de aguas lluvias de 12" y la demolición del puente antiguo, en la vereda Quebraditas del municipio de Acacias	PS-GJ. 1.2.6.23.2235	3.37.3.023.078	Hasta el 10 de octubre de 2024

Debemos mencionar que, previendo el vencimiento de la resolución, la secretaria de infraestructura a través de oficio 1080.30//0393 de fecha 19 de junio de 2024, radico ante la corporación ambiental la solicitud de prorroga a la resolución por un año, la cual no ha sido emitida por la entidad ambiental.

5.14 Seguimiento y control programa de gerencia

Durante el presente periodo del informe, la interventoría realizo control al cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente en la cláusula 9 obligaciones generales y especificas del contratista, de igual forma se requirió al contratista ante el incumplimiento de alguna de ellas con el objetivo de conminarlo a su cumplimiento.

6 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES

Durante el presente periodo del informe, la interventoría dio cumplimiento a cada una de las obligaciones generadas en la cláusula novena y se resume así:

	CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO
1	Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	Durante el presente periodo la interventoria ha cumplido con las condiciones establecidas en el proceso de contratación.
2	Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	Durante el presente periodo la interventoria ha desarrollado el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3	Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.	Durante el presente periodo la interventoria ha garantizado la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
4	Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones, sin costo adicional para el municipio.	Durante el presente periodo no se presentó reclamaciones ni eventos que tengan efecto sobre el objeto del contrato.
5	Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.	Durante el presente periodo la interventoria no ha ordenado ni aprobado trabajos, fuera del presupuesto

6	Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en el Documento base y en el "Anexo 1 - Anexo Técnico", en los plazos acordados con la Entidad.	La interventoria acredito el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en el proceso contractual.
7	Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local durante la ejecución del contrato.	La interventoria ha gestionado y ha promovido la vinculación de mano de obra de personal local para la ejecución del contrato.
8	Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.	La interventoria ha dado cumplimiento al pacto de transparencia según propuesta presentada.
9	Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del contrato.	Durante el presente periodo no se ha informado pues no ha existido ninguna situación que altere los riesgos existentes, y que puedan tener incidencia en la capacidad para continuar con la ejecución del contrato.
10	Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato.	Durante el presente periodo no se ha comunicado a la entidad pues no ha existido ninguna circunstancia que afecte la ejecución del contrato.
11	Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	Durante el presente periodo la interventoria ha conminado al contratista y al personal de interventoria ha dar cumplimiento a los programas de seguridad y salud en el trabajo, así como se ha verificado la entrega de elementos de protección personal.
12	Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.	Durante el presente periodo no se ha presentado cambios en la composición de capital social de la persona jurídica ni para el contrato de obra ni para el contrato de interventoria.

13	Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.	Durante el presente periodo la interventoria ha dado cumplimiento a las obligaciones laborales, tributarias y ambientales que corresponden.
14	Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 10 dias hábiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la "Matriz 4-Lineamientos de requisitos del personal" y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener el titulo de formación académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.	Durante el presente periodo la interventoria ha ejecutado el contrato con el personal clave evaluable, sin que haya existido la necesidad de realizar cambios de estos.
15	Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.	Durante el presente periodo la interventoria ha certificado a través del oficio CI- OCA-978.2023-006 la ficha técnica del papel con sello ambiental colombiano que se utilizara para elaborar todos los documentos entregables durante la ejecución del contrato
16	Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago.	Durante el presente periodo la interventoria ha realizado los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales, así como se ha dado cumplimiento al sistema integral de seguridad social, de acuerdo con lo que normativamente exige, para ello se adjuntan planillas de seguridad social que soportan el pago.
17	Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.	Durante el presente periodo la interventoria ha manejado con confidencialidad la información a la cual se ha tenido acceso y

		la generada en ejecución.
18	Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad.	Durante el presente periodo la interventoria ha reportado a través de oficios, informes semanales y comités de obra información de la ejecución del contrato.
19	Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definida en el documento base y en el "Anexo 1 – Anexo Técnico" en los plazos acordados con la Entidad.	Durante el presente periodo la interventoria ha acreditado debidamente la formación académica mediante oficio CI- OCA-978.2023-007 y acta de aprobación de personal.
20	Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.	Durante el presente periodo la interventoria ha cumplido los Estándares Minimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019.
21	Incorporar como mínimo el [La Entidad incorporará el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del cien por ciento (100 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.	La interventoria ha incorporado en un 100% personal de nacionalidad colombiano, según exigencia del pliego de condiciones.
22	Incorporar como mínimo el cien por ciento (100 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.	La interventoria ha incorporado en un 100% personal de nacionalidad colombiano, según exigencia del pliego de condiciones.

8	CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO
1	Realizar la interventoria administrativa, técnica, financiera, contable, jurídica, ambiental y social del proyecto en mención y de los recursos destinados por el Municipio para ello.	Durante el presente periodo se ha realizado la interventoria administrativa, técnica, financiera, contable, jurídica, ambiental y social del proyecto en mención y de los recursos destinados por el Municipio para ello.
2	Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento, las condiciones y los ofrecimientos presentados en la propuesta.	Durante el presente periodo se ha dado cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento, las condiciones y los ofrecimientos presentados en la propuesta.

3	Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.	Durante el presente periodo se ha aportado todo el conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.
4	Disponer del personal ofertado y del personal adicional idóneo que sea requerido, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad establecida y durante toda la ejecución del contrato, sin costos adicionales para el municipio.	Durante el presente periodo se ha dispuesto del personal ofertado, así como los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad establecida y durante toda la ejecución del contrato, sin costos adicionales para el municipio.
5	Verificar que el contratista, ocupe en el lugar de los trabajos el personal profesional y técnico ofrecido y aprobado en la propuesta, para que las actividades se ejecuten en forma ágil, y eficiente. Verificar además que el contratista vincule a la ejecución del contrato población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional en un porcentaje que no será superior al 10% ni inferior al 5%. El no cumplimiento de la obligación se impondrán las sanciones pecuniarias producto del incumplimiento injustificado, aplicando para el efecto la cláusula de multas prevista en el contrato.	Durante el presente periodo se ha verificado que contratista, ocupe en el lugar de los trabajos el personal profesional y técnico ofrecido y aprobado en la propuesta, para que las actividades se ejecuten en forma ágil, y eficiente, también se ha solicitado al contratista que vincule a la ejecución del contrato población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional en un porcentaje que no será superior al 10% ni inferior al 5%.
6	Realizar previo al inicio de la obra documento que contenga el análisis sobre las condiciones actuales en materia de salud pública, el estado de los recursos naturales y del bienestar social, describiendo las condiciones físicas, económicas y sociales del municipio y del área objeto de intervención.	Previo al inicio y/o suscripción del acta de inicio se realizó el análisis sobre las condiciones en materia de salud pública, el estado de los recursos naturales y del bienestar social, describiendo las condiciones físicas, económicas y sociales del municipio y del área objeto de intervención.
7	Elaborar antes de iniciar el proyecto, las actas de socialización del proyecto acta de vecindad con el respectivo registro fotográfico y de video, firmada por el contratista, el interventor y los vecinos, por cada Sector o frente de trabajo.	Previo al inicio y/o suscripción del acta de inicio del contrato se realizó la respectiva socialización del contrato con fecha 13 de abril de 2024, así mismo se encuentra en elaboración las actas de vecindad de las viviendas circundantes.
8	Exigir al contratista la iniciación y ejecución de los trabajos en los plazos establecidos en el contrato	Durante el presente periodo se ha exigido al contratista la ejecución de los trabajos en los plazos establecidos.
9	Tener conocimiento completo y detallado del objeto del contrato sometido a seguimiento, de los respectivos pliegos de condiciones, del	La interventoria tiene conocimiento completo y detallado del objeto del contrato, de los respectivos pliegos de condiciones, del contrato

	contrato mismo, de las especificaciones, de la propuesta del contratista, del cronograma de ejecución, en especial de las normas técnicas aplicables a la obra y de cualquier otro documento que haga parte del contrato.	mismo, de las especificaciones, de la propuesta del contratista, del cronograma de ejecución, en especial de las normas técnicas aplicables a la obra y de cualquier otro documento que haga parte del contrato.
10	Aprobar el Cronograma de las actividades a realizar por parte del Contratista de obra y hacer el seguimiento a este y a la programación de la obra.	La interventoria ha aprobado el cronograma de actividades a realizar por parte del Contratista de obra y se ha realizado el seguimiento a este y a la programación de la obra.
11	Supervisar, revisar y ajustar en caso de requerirse, los estudios, diseños u otros documentos técnicos entregados por el municipio para el desarrollo del proyecto. En caso de requerirse una modificación sustancial, se deberá informar a la Entidad Contratante y hacer el acompañamiento técnico propio de la interventoría.	Considerando que los estudios y diseños son resultados del contrato de consultoría 275 de 2022 ejecutado por el Consorcio Consultoría Puentes Acacias, todas las observaciones al diseño han sido reportadas por el contratista, esta interventoria informo a la entidad hallazgos incoherentes en los diseños y están en proceso de corrección.
12	Efectuar, en coordinación con el contratista, el reconocimiento las zonas del proyecto para verificar su estado, accesos, permisos y demás aspectos que resulten necesarios para la ejecución del proyecto y de la interventoria, dejando las respectivas constancias.	Durante el presente periodo la interventoria ha realizado en coordinación con el contratista, el reconocimiento las zonas del proyecto para verificar su estado, accesos, permisos y demás aspectos que resulten necesarios para la ejecución del proyecto y de la interventoría, dejando las respectivas constancias.
13	Analizar antes y durante la ejecución con el Contratista las especificaciones del proyecto, el programa de trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo de los trabajos, deberá plantear soluciones de manera previsiva y proactiva informando a la entidad contratante de la medidas administrativas y financieras necesarias para terminación del proyecto, general deberá procurar todas las acciones que permita el correcto desarrollo del objeto contractual.	Durante el presente periodo la interventoria ha analizado antes y durante la ejecución con el Contratista las especificaciones del proyecto, el programa de trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo de los trabajos, se han planteado soluciones de manera previsiva y proactiva informando a la entidad contratante de la medidas administrativas y financieras necesarias para terminación del proyecto.
14	Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto contractual deberán ser presentados en los formatos establecidos por la secretaria de Infraestructura; de igual forma la presentación de informes mensuales deberán contener toda la documentación adicional que a juicio del supervisor considere necesarios, estos deben ser entregados en PDF, WORD, EXCEL, AUTOCAD, debidamente firmados por el	Durante el presente periodo la interventoria ha generado todos los documentos y actas en los formatos establecidos por la secretaria de infraestructura; asi mismo los informes mensuales contienen toda la documentación adicional que a necesaria y serán entregados en PDF, WORD, EXCEL, AUTOCAD, debidamente firmados por el personal idóneo de interventoría.

	personal idóneo de interventoría.	
15	Exigir la entrega, revisar el contenido y avalar el mismo, de cada uno de los documentos de soporte técnico como planos, memorias de cálculo, cartera de topografía entre otros que serán entregados en los formatos indicados en la obligación anterior.	Durante el presente periodo la interventoria ha exigido al contratista la entrega, ha revisado el contenido y se ha avalado el mismo, de cada uno de los documentos de soporte técnico como planos, memorias de cálculo, cartera de topografía entre otros que serán entregados en los formatos indicados en la obligación anterior
16	El interventor asegurará con la presentación de los informes que fueron cumplidas cabalmente las especificaciones, alcances y objetivos en lo técnico, financiero, administrativo, social, de predios, de permisos requeridos y ambientales de acuerdo con la naturaleza del proyecto.	Durante el presente periodo la interventoria asegura con la presentación de los informes que fueron cumplidas cabalmente las especificaciones, alcances y objetivos en lo técnico, financiero, administrativo, social, de predios, de permisos requeridos y ambientales de acuerdo con la naturaleza del proyecto.
17	Gestionar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.	Durante el presente periodo la interventoria ha gestionado con la debida confidencialidad la información, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.
18	Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.	Durante el presente periodo la interventoria ha reportado la información relacionada con la ejecución del contrato o que pueda tener incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.
19	Verificar la debida ejecución del contrato objeto de interventoría e informar por escrito al Municipio oportunamente en caso de incumplimiento por parte del Contratista de Obra	Durante el presente periodo la interventoria ha verificado la debida ejecución del contrato objeto de interventoria y ha informado por escrito al Municipio oportunamente situaciones de análisis.
20	Estar en permanente comunicación con el supervisor del contrato.	Durante el presente periodo la interventoria ha estado en permanente comunicación con el supervisor del contrato.
21	Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo para tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se deberá suscribir.	Durante el presente periodo la interventoria ha concurrido en forma oportuna a las diferentes reuniones que fueron programadas, dejando constancia en el Acta respectiva.
22	Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.	Durante el presente periodo la interventoria ha facilitado la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se han realizado.
23	Verificar y certificar de manera documentada que el objeto de obra contratado se cumpla de manera idónea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y económica, metodología, especificaciones.	Durante el presente periodo la interventoria ha verificado y certificado de manera documentada que el objeto de obra contratado se cumpla de manera idónea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas

	calidad costos y plazos pactados en el contrato.	técnica y económica, metodología, especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el contrato.
24	Revisar y aprobar actas de obra y presentar el acta respectiva dentro de los 5 días siguientes al cumplimiento del mes de labores.	Durante el presente periodo la interventoria ha revisado y aprobado las actas de obra y se ha presentado el acta respectiva dentro de los 5 dias siguientes al cumplimiento del mes de labores.
25	Efectuar las evaluaciones periódicas correspondientes, establecer los incumplimientos y recomendar los correctivos y las sanciones a que haya lugar, para ello deberá mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado de los contratos en relación con su avance, calidad y costo.	Durante el presente periodo la interventoria ha efectuado las evaluaciones periódicas correspondientes, ha establecido posibles incumplimientos y ha recomendado los correctivos y las sanciones a que haya lugar, para esto se cuenta con sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado del contrato en relación con su avance, calidad y costo.
26	Exigir del contratista de obra el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad.	Durante el presente periodo la interventoria ha exigido al contratista de obra el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad.
27	Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con lo previsto en el contrato y general los documentos que rigieron el proceso.	Durante el presente periodo la interventoria ha cumplido con las normas de gestión ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rigen durante la vigencia del presente contrato y ha atendido las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con lo previsto en el contrato y general los documentos que rigieron el proceso.
28	Verificar el cumplimento de las obligaciones de seguridad industrial y salud ocupacional en el proyecto objeto de seguimiento.	Durante el presente periodo la interventoria ha verificado el cumplimento de las obligaciones de seguridad industrial y salud ocupacional en el proyecto objeto de seguimiento.
29	Cumplir de manera cabal y oportuna con la guía de manejo ambiental, cuando a ello haya lugar de acuerdo con las características y naturaleza del contrato objeto de seguimiento.	Durante el presente periodo la interventoria ha cumplido de manera cabal y oportuna con la guía de manejo ambiental, cuando a ello haya lugar de acuerdo con las características y naturaleza del contrato objeto de seguimiento.
30	Cumplir con las actividades administrativas, técnicas, ambientales, prediales y financieras que están descritas en el manual de interventoría vigente y las demás que le correspondan en el ejercicio de su labor, atendiendo la normatividad vigente aplicable. En todos los casos, el alcance	Durante el presente periodo la interventoria ha cumplido con las actividades administrativas, técnicas, ambientales, prediales y financieras que están descritas en el manual de interventoria vigente y las demás que le correspondan en el ejercicio de su labor, atendiendo la normatividad

	y sectores a intervenir se llevarán a cabo en coordinación con el Supervisor Técnico del Contrato de interventoría.	vigente aplicable.
31	Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin menoscabo de las acciones que del hecho se puedan predicar.	Durante el presente periodo la interventoria ha asumido especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios.
32	Verificar estado, permanencia de los materiales, equipos y demás recursos del contratista, necesarios para la ejecución de las obras.	Durante el presente periodo la interventoría ha verificado el estado, permanencia de los materiales, equipos y demás recursos del contratista, necesarios para la ejecución de las obras.
33	Verificar la disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de topografía entre otros.	Durante el presente periodo la interventoría ha verificado la disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de topografia entre otros.
34	Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, de campo y en general los que sean requeridos para la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra.	Durante el presente periodo la interventoría realizo toma de especimenes para ensayos de laboratorio ya que las actividades que lo requerían, y estuvo atento a verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra.
35	Revisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los materiales requeridos para los proyectos, para lo cual se utilizarán los ensayos de laboratorio y demás controles que pueden observarse en los formatos que se adjunten para el efecto.	Durante el presente periodo la interventoria ha revisado el cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los materiales requeridos para los proyectos, no se realizo ensayos de laboratorio ya que las actividades no lo requerian, pero estuvo atento a verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra.
36	Tomar a su costo, los respectivos ensayos y pruebas, adicionales a las tomadas por los contratistas de obra, por medio de un laboratorio debidamente certificado para verificar la calidad de los trabajos y de los materiales que suministre el contratista, en forma habitual y necesaria dentro de la ejecución del contrato.	Durante el presente periodo la interventoría realizo toma de muestras para ensayos de laboratorio ya que las actividades lo requerian, y tambien estuvo atento a verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra, sin embargo, se dispone del servicio de un laboratorio debidamente certificado para verificar la calidad de los trabajos y de los materiales que suministre el contratista, en forma habitual y

		necesaria dentro de la ejecución del contrato.
37	Tomar los datos y hacer los cálculos necesarios para cuantificar los trabajos realizados y previstos en el contrato a través del fondo de contingencia, para los efectos del pago.	Durante el presente periodo la interventoria ha tomado los datos y ha realizado los cálculos necesarios para cuantificar los trabajos realizados y previstos en el contrato a través del fondo de contingencia, para los efectos del pago.
38	Ejercer un control de programación de avance del proyecto, a través de la línea de balance según programación de obra entregada por el Municipio, exigiendo su cumplimiento, dicha programación deberá ser solicitada y actualizada en cada prorroga, suspensión y/o modificación.	Durante el presente periodo la interventoria ha ejercido un control de programación de avance del proyecto, a través de la línea de balance según programación de obra entregada y ha exigido su cumplimiento.
39	Informar oportunamente y por escrito al Supervisor del contrato de interventoría y al contratista de obra sobre las anomalías que se detecten en la calidad de cualquiera de los proyectos.	Durante el presente periodo la interventoria ha informado oportunamente y por escrito al Supervisor del contrato de interventoría y al contratista de obra sobre las anomalías que se detecten en la calidad.
40	Coordinar con el contratista de obra y con el Supervisor del Contrato de interventoría, en caso de la ocurrencia de emergencias, la correspondiente atención.	Durante el presente periodo la interventoria ha coordinado con el contratista de obra y con el Supervisor del Contrato de interventoría, en caso de la ocurrencia de emergencias, la correspondiente atención.
41	Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos.	Durante el presente periodo la interventoria ha solicitado los planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos.
42	Presentar informes integrales periódicos (mensuales) a la secretaria de Infraestructura sobre la forma como se desarrolla la ejecución del contrato, indicando todos los detalles que sean necesarios y poniendo en conocimiento las irregularidades, anomalías y demás circunstancias atinentes al cumplimiento del contratista.	La interventoria presentara los informes integrales periódicos (mensuales) a la secretaria de Infraestructura sobre la forma como se desarrolla la ejecución del contrato, indicando todos los detalles que sean necesarios y poniendo en conocimiento las irregularidades, anomalías y demás circunstancias atinentes al cumplimiento del contratista.
43	Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista; avisar de ellas de manera oportuna al supervisor, a la oficina de Contratación, resolviendo oportunamente aquellas que sean de su competencia.	Durante el presente periodo la interventoria ha estudiado las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista como también ha avisado de manera oportuna al supervisor, resolviendo oportunamente aquellas que sean de su competencia.
44	Atender oportuna y adecuadamente las observaciones o requerimientos que le formule el Supervisor del Contrato y corregir las fallas	Durante el presente periodo la interventoria ha atendido oportuna y adecuadamente las observaciones o

		requerimientos que le formule el Supervisor del Contrato y corregir las fallas
45	Emitir concepto técnico, jurídico, ambiental, contable y financiero de viabilidad respecto de las modificaciones y/o adiciones necesarias para la ejecución del contrato de obra. Para el efecto deberá generará los documentos requeridos, todos los cuales deberán estar suscritos por el personal idóneo de la interventoria.	La interventoria emitirá cuando sea requerido concepto técnico, jurídico, ambiental, contable y financiero de viabilidad respecto de las modificaciones y/o adiciones necesarias para la ejecución del contrato de obra. Para el efecto deberá generará los documentos requeridos, todos los cuales deberán estar suscritos por el personal idóneo de la interventoria.
46	Comunicar en forma inmediata a la oficina de Contratación, a través del Supervisor, las determinaciones tomadas relacionadas con la ejecución del contrato, de lo que enviará copia al contratista.	La interventoría emitirá cuando sea requerido comunicación en forma inmediata a la oficina de Contratación, a través del Supervisor, de las determinaciones tomadas relacionadas con la ejecución del contrato, de lo que enviará copia al contratista.
47	Adelantar las revisiones periódicas que sean necesarias para garantizar que el contratista cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado.	Durante el presente periodo la interventoría ha adelantado las revisiones periódicas que han sido necesarias para garantizar que el contratista cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado.
48	El personal indicado en el Presupuesto como de tiempo completo tendrán disponibilidad permanente durante el plazo de ejecución del contrato de interventoría.	Durante el presente periodo la interventoria ha dispuesto el personal indicado en el presupuesto de forma permanente.
49	Adoptar, durante el desarrollo y ejecución del contrato, todas las medidas que sean necesarias para asegurar y mantener los altos niveles de eficiencia de las condiciones técnicas, mecánicas, profesionales, económicas y financieras ofrecidas por el contratista tanto de obra como de interventoría.	Durante el presente periodo la interventoria ha adoptado durante el desarrollo y ejecución del contrato, todas las medidas necesarias para asegurar y mantener los altos niveles de eficiencia de las condiciones técnicas, mecánicas, profesionales, económicas y financieras ofrecidas por el contratista tanto de obra como de interventoría.
50	Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de carácter laboral vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que son de cumplimiento obligatorio.	Durante el presente periodo la interventoria ha vigilado el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de carácter laboral vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que son de cumplimiento obligatorio.
51	Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que	Durante el presente periodo la interventoria ha realizado todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones y se ha dado cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le

	llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá cumplir con el pago del aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales que le corresponda (Art. 50 Ley 789 de 2002).	correspondan de acuerdo con el personal ofertado, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá cumplir con el pago del aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales que le corresponda (Art. 50 Ley 789 de 2002).
52	Verificar el cumplimiento del pago de seguridad social y parafiscales por parte del contratista de obra.	Durante el presente periodo la interventoria ha verificado el cumplimiento del pago de seguridad social y parafiscales por parte del contratista de obra.
53	Solicitar a la Supervisión, su intervención cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del asunto así lo requieran, para ello deberá informar oportunamente y por escrito al Supervisor del contrato, sobre anomalías que se detecten en la calidad de los proyectos a intervenir.	La interventoria solicitara a la Supervisión, su intervención cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del asunto así lo requieran, para ello deberá informar oportunamente y por escrito al Supervisor del contrato, sobre anomalías que se detecten en la calidad del proyecto a intervenir
54	Participar activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con el municipio en torno a las actividades a desarrollar en cada caso en concreto.	Durante el presente periodo la interventoria ha participado activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con el municipio en torno a las actividades a desarrollar en cada caso en concreto.
55	Acompañar las comisiones evaluadoras o de inspección enviadas por la Administración u otras entidades y suministrarles los datos pertinentes que sean requeridos.	La interventoría acompañara las comisiones evaluadoras o de inspección enviadas por la Administración u otras entidades y suministrarles los datos pertinentes que sean requeridos, en el momento que se requiera
56	Verificar que la obra se reciba y se liquide de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual deberá comprobar su calidad y estabilidad de las obras.	La interventoria verificará que la obra se reciba y se liquide de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual deberá comprobar su calidad y estabilidad de las obras, en el momento requerido
57	Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por el proveedor del contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando traslado de las que no lo sean, adjuntado en todo caso su concepto al respecto.	La interventoria ha atendido las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por el proveedor del contratista, y ha resuelto aquellas que han sido de su competencia y ha dado traslado de las que no son de la competencia, adjuntado en todo caso su concepto al respecto, cuando se ha requerido.
58	En caso de incumplimiento por causas imputables al contratista, informar a la dependencia responsable de la Supervisión a fin de que se adopten las medidas para que se hagan efectivas las sanciones correspondientes.	En caso de incumplimiento por causas imputables al contratista, la interventoria informara a la dependencia responsable de la Supervisión a fin de que se adopten las medidas para que se hagan efectivas las sanciones

		correspondientes.
59	Diligenciar en forma oportuna los informes técnicos indispensables, para la aplicación de sanciones, multas, garantías y cláusulas excepcionales de los contratos de obras, si fuere pertinente.	La Interventoria diligenciara en forma oportuna los informes técnicos indispensables, para la aplicación de sanciones, multas, garantías y cláusulas excepcionales de los contratos de obras, si fuere pertinente.
60	Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro oportuno de las sanciones, multas y garantías a que hubiere lugar.	La interventoria adelantara las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro oportuno de las sanciones, multas y garantías a que hubiere lugar.
61	Actuar de tal modo que se impida que por causas imputables a él o al contratista, sobrevenga un mayor costo en contra de los intereses patrimoniales de la Administración, en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	La interventoria actuara de tal modo que se impida que por causas imputables a él o al contratista, sobrevenga un mayor costo en contra de los intereses patrimoniales de la Administración, en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
62	Verificar y autorizar las actas parciales y final de pago que se presenten en el desarrollo del contrato. Documento que deben presentarse debidamente firmados por los profesionales de la interventoria, a la dependencia encargada de la supervisión y a la oficina de contratación.	La interventoría ha verificado y autorizado las actas parciales presentadas en el desarrollo del contrato. Documentos que serán presentados debidamente firmados por los profesionales de la interventoria, a la dependencia encargada de la supervisión y a la oficina de contratación, en el momento que se requiera.
63	Llevar junto con el constructor, así como custodiar y verificar un diario de obra "BITÁCORA DE OBRA" el cual deberá permanecer disponible en el sitio de obra, en él se consignarán todas las instrucciones, observaciones y determinaciones relacionadas con el desarrollo de la obra, y deberá ser firmado por los residentes de obra y de interventoria en forma diaria, y por los directores de estas en cada visita, esta se entregará en original en la liquidación.	Durante el presente periodo la interventoria ha llevado de forma conjunta con el contratista la bitácora de obra, la cual permanece en el sitio de obra y es firmado por los residentes de obra y de interventoría en forma diaria, y por los directores de estas en cada visita, esta se entregará en original en la liquidación.
64	Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada en desarrollo de los proyectos	Durante el presente periodo la interventoria ha mantenido la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada en desarrollo de los proyectos
65	Ejecutar en forma idónea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía exigida y la garantía presunta por los derechos del municipio como consumidor.	Durante el presente periodo la interventoria ha ejecutado en forma idónea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía exigida y la garantía presunta por los derechos del municipio como consumidor.
66	Desarrollar las actividades de seguimiento y	Durante el presente periodo la interventoría ha

	control del contrato de obra objeto de interventoria verificando el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas y obligaciones especiales fijadas para este; y a las exigencias propias de la interventoria, en sus diferentes ámbitos, ya registradas en este estudio previo.	desarrollado las actividades de seguimiento y control del contrato de obra objeto de interventoría verificando el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas y obligaciones especiales fijadas para este; y a las exigencias propias de la interventoría, en sus diferentes ámbitos, ya registradas en este estudio previo.
67	Acatar las indicaciones que la Supervisión le señale en cumplimiento del objeto contratado conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.	Durante el presente periodo la interventoria ha acatado las indicaciones que la Supervisión ha señalado en cumplimiento del objeto contratado conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.
68	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos.	Durante el presente periodo la interventoria ha obrado con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos.
69	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.	Durante el presente periodo la interventoria no ha accedido a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.
70	Facturar según lo estipulado en el artículo 615 del Estatuto Tributario.	La interventoria facturara según lo estipulado en el artículo 615 del Estatuto Tributario, en el momento que sea requerido.
71	Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las actas parciales y el acta de liquidación.	La interventoría radicara las facturas o documentos equivalentes por el trabajo ejecutado de conformidad con las actas parciales y el acta de liquidación, en el momento que sea requerido.
72	El contratista deberá presentar en sus cuentas de cobro, parciales y de liquidación, detallando los valores causados por la ejecución de los componentes contable, jurídico, ambiental, financiero y técnico de conformidad con la oferta económica aprobada por la entidad.	La interventoría presentara cuentas de cobro, parciales y de liquidación, detallando los valores causados por la ejecución de los componentes contable, jurídico, ambiental, financiero y técnico de conformidad con la oferta económica aprobada por la entidad, cuando sea requerido.
73	Solicitar con la debida anticipación la prórroga o extensión del plazo de ejecución del contrato si es del caso y de conformidad con la Ley, a fin de que pueda ser analizada y decidida en forma oportuna.	La interventoría ha solicitado con la debida anticipación la prórroga o extensión del plazo de ejecución del contrato si es del caso y de conformidad con la Ley, a fin de que pueda ser analizada y decidida en forma oportuna, cuando sea requerido.
74	Suscribir con el supervisor el acta de liquidación del contrato de obra e interventoria, de conformidad con lo previsto en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo allí pactado.	La interventoria suscribirá con el supervisor el acta de liquidación del contrato de obra e interventoria, de conformidad con lo previsto en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo allí pactado, cuando sea requerido.

75	Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos de este.	Durante el presente periodo la interventoría ha mantenido vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos de este.
76	Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato, en caso de se requiera una asesoría externa con profesionales o especialistas, esta será asumida por el contratista y no acarreara costo alguno al municipio.	Durante el presente periodo la interventoría ha ccumplido con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.
77	El Interventor se llega a requerir personal adicional al requerido, deberá vincular en la ejecución del contrato población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional en un porcentaje que no será superior al 10% ni inferior al 5%. El no cumplimiento de la obligación se impondrán las sanciones pecuniarias producto del incumplimiento injustificado, aplicando para el efecto la cláusula de multas prevista en el contrato	Durante el presente periodo la interventoría ha vinculado nuevo personal adicional requerido para actividades del proyecto.
78	Tener una oficina en la jurisdicción del municipio de Acacias durante todo el tiempo de la ejecución de la obra la cual debe funcionar como mínimo durante el mismo horario de atención al público de la Alcaldía de Acacias.	La interventoría cuenta con una oficina en jurisdicción del municipio de Acacias.
79	Mantener actualizado el domicilio y correos electrónicos en la oficina de contratación y la secretaria de infraestructura.	Durante el presente periodo la interventoría ha mantenido actualizado el domicilio y correos electrónicos en la oficina de contratación y la secretaria de infraestructura.
80	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningún motivo suspender o abandonar el objeto contratado.	Durante el presente periodo la interventoría ha dado estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningún motivo se ha suspendido o abandonado el objeto contratado
81	El interventor deberá gestionar y realizar la liquidación del contrato de obra objeto de interventoria, suscribiendo los documentos y actas que en el trámite se generen. En todo caso será su responsabilidad entregar el contrato de obra liquidado.	La interventoría gestionara y realizar la liquidación del contrato de obra objeto de interventoría, suscribiendo los documentos y actas que en el trámite se generen, siendo responsabilidad entregar el contrato de obra liquidado, en el momento que sea requerido
82	El interventor deberá Asistir a todas las actividades de gestión social exigidas en el Contrato para todas las fases del proyecto y a todas aquellas que cite el MUNICIPIO. Durante	Durante el presente periodo la interventoria ha asistido a todas las actividades de gestión social exigidas en el Contrato para todas las fases del proyecto asi mismo se han

	el desarrollo de reuniones informativas con la comunidad o con el comité de sostenibilidad, el área social debe acudir a las mismas en compañia de un delegado del área técnica, cuando sea necesario, con el fin de informar a la comunidad en aspectos técnicos.	realizado reuniones informativas con la comunidad con el fin de informar a la comunidad en aspectos técnicos.
83	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por parte del CONTRATISTA en los diferentes comités y reuniones con la comunidad.	Durante el presente periodo la interventoria ha realizado seguimiento a los compromisos adquiridos por parte del CONTRATISTA en los diferentes comités y reuniones con la comunidad.
84	Identificar las inquietudes de los ciudadanos y garantizar que el CONTRATISTA brinde atención y respuesta soportado en la viabilidad de estas, para lo cual la INTERVENTORÍA revisará y aprobará la información que será suministrada.	Durante el presente periodo la interventoria ha identificado las inquietudes de los ciudadanos y ha garantizado que el CONTRATISTA brinde atención y respuesta soportado en la viabilidad de estas.
85	Las demás derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebre, de la ley, del pliego de condiciones y las que en relación con el objeto del contrato le sean solicitadas por el Supervisor de este.	Durante el presente periodo la interventoria ha realizado y revisado todas las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebre, de la ley, del pliego de condiciones y las que en relación con el objeto del contrato.

7 INCONVENIENTES O PROBLEMAS PRESENTADOS

- Durante el periodo continuaron presentándose condiciones climáticas e hidráulicas desfavorables, asociadas a las lluvias, el nivel freático y las variaciones del caudal del rio Chichimene, las cuales limitaron principalmente la ejecución de las obras de protección y demás actividades desarrolladas en sectores con presencia de agua, requiriendo medidas permanentes de manejo y evacuación.

- Persistieron afectaciones en el rendimiento de la estructura metálica y actividades asociadas al tablero del puente, debido a la ejecución de soldaduras, ensamble y montaje de riostras y actividades previas requeridas para continuar con la conformación de la losa, generando incidencia sobre la secuencia constructiva y la programación vigente.

- Durante el presente período, las lluvias registradas de manera continua en la zona de intervención afectaron el normal desarrollo de las actividades en obra, generando limitaciones en la ejecución de los trabajos. En particular, se vieron impactadas las labores de soldadura para la estructura metálica del puente, las cuales no pueden ejecutarse bajo

condiciones de humedad o precipitación, en atención a los requisitos técnicos y de calidad del proceso, lo que incidió directamente en el avance de las actividades programadas.

- Se mantuvieron restricciones operativas relacionadas con la movilidad de la comunidad, debido a la necesidad de conservar el tránsito en el corredor durante la ejecución de determinadas actividades, situación que obliga a coordinar cierres parciales y pasos alternados y puede afectar los rendimientos programados.

- Se evidenció que el ritmo de ejecución continúa por debajo de la programación aprobada en la Prórroga No. 4, especialmente en actividades de superestructura, obras de protección, vías de acceso, andenes, obras complementarias e iluminación, requiriéndose mayor disponibilidad de recursos, equipos y frentes de trabajo para recuperar el atraso acumulado.

- Se mantiene las dificultades para la reposición de la maquinaria afectada por los hechos de vandalismo ocurridos el 28 de abril de 2026. Esta situación obedece a la limitada disponibilidad de equipos y a la desconfianza de propietarios y empresas proveedoras para vincular maquinaria al proyecto, debido al riesgo percibido de que se presenten nuevos hechos similares en la zona de intervención. Lo anterior ha generado restricciones en la disponibilidad de equipos para la ejecución de algunas actividades programadas, afectando el rendimiento y la programación de la obra.

8 CONCLUSIONES

- La Interventoría ha realizado seguimiento continuo a las actividades del Contratista, velando por el cumplimiento de los objetivos contractuales y de los pliegos de condiciones en aspectos como tiempo, calidad, cantidades y uso adecuado de los recursos. Ha promovido una comunicación coordinada entre las partes, facilitando la realización de reuniones técnicas, comités de obra y socializaciones, y ha verificado el desarrollo adecuado de los procesos mediante la revisión permanente de informes. Ante eventuales inconvenientes, ha brindado soluciones oportunas que han permitido ejercer un control efectivo de los riesgos. Además, ha mantenido vigilancia constante sobre todas las etapas contractuales, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, administrativas, legales, financieras, presupuestales, sociales y ambientales, con el personal ofertado conforme a las dedicaciones establecidas en el análisis de costos presentado por el contratista.

- Durante el período, el proyecto se ejecutó conforme a las condiciones y programación establecidas en la Prórroga No. 4, bajo el seguimiento, control y vigilancia permanente de la Interventoría en los componentes técnicos, administrativos, financieros, ambientales, sociales, de SST y de calidad.

- La Interventoria mantuvo seguimiento a las actividades de estructura metálica, vías de acceso, obras de protección, drenaje, andenes y demás obras complementarias, verificando su ejecución conforme a los diseños, especificaciones técnicas y controles de calidad aplicables.

- Las condiciones climáticas e hidráulicas, las restricciones de tránsito y la ejecución pendiente de actividades criticas continúan representando factores que afectan el desarrollo de la obra; no obstante, corresponde al Contratista implementar las medidas técnicas, logísticas y operativas necesarias para mitigar sus efectos y garantizar el cumplimiento del plazo contractual vigente.

- El análisis de ejecución del contrato para el presente periodo se realiza con base en la reprogramación presentada por el contratista y aprobada conforme a las condiciones establecidas en la Modificatoria de **Prorroga No.4**. Para este análisis se toma como fecha de corte la semana 108, al ser la más cercana a la fecha de elaboración del informe, considerando el avance de cantidades ejecutadas correspondiente a dicha semana.

- De acuerdo con lo anterior, el valor programado acumulado del contrato al corte del presente período asciende a $16.644.363.678,34, equivalente al 98,080% del valor total contractual. No obstante, el valor ejecutado acumulado corresponde a $14.145.688.205,80, lo que representa un avance del 83,356%. En consecuencia, se evidencia una desviación negativa frente a la programación por valor de -$2.498.675.472,54, equivalente a un desfase del 14,724% en el avance acumulado del contrato.

Firma	Firma
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	**JIMMY ANDRES TORRES CASTRO**
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

9 ANEXOS

- *ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DESARROLLADAS.*
- *ANEXO 2. ACTAS DE COMITE OBRA.*
- *ANEXO 3. INFORMES SEMANALES*
- *ANEXO 4. AFILIACIONES Y/O PAGOS DEL PERSONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA.*
- *ANEXO 5. CORRESPONDENCIA ENVIADA y RECIBIDA.*
- *ANEXO 6. INFORME DE INVERSION RECURSOS DE ANTICIPO.*
- *ANEXO 7. COPIA BITACORA DE OBRA.*
- *ANEXO 8. CERTIFICACIONES VARIAS.*
- *ANEXO 9. INFORME DE ESPECIALISTAS*

9.1 Registro Fotográfico

ALCALDÍA DE ACACÍAS


CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME D: 1 M: 8 A: 2026
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023
INTERVENTORIA		
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.



Fotografía 01: Trabajos de soldadura para ensamble de riostras de vigas metalicas.



Fotografía 02: Trabajos de soldadura para ensamble de riostras de vigas metalicas.

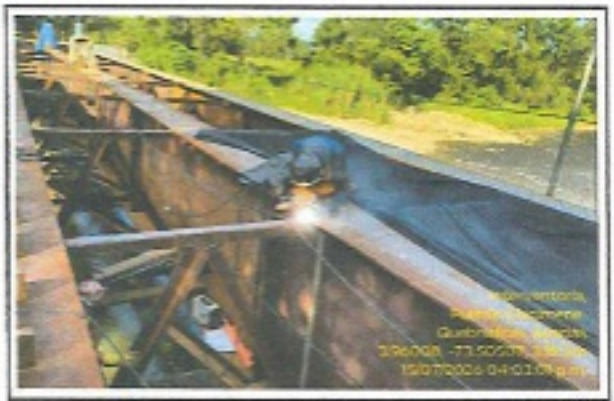

Fotografía 03: Trabajos de soldadura para ensamble de riostras de vigas metalicas.



Fotografía 04: Trabajos de soldadura para ensamble de riostras de vigas metalicas.

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE ACACÍAS

JR

CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME D: 1 M: 8 A: 2026
TIPO CONTRATO: INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023
CONTRATISTA: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA: CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.



Fotografia 05: Trabajos de soldadura para ensamble de riostras de vigas metalicas.



Fotografia 06: Trabajos de soldadura para ensamble de las secciones de vigas metalicas.



Fotografia 07: Trabajos de soldadura para ensamble de las secciones de vigas metalicas.



Fotografia 08: Posicionamiento de las vigas para el montaje mediante gatos hidraulicos.

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

JR


CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	8	2026
		D	M	A
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
INTERVENTORIA				
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		



Fotografía 09: Verificacion de trabajos de soldadura para ensamble de las secciones de vigas metalicas.



Fotografía 10: Trabajos de soldadura para ensamble de las secciones de vigas metalicas.

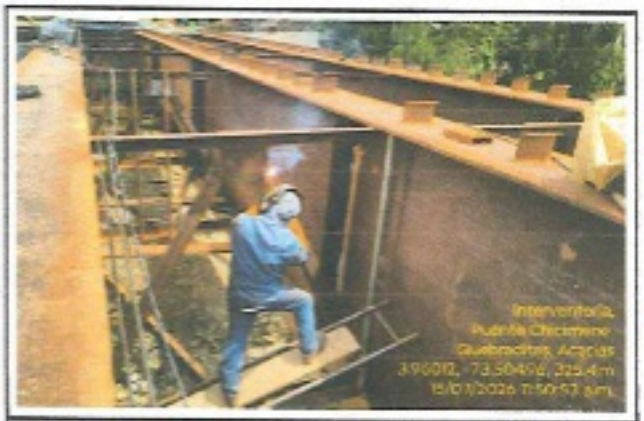

Fotografía 11: Inspeccion visual de los trabajos de soldadura para ensamble de las vigas metalicas.



Fotografía 12: Trabajos de soldadura para ensamble de las secciones de vigas metalicas.

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE ACACÍAS

JR

CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME D: 1 M: 8 A: 2026
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023
INTERVENTORIA		
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.



Fotografia 13: Realizacion de pruebas de ultrasonido a las soldaduras estructurales de las vigas metalicas.



Fotografia 14: Realizacion de pruebas de ultrasonido a las soldaduras estructurales de las vigas metalicas.



Fotografia 15: Verificacion de la ejecucion de pruebas de ultrasonido a las soldaduras a las vigas metalicas.



Fotografia 16: Verificacion de la ejecucion de pruebas de ultrasonido a las soldaduras a las vigas metalicas.

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME D: 1 M: 8 A: 2026
TIPO CONTRATO: INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023
CONTRATISTA: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA: CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.



Fotografia 17: Instalacion de sardineles de confinamiento en tramo vial Quebraditas.



Fotografia 18: Instalacion de sardineles de confinamiento en tramo vial Quebraditas.



Fotografia 19: Acopio de materiales para obras complementarias.



Fotografia 20: Acopio de materiales para obras de urbanismo.

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE ACACÍAS

JR

CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	8	2026
		D	M	A
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
INTERVENTORIA				
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		



Fotografia 21: Actividad de topografia en el montaje de las vigas metalicas.



Fotografia 22: Verificacion de actividad topografica en el montaje de las vigas metalicas.



Fotografia 23: Actividad de topografia en la construccion de estructura vial.



Fotografia 24: Actividad de topografia en la construccion de estructura vial.

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE ACACÍAS

JR

CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME D / M / A: 1 / 8 / 2026
TIPO CONTRATO: INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023
CONTRATISTA: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA: CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.



Fotografia 25: Control vial durante las actividades de la obra.



Fotografia 26: Control vial durante las actividades de la obra.



Fotografia 27: Señalizacion preventiva de zonas de trabajo.



Fotografia 28: Señalizacion preventiva de zonas de riesgo.

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE ACACÍAS

JR

CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME D: 1 M: 8 A: 2026
TIPO CONTRATO: INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023
CONTRATISTA: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA: CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.



Fotografía 29: Descargue de material de relleno para construccion de terraplen para estructura vial.



Fotografía 30: Extension de material de relleno para construccion de terraplen para estructura vial.



Fotografía 31: Compactacoion de capas de relleno para construccion de terraplen para estructura vial.



Fotografía 32: Extension y compactacoion de capa de subbase para estructura vial.

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE ACACÍAS

JR

CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME D: 1 M: 8 A: 2026
TIPO CONTRATO: INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023
CONTRATISTA: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA: CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.



Fotografía 33: Verificación de disponibilidad de puntos ecologicos.



Fotografía 34: Verificación de disponibilidad de puntos ecologicos.



Fotografía 35: Disponibilidad de unidaddes sanitarias.



Fotografía 36: Condiciones climaticas de lluvias.

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE ACACÍAS

JR

CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME D / M / A: 1 / 8 / 2026
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023
INTERVENTORIA		
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.



Fotografía 37: Verificación de elementos de emergencia.



Fotografía 38: Verificación de elementos de emergencia.



Fotografía 39: Verificación de elementos de emergencia.



Fotografía 40: Verificación de elementos de emergencia.

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE ACACÍAS

JR

CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	8	2026
		D	M	A
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
INTERVENTORIA				
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		



Fotografía 41: Comité tecnico de obra realizado en la oficina de Infraestructura.



Fotografía 42: Comité tecnico de obra realizado en la oficina de Infraestructura.



Fotografía 43: Visita del DNP a la obra.



Fotografía 44: Visita del DNP a la obra.

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

9.2 Actas de comité de obra.

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

FECHA	10	7	26

OBJETO DE CONTRATO:

CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

I. TEMAS A TRATAR EN EL COMITE

1 -Avance y estado de la estructura metálica.
2 -Control de calidad.
3 -Instalación del Metal Deck y construcción de la losa del puente
4 -Pavimento MR y accesos.
5 -Rellenos de los estribos y accesos.
6 -Obras de protección.
7 -Modificatoria No. 5.
8 -Atraso del proyecto.
9 -Plazo contractual y nosprobacion de mas prorrogas.
10 -Alumbrado fotovoltaico y barandas.
11 -Barandas del puente.
12 -Informes mensuales.
13 -Seguimiento ante regalias y DNP.
14 -Seguimiento semanal

II. OBJETO

COMITÉ TECICO DE OBRA No.84 REALIZADO EN LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N.A.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	AVANCE DEL COMPROMISO	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
1	Cronograma actualizado para la culminación del proyecto	3-jul	No Cumple
2	Terminacion de soldaduras estructurales y los arriostramientos	31-jul	Vigente
3	Instalación del Metal Deck	20-jul	Vigente
4	Terminación losas MR, losas de aproximación y andenes	15-ago	Vigente
5	Ejecución de los ensayos de ultrasonido	Terminada la soldadura	Vigente
6	Fundida de la losa del puente	Una vez instalado el Metal Deck	Vigente
7			
8			
9			

V. TEMAS TRATADOS


GENERALIDADES DE LOS CONTRATOS	
CONTRATO OBRA No	929 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS, META
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA RAL FRANCISCO MORA GUTIERREZ NIT No 901.767.420-0
VALOR	TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($13.430.269.893,00)
PLAZO	ONCE (11) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
ADICION No.1	TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($3.539.989.566)
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($16.970.259.459)
CONTRATO INTER No	876 DE 2023
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT No 9.668.796-1
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS.
VALOR	SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($627.081.787,00) M/CTE
PLAZO	ONCE (11) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
ADICION No.1	DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO ($291.652.095)
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS ($918.733.882)
FECCHA DE SUSPENSION No.1	24 DE ABRIL DEL 2025
FECCHA DE REINICIO No.1	17 DE JUNIO DEL 2025
FECHA DE INICIO	27 DE MAYO DE 2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	26 DE ABRIL DE 2025
PLAZO PRORROGA No.1	(7 MESES): TOTAL PLAZO CON PRORROGA No.1 (18 MESES)
PLAZO PRORROGA No.2	(3 MESES): TOTAL PLAZO CON PRORROGA No.2 (21 MESES)
PLAZO PRORROGA No.3	(2 MESES): TOTAL PLAZO CON PRORROGA No.3 (23 MESES)
PLAZO PRORROGA No.4	(3 MESES): TOTAL PLAZO CON PRORROGA No.4 (26 MESES)
NUEVA FECHA TERMINACION	20 DE SEPTIEMBRE DE 2026
SUPERVISOR	IVAN MAURICIO ROJAS
APOYO SUPERVISION	CRISTIAN EDUARDO FUENTES AMADO

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

LOCALIZACION DEL PROYECTO




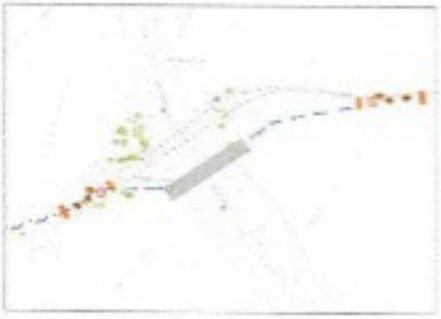


La zona para intervenir se encuentra ubicada en la Municipio de Acacías, específicamente está ubicada en la vía Terciaria que conduce a la vereda quebraditas a 34,4 Km del casco urbano del Municipio de Acacías Meta, de cuales 13,56 se encuentran en afirmado, las coordenadas de ubicación son las 03°57'39,99" N y 73°30'17,67" O

DETALLES DEL PUENTE Y ALCANCE DEL CONTRATO





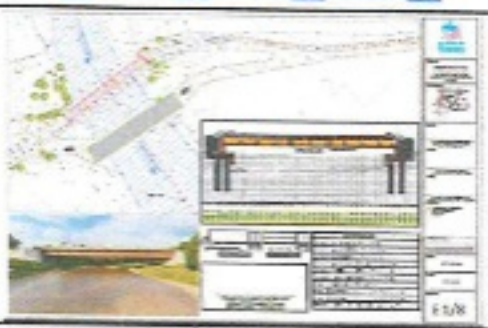



En el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" según modificatoria No 1 estableció en su ajuste lo siguiente: se plantea la construcción de un puente vehicular de 58.0 metros de luz entre ejes de apoyo y un tablero con un ancho de 10.7 metros a bordes externos, ancho efectivo de calzada de 7.30 metros, andenes a ambos costados de 1.20 metros; en el diseño realizado se plantea como apoyo del tablero 4 vigas en I metálicas de acero ASTM A-709 Grado 50W en alma llena, con una separación interna de 2.5 metros y una altura de 2450 milímetros; la infraestructura es una cimentación tipo pilote construyendo 8 pilotes por estribo para un total de 16 pilotes con un diámetro de1.50 metros y una profundidad de 12 metros cada uno; las barandas serán metálicas, tendrá protectores en concreto tipo new jersey los apoyos y juntas estarán en neopreno, las aletas y estribos serán en concreto reforzado y el tablero así como las placas de aproximación serán concreto reforzado, el puente contara con señalización horizontal y vertical respectivamente.

Se realizara la intervención del pluvial existente en una longitud de 140 metros, la construcción de 34 sumideros laterales y 1 pozos de inspección, así como la limpieza de los componentes existentes; de igual manera se realizara la construcción de un sistema de alumbrado público el cual está conformado por 29 módulos metálicos con luminarias Solares con foto celda Completa.


En el componente hidráulico y de protección se construirán 103 m3 de gaviones revestidos en concreto, 789 unidades de bolsacretos, distribuidos en una longitud de 76,87ml margen derecha y 39,06 margen izquierda, así como 160 horas de canalización en el río.


El componente vial se pavimentaran en concreto hidráulico 720 ml de vía en un espesor de 0,23m y anchos viales de 6 mts, incluyendo bocacalles, dicha longitud se distribuyo 476ml sector quebraditas, 159ml sector palomas y bocacalles apoyado en una subabse granular de espesor 0,25m, dicha intervención se complementa con sardineles, bordillos


ALCALDÍA DE
ACACÍAS


ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

ESQUEMAS DEL PUENTE

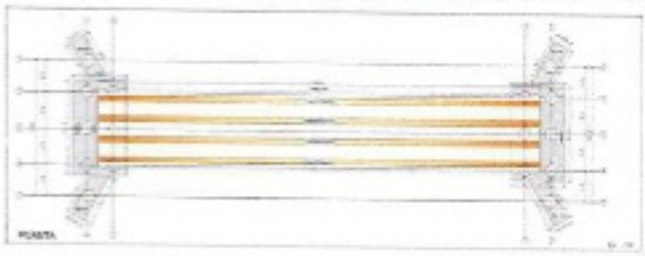

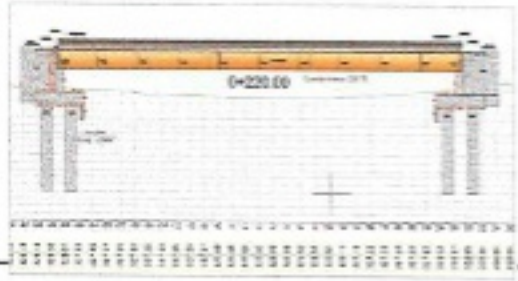


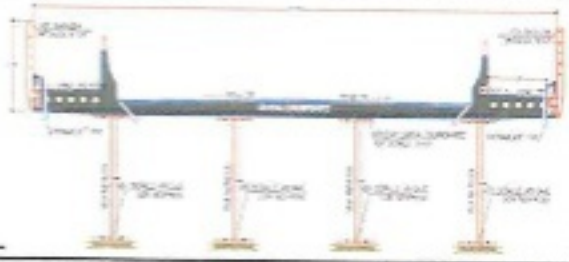



ALCANCE PRESUPUESTAL

CAPITULOS	($) INICIAL	($) MODIFICATORIA	%
1. CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR			
1.1 PRELIMINARES Y NPs	$ 272.192.313,00	$ 413.731.216,00	1,60%
1.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 61.121.896,00	$ 56.786.182,00	0,30%
1.3 INFRAESTRUCTURA	$ 1.310.733.807,00	$ 1.408.353.969,00	7,72%
1.4 SUPERESTRUCTURA	$ 364.786.302,00	$ 370.956.972,00	2,15%
1.5 ACERO DE REFUERZO	$ 8.249.590.695,00	$ 8.607.698.976,00	48,81%
1.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS	$ 204.344.290,00	$ 204.870.970,00	1,20%
2. VÍAS DE ACCESO PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA QUEBRADITAS			0,00%
2.1 PRELIMINARES	$ 3.138.849,00	$ 3.828.018,00	0,02%
2.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 880.519.181,00	$ 460.066.324,00	5,19%
2.3 PLUVIAL	$ 295.715.662,00	$ 91.871.488,00	1,74%
2.4 OBRAS DE PROTECCIÓN	$ 374.028.372,00	$ 1.117.411.963,00	2,20%
2.5 OBRAS DE DEMOLICIÓN	$ 168.737.584,00	$ 207.107.126,00	1,00%
2.6 ILUMINACIÓN	$ 320.579.141,00	$ 265.412.335,00	1,89%
2.7 PAVIMENTO ASFALTICO	$ 346.480.660,00	$ -	2,05%
2.8 ANDENES Y ESPACIO PUBLICO	$ 465.958.102,00	$ 594.184.788,00	2,74%
ITEMS NO PREVISTOS VIA		$ 1.798.209.238,00	0,00%
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 75.000.000,00	$ 75.000.000,00	0,44%
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 35.000.000,00	$ 35.000.000,00	0,21%
	$ 13.430.269.853,00	$ 16.970.259.458,00	100,00%

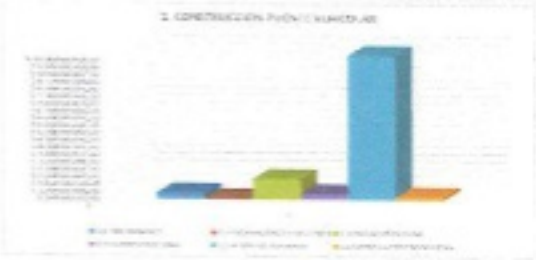



ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

ESTADO DE LA OBRA A LA FECHA

MATERIALES EN OBRA

No	ELEMENTO	UNID	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Acero instalado en pilotes	KG	31.338,18	Acero para pilotes
2	Acero instalado en viga cabezal, estribos y aletas.	KG	31.268,18	Acero para las vigas cabezales
3	Acero estructural en obra	KG	214.268,69	En proceso de montaje

Observaciones: Ya se tiene construidos los los estribos y calla en proceso de montaje de vigas metalicas, tambien se avanza con la estructura vial en concreto rigido.

EQUIPOS Y MAQUINARIA EN OBRA

No	CANTIDAD	MAQUINARIA Y/O EQUIPO
1	1	Planta electrica de 440 V
2	1	Equipo electricos manuales manuales.
3	2	Herramienta menor
	1	Retro-pajarita
	1	Vibrocompactador

Observaciones: A la fecha no se tiene mas equipos

PERSONAL

NO	TIPO PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACION
1	ADMINISTRATIVO	1	DIRECTOR	En obra
2	ADMINISTRATIVO	1	RESIDENTE	En obra
3	ADMINISTRATIVO		ESP ESTRU	
4	ADMINISTRATIVO		ESP VIAS	
5	ADMINISTRATIVO	1	SISO	En obra
6	ADMINISTRATIVO			
7	OPERATIVO	2	TOPOGRAFO	En obra
8	OPERATIVO	1	VIALISTAS	En obra
9	OPERATIVO		VIGILANTE	
10	OPERATIVO	8	OPERATIVOS	En obra
11	OPERATIVO			
12	OPERATIVO			

Observaciones: El personal esta realizando actividades armado de aceros para la viga cabezal del estribo Quebraditas.

ANALISIS FINANCIERO ANTICIPO Y PARCIALES




Observaciones: A la fecha se han aprobado toda las ordenes de operación por un valor total del anticipo que corresponde al 100.00%.

ESTADO DEL CONTRATO

Fecha de Inicio:	lunes, 27 de mayo de 2024		
Fecha de suspension	jueves, 24 de abril de 2025		
Fecha de Reinicio:	martes, 17 de junio de 2025		
Fecha terminación inicial:	sábado, 26 de abril de 2025		
Nueva fecha terminación:	lunes, 21 de septiembre de 2026		
Plazo dias:	795,00	plazo meses:	26,3
Fecha de análisis:	viernes, 10 de julio de 2026		Semana 134
Plazo transcurrido dias:	720,00	meses:	24,000
% transcurrido en tiempo:	90,794%	meses:	91,255%
Avance programado $:	$ 16.289.007.154,37		
Avance programado %:	96,87%		
Avance ejecutado $:	$ 14.140.546.408,80		
Avance ejecutado %:	85,318%		
Atraso (-) o avance (+) $:	-$ 2.148.740.681,80		
Atraso (-) o avance (+) %:	-12,727%		


Observaciones: Del presente análisis se concluye que el contratista mantiene un retraso constante en el cumplimiento del cronograma establecido.

GRAFICO FLUJO DE CAJA

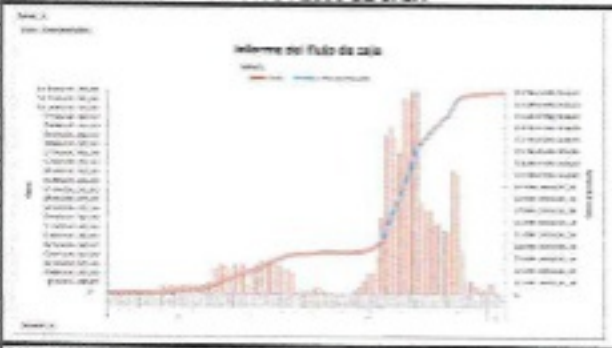


Observaciones: Este flujo de caja se encuentra ajustado a la nueva programación establecida mediante la Modificatoria No. 1.

PROGRAMADO VS EJECUTADO SEMANAL



Observaciones: La gráfica permite evidenciar un incremento progresivo en el atraso acumulado por parte del contratista frente a la programación establecida

AVANCE PROGRAMADO EJECUTADO POR CAPITULO



Observaciones: La gráfica permite evidenciar un incremento progresivo en el atraso acumulado por parte del contratista frente a la programación establecida


ALCALDÍA DE
ACACÍAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

ANALISIS DE AVANCE



ANALISIS DESEMPEÑO DE LA EJECUCION

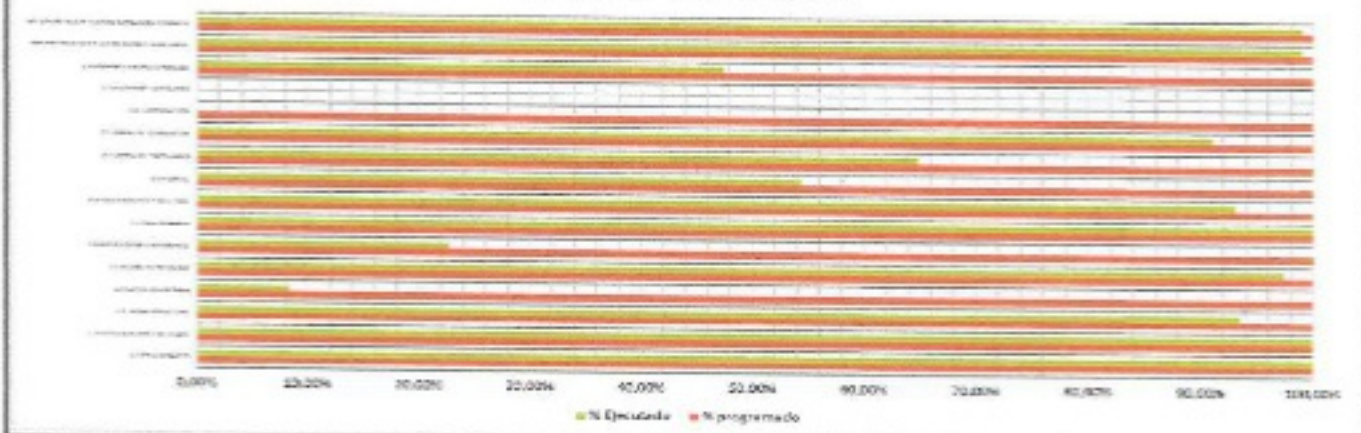

ANALISIS PORCENTUAL Y DE RECURSOS

CAPITULO	VALOR CAPITULO (PESO)	%	VALOR MODIFICATORIA 1	%	VALOR PAGO POR CAPITULO	% PAGO	VALOR EJECUTADO POR CAPITULO	% EJECUTADO	VALOR PENDIENTE POR CAPITULO	ATRASO	ADELANTO	%
1. CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR	$		$		$ 11.203.141.500,32	87,61%	$ 11.203.141.500,32			$	$ -	
1.1 PRE. MINADO	$		$		$		$			$	$ -	
1.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	$		$		$ 50.764.191,40		$ 50.764.191,40		$	$	$ -	
1.3 INFRAESTRUCTURA	$		$		$ 1.464.393.809,11		$ 1.316.109.481,00		$	$	$ -	
1.4 SUPERESTRUCTURA	$		$		$		$		$	$	$ -	
1.5 ALIVIO DE ANDAMIO	$		$		$ 46.670.700,00		$ 24.020.100,00		$	$	$ -	
1.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS	$		$		$ 9.057.886.870,81		$ 9.897.834.308,00		$	$	$ -	
2. VIAS DE ACCESO PUENTE VEHICULAR (SOLADO DE LA VEREDA EL PARAISO)	$		$		$ 157.809.730,19		$ 40.573.308,00		$	$	$ -	
2.1 PRE. MINADO	$		$		$ 4.140.520.362,54	32,39%	$ 2.613.627.696,00		$	$	$ -	
2.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	$		$		$ 3.636.814,00		$ 3.636.814,00		$	$	$ -	
2.3 PILOTAJE	$		$		$ 460.000.335,00		$ 420.236.871,00		$	$	$ -	
2.4 OBRAS DE PROTECCION	$		$		$ 81.671.455,00		$ 49.630.471,00		$	$	$ -	
2.5 OBRAS DE CONTENCION	$		$		$ 983.816.163,13		$ 734.629.263,00		$	$	$ -	
2.6 LOSA FONDO	$		$		$ 297.167.726,87		$ 488.611.963,00		$	$	$ -	
2.7 PAVIMENTO ASFALTICO	$		$		$ 139.539.362,25		$ 168.808,00		$	$	$ -	
2.8 MOBILIARIO Y SERVICIO PUBLICO	$		$		$		$		$	$	$ -	
IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$		$		$ 2.382.184.306,24		$ 1.735.859.173,00		$	$	$ -	
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	$		$		$ 74.200.173,00		$ 74.200.173,00		$	$	$ -	
	$		$		$ 34.666.369,76		$ 34.657.012,00		$	$	$ -	
	$		$		$ 16.291.660.915,68	85,73%	$ 14.139.772.757,00		$	$	$ -	

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

ACTA DE COMITÉ No.64

Siendo las 02:00 p.m. del día 10 de julio de 2026, se dio inicio al Comité Técnico de Obra, convocado por la Interventoría, de manera presencial en la oficina de Infraestructura de la Alcaldía de Acacías, el cual contó con la participación del director de Obra, Gerente de obra, Residente de Obra, Residente de Interventoria(virtual), apoyo de Interventoria, secretario de Infraestructura y apoyo a supervisión.

Objeto del comité.
Realizar el seguimiento al avance físico y al cumplimiento de la programación del proyecto, verificando el estado de ejecución de las actividades críticas, el porcentaje de avance y atraso de la obra, así como definir los compromisos y acciones necesarias para garantizar la culminación del contrato dentro del plazo establecido en la Prórroga No. 4, sin requerir nuevas ampliaciones del término contractual.

Temas tratados en el comité

1. Estado de la estructura metálica
El Contratista informó que las soldaduras longitudinales y transversales de las cuatro vigas principales se encontraban prácticamente terminadas, con un avance aproximado del 95%, quedando pendientes algunos retoques y la soldadura definitiva de los arriostramientos. Se aclaró que estos ya estaban instalados y punteados, por lo que faltaba completar los cordones de soldadura.
También se explicó que el proceso de soldadura se había retrasado por las lluvias, debido a que no es técnicamente procedente soldar sobre superficies húmedas. El Contratista señaló que, después de cada precipitación, debía secar la estructura antes de continuar con los trabajos.

2. Ensayos de control de calidad
Se informó que durante la fabricación de la estructura se realizaron controles mediante partículas magnéticas y ultrasonido. Para las uniones ejecutadas en campo, el Contratista manifestó que realizaría ensayos de ultrasonido durante la semana siguiente, con una duración estimada de dos a tres días.
3. Instalación del Metal Deck y construcción de la losa
El Contratista indicó que el Metal Deck comenzaría a instalar una vez terminaran los arriostramientos. Se estimó que el montaje del Metal Deck, instalación del acero y preparación de la losa podría tomar aproximadamente veinte días.
Se reiteró que la losa del puente deberá vaciarse de manera monolítica, en una sola jornada, con un volumen estimado entre 150 m³ de concreto. Para esta actividad se prevé el uso de bomba telescópica y la coordinación previa con la planta de concreto.
También se discutieron las condiciones climáticas y la necesidad de consultar alternativas técnicas para proteger el concreto en caso de lluvia durante el vaciado.

4. Pavimento rígido MR
Se informó que la maquinaria ya estaba nuevamente disponible y que se reanudarían los vaciados de concreto. Se indicó que el tramo de pavimento MR se redujo aproximadamente en 80 metros en la salida hacia Palomas, quedando una longitud cercana a 70 metros, debido principalmente a la necesidad de destinar recursos al relleno de los estribos y accesos al puente.
Como fecha tentativa, se mantuvo la terminación de las losas MR para el 15 de agosto de 2026.

5. Rellenos de los estribos y accesos
Se explicó que el presupuesto inicial no había contemplado completamente el relleno detrás de los estribos y aletas. Se estimó un volumen aproximado de más de 5.000 m³, necesario para conformar los accesos y la transición entre la vía y el puente.
Esta actividad fue señalada como una de las principales razones para redistribuir recursos mediante la modificatoria.

6. Obras de protección
Se informó que la longitud de algunas obras de protección fue ajustada. En uno de los sectores se redujo de aproximadamente de 53 metros a 34 metros, conservando una terminación anclada al terreno con un ángulo cercano a 45 grados.
Se aclaró que esta solución permitiría proteger los taludes, la estructura del puente y la caseta existente en el sector, manteniendo la funcionalidad de los gaviones y bolsacretos.

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

7. Modificatoria contractual
Se revisó el estado de la Modificatoria No. 5, indicando que había sido entregada para revisión y que aún se encontraban pendientes algunos ajustes antes de su aprobación definitiva.
Se manifestó que, una vez aprobada, deberán incorporarse los nuevos ítems y cantidades a la programación oficial del proyecto, con el fin de actualizar el avance programado y ejecutado.

8. Atraso del proyecto
La Interventoría y la Supervisión señalaron que el contrato presenta un atraso aproximado del 12,4% respecto de la nueva programación. Se indicó que el avance programado debería estar alrededor del 96,05%, mientras que el avance ejecutado alcanza solo 83,33% lo que demuestra un atraso del 12,73%.
Por lo anterior, se solicitó al Contratista presentar un plan de acción o plan de choque, indicando las actividades, personal, maquinaria y medidas que implementará para recuperar el atraso.

9. Fecha de terminación y ausencia de nuevas prórrogas
La Supervisión informó que, de acuerdo con lo manifestado por la Oficina de Contratación, no se prevé autorizar nuevas prórrogas. Por ello, se reiteró la obligación de finalizar todas las actividades dentro del plazo contractual vigente.
En el acta conviene dejar como fecha oficial de terminación el 21 de septiembre de 2026, que es la fecha contractual que se ha venido manejando en los documentos del proyecto.

10. Alumbrado fotovoltaico
El Contratista informó que:
•La totalidad de los postes se encontraba disponible.
•Las luminarias permanecían almacenadas en Bogotá para evitar pérdidas o daños en obra.
•De los 29 pedestales previstos, faltaban aproximadamente ocho por construir.
•La instalación se realizaría una vez avanzaran las actividades principales de obra civil.
También se mencionó un intento de ingreso no autorizado al sitio de almacenamiento, lo cual justificaba mantener los equipos de mayor valor bajo custodia.

11. Barandas del puente
Se informó que las barandas del puente ya se encuentran fabricadas o almacenadas en Bogotá, pendientes de traslado e instalación en obra.

12. Informes mensuales
Se indicó que los informes de los períodos anteriores habían sido entregados a Interventoría y se encuentran en revisión. El Contratista se comprometió a radicar el informe correspondiente al mes de junio el 15 de julio de 2026, atendiendo posteriormente las observaciones formuladas por la Interventoría.

13. Seguimiento ante regalías y DNP
La supervisión manifestó preocupación por los requerimientos de seguimiento efectuados desde el sistema de regalías y por la posibilidad de visitas o llamados de atención por parte del DNP, debido al número de prórroges, modificatorias y al atraso reportado.
Se solicitó mantener toda la información contractual, financiera, técnica y de avance debidamente actualizada y soportada.

14. Seguimiento semanal
Se acordó realizar comités de seguimiento todos los viernes, con el propósito de revisar:
•Avance físico semanal.
•Porcentaje de atraso.
•Cumplimiento de compromisos.
•Estado de la modificatoria.
•Ejecución del plan de acción.
•Actividades críticas pendientes.
El siguiente comité quedó planteado para el 17 de julio de 2026.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

Compromisos completos

1 -Culminar las soldaduras definitivas de los arriostramientos. **Contratista, 15 de julio de 2026**

2 -Ejecutar los ensayos de ultrasonido sobre las soldaduras realizadas en campo y entregar los resultados. **Contratista, 18 de julio de 2026**

3 -Iniciar la instalación del Metal Deck. **Contratista, 20 de julio de 2026**

4 -Presentar el plan de acción para recuperar el atraso aproximado del 12%. **Contratista, 15 de julio de 2026**

5 -Radicar el Informe Mensual correspondiente a junio. **Contratista 15 de julio de 2026**

6 -Actualizar la programación después de la aprobación de la Modificatoria No. 5. **Contratista, Inmediatamente después de su aprobación**

7 -Ejecutar la fundida monolítica de la losa del puente. **Contratista, 10 de agosto de 2026**

8 -Terminar las losas de pavimento MR. **Contratista, 15 de agosto de 2026**

9 -Continuar la construcción de los pedestales faltantes del sistema fotovoltaico. **Contratista, Según programación, antes de la instalación de luminarias**

10 -Finalizar las obras de protección, gaviones, bolsacretos y detalles pendientes. **Contratista, Antes del 21 de septiembre de 2026**

11 No solicitar nuevas ampliaciones del plazo y culminar el proyecto dentro del término contractual. **Contratista, 21 de septiembre de 2026**

12 Realizar comités semanales para verificar avance y atraso. Interventoria, **Supervisión y Contratista, Todos los viernes**

Cierre

- Se da por finalizada la reunión quedando establecidos los compromisos establecidos.

	B. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA	RESPONSABLES
1	Culminar las soldaduras definitivas de los arriostramientos.	15 de julio de 2026	Contratista
2	Ejecutar los ensayos de ultrasonido sobre las soldaduras en campo.	18 de julio de 2026	Contratista
3	Iniciar la instalación del Metal Deck.	20 de julio de 2026	Contratista
4	Presentar el plan de acción para recuperar atraso del 12,55%.	15 de julio de 2026	Contratista
5	Radicar el Informe Mensual correspondiente a junio.	15 de julio de 2026	Contratista
6	Actualizar la programación luego de aprobada la Modificatoria No. 5.	Con la probacion Modificatoria	Contratista
7	Ejecutar la fundida monolítica de la losa del puente.	10 de agosto de 2026	Contratista
8	Terminar las losas de pavimento MR	15 de agosto de 2026	Contratista
9	Continuar la construcción de pedestales del sistema fotovoltaico	Según programacion	Contratista
10	Finalizar las obras de protección, gaviones y detalles pendientes.	21 de julio de 2026	Contratista
11	No solicitar nuevas prorrogas dentro del término contractual.	21 de septiembre de 2026	Contratista
12	Realizar comités semanales para verificar avance y atraso.	Todos los viernes	Supervision e Interventoria

VII. PROXIMA REUNION

FECHA: 17 (DIA) | 7 (MES) | 2026 (AÑO)


Para constancia de lo anterior, se firma acta asistencia de la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Diez (10) (Día en letras) días del mes de Julio (Mes en que se firma el acta) de 2026

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL COMITE REALIZADO



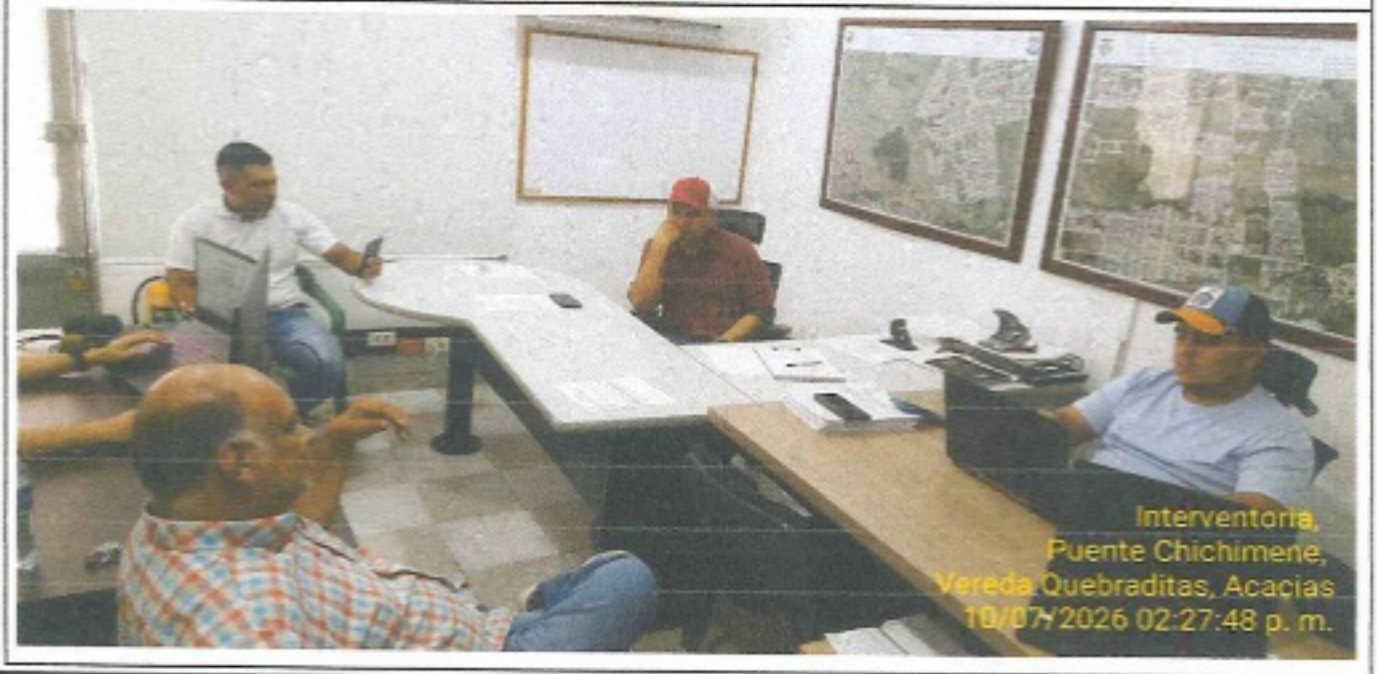

ALCALDÍA DE ACACÍAS

EVENTO / REUNIÓN:	CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS				
FECHA:	10 de Julio del 2026	HORA INICIO:	2:00 PM	HORA FINALIZACIÓN:	
EXPOSITOR / MODERADOR:	CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORIA, SUPERVISION				
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISO MORA GUTIERREZ		CONTRATO No	929 DE 2023	
INTERVENTORIA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONTRATO No	978 DE 2023	
SUPERVISION:	IVAN MAURICIO ROJAS SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA				

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Alexander Herrera M.	80237957	Consorcio Acacia	ING. RESID.		3115764384	.
2	Francisco Mora G	79926913	Consorcio Acacia	Rte Legal		3178192371	Pachomora67@gmail.com
3	Ivan Rojas N.	80731838	Alcaldía Acacias	Sec Infraestructura		3188473370	
4	Pedro Alfonso Rincón	3274632	Interventoría	Apoyo a Interventoría		3202332857	interventoriavias@gmail.com
5	JENNY A. TORRES	86063202	INFRAESTRUCTURA	DIRECTOR INF		3128203226	" " "
6	Jorge Augusto Rodriguez	9658796	Interventoría.	Residente Interventor		3134826364	" " "

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

FECHA	17	7	26

OBJETO DE CONTRATO:

CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

I. TEMAS A TRATAR EN EL COMITE

1 -Soldaduras de arriostramiento.
2 -Ensayos de ultrasonido.
3 -Instalación del Metal Deck.
4 -Plan de acción frente al atraso y respecto al último periodo prorrogado.
5 -Informe mes de junio.
6 -Actualizar la programación luego de aprobada la Modificatoria No. 5.
7 -Losa estructural del puente.
8 -Terminar las losas de pavimento MR.
9 -Obras de protección.
10 -Alumbrado fotovoltaico y barandas.

II. OBJETO

COMITÉ TECICO DE OBRA No.65 REALIZADO EN LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N.A.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	AVANCE DEL COMPROMISO	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
1	Culminar las soldaduras definitivas de los arriostramientos.	15-jul	No Cumple
2	Ejecutar los ensayos de ultrasonido sobre las soldaduras en campo.	16-jul	Vigente
3	Iniciar la instalación del Metal Deck	20-jul	Vigente
4	Presentar el plan de acción para recuperar atraso del 12,56%.	15-jul	Vigente
5	Radicar el Informe Mensual correspondiente a junio.	15-jul	No Cumple
6	Actualizar la programación luego de aprobada la Modificatoria No. 5.	Con la probacion Modificatoria	Vigente
7	Ejecutar la fundida monolitica de la losa del puente.	10-ago	Vigente
8	Terminar las losas de pavimento MR	15-ago	Vigente
9	Continuar la construcción de pedestales del sistema fotovoltaico	Según programacion	Vigente
7	Finalizar las obras de protección, gaviones y detalles pendientes.	22-jul	Vigente
8	No solicitar nuevas prorrogas dentro del término contractual.	21-sep	Vigente
9	Realizar comités semanales para verificar avance y atraso.	Todos los viernes	Vigente
9			

V. TEMAS TRATADOS


GENERALIDADES DE LOS CONTRATOS	
CONTRATO OBRA No	929 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS, META
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA GUTIERREZ NIT No 901.767.420-0
VALOR	TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES DOSICENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($13.430.269.893,00)
PLAZO	ONCE (11) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
ADICION No.1	TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($3.539.989.565)
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($16.970.259.458)
CONTRATO INTER No	978 DE 2023
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT No 9.658.795-1
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAR DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
VALOR	SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($627.081.787,00) M/CTE
PLAZO	ONCE (11) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
ADICION No.1	DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO ($291.652.095)
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS ($918.733.882)
FECCHA DE SUSPENSION No.1	24 DE ABRIL DEL 2025
FECCHA DE REINICIO No.1	17 DE JUNIO DEL 2025
FECHA DE INICIO	27 DE MAYO DE 2024
FECHA TERMINACION INICIAL	26 DE ABRIL DE 2025
PLAZO PRORROGA No.1	(7 MESES): TOTAL PLAZO CON PRORROGA No.1 (18 MESES)
PLAZO PRORROGA No.2	(3 MESES): TOTAL PLAZO CON PRORROGA No.2 (21 MESES)
PLAZO PRORROGA No.3	(2 MESES): TOTAL PLAZO CON PRORROGA No.3 (23 MESES)
PLAZO PRORROGA No.4	(3 MESES): TOTAL PLAZO CON PRORROGA No.4 (26 MESES)
NUEVA FECHA TERMINACION	20 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	IVAN MAURICIO ROJAS
APOYO SUPERVISION	CRISTIAN EDUARDO FUENTES AMADO

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO


LOCALIZACION DEL PROYECTO



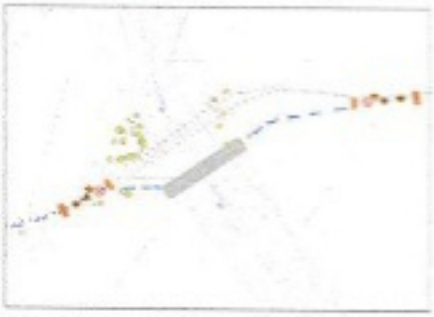



La zona para intervenir se encuentra ubicada en le Municipio de Acacias, especificamente está ubicada en la vía Terciaria que conduce a la vereda quebraditas a 34.4 Km del casco urbano del Municipio de Acacias Meta, de cuales 13.56 se encuentran en afirmado, las coordenadas de ubicación son las 03°57'39.89" N y 73°30'17.67" O

DETALLES DEL PUENTE Y ALCANCE DEL CONTRATO

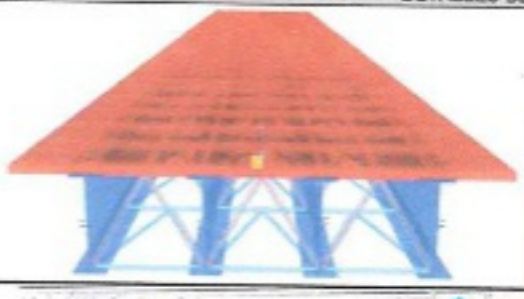



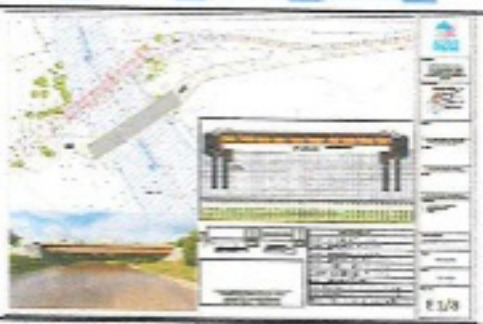

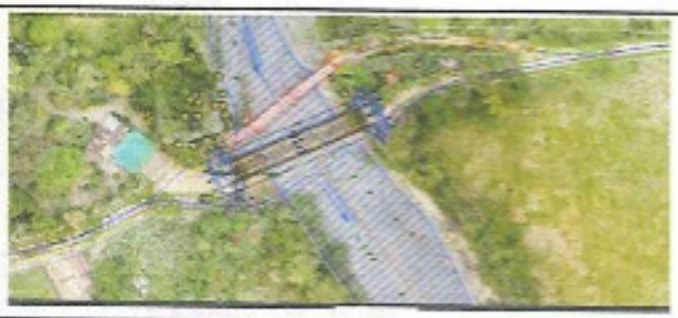

En el proyecto "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" según modificatoria No 1 estableció en su ajuste lo siguiente: se plantea la construcción de un puente vehicular de 58.0 metros de luz entre ejes de apoyo y un tablero con un ancho de 10.7 metros a bordes externos, ancho efectivo de calzada de 7.30 metros, andenes a ambos costados de 1.20 metros, en el diseño realizado se plantea como apoyo del tablero 4 vigas en Σ metálicas de acero ASTM A-709 Grado 50W en alma llena, con una separación interna de 2.5 metros y una altura de 2465 milímetros; la infraestructura es una cimentación tipo pilote construyendo 8 pilotes por estribo para un total de 16 pilotes con un diámetro Ø1,50 metros y una profundidad de 12 metros cada uno; las barandas serán metálicas, tendrá protecciones en concreto tipo new jersey los apoyos y juntas estarán en neopreno, las aletas y estribos serán en concreto reforzado y el tablero así como las placas de aproximación serán concreto reforzado, el puente contara con señalización horizontal y vertical respectivamente.

Se realizara la intervención del pluvial existente en una longitud de 140 metros, la construcción de 34 sumideros laterales y 1 pozos de inspección, así como la limpieza de los componentes existentes; de igual manera se realizara la construcción de un sistema de alumbrado público el cual está conformado por 29 mástiles metálicos con luminarias Solares con foto celda Completa.


En el componente hidráulico y de protección se construirán 103 m3 de gaviones revestidos en concreto, 789 unidades de bolsacretos, distribuidos en una longitud de 76,87ml margen derecha y 39,06 margen izquierda, así como 180 horas de canalización en el río.


El componente vial se pavimentaran en concreto hidráulico 720 ml de vía en un espesor de 0,23m y anchos viales de 6 mts, incluyendo bocacalles, dicha longitud se distribuye 476ml sector quebraditas, 156ml sector palomas y bocacalles soportado en una subbase granular de espesor 0,25m, dicha intervención se complementa con sardineles, bordillos

ALCALDÍA DE
ACACÍAS


ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

ESQUEMAS DEL PUENTE

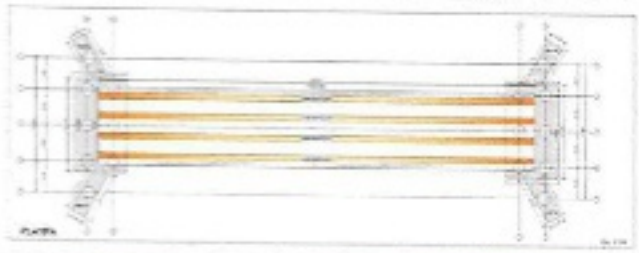

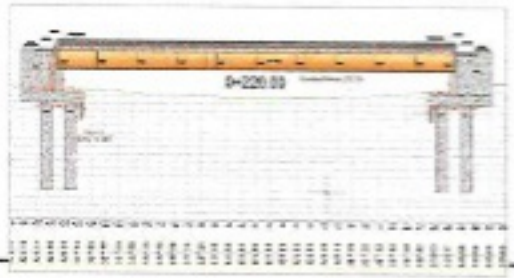







ALCANCE PRESUPUESTAL

CAPITULOS	($) INICIAL	($) MODIFICATORIA	%
1. CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR			
1.1 PRELIMINARES Y kPa	$ 272.192.913,00	$ 413.731.216,00	1,60%
1.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 61.121.695,00	$ 56.788.182,00	0,36%
1.3 INFRAESTRUCTURA	$ 1.310.739.807,00	$ 1.408.363.969,00	7,72%
1.4 SUPERESTRUCTURA	$ 364.706.302,00	$ 370.958.872,00	2,15%
1.5 ACERO DE REFUERZO	$ 8.249.530.695,00	$ 8.907.968.978,00	48,61%
1.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS	$ 204.344.260,00	$ 204.870.970,00	1,20%
2. VÍAS DE ACCESO PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA QUEBRADITAS			0,00%
2.1 PRELIMINARES	$ 3.136.848,00	$ 3.828.018,00	0,02%
2.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 880.518.191,00	$ 460.068.324,00	5,19%
2.3 PLUVIAL	$ 295.715.682,00	$ 91.871.488,00	1,74%
2.4 OBRAS DE PROTECCIÓN	$ 374.028.372,00	$ 1.117.411.983,00	2,20%
2.5 OBRAS DE DEMOLICIÓN	$ 169.737.064,00	$ 207.107.129,00	1,00%
2.6 ILUMINICACIÓN	$ 320.579.141,00	$ 236.412.335,00	1,89%
2.7 PAVIMENTO ASFALTICO	$ 348.485.660,00	$ -	2,05%
2.8 ANDENES Y ESPACIO PUBLICO	$ 466.368.102,00	$ 594.184.788,00	2,74%
ITEMS NO PREVISTOS VIA		$ 1.768.009.236,00	0,00%
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 75.000.000,00	$ 75.000.000,00	0,44%
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 36.000.000,00	$ 36.000.000,00	0,21%
	$ 13.430.269.883,00	$ 16.870.259.456,00	100,00%

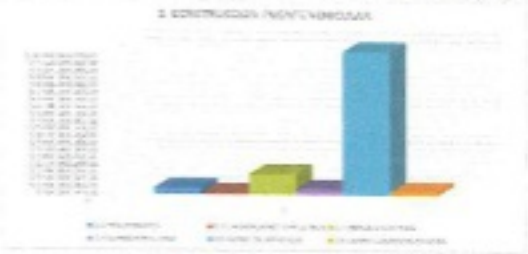

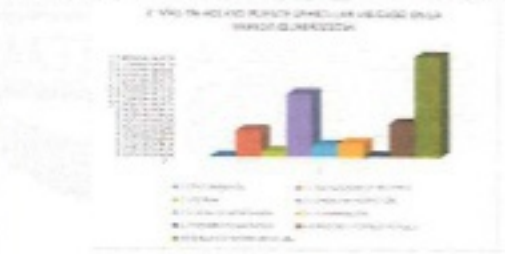

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

ESTADO DE LA OBRA A LA FECHA

MATERIALES EN OBRA

No	ELEMENTO	UNID	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	Acero instalado en pilotes	KG	31.338,18	Acero para pilotes
2	Acero instalado en viga cabezal, estribos y aletas.	KG	31.288,18	Acero para las vigas cabezales
3	Acero estructural en obra	KG	214.268,69	En proceso de montaje

Observaciones: Ya se tiene construidos los los estribos y esta en proceso de montaje de vigas metalicas, tambien se avanza con la estructura vial en concreto rigido.

EQUIPOS Y MAQUINARIA EN OBRA

No	CANTIDAD	MAQUINARIA Y/O EQUIPO
1	1	Planta electrica de 440 V
2	1	Equipo electricos menores manuales.
3	2	Herramienta menor
4	1	Retro-cajarfa
5	1	Vibrocompactador


Observaciones: A la fecha no se tiene mas equipos

PERSONAL

NO	TIPO PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACION
1	ADMINISTRATIVO	1	DIRECTOR	En obra
2	ADMINISTRATIVO	1	RESIDENTE	En obra
3	ADMINISTRATIVO		ESP ESTRU	
4	ADMINISTRATIVO		ESP VIAS	
5	ADMINISTRATIVO	1	SISO	En obra
6	ADMINISTRATIVO			
7	OPERATIVO	2	TOPOGRAFO	En obra
8	OPERATIVO	1	VIALISTAS	En obra
9	OPERATIVO		VIGILANTE	
10	OPERATIVO	8	OPERATIVOS	En obra
11	OPERATIVO			
12	OPERATIVO			

Observaciones: El personal esta trabajando actividades armado de acero para la viga cabezal del estribo Quebraditas.

ANALISIS FINANCIERO ANTICIPO Y PARCIALES

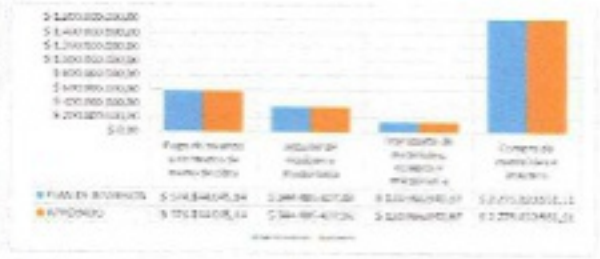


Observaciones: A la fecha se han aprobado todas las ordenes de operación por un valor total del anticipo que corresponde al 100,00%.

ESTADO DEL CONTRATO

Fecha de inicio:	lunes, 27 de mayo de 2024		
Fecha de suspension	jueves, 24 de abril de 2025		
Fecha de Reinicio:	martes, 17 de junio de 2025		
Fecha terminación inicial:	sábado, 26 de abril de 2025		
Nueva fecha terminación:	lunes, 21 de septiembre de 2026		
Plazo dias:	760,00	plazo meses:	26,3
Fecha de análisis:	viernes, 10 de julio de 2026		Semana 104
Plazo transcurrido dias:	720,00	meses:	24,000
% transcurrido en tiempo:	80,794%	meses:	91,255%
Avance programado $:	$ 16.269.007.194,37		
Avance programado %:	56,87%		
Avance ejecutado $:	$ 14.140.546.408,80		
Avance ejecutado %:	55,332%		
Atraso (-) o avance (+) $:	-$ 2.128.740.581,80		
Atraso (-) o avance (+) %:	-12,797%		


Observaciones: Del presente análisis se concluye que el contratista mantiene un retraso constante en el cumplimiento del cronograma establecido.

GRAFICO FLUJO DE CAJA

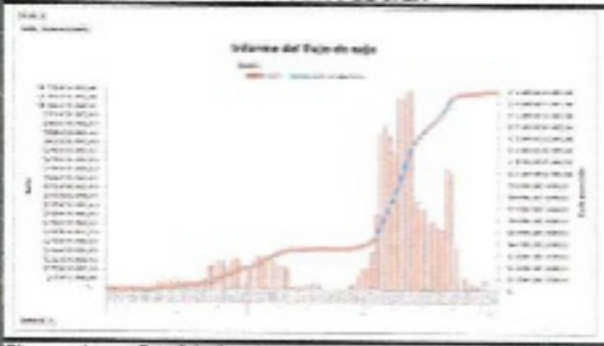


Observaciones: Este flujo de caja se encuentra ajustado a la nueva programación establecida mediante la Modificatoria No. 1.

PROGRAMADO VS EJECUTADO SEMANAL



Observaciones: La grafica permite evidenciar un incremento progresivo en el atraso acumulado por parte del contratista frente a la programación establecida

AVANCE PROGRAMADO EJECUTADO POR CAPITULO



Observaciones: La grafica permite evidenciar un incremento progresivo en el atraso acumulado por parte del contratista frente a la programación establecida


ALCALDÍA DE
ACACÍAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

ANALISIS DE AVANCE



ANALISIS DESEMPEÑO DE LA EJECUCION

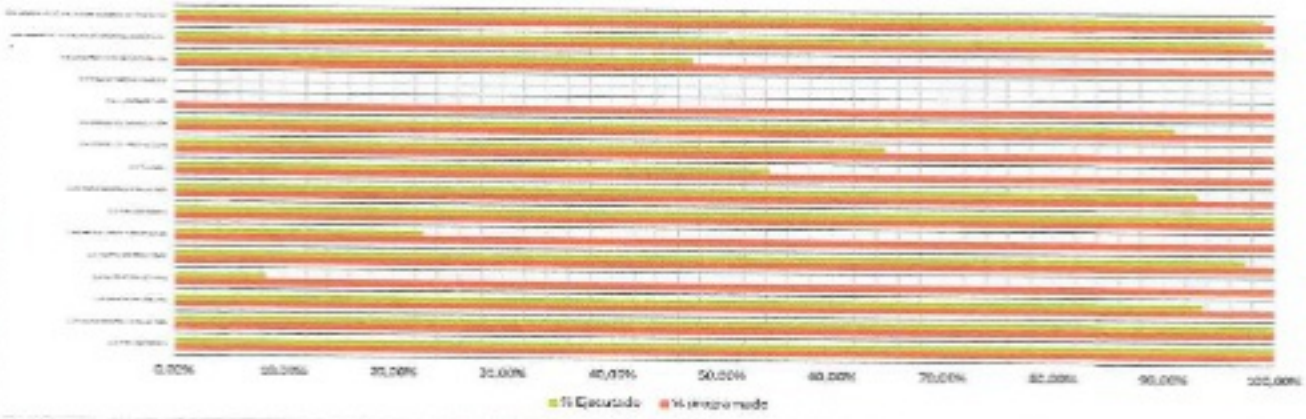

ANALISIS PORCENTUAL Y DE RECURSOS

CAPITULO	VALOR CAPITULO (INICIAL)	%	VALOR MODIFICATORIOS ±	%	VALOR PROGRESO CAPITULO	% AVANCE	VALOR EJECUTADO POR CAPITULO	% EJECUTADO	VALOR PENDIENTE POR CAPITULO	ATRASO	ADELANTO	%
1. CONSTRUCCION INSTITUCIONAL	$		$		$		$		$	$	$	
2. PRELIMINARES	$		$		$		$		$	$	$	
3. EXCAVACIONES Y RELLENOS	$		$		$		$		$	$	$	
4. INFRAESTRUCTURA	$		$		$		$		$	$	$	
5. ACERO DE REFUERZO	$		$		$		$		$	$	$	
6. CONCRETOS	$		$		$		$		$	$	$	
7. MAS DE ACCESO PUENTE VEHICULAR PEATONAL	$		$		$		$		$	$	$	
8. CONSTRUCCION CICLOPEA	$		$		$		$		$	$	$	
9. PAVIMENTO ASFALTICO	$		$		$		$		$	$	$	
10. MOBILIARIO Y ESPACIO PUBLICO	$		$		$		$		$	$	$	
11. IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$		$		$		$		$	$	$	
12. IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$		$		$		$		$	$	$	
	$		$		$		$		$	$	$	

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

ACTA DE COMITÉ No.65

Siendo las 02:00 p.m. del día 17 de julio de 2026, se dio inicio al Comité Técnico de Obra, convocado por la Interventoría, de manera presencial en la oficina de Infraestructura de la Alcaldía de Acacías, el cual contó con la participación, Residente de Obra, Residente de Interventoría(virtual), Director de Interventoría(virtual), apoyo de Interventoría, secretario de Infraestructura y apoyo a supervisión.

1 -OBJETO DEL COMITÉ.

Realizar seguimiento al avance físico y administrativo del proyecto, verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Comité No. 64, revisar las actividades críticas pendientes y definir acciones para garantizar la terminación de la obra dentro del plazo contractual vigente.

2 -REVISION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

De acuerdo con la revisión del comité anterior, se tiene las siguientes observaciones:

•Soldaduras de arriostramiento: incumplidas, debido a que no finalizaron el 15 de julio y su avance era inferior al esperado y se estima que estará terminada el 24 de julio del 2026. No cumple

•Ensayos de ultrasonido: atrasados por afectación del incumplimiento de compromiso anterior, ahora se espera que se inicie la realización para el 21 de julio. No cumple

•Inicio del Metal Deck: atrasado y condicionado a la finalización de los ensayos de ultrasonido. No cumple

•Plan de acción frente al atraso y respecto al último periodo prorrogado. El contratista no presento el plan de acción, por lo tanto. No cumple.

•Informe mes de junio: Continúan pendientes de radicación. No cumple.

•Actualizar la programación luego de aprobada la Modificatoria No. 5. La Modificatoria está pendiente de la firma del secretario. Vigente.

•Losa estructural del puente: Presenta riesgo de atraso de aproximadamente quince días por incumplimiento de compromisos anteriores y podría ejecutarse hacia finales de agosto. No Cumple.

•Terminar las losas de pavimento MR. En campo se observa un avance favorable y posiblemente se ejecute en el plazo establecido. Vigente.

•Obras de protección: sin reinicio y con riesgo de incumplir la fecha del 22 de julio.

•Pedestales fotovoltaicos: Pendientes y sin programación definida. No Cumple.

3 -TEMAS TRATADOS EN EL COMITÉ

3.1. Estado de las soldaduras de arriostramiento de la estructura metálica:

A la fecha de este comité no se ha culminado la actividad y, según la verificación realizada en campo por parte de la Interventoría el avance no superaba aproximadamente el 50.

3.2. Ensayos de ultrasonido en las soldaduras estructurales:

Los ensayos no se realizarían en la fecha acordada. Se reprogramaron para iniciar el 21 de julio y finalizar aproximadamente el 23 de julio.

3.3. Inicio e instalación del sistema Metal Deck:

El Contratista indicó que la instalación quedó condicionada a la terminación de los ensayos de ultrasonido. Se estimó una duración aproximada de veinte días.

3.4. Programación de la losa estructural del puente:

Se informó que Debido al atraso de las soldaduras, ensayos y Metal Deck, el Contratista indicó que la fundida no podría realizarse en la fecha inicialmente establecida y podría trasladarse hacia finales de agosto.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

3.5. Avance de las losas de pavimento MR:
Respecto a la losa de pavimento MR, se informó que la actividad presenta un avance favorable, evidenciándose la ejecución de rellenos, conformación de taludes y colocación de la capa de subbase. Se estimó que, manteniendo el ritmo de trabajo actual, la actividad podría culminarse entre el 10 y el 15 de agosto de 2026.

3.6. Estado de las obras de protección:
indicó que no se han reiniciado las actividades debido a las lluvias y al aumento del caudal, y el ingreso seguro al río.
Respecto a las obras de protección, el Contratista informó que las actividades pendientes no se han reanudado, debido a las lluvias constantes y al aumento del caudal del río lo que dificultan las labores debido al abundante flujo del nivel freático y las condiciones que han limitado el acceso y la ejecución segura de los trabajos. No obstante, se solicitó al Contratista definir una programación para su reinicio, considerando la fecha de compromiso establecida y el plazo contractual vigente.

3.7. Estado de trámite de la Modificatoria No. 5 y la reprogramación de obra:
En relación con la programación de obra, se informó que, aunque la Modificatoria No.5 se encontraba pendiente de firmas y radicación, ya se contaba con las cantidades e ítems definitivos, por lo cual era posible elaborar la programación ajustada, sin modificar el plazo contractual. Dicha programación fue remitida para revisión de la Interventoría y quedó pendiente la elaboración del flujo de caja semanal por capítulos, con el propósito de determinar el porcentaje actualizado de ejecución y atraso del proyecto

3.8. Avance general de la obra:
En cuanto al avance de la obra, se informó que el proyecto registra un avance físico ejecutado del 83,32 % y un atraso del 12,77 % respecto a la programación vigente. Se precisó que dicho atraso obedece a que la Modificatoria No. 5 aún se encuentra en trámite y la programación no ha sido ajustada oficialmente. No obstante, se indicó que las soldaduras principales de las vigas ya fueron culminadas, quedando pendiente la finalización de las soldaduras de arriostramiento y la ejecución de los ensayos de ultrasonido, actividades que condicionan el inicio de la instalación del Metal Deck. Asimismo, se evidenció un avance favorable en las losas de pavimento MR, mientras que la fundida de la losa estructural del puente deberá reprogramarse debido al desplazamiento de las actividades críticas.
3.9. Visita del Departamento Nacional de Planeación:
Respecto a la visita del Departamento Nacional de Planeación, la supervisión informó que esta se realizaría el 21 de julio de 2026, iniciando con una reunión en la Alcaldía de Acacías y posteriormente con una inspección en obra. Se solicitó disponer de la documentación técnica, contractual y financiera requerida, incluyendo soportes del anticipo, fiducia, socializaciones y modificaciones contractuales. Igualmente, se requirió la asistencia obligatoria de los directivos del Contratista y la Interventoría, así como garantizar que el personal y los frentes de trabajo se encontraran debidamente organizados y cumpliendo las condiciones de seguridad.

3.10. Ratificación de que la Entidad no concederá nuevas prórrogas:
La Entidad reiteró que no se concederán nuevas prórrogas al contrato, por lo que el Contratista deberá adoptar las medidas técnicas, operativas y administrativas necesarias para recuperar los atrasos y culminar la totalidad de las actividades dentro del plazo contractual vigente.

4 -COPROMISOS ADQUIRIDOS

4.1 Culminar las soldaduras definitivas de los arriostramientos.	Contratista	24 de julio de 2026
4.2 Ejecutar los ensayos de ultrasonido y resultados.	Contratista	21 de julio de 2026
4.3 Iniciar la instalación del Metal Deck.	Contratista	27 de julio de 2026
4.4 Presentar el plan de acción para recuperar el atraso del 12,7%.	Contratista	Inmediato

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

4.5 Radicar el Informe Mensual de junio.	Contratista	Inmediato
4.6 Actualizar la programación de la Modificatoria No. 5.	Contratista	Inmediatamente.
4.7 Ejecutar la losa del puente.	Contratista	28 de agosto de 2026
4.8 Terminar las losas de pavimento MR.	Contratista	15 de agosto de 2026
4.9 Finalizar las obras de protección	Contratista	Urgente presentar programación.
4.10 Realizar comités semanales para verificar avance y atraso.	Inter-Sup-Contr	Todos los viernes
4.11 Asistir obligatoriamente a la reunión y visita del DNP.	Contr-Interv	21 de Julio

Cierre

- Abordados todos los temas, se da por finalizada la reunión siendo las 03:00 p.m, quedando establecidos los compromisos y el respectivo seguimiento por parte de la interventoría y la supervisión.

5. COMPROMISOS PACTADOS

		FECHA	RESPONSABLES
1	Culminar las soldaduras definitivas de los arriostramientos	24 de julio de 2026	Contratista
2	Ejecutar los ensayos de ultrasonido y entregar los resultados	21 de julio de 2026	Contratista
3	Iniciar la instalación del Metal Deck. Contratista	27 de julio de 2026	Contratista
1	Presentar el plan de acción para recuperar el atraso del 12%	Inmediato	Contratista
5	Radicar el Informe Mensual correspondiente a junio	Inmediato	Contratista
6	Actualizar la programación de la aprobación de la Modificatoria No. 5	Inmediato	Contratista
7	Ejecutar la fundida monolítica de la losa del puente	28 de julio de 2026	Contratista
8	Reiniciar las losas de pavimento MR	15 de julio de 2026	Contratista
9	Finalizar las obras de protección	Urgente	Contratista
10	Realizar comités semanales	Todos los viernes 2:00 PM	Contratista
11	Asistir obligatoriamente a la reunión del DNP	Todos los directivos	Contratista - Interventoría
12			

VII. PROXIMA REUNION


FECHA 24 (DIA) 7 (MES) 2026 (AÑO)


Para constancia de lo anterior, se firma acta asistencia de la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Diecisiete (17) días del mes de Julio de 2026

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL COMITE REALIZADO

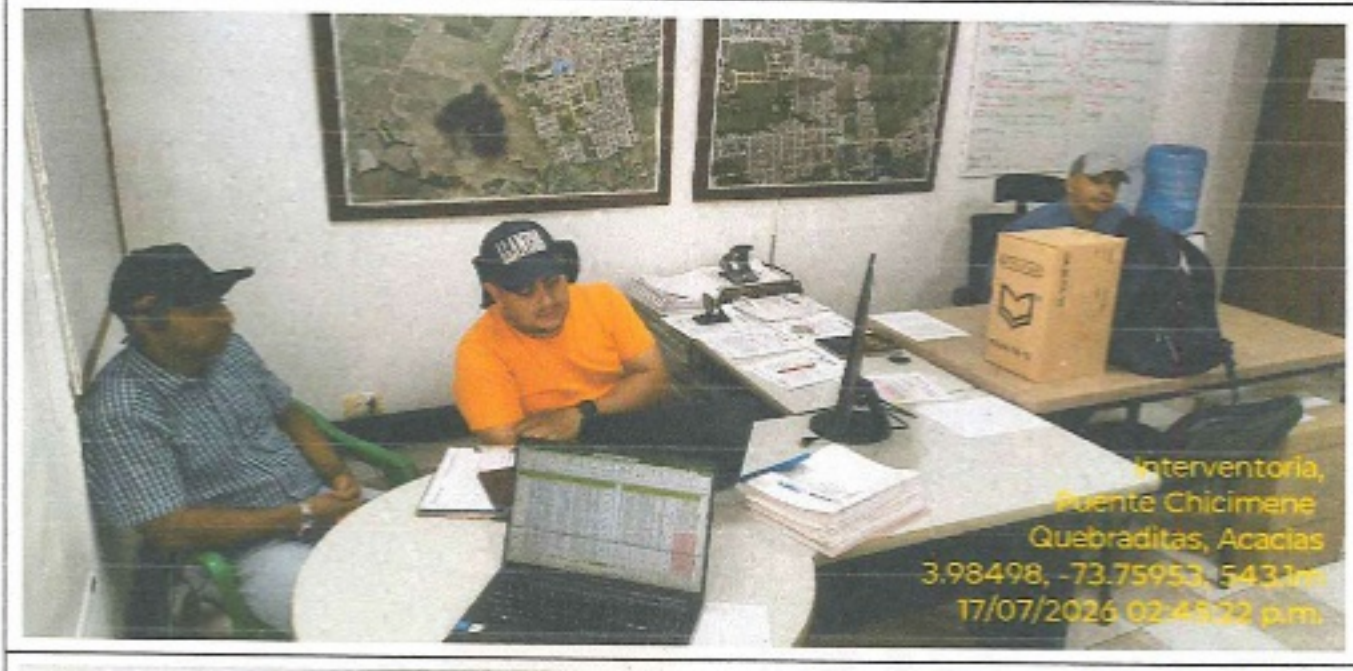

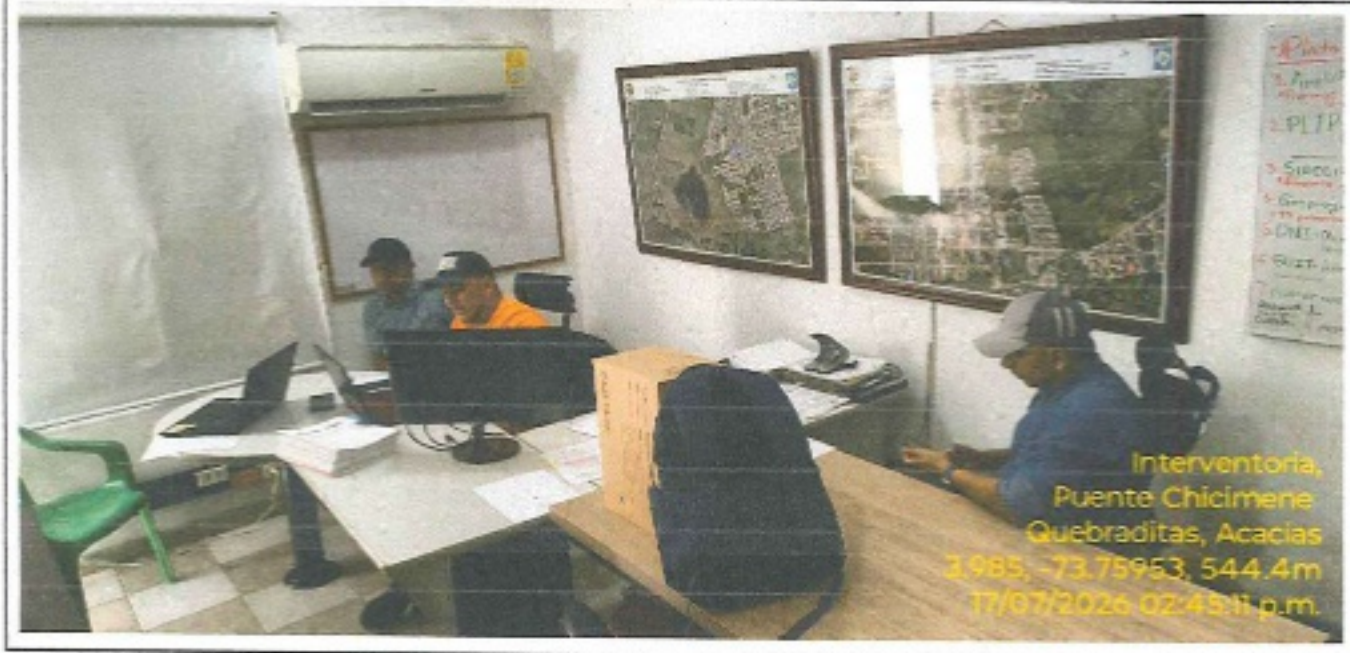

ALCALDÍA DE ACACÍAS

EVENTO / REUNIÓN:	CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS				
FECHA:	17 de Julio del 2026	HORA INICIO:	2:00 PM	HORA FINALIZACIÓN:	3:00 PM.
EXPOSITOR / MODERADOR:	CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORIA, SUPERVISION				
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISO MORA GUTIERREZ			CONTRATO No	929 DE 2023
INTERVENTORIA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA			CONTRATO No	978 DE 2023
SUPERVISION:	IVAN MAURICIO ROJAS SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA				

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Pedro Eladio Alfaro	3274632	Interventoria	Apoyo Interven		3212332857	Interventoriachichimene@gmail.com
2	Alexander Herrera	1115764384	Consorcio A	Ing Resid		3115764384	
3	Ivan Rojas N.	80741838	Secretario infraestructura	Secretario		3138473450	infraestructura@acacias-meta.gov.co
4	Jorge A. Rodriguez R.	9658796	Interventoria	Ing. Residente		3134826547	interventoriachichimene@gmail.com
5	Johnny A. Torres	86063702	Interventoria	Director		3124103226	Interventoriachichimene@gmail.com

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

FECHA	24	7	25

OBJETO DE CONTRATO:

CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

I. TEMAS A TRATAR EN EL COMITE

1. Seguimiento de los compromisos del Comité anterior No. 65.
2. Avance de las soldaduras de las riostras del puente.
3. Ejecución de los ensayos de ultrasonido a las soldaduras.
4. Inicio de la instalación del Metal Deck.
5. Presentación del plan de acción por atraso del proyecto
6. Programación de la fundida de la losa del puente.
7. Reinicio de la construcción del pavimento en concreto MR-40.
8. Estado de ejecución de las obras de protección (bolsacretos y gaviones).
9. Seguimiento al porcentaje de avance físico y atraso del proyecto.
10. Estado de la Modificatoria No. 5 y conceptos técnicos requeridos.

II. OBJETO

COMITÉ TECICO DE OBRA No.66 REALIZADO EN LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N.A.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No.	COMPROMISO Y/O ACCION DE MEJORA	AVANCE DEL COMPROMISO	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
1	Culminar las soldaduras definitivas de los arriostramientos.	24-jul	No Cumple
2	Ejecutar los ensayos de ultrasonido sobre las soldaduras en campo.	21-jul	Cumple
3	Iniciar la instalación del Metal Deck.	27-jul	Vigente
4	Presentar el plan de acción para recuperar el atraso del 12%	Inmediato	No Cumple
5	Radicar el Informe Mensual correspondiente a junio	Inmediato	No Cumple
6	Actualizar la programación de la aprobación de la Modificatoria No. 5	Inmediato	Cumple
7	Ejecutar la fundida monolítica de la losa del puente	28-jul	Vigente
8	Reiniciar las losas de pavimento MR	15-jul	No Cumple
9	Finalizar las obras de protección	Urgente	No Cumple
7	Realizar comités semanales	Todos los Viernes 2.00 PM	Todos los viernes 2.00 PM

V. TEMAS TRATADOS


GENERALIDADES DE LOS CONTRATOS	
CONTRATO OBRA No	929 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS, META
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA GUTIERREZ NIT No 901.757.420-0
VALOR	TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES DOSICENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($13.430.269.893,00)
PLAZO	ONCE (11) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
ADICION No.1	TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($3.539.989.565)
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($16.970.259.458)
CONTRATO INTER No	976 DE 2023
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT No 9.656.795-1
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
VALOR	SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($627.081.787,00) M/CTE
PLAZO	ONCE (11) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
ADICION No.1	DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO ($291.652.095)
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS ($918.733.882)
FECCHA DE SUSPENSION No.1	24 DE ABRIL DEL 2025
FECCHA DE REINICIO No.1	17 DE JUNIO DEL 2025
FECHA DE INICIO	27 DE MAYO DE 2024
FECHA TERMINACION INICIAL	26 DE ABRIL DE 2025
PLAZO PRORROGA No.1	(7 MESES): TOTAL PLAZO CON PRORROGA No.1 (18 MESES)
PLAZO PRORROGA No.2	(3 MESES): TOTAL PLAZO CON PRORROGA No.2 (21 MESES)
PLAZO PRORROGA No.3	(2 MESES): TOTAL PLAZO CON PRORROGA No.3 (23 MESES)
PLAZO PRORROGA No.4	(3 MESES): TOTAL PLAZO CON PRORROGA No.4 (26 MESES)
NUEVA FECHA TERMINACION	20 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	IVAN MAURICIO ROJAS
APOYO SUPERVISION	CRISTIAN EDUARDO FUENTES AMADO

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO


LOCALIZACION DEL PROYECTO



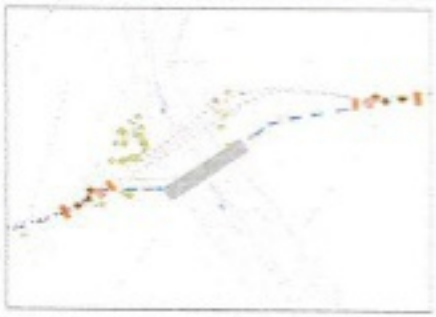

La zona para intervenir se encuentra ubicada en la Municipio de Acacias, específicamente está ubicada en la vía Terciaria que conduce a la vereda quebraditas a 34,4 Km del casco urbano del Municipio de Acacias Meta, de cuales 13.56 se encuentran en afirmado, las coordenadas de ubicación son las 3°57'39.89" N y 73°30'17.67" O

DETALLES DEL PUENTE Y ALCANCE DEL CONTRATO

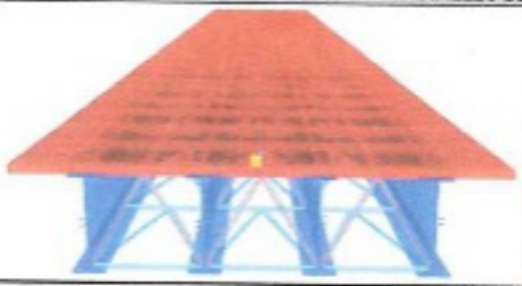







En el proyecto "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" según modificatoria No 1 estableció en su ajuste lo siguiente; se plantea la construcción de un puente vehicular de 55.0 metros de luz entre ejes de apoyo y un tablero con un ancho de 10.7 metros a bordes externos, ancho efectivo de calzada de 7.30 metros, andenes a ambos costados de 1.20 metros; en el diseño realizado se plantea como apoyo del tablero 4 vigas en Ξ metálicas de acero ASTM A-709 Grado 50W en alma llena, con una separación interna de 2.5 metros y una altura de 2485 milímetros; la infraestructura es una cimentación tipo pilote construyendo 8 pilotes por estribo para un total de 16 pilotes con un diámetro ø1.50 metros y una profundidad de 12 metros cada uno; las barandas será metálicas, tendrá protectores en concreto tipo new jersey los apoyos y juntas estarán en neopreno, las aletas y estribos serán en concreto reforzado y el tablero así como las placas de aproximación serán concreto reforzado, el puente contara con señalización horizontal y vertical respectivamente.

Se realizara la intervención del pavimento existente en una longitud de 140 metros, la construcción de 34 sumideros laterales y 1 pozos de inspección, así como la limpieza de los componentes existentes; de igual manera se realizara la construcción de un sistema de alumbrado público el cual está conformado por 26 mástiles metálicos con luminarias Soleres con foto celda Completa.


En el componente hidráulico y de protección se construirán 103 m3 de gaviones revestidos en concreto, 789 unidades de bolsacretos, distribuidos en una longitud de 76,97ml margen derecha y 39,08 margen izquierda, así como 180 horas de canalización en el río.


El componente vial se pavimentaran en concreto hidráulico 720 ml de vía en un espesor de 0,23m y anchos viales de 6 mts, incluyendo bocacalles, dicha longitud se distribuye 476ml sector quebraditas, 150ml sector palomas y bocacalles apoyada en una subbase granular de espesor 0,25m, dicha intervención se complementa con sardineles, bordillos

ALCALDÍA DE
ACACÍAS


ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

ESQUEMAS DEL PUENTE



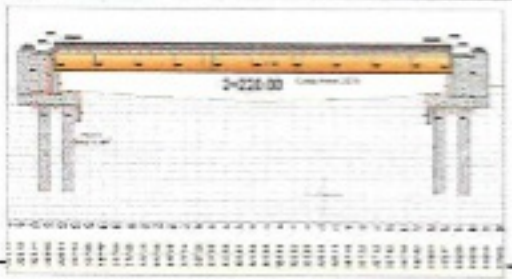







ALCANCE PRESUPUESTAL

CAPITULOS	($) INICIAL	($) MODIFICATORIA	%
1. CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR			
1.1 PRELIMINARES Y NPs	$ 272.192.313,00	$ 419.731.216,00	1,60%
1.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 61.121.996,00	$ 96.786.182,00	0,36%
1.3 INFRAESTRUCTURA	$ 1.310.730.807,00	$ 1.408.959.969,00	7,72%
1.4 SUPERESTRUCTURA	$ 364.786.302,00	$ 370.956.572,00	2,15%
1.5 ACERO DE REFUERZO	$ 8.249.530.635,00	$ 9.907.668.976,00	48,61%
1.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS	$ 204.344.290,00	$ 204.870.970,00	1,20%
2. VÍAS DE ACCESO PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA QUEBRADITAS			0,00%
2.1 PRELIMINARES	$ 3.136.848,00	$ 3.826.018,00	0,02%
2.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 880.516.161,00	$ 480.088.304,00	5,16%
2.3 PLUVIAL	$ 295.715.982,00	$ 81.671.488,00	1,74%
2.4 OBRAS DE PROTECCIÓN	$ 374.028.372,00	$ 1.117.411.963,00	2,20%
2.5 OBRAS DE DEMOLICIÓN	$ 169.737.564,00	$ 207.107.126,00	1,00%
2.6 ILUMINACIÓN	$ 320.579.141,00	$ 255.412.395,00	1,89%
2.7 PAVIMENTO ASFÁLTICO	$ 348.486.960,00	$ -	2,05%
2.8 ANDENES Y ESPACIO PUBLICO	$ 465.358.102,00	$ 584.184.788,00	2,74%
ITEMS NO PREVISTOS VIA		$ 1.766.000.238,00	0,00%
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 75.000.000,00	$ 75.000.000,00	0,44%
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	$ 35.000.000,00	$ 35.000.000,00	0,21%
	$ 13.430.289.893,00	$ 16.970.259.408,00	100,00%

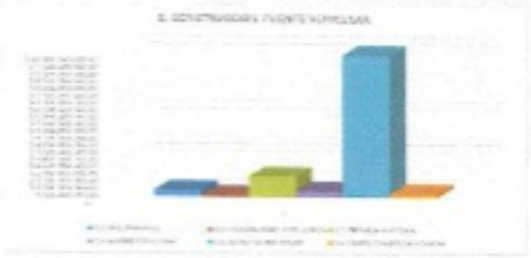



ALCALDÍA DE
ACACÍAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

ESTADO DE LA OBRA A LA FECHA

MATERIALES EN OBRA

No	ELEMENTO	UND	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Acero instalado en pilotes	KG	31.338,18	Acero para pilotes
2	Acero instalado en viga cabezal, estribos y aletas.	KG	31.266,16	Acero para las vigas cabezales
3	Acero estructural en obra	KG	214.268,69	En proceso de montaje

Observaciones: Ya se tiene construidos los los estribos y esta en proceso de montaje de vigas metalicas, tambien se avanza con la estructura vial en concreto rigido.

EQUIPOS Y MAQUINARIA EN OBRA

No	CANTIDAD	MAQUINARIA Y/O EQUIPO
1	1	Planta electrica de 440 V
2	1	Equipo electricos menores manuales.
3	2	Herramienta menor
4	1	Retro-pajarita
5	1	Vibrocompactador

Observaciones: A la fecha no se tiene mas equipos

PERSONAL

NO	TIPO PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACION
1	ADMINISTRATIVO	1	DIRECTOR	En obra
2	ADMINISTRATIVO	1	RESIDENTE	En obra
3	ADMINISTRATIVO		ESP ESTRU	
4	ADMINISTRATIVO		ESP VIAS	
5	ADMINISTRATIVO	1	SISO	En obra
6	ADMINISTRATIVO			
7	OPERATIVO	2	TOPOGRAFO	En obra
8	OPERATIVO	1	VIALISTAS	En obra
9	OPERATIVO		VIGILANTE	
10	OPERATIVO	8	OPERATIVOS	En obra
11	OPERATIVO			
12	OPERATIVO			

Observaciones: El personal esta realizando actividades armado de aceros para la viga cabezal del estribo Quebradillas

ANALISIS FINANCIERO ANTICIPO Y PARCIALES




Observaciones: A la fecha se han aprobado todas las ordenes de operación por un valor total del anticipo que corresponde al 100,00%.

ESTADO DEL CONTRATO

Fecha de inicio:	lunes, 27 de mayo de 2024		
Fecha de suspension	jueves, 24 de abril de 2025		
Fecha de Reinicio:	martes, 17 de junio de 2025		
Fecha terminación Inicial:	sábado, 26 de abril de 2025		
Nueva fecha terminación:	lunes, 21 de septiembre de 2026		
Plazo días:	798,00	plazo meses:	26,3
Fecha de analisis:	viernes, 24 de julio de 2026		Semana 106
Plazo transcurrido días:	704,00	meses:	24,467
% transcurrido en tiempo:	92,486%	meses:	93,028%
Avance programado $:	$ 16.344.240.919,07		
Avance programado %:	86,31%		
Avance ejecutado $:	$ 14.142.893.227,80		
Avance ejecutado %:	86,598%		
Atraso (-) o avance (+) $:	$ 2.201.440.691,27		
Atraso (-) o avance (+) %:	-12,972%		


Observaciones: Del presente análisis se concluya que el contratista mantiene un retraso constante en el cumplimiento del cronograma establecido.

GRAFICO FLUJO DE CAJA

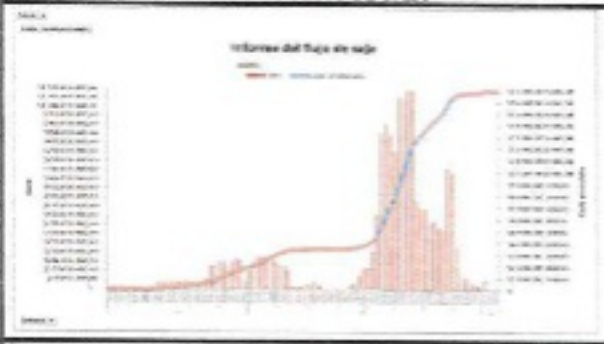

Observaciones: Este flujo de caja se encuentra ajustado a la nueva programación establecida mediante la Modificatoria No. 1.

PROGRAMADO VS EJECUTADO SEMANAL



Observaciones: La gráfica permite evidenciar un incremento progresivo en el atraso acumulado por parte del contratista frente a la programación establecida

AVANCE PROGRAMADO EJECUTADO POR CAPITULO



Observaciones: La gráfica permite evidenciar un incremento progresivo en el atraso acumulado por parte del contratista frente a la programación establecida


ALCALDÍA DE
ACACÍAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

ANALISIS DE AVANCE



ANALISIS DESEMPEÑO DE LA EJECUCIÓN

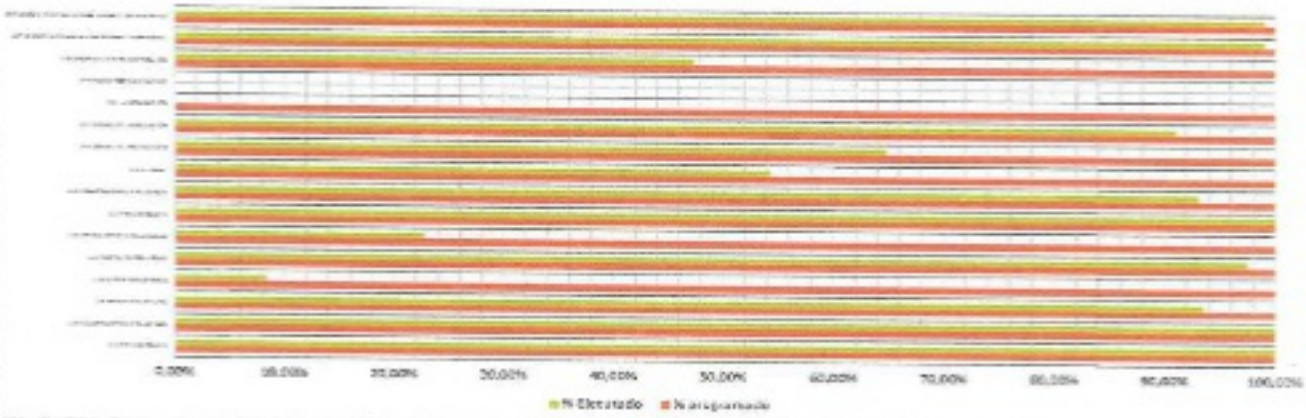

ANALISIS PORCENTUAL Y DE RECURSOS

CAPITULO	VALOR CAPITULO INICIAL	%	VALOR MODIFICACIONES	%	VALOR PAGOS POR CAPITULO	% PAGO	VALOR EJECUTADO POR CAPITULO	% EJECUTADO	VALOR PAGO DE RETE POR CAPITULO	ATRASO	ADELANTO	%
1 CONSTRUCCION Y CONSTRUCCIONES	$		$		$		$		$	$	$	
1.1 PRELIMINARES	$		$		$		$		$	$	$	
1.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	$		$		$		$		$	$	$	
1.3 PAVIMENTOS VIA	$		$		$		$		$	$	$	
1.4 ESTRUCTURA	$		$		$		$		$	$	$	
1.5 ACERO DE REFUERZO	$		$		$		$		$	$	$	
1.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS	$		$		$		$		$	$	$	
2 VIAS DE ACCESO PUNTO DE ENCUENTRO EN LA VEREDA GUAYABITOS	$		$		$		$		$	$	$	
2.1 PRELIMINARES	$		$		$		$		$	$	$	
2.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	$		$		$		$		$	$	$	
2.3 PILLAR	$		$		$		$		$	$	$	
2.4 OBRAS DE ESTRUCTURA	$		$		$		$		$	$	$	
2.5 OBRAS DE DRENAJES	$		$		$		$		$	$	$	
2.6 SEÑALIZACION	$		$		$		$		$	$	$	
2.7 PAVIMENTO ASFALTICO	$		$		$		$		$	$	$	
2.8 OBRAS VARIADAS	$		$		$		$		$	$	$	
IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$		$		$		$		$	$	$	
IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$		$		$		$		$	$	$	
	$		$		$		$		$	$	$	

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

ACTA DE COMITÉ No.66

Siendo las 02:00 p.m. del día 24 de julio de 2026, se dio inicio al Comité Técnico de Obra, convocado por la Interventoría, de manera presencial en la oficina de Infraestructura de la Alcaldía de Acacias, el cual contó con la participación, Residente de Obra, Residente de Interventoría(virtual), apoyo de interventoría, secretario de Infraestructura y apoyo a supervisión.

1 -OBJETO DEL COMITÉ.

Realizar seguimiento al avance físico y administrativo del proyecto, verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Comité No. 65, revisar las actividades críticas pendientes y definir acciones para garantizar la terminación de la obra dentro del plazo contractual vigente.

2 -TEMAS DEL COMITÉ:

1. Seguimiento de los compromisos del Comité anterior No. 65.
2. Avance de las soldaduras de las riostras y estructura metálica del puente.
3. Ejecución de los ensayos de ultrasonido a las soldaduras estructurales.
4. Inicio de la instalación del Metal Deck y su incidencia en la programación de la losa del puente.
5. Presentación del plan de acción (plan de choque) para la recuperación del atraso del proyecto.
6. Programación de la fundida de la losa del puente.
7. Reinicio de la construcción del pavimento en concreto MR-40.
8. Estado de ejecución de las obras de protección (bolsacretos y gaviones).
9. Seguimiento al porcentaje de avance físico y atraso del proyecto.
10. Estado de la Modificatoria No. 5 y conceptos técnicos requeridos para su aprobación.
11. Correcciones pendientes en andenes, juntas, tapas y acabados de pavimento.
12. Compromisos y programación para la siguiente semana

2.1 -REVISION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

La Interventoría verificó el estado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en el comité anterior, evidenciando que algunas actividades presentan retrasos frente a las fechas inicialmente establecidas, por lo que fue necesario reprogramar los plazos de ejecución conforme al avance real de la obra. Sin embargo, en la presenta acta Numeral IV se registra el estado de cumplimiento de cada compromiso.

2.2 AVANCE DE LAS SOLDADURAS DE LAS RIOSTRAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE.

Se constató un avance aproximado del 50-57% en las soldaduras de las riostras. La Interventoría recomendó mantener un seguimiento permanente a esta actividad por tratarse de una labor crítica que condiciona el inicio de las etapas posteriores del puente.

2.3 EJECUCIÓN DE LOS ENSAYOS DE ULTRASONIDO A LAS SOLDADURAS ESTRUCTURALES.

Se evidenció que desde el día anterior se dio inicio a los ensayos de ultrasonido sobre las soldaduras de las vigas principales. La Interventoría solicitó la culminación de las pruebas y la entrega de los respectivos informes técnicos para verificar la conformidad de las uniones soldadas

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

2.4 INICIO DE LA INSTALACIÓN DEL METAL DECK Y SU INCIDENCIA EN LA PROGRAMACIÓN DE LA LOSA DEL PUENTE.

La Interventoría verificó que la instalación continúa condicionada a la terminación de las soldaduras estructurales. Se reiteró la necesidad de iniciar esta actividad una vez se garanticen las condiciones técnicas requeridas para evitar afectar la programación de la losa del puente.

2.5 PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (PLAN DE CHOQUE) PARA LA RECUPERACIÓN DEL ATRASO DEL PROYECTO.

Se evidenció que el contratista aún no ha presentado el plan de choque solicitado. La Interventoría insistió en la necesidad de contar con una programación detallada que permita recuperar el atraso acumulado, considerando que no se prevén nuevas ampliaciones del plazo contractual.

2.6 PROGRAMACIÓN DE LA FUNDIDA DE LA LOSA DEL PUENTE.

Se concluyó que esta actividad depende directamente de la finalización de las soldaduras y de la instalación del Metal Deck. La Interventoría consideró técnicamente viable reprogramar su ejecución para mediados de agosto, siempre que se cumpla la secuencia constructiva prevista.

2.7 REINICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN CONCRETO MR-40.

Se verificó que el reinicio del pavimento puede ejecutarse de manera independiente al avance del puente, una vez finalicen las actividades de aproximación con los rellenos y capas subestructurales. La Interventoría recomendó priorizar esta actividad para mejorar el porcentaje de ejecución física del proyecto.

2.8 ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN (BOLSACRETOS Y GAVIONES).

Se evidenció que las actividades de las obras de protección continúan limitadas por las condiciones hidráulicas del río y la disponibilidad del frente de trabajo. No obstante, la Interventoría considera que el Contratista deberá implementar las medidas operativas necesarias, incluyendo el suministro de equipos de bombeo, achique u otros sistemas que permitan controlar, manejar y evacuar los flujos de agua presentes en la zona de intervención, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades y mitigar las afectaciones ocasionadas por las condiciones hidráulicas, siempre que dichas labores puedan ejecutarse de manera segura y conforme a las especificaciones técnicas del proyecto

2.9 SEGUIMIENTO AL PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y ATRASO DEL PROYECTO.

Se presentó un avance físico ejecutado del 83,339% frente a un programado del 96,31%, equivalente a un atraso aproximado del 12,97%. Si bien existen cantidades ejecutadas pendientes de cuantificación e incorporación, así como ajustes derivados de la Modificatoria No. 5 que permitirán actualizar la programación y el porcentaje real de avance, su inclusión no garantiza la recuperación ni la superación del atraso acumulado. Por lo anterior, la Interventoría reiteró la necesidad de implementar medidas efectivas de recuperación y fortalecer el ritmo de ejecución de las actividades pendientes.

2.10 ESTADO DE LA MODIFICATORIA NO. 5 Y CONCEPTOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA SU APROBACIÓN.

La Interventoría informó que la modificatoria continúa en trámite y que se encuentran en elaboración los conceptos técnicos requeridos para sustentar los ajustes propuestos, previo a su aprobación por parte de la Entidad.

2.11 CORRECCIONES PENDIENTES EN ANDENES, JUNTAS, TAPAS Y ACABADOS DE PAVIMENTO.

Se reitero al Contratista que las actividades de corrección correspondientes a alineación de andenes respecto a las losas podotactiles, resanes, sellado de juntas e instalación de tapas, las cuales deberán ejecutarse antes de la terminación de las obras para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la adecuada calidad de los acabados.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

2.12 COMPROMISOS Y PROGRAMACIÓN PARA LA SIGUIENTE SEMANA

En este comité se reiteró la necesidad de mantener un seguimiento permanente a la programación semanal, verificando el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la implementación de medidas que permitan recuperar el atraso del proyecto y garantizar la culminación de las obras dentro del plazo contractual vigente.

3 -COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y ACTUALIZADOS EN ESTE COMITE

Quedando establecidos los compromisos y el respectivo seguimiento por parte de la interventoria y la supervisión.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA	RESPONSABLES
Culminar las soldaduras definitivas de los arriostramientos	4 de agosto de 2026	Contratista
Ejecutar los ensayos de ultrasonido y entregar los resultados	4 de agosto de 2026	Contratista
Iniciar la instalación del Metal Deck. Contratista	27 de julio de 2026	Contratista
Presentar el plan de acción para recuperar el atraso del 12%	Inmediato	Contratista
Radicar el Informe Mensual correspondiente a junio	Inmediato	Contratista
Actualizar la programación de la aprobación de la Modificatoria No. 5	Con la aprobación de la Modificatoria	Contratista
Ejecutar la fundida monolítica de la losa del puente	15 de agosto de 2026	Contratista
Reiniciar las losas de pavimento MR	28 de julio de 2026	Contratista
Finalizar las obras de protección	10 de agosto de 2026	Contratista
Emitir los conceptos técnicos requeridos para la Modificatoria No. 5	Inmediato	Contratista

-Se da por finalizada la reunión siendo las 03:00 p.m.

B. COMPROMISOS PACTADOS

	B. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA	RESPONSABLES
1	Culminar las soldaduras definitivas de los arriostramientos	4 de agosto de 2026	Contratista
2	Ejecutar los ensayos de ultrasonido y entregar los resultados	4 de agosto de 2026	Contratista
3	Iniciar la instalación del Metal Deck. Contratista	27 de julio de 2026	Contratista
4	Presentar el plan de acción para recuperar el atraso del 12%	Inmediato	Contratista
5	Radicar el Informe Mensual correspondiente a junio	Inmediato	Contratista
6	Actualizar la programación de la aprobación de la Modificatoria No. 5	Con la aprobación	Contratista
7	Ejecutar la fundida monolítica de la losa del puente	15 de agosto de 2026	Contratista
8	Reiniciar las losas de pavimento MR	28 de julio de 2026	Contratista
9	Finalizar las obras de protección	10 de agosto de 2026	Contratista
10	Emitir los conceptos técnicos requeridos para la Modificatoria No. 5	Inmediato	Contratista

VII. PROXIMA REUNION

FECHA: 31 (DIA) 7 (MES) 2026 (AÑO)


Para constancia de lo anterior, se firma acta asistencia de la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Veinticuatro (24) días del mes de Julio de 2026

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL COMITE REALIZADO



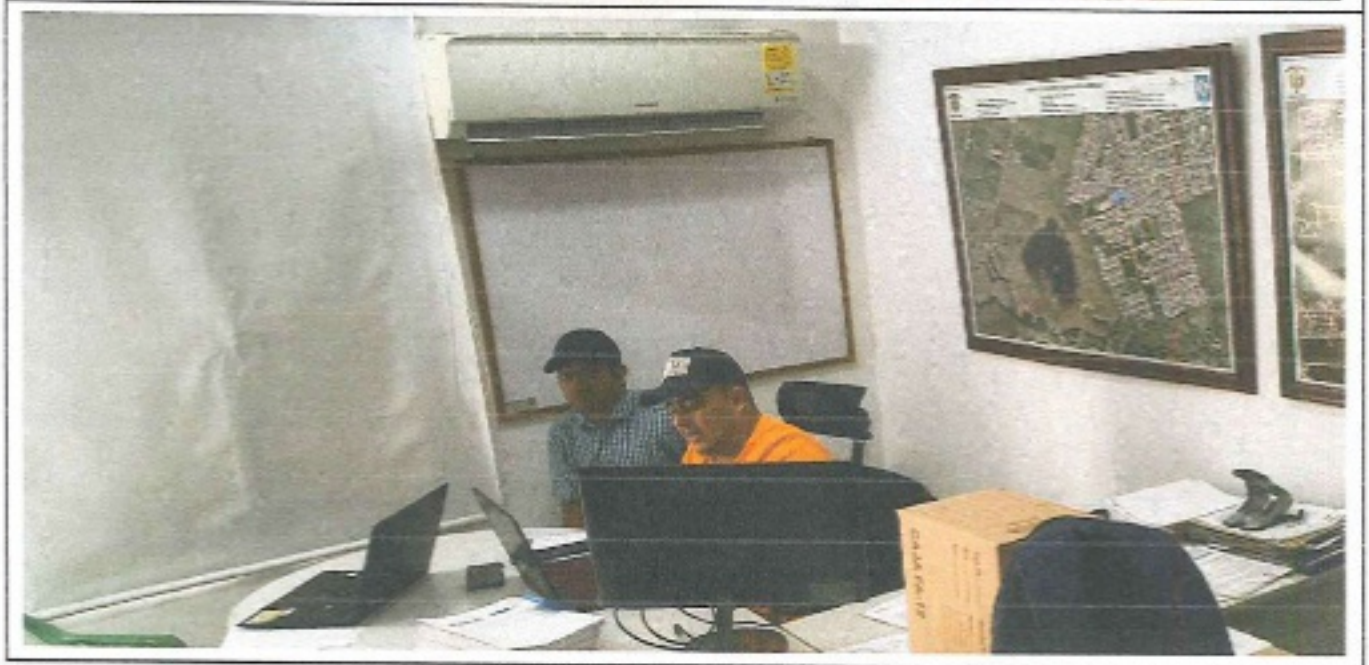

ALCALDÍA DE ACACÍAS

EVENTO / REUNIÓN:	CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS				
FECHA:	24 de Julio del 2026	HORA INICIO:	02:00 PM	HORA FINALIZACIÓN:	03:00 PM.
EXPOSITOR / MODERADOR:	CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORIA, SUPERVISION				
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISO MORA GUTIERREZ		CONTRATO No		929 DE 2023
INTERVENTORIA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONTRATO No		978 DE 2023
SUPERVISION:	IVAN MAURICIO ROJAS SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA				

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Pedro Eladio Alfárez	3274832	Interventoria.	Apoyo de Interventoría		3242332851	interpuentechichemene@gmail.com
2.	Alexandra Herrera.	80257457	Consorcio Acacia	ING Residente		3115764584	consorcioacacia@gmail.com
3	Jhonny F Toro	86063709	Interventoria	Director		3124602726.	interpuentechichemene@gmail.com.
4	Olga A. Rosero	96587950	Interventoria	Residente		3134826490	" " "

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

FECHA	31	7	26

OBJETO DE CONTRATO:

CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

I. TEMAS A TRATAR EN EL COMITÉ

1. Seguimiento de los compromisos del Comité anterior No. 56.
2. Estado actual del proyecto.
3. Avance de las soldaduras de las riostras del puente.
4. Ejecución de los ensayos de ultrasonido a las soldaduras.
5. Inicio de la instalación del Metal Deck.
6. Presentación del plan de acción por atraso del proyecto
7. Programación de la fundida de la losa del puente.
8. Reinicio de la construcción del pavimento en concreto MR-40.
9. Estado de ejecución de las obras de protección (bolsacretos y gaviones).
10. Estado de la Modificatoria No. 5 y conceptos técnicos requeridos.

II. OBJETO

COMITÉ TECICO DE OBRA No.67 REALIZADO EN LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N.A.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	AVANCE DEL COMPROMISO	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
1	Culminar las soldaduras definitivas de los arriostramientos	4 de agosto de 2026	Vigente
2	Ejecutar los ensayos de ultrasonido y entregar los resultados	4 de agosto de 2026	Vigente
3	Iniciar la instalación del Metal Deck. Contratista	27 de julio de 2026	No Cumple
4	Presentar el plan de acción para recuperar el atraso del 12%	Inmediato	No Cumple
5	Radicar el Informe Mensual correspondiente a junio	Inmediato	No Cumple
7	Ejecutar la fundida monolítica de la losa del puente	15 de agosto de 2026	Vigente
8	Reiniciar las losas de pavimento MR	28 de julio de 2026	Cumple
9	Finalizar las obras de protección	10 de agosto de 2026	Vigente
10	Emitir los conceptos técnicos requeridos para la Modificatoria No. 5	Inmediato	No Cumple

V. TEMAS TRATADOS


GENERALIDADES DE LOS CONTRATOS	
CONTRATO OBRA No	929 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS, META
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA RIL FRANCISCO MORA GUTIERREZ NIT No 901.767.420-0
VALOR	TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES DOSICENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($13.430.269.893,00)
PLAZO	ONCE (11) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
ADICION No.1	TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($3.539.989.565)
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($16.970.259.458)
CONTRATO INTER No	975 DE 2023
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT No 9.658.796-1
OBJETO	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
VALOR	SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($627.081.787,00) M/CTE
PLAZO	ONCE (11) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
ADICION No.1	DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO ($291.852.095)
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS ($918.733.882)
FECCHA DE SUSPENSION No.1	24 DE ABRIL DEL 2025
FECCHA DE REINICIO No.1	17 DE JUNIO DEL 2025
FECHA DE INICIO	27 DE MAYO DE 2024
FECHA TERMINACION INICIAL	26 DE ABRIL DE 2025
PLAZO PRORROGA No.1	(7 MESES): TOTAL PLAZO CON PRORROGA No.1 (18 MESES)
PLAZO PRORROGA No.2	(3 MESES): TOTAL PLAZO CON PRORROGA No.2 (21 MESES)
PLAZO PRORROGA No.3	(2 MESES): TOTAL PLAZO CON PRORROGA No.3 (23 MESES)
PLAZO PRORROGA No.4	(3 MESES): TOTAL PLAZO CON PRORROGA No.4 (26 MESES)
NUEVA FECHA TERMINACION	20 DE SEPTIEMBRE DE 2026
SUPERVISOR	IVAN MAURICIO ROJAS
APOYO SUPERVISION	CRISTIAN EDUARDO FUENTES AMADO

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

ACTA COMITE DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO


LOCALIZACION DEL PROYECTO



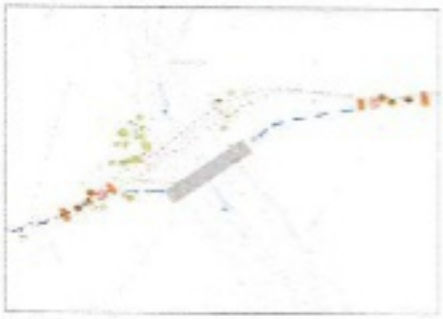


La zona para intervenir se encuentra ubicada en le Municipio de Acacias, especificamente está ubicada en la vía Territorio que conduce a la vereda quebraditas a 34.4 Km del casco urbano del Municipio de Acacias Meta, de cuales 13.58 se encuentran en afirmado, las coordenadas de ubicación son las 03°57'39,99" N y 73°50'17.67" O

DETALLES DEL PUENTE Y ALCANCE DEL CONTRATO

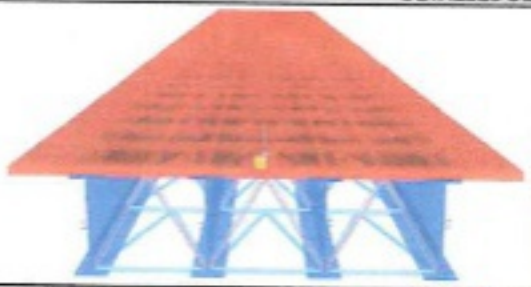



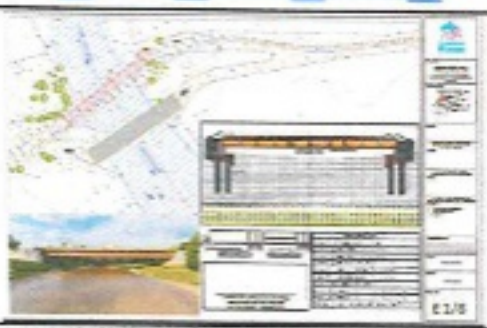



En el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" según modificatoria No 1 estableció en su ajuste lo siguiente; se plantea la construcción de un puente vehicular de 56.0 metros de luz entre ejes de apoyo y un tablero con un ancho de 10.7 metros a bordes externos, ancho efectivo de calzada de 7.30 metros, andenes a ambos costados de 1.20 metros; en el diseño realizado se plantea como apoyo del tablero 4 vigas en Σ metálicas de acero A57M A-706 Grado 50W en alma llena, con una separación interna de 2.5 metros y una altura de 2465 milímetros; la infraestructura es una cimentación tipo pilote construyendo 8 pilotes por estribo para un total de 16 pilotes con un diámetro Φ1.50 metros y una profundidad de 12 metros cada uno; las barandas será metálicas, tendrá protectores en concreto tipo new jersey los apoyos y juntas estarán en neopreno, las aletas y estribos serán en concreto reforzado y el tablero así como las placas de aproximación serán concreto reforzado, el puente contara con señalización horizontal y vertical respectivamente.

Se realizara la intervención del pluvial existente en una longitud de 140 metros, la construcción de 34 sumideros laterales y 1 pozos de inspección, así como la limpieza de los componentes existentes; de igual manera se realizara la construcción de un sistema de alumbrado público el cual está conformado por 29 mastiles metálicos con luminarias Solares con foto celda Completa.


En el componente hidráulico y de protección se construirán 103 m3 de gaviones revestidos en concreto, 799 unidades de bolsacretos, distribuidos en una longitud de 78,87ml margen derecha y 36,06 margen izquierda, así como 160 horas de canalización en el rio.


El componente vial se pavimentaran en concreto hidráulico 720 ml de vía en un espesor de 0.23m y anchos viales de 6 mts, incluyendo bocacalles, dicha longitud se distribuye 476ml sector quebraditas, 159ml sector palermas y bocacalles sportada en una subabse granular de espesor 0.25m. dicha intervención se complementa con sardinelas, bordillas y

ALCALDÍA DE
ACACÍAS


ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

ESQUEMAS DEL PUENTE

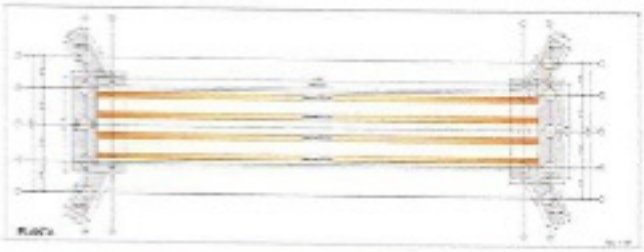

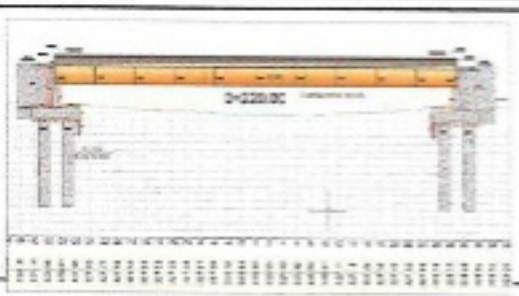







ALCANCE PRESUPUESTAL

CAPITULOS	($) INICIAL	($) MODIFICATORIA	%
1. CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR			
1.1 PRELIMINARES Y NPs	$ 272.192.313,00	$ 413.731.216,00	1.60%
1.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 61.121.996,00	$ 55.795.132,00	0.38%
1.3 INFRAESTRUCTURA	$ 1.310.733.807,00	$ 1.408.959.969,00	7.72%
1.4 SUPERESTRUCTURA	$ 364.798.302,00	$ 370.656.872,00	2.15%
1.5 ACERO DE REFUERZO	$ 6.248.530.535,00	$ 9.997.858.976,00	48.61%
1.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS	$ 204.344.280,00	$ 204.870.970,00	1.20%
2. VÍAS DE ACCESO PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA QUEBRADITAS			0.00%
2.1 PRELIMINARES	$ 3.136.648,00	$ 9.828.018,00	0.02%
2.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 880.519.181,00	$ 460.096.324,00	5.19%
2.3 PLUVIAL	$ 295.715.682,00	$ 81.871.488,00	1.74%
2.4 OBRAS DE PROTECCIÓN	$ 374.028.372,00	$ 1.117.411.963,00	2.20%
2.5 OBRAS DE DEMOLICION	$ 169.737.564,00	$ 267.107.129,00	1.00%
2.6 ILUMINACIÓN	$ 320.579.141,00	$ 255.412.395,00	1.89%
2.7 PAVIMENTO ASFÁLTICO	$ 348.485.880,00	$ -	2.05%
2.8 ANDENES Y ESPACIO PUBLICO	$ 465.358.102,00	$ 594.184.788,00	2.74%
ITEMS NO PREVISTOS VIA		$ 1.768.009.268,00	0.00%
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 75.000.000,00	$ 75.000.000,00	0.44%
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	$ 35.000.000,00	$ 35.000.000,00	0.21%
	$ 13.430.299.893,00	$ 16.970.259.458,00	100.00%

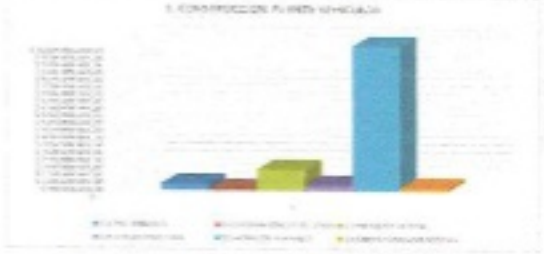

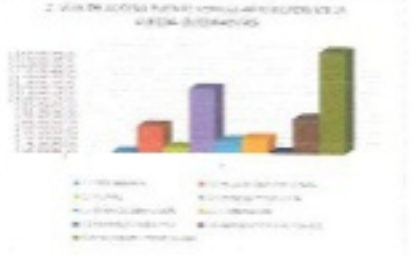

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

ESTADO DE LA OBRA A LA FECHA

MATERIALES EN OBRA

No	ELEMENTO	UNID	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Acero instalado en pilotes	KG	91.338,18	Acero para pilotes
2	Acero instalado en viga cabezal, estribos y aletaas.	KG	91.268,18	Acero para las vigas cabezales
3	Acero estructural en obra	KG	214.288,69	En proceso de montaje

Observaciones: Ya se tiene construidos los los estribos y este en proceso de montaje de vigas metalicas. tambien se avanza con la estructura vial en concreto rigido.

EQUIPOS Y MAQUINARIA EN OBRA

No	CANTIDAD	MAQUINARIA Y/O EQUIPO
1	1	Planta electrica de 440 V
2	1	Equipo electricos menores manuales.
3	2	Herramienta menor
4	1	Retro-pajarita
5	1	Vibrocompactador

Observaciones: A la fecha no se tiene mas equipos

PERSONAL

NO	TIPO PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACION
1	ADMINISTRATIVO	1	DIRECTOR	En obra
2	ADMINISTRATIVO	1	RESIDENTE	En obra
3	ADMINISTRATIVO		ESP ESTRU	
4	ADMINISTRATIVO		ESP VIAS	
5	ADMINISTRATIVO	1	SISO	En obra
6	ADMINISTRATIVO			
7	OPERATIVO	2	TOPOGRAFO	En obra
8	OPERATIVO	1	VIALISTAS	En obra
9	OPERATIVO		VIGILANTE	
10	OPERATIVO	8	OPERATIVOS	En obra
11	OPERATIVO			
12	OPERATIVO			

Observaciones: El personal esta realizando actividades armado de aceros para la viga cabezal del estribo Quebraditas.

ANALISIS FINANCIERO ANTICIPO Y PARCIALES




Observaciones: A la fecha se han aprobado todas las ordenes de operación por un valor total del anticipo que corresponde al 100.00%.

ESTADO DEL CONTRATO

Fecha de inicio:	lunes, 27 de mayo de 2024		
Fecha de suspension	jueves, 24 de abril de 2025		
Fecha de Reinicio:	martes, 17 de junio de 2025		
Fecha terminación inicial:	sábado, 26 de abril de 2025		
Nueva fecha terminación:	lunes, 21 de septiembre de 2026		
Plazo días:	793.00	plazo meses:	26,3
Fecha de análisis:	viernes, 31 de julio de 2026		Semana 107
Plazo transcurrido días:	741.00	meses:	24,700
% transcurrido en tiempo:	93,443%	meses:	93,916%
Avance programado $:	$ 16.484.369.798,71		
Avance programado %:	97,29%		
Avance ejecutado $:	$ 14.144.279.276,80		
Avance ejecutado %:	83,507%		
Atraso (-) o avance (+) $:	-$ 2.360.090.521,91		
Atraso (-) o avance (+) %:	-13,848%		


Observaciones: Del presente análisis se concluye que el contratista mantiene un retraso constante en el cumplimiento del cronograma establecido.

GRAFICO FLUJO DE CAJA

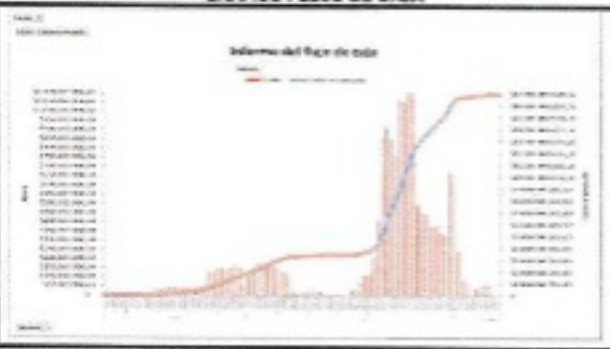

Observaciones: Este flujo de caja se encuentra ajustado a la nueva programación establecida mediante la Modificatoria No. 1.

PROGRAMADO VS EJECUTADO SEMANAL



Observaciones: La grafica permite evidenciar un incremento progresivo en el atraso acumulado por parte del contratista frente a la programación establecida

AVANCE PROGRAMADO EJECUTADO POR CAPITULO



Observaciones: La gráfica permite evidenciar un incremento progresivo en el atraso acumulado por parte del contratista frente a la programación establecida

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

ANALISIS DE AVANCE



ANALISIS DESEMPEÑO DE LA EJECUCION



ANALISIS PORCENTUAL Y DE RECURSOS

CAPITULO	VALOR CAPITULO INICIAL	%	VALOR MODIFICATORIA 1	%	VALOR PROG POR CAPITULO	% PROG	VALOR EJECUTADO POR CAPITULO	% EJECUTADO	VALOR PENDIENTE POR CAPITULO	ADICION	ADELANTO	%
1. CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR	$		$		$	100,00%	$		$	$	$	
2.1 PRELIMINARES	$		$		$	100,00%	$		$	$	$	
2.2 DEMOLICIONES Y RETIROS	$		$		$	100,00%	$		$	$	$	
2.3 INFRAESTRUCTURA	$		$		$	100,00%	$		$	$	$	
2.4 SUPERESTRUCTURA	$		$		$	100,00%	$		$	$	$	
2.5 ANCLAJES	$		$		$	100,00%	$		$	$	$	
2.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS	$		$		$	100,00%	$		$	$	$	
3. OBRAS DE ACCESO PUENTE VEHICULAR (INCLUYE OBRAS DE DRENAJES)	$		$		$	100,00%	$		$	$	$	
3.1 PRELIMINARES	$		$		$	100,00%	$		$	$	$	
3.2 DEMOLICIONES Y RETIROS	$		$		$	100,00%	$		$	$	$	
3.3 PLUVIAL	$		$		$	100,00%	$		$	$	$	
3.4 OBRAS DE CONTENCION	$		$		$	100,00%	$		$	$	$	
3.5 OBRAS DE COMPLEMENTO	$		$		$	100,00%	$		$	$	$	
3.6 SEÑALIZACION	$		$		$	100,00%	$		$	$	$	
3.7 PAVIMENTO ASFALTICO	$		$		$	100,00%	$		$	$	$	
3.8 MOBILIARIO PARA USO PUBLICO	$		$		$	100,00%	$		$	$	$	
IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$		$		$	100,00%	$		$	$	$	
IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$		$		$	100,00%	$		$	$	$	
	$		$		$	100,00%	$		$	$	$	

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRA No. 67

Siendo las 02:00 p. m. del día 31 de julio de 2026, se dio inicio al Comité Técnico de Obra No. 67, convocado por la entidad con el propósito de realizar seguimiento a las actividades y compromisos del proyecto, tomando como referencia lo establecido en el Comité No. 66.

1. OBJETO DEL COMITÉ.

Realizar seguimiento al avance físico, técnico y administrativo del proyecto; verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Comité No. 66; revisar el estado de las actividades críticas; y definir las acciones necesarias para recuperar el atraso y garantizar la culminación de la obra dentro del plazo contractual vigente.

2. TEMAS TRATADOS

2.1. Seguimiento a los compromisos del Comité No. 66.
2.2. Estado general y avance físico del proyecto.
2.3. Avance de las soldaduras de las riostras.
2.4. Resultados de los ensayos de ultrasonido de las vigas metálicas.
2.5. Definición de ensayos de control para las soldaduras de las riostras.
2.6. Instalación de formaletas y programación del Metal Deck.
2.7. Presentación del plan de acción para recuperar el atraso.
2.8. Estado de los informes mensuales de enero a junio de 2026.
2.9. Programación de la fundida monolítica de la losa del puente.
2.10. Reinicio y avance del pavimento en concreto MR-40 y losas de aproximación.
2.11. Reinicio de las obras de protección.
2.12. Estado y trámite de la Modificatoria No. 5.
2.13. Programación vigente, porcentaje de avance y atraso acumulado.
2.14. Condiciones para la presentación de la siguiente acta parcial.

2.1. SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ANTERIORES.

La Interventoría realizó la revisión de los compromisos establecidos en el Comité No. 66, evidenciando actividades cumplidas parcialmente, otras aún dentro del plazo acordado y algunos compromisos vencidos que continúan pendientes. Se reiteró la necesidad de acelerar los frentes de trabajo, teniendo en cuenta que al proyecto le resta aproximadamente un mes y veinte días de plazo contractual.

2.2. ESTADO GENERAL Y AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO.

La Interventoría informó que el proyecto presenta un avance ejecutado del 83,30 % frente a un avance programado del 97,20 %, equivalente a un atraso del 13,80 %, restando aproximadamente un mes y veinte días para la terminación del contrato. Se indicó que la programación continúa soportada en la Prórroga No. 4 y que, aunque la aprobación de la Modificatoria No. 5 permitirá actualizar el avance, esta no garantiza la recuperación del atraso acumulado, por lo que se reiteró la necesidad de fortalecer el ritmo de ejecución de la obra.

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

2.3. SOLDADURAS DE LAS RIOSTRAS

Se verificó que las soldaduras definitivas de las riostras presentan un avance aproximado entre el 70 % y el 75 %. La fecha de terminación continúa establecida para el 4 de agosto de 2026, por lo que el compromiso permanece vigente. La Interventoría continuará verificando su culminación, considerando que esta actividad condiciona el desarrollo de las etapas posteriores de la estructura metálica.

2.4. ENSAYOS DE ULTRASONIDO

Se informó que los ensayos de ultrasonido de las soldaduras de las vigas principales fueron ejecutados y finalizaron el sábado anterior al comité. Durante las pruebas en campo no se reportaron defectos, anomalías ni novedades visibles; sin embargo, continúa pendiente la entrega formal de los informes y resultados que permitan soportar técnicamente la liberación de las vigas.

2.5 DEFINICIÓN DE ENSAYOS PARA SOLDADURAS DE LAS RIOSTRAS

La Interventoría quedó encargada de consultar con el especialista estructural si las soldaduras de las riostras requieren ensayos de ultrasonido u otro método de inspección y control de calidad.

2.6. FORMALETAS Y METAL DECK

El compromiso de iniciar la instalación del Metal Deck el 27 de julio de 2026 no fue cumplido. En campo se evidenció la llegada de elementos de formaleta y el inicio de la instalación de apoyos; no obstante, el Metal Deck aún no había llegado a la obra.
Durante el comité se estimó que la instalación de formaletas y elementos previos podría tomar aproximadamente quince días, por lo que el inicio efectivo del Metal Deck se proyectó tentativamente para el 15 de agosto de 2026. Esta situación afecta directamente la programación de la losa del puente.

2.7. PLAN DE ACCIÓN PARA RECUPERAR EL ATRASO

Se dejó constancia de que el Contratista no ha presentado el plan de acción o plan de choque, pese a haber sido solicitado en varios comités anteriores. Este documento deberá establecer las actividades críticas, recursos, personal, equipos, rendimientos y medidas concretas para recuperar el atraso.
El Contratista se comprometió a presentar el plan de acción el 5 de agosto de 2026.

2.8. INFORMES MENSUALES

Los informes mensuales correspondientes a los meses de enero a mayo de 2026 continúan pendientes de corrección definitiva, principalmente por inconsistencias y soportes faltantes en las planillas de seguridad social. Asimismo, el informe mensual correspondiente a junio de 2026 no ha sido presentado.
La Interventoría reiteró al Contratista la obligación de subsanar las observaciones y radicar la totalidad de los informes pendientes.

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

2.9. FUNDIDA DE LA LOSA DEL PUENTE

La fundida monolítica de la losa del puente permanecía programada para el 15 de agosto de 2026. Sin embargo, esta fecha presenta un alto riesgo de incumplimiento, debido a que la instalación del Metal Deck fue estimada para iniciar aproximadamente en esa misma fecha.
En consecuencia, la interventoría indicó que la fecha definitiva de vaciado deberá ajustarse conforme al avance real de las soldaduras de las riostras, formaletas, Metal Deck, acero de refuerzo y demás actividades previas requeridas para la fundida.

2.10. PAVIMENTO MR-40 Y LOSAS DE APROXIMACIÓN

Se evidenció el inicio de actividades preparatorias relacionadas con el pavimento MR-40 y las losas de aproximación, incluyendo instalación de formaletas, trabajos topográficos, revisión de niveles y adecuación de los elementos requeridos.
Se estimó que el vaciado del pavimento MR-40 podría iniciar alrededor del 5 de agosto de 2026, siempre que se culminen oportunamente las actividades de preparación y se garantice el suministro de concreto.

2.11. OBRAS DE PROTECCIÓN

Se aclaró que la fecha del 10 de agosto de 2026 corresponde al reinicio y no a la finalización de las obras de protección. Las actividades pendientes comprenden la ejecución de algunos bolsacretos y la terminación de los gaviones.
La Interventoría reiteró que el Contratista deberá disponer de los equipos y medidas operativas necesarias para controlar y evacuar los flujos de agua, cuando las condiciones de seguridad permitan intervenir el frente de trabajo.

2.12. MODIFICATORIA NO. 5

Se informó que la Modificatoria No. 5 continúa en proceso de ajuste. La documentación debe incorporar de manera expresa los conceptos emitidos por los especialistas y el respectivo aval de la Interventoría, particularmente para los ajustes relacionados con concreto ciclópeo, cajas de inspección y sumideros.
También se indicó que faltan algunas firmas y soportes, pero se estimó que la documentación podría quedar radicada ante la oficina de contratación el 3 de agosto de 2026, siempre que se completen los requisitos pendientes.

2.13. AVANCE FÍSICO Y ATRASO

A la fecha del comité, el proyecto presentaba un avance programado del 97,20 % y un avance ejecutado aproximado del 83,30 %, equivalente a un atraso cercano al 13,80 %.
Se aclaró que estos porcentajes corresponden a la programación aprobada para la Prórroga No. 4. El avance y el atraso podrán ajustarse una vez se apruebe la Modificatoria No. 5 y se actualice oficialmente la programación; sin embargo, la incorporación de nuevas cantidades e ítems no garantiza por sí sola la recuperación del atraso.

2.14. SIGUIENTE ACTA PARCIAL

Se indicó que la siguiente acta parcial no podrá incluir ni tramitar el reconocimiento de las actividades, cantidades o ítems asociados con la Modificatoria No. 5 hasta que esta se encuentre formalmente aprobada. En consecuencia, el Contratista deberá esperar la firmeza del trámite contractual para incorporar dichos conceptos en el acta de pago correspondiente.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

3. SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DEL COMITÉ ANTERIOR No.66

1 Culminar las soldaduras de las riostras. 4 de agosto de 2026, En ejecución. Avance estimado entre 70 % y 75 %. La fecha continúa vigente.

2 Ejecutar los ensayos de ultrasonido y entregar resultados, 4 de agosto de 2026, Cumplido parcialmente, Los ensayos finalizaron, pero faltan los informes y resultados formales.

3 Iniciar la instalación del Metal Deck, 27 de julio de 2026, No cumple, Se iniciaron apoyos y formaletas, pero el Metal Deck no se encontraba en obra.

4 Presentar el plan de acción para recuperar el atraso, Inmediato, No cumple, No fue presentado; se reprogramó para el 5 de agosto.

5 Radicar el informe mensual de junio, Inmediato, No cumple, El informe aún no ha sido presentado.

6 Actualizar la programación con la Modificatoria No. 5, Con su aprobación, Pendiente, La modificatoria aún no ha sido aprobada.

7 Ejecutar la fundida monolítica de la losa, 15 de agosto de 2026, En alto riesgo, La fecha no es coherente con el inicio estimado del Metal Deck. Debe revisarse.

8 Reiniciar las losas de pavimento MR, 28 de julio de 2026, Cumplido parcialmente, Iniciaron actividades preparatorias; el concreto se estima para el 5 de agosto.

9 Finalizar las obras de protección 10 de agosto de 2026, Fecha corregida, Se aclaró que el 10 de agosto corresponde al reinicio, n a la finalización.

10 Emitir los conceptos técnicos de la Modificatoria No. 5, Inmediato, Cumplido parcialmente, Se elaboraron conceptos, pero faltan ajustes, soportes, avales y firmas.

4. COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL COMITÉ NO. 67

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1	-Entregar los resultados de ultrasonido.	Contratista	4 de agosto de 2026
2	-Definir el tipo de ensayo para riostras.	Interventoría	Antes del próximo comité
3	-Presentar el plan de acción.	Contratista	5 de agosto de 2026
4	-Radicar informe pendientes y el de junio.	Contratista	Inmediato
5	-Suministro e instalación de Metal Deck.	Contratista	15 de agosto de 2026 (Aprox)

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

6 -Definir fecha para la fundida de losadel puente.	Contratista	Próximo comité
7 -Iniciar pavimento MR-40.	Contratista	5 de agosto de 2026
8 -Reiniciar las obras de protección.	Contratista	10 de agosto de 2026
9 -Completar ajustes de la Modificatoria No. 5	Contratista e Interventoría	3 de agosto de 2026

5. CIERRE DEL COMITE

La Interventoría reiteró que el proyecto presenta un atraso significativo y que los compromisos relacionados con el plan de acción, los informes mensuales y el Metal Deck se encuentran vencidos. Por lo tanto, el Contratista deberá fortalecer los frentes de trabajo, garantizar la disponibilidad de materiales, personal y equipos, y cumplir las nuevas fechas establecidas.
No siendo otro el asunto por tratar se dio por finalizado el Comité Técnico No. 67, quedando los compromisos sujetos al seguimiento de la Interventoría y la Supervisión


	B. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA	RESPONSABLES
1	Entregar los resultados de ultrasonido.	Contratista	4 de agosto de 2026
2	Definir el tipo de ensayo para nicetras.	Interventoría	Antes del próximo comité
3	Presentar el plan de acción	Contratista	5 de agosto de 2026
4	Radicar informe pendientes y el de junio	Contratista	Inmediato
5	Suministro e instalación de Metal Deck.	Contratista	15 de agosto de 2026
6	Definir fecha para la fundida de losadel puente.	Contratista	5 de agosto de 2026
7	Iniciar pavimento MR-40.	Contratista	10 de agosto de 2026
8	Reiniciar las obras de protección	Contratista	10 de agosto de 2026
9	Completar ajustes de la Modificatoria No. 5	contratista e Interventoría	3 de agosto de 2026
10			


VII. PRÓXIMA REUNION

FECHA 5 (DÍA) 8 (MES) 2026 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma acta asistencia de la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Treinta y uno (31) (Día en letra) días del mes de Julio (Mes en letra) de 2026

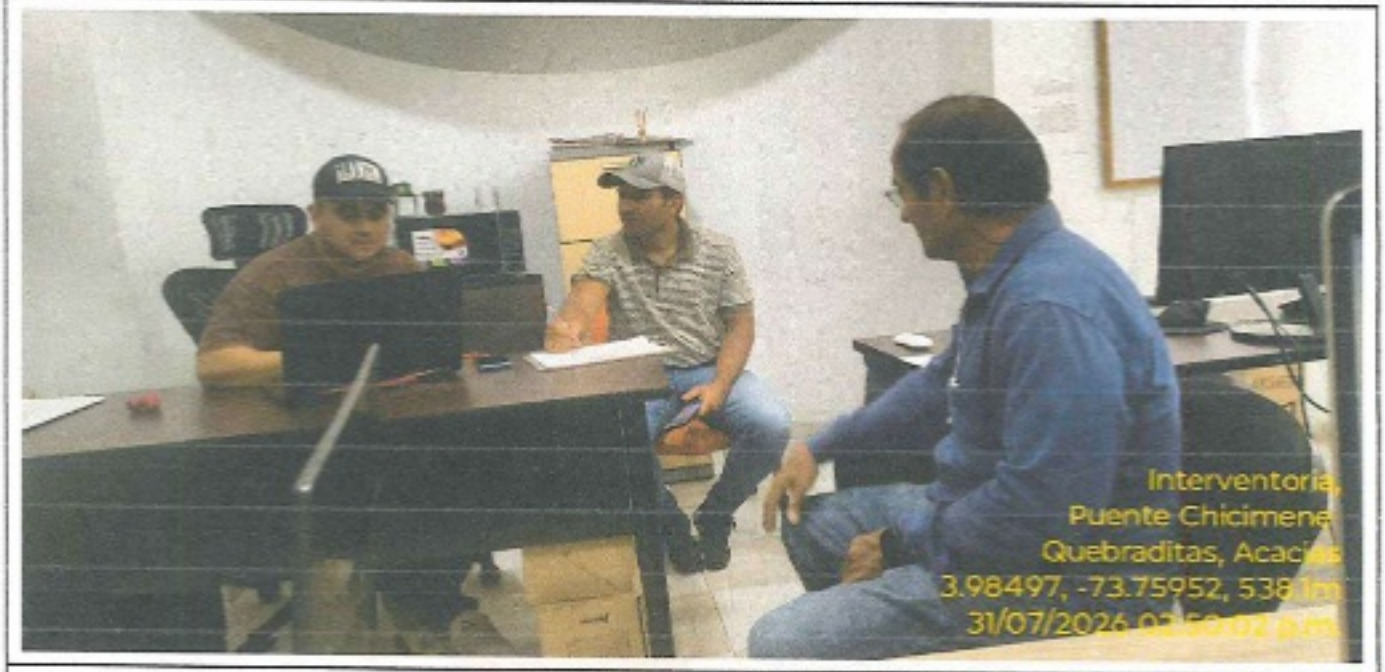
Interventoria
Puente Chicimene
Quebraditas, Acacias
3.98497, -73.75952, 538.1m
31/07/2026

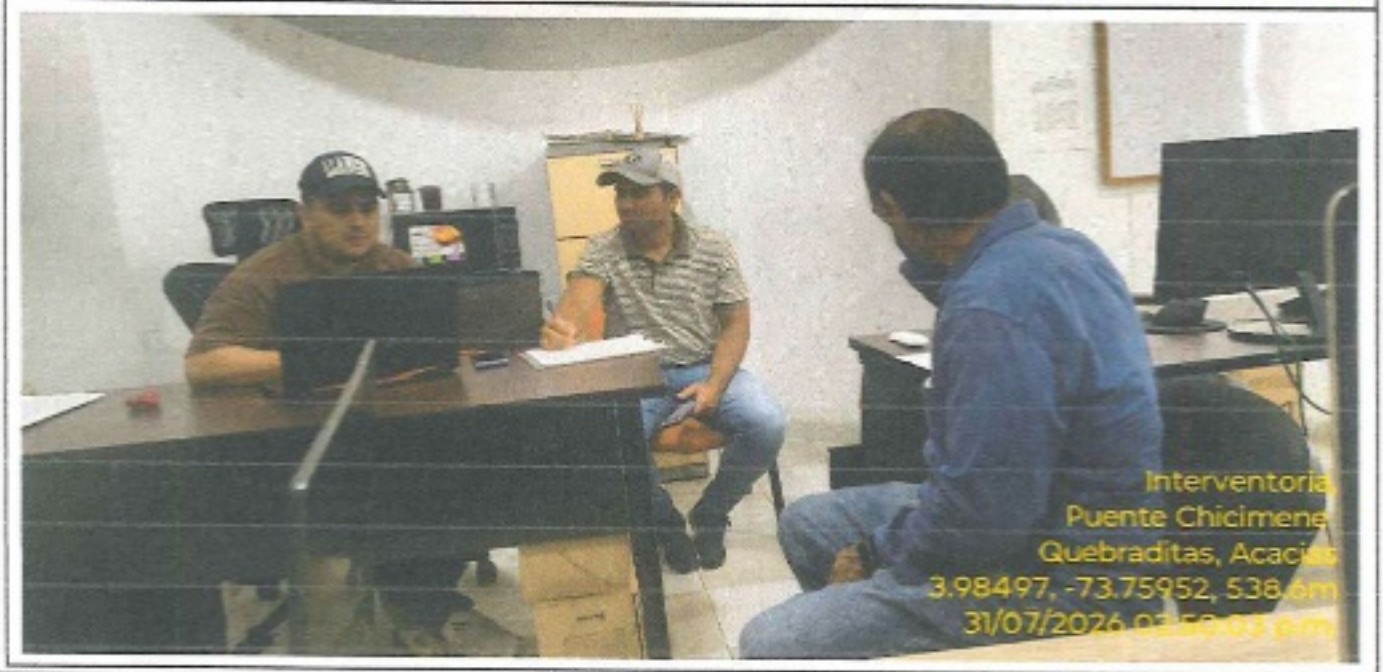
Interventoria
Puente Chicimene
Quebraditas, Acacias
3.98497, -73.75952, 538.6m
31/07/2026

ALCALDÍA DE ACACÍAS

EVENTO / REUNIÓN:	CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS				
FECHA:	31 de Julio del 2026	HORA INICIO:	02:00 PM	HORA FINALIZACIÓN:	
EXPOSITOR / MODERADOR:	CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORIA, SUPERVISION				
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISO MORA GUTIERREZ		CONTRATO No	929 DE 2023	
INTERVENTORIA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONTRATO No	978 DE 2023	
SUPERVISION:	IVAN MAURICIO ROJAS SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA				

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	pedro Alfonso Rincón	3274832	Interventoria	Apoyo Interventoria		3212332857	interventoriadelmunicipio@gmail.com
2	Alexander Herrera	80257957	Consorcio Acacia	Ofg. Residente.		3115766384	

9.3 Informes semanales

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA

1. FECHA ELABORACIÓN:	6	7	2026	2. No. INFORME	194	3. SEMANA No.	194
4. PROYECTO:	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS						
5. SUPERVISOR:	IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA						

A. DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

6. CONTRATO OBRA No:	928-2023			7. FECHA CONTRATO:	27 12 2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 13.430.269.856,00
9. FECHA ACTA INICIO:	27 5 2024			10. FECHA DE TERMINACIÓN:	20 9 2026	11. PLAZO:	25 Meses
12. PRORROGAS:	450 Días			13. SUSPENSIONES:	54 Días	14. ADICIONES:	$ 3.539.969.565,00
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA RL FRANCISCO MORA GUTIERREZ						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	978-2023			18. FECHA CONTRATO:	27 12 2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 627.091.787,00
20. FECHA ACTA INICIO:	27 5 2024			21. FECHA DE TERMINACIÓN:	20 9 2026	22. PLAZO:	26 Meses
23. PRORROGAS:	450 Días			24. SUSPENSIONES:	54 Días	25. ADICIONES:	$ 720.652.095,00
26. INTERVENTOR:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ RUBIA						
27. APOYO A LA SUPERVISION:	CRISTIAN EDUARDO FUENTES AMADO						

B. CONTROL DE PROGRAMACION


28. CAPITULO SECCIÓN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERIODO	32. EVALUACION AVANCE
1. CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR	100,00%	99,15%	Construidos pilotes vigas, estribos y aletas	Presenta atraso respecto a programado
1.1 PRELIMINARES	100,00%	100,00%	Avance en descapote y canalizacion	Capitulo ejecutado
1.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	100,00%	100,00%	Excavación para muros y zapatas	Capitulo ejecutado
1.3 INFRAESTRUCTURA	100,00%	93,49%	Falta solado y terminar obras de protección	Este capitulo registra un atraso
1.4 SUPERESTRUCTURA	100,00%	6,97%	Se continua montaje de vigas	Este capitulo registra un atraso
1.5 ACERO DE REFUERZO	100,00%	97,41%	Acero instalado en pilotes y estribos	Este capitulo registra un atraso
1.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS	100,00%	22,73%	Se inicia construccion de pedestales para luminarias	Este capitulo registra un atraso
2. VIAS DE ACCESO PUENTE VEHICULAR UBICADO E	100,00%	99,88%	Modificatoria No.1 aprobó diseños actuales	Este capitulo registra un atraso
2.1 PRELIMINARES	100,00%	100,00%	Falta construcción de llenic vial	Capitulo ejecutado
2.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	100,00%	99,22%	Cajeo via lleno Quebraditas	Este capitulo registra un atraso
2.3 PLUVIAL	100,00%	54,36%	reja sobre obras pluviales	Avanza acorde con lo programado
2.4 OBRAS DE PROTECCION	100,00%	64,79%	Se esta construyendo los bolsacretos	Este capitulo registra un atraso
2.5 OBRAS DE DEMOLICION	100,00%	91,07%	Demolicion en ejecución	Este capitulo registra un atraso
2.6 PAVIMENTACION	100,00%	0,00%	Se avanza con instalación de postes	Este capitulo registra un atraso
2.7 PAVIMENTO ASFALTICO	0,00%	0,00%	Este capitulo se modifico e creo cantidades	Capitulo modificado e creo cantidades
2.8 ANDENES Y ESPACIO PUBLICO	100,00%	47,30%	Se avanza con la construcción de andenes	Este capitulo registra un atraso
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	100,00%	99,02%	Se ha realizado implementación permanente	Este capitulo registra un atraso
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	100,00%	99,02%	Se ha realizado implementación permanente	Este capitulo registra un atraso
TOTAL				

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCION	Ejecutado	Programado	Atraso(-) Adelanto (+)
Acumulado anterior	$ 14.138.355.340,80	$ 16.249.910.494,35	- 2.111.554.953,55
Durante el periodo	$ 417.292,20	$ 16.289.956,99	- 16.872.578,83
Acumulado Actual	$ 14.138.772.720,80	$ 16.266.207.154,35	- 2.127.434.433,55

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,113%	26,658%
Valor de la Obra Programada	$ 16.289.956,99	$ 16.266.207.154,35

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,003%	83,375%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 417.292,20	$ 14.138.772.720,80

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

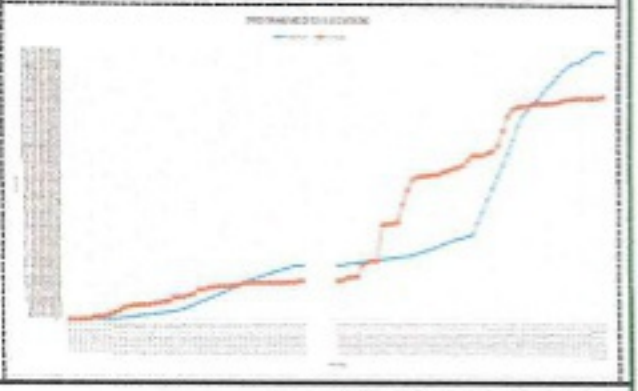

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA

C. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE OBRA

35. CONDICIONES DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1.	CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
1.1	PRELIMINARES	$ 0,00	$ 413.731.216,00	$ 413.731.216,00
1.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 0,00	$ 56.786.160,00	$ 56.786.160,00
1.3	INFRAESTRUCTURA	$ 0,00	$ 1.316.755.492,00	$ 1.316.755.492,00
1.4	SUPERESTRUCTURA	$ 0,00	$ 31.092.160,00	$ 31.092.160,00
1.5	ACERO DE REFUERZO	$ 0,00	$ 9.659.634.304,00	$ 9.659.634.304,00
1.6	OBRAS COMPLEMENTARIAS	$ 0,00	$ 46.573.209,00	$ 46.573.209,00
2.	VIAS DE ACCESO PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA CUERVOCITAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.1	PRELIMINARES	$ 0,00	$ 3.826.016,00	$ 3.826.016,00
2.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 417.280,00	$ 428.868.751,00	$ 429.286.031,00
2.3	PLUVIAL	$ 0,00	$ 49.990.422,00	$ 49.990.422,00
2.4	OBRAS DE PROTECCION	$ 0,00	$ 724.020.368,00	$ 724.020.368,00
2.5	OBRAS DE DEMOLICIÓN	$ 0,00	$ 188.811.186,00	$ 188.811.186,00
2.6	ILUMINACION	$ 0,00	$ 153.966,00	$ 153.966,00
2.7	PAVIMENTO ASFALTICO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.8	ANDENES Y ESPACIO PUBLICO	$ 0,00	$ 1.116.095.113,00	$ 1.116.095.113,00
PMA	IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 0,00	$ 74.265.153,00	$ 74.265.153,00
PMT	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 0,00	$ 34.657.072,00	$ 34.657.072,00
	Subtotal	$ 417.280,00	$ 14.029.490.414,00	$ 14.029.896.494,00
	A.I.U.	$ 100.131,60	$ 3.637.260.514,74	$ 3.637.368.646,59
	Valor total	$ 417.280,00	$ 14.139.365.039,00	$ 14.139.772.719,00

D. RECURSOS DEL CONTRATISTA

36. PERSONAL OPERATIVO OBRA		37. EQUIPOS EN OBRA		38. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
Administrativos(Residente, Director, SISO)	2	Retroexcavadora	0	LUNES	L
Operativos(Maestro, Ayudantes, Operarios)	6	Planta eléctrica 440KV	1	MARTES	L
Cuadrilla topografia	2	Motobombas	0	MIERCOLES	L
Administrativos Interventoria	1	Excavadora Epo pujanta	0	JUEVES	L
Operarios		Volqueta Doble Troque	0	VIERNES	L
Auxiliares viales	1	Vibro compactador	0	SÁBADO	L
				LLUVICSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

E. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- El contratista continuará actividades de cimentación, estructura principal de vigas.
- El contratista continuará actividades de construcción de vías, andenes, obras de protección y obras de iluminación.

F. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Para el presente corte semanal se evidencia un atraso del -12,583% respecto a la programación establecida.

Se recomienda realizar las adiciones ordenes y adoptar las medidas necesarias que permitan recuperar el atraso programado y evitar mayores afectaciones en el cronograma contractual.

Este corte semanal es analizado según la reprogramación aprobada en la Modificatoria de la Prorroga No 4 por tres meses adicionales y vencida desde el 21 de junio del 2026

(Nombre) JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretario de Infraestructura - Supervisión
Copia: Interventor y contratista

Ingresar Código Tabla de Retención Documental

ALCALDÍA DE ACACÍAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA
REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA ELABORACIÓN:	6	7	2026	No. INFORME	104	SEMANA No.	104

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
CONTRATO OBRA No:	929-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA GUTIERREZ
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	978-2023
INTEVENTORÍA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA


6. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 01-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Montaje y ensamble de vigas metálicas.



FECHA FOTO: 01-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Montaje y ensamble de vigas metálicas.

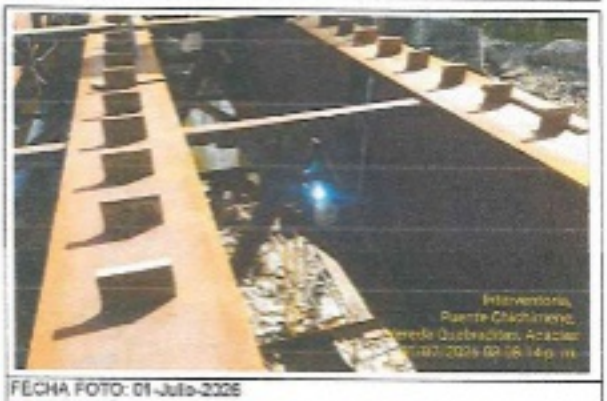

FECHA FOTO: 01-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Montaje y ensamble de vigas metálicas.



FECHA FOTO: 01-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Montaje y ensamble de vigas metálicas.



FECHA FOTO: 01-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Montaje y ensamble de vigas metálicas.



FECHA FOTO: 01-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Montaje y ensamble de vigas metálicas.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA
REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA ELABORACIÓN:	6 / 7 / 2026	No. INFORME	104	SEMANA No.	104
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRACITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS				
CONTRATO OBRA No:	929-2023	CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA GUTIERREZ		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	978-2023	INTEVENTORÍA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

C. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 01-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Construccion de terraplen con material de relleno.



FECHA FOTO: 02-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Cargue de material de relleno para construccion de terraplen.



FECHA FOTO: 02-Julio-2026
DESCRIPCION: Descargue de material de relleno para construccion de terraplen.



FECHA FOTO: 01-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Disponibilidad de puntos ecologicos.



FECHA FOTO: 30-Junio-2026
DESCRIPCION: Comité de obra realizado en la oficina de Interventoría en la sede Villavicencio.



FECHA FOTO: 30-Junio-2026
DESCRIPCION: Comité de obra realizado en la oficina de Interventoría en la sede Villavicencio.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA
REGISTRO FOTOGRAFICO

FECHA ELABORACIÓN:	6 / 7 / 2026	No. INFORME	104	SEMANA No.	104
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS				
CONTRATO OBRA No:	929-2023	CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA GUTIERREZ		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	976-2023	INTEVENTORÍA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

G. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 01-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Inspección de elementos de emergencia.



FECHA FOTO: 01-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Inspección de elementos de emergencia.



FECHA FOTO: 01-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Inspección de elementos de emergencia.



FECHA FOTO: 01-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Inspección de elementos de emergencia.



FECHA FOTO: 01-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Señalización preventiva en las zonas de intervención.



FECHA FOTO: 01-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Señalización preventiva en las zonas de intervención.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	2. No. INFORME	105	3. SEMANA No.	105

4. PROYECTO:	CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
5. SUPERVISOR:	IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA

A. DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

6. CONTRATO OBRA No:	925-2023			7. FECHA CONTRATO:	27	12	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 13.430.269.898,00
9. FECHA ACTA INICIO:	27	5	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	20	9	2026	11. PLAZO:	28 Meses
12. PRORROGAS:	450	Días		13. SUSPENSIONES:	54	Días		14. ADICIONES:	$ 3.529.369.565,00
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA RL FRANCISCO MORA GUTIERREZ								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	978-2023			18. FECHA CONTRATO:	27	12	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 827.051.757,00
20. FECHA ACTA INICIO:	27	5	2024	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	20	9	2026	22. PLAZO:	28 Meses
23. PRORROGAS:	450	Días		24. SUSPENSIONES:	54	Días		25. ADICIONES:	$ 291.652.036,00
26. INTERVENTOR:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA								
27. APOYO A LA SUPERVISION:	CRISTIAN EDUARDO FUENTES AMADO								

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPITULO (según CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERIODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
1. CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR	100,00%	93,16%	Construidos pilotes, vigas, estribos y aletas	Presenta atraso respecto a programado
1.1 PRELIMINARES	100,00%	100,00%	Avance en cerramiento y demolición	Capitulo ejecutado
1.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	100,00%	100,00%	Excavación para muros y zapatas	Capitulo ejecutado
1.3 INFRAESTRUCTURA	100,00%	99,49%	Falta aislado y terminar obras de protección	Este capitulo registra un atraso.
1.4 SUPERESTRUCTURA	100,00%	8,37%	Se continua montaje de vigas	Este capitulo registra un atraso.
1.5 ACERO DE REFUERZO	100,00%	97,41%	Acero instalado en pilotes y estribos	Este capitulo registra un atraso.
1.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS	100,00%	22,73%	Se inicia construcción de pedestales para iluminación	Este capitulo registra un atraso.
2. VIAS DE ACCESO PUENTE VEHICULAR UBICADO E	100,00%	55,99%	Modificatoria No.1 aprobó diseños actuales.	Este capitulo registra un atraso.
2.1 PRELIMINARES	100,00%	100,00%	Falta construcción de tramo vial	Capitulo ejecutado
2.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	100,00%	93,70%	Cierre vía tramo Quebraditas	Este capitulo registra un atraso.
2.3 PLUVIAL	100,00%	54,35%	instalaciones pluviales	Avance acorde con lo programado
2.4 OBRAS DE PROTECCION	100,00%	64,79%	Se esta construyendo los bolsacretos	Este capitulo registra un atraso.
2.5 OBRAS DE DEMOLICIÓN	100,00%	91,07%	Demolición en ejecución	Este capitulo registra un atraso.
2.6 ILUMINACIÓN	100,00%	0,08%	Se avanza con instalación de postes	Este capitulo registra un atraso.
2.7 PAVIMENTO ASFALTICO	0,00%	0,00%	Este capitulo se modifico a cero cantidades	Capitulo modificado a cero cantidades
2.8 ANDENES Y ESPACIO PUBLICO	100,00%	47,33%	Se avanza con la construcción de andenes	Este capitulo registra un atraso.
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	100,00%	96,02%	Se ha realizado implementación permanente	Este capitulo registra un atraso.
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	100,00%	99,02%	Se ha realizado implementación permanente	Este capitulo registra un atraso.
TOTAL				


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	Ejecutado	Programado	Atraso(-) Adelanto (+)
Acumulado anterior	$ 14.838.772.730,60	$ 16.288.007.164,39	- 2.158.234.433,99
Durante el periodo	$ 1.773.656,00	$ 31.279.616,23	- 29.506.126,23
Acumulado Actual	$ 14.140.546.406,60	$ 16.300.286.970,59	- 2.159.740.561,79

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,154%	96,662%
Valor de la Obra Programada	$ 31.279.616,23	$ 16.300.286.970,59

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,010%	83,335%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 1.773.656,00	$ 14.140.546.406,60

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

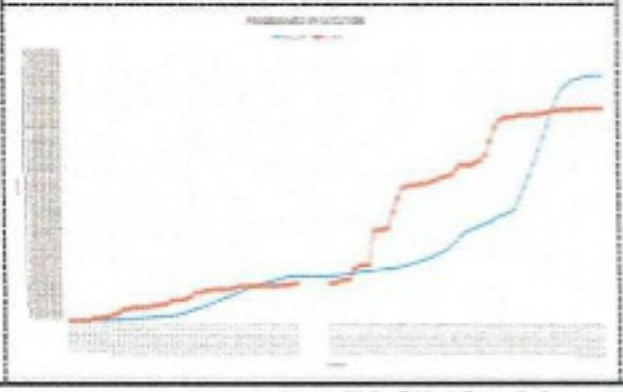

ALCALDÍA DE ACACÍAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA

C. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE OBRA

35. CONDICIONES DEL CONTRATO				
ITEM	DESCRIPCION	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1.	CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
1.1	PRELIMINARES	$ 0,00	$ 413.791.216,00	$ 413.791.216,00
1.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 0,00	$ 56.786.182,00	$ 56.786.182,00
1.3	INFRAESTRUCTURA	$ 0,00	$ 1.316.735.492,00	$ 1.316.735.492,00
1.4	SUPERESTRUCTURA	$ 0,00	$ 31.202.183,00	$ 31.202.183,00
1.5	ACERO DE REFUERZO	$ 0,00	$ 9.661.084.504,00	$ 9.661.084.504,00
1.6	OBRAS COMPLEMENTARIAS	$ 0,00	$ 46.573.709,00	$ 46.573.709,00
2.	VIAS DE ACCESO PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA GUERAOTAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.1	PRELIMINARES	$ 0,00	$ 9.826.019,00	$ 9.826.019,00
2.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 1.773.688,00	$ 429.285.831,00	$ 431.059.519,00
2.3	PLUVIAL	$ 0,00	$ 48.890.422,00	$ 48.890.422,00
2.4	OBRAS DE PROTECCION	$ 0,00	$ 794.089.333,00	$ 794.089.333,00
2.5	OBRAS DE DEMOLICIÓN	$ 0,00	$ 188.811.195,00	$ 188.811.195,00
2.6	ILUMINACIÓN	$ 0,00	$ 153.996,00	$ 153.996,00
2.7	PAVIMENTO ASFALTICO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.8	ANDENES Y ESPACIO PÚBLICO	$ 0,00	$ 1.116.065.119,00	$ 1.116.065.119,00
PMA	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 0,00	$ 74.289.193,00	$ 74.289.193,00
PMT	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	$ 0,00	$ 34.657.072,00	$ 34.657.072,00
	Subtotal	$ 1.773.688,00	$ 14.029.899.494,00	$ 14.031.624.182,00
	A.I.U	$ 459.645,24	$ 3.937.366.646,59	$ 3.937.826.491,83
	Valor total	$ 1.773.688,00	$ 14.159.772.719,00	$ 14.159.548.407,00

D. RECURSOS DEL CONTRATISTA

36. PERSONAL OPERATIVO OBRA		37. EQUIPOS EN OBRA		38. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
Administrativos(Residente, Director, SISO)	2	Retroexcavadora	0	LUNES	L
Operativos(Maestro, Ayudantes, Operarios)	8	Planta eléctrica 440KV	1	MARTES	L
Cuadrilla topografía	2	Motobombas	0	MIERCOLES	L
Administrativos Interventoría	1	Excavadora tipo pajarita	0	JUEVES	L
Operarios		Volqueta Doble Troque	0	VIERNES	L
Auxiliares viales	1	Vibro compactador	0	SÁBADO	L
				LLUVIOSO (LL) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

E. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- El contratista continuará actividades soldadura, ensamble y montaje de vigas.
- El contratista continuará actividades de construcción de vías, andenes, obras de protección y obras de iluminación.

F. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Para el presente corte semanal se evidencia un retraso del -62,727% respecto a la programación establecida.

Se recomienda reforzar las actividades críticas y adoptar las medidas necesarias que permitan recuperar el avance programado y evitar mayores afectaciones en el cronograma contractual.

Este corte semanal se analizó según la reprogramación aprobada en la Modificatoria de la Prórroga No.4 por tres meses adicionales y vigente desde el 21 de junio del 2025.

(Nombre) JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaria de Infraestructura - Supervisión
Copia: Interventoría y contratista

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA
REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA ELABORACIÓN:	14 / 7 / 2026	No. INFORME	105	SEMANA No.	105

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

CONTRATO OBRA No:	929-2023	CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA GUTIERREZ
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	978-2023	INTEVENTORÍA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

G REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 10-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Montaje y ensamble de vigas metálicas.



FECHA FOTO: 10-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Montaje y ensamble de vigas metálicas.



FECHA FOTO: 10-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Montaje y ensamble de vigas metálicas.



FECHA FOTO: 10-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Montaje y ensamble de vigas metálicas.



FECHA FOTO: 10-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Disponibilidad de equipos para montaje del puente.



FECHA FOTO: 10-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Montaje y ensamble de vigas metálicas.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA
REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA ELABORACIÓN:	14 / 7 / 2026	No. INFORME	105	SEMANA No.	165
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRACITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS				
CONTRATO OBRA No:	929-2023	CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA GUTIERREZ		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	979-2023	INTEVENTORÍA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

G. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 10-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Descargue de material de relleno para terraplen.



FECHA FOTO: 10-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Compactacion de capa de mejoro para terraplen.



FECHA FOTO: 10-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Control topografico en la construccion de estructura vial.



FECHA FOTO: 10-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Control topografico en en montaje del puente.



FECHA FOTO: 10-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Comité de obra realizado en la oficina de Infraestructura de la Alcaldia de Acacias.



FECHA FOTO: 10-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Comité de obra realizado en la oficina de Infraestructura de la Alcaldia de Acacias.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA
REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA ELABORACIÓN:	14 / 7 / 2026	No. INFORME	105	SEMANA No.	105
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS				
CONTRATO OBRA No:	929-2023	CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA GUTIERREZ		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	978-2023	INTEVENTORÍA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

G REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 10-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Inspección de elementos de emergencia.



FECHA FOTO: 10-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Inspección de elementos de emergencia.



FECHA FOTO: 10-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Inspección de elementos de emergencia.



FECHA FOTO: 10-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Disponibilidad de puntos ecologicos.



FECHA FOTO: 10-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Control vial durante las actividades de la obra.



FECHA FOTO: 10-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Señalización preventiva en las zonas de intervención.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA

1. FECHA ELABORACIÓN:	21	7	2026	2. No. INFORME	106	3. SEMANA No.	106

4. PROYECTO: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

5. SUPERVISOR: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA

A. DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

6. CONTRATO OBRA No:	929-2023			7. FECHA CONTRATO:	27 / 12 / 2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 13.430.269.963,00
9. FECHA ACTA INICIO:	27 / 5 / 2024			10. FECHA DE TERMINACIÓN:	20 / 9 / 2026	11. PLAZO:	26 Meses
12. PRORROGAS:	450 Días			13. SUSPENSIONES:	54 Días	14. ADICIONES:	$ 3.639.698.466,00
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA RM, FRANCISCO MORA GUTIERREZ						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	978-2023			18. FECHA CONTRATO:	27 / 12 / 2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 627.081.787,00
20. FECHA ACTA INICIO:	27 / 5 / 2024			21. FECHA DE TERMINACIÓN:	20 / 9 / 2026	22. PLAZO:	25 Meses
23. PRORROGAS:	450 Días			24. SUSPENSIONES:	54 Días	25. ADICIONES:	$ 291.662.095,00
26. INTERVENTOR:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA						
27. APOYO A LA SUPERVISION:	CRISTIAN EDUARDO FUENTES AMADO						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPITULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERIODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
1. CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR	100,00%	93,16%	Construidos pilotes, vigas, estribos y aletas	Presenta atraso respecto a programado
1.1 PRELIMINARES	100,00%	100,00%	Avance en cerramiento y señalización	Capitulo ejecutado
1.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	100,00%	100,00%	Excavación para muros y zapatas	Capitulo ejecutado
1.3 INFRAESTRUCTURA	100,00%	99,49%	Falta solado y terminar obras de protección	Este capitulo registra un atraso.
1.4 SUPERESTRUCTURA	100,00%	8,37%	Se continua montaje de vigas	Este capitulo registra un atraso.
1.5 ACERO DE REFUERZO	100,00%	97,41%	Acero instalado en pilotes y estribos.	Este capitulo registra un atraso.
1.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS	100,00%	22,73%	Se inicia construcción de pedestales para luminaria	Este capitulo registra un atraso.
2. VÍAS DE ACCESO PUENTE VEHICULAR UBICADO E	100,00%	66,66%	Modificatoria No.1 aprobó diseños actuales.	Este capitulo registra un atraso.
2.1 PRELIMINARES	100,00%	100,00%	Falta construcción de tramo vial	Capitulo ejecutado
2.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	100,00%	93,70%	Cajeo vía tramo Quebraditas	Este capitulo registra un atraso.
2.3 PLUVIAL	100,00%	54,36%	Instalaciones pluviales	Avance acorde con lo programado
2.4 OBRAS DE PROTECCIÓN	100,00%	64,79%	Se esta construyendo los bolsacretos	Este capitulo registra un atraso.
2.5 OBRAS DE DEMOLICIÓN	100,00%	91,07%	Demolicion en ejecución	Este capitulo registra un atraso.
2.6 ILUMINACIÓN	100,00%	0,06%	Se avanza con instalación de postes	Este capitulo registra un atraso.
2.7 PAVIMENTO ASFÁLTICO	0,00%	0,00%	Este capitulo se modifico a cero cantidades	Capitulo modificado a cero cantidades
2.8 ANDENES Y ESPACIO PÚBLICO	100,00%	47,33%	Se avanza con la construcción de andenes	Este capitulo registra un atraso.
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	100,00%	99,00%	Se ha realizado implementación permanente	Este capitulo registra un atraso.
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	100,00%	99,00%	Se ha realizado implementación permanente	Este capitulo registra un atraso.
TOTAL				


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	Ejecutado	Programado	Atraso(-) Adelanto (+)
Acumulado anterior	$ 14.140.642.566,00	$ 16.300.386.470,90	- 2.159.643.404,90
Durante el periodo	$ 2.296.819,00	$ 43.956.348,47	- 41.702.122,47
Acumulado Actual	$ 14.142.939.385,00	$ 16.344.343.819,37	- 2.201.344.334,37

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,269%	99,311%
Valor de la Obra Programada	$ 43.956.948,47	$ 16.344.343.819,37

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,210%	83,339%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.296.819,00	$ 14.142.939.385,00

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

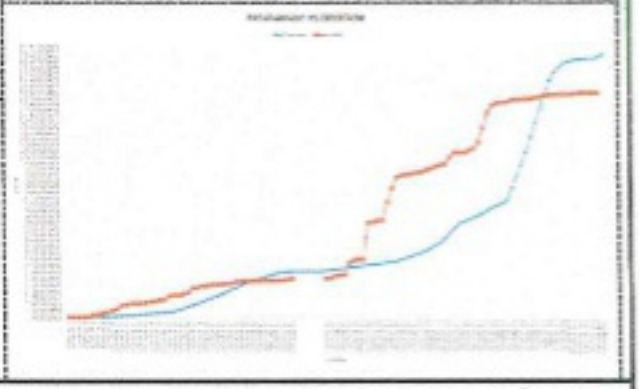

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3209509882. Línea Gratuita: 018000112995.
Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA

C. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE OBRA

35. CONDICIONES DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1.	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
1.1	PRELIMINARES	$ 0,00	$ 413.731.216,00	$ 413.731.216,00
1.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 0,00	$ 56.788.182,00	$ 56.788.182,00
1.3	INFRAESTRUCTURA	$ 2.006.671,00	$ 1.317.404.346,00	$ 1.319.410.919,00
1.4	SUPERESTRUCTURA	$ 0,00	$ 31.002.180,00	$ 31.002.180,00
1.5	ACERO DE REFUERZO	$ 0,00	$ 9.661.284.906,00	$ 9.661.284.906,00
1.6	OBRAS COMPLEMENTARIAS	$ 0,00	$ 46.573.206,00	$ 46.573.206,00
2.	VIAS DE ACCESO PUENTE VEHICULAR VEREDA EL LA VEREDA GUERRAITAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.1	PRELIMINARES	$ 0,00	$ 3.828.016,00	$ 3.828.016,00
2.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 200.248,00	$ 430.295.805,00	$ 430.507.071,00
2.3	FLUVIAL	$ 0,00	$ 49.950.421,00	$ 49.950.421,00
2.4	OBRAS DE PROTECCION	$ 0,00	$ 724.723.306,00	$ 724.923.359,00
2.5	OBRAS DE DRENAJE	$ 0,00	$ 168.811.160,00	$ 168.811.160,00
2.6	ILUMINACIÓN	$ 0,00	$ 153.996,00	$ 153.996,00
2.7	PAVIMENTO ASFALTICO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.8	ANDENES Y ESPACIO PUBLICO	$ 0,00	$ 1.118.085.113,00	$ 1.118.085.113,00
PMA	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 0,00	$ 74.288.152,00	$ 74.288.152,00
PMT	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	$ 0,00	$ 34.657.072,00	$ 34.657.072,00
	Subtotal	$ 2.206.919,00	$ 14.091.530.341,00	$ 14.093.737.160,00
	A.I.U	$ 685.101,22	$ 3.937.801.569,53	$ 3.938.386.671,11
	Valor total	$ 2.206.919,00	$ 14.140.442.586,00	$ 14.142.650.386,00

D. RECURSOS DEL CONTRATISTA

36. PERSONAL OPERATIVO OBRA		37. EQUIPOS EN OBRA		38. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
Administrativos(Residente, Director, SISO)	2	Retroexcavadora	0	LUNES	L
Operativos(Maestro, Ayudantes, Operarios)	8	Planta electrica 440KV	1	MARTES	L
Cuadrilla topografia	2	Motobombas	0	MIERCOLES	L
Administrativos Interventoria	1	Excavadora tipo pajarita	0	JUEVES	L
Operarios		Volqueta Doble Troque	0	VIERNES	L
Auxiliares viales	1	Vibro compactador	0	SABADO	L
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

E. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- El contratista continuará actividades estructura, ensamble y montaje de vigas.
- El contratista continuará actividades de construcción de vías, andenes, obras de protección y obras de iluminación.

F. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Para el presente corte semanal se evidencia un atraso del -12,972% respecto a la programación establecida

Se recomienda revisar las actividades críticas y adoptar las medidas necesarias que permitan recuperar el avance programado y evitar mayores afectaciones en el cronograma contractual.

Este corte semanal se analizo segun la reprogramación aprobada en la Modificatoria de la Prorroga No.4 por tres meses adicionales y vigente hasta el 21 de junio del 2025

(Nombre) JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaria de Infraestructura - Supervisor
Copia: Interventor y contratista

Ingresar Código Tabla de Retención Documental

ALCALDÍA DE
ACACIAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA
REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA ELABORACIÓN:	21 / 7 / 2026	No. INFORME	106	SEMANA No.	106

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

CONTRATO OBRA No:	929-2023	CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA GUTIERREZ
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	978-2023	INTEVENTORÍA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

G. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 15-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Montaje y ensamble de vigas metálicas.



FECHA FOTO: 15-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Montaje y ensamble de vigas metálicas.



FECHA FOTO: 15-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Montaje y ensamble de vigas metálicas.



FECHA FOTO: 15-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Inspección de montaje y ensamble de vigas metálicas.



FECHA FOTO: 15-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Control topográfico en la construcción de estructura vial.



FECHA FOTO: 15-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Control topográfico en el montaje del puente.

ALCALDÍA DE ACACIAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA
REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA ELABORACIÓN:	21 / 7 / 2026	No. INFORME	108	SEMANA No.	106
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS				
CONTRATO OBRA No:	929-2023	CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISDO MORA GUTIERREZ		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	978-2025	INTEVENTORÍA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

G. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 15-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Cargue de material de relleno para terraplén.



FECHA FOTO: 15-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Descargue de material de relleno para terraplén.



FECHA FOTO: 15-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Extendido de material de relleno para construcción de terraplén.



FECHA FOTO: 15-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Compactación de capas de relleno para construcción de terraplén.



FECHA FOTO: 15-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Extendido de capa subbase para construcción de terraplén.



FECHA FOTO: 15-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Compactación de capa subbase para construcción de terraplén.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA
REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA ELABORACIÓN:	21 / 7 / 2026	No. INFORME	106	SEMANA No.	106
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS				
CONTRATO OBRA No:	929-2023	CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA RL FRANCISCO MORA GUTIERREZ		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	978-2023	INTEVENTORÍA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

8. REGISTRO FOTOGRARICO



FECHA FOTO: 15-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Inspección de elementos de emergencia.



FECHA FOTO: 15-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Inspección de elementos de emergencia.



FECHA FOTO: 15-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Inspección de elementos de emergencia.



FECHA FOTO: 15-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Inspección de elementos de emergencia.



FECHA FOTO: 15-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Disponibilidad de puntos ecológicos.



FECHA FOTO: 15-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Señalización preventiva en las zonas de intervención.

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA

1. FECHA ELABORACIÓN:	27	7	2026	2. No. INFORME	107	3. SEMANA No.	107

4. PROYECTO: CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

5. SUPERVISOR: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA

A. DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

6. CONTRATO OBRA No:	929-2023			7. FECHA CONTRATO:	27 / 12 / 2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 13.430.269.860,00
9. FECHA ACTA INICIO:	27 / 5 / 2024			10. FECHA DE TERMINACIÓN:	20 / 9 / 2026	11. PLAZO:	28 Meses
12. PRORROGAS:	450 Días			13. SUSPENSIONES:	54 Días	14. ADICIONES:	$ 3.539.989.995,00
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA RL FRANCISCO MORA GUTIERREZ						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	978-2023			18. FECHA CONTRATO:	27 / 12 / 2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 827.061.787,00
20. FECHA ACTA INICIO:	27 / 5 / 2024			21. FECHA DE TERMINACIÓN:	20 / 9 / 2026	22. PLAZO:	28 Meses
23. PRORROGAS:	450 Días			24. SUSPENSIONES:	54 Días	25. ADICIONES:	$ 291.662.005,00
26. INTERVENTOR:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA						
27. APOYO A LA SUPERVISION:	CRISTIAN EDUARDO FUENTES AMADO						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERIODO	32. EVALUACION AVANCE
1. CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR	100,00%	93,18%	Construidos pilotes, vigas, estribos y aletas	Presenta atraso respecto a programado
1.1 PRELIMINARES	100,00%	100,00%	Avance en descapote y semilleación.	Capitulo ejecutado
1.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	100,00%	100,00%	Excavación pa el muros y zapatas	Capitulo ejecutado
1.3 INFRAESTRUCTURA	100,00%	93,72%	Falta solado y terminar dados de protección	Este capitulo registra un atraso
1.4 SUPERESTRUCTURA	100,00%	8,37%	Se continua montaje de vigas	Este capitulo registra un atraso
1.5 ACERO DE REFUERZO	100,00%	97,41%	Acero instalado en pilotes y estribos	Este capitulo registra un atraso
1.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS	100,00%	22,73%	Se inicia construcción de pedestales para luminaria	Este capitulo registra un atraso
2. VIAS DE ACCESO PUENTE VEHICULAR UBICADO E	100,00%	55,94%	Modificado n No.1 aprobo diseños actuales	Este capitulo registra un atraso
2.1 PRELIMINARES	100,00%	100,00%	Falta construccion de tramo vial	Capitulo ejecutado
2.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	100,00%	93,58%	Cajeo via tramo Quebraditas	Este capitulo registra un atraso
2.3 PLUVIAL	100,00%	54,35%	Instalaciones pluviales	Avance acorde con lo programado
2.4 OBRAS DE PROTECCION	100,00%	64,80%	Se esta construyendo los bolsacretos	Este capitulo registra un atraso
2.5 OBRAS DE DESCOLGUE	100,00%	91,07%	Demolición en ejecución	Este capitulo registra un atraso
2.6 ILUMINACION	100,00%	0,06%	Se avanza con instalación de postes	Este capitulo registra un atraso
2.7 PAVIMENTO ASFÁLTICO	0,00%	0,00%	Este capitulo se modifico a cero cantidades	Capitulo modificado a cero cantidades
2.8 ANDENES Y ESPACIO PÚBLICO	100,00%	47,33%	Se avanza con la construcción de andenes	Este capitulo registra un atraso
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	100,00%	99,02%	Se ha realizado implementación permanente	Este capitulo registra un atraso
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	100,00%	99,02%	Se ha realizado implementación permanente	Este capitulo registra un atraso
TOTAL				


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	Ejecutado	Programado	Atraso(-) Adelanto (+)
Acumulado anterior	$ 14.142.896.385,03	$ 16.344.240.919,07	- 2.201.544.534,37
Durante el periodo	$ 1.470.040,00	$ 150.059.879,63	- 148.589.839,63
Acumulado Actual	$ 14.144.169.434,03	$ 16.494.303.798,70	- 2.350.134.364,70

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,584%	97,126%
Valor de la Obra Programado	$ 150.059.879,63	$ 16.494.303.798,70

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,000%	83,347%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 1.470.040,00	$ 14.144.169.434,00

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

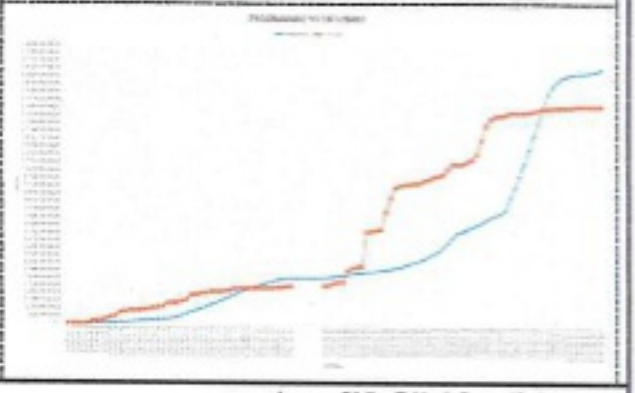

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA

C. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE OBRA

36. CONDICIONES DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1.	CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
1.1	PRELIMINARES	$ 0,00	$ 413.791.216,00	$ 413.791.216,00
1.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 0,00	$ 56.786.182,00	$ 56.786.182,00
1.3	INFRAESTRUCTURA	$ 334.429,00	$ 1.319.410.919,00	$ 1.319.745.348,00
1.4	SUPERESTRUCTURA	$ 0,00	$ 31.092.183,00	$ 31.092.183,00
1.5	ACERO DE REFUERZO	$ 0,00	$ 9.691.294.905,00	$ 9.691.294.905,00
1.6	OBRAS COMPLEMENTARIAS	$ 0,00	$ 46.573.209,00	$ 46.573.209,00
2.	VIAS DE ACCESO PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA GUERRATAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.1	PRELIMINARES	$ 0,00	$ 3.626.015,00	$ 3.626.015,00
2.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 0,00	$ 430.597.071,00	$ 430.597.071,00
2.3	PLUVIAL	$ 0,00	$ 49.990.421,00	$ 49.990.421,00
2.4	OBRAS DE PROTECCION	$ 1.135.622,00	$ 724.723.939,00	$ 725.859.575,00
2.5	OBRAS DE DEMOLICION	$ 0,00	$ 958.011.168,00	$ 958.011.168,00
2.6	ILUMINACIÓN	$ 0,00	$ 153.998,00	$ 153.998,00
2.7	PAVIMENTO ASFALTICO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.8	ANDENES Y ESPACIO PUBLICO	$ 0,00	$ 1.118.995.113,00	$ 1.118.995.113,00
PMA	IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 0,00	$ 74.265.155,00	$ 74.265.155,00
PMT	IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 0,00	$ 34.657.072,00	$ 34.657.072,00
	Subtotal	$ 1.470.049,00	$ 14.099.777.160,00	$ 14.035.247.209,00
	A.I.U	$ 361.123,61	$ 3.636.368.671,11	$ 3.636.787.794,93
	Valor total	$ 1.470.049,00	$ 14.142.099.395,00	$ 14.144.169.434,00

D. RECURSOS DEL CONTRATISTA

36. PERSONAL OPERATIVO OBRA		37. EQUIPOS EN OBRA		38. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
Administrativos(Residente, Director, SISO)	2	Retroexcavadora	0	LUNES	L
Operativos(Maestro, Ayudantes, Operarios)	8	Planta eléctrica 440KV	1	MARTES	L
Cuadrilla topografia	2	Motobombas	0	MIERCOLES	L
Administrativos Interventoria	1	Excavadora tipo pajarita	0	JUEVES	L
Operarios		Volqueta Doble Troque	0	VIERNES	L
Auxiliares viales	1	Vibro compactador	0	SÁBADO	L
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

E. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- El contratista continuara actividades soldadura, ensamble y montaje de riostras de las vigas metalicas.
- El contratista continuara actividades de construcción de vias, anclajes, obras de proteccion y obras de iluminacion.

F. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Para el presente corte semanal se evidencia un atraso del -10,848% respecto a la programación establecida.

Se recomienda revisar las actividades criticas y adoptar las medidas necesarias que permitan recuperar el avance programado y evitar mayores afectaciones en el cronograma contractual.

Este corte semanal se emite dando cogir la reprogramación aprobada en la Modificatoria de la Prorroga No.4 por tres meses adicionales y vigente desde el 21 de junio del 2026

(Nombre) JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


Original: Secretaria de Infraestructura - Supervisión
Copia: Interventor y contratista

ALCALDÍA DE ACACÍAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA
REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA ELABORACIÓN:	27 / 7 / 2026	No. INFORME	107	SEMANA No.	107
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS				
CONTRATO OBRA No:	929-2023	CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA GUTIERREZ		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	978-2023	INTEVENTORÍA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

G. REGISTRO FOTOGRAFICO

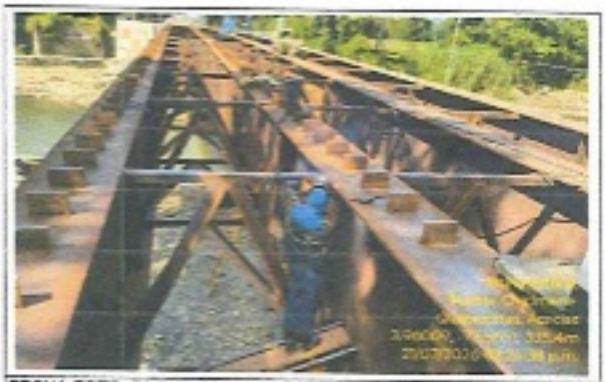


FECHA FOTO: 21-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Montaje y ensamble de vigas metálicas.



FECHA FOTO: 21-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Montaje y ensamble de vigas metálicas.



FECHA FOTO: 21-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Montaje y ensamble de vigas metálicas.

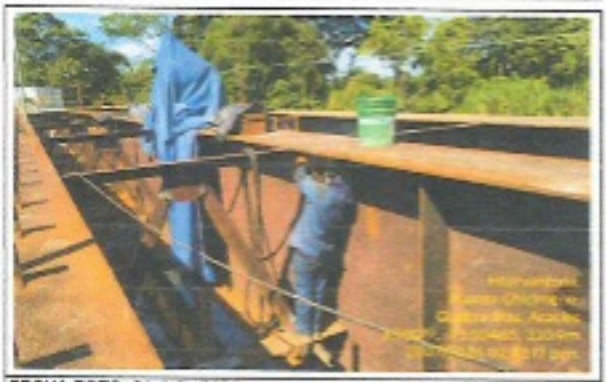

FECHA FOTO: 21-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Montaje y ensamble de vigas metálicas.



FECHA FOTO: 24-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Montaje y ensamble de vigas metálicas.



FECHA FOTO: 24-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Montaje y ensamble de vigas metálicas.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA
REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA ELABORACIÓN:	27 / 7 / 2026	No. INFORME	107	SEMANA No.	107
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS				
CONTRATO OBRA No:	929-2023	CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA GUTIERREZ		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	978-2023	INTEVENTORÍA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

G. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 27-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Extendida de material de relleno para construcción de terraplén.



FECHA FOTO: 24-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Compactación de capas de relleno para construcción de terraplén.



FECHA FOTO: 24-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Extendida de material de relleno para construcción de terraplén.



FECHA FOTO: 24-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Trabajos para construcción de losas de aproximación.



FECHA FOTO: 24-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Trabajos para construcción de losas de aproximación.



FECHA FOTO: 24-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Control vial durante las actividades de la obra.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA
REGISTRO FOTOGRAFICO

FECHA ELABORACIÓN:	27 / 7 / 2026	No. INFORME	107	SEMANA No.	107
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS				
CONTRATO OBRA No:	929-2023	CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA GUTIERREZ		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	978-2023	INTEVENTORÍA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

G. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 24-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Inspección de elementos de emergencia.



FECHA FOTO: 24-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Inspección de elementos de emergencia.



FECHA FOTO: 24-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Inspección de elementos de emergencia.



FECHA FOTO: 24-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Inspección de elementos de emergencia.



FECHA FOTO: 24-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Disponibilidad de puntos ecológicos.



FECHA FOTO: 21-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Señalización preventiva en las zonas de intervención.

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA
REGISTRO FOTOGRAFICO

FECHA ELABORACIÓN:	27 / 7 / 2026	No. INFORME	107	SEMANA No.	107
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS				
CONTRATO OBRA No:	925-2023	CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA GUTIERREZ		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	976-2023	INTEVENTORÍA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

G. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 21-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Visita del DNP para verificación de avance del proyecto.



FECHA FOTO: 21-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Visita del DNP para verificación de avance del proyecto.



FECHA FOTO: 24-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Toma de pruebas de ultrasonido a las soldaduras estructurales de las vigas metálicas.



FECHA FOTO: 24-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Toma de pruebas de ultrasonido a las soldaduras estructurales de las vigas metálicas.



FECHA FOTO: 24-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Control topográfico en el montaje del puente.



FECHA FOTO: 24-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Control topográfico en el montaje del puente.

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	8	2029	2. No. INFORME	108	3. SEMANA No.	108

4. PROYECTO: CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

5. SUPERVISOR: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA

A. DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

6. CONTRATO OBRA No:	929-2023			7. FECHA CONTRATO:	27 / 12 / 2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 13.430.269.899,00
9. FECHA ACTA INICIO:	27 / 5 / 2024			10. FECHA DE TERMINACION:	20 / 9 / 2026	11. PLAZO:	28 Meses
12. PRORROGAS:	450 Días			13. SUSPENSIONES:	54 Días	14. ADICIONES:	$ 3.539.699.696,00
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA RL FRANCISCO MORA GUTIERREZ						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	978-2023			18. FECHA CONTRATO:	27 / 12 / 2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 627.081.767,00
20. FECHA ACTA INICIO:	27 / 5 / 2024			21. FECHA DE TERMINACIÓN:	20 / 9 / 2026	22. PLAZO:	28 Meses
23. PRORROGAS:	450 Días			24. SUSPENSIONES:	54 Días	25. ADICIONES:	$ 297.952.050,00
26. INTERVENTOR:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA						
27. APOYO A LA SUPERVISION:	CRISTIAN EDUARDO FUENTES AMADO						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
1. CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR	100,00%	93,16%	Construidos pilotes, viga, estribos y aletas	Presenta atraso respecto a programado
1.1 PRELIMINARES	100,00%	100,00%	Avances en descapote y canalización	Capítulo ejecutado
1.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	100,00%	100,00%	Excavación para muros y zapatas.	Capítulo ejecutado
1.3 INFRAESTRUCTURA	100,00%	99,74%	Falta aislado y terminar obras de protección	Este capítulo registra un atraso.
1.4 SUPERESTRUCTURA	100,00%	8,37%	Se continua montaje de vigas	Este capítulo registra un atraso.
1.5 ACERO DE REFUERZO	100,00%	97,41%	Acero instalado en pilotes y estribos.	Este capítulo registra un atraso.
1.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS	100,00%	22,73%	Se inicia construcción de pedestales para luminaria	Este capítulo registra un atraso.
2. VIAS DE ACCESO PUENTE VEHICULAR UBICADO E	100,00%	55,97%	Modificatoria No.1 aprobo diseños actuales.	Este capítulo registra un atraso.
2.1 PRELIMINARES	100,00%	100,00%	Falta construcción de tramo vial	Capítulo ejecutado
2.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	100,00%	93,56%	Cajeo Via tramo Quebraditas	Este capítulo registra un atraso.
2.3 PLUVIAL	100,00%	54,95%	Instalaciones pluviales	Avance acorde con lo programado
2.4 OBRAS DE PROTECCION	100,00%	64,91%	Se esta construyendo los bolsacretos	Este capítulo registra un atraso.
2.5 OBRAS DE DEMOLICIÓN	100,00%	91,07%	Demolición en ejecución	Este capítulo registra un atraso.
2.6 ILUMINACIÓN	100,00%	0,06%	Se avanza con instalación de postes	Este capítulo registra un atraso.
2.7 PAVIMENTO ASFÁLTICO	0,00%	0,00%	Este capitulo se modifico a cero cantidades	Capitulo modificado a cero cantidades
2.8 ANDENES Y ESPACIO PÚBLICO	100,00%	47,37%	Se avanza con la construcción de andenes	Este capítulo registra un atraso.
IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	100,00%	99,02%	Se ha realizado implementación permanente	Este capítulo registra un atraso.
IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	100,00%	99,02%	Se ha realizado implementación permanente	Este capítulo registra un atraso.
TOTAL				


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	Ejecutado	Programado	Atraso(-) Adelanto (+)
Acumulado anterior	$ 14.144.159.434,00	$ 16.494.303.768,70	- 2.350.134.384,70
Durante el periodo	$ 1.414.925,00	$ 102.356.673,63	- 140.641.960,63
Acumulado Actual	$ 14.145.584.359,00	$ 16.644.360.673,33	2.489.776.575,33

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,87%	99,096%
Valor de la Obra Programada	$ 150.056.673,63	$ 16.644.360.673,33

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,01%	83,356%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 1.414.925,00	$ 14.145.584.359,00

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

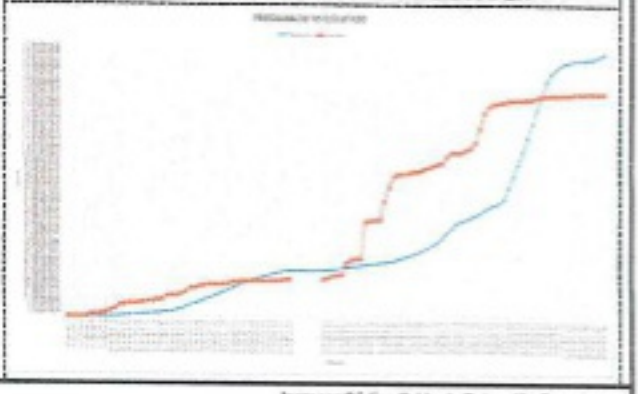

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA

C. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE OBRA

35. CONDICIONES DE CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1.	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
1.1	PRELIMINARES	$ 0,00	$ 413.791.216,00	$ 413.791.216,00
1.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 0,00	$ 56.786.182,00	$ 56.786.182,00
1.3	INFRAESTRUCTURA	$ 884.429,00	$ 1.919.745.348,00	$ 1.920.629.777,00
1.4	SUPERESTRUCTURA	$ 0,00	$ 31.002.183,00	$ 31.002.183,00
1.5	ACERO DE REFUERZO	$ 0,00	$ 9.601.054.506,00	$ 9.601.054.506,00
1.6	OBRAS COMPLEMENTARIAS	$ 0,00	$ 46.573.209,00	$ 46.573.209,00
2.	VIAS DE ACCESO PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA GUAYABITAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.1	PRELIMINARES	$ 0,00	$ 3.808.018,00	$ 3.808.018,00
2.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 0,00	$ 430.597.071,00	$ 430.597.071,00
2.3	PLUVIAL	$ 0,00	$ 49.590.421,00	$ 49.590.421,00
2.4	OBRAS DE PROTECCION	$ 189.270,00	$ 725.158.979,00	$ 725.348.249,00
2.5	OBRAS DE CANALIZACION	$ 0,00	$ 188.011.166,00	$ 188.011.166,00
2.6	ILUMINACION	$ 0,00	$ 103.998,00	$ 103.998,00
2.7	PAVIMENTO ASFALTICO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.8	JARDINES Y ESPACIO PUBLICO	$ 691.200,00	$ 1.118.086.113,00	$ 1.118.086.343,00
PMA	IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 0,00	$ 74.266.149,00	$ 74.266.149,00
PMT	IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 0,00	$ 34.657.072,00	$ 34.657.072,00
	Subtotal	$ 1.414.929,00	$ 14.035.247.209,00	$ 14.037.692.108,00
	A.I.U	$ 366.838,44	$ 2.538.797.794,69	$ 2.539.134.626,37
	Valor total	$ 1.414.929,00	$ 14.144.185.434,00	$ 14.145.584.383,00

D. RECURSOS DEL CONTRATISTA

36. PERSONAL OPERATIVO OBRA		37. EQUIPOS EN OBRA		38. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
Administrativos(Residente, Director, SISO)	2	Retroexcavadora	0	LUNES	Festivo
Operativos(Maestro, Ayudantes, Operarios)	11	Planta eléctrico 440KV	1	MARTES	S
Cuadrilla topografia	2	Motobombas	0	MIERCOLES	L
Administrativos interventoria	1	Excavadora tipo pajarita	0	JUEVES	L
Operarios		Volqueta Doble Troque	0	VIERNES	S
Auxiliares viales	1	Vibro compactador	0	SÁBADO	L
				LLUVIOSO (LL) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

E. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- El contratista continuara actividades soldadura, ensamble y montaje de nodos de los vigas metalicas.
- El contratista continuará actividades de construcción de losas MR para vias , andenes, obras de proteccion y obras de iluminación.

F. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Para el presente corte semanal se evidencia un atraso del -14,738% respecto a la programación establecida.

Se recomienda revisar las actividades criticas y adoptar las medidas necesarias que permitan recuperar el avance programado y evitar mayores afectaciones en el cronograma contractual.

Este corte corresponde al cronograma según la reprogramación aprobada en la Modificatoria de la Prorroga No.4 por tres meses adicionales y el cual inicia el 21 de junio del 2026

(Nombre) JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaria de Infraestructura - Supervisión
Copia: Interventor y contratista

ALCALDÍA DE ACACÍAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA
REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA ELABORACIÓN:	3 | 8 | 2026	No. INFORME	108	SEMANA No.	108
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS				
CONTRATO OBRA No:	909-2023	CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA GUTIERREZ		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	978-2023	INTEVENTORÍA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

G. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 30-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Montaje y ensamble de vigas metálicas.



FECHA FOTO: 30-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Montaje y ensamble de vigas metálicas.



FECHA FOTO: 31-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Montaje y ensamble de vigas metálicas.



FECHA FOTO: 31-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Montaje y ensamble de vigas metálicas.



FECHA FOTO: 31-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Montaje y ensamble de vigas metálicas.



FECHA FOTO: 31-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Montaje y ensamble de vigas metálicas.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA
REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA ELABORACIÓN:	3 / 8 / 2026	No. INFORME	108	SEMANA No.	108
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS				
CONTRATO OBRA No:	929-2023	CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA RL FRANCISCO MORA GUTIERREZ		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	978-2023	INTEVENTORÍA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

G. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 30-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Cargue de material de relleno para construccion de terraplen.



FECHA FOTO: 30-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Colocacion de material de relleno para construccion de terraplen.



FECHA FOTO: 29-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Extendida de material de relleno para construcción de terraplén.



FECHA FOTO: 29-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Compactación de capas de relleno para construcción de terraplén.



FECHA FOTO: 29-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Trabajos para construcción de losas de aproximación.



FECHA FOTO: 30-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Trabajos para construcción de losas de aproximación.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA
REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA ELABORACIÓN:	3 / 9 / 2026	No. INFORME	108	SEMANA No.	108
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS				
CONTRATO OBRA No:	926-2023	CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA RL FRANCISCO MORA GUTIERREZ		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	978-2023	INTEVENTORÍA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 31-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Instalacion de sardinel de confinamiento en tramo vial de aproche.



FECHA FOTO: 31-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Instalacion de sardinel de confinamiento en tramo vial de aproche.



FECHA FOTO: 31-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Extension de capa subbase en aproche de tramo vial.



FECHA FOTO: 31-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Comité tecnico de control de obra.



FECHA FOTO: 30-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Control topográfico en el montaje del puente.



FECHA FOTO: 30-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Control topográfico en el montaje del puente.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA
REGISTRO FOTOGRAFICO

FECHA ELABORACIÓN:	3 / 8 / 2026	No. INFORME	108	SEMANA No.	108
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS				
CONTRATO OBRA No:	029-2023	CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA GUTIERREZ		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	078-2023	INTEVENTORÍA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

G. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 29-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Inspección de elementos de emergencia.



FECHA FOTO: 29-Julio-2026
DESCRIPCION: Inspección de elementos de emergencia.



FECHA FOTO: 29-Julio-2026
DESCRIPCION: Inspección de elementos de emergencia.



FECHA FOTO: 29-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Inspección de elementos de emergencia.



FECHA FOTO: 29-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Disponibilidad de puntos ecológicos.



FECHA FOTO: 31-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Señalización preventiva en las zonas de intervención.

9.4 Afiliaciones y/o pagos del personal a la seguridad social Interventoría.

NOTA ACLATRATORIA.

Durante el presente período no se ha efectuado el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social correspondientes al mes de julio de 2026, teniendo en cuenta que, a la fecha de corte del informe, aún no ha vencido el plazo legal establecido para efectuar dicho pago. En consecuencia, su verificación se realizará una vez se cumpla la fecha límite correspondiente y se alleguen los respectivos soportes

9.5 Correspondencia enviada y recibida.

9.5.1. Correspondencia enviada

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
NIT 9.658.796-1

Acacias, 2 de julio de 2026

CI- OCA-978.2023-361

Ingeniero
IVÁN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura
Secretaria de Infraestructura – Alcaldía de Acacias
infraestructura@acacias.gov.co
Carrera 16 No. 12-10 Barrio Centro

Referencia: Contrato de Interventoría No. OCA-978 DE 2023 cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS" por valor de $918.733.882,00 según Modificatoria No.1, y su plazo de ejecución de veintiséis (26) meses, según Modificatoria de Prórroga No.4.

Asunto: Radicación de comité de obra **No.63** del contrato de obra 929 DE 2023 cuyo objeto es "CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por un valor de ($16.970.259.458,00) m/cte según Modificatoria No.1, y su plazo de ejecución de veintiséis (26) meses, según Modificatoria de Prórroga No.4.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, me permito remitir para su conocimiento la información correspondiente al Comité de Obra **No.63** del 30 de junio del 2026, en el marco del contrato citado en el asunto.

COMITÉ No	FECHA
No.63	30-06-2026

Aclaramos que dicho comité será adjuntado en original en el informe mensual que se radique y él envió por este medio es de conocimiento para las partes, de igual forma los compromisos pactados en dichos comités fueron los siguientes:

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1

Compromisos pactados en el comité No.63.

Compromiso	Responsable	Fecha
Cronograma actualizado para la culminación del proyecto	Contratista	03 de julio del 2026
Terminación de soldaduras estructurales y los arriostramientos	Contratista	31 de julio del 2026
Instalación del Metal Deck	Contratista	20 de julio del 2026
Terminación losas MR, losas de aproximación y andenes	Contratista	15 de agosto del 2026
Ejecución de los ensayos de ultrasonido	Contratista	Al 100% de la soldadura
Fundida de la losa del puente	Contratista	Una vez terminado el Metal Deck

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier aclaración.

Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría

C.C. Consorcio Acacia, R/L Francisco Mora Gutiérrez consorcioacacia.info23@gmail.com
C.C. Ing. Cristian Fuentes Amado - Apoyo a la supervisión cristhian.f9393@gmail.com

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
NIT 9.658.796-1

Acacias, 13 de julio de 2026

CI- OCA-978.2023-362

Señor:
CONSORCIO ACACIA
R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ
consorcioacacia.info23@gmail.com
Calle 26 No. 68C– 61 Oficina 316 Bogotá D.C

Referencia: Contrato de Interventoria No. OCA-978 DE 2023 cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS" por valor de $918.733.882,00 según Modificatoria No.1, y su plazo de ejecución de veintiséis (26) meses, según Modificatoria de Prórroga No.4.

Asunto: Devolución por observaciones encontradas los informes mensuales de enero a mayo, del contrato de obra 929 de 2023 cuyo objeto es "CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por un valor de ($16.970.259.458,00) m/cte según Modificatoria No.1, y su plazo de ejecución de veintiséis (26) meses, según Modificatoria de Prórroga No.4.

Cordial saludo:

En desarrollo de las labores de seguimiento y control contractual, esta Interventoria se permite informar que realizó la revisión de la documentación presentada por el Contratista de los informes mensuales de enero a mayo del 2026.

Como resultado de dicha revisión, se identificaron observaciones que impiden emitir un concepto definitivo sobre la solicitud presentada.

Por lo anterior, a continuación, se relacionan las observaciones encontradas, las cuales deberán ser subsanadas por el Contratista e incorporadas en la documentación corregida para que se radique nuevamente a esta Interventoria.

Lo anterior con el fin de realizar la correspondiente verificación, emitir el concepto respectivo y continuar con el trámite de radicación ante la Entidad.

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
NIT 9.658.796-1

INFORME DE ENERO

- Las planillas de seguridad no han sido corregidas a los afiliados que deben ser de 30 días. Especificamente de:
  - Albeiro López Sierra
  - Alexander Herrera y debe estar cotizando sobre IBC de $2.773.000,00
- Falta planilla de Sebastián Sanches - enero
- Los aportes de riesgos de los profesionales también deben corresponder a 30 días y deben aportar sobre el riesgo V (Clase 5).

INFORME DE FEBRERO

- Informe de obra Pag.20 relacionar Pólizas Prorroga N.2.
- El cuadro de relación de personal del Informe PAGA está mal impreso.
- El IBC de residente de obra no puede estar por debajo de $2´773.000,00
- Anexo No.8 adjuntar laboratorios correspondientes al mes del informe.
  - Laboratorio de las muestras MR 28 enero.
  - Laboratorio de las muestras bolsacreto del 29 de enero.

INFORME DE MARZO

- Informe de obra Pag.2 cambiar No. del informe.
- Informe de obra Pag.20 relacionar Pólizas Prorroga N.2.
- Informe de obra Pag.33 el número de planillas no corresponde.
- Informe de obra Pag.34 verificar el número de planilla HISO y anexar planilla.
- Verificar que el cuadro de relación de personal del Informe PAGA sea el mismo de los demás informes.
- Informe de SST Pag.23 Falta planillas de riesgos de los profesionales y Planilla HISO
- La planilla anexada del consorcio no corresponde al mes de marzo y el IBC del residente de obra no puede estar por debajo de $2´773.000,00.

INFORME DE ABRIL

- Informe de obra Pag.2 cambiar No. del informe.
- Informe de obra Pag.13 falta relacionar Prorroga no.3.
- Informe de obra Pag.17 falta actualizar RP.
- Informe de obra Pag.20 falta relacionar pólizas de Prorroga 2 y Prorroga 3.
- Informe de obra Pag.33 el número de planillas no corresponde.
- Verificar que el cuadro de relación de personal del Informe PAGA sea el mismo de los demás informes.
- Informe SST Pag.6 el número de planillas no corresponde.
- Informe de SST Pag.21 Falta planillas de riesgos de los profesionales.
- La planilla anexada del consorcio no corresponde al mes de abril y el IBC del residente de obra no puede estar por debajo de $2´773.000,00.

Calle 49 No.30-16 oficina 203, Barrio Ceudal
Villavicencio – Meta
interpuentechichimene@gmail.com

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
NIT 9.658.796-1


INFORME DE MAYO

- Informe de obra Pag.17 falta actualizar RP.
- Informe de obra Pag.31 Ítem 2.8.2 no tiene se reportó avance en este corte.
- Informe de obra Pag.32 faltan planillas de mayo y relacionarlas en el cuadro de personal.
- Informe de obra Pag.33 faltan planillas de mayo y relacionarlas en el cuadro de personal.
- Informe de obra Pag.42 faltan anexar correspondencia enviada.
- Informe de obra Pag.43 faltan anexar correspondencia recibida.
- Informe de SST Pag.5 Faltan las páginas No.6 y No.7 donde relacionan cuadro de personal.
- Informe de SST Pag.19 Falta planillas de riesgos de los profesionales.
- Debe anexar Planilla HISO de mayo no de abril.
- La planilla anexada del consorcio no corresponde al mes de mayo y el IBC del residente de obra no puede estar por debajo de $2'773.000,00.
- Falta Planillas de profesionales independientes:(Director de obra -y- Especialista Estructural)

Agradezco la atención y quedo atento a cualquier inquietud.

- **NOTA: Favor recoger las carpetas en la oficina de interventoría.**

Cordialmente:



ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría

C.C. Ing. Cristian Fuentes Amado - Apoyo a la supervisión cristhian.f9393@gmail.com
C.C. Dr. Henry Andres Quintero Novoa apoyo.infraestructura.cps1@acacias.gov.co

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
NIT 9.658.796-1

Acacias, 09 de julio de 2026

CI- OCA-978 2023-363
RECIBIDO
Fecha: 09/07/2026
Hora: 15:41 h.
Firma: Nevo Hernández.
Secretaria de Infraestructura

Ingeniero:
IVÁN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura
Secretaria de Infraestructura – Alcaldía de Acacias
infraestructura@acacias.gov.co
Carrera 16 No. 12-10 Barrio Centro

Referencia: Contrato de Interventoría No. OCA-978 DE 2023 cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS" por valor de $918.733.882,00 según Modificatoria No.1, y su plazo de ejecución de veintiséis (26) meses, según Modificatoria de Prórroga No.4

Asunto: Radicación y viabilidad **Modificatoria No.5** de cantidades mayores y menores e inclusión de ítem no previstos del contrato de obra No. 929 DE 2023 cuyo objeto es "CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por un valor de ($16.970.259.458,00) m/cte según Modificatoria No.1, y su plazo de ejecución de veintiséis (26) meses, según Modificatoria de Prórroga No.4.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la solicitud de la Modificatoria No. 5 presentada por el Contratista, radicada el 29 de mayo de 2026, mediante la cual expone los fundamentos que sustentan dicha modificación, esta Interventoria se permite radicar ante la Entidad el informe, la documentación soporte y el aval correspondiente para el trámite de aprobación de la Modificatoria No. 5, en el marco del contrato referido en el asunto.

CARPETA 1 202 folios	Solicitud modificatoria No.5 de obra de la supervisión. Oficio solicitud del Contratista. Informe del Contratista. Anexo técnico Estructural Anexo técnico Hidráulico de obras de protección. Anexo técnico Hidráulico de obra filtros de drenaje. Anexo técnico de movimiento de postes de redes eléctricas.

Calle 49 No.30-16 oficina 203, Barrio Caudal
Villavicencio – Meta
interpuentechichimene@gmail.com

Powered by CamScanner

	Carteras topográficas. Acta de fijación de precios. Resolución No.022 de 2025. APU de Ítem no previstos Listado mano de obra, equipos y materiales.
CARPETA 2 209 folios	Acta de Modificación No.5. Memorias de cálculo. Especificaciones técnicas. 2 planos
CARPETA 3 69 folios	Informe de Interventoría para Modificatoria No.5 al contrato de Obra

Agradezco de antemano la atención y quedo atento a cualquier información con el fin de garantizar el avance y cumplimiento del objeto del proyecto.

Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría

C.C. Ing. Cristian Fuentes Amado - Apoyo a la supervisión cristhian.f0393@gmail.com
C.C. Dr. Henry Andres Quintero Novoa apoyo.infraestructura.cps1@acacias.gov.co

Powered by CamScanner

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
NIT 9.658.796-1

Acacias, 09 de julio de 2026

CI- OCA-978.2023-364

Ingeniero:
IVÁN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura
Secretaria de Infraestructura – Alcaldía de Acacias
infraestructura@acacias.gov.co
Carrera 16 No. 12-10 Barrio Centro

Referencia: Contrato de Interventoría No. OCA-978 DE 2023 cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS" por valor de $918.733.882,00 según Modificatoria No.1, y su plazo de ejecución de veintiséis (26) meses, según Modificatoria de Prórroga No.4

Asunto: Aval y viabilidad **Modificatoria No.5** de cantidades mayores y menores e inclusión de ítem no previstos del contrato de obra No. 929 DE 2023 cuyo objeto es "CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por un valor de ($16.970.259.458,00) m/cte según Modificatoria No.1, y su plazo de ejecución de veintiséis (26) meses, según Modificatoria de Prórroga No.4.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la solicitud de Modificatoria No.5 por parte del Contratista radicada el 29 de mayo del 2026 donde manifiesta lo siguiente:

"(...). Por medio de la presente solicitamos llevar a cabo el trámite para acta de modificación No. 5 del contrato de la referencia, así:

Se requiere un balance de mayores y menores cantidades y la inclusión de ítems no previstos, debido a las necesidades reales del contrato las cuales se encuentran relacionadas en el informe técnico de justificación

A la fecha se presenta un avance programado para la semana No.98 de 1,038% equivalente a $ 176.077.418,46 para un avance programado acumulado de 97,146% que representa $ 16.485.864.956,25 y para un avance ejecutado para la semana No.98 de 0,051% conforme

al cronograma, para un avance ejecutado acumulado de 82,811% equivalente a $ 14.053.180.413,80.

Finalmente, los demás cambios que se efectuaron en el contrato se evidencian en los anexos según los requisitos dados por los procesos establecidos por parte de la entidad contratante. (...)"

Una vez verificada y analizada la solicitud y verificada la documentación presentada, esta Interventoría evidencia que durante la puesta en marcha y ejecución de la Modificatoria No. 1, el Contratista, identifica que algunas actividades previstas no se ajustaban a las necesidades reales del proyecto, así como la necesidad de incorporar actividades complementarias indispensables para garantizar la adecuada ejecución de la obra.

De acuerdo con dicho análisis, las modificaciones se presentan mediante el formato de mayores y menores cantidades de obra, así como a través de la inclusión de ítems no previstos, generando los ajustes correspondientes conforme a las condiciones reales de la obra, sin modificar el presupuesto inicial aprobado.

Por lo anterior esta Interventoría considera técnicamente viable, dado que durante la ejecución se evidenciaron diferencias entre las cantidades previstas, los diseños actualizados y las condiciones reales encontradas en obra, especialmente en componentes como estructura metálica, redes pluviales, obras de protección, demolición, iluminación, pavimento, andenes y espacio público. Estas modificaciones permiten ajustar el presupuesto a la realidad constructiva y garantizar la funcionalidad, estabilidad, seguridad y correcta terminación del proyecto

Desde el punto de vista financiero, la Modificatoria No. 5 no genera incremento en el valor actualizado del contrato, sino que redistribuye los recursos existentes mediante la disminución o eliminación de actividades que no resultan necesarias y la incorporación de actividades indispensables para la ejecución final de la obra. En consecuencia, se mantiene el equilibrio económico del contrato y no se generan costos adicionales para la Entidad

Así mismo, la Interventoría verifica que la modificación no altera el objeto contractual, sino que permite adecuar las actividades a las necesidades reales del proyecto, garantizando que los recursos ajustados se orienten a los componentes que efectivamente se requieren para la terminación de la obra.

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
NIT 9.658.796-1

El análisis por capítulos del presupuesto de Modificatoria No.1 versus la presente Modificatoria No.5 es el siguiente:

CAPITULOS	CONDICION INICIAL	% INCIDENCIA	MODIFICATORIA 1	% INCIDENCIA	MODIFICATORIA 5	% INCIDENCIA	VA
CONTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR	$ 10.462.709.343,00	77,91%	$ 12.362.368.175,00	72,89%	$ 12.205.703.714,00	71,91%	-
PRELIMINARES E INFRAESTRUCTURA	$ 272.192.313,00	2,03%	$ 413.731.216,00	2,44%	$ 329.967.388,00	1,94%	-2
EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 61.121.906,00	0,46%	$ 56.788.182,00	0,33%	$ 56.788.182,00	0,33%	
INFRAESTRUCTURA	$ 1.310.723.607,00	9,76%	$ 1.406.353.909,00	8,29%	$ 1.266.936.462,00	8,18%	-
SUPERESTRUCTURA	$ 264.786.302,00	2,72%	$ 370.966.872,00	2,19%	$ 343.671.345,00	2,03%	-
ACERO DE REFUERZO	$ 8.240.550.606,00	61,42%	$ 9.997.998.976,00	58,98%	$ 9.861.173.971,00	58,23%	-
OBRAS COMPLEMENTARIAS	$ 204.344.280,00	1,52%	$ 204.070.970,00	1,21%	$ 200.495.358,00	1,26%	-
VÍAS DE ACCESO PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA QUEBRADITAS	$ 2.557.580.550,00	21,28%	$ 4.497.891.283,00	22,50%	$ 4.658.035.448,00	27,44%	
PRELIMINARES	$ 3.126.846,00	1,09%	$ 3.626.018,00	0,03%	$ 3.626.018,00	0,03%	
EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 850.519.161,00	6,56%	$ 460.066.304,00	2,71%	$ 944.405.274,00	5,57%	
PLUVIAL	$ 226.715.882,00	2,20%	$ 91.671.486,00	0,54%	$ 335.822.431,00	1,97%	
OBRAS DE PROTECCIÓN	$ 374.038.372,00	2,78%	$ 1.117.411.963,00	6,59%	$ 1.109.287.625,00	6,54%	-
OBRAS DE DEMOLICION	$ 169.737.564,00	1,26%	$ 207.107.129,00	1,22%	$ 198.906.832,00	1,17%	-
ILUMINACIÓN	$ 320.572.141,00	2,38%	$ 255.413.335,00	1,51%	$ 248.068.678,00	1,46%	-
PAVIMENTO ASFALTICO	$ 348.495.687,00	2,59%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
ANDENES Y ESPACIO PÚBLICO	$ 465.338.122,00	3,46%	$ 2.352.154.025,00	13,92%	$ 1.817.008.290,00	10,71%	-1
IMPLEMENTACION PMA	$ 75.000.000,00	0,56%	$ 75.000.000,00	0,44%	$ 75.000.000,00	0,44%	
IMPLEMENTACION PMT	$ 35.000.000,00	0,26%	$ 35.000.000,00	0,21%	$ 35.000.000,00	0,21%	
	$ 13.430.269.893,00	100,00%	$ 16.970.259.458,00	100,00%	$ 16.970.259.162,00	100,00%	

Por lo anterior, una vez realizado el análisis técnico, financiero, jurídico y de conveniencia, la Interventoría **viabiliza y avala la solicitud de Modificatoria No. 5**, en aras de lograr el equilibrio necesario para la finalización adecuada del proyecto.

Agradezco de antemano su colaboración y atención a esta solicitud y quedo atento a cualquier información con el fin de garantizar el avance y cumplimiento del objeto del proyecto.

Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoria

C.C. Ing. Cristian Fuentes Amado - Apoyo a la supervisión cristhian.ff993@gmail.com
C.C. Dr. Henry Andres Quintero Novoa apoyo.infraestructura.cps1@fiduciasgov.co

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
NIT 9.658.796-1

Acacias, 13 de julio del 2026

CI- OCA-978.2023-365

Ingeniero
IVÁN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura
Secretaria de Infraestructura – Alcaldía de Acacias
infraestructura@acacias.gov.co
Carrera 16 No. 12-10 Barrio Centro

Referencia: Contrato de Interventoría No. OCA-978 DE 2023 cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS" por valor de $918.733.882,00 según Modificatoria No.1, y su plazo de ejecución de veintiséis (26) meses, según Modificatoria de Prórroga No.4.

Asunto: Radicación de los informes semanales **No.103, 104 y 105** del contrato de obra 929 DE 2023 cuyo objeto es "CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por un valor de ($16.970.259.458,00) m/cte según Modificatoria No.1, y su plazo de ejecución de veintiséis (26) meses, según Modificatoria de Prorroga No.4.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales me permito remitir para su conocimiento e información los informes semanales **No.103, 104 y 105,** del contrato citado en el asunto para los siguientes periodos:

INFORME SEMANAL	PERIODO		AVANCE (+) ATRASO (-) $	AVANCE (+) ATRASO (-) %
No 103	22-06-2026	28-06-2026	-$ 2.111.554.853,58	-12,443%
No 104	29-06-2026	05-07-2026	-$ 2.130.234.433,57	-12,553%
No 105	06-07-2026	12-07-2026	-$ 2.159.740.561,80	-12,727%

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1

Los valores y porcentajes programados corresponden a la programación de obra presentada por el Contratista y aprobada por la Interventoría en el marco de la Prórroga No.4. Asimismo, los valores ejecutados reflejan los resultados de las verificaciones de avance realizadas en campo por la Interventoría.

Se precisa que, a partir de la semana No.103, la programación de obra fue actualizada con ocasión de la aprobación de la Modificatoria de la Prórroga No. 4, la cual entró en vigor el 21 de junio de 2026, otorgando un plazo adicional de tres (3) meses para la ejecución del contrato

.

Anexos:

- Informe semanal No **103**
- Informe semanal No **104**
- Informe semanal No **105**
-

Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría

C.C. Consorcio Acacia, R/L Francisco Mora Gutiérrez consorcioacacia.info23@gmail.com
C.C. Ing. Cristian Fuentes Amado - Apoyo a la supervisión cristhian.f9383@gmail.com

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
NIT 9.658.796-1

Acacias, 14 de julio de 2026

CI- OCA-978.2023-366

Señor:
CONSORCIO ACACIA
R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ
consorcioacacia.info23@gmail.com
Calle 26 No. 68C– 61 Oficina 316 Bogotá D.C

Referencia: Contrato de Interventoría No. OCA-978 DE 2023 cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS" por valor de $918.733.882,00 según Modificatoria No.1, y su plazo de ejecución de veintiséis (26) meses, según Modificatoria de Prórroga No.4.

Asunto: Solicitud de **Plan de Acción** para finalizar el proyecto de acuerdo con la última **Prorroga No.4**, del contrato de obra 929 de 2023 cuyo objeto es "CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por un valor de ($16.970.259.458,00) m/cte según Modificatoria No.1, y su plazo de ejecución de veintiséis (26) meses, según Modificatoria de Prórroga No.4.

Cordial saludo:

En ejercicio de las funciones de seguimiento, control y vigilancia que desarrolla esta Interventoría y teniendo en cuenta la aprobación de la Prórroga No. 4, la cual otorgó un plazo adicional de tres (3) meses, estableciendo como fecha de terminación contractual el 21 de septiembre de 2026, se solicita la presentación de un Plan de Acción que permita garantizar el cumplimiento de la programación y la culminación de las actividades pendientes dentro del plazo contractual vigente.

Lo anterior obedece a que, durante el seguimiento efectuado por la Interventoría, se evidencian actividades críticas pendientes de ejecución, así como un porcentaje de atraso respecto a la programación aprobada, por lo cual resulta indispensable definir las estrategias técnicas, operativas y administrativas que permitan recuperar el avance y minimizar los riesgos que puedan afectar la terminación oportuna del proyecto.

En consecuencia, se solicita que el Plan de Acción incluya como mínimo:

1. Cronograma detallado de las actividades pendientes hasta la terminación del contrato.
2. Identificación de las actividades críticas y su ruta de ejecución.

3. Relación del personal, maquinaria y recursos para la culminación de la obra.
4. Estrategias para mitigar retrasos ocasionados por factores que puedan afectar la ejecución.
5. Programación de los ensayos de control de calidad pendientes de la estructura metálica.
6. Fechas estimadas para la terminación de las principales actividades de obra y entrega del proyecto.

Se solicita que dicho documento sea radicado ante esta Interventoría de carácter inmediata con el fin de realizar la correspondiente revisión y seguimiento durante el período de ejecución de la Prórroga No. 4.

Así mismo, deberá tenerse en cuenta que, de acuerdo con lo informado por la Entidad y la Oficina de Contratación, no se contempla la aprobación de nuevas prórrogas al plazo contractual. En consecuencia, el Plan de Acción deberá formularse con medidas suficientes, concretas y verificables que permitan recuperar el atraso existente y garantizar la terminación integral del proyecto a más tardar el 21 de septiembre de 2026

Finalmente, se advierte que el cumplimiento del Plan de Acción será objeto de seguimiento permanente por parte de la Interventoría y que su implementación deberá asegurar la culminación de todas las actividades dentro del plazo vigente, teniendo en cuenta que no se prevé la autorización de nuevas ampliaciones del término contractual

Cordialmente:

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoria

C.C. Ing. Cristian Fuentes Amado - Apoyo a la supervisión cristhian.f9393@gmail.com
C.C. Dr. Henry Andres Quintero Novoa apoyo.infraestructura.cpe1@acacias.gov.co

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
NIT 9.658.796-1

Acacias, 18 de julio de 2026

CI- OCA-978.2023-367

Ingeniero
IVÁN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura
Secretaria de Infraestructura – Alcaldía de Acacias
infraestructura@acacias.gov.co
Carrera 16 No. 12-10 Barrio Centro

Referencia: Contrato de Interventoría No. OCA-978 DE 2023 cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS" por valor de $918.733.882,00 según Modificatoria No.1, y su plazo de ejecución de veintiséis (26) meses, según Modificatoria de Prórroga No.4.

Asunto: Radicación de comité de obra **No.64** del contrato de obra 929 DE 2023 cuyo objeto es "CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por un valor de ($16.970.259.458,00) m/cte según Modificatoria No.1, y su plazo de ejecución de veintiséis (26) meses, según Modificatoria de Prórroga No.4.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, me permito remitir para su conocimiento la información correspondiente al Comité de Obra **No.64** del 10 de julio del 2026, en el marco del contrato citado en el asunto.

COMITÉ No	FECHA
No.64	10-07-2026

Aclaramos que dicho comité será adjuntado en original en el informe mensual que se radique y él envió por este medio es de conocimiento para las partes, de igual forma los compromisos pactados en dichos comités fueron los siguientes:

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1

Compromisos pactados en el comité No.64.

1	Culminar las soldaduras definitivas de los arriostramientos.	Contratista	**15 de julio de 2026**
2	Ejecutar los ensayos de ultrasonido sobre las soldaduras realizadas en campo y entregar los resultados.	Contratista	**18 de julio de 2026**
3	Iniciar la instalación del Metal Deck.	Contratista	**20 de julio de 2026**
4	Presentar el plan de acción para recuperar el atraso aproximado del 12%.	Contratista	**15 de julio de 2026**
5	Radicar el Informe Mensual correspondiente a junio.	Contratista	**15 de julio de 2026**
6	Actualizar la programación después de la aprobación de la Modificatoria No. 5.	Contratista	Inmediatamente después de su aprobación
7	Ejecutar la fundida monolítica de la losa del puente.	Contratista	**10 de agosto de 2026**
8	Terminar las losas de pavimento MR.	Contratista	**15 de agosto de 2026**
9	Continuar la construcción de los pedestales faltantes del sistema fotovoltaico.	Contratista	Según programación, antes de la instalación de luminarias
10	Finalizar las obras de protección, gaviones, bolsacretos y detalles pendientes.	Contratista	Antes del **21 de septiembre de 2026**
11	No solicitar nuevas ampliaciones del plazo y culminar el proyecto dentro del término contractual.	Contratista	**21 de septiembre de 2026**
12	Realizar comités semanales para verificar avance y atraso.	Interventoría, Supervisión y Contratista	Todos los viernes

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier aclaración.

Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría

C.C. Consorcio Acacia, R/L Francisco Mora Gutiérrez consorcioacacia.info23@gmail.com
C.C. Ing. Cristian Fuentes Amado - Apoyo a la supervisión cristhian.f9393@gmail.com

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
NIT 9.658.796-1

Acacias, 18 de julio del 2026

CI- OCA-978.2023-368

Ingeniero
IVÁN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura
Secretaria de Infraestructura – Alcaldía de Acacias
infraestructura@acacias.gov.co
Carrera 16 No. 12-10 Barrio Centro

Referencia: Contrato de Interventoría No. OCA-978 DE 2023 cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS" por valor de $918.733.882,00 según Modificatoria No.1, y su plazo de ejecución de veintiséis (26) meses, según Modificatoria de Prórroga No.4.

Asunto: Radicación del informe semanal **No.106** del contrato de obra 929 DE 2023 cuyo objeto es "CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por un valor de ($16.970.259.458,00) m/cte según Modificatoria No.1, y su plazo de ejecución de veintiséis (26) meses, según Modificatoria de Prorroga No.4.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales me permito remitir para su conocimiento e información el informe semanal **No.106,** del contrato citado en el asunto para los siguientes periodos:

INFORME SEMANAL	PERIODO		AVANCE (+) ATRASO (-) $	AVANCE (+) ATRASO (-) %
No 106	13-07-2026	19-07-2026	-$ 2.201.440.691,27	-12,972%

Los valores y porcentajes programados corresponden a la programación de obra presentada por el Contratista y aprobada por la Interventoría en el marco de la Prórroga No.4. Asimismo, los valores ejecutados reflejan los resultados de las verificaciones de avance realizadas en campo por la Interventoría.

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
NIT 9.658.796-1

Se precisa que, a partir de la semana No.103, la programación de obra fue actualizada con ocasión de la aprobación de la Modificatoria de la Prórroga No. 4, la cual entró en vigor el 21 de junio de 2026, otorgando un plazo adicional de tres (3) meses para la ejecución del contrato

.

Anexos:

- Informe semanal No **106**

Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoria

C.C. Consorcio Acacia, R/L Francisco Mora Gutiérrez consorciopacacia.info23@gmail.com
C.C. Ing. Cristian Fuentes Amado - Apoyo a la supervisión cristhian.f9393@gmail.com

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
NIT 9.658.796-1

Acacias, 23 de julio de 2026

CI- OCA-978.2023-369

Ingeniero
IVÁN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura
Secretaria de Infraestructura – Alcaldía de Acacias
infraestructura@acacias.gov.co
Carrera 16 No. 12-10 Barrio Centro

Referencia: Contrato de Interventoría No. OCA-978 DE 2023 cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS" por valor de $918.733.882,00 según Modificatoria No.1, y su plazo de ejecución de veintiséis (26) meses, según Modificatoria de Prórroga No.4.

Asunto: Radicación de comité de obra **No.65** del contrato de obra 929 DE 2023 cuyo objeto es "CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por un valor de ($16.970.259.458,00) m/cte según Modificatoria No.1, y su plazo de ejecución de veintiséis (26) meses, según Modificatoria de Prórroga No.4.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, me permito remitir para su conocimiento la información correspondiente al Comité de Obra **No.65** del 17 de julio del 2026, en el marco del contrato citado en el asunto.

COMITÉ No	FECHA
No.65	17-07-2026

Aclaramos que dicho comité será adjuntado en original en el informe mensual que se radique y él envió por este medio es de conocimiento para las partes, de igual forma los compromisos pactados en dichos comités fueron los siguientes:

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1

Compromisos pactados en el comité No.65.

1	Culminar las soldaduras definitivas de los arriostramientos.	Contratista	**24 de julio de 2026**
2	Ejecutar los ensayos de ultrasonido sobre las soldaduras realizadas en campo y entregar los resultados.	Contratista	**21 de julio de 2026**
3	Iniciar la instalación del Metal Deck.	Contratista	**27 de julio de 2026**
4	Presentar el plan de acción para recuperar el atraso aproximado del 12%.	Contratista	**Inmediato**
5	Radicar el Informe Mensual correspondiente a junio.	Contratista	**Inmediato**
6	Actualizar la programación de la aprobación de la Modificatoria No. 5.	Contratista	Inmediatamente después de su aprobación.
7	Ejecutar la fundida monolítica de la losa del puente.	Contratista	**28 de agosto de 2026**
8	Terminar las losas de pavimento MR.	Contratista	**15 de agosto de 2026**
9	Finalizar las obras de protección	Contratista	Urgente presentar programación.
10	Realizar comités semanales para verificar avance y atraso.	Interventoría, Supervisión y Contratista	Todos los viernes
11	Asistir obligatoriamente a la reunión y visita de seguimiento del DNP.	Contratista Interventoria	21 de Julio

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier aclaración.

Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría

C.C. Consorcio Acacia, R/L Francisco Mora Gutiérrez consorcioacacia.info23@gmail.com
C.C. Ing. Cristian Fuentes Amado - Apoyo a la supervisión cristhian.f9393@gmail.com

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
NIT 9.658.796-1

Acacias, 30 de julio del 2026

CI- OCA-978.2023-370

Ingeniero
IVÁN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura
Secretaria de Infraestructura – Alcaldía de Acacias
infraestructura@acacias.gov.co
Carrera 16 No. 12-10 Barrio Centro

Referencia: Contrato de Interventoría No. OCA-978 DE 2023 cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS" por valor de $918.733.882,00 según Modificatoria No.1, y su plazo de ejecución de veintiséis (26) meses, según Modificatoria de Prórroga No.4.

Asunto: Radicación del informe semanal **No.107** del contrato de obra 929 DE 2023 cuyo objeto es "CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por un valor de ($16.970.259.458,00) m/cte según Modificatoria No.1, y su plazo de ejecución de veintiséis (26) meses, según Modificatoria de Prorroga No.4.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales me permito remitir para su conocimiento e información el informe semanal **No.107,** del contrato citado en el asunto para los siguientes periodos:

INFORME SEMANAL	PERIODO		AVANCE (+) ATRASO (-) $	AVANCE (+) ATRASO (-) %
No 107	20-07-2026	26-07-2026	-$2.350.030.521,91	-13,848%

Los valores y porcentajes programados corresponden a la programación de obra presentada por el Contratista y aprobada por la Interventoría en el marco de la Prórroga No.4. Asimismo, los valores ejecutados reflejan los resultados de las verificaciones de avance realizadas en campo por la Interventoría.

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
NIT 9.658.796-1

Se precisa que, a partir de la semana No.103, la programación de obra fue actualizada con ocasión de la aprobación de la Modificatoria de la Prórroga No. 4, la cual entró en vigor el 21 de junio de 2026, otorgando un plazo adicional de tres (3) meses para la ejecución del contrato

.

Anexos:

- Informe semanal No **107**

Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría

C.C. Consorcio Acacia, Rit. Francisco Mora Gutiérrez consorcioacacia.info23@gmail.com
C.C. Ing. Cristian Fuentes Amado - Apoyo a la supervisión cristhian.f9393@gmail.com

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
NIT 9.658.796-1

Acacias, 30 de julio de 2026

CI- OCA-978.2023-371

Ingeniero
IVÁN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura
Secretaria de Infraestructura – Alcaldía de Acacias
infraestructura@acacias.gov.co
Carrera 16 No. 12-10 Barrio Centro

Referencia: Contrato de Interventoria No. OCA-978 DE 2023 cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS" por valor de $918.733.882,00 según Modificatoria No.1, y su plazo de ejecución de veintiséis (26) meses, según Modificatoria de Prórroga No.4.

Asunto: Radicación de comité de obra **No.66** del contrato de obra 929 DE 2023 cuyo objeto es "CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por un valor de ($16.970.259.458,00) m/cte según Modificatoria No.1, y su plazo de ejecución de veintiséis (26) meses, según Modificatoria de Prórroga No.4.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, me permito remitir para su conocimiento la información correspondiente al Comité de Obra **No.66** del 24 de julio del 2026, en el marco del contrato citado en el asunto.

COMITÉ No	FECHA
No.66	24-07-2026

Aclaramos que dicho comité será adjuntado en original en el informe mensual que se radique y él envió por este medio es de conocimiento para las partes, de igual forma los compromisos pactados en dichos comités fueron los siguientes:

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1

Compromisos pactados en el comité No.66.

ITEM	COMPROMISOS PACTADOS	FECHA	RESPONSABLES
1	Culminar las soldaduras definitivas de los arriostramientos	4 de agosto de 2026	Contratista
2	Ejecutar los ensayos de ultrasonido y entregar los resultados	4 de agosto de 2026	Contratista
3	Iniciar la instalación del Metal Deck. Contratista	27 de julio de 2026	Contratista
4	Presentar el plan de acción para recuperar el atraso del 12%	Inmediato	Contratista
5	Radicar el Informe Mensual correspondiente a junio	Inmediato	Contratista
6	Actualizar la programación de la aprobación de la Modificatoria No. 5	Con la aprobación de la Modificatoria	Contratista
7	Ejecutar la fundida monolítica de la losa del puente	15 de agosto de 2026	Contratista
8	Reiniciar las losas de pavimento MR	28 de julio de 2026	Contratista
9	Finalizar las obras de protección	10 de agosto de 2026	Contratista
10	Emitir los conceptos técnicos requeridos para la Modificatoria No. 5	Inmediato	Contratista

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier aclaración.

Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoria

C.C. Consorcio Acacia, RL Francisco Mora Gutiérrez consorcioacacia.info23@gmail.com
C.C. Ing. Cristian Fuentes Amado - Apoyo a la supervisión cristhian.f9383@gmail.com

9.5.2. Correspondencia recibida

Departamento
Nacional de Planeación

Bogotá D.C., martes, 14 de julio de 2026

Al responder cite este Nro.
20268450640161

SMSE

Señor
CARLOS JULIO PLATA BECERRA
Alcalde Municipal
alcaldia@acacias.gov.co
Calle 14 # 21-32 Cooperativo
Acacías - Meta

Asunto: Anuncio de visita a proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

Reciba un cordial saludo:

Teniendo en cuenta que el artículo 164 de la ley 2056 de 2020 define que "*El Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC), es el conjunto de actores, normas, procedimientos y actividades que tienen como finalidad velar por el uso eficiente y eficaz de los recursos del Sistema General de Regalías* (...)" el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en su condición de administrador del SSEC, ejerce un control de carácter administrativo que consiste en la recolección, consolidación, análisis y verificación de la información correspondiente a la aprobación y ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), asimismo, adelanta visitas de seguimiento con el objetivo de verificar los avances y resultados de los proyectos de inversión financiados con regalías.

En virtud de lo anterior, en mi calidad de Subdirector de Seguimiento al Desempeño de la Dirección de Seguimiento Evaluación y Control del Sistema General de Regalías, me permito informar que se realizará visita de seguimiento para el días **21 de julio de 2026** con el objetivo de verificar los avances y resultados de los proyectos de inversión que se relacionan a continuación:

BPIN	Nombre proyecto
2023500060004	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS

En este sentido, los consultores designados para adelantar las visitas de seguimiento son los siguientes:

Documento de identidad	Nombre
86.082.962	Floower Emilio Peña
78.713.165	Jairo Elias Jabib Ortega

Agradezco su colaboración y disposición para el buen desarrollo de la actividad, recordándole que las entidades ejecutoras tienen el deber legal[1] y reglamentario[2], en el marco de las visitas de seguimiento, de permitir al DNP el acceso físico y/o digital de documentos, servicios, bienes u obras, conforme a la aprobación del proyecto de inversión, para que en el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales del DNP se pueda llevar a cabo la verificación de los avances y resultados de los proyectos objeto de visitas, razón por la cual son aplicables en este escenario el numeral 1 del artículo 14, el artículo 27 y el artículo 30 de la Ley 1437 de 2011, sustituidos por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015.

Atentamente,

CARLOS URIEL MANRIQUE LADINO
Subdirector de Seguimiento al Desempeño
Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR
Departamento Nacional de Planeación

Elaboró: Jairo Elias Jabib Ortega Profesional Gestor Regional Llanos
Revisó: Diana Alexandra Quiroga Profesional Técnico Regional SSD

[1] Artículo 37 de la Ley 2056 de 2020.
[2] Artículo 1.2.10.1.4. del Decreto 1821 de 2020.

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

Acacías, 17 de julio de 2026

Al contestar cite 16.01/0278

Señor (es):

FRANCISCO MORA GUTIERREZ
R/L CONSORCIO ACACIA
Consorcioacacia.info23@gmail.com
+57 311 819 0371 – (571) 601 – 8089634

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
R/L INTERVENTORÍA
interpuentechichimene@gmail.com
+57 312 440 3276

Asunto: Requerimiento formal por incumplimientos contractuales y administrativos – Contrato de Obra OCA-929-2023

En ejercicio de las funciones de seguimiento, vigilancia y control asignadas a esta Supervisión, se permite requerir formalmente al **CONSORCIO ACACIA**, contratista de la obra identificada con el Contrato OCA-929-2023, teniendo en cuenta que, conforme al seguimiento realizado durante la ejecución contractual, el proyecto continúa presentando un atraso significativo respecto de la programación aprobada, situación que ha sido puesta en conocimiento del contratista en diferentes oportunidades mediante requerimientos, observaciones y recomendaciones efectuadas por esta Supervisión, orientadas a la adopción de medidas que permitan garantizar el cumplimiento oportuno del objeto contractual.

Con el propósito de brindar al contratista la oportunidad de culminar las obras y dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas, la Entidad autorizó una última prórroga contractual, fijando como fecha definitiva de terminación el 20 de septiembre de 2026, plazo que deberá ser atendido de manera estricta, razón por la cual no existe justificación para que continúen presentándose retrasos en la ejecución del proyecto.

Adicionalmente, esta Supervisión manifiesta su preocupación por el incumplimiento de las obligaciones administrativas relacionadas con la actualización de las garantías contractuales. Se evidencia que la Oficina de Contratación remitió observaciones a las pólizas presentadas por el contratista mediante comunicación de fecha **26 de junio de 2026**; sin embargo, a la fecha dichas observaciones no han sido subsanadas ni se ha allegado el acta de validación correspondiente, impidiendo la correcta formalización de las garantías derivadas de la modificación contractual. Esta situación constituye un incumplimiento a las obligaciones a cargo del contratista y refleja falta de diligencia en la atención de los requerimientos efectuados por la Entidad.

En consecuencia, esta Supervisión requiere de manera inmediata al CONSORCIO ACACIA para que implemente todas las acciones técnicas, administrativas, financieras y operativas necesarias que permitan recuperar el atraso existente, incrementando los frentes de trabajo, disponiendo del personal, maquinaria, equipos, materiales e insumos suficientes para garantizar la culminación de la totalidad de las actividades pendientes dentro del plazo contractual vigente.

De igual manera, se requiere que, de forma inmediata, sean atendidas y subsanadas las observaciones formuladas por la Oficina de Contratación respecto de las garantías contractuales, remitiendo la documentación correspondiente para su validación, evitando así que continúe configurándose un incumplimiento de las obligaciones administrativas derivadas del contrato.

Se deja expresa constancia de que esta Supervisión ha ejercido de manera permanente las funciones de seguimiento, control y vigilancia del contrato, efectuando oportunamente los requerimientos, observaciones y llamados de atención necesarios para procurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En consecuencia, la persistencia de los incumplimientos anteriormente descritos será de exclusiva responsabilidad del contratista, sin perjuicio de las actuaciones administrativas, contractuales y legales que la Entidad considere procedentes en defensa de los intereses públicos y de la correcta ejecución del proyecto.

Finalmente, se solicita remitir a esta Supervisión un plan de recuperación actualizado, acompañado del cronograma detallado de ejecución, en el cual se evidencien las acciones concretas que serán implementadas para garantizar la terminación del proyecto dentro del plazo contractual establecido.

Anexo: Se adjunta el último informe semanal de ejecución, en el cual se evidencia el porcentaje de avance físico del proyecto **(83,325%)**, el porcentaje de ejecución programada **(96,052%)** y el porcentaje de atraso registrado a la fecha **(12,727%)**, documento que hace parte integral del presente requerimiento y soporta las observaciones aquí consignadas.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Proyectó: Iván Mauricio Rojas Novoa / Secretario de Infraestructura

Anexos:
- *Informe semanal 105*

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	2. No. INFORME	105	3. SEMANA No.	185

4. PROYECTO: CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

5. SUPERVISOR: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA

A. DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

6. CONTRATO OBRA No:	909-2023			7. FECHA CONTRATO:	27	12	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 13.450.269.953,00
9. FECHA ACTA INICIO:	27	5	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	20	9	2026	11. PLAZO:	26 Meses
12. PRORROGAS:	450	Días		13. SUSPENSIONES:	54	Días		14. ADICIONES:	$ 3.539.989.560,00
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA RL FRANCISCO MORA GUTIERREZ								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	978-2023			18. FECHA CONTRATO:	27	12	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 607.091.787,00
20. FECHA ACTA INICIO:	27	5	2024	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	20	9	2026	22. PLAZO:	26 Meses
23. PRORROGAS:	450	Días		24. SUSPENSIONES:	54	Días		25. ADICIONES:	$ 251.652.096,00
26. INTERVENTOR:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA								
27. APOYO A LA SUPERVISION:	CRISTIAN EDUARDO FUENTES AMADO								

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPITULO SEGUN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERIODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
1. CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR	100,00%	93,15%	Construidos pilotes, vigas, estribos y aletas	Presenta atraso respecto a programado
1.1 PRELIMINARES	100,00%	100,00%	Avance en descapote y conalización.	Capitulo ejecutado
1.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	100,00%	100,00%	Excavación para muros y zapatas.	Capitulo ejecutado
1.3 INFRAESTRUCTURA	100,00%	93,49%	Falta solado y terminar obras de protección	Este capitulo registra un atraso.
1.4 SUPERESTRUCTURA	100,00%	8,57%	Se continua montaje de vigas	Este capitulo registra un atraso.
1.5 ACERO DE REFUERZO	100,00%	97,41%	Acero instalado en pilotes y estribos.	Este capitulo registra un atraso.
1.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS	100,00%	22,73%	Se inicia construcción de pedestales para luminaria	Este capitulo registra un atraso.
2. VÍAS DE ACCESO PUENTE VEHICULAR UBICADO E	100,00%	55,93%	Modificatoria No.1 aprobó diseños actuales.	Este capitulo registra un atraso.
2.1 PRELIMINARES	100,00%	100,00%	Falta construcción de tramo vial	Capitulo ejecutado
2.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	100,00%	93,70%	Cajeo via tramo Quebraditas	Este capitulo registra un atraso.
2.3 PLUVIAL	100,00%	54,35%	redelaciones pluviales	Avance acorde con lo programado
2.4 OBRAS DE PROTECCIÓN	100,00%	64,79%	Se esta construyendo los bolsacretos	Este capitulo registra un atraso.
2.5 OBRAS DE DEVOLUCIÓN	100,00%	91,07%	Demolición en ejecución	Este capitulo registra un atraso.
2.6 SEÑALIZACIÓN	100,00%	0,08%	Se avanza con instalación de postes	Este capitulo registra un atraso.
2.7 PAVIMENTO ASFALTICO	0,00%	0,00%	Este capitulo se modifico a cero cantidades	Capitulo modificado a cero cantidades
2.8 ANDENES Y ESPACIO PUBLICO	100,00%	47,35%	Se avanza con la construcción de andenes	Este capitulo registra un atraso.
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	100,00%	99,02%	Se ha realizado implementación permanente	Este capitulo registra un atraso.
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	100,00%	99,02%	Se ha realizado implementación permanente	Este capitulo registra un atraso.
TOTAL				


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	Ejecutado	Programado	Atraso(-) Adelanto (+)
Acumulado anterior	$ 12.138.772.723,90	$ 14.269.007.154,36	- 2.130.234.430,46
Durante el periodo	$ 1.773.688,00	$ 31.279.816,23	- 29.506.128,23
Acumulado Actual	$ 14.140.546.408,90	$ 16.300.286.970,59	- 2.159.740.561,69

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,194%	86,052%
Valor de la Obra Programada	$ 31.279.816,23	$ 16.300.286.970,59

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,013%	83,325%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 1.773.688,00	$ 14.140.546.408,90

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

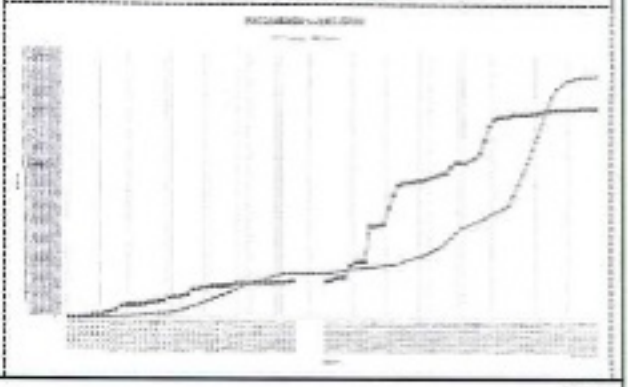

1080.30

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA

C. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE OBRA

35. CONDICIONES DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1.	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
1.1	PRELIMINARES	$ 0,00	$ 413.731.216,00	$ 413.731.216,00
1.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 0,00	$ 96.796.182,00	$ 96.796.182,00
1.3	INFRAESTRUCTURA	$ 0,00	$ 1.316.735.492,00	$ 1.316.735.492,00
1.4	SUPERESTRUCTURA	$ 0,00	$ 31.092.183,00	$ 31.092.183,00
1.5	ACERO DE REFUERZO	$ 0,00	$ 5.651.234.304,00	$ 5.651.234.304,00
1.6	OBRAS COMPLEMENTARIAS	$ 0,00	$ 46.573.209,00	$ 46.573.209,00
2.	VIAS DE ACCESO PUENTE VEHICULAR LADO DERECHO Y LADO IZQUIERDO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.1	PRELIMINARES	$ 0,00	$ 3.839.015,00	$ 3.839.015,00
2.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 1.773.888,00	$ 429.265.631,00	$ 431.039.519,00
2.3	PLUVIAL	$ 0,00	$ 49.930.422,00	$ 49.930.422,00
2.4	OBRAS DE PROTECCION	$ 0,00	$ 724.023.559,00	$ 724.023.559,00
2.5	OBRAS DE CONCRETO	$ 0,00	$ 188.811.166,00	$ 188.811.166,00
2.6	ILUMINACION	$ 0,00	$ 155.000,00	$ 155.000,00
2.7	PAVIMENTO ASFALTICO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.8	ANDENES Y ESPACIO PÚBLICO	$ 0,00	$ 1.118.395.113,00	$ 1.118.395.113,00
PEA	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 0,00	$ 74.295.135,00	$ 74.295.135,00
PMT	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	$ 0,00	$ 34.657.072,00	$ 34.657.072,00
	Subtota	$ 1.773.888,00	$ 14.029.867.494,00	$ 14.031.634.182,00
	A.I.U	$ 459.845,04	$ 3.837.369.915,09	$ 3.837.829.491,63
	Valor total	$ 1.773.888,00	$ 14.136.772.719,00	$ 14.140.546.407,00

D. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		37. EQUIPOS EN OBRA		38. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
Administrativos(Residente, Director, SISO)	2	Retroexcavadora	0	LUNES	L
Operativos(Maestro, Ayudantes, Operarios)	8	Planta eléctrica 440KV	1	MARTES	L
Cuadrilla topografia	2	Motobombas	0	MIERCOLES	L
Administrativos Interventoria	1	Excavadora tipo pajarita	0	JUEVES	L
Operarios		Volqueta Doble Troque	0	VIERNES	L
Auxiliares viales	1	Vibro compactador	0	SÁBADO	L
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

E. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- El contratista continua en actividades soldadura, ensamble y montaje de vigas.
- El contratista continua con actividades de construcción de vías, andenes, obras de protección y obras de iluminación.

F. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Para el presente corte semanal se evidencia un atraso del -12,727% respecto a la programación establecida.

Se recomienda aplicar las actividades criticas y adoptar las medidas necesarias que permitan recuperar el avance programado y evitar mayores afectaciones en el cronograma contractual.

Este corte semanal es analizado según la reprogramación aprobada en la Modificatoria de la Prorroga No.4 por tres meses adicionales y vigente desde el 21 de junio del 2025

(Nombre) JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaria de Infraestructura - Supervisión
Copia: Interventor y contratista

1000.30

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA
REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA ELABORACIÓN:	14 / 7 / 2026	No. INFORME	105	SEMANA No.	105
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS				
CONTRATO OBRA No:	929-2023	CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA GUTIERREZ		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	979-2023	INTEVENTORÍA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 10-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Montaje y ensamble de vigas metálicas.



FECHA FOTO: 10-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Montaje y ensamble de vigas metálicas.



FECHA FOTO: 10-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Montaje y ensamble de vigas metálicas.



FECHA FOTO: 10-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Montaje y ensamble de vigas metálicas.



FECHA FOTO: 10-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Disponibilidad de equipos para montaje del puente.



FECHA FOTO: 10-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Montaje y ensamble de vigas metálicas.

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203508552.
Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co
Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA
REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA ELABORACIÓN:	14 / 7 / 2025	No. INFORME	105	SEMANA No.	105
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONTRUCCION DE FUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS				
CONTRATO OBRA No:	929-2023	CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA GUTIERREZ		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	978-2023	INTEVENTORÍA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

G. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 10-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Descargue de material de relleno para terraplen.



FECHA FOTO: 10-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Compactacion de capa de relleno para terraplen.



FECHA FOTO: 10-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Control topografico en la construccion de estructura vial.



FECHA FOTO: 10-Julio-2025
DESCRIPCIÓN: Control topografico en el montaje del puente.



FECHA FOTO: 10-Julio-2025
DESCRIPCIÓN: Comité de obra realizado en la oficina de Infraestructura de la Alcaldía de Acacias.



FECHA FOTO: 10-Julio-2025
DESCRIPCIÓN: Comité de obra realizado en la oficina de Infraestructura de la Alcaldía de Acacias.

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA
REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA ELABORACIÓN:	14 / 7 / 2026	No. INFORME	105	SEMANA No.	105
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS				
CONTRATO OBRA No:	909-2023	CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA GUTIERREZ		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	978-2023	INTEVENTORÍA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

9. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 10-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Inspección de elementos de emergencia.



FECHA FOTO: 10-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Inspección de elementos de emergencia.



FECHA FOTO: 10-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Inspección de elementos de emergencia.



FECHA FOTO: 10-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Disponibilidad de puntos ecologicos.



FECHA FOTO: 10-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Control vial durante las actividades de la obra.



FECHA FOTO: 10-Julio-2026
DESCRIPCIÓN: Señalización preventiva en las zonas de intervención.

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

Acacías, 17 de julio de 2026

Al contestar cite 16.01/0279

Señor (es):
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
R/L INTERVENTORÍA
interpuentechichimene@gmail.com
+57 312 440 3276

FRANCISCO MORA GUTIERREZ
R/L CONSORCIO ACACIA
Consorcioacacia.info23@gmail.com
+57 311 819 0371 – (571) 601 – 8089634

Asunto: Solicitud urgente de información – Requerimientos formulados por el Departamento Nacional de Planeación – DNP

Cordial saludo.

En el marco de las funciones de seguimiento, vigilancia y supervisión de los contratos de obra e interventoria del proyecto con código BPIN 2023500060004 **"CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS."**, y en atención al oficio de notificación remitido por el **Departamento Nacional de Planeación – DNP**, mediante el cual se informa la realización de una visita de verificación del estado de ejecución y cumplimiento de los proyectos financiados con los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y se relacionan los documentos que deberán ser aportados para su verificación, de manera atenta se solicita allegar a esta Supervisión, con carácter **URGENTE**, la siguiente información:

1. Plan de inversión del anticipo.
2. Copia del contrato de fiducia suscrito para el manejo del anticipo.
3. Informes de seguimiento y control a la correcta inversión y ejecución de los recursos del anticipo, conforme a las obligaciones contractuales.
4. Soportes que evidencien la conformación de la veeduria ciudadana del proyecto.
5. Soportes documentales y/o registros que acrediten la socialización del proyecto con la comunidad y demás actores involucrados.

La documentación anteriormente relacionada deberá ser remitida a esta Supervisión **con la mayor brevedad posible y en carácter de urgente**, teniendo en cuenta que el **Departamento Nacional de Planeación – DNP** realizará la visita de verificación del estado de ejecución y cumplimiento del proyecto el día **21 de julio de 2026 a las 8:30 a. m.**, en la **Sala de Juntas del Despacho de la Alcaldia Municipal de Acacias**, reunión a la cual deberán asistir los representantes del contratista de obra y de la interventoria, en calidad de ejecutores del proyecto.

Es importante precisar que el Departamento Nacional de Planeación dispuso un enlace electrónico para el cargue previo de la documentación objeto de revisión durante la visita técnica, razón por la cual resulta indispensable que la información requerida sea remitida oportunamente a esta Supervisión, con el fin de verificar su integridad, consolidarla y efectuar su cargue dentro de los plazos establecidos por dicha entidad.

En consecuencia, se solicita dar prioridad a la presente comunicación y remitir la totalidad de la documentación de forma completa, organizada y legible, evitando contratiempos en el desarrollo de la visita de seguimiento y permitiendo a la Entidad atender de manera oportuna y satisfactoria los requerimientos formulados por el Departamento Nacional de Planeación – DNP.

De igual manera, se recuerda que la atención oportuna de la presente solicitud hace parte del deber de colaboración, coordinación y suministro de información que asiste tanto al contratista de obra como a la interventoría durante la ejecución contractual, en cumplimiento de las obligaciones derivadas de los respectivos contratos y en apoyo a las actividades de seguimiento adelantadas por la Entidad.

Agradecemos su atención y la pronta remisión de la información solicitada.

Anexo: Oficio de notificación emitido por el Departamento Nacional de Planeación – DNP, mediante el cual se comunica la visita de seguimiento al proyecto y se relacionan los requerimientos objeto de la presente solicitud.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Proyectó: Iván Mauricio Rojas Novoa / Secretario de Infraestructura

Anexos:
- *Comunicado oficial de la visita*

9.6 Informe de inversión recursos de anticipo

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTRATO Nº	378 DE 2023
CONTRATO INTERVENTORÍA N	378 DE 2023
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT. 19558795-1
VALOR DEL CONTRATO DE	$ 197.081.734,00
VALOR ANTICIPO DEL 30%	$ 59.124.520,00
NO CONTRATO CUENTA	DAVIVIENDA S.A. CUENTA DE AHORROS CAMAS No 005045894361566022
FECHA DE DESEMBOLSO	19 DE JULIO DE 2024
VALOR GIRADO MUNICIPIO	$ 59.124.520,00

DATOS PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO

No.	DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE
1	PAGO DE SALARIOS Y COSTOS DIRECTOR DEL PERSONAL	$ 119.874.721,60	60,80%
2	DIRECTOR INTERVENTORIA CIVIL O INGENIERO VIAS Y TRANSPORTE	$ 28.543.500,00	14,48%
3	RESIDENTE DE INTERVENTORIA INGENIERO CIVIL	$ 20.289.000,00	10,29%
4	TECNOLOGO EN OBRA	$ 11.286.120,00	5,73%
5	INGENIERO AMBIENTAL	$ 7.224.000,00	3,66%
6	INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 7.224.000,00	3,66%
7	TOPOGRAFO	$ 6.026.760,00	3,06%
8	CONTADOR(T)	$ 3.921.000,00	1,99%
9	CADENERO	$ 3.339.479,76	1,69%
10	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA	$ 28.218.000,00	14,32%
11	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	$ 14.109.000,00	7,16%
12	MOBILIARIO DE OFICINA	$ 14.109.000,00	7,16%
13	ALQUILER CAMIONETA TIPO PICK UP	$ 47.031.134,00	23,86%
14	CAMIONETA TIPO PICK UP	$ 47.031.134,00	23,86%
	TOTAL	$ 197.081.734,00	100%





NO	DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE
1	PAGO DE SALARIOS Y COSTOS DIRECTOR DEL PERSONAL	$ 119.874.721,60	60,80%
2	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA	$ 28.218.000,00	14,32%
3	ALQUILER CAMIONETA TIPO PICK UP	$ 47.031.134,00	23,86%
	TOTAL	$ 197.081.734,00	100%

DATOS MOVIMIENTOS REALIZADOS

MOVIMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM AFECTADO	DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN
1	31/07/2024	JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	$ 17.486.040,20	2	Reembolso por pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas meses de mayo, junio y julio de 2024
2	31/07/2024	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	$ 35.889.719,15	3	Reembolso por pago salario, prestaciones y demas meses de mayo, junio y julio de 2024
3	31/07/2024	FLOR ANGELA MARTINEZ	$ 7.586.597,20	4	Reembolso por pago salario, prestaciones y demas meses de mayo, junio y julio de 2024
4	31/07/2024	KAROL PAOLA SANTANA TORRES	$ 4.792.269,60	5	Reembolso por pago salario, prestaciones y demas meses de mayo, junio y julio de 2024
5	31/07/2024	JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	$ 4.792.269,60	6	Reembolso por pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas meses de mayo, junio y julio de 2024
6	31/07/2024	OSCAR HERNAN ALARCON ORTEGON	$ 4.191.808,50	7	Reembolso por pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas meses de mayo, junio y julio de 2024
7	31/07/2024	MICHELL VANESA TRUJILLO	$ 2.600.716,50	8	Reembolso por pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas meses de mayo, junio y julio de 2024
8	31/07/2024	PEDRO ELADIO ALFEREZ	$ 6.594.747,25	9	Reembolso por pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas meses de mayo, junio y julio de 2024
9	31/07/2024	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	$ 14.109.340,20	11	Anticipo alquiler equipos de computo personal
10	31/07/2024	MERCEDY MEDA	$ 14.109.340,20	12	Anticipo contrato de arrendamiento oficina
11	31/07/2024	JORGE ESTEBAN ROJAS RODRIGUEZ MEDINA	$ 23.515.567,00	13	Anticipo contrato de arrendamiento vehiculo
12	31/08/2024	JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	$ 6.070.066,40	2	Pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas mes de agosto 2024
13	31/08/2024	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	$ 12.400.947,50	3	Pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas mes de agosto 2024
14	31/08/2024	FLOR ANGELA MARTINEZ	$ 3.001.666,40	4	Pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas mes de agosto 2024
15	31/08/2024	KAROL PAOLA SANTANA TORRES	$ 2.211.616,80	5	Pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas mes de agosto 2024
16	31/08/2024	JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	$ 2.211.616,80	6	Pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas mes de agosto 2024
17	31/08/2024	OSCAR HERNAN ALARCON ORTEGON	$ 1.934.466,52	7	Pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas mes de agosto 2024
18	31/08/2024	MICHELL VANESA TRUJILLO	$ 1.200.330,50	8	Pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas mes de agosto 2024
19	31/08/2024	PEDRO ELADIO ALFEREZ	$ 3.043.729,50	9	Pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas mes de agosto 2024
20	31/08/2024	JORGE ESTEBAN RODRIGUEZ MEDINA	$ 23.515.567,00	13	Anticipo 2 contrato de arrendamiento vehiculo
21	30, 09-2024	JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	$ 3.972.569,60	13	Ultimo salario director de interventoria
		TOTAL APROBADO	$ 188.124.536,00		


RESUMEN DE RECURSOS APROBADOS Y SALDOS DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCION	VALOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	PAGO DE SALARIOS Y COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	$ 112.974.721,60	$ 3.372.960,00	$ 109.602.356,00	$ 112.974.721,60	$ -
2	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA	$ 28.719.680,40	$ 0,00	$ 28.719.680,40	$ 28.719.680,40	$ -
3	ALQUILER CAMIONETA TIPO PICK UP	$ 47.031.134,00	$ 0,00	$ 47.031.134,00	$ 47.031.134,00	$ -
4	[illegible]	$ 28.719.680,40		$ 28.719.680,40	$ 28.719.680,40	$ -
5	[illegible]	$ 11.088.120,80		$ 11.088.120,80	$ 11.088.120,80	$ -
6	[illegible]	$ 7.004.080,80		$ 7.004.080,80	$ 7.004.080,80	$ -
7	[illegible]	$ 7.004.080,80		$ 7.004.080,80	$ 7.004.080,80	$ -
8	[illegible]	$ 6.125.703,90		$ 6.125.703,90	$ 6.125.703,90	$ -
9	[illegible]	$ 3.501.040,80		$ 3.501.040,80	$ 3.501.040,80	$ -
10	[illegible]	$ 9.938.474,75		$ 9.938.474,75	$ 9.938.474,75	$ -
11	[illegible]	$ 28.719.680,40	$ 0,00	$ 28.719.680,40	$ 28.719.680,40	$ -
12	[illegible]	$ 14.109.340,20	$ 0,00	$ 14.109.340,20	$ 14.109.340,20	$ -
13	[illegible]	$ 14.109.340,20	$ 0,00	$ 14.109.340,20	$ 14.109.340,20	$ -
14	[illegible]	$ 47.031.134,00	$ 0,00	$ 47.031.134,00	$ 47.031.134,00	$ -
	[illegible]	$ 47.031.134,00		$ 47.031.134,00	$ 47.031.134,00	$ -
	TOTAL	$ 188.124.536,00	$ 3.372.960,00	$ 184.749.179,40	$ 188.124.536,00	$ 0,00

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	PAGO DE SALARIOS Y COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	$ 112.974.721,60	$ 3.372.960,00	$ 109.602.356,00	$ 112.974.721,60	$ -
2	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA	$ 28.719.680,40	$ 0,00	$ 28.719.680,40	$ 28.719.680,40	$ -
3	ALQUILER CAMIONETA TIPO PICK UP	$ 47.031.134,00	$ 0,00	$ 47.031.134,00	$ 47.031.134,00	$ -
	TOTAL	$ 188.124.536,00	$ 3.372.960,00	$ 184.749.179,40	$ 188.124.536,00	$ 0,00

GRAFICOS DE INVERSION DE RECURSOS DE ANTICIPO



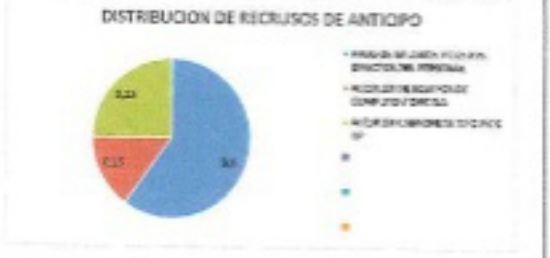

GRAFICOS DE INVERSION DE RECURSOS DE ANTICIPO





Firma:
Nombre: [illegible]
Director de Interventoría

Firma:
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ RIBIA
Residente de Interventoría

9.7 Copia de bitácora de obra.

MIERCOLES 01 DE JULIO DEL 2026.

* Inicio de actividades: 7:00 AM
* Clima del día: Lluvias moderadas en la mañana (5-hrs), tiempo seco en la tarde.
* Profesional SST de obra realiza charla de seguridad al inicio de la jornada
* Personal en obra: 1-residente de obra, 1-profesional SST de obra, 1-maestro, 1-oficial, 1-ayudante, 1-topografo, 1-cadenero, 2-auxiliares viales, 1-auxiliar de oficios varios, Cuadrilla para montaje del puente. (6-pers), 1-residente de Interventoria.
* Equipos y maquinaria: 1-retro-pajarita, 1-planta eléctrica, 1-electrobomba 2" sumergible, 1-motobomba 6", 1-canguro, 1-martillo eléctrico, 1-cortadora de concreto, 1-compresor, 2-martillos eléctricos, 1-vibrocompactador manual, Equipos para montaje y soldadura del puente, herramienta menor.
* Actividades:
- Soldadura para ensamble de módulos y riostras de las vigas metálicas.
- Relleno con material seleccionado para terraplen de acceso al puente.
- Seleccion y acopio de material petreo para construccion de gaviones.
- Localizacion y replanteo topografico en todas las actividades de la obra.
- *NOTA-1*: Pese a que ya se realizó reposicion de una retro-pajarita, aun falta el reemplazo de la demás maquinaria, sin embargo la dificultad persiste debido a los hechos vandálicos ocurridos el pasado 28 de abril.
- *NOTA-2*: En esta fecha se retiran las 2-auxiliares viales. //

Residente de obra:
Ing. Alexander Herrera.

Profesional SST de obra:
Srd. Maria Fernanda Rodriguez

Director de Interventoria:
Ing. Jimmy Andres Torres

Residente de Interventoria:
Ing. Jorge Augusto Rodriguez

Director de obra:
Ing. Luis Eduardo Rodriguez

Profesional de apoyo de Interventoria
Ing. Pedro Alfonso

Powered by CamScanner

JUEVES 02 DE JULIO DEL 2026.

* Inicio de actividades: 7:00 AM.
* Clima del día: Lluvias fuertes en la mañana (4-hrs).
* Profesional SST de obra realiza charla de seguridad al inicio de la jornada.
* Personal en obra: 1-residente de obra, 1-profesional SST de obra, 1-maestro, 1-oficial, 1-ayudante, 1- topografo, 1-cadenero, 1-auxiliar de oficios varios, Cuadrilla para montaje del puente (6-pers), 1-profesional SST de Interventoría, 1-residente de Interventoría, 1-operador.
* Equipos y maquinaria: 1-retropajarita, 1-planta electrica, 1-electrobomba 2" sumergible, 1-motobomba 6", 1-canguro, 1-martillo eléctrico, 1-cortadora de concreto, 1-compresor, 2-martillos neumáticos, 1-vibrocompactador manual, Equipos para montaje y soldadura del puente, herramienta menor.
* Actividades:
- Soldadura para ensamble de módulos y riostras de las vigas metálicas.
- Relleno con material seleccionado por medio mecánico para construccion de terraplen de acceso al puente.
- Seleccion y acopio de material seleccionado petreo para gaviones.
- Localizacion y replanteo topografico en todas las actividades de la obra.
- *NOTA-1*: Falta reposicion de la demás maquinaria, pese a que ya se cuenta con una retro-pajarita, sin embargo continua la dificultad de contratacion debido a los actos vandálicos ocurridos el pasado 28 de abril.

Residente de obra:
Ing. Alexander Herrera.

Profesional SST de obra:
Ingra. Maria Fernanda Rodriguez

Director de Interventoría:
Ing. Jimmy Andres Torres

Residente de Interventoría:
Ing. Jorge Augusto Rodriguez

Director de obra:
Ing. Luis Eduardo Rodriguez

Profesional SST de Interventoría:
Ingra. Angela Navarro Cerino.

Profesional de apoyo de Interventoría:
Ing. Pedro Alfaro

VIERNES 03 DE JULIO DEL 2026.

* Inicio de actividades: 7:00 AM.
* Clima del dia: lluvias moderadas en la mañana (6-hrs), Tiempo seco en la tarde.
* Profesional SST de obra realiza charla de seguridad al inicio de la jornada.
* Personal en obra: 1-residente de obra, 1-profesional SST de obra, 1-maestro, 1-oficial, 1-ayudante, 1-topografo, 1-cadenero, 1-operador, 1-canalizar vial, Cuadrilla para montaje del puente(6-pers), 1-residente de Interventoria.
* Equipos y maquinaria: 1-retropajarita, 1-planta electrica, 1-electrobomba 2" sumergible, 1-motobomba 6", 1-cinguro, 1-martillo electrico, 1-cortadora de concreto, 1-compresor, 2-martillos neumaticos, 1-vibro-compactador manual, Equipos para montaje y soldadura del puente, herramienta menor, 1-volqueta
* Actividades:

-Soldadura para ensamble de módulos y riostras de los vigas metálicas.
-Relleno con material seleccionado para construccion de terraplen por medio mecánico.
-Seleccion y acopio de material petreo para construccion de gaviones.
-Localizacion y replanteo topografico en todas las actividades de la obra.
* NOTA-1 *: Ya se realizo el reintegro de una retro-pajarita sin embargo falta el resto de maquinaria recalcando la dificultad a causa de los hechos vandálicos.

Residente de obra
Ing. Alexander Herrera.

Profesional SST de obra
Arq. María Fernanda Rodriguez.

Director de Interventoria
Ing. Jhonny Andres Torres.

Residente de Interventoria
Ing. Jorge Augusto Rodriguez.

Director de obra
Ing. Luis Eduardo Rodriguez

Profesional de apoyo de Interventoria
Ing. Pedro Alfonso

Powered by CamScanner

SABADO 04 DE JULIO DEL 2026.

* Inicio de actividades: 7:00 AM
* Clima del dia: Tiempo seco en la mañana, lluvias fuertes en la tarde (5-hrs).
* Profesional SST de obra realiza charla de seguridad al inicio de la jornada.
* Personal en obra: 1-residente de obra, 1-profesional SST de obra, 1-maestra, 1-oficial, 1-ayudante, 2-operadores, 1-topografo, 1-cadenero, 1-auxiliar de oficios varios, Cuadrilla para montaje del puente (6-pers), 1-profesional SST de Interventoria, 1-residente de Interventoria.
* Equipos y maquinaria: 1-retro-pajarita, 1-volqueta, 1-vibro compactador manual, 1-planta electrica, 1-electrobomba 2" sumergible, 1-motobomba 6", 1-cangura, 1-martillo electrico, 1-cortadora de concreto, 1-compresor, 2-martillos neumaticos, Equipos para montaje del puente y soldadura, herramienta menor.
* Actividades:
- Soldadura para ensamble de módulos y riostras de las vigas metálicas.
- Relleno con material seleccionado para construccion de terraplen por medio mecánico.
- Seleccion y acopio de material pétreo para construccion de gaviones.
- Localizacion y replanteo topografico en todas las actividades de la obra.
- *NOTA-1*: Ya se realizó reposición de una retro-pajarita, sin embargo falta el resto de maquinaria, reconociendo la dificultad de contratacion debido a los anteriores hechos vandálicos.

Residente de obra:
Ing. Alexander Herrera.

Profesional SST de obra:
Esp. Maria Fernanda Rodriguez

Director de Interventoria:
Ing. Dimary Andres Tovar

Residente de Interventoria:
Ing. Jorge Augusto Rodriguez

Director de obra:
Ing. Luis Eduardo Rodriguez

Profesional SST de Interventoria:
Esp. Angela Narvaez Castro.

Profesional de apoyo de Interventoria:
Ing. Pedro Alfaro.

Powered by CamScanner

LUNES 06 DE JULIO DEL 2026.

* Inicio de obra: 7:00 AM.
* Clima del dia: Lluvias fuertes en la mañana (6 hrs), Tiempo seco en la tarde.
* Profesional SST de obra realiza charla de seguridad al inicio de la jornada.
* Personal en obra: 1-residente de obra, 1-profesional SST de obra, 1-maestro, 1-oficial, 1-ayudante, 2-operadores, 1-topografo, 1-cadenero, 1-auxiliar de oficios varios, Cuadrilla para montaje del puente (6-pax), 1-residente de Interventoria.
* Equipos y maquinaria: 1-Retro-pajarita, 1-volqueta, 1-vibrocompactador manual, 1-planta electrica, 1-electrobomba 2" sumergible, 1-motobomba, 1-cangrejo, 1-martillo electrico, 1-cortadora de concreto, 1-compresor, 2-martillos neumáticos, Equipos para montaje y soldadura del puente, herramienta menor.
* Actividades:
- Soldadura para ensamble de módulos y viestras de las vigas metalicas.
- Relleno con material seleccionado para construccion de terraplen por medio mecánico.
- Seleccion y acopio de material petreo para construccion de gaviones.
- Localizacion y replanteo topografico en todas las actividades de la obra.
* NOTA-SST: Ya se repuso una retro-pajarita, sin embargo falta el resto de maquinaria, para continua la dificultad de contratacion por los anteriores hechos vandálicos.//

Residente de obra:
Ing. Alexander Herrera.

Profesional SST de obra:
Psic. Maria Fernanda Rodriguez

Director de Interventoria:
Ing. Jhonny Andres Torres

Residente de Interventoria:
Ing. Jorge Augusto Rodriguez

Inspector de obra:
Ing. Luis Eduardo Rodriguez

Profesional de apoyo de Interventoria:
Ing. Pedro Alfonso

Powered by CamScanner

MARTES 07 DE JULIO DEL 2026.

* Inicio de actividades: 7:00 Am
* Clima del día: Lluvias fuertes y permanente durante todo el día (10-hrs).
* Profesional SST de obra realiza charla de seguridad al inicio de la jornada
* Personal en obra: 1-residente de obra, 1-profesional SST de obra, 1-maestro, 1-opicial, 1-ayudante, 2-operadores, 1-topografo, 1-cadenero, 1-auxiliar de oficios varios, Cuadrilla para montaje del puente (6-pers), 1-profesional SST de Interventoría, 1-residente de Interventoría.
* Equipos y maquinaria: 1-retropajarita, 1-volqueta, 1-vibro-compactador manual, 1-planta electrica, 1-electrobomba 2" sumergible, 1-motobomba 6", 1-canguro, 1-martillo eléctrico, 1-cortadora de concreto, 1-compresor, 2-martillos neumáticos, Equipos para montaje y soldadura del puente, herramienta menor, 1-vibrocompactador.
* Actividades:

-Soldadura para ensamble de módulos y riostras de las vigas metálicas.
-Relleno con material seleccionado para construcción de terraplen para la vía por medio mecánico.
-Selección y acopio de material petreo para construcción de gaviones.
-Localización y replanteo topográfico en todas las actividades de la obra.
-*NOTA-1*: Se repuso una retro-pajarita por falta el resto de maquinaria, reconociendo que continua la dificultad para contratación debido a los anteriores hechos vandálicos ocurridos. //

Residente de obra:
Ing. Alexander Herrera

Profesional SST de obra:
Esp. María Fernanda Rodríguez

Director de Interventoría:
Ing. Jimmy Andres Tellez

Residente de Interventoría:
Ing. Jorge Augusto Rodríguez

Director de obra:
Ing. Luis Eduardo Rodríguez

Profesional SST de Interventoría:
Dra. Angela Narvaez Castro.

Profesional de apoyo a Interventoría:
Ing. Pedro Alfaro

Powered by CamScanner

MIERCOLES 08 DE JULIO DEL 2026

* Inicio de actividades: 7:00 AM
* Clima del día: Tiempo seco en la mañana, lluvias moderadas en la tarde (4 hrs).
* Profesional SST de obra realiza charla de seguridad al inicio de la jornada.
* Personal en obra; 1. residente de obra, 1. profesional SST de obra, 1. maestro, 1. oficial, 1. ayudante, 2. operarios, 1. topografo, 1. cadenero, 1. auxiliar vial, 1. ayudar de oficios varios, Cuadrilla para montaje del puente (6 pers), 1. residente de Interventoría.
* Equipos y maquinaria: 1. retro-pajarita, 1. vibrocompactador grande, 1. vibro-compactador manual, 1. planta electrica, 1. electrobomba 2" sumergible, 1. motobomba 6", 1. cargador, 1. martillo electrico, 1. cortadora de concreto, 1. compresor, 2. martillos neumáticos, Equipos para montaje y soldadura del puente, herramienta menor, 1 volqueta.
* Actividades:
- Soldadura para ensamble de módulos y riostras de las vigas metálicas.
- Relleno, extension y compactacion de material de relleno para construcion de terraplen
- Seleccion y acopio de material pétreo para construcion de gaviones.
- Localizacion y replanteo topografico en todas las actividades de la obra.

* NOTA-1 *: Se cuenta con parte de la maquinaria amarillas; una retro-pajarita y un vibro-compactador, sin embargo no está completa reconociendo la dificultad para contratacion debido a los anteriores hechos vandalicos. //

Residente de obra:
Ing. Alexander Ramos.

Profesional SST de obra:
Dra. Maria Fernanda Rodriguez

Director de Interventoría:
Ing. Fernando Andres Torres

Residente de Interventoría:
Ing. Jorge Augusto Rodriguez.

Director de obra:
Ing. Luis Eduardo Rodriguez

Profesional de apoyo de Interventoría:
Ing. Pedro Alfonso.

Powered by CamScanner

JUEVES 09 DE JULIO DEL 2026

* Inicio de actividades: 7:00 AM
* Clima del dia: Lluvias fuertes durante toda la jornada (11-hrs).
* Profesional SST de obra realiza charla de seguridad al inicio de la jornada.
* Personal en obra: 1-residente de obra, 1-profesional SST de obra, 1-maestro, 1-oficial, 1-ayudante, 2-operadores, 1-topografo, 1-cadenero, 1-auxiliar vial, 1-auxiliar de oficios varios, Cuadrilla para montaje del puente (6-pers), 1-profesional SST de Interventoria, 1-residente de Interventoria.
* Equipos y maquinaria: 1-retro-pajarita, 1-vibrocompactador mecánico, 1-vibrocompactador manual, 1-volqueta, 1-planta eléctrica, 1-electro-bomba 2" sumergible, 1-motobomba, 1-compresor, 1-martillo electrico, 1-cortadora de concreto, Equipos para montaje y soldadura del puente, herramienta menor.
* Actividades:
- Soldadura para ensamble de modulos y riostras de las vigas metálicas.
- Construccion de terraplen de acceso al puente para estructura vial con material de relleno por medio mecánico.
- Localizacion y replanteo topografico en todas las actividades de la obra.

NOTA: Ya se repuso parte de la maquinaria amarilla pero continua la dificultad para contratacion de maquinaria faltante; debido a los pasados hechos vandálicos. //

Residente de obra:
Ing. Alexander Rivera

Profesional SST de obra:
Dra. Maria Fernanda Rodriguez.

Director de Interventoria:
Ing. Diego Andres Torres

Residente de Interventoria:
Ing. Jorge Augusto Rodriguez

Director de obra:
Ing. Luis Eduardo Rodriguez

Profesional SST de Interventoria:
Dra. Angela Marmez Castro.

Profesional de apoyo a Interventoria:
Ing. Pedro Alfonso

Powered by CamScanner

VIERNES 10 DE JULIO DEL 2026

* Inicio de actividades: 7:00 AM.
* Clima del dia: Tiempo seco en la mañana, lluvias moderadas en la tarde (5-hrs).
* Profesional SST de obra realiza charla de seguridad al inicio de la jornada.
* Personal en obra: 1. residente de obra, 1. profesional SST de obra, 1. maestro, 1. oficial, 1. ayudante, 2. operadores, 1. topografo, 1. cadenero, 1. auxiliar vial, 1. auxiliar de oficios varios, Cuadrilla para montaje del puente (6-pers), 1. profesional SST de Interventoria.
* Equipos y maquinaria: 1. retro-pajarita, 1. vibro-compactador grande, 1. vibro-compactador manual, 1. volqueta, 1. planta electrica, 1. electrobomba 2" Sumergible, 1. motobomba 6", 1. canguro, 1. martillo eléctrico, 1. cortadora de concreto, Equipos para montaje y soldadura del puente, herramienta menor.
* Actividades:
- Soldadura para ensamble de módulos y riostras de las vigas metálicas.
- Transporte de material de relleno para construccion de terraplen.
- Colocacion, extension y compactacion mecánica de capas de relleno para construccion de terraplen para estructura vial.
- Localizacion y replanteo topografico en todas las actividades de la obra.
- *NOTA-1*: Ya se repuso parte de la maquinaria amarilla pero continua la dificultad para contratacion de maquinaria faltante debido a los pasados hechos vandalicos.
- *NOTA-2*: Se realiza visita de control y seguimiento de obra en la oficina de Infraestructura de la Alcaldia de Acacias. //

Residente de obra:
Ing. Alexander Herrera.

Profesional SST de obra:
Dra. Maria Fernanda Rodriguez

Director de Interventoria:
Ing. Jimmy Andres Torres

Residente de Interventoria:
Ing. Jorge Augusto Rodriguez

Director de obra:
Ing. Luis Eduardo Rodriguez

Profesional de apoyo de Interventoria:
Ing. Pedro Alfonso.

Powered by CamScanner

SABADO 11 DE JULIO DEL 2026.

* Inicio de actividades: 7:00 AM
* Clima del dia: Lluvias moderadas en la mañana (5 hrs), Tiempo seco en la tarde.
* Profesional SST de obra, realiza charla de seguridad al inicio de la jornada.
* Personal en obra: 1. residente de obra, 1. profesional SST de obra, 1. maestro, 1. oficial, 1. ayudante, 2. operadores, 1. topografo, 1. cadenero, 1. auxiliar vial, 1. auxiliar de oficios varios, Cuadrilla para montaje del puente (6 pax), 1. profesional SST de Interventoria, 1. residente de Interventoria.
* Equipos y maquinaria: 1. retro-pajarito, 1. volqueta, 1. vibrocompactador grande, 1. vibrocompactador manual, 1. planta electrica, 1. electrobomba 2" sumergible, 1. motobomba 6", 1. congure, 1. martillo electrico, 1. cortadora de concreto, Equipos para montaje y soldadura del puente, herramienta menor.
* Actividades:
- Soldadura para ensamble de modulos y riostras del puente metalico.
- Transporte y descargue de material de relleno para construccion de terraplen.
- Colocacion, extension y compactacion mecanica de capas de relleno para construccion de terraplen para estructura vial.
- localizacion y replanteo topografico en todas las actividades de la obra.
- *NOTA-1*: Ya se repuso parte de la maquinaria amarilla, sin embargo continua la dificultad para contratar la maquinaria adecuada debido a los pasados hechos vandalicos.
- El Lunes 13 de julio es festivo y se remanda actividad el martes 14 de julio.

Residente de obra:
Ing. Alexander Barrera.

Profesional SST de obra:
Sra. Maria Fernanda Rodriguez.

Director de Interventoria:
Ing. Johnny Andres Torres

Residente de Interventoria:
Ing. Jorge Augusto Rodriguez

Director de obra:
Ing. Luis Eduardo Rodriguez

Profesional SST de Interventoria:
Dra. Angela Herrera Castro

Profesional de apoyo de Interventoria:
Ing. Pedro Alfarez.

Powered by CamScanner

MARTES 14 DE JULIO DEL 2026.

* Inicio de actividades: 7:00 AM
* Clima del dia: lluvias moderadas en la mañana (5 hrs), tiempo seco en la tarde
* Profesional SST de obra realiza charla de seguridad al inicio de la jornada.
* Personal en obra: 1. residente de obra, 1. profesional SST de obra, 1. maestro, 1. oficial, 1. ayudante, 2. operadores, 1. topografo, 1. cadenero, 1. auxiliar vial, 1. ayudar de oficios varios. Cuadrilla para montaje del puente (6 pers), 1. profesional SST de Interventoria, 1. residente de Interventoria.
* Equipos y maquinaria: 1. vibrocompactador grande, 1. retro pajarita, 1. volqueta, 1. vibrocompactador manual, 1. planta electrica, 1. electrobomba 2" sumergible, 1. motobombeo, 1. cangura, 1. martillo electrico, 1. cortadora de concreto, Equipos para montaje y soldadura del puente, herramienta menor.
* Actividades:
- Soldadura para ensamble de módulos y riostras de las vigas metalicas.
- Transporte y descargue de material de relleno para construccion de terraplen.
- Colocacion, extension y compactacion mecanica de capas de relleno para construccion de terraplen para estructura vial
- Localizacion y replanteo topografico en todas las actividades de la obra.

* NOTA-1 *: Ya se repuso parte de la maquinaria amarilla, sin embargo continua la dificultad para contratar la faltante maquinaria adecuada debido a los pasados hechos vandalicos.

* NOTA-2 *: Las 4 vigas metalicas ya quedan con la soldadura estructural completa. //

Residente de obra:
Ing. Alexander Rivera.

Profesional SST de obra:
Srta. Maria Fernanda Rodriguez

Director de Interventoria:
Ing. Johnny Andres Torres

Residente de Interventoria:
Ing. Jorge Augusto Rodriguez

Director de obra:
Ing. Luis Eduardo Rodriguez

Profesional SST de Interventoria:
Srta. Angela Narvaez Castro

Profesional de apoyo de Interventoria:
Ing. Pedro Aguirre

Powered by CamScanner

MIERCOLES 15 DE JULIO DEL 2026.

* Inicio de actividades: 7:00 A.M.
* Clima del dia: Lluvias moderadas en la mañana (4-hrs), tiempo seco en la tarde.
* Profesional SST de obra realiza charla de seguridad al inicio de la jornada.
* Personal de obra: 1- residente de obra, 1 profesional SST de obra, 1 maestro, 1 oficial, 1 ayudante, 2 operadores, 1 topografo, 1 cadenero, 1 auxiliar vial, 1 auxiliar de oficios varios, Cuadrilla para montaje del puente (6-pers), 1 residente de interventoria.
* Equipos y maquinaria: 1 retro excavadora tipo pajarita, 1 vibrocompactador grande, 1 vibrocompactador manual, 1 volqueta, 1 planta eléctrica, 1 electrobomba 6" sumergible, 1 motobomba 6", 1 cangrejo, 1 martillo eléctrico, 1 cortadora de concreto, Equipos para montaje y soldadura del puente, herramienta menor.
* Actividades:
  - Soldadura para instalación de riostras de las vigas metálicas.
  - Transporte y descargue de material de relleno para construcion de terraplen.
  - Extension y compactación mecánica de capas de relleno para construccion de terraplen para estructura vial.
  - Localizacion y replantes topograficos en todas las actividades de la obra.

* NOTA-1 *: Ya se repuso maquinaria amarilla pero falta completar la maquinaria, sin desconocer la dificultad para contratar, que aun continua, debido a los pasados hechos vandalicos. //

Residente de obra
Ing. Alexander Herrera

Profesional SST de obra
Esp. Maria Fernanda Rodriguez.

Director de Interventoria
Ing. Jimmy Andres Torres

Residente de Interventoria
Ing. Jorge Augusto Rodriguez.

Director de obra
Ing. Luis Eduardo Rodriguez

Profesional de apoyo de Interventoria.
Ing. Pedro Alfaro.

Powered by CamScanner

JUEVES 16 DE JULIO DEL 2026

* Inicio de actividades: 7:00 AM
* Clima del día: lluvias moderadas en la mañana (4-hrs), lluvias fuertes en la tarde (3-hrs)
* Profesional SST de obra realiza charla de seguridad al inicio de la jornada.
* Personal en obra: 1-residente de obra; 1-profesional SST de obra, 1-maestro, 1-oficial, 1-ayudante, 2-operadores, 1-topografo, 1-cadenero, 1-auxiliar vial, 1-auxiliar de oficios varios, Cuadrilla para montaje del puente (6-pers), 1-profesional SST de Interventoria, 1-residente de Interventoria.
* Equipos y maquinaria: 1-retroexcavadora, 1-vibrocompactador grande, 1-vibrocompactador manual, 1-volqueta, 1-planta eléctrica, 1-electrobomba 2" sumergible, 1-motobomba 6", 1-canguro, 1-martillo eléctrico, 1-cortadora de concreto, Equipos para ensamble y soldadura de riostras del puente, herramienta menor.
* Actividades:
- Soldadura para instalación de riostras de las vigas metálicas
- Cargue, transporte y colocación de material de relleno para construcción de terraplen.
- Extensión y compactación mecánica de capas de relleno para construcción de terraplen de estructura vial
- Localización y replanteo topografico en todas las actividades de la obra.

-NOTA-1: Pese a que se repuso parte de la maquinaria amarilla, aun falta completar maquinaria sin desconocer la dificultad de contratar para esa zona debido a los pasados hechos vandálicos.//

Residente de obra:
Ing. Alexander Herrera.

Profesional SST de obra:
Esp. María Fernanda Rodriguez.

Director de Interventoría:
Ing. Jhonny Andres Torres

Residente de Interventoría:
Ing. Jorge Augusto Rodriguez

Director de obra:
Ing. Luis Eduardo Rodriguez

Profesional SST de Interventoría:
Srta. Angela Mendoza castro.

Profesional de apoyo de Interventoría:
Ing. Pedro Alfaro

Powered by CamScanner

VIERNES 17 DE JULIO DEL 2026.

* Inicio de actividades: 7:00 AM
* Clima del día: Lluvias moderadas en la mañana (5 hrs), Tiempo seco en la tarde.
* Profesional SST de obra realiza charla de seguridad al inicio de la jornada.
* Personal en obra: 1. residente de obra, 1. profesional SST de obra, 1. maestro, 1. oficial, 1. ayudante, 2. operadores, 1. topografo, 1. cadenero, 1. auxiliar vial, 1. auxiliar de oficios varios, Cuadrilla para montaje del puente (6 pers), 1. residente de Interventoria.
* Equipos y maquinaria: 1. retroexcavadora, 1. vibro-compactador grande, 1. vibrocompactador manual, 1 volqueta, 1. planta electrica, 1. electrobomba 2" sumergible, 1. canguro, 1. martillo electrico, 1. cortadora de concreto, Equipos para montaje y soldadura del puente, herramienta menor.
* Actividades:
- Soldadura para ensamble de riostras de las vigas metalicas.
- Cargue, transporte y colocacion de material de relleno para construccion de terraplen.
- Extension y compactacion mecanica de capas de relleno para construccion de terraplen.
- Localizacion y replanteo topografico en todas las actividades de la obra.

NOTA-1: Pese a que ya se repuso parte de la maquinaria amarilla, aun faltan equipos basicos, sin embargo continua la dificultad para contratación debido a los pasados hechos vandalicos ocurridos.

NOTA-2: Se realiza comite técnico de obra en la oficina de Infraestructura. //

Residente de obra:
Ing. Alexander Barrera

Profesional SST de obra:
Dra. Maria Fernanda Rodriguez

Director de Interventoria:
Ing. Jimmy Andres Torres

Residente de Interventoria:
Ing. Jorge Augusto Rodriguez

Director de obra:
Ing. Luis Eduardo Rodriguez

Profesional de apoyo de Interventoria:
Ing. Pedro Alfonso

Powered by CamScanner

SABADO 18 DE JULIO DEL 2026.

* Inicio de actividades: 7:00 AM
* Clima del día: Lluvias fuertes en la mañana (3-hrs), Tiempo seco en la tarde.
* Profesional SST de obra realiza charla de seguridad al inicio de la jornada
* Personal en obra: 1-residente de obra, 1-profesional SST de obra, 1-maestro, 1-oficial, 1-ayudante, 2-operadores, 1-topografo, 1-cadenero, 1-auxiliar vial, 1-auxiliar de oficios viales, Cuadrilla para montaje del puente (6-pers), 1-profesional SST de Interventoria, 1-residente de Interventoria.
* Equipos y maquinaria: 1-retro-pajarita, 1-vibrocompactador operacion mecanica, 1-vibrocompactador operacion manual, 1-volqueta, 1-planta electrica, 1-electrobomba 2" sumergible, 1-concreto, 1-martillo electrico, 1-cortadora de concreto, Equipos para montaje y soldadura del puente, herramienta menor.
* Actividades:
- Soldadura para ensamble de riostras de las vigas metalicas
- Cargue, transporte y colocacion de material de relleno para construccion de terraplen.
- Extension y compactacion mecanica de capas de relleno para construccion de terraplen.
- Localizacion y replanteo topografico en todas las actividades de la obra.

* NOTA-1 *: Ya se reposo parte de la maquinaria amarilla, sin embargo faltan equipos básicos, reconociendo la dificultad de contratacion debido a los hechos viabilitos. //

Residente de obra:
Ing. Alexander Herrera.

profesional SST obra:
Dra. Adria Fernanda Rodriguez

Director de Interventoria:
Ing. Jhonny Andres Torres

Residente de Interventoria:
Ing. Jorge Augusto Rodriguez

Director de obra:
Ing. Luis Eduardo Rodriguez

profesional SST de Interventoria:
Dra. Angela Narvaez Castro.

Profesional de apoyo de Interventoria:
Ing. Pedro Alfaro.

Powered by CamScanner

MARTES 21 DE JULIO DEL 2026.

* Inicio de actividades: 7:00 AM
* Clima del día: Tiempo seco durante toda la jornada.
* Personal en obra: 1. residente de obra, 1. maestro, 1. oficial, 1. ayudante, 2. operadores, 1. topografo, 1. cadenero, 1. auxiliar vial, 1. auxiliar de oficios varios, Cuadrilla para montaje del puente (6. pers), 1 profesional SST de Interventoría, 1. residente de Interventoría.
* Equipos y maquinaria: 1. retro-pajarita, 1. vibrocompactador grande, 1. vibrocompactador manual, 1. volqueta, 1. planta eléctrica, 1. martillo eléctrico, 1. cortadora de concreto, 1. canguro, 1. electrobomba 2" sumergible, Equipos para montaje y soldadura del puente, herramienta menor.
* Actividades:
- Soldadura para ensamble de riostras de las vigas metálicas.
- Cargue, trasporte y colocacion de material de relleno para construccion de terraplen.
- Extension y compactacion mecanica de capas de relleno para construccion de terraplen.
- Localizacion y replanteo topografico en todas las actividades de la obra.

NOTA-1: Pese a que ya se repuso parte de la maquinaria amarilla, aun faltan equipos adecuados y basicos, sin desconocer la dificultad de contratacion debido a los anteriores hechos vandalicos ocurridos.

NOTA-2: Se realiza reunion citada por el DNP en la Alcaldia de Acacias y recorrido a la obra con el objeto de verificar el avance y estado del proyecto. //

Residente de obra:
Ing. Alexander Herrera

Profesional SST de obra:
Dra. Maria Fernanda Rodriguez

Director de Interventoria:
Ing. Jaime Andres Torres.

Residente de Interventoria:
Ing. Jorge Augusto Rodriguez

Director de obra:
Ing. Luis Eduardo Rodriguez.

Profesional SST de Interventoría:
Dra. Angela Marcela Castro.

Profesional de apoyo de Interventoría:
Ing. Pedro Alfonso.

Powered by CamScanner

MIERCOLES 22 DE JULIO DEL 2026.

* Inicio de actividades: 7:00 A.M.
* Clima del dia: lluvias moderadas en la mañana (4 hrs), tiempo seco en la tarde.
* Profesional SST de obra realizan charla de seguridad al inicio de la jornada.
* Personal en obra: 1. residente de obra, 1. profesional SST de obra, 1. maestro, 1. oficial, 1. ayudante, 2. operadores, 1. topografo, 1. cadenero, 1. auxiliar vial, 1. auxiliar de oficios varios, Cuadrilla para montaje y soldadura del puente (6 pers), 1. residente de Interventoria.
* Equipos y maquinaria: 1. retroexcavadora, 1. vibrocompactador operacion mecanica, 1. vibrocompactador manual, 1. volqueta, 1. planta electrica, 1. electrobomba 2" sumergible, 1. canguro, 1. martillo electrico, 1. cortadora de concreto, Equipos para montaje y soldadura del puente, herramienta menor.
* Actividades:
- Soldadura para ensamble de viguetas de las vigas metalicas, 85% avance.
- Cargue, transporte y colocacion de material de relleno para construccion de terraplen.
- Extension y compactacion mecanica de capas de relleno para construccion de terraplen
- Localizacion y replanteo topografico en todas las actividades de la obra.

NOTA-1: Pese a que ya se reparo parte de la maquinaria amarilla, aun faltan equipos básicos, sin desconocer la dificultad para contratacion debido a los pesados hechos vandálicos ocurridos.//

Residente de obra:
Ing. Alexander Guerrero

Prof. Asistente SST de obra:
Dra. Maria Fernanda Rodriguez

Director de Interventoria:
Ing. Camilo Andres Torres

Residente de Interventoria:
Ing. Jorge Augusto Rodriguez

Director de obra:
Ing. Luis Eduardo Rodriguez

Profesional de apoyo de Interventoria:
Ing. Pedro Valencia

Powered by CamScanner

JUEVES 23 DE JULIO DEL 2026.

* Inicio de actividades: 7:00 AM
* Clima del día: Lluvias moderadas en la mañana (5-hrs), lluvias fuertes en la tarde (6-hrs).
* Profesional SST de obra realiza charla de seguridad al inicio de la jornada.
* Personal en obra: 1-residente de obra, 1-profesional SST de obra, 1-maestro, 1-oficial, 1-ayudante, 2-operadores, 1-topografa, 1-cadenero, 1-auxiliar vial, 1-auxiliar de oficios varios, Cuadrilla para montaje del puente (6-pers), 1-profesional SST de Interventoría, 1-residente de Interventoría.
* Equipos y maquinaria: 1-retro-pajarita, 1-vibrocompactador operacion mecánica, 1-vibrocompactador operacion manual, 1-volqueta, 1-planta eléctrica, 1-martillo electrico, 1-cortadora de concreto, 1-canguro, 1-electrobomba 2" sumergible, Equipos para montaje y soldadura del puente, herramienta menor.
* Actividades:
- Soldadura para ensamble de riostras de las vigas metálicas
- Cargue, transporte y colocacion de material de relleno para construccion de terraplen
- Extension y compactacion mecánica, de capas de relleno para construccion de terraplen.
- Se inician las pruebas de ultrasonido para soldaduras estructurales de las vigas.
- Localizacion y replanteo topográfico en todas las actividades de la obra.

NOTA-1: Ya se repuso parte de la maquinaria amarilla, pero aún faltan equipos básicos, sin desconocer la dificultad de contratacion debido a los pasados hechos vandálicos.

NOTA-2: La actividad estuvo muy limitada por causa de las lluvias.

Residente de obra:
Ing. Eduardo Herrera

Profesional SST de obra:
Dra. Maira Fernanda Rodriguez

Director de Interventoría:
Ing. Jeremy Andres Parra

Residente de Interventoría:
Ing. Jorge Augusto Rodriguez

Director de obra:
Ing. Luis Eduardo Rodriguez

Profesional SST de Interventoría:
Dra. Angela Ximena Castro.

Profesional de apoyo de Interventoría:
Ing. Pedro Angel

Powered by CamScanner

VIERNES 24 DE JULIO DEL 2026.

* Inicio de actividades: 7:00 a.m.
* Clima del día: Tiempo seco durante toda la jornada.
* Profesional SST de obra realiza charla de seguridad al inicio de la jornada.
* Personal en obra: 1. residente de obra, 1. profesional SST de obra, 1. maestro, 1. oficial, 1. ayudante, 2. operadores, 1. topografo, 1. cadenero, 1. auxiliar vial, 1. auxiliar de oficios varios, Cuadrilla para montaje del puente (6. pers), personal para pruebas de ultrasonido (2. pers), 1. residente de Interventoría.
* Equipos y maquinaria: 1. retro-pajarita, 1. vibrocompactador, 1. volqueta, 1. planta eléctrica, 1. electrobomba 2" sumergible, 1. martillo electrico, 1. cortadora de concreto, Equipos para soldadura y montaje del puente, herramienta menor.
* Actividades:
  - Soldadura para ensamble de riostras de las vigas metálicas.
  - Cargue, transporte y colocacion de material de relleno para construccion de terraplen.
  - Extension y compactacion mecánica de capas de relleno para construccion de terraplen.
  - Se continua pruebas de ultrasonido para soldaduras estructurales de las vigas.
  - Localizacion y replanteo topografico en todas las actividades del puente y de la obra

NOTA-1: Ya se repuso parte de la maquinaria amarilla, pero aún faltan equipos básicos, sin desconocer la dificultad para contratacion debido a los pasados hechos vandálicos. //

Residente de obra:
Ing. Alexander Barrera.

Profesional SST de obra:
Dra. María Fernanda Rodriguez

Director de Interventoría:
Ing. Jhonny Andres Torres

Residente de Interventoría:
Ing. Jorge Augusto Rodriguez.

Director de obra:
Ing. Luis Eduardo Rodriguez

Profesional de apoyo de Interventoría:
Ing. Pedro Alfonso.

Powered by CamScanner

SABADO 25 DE JULIO DEL 2026.

* Inicio de actividades: 7:00 am.
* Clima del dia: Llovio fuerte en la mañana (4 hrs), Tiempo seco en la tarde
* Profesional SST de obra realizo charla de seguridad al inicio de la jornada.
* Personal en obra: 1 residente de obra, 1 profesional SST de obra, 1 maestro, 1 oficial, 1 ayudante, 2 operadores, 1 topografo, 1 cadenero, 1 auxiliar vial, 1 auxiliar de oficios varios, Cuadrilla para montaje del puente (6 pers), Personal técnico para pruebas de ultrasonido (2 pers), 1 profesional SST de Interventoria, 1 residente de Interventoria.
* Equipos y maquinaria: 1 retro-pajarita, 1 vibro-compactador, 1 volqueta, 1 planta electrica, 1 electrobomba 2" sumergible, 1 martillo electrico, 1 cortadora de concreto, Equipos para montaje y soldadura del puente, herramienta menor.
* Actividades:
- Soldadura para ensamble de riostras de las vigas metalicas.
- Se continua ensayos de ultrasonido en soldadura estructural de las vigas
- Cargue, transporte y colocacion de material de relleno para construccion de terraplen.
- Extension y compactacion mecánica de capas de relleno para construccion de terraplen.
- Localizacion y replanteo topografico en todas las actividades de la obra.

* NOTA-1: * No se ha realizado la reposicion completa de maquinaria comprometida, reconociendo la dificultad de contratacion debido a los pasados hechos vandálicos.

Residente de obra:
Ing. Alexander Herrera.

Profesional SST de obra:
Dra. Yilonia Fernanda Rodriguez

Director de Interventoria:
Ing. Jimmy Andres Torres.

Residente de Interventoria:
Ing. Jorge Augusto Rodriguez.

Director de obra:
Ing. Luis Eduardo Rodriguez.

Profesional SST de Interventoria:
Dra. Angela Hernandez Castro

Profesional de apoyo de Interventoria:
Ing. Pedro Alfonso.

Powered by CamScanner

LUNES 27 DE JULIO DEL 2026.

* Inicio de actividades: 7:00 AM.
* Clima del día: Tiempo seco en la mañana, lluvias moderadas en la tarde (3-hrs)
* Profesional SST de obra realiza charla de seguridad al inicio de la jornada.
* Personal en obra: 1. residente de obra, 1-profesional SST de obra, 1-maestro, 1. oficial, 1-ayudante, 2-operadores, 1. topografo, 1. cadenero, 1. auxiliar civil, 1. auxiliar de oficios varios, Cuadrilla para montaje del puente (6-pax), 1. profesional SST de Interventoría, 1. residente de Interventoría.
* Equipos y maquinaria: 1. retro-pajarita, 1. vibrocompactador, 1. volqueta, 1. planta eléctrica, 1. electrobomba 2" sumergible, 1. martillo eléctrico, 1. cortadora de concreto, Equipos para montaje y soldadura del puente, herramienta menor.
* Actividades:
- Soldadura para ensamble de riostras de las vigas metálicas.
- Se termina el 100% de las pruebas de la soldadura estructural con ultrasonido.
- Cargue, transporte y adecuación de material de relleno para construcción de terraplen.
- Extensión y compactación mecánica de capas de relleno para construcción de terraplen.
- Localización y replanteo topográfico en todas las actividades de la obra
- Construcción de losas de aproximación y adecuación de terreno y armado de aceros.

NOTA-1: No se ha realizado la reposición completa de la maquinaria amarilla debido a la dificultad de contratación causada por los pasados hechos vandálicos.-

NOTA-2: Queda pendiente la entrega de resultados de los ensayos de ultrasonido de soldaduras por parte del contratista. //

Residente de obra:
Ing. Alexander Herrera.

Profesional SST de obra:
Esp. María Fernanda Rodríguez.

Director de Interventoría
Ing. Jimmy Andres Tafur.

Residente de Interventoría:
Ing. Jorge Augusto Rodríguez.

Director de obra:
Ing. Luis Eduardo Rodríguez.

Profesional de apoyo de Interventoría:
Ing. Pedro Alfonso

Powered by CamScanner

MARTES 28 DE JULIO DEL 2026.

* Inicio de actividades: 7:00 AM.
* Clima del día: Tiempo seco durante toda la jornada.
* Profesional SST de obra, realiza charla de seguridad al inicio de la jornada.
* Personal en obra: 1. residente de obra, 1. profesional SST de obra, 1. maestro, 1. oficial, 1. ayudante, 2. operadores, 1. topografo, 1. cadenero, 1. auxiliar sid, 1. auxiliar de oficios varios, Cuadrilla para montaje del puente (6 pers), 1. profesional SST de Interventoria, 1. residente de Interventoria.
* Equipos y maquinaria: 1. retro-pajarita, 1. vibro-compactador, 1. volqueta, 1. planta eléctrica, 1. electrobomba 2" sumergible, 1. martillo electrico, 1. cortadora de concreto, Equipos para montaje y soldadura del puente, herramienta menor.
* Actividades:
- Soldadura para ensamble de riostras de las vigas metálicas.
- Cargue, transporte y colocacion de material de relleno para terraplen de aproches.
- Extension y compactacion mecánica de capas de relleno para terraplen de aproches.
- Adecuacion de terreno y armado de aceros para construccion de losas de aproximacion.
- Localizacion y replanteo topografico en todas las actividades de la obra.

* NOTA-1 *: No se ha realizado la reposicion total de la maquinaria amarilla debido a la dificultad de contratacion a causa de los pasados hechos vandálicos. //

Residente de obra:
Ing. Alexander Ramirez.

Profesional SST de Obra:
Dra. Angela Maria Hernandez Rodriguez

Director de Interventoria:
Ing. Jimmy Andres Tarazona

Residente de Interventoria:
Ing. Jorge Augusto Rodriguez.

Director de Obra:
Ing. Luis Eduardo Rodriguez

Profesional SST de Interventoria:
Dra. Angela Marcela Castro.

Profesional de apoyo de Interventoria:
Ing. Pedro Alfonso

Powered by CamScanner

MIERCOLES 29 DE JULIO DEL 2026.

* Inicio de actividades: 7:00 AM.
* Clima del dia: Lluvias fuertes en la mañana (4-hrs), Lluvias moderadas en la tarde (3-hrs)
* Profesional SST de obra realiza charla de seguridad al inicio de la jornada.
* Personal en obra: 1-residente de obra, 1-profesional SST de obra, 1-maestro, 1-oficial, 1-ayudante, 3-operadores, 1-topografo, 1-cadenero, 1-auxiliar vial, 1-auxiliar de oficios varios, Cuadrilla para montaje del puente (6-pers), 1-residente de interventoria.
* Equipos y maquinaria: 1-retropajarita, 1-vibro-compactador, 1-volqueta, 1-planta electrica, 1-electrobomba 2" sumergible, 1-martillo electrico, 1-cortadora de concreto, Equipos para montaje y soldadura del puente, herramienta menor.
* Actividades:
- Soldadura para ensamble de riostras de las vigas metálicas.
- Cargue, transporte y colocacion de material de relleno para terraplen de aproches.
- Extension y compactacion mecánica de capas de relleno para terraplen de aproches.
- Adecuacion de terreno y armado de aceros para construccion de losas de aproximacion.
- Localizacion y replanteo topografico en todas las actividades de la obra.

NOTA-1: No se ha realizado la reposicion total de la maquinaria amarilla debido a la dificultad de contratacion a causa de los pasados hechos vandálicos. //

Residente de obra:
Ing. Alexander Herrera.

Profesional SST de obra:
Dra. Maria Fernanda Rodriguez.

Director de interventoria:
Ing. Jimmy Andres Torres

Residente de Interventoria:
Ing. Jorge Augusto Rodriguez

Director de obra:
Ing. Luis Eduardo Rodriguez

Profesional de apoyo de Interventoria:
Ing. Pedro Mujica.

Powered by CamScanner

JUEVES 30 DE JULIO DEL 2026.

* Inicio de actividades: 7:00 AM
* Clima del día: Tiempo seco en la mañana, lluvias moderadas en la tarde (4 hrs).
* Profesional SST de obra realiza charla de seguridad al inicio de la jornada.
* Personal en obra: 1 residente de obra, 1 profesional SST de obra, 1 maestro, 1 oficial, 1 ayudante, 3 operadores, 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 auxiliar vial, 1 auxiliar de oficios varios, Cuadrilla para montaje del puente (6 pers), 1 profesional SST de Interventoría, 1 residente de Interventoría.
* Equipos y maquinaria: 1 retro-pajarita, 1 vibro compactador, 1 volqueta, 1 planta eléctrica, 1 electrobomba 2" sumergible, 1 martillo eléctrico, 1 cortadora de concreto, Equipos para montaje y soldadura del puente, herramienta menor.
* Actividades:
- Soldadura para ensamble de riostras de las vigas metálicas
- Cargue, transporte y colocación de material de relleno para terraplen de los aproches.
- Extensión y compactación mecánica de capas de relleno para terraplen de aproches.
- Adecuación de formas y armado de aceros para construcción de losas de aproximación.
- Localización y replanteo topográfico en todas las actividades de la obra.

* NOTA-1 *: No se ha realizado la reposición total de la maquinaria amarilla debido a la dificultad de contratación a causa de los pasados hechos vandálicos. //

Residente de obra:
Ing. Alexander Herrera

Profesional SST de obra:
Mabin Fernanda Rodriguez

Director de Interventoría:
Ing. Jhony Andres Parra.

Residente de Interventoría:
Ing. Jorge Augusto Rodriguez.

Director de obra:
Ing. Jose Eduardo Rodriguez

Profesional SST de Interventoría:
Dra. Angela Mendez Castro.

Profesional de apoyo de Interventoría:
Ing. Pedro Alfaro.

Powered by CamScanner

VIERNES 31 DE JULIO DEL 2026.

* Inicio de actividades: 7:00 AM.
* Clima del día: Tiempo seco en la mañana, lluvias fuertes en la tarde.
* Profesional SST de obra realiza charla de seguridad al inicio de la jornada.
* Personal en obra: 1-residente de obra, 1-profesional SST de obra, 1-maestro, 1-oficial, 1-ayudante, 3-operadores, 1-topografo, 1-cadenero, 1-auxiliar vial, 1-auxiliar de oficios varios, Cuadrilla para montaje del puente (6-pers), 1-residente de Interventoría.
* Equipos y maquinaria: 1-retro-pajarita, 1-vibrocompactador, 1-volqueta, 1-planta eléctrica, 1-electrobomba 2" sumergible, 1-martillo eléctrico, 1-cortadora de concreto, Equipos para montaje y soldadura del puente, herramienta menor.
* Actividades:
  - Soldadura para ensamble de riostras de las vigas metálicas.
  - Cargue, transporte y colocación de material de relleno para terraplen de aproches.
  - Extension y compactacion mecánica de capas de relleno para terraplen de aproches.
  - Adecuación de terreno y armado de aceros para construcción de losas de aproximación.
  - Localizacion y replanteo topográfico en todas las actividades de la obra.
* "NOTA-1": No se ha realizado la reposicion total de la maquinaria amarilla debido a la dificultad de contratacion por causa de los pasados hechos vandalicos que generan temor en los propietarios.

Residente de obra:
Ing. Alexander Herrera

Profesional SST de obra:
Dra. Adina Fernanda Rodriguez.

Director de Interventoría:
Ing. Jhonny Andres Torres.

Residente de Interventoría:
Ing. Jorge Augusto Rodriguez

Director de obra:
Ing. Luis Eduardo Rodriguez

Profesional de apoyo de Interventoría:
Ing. Pedro Jaffiret

Powered by CamScanner

9.8 Certificaciones varias

CERTIFICADO

Por medio de la presente yo HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY en mi condición de contadora de JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA identificado con cedula de ciudadanía 9.658.796 de Yopal, en su condición de CONTRATISTA identificado con NIT numero 9.658.796-1, tiene vinculado en su planta de personal como trabajador en condición de discapacidad al señor CARLOS ALBERTO SANCHEZ RIOS identificado con cedula de ciudadania número 10.031.206 de Pereira en el periodo del 01 de julio del 2026 al 31 de julio de 2026.

En constancia, se firma en Villavicencio a los 31 dias del mes de julio del 2026.

HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
C.C 1.121.884.207 de Villavicencio
T.P 189521-T

CERTIFICADO

Por medio de la presente yo HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY en mi condición de contadora del JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA identificado con Nit número 9658796-1 certifico que en el periodo del 01 de julio del 2026 al 31 de julio de 2026:

- Se ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social y salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a los empleados que se han vinculado por contrato de trabajo, por lo que declaro que el contratista JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales ARP Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA.

En constancia, se firma en Villavicencio a los 31 días del mes de julio del 2026.

HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
C.C 1.121.884.207 de Villavicencio
T.P 189521-T

9.9 Informe de especialistas

9.9.1. Informe estructural N°.26

CONTRATO DE INTERVENTORIA 978 DE 2023

INFORME ESTRUCTURAL N° 26

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS"



PERIODO DEL INFORME

01 DE JULIO DEL 2026 AL 31 DE JULIO DEL 2026

REVISION Y APROBACION

Objeto de Interventoría:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	
Título de Documento:	Informe estructural No 26 (01 DE JULIO DEL 2026 AL 31 DE JULIO DEL 2026)	
Documento No:	INFESTRUC-026	
APROBACION		
	Nombre:	**JIMMY ANDRES TORRES CASTRO**
Responsable por la elaboración:	Firma:	
	Fecha:	01-08-2026
	Nombre:	**ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA**
Vo Bo representante legal:	Firma:	
		01-08-2026

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4

2. OBJETIVOS 5
2.1. Objetivo General 5
2.2. Objetivos específicos 5

3. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 6
3.1. Localización del proyecto y descripción 6
3.2. Alcance del proyecto estructural 7
3.3. Puente vehicular metálico 8
3.4. Vigas principales 9
3.1. Arriostramiento 10
3.2. Neopreno y topes sísmicos 12
3.3. Estribos 13
3.4. Pilotes 14
3.5. Relación de diseños y planos estructurales 15
3.6. Control técnico en obra de los diseños estructurales 16

4. VERIFICACIONES DE DISEÑO 17

5. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE ESTE PERIODOY/O OBSERVACIONES 18

6. CONTROL DE CALIDAD ESTRUCTURAL 20

7. ACTIVIDADES DURANTE EL PRESENTE PERIODO 26

8. CONCLUSIONES 27

9. REGISTRO FOTOGRAFICO 28

INFORME ESTRUCTURAL N° 26

1. INTRODUCCIÓN

En el Municipio de acacias mediante proceso contractual No CM-OCA-013-2023 y resolución de adjudicación No 203 del 22 de diciembre de 2023 suscribió el contrato de interventoría 978 de 2023 cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS" cuyo contratista obra como persona natural y es JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA identificado con cedula de ciudadanía No 9.658.796.

El presente informe corresponde a la revisión y control del componente estructural cuya información fue entregada por la entidad contratante resultado de los estudios y diseños realizados a través del contrato de consultoría 375 de 2022 con la empresa Consorcio Consultorías Puentes Acacias cuyo objeto contractual fue " ESTUDIO Y DISEÑO DE SEIS PUENTES VEHICULARES UBICADOS EN LOS BARRIOS PABLO VI, LAS VEGAS, CARRERA 14 Y 11° VEREDAS SAN CRISTÓBAL, EL DIAMANTE Y QUEBRADITAS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META" quien es el responsable de los estudios y diseños y que además fueron los encargados a través del Ingeniero Ricardo Andres González de la modelación y diseño del puente vehicular el cual se construirá a través del contrato de obra 929 de 2023 cuyo objeto contractual es "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE DEL MUNICIPIO DE ACACIAS-META".

El alcance de este informe es verificar las actividades y controles de calidad asociados a los componentes estructurales, particularmente los materiales empleados, los procesos constructivos y las condiciones de la obra, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones contractuales, la normativa vigente y los estándares de seguridad estructura.

Durante el presente período, el proyecto se ejecutó conforme al cronograma y a las condiciones establecidas en la Prórroga No. 4, mediante la cual se amplió el plazo contractual por tres (3) meses adicionales, fijándose como nueva fecha de terminación el 21 de septiembre de 2026. En este marco, las actividades se desarrollaron bajo el seguimiento y control de la Interventoría, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la programación vigente y demás obligaciones contractuales. Durante el período continuaron presentándose restricciones asociadas a las condiciones climáticas, el comportamiento hidráulico del río y a los ajustes técnicos y de cantidades relacionados con la Modificatoria No. 5, circunstancias que incidieron en el desarrollo de algunos frentes de obra.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Realizar la supervisión, seguimiento y control del cumplimiento a lo establecido estructuralmente en cada uno de los documentos que fueron entregados por la entidad y que forman parte de la consultoria, así mismo atender todas las consultas estructurales que se puedan presentar como resultado de la construcción o implantación real del proyecto.


2.2. Objetivos específicos

- Verificar que la ejecución de las actividades constructivas se realice conforme a los diseños estructurales, especificaciones técnicas y planos aprobados para el proyecto.
- Realizar seguimiento y control a los procedimientos constructivos implementados por el contratista, garantizando la estabilidad, seguridad y funcionalidad de las estructuras proyectadas.
- Supervisar la calidad de los materiales empleados en obra mediante la revisión de ensayos, certificados y controles establecidos en el plan de calidad del proyecto.
- Evaluar el cumplimiento de la normatividad técnica vigente aplicable al diseño y construcción de estructuras, garantizando que las obras ejecutadas satisfagan los requisitos de seguridad estructural.
- Verificar la correcta ejecución de los elementos estructurales y obras complementarias asociadas al proyecto, tales como pilotes, estribos, vigas metálicas, accesos, andenes, sistemas de drenaje y elementos de accesibilidad.
- Emitir conceptos técnicos y recomendaciones estructurales que contribuyan a la adecuada toma de decisiones durante el desarrollo de la obra.
- Verificar que las obras ejecutadas garanticen condiciones adecuadas de accesibilidad y seguridad para los usuarios, conforme a los diseños aprobados y la normativa aplicable.
- Mantener un registro técnico de las actividades desarrolladas, observaciones efectuadas y conceptos emitidos durante la ejecución del proyecto, como soporte para el seguimiento y control estructural de la obra.

3. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

3.1. Localización del proyecto y descripción


La zona para intervenir se encuentra ubicada en el Municipio de Acacias, especificamente está ubicada en la via Terciaria que conduce a la vereda quebraditas a 34.4 Km del casco urbano del Municipio de Acacias Meta, de cuales 13.56 se encuentran en afirmado, las coordenadas de ubicación son las 03°57´39,99" N y 73°30´17,67" O

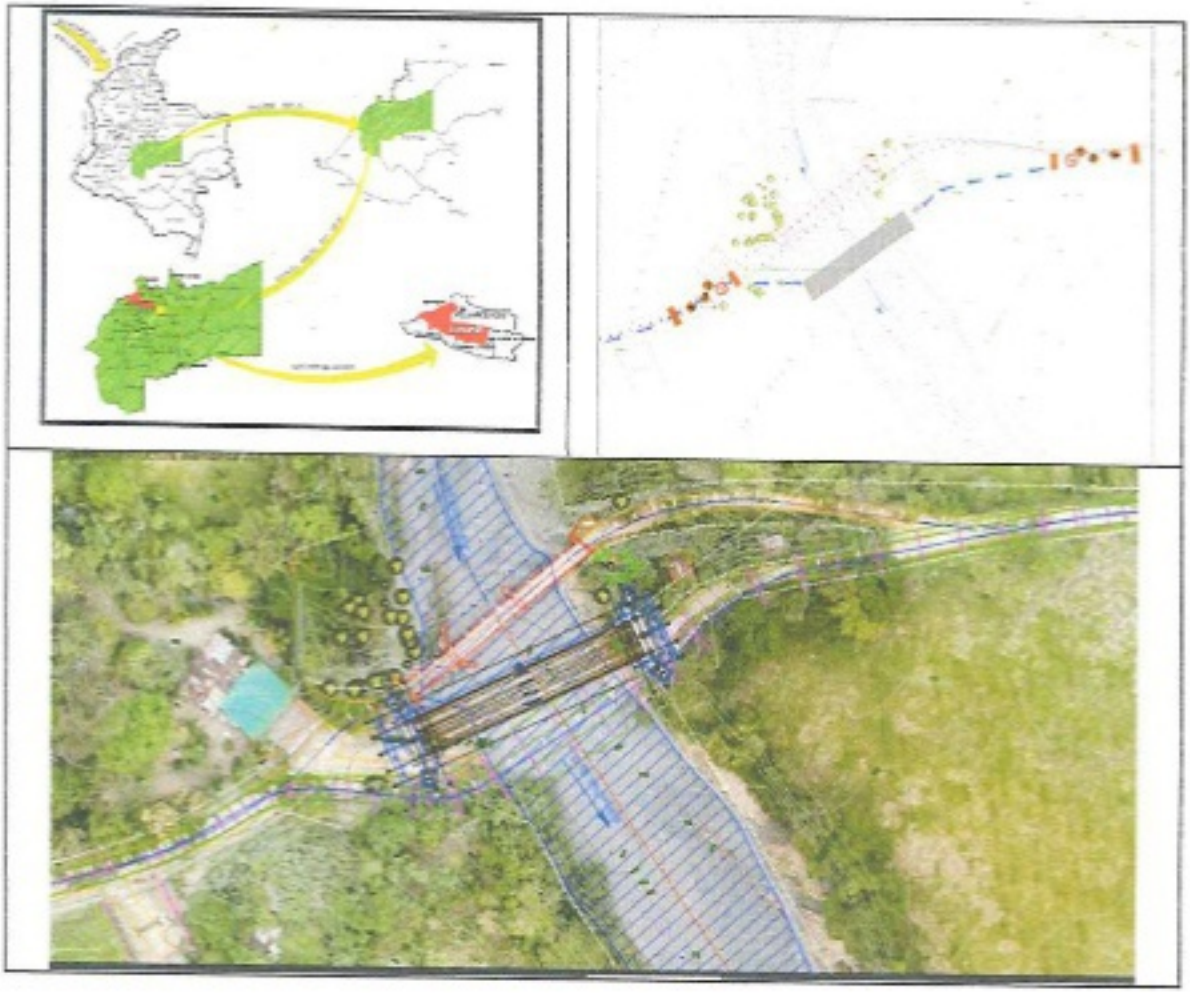

3.2. Alcance del proyecto estructural

El presente alcance corresponde a la revisión y control del componente estructural de la información entregada por la entidad contratante de los estudios y diseños realizados a través del contrato de consultoría 375 de 2022 con la empresa Consultorias Puentes Acacias cuyo objeto contractual fue " ESTUDIO Y DISEÑO DE SEIS PUENTES VEHICULARES UBICADOS EN LOS BARRIOS PABLO VI, LAS VEGAS, CARRERA 14 Y 11° VEREDAS SAN CRISTÓBAL, EL DIAMANTE Y QUEBRADITAS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META" quien es el responsable de los estudios y diseños y que además fueron los encargados de realizar la modelación estructural del proyecto de construcción en las cuales se construirá el alcance del contrato.

El componente estructural plantea la construcción de un puente vehicular de 58.0 metros de luz entre ejes de apoyo y un tablero con un ancho de 10.7 metros a bordes externos, ancho efectivo de calzada de 7.30 metros, andenes a ambos costados de 1.20 metros; la infraestructura es una cimentación tipo pilote construyendo 8 pilotes por estribo para un total de 16 pilotes con un diámetro Φ1.50 metros y una profundidad de 12 metros cada uno;, las aletas y estribos serán en concreto reforzado y el tablero así como las placas de aproximación serán concreto reforzado, el puente contara con señalización horizontal y vertical respectivamente.

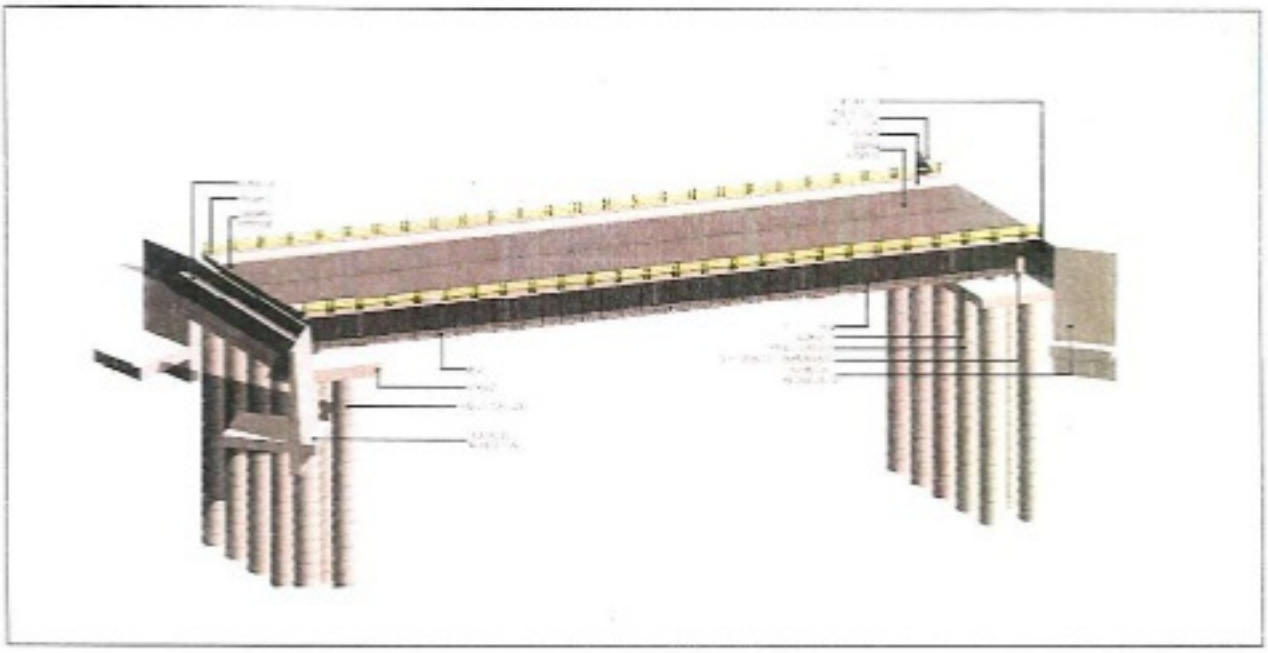


3.3. Puente vehicular metálico

Se plantea la construcción de un puente vehicular metálico, cuya luz es de 58.0 metros entre ejes de apoyos y un tablero con un ancho de 10.7 metros a bordes externos, construido en concreto reforzado con un resistencia a la compresión f'c de 28 MPa y para el acero corrugado con esfuerzo a la fluencia f'y de 420 MPa, la superestructura del puente también cuenta con un sistema de arriostramiento horizontal superior e inferior y verticalmente localizados por debajo del tablero los cuales están constituidos por ángulos en acero ASTM A-709 Grado 50W. Para los miembros principales que sirven de apoyo al tablero se utilizaron cuatro vigas en I metálicas de acero ASTM A-709 Grado S0W con una separación interna de 2.5 metros y una altura de: 2465. Para las vigas principales se plantea una contra flecha de 20 cm en el centro de la luz.


Para el apoyo de superestructura en los estribos se plantean cuatro (4) apoyos en neopreno dureza 60 reforzado, los cuales se fijan al estribo cada uno con 4 pernos de diámetro 1 ¾" grado S.

En la subestructura del puente se utilizaron dos estribos en concreto reforzado con las mismas especificaciones del tablero, los cuales sirven de apoyo a la superestructura, estos estribos están cimentados sobre dos líneas de tres pilotes con diámetros de 1.50 metros y longitudes de 12 metros. Y los cuales tendrán camisas metálicas no recuperables, la cota de cimentación en ambos costados es de 314.0 msnm.

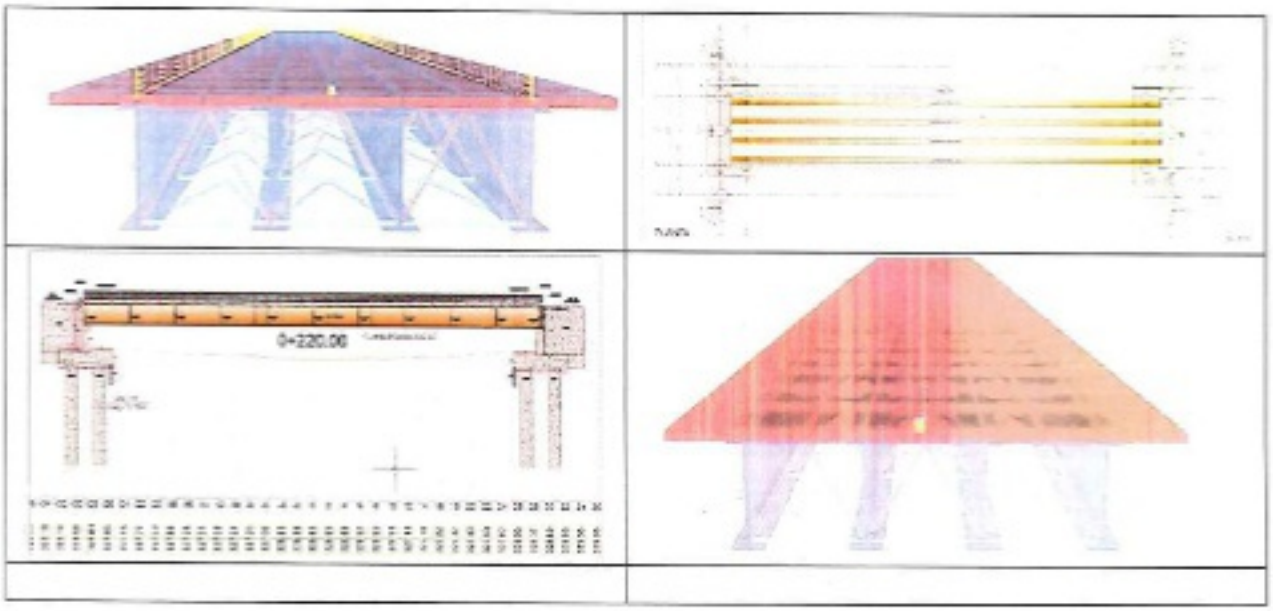

3.4. Vigas principales


Las vigas IPE son conocidas por su gran capacidad para soportar cargas pesadas, su perfil en forma de I proporciona una alta resistencia y rigidez, permitiendo que se utilicen en estructuras que requieren una gran capacidad de carga, una viga en I -o ibeam- es una forma estándar de acero estructural que sirve como marco critico para la industria de la construcción metálica, para el caso particular los miembros principales que sirven de apoyo al tablero se utilizaran cuatro vigas en I metálicas de acero ASTM A-709 Grado S0W con una separación interna de 2.5 metros y una altura de: 2465. Para las vigas principales se plantea una contra flecha de 20 cm en el centro de la luz.

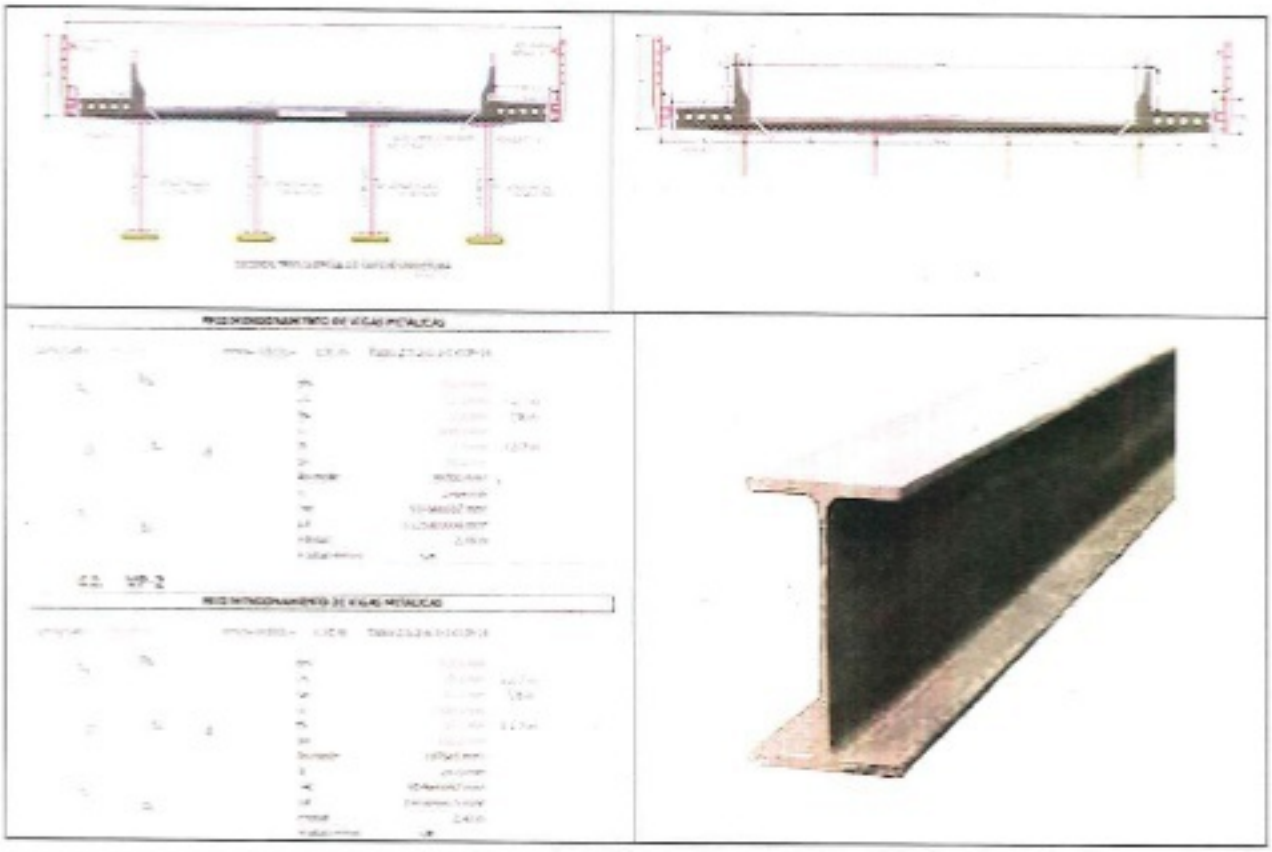


3.1. Arriostramiento

El arriostramiento es una técnica utilizada en la construcción para reforzar y estabilizar la estructura, consiste en la adición de elementos estructurales como vigas que conectan diferentes partes de la estructura y ayudan a distribuir la carga de forma más equilibrada, su funcionamiento es respuesta ante cambios de la configuración teórica de la estructura estas permiten generar fuerzas que tienden a restituirla, su ubicación es cerca de las extremidades de la estructura, para resistir cualquier efecto de torsión


Arriostramiento inferior y superior horizontal

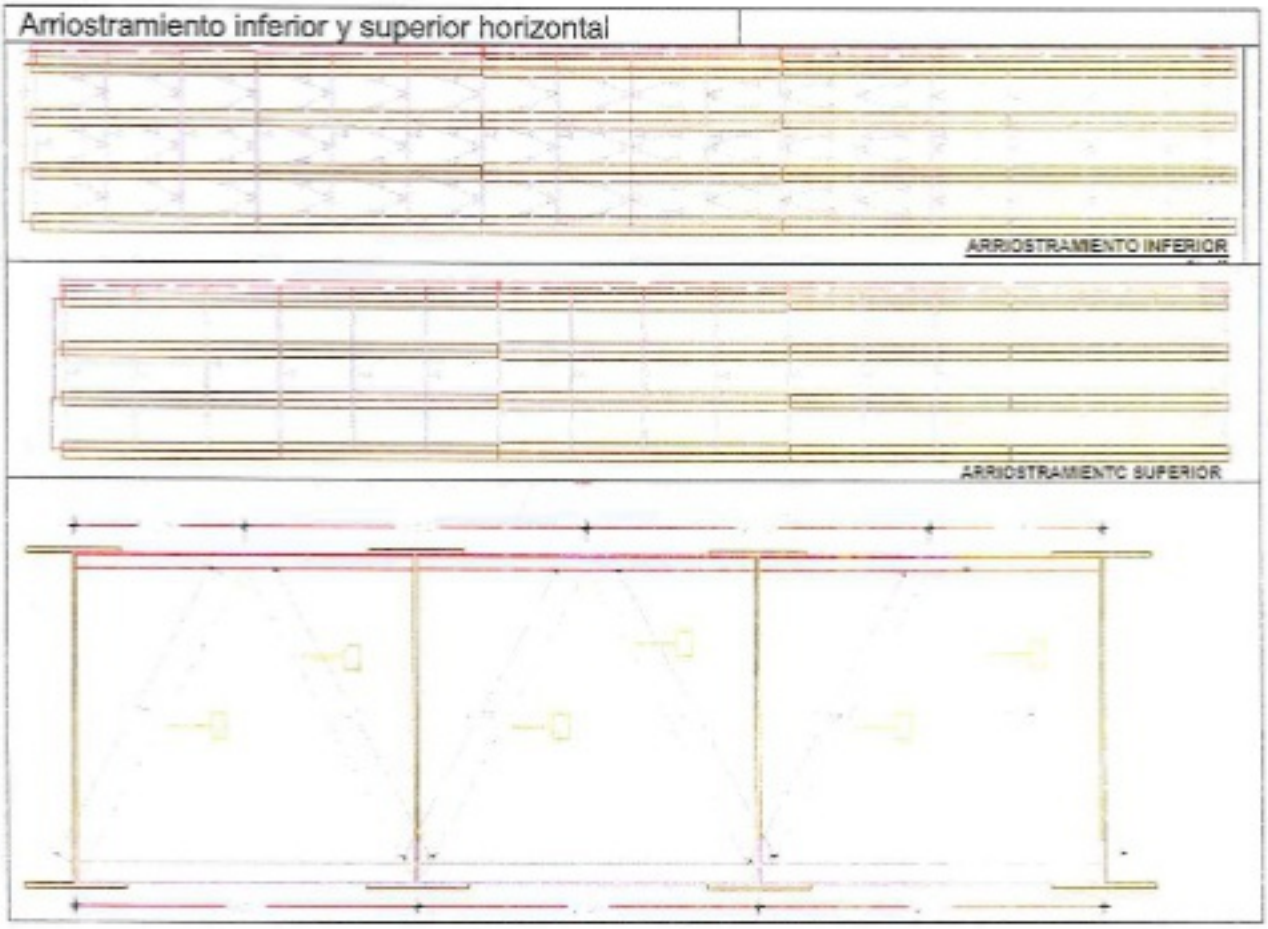

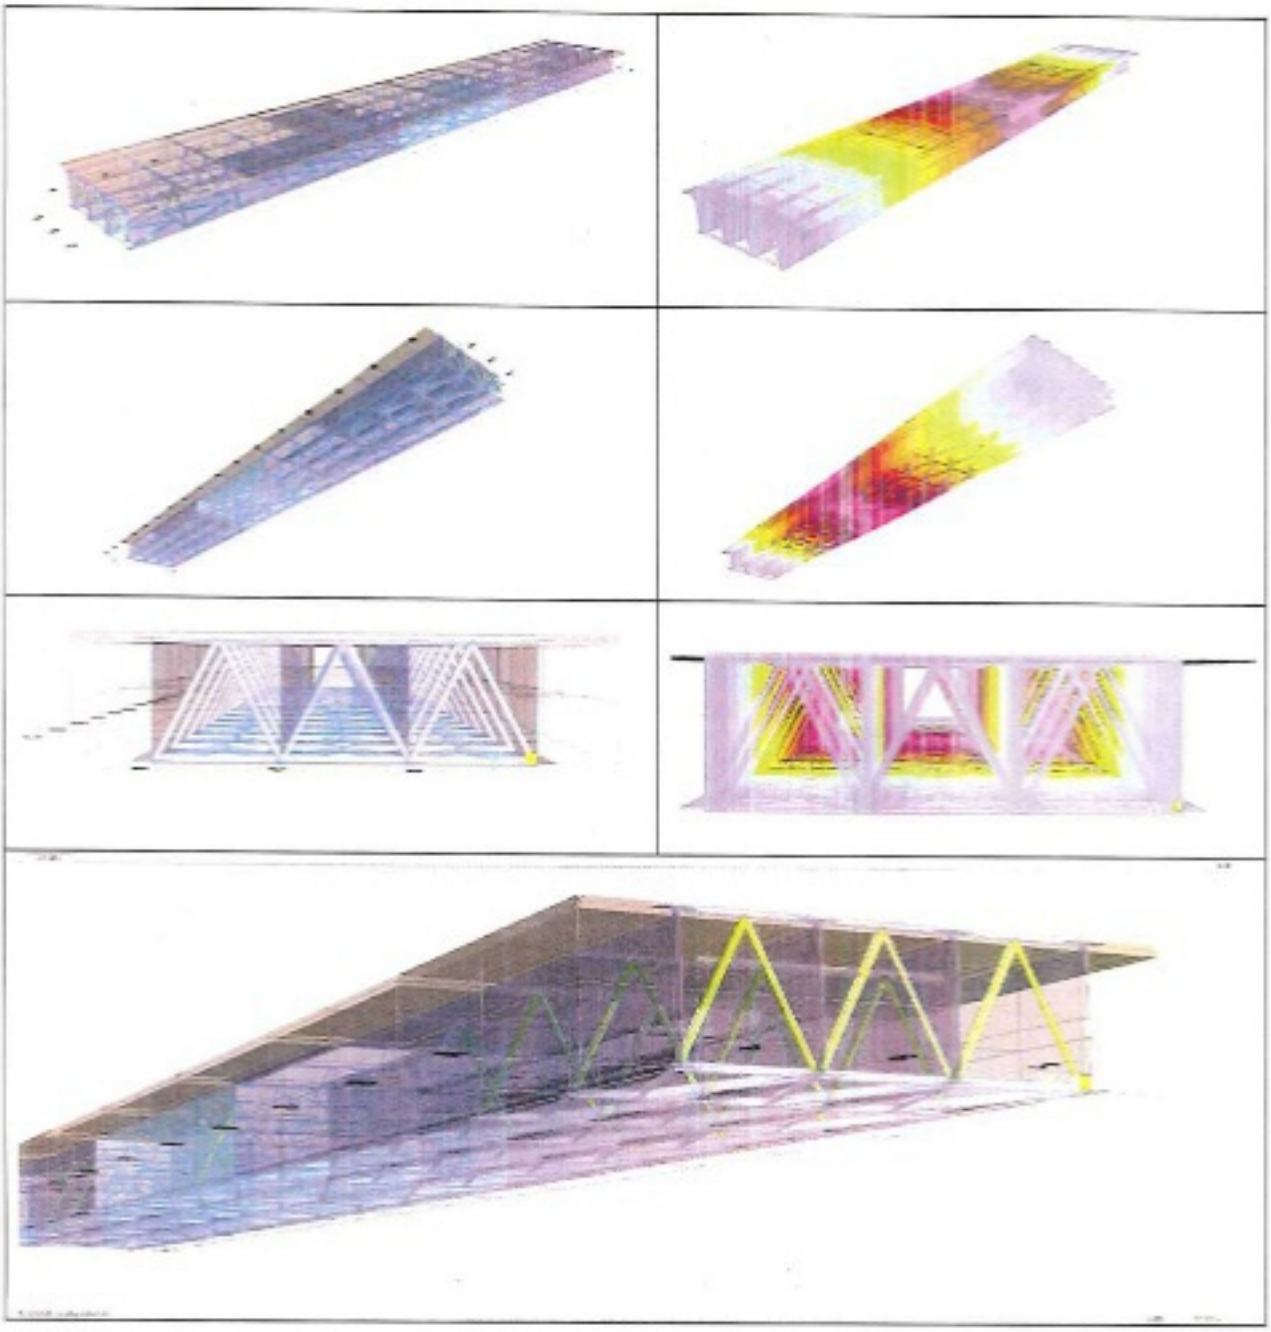


3.2. Neopreno y topes sísmicos

Los apoyos de neopreno, o también llamados "apoyos elastoméricos" son dispositivos colocados entre dos elementos de una estructura (cubierta, y vigas o pilares en el caso de los puentes) que garantizan la transmisión de cargas de un elemento a otro al soportar el paso de vehículos de diferentes cargas, de igual forma los topes sísmicos tienen como propósito evitar los desplazamientos excesivos en dirección transversal y/o longitudinal del tablero , estos se colocan sobre los cabezales de las pilas con una separación que generalmente está comprendida entre 0 y 5 cm con respecto a la pared de la viga transversal, para el caso los topes tendrán una armadura vertical en cada cara de 1No 6 cada 0,20m y horizontal 1 No 4 cada 0,10m.

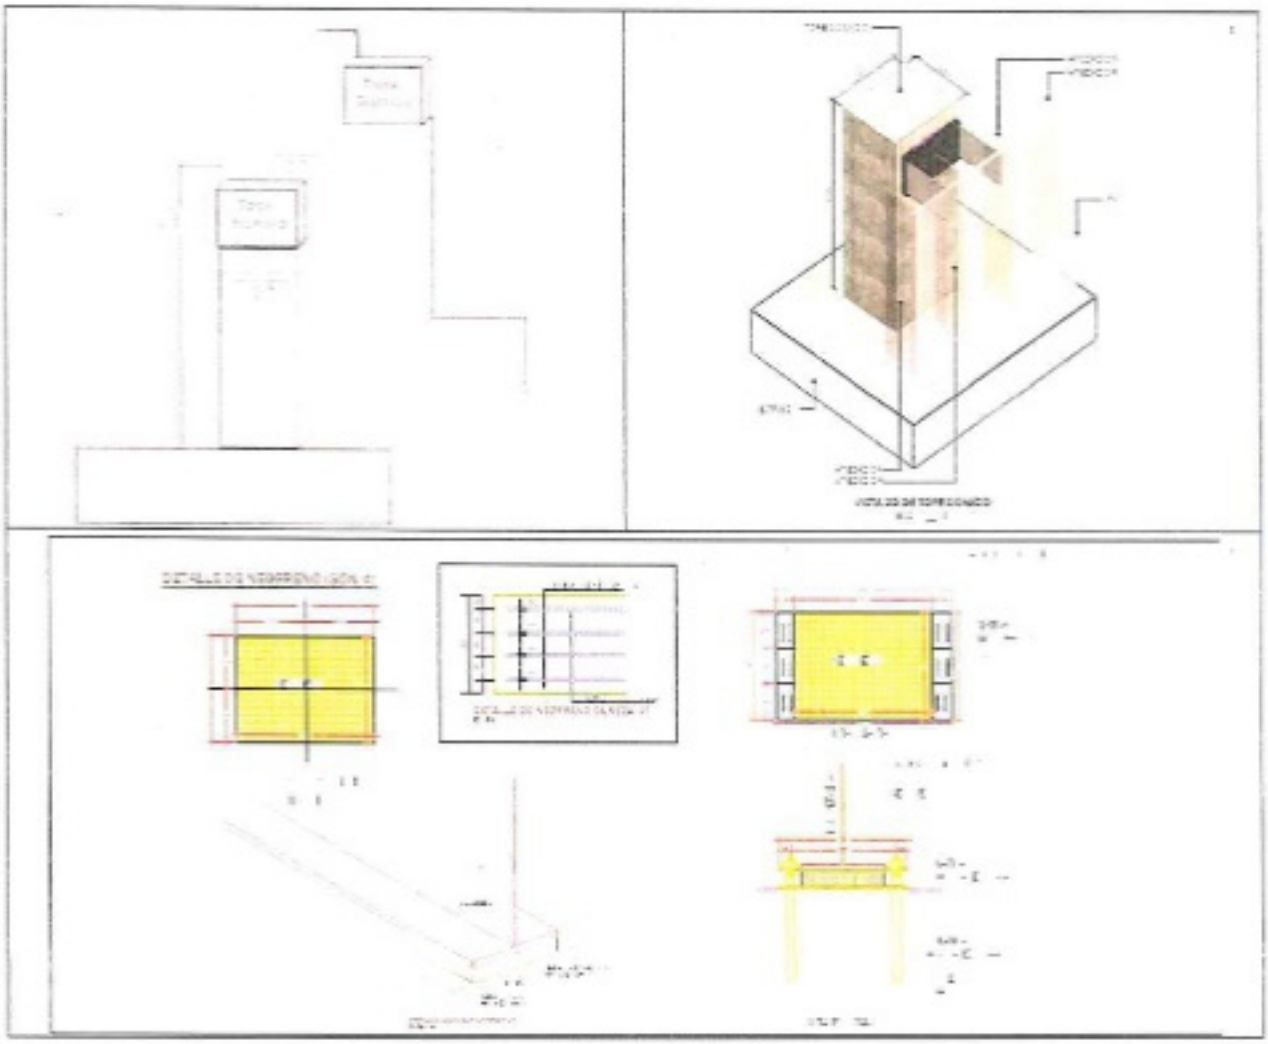


3.3. Estribos

El estribo constituye una de las partes de un puente, que, junto con las pilas, está destinada a soportar las cargas del tablero, sus objetivos son los transmitir el peso a los cimientos, mantener la disposición de la tierra, unir la estructura a las vías de acceso, servir de apoyo a un arco dentro de una estructura, su configuración es zarpa trasera o talón, vástago o pantalla y zarpa delantero o dedo, las dimensiones son de 7 mts por una altura de 1,50 mts y una longitud de 11,70 mts

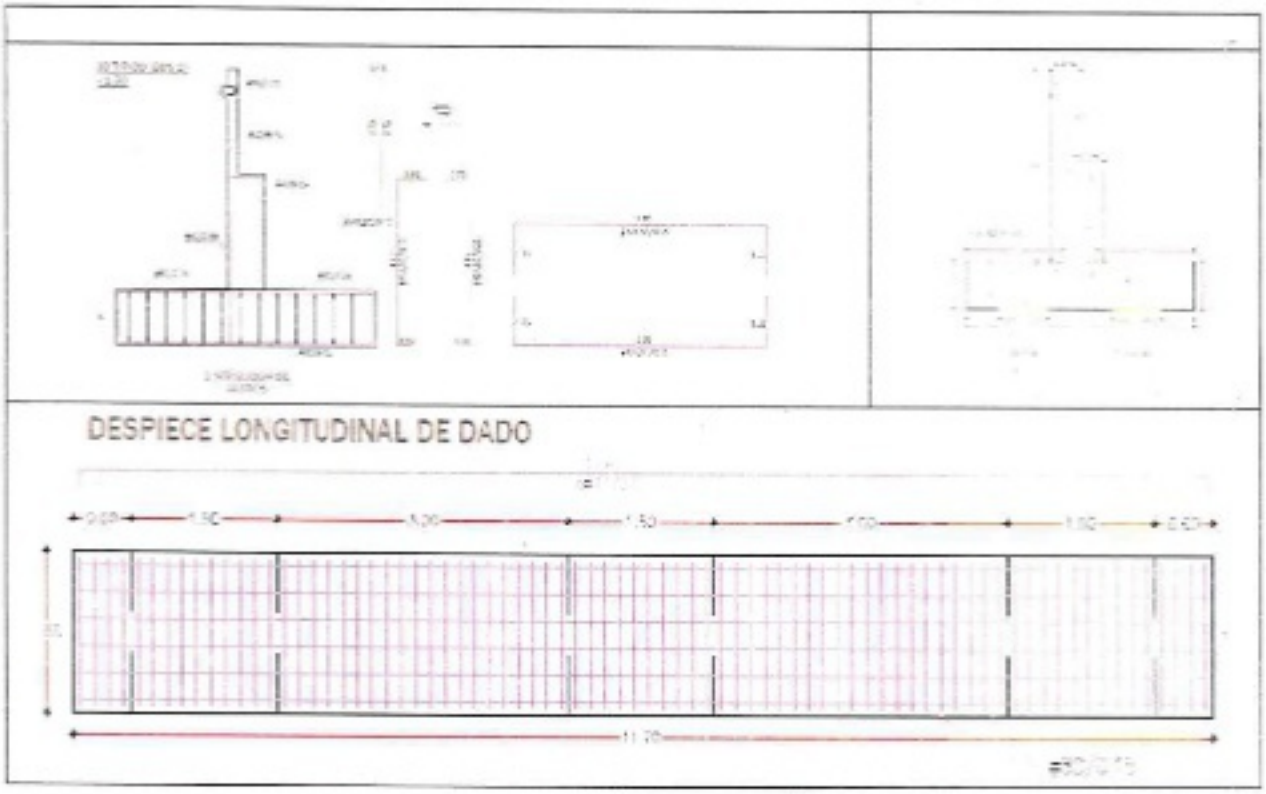

3.4. Pilotes

Estos son elementos estructurales formados por hormigón armado de gran longitud comparada con su sección transversal y que transmiten las cargas a niveles profundos del terreno, para el caso particular estarán cimentados sobre dos líneas de tres pilotes con diámetros de 1.50 metros y longitudes de 12 metros, los cuales tendrán camisas metálicas no recuperables, la cota de cimentación en ambos costados es de 314.0 msnm.

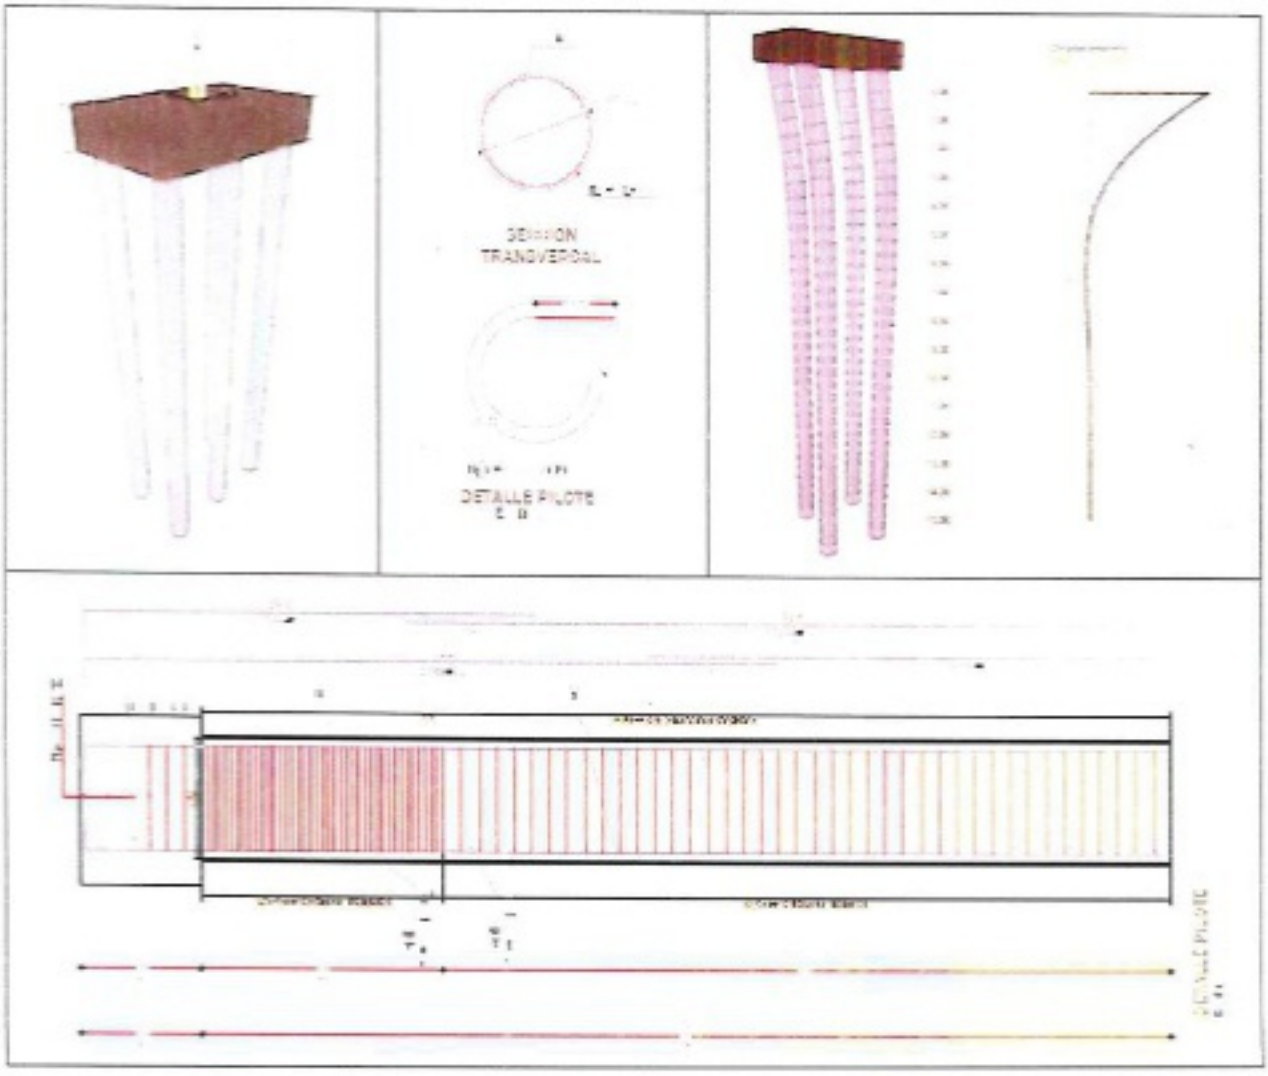

3.5. Relación de diseños y planos estructurales

El municipio de Acacias a través de la secretaria de Infraestructura realizó la entrega real y material de toda la etapa de diseños, en el cual se realizó un análisis detallado de las condiciones actuales que se encuentran en el proyecto, la relación de documentos estructurales es la siguiente:

DOCUMENTO		CASILLA DE VERIFICACION	OBSERVACIONES
Estudios y Diseños	Levantamiento topográfico y batimetría	OK	Se recibe en medio magnético
	Estudio de geología y geotecnia	OK	Se recibe en medio magnético
	Estudio de suelos	OK	Se recibe en medio magnético
	Estudio de transito	OK	Se recibe en medio magnético
	Estudio hidrológico, hidráulico y de socavación	OK	Se recibe en medio magnético
	Diseños estructurales del puente	OK	Se recibe en medio magnético
	Memorias de cálculo	OK	Se recibe en medio magnético

Así mismo frente a la documentación los archivos entregados fueron los siguientes:

DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACION	OBSERVACIONES
Informe de diagnostico	OK	Se recibe en medio magnético
Estudio y diseño de estructuras	OK	Se debe modificar acero especificación acero estructural

Igualmente, los planos entregados fueron los siguientes:

PLANO	CASILLA DE VERIFICACION	OBSERVACIONES
RAGP-PUENTE QUEBRADITAS-V12-E-1-E-2,E-3, E-4, E-5, E-6, E-7, E-8	OK	Hacen falta planos estructurales

3.6. Control técnico en obra de los diseños estructurales

La Interventoria ha realizado la revisión de los documentos técnicos entregados los cuales se ajustan a las condiciones establecidas así:

REQUISITOS MINIMOS SEGÚN LA CAPCIDAD DE DISIPACIÓN DE ENÉRGIA DE LA ESTRUCTURA		
VIGAS PRINCIPALES I	**CRITERIO DE CALCULO**	**CRITERIO DE ACEPTACION**
Dimensiones	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 6	Planos estructurales
Localización	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 6	Planos estructurales
Geometria	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 6	Planos estructurales
Material	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 6	Modelación estructural
Soldaduras	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 6	Planos estructurales
Deflexiones	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 6	Modelación estructural
ARRIOSTRAMIENTO	**CRITERIO DE CALCULO**	**CRITERIO DE ACEPTACION**
Dimensiones	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 6	Planos estructurales
Localización	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 6	Planos estructurales
Geometria	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 6	Planos estructurales
Material	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 6	Modelación estructural
Soldaduras	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 6	Planos estructurales
Deflexiones	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 6	Modelación estructural
ESTRIBOS	**CRITERIO DE CALCULO**	**CRITERIO DE ACEPTACION**
Dimensiones	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 11	Planos estructurales
Localización	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 11	Planos estructurales
Geometria	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 11	Planos estructurales
Material	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 11	Modelación estructural
Aceros	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 11	Modelación estructural
VIGA CABEZAL	**CRITERIO DE CALCULO**	**CRITERIO DE ACEPTACION**
Dimensiones	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 11	Planos estructurales
Localización	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 11	Planos estructurales
Geometria	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 11	Planos estructurales
Material	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 11	Modelación estructural
Aceros	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 11	Modelación estructural
PILOTES	**CRITERIO DE CALCULO**	**CRITERIO DE ACEPTACION**
Dimensiones	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 10	Planos estructurales
Localización	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 10	Planos estructurales
Geometria	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 10	Planos estructurales
Material	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 10	Modelación estructural
Aceros	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 11	Modelación estructural

4. VERIFICACIONES DE DISEÑO

GALIBOS:
El gálibo sobre las vias principales en áreas rurales debe ser por lo menos 4.90 m. en todo el ancho de la vía y debe preverse la posibilidad de repavimentación. En vías principales de áreas urbanas, debe preverse un gálibo mínimo de 4.90 m. excepto en áreas altamente desarrolladas, Debe preverse un gálibo mínimo de 4.90 en áreas rurales y urbanas cuando tal gálibo se requiera por seguridad. En todas las otras vías el gálibo debe ser de 4.50m mínimo sobre el ancho de la vía de debe preverse la posibilidad de repavimentación.

CARGA VIVA:
Los puentes ubicados en las vías que forman parte de la Red Nacional de Carreteras deben diseñarse para carga C40-95. Los puentes ubica-dos en las nuevas carreteras que se construyan con recursos del Instituto Nacional de Vías deben diseñarse para la carga C40 -95, los puentes ubicados en las carreteras que no forma parte de la Red Nacional pueden diseñarse para la carga C32-95, los puentes urbanos ubicados en las vías no contempladas en las carreteras nacionales pueden diseñarse para la carga C32-95.

CARGA POR SISMO:
Los movi-mientos sísmicos de diseño están basados en una probabilidad de 10%de que sean excedidos en un lapso de 50 años, correspondiente a la vida útil promedio de un puente. Los puentes y sus componentes que se diseñen y construyan de acuerdo con los requisitos del código pueden sufrir daño durante un sismo, pero tendrán una baja probabilidad de sufrir colapso debido a los movi-mientos sísmicos del terreno.

CARGAS:
El diseño debe incluir avalúo de cargas muertas, vivas (camión de diseño o linea de carga equivalente), impacto, cargas de peatones, empujes sobre barandas y sardineles, cargas sísmicas según las diferentes categorías de comportamiento, carga de viento, y otras cargas aplicables según el caso, como empujes de tierra e hidráulico, fuerzas térmicas, flotación, fuerza de corrientes de agua. Dichas cargas deben combinarse para producir los máximos efectos, según los diferentes grupos de carga y según el método de diseño escogido.

SUPERESTRUCTURA:
El Supervisor Técnico de Diseño debe verificar las consideraciones de distribución de cargas de rueda sobre el tablero, transversal y/o longitudinalmente, para los diferentes elementos estructurales que lo compongan (concretos reforzado y preesforzado, acero estructural; apoyos, barandas) y señalización.

SUBESTRUCTURA:
El Supervisor Técnico de Diseño debe verificar las consideraciones de diseño de la subestructura (estribos, muros de contención, pilas, fundaciones superficiales y profundas, elementos de concreto (reforzado y preesforzado) conductos enterrados y tierra armada).

El control de planos incluye la verificación de los siguientes aspectos:

- Definición y localización de la estructura
- Grado de detalle (completo)
- Consistencia y uniformidad entre los diferentes dibujos y planos.
- Detalles de los elementos estructu-rales
- Detalles constructivos especiales Dimensionamiento completo
- Especificaciones de materiales
- Especificaciones de la carga de diseño
- Especificaciones especiales sobre la fundación de estructuras

El control de los cálculos incluye la verificación de los siguientes aspectos:

- Contenido general
- Cargas de diseño, sus combinaciones y método empleado.
- Especificaciones de los materiales de la estructura y de la Fundación Modelos de análisis
- Programas de computador utilizados y su descripción
- Categorías de comportamiento sísmico
- Resultados de análisis
- Diseño de elementos
- Cálculo de cantidades de obra

5. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE ESTE PERIODOY/O OBSERVACIONES

- Durante el presente período se evidenció que el nivel freático en la zona de intervención continúa manteniéndose elevado, principalmente como consecuencia de la temporada invernal y del incremento de los caudales asociados al régimen hidrológico del río Chichimene. Esta condición persiste aun cuando ya no se encuentra el terraplén que anteriormente generaba represamiento e interfería parcialmente con el flujo natural del cauce, y pese a que las empresas palmeras suspendieron los vertimientos de agua provenientes del río Guayuriba. En consecuencia, continúan presentándose dificultades para la ejecución de actividades asociadas a cimentaciones, obras de protección y trabajos desarrollados por debajo del nivel

freático, requiriéndose la implementación permanente de medidas de manejo y control de aguas para garantizar la continuidad de las actividades constructivas.

- Por otra parte, se mantiene el inconveniente con la comunidad del sector, quienes insisten en no permitir el cierre total de la vía necesario para la ejecución de determinadas actividades. En consecuencia, ha sido necesario interrumpir periódicamente los trabajos para habilitar paso vehicular de manera alterna, lo cual afecta directamente el rendimiento operativo y genera impactos negativos sobre la programación y los tiempos de ejecución del proyecto.

- Durante el presente período, las lluvias registradas de manera continua en la zona de intervención afectaron el normal desarrollo de las actividades en obra, generando limitaciones en la ejecución de los trabajos. En particular, se vieron impactadas las labores de soldadura para la estructura metálica del puente, las cuales no pueden ejecutarse bajo condiciones de humedad o precipitación, en atención a los requisitos técnicos y de calidad del proceso, lo que incidió directamente en el avance de las actividades programadas.

- Durante el presente periodo persistieron las dificultades para la reposición de la maquinaria afectada por los hechos de vandalismo ocurridos el 28 de abril de 2026. Esta situación obedece a la limitada disponibilidad de equipos y a la reticencia de propietarios y empresas proveedoras para vincular maquinaria al proyecto, debido al riesgo percibido de que se presenten nuevos hechos similares en la zona de intervención. Lo anterior ha generado restricciones en la disponibilidad de equipos para la ejecución de algunas actividades programadas, afectando el rendimiento y la programación de la obra.

Registro de la dificultad para ejecutar actividades debido al gran volumen y alto nivel freático de la zona de trabajo



Control de paso alterno de tránsito durante las actividades de la obra.



Las condiciones climáticas impactan las labores de soldadura para la estructura metálica del puente, las cuales no pueden ejecutarse bajo condiciones de humedad




6. CONTROL DE CALIDAD ESTRUCTURAL

6.1. Seguimiento y control en la construcción de pilotes

Durante la ejecución de los pilotes, construidos en periodos anteriores, se efectuó el control de calidad del concreto mediante la toma y ensayo de especímenes durante su colocación, verificando la resistencia a la compresión exigida en el diseño estructural, conforme a la norma INVI-E-410. Los resultados obtenidos evidenciaron cumplimiento de la resistencia requerida en todos los elementos evaluados, sin registrarse novedades.



Falla a la compresión de especímenes

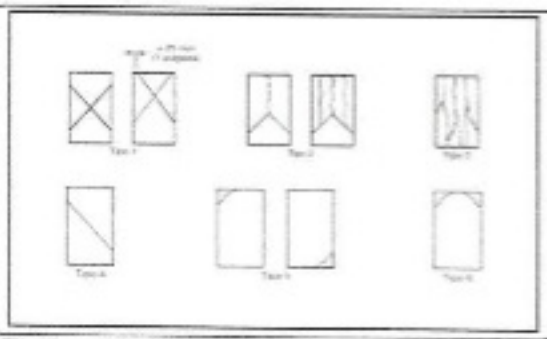

Tipificación del resultado de la falla

6.2. Control de integridad de los pilotes

Durante la construcción de los pilotes en periodos anteriores, las verificaciones de calidad se enfocaron en ensayos y diagnósticos del estado final de estos elementos, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los diseños definidos para la subestructura del proyecto. En ese contexto, se solicitó al contratista la ejecución de pruebas de integridad en cada pilote, consistentes en el análisis de la propagación y recepción de impulsos de vibración mecánica generados mediante un martillo especial, a través de un sensor ubicado en la cabeza del pilote, procedimiento que permite identificar su longitud y comportamiento, conforme a la norma ASTM D5882-07. La interventoría realizó el respectivo seguimiento y verificación de dichos ensayos, obteniéndose como resultado que los pilotes no presentan anomalías, razón por la cual se otorgó aval para continuar con las actividades correspondientes a la etapa de viga cabezal.




Toma de prueba de Integridad al pilote




Toma de prueba de Integridad al pilote

6.3. Seguimiento y control en la construcción de la viga cabezal estribos y aletas.

Una vez finalizada la construcción de los pilotes, se ejecutaron las vigas cabezal, los dados zapata de las aletas y los muros pantalla de los estribos, iniciando en cada caso con el armado del acero de refuerzo conforme a los planos estructurales y verificando su limpieza, correcta ubicación, amarre, recubrimientos, traslapos y uniones. Posteriormente, se instalaron las formaletas y encofrados, garantizando su estabilidad, alineación, nivelación y estanqueidad, y se realizaron los vaciados de concreto de manera continua y controlada, evitando desplazamientos del refuerzo y asegurando la adecuada consolidación del material. Como parte del control de calidad, se efectuaron ensayos de asentamiento y se tomaron muestras de concreto fresco para la elaboración de cilindros, posteriormente ensayados a compresión conforme a la normatividad vigente

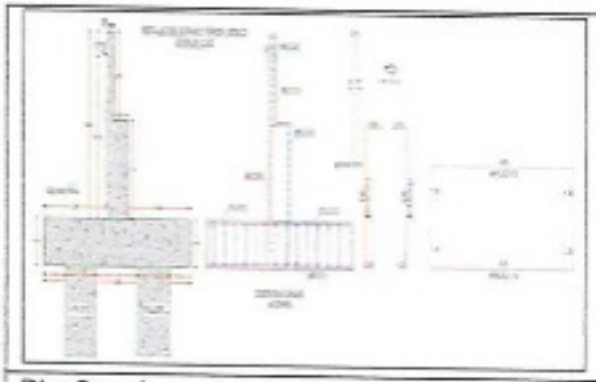

Diseños viga cabezal y estribos

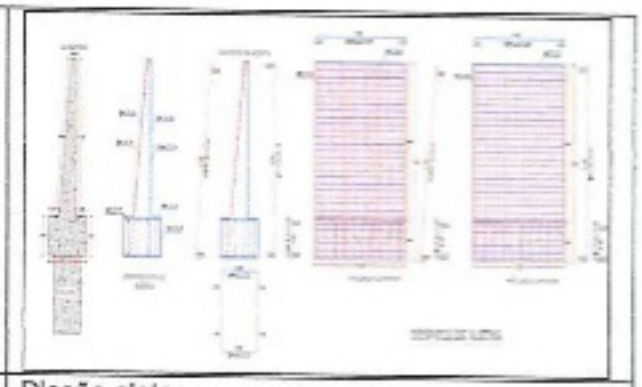

Diseño aletas



Construcción de viga cabezal



Construcción de dados de los muros de aletas




Construcción de estribos.




Construcción de muros de aletas.

6.4. Seguimiento y control en la construcción obras de protección.

Para este periodo de continua con la construcción de las obras de protección mediante la instalación de bolsacretos, ejecutando las actividades de conformidad con los diseños y especificaciones técnicas establecidas.

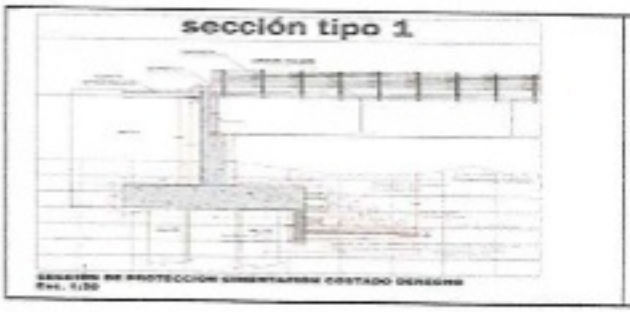

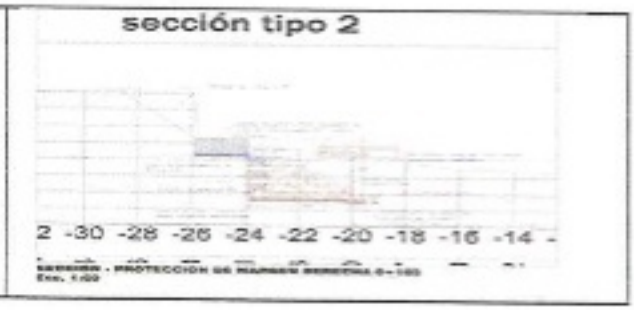

Para el diseño de las obras de protección se evaluaron alternativas considerando la disponibilidad de materiales, las condiciones hidráulicas y la pendiente del talud. En el caño Chichimene, a la altura del puente, se definió la implementación de bolsacreto para protección contra socavación de la cimentación y gaviones recubiertos en concreto impermeabilizado para la estabilización de las márgenes aguas arriba y aguas abajo.

- Bolsacreto, sección de (1,1 × 2,4 × 0,4) m, para profundidad de protección por socavación de la cimentación del puente.
- Gavión recubierto en concreto impermeabilizado, sección de (1,0 × 2,0 × 1,0) m, para estabilizar la altura de la franja adyacente del caño, aguas arriba y aguas abajo del puente.



Construcción de obras de protección.



Construcción de obras de protección.

6.5. Seguimiento y control en la construcción de estructura vial.

En el componente vial se contempla la construcción de 720 ml de vía en concreto hidráulico, con espesor de 0,23 m y ancho de 6,00 m, incluyendo bocacalles, distribuidos en 476 ml en el sector Quebraditas y 159 ml en el sector Palomas, sobre una subbase granular de 0,25 m de espesor, confinada con sardineles, bordillos y 962 m² de espacio público. A la fecha, se tiene ejecutado aproximadamente el 70% de esta estructura; no obstante, durante el presente período no se adelantaron actividades de pavimento en concreto MR, debido a que no se cuenta con pista habilitada para su construcción

.



Diseño estructura vial con losas MR-40.



Vaciado de concreto MR-40 para pavimento.

6.6. Seguimiento y control en el montaje y ensamble de vigas metálicas.

En la fase de superestructura se realizó la fabricación de las vigas metálicas en un taller especializado de Bogotá. Durante la visita técnica efectuada el 12 de agosto de 2025, se verificó el avance del proceso constructivo, evidenciando cumplimiento de las especificaciones técnicas y de diseño. Asimismo, se constató la delimitación del área de trabajo, el uso adecuado de equipos para izaje, corte y soldadura, y el aseguramiento provisional de las piezas durante el armado. Dentro de las actividades inspeccionadas se verificó el corte de planchas de acero estructural mediante oxicorte mecanizado, la medición de espesores con calibrador conforme a los planos, y el ensamblaje de las vigas con rigidizadores transversales, apoyos y elementos de refuerzo temporal, garantizando su correcta alineación para el proceso de punteo y soldadura.



Proceso de oxicorte de precisión de las láminas de acero estructural.



Calibración de los espesores de las láminas de acero.

En periodos anteriores, se inició el montaje de las vigas metálicas realizado mediante grúa hidráulica para su izaje, traslado y posicionamiento sobre los estribos, controlando en todo momento su estabilidad, alineación y correcta ubicación. Para el desarrollo de este procedimiento, se dispuso una estructura de apoyo temporal que ha permitido ejecutar las labores de ensamble y ajuste en campo, incluyendo la instalación de rigidizadores, placas y elementos de conexión mediante soldadura, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

Luego del izaje de las vigas metálicas y su disposición en sitio, se dio continuidad a las actividades de ensamble estructural mediante la ejecución de uniones con soldadura de punteo en los elementos correspondientes a módulos y riostras, conforme a la secuencia constructiva establecida, registrándose un avance aproximado del 90% en este componente.



Izaje de módulos de las vigas metálicas.



Soldadura de puntero para fijación de estructura

7. ACTIVIDADES DURANTE EL PRESENTE PERIODO.

Durante el presente periodo se dio continuidad a las actividades de soldadura estructural definitiva de la superestructura metálica del puente, ejecutando cordones de soldadura en las uniones de empalme de las vigas principales, diafragmas y elementos de arriostramiento transversal previamente instalados y punteados. Estas labores estuvieron orientadas al cierre progresivo de las conexiones estructurales, con el fin de garantizar la continuidad, rigidez y comportamiento monolítico del sistema metálico.

Los trabajos fueron ejecutados de manera secuencial y controlada, atendiendo las condiciones geométricas de la estructura y las restricciones operativas derivadas de las condiciones climáticas. Así mismo, las actividades se desarrollaron conforme a los procedimientos de soldadura aprobados y bajo supervisión permanente, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos, de calidad y resistencia establecidos en los diseños y especificaciones del proyecto.



Proceso de soldadura estructural definitiva



Proceso de soldadura estructural definitiva

8. CONCLUSIONES

En el presente período se ha venido realizando el control conforme al diseño estructural, el cual se encuentra fundamentado en el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes de 1996 y en la Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP-2014. Esta normativa establece los requisitos mínimos para garantizar un diseño seguro y funcional de puentes y demás estructuras viales, considerando los efectos de las cargas mayores y de los sismos en los estudios, diseños, construcción y mantenimiento de los puentes que se ejecuten en la Red Vial Nacional a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS).

Durante el presente período, el control de interventoría se orientó a la verificación de la calidad del material estructural utilizado en el montaje de las vigas metálicas del puente, así como al seguimiento del correcto procedimiento de ensamble y soldadura de los elementos metálicos. Estas actividades incluyeron la inspección de las condiciones de los insumos, la revisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas de diseño y la validación de los procesos constructivos aplicados en obra, en especial aquellos relacionados con la ejecución de uniones soldadas. Lo anterior, con el fin de garantizar la calidad, seguridad estructural y desempeño adecuado de los elementos instalados, en concordancia con la normatividad técnica aplicable y los requerimientos del proyecto.

Para el presente período, el proyecto se ejecutó conforme al cronograma y a las condiciones establecidas en la Prórroga No. 4, mediante la cual se amplió el plazo contractual por tres (3) meses adicionales, fijándose como nueva fecha de terminación el 21 de septiembre de 2026. En este marco, las actividades se desarrollaron bajo el seguimiento y control de la Interventoría, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la programación vigente y demás obligaciones contractuales. Durante el periodo continuaron presentándose restricciones asociadas a las condiciones climáticas, el comportamiento hidráulico del río y a los ajustes técnicos y de cantidades relacionados con la Modificatoria No. 5, circunstancias que incidieron en el desarrollo de algunos frentes de obra.

Firma	Firma
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	**JIMMY ANDRES TORRES CASTRO**
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

9. REGISTRO FOTOGRAFICO





9.9.2. Informe de seguridad y salud en el trabajo N°.26

CONTRATO DE INTERVENTORIA 978 DE 2023

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N°26


"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS"



PERIODO DEL INFORME

01 DE JULIO DEL 2026 AL 31 DE JULIO DEL 2026

REVISION Y APROBACION

Objeto de Interventoría:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	
Título de Documento:	informe de Interventoría de Seguridad y Salud en el Trabajo No.26 (01 DE JULIO DEL 2026 AL 31 DE JULIO DEL 2026)	
Documento No:	INFMSST-026	
APROBACION		
	Nombre:	**FLOR ANGELA NARVÁEZ CASTRO**
Responsable por la elaboración:	Firma:	
	Fecha:	01-08-2026
	Nombre:	**ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA**
Vo Bo representante legal:	Firma:	
		01-08-2026

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4

2. OBJETIVOS 5
2.1. Objetivo General 5
2.2. Objetivos específicos 5

3. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 6
3.1. Localización del proyecto y descripción. 6
3.2. Alcance del proyecto en seguridad y salud en el trabajo. 7
3.3. Estado inicial de la zona de trabajos 7

4. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE INTERVENTORÍA 8
4.1. Actividades desarrolladas por la interventoría. 8
4.2. Generalidades contrato de interventoría. 8
4.3. Marco Legal en Seguridad y Salud en el Trabajo. 10
4.4. Instalaciones administrativas de la interventoría. 10
4.5. Personal de interventoría. 10
4.6. Pagos de seguridad social de interventoría. 10
4.7. Control técnico de la obra en el área de seguridad y salud en el trabajo. 11

5. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE OBRA 12
5.1. Generalidades contrato de obra. 12
5.2. Instalaciones administrativas del contratista. 13
5.3. Relación personal del contratista. 13
5.4. Seguimiento a compromisos laborales. 15
5.5. Exámenes médicos. 15
5.6. Supervisión asistencia a charlas preoperacionales 15
5.7. Supervisión entrega de dotación y EPP. 15
5.8. Supervisión preoperacional de maquinaria. 15
5.9. Supervisión elementos de emergencias. 16
5.10. Pagos de seguridad social del contratista. 16
5.11. Seguimiento a indicadores de seguridad y salud en el trabajo por AT. 16

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES DE SST 18

7. CONCLUSIONES 20

1. INTRODUCCIÓN

La Seguridad y Salud en el Trabajo es un área multidisciplinaria y está relacionada no solo con la seguridad, también vincula la salud y la calidad en el ámbito de los trabajadores, su función es la de proteger a todo trabajador que se vea afectado por el ambiente ocupacional.

La Salud Ocupacional, se construye por medio de un ambiente psicosocial, físico, emocional, donde el trabajador pueda desarrollar una actividad con dignidad, con libre expresión, con ser respetado donde sus condiciones sean seguras y las más adecuadas, no solamente la salud ocupacional se encarga de la parte de salud física si no de la actividad o estado emocional en que se encuentre el trabajador, ya que ellos pueden llegar a presentar algún tipo de inconformidad, problema, y esto afectará el rendimiento en sus diferentes actividades laborales.

Tomando como base esto, este informe que realizará mensualmente JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA identificado con NIT 9.658.796-1, tiene como prioridad cumplir con la supervisión y seguimiento a las actividades que, han sido planificadas y presentadas por el contratista y de esta forma velar por el cumplimiento de condiciones idóneas para los trabajadores, respaldados siempre con la normatividad vigente, garantizando siempre la divulgación y sensibilización de las normas en seguridad y salud en el trabajo, para facilitar el control de los factores de riesgo y prevenir la aparición de Accidentes y Enfermedades de origen laboral.

Para el presente período, el proyecto se ejecutó conforme al cronograma y a las condiciones establecidas en la Prórroga No. 4, mediante la cual se amplió el plazo contractual por tres (3) meses adicionales, fijándose como nueva fecha de terminación el 21 de septiembre de 2026. En este marco, las actividades se desarrollaron bajo el seguimiento y control de la Interventoría, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la programación vigente y demás obligaciones contractuales. Durante el período continuaron presentándose restricciones asociadas a las condiciones climáticas, el comportamiento hidráulico del río y a los ajustes técnicos y de cantidades relacionados con la Modificatoria No. 5, circunstancias que incidieron en el desarrollo de algunos frentes de obra.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Presentar los registros de supervisión, seguimiento y control del cumplimiento a los compromisos establecidos en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, por el contratista de obra en desarrollo de la interventoría, durante el periodo del presente informe.


2.2. Objetivos específicos

- Describir las actividades de SST que se desarrollaron durante el periodo evaluado; las cuales se encuentran divididas por componentes y programas de acuerdo con lo establecido en el plan de acción SST de la interventoría y del Contratista, junto con lo establecido en el Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Generar registros que evidencien el cumplimiento de las actividades SST por parte del contratista y el seguimiento a estas por parte de la interventoría.
- Verificar y validar el seguimiento de la totalidad de las actividades SST dando cumplimiento a lo establecido en el contrato, leyes, decretos, resoluciones, normas, manuales y guías de seguridad y salud en el trabajo vigente para el contrato.
- Propender porque durante el desarrollo del contrato se implementen las medidas de manejo de SST por parte del contratista.
- Verificar el cumplimiento en los soportes de pagos de seguridad social y nómina del personal de los contratistas y el contrato de interventoría.

3. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

3.1. Localización del proyecto y descripción.

La zona para intervenir se encuentra ubicada en el Municipio de Acacias, especificamente está ubicada en la vía Terciaria que conduce a la vereda quebraditas a 34.4 Km del casco urbano del Municipio de Acacias Meta, de cuales 13.56 se encuentran en afirmado, las coordenadas de ubicación son las 03°57'39,99" N y 73°30'17.67" O

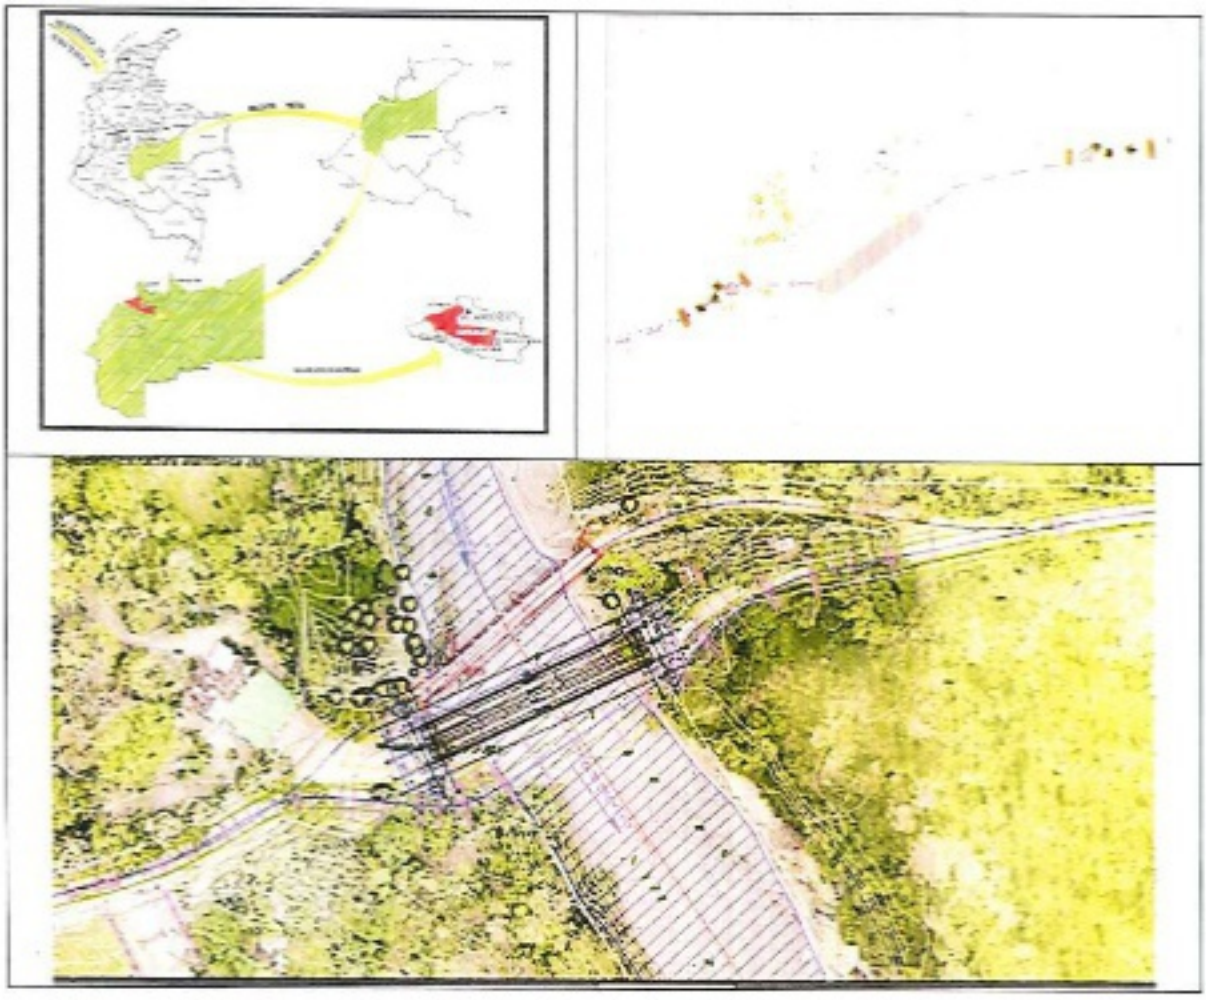


3.2. Alcance del proyecto en seguridad y salud en el trabajo.

Teniendo en cuenta que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) es un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud de los trabajadores (Decreto 1072 de 2015), por lo anterior esta interventoría tiene como objetivo principal garantizar que los trabajadores que hacen parte del proyecto, desarrollen las actividades que han sido planeadas de manera segura y responsable siempre brindando al personal vinculado con el contrato las condiciones idóneas y seguras en cumplimiento de la normatividad legal vigente.

3.3. Estado inicial de la zona de trabajos

El profesional en SST de la interventoría realiza la inspección a la zona de trabajo para verificar su estado, en ella encontramos que el proyecto se ubica en el centro poblado de quebraditas, sector rural del municipio de acacias, una vía terciaria en material granular donde se va a construir un puente vehicular y se tiene que demoler el puente existente el cual ha colapsado.

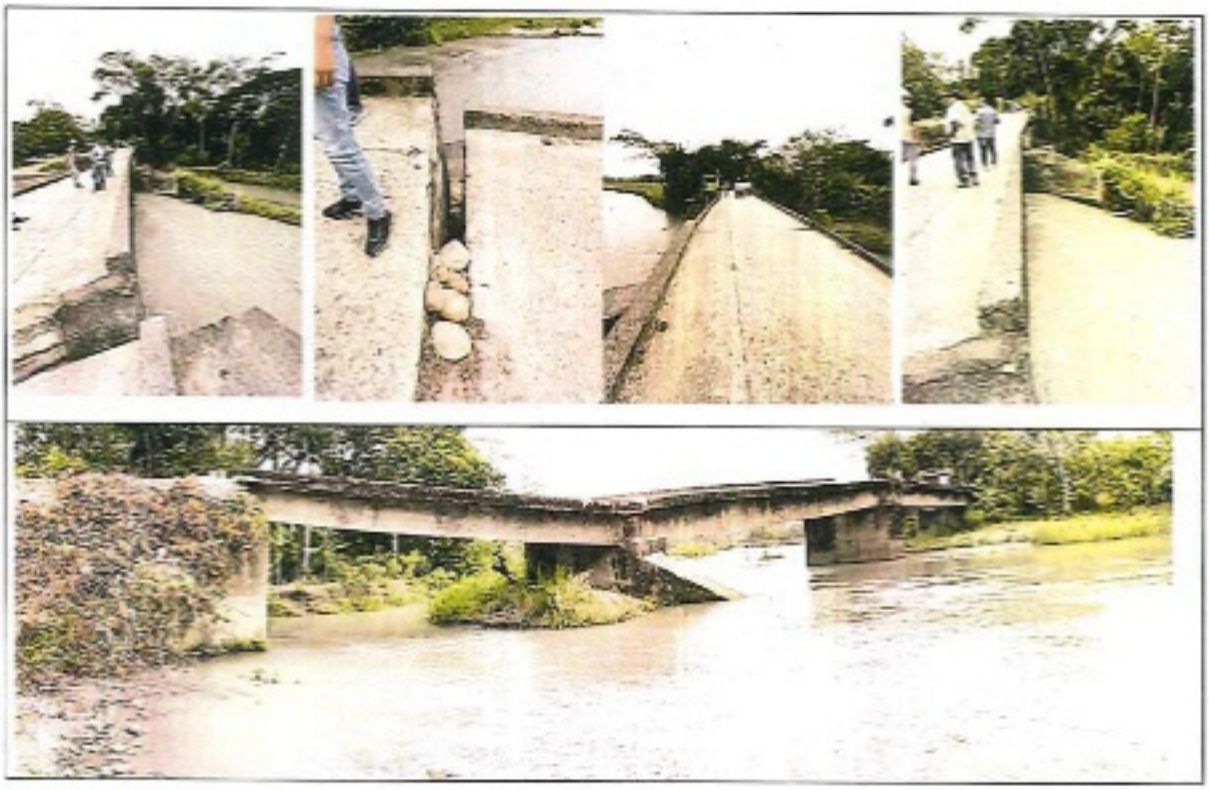

4. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE INTERVENTORÍA

4.1. Actividades desarrolladas por la interventoría.

El presente informe corresponde a las actividades realizadas por el profesional SST de la Interventoría, en cumplimiento de sus actividades de seguimiento al contrato de obra No 929 de 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS".

La interventoría realiza un seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista en el área SST, este seguimiento se ha realizado dejando como evidencia un registro fotográfico, formatos de control, seguimiento y cumplimiento a los indicadores SST, con el fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y trabajo, y preservar un estado de salud, bienestar físico, mental y social de los trabajadores, la prevención de accidentes y enfermedades laborales factibles de intervención, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

La interventoria, en su función de seguimiento a la aplicación del SG SST, realizó la verificación de su implementación, a través de las medidas de seguridad establecidas para el control de los factores de riesgo presentes en la ejecución del contrato de obra en el periodo del presente informe.

4.2. Generalidades contrato de interventoría.

PROCESO CONTRACTUAL:	CM-OCA-013-2023
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE ACACIAS
RESOLUCION DE ADJUDICACION	203 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATO DE:	INTERVENTORIA
No. DEL CONTRATO:	978 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCION	27 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
VALOR INICIAL:	SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($627.081.787,00) M/CTE
VALOR DEL CONTRATO SEGÚN ADICIONAL No.1:	NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($918.733.882,00) M/CTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT No 9.658.796-1

CORREO ELECTRONICO	interpuentechictimena@gmail.com
CÉDULA DE CIUDADANÍA	9.658.796 DE YOPAL
No. Y FECHA RP INICIAL:	5156 DEL 22 DE AGOSTO DEL 2023
SUPERVISOR:	IVÁN MAURICIO ROJAS NOVOA
CARGO DEL SUPERVISOR:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
CORREO ELECTRONICO	infraestructura@acacias-cay.co
APOYO A LA SUPERVISION	CRISTIAN FUENTES AMADO
CORREO ELECTRONICO	cristian.f0393@gmail.com
PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO:	27 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	26 DE ABRIL DE 2025
FECHA SUSPENSION No:1	24 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE REINICIO SEGÚN SUSPENSION-1	8 DE JUNIO DEL 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSION No.1:	10 DE JUNIO DEL 2025
AMPLIACION No.1 A LA SUSPENSION No.1	8 DE JUNIO DEL 2025, (TIEMPO 30 DIAS)
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN AMPLIACION No.1 DE SUSPENSION No.1:	10 DE JULIO DEL 2025
FECHA DE REINICIO ANTICIPADO:	17 DE JUNIO DEL 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL SEGÚN REINICIO ANTICIPADO	20 DE JUNIO DEL 2025
PRORROGA No.1	7 MESES ADICIONALES, TOTAL DE PLAZO 18 MESES
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No.1	20 DE ENRO DEL 2026
VALOR ACTA PARCIAL 1	$85.094.998,51 Equivalente al 10,74%
AMORTIZACIÓN PARCIAL No 1	$ 25.528.499,55
VALOR NETO PARCIAL No 1	$ 59.566.498,96
VALOR ACTA PARCIAL 2	$ 229.775.343,75 Equivalente al 25,01%
AMORTIZACIÓN PARCIAL No 2	$ 68.932.603,12
VALOR NETO PARCIAL No 2	$ 160.842.740,62
VALOR ACTA PARCIAL 3	$ 158.389.721,16 Equivalente al 17,24%
AMORTIZACIÓN PARCIAL No 3	$ 47.516.916,35
VALOR NETO ACTA PARCIAL No 3	$ 110.872.804,81
PRORROGA No.2	3 MESES ADICIONALES, TOTAL DE PLAZO 21 MESES
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No.2	20 DE ABRIL DEL 2026
VALOR ACTA PARCIAL 4	$ 212.227.526,61 Equivalente al 23,10%
AMORTIZACIÓN PARCIAL No 4	$ 46.146.517,08
VALOR NETO ACTA PARCIAL No 4	$ 110.872.804,81
PRORROGA No.3	2 MESES ADICIONALES, TOTAL DE PLAZO 23 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.3	20 DE JUNIO DEL 2026
PRORROGA No.4	3 MESES ADICIONALES, TOTAL DE PLAZO 26 MESES
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No.4	21 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

4.3. Marco Legal en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los requisitos legales relacionados con el aspecto de Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentra incluido dentro del SGSST que fue entregado a la interventoría, en la fase preliminar. En el seguimiento realizado al SG SST, se evidencia que se cuenta con la matriz de requisitos legales ajustados a la ejecución de las actividades establecidas para el contrato.

4.4. Instalaciones administrativas de la interventoría.

Las instalaciones de la interventoría están ubicadas en la Calle 49 No.30-16 oficina 203 Barrio el Caudal en el municipio de Villavicencio Meta, de igual forma se cuenta con oficina en el caso urbano del Municipio de acacias donde se llevan a cabo todos los procesos administrativos por parte de la interventoría y se atenderá al público en general en caso de ser necesario.

4.5. Personal de interventoría.

Durante el presente periodo la interventoría, realizó el acompañamiento de forma permanente con los profesionales en salud ocupacional con sus debidas funciones de supervisar, verificar, controlar y apoyar de forma eficaz y oportuna las acciones de seguridad y salud en el trabajo, por tanto, la interventoria a velado por que se cumpla la normativa vigente legal, y se exigió al contratista el cumplimiento de las mismas con el personal a su cargo durante el desarrollo de los trabajos, con el fin de mitigar los riesgos presentes en obra y crear un ambiente de trabajo seguro, y adecuado para cada labor y así mismo evitar accidentes e incidentes de trabajo y/o enfermedades laborales futuras.

Para estas labores se relaciona el grupo de profesionales de interventoría.

Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Tipo de Vinculación	AFILIACIÓN			
			EPS	Pensión	ARL	CCF
Jimmy Andrés Torres Castro	Director interventoría	Dependiente	SANITAS	PORVENIR	SURA	COFREM
Jorge Augusto Rodriguez Reina	Residente Interventoría	Independiente	ESP SURA	COLPENSIONES	SURA	COFREM
Jimmy Andrés Torres Castro	Especialista Estructural	Dependiente	SANITAS	PORVENIR	SURA	COFREM
Flor Angela Narvaez Castro	Profesional SISO	Dependiente	FOSYGA REGIME	PORVENIR	SURA	COFREM

4.6. Pagos de seguridad social de interventoría.

Esta relación de planillas correspondientes a los pagos de salud, ARL, pensiones y demás aportes parafiscales de los trabajadores, correspondientes al período del 01 al 31 de mayo de 2026, sin embargo, no se ha generado el pago correspondiente a este periodo.

Mes	Planilla No.	Referencia de pago	Pago EPS	Pago Pensión	Pago ARL	Pago CCF	Pago Total
Julio	No vencido	No vencido	$1.160.603,91	$2.634.643,20	$1.146.069,79	$540.556,54	$5.481.873,44
Julio	No vencido	No vencido	$740,700	$948.000,00	$412,400,00	$118,500,00	$2,219,600,00

4.7. Control técnico de la obra en el área de seguridad y salud en el trabajo.

La Interventoria ha realizado presencia en las actividades realizadas por el contratista de manera permanente y se ha realizado un seguimiento a las actividades realizadas por medio de un registro fotográfico y formatos de control y seguimiento.
Para cumplir de manera idónea la interventoria le solicitó al contratista la siguiente documentación:

- ✓ Documentación del SG.SST de la empresa en cumplimiento de la Resolución 1072 del 2015 y la Resolución 0312 2019.
- ✓ Plan de trabajo SST anual.
- ✓ Certificado de funcionamiento de la IPS donde se realizan los exámenes médicos ocupacionales.
- ✓ Hoja de vida de los trabajadores
- ✓ Cedula del trabajador
- ✓ Inducción al cargo.
- ✓ Constancia de Afiliación ARL.
- ✓ Constancia de fondo de pensión y Caja de Compensación Familiar.
- ✓ Constancia de afiliación de EPS con número de radicado (No Adres).
- ✓ Formato entrega de dotación.
- ✓ Formato inducción al cargo.
- ✓ Contrato laboral.
- ✓ Examen médico ocupacional de ingreso.
- ✓ Planillas de seguridad social.
- ✓ Certificado de accidentalidad emitido por la ARL
- ✓ Carta de Idoneidad (para actividades de alto riesgo)
- ✓ Paz y salvos de personal retirado.
- ✓ Informes de SST. Con evidencia fotográfica.
- ✓ Inspecciones a los siguientes formatos:
- ✓ Formato Entrega de EPP
- ✓ Formato Asistencia diaria - charlas preoperacionales
- ✓ Formato capacitaciones programadas
- ✓ Formato inspección herramienta y equipos
- ✓ Formato de Inspección punto ecológico, punto sanitario.
- ✓ Formato de inspección locativa.
- ✓ Formato ATS.

- ✓ Formato inspección camilla y extintores.
- ✓ Formato inspección de botiquín acondicionado de acuerdo con la cantidad de trabajadore

5. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE OBRA

5.1. Generalidades contrato de obra.

PROCESO CONTRACTUAL:	OCA-LP-009-2023
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE ACACIAS
RESOLUCION DE ADJUDICACION	151 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATO DE:	OBRA PUBLICA
No. DEL CONTRATO:	929 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCION	01 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
VALOR INICIAL:	TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($13.430.269.893)
VALOR DEL CONTRATO SEGÚN ADICIONAL No.1:	DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($16.970.259.458,00)
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA NIT 901967420-0
REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO SUAREZ QUIÑONEZ HASTA EL 24 DE JUNIO DE 2024
REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISO MORA GUTIERREZ DESDE EL 24 DE JUNIO DE 2024
CORREO ELECTRONICO	[illegible]
CÉDULA DE CIUDADANÍA	79.426.913 DE BOGOTA
No. Y FECHA RP INICIAL:	2023000069 DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
CONTRATO DEINTERVENTORIA	978 DE 2023
SUPERVISOR:	IVÁN MAURICIO ROJAS NOVOA
CARGO DEL SUPERVISOR:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]
APOYO A LA SUPERVISION	CRISTIAN FUENTES AMADO
CORREO ELECTRONICO	[illegible]
PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO:	27 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE ABRIL DE 2025
FECHA SUSPENSION No:1	24 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE REINICIO SEGÚN SUSPENSION No.1	8 DE JUNIO DEL 2025
AMPLIACION No.1 A LA SUSPENSION No.1	8 DE JUNIO DEL 2025, (TIEMPO 30 DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN AMPLIACION No.1 A LA SUSPENSION No.1:	10 DE JULIO DEL 2025

FECHA DE REINICIO ANTICIPADO:	17 DE JUNIO DEL 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL SEGÚN REINICIO ANTICIPADO	20 DE JUNIO DEL 2025
PRORROGA No.1	21 DE JUNIUO POR 7 MESES, TOTAL DE PLAZO 18 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No.1	20 DE ENRO DEL 2026
VALOR ACTA PARCIAL 1	$ 1.823.069.425,00 Equivalente al 10,74%
AMORTIZACIÓN PARCIAL No 1	$ 546.920.828,00
VALOR NETO PARCIAL No 1	$ 1.276.148.597,00
VALOR ACTA PARCIAL 2	$ 4.243.823.229,00 Equivalente al 25,01%
AMORTIZACIÓN PARCIAL No 2	$ 1.273.146.969,00
VALOR NETO PARCIAL No 2	$ 2.970.676.260,00
VALOR ACTA PARCIAL 3	$ 2.928.156.468,00 Equivalente al 17,24%
AMORTIZACIÓN PARCIAL No 3	$ 877.846.940,00
VALOR NETO ACTA PARCIAL No 3	$ 2.048.309.528,00
PRORROGA No.2	3 MESES ADICIONALES, TOTAL DE PLAZO 21 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.2	20 DE ABRIL DEL 2026
VALOR ACTA PARCIAL 4	$ 3.919.502.303,00 Equivalente al 23,10%
AMORTIZACIÓN PARCIAL No 4	$ 1.175.850.691,00
VALOR NETO ACTA PARCIAL No 4	$ 2.743.651.612,00
PRORROGA No.3	2 MESES ADICIONALES, TOTAL DE PLAZO 23 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.3	20 DE JUNIO DEL 2026
PRORROGA No.4	3 MESES ADICIONALES, TOTAL DE PLAZO 26 MESES
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No.4	21 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

5.2. Instalaciones administrativas del contratista.

El contratista con una oficina ubicada en el casco urbano del municipio de Acacias en la dirección carrera 39 No 16 – 49 Barrio Villa aurora 2, así mismo cuenta con oficina ubicada en Bogotá en la dirección carrera 34 # 10-72 y por estrategia y logística una Oficina en la Vereda Quebraditas, sitio de la Obra, y corresponde a la casa del Señor Yesid Baquero Junto al Puente antiguo.

5.3. Relación personal del contratista.

El Contratista no ha presentado la relación del personal correspondiente al período objeto del presente informe, ni ha generado ni entregado las planillas de pago de seguridad social del personal administrativo y operativo vinculado al proyecto. En consecuencia, el cuadro relacionado que se presenta corresponde al corte del mes de mayo del 2026, el cual hace referencia al personal que continúa vinculado al proyecto, según verificación realizada en campo por parte de la interventoría.

MES DE MAYO DEL 2026						
Nombres y Apellidos	**Cargo**	**Tipo de Vinculación**	**$ EPS**	**$ Pensión**	**$ ARL**	**CCF**
ADMINISTRATIVOS						
LUIS EDUARDO RODRIGUEZ	INGENIERO CIVIL-DIRECTOR DE OBRA	INDEPENDIENTE	SANITAS	Porvenir	SURA	N/A
ALEXANDER HERRERA	INGENIERO RESIDENTE	DEPENDIENTE	SANITAS	COLFONDOS	SURA	N/A
SERGIO REDONDO	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA	INDEPENDIENTE				
SANITAS	PORVENIR					
	SURA	N/A				
SEBASTIAN SANCHEZ	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	INDEPENDIENTE	SANITAS	PORVENIR	SURA	N/A
OPERATIVOS						
DORIS ADRIANA QUINTERO	RESIDENTE OBRA	DEPENDIENTE	SANITAS	PORVENIR	SURA	COFREM
NASLY VIRGUEZ	PROFESIONAL HSE	DEPENDIENTE	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	COFREM
BELTRAN SOFIA MARCELA	AUXILIAR VIAL	DEPENDIENTE	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA	COFREM
SHARIK JULIANA SIERRA ROJAS	AUXILIAR VIAL	DEPENDIENTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COFREM
ANDRES FERNANDO ROA RODRIGUEZ	TOPOGRAFO	DEPENDIENTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COFREM
WILMER ROA MARTINEZ	CADENERO	DEPENDIENTE	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COFREM
JULIAN CANCELADO	AYUDANTE	DEPENDIENTE	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COFREM
JOSE WILSON ESPITIA GUTIERREZ	AYUDANTE	DEPENDIENTE	NUEVA E.P.S.	COLFONDOS	SURA	COFREM
BARROSO ISMAEL	AYUDANTE	DEPENDIENTE	NUEVA E.P.S.	PORVENIR	SURA	COFREM
ALBEIRO LOPEZ SIERRA	MAESTRO	DEPENDIENTE	NUEVA E.P.S.	COLFONDOS	SURA	COFREM
JENIFER PAOLA LOPEZ	AUXILIAR OBRA	DEPENDIENTE	NUEVA EPS	COLFONDOS	SURA	COFREM
EPIEYU CAMILO	AUXILIAR OBRA	DEPENDIENTE	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	COFREM
LOPEZ JOSE	AUXILIAR OBRA	DEPENDIENTE	NUEVA EPS	COLFONDOS	SURA	COFREM
RINCON DEIBER	AUXILIAR OBRA	DEPENDIENTE	SANITAS	PROTECCION	SURA	COFREM
TIQUE CARLOS	AUXILIAR OBRA	DEPENDIENTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COFREM
JOHAN SEBASTIAN QUIÑONES	AUXILIAR DE SOLDADURA	DEPENDIENTE	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	COFREM
ALBEIRO MOLINA MOLINA .	SOLDADOR	DEPENDIENTE	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	COFREM
ANDERSON ESTIVEN HUERTAS MEDINA	AUXILIAR DE SOLDADURA	DEPENDIENTE	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA	COFREM
JORGE ANTONIO BARON MORENO	SOLDADOR	DEPENDIENTE	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	COFREM

5.4. Seguimiento a compromisos laborales.

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO				OBSERVACIONES
	1ª Quincena		2ª Quincena		
	SI	NO	SI	NO	
El contratista tiene al día las afiliaciones a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC de todo el personal.		X		X	Tienen 25 personas en obra
Los vehículos maquinaria y equipo del contratista cumplen con los siguientes requisitos:	X		X		Se tiene documentación de la maquinaria y operador de excavadora
- SOAT					
- Seguro de automóviles contra todo riesgo					
- Tarjeta de propiedad					
- Licencia de conducción de la persona responsable					
El contratista presenta oportunamente las planillas de pago de salarios de todo el personal.		X		X	No ha presentado planillas de salarios.
Los reportes de tiempo de las planillas de pago de salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo.	X		X		Se han generado pagos
Las liquidaciones del personal retirado cumplen con la reglamentación vigente.		X	X		No se ha retirado personal
El contratista tiene al día el pago de seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC, fondos de pensiones, EPS de todo el personal.	X		X		No ha presentado planillas dependientes y faltan independientes

5.5. Exámenes médicos.

El contratista no ha realizado entrega de soportes de exámenes médicos de ingreso para este periodo.

5.6. Supervisión asistencia a charlas preoperacionales

El contratista no ha realizado entrega de soportes de charlas preoperacionales para este periodo.

5.7. Supervisión entrega de dotación y EPP.

El contratista no ha realizado entrega de soportes de entrega de dotación para este periodo.

5.8. Supervisión preoperacional de maquinaria.

El contratista no ha realizado entrega de soportes de inspección de preoperacionales de maquinaria para este periodo.

5.9. Supervisión elementos de emergencias.

El contratista no ha realizado entrega de soportes de revisión de elementos de emergencias para este periodo.

5.10. Pagos de seguridad social del contratista.

NOTA: Respecto al estado de la seguridad social del personal activo vinculado al proyecto, se aclara que el contratista no ha entregado las planillas de pago correspondientes al personal administrativo y operativo, para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026.

Mes		Empresa	Planilla No	Referencia de pago	Pago Total
Julio	Aportes en Línea	Consorcio Acacia	No presento	No presento	No presento
Julio	Aportes en Línea	Luis Eduardo Rodríguez	No presento	No presento	No presento
Julio	Aportes en Línea	Sergio Andrés Redondo	No presento	No presento	No presento
Julio	Aportes en Línea	Jhoan Sebastián Sánchez C.	No presento	No presento	No presento
Julio	Aportes en Línea	Uriel Andres Escalante	No presento	No presento	No presento
Julio	Aportes en Línea	María Fernanda Rodríguez	No presento	No presento	No presento
Julio	Aportes en Línea	Alexander Herrera	No presento	No presento	No presento
Julio	Aportes en Línea	José Luis cerón	No presento	No presento	No presento

5.11. Seguimiento a indicadores de seguridad y salud en el trabajo por AT.

Durante el presente periodo del informe, la interventoría en sus funciones de control y supervisión al contratista, en la implementación de cada uno de los ítems relacionados, no evidencia cumplimiento.

ESTADO				
DESCRIPCIÓN	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
DOTACIÓN DEL PERSONAL				
Dotación completa		X		Se cuenta con personal y se ha entregado dotación con algunas deficiencias.
Buen estado		X		
Uso según zona de trabajo		X		
DOTACIÓN CAMPAMENTO				
Dotación completa		X		Se cuenta con algunos EPPs disponibles, pero no son las cantidades suficientes.
Buen estado	X			
Fácil acceso y operación	X			
Uso según zona de trabajo		X		
Existencia de elementos primeros auxilios		X		
MAQUINARIA - EQUIPO				
Estado del equipo	X			

Regularidad del mantenimiento		X		Se cuenta con maquinaria para excavaciones, compactación y transporte de materiales.
Vibraciones /Ruidos		X		
Protecciones / Guardas / Frenos		X		
Idoneidad operarios	X			
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN.				
Uso permanente		X		Se encuentra con muy escasa señalizada
Uso según zona de trabajo		X		
VIGILANCIA				
Personal suficiente			X	No se cuenta con personal para vigilancia
Diurna		X		
Nocturna			X	
CENTRO DE ATENCIÓN INMEDIATA				
Convenio centro de asistencia			X	No ha presentado planillas de personal vinculado.
Afiliación del Personal al Sistema de Seguridad Social y ARP			X	

INDICADORES HSE			
Accidentes de trabajo sin lesiones:	0	0	0
Total, de HHTT Mes:	0	Total, HHTT acumuladas:	0
Indicador de Lesiones con Incapacidad durante el mes:	0	Días de ausentismo por Incapacidad:	0
Accidentes de trabajo sin lesiones:	0	0	0
DURANTE ESTE PERIODO NO SE PRESENTO ACCIDENTES LABORALES QUE PUEDAN INCIDIR EN EL OBJETIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.			

EL CONTRATISTA NO ENTREGO EL CERTIFICADO DE NO ACCIDENTALIDAD DEL MES DE JULIO DEL 2026

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES DE SST

ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA EN OBRA





VERIFICACION DE ELEMENTOS DE EMERGENCIAS, DOTACIONES Y DEMAS





7. CONCLUSIONES

En el presente informe se establece la capacidad operativa y el personal con que cuenta la Interventoría, el cual posee la experiencia y competencia técnica necesarias para ejecutar las actividades requeridas y garantizar el adecuado seguimiento, control y cumplimiento de cada una de las tareas asociadas al proyecto.

Asi mismo se evidencia el control realizado por la sección de Salud y Seguridad en el Trabajo de la interventoría soportado mediante el informe de los diferentes puntos de inspección y supervisión, lo anterior con las directrices y normas exigidas para un proyecto de estas caracteristicas dentro de la normatividad colombiana.

Adicional, se establece puntos para mejorar por parte del contratista como: - puntualidad en la entrega total de la documentación del personal, efectividad en la presentación de soportes de afiliación a seguridad social, disponibilidad y cumplimiento en la entrega de EPP, diligenciamiento de formatos de inspección, soportes de charlas preoperacionales, señalización adecuada, pagos de seguridad social y entrega oportuna de informes.

Durante el periodo evaluado no se presentaron accidentes de trabajo, incidentes, emergencias ni eventos que afectaran la integridad física o la salud de ningún trabajador, colaborador o personal vinculado a las actividades del proyecto, manteniéndose las condiciones de seguridad y el cumplimiento de las medidas preventivas establecidas.

Durante el presente período, la Interventoría realizó el seguimiento y control en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a las actividades se ejecutaron conforme al cronograma y a las condiciones establecidas en la Prórroga No. 4, mediante la cual se amplió el plazo contractual por

tres (3) meses adicionales, fijándose como nueva fecha de terminación el 21 de septiembre de 2026. En este marco, las actividades se desarrollaron bajo el seguimiento y control de la Interventoria, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la programación vigente y demás obligaciones contractuales. Durante el período continuaron presentándose restricciones asociadas a las condiciones climáticas, el comportamiento hidráulico del río y a los ajustes técnicos y de cantidades relacionados con la Modificatoria No. 5, circunstancias que incidieron en el desarrollo de algunos frentes de obra.

Firma	Firma
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	**FLOR ANGELA NARVÁEZ CASTRO**
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	PROIFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

10 CUADROS ANEXOS

10.1 CONTROL ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.
10.2 CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO.
10.3 CONTROL PERSONAL QUE LABORA INTERVENTORIA.
10.4 CONTROL SEGURIDAD INDUSTRIAL
10.5 CONTROL CORRESPONDENCIA
10.6 CONTROL EQUIPOS CONTRATISTA
10.7 CONTROL IMPLEMENTACION PMA

9.10 Ensayos de laboratorio

Quality Welding GROUP	EVALUACIÓN NDT: PARTICULAS MAGNÉTICAS				MT CÓDIGO AWS D1.5:2025	
	FECHA DE EVALUACIÓN	25 de JULIO 2026				
	Informe Numero:	MT F001			Pag No 2 de 2	
	Consecutivo No				Versión No	2

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Empresa Cliente	HISO INGENIERÍA	Proyecto	PUENTE ACACIAS
Informe Dirigido a	Ing. Francisco Mora	Ciudad /dto	Bogotá
Teléfono		Dirección	
Código/Criterios Aceptación	AWS D1.5:2025 Tabla 8,1 ASTM E 709	Lugar:	ACACIAS - META

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS	PUNTO	CRITERIOS AWS D1.1:2020		CARACTERIZACIÓN		Condición Final OK/R
		Tipo Discontinuidad	Clase	Longitud	Profundidad	
ALMA VIGA 3	N/A	**********	****		****	OK
ALMA VIGA 2	N/A	**********	****		****	OK
ALMA VIGA 1	N/A	**********	****		****	OK
ALMA VIGA 4	N/A	**********	****		****	OK
ALMA VIGA	N/A	**********	****		****	OK
ALMA VIGA	N/A	**********	****		****	OK
PATIN 1 VIGA 4	N/A	**********	****		****	OK
PATIN 2 VIGA 4	N/A	**********	****		****	OK
PATIN 3 VIGA 4	N/A	**********	****		****	OK
PATIN 4 VIGA 4	N/A	**********	****		****	OK
PATIN 1 VIGA 3	N/A	**********	****		****	OK
PATIN 2 VIGA 3	N/A	**********	****		****	OK
PATIN 3 VIGA 3	N/A	**********	****		****	OK
PATIN 4 VIGA 3	N/A	**********	****		****	OK
PATIN 1 VIGA 2	N/A	**********	****		****	OK
PATIN 2 VIGA 2	N/A	**********	****		****	OK
PATIN 3 VIGA 2	N/A	**********	****		****	OK
PATIN 4 VIGA 2	N/A	**********	****		****	OK

INSPECTOR	ING JHONY ROJAS CORTES	
	ANST NIVEL II MT	
FIRMA		
APROBADO	*Ing. Wilson Andres Bautista - Calidad Hiso Ingeniería*	FIRMA INTERVENTORÍA

	EVALUACIÓN NDT: PARTICULAS MAGNÉTICAS	MT CÓDIGO AWS D1.5:2025
	FECHA DE EVALUACIÓN: 25 de Julio 2026	
	Informe Numero: MT F001	Pag 1
	Consecutivo No 2	Versión No 2

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Empresa Cliente	HISO INGENIERÍA	Proyecto	PUENTE ACACIAS
Informe Dirigido a	Ing. Francisco Mora	Ciudad /dto	Bogotá
Teléfono		Dirección	
Código/Criterios Aceptación	AWS D1.5:2025 Tabla 8,1	Lugar:	ACACIAS META

		
Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones	Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones	Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones
		
Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones	Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones	Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones
		
Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones	Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones	Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones

INSPECTOR	ING JHONY ROJAS CORTES	
	ANST NIVEL II MT	
FIRMA		
APROBADO	Ing. Wilson Andres Bautista - Calidad Hiso Ingeniería	FIRMA INTERVENTORÍA

EVALUACIÓN NDT: PARTICULAS MAGNÉTICAS MT CÓDIGO AWS D1.5:2025

	FECHA DE EVALUACIÓN	25 de Julio 2026		
	Informe Numero:	MT F001		Pag 2
	Consecutivo No	2	Versión No	2

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Empresa Cliente	HISO INGENIERÍA	Proyecto	PUENTE ACACIAS
Informe Dirigido a	Ing. Francisco Mora	Ciudad /dto	Bogotá
Teléfono		Dirección	
Código/Criterios Aceptación	AWS D1.5:2025 Tabla 8,1	Lugar:	ACACIAS – META

		
Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones	Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones	Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones
		
Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones	Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones	Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones
		
Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones	Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones	Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones

INSPECTOR	ING JHONY ROJAS CORTES	
	ANST NIVEL II MT	
FIRMA		
APROBADO	Ing. Wilson Andres Bautista - Calidad / Hiso Ingeniería	FIRMA INTERVENTORÍA

EVALUACIÓN NDT: PARTICULAS MAGNÉTICAS MT CÓDIGO AWS D1.5:2025

FECHA DE EVALUACIÓN	25 de Julio 2026		
Informe Numero:	MT F001		Pag 3
Consecutivo No	2	Versión No	2

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Empresa Cliente	HISO INGENIERÍA	Proyecto	PUENTE ACACIAS
Informe Dirigido a	Ing. Francisco Mora	Ciudad /dto	Bogotá
Teléfono		Dirección	
Código/Criterios Aceptación	AWS D1.5:2025 Tabla 8,1	Lugar:	ACACIAS – META

		
Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones	Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones	Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones
		
Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones	Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones	Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones
		
Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones	Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones	Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones

INSPECTOR	ING JHONY ROJAS CORTES	
	ANST NIVEL II MT	
FIRMA		
APROBADO	Ing. Wilson Andres Bautista - Calidad Hiso Ingeniería	FIRMA INTERVENTORÍA

EVALUACIÓN NDT: PARTICULAS MAGNÉTICAS MT CÓDIGO AWS D1.5:2025

FECHA DE EVALUACIÓN	25 de Julio 2026		
Informe Numero:	MT F001		Pag 2
Consecutivo No	2	Versión No	2

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Empresa Cliente	HISO INGENIERÍA	Proyecto	PUENTE ACACIAS
Informe Dirigido a	Ing. Francisco Mora	Ciudad /dto	Bogotá
Teléfono		Dirección	
Código/Criterios Aceptación	AWS D1.5:2025 Tabla 8,1	Lugar:	ACACIAS – META



Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones




Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones



Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones



Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones




Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones



Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones



Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones

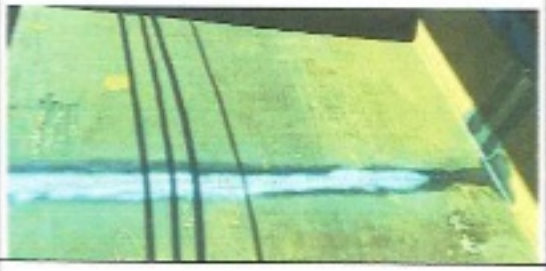

Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones



Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones

INSPECTOR	ING JHONY ROJAS CORTES	
	ANST NIVEL II MT	
FIRMA		
APROBADO	Ing. Wilson Andres Bautista - Calidad Hiso Ingeniería	FIRMA INTERVENTORÍA

EVALUACIÓN NDT: PARTICULAS MAGNÉTICAS		MT CÓDIGO AWS D1.5:2025
FECHA DE EVALUACIÓN	25 de Julio 2026	Pag 2

Informe Numero:	MT F001		
Consecutivo No	2	Versión No	2

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Empresa Cliente	HISO INGENIERÍA	Proyecto	PUENTE ACACIAS
Informe Dirigido a	Ing. Francisco Mora	Ciudad /dto	Bogotá
Teléfono		Dirección	
Código/Criterios Aceptación	AWS D1.5:2025 Table 8.1	Lugar:	ACACIAS – META

		
Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones	Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones	Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones
Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones	Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones	Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones
Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones	Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones	Se realiza Inspección NDT MT Sin Indicaciones

INSPECTOR	ING JHONY ROJAS CORTES	
FIRMA	ANST NIVEL II MT	
APROBADO	Ing. Wilson Andres Bautista - Calidad Hiso Ingeniería	FIRMA INTERVENTORÍA

	EVALUACIÓN NDT: PARTICULAS MAGNÉTICAS MT CÓDIGO AWS D1.5:2025				
	FECHA DE EVALUACIÓN 25 de Julio 2026				
	Informe Numero: MT F001			**Pag No 1 de 2**	
	Consecutivo No 2		**Versión No** 2		
INFORMACIÓN DEL CLIENTE					
Empresa Cliente	HISO INGENIERIA	**Proyecto**	PUENTE ACACIAS		
Informe Dirigido a	Ing. Francisco Mora	**Ciudad /dto.**	Acacias Meta		
Teléfono		**Dirección**			
Código/Criterios Aceptación	AWS D1.5 Tabla 8,1	**Lugar:**	ACACIAS META		
INFORMACIÓN ELEMENTO/ EQUIPO EVALUADO					
Equipo O Elemento Evaluado:	VIGA	**Plano De Inspección No**	VP3TR1A01		
Especificación Material	A709	**Rango De Espesores**	18 mm a 32 mm		
Estado Superficie	Lisa	**Temperatura Superficie**	5° C		
Proceso de Soldadura	FCAW	**Tipo De Junta**	A tope y Filete		
Tratamiento Térmico	N/A	**Diámetro o Longitud**	N/A		
Porcentaje De Inspección	100%	**Desde Superficie De Insp**	EXTERNA		
EQUIPOS DE INSPECCIÓN					
Equipo Yugo MT marca	Magnaflux Y7	**Modelo Serie**	3945		
Método Magnetización	Indirecta	**Tipo Partículas MT**	húmedas Visibles Negras y Secas rojas		
Tipo Corriente	Alterna AC	**Frecuencia Elemento**	2Mhz		
Bloques Calibración peso	10 libras	**Sensibilidad De referencia**	n/a		
PARTICULAS MAGNÉTICAS UTILIZADAS EN LA INSPECCIÓN			**ACCESORIOS EMPLEADOS**		
TIPO	**MARCA**	**REF**	**TIPO**	**MARCA**	**REFERENCIA**
HUMEDAS NEGRAS BAÑO	MAGNAFLUX	7HF	Luxómetro	Mental Meter	S8608
SECAS VISIBLES ROJAS	MAGNAFLUX	8ª	indicador de campo	MAGNAFLUX	MAGNAFLUX
			Gaussimetro	TEST	1558464376
RESULTADOS EVALUACIÓN REALIZADA NDT: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS					
1	ELEMENTOS EVALUADOS		Se inspeccionan 50 mts aproximadamente entre vigas patines y almas		
2	APROBACIÓN O RECHAZO DE ELEMENTOS		No se Presentaron Indicaciones Relevantes Acorde A código AWS D1.5:2025 Tabla 8.1	Todas Las Soldaduras Presentes en el informe están aprobadas acorde a hoja 2 y 3	
3	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN CODIGO		Toda Evaluación Se Desarrolló Bajo Código AWS D1.5:2025 Clausula 8 Acorde a ASTM E 709		
4	VARIABLES A AFECTAR INSPECCIÓN		no se presentaron Variables que afecten la Inspección		
5	OBSERVACIÓN CLIENTE				
INSPECTOR			**ING JHONY ROJAS CORTES**		
			ANST NIVEL II MT		
FIRMA					
APROBADO					

REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL

REVISIÓN:	1
AUTOR:	
EMISIÓN DE FORMATO:	07 DE AGOSTO DE 2017
HOJA:	1

CLIENTE:	HISO INGENIERIA	PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA:	WPS- FCAW HISO 001	REPORTE:	UT - 001
PROYECTO:	PUENTE ACACIAS	ESPECIFICACION DE MATERIAL:	ASTM A 709	FECHA:	25-jul-26
LUGAR:	ACACIAS META	NORMA TECNICA DE INSPECCION:	AWS D1.5:2025	CONTRATO:	NA

EQUIPO DE INSPECCION UT

UNIDAD DE INSPECCION		PALPADOR		ZAPATA	
MARCA	SIUI	MARCA	SIUI	MARCA	SIUI
MODELO	SMART 33 PLAW DETECTOR	MODELO	SDS1TE10AR	MODELO	STB60S
SERIE	M0R5220404SR	FRECUANCIA	2.5 MHZ	ANGULO NOMINAL DEL HAZ REFRACTADO EN EL ACERO	45° SW
		SERIE	230		

CALIBRACION		LEYES FOCALES			
NIVEL DE REFERENCIA	TCG1 ASME/ISO 16/16	TIPO DE BARRIDO	SECTORIAL	VELOCIDAD DE INSPECCION	A 5,9 S (SCAN)
AJUSTE DE SENSIBILIDAD	6 DB	PRIMER MUESTREO	1	ANGULO MENOR	35°
ANGULO USADO	45° - 70°	ULTIMO MUESTREO	14	ANGULO MAYOR	70°
BLOQUE DE CALIBRACION	IIW - 1				
BLOQUE DE REFERENCIA	A 709- GRADO HASTA 4(MM) DT 1				
SUPERFICIE DE REFERENCIA	METAL				
RUIDO	53				
ACOPLANTE	METIL CELULOSA				
LINEALIDAD VERTICAL	BUENA				
LINEALIDAD HORIZONTAL	BUENA				
TIPO DE UNION	A 709- BISEL (B) V				
LIMPIEZA DE SUPERFICIE	CON GRATA MECANICA				
T° DE SUPERFICIE	28°				
ALIVIO TERMICO	NO				

AREA INSPECCIONADA



TRAZABILIDAD INSPECCION						INDICACIONES DEFECTOLOGIA					
ITEM	ISOMETRICO	J	W	Øi (mm)	Tw (mm)	INDICACION	SECCION (mm)	LONGITUD (mm)	PROFUNDIDAD (mm)	CRITERIO	OBSERVACIONES
	VIGA 2 J1 PATIN	16				—	—	—	—	OK	
	VIGA 3 J2 PATIN	17				—	—	—	—	OK	
	VIGA 3 J3 PATIN	18				—	—	—	—	OK	
	VIGA 2 J3 PATIN	19				—	—	—	—	OK	
	VIGA 2 J3 PATIN	20				—	—	—	—	OK	
	VIGA 3 J4 PATIN	21				—	—	—	—	OK	
	VIGA 2 J4 PATIN	22				—	—	—	—	OK	
	VIGA 1 J4 PATIN	23				—	—	—	—	OK	
	VIGA 2 J3 PATIN	24				—	—	—	—	OK	
	VIGA 1 J3 PATIN	25				—	—	—	—	OK	
	VIGA 2 J2 PATIN	26				—	—	—	—	OK	
	VIGA 1 J1 PATIN	27				—	—	—	—	OK	
	VIGA 2 J1 PATIN	28				—	—	—	—	OK	
	VIGA 1 J1 PATIN	29				—	—	—	—	OK	

LISTADO DE INDICACIONES

GL	Fisura longitudinal	ESP	exceso de penetración
GT	–	CV	Cuerda viva
LS	Lineal saliente a la superficie		
LE	Lineal enterrada		
T	Inflexión transversal		
VI	Volumétrica en raíz		
VC	Grupo volumétrico		
VR	volumétrica en la raíz		

COMENTARIOS:

Inspección: Hernando Cubillos	Recibido:	Aprobado:
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Ing. Wilson Baptista	Nombre:
Certificado: UT NIVEL II CERT.: UD-	Cargo: Lider de Calidad Hiso Ingeniería.	Cargo/Registro:
Fecha:	fecha:	fecha:

REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL

REVISION:	1
AUTOR:	
FECHA DE HOMBRE	17 DE AGOSTO DE 2017
HOJA	1

CLIENTE:	HISO INGENIERIA	PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA:	WPS- FCAW HISO 001	REPORTE:	UT - 001
PROYECTO:	PUENTE ACACIAS	ESPECIFICACION DE MATERIAL:	ASTM A 709	FECHA:	25-jul-26
LUGAR:	ACACIAS META	NORMA TECNICA DE INSPECCION:	AWS D1.5:2025	CONTRATO:	NA

EQUIPO DE INSPECCION UT

UNIDAD DE INSPECCION		PALPADOR		ZAPATA	
MARCA	SIUI	MARCA	SIUI	MARCA	SIUI
MODELO	SMART DIGITAL ULTRASONIC DETECTOR	MODELO	QS81721S4R	MODELO	0814665
SERIE#	M3M1203404001R	FRECUENCIA	2.5 MHZ	ANGULO NOMINAL DEL HAZ REFRACTADO EN EL ACERO	45° S/N
		SERIE	226		

CALIBRACION		LEYES FOCALES			
NIVEL DE REFERENCIA	70% ADJUSTED AT %	TIPO DE BARRIDO	SECTORIAL	VELOCIDAD DE INSPECCION	A 2.32 C SCAN
AJUSTE DE SENSIBILIDAD	6 DB	PRIMER ELEMENTO	1	ANGULO MINIMO	40°
ANGULO USADO	45° - 70°	ULTIMO ELEMENTO	16	ANGULO MAXIMO	70°
MUESTRA DE CALIBRACION	IIW - 1				
BLOQUE DE REFERENCIA	A 709, COMPATIBLE AWS D1.1				
CAPA/ESPESOR DE REFERENCIA	50 DB				
BARRIDO	60				
ACOPLANTE	WATER GEL LOGA				
LINEALIDAD VERTICAL	2.5 MM				
LINEALIDAD HORIZONTAL	4.5 MM				
TIPO DE UNION	A TOPE DOBLE BISEL EN V				
LIMPIEZA DE SUPERFICIE	CON GRATA MECANICA				
T° DE SUPERFICIE	20°				
ALIVIO TERMICO	NO				

AREA INSPECCIONADA



TRAZABILIDAD INSPECCION						INDICACIONES DEFECTOLOGIA					
ITEM	ISOMETRICO	J	W	Ø (mm)	Tw (mm)	INDICACION	EMISO (mm)	LOCALIZACION (mm)	PROFUNDIDAD (mm)	OK / R	OBSERVACIONES
	VIGA 1 J4 PATIN	30				-	-	-	-	OK	
	VIGA 1 J3 PATIN	31				-	-	-	-	OK	
	VIGA 1 J2 PATIN	32				-	-	-	-	OK	
	VIGA 4 J1 PATIN	33				-	-	-	-	OK	
	VIGA 4 J2 PATIN	34				-	-	-	-	OK	
	VIGA 4 J3 PATIN	35				-	-	-	-	OK	
	VIGA 4 J4 PATIN	36				-	-	-	-	OK	
	VIGA 3 J1 PATIN SUP	37				-	-	-	-	OK	
	VIGA 3 J2 PATIN SUP	38				-	-	-	-	OK	
	VIGA 1 J1 PATIN SUP	39				-	-	-	-	OK	
	VIGA 1 J2 PATIN SUP	40				-	-	-	-	OK	
	VIGA 1 ALMA	41				-	-	-	-	OK	
	VIGA 2 ALMA	42				-	-	-	-	OK	
	VIGA 3 ALMA	43				-	-	-	-	OK	

LISTADO DE INDICACIONES

GL	Fisura longitudinal	EXP	exceso de penetracion
GT	T	CV	Cruce de via
LS	Linealidad en la superficie		
LS	Linealidad enterrada		
T	Indicacion transversal		
VI	Volumetrica aislada		
VC	Grupo volumetrico		
VR	volumetrica en linea		

COMENTARIOS:

Inspección: PEDRO PRODOLLIANO	Recibido:	Aprobado:
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Ing. Wilson Bautista	Nombre:
Certificado: UT NIVEL II CERT: UD-	Cargo: Lider de Calidad Hiso Ingenieria	Cargo/Registro:
Fecha:	Fecha:	Fecha:

REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL

REVISION	1
AUTOR	
Emision DE FORMATO	17 DE AGOSTO DE 2017
HOJA	1

CLIENTE:	HISO INGENIERIA	PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA:	WPS- FCAW HISO 001	REPORTE:	UT - 001
PROYECTO:	PUENTE ACACIAS	ESPECIFICACION DE MATERIAL:	ASTM A 709	FECHA:	25-jul-26
LUGAR:	ACACIAS META	NORMA TECNICA DE INSPECCION:	AWS D1.5:2025	CONTRATO:	NA

EQUIPO DE INSPECCION UT

UNIDAD DE INSPECCION		PALPADOR		ZAPATA	
MARCA	SIUI	MARCA	SIUI	MARCA	SIUI
MODELO	SIUI ATOR PLAW DETECTOR	MODELO	G2017019HR	MODELO	60N55S
SERIE	M0522004002R	FRECUENCIA	2.5 MHZ	ANGULO NOMINAL DEL HAZ REFRACTADO EN EL ACERO	45° 60°
		SERIE	264		

CALIBRACION		LEYES FOCALES			
NIVEL DE REFERENCIA	100% AMPLITUD 80%	TIPO DE BARRIDO	SECTORIAL	VELOCIDAD DE INSPECCION	4,5,6,7 FPSAR
AJUSTE DE SENSIBILIDAD	6 DB	PRIMER ELEMENTO	1	ANGULO MENOR	45°
RANGO USADO	225 - 75 °	ULTIMO ELEMENTO	16	ANGULO MAYOR	70°
BLOQUE DE CALIBRACION	IIW-1				
BLOQUE DE REFERENCIA	A TOPE CONFORME AWS D1.1				
GANANCIA DE REFERENCIA	40 DB				
RANGO	50				
ACOPLANTE	METYLCEL 30 000				
UNIFORMIDAD VERTICAL	SUERA				
UNIFORMIDAD HORIZONTAL	SUERA				
TIPO DE UNION	A TOPE BISEL DH V				
LIMPIEZA DE SUPERFICIE	DCM GRATA VISCANEZA				
T° DE SUPERFICIE	20°				
ALIVIO TERMICO	NO				

AREA INSPECCIONADA



TRAZABILIDAD INSPECCION						INDICACIONES DEFECTOLOGIA					
ITEM	ISOMETRICO	J	W	Ø (long)	Tw (mm)	INDICACION	EMISO (mm)	LONGITUD (mm)	PROFUNDIDAD (mm)	OK / R	OBSERVACIONES
	VIGA 4 ALMA	44				—	—	—	—	OK	
	VIGA 3 J4 ALMA RECIBE VIGA 6	44				—	—	—	—	OK	
	VIGA 3 J3 RECIBE VIGA 14	44				—	—	—	—	OK	
	VIGA 2 J4	44				—	—	—	—	OK	
	VIGA 3 LONGITUDINAL	44				—	—	—	—	OK	

LISTADO DE INDICACIONES:

SL	Falta longitudinal	EXP	exceso de penetracion
ST	T	CV	Cruce de via
LS	Linea abierta a la superficie		
LB	Linea enterrada		
T	Indicacion transversa		
VI	Vacio entre viruta		
VC	Grupo volumetrico		
VR	volumetrico en la raiz		

COMENTARIOS:

Inspeccion:	Recibido:	Aprobado:
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Ing. Wilson Bautista	Nombre:
Certificado: UT NIVEL II CERT: 03-	Cargo: Lider de Calidad Hiso Ingenieria.	Cargo/Registro:
Fecha:	Fecha:	Fecha:

REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL


REVISADO:	1
AUTOR:	JOSE LUIS CARROJA
EMISION DE FORMATO:	01 DE AGOSTO DE 2017
HOJA:	2


CLIENTE:	HISO INGENIERIA	PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA:	WPS- FCAW HISO 001	REPORTE:	UT - 001
PROYECTO:	PUENTE ACACIAS	ESPECIFICACION DE MATERIAL:	ASTM A 709	FECHA:	25-jul-26
LUGAR:	ACACIAS- META	NORMA TECNICA DE INSPECCION:	AWS D1.5:2025	CONTRATO:	NA

EQUIPO DE INSPECCION UT

UNIDAD DE INSPECCION		PALPADOR		ZAPATA	
MARCA	SIUI	MARCA	SIUI	MARCA	SIUI
MODELO	SMARTOR FLAW DETECTOR	MODELO	5391701HR	MODELO	5WR65
SERIE	M3H2220404331	FRECUENCIA	2.5 MHZ	ANGULO NOMINAL DEL HAZ REFRACTADO EN EL ACERO	45° S/K
		SERIE	298		


IDENTIFICACION	JR 0016 LA V5						CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO			LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° -65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
1		A	70	-	-	-	-	-

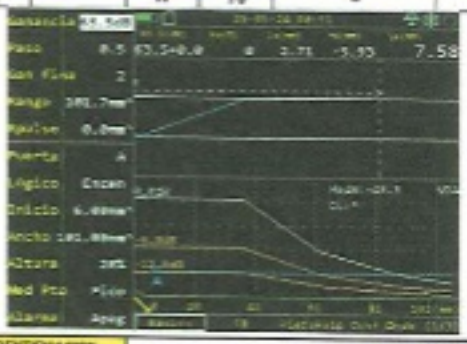

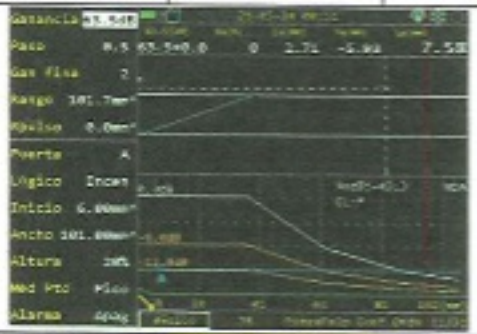

IDENTIFICACION	JR 007 LA V4						CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO			LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° -65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
0		A	70	-	-	-	-	-



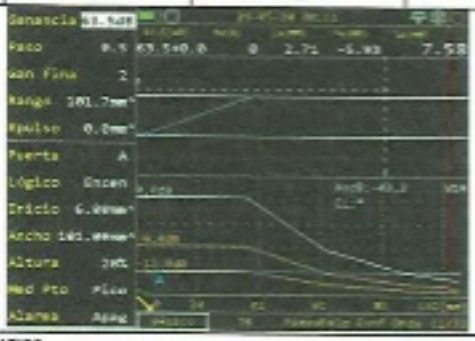

AREA INSPECCIONADA



COMENTARIOS:

Nombre: Certificado: UT NIVEL II CWI: Firma:	Recibido: Firma:	Aprobado: Firma:
Nombre: Certificado UT NIVEL II CWI:	Nombre: Ing. Wilson Bautista Cargo: Lider de Calidad Hiso Ingenieria.	Nombre: Cargo/Registro:

REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL


REVISION	1
AUTOR	JOSE LUIS QUIROGA
EMISION DE FORMATO	31 DE AGOSTO DE 2017
HOJA	3

CLIENTE:	HISO INGENIERIA	PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA:	WPS- FCAW HISO 001	REPORTE:	UT - 001
PROYECTO:	PUENTE ACACIAS	ESPECIFICACION DE MATERIAL:	ASTM A 709	FECHA:	25-jul-26
LUGAR:	ACACIAS -META	NORMA TECNICA DE INSPECCION:	AWS D1.5:2025	CONTRATO:	NA


EQUIPO DE INSPECCION UT

UNIDAD DE INSPECCION		PALPADOR		ZAPATA	
MARCA	SIUI	MARCA	SIUI	MARCA	SIUI
MODELO	DIAMETOR PCAW DETECTOR	MODELO	0201701547	MODELO	SWB60T
SERIE	MONTZZADA2021	FRECUENCIA	2.5 MHZ	ANGULO NOMINAL DEL HAZ REFRACTADO EN EL ACERO	45° SW
		SERIE	288		

IDENTIFICACION		JR0015 LA V5				CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 45°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
1		A	35°	-	-	-	-	-

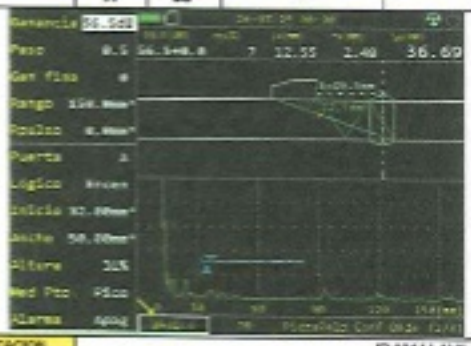

IDENTIFICACION		JR 0014 LAV5				CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 45°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
0		A	35°	-	-	-	-	-

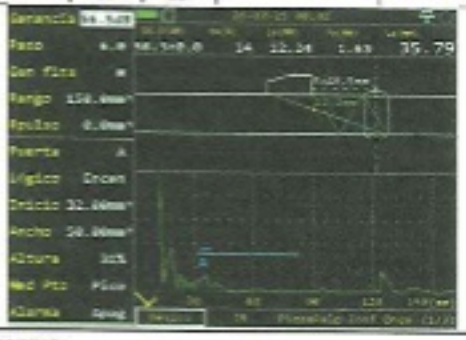

AREA INSPECCIONADA



COMENTARIOS:

Nombre: Certificado: UT NIVEL II CERT: [illegible] Firma:	Recibido: Firma:	Aprobado: Firma:
Nombre: Certificado:UT NIVEL II CERT:	Nombre: Ing. Wilson Bayuelo Cargo: Lider de Calidad Hiso Ingenieria.	Nombre: Cargo/Registro:

REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL

REVISION	0
AUTOR	JOSE LUIS GUEVARA
EMISION DE FORMATO	01 DE AGOSTO DE 2017
HOJA	4

CLIENTE:	HISO INGENIERIA	PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA:	WPS- FCAW HISO 001	REPORTE:	UT - 001
PROYECTO:	PUENTE ACACIAS	ESPECIFICACION DE MATERIAL:	ASTM A 709	FECHA:	25-jul-26
LUGAR:	ACACIAS -META	NORMA TECNICA DE INSPECCION:	AWS D1.5:2025	CONTRATO:	NA

EQUIPO DE INSPECCION UT


UNIDAD DE INSPECCION		PALPADOR		ZAPATA	
MARCA	GE	MARCA	SIUI	MARCA	SIUI
MODELO	SMARTSCAN FLAW DETECTOR	MODELO	0201701S4R	MODELO	SIUI/SIS
SERIE	M0622240432R	FRECUENCIA	2.5 MHZ	ANGULO NOMINAL DEL HAZ REFRACTADO EN EL ACERO	45° SAC
		SERIE	255		

IDENTIFICACION	JR0015 LA V5					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° -65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
1		A	35°	-	-	-	-	-





IDENTIFICACION	JR 0014 LAV5					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° -65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
0		A	35°	-	-	-	-	-

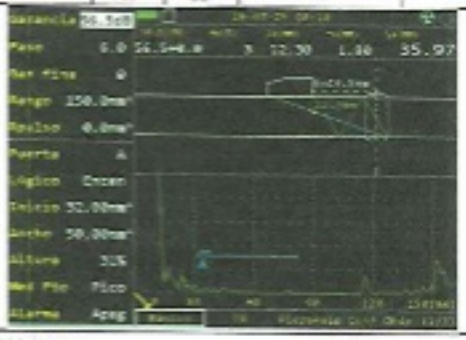



AREA INSPECCIONADA



COMENTARIOS:

Nombre: Certificado: UT NIVEL II CERT: US Firma:	Recibido: Firma:	Aprobado: Firma:
Nombre: Certificado:UT NIVEL II CERT:	Nombre: Ing. Wilson Bautista Cargo: Líder de Calidad Hiso Ingeniería.	Nombre: Cargo/Registro:


Quality Welding GROUP	REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL			REVISION	1
				AUTOR	JUAN LUIS GUERRERO
				EMISION DEL FORMATO	01 DE AGOSTO DE 2017
				HOJA	5

CLIENTE:	HISO INGENIERIA	PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA:	WPS- FCAW HISO 001	REPORTE:	UT - 001
PROYECTO:	PUENTE ACACIAS	ESPECIFICACION DE MATERIAL:	ASTM A 709	FECHA:	25-jul-26
LUGAR:	ACACIAS-META	NORMA TECNICA DE INSPECCION:	AWS D1.5:2025	CONTRATO:	NA

EQUIPO DE INSPECCION UT


UNIDAD DE INSPECCION		PALPADOR		ZAPATA	
MARCA	SIUI	MARCA	SIUI	MARCA	SIUI
MODELO	SMARTOR FLAW DETECTOR	MODELO	D2917S10HR	MODELO	D2N22S
SERIE	W0622320432R	FRECUENCIA	2.5 MHZ	ANGULO NOMINAL DEL HAZ REFRACTADO EN EL ACERO	45° SW
		SERIE	258		


IDENTIFICACION	JR0015 LA V9					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
1		A	35°	-	-	-	-	-

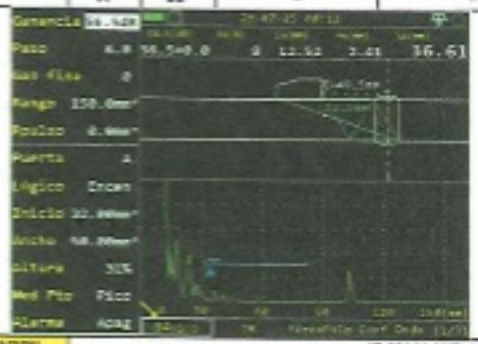



IDENTIFICACION	JR 0014 LAV5					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
0		A	35°	-	-	-	-	-

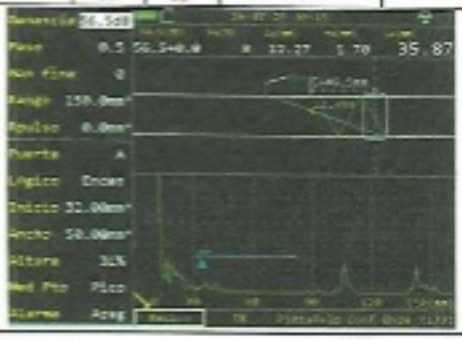

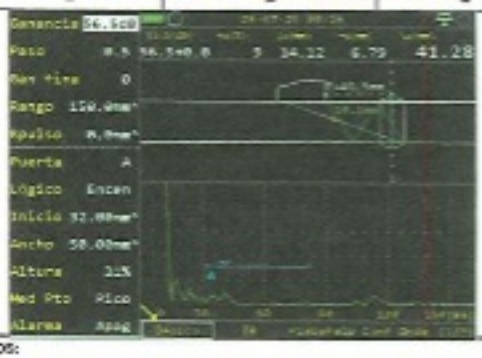

AREA INSPECCIONADA



COMENTARIOS:

Nombre: Certificado: UT NIVEL II CERT:	Recibido:	Aprobado:
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Certificado:UT NIVEL II CERT:	Nombre: Ing. Wilson Bautista Cargo: Lider de Calidad Hiso Ingenieria.	Nombre: Cargo/Registro:

REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL


REVISION	1
AUTOR	JOSE LUIS CORTOZA
EMISION DE FORMATO	01 DE AGOSTO DE 2017
HOJA	6

CLIENTE:	HISO INGENIERIA	PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA:	WPS- FCAW HISO 001	REPORTE:	UT - 001
PROYECTO:	FUENTE ACACIAS	ESPECIFICACION DE MATERIAL:	ASTM A 709	FECHA:	25-jul-26
LUGAR:	ACACIAS -META	NORMA TECNICA DE INSPECCION:	AWS D1.5:2025	CONTRATO:	NA

EQUIPO DE INSPECCION UT


UNIDAD DE INSPECCION		PALPADOR		ZAPATA	
MARCA	SIUI	MARCA	SIUI	MARCA	SIUI
MODELO	SMARTOR FLAW DETECTOR	MODELO	0.25"/10MR	MODELO	60°/MS
SERIE	0CH5023404721	FRECUENCIA	2.5 MHZ	ANGULO NOMINAL DEL HAZ REFRACTADO EN EL ACERO	60° SW
		SERIE	248		

IDENTIFICACION	JR0015 LA V9					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 60°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
1		A	35°	-	-	-	-	-

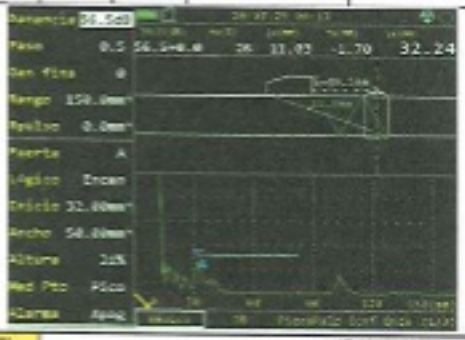



IDENTIFICACION	JR 0014 LAV5					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 60°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
0		A	35°	-	-	-	-	-

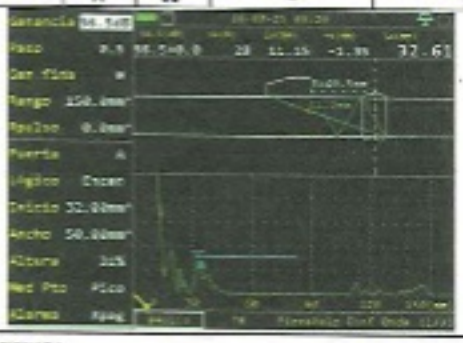



AREA INSPECCIONADA



COMENTARIOS:

Nombre: Certificado: UT NIVEL II CERT: US Firma:	Recibido: Firma:	Aprobado: Firma:
Nombre: Certificado UT NIVEL II CERT:	Nombre: Ing. Wilson Bautista Cargo: Lider de Calidad Hiso Ingenieria.	Nombre: Cargo/Registro:

Quality Welding Group	REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL	REVISIÓN	1
		AUTOR	JOSE LUIS SUAREZ
		EMISION DE FORMATO	04 DE AGOSTO DE 2017
		HOJA	7

CLIENTE:	HISO INGENIERIA	PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA:	WPS- FCAW HISO 001	REPORTE:	UT - 001
PROYECTO:	PUENTE ACACIAS	ESPECIFICACION DE MATERIAL:	ASTM A 709	FECHA:	25-jul-26
LUGAR:	ACACIAS -META	NORMA TECNICA DE INSPECCION:	AWS D1.5:2025	CONTRATO:	NA

EQUIPO DE INSPECCION UT


UNIDAD DE INSPECCION		PALPADOR		ZAPATA	
MARCA	SIUI	MARCA	SIUI	MARCA	SIUI
MODELO	SMARTOR FLAW DETECTOR	MODELO	G2017194R	MODELO	SENSOR
SERIE	W0R0222H0428	FRECUENCIA	2.5 MHZ	ANGULO NOMINAL DEL HAZ REFRACTADO EN EL ACERO	40° SW
		SERIE	258		

IDENTIFICACION	JR0015 LA V6					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
1		A	35°	-	-	-	-	-





IDENTIFICACION	JR 0014 LAV5					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
0		A	35°	-	-	-	-	-

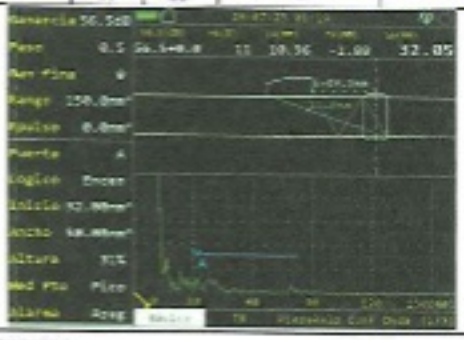



AREA INSPECCIONADA



COMENTARIOS:

Nombre: Certificado: UT NIVEL II CERT: 16 Firma:	Recibido: Firma:	Aprobado: Firma:
Nombre: Certificado:UT NIVEL II CERT:	Nombre: Ing. Wilson Bautista Cargo: Lider de Calidad Hiso Ingenieria.	Nombre: Cargo/Registro:

REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL

REVISION	1
AUTOR	JOSE LUIS QUIROGA
FECHA DE EMISION	05 DE AGOSTO DE 2025
HOJA	5


CLIENTE:	HISO INGENIERIA	PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA:	WPS- FCAW HISO 001	REPORTE:	UT - 001
PROYECTO:	PUENTE ACACIAS	ESPECIFICACION DE MATERIAL:	ASTM A 709	FECHA:	25-jul-26
LUGAR:	ACACIAS -META	NORMA TECNICA DE INSPECCION:	AWS D1.5:2025	CONTRATO:	NA

EQUIPO DE INSPECCION UT

UNIDAD DE INSPECCION		PALPADOR		ZAPATA	
MARCA	SIUI	MARCA	SIUI	MARCA	SIUI
MODELO	SMARTOR FLAW DETECTOR	MODELO	[illegible]	MODELO	[illegible]
SERIE	[illegible]	FRECUENCIA	2.5 MHZ	ANGULO NOMINAL DEL HAZ REFRACTADO EN EL ACERO	45° SW
		SERIE	258		

IDENTIFICACION	JR0015 LA V5					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° -60°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
1		A	35°	-	-	-	-	-



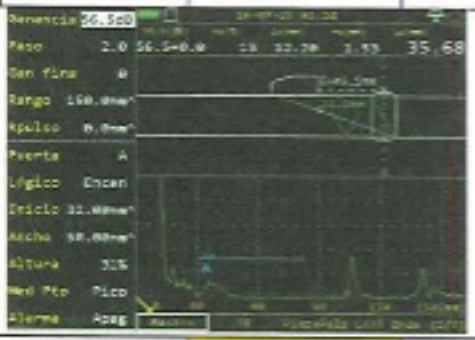

IDENTIFICACION	JR 0014 LAV5					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° -60°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
0		A	35°	-	-	-	-	-





AREA INSPECCIONADA



COMENTARIOS:

Nombre: Certificado: UT NIVEL II CSWIP [illegible] Firma:	Recibido: Firma:	Aprobado: Firma:
Nombre: Certificado:UT NIVEL II CSWIP:	Nombre: Ing. Wilson Bautista Cargo: Lider de Calidad Hiso Ingeniería.	Nombre: Cargo/Registro:

REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL

REVISION	1
EMITIDO	JOSE LUIS GUARNIZO
EMISION DEL FORMATO	31 DE AGOSTO DE 2017
HOJA	9

CLIENTE:	HISO INGENIERIA	PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA:	WPS- FCAW HISO 001	REPORTE:	UT - 001
PROYECTO:	PUENTE ACACIAS	ESPECIFICACION DE MATERIAL:	ASTM A 709	FECHA:	25-jul-26
LUGAR:	ACACIAS -META	NORMA TECNICA DE INSPECCION:	AWS D1.5:2025	CONTRATO:	XA

EQUIPO DE INSPECCION UT

UNIDAD DE INSPECCION		PALPADOR		ZAPATA	
MARCA	SUI	MARCA	SUI	MARCA	SUI
MODELO	SIGNATOR PLUS DETECTOR	MODELO	GSS1701HR	MODELO	SWS55
SERIE	MC6220304R0R	FRECUENCIA	2.5 MHZ	ANGULO NOMINAL DEL HAZ REFRACTADO EN EL ACERO	45° SW
		SERIE	253		


IDENTIFICACION		JR0015 LA VS					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA				
JUNTA	SOLDADOR	45° - 65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
1		A	35°	-	-	-	-	-





IDENTIFICACION		JR 0014 LAWS					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA				
JUNTA	SOLDADOR	45° - 65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
0		A	35°	-	-	-	-	-



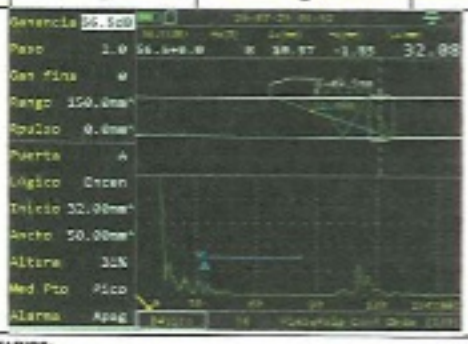

AREA INSPECCIONADA



COMENTARIOS:

Nombre: Certificado: UT NIVEL II CERT. N° Firma:	Recibido: Firma:	Aprobado: Firma:
Nombre: Certificado:UT NIVEL II CERT:	Nombre: Ing. Wilson Bautista Cargo: Lider de Calidad Hiso Ingeniería.	Nombre: Cargo/Registro:

REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL


REVISION	1
AUTOR	JOSE LUIS QUIÑONEZ
EMISION DE FORMATO	01 DE AGOSTO DE 2017
HOJA	10

CLIENTE:	HISO INGENIERIA	PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA:	WPS- FCAW HISO 001	REPORTE:	UT - 001
PROYECTO:	PUENTE ACACIAS	ESPECIFICACION DE MATERIAL:	ASTM A 709	FECHA:	25-jul-26
LUGAR:	ACACIAS-META	NORMA TECNICA DE INSPECCION:	AWS D1.5:2025	CONTRATO:	NA

EQUIPO DE INSPECCION UT

UNIDAD DE INSPECCION		PALPADOR		ZAPATA	
MARCA	SIUI	MARCA	SIUI	MARCA	SIUI
MODELO	DIAMATOR FLAW DETECTOR	MODELO	G2017219R	MODELO	ESN035
SERIE	N°0822DH0439	FRECUENCIA	2.5 MHZ	ANGULO NOMINAL DEL HAZ REFRACTADO EN EL ACERO	45° SW
		SERIE	255		


IDENTIFICACION:	JR0015 LA V5						CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR:	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA				
JUNTA	SOLDADOR	45° - 65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
1		A	35°	-	-	-	-	-

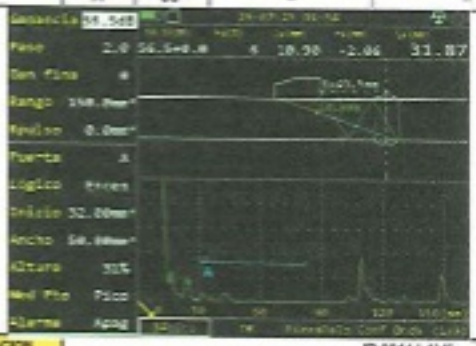



IDENTIFICACION	JR 0014 LAV5						CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR:	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA				
JUNTA	SOLDADOR	45° - 65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
0		A	35°	-	-	-	-	-



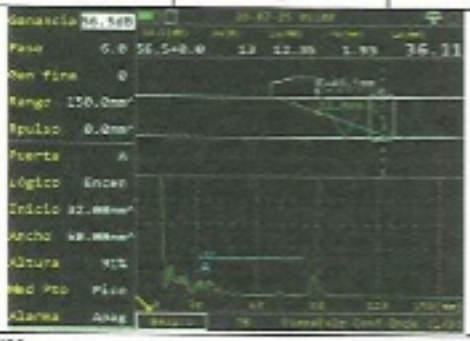

AREA INSPECCIONADA



COMENTARIOS:

Nombre: Certificado: UT NIVEL II CERT: 24 Firma:	Recibido: Firma:	Aprobado: Firma:
Nombre: Certificado:UT NIVEL II CERT:	Nombre: Ing. Wilson Bautista Cargo: Lider de Calidad Hiso Ingenieria.	Nombre: CargoRegistro:

REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL


REVISION	1
EDITOR	JOSE LUIS GUZMAN
EMISION DEL FORMATO	01 DE AGOSTO DE 2017
HOJA	11


CLIENTE:	HISO INGENIERIA	PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA:	WPS- FCAW HISO 001	REPORTE:	UT - 001
PROYECTO:	PUENTE ACACIAS	ESPECIFICACION DE MATERIAL:	ASTM A 709	FECHA:	25-jul-26
LUGAR:	ACACIAS -META	NORMA TECNICA DE INSPECCION:	AWS D1.5:2025	CONTRATO:	NA

EQUIPO DE INSPECCION UT


UNIDAD DE INSPECCION		PALPADOR		ZAPATA	
MARCA	SUI	MARCA	SUI	MARCA	SUI
MODELO	SMARTSCAN PLAIN DETECTOR	MODELO	G2S17D10AR	MODELO	SWS60
SERIE	MC6222245902R	FRECUENCIA	2.5 MHZ	ANGULO NOMINAL DEL HAZ REFRACTADO EN EL ACERO	42° SW
		SERIE	253		


IDENTIFICACION	JR0015 LA VS					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR:	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
1		A	35°	-	-	-	-	-

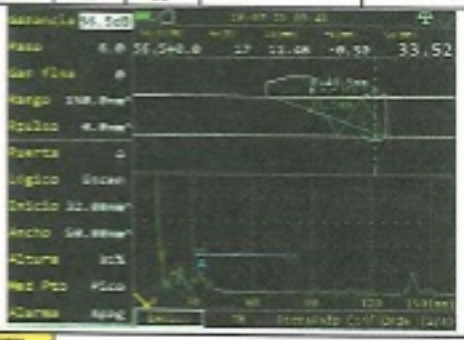

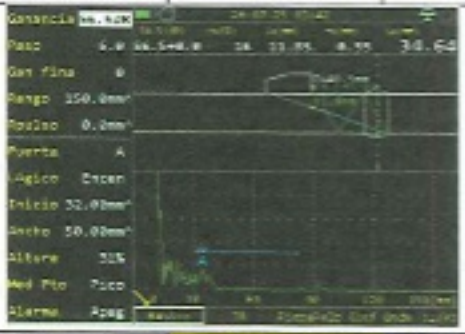

IDENTIFICACION	JR 0014 LAVS					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR:	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
0		A	35°	-	-	-	-	-

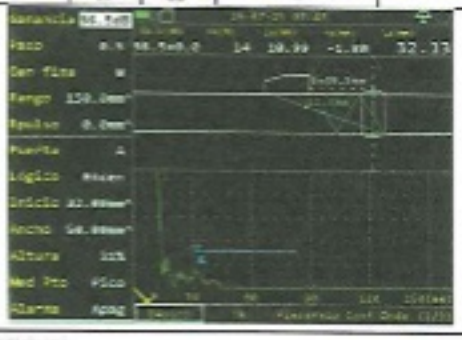

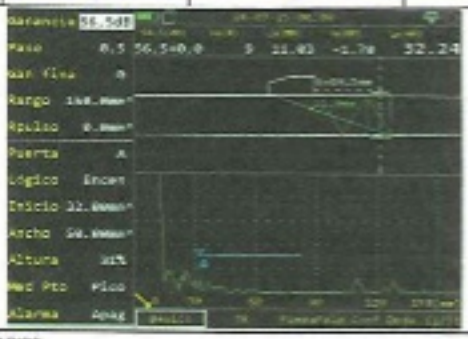

AREA INSPECCIONADA



COMENTARIOS:

Nombre: Certificado: UT NIVEL II CERT: [illegible] Firma:	Recibido: Firma:	Aprobado: Firma:
Nombre: Certificado:UT NIVEL II CERT:	Nombre: Ing. Wilson Bautista Cargo: Lider de Calidad Hiso Ingenieria.	Nombre: Cargo/Registro:

REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL

				REVISION:	1
				AUTOR:	JORGE LUIS CUBILLOS
				EMISION DE DOCUMENTO:	01 DE AGOSTO DE 2017
				HOJA:	12
CLIENTE:	HISO INGENIERIA	PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA:	WPS - FCAW HISO 001	REPORTE:	UT - 001
PROYECTO:	PUENTE ACACIAS	ESPECIFICACION DE MATERIAL:	ASTM A 709	FECHA:	25-jul-26
LUGAR:	ACACIAS -META	NORMA TECNICA DE INSPECCION:	AWS D1.5:2025	CONTRATO:	NA

EQUIPO DE INSPECCION UT

UNIDAD DE INSPECCION		PALPADOR		ZAPATA	
MARCA	SUI	MARCA	SUI	MARCA	SUI
MODELO	QUARTUS FLAW DETECTOR	MODELO	0251701547	MODELO	559-555
SERIE	M0122045402R	FRECUENCIA	2.5 MHZ	ANGULO NOMINAL DEL HAZ REFRACTADO EN EL ACERO	45° SW
		SERIE	255		


IDENTIFICACION	JR0015 LA VS					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR: 32 mm	DIAMETRO			LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
1		A	35°	-	-	-	-	-





IDENTIFICACION	JR 0014 LAVS					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR: 32 mm	DIAMETRO			LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
0		A	35°	-	-	-	-	-



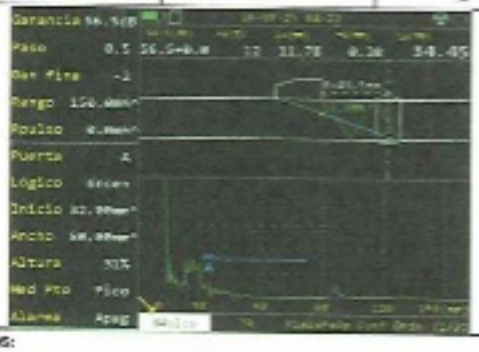

AREA INSPECCIONADA



COMENTARIOS:

Nombre: Certificado: UT NIVEL II CGRT: [illegible] Firma:	Recibido: Firma:	Aprobado: Firma:
Nombre: Certificado UT NIVEL II CGRT:	Nombre: Ing. Wilson Bautista Cargo: Lider de Calidad Hiso Ingenieria.	Nombre: Cargo/Registro:

REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL

REVISION:	1
AUTOR:	JORE LUIS GUEROCA
EMISION DE INFORME:	31 DE AGOSTO DE 2017
HOJA:	13


CLIENTE:	HISO INGENIERIA	PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA:	WPS- FCAW HISO 001	REPORTE:	UT - 001
PROYECTO:	FUENTE ACACIAS	ESPECIFICACION DE MATERIAL:	ASTM A 709	FECHA:	25-jul-26
LUGAR:	ACACIAS -META	NORMA TECNICA DE INSPECCION:	AWS D1.5:2025	CONTRATO:	NA

EQUIPO DE INSPECCION UT

UNIDAD DE INSPECCION		PALPADOR		ZAPATA	
MARCA	SIUI	MARCA	SIUI	MARCA	SIUI
MODELO	SMARTOR FLAW DETECTOR	MODELO	G2917E19xR	MODELO	5X60S
SERIE	V0#S2240422R	FRECUENCIA	2.5 MHZ	ANGULO NOMINAL DEL HAZ REFRACTADO EN EL ACERO	45° SW
		SERIE	248		


IDENTIFICACION			JR3015 LA VS				CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm		DIAMETRO			LONGITUD INSPECCIONADA		
JUNTA	SOLDADOR	45° - 02°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
1		A	35°	-	-	-	-	-



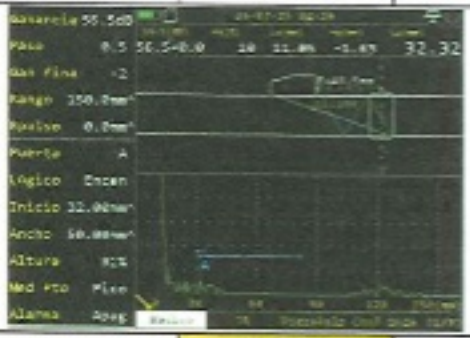

IDENTIFICACION			JR 0014 LAVS				CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm		DIAMETRO			LONGITUD INSPECCIONADA		
JUNTA	SOLDADOR	45° - 02°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
0		A	35°	-	-	-	-	-



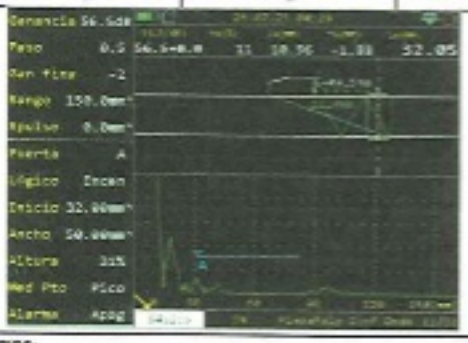

AREA INSPECCIONADA:



COMENTARIOS:

Nombre: Certificado: UT NIVEL II CERT: US Firma:	Recibido: Firma:	Aprobado: Firma:
Nombre: Certificado UT NIVEL II CERT:	Nombre: Ing. Wilson Bautista Cargo: Lider de Calidad Hiso Ingenieria.	Nombre: Cargo/Registro:

REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL

REVISION:	1
AUTOR:	JOSE LUIS QUEROZ
FECHA DE PERIODO:	01 DE AGOSTO DE 2017
HOJA:	14

CLIENTE:	HISO INGENIERIA	PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA:	WPS- FCAW HISO 001	REPORTE:	UT - 001
PROYECTO:	PUENTE ACACIAS	ESPECIFICACION DE MATERIAL:	ASTM A 709	FECHA:	25-jul-26
LUGAR:	ACACIAS -META	NORMA TECNICA DE INSPECCION:	AWS D1.5:2025	CONTRATO:	NA

EQUIPO DE INSPECCION UT


UNIDAD DE INSPECCION		PALPADOR		ZAPATA	
MARCA	SIUI	MARCA	SIUI	MARCA	SIUI
MODELO	SIGNATOR PLATA DETECTOR	MODELO	G2S17E19MR	MODELO	SX5203
SERIE	WC2203F6393JH	FRECUENCIA	2.5 MHZ	ANGULO NOMINAL DEL HAZ REFRACTADO EN EL ACERO	45° SW
		SERIE	250		


IDENTIFICACION	JR0015 LA VS					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° -65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
1		A	35°	-	-	-	-	-





IDENTIFICACION	JR 0014 LAVS					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° -65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
0		A	35°	-	-	-	-	-

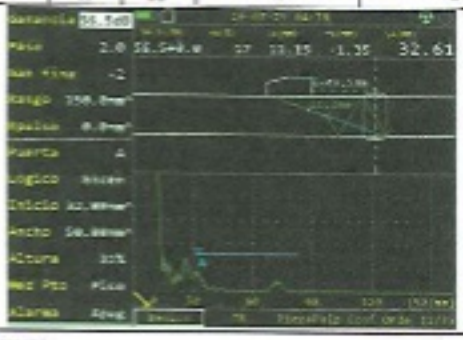

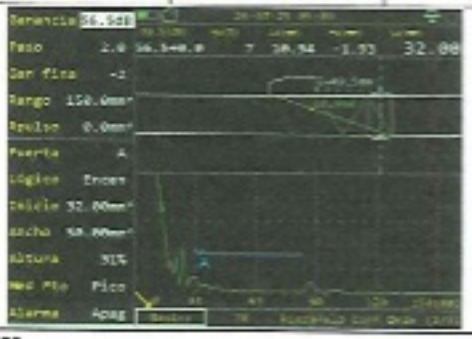

AREA INSPECCIONADA



COMENTARIOS:

Nombre: Certificado: UT NIVEL II CERT:	Revisado: Firma:	Aprobado: Firma:
Nombre: Certificado:UT NIVEL II CERT:	Nombre: Ing. Wilson Bahtista Cargo: Lider de Calidad Hiso Ingenieria.	Nombre: Cargo/Registro:

REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL

REVISION:	1
AUTOR:	JOSE LUIS QUIROGA
EMISION DEL FORMATO:	01 DE AGOSTO DE 2017
HOJA:	15

CLIENTE:	HISO INGENIERIA	PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA:	WPS- FCAW HISO 001	REPORTE:	UT - 001
PROYECTO:	PUENTE ACACIAS	ESPECIFICACION DE MATERIAL:	ASTM A 709	FECHA:	25-jul-26
LUGAR:	ACACIAS -META	NORMA TECNICA DE INSPECCION:	AWS D1.5:2025	CONTRATO:	NA

EQUIPO DE INSPECCION UT

UNIDAD DE INSPECCION		PALPADOR		ZAPATA	
MARCA	SIUI	MARCA	SIUI	MARCA	SIUI
MODELO	SIUI [illegible]	MODELO	[illegible]	MODELO	[illegible]
SERIE	[illegible]	FRECUENCIA	2.5 MHZ	ANGULO NOMINAL DEL HAZ REFRACTADO EN EL ACERO	45° SW
		SERIE	258		


IDENTIFICACION		JR0015 LA V6				CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR:	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° -45°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
1		A	35°	-	-	-	-	-



IDENTIFICACION		JR 0014 LAV5				CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR:	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° -45°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
0		A	35°	-	-	-	-	-



AREA INSPECCIONADA



COMENTARIOS:

Nombre: Certificado: UT NIVEL II CERT: [illegible] Firma:	Recibido: Firma:	Aprobado: Firma:
Nombre: Certificado:UT NIVEL II CERT:	Nombre: Ing. Wilson Bautista Cargo: Lider de Calidad Hiso Ingenieria.	Nombre: Cargo/Registro:

REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL

REVISION	1
AUTOR	JOSE LUIS DE MOYA
EMISION DE FORMATO	01 DE AGOSTO DE 2017
HOJA	18

CLIENTE:	HISO INGENIERIA	PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA:	WPS- FCAW HISO 001	REPORTE:	UT - 001
PROYECTO:	PUENTE ACACIAS	ESPECIFICACION DE MATERIAL:	ASTM A 709	FECHA:	25-jul-26
LUGAR:	ACACIAS -META	NORMA TECNICA DE INSPECCION:	AWS D1.5:2025	CONTRATO:	NA

EQUIPO DE INSPECCION UT

UNIDAD DE INSPECCION		PALPADOR		ZAPATA	
MARCA	SUI	MARCA	SUI	MARCA	SUI
MODELO	GWARTOR FLAW DETECTOR	MODELO	GSS1701HR	MODELO	WASSE
SERIE	MOR0004940GR	FRECUENCIA	2.5 MHZ	ANGULO NOMINAL DEL HAZ REFRACTADO EN EL ACERO	45° SW
		SERIE	258		

IDENTIFICACION	JR0015 LA VS				CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA		


JUNTA	SOLDADOR	45° - 60°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
1		A	35°	-	-	-	-	-






IDENTIFICACION	JR 0014 LAVS				CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA		

JUNTA	SOLDADOR	45° - 60°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
0		A	35°	-	-	-	-	-

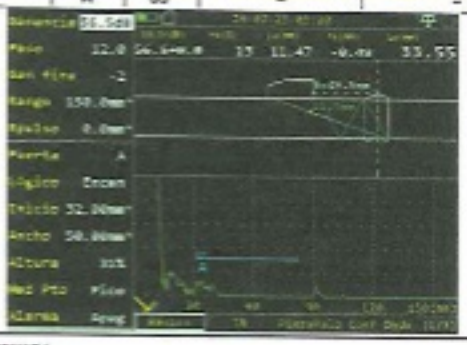

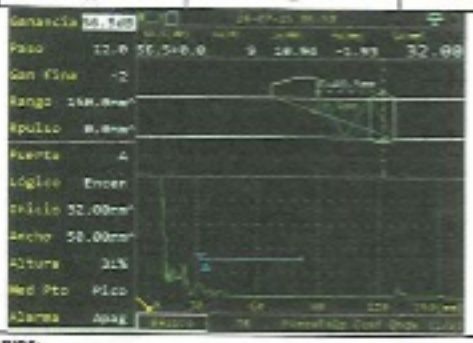

AREA INSPECCIONADA



COMENTARIOS:

Nombre: Certificado: UT NIVEL II CERT: [illegible] Firma:	Recibido: Firma:	Aprobado: Firma:
Nombre: Certificado UT NIVEL II CERT:	Nombre: Ing. Wilson Bautista Cargo: Lider de Calidad Hiso Ingenieria.	Nombre: Cargo/Registro:

REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL

REVISIÓN	1
AUTOR	JOSE LUIS CORTAZA
EMISION DE FORMATO	01 DE AGOSTO DE 2017
HOJA	17


CLIENTE:	HISO INGENIERIA	PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA:	WPS- FCAW HISO 001	REPORTE:	UT - 001
PROYECTO:	PUENTE ACACIAS	ESPECIFICACION DE MATERIAL:	ASTM A 709	FECHA:	25-jul-26
LUGAR:	ACACIAS -META	NORMA TECNICA DE INSPECCION:	AWS D1.5:2025	CONTRATO:	NA

EQUIPO DE INSPECCION UT

UNIDAD DE INSPECCION		PALPADOR		ZAPATA	
MARCA	SIUI	MARCA	SIUI	MARCA	SIUI
MODELO	SMARTOR FLAW DETECTOR	MODELO	G2017216HR	MODELO	SHOE
SERIE	[illegible]	FRECUENCIA	2.5 MHZ	ANGULO NOMINAL DEL HAZ REFRACTADO EN EL ACERO	45° SW
		SERIE	2/5		

IDENTIFICACION:	JR0016 LA V5					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR:	32 mm	DIAMETRO:		LONGITUD INSPECCIONADA:			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
1		A	35°	-	-	-	-	-



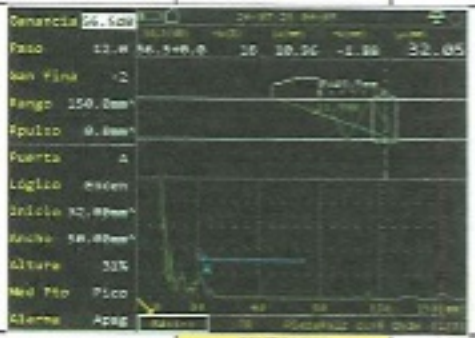

IDENTIFICACION:	JR 0014 LAV5					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR:	32 mm	DIAMETRO:		LONGITUD INSPECCIONADA:			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
0		A	35°	-	-	-	-	-





AREA INSPECCIONADA:



COMENTARIOS:

Nombre: Certificado: UT NIVEL II CERT: [illegible] Firma:	Recibido: Firma:	Aprobado: Firma:
Nombre: Certificado:UT NIVEL II CERT:	Nombre: Ing. Wilson Bautista Cargo: Lider de Calidad Hiso Ingeniería.	Nombre: Cargo/Registro:

REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL

REVISION:	1
AUTOR:	JOSE LUIS QUIMBAYA
EMISION DE FORMATO:	31 DE AGOSTO DE 2017
HOJA:	18


CLIENTE:	HISO INGENIERIA	PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA:	WPS- FCAW HISO 001	REPORTE:	UT - 001
PROYECTO:	PUENTE ACACIAS	ESPECIFICACION DE MATERIAL:	ASTM A 709	FECHA:	25-jul-26
LUGAR:	ACACIAS -META	NORMA TECNICA DE INSPECCION:	AWS D1.5:2025	CONTRATO:	NA


EQUIPO DE INSPECCION UT

UNIDAD DE INSPECCION		PALPADOR		ZAPATA	
MARCA	SIUI	MARCA	SIUI	MARCA	SIUI
MODELO	SMART OR PLUS DETECTOR	MODELO	G2S17D19AR	MODELO	[illegible]
SERIE	V0102224G1922R	FRECUENCIA	2.5 MHZ	ANGULO NOMINAL EN EL HAZ REFRACTADO EN EL ACERO	45° SW
		SERIE	353		

IDENTIFICACION	JR0015 LA V5				CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA		


JUNTA	SOLDADOR	45° - 60°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
1		A	35°	-	-	-	-	-

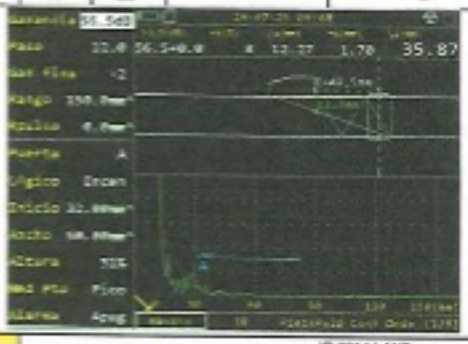

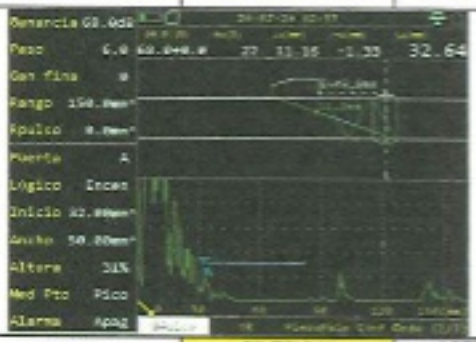

IDENTIFICACION	JR 0014 LAV5				CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA		

JUNTA	SOLDADOR	45° - 60°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
0		A	35°	-	-	-	-	-

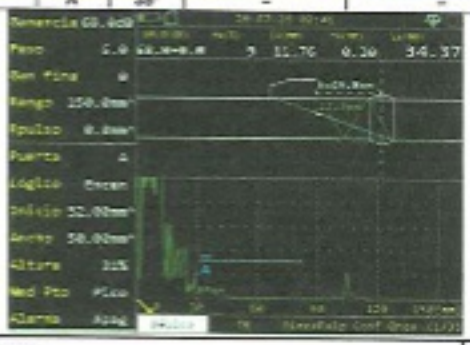



AREA INSPECCIONADA



COMENTARIOS:

Nombre: Certificado: UT NIVEL II CERT: UC Firma:	Recibido: Firma:	Aprobado: Firma:
Nombre: Certificado:UT NIVEL II CERT:	Nombre: Ing. Wilson Bautista Cargo: Lider de Calidad Hiso Ingeniería.	Nombre: Cargo/Registro:

Quality Welding GROUP	REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL			REVISION:	1
				AUTOR:	JOSE LUIS GUERRA
				EMISION DE FORMATO	01 DE AGOSTO DE 2017
				HOJA:	19
CLIENTE:	HISO INGENIERIA	PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA:	WPS- FCAW HISO 001	REPORTE:	UT - 001
PROYECTO:	FUENTE ACACIAS	ESPECIFICACION DE MATERIAL:	ASTM A 709	FECHA:	25-jul-26
LUGAR:	ACACIAS -META	NORMA TECNICA DE INSPECCION:	AWS D1.5:2026	CONTRATO:	NA

EQUIPO DE INSPECCION UT


UNIDAD DE INSPECCION		PALPADOR		ZAPATA	
MARCA	SIUI	MARCA	SIUI	MARCA	SIUI
MODELO	SMARTOR PLAY DETECTOR	MODELO	D3017E1N4R	MODELO	6N60S
SERIE	W0623224XXXXH	FRECUENCIA	2.5 MHZ	ANGULO NOMINAL DEL HAZ REFRACTADO EN EL ACERO	45° SW
		SERIE	2W		

IDENTIFICACION	JR0015 LA VS					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR: 32 mm	DIAMETRO			LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
1		A	35°	-	-	-	-	-





IDENTIFICACION	JR 0014 LAVS					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR: 32 mm	DIAMETRO			LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
0		A	35°	-	-	-	-	-

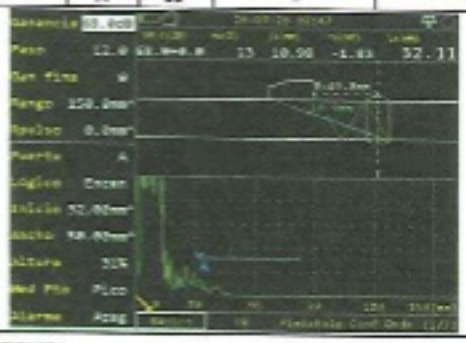



AREA INSPECCIONADA



COMENTARIOS:

Nombre: Certificado: UT NIVEL II CERT: 1[illegible] Firma:	Recibido: Firma:	Aprobado: Firma:
Nombre: Certificado: UT NIVEL II CERT:	Nombre: Ing. Wilson Bautista Cargo: Lider de Calidad Hiso Ingenieria.	Nombre: Cargo/Registro:

REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL


REVISION	1
AUTOR	JOSE LUIS QUIROZ
EMISION DE FORMATO	01 DE AGOSTO DE 2017
HOJA	20


CLIENTE:	HISO INGENIERIA	PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA:	WPS- FCAW HISO 001	REPORTE:	UT - 001
PROYECTO:	PUENTE ACACIAS	ESPECIFICACION DE MATERIAL:	ASTM A 709	FECHA:	25-jul-26
LUGAR:	ACACIAS -META	NORMA TECNICA DE INSPECCION:	AWS D1.5:2025	CONTRATO:	NA

EQUIPO DE INSPECCION UT


UNIDAD DE INSPECCION		PALPADOR		ZAPATA	
MARCA	SIUI	MARCA	SIUI	MARCA	SIUI
MODELO	SMARTOR FLAW DETECTOR	MODELO	0291731048	MODELO	0242233
SERIE	WORK22404635	FRECUENCIA	2.5 MHZ	ANGULO NOMINAL DEL HAZ REFRACTADO EN EL ACERO	45° SW
		SERIE	258		


IDENTIFICACION		JR0016 LA V9				CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
1		A	35°	-	-	-	-	-

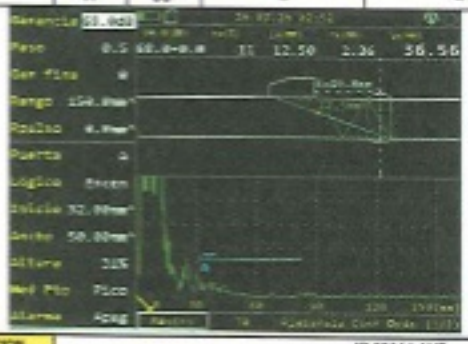

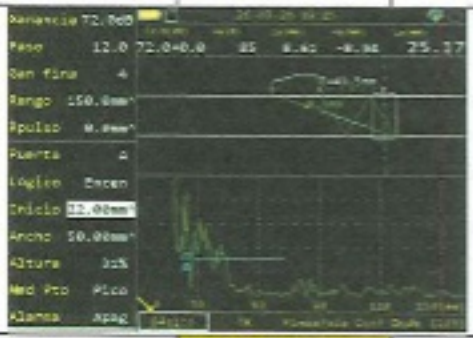


IDENTIFICACION		JR 0014 LAV5				CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
0		A	35°	-	-	-	-	-

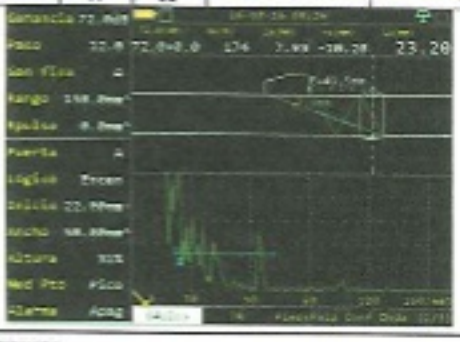

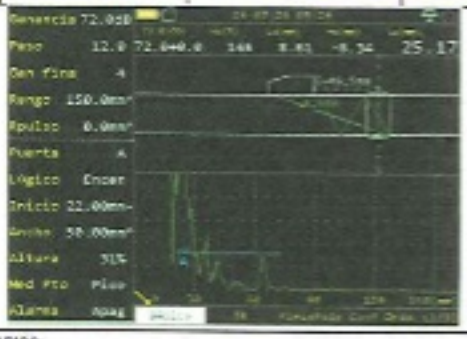

AREA INSPECCIONADA



COMENTARIOS:

Nombre: Certificado: UT NIVEL II CERT: [illegible] Firma:	Recibido: Firma:	Aprobado: Firma:
Nombre: Certificado:UT NIVEL II CERT:	Nombre: Ing. Wilson Bautista Cargo: Lider de Calidad Hiso Ingeniería.	Nombre: Cargo/Registro:

REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL


REVISION:	1
AUTOR:	JOAN LUIS QUIROGA
EMISION FECHA:	31 DE AGOSTO DE 2017
HOJA:	21

CLIENTE:	HISO INGENIERIA	PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA:	WPS- FCAW HISO 001	REPORTE:	UT - 001
PROYECTO:	PUENTE ACACIAS	ESPECIFICACION DE MATERIAL:	ASTM A 709	FECHA:	25-jul-26
LUGAR:	ACACIAS -META	NORMA TECNICA DE INSPECCION:	AWS D1.5:2025	CONTRATO:	NA

EQUIPO DE INSPECCION UT

UNIDAD DE INSPECCION		PALPADOR		ZAPATA	
MARCA	SIUI	MARCA	SIUI	MARCA	SIUI
MODELO	SMART DR PLUS DETECTOR	MODELO	D2917D19AR	MODELO	SDN55S
SERIE	WDR3222404002R	FRECUENCIA	2.5 MHZ	ANGULO NOMINAL DEL HAZ REFRACTADO EN EL ACERO	45° SKIP
		SERIE	255		

IDENTIFICACION	JR0015 LA V5					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
1		A	35°	-	-	-	-	-

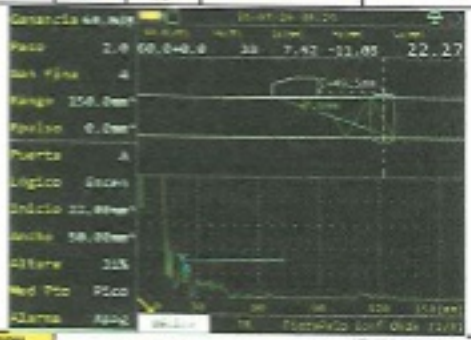



IDENTIFICACION	JR 0014 LAV5					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
0		A	35°	-	-	-	-	-





AREA INSPECCIONADA



COMENTARIOS:

Nombre: Certificado: UT NIVEL II CERT: [illegible] Firma:	Recibido: Firma:	Aprobado: Firma:
Nombre: Certificado UT NIVEL II CERT:	Nombre: Ing. Wilson Bautista Cargo: Lider de Calidad Hiso Ingenieria.	Nombre: Cargo/Registro:

REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL


REVISION	1		
AUTOR	JUAN LUIS VILLAMIZAR		
EMISION DE REPORTE	31 DE AGOSTO DE 2017		
HOJA	22		


CLIENTE:	HISO INGENIERIA	PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA:	WPS- FCAW HISO 001	REPORTE:	UT - 001
PROYECTO:	PUENTE ACACIAS	ESPECIFICACION DE MATERIAL:	ASTM A 709	FECHA:	25-jul-26
LUGAR:	ACACIAS -META	NORMA TECNICA DE INSPECCION:	AWS D1.5:2025	CONTRATO:	NA

EQUIPO DE INSPECCION UT


UNIDAD DE INSPECCION		PALPADOR		ZAPATA	
MARCA	[illegible]	MARCA	SIUI	MARCA	SIUI
MODELO	SMARTOR PLAIN DETECTOR	MODELO	[illegible]	MODELO	[illegible]
[illegible]	MICROSTANDARD	FRECUENCIA	2.5 MHZ	ANGULO NOMINAL DEL HAZ REFRACTADO EN EL ACERO	45° [illegible]
		SERIE	258		


IDENTIFICACION	JR0015 LA V5					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
1		A	35°	-	-	-	-	-

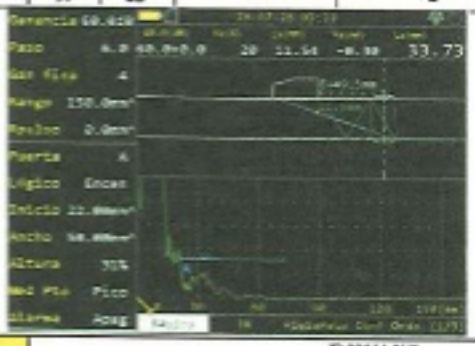

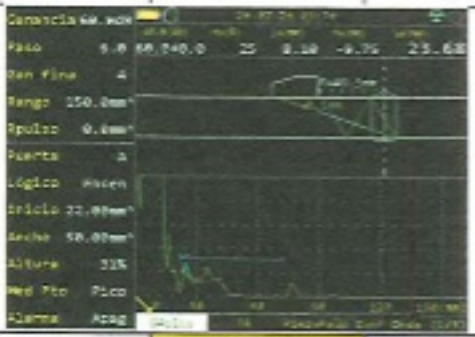

IDENTIFICACION	JR0014 LAV5					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
0		A	35°	-	-	-	-	-

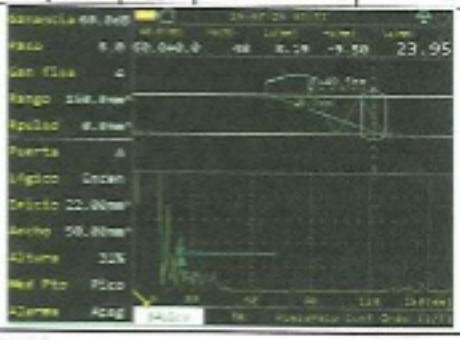

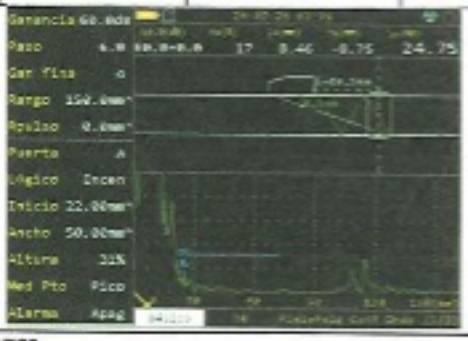

AREA INSPECCIONADA



COMENTARIOS:

Nombre: Certificado: UT NIVEL II CERT: [illegible] Firma:	Recibido: Firma:	Aprobado: Firma:
Nombre: Certificado UT NIVEL II CERT:	Nombre: *Ing. Wilson Bautista* Cargo: *Lider de Calidad Hiso Ingenieria.*	Nombre: Cargo/Registro:

Quality Welding GROUP	REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL	REVISIÓN	1
		AUTOR	JOSE LUIS ORTEGA
		EMISIÓN DE FORMATO	01 DE AGOSTO DE 2017
		HOJA	23

CLIENTE:	HISO INGENIERIA	PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA:	WPS- FCAW HISO 001	REPORTE:	UT - 001
PROYECTO:	PUENTE ACACIAS	ESPECIFICACION DE MATERIAL:	ASTM A 709	FECHA:	25-jul-26
LUGAR:	ACACIAS -META	NORMA TECNICA DE INSPECCION:	AWS D1.5:2025	CONTRATO:	NA

EQUIPO DE INSPECCION UT


UNIDAD DE INSPECCION		PALPADOR		ZAPATA	
MARCA	SIUI	MARCA	SIUI	MARCA	SIUI
MODELO	SUPERSONIC FLAW DETECTOR	MODELO	0291701547	MODELO	60/70
SERIE	MOD2224SUPER	FRECUENCIA	2.5 MHZ	ANGULO NOMINAL DEL HAZ REFRACTADO EN EL ACERO	45° 0/9
		SERIE	259		

IDENTIFICACION	JR0015 LA V5					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 45°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
1		A	35°	-	-	-	-	-



IDENTIFICACION	JR 0014 LAV5					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 45°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
0		A	35°	-	-	-	-	-



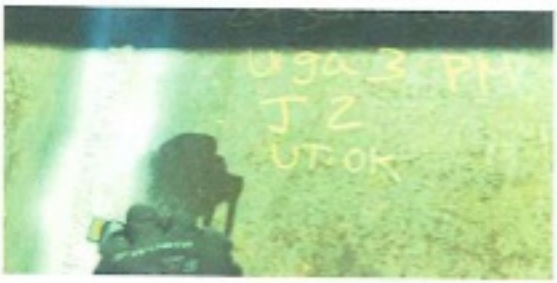

AREA INSPECCIONADA



COMENTARIOS:

Nombre:	Recibido:	Aprobado:
Certificado: UT NIVEL II CERT:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Ing. Wilson Bautista	Nombre:
Certificado: UT NIVEL II CERT:	Cargo: Lider de Calidad Hiso Ingenieria.	Cargo/Registro:


Quality Welding Group	REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL	REVISION	1
		AUTOR	JOSE LUIS QUIROGA
		FECHA DE FORMATO	01 DE AGOSTO DE 2017
		HOJA	24

CLIENTE:	HISO INGENIERIA	PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA:	WPS - FCAW HISO 001	REPORTE:	UT - 001
PROYECTO:	PUENTE ACACIAS	ESPECIFICACION DE MATERIAL:	ASTM A 709	FECHA:	25-jul-26
LUGAR:	ACACIAS -META	NORMA TECNICA DE INSPECCION:	AWS D1.5:2025	CONTRATO:	NA

EQUIPO DE INSPECCION UT


UNIDAD DE INSPECCION		PALPADOR		ZAPATA	
MARCA	SIUI	MARCA	SIUI	MARCA	SIUI
MODELO	SIGNATOR PLATA DETECTOR	MODELO	G2S1TS19AR	MODELO	60N0008
SERIE	WC1220H6MP2H	FRECUENCIA	2.5 MHZ	ANGULO NOMINAL DEL HAZ REFRACTADO EN EL ACERO	45° SVT
		SERIE	258		

IDENTIFICACION	JR 0015 LA V5					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR:	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
1		A	35°	-	-	-	-	-

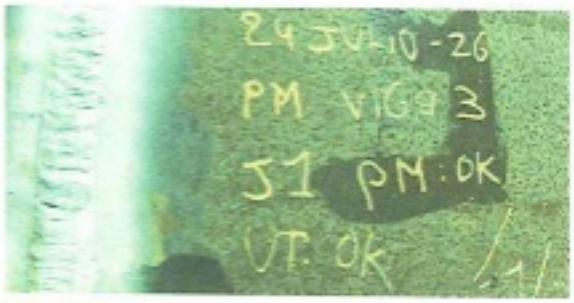



IDENTIFICACION	JR 0014 LAV5					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR:	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
0		A	35°	-	-	-	-	-

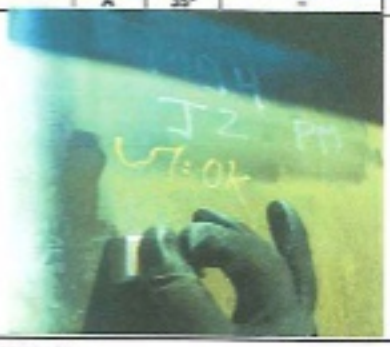



AREA INSPECCIONADA



COMENTARIOS:

Nombre: Certificado: UT NIVEL II CERT. N° Firma:	Recibido: Firma:	Aprobado: Firma:
Nombre: Certificado:UT NIVEL II CERT.	Nombre: Ing. Wilson Bautista Cargo: Lider de Calidad Hiso Ingeniería.	Nombre: Cargo/Registro:

REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL

REVISION:	1		
EMISOR:	JOSE LUIS QUIROGA		
EMISION DE FORMATO:	01 DE AGOSTO DE 2017		
HOJA:	25		


CLIENTE:	HISO INGENIERIA	PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA:	WPS- FCAW HISO 001	REPORTE:	UT - 001
PROYECTO:	PUENTE ACACIAS	ESPECIFICACION DE MATERIAL:	ASTM A 709	FECHA:	25-jul-26
LUGAR:	ACACIAS -META	NORMA TECNICA DE INSPECCION:	AWS D1.5:2025	CONTRATO:	NA

EQUIPO DE INSPECCION UT

UNIDAD DE INSPECCION		PALPADOR		ZAPATA	
MARCA	[illegible]	MARCA	GE	MARCA	GE
MODELO	SMARTOR FLAW DETECTOR	MODELO	D2S1T5R6R	MODELO	[illegible]
SERIE	[illegible]	FRECUENCIA	2.5 MHZ	ANGULO NOMINAL DEL HAZ REFRACTADO EN EL ACERO	45° SVP
		SERIE	255		

IDENTIFICACION		JR6015 LA V5				CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 60 °	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
1		A	35°	-	-	-	-	-



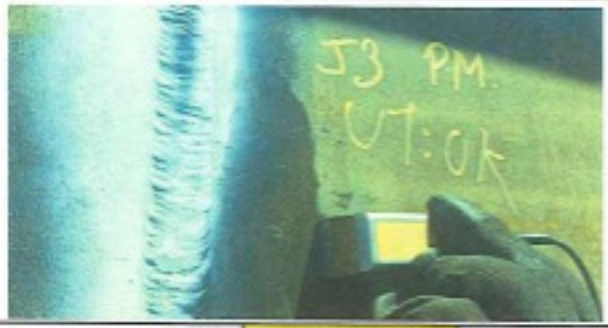

IDENTIFICACION		JR 0014 LAV5				CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 60 °	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
0		A	35°	-	-	-	-	-





AREA INSPECCIONADA



COMENTARIOS:

Nombre: Certificado: UT NIVEL II CERT: [illegible] Firma:	Nombre: Firma:	Aprobado: Firma:
Nombre: Certificado UT NIVEL II CERT:	Nombre: Ing. Wilson Bautista Cargo: Lider de Calidad Hiso Ingenieria.	Nombre: Cargo/Registro:

REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL

REVISION	1
AUTOR	JOSE LUIS GUEVARA
EMISION DE FORMATO	01 DE AGOSTO DE 2017
HOJA	28


CLIENTE:	HISO INGENIERIA	PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA:	WPS- FCAW HISO 001	REPORTE:	UT - 001
PROYECTO:	PUENTE ACACIAS	ESPECIFICACION DE MATERIAL:	ASTM A 709	FECHA:	25-jul-26
LUGAR:	ACACIAS -META	NORMA TECNICA DE INSPECCION:	AWS D1.5:2025	CONTRATO:	NA

EQUIPO DE INSPECCION UT

UNIDAD DE INSPECCIÓN		PALPADOR		ZAPATA	
MARCA:	SIUI	MARCA:	SIUI	MARCA:	SIUI
MODELO:	SMARTOR TOUCH DETECTOR	MODELO:	0261701547	MODELO:	SWB-5S5
SERIE:	MONOCRISTALINO	FRECUENCIA:	2.5 MHZ	ANGULO NOMINAL DEL HAZ REFRACTADO EN EL ACERO	45° SW
		SERIE:	255		

IDENTIFICACION		JR0015 LA V5					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR:	32 mm	DIAMETRO:		LONGITUD INSPECCIONADA:				
JUNTA	SOLDADOR	45° - 60°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
1		A	35°	-	-	-	-	-



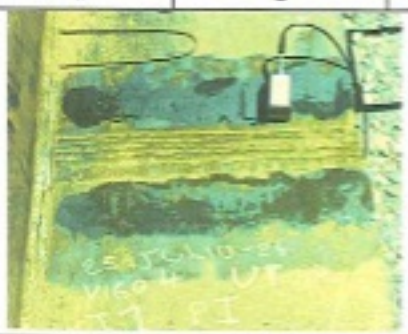

IDENTIFICACION		JR 0014 LAV5					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR:	32 mm	DIAMETRO:		LONGITUD INSPECCIONADA:				
JUNTA	SOLDADOR	45° - 60°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
0		A	35°	-	-	-	-	-







AREA INSPECCIONADA:



COMENTARIOS:

Nombre: Certificado: UT NIVEL II CERT: 23 Firma:	Recibido: Firma:	Aprobado: Firma:
Nombre: Certificado UT NIVEL II CERT:	Nombre: Ing. Wilson Bautista Cargo: Lider de Calidad Hiso Ingeniería.	Nombre: Cargo/Registro:

REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL


REVISIÓN:	1
AUTOR:	JOSE LUIS QUINTERO
EMISION DE FORMATO:	01-09-2025
HOJA:	27

CLIENTE:	HISO INGENIERIA	PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA:	WPS- FCAW HISO 001	REPORTE:	UT - 001
PROYECTO:	PUENTE ACACIAS	ESPECIFICACION DE MATERIAL:	ASTM A 709	FECHA:	25-jul-26
LUGAR:	ACACIAS -META	NORMA TECNICA DE INSPECCION:	AWS D1.5:2025	CONTRATO:	NA

EQUIPO DE INSPECCION UT


UNIDAD DE INSPECCION		PALPADOR		ZAPATA	
MARCA	SIUI	MARCA	SIUI	MARCA	SIUI
MODELO	SIGNATOR FLAW DETECTOR	MODELO	0.591"/15MR	MODELO	SA7070
SERIE	USHH2324047271	FRECUENCIA	2.5 MHZ	ANGULO NOMINAL DEL HAZ REFRACTADO EN EL ACERO	45° SW
		SERIE	248		

IDENTIFICACION	JR0015 LA V6					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 60°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
1		A	35°	-	-	-	-	-

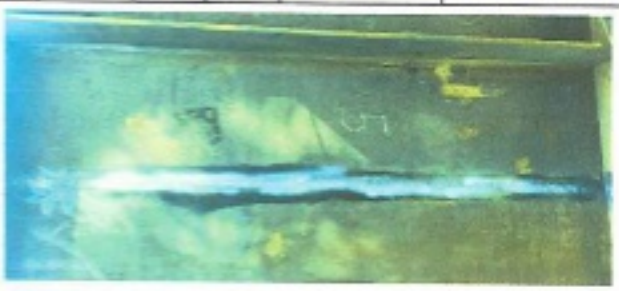



IDENTIFICACION	JR 0014 LAV5					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 60°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
0		A	35°	-	-	-	-	-

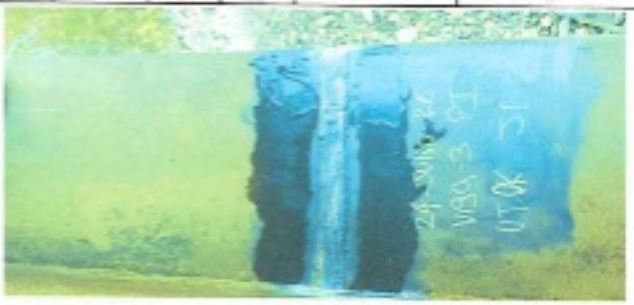



AREA INSPECCIONADA



COMENTARIOS:

Nombre: Certificado: UT NIVEL II CERT: US Firma:	Recibido: Firma:	Aprobado: Firma:
Nombre: Certificado:UT NIVEL II CERT:	Nombre: Ing. Wilson Bayliste Cargo: Lider de Calidad Hiso Ingenieria.	Nombre: Cargo/Registro:

REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL

REVISION	1
AUTOR	JOSE LUIS QUIMBAYO
EMISION DE FORMATO	01 DE AGOSTO DE 2017
HOJA	28

CLIENTE:	HISO INGENIERIA	PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA:	WPS- FCAW HISO 001	REPORTE:	UT - 001
PROYECTO:	PUENTE ACACIAS	ESPECIFICACION DE MATERIAL:	ASTM A 709	FECHA:	25-jul-26
LUGAR:	ACACIAS -META	NORMA TECNICA DE INSPECCION:	AWS D1.5:2025	CONTRATO:	NA


EQUIPO DE INSPECCION UT

UNIDAD DE INSPECCION		PALPADOR		ZAPATA	
MARCA	SIUI	MARCA	SIUI	MARCA	SIUI
MODELO	SIUI DIGITAL FLAW DETECTOR	MODELO	G2017D134R	MODELO	0N3955
SERIE		FRECUENCIA	2.5 MHZ	ANGULO NOMINAL DEL HAZ REFRACTADO EN EL ACERO	45° SW
		SERIE	253		

IDENTIFICACION		JR0015 LA VS				CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
1		A	35°	-	-	-	-	-



IDENTIFICACION		JR 0014 LAVS				CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
0		A	35°	-	-	-	-	-

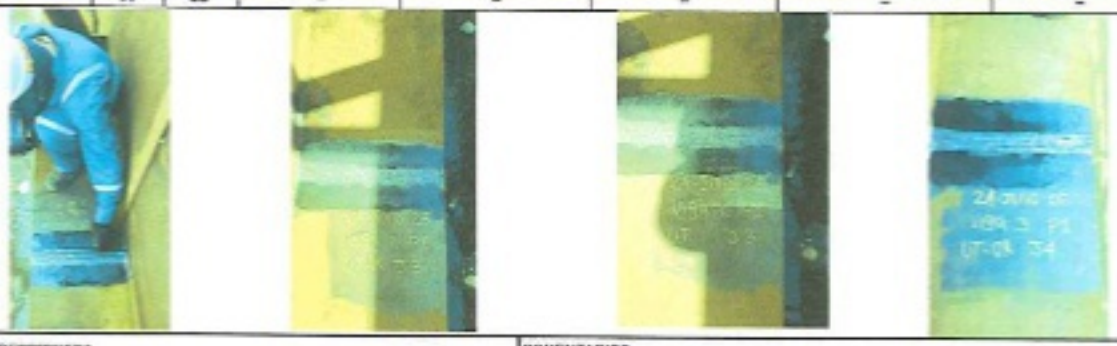

AREA INSPECCIONADA



COMENTARIOS:

Nombre: Certificado: UT NIVEL II CERT: 10 Firma:	Recibido: Firma:	Aprobado: Firma:
Nombre: Certificado UT NIVEL II CERT:	Nombre: Ing. Wilson Bautista Cargo: Lider de Calidad Hiso Ingenieria.	Nombre: Cargo/Registro:

REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL

REVISIÓN	1
AUTOR	JOSE LUIS CERVIDAL
FECHA DE EMISIÓN	01 DE AGOSTO DE 2017
HOJA	29

CLIENTE:	HISO INGENIERIA	PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA:	WPS- FCAW HISO 001	REPORTE:	UT - 0
PROYECTO:	PUENTE ACACIAS	ESPECIFICACION DE MATERIAL:	ASTM A 709	FECHA:	25-jul-26
LUGAR:	ACACIAS-META	NORMA TECNICA DE INSPECCION:	AWS D1.5:2025	CONTRATO:	NA


EQUIPO DE INSPECCION UT

UNIDAD DE INSPECCION		PALPADOR		ZAPATA	
MARCA	SIUI	MARCA	SIUI	MARCA	SIUI
MODELO	SMARTSCAN FLAW DETECTOR	MODELO	0201721048	MODELO	6574665
SERIE	V0622224043SR	FRECUENCIA	2.5 MHZ	ANGULO NOMINAL DEL HAZ REFRACTADO EN EL ACERO	45° SW
		SERIE	256		

IDENTIFICACION		JR0015 LA V5					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO			LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
1		A	35°	-	-	-	-	-



IDENTIFICACION		JR 0014 LAV5					CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO			LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
0		A	35°	-	-	-	-	-

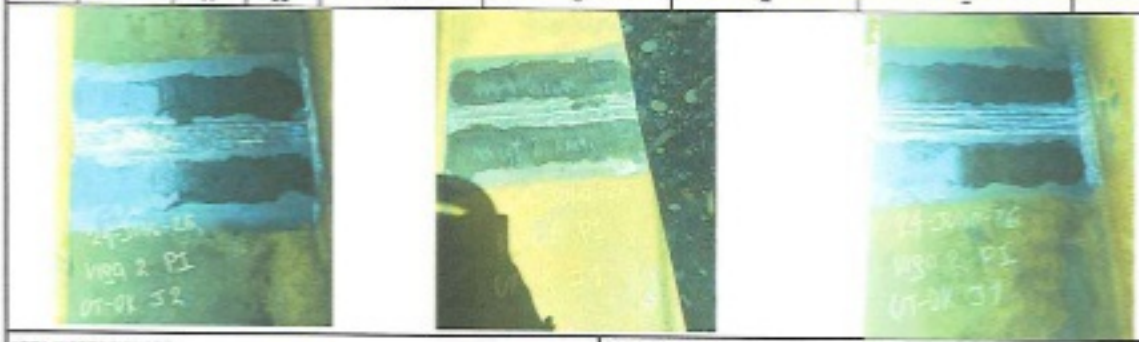

AREA INSPECCIONADA



COMENTARIOS:

Nombre: Certificado: UT NIVEL II CERT: [illegible] Firma:	Recibido: Firma:	Aprobado: Firma:
Nombre: Certificado: UT NIVEL II CERT:	Nombre: Ing. Wilson Bautista Cargo: Lider de Calidad Hiso Ingenieria.	Nombre: Cargo/Registro:

Quality Welding GROUP	**REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL**			REVISION	1
				AUTOR	JOSE LUIS GUEVARA
				EMISION DE FORMATO	01 DE AGOSTO DE 2017
				HOJA	30
CLIENTE:	HISO INGENIERIA	PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA:	WPS- FCAW HISO 001	REPORTE:	**UT - 001**
PROYECTO:	PUENTE ACACIAS	ESPECIFICACION DE MATERIAL:	ASTM A 709	FECHA:	25-jul-26
LUGAR:	ACACIAS -META	NORMA TECNICA DE INSPECCION:	AWS D1.5:2025	CONTRATO:	NA

EQUIPO DE INSPECCION UT

UNIDAD DE INSPECCION		PALPADOR		ZAPATA	
MARCA	GE	MARCA	GE	MARCA	GE
MODELO	SMART SCAN PLUS DETECTOR	MODELO	D2917S104R	MODELO	5B965
SERIE	VD0222240422R	FRECUENCIA	2.5 MHZ	ANGULO NOMINAL DEL HAZ REFRACTADO EN EL ACERO	45° SW
		SERIE	255		

IDENTIFICACION		JR5015 LA V5				CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
1		A	35°	-	-	-	-	-



IDENTIFICACION		JR 0014 LAV5				CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 65°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
0		A	35°	-	-	-	-	-



AREA INSPECCIONADA



COMENTARIOS:

Nombre: Certificado: UT NIVEL II CERT: US Firma:	Recibido: Firma:	Aprobado: Firma:
Nombre: Certificado:UT NIVEL II CERT:	Nombre: Ing. Wilson Bautista Cargo: Lider de Calidad Hiso Ingeniería.	Nombre: Cargo/Registro:

REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL

REVISION	1
AUTOR	JOSE LUIS QUINTERO
EMISION DE FORMATO	01 DE AGOSTO DE 2017
HOJA	3

CLIENTE:	HISO INGENIERIA	PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA:	WPS- FCAW HISO 001	REPORTE:	UT - 0
PROYECTO:	PUENTE ACACIAS	ESPECIFICACION DE MATERIAL:	ASTM A 709	FECHA:	25-jul-26
LUGAR:	ACACIAS -META	NORMA TECNICA DE INSPECCION:	AWS D1.5:2025	CONTRATO:	NA

EQUIPO DE INSPECCION UT

UNIDAD DE INSPECCION		PALPADOR		ZAPATA	
MARCA	SIUI	MARCA	SIUI	MARCA	SIUI
MODELO	SMART OR FLAW DETECTOR	MODELO	G2017E19HR	MODELO	0516555
SERIE	[illegible]	FRECUENCIA	2.5 MHZ	ANGULO NOMINAL DEL HAZ REFRACTADO EN EL ACERO	45° SWT
		SERIE	350		

IDENTIFICACION		JR0015 LA V5				CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° -55°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
1		A	35°	-	-	-	-	-






IDENTIFICACION		JR 0014 LAV5				CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° -55°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
0		A	35°	-	-	-	-	-





AREA INSPECCIONADA



COMENTARIOS:

Nombre: Certificado: UT NIVEL II CERT: [illegible] Firma:	Recibido: Firma:	Aprobado: Firma:
Nombre: Certificado UT NIVEL II CERT:	Nombre: Ing. Wilson Bautista Cargo: Lider de Calidad Hiso Ingeniería.	Nombre: Cargo Registro:

REPORTE DE INSPECCION POR ULTRASONIDO CONVENCIONAL

REVISION:	1
INSPECTOR:	JOSE LUIS QUIROGA.
EMISION DE FORMATO	01 DE AGOSTO DE 2017
HOJA	3

CLIENTE:	HISO INGENIERIA	PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA:	WPS- FCAW HISO 001	REPORTE:	UT - 0
PROYECTO:	PUENTE ACACIAS	ESPECIFICACION DE MATERIAL:	ASTM A 709	FECHA:	25-jul-26
LUGAR:	ACACIAS -META	NORMA TECNICA DE INSPECCION:	AWS D1.5:2025	CONTRATO:	NA

EQUIPO DE INSPECCION UT

UNIDAD DE INSPECCION		PALPADOR		ZAPATA	
MARCA	SIUI	MARCA	SIUI	MARCA	SIUI
MODELO	SMARTOR FLAW DETECTOR	MODELO	0291703164R	MODELO	69A550
SERIE	M2K2202404008	FRECUENCIA	2.2 MHZ	ANGULO NOMINAL DEL HAZ REFRACTADO EN EL ACERO	45° SW
		SERIE	255		

IDENTIFICACION		JR0015 LA V9				CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 60°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
1		A	35°	-	-	-	-	-





IDENTIFICACION		JR 0014 LAV5				CALIFICACION	ACEPTADA
ESPESOR	32 mm	DIAMETRO		LONGITUD INSPECCIONADA			
JUNTA	SOLDADOR	45° - 60°	ANGULO	PROFUNDIDAD	LONGITUD INDICACION	DISTANCIA EN X	DISTANCIA EN Y	INDICACION
0		A	35°	-	-	-	-	-

AREA INSPECCIONADA



COMENTARIOS:

Nombre: Certificado: UT NIVEL II CERT. VIGENTE Firma:	Revisado: Firma:	Aprobado: Firma:
Nombre: Certificado:UT NIVEL II CERT:	Nombre: Ing. Wilson Bautista Cargo: Lider de Calidad Hiso Ingenieria.	Nombre: Cargo/Registro:

10.1. Control estado general del tiempo.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
NIT:	NIT 9558796-1		

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

MES DE JULIO DEL 2026

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Tiempo en la mañana																															
Soleado				X				X		X											X			X			X	X		X	X
Lluvias moderadas	X		X								X			X	X	X	X					X	X								
Lluvias intensas		X				X	X		X									X							X				X		
Tiempo en la Tarde																															
Soleado	X	X	X			X					X			X	X		X	X			X	X		X	X			X			
Lluvias moderadas								X		X																	X		X	X	
Lluvias intensas				X			X		X							X							X								X

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al día 31 de julio del 2026

Firma

Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

10.2. Control de ensayos de laboratorio.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO

JR

CONTRATO N°	925 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500040064
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	975 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
NIT:	NIT 9838766-1		

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO MES DE JULIO DEL 2026

Fecha de Toma	Fecha de Prueba	Ensayo realizado por C / I*	Material	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Resultados		Análisis de Resultados	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
								Rango Cumplimiento	Porcentaje Obtenido %	Cumple SI/N	
25-jul	25-jul	Contratista	Soldadura Vigas	MT (Partio Maga)	Acacias	Quality Welding Group	AWS D1.5 2025	AWS D1.5	100%	OK	Cumple
25-jul	25-jul	Contratista	Soldadura Vigas	UT (Ultrasonido)	Acacias	Quality Welding Group	AWS D1.5 2025	AWS D1.5	100%	OK	Cumple

Durante el presente periodo se realizó Ensayos No Destructivos y de Particulas Magneticas a las soldaduras de union de los modulos que forman las vigas metalicas.

Nota 1: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al día 31 de julio del 2026

Firma
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

10.3. Control personal que labora interventoría.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PERSONAL INTERVENTORIA

JR

CONTRATO N°	079 DE 2025	PROYECTO N°	BPIN 2021760030004

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIVENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
NIT:	NIT No 5.053.786-1
CONTRATO INTERVENTORIA N	079 DE 2025
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	IVAN MAURICIO ROJAS MOJICA

PLANILLA de "Expedición de pago"	Estado "" "Expedición de pago"		REFERENCIA DE PAGO: "Expedición de pago"		Estado "" "Expedición de pago"		DIAS LABORADOS		30 DIAS	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:				del 01 DE JULIO 2026		al 31 DE JULIO 2026		
										AFILIACION								
Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula	Tipo de Vinculación	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro	Asignacion Salarial Según propuesta	% Dedicación propuesta	Dias cotizados	Salud	%	Pensión	%	ARL	%	Caja de Compensación	%	Ingreso Base de Cotización Según Proyectado 30 días	
Jimmy Andres Torres Castro	Director Interventoría	86.063.392	Dependiente	21/07/2026		$ 7.600.550,00	30%	20,00	$ 61.534,54	4%	$ 240.000,10	16%	$ 107.052,71	0,696%	$ 61.534,54	4%	$	1.838.113,80
Jorge Augusto Rodriguez Reina	Residente de Interventoría	5.053.786	Independiente	21/07/2026		$ 5.605.310,00	30%	20,00	$ 221.445,40	12,5%	$ 333.450,22	16%	$ 123.300,65	6,696%	$ 35.431,28	2%	$	1.771.563,80
Flor Angela Narvaez Castro	Tecnologo en HSEQ	1.121.891.766	Dependiente	1/08/2025		$ 3.334.766,00	50%	33,00	$ 68.889,35	4%	$ 266.761,44	16%	$ 116.049,83	6,96%	$ 68.835,35	4%	$	1.037.304,00
Jimmy Andres Torres Castro	Ingeniero especialista en Ambientales	86.063.392	Dependiente	21/07/2026		$ 5.200.220,00	10%	30,00	$ 21.394,92	4%	$ 84.250,00	16%	$ 36.652,90	6,99%	$ 21.394,92	4%	$	626.023,00
								TOTAL	$ 370.730,31		$ 880.589,52		$ 383.656,44		$ 184.710,10			

Nota: Se aclara que el valor del IBC de la planilla aportada corresponde a la afectación de los días laborados, por lo anterior se realiza el siguiente cuadro el cual demuestra que el valor a cotizar es inferior al cotizado cumpliendo de esta forma las condiciones contractuales, así mismo los porcentajes determinados para salud del personal dependen cliente corresponde a lo establecido como excenciones de acuerdo con el Estatuto Tributario, en el artículo 114-1.

NOMBRES Y APELLIDOS	IBC PROPUESTA 30 DIAS	DIAS LABORADOS	IBC PROPUESTA DIAS LABORADOS	IBC PLANILLA
Jimmy Andres Torres Castro	$ 1.838.113,80	30	$ 1.838.113,80	$ 2.170.000,00
Jorge Augusto Rodriguez Reina	$ 1.771.563,80	30	$ 1.771.563,80	$ 4.167.300,00
Flor Angela Narvaez Castro	$ 1.037.304,00	30	$ 1.037.304,00	$ 1.700.000,00
Jimmy Andres Torres Castro	$ 626.023,00	30	$ 626.023,00	$ 2.170.000,00

Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentra Afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos

Firma:
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: FLOR ANGELA NARVAEZ CASTRO
PROFESIONAL SISO

Firma:
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

10.4. Control seguridad industrial

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTRATO Nº	078 DE 2020	PROYECTO Nº	BPIN 2020680080004
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUESTO URMICULAR SOBRE EL CAMINO HDA. ISAURA EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
PERIODO DE EJECUCIÓN	01- JULIO-2020 AL 31- JULIO-2020	Nº DE TRABAJADORES	03

CRITERIO DE EVALUACION 2020 DE INTERVENTORIA

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio en análisis (0 puntos); E. No aplica en el área.

ITEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL DE INTERVENTORIA	CRITERIO DE CALIFICACION				
		A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
1	Tiene copia (solo consignar en Observaciones) (Acuerdo y Resolución) (SIPP, PDT y PTP)	x				
2	Copia de Registro de Alcalde Menor ante la Inspección de Policía y Seguridad		x			
3	Copia de Inspecciones realizadas (Formato interno)		x			
4	Entrega de los equipos de trabajo seleccionado acorde a las actividades	x				
5	Se cuenta con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado, (capacitar, vigente y firmado por el representante legal de la empresa)	x				
6	Se cuentan con las hojas de seguridad de los productos químicos en el sitio de trabajo y el almacenamiento (inventario en uso)					x
7	Se presenta la especificación de material, en el cual encuentren las características utilizar con los riesgos y controles.	x				
8	Se cuenta con el plan de emergencia, para actividades críticas y en general que corresponda al alcance de la actividad desarrollada.		x			
9	El personal cuenta con un programa de inducción en SSGAST, medio ambiente, actividades y riesgos del cargo (inducción de proyecto antes)	x				
	SUBTOTAL	60	15	0	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(10+5+N/A)	81%				

ITEM	GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA					
		10	5	3	0	N.A
10	Existe la zona de lavado limpia, ordenada y señalizada.	x				
11	Los residuos sanitarios (ya) se (están) están bien (ingresos)	x				
12	Poseer Sensibilización y organización, el día con el periodo 2019-2020 de los residuos para la disposición final	x				
13	Están (señalizados y organizados) la (disposición) con (ambiental) los residuos generados de (estos casos)	x				
14	Los equipos y herramientas están organizados	x				
15	En los alrededores de (trabajo están) están (limpios y ordenados)	x				
16	El sitio de trabajo esta en orden y aseo	x				
	SUBTOTAL	70	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(10+N/A)	100%				

ITEM	GESTION DEL PROYECTO					
		10	5	3	0	N.A
17	Los Procedimientos son seguros (evaluados a Tiempo en la obra o más según actividad)	x				
18	La empresa cuenta con (equipos, ganas firmes, señalización, (actividad entregada a su trabajo salud, el personal este (estado de la (actividad) (a realizar)					x
19	Hacer (visitas) por (accidentes en (obras vecinas), (con (peligros) (algún tipo de riesgo al personal)					x
20	Hay (registro de (los trabajadores) con (certificado) (buen estado de (condiciones) (esto (garantiza) la (adecuada) (ubicación) (en (obra) (o (inmediatez)	x				
21	Se cuenta con los equipos necesarios para realizar el (trabajo) (de (alto riesgo) (según (la (norma))					x
22	Los equipos tienen (puesta de seguridad) (cintas, resistencia, etc.)					x
23	Se cuenta con (copia) (de (licencia) (de (uso para (trabajos de (altura) (o (equipos (elevadores)			0		
	SUBTOTAL	20	0	0	0	1
	Valor % Obtenido (A+B+C)/(10+N/A)	77%				

ITEM	PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS					
		10	5	3	0	N.A
28	El (personal) cuenta con (el) (de personal) (cuenta) con el (sitio) de (trabajo) de (acuerdo) a la (obra) y (cumple) (los) (requerimientos) (exigidos)	x				
29	En (obras) (divulgación) y (entrenamiento) en el (plan) de (emergencias) a (trabajadores) y (visitantes)	x				
30	Los (visitantes) (están) (dotados) (adecuadamente) en (obras) y (no) (trabajadores) (cumplen) (el) (reglamento) (interno)	x				
31	(Hay) (de) (manera) (que) (esta) (bien) (señalizada), y el (personal) (este) (atento) (de la) (atención) (de) (peligros) (el) (cuerpo)	x				
32	La empresa (tiene) (contrato) (plan) (para) (la) (atención) (en) (el) (sitio) (de) (trabajo) (con) (hospital)	x				
33	En (obra) (se) (tiene) (de) (la) (brigada) (de) (emergencia) ((botiquín), (extintores), (camillas), (sistema) (de) (alerta), (y) (personal) (capacitado)	x				
	SUBTOTAL	80	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(10+N/A)	100%				

ITEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACION				
		A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
35	El personal (posee) y (usa) (de manera adecuada) los (EPP) necesarios para la labor	x				
36	El personal (cuenta) con (botiquín) (personal)	x				
37	(Cuenta) (de) (seguridad) con (equipo) (para) (rescate) en (alturas)	x				
38	Se cuenta con (extintor)	x				
39	Botas de (cuero) en (buen) (estado) con (punta) (reforzada)	x				
40	Botas de (cuero) en (buen) (estado) sin (punta) (reforzada)					x
41	Protección (respiratoria) (adecuada) para (el) (labor)	x				
42	Cuentan (con) (gafas) (de) (seguridad) (claras) (y) (oscuras)		x			
43	Están (utilizando) (protector) (auditivo) (adecuado) (para) (labor)	x				
44	(El) (casco) (no) (cumple) (con) (elementos) (de) (protección) (de) (personal) (para) (exposición) (según) (necesidad)	x				
45	El (personal) (utiliza) (todos) (los) (EPP) (de) (acuerdo) (al) (riesgo) (para) (ingresar)	x				
	SUBTOTAL	100	5	0	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(10+N/A)	96%				

ITEM	MEDICINA PREVENTIVA					
		10	5	3	0	N.A
46	(Se) (realizaron) (los) (exámenes) (de) (ingreso) (y) (periódicos) (a) (los) (trabajadores) (Ver) (registro) (Registro) (expedido) (por) (medico) (especialista) (en) (S.O.)	x				
47	(Certificados), (Capacitación), (en) (Uso) (y) (Manejo) (de) (Extintores) (y) (Seguridad) (y) (Salud) (en) (el) (Trabajo)		x			
48	(Hacer) (seguimiento) (de) (recomendaciones) (y) (diagnósticos) (de) (enfermedades) (con) (el) (ambiente) (Ley) (del) (1) (de) (la) (Ley) (30) (de) (1995)					x
	SUBTOTAL	10	5	0	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(10+N/A)	73%				

ITEM	SEÑALIZACION COMPONENTE DE INTERVENTORIA					
		10	5	3	0	N.A
49	Se evidencian (algunas) (con) (advertencias) (de) (peligro) (o) (instrucciones) (generales)	x				
50	Se (cuenta) (con) (avisos) (preventivos), (como), (demarcación) (con) (cinta) (peligro), (señalización) (restricciones), (salvajismo) (en) (obra), (etc.)	x				
51	(Tienen) (Protección) (o) (señalización) (en) (los) (sitios) (críticos) (de) (las) (actividades) (o) (obra)	x				
52	(Se) (tiene) (señalizada) (y) (demarcada) (la) (zona) (de) (trabajo)	x				
53	(Las) (áreas) (de) (trabajo) (están) (señalizadas) (y) (tienen) (avisos) (de) (prevención)	x				
	SUBTOTAL	50	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(10+N/A)	100%				

GESTION DE CAMPO

	CONCEPTOS	% CUMPLIMIENTO	A	B	C	D	N.A
1	DOCUMENTACION DE CAMPO	81%	90	15	0	0	1
2	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	96%	100	5	0	0	1
3	GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA	100%	70	0	0	0	0
4	MEDICINA PREVENTIVA	73%	10	5	0	0	1
5	GESTION DEL PELIGRO	77%	20	0	3	0	4
6	SEÑALIZACION	100%	50	0	0	0	0
7	PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	100%	80	0	0	0	0
RESULTADO DE AUDITORIA GESTION EN CAMPO			326	25	3	0	7
ALTO	MEDIO	BAJO	89,8%				
X							

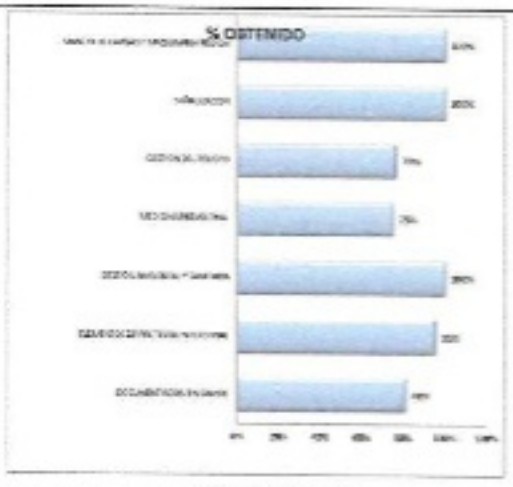


GRAFICO DE GESTION 2020

FIRMA
Nombre: JAIRO ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE FISCALIZACION

FIRMA
Nombre: FLOR ANGELA MARVAEZ CASTRO
PROFESIONAL SISO

FIRMA
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

10.5. Control correspondencia

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2026 AL 31 DE JULIO DEL 2026

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023680060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA DEL MES DE JULIO DEL 2026

FECHA	# OFICIO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
2 de julio de 2026	CI- OCA-978.2023-361	Radicación de comité de obra No.03 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	infraestructura@acacias.gov.co; consorcioacacia.info23@gmail.com, cristhian.f9393@gmail.com
13 de julio de 2026	CI- OCA-978.2023-362	Devolución por observaciones encontradas los informes mensuales de enero a mayo, del contrato de obra 929 de 2023	interpuentechichimene@gmail.com	consorcioacacia.info23@gmail.com, infraestructura@acacias.gov.co; cristhian.f9393@gmail.com
9 de julio de 2026	CI- OCA-978.2023-363	Radicación Modificatoria No.5 de de mayores y menores y NPs del contrato de obra No. 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	infraestructura@acacias.gov.co; consorcioacacia.info23@gmail.com, cristhian.f9393@gmail.com
9 de julio de 2026	CI- OCA-978.2023-364	Aval de Modificatoria No.5 de de mayores y menores y NPs del contrato de obra No. 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	infraestructura@acacias.gov.co; consorcioacacia.info23@gmail.com, cristhian.f9393@gmail.com
13 de julio de 2026	CI- OCA-978.2023-365	Radicación de los informes semanales No.103, 104 y 105 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	infraestructura@acacias.gov.co; consorcioacacia.info23@gmail.com, cristhian.f9393@gmail.com
14 de julio de 2026	CI- OCA-978.2023-366	Solicitud de Plan de Acción para finalizar el proyecto de acuerdo con la última Prorroga No.4, del contrato de obra 929 de 2023	interpuentechichimene@gmail.com	consorcioacacia.info23@gmail.com, infraestructura@acacias.gov.co; cristhian.f9393@gmail.com
18 de julio de 2026	CI- OCA-978.2023-367	Radicación de comité de obra No.04 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	infraestructura@acacias.gov.co; consorcioacacia.info23@gmail.com, cristhian.f9393@gmail.com
18 de julio de 2026	CI- OCA-978.2023-368	Radicación del informe semanal No.106 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	infraestructura@acacias.gov.co; consorcioacacia.info23@gmail.com, cristhian.f9393@gmail.com

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2026 AL 31 DE JULIO DEL 2026

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023680060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA DEL MES DE JULIO DEL 2026

FECHA	# OFICIO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
23 de julio de 2026	CI- OCA-978.2023-369	Radicación de comité de obra No.65 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	infraestructura@acacias.gov.co; consorcioacacia.info23@gmail.com, cristhian.f9393@gmail.com
30 de julio de 2026	CI- OCA-978.2023-370	Radicación del informe semanal No.107 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	infraestructura@acacias.gov.co; consorcioacacia.info23@gmail.com, cristhian.f9393@gmail.com
30 de julio de 2026	CI- OCA-978.2023-371	Radicación de comité de obra No.66 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	infraestructura@acacias.gov.co; consorcioacacia.info23@gmail.com, cristhian.f9393@gmail.com

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al día 31 de julio del 2026

Firma

Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2026 AL 31 DE JULIO DEL 2026

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023401060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767428-3		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUMCIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

RELACION DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL MES DE JUNIO DEL 2026

FECHA	# OFICIO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
14 de julio de 2026	2,02085E+13	Oficio anuncio visita del DNP	infraestructura@acacias.gov.co>	interpuentechichimene@gmail.com, consorcioacacia.info23@gmail.com
17 de julio de 2026	1601-0279	Oficio de la entidad socializando anuncio visita del DNP	infraestructura@acacias.gov.co>	interpuentechichimene@gmail.com, consorcioacacia.info23@gmail.com
17 de julio de 2026	1080.16-278	Oficio de la entidad requerimiento por Incumplimiento	infraestructura@acacias.gov.co>	interpuentechichimene@gmail.com, consorcioacacia.info23@gmail.com

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al dia 31 de julio del 2026.

Firma

Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

10.6. Control equipos contratista

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL EQUIPOS DEL CONTRATISTA

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500080004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA RL. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767429-8		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
NIT:	NIT 9658796-1		

MAQUINARIA Y EQUIPO

MES DE JULIO DEL 2026

TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Eq.Excavarora tipo Pajarita	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Vibrocompactador								X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Excavadora																															
Vehiculo pick up																															
Herramienta menor	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Equipos de topografia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Motobomba	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Planta eléctrica	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Electrobomba	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X

NOTA-1: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al dia 31 de julio del 2026.

NOTA-2: El Contratista logra reponer una retro-pajarita y vincularla al proyecto desde el 30 de junio y un Vibrocompactador desde el 8 de julio.

Firma

Nombre:JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre:JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

10.7. Control implementación Plan De Manejo Ambiental

ALCALDÍA DE ACACÍAS

INFORME IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

JR

CONTRATO N°	029 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2022680130000
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIVENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA RV, FRANCISCO MORA GUTIERREZ		
NIT	NIT 901797420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	078 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIVENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ RERA		
PERIODO IMPLEMENTACIÓN:	01- JULIO-2026 AL 31-JULIO-2026		

ESTADO PERMISOS AMBIENTALES

Permisos: Ambiental y otros	Aplica	Número y fecha de acto administrativo que otorga el permiso	Estado de cumplimiento requerimientos	Observaciones
Permiso de ocupación de cauces	SI	PS-GJ. 1.2.6.23.2225 Hasta el 10 de octubre de 2024	Se solicito la prorroga y en espera de la aprobacion.	Se radico solicitud de prorroga por parte de la entidad contratante
Permiso de aprovechamiento forestal	NO			No aplica al proyecto
Permiso de vertimientos	NO			No aplica al proyecto
Permiso de concesión de aguas	NO			No aplica al proyecto
Autorización de sitios de disposición final de sobrantes	SI		Se recibe autorizacion de los predios privado	Se ha dispuesto el material sobrante de descapote en predios privados los cuales cuentan con autorización.
Permiso de emisiones atmosféricas	NO			No aplica al proyecto
Permiso de explotación de materiales	NO	Concesión minera No 19C09 para extracción y transporte de material granular. Rio Guayuriba vigencia hasta el 28 de diciembre de 2030. Licencia ambiental Resolución No PS-GJ-1.2.6.013-1941 para extracción y transporte de material granular Rio Guayuriba, vigencia hasta el 28 de diciembre de 2030		Se ha aportado documentacion de la mina que suministrara material granular
Permiso de ocupa temporales de vías	NO			No aplica al proyecto
Pago de tasas y/o regalías	NO			No aplica al proyecto
Permiso de trabajos nocturnos	NO			No aplica al proyecto
Otro (cual):	NO			

VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES

CUMPLIMIENTO DE METAS

Programa ambiental	Aplica	Cumplimiento de metas %	Observaciones
Desarrollo e implementación del sistema de gestión ambiental	SI	90%	Se han ejecutado actividades de acuerdo al Plan ambiental General. Ajustado presentado y aval dado por interventoria
Manejo integral de residuos sólidos	SI	80%	Se ha generado residuos sólidos en proporciones pequeñas los convencionales
Manejo integral de materiales de construcción	SI	100%	Los materiales de construcción generados se ha dado manejo adecuado según PMA
Explotación fuentes de materiales	SI	0%	No se ha realizado explotación de esta para la ejecución de la obra
Manejo integral de aguas y residuos líquidos	SI	90%	La comunidad de obra no ha generado residuos líquidos y se ha dado un manejo adecuado a los aguas existentes.
Control de erosión, estabilidad de taludes y laderas	SI	0%	No se ha presentado erosión o afectaciones de estabilidad de taludes y/o laderas
Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamento y sitios de acopio temporal	SI	100%	El sitio de acopio de material se ubicado en un predio privado en cercanía con la ejecución del proyecto
Instalación, funcionamiento y abandono de las plantas de trituración, asfalto y concreto	NA	0%	El proyecto no establece operación de plantas para fabricación de concreto y/o asfalto, ya que se contempla proveedores autorizados para el suministro de material
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	SI	90%	El manejo y control de los equipos y vehículos ha sido acorde a lo establecido en el PMA del proyecto
Manejo de Vegetación	SI	0%	No se ha presentado afectación en la vegetación de la zona
Manejo de fauna	SI	0%	No se ha presentado afectación a la fauna en la zona
Protección de fauna	SI	0%	Se han tomado todas las medidas y precauciones que garanticen la protección de fauna
Protección de áreas sensibles	SI	0%	No se presentan áreas sensibles ambientalmente del proyecto
Plan de Gestión Social	SI	70%	Se ha implementado el plan de gestión social de acuerdo a las necesidades del proyecto
Programa de higiene y salud ocupacional	SI	100%	Se ha dado cumplimiento al programa de seguridad y salud en el trabajo según documento ambiental
Otros	SI	100%	Se ha cumplido a cabalidad lo establecido en el PMA

Nota: Diligencie las casillas de programa ambiental teniendo en cuenta lo establecido en el PMA o EIA, de acuerdo a la necesidad puede incluir mas filas con los programas que no encuentre diligenciados en el presente formato.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

INFORME IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023330000004
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA RL, FRANCISO VICRA GUTIERREZ		
NIT	N.I.T 901787420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	979 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
PERIODO IMPLEMENTACIÓN:	01- JULIO-2026 AL 31-JULIO-2026		

RESTAURACIÓN O RECUPERACIÓN DE AREAS INTERVENIDAS

Cumplió con los requerimientos para la entrega de áreas intervenidas?	N/A
Localización	N/A
No. de individuos sembrados	N/A
Estado fitosanitario de los individuos	N/A
	N/A
Área empradizada (m^2)	N/A

Observaciones: No es requerido la restauracion de areas intervenidas, sin embargo se evaluara el impacto durante la ejecucion de la obra para lo cual obligar al contratista a su recuperacion si existe afectacion.

TRATAMIENTOS SILVICULTURALES EJECUTADOS

Tratamiento Autorizado	EJECUTADO				Observaciones
	Aplica	unidad	Localización	Periodo	
Tala	NO				
Poda	NO				
Otro, cual?	N.A				

SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES

Material	Volumen dispuesto (m^3)	Nombre de Sitio de disposición
Sobrante de excavación	122	Finca de cenizas

MONITOREOS

MONITOREOS	Aplica	N°	Periodo	Requerimientos Cumplidos
AGUA	NO			
AIRE	NO			
RUIDO	N.A			
VEGETACION	NO			

INTERVENCION CORRIENTES DE AGUAS

Se intervinieron corrientes de aguas durante el trascurso del proyecto:	NO
Nombre	NO
Tipo de intervención	NO
Medidas para su recuperación	NO

PASIVOS AMBIENTALES PENDIENTES PARA EL CIERRE

RADICAR MEDIDAS DE MANEJO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

¿Cuales?

CONCLUSIONES, COMENTARIOS O RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA DAR CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS AMBIENTALES EN CUANTO A LOS PERMISOS AMBIENTALES OTORGADOS DE OCUPACION DE CAUCE

Firma

Nombre: JHON ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre:JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
