INFORME DE CUENTA DE COBRO No. 03



CONTRATO DE OBRA No. 3049 del 7 de Noviembre del 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO IBAGUÉ VIAL URBANO 2025

REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ

OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 2

PERIODO DEL 8 DE MARZO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026.

Contenido

INTRODUCCIÓN 3
I. Antecedentes del proyecto 4
1.1 Descripción general 4
1.2 Localización 4
1.3 Alcance 4
1.4 Datos generales del contrato de Obra 5
1.6 Pólizas contractuales 5
1.7 Seguridad social y parafiscales 6
II. Actividades contractuales 6
2.1 Informe de actividades realizadas 8
4.1 Tabla de programación 10
V. Estado financiero del contrato 10
VI. Registro fotográfico 11
VII. Conclusiones y recomendaciones 42

INTRODUCCIÓN

El **municipio de Ibagué**, celebró el contrato de obra No. 3049 del 7 de Noviembre del 2025, con el contratista **CONSORCIO IBAGUÉ VIAL URBANO 2025** cuyo objeto es "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 2", por un valor de QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($15.574.537.925,10) M/CTE. En un plazo de diez (10) meses.

En este informe se presenta una recopilación de las actividades desarrolladas a lo largo de la ejecución del proyecto para el municipio de Ibagué - Tolima, durante el periodo del 08 de Marzo de 2026 al 30 de Junio de 2026.

I.Antecedentes del proyecto

1.1 Descripción general

Como parte del compromiso con el desarrollo urbano del municipio de Ibagué y en pro de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, la Administración Municipal gestionó los recursos necesarios para la ejecución del contrato de obras de mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial urbana y obras complementarias en el Lote 2. El objetivo es ampliar la cobertura de intervenciones en la red vial, garantizando vías en óptimas condiciones que reduzcan los tiempos de desplazamiento, disminuyan los riesgos de accidentalidad asociados al deterioro de la malla vial y contribuyan a mitigar los problemas de salud derivados de la exposición a polvo y deficiencias en la movilidad.

1.2 Localización

El proyecto de ubica en la zona urbana del Municipio de Ibagué, Departamento del Tolima, Colombia.

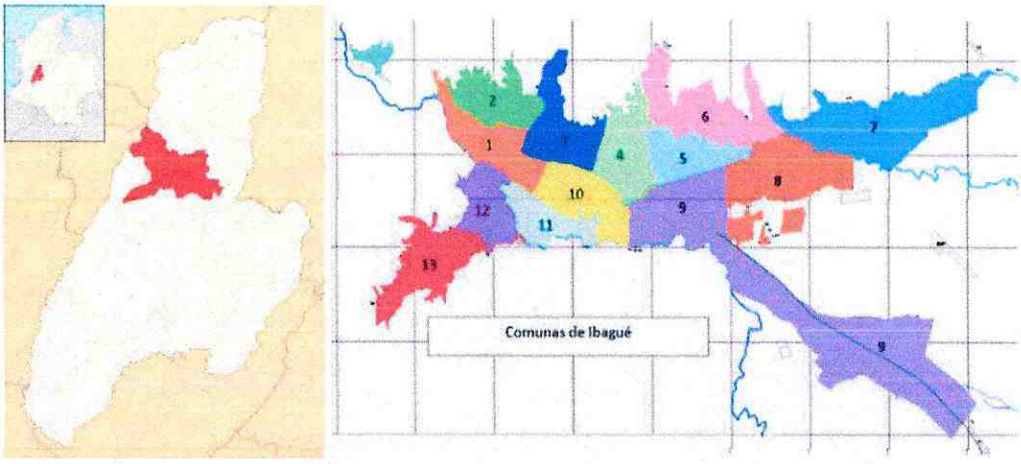


Ilustración 1. Localización del municipio de Ibagué. Fuente: Google Maps

1.3 Alcance

En la actualidad en el municipio de Ibagué habitan alrededor de 540.000 personas, de igual forma hay población flotante de los municipios cercanos de la zona. Por tal razón, el mejoramiento de las vías es de vital importancia para la comunidad por el desarrollo de la región. Estas acciones permitirán no solo mejorar la infraestructura existente, sino también cumplir con el Plan de Desarrollo Territorial, donde uno de sus proyectos busca, la intervención de vías en mal estado. El alcance del proyecto incluye la intervención integral de tramos viales, mediante actividades como demolición de pavimento, excavación, instalación de estructuras de pavimento (subrasante, sub-base, base, asfalto o concreto), construcción de andenes, bordillos, sardineles, sistemas hidráulicos (sumideros, pozos, rejillas), señalización vial y demás obras complementarias.

1.4 Datos generales del contrato de Obra

INFORMACION BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.	3049 del 7 de Noviembre del 2025
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 2
CONTRATISTA	CONSORCIO IBAGUÉ VIAL URBANO 2025
NIT	901.999.914-2
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS RICARDO ORTIGOZA
CONTRATANTE	ALCALDÍA DE IBAGUÉ SEC. DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	7 de Noviembre del 2025
TÉRMINO DEL CONTRATO	10 MESES
FECHA ACTA DE INICIO	20 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($15.574.537.925,10) M/CTE.
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE SEPTIEMBRE DE 2026

1.6 Pólizas contractuales

- Anexo 0. PÓLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO
			DESDE	HASTA		
Seguros Mundial	I-100050097	Cumplimiento del contrato	07/11/2025	07/01/2025	$1.557.453,60	Modificada
Seguros Mundial	I-100050097	Pago de salarios, prestaciones sociales e *indemnización Laboral*	07/11/2025	07/09/2029	$778.726.896,30	Modificada
Seguros Mundial	I-100050097	Estabilidad y calidad de la obra	07/09/2026	07/09/2031	$3.114.907.585,20	Modificada
Seguros Mundial	I-100012901	Responsabilidad civil	07/11/2025	07/09/2026	$778.726.896,00	Modificada

- Anexo 1. PÓLIZAS ACTA DE INCIO

COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO
			DESDE	HASTA		
Seguros Mundial	I-100050097	Cumplimiento del contrato	20/11/2025	20/01/2027	$1.557.792,60	VIGENTE
Seguros Mundial	I-100050097	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización Laboral	20/11/2025	20/09/2029	$778.726.896,30	VIGENTE
Seguros Mundial	I-100050097	Estabilidad y calidad de la obra	20/09/2026	20/09/2031	$3.114.907.585,20	VIGENTE
Seguros Mundial	I-100012901	Responsabilidad civil	20/11/2025	20/09/2026	$778.726.896,00	VIGENTE

1.7 Seguridad social y parafiscales

A la fecha del presente informe se han realizado las afiliaciones de todo el personal al Sistema de Seguridad Social y se ha dado cumplimiento a todos los requerimientos de ley.

II. Actividades contractuales

El presente contrato comprende la ejecución de las siguientes actividades:

1.	PRELIMINARES	UND
1.01	CERCA EN TELA VERDE H=2,10 M	ML
2.	OBRAS DE EXPLANACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	
2.01	DEMOLICION PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO	M3
2.02	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2
2.03	Rotura pavimento flexible e = 0,10 m	M2
2.04	EXCAVACION A MAQUINA (CAJEO)	M3
2.05	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	M3
2.06	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 8 KMS	M3/COMP
2.07	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	M3/COMP
2.08	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KMS	M3/COMP
3.	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	
3.01	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA	M2
3.02	Suministro e Instalacion de Rajon Mejoramiento de Via, Incluye Transporte	M3/COMP
3.03	SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACION (BASE -GRANULAR MEDIO MECANICO)	M3/COMP
3.04	Transporte Materiales Petreos	M3/KM
4.	CAPA DE RODADURA	
4.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 EN SITIO	M3/COMP

4.02	Suministro y aplicación Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 (incluye barrido y soplado)	M2
4.03	GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE	M2
4.04	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 (INCLUYE JUNTAS Y SELLANTES)	M3
4.05	CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA	ML
5.	**ACERO**	
5.01	Acero de Refuerzo Fy: 420 MPA	Kg
6.	**DEMARCACIÓN Y PROTECCIÓN VIAL Y PEATONAL**	
6.01	LNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	ML
6.02	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2
6.03	BASE IMPRIMANTE LÍNEA DE PINTURA PARA PAVIMENTOS EN CONCRETO	ML
6.04	BASE IMPRIMANTE PARA DEMARCACION DE PINTURA EN PAVIMENTO EN CONCRETO	M2
7.	**OBRAS EXTERIORES, ADICIONALES E HIDRAULICAS**	
7.01	ANDEN EN CONCRETO E=0,10 (INCLUYE ALISTADO Y NIVELACIÓN)	M2
7.02	SARDINEL TRAPEZIODAL B (15-20) h=36-45 COM CONCRETO 2500 PSI	ML
7.03	SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE REJILLA)	UND
7.04	Suministro e instalación de Arotapa Completa Vibrocompactada	UND
7.05	Nivelación de Pozos de Inspección de 4 a 5 hiladas	UND
7.06	Filtro en Geodren 4" de H = 1m Tubular Incl. Excavaciones	ML
7.07	Viga de confinamiento para transicion de pavimento nuevo con antiguo 30x20cm	ML
7.08	Sumidero pasacalle 0,7*0,75*1 e=0,15 m (INCLUYE REJILLA Y ACERO DE REFUERZO 3/8")	ML
7.09	Ruana en Concreto de 4000 PSI (1.5mx1.5mx020m) Para Ajuste Aro y Tapa Para Pozo de Inspeccion, (Incluye acero de refuerzo)	UND
8.	**PARCHEO**	
8.01	Parcheo de pavimento asfáltico - (Incluye corte, demolición, barrido y soplado, imprimación o riego de liga, suministro, extendida, compactación y transporte de la mezcla asfáltica)	M3/COMP
9.	**REHABILITACIÓN**	
9.01	FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ESPESOR DE 7,5 CM INCLUYE TRANSPORTE KM	M2
NP	**ÍTEMS NO PREVISTOS**	
NP 1.	FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO INCLUYE TRANSPORTE HASTA 19 KM	M3
NP 2.	IMPRIMACIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO	M2
NP 3.	CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE CON CORTADORA	ML
NP 4.	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2
NP 5.	ROTURA PAVIMENTO FLEXIBLE	M3
NP 6.	SUMINISTRO, EXTENDIDA E INSTALACIÓN DE GEOMALLA EN FIBRA DE VIDRIO RT100	M2
NP 7.	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML
NP 8.	CONCRETO (3000 PSI - 20.7 MPA) ELEVACIÓN	M2
NP 9.	CANASTILLA PARA BARRA PASA JUNTA	ML
NP 10.	ACERO LISO PARA BARRA PASA JUNTA (DOVELAS)	KG

NP 11.	REJILLA METÁLICA PARA CARCAMO O SUMIDERO	ML

2.1 Informe de actividades realizadas

En el marco del contrato de obra pública No. 3049 del 7 de Noviembre de 2025, se han ejecutado las siguientes actividades contractuales:

I. Preliminares y explanaciones.

Se realizaron actividades de topografía, localización y replanteo del terreno en las diferentes vías a intervenir.

II. Cajeo e instalación de la estructura de pavimento

Se avanzó en el proceso de cajeo para la instalación de la estructura de pavimento, adecuando el terreno conforme a los niveles proyectados. Se instaló capa de mejoramiento tipo rajón, en el caso que aplicara para garantizar una estructura estable, seguido de la instalación de geotextil en el caso *que aplicara, luego el suministro, instalación y compactación de la base granular. Para finalmente,* ejecutar la instalación de pavimento asfáltico o concreto hidráulico MR-42 siguiendo las especificaciones de diseño de cada tramo vial, cumpliendo con los estándares técnicos requeridos para asegurar la durabilidad y resistencia del pavimento.

III. Obras exteriores, adicionales e hidráulicas

Se ejecutaron las actividades de nivelación de pozos, así como la instalación de ruanas y arotapas, garantizando la correcta adecuación de las estructuras existentes. De manera complementaria, se construyeron las obras hidráulicas necesarias para el adecuado funcionamiento de la vía, entre ellas: cárcamos y sumideros para la conducción de aguas superficiales. Finalmente, se desarrollaron las obras de urbanismo asociadas a la vía, tales como la construcción de andenes, bordillos y vigas de confinamiento, con el fin de asegurar la estabilidad del corredor y mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad para los usuarios.

IV. Demarcación y protección vial y peatonal

Se iniciaron estas actividades con la imprimación, una capa base para sellar la superficie, mejorar la adherencia y garantizar la durabilidad de la pintura. Una vez preparada la vía, se ejecutaron las diferentes marcas reglamentarias: líneas longitudinales para delimitar carriles y sentidos de circulación, líneas transversales de pare, flechas direccionales y pasos peatonales tipo cebra, diseñados para resaltar zonas de cruce seguro.

De manera general, las actividades descritas se ejecutaron en todos los frentes de obra siguiendo los mismos lineamientos constructivos y especificaciones técnicas. No obstante, debido a las particularidades propias de cada tramo vial, como diferencias en diseño, condiciones del terreno, requerimientos hidráulicos, interferencias existentes o ajustes operativos durante la ejecución, surgieron situaciones específicas que es necesario destacar para una adecuada comprensión del

proceso constructivo. A continuación, se presentan los aspectos particulares más relevantes identificados en algunos sectores intervenidos:

- CARRERA 6A(6B) ENTRE CALLE 56 Y 59 - BARRIO LIMONAR: En este tramo se contempla la reposición de las redes de alcantarillado y acueducto a cargo de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P., entidad responsable de la renovación integral de la tubería de acueducto, alcantarillado y de sus respectivas acometidas domiciliarias. La ejecución de estas actividades, desarrolladas de manera paralela al proceso de cajeo de la vía, ha generado afectaciones en el avance del frente de obra, dado que únicamente una vez culminadas dichas labores será posible continuar con la instalación de la estructura de pavimento.
  Durante este periodo, la subrasante permanece expuesta, lo que ocasiona deterioro del material existente y, adicionalmente, implica retrasos operativos y sobrecostos asociados a personal, alquiler de maquinaria y demás recursos necesarios para la continuidad de las actividades constructivas.

- CALLE 57 ENTRE CARRERAS 6 Y 7 – BARRIO LIMONAR: En este tramo se contempla la reposición de las redes de alcantarillado y acueducto a cargo de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P., entidad responsable de la renovación integral de la tubería de acueducto, alcantarillado y de sus respectivas acometidas domiciliarias. La ejecución de estas actividades, desarrolladas de manera paralela al proceso de cajeo de la vía, ha generado afectaciones en el avance del frente de obra, dado que únicamente una vez culminadas dichas labores será posible continuar con la instalación de la estructura de pavimento.
  Durante este periodo, la subrasante permanece expuesta, lo que ocasiona deterioro del material existente y, adicionalmente, implica retrasos operativos y sobrecostos asociados a personal, alquiler de maquinaria y demás recursos necesarios para la continuidad de las actividades constructivas.

- TRAMO No. 31 CALLE 111 ENTRE AVENIDA MIROLINDO Y CARRERA 21 SUR – BARRIO APARCO: En este tramo contempla la reposición de las redes de acueducto a cargo de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P., entidad responsable de la renovación integral de la tubería de acueducto y de sus respectivas acometidas domiciliarias. La ejecución de estas actividades, desarrolladas de manera paralela al proceso de cajeo de la vía, ha generado afectaciones en el avance del frente de obra, dado que únicamente una vez culminadas dichas labores será posible continuar con la instalación de la estructura de pavimento.
  Durante este periodo, la subrasante permanece expuesta, lo que ocasiona deterioro del material existente y, adicionalmente, implica retrasos operativos y sobrecostos asociados a personal, alquiler de maquinaria y demás recursos necesarios para la continuidad de las actividades constructivas.

- TRAMO DE LA CRA 14 SUR ENTRE CALLE 23 Y 23B – BARRIO RICAURTE: En este tramo contempla la reposición de las redes de acueducto a cargo de la ACUARICAURTE., entidad responsable de la renovación integral de la tubería de acueducto y de alcantarillado

y de sus respectivas acometidas domiciliarias. La ejecución de estas actividades, desarrolladas de manera paralela al proceso de cajeo de la vía, ha generado afectaciones en el avance del frente de obra, dado que únicamente una vez culminadas dichas labores será posible continuar con la instalación de la estructura de pavimento.
Durante este periodo, la subrasante permanece expuesta, lo que ocasiona deterioro del material existente y, adicionalmente, implica retrasos operativos y sobrecostos asociados a personal, alquiler de maquinaria y demás recursos necesarios para la continuidad de las actividades constructivas.

- TRAMO No. 35 CARRERA 3A ENTRE CALLES 70 Y 71 – BARRIO JORDAN 2 ETP: En este tramo se contempla la reposición de las redes de acueducto a cargo de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P., entidad responsable de la renovación integral de la tubería de acueducto y de sus respectivas acometidas domiciliarias. La ejecución de estas actividades, desarrolladas de manera paralela al proceso de cajeo de la vía, ha generado afectaciones en el avance del frente de obra, dado que únicamente una vez culminadas dichas labores será posible continuar con la instalación de la estructura de pavimento.

4.1 Tabla de programación

CONTRATO No. 3049	
FECHA DE INICIO	**20/11/2025**
FECHA DE CORTE SEGÚN PRESENTE INFORME	**30/06/2026**
% AVANCE DE OBRA EJECUTADO	**94.99%**
% AVANCE DE OBRA DURANTE EL PERIODO	**25.83%**


V. Estado financiero del contrato

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$15.574.537.925,10
VALOR ACTA PARCIAL 1	$ 4.673.028.829,00	
VALOR ACTA PARCIAL 2	$ 6.098.027.946,28	
VALOR ACTA PARCIAL 3	$ 4.023.680.837,51	
VALOR POR COBRAR	$ 779.800.312,31	
SUMAS IGUALES	$15.574.537.925,10	$15.574.537.925,10

VI. Registro fotográfico

- **DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, CAJEO Y CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES:**




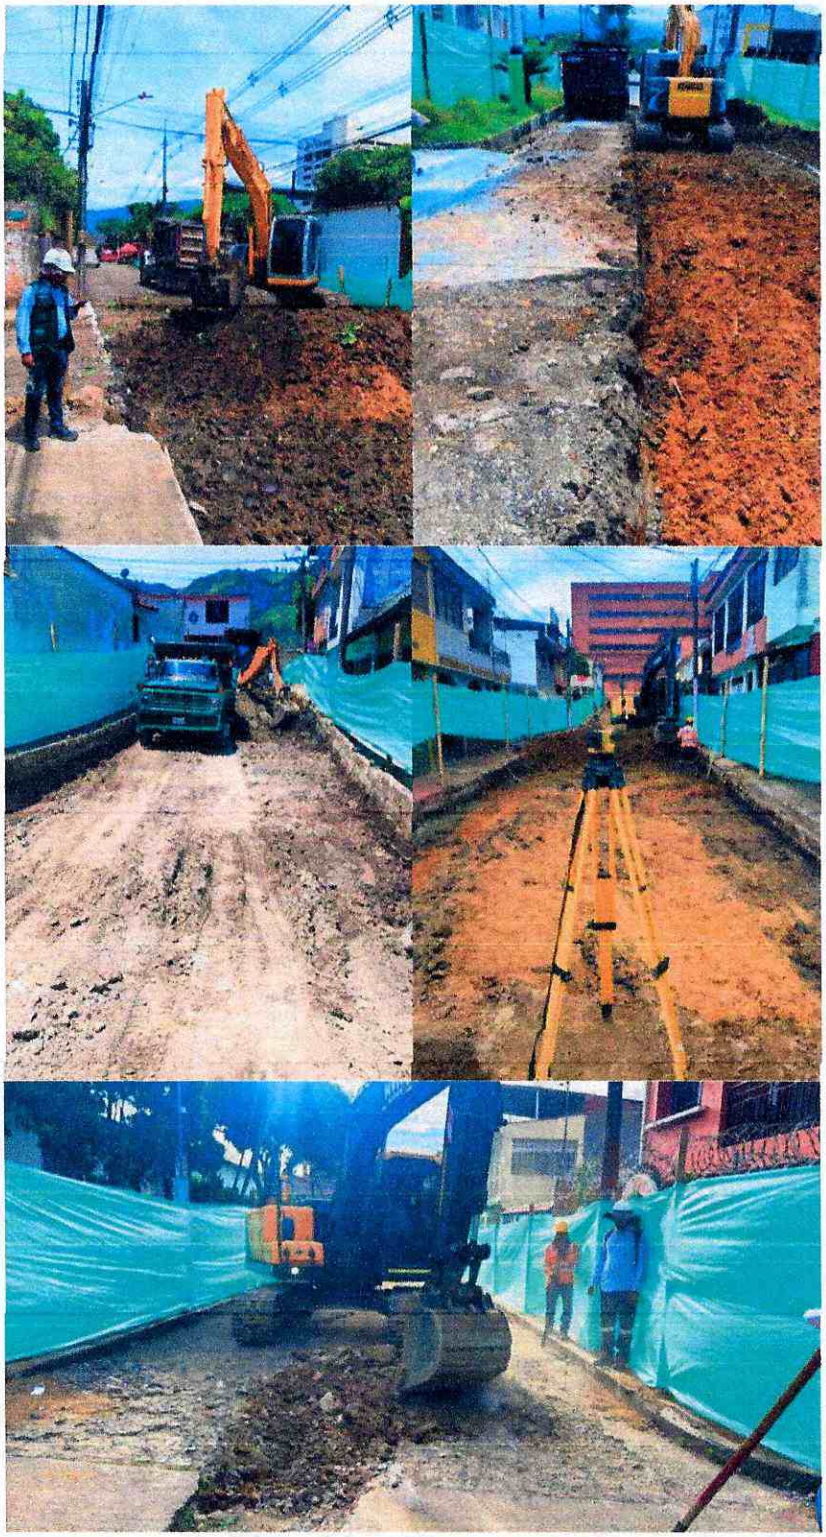

Dirección: Calle 12 No. 2-70 Oficina 405 Edificio El Molino, Ibagué – Tolima
E-mail: consorciovialibague2025@gmail.com licitaciones.ro@gmail.com
Cel: (8) 2637743



- **NIVELACIÓN DE LA SUBRASANTE Y SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEJORAMIENTO TIPO RAJÓN:**

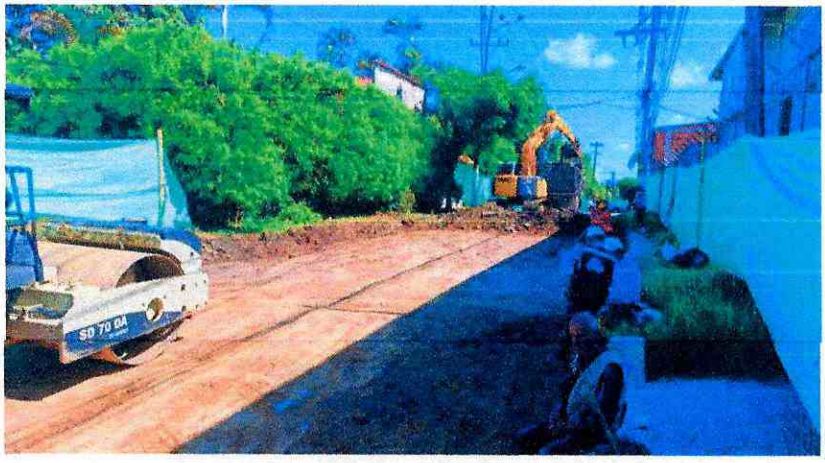







- **INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR:**






Dirección: Calle 12 No. 2-70 Oficina 405 Edificio El Molino, Ibagué – Tolima
E-mail: consorciovialibague2025@gmail.com licitaciones.ro@gmail.com
Cel: (8) 2637743


Galaxy S20 FE



Galaxy S20 FE

- **INSTALACIÓN DE IMPRIMACIÓN Y SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO:**

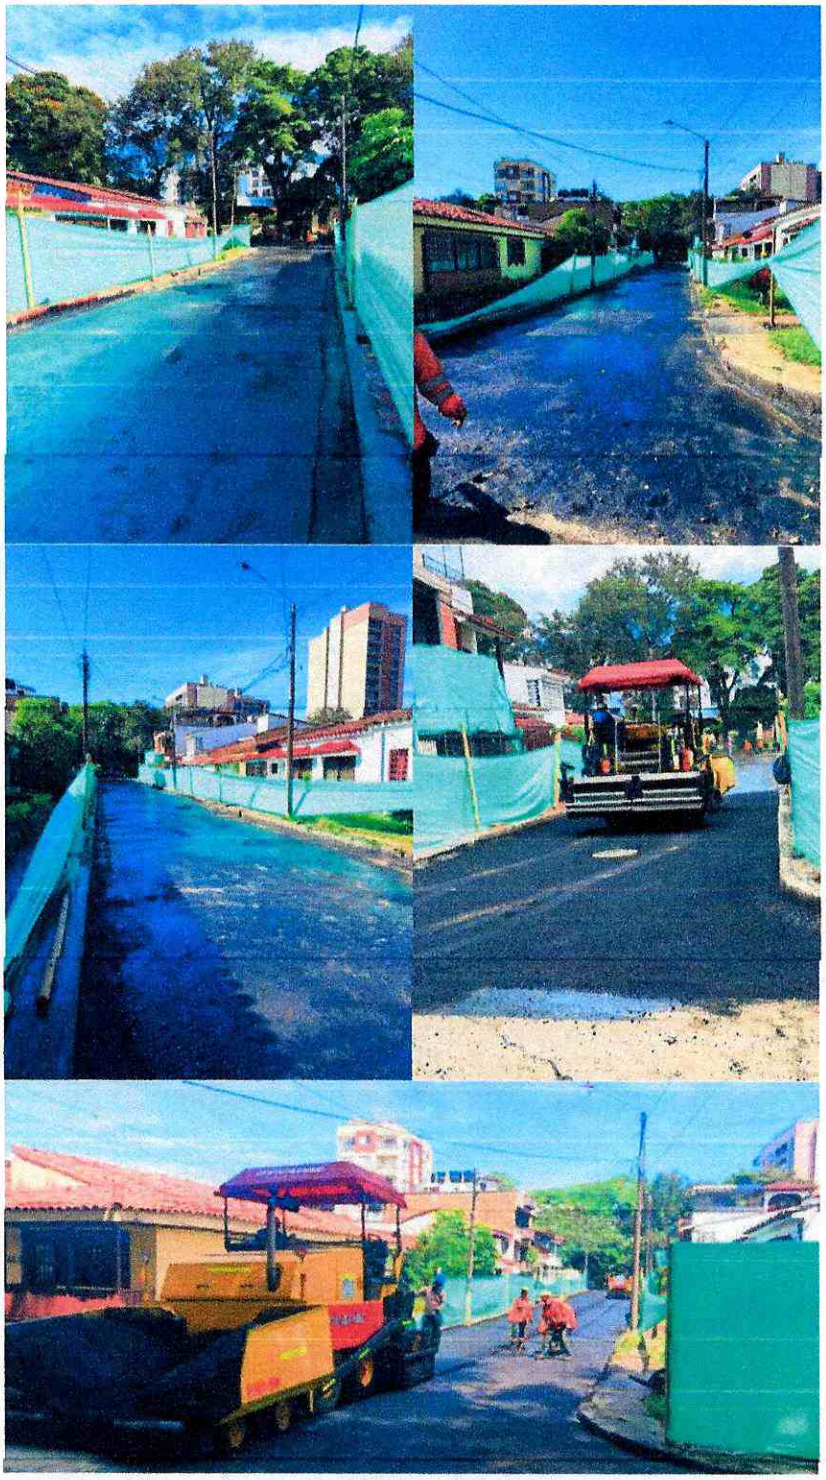



Dirección: Calle 12 No. 2-70 Oficina 405 Edificio El Molino, Ibagué – Tolima
E-mail: consorciovialibague2025@gmail.com licitaciones.ro@gmail.com
Cel: (8) 2637743

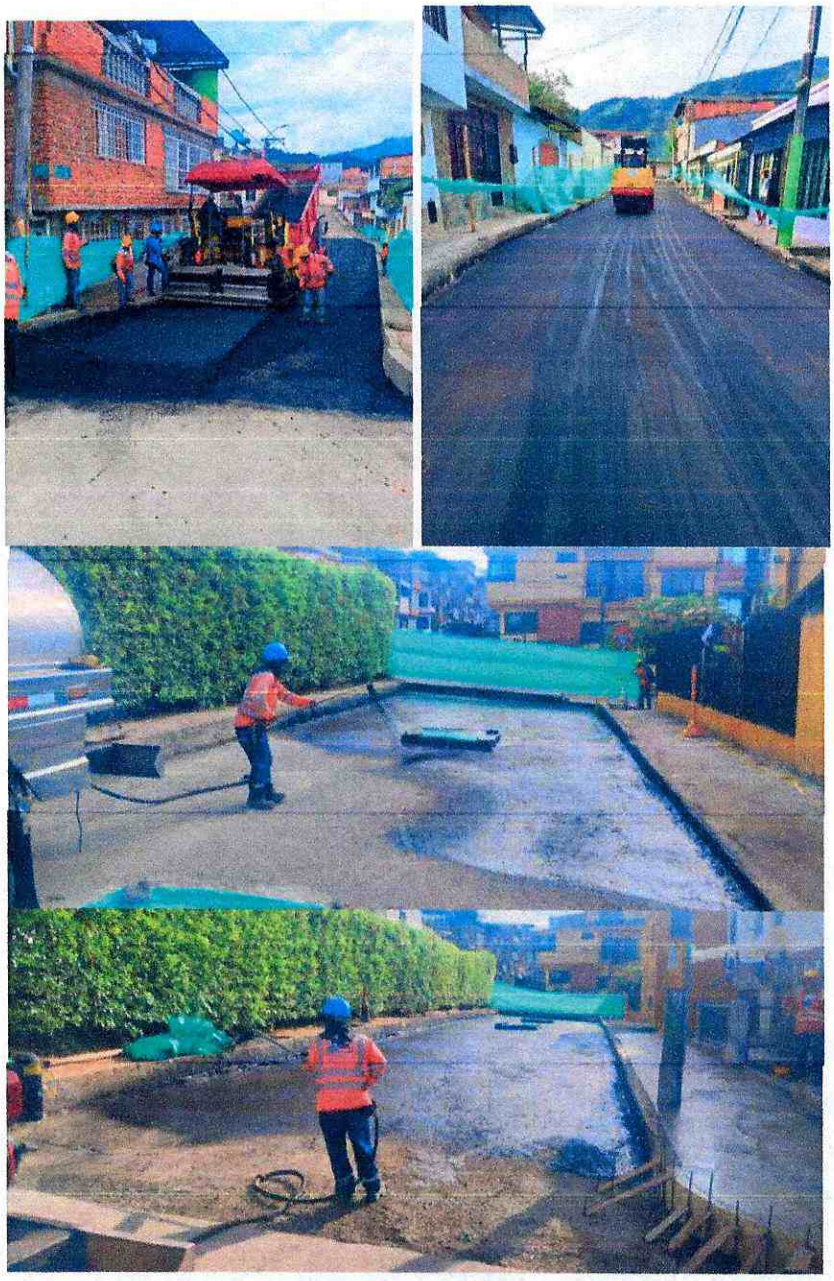

Dirección: Calle 12 No. 2-70 Oficina 405 Edificio El Molino, Ibagué – Tolima
E-mail: consorciovialibague2025@gmail.com licitaciones.ro@gmail.com
Cel: (8) 2637743



Dirección: Calle 12 No. 2-70 Oficina 405 Edificio El Molino, Ibagué – Tolima
E-mail: consorciovialibague2025@gmail.com licitaciones.ro@gmail.com
Cel: (8) 2637743



Dirección: Calle 12 No. 2-70 Oficina 405 Edificio El Molino, Ibagué – Tolima
E-mail: consorciovialibague2025@gmail.com licitaciones.ro@gmail.com
Cel: (8) 2637743

- **INSTALACIÓN DE ACERO Y CONCRETO PRE-MEZCLADO MR-42:**





Dirección: Calle 12 No. 2-70 Oficina 405 Edificio El Molino, Ibagué – Tolima
E-mail: consorciovialibague2025@gmail.com licitaciones.ro@gmail.com
Cel: (8) 2637743









Dirección: Calle 12 No. 2-70 Oficina 405 Edificio El Molino, Ibagué – Tolima
E-mail: consorciovialibague2025@gmail.com licitaciones.ro@gmail.com
Cel: (8) 2637743



Dirección: Calle 12 No. 2-70 Oficina 405 Edificio El Molino, Ibagué – Tolima
E-mail: consorciovialibague2025@gmail.com licitaciones.ro@gmail.com
Cel: (8) 2637743



Dirección: Calle 12 No. 2-70 Oficina 405 Edificio El Molino, Ibagué – Tolima
E-mail: consorciovialibague2025@gmail.com licitaciones.ro@gmail.com
Cel: (8) 2637743

- **EXCAVACIÓN MANUAL E INSTALACIÓN DE SARDINELES:**





- INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE (CÁRCAMOS, SUMIDEROS):




- NIVELACIÓN DE POZOS E INSTALACIÓN DE RUANAS Y AROTAPAS:



- OBRAS COMPLEMENTARIAS (ANDENES, BORDILLOS, ETC.):



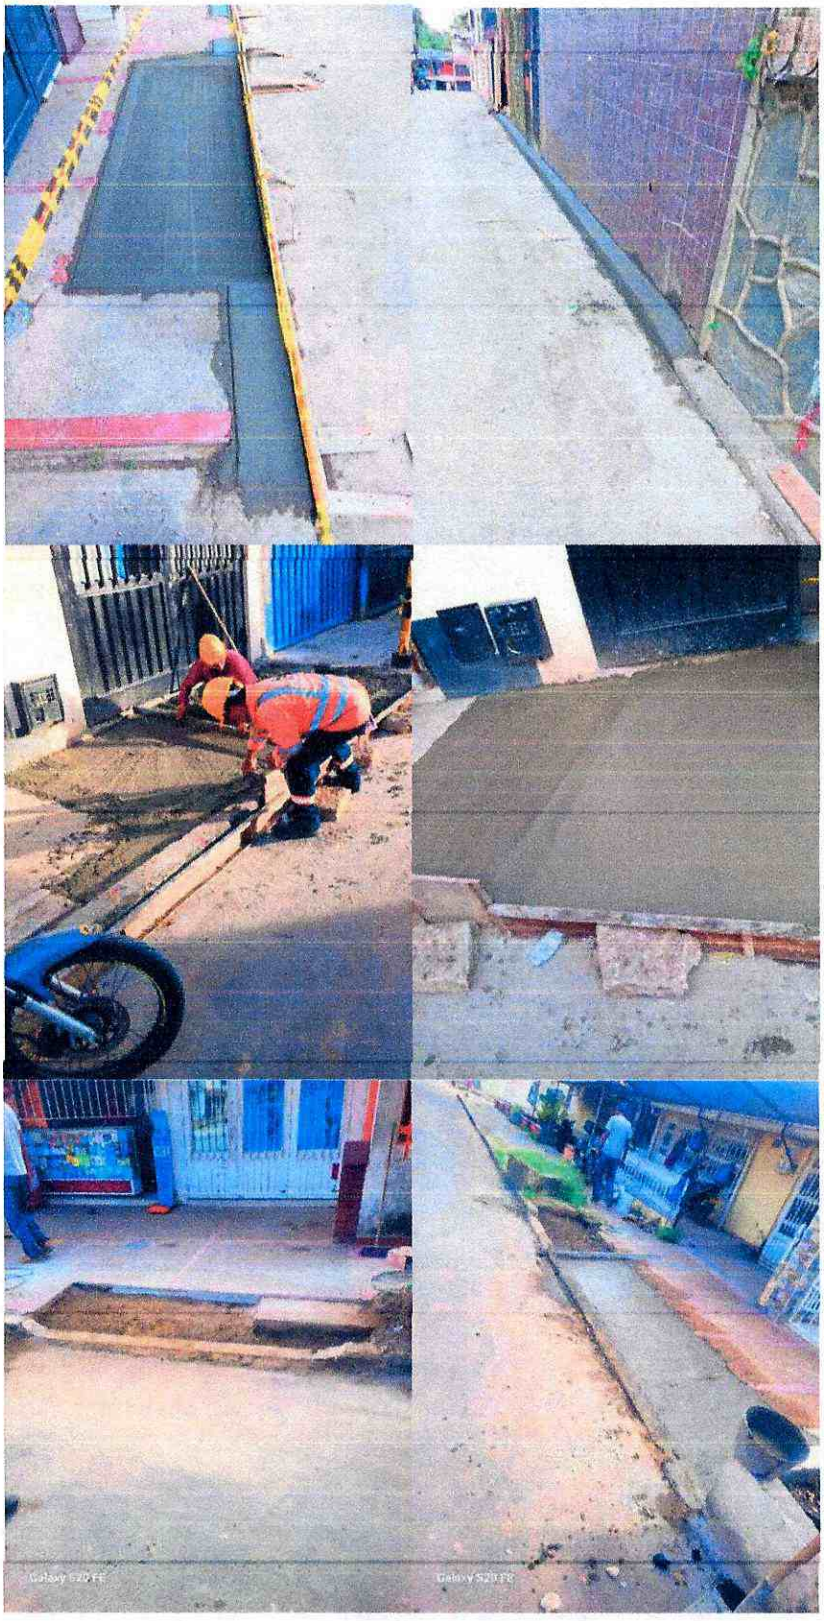

Dirección: Calle 12 No. 2-70 Oficina 405 Edificio El Molino, Ibagué – Tolima
E-mail: consorciovialibague2025@gmail.com licitaciones.ro@gmail.com
Cel: (8) 2637743



Dirección: Calle 12 No. 2-70 Oficina 405 Edificio El Molino, Ibagué – Tolima
E-mail: consorciovialibague2025@gmail.com licitaciones.ro@gmail.com
Cel: (8) 2637743



- **SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL VIAL Y PEATONAL:**










Dirección: Calle 12 No. 2-70 Oficina 405 Edificio El Molino, Ibagué – Tolima
E-mail: consorciovialibague2025@gmail.com licitaciones.ro@gmail.com
Cel: (8) 2637743



Dirección: Calle 12 No. 2-70 Oficina 405 Edificio El Molino, Ibagué – Tolima
E-mail: consorciovialibague2025@gmail.com licitaciones.ro@gmail.com
Cel: (8) 2637743

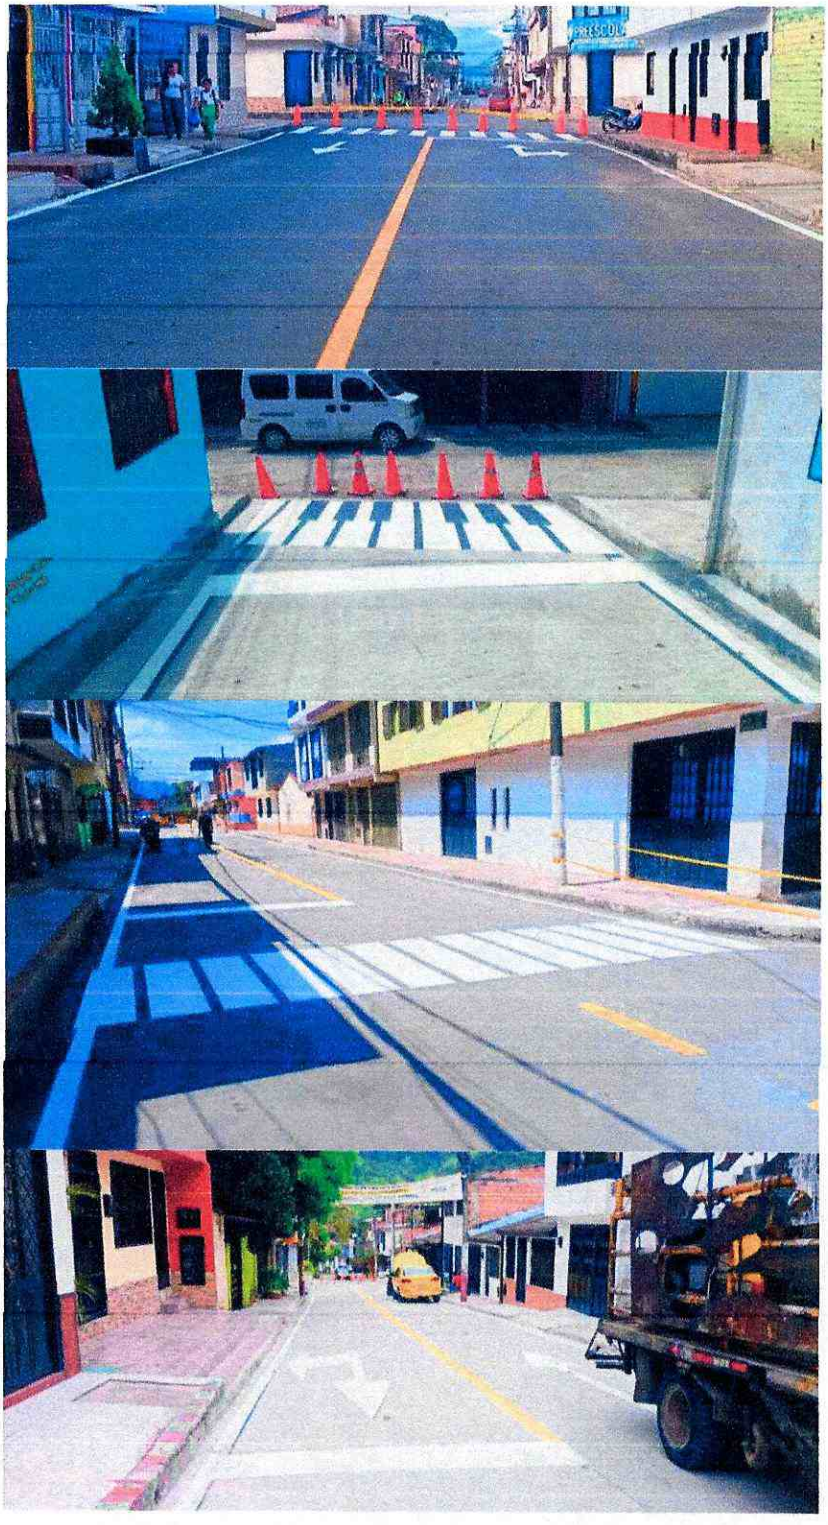

Dirección: Calle 12 No. 2-70 Oficina 405 Edificio El Molino, Ibagué – Tolima
E-mail: consorciovialibague2025@gmail.com licitaciones.ro@gmail.com
Cel: (8) 2637743







Dirección: Calle 12 No. 2-70 Oficina 405 Edificio El Molino, Ibagué – Tolima
E-mail: consorciovialibague2025@gmail.com licitaciones.ro@gmail.com
Cel: (8) 2637743



Dirección: Calle 12 No. 2-70 Oficina 405 Edificio El Molino, Ibagué – Tolima
E-mail: consorciovialibague2025@gmail.com licitaciones.ro@gmail.com
Cel: (8) 2637743



Dirección: Calle 12 No. 2-70 Oficina 405 Edificio El Molino, Ibagué – Tolima
E-mail: consorciovialibague2025@gmail.com licitaciones.ro@gmail.com
Cel: (8) 2637743

VII. Conclusiones y recomendaciones

Las actividades del contrato se han desarrollado dentro del plazo establecido en el mismo. Durante el periodo del presente informe, se ejecutaron las actividades planificadas, cumpliendo las especificaciones técnicas requeridas y acogiéndonos estrictamente a los diseños entregados por la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Ibagué.

Se ha cumplido con la afiliación del personal contratado al sistema de seguridad social, cumpliendo todo lo relacionado a seguridad industrial y todos los requerimientos de ley.

Las actividades realizadas, como localización y replanteo, cajeo, instalación de la estructura de pavimento, así como rehabilitación y parcheo. Fueron llevadas a cabo bajo los estándares técnicos exigidos, garantizando la calidad y durabilidad de la obra. La utilización de materiales certificados y mano de obra calificada permitió asegurar el cumplimiento de las especificaciones contractuales y técnicas, reduciendo riesgos en el desarrollo del proyecto.

Se alcanzaron los objetivos previstos para este periodo, lo que demuestra una eficiente gestión técnica, administrativa y operativa del proyecto. Con los avances obtenidos, el proyecto se encuentra en línea con el cronograma general, garantizando que las metas finales sean alcanzadas dentro de los tiempos establecidos y en beneficio de la comunidad del municipio de Ibagué.

Atentamente,

Ing. RICARDO ORTIGOZA GONZÁLEZ
Rep. CONSORCIO IBAGUÉ VIAL URBANO 2025
