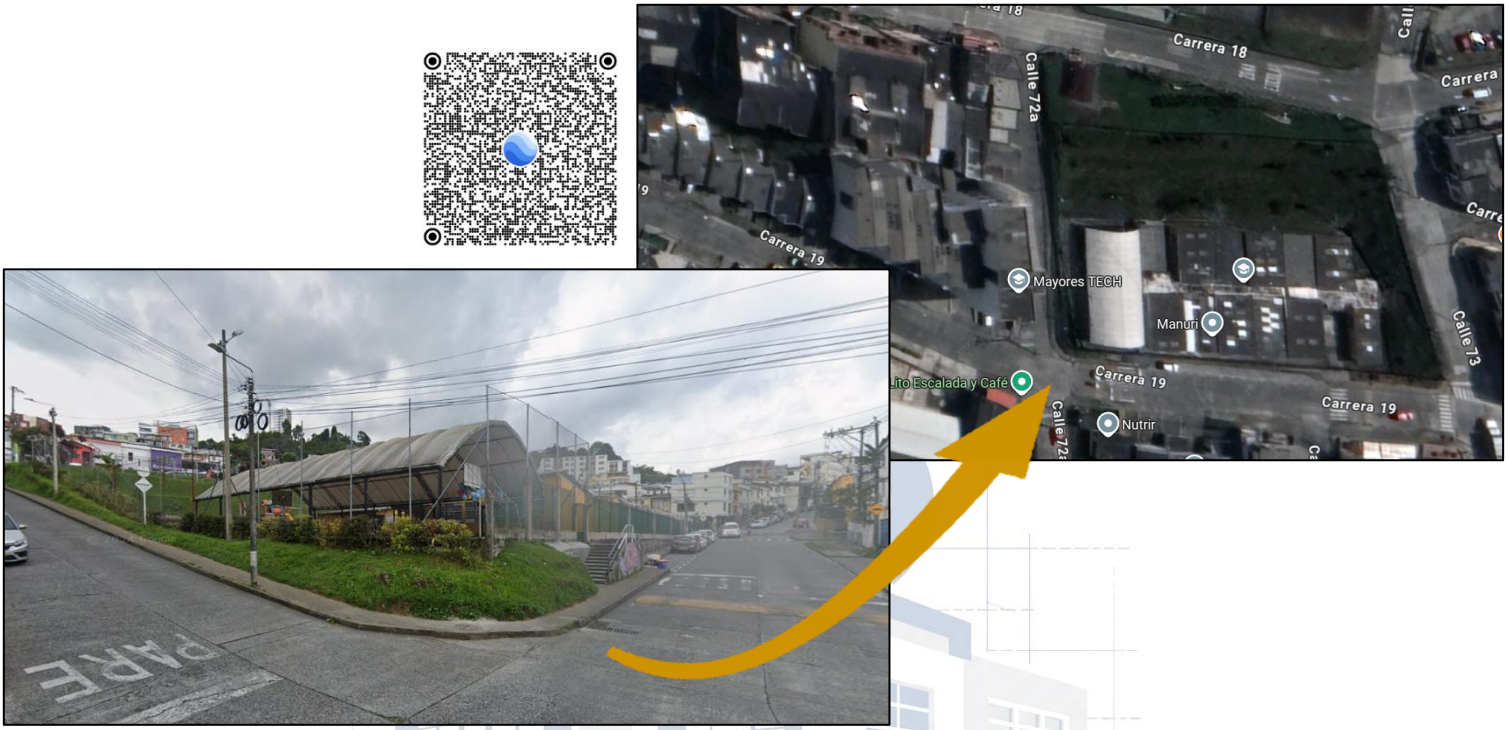
CONSORCIO DANFTC 030

INFORME DEL PROYECTO N° 02



OBJETO OBRA: MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA SEDE A MERCEDES ABREGO, UBICADA EN LA COMUNA 6 - ECOTURÍSTICA CERRO DE ORO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

CONTRATO: 2604140798

PERIODO INFORME: JUNIO 07 A JUNIO 15 DE 2026

CONTRATISTA: CONSORCIO DANFTC 030

INTERVENTOR: CINTE SAS INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA SAS

SUPERVISOR: ORLANDO MARÍN MEJÍA

FECHA ACTUALIZACION INFORME: JUNIO 15 DE 2026

CONSORCIO DANFTC 030
CONSTRUIMOS ESPACIOS PARA EL FUTURO
EDIFICACIONES ESCOLARES CON CALIDAD Y COMPROMISO

TABLA DE CONTENIDO

INFORME DEL PROYECTO N° 02 1
TABLA DE CONTENIDO 2
INTRODUCCIÓN 3
DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 5
ACTIVIDADES POR EJECUTAR 6
CONTRATO DE OBRA 7
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 7
DESARROLLO DE LAS OBRAS 8
PROGRAMACIÓN DE OBRA 12
EJECUCIÓN DE OBRA 14
REGISTRO DE LLUVIAS 18
REGISTRO FOTOGRAFICO 19

ESCUELA
CONSORCIO
DANFTC 030
CONSTRUIMOS ESPACIOS PARA EL FUTURO
EDIFICACIONES ESCOLARES CON CALIDAD Y COMPROMISO

INTRODUCCIÓN

El artículo 311 de la Constitución Política, establece que al municipio como entidad fundamental de la división política administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que le determine la Ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, y cumplir las demás funciones que le asignen en la Constitución y las leyes.

De acuerdo con el PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027, de acuerdo con Programa de "Gobierno En Serio" en la LÍNEA ESTRATÉGICA denominada "Desarrollo Humano Social", se enmarca en el proyecto "MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES" el cual tiene como propósito implementar un plan anual de construcción, mantenimiento y modernización para el mejoramiento de la infraestructura educativa.

Proyecto que fue formulado teniendo en cuenta el diagnóstico de necesidades a nivel de la infraestructura de los escenarios educativos del municipio de Manizales. Dicho plan igualmente se encuentra vigente y tendrá como objetivo central la creación de las condiciones sociales, culturales, económicas, territoriales, políticas e institucionales, para ampliar las oportunidades de desarrollo humano integral para todos sus habitantes.

La comunidad y los funcionarios del municipio requieren de instalaciones en buen estado que permitan su adecuado uso y goce, por tal motivo se hace necesario proyectar un contrato de obra, que permita la preservación del buen estado y funcionamiento de los bienes inmuebles a través de actividades de recuperación, mantenimiento y mejoramiento, que mitiguen el impacto por deterioros causados por el uso, el paso del tiempo, la inclemencia climática y los actos vandálicos.

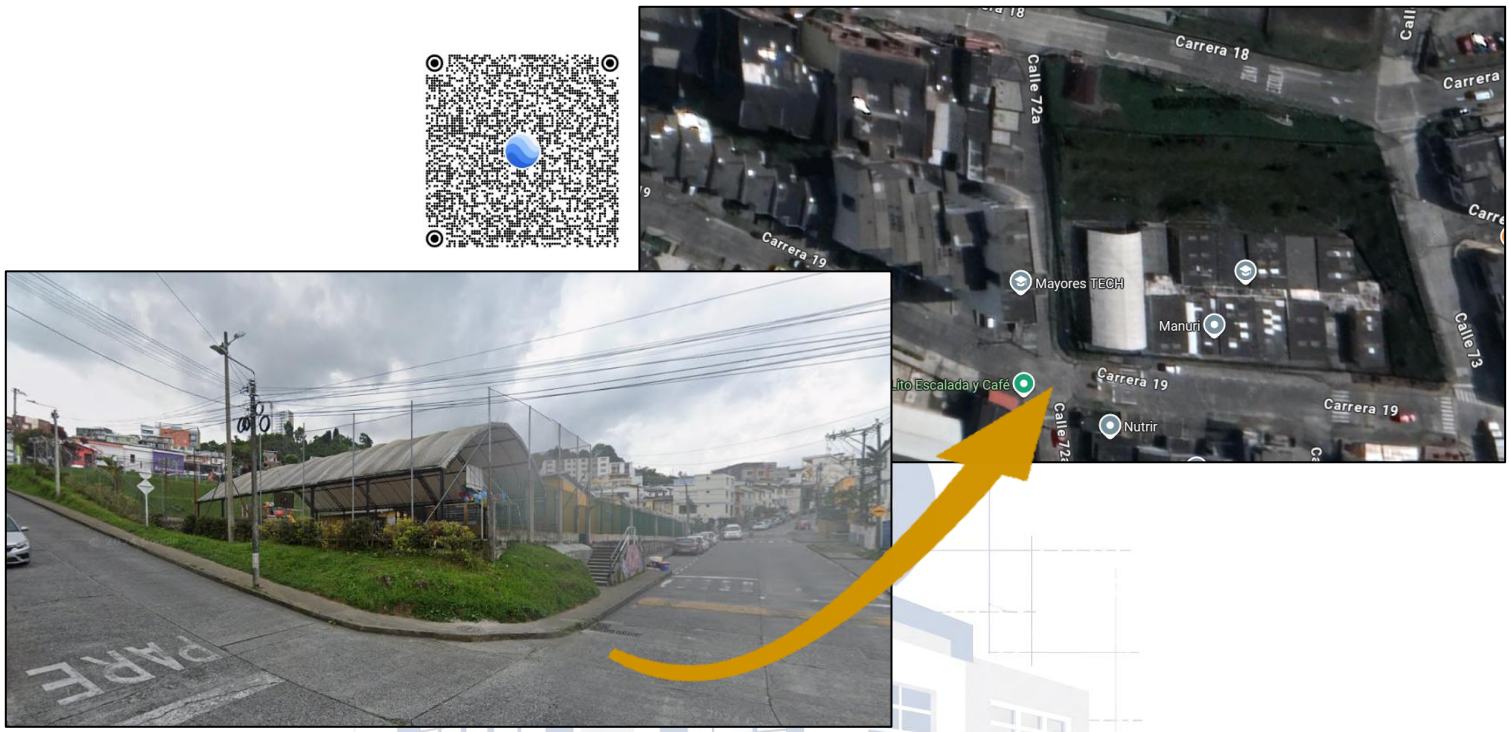
La Alcaldía de Manizales a través de la Secretaría de infraestructura como responsable del diseño, construcción, reparación, adecuación y mantenimiento de toda la infraestructura institucional, comunitaria, vial, de parques, escenarios deportivos, obras de estabilidad y bienes del municipio en general, en cumplimiento del Plan de Desarrollo y de su misión institucional; razón por la cual, ha desarrollado y ejecutado planes y programas que incorporan los criterios de participación social y comunitaria, con ánimo de garantizar y propiciar un ambiente sano y agradable de todos sus habitantes.

Al respecto, la Secretaría de Educación Municipal a través del área de Planeación se apoya en la Secretaría de Infraestructura, para dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos que tienen que ver con contratos de obra cuyo fin es realizar mantenimientos, mejoramientos y cumplimiento de acciones judiciales sobre las Instituciones Educativas de propiedad del municipio, permitiendo mantener los inmuebles en las debidas condiciones de higiene y ornato.

El contrato consiste en ejecutar obras de carácter civil en Instituciones Educativas de propiedad del municipio de Manizales, según la prioridad y necesidad, buscando mantener los bienes en condiciones óptimas desde el punto de vista de calidad, salubridad, funcionalidad y seguridad.

ESCUELA
CONSORCIO
DANFTC 030
CONSTRUIMOS ESPACIOS PARA EL FUTURO
EDIFICACIONES ESCOLARES CON CALIDAD Y COMPROMISO

DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR



*ESCUELA NACIONAL DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA SEDE A MERCEDES ABREGO

Se intervendrán las Instituciones Educativas del municipio que según el inventario de necesidades que reposan en la Secretaría de Educación Municipal se clasifiquen como prioritarias, el contrato será por selección abreviada de menor cuantía, a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste.

Se pretende intervenir el siguiente listado bienes inmuebles que se encuentran en el directorio de Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Manizales, de acuerdo con las certificaciones expedidas por la Profesional Universitaria de la Oficina Coordinadora de Bienes Inmuebles de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Manizales, así:

INSTITUCION EDUCATIVA	COMUNA	No	DIRECCIÓN	DESTINACIÓN	FICHA CATASTRAL
ESCUELA NACIONAL DE AUXILIARES DE ENFERMERIA SEDE A MERCEDES OBREGO	6 - ECOTURISTICA CERRO DE ORO	I-CER-SH-2026-20	CALLES 72ª Y 73 CON CARRERAS 18 Y 19	ESCUELA DE NIÑAS MERCEDES ABREGO	17001010100000172000100000000

ACTIVIDADES POR EJECUTAR

Las obras deben regirse por las especificaciones técnicas vigentes para la ejecución, que se encuentren en la Alcaldía de Manizales.

N°	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	NECESIDADES BÁSICAS (en general)
1	ESCUELA NACIONAL DE AUXILIARES DE ENFERMERIA	SEDE A	Intervención de muros interiores en cambio de pintura y tratamiento de humedades. Cambio de cielo raso. Pintura de fachada. Cambio de cubierta en zonas deterioradas. Reparación de redes eléctricas e hidrosanitarias. Cambio de baterías sanitarias. Tratamiento de aguas lluvia.

NOTA: Las actividades a desarrollar en el establecimiento educativo pueden ser complementadas de acuerdo a la ejecución física y las condiciones de necesidades encontradas, debido a que se trata de un contrato de mantenimiento y reparación.

ESCUELA
CONSORCIO
DANFTC 030
CONSTRUIMOS ESPACIOS PARA EL FUTURO
EDIFICACIONES ESCOLARES CON CALIDAD Y COMPROMISO

CONSORCIO DANFTC 030

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO №	2604140798
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA SEDE A MERCEDES ABREGO, UBICADA EN LA COMUNA 6 - ECOTURÍSTICA CERRO DE ORO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	07/05/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	21/06/2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	MES Y MEDIO (1,5) A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
VALOR	$ 320.636.470,00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	N.A.
SUSPENSIONES	N.A.
ADICIONES	N.A.
VALOR ANTICIPO	$ 64.127.294,00
CONTRATISTA	CONSORCIO DANFTC 030

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO №	2604230809
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS COMUNAS ECOTURÍSTICO CERRO DE ORO, TESORITO, PALOGRANDE Y UNIVERSITARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	07/05/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	06/09/2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	CUATRO (4) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
VALOR	$ 145.963.496,00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	N.A.
SUSPENSIONES	N.A.
ADICIONES	N.A.
VALOR ANTICIPO	N.A.
CONTRATISTA	CINTE SAS INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA SAS

CONSORCIO DANFTC 030
CONSTRUIMOS ESPACIOS PARA EL FUTURO
EDIFICACIONES ESCOLARES CON CALIDAD Y COMPROMISO

DESARROLLO DE LAS OBRAS

Con corte al día 15 de junio de 2026, se presenta el informe del contrato de obra ***2604140798***, cuyo objeto es el ***MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA SEDE A MERCEDES ABREGO, UBICADA EN LA COMUNA 6 - ECOTURÍSTICA CERRO DE ORO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES***, la cual está siendo ejecutada por el ***CONSORCIO DANFTC 030*** en calidad de contratista, y en calidad de interventor por ***CINTE SAS INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA SAS***

Principales actividades ejecutadas:

- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M 60 ML
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CARCAMO A=0.30 M. H=0.20 M. CON REJILLA PREFABRICADA (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA CONCRETO) 11 ML
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL BAJO CONSUMO POR DESCARGA, COLOR BLANCO CORONA REF 340021001 O SIMILAR, INCLUYE MUEBLE Y ACCESORIOS GENERALES DE INSTALACIÓN. 7 UND
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA BAJO TIERRA 6" 13 ML
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.15 7.5 M2
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 4 MM TEXTURIZADO MODULADO 0,60 X 0,60 PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 33.65 M2
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA SAN LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA REF: O19001001 O SIMILAR. (INCLUYE ELEMENTOS DE GRIFERÍA PARA INSTALACIÓN). 4 UND
- SONDEO DE TUBERÍAS Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIA 67.32 ML
- RECORRIDO DE CUBIERTA (INC. GANCHOS, AMARRAS Y SIKAFLEX) 850.73 M2

- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7 132.98 M2
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN) 78.4 KG
- DESMONTE DE RED ELECTRICA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE TAPAS CIEGAS INEM BLOQUE B 1 GLB
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA DE IILUMINACIÓN EN TUBERÍA PVC SCH40 1/2", CABLE 12 AWG HFFR LS 102 UND
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60X60 CMS, 40W DE INCRUSTAR, 4000K, TIPO P27930 Ó SIMILAR 80 UND
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL LED CIRCULAR SOBREPONER 12W - SYLVANIA O SIMILAR 13 UND
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED RECTANGULAR DE 40W DE INCRUSTAR 9 UND
- SUMINISTRO, TRANSPROTE E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED 200 W, IP65 4 UND
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 1/2", CABLE N° 12 AWG HFFR LS. 25 UND
- SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERA CONDUIT EMT 1/2", CABLE 12 AWG HFFR LS 41 UND
- SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1X20 A 26 UND
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 3F5H CU THHN/THWN EN CABLE 3X4AWG + 4AWG (N) + DESNUDO 6 AWG. NO INCLUYE CONDULINADO. 14 ML
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 3F5H CU THHN/THWN EN CABLE 3X2AWG + 2AWG (N) + DESNUDO 4 AWG. NO INCLUYE CONDULINADO. 56 ML
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GENERAL CON CUATRO VARILAS DE COBRE 5/8X2,4M, CABLE NO.2/0AWG (SPAT-4V). 1 GLB
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RED ELECTRICA EN 3 # 12 THHN (NO INCLUYE DUCTO) 289 ML
- SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) 86.49 M2

- RAYADO CON PULIDORA Y PICADO DE PAREDES PARA PREPARACION DE SUPERFICIE 156 M2
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2 1069.53 M2
- SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y 3 MANOS DE PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA 28.37 M2
- DEMARCACION DE LAS DIFERENTES CANCHAS (LINEAS PARA FUTBOL SALA, VOLEIBOL, BALONMANO Y BALONCESTO). INCLUYE EQUIPO Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU EJECUCION 1 UND
- ARREGLO DE PORTERIAS MICROFUTBOL CON EXTENSIÓN Y TABLERO BALONCESTO (INCLUYE SOLDADURA, GRAFIL 5,5, MASILLA, PINTURA, ANTICORROSIVO, MALLA ESLABONADA CA 10) 1 UND
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0,74 M. (INCLUYE PINTURA DE CANAL Y GANCHOS SOPORTE) INCLUYE ANCLAJE CON GANCHO EN PLATINA DE 3/16 33 ML
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. AMBAS CARAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS. 455.34 M2
- DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO) 33.65 M2
- DESMONTE DE FLANCHES (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS) Y ALFAJIAS 66 ML
- DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES 33.3 ML
- DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.20 M (INCLUYE RETIRO) 7.5 M2
- CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 0,07 MM 38.6 ML
- EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 2.01 A 4.00 M 7.66 M3
- RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM) 23.01 M3-Suelto
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA CUALQUIER REFERENCIA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO). 24 KG
- DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS 11.31 M2

- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFILES TUBULARES ACERO LAMINADOS EN FRIO ASTM A-500 GRADO C (INCLUYE PERNOS, PLATINAS, TUERCAS, ARANDELAS, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE) 120.19 KG
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET 1 UND
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TOTALIZADOR 2X80A, 25KA 1 UND
- SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMINA DE FIBROCEMENTO E=8 MM SOBRE MURO EXISTENTE (REVOQUE EN SECO) 9.44 M2
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPERMEABILIZACION FIBER GLASS P-3 CON REFUERZO EN POLIESTER . (REMATES, EMULSIÓN ASFALTICA) 20 M2
- SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TEJA ONDULADA TRASLUCIDA AJOVER 24.69 M2
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA VENTILACION #6 PERFIL 7 33.67 M2
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO. 313.02 M2
- SUMINISTRO, TRANSPORTE DE HIDROLAVADO PARA PISOS 393.35 M2
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN TIPO II (0,80X0,80 M) EN CONCRETO CLASE II 2 ML
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCIÓN TIPO II (0,9X0,9X0,1 M) CONCRETO CLASE II 2 UND
- LIMPIEZA Y NIVELACION DE CANALES INCLUYE SOLDADURAS Y APLICACION DE WASH PREMIER 75 ML
- SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN GRANITO NATURAL CRISTAL PULIDO Y BRILLADO, PARA INCRUSTAR LAVAMANOS A=0.60M 6 ML
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED COLOR SEGÚN DISEÑO REF POREZ BEIGE MEDELLIN EXISTENTE (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.) ZOCALO EXTERIOR 90.09 M2

- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO - PARED EGEO BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR. COLOR BLANCO (INCLUYE BOQUILLA). PARA BAÑOS 11.31 M2
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA ACRILICA DE 60X60 CM VENTILACION EN CIELO RASO SALONES 89 UND
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL .22 D/ 1.00 M. (INCLUYE ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SIKAFLEX) 66 ML

PROGRAMACIÓN DE OBRA

El contratista tiene programado para este periodo una inversión acumulada de **$241,046,317** equivalentes al **75.18%**, del valor total, incluyendo adiciones, los cuales están representados así:

PRELIMINARES	
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	$ 788,400
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CARCAMO A=0.30 M. H=0.20 M. CON REJILLA PREFABRICADA (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA CONCRETO)	$ 4,015,200
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL BAJO CONSUMO POR DESCARGA, COLOR BLANCO CORONA REF 340021001 O SIMILAR, INCLUYE MUEBLE Y ACCESORIOS GENERALES DE INSTALACIÓN.	$ 3,632,800
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA BAJO TIERRA 4"	$ 788,100
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA BAJO TIERRA 6"	$ 2,706,000
ESTRUCTURAS DE CONCRETO	
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.15	$ 8,576,820
CIELO RASOS	
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 4 MM TEXTURIZADO MODULADO 0,60 X 0,60 PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	$ 19,692,800
INSTALACIONES HIDRAULICAS	
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA SAN LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA REF: O19001001 O SIMILAR. (INCLUYE ELEMENTOS DE GRIFERÍA PARA INSTALACIÓN).	$ 2,300,410
SONDEO DE TUBERÍAS Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIA	$ 718,200
CUBIERTA	
RECORRIDO DE CUBIERTA (INC. GANCHOS, AMARRAS Y SIKAFLEX)	$ 13,685,000
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	$ 6,550,000

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CLARABOYA FIBROCEMENTO # 6 INCLUYE VIDRIO	$ 1,355,000
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 PSI 0.20 X 0.12 M.	$ 1,294,500
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	$ 1,284,720
INSTALACIONES ELECTRICAS	
DESMONTE DE RED ELECTRICA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE TAPAS CIEGAS INEM BLOQUE B	$ 2,487,500
DESMONTE Y RETIRO DE REDES ELÉCTRICAS PARÁSITAS. INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	$ 3,442,500
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA DE IILUMINACIÓN EN TUBERÍA PVC SCH40 1/2", CABLE 12 AWG HFFR LS	$ 24,775,200
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60X60 CMS, 40W DE INCRUSTAR, 4000K, TIPO P27930 Ó SIMILAR	$ 6,049,280
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL LED CIRCULAR SOBREPONER 12W - SYLVANIA O SIMILAR	$ 638,280
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED RECTANGULAR DE 40W DE INCRUSTAR	$ 2,079,500
SUMINISTRO, TRANSPROTE E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED 200 W, IP65	$ 1,256,040
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 1/2", CABLE N° 12 AWG HFFR LS.	$ 639,720
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERA CONDUIT EMT 1/2", CABLE 12 AWG HFFR LS	$ 6,860,700
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE PT GFCI, EN TUBERA CONDUIT EMT 1/2", CABLE 12 AWG HFFR LS	$ 1,899,180
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA CCCE 36 W MARCA ILTEC O SIMILAR	$ 3,042,990
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, 20 CIRCUITOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQUARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1X20 A	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER 1 X 30 AMP	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 2X50 A	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 3F5H CU THHN/THWN EN CABLE 3X4AWG + 4AWG (N) + DESNUDO 6 AWG. NO INCLUYE CONDULINADO.	$ 2,105,760
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 3F5H CU THHN/THWN EN CABLE 3X2AWG + 2AWG (N) + DESNUDO 4 AWG. NO INCLUYE CONDULINADO.	$ 2,539,973
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GENERAL CON CUATRO VARILAS DE COBRE 5/8X2,4M, CABLE NO.2/0AWG (SPAT-4V).	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RED ELECTRICA EN 3 # 12 THHN (NO INCLUYE DUCTO)	$ 2,434,133
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE PASO RAWELT 4X4"	$ 4,937,700
REVOQUES-RESANES	
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	$ 6,030,700

RAYADO CON PULIDORA Y PICADO DE PAREDES PARA PREPARACION DE SUPERFICIE	$ 2,102,100
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	$ 15,088,000
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	$ 15,444,000
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	$ 9,850,000
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y 3 MANOS DE PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	$ 4,413,000
DEMARCACION DE LAS DIFERENTES CANCHAS (LINEAS PARA FUTBOL SALA, VOLEIBOL, BALONMANO Y BALONCESTO). INCLUYE EQUIPO Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU EJECUCION	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA ESMALTE. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. ALTURA <3.0M	$ 2,495,333
CARPINTERIA METALICA	
ARREGLO DE PORTERIAS MICROFUTBOL CON EXTENSIÓN Y TABLERO BALONCESTO (INCLUYE SOLDADURA, GRAFIL 5,5, MASILLA, PINTURA, ANTICORROSIVO, MALLA ESLABONADA CA 10)	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0,74 M. (INCLUYE PINTURA DE CANAL Y GANCHOS SOPORTE) INCLUYE ANCLAJE CON GANCHO EN PLATINA DE 3/16	$ 28,764,000
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. AMBAS CARAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS.	$ 5,061,600
DESMONTES	
DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	$ 7,239,000
DESMONTE DE FLANCHES (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS) Y ALFAJIAS	$ 565,600
DESMONTE DE TUBERÍA HIDROSANITARIA (INCLUYE RETIRO)	$ 4,126,000
DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	$ 1,820,000
DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.20 M (INCLUYE RETIRO)	$ 3,471,720
ASEO GENERAL	$ 1,998,857
VALOR TOTAL	**$ 241,046,317**

CONSTRUIMOS ESPACIOS PARA EL FUTURO
EDIFICACIONES ESCOLARES CON CALIDAD Y COMPROMISO

EJECUCIÓN DE OBRA

El contratista ha ejecutado en este periodo una inversión de **$288,293,120** equivalentes al **90,00%**, los cuales están representados así:

PRELIMINARES	
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	$ 1,182,600
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CARCAMO A=0.30 M. H=0.20 M. CON REJILLA PREFABRICADA (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA CONCRETO)	$ 1,472,240
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL BAJO CONSUMO POR DESCARGA, COLOR BLANCO CORONA REF 340021001 O SIMILAR, INCLUYE MUEBLE Y ACCESORIOS GENERALES DE INSTALACIÓN.	$ 5,085,920
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA BAJO TIERRA 4"	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA BAJO TIERRA 6"	$ 1,599,000
ESTRUCTURAS DE CONCRETO	
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.15	$ 1,531,575
CIELO RASOS	
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 4 MM TEXTURIZADO MODULADO 0,60 X 0,60 PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	$ 3,106,232
INSTALACIONES HIDRAULICAS	
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA SAN LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA REF: O19001001 O SIMILAR. (INCLUYE ELEMENTOS DE GRIFERÍA PARA INSTALACIÓN).	$ 2,629,040
SONDEO DE TUBERÍAS Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIA	$ 805,820
CUBIERTA	
RECORRIDO DE CUBIERTA (INC. GANCHOS, AMARRAS Y SIKAFLEX)	$ 23,284,480
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	$ 8,710,190
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CLARABOYA FIBROCEMENTO # 6 INCLUYE VIDRIO	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 PSI 0.20 X 0.12 M.	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	$ 791,840
INSTALACIONES ELECTRICAS	
DESMONTE DE RED ELECTRICA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE TAPAS CIEGAS INEM BLOQUE B	$ 2,487,500
DESMONTE Y RETIRO DE REDES ELÉCTRICAS PARÁSITAS. INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA DE IILUMINACIÓN EN TUBERÍA PVC SCH40 1/2", CABLE 12 AWG HFFR LS	$ 21,058,920
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60X60 CMS, 40W DE INCRUSTAR, 4000K, TIPO P27930 Ó SIMILAR	$ 14,233,600
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL LED CIRCULAR SOBREPONER 12W - SYLVANIA O SIMILAR	$ 1,382,940
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED RECTANGULAR DE 40W DE INCRUSTAR	$ 1,871,550
SUMINISTRO, TRANSPROTE E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED 200 W, IP65	$ 1,256,040
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 1/2", CABLE N° 12 AWG HFFR LS.	$ 5,331,000

SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERA CONDUIT EMT 1/2", CABLE 12 AWG HFFR LS	$ 8,523,900
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE PT GFCI, EN TUBERA CONDUIT EMT 1/2", CABLE 12 AWG HFFR LS	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA CCCE 36 W MARCA ILTEC O SIMILAR	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, 20 CIRCUITOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQUARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1X20 A	$ 1,975,480
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER 1 X 30 AMP	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 2X50 A	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 3F5H CU THHN/THWN EN CABLE 3X4AWG + 4AWG (N) + DESNUDO 6 AWG. NO INCLUYE CONDULINADO.	$ 1,228,360
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 3F5H CU THHN/THWN EN CABLE 3X2AWG + 2AWG (N) + DESNUDO 4 AWG. NO INCLUYE CONDULINADO.	$ 7,619,920
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GENERAL CON CUATRO VARILAS DE COBRE 5/8X2,4M, CABLE NO.2/0AWG (SPAT-4V).	$ 5,979,800
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RED ELECTRICA EN 3 # 12 THHN (NO INCLUYE DUCTO)	$ 7,537,120
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE PASO RAWELT 4X4"	$ -
REVOQUES - RESANES	
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	$ 4,012,271
RAYADO CON PULIDORA Y PICADO DE PAREDES PARA PREPARACION DE SUPERFICIE	$ 2,522,520
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	$ 40,342,672
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	$ -
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y 3 MANOS DE PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	$ 1,251,968
DEMARCACION DE LAS DIFERENTES CANCHAS (LINEAS PARA FUTBOL SALA, VOLEIBOL, BALONMANO Y BALONCESTO). INCLUYE EQUIPO Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU EJECUCION	$ 1,506,960
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA ESMALTE. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. ALTURA <3.0M	$ -
CARPINTERIA METALICA	
ARREGLO DE PORTERIAS MICROFUTBOL CON EXTENSIÓN Y TABLERO BALONCESTO (INCLUYE SOLDADURA, GRAFIL 5,5, MASILLA, PINTURA, ANTICORROSIVO, MALLA ESLABONADA CA 10)	$ 1,671,690

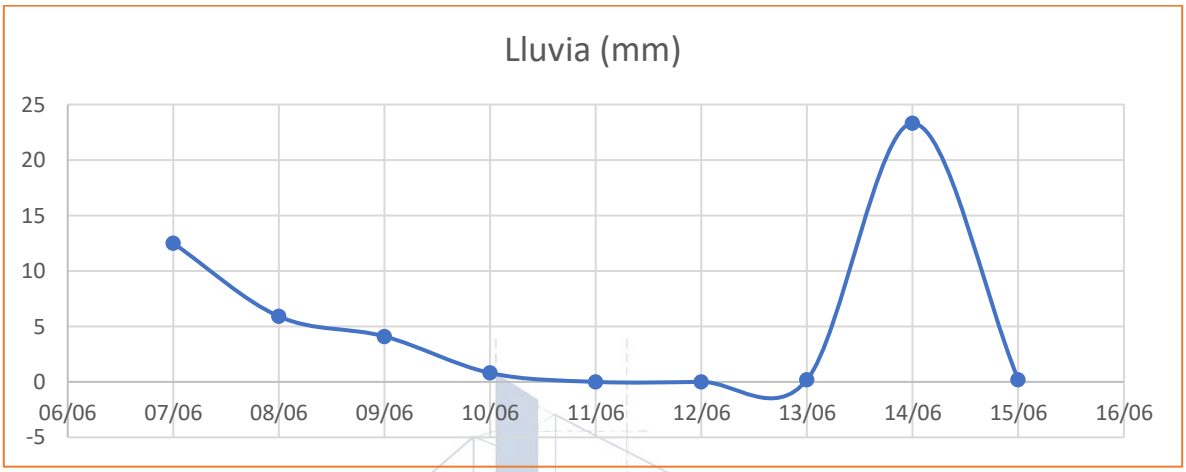
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0,74 M. (INCLUYE PINTURA DE CANAL Y GANCHOS SOPORTE) INCLUYE ANCLAJE CON GANCHO EN PLATINA DE 3/16	$ 7,910,100
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. AMBAS CARAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS.	$ 19,206,241
DESMONTES	
DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	$ 811,975
DESMONTE DE FLANCHES (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS) Y ALFAJIAS	$ 466,620
DESMONTE DE TUBERÍA HIDROSANITARIA (INCLUYE RETIRO)	$ -
DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	$ 303,030
DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.20 M (INCLUYE RETIRO)	$ 309,975
ASEO GENERAL	$ -
ÍTEMS NO PREVISTOS	
CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 0,07 MM	$ 768,217
EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 2.01 A 4.00 M	$ 508,387
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	$ 1,369,348
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA CUALQUIER REFERENCIA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO).	$ 288,984
DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	$ 213,126
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFILES TUBULARES ACERO LAMINADOS EN FRIO ASTM A-500 GRADO C (INCLUYE PERNOS, PLATINAS, TUERCAS, ARANDELAS, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE)	$ 3,719,280
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	$ 1,254,121
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TOTALIZADOR 2X80A, 25KA	$ 410,350
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMINA DE FIBROCEMENTO E=8 MM SOBRE MURO EXISTENTE (REVOQUE EN SECO)	$ 901,888
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPERMEABILIZACION FIBER GLASS P-3 CON REFUERZO EN POLIESTER . (REMATES, EMULSIÓN ASFALTICA)	$ 2,041,500
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TEJA ONDULADA TRASLUCIDA AJOVER	$ 2,102,033
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA VENTILACION #6 PERFIL 7	$ 6,717,199
REINSTALACION DE CIELO RASO EN ESTRUCTURA EXISTENTE INCLUYE PINTURA	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	$ 14,539,779
SUMINISTRO, TRANSPORTE DE HIDROLAVADO PARA PISOS	$ 5,316,125
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN TIPO II (0,80X0,80 M) EN CONCRETO CLASE II	$ 1,896,856

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCIÓN TIPO II (0,9X0,9X0,1 M) CONCRETO CLASE II	$ 722,340
LIMPIEZA Y NIVELACION DE CANALES INCLUYE SOLDADURAS Y APLICACION DE WASH PREMIER	$ 1,788,825
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN GRANITO NATURAL CRISTAL PULIDO Y BRILLADO, PARA INCRUSTAR LAVAMANOS A=0.60M	$ 5,384,736
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED COLOR SEGÚN DISEÑO REF POREZ BEIGE MEDELLIN EXISTENTE (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.) ZOCALO EXTERIOR	$ 10,830,530
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED PLANA REF MALAMBO GRIS 51X51 TIPO CM. TIPO CORONA O SIMILAR. COLOR GRIS (INCLUYE BOQUILLA.) ZOCALO INTERIOR	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO - PARED EGEO BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR. COLOR BLANCO (INCLUYE BOQUILLA). PARA BAÑOS	$ 1,461,648
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA ACRILICA DE 60X60 CM VENTILACION EN CIELO RASO SALONES	$ 8,713,367
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL .22 D/ 1.00 M. (INCLUYE ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SIKAFLEX)	$ 6,343,392
TOTAL	**$ 288,293,120**

REGISTRO DE LLUVIAS[1]



[1] https://cdiac.manizales.unal.edu.co/geoportal-simac/, estación Aguas de Manizales



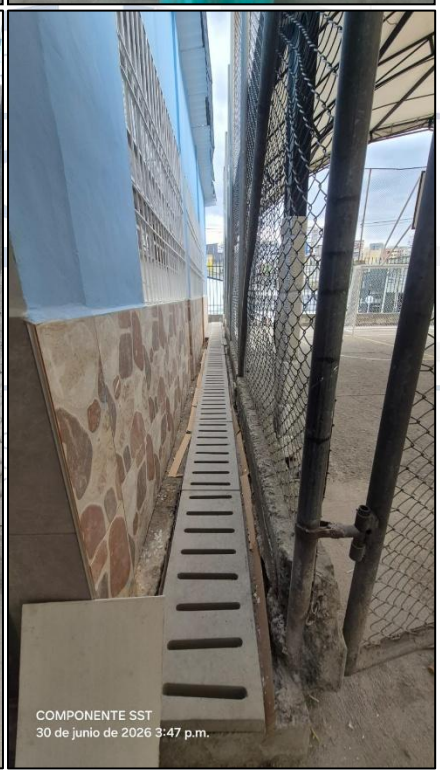
REGISTRO FOTOGRAFICO




COMPONENTE SST
12 de mayo de 2026 10:02 a.m.


COMPONENTE SST
14 de mayo de 2026 11:21 a.m.



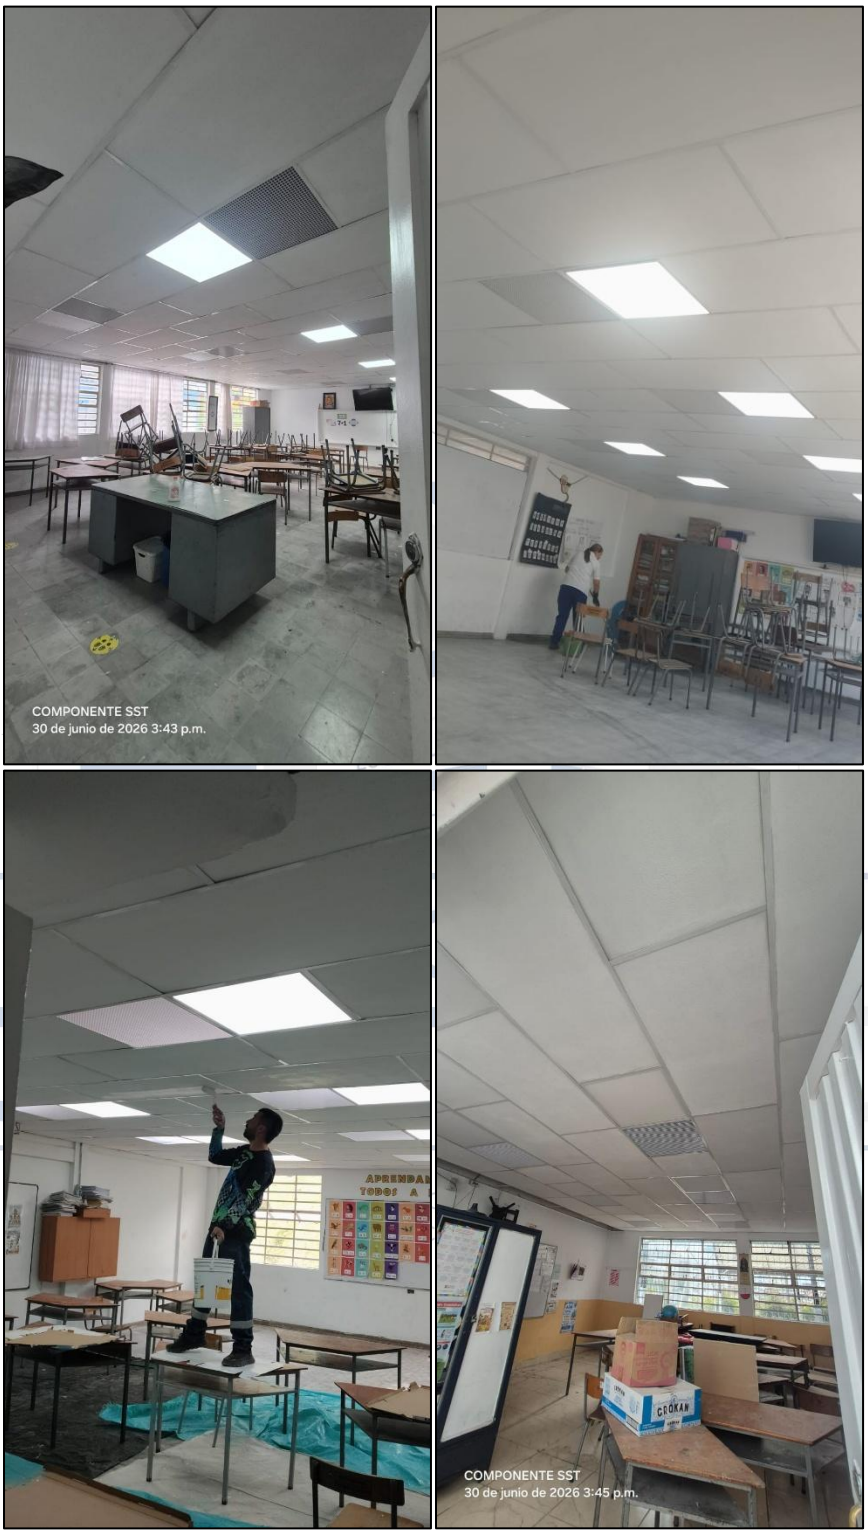

COMPONENTE SST
30 de junio de 2026 3:47 p.m.


COMPONENTE SST
02 de junio de 2026 9:26 a.m.


COMPONENTE SST
30 de junio de 2026 3:43 p.m.
COMPONENTE SST
30 de junio de 2026 3:44 p.m.

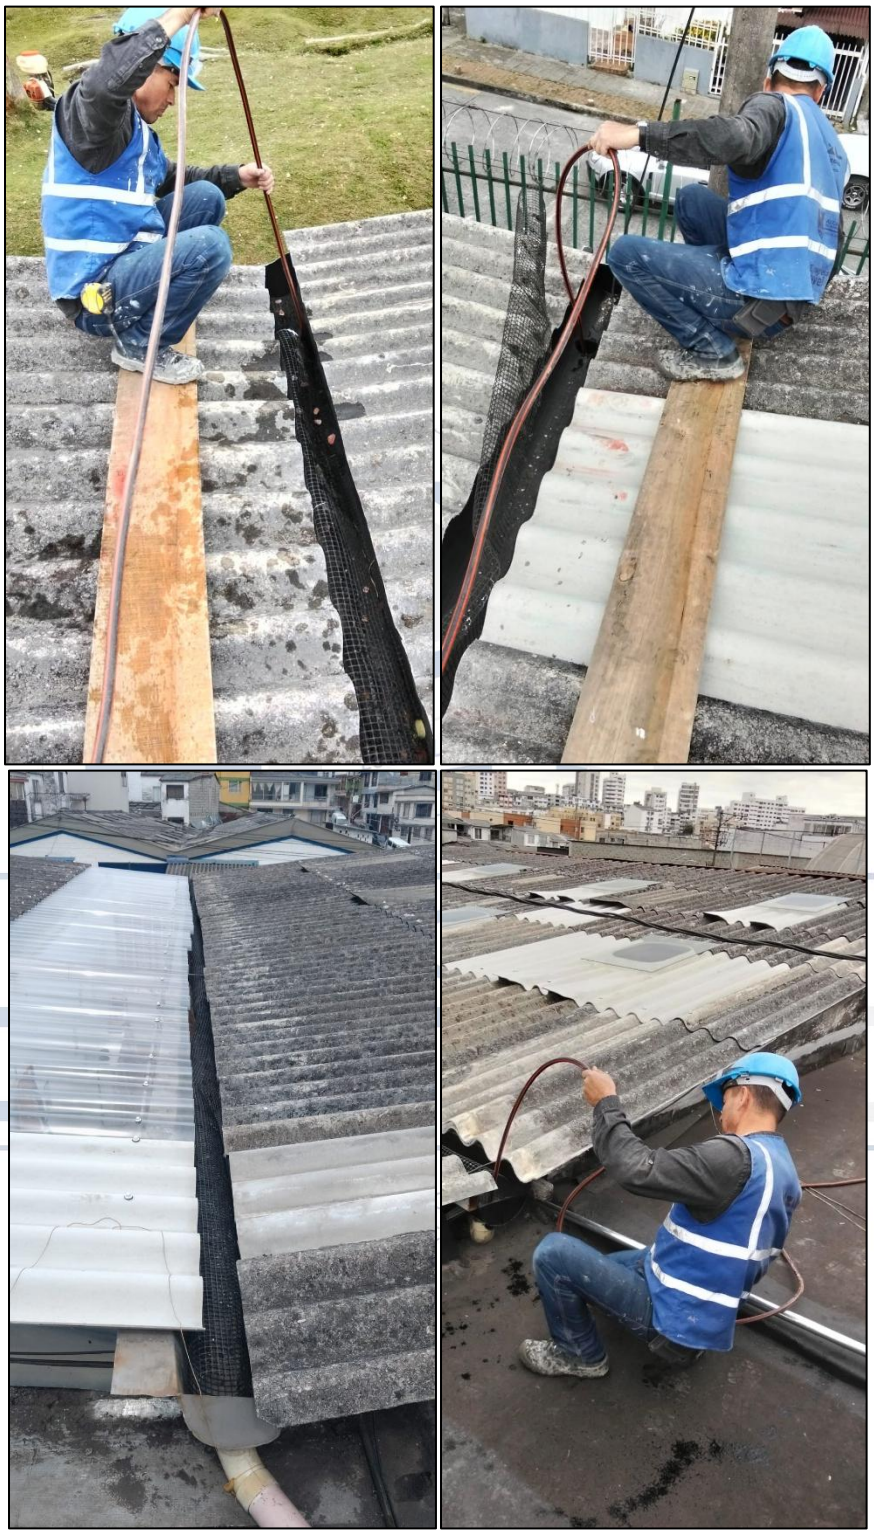

COMPONENTE SST
28 de mayo de 2026 10:54 a.m.


COMPONENTE SST
28 de mayo de 2026 10:52 a.m.
COMPONENTE SST
02 de junio de 2026 9:35 a.m.

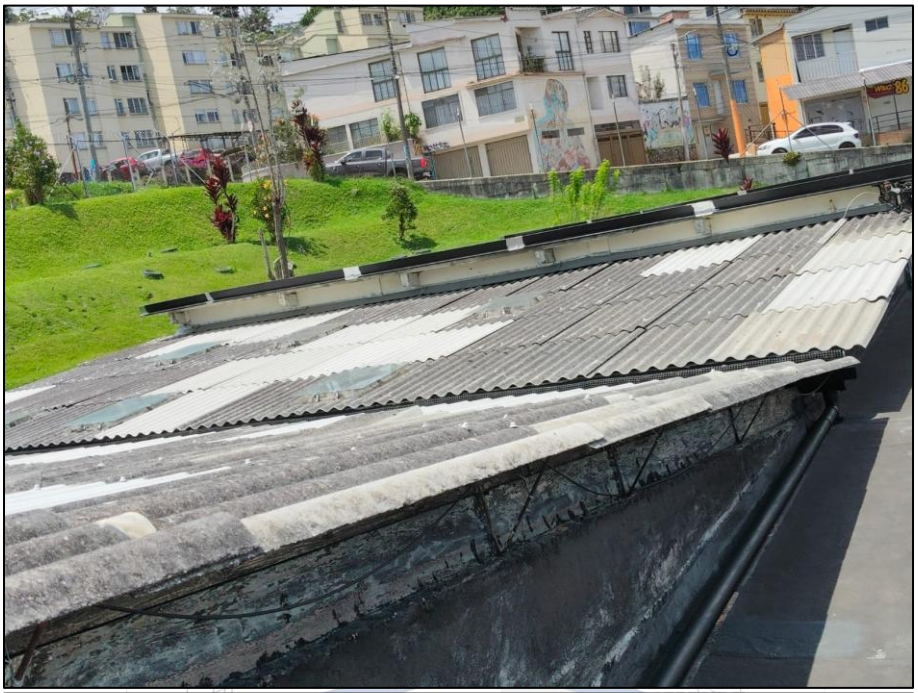

COMPONENTE SST
30 de junio de 2026 3:43 p.m.
COMPONENTE SST
30 de junio de 2026 3:45 p.m.



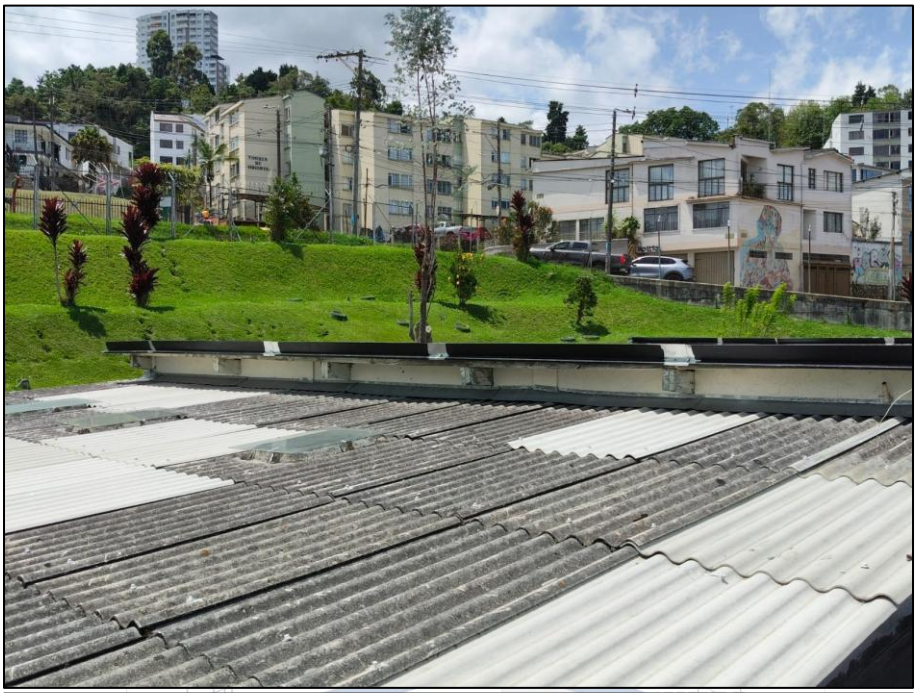


Calle 22 Nº 22-26 Oficina 609 - Teléfono 310 422 31 43 - Manizales
e-mail: danielhlesmes@yahoo.com









Calle 22 Nº 22-26 Oficina 609 - Teléfono 310 422 31 43 - Manizales
e-mail: danielhlesmes@yahoo.com





DANFTC 030
CONSTRUIMOS ESPACIOS PARA EL FUTURO
EDIFICACIONES ESCOLARES CON CALIDAD Y COMPROMISO


COMPONENTE SST
02 de junio de 2026 9:42 a.m.

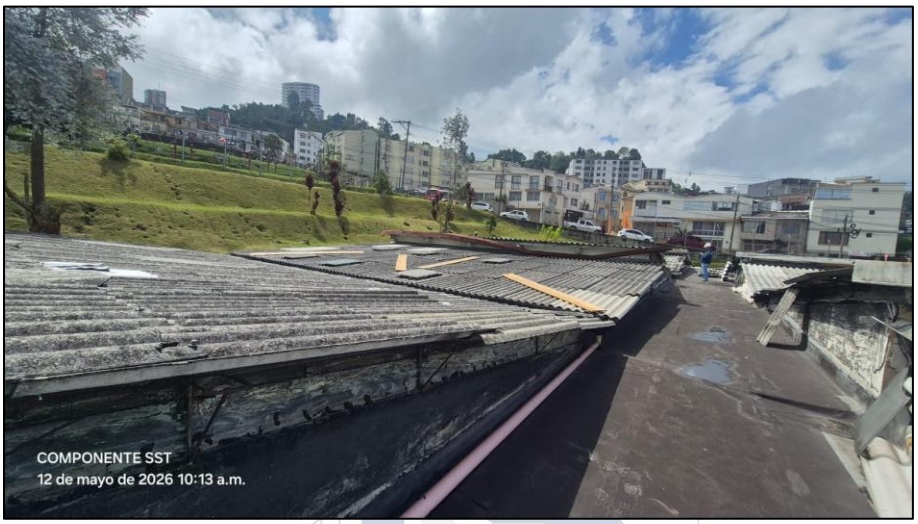

COMPONENTE SST
02 de junio de 2026 9:42 a.m.


COMPONENTE SST


COMPONENTE SST
12 de mayo de 2026 10:08 a.m.


COMPONENTE SST
12 de mayo de 2026 10:12 a.m.


COMPONENTE SST
12 de mayo de 2026 10:13 a.m.


COMPONENTE SST
12 de mayo de 2026 10:13 a.m.


COMPONENTE SST
28 de mayo de 2026 11:00 a.m.

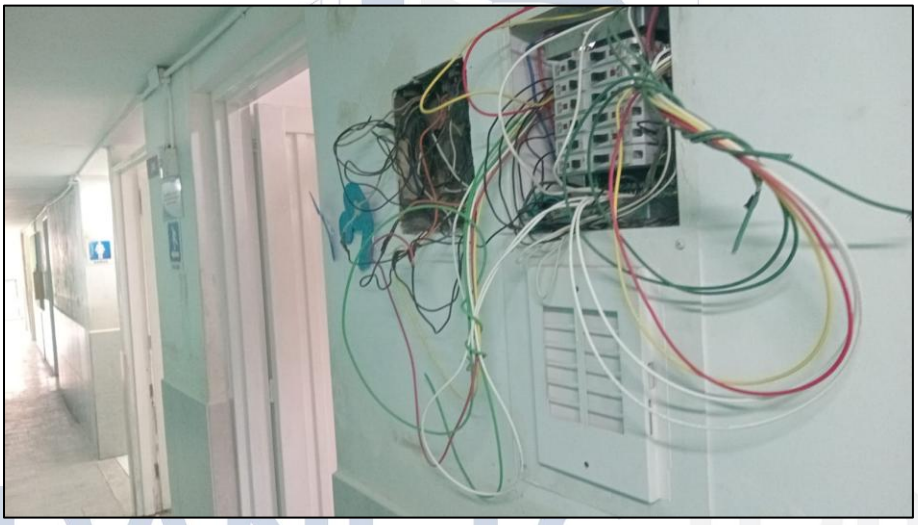

COMPONENTE SST
02 de junio de 2026 9:39 a.m.


COMPONENTE SST
16 de junio de 2026 11:38 a.m.







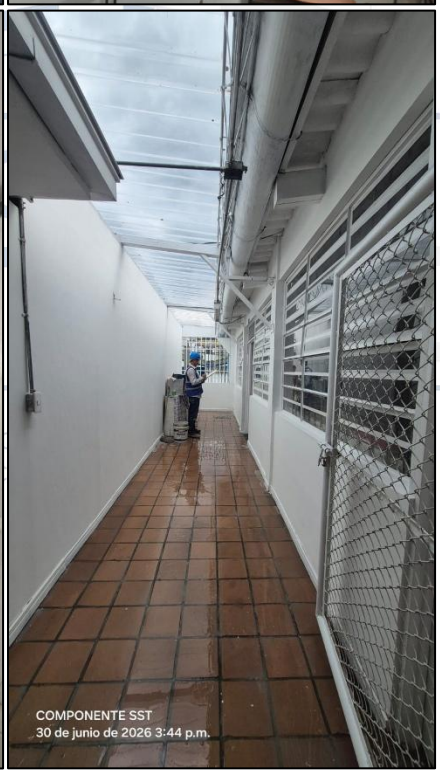


DANFTC 030
CONSTRUIMOS ESPACIOS PARA EL FUTURO
EDIFICACIONES ESCOLARES CON CALIDAD Y COMPROMISO


COMPONENTE SST
12 de mayo de 2026 10:28 a.m.


COMPONENTE SST
02 de junio de 2026 9:35 a.m.


BAÑO PROFESORES
7


COMPONENTE SST
30 de junio de 2026 3:44 p.m.


COMPONENTE SST
30 de junio de 2026 3:44 p.m.

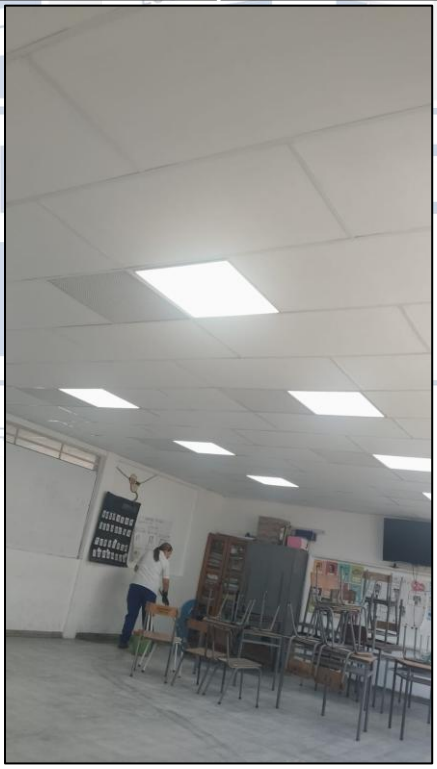

BAÑO PROFESORES
7


BAÑO PROFESORES
7
BAÑOS


COMPONENTE SST
30 de junio de 2026 3:45 p.m.







CONSORCIO DANFTC 030
CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIONES
FUTURO COMPROMISO


COMPONENTE SST
30 de junio de 2026 3:47 p.m.
COMPONENTE SST
30 de junio de 2026 3:43 p.m.
COMPONENTE SST
30 de junio de 2026 3:41 p.m.
COMPONENTE SST
30 de junio de 2026 3:41 p.m.







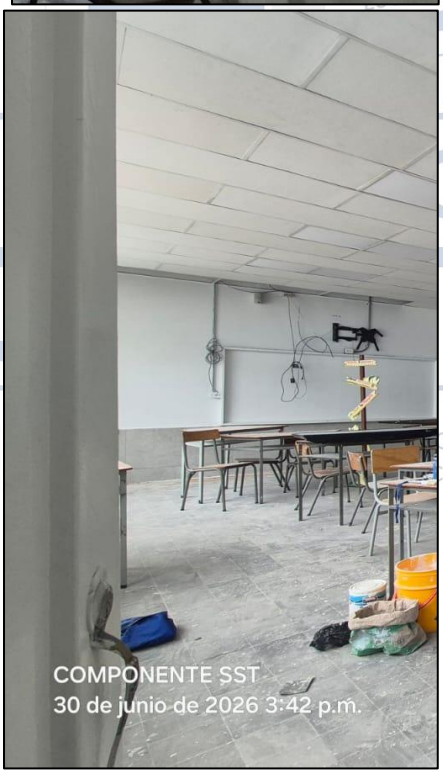


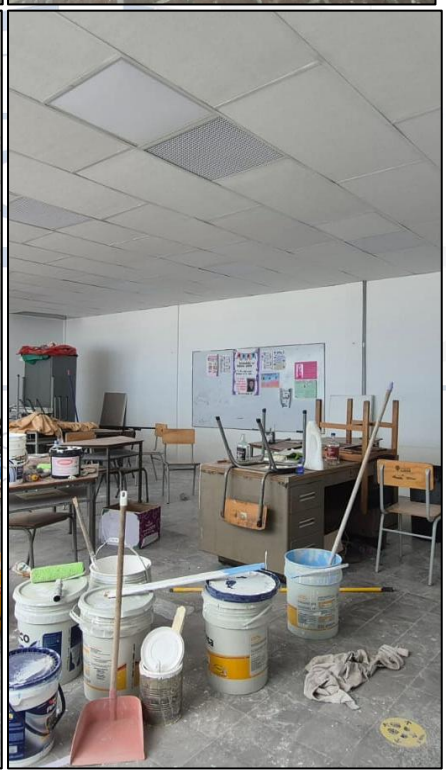
Calle 22 Nº 22-26 Oficina 609 - Teléfono 310 422 31 43 - Manizales
e-mail: danielhlesmes@yahoo.com

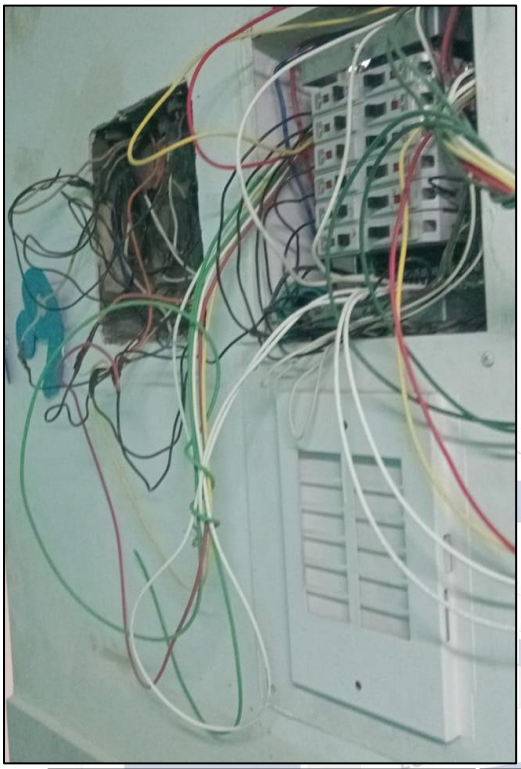

COMPONENTE SST
30 de junio de 2026 3:47 p.m.
COMPONENTE SST
30 de junio de 2026 3:47 p.m.
COMPONENTE SST
30 de junio de 2026 3:47 p.m.
COMPONENTE SST
30 de junio de 2026 3:44 p.m.



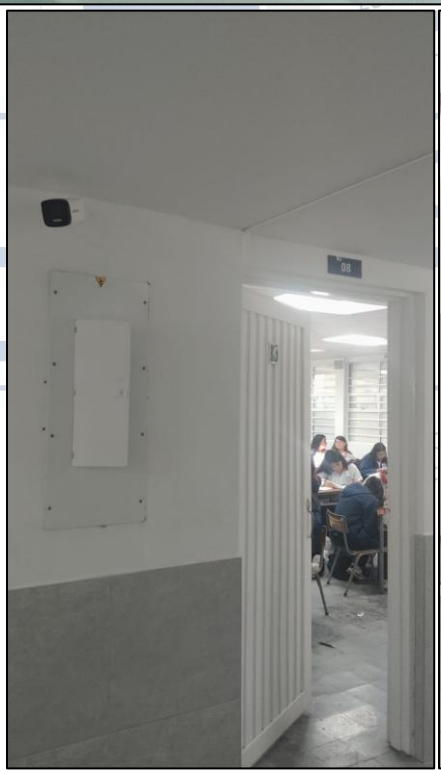

COMPONENTE SST
30 de junio de 2026 3:43 p.m.

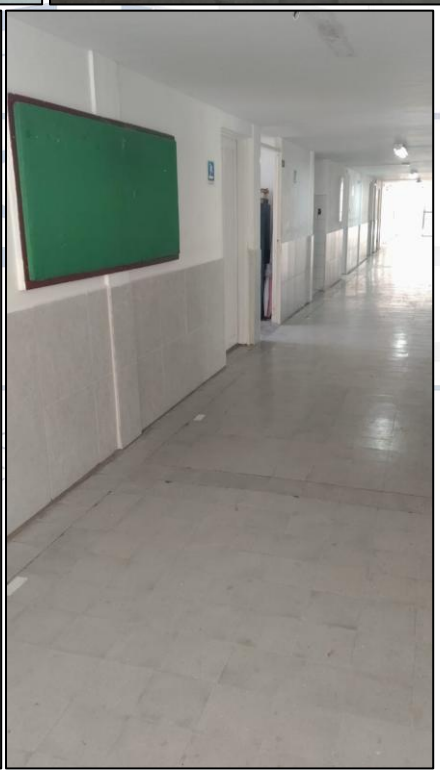

COMPONENTE SST
30 de junio de 2026 3:42 p.m.






COMPONENTE SST
30 de junio de 2026 3:43 p.m.





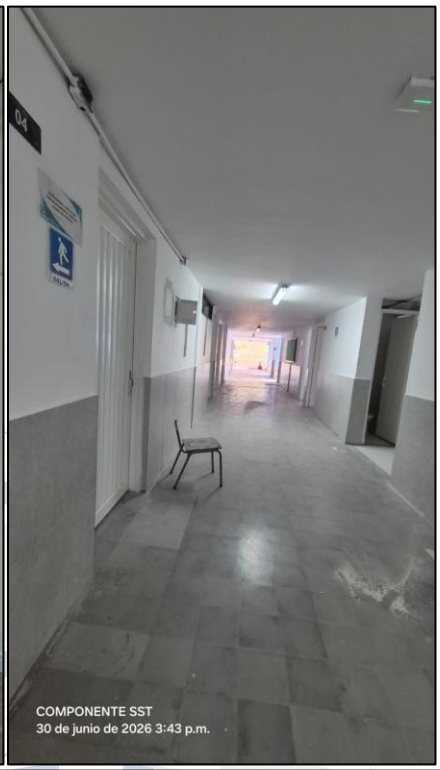


Calle 22 Nº 22-26 Oficina 609 - Teléfono 310 422 31 43 - Manizales
e-mail: danielhlesmes@yahoo.com



Calle 22 Nº 22-26 Oficina 609 - Teléfono 310 422 31 43 - Manizales
e-mail: danielhlesmes@yahoo.com

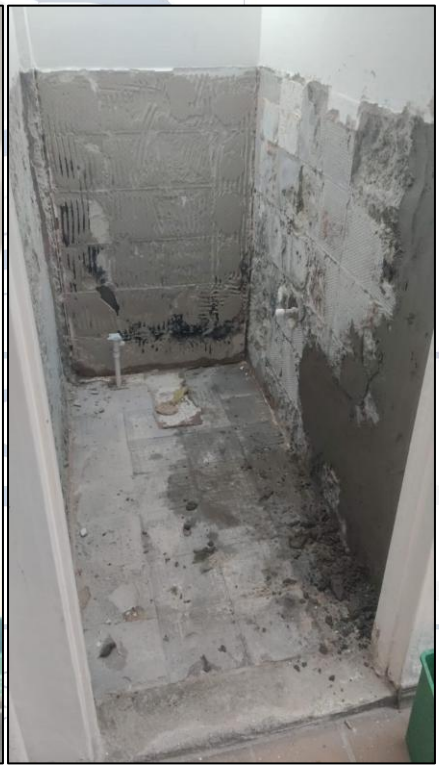

COMPONENTE SST
30 de junio de 2026 3:43 p.m.


04
COMPONENTE SST
30 de junio de 2026 3:43 p.m.




COMPONENTE SST
28 de mayo de 2026 10:52 a.m.
BIENVENIDAS












COMPONENTE SST
30 de junio de 2026 3:41 p.m.



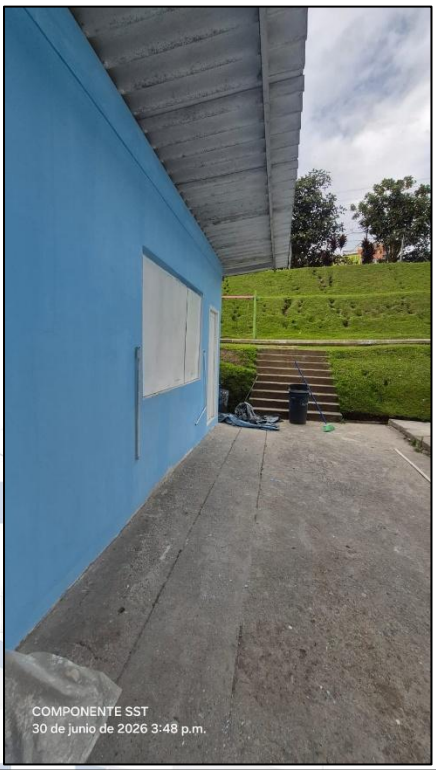



COMPONENTE SST
16 de junio de 2026 11:35 a.m.











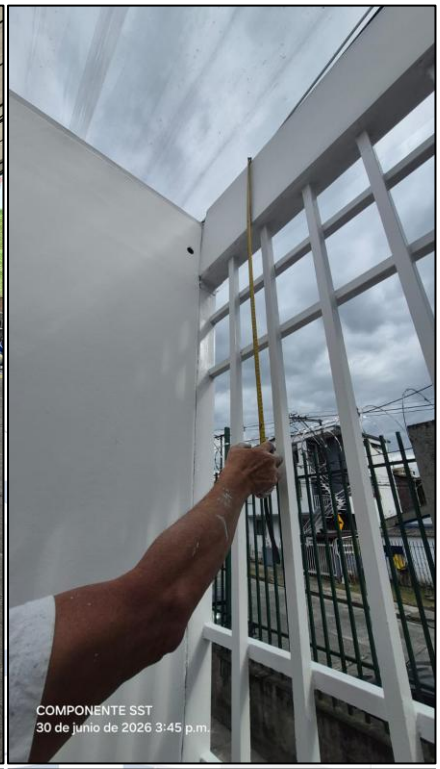


Calle 22 Nº 22-26 Oficina 609 - Teléfono 310 422 31 43 - Manizales
e-mail: danielhlesmes@yahoo.com


COMPONENTE SST
26 de mayo de 2026 9:18 a.m.
COMPONENTE SST
28 de mayo de 2026 10:58 a.m.


PELIGRO
TRABAJOS EN ALTURAS
COMPONENTE SST
14 de mayo de 2026 11:51 a.m.
TRUPER
COMPONENTE SST
14 de mayo de 2026 11:13 a.m.
COMPONENTE SST
28 de mayo de 2026 11:06 a.m.


COMPONENTE SST
26 de mayo de 2026 9:17 a.m.

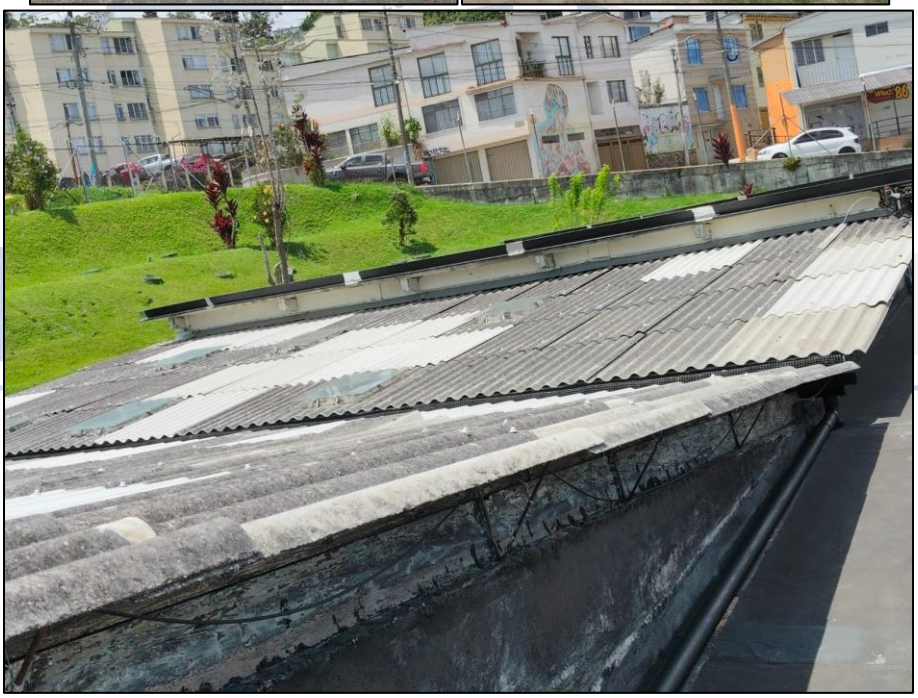

COMPONENTE SST
30 de junio de 2026 3:45 p.m.

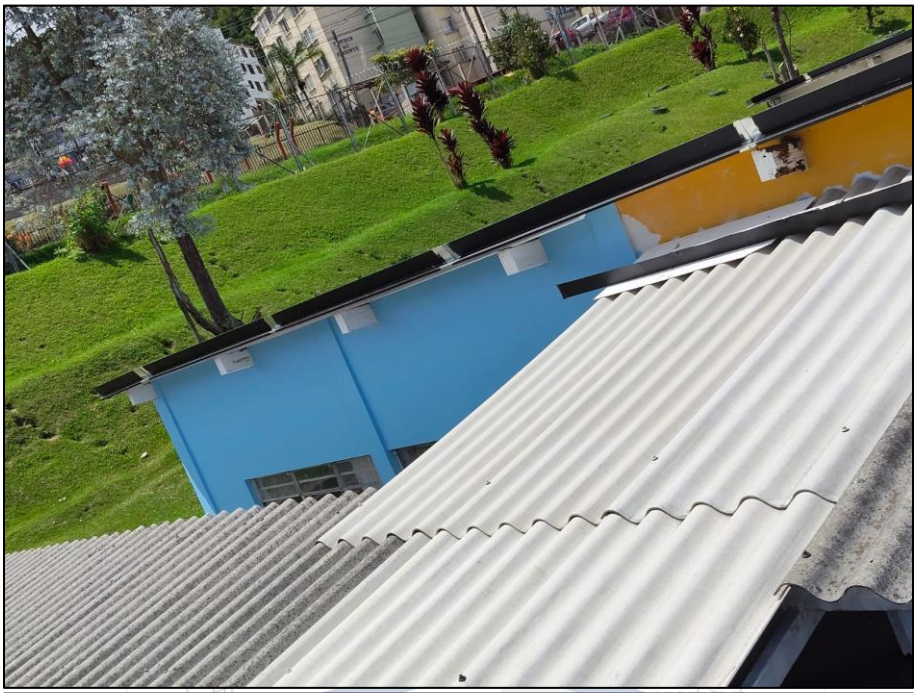

COMPONENTE SST
30 de junio de 2026 3:46 p.m.


COMPONENTE SST
16 de junio de 2026 11:35 a.m.


COMPONENTE SST
16 de junio de 2026 11:35 a.m.









EDIFICACIONES ESCOLARES CON CALIDAD Y COMPROMISO





EDIFICACIONES ESCOLARES CON CALIDAD Y COMPROMISO








COMPONENTE SST
16 de junio de 2026 11:35 a.m.


COMPONENTE SST
16 de junio de 2026 11:41 a.m.


COMPONENTE SST
16 de junio de 2026 11:41 a.m.


COMPONENTE SST
16 de junio de 2026 11:35 a.m.


PELIGRO
TRABAJOS EN ALTURAS
COMPONENTE SST
14 de mayo de 2026 11:51 a.m.


COMPONENTE SST
16 de junio de 2026 11:41 a.m.


C1318P





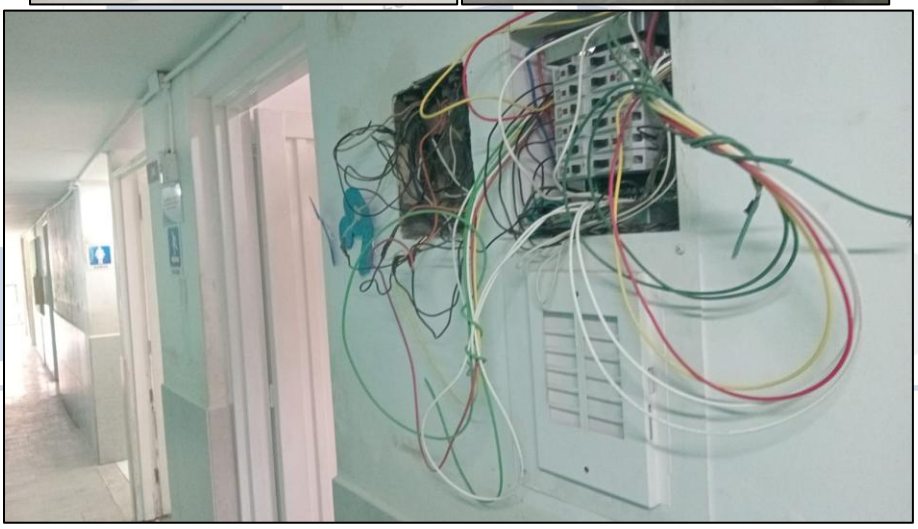

COMPONENTE SST
26 de mayo de 2026 9:15 a.m.









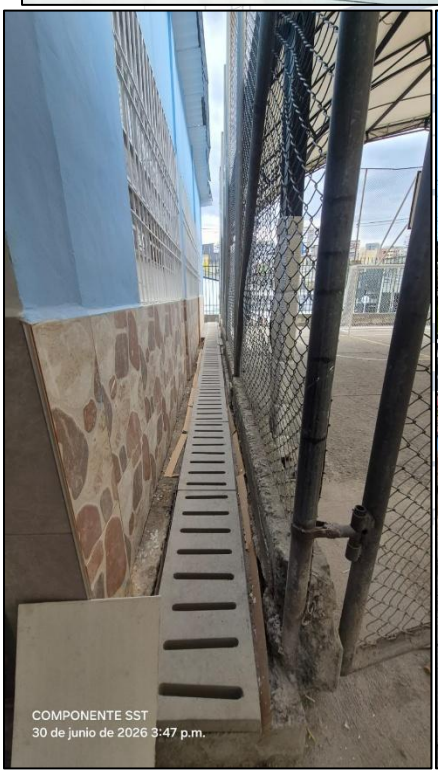









NUEVOS Y
USADOS
PARA EL HOGAR


COMPONENTE SST
30 de junio de 2026 3:47 p.m.







DANIEL HORACIO LESMES OSORIO
Representante Legal
CONSORCIO DANFTC 030
cc: archivo

CONSORCIO DANFTC 030
CONSTRUIMOS ESPACIOS PARA EL FUTURO
EDIFICACIONES ESCOLARES CON CALIDAD Y COMPROMISO
