Florencia,10 de julio -2026

No DEL PROCESO EN EL SECOP	DC-IN-LP-017-2025				
CONTRATO No.	202500000890	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		
TIPO DE PERSONA	PERSONA NATURAL				
CLASE DE CONTRATO:	OBRA				
CONTRATISTA:	***HILMON MERCHAN SUAREZ***				
	IDENTIFICACIÓN	*CC. No. 91.210.294 expedida en Bucaramanga- Santander*			
OBJETO:	**"CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AÉREAS PARA LA COMUNIDAD ALTOS DE MORITY Y NÚCLEOS EN LAS VEREDAS SEMILLAS DE PAZ, LA INDIA Y AGUA BLANCA MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA Y LA VEREDA EL ROSAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"**				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	DOS MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS ($ 2.056.568.304,00) M/CTE				
ADICIÓN 1 DEL CONTRATO	*N/A*				
VALOR TOTAL	DOS MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS ($2.056.568.304,00) M/CTE				
No DE CDP	2025071376 / 5625	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	22/07/2025 22/07/2025	**VALOR**	$ 2.056.568.304,00
No DE RP	202104597 / 5525	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	03/10/2025 03/10/2025	**VALOR**	$ 2.056.568.304,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	*Hasta el 03 de marzo del 2026*				
PRÓRROGA 1	OTRO SÍ No. 001 el 03 de marzo de 2026; el cual indica que el plazo de ejecución será hasta el 3 de mayo 2026.				
SUSPENSIÓN	*N/A*				
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	Acta de Mayores y Menores Cantidades 12 de marzo 2026				
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	**CONSORCIO INTERVENTORÍA LA MONTAÑITA Y SAN JOSÉ DEL FRAGUA 2025** **NIT. 902.005.234-1** JOSE MANUEL ARCE FERNANDEZ Representante Legal				
FECHA DE INICIO:	04 DE DICIEMBRE DEL 2025				

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 03 – MARZO – 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	HASTA EL 03 – MAYO – 2026

GARANTÍA - CONTRACTUAL			
FECHA DE APROBACIÓN	25/09/2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	CHU - 100057601	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	24/09/2025
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	CHU - 100010893	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	24/09/2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
1. Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	$ 205.656.830,40	24/06/2026	
2. Cumplimiento – Buen manejo del Anticipo	$ 822.627.321,65	24/06/2026	
3. Cumplimiento – prestaciones sociales	$ 102.828.415,20	24/12/2028	
4. Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra	$ 411.313.660,80	24/12/2030	
5. Responsabilidad civil extracontractual	$ 427.050.000,00	24/06/2025	

GARANTÍA – ACTA DE INICIO			
FECHA DE APROBACIÓN	10/12/2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	CHU - 100057601	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	09/12/2025
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	CHU - 100010893	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	10/12/2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
6. Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	$ 205.656.830,40	03/09/2026	
7. Cumplimiento - Buen manejo del Anticipo	$ 822.627.321,65	03/09/2026	
8. Cumplimiento - prestaciones sociales	$ 102.828.415,20	05/03/2029	

9. Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra	$ 411.313.660,80	05/03/2031
10. Responsabilidad civil extracontractual	$ 427.050.000,00	05/03/2026

1. **CANTIDADES ENTREGADAS:** En mi calidad de ***INTERVENTOR***, me permito señalar las cantidades entregadas de ejecución parcial 02 del **89,56%** con respecto con las obligaciones ejecutadas; del siguiente modo:

CONDICIONES ORIGINALES						AVANCE 1			AVANCE 2			AVANCE 3			AVANCE 4		
No	ITEM DE PAGO	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% AVANC	CANT.	VR. TOTAL	% AVANCE	CANT.	VR. TOTAL	% AVANCE	CANT.	VR. TOTAL	% AVANCE
1	**LOCALIZACION Y REPLANTEO EN MEDIA TENSION**																
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO LINEA DE MEDIA TENSION	Km	9,04	$ 799.439	$ 7.226.929	8,51	$ 6.803.226	94%							0,53	$ 423.703	6%
2	**APOYOS MEDIA TENSION**																
2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE HOYADO,HINCADO, APLOMADO E INSTALACION DE POSTE POLIMERICO MONOLITICO DE 10 METROS X510 KG	Un	68,00	$ 2.279.405	$ 154.999.540	44	$ 100.293.820	65%	13	$ 29.632.265	19,12%				11	$ 25.073.455	16%
3	**VESTIDA / ARMADA POSTES MEDIA TENSION**																
3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (710)	Un	20,00	$ 1.715.092	$ 34.301.840							5	$ 8.575.460	25%	15	$ 25.726.380	75%
3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (731)	Un	1,00	$ 1.632.456	$ 1.632.456										1	$ 1.632.456	100%
3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (505)	Un	12,00	$ 257.445	$ 3.089.340				1	$ 257.445	8,33%				11	$ 2.831.895	92%
3.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (510)	Un	17,00	$ 493.039	$ 8.381.663				13	$ 6.409.507	76,47%	2	$ 986.078	12%	2	$ 986.078	12%
3.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (514)	Un	19,00	$ 913.988	$ 17.365.772				7	$ 6.397.916	36,84%	8	$ 7.311.904	42%	4	$ 3.655.952	21%
3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (515)	Un	11,00	$ 1.165.261	$ 12.817.871				5	$ 5.826.305	45,45%	3	$ 3.495.783	27%	3	$ 3.495.783	27%
3.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (RH214)	Un	1,00	$ 1.295.617	$ 1.295.617										1	$ 1.295.617	100%
3.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - PH202 MONOFASICA	Un	2,00	$ 747.864	$ 1.495.728										2	$ 1.495.728	100%
4	**TENDIDO RED MEDIA TENSION**																
4.1	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES MEDIA TENSION 2 x 2 ACSR	Km	9,04	$ 12.787.097	$ 115.595.357				4,13	$ 52.810.711	45,69%	3	$ 38.361.291	33%	1,91	$ 24.423.355,00	21%
4.2	PLACA PARA CODIFICACION DE EXTRUCTURAS DE MEDIA TENSION A 13,2 kV	Un	117	$ 54.945	$ 6.428.565										117	$ 6.428.565,00	100%
5	**TEMPLETES MEDIA TENSION**																
5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEMPLETES SENCILLOS, MEDIA TENSION	Un	82,00	$ 660.611	$ 54.170.102				31	$ 20.478.941	37,80%	20	$ 13.212.220	24,39%	31	$ 20.478.941,00	38%
5.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEMPLETES DOBLES	Un	12,00	$ 962.306	$ 11.547.672				3	$ 2.886.918	25%				9	$ 8.660.754,00	75%

6	**LOCALIZACION Y REPLANTEO EN BAJA TENSION**																
6.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO LINEA DE BAJA TENSION	Km	12,70	$ 1.041.861	$ 13.231.635	12,62	$ 13.148.286	99,37%							0,08	$ 83.349	0,63%
7	**APOYOS BAJA TENSION**																
7.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE POLIMERICO DE 8 METROS - 510 KG	Un	120,00	$ 1.808.871	$ 217.064.520	50	$ 90.443.550	41,67%	41	$ 74.163.711	34,17%	5	$ 9.044.355	4%	24	$ 43.412.904	20%
8	**VESTIDA / ARMADA POSTES BAJA TENSION**																
8.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA BAJA TENSIÓN TIPO NORMA CODENSA LA-320 SIN CAJA Y SIN A PUB	Un	62,00	$ 143.257	$ 8.881.934							20	$ 2.865.140	32%	42	$ 6.016.794	68%
8.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA BAJA TENSIÓN TIPO NORMA CODENSA LA-321 SIN CAJA Y SIN A PUB	Un	129,00	$ 181.411	$ 23.402.019							30	$ 5.442.330	23%	99	$ 17.959.689	77%
8.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA BAJA TENSIÓN TIPO NORMA CODENSA LA-327 SIN CAJA Y SIN A PUB	Un	3,00	$ 124.292	$ 372.876										3	$ 372.876	100%
8.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE DERIVACION DE 8 SALIDAS (LONCHERA)	Un	45,00	$ 684.451	$ 30.800.295							10	$ 6.844.510	22%	35	$ 23.955.785	78%
9	**TENDIDO RED BAJA TENSION**																
9.1	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES BAJA TENSION 3 x 2 ACSR	Km	11,20	$ 31.762.994	$ 355.745.533	0,013	$ 412.919	0,12%	5	$ 158.814.970	44,64%	2,94	$ 93.383.202	26,25%	3,25	$ 103.134.442	29%
9.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE, TENDIDO Y TENSIONADO CABLE TRIPLEX AUTOSORTADO 2x50 mm + 1x50 mm (2x1/0, XLP + 1x1/0 ACSR)	Km	1,50	$ 38.490.690	$ 57.736.035				0,66	$ 25.403.855	44%				0,84	$ 32.332.180	56%
10	**TEMPLETES BAJA TENSION**																
10.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEMPLETES SENCILLOS BAJA TENSION	Un	153,00	$ 637.526	$ 97.541.478	4	$ 2.550.104	2,61%	40	$ 25.501.040	26,14%	70	$ 44.626.820	45,75%	39	$ 24.863.514	25%
11	**PUESTA A TIERRA BAJA TENSION**																
11.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ATERRIZAJE DE ESTRUCTURA TERMINAL DE BAJA TENSIÓN CON BAJANTE DE ACERO GALVANIZADO EXTRARESISTENTE 9,5 MM Y VARILLA DE PUESTA A TIERRA ACERO GALVANIZADO 70 MICRAS 5/8 X 2,4 MTS, CON CONECTOR NORMA RETIE (INCLUYE ACCESORIOS)	Un	66,00	$ 410.972	$ 27.124.152							20	$ 8.219.440	30%	46	$ 18.904.712	70%
12	**TRANSFORMADORES**																
12.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 5 KVA	Un	16,00	$ 5.703.145	$ 91.250.320				2	$ 11.406.290	12,50%				14	$ 79.844.030	88%
12.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA	Un	0,00	$ 8.489.979	$ 0												
12.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA	Un	1,00	$ 10.219.812	$ 10.219.812										1	$ 10.219.812	100%
12.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA	Un	3,00	$ 12.285.179	$ 36.855.537										3	$ 36.855.537	100%
	ACOMETIDAS Y OTROS																

13	ACOMETIDAS																
13.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIALES PARA ACOMETIDA BIFÁSICA CABLE ALUMINIO CON NEUTRO CONCENTRICO 2N°6 +1N°6 AWG	Un	115,00	$ 1.084.593	$ 124.728.195										15	$ 16.268.895	13%
13.2	TRAMITES PARA APROBACIÓN DEL PROYECTO Y OTROS ANTE EL OPERADOR DE RED.	Un	1,00	$ 4.854.573	$ 4.854.573												
				SUBTOTAL OBRA	$ 1.530.157.365		$ 213.651.905			$ 419.988.874			$ 242.368.533			$ 540.083.131	
ADMINISTRACION				22%	$ 336.634.620		$ 47.003.419			$ 92.397.772			$ 53.321.077			$ 118.988.300	
IMPREVISTOS				1%	$ 15.301.574		$ 2.136.519			$ 4.199.999			$ 2.423.635			$ 5.408.332	
UTILIDAD				7%	$ 107.111.016		$ 14.955.633			$ 19.999.291			$ 29.995.797			$ 37.858.322	
TOTAL				30%	$ 459.047.209		$ 64 095.571			$ 125.996.962			$ 72.710.559			$ 162.249.955	
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)					$ 1.989.204.574		$ 277.747.476	13,51%		$ 545.986.886	26,55%		$ 315.079.092	15,32%		$ 703.083.136	34,18%
RETIE				3%	$ 55.999.973												
PMA					$ 11.363.757												
VALOR TOTAL					$ 2.056.568.304		$ 277.747.476	13,51%		$ 545.986.886	26,55%		$ 315.079.092	15,32%		$ 703.083.136	34,18%

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR
ANTICIPO	*$ 822.627.322*	*29/12/2025*		
ADICIÓN				
(01) PRIMER PAGO	$ 1.138.813.406	*25/05/2026*	$ 455.525.362,4	$ 367.101.959,60
(02) SEGUNDO PAGO				
(03) TERCER PAGO				
(04) CUARTO PAGO				
(05) QUINTO PAGO				
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 703.083.136	*N/a*	$ 367.101.959,60	$ 0

SALDO PENDIETE POR EJECUTAR	$ 214.671.764	*N/a*		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			*$ 2.056.568.304,00*	



BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	MODIFICACIONES	VALOR EJECUTADO
VALOR CONTRATO CONDICIONES INICIALES	**$ 2.056.568.304,00**		
VALOR CONTRATO CONDICIONES FINALES		$ 2.053.344.548	
VALOR DISMINUIDO POR EL ACTA DE MODIFICACIÓN ACTA DE MENORES Y MAYORES CANTIDADES		$ 3.223.756	
VALOR PAGO INFORME PARCIAL No.1			$ 1.138.813.406
VALOR A PAGAR INFORME DE PAGO PARCIAL No.2			$ 703.083.136
VALOR PENDIENTE POR PAGAR			$ 214.671.762
TOTALES	**$ 2.056.568.304,00**	**$ 2.056.568.304,00**	**$ 2.056.568.304,00**


NOTA EXPLICATIVA:


En la presente Acta de Recibo Parcial 02, se registra un valor a pagar de SETECIENTOS TRES MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 703.083.136), conforme a lo establecido en el Informe Parcial 02 para Pago, con este cobro, la obra alcanza un avance de obra ejecutada acumulado del 89,56%, según la cláusula octava se realizara la amortización del restante de la amortización que corresponde a un valor de ($ 367.101.959,60), por lo tanto el valor a cancelar después de deducir el valor de amortización es de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 335.981.176,40)

2. RELACIÓN FOTOGRÁFICA

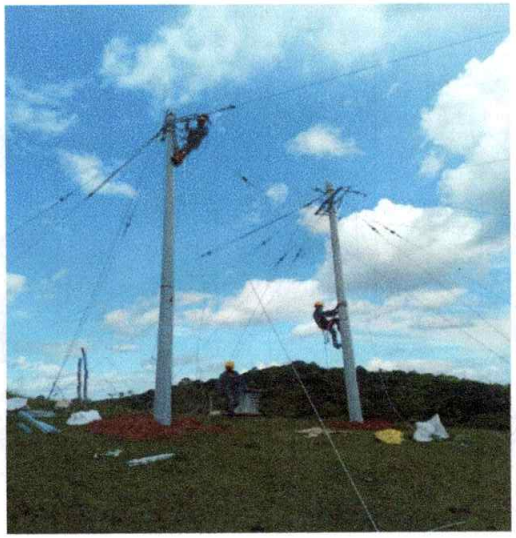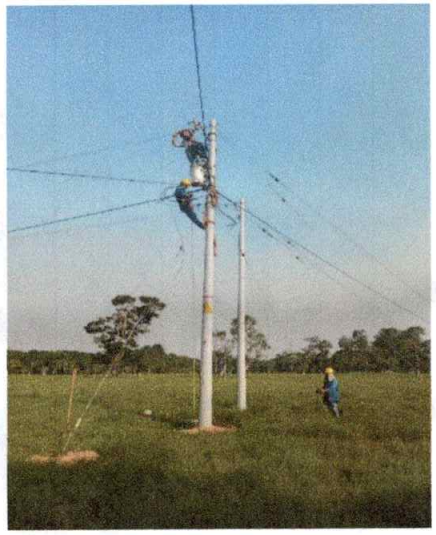
REGISTRO FOTOGRAFICO		
		



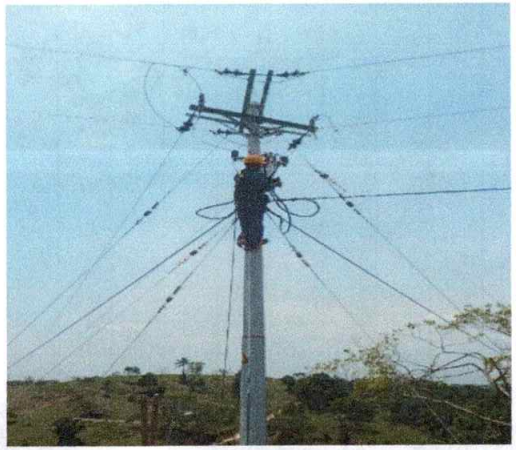


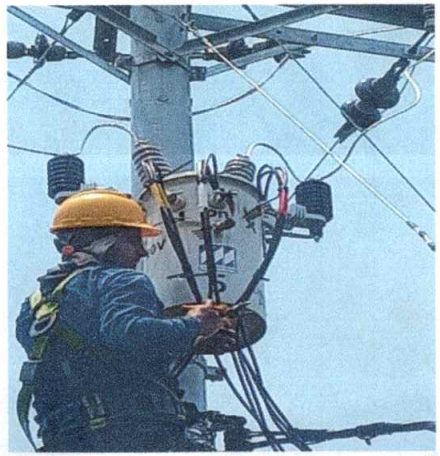



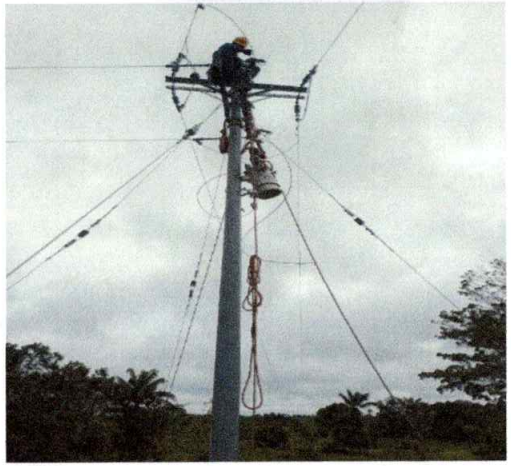



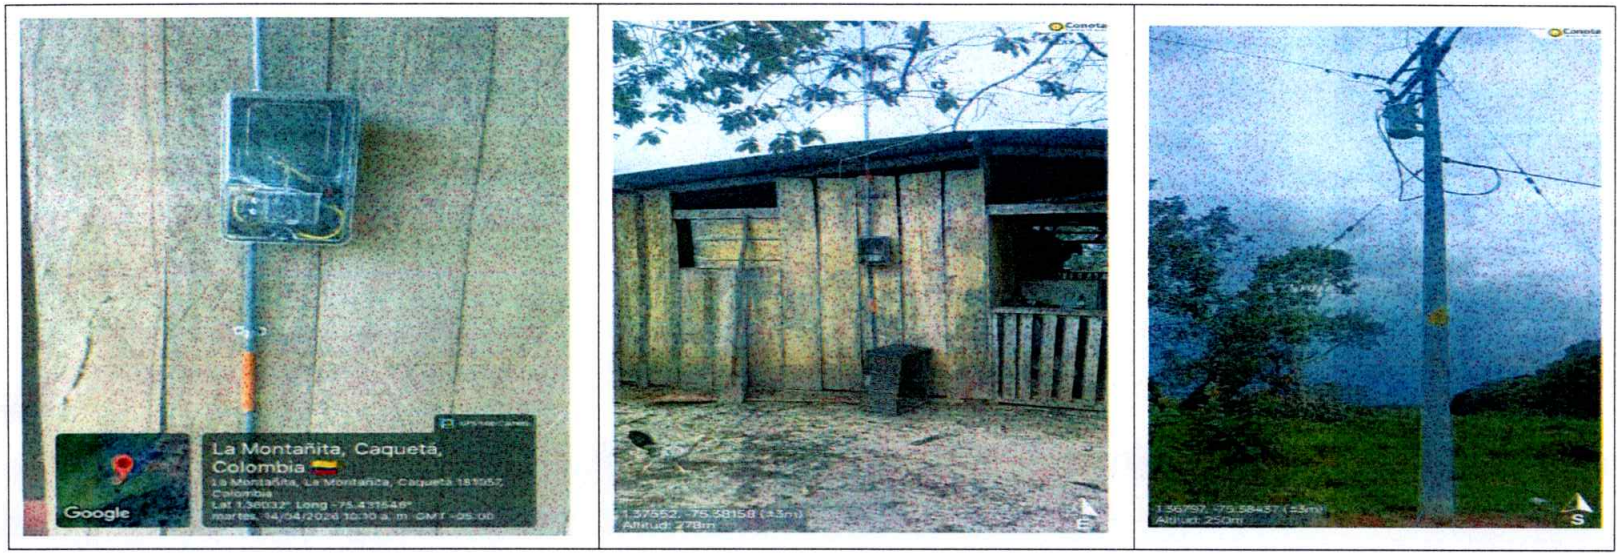

NOTA EXPLICATIVA: *En la comunidad de Altos de Mority y núcleos de las veredas Semillas de Paz, Agua Blanca, en el municipio de La Montañita, así como en la vereda El Rosal del municipio de San José del Fragua, departamento del Caquetá, se han desarrollado actividades orientadas al fortalecimiento de la infraestructura eléctrica.*

Entre las principales labores ejecutadas se destacan la instalación de estructuras para redes de Media y Baja Tensión, así como el tendido de redes de Media Tensión (MT) y baja tensión (BT). De igual manera, se llevó a cabo la instalación de transformadores monofásicos de 5 Kva, 15 kva, 25 kva, e instalación de 15 acometidas cómo resultado de estas actividades, se alcanzó un avance físico de obra del 34,18%, para un total de 89,56%.

3. OBSERVACIONES:

N/A

4. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA:

- Informe ejecutivo avance de obra (Periodo avance No. 02 correspondiente al 01 de marzo del 2026 al 31 de marzo del 2026.

- Planillas de aportes de seguridad social pagadas del mes de marzo 2026. (contratista de obra)
- Registro Fotográfico avance de obra ejecutado

5. CONCLUSION:

Con base en lo anteriormente expuesto, el suscrito INTERVENTOR deja constancia mediante la presente Acta que recibe las actividades ejecutadas a la fecha, las cuales corresponden al avance de obra evidenciado en el proyecto desarrollado en las comunidades de Altos de Mority y núcleos de las veredas Semillas de Paz, Agua Blanca, en el municipio de La Montañita, así como en la vereda El Rosal del municipio de San José del Fragua, departamento del Caquetá. Igualmente, se avala que el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en el marco del contrato, de conformidad con las condiciones técnicas, administrativas y contractuales pactadas.

En este sentido, la Interventoría, en ejercicio de sus funciones técnicas, administrativas, jurídicas y financieras, y en cumplimiento de sus labores de seguimiento y control, certifica que el avance de este informe es 34,18% de ejecución; para un alcance de obra del 89,56%, acorde con lo establecido en los términos contractuales, cronogramas y normatividad vigente. En consecuencia, se aprueba y autoriza el reconocimiento de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra, para los fines correspondientes.

POR LA ENTIDAD	POR LA INTERVENTORÍA	POR EL CONTRATISTA
JUAN ANTONIO CAMARGO VARGAS C.C. 1.056.573.045 Sotaquira Secretaria de Infraestructura –Gestor PDA – Encargado – Decreto 0623- 2/07/26	**JOSE MANUEL ARCE FERNANDEZ** C.C. 18.520.422 de Dosquebradas (Risaralda) R. L. CONSORCIO INTERVENTORÍA LA MONTAÑITA Y SAN JOSÉ DEL FRAGUA 2025 NIT. 902.005.234-1	**HILMON MERCHAN SUAREZ** C.C. 91.210.294 expedida en Bucaramanga- Santander Representante legal CONTRATISTA

VoBo supervisión a la Interventoría:
Luis Antonio Vesga Rueda
Profesional Universitario
Secretaria de Infraestructura
Gobernación del Caquetá
