K&J T.I. & CONSTRUCCIONES S.A.S.
N.I.T.: 901450685-3
Régimen Común

INFORME MENSUAL
CONTRATO 44-003-2026

OBJETO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA OBRA PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL EN VIDRIO AUTOMÁTICA Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN VIDRIO MANUAL DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE YOPAL.



24 de agosto 2026
Yopal Casanare

Correo: soporte.ticonstrucciones@gmail.com
No. Cel.: 312 5356 383
Dirección: CR 11 A 7 B 126, Melgar Tolima

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	44-003-2026
INFORME	Mensual 02
CONTRATANTE	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CONTRATISTA	K&J TI & CONSTRUCCIONES SAS
OBJETO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA OBRA PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL EN VIDRIO AUTOMÁTICA Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN VIDRIO MANUAL DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE YOPAL.
VALOR DEL CONTRATO	$ 31.697.741,47
LOCALIZACIÓN	Dir, Seccional Yopal
FECHA DE INICIO	18 de junio 2026
FECHA DE EJECUCIÓN	11 de agosto 2026
FECHA DE PRORROGA 01	18 de septiembre 2026
SUPERVISOR	ING. DIANA CAROLINA PORRAS GUERRERO
INTERVENTOR	N/A

PRESUPUESTO

CUADRO DE COSTOS							
Nivel	**Ref. Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio total estimado**
0	1.		MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS				
0	1.1	30171510	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUERTAS AUTOMÁTICA INGRESO VEHICULAR.CONSISTENTE EN HACER REVISIÓN GENERAL DE LA PUERTA, VERIFICAR CIERRE, VERIFICAR Y LUBRICAR BISAGRAS, HACER AJUSTE DE CIERRES, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO Y/O CORREGIR ALTURAS DE HOJA Y MOVIMIENTOS JUNTO CON AJUSTE.	1	UN	$ 287,462.31	$ 287,462.31
0	1.2	30171510	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUERTAS EN VIDRIO UNA SOLA HOJA MANUALES.CONSI	3	UN	$ 131,267.19	$ 393,801.57

			STENTE EN HACER REVISIÓN GENERAL DE LA PUERTA, VERIFICAR CIERRE, VERIFICAR Y LUBRICAR BISAGRAS, HACER AJUSTE DE CIERRES, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO Y/O CORREGIR ALTURAS DE HOJA Y MOVIMIENTO				
0	2.		MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS				
0	2.1	30171510	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTÓN DE APAGADO DE EMERGENCIA	1	UN	$ 217,473.66	$ 217,473.66
0	2.2	30171510	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUCES DE ALARMA PARA APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DE SEGURIDAD	2	UN	$ 114,646.70	$ 229,293.40
0	2.3	30171510	TOPES PUERTAS	2	UN	$ 117,590.61	$ 235,181.22
			TOTAL				**$ 1,363,212.16**

CUADRO DE COSTOS							
Nivel	**Ref. Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio total estimado**


0	3.		OBRA				
0	3.1	72101507	DESMONTES DE PUERTAS EN VIDRIO Y PORTONES METÁLICOS EXISTENTES INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	9	M2	$ 50,502.94	$ 454,526.46
0	3.2	72101507	RETIRO DE ESTUCO Y LIMPIEZA DE MUROS ALTURA MAYORES A 2 MTS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	40	M2	$ 6,654.60	$ 266,184.00
0	3.3	72101507	ESTUCO Y RESANES EN MUROS	59	M2	$ 14,111.32	$ 832,567.88
0	3.4	72101507	VINILO SOBRE PAÑETE 3 MANOS	36	M2	$ 17,238.59	$ 620,589.24
0	3.5	72101507	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PUERTAS EN ALUMINIO CON VIDRIO, INCLUYE SOPORTE ANCLAJE DE FIJACIÓN AL PISO Y TECHO	3	UN	$ 49,515.83	$ 148,547.49
0	3.6	72101507	INSTALACION DE PUERTAS EN VIDRIO (INCLUYE, ELEMENTOS DE FIJACION, REFUERZO CON PLATINAS DE ANCLAJES, CERRADURAS Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE).	2	UN	$ 161,572.88	$ 323,145.76
0	3.7	72101507	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=10CM INCLUYE PINTURA	20	M2	$ 65,278.13	$ 1,305,562.60

0	3.8	72101507	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA AUTOMÁTICA GEZE ECDRIVE T2 PARA DOS HOJAS MÓVIL Y DOS HOJAS FIJAS CIERRE CENTRAL PARA PUERTAS FULL GLASS PASO LIBRE 1,5 MT. FABRICADO EN ALEMANIA, CON CAPACIDAD HASTA DE 120 KG POR HOJA. INCLUYE: KIT ECDRIVE T2: ELECTRÓNICA DCU 1 NT, TRANSFORMADOR 110V, CARROS AUTOLIMPIANTES PARA 140 KG/HOJA , BATERÍA EMERGENCIA, TOPES, MOTOR, POLEA DE GRAN DIAMETRO Y ROIDAMIENTOS DOBLES, PERMITEN TRABAJAR CON CARGA DE MAYOR PESO MOVIMIEBTOS PRECISOS Y DE BAJA PFRICCIÓN,PROTECCIÓN ACÚSTICA EN VARIOS PUNTOS DEL RIELY FIJACIÓN, ESPACIO INTERNO PARA DOS BATERIAS DE 12V	8	M2	$ 1,692,896.37	$ 13,289,236.50

			1,2 AMP.* CARRIL DE RODADURA HASTA 6.5 MTS.* PERFILES DE UNIDAD MOTRIZ.* TAPA.* TAPAS LATERALES.* CORREA.* PERFIL CONTINUO DE SUJECIÓN T.*SENSOR GC 363+R DE MOVIMIENTO PERFIL TAPALUCES ENTRE HOJAS MÓVILES Y MÓDULOS FIJOS.* DPS PROGRAMADOR, SELECTOR DE 5 USOS, INFORME DE ERRORES Y MANTENIMIENTO. * SEGURO ELECTROMECÁNICO * SENSOR GC 363+ R DE MOVIMIENTO Y DE SEGURIDAD.* DETECTOR DE MOVIMIENTO GC 308 R* VIDRIOS TEMPLADOS LAMINADO 5+5 MM INCOLOROS				
0	3.9	72101507	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO CAP 150 KG	1	UN	$ 609,622.43	$ 609,622.43
0	3.10	72101507	SUMINISTRO INST. DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 3+3 COLOR SIMILAR AL EXISTENTE	8	M2	$ 218,266.80	$ 1,746,134.40

0	3.11	72101507	SEÑALIZACIÓN EN VINILO IMPRESO LAMINADO A COLOR ADHSESIVO.	47	M2	$ 58,100.00	$ 2,721,985.00
			COSTO DIRECTO				**$ 22,318,101.76**
0	3.12	72101507	ADMINISTRACIÓN 23%		23%	$ 6,410,912.16	$ 6,410,912.16
0	3.13	72101507	IMPREVISTOS 1%		1%	$ 278,735.31	$ 278,735.31
0	3.14	72101507	UTILIDAD 4%		4%	$ 1,114,941.24	$ 1,114,941.24
0	3.15	72101507	IVA/UTILIDAD 19%		19%	$ 211,838.84	$ 211,838.84
			TOTAL OBRA				**$ 30,334,529.31**

PROGRAMACIÓN DE OBRA

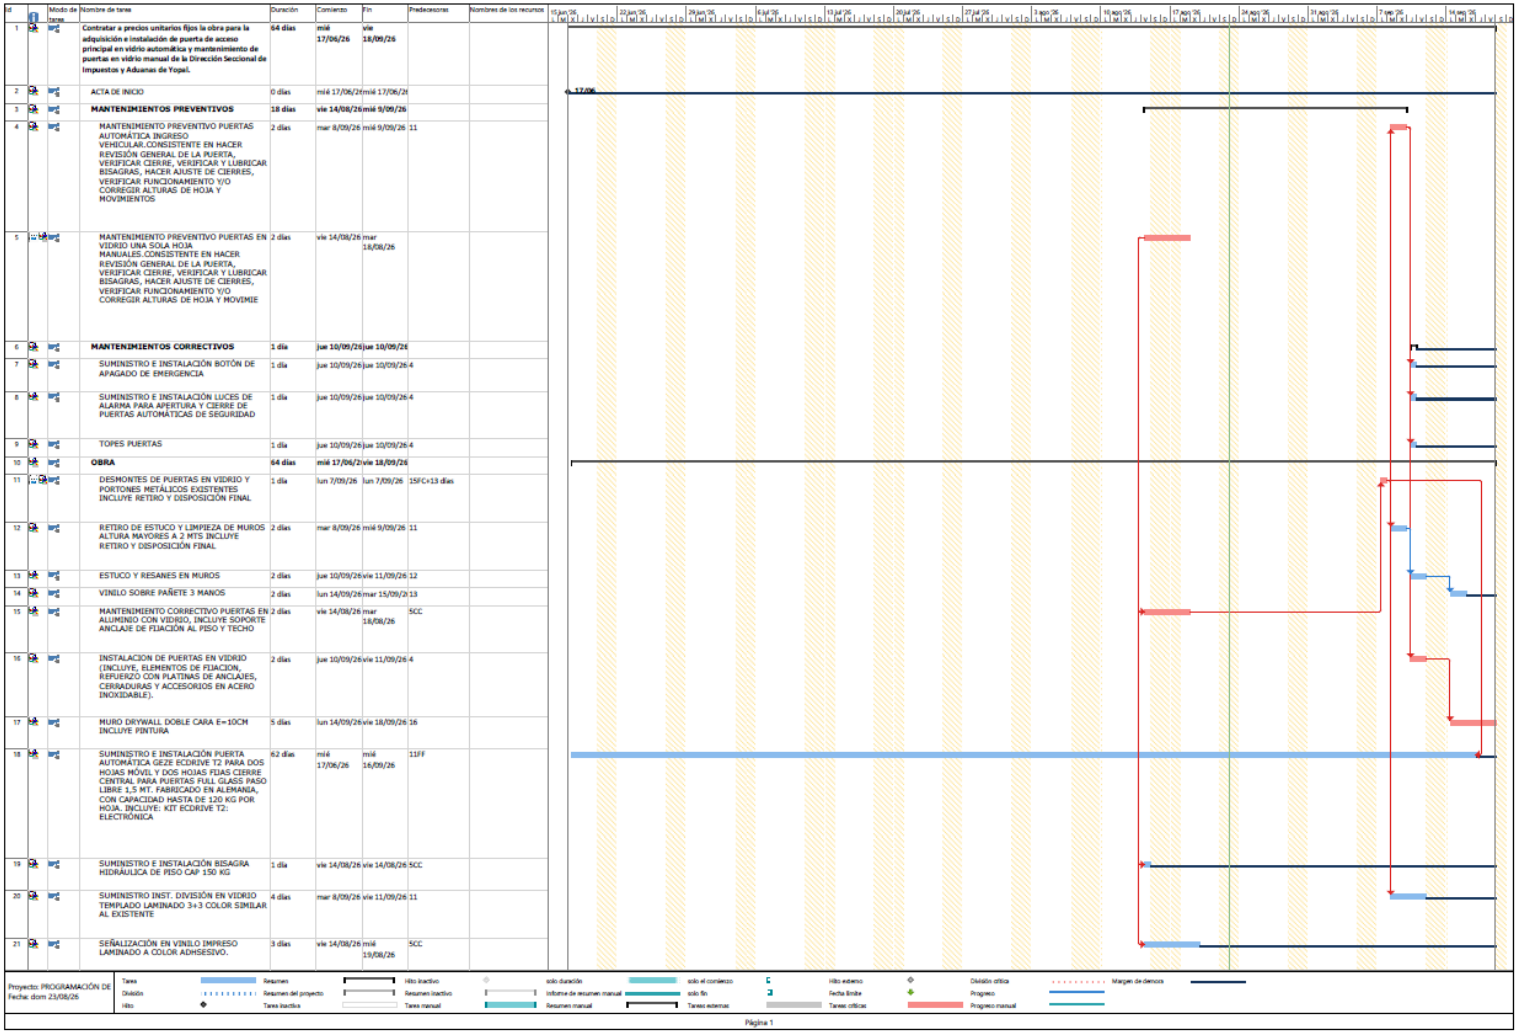

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
1		**Contratar a precios unitarios fijos la obra para la adquisición e instalación de puerta de acceso principal en vidrio automática y mantenimiento de puertas en vidrio manual de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal.**	**64 días**	**mié 17/06/26**	**vie 18/09/26**		
2		ACTA DE INICIO	0 días	mié 17/06/26	mié 17/06/26		
3		**MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS**	**18 días**	**vie 14/08/26**	**mié 9/09/26**		
4		MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUERTAS AUTOMÁTICA INGRESO VEHICULAR.CONSISTENTE EN HACER REVISIÓN GENERAL DE LA PUERTA, VERIFICAR CIERRE, VERIFICAR Y LUBRICAR BISAGRAS, HACER AJUSTE DE CIERRES, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO Y/O CORREGIR ALTURAS DE HOJA Y MOVIMIENTOS	2 días	mar 8/09/26	mié 9/09/26	11	
5		MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUERTAS EN VIDRIO UNA SOLA HOJA MANUALES.CONSISTENTE EN HACER REVISIÓN GENERAL DE LA PUERTA, VERIFICAR CIERRE, VERIFICAR Y LUBRICAR BISAGRAS, HACER AJUSTE DE CIERRES, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO Y/O CORREGIR ALTURAS DE HOJA Y MOVIMIE	2 días	vie 14/08/26	mar 18/08/26		
6		**MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS**	**1 día**	**jue 10/09/26**	**jue 10/09/26**		
7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTÓN DE APAGADO DE EMERGENCIA	1 día	jue 10/09/26	jue 10/09/26	4	
8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUCES DE ALARMA PARA APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DE SEGURIDAD	1 día	jue 10/09/26	jue 10/09/26	4	
9		TOPES PUERTAS	1 día	jue 10/09/26	jue 10/09/26	4	
10		**OBRA**	**64 días**	**mié 17/06/26**	**vie 18/09/26**		
11		DESMONTES DE PUERTAS EN VIDRIO Y PORTONES METÁLICOS EXISTENTES INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	1 día	lun 7/09/26	lun 7/09/26	15FC+13 días	
12		RETIRO DE ESTUCO Y LIMPIEZA DE MUROS ALTURA MAYORES A 2 MTS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	2 días	mar 8/09/26	mié 9/09/26	11	
13		ESTUCO Y RESANES EN MUROS	2 días	jue 10/09/26	vie 11/09/26	12	
14		VINILO SOBRE PAÑETE 3 MANOS	2 días	lun 14/09/26	mar 15/09/26	13	
15		MANTENIMIENTO CORRECTIVO PUERTAS EN ALUMINIO CON VIDRIO, INCLUYE SOPORTE ANCLAJE DE FIJACIÓN AL PISO Y TECHO	2 días	vie 14/08/26	mar 18/08/26	5CC	
16		INSTALACION DE PUERTAS EN VIDRIO (INCLUYE, ELEMENTOS DE FIJACION, REFUERZO CON PLATINAS DE ANCLAJES, CERRADURAS Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE).	2 días	jue 10/09/26	vie 11/09/26	4	
17		MURO DRYWALL DOBLE CARA E=10CM INCLUYE PINTURA	5 días	lun 14/09/26	vie 18/09/26	16	
18		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA AUTOMÁTICA GEZE ECDRIVE T2 PARA DOS HOJAS MÓVIL Y DOS HOJAS FIJAS CIERRE CENTRAL PARA PUERTAS FULL GLASS PASO LIBRE 1,5 MT. FABRICADO EN ALEMANIA, CON CAPACIDAD HASTA DE 120 KG POR HOJA. INCLUYE: KIT ECDRIVE T2: ELECTRÓNICA	62 días	mié 17/06/26	mié 16/09/26	11FF	
19		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BISAGRA HIDRAULICA DE PISO CAP 150 KG	1 día	vie 14/08/26	vie 14/08/26	5CC	
20		SUMINISTRO INST. DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 3+3 COLOR SIMILAR AL EXISTENTE	4 días	mar 8/09/26	vie 11/09/26	11	
21		SEÑALIZACIÓN EN VINILO IMPRESO LAMINADO A COLOR ADHESIVO.	3 días	vie 14/08/26	mié 19/08/26	5CC	

Correo: soporte.ticonstrucciones@gmail.com
No. Cel.: 312 5356 383
Dirección: CR 11 A 7 B 126, Melgar Tolima

AVANCE DE OBRA

1.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUERTAS EN VIDRIO UNA SOLA HOJA MANUALES. CONSISTENTE EN HACER REVISIÓN GENERAL DE LA PUERTA, VERIFICAR CIERRE, VERIFICAR Y LUBRICAR BISAGRAS, HACER AJUSTE DE CIERRES, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO Y/O CORREGIR ALTURAS DE HOJA Y MOVIMIENTO

Registro fotográfico






3.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PUERTAS EN ALUMINIO CON VIDRIO, INCLUYE SOPORTE ANCLAJE DE FIJACIÓN AL PISO Y TECHO.

Registro fotográfico.




3.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO CAP 150 KG.

Registro fotográfico.

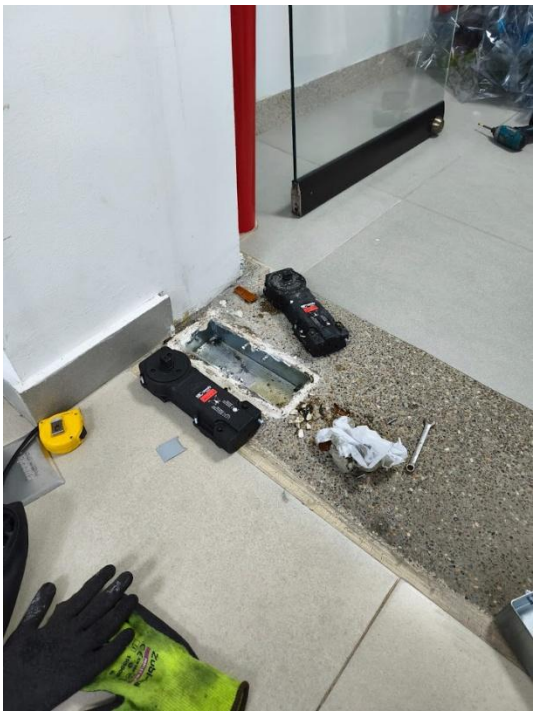



3.11 SEÑALIZACIÓN EN VINILO IMPRESO LAMINADO A COLOR ADHSESIVO.

Registro fotográfico.

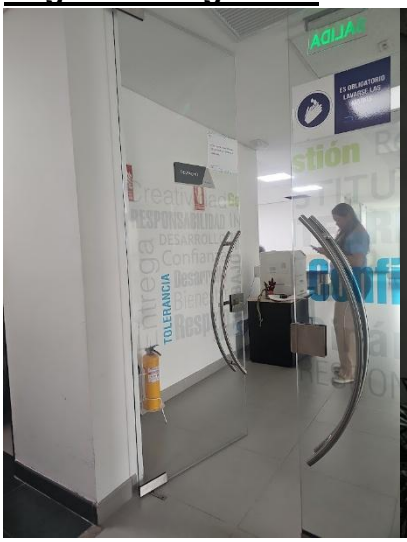




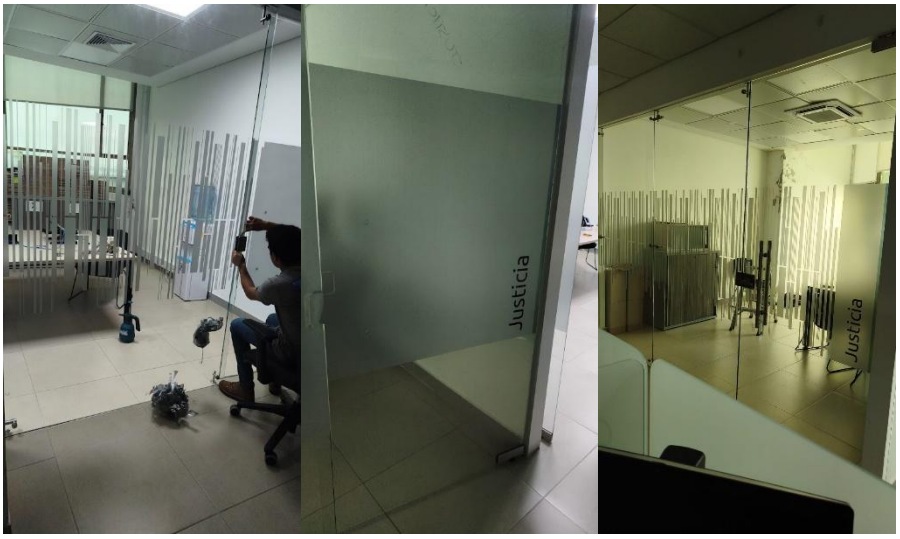


AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CRITICAS

MEDIDAS DE CORTE DE VIDRIO

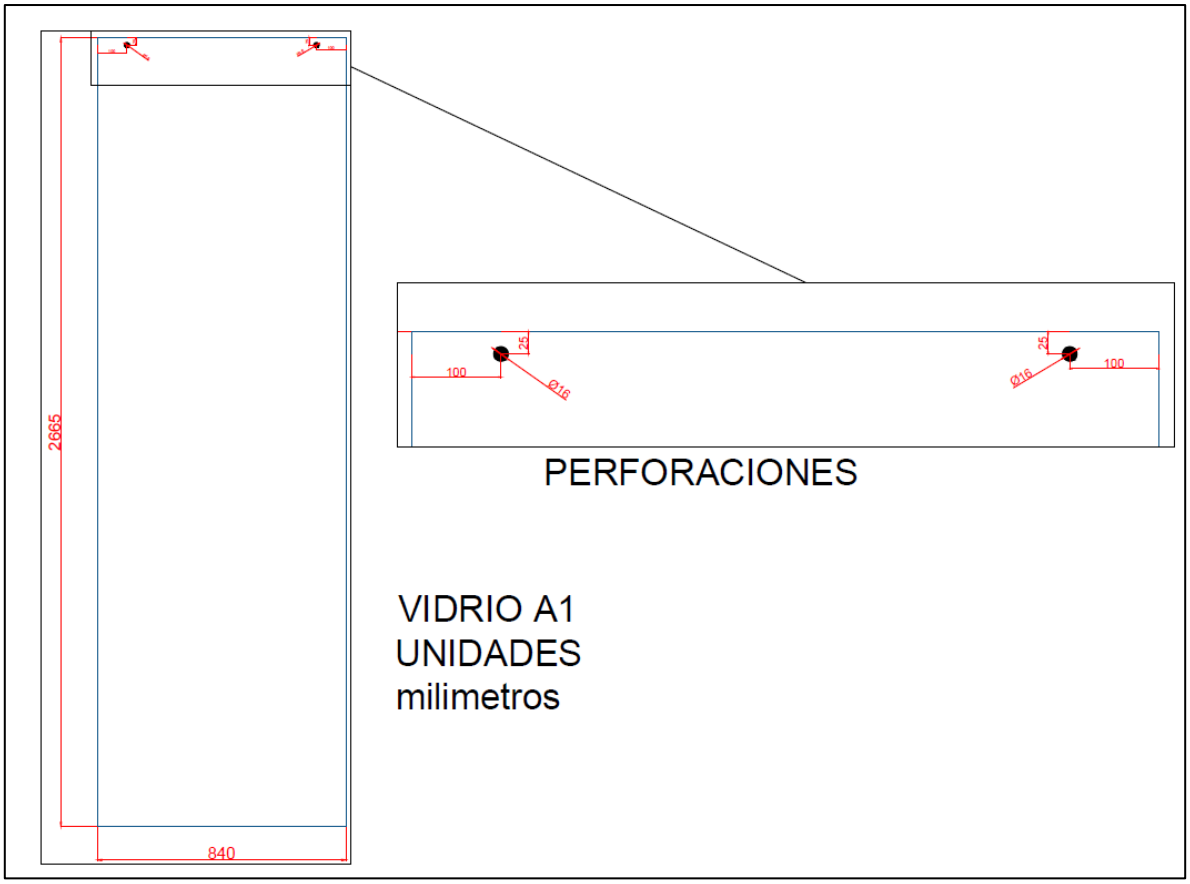

Correo: soporte.ticonstrucciones@gmail.com
No. Cel.: 312 5356 383
Dirección: CR 11 A 7 B 126, Melgar Tolima

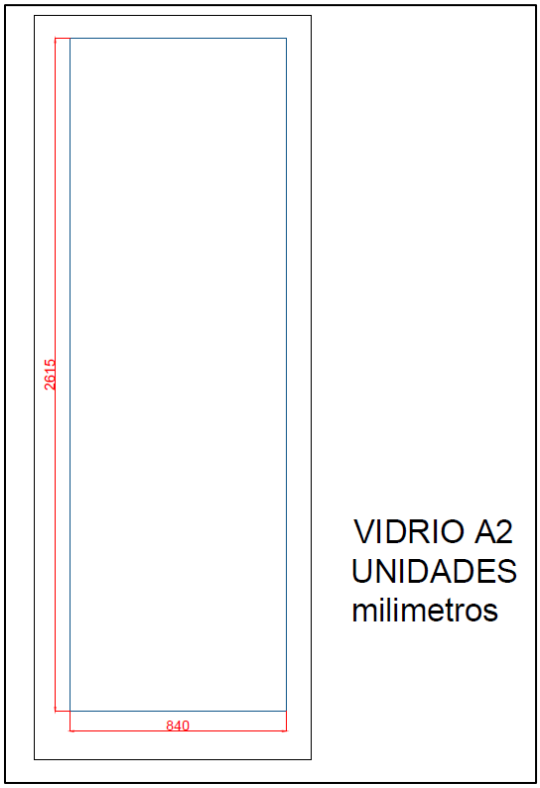

Las actividades que corresponden con la puerta automática, las cuales se deben ejecutar en sincronía, se encuentran en avance, y esta dentro de las fechas solicitadas, ya que su producción se realiza fuera de la región, como lo es el vidrio 5+5 templado, como también los equipos a instalar, por medio se proyecta su correcta instalación en los tiempos solicitados.





Las actividades correspondientes al mantenimiento de la puerta automática de parqueadero, suministro e instalación del dispositivo de apagado de emergencia y

de las luces indicadoras de alarma para apertura y cierre, requieren la intervención de una cuadrilla especializada de mecánicos.

Estas actividades serán ejecutadas de manera conjunta con la instalación de la nueva puerta automática, debido a que, en el municipio de Yopal, Casanare, no se cuenta con personal técnico especializado que garantice la correcta ejecución de los trabajos sobre los modelos y equipos a utilizar.

Por lo anterior, se ha previsto realizar la totalidad de estas actividades de manera integral y coordinada, durante la jornada programada para la instalación de la puerta automática, garantizando así la correcta ejecución, funcionamiento y puesta en servicio de los sistemas intervenidos.

De igual forma se debe tener en cuenta que hay actividades que son predecesoras de las anteriores mencionadas, dado que su ejecución se realizara antes, durante y después, por ello se realizaran de forma presentada en la ejecución.

BALANCE DE CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	EJECUTADO JORNADA 1
1.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUERTAS AUTOMÁTICA INGRESO VEHICULAR.CONSISTENTE EN HACER REVISIÓN GENERAL DE LA PUERTA, VERIFICAR CIERRE, VERIFICAR Y LUBRICAR BISAGRAS, HACER AJUSTE DE CIERRES, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO Y/O CORREGIR ALTURAS DE HOJA Y MOVIMIENTOS JUNTO CON AJUSTE.	UN	1	$ 287,462.31	$ 287,462.31	
1.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUERTAS EN VIDRIO UNA SOLA HOJA MANUALES.CONSISTENTE EN HACER REVISIÓN GENERAL DE LA PUERTA, VERIFICAR CIERRE, VERIFICAR Y LUBRICAR BISAGRAS, HACER AJUSTE DE CIERRES, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO Y/O CORREGIR ALTURAS DE HOJA Y MOVIMIENTO	UN	5	$ 131,267.19	$ 656,335.95	$ 656,335.95
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTÓN DE APAGADO DE EMERGENCIA	UN	1	$ 217,473.66	$ 217,473.66	
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUCES DE ALARMA PARA APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DE SEGURIDAD	UN	2	$ 114,646.70	$ 229,293.40	
2.3	TOPES PUERTAS	UN	2	$ 117,590.61	$ 235,181.22	
3.1	DESMONTES DE PUERTAS EN VIDRIO Y PORTONES METÁLICOS EXISTENTES INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	M2	9.22	$ 50,502.94	$ 465,637.11	
3.2	RETIRO DE ESTUCO Y LIMPIEZA DE MUROS ALTURA MAYORES A 2 MTS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	M2	1.47	$ 6,654.60	$ 9,782.26	
3.3	ESTUCO Y RESANES EN MUROS	M2	1.47	$ 14,111.32	$ 20,743.64	
3.4	VINILO SOBRE PAÑETE 3 MANOS	M2	68.39	$ 17,238.59	$ 1,178,947.17	
3.5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PUERTAS EN ALUMINIO CON VIDRIO, INCLUYE SOPORTE ANCLAJE DE FIJACIÓN AL PISO Y TECHO	UN	3	$ 49,515.83	$ 148,547.49	$ 148,547.49
3.6	INSTALACION DE PUERTAS EN VIDRIO (INCLUYE, ELEMENTOS DE FIJACION, REFUERZO CON PLATINAS DE ANCLAJES, CERRADURAS Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE).	UN	1	$ 161,572.88	$ 161,572.88	
3.7	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=10CM INCLUYE PINTURA	M2	3.97	$ 65,278.13	$ 259,154.18	

Correo: soporte.ticonstrucciones@gmail.com
No. Cel.: 312 5356 383
Dirección: CR 11 A 7 B 126, Melgar Tolima

3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA AUTOMÁTICA GEZE ECDRIVE T2 PARA DOS HOJAS MÓVIL Y DOS HOJAS FIJAS CIERRE CENTRAL PARA PUERTAS FULL GLASS PASO LIBRE 1,5 MT. FABRICADO EN ALEMANIA, CON CAPACIDAD HASTA DE 120 KG POR HOJA. INCLUYE: KIT ECDRIVE T2: ELECTRÓNICA DCU 1 NT, TRANSFORMADOR 110V, CARROS AUTOLIMPIANTES PARA 140 KG/HOJA , BATERÍA EMERGENCIA, TOPES, MOTOR, POLEA DE GRAN DIAMETRO Y ROIDAMIENTOS DOBLES, PERMITEN TRABAJAR CON CARGA DE MAYOR PESO MOVIMIEBTOS PRECISOS Y DE BAJA PFRICCIÓN,PROTECCIÓN ACÚSTICA EN VARIOS PUNTOS DEL RIELY FIJACIÓN, ESPACIO INTERNO PARA DOS BATERIAS DE 12V 1,2 AMP. * CARRIL DE RODADURA HASTA 6.5 MTS.* PERFILES DE UNIDAD MOTRIZ.* TAPA.* TAPAS LATERALES.* CORREA.* PERFIL CONTINUO DE SUJECIÓN T. *SENSOR GC 363+R DE MOVIMIENTO PERFIL TAPALUCES ENTRE HOJAS MÓVILES Y MÓDULOS FIJOS.* DPS PROGRAMADOR, SELECTOR DE 5 USOS, INFORME DE ERRORES Y MANTENIMIENTO.* SEGURO ELECTROMECÁNICO * SENSOR GC 363+ R DE MOVIMIENTO Y DE SEGURIDAD.* DETECTOR DE MOVIMIENTO GC 308 R* VIDRIOS TEMPLADOS LAMINADO 5+5 MM INCOLOROS	M2	9.22	$ 1,692,896.37	$ 15,608,504.53	$ 5,462,976.59
3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO CAP 150 KG	UN	1	$ 609,622.43	$ 609,622.43	$ 609,622.43
3.10	SUMINISTRO INST. DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 3+3 COLOR SIMILAR AL EXISTENTE	M2	7.31	$ 218,266.80	$ 1,595,530.31	
3.11	SEÑALIZACIÓN EN VINILO IMPRESO LAMINADO A COLOR ADHSESIVO.	M2	54.5	$ 58,100.00	$ 3,166,450.00	$ 3,166,450.00
SUBTOTAL MANTENIMIENTO					**$ 1,625,746.54**	**$ 656,335.95**
SUBTOTAL OBRA					**$ 23,224,491.99**	**$ 9,387,596.51**
	ADMINISTRACION			23%	$ 5,341,633.16	$ 2,159,147.20
	IMPREVISTOS			1%	$ 232,244.92	$ 93,875.97
	UTILIDAD			4%	$ 928,979.68	$ 375,503.86
	IVA			19%	$ 176,506.14	$ 71,345.73
VALOR TOTAL					**$ 31,529,602.43**	**$ 12,743,805.21**

Correo: soporte.ticonstrucciones@gmail.com
No. Cel.: 312 5356 383
Dirección: CR 11 A 7 B 126, Melgar Tolima

SEGURIDAD INDUSTRIAL

No se ha presentado ningún accidente. Se han utilizado las respectivas recomendaciones y normatividades de la ARL respectiva y la utilización de los EPP.

AVANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS – MES DE AGOSTO DE 2026

En el marco de la ejecución del Contrato No. 44-003-2026, cuyo objeto corresponde a la adquisición e instalación de puerta de acceso principal en vidrio automática y mantenimiento de puertas en vidrio manual de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal, se realizó el seguimiento a la generación y manejo de residuos durante las actividades ejecutadas en el mes de agosto de 2026.

Durante el periodo objeto del presente informe, los residuos generados correspondieron principalmente a material plástico y residuos derivados de las actividades de instalación de vinilos, producto de los procesos de adecuación y terminación realizados en las instalaciones.

Los residuos generados fueron recolectados, separados y manejados de acuerdo con su naturaleza, evitando su disposición inadecuada y manteniendo las áreas de trabajo en condiciones apropiadas de orden y limpieza.

Durante el periodo reportado no se generaron residuos que requirieran disposición final por parte de un gestor externo, ni se presentaron residuos peligrosos asociados a las actividades ejecutadas. Los residuos generados fueron manejados mediante las medidas de separación y almacenamiento temporal correspondientes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos establecidos en el Plan de Gestión de Residuos.

Por lo anterior, para el periodo correspondiente al mes de agosto de 2026, se evidencia un manejo adecuado de los residuos generados durante la ejecución de las actividades contractuales, sin registrarse eventos asociados a disposición final de residuos.

Tipo de residuo	Origen	Manejo realizado	Disposición final
Plástico	Actividades de instalación y adecuación	Recolección y separación	No se realizó disposición final durante el periodo

Tipo de residuo	Origen	Manejo realizado	Disposición final
Residuos de vinilos	Instalación de vinilos	Recolección y almacenamiento temporal	No se realizó disposición final durante el periodo
Residuos peligrosos	No se generaron	No aplica	No aplica

Registro fotografico





ING. JOSE EDUARDO PEÑA FIAGA
REPRESENTANTE LEGAL
K&J T.I.& CONSTRUCCIONES S.A.S
