INFORME FINAL DE SUPERVISION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 098 -2026.

"IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, ORIENTADAS A LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, ARAUCA"

SUPERVISOR
CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

PUERTO RONDÓN – ARAUCA
SEPTIEMBRE 2026

INFORME FINAL DE SUPERVISION
Selección Abreviada de Subasta Inversa | TRD. 102.04.08

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN
CONTRATISTA	INGENIERIA & SOLUCIONES MARQUES R&D S.A.S Identificado con NIT: 901.317.287-7 R/L: DIEGO ALBERTO QUESADA DULCEY
OBJETO A CONTRATAR	IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SISTEMAS DE BOMBEO EN VIVIENDAS RURALES DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO	NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($99.995.000,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN	VEINTE (20) DÍAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	04 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO	19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	08 DE JULIO DE 2026
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No 01	06 DE JULIO DE 2026
PLAZO DE SUSPENSIÓN No 01	VEINTE (20) DÍAS
FECHA ACTA DE PRORROGA No 01 A LA SUSPENSIÓN No 01	24 DE JULIO DE 2026
PLAZO DE PRORROGA No 01 A LA SUSPENSIÓN No 01	QUINCE (15) DÍAS
FECHA ACTA DE PRORROGA No 02 A LA SUSPENSIÓN No 01	07 DE AGOSTO DE 2026
PLAZO DE PRORROGA No 02 A LA SUSPENSIÓN No 01	QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE REINICIO No 01	25 DE AGOSTO DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE AGOSTO DE 2026

Una vez recibido el contrato y verificada la ejecución de las actividades conforme a los compromisos pactados, se procede a elaborar el siguiente informe, cuyo objeto corresponde a: **"IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, ORIENTADAS A LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, ARAUCA"** procedimiento que consta de las siguientes partes:

2. ASPECTOS LEGALES

2.1 PÓLIZAS DEL CONTRATO DE PÓLIZAS CONTRATO DE SUMINISTRO No 098-2026

De conformidad con lo establecido en el Contrato de Suministro No. 098-2026, y con el fin de garantizar el cumplimiento general de las obligaciones derivadas del mismo, las garantías que amparan los riesgos contractuales y extracontractuales fueron constituidas conforme a las circunstancias propias del proceso, de

acuerdo con lo señalado en los artículos 2.2.1.2.1.5.4, 2.2.1.2.3.1.1 y subsiguientes del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015.

En cumplimiento de lo anterior, el contratista **INGENIERIA & SOLUCIONES MARQUES R&D S.A.S.**, identificada con NIT No 901.317.287-7 y representada legalmente por **DIEGO ALBERTO QUESADA DULCEY**, constituyó la Garantía Única de Cumplimiento No. COQ-100009520, expedidas por la compañía SEGUROS MUNDIAL., las cuales fueron debidamente revisadas y aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica del municipio de Puerto Rondón.

Las pólizas anteriormente mencionadas cuentan con los siguientes amparos:

A. PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN, Aprobada mediante constancia de aprobación del día 16 de junio de 2026.

AMPAROS DE LA GARANTÍA	SEGUROS MUNDIAL	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Garantía de Cumplimiento.	COQ-100009520 Anexo 0	04/06/2026	25/10/2026	$ 9.999.500,00
Calidad y Correcto Funcionamiento		04/06/2026	25/06/2027	$ 19.999.000,00

A. PÓLIZAS ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE INICIO, Aprobada mediante constancia de aprobación del día 01 de septiembre de 2026.

AMPAROS DE LA GARANTÍA	SEGUROS MUNDIAL	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Garantía de Cumplimiento.	COQ-100009520 Anexo 2	19/06/2026	09/11/2026	$ 9.999.500,00
Calidad y Correcto Funcionamiento		19/06/2026	10/07/2027	$ 19.999.000,00

B. PÓLIZAS ACTUALIZADA SEGUN acta de Suspensión No 01 – Prorroga No 01 a la Suspensión No 01 - Prorroga No 02 a la Suspensión No 01 y Acta de Reinicio No 01, aprobada mediante Constancia de fecha 01 de septiembre de 2026.

AMPAROS DE LA GARANTÍA	SEGUROS MUNDIAL	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Garantía de Cumplimiento.	COQ-100009520 Anexo 3	06/07/2026	27/12/2026	$ 9.999.500,00
Calidad y Correcto Funcionamiento		06/07/2026	28/08/2027	$ 19.999.000,00

3. SEGURIDAD SOCIAL

3.1. PAGO SEGURIDAD SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL

MES	CONCEPTO	No. PLANILLA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR
JUNIO - JULIO 2026	PENSION	9507236875	PORVENIR	27/07/2026	$ 280.200,00
	ARL		ARL SURA		$ 9.200,00
	SALUD		SANITAS		$ 70.100,00
	CCF		COMFACASANARE		$ 70.100,00

INFORME FINAL DE SUPERVISION

Selección Abreviada de Subasta Inversa TRD. 102.04.08

VR TOTAL	**$429.600,00**

MES	CONCEPTO	No. PLANILLA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR
JULIO - AGOSTO 2026	PENSION	**9508847249**	PORVENIR	05/08/2026	$ 280.200,00
	ARL		ARL SURA		$ 9.200,00
	SALUD		SANITAS		$ 70.100,00
	CCF		COMFACASANARE		$ 70.100,00
VR TOTAL					**$429.600,00**

MES	CONCEPTO	No. PLANILLA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR
AGOSTO - SEPTIEMBRE 2026	PENSION	**9510444144**	PORVENIR	02/09/2026	$ 280.200,00
	ARL		ARL SURA		$ 9.200,00
	SALUD		SANITAS		$ 70.100,00
	CCF		COMFACASANARE		$ 70.100,00
VR TOTAL					**$429.600,00**

1. DATOS PRESUPUESTALES

	FECHA	NÚMERO	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	06/05/2026	05060001	NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($99.995.000,00).

	FECHA	NÚMERO	VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)	05/06/2026	06050003	NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($99.995.000,00).

2. PRESUPUESTO OFICIAL CONTRATADO

INFORME FINAL DE SUPERVISION
Selección Abreviada de Subasta Inversa TRD. 102.04.08

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL					
OBJETO: "IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SISTEMAS DE BOMBEO EN VIVIENDAS RURALES DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"					
PRESUPUESTO OFICIAL					
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**VLR. UNITARIO**	**VLR. TOTAL**
1,0	**SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA**				**$ 99.995.000,00**
1,1	Suministro de una bomba hidráulica (Bomba periférica QB 60 370 w Panel 605 w) con sistema de energía solar, que incluya los componentes básicos de bombeo, conducción, soporte estructural, conexiones eléctricas y materiales complementarios necesarios para garantizar su correcto funcionamiento y puesta en marcha.	UND	14,00	$ 7.142.500,00	$ 99.995.000,00
				SUB TOTAL VALOR	**$ 99.995.000,00**
				VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 99.995.000,00**

Página 1

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA

Como supervisor designado mediante comunicación de fecha 04 de junio de 2026, se rindió informe sobre el cumplimiento de las actividades previstas en el Contrato de Suministro No. 098-2026, cuyo objeto corresponde al **"IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, ORIENTADAS A LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, ARAUCA" ,** evidenciándose la ejecución del cien por ciento (100%) de las actividades contractuales, conforme a las especificaciones técnicas y obligaciones establecidas en el contrato, así:

ÍTEM	ACTIVIDAD	
1,1	Suministro de una bomba hidráulica (Bomba periférica QB 60 370 w Panel 605 w) con sistema de energía solar, que incluya los componentes básicos de bombeo, conducción, soporte estructural, conexiones eléctricas y materiales complementarios necesarios para garantizar su correcto funcionamiento y puesta en marcha.	
	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
	CANTIDAD	14,00
	DESCRIPCIÓN	El suministro incluye: 1. Bomba periférica QB 60 370 w. 2. Cofres, cajas o armarios. 3. Acoples de tubos de plástico PVC. 4. Válvulas hidráulicas. 5. Interruptor de circuito 6. Panel solar 605 w de potencia 7. Tubo cuadrado metálico ángulo 8. Abrazaderas 9. Tornillos de anclaje 10. Tubo galvanizado 11. Cableado 12. Tubo metálico

Registro fotográfico:



INFORME FINAL DE SUPERVISION

Selección Abreviada de Subasta Inversa | TRD. 102.04.08







INFORME FINAL DE SUPERVISION

Selección Abreviada de Subasta Inversa | TRD. 102.04.08




INFORME FINAL DE SUPERVISION
Selección Abreviada de Subasta Inversa TRD. 102.04.08



INFORME FINAL DE SUPERVISION
Selección Abreviada de Subasta Inversa | TRD. 102.04.08

4. LUGAR DE EJECUCIÓN

Municipio de Puerto Rondón, Arauca – (Área Rural).

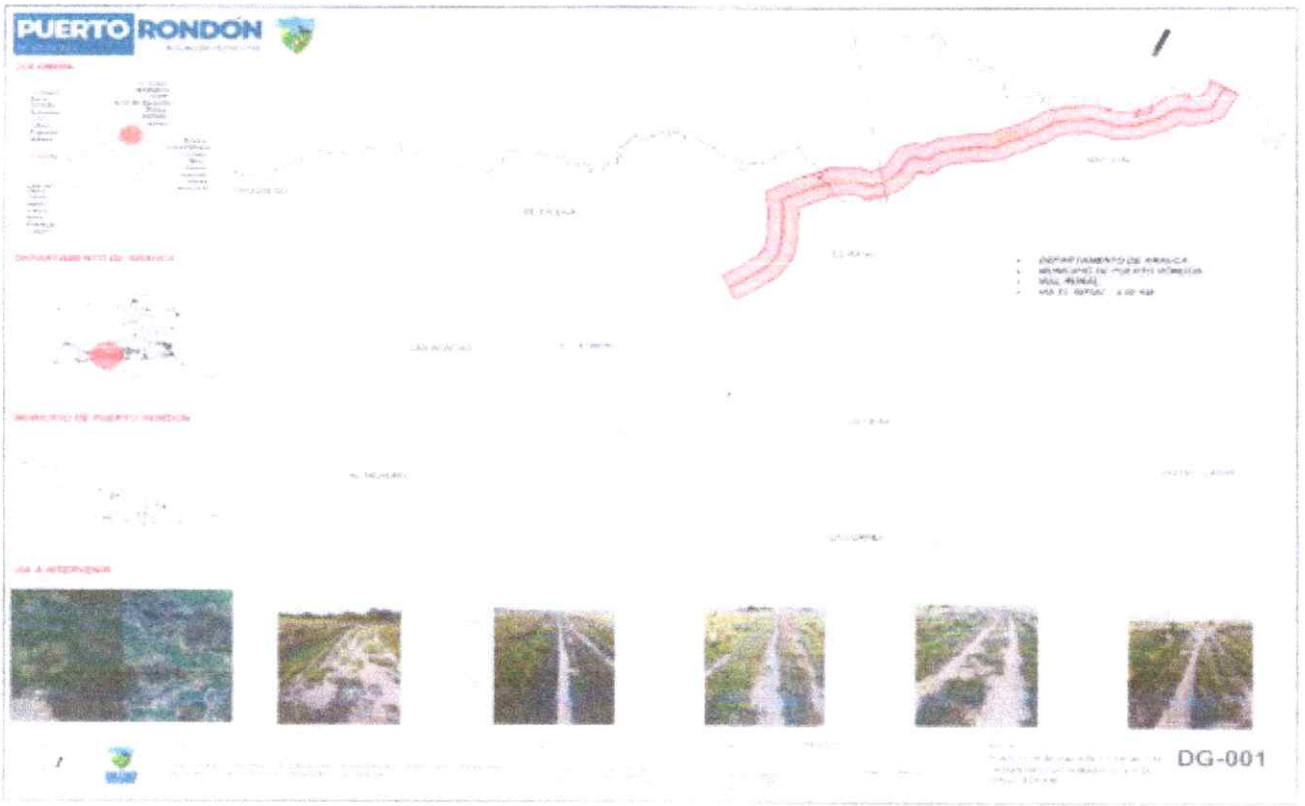

5. INFORME FINANCIERO EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO

DESCRIPCION	CONTRACTUAL	EJECUTADO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$99.995.000,00	
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO		$99.995.000,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0	$0
SUMAS IGUALES	$99.995.000,00	$99.995.000,00

Con relación a los pagos, el valor que actualmente el Municipio adeuda al contratista corresponde al saldo final del contrato, el cual será reconocido mediante el Acta de Recibo Final, por la suma de **NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($99.995.000,00).**

6. CONCLUSIONES

De conformidad con el seguimiento realizado en calidad de supervisor del Contrato de Suministro No. 098-2026, se concluye que el contratista cumplió satisfactoriamente con las obligaciones contractuales adquiridas, ejecutando el cien por ciento (100%) de las actividades contempladas dentro del objeto contractual.

INFORME FINAL DE SUPERVISION
Selección Abreviada de Subasta Inversa | TRD. 102.04.08

Durante el desarrollo del contrato se realizaron las actividades de suministro, instalación, montaje, pruebas y puesta en marcha de catorce (14) unidades de bombeo hidráulico con sistema de energía solar fotovoltaica, conforme a las condiciones técnicas definidas en el pliego contractual y las especificaciones del ítem principal.

Así mismo, se evidenció el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales relacionadas con la constitución y aprobación de pólizas, manejo ambiental y demás requerimientos exigidos para la correcta ejecución del proyecto.

Como conclusión final, y teniendo en cuenta el presente informe, la supervisión AVALA el pago consignado en el acta de recibo final, por cuanto se evidenció el cumplimiento de la ejecución del Contrato de Suministro No. 098-2026, de conformidad con las especificaciones técnicas y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
Secretario de Planeación e Infraestructura del municipio
Supervisor

Proyectó:	Aprobó aspectos técnicos:
Nombre: Yoel Ojeda Robins **Cargo:** Profesional de Apoyo Esp. No.106 - 2026	**Nombre:** Arquitecto Carlo Brian Riaño Carreño **Cargo:** secretario de Planeación e Infraestructura

CERTIFICACIONES
Proceso MPR-SASI-003-2026 TRD. 102.04.06

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN

HACE CONSTAR:

Que la empresa **INGENIERIA & SOLUCIONES MARQUES R&D S.A.S Identificado con NIT: 901.317.287-7 R/L: DIEGO ALBERTO QUESADA DULCEY**, en calidad de contratista del **Contrato de Suministro No. 098-2026**, cuyo objeto es: **"IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SISTEMAS DE BOMBEO EN VIVIENDAS RURALES DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA ",** NO realizó solicitud por concepto de anticipo

La presente certificación se expide a los dos (02) días del mes de septiembre de 2026, para los fines pertinentes.

CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
Secretario de Planeación e Infraestructura del municipio
Supervisor

Proyectó:	Aprobó aspectos técnicos:
Nombre: Yoel Ojeda Robins **Cargo:** Profesional de Apoyo Esp. No.106 - 2026	**Nombre:** Arquitecto Carlo Brian Riaño Carreño **Cargo:** secretario de Planeación e Infraestructura

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAZ Y SALVO

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN

HACE CONSTAR:

Que la empresa **INGENIERIA & SOLUCIONES MARQUES R&D S.A.S Identificado con NIT: 901.317.287-7 R/L: DIEGO ALBERTO QUESADA DULCEY**, en calidad de contratista del **Contrato de Suministro No. 098-2026**, cuyo objeto es: **"IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SISTEMAS DE BOMBEO EN VIVIENDAS RURALES DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA ",** efectuó los pagos correspondientes a proveedores, personal operativo y demás obligaciones derivadas de la ejecución contractual, por lo cual se encuentra a paz y salvo por dichos conceptos.

La presente certificación se expide a los dos (02) días del mes de septiembre de 2026, para los fines pertinentes.

CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
Secretario de Planeación e Infraestructura del municipio
Supervisor

Proyectó:

Nombre: Yoel Ojeda Robins
Cargo: Profesional de Apoyo Esp. No.106 - 2026

Aprobó aspectos técnicos:

Nombre: Arquitecto Carlo Brian Riaño Carreño
Cargo: secretario de Planeación e Infraestructura

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN

HACE CONSTAR:

Que la empresa **INGENIERIA & SOLUCIONES MARQUES R&D S.A.S Identificado con NIT: 901.317.287-7 R/L: DIEGO ALBERTO QUESADA DULCEY**, en calidad de contratista del **Contrato de Suministro No. 098-2026**, cuyo objeto es: **"IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SISTEMAS DE BOMBEO EN VIVIENDAS RURALES DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA " ,** ha ejecutado a la fecha el cien por ciento (100%) de las actividades contractuales programadas, conforme al alcance establecido y de acuerdo con el seguimiento realizado por la supervisión del contrato.

La presente certificación se expide a los dos (02) días del mes de septiembre de 2026, para los fines pertinentes.

CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
Secretario de Planeación e Infraestructura del municipio
Supervisor –

Proyectó:	Aprobó aspectos técnicos:
Nombre: Yoel Ojeda Robins **Cargo:** Profesional de Apoyo Esp. No.106 - 2026	**Nombre:** Arquitecto Carlo Brian Riaño Carreño **Cargo:** secretario de Planeación e Infraestructura

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN

HACE CONSTAR:

Que la empresa **INGENIERIA & SOLUCIONES MARQUES R&D S.A.S Identificado con NIT: 901.317.287-7 R/L: DIEGO ALBERTO QUESADA DULCEY**, presentó los respectivos soportes de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, evidenciando encontrarse a paz y salvo por dichos conceptos, para efectos de la ejecución del **Contrato de Suministro No. 098-2026**, cuyo objeto es: **"IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SISTEMAS DE BOMBEO EN VIVIENDAS RURALES DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA "**

La presente certificación se expide a los dos (02) días del mes de septiembre de 2026, para los fines pertinentes.

CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
Secretario de Planeación e Infraestructura del municipio
Supervisor -

Proyectó:

Nombre: Yoel Ojeda Robins
Cargo: Profesional de Apoyo Esp. No.106 - 2026

Aprobó aspectos técnicos:

Nombre: Arquitecto Carlo Brian Riaño Carreño
Cargo: secretario de Planeación e Infraestructura
