
Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración
0		**Construccion de Cimentaciones Para Puente Militar**	**$ 999.414.842,00**	**90 días**
1		Inicio	$ 0,00	0 días
2	**1**	**PGIO y PMT**	**$ 37.678.400,00**	**90 días**
3	1.1	Ejecución y Seguimiento del PGIO	$ 20.777.400,00	90 días
4	1.2	Ejecución y Seguimiento del PMT	$ 16.901.000,00	90 días
5	**2**	**Movimientos de Tierra**	**$ 715.533.900,77**	**57 días**
6	2.1	Excavaciones varias manual en material común. Incluye cargue y disposición final del material sobrante	$ 906.104,85	3 días
7	2.2	Excavación en material común para construcción de pilotes de 0,5m de diámetro	$ 19.517.910,52	14 días
8	2.3	Excavación en material común para construcción de cabezales. disposición final del material sobrante	$ 7.091.842,75	6 días
9	2.4	Suministro, transporte e instalación de lleno compactado a máquina, material de afirmado y compactación para plataformas de acceso y de lanzamiento	$ 688.018.042,65	35 días
10	**3**	**Cimentaciones**	**$ 55.166.139,38**	**18 días**
11	3.1	Suministro, transporte, armado y colocación de acero de refuerzo Fy=420 Mpa (Grado 60) (Pilotes).	$ 34.673.922,00	13 días
12	3.2	Suministro, colocación y transporte de concreto 4000 psi para pilotes preexcavados de 0,5m de diámetro	$ 20.492.217,38	5 días
13	**4**	**Estructura (Espaldares y Cabezales)**	**$ 124.145.683,26**	**48 días**
14	4.1	Suministro, colocación y transporte de concreto 2000 psi para solado	$ 2.972.591,27	3 días
15	4.2	Suministro, transporte, armado y colocación de acero de refuerzo Fy=420 Mpa (Grado 60) (Estructura)	$ 24.427.597,39	15 días
16	4.3	Suministro, colocación y transporte de concreto 4000 psi (Cabezales y Espaldares)	$ 94.585.531,85	8 días
17	4.4	Suministro e instalación de apoyos elastoméricos de 500x2500x50 mm, según diseño, dureza 60 y sin refuerzos de acero	$ 2.159.962,75	1 día
18	**5**	**Elementos de Contención**	**$ 66.890.718,59**	**33 días**
19	5.1	Excavaciones varias en material común provenientes de la explanación y canales. Incluye disposición final del material sobrante	$ 23.270.109,01	5 días
20	5.2	Geotextil tipo no tejido NT2500 para separación de suelos y capas granulares en muros en gavión	$ 40.158.850,34	3 días
21	5.3	Muro en gaviones, en malla de triple torsión y con piedra rajón según INV-ART 681 - 07	$ 3.461.759,24	25 días
22		Fin	$ 0,00	0 días

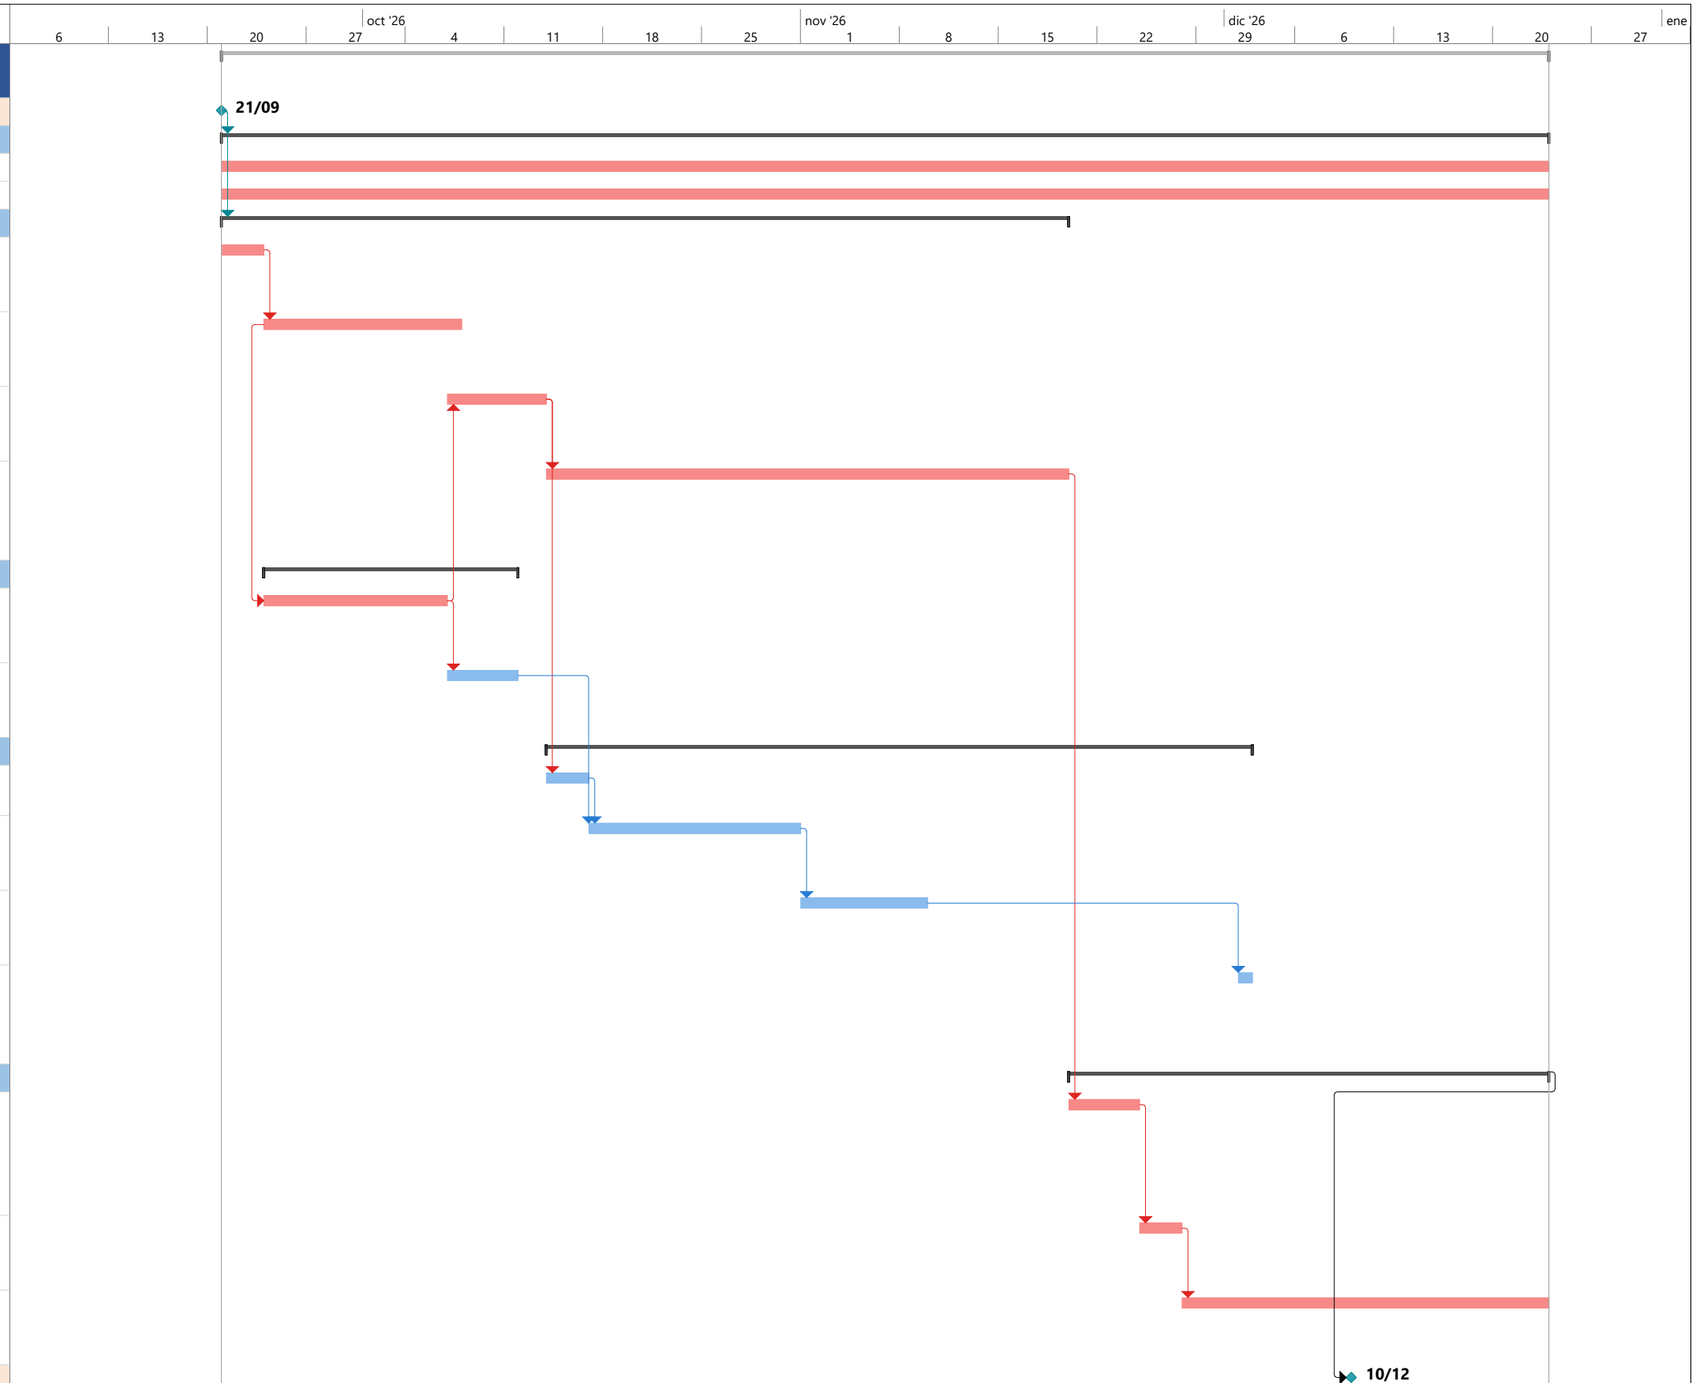

Proyecto: Construccion de Cime
Fecha: mar 7/07/26

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual
