	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	**CÓDIGO:**	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	11 de mayo de 2026				
INFORME No.	6	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	7/04/2026	Y EL	6/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL SECTOR LA CANCHA DE FUTBOL, BARRIO LA CANCHA, DEL MUNICIPIO DE ONZAGA - SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES REVESTIDOS EN CONCRETO.				
ESTADO	EN EJECUCIÓN		PLAZO INICIAL CONTRATO	SEIS (06) MESES	
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		VALOR INICIAL CONTRATO	$	289.712.052,15
PROCESO No.:	CI-008-2025		FECHA DE INICIO:	7 DE NOVIEMBRE DE 2025	
CONTRATO No.:	01310 DE 2025		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	6 DE MAYO DE 2026	
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE ONZAGA		LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE ONZAGA	
NIT CONTRATISTA:	890.208.148-5		SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ - SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL	
LINK DE PROCESO	<Insertar link del proceso contractual >		APOYO SUPERVISIÓN	SAUL ANTONIO CORTES DURAN - Contratista SPL	

1.1 SEGUIMIENTO TÉCNICO/JURÍDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Acta Inicio Contrato	7/11/2025	7/11/2025	6/05/2026	6 MESES		6/05/2026	Si	Se da inicio a l,as actividades del convenio
Prórroga No. 1	16/03/2026	7/05/2025	6/08/2026	3 MESES		6/08/2026	SI	El municipio solicitó una prórroga por 3 meses por dificultades presentadas

PLAZO CONTRATO ACTUALIZADO (En meses/dias)	**9 MESES**	
% AVANCE FISICO	**56%**	

1.2 ESTADO DE LAS GARANTIAS (Pólizas)

CLASE	# DE POLIZA	FECHA DE EXPEDICION	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA (Fechas) DESDE	VIGENCIA (Fechas) HASTA	7.VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	400-47-994000111034	25 DE MARZO DE 2026	2	CUMPLIMIENTO	7/11/2025	6/02/2027	$57.942.410,60
				PAGO DE SALARIOS			
				CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS			
				CALIDAD DEL SERVICIO			
				AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE EQUIPOS			
				ESTABILIDAD DE LA OBRA			
				BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL				PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES			

2. EJECUCION PRESUPUESTAL

ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 12.601.635,00
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 277.110.417,15
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 0,00

ADICIONES

CONCEPTO	ACTUALIZAR POLIZA	FECHA	VALOR


	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 289.712.052,15					
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00					
VALOR TOTAL + ADICION(ES)	$ 289.712.052,15					
VALOR PAGADO:	$ 83.133.125,00					
VALOR POR PAGAR:	$ 206.578.927,15					
% POR PAGAR	71,30%					
% AVANCE FINANCIERO	28,70%	TOTAL DE ADICIONES			$	-

2.1. SITUACIÓN FINANCIERA

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Acta Parcial No 01	19 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 83.133.125,00
TOTAL		$ 83.133.125,00

3. CURVA "S"

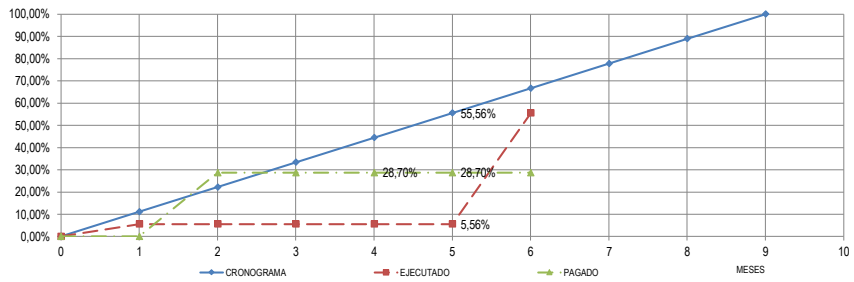

MES/DIAS	CRONOGRAMA	EJECUTADO	PAGADO
0	0,00%	0,00%	0,00%
1	11,11%	5,56%	0,00%
2	22,22%	5,56%	28,70%
3	33,33%	5,56%	28,70%
4	44,44%	5,56%	28,70%
5	55,56%	5,56%	28,70%
6	66,67%	55,56%	28,70%
7	77,78%		
8	88,89%		
9	100,00%		

PROGRAMADO	66,67%	
EJECUTADO	55,56%	
ATRASOS	-11,11%	
DESEMPEÑO		0,83
% PAGADO A LA FECHA	28,70%	
Pendiente por Ejecutar total	$	206.578.927,15
% POR CANCELAR A LA FECHA	71,30%	
Índice de avance financiero		0,52

Notas:

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO A LA FECHA

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/s

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

Por medio del Oficio SPL.644.2026, se convocó al Municipio de Onzaga a Mesa Técnica No. 3, la cual se llevó a cabo el día 15 de abril de 2026, en el marco del seguimiento técnico al proyecto. En el comité se efectuó revisión al estado actual de los contratos derivados del convenio y al cronograma de ejecución, analizándose las situaciones presentadas en el proceso contractual de interventoría, las cuales han tenido incidencia en el inicio de ejecución de las actividades contempladas en la programación actualizada con la prórroga No.1. El municipio se comprometió a allegar informe de acciones frente a los retrasos.

Por medio del Oficio SPL.782.2026, se convocó al Municipio de Onzaga a la Mesa Técnica No. 4, realizada el día 05 de mayo de 2026. Durante la sesión, el municipio informó que el derivado de obra correspondiente al proceso No. MO-SA-05-2026 fue adjudicado mediante Contrato de Obra Pública No. 063 de 2026, y que el derivado de interventoría correspondiente al proceso No. MO-MC-14-2026 se adjudicó con el contrato No.066 de 2026, dando por superado la etapa precontractual de los derivados. Cabe aclarar que el municipio no cumplió con el informe de acciones frente a los retrasos.

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

El municipio se comprometió a remitir, a más tardar el día 08 de mayo de 2026, un informe detallado de la situación presentada y el cronograma actualizado del proyecto, con el fin de ajustar la programación establecida y dar cumplimiento a las obligaciones pactadas con la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS.

Las CAS en sus actividades de supervisión, revisó que el día 6 de mayo de 2026, tanto obra como interventoría dieron inicio a las actividades bajo los contratos No.063 y No. 066 de 2026, respectivamente. Dando por iniciada las actividades establecidas en el convenio en lo que respecta a obra e interventoría.

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>


CAS Corporación Autónoma Regional de Santander — Ambiente

San Gil, 14 de abril de 2026

OFICIO SPL.644.2026


Señor
JUAN FERNANDO CÁCERES NAVAS
Alcalde del Municipio de Onzaga – Santander
Correo: alcaldia@onzaga-santander.gov.co

Asunto: Convocatoria a mesa de trabajo virtual – Seguimiento Convenio Interadministrativo No. 01310-2025

Respetado señor Alcalde:

En mi calidad de Supervisora designada por la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS del Convenio Interadministrativo No. 01310-2025, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL

OFICIO No. SPL.644.2026 REMITIDO AL MUNICIPIO


Detalle del Proceso Número: MO-SA-05-2026

PROCESO No.MO-SA-05-2026

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>


CAS Corporación Autónoma Regional de Santander — Ambiente

DATOS GENERALES

FECHA	DD: 15	MM: 04	AA: 2026	**LUGAR:** Virtual	
HORA DE INICIO: 2:30 pm				**HORA DE FINALIZACIÓN:** 2:50 pm	

OBJETIVO: Mesa Técnica No. 03 del proyecto cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL SECTOR LA CANCHA DE FUTBOL, BARRIO LA CANCHA, DEL MUNICIPIO DE ONZAGA - SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES REVESTIDOS EN CONCRETO."

Contrato de Obra Pública No. 01310-2025

Contratista: MUNICIPIO DE ONZAGA, NIT 890.208.148-5

Contratante: Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, NIT 804.000.292-0

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER

COMITÉ TECNICO No. 3


Detalle del Proceso Número: MO-MC-14-2026

PROCESO No.MO-MC-14-2026

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>


CAS Corporación Autónoma Regional de Santander — Ambiente

San Gil, 04 de mayo de 2026

OFICIO SPL.782.2026

Señor
JUAN FERNANDO CÁCERES NAVAS
Alcalde del Municipio de Onzaga – Santander
Correo: alcaldia@onzaga-santander.gov.co

Asunto: Convocatoria a mesa de trabajo virtual – Seguimiento Convenio Interadministrativo No. 01310-2025

Respetado señor Alcalde:

OFICIO No. SPL.782.2026 REMITIDO AL MUNICIPIO

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>


CAS Corporación Autónoma Regional de Santander — Ambiente

DATOS GENERALES

FECHA	DD: 05	MM: 05	AA: 2026	**LUGAR:** Virtual	
HORA DE INICIO: 2:23 pm				**HORA DE FINALIZACIÓN:** 2:59 pm	

OBJETIVO: Mesa Técnica No. 04 del proyecto cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL SECTOR LA CANCHA DE FUTBOL, BARRIO LA CANCHA, DEL MUNICIPIO DE ONZAGA - SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES REVESTIDOS EN CONCRETO."

Contrato de Obra Pública No. 01310-2025

Contratista: MUNICIPIO DE ONZAGA, NIT 890.208.148-5

Contratante: Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, NIT 804.000.292-0

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER

ORDEN DE LA REUNION

1. Inicio del comité técnico
2. Estado actual del convenio.
3. Revisión del cronograma.
4. Revisión del estado de los contratos derivados.
5. Compromisos.

COMITÉ TECNICO No. 4

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

Nombre: SUPERVISOR/ INTERVENTOR
EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	ANGIE MICHELLE ROJAS LEÓN	CONTRATISTA-SPL	
REVISO:	SAUL ANTONIO CORTES DURAN	CONTRATISTA-SPL	
V.B:	ANDRÉS GONZÁLEZ	FUNCIONARIO - SPL	
