#699

Radicado
20260105979O1
03/09/2026 15:07:01

CONTRATO No.
26SS111B2865 de 2026

NIT:902061427-4

CON-LGI-041

Medellin -lunes 24 de agosto de 2026

Ingeniero:
EDUARDO ALONSO HERRERA ZAMBRANO
Profesional Universitario
Secretaria de Infraestructura física
Dirección de Desarrollo físico
Medellín - Antioquia

REFERENCIA: Contrato 26SS111B2865 de 2026 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".

ASUNTO: Radicado acta de obra e Interventoria

Cordial saludo;

Por medio de la presente, la interventoria, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones otorgadas mediante el contrato **26SS111B2865 de 2026** cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA". se permite remitir el acta de obra e interventoria No.1 con sus respectivos anexos.

Acta de interventoria No.1

1. Formato Presentación Acta 1 interventoria
2. Informe de seguimiento acta 1 interventoria
3. Certificado supervisor parafiscales acta 1 interventoria
4. Certificación parafiscales y planillas interventoria
5. Acta de pago en PDF y Excel 1 interventoria
6. Preactas de pago, cuentas facturas acta 1
7. Informe Técnico No.1 obra

Recibi 24/08/26
Pablo

Carrera 43a No. 1sur–100 Oficina 1316, Ed. Sudameris, Medellín.
Teléfono: (4) 3582274. Dirección electrónica: consorciolgiituango@gmail.co

CONTRATO No.
26SS111B2865 de 2026

NIT:902061427-4

CON-LGI-041

Acta de Obra No.1

1. FORMATO DE PRESENTACIÓN DE ACTAS
2. FO-M7-P6-016_Informe_de_seguimiento Acta_No.1
3. ACTA PARCIAL DE OBRA No.1

LEIDY JOHANNA MORA VALENCIA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO LGI ITUANGO
Email: consorciolgituango@gmail.com
Elaboró: Johanna Mora Valencia
Folios:
Anexos:

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRÍNCIPE, DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 26SS111B2865 DE 2026



INFORME TECNICO MENSUAL No.1

PERIODO:

23 DE JUNIO DE 2026 AL 25 DE JULIO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 26OO111B2860 de 2026

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA INTERVENCION DE PUNTOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

AGOSTO 2026

ITUNGO-ANTIOQUIA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1

CONSORCIO LGI ITUANGO

DEPENDENCIA	NÚMERO DE COPIAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICAGOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	1

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN



DOCUMENTO	INFORME MENSUAL No.1 JULIO 2026	
ELABORÓ:	NOMBRE	DIEGO MARTIN RESTREPO AGUDELO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ITUANGO	FIRMA	
REVISÓ Y APROBÓ:	NOMBRE	LEIDY JOHANNA MORA VALENCIA
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	FIRMA	
RECIBIÓ:	NOMBRE	EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO
SUPERVISOR DEL PROYECTO	FIRMA	
FECHA	AGOSTO – 10 – 2026	

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 5
2. GENERALIDADES 6
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
3.1 Localización General y especifica 6
3.2 INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS 8
3.2.1 Datos generales del contrato de obra 9
3.2.2 Datos generales del contrato de Interventoria 9
3.3 Características técnicas del proyecto 10
4. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 19
4.1 Información del contrato de obra 19
5.SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA 20
5.1 Descripción de actividades acumuladas 20
5.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 21
5.3 Relación de actas de pago parciales, acumulados y saldos por ejecutar 21
5.4 Control de programación y recursos 21
5.5 Informe semanal 22
5.6 Seguimiento a la curva S 22
5.7 Control de estado general del tiempo 23
5.8 Control de maquinaria y equipo 24
5.9 Cumplimiento del personal profesional de obra 24
5.10 Control aportes legales y seguridad social contrato de obra 25
5.11 Resumen ensayos de laboratorio 25
5.12 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 25
5.13 Seguimiento a las garantías de obra 25
5.14 Actas de comité de obra o actas de reunión 26

5.15 Copia de bitácora 26
5.16 Fuentes de materiales 27
6. Seguimiento al plan de Gerencia 27
6.1 Definición y alineación de los objetivos 27
7. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 29
7.1 Datos del contrato de interventoria 29
7.2 Acciones a seguir por parte de la interventoria durante la ejecución del proyecto 30
7.3 Descripción de las actividades realizadas por el interventor 32
7.4 REGISTRO FOTOGRAFICO 33
7.5 Relación de equipos contrato de interventoria 33
7.6 RELACION DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA 34
7.7 Control de aportes legales y seguridad social del contrato de interventoria . 34
7.8 Informe financiero y presupuestal contrato de interventoria 34
7.9 Seguimiento a garantías del contrato de interventoria 35
8.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 36
9. ANEXOS 37

1. INTRODUCCIÓN

Mediante licitación pública N° LIC-111B-05-2025, la Gobernación de Antioquia-secretaria de Infraestructura Física (SIF). Adjudicó el contrato de obra No. 26OO111B2860 DE 2026 a la firma CONSORCIO VIAL REGIONAL ANTIOQUIA 2026, cuyo objeto es la "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA INTERVENCION DE PUNTOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", por un valor inicial de $ 11.869.263.725 y un plazo de 12 meses.

De igual manera, y con el objeto de garantizar el cumplimiento al contrato y de garantizar la calidad de las obras, la misma Entidad adjudicó al CONSORCIO LGI ITUANGO el contrato No. 26SS111B2865 DE 2026, cuyo objeto es : "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRÍNCIPE, DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", por un valor de $ 406.697.441 (incluido IVA) y un plazo de 13 meses.

Este proyecto se llevará a cabo en el Norte del departamento de Antioquia, el cual consta de cuatro puntos de atención; de los cuales tres se encuentran en las abscisas K82+000 , K76+300 y el K73+800 del municipios de Ituango y un punto en la abscisa K41+900 del municipio de Carolina del príncipe; estas intervenciones se realizan con el fin de mejorar las condiciones de movilidad como factor de incremento de la calidad de vida y bienestar para los habitantes del sector y los potenciales usuarios de la vía, garantizando la conectividad local y regional, lo que permitirá mejorar las condiciones de operación de la infraestructura vial existente.

2. GENERALIDADES

El Departamento de Antioquia adjudico el mejoramiento de la red vial a cargo del departamento la intervención de CUATRO (4) Puntos de Atención Prioritaria (PAP) localizados en los municipios de Ituango y Carolina del Príncipe. En el municipio de Ituango, en la vía identificada con código 25AN11-1 se encuentran tres de los cuatro puntos a intervenir, en las abscisas Km 82+000, Km 76+300 y Km 73+800. En el municipio de Carolina del Príncipe se encuentra un punto de atención prioritaria localizado en el Km 41+900. En total, las intervenciones en estos CUATRO (4) puntos suman una intervención de 711m en el municipio de Ituango y de 54m en el municipio de Carolina del Príncipe para un total de 765m, los cuales pretende mejorar las condiciones de movilidad como factor de incremento de la calidad de vida y bienestar para los habitantes del sector y los potenciales usuarios de las vías, garantizando la conectividad local y regional, lo que permitirá mejorar las condiciones de operación de la infraestructura vial existente, alcanzando los factores de operación, seguridad y confort mínimos exigidos por la normatividad.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 Localización General y especifica

Los trabajos se ejecutan en las vías (25AN11-1) La Partidas a San José de la Montana -San Andrés de Cuerquía-Matanzas-Pescadero-Ituango y en la vía (62AN21-1) Puente Gabino-Gómez Plata-El Guayabo-Carolina del Principe-La Herradura-Partidas de Guadalupe-Guadalupe (No incluye tramo urbano de Gómez Plata)

Localización de los PAP de la subregión Norte



Localización de los PAP de la subregión municipio de Ituango





Localización de los PAP de la subregión municipio de Carolina del Principe





El proyecto se desarrollará en los siguientes corredores viales (25AN11-1) Las Partidas a San José de la Montana -San Andrés de Cuerquia-Matanzas-Pescadero-Ituango y la via (62AN21-1) Puente Gabino-Gómez Plata-El Guayabo-Carolina del Principe-La Herradura-Partidas de Guadalupe-Guadalupe (No incluye tramo urbano de Gómez Plata

UBICACIÓN DE VIAS A INTERVENIR

Código vía	Municipio	Abscisa inicial	Abscisa final	Longitud (m)	Coordenada inicial	Coordenada final
62AN21-1	Carolina del Príncipe	Km 41+870	Km 41+924	54	X:4747688.32332	X: 4747738.015009
					Y:2308382.872207	Y: 2308406.46995
25AN11-1	Ituango (PAP 4)	Km 73+630	Km 73+900	270	X: 4699701.969816	X: 4699694.02094
					Y: 2347256.430686	Y: 2347393.823737
25AN11-1	Ituango (PAP 3)	Km 76+140	Km 76+406	266	X: 4699101.356205	X: 4699111.972491
					Y: 2348316.456361	Y: 2348464.399304
25AN11-1	Ituango (PAP 2)	Km 81+925	Km 82+100	175	X: 4696381.01385	X: 4696473.660125
					Y:2350743.461283	Y: 2350828.199056

3.2 INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

A continuación, se describe la información general de los contratos de obra e interventoria.

3.2.1 Datos generales del contrato de obra

En la siguiente tabla se muestran los datos generales del contrato de obra No. 26OO111B2860 DE 2026

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATISTA DE OBRA	
Contratista	CONSORCIO VIAL REGIONAL ANTIOQUIA 2026
Nit.	902036033-0
Representante Legal	ALBEIRO MONROY DONADO
Contrato de Obra No.	26OO111B2860 DE 2026
Objeto	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA INTERVENCION DE PUNTOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Fecha de suscripción del contrato	17/02/2026
Fecha del acta de inicio	23/06/2026
Valor del contrato	$ 11.869.263.725
Plazo inicial	12 MESES
Fecha de terminación	23/06/2027

3.2.2 Datos generales del contrato de Interventoria

En la siguiente tabla se muestran los datos generales del contrato de obra No. 26OO111B2860 DE 2026

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO LGI ITUANGO
Nit.	902061427-4
Representante Legal	BLANCA LILLYAM TABARES MESA
Contrato de interventoria No.	26SS111B2865 DE 2026
Objeto	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRÍNCIPE, DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"
Fecha de Suscripción	28/05/2026
Fecha del acta de inicio	23/06/2026
Valor del contrato	$ 1.512.855.363
Plazo inicial	13 MESES
Fecha de terminación	23/07/2027


3.3 Características técnicas del proyecto


La intervención de las vías busca mejorar la transitabilidad en las vías de los municipios beneficiados con la construccion de los puntos donde se presentó afectación con la perdida parcial de la banca, a continuación de numeran los sitios y cuáles son las actividades de que se ejecutaran.

- En la via 25AN11-1 Las Partidas a San José de la Montana -San Andrés de Cuerquia-Matanzas-Pescadero-Ituango, se presentan tres puntos de atención:


a) **PAP 2 en el K82+000:** En este punto la vía está compuesta por una calzada sencilla con una calzada bidireccional. En el punto se presenta perdida de banca, debido a la interrupción y colmatación del box coulvert existente el cual tiene una sección de 1,8m x 1,8m. De acuerdo con lo reportado en los chequeos técnicos el box coulvert es en concreto y se encuentra colmatado y estructuralmente fallado, Teniendo en cuenta las condiciones y con el fin de recuperar la calzada en este sector se ejecutarán las siguientes actividades:

- Estructura de pavimento en el área afectada

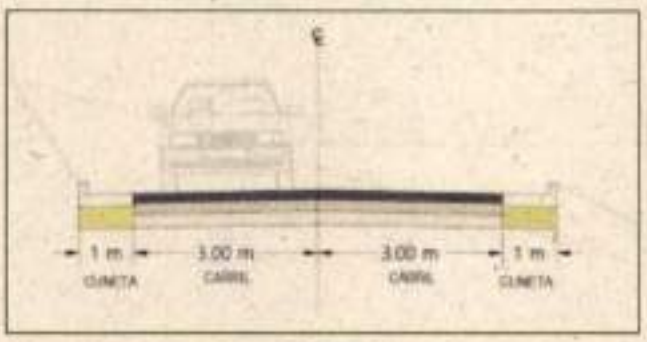


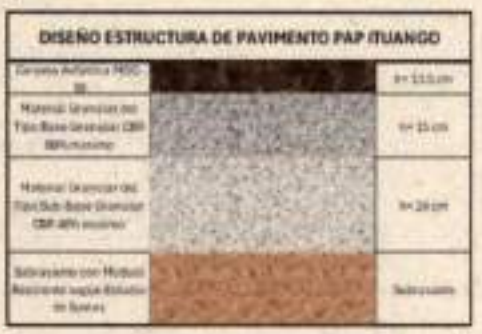


- Construccion de muros de contención en zapatas y pilas

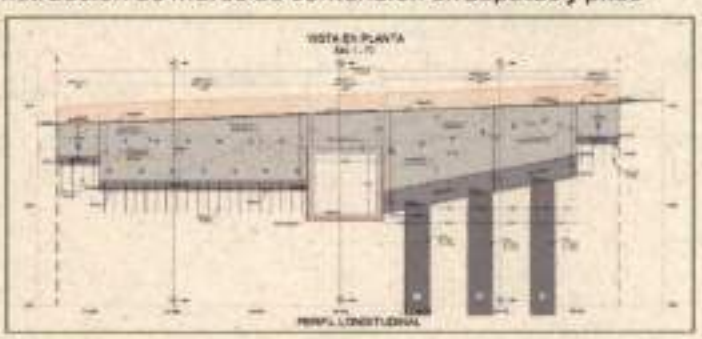


- Construccion de Box coulvert

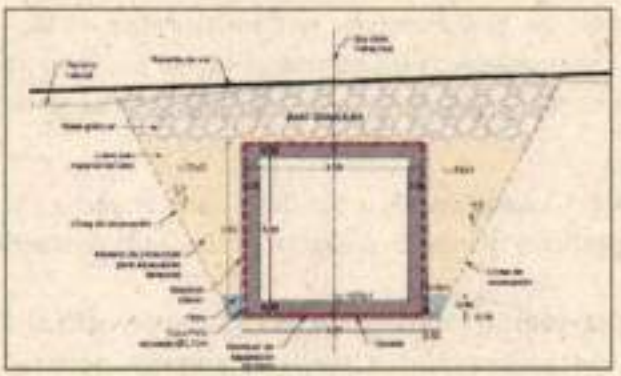


- Construccion de filtro francés e instalación de geodrén planar

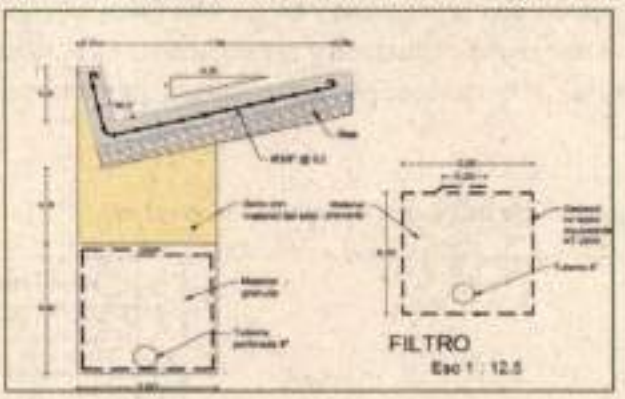


- Construccion de cuneta y canal cuneta

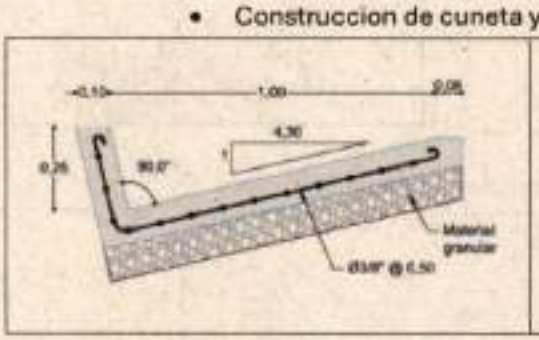

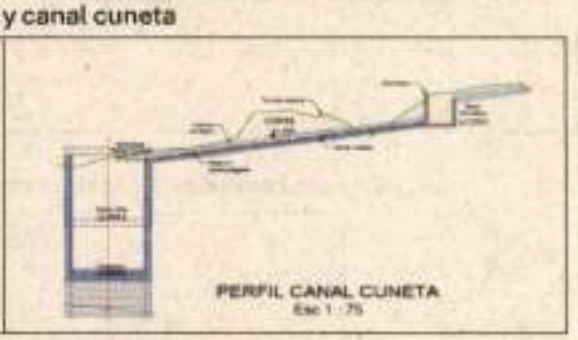

- Construccion de canal escalonado

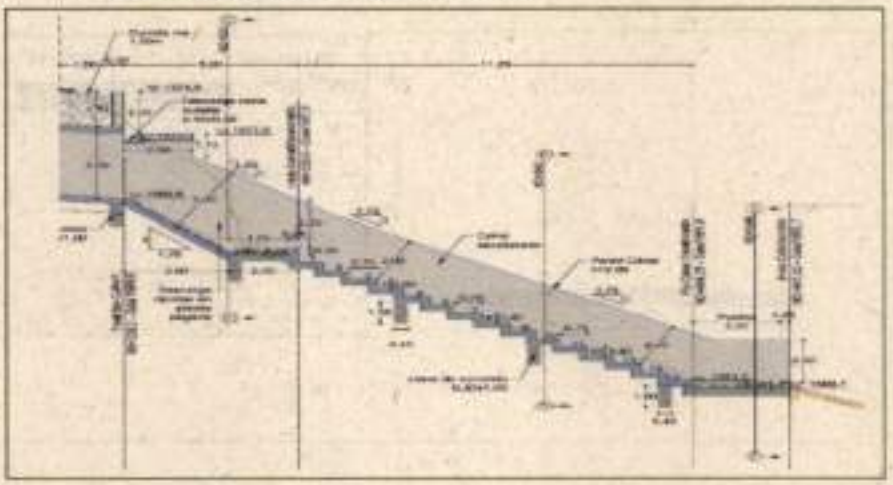


- Construccion de colchacreto




b) **PAP 3 en el K76+300**: En este punto la vía tiene una calzada sencilla, con calzada bidireccional. En este sitio se presentó una avenida torrencial que detonó la pérdida de la banca y sumado a esto la ausencia de obras hidráulicas para el manejo de aguas y escorrentía ha generado con el paso del tiempo procesos erosivos, carcavamiento, arrastre de material a lo largo de la ladera inferior y desconfinamiento lateral de la vía existente; Actualmente la vía no presenta carpeta asfáltica ni cuenta con cunetas laterales, sin embargo, se pueden apreciar algunos vestigios de la carpeta antigua, teniendo en cuenta lo anterior la consultoría en sus diseños, propones ejecutar las siguientes actividades:

- Construccion de la estructura de pavimento en el área afectada

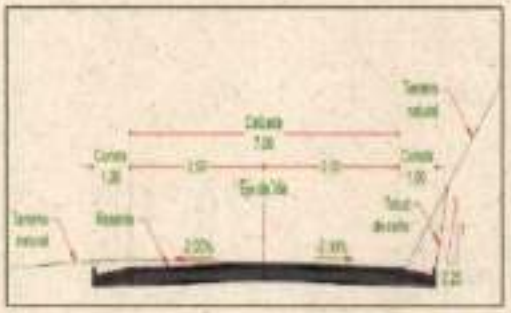





- Construccion de muros de contención en pilas

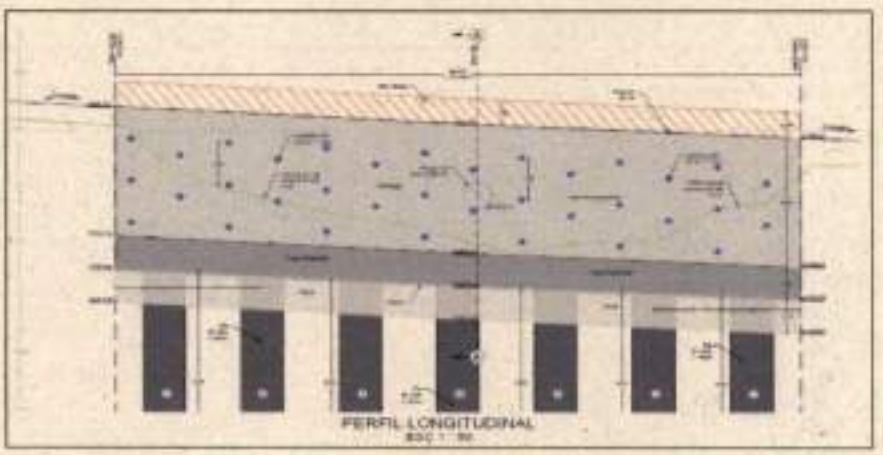


- Estabilización de talud con geomanto

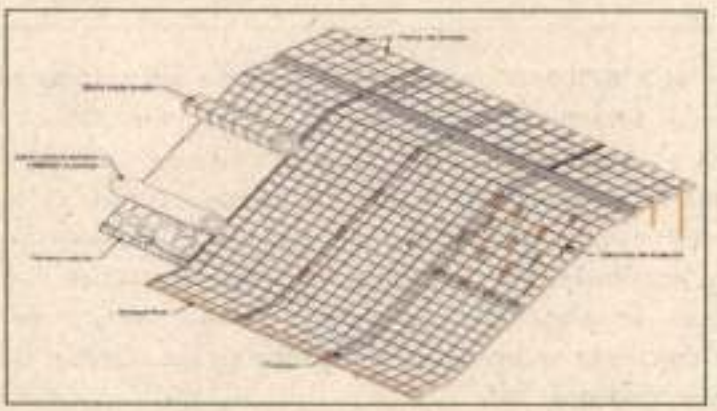


- Construccion de Box coulvert

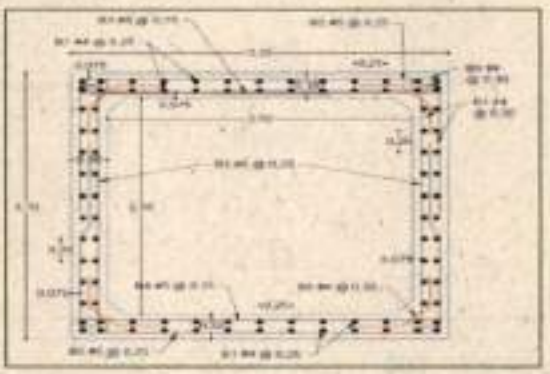


- Construccion de canal escalonado

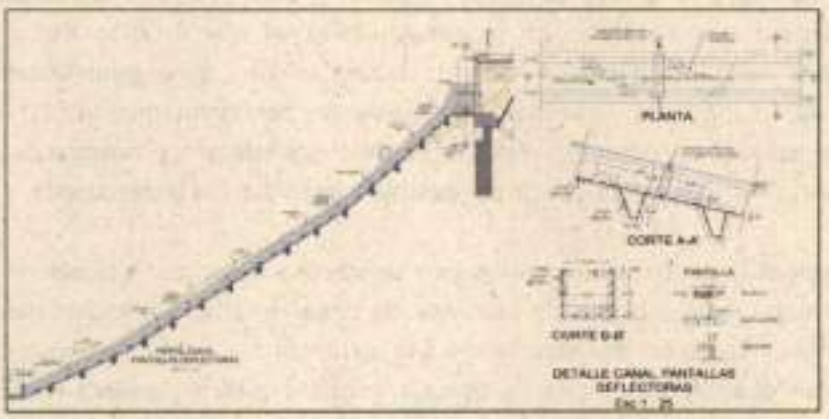

- Construccion de alcantarilla de 36"

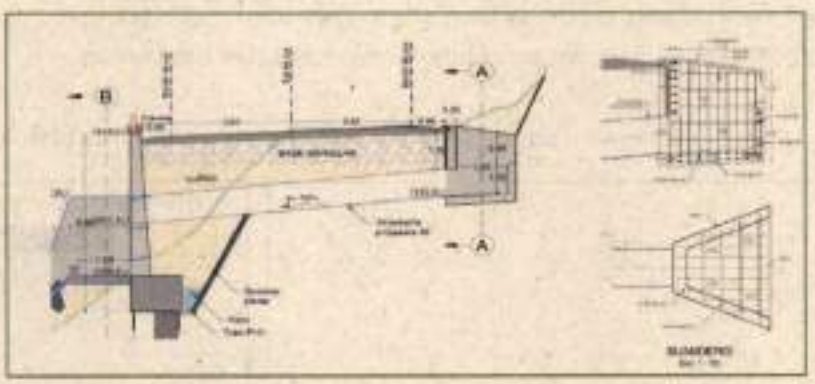


- Construccion de cuneta filtro

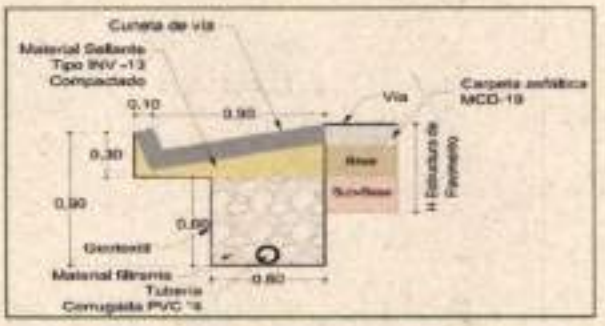

c) **PAP 4 en el K73+800: 73+800** En este punto de atención la vía es una calzada sencilla bidireccional que presenta un proceso de perdida de banca en la zona de la curva, se considera que este fallo se generó debido al taponamiento de las obras hidráulicas existentes, lo que detonó un proceso erosivo ya que el agua de escorrentía y de la vaguada caen directamente sobre la ladera inferior, generando arrastre continuo de material superficial, también se observa desconfinamiento lateral debido al desprendimiento y pérdida de las obras hidráulicas existentes, ademas de encontrar el box coulvert destruido por lo que no fue posible determinar las dimensiones.


En general la estructura de pavimento se observa deteriorada debido a que el agua de escorrentía fluye sobre la vía existente. Se observa también desconfinamiento lateral, y desprendimiento de material debido a la ausencia de obras hidráulicas como cunetas o canales, el agua fluye sobre la ladera inferior sin control y genera erosión y arrastre de materiales. Por otro lado, la ladera superior se observa estable y se identifican afloramientos de roca fracturada y moderadamente meteorizada; Teniendo en cuenta la problemática de este punto de atención el consultor indica las obras necesarias que se deben construir para garantizar la buena transitabilidad en el sector:

- Construccion de la estructura de pavimento en el área afectada

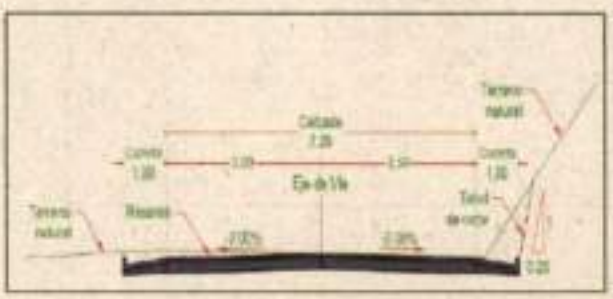





- Construccion de muros de contención en pilas y zapatas

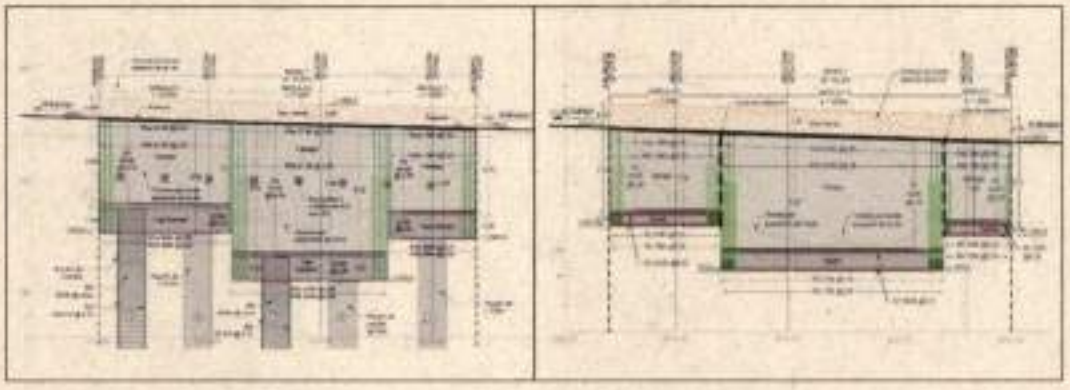

- Construccion de Box coulvert

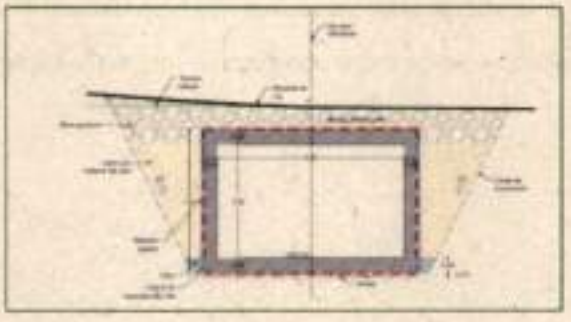


- Construccion de cuneta

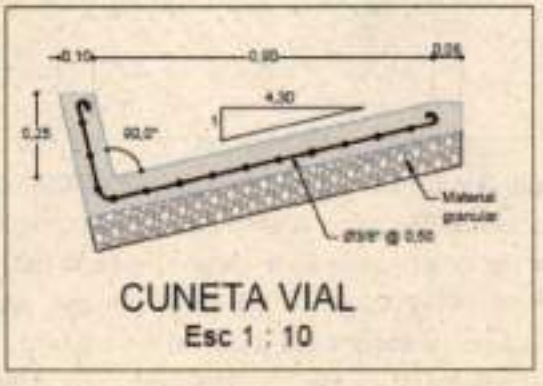


CUNETA VIAL
Esc 1 : 10

- Construccion de canal escalonado CDP

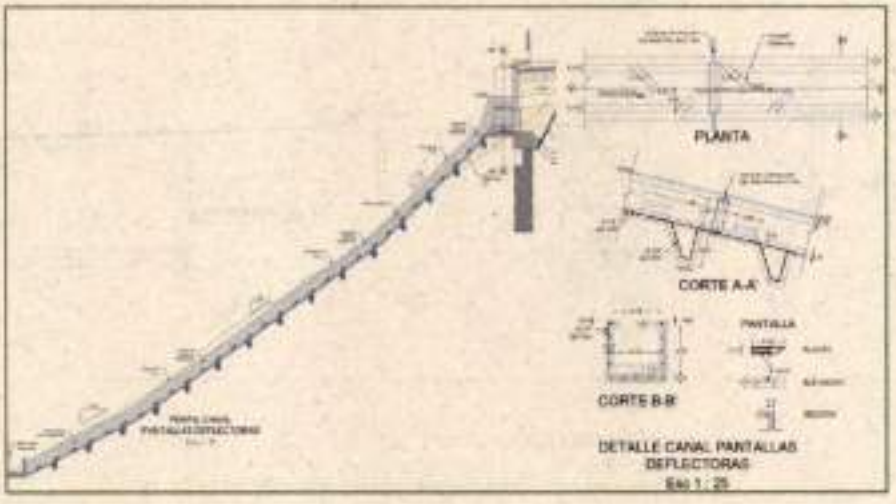


- Estabilización de talud con geomanto y malla triple torsión

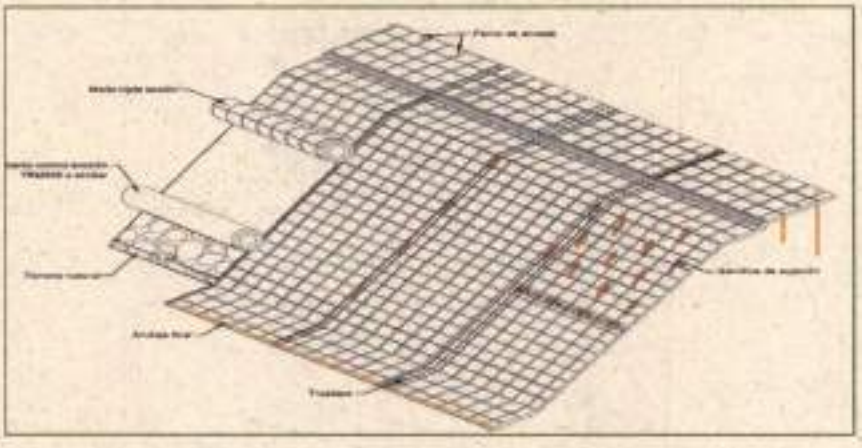


➢ (62AN21-1) Puente Gabino-Gómez Plata-El Guayabo-Carolina del Principe-La Herradura-Partidas de Guadalupe-Guadalupe (No incluye tramo urbano de Gómez Plata), esta vía está compuesta por una calzada sencilla con un carril bidireccional. Las afectaciones presentadas en el K41+900, de la vía corresponden principalmente a un manejo inadecuado de aguas de escorrentía procedentes de la ladera superior y a las pobres condiciones de drenaje a las que se encuentra expuesta la vía, las cuales configuraron la pérdida de banca progresiva en el tramo vial, así mismo, se presenta socavación en la banca a la salida de la alcantarilla. Teniendo en cuenta la afectación presentada el consultor propone realizar las siguientes estructuras:

- Construccion de la estructura de pavimento en el área afectada

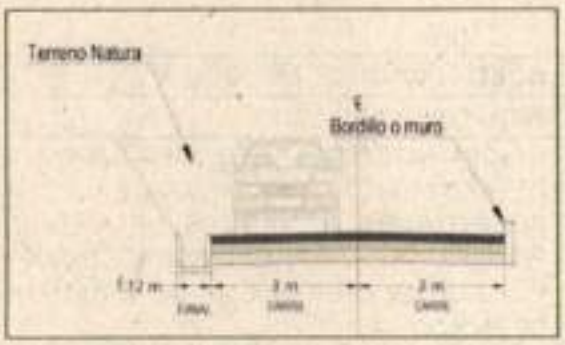




- Construccion de muros de contención en pilas

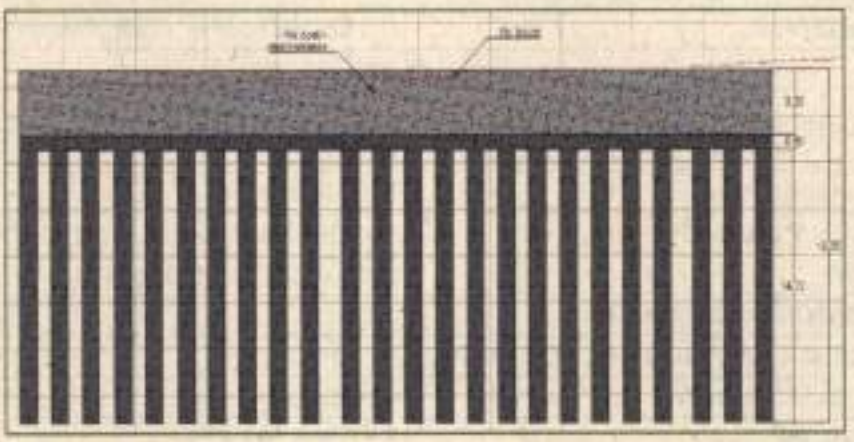

- Construccion de canal escalonado CDP

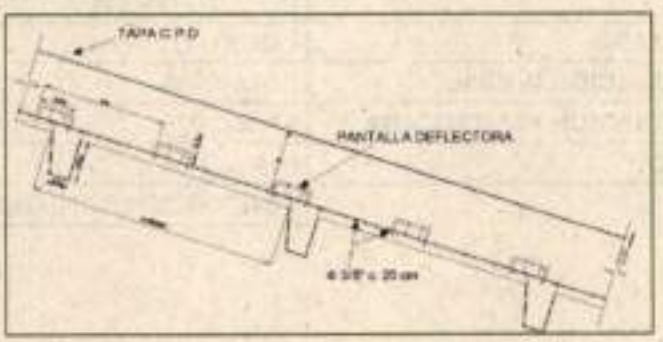

- Estabilización de talud con geomanto
- Construccion de alcantarilla de 36"

4. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

4.1 Información del contrato de obra

ENTIDAD CONTRATANTE	**GOBERNACION DE ANTIOQUIA**
No CONTRATO:	26OO111B2860 DE 2026
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA INTERVENCION DE PUNTOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PROCESO DE SELECCIÓN	LICITACION PUBLICA No. LIC-111B-05-2025
DATOS DEL CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL REGIONAL ANTIOQUIA 2026
Nit.	902.036.033-0
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	CONSTRUCIVIL SD SAS 90 %
	EDETEL SAS 10%
Representante Legal	ALBEIRO MONROY DONADO
DIRECCION Y CIUDAD	CARRERA 80A 32E 60 - MEDELLIN
TELEFONO	3023750360-3148944851
OTROS DATOS DE CONTACTO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	17/02/2026
FECHA DE INICIACIÓN	23/06/2026
VALOR INICIAL:	$ 11.869.263.725
VALOR ACTUALIZADO	$ 11.869.263.725
PLAZO INICIAL	DOCE (12) Meses
PLAZO ACTUALIZADO	DOCE (12) Meses
FECHA DETERMINACION INICIAL	23/06/2026
FECHA DETERMINACION ACTUALIZADA	23/06/2026
VALOR ANTICIPO	N/A
INTERVENTOR	CONSORCIO LGI ITUANGO

5.SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA

5.1 Descripción de actividades acumuladas

El 23 de junio de 2026 se emitió la orden de inicio tanto para la interventoria y el contratista, dándose inicio a la etapa de pre-construcción donde el contratita según los pliegos tiene 10 días para realizar observaciones a los diseños, para el corte de este informe no se había pronunciado en cuanto a los diseños, sin embargo, el contratista ya había realizado unas visitas en los puntos a intervenir tanto de Ituango como de carolina del príncipe donde realizo una verificación, encontrando diferencias en el PAP de carolina, debido a que la ubicación donde se va construir el muro de contención tiene diferencias de altura y largo, por lo que se decide iniciar por los puntos de atención prioritaria del frente de Ituango (PAP), mientras se constata con topografía la información del frente de carolina del príncipe.
En los PAP del frente de Ituango se inició con la rocería, replanteo y verificación del estado de los puntos a intervenir ¿, encontrando que se hace necesario un aprovechamiento forestal en dos de los tres puntos, por lo que se hace necesario la visita de las Profeionales ambientales y forestales de la entidad, el día 21 de julio de 2026 se hicieron presente tomando toda la información necesaria para realizar la solicitud ante CORANTIOQUIA.

Cabe anotar que los diseños con los que se esta ejecutando el contrato son los mismos de la licitación y estos están en formato PDF lo que dificulta un poco mas constatar los diseños iniciales con las condiciones actuales de los puntos a intervenir, sin embargo, desde la interventoria y el contratista se han puesto en contacto con los diseñadores de cada frente para que nos envíen los diseños en formato AutoCAD.

Frente de obra: Via (25AN11-1) Las Partidas a San José de la Montana -San Andrés de Cuerquia-Matanzas-Pescadero-Ituango

Durante este mes el contratista se desplazó para el frente de Ituango para realizar actividades preliminares como la consecución de campamentos y almacén, la búsqueda de las fuentes de materiales y personal

PAP 2: Se realiza localización y replanteo, la rocería y limpieza de las zonas verdes, se realiza la construccion e instalación de la señalización provisional del punto de atención.

PAP 3: Se realiza localización y replanteo, la rocería y limpieza de las zonas verdes, se realiza la construccion e instalación de la señalización provisional del punto de atención.

Frente de obra: via (62AN21-1) Puente Gabino-Gómez Plata-El Guayabo-Carolina del Príncipe-La Herradura-Partidas de Guadalupe-Guadalupe (No incluye tramo urbano de Gómez Plata)

En el frente de carolina no se han iniciado actividades, pero si se realizo un replanteo de la obra.

5.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

A continuación, se presenta el resumen general del estado en el cual se encuentra el proyecto y las actividades que se ejecutaron durante el periodo.

Frente de obra: Via (25AN11-1) Las Partidas a San José de la Montana -San Andrés de Cuerquia-Matanzas-Pescadero-Ituango

- ✓ Fabricación en obra de la señalización provisional, prevista en cada PMT.
- ✓ Localización Topográfica de las estructuras proyectadas en los PAPs 2 y 3 y su diseño geométrico de la vía.
- ✓ Desmonte y limpieza de zonas verdes existentes, incluyendo desenraice de setos existentes y rocería de arbustos. Esto, para PAPs 2 y 3.
- ✓ ubicación de campamentos y almacén
- ✓ Ubicación fuentes de material

- **Frente de obra: en el K41+900 de la via (62AN21-1) Puente Gabino-Gómez Plata-El Guayabo-Carolina del Principe-La Herradura-Partidas de Guadalupe-Guadalupe (No incluye tramo urbano de Gómez Plata)**

  - ✓ En esta via aún no se registran actividades, sin embargo, se realizaron labores de replanteo y localización.

5.3 Relación de actas de pago parciales, acumulados y saldos por ejecutar

ACTAS DE PAGOS PARCIALES, ACUMULADOS Y SALDOS POR EJECUTAR					
Fecha	**Concepto**	**Periodo de Cobro**	**Valor Facturado**	**Valor Neto a Pagar**	**Saldo**
25/07/2026	Acta No.1	Julio	$ -	$ -	$ 11.869.263.725
Valores Totales					$ 11.869.263.725

5.4 Control de programación y recursos

A continuación, se muestran los valores financieros programados y ejecutados durante el mes.

PERIODO	PROGRAMADO DEL MES	EJECUTADO DEL MES	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
Julio-26	$ 508.805.423	$ -	$ 508.805.423	$ -

5.5 Informe semanal

En la siguiente tabla se relacionan los informes semanales presentado

No. SEMANA	PERIODO
SEMANA 1	Del 20 al 27 de julio del 2026

NOTA: El acta de inicio se da el 23 de junio de 2026 y desde ese día hasta el 20 de julio el contratista se encuentra en el traslado hacia el punto de intervención en Ituango y se dedica a gestionar las ubicaciones de los campamentos y almacén, e inicia con la búsqueda del personal, por lo que no se presentan informes semanales hasta el 20 de julio que inicia con actividades preliminares.

5.6 Seguimiento a la curva S

Semana	Valor Programado Línea Base	Valor Reprogramación Línea Base	Avance Ejecutado	Facturado
S1-2026	$ -		$ -	$ -
S2-2026	$ -		$ -	$ -
S3-2026	$ -		$ -	$ -
S4-2026	$ 15.532.689		$ -	$ -
S5-2026	$ 224.037.053		$ 23.024.715	$ -
S6-2026	$ 508.805.423		$ 2.705.482	$ -



5.7 Control de estado general del tiempo

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DIRECCIÓN DE DESARROLLO FISICO
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CONSORCIO LGI

CONTRATO DE OBRA No: 2020[illegible] de 2020 — CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL REGIONAL ANTIOQUIA 2020

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-25 — PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA INTERVENCION DE PUNTOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2020[illegible] de 2020 — INTERVENTOR: CONSORCIO LGI ITUANGO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

(2MAT1-1) Las Partidas a San José de la Montaña -San Andrés de Cuerquía-Manzanos-Pescadero-Ituango

Clase de tiempo	DIAS DEL MES																													Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Seco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	192
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	192

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DIA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre Diego Restrepo Agudelo
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-29869 ANT

Firma
Nombre Luis Guillermo Silva Gaitana
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 81202-396230 CND

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DIRECCIÓN DE DESARROLLO FISICO
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CONSORCIO LGI

CONTRATO DE OBRA No: 2020[illegible] de 2020 — CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL REGIONAL ANTIOQUIA 2020

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-25 — PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA INTERVENCION DE PUNTOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2020[illegible] de 2020 — INTERVENTOR: CONSORCIO LGI ITUANGO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

(2MAT1-1) Las Partidas a San José de la Montaña -San Andrés de Cuerquía-Manzanos-Pescadero-Ituango

Clase de tiempo	DIAS DEL MES																														Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	19	24	24	24	0	0	0	0	0	0	504
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	509

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DIA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre Diego Restrepo Agudelo
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-29869 ANT

Firma
Nombre Luis Guillermo Silva Gaitana
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 81202-396230 CND

5.8 Control de maquinaria y equipo

Para el desarrollo de las actividades en obra son necesarios los siguientes equipos

- Retroexcavadora llanta
- Compactador Vibratorio Ingersoll Rand DD-110HF o equivalente
- Compactador tipo canguro o tipo rana
- Volquetas
- Vibrador de concreto a gasolina
- Compresor neumático
- Retroexcavadora oruga
- Bulldozer CAT D6H o similar
- Piloteadora
- Carrotanque agua
- Carrotanque irrigador o imprimador
- Compresor neumático (barrido y soplado)
- Motosierra a gasolina
- Mezcladora de trompo
- Mixer
- Equipo de oxicorte
- Planta de gasolina 110 volts/ 220 volts

Sin embargo, para el corte de este informe el contratista no dispone de maquinaria y equipo en obra teniendo en cuenta que aun no realizan actividades de construcción en ninguno de los PAP, se debe tener en cuenta que cumplieron con los compromisos contractuales con oficio CVRA-003-2026 OFICIO EQUIPOS_003_2026

5.9 Cumplimiento del personal profesional de obra

Cargo	Municipio	Cant	Dedicación	Plazo (meses)	Nombre y Apellidos	Cedula	Cumple (SI/NO)
Director de Obra	Ambos	1	100%	8	JOSE ORLANDO SUAREZ LONDOÑO	18.391.882	CUMPLE
Residente de Obra	Ituango	1	100%	8	LUIS GUILLERMO SILVA GALEANO	18.494.167	CUMPLE
Residente de Obra	Carolina	1	100%	6			
Residente Ambiental	Ambos	1	100%	8	CARLOS MARIO QUIROZ CARRERA	1.052.992.504	CUMPLE
Profesional SST	Ituango	1	100%	8	ANGELO ANDRES RUEDA SOTO	13.514.398	CUMPLE
Profesional SST	Carolina	1	100%	6			
Profesional Social	Ambos	1	100%	8	SEBASTIAN CASTAÑO LONDOÑO	1.097.404.962	CUMPLE
Tecnólogo en construcciones Civiles	Ituango	1	100%	8	JOHN JAIRO GRANADA VELEZ	89.001.153	CUMPLE
Tecnólogo SST	Ituango	1	100%	8			

5.10 Control aportes legales y seguridad social contrato de obra

Para la fecha de corte del presente informe, la interventoría por medio del área SST hizo el respectivo análisis y revisión a las afiliaciones del personal administrativo al Sistema de Seguridad Social Integral y la información fue consignada en el informe mensual de julio.

5.11 Resumen ensayos de laboratorio

A la fecha de corte del presente informe, no se ejecutaron actividades para realizar algún tipo de ensayo.

5.12 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

El pago de las actas que se generen en este contrato, serán pagadas con la apropiación presupuestal correspondiente al certificado de disponibilidad presupuestal No.3600004472 del 17 de abril del 2026 y RCP 4500066944, y los recursos están respaldados por el sistema general de la nación.

5.13 Seguimiento a las garantías de obra

Pólizas actualizadas al acta de inicio

Nombre de Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de expedición de la Garantía	Valor Amparo
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S. A	65-44-101248636 CUMPLIMIENTO	Cumplimiento del Contrato	23/06/2026	23/10/2027	06/08/2026	$ 2.373.852.745,00
		Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	23/06/2026	23/06/2030	06/08/2026	$ 1.186.926.372,00
		Estabilidad y Calidad de la Obra	23/06/2027	23/06/2032	06/08/2026	$ 2.373.852.745,00

Nombre de Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de expedición de la Garantía	Valor Amparo
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S. A	65-40-101087159 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Predios, Labores y Operaciones-PLO	23/06/2026	23/06/2027	06/08/2026	$ 593.463.186,25
		Daños emergentes y lucro cesante	23/06/2026	23/06/2027	06/08/2026	$ 593.463.187,25
		Perjuicios Extrapatrimoniales	23/06/2026	23/06/2027	06/08/2026	$ 593.463.186,25

5.14 Actas de comité de obra o actas de reunión

En la siguiente tabla se registran las diferentes reuniones y comités llevados a cabo durante el periodo

ACTADE DE COMITÉ /REUNION LEVANTADAS		
ACTA No.	**FECHA**	**TEMAS TRATADOS**
REUNION DE INICIO	11/06/2026	Se presentaron los equipos de trabajo del contratista la interventoria y la entidad, se habla del contrato y los alcances, se informa que las áreas socioambientales tendrán una reunión para hablar de los planes, Los documentos para la entrega al inicio de obra e interventoria, firma de actas de inicio de contratista e interventoria
COMITÉ DE OBRA No.1	23/06/2026	Se realiza la firma de las actas de inicio tanto de contratista como de interventoria, se habla de la verificación del muro del frente de carolina y si la el frente tiene cambios cuanto costara para ver si es necesario más recursos, el director de interventoria informa que las fechas en que tiene programado iniciar actividades en los PAP de Ituango, se establecen fechas de entrega de los informes mensuales y actas de cobro , se informa que deben realizar la radicación del PMT en la gerencia de seguridad vial
COMITÉ DE IBRA No.2	15/07/2026	Se habla del área sst y todo lo que se debe de aportar antes del ingreso del personal, se solicita al contratista cumplir con la dotación tanto para el personal operativo como para el administrativo, se solicita al contratista dar inicio al frente de carolina por que el único cambio que tiene diferencias es el muro de contención, se solicita al contratista la instalación de la señalización provisional de los PAP, se solicita a la entidad los planos en AutoCAD para realizar verificación de los puntos , se le solicita al contratista la necesidad del profesional SST el cual es indispensable para dar inicio a la ejecución de actividades

5.15 Copia de bitácora

Diariamente se llevará el registro de la bitácora de obra incluyendo condiciones climáticas, actividades realizadas, compromisos, dificultades, solicitudes, entre otros (se anexa registro del periodo de control).

5.16 Fuentes de materiales

Para el corte de este informe el contratista no ha entregado información de ninguna cantera para aprobación.

6. Seguimiento al plan de Gerencia

6.1 Definición y alineación de los objetivos

Objetivo General

Establecer los lineamientos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, sociales y operativos que permitan planificar, coordinar, dirigir, controlar y hacer seguimiento a la ejecución del contrato de obra cuyo objeto es el "Mejoramiento de la Red Vial de Segundo Orden mediante la Intervención de Puntos de Atención Prioritaria en los Municipios de Ituango y Carolina del Príncipe del Departamento de Antioquia", garantizando el cumplimiento de los alcances, especificaciones técnicas, plazos, costos y requisitos contractuales establecidos.

Objetivo especifico

- Coordinar integralmente los recursos humanos, técnicos, financieros y logísticos requeridos para la ejecución del proyecto.
- Garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requerimientos de la Interventoría y de la Entidad Contratante.
- Realizar seguimiento permanente al avance físico y financiero de las obras.
- Implementar mecanismos de control de calidad para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.
- Coordinar la ejecución de los componentes ambientales, sociales, de seguridad y salud en el trabajo y de manejo de tránsito.
- Identificar oportunamente riesgos que puedan afectar el desarrollo del contrato y establecer medidas preventivas y correctivas.
- Mantener una comunicación efectiva entre la Entidad Contratante, la Interventoría, las autoridades competentes y las comunidades del área de influencia.

CONCLUSION

El Programa de Gerencia constituye el instrumento de planificación, coordinación, dirección, seguimiento y control que permitirá al CONSORCIO VIAL REGIONAL ANTIOQUIA 2026 ejecutar de manera eficiente el contrato cuyo objeto es el "Mejoramiento de la Red Vial de Segundo Orden mediante la Intervención de Puntos de Atención Prioritaria en los Municipios de Ituango y Carolina del Príncipe del Departamento de Antioquia".

A través de este instrumento se establecen los lineamientos organizacionales, administrativos, técnicos, financieros, ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo necesarios para

garantizar una adecuada articulación entre los diferentes actores involucrados en el desarrollo contractual. Asimismo, permite definir responsabilidades, mecanismos de comunicación, procedimientos de control y estrategias de seguimiento orientadas al cumplimiento de los objetivos, metas, alcances, costos y plazos establecidos en el contrato.

La gestión de la dirección del proyecto se soporta en un equipo interdisciplinario conformado por profesionales especializados en las diferentes áreas de intervención, quienes tendrán la responsabilidad de liderar los procesos de planeación, gestión documental, control de calidad, gestión ambiental, gestión social, seguridad vial, seguridad y salud en el trabajo, programación, seguimiento financiero y coordinación técnica de las obras.

De igual manera, el plan contempla una etapa inicial orientada a la obtención de permisos, autorizaciones, aprobaciones y demás requisitos previos para el inicio de las actividades constructivas, destacándose la gestión de autorizaciones ambientales relacionadas con la ocupación de cauces, playas y lechos, así como la implementación de los planes de manejo ambiental, social, tránsito y SST, garantizando el cumplimiento de la normatividad aplicable y de los requerimientos de la Entidad Contratante y la Interventoría.

La estructura de seguimiento definida permitirá evaluar permanentemente el avance físico y financiero del proyecto, verificar el cumplimiento de los hitos programados, identificar oportunamente desviaciones y adoptar las acciones preventivas y correctivas que resulten necesarias para asegurar el logro de los resultados esperados

En consecuencia, el presente Plan de Gestión de la Dirección se constituye en una guía integral para la administración eficiente del contrato, orientada a garantizar la correcta utilización de los recursos humanos, técnicos, financieros, logísticos y ambientales, promoviendo la calidad de las obras, el cumplimiento de los compromisos contractuales y la entrega oportuna de las intervenciones, contribuyendo al fortalecimiento de la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo socioeconómico de las comunidades beneficiadas en los municipios de Ituango y Carolina del Príncipe, Departamento de Antioquia.

La interventoria teniendo en cuenta el plan de gerencia presentado por el consorcio Vial Regional Antioquia 2026, se le dará seguimiento de manera mensual, con el fin de garantizar que este se cumpla.

7. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

7.1 Datos del contrato de interventoria

A continuación, se describen los aspectos contractuales del contrato de interventoria

ENTIDAD CONTRATANTE	**GOBERNACION DE ANTIOQUIA**
No CONTRATO:	23SS111B1412
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRÍNCIPE, DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"
PROCESO DE SELECCIÓN	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO CON-111B-01-2023
DATOS DEL INTERVENTOR	
CONTRATISTA INTERVENTOR	CONSORCIO LGI ITUANGO
Nit.	902.061.427-4
Representante Legal	BLANCA LILLYAM TABARES MESA
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	LINEA GLOBAL INGENIERIA (50%)
	INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. (50%)
DIRECCION Y CIUDAD	Cra 43 a 1 sur 100 OF.1416 Edificio Sudameris
TELEFONO	604 3582274
OTROS DATOS DE CONTACTO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	28 DE MAYO DE 2026
VALOR INICIAL:	$ 1.512.855.363
VALOR ACTUALIZADO	$ 1.512.855.363
PLAZO INICIAL	TRECE (13) Meses
PLAZO ACTUALIZADO	TRECE (13) Meses
FECHA DE INICIACIÓN	23 DE JUNIO DE 2026
FECHA DETERMINACION INICIAL	23 DE JUNIO DE 2026
FECHA DETERMINACION ACTUALIZADA	23 DE JULIO DE 2027
VALOR ANTICIPO	N/A
SUPERVISOR	EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO

7.2 Acciones a seguir por parte de la interventoria durante la ejecución del proyecto

ACCIONES	OBSERVACIONES
Verificar de manera permanente que el contratista de obra cumpla con sus obligaciones y realice las obras y trabajos contratados en estricto cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas definidas y que las mismas cumplan con criterios de calidad.	Se verifica diariamente en campo durante el desarrollo de los trabajos en cada uno de los frentes del proyecto.
Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo y en lo relativo a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, así como de la verificación de implementación de un programa de salud y seguridad en el trabajo para el contrato de obra y del cumplimiento al Manual para contratistas en materia de SST del Departamento de Antioquia.	Se corrobora diariamente a través del área SST el cumplimiento de los protocolos e implementación de elementos de protección personal con el fin de velar con la seguridad y salud en el trabajo de todo el proyecto.
Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de la normatividad ambiental vigente y en especial a lo estipulado en la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015, la Resolución No. 472 de 2017 y las normas que los modifiquen, complementen o adicionen que rijan durante la vigencia del contrato de obra.	Se verifica cuando se requiera la utilización de una nueva cantera, la ubicación y el uso apto de los terrenos destinados como Zodme y en cada de uno de los recorridos en obra en conjunto se identifica todos aquellos permisos necesarios para el desarrollo de las actividades del proyecto.
Verificar que las personas que conforman el equipo del contratista de obra cumplan las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes o superiores según perfil requerido, cuando fuere necesario.	Se verifica durante la ejecución del proyecto, en el desarrollo de las responsabilidades de cada uno de los profesionales que componen el equipo del contratista de obra.
Verificar que el contratista de obra disponga de los materiales e insumos, recursos logísticos, herramientas, equipos y maquinaria necesarios para desarrollar el contrato de obra dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.	Se verifica diariamente en campo durante el desarrollo de los trabajos en cada uno de los frentes del proyecto sean acorde a las actividades previamente programadas.
Verificar los certificados de calidad, de origen y legalidad de los materiales empleados para la construcción de la obra por parte del contratista de obra.	Se verifica en el desarrollo de los informes mensuales como anexos a la verificación de los materiales implementamos en las actividades del proyecto y/o muestras de concreto necesarias para corroboración de su resistencia.
Verificar y medir en campo las cantidades ejecutadas por el contratista de obra y constatar todas las operaciones aritméticas que soportan las obras realmente ejecutadas.	Se verifica diariamente en campo durante el desarrollo de los trabajos en cada uno de los frentes del proyecto. Al igual de cortes semanales en conjunto.

ACCIONES	OBSERVACIONES
Controlar el avance del contrato de obra con base en el cronograma de ejecución aprobado y recomendar a la entidad contratante los ajustes a que haya lugar.	Se verifica mensualmente el cronograma de ejecución aprobado, comparando el progreso real con lo planificado y registrando cualquier desviación, dentro de los informes semanales y mensuales.
Emitir concepto técnico, cuando sea requerido, sobre los métodos utilizados por el contratista de obra en la ejecución del contrato y respecto a la revisión y/o calibración de los diseños, cuando proceda, antes de ser sometidos a la aprobación de la entidad para su aprobación.	Cuando se requiera o la obra lo amerite se emitirán conceptos técnicos a través del personal especializado que integra el equipo de interventoría.
Verificar que el contratista de obra mantenga el personal en condición de discapacidad según lo establecido en el Decreto 392 de 2018, cuando a ello haya lugar.	N/A, a la fecha no se tiene esta condición dentro de la obra.
Verificar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido por el contratista de obra dentro del proceso de selección en los plazos acordados con la Entidad Estatal.	Se verifica mensualmente la implementación del plan de Gerencia de Calidad para asegurar que se ajuste a los estándares especificados, cumpliendo con los requisitos técnicos y los plazos acordados con la Entidad
Elaborar y presentar conjuntamente con el contratista de obra la relación de las obras objeto de seguimiento post contractual en el formato definido por la Entidad Estatal.	Se verifica diariamente en campo durante el desarrollo de los trabajos en cada uno de los frentes del proyecto. Al igual de cortes semanales en conjunto.
Realizar la revisión oportuna y emitir concepto técnico, cuando sea requerido, sobre los estudios de suelos y recomendación de cimentación para estructuras de contención definidas en el documento "Obras de drenaje y protección para carreteras de la secretaria de infraestructura física de la Gobernación de Antioquia", así como respecto de los estudios y diseños específicos entregados y/o ajustes a los mismos realizados y presentados por el Contratista de Obra, necesarios para la correcta ejecución de las Obras,	Se realizará a través del personal profesional pertinente y capacitado según las condiciones y exigencias de la obra.
Verificar que el contratista de Obra cumpla con la señalización preventiva e informativa requerida según norma INVIAS, tanto en las vías con frentes de obra activos como en el resto de las vías que no se estén interviniendo y que presenten sitios con riesgo de accidentalidad (pérdidas de banca, derrumbes, obstáculos en la vía, entre otros).	Se verificará diariamente durante el desarrollo de las actividades que se cumpla con el PMT que fue aprobado previamente.
Presentar a la Entidad, el listado consolidado de obras ejecutadas, así como el consolidado de las vías mantenidas.	Se presenta semanalmente y mensualmente a través de informes correspondientes.
Diligenciar y llevar actualizado un diario de obra o bitácora, el cual deberá diligenciarse sin tachones y/o enmendaduras de los acontecimientos, sucesos y decisiones durante la ejecución del contrato y en el marco de las labores de	Se diligencia diariamente durante el desarrollo de las actividades y lleva una por cada uno de los frentes.

ACCIONES	OBSERVACIONES
vigilancia y seguimiento al contrato de obra. Así mismo, deberá registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto y demás acontecimientos. Deberá foliarse y firmarse por los Residentes de Obra e interventoría, así como por el Supervisor cuando éste visite el proyecto.	
Elaborar, conjuntamente con el Contratista, las actas de vecindad antes de iniciar cualquier actividad que lo requiera; las cuales deben contar con un registro fotográfico a color y con una resolución mínima de 300 ppp, detallando el estado actual y funcional del predio, para su posterior comparación al término de la obra.	Se realiza el respectivo acompañamiento cada vez que el proyecto lo requiera.
Verificar de manera periódica los imprevistos que efectivamente se causen durante la ejecución del contrato de obra, los cuales deberán estar debidamente acreditados por el contratista de obra, así como efectuar los descuentos respectivos por los imprevistos que no se causen en las respectivas actas de pago o al momento de la liquidación del contrato de obra.	Se realiza una verificación mediante un sistema de registro (Bitácora) y la información se consignará en el informe mensual.
Realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue al contratista de obra para la ejecución de las obras objeto de la interventoría	Se verifica durante el desarrollo de las actividades y socializan y se aprueban mediante comités o actas de obras.
Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable en el territorio colombiano en materia de Seguridad y salud en el trabajo, incluye los aspectos relacionados con pandemias y enfermedades endémicas, además de los eventos catastróficos de todo tipo.	Se da cumplimiento a la normatividad vigente a todo el tema relacionado con la seguridad y salud en el trabajo a través del área SST.
Suministrar las evidencias de gestión, así como los respectivos informes de esta en materia de seguridad y salud en el trabajo a la interventoría y entidad contratante cuando sea solicitado en virtud de exigencia técnica.	A través de informes mensuales y semanales se suministrarán evidencias de gestión relacionadas con el área de seguridad y salud en el trabajo.

7.3 Descripción de las actividades realizadas por el interventor

A continuación, se describen actividades generales realizadas por la interventoria, teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en la etapa de movilización y ubicación.

- ✓ Se formalizo la orden de inicio de interventoria el 23 de junio de 2026
- ✓ Se formalizo la orden de inicio del contratista el 23 de junio de 2026
- ✓ Se realiza revisión de los documentos de inicio como cronogramas de obra, revisión y aprobación de hojas de vida.
- ✓ Revisión y aprobación del PMT
- ✓ Revisión de los PMA, PMS y SST
- ✓ Revisión del Plan de gerencia
- ✓ Se realizan informes semanales

- ✓ Se realizan reuniones en la gobernación entre los profesionales socio ambientales
- ✓ Durante este periodo el contratista no tiene equipo disponible
- ✓ Se realiza el diligenciamiento de la bitácora de obra

- **(25AN11-1) Las Partidas a San José de la Montana -San Andrés de Cuerquia-Matanzas-Pescadero-Ituango**

  - ✓ Visitas de campo en compañía de la supervisión el 01 de julio y el 15 de julio de 2026
  - ✓ Se hace seguimiento en obra de todas las actividades realizadas por el contratista como rocería, e instalación de señalización provisional, replanteo de los puntos a intervenir

- **(62AN21-1) Puente Gabino-Gómez Plata-El Guayabo-Carolina del Príncipe-La Herradura-Partidas de Guadalupe-Guadalupe (No incluye tramo urbano de Gómez Plata)**

  - ✓ En este frente de obra aun no se inician actividades de obra

7.4 REGISTRO FOTOGRAFICO

Se anexa un registro fotográfico con el avance de las actividades ejecutadas durante el periodo del informe

7.5 Relación de equipos contrato de interventoria

- ❖ **Vehículos**

La interventoría cuenta con un vehículo para el desplazamiento en el frente de obra de Ituango, el cual es una Camioneta Chevrolet Equinox Premier de placa EPT 383 (Modelo 2018|) incluido peajes, conductor y combustible, con SOAT Vigente hasta 13-agosto-2025

- ❖ **Equipos de oficina**

La interventoría cuenta con una oficina en el municipio de Ituango y la cual está dotada así:

- ✓ Equipos de computación portátiles
- ✓ Equipos de impresión y escáner
- ✓ Dotación de la oficina

- ❖ **Sedes de la Interventoria**

- ✓ Oficina No. 1 se encuentra ubicada en el municipio de Ituango en la cra 21 Córdoba con calle 21 arias
- ✓ Una oficina Ubicada en la ciudad de Medellín en la cra 43ª N 1sur -100 ed. Sudameris

7.6 RELACION DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA

A continuación, se relacionan los profesionales de interventoria

CARGO	NOMBRE	INGRESO	RETIRO
DIRECTORA	LEIDY JOHANNA MORA VALENCIA	07/07/2026	N/A
INGENIERO RESIDENTE ITUANGO	DIEGO MARTÍN RESTREPO AGUDELO	01/07/2026	N/A
PROFESIONAL AMBIENTAL	MONICA LUCIA ESCOBAR LOPEZ	01/07/2026	N/A
PROFESIONAL SST	LUZ MARINA SANCHEZ ROJAS	01/07/2026	N/A
PROFESIONAL SOCIAL	JUAN FELIPE ALZATE GIRALDO	01/07/2026	N/A
TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES CIVILES	ABELARDO ANTONIO URIBE JIMENEZ	16/07/2026	N/A

7.7 Control de aportes legales y seguridad social del contrato de interventoria

En el acta de costos de interventoría correspondiente al mes de julio de 2026, se anexan pagos de la seguridad social del personal de interventoría, los cuales se han cumplido a cabalidad

7.8 Informe financiero y presupuestal contrato de interventoria

El pago de las actas de interventoria se realizará por la disponibilidad presupuestal estipulada em el RPC No.4500067002 del 28 de mayo de 2026 por valor de 1.512.855.363 y CDP del sistema general de regalías No. 3500056507 del 09 de diciembre de 2025 por valor de 1.516.772.225

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	23/06/2026	$ 1.512.855.363		$ -		$ 1.512.855.363	
Pago No.1 / Desembolso julio 2026							
TOTALES		$ 1.512.855.363	$ -	$ -	$ -	$ 1.512.855.363	$ -

7.9 Seguimiento a garantías del contrato de interventoria

pólizas actualizadas al acta de inicio:

La interventoria otorga a favor de la entidad las siguientes pólizas o garantías según los amparos de conformidad con lo establecido por el contrato

Nombre de Aseguradora	Nº Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de expedición de la Garantía	Valor Amparo
			Desde	Hasta		
Aseguradora solidaria de Colombia	520-47-994000056449 CUMPLIMIENTO	Cumplimiento del Contrato	23/06/2026	23/02/2027	07/07/2026	$ 302.571.072,60
		Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	23/06/2026	23/07/2030	07/07/2026	$ 347.956.733,49
		Calidad de Servicio	23/07/2027	23/07/2032	07/07/2026	$ 302.571.072,60

Nombre de Aseguradora	Nº Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de expedición de la Garantía	Valor Amparo
			Desde	Hasta		
Aseguradora solidaria de Colombia	520-74-994000026458 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Predios, Labores y Operaciones-PLO	22/06/2026	23/07/2027	07/07/2026	$ 350.181.000,00
		Contratistas y Subcontratistas	22/06/2026	23/07/2027	07/07/2026	$ 350.181.000,00
		Vehículos Propios y No Propios	22/06/2026	23/07/2027	07/07/2026	$ 350.181.000,00

8.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda al contratista agilizar con todas las actividades de preliminares y la entrega de documentación pendiente, ya que esta puede generar retrasos en las actividades principales.
- Se le recomienda al contratista tener en cuenta toda la normatividad vigente en el área SST, debido a que los puntos de intervención contemplan actividades de alto riesgo.
- Se le solicita al contratista tener presente las obligaciones contractuales para evitar algún tupo de sanción económica
- Se le recomienda al contratista garantizar durante la ejecución de la obra todo el personal necesario para su buen fin.
- Teniendo en cuenta que este mes es mas de traslado, ubicación, y consecución de personal, se le insiste al contratista aumentar esfuerzos para que inicien con las actividades y no se generen retrasos en la programación del contrato.

9. ANEXOS

- Anexo 1 - Copia de Bitácora
- Anexo 2 - Actas de comité de obra
- Anexo 3 - Copia Informes Semanales
- Anexo 4 - Registro Fotográfico
- Anexo 5 - Ensayos de laboratorio y Análisis
- Anexo 6 - Programación de obra
- Anexo 7 - Maquinaria y equipo de obra
- Anexo 8 - Estado del Tiempo
- Anexo 9 - Correspondencia enviada
- Anexo 10 - Correspondencia Recibida
- Anexo 11 – Acta de Interventoria
- Anexo 12 – Acta de obra

Anexo 1

Copia de Bitácora

CONTRATO DE OBRA Nº 2600133B2860 DE 2026

Objeto: Mejoramiento de la red vial a cargo del Departamento mediante la intervención de puntos de atención prioritaria en los municipios de Ituango y Carolina del Príncipe del departamento de Antioquia.

Contratista: Consorcio vial Regional Antioquia 2026
NIT 902036033-0
Fecha Inicio: 23 junio/2026
Fecha fin.: 23 junio/2027

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 2655133B2865 DE 2026

Objeto: Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental financiera y legal al contrato de mejoramiento de la red vial de segundo orden mediante la intervención de puntos de atención prioritaria en los municipios de Ituango y carolina del Príncipe del Departamento de Antioquia.


Contratista: Consorcio LGI Ituango
NIT: 902061427-4.
Fecha Inicio: 23 junio/2026
Fecha fin: 23 julio/2027

Vía: Partidas a San José de la montaña - San Andres de Cuerquia. - Matonzas - Pescadero - Ituango.

- DIRECTOR DE OBRA. José O. Suarez L -
- DIRECTORA DE INTERVENTORIA. -
- RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
- RESIDENTE DE OBRA.

(Luis G. Silva)

Powered by CamScanner

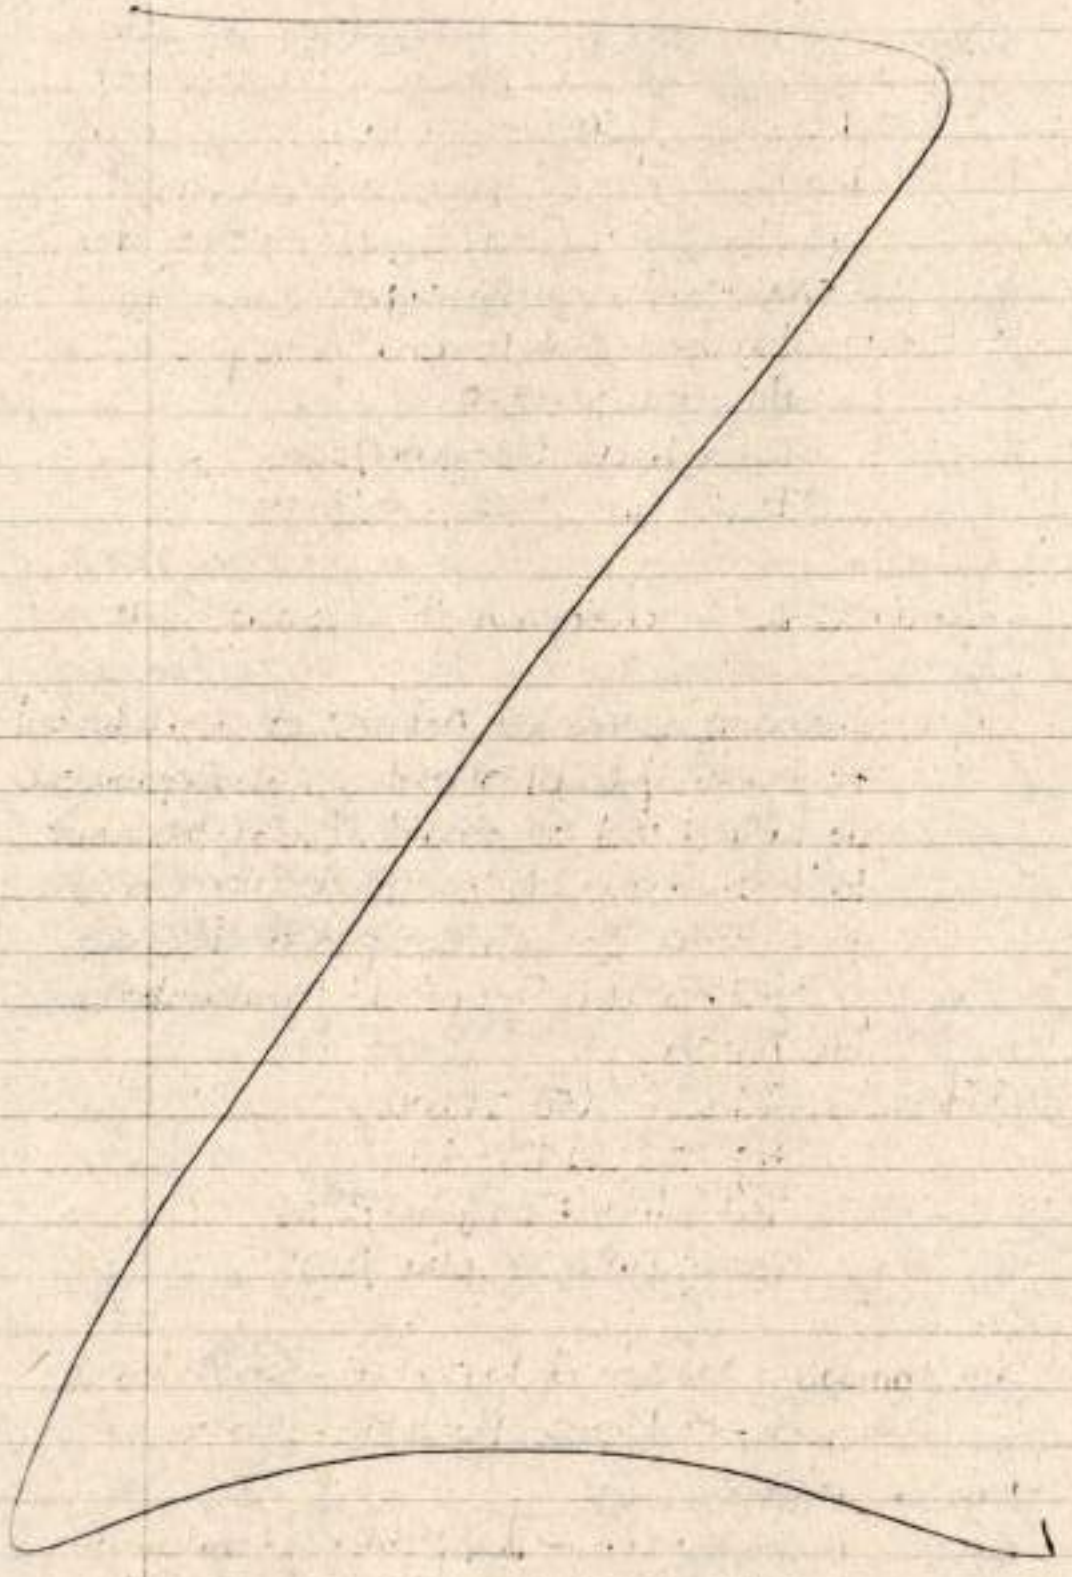

Junio 23-2026 (Martes)

Se realizo reunión en las instalaciones de la gobernación y se firman las actas de inicio de obra e interventoria, en la reunion estuvieron presentes por parte de la entidad contratante el director de Infraestructura el señor Juan Diego Aguirre y el supervisor Eduardo Alfonso Herrera., Por parte de interventoria la Representante Legal Blanca Lilyam Tobares y la directora Johanna Maria Valencia, Por el contratista el Ing Jorge Andres Arieta, el director Jose Orlando Suarez, el profesional Saul Sebastian Gustavo Londoño y el topografo Alejandro Bendon en esta reunión se trataron ademas temas Como el estado actual de los puntos a intervenir tanto de Cordino del principe, como de Huango; se deja acta de reunion.

Lady Tatiana Ospina
Directora Interventora.

Julio 01/2026 - (Miercoles).
Se realiza reunión en las instalaciones de la gobernación con los profesionales Ambientales y Sociales donde se dan indicaciones claras. Sobre como se debe manejar cada area, el tiempo de entrega de informes y los formatos que deben de anexar con cada informe; se deja acta de la reunión.

Lady Tatiana Ospina
Directora Interv.

Nota 1: 23 junio se realizo mesa de trabajo entre Interventoria y Contratista para revision de documentacion enviada.
Nota 2: 26 de junio envian programación y se le realizan observaciones.

Powered by CamScanner

Nota 3: 02 julio Se realizo mesa de trabajo para revisar la programacion entre interventoria y Contratista
Directora Interventoria

Julio 02/2026 Jueves
Clima: Soleado
Personal en obra: Director, Residente de obra, Tecnologo, Conductor.
Actividades: Se realizan actividades de ubicación del contratista en el frente de Hoango
Equipo y maquinaria: Camioneta
Directora Interv.

Julio 03/2026 Viernes
Clima: Soleado
Personal en obra: Director, Residente de obra, tecnologo, Conductor
Actividades: Continuan las actividades de Ubicación del contratista para el personal y Almacen.
Equipo y maquinaria: Camioneta
Directora de Interventoria.

Julio 04/2026 Sabado
Clima: Soleado
Personal en obra: Director, Residente de obra, tecnologo, Conductor
Actividades: Continuan en actividades de ubicación para el personal y el equipo del contratista
Equipo y maquinaria: Camioneta
Directora Interv

Julio 05/2026 Domingo
No se labora

Julio 06/2026 lunes
Clima: Soleado
Personal en obra: Director, Residente de obra, tecnólogo civil, Conductor.
Actividades: Continuan en actividades para la ubicación del personal y el equipo del contratista
Equipo y maquinaria: Camioneta.
Judy Yohanna Ruiz
directora Interventoría

Julio 07/2026 Martes
Clima: Soleado
Personal en obra: Director, Residente de obra, tecnólogo civil, Conductor, (~~propietario~~ Asesor)
Actividades: Se continua con las actividades para la ubicación del personal y para el equipo de obra, Se realiza una reunión corta entre contratista e Interventoría donde se le recuerda al director los pendientes del area administrativa y que son contractuales, se solicita la entrega lo mas pronto posible.
Judy Yohanna Ruiz.
Directora de Interventoría

Julio 08/2026 Miercoles
Clima: Soleado
Personal en obra: Director, Residente de obra, tecnólogo civil, Conductor.
Actividades: Se continua con la ubicación del personal de obra, se inicia con la identificación de los puntos a intervenir.
Equipo y maquinaria: Camioneta.
Judy Yohanna Ruiz
directora Interventoría

Julio 09/2026 Jueves.
Clima: Soleado

Powered by CamScanner

Personal en obra: Director, Residente de obra, tecnologo civil, Conductor.
Actividades: Se continua realizando actividades para la ubicacion del personal y equipo, se encuentran en la busqueda del personal operativo y ajustando los documentos que aun tienen pendientes por entrega a Interventoria.
Equipo y maquinaria: Camioneta.
Judy Yolanda Ruiz
Directora Interventoria.

Julio 10/2026 Viernes.
Clima: Soleado
Personal de obra: Director, Residente de obra tecnologo, Civil, Conductor.
Equipo y maquinaria.: Camioneta,,
Actividades: Continuan con la Ubicación e instalación del personal de obra, Continuan con la busqueda del personal operativo, envio de programación de obra con sus respectivos apoyos
Judy Yolanda Ruiz
Directora Interventoria.

Julio 11/2026 Sabado.
Personal de obra: Director, Residente de obra tecnologo Civil, Conductor
Clima: Soleado.
Equipo y Maquinaria: Camioneta
Actividades: Continuan con la instalación de Campamentos y Almacen para el personal y equipos.
Judy Yolanda Ruiz
directora Interventora

Julio 12/2026 Domingo
No se ejecutan Actividades.
Judy Yolanda Ruiz

Julio 13/2026 Lunes festivo
No se registran Actividades
Directora Interventoría.

Julio 14/2026 Martes
Clima: Soleado
Personal en obra: Director de obra, tecnólogo civil, Conductor, Topografo, 1 oficial, 2ayudantes
Residente Ambiental
Equipo y maquinaria: Camioneta, Estacion total, nivel, trompo de topografia.
Actividades: Se realiza rocería en PAP2, Localización topografica, fabricación de señalización provisional continuan con la instalación de personal y campamentos
Directora Interv.

Miércoles 15 de Julio de 2026
Estado del tiempo: M: Seco T: Seco N: Seco
PERSONAL EN OBRA:
- INTERVENTORIA: 1 Ing. - Directora de Interventoría, 1 Ing. Residente, 1 Ing. Residente Ambiental 1, Profesional Social, 1 Profesional SST.
- OBRA: 1 Ing Director de obra, 1 Ing. Residente, 1 Ing Profesional Ambiental, 1 Profesional Social, 1 Tecnólogo de obras civiles, 1 conductor, 1 Topógrafo, 1 oficial y 2 ayudantes.

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: 1 camioneta de Estacas y 1 Equipo completo de Topografía.

ACTIVIDADES DE OBRA:
- Trabajos de Rocería y desmonte en PAP2 y PAP3
- Localización y Replanteo topográfico en PAP2
- Fabricación de señalización provisional para PAP3
- Vinculación de personal operativo y profesional.

Powered by CamScanner

• Instalacion de Campamentos e instalaciones provisionales

OTROS:

• Se efectua en la localidad, el comité técnico de obra N.2 Con presencia del Ing. Supervisor del contrato de Interventoria por parte de la secretaria de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia. Los asistentes, Temas tratados, y Compromisos pactados, se encuentran consignados en el acta de comite N.2 llevado a cabo en este dia.

• Se efectua la instalación y alojamiento del personal profesional de la Interventoria en Casa cercana al parque central del Municipio de Ituango. Acá se ubicará tambien las oficinas de la Interventoria de la obra.

Ing. J. Rodas A.
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

ING. DIRECTOR DE OBRA.

Jueves 16 de Julio de 2026.

Estado del tiempo M: Seca, T: Seca, N: Seca.

PERSONAL EN OBRA:

- Por Interventoria: 1 Ing. Director, 1 Ing. Residente, 1 Ing Residente Ambiental, 1 Profesional Social, 1 Profesional SST y 1 Tecnólogo en construcciones civiles.
- Por Contratista de obra: 1 Ing. Director, 1 Ing. Residente, 1 Tecnólogo en construcciones civiles, 1 Ingeniero Residente Ambiental, 1 Profesional Social, 1 profesional administrativo, 1 Topógrafo, 2 Maestros, 2 Oficiales, y 2 Ayudantes.

MAQUINARIA Y/O EQUIPO: 1 camioneta de Estacas y 1 Equipo completo de topografia.

ACTIVIDADES DE OBRA:

• Trabajos de Rocería desmonte y limpieza en PAP2 y PAP3
• Localización y replanteo topográfico en PAP2 y PAP3
• Fabricación de señalización provisional para PMT8
• Instalación de campamentos e instalaciones provisionales
• Funciones administrativas para el proceso de afilación y

Powered by CamScanner

Vinculacion del personal profesional y operativo de obra.

Diego Rodriguez A.
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. DIRECTOR DE OBRA.

Viernes 17 de Julio de 2026.
Estado del Tiempo M: Seca T: Seca N: Lloviznas

PERSONAL EN OBRA:

- Por Interventoria: 1 Ing. Director, 1 Ing. Residente, 1 Ing. Residente Ambiental, 1 profesional Social, 1 profesional SST, y 1 Tecnólogo en Construcciones civiles
- Por Contratista de Obra: 1 Ing. Director, 1 Ing. Residente, 1 Tecnólogo en construcciones civiles, 1 Ing. Residente Ambiental, 1 profesional Social, 1 profesional Administrativo, 1 Topógrafo, 2 Maestros de obra, 2 oficiales y 2 Ayudantes.

MAQUINARIA Y/O EQUIPO: 1 Camioneta de Estacas, 1 Equipo completo de topografia.

ACTIVIDADES DE OBRA:

- Trabajos de Rocería desmonte y limpieza en PAP3.
- Localización y replanteo topográfico en PAP3.
- Fabricación en obra de señalización provisional para PAP6
- Instalacion de campamentos e instalaciones provisionales y adecuaciones previas a la ejecucion de las obras
- Adelanto al proceso administrativo de afiliaciones y vinculación del personal administrativo y operativo de obra.

OTRAS:

AREA AMBIENTAL: Se realizo recorrido con el contratista de obra Consorcio vial Regional 2026, con el objetivo de identificar y planificar los medios ambientales requeridos en obra. Mesa de trabajo con el profesional ambiental residente, con el objetivo de socializar las observaciones realizadas al plan de Manejo ambiental y socializar los formatos ambientales en general.

AREA: SOCIAL: Recepcion y revisión de piezas informativas y devolucion para ajustes. Felipe to

Powered by CamScanner

COMPONENTE SST: No se evidencia la presencia en obra del profesional SST encargado de mitigar los riesgos y peligros, como tampoco se cuenta con los documentos de ingreso del personal que esta ejecutando labores, no hay PMT instalado, no se autorizan labores por parte de la interventoría.

Ing. Residente de Interventoría

Ing. Director de Obra

Sábado 18 de Julio de 2026.
Estado del tiempo: M: Seca T: Lloviznas N: Lloviznas
PERSONAL EN OBRA:
- Por Interventoría: 1 Director, 1 Ing. Residente, 1 Ing. Profesional Residente Ambiental, 1 profesional Social, 1 Profesional SST y 1 Tecnólogo en construcciones civiles.
- Por Contratista de obra: 1 Director, 1 Ing. Residente, 1 Tecnólogo en construcciones civiles, 1 Ing. Residente Ambiental, 1 Profesional Social, 1, Profesional administrativo, 1 topografo, 2 Maestros de obra, 2 oficiales y 2 ayudantes

MAQUINARIA Y/O EQUIPO: 1 Camioneta de estacas y 1 equipo completo de topografía.

ACTIVIDADES DE OBRA:
- Trabajos de Rocería desmonte y limpieza en PAP3.
- localización y replanteo topográfico en PAP3.
- Fabricación en obra de señalización provisional para PMTs
- Instalación de campamentos e instalaciones provisionales y adecuaciones previas a la ejecución de las obras.
- Continua el proceso administrativo de afiliaciones y vinculación del personal Administrativo y operativo de obra.

OTRAS:
AREA AMBIENTAL:
Recorrido por los puntos de atención prioritaria P-A-P numero 2, 3 y 4, con el objetivo de revisar el estado de la flora existente en cada uno de ellos y solicitar al constructor Corredor Vial Regional 2026, su protección

Powered by CamScanner

AREA SOCIAL: Recorrido por los PAP y reunion con el profesional social del contratista donde se recuerda sobre todos los preliminares de obra y el PMS. Felipe A.
AREA SST: Se realiza recorrido por los P.A.P no hay profesional SST, no se cuenta con los documentos de ingreso, no hay PAUT, se recomienda no hacer actividades en obra sin SST

Ing. Residente de Interventoria. Ing. Director de obra

DOMINGO 19 de Julio de 2026 FESTIVO
Estado del tiempo: M: Nublado T: Nublado N: Lloviznas
No se realiza ninguna actividad de obra física por ser día festivo.

Ing. Residente de Interventoria Ing. Director de obra.

LUNES 20 de Julio de 2026 FESTIVO
Estado del tiempo M: Seco T: Seco N: Seco
No se realiza ninguna actividad de obra física por ser día festivo.

Ing. Residente de Interventoria Ing. Director de Obra

MARTES 21 de Julio de 2026
Estado del tiempo M: Seco T: Seco N: Seco
PERSONAL EN OBRA:
- Por interventoria: 1 Ing Directora, 1 Ing Residente, 1 Ing Profesional Residente Ambiental, 1 Profesional Social, 1 Profesional SST y 1 Tecnólogo en construcciones civiles.
- Por Contratista de obra: 1 Ing Director, 1 Ing Residente, 1 Tecnólogo en construcciones civil

Powered by CamScanner

1 Ing. Residente Ambiental, 1 Profesional Social, 1 Profesional Administrativo, 1 Topografo, 2 Maestros de Obra, 2 oficiales, y 2 ayudantes.

MAQUINARIA Y/O EQUIPO: 1 Camioneta de Estacas y 1 Equipo completo de topografia.

ACTIVIDADES DE OBRA:

- Rocería desmonte y limpieza en PAP3.
- Localización y replanteo topográfico en PAP3
- Fabricación en obra de señalización provisional para PMTs
- Continúa el proceso administrativo de afiliaciones y vinculacion de personal Administrativo y operativo de obra

OTRAS:

- La Interventoria envia al contratista de obra, el comunicado CON-LGI 014 en el cual se hacen unas solicitudes o requerimientos de tipo técnico previas a la ejecución de los trabajos.
- La Interventoria envia al Contratista de obra, el comunicado CON-LGI-015 en el cual se hacen varias solicitudes o requerimientos de tipo SST, en relación con la entrega de la documentación del personal y del cumplimiento de la normatividad y reglamento en la materia.
- La Interventoria envia al contratista de obra, el comunicado CON-LGI-013 en el cual se le solicita dar respuesta a los requerimientos y documentos de tipo administrativo, exigidos contractualmente.
- La Interventoria envia al contratista de obra, correo electrónico en el cual se les hace varios requerimientos para trabajo de alto riesgo.
- La Interventoria envio a la profesional de apoyo de la Supervisión social de la gobernación de Antioquia, los diseños de las piezas informativas y de socialización.
- La Interventoria recibe del contratista de obra el comunicado CVRA-009 suministrando para aprobación los diseños de las piezas informativas y de socialización.

Powered by CamScanner

- La Interventoria recibe del Contratista de obra el comunicado CVRA-010 en el cual remite para aprobación las actas de entorno de los PAIS de Ituango.

AREA AMBIENTAL:
Seguimiento al estado de los nidos de los pajaros guluntos, identificados en los individuos arbóreos de la especie Cobanero, existentes en el PAP 4 y solicitud al contratista de obra Consorcio Vial regional 2026, su protección.
AREA SOCIAL: Reunion de los profesionales sociales de Interventoria y Gobernación. Requerimiento al contratista de ajuste al PMO. y a las piezas informativas. Felipe A.
AREA SST: Se solicita la presencia del profesional SST en obra, no se cuenta con los documentos del personal, no se tiene autorizado ningun vehiculo o motocicleta para prestar servicio al personal se requiere de acciones de mejora. SST

Ing. Residente Interventoria Ing. Director de Obra.

MIERCOLES 22 de Julio de 2026.
Estado del tiempo: M: Seca, T: Seca, N: Lluviosas.
PERSONAL EN OBRA:
- Por Interventoria: 1 Ing. Directora, 1 Ing. Residente, 1 Ing. profesional Residente Ambiental, 1 Profesional Social, 1 Profesional SST, 1 Tecnólogo en construcciones civiles.
- Por Contratista de obra: 1 Ing. Director, 1 Ing. Residente, 1 Tecnólogo en construcciones civiles, 1 Ingeniero Residente Ambiental, 1 Profesional Social, 1 profesional Administrativo, 1 Topógrafo, 2 Maestros de obra, 2 oficiales, 14. 2 ayudantes.

MAQUINARIA Y/O EQUIPO: 1 Camioneta de Estacas, 1 Equipo completo de Topografia.
ACTIVIDADES DE OBRA:
- Se hace limpieza de cuneta para ampliación de la banca en PAIS. Se conforma zona para su ampliación.
- Fabricación en obra de señales provisionales para PAIS

Powered by CamScanner

- Continúa el proceso administrativo para afiliaciones y vinculación de personal administrativo y operativo y la adquisición de recursos para la ejecución de la obra.

OTRAS:

- La Interventoría envía a la Secretaría de Infraestructura física de la Gobernación de Antioquia el comunicado CON-LGI-019 en el cual solicita con su justificación, la permanencia en obra de la comisión de Topografía por el tiempo de ejecución de los trabajos.

AREA AMBIENTAL:
Solicitud al contratista de obra Consorcio vial Regional 2026, a través de recorrido por los P. AP número 2, 3 y 4, la instalación de unidades sanitarios y los puntos ecológicos.

AREA SOCIAL: Requerimiento de Presentación de reunión de inicio de obra y pieza de invitación a la misma y gestión del lugar para dicha reunión Felipe F.

AREA SST: Se informa al contratista la preocupación de la ausencia del profesional SST y la falta de orden e interés en radicar documentos del personal, no se autorizan labores hasta no contar con los requerimientos, falta SST

Diego Restrepo A
Ing. Residente de Interventoría

ING. DIRECTOR DE OBRA

JUEVES 23 de Julio de 2026
Estado del Tiempo: M: Seca T: Seca N: Seca
PERSONAL EN OBRA:
- Por Interventoría: 1 Ing. Director, 1 Ing. Residente, 1 Ing. Profesional Residente Ambiental, 1 Profesional Social, 1 Profesional SST y 1 Tecnólogo en construcciones civiles
- Por Contratista de obra: 1 Ing. Director, 1 Ing. Residente, 1 tecnólogo en construcciones civiles, 1 Ing. Residente Ambiental, 1 Profesional Social, 1 Profesional Administrativo, 2 Maestros de obra, 2 Oficiales y 3 Ayudantes.

MAQUINARIA Y/O EQUIPO: 1 Camioneta de Estacas, 1 Equipo

Powered by CamScanner

completo de topografía.

ACTIVIDADES DE OBRA

- Termina la limpieza y conformación en el sector de la cuneta para ampliación de la banca y mejoramiento de la curva para brindar mayor seguridad vial a la salida del tramo PAT3
- Fabricación en obra de señalización provisional para PITS.
- Continúa el proceso administrativo para afiliaciones y vinculaciones del personal administrativo y operativo y la adquisición de recorses para la ejecución de las obras.

OTRAS:

AREA AMBIENTAL:

Acercamiento con la Empresa de Servicios públicos Domiciliarios del municipio de Ibagué S.A.E.S.P "Servitolima", con el objetivo de conocer los días de recolección de los residuos sólidos en la cabecera municipal, con el objetivo de programar la entrega de los generados en la oficina de la interventoría Consorcio Ucitolima;

AREA SOCIAL: Requerimiento de difusión de lugar para la recepción de hojas de vida para trabajadores en la obra. Posible utilización de carteleras municipales

AREA SST: Se requiere del 0% presencia del profesional SST, Se solicitan documentos de ingreso, Señalización de peligro, personal sin inducción y entrega de dotación, inspecciones y demas actividades SST

SST

Ing. Residente A
Ing. RESIDENTE INTERVENTORIA

ING. DIRECTOR DE OBRA.

VIERNES 24 de Julio de 2026.

Estado del Tiempo: M: Seca T: Seca N: Seca.

PERSONAL EN OBRA:

- Por Interventoria: 1 Ing Directora, 1 Ing. Residente, 1 Ing. Profesional Residente Ambiental, 1 Profesional Social, 1 Profesional SST y 1 Tecnólogo en Construcciones civiles.

Powered by CamScanner

-Por Contratista de obra: 1 Ing. Director, 1 Ing. Residente, 1 Tecnólogo en construcciones civiles, 1 Ing. Residente Ambiental, 1 Profesional Social, 1 Profesional Administrativo, 1 Topografo, 2 Maestros de obra, 2 Oficiales y 2 Ayudantes.

ACTIVIDADES DE OBRA:

- Fabricación en obra de la señalización provisional para PMT.
- Continua el proceso administrativo de afiliaciones y vinculación del personal administrativo y operativo y la adquisición de recursos para la ejecución de las obras.

OTRAS:

AREA AMBIENTAL: Socialización del procedimiento a seguir, con relación a los individuos arbóreos requeridos para tala, en los p.m.p, de la protección de los nidos de galapitos existentes en el p.AP 4, según brindado por la entidad contratante en el recorrido del 23/6/2026.

AREA SOCIAL: Felipe A
Requerimiento de Pieza para invitacion a reunion de inicio para remision y aprobación por la Gobernación

AREA SST: Se indico al aux administrador la forma de entrego de los documentos de ingreso y se solicita los ingresos deben llegar con base de datos actualizada SST

Diego Restrepo A
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. DIRECTOR DE OBRA

SABADO 25 de Julio de 2026

Estado del tiempo: M: Seca. Tarde: Seca, N: Seca.

PERSONAL EN OBRA:

-Por Interventoria: 1 Ing Directora, 1 Ing Residente, 1 Ing. Profesional Residente Ambiental, 1 Profesional Social, 1 Profesional SST, 1 Tecnólogo en construcción civiles.

-Por Contratista de obra: 1 Ing. Director, 1 Ingeniero Residente, 1 Tecnólogo en construcciones civiles,

Powered by CamScanner

1 Ingeniero Residente Ambiental, 1 profesional social, 1 profesional administrativo, 1 Topógrafo, 2 Maestros de obra, 2 oficiales y 2 ayudantes.

ACTIVIDADES DE OBRA:

- Fabricación en obra de la señalización provisional para PMTS
- Continúa el proceso administrativo de afiliaciones y vinculación del personal administrativo y operativo y la consecución de recursos para la ejecución de las obras.

OTRAS:

AREA AMBIENTAL: seguimiento al estado los individuos arbóreos y de la vegetación, al igual que los pasos de fauna existentes en los PMA número 2, 3 y 4. y de la conservación de los mismos.

AREA SOCIAL: Requerimiento de ajustes a las actas de entorno e información de fecha de reunión de inicio para el cumplimiento.

AREA SST: Se continua sin la presencia del profesional SST en obra, sin del radicado de documentos, sin PMT, se solicita mitigar riesgos y peligros.

Diego Rodriguez A.
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA

ING. DIRECTOR DE OBRA.

DOMINGO 26 de Julio de 2026 ..... FESTIVO

Estado del tiempo: M: Seco, T: Seco, N: Nocturnas.

No se realiza ninguna actividad de obra física por ser día festivo.

Diego Rodriguez A.
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA

ING. DIRECTOR DE OBRA.

LUNES 27 de Julio de 2026

Estado del Tiempo: M: Seca T: Seca N: Seca.

PERSONAL EN OBRA:

- Por Interventoria: 1 Ing. Directora, 1 Ingeniero Residente, 1 Ing. Profesional Residente Ambiental, 1 Profesional Social, 1 profesional SST, 1 Tecnólogo en const. civiles.

Powered by CamScanner

Anexo 2

Actas de comité de obra

REUNION DE INICIO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

LISTADO ASISTENCIA

Código: FO-M1-P7-001
Versión: 03
Fecha de aprobación: 04/02/2020

FECHA: 01/Julio/2026 HORA: 10:00 – LUGAR EVENTO: Dirección D/o Físico

ASUNTO: Revisión estado contrato P.A.P Inicio DEPENDENCIA RESPONSABLE: Secretaría de Infraestructura Física

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	CÉDULA	CARGO/DEPENDENCIA	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
JORGE ARREOLA R	1052965730	C REGIONAL VIAL ANTIO	3043753860	CONSORCIO VIAL REGIONAL – PATTOQUIA@GMAIL.COM	
Sebastian Castaño L.	1097404902	Profesional social	3103159906		
José Orlando Suarez L.	18'391882	Director obra/contabl	314 894 48 91		
Luisa Fda Gómez G	43 877806	PU Ambiental	314 488 3387		
Blanca Lilia Tobón Mor	32.000.034	Rpte Legal	3147836006	CONSORCIO LEITONES@gmail.com	
Ceidy Johanna Mora O.	43.269093	Consorcio Leitones	3008518190	Consorciolgitonesgo@gmail.com	
Lucelly Pamela Volanco	42779460	P. Social S.J		lucelly-pamela@antioquia.gov.co	
Eduardo A. Herrera.	12.969.258	Prof. Universitario	3148679892	eduardo.herrera@antioquia	

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Tipo de reunión: Reunión de inicio al contrato.	**Fecha de reunión:** 01/06/2026
Organismo, Dependencia o Proceso: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Dirección de Desarrollo Físico. CONTRATO No 26SS111182865. OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VÍAL DE SEGUNDO ORDEN MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRÍNCIPE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	**Fecha de elaboración:** **05/06/2026**
Asistentes, Organismo: **Por el Contratista: CONSORCIO VIAL REGIONAL ANTIOQUIA 2026. NIT: 902036033-0** Ing. Jorge Arrieta R. – Representante del contratista de obra. P.S Sebastián Castaño – Profesional social designado Ing. José Orlando Suarez – Director de obra designado **-Por la Interventoría: CONSORCIO LGI ITUANGO NIT: 902.061.427-4,** Ing. Blanca Liliana Tabares. – Representante legal Consorcio Ing. Leidy Johanna Mora O. - Directora de interventoría designada. **-Por la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA:** Ing. Eduardo Alfonso Herrera Zambrano - Apoyo a supervisor Ing. Luisa Fernanda Gómez - Ingeniera ambiental SIF. Lucelly Penagos Valencia – Profesional social SIF.	**Ausentes, Organismo:** **Por el Contratista: n/a** **Por el Interventor: n/a**

Orden del Día:

1. **PRESENTACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO**. Equipos técnicos y administrativos del Contratista de obra, Contratista Interventor y funcionarios de la Secretaría de Infraestructura quienes harán el seguimiento a los contratos.
2. **DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA Y PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, INTERVENCIÓN Y PRIORIZACIÓN.**
3. **GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL.**
4. **ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA ETAPA CONTRACTUAL.**
5. **DOCUMENTOS PARA ENTREGA AL INICIO DE OBRA E INTERVENTORÍA.**
6. **PROPOSICIONES Y VARIOS**

Desarrollo de la Reunión:

Se dio inicio con la reunión, con instalación por parte del supervisor de apoyo, ingeniero Eduardo Alfonso Herrera, el cual dio a conocer la finalidad de este primer encuentro conjunto, para presentación de los equipos de trabajo y del personal profesional de apoyo de la SIF.

TEMAS TRATADOS.

1. **PRESENTACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.**

Se dio la palabra a los representantes de las empresas que adelantarán la Interventoría y la ejecución de obra para presentar sus firmas y sus equipos de trabajo.

Se solicita a los Representantes de la Interventoría y Obra, la preparación y entrega de las hojas de vida de los profesionales que conformarán los equipos de trabajo, inicialmente de los directores de obra y profesionales ambientales.

El contratista entregará las hojas de vida del equipo de trabajo al Interventor para que revise y apruebe. La Interventoría, las entregará a la supervisión de apoyo. **(Plazo máximo Cinco (5) días calendario una vez suscrita el acta de inicio).**

Se recuerda, que el perfil de estos profesionales debe estar acorde con las exigencias solicitadas en los documentos precontractuales (Pliegos de Condiciones, Estudios y Documentos Previos y Anexo Técnico).

2. **DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA Y PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, INTERVENCIÓN Y PRIORIZACIÓN.**

El Contrato adjudicado consiste en adelantar intervención de cuatro (4) puntos de perdida de banca, ubicadas así: tres (3) puntos en la vía Partidas a San José de la Montaña – San Andrés de Cuerquia – Pescadero – Ituango; un (1) punto de pérdida de banca en la vía Puente Gavino – Gómez Plata – Carolina del Príncipe - Guadalupe, en las abscisas y coordenadas indicada en los documento y estudios previos. Se indica que los recursos empleados para estos contratos, provienes de recurso de Regalías. Las actividades incluyen construcción de obras de contención, obras de drenaje, estabilización de taludes, pavimentos y otros con el fin de garantizar la seguridad y comodidad a los usuarios de estas vías.

Los criterios generales para determinar el alcance de la intervención de estos puntos están sujetos a la revisión inicial de los puntos, revisión de los diseños y presupuestos de obra.

- El supervisor de apoyo manifiesta que a visitado los puntos de atención prioritaria de Ituango y Carolina y manifiesta la necesidad urgente de realizar las intervenciones.

- El contratista de obra manifiesta que realizará una visita de inspección a los puntos de atención prioritario en Ituango y Carolina del príncipe en conjunto con la comisión de Topografía para establecer las condiciones actuales del terreno en las zonas a intervenir.

3. INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN.

3.1 RECURSOS POR EJECUTAR - CONTRATO DE OBRA:

$	**$ 11.869.263.725 (Incluye AIU de 36.09%)**

1. Se le recuerda al contratista que deben de realizar la entrega de la programación de obra y el programa de inversión, además, definir la logística necesaria para garantizar el traslado de equipos, materiales y personal que le permita la ejecución de las obras establecidas en el contrato y para el plazo establecido para ello.

4. RECURSOS POR EJECTUTAR- CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

$	**1.512.855.363 (incluye IVA del 19%) con un FM= 1.96**

5. PUBLICACIÓN EN SECOP II.

5.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

- El contratista deberá entregar de maneta oportuna la información que hace parte del expediente del contrato, previa aprobación del interventor para que sean publicados oportunamente en el SECOP II.

5.2 OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA.

- Revisar toda la documentación durante la ejecución del contrato para remitir a la entidad contratante oportunamente y estas a su vez dar cumplimiento a los parámetros establecidos en Colombia compra Eficiente en la parte concerniente a las publicaciones del SECOP II

6 GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Se hace una presentación de las profesionales por parte de la entidad contratante que nos estarán acompañando en la ejecución del proyecto:

- Ingeniera Ambiental Luisa Fernanda Gómez.
- Profesional Social Lucelly Penagos.

Por parte del Profesional ambiental se informa que los puntos a atender en Ituango ya cuentan con los permisos de ocupación de cauces, y en lo que tiene que ver con Carolina del Principe solicita que se le entreguen los diseños para establecer si se hace necesario realizar un trámite Adicional.

Se reitera el cumplimiento de lo establecido en los Pliegos de Condiciones para estos componentes quedando pendiente por lo tanto la reunión con los pares Ambientales, sociales y SST una vez se tengan aprobados los profesionales que estarán en el proyecto. Se deberán realizar reuniones especificas en cada componente para definir temas de ejecución y cumplimiento con información semanal y mensual que es necesario entregar a la entidad.

7 PLAN DE CALIDAD – ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS.

Se solicita al contratista la elaboración del Programa de Gerencia del Proyecto para la ejecución de las obras tal como lo establecen los pliegos de condiciones.

8 PROPOSICIONES Y VARIOS

- Realizar una visita de obra con el personal, tanto de obra como de interventoria.

9 COMPROMISOS PACTADOS:

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1	Se recordó tanto al contratista como a la interventoria que se debe entregar la información establecida en los documentos que hacen parte del contrato (pliegos de condiciones, Anexos técnicos, etc), una vez suscrita el acta de Inicio.	Contratistas/ interventoría	Pendiente	
2	Aprobación de pólizas tanto del contratista como de interventoria	Entidad	Pendiente	
3	Firma de acta de inicio por el contratista de obra e interventoría	Contratistas/ interventoría	Pendiente	

Elaboró: Eduardo Alfonso Herrera Zambrano – Supervisor de apoyo

Revisó y Aprobó: Por la Interventoría:

Revisó y Aprobó: Por el Contratista Obra: JORGE ARRIETA ROMERO

SE ANEXA FORMATO DE ASISTENCIA A REUNION FIRMADO POR LOS ASISTENTES.

COMITÉ No.1

	LISTADO ASISTENCIA	Código FO-M1-P7-001 Versión 03 Fecha de aprobación 04/02/2025

FECHA 23 Junio / 2026 HORA 9:00 Am LUGAR EVENTO Gobernación de Antioquia.

ASUNTO Comité Nº 3 DEPENDENCIA RESPONSABLE Secretaría de Infraestructura.

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	CÉDULA	CARGO/DEPENDENCIA	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Leidy Johanna Muñoz	43259093	Consorciales.suroeste@gmail.com	3004818740	Interventoria	
Blanca Lillyam Tabares Mesa		Representante legal	3147891606	Consorciales.suroeste@gmail.com	
Ibeth del Carmen Londoño	1039404462	Profesional Social Comité	3105540104		
Alejandro Rendon Cardona	1037624992	Ingeniero Civil	3148999097	Alejandrorendon76@hotmail.com	Alejandro R.C.
JORGE ARRIETA	10529605170	Residente Vía Regional	3123782620	conservacionregionalantioquia@gmail.	
José O. Suarez L.	18391882	Consorcio Vial Regional	3146949491	Conservacionalregionalant@gmail.com	
Eduardo A Herrera Zambrano	12959150	Supervisor Interv	3145677942	eduardo.herrera@antioquia.gov.co	
Juan Diego Agudelo L.	71356927	Director	3116162462	juandiego.agudelo@antioquia.gov.co	

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código: FO-M1-P5-005** **Versión: 02** **Fecha de aprobación: 25/06/2018**

Tipo de reunión: Comité de obra, CONTRATO OBRA No. 26OO111B2860 de 2026 "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MEDIANTE LA INTERVENCION DE PUNTOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.".	**Fecha de reunión: 23 de junio de 2026**
Organismo, Dependencia o Proceso:	**Fecha de elaboración:**
Asistentes, Organismo: **Ing. Juan Diego Aguirre – Director de desarrollo fisico** **Ing. Eduardo Alfonso Herrera Zambrano-Supervisor Area técnica** **Ing. Blanca Lillyam Tabares Mesa – Representante Legal** **Ing. Johanna Mora Valencia – directora de Interventoria** **Ing. Jorge Andrés Arrieta –** **Ing. José Orlenado Suarez Londoño – director de obra** **Prof. Sebastián Castaño Londoño - Social obra** **Ing. Alejandro Rendon**	**Ausentes, Organismo:**

ACTA DE COMITÉ No.1 del 23 de JUNIO de 2026

Orden del Dia

1. Lectura del acta anterior
2. Revisión compromisos anteriores
3. Temas tratados
4. Proposiciones y varios
5. Compromisos pactados

Desarrollo de la Reunión:

1. Temas tratados

El director de desarrollo fisico Juan Diego Aguirre informa que el con el acta de inicio de la obra se debe anexar un cronograma de obra ajustado a la realidad de ejecución, teniendo en cuenta que no se van a necesitar los 4 meses de licencias y permisos, igualmente el acta de inicio queda con fecha del 23 de junio de 2026; además pide que le informen las dudas que se tengan sobre el proyecto y que las que no se puedan subsanar en el momento de la reunión, las investigara y nos suministrara la información posteriormente.
La Represéntate legal de interventoria informa que debido a que los permisos de ocupación de cause que se requieren para iniciar el frente de obra de Ituango ya están aprobados, sin embargo, al realizar el replanteo en el frente de Carolina del Principe, se encontraron diferencias frente a las condiciones

Powered by CamScanner

iniciales por lo que se haría necesario una visita con el diseñador para verificar si es necesario realizar ajustes a los diseños.

Por otro lado, el director de desarrollo fisico Diego Aguirre, solicita dar claridad para ver como se realiza el inicio de la ejecución, a lo que se le informa que se iniciaría por Ituango con los tres puntos, pero el ingeniero Alejandro informa que sin realizar la comparación entre el replanteo realizado por el contratista y el diseño inicial del PAP2 aparentemente se tienen diferencias en el PAP2 por lo que va revisar de manera más meticulosas para no generas falsas alarmas antes de dar su versión final del replanteo; sin embargo mientras se realiza esta verificación se puede iniciar por los otros dos puntos de atención, a lo que la representante de Interventoria la ingeniera Blanca Lillyam comunica que se pueden iniciar los tres puntos, pero que durante la ejecución de las obras se pueden presentar obras adicionales las cuales se les informara con el debido tiempo a la entidad.
El director de desarrollo fisico pregunta si esas obras adicionales no se pueden definir antes de iniciar las actividades del proyecto, a lo que la representante Legal de Interventoria manifestó, que primero se debe iniciar la ejecución para ir verificando que tipo de obras adicionales se van a requerir y los costos.

El director de desarrollo fisico solicita que se le de claridad si se necesita o no mas recursos para el PAP 2, por que el debe de balancear los recurso del proyecto ya que este contrato es de regalias, por lo que insiste que se debe organizar el cronograma teniendo en cuenta que se van a iniciar obras de manera inmediata sin tener los cuatro meses de permisos y licencias, ademas solicita que como se tiene acta de inicio, se debe de iniciar de inmediato con la legalización del personal (afiliaciones) que va ingresar para la ejecución de la obra.

El director del consorcio vial regional Antioquia, informa grosso modo que inicia actividades en el PAP2 a los 15 dias inicia con el PAP4 y a los 30 días el PAP3, la representante legal de la Interventora le pregunta que por que tanto tiempo para iniciar si los puntos se pueden iniciar al mismo tiempo teniendo en cuenta que son puntos de atención aislados uno del otro y que debe tener en cuenta que el contrato le solicita que se ejecuten tres puntos de atención de manera simultánea, el Director del consorcio vial regional Antioquia informa que es por temas de logistica, director de desarrollo fisico le recuerda que el contrato tiene unos plazos y que tiene unos mínimos a iniciar que se deben de realizar según lo establecido en el pliego y esto debe quedar reflejado en la programación, el director del consorcio vial regional Antioquia informa que el PAP 2 es el que muestra más tiempo de ejecución.

El director de desarrollo fisico pregunta que como ha sido la gestión del personal, ya que con las alcaldías puede darse más fácil la consecución del personal, a lo que el ingeniero Jorge Andrés Arneta informa que por parte del contratista ya se realizan los acercamientos tanto en Carolina del Principe como de Ituango, ademas en visita realizada por el contratista a Ituango la alcaldía les hizo acompañamiento con un funcionario de la secretaria de planeación y con el se hablo de la necesidad de la mano de obra no calificada y si contaban con equipos de fácil acceso para tenerlos en la obra, el director de desarrollo fisico recalco la importancia de realizar la reunión de del inicio de obra y lo adecuado que es tener una buena relación con la alcaldía, el director del consorcio vial regional Antioquia informa que en la visita realizada el día sábado 21 de junio dio la casualidad que muchos lides sociales y algunas personas de la comunidad estaba reunidos y se hizo un acercamiento previo con ellos y se les informo sobre el proyecto, el profesional social del consorcio vial regional Antioquia informa que dichas personas estaban muy interesadas en poder trabajar en la ejecución de la obra y

Powered by CamScanner

una de las lideres se comprometió en enviar un paquete con hojas de vida de personas que están en el sector, el supervisor de la secretaria de infraestructura recalco que se debe de hacer la reunión de socialización de inicio de obra.
El director del consorcio vial regional Antioquia informa que ellos hablaron con el propietario del predio ubicado en el K82+100,mostrándole la localización de la franja que está en negociación con él, y ademas se tiene un permiso de intervención, y en los PAP3 y PAP 4 como no se tiene viviendas es más fácil dar inicio a las actividades, pero en el PAP3 durante la afectación por medio de la alcaldía se realizaron unos muros de contención los cuales se deben de revisar para definir si por su ubicación no se deben demoler.

El director de desarrollo fisico advierte las fechas de entrega de los informes mensuales ante la entidad, los cuales deben ser radicado en la secretaria por la interventoria los primeros 5 días de cada mes para que la secretaria pueda revisar la documentación entregada y si se debe hacer algún ajuste sea dentro del tiempo establecido entregar a tiempo a las personas encargadas de regalías y no generar retrasos, ya que así sea un día que pase sin entregar a regalías la información no se puede subir a la plataforma es decir no reciben y eso genera alertas que reduce porcentajes de calificación y cumplimiento, por lo que a regalías se les debe entregar a los diez días máximo para que ellos también puedan revisar por si tienen alguna observación se pueda subsanar y quede bien en la plataforma.

El director de desarrollo fisico le solicita al Supervisor del contrato entregar tanto al contratista como a la interventoria los formatos que se deben diligenciar para la presentación de informes (informes de seguimiento, actas de cobros de pago, etc.), el Ingeniero supervisor Eduardo informa que los informes SST, Ambiental ,social y Técnico se presentan con el acta de pago tanto para obra como para interventoria, ademas la representante legal de la interventoria recomienda al contratista la entrega de información completa y a tiempo para que no se retrasen la presentación tanto de los informes como del acta de cobro, la directora de interventoria les informa que se debe de tener pago la seguridad social del personal y pago de salarios máximo el día 2 de cada mes y que los cortes de obra se realizaran con corte al veinticinco de cada mes, estos son documentos necesario para la presentación y pago del acta.

La directora de interventoria le informa al contratista que el PMT debe ser radicado en la gerencia de seguridad vial para que pueda ser aprobado, el director de desarrollo fisico recomienda que se radique tanto en la agencia de seguridad vial y en los municipios donde se tiene injerencia, ademas se le recuerda al contratista que el PMT debe ser socializado con los actores viales del municipio y les solicita que apenas se encuentre radicado el PMT se lo compartamos para el estar al pendiente del avance del permiso y la resolución salga lo mas pronto posible, igual cuando se radique en las alcaldías

Se le informa tanto a contratista como a interventoria que cuando el personal SST, AMBIENTAL y SOCIAL estén aprobados se realizará una reunión entre los pares de la entidad, la interventoria y el contratista, la cual será informada a su debido tiempo.

El director de obra pregunta sobre el ajuste a los salarios del personal operativo ya que el presupuesto es con salarios del 2025, El director de desarrollo fisico informa que se debe verificar si se tiene rublo para ajustes, si los tiene, se debe mirar que tanto el proyecto como en la plataforma tenga ajustes ya que tanto los proyectos como los contratos debe ser iguales, sin embargo si se hace necesario el ajuste de precios se debe de revisar, como se deben de ajustar y cada cuanto ademas

Powered by CamScanner

se tiene una fórmula para calcularlos; por otro lado, está el tema de los imprevistos estos se deben de justificar para efectos de la liquidación del contrato
El director del contratista informa que en el punto de Carolina del principe no se encontraron en campo los puntos físicos, sin embargo tienen las coordenadas, el director le solicita al supervisor que revise el tema y que los asuma, por otro lado, el director del contratista informa que dentro del contrato se tiene para cada punto un tiempo de topografia de 30 días para 8 meses de ejecución lo que daría para cada punto serian dos días en el frente y para el desplazamiento se lleva un tiempo, sin embargo el director de la secretaria informa que no es necesario tener una topografía en cada zona , por lo que es necesario justificar el porque de la necesidad de la topografía y enviarlo por medio de un comunicado enviado a la entidad.
El director de la secretaria solicita realizar los comités de obra cada 8 días para verificar el avance de la obra.

2. Proposiciones y varios

3. Compromisos pactados

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1.	Entrega de cronograma de obra	Contratista		
2.	Entrega de formatos para la presentación de informes (lista de chequeo)	Entidad		
3.	Radicación del PMT en la gerencia de seguridad vial de la gobernación y alcaldías de Ituango y Carolina del Principe	Contratista		

FIRMA
CARGO Director de obra
EMPRESA Consorcio Vial R. Antq.

FIRMA
CARGO Director Interventoria
EMPRESA Consorcio Vial Ituango

FIRMA
CARGO
EMPRESA

FIRMA
CARGO
EMPRESA

Powered by CamScanner

COMITÉ No.2

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

LISTADO ASISTENCIA

Código: FO-M1-P7-001
Versión: 03
Fecha de aprobación: 04/02/2025

FECHA: 15 julio /2026 | HORA: 2:00 | LUGAR EVENTO: Campamento de Interventoria

ASUNTO: Comite N°2 | DEPENDENCIA RESPONSABLE:

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	CÉDULA	CARGO/DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Johanna Moro O.	43265793	Direct Interven	3008518410	consorciogiturango@Gmail.com	
Eduardo A. Herrera	12984219	Supervisor Gobant	314-8679878	eduardo.herrera@antioquia.gov.co	
Mónica Lucía Escobar López	43'210-207	profesional residente ambi	3172868240	consorciogiturango@gmail.com	
Juan Felipe Alzate G	71142121	Profesional Social	3007760175	"	
Diego M. Restrepo A	98.486.577	Residente Interven	3213153558	"	
Marina Sanchez	1073321730	Residente SST Interv	3126840221	consorciogiturango@gmail.com	
Josi O. Suarez L.	18'391.683	Director obra	3148944651	josingeniero@gmail.com	
John Granada U.	89.001153	Inspector obra	3180061784	JJgranadaU@gmail.com	
Jose Ortiz	73145412	topografo	3137156118	Topocor01.JJOM@hotmail.com	
Sebastian Castaño Ochoa	1097403052	Profesional social	3103219906	SebastianN.castano95@gmail.com	
Luis Guillermo Silva G	1849167	Residente obra	3124463246	Silvaluisg@gmail.com	
Carlos Mario Ruiz C.	70564754	Ambiental Residente	3107990979	Carlosruiz@unipaz.edu.co	

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 2**	**Código:** FO-M1-P5-005 **Versión**: 02 **Fecha de aprobación: 25/06/2018**

Tipo de reunión: Comité de obra No. 2, CONTRATO OBRA No. 26OO111B2860 de 2026 "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MEDIANTE LA INTERVENCION DE PUNTOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.".	**Fecha de reunión:** 15 de julio de 2026
Organismo, Dependencia o Proceso: Secretaría de Infraestructura física	**Fecha de elaboración:** 15 de Julio de 2026
Asistentes, **Organismo:** Ing. Eduardo Alfonso Herrera Zambrano-Supervisor Area técnica Secretaria de Infraestructura. **Interventoria: CONSORCIO LGI ITUANGO** Ing. Johanna Mora Valencia – Directora de Interventoría. Ing. Diego Martín Restrepo Agudelo – Residente de Interventoría. Ing. Mónica Lucía Escobar Lòpez – Profesional Ambiental de Interventoría. Juan Felipe Álzate Giraldo – Profesional Social de Interventoría. Luz Marina Sánchez Rojas – Profesional SST de Interventoría. **Contratista de Obra: CONSORCIO VIAL REGIONAL ANTIOQUIA 2026** Ing. José Orlando Suárez Londoño – Director de obra. Ing. Luis Guillermo Silva Galeano – Residente de obra. Ing. Carlos Mario Quiroz Carrera – Profesional Ambiental de obra. TS. Sebastián Castaño Londoño – Profesional Social de obra.	**Ausentes, Organismo:**

ACTA DE COMITÉ No.2 del 15 de JULIO de 2026

Orden del Dia

1. Lectura del acta anterior.
2. Revisión compromisos anteriores.
3. Temas tratados.
4. Proposiciones y varios.
5. Compromisos pactados.

Desarrollo de la Reunión:

1. Temas tratados.

La directora de Interventoría inicia el comité realizando varios comentarios relacionados con el poco avance que ha tenido el proyecto desde el componente administrativo por parte del Contratista de obra. Manifiesta su preocupación por la falta de respuesta inmediata en la atención de algunos

requisitos y solicitudes realizadas por la Interventoría, previos al inicio de las actividades de obra. Sigue el Contratista sin enviar la documentación completa de las afiliaciones al personal profesional técnico y operativo, no existe señalización en obra, no se tiene aún las piezas informativas de vallas, socializaciones, actas de vecindad y de entorno.

El supervisor por su parte agrega que ya la Gobernación hizo entrega de los modelos de vallas y demás piezas informativas y del manual de obra pública, el cual deberá ser de estricto cumplimiento, tanto para el contratista de obra como para la Interventoría. Dice que se deberá cumplir con toda la dotación allí estipulada y los distintivos para los vehículos, así como también, con todos los requisitos para la elaboración de la valla informativa, la cual deberá ser sometida a revisión y aprobación del departamento de comunicaciones de la Gobernación de Antioquia. Recuerda que son 2 vallas, una para cada Municipio (Ituango y Carolina del Príncipe). La directora de Interventoría manifiesta que se deberán ponerse de acuerdo entre los pares Sociales de Obra e Interventoría para enviar un único documento a dicho Departamento. Al respecto expresa el director de Obra que ya existe un comunicado en el cual la Interventoría realiza una serie de observaciones a los planes presentados, Plan de Manejo social, Plan de Manejo Ambiental y Plan de Gestión SST., las cuales se han venido subsanando. El Supervisor insiste que se deberá mantener una coordinada y permanente comunicación y conciliación entre los pares de las partes, incluyendo los de la gobernación para que se agilicen los procesos de solicitudes y respuesta; Manifiesta que ya se tiene previsto una visita de los profesionales Social y Ambiental de la gobernación para la próxima semana. El director de obra agrega que ya tiene identificado en el PAP4 uno o unos arboles con existencia de nidos de pájaros al cual habrá que hacer un plan de manejo de fauna para este caso; al respecto dice el Supervisor que será la Corporación Regional quien dicte el lineamiento a seguir, por solicitud expresa de la misma gobernación, proceso que iniciará con la visita mencionada anteriormente. Pide la directora de interventoría que se tenga para dicha visita la localización topográfica del proyecto en cada PAP, pues sería innecesario hacer cualquier intervención forestal o de fauna por fuera de sus límites.

En cuanto al profesional SST de la gobernación, manifiesta el supervisor que espera se solucione prontamente desde este organismo, su vinculación laboral. Sin embargo, dice la directora que, aunque no se tenga aún su presencia, la Interventoría le hará cumplir al Contratista todo lo estipulado en los manuales dispuestos para ello.

Recuerda también el supervisor, que se deberá realizar a la mayor brevedad posible, la primera de tres socializaciones previstas con la comunidad, la reunión de inicio. Al respecto agrega el Profesional Social de la Interventoría que no se tienen indicios por parte del Contratista, de programar dicha reunión, tampoco las actas de vecindad y/o de entorno, ni tampoco se han identificado los posibles sitios para la instalación de las vallas. Pide el Supervisor que desde esta misma semana se inicie el desarrollo de estas gestiones, vinculando desde luego a la Alcaldía Municipal y a las empresas de transportes o gremios de la región.

La Profesional SST de la Interventoría insiste que el Contratista deberá suministrar con la debida antelación para revisión y a la mayor brevedad posible, toda la documentación relacionada con la vinculación y afiliaciones de todo el personal profesional y operativo que laborará en el proyecto, solicita nuevamente que ello deberá enviarse de manera oficial, por comunicado y/o por correo electrónico con mínimo 3 días de anticipación, para poder llevar a cabo su correspondiente verificación, validación y aprobación por parte de la Interventoría y así pueda ingresar el personal a la obra con tranquilidad cubiertos de todo riesgo. Recuerda que ya se le envió al Contratista un comunicado en el cual se relaciona la documentación que se solicita por cada trabajador, entonces,

para el tema de las afiliaciones, si el personal ingresó a laborar en el mes anterior, para el presente mes ya debería tener planilla la cual tendrá que ser revisada y evaluada por la Interventoría, que posterior y directamente en el sitio de labor se verificará mediante documentación en físico, que si corresponda al personal relacionado. Dice que hasta la fecha no se tiene ningún documento de afiliación del personal laborando, 6 operativos y 6 administrativos y por dicha condición se solicita al Contratista, retirar todo este personal del frente de trabajo, hasta tanto no se verifique y apruebe la validez de la documentación que relacionen la cual debe de tener un orden para facilitar su revisión.

Por su parte, menciona la directora de Interventoría que, según información del director de obra, su Profesional SST ya aprobado por la interventoría, no aceptó el cargo y por tanto, pide acelerar el proceso de consecución de su reemplazo. Responde el director que ya se han adelantado conversaciones con un profesional residente de Ituango y agrega el Supervisor que lo importante es que cumpla con el perfil y la experiencia exigida.

Desde el componente técnico, pregunta el Supervisor que si ya se tiene la localización topográfica del proyecto o que otra inquietud de orden técnico se posee. Al respecto el Director de obra responde que en los PAP2 (K82+100) y PAP3 (Km76+300) No se habían encontrado inicialmente los BMs en el sitio, sin embargo se logró hacer su localización directa pero se encontraron algunas inconsistencias, principalmente en lo que se refiere a las coordenadas del diseño geométrico, para lo cual manifiesta el Supervisor que para esclarecer la situación, deberá hacerse inicialmente la verificación en campo con la Interventoría, utilizando el diseño en AUTOCAD, y si persisten las dudas deberá realizarse la consulta formal con los diseñadores.

En lo que se refiere al PAP2 el director de obra comenta que se tenían algunas inquietudes respecto al anclaje de unos perfiles IP, pero dice el supervisor que eso si podría esclarecerse directamente con la Interventoría en el sitio.

Por otra parte, la directora de Interventoría solicita al contratista, se informe sobre el suministro e instalación provisional dispuesta en los PMTs aprobados para cada PAP. El director de obra del contratista responde que ya se encuentra en fabricación y podría contar inicialmente con la señalización para los frentes 2 y 3 el próximo sábado 18 de Julio.

En cuanto a las unidades sanitarias para cada frente, pregunta el supervisor en que va su disposición. El director de obra responde que se ha estado coordinando con el Ing. Ambiental para construirlos en cada sitio y con descarga a un poso séptico, para lo cual responde la Ing. Ambiental de la Interventoría que habría que revisar los permisos Municipales o ambientales de su funcionamiento y la descarga final, considera que los baños portátiles serían la mejor solución al tema. Dice el director de obra que esta solución incrementaría muchísimo los costos previstos por su transporte y mantenimiento y con el agravante que se requerirían de a dos unidades por cada PAP e informa que se está en la construcción de 2 baños en la casa donde reside actualmente el personal administrativo (K79+000).

La directora de Interventoría reitera, la necesidad de señalizar adecuadamente los 3 PAPs previstos. Recuerda que, desde el 23 de junio, fecha de iniciación del contrato, el contratista es totalmente responsable de cualquier eventualidad que ocurra en dichos sitios y, por tanto, deberá disponer para cada uno, las cintas de señalización de peligro, mientras se inician las labores y se dispone de la señalización provisional prevista en el PMT aprobado.

Recuerda también la Profesional SST de la Interventoría que el profesional SST del contratista deberá estar debidamente capacitado y ser coordinador de alturas, de espacios confinados y para trabajos de alto riesgo, ser vigía etc. Y tener en cuenta, que se debe disponer del medidor de gases, debidamente certificado en su calibración, para la excavación de las pilas y agrega la directora de Interventoría que se deberá tener totalmente claro la disposición de anclajes para el aseguramiento de la línea de vida. Insiste en prestar absoluta atención a toto el tema de Seguridad y Salud en el Trabajo. No quiere que se presente en obra ningún incidente o accidente que lamentar y disponer de todas las medidas necesarias para prevenir accidentes de la movilidad vehicular.

En lo referente al frente de Carolina del Príncipe, informa el contratista que está previsto iniciarlo según programación, a mediados del mes de agosto, pero considera la directora de Interventoría que desde ahora mismo ya se puede dar comienzo a este frente. Al parecer, la longitud del muro previsto se ha incrementado en longitud en 10m., y por esta condición, se deberá programar una visita del diseñador al sitio, que, con su informe, se determinará o no la necesidad de esa estructura adicional o algún otro componente técnico alternativo. Dice el Supervisor, que hará la respectiva consulta o autorización a la división de Estructuración de la gobernación para programar dicha visita, que como se sabe, no podrá cargarse a los costos de la interventoría. Agrega que no le preocupa que sea de mayor dimensión, igual habría que atenderlo, sino, el valor adicional que habría que solicitar a REGALÍAS para poderlo intervenir, sin embargo, en desarrollo del contrato, se deberá hacer, de manera permanente y continua, un balance financiero del proyecto y así ir ajustando el valor definitivo y el monto a adicionar, en caso de ser necesario, pero sí, habría que pedir autorización para hacer el ajuste constructivo.

Por otra parte, la directora de Interventoría solicita al contratista estar preparado para el Frente de Carolina del Príncipe, en todas las áreas Social, técnico, SST y ambiental solicitados o requeridos contractualmente, previos al inicio de las obras.

El supervisor solicita, hacer el debido uso de todos los automotores que se vallan a emplear en la obra, se debe contar con toda la documentación vigente y utilizar los elementos de protección personal reglamentados, esto, especialmente para el uso de las motocicletas. Y como precaución, por seguridad, no circular o transitar por la vía en horarios nocturnos.

Por último, la directora de interventoría recuerda dar un estricto cumplimiento al manual de dotación establecido por la Gobernación de Antioquia y al debido diligenciamiento de todos los formatos previstos para ello. Se debe cumplir con lo establecido en el manual de imagen y logos institucionales.

2. Proposiciones y varios

El Supervisor de la Gobernación solicita que todos los comunicados y correspondencias deberán ser radicadas en físico en las oficinas o Archivos del Departamento y deberán estar relacionados y con su correspondiente copia en el informe mensual.

El Supervisor informa que las pólizas de los contratos deben ser actualizadas con el acta de inicio y aprobadas por la Gobernación.

La directora de Interventoría pide al contratista dar cumplimiento estricto a lo estipulado en el contrato, ser muy puntuales con la entrega de la información, en especial para las actas, recuerda que los cortes se harán los días 25 de cada mes como fecha ultima de entrega, para la Interventoría revisar en los siguientes 5 días y entregar en limpio a la gobernación los primeros 5 días del mes siguiente; sino se cumple con estas fechas, difícilmente la Entidad podrá hacer el pago correspondiente al acta en ese mismo mes.

3. Compromisos pactados

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1.	Entrega de una manera clara ordenada y completa de toda la documentación correspondiente a las afiliaciones del personal operativo y administrativo.	Contratista	Sábado 18 de Julio de 2026	
2.	Instalación de señalización provisional dispuesta en los PMTs aprobados para cada PAP	Contratista	Sábado 18 de Julio de 2026	
3.	Información y suministro de los baños portátiles para cada frente	Contratista	Sábado 18 de Julio de 2026	
4.	Programar visita con Profesional Ambiental de la Gobernación	Supervisor Secretaría de Infraestructura Física	Martes 21 de Julio de 2026	
5.	Programar visita con Especialista y área técnica de la Secretaria de Infraestructura física, para revisar la estructura propuesta del Muro en Carolina del Príncipe.	Supervisor Secretaría de Infraestructura Física	Martes 21 de Julio de 2026	
6.	Dar información sobre el avance que se tiene en cuanto a la fabricación y suministro de toda la dotación de uniformes para los trabajadores y los chalecos para el personal profesional.	Contratista	Sábado 18 de Julio de 2026	

FIRMA Eduardo Alfonso Herrera Zambrano.
EMPRESA Secretaría de Infraestructura Física
Gobernación de Antioquia.
CARGO Supervisor.

FIRMA Johanna Mora Valencia.
CARGO Ing. directora de Interventoría.
EMPRESA Consorcio LGI ITUANGO.

FIRMA Diego Martin Restrepo Agudelo.
CARGO Ing. Residente de Interventoría.
EMPRESA Consorcio LGI ITUANGO.

FIRMA Mónica Lucía Escobar López.
CARGO Ing. Profesional Residente Ambiental de la Interventoría.
EMPRESA Consorcio LGI ITUANGO.

FIRMA Juan Felipe Alzate Giraldo.
CARGO Profesional Social de la Interventoría.
EMPRESA Consorcio LGI ITUANGO.

FIRMA Luz Marina Sánchez Rojas.
CARGO Profesional SST de la Interventoría.
EMPRESA Consorcio LGI ITUANGO.

FIRMA José Orlando Suárez Londoño.
CARGO Ing. Director de Obra.
EMPRESA Consorcio Vial Regional Antioquia 2026.

FIRMA Luis Guillermo Silva Galeano.
CARGO Ing. Residente de obra.
EMPRESA Consorcio Vial Regional Antioquia 2026.

FIRMA Carlos Mario Quiroz Carrera.
CARGO Ing. Profesional Ambiental de Obra.
EMPRESA Consorcio Vial Regional Antioquia 2026.

FIRMA Sebastián Castaño Londoño.
CARGO Profesional Social de Obra.
EMPRESA Consorcio Vial Regional Antioquia 2026.

Anexo 3

Informes Semanales

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Secretaría De Infraestructura Física Subsecretaria Operativa **INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO DE OBRA**

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA INTERVENCION DE PUNTOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S5-2026 Del 20/07/2026 al 26/07/2026

	Información Contractual
	Seguimiento del Avance Físico de Obra
	Actividades Ejecutadas del Proyecto
	Seguimiento del Avance Financiero de Obra
	Seguimiento a Nuevos Ítems (Obra Extra)
	Seguimiento del Avance Financiero de Interventoría
	Seguimiento Empleabilidad del Proyecto
	Varios
	*Cuadro de mando*

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Secretaría De Infraestructura Física

Subsecretaría Operativa

INFORME SEMANAL - INFORMACIÓN CONTRACTUAL

	OBRA	INTERVENTORIA
NUMERO DE CONTRATO	2600111852860 de 2026	2358111181412
PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA OBRA PÚBLICA LIC-111B-05-2025	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO CON-111B-01-2023
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA INTERVENCION DE PUNTOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE, DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"
CONTRATISTA	**CONSORCIO VIAL REGIONAL ANTIOQUIA 2026** CONSTRUCIVIL SD SAS (80%)	**CONSORCIO LGI ITUANGO** LINEA GLOBAL INGENIERIA (50%) INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. (50%)
NIT	902.036.033-0	902061427-4
SUBREGIÓN	NORTE	
MUNICIPIOS IMPACTADOS	SAN JOSE DE LA MONTAÑA -SAN ANDRES DE CUERQUIA - MATANZAS - PESCADERO - ITUANGO PUENTE GABINO - GOMEZ PLATA - EL GUAYABO - CAROLINA DEL PRINCIPE - LA HERRADURA - GUADALUPE	
SUPERVISOR	EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO	
ESTADO	EJECUCION	EJECUCION
VALOR	$ 10.556.379.435,00	$ 1.512.855.363,00
PLAZO	12 MESES	13 MESES
FECHA DE INICIO	23/06/2026	23/06/2026
FECHA DE FIN	23/06/2027	23/07/2027

	FECHA	VALOR	%	FECHA	VALOR	%
VALOR INICIAL	23/06/2026	$ 10.556.379.435	100,00%	23/06/2026	$ 1.512.855.363	100,00%
ADICIÓN 1						
ADICIÓN 2						
ADICIÓN 3						
ADICIÓN 4						
ADICIÓN 5						
VALOR TOTAL	$	10.556.379.435		$	1.512.855.363	

	FECHA	DIAS	%	FECHA	DIAS	%
PLAZO INICIAL	23/06/2026	365	100,00%	23/06/2026	395	100,00%
AMPLIACIÓN 1						
AMPLIACIÓN 2						
AMPLIACIÓN 3						
AMPLIACIÓN 4						
AMPLIACIÓN 5						
PLAZO TOTAL	365 DIAS			395 DIAS		

	FECHA INICIO	FECHA FIN	DÍAS	FECHA INICIO	FECHA FIN	DÍAS
SUSPENSIÓN 1			0			0
SUSPENSIÓN 2			0			0
SUSPENSIÓN 3			0			0
SUSPENSIÓN 4			0			0
SUSPENSIÓN 5			0			0
TOTAL		0			0	

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Secretaría De Infraestructura Física

Subsecretaría Operativa

INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FISICO


OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA INTERVENCION DE PUNTOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana	53-2026	Del	29/07/2026	al	29/07/2026

RESUMEN GRAFICO - AVANCE DE ACTIVIDADES

Descripción	Semana	Acumulado
Avance Programado	1,08%	2,12%
Avance Ejecutado	0 %	1,07%
Desviación	1,08%	1,10%
Desviación (días)	8	
Fin Proyectado	23/06/2027	

CURVA S AVANCE GENERAL

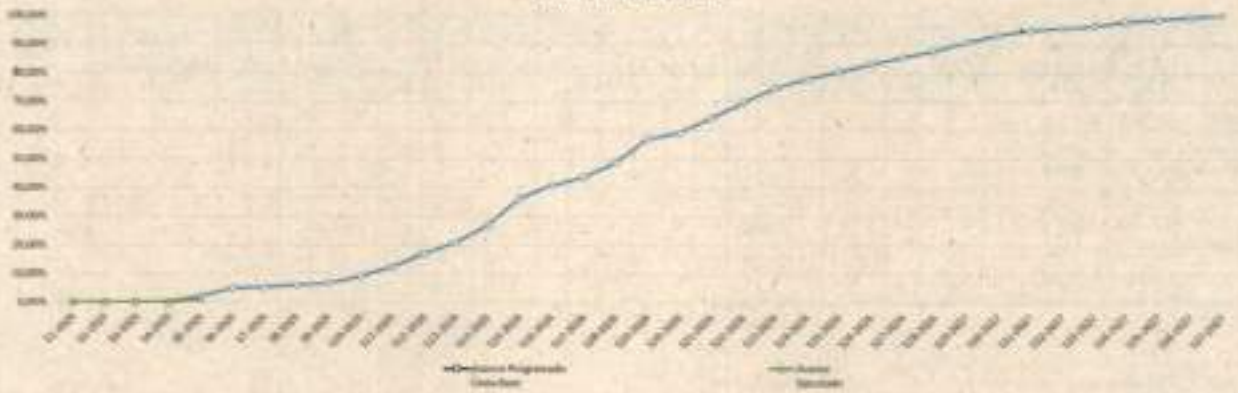







AVANCE ACTIVIDADES LICENCIAS Y PERMISOS

ACTIVIDAD	% ANTERIOR	% ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
PMT del Punto de atencion prioritaria No.2 Ituango (2SAN11-1) KB1+925 y KB2+100	0%	100,00%	100,00%	0,00%
PMT del Punto de atencion prioritaria No.3 Ituango (2SAN11-1) K76+140 a K76+406	0%	100,00%	100,00%	0,00%
PMT del Punto de atencion prioritaria No.4 Ituango (2SAN11-1) Km 73+636- Km 73+900	0%	100,00%	100,00%	0,00%
PMT del Punto de atencion prioritaria Carolina (62AN21-1) Km 41+670-Km 41+62A	0%	100,00%	100,00%	0,00%

ACTIVIDAD	% ANTERIOR	% ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
Aprovechamiento Forestal del Punto de atencion prioritaria No.2 Ituango (2SAN11-1) KB1+925 y KB2+100	0%	100,00%	100,00%	0,00%
Aprovechamiento Forestal del Punto de atencion prioritaria No.4 Ituango (2SAN11-1) Km 73+636- Km 73+900	0%	100,00%	100,00%	0,00%

ACTIVIDAD	% ANTERIOR	% ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
Ocupacion de cauce del Punto de atencion prioritaria No.2 Ituango (2SAN11-1) KB1+925 y KB2+100	0%	100,00%	100,00%	0,00%
Ocupacion de cauceldel Punto de atencion prioritaria No.3 Ituango (2SAN11-1) K76+140 a K76+406	0%	100,00%	100,00%	0,00%
Ocupacion de cauceldel Punto de atencion prioritaria No.4 Ituango (2SAN11-1) Km 73+636- Km 73+900	0%	100,00%	100,00%	0,00%

AVANCE ACTIVIDADES OBRAS

ACTIVIDAD	CANT. CONTRACTUAL/ MOD	CANT. EJECUTADA ACUM.	% ANTERIOR	% ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
Punto de atencion prioritaria No 2 de la viaPartidas a San Jose de la Montana -San Andres de Cuerquia-Mutatenas-Pescadero-Ituango (2SAN11-1) KB1+025 y KB3+100						
PRODUCTO 1. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO						
Localizacion, trazado y replanteo con equipos de precisión. Incluye vehiculo para el transporte de personal y equipo con dedicación exclusiva.	$ 40.582.230,00	$ 6.763.705,00	0,0%	16,67%		-16,67%
Demolición de pavimento asfáltico, de cualquier espesor. Incluye corte con cortadora según trazado y cargue, transporte y disposición final de escombros	$ 2.140.596,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, cortes, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	$ 1.317.648,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, colocación, conformación y compactación de Subbase granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95% de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	$ 42.702.374,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, colocación, conformación y compactación de Base Granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	$ 55.160.048,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L, para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 425-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con gravilla/arena.	$ 5.809.540,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y aplicacion de emulsion asfaltica cationica de rompimiento rapido C.R.R-1 (C.R.R-60) para riego de liga segun normas para la construccion de pavimentos de INVIAS 421-22- Incluye todo lo necesario para su correcta construccion y funcionamiento. Incluye recuperacion de superficie	$ 4.600.446,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 que cumple con el Artículo 450-22 de la norma INVIAS 2022. Incluye: colocación con terminadora (finisher), compactación y terminación de bordes. No incluye: imprimación, ni transporte de materiales, que se pagarán en su respectivo ítem. Su medida de pago será metro cúbico compacto medido en sitio.	$ 263.491.756,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de explotales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	$ 180.286.347,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
PRODUCTO 2. CONTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN K 63+000						
Desmonte y limpieza de zonas verdes existentes. Incluye corte y desarraigo de arbustos existentes, cargue, retiro y transporte de material vegetal resultante. Esta actividad se realizará simultáneamente con la rocería de arbustos.	$ 2.038.932,00	$ 1.366.890,00	0,0%	67,11%		-67,11%
Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	$ 1.071.282,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Lleno mecánico compactado con material de préstamo (suelo colorar) para densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. No incluye transporte	$ 6.712.875,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Pilote en concreto Clase C (28 MPa) de diámetro interior 1,20 m. Incluye sello E=0,15 m en concreto Clase D y excavación	$ 115.683.784,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0,05 m.	$ 1.210.944,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Concreto Clase C (28 MPa) para zapatas y vigas de fundación	$ 10.438.343,80	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Concreto Clase C (28 MPa). Barrera de contención tipo New Jersey, sección tipo unidireccional según diseño.	$ 8.832.365,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Pilastra epóxica de 1" en perforación de 1 1/8". Incluye perforación, limpieza, aplicación de epóxico e instalación de varilla corrugada de 1". Sólo se mide longitud de anclaje. El acero libre está considerado en el costo total de la actividad.	$ 12.595.880,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%

ACTIVIDAD	CANT. CONTRACTUAL/ MOD	CANT. EJECUTADA ACUM.	% ANTERIOR	% ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
Concreto Clase C (28 MPa) para zapatas y vigas de fundación	$ 12.326.709,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa), para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	$ 35.521.696,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de Geotextil NT 2500 o equivalente. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo.	$ 2.991.936,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de tubería de 2", perforada, recubierta con geotextil NT 2500 para filtrantes	$ 1.381.873,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	$ 79.941.826,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	$ 34.286.019,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	$ 521.058,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
PRODUCTO 3. CONTRUCCIÓN DE BOX COLVERT						
Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	$ 9.330.068,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Excavaciones en roca bajo agua de 0 a 4 m con cuña hidráulica. Incluye: desenfronde, cargue y disposición final del material	$ 142.415.500,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. No incluye transporte.	$ 5.909.825,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, colocación, conformación y compactación de Base granular para lechos, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	$ 129.031.374,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro y aplicación de mortero de protección sobre superficies de excavaciones temporales, en proporción 1:5 (cemento:arena), con espesor promedio de 2 cm, aplicado manualmente con llana o lanzado sobre paredes o fondo de zanja	$ 480.492,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0,05 m	$ 1.297.925,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Concreto Clase C (28 MPa). Box Colvert - Losa inferior	$ 12.377.882,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Concreto Clase C (28 MPa). Box Colvert - Losa superior y muros laterales	$ 37.855.830,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Concreto Clase C (28 MPa). Canales en concreto.	$ 14.308.538,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase D (21 MPa), para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta	$ 8.578.572,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Fundido en piedra pegada incluye concreto f'c=17,5 MPa	$ 4.589.088,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Colocación de CINTA PVC TIPO O-22 o equivalente, entre juntas de construcción de obras en concreto. Incluye el suministro de de la cinta y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento según especificaciones del proveedor	$ 1.075.825,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de Geotextil NT 2500 o equivalente. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo.	$ 2.143.166,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de material filtrante para construcción de filtros de 2" a 3" con canto rodado.	$ 691.166,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de Geodren planar H=2,5 m	$ 549.302,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de tubería perforada de 6" para drenaje con filtro. Incluye los accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	$ 1.916.905,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	$ 63.666.138,50	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de viga HEA-160 con hincado estudiado en terreno según diseño. Incluye perfil metálico, ubicación en sitio, alineación e hincado.	$ 42.090.506,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	$ 4.287.757,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	$ 28.175.306,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
PRODUCTO 4. CONSTRUCCIÓN DE CANAL ESCALONADO Y POZA DISIPADORA						
Excavación para estructuras varias en material común bajo agua, incluye entibado, ataguiamiento. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	$ 7.466.034,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor	$ 3.089.400,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Concreto Clase C (28 MPa). Canales en concreto.	$ 49.519.170,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa), para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	$ 5.096.950,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de Geotextil NT 2500 o equivalente. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo.	$ 1.066.226,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de material filtrante para construcción de filtros de 2" a 3" con canto rodado.	$ 460.875,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de tubería perforada de 6" para drenaje con filtro. Incluye los accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	$ 1.271.835,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	$ 12.764.616,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	$ 8.133.472,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto	$ 667.408,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%

ACTIVIDAD	CANT. CONTRACTUAL IMOD	CANT. EJECUTADA ACUM.	% ANTERIOR	% ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
PRODUCTO 5. CONSTRUCCIÓN DE COLCHACRETO						
Suministro, transporte e instalación de Geotextil NT 2500 o equivalente. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo.	$ 1.463.740,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Explanación y nivelación del terreno manualmente, bajo cualquier grado de humedad, incluye corte de taludes y terraceo requeridos según planos y/o definidos por la interventoría. Medido in sitio, incluye cargue y transporte interno.	$ 2.254.080,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Construcción de Pilotes, colchacreto o equivalente, anclado al terreno, y sobre el según diseño. Incluye suministro de concreto (21 Mpa) para Colchacreto, colchacreto o equivalente.	$ 69.431.280,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de geotextiles por wides de 3.5x2.4x1.0 elaborados en geotextil de tejido plano. Incluye llenos con material proveniente de la excavación.	$ 16.212.388,80	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Concreto Clase I (Ciclópeo con concreto clase C- 28 MPa y Piedra de 3" a 4")	$ 14.145.756,80	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
PRODUCTO 6. CONSTRUCCION DE FILTRO FRANCES						
Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	$ 1.891.602,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 90%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	$ 588.840,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Lleno con Material Filtrante 1 1/2". Incluye suministro y colocación, el transporte se pagará por su respectivo ítem.	$ 4.447.477,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de Geotextil NT 2500 o equivalente. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo.	$ 3.923.808,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de tubería perforada de 4" para drenaje con filtro. Incluye los accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	$ 3.780.715,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de esponjamiento).	$ 3.336.034,08	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de esponjamiento).	$ 7.739.529,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
PRODUCTO 7. CONSTRUCCIÓN DE CUNETA						
Concreto Clase D (21 MPa). Cunetas	$ 7.534.417,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, colocación, conformación y compactación de Base Granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	$ 1.998.164,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	$ 723.677,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de esponjamiento).	$ 2.345.580,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
PRODUCTO 8. CONSTRUCCIÓN DEL CANAL CUNETA						
Excavación manual en material común. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	$ 464.496,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Concreto Clase C (28 MPa). Canales en concreto.	$ 3.201.276,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60).	$ 915.486,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de esponjamiento).	$ 1.166.256,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Punto de Atención Prioritaria No 5 de la vía Partidas a San Jose de la Montaña -San Andres de Cuerquia-Mutatoon Pescadero-Buenga (2SAM13-2), ubicado entre el K70+140 a K70+400						
PRODUCTO 1. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO						
Localización, trazado y nivelación con equipos de precisión. Incluye vehículo para el transporte de personal y equipo con dedicación exclusiva.	$ 40.582.230,00	$ 6.763.705,00	0,0%	16,67%		-16,67%
Demolición de pavimento asfáltico, de cualquier espesor. Incluye corte con cortadora según trazado y cargue, transporte y disposición final de escombros.	$ 1.689.768,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Excavación sin clasificar de la explanación, canales y préstamos. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	$ 27.286.079,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Lleno mecánico compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor	$ 8.040.879,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, colocación, conformación y compactación de Subbase granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	$ 72.629.668,09	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, colocación, conformación y compactación de Base Granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	$ 65.736.467,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 que cumpla con el Artículo 450-22 de la norma INVIAS 2022. Incluye: colocación con terminadora (finisher), compactación y señalización de tramos. No incluye imprimación, el transporte de materiales, que se pagarán en su respectivo ítem. Su medida de pago será metro cúbico compacto medido en sitio.	$ 418.568.182,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento CR-1, para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carrotanque.	$ 9.238.244,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento rapido CR-1 (CSS-1h-60) para riego de liga según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 421-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie.	$ 7.321.384,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%

ACTIVIDAD	CANT. CONTRACTUAL/ M3D	CANT. EJECUTADA ACUM.	% ANTERIOR	% ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	$ 32.092.695,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	$ 265.791.679,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
PRODUCTO 2. CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCION KM 36+350						
Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales	$ 15.403.811,00	$ 6.783.705,00	0,0%	65,01%		65,01%
Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 9-12 m, diámetro interno 1.0 m. Incluye anillo en concreto e=10cm 21 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.3 m). Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	$ 16.117.125,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 3-4 m, diámetro interno 1.3 m. Incluye anillo en concreto e=10cm 21 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.5 m). Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	$ 19.330.325,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 4-8 m, diámetro interno 1.3 m. Incluye anillo en concreto e=10cm 21 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.5 m). Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	$ 19.081.575,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 6-8 m, diámetro interno 1.3 m. Incluye anillo en concreto e=10cm 21 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.5 m). Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	$ 21.000.800,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 9-12 m, diámetro interno 1.3 m. Incluye anillo en concreto e=10cm 21 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.5 m). Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	$ 5.482.756,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. No incluye transporte.	$ 13.770.000,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	$ 18.369.187,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para filtros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construccion y funcionamiento	$ 113.039.000,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Pila-pilote-caisson en concreto Clase C (28 MPa) fundido en sitio	$ 75.986.368,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0,01 m	$ 649.964,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Colocación de CINTA PVC TIPO O-22 o equivalente, entre juntas de construcción de obras en concreto. Incluye el suministro de de la cinta y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento segun especificaciones del proveedor.	$ 3.574.836,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de Geotrén planar H=2.5 m	$ 12.017.008,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de tubería de 2", perforada, recubierta con geotextil NT 2000 para tiodrenes	$ 349.283,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Lleno con material roca clasificado de río para filtro Geotrén. Incluye suministro, transporte y colocación	$ 1.244.727,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de tubería perforada 100 mm	$ 914.949,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	$ 186.770.392,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	$ 70.356.836,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
PRODUCTO 3. ESTABILIZACIÓN DE TALUD INFERIOR						
Desmonte y limpieza de zonas verdes existentes. Incluye corte y dimensiones de seros existentes, cargue, retiro y transporte de material vegetal resultante. Esta actividad se realizará simultáneamente con la tocería de arbustos.	$ 56.157.149,00	$ 1.366.800,00	0,0%	2,44%		-2,44%
Protección vegetal de taludes con tierra orgánica y semillas	$ 51.525.406,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y siembra de Pasto Vetiver	$ 93.566.225,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro e instalación de manto para control de erosión TRM 500 y sus respectivos anclajes de fijación	$ 194.075.440,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de malla triple torsión recubierta en PVC, incluye instalación de la malla y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad, anclajes y pernos se pagaron en su item respectivo.	$ 237.972.435,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de perno helicoidal de anclaje pasivo. Incluye fluido de perforación y mortero de relleno.	$ 173.239.774,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
PRODUCTO 4. CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT K76+300						
Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales	$ 33.540.467,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. No incluye transporte.	$ 4.186.375,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	$ 404.094,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%

ACTIVIDAD	CANT. CONTRACTUAL/ MOD	CANT. EJECUTADA ACUM.	% ANTERIOR	% ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
Concreto Clase 7 (14 MPa). Estados de E=0.05 m	$ 1.297.500,00	$ -	0,0%	0,00%	-	0,00%
Concreto Clase C (28 MPa). Box Culvert - Losa superior y muros laterales	$ 37.995.835,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Concreto Clase C (28 MPa). Box Culvert - Losa inferior	$ 12.377.882,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Empicado en piedra pegada	$ 2.191.540,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Colocación de CINTA PVC TIPO O-22 o equivalente, entre juntas de construcción de obras en concreto. Incluye el suministro de de la cinta y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento según especificaciones del proveedor.	$ 2.792.700,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de Geotextil NT 2500 o equivalente. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo.	$ 2.703.704,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de material filtrante para construcción de filtros de 2" a 3" con canto rodado.	$ 751.400,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de Geodren planar H=2.0 m	$ 13.274.808,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de tubería perforada de 4" para drenaje con filtro. Incluye los accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	$ 1.080.521,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60).	$ 30.978.607,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VIGA METÁLICA CON PERFILES PREVIOS EN torres según diseño. Incluye perfil metálico, elevación en obra, elevación e izmado.	$ 63.050.654,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	$ 24.332.511,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	$ 37.286.560,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
PRODUCTO 5. CONSTRUCCIÓN CANAL ESCALONADO K76+900						
Suministro, transporte y colocación de Defensa metálica Galvanizada en Cabrate. Incluye concreto para empotramiento de postes.	$ 22.437.765,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Retiro de señal vertical. Incluye transporte y disposición final (incluye señales SI-25, SI-55 y poste de referencia SI-04 en concreto)	$ 4.676.975,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	$ 3.442.208,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de tachas reflectivas en la superficie del pavimento.	$ 957.272,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de señal vertical tipo SI en lámina galvanizada cal. 16, reflectivo tipo III, estructura metálica tipo pedestal compuesta por un panel en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo de 2"x2"x1/8"	$ 1.742.780,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, Transporte e instalación de panel (tablero) de altura y ancho variable en lámina calibre 10, material reflectivo tipo III y texto, incluye estructura de soporte, tornillos, tuercas y demás elementos para su correcta instalación.	$ 772.341,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de barrera final para defensa vial.	$ 72.775.740,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de Captafaros para defensa vial.	$ 1.848.882,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de señal vertical poste de referencia (SI-04) en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo III, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un panel en tubería de 2", espesor 2 mm, doble tablero.	$ 158.375.210,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de señal vertical SP- (1) Delineador de curva. Incluye Fijación en ángulo de 2x1/4" y concreto de 2500 psi para empotrar	$ 7.934.016,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y aplicación de pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para resaltos, zonas escolares y otras áreas. Incluye todo, pintagrama y todo lo necesario para su correcta instalación.	$ 24.726.870,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
PRODUCTO 6. CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA K76+335						
Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado, incluye transporte y disposición final de los materiales.	$ 21.703.844,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. No incluye transporte.	$ 2.085.503,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y Relleno de zanjas, no incluye transporte.	$ 389.264,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 36"	$ 19.718.241,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	$ 17.537.491,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	$ 92.626.469,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	$ 91.503.466,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	$ 34.225.128,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%

ACTIVIDAD	CANT. CONTRACTUAL/ WEB	CANT. EJECUTADA ACUM.	% ANTERIOR	% ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
PRODUCTO 7. CONSTRUCCIÓN DE CUNETA-FILTRO						
Excavación para estructuras varias en material común en seco de avitiado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	$ 2.194.340,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Concreto Clase D (21 MPa). Cunetas.	$ 70.325.892,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	$ 3.291.809,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro y colocación de material filtrante para construcción de filtros de 2" a 3" con cantos rodados. No incluye transporte.	$ 6.166.226,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de Geotextil NT 2500 o equivalentes. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo.	$ 4.517.194,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de tubería perforada 300 mm	$ 4.986.868,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de Malla Electrosoldada 15x15cm Diámetro 4.0mm (XY-084)	$ 5.956.848,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	$ 21.681.483,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, jarillones para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	$ 8.383.832,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
PRODUCTO 8. CONSTRUCCIÓN DE COLCHACRETO						
Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	$ 46.653,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Explanación y nivelación del terreno manualmente, bajo cualquier grado de humedad, incluye corte de taludes y terraceos requeridos según planos y/o definidos por la interventoría. Medido in situ. Incluye cargue y transporte interno.	$ 939.400,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de Geotextil NT 2500 o equivalentes. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo.	$ 1.086.076,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de gaviones por valores de 0.5x2.0x1.0 elaborados en geotextil de tejido plano. Incluye llenos con material proveniente de la excavación.	$ 3.202.008,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Construccion de Pavimento, colchacreto o equivalente, anclado al terreno y entre si segun diseño. Incluye suministro de concreto (21 Mpa) para Pavimento, colchacreto o equivalente.	$ 8.026.458,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Punto de Atención Prioritario No 4 en la vía Partidas a San Jose de la Montaña- San Andres de Cuerquia-Motores-Pescadero-Buenga (2SAN13-3) Km 73+638- Km 73+900						
PRODUCTO 1. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO						
Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión. Incluye vehículo para el transporte de personal y equipo con dedicación exclusiva.	$ 49.582.230,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Demolición de pavimento asfáltico, de cualquier espesor. Incluye corte con cortadora según trazado y cargue, transporte y disposición final de escombros.	$ 60.026.504,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, jarillones para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	$ 30.066.442,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, colocación, conformación y compactación de subbase granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	$ 69.123.316,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, colocación, conformación y compactación de base triturada, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	$ 98.739.532,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con correntigas.	$ 9.376.980,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y aplicación de emulsion asfaltica cationica de rompimiento rapido C.R.R-1 (C.R.R-60) para riego de liga segun normas para la construccion de pavimentos de INVIAS 421-22. incluye todo lo necesario para su correcta construccion y funcionamiento. Incluye recuperacion de superficie.	$ 7.431.480,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo denso MDC 19 que cumpla con el Artículo 450-22 de la norma INVIAS 2022. Incluye: colocación con terminadora (finisher), compactación y terminación de bordes. No incluye imprimación, el transporte de materiales, que se pagarán en su respectivo ítem. Su medida de pago será metro cúbico compacto medido en sitio.	$ 455.356.843,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	$ 261.190.488,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
PRODUCTO 2. CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN						
Descapote a máquina del terreno natural hasta 30 cm. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	$ 4.730.368,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	$ 4.680.014,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Excavación en roca de la explanación, comprende la excavación de masas de rocas hasta 30 cm de diámetro", fuertemente fisiladas que, debido a su buena cementación o alta consolidación, no es posible su división mecánica en la excavación. Incluye transporte, botada y disposición final de los materiales.	$ 719.022.544,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%

ACTIVIDAD	CANT. CONTRACTUAL/ M3D	CANT. EJECUTADA ACUM.	% ANTERIOR	% ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	$ 24.474.560,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Pilote en concreto de 28 MPA vaciado en sitio de diámetro 1,3 m. Incluye Camisa metálica recuperable, excavación y transporte y disposición final de material sobrante. El acero se pagará en su respectivo ítem.	$ 107.306.940,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de Geodren planar H=1.0 m	$ 28.676.160,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	$ 1.362.912,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Concreto Clase D (21 MPa). Barrera de contención tipo New Jersey, sección tipo unidireccional según diseño.	$ 22.962.045,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de perno helicoidal de anclaje pasivo. Incluye fluido de perforación y mortero de relleno.	$ 10.674.504,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Concreto Clase C (28 MPa). Dado de anclaje de cualquier dimensión. Incluye Suministro, transporte y colocación. El refuerzo se pagara en su item respectivo.	$ 306.093,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Concreto Clase C (28 MPa). Estribos, vigas cabezales y vigas de amarre. Incluye suministro, transporte, colocación, formaleta, obra falsa para puentes y demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	$ 265.851.492,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Concreto Clase C (28 MPa) para zapatas y vigas de fundación	$ 170.212.267,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de material Filtrante para construcción de filtros de 2" a 3" con canto rodado.	$ 3.797.250,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	$ 240.431.250,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de tubería de 2", perforada, revestida con geotextil NT 1800 para huraderos	$ 3.237.052,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, colocación, conformación y compactación de Base granular para lechos, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	$ 93.458.369,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	$ 539.607.600,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	$ 130.159.079,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, cortes, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	$ 121.071.800,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
PRODUCTO 3: CONTRUCCIÓN BOX CULVERT MAYOR Km 73+000						
Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	$ 10.602.300,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Descapote a máquina del terreno natural hasta 30 cm. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	$ 6.418.800,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Excavación en roca de tu explanación, comprende la excavación de masas de rocas hasta 30 cm de diámetro", fuertemente trituradas que, debido a su buena cementación o alta consolidación, no es posible su remoción mecánica en la excavación. Incluye transporte, botada y disposición final de los materiales	$ 32.638.016,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	$ 2.992.800,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, colocación, conformación y compactación de Base Granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	$ 19.277.581,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	$ 4.543.748,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Concreto Clase C (28 MPa). Box Culvert - Losa superior y muros laterales	$ 180.948.880,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Concreto Clase C (28 MPa). Canales en concreto.	$ 18.707.242,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase D (21 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	$ 5.236.970,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Colocación de CINTA PVC TIPO O-22 o equivalente, entre juntas de construcción de obras en concreto. Incluye el suministro de de la cinta y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento según especificaciones del proveedor.	$ 1.875.420,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de material filtrante para construcción de filtros de 2" a 3" con canto rodado.	$ 1.202.320,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de Geotextil NT 2500 o equivalente. No incluye excavación y llenos, los costos se pagan por su item respectivo.	$ 93.944,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de tubería perforada de 4" para drenaje con filtro. Incluye los accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	$ 1.823.017,20	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de Geodren planar H=2.0 m	$ 13.679.976,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	$ 85.018.989,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de viga HEA-340 con hincado mecanico en terreno según diseño. Incluye perfil metalico, ubicación en sitio, alineación e hincado.	$ 42.500.688,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%

ACTIVIDAD	CANT. CONTRACTUAL/MOD	CANT. EJECUTADA ACUM.	% ANTERIOR	% ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	$ 30.760.591,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	$ 37.060.491,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
PRODUCTO 4.CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT MENOR Box (1)=B13						
Descapote o maquina del terreno natural hasta 50 cm. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	$ 436.520,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Excavación en roca de la explanación, comprende la excavación de masas de roca hasta 30 cm de diámetro". Fuertemente fisiticadas que, debido a su buena cementación o alta consolidación, no es posible su división mecánica en la excavación. Incluye transporte, botada y disposición final de los materiales.	$ 21.000.816,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	$ 2.573.720,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, colocación, conformación y compactación de Base Granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	$ 13.884.110,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Concreto Clase F (14 MPa). Solados (e=0.05)-m	$ 2.595.896,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Concreto Clase C (28 MPa). Box Culvert - Losa superior y muros internos	$ 74.849.796,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas en concreto.	$ 23.108.946,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase D (21 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	$ 3.230.370,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Colocación de CINTA PVC TIPO O-23 o equivalente, entre juntas de construcción de obras en concreto. Incluye el suministro de de la cinta y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento según especificaciones del proveedor.	$ 2.070.744,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de material filtrante para construcción de filtros de 2" a 3" con canto rodado.	$ 2.254.350,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de Geotextil NT 2500 o equivalente. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo.	$ 214.318,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de tubería perforada de 4" para drenaje con filtro. Incluye los accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	$ 1.023.017,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de Geodren plano H=3.0 m	$ 29.244.448,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	$ 63.666.138,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de viga HEA-160 con hincado mecánico en terreno según diseño. Incluye perfil metálico, ubicación en sitio, alineación e hincado.	$ 7.088.418,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	$ 24.618.377,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	$ 22.236.301,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
PRODUCTO 5.CONSTRUCCIÓN CUNETA						
Excavación manual en material común. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	$ 1.741.860,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Concreto Clase D (21 MPa). Cunetas.	$ 17.561.473,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Material granular de 12 a 25 mm para filtro, cimentaciones o cama de tuberías. Incluye transporte interno, suministro, transporte e instalación de y todo lo necesario para su correcta instalación.	$ 2.782.395,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	$ 1.665.329,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	$ 3.743.657,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
PRODUCTO 6. CONSTRUCCIÓN FILTRO						
Excavación manual en material común. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	$ 1.741.860,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de Geotextil NT 2500 o equivalente. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo.	$ 5.824.960,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de material filtrante para construcción de filtros de 2" a 3" con canto rodado.	$ 9.115.060,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de tubería perforada de 4" para drenaje con filtro. Incluye los accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	$ 6.871.860,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material	$ 15.836.430,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m.	$ 3.743.657,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%

ACTIVIDAD	CANT. CONTRACTUAL/ MOD	CANT. EJECUTADA ACUM.	% ANTERIOR	% ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
PRODUCTO 7. CONSTRUCCIÓN DEL CANAL CPD						
Excavación en roca de la explanación, comprende la excavación de masas de rocas hasta 30 cm de diámetro*, fuertemente trituradas que, debido a su buena cementación o alta consolidación, no es posible su dimisión mecánica en la excavación, incluye transporte, botada y disposición final	$ 1.732.992,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. No incluye transporte	$ 1.377.000,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	$ 14.912.070,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	$ 5.760.259,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de esponjamiento).	$ 7.854.916,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
PRODUCTO 8. ESTABILIZACION DEL TALUD INFERIOR						
Desmonte y limpieza de zonas verdes existentes, incluye corte y descarcaje de seres existentes, cargue, retiro y transporte de material vegetal resultante. Esta actividad se realizará simultáneamente con la rocería de arbustos.	$ 27.445.344,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y siembra de Pasto Vetiver	$ 46.471.940,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Protección vegetal de taludes con tierra orgánica y semillas	$ 38.860.688,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro e instalación de malla para control de erosión TRM 500 y sus respectivos anclajes de fijación	$ 75.757.824,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de malla triple torsión recubierta en PVC, incluye instalación de la malla y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad, anclajes y pernos no pagarán en su item respectivo.	$ 116.357.376,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de pernos helicoidal de anclaje pasivo, incluye fluido de perforación y suministro de cilindros.	$ 1.927.341,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Punto de Atención Prioritaria de la vía Puente Gabino-Gomez Plata-El Guayabo-Carolina del Príncipe La Herradura Partido de Guadalupe-Guadalupe (No incluye tramo urbano de Gomez Plata) 62AM23-1. Km 81+870 Km 81+924						
PRODUCTO 1. CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO						
Localización, trazado y replanteo con equipo de precisión, incluye vehículo para el transporte de personal y equipo con dedicación exclusiva.	$ 40.682.230,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Demolición de pavimento asfáltico, de cualquier espesor. Incluye cortar con cortadora según trazado y cargue, transporte y disposición final de escombros	$ 5.850.949,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, colocación, conformación y compactación de Base Granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	$ 19.377.981,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 que cumpla con el Artículo 450-22 de la norma INVIAS 2022. Incluye colocación, con terminadora (finisher), compactación y terminación de bordes. No incluye imprimación, el transporte de materiales, que se pagarán en su respectivo ítem. Su medida de pago será metro cúbico compacto medido en sitio.	$ 53.368.824,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 400-23. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carrotanque.	$ 1.607.686,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de esponjamiento).	$ 19.803.924,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
PRODUCTO 2. CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCION Km 81+900						
Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado, incluye transporte y disposición final de los materiales.	$ 17.071.548,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 0-2 m, diámetro interno 1.2 m. Incluye anillo en concreto e=10cm 21 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4 m). Incluye transporte interno.	$ 39.589.672,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 2-4 m, diámetro interno 1.2 m. Incluye anillo en concreto e=10cm 21 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4 m). Incluye transporte interno.	$ 32.151.148,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 4-6 m, diámetro interno 1.2 m. Incluye anillo en concreto e=10cm 21 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4 m). Incluye transporte interno.	$ 34.679.580,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 6-8 m, diámetro interno 1.2 m. Incluye anillo en concreto e=10cm 21 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4 m). Incluye transporte interno.	$ 36.298.136,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 8-10 m, diámetro interno 1.2 m. Incluye anillo en concreto e=10cm 21 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4 m). Incluye transporte interno.	$ 38.858.370,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 10_12 m, diámetro interno 1.2 m. Incluye anillo en concreto e=10cm 21 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4 m). Incluye transporte interno.	$ 41.398.114,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%

ACTIVIDAD	CANT. CONTRACTUAL/ BOD	CANT. EJECUTADA ACUM.	% ANTERIOR	% ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 12-14 m, diámetro interno 1.2 m. Incluye anillo en concreto e=10cm f'c Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4 m). Incluye transporte interno.	$ 44.198.818,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 14-16 m, diámetro interno 1.2 m. Incluye anillo en concreto e=10cm f'c Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4 m). Incluye transporte interno.	$ 23.897.294,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. No incluye transporte.	$ 23.388.125,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidas a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	$ 42.483.899,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	$ 161.793.388,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Pila-pilote-caisson en concreto Clase C (28 MPa) fundido en sitio	$ 175.122.288,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	$ 2.585.856,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Colocación de CINTA PVC TIPO O-22 o equivalente, entre juntas de construcción de obras en concreto, incluye el suministro de de la cinta y todo lo necesario para su correcta colocación y fencarsamiento según especificaciones del proveedor.	$ 6.025.896,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de Geodren plano H=2.0 m	$ 8.086.952,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de tubería de 2", perforada, recubierta con geotextil NT 2000 para filtraderos.	$ 254.024,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Lleno con material no clasificado de río para filtro Geodren. Incluye suministro, transporte y colocación	$ 5.947.029,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de tubería perforada 300 mm	$ 2.300.157,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	$ 258.698.225,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidas a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	$ 94.500.940,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
PRODUCTO 3. ESTABILIZACIÓN DE TALUD						
Desmonte y limpieza de zonas verdes existentes, incluye corte y desenraice de setos existentes, cargue, retiro y transporte de material vegetal resultante. Esta actividad se realizará simultáneamente con la recería de arbustos.	$ 50.780.280,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Construcción de drenes horizontales según diseño, incluye perforación en suelo con fragmentos rocosos mineralizados por medio de sistemas electromecánicos en un diámetro de 3", el suministro, transporte y colocación de tubería PVC sanitaria de 6" con perforada y ranurada, uniones, geotextil NT1600 y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	$ 40.359.360,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Revegetalización de taludes con agromanto de tique con Brachiaria decumbens, para sembrar en sitios con alturas hasta 2.000 msnm	$ 57.753.675,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y siembra de Pasto Vetiver	$ 62.191.975,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Construcción de trinchos en madera	$ 23.949.475,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	$ 2.992.606,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
PRODUCTO 4. CONSTRUCCIÓN CANAL (CPO)						
Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	$ 1.992.446,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	$ 777.826,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte e instalación de tubería PVC E 3/0" para Gaviones en estructuras.	$ 339.606,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro y colocación de material filtrante para construcción de filtros de 3/0" con canto rodado. No incluye transporte.	$ 545.130,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Concreto Clase H (Dentellon con concreto clase D - 21 MPa y Piedra de 3" a 4")	$ 686.476,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	$ 20.909.020,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	$ 7.515.770,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidas a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	$ 459.774,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 2000 m medidas a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	$ 3.743.214,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%

ACTIVIDAD	CANT. CONTRACTUAL/ MOD	CANT. EJECUTADA ACUM	% ANTERIOR	% ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
PRODUCTO 5. CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA						
Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	$ 2.332.517,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Retiro de tubería existente de 24", sin excavación	$ 312.060,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	$ 947.585,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	$ 1.077.120,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanja, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	$ 399.284,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 36"	$ 21.202.410,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	$ 17.060.800,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	$ 19.626.469,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	$ 5.526.708,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	$ 1.212.981,00	$ -	0,0%	0,00%		0,00%

SEGUIMIENTO CURVA S

GENERAL

Atraso >= 5%	Atraso < 5%	Adelanto < 5%	Adelanto >= 5%
Semana	Avance Programado Línea Base	Avance Programado Reprogramación	Avance Ejecutado
S1-2026 *	0,00%		0,00%
S2-2026	0,00%		0,00%
S3-2026	0,00%		0,00%
S4-2026	0,16%		0,00%
S5-2026	2,12%		1,00%
S6-2026	4,82%		
S7-2026	5,59%		
S8-2026	6,81%		
S9-2026	6,76%		
S10-2026	8,03%		
S11-2026	12,30%		
S12-2026	15,92%		
S13-2026	20,04%		
S14-2026	25,86%		
S15-2026	30,25%		
S16-2026	40,71%		
S17-2026	41,73%		
S18-2026	40,71%		
S19-2026	56,86%		
S20-2026	59,11%		
S21-2026	64,28%		
S22-2026	68,61%		
S23-2026	74,88%		
S24-2026	77,88%		
S25-2026	80,39%		
S26-2026	82,91%		
S27-2026	85,47%		
S28-2026	87,47%		
S29-2027	90,92%		
S30-2027	93,96%		
S31-2027	94,56%		
S32-2027	95,49%		
S33-2027	96,24%		
S34-2027	97,82%		
S35-2027	98,45%		
S36-2027	99,22%		
S37-2027	100,00%		

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría Operativa

INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA INTERVENCION DE PUNTOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana 55-2026 Del 20/07/2026 al 26/07/2026

Observaciones Generales

* Se da acta de inicio el 23 de junio de 2026 tanto para obra , como para interventoria

* se realizan La reunion de inicio el 23 de junio de 2026

*Se lleva a cabo varias mesas de trabajo con el contratista para que realicen los ajustes pertinentes en cuanto a las ojas de vida del personal administrayivo, ajustes a la programacion inicial , y ademaas se realiza la solicitud de varios documentos faltante.

* El dia 15 de Julio de 2026 se llevó a cabo en la localidad de Ituango el comité técnico de obra No. 2. En él, participó el personal profesional de la Supervisión del Departamento, de la Interventoría y del Contratista de obra. El orden del día, los temas tratados y los compromisos pactados se encuentran consignados en el acta de comité llevado a cabo en este día.

* Se observo lentitud por parte del contratista en atender y resolver todos los asuntos administrativos requeridos y exigidos contractualmente, como fase previa a la ejecución misma de las obras.

* El Contratista de obra tramita con lentitud todas las acciones necesarias para la implementación de sus instalaciones provisionales.

Actividades Permisos y Licencias

Se realiza visita por parte del area forestal de la gobernacion de antioquia , para adelantar el permiso de aprovechamiento forestal

Descripción de las Actividades Ejecutadas esta Semana

ACTIVIDADES SEMANALES TECNICAS

* Fabricación en obra de la señalización provisional, prevista en cada PMT.
* Localización Topográfica del las estructuras proyectadas en los PAPs 2 y 3 y su diseño geométrico de la vía.
* Desmonte y limpieza de zonas verdes existentes, incluyendo desenraice de setos existentes y rocería de arbustos. Esto, para PAPs 2 y 3.



Fotografía 1. Condición inicial de PAP 4 . Sin actividad.



Fotografía 2. Condición inicial de PAP 4 . Sin actividad.



Fotografía 3. PAP 3 . Desmonte y limpieza de zonas verdes existentes, desenraice de setos existentes y rocería de arbustos.



Fotografía 4. PAP 3 . Trabajos de topografía.



Fotografía 5. Condición inicial de PAP 2 . Sin actividad.



Fotografía 6. Rocería en ancole Box PAP 2

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Secretaría De Infraestructura Física

Subsecretaría Operativa

INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO


OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA INTERVENCION DE PUNTOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana	05-2026	Del	20/07/2026	al	26/07/2026

RESUMEN GRAFICO - AVANCE DE ACTIVIDADES

Avance Financiero Programado	$	224.037.053	2,12%
Avance Financiero Ejecutado	$	23.024.715	0,22%
Anticipo	$	-	0,00%
Facturado	$	-	0,00%
Potencial de Facturación	-$	23.024.715	

CURVA S AVANCE FINANCIERO DE OBRA

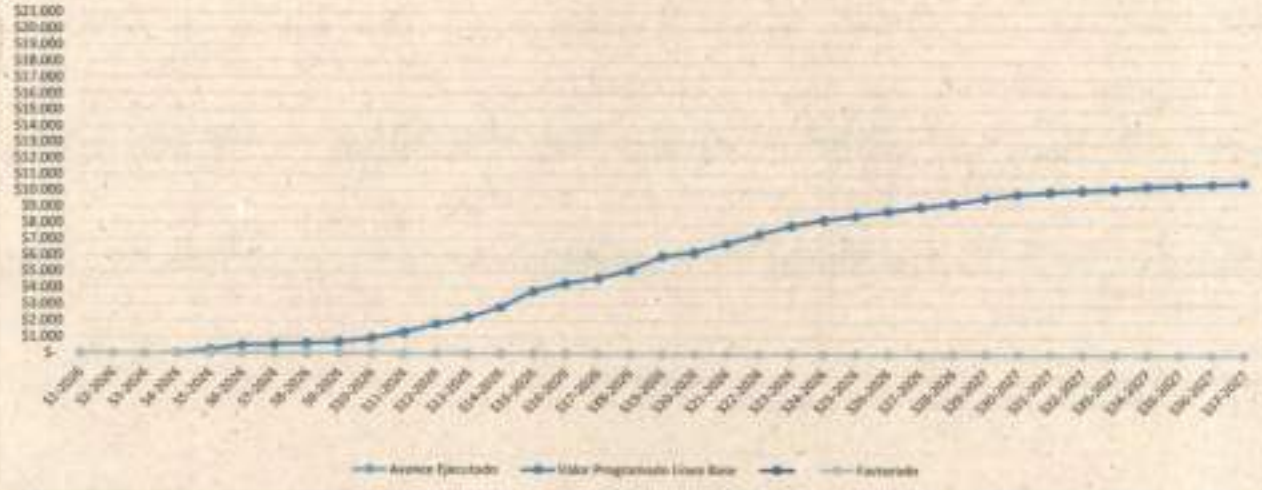

SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATADO	$	10.556.379.435
VALOR ADICIONAL POR MAYORES CANTIDADES EJECUTADAS EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$	-
VALOR DE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS O MENORES CANTIDADES EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$	-
VALOR POR PROYECCION DE NUEVAS OBRAS (OBRAS EXTRAS)	$	-
VALOR TOTAL PROYECTO	$	**10.556.379.435**

SEGUIMIENTO CURVA S						
			Atraso >= 5%	Atraso < 5%	Adelanto < 5%	Adelanto >= 5%
Semana	Valor Programado Linea Base		% Programado	Avance Ejecutado	% Ejecutado	Facturado
S1-2026	$ -		0,00%	$ -	0,00%	$ -
S2-2026	$ -		0,00%	$ -	0,00%	$ -
S3-2026	$ -		0,00%	$ -	0,00%	$ -
S4-2026	$ 15.532.689		0,15%	$ -	0,00%	$ -
S5-2026	$ 224.037.653		2,12%	$ 23.024.715	0,22%	$ -
S6-2026	$ 508.805.423		4,82%		0,00%	$ -
S7-2026	$ 558.046.967		5,29%		0,00%	$ -
S8-2026	$ 624.184.700		5,91%		0,00%	$ -
S9-2026	$ 714.090.482		6,76%		0,00%	$ -
S10-2026	$ 953.589.629		9,03%		0,00%	$ -
S11-2026	$ 1.298.013.381		12,30%		0,00%	$ -
S12-2026	$ 1.786.174.961		16,92%		0,00%	$ -
S13-2026	$ 2.210.734.421		20,94%		0,00%	$ -
S14-2026	$ 2.834.956.636		26,86%		0,00%	$ -
S15-2026	$ 3.826.554.811		36,25%		0,00%	$ -
S16-2026	$ 4.303.993.439		40,77%		0,00%	$ -
S17-2026	$ 4.618.233.387		43,75%		0,00%	$ -
S18-2026	$ 5.142.422.300		48,71%		0,00%	$ -
S19-2026	$ 5.996.385.442		56,80%		0,00%	$ -
S20-2026	$ 6.239.429.236		59,11%		0,00%	$ -
S21-2026	$ 6.785.998.113		64,28%		0,00%	$ -
S22-2026	$ 7.348.639.245		69,61%		0,00%	$ -
S23-2026	$ 7.884.334.774		74,69%		0,00%	$ -
S24-2026	$ 8.220.935.147		77,88%		0,00%	$ -
S25-2026	$ 8.465.838.964		80,39%		0,00%	$ -
S26-2026	$ 8.752.805.208		82,91%		0,00%	$ -
S27-2026	$ 9.022.464.580		85,47%		0,00%	$ -
S28-2026	$ 9.233.828.340		87,47%		0,00%	$ -
S29-2027	$ 9.566.511.975		90,62%		0,00%	$ -
S30-2027	$ 9.826.006.252		93,08%		0,00%	$ -
S31-2027	$ 9.961.644.502		94,56%		0,00%	$ -
S32-2027	$ 10.080.271.129		95,48%		0,00%	$ -
S33-2027	$ 10.159.735.147		96,24%		0,00%	$ -
S34-2027	$ 10.326.588.850		97,82%		0,00%	$ -
S35-2027	$ 10.392.653.261		98,45%		0,00%	$ -
S36-2027	$ 10.473.850.226		99,22%		0,00%	$ -
S37-2027	$ 10.566.379.436		100,00%		0,00%	$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría Operativa

INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA INTERVENCION DE PUNTOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana	S5-2026	Del	20/07/2026	al	26/07/2026

RESUMEN GRAFICO - AVANCE DE ACTIVIDADES

Avance Financiero Programado	$	-	10,00%
Avance Financiero Ejecutado	$	39.328.506	2,60%
Anticipo	$	-	
Facturado	$	-	0,00%
Potencial de Facturación	-$	39.328.506	

CURVA S AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA



SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATADO	$	1.512.855.363
VALOR ADICIONAL POR MAYORES CANTIDADES EJECUTADAS EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$	-
VALOR DE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS O MENORES CANTIDADES EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$	-
VALOR POR PROYECCION DE NUEVAS OBRAS (OBRAS EXTRAS)	$	-
VALOR TOTAL PROYECTO	**$**	**1.512.855.363**

SEGUIMENTO CURVA S						
			Atraso >= 5%	Atraso < 5%	Adelanto < 5%	Adelanto >= 5%
Semana	Valor Programado Linea Base		% Programado	Avance Ejecutado	% Ejecutado	Facturado
S1-2026	$ -		0,00%	$ 4.916.063	0,32%	
S2-2026	$ 37.821.384		2,50%	$ 13.519.174	0,89%	
S3-2026	$ 75.642.768		5,00%	$ 22.122.285	1,46%	
S4-2026	$ 113.464.152		7,50%	$ 30.725.395	2,03%	
S5-2026	$ 151.285.536		10,00%	$ 39.328.506	2,60%	
S6-2026	$ 189.106.920		12,50%		0,00%	
S7-2026	$ 226.928.304		15,00%		0,00%	
S8-2026	$ 264.749.689		17,50%		0,00%	
S9-2026	$ 302.571.073		20,00%		0,00%	
S10-2026	$ 340.392.457		22,50%		0,00%	
S11-2026	$ 378.213.841		25,00%		0,00%	
S12-2026	$ 416.035.225		27,50%		0,00%	
S13-2026	$ 453.856.609		30,00%		0,00%	
S14-2026	$ 491.677.993		32,50%		0,00%	
S15-2026	$ 529.499.377		35,00%		0,00%	
S16-2026	$ 567.320.761		37,50%		0,00%	
S17-2026	$ 605.142.145		40,00%		0,00%	
S18-2026	$ 642.963.529		42,50%		0,00%	
S19-2026	$ 680.784.913		45,00%		0,00%	
S20-2026	$ 718.606.297		47,50%		0,00%	
S21-2026	$ 756.427.682		50,00%		0,00%	
S22-2026	$ 794.249.066		52,50%		0,00%	
S23-2026	$ 832.070.450		55,00%		0,00%	
S24-2026	$ 869.891.834		57,50%		0,00%	
S25-2026	$ 907.713.218		60,00%		0,00%	
S26-2026	$ 945.534.602		62,50%		0,00%	
S27-2026	$ 983.355.986		65,00%		0,00%	
S28-2026	$ 1.021.177.370		67,50%		0,00%	
S29-2027	$ 1.058.998.754		70,00%		0,00%	
S30-2027	$ 1.096.820.138		72,50%		0,00%	
S31-2027	$ 1.134.641.522		75,00%		0,00%	
S32-2027	$ 1.172.462.906		77,50%		0,00%	
S33-2027	$ 1.210.284.290		80,00%		0,00%	
S34-2027	$ 1.248.105.674		82,50%		0,00%	
S35-2027	$ 1.285.927.059		85,00%		0,00%	
S36-2027	$ 1.323.748.443		87,50%		0,00%	
S37-2027	$ 1.361.569.827		90,00%		0,00%	
S38-2027	$ 1.399.391.211		92,50%		0,00%	
S39-2027	$ 1.437.212.595		95,00%		0,00%	
S40-2027	$ 1.475.033.979		97,50%		0,00%	
S41-2027	$ 1.512.855.363		100,00%		0,00%	

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría Operativa
INFORME SEMANAL - EMPLEABILIDAD

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA INTERVENCION DE PUNTOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana	S5-2026	Del	20/07/2026	al	26/07/2026

	Gobernación	Contratista Interventoría	Contratista Obra	Subcontratistas	Total	Incidencia Total
Ingresos	**4**	**6**	**13**	**0**	**23**	
Profesionales	4	5	4	0	13	56,5%
Tecnólogos	0	1	2	0	3	13,0%
Operativos	0	0	6	0	6	26,1%
Administrativos	0	0	1	0	1	4,3%
Retiros	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Profesionales	0	0	0	0	0	
Tecnólogos	0	0	0	0	0	
Operativos	0	0	0	0	0	
Administrativos	0	0	0	0	0	
Activos	**4**	**6**	**13**	**0**	**23**	
Profesionales	4	5	4	0	13	56,5%
Tecnólogos	0	1	2	0	3	13,0%
Operativos	0	0	6	0	6	26,1%
Administrativos	0	0	1	0	1	4,3%
Caracterización						
Hombres	2	3	13	0	18	78,3%
Mujeres	2	3	0	0	5	21,7%
Primer Empleo	0	0	0	0	0	
Discapacitado	0	0	0	0	0	
Indígenas	0	0	0	0	0	
LGTBI	0	0	0	0	0	
Afrodescendiente	0	0	0	0	0	
Localización						
De la Subregión	0	1	3	0	4	17,4%
De Antioquia	3	4	0	0	7	30,4%
Fuera de Antioquia	1	1	10	0	12	52,2%

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Secretaría De Infraestructura Física Subsecretaría Operativa **INFORME SEMANAL - VARIOS**

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA INTERVENCION DE PUNTOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana	55-2026	Del	20/07/2026	al	26/07/2026

Informe Ambiental

Actividades en campo

La interventoría Consorcio LGI Ituango en compañía del contratista de obra Consorcio Vial Regional Antioquia 2026, realizó recorridos por los puntos los P.A.P 2, 3 Y 4, con el objetivo de identificar y planificar las medidas a implementar antes y durante la ejecución de las actividades constructivas.

Actividades Administrativas:

*Revisión del Plan de Manejo Ambiental, presentado por el contratista de obra Consorcio Vial Regional Antioquia 2026 y socialización de las observaciones realizadas al mismo con el residente ambiental.

*Revisión y socialización con el residente ambiental del contratista de obra Consorcio Vial Regional Antioquia 2026, los permisos de ocupación de cauces, otorgados al proyecto, la Guia de Manejo Social, Ambiental, y de Seguridad y Salud en el Trabajo, para Proyectos de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia, la inversión ambiental y los formatos de la entidad contratante a implementar.

*Solicitud al contratista de obra Consorcio Vial Regional Antioquia 2026, la gestión de las unidades sanitarias, los puntos ecológicos y demás elementos requeridos para el inicio de las actividades constructivas

*Acercamiento por parte de la interventoría Consorcio LGI Ituango con la empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Ituango S.A.E.S.P "Servituango", con el objetivo consultar los días de recolección de los residuos sólidos en el casco urbano, para garantizar la adecuada gestión de los generados en la oficina de la interventoría.

*El día veinte tres (23) de julio de 2026, la profesional residente ambiental de la interventoría Consorcio LGI Ituango, capacitó al resto de profesionales de la interventoría en el código de colores obligatorio a nivel nacional, para la separación de residuos en la fuente, según la Resolución 2184 de 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

*Participación en el primer comité de obra.

*Elaboración y presentación del informe semanal.

REGISTRO FOTOGRÁFICO GESTIÓN AMBIENTAL- ITUANGO



Fotografía 1. Capacitacion al equipo de interventoría en el manejo en la gestión adecuado del manejo de residuos sólidos.



Fotografía 2. Socialización de la inversión ambiental con el contratista de obra.



Fotografía 3. Seguimiento al inicio de la instalación del punto ecológico en el campamento del contratista de obra.

INFORME FORESTAL -ITUANGO

Actividades en campo.

El día veinte tres (23) de julio de 2026, la interventoría Consorcio LGI Ituango, realizó recorrido por los P.A.P número 2 y 4, en compañía del contratista de obra "Consorcio Vial Regional Antioquia 2026" y de las profesionales Luisa Fernanda Gómez Gómez y Verónica Martínez Trujillo, en calidad de coordinadora ambiental e ingeniera forestal respectivamente de la entidad contratante, con el objetivo de identificar los individuos arbóreos que se encuentran en los P.A.P, anteriormente mencionados, de los cuales se requiere permiso de aprovechamiento forestal, para poder adelantar las actividades constructivas, contempladas en el proyecto e identificación de los nidos de los pájaros guáimbos existentes en dos (2) de los árboles asistentes en el P. A.P 4.

Actividades Administrativas:

Socialización con el contrista de obra Consorcio Vial Regional Antioquia 2026, la importancia de gestionar los permisos para la disposición de sobrantes de rocería y desmonte, requeridos para el inicio de la obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO GESTIÓN FORESTAL - ITUANGO



Fotografía 1. Medición de individuos arbóreos en P.A.F 4, requerido para tala.



Fotografía 2. Identificación de individuos arbóreos requeridos para tala, en el P.A.F 3.



Fotografía 3. Medición de individuos arbóreos, en el P.A.F 2.

INFORME SOCIAL -ITUANGO

* Se realizan recorridos de campo en compañía del área social del contratista para el reconocimiento del entorno del proyecto.
* Se reciben piezas informativas para revisión y remisión a la oficina de comunicaciones de la Gobernación de Antioquia.
* Se hacen recomendaciones de ajustes al plan de manejo social, actas de entorno y piezas informativas para revisión.
*Se recibe y se remite pieza informativa de invitación para reunión de inicio de actividades.
*Se participa en comité de obra N°1, donde se recomienda al profesional social, los ajustes a todos los preliminares entregados para aprobación.
*Se realiza recorrido de obra con profesionales de contratista y de Gobernación de Antioquia en donde se deja como compromiso el gestionar los permisos de intervención en predios privados para para la tala de algunos individuos arbóreos, para la posterior gestión de aprovechamientos forestales y demas requisitos en dichos predios.

REGISTRO FOTOGRÁFICO SST



Fotografía 1. Recorrido de obra con supervisión técnica de Gobernación de Antioquia



Fotografía 2. Participación en comité de obra



Fotografía 3. Recorrido con áreas ambiental y forestal de la Gobernación de Antioquia



Fotografía 4. recorrido con áreas ambiental y forestal de la Gobernación de Antioquia



Fotografía 5. Recorrido con áreas ambiental y forestal de la Gobernación de Antioquia

Informe SST

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS :

* Durante la semana, desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se desarrollaron actividades de carácter administrativo, incluyendo la emisión de oficios y el envío de comunicaciones por correo electrónico relacionadas con los requisitos mínimos para la ejecución de trabajos de alto riesgo, así como observaciones sobre la entrega oportuna de la documentación del personal previa a su ingreso al proyecto.

Actividades SST operativas

Durante los recorridos de obra realizados en la semana, desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se ejecutaron las siguientes actividades:

* Se evidencia la entrega y el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) por parte del personal, conforme a los riesgos asociados a las actividades ejecutadas.
* Se constató la implementación de señalización preventiva mediante cinta de peligro en las áreas con riesgo de caída a diferente nivel.
* Se observó el mantenimiento de condiciones adecuadas de orden y aseo en los diferentes frentes de trabajo, contribuyendo al control de riesgos locativos.
* Se verificó el avance en la adecuación de la oficina administrativa del contratista para el desarrollo de las actividades del proyecto.
* Se revisó la gestión adelantada para la elaboración de la dotación institucional, en cumplimiento del Manual de Identidad e Imagen de la Gobernación de Antioquia.
* Se identificó la aplicación de prácticas de autocuidado por parte del personal operativo y administrativo durante el desarrollo de las actividades en las instalaciones del proyecto.
* Se realizó acompañamiento por parte del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la interventoría al contratista, orientado al fortalecimiento de las medidas de control frente a los riesgos locativos y a la implementación de las condiciones mínimas de seguridad para la ejecución de trabajos de alto riesgo (TAR).
* Solicitud al contratista de la designación del profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para el inicio de actividades, garantizando la implementación, administración y seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.
* Implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para la gestión y control de la movilidad en el área de intervención, garantizando la instalación de la señalización preventiva, condiciones seguras para usuarios de la vía y trabajadores, conforme al Manual de Señalización Vial vigente.

Por parte del equipo de la interventoría, se continua con el proceso de diseño, implementación y fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), conforme a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente y a las necesidades del proyecto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO SST



Fotografía 1. Inspección de puntos críticos y acompañamiento técnico para la identificación de puntos de anclaje destinados a trabajos en alturas (TAR).



Fotografía 2. Instalación de cinta de peligro en P.A.P 4 como medida de señalización preventiva.



Fotografía 3. Instalación de cinta de peligro en P.A.P 4 delimitación de zonas con riesgo de caída a diferente nivel.



Fotografía 4. Inspección de elementos de protección personal (EPP) del personal de la interventoría.



Fotografía 5. Instalación de cinta de peligro en P.A.P 2 delimitación de zonas con riesgo de caída a diferente nivel.



Fotografía 5. Charla de seguridad enfocada en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de medidas de prevención durante las

Informe Jurídico

No se adelantan procesos jurídicos hasta el momento.

Seguimiento a los Riesgos

No se evidencian nuevos riesgos

Seguimiento al Plan de Gerencia

Se encuentra en revisión por parte de la interventoría, sin embargo apenas se realice las observaciones y ajustes, el contratista debera presentar informe de seguimiento a el mismo, donde la interventoría pueda también hacer seguimiento durante la ejecución del contrato.

Anexo 4

Registro Fotográfico

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DIRECCIÓN DE DESARROLLO FÍSICO
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA No:	2600111B2860 DE 2026	**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL REGIONAL ANTIOQUIA 2026
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	Del 23 de Junio al 25 de Julio de 2026	**PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA INTERVENCION DE PUNTOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	23SS111B1412 de 2026	**INTERVENTOR: CONSORCIO LGI ITUANGO**

REGISTRO FOTOGRAFICO

(25AN11-1) Las Partidas a San José de la Montana -San Andrés de Cuerquia-Matanzas-Pescadero-Ituango



ANTES: PAP2 K82+000 sin intervencion



ANTES: PAP2 K82+000 sin intervencion



ANTES: PAP2 K82+000 sin intervencion

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DIRECCIÓN DE DESARROLLO FÍSICO
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA No:	2600111B2860 DE 2026	**CONTRATISTA:**CONSORCIO VIAL REGIONAL ANTIOQUIA 2026
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	Del 23 de Junio al 25 de Julio de 2026	**PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA INTERVENCION DE PUNTOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	23SS111B1412 de 2026	**INTERVENTOR: CONSORCIO LGI ITUANGO**

REGISTRO FOTOGRAFICO

(25AN11-1) Las Partidas a San José de la Montana -San Andrés de Cuerquia-Matanzas-Pescadero-Ituango



ANTES:PAP2 K82+000 sin intervencion



ANTES:PAP3 K76+300 sin intervencion



ANTES:PAP3 K76+300 sin intervencion

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DIRECCIÓN DE DESARROLLO FÍSICO
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA No:	2600111B2660 DE 2026	**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL REGIONAL ANTIOQUIA 2026
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	Del 23 de Junio al 25 de Julio de 2026	**PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA INTERVENCION DE PUNTOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	23SS111B1412 de 2026	**INTERVENTOR: CONSORCIO LGI ITUANGO**

REGISTRO FOTOGRAFICO

(25AN11-1) Las Partidas a San José de la Montana -San Andrés de Cuerquia-Matanzas-Pescadero-Ituango



DURANTE: PAP 3 K76+300 Se realiza Roceria



DURANTE: PAP 3 K76+300 Se realiza Roceria y se delimita el punto



DURANTE: PAP 3 K76+300 Se realiza Roceria

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DIRECCIÓN DE DESARROLLO FÍSICO
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA No:	2600111B2860 DE 2026	**CONTRATISTA:**CONSORCIO VIAL REGIONAL ANTIOQUIA 2026
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	Del 23 de Junio al 25 de Julio de 2026	**PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA INTERVENCION DE PUNTOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	23SS111B1412 de 2026	**INTERVENTOR: CONSORCIO LGI ITUANGO**

REGISTRO FOTOGRAFICO

(25AN11-1) Las Partidas a San José de la Montana -San Andrés de Cuerquia-Matanzas-Pescadero-Ituango

		
DURANTE: PAP 3 K76+300 Se realiza Roceria y se inicia con la instalacion de señalizacion	**DURANTE:**PAP 3 K76+300 Se realiza Roceria	**DURANTE:** PAP 3 K76+300 Se realiza Roceria

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DIRECCIÓN DE DESARROLLO FÍSICO
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA No:	2600111B2860 DE 2026	**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL REGIONAL ANTIOQUIA 2026
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	Del 23 de Junio al 25 de Julio de 2026	**PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA INTERVENCION DE PUNTOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	23SS111B1412 de 2026	**INTERVENTOR: CONSORCIO LGI ITUANGO**

REGISTRO FOTOGRAFICO

(25AN11-1) Las Partidas a San José de la Montana -San Andrés de Cuerquia-Matanzas-Pescadero-Ituango



DURANTE: PAP 3 K76+300 Se realiza localizacion del punto



DURANTE: PAP 3 K76+300 Se realizaverificacion de actividades en obra



DURANTE: PAP 3 K76+300 Se realizaverificacion de actividades en obra

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DIRECCIÓN DE DESARROLLO FÍSICO
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA No:	2600111B2860 DE 2026	**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL REGIONAL ANTIOQUIA 2026
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	Del 23 de Junio al 25 de Julio de 2026	**PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA INTERVENCION DE PUNTOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	23SS111B1412 de 2026	**INTERVENTOR: CONSORCIO LGI ITUANGO**

REGISTRO FOTOGRAFICO

(25AN11-1) Las Partidas a San José de la Montana -San Andrés de Cuerquia-Matanzas-Pescadero-Ituango



ANTES: PAP 4 K73+900 SIN INTERVENCION



ANTES: PAP 4 K73+900 SIN INTERVENCION



ANTES: PAP 4 K73+900 SIN INTERVENCION

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DIRECCIÓN DE DESARROLLO FÍSICO
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA No:	2600111B2860 DE 2026	**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL REGIONAL ANTIOQUIA 2026
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	Del 23 de Junio al 25 de Julio de 2026	**PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA INTERVENCION DE PUNTOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	23SS111B1412 de 2026	**INTERVENTOR: CONSORCIO LGI ITUANGO**

REGISTRO FOTOGRAFICO

(25AN11-1) Las Partidas a San José de la Montana -San Andrés de Cuerquia-Matanzas-Pescadero-Ituango



ANTES: PAP 4 K73+900 SIN INTERVENCION



ANTES: PAP 4 K73+900 SIN INTERVENCION



ANTES: PAP 4 K73+900 SIN INTERVENCION

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DIRECCIÓN DE DESARROLLO FÍSICO
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA No:	2600111B2860 DE 2026	**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL REGIONAL ANTIOQUIA 2026
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	Del 23 de Junio al 25 de Julio de 2026	**PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA INTERVENCION DE PUNTOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	23SS111B1412 de 2026	**INTERVENTOR: CONSORCIO LGI ITUANGO**

REGISTRO FOTOGRAFICO

(25AN11-1) Las Partidas a San José de la Montana -San Andrés de Cuerquia-Matanzas-Pescadero-Ituango

		
Construccion de señalizacion provisional		

Anexo 5

Ensayos de laboratorio y Análisis

Debido a que para el corte del presente informe no se realizaron actividades , para realizar algún tipo de ensayo , no se anexa información

Anexo 6

Programación de obra

Id		ÍTEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
1			**PRESUPUESTO SAN JOSE DE LA MONTANA-SAN ANDRES DE CUERQUIA-MATANZAS**		**0**	**240 días**	**mar 23/06/26**		**vie 26/02/27**	**$ 10.556.379.435,...**	
2			**FRENTE 1- PAP2**		**0**	**190 día**	**mar 23/06/2**		**jue 07/01/27**	**$ 1.603.946.423...**	
3			**PRODUCTO 1. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**		**0**	**102 días**	**mar 23/06/26**		**mar 06/10/26**	**$ 576.172.970,00**	
4		0.00	ALISTAMIENO Y LOGISTIA - AFILIACIONES - CAMPAMENTOS -		0	20 días	mar 23/06/26		lun 13/07/26	$ 0,00	5
5		1.1	Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión. Incluye vehiculo para el transporte de personal y equipo con dedicación exclusiva.	día	30	30 días	mar 14/07/26	4	vie 14/08/26	$ 40.582.230,00	15CC;6CC+ días;8FC+1 días
6		2.3	Demolición de pavimento asfáltico, de cualquier espesor. Incluye corte con cortadora según trazado y cargue, transporte y disposición final de	m3	15	5 días	mié 22/07/26	5CC+7 días	dom 26/07/26	$ 2.140.590,00	7FC+1 día
7		13.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Kn	705	14 días	mar 28/07/26	6FC+1 día	mar 11/08/26	$ 1.317.645,00	

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	

Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
8	5.1.6	Suministro, colocación, conformación y compactación de Subbase granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	281	6 días	lun 31/08/26	5FC+15 días	sáb 05/09/26	$ 42.783.374,00	9FC+14 días
9	5.1.4	Suministro, colocación, conformación y compactación de Base Granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	176	6 días	dom 20/09/26	8FC+14 días	vie 25/09/26	$ 35.160.048,00	10;13CC+2 días
10	7.1.1	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta const	m2	1170	5 días	sáb 26/09/26	9	mié 30/09/26	$ 5.805.540,00	11;12
11	7.1.1.1	Suministro, transporte y aplicacion de emulsion asfaltica cationica de rompimiento rapido C.R.R-1 (C.R.R-60) para riego de liga segun normas para la construccion de pavimentos de INVIAS 421-22- incluye todo lo necesario para su correcta construccion y fun	m2	1170	3 días	jue 01/10/26	10	sáb 03/10/26	$ 4.600.440,00	

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id		ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
12		7.1.2	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 que cumpla con el Artículo 450-22 de la norma INVIAS 2022. Incluye: colocación con terminadora (finisher), compactación y terminación de bordes. No incluye	m3	158	6 días	jue 01/10/26	10	mar 06/10/26	$ 263.493.756,00	
13		13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Kn	96463	14 días	mar 22/09/26	9CC+2 días	lun 05/10/26	$ 180.289.347,00	
14			**PRODUCTO 2. CONTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN K 82+000**		**0**	93 días	**mar 14/07/26**		**dom 18/10/26**	**$ 324.532.882,00**	
15		15.9	Desmonte y limpieza de zonas verdes existentes. Incluye corte y desenraice de setos existentes, cargue, retiro y transporte de material vegetal resultante. Esta actividad se realizará simultáneamente con la rocería de	m2	149	3 días	mar 14/07/26	5CC	jue 16/07/26	$ 2.036.532,00	18FC+1 día;27FC+7 días;47FC+ días;16FC+ días
16		2.8	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	6	5 días	mar 21/07/26	15FC+3 días	sáb 25/07/26	$ 1.272.282,00	29FC+7 días

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
17	4.2.3	Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. No incluye transporte.	m3	117	8 días	lun 14/09/26	24FF-3 días	lun 21/09/26	$ 6.712.875,00	69FC-1 día;21FC+5 días;28FC+ días
18	6.1.8	Pilote en concreto Clase C (28 MPa) de diámetro interior 1.20 m. Incluye anillo E=0.15 m en concreto Clase D y excavación	m	34	43 días	sáb 18/07/26	15FC+1 día	mar 01/09/26	$ 115.663.784,00	19FC+1 día;22CC+3 días;20FC-7 días;32FC+
19	6.1.18.1	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	32	4 días	jue 03/09/26	18FC+1 día	dom 06/09/26	$ 1.210.944,00	
20	6.1.24.1	Concreto Clase C (28 MPa) para zapatas y vigas de fundación	m3	11	14 días	mié 26/08/26	18FC-7 días	mar 08/09/26	$ 10.430.343,00	23CC
21	6.2.12.2	Concreto Clase C (28 MPa). Barrera de contención tipo New Jersey, seccion tipo unidireccional según diseño.	m3	5	21 días	dom 27/09/26	17FC+5 días	dom 18/10/26	$ 5.832.305,00	
22	11.5	Fijación epóxica de 1" en perforación de 1 1/8". Incluye perforación, limpieza, aplicación de epóxico e instalación de varilla corrugada de 1". Sólo se mide longitud de anclaje. El acero libre está considerado en el costo total de la	cm	4200	20 días	mié 22/07/26	18CC+3 días	mar 11/08/26	$ 12.595.800,00	
23	6.1.24.1	Concreto Clase C (28 MPa) para zapatas y vigas de fundación	m3	13	8 días	mié 26/08/26	20CC	mié 02/09/26	$ 12.326.769,00	24FC+7 días

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id		ÍTEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
24		6.2.24	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y	m3	31	15 días	jue 10/09/26	23FC+7 días	jue 24/09/26	$ 35.321.090,00	25FC+2 días;17FF-3 días
25		8.9	Suministro, transporte e Instalación de Geotextil NT 2500 o equivalente. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo.	m2	176	16 días	dom 27/09/26	24FC+2 días	mar 13/10/26	$ 2.901.536,00	26CC
26		8.30	Suministro, transporte y colocación de tubería de 2", perforada, recubierta con geotextil NT 2000 para lloraderos.	m	41	15 días	dom 27/09/26	25CC	dom 11/10/26	$ 1.301.873,00	
27		10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado	kg	9054	40 días	sáb 25/07/26	15FC+7 días	vie 04/09/26	$ 82.101.672,00	
28		13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Kn	18351	19 días	mar 29/09/26	17FC+7 días	dom 18/10/26	$ 34.298.019,00	
29		13.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Kn	282	15 días	dom 02/08/26	16FC+7 días	mar 18/08/26	$ 527.058,00	

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	


Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
30		**PRODUCTO 3. CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT**		**0**	**120 días**	**sáb 25/07/26**		**jue 26/11/26**	**$ 510.584.609,00**	
31	2.8	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	44	3 días	dom 04/10/26	32FC+7 días	mar 06/10/26	$ 9.330.068,00	50CC;49CC días
32	4.1.13	Excavaciones en roca bajo agua de 0 a 4 m con cuña hidráulica. Incluye: desembombe, cargue y disposición final	m3	250	21 días	dom 06/09/26	18FC+4 días	sáb 26/09/26	$ 142.415.500,00	39;40;41;4 días
33	4.2.3	Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. No incluye transporte.	m3	103	7 días	mié 11/11/26	44;46;43;38	mié 18/11/26	$ 5.909.625,00	
34	5.1.3	Suministro, colocación, conformación y compactación de Base granular para bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor	m3	574	9 días	mié 18/11/26	40	jue 26/11/26	$ 128.031.274,00	
35	8100	Suministro y aplicación de mortero de protección sobre superficies de excavaciones temporales, en proporción 1:3 (cemento:arena), con espesor promedio de 2 cm, aplicado manualmente con llana o lanzado sobre	m2	12	9 días	dom 15/11/26	38FC+4 días	mar 24/11/26	$ 480.492,00	

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

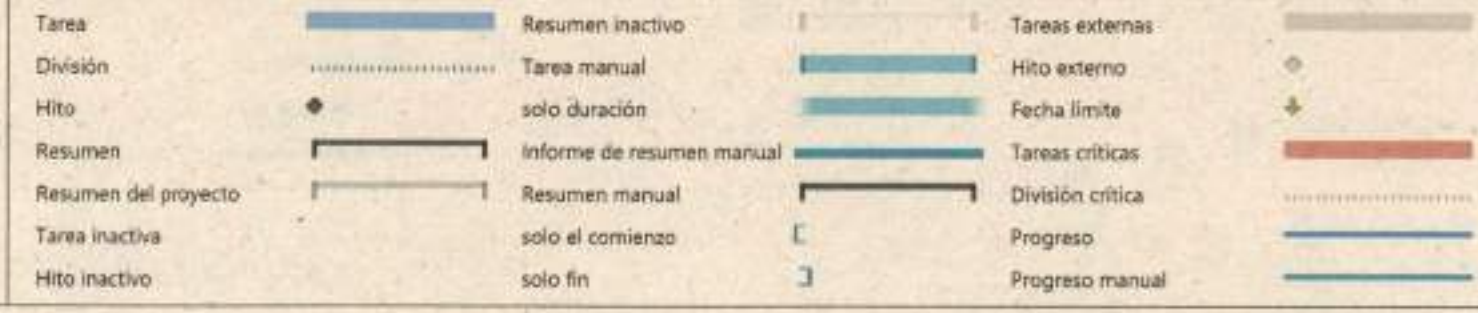


Id	ÍTEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
36	6.1.18	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m3	2	6 días	mar 13/10/26	37FC-6 días	dom 18/10/26	$ 1.297.928,00	39;40;41
37	6.2.25	Concreto Clase C (28 MPa). Box Culvert - Losa Inferior	m3	11	9 días	vie 09/10/26	47;48	dom 18/10/26	$ 12.377.882,00	38;36FC-6 días;43
38	6.2.26	Concreto Clase C (28 MPa). Box Culvert - Losa superior y muros laterales	m3	30	15 días	lun 26/10/26	37;42	mar 10/11/26	$ 37.855.830,00	33;35FC+4 días
39	6.2.28	Concreto Clase C (28 MPa). Canales en concreto.	m3	13	13 días	mar 03/11/26	46;36;32;44	dom 15/11/26	$ 14.305.538,00	
40	6.2.10	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase D (21 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y	m3	8	14 días	mar 03/11/26	46;36;32;44	mar 17/11/26	$ 8.378.512,00	34
41	8.38.1	Enrocado en piedra pegada incluye concreto f´c=17,5 MPa	m3	11	9 días	mar 03/11/26	46;36;32;44	mié 11/11/26	$ 4.588.089,00	
42	7.2.13	Colocación de CINTA PVC TIPO O-22 o equivalente, entre juntas de construcción de obras en concreto. Incluye el suministro de de la cinta y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento según especificaciones	m	15	16 días	vie 09/10/26	47;48	dom 25/10/26	$ 1.675.620,00	38

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26




Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidac	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
43	8.9	Suministro, transporte e instalación de Geotextil NT 2500 o equivalente. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo.	m2	130	5 días	lun 19/10/26	37	vie 23/10/26	$ 2.143.180,00	33;46
44	8.5	Suministro, transporte y colocación de material filtrante para construcción de filtros de 2" a 3" con canto rodado.	m3	4	6 días	mar 27/10/26	46	dom 01/11/26	$ 601.160,00	33;39;40;4
45	8.12.1	Suministro, transporte e instalación de Geodren planar H=2.0 m	m	3,6	3 días	jue 22/10/26	31FC+14 días	sáb 24/10/26	$ 549.302,00	
46	8.31.2	Suministro, transporte y colocación de tubería perforada de 6" para drenaje con filtro. Incluye los accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m	20	3 días	sáb 24/10/26	43	lun 26/10/26	$ 1.816.900,00	33;39;40;4
47	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado	kg	7302	9 días	sáb 25/07/26	15FC+7 días	dom 02/08/26	$ 63.666.138,00	37;42
48	11.28	Suministro, transporte e instalación de viga HEA-160 con hincado mecanico en terreno según diseño. Incluye perfil metalico, ubicación en sitio, alineación e	m	102	12 días	dom 27/09/26	32	jue 08/10/26	$ 42.590.508,00	37;42
49	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Kn	2353	18 días	dom 04/10/26	31CC	jue 22/10/26	$ 4.397.757,00	

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26




Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
50	13.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Km	15074	11 días	dom 04/10/26	31CC	jue 15/10/26	$ 28.173.306,00	
51		**PRODUCTO 4. CONSTRUCCIÓN DE CANAL ESCALONADO Y POCETA(DISIPADORES)**		**0**	51 días	**lun 19/10/26**		**vie 11/12/26**	**$ 92.444.366,00**	
52	4.1.10	Excavación para estructuras varias en material común bajo agua, incluye entibado, motobomba. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	104	10 días	lun 19/10/26	77	mié 28/10/26	$ 7.408.024,00	55;56;59;6
53	4.2.2	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	130	7 días	jue 29/10/26	52	jue 05/11/26	$ 3.889.600,00	
54	6.2.28	Concreto Clase C (28 MPa). Canales en concreto.	m3	45	10 días	mar 01/12/26	57;58;55	vie 11/12/26	$ 49.519.170,00	64

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

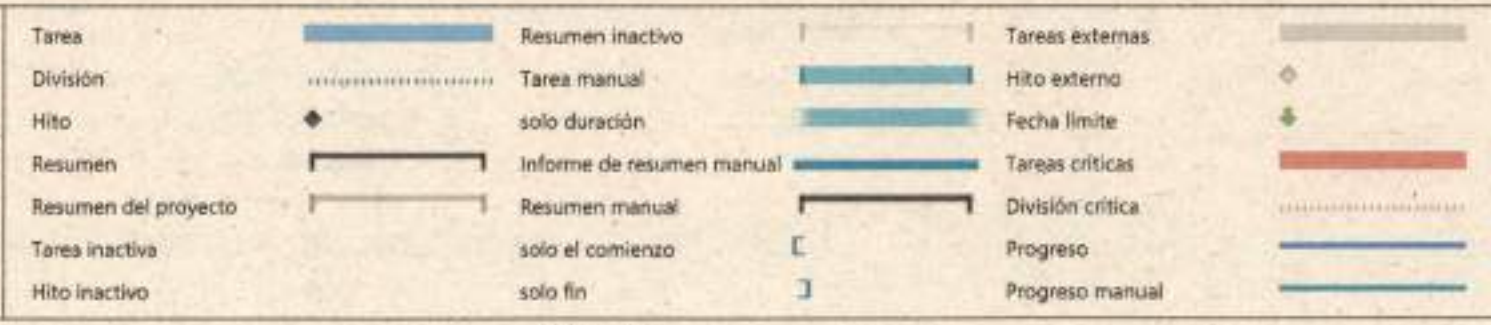

Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
55	6.2.24	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y	m3	5	10 días	sáb 21/11/26	59;52;57;56	lun 30/11/26	$ 5.696.950,00	54
56	8.9	Suministro, transporte e Instalación de Geotextil NT 2500 o equivalente. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo.	m2	91	7 días	jue 29/10/26	52	jue 05/11/26	$ 1.500.226,00	55;58
57	8.5	Suministro, transporte y colocación de material filtrante para construcción de filtros de 2" a 3" con canto rodado.	m3	3	7 días	vie 13/11/26	58	vie 20/11/26	$ 450.870,00	54;55
58	8.31.2	Suministro, transporte y colocación de tubería perforada de 6" para drenaje con filtro. Incluye los accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m	14	7 días	vie 06/11/26	56	jue 12/11/26	$ 1.271.830,00	54;57
59	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado	kg	1464	7 días	jue 29/10/26	52	jue 05/11/26	$ 12.764.616,00	55
60	13.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Kn	4888	8 días	lun 19/10/26	52CC	lun 26/10/26	$ 9.135.672,00	

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

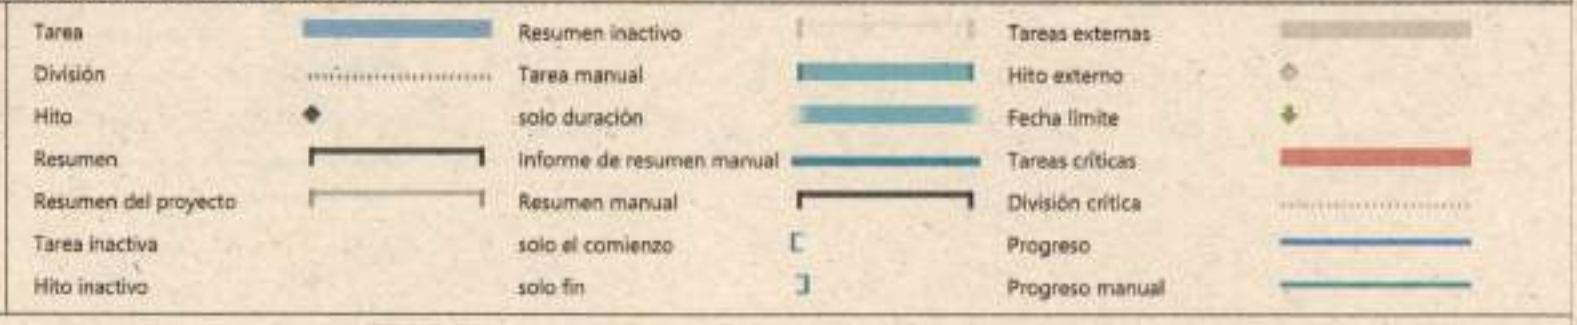

Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
61	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Km	432	8 días	lun 19/10/26	52CC	lun 26/10/26	$ 807.408,00	
62		**PRODUCTO 5. CONSTRUCCIÓN DE COLCHACRETO**		**0**	**26 días**	**sáb 12/12/26**		**jue 07/01/27**	**$ 56.532.033,00**	
63	8.9	Suministro, transporte e Instalación de Geotextil NT 2500 o equivalente. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo.	m2	90	7 días	jue 17/12/26	64	mié 23/12/26	$ 1.483.740,00	65;66;67
64	4.3.7	Explanación y nivelación del terreno manualmente, bajo cualquier grado de humedad, incluye corte de taludes y terraceós requeridos según planos y/o definidos por la interventoría. Medido in situ. Incluye cargue y transporte interno.	m3	36	5 días	sáb 12/12/26	54	mié 16/12/26	$ 2.254.680,00	63;65;66
65	8101	Construccion de Flexocreto, colchacreto o equivalente, anicado al terreno y entre sí según diseño. Incluye suministro de concreto (21 Mpa) para Felxocreto, colchacreto o equivalente.	m2	121	9 días	jue 24/12/26	63;64	sáb 02/01/27	$ 19.431.269,00	66

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	


Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
66	8.64	Suministro, transporte e instalación de geobolsas por volteo de 3.5x2.4x1.0 elaboradas en geotextil de tejido plano. Incluye lleno con material proveniente de la excavación.	Und	12	5 días	dom 03/01/27	63;64;65	jue 07/01/27	$ 19.212.588,00	
67	6.2.1.1	Concreto Clase I (Ciclópeo con concreto clase C- 28 MPa y Piedra de 2" a 4")	m3	19	14 días	jue 24/12/26	63	jue 07/01/27	$ 14.149.756,00	
68		**PRODUCTO 6. CONSTRUCCIÓN DE FILTRO FRANCÉS**		**0**	14 días	**lun 21/09/26**		**dom 04/10/26**	**$ 25.629.665,00**	
69	4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	38	6 días	lun 21/09/26	17FC-1 día	sáb 26/09/26	$ 1.891.602,00	72;74CC;75
70	4.2.2	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	17	2 días	sáb 03/10/26	71;73	dom 04/10/26	$ 508.640,00	82
71	4.2.6	Lleno con Material filtrante 1 1/2". Incluye suministro y colocación, el transporte se pagará por su respectivo	m3	31	3 días	mié 30/09/26	73	vie 02/10/26	$ 4.447.477,00	70

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
72	8.9	Suministro, transporte e Instalación de Geotextil NT 2500 o equivalente. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo.	m2	238	1 día	dom 27/09/26	69	dom 27/09/26	$ 3.923.668,00	73
73	8.31	Suministro, transporte y colocación de tubería perforada de 4" para drenaje con filtro. Incluye los accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m	85	2 días	lun 28/09/26	72	mar 29/09/26	$ 3.780.715,00	70;71
74	13.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Kn	1786	7 días	lun 21/09/26	69CC	dom 27/09/26	$ 3.338.034,00	
75	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Kn	4141	7 días	lun 21/09/26	69CC	dom 27/09/26	$ 7.739.529,00	
76		**PRODUCTO 7. CONSTRUCCIÓN DE CUNETA**		**0**	3 días	**vie 16/10/26**		**dom 18/10/26**	**$ 12.202.373,00**	
77	6.2.5	Concreto Clase D (21 MPa). Cunetas.	m3	9	2 días	sáb 17/10/2	79	dom 18/10/26	$ 7.534.917,00	80CC;52

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26



Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
78	5.1.4	Suministro, colocación, conformación y compactación de Base Granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	8	1 día	vie 16/10/26	83	vie 16/10/26	$ 1.598.184,00	
79	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado	kg	83	1 día	vie 16/10/26	83	vie 16/10/26	$ 723.677,00	77
80	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Kn	1255	2 días	sáb 17/10/26	77CC	dom 18/10/26	$ 2.345.595,00	
81		**PRODUCTO 8. CONSTRUCCIÓN DEL CANAL CUNETA**		**0**	**10 días**	**lun 05/10/26**		**jue 15/10/26**	**$ 5.847.525,00**	
82	4.1.3	Excavación manual en material común. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	12	4 días	lun 05/10/26	70	jue 08/10/26	$ 464.496,00	83;84;85CC
83	6.2.28	Concreto Clase C (28 MPa). Canales en concreto.	m3	3	2 días	mié 14/10/26	82;84	jue 15/10/26	$ 3.301.278,00	78;79
84	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado	kg	105	4 días	vie 09/10/26	82	mar 13/10/26	$ 915.495,00	83

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id		ÍTEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
85		13.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Km	624	4 días	lun 05/10/26	82CC	jue 08/10/26	$ 1.166.256,00	
86			**FRENTE 2- PAP3**		**0**	**214 día**	**mar 21/07/2**		**vie 26/02/27**	**$ 3.190.207.513...**	
87			**PRODUCTO 1. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO**		**0**	**100 días**	**mar 21/07/26**		**sáb 31/10/26**	**$ 967.158.268,00**	
88		1.1	Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión. Incluye vehículo para el transporte de personal y equipo con dedicación exclusiva.	día	30	30 días	mar 21/07/26		vie 21/08/26	$ 40.582.230,00	89CC+7 días;97CC;9 días;143;16 días
89		2.3	Demolición de pavimento asfáltico, de cualquier espesor. Incluye corte con cortadora según trazado y cargue, transporte y disposición final de	m3	11	5 días	mar 28/07/26	88CC+7 días	sáb 01/08/26	$ 1.569.766,00	92FC+4 días
90		4.1.7	Excavación sin clasificar de la explanación, canales y préstamos. Incluye transporte y disposición final de	m3	943	10 días	sáb 29/08/26	88FC+7 días	lun 07/09/26	$ 27.296.078,00	91FC+7 días;92
91		4.2.1	Lleno mecánico compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del	m3	578	8 días	mar 15/09/26	90FC+7 días	mar 22/09/26	$ 6.040.678,00	92FC+14 días

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	

Id	ÍTEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
92	5.1.6	Suministro, colocación, conformación y compactación de Subbase granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	479	9 días	mié 07/10/26	91FC+14 días;90;89FC días	vie 16/10/26	$ 72.929.666,00	93
93	5.1.4	Suministro, colocación, conformación y compactación de Base Granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	279	4 días	sáb 17/10/26	92	mar 20/10/26	$ 55.736.667,00	95
94	7.1.2	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 que cumpla con el Artículo 450-22 de la norma INVIAS 2022. Incluye: colocación con terminadora (finisher), compactación y terminación de bordes. No incluye	m3	251	5 días	mar 27/10/26	96	sáb 31/10/26	$ 418.588.182,00	
95	7.1.1	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta const	m2	1862	3 días	mié 21/10/26	93	vie 23/10/26	$ 9.239.244,00	96

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26



Id		ÍTEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
96		7.1.1.1	Suministro, transporte y aplicacion de emulsion asfaltica cationica de rompimiento rapido C.R.R-1 (C.R.R-60) para riego de liga segun normas para la construccion de pavimentos de INVIAS 421-22- incluye todo lo necesario para su correcta construccion y fun	m2	1862	3 días	sáb 24/10/26	95	lun 26/10/26	$ 7.321.384,00	94
97		13.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Kn	17155	13 días	mar 21/07/26	88CC	dom 02/08/26	$ 32.062.695,00	
98		13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Kn	158262	13 días	mar 21/07/26	88CC	dom 02/08/26	$ 295.791.678,00	
99			**PRODUCTO 2. CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCION KM 76+350**		**0**	**104 dias**	**sáb 22/08/26**		**dom 06/12/26**	**$ 601.637.410,00**	
100		4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	209	21 días	sáb 22/08/26	88	vie 11/09/26	$ 10.403.811,00	108;112;11 días

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

		ÍTEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
101		4.1.62	Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 0-2 m, diámetro interno 1.3 m, Incluye anillo en concreto e=10cm 21 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.5 m). Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye t	m3	25	10 días	mar 15/09/26	100FC+3 días	jue 24/09/26	$ 16.117.125,00	102FC+1 día;103FC+ días;104FC días
102		4.1.63	Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 2-4 m, diámetro interno 1.3 m, Incluye anillo en concreto e=10cm 21 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.5 m). Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye t	m3	25	6 días	sáb 26/09/26	101FC+1 día	jue 01/10/26	$ 19.330.325,00	103FC-3 días;104FC días;105FC días
103		4.1.64	Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 4-6 m, diámetro interno 1.3 m, Incluye anillo en concreto e=10cm 21 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.5 m). Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye t	m3	25	8 días	mar 29/09/26	102FC-3 días;101FC+ días	mar 06/10/26	$ 19.961.575,00	108;104;10 días

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
104	4.1.65	Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 6-8 m, diámetro interno 1.3 m, Incluye anillo en concreto e=10cm 21 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.5 m). Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye t	m3	25	10 días	mié 07/10/26	103;102FC+ días;101FC+ días	sáb 17/10/26	$ 21.600.650,00	105FC+1 día
105	4.1.65.1	Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 8-10 m, diámetro interno 1.3 m, Incluye anillo en concreto e=10cm 21 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.5 m). Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye	m3	6	12 días	lun 19/10/26	104FC+1 día;103FC+2 días;102FC+ días	vie 30/10/26	$ 5.492.766,00	109FC-3 días
106	4.2.3	Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. No incluye transporte.	m3	240	6 días	mié 16/09/26	114FC+1 día;113;115	lun 21/09/26	$ 13.770.000,00	
107	13.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Km	9823	10 días	sáb 22/08/26	100CC	lun 31/08/26	$ 18.359.187,00	

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
108	6.2.24	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y	m3	100	12 días	mié 25/11/26	116;110;10(	dom 06/12/26	$ 113.939.000,00	126FC-14 días
109	6.1.13	Pila-pilote-caisson en concreto Clase C (28 MPa) fundido en sitio	m3	79	15 días	mié 28/10/26	105FC-3 días	jue 12/11/26	$ 75.986.308,00	110
110	6.1.18	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m3	1	1 día	vie 13/11/26	109	vie 13/11/26	$ 648.964,00	108;116
111	7.2.13	Colocación de CINTA PVC TIPO O-22 o equivalente, entre juntas de construcción de obras en concreto. Incluye el suministro de de la cinta y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento según especificaciones	m	32	6 días	mié 25/11/26	116	lun 30/11/26	$ 3.574.656,00	
112	8.12.1	Suministro, transporte e instalación de Geodren planar H=2.0 m	m	84	2 días	sáb 12/09/26	100	dom 13/09/26	$ 12.817.056,00	106
113	8.30	Suministro, transporte y colocación de tubería de 2", perforada, recubierta con geotextil NT 2000 para lloraderos.	m	11	2 días	sáb 12/09/26	100	dom 13/09/26	$ 349.283,00	106;114
114	4.2.5	Lleno con material no clasificado de río para filtro Geodren. Incluye suministro, transporte y colocación	m3	9	1 día	lun 14/09/26	113;115	lun 14/09/26	$ 1.244.727,00	106FC+1 día

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
115	8.19	Suministro, transporte e instalación de tubería perforada 100 mm	m	21	2 días	sáb 12/09/26	100	dom 13/09/26	$ 914.949,00	106;114
116	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado	kg	22568	10 días	sáb 14/11/26	110	mar 24/11/26	$ 196.770.392,00	108;111
117	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Kn	37644	8 días	sáb 22/08/26	100CC	sáb 29/08/26	$ 70.356.636,00	
118		**PRODUCTO 3. ESTABILIZACIÓN DE TALUD INFERIOR**		**0**	50 días	**jue 03/09/26**		**vie 23/10/26**	**$ 798.990.419,00**	
119	15.9	Desmonte y limpieza de zonas verdes existentes. Incluye corte y desenraice de setos existentes, cargue, retiro y transporte de material vegetal resultante. Esta actividad se realizará simultáneamente con la rocería de	m2	4105	8 días	jue 03/09/26	88FC+12 días	jue 10/09/26	$ 56.107.140,00	120;121;12 día;124FC+ días
120	8.55	Protección vegetal de taludes con tierra orgánica y semillas	m2	4105	8 días	vie 16/10/26	122;123;12	vie 23/10/26	$ 81.529.405,00	
121	8.46	Suministro, transporte y siembra de Pasto Vetiver	m2	4105	8 días	vie 16/10/26	122;123;12	vie 23/10/26	$ 93.368.225,00	128
122	8.67.1	Suministro e instalación de manto para control de erosión TRM 500 y sus respectivos anclajes de fijación	m2	4105	7 días	jue 08/10/26	119FC+1 día;124;123 día	jue 15/10/26	$ 154.873.440,00	120;121

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	


Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
123	11.24	Suministro, transporte e instalación de malla triple torsión recubierta en PVC, incluye instalación de la malla y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad, anclajes y pernos se pagaran en su ítem respectivo.	m2	4105	8 días	mar 29/09/26	124	mar 06/10/26	$ 237.872.435,00	120;121;12 día
124	11.19	Suministro, transporte e instalación de perno helicoidal de anclaje pasivo. Incluye fluido de perforación y mortero	m	1182	16 días	dom 13/09/26	119FC+2 días	lun 28/09/26	$ 175.239.774,00	120;121;12
125		**PRODUCTO 4. CONSTRUCCIÓN DEL BOX COULVERT K76+300**		**0**	72 días	**sáb 24/10/26**		**jue 07/01/27**	**$ 258.151.621,00**	
126	4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	473	12 días	lun 23/11/26	108FC-14 días	vie 04/12/26	$ 23.545.467,00	129;132;13
127	4.2.3	Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. No incluye transporte.	m3	73	4 días	lun 04/01/27	135;137;13	jue 07/01/27	$ 4.188.375,00	155
128	2.8	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	2	1 día	sáb 24/10/26	121	sáb 24/10/26	$ 424.094,00	

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

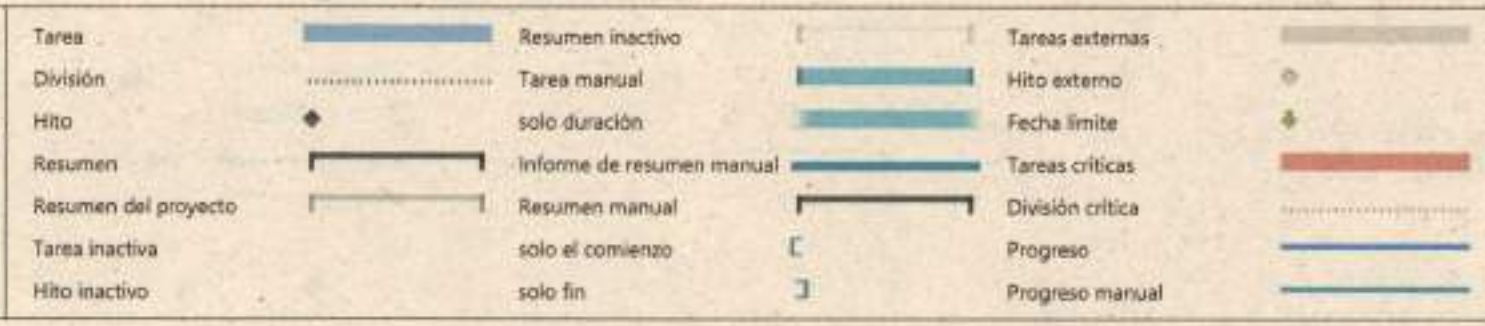

Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
129	6.1.18	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m3	2	1 día	sáb 05/12/26	126	sáb 05/12/26	$ 1.297.928,00	132;138
130	6.2.26	Concreto Clase C (28 MPa). Box Culvert - Losa superior y muros laterales	m3	30	13 días	lun 21/12/26	131;138	dom 03/01/27	$ 37.855.830,00	127
131	6.2.25	Concreto Clase C (28 MPa). Box Culvert - Losa Inferior	m3	11	4 días	jue 17/12/26	138;139	dom 20/12/26	$ 12.377.882,00	130
132	8.38	Enrocado en piedra pegada	m3	5	1 día	jue 17/12/2	138;129;12(	jue 17/12/26	$ 2.191.540,00	
133	7.2.13	Colocación de CINTA PVC TIPO O-22 o equivalente, entre juntas de construcción de obras en concreto. Incluye el suministro de de la cinta y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento según especificaciones	m	25	1 día	jue 17/12/26	138;139	jue 17/12/26	$ 2.792.700,00	
134	8.9	Suministro, transporte e Instalación de Geotextil NT 2500 o equivalente. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo.	m2	164	1 día	sáb 05/12/26	126	sáb 05/12/26	$ 2.703.704,00	137
135	8.5	Suministro, transporte y colocación de material filtrante para construcción de filtros de 2" a 3" con canto rodado.	m3	5	7 días	jue 10/12/26	137	mié 16/12/26	$ 751.450,00	127;132
136	8.12.1	Suministro, transporte e instalación de Geodren planar H=2.0 m	m	87	3 días	sáb 05/12/26	126	lun 07/12/26	$ 13.274.808,00	127

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26




Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
137	8.31	Suministro, transporte y colocación de tubería perforada de 4" para drenaje con filtro. Incluye los accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m	24,72	3 días	dom 06/12/26	134	mié 09/12/26	$ 1.099.521,00	127;135
138	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado	kg	3553	10 días	dom 06/12/26	129	mié 16/12/26	$ 30.978.607,00	131;132;13
139	11.28	Suministro, transporte e instalación de viga HEA-160 con hincado mecanico en terreno según diseño. Incluye perfil metalico, ubicación en sitio, alineación e	m	151	10 días	sáb 05/12/26	126	mar 15/12/26	$ 63.050.654,00	131;133
140	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Kn	13019	30 días	lun 23/11/26	126CC	mié 23/12/26	$ 24.332.511,00	
141	13.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Kn	19950	30 días	lun 23/11/26	126CC	mié 23/12/26	$ 37.286.550,00	
142		**PRODUCTO 5. CONSTRUCCIÓN CANAL ESCALONADO K76+300**		**0**	40 días	**sáb 22/08/26**		**mié 30/09/26**	**$ 298.989.858,00**	

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26




Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
143	4.1.10	Excavación para estructuras varias en material común bajo agua, incluye entibado, motobomba. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	315	7 días	sáb 22/08/26	88	vie 28/08/26	$ 22.437.765,00	146;150;15
144	4.2.3	Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. No incluye transporte.	m3	85	2 días	mar 29/09/26	145;147;15	mié 30/09/26	$ 4.876.875,00	174;175
145	4.2.6	Lleno con Material filtrante 1 1/2". Incluye suministro y colocación, el transporte se pagará por su respectivo	m3	24	2 días	lun 31/08/26	147	mar 01/09/26	$ 3.443.208,00	144;151
146	8.9	Suministro, transporte e Instalación de Geotextil NT 2500 o equivalente. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo.	m2	52	1 día	sáb 29/08/26	143	sáb 29/08/26	$ 857.272,00	147
147	8.19	Suministro, transporte e instalación de tubería perforada 100 mm	m	40	1 día	dom 30/08/26	146	dom 30/08/26	$ 1.742.760,00	144;145
148	9.7.1	Suministro, transporte e instalación de rejilla prefabricada en concreto clase C (280 Kg/cm2) para canal	m	3	1 día	mar 29/09/26	151	mar 29/09/26	$ 772.341,00	
149	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado	kg	8346,8	9 días	dom 30/08/26	150	lun 07/09/26	$ 72.775.749,00	151
150	6.1.18	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m3	3	1 día	sáb 29/08/26	143	sáb 29/08/26	$ 1.946.892,00	149;151

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26



Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
151	6.2.24	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y	m3	139	21 días	mar 08/09/26	149;150;14	lun 28/09/26	$ 158.375.210,00	144;148;15
152	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Kn	3764	8 días	sáb 22/08/26	143CC	sáb 29/08/26	$ 7.034.916,00	
153	13.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Kn	13230	11 días	vie 18/09/26	143CC;151F	lun 28/09/26	$ 24.726.870,00	
154		**PRODUCTO 6. CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA K76+335**		**0**	50 días	**vie 08/01/27**		**vie 26/02/27**	**$ 125.829.232,00**	
155	4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	436	14 días	vie 08/01/27	127	jue 21/01/27	$ 21.703.644,00	157;159;16

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26




Id	ÍTEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
156	4.2.3	Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. No incluye transporte.	m3	36	14 días	sáb 13/02/27	158;159	vie 26/02/27	$ 2.065.500,00	
157	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	4	4 días	vie 22/01/27	155	lun 25/01/27	$ 399.264,00	160
158	8.27	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 36"	m	9,3	2 días	vie 22/01/27	155	sáb 23/01/27	$ 19.718.241,00	156
159	6.2.24	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y	m3	15,39	13 días	dom 31/01/27	160;155	vie 12/02/27	$ 17.537.491,00	156;162FF;
160	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado	kg	2251	5 días	mar 26/01/27	157	sáb 30/01/27	$ 19.626.469,00	159

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	


Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
161	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	5646,6	14 días	sáb 30/01/27	155CC;159F	vie 12/02/27	$ 10.553.495,00	
162	13.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	18312	10 días	mié 03/02/27	155CC;159F	vie 12/02/27	$ 34.225.128,00	
163		**PRODUCTO 7. CONSTRUCCIÓN DE CUNETA-FILTRO**		**0**	30 días	**sáb 22/08/26**		**dom 20/09/26**	**$ 126.143.578,00**	
164	4.1.9	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	84	6 días	sáb 22/08/26	88	jue 27/08/26	$ 2.594.340,00	165;166;16
165	6.2.5	Concreto Clase D (21 MPa). Cunetas.	m3	84	14 días	lun 07/09/2	170;164;16	dom 20/09/26	$ 70.325.892,00	171FF;172
166	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	33	5 días	vie 28/08/26	164	mar 01/09/26	$ 3.293.928,00	170

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26



Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
167	8.5.1	Suministro y colocación de material filtrante para construcción de filtros de 2" a 3" con canto rodado. No incluye	m3	41	4 días	mar 01/09/26	169	vie 04/09/26	$ 6.159.225,00	165
168	8.9	Suministro, transporte e Instalación de Geotextil NT 2500 o equivalente. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo.	m2	274	2 días	vie 28/08/26	164	sáb 29/08/26	$ 4.517.164,00	165;169
169	8.19	Suministro, transporte e instalación de tubería perforada 100 mm	m	114	2 días	dom 30/08/26	168	lun 31/08/26	$ 4.966.866,00	167
170	10.2	Suministro, transporte y colocación de Malla Electrosoldada 15x15cm Diámetro 4.0mm (XX-084)	m2	428	5 días	mié 02/09/26	166	dom 06/09/26	$ 5.998.848,00	165
171	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Kn	11607	20 días	mar 01/09/26	164CC;165F	dom 20/09/26	$ 21.693.483,00	
172	13.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Kn	3528	20 días	mar 01/09/26	164CC;165F	dom 20/09/26	$ 6.593.832,00	
173		**PRODUCTO 8. CONSTRUCCIÓN DE COLCHACRETO**		**0**	**16 días**	**jue 01/10/26**		**sáb 17/10/26**	**$ 13.307.127,00**	

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

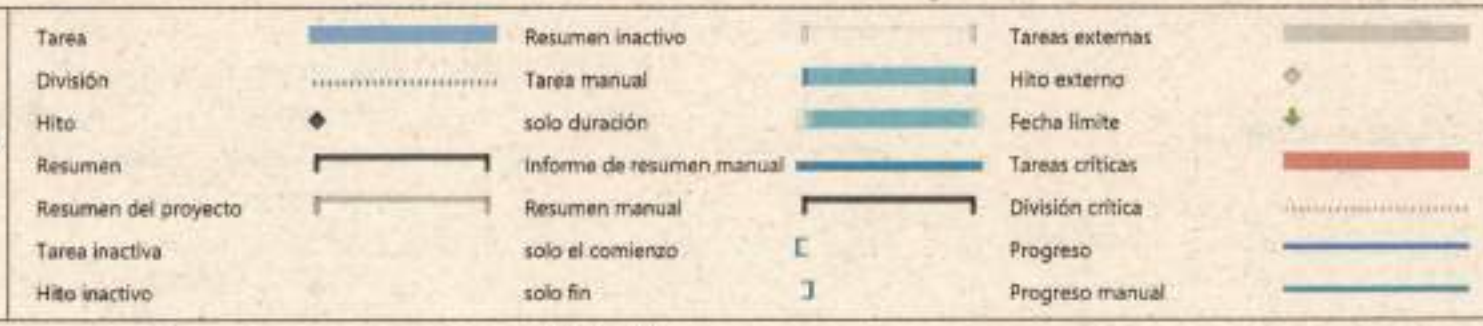

Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
174	4.1.2	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	1	1 día	jue 01/10/26	144	jue 01/10/26	$ 48.053,00	178
175	4.3.7	Explanación y nivelación del terreno manualmente, bajo cualquier grado de humedad, incluye corte de taludes y terraceós requeridos según planos y/o definidos por la interventoría. Medido in situ. Incluye cargue y transporte interno.	m3	15	7 días	jue 01/10/26	144	mié 07/10/26	$ 939.450,00	176;177;17
176	8.9	Suministro, transporte e instalación de Geotextil NT 2500 o equivalente. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo.	m2	66	2 días	jue 08/10/26	175	vie 09/10/26	$ 1.088.076,00	177;178
177	8.64	Suministro, transporte e instalación de geobolsas por volteo de 3.5x2.4x1.0 elaboradas en geotextil de tejido plano. Incluye lleno con material proveniente de la excavación.	Und	2	1 día	sáb 17/10/26	176;175;17	sáb 17/10/26	$ 3.202.098,00	
178	8101	Construccion de Flexocreto, colchacreto o equivalente, anlcado al terreno y entre sí según diseño. Incluye suministro de concreto (21 Mpa) para Felxocreto, colchacreto o equivalente.	m2	50	6 días	sáb 10/10/26	176;175;17	vie 16/10/26	$ 8.029.450,00	177
179		**FRENTE 3- PAP4**		**0**	184 día	sáb 22/08/2		vie 26/02/27	**$ 4.059.562.259...**	

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	


Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
180		**PRODUCTO 1. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**		**0**	**70 días**	**sáb 22/08/26**		**sáb 31/10/26**	**$ 961.105.082,00**	
181	1.1	Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión. Incluye vehículo para el transporte de personal y equipo con dedicación exclusiva.	día	30	30 días	sáb 22/08/26	88	dom 20/09/26	$ 40.582.230,00	182CC+3 días;191CC
182	2.3	Demolición de pavimento asfáltico, de cualquier espesor. Incluye corte con cortadora según trazado y cargue, transporte y disposición final de	m3	284	10 días	mar 25/08/26	181CC+3 días	jue 03/09/26	$ 40.528.504,00	184FC+2 días;183FC días
183	13.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Km	11218	17 días	mié 02/09/26	182FC-2 días	vie 18/09/26	$ 20.966.442,00	
184	5.1.6	Suministro, colocación, conformación y compactación de Subbase granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	454	21 días	dom 06/09/26	182FC+2 días	sáb 26/09/26	$ 69.123.316,00	185FC+2 días;189

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
185	5.1.4	Suministro, colocación, conformación y compactación de Base Granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	284	12 días	mar 29/09/26	184FC+2 días	sáb 10/10/26	$ 56.735.532,00	186;187FC días
186	7.1.1	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta const	m2	1890	7 días	dom 11/10/26	185	dom 18/10/26	$ 9.378.180,00	188
187	7.1.1.1	Suministro, transporte y aplicacion de emulsion asfaltica cationica de rompimiento rapido C.R.R-1 (C.R.R-60) para riego de liga segun normas para la construccion de pavimentos de INVIAS 421-22- incluye todo lo necesario para su correcta construccion y fun	m2	1890	7 días	vie 16/10/26	185FC+4 días	jue 22/10/26	$ 7.431.480,00	
188	7.1.2	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 que cumpla con el Artículo 450-22 de la norma INVIAS 2022. Incluye: colocación con terminadora (finisher), compactación y terminación de bordes. No incluye	m3	255	13 días	lun 19/10/26	186	sáb 31/10/26	$ 425.258.910,00	

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26




Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
189	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Km	155752	5 días	dom 27/09/26	184	jue 01/10/26	$ 291.100.488,00	
190		**PRODUCTO 2. CONTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN**		**0**	**184 días**	**sáb 22/08/26**		**vie 26/02/27**	**$ 1.981.082.554,00**	
191	4.1.95	Descapote a máquina del terreno natural hasta 30 cm. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m2	344	5 días	sáb 22/08/26	181CC	mié 26/08/26	$ 4.290.368,00	192;208CC días;226FC días
192	2.8	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	22	4 días	jue 27/08/26	191	dom 30/08/26	$ 4.665.034,00	193
193	4.1.6	Excavación en roca de la explanación, comprende la excavación de masas de rocas hasta 30 cm de diámetro*, fuertemente litificadas que, debido a su buena cementación o alta consolidación, no es posible su división mecánica en la excavación. Incluye transpo	m3	1618	26 días	lun 31/08/26	192	vie 25/09/26	$ 116.832.544,00	195;196;19

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidac	Cantidac	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
194	4.2.2	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	818	21 días	jue 28/01/27	203;205;19(	mié 17/02/27	$ 24.474.560,00	206FC-2 días
195	4.1.12.1	Pilote en concreto de 28 MPA vaciado en Situ de diametro 1,3 m. Incluye Camisa metalica reutilizable, excavación y transporte y disposición final de material sobrante. El acero se pagará en su respectivo item.	m	40	35 días	sáb 26/09/26	193	sáb 31/10/26	$ 107.300.840,00	197;207FC días
196	8.12	Suministro, transporte e instalación de Geodren planar H=1.0 m	m	355	8 días	sáb 26/09/26	193	sáb 03/10/26	$ 28.676.190,00	194
197	6.1.18.1	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	36	6 días	dom 01/11/26	195	sáb 07/11/26	$ 1.362.312,00	198;204
198	6.2.12.1	Concreto Clase D (21 MPa). Barrera de contención tipo New Jersey, seccion tipo unidireccional según diseño.	m3	21	10 días	jue 07/01/27	207;197;19: días	sáb 16/01/27	$ 22.562.043,00	
199	11.19	Suministro, transporte e instalación de perno helicoidal de anclaje pasivo. Incluye fluido de perforación y mortero	m	72	21 días	sáb 26/09/26	193	sáb 17/10/26	$ 10.674.504,00	202

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

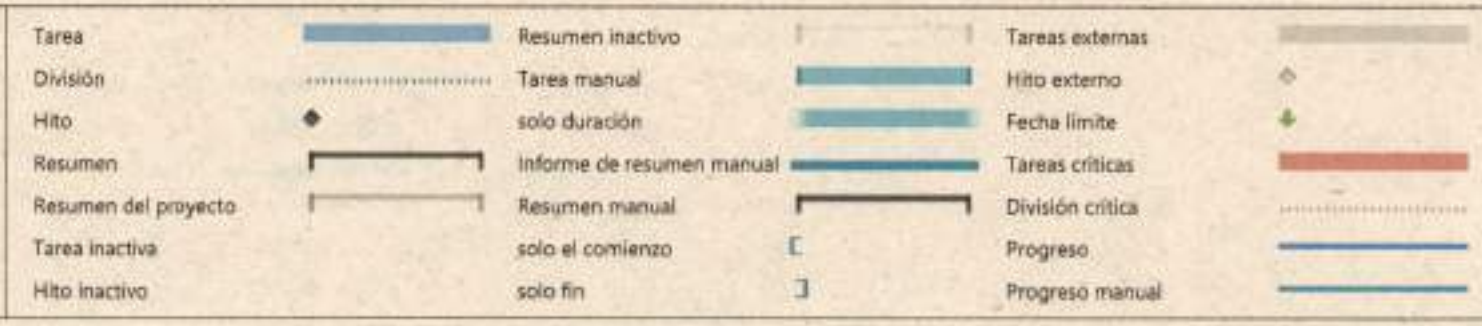


Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
200	6.2.27	Concreto Clase C (28 MPa). Dado de anclaje de cualquier dimensión. Incluye Suministro, transporte y colocación. El refuerzo se pagara en su ítem	m3	0,48	2 días	lun 09/11/26	202	mar 10/11/26	$ 506.093,00	
201	6.2.31	Concreto Clase C (28 MPa). Estribos, vigas cabezales y vigas de amarre. Incluye suministro, transporte, colocación, formaleta, obra falsa para puentes y demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	m3	279	21 días	lun 09/11/26	202	lun 30/11/26	$ 349.851.492,00	
202	6.1.24.1	Concreto Clase C (28 MPa) para zapatas y vigas de fundación	m3	189	21 días	dom 18/10/26	199	dom 08/11/26	$ 179.212.257,00	200;201
203	8.5	Suministro, transporte y colocación de material filtrante para construcción de filtros de 2" a 3" con canto rodado.	m3	25	21 días	vie 02/10/26	205	vie 23/10/26	$ 3.757.250,00	194;198FC días;204
204	6.2.24	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y	m3	211	21 días	jue 07/01/27	207;197;19	mié 27/01/27	$ 240.411.290,00	194
205	8.30	Suministro, transporte y colocación de tubería de 2", perforada, recubierta con geotextil NT 2000 para lloraderos.	m	101	6 días	sáb 26/09/26	193	jue 01/10/26	$ 3.207.053,00	194;203

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26



Id	ÍTEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
206	5.1.3	Suministro, colocación, conformación y compactación de Base granular para bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor	m3	419	11 días	mar 16/02/27	194FC-2 días	vie 26/02/27	$ 93.458.369,00	209FF;208I
207	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado	kg	61774	60 días	jue 05/11/26	195FC+3 días	mié 06/01/27	$ 538.607.506,00	198;204
208	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Kn	69641	70 días	vie 18/12/26	191CC;206F	vie 26/02/27	$ 130.159.029,00	
209	13.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Kn	64780	90 días	vie 27/11/26	191CC;206F	vie 26/02/27	$ 121.073.820,00	
210		**PRODUCTO 3. CONTRUCCIÓN BOX CULVERT MAYOR Km 73+803**		**0**	130 días	**dom 06/09/26**		**lun 18/01/27**	**$ 416.132.583,00**	
211	2.8	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	50	21 días	dom 13/09/26	212	sáb 03/10/26	$ 10.602.350,00	213;227CC

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26




Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
212	4.1.95	Descapote a máquina del terreno natural hasta 30 cm. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m2	675	7 días	dom 06/09/26	267	sáb 12/09/26	$ 8.418.600,00	211
213	4.1.6	Excavación en roca de la explanación, comprende la excavación de masas de rocas hasta 30 cm de diámetro*, fuertemente litificadas que, debido a su buena cementación o alta consolidación, no es posible su división mecánica en la excavación. Incluye transpo	m3	452	35 días	dom 04/10/26	211	lun 09/11/26	$ 32.638.016,00	216;218;21
214	4.2.2	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	89	8 días	dom 03/01/27	221;223;22	dom 10/01/27	$ 2.662.880,00	215
215	5.1.4	Suministro, colocación, conformación y compactación de Base Granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	97	8 días	lun 11/01/27	214	lun 18/01/27	$ 19.377.981,00	228FF;227
216	6.1.18	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m3	7	1 día	mar 10/11/26	213	mar 10/11/26	$ 4.542.748,00	218;219;22
217	6.2.26	Concreto Clase C (28 MPa). Box Culvert - Losa superior y muros laterales	m3	80	10 días	mié 23/12/26	220	sáb 02/01/27	$ 100.948.880,00	214

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
218	6.2.28	Concreto Clase C (28 MPa). Canales en concreto.	m3	17	3 días	dom 13/12/26	225;216;21	mar 15/12/26	$ 18.707.242,00	
219	6.2.10	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase D (21 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y	m3	5	2 días	dom 13/12/26	225;216;21	lun 14/12/26	$ 5.236.570,00	
220	7.2.13	Colocación de CINTA PVC TIPO O-22 o equivalente, entre juntas de construcción de obras en concreto. Incluye el suministro de de la cinta y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento según especificaciones	m	15	10 días	dom 13/12/26	225;226	mar 22/12/26	$ 1.675.620,00	217
221	8.5	Suministro, transporte y colocación de material filtrante para construcción de filtros de 2" a 3" con canto rodado.	m3	8	12 días	sáb 21/11/26	223	mié 02/12/26	$ 1.202.320,00	214;218;21
222	8.9	Suministro, transporte e Instalación de Geotextil NT 2500 o equivalente. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo.	m2	4	7 días	mar 10/11/26	213	mar 17/11/26	$ 65.944,00	223

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26




Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
223	8.31	Suministro, transporte y colocación de tubería perforada de 4" para drenaje con filtro. Incluye los accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m	23	3 días	mié 18/11/26	222	vie 20/11/26	$ 1.023.017,00	214;221
224	8.12.1	Suministro, transporte e instalación de Geodren planar H=2.0 m	m	89	7 días	mar 10/11/26	213	mar 17/11/26	$ 13.579.976,00	214
225	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado	kg	9751	30 días	mié 11/11/26	216	sáb 12/12/26	$ 85.018.969,00	218;219;22
226	11.28	Suministro, transporte e instalación de viga HEA-160 con hincado mecanico en terreno según diseño. Incluye perfil metalico, ubicación en sitio, alineación e	m	102	21 días	vie 11/09/26	191FC+15 días	jue 01/10/26	$ 42.590.508,00	220
227	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Km	16469	21 días	mar 29/12/26	211CC;215F	lun 18/01/27	$ 30.780.561,00	
228	13.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Km	19829	21 días	mar 29/12/26	211CC;215F	lun 18/01/27	$ 37.060.401,00	
229		**PRODUCTO 4.CONTRUCCIÓN BOX CULVERT MENOR Km 73+815**		**0**	**93 días**	**dom 04/10/26**		**sáb 09/01/27**	**$ 293.917.848,00**	

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26



Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
230	4.1.95	Descapote a máquina del terreno natural hasta 30 cm. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m2	35	7 días	dom 04/10/26	211	sáb 10/10/26	$ 436.520,00	231;246CC
231	4.1.6	Excavación en roca de la explanación, comprende la excavación de masas de rocas hasta 30 cm de diámetro", fuertemente litificadas que, debido a su buena cementación o alta consolidación, no es posible su división mecánica en la excavación. Incluye transpo	m3	302	28 días	dom 11/10/26	230	lun 09/11/26	$ 21.806.816,00	234;236;24 días
232	4.2.2	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	86	7 días	lun 23/11/26	239;241;24;	dom 29/11/26	$ 2.573.120,00	233
233	5.1.4	Suministro, colocación, conformación y compactación de Base Granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	70	3 días	lun 30/11/26	232	mié 02/12/26	$ 13.984.110,00	
234	6.1.18	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m3	4	1 día	mar 10/11/26	231	mar 10/11/26	$ 2.595.856,00	236;237;24 días
235	6.2.26	Concreto Clase C (28 MPa). Box Culvert - Losa superior y muros laterales	m3	59	12 días	mar 29/12/26	238	sáb 09/01/27	$ 74.449.799,00	246FF;245I

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26



Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
236	6.2.28	Concreto Clase C (28 MPa). Canales en concreto.	m3	21	6 días	lun 23/11/26	243;234;23	sáb 28/11/26	$ 23.108.946,00	
237	6.2.10	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase D (21 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y	m3	5	7 días	lun 23/11/26	243;234;23	dom 29/11/26	$ 5.236.570,00	
238	7.2.13	Colocación de CINTA PVC TIPO O-22 o equivalente, entre juntas de construcción de obras en concreto. Incluye el suministro de de la cinta y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento según especificaciones	m	18	4 días	jue 24/12/26	243;244	lun 28/12/26	$ 2.010.744,00	235
239	8.5	Suministro, transporte y colocación de material filtrante para construcción de filtros de 2" a 3" con canto rodado.	m3	15	4 días	jue 19/11/26	241	dom 22/11/26	$ 2.254.350,00	232;236;23
240	8.9	Suministro, transporte e Instalación de Geotextil NT 2500 o equivalente. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo.	m2	13	4 días	mar 10/11/26	231	vie 13/11/26	$ 214.318,00	241

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
241	8.31	Suministro, transporte y colocación de tuberia perforada de 4" para drenaje con filtro. Incluye los accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m	23	4 días	sáb 14/11/26	240	mié 18/11/26	$ 1.023.017,00	232;239
242	8.12.1	Suministro, transporte e instalación de Geodren planar H=2.0 m	m	172	5 días	mar 10/11/26	231	sáb 14/11/26	$ 26.244.448,00	232
243	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado	kg	7302	14 días	jue 05/11/26	234CC-5 días	Jue 19/11/26	$ 63.666.138,00	236;238;23
244	11.28	Suministro, transporte e instalación de viga HEA-160 con hincado mecanico en terreno según diseño. Incluye perfil metalico, ubicación en sitio, alineación e	m	17	21 días	mié 02/12/26	231FC+21 días	mié 23/12/26	$ 7.098.418,00	238
245	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Kn	13333	20 días	dom 20/12/26	230CC;235F	sáb 09/01/27	$ 24.919.377,00	
246	13.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Kn	11929	20 días	dom 20/12/26	230CC;235F	sáb 09/01/27	$ 22.295.301,00	
247		**PRODUCTO 5.CONSTRUCCIÓN CUNETA**		**0**	**21 días**	**sáb 06/02/2**		**vie 26/02/27**	**$ 27.524.655,00**	

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
248	4.1.3	Excavación manual en material común. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	45	16 días	sáb 06/02/27	256	dom 21/02/27	$ 1.741.860,00	249FC-2 días;250;25
249	6.2.5	Concreto Clase D (21 MPa). Cunetas.	m3	21	4 días	mar 23/02/2	251FC-2 día	vie 26/02/27	$ 17.581.473,00	
250	8.6	Material granular de 12 a 25 mm para filtro, cimentaciones o cama de triturado. Incluye transporte interno, Suministro, transporte e instalación de y todo lo necesario para su correcta instalación.	m3	17	3 días	lun 22/02/27	248	mié 24/02/27	$ 2.792.386,00	249FC-2 días;252CC días
251	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado	kg	191	3 días	lun 22/02/27	248	mié 24/02/27	$ 1.665.329,00	249FC-2 días
252	13.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Kn	2003	3 días	sáb 20/02/27	250CC-2 días	lun 22/02/27	$ 3.743.607,00	
253		**PRODUCTO 6. CONSTRUCCIÓN FILTRO**		**0**	27 días	**dom 10/01/**		**vie 05/02/27**	**$ 42.038.367,00**	
254	4.1.3	Excavación manual en material común. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	45	4 días	dom 10/01/27	235	mié 13/01/27	$ 1.741.860,00	255;259CC
255	8.9	Suministro, transporte e Instalación de Geotextil NT 2500 o equivalente. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo.	m2	360	5 días	jue 14/01/27	254	lun 18/01/27	$ 5.934.960,00	257

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
256	8.5	Suministro, transporte y colocación de material filtrante para construcción de filtros de 2" a 3" con canto rodado.	m3	54	12 días	lun 25/01/27	257	vie 05/02/27	$ 8.115.660,00	259FF;248
257	8.31	Suministro, transporte y colocación de tubería perforada de 4" para drenaje con filtro. Incluye los accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m	150	6 días	mar 19/01/27	255	dom 24/01/27	$ 6.671.850,00	256
258	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Kn	8470	12 días	dom 10/01/27	254CC	jue 21/01/27	$ 15.830.430,00	
259	13.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Kn	2003	12 días	lun 25/01/27	254CC;256F	vie 05/02/27	$ 3.743.607,00	
260		**PRODUCTO 7. CONSTRUCCIÓN DEL CANAL CPD**		**0**	52 días	**lun 23/11/26**		**vie 15/01/27**	**$ 30.720.237,00**	

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id		ÍTEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
261		4.1.6	Excavación en roca de la explanación, comprende la excavación de masas de rocas hasta 30 cm de diámetro", fuertemente litificadas que, debido a su buena cementación o alta consolidación, no es posible su división mecánica en la excavación. Incluye transpo	m3	24	30 días	lun 23/11/26		mié 23/12/26	$ 1.732.992,00	263FC-1 día;264;26
262		4.2.3	Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. No incluye transporte.	m3	24	8 días	vie 08/01/27	263FC-5 días	vie 15/01/27	$ 1.377.000,00	
263		6.2.24	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y	m3	13	6 días	jue 07/01/27	264FC-1 día;261FC-1 día	mar 12/01/27	$ 14.812.070,00	262FC-5 días
264		10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado	kg	661	14 días	jue 24/12/26	261	jue 07/01/27	$ 5.763.259,00	263FC-1 día
265		13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Kn	3764	3 días	lun 23/11/26	261CC	mié 25/11/26	$ 7.034.916,00	

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
266		**PRODUCTO 8. ESTABILIZACION DE TALUD INFERIOR**		**0**	**42 días**	**jue 27/08/26**		**mié 07/10/26**	**$ 307.040.933,00**	
267	15.9	Desmonte y limpieza de zonas verdes existentes. Incluye corte y desenraice de setos existentes, cargue, retiro y transporte de material vegetal resultante. Esta actividad se realizará simultáneamente con la rocería de	m2	2008	10 días	jue 27/08/26	191	sáb 05/09/26	$ 27.445.344,00	268;269;27
268	8.46	Suministro, transporte y siembra de Pasto Vetiver	m2	2008	6 días	jue 01/10/26	270;271;27	mar 06/10/26	$ 45.671.960,00	
269	8.55	Protección vegetal de taludes con tierra orgánica y semillas	m2	2008	7 días	jue 01/10/26	270;271;27	mié 07/10/26	$ 39.880.888,00	
270	8.67.1	Suministro e instalación de manto para control de erosión TRM 500 y sus respectivos anclajes de fijación	m2	2008	5 días	sáb 26/09/26	267;272;27	mié 30/09/26	$ 75.757.824,00	268;269
271	11.24	Suministro, transporte e instalación de malla triple torsión recubierta en PVC, incluye instalación de la malla y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad, anclajes y pernos se pagaran en su ítem respectivo.	m2	2008	5 días	lun 21/09/26	272	vie 25/09/26	$ 116.357.576,00	268;269;27
272	11.19	Suministro, transporte e instalación de perno helicoidal de anclaje pasivo. Incluye fluido de perforación y mortero	m	13	15 días	dom 06/09/26	267	dom 20/09/26	$ 1.927.341,00	268;269;27
273		**FRENTE 4- CAROLINA DEL PRINCIPE**		**0**	**180 día**	**lun 10/08/26**		**jue 11/02/27**	**$ 1.702.663.240...**	

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	


Id		ÍTEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
274			**PRODUCTO 1. CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO**		**0**	80 días	**lun 10/08/26**		**vie 30/10/26**	**$ 140.588.593,00**	
275		1.1	Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión. Incluye vehículo para el transporte de personal y equipo con dedicación exclusiva.	día	30	30 días	lun 10/08/26		mié 09/09/26	$ 40.582.230,00	276CC+7 días;280CC días
276		2.3	Demolición de pavimento asfáltico, de cualquier espesor. Incluye corte con cortadora según trazado y cargue, transporte y disposición final de	m3	41	19 días	mar 18/08/26	275CC+7 días	sáb 05/09/26	$ 5.850.946,00	277FC+21 días
277		5.1.4	Suministro, colocación, conformación y compactación de Base Granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	97	15 días	dom 27/09/26	276FC+21 días	dom 11/10/26	$ 19.377.981,00	279FC+4 días
278		7.1.2	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 que cumpla con el Artículo 450-22 de la norma INVIAS 2022. Incluye: colocación con terminadora (finisher), compactación y terminación de bordes. No incluye imprimación, ni transport	m3	32	5 días	lun 26/10/26	279FC+3 días	vie 30/10/26	$ 53.365.824,00	

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id	ÍTEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
279	7.1.1	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta	m2	324	6 días	sáb 17/10/26	277FC+4 días	jue 22/10/26	$ 1.607.688,00	278FC+3 días
280	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Km	10596	25 días	lun 10/08/26	275CC	vie 04/09/26	$ 19.803.924,00	
281		**PRODUCTO 2. CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCION Km 41+900**		**0**	**173 días**	**mar 18/08/26**		**jue 11/02/27**	**$ 1.238.613.637,00**	
282	4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	355	19 días	mar 18/08/26	275CC+7 días	sáb 05/09/26	$ 17.671.545,00	301
283	4.1.46	Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 0-2 m, diámetro interno 1.2 m. Incluye anillo en concreto e=10cm 21 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4 m). Incluye transporte interno.	m	46	11 días	mié 04/11/26	304	sáb 14/11/26	$ 30.389.072,00	284;285CC día

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

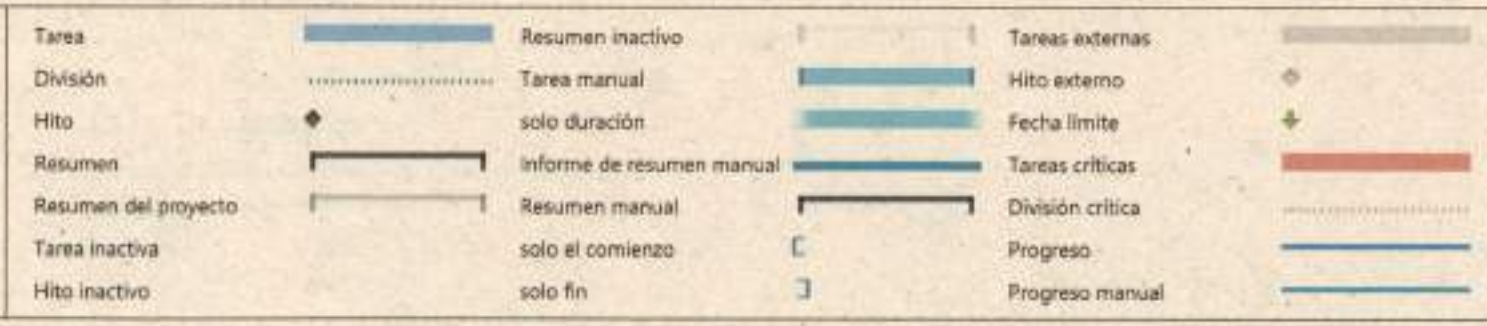


Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
284	4.1.47	Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 2-4 m, diámetro interno 1.2 m. Incluye anillo en concreto e=10cm 21 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4 m). Incluye transporte interno.	m	46	12 días	dom 15/11/26	283	vie 27/11/26	$ 32.151.148,00	
285	4.1.48	Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 4-6 m, diámetro interno 1.2 m. Incluye anillo en concreto e=10cm 21 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4 m). Incluye transporte interno.	m	46	13 días	jue 05/11/26	283CC+1 día	mié 18/11/26	$ 34.079.330,00	286;287;28 día;289CC+ días;290CC días
286	4.1.49	Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 6-8 m, diámetro interno 1.2 m. Incluye anillo en concreto e=10cm 21 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4 m). Incluye transporte interno.	m	46	16 días	jue 19/11/26	285	vie 04/12/26	$ 36.290.136,00	
287	4.1.50	Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 8-10 m, diámetro interno 1.2 m. Incluye anillo en concreto e=10cm 21 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4 m). Incluye transporte interno.	m	46	18 días	jue 19/11/26	285	dom 06/12/26	$ 38.656.376,00	

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26




Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
288	4.1.51	Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 10_12 m, diámetro interno 1.2 m. Incluye anillo en concreto e=10cm 21 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4 m). Incluye transporte interno.	m	46	20 días	vie 06/11/26	285CC+1 día	jue 26/11/26	$ 41.398.114,00	292CC
289	4.1.52	Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 12-14 m, diámetro interno 1.2 m. Incluye anillo en concreto e=10cm 21 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4 m). Incluye transporte interno.	m	46	23 días	sáb 07/11/26	285CC+2 días	lun 30/11/26	$ 44.196.018,00	292CC
290	4.1.53	Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 14-16 m, diámetro interno 1.2 m. Incluye anillo en concreto e=10cm 21 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4 m). Incluye transporte interno.	m	23	26 días	lun 09/11/26	285CC+4 días	sáb 05/12/26	$ 23.807.254,00	292CC;297 días
291	4.2.3	Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. No incluye transporte.	m3	355	12 días	dom 31/01/27	297;298;29	jue 11/02/27	$ 20.368.125,00	

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26



Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
292	13.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Km	22720	14 días	lun 09/11/26	288CC;289C	lun 23/11/26	$ 42.463.680,00	302
293	6.2.24	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y	m3	142	14 días	dom 03/01/27	294FC-3 días	sáb 16/01/27	$ 161.793.380,00	
294	6.1.13	Pila-pilote-caisson en concreto Clase C (28 MPa) fundido en sitio	m3	390	27 días	mié 09/12/26	290FC+2 días	mar 05/01/27	$ 375.122.280,00	293FC-3 días;295;29
295	6.1.18	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m3	4	9 días	mié 06/01/27	294	jue 14/01/27	$ 2.595.856,00	300
296	7.2.13	Colocación de CINTA PVC TIPO O-22 o equivalente, entre juntas de construcción de obras en concreto. Incluye el suministro de de la cinta y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento según	m	62	7 días	lun 18/01/27	294FC+12 días	dom 24/01/27	$ 6.925.896,00	
297	8.12.1	Suministro, transporte e instalación de Geodren planar H=2.0 m	m	53	10 días	dom 06/12/26	290	mié 16/12/26	$ 8.086.952,00	291;298

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26



Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
298	8.30	Suministro, transporte y colocación de tubería de 2", perforada, recubierta con geotextil NT 2000 para lloraderos.	m	8	6 días	mié 20/01/27	297;300	lun 25/01/27	$ 254.024,00	291;299
299	4.2.5	Lleno con material no clasificado de río para filtro Geodren. Incluye suministro, transporte y colocación	m3	43	5 días	mar 26/01/27	298	sáb 30/01/27	$ 5.947.029,00	291
300	8.19	Suministro, transporte e instalación de tubería perforada 100 mm	m	53	5 días	vie 15/01/27	295	mar 19/01/27	$ 2.309.157,00	291;298
301	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado	kg	29775	10 días	dom 06/09/26	282	mar 15/09/26	$ 259.608.225,00	
302	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Kn	29160	15 días	mar 24/11/26	292	mié 09/12/26	$ 54.500.040,00	
303		**PRODUCTO 3. ESTABILIZACIÓN DE TALUD**		**0**	34 días	**jue 22/10/26**		**jue 26/11/26**	**$ 217.854.655,00**	
304	15.9	Desmonte y limpieza de zonas verdes existentes. Incluye corte y desenraice de setos existentes, cargue, retiro y transporte de material vegetal resultante. Esta actividad se realizará simultáneamente con la rocería de	m2	3710	12 días	jue 22/10/26	191CC+60 días	mar 03/11/26	$ 50.708.280,00	305;306;30

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	


Id	ÍTEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
305	8.15	Construcción de drenes horizontales según diseño. Incluye perforación en suelo con fragmentos rocosos meteorizados por medio de sistemas electromecánicos en un diámetro de 3", el suministro, transporte y colocación de tubería PVC sanitaria de	m	240	10 días	mié 04/11/26	304	vie 13/11/26	$ 40.359.360,00	306;307;30
306	8.39	Revegetalización de taludes con agromanto de fique con Brachiaria decumbens, para sembrar en sitios con alturas hasta 2.000 msnm	m2	1855	6 días	sáb 14/11/26	305;304	vie 20/11/26	$ 57.753.570,00	
307	8.46	Suministro, transporte y siembra de Pasto Vetiver	m2	1855	5 días	sáb 14/11/26	305;304	jue 19/11/26	$ 42.191.975,00	
308	8.47	Construcción de trinchos en madera	m	530	12 días	sáb 14/11/2	305	jue 26/11/26	$ 23.849.470,00	
309	4.2.2	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	100	8 días	sáb 14/11/26	305	dom 22/11/26	$ 2.992.000,00	
310		**PRODUCTO 4. CONSTRUCCIÓN CANAL (CPD)**		**0**	**25 días**	**jue 03/12/26**		**mar 29/12/26**	**$ 36.278.407,00**	

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
311	4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	34	13 días	jue 03/12/26	324	mié 16/12/26	$ 1.692.486,00	313;315;31
312	4.2.2	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	26	2 días	lun 28/12/26	314;313;31	mar 29/12/26	$ 777.920,00	318FF;319
313	8.34	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC 1 1/2" para Lloradero en estructuras.	m	18	2 días	jue 17/12/26	311	vie 18/12/26	$ 339.606,00	312;314
314	8.5.2	Suministro y colocación de material filtrante para construcción de filtros de 3/8" con canto rodado. No incluye transporte.	m3	3	1 día	sáb 19/12/26	313	sáb 19/12/26	$ 545.130,00	312
315	6.2.1	Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa y Piedra de	m3	1	4 días	dom 20/12/26	317;311;21	mié 23/12/26	$ 689.479,00	
316	6.2.24	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y	m3	18	7 días	dom 20/12/26	317;311;21	dom 27/12/26	$ 20.509.020,00	312

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

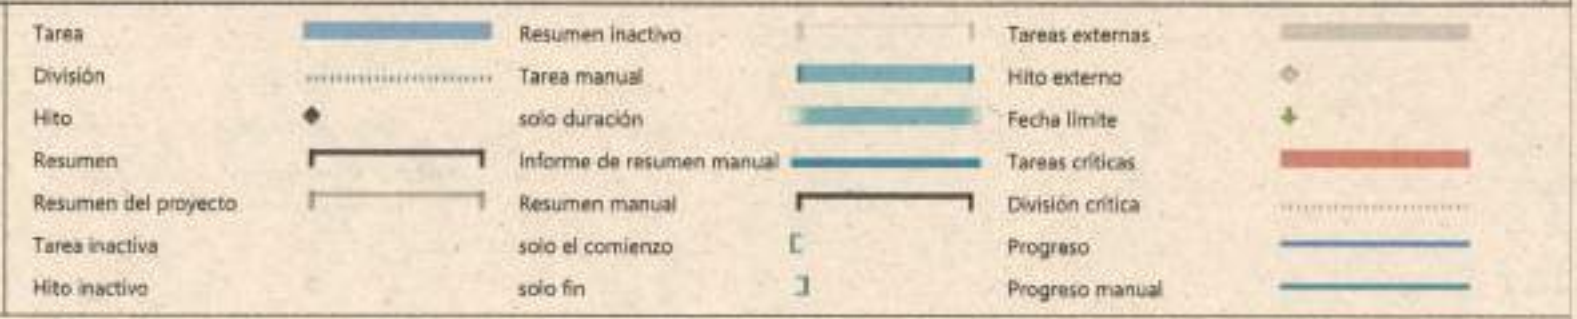

Id		ÍTEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
317		10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado	kg	862	3 días	jue 17/12/26	311	sáb 19/12/26	$ 7.515.778,00	315;316
318		13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Kn	246	5 días	jue 24/12/26	311CC;312F	mar 29/12/26	$ 459.774,00	
319		13.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Kn	2006	5 días	jue 24/12/26	311CC;312F	mar 29/12/26	$ 3.749.214,00	
320			**PRODUCTO 5. CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA**		**0**	**49 días**	**mar 13/10/26**		**mié 02/12/26**	**$ 69.327.948,00**	
321		2.8	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	11	6 días	mar 13/10/26		dom 18/10/26	$ 2.332.517,00	322;323
322		2.14	Retiro de tubería existente de 24", sin excavación	m	7	7 días	lun 19/10/26	321	dom 25/10/26	$ 312.060,00	325FC+7 días
323		4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	11	16 días	lun 19/10/26	321	mié 04/11/26	$ 547.569,00	327;329CC

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
324	4.2.2	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	36	7 días	jue 26/11/26	326;327	mié 02/12/26	$ 1.077.120,00	311
325	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	4	6 días	mar 03/11/26	322FC+7 días	dom 08/11/26	$ 399.264,00	326;328
326	8.27	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 36"	m	10	7 días	lun 09/11/26	325	dom 15/11/26	$ 21.202.410,00	324
327	6.2.24	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y	m3	15	6 días	vie 20/11/26	328;323	mié 25/11/26	$ 17.090.850,00	324
328	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado	kg	2251	10 días	lun 09/11/26	325	jue 19/11/26	$ 19.626.469,00	327


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Predecesoras	Fin	Costo	Sucesoras
329	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Kn	957,0	12 días	lun 19/10/26	323CC	vie 30/10/26	$ 5.526.708,00	
330	13.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	n3-Kn	649	12 días	lun 19/10/26	323CC	vie 30/10/26	$ 1.212.981,00	


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

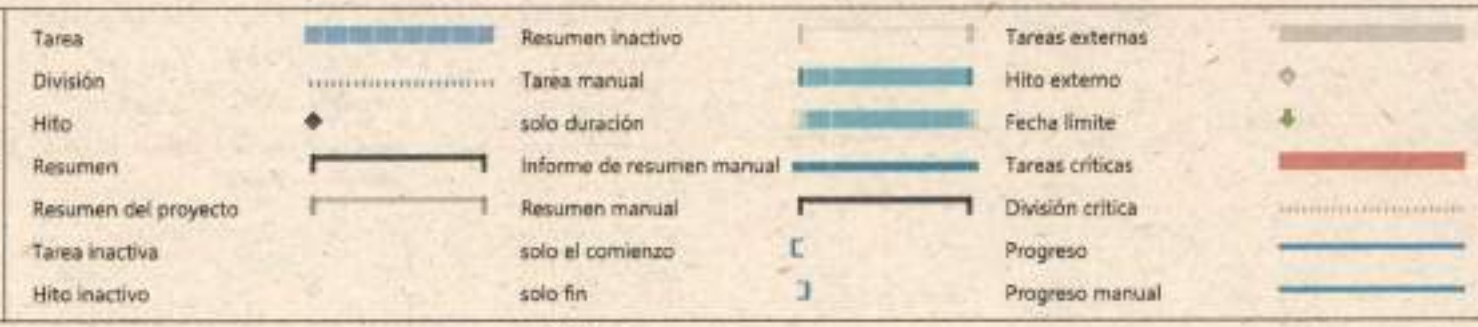

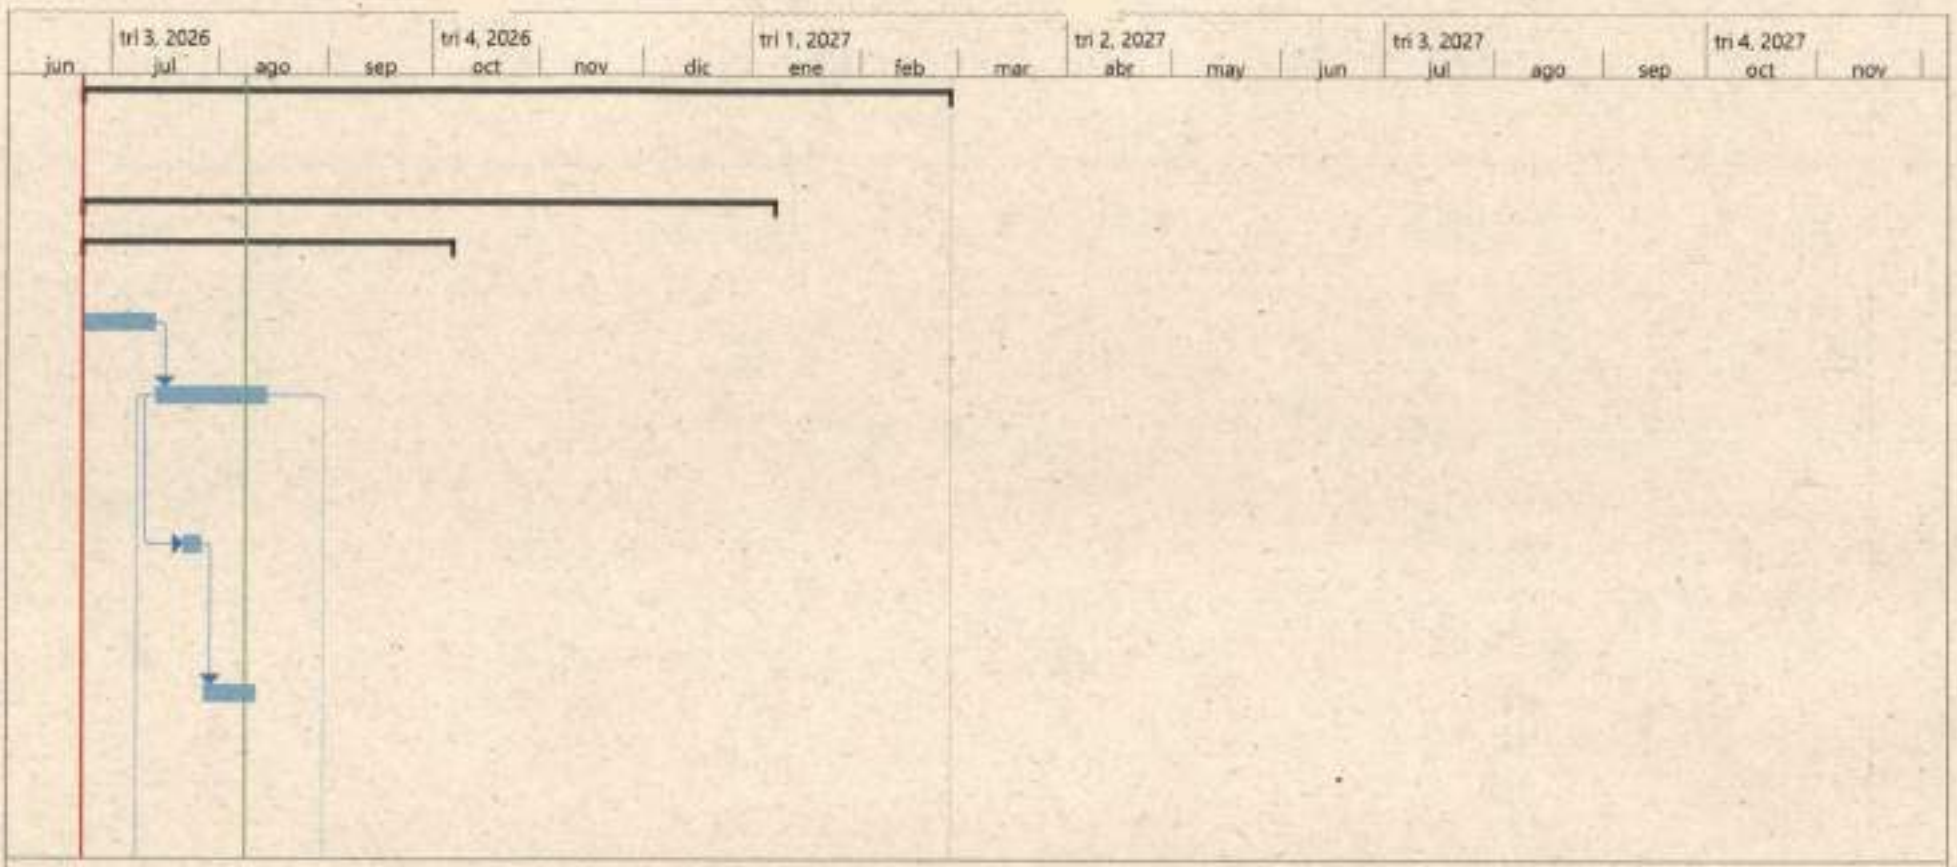


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

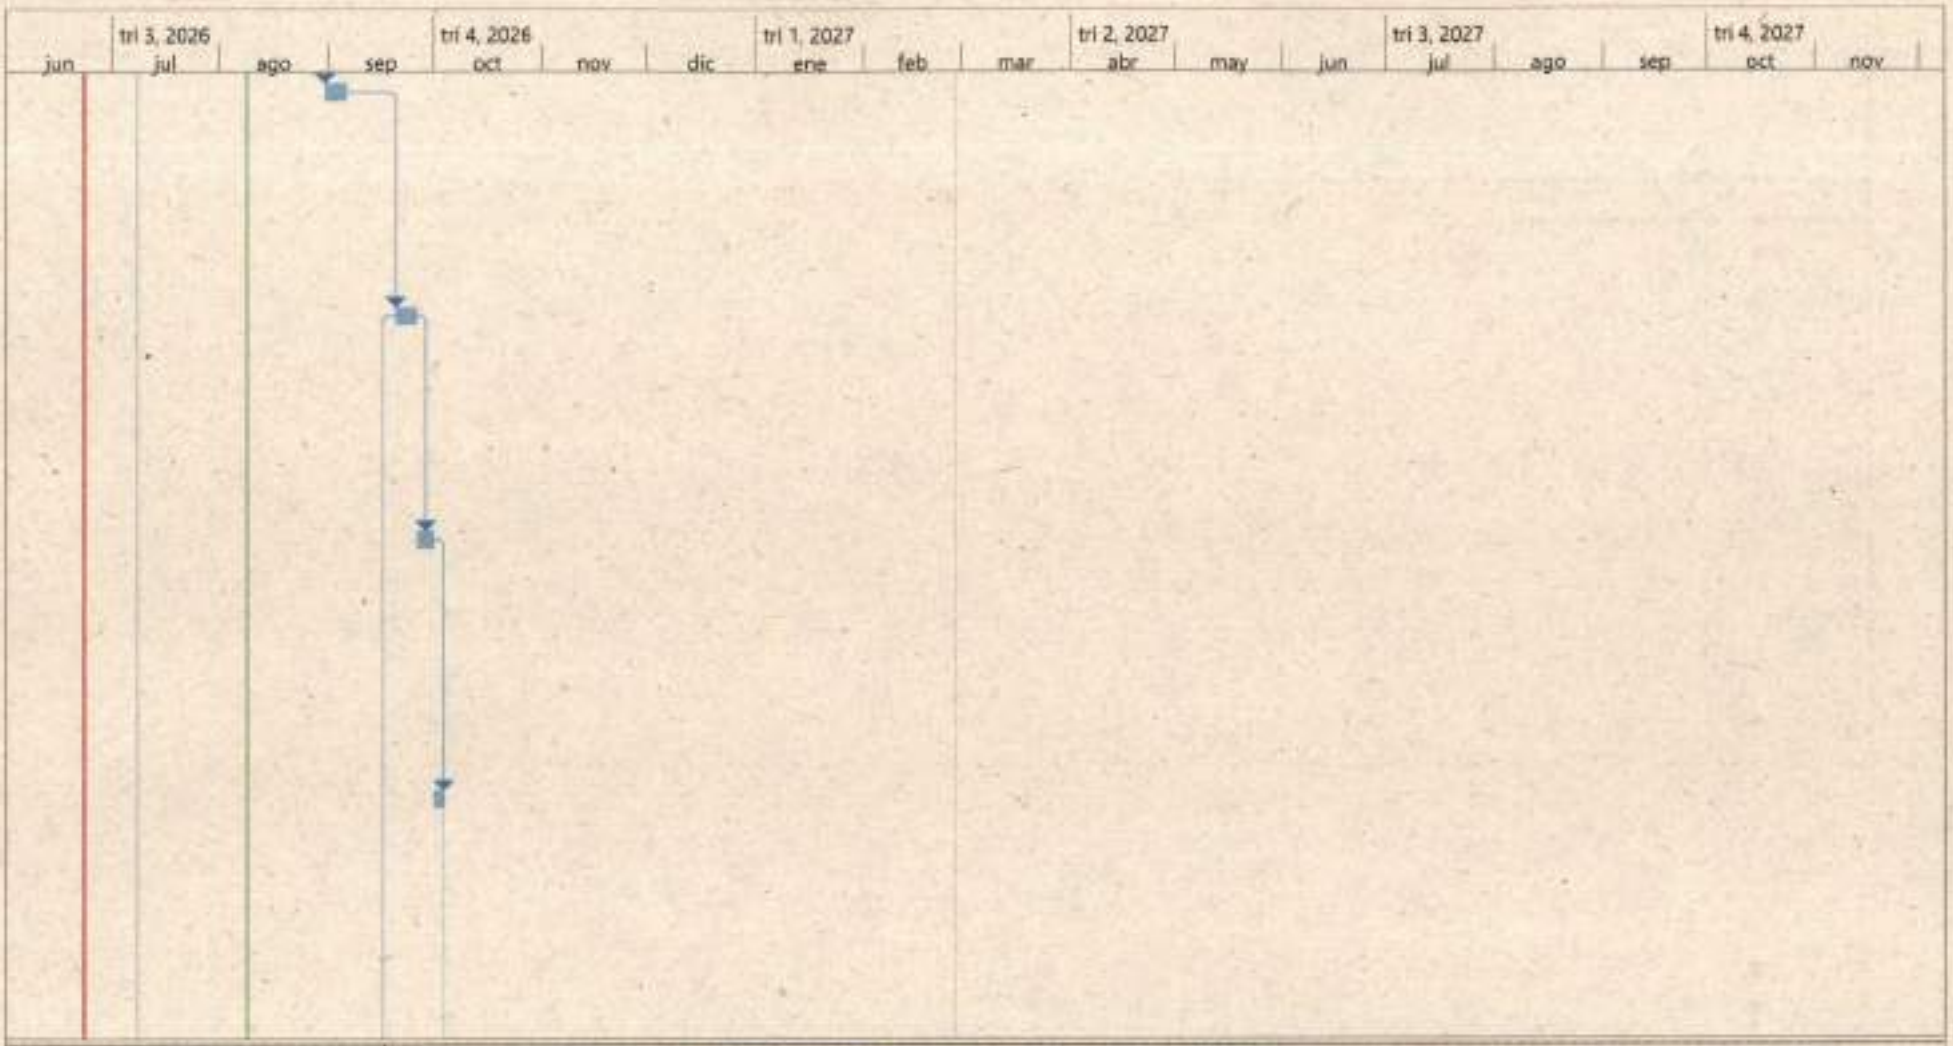


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

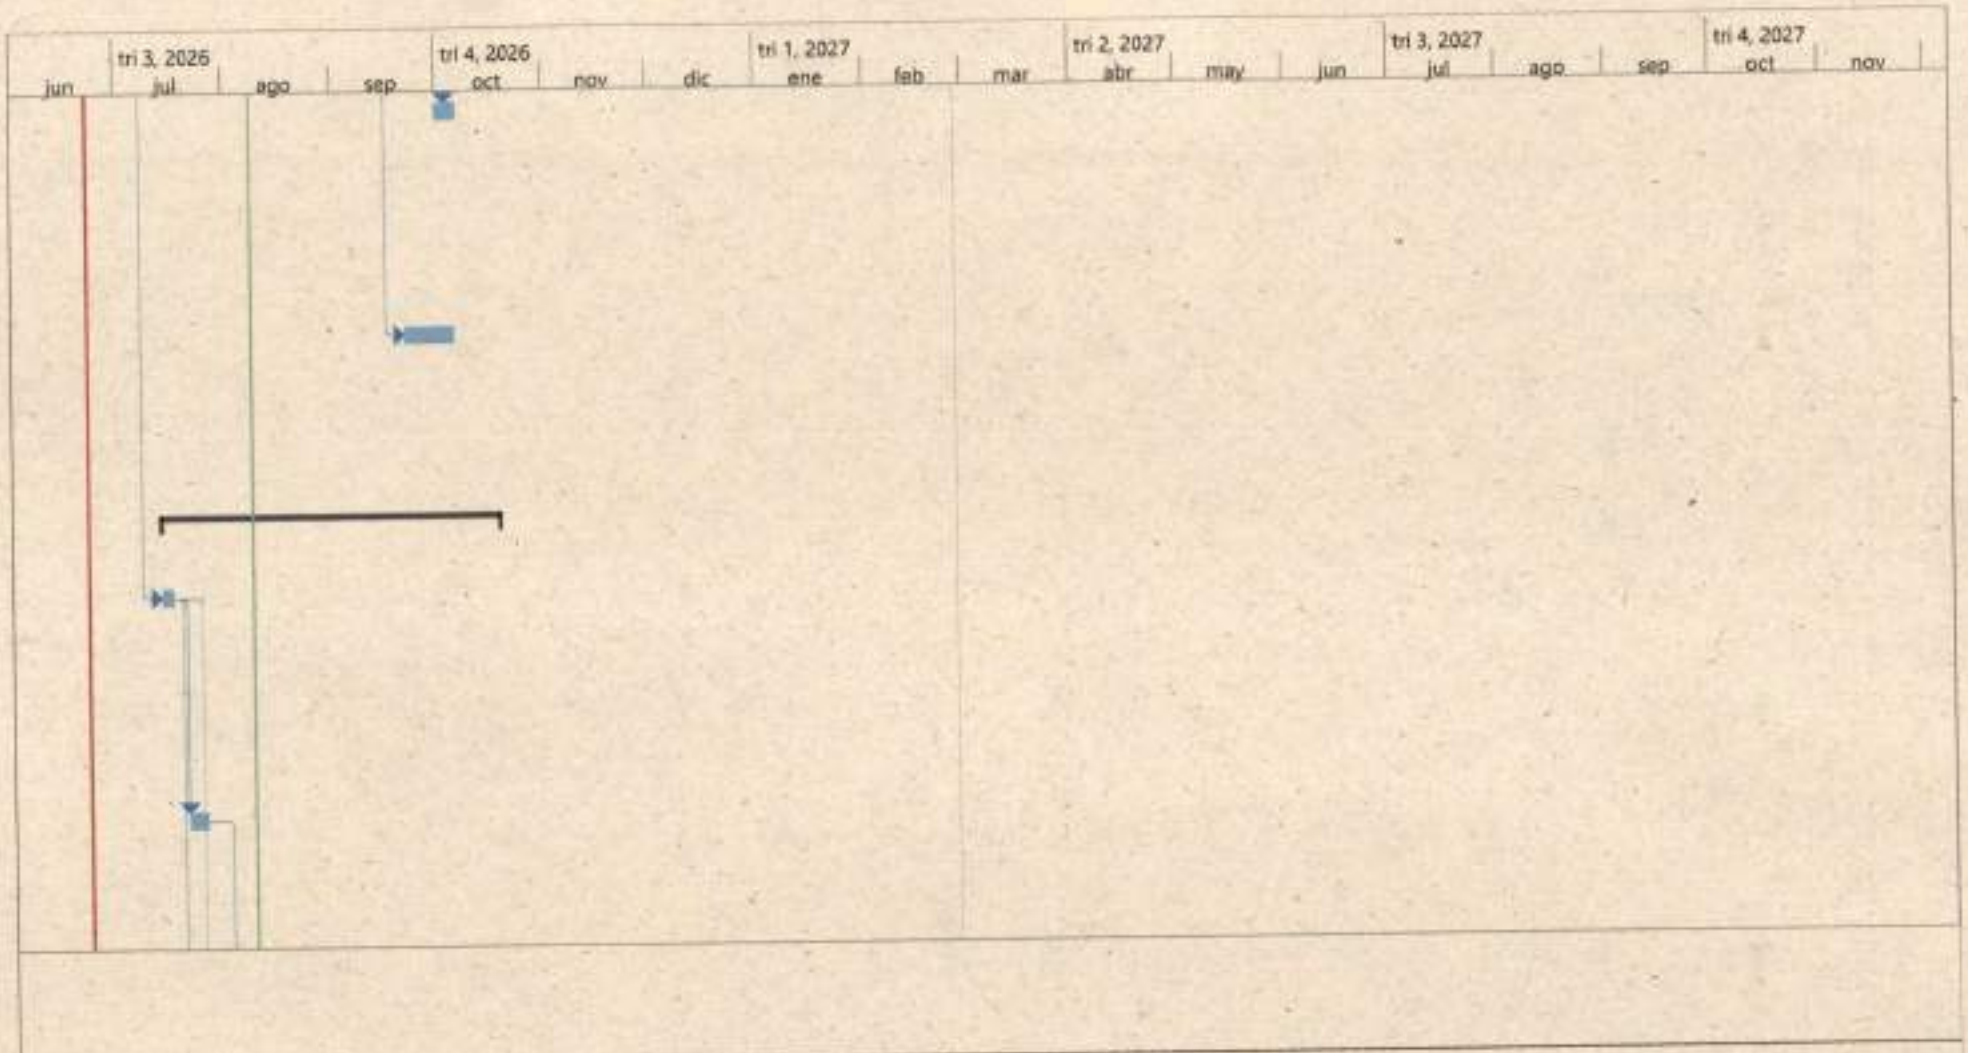

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

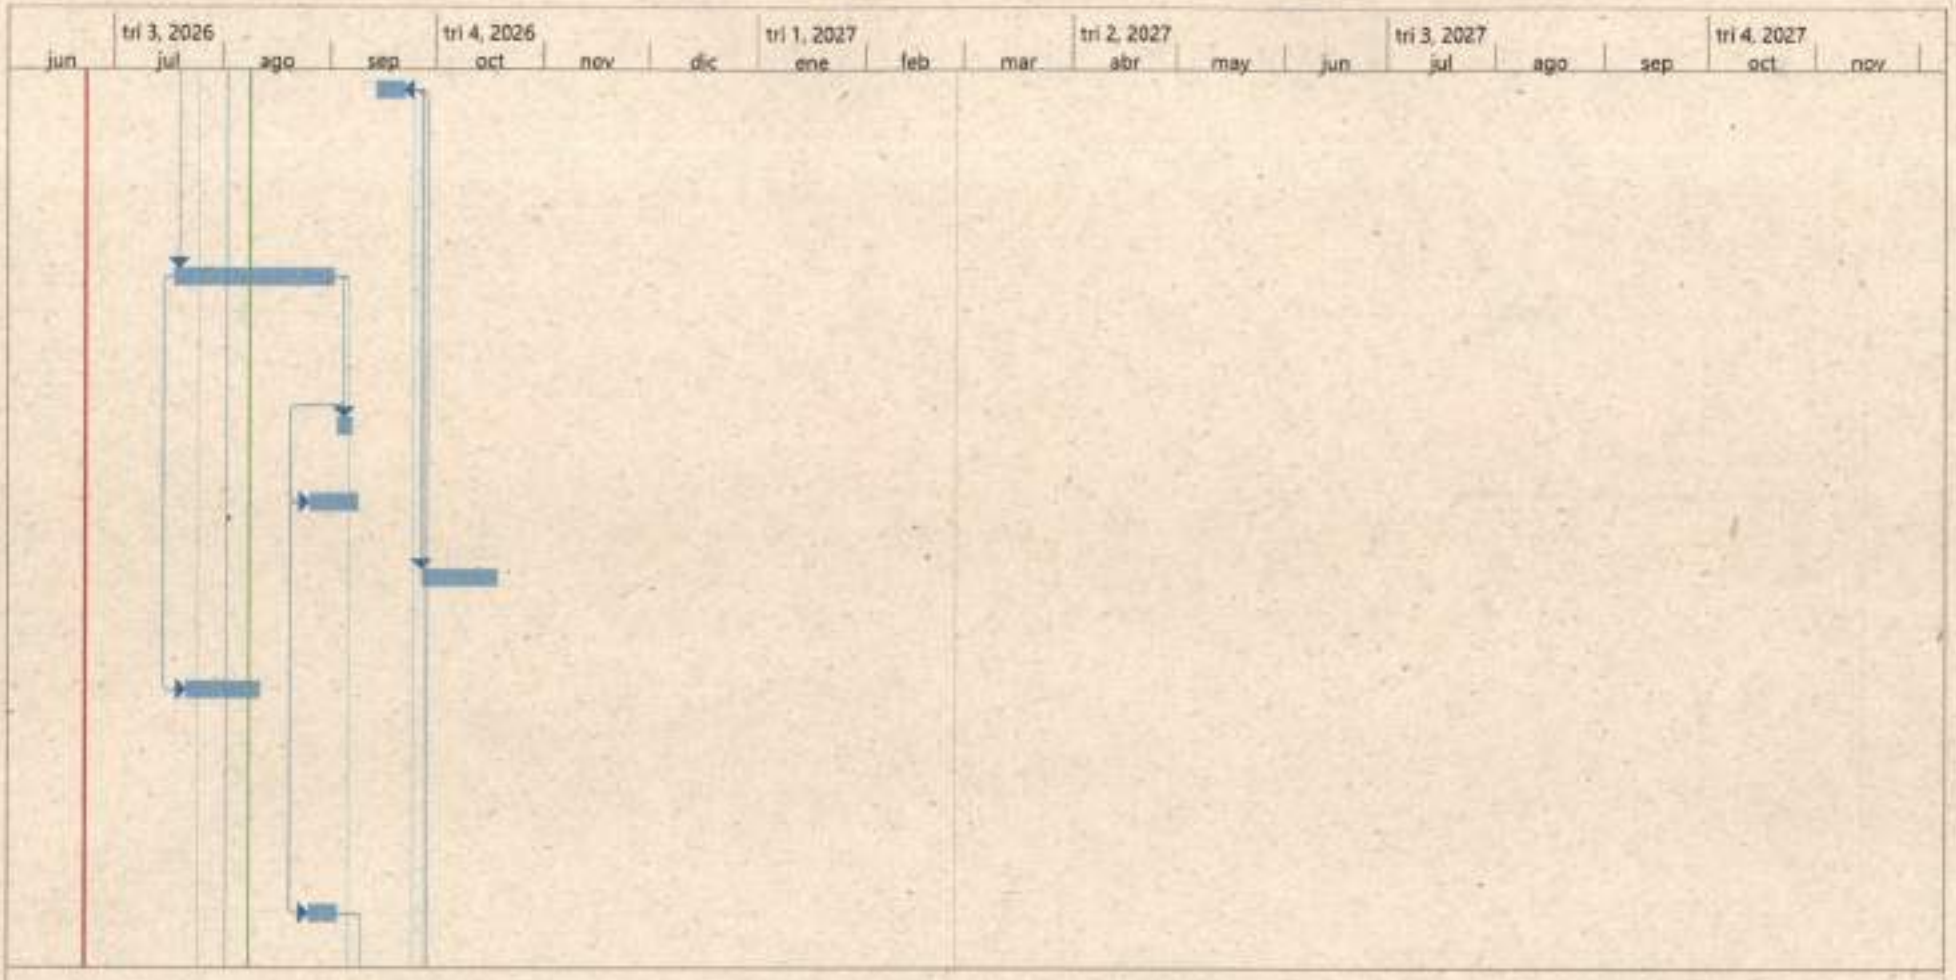


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	




Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

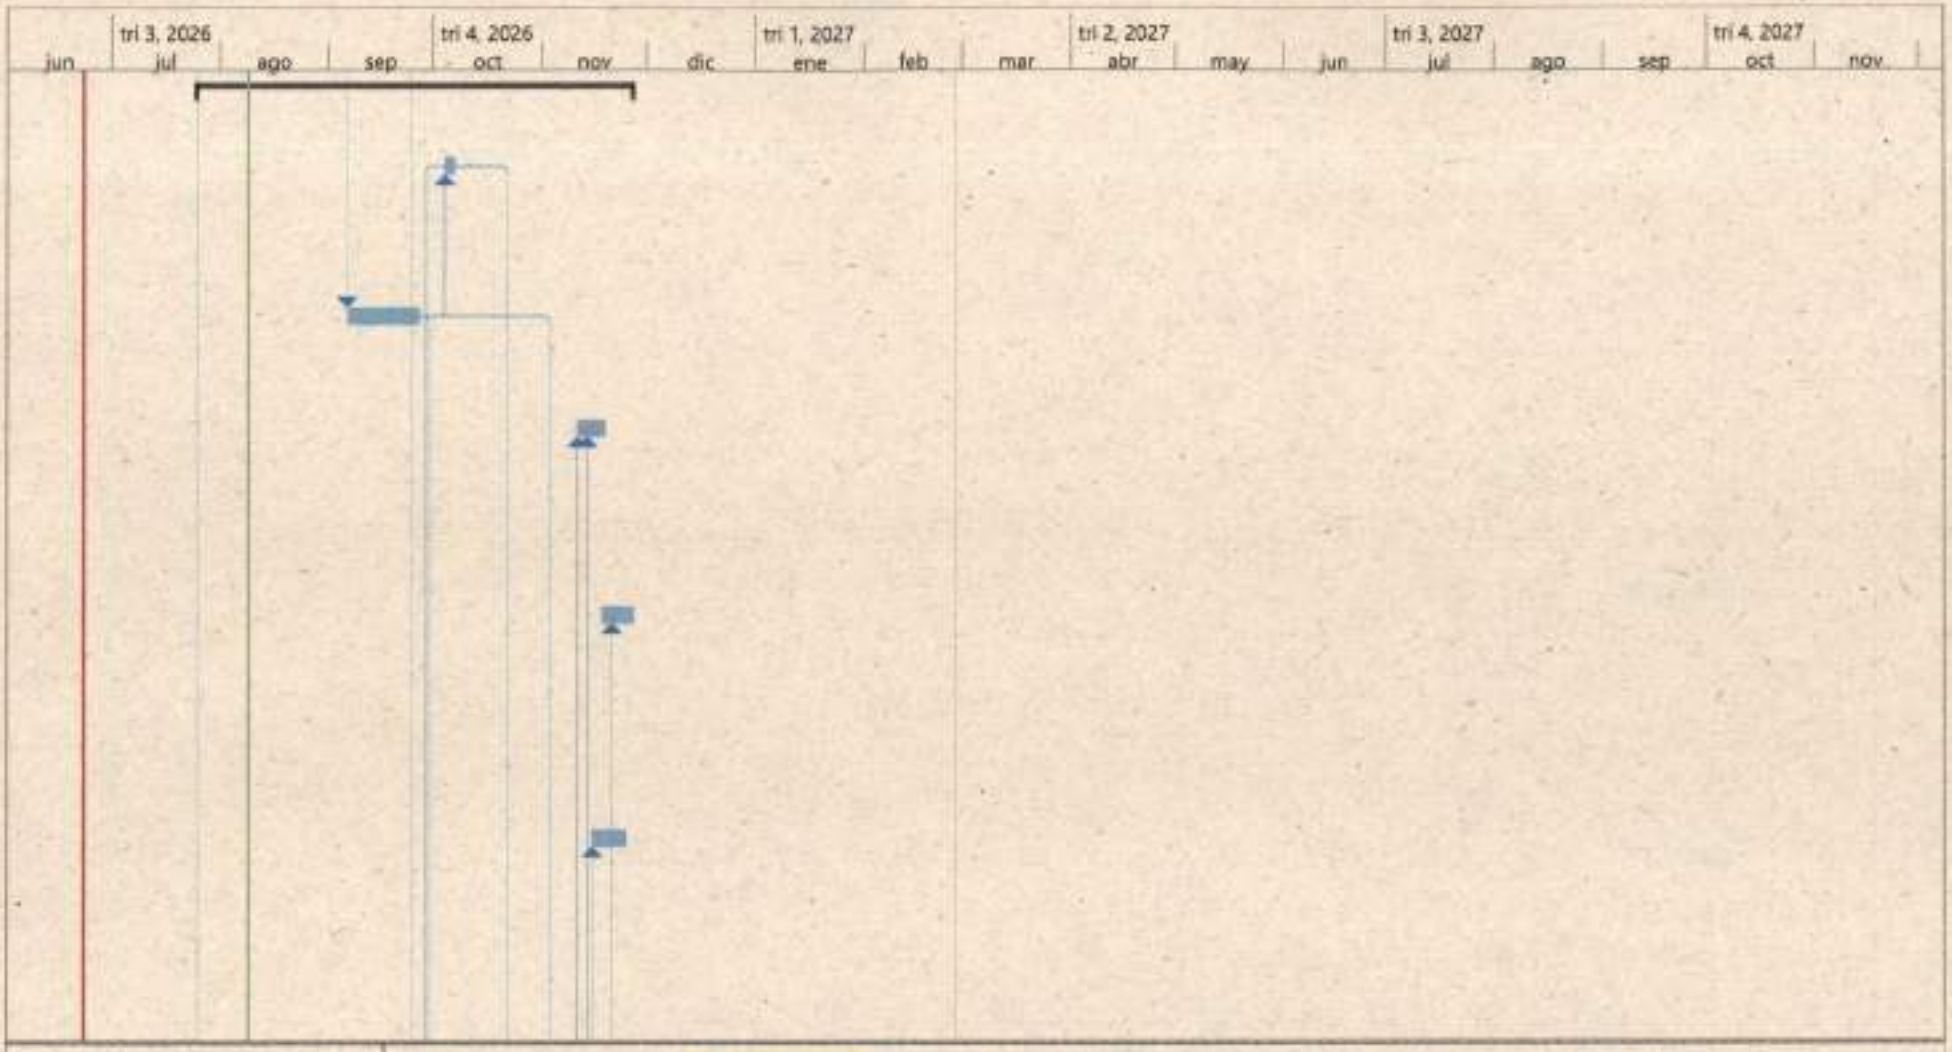


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

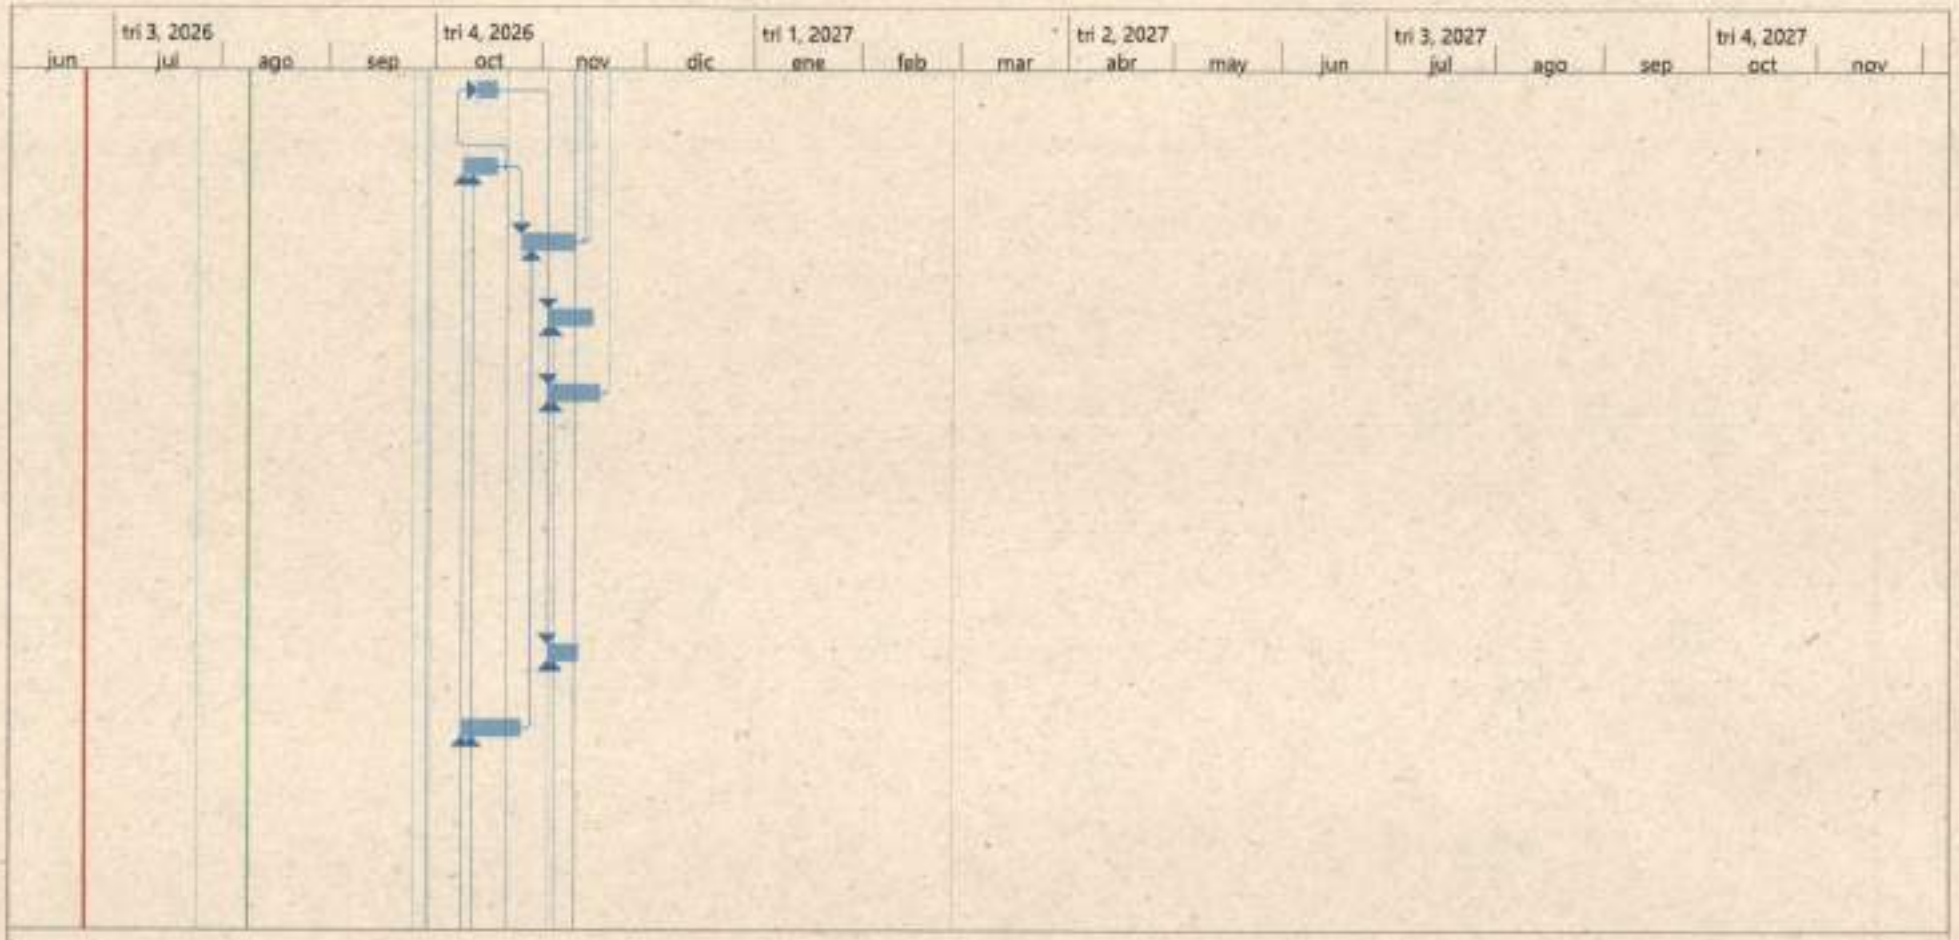


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

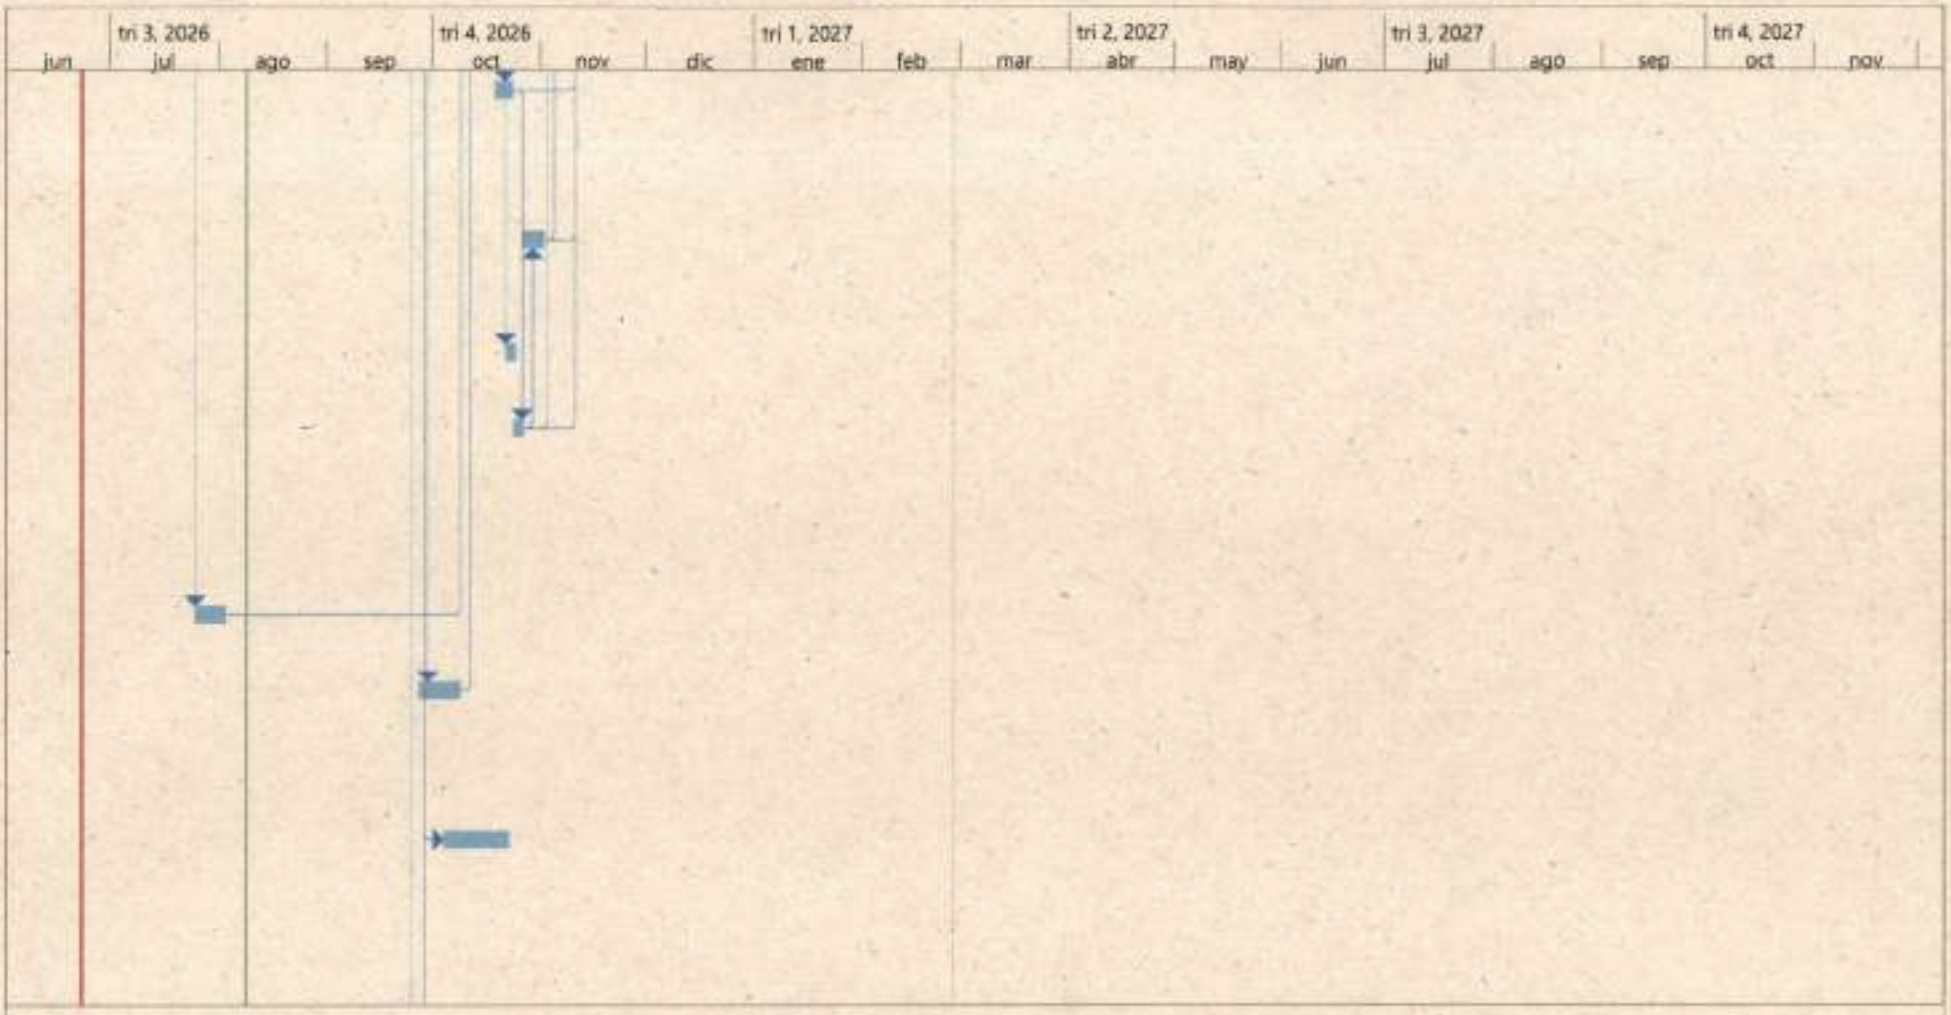


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

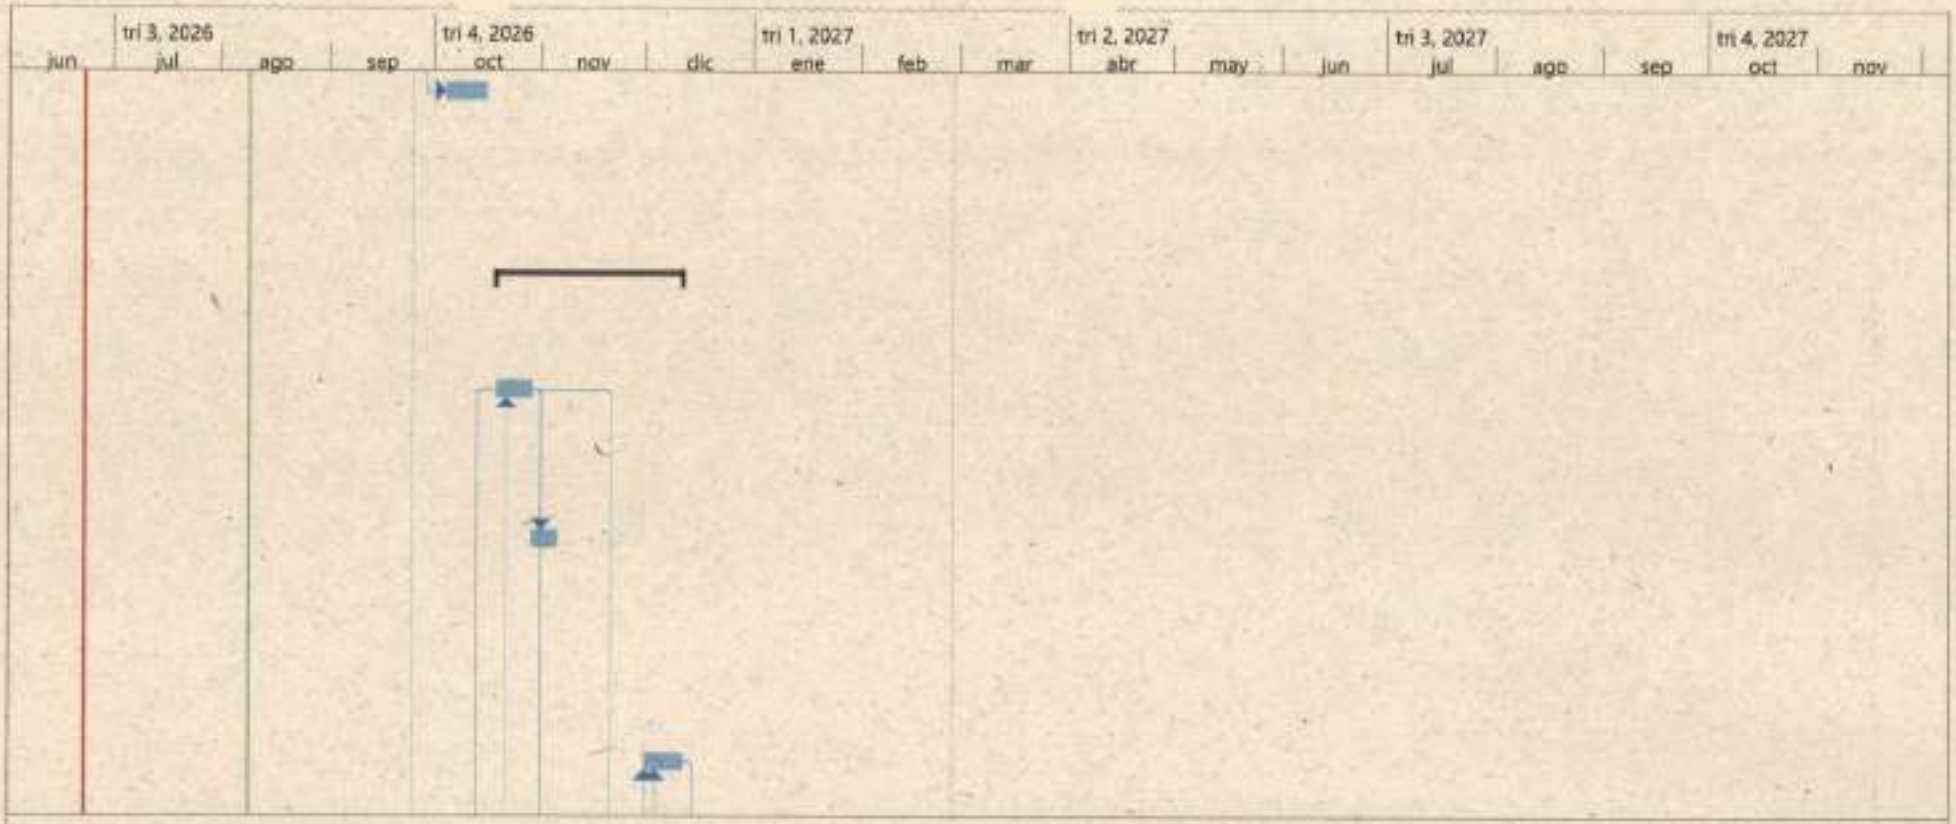


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

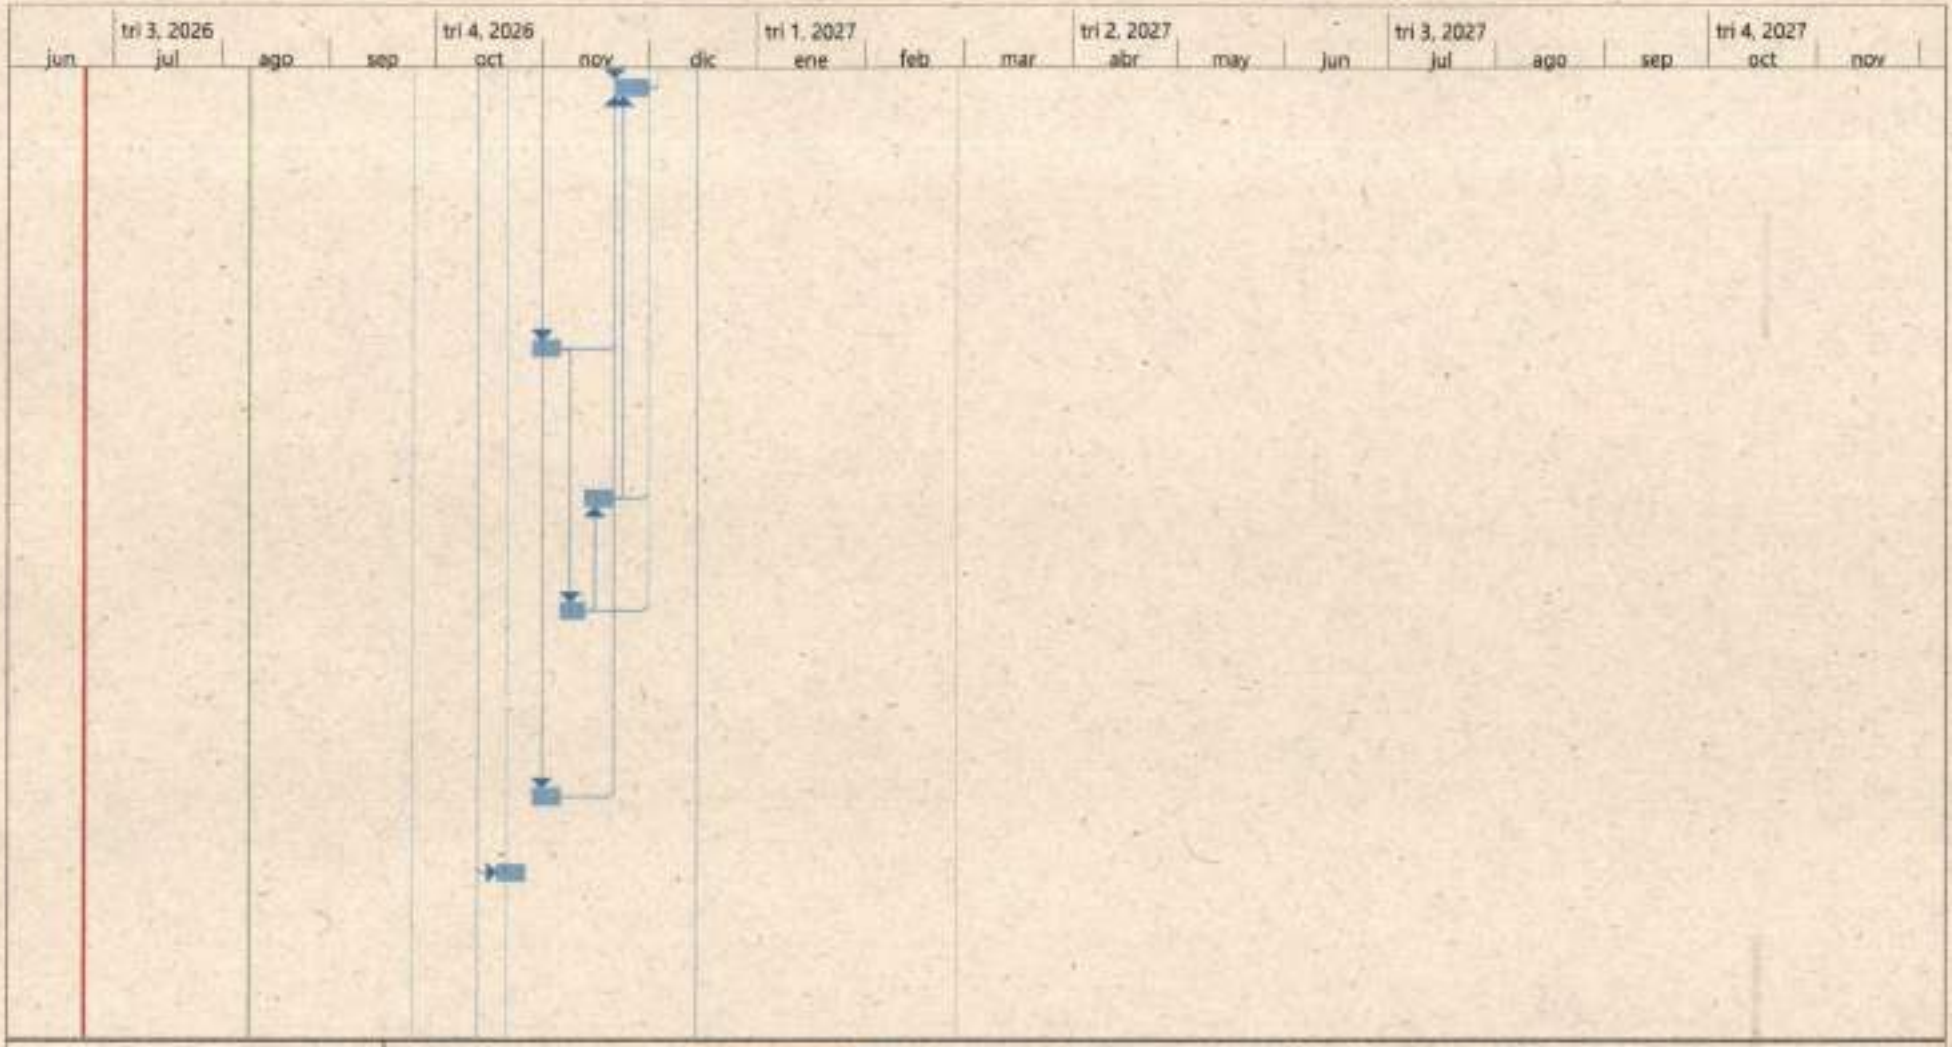


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

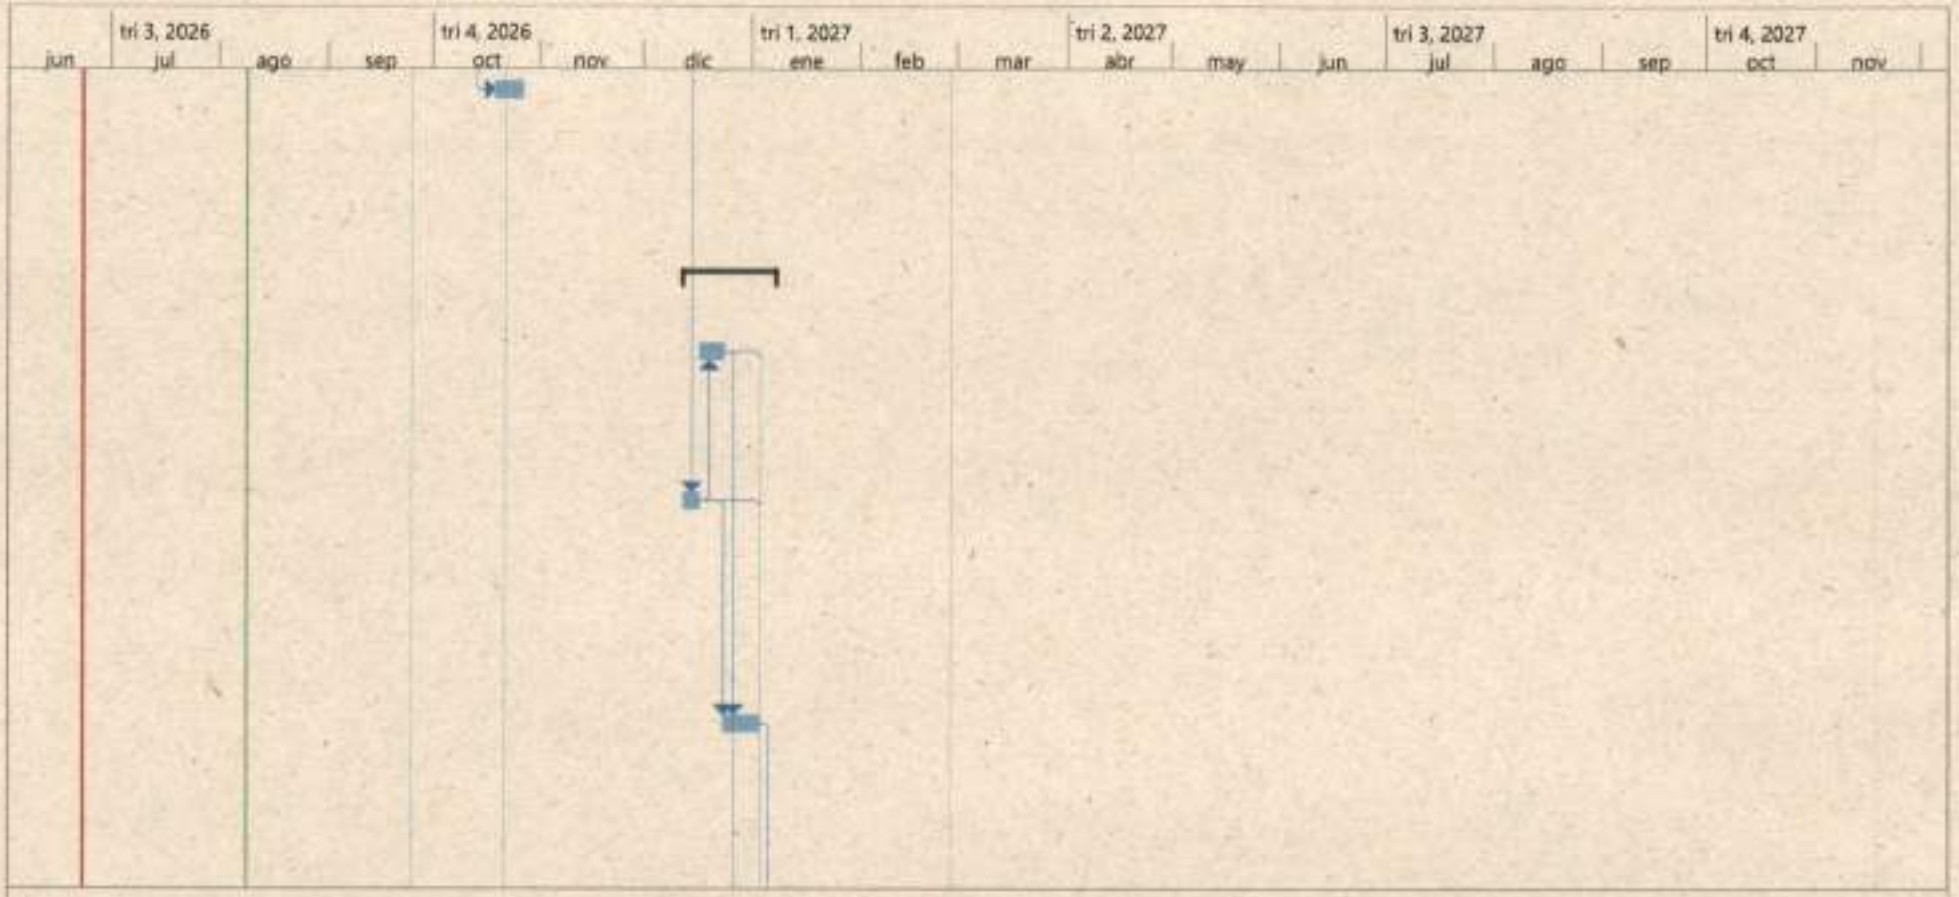


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

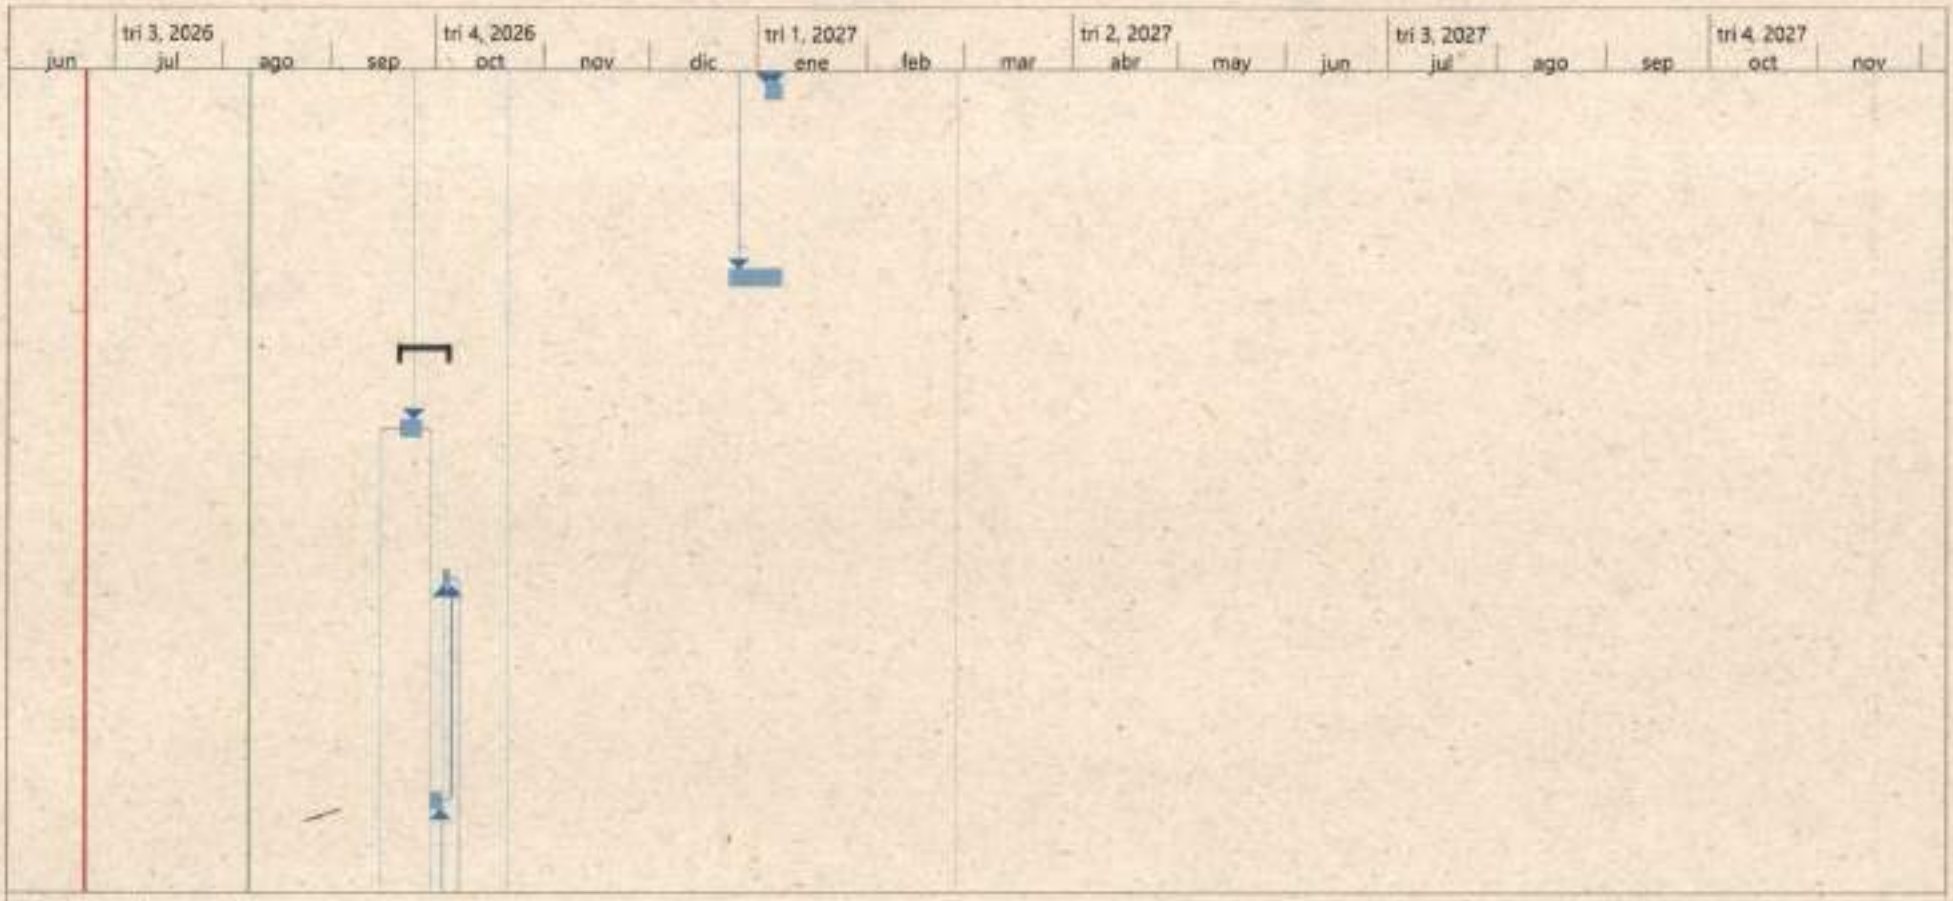


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

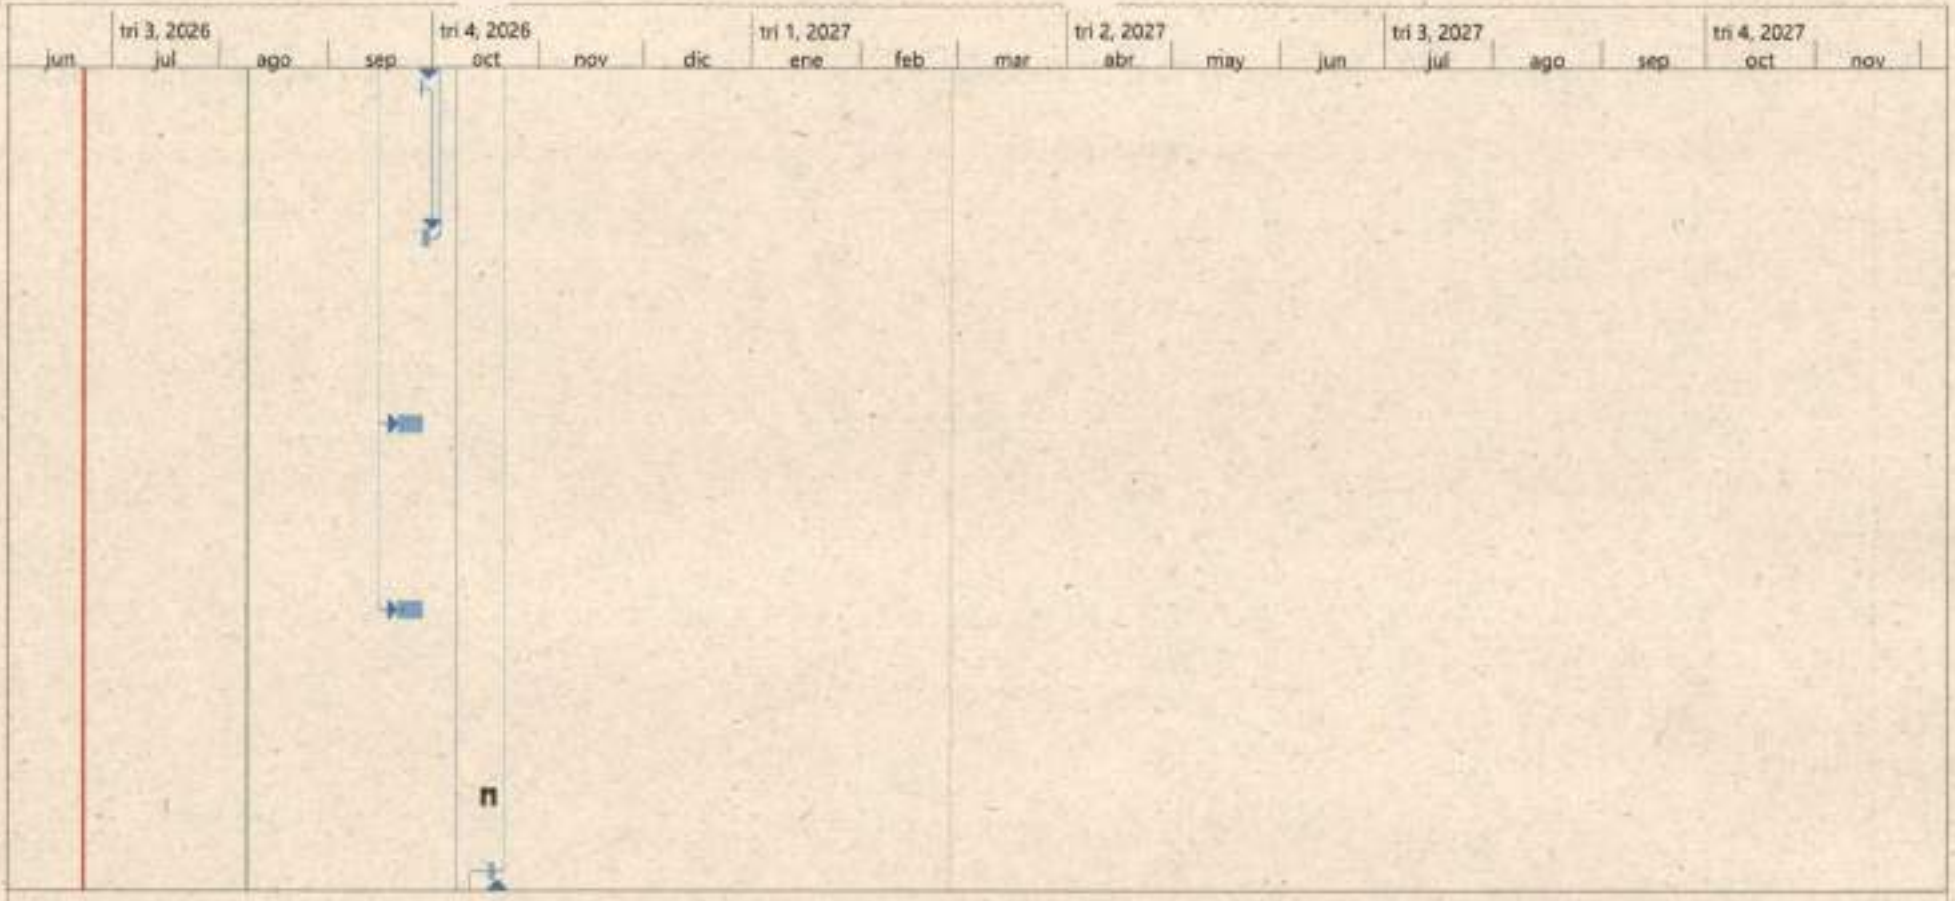


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

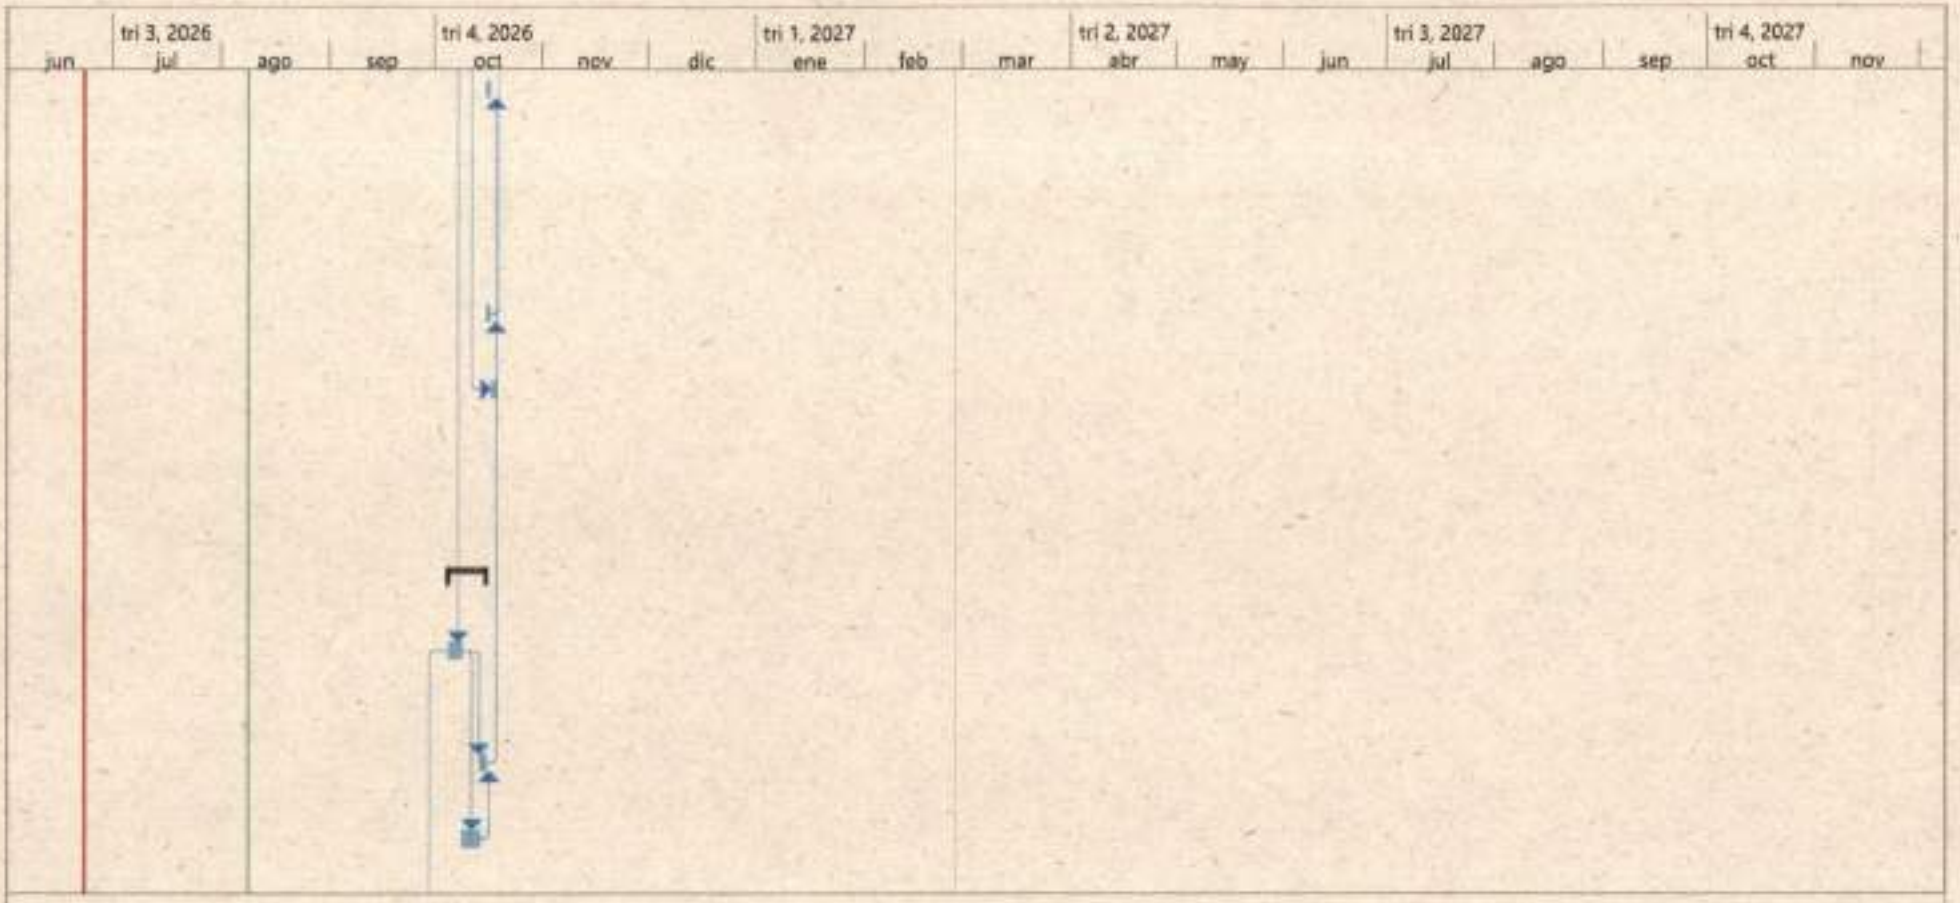


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

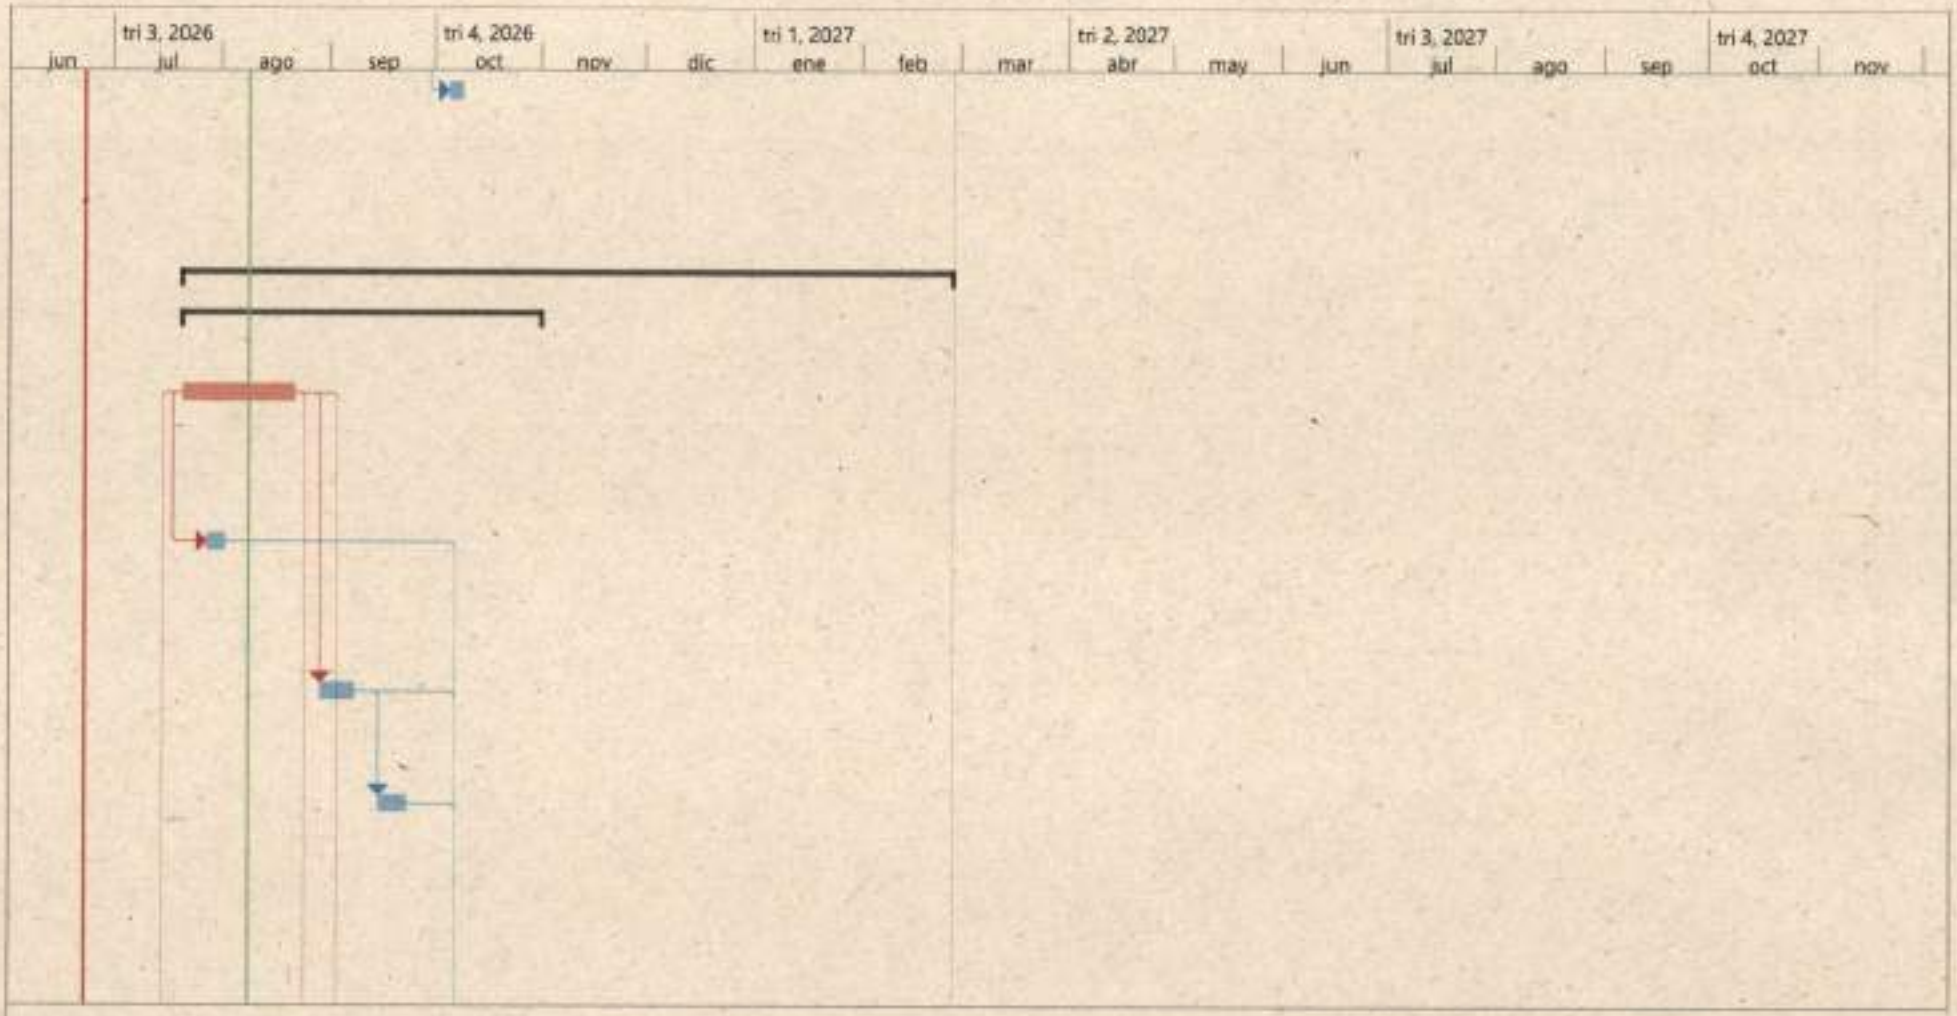


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

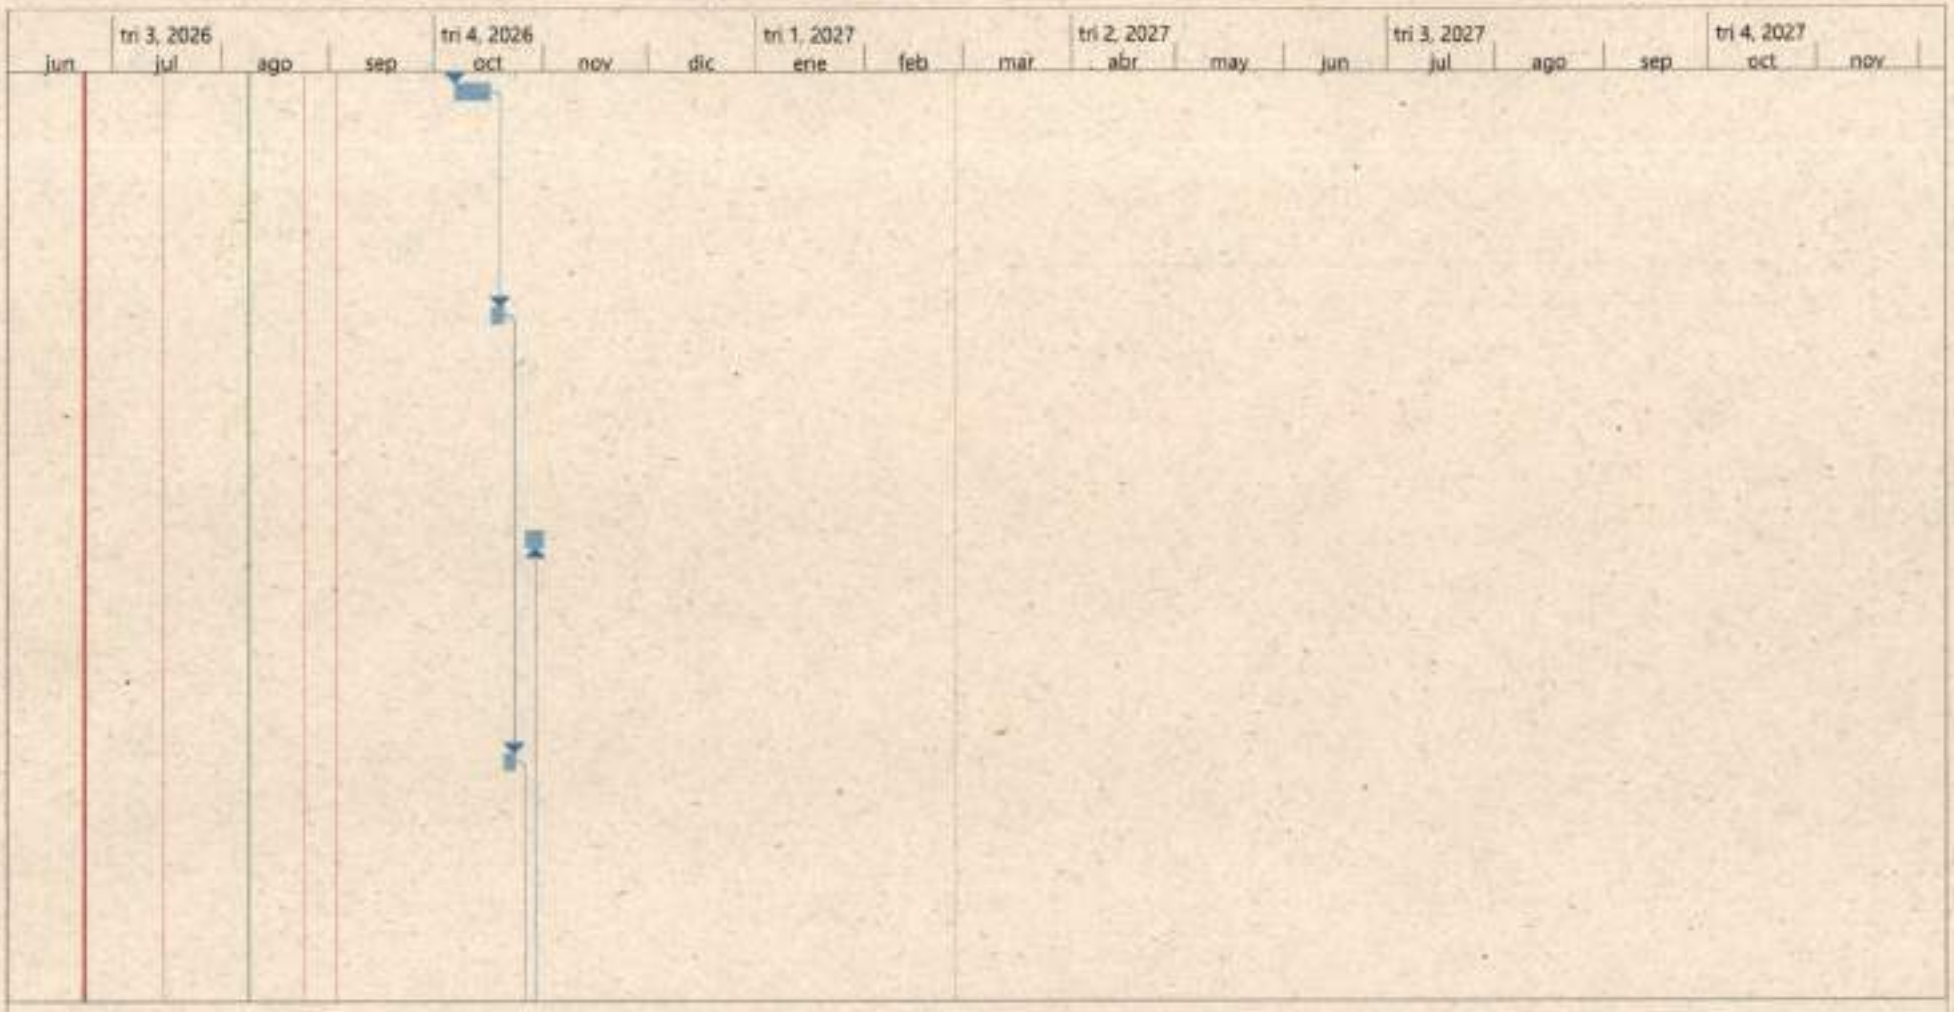


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

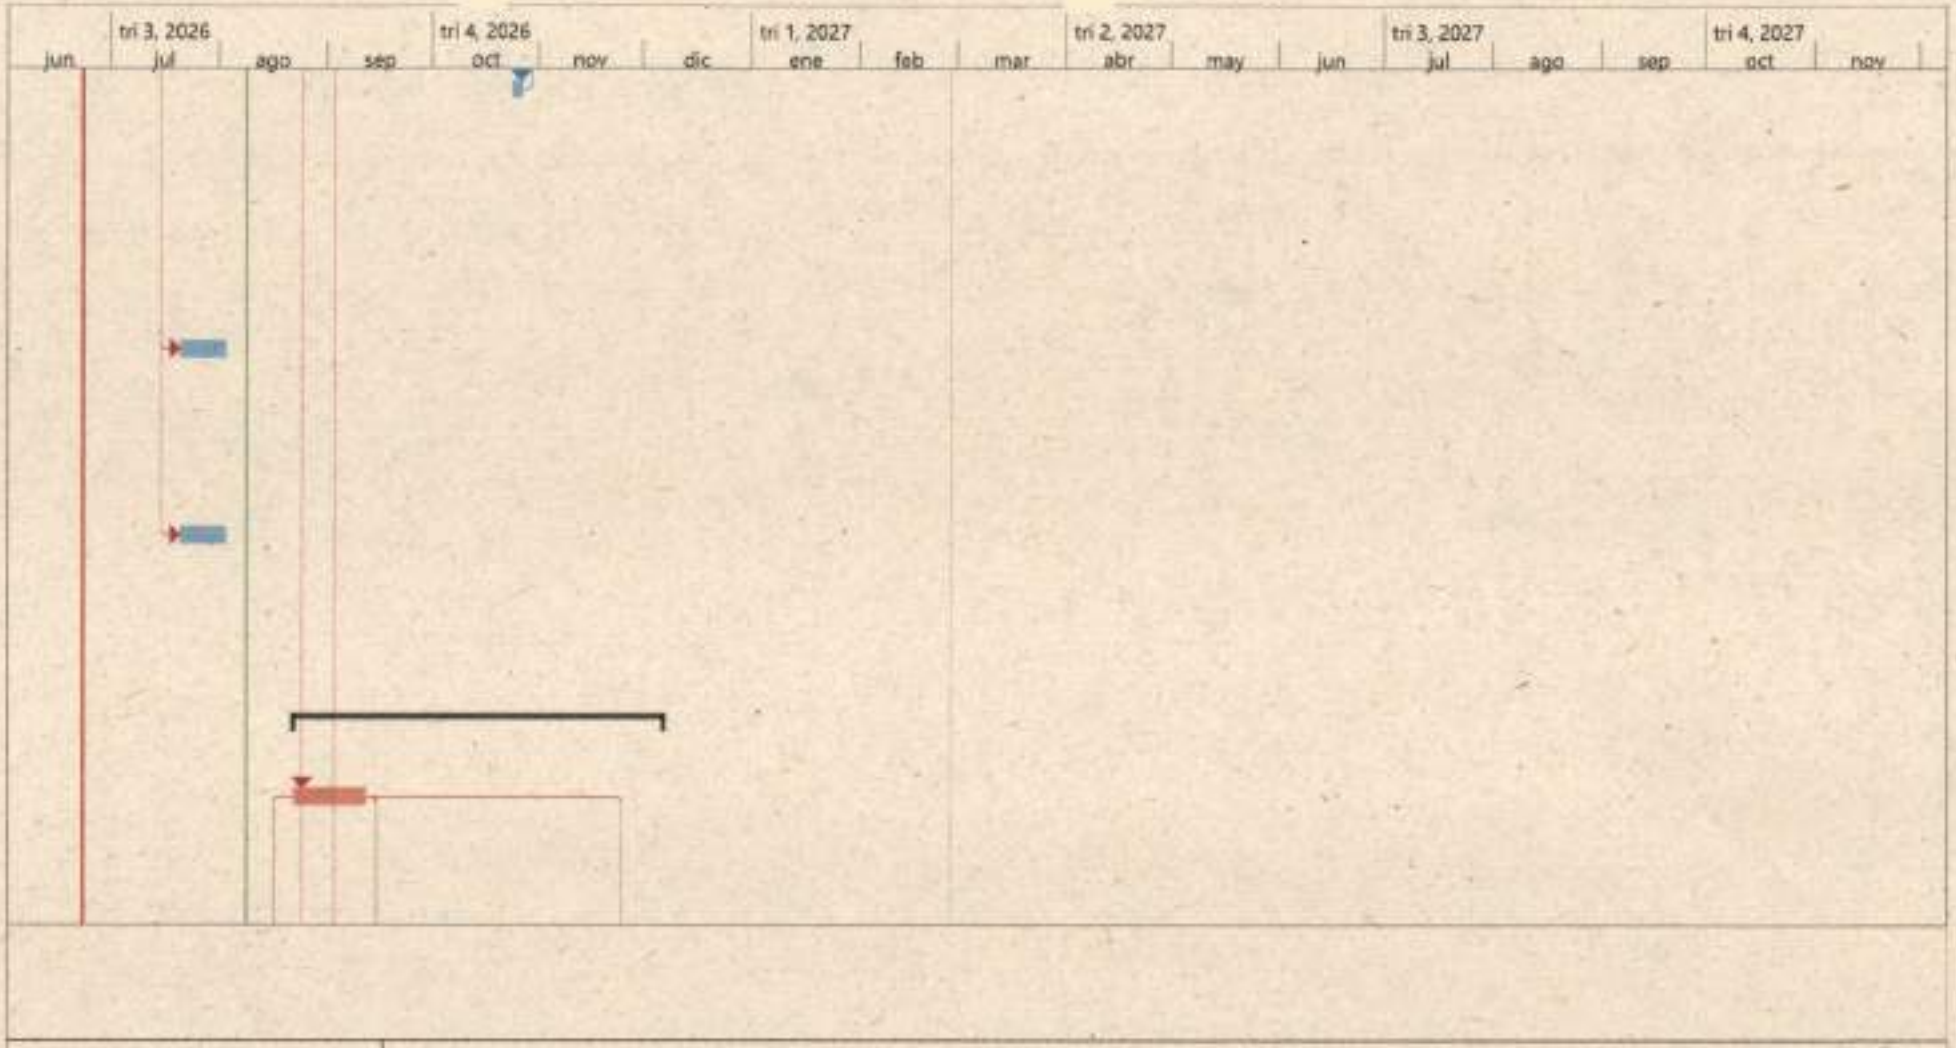


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

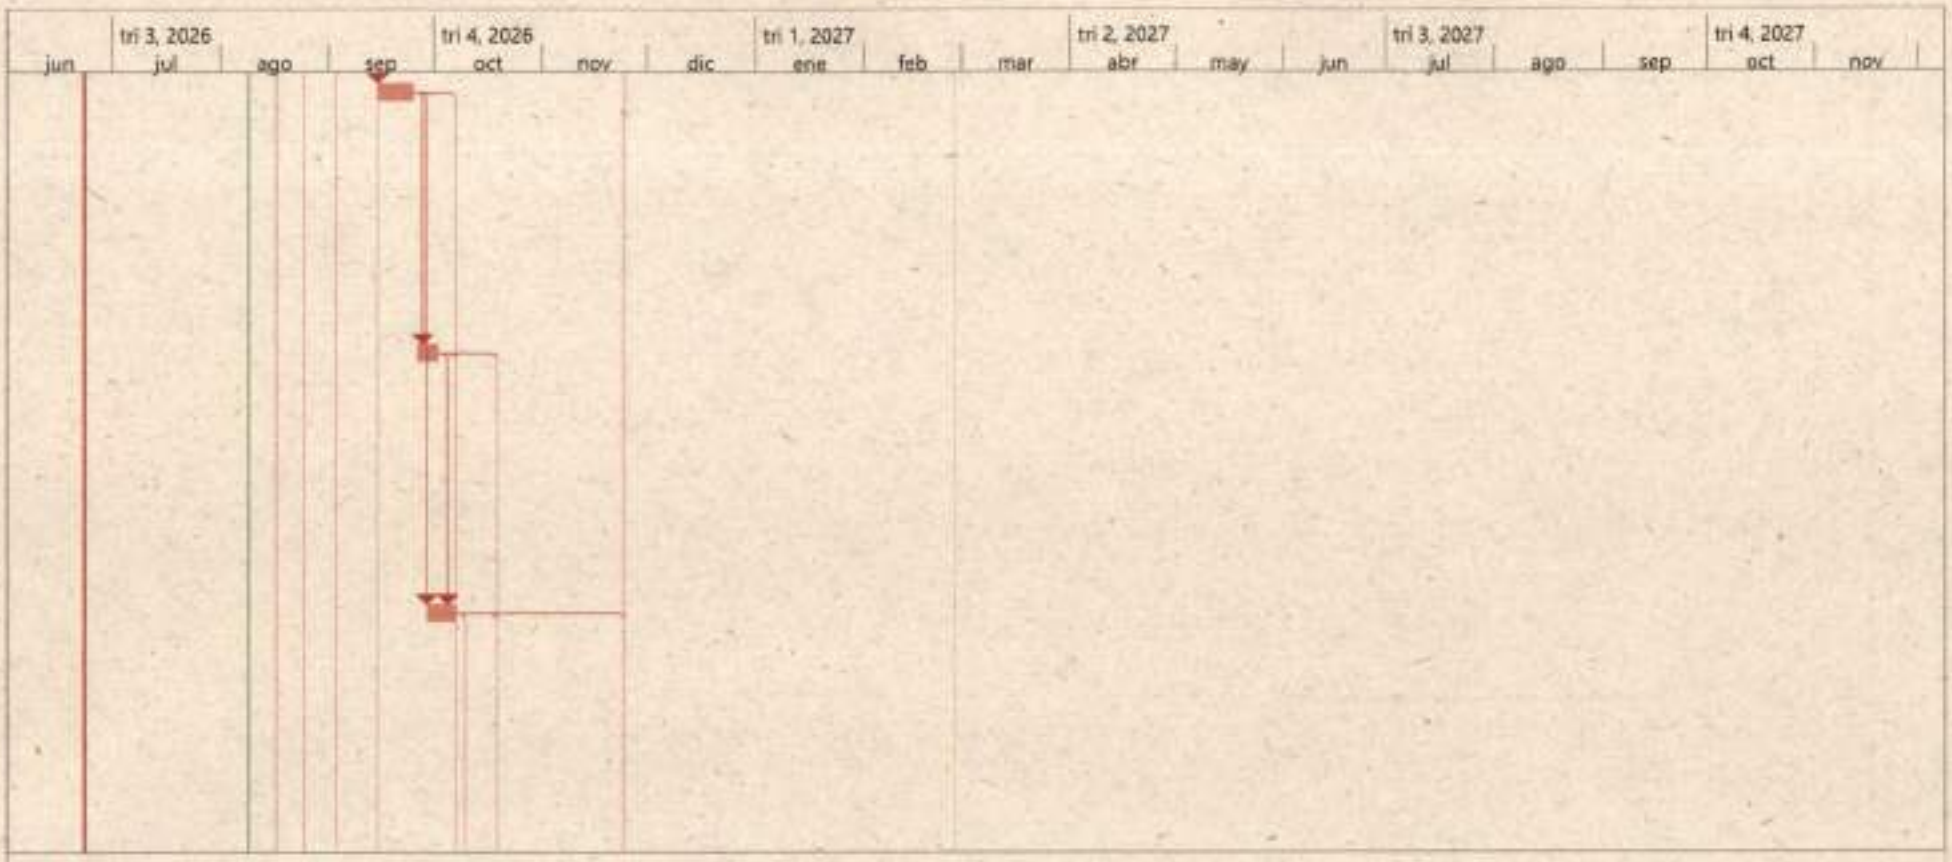


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

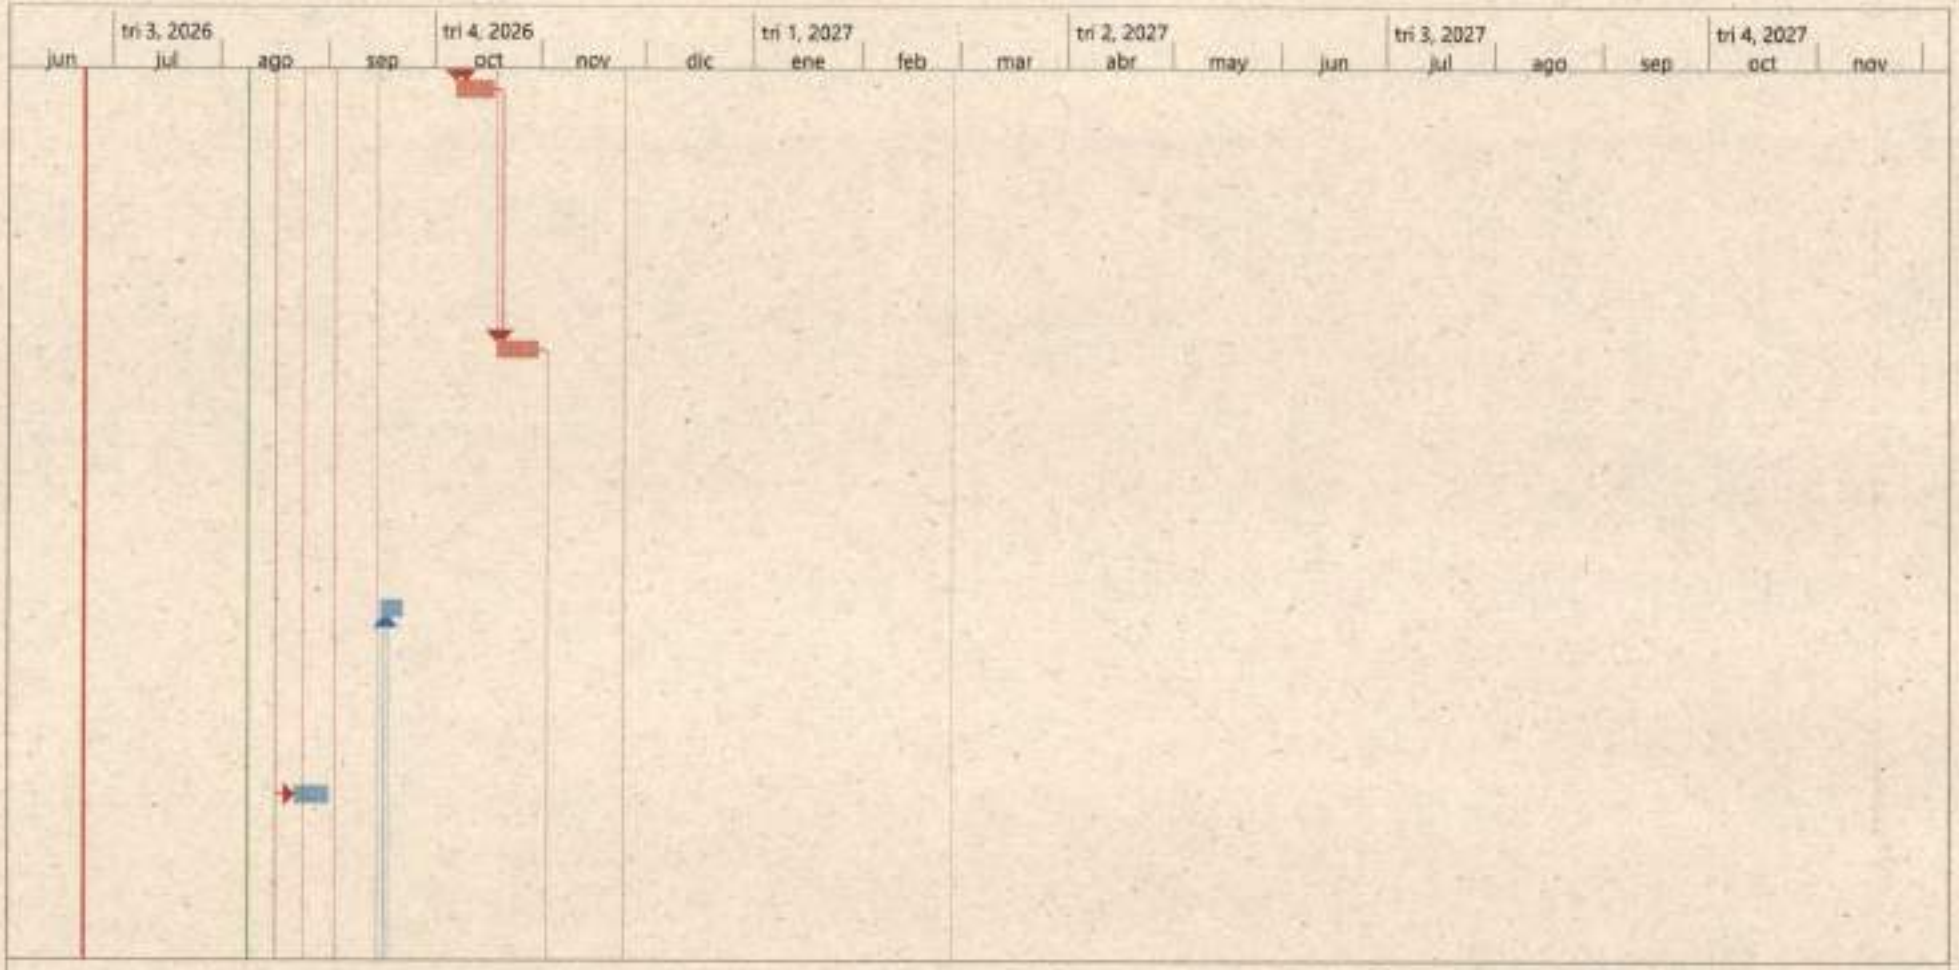


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

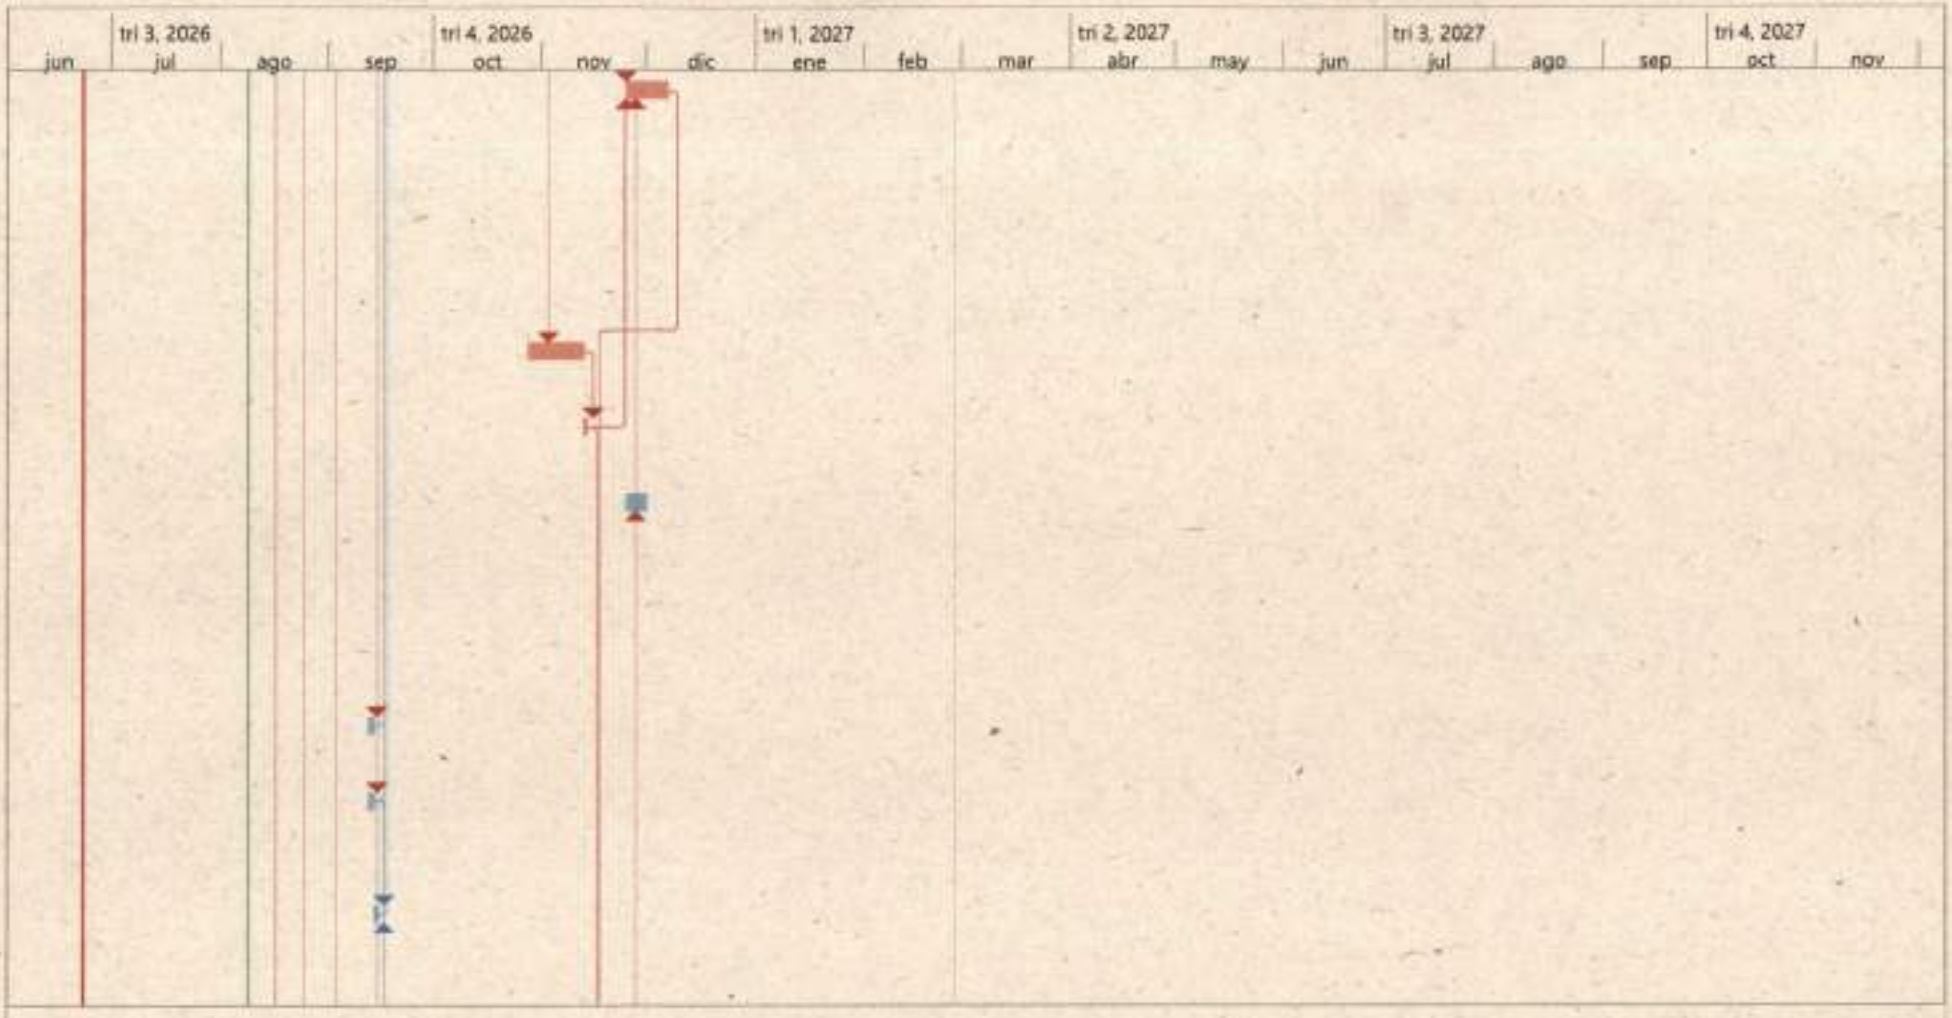


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

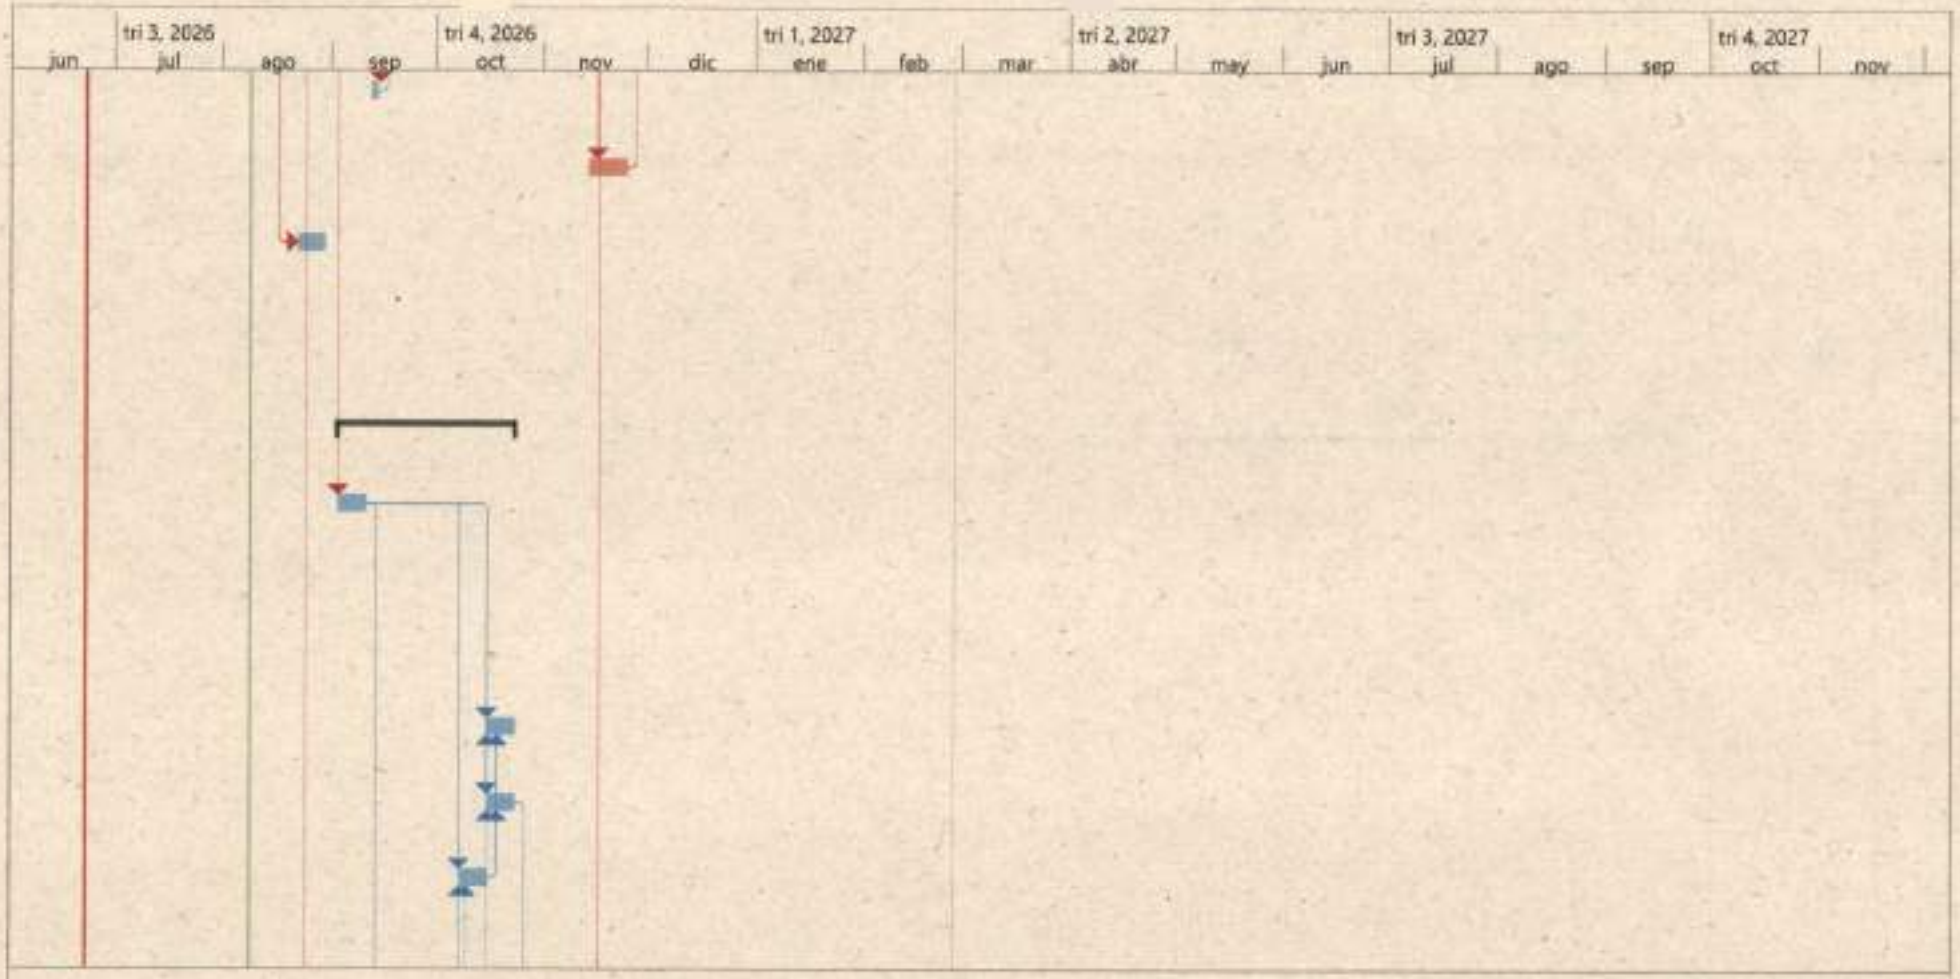


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

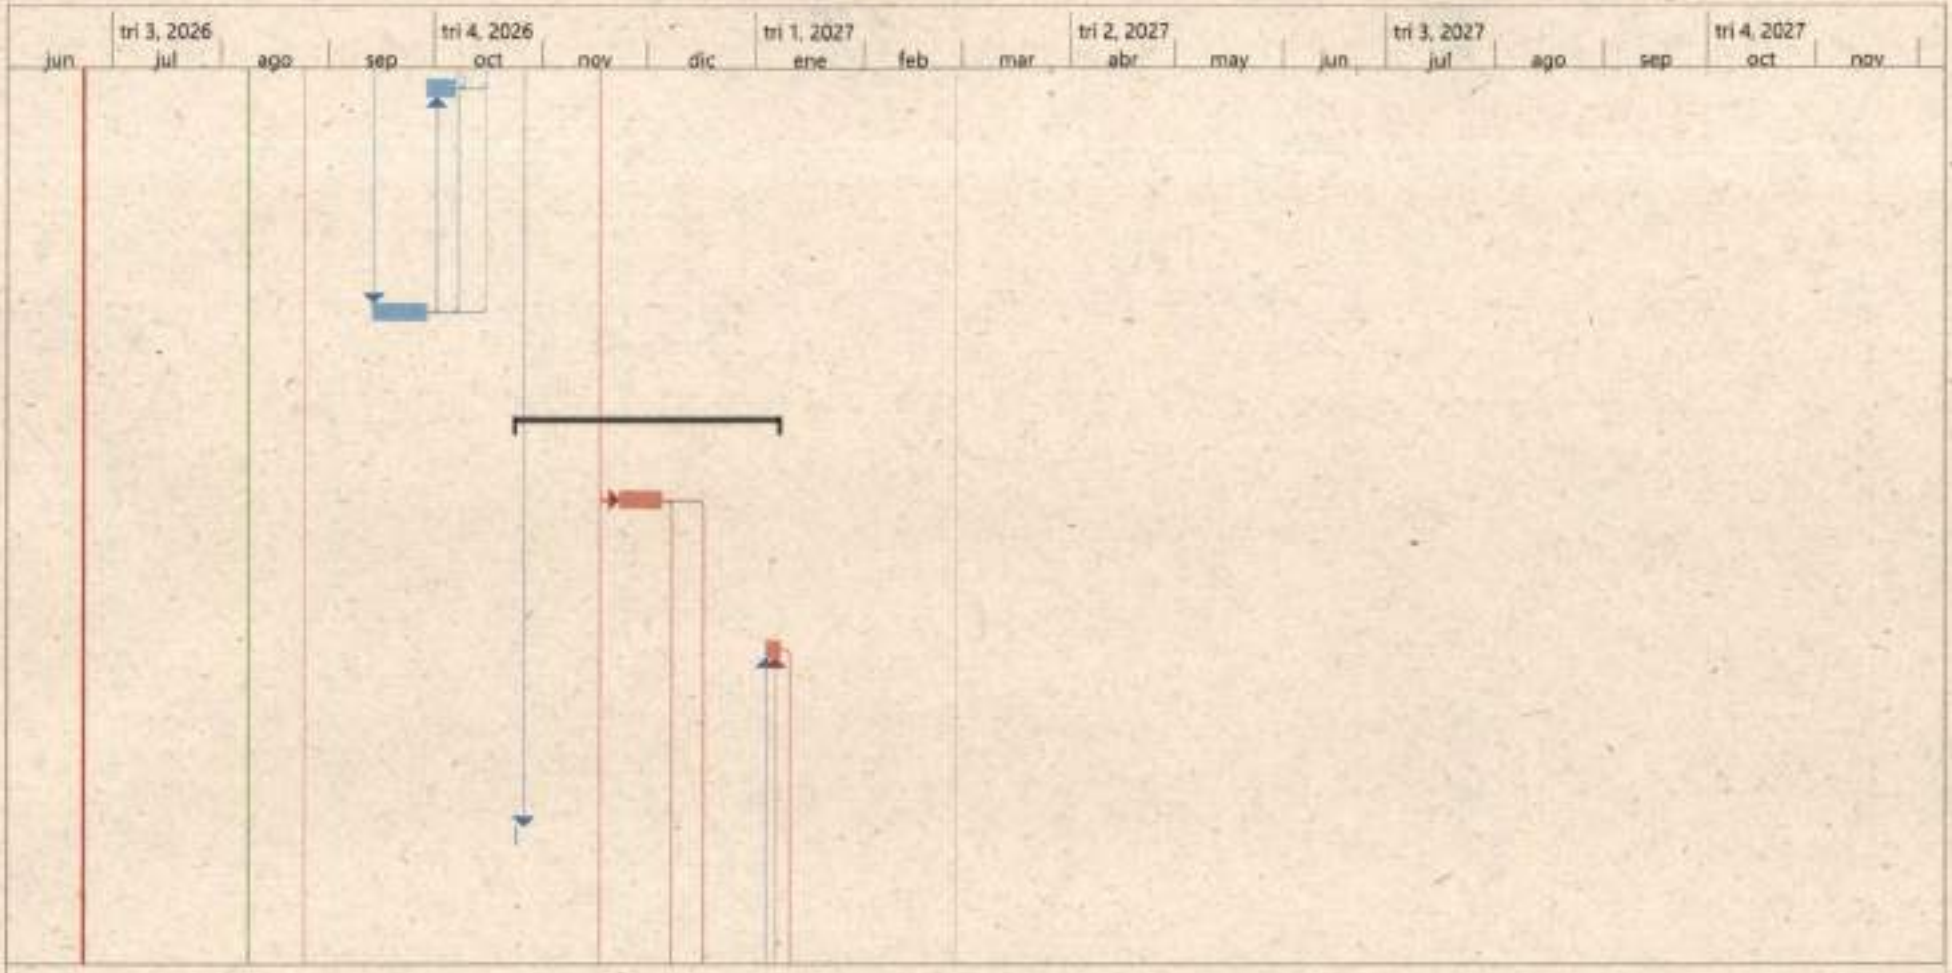


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

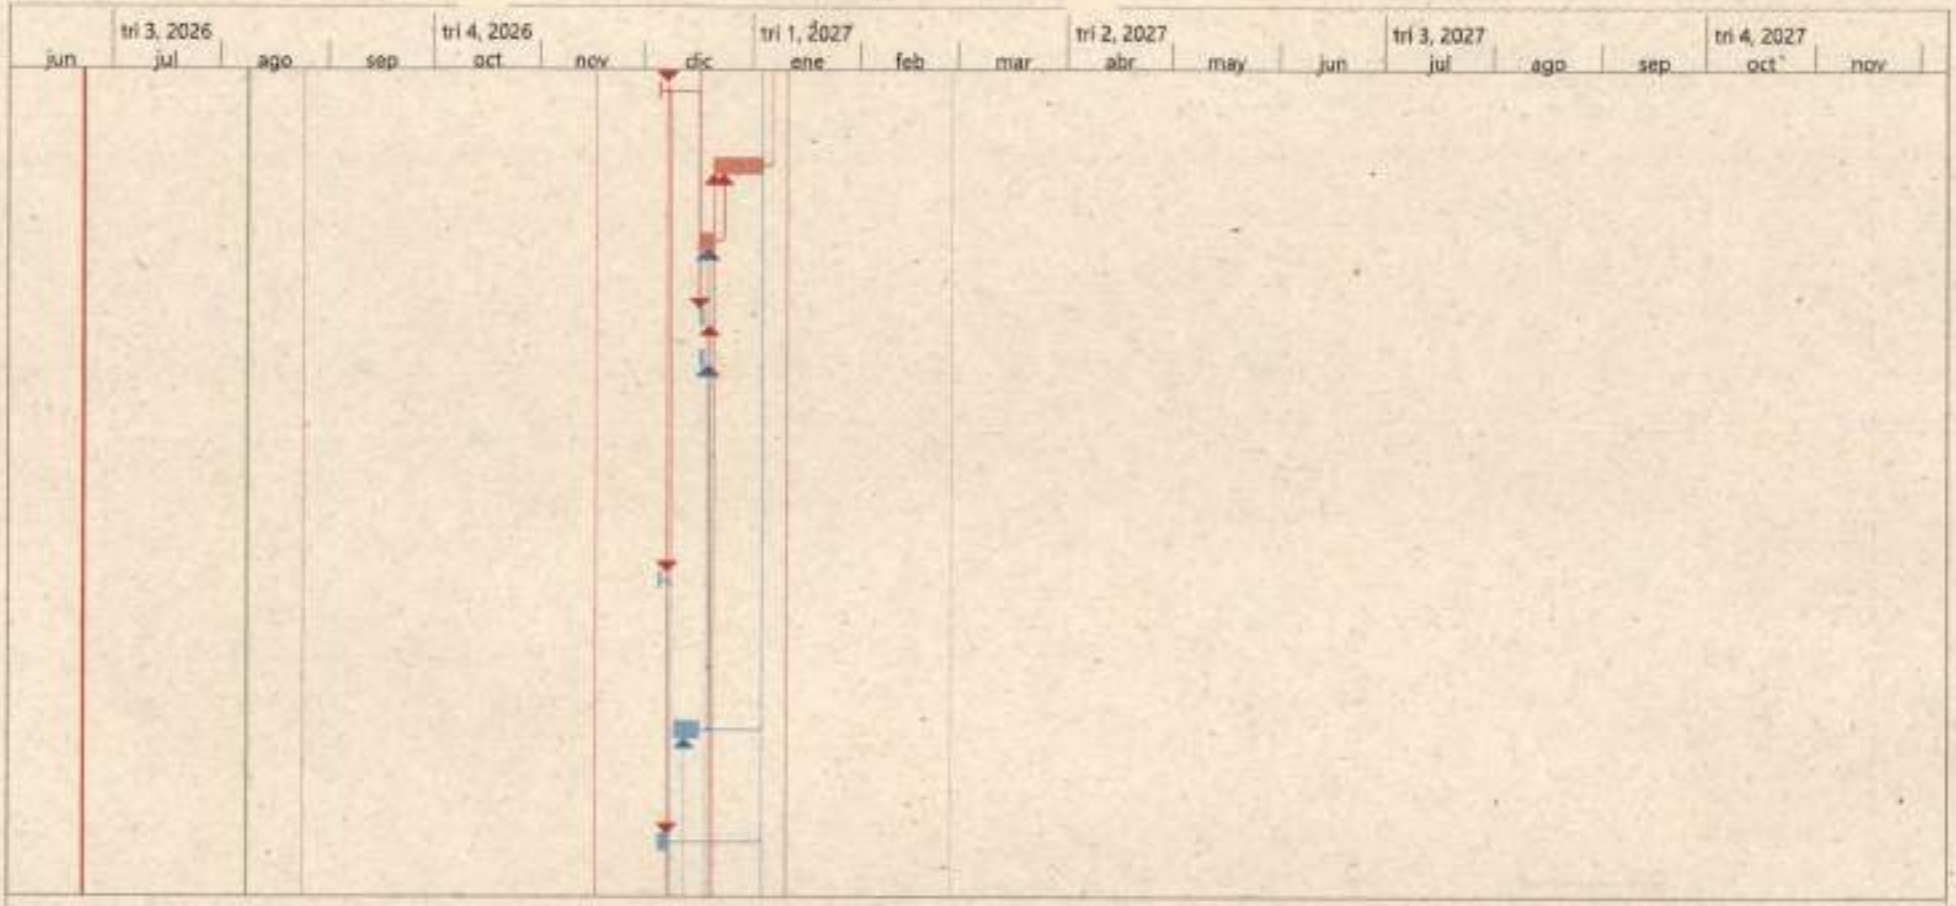


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

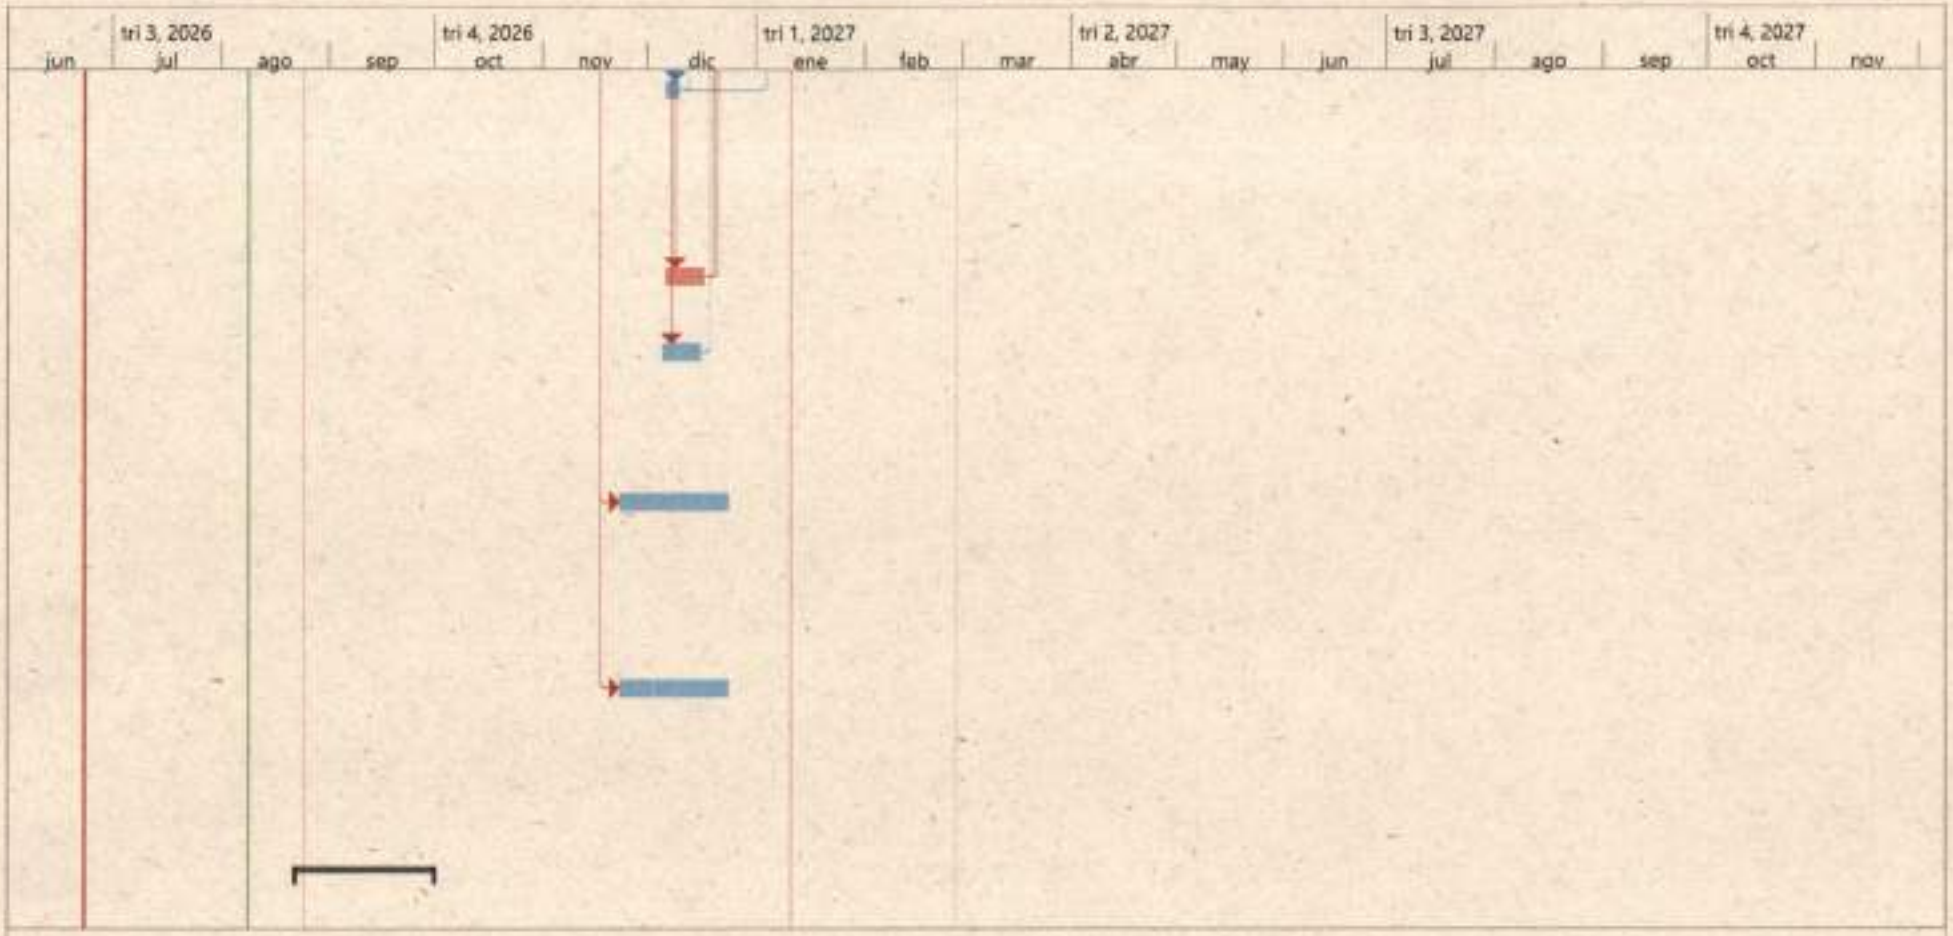


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

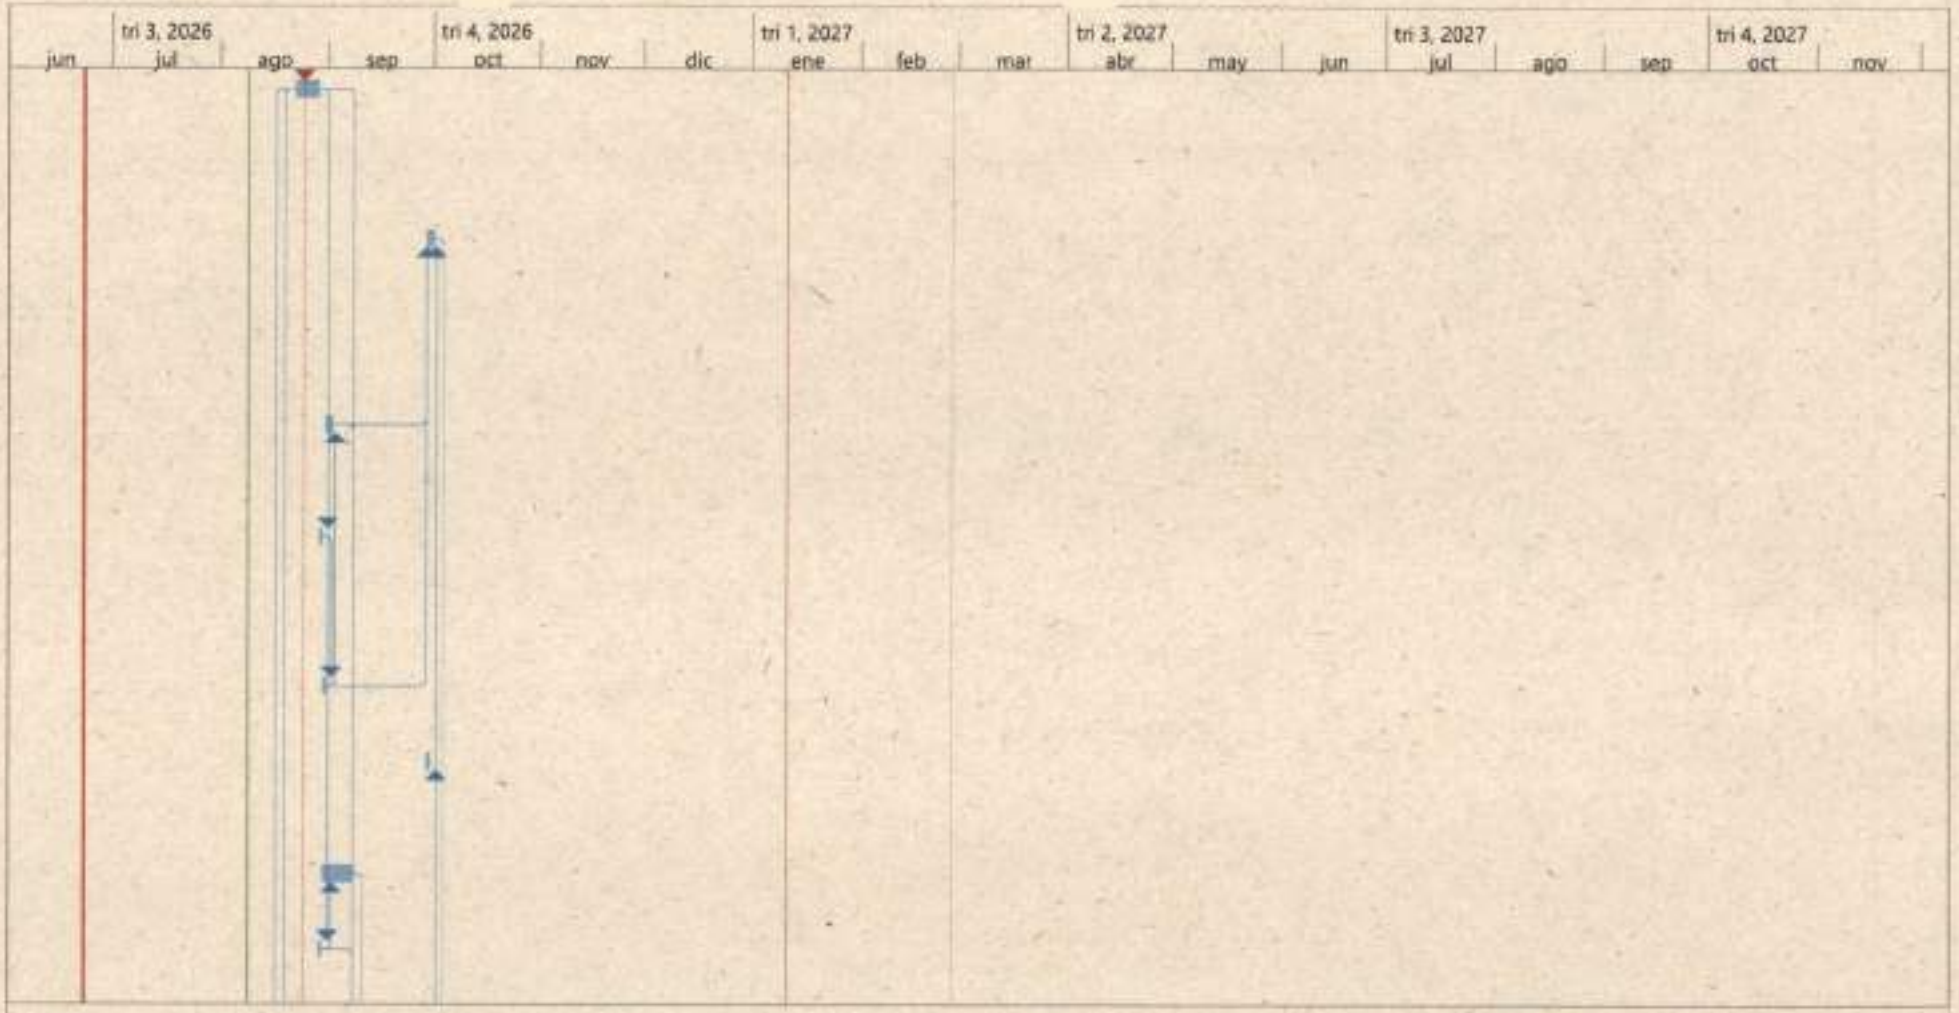


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

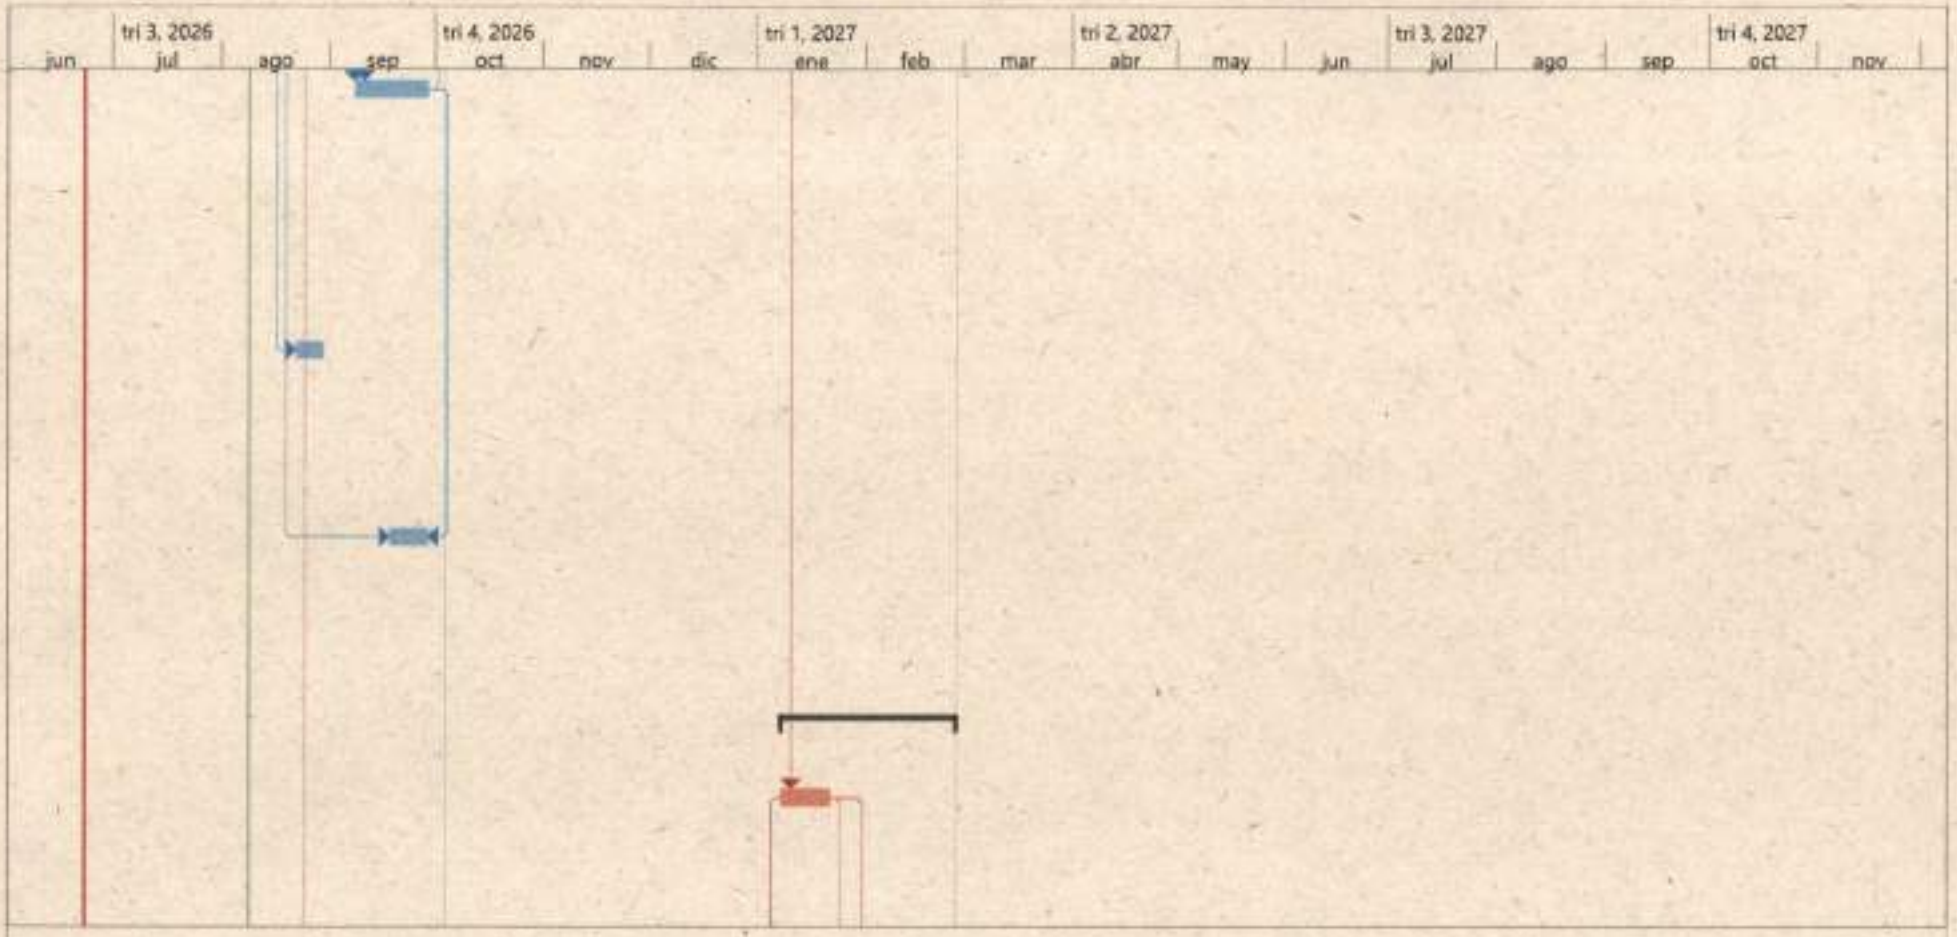


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

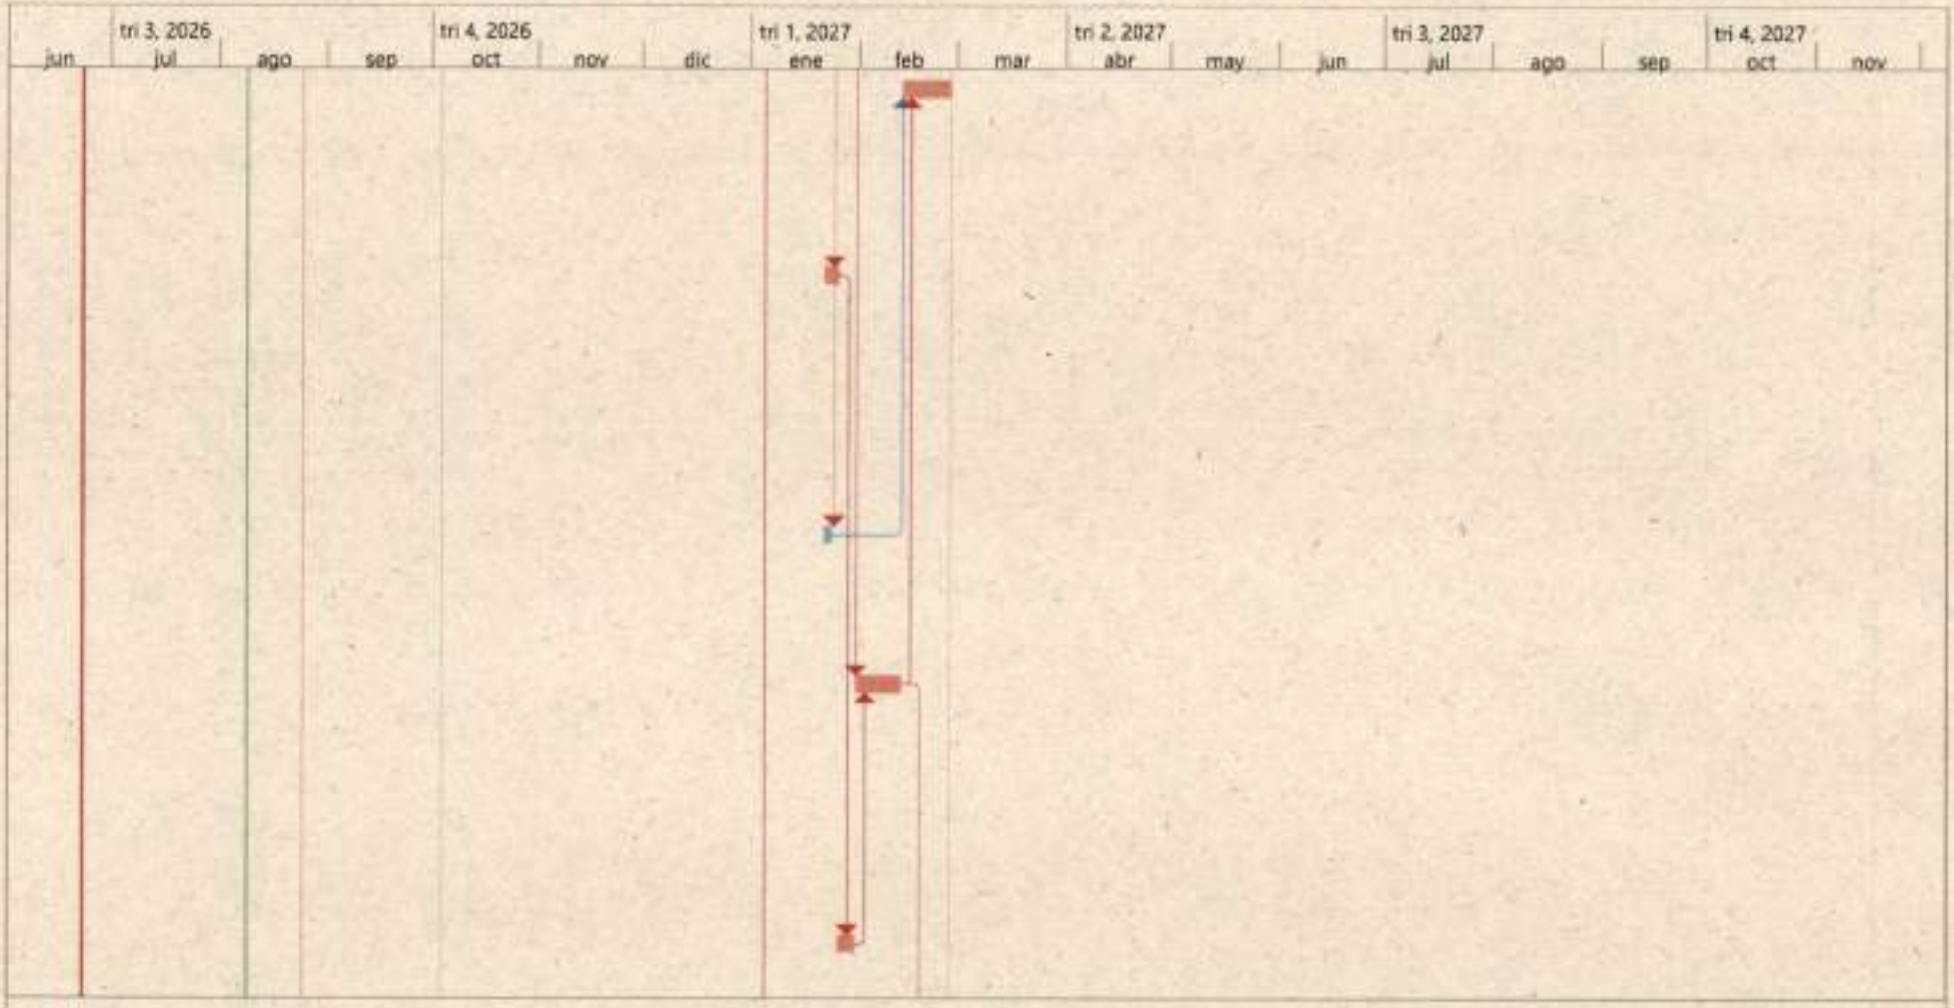


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

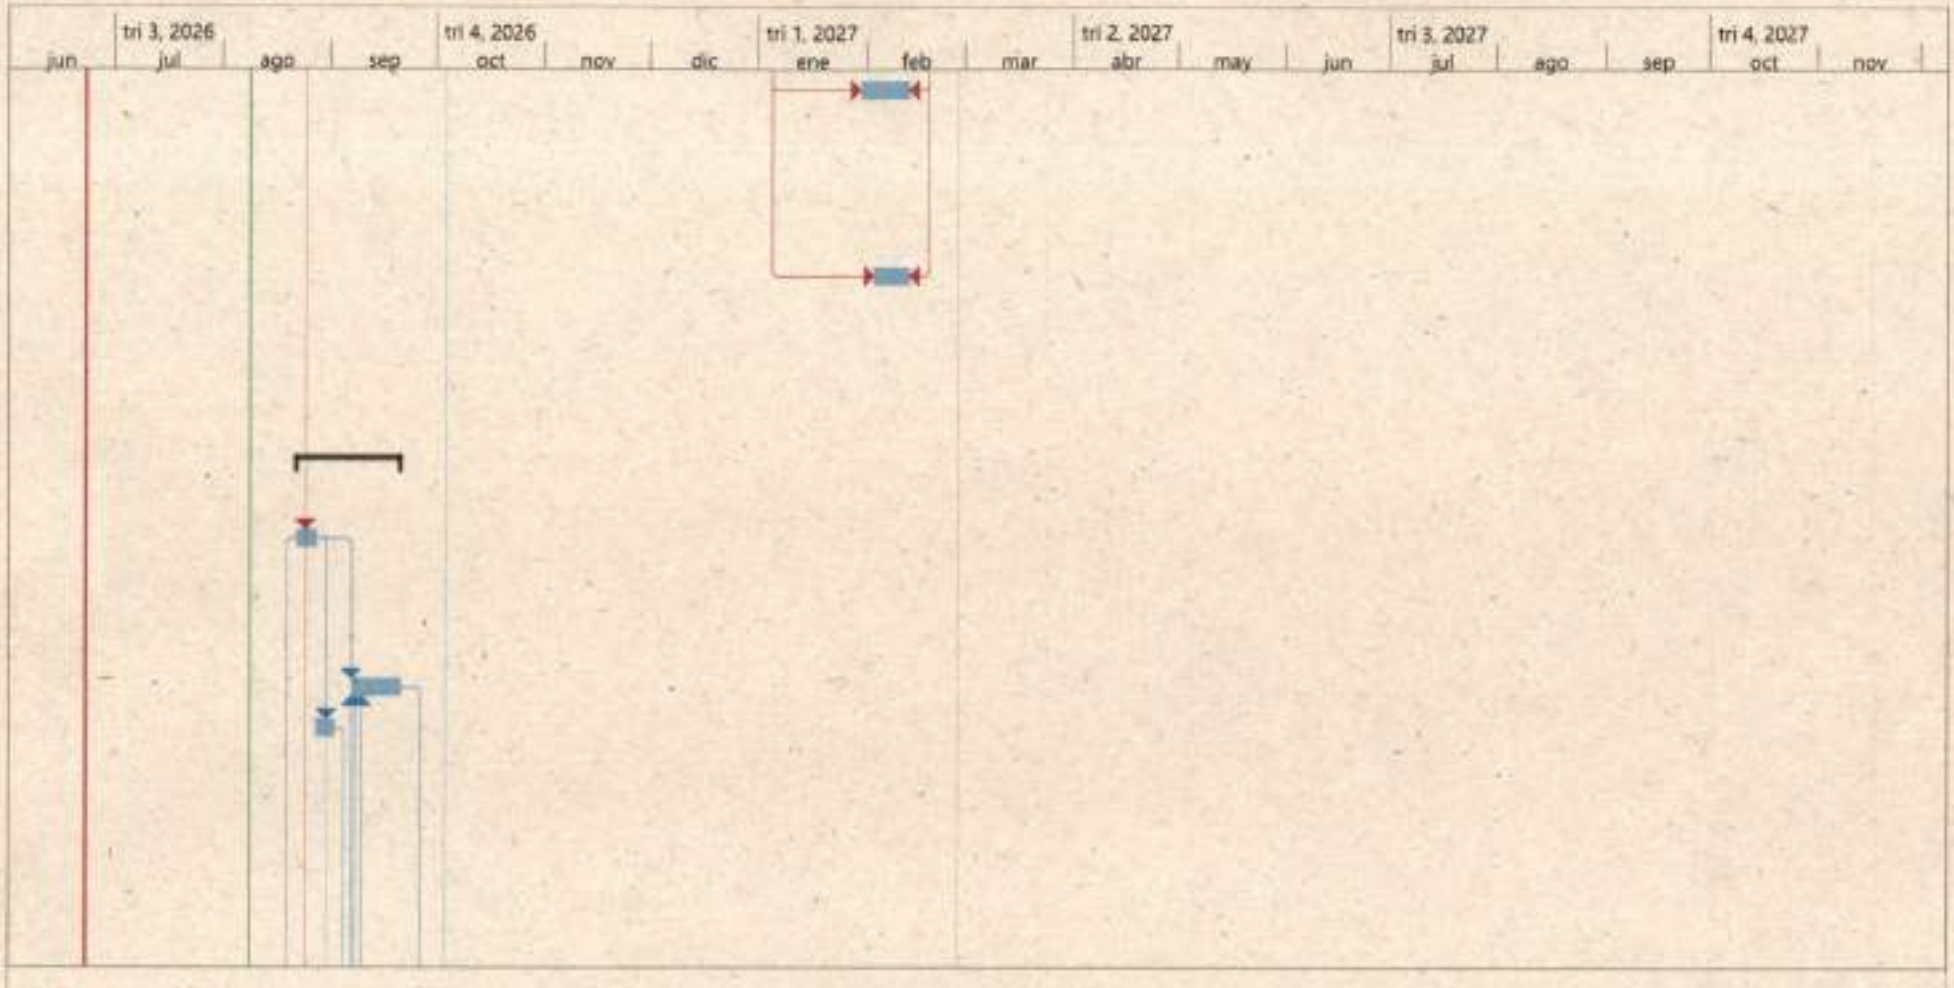


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

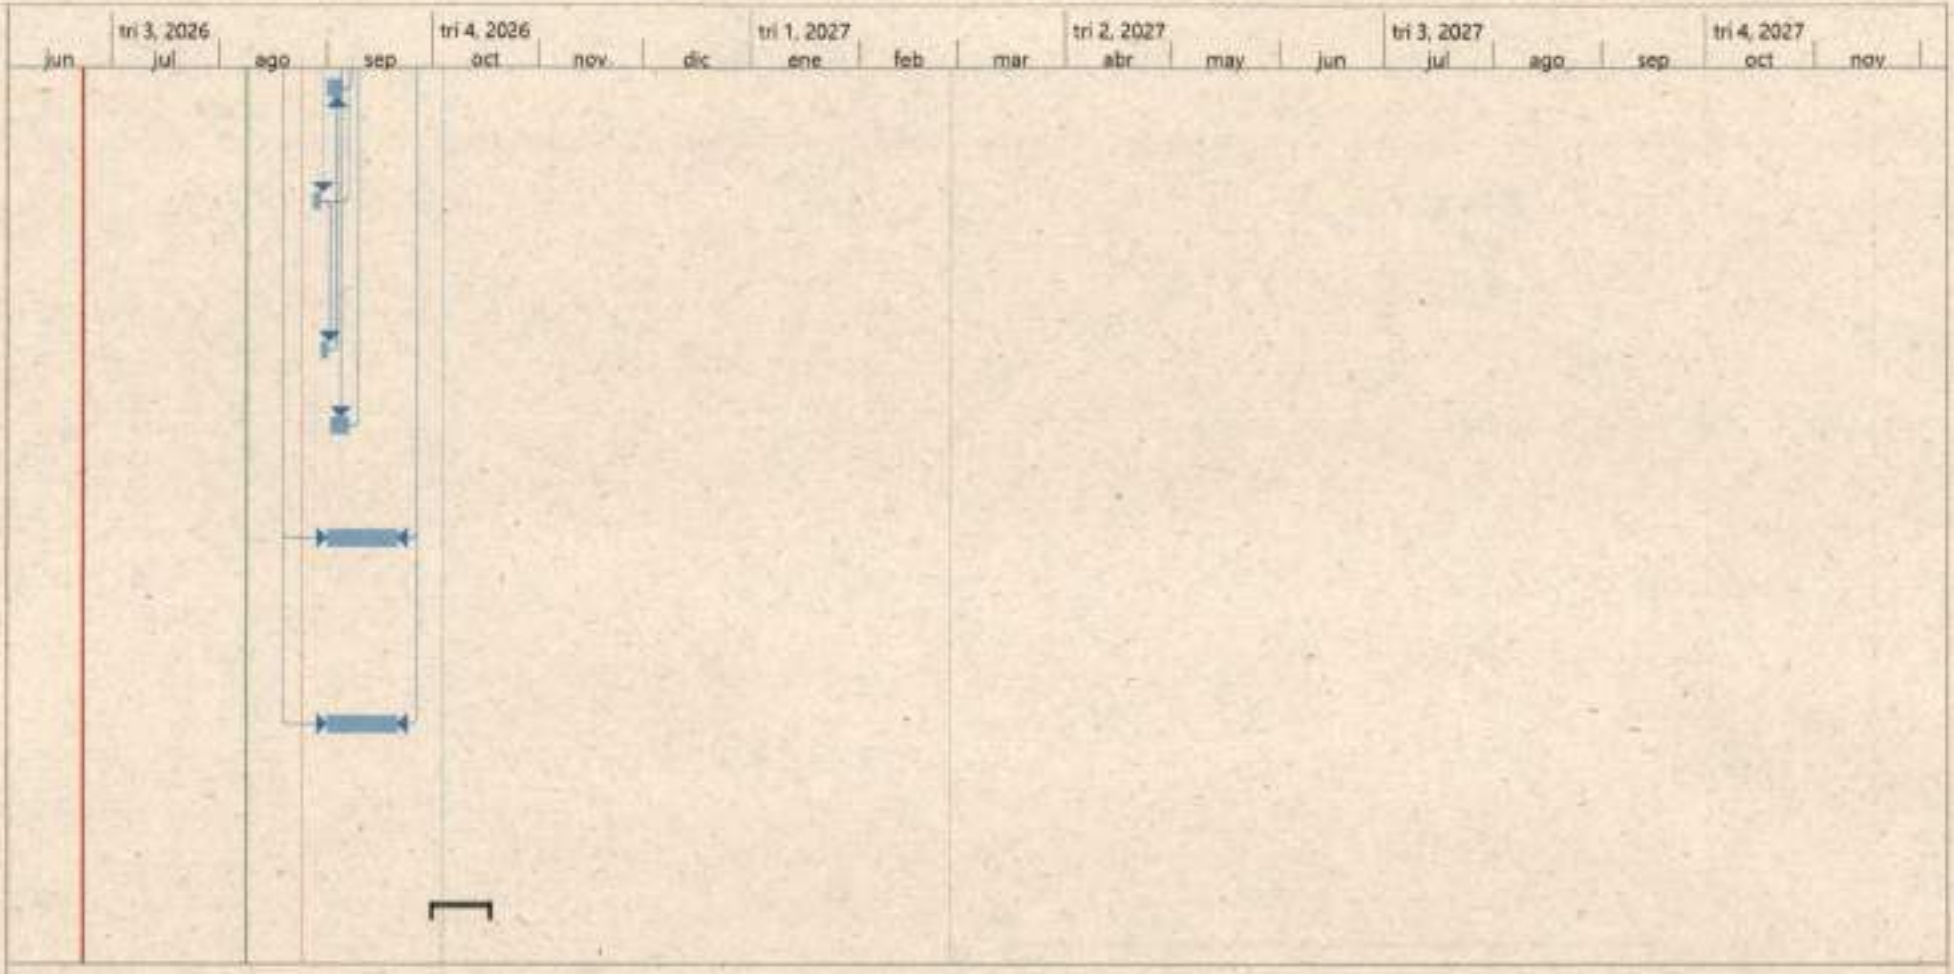


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

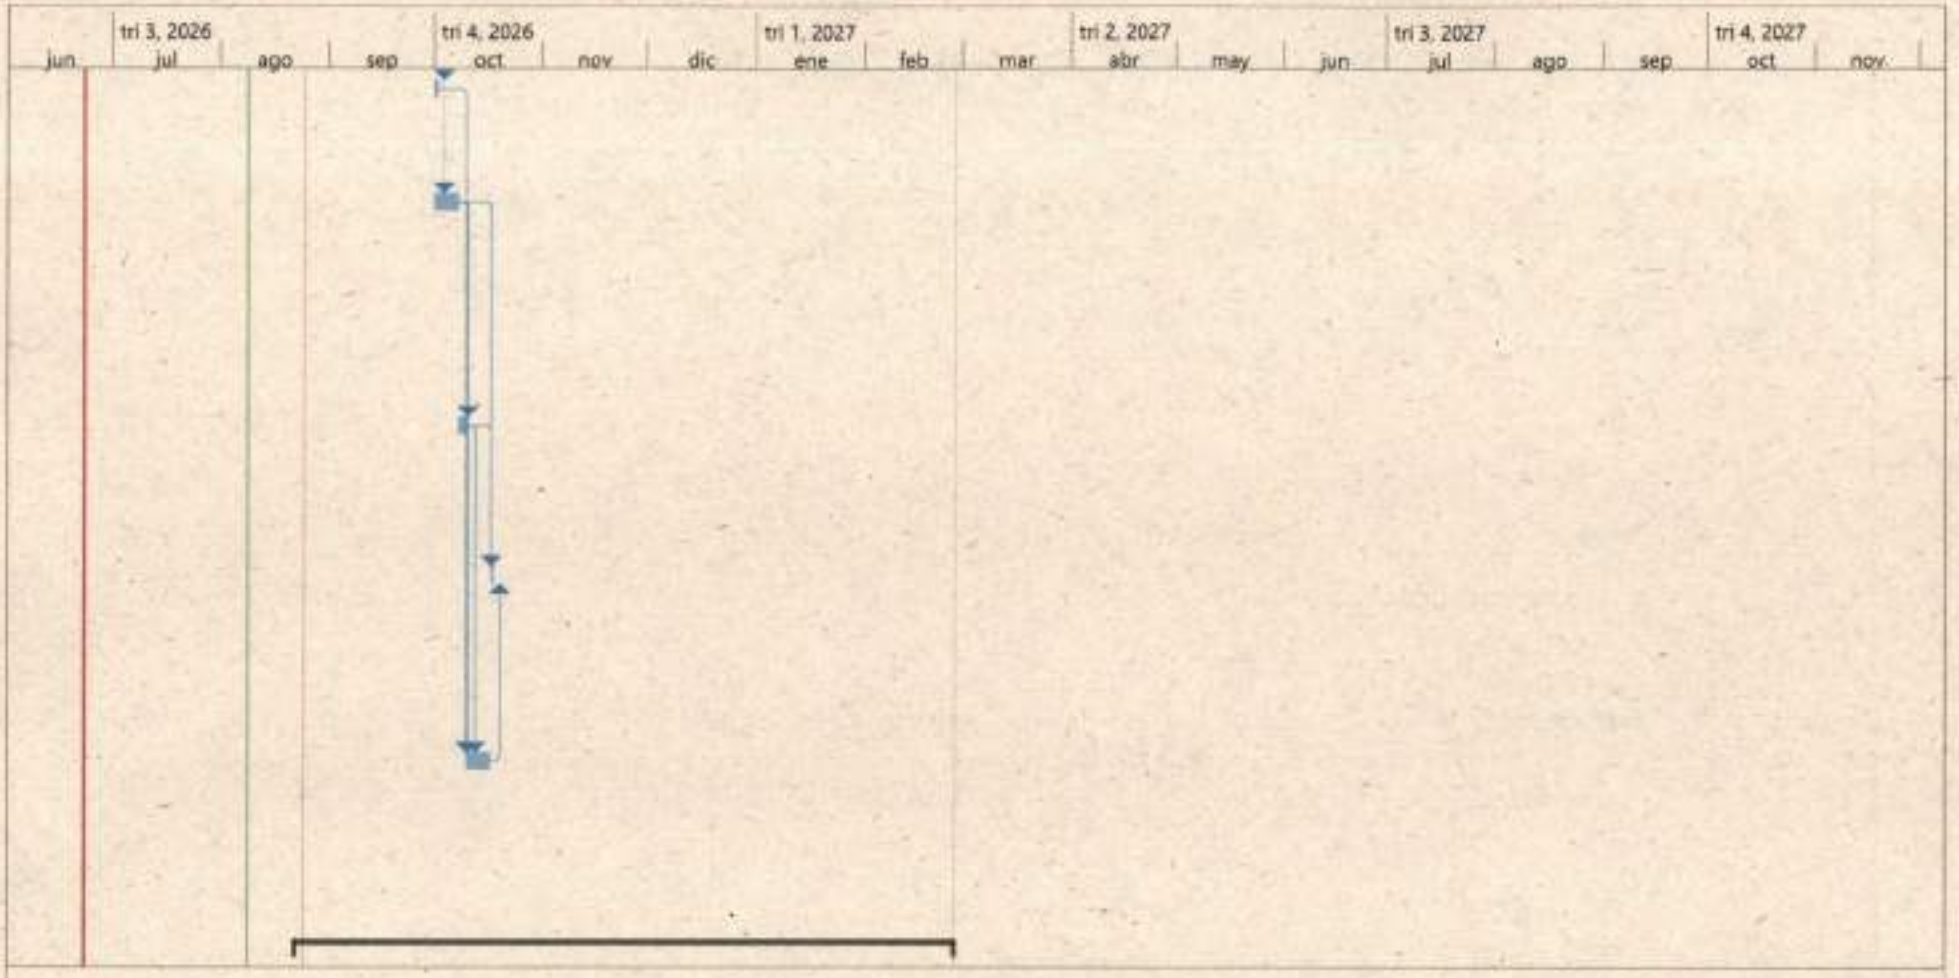


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

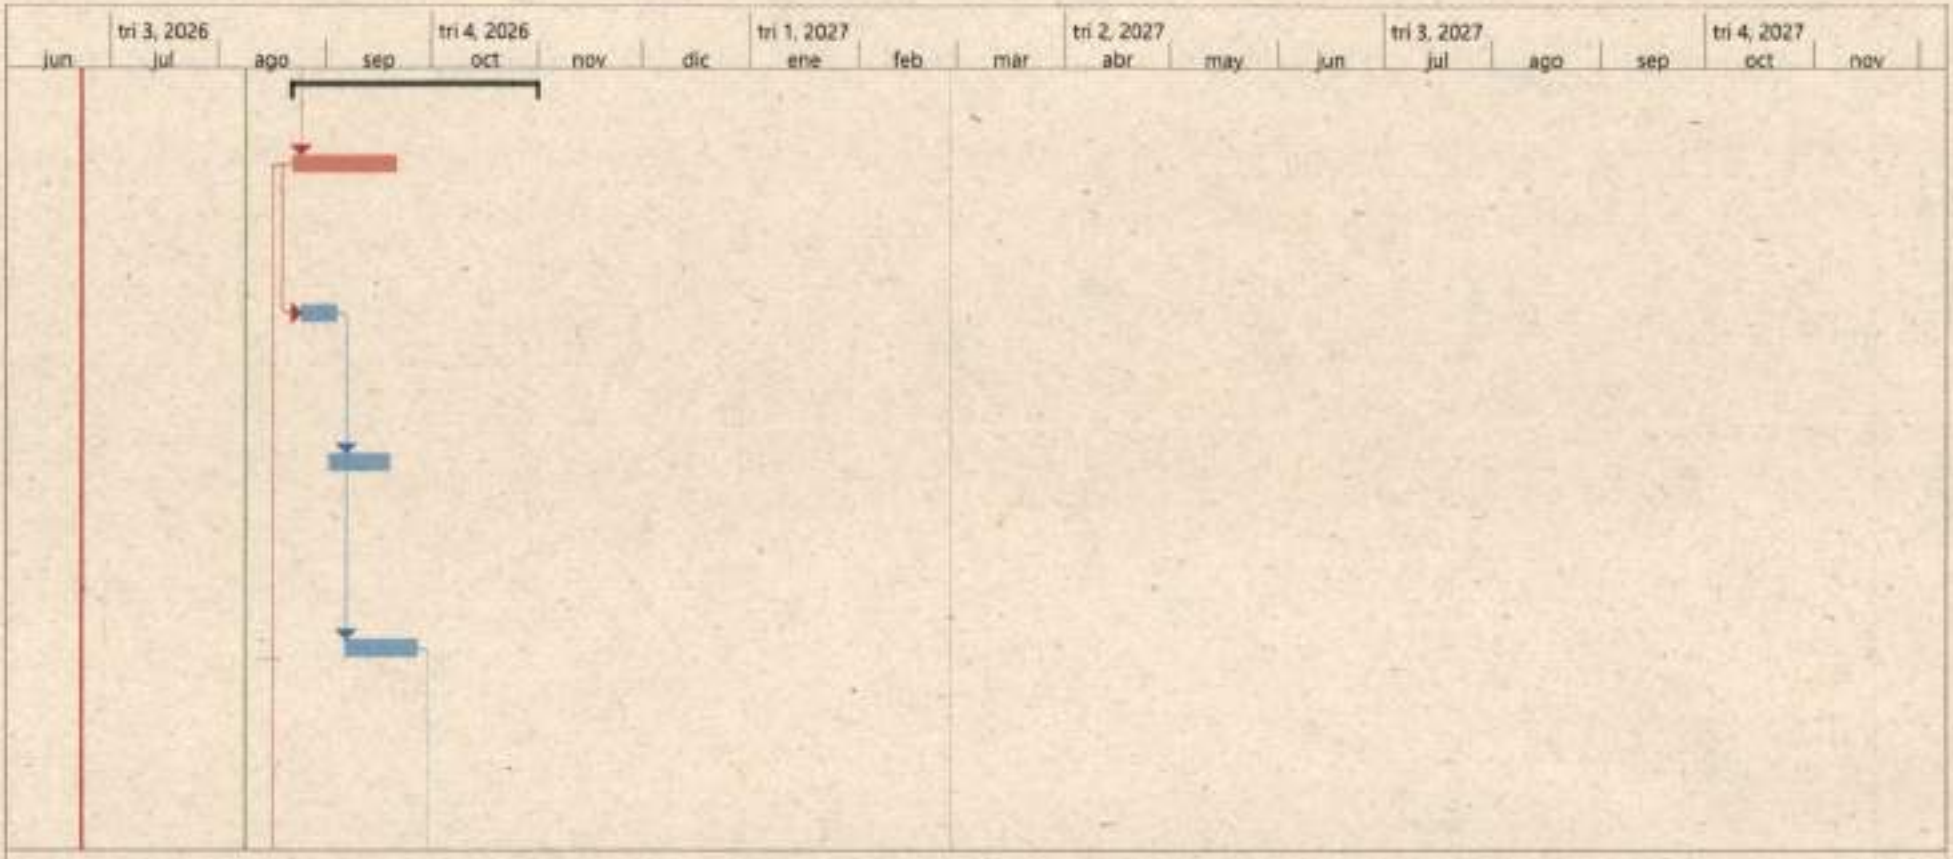


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

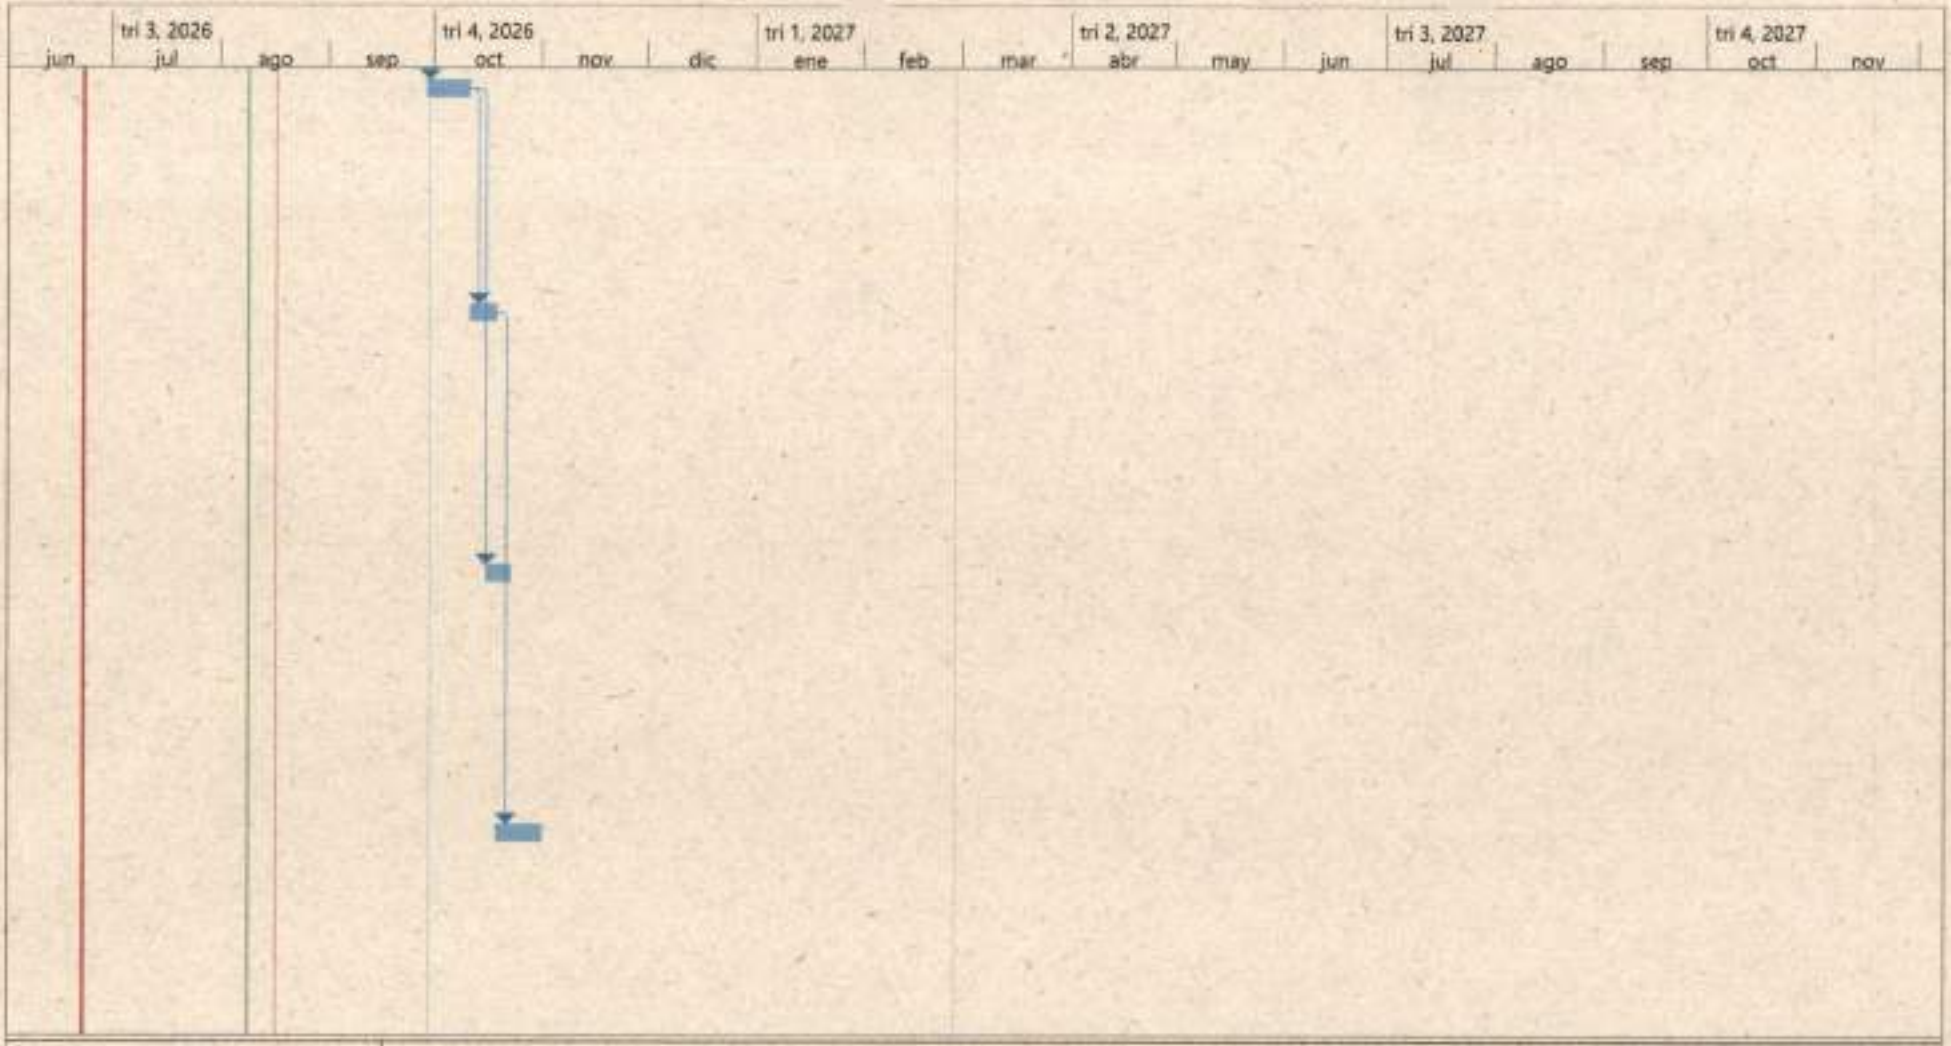


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

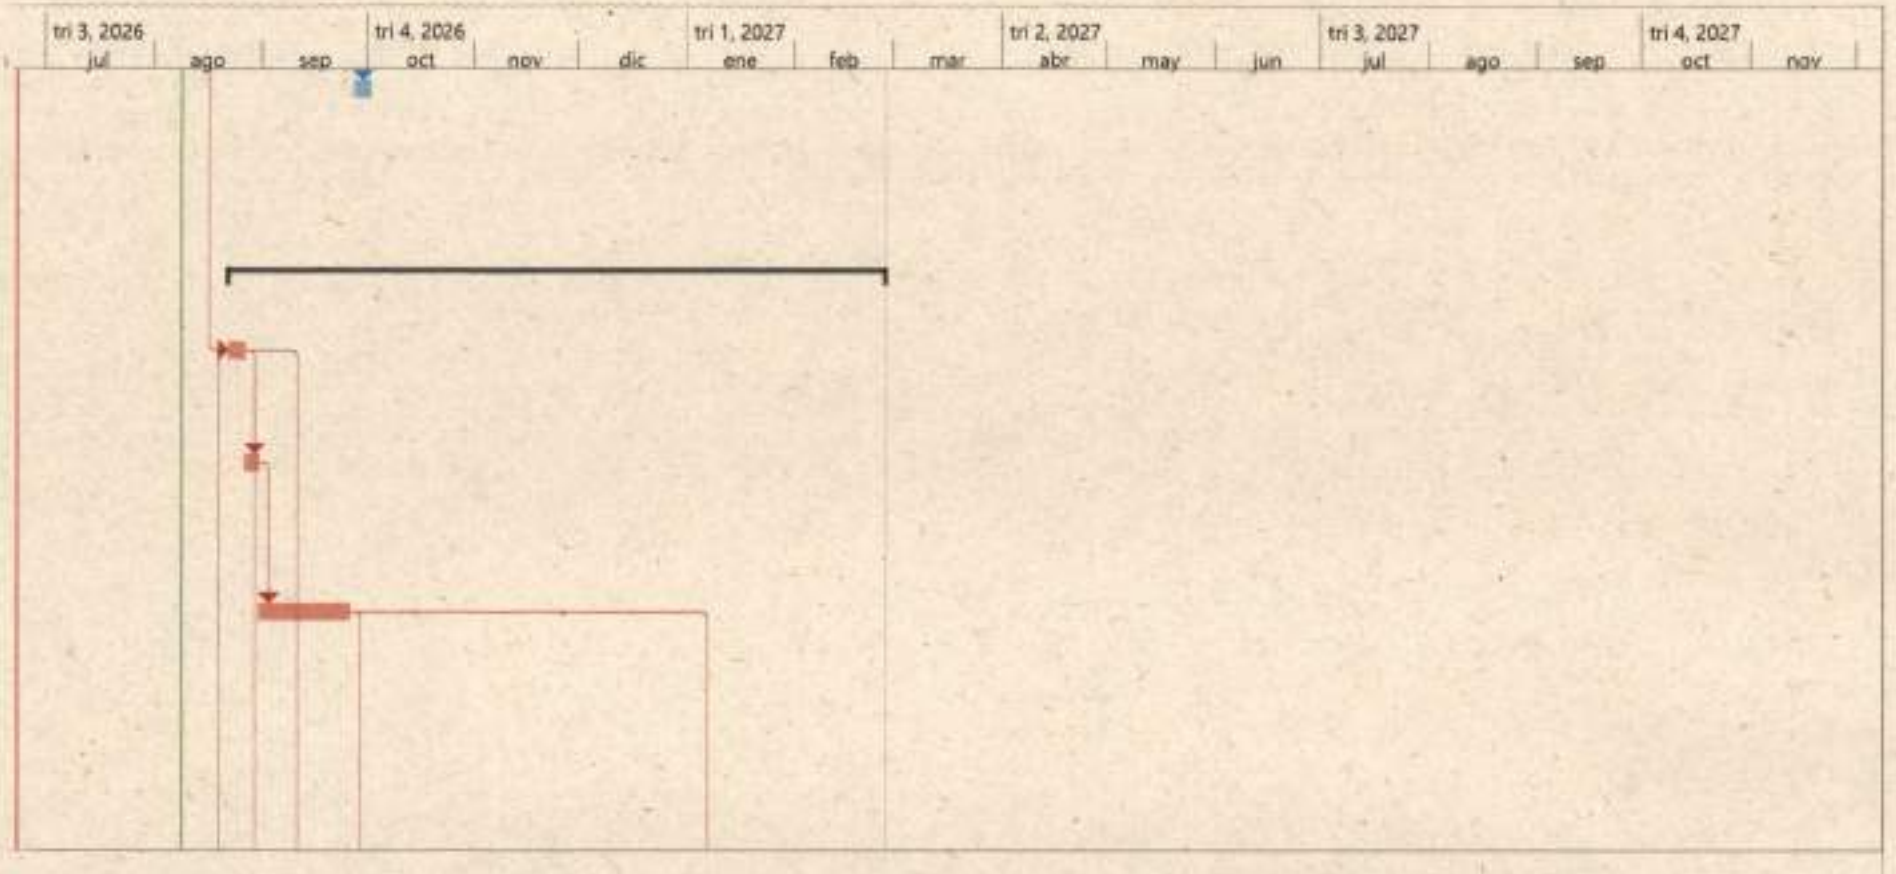


ecto: PROGRAMACION LU
a: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

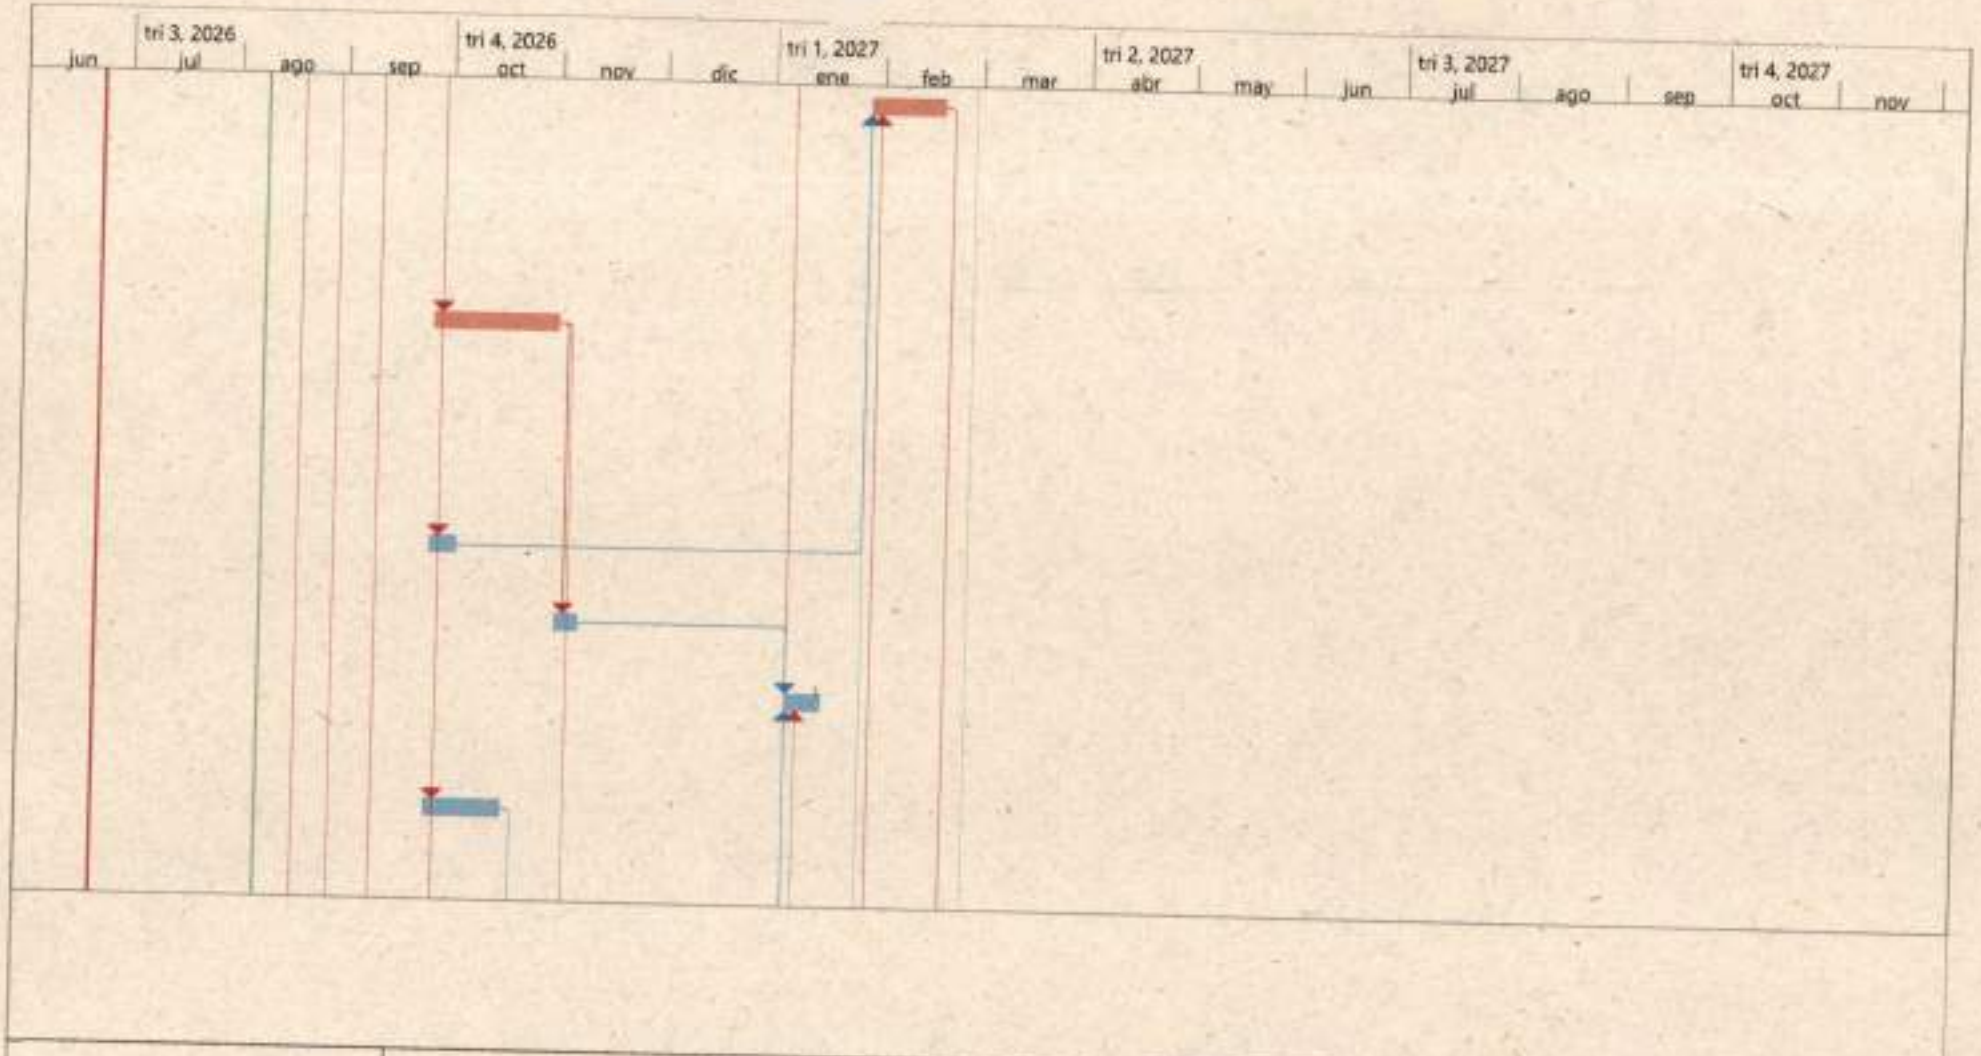


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

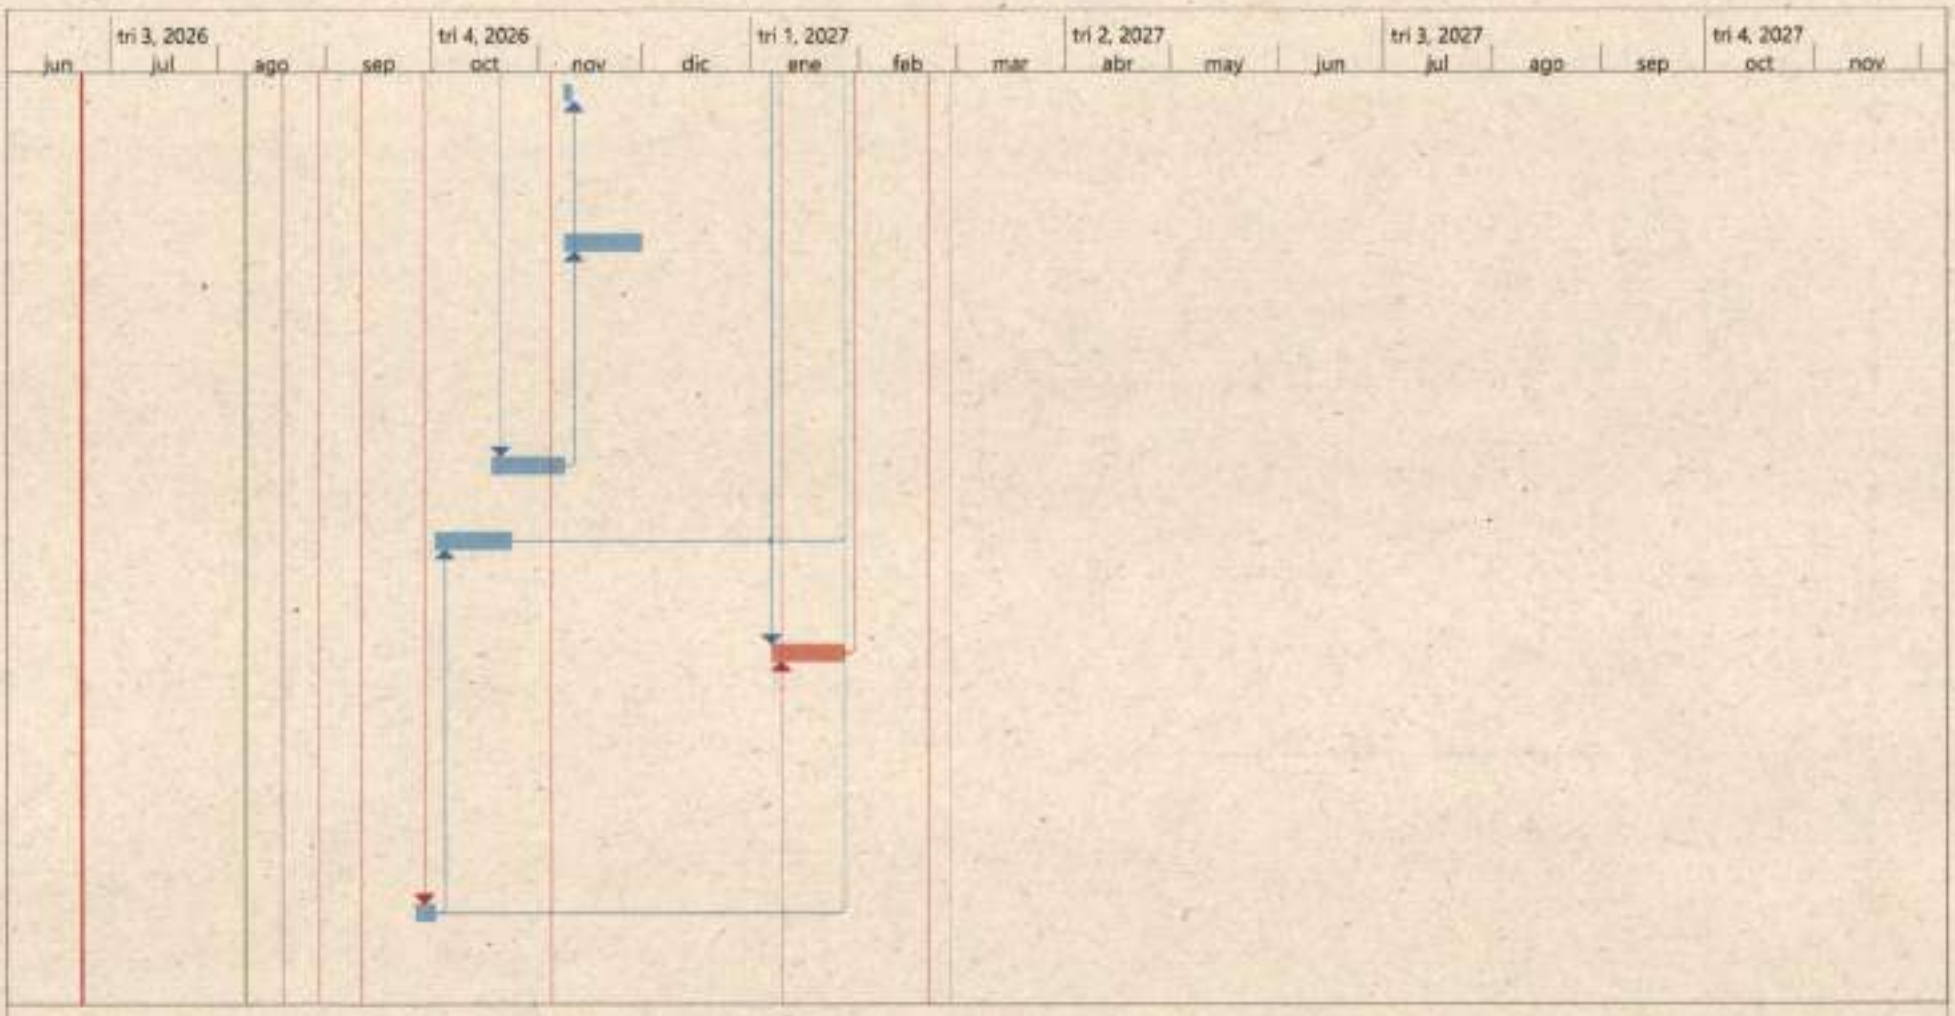


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

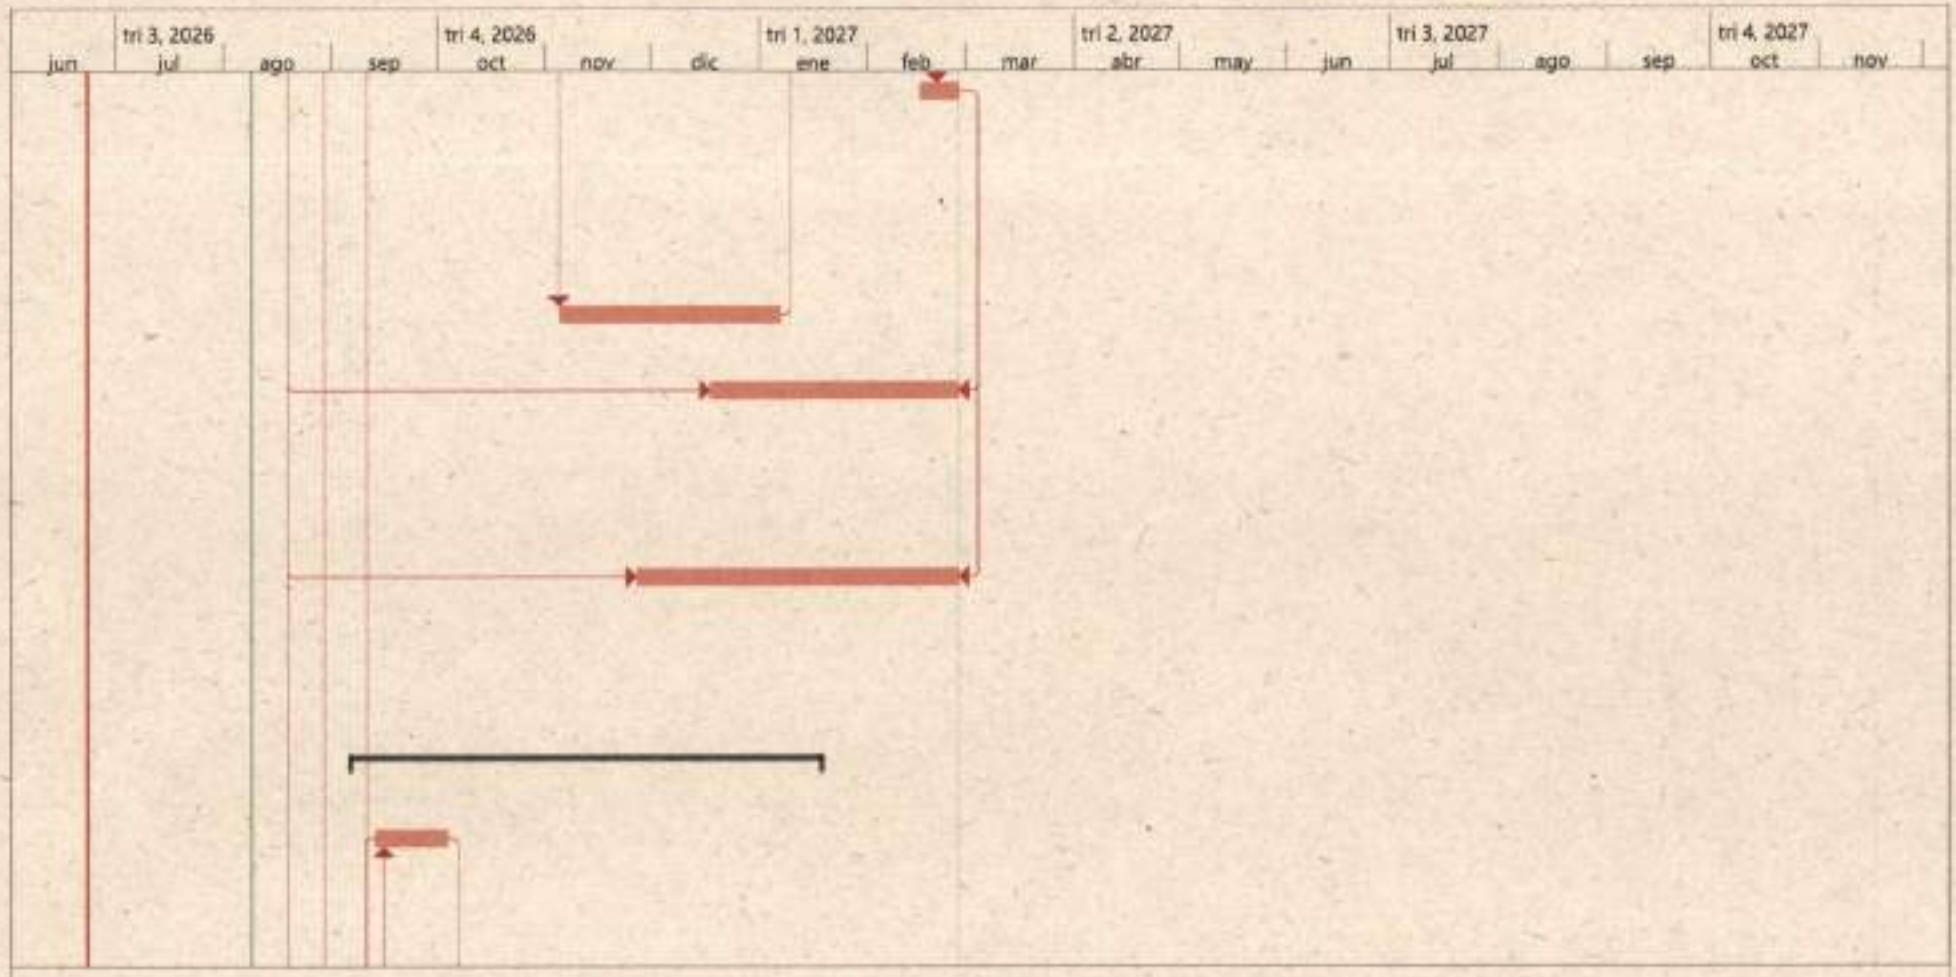


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

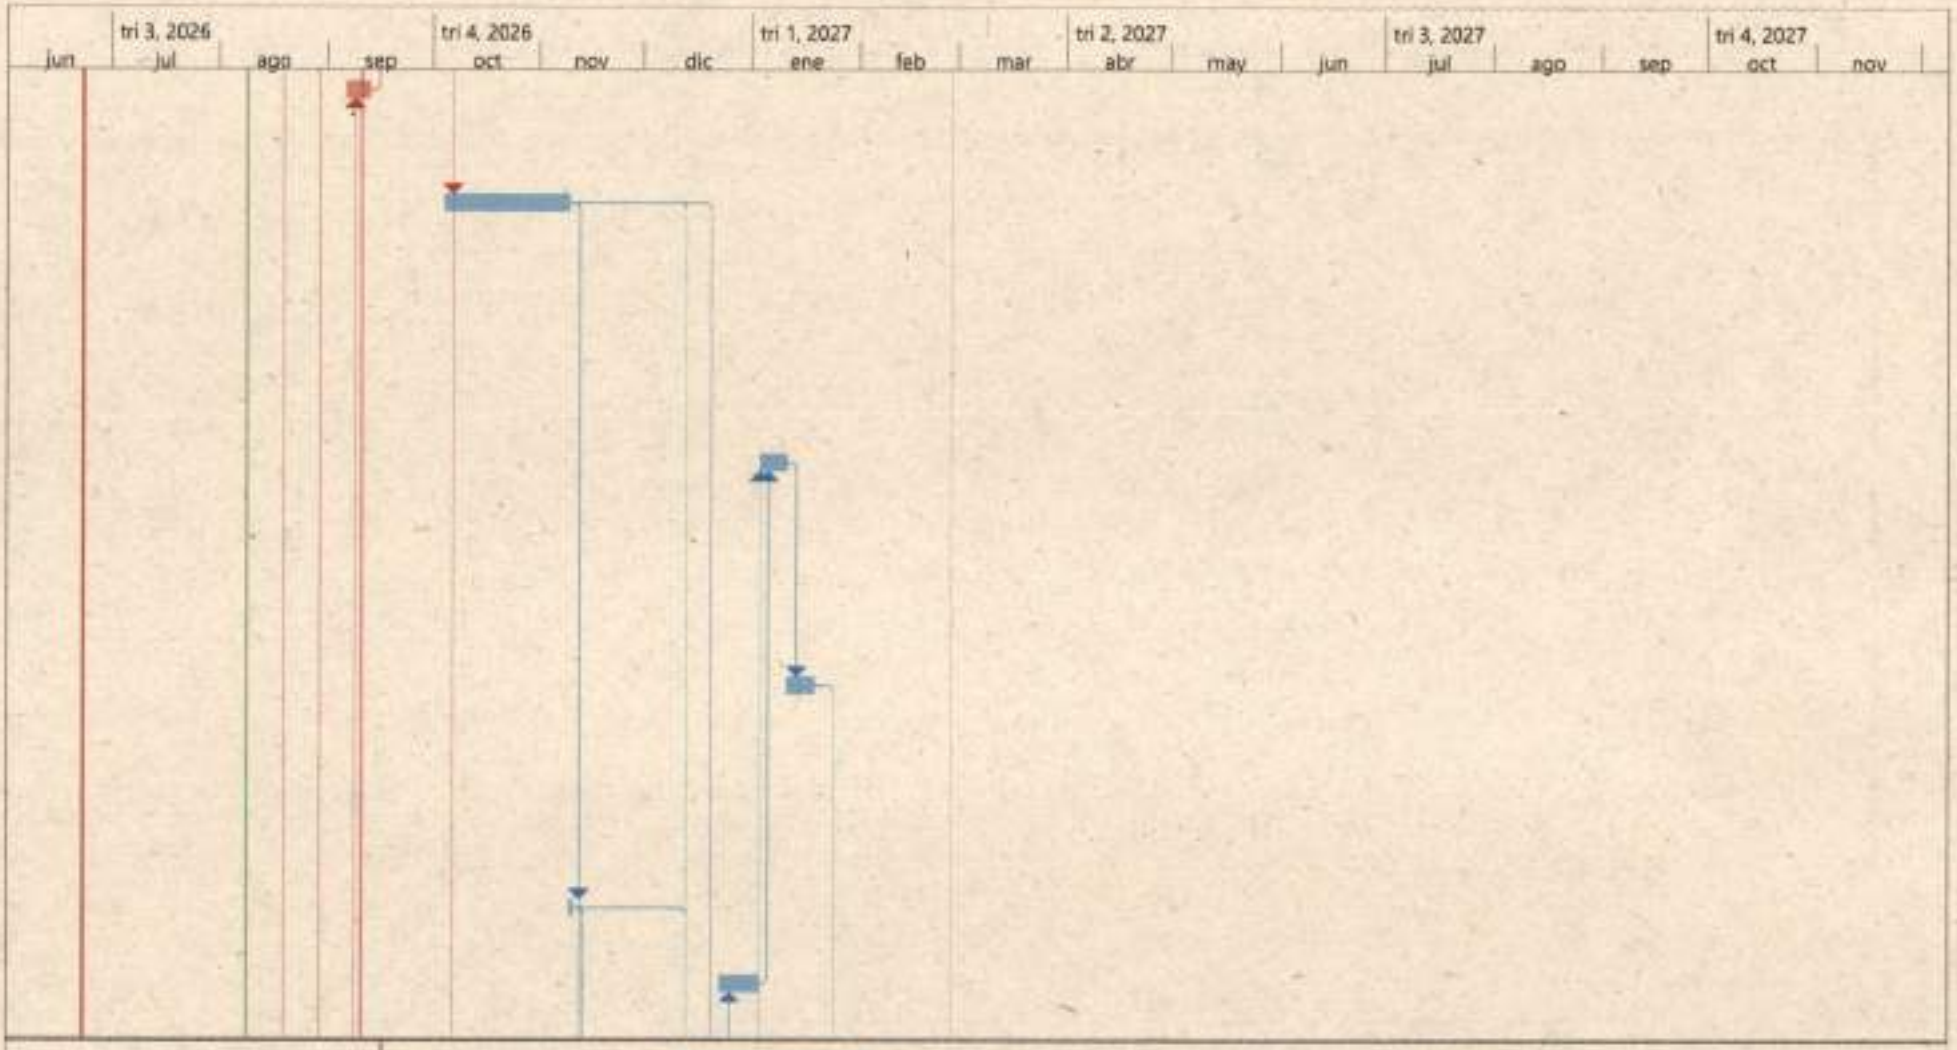

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

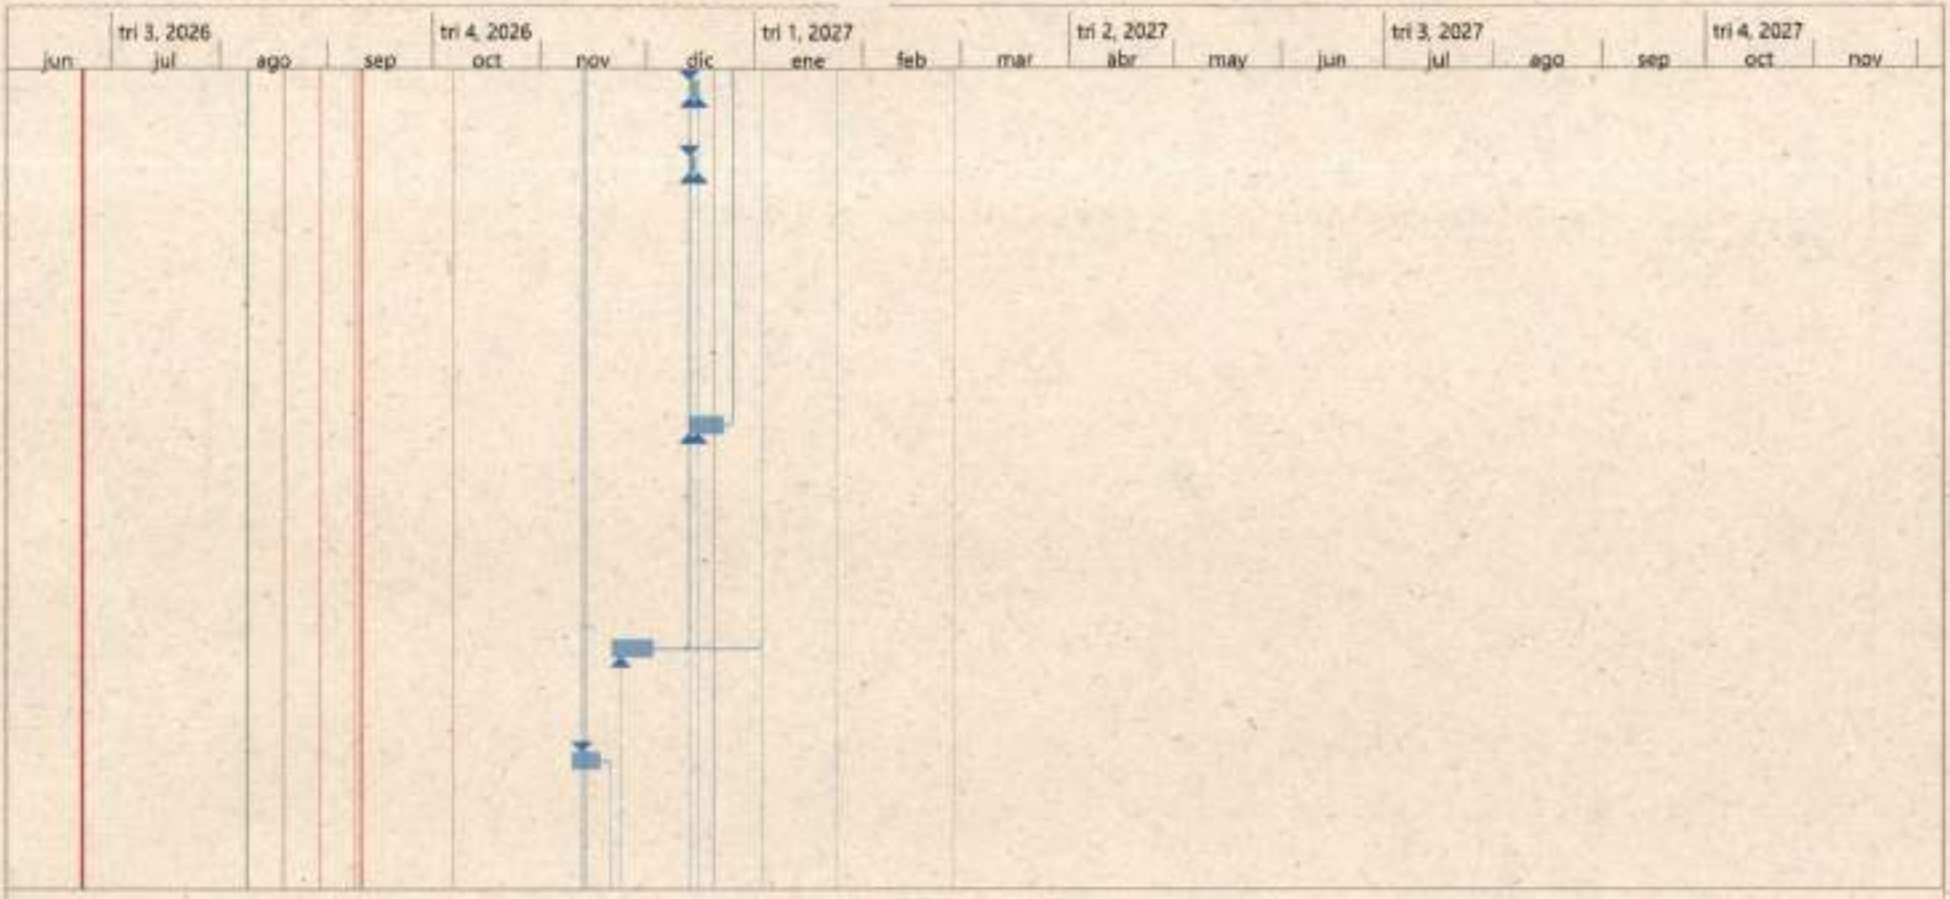


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual




Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

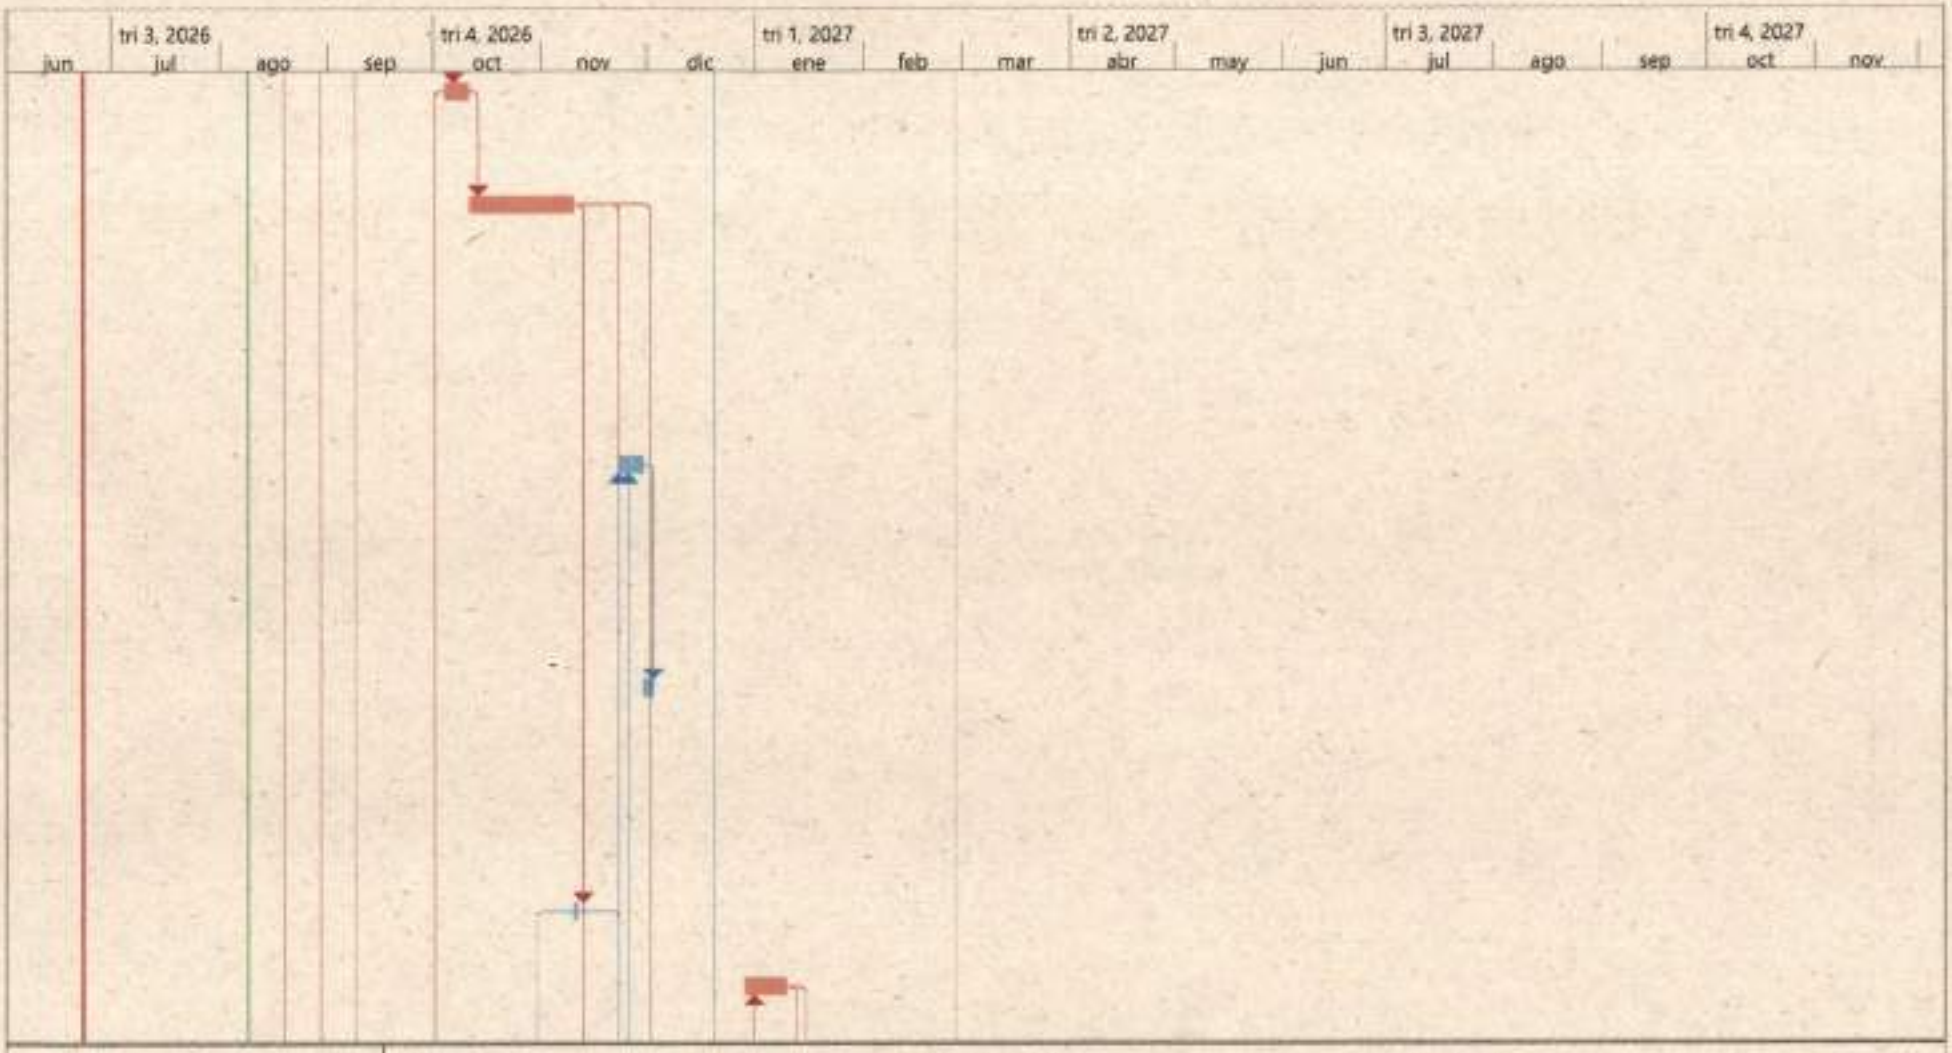


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

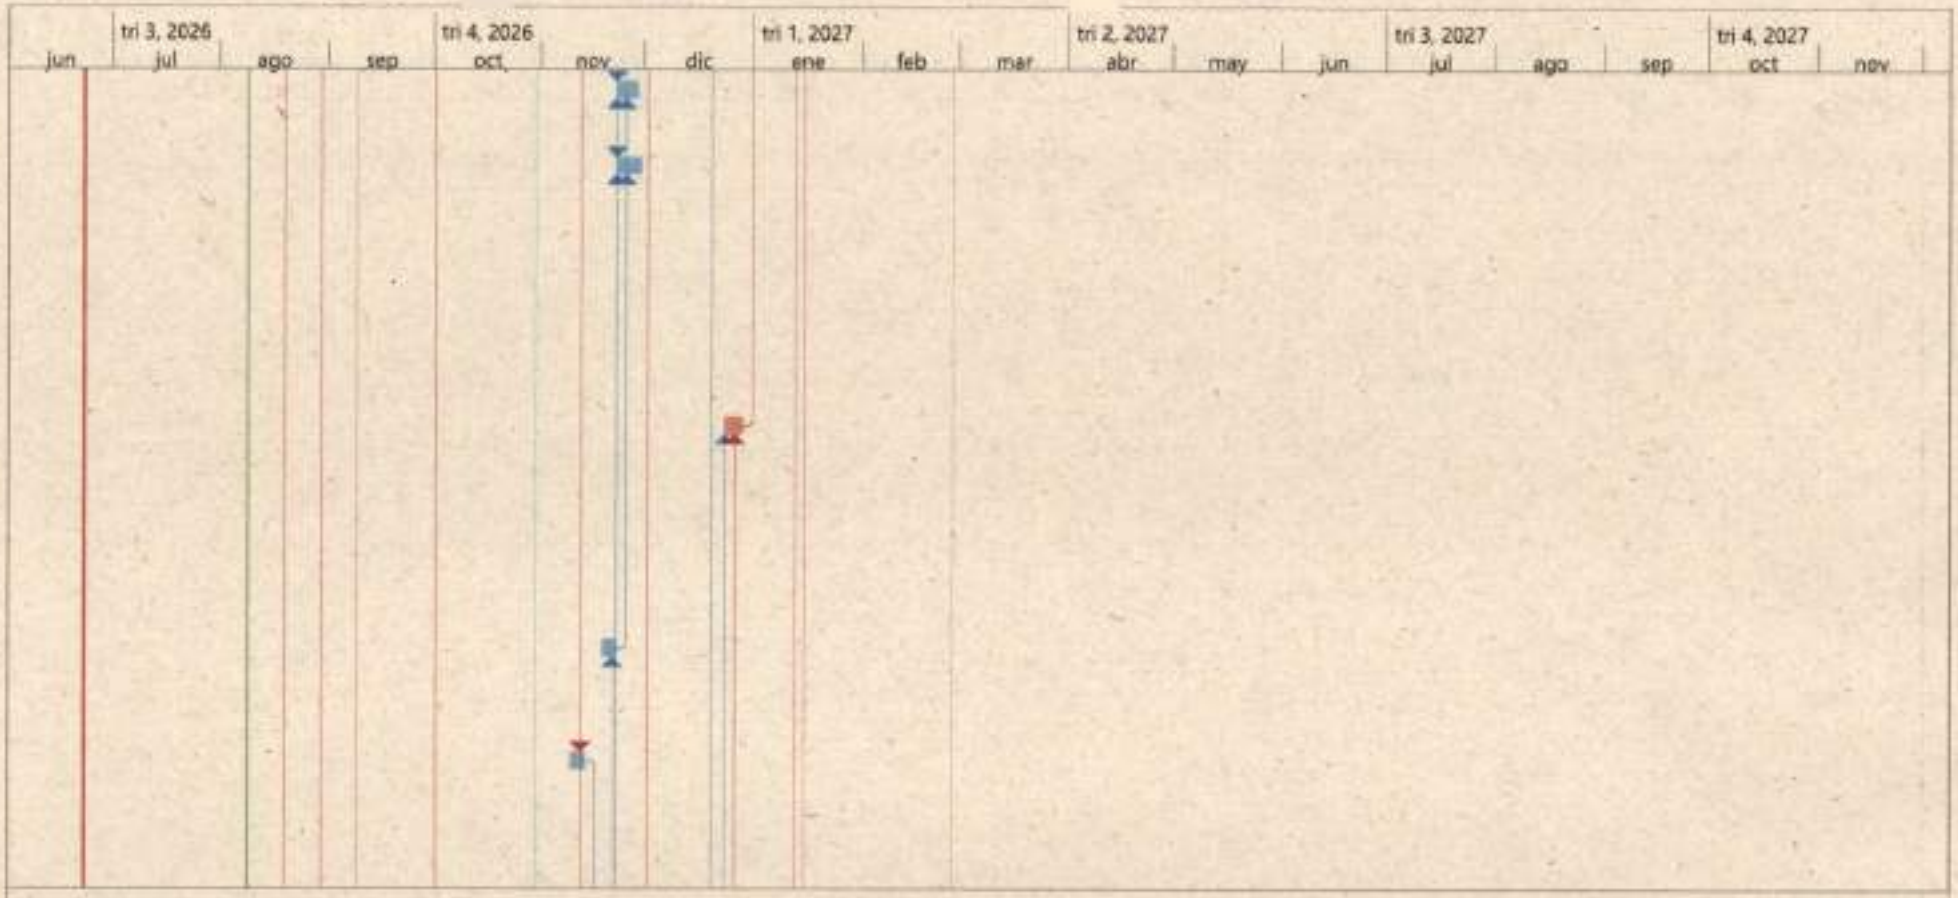


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

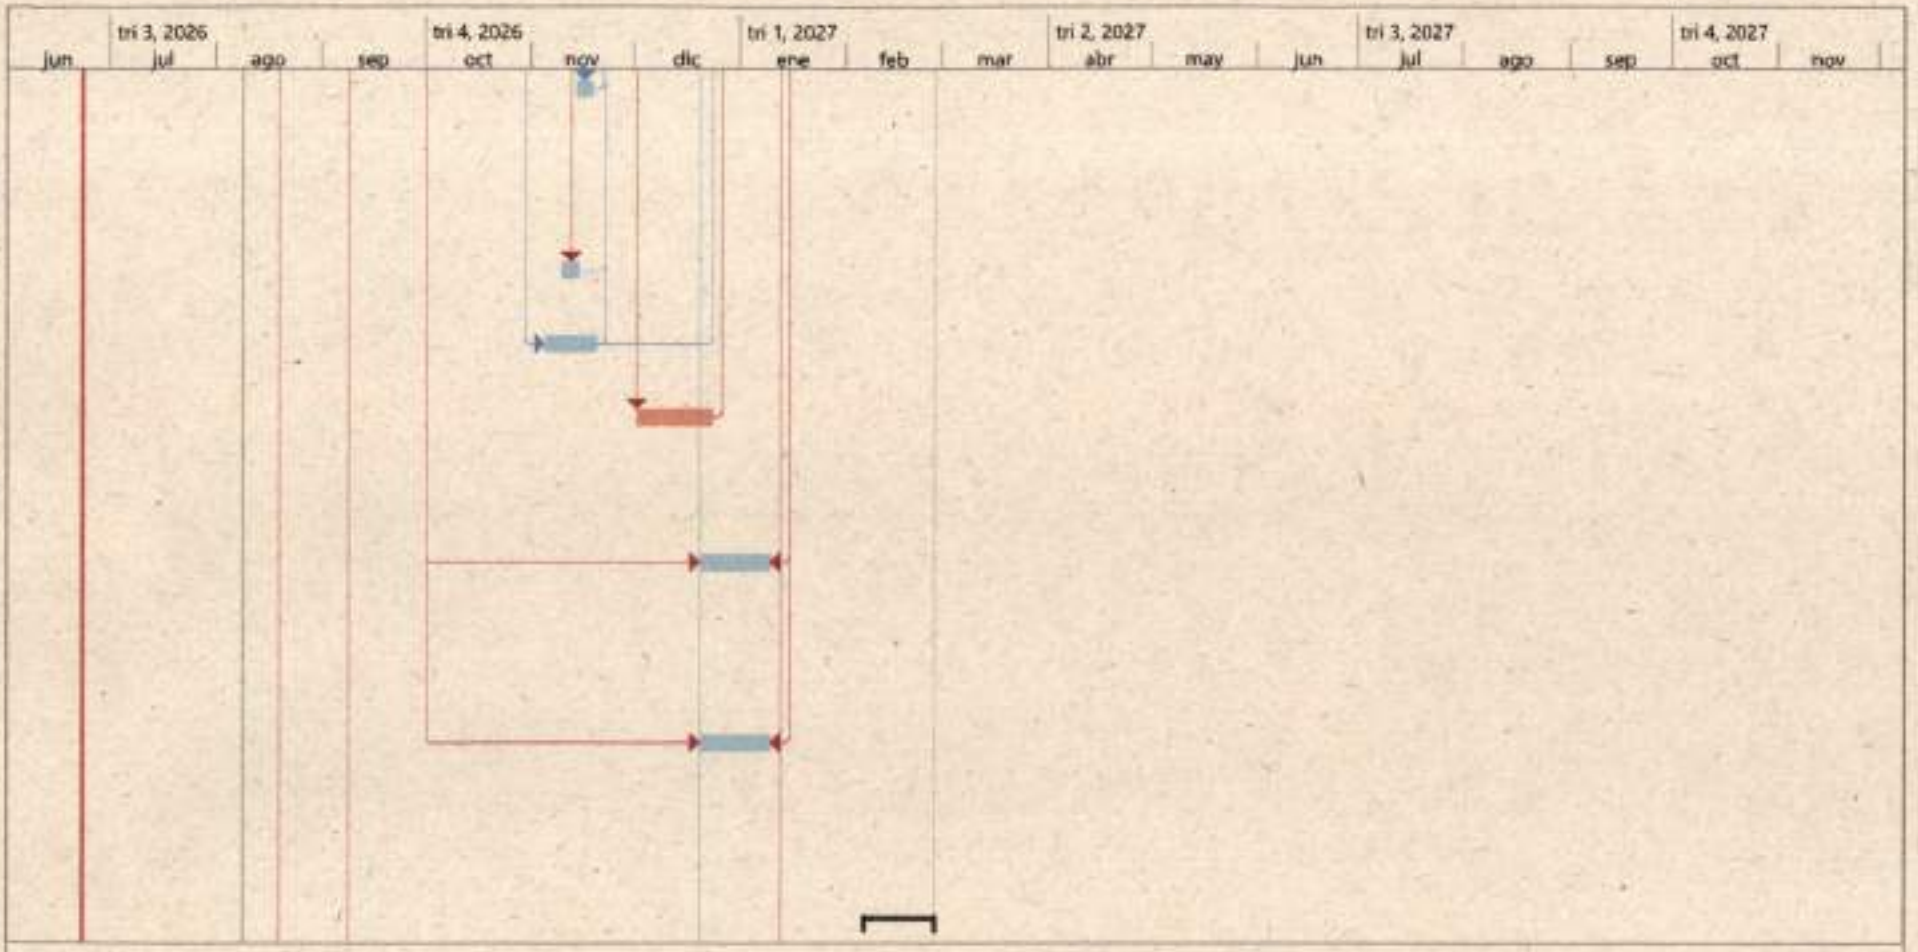


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

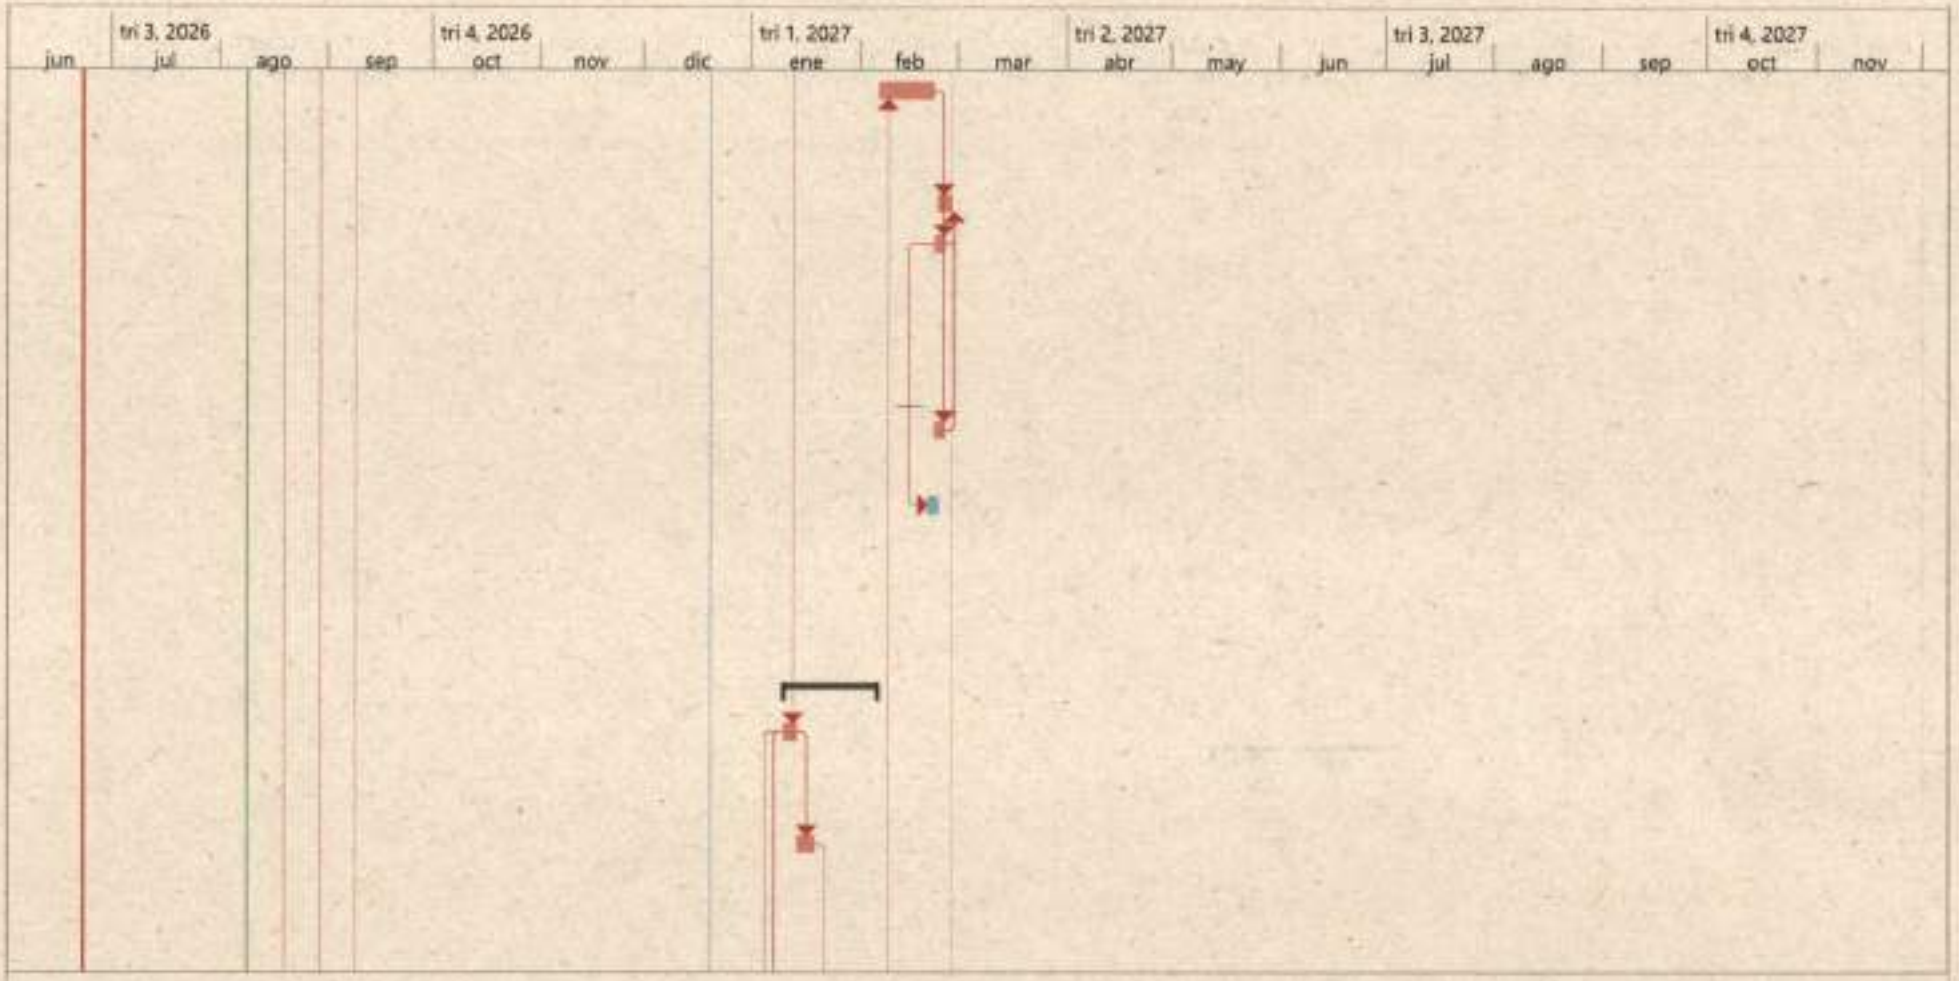


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

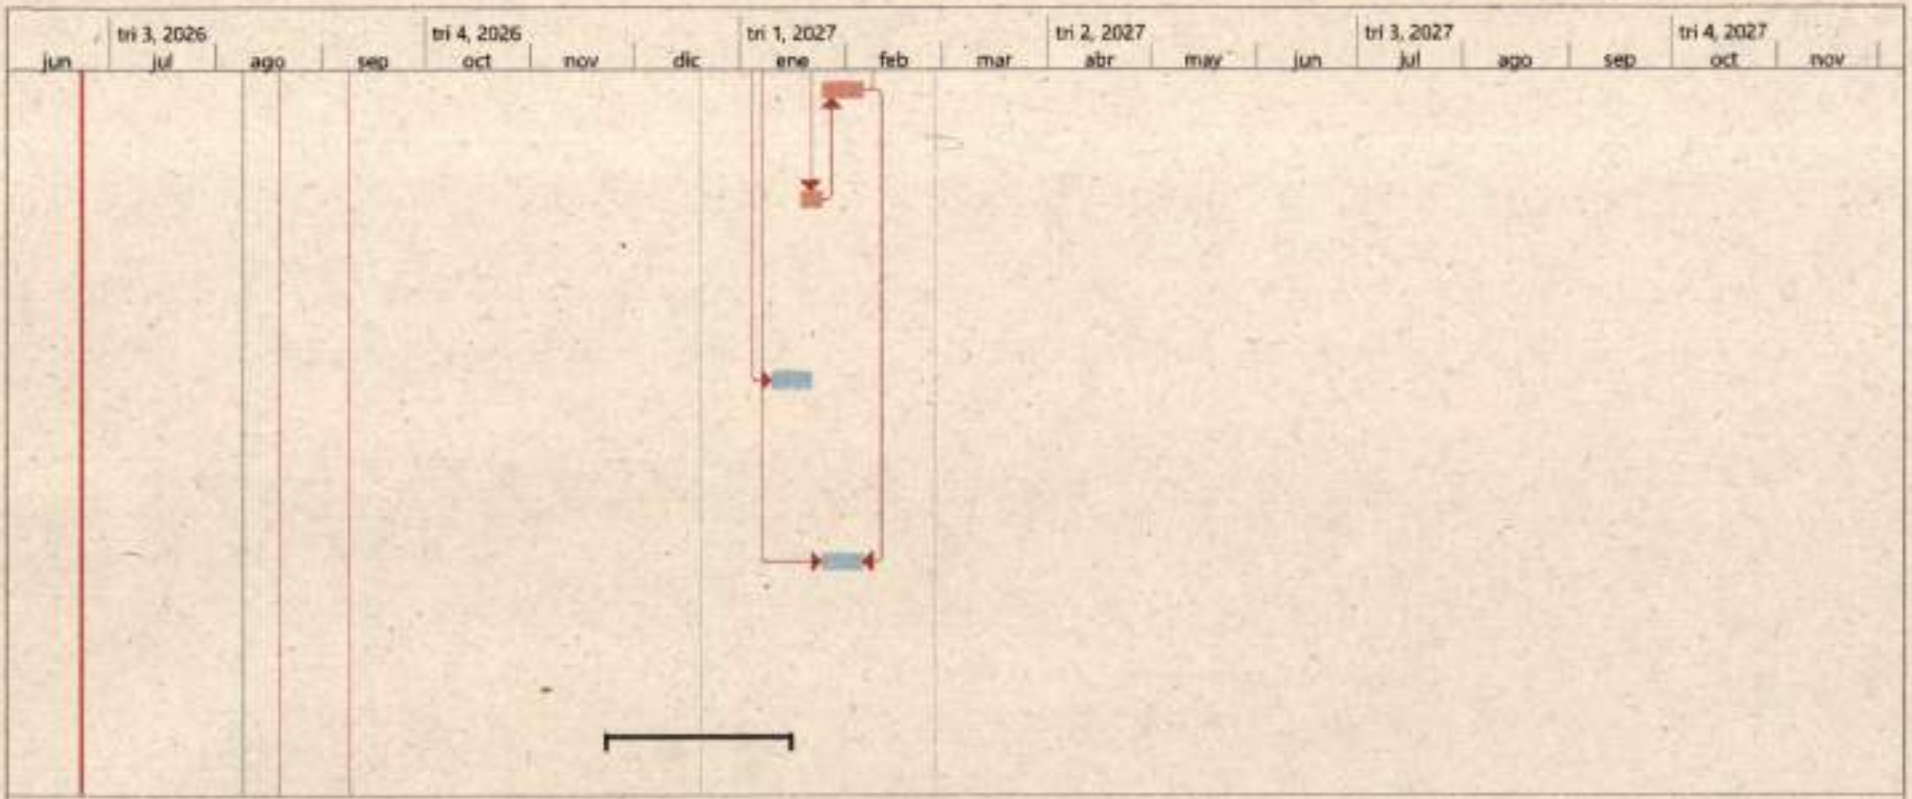


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

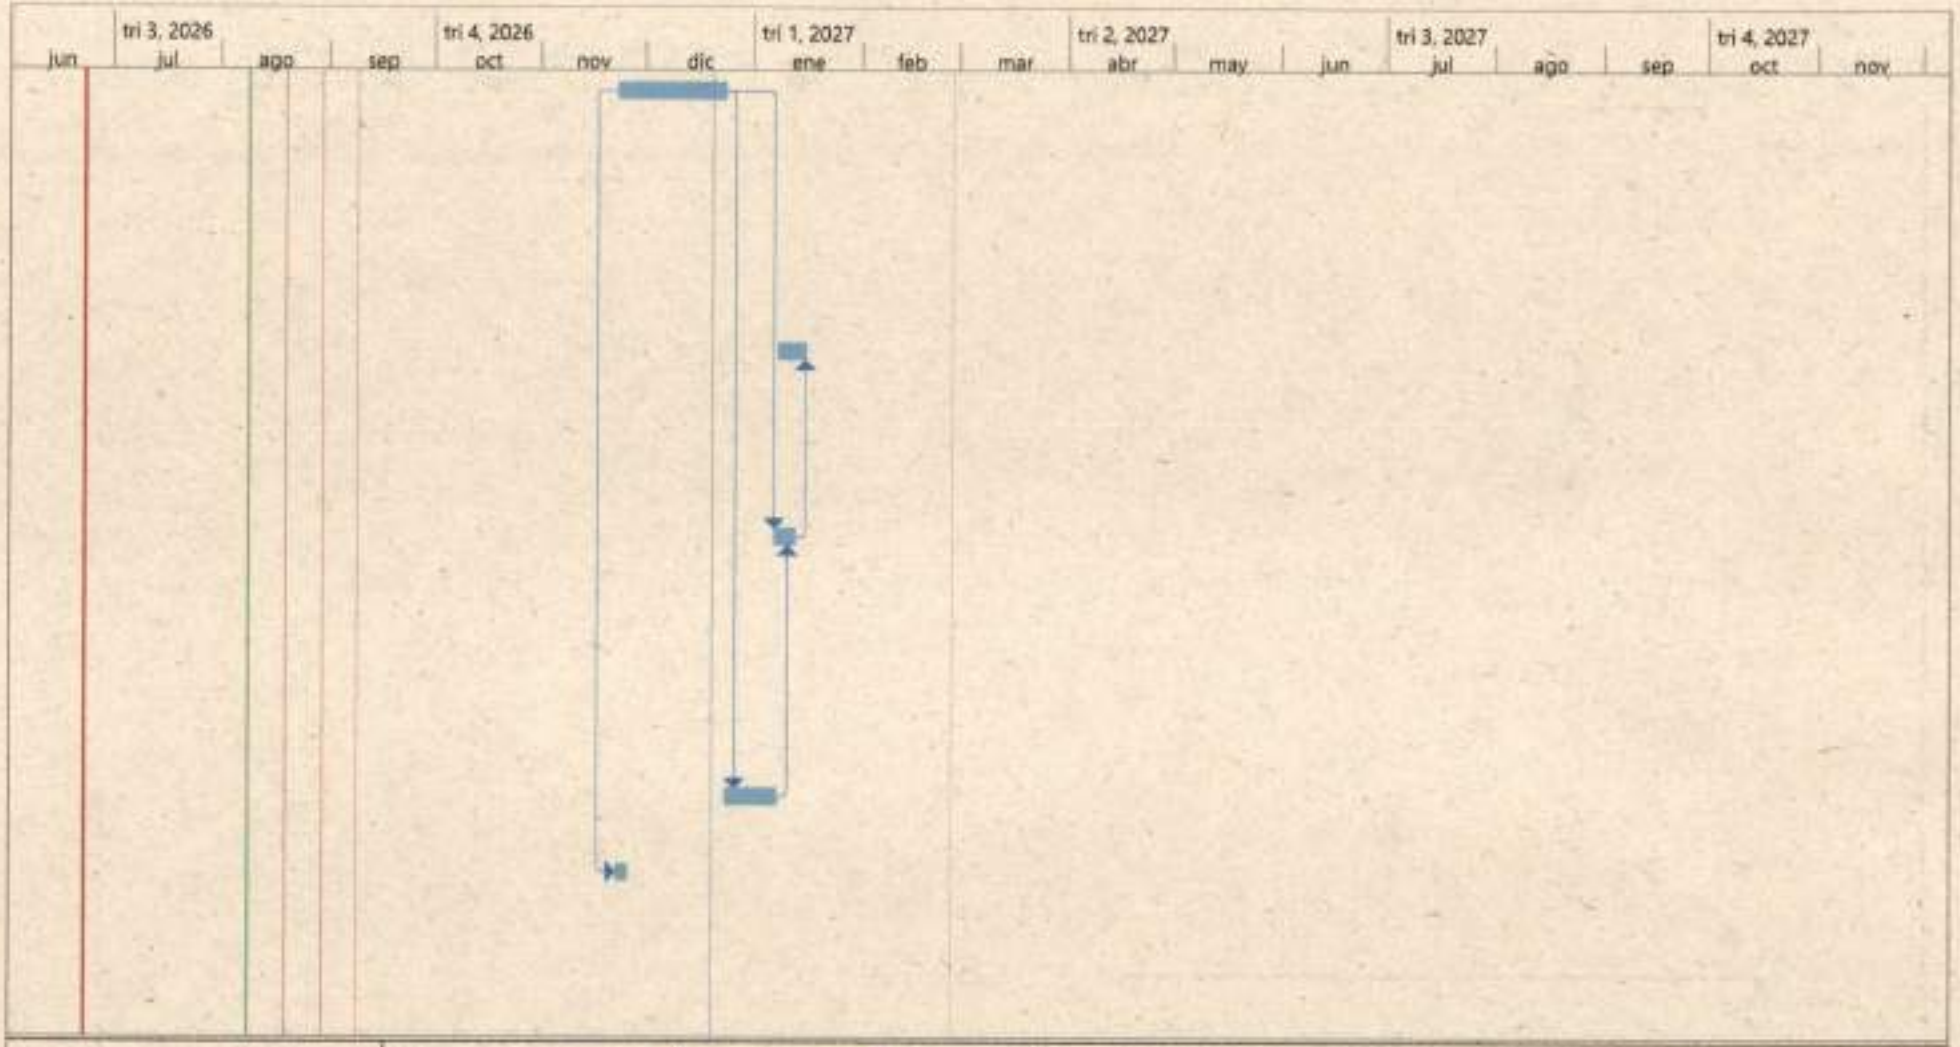


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

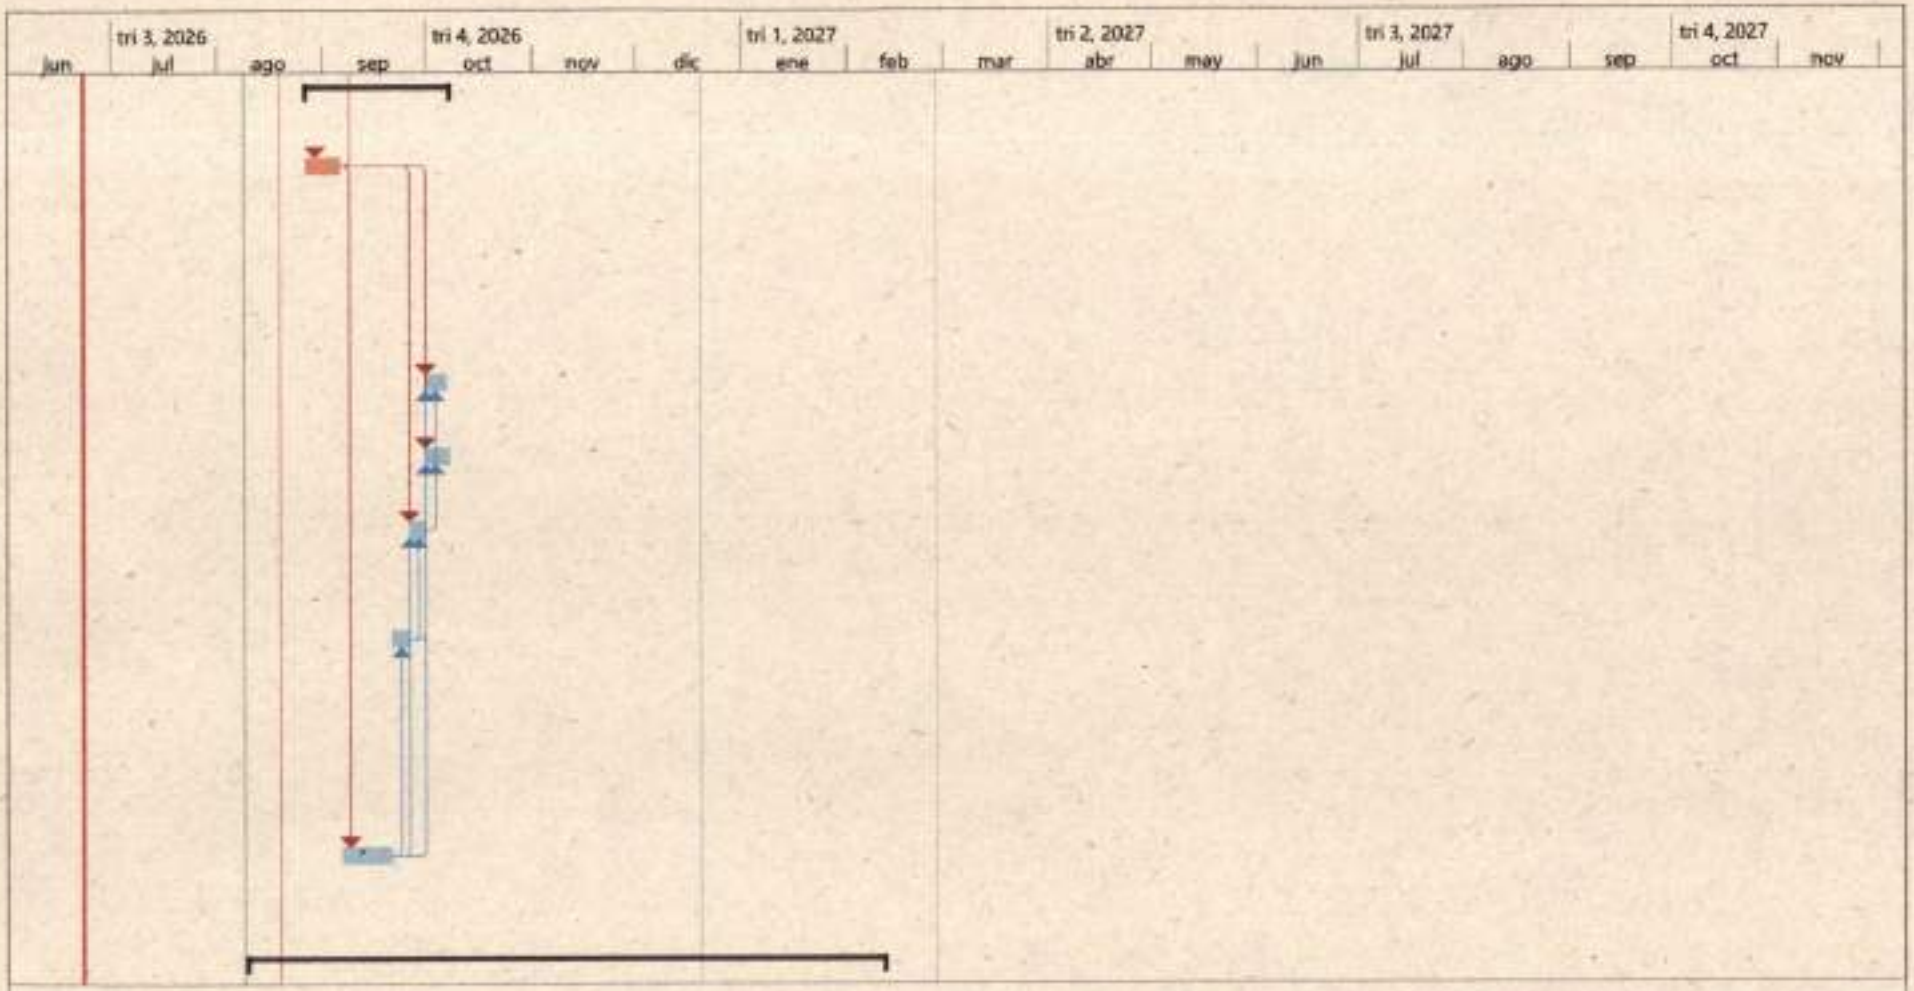


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

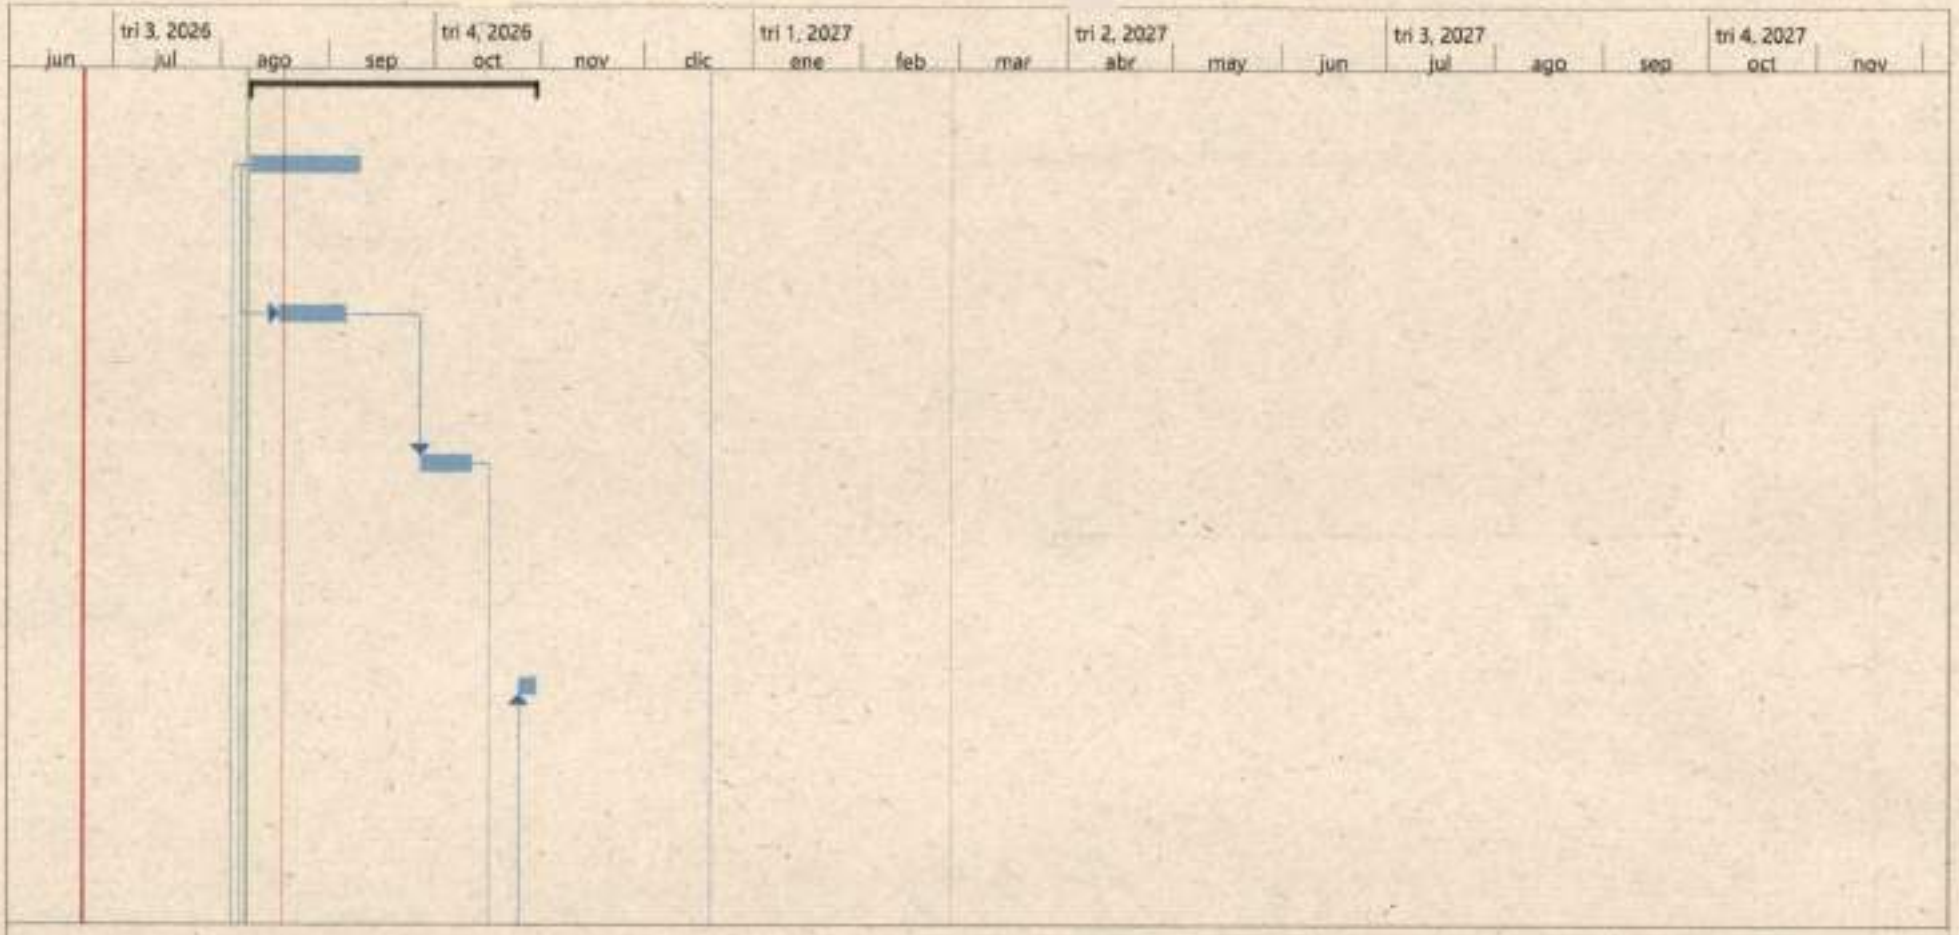


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

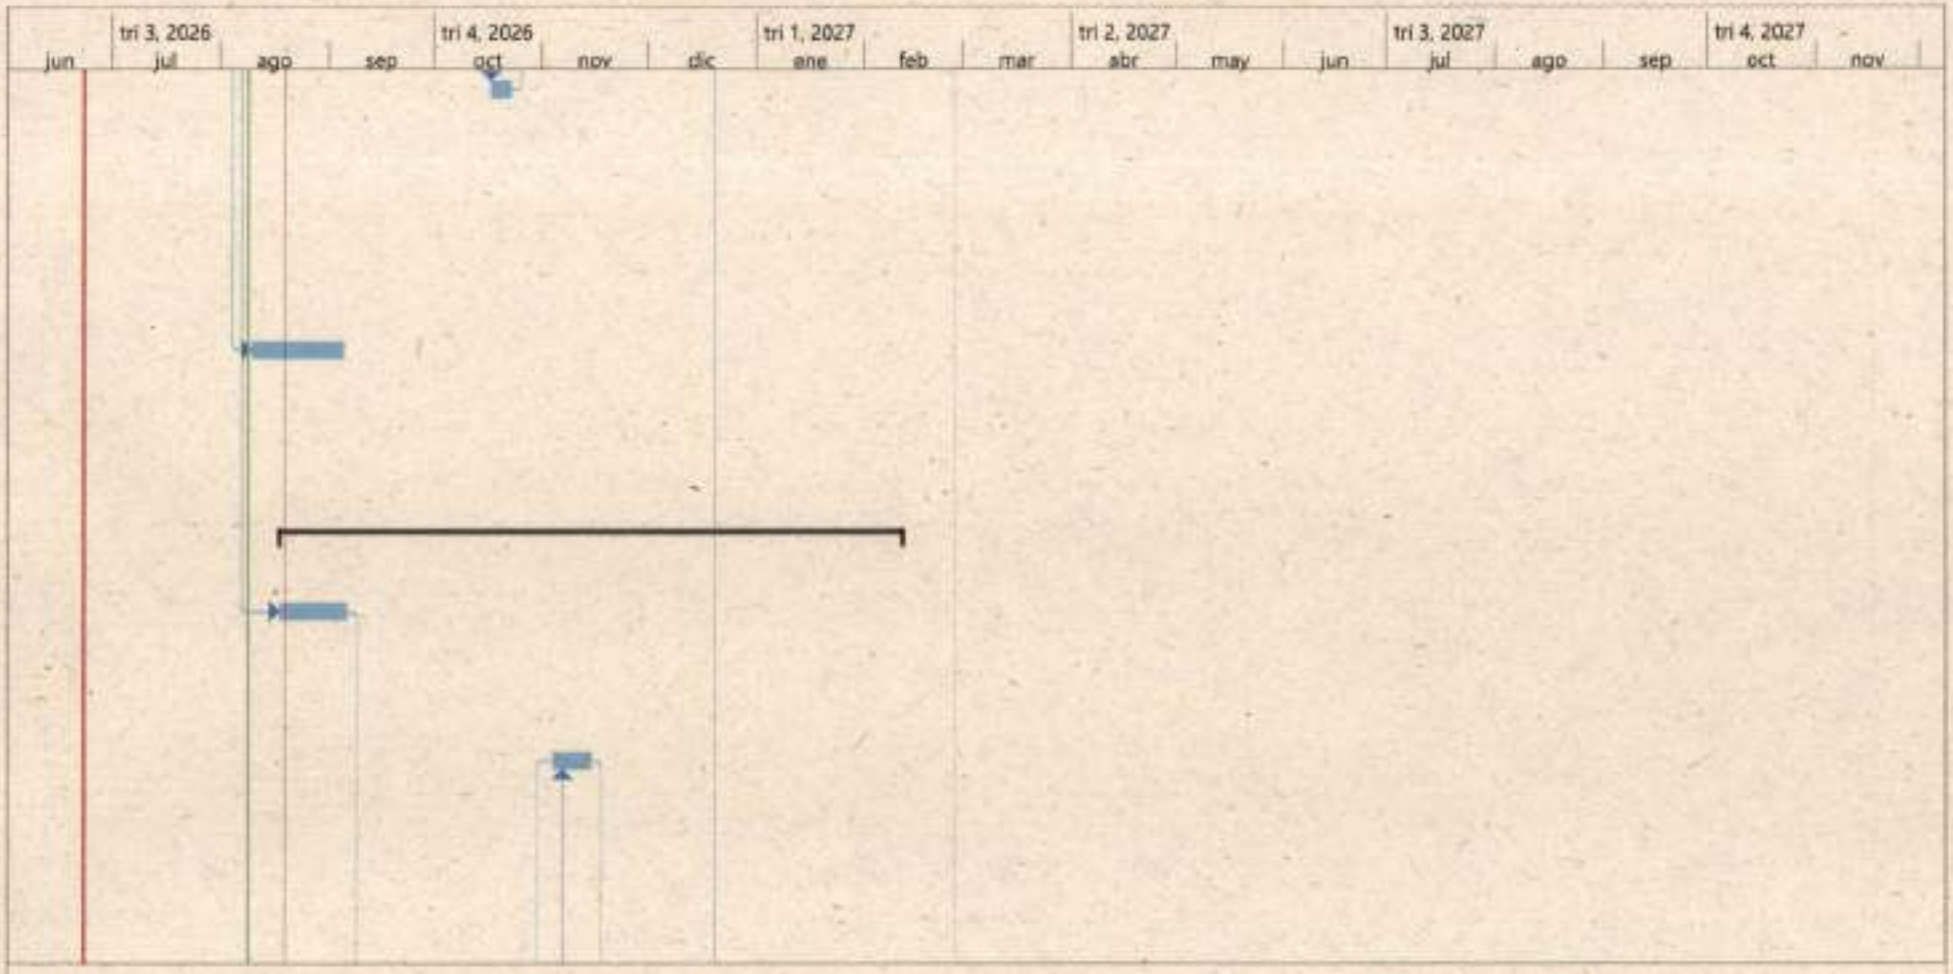


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

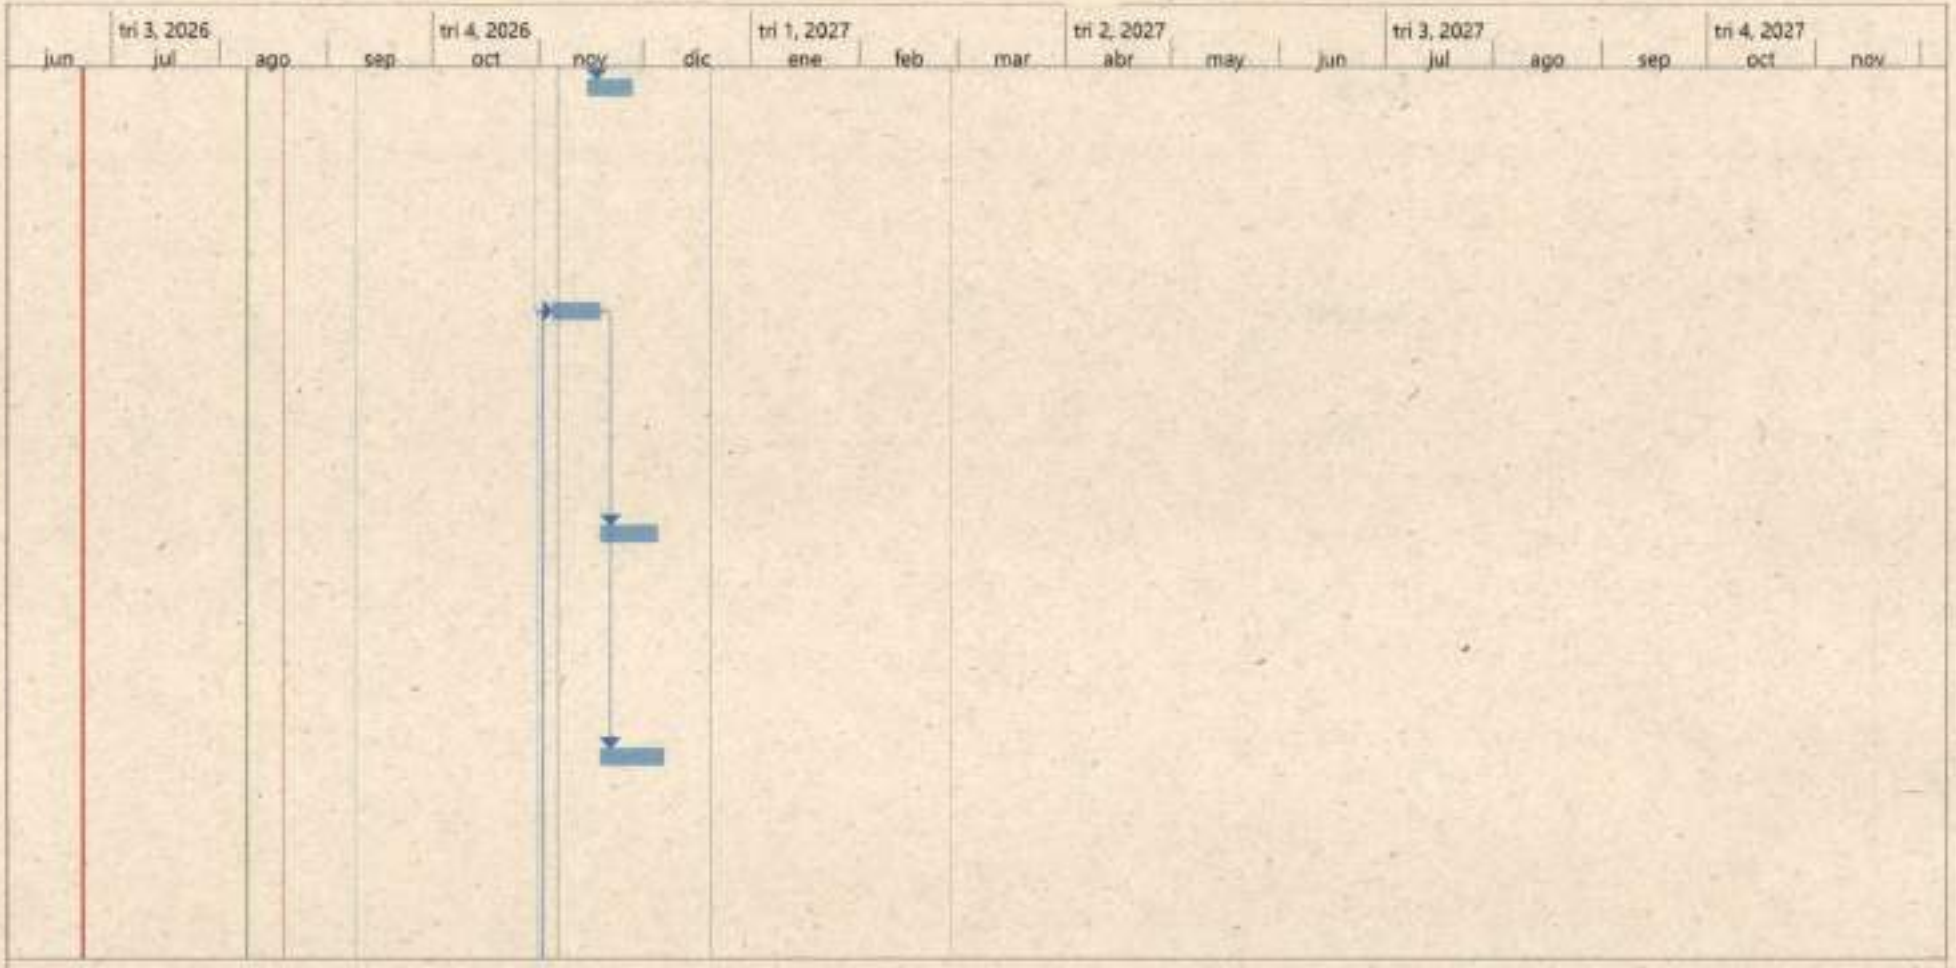


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

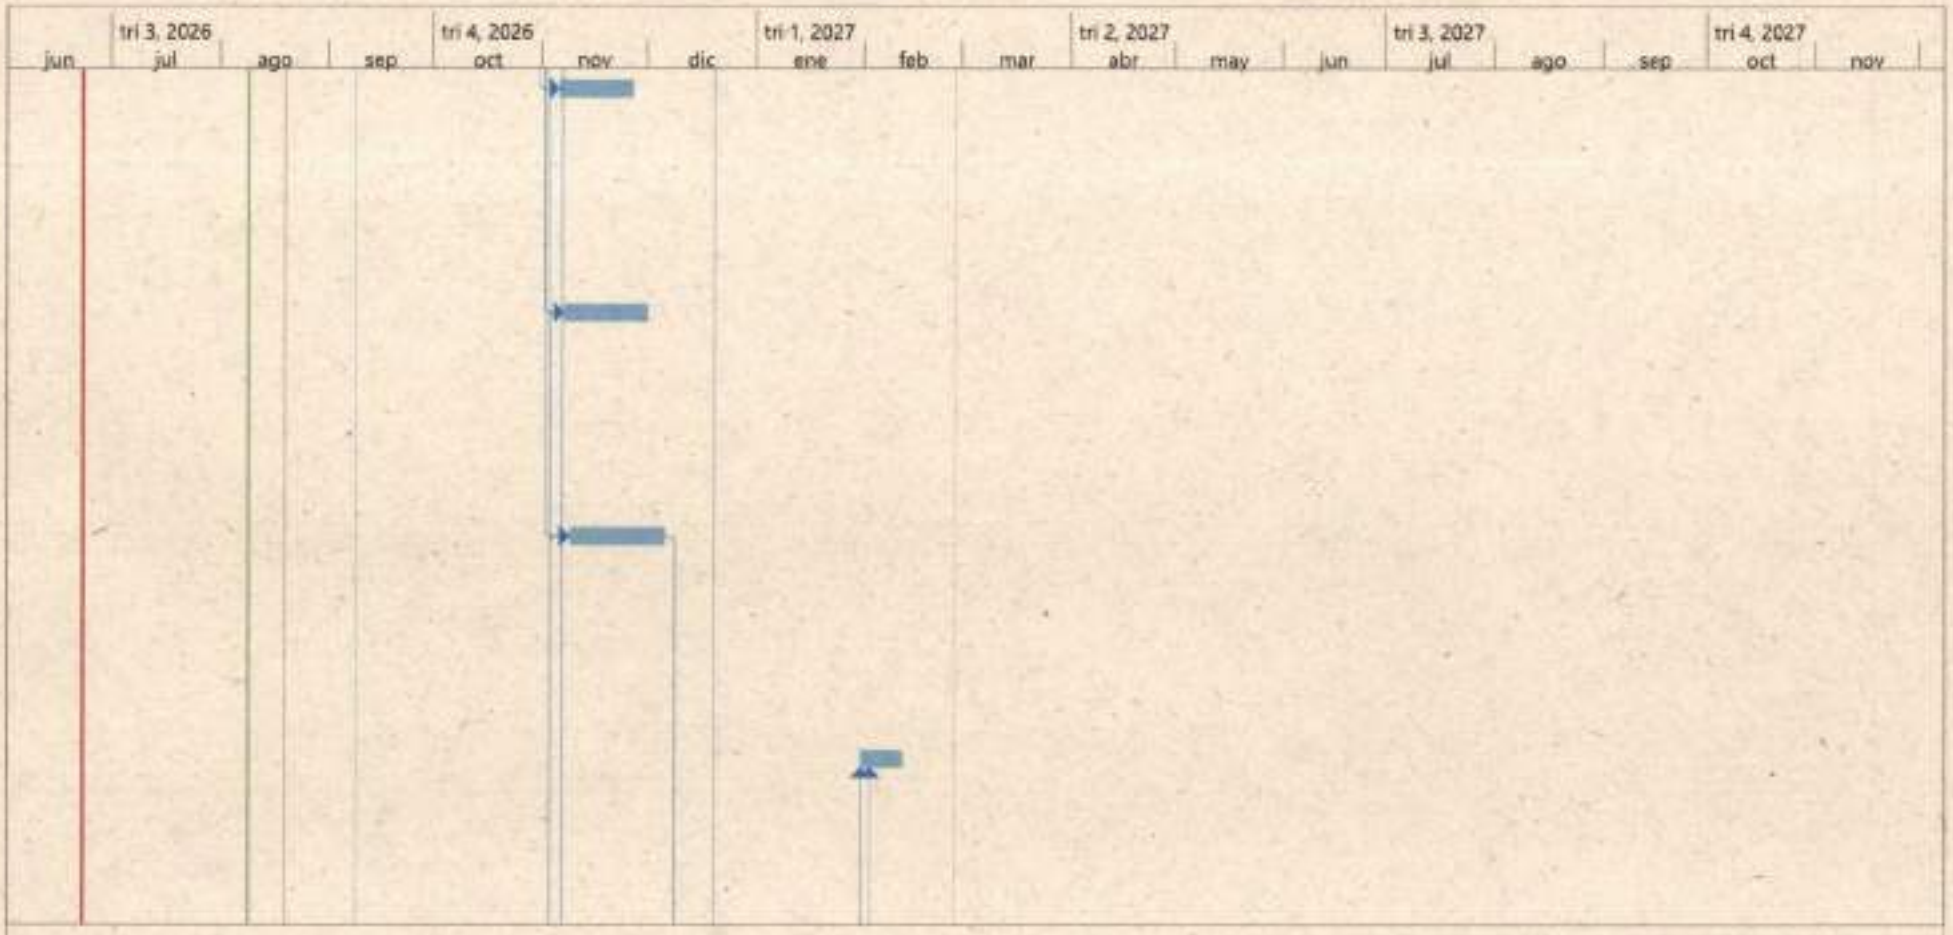


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

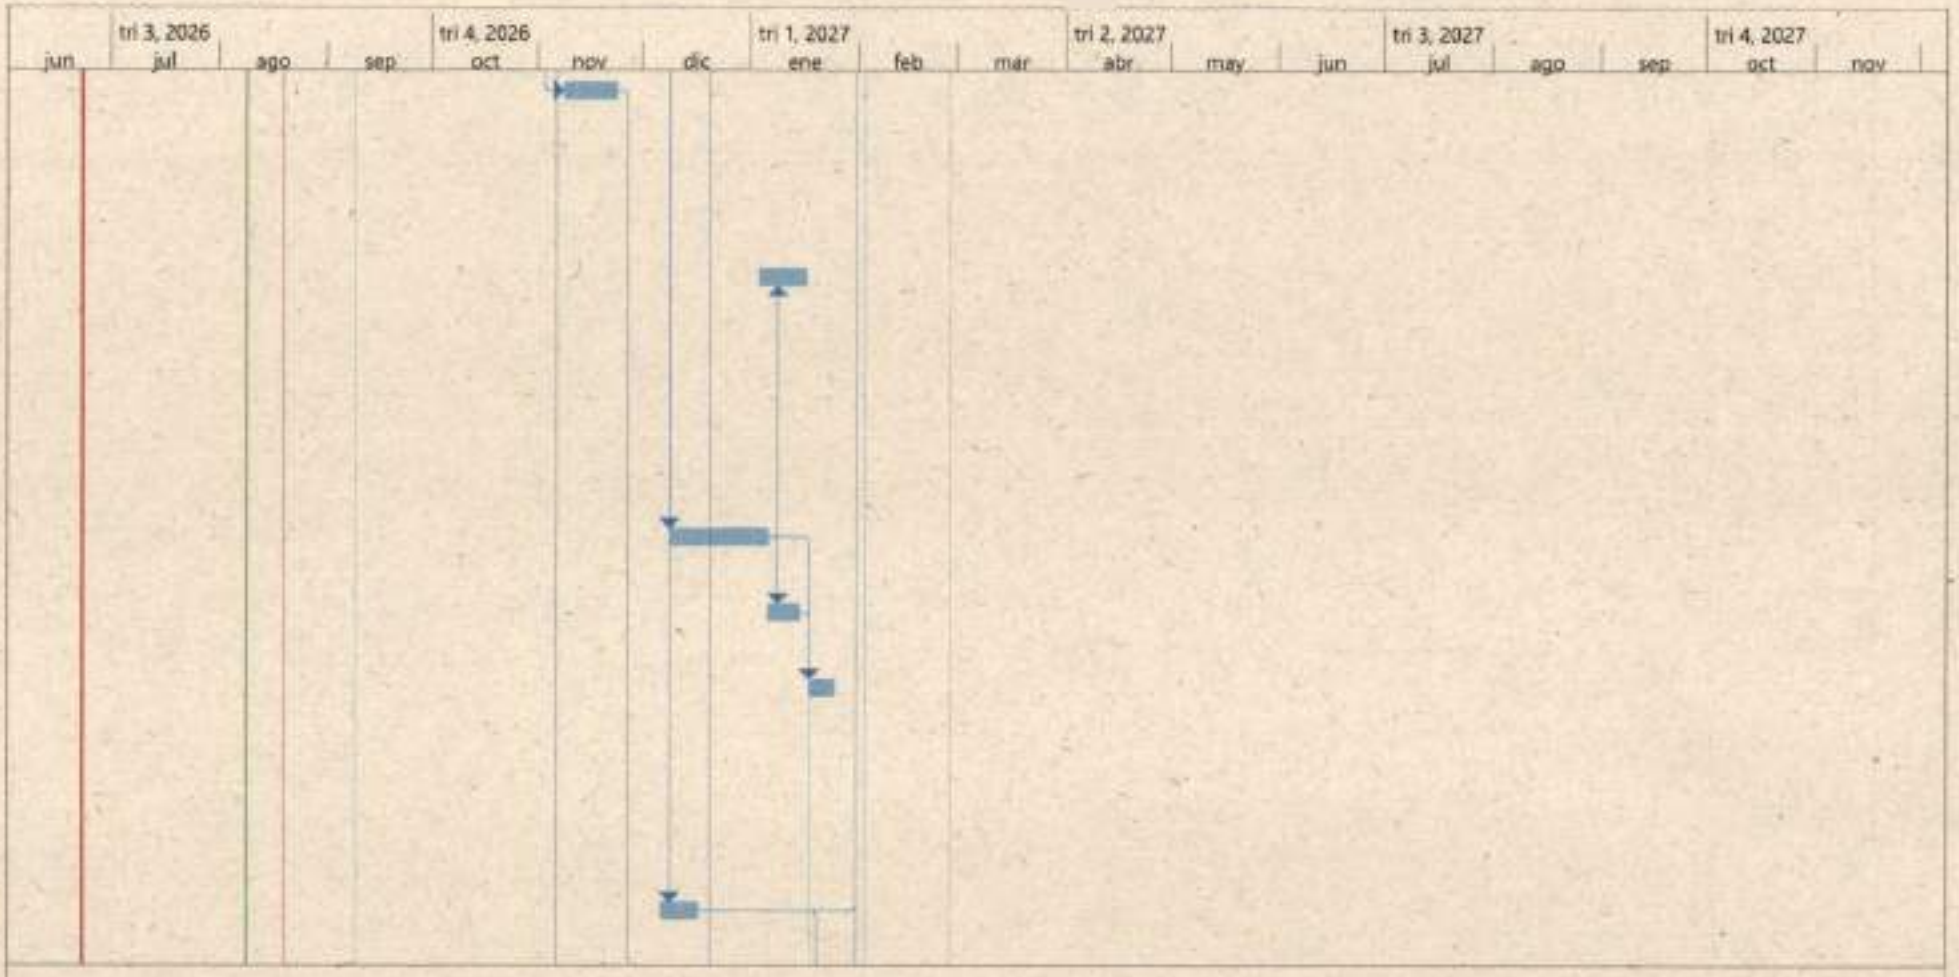


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

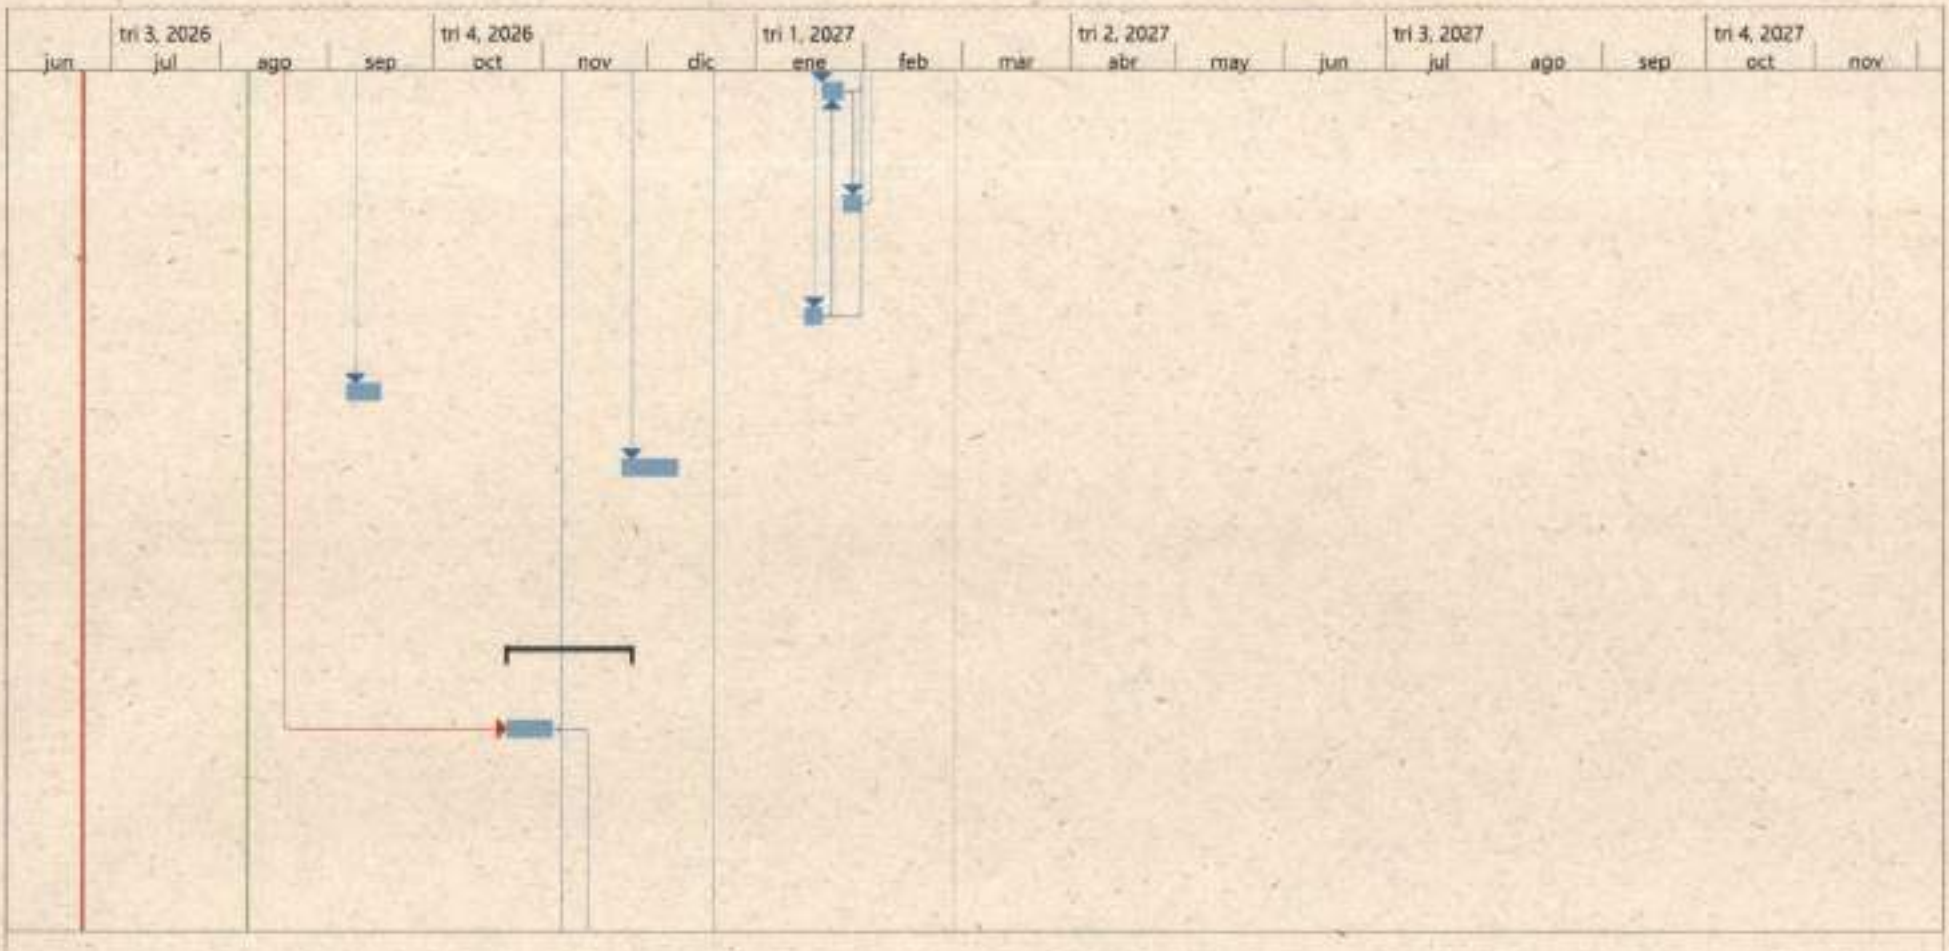


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

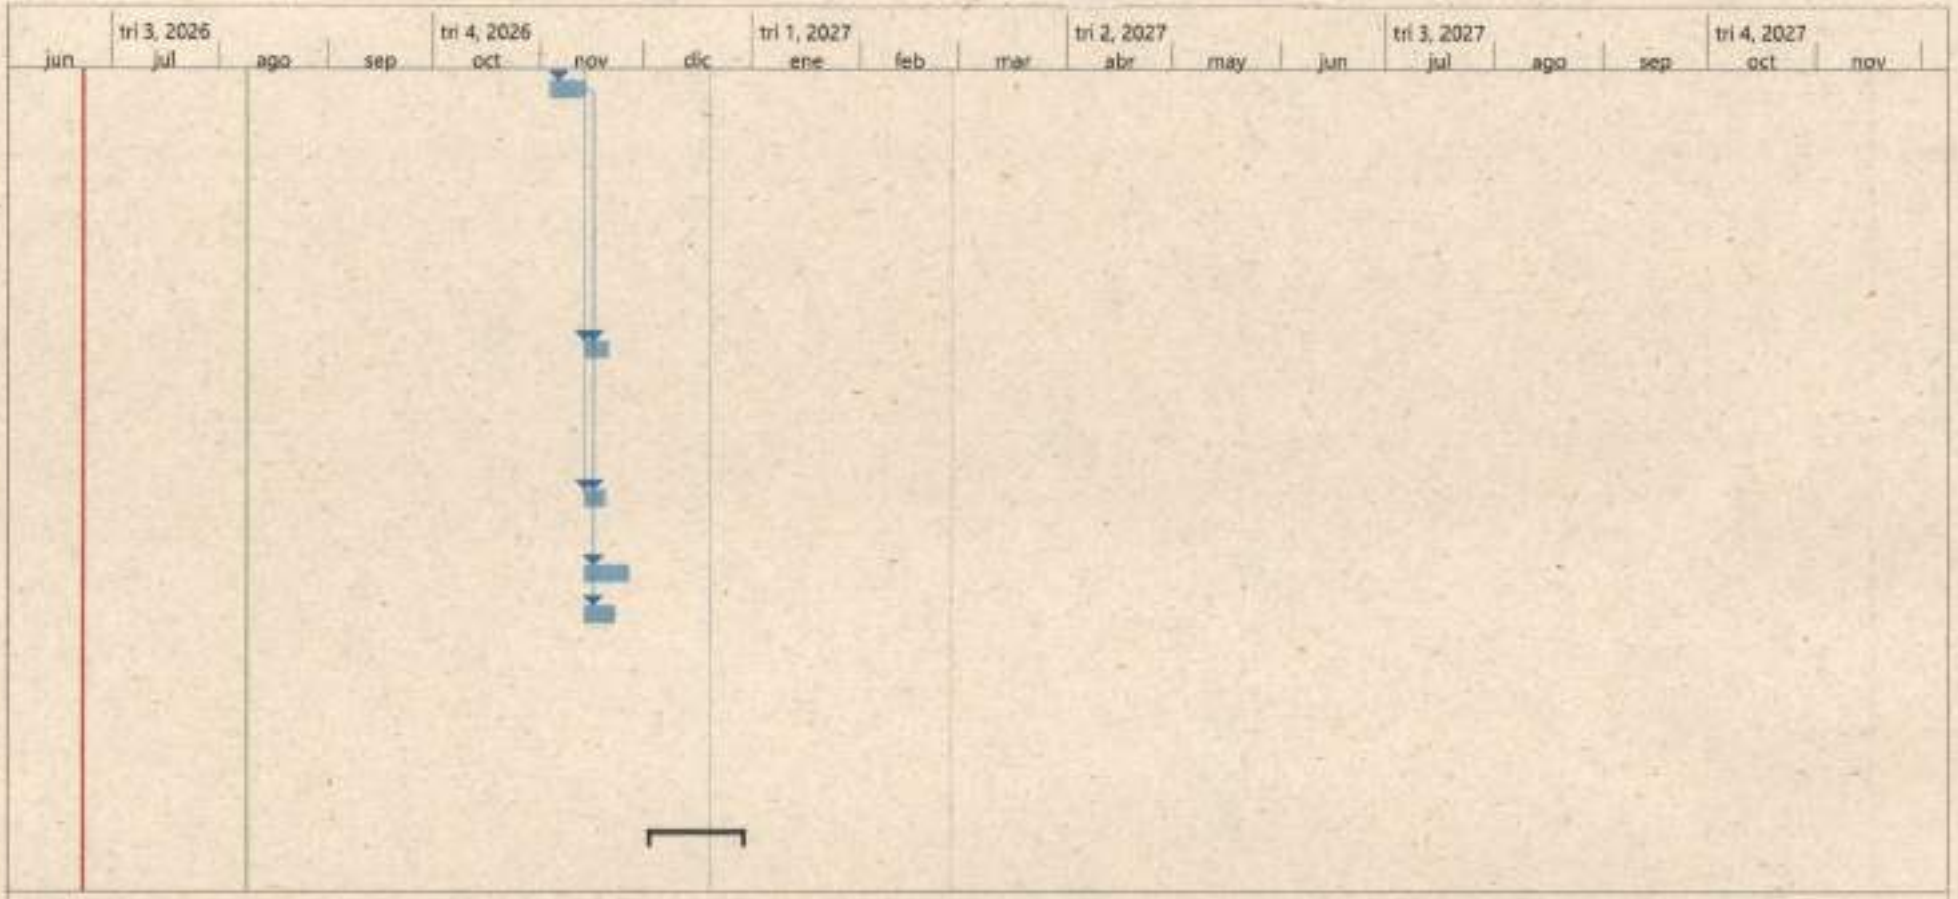


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

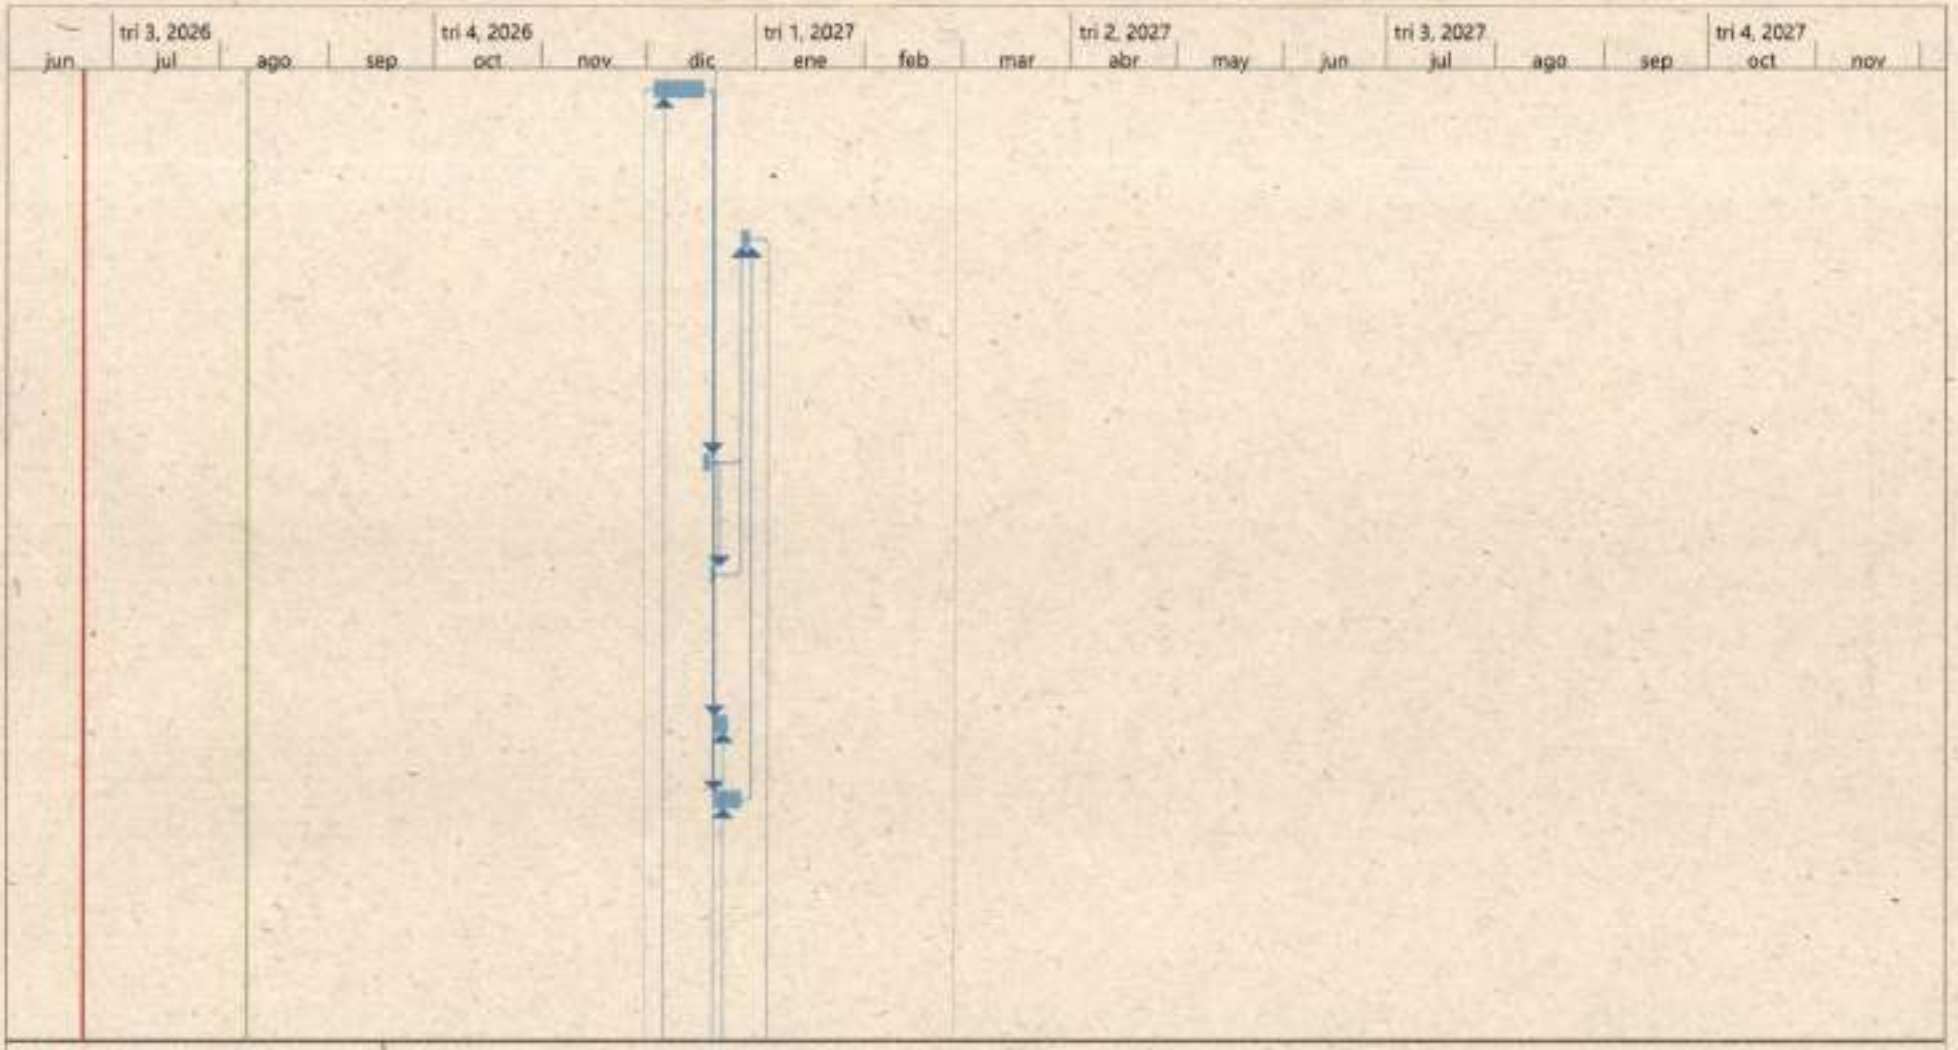


Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

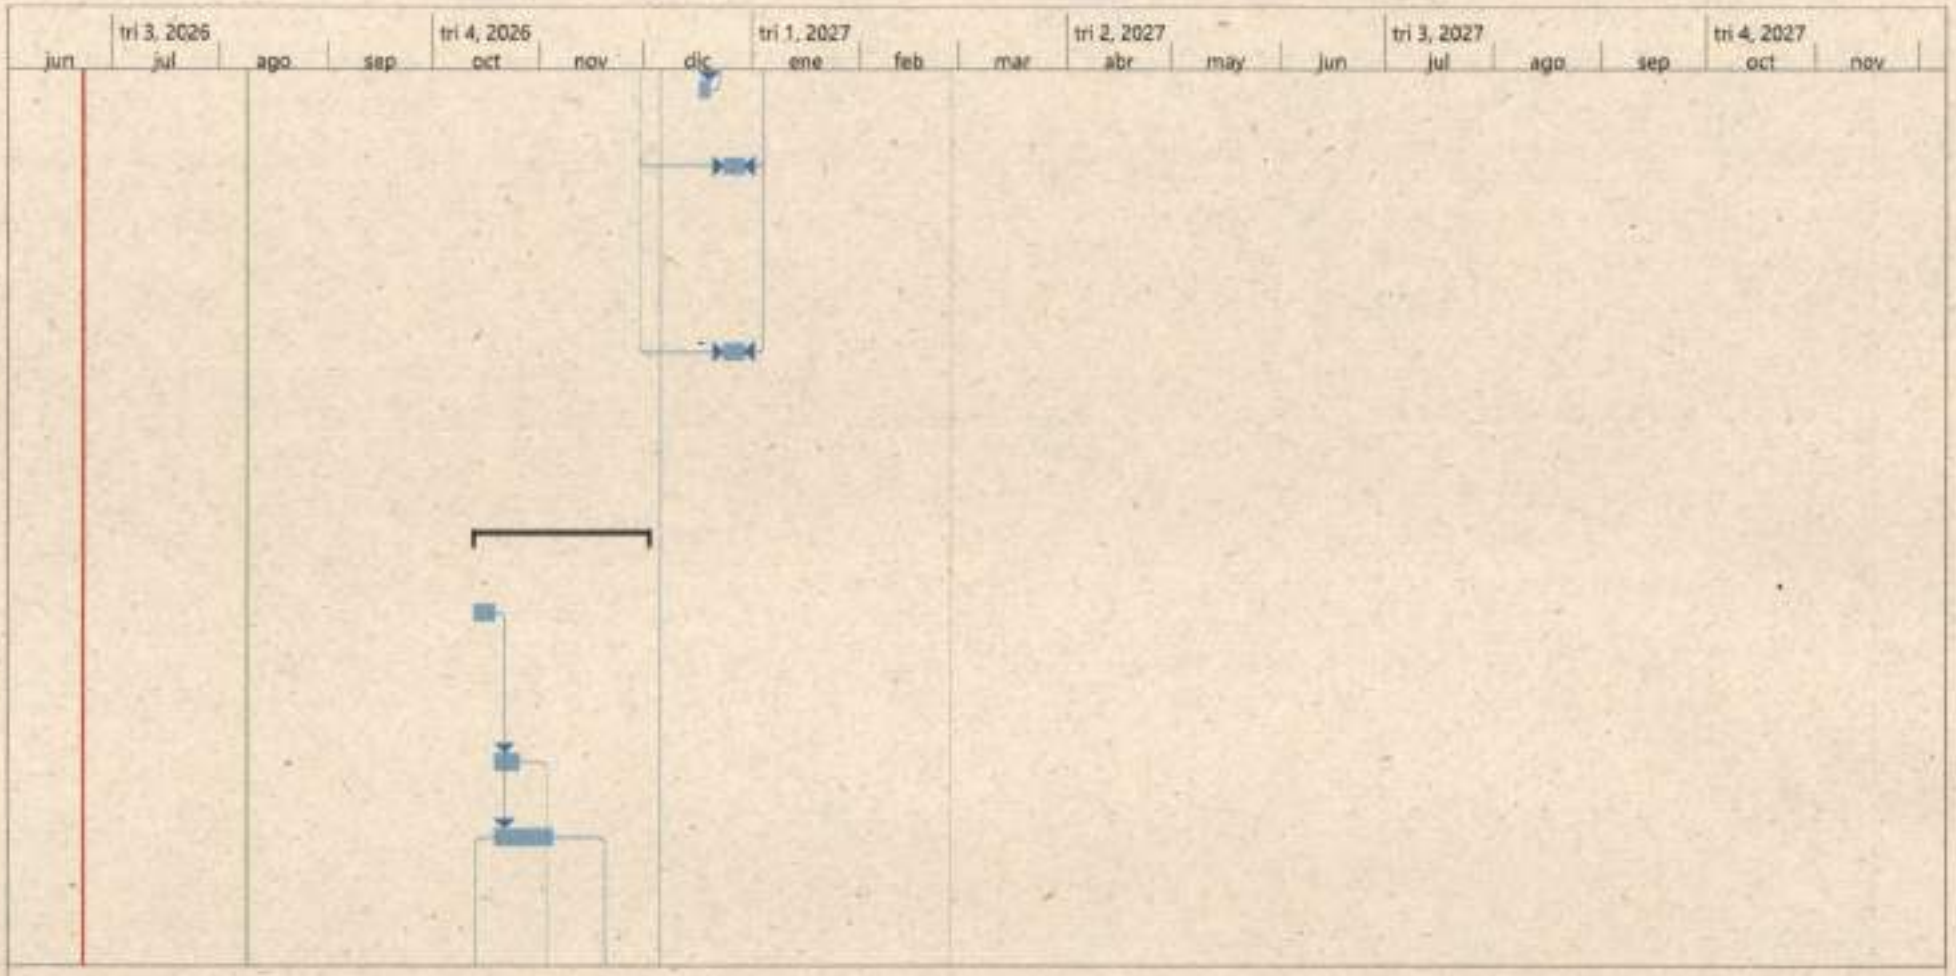

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

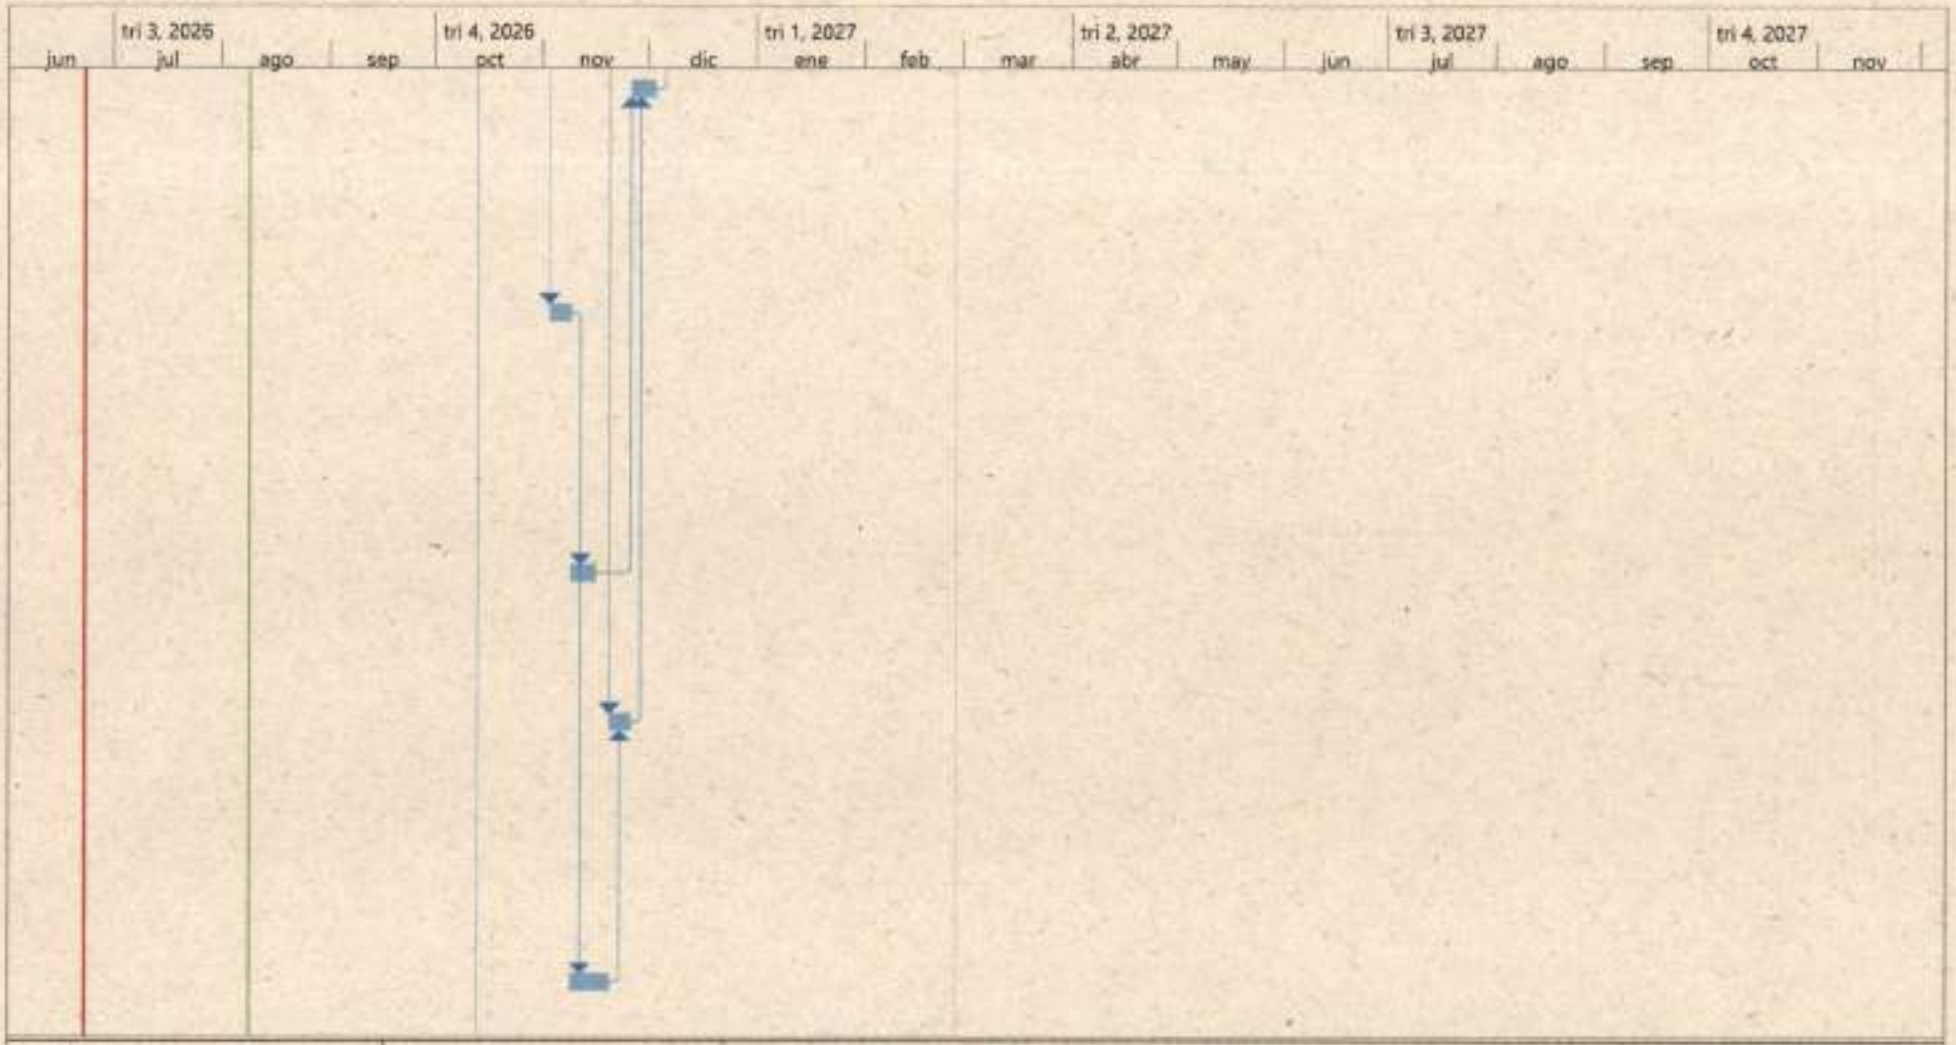

Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual



Proyecto: PROGRAMACION LU
Fecha: dom 09/08/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Anexo 7

Maquinaria y equipo de obra

Debido a que para el corte del presente informe no se realizaron actividades, solo se realizó movilización, ubicación, localización, replanteo y rocería, no se evidencio equipo, ni maquinaria en el frente de obra

Anexo 8

Estado del Tiempo

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DIRECCIÓN DE DESARROLLO FÍSICO
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

31/10/2024

CONTRATO DE OBRA No: 2600111B2860 de 2026 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL REGIONAL ANTIOQUIA 2026

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-26 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA INTERVENCION DE PUNTOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 23SS111B1412 de 2026 **INTERVENTOR:** CONSORCIO LGI ITUANGO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

(25AN11-1) Las Partidas a San José de la Montana -San Andrés de Cuerquia-Matanzas-Pescadero-Ituango

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Seco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	192
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	192

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre Diego Restrepo Agudelo
Residente de Interventoria
Matricula Profesional No.: 05202-26869 ANT

Firma
Nombre: Luis Guillermo Silva Galeano
Residente de Obra
Matricula Profesional No.: 63202-086230 QND

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DIRECCIÓN DE DESARROLLO FÍSICO
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

31/10/2024

CONTRATO DE OBRA No: 2600111B2860 de 2026 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL REGIONAL ANTIOQUIA 2026

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-26 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA INTERVENCION DE PUNTOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 23SS1116I412 de 2026 **INTERVENTOR:** CONSORCIO LGI ITUANGO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

(25AN11-1) Las Partidas a San José de la Montana -San Andrés de Cuerquía-Matarraza-Pescadero-Ituango

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	18	24	24	24	0	0	0	0	0	0	594
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Lluvias intense	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	600

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre:Diego Restrepo Agudelo
Residente de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 05202-28669 ANT

Firma
Nombre: Luis Guillermo Silva Galeano
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-086230 QND

Anexo 9

Correspondencia enviada

CORRESPONDENCIA ENVIADA
CONSORCIO LGI ITUANGO

CONTRATO No.
26SS111182665 de 2026

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	REMITE	DESTINATARIO	ENTIDAD	No. RADICADO
CON-LGI-001	22/05/2026	Entrega de contrato de interventoría firmado	BLANCA LILLYAM TABARES MESA	JUAN FERNANDO URIBE JARAMILLO	DIRECCION ASUNTOS LEGALES	
CON-LGI-002	01/06/2026	Remisión de pólizas de garantía del contrato 26SS111182665 de 2026	BLANCA LILLYAM TABARES MESA	JUAN FERNANDO URIBE JARAMILLO	DIRECCION ASUNTOS LEGALES	
CON-LGI-003	11/06/2026	Entrega del acta de inicio de interventoría No. 26SS111182665 de 2026 y anexos.	BLANCA LILLYAM TABARES MESA	ALBEIRO MONROY DONADO	CONSORCIO VIAL REGIONAL ANTIOQUIA 2026	
CON-LGI-004	17/06/2026	Entrega del acta de inicio de interventoría No. 26SS111182665 de 2026 y anexos.	BLANCA LILLYAM TABARES MESA	EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	2026010335695
CON-LGI-005	06/07/2026	Personal propuesto al contrato de interventoria No. 26SS111182665 de 2026	BLANCA LILLYAM TABARES MESA	EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	2026010367751
CON-LGI-006	06/07/2026	Personal propuesto al contrato de interventoria No. 26SS111182665 de 2026	BLANCA LILLYAM TABARES MESA	EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	2026010367753
CON-LGI-007	09/07/2026	Revisión Hojas de vida personal y los planes social, ambiental y SST del Consorcio Vial Regional Antioquia	JOHANNA MORA VALENCIA	ALBEIRO MONROY DONADO	CONSORCIO VIAL REGIONAL ANTIOQUIA 2026	
CON-LGI-008	09/07/2026	Solicitud entrega de documentación de personal para ingreso a obra (SG-SST) del contrato 26OO111182660 de 2026.	JOHANNA MORA VALENCIA	ALBEIRO MONROY DONADO	CONSORCIO VIAL REGIONAL ANTIOQUIA 2026	
CON-LGI-009	10/07/2026	Remisión de pólizas actualizadas de garantía del contrato 26SS111182665 de 2026.	BLANCA LILLYAM TABARES MESA	EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	2026010383071
CON-LGI-010	09/07/2026	Solicitud de actualización de pólizas del contrato No. 26OO111182660 de 2026	BLANCA LILLYAM TABARES MESA	ALBEIRO MONROY DONADO	CONSORCIO VIAL REGIONAL ANTIOQUIA 2026	
CON-LGI-011	09/07/2026	Respuesta a comunicado No. CVRA-055-2026- permanencia de topografía de obra.	BLANCA LILLYAM TABARES MESA	ALBEIRO MONROY DONADO	CONSORCIO VIAL REGIONAL ANTIOQUIA 2027	
CON-LGI-012	10/07/2026	CV. Tecnólogo en construcciones civiles para el contrato de interventoria No. 26SS111182665 de 2026	JOHANNA MORA VALENCIA	EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	2026010383156
CON-LGI-013	21/07/2026	Observaciones Varias contrato No. 26OO111182660 de 2026	BLANCA LILLYAM TABARES MESA	ALBEIRO MONROY DONADO	CONSORCIO VIAL REGIONAL ANTIOQUIA 2026	
CON-LGI-014	21/07/2026	Solicitudes Varias respecto a la ejecución técnica de los trabajos	JOHANNA MORA VALENCIA	ALBEIRO MONROY DONADO	CONSORCIO VIAL REGIONAL ANTIOQUIA 2026	
CON-LGI-015	21/07/2026	Solicitud entrega de documentación de personal y observaciones de obra del contrato No. 26OO111182660 de 2026	JOHANNA MORA VALENCIA	ALBEIRO MONROY DONADO	CONSORCIO VIAL REGIONAL ANTIOQUIA 2027	
CON-LGI-016	21/07/2026	CV. Tecnólogo en SST para el contrato de interventoría No. 26SS111182665 de 2026	JOHANNA MORA VALENCIA	EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	2026010432875
CON-LGI-017	24/07/2026	Remisión de documentación del contrato de obra No.26OO111182660 de 2026	JOHANNA MORA VALENCIA	EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	2026010432877
CON-LGI-018	24/07/2026	Solicitud de diseños del proyecto en formato AUTO CAD	JOHANNA MORA VALENCIA	JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	2026010432886
CON-LGI-019	24/07/2026	Permanencia de topografía en obra	JOHANNA MORA VALENCIA	EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	2026010432888
CON-LGI-020	27/07/2026	Respuesta a comunicado No. CVRA-055-2026	JOHANNA MORA VALENCIA	ALBEIRO MONROY DONADO	CONSORCIO VIAL REGIONAL ANTIOQUIA 2026	
CON-LGI-021	28/07/2026	PRELIMINARES SOCIALES	JOHANNA MORA VALENCIA	ALBEIRO MONROY DONADO	CONSORCIO VIAL REGIONAL ANTIOQUIA 2027	

Anexo 10

Correspondencia Recibida

CORRESPONDENCIA RECIBIDA -GOBERNACION

CONTRATO No. 2655111802665 de 2026

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	REMITE	DESTINATARIO	ENTIDAD	FIRMA
20260305813332	09/06/2026	Oficio aprobacion polizas PAP-obra	EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO	SEGUROS DEL ESTADO	SEGUROS DEL ESTADO	
20260305842191	18/06/2026	Oficio citacion reunion Ituango	EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO	BLANCA LILLYAM TABARES MESA	CONSORCIO LGI ITUANGO	
20260305991501	23/06/2026	Oficio aceptacion ing. ambiental PAP Ituango	EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO	BLANCA LILLYAM TABARES MESA	CONSORCIO LGI ITUANGO	
20260306029861	26/06/2026	Oficio 2 aceptación personal interventoria	EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO	BLANCA LILLYAM TABARES MESA	CONSORCIO LGI ITUANGO	
20260306086751	03/07/2026	Oficio aceptacion directora de interventoria Ituango	EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO	BLANCA LILLYAM TABARES MESA	CONSORCIO LGI ITUANGO	
20260306112471	06/07/2026	Oficio aceptacion personal tecnico interv. julio 6 2026	EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO	JOHANNA MORA VALENCIA	CONSORCIO LGI ITUANGO	
20260306391931	14/07/2026	Oficio aceptación cambio tecnologo Ituango	EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO	JOHANNA MORA VALENCIA	CONSORCIO LGI ITUANGO	
20260306624941	27/07/2026	Tecnologo sst Ituango julio 27 2026	EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO	JOHANNA MORA VALENCIA	CONSORCIO LGI ITUANGO	

CORRESPONDENCIA RECIBIDA- CONTRATISTA

CONTRATO No. 2655111/02865 de 2026

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	REMITE	DESTINATARIO	ENTIDAD	FIRMA
CVRA-001-2026	17/06/2026	DOCUMENTACION PARA INICIO Y PLAN DE GERENCIA	ALBEIRO MONROY DONADO	BLANCA LILLYAM TABARES MESA	CONSORCIO LGI ITUANGO	
CVRA-002-2026	19/06/2026	INFORME TECNICO DE CAMPO_CTO_2655111/02865	ALBEIRO MONROY DONADO	BLANCA LILLYAM TABARES MESA	CONSORCIO LGI ITUANGO	
CVRA-003-2026	24/06/2026	OFICIO EQUIPOS_003_2026 (1)	ALBEIRO MONROY DONADO	BLANCA LILLYAM TABARES MESA	CONSORCIO LGI ITUANGO	
CVRA-0014-2026	26/06/2026	PMT RADICADO	ALBEIRO MONROY DONADO	GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
CVRA-005-2026	30/06/2026	OFICIO JUSTIFICACION TOPOGRAFIA V1 (30 JUN)	ALBEIRO MONROY DONADO	BLANCA LILLYAM TABARES MESA	CONSORCIO LGI ITUANGO	
CVRA-006-2026	10/07/2026	OFICIO JUSTIFICACION TOPOGRAFIA V1 (10 JUL)	ALBEIRO MONROY DONADO	BLANCA LILLYAM TABARES MESA	CONSORCIO LGI ITUANGO	
CVRA-006-2026						
CVRA-007-2026						
CVRA-008-2026	21/07/2026	PERSONAL NUEVO SST PROFESIONAL Y SST TECNÓLOGO.	ALBEIRO MONROY DONADO	BLANCA LILLYAM TABARES MESA	CONSORCIO LGI ITUANGO	
CVRA-009-2026	24/07/2026	Radicado Aprobación Pezas publicitarias	JOSE ORLANDO SUAREZ LONDOÑO	BLANCA LILLYAM TABARES MESA	CONSORCIO LGI ITUANGO	
CVRA-010-2026	24/07/2026	Radicado actas de entorno	JOSE ORLANDO SUAREZ LONDOÑO	BLANCA LILLYAM TABARES MESA	CONSORCIO LGI ITUANGO	
CVRA-011-2026	08/08/2026					
CVRA-012-2026	01/08/2026					
CVRA-013-2026	28/07/2026	Envio de soporte de Seg Social Profesional técnico y administrativo	JOSE ORLANDO SUAREZ LONDOÑO	BLANCA LILLYAM TABARES MESA	CONSORCIO LGI ITUANGO	
CVRA-014-2026	28/07/2026	OFICIO VISITA CONJUNTA PAP CAROLINA_014_2026	ALBEIRO MONROY DONADO	BLANCA LILLYAM TABARES MESA	CONSORCIO LGI ITUANGO	
