
PROGRAMACION DE OBRA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
1	**OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C**	**48 días**	**mar 8/18/26**
2	INICIO	0 días	mar 8/18/26
3	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**12 días**	**lun 9/7/26**
4	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION	12 días	lun 9/7/26
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	6 días	**dom 9/27/26**
6	LÁMPARA LED SOLAR DE 400W PARA ALUMBRADO EXTERIOR, 36,000 LÚMENES, Y TEMPERATURA DE COLOR DE 6500K (BLANCO FRÍO). INCLUYE PANEL SOLAR MONOCRISTALINO DE 36W, BATERÍA DE 35AH, SOPORTE PARA MONTAJE EN POSTE O PARED Y CONTROL REMOTO. RESISTENTE AL AGUA CON PR	2 días	jue 10/1/26
7	POSTE CÓNICO DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, ALTURA DE 6 METROS, CON DIÁMETRO SUPERIOR DE 60 MM Y DIÁMETRO INFERIOR DE 130 MM. ESPESOR DE 3 MM. INCLUYE PLACA BASE DE 300X300X12 MM Y PERNOS J DE ANCLAJE. CUMPLE CON NORMATIVA NCH432 PARA RESISTENCIA A CON	1 día	mié 9/30/26
8	JUEGO DE MARCO EN ACERO Y 2 TAPAS DE CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN DOBLE CS276	3 días	dom 9/27/26
9	**OBRAS GENERALES**	2 días	**dom 9/27/26**
10	EMPRADIZACIÓN - TIERRA NEGRA ABONO Y GRAMA TIPO KIKUYO	2 días	dom 9/27/26
11	**URBANISMO**	30 días	**sáb 9/5/26**
12	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ANDEN EXISTENTE	5 días	sáb 9/19/26
13	RETIRO E INSTALACION DE BOLARDO NUEVO EN HIERRO FUNDIDO E= 4 MM	3 días	jue 9/24/26
14	DESMONTE DE BARRERA DE CICLOVIA	1 día	sáb 9/5/26
15	LIMPIEZA DE JUNTAS INCLUYENDO EL RETIRO DE SELLO BITUMINOSO Y DEMÁS MATERIAL SUELTO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES Y DEMÁS ASPECTOS NECESARIOS PARA LLEVARA ACABO DICHA ACTIVIDAD.	7 días	lun 9/28/26
16	JUNTAS DE AISLAMIENTO INCLUYE FONDO DE JUNTA Y SELLO.	3 días	vie 9/25/26
17	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0,10M. INCLUYE MATERIALES, FORMALETA, TEXTURIZADO, CURADO Y MALLA ELECTROSOLDADA	4 días	sáb 9/19/26
18	LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CON CHORRO DE AGUA A UNA PRESIÓN MÍNIMA DE 3500 PSI. INCLUYE APLICACIÓN DE DESENGRASANTE BIODEGRADABLE TIPO SIKAGUARD-719W O SIMILAR. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES Y DEMÁS ASPECTOS NECESARIOS PARA LLEVA	5 días	mié 9/23/26
19	BORDILLO B-20 PARA CONTENEDOR DE RAICES	4 días	lun 9/28/26
20	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**	**31 días**	**vie 9/4/26**
21	REJILLA PREFABRICADA 300 X600M TRAFICO PESADO	3 días	vie 10/2/26
22	DEMOLICION, CARGUE Y RETIRO DE SARDINEL EXISTENTE A-10 - A, 85 - A-80	3 días	vie 9/18/26
23	DADOS PARA ANCLAJE DE POSTES	2 días	lun 9/28/26
24	CERRAMIENTO PROVISIONAL PARA OBRAS EXTERIORES	2 días	vie 9/4/26
25	RETIRO DE LOSETAS DE PISO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS	3 días	sáb 9/5/26
26	INSTALACION DE LOSETA GUIA INCLUYE MORTERO DE PEGA	4 días	mié 9/23/26
27	INSTALACION DE LOSETA LISA INCLUYE MORTERO DE PEGA	10 días	mié 9/23/26
28	INSTALACION ADOQUIN 20X10X6 INCLUYE MORTERO DE PEGA	2 días	mié 9/23/26
29	JUEGO DE MARCO EN ACERO Y TAPAS DE CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN DE CONTADORES DE ACUEDUCTO Y ELÉCTRICA CS-275	3 días	mié 9/30/26
30	REINSTALACIÓN BARRERA CICLOVÍA	2 días	dom 9/6/26
31	DESMONTE DE MARCO Y TAPAS CAJAS PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN DE CONTADORES DE ACUEDUCTO Y ELÉCTRICA. INC RETIRO DE SOBRANTES	3 días	mar 9/8/26
32	DEMOLICION DE BORDES DE CAJA Y PLACAS DE POZOS DE ALCANTARILLADO. ANCHO 0.15 -0.20. INC RETIRO DE SOBRANTES	3 días	vie 9/11/26
33	FIN	0 días	vie 10/2/26

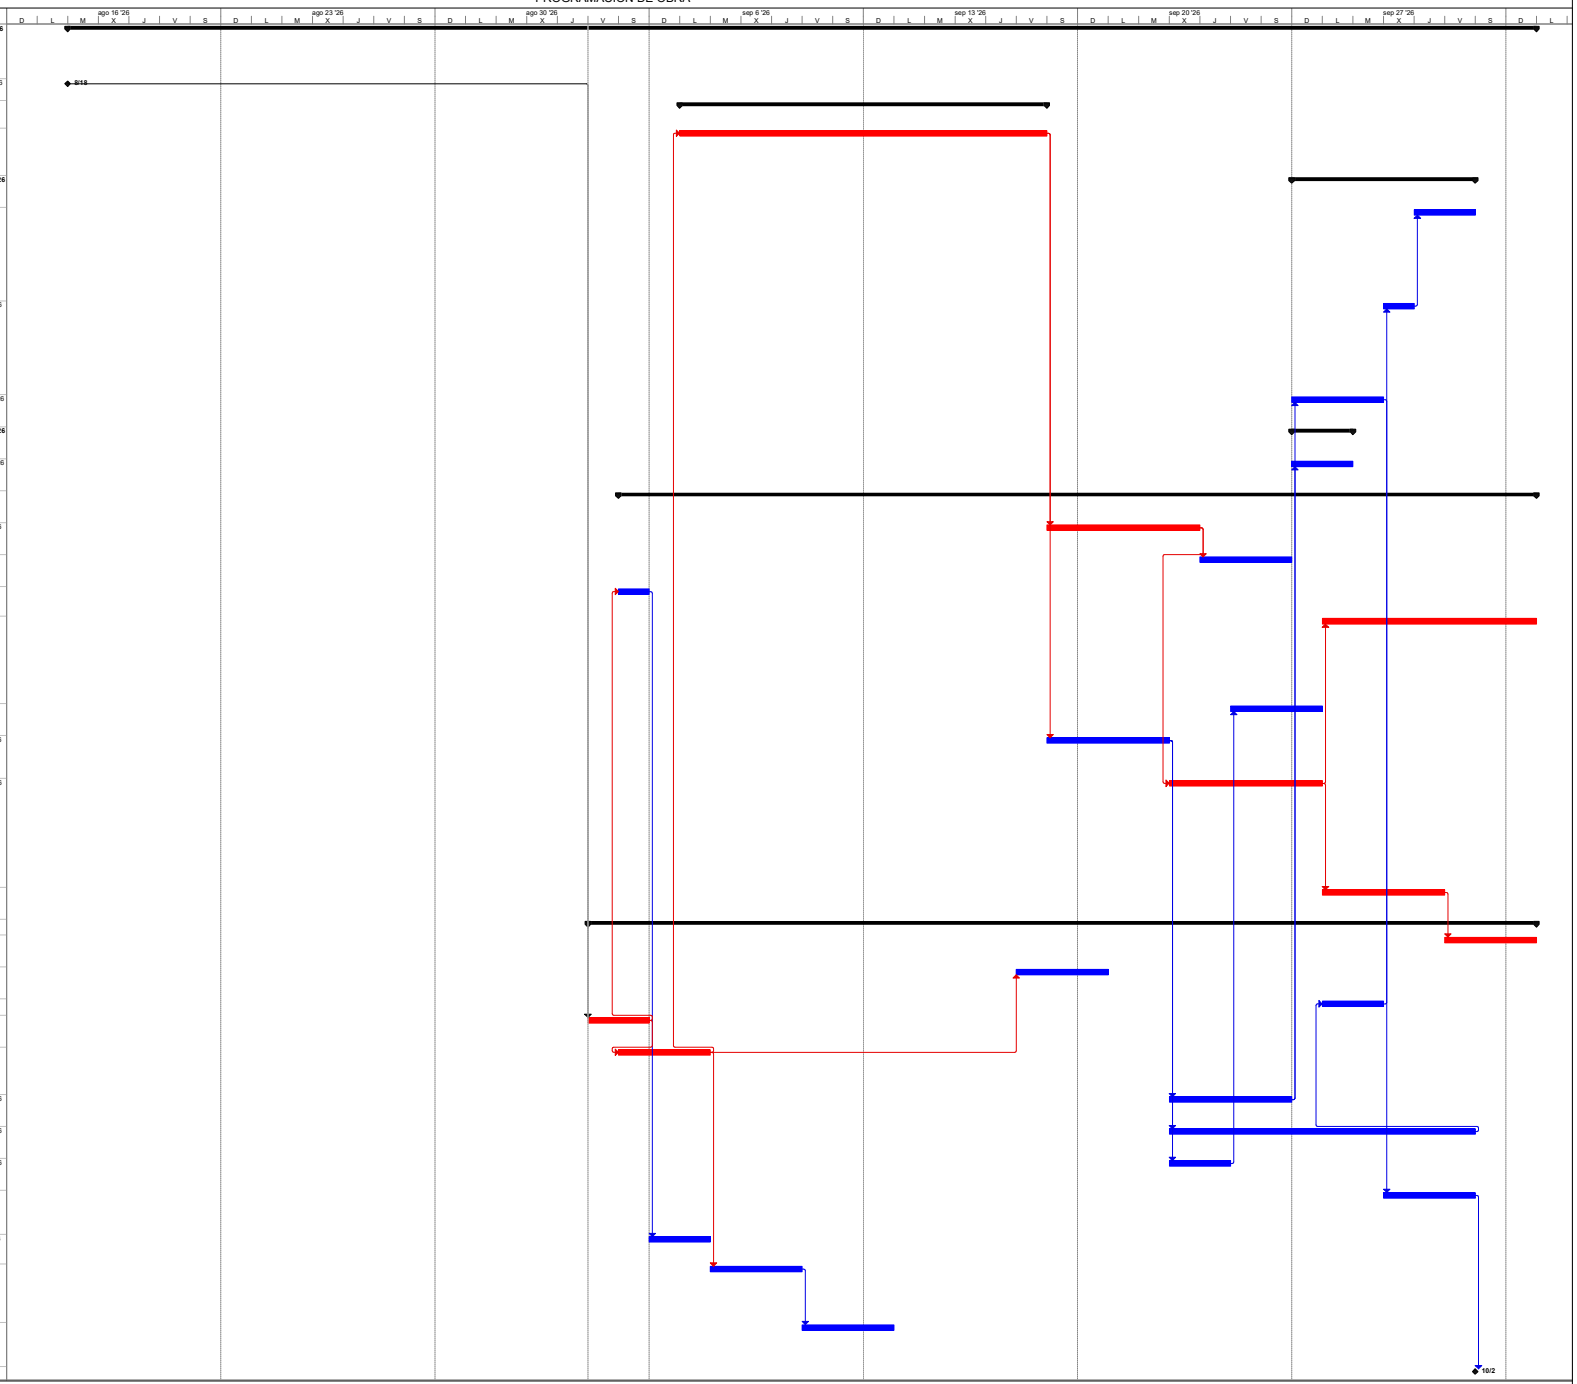

Proyecto: Programacion#2
Fecha: vie 9/4/26

normales · externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo · Sólo duración · Resumen manual · Sólo fin
ruta crítica · agrupadas · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · Sólo el comienzo · normal
