

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA 01

CONTRATO DE OBRA SAMC 009 DE 2026
"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA VEREDA EL ESCUDO, JURISDICCION DE EL MUNICIPIO DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL CESAR."

Alcaldía Municipal de Astrea

CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE ASTREA
SUPERVISIÓN: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

ASTREA, CESAR
SEPTIEMBRE DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 2
2. JUSTIFICACIÓN 3
3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 4
4. PROCESO DE CONTRATACIÓN 5
5. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO 5
6. DATOS FINANCIEROS 5
7. GARANTÍAS DEL CONTRATO 5
8. ACTIVIDADES CONTRATADAS 6
9. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 8
10. RESUMEN GENERAL EJECUTADO 9
11. EVIDENCIA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO 10
12. OBSERVACIONES 13

PALACIO MUNICIPAL
Dirección: Cra.2 #7-31 - Barrio Centro, Astrea – Cesar
Código postal: 201040
Correo electrónico: secretariadeplaneacion@astrea-cesar.gov.co
Sitio web: www.astrea-cesar.gov.co

1. INTRODUCCIÓN

En el Marco del cumplimiento de las responsabilidades adquiridas a través del Contrato de Obra SAMC-009-2026 suscrito entre el Municipio de Astrea – Cesar y ***CONSORCIO AGUAS DE ASTREA***, *representada legalmente por* ***CHRISTIAN DAVID MANOTAS JAIMES*** identificado con la cedula de ciudadanía **No. 1.065.841.558**, se presenta el siguiente informe de supervisión de las actividades realizadas a través del Contrato que tiene por objeto **"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA VEREDA EL ESCUDO, JURISDICCION DE EL MUNICIPIO DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL CESAR.".**

PALACIO MUNICIPAL
Dirección: Cra.2 #7-31 - Barrio Centro, Astrea – Cesar
Código postal: 201040
Correo electrónico: secretariadeplaneacion@astrea-cesar.gov.co
Sitio web: www.astrea-cesar.gov.co

2. JUSTIFICACIÓN

Se realiza el siguiente informe de supervisión en cumplimiento de las responsabilidades legales y contractuales adquiridas por la Secretaría de *Planeación y Obras Públicas, actuando por parte del Municipio de Astrea – Cesar,* como supervisor de las actividades contempladas en el Contrato **SAMC-009-2026** que tiene por objeto **"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA VEREDA EL ESCUDO, JURISDICCION DE EL MUNICIPIO DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL CESAR."**

Esta supervisión se llevó a cabo mediante visitas técnicas y de seguimiento en el área de intervención del proyecto, con el propósito de verificar directamente el avance y la correcta ejecución de las actividades contempladas en el objeto contractual.

Durante las visitas se verificó que los trabajos se desarrollaran de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, cantidades de obra y demás documentos contractuales. Entre las actividades supervisadas se encuentran las excavaciones, rellenos y compactación, así como la ejecución de concretos y aceros de refuerzo para la estructura del tanque elevado. De igual manera, se realizó seguimiento a la instalación de las tuberías de la red de distribución, verificando su adecuada ejecución y conexión.

En general, las labores de supervisión permitieron realizar seguimiento al avance de las obras, efectuar las recomendaciones necesarias y verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas y contractuales, contribuyendo al adecuado desarrollo del proyecto.

PALACIO MUNICIPAL
Dirección: Cra.2 #7-31 - Barrio Centro, Astrea – Cesar
Código postal: 201040
Correo electrónico: secretariadeplaneacion@astrea-cesar.gov.co
Sitio web: www.astrea-cesar.gov.co

3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA
Nº DEL CONTRATO	SAMC-009-2026
OBJETO:	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA VEREDA EL ESCUDO, JURISDICCION DE EL MUNICIPIO DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ASTREA CESAR
NIT:	892301541-1
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFREDO BARRIOS ORTEGA
IDENTIFICACIÓN:	91.243.788 DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA:	CONSORCIO AGUAS DE ASTREA.
NIT:	902.090.805-9
REPRESENTANTE LEGAL:	CHRISTIAN DAVID MANOTAS JAIMES
CC:	1.065.841.558
VALOR CONTRATO:	CUATROCIENTOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($ 400.104.664,42)
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	TRES (03) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026
FECHA DE INICIO:	TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2026

Tabla 1. Datos generales.

PALACIO MUNICIPAL
Dirección: Cra.2 #7-31 - Barrio Centro, Astrea – Cesar
Código postal: 201040
Correo electrónico: secretariadeplaneacion@astrea-cesar.gov.co
Sitio web: www.astrea-cesar.gov.co

4. PROCESO DE CONTRATACIÓN

Para el desarrollo del objeto de las actividades contractuales, el **MUNICIPIO DE ASTREA – CESAR**, identificado con el NIT **892.301.541-1**, suscribió el **CONTRATO SAMC-009-2026** con **CONSORCIO AGUAS DE ASTREA**, el contrato tiene un valor total de **CUATROCIENTOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($ 400.104.664,42)** y un plazo de ejecución total de **tres (03) meses** calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio.

5. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO

ACTA	FECHA
Acta de Inicio	31 de julio de 2026
Acta parcial 01	02 de septiembre de 2026

Tabla 2. Relación de actas.

6. DATOS FINANCIEROS

CONTRATO SAMC-009-2026					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - C.D. P					
N°	CDP-2026-000584	**Valor**	$ 431.367.434	**Fecha**	29 DE MAYO 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL- R. P					
N°	RP-2026-000693	**Valor**	$ 400.104.664,42	**Fecha**	31 DE JULIO 2026

Tabla 3. CDP y RP.

7. GARANTÍAS DEL CONTRATO

ANEXO 0

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA N°.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31-07-2026	28-02-2027	$ 40,010,466.44	11-44-101288625
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31-07-2026	31-10-2029	$ 20,005,233.22	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	TIENE VIGENCIA DE 2 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA		$ 40,010,466.44	

Tabla 4. Relación de pólizas.

PALACIO MUNICIPAL
Dirección: Cra.2 #7-31 - Barrio Centro, Astrea – Cesar
Código postal: 201040
Correo electrónico: secretariadeplaneacion@astrea-cesar.gov.co
Sitio web: www.astrea-cesar.gov.co

8. ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
CAPITULO 1. TANQUE ELEVADO			
CAP.1.1.0	**OBRAS PRELIMINARES**		
	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
CAP.1.1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS	m²	36
CAP.1.2.0	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		
	EXCAVACIONES MANUAL A UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2 M		
CAP.1.2.01	EXCAVACIONES MANUAL A UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2,5 M	m³	62,5
	RELLENOS		
CAP.1.2.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO	m³	44,9
	SOBRANTES		
CAP.1.2.03	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES	m³	17,6
CAP.1.3.0	**CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ACABADOS**		
	CONCRETOS SIMPLES		
CAP.1.3.01	SOLADOS, CONCRETO SIMPLE RESIST. (2000 P.S.I)	m³	2,5
	CONCRETOS ESTRUCTURALES		
CAP.1.3.02	CONCRETO ESTRUCTURAL IMPERMEABILIZADO RESIST. (4000 P.S.I)	m³	13,71
CAP.1.3.03	CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. (4000 P.S.I)	m³	30,84
	ACERO DE REFUERZO		
CAP.1.3.04	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	kg	9889,81
	OTROS		
CAP.1.3.05	CINTA PVC V-15	m	12
	TUBERÍA Y ACCESORIOS		
CAP.1.3.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HD DE Ø=3" (75mm) BXB	m	45
CAP.1.3.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO HD DE Ø=3" (75mm) DE 90° BXB	unidad	9
CAP.1.3.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO HD DE Ø=3" (75mm) EBXEB, L=0 A 0.50M	unidad	2
CAP.1.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HD DE Ø=3"X3"X3" (75mm) BXB	unidad	7
CAP.1.3.10	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA - EXTREMOS BRIDADOS DE Ø=3"	unidad	6
CAP.1.3.11	SUMINISTRO E INSTALACION TAPÓN HD 3" BXB	unidad	2
CAP.1.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR ANALOGO EXTREMO BRIDADO	unidad	1
CAP.1.3.13	SUMINISTRO E INSTALACION UNIÓN UNIVERSAL DE ACOPLE POR BRIDA HD 3"	unidad	18
CAP.1.3.14	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE HD 3" BXB	unidad	1
CAP.1.3.15	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCIÓN HD 3"X2" BXB	unidad	1
CAP.1.3.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA EN PERFIL TUBULAR REDONDO PRINCIPAL DE 1 1/2 CON TUBERIA INTERMEDIA PARA LOS PASOS DE 1" CON SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDA EN PLATINA 1 1/2 X 1/8 CALIBRE 16	m	16

PALACIO MUNICIPAL
Dirección: Cra.2 #7-31 - Barrio Centro, Astrea – Cesar
Código postal: 201040
Correo electrónico: *secretariadeplaneacion@astrea-cesar.gov.co*
Sitio web: www.astrea-cesar.gov.co

CAP.1.3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA LIVIANA PARA PASAMANOS DE 2", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO	m	14,8
CAP.1.3.18	TAPA METALICA EN ANGULO DE 2"X1/8" LAMINA CALIBRE 16" CON PORTACANDADO Y MANIJA DE LEVANTE. MEDIDA DE LA TAPA 1,0MX1,0M	unidad	1
CAP.1.3.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN DE 4" EN PVC SANITARIO INCLUYE NIPLE DE 0.40 ML. UN NIPLE DE 0.20 ML Y DOS CODOS DE 90° CXC (VER DETALLE DE PLANO) INCLUYE: MANO DE OBRA. MATERIALES. TRANSPORTE. ANCLAJES Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.	unidad	2
CAPITULO 2. CERRAMIENTO			
CAP.2.1.0	**OBRAS PRELIMINARES**		
	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
CAP.2.1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS	m²	225
CAP.2.2.0	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		
	EXCAVACIONES MANUAL A UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2 M		
CAP.2.2.01	EXCAVACIONES MANUAL A UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2 M	m³	11,2
	RELLENOS		
CAP.2.2.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO	m³	33,612
	SOBRANTES		
CAP.2.2.03	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES	m³	6,64
CAP.2.3.0	**CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ACABADOS**		
	CONCRETOS SIMPLES		
CAP.2.3.01	SOLADOS, CONCRETO SIMPLE RESIST. (2000 P.S.I)	m³	0,8
	CONCRETOS ESTRUCTURALES		
CAP.2.3.02	CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. (3500 P.S.I)	m³	6,14
	ACERO DE REFUERZO		
CAP.2.3.03	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	KG	435,27
CAP.2.4.0	**MAMPOSTERIA**		
CAP.2.4.01	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE CONCRETO 10x20x40 PEGA CON MORTERO	m²	31
CAP.2.4.02	ALFAJÍAS EN CONCRETO DE 3.000psi, SECCIÓN 0,10x0,20	m	20
CAP.2.5.0	**VARIOS Y EXTERIORES**		
CAP.2.5.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON EN TUBO REDONDO PARALES EN TUBO 3"X2.5MM, MARCO HOJA TUBOS DE 2"X2.5MM, RIOSTRAS EN TUBO DE 1 1/2"X2.5MM -MALLA ESLABONADA #10, CERRADURA, INCL. ANTICORROSIVO	m²	4
CAP.2.5.02	MALLA ESLABONADA 60mm - TUBO GALVANIZADO CERRAMIENTO DE 2 1/2" - INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN - ALTURA DE 2.00m Y APOYOS CADA 3m	m²	40
CAP.2.5.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN ANGULO DE 1 1/2" PARA REFORZAMIENTODE MALLA, INCLUYE PINTURA	m	93,61
CAPITULO 3. CASETA DE OPERACIÓN			
CAP.3.1.01	PAÑETE INTERIOR EN MUROS	m³	1,2
CAP.3.1.02	ESTUCO PARA INTERIOR Y EXTERIROR EN MUROS	m²	40
CAP.3.1.03	PINTURA PARA INTERIOR Y EXTERIOR DE MUROS	m²	40
CAP.3.1.04	LOSA EN CONCRETO DE 3000 PSI	m³	1
CAP.3.1.05	LOSA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADA DE 3000 PSI	m³	0,4
CAP.3.1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN LAMINA CR CALIBRE 16	UN	2
CAPITULO 4. RED DE DISTRIBUCCION			

PALACIO MUNICIPAL
Dirección: Cra.2 #7-31 - Barrio Centro, Astrea – Cesar
Código postal: 201040
Correo electrónico: secretariadeplaneacion@astrea-cesar.gov.co
Sitio web: www.astrea-cesar.gov.co

CAP.4.1.0	**OBRAS PRELIMINARES**		
	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
CAP.4.1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TUBERIA DE DISTRIBUCCION		300
CAP.4.2.0	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		
	EXCAVACIONES A MANO EN CONGLOMERADO EN SECO		
CAP.4.2.01	EXCAVACIONES MANUAL A UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2 M	m³	150
	RELLENOS		
CAP.4.2.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO	m³	45
CAP.4.2.03	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES	m³	105
CAP.4.2.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC UNIÓN PLATINO DN80mm (3") RDE 21	m	300
CAP.4.2.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE 3 PULGADAS EN PVC DE PRESION	unidad	8
CAP.4.2.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 3 PULGADAS EN PVC DE *PRESION JUNTA RAPIDA*	unidad	4
CAP.4.2.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA DE 3 PULGADAS EN PVC DE PRESION JUNTA RAPIDA	unidad	1
CAP.4.2.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE 3 PULGADAS EN PVC DE PRESION JUNTA RAPIDA	unidad	5
CAP.4.3.0	**MICROMEDIDORES**		
CAP.4.3.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDOR R-160 INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO	unidad	37
CAP.4.3.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJILLA PROTECTORA EN PVC	unidad	37
CAP.4.3.03	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE VENTOSA SENCILLA 3" BRIDADA, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO	unidad	1

Tabla 5. Actividades contratadas.

9. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CARGO	BENEFICIARIO	TIPO DE APORTE	PLANILLA No.	VALOR LIQUIDADO	VR PAGADO	PERIODO
AYUDANTE DE OBRA	DARIO BAÑOS	PENSION	9510664043	$ 140,100	$ 140,100	AGOSTO
		ARL		$ 61,000	$ 61,000	
		SALUD		$ 35,100	$ 35,100	
		CCF		$35,100	$35,100	
AYUDANTE DE OBRA	JOSE CADENA	PENSION		$ 140,100	$ 140,100	AGOSTO
		ARL		$ 61,000	$ 61,000	
		SALUD		$ 35,100	$ 35,100	
		CCF		$35,100	$35,100	
DIRECTOR DE OBRA	CHRISTIAN MANOTAS	PENSION		$ 280,200	$ 280,200	AGOSTO
		ARL		$121,900	$121,900	
		SALUD		$70,100	$70,100	
		CCF		$70,100	$70,100	

PALACIO MUNICIPAL
Dirección: Cra.2 #7-31 - Barrio Centro, Astrea – Cesar
Código postal: 201040
Correo electrónico: secretariadeplaneacion@astrea-cesar.gov.co
Sitio web: www.astrea-cesar.gov.co

RESIDENTE DE OBRA	TANIA MANZANO	PENSION		$ 280,200	$ 280,200	AGOSTO
		ARL		$121,900	$121,900	
		SALUD		$70,100	$70,100	
		CCF		$70,100	$70,100	
OFICIAL DE OBRA	FRANCISCO NAVARRO	PENSION		$ 140,100	$ 140,100	AGOSTO
		ARL		$ 61,000	$ 61,000	
		SALUD		$ 35,100	$ 35,100	
		CCF		$35,100	$35,100	
MAESTRO DE OBRA	LUIS VEGA	PENSION		$ 140,100	$ 140,100	AGOSTO
		ARL		$ 61,000	$ 61,000	
		SALUD		$ 35,100	$ 35,100	
		CCF		$35,100	$35,100	

Tabla 6. Aportes seguridad social.

10. RESUMEN GENERAL EJECUTADO

Durante la ejecución del contrato se adelantan diferentes actividades orientadas al cumplimiento del objeto contractual y a la optimización del sistema de acueducto de la vereda El Escudo. Para la presente parcialidad, se verifica el avance de actividades como excavaciones, rellenos, la ejecución de concretos y aceros de refuerzo para la estructura del tanque elevado, la instalación de tuberías correspondientes a la red de distribución y las actividades correspondientes a la *ejecución del cerramiento del área de la estructura del tanque, destinado a su* protección y seguridad.

Las actividades objeto de seguimiento se desarrollan de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, cantidades de obra y demás condiciones *establecidas en el contrato, verificando la adecuada utilización de materiales,* equipos y procedimientos constructivos.


De igual manera, se realiza seguimiento al avance físico de las obras y al cumplimiento de las actividades programadas, con el fin de verificar el porcentaje de ejecución alcanzado y su correspondencia con las actividades desarrolladas durante el período objeto de la presente supervisión.

En este sentido, la supervisión permite verificar que las actividades ejecutadas hasta la fecha cumplen con las condiciones técnicas y contractuales requeridas, contribuyendo al adecuado desarrollo del proyecto y a la posterior optimización del sistema de acueducto de la vereda El Escudo.

PALACIO MUNICIPAL
Dirección: Cra.2 #7-31 - Barrio Centro, Astrea – Cesar
Código postal: 201040
Correo electrónico: secretariadeplaneacion@astrea-cesar.gov.co
Sitio web: www.astrea-cesar.gov.co

11. EVIDENCIA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO


Se realiza el siguiente registro fotográfico como evidencias del proceso de ejecución de las actividades.

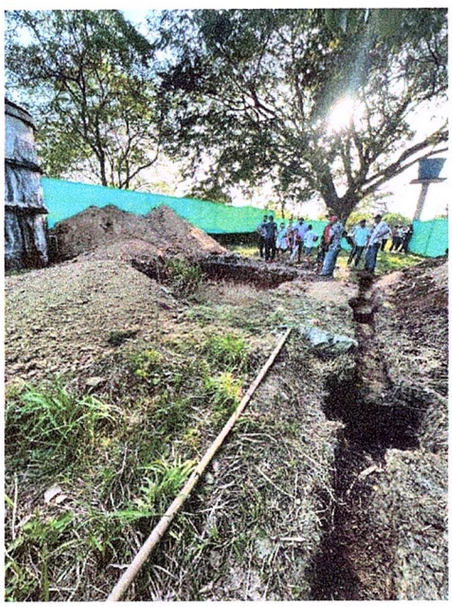


Fotografía 1. Excavaciones para tuberías.



Fotografía 2. Excavación para tanque elevado.

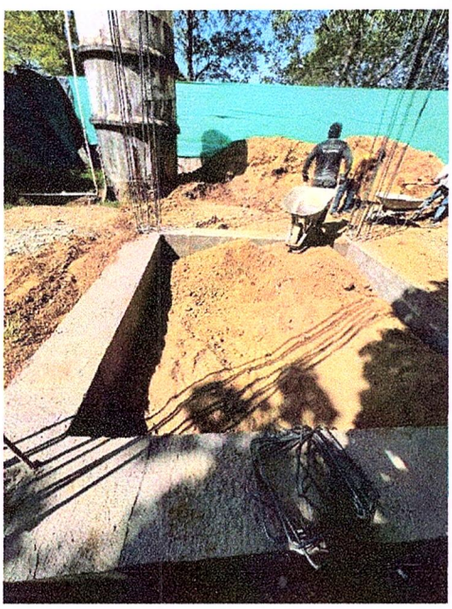


Fotografía 3. Cimentación tanque elevado.

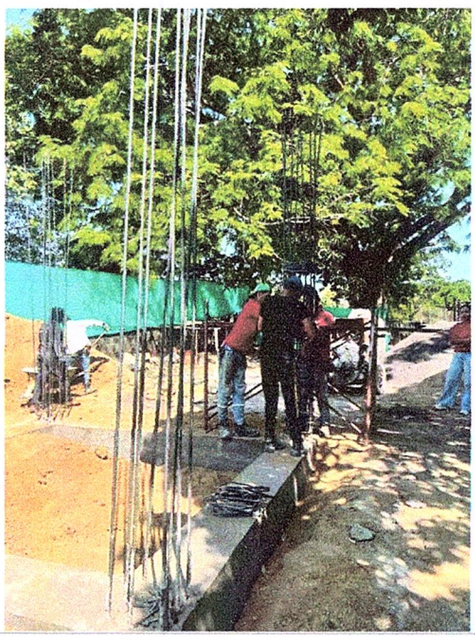


Fotografía 4. Acero de refuerzo para Columnas.

PALACIO MUNICIPAL
Dirección: Cra.2 #7-31 - Barrio Centro, Astrea – Cesar
Código postal: 201040
Correo electrónico: *secretariadeplaneacion@astrea-cesar.gov.co*
Sitio web: www.astrea-cesar.gov.co

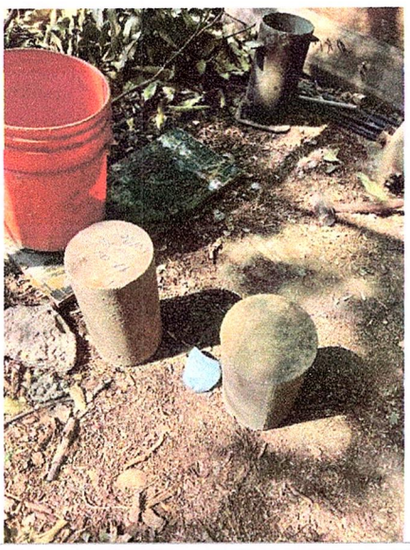

Fotografía 5. Probeta de concreto para ensayo..

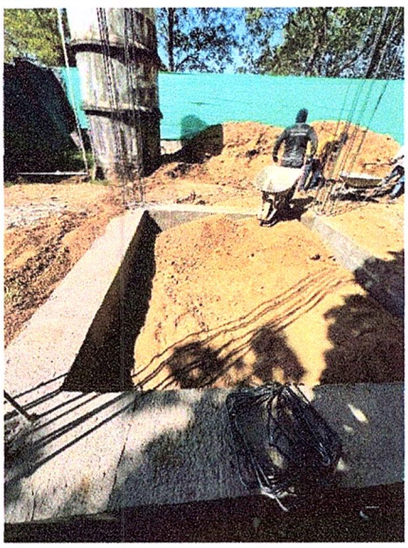

Fotografía 6. Cimentación estructura.



Fotografía 7. Columnas tanque elevado.



Fotografía 8. Columnas y acero para vigas.



Fotografía 9. Avance construcción de tanque elevado.



Fotografía 10. Columnas y vigas reforzadas.

PALACIO MUNICIPAL
Dirección: Cra.2 #7-31 - Barrio Centro, Astrea – Cesar
Código postal: 201040
Correo electrónico: secretariadeplaneacion@astrea-cesar.gov.co
Sitio web: www.astrea-cesar.gov.co



Fotografía 11. Tuberías para red de distribución.



Fotografía 12. Excavaciones y tuberías.

PALACIO MUNICIPAL
Dirección: Cra.2 #7-31 - Barrio Centro, Astrea – Cesar
Código postal: 201040
Correo electrónico: secretariadeplaneacion@astrea-cesar.gov.co
Sitio web: www.astrea-cesar.gov.co

12. OBSERVACIONES

El Contrato de Obra **SAMC-009-2026**, a la fecha del presente informe presenta un avance de ejecución del 42,10%, el contratista ha cumplido hasta la fecha con las *cantidades plasmadas en el Acta Parcial de Obra 01, por tal motivo es viable su* pago del Acta en mención.

Se da visto bueno para realizar el pago del ACTA PARCIAL 01 por valor de **CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 168.444.758,33)**, por concepto de las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido del 31 de julio al 02 de septiembre del Contrato **SAMC-009-2026**, cuyo objeto es: **OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA VEREDA EL ESCUDO, JURISDICCION DE EL MUNICIPIO DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL CESAR.**

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como Supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó la Contratista que fueron la base de los datos que suministró en este Informe por medio del cual autorizo realizar el pago del valor antes expresado; así mismo dejo constancia que la JAC realizó los pagos por los valores correspondientes a los impuestos y publicaciones requeridos para la legalización del Contrato y que he verificado que la JAC ha cumplido con el pago de los Aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral conforme a lo exigido por la Ley y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por la JAC, además que el valor cotizado corresponda al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

Para mayor constancia se firma el presente informe a los **dos (02)** días del mes de septiembre de 2026.

GERMÁN ENRIQUE ARAGÓN LÓPEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal
Astrea – Cesar

PALACIO MUNICIPAL
Dirección: Cra.2 #7-31 - Barrio Centro, Astrea – Cesar
Código postal: 201040
Correo electrónico: secretariadeplaneacion@astrea-cesar.gov.co
Sitio web: www.astrea-cesar.gov.co
