Secretaría Distrital del Hábitat	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO SOLUCIONES POLIGONALES NIT: 902.015.861-2

FECHA	12/7/2026	**PERIODO No.**	**21**	DEL	**6/7/2026**	AL	**12/7/2026**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.” (Grupo 4)”
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Y NOMBRE DEL POLÍGONO	Grupo 4 " Poligono 8. Parque San Eusebio – 16-150- Torremolinos II Sector y Poligono 9 - Parque 08-105 Vecinal Llano Grande - María Paz."

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	1333 DE 2025 CONSORCIO SOLUCIONES POLIGONALES	**CONTRATO No.:**	1268-2025 CONSORCIO HÁBITAT BOGOTÁ 2025
PLAZO INICIAL:	21 MESES	**PLAZO INICIAL:**	21 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	13 de febrero de 2026	**FECHA DE INICIACIÓN:**	13 de febrero de 2026
****FECHA DE REINICIO**	-	****FECHA DE REINICIO:**	-
PRORROGA	-	**PRORROGA**	-
FECHA DE TERMINACIÓN:	12/11/2027	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	12/11/2027
PRORROGA	-	**PRORROGA**	-
FECHA DE TERMINACIÓN:	12/11/2027	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	12/11/2027
PLAZO ACTUALIZADO:	637	**PLAZO ACTUALIZADO:**	637
PLAZO TRANSCURRIDO:	149 EQUIVALE AL 23%	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	149 EQUIVALE AL 23%
VALOR INICIAL OFERTADO CONTRACTUAL :	$ 1.927.629.041,00	**VALOR INICIAL OFERTADO CONTRACTUAL :**	$ 14.764.025.105,00
Valor etapa 1	$ 383.387.429,00		$ 929.899.632,00
Valor etapa 2	$ 1.544.241.612,00		$ 13.834.128.473,00
VALOR INICIAL CONTRACTUAL :	$ 1.927.629.041,00	**VALOR INICIAL CONTRACTUAL :**	$ 14.764.025.105,00
VALOR ANTICIPO	N/A	**VALOR ANTICIPO**	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.927.629.041,00	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 14.764.025.105,00
VALOR PAGADO:	**$ -**	**VALOR PAGADO:**	**$ -**
VALOR DISPONIBLE POR DESIGNAR PARA EJECUCIÓN:	$ -	**VALOR DISPONIBLE POR DESIGNAR PARA EJECUCIÓN:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 1.927.629.041,00	**VALOR POR PAGAR:**	$ 14.764.025.105,00
% FINANCIERO PAGADO	0,00%	**% FINANCIERO PAGADO**	0,00%
SUPERVISOR:	*Director de Operaciones Camilo Torres*	**SUPERVISOR:**	*Director de Operaciones Camilo Torres*


** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios, prórrogas y pagos.

2. CONTROL DE HITOS.

ÍTEM	GRUPO 4 FASE I FACTIBILIDAD	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	13-02-26	13-02-26	0
	FACTIBILIDAD, ESTUDIOS,DISEÑOS DEFINITIVOS Y APROBACIONES			
	1.0 COMPONENTE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA,VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA	13/02/2026	13/02/2026	0,00
	Solicitud ante el IDIGER, para conocer los condicionamientos y/o restricciones por riesgo	20/02/2026	12/03/2026	-20,00
	Respuesta Idiger	27/02/2026	21/04/2026	-53,00
	Documento técnico de factibilidad con estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de movimientos en masa	16/03/2026	1/04/2026	-16,00
	1.1. COMPONENTE DE AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES	13/04/2026		
	Solicitud ante el IDIGER, para conocer los condicionamientos y/o restricciones por riesgo	20/02/2026	12/03/2026	-20,00
	Respuesta Idiger	27/02/2026	21/04/2026	-53,00
	Documento técnico de factibilidad con estudio de amenaza por avenidas torrenciales	16/03/2026	14/04/2026	-29,00
	1.2. COMPONENTE DE AMENAZA Y RIESGO POR INUNDACIÓN	13/04/2026	13/04/2026	
	Solicitud ante el IDIGER, para conocer los condicionamientos y/o restricciones por riesgo	20/02/2026	12/03/2026	-20,00
	Respuesta Idiger	27/02/2026	21/04/2026	-53,00
	Documento técnico de factibilidad con estudio de amenaza por avenidas torrenciales	16/03/2026	15/04/2026	-30,00
	1.3 COMPONENTE DE TOPOGRAFIA	13/04/2026		
	Localización y Levantamiento topografico inicial de los dos poligonos de ejecución	5/03/2026	26/03/2026	-21,00
	Levantamiento de elementos presentes,predios colindantes, redes de servicios externas, vías principales y secundarias	12/03/2026	26/03/2026	-14,00
	Levantamiento de elementos del componente ambiental	10/03/2026	26/03/2026	-16,00
	Cartografía preliminar	12/03/2026	26/03/2026	-14,00
	Entrega de informe topografico etapa de factibilidad	12/03/2026		-122,00
	1.4 COMPONENTE DE VERIFICACIÓN NORMATIVA			

	Metodología de trabajo para el desarrollo del estudio de títulos	18/02/2026	24/04/2026	-65,00
	Informe de Estudio de títulos y gestión predial Secretaría Distrital de Planeación – SDP	27/02/2026	27/02/2026	revizar
	Consulta a entidades: Solicitud de documentos, certificados , cartografía y demás documentos para el desarrollo del contrato	6/03/2026	6/03/2026	-128,00
	Informe de consulta a entidades,solicitud de lineamientos,determinantes,normatividad vigente Y Expediente de radicados	16/03/2026	16/03/2026	-118,00
	1.5 COMPONENTE ARQUITECTÓNICO Y URBANO	13/04/2026	13/04/2026	-90,00
	Informe de Recopilación y análisis de información	27/02/2026	27/02/2026	-135,00
	Desarrollo y entrega de metodología de trabajo y diagnostico urbanistico	16/03/2026	28/04/2026	-43,00
	1.6 COMPONENTE DE VIAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD	13/04/2026	13/04/2026	
	Informe de Recopilación y análisis de la información	16/03/2026	16/03/2026	-118,00
	Metodología para la elaboración de estudios de tránsito	16/03/2026	16/03/2026	-118,00
	1.7 COMPONENTE DE REDES HIDROSANITARIAS Y DE GAS			
	1.7.1. REDES HIDROSANITARIAS	13/04/2026	13/04/2026	
	Informe técnico de diagnóstico de factibilidad y documentos técnicos de soporte	16/03/2026	16/03/2026	-118,00
	Informe de inspección de redes existentes , documentos técnicos de soporte y validación de topografía por parte de EAAB	16/03/2026	16/03/2026	-118,00
	Documento técnico de los SUDS	16/03/2026	16/03/2026	-118,00
	1.7.2 REDES ELÉCTRICAS Y DE GAS	13/04/2026	13/04/2026	-90,00
	Informe técnico de diagnóstico de factibilidad y documentos técnicos de soporte	16/03/2026	16/03/2026	-118,00
	Informe de recopilación de información Redes secas	16/03/2026	16/03/2026	-118,00
	Documento técnico de soporte (DTS) basado en inventario de redes existenes y diagnostico de estas	16/03/2026	16/03/2026	-118,00
	1.8 COMPONENTE BIM	13/04/2026	13/04/2026	
	Plan de ejecución BIM	20/02/2026	15/03/2026	-23,00
	Objetivo del BEP: Lineamientos BIM	16/03/2026	16/03/2026	-118,00
	Modelos de madurez LOD 100	16/03/2026	16/03/2026	-118,00
	1.9 COMPONENTE DE ESTRUCTURAS	13/04/2026	13/04/2026	
	Informe de diagnóstico recolección, validación, análisis y complementación de información	16/03/2026	16/03/2026	-118,00
	Planimetria estructural de factibilidad con documentos técnicos de soporte	16/03/2026	16/03/2026	-118,00
	Documento Tecnico de Soporte (DTS)	16/03/2026	16/03/2026	-118,00
	1.10 COMPONENTE DE GEOTECNIA	13/04/2026	13/04/2026	
	Informe de Investigación y recopilación de información	6/03/2026	13/04/2026	-38,00
	Plan de exploración geotécnico del subsuelo	16/03/2026	17/04/2026	-86,00
	Informe de Análisis geotecnico: Alternativa de solución geotécnica para el proyecto	16/03/2026	16/03/2026	-118,00
	Caracterización de la localización del proyecto	16/03/2026	22/04/2026	-37,00
	1.11 COMPONENTE DE ARQUEOLOGIA	13/04/2026	13/04/2026	
	Recopilación de información y diagnóstico arqueológico	25/02/2026	25/02/2026	-137,00
	Documento de diagnóstico arqueológico de acuerdo a la normativa vigente del ICANH	16/03/2026	16/03/2026	-118,00
	1.12 COMPONENTE DE PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMA DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN	13/04/2026	13/04/2026	
	Plan de trabajo o cronograma de la etapa 1	20/02/2026	9/03/2026	-17,00
	Estimación de cantidades y precios vigentes soportados de las alternativas definidas de trabajo	2/03/2026	2/03/2026	-132,00
	Entrega de presupuesto de alternativa definida detallado	16/03/2026	16/03/2026	-118,00
	1.13 COMPONENTE DE PAVIMENTOS	13/04/2026	13/04/2026	
	Informe de recopilación de información, plan de exploración y metodología con documentos de soporte	16/03/2026	16/03/2026	-118,00
	1.14 COMPONENTE AMBIENTAL Y SST	13/04/2026	13/04/2026	
	Diagnóstico linea base ambiental	2/03/2026	2/03/2026	0,00
	Identificación de determinantes ambientales, tramites y permisos requeridos por la AAC,	2/03/2026	12/03/2026	-10,00
	Diagnóstico linea base ambiental- 2da entrega	5/03/2026	20/04/2026	-46,00
	Inscripción y apertura del PIN del contrato	16/03/2026	18/03/2026	-2,00
	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	16/03/2026	16/03/2026	-118,00
	Plan de gestión de riesgos y desastres	16/03/2026	16/03/2026	-118,00
	1.15 COMPONENTE SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	13/04/2026	13/04/2026	
	Instalación del punto de atención a la ciudadanía (PAC)	20/02/2026	15/03/2026	-23,00
	Reunión de inicio No.1	6/03/2026	6/03/2026	0,00
	Plan de gestión social y participación ciudadana	6/03/2026	19/03/2026	-13,00

3. CURVA "S" SEGUIMIENTO SEMANAL GENERAL

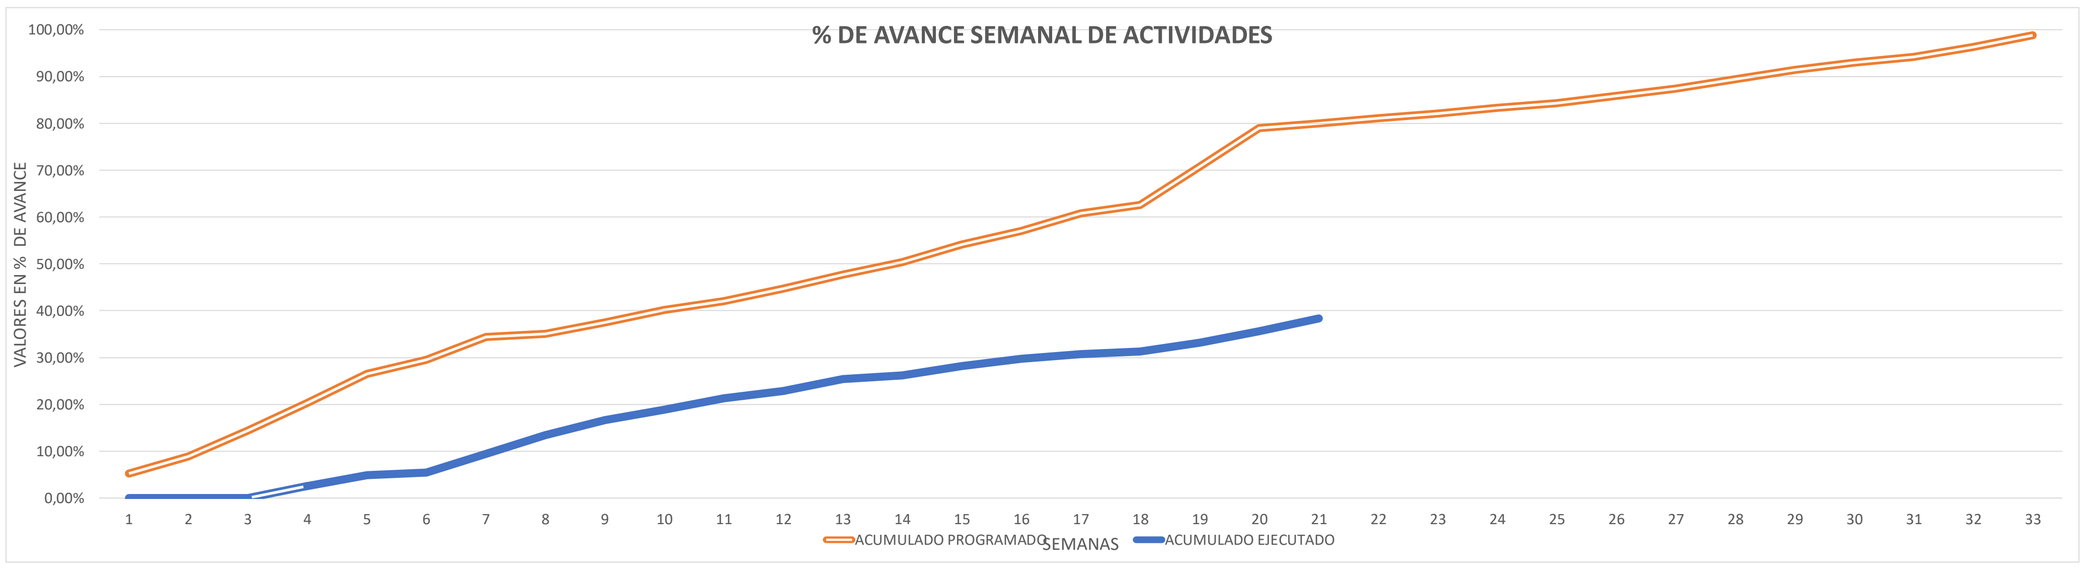

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

El dia 9 de marzo se realiza la aprobación del plan detallado de trabajo (PDT) a corte del 5 de julio se tiene el siguiente estado :
FASE DE FACTIBILIDAD: Programado : 100% ; Ejecutado :82,27% , Atraso: -17,73%
FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: Programado : 100% ; Ejecutado : 21,23% , Atraso: -78,77%
ETAPA 1 : Programado : 80% ; Ejecutado : 38,35% , Atraso: -41,65%
CONTRATO: Programado : 5,04% ; Ejecutado : 2,42% , Atraso: -2,62%

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

NO APLICA PARA LA ETAPA 1

7. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

Actividades Técnicas por el contratista:

SDHT-LP-2025-321	6/07/2026	Consorcio SOLUCIONES POLIGONALES	Corrección de Documentos de la Nueva Profesional Técnico en manejo de registro Fotográfico y Topográfico. Respuesta comunicado CSP-SDHT-1333-26-0373
SDHT-LP-2025-324	19/07/2026	Consorcio SOLUCIONES POLIGONALES	Entrega de Informe Semanal 16
SDHT-LP-2025-325	7/07/2026	Consorcio SOLUCIONES POLIGONALES	Informe de Solicitudes y Gestiones realizadas con Entidades. Fase 2 de Estudios y Diseños
SDHT-LP-2025-326	20/07/2026	Consorcio SOLUCIONES POLIGONALES	Entrega de Informe Semanal 18
SDHT-LP-2025-327	6/07/2026	Consorcio SOLUCIONES POLIGONALES	Entrega de Informe Técnico Mensual No. 5. Junio 2026
SDHT-LP-2025-328	7/07/2026	Consorcio SOLUCIONES POLIGONALES	Informe de Solicitudes y Gestiones realizadas con Entidades. Fase 2 de Estudios y Diseños
SDHT-LP-2025-329	7/07/2026	Consorcio SOLUCIONES POLIGONALES	Propuesta de Intervención Ronda Hídrica Parque San Eusebio
SDHT-LP-2025-331	7/07/2026	Consorcio SOLUCIONES POLIGONALES	Documentos de Ingreso del Nuevo Especialista en Gestión Ambiental Profesional del componente Ambiental. Respuesta comunicado CSP-SDHT-1333-26-0388
2-2026-49826	7/07/2026	Consorcio SOLUCIONES POLIGONALES	RESPUESTA AL RADICADO 1-2026-30020 - COMUNICADO CSP-SDHT-1333-26-0303 DEL 2 DE JUNIO DE 2026 TRASLADO DEL COMUNICADO DEL CONSORCIO HABITAT BOGOTÁ 2025 SDHT-LP-2025-264 SOBRE SOLICITUD DE APOYO INTERINSTITUCIONAL CON EL INSTITUTO
SDHT-LP-2025-332	7/07/2026	Consorcio SOLUCIONES POLIGONALES	Documento Técnico Estudio de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por Movimientos en Masa, Fase 2 Estudios y Diseños. Proyecto Parques Llano Grande y San Eusebio

SDHT-LP-2025-333	7/07/2026	Consorcio SOLUCIONES POLIGONALES	Entrega de Informe Semanal 20
SDHT-LP-2025-337	9/07/2026	Consorcio SOLUCIONES POLIGONALES	Documento Técnico Estudios Detallados de Amenaza y Riesgo por Inundación, Fase 2 Estudios y Diseños. Proyecto Parques Llano Grande y San Eusebio
SDHT-LP-2025-338	9/07/2026	Consorcio SOLUCIONES POLIGONALES	Entrega de Informe Diseños de Urbanismo y Espacio Público, Fase 2 de Estudios y Diseños, componente Arquitectónico y Urbano

Actividades Técnicas por interventoria

-Pereparar, convocar y dirigir el comité integral No.21 el 1 de julio de 2026, el cual se realizó de manera presencial en las oficinas del contratista
- Particpar en la Reunión virtual con delegados de la huerta de San Eusebio, donde se tomaron insumos para la realizacion del esquema urbanistico
7 de julio de 2026: Mediante el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0398, la interventoría emitió el Apremio No. 1 por la no subsanación o no remisión de los productos correspondientes a la Fase 1 de Factibilidad.
7 de julio de 2026: Mediante el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0399, la interventoría emitió el Apremio No. 1 por la no subsanación o no remisión de los productos correspondientes a la Fase 2 de Estudios y Diseños.
7 de julio de 2026: Mediante el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0400, la interventoría realizó el traslado del comunicado del Consorcio Hábitat Bogotá 2025 relacionado con la propuesta de intervención de la ronda hídrica del Parque San Eusebio, para el trámite correspondiente.
8 de julio de 2026: Mediante el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0397, la interventoría emitió respuesta a las observaciones presentadas al Informe de Diseño de Geometría Vial.
10 de julio de 2026: Mediante el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0409, la interventoría realizó el traslado de la solicitud para la presentación técnica de la incorporación de diseños sostenibles y ecourbanismo, correspondiente a la Fase 2 de la Etapa 1.
10 de julio de 2026: Mediante el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0410, la interventoría emitió observaciones al Informe Mensual Técnico No. 4 correspondiente al mes de mayo de 2026 (Versión 1).
10 de julio de 2026: Mediante el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0412, la interventoría emitió respuesta a las observaciones del Informe de Estudio de Títulos y Gestión Predial, Versión 3.7 de julio de 2026: Mediante el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0401, la interventoría emitió la aprobación de la hoja de vida para el cambio del cargo de Ingeniera Topográfica del equipo de trabajo del contrato de consultoría para la Etapa 1.
7 de julio de 2026: Mediante el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0402, la interventoría emitió la aprobación de la hoja de vida para el cambio del cargo de Profesional SIG del equipo de trabajo del contrato de consultoría para la Etapa 1.
7 de julio de 2026: Mediante el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0403, la interventoría emitió la aprobación de la hoja de vida para el cambio del cargo de Técnico en Manejo de Registro Fotográfico y Topográfico del equipo de trabajo del contrato de consultoría para la Etapa 1.
10 de julio de 2026: Mediante el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0413, la interventoría emitió respuesta a las observaciones relacionadas con la hoja de vida para el cambio del Especialista en Estructuras.

AVANCE GESTIÓN AMBIENTAL

Componente Ambiental por parte del contratista :
7 de julio de 2026: Mediante el radicado SDHT-LP-2025-331, el Consorcio Soluciones Poligonales presentó los documentos de ingreso del nuevo Especialista en Gestión Ambiental, en respuesta al comunicado CSP-SDHT-1333-26-0388.
7 de julio de 2026: Mediante el radicado SDHT-LP-2025-334, el Consorcio Soluciones Poligonales realizó la entrega del Plan de Manejo Ambiental de Obra (MAO).
7 de julio de 2026: Mediante el radicado SDHT-LP-2025-329, el Consorcio Soluciones Poligonales presentó la Propuesta de Intervención de la Ronda Hídrica del Parque San Eusebio.
7 de julio de 2026: Mediante el radicado SDHT-LP-2025-332, el Consorcio Soluciones Poligonales presentó el Documento Técnico del Estudio de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por Movimientos en Masa, correspondiente a la Fase 2 de Estudios y Diseños para los parques Llano Grande y San Eusebio.

Componente Ambiental por parte de la interventoría :
Se participó en el comité integral realizado el día miercoles 8 de julio de 2026 de manera virtual, en donde se inform que los docmetntos entregados por el contratista se recibieron el dia 8 de julio y estos entraran a revision por parte de interventoria. adicionalmnete se reitera que no se han recibido los informes mensuales No 4 correpsondiente al mes de mayo y No. 5 correspondiente al mes de junio

AVANCE GESTIÓN SOCIAL

Actividades desarrolladas por el contratista
8 de julio de 2026: Mediante el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0405, la interventoría emitió la aprobación del Informe Mensual No. 5, Versión 1, correspondiente al componente de Gestión Social.
8 de julio de 2026: Mediante el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0407, la interventoría emitió la aprobación del avance del Documento de Caracterización Social, Versión 5.
8 de julio de 2026: Mediante el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0408, la interventoría realizó la radicación de la Caracterización Social presentada por el contratista de consultoría y obra, avalada por la interventoría

Actividades desarrolladas por Interventoría
Se hace entrega del informe semanal de Gestión Social.
Se participó en el comité integral realizaso el día miercoles 8 de julio de 2026 de manera virtual, se informa sobre el avance en el programa de Gestión Social.
Reunión virtual con delegados de la huerta de san Eusebio
Reunión con huerteros, grupo diseñador contratista, interventoría y Secretaria Distrital del Hábitat: En cumplimiento de los compromisos establecidos durante la reunión realizada el 4 de julio con el grupo de huerteros, el día 8 de julio a las 2:00 p. m. se llevó a cabo un encuentro virtual entre los profesionales y el grupo de huerteros. El objetivo de esta reunión fue conocer sus opiniones, observaciones y solicitudes con respecto a la huerta. La sesión tuvo una duración de dos horas.

Actualmente se está prestando atención en el PAC, los días martes en María Paz de 9.30 a 12:00 y el miércoles en San Eusebio en el mismo horario.
La contratista continua con la supervisión a la instalación de los puntos satélites en los dos polígonos, en total se encuentran 9 puntos de información en las zonas de intervención, en la semana el contratista realizó cambio de dos puntos satélites por petición de los propietarios del predio.
Se trabaja en el informe mensual del periodo entre el 1° y el 30 de junio de 2026.

AVANCE GESTIÓN SST

Actividades desarrolladas por el contratista
8 de julio de 2026: Mediante el radicado SDHT-LP-2025-336, el Consorcio Soluciones Poligonales presentó la corrección del Informe Mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo No. 01, correspondiente al mes de febrero de 2026, en respuesta a los comunicados CSP-SDHT-1333-26-0349.
7 de julio de 2026: Mediante el radicado SDHT-LP-2025-335, el Consorcio Soluciones Poligonales realizó la entrega del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres para Entidades Públicas y Privadas, como parte de las actividades asociadas al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Actividades desarrolladas por Interventoría
7 de julio de 2026: Mediante el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0404, la interventoría emitió el Apremio No. 5 por la no radicación del Informe Mensual de los componentes Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), correspondiente al mes de mayo de 2026.
10 de julio de 2026: Mediante el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0411, la interventoría emitió el Apremio No. 6 por la no radicación del Informe Mensual No. 4 de los componentes Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), correspondiente al mes de mayo de 2026


AVANCE GESTIÓN CALIDAD

Durante el periodo reportado, se realizo la revision y seguimiento de documentacion presentada por el contratista

AVANCE GESTIÓN ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS:

se realizo la radicacion de la cuenta No 3 de interventoria mediante el formato JSP 7


9. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA




Registro de asistentes a a comité No 21 del 8 de julio




Registro de asistentes a a comité No 21 del 8 de julio



Registro de asistentes a a comité No 21 del 8de julio



Registro de asistentes a la mesa de trabajo con la comunidad de huertas realizada el 8 de julio



FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: ING. MONICA JIMENA GUERRA VERGARA

FIRMA APOYO SUPERVISOR
NOMBRE APOYO SUPERVISOR:
ING CARLOS TAMAYO
