BOGOTÁ Secretaría Distrital del Hábitat	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO SOLUCIONES POLIGONALES NIT: 902.015.861-2

FECHA	19/7/2026	**PERIODO No.**	**22**	DEL	**13/7/2026**	AL	**19/7/2026**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.” (Grupo 4)”
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Y NOMBRE DEL POLÍGONO	Grupo 4 " Poligono 8. Parque San Eusebio – 16-150- Torremolinos II Sector y Poligono 9 - Parque 08-105 Vecinal Llano Grande - María Paz."

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			**CONTRATO DE OBRA**		
CONTRATO No.:	1333 DE 2025 CONSORCIO SOLUCIONES POLIGONALES		**CONTRATO No.:**	1268-2025 CONSORCIO HÁBITAT BOGOTÁ 2025	
PLAZO INICIAL:	21 MESES		**PLAZO INICIAL:**	21 MESES	
FECHA DE INICIACIÓN:	13 de febrero de 2026		**FECHA DE INICIACIÓN:**	13 de febrero de 2026	
****FECHA DE REINICIO**	-		****FECHA DE REINICIO:**	-	
PRORROGA	-		**PRORROGA**	-	
FECHA DE TERMINACIÓN:	12/11/2027		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	12/11/2027	
PRORROGA	-		**PRORROGA**	-	
FECHA DE TERMINACIÓN:	12/11/2027		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	12/11/2027	
PLAZO ACTUALIZADO:	637		**PLAZO ACTUALIZADO:**	637	
PLAZO TRANSCURRIDO:	156 EQUIVALE AL	24%	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	156 EQUIVALE AL	24%
VALOR INICIAL OFERTADO CONTRACTUAL :	$	1.927.629.041,00	**VALOR INICIAL OFERTADO CONTRACTUAL :**	$	14.764.025.105,00
Valor etapa 1	$	383.387.429,00		$	929.899.632,00
Valor etapa 2	$	1.544.241.612,00		$	13.834.128.473,00
VALOR INICIAL CONTRACTUAL :	$	1.927.629.041,00	**VALOR INICIAL CONTRACTUAL :**	$	14.764.025.105,00
VALOR ANTICIPO	N/A		**VALOR ANTICIPO**	N/A	
VALOR ACTUALIZADO:	$	1.927.629.041,00	**VALOR ACTUALIZADO:**	$	14.764.025.105,00
VALOR PAGADO:	**$**	**-**	**VALOR PAGADO:**	**$**	**-**
VALOR DISPONIBLE POR DESIGNAR PARA EJECUCIÓN:	$	-	**VALOR DISPONIBLE POR DESIGNAR PARA EJECUCIÓN:**	$	-
VALOR POR PAGAR:	$	1.927.629.041,00	**VALOR POR PAGAR:**	$	14.764.025.105,00
% FINANCIERO PAGADO	0,00%		**% FINANCIERO PAGADO**		0,00%
SUPERVISOR:	*Director de Operaciones Camilo Torres*		**SUPERVISOR:**	*Director de Operaciones Camilo Torres*	


** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios, prórrogas y pagos.

2. CONTROL DE HITOS.

ÍTEM	GRUPO 4 FASE I FACTIBILIDAD	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	13-02-26	13-02-26	0
	FACTIBILIDAD, ESTUDIOS,DISEÑOS DEFINITIVOS Y APROBACIONES			
	1.0 COMPONENTE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA,VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA	13/02/2026	13/02/2026	0,00
	Solicitud ante el IDIGER, para conocer los condicionamientos y/o restricciones por riesgo	20/02/2026	12/03/2026	-20,00
	Respuesta Idiger	27/02/2026	21/04/2026	-53,00
	Documento técnico de factibilidad con estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de movimientos en masa	16/03/2026	1/04/2026	-16,00
	1.1. COMPONENTE DE AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES	13/04/2026		
	Solicitud ante el IDIGER, para conocer los condicionamientos y/o restricciones por riesgo	20/02/2026	12/03/2026	-20,00
	Respuesta Idiger	27/02/2026	21/04/2026	-53,00
	Documento técnico de factibilidad con estudio de amenaza por avenidas torrenciales	16/03/2026	14/04/2026	-29,00

	1.2. COMPONENTE DE AMENAZA Y RIESGO POR INUNDACIÓN	13/04/2026	13/04/2026	
	Solicitud ante el IDIGER, para conocer los condicionamientos y/o restricciones por riesgo	20/02/2026	12/03/2026	-20,00
	Respuesta Idiger	27/02/2026	21/04/2026	-53,00
	Documento técnico de factibilidad con estudio de amenaza por avenidas torrenciales	16/03/2026	15/04/2026	-30,00
	1.3 COMPONENTE DE TOPOGRAFIA	13/04/2026		
	Localización y Levantamiento topografico inicial de los dos poligonos de ejecución	5/03/2026	26/03/2026	-21,00
	Levantamiento de elementos presentes,predios colindantes, redes de servicios externas, vías principales y secundarias	12/03/2026	26/03/2026	-14,00
	Levantamiento de elementos del componente ambiental	10/03/2026	26/03/2026	-16,00
	Cartografía preliminar	12/03/2026	26/03/2026	-14,00
	Entrega de informe topografico etapa de factibilidad	12/03/2026		-129,00
	1.4 COMPONENTE DE VERIFICACIÓN NORMATIVA			
	Metodología de trabajo para el desarrollo del estudio de títulos	18/02/2026	24/04/2026	-65,00
	Informe de Estudio de títulos y gestión predial Secretaría Distrital de Planeación – SDP	27/02/2026	27/02/2026	revizar
	Consulta a entidades: Solicitud de documentos, certificados , cartografía y demás documentos para el desarrollo del contrato	6/03/2026	6/03/2026	-135,00
	Informe de consulta a entidades,solicitud de lineamientos,determinantes,normatividad vigente Y Expediente de radicados	16/03/2026	16/03/2026	-125,00
	1.5 COMPONENTE ARQUITECTÓNICO Y URBANO	13/04/2026	13/04/2026	-97,00
	Informe de Recopilación y análisis de información	27/02/2026	27/02/2026	-142,00
	Desarrollo y entrega de metodología de trabajo y diagnostico urbanistico	16/03/2026	28/04/2026	-43,00
	1.6 COMPONENTE DE VIAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD	13/04/2026	13/04/2026	
	Informe de Recopilación y análisis de la información	16/03/2026	16/03/2026	-125,00
	Metodología para la elaboración de estudios de tránsito	16/03/2026	16/03/2026	-125,00
	1.7 COMPONENTE DE REDES HIDROSANITARIAS Y DE GAS			
	1.7.1. REDES HIDROSANITARIAS	13/04/2026	13/04/2026	
	Informe técnico de diagnóstico de factibilidad y documentos técnicos de soporte	16/03/2026	16/03/2026	-125,00
	Informe de inspección de redes existentes , documentos técnicos de soporte y validación de topografía por parte de EAAB	16/03/2026	16/03/2026	-125,00
	Documento técnico de los SUDS	16/03/2026	16/03/2026	-125,00
	1.7.2 REDES ELÉCTRICAS Y DE GAS	13/04/2026	13/04/2026	-97,00
	Informe técnico de diagnóstico de factibilidad y documentos técnicos de soporte	16/03/2026	16/03/2026	-125,00
	Informe de recopilación de información Redes secas	16/03/2026	16/03/2026	-125,00
	Documento técnico de soporte (DTS) basado en inventario de redes existenes y diagnostico de estas	16/03/2026	16/03/2026	-125,00
	1.8 COMPONENTE BIM	13/04/2026	13/04/2026	
	Plan de ejecución BIM	20/02/2026	15/03/2026	-23,00
	Objetivo del BEP: Lineamientos BIM	16/03/2026	16/03/2026	-125,00
	Modelos de madurez LOD 100	16/03/2026	16/03/2026	-125,00
	1.9 COMPONENTE DE ESTRUCTURAS	13/04/2026	13/04/2026	
	Informe de diagnóstico recolección, validación, análisis y complementación de información	16/03/2026	16/03/2026	-125,00
	Planimetria estructural de factibilidad con documentos técnicos de soporte	16/03/2026	16/03/2026	-125,00
	Documento Tecnico de Soporte (DTS)	16/03/2026	16/03/2026	-125,00
	1.10 COMPONENTE DE GEOTECNIA	13/04/2026	13/04/2026	
	Informe de Investigación y recopilación de información	6/03/2026	13/04/2026	-38,00
	Plan de exploración geotécnico del subsuelo	16/03/2026	17/04/2026	-93,00
	Informe de Análisis geotecnico: Alternativa de solución geotécnica para el proyecto	16/03/2026	16/03/2026	-125,00
	Caracterización de la localización del proyecto	16/03/2026	22/04/2026	-37,00
	1.11 COMPONENTE DE ARQUEOLOGIA	13/04/2026	13/04/2026	
	Recopilación de información y diagnóstico arqueológico	25/02/2026	25/02/2026	-144,00
	Documento de diagnóstico arqueológico de acuerdo a la normativa vigente del ICANH	16/03/2026	16/03/2026	-125,00
	1.12 COMPONENTE DE PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMA DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN	13/04/2026	13/04/2026	
	Plan de trabajo o cronograma de la etapa 1	20/02/2026	9/03/2026	-17,00
	Estimación de cantidades y precios vigentes soportados de las alternativas definidas de trabajo	2/03/2026	2/03/2026	-139,00
	Entrega de presupuesto de alternativa definida detallado	16/03/2026	16/03/2026	-125,00
	1.13 COMPONENTE DE PAVIMENTOS	13/04/2026	13/04/2026	
	Informe de recopilación de información, plan de exploración y metodología con documentos de soporte	16/03/2026	16/03/2026	-125,00
	1.14 COMPONENTE AMBIENTAL Y SST	13/04/2026	13/04/2026	
	Diagnóstico linea base ambiental	2/03/2026	2/03/2026	0,00
	Identificación de determinantes ambientales, tramites y permisos requeridos por la AAC,	2/03/2026	12/03/2026	-10,00
	Diagnóstico linea base ambiental- 2da entrega	5/03/2026	20/04/2026	-46,00
	Inscripción y apertura del PIN del contrato	16/03/2026	18/03/2026	-2,00
	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	16/03/2026	16/03/2026	-125,00
	Plan de gestión de riesgos y desastres	16/03/2026	16/03/2026	-125,00
	1.15 COMPONENTE SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	13/04/2026	13/04/2026	
	Instalación del punto de atención a la ciudadanía (PAC)	20/02/2026	15/03/2026	-23,00
	Reunión de inicio No.1	6/03/2026	6/03/2026	0,00
	Plan de gestión social y participación ciudadana	6/03/2026	19/03/2026	-13,00

3. CURVA "S" SEGUIMIENTO SEMANAL GENERAL

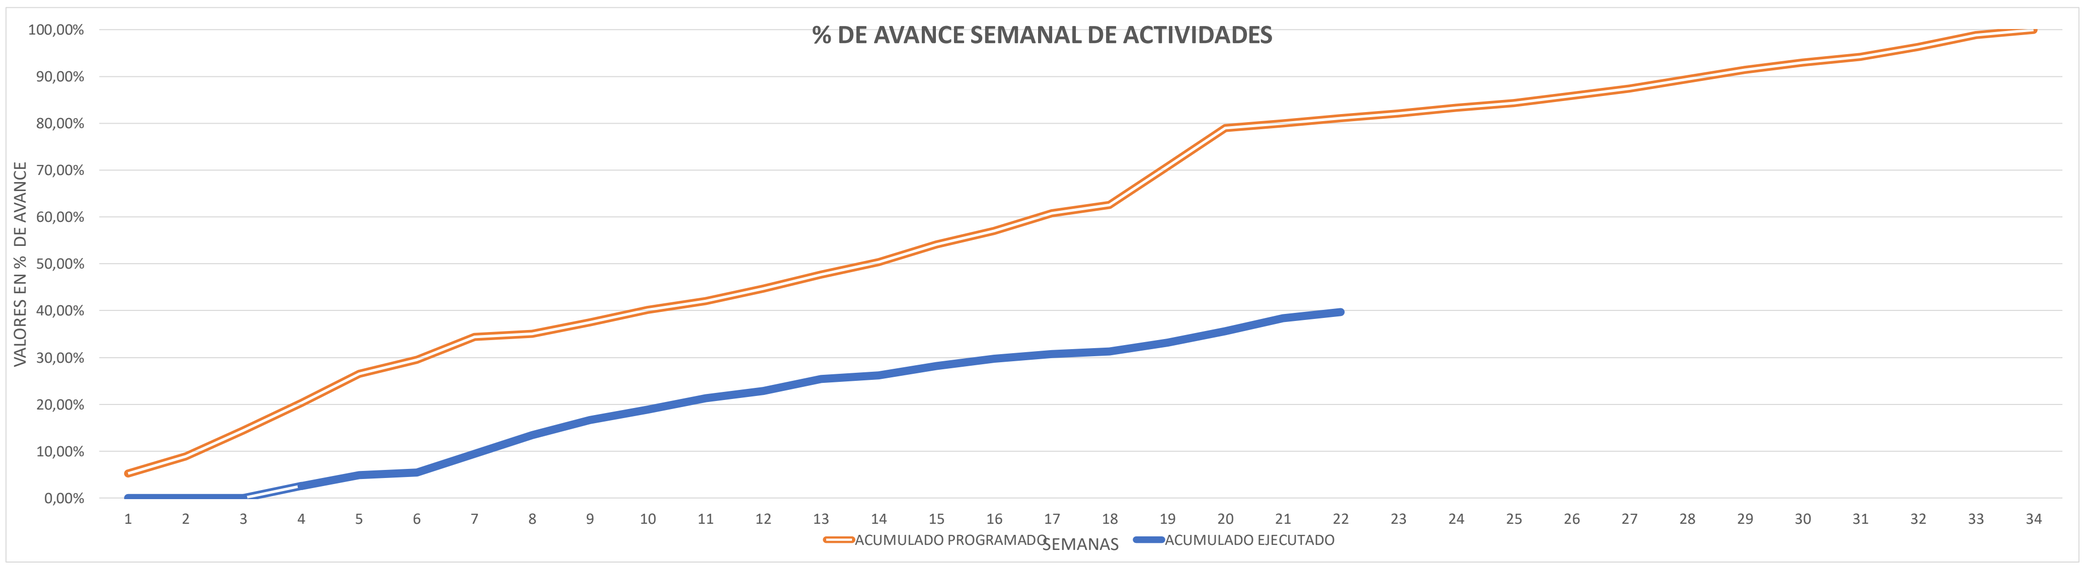

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

El dia 9 de marzo se realiza la aprobación del plan detallado de trabajo (PDT) a corte del 5 de julio se tiene el siguiente estado :
FASE DE FACTIBILIDAD: Programado : 100% ; Ejecutado : 82,27% , Atraso: -17,73%
FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: Programado : 100% ; Ejecutado : 24,23% , Atraso: -75,77%
ETAPA 1 : Programado : 81,12% ; Ejecutado : 39,70% , Atraso: -41,42 %
CONTRATO: Programado : 5,11% ; Ejecutado : 2,50% , Atraso: -2,61%

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

NO APLICA PARA LA ETAPA 1

7. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

Actividades Técnicas por el contratista:

SDHT-LP-2025-324	19/07/2026	Consorcio SOLUCIONES POLIGONALES	Entrega de Informe Semanal 16
SDHT-LP-2025-326	20/07/2026	Consorcio SOLUCIONES POLIGONALES	Entrega de Informe Semanal 18
SDHT-LP-2025-339	13/07/2026	Consorcio SOLUCIONES POLIGONALES	|Informe Mensual No. 4 del Componente SST correspondiente al mes de Mayo 2026.Respuesta a comunicados CSP-SDHT-1333-26-0329, CSP-SDHT-1333-26-0339, CSP-SDHT-1333-26-0352, CSP-SDHT-1333-26-0382 y CSP-SDHT-1333-26-0404
SDHT-LP-2025-343	14/07/2026	Consorcio SOLUCIONES POLIGONALES	Informe Mensual No. 4 del Componente Ambiental correspondiente al mes de Mayo 2026
SDHT-LP-2025-344	14/07/2026	Consorcio SOLUCIONES POLIGONALES	Informe Mensual No. 5 del Componente Ambiental correspondiente al mes de Junio 2026
SDHT-LP-2025-346	14/07/2026	Consorcio SOLUCIONES POLIGONALES	Solicitud de Reunión de Empalme Técnico e Institucional intervención Parque San Eusebio
2-2026-52957	15/07/2026	Consorcio SOLUCIONES POLIGONALES	RESPUESTA AL RADICADO NO. 1-2026-31781 DEL 10 DE JUNIO DE 2026 (SDHT) ASOCIADO AL CONSECUTIVO NO. CSP-SDHT-1333-26-0324 DEL 9 DE JUNIO DE 2026 (INTERVENTORÍA) - AVAL TÉCNICO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA NO. 03 CONTRATO NO. 1333-2025

SDHT-LP-2025-347	15/07/2026	Consorcio SOLUCIONES POLIGONALES	Remisión de oficio ANS SDHT-LP-2025-277 en formato editable por requerimiento de la Interventoría
SDHT-LP-2025-348	16/07/2026	Consorcio SOLUCIONES POLIGONALES	Solicitud de convocatorio de Mesa Técnica con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD para revisión de Diseños del Contrato 1268 de 2025 Grupo 4
SDHT-LP-2025-349	17/07/2026	Consorcio SOLUCIONES POLIGONALES	Corrección del Informe Técnico de Análisis de la Información Recopilada para la Geometría Vial. Componente Vial, Tránsito y Movilidad, Apéndice 05. Respuesta comunicado CSP- SDHT-1333-26-0397
SDHT-LP-2025-350	17/07/2026	Consorcio SOLUCIONES POLIGONALES	Documentos de Ingreso del Nuevo Especialista en Redes Hidrosanitarias. SUDS y Saneamiento Básico. Respuesta comunicado CSP-SDHT-1333-26-0389
SDHT-LP-2025-351	17/07/2026	Consorcio SOLUCIONES POLIGONALES	Corrección del Informe Topográfico de Etapa de Factibilidad. Respuesta a comunicado CSP-SDHT-1333-26-0282, CSP-SDHT-1333-26-0307, CSP-SDHT-1333-26-0358 y CSP-SDHT-1333-26-0380

Actividades Técnicas por interventoria

-Preparar, convocar y diorigir el comite de seguimiento No 22 realizado de manera presencial el 14 de julio en las oficinas de la interventoria
-Participar de mesa de trabajo con el consorcio de metro linea 1 el 17 de julio donde se acordaon temas referentes al limite de intervencion del parque San Eusebio.
15 de julio de 2026: Mediante el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0396, la interventoría emitió respuesta al comunicado SDHT-LP-2025-304, remitiendo las observaciones al Informe de Tránsito Promedio Diario V2.
10 de julio de 2026: Mediante el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0413, la interventoría emitió respuesta al comunicado SDHT-LP-2025-317, presentando observaciones a la hoja de vida para el cambio del Especialista en Estructuras del equipo consultor.
14 de julio de 2026: Mediante el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0414, la interventoría realizó el traslado del comunicado 2-2026-49816, relacionado con la respuesta a la solicitud de apoyo interinstitucional con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).
14 de julio de 2026: Mediante el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0415, la interventoría emitió el Apremio No. 2 por la no subsanación o no remisión de los productos correspondientes a la Fase 1 de Factibilidad.
14 de julio de 2026: Mediante el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0417, la interventoría emitió el Apremio No. 2 por la no subsanación o no remisión de los productos correspondientes a la Fase 2 de Estudios y Diseños.

17 de julio de 2026: Mediante el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0421, la interventoría emitió respuesta al comunicado SDHT-LP-2025-327, remitiendo las observaciones al Informe Técnico Mensual No. 5, correspondiente al mes de junio de 2026, versión 1.
16 de julio de 2026: Mediante el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0423, la interventoría realizó la remisión de los Informes Semanales de Interventoría No. 16, 17, 18 y 19.
16 de julio de 2026: Mediante el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0424, la interventoría realizó la remisión de los Informes Semanales de Interventoría No. 11, 12, 13, 14 y 15.
17 de julio de 2026: Mediante el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0425, la interventoría realizó el traslado del comunicado SDHT-LP-2025-348, relacionado con la solicitud de apoyo interinstitucional con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

AVANCE GESTIÓN AMBIENTAL

Componente Ambiental por parte del contratista :
14 de julio de 2026: Mediante el comunicado SDHT-LP-2025-343, se presentó el Informe Mensual No. 4 del Componente Ambiental, correspondiente al mes de mayo de 2026.
14 de julio de 2026: Mediante el comunicado SDHT-LP-2025-344, se presentó el Informe Mensual No. 5 del Componente Ambiental, correspondiente al mes de junio de 2026

Componente Ambiental por parte de la interventoría :
14 de julio de 2026: Mediante el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0418, la interventoría emitió observaciones a la Metodología para la Evaluación de Impacto Ambiental CONESA – Simplificado.
14 de julio de 2026: Mediante el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0419, la interventoría emitió observaciones a la Matriz de Manejo Ambiental de Obra (MAO).
15 de julio de 2026: Mediante el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0422, la interventoría emitió respuesta al Informe Mensual No. 4 del componente Ambiental, correspondiente al mes de mayo de 2026.
17 de julio de 2026: Mediante el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0426, la interventoría emitió respuesta al Informe Mensual No. 5 del componente Ambiental, correspondiente al mes de junio de 2026.

AVANCE GESTIÓN SOCIAL

Actividades desarrolladas por el contratista
Durante la semana se elaboró y presentó el informe semanal correspondiente al periodo del 13 al 19 de julio de 2026, consolidando las actividades desarrolladas por el componente social.

En el marco de la atención del Punto de Atención a la Ciudadanía (PAC), se prestó servicio a la comunidad en los dos polígonos de intervención: el 14 de julio en Llano Grande – María Paz y el 15 de julio en San Eusebio, brindando orientación a los habitantes sobre el avance del proyecto y atendiendo las inquietudes relacionadas con las intervenciones previstas.

Asimismo, se realizó el seguimiento y actualización de los Puntos Satélites de Información (PSI) instalados en ambos polígonos. Se verificó la permanencia de los puntos activos, se efectuó la actualización de la información divulgada y se incorporó un nuevo punto satélite en el polígono de María Paz, correspondiente al establecimiento Venta de Ropa – Andrés Rico, fortaleciendo la estrategia de comunicación con la comunidad. Igualmente, se mantuvo el control sobre el estado de los puntos existentes, registrando el retiro del establecimiento Restaurante Vanessa Guzmán.

En desarrollo de las actividades de participación ciudadana, se avanzó en la preparación del Comité Mi Hábitat, mediante la elaboración de la metodología de la jornada y la presentación correspondiente al polígono San Eusebio. Ambos documentos fueron remitidos a la interventoría el 17 de julio de 2026 para su revisión y aprobación, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo del comité y la socialización de los avances del proyecto con la comunidad.
se realizo la entrega de la correccion de la caracterizacion social mediante el comunicado SDHT-1333-26-0287
se realizo la entrega del informe mensual No4 del componente de gestion social mediante el comunicado SDHT-1333-26-0288

Actividades desarrolladas por Interventoría
Se hace entrega del informe semanal de Gestión Social.
Se participó en el comité integral realizaso el día martes 14 de julio de 2026 de manera presencial, se informa sobre el avance en el programa de Gestión Social.
Reunión virtual con el contratista la interventoria y el Hábitat sobre la definición en los diseños de la huerta de san Eusebio.

Actualmente se está prestando atención en el PAC, los días martes en María Paz de 9.30 a 12:00 y el miércoles en San Eusebio en el mismo horario.
La contratista continua con la supervisión a la instalación de los p satélites en los dos polígonos, en total se encuentran 9 puntos de información en las zonas de intervención, en la semana el contratista realizó cambio de dos puntos satélites por petición de los propietarios del predio.

AVANCE GESTIÓN SST

Actividades desarrolladas por el contratista

13 de julio de 2026: Mediante el comunicado SDHT-LP-2025-339, se presentó el Informe Mensual No. 4 del Componente SST, correspondiente al mes de mayo de 2026, en respuesta a los comunicados CSP-SDHT-1333-26-0329, CSP-SDHT-1333-26-0339, CSP-SDHT-1333-26-0352, CSP-SDHT-1333-26-0382 y CSP-SDHT-1333-26-0404.

Actividades desarrolladas por Interventoría
14 de julio de 2026: Mediante el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0416, la interventoría emitió el Apremio No. 1 por la no radicación del Informe Mensual No. 5 de los componentes Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), correspondiente al mes de junio de 2026.
14 de julio de 2026: Mediante el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0420, la interventoría emitió respuesta al comunicado SDHT-LP-2025-336, aprobando la corrección del Informe Mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo No. 1, correspondiente al mes de febrero de 2026.


AVANCE GESTIÓN CALIDAD

Durante el periodo reportado, se realizo la revision y seguimiento de documentacion presentada por el contratista

AVANCE GESTIÓN ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS:

No se realizo la radicacion de cuentas de cobro

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

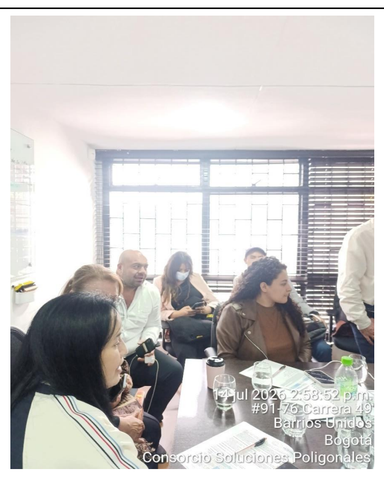

Registro de asistentes a a comité No 22 del 14 de julio



Registro de asistentes a a comité No 22 del 14 de julio




atencion PAC San Eusebio el 15de julio



atencion PAC Llano grande el 14 de julio

Registro de asistentes a a comité No 22 del 14 de julio

Registro de asistentes a mesa de trabajo con metro 17 de julio



FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: ING. MONICA JIMENA GUERRA VERGARA
