FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 6

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

1-11-2025 AL 30-11-2025

DURACIÓN CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5,142,932,607.00
VALOR CORTE 06	$ 161,758,685.34
domingo, 30 de noviembre de 2025	

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 06			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
	REPARACIONES LOCATIVAS GENERALES SEDE PRINCIPAL				386,565,099.94	-	-	-	12,160,064.04	-	104,788,869.00	-	49,597,308.27	-	-	-	26,476,618.12	-	193,022,859.19			193,542,240.75
1.1.	Retiro, reparación y reposicion puntual de junta entre laminas (junta con factor forma 2cmx1cm), mediante el uso de fondo de junta tipo sika rod y sello elastomérico de poliuretano en color negro, con alta resistencia a la intemperie incluye andamio colgante o toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.	ml	20.00	15,908.00	318,160.00	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	20.00	15,908.00	318,160.00
1.2.	Pintura exterior tipo coraza para muros sobre pañete incluye toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.	m2	550.00	42,081.00	23,144,550.00	-	-		-	100.11	4,212,643.00	-	-	-	-	293.52	12,351,615.12	393.63	16,564,257.76	156.37	42,081.00	6,580,292.24
2.1.	Retiro de impermeabilización existente y mortero de nivelación. Incluye el retiro y disposición final de escombros (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").	m2	1,242.42	29,570.00	36,738,359.40	-	-	214.28	6,336,259.60		-	1,018.73	30,123,846.10	-	-		-	1,233.01	36,460,105.70	9.41	29,570.00	278,253.70
2.2.	Instalación de mortero de nivelación con materiales de SIKA o similares características, previo a la instalación de la impermeabilización (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").	m2	-	62,971.00	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	62,971.00	-
2.3.	Impermeabilización de placa de cubierta plana transitable, no ventilada, con piso fijo, tipo convencional, para tráfico peatonal privado. Tipo Sika o de similares características con uso de mantos asfálticos, tipo bicapa (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").	m2	182.42	126,524.00	23,080,508.08	-	-		-	162.38	20,544,967.00	-	-	-	-		-	162.38	20,544,967.12	20.04	126,524.00	2,535,540.96
2.4.	Desmonte de ventaneria con vidrios en celosía ubicados en culata de cubierta en el edificio CNA.	m2	520.00	52,493.00	27,296,360.00	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	520.00	52,493.00	27,296,360.00
2.5.	Suministro e instalación de sistema de ventanas en vidrio fijas (sin basculante) en reemplazo de las ventanas en vidrio retiradas, ubicados en culata de cubierta en el edificio CNA.	m2	-	297,835.00	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	297,835.00	-
2.6.	Retiro de canaletas existentes y suministro e instalación de canaletas metálicas de sección trapezoidal elaboradas en acero galvanizado calibre 16 de acuerdo con las necesidades técnicas de la cubierta de aguas lluvia, incluye la instalación de la soportería para el anclaje de la canaleta en el edificio CNA.	ml	201.00	121,951.00	24,512,151.00	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	201.00	121,951.00	24,512,151.00
2.7.	Retiro de instalación existente y suministro e instalación de soscos para la bajante de agua lluvia ø 4" en PVC con su respectivo sifón para evitar malos olores, incluye la instalación de la soportería para el anclaje en el edificio CNA.	und	50.00	86,553.00	4,327,650.00	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	50.00	86,553.00	4,327,650.00
2.8.	Limpieza y mantenimientos de tubería bajante de agua lluvia ø 4" en PVC, en el edificio CNA.	und	50.00	94,430.00	4,721,500.00	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	50.00	94,430.00	4,721,500.00
3.1.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros.	m2	120.00	37,322.00	4,478,640.00	-	-	80.00	2,985,760.00		-	33.21	1,239,463.62	-	-		-	113.21	4,225,223.62	6.79	37,322.00	253,416.38
3.2.	Mantenimiento de cielo raso en fibra mineral. Incluye cambio, pintura y/o reutilización de láminas en fibra mineral, instalación de anclajes y arreglo de perfilería descolgada y colocación de soportes.	m2	300.00	34,073.00	10,221,900.00	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	300.00	34,073.00	10,221,900.00
3.3.	Suministro e instalación cielo raso PVC de 10 mm de espesor, incluye estructura, perforaciones para las luminarias. A todo costo.	m2	-	94,144.00	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	94,144.00	-
3.4.	Suministro e instalación cielo raso en drywall de 1/2" de espesor a una sola cara, incluye estructura, perforaciones luminarias. A todo costo.	m2	140.00	127,042.00	17,785,880.00	-	-	8.32	1,056,989.44		-	127.70	16,223,263.40	-	-		-	136.02	17,280,252.84	3.98	127,042.00	505,627.16
4.1.	Cambio de válvula antivandálica de empotrar tipo push para sanitarios institucionales de consumo de agua 4.85 lpf (1.28 gpf) tipo corona o similar. Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. A todo costo con la instalación de un enchape de similares caracteristicas a las originales.	und	25.00	1,200,516.00	30,012,900.00	-	-		-	11.00	13,205,676.00	-	-	-	-	6.00	7,203,096.00	17.00	20,408,772.00	8.00	1,200,516.00	9,604,128.00
4.2.	Cambio de grifería para lavamanos de empotrar a muro tipo push aplicación institucional de consumo 0,4 - 1.9 litros, tipo corona o similar incluye desmonte y reinstalación de aparatos. A todo costo con la instalación de un enchape de similares caracteristicas a las originales.	und	30.00	729,335.00	21,880,050.00	-	-		-	9.00	6,564,015.00	-	-	-	-	6.00	4,376,010.00	15.00	10,940,025.00	15.00	729,335.00	10,940,025.00

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 6

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

1-11-2025 AL 30-11-2025

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5,142,932,607.00
VALOR CORTE 06	$ 161,758,685.34
domingo, 30 de noviembre de 2025	

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 06			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
4.3.	Cambio de válvula antivandálica de empotrar tipo push para orinales institucionales de consumo de agua 0.5 a 1.9 lpf (0.13 a 0.5 gpf), tipo corona o similar. Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. A todo costo con la instalación de un enchape de similares características a las originales.	und	10.00	1,209,112.00	12,091,120.00	-	-		-	4.00	4,836,448.00	-	-	-	-	2.00	2,418,224.00	6.00	7,254,672.00	4.00	1,209,112.00	4,836,448.00
4.4.	Desmonte de divisiones metálicas para baños. Incluye soportería, tornillos, herrajes, retiro y disposición final.	m2	125.00	39,579.00	4,947,375.00	-	-	45.00	1,781,055.00		-	15.25	603,579.75	-	-		-	60.25	2,384,634.75	64.75	39,579.00	2,562,740.25
4.5.	Suministro e instalación de divisiones de baño en acero inoxidable por ambas caras calibre 22, aleación 304 acabado satinado tipo SOCODA o similar. Con puerta, anclajes y accesorios necesarios para su instalación y correcto funcionamiento.	m2	125.00	1,005,111.00	125,638,875.00	-	-		-	45.00	45,229,995.00	1.40	1,407,155.40	-	-		-	46.40	46,637,150.40	78.60	1,005,111.00	79,001,724.60
4.6.	Limpieza con sonda de tubería sanitaria en diferentes diámetros, actividad para ejecutar por punto.	und	105.00	109,625.00	11,510,625.00	-	-		-	93.00	10,195,125.00	-	-	-	-		-	93.00	10,195,125.00	12.00	109,625.00	1,315,500.00
5.1.	Desmonte de puerta en madera de 1.44 m x2.47 m, incluye marco y retiro.	und	1.00	127,673.00	127,673.00	-	-		-		-	-	-	-	-	1.00	127,673.00	1.00	127,673.00	-	127,673.00	-
5.2.	Suministro e instalación de puerta de acceso a cubierta en aluminio de dos hojas: una de 0.90 m x 2.47 m y otra de 0.54 m x 2.47 m. Incluye bisagras cerradura, cantonera marco y accesorios necesarios para su funcionamiento.	und	-	1,192,289.00	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	1,192,289.00	-
6.1.	Resanes y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre pañete o repello liso. A todo costo.	m2	110.56	33,744.00	3,730,823.46	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	110.56	33,744.00	3,730,823.46
	TOTAL REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CNA - PISO 2				1,001,282,660.38		71,974,262.62		10,754,525.00		7,859,740.00	-	7,114,659.60	-	-		47,173,783.91	-	144,876,971.13	-		856,405,889.25
1.1.	Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.	m2	257.87	47,734.00	12,309,004.28	-	-		-		-	-	-	-	-	83.48	3,984,834.32	83.48	3,984,834.32	174.39	47,734.00	8,324,169.96
1.2.	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	m2	66.97	49,324.00	3,303,277.60	-	-		-		-	-	-	-	-	17.13	844,920.12	17.13	844,920.12	49.84	49,324.00	2,458,357.48
1.3.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros.	m2	1,397.62	35,224.00	49,229,907.78	-	-		-		-	-	-	-	-	698.10	24,589,874.40	698.10	24,589,874.40	699.52	35,224.00	24,640,033.38
1.4.	Desmonte de redes eléctricas existentes. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	glb	1.00	12,717,035.00	12,717,035.00	-	-		-		-	-	-	-	-	0.33	4,196,621.55	0.33	4,196,621.55	0.67	12,717,035.00	8,520,413.45
1.5.	Desmonte de puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	und	181.00	93,786.00	16,975,266.00	-	-		-		-	-	-	-	-	106.00	9,941,316.00	106.00	9,941,316.00	75.00	93,786.00	7,033,950.00
1.6.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo.	m2	89.42	92,676.00	8,287,458.62	-	-		-		-	-	-	-	-	39.02	3,616,217.52	39.02	3,616,217.52	50.40	92,676.00	4,671,241.10
2.1.	Suministro e instalación de columnetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre 12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye platina soldada a la base y anclajes a placa de piso y retiro de escombros.	ml	11.80	198,521.00	2,342,547.80	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	11.80	198,521.00	2,342,547.80
2.2.	Suministro e instalación de viguetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye soldadura a columnetas y retiro de escombros.	ml	- 1.08	181,351.00	- 195,859.08	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	- 1.08	181,351.00	- 195,859.08
3.1.	Suministro e instalación de muro en Superboard de 8 mm, altura 2.40 m a dos caras. Incluye estructura metálica, anclaje, cinta, estuco y fondeo de acabado en pintura en vinilo tipo 1.	m2	188.45	199,697.00	37,632,500.26	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	188.45	199,697.00	37,632,500.26
4.1.	Suministro e instalación de cielorraso en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura. A todo costo.	m2	1,261.16	128,125.00	161,586,750.30	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	1,261.16	128,125.00	161,586,750.30
4.2.	Suministro e instalación de Frescasa Eco Sin Papel 3 1/2" para cielorraso en Drywall. A todo costo.	m2	820.09	32,499.00	26,652,104.91	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	820.09	32,499.00	26,652,104.91
5.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad. Incluye plástico aislante y yumbolon de acuerdo a las características técnicas y el guardaescobas.	m2	1,019.41	189,748.00	193,431,008.68	379.32	71,974,262.62		-		-	-	-	-	-		-	379.32	71,974,262.62	640.10	189,748.00	121,456,746.06
6.1.	Suministro e instalación de alimentador 1N°12 Fase+1N°12 Neutro+1N°12 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	2,400.00	19,944.00	47,865,600.00	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	2,400.00	19,944.00	47,865,600.00
6.2.	Suministro e instalación de alimentador a tableros en 3N°2/0 Fase+1N°2/0 Neutro+1N°2 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	200.00	363,569.00	72,713,800.00	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	200.00	363,569.00	72,713,800.00
6.3.	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble, cumpliendo norma RETIE.	und	310.00	153,691.00	47,644,210.00	-	-	43.00	6,608,713.00		-	-	-	-	-		-	43.00	6,608,713.00	267.00	153,691.00	41,035,497.00
6.4.	Suministro e instalación de salida interruptor sencillo o doble 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH40 3/4", elementos de fijación y conductores. Cumpliendo norma RETIE.	und	10.00	173,282.00	1,732,820.00	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	10.00	173,282.00	1,732,820.00
6.5.	Suministro e instalación de lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x4x7cm. Largo de la guaya: 100cm, incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	82.00	318,520.00	26,118,640.00	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	82.00	318,520.00	26,118,640.00
6.6.	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	140.00	224,564.00	31,438,960.00	-	-	3.00	673,692.00	35.00	7,859,740.00	-	-	-	-		-	38.00	8,533,432.00	102.00	224,564.00	22,905,528.00

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 6

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

1-11-2025 AL 30-11-2025

DURACIÓN CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5,142,932,607.00
VALOR CORTE 06	$ 161,758,685.34
domingo, 30 de noviembre de 2025	

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 06			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (+)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
6.7.	Suministro e instalación de panel LED de gran formato redondo de 24W, luz neutra 4000K, dimensiones 100 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	7.00	190,825.00	1,335,775.00	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	7.00	190,825.00	1,335,775.00
6.8.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	22.00	176,599.00	3,885,178.00	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	22.00	176,599.00	3,885,178.00
6.9.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia de aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	10.00	195,508.00	1,955,080.00	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	10.00	195,508.00	1,955,080.00
6.10.	Suministro e instalación de salida tomacorriente doble polo a tierra (red normal), monofásico 120V 15A, 3m prom en cable No 12 LSHF AWG, elementos de fijación y conductores.	und	83.00	173,606.00	14,409,298.00	-	-	20.00	3,472,120.00		-	-	-	-	-		-	20.00	3,472,120.00	63.00	173,606.00	10,937,178.00
6.11.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. Cumpliendo norma RETIE.	m	300.00	16,035.00	4,810,500.00	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	300.00	16,035.00	4,810,500.00
6.12.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit EMT ø 3" oculta sobre cielo o en muros.	ml	180.00	155,392.00	27,970,560.00	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	180.00	155,392.00	27,970,560.00
6.13.	Suministro e instalación de ducto cerrado de 40X8 galvanizado o con pintura electrostática.	ml	220.00	293,413.00	64,550,860.00	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	220.00	293,413.00	64,550,860.00
6.14.	Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico tetrafilar con espacio para totalizador y barraje neutro y tierra. Incluye totalizador y protecciones.	und	2.00	3,460,340.00	6,920,680.00	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	2.00	3,460,340.00	6,920,680.00
7.1.	Suministro e instalación de Vidrios Templado 8 mm para divisiones de oficina incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	25.67	830,396.00	21,314,259.63	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	25.67	830,396.00	21,314,259.63
7.2.	Suministro e instalación de Puerta en Vidrio Templado 8 mm con Pivote, incluye topes de piso, accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento a todo costo.	m2	13.12	856,303.00	11,234,695.36	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	13.12	856,303.00	11,234,695.36
7.3.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho a todo costo de uso interior y exterior.	ml	-	85,101.00	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	85,101.00	-
7.4.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho de uso interior y exterior, con corte de letras para identificar las oficinas en vidrio. A todo costo.	und	-	139,113.00	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	139,113.00	-
8.1.	Suministro e instalación de Puerta en madecor entamborada de 0,90 m de ancho por 2.20 m de alto, incluye marcos, chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	1.00	1,145,405.00	1,145,405.00	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	1.00	1,145,405.00	1,145,405.00
9.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores blancos. A todo costo, incluye lineales.	m2	630.28	37,195.00	23,443,301.80	-	-		-		-	191.28	7,114,659.60	-	-		-	191.28	7,114,659.60	439.00	37,195.00	16,328,642.20
9.2.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos cielo falsos blanco. A todo costo, incluye lineales.	m2	1,661.68	40,033.00	66,522,035.44	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	1,661.68	40,033.00	66,522,035.44
	REPARACIONES LOCATIVAS CASINO - EDIFICIO CONVENCIONES				85,456,440.92		79,297,346.28		-		-	-	-	-	-		-	-	79,297,346.28	-		6,159,094.64
5.5.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad, para la zona de mesas del restaurante Incluye nivelación en zonas puntuales, plástico aislante, yumbolon de acuerdo con las características técnicas y el guardaescobas.	m2	360.00	189,748.00	68,309,280.00	352.36	66,859,605.28		-		-	-	-	-	-		-	352.36	66,859,605.28	7.64	189,748.00	1,449,674.72
9.1.	Suministro e instalación de estructura decorativa para plantas colgantes de 6,85m ancho x 1,00 m de profundo con viguetas cada 0,76 m en tubería metálica cuadrada 50x50x2.0mm con acabado en pintura electrostática negro mate incluye 6 puntos de apoyo en guaya de tipo colgante. incluye 3 lamparas segun imagen.	und	1.70	3,245,844.00	5,517,934.80	1.00	3,245,844.00		-		-	-	-	-	-		-	1.00	3,245,844.00	0.70	3,245,844.00	2,272,090.80
9.2.	Suministro e instalación de estructura para microondas con módulos de 0,71 m de largo 0,56 m de profundo y 0,40 m de alto en tubería metálica cuadrada 50x50x3.0mm en pintura electrostática negro mate incluye 2 superficies en madera tipo madecor RH de 1" cada módulo y anclajes a la pared no visibles.	und	11.00	835,627.00	9,191,897.00	11.00	9,191,897.00		-		-	-	-	-	-		-	11.00	9,191,897.00	-	835,627.00	-
11.1.	Resanes y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre pañete o repello liso. Incluyen andamios, escaleras y sistemas de seguridad de operación. A todo costo.	m2	72.23	33,744.00	2,437,329.12	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	72.23	33,744.00	2,437,329.12
	REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CONVENCIONES - PISO 4				1,123,788,243.11		190,840,084.88		23,658,562.85		650,169.00	-	102,099,414.86	-	57,326,417.80		35,990,378.52	-	410,565,027.31	-		713,223,215.80
1.1.	Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.	m2	461.58	47,734.00	22,033,059.72	47.71	2,277,389.14	8.25	393,805.50		-	137.60	6,568,198.40	-	-		-	193.56	9,239,393.04	268.02	47,734.00	12,793,666.68
1.2.	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	m2	526.96	95,354.00	50,247,743.84	125.23	11,941,181.42	3.68	350,902.72		-	118.05	11,256,539.70	-	-	268.28	25,581,571.12	515.24	49,130,194.96	11.72	95,354.00	1,117,548.88
1.3.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros	m2	1,188.84	35,224.00	41,875,700.16	455.25	16,035,726.00		-		-	433.59	15,272,774.16	-	-		-	888.84	31,308,500.16	300.00	35,224.00	10,567,200.00
1.4.	Desmonte de redes eléctricas existentes. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	glb	1.00	6,775,716.00	6,775,716.00	1.00	6,775,716.00		-		-	-	-	-	-		-	1.00	6,775,716.00	-	6,775,716.00	-

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 6

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5,142,932,607.00
VALOR CORTE 06	$ 161,758,685.34
domingo, 30 de noviembre de 2025	

1-11-2025 AL 30-11-2025

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 06			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
1.5.	Desmonte puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el Fondo Nacional del Ahorro S.A. indique.	und	150.00	93,786.00	14,067,900.00	79.00	7,409,094.00		-		-	71.00	6,658,806.00		-		-	150.00	14,067,900.00	-	93,786.00	-
1.6.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo	m2	75.55	92,676.00	7,001,857.15	18.00	1,668,168.00		-		-	-	-	-	-		-	18.00	1,668,168.00	57.55	92,676.00	5,333,689.15
2.1.	Suministro e instalación de columnetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre 12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye platina soldada a la base y anclajes a placa de piso y retiro de escombros.	ml	163.20	198,521.00	32,398,627.20	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	163.20	198,521.00	32,398,627.20
2.2.	Suministro e instalación de viguetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye soldadura a columnetas y retiro de escombros.	ml	122.50	181,351.00	22,215,497.50	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	122.50	181,351.00	22,215,497.50
2.3.	Suministro e instalación perfiles WPC textura madera. Para instalar en muros divisorios de dimensiones 10 cm x 5 cm. Incluye estructura anclajes y retiro de escombros.	m2	28.44	234,409.00	6,666,591.96	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	28.44	234,409.00	6,666,591.96
3.1.	Suministro e instalación de muro en Superboard, altura 2.40 m. a dos caras incluye estructura, anclaje, cinta, estuco y fondeo de acabado en pintura en vinilo tipo 1.	m2	19.23	156,903.00	3,017,558.50	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	19.23	156,903.00	3,017,558.50
4.1.	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall de 1/2" en diferentes niveles a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura a 3 manos. A todo costo.	m2	1,023.28	113,010.00	115,640,872.80	-	-		-		-	551.66	62,343,096.60	320.46	36,215,184.60	58.14	6,570,401.40	930.26	105,128,682.60	93.02	113,010.00	10,512,190.20
5.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad Incluye plastico aislante y pymbolon, de acuerdo a las caracteristicas técnicas y el guardaescobas.	m2	1,058.84	189,748.00	200,912,772.32	315.09	59,788,414.57	120.76	22,913,854.63		-	-	-	-	-		-	435.85	82,702,269.20	622.99	189,748.00	118,210,503.12
6.1.	Suministro e instalación de alimentador 1N°12 Fase+1N°12 Neutro+1N°12 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	1,800.00	19,842.00	35,715,600.00	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	1,800.00	19,842.00	35,715,600.00
6.2.	Suministro e instalación de alimentador a tableros en 3N°2/0 Fase+1N°2/0 Neutro+1N°2 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	50.00	220,320.00	11,016,000.00	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	50.00	220,320.00	11,016,000.00
6.3.	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	301.00	147,631.00	44,436,931.00	-	-		-		-	-	-	143.00	21,111,233.00	26.00	3,838,406.00	169.00	24,949,639.00	132.00	147,631.00	19,487,292.00
6.4.	Suministro e instalación de salida interruptor sencillo o doble 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH40 3/4", elementos de fijación y conductores. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	32.00	166,320.00	5,322,240.00	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	32.00	166,320.00	5,322,240.00
6.5.	Suministro e instalación de Lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x4x7cm. Largo de la guaya: 100cm incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	40.00	300,264.00	12,010,560.00	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	40.00	300,264.00	12,010,560.00
6.6.	Reinstalación de panel LED cuadrado de dimensiones 60x60 cm preexistentes. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	-	103,354.00	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	103,354.00	-
6..7	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	52.00	209,700.00	10,904,400.00	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	52.00	209,700.00	10,904,400.00
6.8.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	22.00	220,546.00	4,852,012.00	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	22.00	220,546.00	4,852,012.00
6.9.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	14.00	198,472.00	2,778,608.00	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	14.00	198,472.00	2,778,608.00
6.10.	Suministro e instalación Salida tomacorriente doble polo a tierra (red normal), monofásico 120V 15A, 3m prom en cable No 12 LSHF AWG, elementos de fijación y conductores. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	33.00	173,606.00	5,728,998.00	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	33.00	173,606.00	5,728,998.00
6.11.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	150.00	16,035.00	2,405,250.00	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	150.00	16,035.00	2,405,250.00
6.12.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit EMT ø 3" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	50.00	155,392.00	7,769,600.00	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	50.00	155,392.00	7,769,600.00
6.13.	Suministro e instalación de ducto cerrado de 40X8 galvanizado o con pintura electrostática. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	20.00	317,627.00	6,352,540.00	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	20.00	317,627.00	6,352,540.00
6.14.	Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico tetrafilar con espacio para totalizador y barraje neutro y tierra, incluye totalizador y proteccione. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	1.00	3,460,340.00	3,460,340.00	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	1.00	3,460,340.00	3,460,340.00

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 6

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

1-11-2025 AL 30-11-2025

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5,142,932,607.00
VALOR CORTE 06	$ 161,758,685.34
domingo, 30 de noviembre de 2025	

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 06			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
7.1.	Suministro e Instalación de barra de comida en acero inoxidable calibre 22. de 45 cms de ancho incluye soporte en estructura metálica a pared.	ml	3.22	1,416,162.00	4,560,041.64	-	-		-		-		-		-		-	-	-	3.22	1,416,162.00	4,560,041.64
7.2.	Suministro e instalación de mueble de cocina de 1.60x0.60x0.90m en madera RH y en acero inoxidable, incluye grifería y accesorios de desagüe.	und	1.00	2,569,025.00	2,569,025.00	-	-		-		-		-		-		-	-	-	1.00	2,569,025.00	2,569,025.00
8.1.	Suministro e instalación de vidrio templado 8 mm para divisiones de oficina incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	317.09	856,266.00	271,511,673.41	99.20	84,944,395.75		-		-		-		-		-	99.20	84,944,395.75	217.88	856,266.00	186,567,277.66
8.2.	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado 8 mm con pivote, incluye topes de piso, accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento a todo costo.	m2	47.52	858,737.00	40,807,182.24	-	-		-		-		-		-		-	-	-	47.52	858,737.00	40,807,182.24
8.3.	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de 8 mm con sistema antipanico. Incluye topes de piso y accesorios para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	7.68	1,607,888.00	12,348,579.84	-	-		-		-		-		-		-	-	-	7.68	1,607,888.00	12,348,579.84
8.4.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho, de uso interior y exterior. A todo costo.	ml	60.00	82,644.00	4,958,640.00	-	-		-		-		-		-		-	-	-	60.00	82,644.00	4,958,640.00
8.5.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho, de uso interior y exterior, con corte de letras para identificar las oficinas en vidrio. A todo costo.	und	17.00	139,113.00	2,364,921.00	-	-		-		-		-		-		-	-	-	17.00	139,113.00	2,364,921.00
9.1.	Suministro e instalación de puerta en madecor entamborada de 0,90 m de ancho por 2.20 m de alto, incluye marcos chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	11.00	1,145,405.00	12,599,455.00	-	-		-		-		-		-		-	-	-	11.00	1,145,405.00	12,599,455.00
9.2.	Suministro e instalación de superficie de madera ancho 40cm y 3 cm de espesor, para instalar en muros bajos, correspondientes a la barra para computadores y zonas de estancia.	ml	100.00	354,159.00	35,415,900.00	-	-		-		-		-		-		-	-	-	100.00	354,159.00	35,415,900.00
10.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores blanco. A todo costo, incluye lineales.	m2	720.38	32,772.00	23,608,162.27	-	-		-		-		-		-		-	-	-	720.38	32,772.00	23,608,162.27
10.2.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos cielo falsos blanco. A todo costo, incluye lineales.	m2	920.38	39,060.00	35,949,886.56	-	-		-		-		-		-		-	-	-	920.38	39,060.00	35,949,886.56
10.3.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores azul institucional. A todo costo, incluye lineales.	m2	40.00	37,195.00	1,487,800.00	-	-		-	17.48	650,169.00		-		-		-	17.48	650,168.60	22.52	37,195.00	837,631.40
10.4.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores verde institucional. A todo costo, incluye lineales.	m2	-	37,195.00	-	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	37,195.00	-
	REPARACIONES LOCATIVAS - TORRE DE TECNOLOGÍA - PISO 2				58,822,037.54		57,849,827.36		-		-		-		-		-	-	57,849,827.37	-		972,210.17
1.1.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall, incluye desmonte de 113 luminarias tipo panel Led de 60 x 60 luz neutra 4000K y retiro con su disposición final de escombros.	m2	-	37,322.00	-	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	37,322.00	-
1.2.	Desmonte de puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	und	-	93,786.00	-	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	93,786.00	-
1.3.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo.	m2	-	92,676.00	-	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	92,676.00	-
2.1.	Suministro e instalación de cielorraso en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco y capa fondeo pintura. A todo costo.	m2	0.00	127,159.00	157.54	-	-		-		-		-		-		-	-	-	0.00	127,159.00	157.54
3.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad. Incluye plástico aislante y yumbolon de acuerdo a las características técnicas y el guardaescobas.	m2	310.00	189,748.00	58,821,880.00	304.88	57,849,827.36		-		-		-		-		-	304.88	57,849,827.37	5.12	189,748.00	972,052.63
4.1.	Suministro e instalación de lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x4x7cm. Largo de la guaya: 100cm, incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	-	311,065.00	-	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	311,065.00	-
4.2.	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	-	227,693.00	-	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	227,693.00	-
4.3.	Reinstalación de panel LED cuadrado de dimensiones 60x60 cm luz neutra 4000K preexistentes. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	-	96,211.00	-	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	96,211.00	-
4.4.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	-	210,033.00	-	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	210,033.00	-
4.5.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia de aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	-	195,508.00	-	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	195,508.00	-
5.1.	Suministro e instalación de Puerta en madecor entamborada de 0,90 m de ancho por 2.20 m de alto, incluye marcos, chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	-	997,838.00	-	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	997,838.00	-

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 6

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

1-11-2025 AL 30-11-2025

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5,142,932,607.00
VALOR CORTE 06	$ 161,758,685.34
domingo, 30 de noviembre de 2025	

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 06			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
6.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores blancos. A todo costo, incluye lineales.	m2	-	34,883.00	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	34,883.00	-
	BOLSA DE ITEMS NO PREVISTOS (10%)				-	-	-	-	-		-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
	SALDO BOLSA NP´s					-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS - NPs				1,514,143,579.13	-	-		55,478,187.73		72,690,956.01	-	77,334,076.42	-	533,202,754.58		21,518,455.10	-	760,224,429.84	-	-	753,919,149.29
NP-01	Demolición placa maciza 0.15 mt en horarios autorizado por la entidad (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	m2	1,100.00	49,331.00	54,264,100.00		-	46.23	2,280,646.13		-	769.13	37,941,952.03	21.55	1,063,083.05		-	836.91	41,285,681.21	263.09	49,331.00	12,978,418.79
NP-02	Suministro e instalación de mortero premezclado de nivelación bombeable, acelerado a 7 dias con baja permeabilidad para zona de cubiertas, garantizando pendientes de desagues hacia los sifones.	m2	185.00	104,277.00	19,291,245.00		-	137.79	14,368,567.67		-	-	-	-	-		-	137.79	14,368,567.67	47.21	104,277.00	4,922,677.33
NP-03	Demolición baldosa muro en horarios autorizados por la ENTIDAD (incluye retiro de material desde frente de obra al sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	m2	225.00	27,952.00	6,289,200.00		-	140.63	3,930,912.12		-	12.99	363,096.48	-	-		-	153.62	4,294,008.60	71.38	27,952.00	1,995,191.40
NP-04	Baldosa ceramica pared 30x60.	m2	355.43	142,571.00	50,673,986.68		-	31.15	4,441,713.96	73.76	10,516,607.24	42.12	6,005,090.52	-	-		-	147.04	20,963,411.73	208.39	142,571.00	29,710,574.96
NP-05	Baldosa ceramica piso 60x60.	m2	170.00	154,546.00	26,272,820.00		-		-		-	77.86	12,032,951.56	-	-		-	77.86	12,032,951.56	92.14	154,546.00	14,239,868.44
NP-06	Suministro e instalacion de cinta led en parte baja de gabinete superior de mueble de cocina.	und	1.00	260,334.00	260,334.00		-	1.00	260,334.00		-	-	-	-	-		-	1.00	260,334.00	-	260,334.00	-
NP-07	Desmonte y reinstalacion de rejillas de extraccion aire en cocina presidencia.	und	8.00	45,000.00	360,000.00		-	3.00	135,000.00		-	-	-	-	-		-	3.00	135,000.00	5.00	45,000.00	225,000.00
NP-08	Desmonte redes eléctricas existentes, Incluye la disposición final fondo Nacional del Ahorro indique. (Zona de recepcion).	und	1.00	930,686.00	930,686.00		-		-	1.00	930,686.00	-	-	-	-		-	1.00	930,686.00	-	930,686.00	-
NP-09	Demolición de guardaescoba, (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	ml	220.00	14,785.00	3,252,700.00		-	120.00	1,774,200.00		-	22.13	327,192.05	-	-		-	142.13	2,101,392.05	77.87	14,785.00	1,151,307.95
NP-10	Desmonte espejo.	und	10.00	23,790.00	237,900.00		-	4.00	95,160.00		-	-	-	-	-		-	4.00	95,160.00	6.00	23,790.00	142,740.00
NP-11	Desmonte de cubierta en policarbonato.	m2	55.00	52,335.00	2,878,425.00		-	29.92	1,565,863.20		-	-	-	-	-		-	29.92	1,565,863.20	25.08	52,335.00	1,312,561.80
NP-12	Suministro e instalación de Policarbonato alveolar 8 mm para cubierta curva, incluye conectores y accesorios para su correcta instalación. No incluye estructura de soporte.	m2	45.00	443,800.00	19,971,000.00		-	25.00	11,093,002.90		-	-	-	-	-		-	25.00	11,093,002.90	20.00	443,800.00	8,877,997.10
NP-13	Mantenimiento marquesina cubierta de vidrio acceso, incluye: Revisión general, limpieza perimetral y limpieza de vidrios.	m2	19.00	58,150.00	1,104,850.00		-		-	17.45	1,014,746.58	-	-	-	-		-	17.45	1,014,746.58	1.55	58,150.00	90,103.43
NP-14	Lavado e hidrofugado de fachadas, muros en piedra y/o acabado abuzardado	m2	282.00	51,032.00	14,391,024.00		-	216.78	11,062,716.96		-	-	-	-	-		-	216.78	11,062,716.96	65.22	51,032.00	3,328,307.04
NP-15	Suministro e instalacion de revestimiento interior de fachada en WPC Panel Casino, de acuerdo a muestra seleccionada.	m2	50.00	249,987.00	12,499,350.00		-	13.18	3,294,578.67	20.52	5,130,233.21	5.08	1,269,933.96	-	-		-	38.78	9,694,745.85	11.22	249,987.00	2,804,604.15
NP-16	Desmonte de aparatos sanitarios (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio (hasta 50 m) y desde sitio de acopio a escombrera).	und	60.00	40,607.00	2,436,420.00		-	25.00	1,015,175.00		-	-	-	-	-	13.00	527,891.00	38.00	1,543,066.00	22.00	40,607.00	893,354.00
NP-17	Desmonte de muro fachada imitacion madera (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera)	m2	10.00	16,161.00	161,610.00		-	9.92	160,317.12		-	-	-	-	-		-	9.92	160,317.12	0.08	16,161.00	1,292.88
NP-18	Suministro e instalación de sensor de presencia Infrarrojo 360° de cobertura, montaje en techo, detección de movimiento hasta 4 metros radiales a una altura de instalación de 2.4 metros.	und	30.00	210,035.00	6,301,050.00		-		-		-	5.00	1,050,175.00	-	-		-	5.00	1,050,175.00	25.00	210,035.00	5,250,875.00
NP-19	Suministro e instalación de enceres mobiles de inferior 220 X 90 X 63 y superior de 200X76X35 incluye campana extractora, puertas, manijas en acero tabular, bisagras de parche, entrepaños, patas de 8 cm y manija en acero tubular. Modulo torre hornos de 200 X 60 X 60 con dos puertas parte alta y dos cajones parte baja central para horno. Tapa barra de 130 x 50 con patas en acero de 100 cm y anclaje a la pared. Todo elaborado en melamina de 15mm, color arena o glacial fabricado e instalado.	UND	1.00	12,900,000.00	12,900,000.00		-	-	-	1.00	12,900,000.00	-	-	-	-		-	1.00	12,900,000.00	-	12,900,000.00	-
NP-20	Mesón en quartzone blanco polar con hueco para estufa y lavaplatos, incluye pulida, poceta, salpicadero 8 cm y estufa x 4 puestos challenger para uso con gas propano.	UND	1.00	6,850,000.00	6,850,000.00		-	-	-	1.00	6,850,000.00	-	-	-	-		-	1.00	6,850,000.00	-	6,850,000.00	-
NP-21	Suministro e instalación punto de gas propano para estufa de presidencia, en tubería pe al pe de 1/2" , con coraza de protección a la vista y accesorios de conexión con pases por muros. incluye suministro de 2 cilindros de 100 libras en gas propano, con valvula reguladora para cada cilindro, base (poyo) soporte para cilindros y caja metalica de protección de cilindros para la intemperie.	GLB	1.00	6,155,883.00	6,155,883.00		-	-	-	1.00	6,155,883.00	-	-	-	-		-	1.00	6,155,883.00	-	6,155,883.00	-
NP-22	Suministro e instalacion registro 1/2" agua potable	UND	5.00	89,688.00	448,440.00		-	-	-	2.00	179,376.00	1.00	89,688.00	-	-		-	3.00	269,064.00	2.00	89,688.00	179,376.00
NP-23	Jardineras artificiales de acuerdo a render incluye amarre plastico	ml	40.00	141,213.00	5,648,520.00		-	-	-	15.06	2,126,667.78	5.40	762,550.20	-	-		-	20.46	2,889,217.98	19.54	141,213.00	2,759,302.02
NP-24	Suministro e instalacion de extractor para cocina y baños (16 x 16 x 9 cm)	UND	20.00	196,410.00	3,928,200.00		-	-	-		-	9.00	1,767,690.00	-	-		-	9.00	1,767,690.00	11.00	196,410.00	2,160,510.00
NP-25	Demolicion de meson en grano de marmol de ventanilla bancolombia	UND	1.00	89,351.00	89,351.00		-	-	-	1.00	89,351.00	-	-	-	-		-	1.00	89,351.00	-	89,351.00	-
NP-26	Desmonte de aviso de fachada en recepción	UND	1.00	283,054.00	283,054.00		-	-	-	1.00	283,054.00	-	-	-	-		-	1.00	283,054.00	-	283,054.00	-
NP-27	Suministro e instalación de sanitario blanco institucional tipo adriatica o similar de entrada posterior no incluye pusch	UND	30.00	1,146,999.00	34,409,970.00		-	-	-	11.00	12,616,989.00	-	-	-	-		-	11.00	12,616,989.00	19.00	1,146,999.00	21,792,981.00
NP-28	Suministro e instalación lavamanos blanco tipo cascada de baru o similar, no incluye griferia no incluye push	UND	32.00	613,653.00	19,636,896.00		-	-	-	9.00	5,522,877.00	-	-	-	-		-	9.00	5,522,877.00	23.00	613,653.00	14,114,019.00
NP-29	Suministro e instalacion de carpa en lona para control de acceso en zona de recepcion	UND	1.00	3,605,351.00	3,605,351.00		-	-	-	1.00	3,605,351.00	-	-	-	-		-	1.00	3,605,351.00	-	3,605,351.00	-
NP-30	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	32.00	121,212.00	3,878,784.00		-	-	-	3.00	363,636.00	13.00	1,575,756.00	-	-		-	16.00	1,939,392.00	16.00	121,212.00	1,939,392.00
NP-31	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UND	30.00	163,414.00	4,902,420.00		-	-	-	1.00	163,414.00	10.00	1,634,140.00	-	-		-	11.00	1,797,554.00	19.00	163,414.00	3,104,866.00
NP-32	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	24.00	109,459.00	2,627,016.00		-	-	-	2.00	218,918.00	12.00	1,313,508.00	-	-		-	14.00	1,532,426.00	10.00	109,459.00	1,094,590.00

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 6

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

1-11-2025 AL 30-11-2025

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5,142,932,607.00
VALOR CORTE 06	$ 161,758,685.34
domingo, 30 de noviembre de 2025	

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 06			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
NP-33	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	8.00	129,358.00	1,034,864.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00	129,358.00	1,034,864.00
NP-34	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	62.00	148,502.00	9,207,124.00	-	-	-	-	10.00	1,485,020.00	-	-	-	-	48.00	7,128,096.00	58.00	8,613,116.00	4.00	148,502.00	594,008.00
NP-35	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UND	18.00	109,645.00	1,973,610.00	-	-	-	-	4.00	438,580.00	-	-	-	-	-	-	4.00	438,580.00	14.00	109,645.00	1,535,030.00
NP-36	RED SANITARIA PVC-S 4"	ml	410.00	74,903.00	30,710,230.00	-	-	-	-	17.80	1,333,273.40	-	-	-	-	174.08	13,039,114.24	191.88	14,372,387.64	218.12	74,903.00	16,337,842.36
NP-37	RED SANITARIA PVC-S 3"	ml	60.00	61,047.00	3,662,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	61,047.00	3,662,820.00
NP-38	RED SANITARIA PVC-S 2"	ml	80.00	49,310.00	3,944,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00	49,310.00	3,944,800.00
NP-39	RED SANITARIA PVC-VENTILACION 2"	ml	60.00	31,024.00	1,861,440.00	-	-	-	-	24.70	766,292.80	-	-	-	-	-	-	24.70	766,292.80	35.30	31,024.00	1,095,147.20
NP-40	Red suministro 1 1/4"	ml	35.00	36,089.00	1,263,115.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.00	36,089.00	1,263,115.00
NP-41	Red suministro 1"	ml	50.00	27,219.00	1,360,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	27,219.00	1,360,950.00
NP-42	Red suministro 3/4"	ml	60.00	20,862.00	1,251,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	20,862.00	1,251,720.00
NP-43	Red suministro 1/2"	ml	60.00	18,245.00	1,094,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	18,245.00	1,094,700.00
NP-44	Registro PVC-P 1 - 1/4"	UND	17.00	145,520.00	2,473,840.00	-	-	-	-	-	-	8.00	1,164,160.00	-	-	-	-	8.00	1,164,160.00	9.00	145,520.00	1,309,680.00
NP-45	Registro PVC-P 1"	UND	10.00	111,417.00	1,114,170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	111,417.00	1,114,170.00
NP-46	Trasiego incluye traslado a sitio de acopio en bolsas de aproximadamente 25 kilos	m3	50.00	52,788.00	2,639,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	52,788.00	2,639,400.00
NP-47	Construccion de Media caña en mortero 1:3	ml	350.00	47,181.00	16,513,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00	47,181.00	16,513,350.00
NP-48	Suministro e instalación orinal tipo gotta o similar de entrada posterior no incluye grigeria ni incluye pustch	un	6.00	1,037,619.00	6,225,714.00	-	-	-	-	-	-	4.00	4,150,476.00	-	-	-	-	4.00	4,150,476.00	2.00	1,037,619.00	2,075,238.00
NP-49	Desmonte de cubierta en lamina de zinc en cubierta de convenciones incluye estructura metalica de soporte, incluye retiro a sitio de acopio y disposición final.	m2	110.00	58,611.00	6,447,210.00	-	-	-	-	-	-	100.42	5,885,716.62	-	-	-	-	100.42	5,885,716.62	9.58	58,611.00	561,493.38
NP-50	Desmonte de ductos de aire acondicionado (incluye fibra de vidrio, transporte y disposición final)	ml	350.00	49,313.00	17,259,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00	49,313.00	17,259,550.00
NP-51	Desmonte de ductos de red contraincendio en tubería CPVC de varios diametros incluye soportería. (Incluye trasiego y disposición final)	ml	380.00	17,183.00	6,529,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.00	17,183.00	6,529,540.00
NP-52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Impermeabilización de placa poliurea pura RESISTENTE A RAYOS UV DANOCOAT 250 incluye suministro y aplicación de POLIUREA en 80 MILS +-10%, ESPESOR TEXTURIZADA PREVIA IMPRIMACION EPOXICA BICOMPONENTE CON ARENA DE QUARZO EN UNA CAPA (si se requieren más se cobrarán por aparte), INCLUYE REACTOR GRACO, MATERIALES Y EQUIPOS CERTIFICADOS, PREVIO tratamiento de fisuras existentes. Acabado original gris cambia por rayos UV. Suministro y aplicación esmalte uretano gris o blanco resistente a Rayos UV color homogéneo como protección del sistema Poliurea.	M2	1,136.80	225,935.00	256,842,908.00	-	-	-	-	-	-	-	-	994.57	224,708,172.95	-	-	994.57	224,708,172.95	142.23	225,935.00	32,134,735.05
NP-53	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRATO DE MORTERO SECO CON BAJO CONTENIDO DE AGUA PARA NIVELACION DE CUBIERTAS CON ESPESORES PROMEDIO DE 8cm, SOBRE SUPERFICIE IRREGULAR RESULTADO DE DEMOLICION DE ELEMENTOS NO DESMONTADOS Y RETIRADOS EN LAS AREAS A INTERVENIR zona de cubiertas, grantizando pendientes de desagues hacia los sifones. INCLUYE TRASIEGO DE MATERIALES A SITIOS DE FUNDIDAS	M2	1,100.00	138,890.00	152,779,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	768.71	106,766,131.90	-	-	768.71	106,766,131.90	331.29	138,890.00	46,012,868.10
NP-54	Demolicion de dados de concreto de 0.3 x 0.3 x 0.25 m, los cuales se encuentran en zona de cubierta incluye trasiego y disposición final.	Und	80.00	57,437.00	4,594,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00	4,594,960.00	-	-	80.00	4,594,960.00	-	57,437.00	-
NP-55	Desmonte de ducto de extrator incluye retiro 2 extractores tipo hongo incluye retiro y disposición final.	Und	3.00	223,054.00	669,162.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	223,054.00	669,162.00
NP-56	Desmonte de bandeja bandeja tipo escalera incluye cableado estructurado, cableado normal, cableado regulado y voz y datos correspondiente a alimentacion de puestos de trabajo existentes (incluye clasificación y entrega a la Entidad)	ml	160.00	50,187.00	8,029,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00	50,187.00	8,029,920.00
NP-57	Suministro e instalación de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado de 30 x 10 x 1 m galvanizada con separador incluye curvas, soportería y conductor de tierra para bandeja.	ml	322.00	151,533.00	48,793,626.00	-	-	-	-	-	-	-	-	251.62	38,128,733.46	-	-	251.62	38,128,733.46	70.38	151,533.00	10,664,892.54
NP-58	Suministro e instalación de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado de 15 x 10 x 1 m galvanizada, incluye curvas, soportería y conductor de tierra para bandeja.	ml	172.00	129,520.00	22,277,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88.42	11,452,158.40	-	-	88.42	11,452,158.40	83.58	129,520.00	10,825,281.60
NP-59	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 " SEGÚN DISEÑO DESARROLLO DE HASTA 1m	Und	132.00	165,000.00	21,780,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	129.04	21,291,600.00	-	-	129.04	21,291,600.00	2.96	165,000.00	488,400.00
NP-60	Punto hidraulico para rociador automatico de 1/2"	Und	75.00	114,984.00	8,623,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00	8,623,800.00	-	-	75.00	8,623,800.00	-	114,984.00	-
NP-61	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	Und	75.00	63,827.00	4,787,025.00	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00	4,787,025.00	-	-	75.00	4,787,025.00	-	63,827.00	-
NP-62	Suministro e instalacion TEE MECANICA RANURADA DE 3" X 1 1/2"	Und	23.00	60,791.00	1,398,193.00	-	-	-	-	-	-	-	-	17.00	1,033,447.00	-	-	17.00	1,033,447.00	6.00	60,791.00	364,746.00
NP-63	Suministro e instalacion STRAP DE 3" X 1"	Und	35.00	52,687.00	1,844,045.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00	1,580,610.00	-	-	30.00	1,580,610.00	5.00	52,687.00	263,435.00
NP-64	Suministro e instalación de soporte tipo pera con varilla 3/8" con perno bean clamb para tubería 1"	Und	76.00	33,022.00	2,509,672.00	-	-	-	-	-	-	-	-	76.00	2,509,672.00	-	-	76.00	2,509,672.00	-	33,022.00	-
NP-65	Suministro e instalación de soporte tipo pera con varilla 3/8" con perno bean clamb para tubería 1-1/2"	Und	26.00	31,784.00	826,384.00	-	-	-	-	-	-	-	-	26.00	826,384.00	-	-	26.00	826,384.00	-	31,784.00	-
NP-66	Suministro e instalación de soporte tipo pera con varilla 3/8" con perno bean clamb para tubería 3"	Und	95.00	33,033.00	3,138,135.00	-	-	-	-	-	-	-	-	95.00	3,138,135.00	-	-	95.00	3,138,135.00	-	33,033.00	-
NP-67	Suministro e instalación de soporte transversal sismoresitente para tubería 3"	Und	22.00	234,807.00	5,165,754.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16.00	3,756,912.00	-	-	16.00	3,756,912.00	6.00	234,807.00	1,408,842.00
NP-68	Suministro e instalación de soporte LONGITUDINAL sismoresitente para tubería 3"	Und	20.00	202,663.00	4,053,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	4,053,260.00	-	-	20.00	4,053,260.00	-	202,663.00	-

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 6

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

1-11-2025 AL 30-11-2025

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5,142,932,607.00
VALOR CORTE 06	$ 161,758,685.34
domingo, 30 de noviembre de 2025	

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 06			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
NP-69	SOPORTE ANTISISMICO 4 VIAS	Und	6.00	389,851.00	2,339,106.00		-	-	-	-	-	-	-	6.00	2,339,106.00		-	6.00	2,339,106.00	-	389,851.00	-
NP-70	TUBERIA ACC ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y PINTURA)	ml	149.20	66,346.00	9,898,823.20		-	-	-	-	-	-	-	134.20	8,903,633.20	12.41	823,353.86	146.61	9,726,987.06	2.59	66,346.00	171,836.14
NP-71	Tuberia de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diametro 1-1/2", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	ml	52.25	100,995.00	5,276,988.75		-	-	-	-	-	-	-	28.55	2,883,407.25		-	28.55	2,883,407.25	23.70	100,995.00	2,393,581.50
NP-72	Tuberia de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diametro 3", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	ml	203.50	224,347.00	45,654,614.50		-	-	-	-	-	-	-	192.71	43,233,910.37		-	192.71	43,233,910.37	10.79	224,347.00	2,420,704.13
NP-73	Suministro e instalacion codo ranurado acero al Carbono ASTM-A53 SCH 40 diametro 3", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	Und	10.00	98,325.00	983,250.00		-	-	-	-	-	-	-	9.00	884,925.00		-	9.00	884,925.00	1.00	98,325.00	98,325.00
NP-74	Suministro e instalacion TEE ranurado acero al Carbono ASTM-A53 SCH 40 diametro 3", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	Und	9.00	144,525.00	1,300,725.00		-	-	-	-	-	-	-	8.00	1,156,200.00		-	8.00	1,156,200.00	1.00	144,525.00	144,525.00
NP-75	Suministro e instalación de estación de control para red contra incendios	Und	1.00	3,271,755.00	3,271,755.00		-	-	-	-	-	-	-	1.00	3,271,755.00		-	1.00	3,271,755.00	-	3,271,755.00	-
NP-76	Suministro e instalación de Gabinete Tipo 3 para red contra incendios	Und	1.00	2,442,914.00	2,442,914.00		-	-	-	-	-	-	-	1.00	2,442,914.00		-	1.00	2,442,914.00	-	2,442,914.00	-
NP-77	Suministro e instalación de ventosa automática para red contra incendios	Und	2.00	707,363.00	1,414,726.00		-	-	-	-	-	-	-	2.00	1,414,726.00		-	2.00	1,414,726.00	-	707,363.00	-
NP-78	Suministro e Instalacion AVISO 1 - INGRESO DE FUNCIONARIOS: Suministro e instalación de aviso tipo caja de luz, 15 cm de cantonera, logo en relieve acrilico, cantonera de 4 cm - iluminación LED - Textos en acrilico 4m sobre puestas con interruptor encendido y apagado. (7m*60cm)	Und	1.00	10,729,783.00	10,729,783.00		-	-	-	-	-	-	-	1.00	10,729,783.00		-	1.00	10,729,783.00	-	10,729,783.00	-
NP-79	Suministro e Instalacion AVISO 2 INTERNO - AVISO TEXTO - JUNTOS HACEMOS REALIDAD EL HOGAR DE LOS COLOMBIANOS - Suministro e instalación de aviso en acrilico 3mm letra a letra volumentrico - cantonera de 5 cm - . (3,2m*40cm)	Und	1.00	8,652,770.00	8,652,770.00		-	-	-	-	-	-	-	1.00	8,652,770.00		-	1.00	8,652,770.00	-	8,652,770.00	-
NP-80	Suministro e Instalacion AVISO 3 - LOGO INTERNO FNA - Suministro e instalación de aviso en acrilico 3mm letra a letra volumentrico - cantonera de 5 cm - (80cm*80cm)	Und	1.00	4,130,770.00	4,130,770.00		-	-	-	-	-	-	-	1.00	4,130,770.00		-	1.00	4,130,770.00	-	4,130,770.00	-
NP-81	Suministro e Instalacion AVISO 4 - LOGO INTERNO FNA - Suministro e instalación de aviso en acrilico 3mm letra a letra Volumentrico - cantonera de 5 cm - (120cm*120cm)	Und	1.00	4,844,770.00	4,844,770.00		-	-	-	-	-	-	-	1.00	4,844,770.00		-	1.00	4,844,770.00	-	4,844,770.00	-
NP-82	Suministro e instalación de señales en acrilico cal 3m + impresión digital full color - corte laser + instalación -(Opciones: hale, empuje, rack, baños mixtos, Ref Entrada FNA (11cm*29 cm))	Und	15.00	116,946.00	1,754,190.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	15.00	116,946.00	1,754,190.00
NP-83	Pañete impermeabilizado con mortero 1:3 y sika 1 o similar (no incluye lineales)	M2	380.00	42,254.00	16,056,520.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	380.00	42,254.00	16,056,520.00
NP-84	Pañete impermeabilizado con mortero 1:3 y sika 1 o similar	ML	450.00	23,802.00	10,710,900.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	450.00	23,802.00	10,710,900.00
NP-85	Placa contrapiso de 10 cm de espesor, en concreto de 2500 PSI, No ncluye acero de refuerzo	m2	30.00	78,487.00	2,354,610.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	30.00	78,487.00	2,354,610.00
NP-86	Mamposteria en bloque de arcilla no. 4 (no incluye lineales)	M2	110.00	64,001.00	7,040,110.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	110.00	64,001.00	7,040,110.00
NP-87	Mamposteria en bloque de arcilla no. 4 ancho max <0.70cm	ML	60.00	47,115.00	2,826,900.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	60.00	47,115.00	2,826,900.00
NP-88	Anclaje 1/2" L=50 cm	Und	300.00	26,778.00	8,033,400.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	300.00	26,778.00	8,033,400.00
NP-89	Viga de amarre de 0,12 x 0,20 NO incluye acero de refuerzo, alambre negro, incluye fomaleta y concreto de 2500 psi.	ML	100.00	63,817.00	6,381,700.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	100.00	63,817.00	6,381,700.00
NP-90	Columneta de confinamiento (0,12*0.20) NO incluye acero de refuerzo, alambre negro, INCLUYE fomaleta y concreto de 2500 psi.	ML	80.00	54,823.00	4,385,840.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	80.00	54,823.00	4,385,840.00
NP-91	Suministro e Instalacion de soporte para tuberia de 1/2" a 4" para tuberias hidrosanitarias	Und	130.00	27,237.00	3,540,810.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	130.00	27,237.00	3,540,810.00
NP-92	Dovela en concreto tipo gruting de 3000 psi NO incluye acero de refuerzo	ML	75.00	8,375.00	628,125.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	75.00	8,375.00	628,125.00
NP-93	Construccion de Placa de entrepiso de 2.5 m x 2.5 m, con lámina colaborante 2", cal 22, h=10cm de acuerdo a detalle expresado en justificacion, incluye acero de refuerzo, concreto de 3000 psi y lamina colaborante (Incluye Cerramiento de protección en tercer piso, trasciego de insumos por 4 pisos en sentido vertical y 50 m en sentido horizontal)	UND	2.00	2,496,403.00	4,992,806.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	2.00	2,496,403.00	4,992,806.00

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 6

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

1-11-2025 AL 30-11-2025

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5,142,932,607.00
VALOR CORTE 06	$ 161,758,685.34
domingo, 30 de noviembre de 2025	

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 06			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
NP-94	Demolición de muro en mampostería en bloque de arcilla de 15 cm (incluye trasciego de materiales desde unas distantancias superiores a 50 ml y niveles superiores a un piso a punto de acopio de acuerdo a horarios establecidos por entidad)	M2	80.00	28,701.00	2,296,080.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00	28,701.00	2,296,080.00
NP-95	Desmonte de ductos de extracción de aire desde terraza hasta nivel de piso cuarto piso (Cerramiento preventivo en 3 piso, ductos de 1,60*0,90. Incluye trasiego desde cubierta ubicada a cinco pisos y disposición final).	ML	20.00	210,361.00	4,207,220.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	210,361.00	4,207,220.00
NP-96	Suministro e instalacion de gravilla lavada para transiciones entre enchapes y / o pisos laminados o urbanismo (ancho promedio 15 cm)	ML	100.00	72,837.00	7,283,700.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	72,837.00	7,283,700.00
NP-97	Desmonte de antena existente (incluye trasiego y disposición)	Und	1.00	2,558,429.00	2,558,429.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	2,558,429.00	2,558,429.00
NP-98	Mampostería en bloque de arcilla estructural No. 4 de perforacion vertical (no incluye linealles, ni elementos no estructurales)	M2	60.00	70,975.00	4,258,500.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	70,975.00	4,258,500.00
NP-99	Mampostería en bloque de arcilla estructural No. 4 de perforacion vertical, ancho max <0.60 cm (No incluye elementos no estructurales)	ML	20.00	51,514.00	1,030,280.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	51,514.00	1,030,280.00
NP-100	Suministro e instalacion de lineal en super board contra la ventaneria existente	Ml	300.00	93,616.00	28,084,800.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	93,616.00	28,084,800.00
NP-101	Suministro e instalacion de Marco para luminaria led de 60 x 60 para cielo raso en Dry Wall	UND	350.00	77,136.00	26,997,600.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00	77,136.00	26,997,600.00
NP-102	Suministro e instalacion de Espejo en 4mm con bordes pulidos,brillados y flotado con tubular en aluminio con luz led calida de 120 v	M2	35.00	550,099.00	19,253,465.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.00	550,099.00	19,253,465.00
NP-103	Suministro e instalación de platina 150x150x6 mm con tornillo pasante de 1/2" L=0,40m, 6 tuercas y arandelas para instalación de estructura metalica de los micro ondas	UND	12.00	132,577.00	1,590,924.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	132,577.00	1,590,924.00
NP-104	Suministro e instalacion de luminaria led de 60 x 60 de 4000 k NO INCLUYE marco para luminaria de 60 x 60 para cielo raso en Dry Wall	UND	350.00	171,691.00	60,091,850.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00	171,691.00	60,091,850.00
NP-105	Desmonte de puerta de vidrio laminado 5+5 MM, trasiego a punto de acopio y disposicion final a botadero certificado, suministro e instalacion de puerta en vidrio templado laminado 5 + 5 MM, con pelicula tipo bronce, incluye reinstalacion de postes de giro e instalacion de topes de piso, adecuación a los herrajes existentes (Incluye el transporte e instalación en horario nocturno).	M2	7.00	1,715,072.00	12,005,504.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.00	1,715,072.00	12,005,504.00
NP-106	Ajuste de puertas de acceso en vidrio templado incluye cambio de montante y cambio de bisagras hidráulicas	M2	35.00	1,343,902.00	47,036,570.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.00	1,343,902.00	47,036,570.00
NP-107	Suministro e instalacion de Tapa registro en acero inoxidable de 30 x 30 cm incluye mortero de caja, estuco y pintura	Und	20.00	290,521.00	5,810,420.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	290,521.00	5,810,420.00
NP-108	Suministro de mesón para cubierta de lavamanos con perforaciones para poceta de sobre poner en Quarzstone Blanco Polar de 0.80 x0.55 mt, con baberos de 30 cms a los costados, salpicadero de 80 cms x 8 cms y frente con reengruese de 5 cms y tapa frontal en sinterizado color madera, instalación con pie de amigo. (Recepción)	Und	1.00	1,876,500.00	1,876,500.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1,876,500.00	1,876,500.00
NP-109	Suministro e instalacion de mesón para lavamanos con perforaciones para poceta de sobre poner en Quarzstone Blanco Polar de 55 cm de ancho con baberos laterales y frontal de 30 cms con su respectivo salpicadero en escuadra de 8 cms, fijado con pie de amigo.	ml	50.00	1,359,000.00	67,950,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	1,359,000.00	67,950,000.00
NP-110	Suministro de caseta para puesto de vigilancia temporal en zona de acceso vehicular y rehubicable en cualquier sector que disponga la entidad, en estructura metalica calibre 18 con pintura esmalte negra.	UND	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
NP-111	Suministro e instalación de sanitario SMART AL SINGLE BLANCO o similar	UND	1.00	714,259.00	714,259.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	714,259.00	714,259.00
NP-112	Construccion de cajas de inspeccion sanitarias DE 80 X 80, incluye marco y tapa	UND	1.00	721,565.00	721,565.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	721,565.00	721,565.00
NP-113	Suministro, corte, doblado e instalación acero figurado 60000 PSI	Kg	250.00	7,899.00	1,974,750.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00	7,899.00	1,974,750.00
NP-114	Suministro e instalación de pirlan en aluminio de 5.5 cm de ancho fijado con chazo puntilla	Ml	40.00	53,466.00	2,138,640.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00	53,466.00	2,138,640.00
NP-115	Suministro e instalacion dilatación dry wall en Z	ML	1,000.00	19,049.00	19,049,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	19,049.00	19,049,000.00
NP-116	Refuerzo filos y dilataciones en muros y columnas	ML	600.00	16,823.00	10,093,800.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	16,823.00	10,093,800.00

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 6

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

1-11-2025 AL 30-11-2025

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5,142,932,607.00
VALOR CORTE 06	$ 161,758,685.34
domingo, 30 de noviembre de 2025	

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 06			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
NP-117	Resanes y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre pañete o repello liso. A todo costo.	ML	800.00	23,356.00	18,684,800.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	23,356.00	18,684,800.00
NP-118	Presurización de la RCI mediante cargue de la red, para evaluación de la resistencia de las tuberías, uniones, válvulas y accesorios frente a presiones superiores a las de operación normal, según normas como NFPA 24 y NFPA 13 o ASME B31.1, bajo pruebas hidrostáticas a no menos de 200 psi (13.8 bar)	M2	1,000.00	4,166.00	4,166,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	4,166.00	4,166,000.00
					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL COSTO DIRECTO				4,170,058,061.02		399,961,521.14		102,051,339.62		185,989,734.01		236,145,459.15		590,529,172.18		131,159,235.65		1,645,836,461.12		COSTO DTO	2,524,221,599.90
	ADMINISTRACIÓN		12.00%		500,406,967.32	A.I.U.	47,995,382.54	A.I.U.	12,246,160.75	A.I.U.	22,318,768.08	A.I.U.	28,337,455.10	A.I.U.	70,863,500.66	A.I.U.	15,739,108.28	A.I.U.	197,500,375.33	A.I.U.	ADMON.	302,906,591.99
	IMPREVISTOS		3.00%		125,101,741.83		11,998,845.63		3,061,540.19		5,579,692.02		7,084,363.77		17,715,875.17		3,934,777.07		49,375,093.83		IMPREVISTOS	75,726,648.00
	UTILIDAD		7.00%		291,904,064.27		27,997,306.48		7,143,593.77		13,019,281.38		16,530,182.14		41,337,042.05		9,181,146.50		115,208,552.28		UTILIDAD	176,695,511.99
	IVA SOBRE UTILIDAD		19.00%		55,461,772.21		5,319,488.23		1,357,282.82		2,473,663.46		3,140,734.61		7,854,037.99		1,744,417.84		21,889,624.93		IVA / UTILIDAD	33,572,147.28
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				972,874,545.63		93,311,022.88		23,808,577.53		43,391,404.94		55,092,735.62		137,770,455.87		30,599,449.69		383,973,646.37		INDIRECTOS	588,900,899.26
	VALOR TOTAL PROYECTO				5,142,932,607.00		493,272,544.00		125,859,917.00		229,381,139.00		291,238,195.00		728,299,628.05		161,758,685.34		2,029,810,107.49		VALOR TOTAL	3,113,122,499.16
			CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 05				CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		ACUMULADO CORTES			VALOR POR EJECUTAR

ESTADO DE PAGOS DE CONTRATISTA

ACTA No.	PERIODO	ESTADO	VALOR CORTES	PORCENTAJE	PAGADO	SALDO
	VALOR CONTRATO		$ 5,142,932,606		–	$ 5,142,932,606
1	(07 MARZO AL 30 ABRIL DE 2025)	PAGADO	$ 493,272,544.00	9.59%	$ 493,272,544.00	$ 4,649,660,062.00
2	(01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2025)	PAGADO	$ 125,859,917.00	2.45%	$ 619,132,461.00	$ 4,523,800,145.00
3	(01 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2025)	PAGADO	$ 229,381,139.00	4.46%	$ 848,513,600.00	$ 4,294,419,006.00
4	(01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025)	PAGADO	$ 291,238,195.00	5.66%	$ 1,139,751,795.00	$ 4,003,180,811.00
5	(01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025)	PAGADO	$ 728,299,628.05	14.16%	$ 1,868,051,423.05	$ 3,274,881,182.95
6	(01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025)	TRAMITE	$ 161,758,685.34	3.15%	$ 2,029,810,108.39	$ 3,113,122,497.61
	TOTAL		$ 2,029,810,108.39	39.47%	$ 2,029,810,108.39	

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 131,159,235.65
ADMINISTRACIÓN	12.00%	15,739,108.28
IMPREVISTOS	3.00%	3,934,777.07
UTILIDAD	7.00%	9,181,146.50
IVA SOBRE UTILIDAD	19.00%	1,744,417.84
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 30,599,449.69
VALOR TOTAL CORTE 06 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE		$ 161,758,685.34

ING. JEFFERSON BOHORQUEZ LEGMES
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA
INGEBYP S.A.S. / CTO FNA - 166 - 2024

ING. RICARDO ACEVEDO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA
BIODECCO S.A.S. / CTO FNA - 022 - 2025

ING. RODOLFO ENRIQUE BARRETO VARGAS
COORDINADOR OBRA
INGEBYP S.A.S. / CTO FNA - 166 - 2024

ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR INTERVENTORIA
BIODECCO S.A.S. / CTO FNA - 022 - 2025

Dr. VANESA PACHECO GOMEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR CTO INTERVENTORÍA FNA 022 2025
FONDO NACIONAL DEL AHORRO FNA SA


ING. JAIME HERNANDO PRIETO
PROFESIONAL EJECUTIVO NIVEL 2
APOYO SUPERVISIÓN CTO INTERVENTORÍA FNA 022 2025
FONDO NACIONAL DEL AHORRO FNA SA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 04			INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2- FNA			
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	1 DE 2

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			**ACTA PARCIAL**	4	**FECHA** 30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	4.4.	**DESCRIPCION ITEM:**	Desmonte de divisiones metálicas para baños. Incluye soportería, tornillos, herrajes, retiro y disposición final.		**UNIDAD:**	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

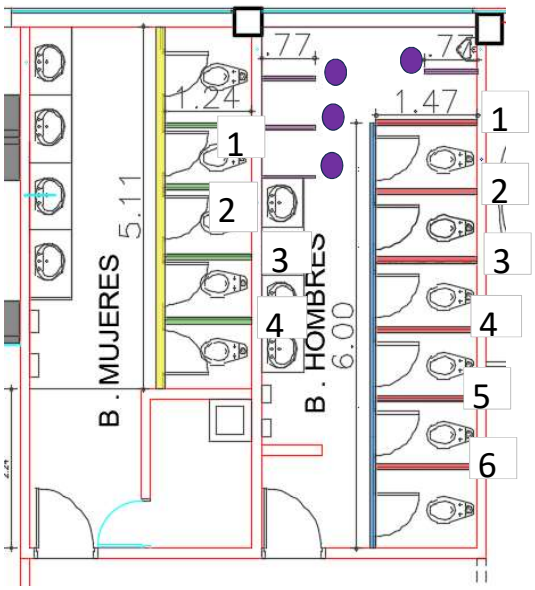

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	Nº ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					-
BAÑO HOMBRES					-
ENTREPAÑOS	1,80		1,47	6,00	15,88
FRONTAL BAÑO	1,80		6,00	1,00	10,80
DISION BAÑO ORINALES	0,90		0,77	4,00	2,77
BAÑO MUJERES					-
ENTREPAÑOS	1,80		1,24	4,00	8,93
FRONTAL BAÑO	1,80		5,11	2,00	18,40
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	56,78
				VIENE	-
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADO	56,78
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3	- 41,53
				PRESENTE ACTA	15,25

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:	

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS **COORDINADOR DE PROYECTO**	**ING. FABIAN BOHORQUEZ** **GERENTE DE OBRA**	**ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN** **COORDINADOR DE INTERVENTORIA**

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 04			INGEBYP NIT. 830.121.807-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA			
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	2 DE 2

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			**ACTA PARCIAL**	4	**FECHA** 30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	4.4.	**DESCRIPCION ITEM:**	Desmonte de divisiones metálicas para baños. Incluye soportería, tornillos, herrajes, retiro y disposición final.		**UNIDAD:**	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS **COORDINADOR DE PROYECTO**	**ING. FABIAN BOHORQUEZ** **GERENTE DE OBRA**	**ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN** **COORDINADOR DE INTERVENTORIA**

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 04				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	1 DE 2	

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBY S.A.S			**ACTA PARCIAL**	4	**FECHA** 30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	1.1.	**DESCRIPCION ITEM:**	Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.		**UNIDAD:**	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

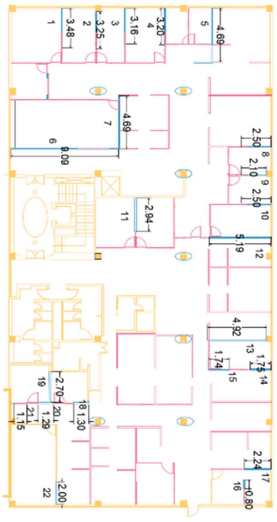

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	Nº ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Cuarto PISO edificio Convenciones					-
Muro 1	2,38		3,48	1,00	8,28
Muro 2	2,38		3,25	1,00	7,74
Muro 3	2,38		3,16	1,00	7,52
Muro 4	2,38		3,20	1,00	7,62
Muro 5	2,38		4,69	1,00	11,16
Muro 6	1,13		9,09	1,00	10,27
Muro 7	2,38		4,69	1,00	11,16
Muro 8	2,38		2,50	1,00	5,95
Muro 9	2,38		2,10	1,00	5,00
Muro 10	2,38		2,50	1,00	5,95
Muro 11	2,38		2,94	1,00	7,00
Muro 12	2,38		5,19	1,00	12,35
Muro 13	2,38		4,92	1,00	11,71
Muro 14	2,38		1,75	1,00	4,17
Muro 15	2,38		1,74	1,00	4,14
Muro 16	2,38		0,80	1,00	1,90
Muro 17	2,38		2,24	1,00	5,33
Muro 18	1,13		1,30	1,00	1,47
Muro 19	2,38		2,70	1,00	6,43
Muro 20	2,38		1,29	1,00	3,07
Muro 21	2,38		1,15	1,00	2,74
Muro 22	2,38		2,00	1,00	4,76
(columna)	2,38		3,35	6,00	47,84
					-
					-
				SUBTOTAL	193,56
				VIENE	-
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADO	193,56
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3	- 55,96
				PRESENTE ACTA	137,60

REGISTRO FOTOGRÁFICO

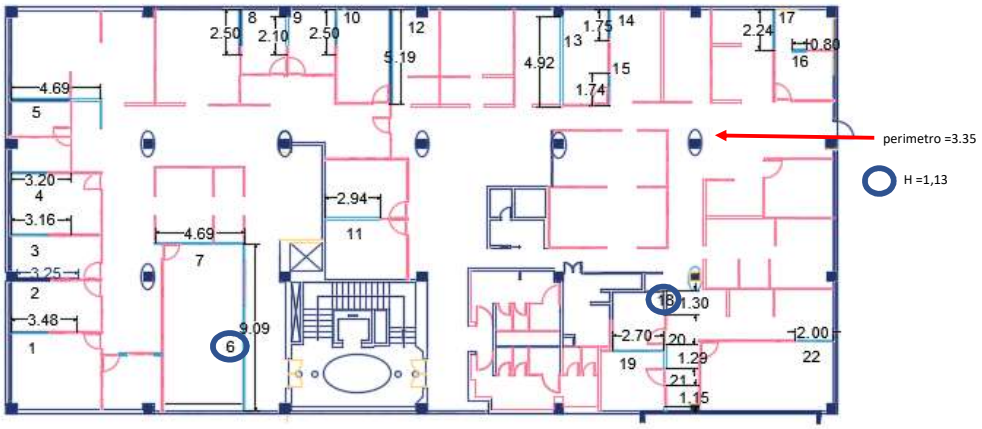

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

	ACTA PARCIAL No. 04			
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA			
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	2 DE 2

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			**ACTA PARCIAL**	4	**FECHA** 30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	1.1.	**DESCRIPCION ITEM:**	Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.		**UNIDAD:**	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS **COORDINADOR DE PROYECTO**	**ING. FABIAN BOHORQUEZ** **GERENTE DE OBRA**	**ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN** **COORDINADOR DE INTERVENTORIA**

ACTA PARCIAL No. 06


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	1 DE 2

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA	30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	1.2.	DESCRIPCION ITEM:	Pintura exterior tipo coraza para muros sobre pañete incluye toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

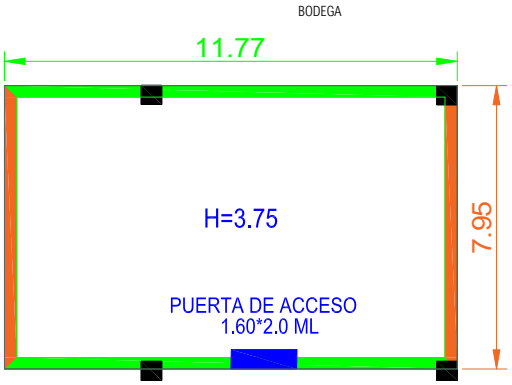

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					-
EDIFICIO CONVENCIONES					-
PUNTO FIJO					-
MUROS LONGITUDINALES					-
MURO 1	3,20		8,88	1,00	28,42
PUERTAS DE ACCESSO	2,00		0,70	-4,00	- 5,60
MURO 2	3,75		3,33	1,00	12,49
MURO 2 REJILLA	2,78		2,80	-1,00	- 7,78
MURO 3	3,75		15,35	1,00	57,56
PUERTAS DE ACCESSO	2,00		0,98	-1,00	- 1,96
MURO 4	3,75		8,33	1,00	31,24
MURO 4 REJILLA	1,35		1,25	-1,00	- 1,69
MURO 5	3,75		6,50	1,00	24,38
MURO 5 PUERTAS DE ACCESSO	2,18		1,06	-1,00	- 2,31
MURO 5 VENTANA	1,20		1,40	-1,00	- 1,68
MURO 6	3,75		4,67	1,00	17,51
MURO 6 REJILLA	1,32		1,34	-1,00	- 1,77
BODEGA					-
MUROS LONGITUDINALES	3,75		11,77	2,00	88,28
MUROS CORTOS	3,75		7,95	2,00	59,63
PUERTA DE ACCESO	2,00		1,60	-1,00	- 3,20
				SUBTOTAL	293,52
				VIENE	100,11
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	393,63
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 4	- 100,11
				PRESENTE ACTA	293,52

REGISTRO FOTOGRÁFICO

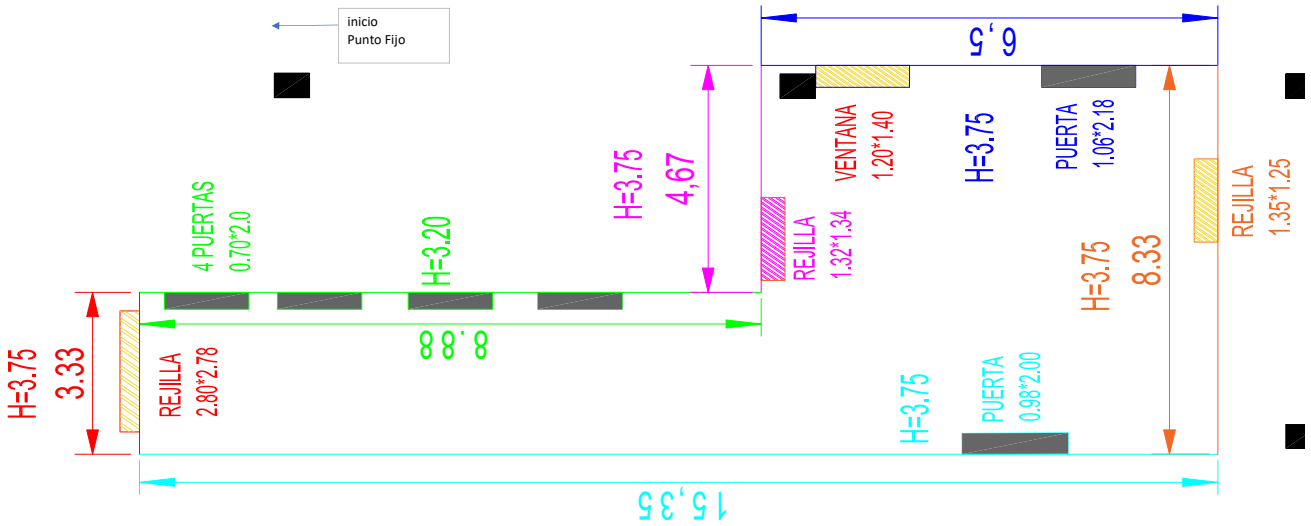

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 06				INGEBYP NIT. 830.121.507-2	
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA					
	PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025		HOJA	2 DE 2	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA 30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	1.2.	DESCRIPCION ITEM:	Pintura exterior tipo coraza para muros sobre pañete incluye toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.		UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO






REGISTRO FOTOGRÁFICO






REGISTRO FOTOGRÁFICO



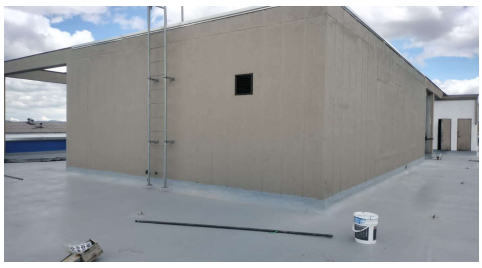


OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 06


MEMORIAS DE CANTIDADES - CAPITULOS GENERALES - PRIMER PISO - EDIFICIO DE TECNOLOGIA FNA

PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA 30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	4.1.	DESCRIPCION ITEM:	Cambio de válvula antivandálica de empotrar tipo push para sanitarios institucionales de consumo de agua 4.85 lpf (1.28 gpf) tipo corona o similar. Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. A todo costo con la instalación de un enchape de similares caracteristicas a las originales.		UNIDAD:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

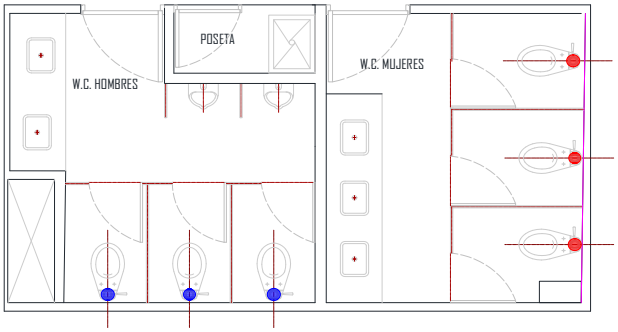

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					-
EDIFICIO TECNOLOGIA					-
BAÑO MUJERES				3,00	3,00
BAÑO HOMBRES				3,00	3,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	6,00
				VIENE	11,00
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	17,00
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 5	- 11,00
				PRESENTE ACTA	6,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 06


MEMORIAS DE CANTIDADES - CAPITULOS GENERALES - PRIMER PISO - EDIFICIO DE TECNOLOGIA FNA

PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025		HOJA	1 DE 2	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA 30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	4,2	DESCRIPCION ITEM:	Cambio de grifería para lavamanos de empotrar a muro tipo push aplicación institucional de consumo 0,4 - 1.9 litros, tipo corona o similar incluye desmonte y reinstalación de aparatos. A todo costo con la instalación de un enchape de similares caracteristicas a las originales.		UNIDAD:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

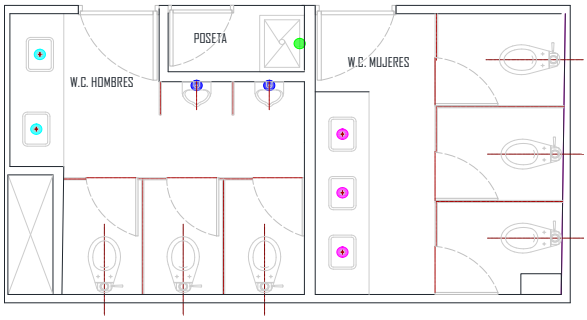

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					-
EDIFICIO TECNOLOGIA					-
BAÑO MUJERES					-
LAVAMANOS				3,00	3,00
					-
BAÑO HOMBRES					-
LAVAMANOS				2,00	2,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	5,00
				VIENE	10,00
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	15,00
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 5	- 9,00
				PRESENTE ACTA	6,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 06


MEMORIAS DE CANTIDADES - CAPITULOS GENERALES - PUNTO DE ATENCION PRIMARIO - PISO 1 - EDIFICIO CNA FNA

PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	2 DE 2

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA 30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	4,2	DESCRIPCION ITEM:	Cambio de grifería para lavamanos de empotrar a muro tipo push aplicación institucional de consumo 0,4 - 1.9 litros, tipo corona o similar incluye desmonte y reinstalación de aparatos. A todo costo con la instalación de un enchape de similares caracteristicas a las originales.	UNIDAD:	M2	

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

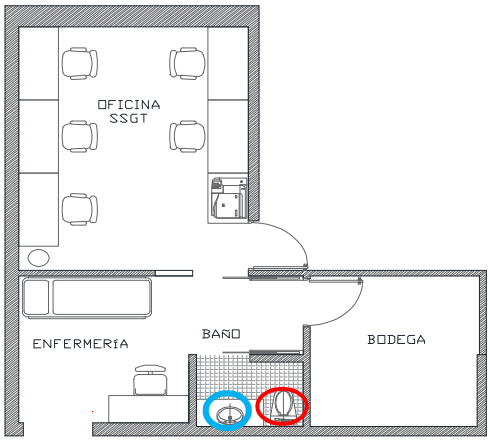

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					-
EDIFICIO CNA					-
PUNTO DE ATENCION PRIMARIO					-
LAVAMANO				1,00	1,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	1,00
				VIENE	9,00
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	10,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

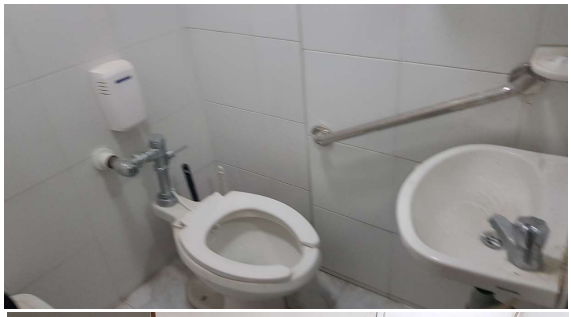





OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 06


MEMORIAS DE CANTIDADES - CAPITULOS GENERALES - PRIMER PISO - EDIFICIO DE TECNOLOGIA FNA

PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA	30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	4.3.	DESCRIPCION ITEM:	Cambio de válvula antivandálica de empotrar tipo push para orinales institucionales de consumo de agua 0.5 a 1.9 lpf (0.13 a 0.5 gpf). tipo corona o similar. Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. A todo costo con la instalación de un enchape de similares caracteristicas a las originales.		UNIDAD:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

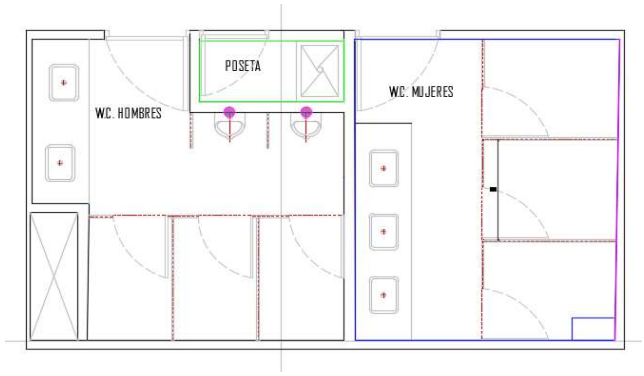


LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					-
EDIFICIO TECNOLOGIA					-
BAÑO HOMBRES					-
ORINALES				2,00	2,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	2,00
				VIENE	4,00
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	6,00
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 5	- 4,00
				PRESENTE ACTA	2,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





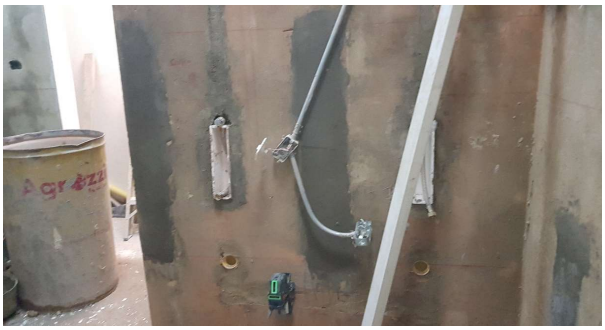

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 06


MEMORIAS DE CANTIDADES - CAPITULOS GENERALES - CUARTO PISO - EDIFICIO DE CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA 30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	5.1.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de puerta en madera de 1.44 m x2.47 m, incluye marco y retiro.		UNIDAD:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

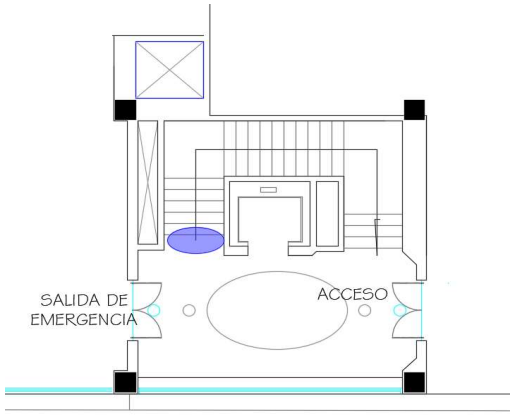


LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					-
Convenciones cuarto piso					-
ACCESO CUBIERTA				1,00	1,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	1,00
				VIENE	-
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	1,00
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 5	-
				PRESENTE ACTA	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





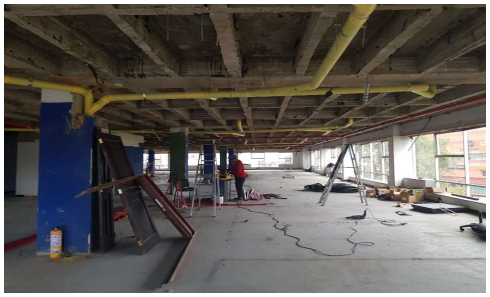

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 06


MEMORIAS DE CANTIDADES - SEGUNDO PISO - CNA FNA

PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	1 DE 2

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA 30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	1,1	DESCRIPCION ITEM:	Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					-
EDICIO CNA PISO 2					-
1	2,43	4,60		1,00	11,18
2	2,43	4,64		1,00	11,28
3	2,43	6,25		1,00	15,19
4	2,43	6,25		1,00	15,19
5	2,43	6,25		1,00	15,19
6	2,43	2,95		1,00	7,17
	2,21	0,90		- 1,00	- 1,99
	2,21	1,57		- 1,00	- 3,47
7	2,43	7,24		1,00	17,59
	2,21	2,07		- 1,00	- 4,57
	2,21	2,31		- 1,00	- 5,11
	2,21	0,90		- 1,00	- 1,99
8	2,43	3,22		1,00	7,82
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					83,48
VIENE					-
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					83,48
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 5					-
PRESENTE ACTA					83,48

REGISTRO FOTOGRÁFICO

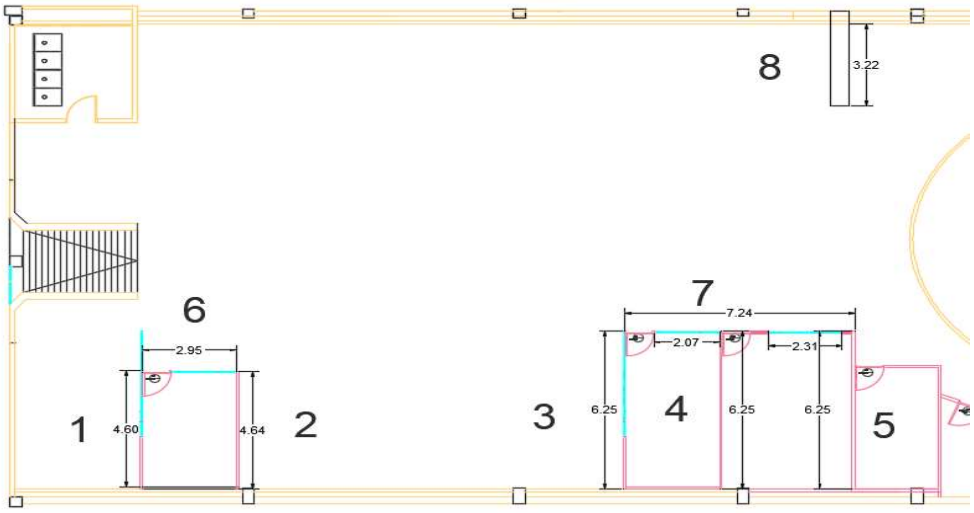

OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 06				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - SEGUNDO PISO - CNA FNA				
	PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	2 DE 2	

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA 30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	1,1	DESCRIPCION ITEM:	Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.		UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 06


MEMORIAS DE CANTIDADES - SEGUNDO PISO - CNA FNA

PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	1 DE 2

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S	ACTA PARCIAL	6	FECHA	30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO				
ITEM No.	1,2	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					-
EDICIO CNA PISO 2					-
6					-
	2,21	0,90		1,00	1,99
	2,21	1,57		1,00	3,47
7					-
	2,21	2,07		1,00	4,57
	2,21	2,31		1,00	5,11
	2,21	0,90		1,00	1,99
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					17,13
VIENE					-
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					17,13
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 4					-
PRESENTE ACTA					17,13

REGISTRO FOTOGRÁFICO

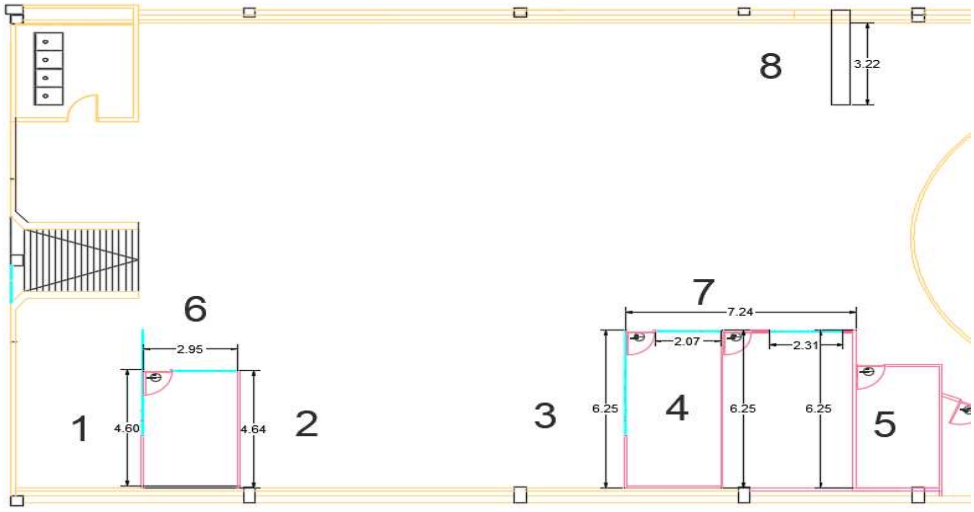

OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 06				INGEBYP NIT. 830.131.607-3
	MEMORIAS DE CANTIDADES - SEGUNDO PISO - CNA FNA				
	PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	2 DE 2	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA 30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	1,2	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.		UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 06


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	1 DE 2

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S	ACTA PARCIAL	6	FECHA	30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO				
ITEM No.	1.3.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros.	UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					-
EDICIO CNA PISO 2					-
DIAGONAL		5,87	19,50	4,00	457,86
HORIZONTAL		2,33	19,50	4,00	181,74
VERTICAL		1,00	19,50	3,00	58,50
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					698,10
VIENE					-
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					698,10
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 4					-
PRESENTE ACTA					698,10

REGISTRO FOTOGRÁFICO

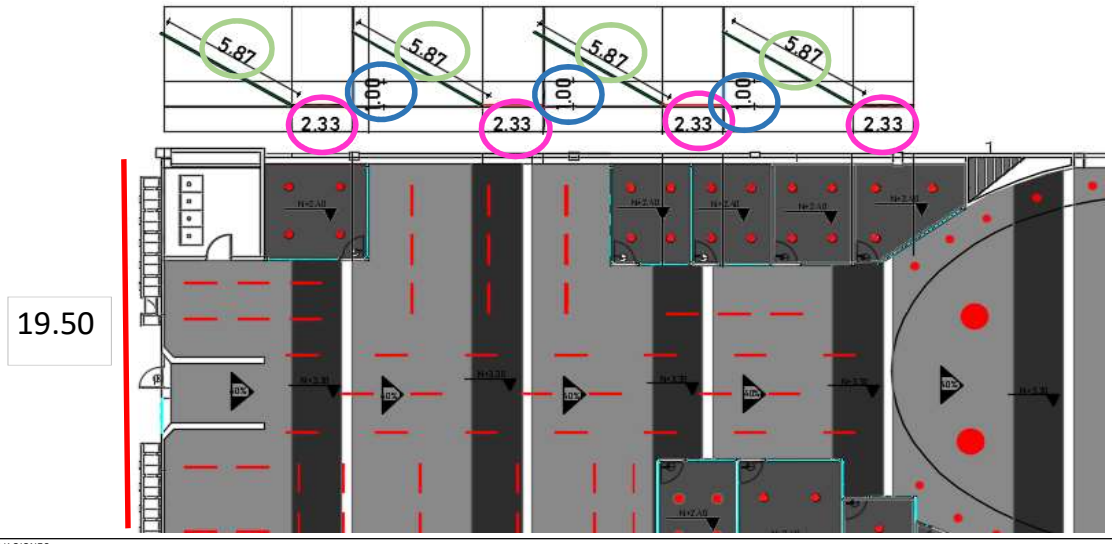

OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 06				INGEBYP NIT. 830.131.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	2 DE 2	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA 30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	1.3.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros.		UNIDAD:	M2


REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO



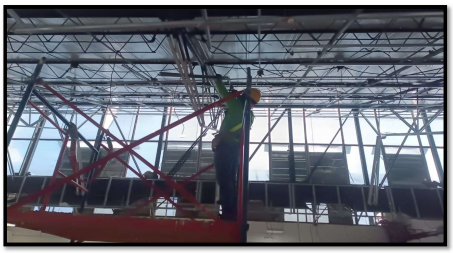


OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA


ACTA PARCIAL No. 06

MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA


PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	1 DE 2

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA 30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	1.4.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de redes eléctricas existentes. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
						-
	EDICIO CNA PISO 2					-
						-
	COSTADO NORTE				0,33	0,33
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	0,33
					VIENE	-
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	0,33
					COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 4	-
					PRESENTE ACTA	0,33

REGISTRO FOTOGRÁFICO

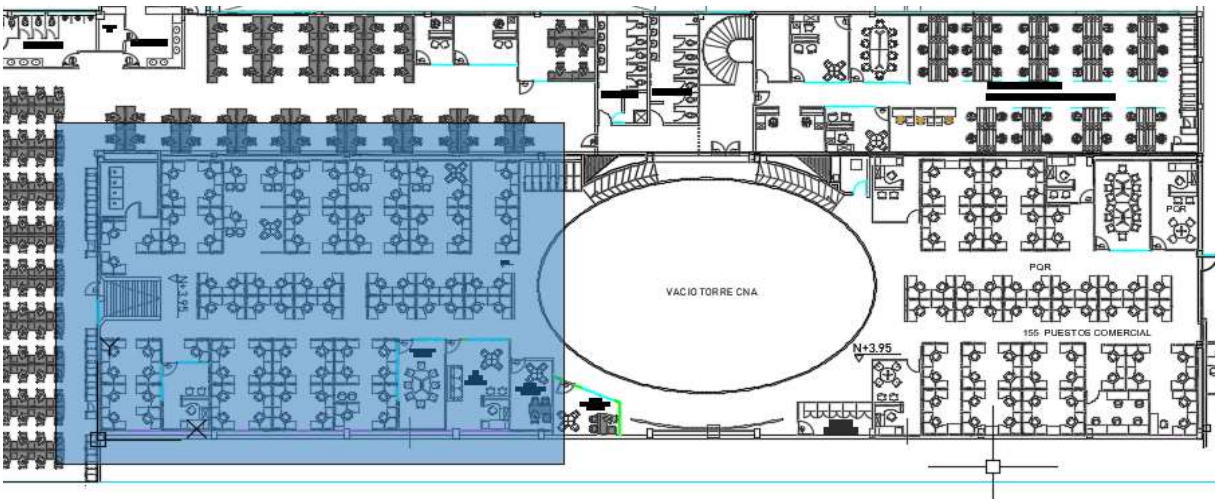

OBSERVACIONES:
La medida corresponde a la tercera parte del área intervenida



Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 06				INGEBYP NIT. 830.131.607-3
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	2 DE 2	

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA 30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	1.4.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de redes eléctricas existentes. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.		UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO


REGISTRO FOTOGRÁFICO



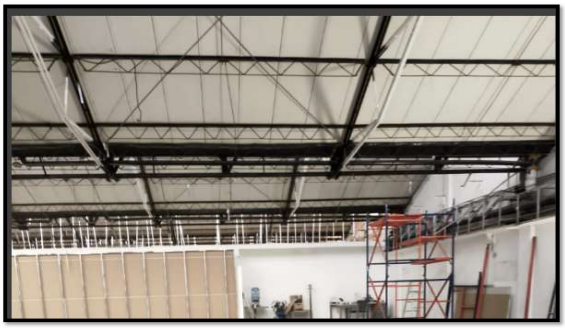


OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 06					INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA					
	PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025		HOJA	1 DE 2	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA 30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	1.5.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
						-
	EDICIO CNA PISO 2					-
	VICEPRECIDENCIA JURIDICA				26,00	26,00
	GERENCIA DE MERCADEO Y COMUNICACIONES				42,00	42,00
	GRUPO COLABORATIVO PRESIDENCIA				8,00	8,00
	COMERCIAL ZONA 2				6,00	6,00
	GERENCIA DE REPRESENTACION JUDICIAL				6,00	6,00
	GERENCIA DE PUNTOS DE ATENCION				8,00	8,00
	GERENCIA ASESORIA Y CONCEPTOS				8,00	8,00
	COMERCIAL ZONA 1				2,00	2,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	106,00
					VIENE	-
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	106,00
					COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 4	-
					PRESENTE ACTA	106,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

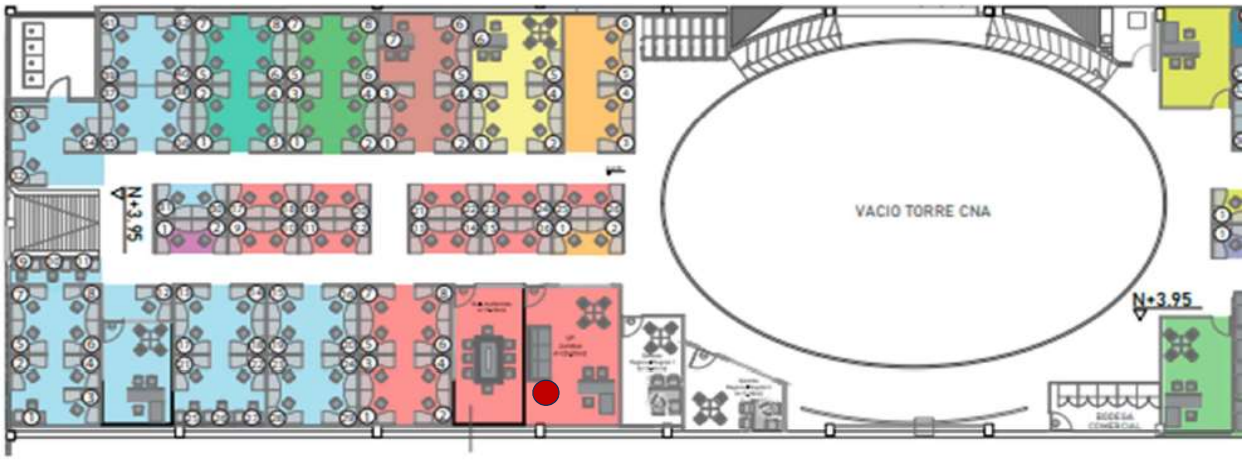

OBSERVACIONES:



Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 06					INGEBYP NIT. 830.131.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA					
	PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025		HOJA	2 DE 2	

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA 30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	1.5.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.		UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO


REGISTRO FOTOGRÁFICO



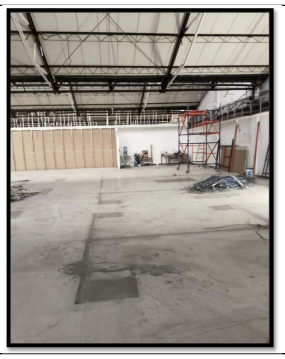

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA


ACTA PARCIAL No. 06

MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA


PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	1 DE 2

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA 30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	1.6.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo.		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
						-
	Convenciones cuarto piso					-
		2,60		10,20		26,52
		2,60		2,94		7,64
		2,60		1,87		4,86
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	39,02
					VIENE	-
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	39,02
					COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 4	-
					PRESENTE ACTA	39,02

REGISTRO FOTOGRÁFICO

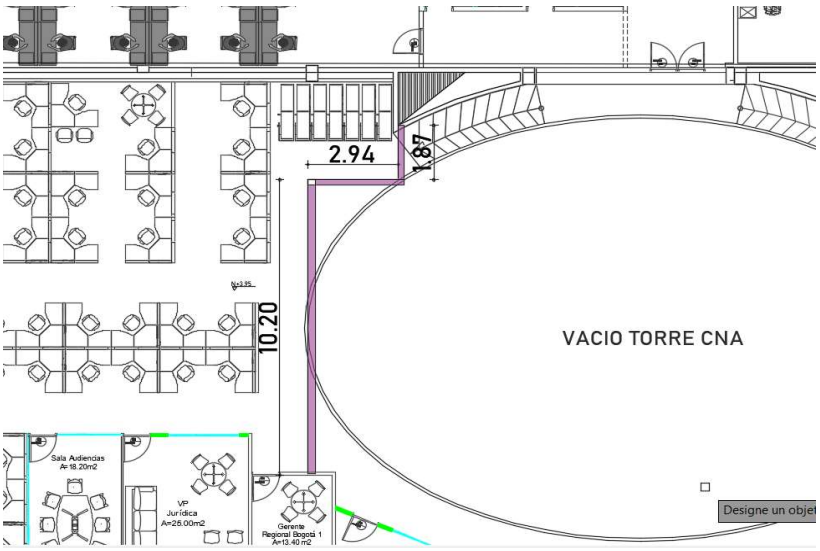

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 06					INGEBYP NIT. 830.131.607-3
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA					
	PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025		HOJA	2 DE 2	

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA 30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	1.6.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo.		UNIDAD:	M2


REGISTRO FOTOGRÁFICO






REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 06

MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	1 DE 5

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBY S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA 30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	1.2.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.		UNIDAD:	m²

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	Nº ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Cuarto PISO edificio Convenciones					-
División 1	2,38		12,87	1,00	30,63
División 2	2,38		2,69	1,00	6,40
División 3	2,38		2,70	1,00	6,43
División 4	2,38		2,72	1,00	6,47
División 5	2,38		1,60	1,00	3,81
División 6	2,38		3,13	1,00	7,45
División 7	2,38		5,47	1,00	13,02
División 8	2,38		1,70	1,00	4,05
División 9	2,38		5,14	1,00	12,23
División 10	2,38		3,10	1,00	7,38
División 11	2,38		2,67	1,00	6,35
División 12	2,38		3,21	1,00	7,64
División 13	2,38		1,00	1,00	2,38
División 14	2,38		4,98	1,00	11,85
División 15	2,38		3,08	1,00	7,33
División 16	2,38		2,84	1,00	6,76
División 17	2,38		2,74	1,00	6,52
División 18	2,38		9,08	1,00	21,61
División 19	2,38		1,50	1,00	3,57
División 20	2,38		1,50	1,00	3,57
				SUBTOTAL	175,45
				VIENE	339,79
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADO	515,24
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 5	- 246,96
				PRESENTE ACTA	268,28

REGISTRO FOTOGRÁFICO

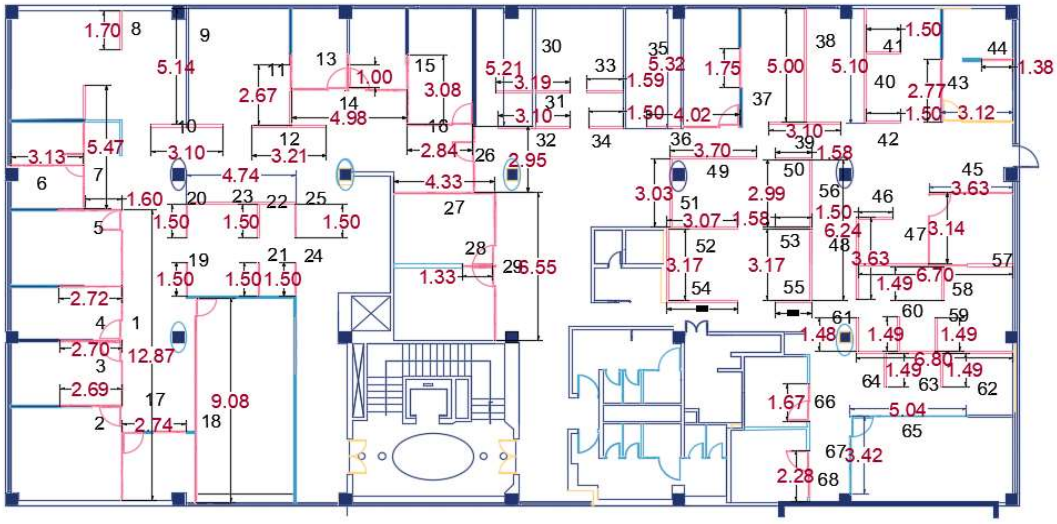

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 06

MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	2 DE 5

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBY S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA 30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	1.2.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.		UNIDAD:	m²

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	Nº ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Cuarto PISO edificio Convenciones					-
División 21	2,38		1,50	1,00	3,57
División 22	2,38		1,50	1,00	3,57
División 23	2,38		4,74	1,00	11,28
División 24	2,38		1,50	1,00	3,57
División 25	2,38		1,50	1,00	3,57
División 26	2,38		2,95	1,00	7,02
División 27	2,38		4,33	1,00	10,31
División 28	2,38		1,33	1,00	3,17
División 29	2,38		6,55	1,00	15,59
División 30	2,38		5,21	1,00	12,40
División 31	2,38		3,19	1,00	7,59
División 32	2,38		3,10	1,00	7,38
División 33	2,38		1,59	1,00	3,78
División 34	2,38		1,50	1,00	3,57
División 35	2,38		5,32	1,00	12,66
División 36	2,38		4,02	1,00	9,57
División 37	2,38		1,75	1,00	4,17
División 38	2,38		5,00	1,00	11,90
División 39	2,38		3,10	1,00	7,38
División 40	2,38		5,10	1,00	12,14
				SUBTOTAL	154,19
				VIENE	185,60
				SUBTOTAL ACUMULADO	339,79

REGISTRO FOTOGRÁFICO

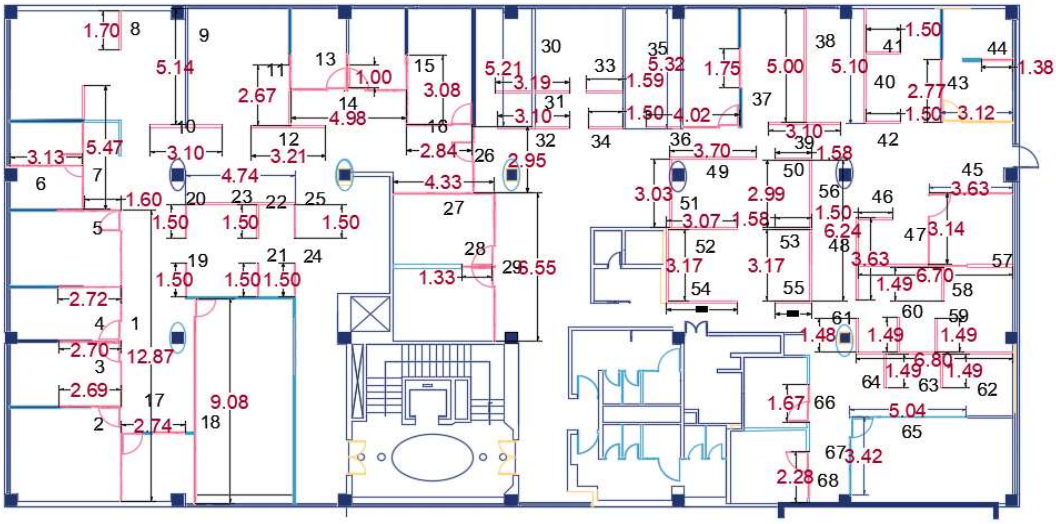

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 06

MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	3 DE 5

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBY S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA	30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	1.2.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.			UNIDAD:	m²

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	Nº ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Cuarto PISO edificio Convenciones					-
División 41	2,38		1,50	1,00	3,57
División 42	2,38		1,50	1,00	3,57
División 43	2,38		2,77	1,00	6,59
División 44	2,38		1,38	1,00	3,28
División 45	2,38		3,63	1,00	8,64
División 46	2,38		1,50	1,00	3,57
División 47	2,38		3,14	1,00	7,47
División 48	2,38		3,63	1,00	8,64
División 49	2,38		3,70	1,00	8,81
División 50	2,38		1,58	1,00	3,76
División 51	2,38		3,07	1,00	7,31
División 52	2,38		3,17	1,00	7,54
División 53	2,38		1,58	1,00	3,76
División 54	2,38		3,17	1,00	7,54
División 55	2,38		1,58	1,00	3,76
División 56	2,38		6,24	1,00	14,85
División 57	2,38		6,70	1,00	15,95
División 58	2,38		1,49	1,00	3,55
División 59	2,38		1,49	1,00	3,55
División 60	2,38		1,49	1,00	3,55
				SUBTOTAL	129,26
				VIENE	56,34
				SUBTOTAL ACUMULADO	185,60

REGISTRO FOTOGRÁFICO

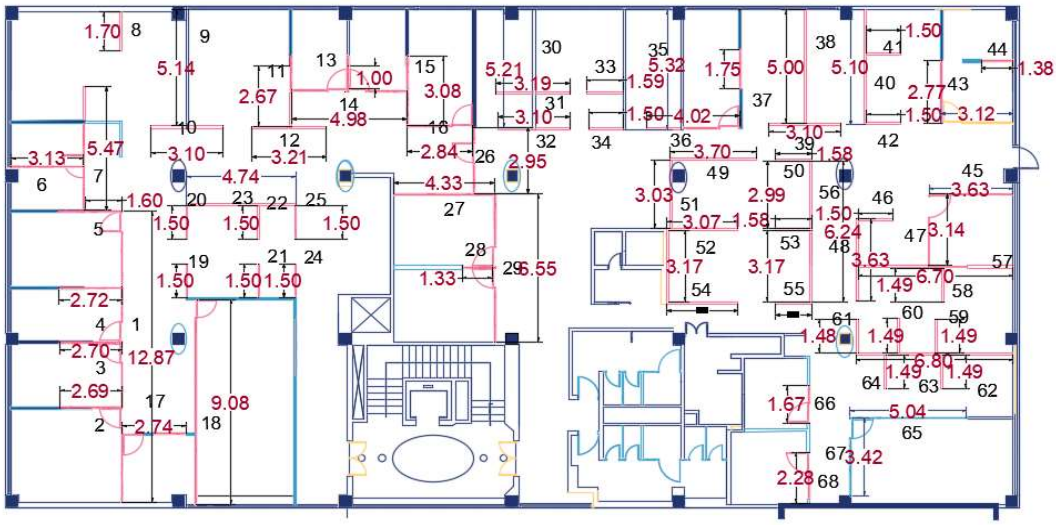

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 06

MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	4 DE 5

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBY S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA	30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	1.2.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.			UNIDAD:	m²

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	Nº ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Cuarto PISO edificio Convenciones					-
División 61	2,38		1,48	1,00	3,52
División 62	2,38		1,49	1,00	3,55
División 63	2,38		6,80	1,00	16,18
División 64	2,38		1,49	1,00	3,55
División 65	2,38		5,04	1,00	12,00
División 66	2,38		1,67	1,00	3,97
División 67	2,38		3,42	1,00	8,14
División 68	2,38		2,28	1,00	5,43
					-
					-
					-
					-
				-	-
				-	-
				-	-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	56,34
				VIENE	-
				SUBTOTAL ACUMULADO	56,34

REGISTRO FOTOGRÁFICO

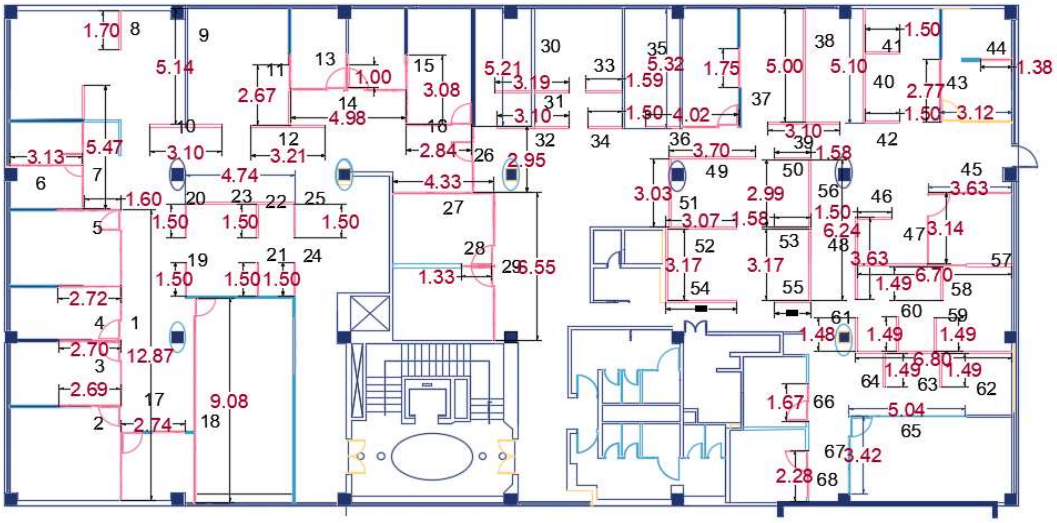

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

	ACTA PARCIAL No. 06				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	5 DE 5	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA 30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	1.2.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.		UNIDAD:	m²

REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO







REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS **COORDINADOR DE PROYECTO**	**ING. FABIAN BOHORQUEZ** **GERENTE DE OBRA**	**ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN** **COORDINADOR DE INTERVENTORIA**

ACTA PARCIAL No. 06


MEMORIAS DE CANTIDADES -BODEGA MARKETING - PRIMER PISO - EDIFICIO CNA FNA

PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	1 DE 3

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S	ACTA PARCIAL	6	FECHA	30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO				
ITEM No.	4.1.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall de 1/2" en diferentes niveles a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura a 3 manos. A todo costo.	UNIDAD:	M2


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

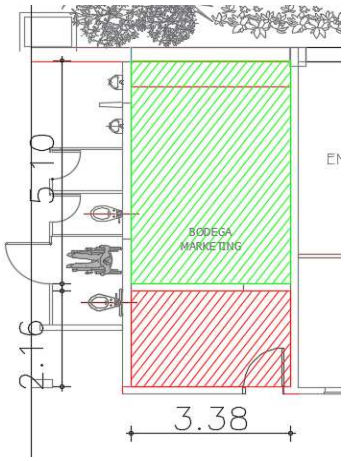


LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					-
EDIFICIO CNA					-
BODEGA DE MARKETING					-
area bodega		3,38	5,1	1,00	17,24
recepcion bodega		3,38	2,16	1,00	7,30
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					24,54
VIENE					905,72
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					930,26
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 5					- 872,12
PRESENTE ACTA					58,14

REGISTRO FOTOGRÁFICO

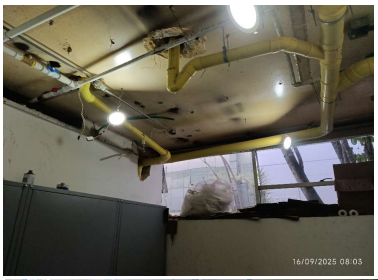

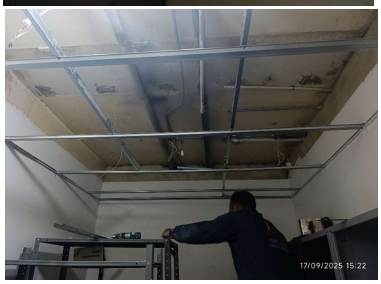



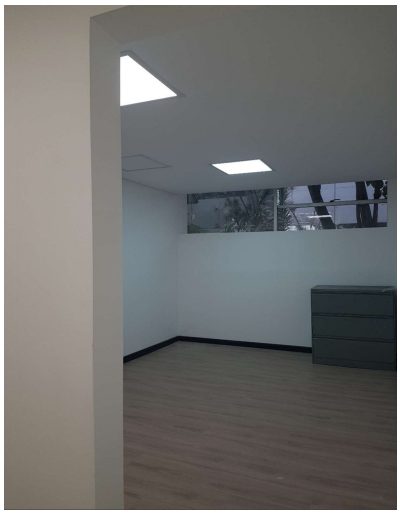


OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 06				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES -PUNTO DE ATENCION PRIMARIO - PRIMER PISO - EDIFICIO CNA FNA				
	PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	2 DE 3	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA 30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	4.1.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall de 1/2" en diferentes niveles a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura a 3 manos. A todo costo.		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

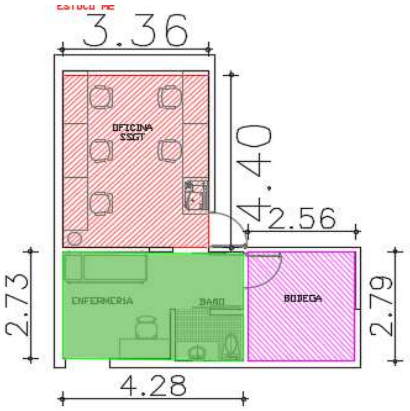

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					-
EDIFICIO CNA					-
PUNTO DE ATENCION PRIMARIO					-
OFICINA SSGT		3,36	4,4	1	14,78
ENFERMERIA Y BAÑO CNA		2,73	4,28	1	11,68
BODEGA		2,79	2,56	1	7,14
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	33,60
				VIENE	872,12
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	905,72

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 06				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	3 DE 3	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA 30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	4.1.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall de 1/2" en diferentes niveles a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura a 3 manos. A todo costo.		UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 06


MEMORIAS DE CANTIDADES -BODEGA MARKETING - PRIMER PISO - EDIFICIO CNA FNA

PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	1 DE 2

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA	30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	6.3.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.		UNIDAD:	UND	


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

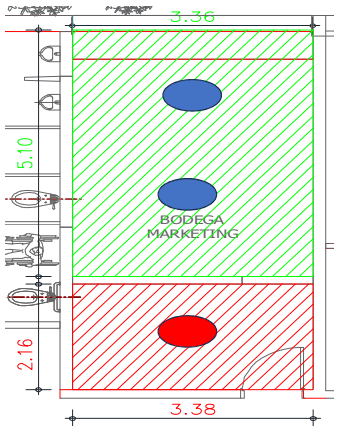


LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					-
EDIFICIO CNA					-
BODEGA DE MARKETING					-
area bodega				2,00	2,00
recepcion bodega				1,00	1,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	3,00
				VIENE	166,00
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	169,00
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 5	- 143,00
				PRESENTE ACTA	26,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

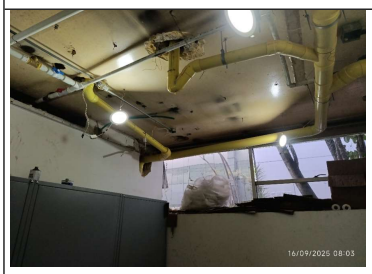

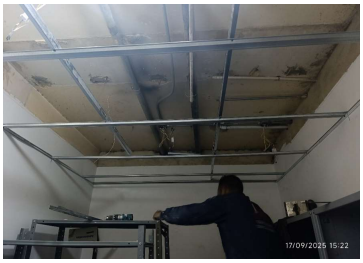



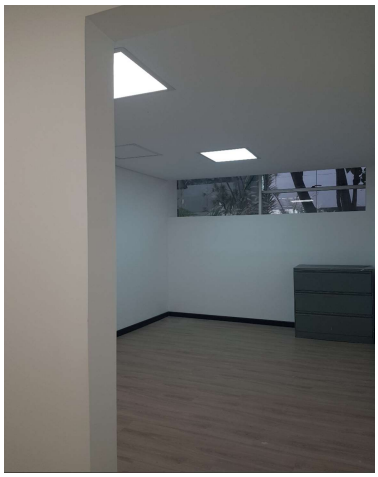

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 06					INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA					
	PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025		HOJA	2 DE 2	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA 30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6.3.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.			UNIDAD: Und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						-
	CONVENCIONES CUARTO PISO					-
	LUMINARIA DESCOLGADA					-
	CORREDORES				5,00	5,00
	ENTRE EJE (B - C) - (1-4)				6,00	6,00
	ENTRE EJE (C - D) - (1-4)					-
	ENTRE EJE (D - E) - (1-4)				6,00	6,00
	ENTRE EJE (E - F) - (1-4)				1,00	1,00
	ENTRE EJE (F - G) - (1-4)				5,00	5,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	23,00
					VIENE	143,00
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	166,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 06


MEMORIAS DE CANTIDADES -PUNTO DE ATENCION PRIMARIO - PRIMER PISO - EDIFICIO CNA FNA

PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	1 DE 2

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S	ACTA PARCIAL	6	FECHA	30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO				
ITEM No.	NP-16	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de aparatos sanitarios (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio (hasta 50 m) y desde sitio de acopio a escombrera).	UNIDAD:	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

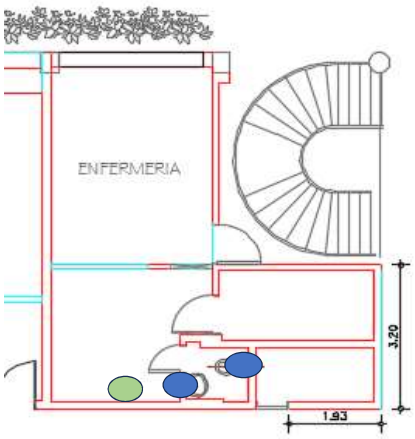

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					-
EDIFICIO CNA					-
PUNTO DE ATENCION PRIMARIO					-
BAÑO				2,00	2,00
COCINETA				1,00	1,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	3,00
				VIENE	35,00
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	38,00
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 4	- 25,00
				PRESENTE ACTA	13,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

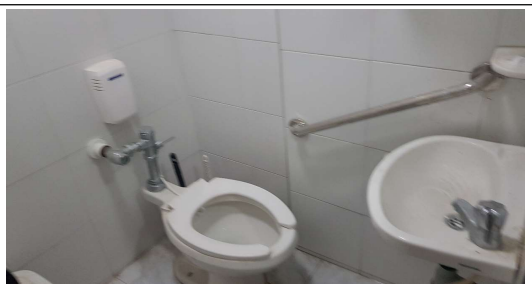







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 06


MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS TECNOLOGIA - PRIMER PISO - TECNOLOGIA FNA

PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	2 DE 2

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S	ACTA PARCIAL	6	FECHA	30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO				
ITEM No.	NP-16	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de aparatos sanitarios (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio (hasta 50 m) y desde sitio de acopio a escombrera).	UNIDAD:	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

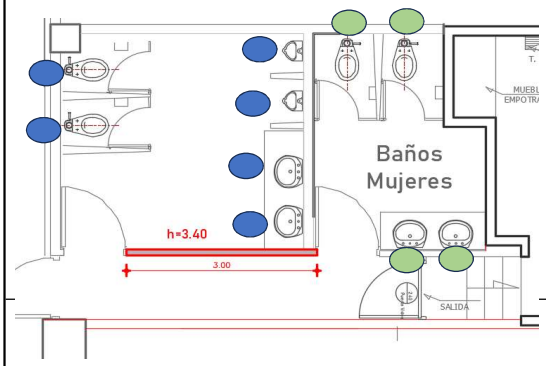


LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					-
EDIFICIO TECNOLOGIA					-
BAÑOS PRIMER PISO					-
BAÑO HOMBRES				6,00	6,00
BAÑO MUJERES				4,00	4,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					10,00
VIENE					25,00
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					35,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

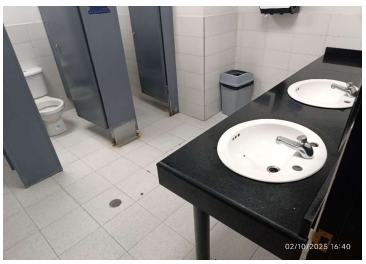





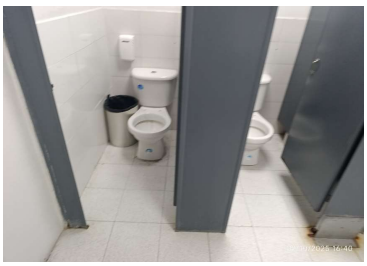





OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 06

MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	1 DE 4

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA 30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-34	DESCRIPCION ITEM:	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"		UNIDAD:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					-
EDIFICIO DE CONVENCIONES					-
CUBIERTA				41,00	41,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	41,00
				VIENE	17,00
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	58,00
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 5	- 10,00
				PRESENTE ACTA	48,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

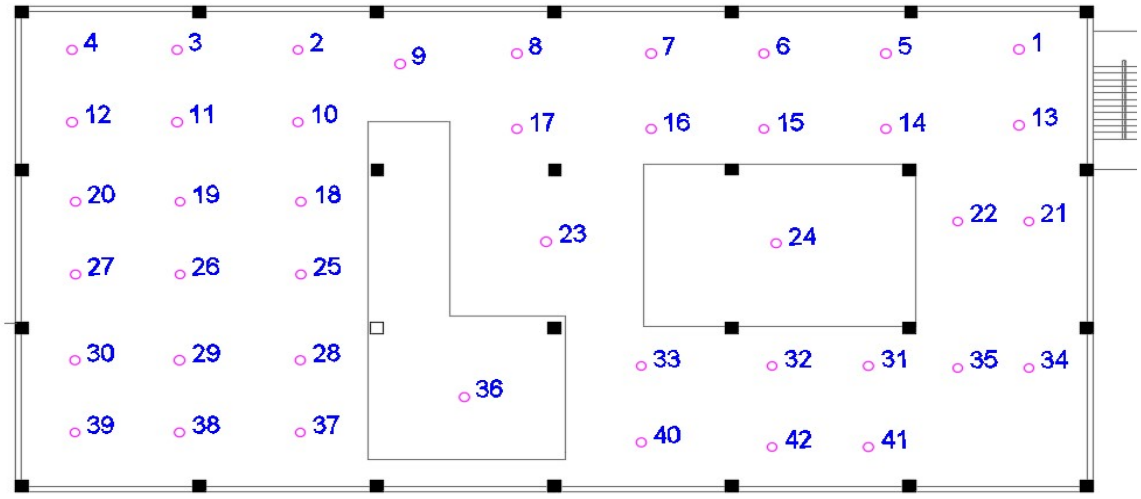

OBSERVACIONES:




Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 06				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	2 DE 4	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA 30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-34	DESCRIPCION ITEM:	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"		UNIDAD:	UND

REGISTRO FOTOGRÁFICO

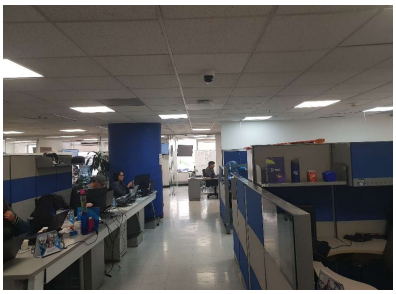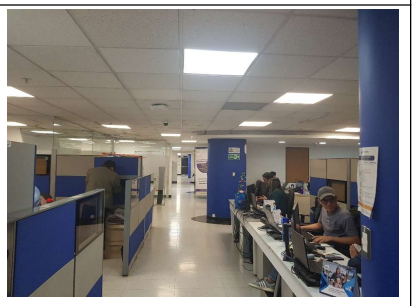




REGISTRO FOTOGRÁFICO



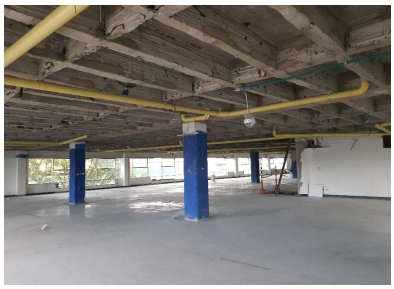

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 06


MEMORIAS DE CANTIDADES -PUNTO DE ATENCION PRIMARIO - PRIMER PISO - EDIFICIO CNA FNA

PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	3 DE 4

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA 30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-34	DESCRIPCION ITEM:	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"		UNIDAD:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

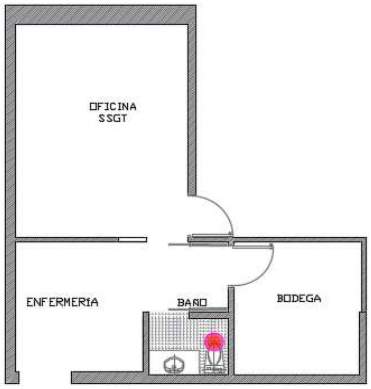

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					-
EDIFICIO CNA					-
PUNTO DE ATENCION PRIMARIO					-
BAÑO				1,00	1,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	1,00
				VIENE	16,00
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	17,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

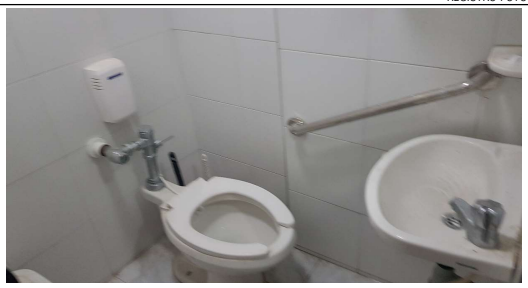







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA


ACTA PARCIAL No. 06

MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS TECNOLOGIA - PRIMER PISO - TECNOLOGIA FNA

PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	4 DE 4

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA 30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-34	DESCRIPCION ITEM:	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"		UNIDAD:	UND

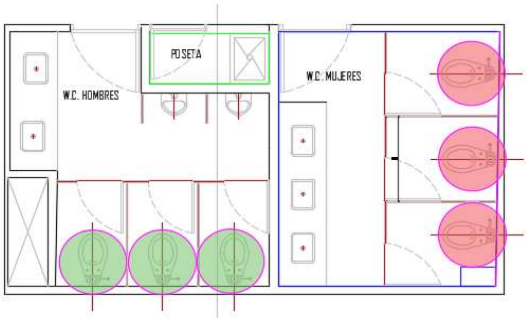PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
						-
	EDIFICIO TECNOLOGIA					-
	BAÑOS PRIMER PISO					-
	BAÑO HOMBRES				3,00	3,00
	BAÑO MUJERES				3,00	3,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	6,00
					VIENE	10,00
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	16,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO











OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 06					INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA					
	PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025		HOJA	1 DE 8	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA 30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-36	DESCRIPCION ITEM:	RED SANITARIA PVC-S 4"		UNIDAD:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
						-
	EDIFICIO DE CONVENCIONES					-
	CUBIERTA					-
				4,20		4,20
				0,80		0,80
				5,80		5,80
				0,80		0,80
				2,30		2,30
				6,30		6,30
				2,30		2,30
	Salidas sanitarias para sifones			1,10	4,00	4,40
	Descuento salidas sanitarias para sifones			1,10	- 4,00	- 4,40
						-
				3,02		3,02
				3,42		3,42
				1,50		1,50
				6,00		6,00
				1,53		1,53
	Salidas sanitarias para sifones			1,10	4,00	4,40
	Descuento salidas sanitarias para sifones			1,10	- 4,00	- 4,40
						-
				5,40		5,40
				2,50		2,50
	Salidas sanitarias para sifones			1,10	1,00	1,10
	Descuento salidas sanitarias para sifones			1,10	- 1,00	- 1,10
					SUBTOTAL	45,87
					VIENE	146,01
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	191,88
					COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 5	- 17,80
					PRESENTE ACTA	174,08

REGISTRO FOTOGRÁFICO

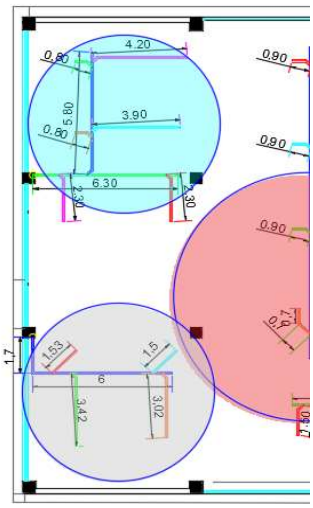

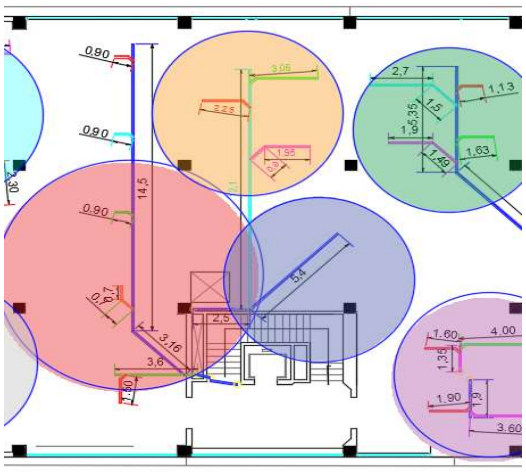

tuberia aguas lluvias 4"

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 06


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	2 DE 8

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA 30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-36	DESCRIPCION ITEM:	RED SANITARIA PVC-S 4"		UNIDAD:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

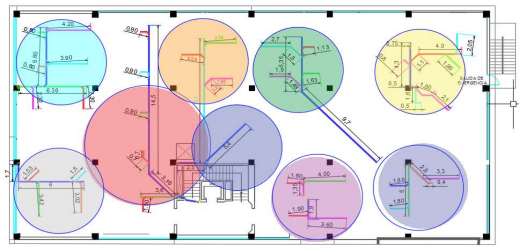

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					-
EDIFICIO DE CONVENCIONES					-
CUBIERTA					-
			0,90		0,90
			0,90		0,90
			14,50		14,50
			0,90		0,90
			0,70		0,70
			0,70		0,70
			3,16		3,16
			3,60		3,60
			1,50		1,50
Salidas sanitarias para sifones			1,10	5,00	5,50
Descuento salidas sanitarias para sifones			1,10	- 5,00	- 5,50
					-
			9,70		9,70
			1,49		1,49
			1,63		1,63
			1,90		1,90
			5,35		5,35
			1,50		1,50
			1,13		1,13
			2,70		2,70
Salidas sanitarias para sifones			1,10	5,00	5,50
Descuento salidas sanitarias para sifones			1,10	- 5,00	- 5,50
				SUBTOTAL	52,26
				VIENE	93,75
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	146,01

REGISTRO FOTOGRÁFICO

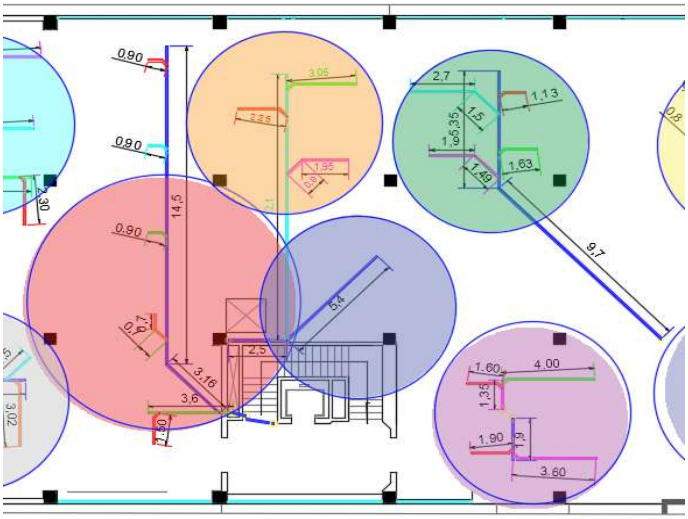

OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 06					INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA					
	PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025		HOJA	3 DE 8	

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA 30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-36	DESCRIPCION ITEM:	RED SANITARIA PVC-S 4"		UNIDAD:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					-
EDIFICIO DE CONVENCIONES					-
CUBIERTA					-
			4,00		4,00
			1,60		1,60
			1,35		1,35
			1,90		1,90
			1,90		1,90
			3,60		3,60
Salidas sanitarias para sifones			1,10	4,00	4,40
Descuento salidas sanitarias para sifones			1,10	- 4,00	- 4,40
					-
			0,40		0,40
			3,30		3,30
			2,50		2,50
			5,00		5,00
			1,80		1,80
			1,80		1,80
Salidas sanitarias para sifones			1,10	5,00	5,50
Descuento salidas sanitarias para sifones			1,10	- 5,00	- 5,50
					-
			2,10		2,10
			1,80		1,80
			0,50		0,50
					-
				SUBTOTAL	33,55
				VIENE	60,20
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	93,75

REGISTRO FOTOGRÁFICO

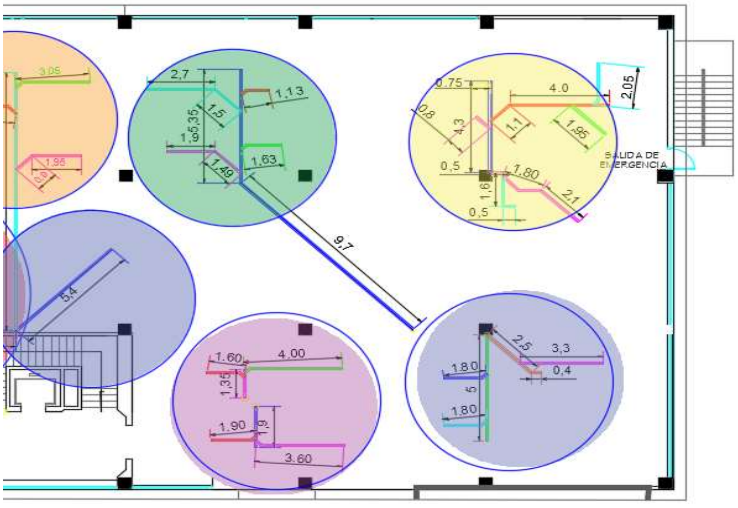

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 06


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	4 DE 8

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA 30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-36	DESCRIPCION ITEM:	RED SANITARIA PVC-S 4"		UNIDAD:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					-
EDIFICIO DE CONVENCIONES					-
CUBIERTA					-
			1,60		1,60
			0,50		0,50
			4,30		4,30
			0,80		0,80
			2,05		2,05
			1,95		1,95
			4,00		4,00
			1,10		1,10
			4,30		4,30
			0,70		0,70
Salidas sanitarias para sifones			1,10	6,00	6,60
Descuento salidas sanitarias para sifones			1,10	- 6,00	- 6,60
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	21,30
				VIENE	38,90
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	60,20

REGISTRO FOTOGRÁFICO

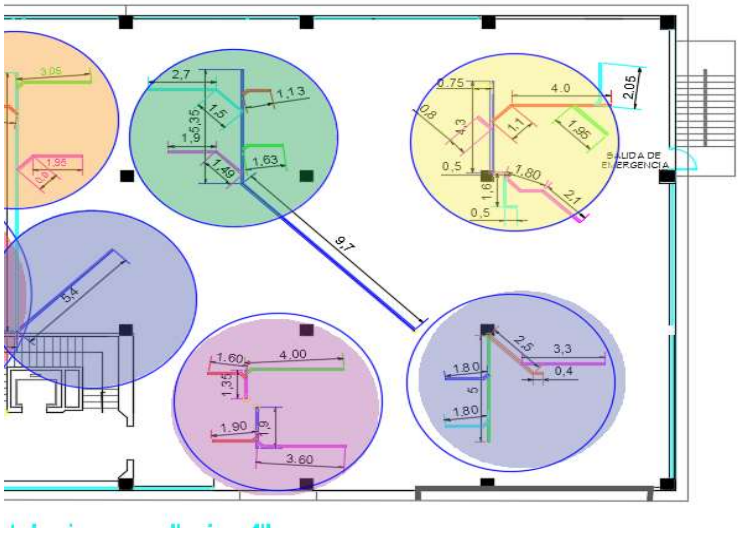


OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA


fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 06				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	5 DE 8	


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA 30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-36	DESCRIPCION ITEM:	RED SANITARIA PVC-S 4"		UNIDAD:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
						-
	EDIFICIO DE CONVENCIONES					-
	CUBIERTA					-
	PUNTO FIJO			0,50		0,50
				3,90		3,90
				1,30		1,30
	Salidas sanitarias para sifones			1,10	1,00	1,10
	Descuento salidas sanitarias para sifones			1,10	- 1,00	- 1,10
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL		5,70
				VIENE		33,20
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA		38,90

REGISTRO FOTOGRÁFICO

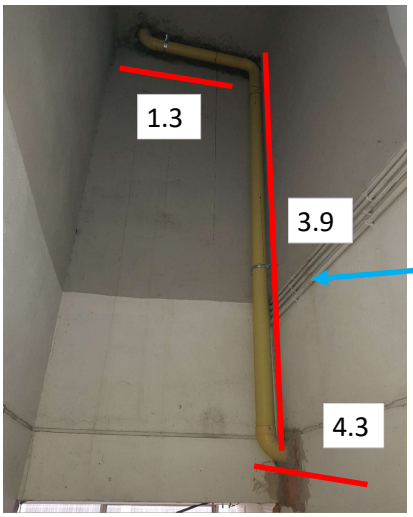

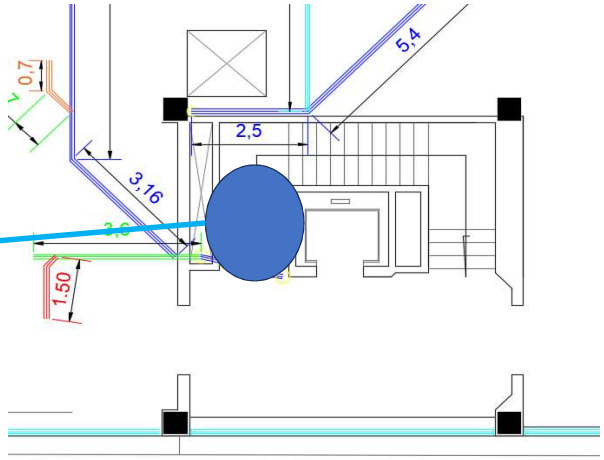

OBSERVACIONES:




Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 06				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	6 DE 8	

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA 30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-36	DESCRIPCION ITEM:	RED SANITARIA PVC-S 4"			UNIDAD: ML

REGISTRO FOTOGRÁFICO

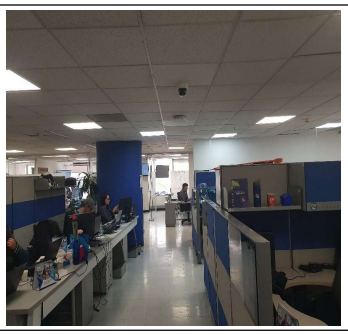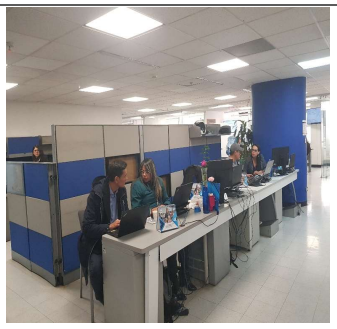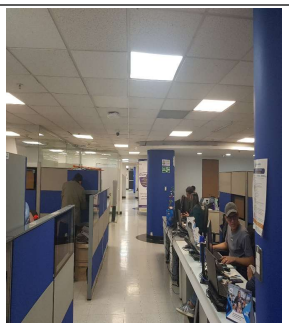REGISTRO FOTOGRÁFICO



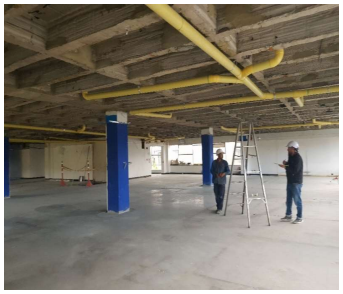

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 06

MEMORIAS DE CANTIDADES -PUNTO DE ATENCION PRIMARIO - PRIMER PISO - EDIFICIO CNA FNA

PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	7 DE 8

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA	30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	NP-36	DESCRIPCION ITEM:	RED SANITARIA PVC-S 4"			UNIDAD:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					-
EDIFICIO CNA					-
PUNTO DE ATENCION PRIMARIO					-
BAÑO			2,00	1,00	2,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	2,00
				VIENE	31,20
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	33,20

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA


ACTA PARCIAL No. 06

MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS TECNOLOGIA - PRIMER PISO - TECNOLOGIA FNA

PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	8 DE 8

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA 30/11/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-36	DESCRIPCION ITEM:	RED SANITARIA PVC-S 4"		UNIDAD:	ML

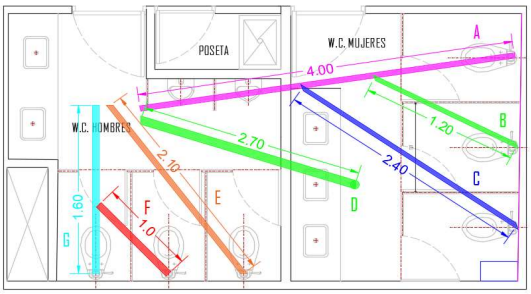PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
						-
	EDIFICIO TECNOLOGIA					-
	BAÑOS PRIMER PISO					-
				4,00	1,00	4,00
				1,20	1,00	1,20
				2,40	1,00	2,40
				2,70	1,00	2,70
				2,10	1,00	2,10
				1,00	1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	13,40
					VIENE	17,80
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	31,20

REGISTRO FOTOGRÁFICO










OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 06			INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA			
	PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA 30/11/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-70	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Tubería ACC roscada 1" sch-40 (incluye accesorios y pintura)		UNIDAD:	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

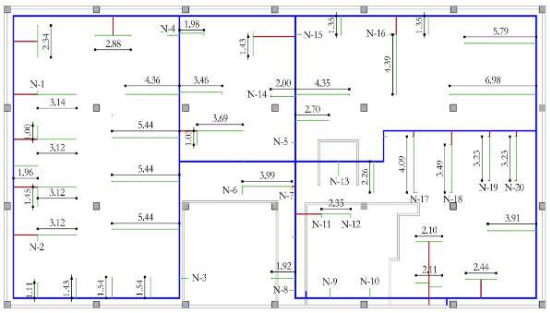

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
Piso cuarto - Convenciones					-
					-
Red distribución 1 "			2,34	1,00	2,34
Red distribución 1 "			2,88	1,00	2,88
Red distribución 1 "			4,36	1,00	4,36
Red distribución 1 "			3,14	1,00	3,14
Red distribución 1 "			5,44	1,00	5,44
Red distribución 1 "			3,12	1,00	3,12
Red distribución 1 "			1,00	1,00	1,00
Red distribución 1 "			5,44	1,00	5,44
Red distribución 1 "			1,96	1,00	1,96
Red distribución 1 "			1,45	1,00	1,45
Red distribución 1 "			3,12	1,00	3,12
Red distribución 1 "			5,44	1,00	5,44
Red distribución 1 "			3,12	1,00	3,12
Red distribución 1 "			1,11	1,00	1,11
Red distribución 1 "			1,43	1,00	1,43
Red distribución 1 "			1,54	2,00	3,08
Red distribución 1 "			1,98	1,00	1,98
Red distribución 1 "			1,43	1,00	1,43
Red distribución 1 "			3,46	1,00	3,46
Red distribución 1 "			2,00	1,00	2,00
					-
				SUBTOTAL	57,30
				VIENE	89,31
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	146,61
				PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 5	- 134,20
				PRESENTE ACTA	12,41

REGISTRO FOTOGRÁFICO








OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 06			INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA			
	PERIODO	1-11-2025 AL 30-11-2025	HOJA	2 DE 2

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	6	FECHA 30/11/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-70	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Tubería ACC roscada 1" sch-40 (incluye accesorios y pintura)		UNIDAD:	ml

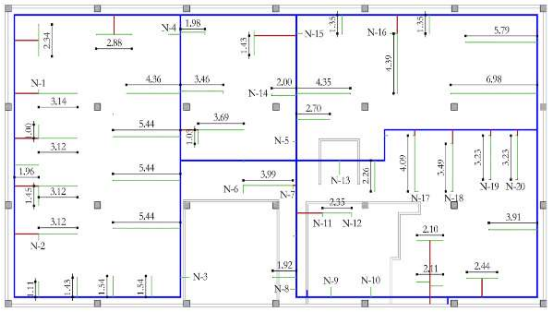PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Piso cuarto - Convenciones					-
						-
	Red distribución 1 "			3,69	1,00	3,69
	Red distribución 1 "			1,03	1,00	1,03
	Red distribución 1 "			3,99	1,00	3,99
	Red distribución 1 "			1,92	1,00	1,92
	Red distribución 1 "			1,35	2,00	2,70
	Red distribución 1 "			4,39	1,00	4,39
	Red distribución 1 "			5,79	1,00	5,79
	Red distribución 1 "			6,98	1,00	6,98
	Red distribución 1 "			2,70	1,00	2,70
	Red distribución 1 "			2,26	1,00	2,26
	Red distribución 1 "			4,09	1,00	4,09
	Red distribución 1 "			3,49	1,00	3,49
	Red distribución 1 "			3,23	2,00	6,46
	Red distribución 1 "			2,35	1,00	2,35
	Red distribución 1 "			2,10	1,00	2,10
	Red distribución 1 "			3,91	2,00	7,82
	Red distribución 1 "			2,11	1,00	2,11
	Red distribución 1 "			2,44	1,00	2,44
	Niples red distribución 1 "			1,00	23,00	23,00
						-
						-
					SUBTOTAL	89,31
					VIENE	-
					SUBTOTAL ACUMULADO	89,31

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 7

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

1-12-2025 AL 31-12-2025

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5.142.932.606,00
VALOR CORTE 07	$ 313.223.406,02
miércoles, 31 de diciembre de 2025	

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 06			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		CORTE 07		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
	REPARACIONES LOCATIVAS GENERALES SEDE PRINCIPAL				393.516.349,99	-	-	-	12.160.064,04	-	104.788.869,00	-	49.597.309,27	-	-	-	26.476.618,12	-	26.356.367,14	-	219.379.356,33			174.137.093,66
1.1.	Retiro, reparación y reposicion puntual de junta entre laminas (junta con factor forma 2cmx1cm), mediante el uso de fondo de junta tipo sika rod y sello elastomérico de poliuretano en color negro, con alta resistencia a la intemperie incluye andamio colgante o toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.	ml	20,00	15.908,00	318.160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	15.908,00	318.160,00
1.2.	Pintura exterior tipo coraza para muros sobre pañete incluye toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.	m2	550,00	42.081,00	23.144.550,00	-	-	-	-	100,11	4.212.643,00	-	-	-	-	293,52	12.351.615,12	104,37	4.391.993,97	498,00	20.956.251,73	52,00	42.081,00	2.188.298,27
2.1.	Retiro de impermeabilización existente y mortero de nivelación. Incluye el retiro y disposición final de escombros (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").	m2	1241,74	29.570,00	36.718.267,30	-	-	214,28	6.336.259,60		-	1.018,73	30.123.846,10	-	-				-	1.233,01	36.460.105,70	8,73	29.570,00	258.161,60
2.2.	Instalación de mortero de nivelación con materiales de SIKA o similares características, previo a la instalación de la impermeabilización (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").	m2	0,00	62.971,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	62.971,00	-
2.3.	Impermeabilización de placa de cubierta plana transitable, no ventilada, con piso fijo, tipo convencional, para tráfico peatonal privado. Tipo Sika o de similares características con uso de mantos asfálticos, tipo bicapa (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").	m2	182,42	126.524,00	23.080.508,08	-	-	-	-	162,38	20.544.967,00	-	-	-	-				-	162,38	20.544.967,12	20,04	126.524,00	2.535.540,96
2.4.	Desmonte de ventaneria con vidrios en celosía ubicados en culata de cubierta en el edificio CNA.	m2	520,00	52.493,00	27.296.360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	520,00	52.493,00	27.296.360,00
2.5.	Suministro e instalación de sistema de ventanas en vidrio fijas (sin basculante) en reemplazo de las ventanas en vidrio retiradas, ubicados en culata de cubierta en el edificio CNA.	m2	0,00	297.835,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	297.835,00	-
2.6.	Retiro de canaletas existentes y suministro e instalación de canaletas metálicas de sección trapezoidal elaboradas en acero galvanizado calibre 16 de acuerdo con las necesidades técnicas de la cubierta de aguas lluvia, incluye la instalación de la soportería para el anclaje de la canaleta en el edificio CNA.	ml	201,00	121.951,00	24.512.151,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	201,00	121.951,00	24.512.151,00
2.7.	Retiro de instalación existente y suministro e instalación de soscos para la bajante de agua lluvia a 4" en PVC con su respectivo sifón para evitar malos olores, incluye la instalación de la soportería para el anclaje en el edificio CNA.	und	50,00	86.553,00	4.327.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	50,00	86.553,00	4.327.650,00
2.8.	Limpieza y mantenimientos de tubería bajante de agua lluvia a 4" en PVC, en el edificio CNA.	und	50,00	94.430,00	4.721.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	50,00	94.430,00	4.721.500,00
3.1.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros.	m2	120,00	37.322,00	4.478.640,00	-	-	80,00	2.985.760,00		-	33,21	1.239.463,62	-	-				-	113,21	4.225.223,62	6,79	37.322,00	253.416,38
3.2.	Mantenimiento de cielo raso en fibra mineral. Incluye cambio, pintura y/o reutilización de láminas en fibra mineral, instalación de anclajes y arreglo de perfilería descolgada y colocación de soportes.	m2	300,00	34.073,00	10.221.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			21,95	747.902,35	21,95	747.902,35	278,05	34.073,00	9.473.997,65
3.3.	Suministro e instalación cielo raso PVC de 10 mm de espesor, incluye estructura, perforaciones para las luminarias. A todo costo.	m2	0,00	94.144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	94.144,00	-
3.4.	Suministro e instalación cielo raso en drywall de 1/2" de espesor a una sola cara, incluye estructura, perforaciones luminarias. A todo costo.	m2	196,02	127.042,00	24.902.772,84	-	-	8,32	1.056.989,44		-	127,70	16.223.263,40	-	-				-	136,02	17.280.252,84	60,00	127.042,00	7.622.520,00
4.1.	Cambio de válvula antivandálica de empotrar tipo push para sanitarios institucionales de consumo de agua 4.85 lpf (1,28 gpf) tipo corona o similar. Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. A todo costo con la instalación de un enchape de similares caracteristicas a las originales.	und	25,00	1.200.516,00	30.012.900,00	-	-	-	-	11,00	13.205.676,00	-	-	-	-	6,00	7.203.096,00		-	17,00	20.408.772,00	8,00	1.200.516,00	9.604.128,00
4.2.	Cambio de grifería para lavamanos de empotrar a muro tipo push aplicación institucional de consumo 0,4 - 1.9 litros, tipo corona o similar incluye desmonte y reinstalación de aparatos. A todo costo con la instalación de un enchape de similares caracteristicas a las originales.	und	30,00	729.335,00	21.880.050,00	-	-	-	-	9,00	6.564.015,00	-	-	-	-	6,00	4.376.010,00		-	15,00	10.940.025,00	15,00	729.335,00	10.940.025,00
4.3.	Cambio de válvula antivandálica de empotrar tipo push para orinales institucionales de consumo de agua 0,5 a 1.9 lpf (0,13 a 0,5 gpf), tipo corona o similar. Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. A todo costo con la instalación de un enchape de similares caracteristicas a las originales.	und	10,00	1.209.112,00	12.091.120,00	-	-	-	-	4,00	4.836.448,00	-	-	-	-	2,00	2.418.224,00		-	6,00	7.254.672,00	4,00	1.209.112,00	4.836.448,00
4.4.	Desmonte de divisiones metálicas para baños. Incluye soportería, tomillos, herrajes, retiro y disposición final.	m2	125,00	39.579,00	4.947.375,00	-	-	45,00	1.781.055,00		-	15,25	603.579,75	-	-			35,01	1.385.660,79	95,26	3.770.295,54	29,74	39.579,00	1.177.079,46
4.5.	Suministro e instalación de divisiones de baño en acero inoxidable por ambas caras calibre 22, aleación 304 acabado satinado tipo SOCODA o similar. Con puerta, anclajes y accesorios necesarios para su instalación y correcto funcionamiento.	m2	125,00	1.005.111,00	125.638.875,00	-	-	-	-	45,00	45.229.995,00	1,40	1.407.155,40	-	-			19,73	19.830.840,03	66,13	66.467.990,43	58,87	1.005.111,00	59.170.884,57
4.6.	Limpieza con sonda de tubería sanitaria en diferentes diámetros, actividad para ejecutar por punto.	und	105,00	109.625,00	11.510.625,00	-	-	-	-	93,00	10.195.125,00	-	-	-	-				-	93,00	10.195.125,00	12,00	109.625,00	1.315.500,00
5.1.	Desmonte de puerta en madera de 1.44 m x2.47 m, incluye marco y retiro.	und	1,00	127.673,00	127.673,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	127.673,00		-	1,00	127.673,00	-	127.673,00	-
5.2.	Suministro e instalación de puerta de acceso a cubierta en aluminio de dos hojas: una de 0.90 m x 2.47 m y otra de 0.54 m x 2.47 m. Incluye bisagras cerradura, cantonera marco y accesorios necesarios para su funcionamiento.	und	0,00	1.192.289,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	1.192.289,00	-
6.1.	Resanes y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre pañete o revello liso. A todo costo.	m2	106,25	33.744,00	3.585.272,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	106,25	33.744,00	3.585.272,77
	TOTAL REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CNA - PISO 2				983.388.292,19		71.974.262,62		10.754.525,00		7.859.740,00	-	7.114.659,60	-	-	-	47.173.783,41		9.738.522,92	-	154.615.454,05	-	-	828.772.798,14
1.1.	Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.	m2	257,87	47.734,00	12.309.004,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,48	3.984.834,32		-	83,48	3.984.834,32	174,39	47.734,00	8.324.169,96
1.2.	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	m2	66,97	49.324,00	3.303.277,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,13	844.920,12		-	17,13	844.920,12	49,84	49.324,00	2.458.357,48
1.3.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros.	m2	1397,62	35.224,00	49.229.907,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	698,10	24.589.874,40		-	698,10	24.589.874,40	699,52	35.224,00	24.640.033,38
1.4.	Desmonte de redes eléctricas existentes. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	glb	1,00	12.717.035,00	12.717.035,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,33	4.196.621,55		-	0,33	4.196.621,55	0,67	12.717.035,00	8.520.413,45
1.5.	Desmonte de puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	und	181,00	93.786,00	16.975.266,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,00	9.941.316,00		-	106,00	9.941.316,00	75,00	93.786,00	7.033.950,00
1.6.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo.	m2	89,42	92.676,00	8.287.458,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,02	3.616.217,52		-	39,02	3.616.217,52	50,40	92.676,00	4.671.241,10
2.1.	Suministro e instalación de columnetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre 12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye platina soldada a la base y anclajes a placa de piso y retiro de escombros.	ml	11,80	198.521,00	2.342.547,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	11,80	198.521,00	2.342.547,80
2.2.	Suministro e instalación de viguetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye soldadura a columnetas y retiro de escombros.	ml	0,00	181.351,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	181.351,00	-
3.1.	Suministro e instalación de muro en Superboard de 8 mm, altura 2.40 m a dos caras. Incluye estructura metálica, anclaje, cinta, estuco y fondeo de acabado en pintura en vinilo tipo 1.	m2	38,45	199.697,00	7.677.950,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	38,45	199.697,00	7.677.950,26
4.1.	Suministro e instalación de cielorraso en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura. A todo costo.	m2	1400,59	128.125,00	179.450.273,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			25,55	3.273.593,75	25,55	3.273.593,75	1.375,04	128.125,00	176.176.679,28

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 7

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

1-12-2025 AL 31-12-2025

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5.142.932.606,00
VALOR CORTE 07	$ 313.223.406,02
miércoles, 31 de diciembre de 2025	

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 06			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		CORTE 07		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
4.2.	Suministro e instalación de Frescasa Eco Sin Papel 3 1/2" para cielorraso en Drywall. A todo costo.	m2	20,09	32.499,00	652.904,91	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	20,09	32.499,00	652.904,91
5.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad. Incluye plástico aislante y yumbolon de acuerdo a las características técnicas y el guardaescobas.	m2	1019,41	189.748,00	193.431.008,68	379,32	71.974.262,62		-		-		-		-		-		-	379,32	71.974.262,62	640,10	189.748,00	121.456.746,06
6.1.	Suministro e instalación de alimentador 1N°12 Fase+1N°12 Neutro+1N°12 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	2400,00	19.944,00	47.865.600,00	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	2.400,00	19.944,00	47.865.600,00
6.2.	Suministro e instalación de alimentador a tableros en 3N°2/0 Fase+1N°2/0 Neutro+1N°2 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	200,00	363.569,00	72.713.800,00	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	200,00	363.569,00	72.713.800,00
6.3.	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble, cumpliendo norma RETIE.	und	310,00	153.691,00	47.644.210,00	-	-	43,00	6.608.713,00		-		-		-		-		-	43,00	6.608.713,00	267,00	153.691,00	41.035.497,00
6.4.	Suministro e instalación de salida interruptor sencillo o doble 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH40 3/4", elementos de fijación y conductores. Cumpliendo norma RETIE.	und	10,00	173.282,00	1.732.820,00	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	10,00	173.282,00	1.732.820,00
6.5.	Suministro e instalación de lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x4x7cm. Largo de la guaya: 100cm, incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	82,00	318.520,00	26.118.640,00	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	82,00	318.520,00	26.118.640,00
6.6.	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	140,00	224.564,00	31.438.960,00	-	-	3,00	673.692,00	35,00	7.859.740,00	-	-		-		-		-	38,00	8.533.432,00	102,00	224.564,00	22.905.528,00
6.7.	Suministro e instalación de panel LED de gran formato redondo de 24W, luz neutra 4000K, dimensiones 100 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	7,00	190.825,00	1.335.775,00	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	7,00	190.825,00	1.335.775,00
6.8.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	22,00	176.599,00	3.885.178,00	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	22,00	176.599,00	3.885.178,00
6.9.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia de aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	10,00	195.508,00	1.955.080,00	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	10,00	195.508,00	1.955.080,00
6.10.	Suministro e instalación de salida tomacorriente doble polo a tierra (red normal), monofásico 120V 15A, 3m prom en cable No 12 LSHF AWG, elementos de fijación y conductores.	und	83,00	173.606,00	14.409.298,00	-	-	20,00	3.472.120,00		-		-		-		-		-	20,00	3.472.120,00	63,00	173.606,00	10.937.178,00
6.11.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. Cumpliendo norma RETIE.	m	300,00	16.035,00	4.810.500,00	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	300,00	16.035,00	4.810.500,00
6.12.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit EMT ø 3" oculta sobre cielo o en muros.	ml	180,00	155.392,00	27.970.560,00	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	180,00	155.392,00	27.970.560,00
6.13.	Suministro e instalación de ducto cerrado de 40X8 galvanizado o con pintura electrostática.	ml	220,00	293.413,00	64.550.860,00	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	220,00	293.413,00	64.550.860,00
6.14.	Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico tetrafilar con espacio para totalizador y barraje neutro y tierra. Incluye totalizador y protecciones.	und	2,00	3.460.340,00	6.920.680,00	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	2,00	3.460.340,00	6.920.680,00
7.1.	Suministro e instalación de Vidrios Templado 8 mm para divisiones de oficina incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	25,67	830.396,00	21.314.259,63	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	25,67	830.396,00	21.314.259,63
7.2.	Suministro e instalación de Puerta en Vidrio Templado 8 mm con Pivote, incluye topes de piso, accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento a todo costo.	m2	13,12	856.303,00	11.234.695,36	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	13,12	856.303,00	11.234.695,36
7.3.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho a todo costo de uso interior y exterior.	ml	0,00	85.101,00	-	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	85.101,00	-
7.4.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho de uso interior y exterior, con corte de letras para identificar las oficinas en vidrio. A todo costo.	und	0,00	139.113,00	-	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	139.113,00	-
8.1.	Suministro e instalación de Puerta en madecor entamborada de 0,90 m de ancho por 2.20 m de alto, incluye marcos, chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	1,00	1.145.405,00	1.145.405,00	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	1,00	1.145.405,00	1.145.405,00
9.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores blancos. A todo costo, incluye lineales.	m2	630,28	37.195,00	23.443.301,80	-	-		-		-	191,28	7.114.659,60		-		-		-	191,28	7.114.659,60	439,00	37.195,00	16.328.642,20
9.2.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos cielo falsos blanco. A todo costo, incluye lineales.	m2	1661,68	40.033,00	66.522.035,44	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	161,49	6.464.929,17	161,49	6.464.929,17	1.500,19	40.033,00	60.057.106,27
	REPARACIONES LOCATIVAS CASINO - EDIFICIO CONVENCIONES				85.131.856,52		79.297.346,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.247.160,00	-	83.544.506,28	-		1.587.350,24
5.5.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad, para la zona de mesas del restaurante Incluye nivelación en zonas puntuales, plástico aislante, yumbolon de acuerdo con las características técnicas y el guardaescobas.	m2	360,00	189.748,00	68.309.280,00	352,36	66.859.605,28		-		-		-		-		-		-	352,36	66.859.605,28	7,64	189.748,00	1.449.674,72
9.1.	Suministro e instalación de estructura decorativa para plantas colgantes de 6,05m ancho x 1,00 m de profundo con viguetas cada 0,76 m en tubería metálica cuadrada 50x50x2.0mm con acabado en pintura electrostática negro mate incluye 6 puntos de apoyo en guaya de lipo colgante. incluye 3 lamparas segun imagen.	und	1,60	3.245.844,00	5.193.350,40	1,00	3.245.844,00		-		-		-		-		-	0,60	1.947.506,40	1,60	5.193.350,40	-	3.245.844,00	-
9.2.	Suministro e instalación de estructura para microrondas con módulos de 0,71 m de largo 0,56 m de profundo y 0,40 m de alto en tubería metálica cuadrada 50x50x3.0mm en pintura electrostática negro mate incluye 2 superficies en madera tipo madecor RH de 1" cada módulo y anclajes a la pared no visibles.	und	11,00	835.627,00	9.191.897,00	11,00	9.191.897,00		-		-		-		-		-		-	11,00	9.191.897,00	-	835.627,00	-
11.1.	Resanes y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre pañete o repello liso. Incluyen andamios, escaleras y sistemas de seguridad de operación. A todo costo.	m2	72,23	33.744,00	2.437.329,12	-	-		-		-		-		-		-	68,15	2.299.653,60	68,15	2.299.653,60	4,08	33.744,00	137.675,52
	REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CONVENCIONES - PISO 4				1.153.298.402,92		190.840.084,88		23.658.567,86		650.169,00	-	102.099.414,86	-	57.326.417,60		35.990.378,52		60.160.434,05	-	470.725.461,36			682.572.941,56
1.1.	Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.	m2	461,58	47.734,00	22.033.059,72	47,71	2.277.389,14	8,25	393.805,50		-	137,60	6.568.198,40	-	-		-	18,91	902.649,94	212,47	10.142.042,98	249,11	47.734,00	11.891.016,74
1.2.	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	m2	526,96	95.354,00	50.247.743,84	125,23	11.941.181,42	3,68	350.902,72		-	118,05	11.256.539,70	-	-	268,28	25.581.571,12	10,83	1.032.683,82	526,07	50.162.878,78	0,89	95.354,00	84.865,06
1.3.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros.	m2	1188,84	35.224,00	41.875.700,16	455,25	16.035.726,00		-		-	433,59	15.272.774,16	-	-		-	28,39	1.000.009,36	917,23	32.308.509,52	271,61	35.224,00	9.567.190,64
1.4.	Desmonte de redes eléctricas existentes. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	glb	1,00	6.775.716,00	6.775.716,00	1,00	6.775.716,00		-		-	-	-	-	-		-	-	-	1,00	6.775.716,00	-	6.775.716,00	-
1.5.	Desmonte puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el Fondo Nacional del Ahorro S.A. indique	und	150,00	93.786,00	14.067.900,00	79,00	7.409.094,00		-		-	71,00	6.658.806,00		-		-		-	150,00	14.067.900,00	-	93.786,00	-
1.6.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta. enduco. A todo costo	m2	75,55	92.676,00	7.001.857,15	18,00	1.668.168,00		-		-	-	-	-	-		-	8,58	795.160,08	26,58	2.463.328,08	48,97	92.676,00	4.538.529,07
2.1.	Suministro e instalación de columnetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre 12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye platina soldada a la base y anclajes a placa de piso y retiro de escombros.	ml	163,20	198.521,00	32.398.627,20	-	-		-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	163,20	198.521,00	32.398.627,20
2.2.	Suministro e instalación de viguetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye soldadura a columnetas y retiro de escombros.	ml	122,50	181.351,00	22.215.497,50	-	-		-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	122,50	181.351,00	22.215.497,50

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 7

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

1-12-2025 AL 31-12-2025

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACION	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5.142.932.606,00
VALOR CORTE 07	$ 313.223.406,02
miércoles, 31 de diciembre de 2025	

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 06			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		CORTE 07		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
2.3.	Suministro e instalación perfiles WPC textura madera. Para instalar en muros divisorios de dimensiones 10 cm x 5 cm. Incluye estructura anclajes y retiro de escombros.	m2	28,44	234.409,00	6.666.591,96	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	28,44	234.409,00	6.666.591,96
3.1.	Suministro e instalación de muro en Superboard, altura 2.40 m. a dos caras incluye estructura, anclaje, cinta, estuco y fondeo de acabado en pintura en vinilo tipo 1.	m2	207,31	156.903,00	32.527.718,31	-	-		-		-		-		-		-	128,60	20.177.725,80	128,60	20.177.725,80	78,71	156.903,00	12.349.992,51
4.1.	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall de 1/2" en diferentes niveles a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura a 3 manos. A todo costo.	m2	1023,28	113.010,00	115.640.872,80	-	-		-		-	551,66	62.343.096,60	320,46	36.215.184,60	98,14	6.570.401,40	42,32	4.782.583,20	972,58	109.911.265,80	50,70	113.010,00	5.729.637,00
5.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad Incluye plástico aislante y yumbolton, de acuerdo a las características técnicas y el guardaescobas.	m2	1058,84	189.748,00	200.912.772,32	315,09	59.788.414,57	120,76	22.913.854,63		-		-		-		-		-	435,85	82.702.269,20	622,99	189.748,00	118.210.503,12
6.1.	Suministro e instalación de alimentador 1N°12 Fase+1N°12 Neutro+1N°12 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	1800,00	19.842,00	35.715.600,00	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	1.800,00	19.842,00	35.715.600,00
6.2.	Suministro e instalación de alimentador a tableros en 3N°2/0 Fase+1N°2/0 Neutro+1N°2 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	50,00	220.320,00	11.016.000,00	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	50,00	220.320,00	11.016.000,00
6.3.	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	301,00	147.631,00	44.436.931,00	-	-		-		-		-	143,00	21.111.233,00	26,00	3.838.406,00		-	169,00	24.949.639,00	132,00	147.631,00	19.487.292,00
6.4.	Suministro e instalación de salida interruptor sencillo o doble 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH40 3/4", elementos de fijación y conductores. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	32,00	166.320,00	5.322.240,00	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	32,00	166.320,00	5.322.240,00
6.5.	Suministro e instalación de Lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x4x7cm. Largo de la guaya: 100cm incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	40,00	300.264,00	12.010.560,00	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	40,00	300.264,00	12.010.560,00
6.6.	Reinstalación de panel LED cuadrado de dimensiones 60x60 cm preexistentes. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	0,00	103.354,00	-	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	103.354,00	-
6.7	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	52,00	209.700,00	10.904.400,00	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	52,00	209.700,00	10.904.400,00
6.8.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	22,00	220.546,00	4.852.012,00	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	22,00	220.546,00	4.852.012,00
6.9.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	14,00	198.472,00	2.778.608,00	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	14,00	198.472,00	2.778.608,00
6.10.	Suministro e instalación Salida tomacorriente doble polo a tierra (red normal), monofásico 120V 15A, 3m prom en cable No 12 LSHF AWG, elementos de fijación y conductores. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	33,00	173.606,00	5.728.998,00	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	33,00	173.606,00	5.728.998,00
6.11.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 a 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	150,00	16.035,00	2.405.250,00	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	150,00	16.035,00	2.405.250,00
6.12.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit EMT ø 3" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	50,00	155.392,00	7.769.600,00	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	50,00	155.392,00	7.769.600,00
6.13.	Suministro e instalación de ducto cerrado de 40X8 galvanizado o con pintura electrostática. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	20,00	317.627,00	6.352.540,00	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	20,00	317.627,00	6.352.540,00
6.14.	Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico tetrafilar con espacio para totalizador y barraje neutro y tierra, incluye totalizador y proteccione. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	1,00	3.460.340,00	3.460.340,00	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	1,00	3.460.340,00	3.460.340,00
7.1.	Suministro e Instalación de barra de comida en acero inoxidable calibre 22. de 45 cms de ancho incluye soporte en estructura metálica a pared.	ml	3,22	1.416.162,00	4.560.041,64	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	3,22	1.416.162,00	4.560.041,64
7.2.	Suministro e instalación de mueble de cocina de 1.60x0.60x0.90m en madera RH y en acero inoxidable, incluye grifería y accesorios de desagüe.	und	1,00	2.569.025,00	2.569.025,00	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	1,00	2.569.025,00	2.569.025,00
8.1.	Suministro e instalación de vidrio templado 8 mm para divisiones de oficina incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	317,09	856.266,00	271.511.673,41	99,20	84.944.395,75		-		-		-		-		-		-	99,20	84.944.395,75	217,88	856.266,00	186.567.277,66
8.2.	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado 8 mm con pivote, incluye topes de piso, accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento a todo costo.	m2	47,52	858.737,00	40.807.182,24	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	47,52	858.737,00	40.807.182,24
8.3.	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de 8 mm con sistema antipanico. Incluye topes de piso y accesorios para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	7,68	1.607.888,00	12.348.579,84	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	7,68	1.607.888,00	12.348.579,84
8.4.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho, de uso interior y exterior. A todo costo.	ml	60,00	82.644,00	4.958.640,00	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	60,00	82.644,00	4.958.640,00
8.5.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho, de uso interior y exterior, con corte de letras para identificar las oficinas en vidrio. A todo costo.	und	17,00	139.113,00	2.364.921,00	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	17,00	139.113,00	2.364.921,00
9.1.	Suministro e instalación de puerta en madecor entamborada de 0,90 m de ancho por 2.20 m de alto, incluye marcos chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	11,00	1.145.405,00	12.599.455,00	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	11,00	1.145.405,00	12.599.455,00
9.2.	Suministro e instalación de superficie de madera ancho 40cm y 3 cm de espesor, para instalar en muros bajos, correspondiente a la barra para computadores y zonas de estancia.	ml	100,00	354.159,00	35.415.900,00	-	-		-		-		-		-		-	76,59	27.125.037,81	76,59	27.125.037,81	23,41	354.159,00	8.290.862,19
10.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores blanco. A todo costo, incluye lineales.	m2	720,36	32.772,00	23.608.162,27	-	-		-		-		-		-		-	132,57	4.344.584,04	132,57	4.344.584,04	587,81	32.772,00	19.263.578,23
10.2.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos cielo falsos blanco. A todo costo, incluye lineales.	m2	920,38	39.060,00	35.949.886,56	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-	920,38	39.060,00	35.949.886,56
10.3.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores azul institucional. A todo costo, incluye lineales.	m2	40,00	37.195,00	1.487.800,00	-	-		-	17,48	650.169,00	-	-		-		-		-	17,48	650.168,60	22,52	37.195,00	837.631,40

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 7

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

1-12-2025 AL 31-12-2025

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5.142.932.606,00
VALOR CORTE 07	$ 313.223.406,02
miércoles, 31 de diciembre de 2025	

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 06			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		CORTE 07		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
10.4.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores verde institucional. A todo costo, incluye lineles.	m2	0,00	37.195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.195,00	-
	REPARACIONES LOCATIVAS - TORRE DE TECNOLOGÍA - PISO 2				60.566.030,00		57.849.827,36	-		-		-		-		-		1.705.081,04		-	59.554.908,41	-		1.011.121,59
1.1.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall, incluye desmonte de 113 luminarias tipo panel Led de 60 x 60 luz neutra 4000K y retiro con su disposición final de escombros.	m2	0,00	37.322,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.322,00	-
1.2.	Desmonte de puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	und	0,00	93.786,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.786,00	-
1.3.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, esduco. A todo costo.	m2	0,00	92.676,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.676,00	-
2.1.	Suministro e instalación de cielorraso en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, esduco y cava fondeo pintura. A todo costo.	m2	0,00	127.159,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.159,00	-
3.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 x 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad. Incluye plástico aislante y zumbidon de acuerdo a las características técnicas y el guardaescobas.	m2	310,00	189.748,00	58.821.880,00	304,88	57.849.827,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304,88	57.849.827,37	5,12	189.748,00	972.052,63
4.1.	Suministro e instalación de lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x4x7cm. Largo de la guaya: 100cm, incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	0,00	311.065,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311.065,00	-
4.2.	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	0,00	227.693,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227.693,00	-
4.3.	Reinstalación de panel LED cuadrado de dimensiones 60x60 cm luz neutra 4000K preexistentes. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	0,00	96.211,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.211,00	-
4.4.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	0,00	210.033,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.033,00	-
4.5.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia de aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	0,00	195.508,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195.508,00	-
5.1.	Suministro e instalación de Puerta en madecor entamborada de 0,90 m de ancho por 2.20 m de alto, incluye marcos, chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	0,00	997.838,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	997.838,00	-
6.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores blancos. A todo costo, incluye lineles	m2	50,00	34.883,00	1.744.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,88	1.705.081,04	48,88	1.705.081,04	1,12	34.883,00	39.068,96
	BOLSA DE ITEMS NO PREVISTOS (10%)					-	-	-												-		-		-
	SALDO BOLSA NP´s					-	-		-		-		-		-					-	-	-		-
	TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS - NPs				1.514.157.129,13	-	-	55.478.187,73		72.690.956,01		77.334.076,42		533.202.754,96		21.518.455,10		151.764.192,75		-	911.988.622,59	-	-	602.168.506,54
NP-01	Demolición placa maciza 0.15 mt en horarios autorizado por la entidad (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	m2	1100,00	49.331,00	54.264.100,00	-	-	46,23	2.280.646,13	-	-	769,13	37.941.952,03	21,55	1.063.083,05	-	-	28,40	1.401.000,40	865,31	42.686.681,61	234,69	49.331,00	11.577.418,39
NP-02	Suministro e instalación de mortero premezclado de nivelación bombeable, acelerado a 7 dias con baja permeabilidad para zona de cubiertas, garantizando pendientes de desagues hacia los sifones.	m2	185,00	104.277,00	19.291.245,00	-	-	137,79	14.368.567,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,79	14.368.567,67	47,21	104.277,00	4.922.677,33
NP-03	Demolición baldosa muro en horarios autorizados por la ENTIDAD (incluye retiro de material desde frente de obra al sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	m2	225,00	27.952,00	6.289.200,00	-	-	140,63	3.930.912,12	-	-	12,99	363.096,48	-	-	-	-	52,92	1.479.219,84	206,54	5.773.228,44	18,46	27.952,00	515.971,56
NP-04	Baldosa ceramica pared 30x60.	m2	355,43	142.571,00	50.673.986,68	-	-	31,15	4.441.713,96	73,76	10.516.607,24	42,12	6.005.090,52	-	-	-	-	74,61	10.637.222,31	221,65	31.600.634,04	133,78	142.571,00	19.073.352,65
NP-05	Baldosa ceramica piso 60x60.	m2	170,00	154.546,00	26.272.820,00	-	-	-	-	-	-	77,88	12.032.951,56	-	-	-	-	25,94	4.008.923,24	103,80	16.041.874,80	66,20	154.546,00	10.230.945,20
NP-06	Suministro e instalacion de cinta led en parte baja de gabinete superior de mueble de cocina.	und	1,00	260.334,00	260.334,00	-	-	1,00	260.334,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	260.334,00	-	260.334,00	-
NP-07	Desmonte y reinstalacion de rejillas de extraccion aire en cocina presidencia.	und	8,00	45.000,00	360.000,00	-	-	3,00	135.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	135.000,00	5,00	45.000,00	225.000,00
NP-08	Desmonte redes electricas existentes, incluye la disposición final fondo Nacional del Ahorro indique. (Zona de recepcion).	und	1,00	930.686,00	930.686,00	-	-	-	-	1,00	930.686,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	930.686,00	-	930.686,00	-
NP-09	Demolición de guardaescoba, (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	ml	220,00	14.785,00	3.252.700,00	-	-	120,00	1.774.200,00	-	-	22,13	327.192,05	-	-	-	-	-	-	142,13	2.101.392,05	77,87	14.785,00	1.151.307,95
NP-10	Desmonte espejo.	und	10,00	23.790,00	237.900,00	-	-	4,00	95.160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	118.950,00	9,00	214.110,00	1,00	23.790,00	23.790,00
NP-11	Desmonte de cubierta en policarbonato.	m2	55,00	52.335,00	2.878.425,00	-	-	29,92	1.565.863,20	-	-	-	-	-	-	-	-	9,60	502.416,00	39,52	2.068.279,20	15,48	52.335,00	810.145,80
NP-12	Suministro e instalación de Policarbonato alveolar 8 mm para cubierta curva, incluye conectores y accesorios para su correcta instalación. No incluye estructura de soporte.	m2	45,00	443.800,00	19.971.000,00	-	-	25,00	11.093.002,90	-	-	-	-	-	-	-	-	10,77	4.779.726,00	35,77	15.872.728,90	9,23	443.800,00	4.098.271,10
NP-13	Mantenimiento marquesina cubierta de vidrio acceso, incluye: Revisión general, limpieza perimetral y limpieza de vidrios.	m2	19,00	58.150,00	1.104.850,00	-	-	-	-	17,45	1.014.746,58	-	-	-	-	-	-	-	-	17,45	1.014.746,58	1,55	58.150,00	90.103,43
NP-14	Lavado e hidrolugado de fachadas, muros en piedra y/o acabado abuzardado	m2	282,00	51.032,00	14.391.024,00	-	-	216,78	11.062.716,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216,78	11.062.716,96	65,22	51.032,00	3.328.307,04
NP-15	Suministro e instalacion de revestimiento interior de fachada en WPC Panel Casino, de acuerdo a muestra seleccionada.	m2	50,00	249.987,00	12.499.350,00	-	-	13,18	3.294.578,67	20,52	5.130.233,21	5,08	1.269.933,96	-	-	-	-	-	-	38,78	9.694.745,85	11,22	249.987,00	2.804.604,15
NP-16	Desmonte de aparatos sanitarios (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio (hasta 50 m) y desde sitio de acopio a escombrera).	und	60,00	40.607,00	2.436.420,00	-	-	25,00	1.015.175,00	-	-	-	-	-	-	13,00	527.891,00	-	-	38,00	1.543.066,00	22,00	40.607,00	893.354,00
NP-17	Desmonte de muro fachada imitacion madera (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	m2	10,00	16.161,00	161.610,00	-	-	9,92	160.317,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,92	160.317,12	0,08	16.161,00	1.292,88
NP-18	Suministro e instalación de sensor de presencia Infrarrojo 360° de cobertura, montaje en techo, detección de movimiento hasta 4 metros radiales a una altura de instalación de 2,4 metros.	und	30,00	210.035,00	6.301.050,00	-	-	-	-	-	-	5,00	1.050.175,00	-	-	-	-	-	-	5,00	1.050.175,00	25,00	210.035,00	5.250.875,00
NP-19	Suministro e instalación de encimes mobiles de inferior 220 X 90 X 63 y superior de 200X70X35 incluye campana estructura, puertas, marrijas en acero tabular, bisagras de parche, entrepaños, patas de 8 cm y manija en acero tubular. Modulo torre hornos de 200 X 60 X 60 con dos puertas parte alta y dos cajones parte baja central para horno. Tapa barra de 130 x 50 con patas en acero de 100 cm y anclaje a la pared. Todo elaborado en melamina de 15mm, color arena o glacial fabricado e instalado.	UND	1,00	12.900.000,00	12.900.000,00	-	-	-	-	1,00	12.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	12.900.000,00	-	12.900.000,00	-
NP-20	Mesón en quartzone blanco polar con hueco para estufa y lavaplatos, incluye pulida, poceta, salpicadero 8 cm y estufa x 4 puestos challenger para uso con gas propano.	UND	1,00	6.850.000,00	6.850.000,00	-	-	-	-	1,00	6.850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	6.850.000,00	-	6.850.000,00	-
NP-21	Suministro e instalación punto de gas propano para estufa de presidencia, en tubería pe al pe de 1/2" , con coraza de protección a la vista y accesorios de conexión con pases por muros. incluye suministro de 2 cilindros de 100 libras en gas propano, con válvula regulatora para cada cilindro, base (poyo) soporte para cilindros y caja metálica de protección de cilindros para la intemperie.	GLB	1,00	6.155.883,00	6.155.883,00	-	-	-	-	1,00	6.155.883,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	6.155.883,00	-	6.155.883,00	-
NP-22	Suministro e instalacion registro 1/2" agua potable.	UND	5,00	89.688,00	448.440,00	-	-	-	-	2,00	179.376,00	1,00	89.688,00	-	-	-	-	-	-	3,00	269.064,00	2,00	89.688,00	179.376,00
NP-23	Jardineras artificiales de acuerdo a render incluye amarre plastico	mil	40,00	141.213,00	5.648.520,00	-	-	-	-	15,06	2.126.667,78	5,40	762.550,20	-	-	-	-	-	-	20,46	2.889.217,98	19,54	141.213,00	2.759.302,02
NP-24	Suministro e instalacion de extractor para cocina y baños (15 x 16 x 9 cm)	UND	20,00	196.410,00	3.928.200,00	-	-	-	-	-	-	9,00	1.767.690,00	-	-	-	-	-	-	9,00	1.767.690,00	11,00	196.410,00	2.160.510,00
NP-25	Demolicion de meson en grano de marmol de ventanilla bancolombia	UND	1,00	89.351,00	89.351,00	-	-	-	-	1,00	89.351,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	89.351,00	-	89.351,00	-
NP-26	Desmonte de aviso de fachada en recepción	UND	1,00	283.054,00	283.054,00	-	-	-	-	1,00	283.054,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	283.054,00	-	-	-
NP-27	Suministro e instalación de sanitario blanco institucional tipo adriatica o similar de entrada posterior no incluye puich	UND	30,00	1.146.999,00	34.409.970,00	-	-	-	-	11,00	12.616.989,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,00	12.616.989,00	19,00	1.146.999,00	21.792.981,00
NP-28	Suministro e instalación lavamanos blanco tipo cascada de baru o similar, no incluye griferia no incluye puich	UND	32,00	613.653,00	19.636.896,00	-	-	-	-	9,00	5.522.877,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	5.522.877,00	23,00	613.653,00	14.114.019,00
NP-29	Suministro e instalacion de carpa en lona para control de acceso en zona de recepcion	UND	1,00	3.605.351,00	3.605.351,00	-	-	-	-	1,00	3.605.351,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3.605.351,00	-	3.605.351,00	-
NP-30	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	32,00	121.212,00	3.878.784,00	-	-	-	-	3,00	363.636,00	13,00	1.575.756,00	-	-	-	-	-	-	16,00	1.939.392,00	16,00	121.212,00	1.939.392,00
NP-31	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UND	30,00	163.414,00	4.902.420,00	-	-	-	-	1,00	163.414,00	10,00	1.634.140,00	-	-	-	-	-	-	11,00	1.797.554,00	19,00	163.414,00	3.104.866,00

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.
ACTA DE COBRO 7

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

1-12-2025 AL 31-12-2025

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5.142.932.606,00
VALOR CORTE 07	$ 313.223.406,02
miércoles, 31 de diciembre de 2025	

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 06			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		CORTE 07		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
NP-32	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	24,00	109.459,00	2.627.016,00		-	-	-	2,00	218.918,00	12,00	1.313.508,00	-	-		-		-	14,00	1.532.426,00	10,00	109.459,00	1.094.590,00
NP-33	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	8,00	129.358,00	1.034.864,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	8,00	129.358,00	1.034.864,00
NP-34	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	62,00	148.502,00	9.207.124,00		-	-	-	10,00	1.485.020,00	-	-	-	-	48,00	7.128.096,00		-	58,00	8.613.116,00	4,00	148.502,00	594.008,00
NP-35	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UND	18,00	109.645,00	1.973.610,00		-	-	-	4,00	438.580,00	-	-	-	-		-		-	4,00	438.580,00	14,00	109.645,00	1.535.030,00
NP-36	RED SANITARIA PVC-S 4"	ml	410,00	74.903,00	30.710.230,00		-	-	-	17,80	1.333.273,40	-	-	-	-	174,08	13.039.114,24		-	191,88	14.372.387,64	218,12	74.903,00	16.337.842,36
NP-37	RED SANITARIA PVC-S 3"	ml	60,00	61.047,00	3.662.820,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	60,00	61.047,00	3.662.820,00
NP-38	RED SANITARIA PVC-S 2"	ml	80,00	49.310,00	3.944.800,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	80,00	49.310,00	3.944.800,00
NP-39	RED SANITARIA PVC-VENTILACION 2"	ml	60,00	31.024,00	1.861.440,00		-	-	-	24,70	766.292,80	-	-	-	-		-		-	24,70	766.292,80	35,30	31.024,00	1.095.147,20
NP-40	Red suministro 1 1/4"	ml	35,00	36.089,00	1.263.115,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	35,00	36.089,00	1.263.115,00
NP-41	Red suministro 1"	ml	50,00	27.219,00	1.360.950,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	50,00	27.219,00	1.360.950,00
NP-42	Red suministro 3/4"	ml	60,00	20.862,00	1.251.720,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	60,00	20.862,00	1.251.720,00
NP-43	Red suministro 1/2"	ml	60,00	18.245,00	1.094.700,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	60,00	18.245,00	1.094.700,00
NP-44	Registro PVC-P 1 - 1/4"	UND	17,00	145.520,00	2.473.840,00		-	-	-	-	-	8,00	1.164.160,00	-	-		-		-	8,00	1.164.160,00	9,00	145.520,00	1.309.680,00
NP-45	Registro PVC-P 1"	UND	10,00	111.417,00	1.114.170,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	10,00	111.417,00	1.114.170,00
NP-46	Trasiego incluye traslado a sitio de acopio en bolsas de aproximadamente 25 kilos	m3	50,00	52.788,00	2.639.400,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	50,00	52.788,00	2.639.400,00
NP-47	Construccion de Media caña en mortero 1:3	ml	350,00	47.206,00	16.522.100,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	350,00	47.206,00	16.522.100,00
NP-48	Suministro e instalación orinal tipo gotta o similar de entrada posterior no incluye grigeria ni incluye ouach	un	6,00	1.037.619,00	6.225.714,00		-	-	-	-	-	4,00	4.150.476,00	-	-		-		-	4,00	4.150.476,00	2,00	1.037.619,00	2.075.238,00
NP-49	Desmonte de cubierta en lamina de zinc en cubierta de convenciones incluye estructura metalica de soporte, incluye retiro a sitio de acopio y disposición final.	m2	110,00	58.611,00	6.447.210,00		-	-	-	-	-	100,42	5.885.716,62	-	-		-		-	100,42	5.885.716,62	9,58	58.611,00	561.493,38
NP-50	Desmonte de ductos de aire acondicionado (incluye fibra de vidrio, transporte y disposición final)	ml	350,00	49.313,00	17.259.550,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	350,00	49.313,00	17.259.550,00
NP-51	Desmonte de ductos de red contraincendio en tubería CPVC de varios diametros incluye soportería. (Incluye trasiego y disposición final)	ml	380,00	17.183,00	6.529.540,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	380,00	17.183,00	6.529.540,00
NP-52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Impermeabilización de placa poliurea pura RESISTENTE A RAYOS UV DANOCOAT 250 incluye suministro y aplicación de POLIUREA en 80 MILS +- 10%, ESPESOR TEXTURIZADA PREVIA IMPRIMACION EPOXICA BICOMPONENTE CON ARENA DE QUARZO EN UNA CAPA (si se requieren más se cobrarán por aparte), INCLUYE REACTOR GRACO, MATERIALES Y EQUIPOS CERTIFICADOS, PREVIO tratamiento de fisuras existentes. Acabado original gris cambia por reyes UV. Suministro y aplicación esmalte uretano gris o blanco resistente a Rayos UV color homogéneo como protección del sistema Poliurea.	M2	1136,80	225.935,00	256.842.908,00		-	-	-	-	-	-	-	994,57	224.708.172,95		-		-	994,57	224.708.172,95	142,23	225.935,00	32.134.735,05
NP-53	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRATO DE MORTERO SECO CON BAJO CONTENIDO DE AGUA PARA NIVELACION DE CUBIERTAS CON ESPESORES PROMEDIO DE 8cm, SOBRE SUPERFICIE IRREGULAR RESULTADO DE DEMOLICION DE ELEMENTOS NO DESMONTADOS Y RETIRADOS EN LAS AREAS A INTERVENIR. zona de cubiertas, orantiando pendientes de desagues hacia los sifones.	M2	1100,00	138.890,00	152.779.000,00		-	-	-	-	-	-	-	768,71	106.766.131,90		-		-	768,71	106.766.131,90	331,29	138.890,00	46.012.868,10
NP-54	Demolicion de dados de concreto de 0.3 x 0.3 x 0.25 m, los cuales se encuentran en zona de cubierta incluye trasiego y disposición final.	Und	80,00	57.437,00	4.594.960,00		-	-	-	-	-	-	-	80,00	4.594.960,00		-		-	80,00	4.594.960,00	-	57.437,00	-
NP-55	Desmonte de ducto de extrator incluye retiro 2 extractores tipo hongo incluye retiro y disposición final.	Und	3,00	223.054,00	669.162,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	3,00	223.054,00	669.162,00
NP-56	Desmonte de bandeja bandeja tipo escalera incluye cableado estructurado, cableado normal, cableado regulado y voz y datos correspondiente a alimentacion de puestos de trabajo existentes (incluye clasificación y entrega a la Entidad)	ml	160,00	50.217,00	8.034.720,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	160,00	50.217,00	8.034.720,00
NP-57	Suministro e instalación de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado de 30 x 10 x 1 m galvanizada con separador incluye curvas, soportería y conductor de tierra para bandeja.	ml	322,00	151.533,00	48.793.626,00		-	-	-	-	-	-	-	251,62	38.128.733,46		-		-	251,62	38.128.733,46	70,38	151.533,00	10.664.892,54
NP-58	Suministro e instalación de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado de 15 x 10 x 1 m galvanizada, incluye curvas, soportería y conductor de tierra para bandeja.	ml	172,00	129.520,00	22.277.440,00		-	-	-	-	-	-	-	88,42	11.452.158,40		-		-	88,42	11.452.158,40	83,58	129.520,00	10.825.281,60
NP-59	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 " SEGÚN DISEÑO DESARROLLO DE HASTA 1m	Und	132,00	165.000,00	21.780.000,00		-	-	-	-	-	-	-	129,04	21.291.600,00		-		-	129,04	21.291.600,00	2,96	165.000,00	488.400,00
NP-60	Punto hidraulico para rociador automatico de 1/2"	Und	75,00	114.984,00	8.623.800,00		-	-	-	-	-	-	-	75,00	8.623.800,00		-		-	75,00	8.623.800,00	-	114.984,00	-
NP-61	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	Und	75,00	63.827,00	4.787.025,00		-	-	-	-	-	-	-	75,00	4.787.025,00		-		-	75,00	4.787.025,00	-	63.827,00	-
NP-62	Suministro e instalacion TEE MECANICA RANURADA DE 3" X 1 1/2"	Und	23,00	60.791,00	1.398.193,00		-	-	-	-	-	-	-	17,00	1.033.447,00		-		-	17,00	1.033.447,00	6,00	60.791,00	364.746,00
NP-63	Suministro e instalacion STRAP DE 3" X 1"	Und	35,00	52.687,00	1.844.045,00		-	-	-	-	-	-	-	30,00	1.580.610,00		-		-	30,00	1.580.610,00	5,00	52.687,00	263.435,00
NP-64	Suministro e instalación de soporte tipo pera con varilla 3/8" con perno bean clamb para tubería 1"	Und	76,00	33.022,00	2.509.672,00		-	-	-	-	-	-	-	76,00	2.509.672,00		-		-	76,00	2.509.672,00	-	33.022,00	-
NP-65	Suministro e instalación de soporte tipo pera con varilla 3/8" con perno bean clamb para tubería 1-1/2"	Und	26,00	31.784,00	826.384,00		-	-	-	-	-	-	-	26,00	826.384,00		-		-	26,00	826.384,00	-	31.784,00	-
NP-66	Suministro e instalación de soporte tipo pera con varilla 3/8" con perno bean clamb para tubería 3"	Und	95,00	33.033,00	3.138.135,00		-	-	-	-	-	-	-	95,00	3.138.135,00		-		-	95,00	3.138.135,00	-	33.033,00	-
NP-67	Suministro e instalación de soporte transversal sismoresitente para tubería 3"	Und	22,00	234.807,00	5.165.754,00		-	-	-	-	-	-	-	16,00	3.756.912,00		-		-	16,00	3.756.912,00	6,00	234.807,00	1.408.842,00
NP-68	Suministro e instalación de soporte LONGITUDINAL sismoresitente para tubería 3"	Und	20,00	202.663,00	4.053.260,00		-	-	-	-	-	-	-	20,00	4.053.260,00		-		-	20,00	4.053.260,00	-	202.663,00	-
NP-69	SOPORTE ANTISISMICO 4 VIAS	Und	6,00	389.851,00	2.339.106,00		-	-	-	-	-	-	-	6,00	2.339.106,00		-		-	6,00	2.339.106,00	-	389.851,00	-
NP-70	TUBERIA ACC ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y PINTURA)	ml	149,20	66.346,00	9.898.823,20		-	-	-	-	-	-	-	134,20	8.903.633,20	12,41	823.353,86		-	146,61	9.726.987,06	2,59	66.346,00	171.836,14
NP-71	Tuberia de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diametro 1-1/2", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	ml	52,25	100.995,00	5.276.988,75		-	-	-	-	-	-	-	28,55	2.883.407,25		-		-	28,55	2.883.407,25	23,70	100.995,00	2.393.581,50
NP-72	Tuberia de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diametro 3", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	ml	203,50	224.347,00	45.654.614,50		-	-	-	-	-	-	-	192,71	43.233.910,37		-		-	192,71	43.233.910,37	10,79	224.347,00	2.420.704,13
NP-73	Suministro e instalacion codo ranurado acero al Carbono ASTM-A53 SCH 40 diametro 3", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	Und	10,00	98.325,00	983.250,00		-	-	-	-	-	-	-	9,00	884.925,00		-		-	9,00	884.925,00	1,00	98.325,00	98.325,00
NP-74	Suministro e instalacion TEE ranurado acero al Carbono ASTM-A53 SCH 40 diametro 3", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	Und	9,00	144.525,00	1.300.725,00		-	-	-	-	-	-	-	8,00	1.156.200,00		-		-	8,00	1.156.200,00	1,00	144.525,00	144.525,00
NP-75	Suministro e instalación de estación de control para red contra incendios	Und	1,00	3.271.755,00	3.271.755,00		-	-	-	-	-	-	-	1,00	3.271.755,00		-		-	1,00	3.271.755,00	-	3.271.755,00	-
NP-76	Suministro e instalación de Gabinete Tipo 3 para red contra incendios	Und	1,00	2.442.914,00	2.442.914,00		-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.442.914,00		-		-	1,00	2.442.914,00	-	2.442.914,00	-

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 7

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

1-12-2025 AL 31-12-2025

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5.142.932.606,00
VALOR CORTE 07	$ 313.223.406,02
miércoles, 31 de diciembre de 2025	

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 06			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		CORTE 07		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
NP-77	Suministro e instalación de ventosa automática para red contra incendios	Und	2,00	707.363,00	1.414.726,00		-	-	-	-	-	-	-	2,00	1.414.726,00		-		-	2,00	1.414.726,00	-	707.363,00	-
NP-78	Suministro e Instalacion AVISO 1 - INGRESO DE FUNCIONARIOS: Suministro e instalación de aviso tipo caja de luz, 15 cm de cantonera, logo en relieve acrílico, cantonera de 4 cm - iluminación LED - Textos en acrilico 4m sobre puestas con interruptor encendido y apagado. (7m*80cm)	Und	1,00	10.729.783,00	10.729.783,00		-	-	-	-	-	-	-	1,00	10.729.783,00		-		-	1,00	10.729.783,00	-	10.729.783,00	-
NP-79	Suministro e Instalacion AVISO 2 INTERNO - AVISO TEXTO - JUNTOS HACEMOS REALIDAD EL HOGAR DE LOS COLOMBIANOS - Suministro e instalación de aviso en acrilico 3mm letra a letra volumentrico - cantonera de 5 cm - . (3,2m* 40cm)	Und	1,00	8.652.770,00	8.652.770,00		-	-	-	-	-	-	-	1,00	8.652.770,00		-		-	1,00	8.652.770,00	-	8.652.770,00	-
NP-80	Suministro e Instalacion AVISO 3 - LOGO INTERNO FNA - Suministro e instalación de aviso en acrilico 3mm letra a letra volumentrico - cantonera de 5 cm - (80cm*80cm)	Und	1,00	4.130.770,00	4.130.770,00		-	-	-	-	-	-	-	1,00	4.130.770,00		-		-	1,00	4.130.770,00	-	4.130.770,00	-
NP-81	Suministro e Instalacion AVISO 4 - LOGO INTERNO FNA - Suministro e instalación de aviso en acrilico 3mm letra a letra Volumentrico - cantonera de 5 cm - (120cm*120cm)	Und	1,00	4.844.770,00	4.844.770,00		-	-	-	-	-	-	-	1,00	4.844.770,00		-		-	1,00	4.844.770,00	-	4.844.770,00	-
NP-82	Suministro e instalación de señales en acrílico cal 3m + impresión digital full color - corte laser + instalación -(Opciones: hale, empuje, rack, baños mixtos, Ref Entrada FNA (11cm*29 cm))	Und	15,00	116.946,00	1.754.190,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	15,00	116.946,00	1.754.190,00
NP-83	Pañete impermeabilizado con mortero 1:3 y sika 1 o similar (no incluye lineales)	M2	380,00	42.254,00	16.056.520,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	380,00	16.056.520,00	380,00	16.056.520,00	-	42.254,00	-
NP-84	Pañete impermeabilizado con mortero 1:3 y sika 1 o similar	ML	450,00	23.802,00	10.710.900,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	306,61	7.297.931,22	306,61	7.297.931,22	143,39	23.802,00	3.412.968,78
NP-85	Placa contrapiso de 10 cm de espesor, en concreto de 2500 PSI, No incluye acero de refuerzo	m2	30,00	78.487,00	2.354.610,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	20,63	1.619.186,81	20,63	1.619.186,81	9,37	78.487,00	735.423,19
NP-86	Mamposteria en bloque de arcilla no. 4 (no incluye lineales)	M2	110,00	64.001,00	7.040.110,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	47,94	3.068.207,94	47,94	3.068.207,94	62,06	64.001,00	3.971.902,06
NP-87	Mamposteria en bloque de arcilla no. 4 ancho max <0.70cm	ML	60,00	47.115,00	2.826.900,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	47,41	2.233.722,15	47,41	2.233.722,15	12,59	47.115,00	593.177,85
NP-88	Anclaje 1/2" L=50 cm	Und	300,00	26.778,00	8.033.400,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	262,00	7.015.836,00	262,00	7.015.836,00	38,00	26.778,00	1.017.564,00
NP-89	Viga de amarre de 0,12 x 0,20 NO incluye acero de refuerzo, alambre negro, incluye fomaleta y concreto de 2500 psi.	ML	100,00	63.817,00	6.381.700,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	100,00	6.381.700,00	100,00	6.381.700,00	-	63.817,00	-
NP-90	Columneta de confinamiento (0,12*0,20) NO incluye acero de refuerzo, alambre negro, INCLUYE fomaleta y concreto de 2500 psi.	ML	80,00	54.823,00	4.385.840,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	44,22	2.424.273,06	44,22	2.424.273,06	35,78	54.823,00	1.961.566,94
NP-91	Suministro e Instalacion de soporte para tubería de 1/2" a 4" para tuberias hidrosanitarias	Und	130,00	27.237,00	3.540.810,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	106,00	2.887.122,00	106,00	2.887.122,00	24,00	27.237,00	653.688,00
NP-92	Dovela en concreto tipo gruting de 3000 psi NO incluye acero de refuerzo	ML	75,00	8.375,00	628.125,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	70,08	586.920,00	70,08	586.920,00	4,92	8.375,00	41.205,00
NP-93	Construccion de Placa de entrepiso de 2.5 m x 2.5 m, con lámina colaborante 2", cal 22, h=10cm de acuerdo a detalle expresado en justificacion, incluye acero de refuerzo, concreto de 3000 psi y lamina colaborante (Incluye Cerramiento de protección en tercer piso, traslados de insumos, pre-fi, retiro en	UND	2,00	2.496.403,00	4.992.806,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	2,00	4.992.806,00	2,00	4.992.806,00	-	2.496.403,00	-
NP-94	Demolición de muro en mamposteria en bloque de arcilla de 15 cm (incluye trasciego de materiales desde unas distancias superiores a 50 ml y niveles superiores a un piso a punto de acopio de acuerdo a horarios establecidos por entidad)	M2	80,00	28.701,00	2.296.080,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	60,65	1.740.715,65	60,65	1.740.715,65	19,35	28.701,00	555.364,35
NP-95	Desmonte de ductos de extración de aire desde terraza hasta nivel de piso cuarto piso (Cerramiento preventivo en 3 piso, ductos de 1,60*0,80. Incluye trasiego desde cubierta ubicada a cinco pisos y disposición final).	ML	20,00	210.361,00	4.207.220,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	19,50	4.102.039,50	19,50	4.102.039,50	0,50	210.361,00	105.180,50
NP-96	Suministro e instalacion de gravilla lavada para transiciones entre enchapes y / o pisos laminados o urbanismo (ancho promedio 15 cm)	ML	100,00	72.837,00	7.283.700,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	63,70	4.639.716,90	63,70	4.639.716,90	36,30	72.837,00	2.643.983,10
NP-97	Desmonte de antena existente (incluye trasiego y disposición)	Und	1,00	2.558.429,00	2.558.429,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	1,00	2.558.429,00	1,00	2.558.429,00	-	2.558.429,00	-
NP-98	Mamposteria en bloque de arcilla estructural No. 4 de perforacion vertical (no incluye lineales, ni elementos no estructurales)	M2	60,00	70.975,00	4.258.500,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	42,35	3.005.791,25	42,35	3.005.791,25	17,65	70.975,00	1.252.708,75
NP-99	Mamposteria en bloque de arcilla estructural No. 4 de perforacion vertical, ancho max <0.60 cm (No incluye elementos no estructurales)	ML	20,00	51.514,00	1.030.280,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	12,43	640.319,02	12,43	640.319,02	7,57	51.514,00	389.960,98
NP-100	Suministro e instalacion de lineal en super board contra la ventaneria existente	Ml	300,00	93.616,00	28.084.800,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	300,00	93.616,00	28.084.800,00
NP-101	Suministro e instalacion de Marco para luminaria led de 60 x 60 para cielo raso en Dry Wall	UND	350,00	77.136,00	26.997.600,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	350,00	77.136,00	26.997.600,00
NP-102	Suministro e instalacion de Espejo en 4mm con bordes pulidos,brillados y flotado con tubular en aluminio con luz led calida de 120 v	M2	35,00	550.099,00	19.253.465,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	12,37	6.804.724,63	12,37	6.804.724,63	22,63	550.099,00	12.448.740,37
NP-103	Suministro e instalación de platina 150x150x6 mm con tornillo pasante de 1/2" L=0,40m, 6 tuercas y prandetas para instalación de estructura metalica de los micro ondas	UND	12,00	132.577,00	1.590.924,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	12,00	132.577,00	1.590.924,00
NP-104	Suministro e instalacion de luminaria led de 60 x 60 de 4000 k NO INCLUYE marco para luminaria de 60 x 60 para cielo raso en Dry Wall	UND	350,00	171.691,00	60.091.850,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	350,00	171.691,00	60.091.850,00
NP-105	Desmonte de puerta de vidrio laminado 5+5 MM, trasiego a punto de acopio y disposicion final a botadero certificado, suministro e instalacion de puerta en vidrio templado laminado 5 + 5 MM, con pelicula tipo bronce, incluye reinstalacion de postes de giro e instalacion de topes de piso, adecuación a	M2	7,00	1.715.072,00	12.005.504,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	3,75	6.431.520,00	3,75	6.431.520,00	3,25	1.715.072,00	5.573.984,00
NP-106	Ajuste de puertas de acceso en vidrio templado incluye cambio de montante y cambio de bisagras hidráulicas	M2	35,00	1.343.902,00	47.036.570,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	10,83	14.554.458,66	10,83	14.554.458,66	24,17	1.343.902,00	32.482.111,34
NP-107	Suministro e instalacion de Tapa registro en acero inoxidable de 30 x 30 cm incluye mortero de caja, estuco y pintura	Und	20,00	290.521,00	5.810.420,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	13,00	3.776.773,00	13,00	3.776.773,00	7,00	290.521,00	2.033.647,00
NP-108	Suministro de mesón para cubierta de lavamanos con perforaciones para poceta de sobre poner en Quarzstone Blanco Polar de 0,80 x0,55 mt, con baberos de 30 cms a los costados, salpicadero de 80 cms, a 8 cms, a frente con mencruana de 5 cms, a lava frontal en sistetolado color madera, instalación	Und	1,00	1.876.500,00	1.876.500,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	1,00	1.876.500,00	1,00	1.876.500,00	-	1.876.500,00	-
NP-109	Suministro e instalacion de mesón para lavamanos con perforaciones para poceta de sobre poner en Quarzstone Blanco Polar de 55 cm de ancho con baberos laterales y frontal de 30 cms con su respectivo salpicadero en escuadra de 8 cms, fijado con pie de amigo.	ml	50,00	1.359.000,00	67.950.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	11,58	15.737.220,00	11,58	15.737.220,00	38,42	1.359.000,00	52.212.780,00
NP-110	Suministro de caseta para puesto de vigilancia temporal en zona de acceso vehicular y rehubicable en cualquier sector que disponga la entidad, en estructura metalica calibre 16 con pintura esmalte negra.	UND	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	1,00	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
NP-111	Suministro e instalación de sanitario SMART AL SINGLE BLANCO o similar	UND	1,00	714.259,00	714.259,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	1,00	714.259,00	1,00	714.259,00	-	714.259,00	-
NP-112	Construccion de cajas de inspeccion sanitarias DE 80 X 80, incluye marco y tapa	UND	1,00	721.565,00	721.565,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	1,00	721.565,00	1,00	721.565,00	-	721.565,00	-
NP-113	Suministro, corte, doblado e instalación acero figurado 60000 PSI	Kg	250,00	7.899,00	1.974.750,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	250,00	7.899,00	1.974.750,00

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 7

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5.142.932.606,00
VALOR CORTE 07	$ 313.223.406,02
	miércoles, 31 de diciembre de 2025

1-12-2025 AL 31-12-2025

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 06			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		CORTE 07		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
NP-114	Suministro e instalación de piñan en aluminio de 5.5 cm de ancho fijado con chazo puntilla	MI	40,00	53.466,00	2.138.640,00		-	-	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	40,00	53.466,00	2.138.640,00
NP-115	Suministro e instalacion dilatación dry wall en Z	ML	1000,00	19.049,00	19.049.000,00		-	-	-		-	-	-	-	-		-	208,33	3.968.478,17	208,33	3.968.478,17	791,67	19.049,00	15.080.521,83
NP-116	Refuerzo filos y dilataciones en muros y columnas	ML	600,00	16.823,00	10.093.800,00		-	-	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	600,00	16.823,00	10.093.800,00
NP-117	Resanes y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre pañete o repello liso. A todo costo.	ML	800,00	23.356,00	18.684.800,00		-	-	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	800,00	23.356,00	18.684.800,00
NP-118	Presurización de la RCI mediante cargue de la red, para evaluación de la resistencia de las tuberías, uniones, válvulas y accesorios frente a presiones superiores a las de operación normal, según normas como NFPA 24 y NFPA 13 o ASME B31.1, bajo pruebas hidrostáticas a no menos de 200 psi (13,8 bar)	M2	1000,00	4.166,00	4.166.000,00		-	-	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	1.000,00	4.166,00	4.166.000,00
			TOTAL COSTO DIRECTO		4.170.058.060,75		399.961.521,14		102.051.339,62		185.989.734,01		236.145.459,15		590.529.172,18		131.159.235,65		253.971.787,90		1.899.808.249,02		COSTO DTO	2.270.249.811,73
			ADMINISTRACIÓN	12,00%	500.406.967,29	A.I.U.	47.995.382,54	A.I.U.	12.246.160,75	A.I.U.	22.318.768,08	A.I.U.	28.337.455,10	A.I.U.	70.863.500,66	A.I.U.	15.739.108,28	A.I.U.	30.476.614,55	A.I.U.	227.976.989,88	A.I.U.	ADMON.	272.429.977,41
			IMPREVISTOS	3,00%	125.101.741,82		11.998.845,63		3.061.540,19		5.579.692,02		7.084.363,77		17.715.875,17		3.934.777,07		7.619.153,64		56.994.247,47		IMPREVISTOS	68.107.494,35
			UTILIDAD	7,00%	291.904.064,25		27.997.306,48		7.143.593,77		13.019.281,38		16.530.182,14		41.337.042,05		9.181.146,50		17.778.025,15		132.986.577,43		UTILIDAD	158.917.466,82
			IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	55.461.772,21		5.319.488,23		1.357.382,82		2.473.663,46		3.140.734,61		7.854.037,99		1.744.417,64		3.377.824,78		25.267.449,71		IVA / UTILIDAD	30.194.322,50
			TOTAL COSTOS INDIRECTOS		972.874.545,57		93.311.022,88		23.808.577,53		43.391.404,94		55.092.735,62		137.770.455,87		30.599.449,69		59.251.618,12		443.225.264,49		INDIRECTOS	529.649.281,08
			VALOR TOTAL PROYECTO		5.142.932.606,00		493.272.544,00		125.859.917,00		229.381.139,00		291.238.195,00		728.299.628,05		161.758.685,34		313.223.406,02		2.343.033.514,00		VALOR TOTAL	2.799.898.093,00
						CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 05		CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		CORTE 07		ACUMULADO CORTES			VALOR POR EJECUTAR

ESTADO DE PAGOS DE CONTRATISTA

ACTA No.	PERIODO	ESTADO	VALOR CORTES	PORCENTAJE	PAGADO	SALDO
	VALOR CONTRATO		$ 5.142.932.606			$ 5.142.932.606
1	(07 MARZO AL 30 ABRIL DE 2025)	PAGADO	$ 493.272.544,00	9,59%	$ 493.272.544,00	$ 4.649.660.062,00
2	(01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2025)	PAGADO	$ 125.859.917,00	2,45%	$ 619.132.461,00	$ 4.523.800.145,00
3	(01 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2025)	PAGADO	$ 229.381.139,00	4,46%	$ 848.513.600,00	$ 4.294.419.006,00
4	(01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025)	PAGADO	$ 291.238.195,00	5,66%	$ 1.139.751.795,00	$ 4.003.180.811,00
5	(01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025)	PAGADO	$ 728.299.628	14,16%	$ 1.868.051.423,05	$ 3.274.881.182,95
6	(01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025)	TRAMITE	$ 161.758.685	3,15%	$ 2.029.810.108,39	$ 3.113.122.497,61
7	(01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025)	TRAMITE	$ 313.223.406	6,09%	$ 2.343.033.514,41	$ 2.799.898.091,59
TOTAL			$ 2.343.033.514	45,56%	$ 2.343.033.514,41	

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 253.971.787,90
ADMINISTRACION	12,00%	$ 30.476.614,55
IMPREVISTOS	3,00%	$ 7.619.153,64
UTILIDAD	7,00%	$ 17.778.025,15
IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	$ 3.377.824,78
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 59.251.618,12
VALOR TOTAL CORTE 07 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE		$ 313.223.406,02

5.142.932.607,00
1,00

ING. JEFFERSON BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA
INGEBYP S.A.S. / CTO FNA - 166 - 2024

ING. RICARDO MORENO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA
BIODECCO S.A.S. / CTO FNA - 022 - 2025

ING. RODOLFO ENRIQUE BARRETO VARGAS
COORDINADOR OBRA
INGEBYP S.A.S. / CTO FNA - 166 - 2024

ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR INTERVENTORIA
BIODECCO S.A.S. / CTO FNA - 022 - 2025

Dr. VANESA PACHECO GÓMEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR CTO INTERVENTORÍA FNA 022 2025
FONDO NACIONAL DEL AHORRO FNA SA

ING. JAIME HERNANDO PRIETO
PROFESIONAL EJECUTIVO NIVEL 2
APOYO SUPERVISIÓN CTO INTERVENTORÍA FNA 022 2025
FONDO NACIONAL DEL AHORRO FNA SA

ACTA PARCIAL No. 07

MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA

PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 2

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA	31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	1.2.	DESCRIPCION ITEM:	Pintura exterior tipo coraza para muros sobre pañete incluye toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.			UNIDAD:	M2


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES- CUBIERTA					-
Tramo 1	0,86		6,73	1,00	5,79
Tramo 2	0,86		6,76	1,00	5,81
Tramo 3	0,86		6,73	1,00	5,79
Tramo 4	0,86		6,73	1,00	5,79
Tramo 5	0,86		6,76	1,00	5,81
Tramo 6	0,86		6,75	1,00	5,81
Tramo 7	0,86		6,76	1,00	5,81
Tramo 8	0,86		6,70	1,00	5,76
Tramo 9	0,86		6,76	1,00	5,81
Tramo 10	0,86		6,75	1,00	5,81
Tramo 11	0,86		6,76	1,00	5,81
Tramo 12	0,86		6,73	1,00	5,79
Tramo 13	0,86		6,73	1,00	5,79
Tramo 14	0,86		6,76	1,00	5,81
Tramo 15	0,86		6,73	1,00	5,79
Tramo 16	0,86		6,76	1,00	5,81
Tramo 17	0,86		6,70	1,00	5,76
Tramo 18	0,86		6,76	1,00	5,81
				SUBTOTAL	104,36
				VIENE	393,64
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	498,00
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 4	- 393,63
				PRESENTE ACTA	104,37

REGISTRO FOTOGRÁFICO

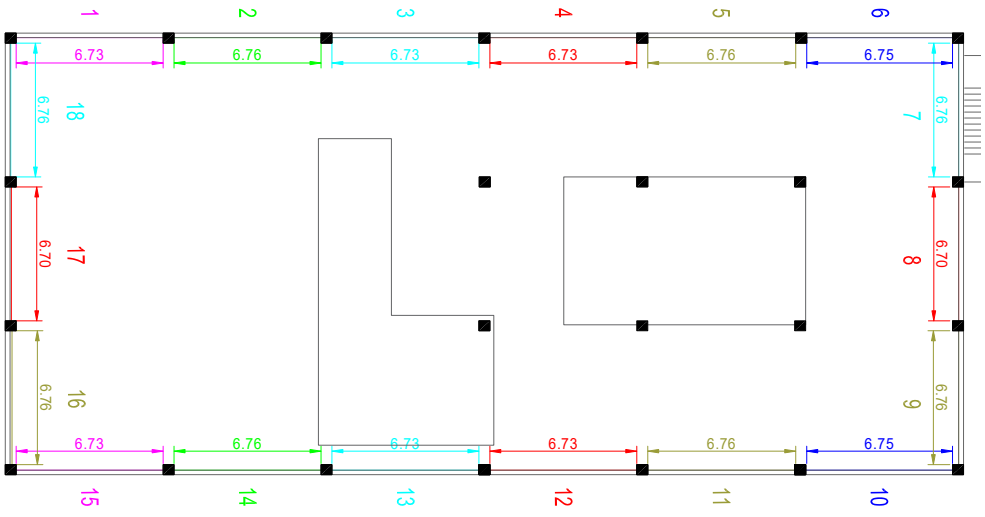

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07					INGEBYP NIT. 830.131.607-3
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA					
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025		HOJA	2 DE 2	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	1.2.	DESCRIPCION ITEM:	Pintura exterior tipo coraza para muros sobre pañete incluye toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.		UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 07


MEMORIAS DE CANTIDADES -GESTION DOCUMENTAL - BAÑO - PRIMER PISO - EDIFICIO TECNOLOGIAFNA

PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	3.2.	DESCRIPCION ITEM:	Mantenimiento de cielo raso en fibra mineral. Incluye cambio, pintura y/o reutilización de láminas en fibra mineral, instalación de anclajes y arreglo de perfilería descolgada y colocación de soportes.		UNIDAD:	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

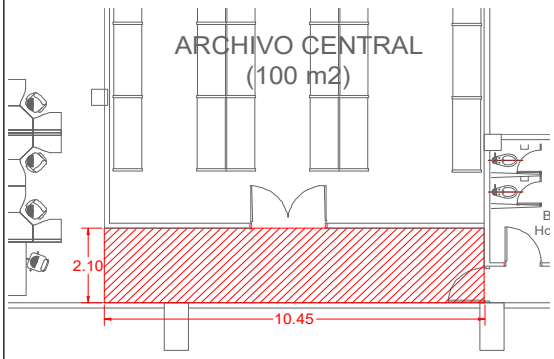

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
BAÑOS TECNOLOGIA					-
					-
pasillo entrada a baños		2,10	10,45	1,00	21,95
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	21,95
				VIENE	-
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	21,95
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 6	-
				PRESENTE ACTA	21,95







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 07


MEMORIAS DE CANTIDADES -GESTION DOCUMENTAL - BAÑO - PRIMER PISO - EDIFICIO TECNOLOGIAFNA

PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 2

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	4,4	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de divisiones metálicas para baños. Incluye soportería, tornillos, herrajes, retiro y disposición final.		UNIDAD:	Und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

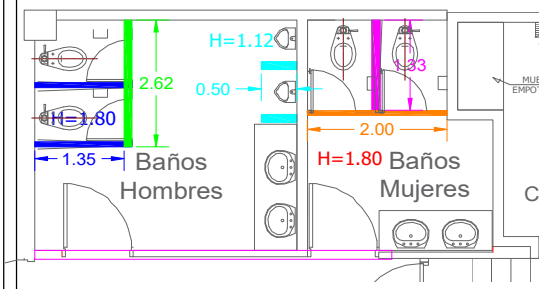

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	Und	MEDIDA TOTAL
Edificio Gestion Documental.					-
Piso 1					-
BAÑO HOMBRES					-
DIVICIONES LATERALES	1,80		1,35	2,00	4,86
PUERTAS	1,80		2,62	1,00	4,72
DIVISIONES ORINALES	1,12		0,50	2,00	1,12
					-
BAÑO MUJERES					-
DIVISIONES LATERALES	1,80		1,33	1,00	2,39
PUERTAS	1,80		2,00	1,00	3,60
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					16,69
VIENE					78,57
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					95,26
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 6					- 60,25
PRESENTE ACTA					35,01

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA


ACTA PARCIAL No. 07

MEMORIAS DE CANTIDADES -BATERIA SANITARIA - CUARTO PISO - EDIFICIO CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	2 DE 2

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	4,4	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de divisiones metálicas para baños. Incluye soportería, tornillos, herrajes, retiro y disposición final.		UNIDAD:	Und

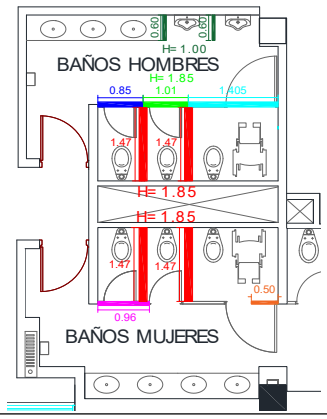PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			Und	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	EDIFICIO CONVENCIONES					-
	PISO 4 BAÑOS					-
	baño hombre					-
	puerta sanitario	1,90	0,85		1,00	1,62
	puerta sanitario	1,90	1,01		1,00	1,92
	puerta sanitario	1,90	1,41		1,00	2,67
	division sanitario	1,90	1,47		2,00	5,59
						-
	Baño Mujeres					-
	division sanitario	1,90	1,47		2,00	5,59
	puerta sanitario	1,90	0,96		1,00	1,82
	Paral puerta	1,90	0,50		1,00	0,95
	Puerta de acceso	1,90	0,86		1,00	1,63
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL		21,79
				VIENE		56,78
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA		78,57

REGISTRO FOTOGRÁFICO











OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA


ACTA PARCIAL No. 07

MEMORIAS DE CANTIDADES -GESTION DOCUMENTAL - BAÑO - PRIMER PISO - EDIFICIO TECNOLOGIAFNA

PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	4.5.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de divisiones de baño en acero inoxidable por ambas caras calibre 22, aleación 304 acabado satinado tipo SOCODA o similar. Con puerta, anclajes y accesorios necesarios para su instalación y correcto funcionamiento.		UNIDAD:	M2

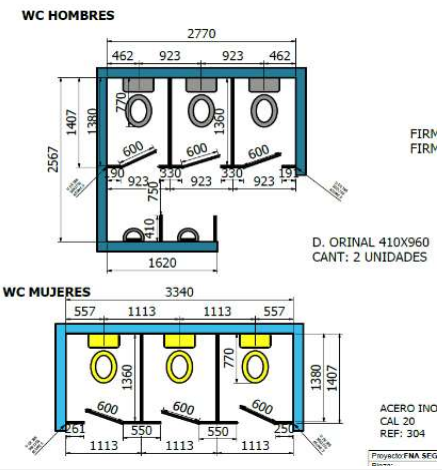PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	Und	MEDIDA TOTAL
	Edificio TECNOLOGIA Gestion Documental.					-
	Piso 1					-
	BAÑO HOMBRES					-
	DIVICIONES LATERALES	1,80		1,36	2,00	4,90
	PUERTAS	1,80		0,60	1,00	1,08
		1,80		0,33	2,00	1,19
		1,80		0,19	2,00	0,68
	DIVISIONES ORINALES	0,91		0,46	2,00	0,84
						-
	BAÑO MUJERES					-
	DIVISIONES LATERALES	1,80		1,36	2,00	4,90
	PUERTAS	1,80		0,60	3,00	3,24
		1,80		0,26	1,00	0,47
		1,80		0,25	1,00	0,45
		1,80		0,55	2,00	1,98
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	19,73
					VIENE	46,40
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	66,13
					COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 6	- 46,40
					PRESENTE ACTA	19,73

REGISTRO FOTOGRÁFICO








OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.124.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES -GESTION DOCUMENTAL - BAÑO - PRIMER PISO - EDIFICIO TECNOLOGIAFNA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	3.4.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación cielo raso en drywall de 1/2" de espesor a una sola cara, incluye estructura, perforaciones luminarias. A todo costo.		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

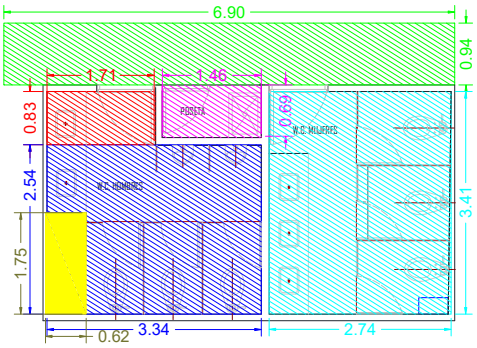

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	LARGO	ANCHO	UNIDADES	MEDIDA TOTAL
Edificio Tecnologia					-
Piso 1 Baño General					-
baño hombres					-
entrada		0,83	1,71	1,00	1,42
baño general		2,54	3,34	1,00	8,48
Ducto		1,75	0,62	- 1,00	- 1,09
					-
POSETA		0,69	1,46	1,00	1,01
					-
BAÑO MUJERES		3,41	2,74	1,00	9,34
COLUMNA		0,25	0,40	- 1,00	- 0,10
					-
PASILLO		0,94	6,90	1,00	6,49
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	25,55
				VIENE	-
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	25,55
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 6	-
				PRESENTE ACTA	25,55

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT 830.121.507-0
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - TECNOLOGIA FNA - BAÑOS PISO 1				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	9.1.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de estructura decorativa para plantas colgantes de 6,85m ancho x 1,00 m de profundo con viguetas cada 0,76 m en tubería metálica cuadrada 50x50x2.0mm con acabado en pintura electrostática negro mate incluye 6 puntos de apoyo en guaya de tipo colgante. incluye 3 lamparas segun imagen.		UNIDAD:	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

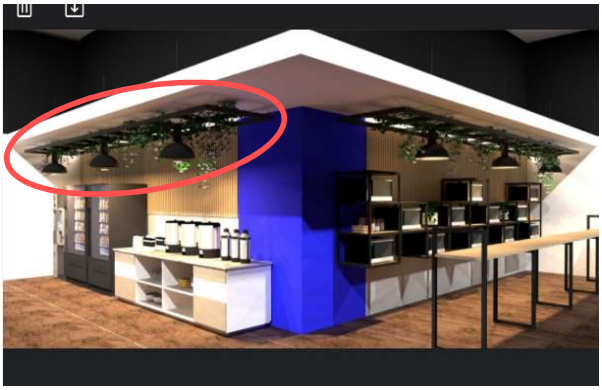

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	LARGO	ANCHO	UNIDADES	MEDIDA TOTAL
					-
Edificio Convenciones					-
Piso 1					-
					-
Atencion al usuario				0,60	0,60
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	0,60
				VIENE	1,00
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	1,60
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 6	- 1,00
				PRESENTE ACTA	0,60

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

	ACTA PARCIAL No. 07				
	MEMORIAS DE CANTIDADES -GESTION DOCUMENTAL - BAÑO - PRIMER PISO - EDIFICIO TECNOLOGIAFNA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 4	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	9.2.	DESCRIPCION ITEM:	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos cielo falsos blanco. A todo costo, incluye lineales.		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

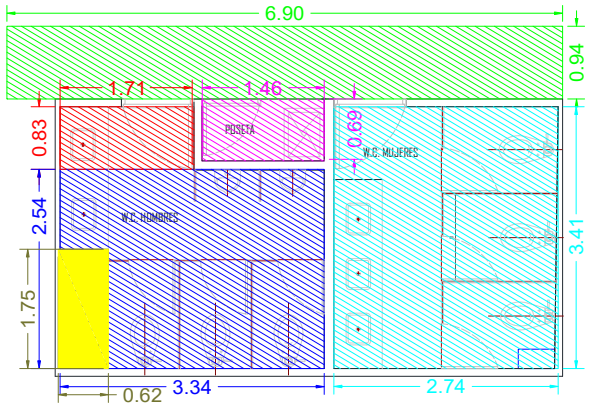

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	LARGO	ANCHO	UNIDADES	MEDIDA TOTAL
					-
Edificio Tecnologia					-
Piso 1 Baño General					-
baño hombres					-
entrada		0,81	1,64	1,00	1,33
baño general		2,54	3,34	1,00	8,48
Ducto		1,75	0,62	- 1,00	- 1,09
					-
POSETA		0,69	1,46	1,00	1,01
					-
BAÑO MUJERES		3,41	2,74	1,00	9,34
COLUMNA		0,25	0,40	- 1,00	- 0,10
					-
PASILLO		0,94	6,90	1,00	6,49
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					25,46
VIENE					136,03
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					161,49
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 6					-
PRESENTE ACTA					161,49

REGISTRO FOTOGRÁFICO









OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - RECEPCION - ACCESO FNA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	2 DE 4	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	9.2.	DESCRIPCION ITEM:	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos cielo falsos blanco. A todo costo, incluye lineales.		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

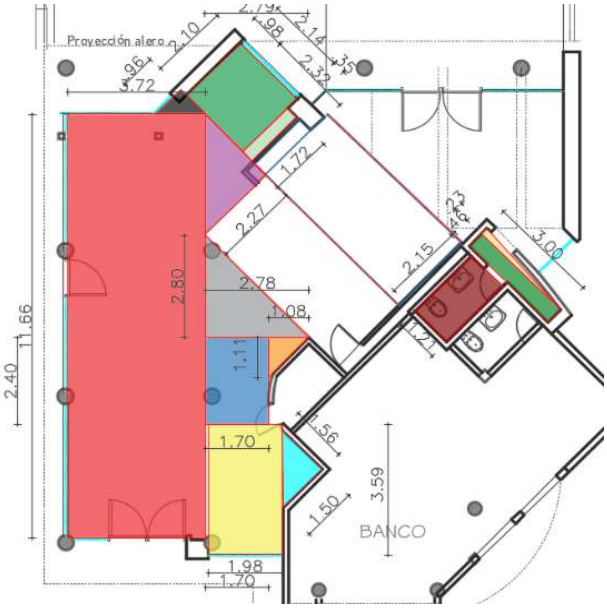

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	LARGO	ANCHO	UNIDADES	MEDIDA TOTAL
RECEPCION					-
		2,14	2,10	1,00	4,49
		11,66	3,72	1,00	43,38
		3,59	1,98	1,00	7,11
		2,40	1,70	1,00	4,08
		1,56	1,50	0,50	1,17
		1,11	1,08	0,50	0,60
		2,80	2,78	0,50	3,89
		2,27	2,32	0,50	2,63
		1,72	0,35	1,00	0,60
		0,96	0,98	0,50	0,47
		2,15	1,21	1,00	2,60
		0,46	3,00	1,00	1,38
		0,23	3,00	0,50	0,35
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	72,75
				VIENE	63,28
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	136,03

REGISTRO FOTOGRÁFICO










OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

	ACTA PARCIAL No. 07				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS - EDIFICIO CONVENCIONES FNA - BAÑOS PISO 2				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	3 DE 4	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	9.2.	DESCRIPCION ITEM:	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos cielo falsos blanco. A todo costo, incluye lineales.		UNIDAD:	M2

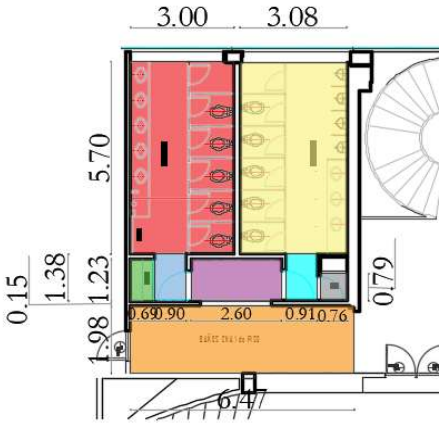PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	UNIDADES	MEDIDA TOTAL
	BAÑOS CNA PISO 2					
	Baño de Mujeres					-
		3,00		5,70	1,00	17,10
		1,23		0,69	1,00	0,85
		1,38		0,90	1,00	1,24
	Baño de Hombres					-
		3,08		5,70	1,00	17,56
		1,23		0,76	1,00	0,93
		1,38		0,91	1,00	1,26
						-
	PASILLO					-
		6,47		1,98	1,00	12,81
		2,60		1,23	1,00	3,20
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL		54,95
				VIENE		8,33
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA		63,28

REGISTRO FOTOGRÁFICO










OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CAFETERIA - EDIFICIO DE CONVENCIONES FNA - PISO 2				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	4 DE 4	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	9.2.	DESCRIPCION ITEM:	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos cielo falsos blanco. A todo costo, incluye lineales.		UNIDAD:	M2

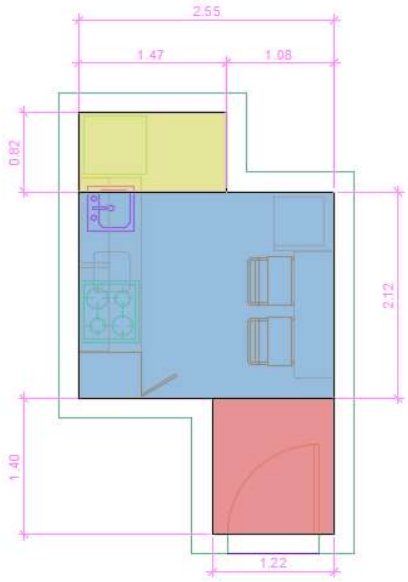PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			UNIDADES	MEDIDA TOTAL
		ALTO	LARGO	ANCHO		
	COCINA PRESIDENCIA					-
			2,55	2,12	1,00	5,41
			1,47	0,82	1,00	1,21
			1,40	1,22	1,00	1,71
					SUBTOTAL	8,33
					VIENE	-
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	8,33

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 07


MEMORIAS DE CANTIDADES -CASINO - PRIMER PISO - EDIFICIO CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	11,1	DESCRIPCION ITEM:	Resanes y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre pañete o repello liso. Incluyen andamios, escaleras y sistemas de seguridad de operación. A todo costo.		UNIDAD:	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

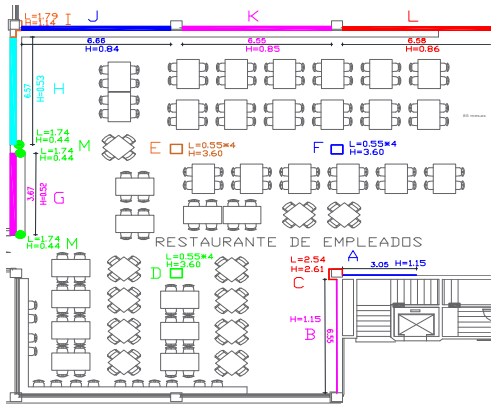

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CASINO					-
MURO A	1,15		3,05	1,00	3,51
MURO B	1,15		6,55	1,00	7,53
MURO C	2,61		2,54	1,00	6,63
COLUMNA D	3,60		0,55	4,00	7,92
COLUMNA E	3,60		0,55	4,00	7,92
COLUMNA F	3,60		0,55	4,00	7,92
MURO G	0,52		3,67	1,00	1,91
MURO H	0,53		6,57	1,00	3,48
MURO I	1,14		1,79	1,00	2,04
MURO J	0,84		6,86	1,00	5,76
MURO K	0,85		6,55	1,00	5,57
MURO L	0,86		6,58	1,00	5,66
MURO M	0,44		1,74	3,00	2,30
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	68,15
				VIENE	-
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	68,15
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 6	-
				PRESENTE ACTA	68,15









OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES -GESTION DOCUMENTAL - BAÑO - PRIMER PISO - EDIFICIO TECNOLOGIAFNA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	1.1.	DESCRIPCION ITEM:	Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.			UNIDAD: m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

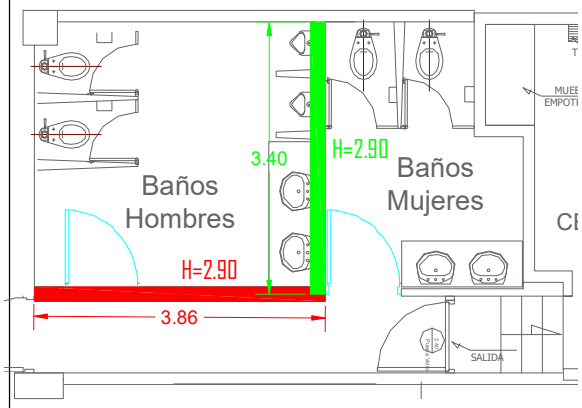

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	Und	MEDIDA TOTAL
Edificio Gestion Documental.					-
Piso 1					-
Baños Tecnología	2,90		3,86	1,00	11,19
puertas	1,02		2,10	- 1,00	- 2,14
					-
muro divisorio	2,90		3,40	1,00	9,86
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	18,91
				VIENE	193,56
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	212,47
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 6	- 193,56
				PRESENTE ACTA	18,91

REGISTRO FOTOGRÁFICO








OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07			INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO RECEPCION - ACCESO- PISO 1			
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	1.2.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.			UNIDAD: M2

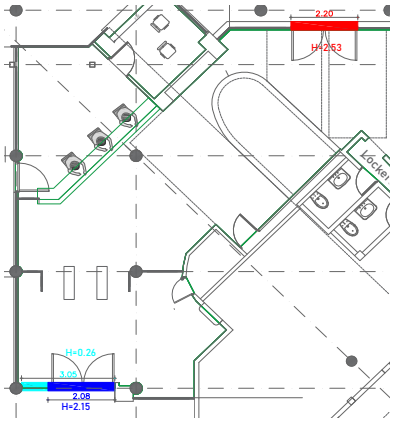PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			Und	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	EDIFICIO RECEPCION					-
						-
	PUERTA DE ACCESO A RECEPCION	2,53		2,20	1,00	5,57
	PUERTA DE SALIDA DE RECEPCION	2,08		2,15	1,00	4,47
	MONTANTE PUERTA DE SALIDA	0,26		3,05	1,00	0,79
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	10,83
					VIENE	515,24
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	526,07
					COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 6	- 515,24
					PRESENTE ACTA	10,83

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - TECNOLOGIA FNA - BAÑOS PISO 1				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	1.3.	DESCRIPCION ITEM:	Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.		UNIDAD:	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

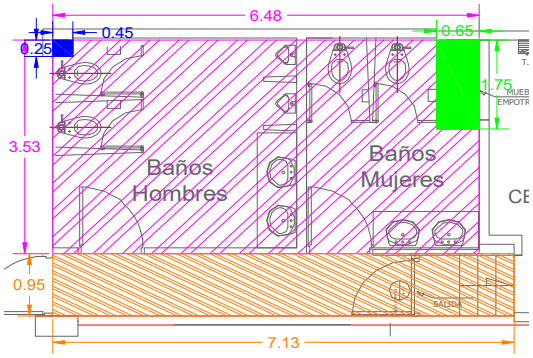

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	Und	MEDIDA TOTAL
Baños Tecnologia					-
					-
baños		6,48	3,53	1,00	22,87
pasillo		7,13	0,95	1,00	6,77
columna		0,25	0,45	- 1,00	- 0,11
ducto		0,65	1,75	- 1,00	- 1,14
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	28,39
				VIENE	888,84
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	917,23
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 6	- 888,84
				PRESENTE ACTA	28,39

REGISTRO FOTOGRÁFICO








OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07		INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - TECNOLOGIA FNA - BAÑOS PISO 1		
	PERIODO: 1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA: 1 DE 1	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA: 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	1.6.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo			UNIDAD: M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					-
EDIFICIO TECNOLOGIA - P1					-
Baños Tecnología	2,10	2,80		1,00	5,88
Baños Tecnología	2,70	1,00		1,00	2,70
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	8,58
				VIENE	18,00
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	26,58
				PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 6	- 18,00
				PRESENTE ACTA	8,58

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 07

MEMORIAS DE CANTIDADES -OFICINA ABIERTA - CUARTO PISO - EDIFICIO CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 2

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	3,1	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de muro en Superboard, altura 2.40 m. a dos caras incluye estructura, anclaje, cinta, estuco y fondeo de acabado en pintura en vinilo tipo 1.		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ELEMENTO	ANCHO	ALTO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					-
EDIFICIO CNA					-
BODEGA DE MARKETING					-
area bodega	N.1	2,35	2,40	1,00	5,64
recepcion bodega	N.2	2,35	2,40	1,00	5,64
	N.3	2,06	2,40	1,00	4,94
	N.4	2,35	2,40	1,00	5,64
	N.5	2,35	2,40	1,00	5,64
	N.6	2,35	2,40	1,00	5,64
	N.7	2,35	2,40	1,00	5,64
	N.8	2,57	2,40	1,00	6,17
	N.9	7,31	2,40	1,00	17,54
	N.10	1,50	2,40	1,00	3,60
	N.11	2,18	2,40	1,00	5,23
	N.12	4,51	2,40	1,00	10,82
	N.13	2,35	2,40	1,00	5,64
	N.14	2,35	2,40	1,00	5,64
	N.15	2,63	2,40	1,00	6,31
	N.16	2,63	2,40	1,00	6,31
	N.17	2,63	2,40	1,00	6,31
	N.18	1,01	2,40	1,00	2,42
	N.19	1,92	2,40	1,00	4,61
	N.20	1,92	2,40	1,00	4,61
	N.21	1,92	2,40	1,00	4,61
					-
					-
				SUBTOTAL	128,60
				VIENE	-
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	128,60
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 5	0,00
				PRESENTE ACTA	128,60

REGISTRO FOTOGRÁFICO

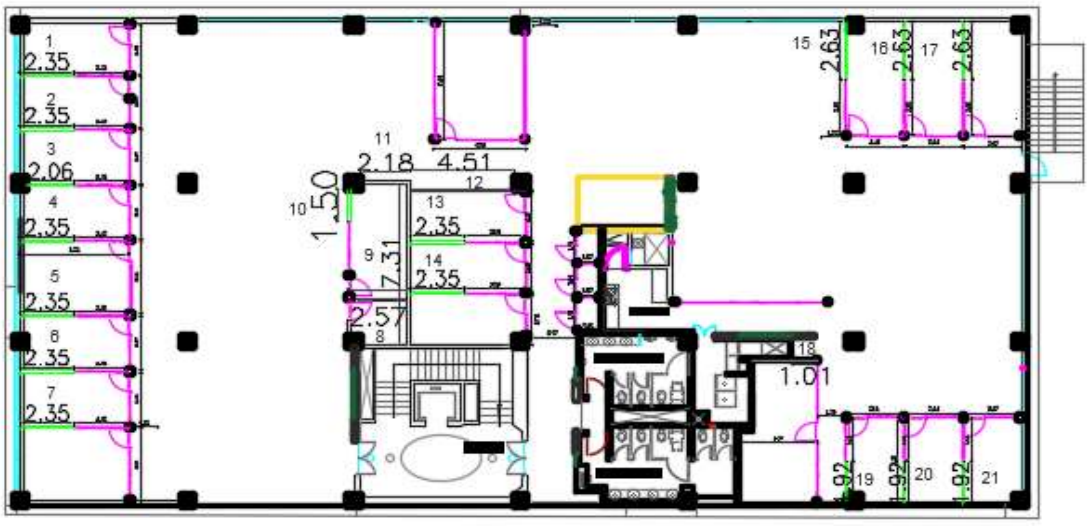

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07					INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES -OFICINA ABIERTA - CUARTO PISO - EDIFICIO CONVENCIONES FNA					
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025		HOJA	2 DE 2	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	3,1	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de muro en Superboard, altura 2.40 m. a dos caras incluye estructura, anclaje, cinta, estuco y fondeo de acabado en pintura en vinilo tipo 1.		UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 07

MEMORIAS DE CANTIDADES -OFICINAS - CUARTO PISO - EDIFICIO CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 2

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	4.1.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall de 1/2" en diferentes niveles a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura a 3 manos. A todo costo.		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					-
EDIFICIO CNA					-
BODEGA DE MARKETING					-
area bodega		21,80	14,50	1,00	316,10
recepcion bodega		21,40	21,80	1,00	466,52
		3,50	6,90	1,00	24,15
		7,40	14,55	1,00	107,67
		1,00	872,12	- 1,00	- 872,12
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	42,32
				VIENE	930,26
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	972,58
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 5	- 930,26
				PRESENTE ACTA	42,32

REGISTRO FOTOGRÁFICO

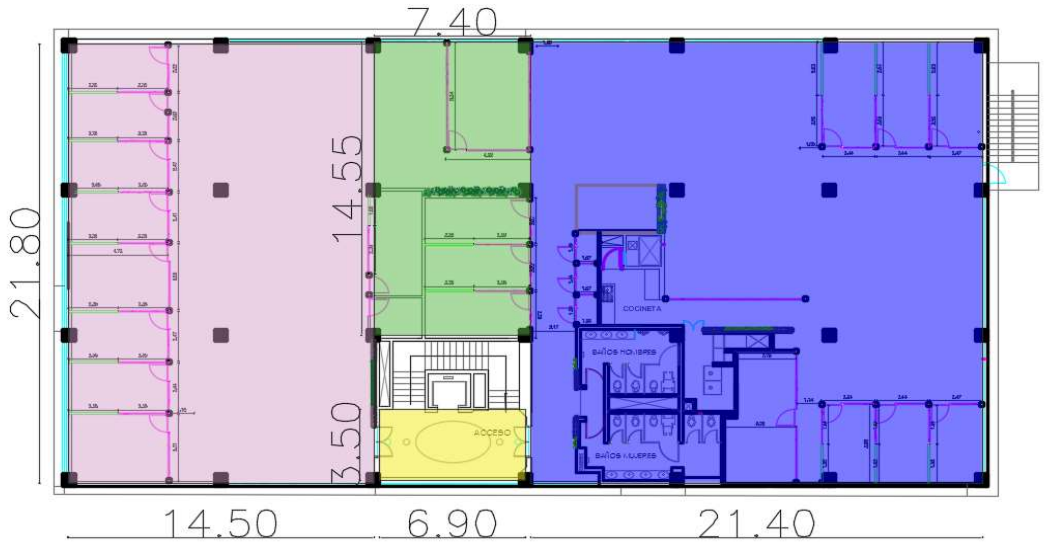

OBSERVACIONES: El valor descontado de 872.12 refiere al valor pasado de esta area en cortes anteriores los cuales se ven reflejados al final de esta memorias

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07					INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES -OFICINAS - CUARTO PISO - EDIFICIO CONVENCIONES FNA					
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025		HOJA	2 DE 2	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	4.1.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall de 1/2" en diferentes niveles a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura a 3 manos. A todo costo.		UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO




OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 2	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA	31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	9.2.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de superficie de madera ancho 40cm y 3 cm de espesor, para instalar en muros bajos, correspondientes a la barra para computadores y zonas de estancia.			UNIDAD:	ML

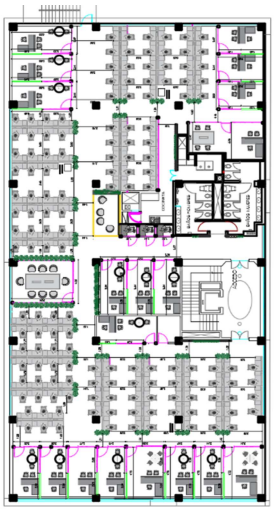PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			Nº ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	EDIFICIO DE CONVENCIONES					-
	PISO 4					-
						-
						-
				3,20	1,00	3,20
				6,70	1,00	6,70
				6,56	1,00	6,56
				6,70	1,00	6,70
				6,70	1,00	6,70
				6,70	1,00	6,70
				6,65	1,00	6,65
				6,70	1,00	6,70
				6,66	1,00	6,66
				6,71	1,00	6,71
				6,65	1,00	6,65
				6,66	1,00	6,66
						-
						-
						-
						-
	SUBTOTAL					76,59
	VIENE					-
	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					76,59
	COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 6					-
	PRESENTE ACTA					76,59

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	2 DE 2	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA	31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	9.2.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de superficie de madera ancho 40cm y 3 cm de espesor, para instalar en muros bajos, correspondientes a la barra para computadores y zonas de estancia.			UNIDAD:	ML


REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO CONVENCIONES FNA - OFICINA MARKETING PISO 1				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 3	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	10.1.	DESCRIPCION ITEM:	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores blanco. A todo costo, incluye lineales.		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

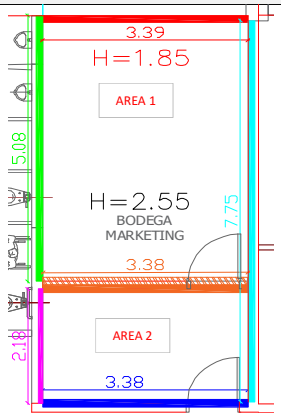

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CNA PISO 1					-
BODEGA DE MARKETING					-
Muro a fachada	1,85		3,39	1,00	6,27
muro contra enfermeria	2,55		7,75	1,00	19,76
muro contra baños	2,55		5,08	1,00	12,95
Muro divisorio	2,55		3,38	2,00	17,24
puerta divisorias	2,20		1,00	- 2,00	- 4,40
					-
acceso de Bodega	2,55		2,18	1,00	5,56
muro de acceso	2,55		3,38	1,00	8,62
puerta divisoria	2,10		0,88	- 1,00	- 1,85
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	64,15
				VIENE	68,42
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	132,57
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 6	-
				PRESENTE ACTA	132,57

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.121.537-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO CONVENCIONES FNA - OFICINA MARKETING PISO 1				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	2 DE 3	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA	31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	10.1.	DESCRIPCION ITEM:	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores blanco. A todo costo, incluye lineales.			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

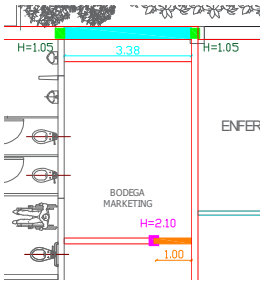

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CNA PISO 1					-
BODEGA MARKETING					-
Muro CON VISTA A MATERA		0,60	3,36	1,00	2,02
Puerta interna bodega lateral	2,20	0,60		1,00	1,32
Puerta interna bodega dintel		0,60	1,00	1,00	0,60
					-
Cieloraso bodega					-
Cortinero		0,60	3,38	1,00	2,03
					-
Descolgado LATERALES en ventana	1,05	0,60		2,00	1,26
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					7,23
VIENE					61,19
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					68,42

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO CNA FNA - PISO 2 - PASILLO BAÑOS				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	3 DE 3	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	10.1.	DESCRIPCION ITEM:	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores blanco. A todo costo, incluye lineales.		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

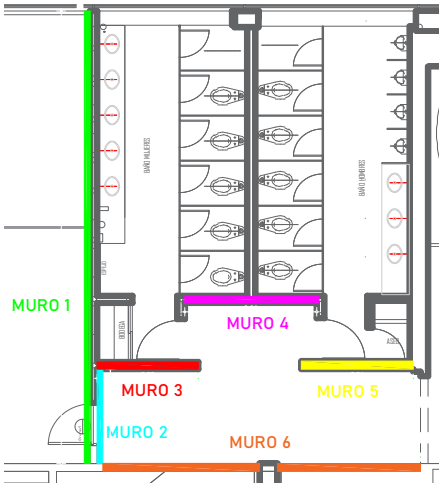

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
baños CNA piso 2					-
Muro 1	2,90		9,25	1,00	26,83
puerta	2,09		1,28	- 1,00	- 2,68
Muro 2	2,70		1,99	1,00	5,37
puerta	2,09		1,28	- 1,00	- 2,68
Muro 3	2,70		2,02	1,00	5,45
Muro 4	2,70		2,64	1,00	7,13
Muro 5	2,70		2,18	1,00	5,89
Muro 6	2,70		5,88	1,00	15,88
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	61,19
				VIENE	-
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	61,19

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO TECNOLOGIA FNA - GESTION DOCUMENTAL				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 4	

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6.1.	DESCRIPCION ITEM:	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores blancos. A todo costo, incluye lineales.		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

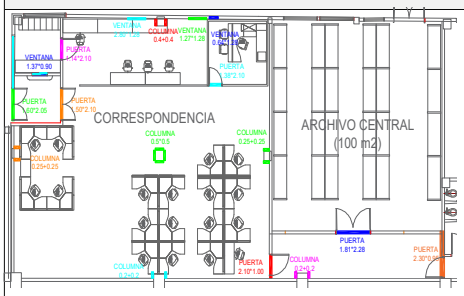

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO TECNOLOGIA					-
GESTION DOCUMENTAL					-
V.PRINCIPAL DEL PARQUEADERO	2,05	0,60		1,00	1,23
H.PRINCIPAL DEL PARQUEADERO	1,60	0,60		1,00	0,96
V. VENTANA RECEPCION	1,37	0,60		1,00	0,82
H. VENTANA RECEPCION	0,39	0,60		1,00	0,23
V.PUERTA VIDRIO ACCESO	2,10	0,60		2,00	2,52
H.PUERTA VIDRIO ACCESO	1,50	0,60		1,00	0,90
V.PUERTA ACCESO RECEPCION	2,10	0,60		2,00	2,52
H..PUERTA ACCESO RECEPCION	1,14	0,60		1,00	0,68
V. VENTANA A PARQUEADERO	1,28	0,60		2,00	1,54
H. VENTANA A PARQUEADERO	2,80	0,60		2,00	3,36
COLUMNA CONTRA PARQUEADERO	2,75	0,60		2,00	3,30
V. VENTANA A PARQUEADERO	1,28	0,60		2,00	1,54
H. VENTANA A PARQUEADERO	1,27	0,60		2,00	1,52
					-
CANTIDAD PONDERABLE	300,00			- 1,00	- 300,00
				SUBTOTAL	- 278,88
				VIENE	327,76
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	48,88
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 6	-
				PRESENTE ACTA	48,88

REGISTRO FOTOGRÁFICO

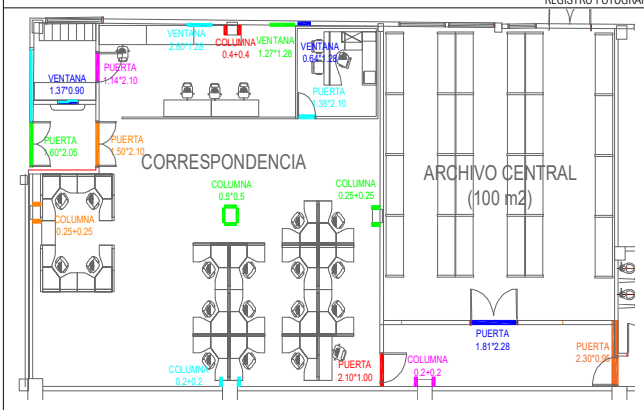





OBSERVACIONES: **Con la ejecucion de esta actividad se subsana la actividad correspondiente a 300 m2 de Pintura vinilo primera de acuerdo al poderable presentado al momento de presentar la propuesta para ejecucion del proyecto.**


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO TECNOLOGIA FNA - GESTION DOCUMENTAL				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	2 DE 4	

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA	31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	6.1.	DESCRIPCION ITEM:	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores blancos. A todo costo, incluye lineales.			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

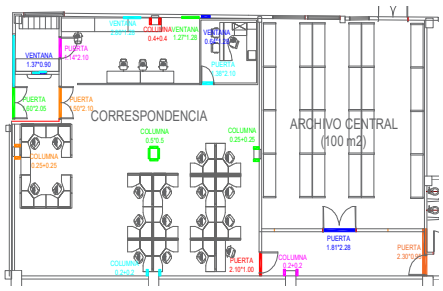

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO TECNOLOGIA					-
GESTION DOCUMENTAL					-
COLUMNA MURO ACCESO	2,75	0,60		2,00	3,30
COLUMNA CENTRAL	2,75	0,60		4,00	6,60
COLUMNA INFERIOR	2,75	0,60		2,00	3,30
V. VENTANA OFICINA	1,28	0,60		2,00	1,54
H. VENTANA OFICINA	0,64	0,60		2,00	0,77
V.PUERTA ACCESO RECEPCION	2,10	0,60		2,00	2,52
H..PUERTA ACCESO RECEPCION	1,38	0,60		1,00	0,83
COLUMNA CONTRAARCHIVO CENTRAL	2,75	0,60		2,00	3,30
V.PUERTA PASILLO BAÑOS	2,10	0,60		1,00	1,26
H.PUERTA PASILLO BAÑOS	1,00	0,60		1,00	0,60
COLUMNA CENTRAL	2,75	0,60		2,00	3,30
V.PUERTA ARCHIVO GENERAL	2,28	0,60		2,00	2,74
H.PUERTA ARCHIVO GENERAL	1,81	0,60		1,00	1,09
V.PUERTA ACCESO A BAÑOS	2,30	0,60		1,00	1,38
H.PUERTA ACCESO A BAÑOS	0,95	0,60		1,00	0,57
					-
					-
				SUBTOTAL	33,10
				VIENE	294,66
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	327,76

REGISTRO FOTOGRÁFICO

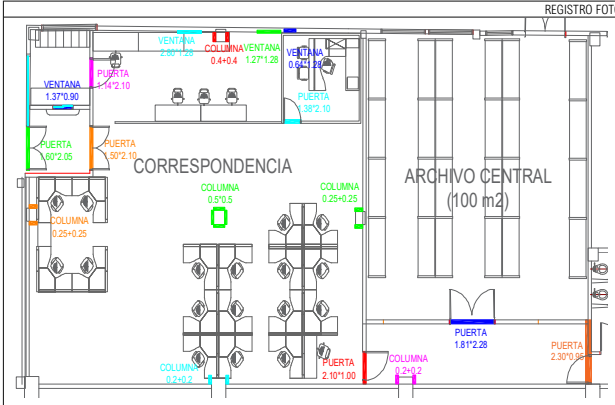





OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO TECNOLOGIA FNA - GESTION DOCUMENTAL				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	3 DE 4	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6.1.	DESCRIPCION ITEM:	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores blancos. A todo costo, incluye lineales.		UNIDAD:	M2


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					-
EDIFICIO TECNOLOGIA					-
MURO BAÑO G.DOC.	2,75		2,00	2,00	11,00
PUERTAS BAÑO G.DOC.	2,30		0,95	- 1,00	- 2,19
PUERTA ACCESO A PASILLO	2,10		1,00	- 1,00	- 2,10
PASILLO BAÑOS	2,75		10,45	1,00	28,74
PASILLO BAÑOS	2,75		10,45	1,00	28,74
PUERTA ARCHIVO GENERAL	1,81		2,28	- 1,00	- 4,13
ENTRADA PASILLO DE BAÑOS	2,75		9,00	1,00	24,75
PUERTA ACCESO A PASILLO	2,10		1,00	- 1,00	- 2,10
MURO INFERIOR	2,75		14,30	1,00	39,33
MURO ACCESO	2,75		7,57	1,00	20,82
MURO ACCESO	2,75		2,81	2,00	15,46
MURO ACCESO	2,75		4,53	2,00	24,92
PUERTA ACCESO PRINCIPAL	2,10		1,50	- 2,00	- 6,30
PUERTA ACCESO RECEPCIÓN	2,10		1,14	- 2,00	- 4,79
MURO DE ACCESO	2,75		1,97	1,00	5,42
PUERTA DE ACCESOA RECEPCION	2,05		1,60	- 1,00	- 3,28
MURO RECEPCION	2,75		2,51	2,00	13,81
VENTANILLA RECEPCION	1,37		0,90	- 2,00	- 2,47
MURO FONDO ACCESO RECEPCION	2,75		2,50	1,00	6,88
FONDO VENTANILLA RECEPCION	2,75		2,40	1,00	6,60
MURO CONTRA PARQUEADERO	2,75		8,27	1,00	22,74
VENTANA	1,28		2,80	- 1,00	- 3,58
VENTANA	1,28		1,28	- 1,00	- 1,64
MURO OFICINA	2,75		3,10	2,00	17,05
ACCESO OFICINA	2,75		3,36	2,00	18,48
PUERTA ACCESO OFICINA	2,10		1,38	- 2,00	- 5,80
MURO ACCESO FONDO	2,75		3,03	1,00	8,33
ACCESO FONDO VENTANA	2,75		3,24	1,00	8,91
VENTANA	1,28		0,64	- 1,00	- 0,82
					-
					-
				SUBTOTAL	262,78
				VIENE	31,88
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	294,66

REGISTRO FOTOGRÁFICO

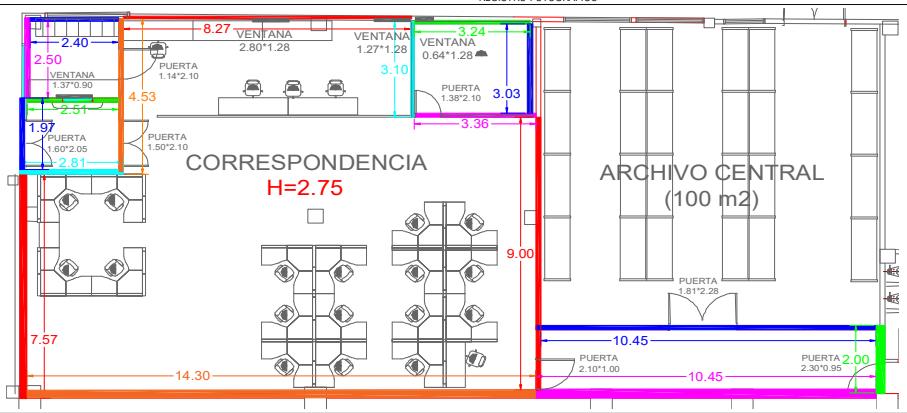

OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO TECNOLOGIA FNA - GESTION DOCUMENTAL				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	4 DE 4	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA	31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	6.1.	DESCRIPCION ITEM:	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores blancos. A todo costo, incluye lineales.			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

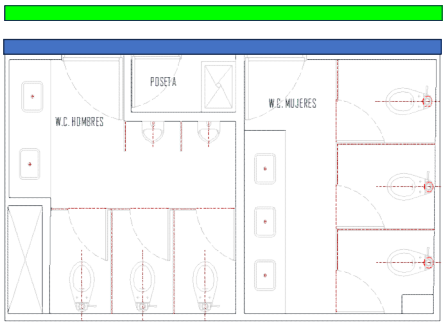

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO TECNOLOGIA					-
GESTION DOCUMENTAL					-
baño tecnologia hombres					-
estuco de pasillo	2,80		6,70	1,00	18,76
puerta de mujeres	2,08		0,90	- 1,00	- 1,87
puerta de poseta	2,08		0,73	- 1,00	- 1,52
puerta de hombres	2,08		0,89	- 1,00	- 1,85
					-
muro de pasillo	2,70		6,80	1,00	18,36
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	31,88
				VIENE	
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	31,88

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07		INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO TECNOLOGIA FNA - GESTION DOCUMENTAL		
	PERIODO: 1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA: 1 DE 1	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA: 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-01	DESCRIPCION ITEM:	Demolición placa maciza 0.15 mt en horarios autorizado por la entidad (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

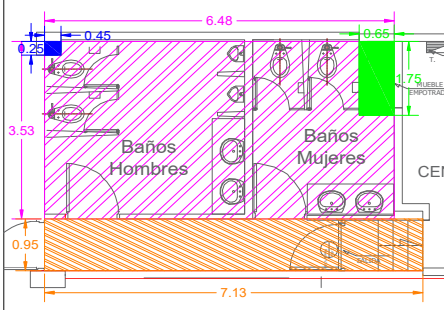

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO DE TECNOLOGIA					-
Baños Edificio Gestion Documental.					-
Piso 1					-
					-
Baños Tecnología		6,48	3,53	1,00	22,87
ducto		0,65	1,75	- 1,00	- 1,14
columna		0,45	0,25	- 1,00	- 0,11
					-
Pasillo frente a baños		7,13	0,95	1,00	6,77
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					28,39
VIENE					836,92
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					865,31
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 6					- 836,91
PRESENTE ACTA					28,40

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT: 830.121.907-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO TECNOLOGIA FNA - GESTION DOCUMENTAL				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 2	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-03	DESCRIPCION ITEM:	Demolición baldosa muro en horarios autorizados por la ENTIDAD (incluye retiro de material desde frente de obra al sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).			UNIDAD: M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

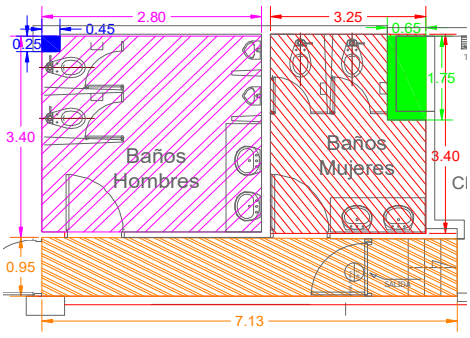

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Baños Tecnologia					-
piso baños hombre existente		3,25	3,40	1,00	11,05
ducto existente		0,65	1,75	- 1,00	- 1,14
					-
baños mujeres viejo		2,80	3,40	1,00	9,52
columna		0,25	0,45	- 1,00	- 0,11
pasillo		0,95	7,13	1,00	6,77
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	26,09
				VIENE	180,45
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADO	206,54
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 6	- 153,62
				PRESENTE ACTA	52,92

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO TECNOLOGIA FNA - GESTION DOCUMENTAL				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	2 DE 2	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			**ACTA PARCIAL**	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-03	**DESCRIPCION ITEM:**	Demolición baldosa muro en horarios autorizados por la ENTIDAD (incluye retiro de material desde frente de obra al sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).		**UNIDAD:**	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

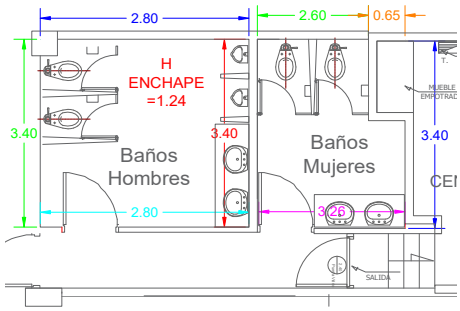

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	Nº ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Baños Tecnología					-
paredes hombre existente	1,24	3,40		1,00	4,22
paredes hombre existente	1,24	2,80		1,00	3,47
paredes hombre existente	1,24	3,40		2,00	8,43
paredes hombre existente	1,24	2,80		1,00	3,47
puerta acceso	1,24	1,02	-	1,00	- 1,26
					-
					-
					-
paredes mujeres existente	1,24	2,60		1,00	3,22
paredes mujeres existente	1,24	0,65		1,00	0,81
paredes mujeres existente	1,24	3,40		1,00	4,22
paredes mujeres existente	1,24	3,26		1,00	4,04
puerta	1,24	1,02	-	1,00	- 1,26
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	29,36
				VIENE	151,09
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADO	180,45

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07		INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO TECNOLOGIA FNA - GESTION DOCUMENTAL		
	PERIODO: 1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA: 1 DE 1	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-04	DESCRIPCION ITEM:	Baldosa cerámica pared 30x60.			UNIDAD: M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

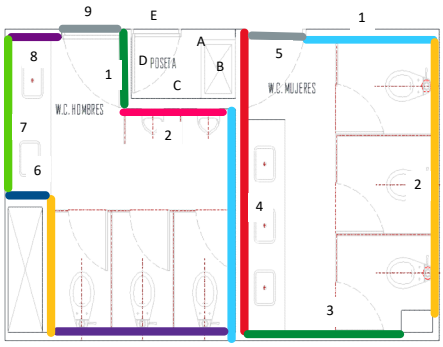


LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	Nº ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO TECNOLOGIA					-
Baño mujeres					-
Muro 1	2,74		1,85	1,00	5,07
Muro 2	2,74		3,15	1,00	8,63
Muro 3	2,74		2,13	1,00	5,84
Muro 4	2,74		3,40	1,00	9,32
Muro 5	0,60		0,90	1,00	0,54
					-
Poceta					-
Muro A	2,74		0,75	1,00	2,06
Muro B	2,74		0,68	1,00	1,86
Muro C	2,74		1,46	1,00	4,00
Muro D	2,74		0,70	1,00	1,92
Muro E	0,60		0,73	1,00	0,44
Poyo poseta	0,15		0,68	- 1,00	- 0,10
					-
Baño hombres					-
Muro 1	2,74		0,85	1,00	2,33
Muro 2	2,74		1,63	1,00	4,47
Muro 3	2,74		2,55	1,00	6,99
Muro 4	2,74		2,70	1,00	7,40
Muro 5	2,74		1,75	1,00	4,80
Muro 6	2,74		0,66	1,00	1,81
Muro 7	2,74		1,59	1,00	4,36
Muro 8	2,74		0,82	1,00	2,25
Muro 9	0,60		0,90	1,00	0,54
					-
				SUBTOTAL	74,53
				VIENE	147,12
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	221,65
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 6	- 147,04
				PRESENTE ACTA	74,61

REGISTRO FOTOGRAFICO







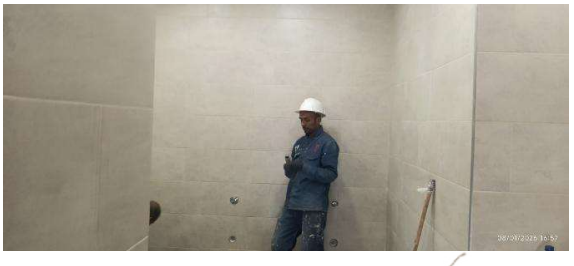


OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO TECNOLOGIA FNA - GESTION DOCUMENTAL				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-05	DESCRIPCION ITEM:	Baldosa ceramica piso 60x60.			UNIDAD: M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

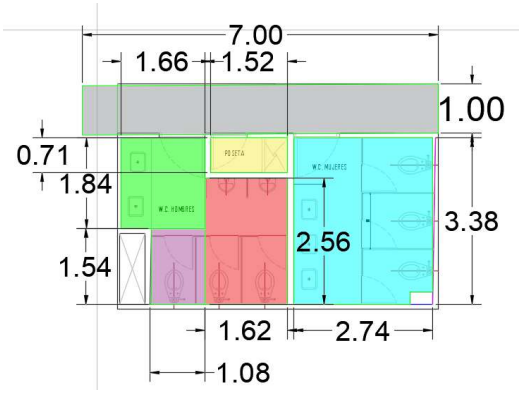

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO TECNOLOGIA					-
Baño mujeres					-
Piso	2,74		3,38	1,00	9,26
columna esquina	0,58		0,26	- 1,00	- 0,15
Poceta					-
Piso	0,71		1,52	1,00	1,08
Poyo poseta	0,15		0,71	- 1,00	- 0,11
Baño hombres					-
Piso	1,62		2,56	1,00	4,15
Piso	1,08		1,54	1,00	1,66
Piso	1,84		1,66	1,00	3,05
Corredor					-
Piso	7,00		1,00	1,00	7,00
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	25,94
				VIENE	77,86
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	103,80
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 6	- 77,86
				PRESENTE ACTA	25,94

REGISTRO FOTOGRÁFICO










OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 3	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA	31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	NP-10	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte espejo.			UNIDAD:	Und

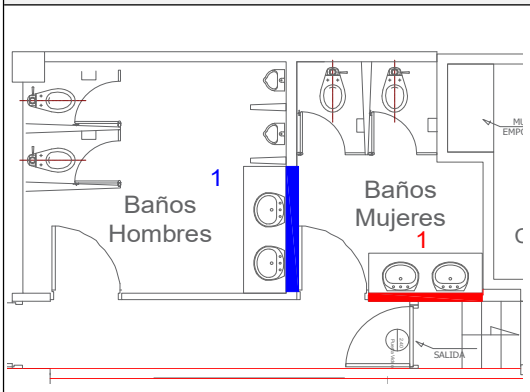PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			Und	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Edificio Gestion Documental.					-
	Piso 1					-
	Espejo baño mujeres				1,00	1,00
	Espejo baño hombres				1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	2,00
					VIENE	7,00
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	9,00
					COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 6	- 4,00
					PRESENTE ACTA	5,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO






OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	2 DE 3	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-10	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte espejo.			UNIDAD: Und

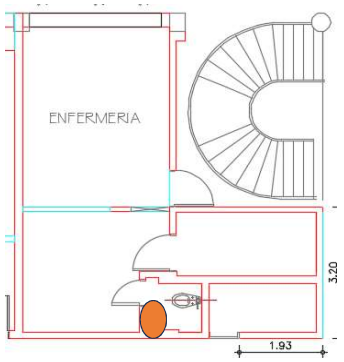PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			Und	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	EDIFICIO DE CNA					-
	PUNTO DE ATENCION PRIMARIO					-
	Espejo baño				1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	1,00
					VIENE	6,00
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	7,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO






OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07			INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA			
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	3 DE 3

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA	31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	NP-10	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte espejo.			UNIDAD:	Und

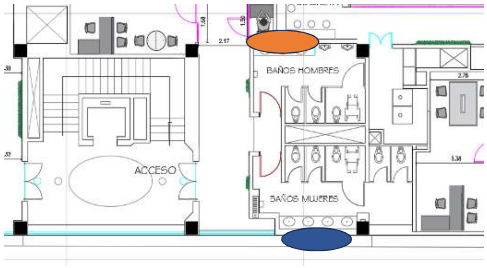PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			Und	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	EDIFICIO DE CONVENCIONES CUARTO PISO					-
	BAÑOS CUARTO PISO					-
	BAÑO HOMBRES				1,00	1,00
	BAÑO MUJERES				1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	2,00
					VIENE	4,00
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	6,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

	ACTA PARCIAL No. 07				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO CONVENCIONES FNA - CASINO				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 11	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de cubierta en policarbonato.			UNIDAD: M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

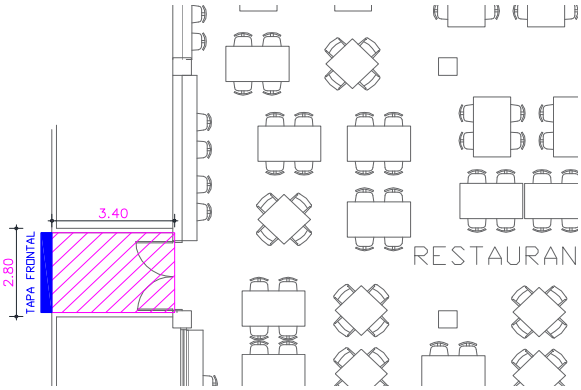

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	LARGO	ANCHO	UNIDADES	MEDIDA TOTAL
					-
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CASINO					-
ENTRADA		2,80	3,40	1,00	9,52
TAPA FRONTAL		0,53	2,35	1,00	1,25
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	10,77
				VIENE	28,75
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	39,52
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 6	- 29,92
				PRESENTE ACTA	9,60

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

	ACTA PARCIAL No. 07				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO CONVENCIONES FNA - CASINO				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 12	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de Policarbonato alveolar 8 mm para cubierta curva, incluye conectores y accesorios para su correcta instalación. No incluye estructura de soporte.		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

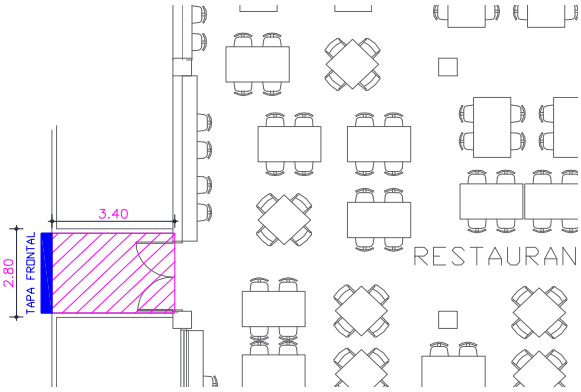


LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	LARGO	ANCHO	UNIDADES	MEDIDA TOTAL
					-
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CASINO					-
ENTRADA		2,80	3,40	1,00	9,52
TAPA FRONTAL		0,53	2,35	1,00	1,25
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	10,77
				VIENE	25,00
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	35,77
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 6	- 25,00
				PRESENTE ACTA	10,77

REGISTRO FOTOGRÁFICO





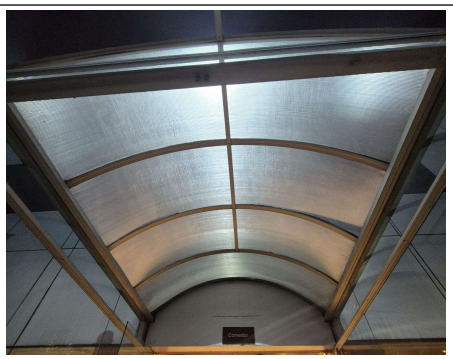

OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.124.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO CNA FNA - BAÑOS SEGUNDO PISO				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 7	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 83	DESCRIPCION ITEM:	Pañete impermeabilizado con mortero 1:3 y sika 1 o similar (no incluye lineales)		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

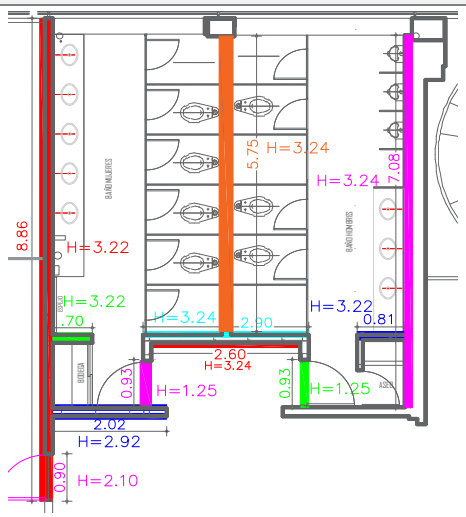

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	LARGO	ANCHO	UNIDADES	MEDIDA TOTAL
baños CNA piso 2					-
baño mujeres					-
muro nuevo	3,22		8,86	2,00	57,06
puerta de acceso	2,10		0,90	- 2,00	- 3,78
muro de entrada	3,22		2,02	2,00	13,01
muro de deposito	3,22		0,70	2,00	4,51
dintel puerta principal	1,25		0,93	2,00	2,33
muro princepal interno	3,24		2,90	1,00	9,40
muro princepal fachada	3,24		2,60	1,00	8,42
muro intermedio de baños	3,24		5,75	2,00	37,26
					-
baño de hombre					-
dintel de acceso	1,25		0,93	2,00	2,33
muro de poseta	3,22		0,81	2,00	5,22
muro lavamanos	3,24		7,08	1,00	22,94
					-
pendiente para cobrar en siguiente corte	27,24			- 1,00	- 27,24
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					131,46
VIENE					248,54
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					380,00
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 6					-
PRESENTE ACTA					380,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO






OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO CNA FNA - BAÑOS SEGUNDO PISO				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	2 DE 7	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 83	DESCRIPCION ITEM:	Pañete impermeabilizado con mortero 1:3 y sika 1 o similar (no incluye lineales)			UNIDAD: M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

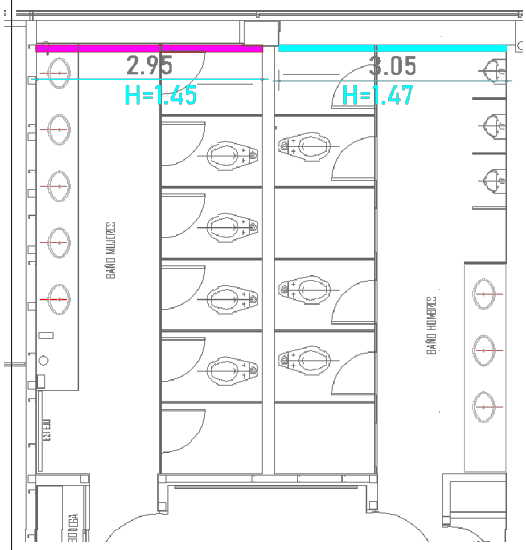

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
baños CNA piso 2					-
baño mujeres					-
Muro ventana	1,45		2,95	1,00	4,28
					-
					-
baño de hombre					-
Muro Ventana	1,47		3,05	1,00	4,48
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	8,76
				VIENE	239,78
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	248,54

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT: 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	3 DE 7	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 83	DESCRIPCION ITEM:	Pañete impermeabilizado con mortero 1:3 y sika 1 o similar (no incluye lineales)		UNIDAD:	M2

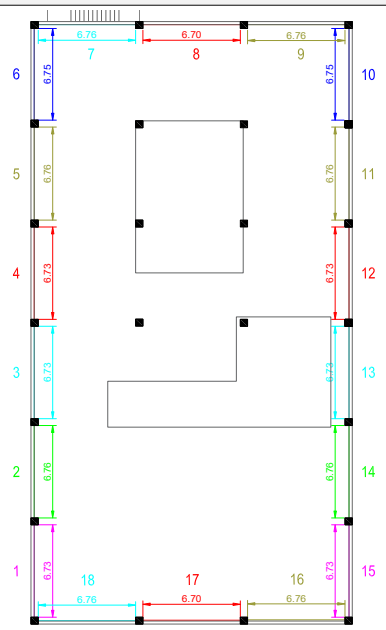PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			AREA	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Placa cubierta Edificio Convenciones					-
	Tramo 1	0,86		6,73	1,00	5,79
	Tramo 2	0,86		6,76	1,00	5,81
	Tramo 3	0,86		6,73	1,00	5,79
	Tramo 4	0,86		6,73	1,00	5,79
	Tramo 5	0,86		6,76	1,00	5,81
	Tramo 6	0,86		6,75	1,00	5,81
	Tramo 7	0,86		6,76	1,00	5,81
	Tramo 8	0,86		6,70	1,00	5,76
	Tramo 9	0,86		6,76	1,00	5,81
	Tramo 10	0,86		6,75	1,00	5,81
	Tramo 11	0,86		6,76	1,00	5,81
	Tramo 12	0,86		6,73	1,00	5,79
	Tramo 13	0,86		6,73	1,00	5,79
	Tramo 14	0,86		6,76	1,00	5,81
	Tramo 15	0,86		6,73	1,00	5,79
	Tramo 16	0,86		6,76	1,00	5,81
	Tramo 17	0,86		6,70	1,00	5,76
	Tramo 18	0,86		6,76	1,00	5,81
						-
						-
					SUBTOTAL	104,36
					VIENE	135,42
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	239,78

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:	


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	4 DE 7	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 83	DESCRIPCION ITEM:	Pañete impermeabilizado con mortero 1:3 y sika 1 o similar (no incluye lineales)		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

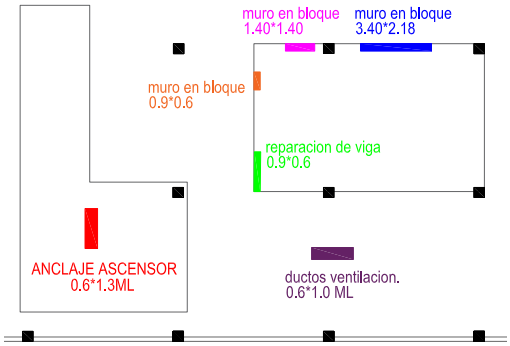

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	AREA	MEDIDA TOTAL
Placa cubierta Edificio Convenciones					-
					-
Muros en subestacion	3,40	2,18		2,00	14,82
Muros en subestacion	1,40	1,40		2,00	3,92
Muros en subestacion	0,90	0,60		2,00	1,08
Muro en esquina exterior superior muro sur de subestacion	1,20	0,80		1,00	0,96
					-
Muerto para equipos en acceso ascensor	0,60	0,90		1,00	0,54
	1,33	0,90		2,00	2,39
	1,33	0,60		1,00	0,80
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	24,51
				VIENE	110,91
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	135,42

REGISTRO FOTOGRÁFICO








OBSERVACIONES:	


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO CNA FNA - PUNTO DE ATENCION PRIMARIO - PISO 1				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	5 DE 7	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 83	DESCRIPCION ITEM:	Pañete impermeabilizado con mortero 1:3 y sika 1 o similar (no incluye lineales)		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

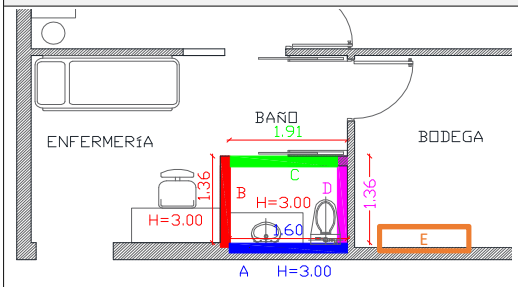

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
ENFERMERIA CNA piso 1					-
MURO A	3,00		1,63	1,00	4,89
MURO B	3,00		1,36	2,00	8,16
PUERTA BAÑO	2,10		0,94	- 1,00	- 1,97
MURO C	3,00		1,91	2,00	11,46
MURO D	3,00		1,36	2,00	8,16
MURO E PUERTA EXISTENTE	2,10		0,75	2,00	3,15
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	33,85
				VIENE	77,06
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	110,91

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.123.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO TECNOLOGIA FNA - GESTION DOCUMENTAL - BAÑOS PISO 1				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	6 DE 7	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 83	DESCRIPCION ITEM:	Pañete impermeabilizado con mortero 1:3 y sika 1 o similar (no incluye lineales)		UNIDAD:	M2

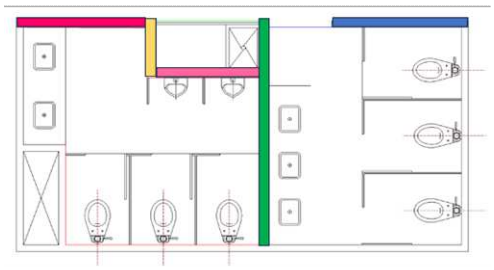PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	EDIFICIO TECNOLOGIA					-
						-
	Baño hombres					-
	Muro 1	3,50	2,70		1,00	9,45
						-
	Muro 2	3,50	1,75		1,00	6,13
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	15,58
					VIENE	61,48
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	77,06

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.121.907-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO TECNOLOGIA FNA - GESTION DOCUMENTAL - BAÑOS PISO 1				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	7 DE 7	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 83	DESCRIPCION ITEM:	Pañete impermeabilizado con mortero 1:3 y sika 1 o similar (no incluye lineales)			UNIDAD: M2

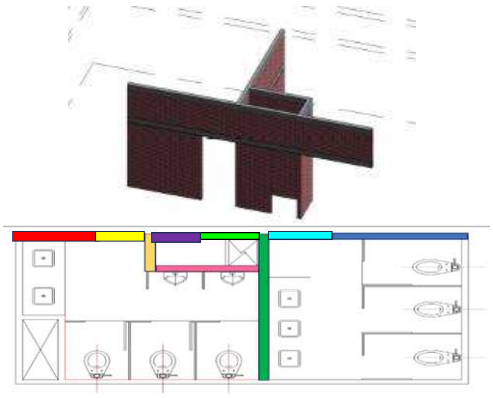PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	BAÑOS TECNOLOGIA					-
						-
	BAÑO MUJERES pasillo	3,00	1,80		1,00	5,40
	BAÑO MUJERES interno	3,50	1,80		1,00	6,30
	POCETA INTERNO DE ASEO	3,00	0,94		1,00	2,82
	POCETA BAÑO HOMBRES	3,50	0,94		1,00	3,29
	POCETA INTERNA	3,00	1,62		1,00	4,86
	POCETA BAÑO DE HOMBRES	3,50	1,62		1,00	5,67
	BAÑO HOMBRES	1,00	1,75		1,00	1,75
	MURO DIVISORIO	3,50	3,54		1,00	12,39
	MURO DIVISORIO	3,50	3,28		1,00	11,48
	POCETA DE ASEO	3,00	0,84		1,00	2,52
	PUERTAS BAÑO MUJERES	0,94	0,94		2,00	1,77
	PUERTAS BAÑO HOMBRES	0,94	0,96		2,00	1,80
	PUERTA POCETA	0,94	0,76		2,00	1,43
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL		61,48
				VIENE		-
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA		61,48

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO RECEPCION FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 10	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 84	DESCRIPCION ITEM:	Pañete impermeabilizado con mortero 1:3 y sika 1 o similar			UNIDAD: ml

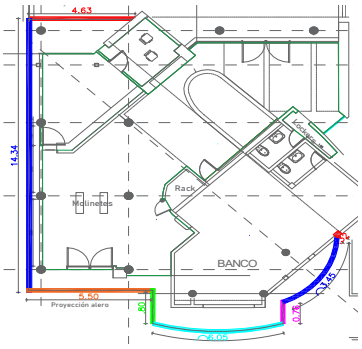PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			UNIDADES	MEDIDA TOTAL
		ALTO	LARGO	ANCHO		
	EDIFICIO RECEPCIÓN					
	CUBIERTA					-
	perimetro cubierta		4,63		3,00	13,89
	perimetro cubierta		14,36		3,00	43,08
	perimetro cubierta		5,50		3,00	16,50
	perimetro cubierta		0,80		3,00	2,40
	perimetro cubierta		6,05		3,00	18,15
	perimetro cubierta		0,76		3,00	2,28
	perimetro cubierta		3,45		3,00	10,35
	perimetro cubierta		0,32		3,00	0,96
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	107,61
					VIENE	199,00
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	306,61
					COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 5	-
					PRESENTE ACTA	306,61

REGISTRO FOTOGRÁFICO









OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO RECEPCION FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	2 DE 10	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 84	DESCRIPCION ITEM:	Pañete impermeabilizado con mortero 1:3 y sika 1 o similar			UNIDAD: ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

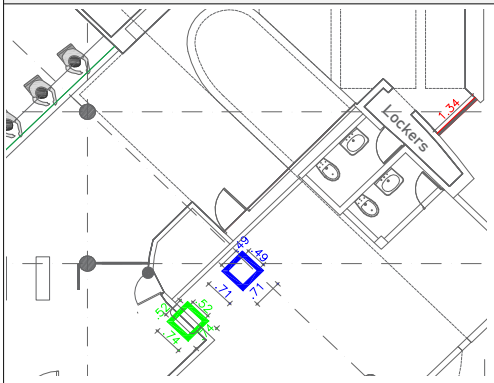

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
PLACA DE CUBIERTA					-
MURO DE DUCTO externo			0,74	4,00	2,96
MURO DE DUCTO interno			0,52	4,00	2,08
MURO DE DUCTO superior			0,63	4,00	2,52
MURO DE DUCTO externo			0,71	4,00	2,84
MURO DE DUCTO interno			0,49	4,00	1,96
MURO DE DUCTO superior			0,60	4,00	2,40
PISO VENTANA A JARDINERA externo			1,34	1,00	1,34
PISO VENTANA A JARDINERA interno			1,34	1,00	1,34
PISO VENTANA A JARDINERA superior			1,34	1,00	1,34
					-
					-
					-
					-
TOTAL ITEM					18,78
VINE					180,22
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA					199,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

	ACTA PARCIAL No. 07				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO CNA FNA - BAÑOS SEGUNDO PISO				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	3 DE 10	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA	31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	NP - 84	DESCRIPCION ITEM:	Pañete impermeabilizado con mortero 1:3 y sika 1 o similar			UNIDAD:	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

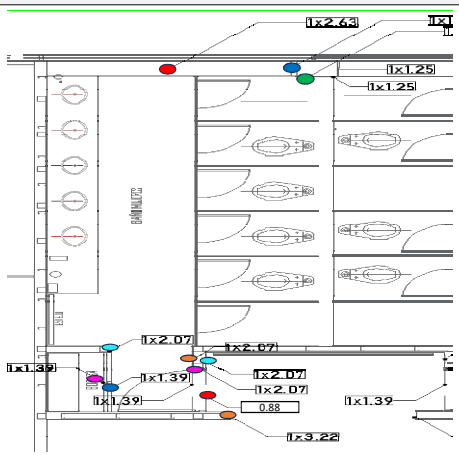

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	AREA	MEDIDA TOTAL
baños CNA piso 2					-
baño mujeres			2,63	1,00	2,63
lateral derecho ventana	1,48			1,00	1,48
cara de columna	1,48			1,00	1,48
muro de acceso	2,07			1,00	2,07
lateral puerta	2,07			1,00	2,07
muro fachada	2,07			1,00	2,07
dintel puerta de acceso			0,88	1,00	0,88
perfil muro acceso nuevo	3,22			1,00	3,22
dintel puerta deposito			1,39	1,00	1,39
horizontales puerta deposito			1,39	2,00	2,78
frontal muro deposito	2,07			1,00	2,07
					-
					-
					-
TOTAL PRESENTE HOJA					22,14
VIENE DE HOJA ANTERIOR					158,08
TOTAL EJECUTADO					180,22

REGISTRO FOTOGRÁFICO




OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP Nit. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO CNA FNA - BAÑOS SEGUNDO PISO				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	4 DE 10	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 84	DESCRIPCION ITEM:	Pañete impermeabilizado con mortero 1:3 y sika 1 o similar			UNIDAD: ml

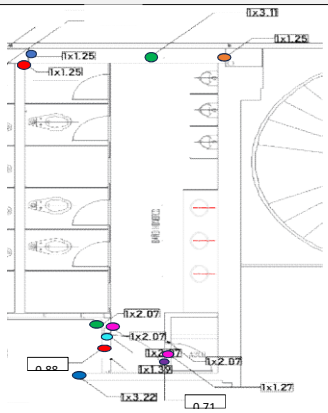PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			AREA	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	BAÑO DE HOMBRE					-
	CARA DE COLUMNA	1,25			1,00	1,25
	LATERAL IZQUIERDO VENTANA	1,25			1,00	1,25
	PARTE BAJA DE VENTANA			3,11	1,00	3,11
	LATERAL DERECHO VENTANA	1,25			1,00	1,25
	MURO LATERAL IZQUIERDO LAVA TRAPEROS	3,22			2,00	6,44
	DINTEL PUERTA LAVATRAPEROS			0,71	1,00	0,71
	DINTEL PUERTA LAVATRAPEROS	1,27			2,00	2,54
	DINTEL PUERTA ACCESO PRINCIPAL			0,88	1,00	0,88
	FRONTAL MURO EXISTENTE FACHADA	3,22			1,00	3,22
	MURO FACHADA DERECHA	2,07			1,00	2,07
	LATERAL DE PUERTA PRINCIPAL	2,07			1,00	2,07
	MURO INTERNO DE FACHADA DERECHA	2,07			1,00	2,07
						-
						-
	TOTAL PRESENTE HOJA					26,86
	VIENE DE HOJA ANTERIOR					131,22
	TOTAL EJECUTADO					158,08

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:	

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 900.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO CNA FNA - BAÑOS SEGUNDO PISO				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	5 DE 10	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 84	DESCRIPCION ITEM:	Pañete impermeabilizado con mortero 1:3 y sika 1 o similar			UNIDAD: ml

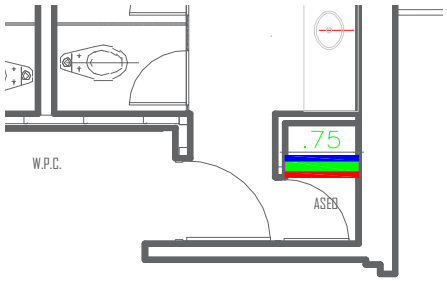PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			AREA	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	baños CNA piso 2					-
	baño de hombre					-
	Poceta			0,75	3,00	2,25
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	TOTAL PRESENTE HOJA					2,25
	VIENE DE HOJA ANTERIOR					128,97
	TOTAL EJECUTADO					131,22

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:	


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

	ACTA PARCIAL No. 07				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	6 DE 10	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 84	DESCRIPCION ITEM:	Pañete impermeabilizado con mortero 1:3 y sika 1 o similar		UNIDAD:	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

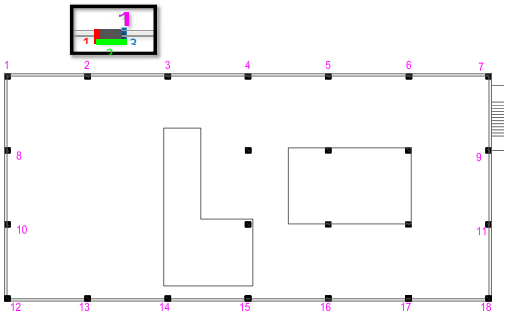

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	AREA	MEDIDA TOTAL
Placa cubierta Edificio Convenciones					-
Columna 1			0,86	3,00	2,58
Columna 2			0,86	3,00	2,58
Columna 3			0,86	3,00	2,58
Columna 4			0,86	3,00	2,58
Columna 5			0,86	3,00	2,58
Columna 6			0,86	3,00	2,58
Columna 7			0,86	3,00	2,58
Columna 8			0,86	3,00	2,58
Columna 9			0,86	3,00	2,58
Columna 10			0,86	3,00	2,58
Columna 11			0,86	3,00	2,58
Columna 12			0,86	3,00	2,58
Columna 13			0,86	3,00	2,58
Columna 14			0,86	3,00	2,58
Columna 15			0,86	3,00	2,58
Columna 16			0,86	3,00	2,58
Columna 17			0,86	3,00	2,58
Columna 18			0,86	3,00	2,58
					-
TOTAL PRESENTE HOJA					46,44
VIENE DE HOJA ANTERIOR					82,53
TOTAL EJECUTADO					128,97

REGISTRO FOTOGRÁFICO






OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FÁBIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.121.907-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	7 DE 10	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 84	DESCRIPCION ITEM:	Pañete impermeabilizado con mortero 1:3 y sika 1 o similar			UNIDAD: ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

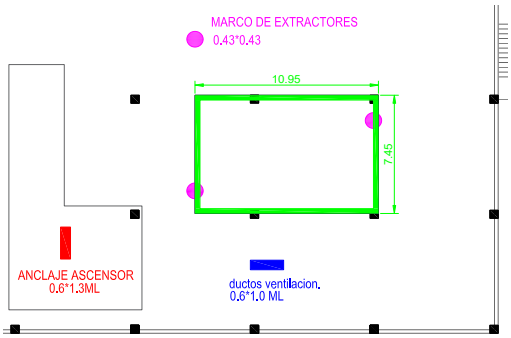

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	Und	MEDIDA TOTAL
CUBIERTA DE CONVENCIONES					-
					-
Antepechos sobre BODEGA	10,95	1,00		2,00	21,90
	7,45	1,00		2,00	14,90
Extractor de aire en muro sur subestacion	0,43	1,00		4,00	1,72
Extractor de aire en muro sur oriental	0,43	1,00		4,00	1,72
					-
Muerto de ventilacion	0,36	1,00		2,00	0,72
Muerto de ventilacion	1,00	1,00		4,00	4,00
Muerto de ventilacion	0,60	1,00		2,00	1,20
					-
ANCLAJE SOBRE ascensor	0,60	1,00		2,00	1,20
ANCLAJE SOBRE ascensor	1,30	1,00		2,00	2,60
					-
TOTAL PRESENTE HOJA					49,96
VIENE DE HOJA ANTERIOR					32,57
TOTAL EJECUTADO					82,53

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.121.503-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO TECNOLOGIA FNA - GESTION DOCUMENTAL - BAÑOS PISO 1				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	8 DE 10	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 84	DESCRIPCION ITEM:	Pañete impermeabilizado con mortero 1:3 y sika 1 o similar			UNIDAD: ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
BAÑOS TECNOLOGIA					-
					-
Puerta baño mujeres	2,09			1,00	2,09
Puerta baño mujeres		0,90		1,00	0,90
Puerta Poceta	2,08			1,00	2,08
Puerta Poceta		0,73		1,00	0,73
frontal entre puertas	2,08			1,00	2,08
Pueerta baño hombres		0,90		1,00	0,90
Lateral puerta hombres	2,08			1,00	2,08
					-
Rejistros deaqua potable	1,20			6,00	7,20
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	18,06
				VIENE	14,51
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	32,57

REGISTRO FOTOGRÁFICO






OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO TECNOLOGIA FNA - GESTION DOCUMENTAL - BAÑOS PISO 1				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	9 DE 10	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 84	DESCRIPCION ITEM:	Pañete impermeabilizado con mortero 1:3 y sika 1 o similar		UNIDAD:	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						-
	BAÑOS TECNOLOGIA					-
						-
						-
						-
	Pañte en mampostería para paso de escalera			1,00	4,00	4,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	4,00
					VIENE	10,51
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	14,51

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

	ACTA PARCIAL No. 07		
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO CNA FNA - PUNTO DE ATENCION PRIMARIO - PISO 1		
PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	10 DE 10

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 84	DESCRIPCION ITEM:	Pañete impermeabilizado con mortero 1:3 y sika 1 o similar			UNIDAD: ml

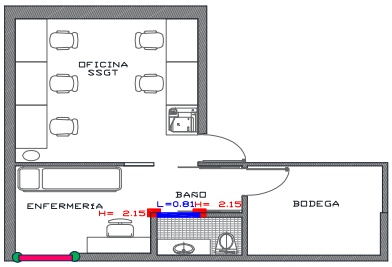PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	ENFERMERIA CNA piso 1					
	Muros PUERTA BAÑO	2,15	1,00		2,00	4,30
	SOBRE PUERTA	0,81	1,00		1,00	0,81
						-
	puerta de acceso nueva					-
	Verticales	2,15	1,00		2,00	4,30
	Horizontales	1,10	1,00		1,00	1,10
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	SUBTOTAL					10,51
	VIENE					-
	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					10,51

REGISTRO FOTOGRÁFICO






OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07			INGEBYP NIT 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO TECNOLOGIA FNA - GESTION DOCUMENTAL - P1 - BAÑOS			
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-85	DESCRIPCION ITEM:	Placa contrapiso de 10 cm de espesor, en concreto de 2500 PSI, No ncluye acero de refuerzo		UNIDAD:	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

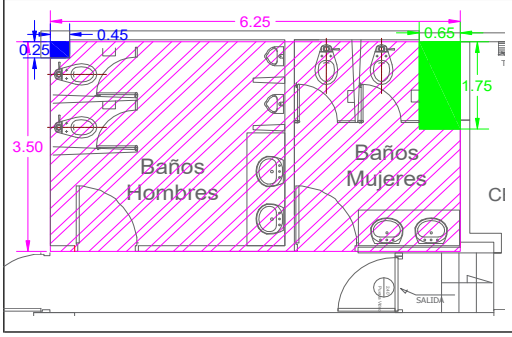

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	Und	MEDIDA TOTAL
BAÑOS TECNOLOGIA					-
					-
Baños Tecnología		6,25	3,50	1,00	21,88
					-
ducto		0,65	1,75	- 1,00	- 1,14
columna		0,45	0,25	- 1,00	- 0,11
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	20,63
				VIENE	-
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	20,63
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 6	-
				PRESENTE ACTA	20,63

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT 830.101.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 3	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 86	DESCRIPCION ITEM:	Mampostería en bloque de arcilla no. 4 (no incluye lineales)			UNIDAD: m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	UNIDADES	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO DE CONVENCIONES- CUBIERTA					-
CUARTO DE BODEGA					-
Muros en cuarto de Bodega	3,40	2,18		1,00	7,41
Muros en cuarto de Bodega	1,40	1,40		2,00	3,92
Muros en cuarto de Bodega	0,90	0,60		2,00	1,08
					-
Muro en esquina exterior superior muro sur de Bodega	1,60	0,80		1,00	1,28
					-
CUARTO DEL ASCENSOR					-
Muro en esquina exterior superior muro NORTE de Escaleras	0,80	0,80		1,00	0,64
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	14,33
				VIENE	33,61
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	47,94
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 6	-
				PRESENTE ACTA	47,94

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO TECNOLOGIA FNA - GESTION DOCUMENTAL - BAÑOS -PISO 1				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	2 DE 3	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 86	DESCRIPCION ITEM:	Mampostería en bloque de arcilla no. 4 (no incluye lineales)			UNIDAD: m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

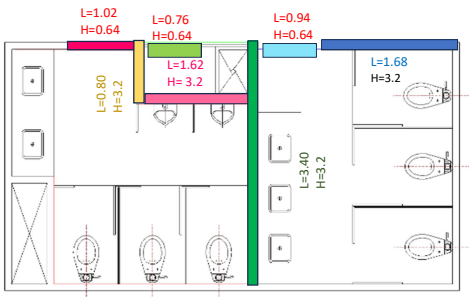

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO TECNOLOGIA					-
BAÑOS TECNOLOGIA					-
					-
BAÑO MUJERES	3,20	1,68		1,00	5,38
POCETA DE ASEO	3,20	0,80		1,00	2,56
POCETA DE ASEO	3,20	1,62		1,00	5,18
puerta dintel BAÑO HOMBRES	0,64	1,02		1,00	0,65
MURO DIVISORIO	3,20	3,40		1,00	10,88
Dintel puerta de mujeres	0,64	0,94		1,00	0,60
puerta poceta	0,64	0,76		1,00	0,49
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	25,74
				VIENE	7,87
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	33,61

REGISTRO FOTOGRÁFICO








OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO CNA FNA - PUNTO DE ATENCION PRIMARIO - PISO 1				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	3 DE 3	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 86	DESCRIPCION ITEM:	Mampostería en bloque de arcilla no. 4 (no incluye lineales)		UNIDAD:	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
ENFERMERIA CNA					-
					-
Muros A púerta existente	2,13	0,71		1,00	1,51
Muros B	2,85	1,22		1,00	3,48
Muros C	2,85	0,72		1,00	2,05
Muros D	0,88	0,94		1,00	0,83
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	7,87
				VIENE	-
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	7,87

REGISTRO FOTOGRÁFICO






OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT 830.131.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 4	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 87	DESCRIPCION ITEM:	Mampostería en bloque de arcilla no. 4 ancho max <0.70cm			UNIDAD: ml


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

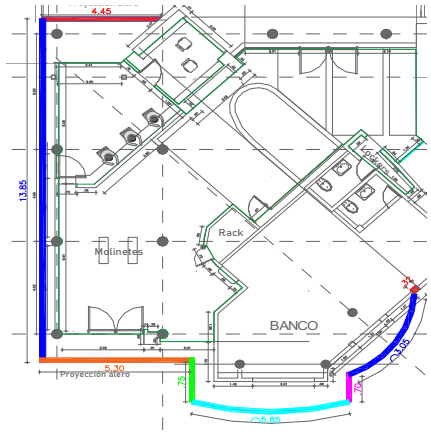

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	UNIDADES	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO RECEPCIÓN					
CUBIERTA					-
Placa cubierta recepcion, perimetro			4,45	1,00	4,45
Placa cubierta recepcion, perimetro			13,85	1,00	13,85
Placa cubierta recepcion, perimetro			5,30	1,00	5,30
Placa cubierta recepcion, perimetro			0,75	1,00	0,75
Placa cubierta recepcion, perimetro			5,85	1,00	5,85
Placa cubierta recepcion, perimetro			0,70	1,00	0,70
Placa cubierta recepcion, perimetro			3,05	1,00	3,05
Placa cubierta recepcion, perimetro			0,32	1,00	0,32
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	34,27
				VIENE	13,14
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	47,41
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 5	-
				PRESENTE ACTA	47,41

REGISTRO FOTOGRAFICO



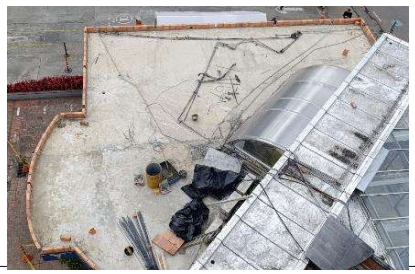




OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	2 DE 4	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 87	DESCRIPCION ITEM:	Mamposteria en bloque de arcilla no. 4 ancho max <0.70cm		UNIDAD:	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

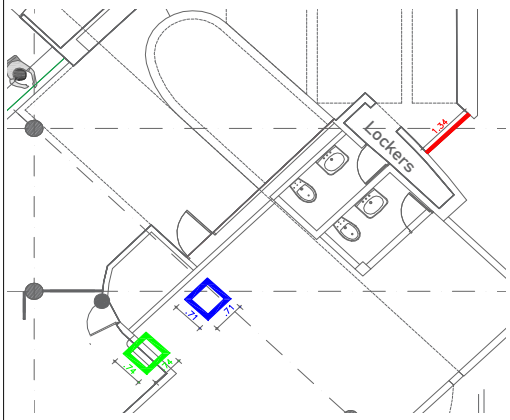

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
RECEPCION					-
MURO DE DUCTO			0,74	4,00	2,96
MURO DE DUCTO			0,71	4,00	2,84
					-
					-
PRIMER PISO					-
PISO VENTANA A JARDINERA			1,34	1,00	1,34
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					7,14
VIENE					6,00
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					13,14

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

	ACTA PARCIAL No. 07				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	3 DE 4	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 87	DESCRIPCION ITEM:	Mamposteria en bloque de arcilla no. 4 ancho max <0.70cm		UNIDAD:	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

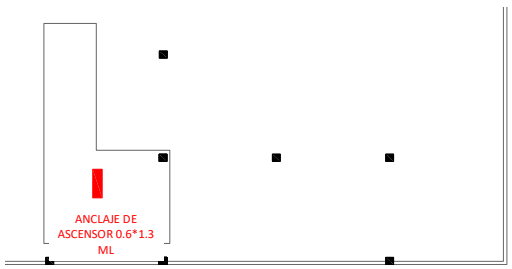

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	AREA	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES CUBIERTA					-
CUBIERTA DE ASCENSOR					-
PLACA DE CUBIERTA					-
					-
Caja sobre placa ascensor y escaleras	0,60	1,00		2,00	1,20
Caja sobre placa ascensor y escaleras	1,30	1,00		2,00	2,60
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	3,80
				VIENE	2,20
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	6,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:	


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	4 DE 4	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 87	DESCRIPCION ITEM:	Mampostería en bloque de arcilla no. 4 ancho max <0.70cm			UNIDAD: ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

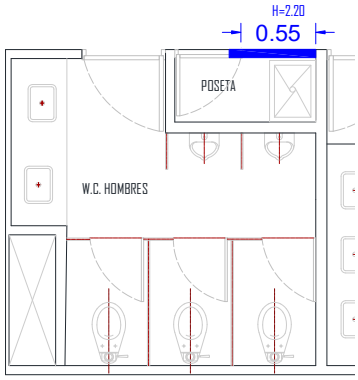

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	AREA	MEDIDA TOTAL
BAÑOS TECNOLOGIA					-
					-
BAÑO MUJERES	2,20			1,00	2,20
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	2,20
				VIENE	
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	2,20

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:	


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT 830.124.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 5	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 88	DESCRIPCION ITEM:	Anclaje 1/2" L=50 cm		UNIDAD:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

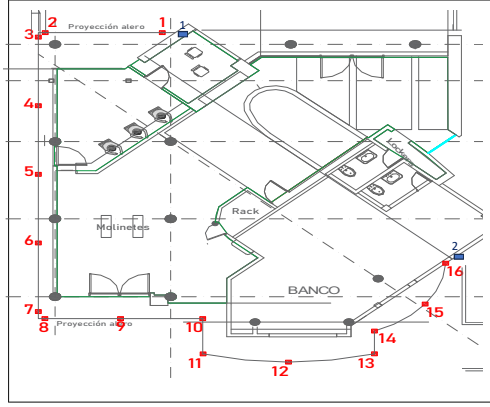

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES No RAMAL	UNIDADES	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO RECEPCIÓN					-
CUBIERTA					-
Placa cubierta recepcion, columnetas			2,00	16,00	32,00
Placa cubierta recepcion, vigueta			2,00	2,00	4,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	36,00
				VIENE	226,00
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	262,00
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 6	-
				PRESENTE ACTA	262,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO










OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	2 DE 5	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 88	DESCRIPCION ITEM:	Anclaje 1/2" L=50 cm			UNIDAD: UND

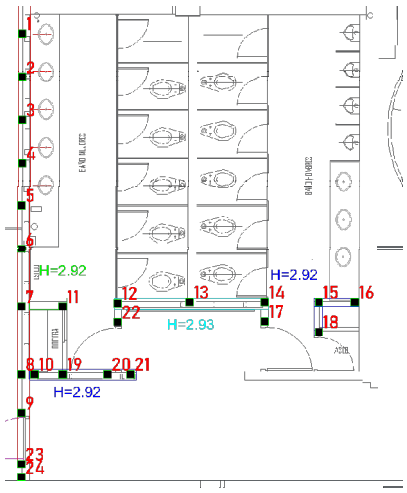PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	CNA-PISO 2- BAÑOS					-
						-
	anclajes de Dovelas piso				24,00	24,00
	anclajes de Dovelas techo				24,00	24,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	48,00
					VIENE	178,00
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	226,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.131.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	3 DE 5	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 88	DESCRIPCION ITEM:	Anclaje 1/2" L=50 cm			UNIDAD: UND

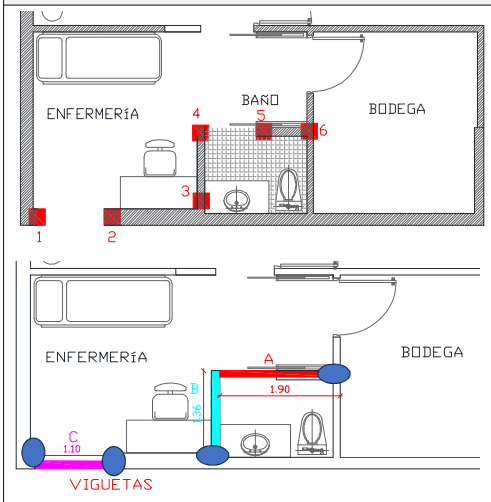PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	unidades		
	ENFERMERIA CNA piso 1					-
	Anclajes columnetas			4,00	6,00	24,00
						-
	Anclajes viguetas			4,00	2,00	8,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	32,00
					VIENE	146,00
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	178,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	4 DE 5	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 88	DESCRIPCION ITEM:	Anclaje 1/2" L=50 cm			UNIDAD: UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

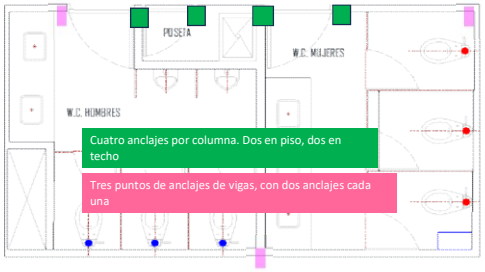

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO TECNOLOGIA					-
					-
Anclajes columnetas a torta inferior y superior			4,00	4,00	16,00
Anclajes vigas			3,00	2,00	6,00
anclaje viga dinteles			2,00	2,00	4,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					26,00
VIENE					120,00
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					146,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA


fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT 830.124.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	5 DE 5	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 88	DESCRIPCION ITEM:	Anclaje 1/2" L=50 cm			UNIDAD: UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
						-
	EDIFICIO DE CONVENCIONES					-
						-
	CUARTO PISO				15,00	15,00
					15,00	15,00
					15,00	15,00
					15,00	15,00
						-
	QUINTO PISO				15,00	15,00
					15,00	15,00
					15,00	15,00
					15,00	15,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	120,00
					VIENE	-
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	120,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

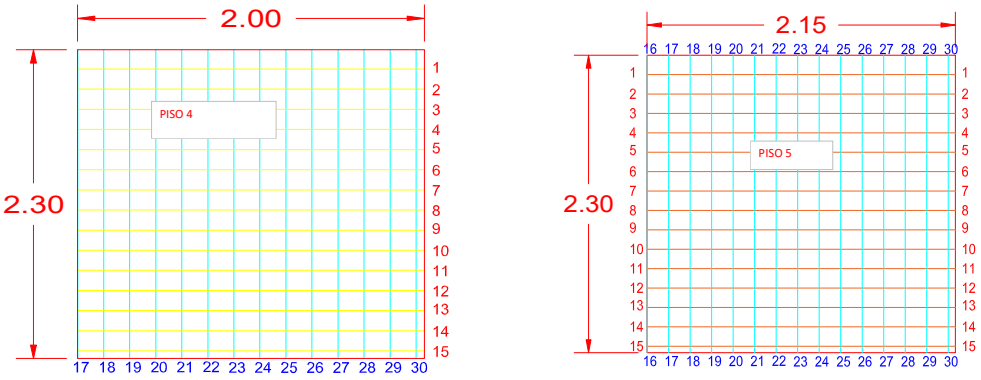


OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO RECEPCION FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 4	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 89	DESCRIPCION ITEM:	Viga de amarre de 0,12 x 0,20 NO incluye acero de refuerzo, alambre negro, incluye fomaleta y concreto de 2500 psi.		UNIDAD:	ml

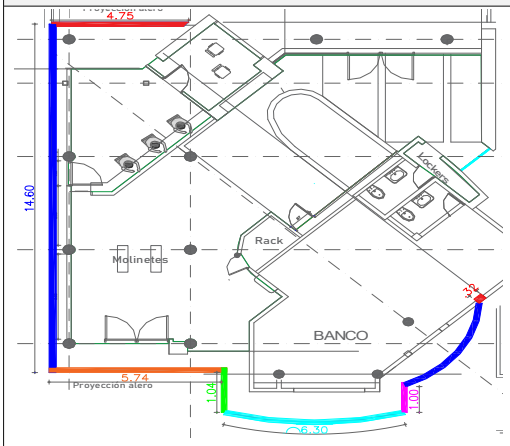PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			UNIDADES	MEDIDA TOTAL
		ALTO	LARGO	ANCHO		
	EDIFICIO RECEPCIÓN					
	CUBIERTA					-
	Placa cubierta recepcion, perimetro		4,75		1,00	4,75
	Placa cubierta recepcion, perimetro		14,60		1,00	14,60
	Placa cubierta recepcion, perimetro		5,74		1,00	5,74
	Placa cubierta recepcion, perimetro		1,04		1,00	1,04
	Placa cubierta recepcion, perimetro		6,30		1,00	6,30
	Placa cubierta recepcion, perimetro		1,00		1,00	1,00
	Placa cubierta recepcion, perimetro		3,70		1,00	3,70
	Placa cubierta recepcion, perimetro		0,32		1,00	0,32
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	37,45
					VIENE	62,55
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	100,00
					COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 5	-
					PRESENTE ACTA	100,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO









OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	2 DE 4	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 89	DESCRIPCION ITEM:	Viga de amarre de 0,12 x 0,20 NO incluye acero de refuerzo, alambre negro, incluye fomaleta y concreto de 2500 psi.		UNIDAD:	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

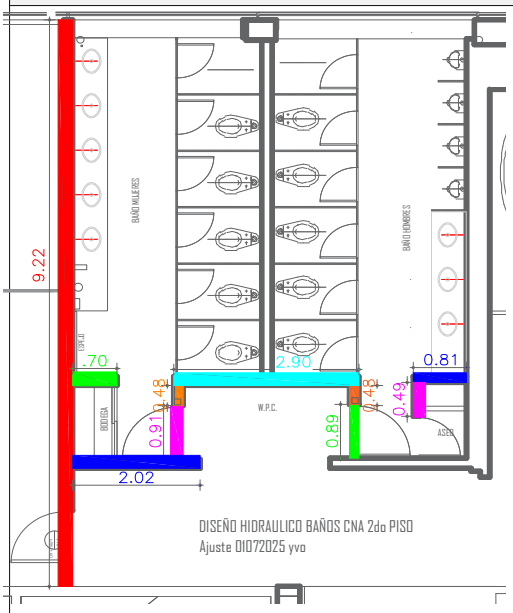

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
BAÑO DE MUJERES					-
MURO NUEVO			9,22	2,00	18,44
MURO DE DEPOSITO			0,70	2,00	1,40
MURO DE ENTRADA EN WPC			2,90	2,00	5,80
LINEAL DEL MURO WPC			0,48	4,00	1,92
MURO DE ACCESO PRINCIPAL			2,02	2,00	4,04
DINTEL DE PUERTA			0,91	2,00	1,82
					-
BAÑOS DE HOMBRE					-
DINTEL PUERTA DE ACCESO			0,89	2,00	1,78
MURO DE POSETA			0,81	2,00	1,62
MURO DE POSETA			0,49	2,00	0,98
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					37,80
VIENE					24,75
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					62,55

REGISTRO FOTOGRÁFICO









OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	3 DE 4	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 89	DESCRIPCION ITEM:	Viga de amarre de 0,12 x 0,20 NO incluye acero de refuerzo, alambre negro, incluye fomaleta y concreto de 2500 psi.		UNIDAD:	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

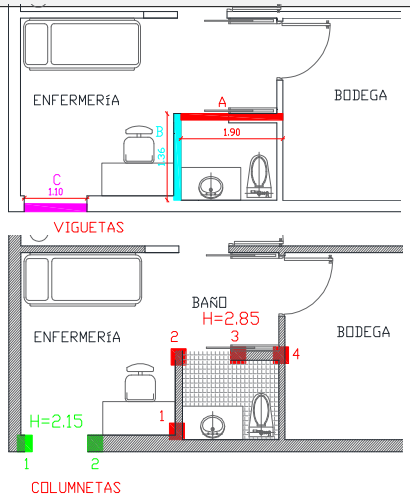

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
ENFERMERIA CNA piso 1					-
Vigueta en baño					-
VIGUETA A			1,90	1,00	1,90
VIGUETA B			1,36	1,00	1,36
VIGUETA C			1,10	1,00	1,10
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	4,36
				VIENE	20,39
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	24,75

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - TECNOLOGIA FNA - GESTION DOCUMENTAL - BAÑOS				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	4 DE 4	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 89	DESCRIPCION ITEM:	Viga de amarre de 0,12 x 0,20 NO incluye acero de refuerzo, alambre negro, incluye fomaleta y concreto de 2500 psi.		UNIDAD:	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

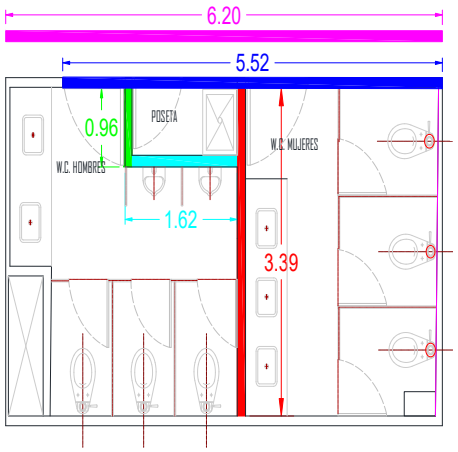

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO DE TECNOLOGIA					-
GESTION DOCUMENTAL					-
BAÑOS					-
MURO A HALL viguetas dinteles	5,52			1,00	5,52
MURO A HALL viguetas superior	6,20			1,00	6,20
MURO DIVISORIO viguetas	3,39			2,00	6,78
MURO POCETA viguetas	0,96			2,00	1,92
MURO POCETA viguetas	1,62			2,00	3,24
	3,27			- 1,00	- 3,27
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	20,39
				VIENE	-
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	20,39

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07		INGEBYP NIT 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA		
	PERIODO: 1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA: 1 DE 4	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA: 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 90	DESCRIPCION ITEM:	Columneta de confinamiento (0,12*0.20) NO incluye acero de refuerzo, alambre negro, INCLUYE fomaleta y concreto de 2500 psi.		UNIDAD:	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

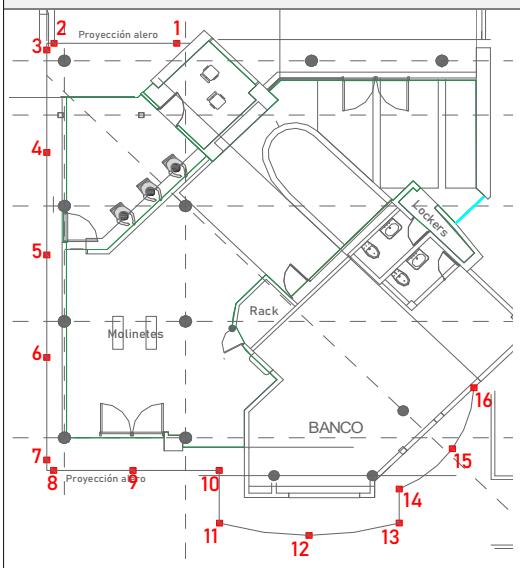

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	LARGO	ANCHO	UNIDADES	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO RECEPCIÓN					-
CUBIERTA					-
Placa cubierta recepcion, columnetas	0,25			16,00	4,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	4,00
				VIENE	40,22
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	44,22
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 6	-
				PRESENTE ACTA	44,22

REGISTRO FOTOGRÁFICO








OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

	ACTA PARCIAL No. 07				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	2 DE 4	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 90	DESCRIPCION ITEM:	Columneta de confinamiento (0,12*0.20) NO incluye acero de refuerzo, alambre negro, INCLUYE fomaleta y concreto de 2500 psi.		UNIDAD:	ml

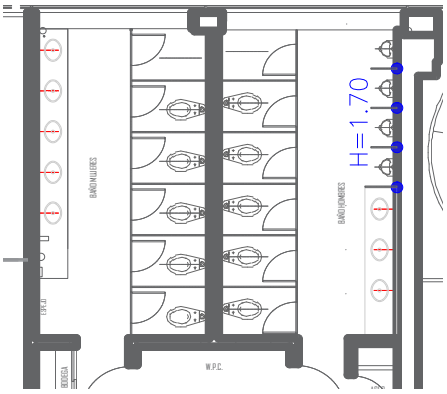PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	muros existentes en baños hombre					-
	columnetas para diviciones	1,70			4,00	6,80
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	TOTAL ITEM					6,80
	VINE					33,42
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA					40,22

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	3 DE 4	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 90	DESCRIPCION ITEM:	Columneta de confinamiento (0,12*0.20) NO incluye acero de refuerzo, alambre negro, INCLUYE fomaleta y concreto de 2500 psi.		UNIDAD:	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
BAÑOS TECNOLOGIA					-
					-
MURO A HALL columnetas	3,48			4,00	13,92
					-
					-
					-
baño tecnologia hombres					-
columnetas para orinales	1,00			2,00	2,00
columnetas para lavamanos	0,60			3,00	1,80
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
TOTAL ITEM					17,72
VINE					15,70
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA					33,42

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	4 DE 4	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 90	DESCRIPCION ITEM:	Columneta de confinamiento (0,12*0.20) NO incluye acero de refuerzo, alambre negro, INCLUYE fomaleta y concreto de 2500 psi.		UNIDAD:	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

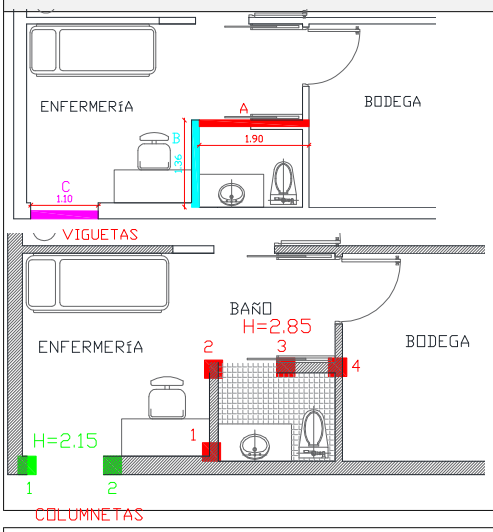

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
ENFERMERIA CNA piso 1					-
					-
Columnetas de puertas	2,85			4,00	11,40
Columnetas en baño	2,15			2,00	4,30
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	15,70
				VIENE	-
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	15,70

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.124.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 3	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 91	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e Instalacion de soporte para tuberia de 1/2" a 4" para tuberias hidrosanitarias		UNIDAD:	und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA








LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	UNIDADES	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS					-
RAMAL 1 (1-10)				10,00	10,00
RAMAL 2 (1-9)				9,00	9,00
RAMAL 3 (1-10)				10,00	10,00
RAMAL 4 (1-13)				13,00	13,00
RAMAL 5 (1-10)				10,00	10,00
RAMAL 6 (1-6)				6,00	6,00
RAMAL 7 (1-12)				12,00	12,00
RAMAL 8 (1-6)				6,00	6,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
			SUBTOTAL		76,00
			VIENE		30,00
			CANTIDAD TOTAL ACUMULADA		106,00
			COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 6		-
			PRESENTE ACTA		106,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

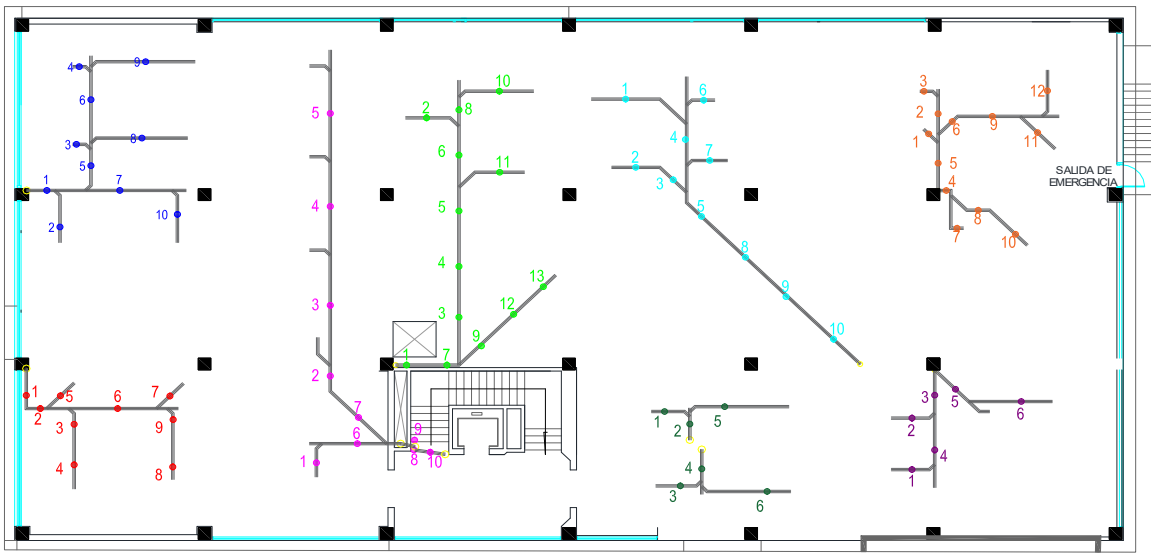


OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	2 DE 3	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 91	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e Instalacion de soporte para tuberia de 1/2" a 4" para tuberias hidrosanitarias		UNIDAD:	und

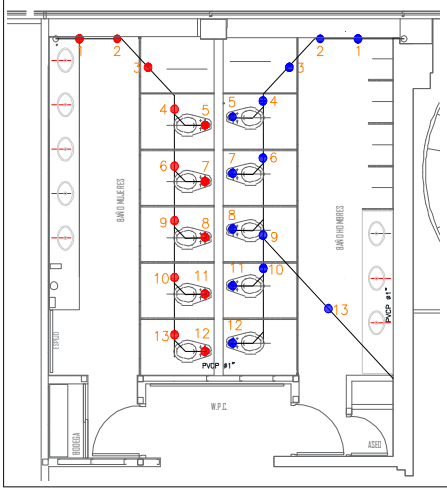PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Placa entrepiso ENFERMERÍA CNA					-
	soportes baños hombres	13,00			1,00	13,00
	soportes baños mujeres	13,00			1,00	13,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	26,00
					VIENE	4,00
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	30,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO




OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT 830.124.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	3 DE 3	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 91	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e Instalacion de soporte para tuberia de 1/2" a 4" para tuberias hidrosanitarias		UNIDAD:	und

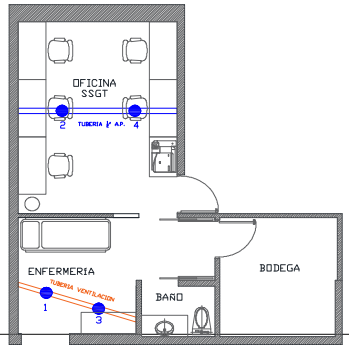PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						-
	Placa entrepiso ENFERMERÍA CNA					-
	Soportes tuberia A.p. para piso 2				2,00	2,00
	Soportes tuberia ventilacion baño				2,00	2,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	4,00
					VIENE	-
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	4,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 92	DESCRIPCION ITEM:	Dovela en concreto tipo gruting de 3000 psi NO incluye acero de refuerzo		UNIDAD:	ml


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

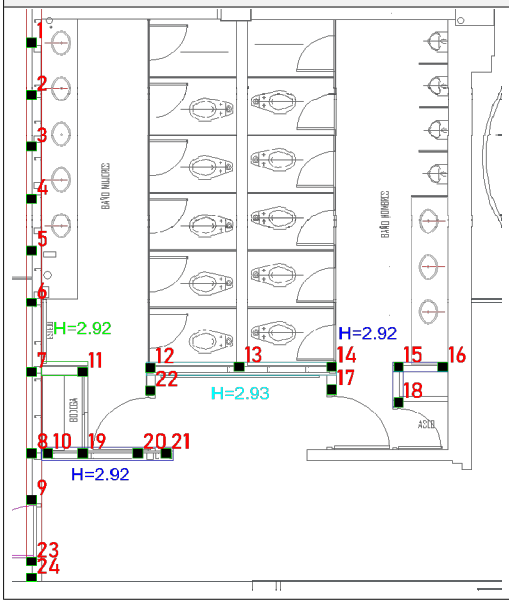

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	LARGO	ANCHO	UNIDADES	MEDIDA TOTAL
BAÑOS CNA PISO2					-
BAÑO MUJERES					-
muros en mamposteria certical	2,92			24,00	70,08
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	70,08
				VIENE	-
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	70,08
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 6	-
				PRESENTE ACTA	70,08

REGISTRO FOTOGRÁFICO



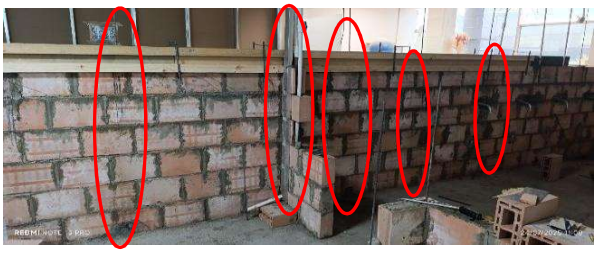




OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07			INGEBYP NIT 830.124.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA			
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 1


A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 93	DESCRIPCION ITEM:	Construccion de Placa de entrepiso de 2.5 m x 2.5 m, con lámina colaborante 2", cal 22, h=10cm de acuerdo a detalle expresado en justificacion, incluye acero de refuerzo, concreto de 3000 psi y lamina colaborante (Incluye Cerramiento de protección en tercer piso, trasciego de insumos por 4 pisos en sentido vertical y 50 m en sentido horizontal)		UNIDAD:	Und

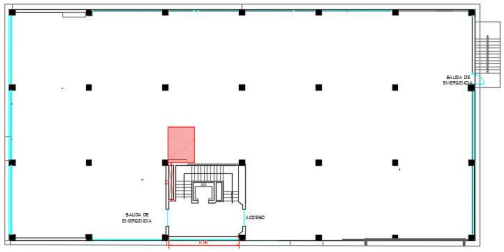PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	UNIDADES	MEDIDA TOTAL
	Edificio Convenciones					-
						-
	CUBIERTA				1,00	1,00
						-
	CUARTO PISO				1,00	1,00
						-
						-
						-

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 5	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 94	DESCRIPCION ITEM:	Demolición de muro en mampostería en bloque de arcilla de 15 cm (incluye trasciego de materiales desde unas disistancias superiores a 50 ml y niveles superiores a un piso a punto de acopio de acuerdo a horarios establecidos por entidad)		UNIDAD:	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

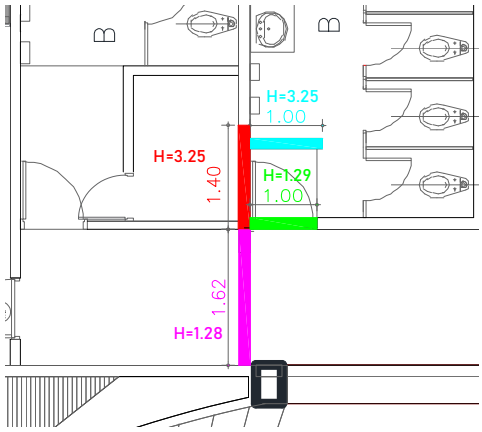

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	LARGO	ANCHO	UNIDADES	MEDIDA TOTAL
					-
BAÑO MUJERES					-
muro Divisorio de pasillo	1,28		1,62	1,00	2,07
muro divisorio de baños	3,25		1,40	1,00	4,55
					-
BAÑO HOMBRES					-
muro de acceso baño hombres	3,25		1,00	1,00	3,25
muro de acceso baño hombres	1,29		1,00	1,00	1,29
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	11,16
				VIENE	49,49
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	60,65
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 6	-
				PRESENTE ACTA	60,65

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA


fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	2 DE 5	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 94	DESCRIPCION ITEM:	Demolición de muro en mampostería en bloque de arcilla de 15 cm (incluye trasciego de materiales desde unas disistancias superiores a 50 ml y niveles superiores a un piso a punto de acopio de acuerdo a horarios establecidos por entidad)	UNIDAD:	m2	

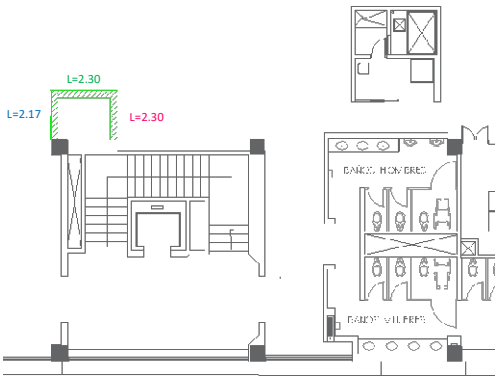PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	PISO 4 - CONVENCIONES.					-
	Muro ductería					-
		2,45	2,30		1,00	5,64
		2,45	2,30		1,00	5,64
		2,45	2,17		1,00	5,32
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	SUBTOTAL					16,60
	VIENE					32,89
	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					49,49

REGISTRO FOTOGRÁFICO



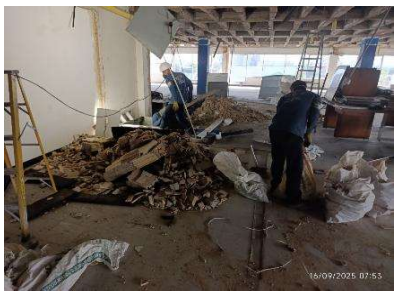



OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA


fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT: 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	3 DE 5	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA	31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	NP - 94	DESCRIPCION ITEM:	Demolición de muro en mampostería en bloque de arcilla de 15 cm (incluye trasciego de materiales desde unas disistancias superiores a 50 ml y niveles superiores a un piso a punto de acopio de acuerdo a horarios establecidos por entidad)			UNIDAD:	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



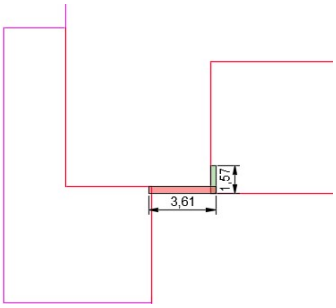

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	AREA	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
PLACA DE CUBIERTA					-
CUBIERTA ASCENSORES					-
Muro en esquina exterior superior muro sur de BODEGA	1,57	0,80		1,00	1,26
Viga de conexión entre BODEGA y PUNTO FIJO	3,61	0,80		1,00	2,89
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	4,15
				VIENE	28,74
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	32,89

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:	


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT: 830.121.907-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	4 DE 5	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 94	DESCRIPCION ITEM:	Demolición de muro en mampostería en bloque de arcilla de 15 cm (incluye trasciego de materiales desde unas disistancias superiores a 50 ml y niveles superiores a un piso a punto de acopio de acuerdo a horarios establecidos por entidad)		UNIDAD:	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

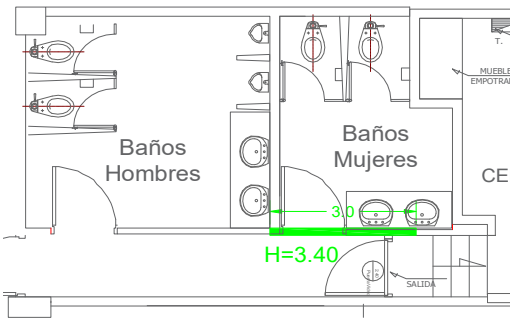

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	AREA	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO TECNOLOGIA					-
Baños Tecnología	3,40		3,00	1,00	10,20
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	10,20
				VIENE	18,54
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	28,74

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:	


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT: 830.123.967-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	5 DE 5	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 94	DESCRIPCION ITEM:	Demolición de muro en mampostería en bloque de arcilla de 15 cm (incluye trasciego de materiales desde unas disistancias superiores a 50 ml y niveles superiores a un piso a punto de acopio de acuerdo a horarios establecidos por entidad)		UNIDAD:	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

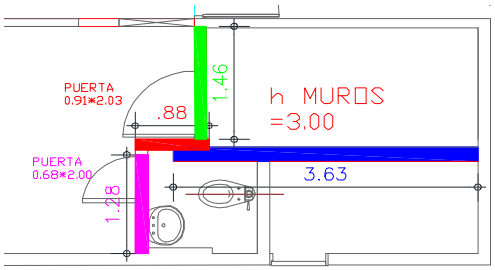

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	AREA	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CNA					-
BAÑOS ENFERMERIA					-
MURO 1	3,00	1,46		1,00	4,38
PUERTA	2,03	0,91		- 1,00	- 1,85
MURO 2	3,00	0,88		1,00	2,64
MURO 3	3,00	1,28		1,00	3,84
PUERTA BAÑO	2,00	0,68		- 1,00	- 1,36
MURO 4	3,00	3,63		1,00	10,89
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	18,54
				VIENE	
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	18,54

REGISTRO FOTOGRAFICO








OBSERVACIONES:	

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 95	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de ductos de extracción de aire desde terraza hasta nivel de piso cuarto piso (Cerramiento preventivo en 3 piso, ductos de 1,60*0,90. Incluye trasiego desde cubierta ubicada a cinco pisos y disposición final).		UNIDAD:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	LARGO	ANCHO	UNIDADES	MEDIDA TOTAL
Edificio Convenciones					-
cubierta					-
Tramo 1 vertical externo a la bodega	3,00			1,00	3,00
Tramo 2 horizontal interno en bodega	4,00			1,00	4,00
					-
punto fijo					-
zona posterior del cuarto del ascensor	12,50			1,00	12,50
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					19,50
VIENE					-
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					19,50
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 5					-
PRESENTE ACTA					19,50

REGISTRO FOTOGRÁFICO



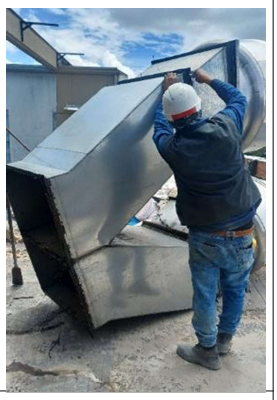

OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 4	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 96	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalacion de gravilla lavada para transiciones entre enchapes y / o pisos laminados o urbanismo (ancho promedio 15 cm)		UNIDAD:	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

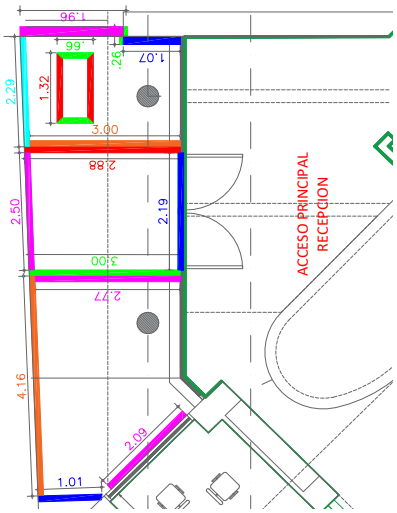

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	LARGO	ANCHO	UNIDADES	MEDIDA TOTAL
ACCESO PRINCIPAL RECEPCION					-
CAJA EXISTENTE			0,66	2,00	1,32
CAJA EXISTENTE			1,32	2,00	2,64
ANDEN COSTADO SUR			2,29	1,00	2,29
ANDEN COSTADO SUR			1,96	1,00	1,96
ANDEN COSTADO SUR			0,26	1,00	0,26
ANDEN COSTADO SUR			1,07	1,00	1,07
ACCESO DE ENTRADA, SUR			2,88	1,00	2,88
ACCESO DE ENTRADA, SUR			3,00	1,00	3,00
BOCAPUERTA DE ANDEN VIA			2,50	1,00	2,50
BOCAPUERTA EDIFICIO			2,19	1,00	2,19
ACCESO DE ENTRADA, NORTE			3,00	1,00	3,00
ACCESO DE ENTRADA, NORTE			2,77	1,00	2,77
ANDEN COSTADO NORTE			4,16	1,00	4,16
ANDEN COSTADO NORTE MATERA			1,01	1,00	1,01
ANDEN COSTADO NORTE VENTANA			2,09	1,00	2,09
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	33,14
				VIENE	30,56
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	63,70
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 6	-
				PRESENTE ACTA	63,70

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	2 DE 4	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 96	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalacion de gravilla lavada para transiciones entre enchapes y / o pisos laminados o urbanismo (ancho promedio 15 cm)		UNIDAD:	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

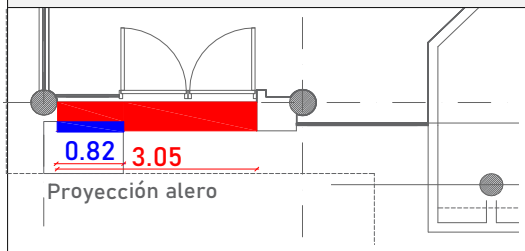

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
edificio Recepcion					-
Salida a plazoleta					-
Piso			3,05	1,00	3,05
Guardaescoba			0,82	1,00	0,82
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					3,87
VIENE					26,69
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					30,56

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT: 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	3 DE 4	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 96	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalacion de gravilla lavada para transiciones entre enchapes y / o pisos laminados o urbanismo (ancho promedio 15 cm)		UNIDAD:	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

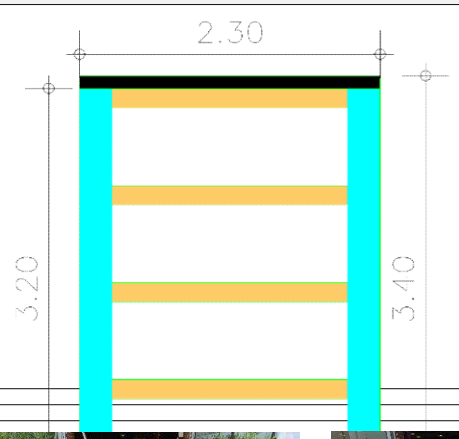

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
RAMPA ACCESO DE CASINO					-
Horizontales			1,80	5,00	9,00
Verticales			3,40	2,00	6,80
LLEGADAS CAMBIO PENDIENTE			2,30	2,00	4,60
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	20,40
				VIENE	6,29
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	26,69

REGISTRO FOTOGRAFICO








OBSERVACIONES:	

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT: 830.131.907-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	4 DE 4	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 96	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalacion de gravilla lavada para transiciones entre enchapes y / o pisos laminados o urbanismo (ancho promedio 15 cm)		UNIDAD:	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

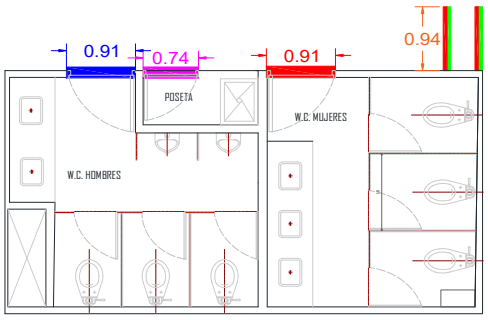

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
BAÑOS TECNOLOGIA					-
					-
Baño hombres			0,90	1,00	0,90
Poceta			0,73	1,00	0,73
Baño mujeres			0,90	1,00	0,90
Escalera contra huella			0,94	2,00	1,88
huella			0,94	2,00	1,88
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	6,29
				VIENE	-
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	6,29

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:	


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 97	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de antena existente (incluye trasiego y disposición)		UNIDAD:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

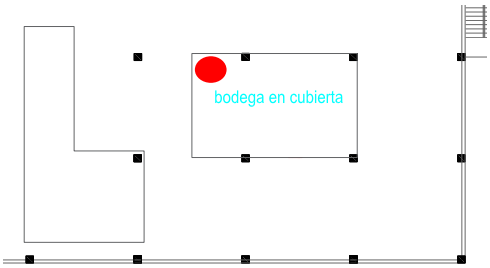

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	LARGO	ANCHO	UNIDADES	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
PLACA DE CUBIERTA					-
CUBIERTA DE BODEGA				1,00	1,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	1,00
				VIENE	
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	1,00
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 6	-
				PRESENTE ACTA	1,00

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT 830.124.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 98	DESCRIPCION ITEM:	Mampostería en bloque de arcilla estructural No. 4 de perforacion vertical (no incluye lineales, ni elementos no estructurales)		UNIDAD:	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

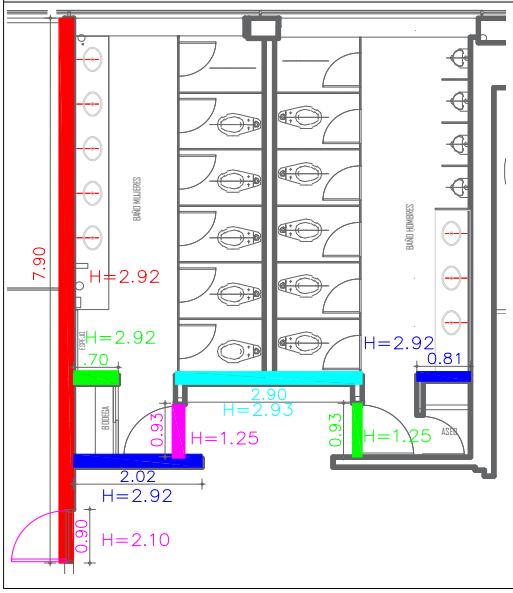

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	LARGO	ANCHO	UNIDADES	MEDIDA TOTAL
BAÑOS DE MUJERES					-
MUROS LONGITUDINALES		7,90	2,92	1,00	23,07
PUERTA DIVISORIA		0,90	2,10	- 1,00	- 1,89
MURO DEPOSITO		0,70	2,92	1,00	2,04
MURO DE ACCESO		2,02	2,92	1,00	5,90
DINTEL DE ACCESO		0,93	1,27	1,00	1,18
					-
					-
BAÑOS DE HOMBRES					-
MURO DE POSETA DE ASEO		0,81	2,92	1,00	2,37
MURO DE ACCESO		2,90	2,93	1,00	8,50
DINTEL DE ACCESO		0,93	1,27	1,00	1,18
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	42,35
				VIENE	
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	42,35
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 5	-
				PRESENTE ACTA	42,35

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 2	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP - 99	DESCRIPCION ITEM:	Mamposteria en bloque de arcilla estructural No. 4 de perforacion vertical, ancho max <0.60 cm (No incluye elementos no estructurales)		UNIDAD:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

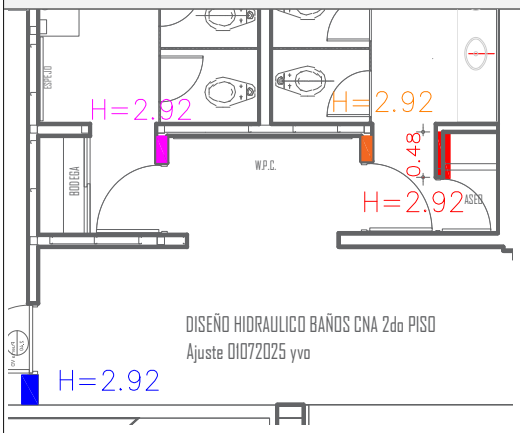

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	UNIDADES	MEDIDA TOTAL
BAÑOS DE MUJERES					-
entrada de acceso WPC			2,92	1,00	2,92
					-
BAÑOS DE HOMBRES					-
entrada de acceso WPC			2,92	1,00	2,92
muro de poseta de aseo			2,92	1,00	2,92
					-
puerta de acceso			2,92	1,00	2,92
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	11,68
				VIENE	0,75
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	12,43
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 5	-
				PRESENTE ACTA	12,43

REGISTRO FOTOGRÁFICO






OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 07


MEMORIAS DE CANTIDADES - CONVENCIONES FNA - CUBIERTA

PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	2 DE 2

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA	31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	NP - 99	DESCRIPCION ITEM:	Mamposteria en bloque de arcilla estructural No. 4 de perforacion vertical, ancho max <0.60 cm (No incluye elementos no estructurales)			UNIDAD:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

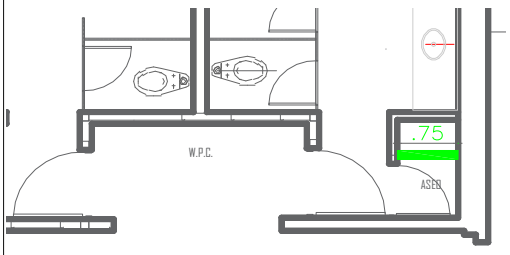

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
BAÑOS CNA					-
PISO 2					-
baño de hombre					-
Poceta			0,75	1,00	0,75
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					0,75
VIENE					-
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					0,75

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07		INGEBYP NIT: 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO CNA - PISO 2 - BATERIA SANITARIA		
	PERIODO: 1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA: 1 DE 4	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA: 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-102	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalacion de Espejo en 4mm con bordes pulidos,brillados y flotado con tubular en aluminio con luz led calida de 120 v		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

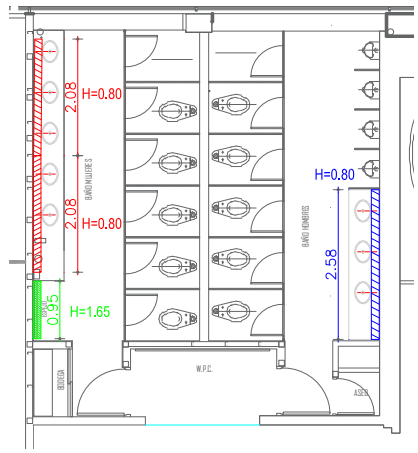

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					-
EDIFICIO CNA					-
PISO 2					-
BAÑOS					-
					-
MESON HOMBRES	0,8		2,58	1,00	2,06
MESON MUJERES	0,8		2,08	2,00	3,33
	1,65		0,95	1,00	1,57
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	6,96
				VIENE	5,41
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	12,37
				PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 6	-
				PRESENTE ACTA	12,37

REGISTRO FOTOGRÁFICO




OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07			INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO TECNOLOGIA - PISO 1 - GESTION DOCUMENTAL - BATERIA SANITARIA			
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA 2 DE 4	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-102	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalacion de Espejo en 4mm con bordes pulidos,brillados y flotado con tubular en aluminio con luz led calida de 120 v		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

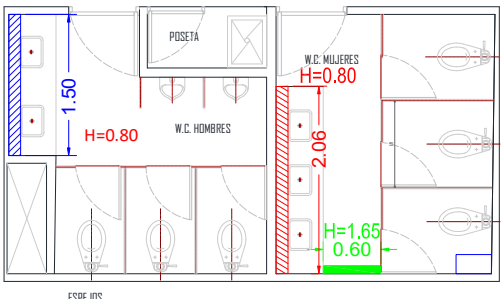

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					-
BAÑOS TECNOLOGIA					-
BAÑO HOMBRES					-
ESPEJO MESON	0,80		1,50	1,00	1,20
					-
BAÑO MUJERES					-
ESPEJO MESON	0,80		2,06	1,00	1,65
ESPEJO CUERPO ENTERO	1,65		0,60	1,00	0,99
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	3,84
				VIENE	1,57
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	5,41

REGISTRO FOTOGRÁFICO






OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

	ACTA PARCIAL No. 07			
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO CNA - PISO 1 - PUNTO DE ATENCION PRIMARIO			
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	3 DE 4

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA	31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	NP-102	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalacion de Espejo en 4mm con bordes pulidos,brillados y flotado con tubular en aluminio con luz led calida de 120 v			UNIDAD:	M2

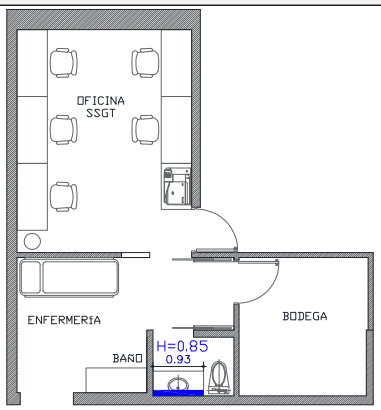PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						-
	EDIFICIO CNA					-
	PISO 1					-
	PUNTO DE ATENCION PRIMARIO					-
	BAÑO MESON	0,85		1,00	1,00	0,85
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	0,85
					VIENE	0,72
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	1,57

REGISTRO FOTOGRÁFICO




OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07			INGEBYP NIT. 830.121.607-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO RECEPCION - PRIMER PISO			
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	4 DE 4

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA	31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	NP-102	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalacion de Espejo en 4mm con bordes pulidos,brillados y flotado con tubular en aluminio con luz led calida de 120 v			UNIDAD:	M2

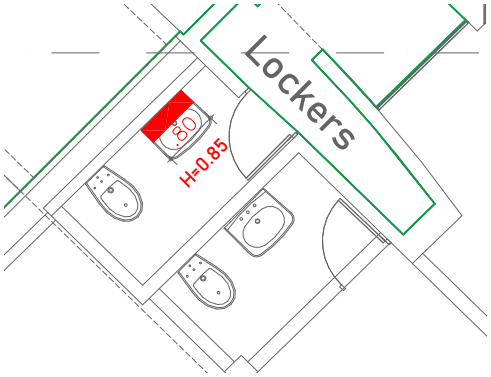PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						-
	EDIFICIO RECEPCION					-
	PISO 1					-
						-
	BAÑO MESON	0,85		0,85	1,00	0,72
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	0,72
					VIENE	-
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	0,72

REGISTRO FOTOGRÁFICO






OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

	ACTA PARCIAL No. 07			
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA			
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 2


A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA	31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	NP-105	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de puerta de vidrio laminado 5+5 MM, trasiego a punto de acopio y disposicion final a botadero certificado, suministro e instalacion de puerta en vidrio templado laminado 5 + 5 MM, con pelicula tipo bronce, incluye reinstalacion de postes de giro e instalacion de topes de piso, adecuación a los herrajes existentes (Incluye el transporte e instalación en horario nocturno).		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						-
	EDIFICIO DE CONVENCIONES					-
	PRIMER PISO					-
						-
		2,04	1,84		1,00	3,75
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	3,75
					VIENE	-
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	3,75
					PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 6	-
					PRESENTE ACTA	3,75



REGISTRO FOTOGRÁFICO



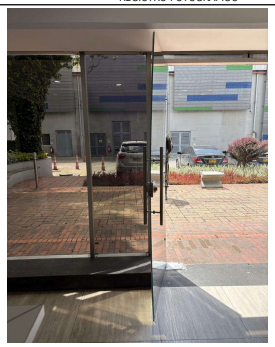




OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07			INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO RECEPCION FNA - PRIMER PISO			
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-106	DESCRIPCION ITEM:	Ajuste de puertas de acceso en vidrio templado incluye cambio de montante y cambio de bisagras hidráulicas		UNIDAD:	M2

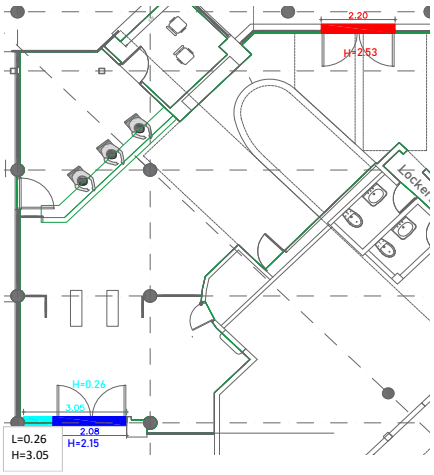PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						-
	EDIFICIO DE RECEPCION					-
						-
						-
						-
	PUERTA DE ACCESO A RECEPCION	2,53		2,20	1,00	5,57
	PUERTA DE SALIDA DE RECEPCION	2,08		2,15	1,00	4,47
	MONTANTE PUERTA DE SALIDA	0,26		3,05	1,00	0,79
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL		10,83
				VIENE		
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA		10,83
				PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 6		-
				PRESENTE ACTA		10,83

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07		INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO CNA - PISO 2 - BATERIA SANITARIA		
	PERIODO: 1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA: 1 DE 3	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA: 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-107	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalacion de Tapa registro en acero inoxidable de 30 x 30 cm incluye mortero de caja, estuco y pintura		UNIDAD:	UND


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

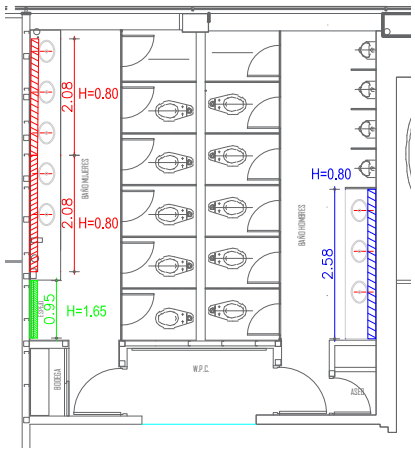

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					-
EDIFICIO CNA					-
PISO 2					-
BAÑOS					-
					-
BAÑO MUJERES				3,00	3,00
BAÑO HOMBRES				3,00	3,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	6,00
				VIENE	7,00
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	13,00
				PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 6	-
				PRESENTE ACTA	13,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



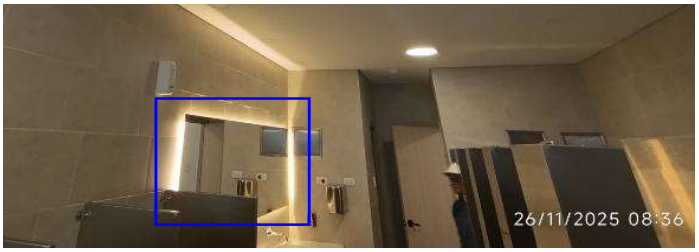


OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ CAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07			INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO TECNOLOGIA - PISO 1 - GESTION DOCUMENTAL - BATERIA SANITARIA			
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA 2 DE 3	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-107	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalacion de Tapa registro en acero inoxidable de 30 x 30 cm incluye mortero de caja, estuco y pintura		UNIDAD:	UND

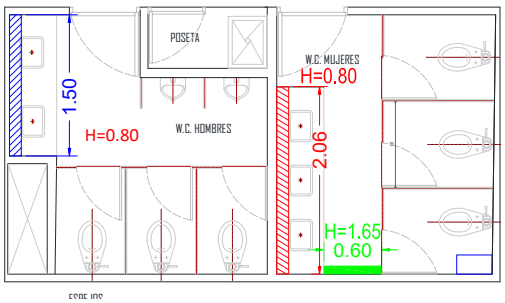PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						-
	EDIFICIO TECNOLOGIA					-
	PISO 1					-
	BAÑOS					-
						-
	BAÑO MUJERES				3,00	3,00
	BAÑO HOMBRES				3,00	3,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	6,00
					VIENE	1,00
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	7,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO






OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07			INGEBYP NIT. 830.121.607-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO CNA - PISO 1 - PUNTO DE ATENCION PRIMARIO			
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	3 DE 3

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	7	FECHA	31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-107	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalacion de Tapa registro en acero inoxidable de 30 x 30 cm incluye mortero de caja, estuco y pintura		UNIDAD:	UND

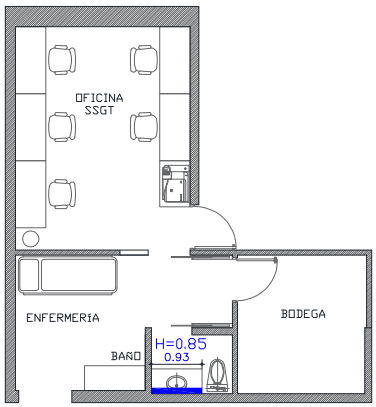PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						-
	EDIFICIO CNA					-
	PISO 1					-
	PUNTO DE ATENCION PRIMARIO					-
						-
	BAÑO				1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	1,00
					VIENE	-
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO




OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07			INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA			
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-108	DESCRIPCION ITEM:	Suministro de mesón para cubierta de lavamanos con perforaciones para poceta de sobre poner en Quarzstone Blanco Polar de 0.80 x0.55 mt, con baberos de 30 cms a los costados, salpicadero de 80 cms x 8 cms y frente con reengruese de 5 cms y tapa frontal en sinterizado color madera, instalación con pie de amigo. (Recepción)		UNIDAD:	UND

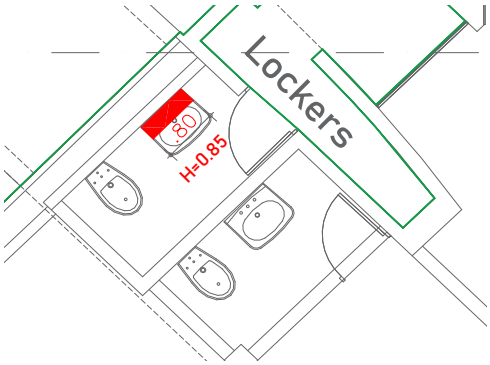PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						-
	EDIFICIO DE RECEPCION					-
						-
	BAÑO				1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	1,00
					VIENE	-
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	1,00
					PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 6	-
					PRESENTE ACTA	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO






OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07			INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA			
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA 1 DE 4	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-109	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalacion de mesón para lavamanos con perforaciones para poceta de sobre poner en Quarzstone Blanco Polar de 55 cm de ancho con baberos laterales y frontal de 30 cms con su respectivo salpicadero en escuadra de 8 cms, fijado con pie de amigo.		UNIDAD:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

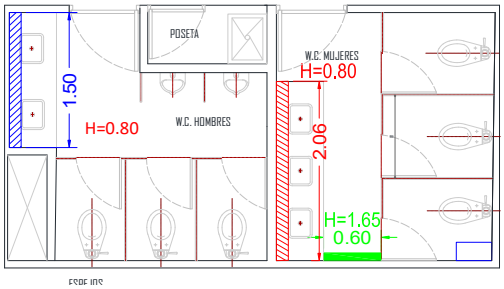

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					-
BAÑOS TECNOLOGIA					-
BAÑO HOMBRES					-
ESPEJO MESON	0,75		1,5	1,00	1,13
					-
BAÑO MUJERES					-
ESPEJO MESON	0,8		2,06	1,00	1,65
ESPEJO CUERPO ENTERO	1,65		0,6	1,00	0,99
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					3,77
VIENE					7,81
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					11,58
PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 6					-
PRESENTE ACTA					11,58

REGISTRO FOTOGRÁFICO









OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA


fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07			INGEBYP NIT. 830.121.567-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA			
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	2 DE 4

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA	31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	NP-109	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalacion de mesón para lavamanos con perforaciones para poceta de sobre poner en Quarzstone Blanco Polar de 55 cm de ancho con baberos laterales y frontal de 30 cms con su respectivo salpicadero en escuadra de 8 cms, fijado con pie de amigo.		UNIDAD:	ML

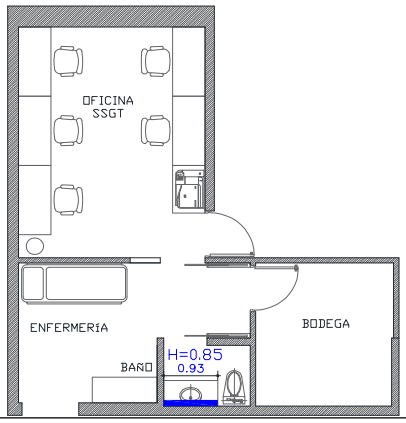PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						-
						-
	EDIFICIO CNA- PISO 1					-
	Baño PUNTO DE ATENCION PRIMARIO					-
	MESON	0,85		1,00	1,00	0,85
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	0,85
					VIENE	6,96
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	7,81

REGISTRO FOTOGRÁFICO

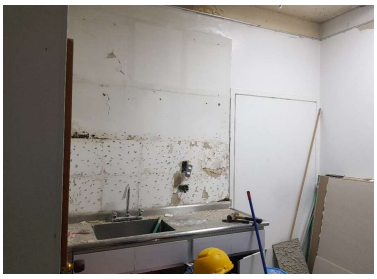

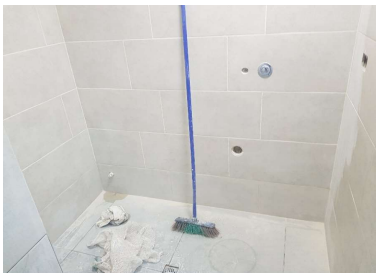




OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07		INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA		
	PERIODO: 1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA: 3 DE 4	


A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA: 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-109	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalacion de mesón para lavamanos con perforaciones para poceta de sobre poner en Quarzstone Blanco Polar de 55 cm de ancho con baberos laterales y frontal de 30 cms con su respectivo salpicadero en escuadra de 8 cms, fijado con pie de amigo.		UNIDAD:	ML

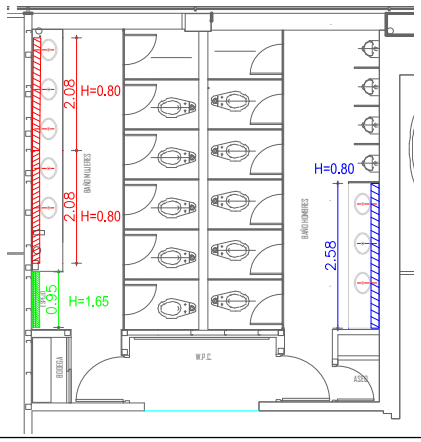PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						-
	EDIFICIO CNA- PISO 2					-
	Baño CNA PISO 2					-
	MESON HOMBRES	0,80		2,58	1,00	2,06
	MESON MUJERES	0,80		2,08	2,00	3,33
		1,65		0,95	1,00	1,57
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	6,96
					VIENE	-
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	6,96

REGISTRO FOTOGRÁFICO









OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07			INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - ACCESO - EDIFICIO DE RECEPCION FNA			
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-110	DESCRIPCION ITEM:	Suministro de caseta para puesto de vigilancia temporal en zona de acceso vehicular y rehubicable en cualquier sector que disponga la entidad, en estructura metalica calibre 18 con pintura esmalte negra.		UNIDAD:	Und

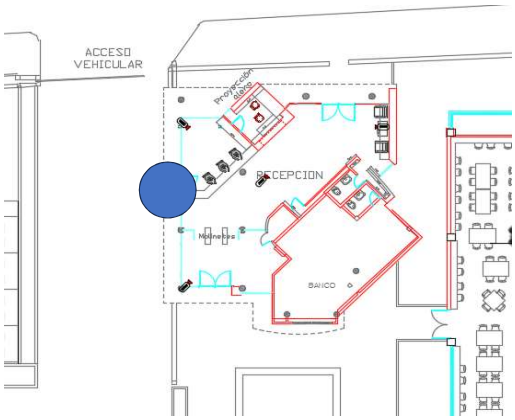PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
						-
	EDIFICIO DE RECEPCION					-
						-
	ACCESO VEHICULAR				1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	1,00
					VIENE	-
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	1,00
					PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 6	-
					PRESENTE ACTA	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO








OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07			INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA			
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA 1 DE 1	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-111	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de sanitario SMART AL SINGLE BLANCO o similar			UNIDAD: Und

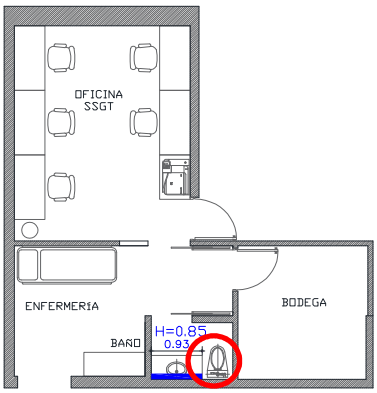PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						-
	EDIFICIO CNA					-
	PISO 1					-
	PUNTO DE ATENCION PRIMARIO				1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	1,00
					VIENE	-
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	1,00
					PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 6	-
					PRESENTE ACTA	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO








OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07			INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA			
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA 1 DE 1	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-112	DESCRIPCION ITEM:	Construccion de cajas de inspeccion sanitarias DE 80 X 80, incluye marco y tapa		UNIDAD:	Und

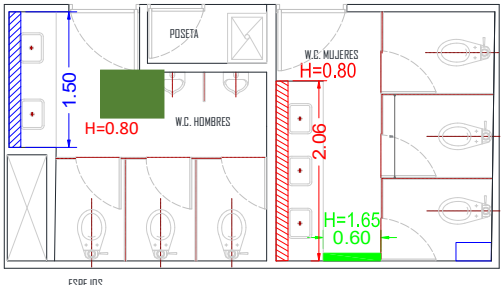PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						-
	EDIFICIO TECNOLOGIA					-
	PISO 1					-
	OFICINA DE ARCHIVO Y GESTION DOCUMENTAL				1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	1,00
					VIENE	-
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	1,00
					PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 6	-
					PRESENTE ACTA	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO









OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07			INGEBYP NIT. 830.101.607-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA			
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	1 DE 6

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-115	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalacion dilatación dry wall en Z		UNIDAD:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						-
	EDIFICIO CNA PISO 2					-
	BAÑOS CNA PISO 2					-
	BAÑO MUJERES			5,68	1,00	5,68
				0,71	1,00	0,71
				1,39	1,00	1,39
				0,85	1,00	0,85
				1,40	1,00	1,40
				1,38	1,00	1,38
				5,68	1,00	5,68
	BODEGA MUJERES			1,21	2,00	2,42
				0,55	2,00	1,10
	BAÑO HOMBRES			5,67	1,00	5,67
				1,39	1,00	1,39
				1,36	1,00	1,36
				0,90	1,00	0,90
				1,37	1,00	1,37
				0,86	1,00	0,86
				5,67	1,00	5,67
						-
						-
					SUBTOTAL	37,83
					VIENE	170,50
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	208,33
					PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 6	-
					PRESENTE ACTA	208,33

REGISTRO FOTOGRÁFICO

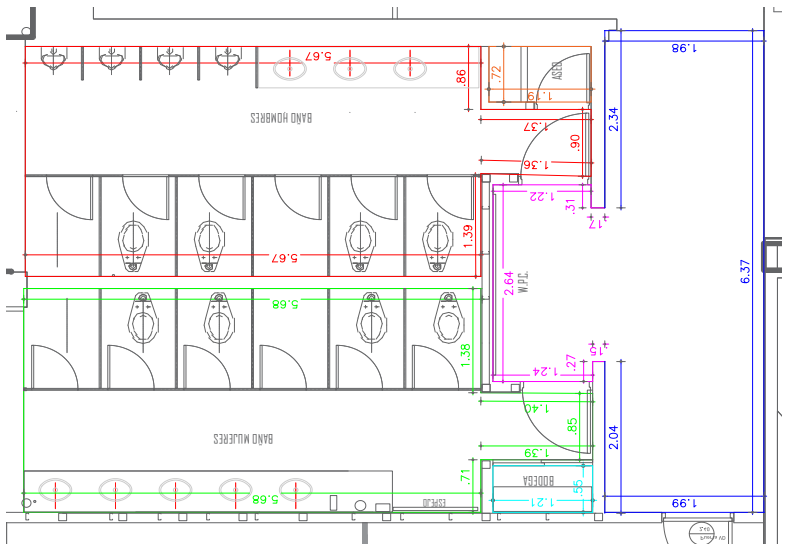

OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07			INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA			
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA 2 DE 6	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-115	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalacion dilatación dry wall en Z		UNIDAD:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						-
	EDIFICIO CNA PISO 2					-
	BAÑOS CNA PISO 2					-
	ASEO			1,19	2,00	2,38
				0,72	2,00	1,44
	PASILLO ENTRE BAÑOS			0,15	1,00	0,15
				0,27	1,00	0,27
				1,24	1,00	1,24
				2,64	1,00	2,64
				1,22	1,00	1,22
				0,31	1,00	0,31
				0,17	1,00	0,17
	PASILLO			2,04	1,00	2,04
				1,99	1,00	1,99
				6,37	1,00	6,37
				1,98	1,00	1,98
				2,34	1,00	2,34
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	24,54
					VIENE	145,96
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	170,50

REGISTRO FOTOGRÁFICO

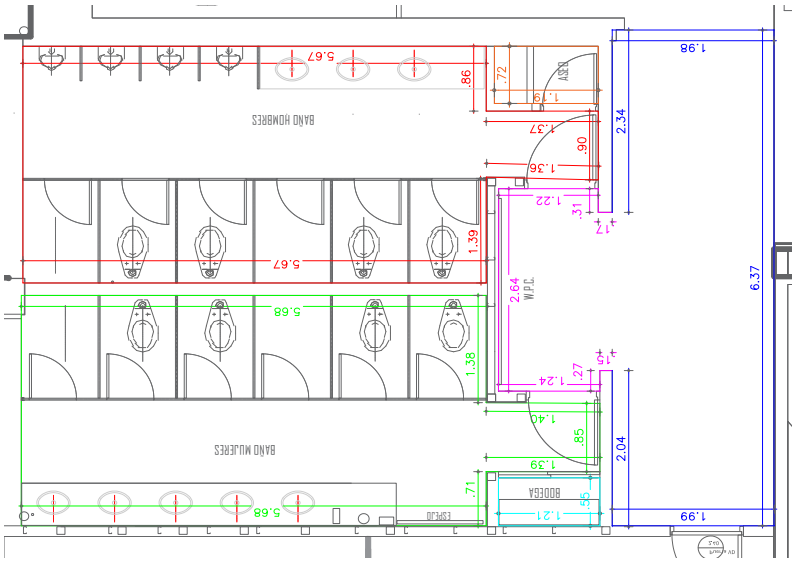


OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07			INGEBYP NIT. 830.121.537-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA			
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	3 DE 6

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-115	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalacion dilatación dry wall en Z		UNIDAD:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

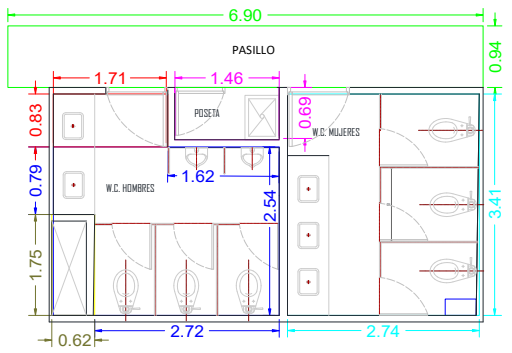

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					-
Edificio Tecnologia					-
Piso 1 Baño General					-
baño hombres					-
ENTRADA			0,83	2,00	1,66
ENTRADA			1,71	1,00	1,71
WC HOMBRES			1,62	1,00	1,62
			2,54	1,00	2,54
			2,72	1,00	2,72
			0,79	1,00	0,79
DUCTO			1,75	1,00	1,75
			0,62	1,00	0,62
POSETA			1,46	2,00	2,92
			0,69	2,00	1,38
WC MUJERES.			3,41	2,00	6,82
			2,74	2,00	5,48
PASILLO			0,94	2,00	1,88
			6,90	2,00	13,80
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	45,69
				VIENE	100,27
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	145,96

REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS.	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07		INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA		
	PERIODO: 1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA: 4 DE 6	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA: 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-115	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalacion dilatación dry wall en Z		UNIDAD:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						-
	EDIFICIO CNA PISO 1					-
	AREA DE ATENCION PRIMARIA					-
	OFICINA SSGT			4,65	1,00	4,65
				3,36	1,00	3,36
				4,65	1,00	4,65
	ENFERMERIA			2,80	1,00	2,80
				2,36	1,00	2,36
				1,37	1,00	1,37
				1,78	1,00	1,78
				1,47	1,00	1,47
				4,14	1,00	4,14
	BAÑO			1,60	2,00	3,20
				1,19	2,00	2,38
	BODEGA			2,48	2,00	4,96
				2,88	2,00	5,76
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	42,88
					VIENE	57,39
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	100,27

REGISTRO FOTOGRÁFICO

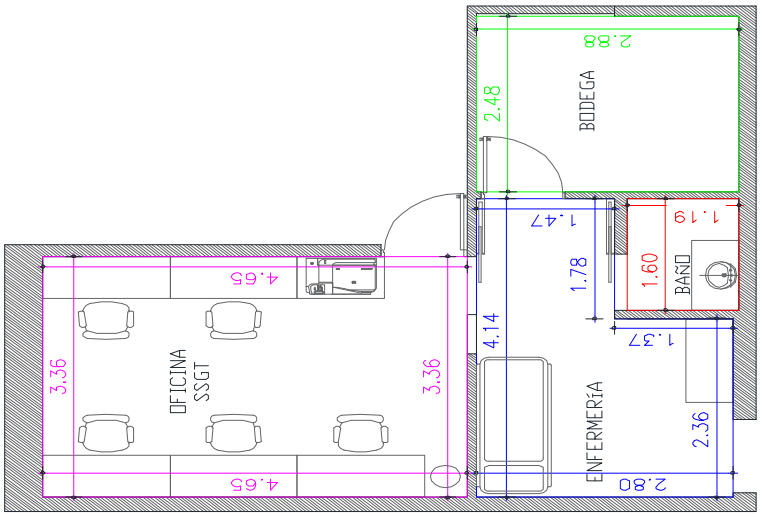

OBSERVACIONES:	


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA	5 DE 6	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-115	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalacion dilatación dry wall en Z		UNIDAD:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						-
	EDIFICIO CNA PISO 1					-
	BODEGA DE MARKETING					-
	BODEGA MARKETING			5,08	1,00	5,08
				3,38	1,00	3,38
				2,18	1,00	2,18
				3,38	1,00	3,38
				7,28	1,00	7,28
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL		21,30
				VIENE		36,09
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA		57,39

REGISTRO FOTOGRÁFICO

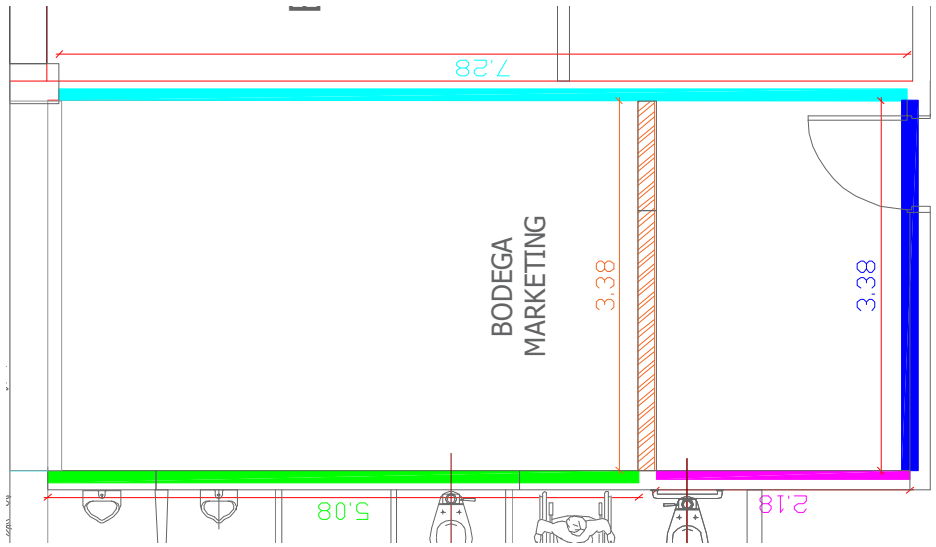

OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 07			INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA			
	PERIODO	1-12-2025 AL 31-12-2025	HOJA 6 DE 6	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	7	FECHA 31/12/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-115	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalacion dilatación dry wall en Z		UNIDAD:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						-
	EDIFICIO RECEPCION					-
	OFICINA					-
				2,21	1,00	2,21
				3,45	1,00	3,45
				1,68	1,00	1,68
				2,45	1,00	2,45
						-
	LOCKERS			3,20	1,00	3,20
				0,45	1,00	0,45
				3,17	1,00	3,17
				0,88	1,00	0,88
	BAÑO			2,15	1,00	2,15
				1,39	1,00	1,39
	SOBRE DETECTORES 2 NIVEL			2,45	2,00	4,90
	MURO DEL RACK			2,98	1,00	2,98
				1,77	1,00	1,77
	MURO CONTRA BANCO			2,51	1,00	2,51
	SALIDA RECEPCION			2,25	1,00	2,25
	SALIDA RECEPCION			0,65	1,00	0,65
						-
					SUBTOTAL	36,09
					VIENE	-
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	36,09

REGISTRO FOTOGRÁFICO

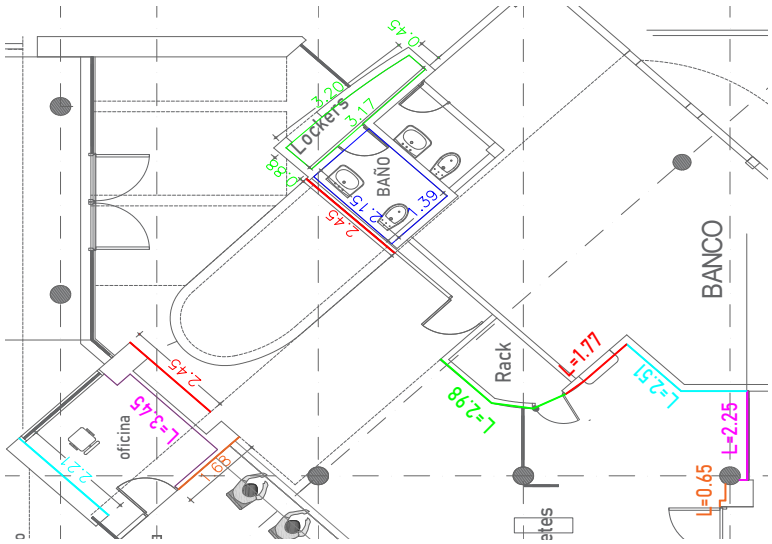

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 9

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 07			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		CORTE 07		CORTE 08		CORTE 09		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
	REPARACIONES LOCATIVAS GENERALES SEDE PRINCIPAL				262.432.679,73	-	-	-	12.160.064,04	-	104.788.869,00	-	49.597.308,27	-	-	-	26.476.618,12	-	26.356.397,14	-	36.947.261,48	-	4.905.645,92		261.232.163,73			1.200.516,00
1.1.	Retiro, reparación y reposicion puntual de junta entre laminas (junta con factor forma 2cmx1cm), mediante el uso de fondo de junta tipo sika rod y sello elastomérico de poliuretano en color negro, con alta resistencia a la intemperie incluye andamio colgante o toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.	ml	0,00	15.908,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.908,00	-
1.2.	Pintura exterior tipo coraza para muros sobre pañete incluye toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.	m2	498,00	42.081,00	20.956.251,73	-	-	-	-	100,11	4.212.643,00	-	-	-	-	293,52	12.351.615,12	104,37	4.391.993,97	-	-	-	-	498,00	20.956.251,73	-	42.081,00	-
2.1.	Retiro de impermeabilización existente y mortero de nivelación. Incluye el retiro y disposición final de escombros (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").	m2	1233,01	29.570,00	36.460.105,70	-	-	214,28	6.336.259,60	-	-	1.018,73	30.123.846,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.233,01	36.460.105,70	-	29.570,00	-
2.2.	Instalación de mortero de nivelación con materiales de SIKA o similares caracteristicas, previo a la instalación de la impermeabilización (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").	m2	0,00	62.971,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.971,00	-
2.3.	Impermeabilización de placa de cubierta plana transitable, no ventilada, con piso fijo, tipo convencional, para tráfico peatonal privado. Tipo Sika o de similares caracteristicas con uso de mantos asfálticos, tipo bicapa (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").	m2	162,38	126.524,00	20.544.967,12	-	-	-	-	162,38	20.544.967,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,38	20.544.967,12	-	126.524,00	-
2.4.	Desmonte de ventaneria con vidrios en celosía ubicados en culata de cubierta en el edificio CNA.	m2	0,00	52.493,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.493,00	-
2.5.	Suministro e instalación de sistema de ventanas en vidrio fijas (sin basculante) en reemplazo de las ventanas en vidrio retiradas, ubicados en culata de cubierta en el edificio CNA.	m2	0,00	297.835,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297.835,00	-
2.6.	Retiro de canaletas existentes y suministro e instalación de canaletas metálicas de sección trapezoidal elaboradas en acero galvanizado calibre 16 de acuerdo con las necesidades técnicas de la cubierta de aguas lluvia, incluye la instalación de la soportería para el anclaje de la canaleta en el edificio CNA.	ml	0,00	121.951,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.951,00	-
2.7.	Retiro de instalación existente y suministro e instalación de sosocs para la bajante de agua lluvia ø 4" en PVC con su respectivo sifón para evitar malos olores, incluye la instalación de la soportería para el anclaje en el edificio CNA.	und	0,00	86.553,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.553,00	-
2.8.	Limpieza y mantenimientos de tuberia bajante de agua lluvia a 4" en PVC, en el edificio CNA.	und	0,00	94.430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.430,00	-
3.1.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros.	m2	113,21	37.322,00	4.225.223,62	-	-	80,00	2.985.760,00	-	-	33,21	1.239.463,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,21	4.225.223,62	-	37.322,00	-
3.2.	Mantenimiento de cielo raso en fibra mineral. Incluye cambio, pintura y/o reutilización de láminas en fibra mineral, instalación de anclajes y armejo de perfileria descolgada y colocación de soportes.	m2	24,99	34.073,00	851.484,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,95	747.902,35	-	-	3,04	103.581,92	24,99	851.484,27	-	34.073,00	-
3.3.	Suministro e instalación cielo raso PVC de 10 mm de espesor, incluye estructura, perforaciones para las luminarias. A todo costo.	m2	0,00	94.144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.144,00	-
3.4.	Suministro e instalación cielo raso en drywall de 1/2" de espesor a una sola cara, incluye estructura, perforaciones luminarias. A todo costo.	m2	136,02	127.042,00	17.280.252,84	-	-	8,32	1.056.989,44	-	-	127,70	16.223.263,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,02	17.280.252,84	-	127.042,00	-
4.1.	Cambio de válvula antivandálica de empotrar tipo push para sanitarios institucionales de consumo de agua 4.85 lpf (1.28 gpf) tipo corona o similar. Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. A todo costo con la instalación de un enchape de similares caracteristicas a las originales.	und	22,00	1.200.516,00	26.411.352,00	-	-	-	-	11,00	13.205.676,00	-	-	-	-	6,00	7.203.096,00	-	-	-	-	4,00	4.802.064,00	21,00	25.210.836,00	1,00	1.200.516,00	1.200.516,00
4.2.	Cambio de grifería para lavamanos de empotrar a muro tipo push aplicación institucional de consumo 0,4 - 1.9 litros, tipo corona o similar incluye desmonte y reinstalación de aparatos. A todo costo con la instalación de un enchape de similares caracteristicas a las originales.	und	22,00	729.335,00	16.045.370,00	-	-	-	-	9,00	6.564.015,00	-	-	-	-	6,00	4.376.010,00	-	-	7,00	5.105.345,00	-	-	22,00	16.045.370,00	-	729.335,00	-
4.3.	Cambio de válvula antivandálica de empotrar tipo push para orinales institucionales de consumo de agua 0.5 a 1.9 lpf (0.13 a 0.5 gpf). tipo corona o similar. Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. A todo costo con la instalación de un enchape de similares caracteristicas a las originales.	und	6,00	1.209.112,00	7.254.672,00	-	-	-	-	4,00	4.836.448,00	-	-	-	-	2,00	2.418.224,00	-	-	-	-	-	-	6,00	7.254.672,00	-	1.209.112,00	-
4.4.	Desmonte de divisiones metálicas para baños. Incluye soportería, tornillos, herrajes, retiro y disposición final	m2	95,26	39.579,00	3.770.295,54	-	-	45,00	1.781.055,00	-	-	15,25	603.579,75	-	-	-	-	35,01	1.385.660,79	-	-	-	-	95,26	3.770.295,54	-	39.579,00	-
4.5.	Suministro e instalación de divisiones de baño en acero inoxidable por ambas caras calibre 22, aleación 304 acabado satinado tipo SOCODA o similar. Con puerta, anclajes y accesorios necesarios para su instalación y correcto funcionamiento.	m2	97,81	1.005.111,00	98.309.906,91	-	-	-	-	45,00	45.229.995,00	1,40	1.407.155,40	-	-	-	-	19,73	19.830.840,03	31,68	31.841.916,48	-	-	97,81	98.309.906,91	-	1.005.111,00	-
4.6.	Limpieza con sonda de tubería sanitaria en diferentes diámetros, actividad para ejecutar por punto.	und	93,00	109.625,00	10.195.125,00	-	-	-	-	93,00	10.195.125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,00	10.195.125,00	-	109.625,00	-
5.1.	Desmonte de puerta en madera de 1.44 m x2.47 m, incluye marco y retiro.	und	1,00	127.673,00	127.673,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	127.673,00	-	-	-	-	-	-	1,00	127.673,00	-	127.673,00	-
5.2.	Suministro e instalación de puerta de acceso a cubierta en aluminio de dos hojas: una de 0.90 m x 2.47 m y otra de 0.54 m x 2.47 m. Incluye bisagras cerradura, cantonera marco y accesorios necesarios para su funcionamiento.	und	0,00	1.192.289,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.192.289,00	-
6.1.	Resanes y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre pañete o repello liso. A todo costo.	m2	0,00	33.744,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.744,00	-
	TOTAL REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CNA - PISO 2				88.635.180,43		71.974.262,62		10.754.525,00		7.859.740,00	-	7.114.659,60	-	-		47.173.783,91		9.738.522,92		-	-	65.980.313,62		88.635.180,43	-		-
1.1.	Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.	m2	83,48	47.734,00	3.984.834,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,48	3.984.834,32	-	-	-	-	-	-	83,48	3.984.834,32	-	47.734,00	-
1.2.	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	m2	17,13	49.324,00	844.920,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,13	844.920,12	-	-	-	-	-	-	17,13	844.920,12	-	49.324,00	-
1.3.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros.	m2	698,10	35.224,00	24.589.874,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	698,10	24.589.874,40	-	-	-	-	-	-	698,10	24.589.874,40	-	35.224,00	-
1.4.	Desmonte de redes eléctricas existentes. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	glb	0,33	12.717.035,00	4.196.621,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,33	4.196.621,55	-	-	-	-	-	-	0,33	4.196.621,55	-	12.717.035,00	-
1.5.	Desmonte de puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	und	106,00	93.786,00	9.941.316,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,00	9.941.316,00	-	-	-	-	-	-	106,00	9.941.316,00	-	93.786,00	-
1.6.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo.	m2	39,02	92.676,00	3.616.217,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,02	3.616.217,52	-	-	-	-	-	-	39,02	3.616.217,52	-	92.676,00	-
2.1.	Suministro e instalación de columnetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre 12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye platina soldada a la base y anclajes a placa de piso y retiro de escombros.	ml	0,00	198.521,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	198.521,00	-
2.2.	Suministro e instalación de viguetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye soldadura a columnetas y retiro de escombros.	ml	0,00	181.351,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181.351,00	-
3.1.	Suministro e instalación de muro en Superboard de 8 mm, altura 2.40 m a dos caras. Incluye estructura metálica, anclaje, cinta, estuco y fondeo de acabado en pintura en vinilo tipo 1.	m2	0,00	199.697,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.697,00	-
4.1.	Suministro e instalación de cielorraso en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura. A todo costo.	m2	25,55	128.125,00	3.273.593,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,55	3.273.593,75	-	-	-	-	25,55	3.273.593,75	-	128.125,00	-
4.2.	Suministro e instalación de Frescasa Eco Sin Papel 3 1/2" para cielorraso en Drywall. A todo costo.	m2	0,00	32.499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.499,00	-
5.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 x 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad. Incluye plástico aislante y yumbolon de acuerdo a las caracteristicas técnicas y el guardaescobas.	m2	0,00	189.748,00	-	379,32	71.974.262,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379,32	71.974.262,62	-	189.748,00	-
6.1.	Suministro e instalación de alimentador 1N°12 Fase+1N°12 Neutro+1N°12 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	0,00	19.944,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.944,00	-
6.2.	Suministro e instalación de alimentador a tableros en 3N°2/0 Fase+1N°2/0 Neutro+1N°2 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	0,00	363.569,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363.569,00	-
6.3.	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble, cumpliendo norma RETIE.	und	82,00	153.691,00	12.602.662,00	-	-	43,00	6.608.713,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,00	5.993.949,00	82,00	12.602.662,00	-	153.691,00	-
6.4.	Suministro e instalación de salida interruptor sencillo o doble 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH40 3/4", elementos de fijación y conductores. Cumpliendo norma RETIE.	und	0,00	173.282,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173.282,00	-
6.5.	Suministro e instalación de lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x4x7cm. Largo de la guaya: 100cm, incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	0,00	318.520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318.520,00	-
6.6.	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	38,00	224.564,00	8.533.432,00	-	-	3,00	673.692,00	35,00	7.859.740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,00	8.533.432,00	-	224.564,00	-
6.7.	Suministro e instalación de panel LED de gran formato redondo de 24W, luz neutra 4000K, dimensiones 100 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	0,00	190.825,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.825,00	-

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 9

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 07			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		CORTE 07		CORTE 08		CORTE 09		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
6.8.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	0,00	176.599,00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.599,00	-
6.9.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia de aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	0,00	195.508,00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195.508,00	-
6.10.	Suministro e instalación de salida tomacorriente doble polo a tierra (red normal), monofásico 120V 15A, 3m prom en cable No 12 LSHF AWG, elementos de fijación y conductores.	und	20,00	173.606,00	3.472.120,00	-	-	20,00	3.472.120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	3.472.120,00	-	173.606,00	-
6.11.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. Cumpliendo norma RETIE.	m	0,00	16.035,00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.035,00	-
6.12.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit EMT ø 3" oculta sobre cielo o en muros.	ml	0,00	155.392,00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.392,00	-
6.13.	Suministro e instalación de ducto cerrado de 40X8 galvanizado o con pintura electrostática.	ml	0,00	293.413,00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293.413,00	-
6.14.	Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico tetrafilar con espacio para totalizador y barraje neutro y tierra. Incluye totalizador y protecciones.	und	0,00	3.460.340,00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.460.340,00	-
7.1.	Suministro e instalación de Vidrios Templado 8 mm para divisiones de oficina incluye acesorios en aluminio para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	0,00	830.396,00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830.396,00	-
7.2.	Suministro e instalación de Puerta en Vidrio Templado 8 mm con Pivote, incluye topes de piso, acesorios en aluminio para su correcto funcionamiento a todo costo.	m2	0,00	856.303,00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856.303,00	-
7.3.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho a todo costo de uso interior y exterior.	ml	0,00	85.101,00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.101,00	-
7.4.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho de uso interior y exterior, con corte de letras para identificar las oficinas en vidrio. A todo costo.	und	0,00	139.113,00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.113,00	-
8.1.	Suministro e instalación de Puerta en madecor entamborada de 0,90 m de ancho por 2,20 m de alto, incluye marcos, chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	0,00	1.145.405,00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.145.405,00	-
9.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores blancos. A todo costo, incluye lineales.	m2	191,28	37.195,00	7.114.659,60	-	-		-	-	-	191,28	7.114.659,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,28	7.114.659,60	-	37.195,00	-
9.2.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos cielo falsos blanco. A todo costo, incluye lineales.	m2	161,49	40.033,00	6.464.929,17	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	161,49	6.464.929,17	-	-	-	-	161,49	6.464.929,17	-	40.033,00	-
	REPARACIONES LOCATIVAS CASINO - EDIFICIO CONVENCIONES				83.544.506,28		79.297.346,28		-		-		-		-		-		4.247.160,00		-		-		83.544.506,28		-	
5.5.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 x 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad, para la zona de mesas del restaurante Incluye nivelación en zonas puntuales, plástico aislante, yumbolon de acuerdo con las características técnicas y el guardabarrobas.	m2	352,36	189.748,00	66.859.605,28	352,36	66.859.605,28		-		-		-		-		-		-		-		-	352,36	66.859.605,28	-	189.748,00	-
9.1.	Suministro e instalación de estructura decorativa para plantas colgantes de 6,85m ancho x 1,00 m de profundo con viguetas cada 0,76 m en tubería metálica cuadrada 50x50x2.0mm con acabado en pintura electrostática negro mate incluye 6 puntos de apoyo en guaya de tipo colgante. incluye 3 lamparas segun imagen.	und	1,60	3.245.844,00	5.193.350,40	1,00	3.245.844,00		-		-		-		-		-	0,60	1.947.506,40		-		-	1,60	5.193.350,40	-	3.245.844,00	-
9.2.	Suministro e instalación de estructura para microondas con módulos de 0,71 m de largo 0,56 m de profundo y 0,40 m de alto en tubería metálica cuadrada 50x50x3.0mm en pintura electrostática negro mate incluye 2 superficies en madera tipo madecor RH de 1" cada módulo y anclajes a la pared no visibles.	und	11,00	835.627,00	9.191.897,00	11,00	9.191.897,00		-		-		-		-		-		-		-		-	11,00	9.191.897,00	-	835.627,00	-
11.1.	Resanes y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre pañete o repello liso. Incluyen andamios, escaleras y sistemas de seguridad de operación. A todo costo.	m2	68,15	33.744,00	2.299.653,60	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,15	2.299.653,60	-	-	-	-	68,15	2.299.653,60	-	33.744,00	-
	REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CONVENCIONES - PISO 4				1.159.402.913,91		190.840.084,88		23.658.562,85		650.169,00		102.099.414,86		57.326.417,60		35.990.378,52		60.160.434,05		209.185.333,26		196.794.036,48		876.704.831,10				282.698.082,81
1.1.	Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.	m2	241,02	47.734,00	11.504.848,68	47,71	2.277.389,14	8,25	393.805,50		-	137,60	6.568.198,40	-	-		-	18,91	902.649,94		-		-	212,47	10.142.042,98	28,55	47.734,00	1.362.805,70
1.2.	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	m2	526,07	95.354,00	50.162.878,78	125,23	11.941.181,42	3,68	350.902,72		-	118,05	11.256.539,70		-	268,28	25.581.571,12	10,83	1.032.683,62		-		-	526,07	50.162.878,78	-	95.354,00	-
1.3.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros.	m2	986,86	35.224,00	34.761.156,64	455,25	16.035.726,00		-		-	433,59	15.272.774,16	-	-		-	28,39	1.000.009,36	69,63	2.452.647,12		-	986,86	34.761.156,64	-	35.224,00	-
1.4.	Desmonte de redes eléctricas existentes. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	glb	1,00	6.775.716,00	6.775.716,00	1,00	6.775.716,00		-		-	-	-	-	-		-		-		-		-	1,00	6.775.716,00	-	6.775.716,00	-
1.5.	Desmonte puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el Fondo Nacional del Ahorro S.A. indique.	und	150,00	93.786,00	14.067.900,00	79,00	7.409.094,00		-		-	71,00	6.658.806,00		-		-		-		-		-	150,00	14.067.900,00	-	93.786,00	-
1.6.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo.	m2	26,58	92.676,00	2.463.328,08	18,00	1.668.168,00		-		-	-	-	-	-		-	8,58	795.160,08		-		-	26,58	2.463.328,08	-	92.676,00	-
2.1.	Suministro e instalación de columnetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre 12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye platina soldada a la base y anclajes a placa de piso y retiro de escombros.	ml	164,80	198.521,00	32.716.260,80	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-		-	157,48	31.263.087,08		-	157,48	31.263.087,08	7,32	198.521,00	1.453.173,72
2.2.	Suministro e instalación de viguetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye soldadura a columnetas y retiro de escombros.	ml	127,68	181.351,00	23.154.895,68	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-		-	122,50	22.215.497,50		-	122,50	22.215.497,50	5,18	181.351,00	939.398,18
2.3.	Suministro e instalación perfiles WPC textura madera. Para instalar en muros divisorios de dimensiones 10 cm x 5 cm. Incluye estructura anclajes y retiro de escombros.	m2	0,00	234.409,00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	-	-	-	234.409,00	-
3.1.	Suministro e instalación de muro en Superboard, altura 2.40 m. a dos caras incluye estructura, anclaje, cinta, estuco y fondeo de acabado en pintura en vinilo tipo 1.	m2	234,01	156.903,00	36.716.871,03	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	128,60	20.177.725,80		-		-	128,60	20.177.725,80	105,41	156.903,00	16.539.145,23
4.1.	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall de 1/2" en diferentes niveles a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura a 3 manos. A todo costo.	m2	972,58	113.010,00	109.911.265,80	-	-		-	-	-	551,66	62.343.096,60	320,46	36.215.184,60	58,14	6.570.401,40	42,32	4.782.583,20		-		-	972,58	109.911.265,80	-	113.010,00	-
5.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad Incluye plastico aislante y yumbolon, de acuerdo a las caracteristicas tecnicas y el guardabarrobas.	m2	1120,05	189.748,00	212.527.247,40	315,09	59.788.414,57	120,76	22.913.854,63		-		-		-		-		-		-	684,20	129.824.978,20	1.120,05	212.527.247,40	-	189.748,00	-
6.1.	Suministro e instalación de alimentador 1N°12 Fase+1N°12 Neutro+1N°12 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	1458,70	19.842,00	28.943.525,40	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-		-	1.300,00	25.794.600,00		-	1.300,00	25.794.600,00	158,70	19.842,00	3.148.925,40
6.2.	Suministro e instalación de alimentador a tableros en 3N°2/0 Fase+1N°2/0 Neutro+1N°2 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	40,00	220.320,00	8.812.800,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	-	-	40,00	220.320,00	8.812.800,00
6.3.	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	305,00	147.631,00	45.027.455,00	-	-		-	-	-	-	-	143,00	21.111.233,00	26,00	3.838.406,00		-		-	136,00	20.077.816,00	305,00	45.027.455,00	-	147.631,00	-
6.4.	Suministro e instalación de salida interruptor sencillo o doble 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH40 3/4", elementos de fijación y conductores. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	6,00	166.320,00	997.920,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-		-		-	6,00	997.920,00	6,00	997.920,00	-	166.320,00	-
6.5.	Suministro e instalación de Lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x4x7cm. Largo de la guaya: 100cm incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	0,00	300.264,00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	-	-	-	300.264,00	-
6.6.	Reinstalación de panel LED cuadrado de dimensiones 60x60 cm preexistentes. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	0,00	103.354,00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	-	-	-	103.354,00	-
6.7	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	8,00	209.700,00	1.677.600,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-		-	8,00	1.677.600,00		-	8,00	1.677.600,00	-	209.700,00	-
6.8.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	24,00	220.546,00	5.293.104,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	-	-	24,00	220.546,00	5.293.104,00
6.9.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	0,00	198.472,00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	-	-	-	198.472,00	-
6.10.	Suministro e instalación Salida tomacorriente doble polo a tierra (red normal), monofásico 120V 15A, 3m prom en cable No 12 LSHF AWG, elementos de fijación y conductores. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	519,00	173.606,00	90.101.514,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-		-		-	12,00	2.083.272,00	12,00	2.083.272,00	507,00	173.606,00	88.018.242,00
6.11.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	410,00	16.035,00	6.574.350,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-		-		-	138,00	2.212.830,00	138,00	2.212.830,00	272,00	16.035,00	4.361.520,00

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 9

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 07			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		CORTE 07		CORTE 08		CORTE 09		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (+)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
6.12.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit EMT ø 3" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	0,00	155.392,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.392,00	-
6.13.	Suministro e instalación de ducto cerrado de 40X8 galvanizado o con pintura electrostática. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	0,00	317.627,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317.627,00	-
6.14.	Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico tetrafilar con espacio para totalizador y barraje neutro y tierra, incluye totalizador y proteccione. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	0,00	3.460.340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.460.340,00	-
7.1.	Suministro e Instalación de barra de comida en acero inoxidable calibre 22. de 45 cms de ancho incluye soporte en estructura metálica a panel.	ml	0,00	1.416.162,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.416.162,00	-
7.2.	Suministro e instalación de mueble de cocina de 1.60x0.60x0.90m en madera RH y en acero inoxidable, incluye grifería y accesorios de desagüe.	und	0,00	2.569.025,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.569.025,00	-
8.1.	Suministro e instalación de vidrio templado 8 mm para divisiones de oficina incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	249,16	856.266,00	213.350.045,11	99,20	84.944.395,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,66	90.473.065,56	-	-	204,86	175.417.461,31	44,30	856.266,00	37.932.583,80
8.2.	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado 8 mm con pivote, incluye topes de piso, accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento a todo costo.	m2	48,52	858.737,00	41.665.919,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,44	41.597.220,28	48,44	41.597.220,28	0,08	858.737,00	68.698,96
8.3.	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de 8 mm con sistema antipanico. Incluye topes de piso y accesorios para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	0,00	1.607.888,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.607.888,00	-
8.4.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho, de uso interior y exterior. A todo costo.	ml	0,00	82.644,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.644,00	-
8.5.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho, de uso interior y exterior, con corte de letras para identificar las oficinas en vidrio. A todo costo.	und	0,00	139.113,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.113,00	-
9.1.	Suministro e instalación de puerta en madecor entamborada de 0,90 m de ancho por 2,20 m de alto, incluye marcos chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	18,00	1.145.405,00	20.617.290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	13.744.860,00	-	-	12,00	13.744.860,00	6,00	1.145.405,00	6.872.430,00
9.2.	Suministro e instalación de superficie de madera ancho 40cm y 3 cm de espesor, para instalar en muros bajos, correspondientes a la barra para computadores y zonas de estancia.	ml	87,56	354.159,00	31.010.162,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,59	27.125.037,81	-	-	-	-	76,59	27.125.037,81	10,97	354.159,00	3.885.124,23
10.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores blanco. A todo costo, incluye lineales.	m2	1770,38	32.772,00	58.018.762,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,57	4.344.584,04	658,00	21.563.976,00	-	-	790,57	25.908.560,04	979,81	32.772,00	32.110.202,23
10.2.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos cielo falsos blanco. A todo costo, incluye lineales.	m2	1840,76	39.060,00	71.899.929,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,76	39.060,00	71.899.929,36
10.3.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores azul institucional. A todo costo, incluye lineales.	m2	17,48	37.195,00	650.168,60	-	-	-	-	17,48	650.169,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,48	650.168,60	-	37.195,00	-
10.4.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores verde institucional. A todo costo, incluye lineales.	m2	0,00	37.195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.195,00	-
	REPARACIONES LOCATIVAS - TORRE DE TECNOLOGÍA - PISO 2				1.705.081,04	-	57.849.827,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.705.081,04	-	-	-	57.849.827,37	-	1.705.081,04	-	-
1.1.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall, incluye desmonte de 113 luminarias tipo panel Led de 60 x 60 luz neutra 4000K y retiro con su disposición final de escombros.	m2	0,00	37.322,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.322,00	-
1.2.	Desmonte de puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	und	0,00	93.786,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.786,00	-
1.3.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo.	m2	0,00	92.676,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.676,00	-
2.1.	Suministro e instalación de cielorraso en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco y capa fondeo pintura. A todo costo.	m2	0,00	127.159,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.159,00	-
3.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad. Incluye plástico aislante y yumbolon de acuerdo a las caracteristicas técnicas y el guardaescobas.	m2	0,00	189.748,00	-	304,88	57.849.827,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304,88	57.849.827,37	-	189.748,00	-
4.1.	Suministro e instalación de lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x4x7cm. Largo de la guaya: 100cm, incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	0,00	311.065,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311.065,00	-
4.2.	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	0,00	227.693,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227.693,00	-
4.3.	Reinstalación de panel LED cuadrado de dimensiones 60x60 cm luz neutra 4000K preexistentes. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	0,00	96.211,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.211,00	-
4.4.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	0,00	210.033,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.033,00	-
4.5.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia de aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	0,00	195.508,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195.508,00	-
5.1.	Suministro e instalación de Puerta en madecor entamborada de 0,90 m de ancho por 2,20 m de alto, incluye marcos, chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	0,00	997.838,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	997.838,00	-
6.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores blancos. A todo costo, incluye lineales.	m2	48,88	34.883,00	1.705.081,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,88	1.705.081,04	-	-	-	-	48,88	1.705.081,04	-	34.883,00	-
	BOLSA DE ITEMS NO PREVISTOS (10%)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO BOLSA NP´s				943.853.641,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	943.853.641,20
	TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS - NPs				1.630.484.058,98	-	-	-	55.478.187,73	-	72.690.956,01	-	77.334.078,42	-	533.202.754,58	-	21.518.455,10	-	151.764.192,75	-	287.422.320,00	-	91.562.285,32	-	1.290.973.227,81	-	339.510.831,86
NP-01	Demolición placa maciza 0.15 mt en horarios autorizado por la entidad (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	m2	865,31	49.331,00	42.686.681,61	-	-	46,23	2.280.646,13	-	-	769,13	37.941.952,03	21,55	1.063.083,05	-	-	28,40	1.401.000,40	-	-	-	-	865,31	42.686.681,61	-	49.331,00	-
NP-02	Suministro e instalación de mortero premezclado de nivelación bombeable, acelerado a 7 dias con baja permeabilidad para zona de cubiertas, garantizando pendientes de desagues hacia los sifones.	m2	137,79	104.277,00	14.368.567,87	-	-	137,79	14.368.567,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,79	14.368.567,87	-	104.277,00	-
NP-03	Demolición baldosa muro en horarios autorizados por la ENTIDAD (incluye retiro de material desde frente de obra al sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	m2	397,76	27.952,00	11.118.209,88	-	-	140,63	3.930.912,12	-	-	12,99	363.096,48	-	-	-	-	52,92	1.479.219,84	18,45	515.714,40	-	-	224,99	6.288.942,84	172,77	27.952,00	4.829.267,04
NP-04	Baldosa ceramica pared 30x60.	m2	325,69	142.571,00	46.433.720,88	-	-	31,15	4.441.713,96	73,76	10.516.607,24	42,12	6.005.090,52	-	-	-	-	74,61	10.637.222,31	-	-	96,04	13.692.518,84	317,69	45.293.152,88	8,00	142.571,00	1.140.568,00
NP-05	Baldosa ceramica piso 60x60.	m2	140,93	154.546,00	21.780.167,78	-	-	-	-	-	-	77,86	12.032.951,56	-	-	-	-	25,94	4.008.923,24	-	-	37,13	5.738.292,98	140,93	21.780.167,78	-	154.546,00	-
NP-06	Suministro e instalación de cinta led en parte baja de gabinete superior de mueble de cocina.	und	1,00	260.334,00	260.334,00	-	-	1,00	260.334,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	260.334,00	-	260.334,00	-
NP-07	Desmonte y reinstalacion de millas de extraccion aire en cocina presidencia.	und	3,00	45.000,00	135.000,00	-	-	3,00	135.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	135.000,00	-	45.000,00	-
NP-08	Desmonte redes eléctricas existentes, Incluye la disposición final fondo Nacional del Ahorro indique. (Zona de recepcion).	und	1,00	930.686,00	930.686,00	-	-	-	-	1,00	930.686,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	930.686,00	-	930.686,00	-
NP-09	Demolición de guardascoba, (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	ml	193,05	14.785,00	2.854.244,25	-	-	120,00	1.774.200,00	-	-	22,13	327.192,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142,13	2.101.392,05	50,92	14.785,00	752.852,20
NP-10	Desmonte espejo.	und	9,00	23.790,00	214.110,00	-	-	4,00	95.160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	118.950,00	-	-	-	-	9,00	214.110,00	-	23.790,00	-
NP-11	Desmonte de cubierta en policarbonato.	m2	39,52	52.335,00	2.068.279,20	-	-	29,92	1.565.863,20	-	-	-	-	-	-	-	-	9,60	502.416,00	-	-	-	-	39,52	2.068.279,20	-	52.335,00	-
NP-12	Suministro e instalación de Policarbonato alveolar 8 mm para cubierta curva, incluye conectores y accesorios para su correcta instalación. No incluye estructura de soporte.	m2	35,77	443.800,00	15.874.726,00	-	-	25,00	11.093.002,90	-	-	-	-	-	-	-	-	10,77	4.779.726,00	-	-	-	-	35,77	15.872.728,90	0,00	443.800,00	1.997,10
NP-13	Mantenimiento marquesina cubierta de vidrio acceso, incluye: Revisión general, limpieza perimetral y limpieza de vidrios.	m2	17,45	58.150,00	1.014.746,58	-	-	-	-	17,45	1.014.746,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,45	1.014.746,58	-	58.150,00	-
NP-14	Lavado e hidrofugado de fachadas, muros en piedra y/o acabado abuzardado	m2	220,30	51.032,00	11.242.349,60	-	-	216,78	11.062.716,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216,78	11.062.716,96	3,52	51.032,00	179.632,64
NP-15	Suministro e instalacion de revestimiento interior de fachada en WPC Panel Casimo, de acuerdo a muestra seleccionada.	m2	88,28	249.987,00	22.069.102,36	-	-	13,18	3.294.578,67	20,52	5.130.233,21	5,08	1.269.933,96	-	-	-	-	-	-	-	-	49,50	12.374.356,50	88,28	22.069.102,35	-	249.987,00	-
NP-16	Desmonte de aparatos sanitarios (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio (hasta 50 m) y desde sitio de acopio a escombrera).	und	61,00	40.607,00	2.477.027,00	-	-	25,00	1.015.175,00	-	-	-	-	-	-	13,00	527.891,00	-	-	-	-	-	-	38,00	1.543.066,00	23,00	40.607,00	933.961,00
NP-17	Desmonte de muro fachada imitacion madera (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acceso a escombrera).	m2	9,92	16.161,00	160.317,12	-	-	9,92	160.317,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,92	160.317,12	-	16.161,00	-
NP-18	Suministro e instalación de sensor de presencia Inframojo 360° de cobertura, montaje en techo, detección de movimiento hasta 4 metros radiales a una altura de instalación de 2.4 metros.	und	39,00	210.035,00	8.191.365,00	-	-	-	-	-	-	5,00	1.050.175,00	-	-	-	-	-	-	-	-	32,00	6.721.120,00	37,00	7.771.295,00	2,00	210.035,00	420.070,00
NP-19	Suministro e instalación de encenes mobiles de inferior 220 X 90 X 63 y superior de 200X76X35 incluye campana extractora, puertas, manijas en acero tabular, bisagras de parche, entrepaños, patas de 8 cm y manija en acero tubular. Modulo torre hornos de 200 X 60 X 60 con dos puertas parte alta y dos cajones parte baja central para horno. Tapa barra de 130 x 50 con patas en acero de 100 cm y anclaje a la pared. Todo elaborado en melamina de 15mm, color arena o glacial fabricado e instalado.	UND	2,00	12.900.000,00	25.800.000,00	-	-	-	-	1,00	12.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	12.900.000,00	2,00	25.800.000,00	-	12.900.000,00	-
NP-20	Mesón en quartzone blanco polar con hueco para estufa y lavaplatos, incluye pulida, poceta, salpicadero 8 cm y estufa x 4 puestos challenger para uso con gas propano.	UND	1,00	6.850.000,00	6.850.000,00	-	-	-	-	1,00	6.850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	6.850.000,00	-	6.850.000,00	-

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 9

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 07			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		CORTE 07		CORTE 08		CORTE 09		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
NP-21	Suministro e instalación punto de gas propano para estufa de presidencia, en tuberia pe al pe de 1/2" , con coraza de protección a la vista y accesorios de conexión con pases por muros. incluye suministro de 2 cilindros de 100 libras en gas propano, con valvula reguladora para cada cilindro, base (poyo) soporte para cilindros y caja metalica de protección de cilindros para la intemperie.	GLB	1,00	6.155.883,00	6.155.883,00		-		-	1,00	6.155.883,00	-	-	-	-		-		-		-		1,00	6.155.883,00	-	6.155.883,00	-
NP-22	Suministro e instalacion registro 1/2" agua potable	UND	3,00	89.688,00	269.064,00		-		-	2,00	179.376,00	1,00	89.688,00	-	-		-		-		-		3,00	269.064,00	-	89.688,00	-
NP-23	Jardineras artificiales de acuerdo a render incluye amarre plastico	ml	49,76	141.213,00	7.026.758,88		-		-	15,06	2.126.667,78	5,40	762.550,20	-	-		-		-		-		20,46	2.889.217,98	29,30	141.213,00	4.137.540,90
NP-24	Suministro e instalacion de extractor para cocina y baños (16 x 16 x 9 cm)	UND	9,00	196.410,00	1.767.690,00		-		-		-	9,00	1.767.690,00	-	-		-		-		-		9,00	1.767.690,00	-	196.410,00	-
NP-25	Demolicion de meson en grano de marmol de ventanilla bancolombia	UND	1,00	89.351,00	89.351,00		-		-	1,00	89.351,00	-	-	-	-		-		-		-		1,00	89.351,00	-	89.351,00	-
NP-26	Desmonte de aviso de fachada en recepción	UND	1,00	283.054,00	283.054,00		-		-	1,00	283.054,00	-	-	-	-		-		-		-		1,00	283.054,00	-	283.054,00	-
NP-27	Suministro e instalación de sanitario blanco institucional tipo adriatica o similar de entrada posterior no incluye puoch	UND	19,00	1.146.999,00	21.792.981,00		-		-	11,00	12.616.989,00	-	-	-	-		-		-		2,00	2.293.998,00	13,00	14.910.987,00	6,00	1.146.999,00	6.881.994,00
NP-28	Suministro e instalación lavamanos blanco tipo cascada de baru o similar, no incluye griferia no incluye push	UND	22,00	613.653,00	13.500.366,00		-		-	9,00	5.522.877,00	-	-	-	-		-		-		12,00	7.363.836,00	21,00	12.886.713,00	1,00	613.653,00	613.653,00
NP-29	Suministro e instalacion de carpa en lona para control de acceso en zona de recepcion	UND	1,00	3.605.351,00	3.605.351,00		-		-	1,00	3.605.351,00	-	-	-	-		-		-		-		1,00	3.605.351,00	-	3.605.351,00	-
NP-30	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	32,00	121.212,00	3.878.784,00		-		-	3,00	363.636,00	13,00	1.575.756,00	-	-		-		-	16,00	1.939.392,00		-	32,00	3.878.784,00	-	121.212,00	-
NP-31	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UND	20,00	163.414,00	3.268.280,00		-		-	1,00	163.414,00	10,00	1.634.140,00	-	-		-		-	9,00	1.470.726,00		-	20,00	3.268.280,00	-	163.414,00	-
NP-32	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	31,00	109.459,00	3.393.229,00		-		-	2,00	218.918,00	12,00	1.313.508,00	-	-		-		-	10,00	1.094.590,00		-	24,00	2.627.016,00	7,00	109.459,00	766.213,00
NP-33	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	8,00	129.358,00	1.034.864,00		-		-		-	-	-	-	-		-		-		-		-	-	8,00	129.358,00	1.034.864,00
NP-34	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	64,00	148.922,00	9.504.128,00		-		-	10,00	1.485.020,00	-	-	-	-	48,00	7.128.096,00		-		-		58,00	8.613.116,00	6,00	148.922,00	891.012,00
NP-35	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UND	9,00	109.645,00	986.805,00		-		-	4,00	438.580,00	-	-	-	-		-		-		-		4,00	438.580,00	5,00	109.645,00	548.225,00
NP-36	RED SANITARIA PVC-S 4"	ml	212,13	74.903,00	15.889.173,39		-		-	17,80	1.333.273,40	-	-	-	-	174,08	13.039.114,24		-	20,25	1.516.785,75		-	212,13	15.889.173,39	-	74.903,00	-
NP-37	RED SANITARIA PVC-S 3"	ml	20,71	61.047,00	1.264.263,37		-		-		-	-	-	-	-		-		-	20,71	1.264.263,37		-	20,71	1.264.263,37	-	61.047,00	-
NP-38	RED SANITARIA PVC-S 2"	ml	9,70	49.310,00	478.307,00		-		-		-	-	-	-	-		-		-		-		-	-	9,70	49.310,00	478.307,00
NP-39	RED SANITARIA PVC-VENTILACION 2"	ml	60,00	31.024,00	1.861.440,00		-		-	24,70	766.292,80	-	-	-	-		-		-	35,30	1.095.147,20		-	60,00	1.861.440,00	-	31.024,00	-
NP-40	Red suministro 1 1/4"	ml	90,00	36.089,00	3.248.010,00		-		-		-	-	-	-	-		-		-		-		-	-	90,00	36.089,00	3.248.010,00
NP-41	Red suministro 1"	ml	39,92	27.219,00	1.086.582,48		-		-		-	-	-	-	-		-		-		-		-	-	39,92	27.219,00	1.086.582,48
NP-42	Red suministro 3/4"	ml	9,11	20.862,00	190.052,82		-		-		-	-	-	-	-		-		-		-		-	-	9,11	20.862,00	190.052,82
NP-43	Red suministro 1/2"	ml	27,38	18.245,00	499.548,10		-		-		-	-	-	-	-		-		-		-		-	-	27,38	18.245,00	499.548,10
NP-44	Registro PVC-P 1 - 1/4"	UND	9,00	145.520,00	1.309.680,00		-		-		-	8,00	1.164.160,00	-	-		-		-		-		-	8,00	1.164.160,00	1,00	145.520,00	145.520,00
NP-45	Registro PVC-P 1"	UND	6,00	111.417,00	668.502,00		-		-		-	-	-	-	-		-		-		-		-	-	6,00	111.417,00	668.502,00
NP-46	Trasiego incluye tratalado a sitio de acopio en bolsas de aproximadamente 25 kilos	m3	75,95	52.788,00	4.009.248,60		-		-		-	-	-	-	-		-		-		-	75,95	4.009.248,60	75,95	4.009.248,60	-	52.788,00	-
NP-47	Construccion de Media caña en mortero 1:3	ml	296,37	47.206,00	13.990.442,22		-		-		-	-	-	-	-		-		-	296,37	13.990.442,22		-	296,37	13.990.442,22	-	47.206,00	-
NP-48	Suministro e instalación orinal tipo gotta o similar de entrada posterior no incluye grigeria ni incluye puoch	un	4,00	1.037.619,00	4.150.476,00		-		-		-	4,00	4.150.476,00	-	-		-		-		-		4,00	4.150.476,00	-	1.037.619,00	-
NP-49	Desmonte de cubierta en lamina de zinc en cubierta de convenciones incluye estructura metalica de soporte, incluye retiro a sitio de acopio y disposición final.	m2	100,42	58.611,00	5.885.716,62		-		-		-	100,42	5.885.716,62	-	-		-		-		-		100,42	5.885.716,62	-	58.611,00	-
NP-50	Desmonte de ductos de aire acondicionado (incluye fibra de vidrio, transporte y disposición final)	ml	285,91	49.313,00	14.099.079,83		-		-		-	-	-	-	-		-		-	273,82	13.502.885,66	12,09	596.194,17	285,91	14.099.079,83	-	49.313,00	-
NP-51	Desmonte de ductos de red contraincendio en tuberia CPVC de varios diametros incluye soporteria. (Incluye trasiego y disposición final)	ml	275,58	17.183,00	4.735.291,14		-		-		-	-	-	-	-		-		-	275,58	4.735.291,14		-	275,58	4.735.291,14	-	17.183,00	-
NP-52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Impermeabilización de placa poliurea pura RESISTENTE A RAYOS UV DAMOCOAT 250 incluye suministro y aplicación de POLIUREA en 60 MILS +-10%, ESPESOR TEXTURIZADA PREVIA IMPRIMACION EPOXICA BICOMPONENTE CON ARENA DE QUARZO EN UNA CAPA (si se requieren más se cobrarán por aparte), INCLUYE REACTOR GRACO, MATERIALES Y EQUIPOS CERTIFICADOS, PREVIO tratamiento de fisuras existentes. Acabado original gris cambia por rayos UV. Suministro y aplicación esmalte uretano gris o blanco resistente a Rayos UV color homogéneo como protección del sistema Poliurea.	M2	994,57	225.935,00	224.708.172,95		-		-		-		-	994,57	224.708.172,95		-		-		-		994,57	224.708.172,95	-	225.935,00	-
NP-53	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRATO DE MORTERO SECO CON BAJO CONTENIDO DE AGUA PARA NIVELACION DE CUBIERTAS CON ESPESORES PROMEDIO DE 8cm, SOBRE SUPERFICIE IRREGULAR RESULTADO DE DEMOLICION DE ELEMENTOS NO DESMONTADOS Y RETIRADOS EN LAS AREAS A INTERVENIR zona de cubiertas, grantizando pendientes de desagues hacia los sifones. INCLUYE TRASIEGO DE MATERIALES A SITIOS DE FUNDIDAS	M2	768,71	138.890,00	106.766.131,90		-		-		-		-	768,71	106.766.131,90		-		-		-		768,71	106.766.131,90	-	138.890,00	-
NP-54	Demolicion de dados de concreto de 0.3 x 0.3 x 0.25 m, los cuales se encuentran en zona de cubierta incluye trasiego y disposición final.	Und	80,00	57.437,00	4.594.960,00		-		-		-		-	80,00	4.594.960,00		-		-		-		80,00	4.594.960,00	-	57.437,00	-
NP-55	Desmonte de ducto de extrator incluye retiro 2 extractores tipo hongo incluye retiro y disposición final.	Und	3,00	223.054,00	669.162,00		-		-		-		-	-	-		-		-	3,00	669.162,00		-	3,00	669.162,00	-	223.054,00	-
NP-56	Desmonte de bandeja bandeja tipo escalera incluye cableado estructurado, cableado normal, cableado regulado y voz y datos correspondiente a alimentacion de puestos de trabajo existentes (incluye clasificación y entrega a la Entidad)	ml	206,61	50.217,00	10.375.334,37		-		-		-		-	-	-		-		-	206,61	10.375.334,37		-	206,61	10.375.334,37	-	50.217,00	-
NP-57	Suministro e instalación de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado de 30 x 10 x 1 m galvanizada con separador incluye curvas, soporteria y conductor de tierra para bandeja.	ml	285,62	151.533,00	43.280.855,46		-		-		-		-	251,62	38.128.733,46		-		-		-		251,62	38.128.733,46	34,00	151.533,00	5.152.122,00
NP-58	Suministro e instalación de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado de 15 x 10 x 1 m galvanizada, incluye curvas, soporteria y conductor de tierra para bandeja.	ml	284,62	129.520,00	36.863.982,40		-		-		-		-	88,42	11.452.158,40		-		-		-		88,42	11.452.158,40	196,20	129.520,00	25.411.824,00
NP-59	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 " SEGÚN DISEÑO DESARROLLO DE HASTA 1m	Und	129,04	165.000,00	21.291.600,00		-		-		-		-	129,04	21.291.600,00		-		-		-		129,04	21.291.600,00	-	165.000,00	-
NP-60	Punto hidraulico para rociador automatico de 1/2"	Und	75,00	114.984,00	8.623.800,00		-		-		-		-	75,00	8.623.800,00		-		-		-		75,00	8.623.800,00	-	114.984,00	-
NP-61	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	Und	75,00	63.827,00	4.787.025,00		-		-		-		-	75,00	4.787.025,00		-		-		-		75,00	4.787.025,00	-	63.827,00	-
NP-62	Suministro e instalacion TEE MECANICA RANURADA DE 3" X 1 1/2"	Und	17,00	60.791,00	1.033.447,00		-		-		-		-	17,00	1.033.447,00		-		-		-		17,00	1.033.447,00	-	60.791,00	-
NP-63	Suministro e instalacion STRAP DE 3" X 1"	Und	30,00	52.687,00	1.580.610,00		-		-		-		-	30,00	1.580.610,00		-		-		-		30,00	1.580.610,00	-	52.687,00	-
NP-64	Suministro e instalación de soporte tipo pera con varilla 3/8" con perno bean clamb para tuberia 1"	Und	76,00	33.022,00	2.509.672,00		-		-		-		-	76,00	2.509.672,00		-		-		-		76,00	2.509.672,00	-	33.022,00	-
NP-65	Suministro e instalación de soporte tipo pera con varilla 3/8" con perno bean clamb para tuberia 1-1/2"	Und	26,00	31.784,00	826.384,00		-		-		-		-	26,00	826.384,00		-		-		-		26,00	826.384,00	-	31.784,00	-
NP-66	Suministro e instalación de soporte tipo pera con varilla 3/8" con perno bean clamb para tuberia 3"	Und	95,00	33.033,00	3.138.135,00		-		-		-		-	95,00	3.138.135,00		-		-		-		95,00	3.138.135,00	-	33.033,00	-
NP-67	Suministro e instalación de soporte transversal sismoresitente para tuberia 3"	Und	16,00	234.807,00	3.756.912,00		-		-		-		-	16,00	3.756.912,00		-		-		-		16,00	3.756.912,00	-	234.807,00	-
NP-68	Suministro e instalación de soporte LONGITUDINAL sismoresitente para tuberia 3"	Und	20,00	202.663,00	4.053.260,00		-		-		-		-	20,00	4.053.260,00		-		-		-		20,00	4.053.260,00	-	202.663,00	-
NP-69	SOPORTE ANTISISMICO 4 VIAS	Und	6,00	389.851,00	2.339.106,00		-		-		-		-	6,00	2.339.106,00		-		-		-		6,00	2.339.106,00	-	389.851,00	-
NP-70	TUBERIA ACC ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y PINTURA)	ml	146,61	66.346,00	9.726.987,06		-		-		-		-	134,20	8.903.633,20	12,41	823.353,86		-		-		146,61	9.726.987,06	-	66.346,00	-
NP-71	Tuberia de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diametro 1-1/2", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	ml	28,55	100.995,00	2.883.407,25		-		-		-		-	28,55	2.883.407,25		-		-		-		28,55	2.883.407,25	-	100.995,00	-
NP-72	Tuberia de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diametro 3", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	ml	192,71	224.347,00	43.233.910,37		-		-		-		-	192,71	43.233.910,37		-		-		-		192,71	43.233.910,37	-	224.347,00	-
NP-73	Suministro e instalacion codo ranurado acero al Carbono ASTM-A53 SCH 40 diametro 3", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	Und	9,00	98.325,00	884.925,00		-		-		-		-	9,00	884.925,00		-		-		-		9,00	884.925,00	-	98.325,00	-
NP-74	Suministro e instalacion TEE ranurado acero al Carbono ASTM-A53 SCH 40 diametro 3", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	Und	8,00	144.525,00	1.156.200,00		-		-		-		-	8,00	1.156.200,00		-		-		-		8,00	1.156.200,00	-	144.525,00	-
NP-75	Suministro e instalación de estación de control para red contra incendios	Und	1,00	3.271.755,00	3.271.755,00		-		-		-		-	1,00	3.271.755,00		-		-		-		1,00	3.271.755,00	-	3.271.755,00	-
NP-76	Suministro e instalación de Gabinete Tipo 3 para red contra incendios	Und	1,00	2.442.914,00	2.442.914,00		-		-		-		-	1,00	2.442.914,00		-		-		-		1,00	2.442.914,00	-	2.442.914,00	-
NP-77	Suministro e instalación de ventosa automática para red contra incendios	Und	2,00	707.363,00	1.414.726,00		-		-		-		-	2,00	1.414.726,00		-		-		-		2,00	1.414.726,00	-	707.363,00	-
NP-78	Suministro e Instalacion AVISO 1 - INGRESO DE FUNCIONARIOS: Suministro e instalación de aviso tipo caja de luz, 15 cm de cantonera, logo en relieve acrílico, cantonera de 4 cm - iluminación LED - Textos en acrílico 4m sobre puestas con interruptor encendido y apagado. (2m*60cm)	Und	1,00	10.729.783,00	10.729.783,00		-		-		-		-	1,00	10.729.783,00		-		-		-		1,00	10.729.783,00	-	10.729.783,00	-

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 9

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 07			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		CORTE 07		CORTE 08		CORTE 09		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (+)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
NP-79	Suministro e Instalacion AVISO 2 INTERNO - AVISO TEXTO - JUNTOS HACEMOS REALIDAD EL HOGAR DE LOS COLOMBIANOS - Suministro e instalación de aviso en acrilico 3mm letra a letra volumentrico - cantonera de 5 cm - .(3,2m*.40cm)	Und	1,00	8.652.770,00	8.652.770,00		-	-	-	-	-	-	-	1,00	8.652.770,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	8.652.770,00	-	8.652.770,00	-
NP-80	Suministro e Instalacion AVISO 3 - LOGO INTERNO FNA - Suministro e instalación de aviso en acrilico 3mm letra a letra volumentrico - cantonera de 5 cm - (80cm*90cm)	Und	1,00	4.130.770,00	4.130.770,00		-	-	-	-	-	-	-	1,00	4.130.770,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	4.130.770,00	-	4.130.770,00	-
NP-81	Suministro e Instalacion AVISO 4 - LOGO INTERNO FNA - Suministro e instalación de aviso en acrilico 3mm letra a letra Volumentrico - cantonera de 5 cm - (120cm*120cm)	Und	1,00	4.844.770,00	4.844.770,00		-	-	-	-	-	-	-	1,00	4.844.770,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	4.844.770,00	-	4.844.770,00	-
NP-82	Suministro e instalación de señales en acrilico cal 3m + impresión digital full color - corte laser + instalación -(Opciones: hale, empuje, rack, baños mixtos, Ref Entrada FNA (11cm*29 cm))	Und	14,00	116.946,00	1.637.244,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,00	1.637.244,00	-	14,00	1.637.244,00	-	116.946,00	-
NP-83	Pañete impermeabilizado con mortero 1:3 y sika 1 o similar (no incluye lineales)	M2	407,54	42.254,00	17.220.195,16		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,00	16.056.520,00		-	-	380,00	16.056.520,00	27,54	42.254,00	1.163.675,16
NP-84	Pañete impermeabilizado con mortero 1:3 y sika 1 o similar	ML	306,61	23.802,00	7.297.931,22		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306,61	7.297.931,22		-	-	306,61	7.297.931,22	-	23.802,00	-
NP-85	Placa contrapiso de 10 cm de espesor, en concreto de 2500 PSI, No ncluye acero de refuerzo	m2	30,63	78.487,00	2.404.056,81		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,63	1.619.186,81		-	-	20,63	1.619.186,81	10,00	78.487,00	784.870,00
NP-86	Mamposteria en bloque de arcilla no. 4 (no incluye lineales)	M2	47,94	64.001,00	3.068.207,94		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,94	3.068.207,94		-	-	47,94	3.068.207,94	-	64.001,00	-
NP-87	Mamposteria en bloque de arcilla no. 4 ancho max <0.70cm	ML	47,41	47.115,00	2.233.722,15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,41	2.233.722,15		-	-	47,41	2.233.722,15	-	47.115,00	-
NP-88	Anclaje 1/2" L=50 cm	Und	262,00	26.778,00	7.015.836,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262,00	7.015.836,00		-	-	262,00	7.015.836,00	-	26.778,00	-
NP-89	Viga de amarre de 0,12 x 0,20 NO incluye acero de refuerzo, alambre negro, incluye fomaleta y concreto de 2500 psi.	ML	103,27	63.817,00	6.590.381,59		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	6.381.700,00		-	-	100,00	6.381.700,00	3,27	63.817,00	208.681,59
NP-90	Columneta de confinamiento (0,12*0,20) NO incluye acero de refuerzo, alambre negro, INCLUYE fomaleta y concreto de 2500 psi.	ML	44,22	54.823,00	2.424.273,06		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,22	2.424.273,06		-	-	44,22	2.424.273,06	-	54.823,00	-
NP-91	Suministro e Instalacion de soporte para tuberia de 1/2" a 4" para tuberias hidrosanitarias	Und	106,00	27.237,00	2.887.122,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,00	2.887.122,00		-	-	106,00	2.887.122,00	-	27.237,00	-
NP-92	Dovela en concreto tipo gruting de 3000 psi NO incluye acero de refuerzo	ML	70,08	8.375,00	586.920,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,08	586.920,00		-	-	70,08	586.920,00	-	8.375,00	-
NP-93	Construccion de Placa de entrepiso de 2.5 m x 2.5 m, con lámina colaborante 2", cal 22, h=10cm de acuerdo a detalle expresado en justificacion, incluye acero de refuerzo, concreto de 3000 psi y lamina colaborante (Incluye Cerramiento de proteccion en tercer piso, trasciego de insumos por 4 pisos en sentido vertical y 50 m en sentido horizontal)	UND	2,00	2.496.403,00	4.992.806,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	4.992.806,00		-	-	2,00	4.992.806,00	-	2.496.403,00	-
NP-94	Demolición de muro en mampostería en bloque de arcilla de 15 cm (incluye trasciego de materiales desde unas disistancias superiores a 50 ml y niveles superiores a un piso a punto de acopio de acuerdo a horarios establecidos por entidad)	M2	60,65	28.701,00	1.740.715,65		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,65	1.740.715,65		-	-	60,65	1.740.715,65	-	28.701,00	-
NP-95	Desmonte de ductos de extracción de aire desde terraza hasta nivel de piso cuarto piso (Cerramiento preventivo en 3 piso, ductos de 1,60*0,90. Incluye trasiego desde cubierta ubicada a cinco pisos y disposición final).	ML	19,50	210.361,00	4.102.039,50		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,50	4.102.039,50		-	-	19,50	4.102.039,50	-	210.361,00	-
NP-96	Suministro e instalacion de gravilla lavada para transiciones entre enchapes y / o pisos laminados o urbanismo (ancho promedio 15 cm)	ML	63,70	72.837,00	4.639.716,90		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,70	4.639.716,90		-	-	63,70	4.639.716,90	-	72.837,00	-
NP-97	Desmonte de antena existente (incluye trasiego y disposición)	Und	1,00	2.558.429,00	2.558.429,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.558.429,00		-	-	1,00	2.558.429,00	-	2.558.429,00	-
NP-98	Mamposteria en bloque de arcilla estructural No. 4 de perforacion vertical (no incluye lineales, ni elementos no estructurales)	M2	42,35	70.975,00	3.005.791,25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,35	3.005.791,25		-	-	42,35	3.005.791,25	-	70.975,00	-
NP-99	Mamposteria en bloque de arcilla estructural No. 4 de perforacion vertical, ancho max <0.60 cm (No incluye elementos no estructurales)	ML	12,43	51.514,00	640.319,02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,43	640.319,02		-	-	12,43	640.319,02	-	51.514,00	-
NP-100	Suministro e instalacion de lineal en super board contra la ventaneria existente	Ml	235,10	93.616,00	22.009.121,60		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	157,81	14.773.540,96	157,81	14.773.540,96	77,29	93.616,00	7.235.580,64
NP-101	Suministro e instalacion de Marco para luminaria led de 60 x 60 para cielo raso en Dry Wall	UND	153,00	77.136,00	11.801.808,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	11.570.400,00	-	-	150,00	11.570.400,00	3,00	77.136,00	231.408,00
NP-102	Suministro e instalacion de Espejo en 4mm con bordes pulidos,brillados y flotado con tubular en aluminio con luz led calida de 120 v	M2	22,67	550.099,00	12.470.744,33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,37	6.804.724,63		-	-	12,37	6.804.724,63	10,30	550.099,00	5.666.019,70
NP-103	Suministro e instalación de platina 150x150x6 mm con tornillo pasante de 1/2" L=0,40m, 6 tuercas y arandelas para instalación de estructura metalica de los micro ondas	UND	14,00	132.577,00	1.856.078,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	1.590.924,00	-	-	12,00	1.590.924,00	2,00	132.577,00	265.154,00
NP-104	Suministro e instalacion de luminaria led de 60 x 60 de 4000 k NO INCLUYE marco para luminaria de 60 x 60 para cielo raso en Dry Wall	UND	110,00	171.691,00	18.886.010,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,00	18.886.010,00	-	-	110,00	18.886.010,00	-	171.691,00	-
NP-105	Desmonte de puerta de vidrio laminado 5+5 MM, trasiego a punto de acopio y disposicion final a botadero certificado, suministro e instalacion de puerta en vidrio templado laminado 5 + 5 MM, con película tipo bronce, incluye reinstalacion de postes de giro e instalacion de topes de piso, adecuación a los herrajes existentes (Incluye el transporte e instalación en horario nocturno).	M2	3,75	1.715.072,00	6.431.520,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,75	6.431.520,00		-	-	3,75	6.431.520,00	-	1.715.072,00	-
NP-106	Ajuste de puertas de acceso en vidrio templado incluye cambio de montante y cambio de bisagras hidraulicas	M2	10,83	1.343.902,00	14.554.458,66		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,83	14.554.458,66		-	-	10,83	14.554.458,66	-	1.343.902,00	-
NP-107	Suministro e instalacion de Tapa registro en acero inoxidable de 30 x 30 cm incluye mortero de caja, estuco y pintura	Und	13,00	290.521,00	3.776.773,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00	3.776.773,00		-	-	13,00	3.776.773,00	-	290.521,00	-
NP-108	Suministro de mesón para cubierta de lavamanos con perforaciones para poceta de sobre poner en Quarzstone Blanco Polar de 0.80 x0.55 mt, con baberos de 30 cms a los costados, salpicadero de 80 cms x 8 cms y frente con reengruese de 5 cms y tapa frontal en sinterizado color madera, instalación con pie de amigo. (Recepción)	Und	1,00	1.876.500,00	1.876.500,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.876.500,00		-	-	1,00	1.876.500,00	-	1.876.500,00	-
NP-109	Suministro e instalacion de mesón para lavamanos con perforaciones para poceta de sobre poner en Quarzstone Blanco Polar de 55 cm de ancho con baberos laterales y frontal de 30 cms con su respectivo salpicadero en escuadra de 8 cms, fijado con pie de amigo.	ml	28,58	1.359.000,00	38.840.220,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,58	15.737.220,00		-	-	11,58	15.737.220,00	17,00	1.359.000,00	23.103.000,00
NP-110	Suministro de caseta para puesto de vigilancia temporal en zona de acceso vehicular y rehubicable en cualquier sector que disponga la entidad, en estructura metalica calibre 18 con pintura esmalte negra.	UND	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3.000.000,00		-	-	1,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
NP-111	Suministro e instalación de sanitario SMART AL SINGLE BLANCO o similar	UND	1,00	714.259,00	714.259,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	714.259,00		-	-	1,00	714.259,00	-	714.259,00	-
NP-112	Construccion de cajas de inspeccion sanitarias DE 80 X 80, incluye marco y tapa	UND	1,00	721.565,00	721.565,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	721.565,00		-	-	1,00	721.565,00	-	721.565,00	-
NP-113	Suministro, corte, doblado e instalación acero figurado 60000 PSI	Kg	557,08	7.899,00	4.400.374,92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	1.974.750,00	-	-	250,00	1.974.750,00	307,08	7.899,00	2.425.624,92
NP-114	Suministro e instalación de pirlan en aluminio de 5.5 cm de ancho fijado con chazo puntilla	Ml	30,00	53.466,00	1.603.980,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,98	1.121.716,68	-	-	20,98	1.121.716,68	9,02	53.466,00	482.263,32
NP-115	Suministro e instalacion dilatación dry wall en Z	ML	578,07	19.049,00	11.011.655,43		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208,33	3.968.478,17	325,21	6.194.925,29	-	-	533,54	10.163.403,46	44,53	19.049,00	848.251,97
NP-116	Refuerzo filos y dilataciones en muros y columnas	ML	722,55	16.823,00	12.155.458,65		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,56	3.861.887,88	492,99	8.293.570,77	722,55	12.155.458,65	-	16.823,00	-
NP-117	Resanes y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre pañete o repello liso. A todo costo.	ML	1000,00	23.356,00	23.356.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1.000,00	23.356,00	23.356.000,00

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 9

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 07			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		CORTE 07		CORTE 08		CORTE 09		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
NP-118	Presurización de la RCI mediante cargue de la red, para evaluación de la resistencia de las tuberías, uniones, válvulas y accesorios frente a presiones superiores a las de operación normal, según normas como NFPA 24 y NFPA 13 o ASME B31.1, bajo pruebas hidrostáticas a no menos de 200 psi (13.8 bar)	M2	980,00	4.166,00	4.082.680,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980,00	4.166,00	4.082.680,00
NP-119	Desmonte de redes eléctricas existentes. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	M2	300,00	14.421,00	4.326.300,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	14.421,00	4.326.300,00
NP-120	DESMONTE DE PUERTAS EN MADERA. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	Und	18,00	31.864,00	573.552,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	477.960,00	-	-	15,00	477.960,00	3,00	31.864,00	95.592,00
NP-121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PARA INTERIORES CON ANCHO MAYOR A 0,60 M	M2	621,29	22.348,00	13.884.588,92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524,21	11.715.045,08	-	-	524,21	11.715.045,08	97,08	22.348,00	2.169.543,84
NP-122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PARA INTERIORES CON ANCHO MENOR A 0,60 M (ml)	ML	766,93	13.760,00	10.552.956,80		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704,01	9.687.177,60	-	-	704,01	9.687.177,60	62,92	13.760,00	865.779,20
NP-123	Suministro e instalacion de acometida electrica en: tubo emt 2 de 3" y cable 2(3#350+1#500+1#2T cu)desde tablero ppal casino 1er piso a cuarto tecnico 4° piso.	ML	102,59	2.532.624,00	259.811.979,11		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,23	109.485.335,52	-	-	43,23	109.485.335,52	59,36	2.532.624,00	150.326.643,59
NP-124	Suministro e instalacion de tablero electico para cuarto tecnico 4° piso de acuerdo a diagrama unifiliar y cargas requeridas	Und	-	31.130.536,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	31.130.536,00	-
NP-125	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS Y/O PISOS, ANCHO <= 10CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	Ml	58,11	30.462,00	1.770.146,82		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,11	1.770.146,82	-	-	58,11	1.770.146,82	-	30.462,00	-
NP-126	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA METÁLICA CUADRADA DE 3X2" CON SOSCO	Und	12,00	46.795,00	561.540,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	561.540,00	-	-	12,00	561.540,00	-	46.795,00	-
NP-127	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATES DE ESQUINA PARA ENCHAPES EN WING EN ALUMINIO	ML	98,27	28.550,00	2.805.608,50		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	98,27	2.805.608,50	98,27	2.805.608,50	-	28.550,00	-
NP-128	DECAPADO, PULIDA Y SELLADO DE PISOS EN GRANO DE MARMOL	M2	-	83.737,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	83.737,00	-
NP-129	DECAPADO, PULIDA Y SELLADO DE PISOS EN GRANO DE MARMOL	ML	-	51.384,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	51.384,00	-
NP-130	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERÁMICA PARED CALIDAD PRIMERA, CON ANCHO < = A 0.60 ML (LINEAL)	Ml	124,55	87.589,00	10.909.209,95		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,55	10.909.209,95	-	-	124,55	10.909.209,95	-	87.589,00	-
NP-131	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METÁLICA TIPO CUPULA 4 X 3" SOSCO	Und	50,00	71.795,00	3.589.750,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	50,00	71.795,00	3.589.750,00
NP-132	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPÓXICA CON UN ANCHO MAYOR A 60CM (NO INCLUYE LINEALES)	M2	77,00	54.106,00	4.166.162,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	77,00	54.106,00	4.166.162,00
NP-133	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPÓXICA CON UN ANCHO MENOR A 60CM (LINEALES)	Ml	16,00	33.211,00	531.376,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	16,00	33.211,00	531.376,00
NP-134	SUMINISTRO EL INSTALACION DE ALISTADO PISOS 1:3, E= 0.04 ((INCLUYE TRASCIEGO DE INSUMOS A LOS DIFERENTES FRENTES DE OBRA	M2	120,00	45.403,00	5.448.360,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	120,00	45.403,00	5.448.360,00
NP-135	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO DE 18 CTS. 3F. 5H 225AMP. CON PUERTA Y CON TOTALIZADOR BASE GALVANIZADA TAPA BLANCA	Und	1,00	1.283.059,00	1.283.059,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.283.059,00	-	-	1,00	1.283.059,00	-	1.283.059,00	-
NP-136	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO DE 12 CTS. 3F. 5H 225AMP. CON PUERTA Y CON TOTALIZADOR BASE GALVANIZADA TAPA BLANCA	Und	2,00	894.089,00	1.788.178,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	894.089,00	-	-	1,00	894.089,00	1,00	894.089,00	894.089,00
NP-137	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PVC-P 1 1/2", INCLUYE UNIVERSALES	Und	6,00	167.925,00	1.007.550,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	6,00	167.925,00	1.007.550,00
NP-138	RED DE SUMINISTRO PVC-P 1 1/2"	Ml	24,16	46.404,00	1.121.120,64		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	24,16	46.404,00	1.121.120,64
NP-139	SUMINISTRO E INSTALACION DEREGISTRO PVC-P 3/4", INCLUYE UNIVERSALES	Und	6,00	72.291,00	433.746,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	6,00	72.291,00	433.746,00
NP-140	Suministro e instalación de cielorraso en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo de vinilo. A todo costo.	ML	-	79.032,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	79.032,00	-
NP-141	Suministro e instalación de muro en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo.	ML	-	58.732,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	58.732,00	-
NP-142	Suministro e instalación de puerta en madecor entamborada de 0,85 m de ancho por 2.20 m de alto, sistema corredizo Ducasse. incluye marcos, chapa tipo pico de loro con su respectiva cantonera, guia de corrediza, tapa de guia en madecory todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	Und	3,00	1.755.000,00	5.265.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	5.265.000,00	-	-	3,00	5.265.000,00	-	1.755.000,00	-
NP-143	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 30 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	UND	3,00	106.655,00	319.965,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	319.965,00	-	-	3,00	319.965,00	-	106.655,00	-
NP-144	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 18 w, luz neutra 4000K. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	UND	27,00	103.655,00	2.798.685,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,00	2.798.685,00	-	-	27,00	2.798.685,00	-	103.655,00	-
NP-145	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 9 w, luz neutra 4000K. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	UND	23,00	88.855,00	2.043.665,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,00	2.043.665,00	-	-	23,00	2.043.665,00	-	88.855,00	-
NP-146	Suministro e instalacion salida electrica para toma corriente doble normal GFCI Incluye: Tuberia sch-40 de 3/4"(max.6mts) + caja metalica + terminales + cable trenzado (LSZH) 3x12 + autodesforres + TOMA GFCI FUTURA.	UND	8,00	247.692,00	1.981.536,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	1.733.844,00	-	-	7,00	1.733.844,00	1,00	247.692,00	247.692,00
NP-147	Suministro e instalacion de salida para HDMI incluye: tuberia pvc sch-40 de 1-1/4 + caja 10x10 doble fondo con suplemento + caja 2400 + terminales. NO INCLUYE CABLE	UND	23,00	207.747,00	4.778.181,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	4.154.940,00	-	-	20,00	4.154.940,00	3,00	207.747,00	623.241,00
NP-148	Suministro e instalación de alimentador 3N°8 Fase+1N°8 Neutro+1N°10 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ML	42,00	65.825,00	2.764.650,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	42,00	65.825,00	2.764.650,00
NP-149	SENSOR PRESENCIA MULTITECNOLOGIA LEVITON OSC10-MDW	UND	9,00	742.527,00	6.682.743,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	9,00	742.527,00	6.682.743,00
NP-150	SENSOR MULTITECNOLOGIA PIR MONTAJE EN TECHO LEVITON OSC15-10W CON FUENTE RELEVO-P/SENSOR LEVITON OSP20-RDO	UND	3,00	735.982,00	2.207.946,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	3,00	735.982,00	2.207.946,00
NP-151	Suministro e instalacion de perfiles WPC DE 100 X 50 MM, EN COLOR ASIGNADO POR LA ENTIDAD, INCLUYE SOPORTE GIRATORIO DE EXTREMOS	ML	95,00	80.486,00	7.646.170,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	95,00	80.486,00	7.646.170,00
NP-152	Suministro e instalacion de piso tipo DECK en WPC de acuerdo a detalle suministrado por la entidad (incluye estructura y accesorios de fijaccion y bocel de terminacion)	M2	9,91	979.125,00	9.700.387,20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	9,91	979.125,00	9.700.387,20
NP-153	Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada cla. 18 de 1.2 m de desarrollo incluye soporte de fijacion	ML	-	255.000,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	255.000,00	-
NP-154	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LÁMINA ALFAJOR Y ÁNGULO A CON PESTAÑAS DE 10cm POR LOS LADOS, PARA SELLAR DUCTO EN CUBIERTA	M2	7,99	472.000,00	3.771.280,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,18	3.388.960,00	-	-	7,18	3.388.960,00	0,81	472.000,00	382.320,00
NP-155	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 " SEGÚN DISEÑO DESARROLLO DE 0.4 M HASTA 0.7 M	ML	82,30	121.275,00	9.980.932,50		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,30	9.980.932,50	-	-	82,30	9.980.932,50	-	121.275,00	-
NP-156	Suministro e instalacion de salida para toma de datos y/o corriente incluye: tuberia pvc sch-40 de 3/4 (5 m) + caja 2400 + terminales. NO INCLUYE CABLE	UND	23,00	135.978,00	3.127.494,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	2.719.560,00	-	-	20,00	2.719.560,00	3,00	135.978,00	407.934,00

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 9

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 07			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		CORTE 07		CORTE 08		CORTE 09		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
NP-157	Suministro e instalacion salida electrica para toma secadores Incluye: Tuberia sch-40 de 3/4"(max.6mts) + caja metalica + terminales + cable trenzado (LSZH) 3x10 (20 mts). NO INCLUYE TOMA.	UND	6,00	248.325,00	1.489.950,00		-	-	-		-	-	-	-	-		-		-	6,00	1.489.950,00		-	6,00	1.489.950,00	-	248.325,00	-
NP-158	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS EN FORMA DE FIGURA PARA SEÑALIZACION DE BAÑOS DE 30 CM DE ALTO, EN ACRILICO EN VOLUMEN DE 3 CM	UND	4,00	355.500,00	1.422.000,00		-	-	-		-	-	-	-	-		-		-	2,00	711.000,00		-	2,00	711.000,00	2,00	355.500,00	711.000,00
NP-159	Desmonte gabinetes (NORMAL, REGULADO Y RACK) cuarto tecnico 4° piso incluye: desconexiones acometidas principales regulada y normal , desconexion circuitos de distribucion, retiro de tableros del cuarto tecnico, traslado de tableros del 4° piso al 1er piso y entrega de elementos internos de los tableros.	UND	4,00	991.349,00	3.965.396,00		-	-	-		-	-	-	-	-		-		-	4,00	3.965.396,00		-	4,00	3.965.396,00	-	991.349,00	-
NP-160	ASEO FINAL DE OBRA	M2	2.051,81	3.097,00	6.354.455,57		-	-	-		-	-	-	-	-		-		-	987,81	3.059.247,57		-	987,81	3.059.247,57	1.064,00	3.097,00	3.295.208,00
					-		-	-	-		-	-	-	-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-
		TOTAL COSTO DIRECTO			4.170.058.061,57		399.961.521,14		102.051.339,62		185.989.734,01		236.145.459,15		590.529.172,18		131.159.235,65		253.971.787,90		533.554.914,74		189.431.826,73		2.802.794.990,49		COSTO DTO	1.567.263.071,08
		ADMINISTRACIÓN	12,00%		500.406.967,39	A.I.U.	47.995.382,54	A.I.U.	12.246.160,75	A.I.U.	22.318.768,08	A.I.U.	28.337.455,10	A.I.U.	70.863.500,66	A.I.U.	15.739.108,28	A.I.U.	30.476.614,55	A.I.U.	64.026.589,77	A.I.U.	20.331.819,21	A.I.U.	312.335.398,86	A.I.U.	ADMON.	188.071.568,53
		IMPREVISTOS	3,00%		125.101.741,85		11.998.845,63		3.061.540,19		5.579.692,02		7.084.363,77		17.715.875,17		3.934.777,07		7.619.153,64		16.006.647,44		5.082.954,80		78.083.849,71		IMPREVISTOS	47.017.892,13
		UTILIDAD	7,00%		291.904.064,31		27.997.306,48		7.143.593,77		13.019.281,38		16.530.182,14		41.337.042,05		9.181.146,50		17.778.025,15		37.348.844,03		11.860.227,87		182.195.649,33		UTILIDAD	109.708.414,97
		IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%		55.461.772,22		5.319.488,23		1.357.282,82		2.473.663,46		3.140.734,61		7.854.037,99		1.744.417,84		3.377.824,78		7.096.280,37		2.253.443,30		34.617.173,37		IVA / UTILIDAD	20.844.598,84
		TOTAL COSTOS INDIRECTOS			972.874.545,77		93.311.022,88		23.808.577,53		43.391.404,94		55.092.735,62		137.770.455,87		30.599.449,69		59.251.618,12		124.478.361,61		39.528.445,18		607.232.071,27		INDIRECTOS	365.642.474,47
					-																						
		VALOR TOTAL PROYECTO			1,00																						
					5.142.932.606,00		493.272.544,00		125.859.917,00		229.381.139,00		291.238.195,00		728.299.628,05		161.758.685,00		313.223.406,00		658.033.276,00		208.960.272,00		3.210.027.062,00		VALOR TOTAL	1.932.905.546,00
			CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 07			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		CORTE 07		CORTE 08		CORTE 09		ACUMULADO CORTES				VALOR POR EJECUTAR

ESTADO DE PAGOS DE CONTRATISTA

ACTA No.	PERIODO	ESTADO	VALOR CORTES	PORCENTAJE	PAGADO	SALDO
	VALOR CONTRATO		$ 5.142.932,606		-	$ 5.142.932,606
1	(02 MARZO AL 30 ABRIL DE 2025)	PAGADO	$ 493.272.544,00	9,59%	$ 493.272.544,00	$ 4.649.660.062,00
2	(01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2025)	PAGADO	$ 125.859.917,00	2,45%	$ 619.132.461,00	$ 4.523.800.145,00
3	(01 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2025)	PAGADO	$ 229.381.139,00	4,46%	$ 848.513.600,00	$ 4.294.419.006,00
4	(01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025)	PAGADO	$ 291.238.195,00	5,66%	$ 1.139.751.795,00	$ 4.003.180.811,00
5	(01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025)	PAGADO	$ 728.299.628	14,16%	$ 1.868.051.423,05	$ 3.274.881.182,95
6	(01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025)	PAGADO	$ 161.758.685	3,15%	$ 2.029.810.108,05	$ 3.113.122.497,95
7	(01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025)	PAGADO	$ 313.223.406	6,09%	$ 2.343.033.514,05	$ 2.799.899.091,95
8	(01 DENERO AL 31 DE ENERO DE 2026)	TRAMITE	$ 658.033.276	12,79%	$ 3.001.066.790,05	$ 2.141.865.815,95
9	(01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026)	TRAMITE	$ 208.960.272	4,06%	$ 3.210.027.062,05	$ 1.932.905.543,95
	TOTAL		$ 3.210.027.062,05	62,42%	$ 3.210.027.062,05	

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 169.431.826,73
ADMINISTRACIÓN	12,00%	$ 20.331.819,21
IMPREVISTOS	3,00%	$ 5.082.954,80
UTILIDAD	7,00%	$ 11.860.227,87
IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	$ 2.253.443,30
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 39.528.445,18
VALOR TOTAL CORTE 09 DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026		$ 208.960.272,00

ING. JEFFERSON BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA
INGEBYP S.A.S. / CTO FNA - 166 - 2024

ING. RICARDO LEONARDO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA
BIODECCO S.A.S. / CTO FNA - 022 - 2025

ING. RODOLFO ENRIQUE BARRETO VARGAS
COORDINADOR OBRA
INGEBYP S.A.S. / CTO FNA - 166 - 2024

ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR INTERVENTORIA
BIODECCO S.A.S. / CTO FNA - 022 - 2025

Dr. VANESA PACHECO GOMEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR CTO INTERVENTORÍA FNA 022 2025
FONDO NACIONAL DEL AHORRO FNA SA

ING. JUAN SEBASTIÁN PIÑEROS
PROFESIONAL EJECUTIVO NIVEL 6
APOYO SUPERVISIÓN CTO INTERVENTORÍA FNA 022 2025
FONDO NACIONAL DEL AHORRO FNA SA

ACTA PARCIAL No. 09


MEMORIAS DE CANTIDADES - PRIMER PISO - BANCOLOMBIA - EDIFICIO RECEPCION

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	3.2.	DESCRIPCION ITEM:	Mantenimiento de cielo raso en fibra mineral. Incluye cambio, pintura y/o reutilización de láminas en fibra mineral, instalación de anclajes y arreglo de perfilería descolgada y colocación de soportes.		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

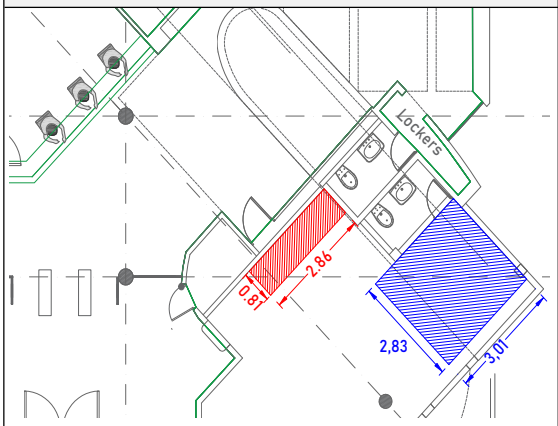

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO RECEPCION					-
PRIMER PISO					-
ZONA DE BANCOLOMBIA					-
ENTRADA A OFICINA		0,81	2,86	1,00	2,32
OFICINA BANCOLOMBIA		3,01	2,83	1,00	8,52
					-
PENDIENTE PARA COBRAR EN ACTA 10			7,80	- 1,00	- 7,80
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					3,04
VIENE					21,95
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					24,99
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 8					- 21,95
PRESENTE ACTA					3,04








OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	4.1.	DESCRIPCION ITEM:	Cambio de válvula antivandálica de empotrar tipo push para sanitarios institucionales de consumo de agua 4.85 lpf (1.28 gpf) tipo corona o similar. Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. A todo costo con la instalación de un enchape de similares caracteristicas a las originales.		UNIDAD:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

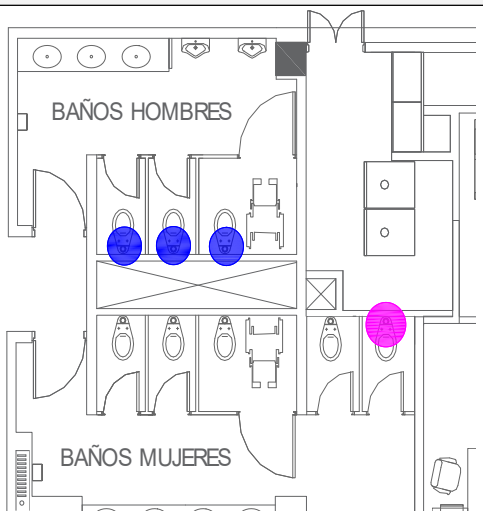

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CUARTO PISO					-
					-
BAÑO MUJERES				1,00	1,00
BAÑO HOMBRES				3,00	3,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					4,00
VIENE					17,00
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					21,00
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 8					- 17,00
PRESENTE ACTA					4,00









OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09


MEMORIAS DE CANTIDADES - SEGUNDO PISO - BAÑOS - EDIFICIO CNA

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6,3	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	UNIDAD:	UND	

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

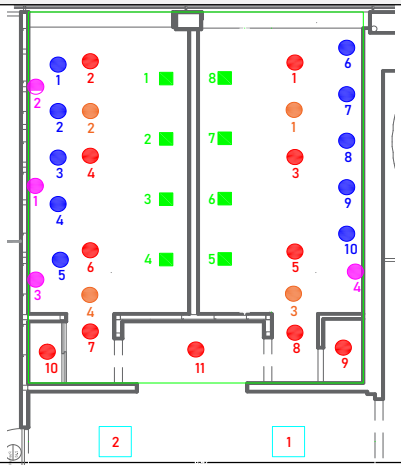

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CNA					-
SEGUNDO PISO					-
BAÑOS GENERALES					-
LUMINARIAS 24 W				11,00	11,00
LUMINARIAS9W				10,00	10,00
ESPEJOS				4,00	4,00
SENSORES				4,00	4,00
EXTRACTORES				8,00	8,00
LUMINARIA 60*60				2,00	2,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					39,00
VIENE					43,00
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					82,00
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 8					- 43,00
PRESENTE ACTA					39,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO













OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09


MEMORIAS DE CANTIDADES

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.
CONTRATISTA:	INGEBY S.A.S	ACTA PARCIAL: 9	FECHA: 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO		
TOTAL REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CNA - PISO 2			
ITEM No. 5.1.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad, para la zona de mesas del restaurante Incluye nivelación en zonas puntuales, plástico aislante, yumbolon de acuerdo con la	UNIDAD: m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

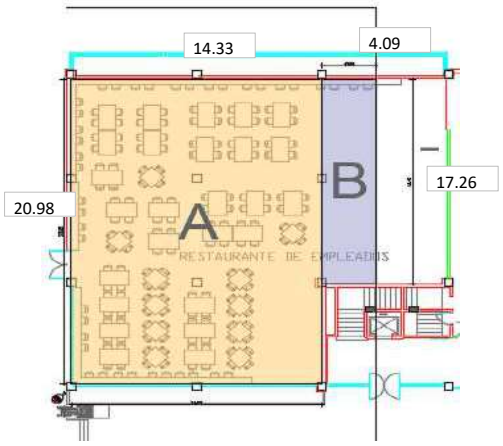

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					0,00
A	21,54		14,33	1	308,73
B	17,26		4,09	1	70,59
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
				SUBTOTAL	379,32
				VIENE	740,73
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	1.120,05
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 8	- 435,85
				PRESENTE ACTA	684,20

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09


MEMORIAS DE CANTIDADES

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	2 DE2

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBY S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
REPARACIONES LOCATIVAS - TORRE DE TECNOLOGÍA - PISO 2						
ITEM No.	3,1	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad. Incluye plástico aislante y yumbolon de acuerdo a las características técnicas y el guardaescobas.	UNIDAD:	m2	


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

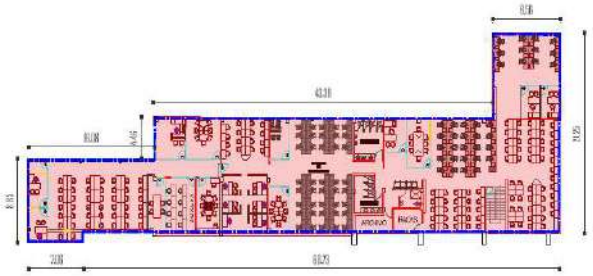

2do PISO TECNOLOGIA (822 M2)

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					-
ZONA DE OFICINAS		8,56	21,25	1	181,90
		13,31	9,24	1	122,98
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	304,88
				VIENE	435,85
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	740,73

REGISTRO FOTOGRÁFICO

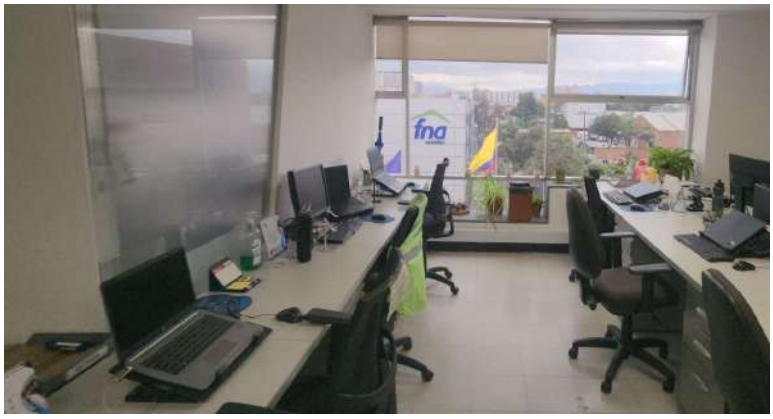



OBSERVACIONES: Suministro de material referente al piso laminado

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09


MEMORIAS DE CANTIDADES - PRIMER PISO - ATENCION PRIMARIA - EDIFICIO CNA

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	1 DE 6

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6,3	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	UNIDAD:	UND	


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

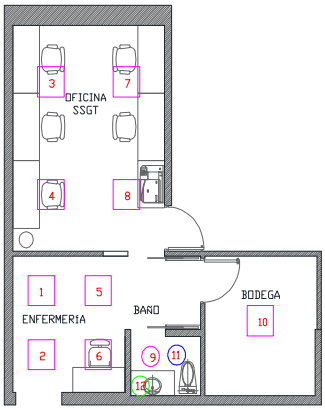

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CNA					-
PRIMER PISO					-
ATENCION PRIMERIA					-
LUMINARIAS (1-10)				10,00	10,00
SENSOR (11)				1,00	1,00
ESPEJO (12)				1,00	1,00
					-
PENDIENTE PARA COBRAR EN ACTA 10			3,00	- 1,00	- 3,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					9,00
VIENE					296,00
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					305,00
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 8					- 169,00
PRESENTE ACTA					136,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO








OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09


MEMORIAS DE CANTIDADES - PRIMER PISO - ATENCION PRIMARIA - EDIFICIO CNA

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	2 DE 6

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6,3	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	UNIDAD:	UND	

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

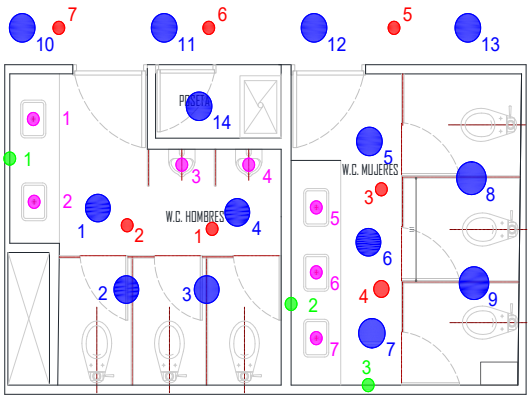

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO TECNOLOGIA					-
PRIMER PISO					-
BAÑOS GESTION DOCUMENTAL					-
LUMINARIAS 24 W				14,00	14,00
LUMINARIAS DE 9W				7,00	7,00
SENSOR				7,00	7,00
ESPEJO				3,00	3,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	31,00
				VIENE	265,00
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	296,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO








OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA


ACTA PARCIAL No. 09

MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - EDIFICIO CONVENCIONES FNA


PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	3 DE 6

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6,3	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	UNIDAD:		UND

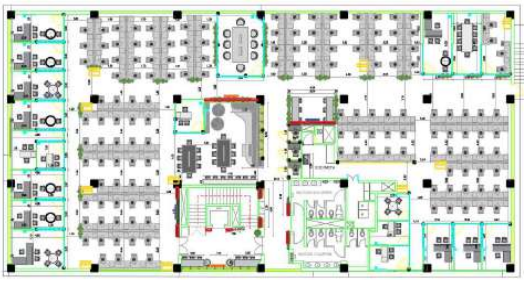PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	EDIFICIO CONVENCIONES					-
	CUARTO PISO					-
	luminarias led					-
	LED EMERGENCY				23,00	23,00
	LUMINARIA DESCOLGADA				29,00	29,00
	LUMINARIA DESCOLGADA(PAGADAS CORTE 5)				- 20,00	- 20,00
	lampara 60 * 60				1,00	1,00
	iluminacion de espejos				3,00	-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	SUBTOTAL					33,00
	VIENE					232,00
	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					265,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

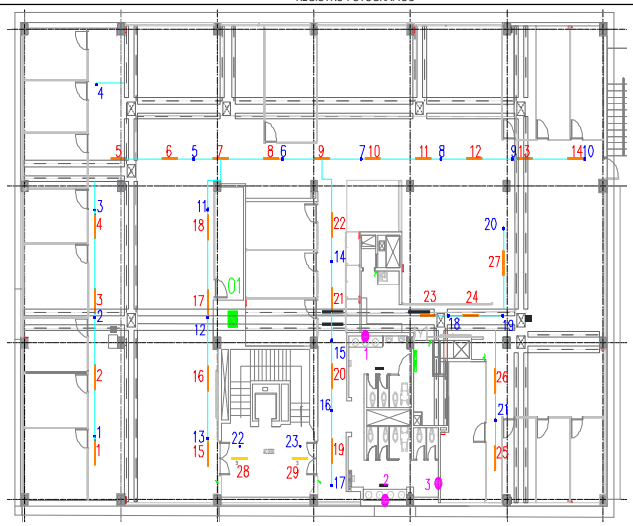


OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 09				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - EDIFICIO CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	4 DE 6	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6,3	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.		UNIDAD:	UND

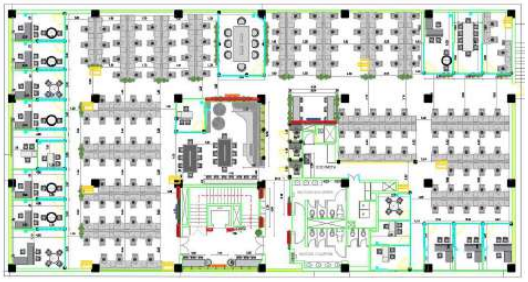PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	EDIFICIO CONVENCIONES					-
	CUARTO PISO					-
	luminarias led					-
	SALA DE JUNTAS				11,00	11,00
	HALL DE ACCESO				12,00	12,00
	AREA DE SERVICIO Y BAÑOS				38,00	38,00
						-
	LUMINARIA DESCOLGADA(PAGADAS CORTE 5)				- 46,00	- 46,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	15,00
					VIENE	217,00
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	232,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

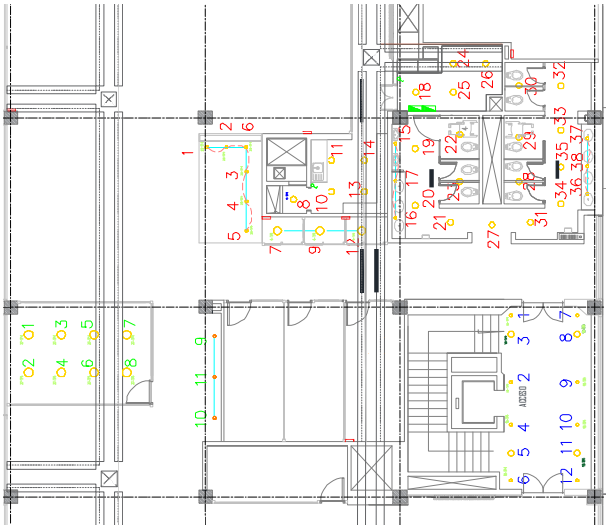

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - EDIFICIO CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	5 DE 6

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6,3	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	UNIDAD:	UND	

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

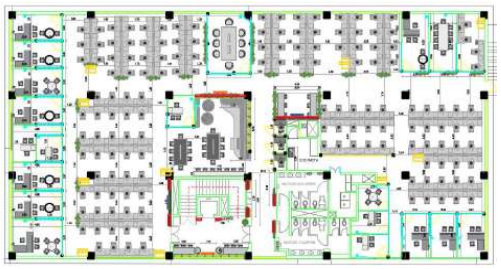

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CUARTO PISO					-
AREA GENERAL					-
					-
SENSOR MOVIMIENTO				45,00	45,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	45,00
				VIENE	172,00
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	217,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

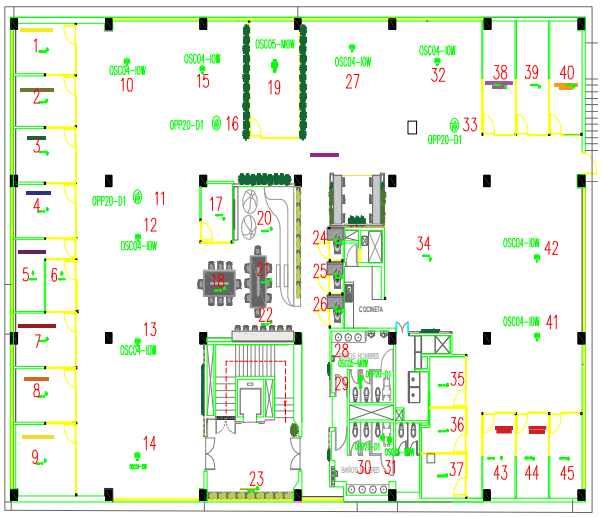

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 09				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - EDIFICIO CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026		HOJA	6 DE 6


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6.3.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.		UNIDAD:	Und

REGISTRO FOTOGRÁFICO













OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6.4.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalacióin de salida interruptor sencillo o doble 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH40 3/4", elementos de fijación y conductores. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.		UNIDAD:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

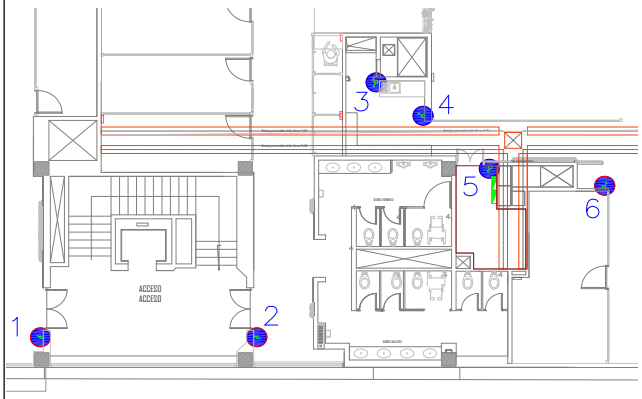

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CUARTO PISO					-
					-
HALL DE ACCESO (1-2)				2,00	2,00
AREAS DE SERVICIO (3-6)				4,00	4,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					6,00
VIENE					
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					6,00
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 8					-
PRESENTE ACTA					6,00







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09

MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6.10.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de salida tomacorriente doble polo a tierra (red normal), monofásico 120V 15A, 3m prom en cable No 12 LSHF AWG, elementos de fijación y conductores.		UNIDAD:	UND


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CUARTO PISO					-
TOMAS DE SERVICIO					-
AREAS COMUNES				12,00	12,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	12,00
				VIENE	
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	12,00
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 8	-
				PRESENTE ACTA	12,00

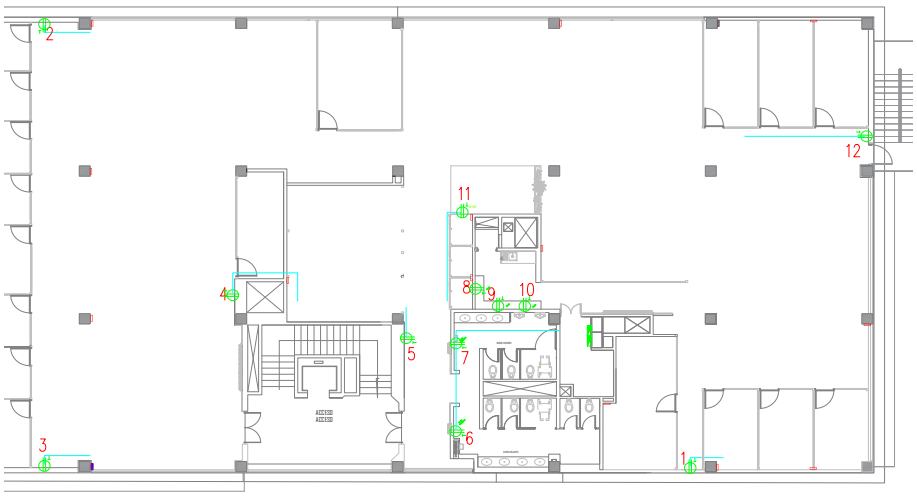

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	1 DE 14


A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6.11.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.		UNIDAD:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

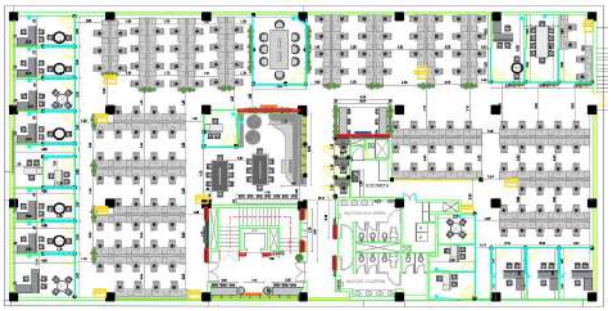

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CUARTO PISO					-
DUCTOS PARA ALIMENTACION					-
AREAS COMUNES C35			9,47	1,00	9,47
			1,20	1,00	1,20
			4,88	1,00	4,88
			1,42	1,00	1,42
			1,20	1,00	1,20
Luminarias C-35			3,00	8,00	24,00
			3,00	- 8,00	- 24,00
SALA DE JUNTAS C 37			2,03	1,00	2,03
Luminarias C-37			3,00	8,00	24,00
			3,00	- 8,00	- 24,00
					-
					-
PENDIENTE PARA COBRAR EN ACTA 10			136,31	- 1,00	- 136,31
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	- 116,11
				VIENE	254,11
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	138,00
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 8	-
				PRESENTE ACTA	138,00

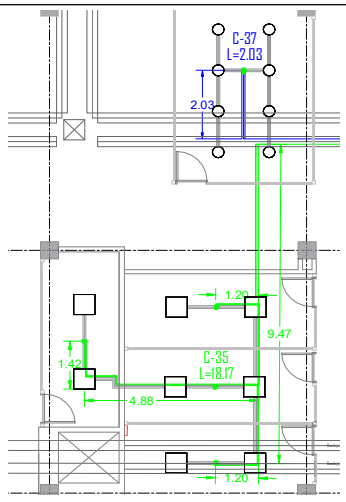

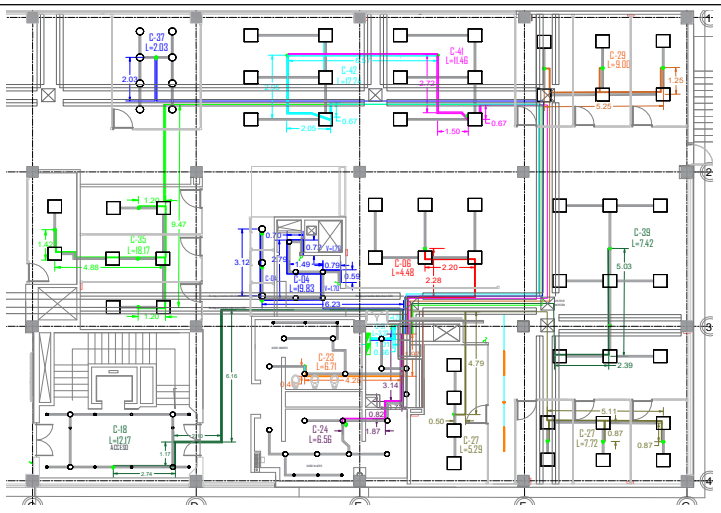

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	2 DE 14

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6.11.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.		UNIDAD:	ML


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

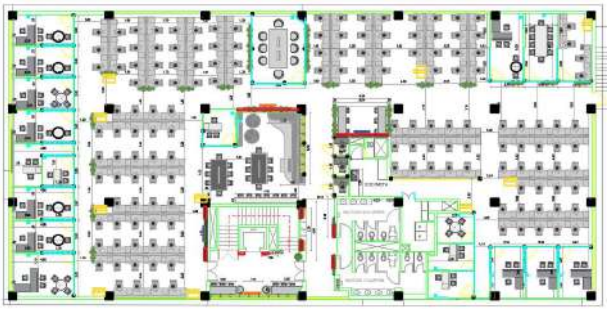

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CUARTO PISO					-
DUCTOS PARA ALIMENTACION					-
AREAS COMUNES C42			0,67	1,00	0,67
			2,05	1,00	2,05
			2,95	1,00	2,95
			6,57	1,00	6,57
Luminarias C-42			3,00	6,00	18,00
			3,00	- 6,00	- 18,00
					-
					-
					-
					-
SALA DE JUNTAS C 41			0,67	1,00	0,67
			1,50	1,00	1,50
			2,72	1,00	2,72
			6,57	1,00	6,57
Luminarias C-41			3,00	6,00	18,00
			3,00	- 6,00	- 18,00
					-
					-
				SUBTOTAL	23,70
				VIENE	230,41
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	254,11

REGISTRO FOTOGRÁFICO

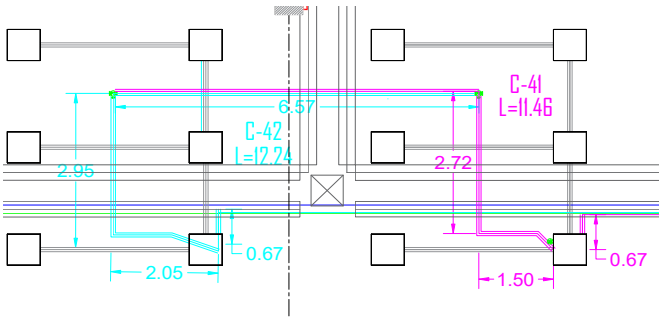

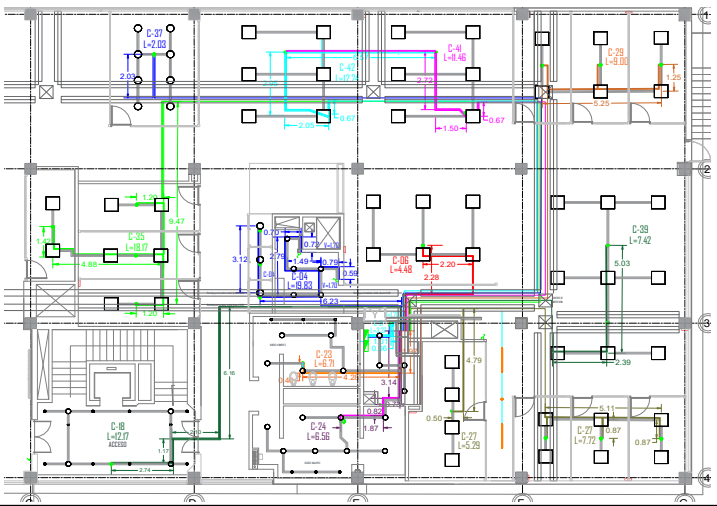

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	3 DE 14

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6.11.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.		UNIDAD:	ML


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

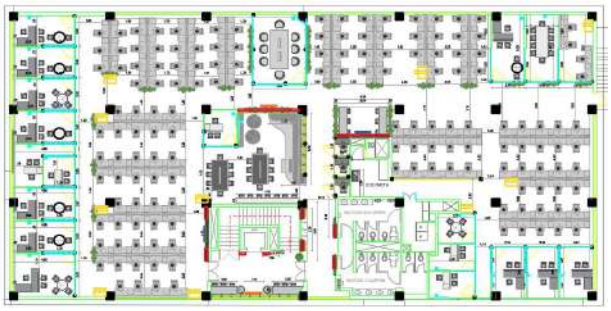

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CUARTO PISO					-
DUCTOS PARA ALIMENTACION					-
AREAS COMUNES C29			5,25	1,00	5,25
			1,25	3,00	3,75
Luminarias C-29			3,00	4,00	12,00
			3,00	- 4,00	- 12,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	9,00
				VIENE	221,41
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	230,41

REGISTRO FOTOGRÁFICO

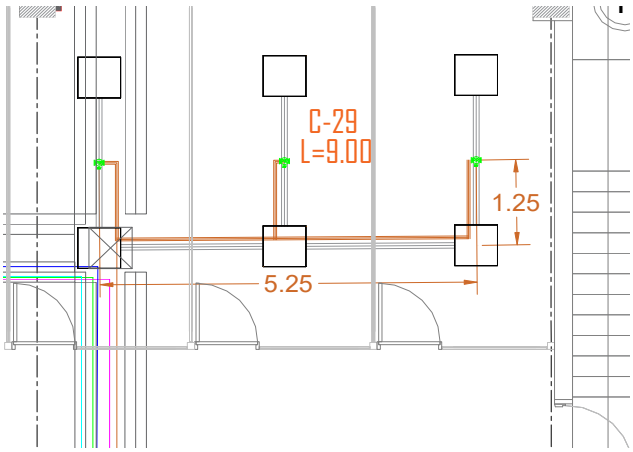

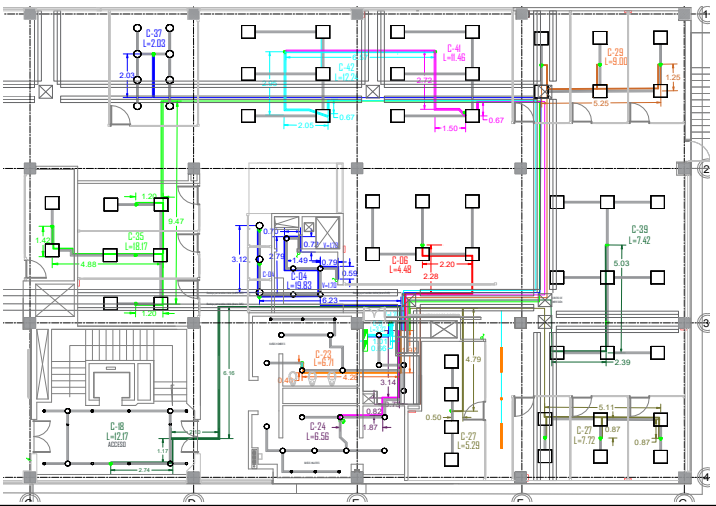

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	4 DE 14

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6.11.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.		UNIDAD:	ML


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

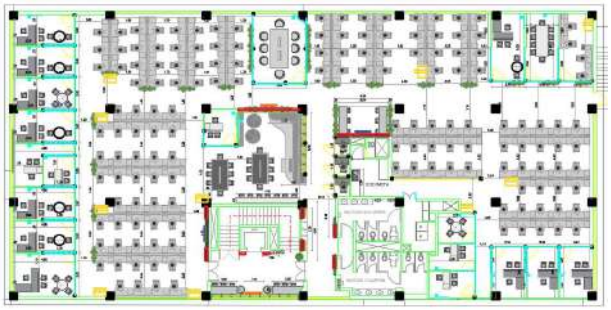

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CUARTO PISO					-
DUCTOS PARA ALIMENTACION					-
AREAS COMUNES C 39			2,39	1,00	2,39
			5,03	1,00	5,03
Luminarias C-39			3,00	3,00	9,00
			3,00	- 3,00	- 9,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					7,42
VIENE					213,99
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					221,41

REGISTRO FOTOGRÁFICO

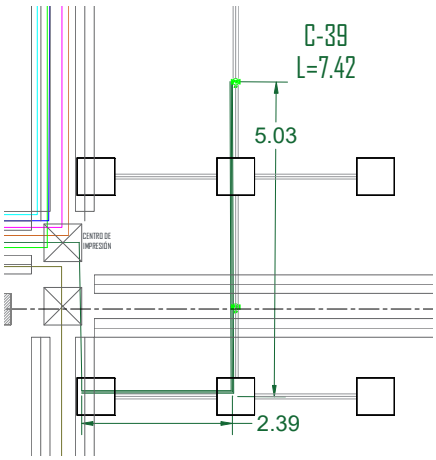

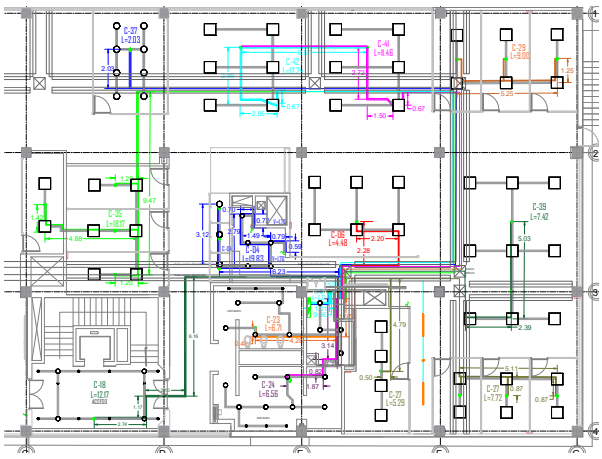

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	5 DE 14

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6.11.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.		UNIDAD:	ML


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

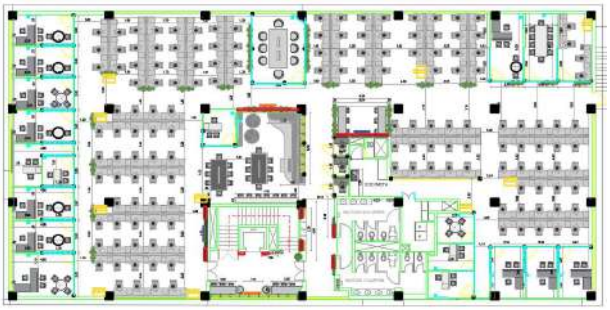

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CUARTO PISO					-
DUCTOS PARA ALIMENTACION					-
SALA DE JUNTAS C27			4,79	1,00	4,79
			0,50	1,00	0,50
Luminarias C-27			3,00	4,00	
			3,00	- 4,00	- 12,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
OFICINAS C27			5,11	1,00	5,11
			0,87	3,00	2,61
Luminarias C-27			3,00	6,00	18,00
			3,00	- 6,00	- 18,00
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	1,01
				VIENE	212,98
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	213,99

REGISTRO FOTOGRÁFICO

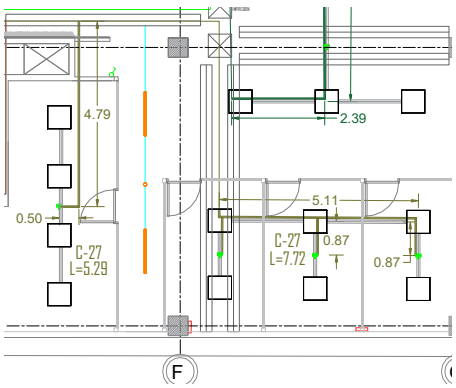

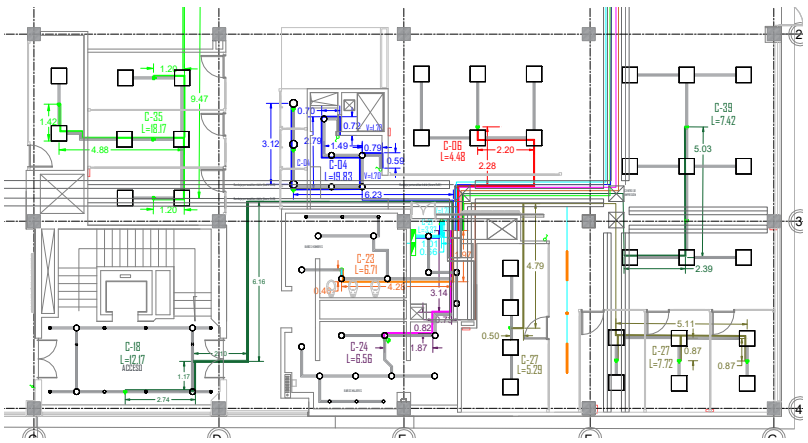

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09

MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA


PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	6 DE 14


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6.11.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.		UNIDAD:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	EDIFICIO CONVENCIONES					-
	CUARTO PISO					-
	DUCTOS PARA ALIMENTACION					-
	AREAS COCINA C 04			6,23	1,00	6,23
				3,12	1,00	3,12
				2,79	1,00	2,79
				1,49	1,00	1,49
				0,70	1,00	0,70
				0,72	1,00	0,72
				1,70	1,00	1,70
				0,79	1,00	0,79
				0,59	1,00	0,59
				1,70	1,00	1,70
	Luminarias C-04			3,00	8,00	24,00
				3,00	- 8,00	- 24,00
						-
						-
	OFICINA CENTRAL C 06			2,28	1,00	2,28
				2,20	1,00	2,20
	Luminarias C-06			3,00	3,00	9,00
				3,00	- 3,00	- 9,00
					SUBTOTAL	24,31
					VIENE	188,67
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	212,98

REGISTRO FOTOGRÁFICO

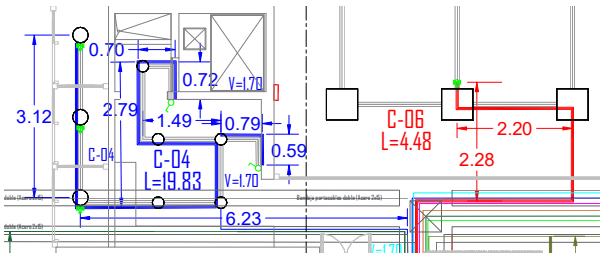

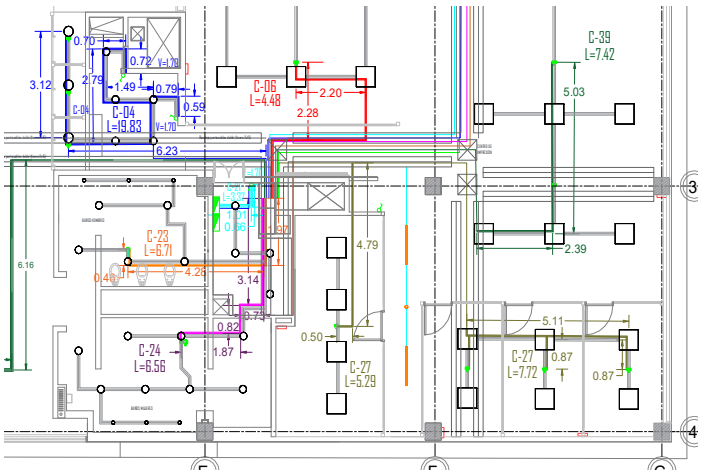

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	7 DE 14

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6.11.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.		UNIDAD:	ML


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

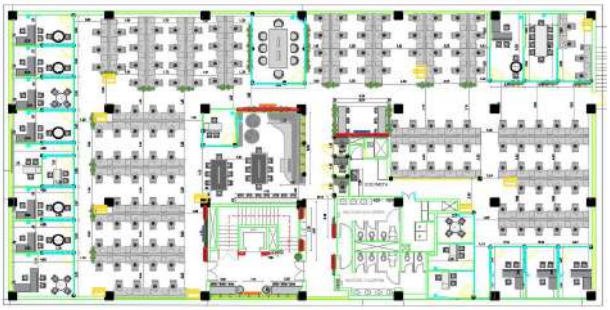

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CUARTO PISO					-
DUCTOS PARA ALIMENTACION					-
CUARTO DE RACK C 21			1,01	1,00	1,01
			0,66	1,00	0,66
			1,70	1,00	1,70
Luminarias C-21			3,00	4,00	12,00
			3,00	- 4,00	- 12,00
					-
BAÑO DE HOMBRES C 23			1,97	1,00	1,97
			4,28	1,00	4,28
			0,46	1,00	0,46
Luminarias C-23			3,00	5,00	15,00
			3,00	- 5,00	- 15,00
BAÑO DE MUJERES C 24			1,87	1,00	1,87
			0,82	1,00	0,82
			0,73	1,00	0,73
			3,14	1,00	3,14
Luminarias C-24			3,00	3,00	9,00
			3,00	- 3,00	- 9,00
					-
				SUBTOTAL	16,64
				VIENE	172,03
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	188,67

PLANO

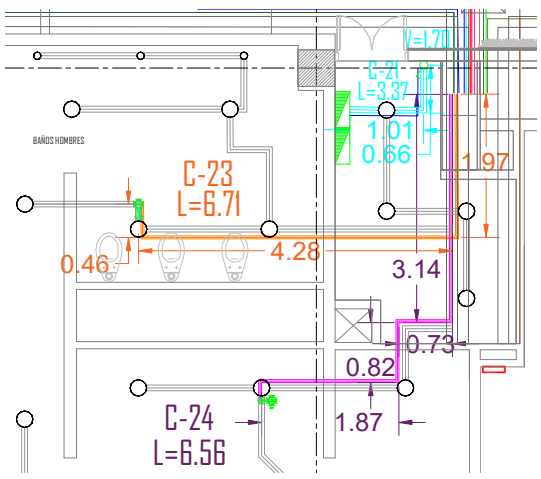

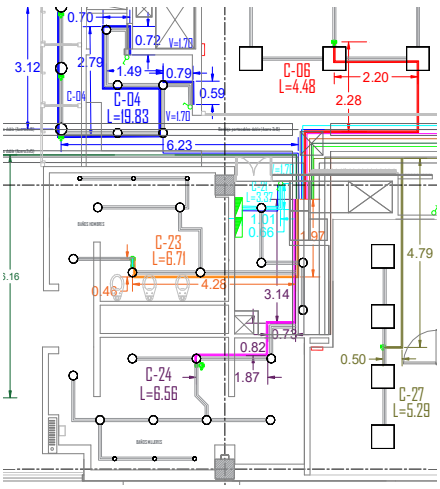

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA


ACTA PARCIAL No. 09

MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA


PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	8 DE 14


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6.11.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.		UNIDAD:	ML

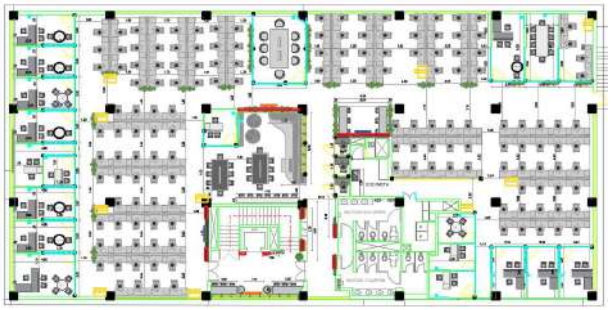PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	EDIFICIO CONVENCIONES					-
	CUARTO PISO					-
	DUCTOS PARA ALIMENTACION					-
	HALL DE ACCESO C18			2,74	1,00	2,74
				1,17	1,00	1,17
				2,10	1,00	2,10
				6,16	1,00	6,16
	Luminarias C-18			3,00	3,00	9,00
				3,00	- 3,00	- 9,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	12,17
					VIENE	159,86
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	172,03

PLANO

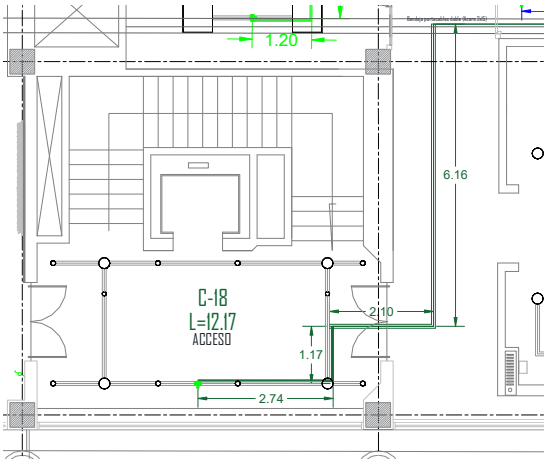

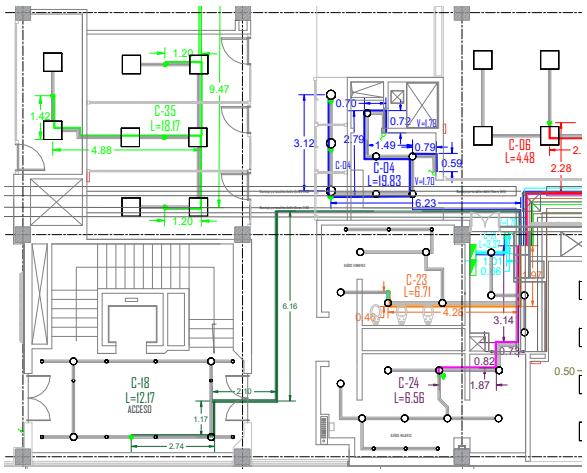

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	9 DE 14

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6.11.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.		UNIDAD:	ML


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

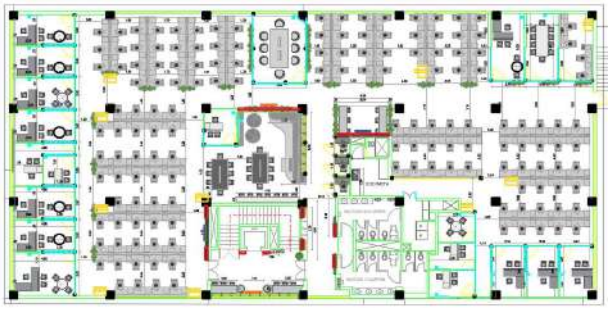

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CUARTO PISO					-
DUCTOS PARA ALIMENTACION					-
OFICINAS TRAS ASCENSOR C35			9,47	1,00	9,47
			1,20	1,00	1,20
			4,88	1,00	4,88
			1,42	1,00	1,42
			1,20	1,00	1,20
Luminarias C-35			3,00	7,00	21,00
			3,00	- 7,00	- 21,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					18,17
VIENE					141,69
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					159,86

PLANO

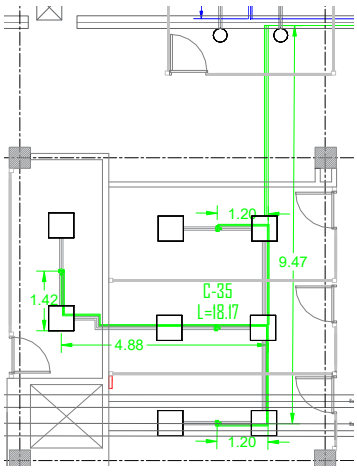

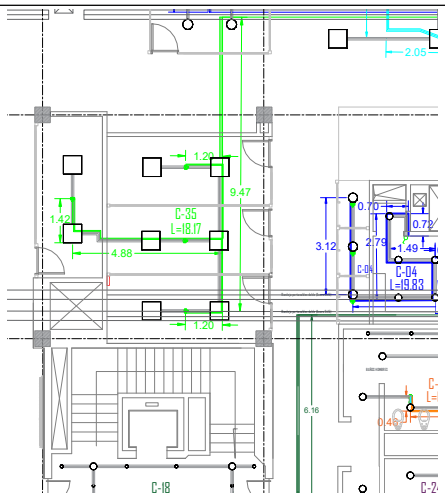

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	10 DE 14

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6.11.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.		UNIDAD:	ML


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

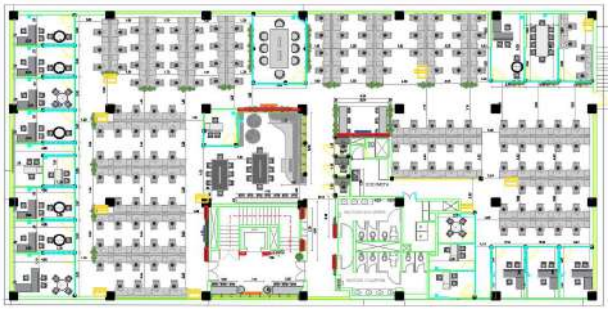

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CUARTO PISO					-
DUCTOS PARA ALIMENTACION					-
OFICINAS NORTE C31			0,56	1,00	0,56
			11,67	1,00	11,67
			1,16	5,00	5,80
Luminarias C-31			3,00	10,00	30,00
			3,00	- 10,00	- 30,00
					-
					-
					-
OFICINAS NORTE C 02			7,19	1,00	7,19
			3,00	1,00	3,00
Luminarias C-02			3,00	12,00	36,00
			3,00	- 12,00	- 36,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	28,22
				VIENE	113,47
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	141,69

PLANO

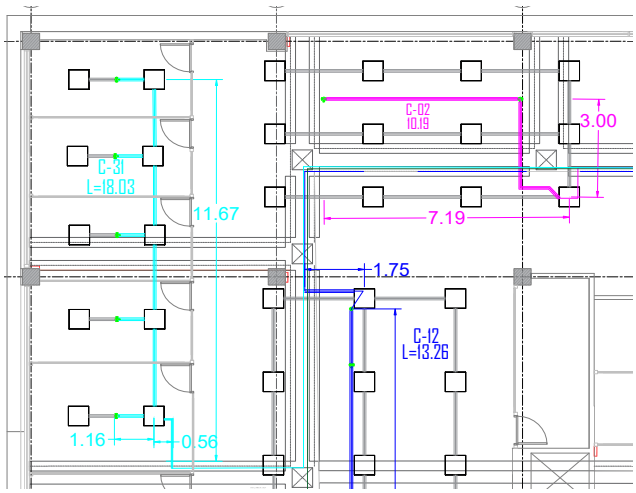

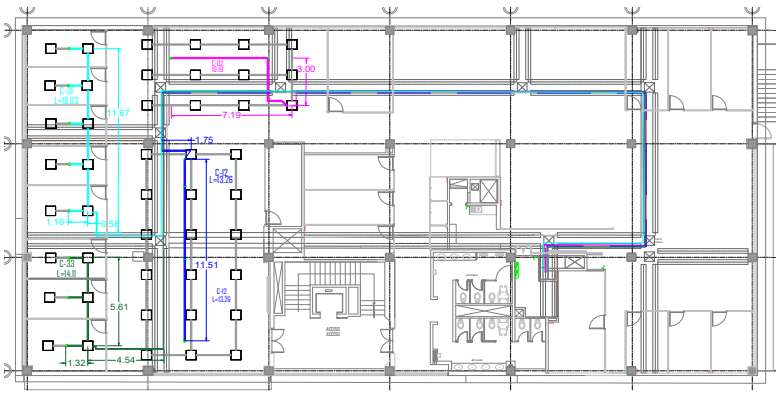

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	11 DE 14

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6.11.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.		UNIDAD:	ML


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

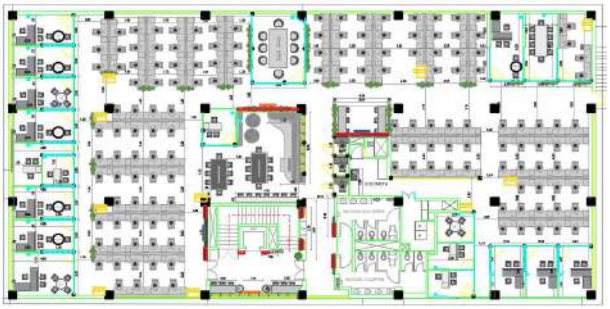

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CUARTO PISO					-
DUCTOS PARA ALIMENTACION					-
PASILLO CENTRAL C 12			1,75	1,00	1,75
			11,51	1,00	11,51
Luminarias C-12			3,00	12,00	36,00
			3,00	- 12,00	- 36,00
					-
					-
					-
OFICINAS NORTE C 33			4,54	1,00	4,54
			5,61	1,00	5,61
			1,32	3,00	3,96
Luminarias C-33			3,00	6,00	18,00
			3,00	- 6,00	- 18,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	27,37
				VIENE	86,10
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	113,47

PLANO

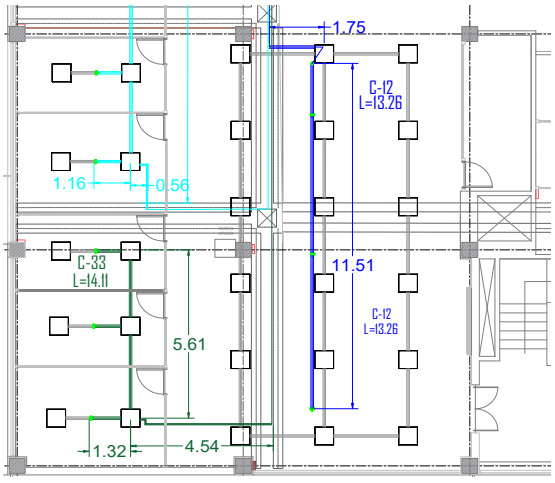

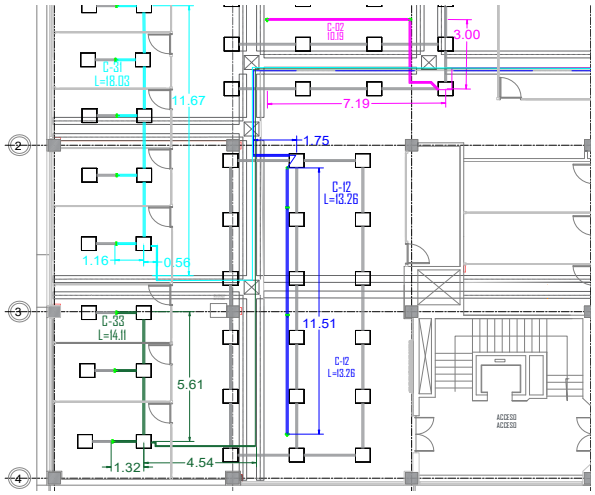

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	12 DE 14

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6.11.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.		UNIDAD:	ML


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

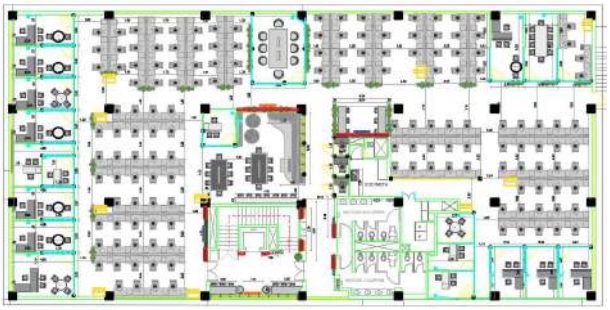

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CUARTO PISO					-
DUCTOS DE TOMAS DE SERVICIO					-
TOMA NOR ORIENTE C13			3,04	1,00	3,04
TOMA NOR OCC C13			3,14	1,00	3,14
TOMA SUR ORIENTE C13			5,68	1,00	5,68
TOMA SUR ORIENTE C13			2,62	1,00	2,62
Luminarias C-13			3,00	4,00	12,00
			3,00	- 4,00	- 12,00
					-
					-
					-
TOMA NORTE C11			6,31	1,00	6,31
TOMA CENTRAL C11			5,84	1,00	5,84
TOMA BAÑOS C11			6,93	1,00	6,93
Luminarias C-11			3,00	3,00	9,00
			3,00	- 3,00	- 9,00
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	33,56
				VIENE	52,54
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	86,10

PLANO

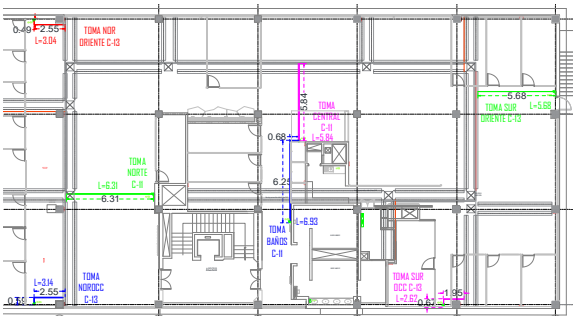

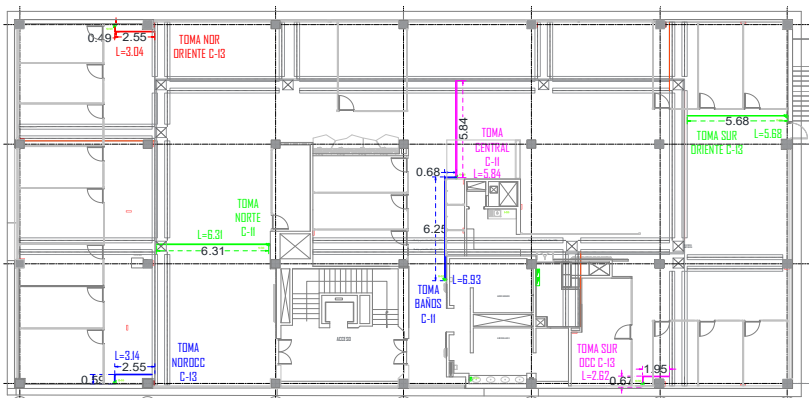

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	13 DE 14

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6.11.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.		UNIDAD:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

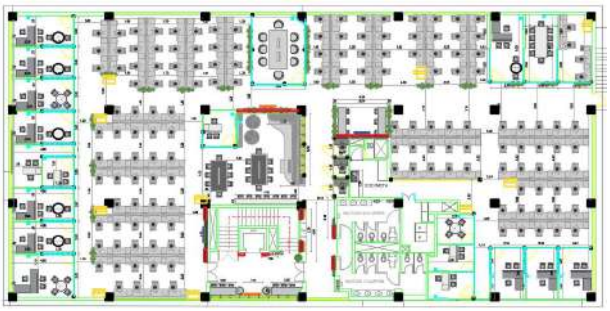

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CUARTO PISO					-
DUCTOS PARA TOMAS					-
TOMA SOBRE MEZON C-01			6,35	1,00	6,35
TOMA DE SERVICIO PISO C-03			5,60	1,00	5,60
TOMAS EN BARRA C-05			7,30	1,00	7,30
TOMA DE SECAMANOS BH C-15			7,15	1,00	7,15
TOMA DE SECAMANOS BM C-17			11,12	1,00	11,12
TOMAD EN LAVAMANOS C-09			15,02	1,00	15,02
Luminarias C-01-03-05-15-17-09			3,00	6,00	18,00
			3,00	- 6,00	- 18,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	52,54
				VIENE	-
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	52,54

PLANO

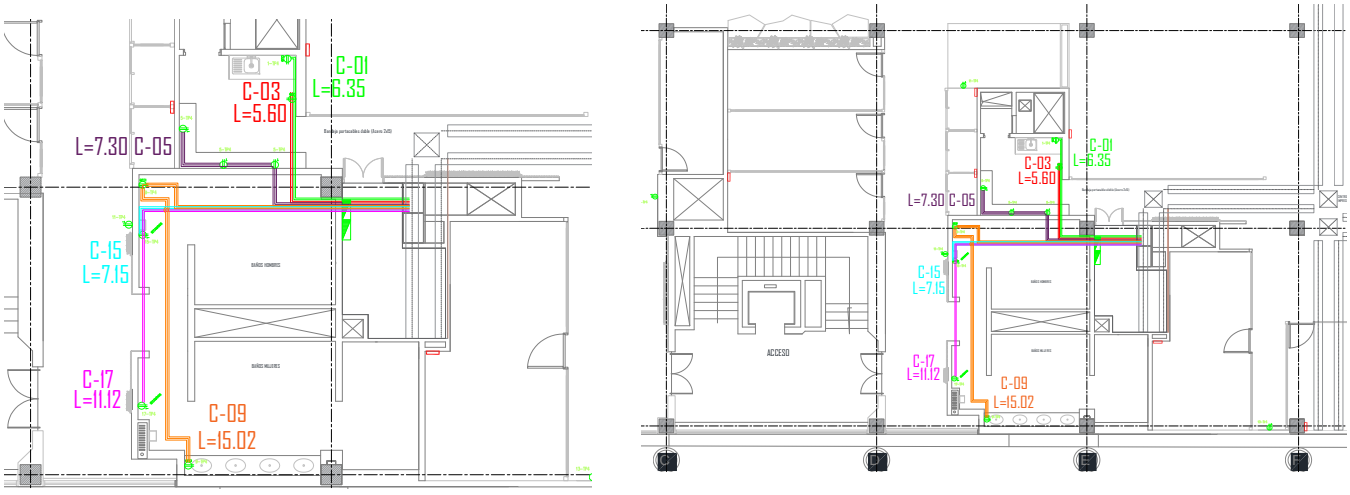

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 09					INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA					
	PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026		HOJA	14 DE 14	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA	28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	6.11.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.			UNIDAD:	ML

REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	1 DE 2


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	8,2	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado 8 mm con pivote, incluye topes de piso, accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento a todo costo.		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

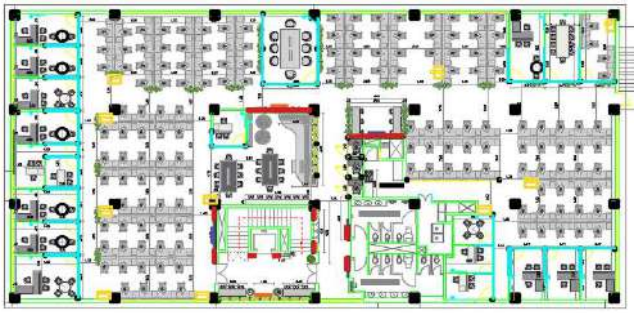

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CUARTO PISO					-
					-
AREA DE OFICINAS	2,34	0,90		23,00	48,44
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					48,44
VIENE					
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					48,44
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 8					-
PRESENTE ACTA					48,44

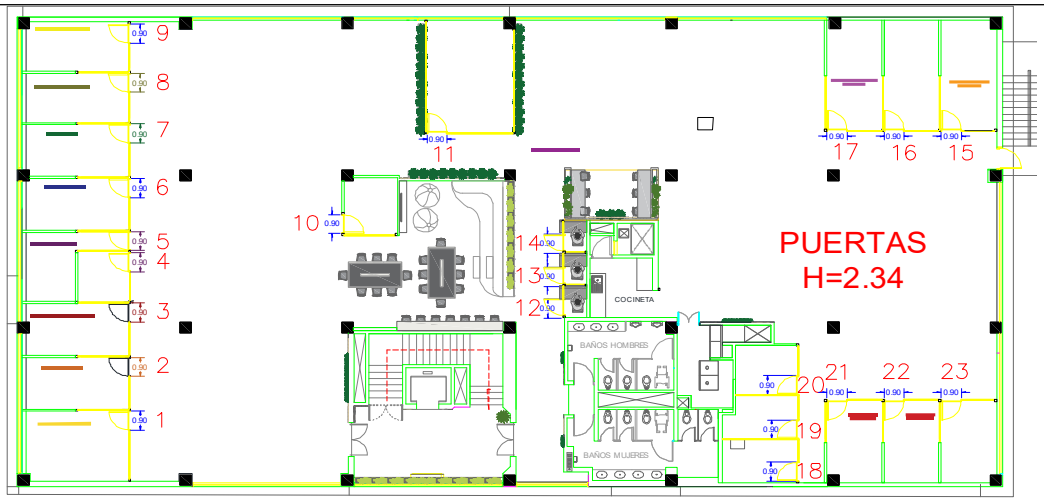

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09

MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	2 DE 2

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA	28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	8,2	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado 8 mm con pivote, incluye topes de piso, accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento a todo costo.			UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 09		INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES -POSETA - CUARTO PISO - EDIFICIO CONVENCIONES FNA		
	PERIODO: 1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA: 1 DE 3	

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA: 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-04	DESCRIPCION ITEM:	Baldosa cerámica pared 30x60.			UNIDAD: M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

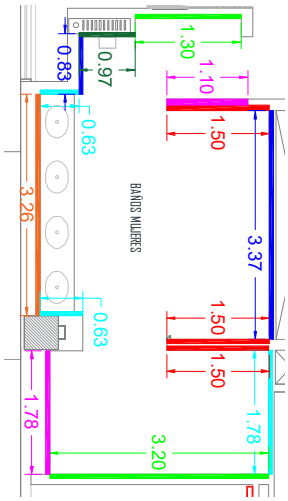

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
BAÑO DE mujeres					-
MURO A lavamanos	2,40		3,26	1,00	7,82
MURO B lavamanos laterales	2,40		0,63	2,00	3,02
MURO C ventana	2,40		1,78	1,00	4,27
MURO D muro fondo	2,40		3,20	1,00	7,68
MURO E fondo sanitario	2,40		1,78	1,00	4,27
MURO F divisorio sanitario	2,40		1,50	3,00	10,80
MURO G espaldar sanitario	2,40		3,37	1,00	8,09
MURO H muro de acceso	2,40		1,10	1,00	2,64
MURO I muro de acceso	2,40		1,30	1,00	3,12
MURO J muro de secamanos	2,40		0,97	1,00	2,33
MURO K muro de secamanos	2,40		0,83	1,00	1,99
					-
					-
					-
					-
					-
			SUBTOTAL		56,03
			VIENE		261,66
			CANTIDAD TOTAL ACUMULADA		317,69
			COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 8		- 221,65
			PRESENTE ACTA		96,04

REGISTRO FOTOGRÁFICO

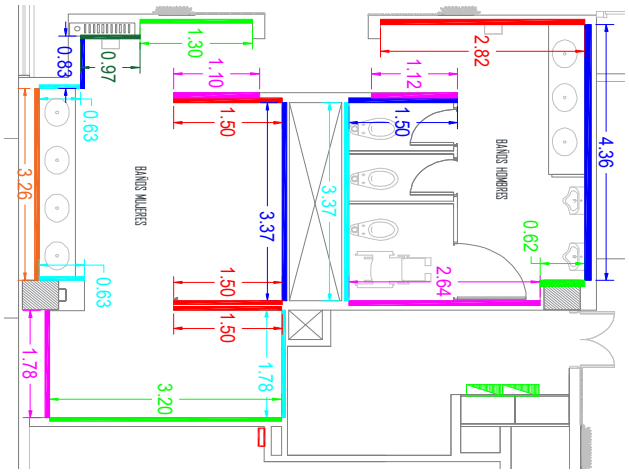








OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 09				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES -POSETA - CUARTO PISO - EDIFICIO CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	2 DE 3	


A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-04	DESCRIPCION ITEM:	Baldosa cerámica pared 30x60.			UNIDAD: M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

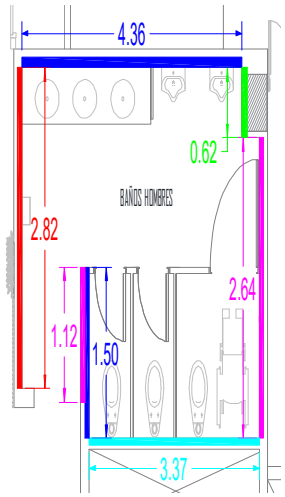

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
BAÑO DE HOMBRES					-
MURO A lavamanos	2,40		4,36	1,00	10,46
MURO B columna	2,40		0,62	1,00	1,49
MURO C	2,40		2,64	1,00	6,34
MURO D sanitarios	2,40		3,37	1,00	8,09
MURO E sanitario	2,40		1,50	1,00	3,60
MURO F acceso	2,40		1,12	1,00	2,69
MURO G acceso	2,40		2,82	1,00	6,77
					-
Descuentos por salidas de pusch					-
Lavamano			1,00	- 5,00	- 5,00
Sanitarios			1,00	- 3,00	- 3,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
			SUBTOTAL		31,44
			VIENE		230,22
			CANTIDAD TOTAL ACUMULADA		261,66

REGISTRO FOTOGRAFICO

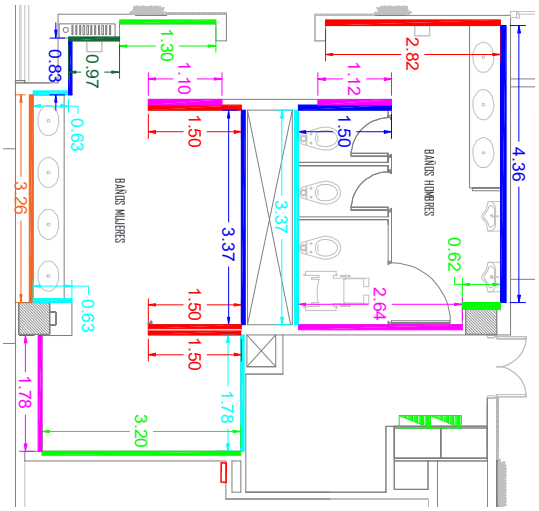







OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 09				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES -POSETA - CUARTO PISO - EDIFICIO CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	3 DE 3	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-04	DESCRIPCION ITEM:	Baldosa cerámica pared 30x60.			UNIDAD: M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

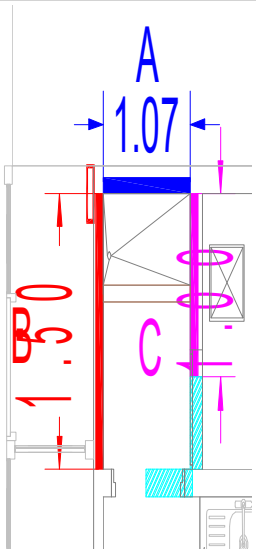

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
POCETA DE ASEO					-
MURO A	2,40		1,07	1,00	2,57
MURO B	2,40		1,50	1,00	3,60
MURO C	2,40		1,00	1,00	2,40
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	8,57
				VIENE	221,65
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	230,22

REGISTRO FOTOGRÁFICO










OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 09				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO CONVENCIONES - CUARTO PISO - BAÑOS				
	PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	1 DE 2	


A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-05	DESCRIPCION ITEM:	Baldosa ceramica piso 60x60.			UNIDAD: M2

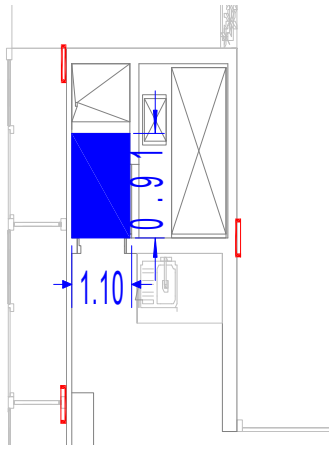PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	EDIFICIO CONVENCIONES 4 PISO					-
	CUARTO DE ASEO					-
	ENTRADA		1,10	0,91	1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	1,00
					VIENE	139,93
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	140,93
					COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 8	- 103,80
					PRESENTE ACTA	37,13

REGISTRO FOTOGRÁFICO



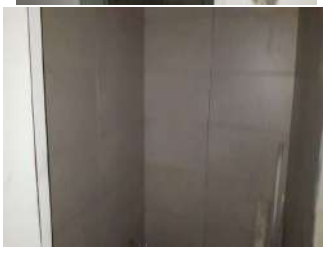

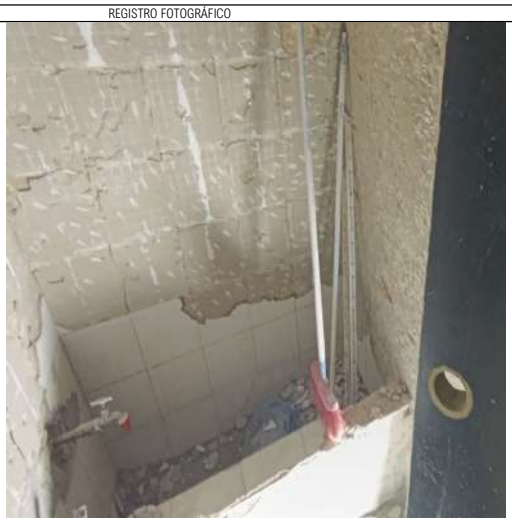




OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 09				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO CONVENCIONES - CUARTO PISO - BAÑOS				
	PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	2 DE 2	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-05	DESCRIPCION ITEM:	Baldosa ceramica piso 60x60.			UNIDAD: M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES 4 PISO					-
BAÑO HOMBRES					-
ENTRADA		1,32	2,82	1,00	3,72
SANITARIOS		3,37	3,26	1,00	10,99
					-
BAÑO MUJERES					-
ENTRADA		1,12	2,35	1,00	2,63
SANITARIOS		5,61	3,35	1,00	18,79
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	36,13
				VIENE	103,80
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	139,93

REGISTRO FOTOGRÁFICO









OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09


MEMORIAS DE CANTIDADES - AREAS COMUNES - CUARTO PISO - EDIFICIO CONVENCIONES

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S	ACTA PARCIAL	9	FECHA	28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO				
ITEM No.	NP-15	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de revestimiento interior de fachada en WPC Panel Casino, de acuerdo a muestra seleccionada.	UNIDAD:	Und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

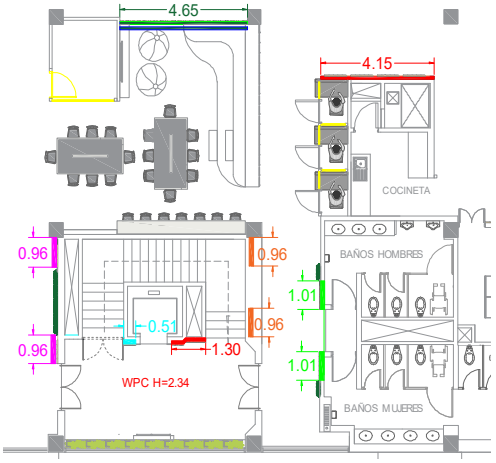

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	Und	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CUARTO PISO					-
PUERTA ASCENSOR	2,34		1,30	2,00	6,08
MURO IZQUIERDO	2,34		0,51	1,00	1,19
MURO IZQUIERDO INTERNO	2,34		0,96	2,00	4,49
MURO FRENTE A SALA DE JUNTAS	2,34		4,65	2,00	21,76
MURO EXTERNO A COCINETA	2,34		4,15	1,00	9,71
MURO EXTERNO RACK	0,80		0,96	2,00	1,54
MUROS DE ACCESO BAÑOS	2,34		1,01	2,00	4,73
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					49,50
VIENE					38,78
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					88,28
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 8					- 38,78
PRESENTE ACTA					49,50

REGISTRO FOTOGRÁFICO









OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09


MEMORIAS DE CANTIDADES - SALA DE JUNTAS - CUARTO PISO - EDIFICIO CONVENCIONES

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	1 DE 3

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA	28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	NP 18.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de sensor de presencia Infrarrojo 360° de cobertura, montaje en techo, detección de movimiento hasta 4 metros radiales a una altura de instalación de 2.4 metros.			UNIDAD:	Und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

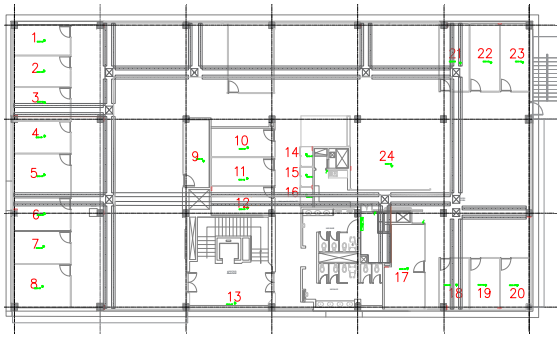

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	Und	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES CUARTO PISO					-
SALA DE JUNTAS					-
SENSOR INFRARROJO				24,00	24,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	24,00
				VIENE	13,00
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	37,00
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 8	- 5,00
				PRESENTE ACTA	32,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO











OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA


ACTA PARCIAL No. 09

MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑO - PUNTO DE ATENCION PRIMARIO - PRIMER PISO - EDIFICION CNA

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	2 DE 3

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP 18.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de sensor de presencia Infrarrojo 360° de cobertura, montaje en techo, detección de movimiento hasta 4 metros radiales a una altura de instalación de 2.4 metros.		UNIDAD:	Und

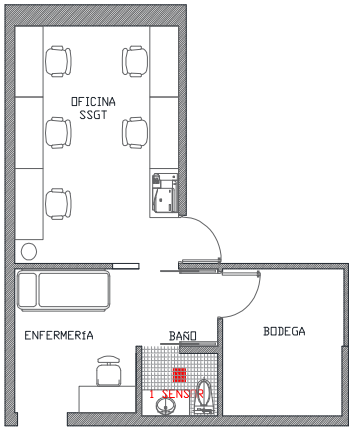PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	EDIFICIO CNA, PRIMER PISO					-
	PUNTO DE ATENCION PRIMARIO					-
						-
	BAÑO				1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	1,00
					VIENE	12,00
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	13,00









OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA


ACTA PARCIAL No. 09

MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑO - GESTION DOCUMENTAL - PRIMER PISO - EDIFICION TECNOLOGIA

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	3 DE 3

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP 18.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de sensor de presencia Infrarrojo 360° de cobertura, montaje en techo, detección de movimiento hasta 4 metros radiales a una altura de instalación de 2.4 metros.		UNIDAD:	Und

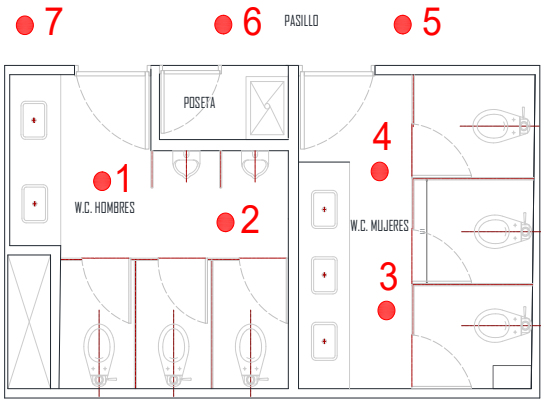PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	EDIFICIO TECNOLOGIA PRIMER PISO					-
	GESTION DOCUMENTAL					-
						-
	AREA DE BAÑO				7,00	7,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	7,00
					VIENE	5,00
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	12,00









OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-19	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de enceres mobiles de inferior 220 X 90 X 63 y superior de 200X76X35 incluye campana extractora, puertas, manijas en acero tabular, bisagras de parche, entrepaños, patas de 8 cm y manija en acero tubular. Modulo torre hornos de 200 X 60 X 60 con dos puertas parte alta y dos cajones parte baja central para horno. Tapa barra de 130 x 50 con patas en acero de 100 cm y anclaje a la pared. Todo elaborado en melamina de 15mm, color arena o glacial fabricado e instalado.	UNIDAD:	UND	

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

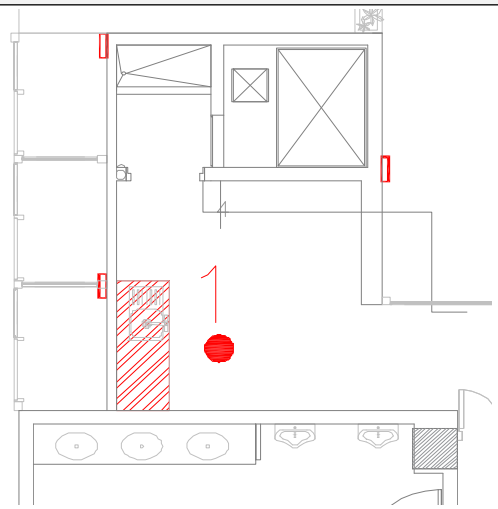

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CUARTO PISO					-
AREA DE SERVICIO					-
COCINETA				1,00	1,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					1,00
VIENE					1,00
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					2,00
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 8					- 1,00
PRESENTE ACTA					1,00





OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA


ACTA PARCIAL No. 09

MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-27	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de sanitario blanco institucional tipo adriatica o similar de entrada posterior no incluye pusch		UNIDAD:	UND

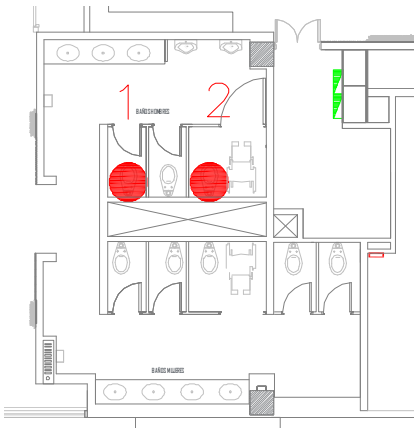PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	EDIFICIO CONVENCIONES					-
	CUARTO PISO					-
	BAÑO DE HOMBRES					-
	SANITARIOS				2,00	2,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	2,00
					VIENE	11,00
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	13,00
					COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 8	11,00
					PRESENTE ACTA	2,00

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - EDIFICO CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	1 DE 2

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA	28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	NP-28	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación lavamanos blanco tipo cascada de baru o similar, no incluye griferia no incluye push			UNIDAD:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

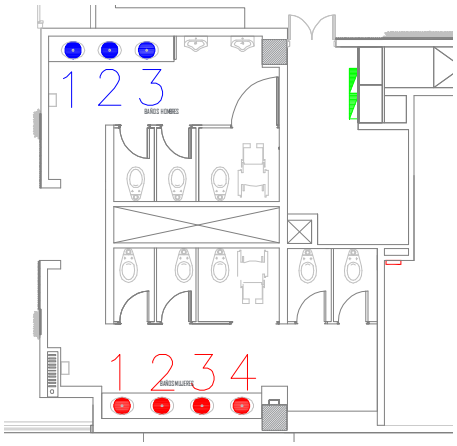

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CUARTO PISO					-
ZONA DE BAÑOS					-
BAÑO DE HOMBRES				3,00	3,00
BAÑO DE MUJERES				4,00	4,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					7,00
VIENE					14,00
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					21,00
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 8					- 9,00
PRESENTE ACTA					12,00

REGISTRO FOTOGRAFICO








OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA


ACTA PARCIAL No. 09

MEMORIAS DE CANTIDADES - PRIMER PISO - BAÑOS GESTION DOCUMENTAL - EDIFICO TECNOLOGIA FNA

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	2 DE 2

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA	28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	NP-28	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación lavamanos blanco tipo cascada de baru o similar, no incluye griferia no incluye push			UNIDAD:	UND

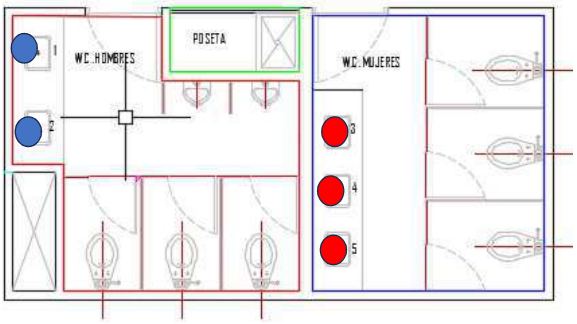PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	EDIFICIO CONVENCIONES					-
	CUARTO PISO					-
	ZONA DE BAÑOS					-
	BAÑO DE HOMBRES				2,00	2,00
	BAÑO DE MUJERES				3,00	3,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	SUBTOTAL					5,00
	VIENE					9,00
	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					14,00

REGISTRO FOTOGRAFICO










OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 09				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - EDIFICIO TECNOLOGIA FNA - GESTION DOCUMENTAL				
	PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	1 DE 6	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA	28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	NP-46	DESCRIPCION ITEM:	Trasiego incluye traslado a sitio de acopio en bolsas de aproximadamente 25 kilos			UNIDAD:	M3

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

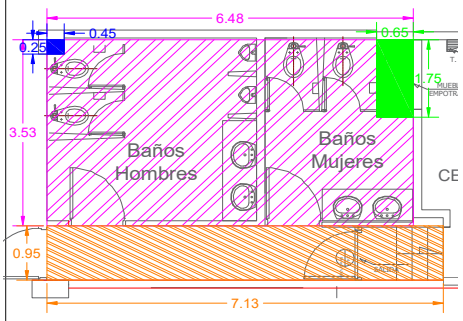

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO DE TECNOLOGIA					-
Baños Edificio Gestion Documental.					-
Piso 1					-
					-
Baños Tecnología	0,15	6,48	3,53	1,00	3,43
ducto	0,15	0,65	1,75	- 1,00	- 0,17
columna	0,15	0,45	0,25	- 1,00	- 0,02
					-
Pasillo frente a baños	0,15	7,13	0,95	1,00	1,02
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					4,26
VIENE					71,69
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					75,95
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 8					
PRESENTE ACTA					75,95

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 05


MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	2 DE 6

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-46	DESCRIPCION ITEM:	Trasiego incluye traslado a sitio de acopio en bolsas de aproximadamente 25 kilos		UNIDAD:	M3

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

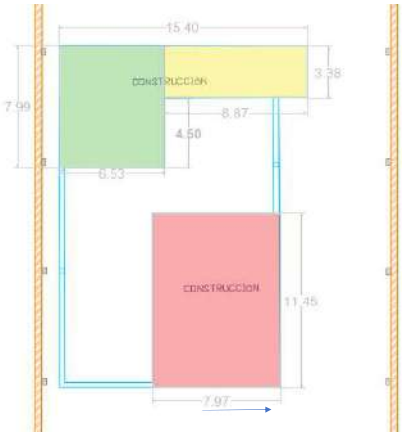

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					-
Cubierta edificio convenciones					-
Media caña					-
	0,15	0,10	7,97	2,00	0,24
	0,15	0,10	11,45	2,00	0,34
	0,15	0,10	6,53	1,00	0,10
	0,15	0,10	4,50	1,00	0,07
	0,15	0,10	8,87	1,00	0,13
	0,15	0,10	3,38	1,00	0,05
	0,15	0,10	15,40	1,00	0,23
	0,15	0,10	7,99	1,00	0,12
	0,15	0,10	43,32	2,00	1,30
	0,15	0,10	21,69	2,00	0,65
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	3,23
				VIENE	68,46
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	71,69

REGISTRO FOTOGRÁFICO

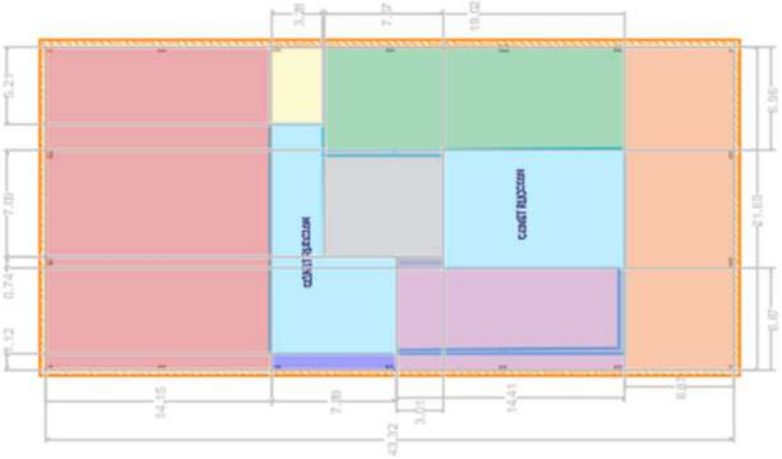

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

	ACTA PARCIAL No. 09				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	3 DE 6	

A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA	28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	NP-46	DESCRIPCION ITEM:	Trasiego incluye traslado a sitio de acopio en bolsas de aproximadamente 25 kilos			UNIDAD:	M3

REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO






OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 09				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	4 DE 6	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		ACTA PARCIAL	9	FECHA	28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-46	DESCRIPCION ITEM:	Trasiego incluye traslado a sitio de acopio en bolsas de aproximadamente 25 kilos		UNIDAD:	M3

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						-
	Cubierta edificio convenciones					-
						-
						-
		0,08	6,87	21,69	1,00	11,92
		0,08	19,02	6,96	1,00	10,59
		0,08	3,28	5,21	1,00	1,37
		0,08	14,15	21,69	1,00	24,55
		0,08	1,12	7,89	1,00	0,71
		0,08	14,41	6,87	1,00	7,92
		0,08	7,09	7,57	1,00	4,29
		0,08	0,74	3,01	1,00	0,18
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	61,53
					VIENE	6,93
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	68,46

REGISTRO FOTOGRÁFICO

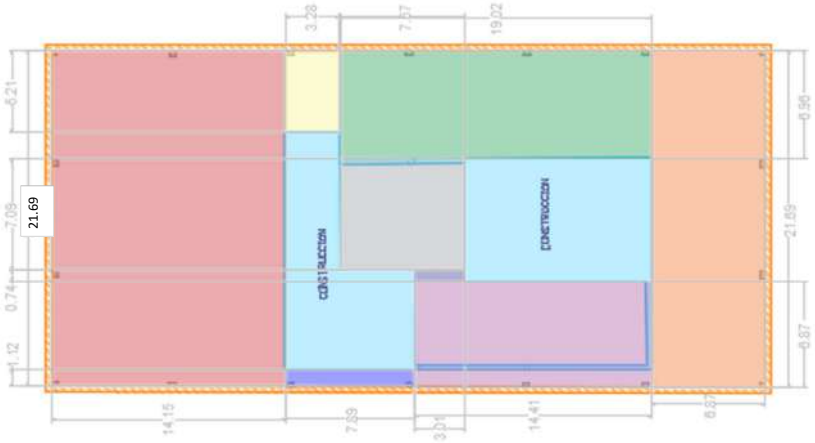

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

	ACTA PARCIAL No. 09				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	5 DE 6	

A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA	28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	NP-46	DESCRIPCION ITEM:	Trasiego incluye traslado a sitio de acopio en bolsas de aproximadamente 25 kilos			UNIDAD:	M3

REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO






OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PACIAL No. 09				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA				
	PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	6 DE 6	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA	28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	NP-46	DESCRIPCION ITEM:	Trasiego incluye traslado a sitio de acopio en bolsas de aproximadamente 25 kilos			UNIDAD:	M3

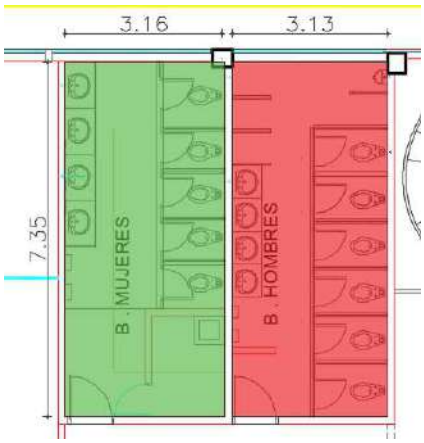PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			AREA	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						
		0,15	3,13	7,35	1,00	3,45
		0,15	3,16	7,35	1,00	3,48
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	6,93
					VIENE	
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	6,93

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09


MEMORIAS DE CANTIDADES - PRIMER PISO - BAÑO GESTION DOCUMENTAL - TECNOLOGIA FNA

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S	ACTA PARCIAL: 9	FECHA: 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO		
ITEM No.	NP-50	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de ductos de aire acondicionado (incluye fibra de vidrio, transporte y disposición final) — UNIDAD: ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

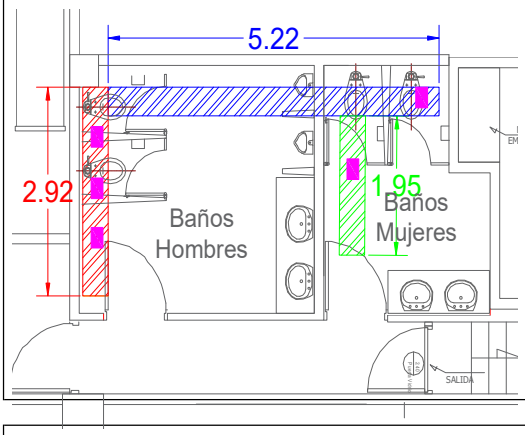

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CUARTO PISO					-
ZONA DE BAÑOS					-
ENTRADA DE DUCTO			2,92	1,00	2,92
DISTRIBUCION			5,22	1,00	5,22
BAÑO DE HOMBRES			1,95	1,00	1,95
BAJANTES			0,40	5,00	2,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					12,09
VIENE					273,82
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					285,91
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 8					- 273,82
PRESENTE ACTA					12,09







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	1 DE 3


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA	28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	NP-100	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalacion de lineal en super board contra la ventaneria existente			UNIDAD:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

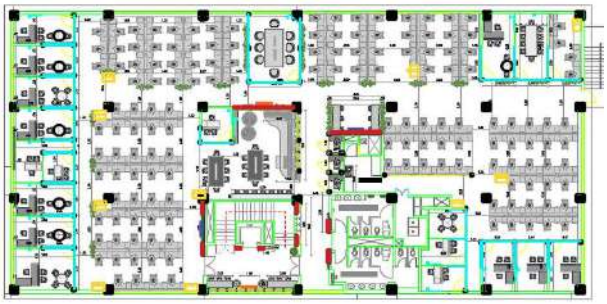

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CUARTO PISO					-
VENTANAS PERIMETRALES					-
A			7,15	1,00	7,15
B			6,70	1,00	6,70
C			6,08	1,00	6,08
D			6,70	1,00	6,70
E			7,20	1,00	7,20
F			6,70	1,00	6,70
G			7,25	1,00	7,25
H			5,21	1,00	5,21
I			6,05	1,00	6,05
J			6,70	1,00	6,70
K			3,26	1,00	3,26
L			7,71	1,00	7,71
M			6,70	1,00	6,70
					-
					-
					-
SUBTOTAL					83,41
VIENE					74,40
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					157,81
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 8					-
PRESENTE ACTA					157,81

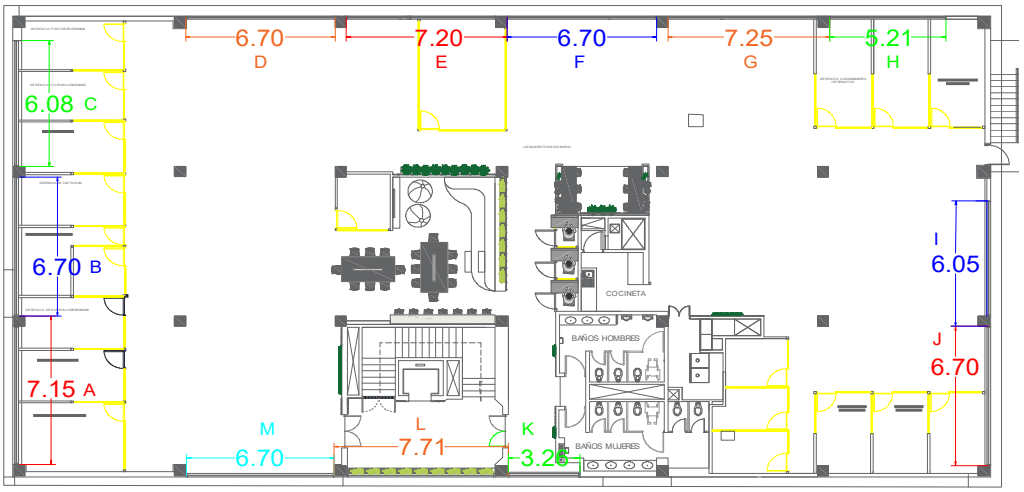

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA


ACTA PARCIAL No. 09


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	2 DE 3

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-100	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalacion de lineal en super board contra la ventaneria existente		UNIDAD:	ML

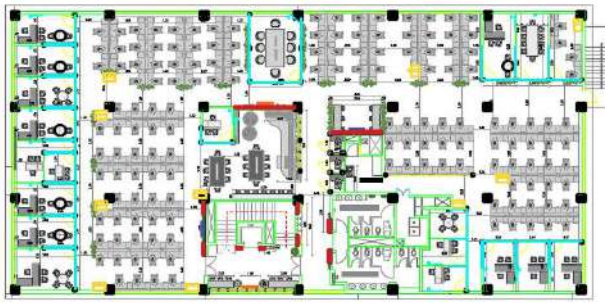PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	EDIFICIO CONVENCIONES					-
	CUARTO PISO					-
	VENTANAS PERIMETRALES					-
	A	2,40			31,00	74,40
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	74,40
					VIENE	
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	74,40

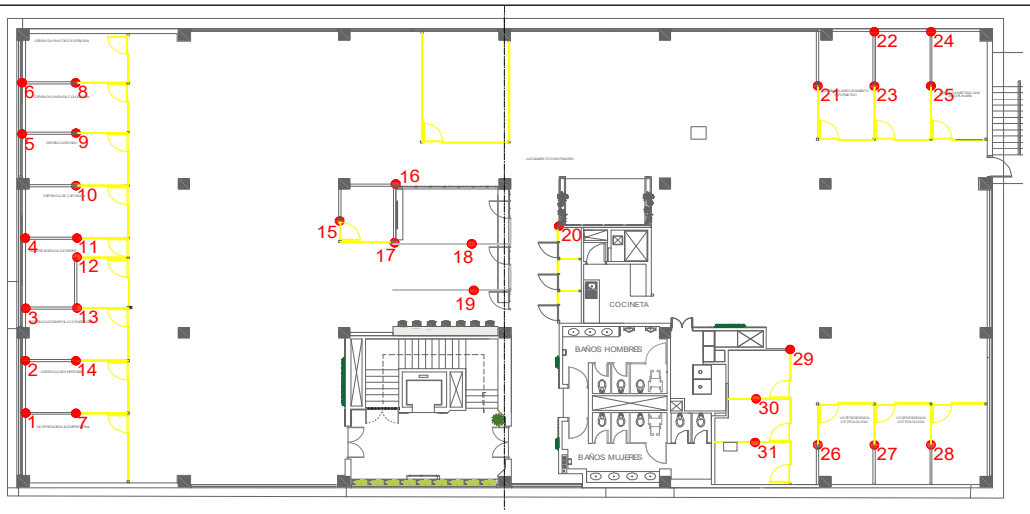

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

	ACTA PARCIAL No. 09						
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA						
	PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026		HOJA	3 DE 3		

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA	28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	NP-100	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalacion de lineal en super board contra la ventaneria existente			UNIDAD:	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO





REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 09		INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA		
	PERIODO: 1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA: 1 DE 2	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA: 28/02/2026
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-116	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Refuerzo filos y dilataciones en muros y columnas		UNIDAD:	ML

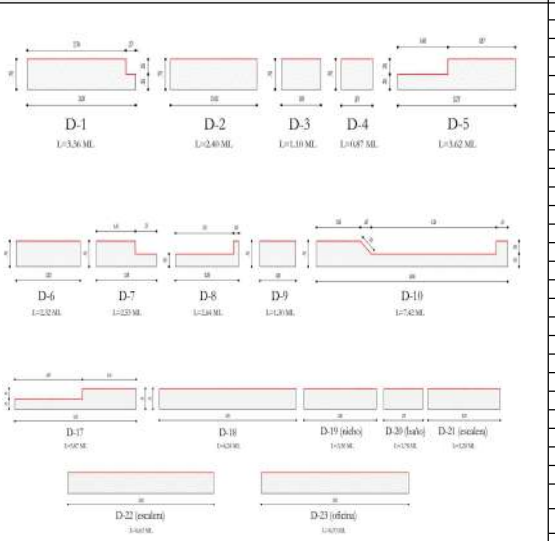PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						-
	Detalle 1			3,36	1,00	3,36
	Detalle 2			2,40	1,00	2,40
	Detalle 3			1,10	1,00	1,10
	Detalle 4			0,87	1,00	0,87
	Detalle 5			3,62	1,00	3,62
	Detalle 6			2,32	1,00	2,32
	Detalle 7			2,53	1,00	2,53
	Detalle 8			2,64	1,00	2,64
	Detalle 9			1,30	1,00	1,30
	Detalle 10			7,42	1,00	7,42
	Detalle 11			7,05	1,00	7,05
	Detalle 12			7,09	1,00	7,09
	Detalle 13			7,22	1,00	7,22
	Detalle 14			1,87	1,00	1,87
	Detalle 15			2,43	1,00	2,43
	Detalle 16			0,53	1,00	0,53
	Detalle 17			5,87	1,00	5,87
	Detalle 18			6,24	1,00	6,24
	Detalle 19			3,30	1,00	3,30
	Detalle 20			1,78	1,00	1,78
	Detalle 21			3,28	1,00	3,28
	Detalle 22			6,63	1,00	6,63
	Detalle 23			6,70	1,00	6,70
						-
						-
					SUBTOTAL	87,55
					VIENE	635,00
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	722,55
					COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 8	- 229,56
					PRESENTE ACTA	492,99

REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09


MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	2 DE 2

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-116	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Refuerzo filos y dilataciones en muros y columnas		UNIDAD:	ML

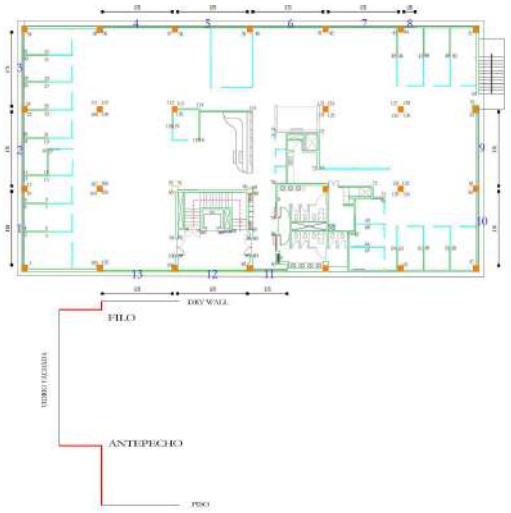PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						-
						-
						-
	Refuerzo esquina muros y columnas	2,40			132,00	316,80
						-
	Refuerzo dinteles					-
	D - 1			6,65	1,00	6,65
	D - 2			6,70	1,00	6,70
	D - 3			6,70	1,00	6,70
	D - 4			6,70	1,00	6,70
	D - 5			6,70	1,00	6,70
	D - 6			6,70	1,00	6,70
	D - 7			6,75	1,00	6,75
	D - 8			1,09	1,00	1,09
	D - 9			6,70	1,00	6,70
	D - 10			6,70	1,00	6,70
	D - 11			3,75	1,00	3,75
	D - 12			6,70	1,00	6,70
	D - 13			6,70	1,00	6,70
	Nicho			3,30	2,00	6,60
	Nicho			1,75	2,00	3,50
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	405,44
					VIENE	229,56
					PRESENTE ACTA	635,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

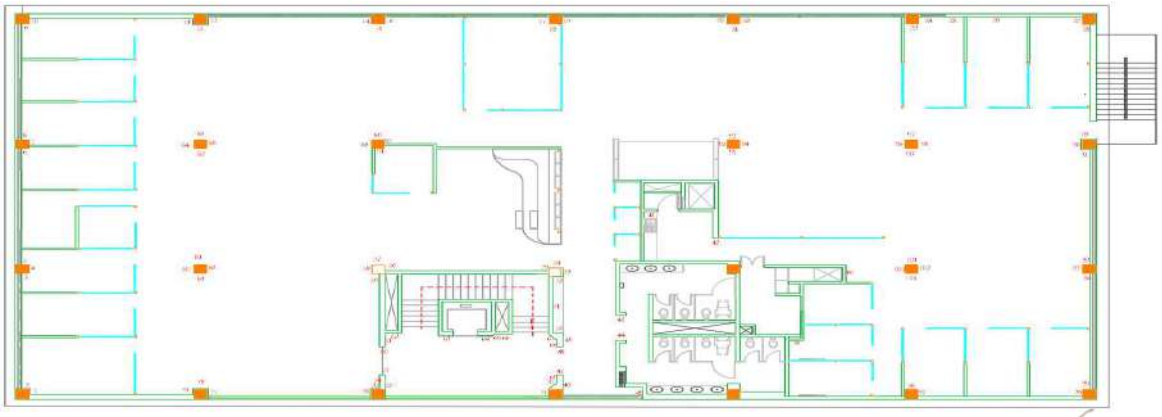

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09


MEMORIAS DE CANTIDADES - PRIMER PISO - EDIFICIO TECNOLOGIA FNA

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	1 DE 4

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-127	DESCRIPCION ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATES DE ESQUINA PARA ENCHAPES EN WING EN ALUMINIO		UNIDAD:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

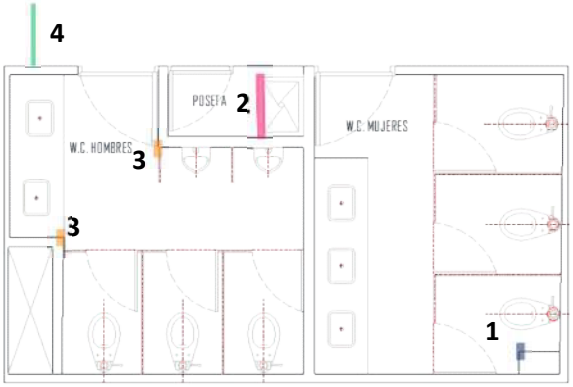

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO TECNOLOGIA					-
PRIMER PISO					-
Baño mujeres					-
Ducto (1)	2,74			1,00	2,74
					-
Poceta					-
Lavatraperos (2)		0,68		2,00	1,36
					-
Baño Hombres					-
Esquina (3)	2,74			2,00	5,48
					-
ESQUINERO DE ESCALON (4)		0,94		1,00	0,94
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					10,52
VIENE					87,75
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					98,27
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 8					-
PRESENTE ACTA					98,27











OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	2 DE 4

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-127	DESCRIPCION ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATES DE ESQUINA PARA ENCHAPES EN WING EN ALUMINIO		UNIDAD:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

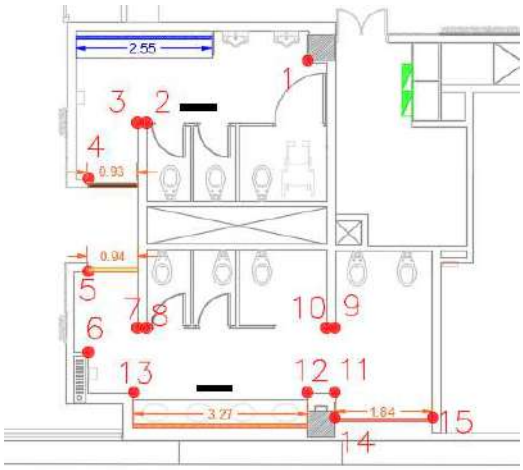

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CUARTO PISO					-
ZONA DE BAÑOS					-
win lavamanos hombres			2,55	1,00	2,55
win lavamanos mujeres			3,27	1,00	3,27
					-
Win puertas acceso 4			2,00	1,00	2,00
Win puertas acceso 5			2,00	1,00	2,00
Win puertas acceso hombres			0,93	1,00	0,93
Win puertas acceso mujeres			0,94	1,00	0,94
					-
Win vertical hombres (1-2-3)			2,40	3,00	7,20
Win vertical hombres (6-7-8-9-10-11-12-13)			2,40	8,00	19,20
					-
Win vertical hombres (14-15)			0,60	2,00	1,20
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					39,29
VIENE					48,46
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					87,75







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	3 DE 4

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-127	DESCRIPCION ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATES DE ESQUINA PARA ENCHAPES EN WING EN ALUMINIO		UNIDAD:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

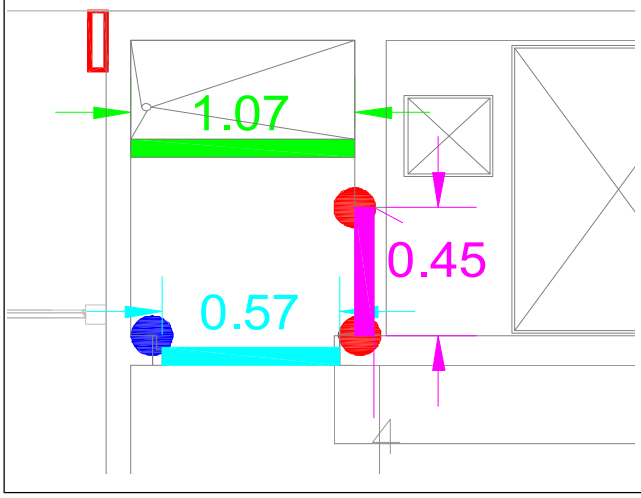

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					
CUARTO PISO					
ZONA DE BAÑOS					
win poseta			1,07	2	2,14
verticales ducto	1,65			2	3,30
horizontales ducto			0,45	2	0,90
verticales puerta acceso	2,08			1	2,08
horizontales puerta acceso			0,57	1	0,57
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	8,99
				VIENE	39,47
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	48,46

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09


MEMORIAS DE CANTIDADES -BAÑOS - SEGUNDO PISO - EDIFICION CNA

PERIODO	1-02-2026 AL 28-02-2026	HOJA	4 DE 4

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	9	FECHA 28/02/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-127	DESCRIPCION ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATES DE ESQUINA PARA ENCHAPES EN WING EN ALUMINIO		UNIDAD:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

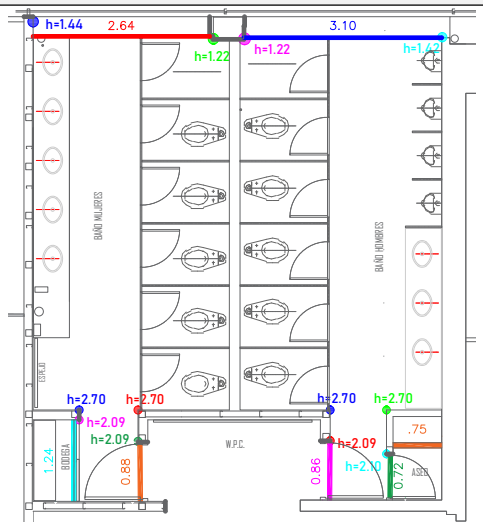

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CNA - PISO 2					
BAÑO DE MUJERES					
win ventana fondo	1,44			1	1,44
	1,22			1	1,22
			2,64	1	2,64
bodega	2,7			1	2,70
puerta bodega	2,09			1	2,09
	1,24			2	2,48
puerta de acceso principal	0,88			1	0,88
	2,09			1	2,09
	2,7			1	2,70
BAÑO DE HOMBRES					0,00
ventana fondo	1,22			1	1,22
	1,42			1	1,42
			3,1	1	3,10
poseta de aseo			0,75	2	1,50
puerta poseta			0,72	2	1,44
	2,1			2	4,20
	2,7			1	2,70
púerta principal	2,7			1	2,70
	2,09			1	2,09
			0,86	1	0,86
					-
					-
				SUBTOTAL	39,47
				VIENE	-
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	39,47

REGISTRO FOTOGRÁFICO








OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 10

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-016-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	miércoles 20 de mayo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5,142,932,606.00
VALOR CORTE 10	$ 1,199,971,940.00
martes, 31 de marzo de 2026	

1-03-2026 AL 20-03-2026

658,033,276.00 658,033,276.00

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 10			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		CORTE 07		CORTE 08		CORTE 09		CORTE 10		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
	REPARACIONES LOCATIVAS GENERALES SEDE PRINCIPAL				262,698,449.13	-	-	-	12,160,064.04	-	104,788,869.00	-	49,597,308.27	-	-	-	26,476,618.12	-	26,366,367.14	-	36,947,261.48	-	4,905,645.92	-	1,466,285.40		262,698,449.13			-
1.1.	Retiro, reparación y reposicion puntual de junta entre laminas (junta con factor forma 2cms/1cm), mediante el uso de fondo de junta tipo sika rod y sello elastomérico de poliuretano en color negro, con alta resistencia a la intemperie incluye andamio colgante o toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.	ml	0.00	15,908.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,908.00	-
1.2.	Pintura exterior tipo coraza para muros sobre pañete incluye toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.	m2	498.00	42,081.00	20,956,251.73	-	-			-	100.11	4,212,643.00	-	-	-	-	293.52	12,351,615.12	104.37	4,391,993.97		-		-		-	498.00	20,956,251.73	-	42,081.00	-
2.1.	Retiro de impermeabilización existente y mortero de nivelación. Incluye el retiro y disposición final de escombros (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").	m2	1233.01	29,570.00	36,460,105.70	-	-	214.28	6,336,259.60		-	1,018.73	30,123,846.10	-	-		-		-		-		-		-		1,233.01	36,460,105.70	-	29,570.00	-
2.2.	Instalación de mortero de nivelación con materiales de SIKA o similares características, previo a la instalación de la impermeabilización (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").	m2	0.00	62,971.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,971.00	-
2.3.	Impermeabilización de placa de cubierta plana transitable, no ventilada, con piso fijo, tipo convencional, para tráfico peatonal privado. Tipo Sika o de similares características con uso de mantos asfálticos, tipo bicapa (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").	m2	162.38	126,524.00	20,544,967.12	-	-	-	-	162.38	20,544,967.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.38	20,544,967.12	-	126,524.00	-
2.4.	Desmonte de ventaneria con vidrios en celosia ubicados en cubita de cubierta en el edificio CNA.	m2	0.00	52,493.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,493.00	-
2.5.	Suministro e instalación de sistema de ventanas en vidrio fijas (sin bisculante) en reemplazo de las ventanas en vidrio retiradas, ubicados en cubita de cubierta en el edificio CNA.	m2	0.00	297,835.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297,835.00	-
2.6.	Retiro de canaletas existentes y suministro e instalación de canaletas metálicas de sección trapezoidal elaboradas en acero galvanizado calibre 16 de acuerdo con las necesidades técnicas de la cubierta de aguas lluvia, incluye la instalación de la soportería para el anclaje de la canaleta en el edificio CNA.	ml	0.00	121,951.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,951.00	-
2.7.	Retiro de instalación existente y suministro e instalación de sosocs para la bajante de agua lluvia ø 4" en PVC con su respectivo sifón para evitar malos olores, incluye la instalación de la soportería para el anclaje en el edificio CNA.	und	0.00	86,553.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,553.00	-
2.8.	Limpieza y mantenimientos de tubería bajante de agua lluvia ø 4" en PVC, en el edificio CNA.	und	0.00	94,430.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,430.00	-
3.1.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros.	m2	113.21	37,322.00	4,225,223.62	-	-	80.00	2,985,760.00		-	33.21	1,239,463.62	-	-		-		-		-		-		-		113.21	4,225,223.62	-	37,322.00	-
3.2.	Mantenimiento de cielo raso en fibra mineral. Incluye cambio, pintura y/o readilización de láminas en fibra mineral, instalación de anclajes y arreglo de perfilería descolgada y colocación de soportes.	m2	32.79	34,073.00	1,117,253.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.95	747,902.35	-	-	3.04	103,581.92	7.80	265,769.40	32.79	1,117,253.67	-	34,073.00	-
3.3.	Suministro e instalación cielo raso PVC de 10 mm de espesor, incluye estructura, perforaciones para las luminarias. A todo costo.	m2	0.00	94,144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,144.00	-
3.4.	Suministro e instalación cielo raso en drywall de 1/2" de espesor a una sola cara, incluye estructura, perforaciones luminarias. A todo costo.	m2	136.02	127,042.00	17,280,252.84	-	-	8.32	1,056,989.44		-	127.70	16,223,263.40	-	-		-		-		-		-		-		136.02	17,280,252.84	-	127,042.00	-
4.1.	Cambio de válvula antivandálica de empotrar tipo push para sanitarios institucionales de consumo de agua 4.85 lpf (1.28 gpf) tipo corona o similar. Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. A todo costo con la instalación de un enchape de similares características a las originales.	und	22.00	1,200,516.00	26,411,352.00	-	-	-	-	11.00	13,205,676.00	-	-	-	-	6.00	7,203,096.00				-	4.00	4,802,064.00	1.00	1,200,516.00	22.00	26,411,352.00	-	1,200,516.00	-
4.2.	Cambio de grifería para lavamanos de empotrar a muro tipo push aplicación institucional de consumo 0,4 - 1.9 litros, tipo corona o similar incluye desmonte y reinstalación de aparatos. A todo costo con la instalación de un enchape de similares características a las originales.	und	22.00	729,335.00	16,045,370.00	-	-	-	-	9.00	6,564,015.00	-	-	-	-	6.00	4,376,010.00			7.00	5,105,345.00		-		-	22.00	16,045,370.00	-	729,335.00	-
4.3.	Cambio de válvula antivandálica de empotrar tipo push para orinales institucionales de consumo de agua 0.5 a 1.9 lpf (0.13 a 0.5 gpf). tipo corona o similar. Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. A todo costo con la instalación de un enchape de similares características a las originales.	und	6.00	1,209,112.00	7,254,672.00	-	-	-	-	4.00	4,836,448.00	-	-	-	-	2.00	2,418,224.00				-		-		-	6.00	7,254,672.00	-	1,209,112.00	-
4.4.	Desmonte de divisiones metálicas para baños. Incluye soportería, tornillos, herrajes, retiro y disposición final.	m2	95.26	39,579.00	3,770,295.54	-	-	45.00	1,781,055.00		-	15.25	603,579.75	-	-		-	35.01	1,385,660.79		-		-		-	95.26	3,770,295.54	-	39,579.00	-
4.5.	Suministro e instalación de divisiones de baño en acero inoxidable por ambas caras calibre 22, aleación 304 acabado satinado tipo SOCODA o similar. Con puerta, anclajes y accesorios necesarios para su instalación y correcto funcionamiento.	m2	97.81	1,005,111.00	98,309,906.91	-	-	-	-	45.00	45,229,995.00	1.40	1,407,155.40	-	-		-	19.73	19,830,840.03	31.68	31,841,916.48		-		-	97.81	98,309,906.91	-	1,005,111.00	-

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 10

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-010-2024
CONTRATISTA	FNA - 186 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

1-03-2026 AL 31-03-2026

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	miércoles 20 de mayo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5,142,932,606.00
VALOR CORTE 10	$ 1,199,971,940.00
martes, 31 de marzo de 2026	

658,033,276.00 658,033,276.00

ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 10			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		CORTE 07		CORTE 08		CORTE 09		CORTE 10		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
4.6.	Limpieza con sonda de tubería sanitaria en diferentes diámetros, actividad para ejecutar por punto.	und	93.00	109,625.00	10,195,125.00	-	-	-	-	93.00	10,195,125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.00	10,195,125.00	-	109,625.00	-
5.1.	Desmonte de puerta en madera de 1.44 m x2.47 m, incluye marco y rebro.	und	1.00	127,673.00	127,673.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	127,673.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	127,673.00	-	127,673.00	-
5.2.	Suministro e instalación de puerta de acceso a cubierta en aluminio de dos hojas: una de 0.90 m x 2.47 m y otra de 0.54 m x 2.47 m. Incluye bisagras cerradura, cantonera marco y accesorios necesarios para su funcionamiento.	und	0.00	1,192,289.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,192,289.00	-
6.1.	Resanes y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre safete o resello liso. A todo costo.	m2	0.00	33,744.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,744.00	-
	TOTAL REPARACIONES LOCATIVAS : EDIFICIO CNA - PISO 2				88,635,180.43		71,974,262.62		10,754,525.00		7,869,740.00	-	7,114,659.60	-	-		47,173,783.91		9,738,522.92	-	-		65,980,313.62	-	-		88,635,180.43	-	-	-
1.1.	Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.	m2	83.48	47,734.00	3,984,834.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.48	3,984,834.32	-	-	-	-	-	-	-	-	83.48	3,984,834.32	-	47,734.00	-
1.2.	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	m2	17.13	49,324.00	844,920.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.13	844,920.12	-	-	-	-	-	-	-	-	17.13	844,920.12	-	49,324.00	-
1.3.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros.	m2	698.10	35,224.00	24,589,874.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	698.10	24,589,874.40	-	-	-	-	-	-	-	-	698.10	24,589,874.40	-	35,224.00	-
1.4.	Desmonte de redes eléctricas existentes. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	glb	0.33	12,717,035.00	4,196,621.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	4,196,621.55	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	4,196,621.55	-	12,717,035.00	-
1.5.	Desmonte de puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	und	106.00	93,786.00	9,941,316.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.00	9,941,316.00	-	-	-	-	-	-	-	-	106.00	9,941,316.00	-	93,786.00	-
1.6.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo.	m2	39.02	92,676.00	3,616,217.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.02	3,616,217.52	-	-	-	-	-	-	-	-	39.02	3,616,217.52	-	92,676.00	-
2.1.	Suministro e instalación de columnetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre 12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye platina soldada a la base y anclajes a placa de piso y retiro de escombros.	ml	0.00	198,521.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	198,521.00	-
2.2.	Suministro e instalación de viguetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye soldadura a columnetas y retiro de escombros.	ml	0.00	181,351.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,351.00	-
3.1.	Suministro e instalación de muro en Superboard de 8 mm, altura 2.40 m a dos caras. Incluye estructura metálica, anclaje, cinta, estuco y fondeo de acabado en pintura en vinilo tipo 1.	m2	0.00	199,697.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,697.00	-
4.1.	Suministro e instalación de cielorraso en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura. A todo costo.	m2	25.55	128,125.00	3,273,593.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.55	3,273,593.75	-	-	-	-	-	-	25.55	3,273,593.75	0.00	128,125.00	-
4.2.	Suministro e instalación de Frescaza Eco Sin Papel 3 1/2" para cielorraso en Drywall. A todo costo.	m2	0.00	32,499.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,499.00	-
5.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad. Incluye plástico aislante y yumbalon de acuerdo a las características técnicas y el guardaescobas.	m2	0.00	189,748.00	-	379.32	71,974,262.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379.32	71,974,262.62	-	-	-	-	-	189,748.00	-
6.1.	Suministro e instalación de alimentador 1N°12 Fase+1N°12 Neutro+1N°12 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	0.00	19,944.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,944.00	-
6.2.	Suministro e instalación de alimentador a tableros en 3N°2/0 Fase+1N°2/0 Neutro+1N°2 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	0.00	363,569.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363,569.00	-
6.3.	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble, cumpliendo norma RETIE.	und	82.00	153,691.00	12,602,662.00	-	-	43.00	6,608,713.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.00	5,993,949.00	-	-	82.00	12,602,662.00	-	153,691.00	-
6.4.	Suministro e instalación de salida interruptor sencillo o doble 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación y conductores. Cumpliendo norma RETIE.	und	0.00	173,282.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173,282.00	-
6.5.	Suministro e instalación de lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x4x7cm. Largo de la guaya: 100cm, incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	0.00	318,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,520.00	-
6.6.	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	38.00	224,564.00	8,533,432.00	-	-	3.00	673,692.00	35.00	7,859,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.00	8,533,432.00	-	224,564.00	-
6.7.	Suministro e instalación de panel LED de gran formato redondo de 24W, luz neutra 4000K, dimensiones 100 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	0.00	190,825.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,825.00	-
6.8.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	0.00	176,599.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176,599.00	-
6.9.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia de aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	0.00	195,508.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,508.00	-
6.10.	Suministro e instalacion de salida tomacorriente doble polo a tierra (nat normal), monofásico 120V 15A, 3m prom en cable No 12 LSHF AWG, elementos de fijación y	und	20.00	173,606.00	3,472,120.00	-	-	20.00	3,472,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	3,472,120.00	-	173,606.00	-
6.11.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 a 3/4" oculta sobre cielo o en muros. Cumpliendo norma RETIE.	m	0.00	16,035.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,035.00	-

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 10

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

1-03-2026 AL 31-03-2026

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	miércoles 20 de mayo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5,142,932,606.00
VALOR CORTE 10	$ 1,199,971,940.00
	martes, 31 de marzo de 2026

658,033,276.00 658,033,276.00

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 10			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		CORTE 07		CORTE 08		CORTE 09		CORTE 10		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
6.12.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit EMT ø 3" oculta sobre cielo o en muros.	ml	0.00	155,392.00	-	-	-					-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	155,392.00	-
6.13.	Suministro e instalación de ducto cerrado de 40X6 galvanizado o con pintura electrostática.	ml	0.00	293,413.00	-	-	-					-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	293,413.00	-
6.14.	Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico tetrafilar con espacio para totalizador y barraje neutro y tierra. Incluye totalizador y protecciones.	und	0.00	3,460,340.00	-	-	-					-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	3,460,340.00	-
7.1.	Suministro e instalación de Vidrios Templado 8 mm para divisiones de oficina incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	0.00	830,396.00	-	-	-					-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	830,396.00	-
7.2.	Suministro e instalación de Puerta en Vidrio Templado 8 mm con Pivote, incluye topes de piso, accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento a todo costo.	m2	0.00	856,303.00	-	-	-					-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	856,303.00	-
7.3.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho a todo costo de uso interior y exterior.	ml	0.00	85,101.00	-	-	-					-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	85,101.00	-
7.4.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho de uso interior y exterior, con corte de letras para identificar las oficinas en vidrio. A todo costo.	und	0.00	139,113.00	-	-	-					-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	139,113.00	-
8.1.	Suministro e instalación de Puerta en madecor entamborada de 0,90 m de ancho por 2,20 m de alto, incluye marcos, chapa, cantoneras y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	0.00	1,145,405.00	-	-	-					-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	1,145,405.00	-
9.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores blancos. A todo costo, incluye lineales.	m2	191.28	37,195.00	7,114,659.60	-	-					191.28	7,114,659.60	-	-					-	-	-	-	-	-	191.28	7,114,659.60	-	37,195.00	-
9.2.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos cielo falsos blancos. A todo costo, incluye lineales.	m2	161.49	40,033.00	6,464,929.17	-	-					-	-	-	-			161.49	6,464,929.17	-	-	-	-	-	-	161.49	6,464,929.17	-	40,033.00	-
	REPARACIONES LOCATIVAS CASINO - EDIFICIO CONVENCIONES				83,544,506.28		79,297,346.28		-		-	-	-	-	-		-		4,247,160.00		-		-		-	-	83,544,506.28		-
5.5.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad, para la zona de mesas del restaurante Incluye nivelación en zonas puntuales, plástico antiante, yumbolon de acuerdo con las características técnicas y el guardaescobas.	m2	352.36	189,748.00	66,859,605.28	352.36	66,859,605.28					-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	352.36	66,859,605.28	-	189,748.00	-
9.1.	Suministro e instalación de estructura decorativa para plantas colgantes de 6,85m ancho x 1,00 m de profundo con viguetas cada 0,76 m en tubería metálica cuadrada 50x50x2.0mm con acabado en pintura electrostática negro mate incluye 6 puntos de apoyo en guaya de tipo colgante. incluye 3 lamparas segun imagen.	und	1.60	3,245,844.00	5,193,350.40	1.00	3,245,844.00					-	-	-	-			0.60	1,947,506.40	-	-	-	-	-	-	1.60	5,193,350.40	-	3,245,844.00	-
9.2.	Suministro e instalación de estructura para microsondas con módulos de 0,71 m de largo 0,56 m de profundo y 0,40 m de alto en tubería metálica cuadrada 50x50x0.0mm en pintura electrostática negro mate incluye 2 superficies en madera tipo madecor RH de 1" cada módulo y anclajes a la pared no visibles.	und	11.00	835,627.00	9,191,897.00	11.00	9,191,897.00					-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	11.00	9,191,897.00	-	835,627.00	-
11.1.	Resanes y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre pañete o regelle liso. Incluyen andamios, escaleras y sistemas de seguridad de operación. A todo costo.	m2	68.15	33,744.00	2,299,653.60	-	-					-	-	-	-			68.15	2,299,653.60	-	-	-	-	-	-	68.15	2,299,653.60	-	33,744.00	-
	REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CONVENCIONES - PISO 4				1,087,684,599.56		190,840,084.88		23,658,562.86		600,169.00	-	102,099,414.86	-	57,326,417.60		35,990,378.52		80,160,434.66		209,185,353.26		196,765,173.48		114,177,589.80		990,853,557.90	-		96,831,042.66
1.1.	Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.	m2	341.17	47,734.00	16,285,408.78	47.71	2,277,389.14	8.25	393,805.50		-	137.60	6,568,198.40	-	-		-	18.91	902,649.94		-		-	128.70	6,143,365.80	341.17	16,285,408.78	-	47,734.00	-
1.2.	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	m2	664.73	95,354.00	63,384,664.42	125.23	11,941,181.42	3.68	350,902.72		-	118.05	11,256,539.70	-	-	268.28	25,581,571.12	10.83	1,032,683.82		-		-	138.66	13,221,785.64	664.73	63,384,664.42	-	95,354.00	-
1.3.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros	m2	1130.82	35,224.00	39,832,003.68	455.25	16,035,726.00				-	433.59	15,272,774.16	-	-		-	28.39	1,000,009.36	69.63	2,452,647.12		-	143.96	5,070,847.04	1,130.82	39,832,003.68	-	35,224.00	-
1.4.	Desmonte de redes eléctricas existentes. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	glb	1.00	6,775,716.00	6,775,716.00	1.00	6,775,716.00				-	-	-	-	-		-	-	-		-		-		-	1.00	6,775,716.00	-	6,775,716.00	-
1.5.	Desmonte puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposicion que el Fondo Nacional del Ahorro S.A. indique.	und	150.00	93,786.00	14,067,900.00	79.00	7,409,094.00				-	71.00	6,658,806.00				-		-		-		-		-	150.00	14,067,900.00	-	93,786.00	-
1.6.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo	m2	26.58	92,676.00	2,463,328.08	18.00	1,668,168.00				-	-	-	-	-		-	8.58	795,160.08		-		-		-	26.58	2,463,328.08	-	92,676.00	-
2.1.	Suministro e instalación de columnetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre 12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye platina soldada a la base y anclajes a placa de piso y retiro de escombros.	ml	165.10	198,521.00	32,775,817.10	-	-				-	-	-	-	-		-		-	157.48	31,263,087.08		-	7.62	1,512,730.02	165.10	32,775,817.10	-	198,521.00	-
2.2.	Suministro e instalación de viguetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye soldadura a columnetas y retiro de escombros	ml	127.68	181,351.00	23,154,895.68	-	-				-	-	-	-	-		-		-	122.50	22,215,497.50		-	5.18	939,398.18	127.68	23,154,895.68	-	181,351.00	-
2.3.	Suministro e instalación perfiles WPC textura madera. Para instalar en muros divisorios de dimensiones 10 cm x 5 cm. Incluye estructura anclajes y retiro de escombros.	m2	0.00	234,409.00	-	-	-				-	-	-	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	234,409.00	-
3.1.	Suministro e instalación de muro en Superboard, altura 2.40 m. a dos caras incluye estructura, anclaje, cinta, estuco y fondeo de acabado en pintura en vinilo tipo 1.	m2	176.60	156,903.00	27,709,069.80	-	-				-	-	-	-	-		-	128.60	20,177,725.80		-		-	48.00	7,531,344.00	176.60	27,709,069.80	-	156,903.00	-
4.1.	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall de 1/2" en diferentes niveles a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura a 3 manos. A todo costo.	m2	972.58	113,010.00	109,911,265.80	-	-				-	551.66	62,343,096.60	320.46	36,215,184.60	58.14	6,570,401.40	42.32	4,782,583.20		-		-		-	972.58	109,911,265.80	-	113,010.00	-
5.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad Incluye plastico antiante y yumbolon, de acuerdo a las caracteristicas técnicas y el guardaescobas.	m2	1120.05	189,748.00	212,527,247.40	315.09	59,788,414.57	120.76	22,913,854.63		-	-	-	-	-		-		-		-	684.20	129,824,978.20		-	1,120.05	212,527,247.40	-	189,748.00	-

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 10

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 186 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

1-03-2026 AL 20-03-2026

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	miércoles 20 de mayo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5,142,932,606.00
VALOR CORTE 10	$ 1,199,971,940.00
martes, 31 de marzo de 2026	

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 10			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		CORTE 07		658,033,276.00 CORTE 08		658,033,276.00 CORTE 09		CORTE 10		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
6.1.	Suministro e instalación de alimentador 1N°12 Fase+1N°12 Neutro+1N°12 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	1642.48	19,842.00	32,590,088.16	-	-		-		-		-		-		-		-	1,300.00	25,794,600.00		-	342.48	6,795,488.16	1,642.48	32,590,088.16	-	19,842.00	-
6.2.	Suministro e instalación de alimentador a tableros en 3N°2/0 Fase+1N°2/0 Neutro+1N°2 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	40.00	220,320.00	8,812,800.00	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	40.00	220,320.00	8,812,800.00
6.3.	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	317.00	147,631.00	46,799,027.00	-	-		-		-		-	143.00	21,111,233.00	26.00	3,838,406.00		-		-	136.00	20,077,816.00	12.00	1,771,572.00	317.00	46,799,027.00	-	147,631.00	-
6.4.	Suministro e instalación de salida interruptor sencillo o doble 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH40 3/4", elementos de fijación y conductores. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	6.00	166,320.00	997,920.00	-	-		-		-		-		-		-		-		-	6.00	997,920.00		-	6.00	997,920.00	-	166,320.00	-
6.5.	Suministro e instalación de Lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x4x7cm. Largo de la guaya: 100cm incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	0.00	300,264.00	-	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	300,264.00	-
6.6.	Reinstalación de panel LED cuadrado de dimensiones 60x60 cm preexistentes. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	0.00	103,354.00	-	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	103,354.00	-
6..7	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	8.00	209,700.00	1,677,600.00	-	-		-		-		-		-		-		-	8.00	1,677,600.00		-		-	8.00	1,677,600.00	-	209,700.00	-
6.8.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	23.00	220,546.00	5,072,558.00	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-	23.00	5,072,558.00	23.00	5,072,558.00	-	220,546.00	-
6.9.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	0.00	198,472.00	-	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	198,472.00	-
6.10.	Suministro e instalación Salida tomacorriente doble polo a tierra (red normal), monofásico 120V 15A, 3m prom en cable No 12 LSHF AWG, elementos de fijación y conductores. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	519.00	173,606.00	90,101,514.00	-	-		-		-		-		-		-		-		-	12.00	2,083,272.00		-	12.00	2,083,272.00	507.00	173,606.00	88,018,242.00
6.11.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	439.28	16,035.00	7,043,854.80	-	-		-		-		-		-		-		-		-	136.20	2,183,967.00	303.08	4,859,887.80	439.28	7,043,854.80	-	16,035.00	-
6.12.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit EMT ø 3" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	0.00	155,392.00	-	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	155,392.00	-
6.13.	Suministro e instalación de ducto cerrado de 40X6 galvanizado o con pintura electrostática. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	0.00	317,627.00	-	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	317,627.00	-
6.14.	Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico tetrafilar con espacio para totalizador y barraje neutro y tierra, incluye totalizador y protección. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	0.00	3,460,340.00	-	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	3,460,340.00	-
7.1.	Suministro e Instalación de barra de comida en acero inoxidable calibre 22. de 45 cms de ancho incluye soporte en estructura metálica a pared.	ml	0.00	1,416,162.00	-	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	1,416,162.00	-
7.2.	Suministro e instalación de mueble de cocina de 1.60x0.60x0.90m en madera RH y en acero inoxidable, incluye grifería y accesorios de desagüe.	und	0.00	2,569,025.00	-	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	2,569,025.00	-
8.1.	Suministro e instalación de vidrio templado 8 mm para divisiones de oficina incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	261.96	856,266.00	224,310,249.91	99.20	84,944,395.75		-		-		-		-		-		-	105.66	90,473,065.56		-	57.10	48,892,788.60	261.96	224,310,249.91	-	856,266.00	-
8.2.	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado 8 mm con pivote, incluye topes de piso, accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento a todo costo.	m2	48.44	858,737.00	41,597,220.28	-	-		-		-		-		-		-		-		-	48.44	41,597,220.28		-	48.44	41,597,220.28	-	858,737.00	-
8.3.	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de 8 mm con sistema antipanico. Incluye topes de piso y accesorios para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	0.00	1,607,888.00	-	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	1,607,888.00	-
8.4.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho, de uso interior y exterior. A todo costo.	ml	0.00	82,644.00	-	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	82,644.00	-
8.5.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho, de uso interior y exterior, con corte de letras para identificar las oficinas en vidrio. A todo costo.	und	0.00	139,113.00	-	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	139,113.00	-
9.1.	Suministro e instalación de puerta en madecor entamborada de 0,90 m de ancho por 2,20 m de alto, incluye marcos chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	18.00	1,145,405.00	20,617,290.00	-	-		-		-		-		-		-		-	12.00	13,744,860.00		-	6.00	6,872,430.00	18.00	20,617,290.00	-	1,145,405.00	-

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 10

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	miércoles 20 de mayo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5,142,932,606.00
VALOR CORTE 10	$ 1,190,971,940.00
martes, 31 de marzo de 2026	

1-03-2026 AL 25-03-2026

658,033,276.00 658,033,276.00

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 10			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		CORTE 07		CORTE 08		CORTE 09		CORTE 10		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
9.2.	Suministro e instalación de superficie de madera ancho 40cm y 3 cm de espesor, para instalar en muros bajos, correspondientes a la barra para computadores y zonas de estancia.	ml	89.71	354,159.00	31,771,603.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.59	27,125,037.81		-	-	-	13.12	4,646,566.08	89.71	31,771,603.89	-	354,159.00	-
10.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores blanco. A todo costo, incluye lineales.	m2	816.41	32,772.00	26,755,388.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.57	4,344,584.04	658.00	21,563,976.00	-	-	25.84	846,828.48	816.41	26,755,388.52	-	32,772.00	-
10.2.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos cielo falsos blanco. A todo costo, incluye lineales.	m2	0.00	39,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,060.00	-
10.3.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores azul institucional. A todo costo, incluye lineales.	m2	17.48	37,195.00	650,168.60	-	-	-	-	17.48	650,169.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.48	650,168.60	-	37,195.00	-
10.4.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores verde institucional. A todo costo, incluye lineales.	m2	0.00	37,195.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,195.00	-
	REPARACIONES LOCATIVAS - TORRE DE TECNOLOGÍA - PISO 2				1,705,081.04		57,849,827.36		-		-	-	-	-	-	-	-		1,705,081.04		-		57,849,827.37		-		1,705,081.04	-	-
1.1.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall, incluye desmonte de 113 luminarias tipo panel Led de 60 x 60 luz neutra 4000K y retiro con su disposición final de escombros.	m2	0.00	37,322.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,322.00	-
1.2.	Desmonte de puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposicion que el fondo Nacional del Ahorro indique.	und	0.00	93,786.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,786.00	-
1.3.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, enluco. A todo costo.	m2	0.00	92,676.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,676.00	-
2.1.	Suministro e instalación de cielorraso en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, enluco y capa fondeo pintura. A todo costo.	m2	0.00	127,159.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,159.00	-
3.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 850 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad. Incluye plástico aislante y yumbolon de acuerdo a las características técnicas y el guardaescobas.	m2	0.00	189,748.00	-	304.88	57,849,827.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304.88	57,849,827.37	-	-	-	-	-	189,748.00	-
4.1.	Suministro e instalación de lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x4x7cm. Largo de la guaya: 100cm, incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	0.00	311,065.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311,065.00	-
4.2.	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	0.00	227,693.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227,693.00	-
4.3.	Reinstalación de panel LED cuadrado de dimensiones 60x60 cm luz neutra 4000K preexistentes. A todo costo, cumpliendo norma RETIE	und	0.00	96,211.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,211.00	-
4.4.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	0.00	210,033.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,033.00	-
4.5.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia de aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	0.00	195,508.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,508.00	-
5.1.	Suministro e instalación de Puerta en madecor entamborada de 0,90 m de ancho por 2,20 m de alto, incluye marcos, chapa, cantoneras y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	0.00	997,838.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	997,838.00	-
6.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores blancos. A todo costo, incluye lineales.	m2	48.88	34,883.00	1,705,081.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.88	1,705,081.04	-	-	-	-	-	-	48.88	1,705,081.04	-	34,883.00	-
	BOLSA DE ITEMS NO PREVISTOS (10%)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO BOLSA NP´s				$ 497,494,373.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497,494,373.83
	TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS - NPs				2,148,305,870.74	-	-	-	55,478,187.73	-	75,995,395.01	-	77,334,076.42	-	533,202,754.58	-	21,518,455.10	-	161,764,192.73	-	287,422,320.00	-	91,562,285.32	-	857,332,642.81	-	2,148,305,870.72	-	-	-
NP-01	Demolición placa maciza 0.15 mt en horarios autorizado por la entidad (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	m2	1753.88	49,331.00	86,520,726.28	-	-	46.23	2,280,646.13	-	-	769.13	37,941,962.03	21.55	1,063,083.05	-	-	28.40	1,401,000.40	-	-	-	-	888.57	43,834,046.67	1,753.88	86,520,726.28	-	49,331.00	-
NP-02	Suministro e instalación de mortero premezclado de nivelación bombeable, acelerado a 7 días con baja permeabilidad para zona de cubiertos, garantizando pendientes de desagues hacia los sifones.	m2	137.79	104,277.00	14,368,567.67	-	-	137.79	14,368,567.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137.79	14,368,567.67	-	104,277.00	-
NP-03	Demolición baldosa muro en horarios autorizados por la ENTIDAD (incluye retiro de material desde frente de obra al sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	m2	385.89	27,952.00	10,786,419.64	-	-	140.63	3,930,912.12	-	-	12.99	363,096.48	-	-	-	-	52.92	1,479,219.84	18.45	515,714.40	-	-	160.90	4,497,476.80	385.89	10,786,419.64	-	27,952.00	-
NP-04	Baldosa ceramica pared 30x60.	m2	329.39	142,571.00	46,961,233.58	-	-	31.15	4,441,713.96	73.76	10,516,607.24	42.12	6,005,090.52	-	-	-	-	74.61	10,637,222.31	-	-	96.04	13,692,518.84	11.70	1,668,080.73	329.39	46,961,233.58	-	142,571.00	-
NP-05	Baldosa ceramica piso 60x60.	m2	174.42	154,546.00	26,955,913.32	-	-	-	-	-	-	77.86	12,032,961.56	-	-	-	-	25.94	4,008,923.24	-	-	37.13	5,738,282.98	33.49	5,175,745.54	174.42	26,955,913.32	-	154,546.00	-
NP-06	Suministro e instalacion de cinta led en parte baja de gabinete superior de mueble de cocina.	und	1.00	260,334.00	260,334.00	-	-	1.00	260,334.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	260,334.00	-	260,334.00	-
NP-07	Desmonte y reinstalacion de rejillas de extraccion aire en cocina presidencia.	und	3.00	45,000.00	135,000.00	-	-	3.00	135,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	135,000.00	-	45,000.00	-

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 10

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

DURACIÓN CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	miércoles 20 de mayo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5,142,932,606.00
VALOR CORTE 10	$ 1,199,971,940.00
martes, 31 de marzo de 2026	

1-03-2026 AL 31-03-2026

658,033,276.00 658,033,276.00

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 10			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		CORTE 07		CORTE 08		CORTE 09		CORTE 10		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
NP-08	Desmonte redes electricas existentes, Incluye la disposición final fondo Nacional del Ahorro indique. (Zona de recepcion)	und	1.00	930,686.00	930,686.00		-		-	1.00	930,686.00	-	-	-	-		-		-		-		-	1.00	930,686.00	-	930,686.00	-
NP-09	Demolición de guardaescoba, (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	ml	193.05	14,785.00	2,854,244.25		-	120.00	1,774,200.00		-	22.13	327,192.05	-	-		-		-		-		50.92	752,852.20	193.05	2,854,244.25	-	14,785.00	-
NP-10	Desmonte espejo.	und	9.00	23,790.00	214,110.00		-	4.00	95,160.00		-	-	-	-	-		-	5.00	118,950.00		-		-		-	9.00	214,110.00	-	23,790.00	-
NP-11	Desmonte de cubierta en policarbonato.	m2	39.52	52,335.00	2,068,279.20		-	29.52	1,545,863.20		-	-	-	-	-		-	9.60	502,416.00		-		-		-	39.52	2,068,279.20	-	52,335.00	-
NP-12	Suministro e instalación de Policarbonato alveolar 8 mm para cubierta curva, incluye conectores y accesorios para su correcta instalación. No incluye estructura de soporte.	m2	35.77	443,800.00	15,872,728.90		-	25.00	11,093,002.90		-	-	-	-	-		-	10.77	4,779,726.00		-		-		-	35.77	15,872,728.90	-	443,800.00	-
NP-13	Mantenimiento marquesina cubierta de vidrio acceso, incluye: Revisión general, limpieza perimetral y limpieza de vidrios.	m2	17.45	58,150.00	1,014,746.58		-		-	17.45	1,014,746.58	-	-	-	-		-		-		-		-		-	17.45	1,014,746.58	-	58,150.00	-
NP-14	Lavado e hidrolugado de fachadas, muros en piedra y/o acabado aburardado	m2	216.78	51,032.00	11,062,716.96		-	216.78	11,062,716.96		-	-	-	-	-		-		-		-		-		-	216.78	11,062,716.96	-	51,032.00	-
NP-15	Suministro e instalacion de revestimiento interior de fachada en WPC Panel Casino, de acuerdo a muestra seleccionada.	m2	86.28	249,987.00	22,069,102.35		-	13.18	3,294,578.67	20.52	5,130,233.21	5.08	1,269,933.96	-	-		-		-		-	49.50	12,374,356.50		-	86.28	22,069,102.35	-	249,987.00	-
NP-16	Desmonte de aparatos sanitarios (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio (hasta 50 m) y desde sitio de acopio a escombrera).	und	61.00	40,607.00	2,477,027.00		-	25.00	1,015,175.00		-	-	-	-	-	13.00	527,891.00		-		-		-	23.00	933,961.00	61.00	2,477,027.00	-	40,607.00	-
NP-17	Desmonte de muro fachada imitacion madera (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera)	m2	9.92	16,161.00	160,317.12		-	9.92	160,317.12		-	-	-	-	-		-		-		-		-		-	9.92	160,317.12	-	16,161.00	-
NP-18	Suministro e instalación de sensor de presencia Infrarrojo 360° de cobertura, montaje en techo, detección de movimiento hasta 4 metros radiales a una altura de instalación de 2.4 metros.	und	41.00	210,035.00	8,611,435.00		-		-		-	5.00	1,050,175.00	-	-		-		-		-	32.00	6,721,120.00	4.00	840,140.00	41.00	8,611,435.00	-	210,035.00	-
NP-19	Suministro e instalación de enceres mobiles de inferior 220 X 90 X 63 y superior de 200X70X36 incluye campana extractora, puertas, manijas en acero tabular, bisagras de parche, entregaños, patas de 8 cm y manija en acero tubular. Modulo torre hornos de 200 X 60 X 60 con dos puertas parte alta y dos cajones parte baja central para horno. Tapa barra de 130 x 50 con patas en acero de 100 cm y anclaje a la pared. Todo elaborado en melamina de 15mm, color arena o glacial fabricado e instalado.	UND	2.00	12,900,000.00	25,800,000.00		-		-	1.00	12,900,000.00	-	-	-	-		-		-		-	1.00	12,900,000.00		-	2.00	25,800,000.00	-	12,900,000.00	-
NP-20	Mesón en quartzone blanco polar con huaco para estufa y lavaplatos, incluye pulida, poceta, salpicadero 8 cm y estufa x 4 puestos challenger para uso con gas propano.	UND	1.00	6,850,000.00	6,850,000.00		-		-	1.00	6,850,000.00	-	-	-	-		-		-		-		-		-	1.00	6,850,000.00	-	6,850,000.00	-
NP-21	Suministro e instalación punto de gas propano para estufa de presidencia, en tuberia pe al pe de 1/2" , con coraza de protección a la vista y accesorios de conexión con pases por muros. incluye suministro de 2 cilindros de 100 libras en gas propano, con valvula reguladora para cada cilindro, base (poyo) soporte para cilindros y caja metalica de protección de cilindros para la intemperie.	GLB	1.00	6,155,883.00	6,155,883.00		-		-	1.00	6,155,883.00	-	-	-	-		-		-		-		-		-	1.00	6,155,883.00	-	6,155,883.00	-
NP-22	Suministro e instalacion registro 1/2" agua potable	UND	3.00	89,688.00	269,064.00		-		-	2.00	179,376.00	1.00	89,688.00	-	-		-		-		-		-		-	3.00	269,064.00	-	89,688.00	-
NP-23	Jardineras artificiales de acuerdo a render incluye amarre plastico	ml	36.56	141,213.00	5,162,747.28		-		-	15.06	2,126,667.78	5.40	762,550.20	-	-		-		-		-		-	16.10	2,273,529.30	36.56	5,162,747.28	-	141,213.00	-
NP-24	Suministro e instalacion de extractor para cocina y baños (16 x 16 x 9 cm)	UND	9.00	196,410.00	1,767,690.00		-		-		-	9.00	1,767,690.00	-	-		-		-		-		-		-	9.00	1,767,690.00	-	196,410.00	-
NP-25	Demolicion de meson en grano de marmol de ventanilla barcelonitos	UND	1.00	89,351.00	89,351.00		-		-	1.00	89,351.00	-	-	-	-		-		-		-		-		-	1.00	89,351.00	-	89,351.00	-
NP-26	Desmonte de puiso de fachada en recepcion	UND	1.00	283,054.00	283,054.00		-		-	1.00	283,054.00	-	-	-	-		-		-		-		-		-	1.00	283,054.00	-	283,054.00	-
NP-27	Suministro e instalación de sanitario blanco institucional tipo adriatico o similar de entrada posterior no incluye puich	UND	19.00	1,146,999.00	21,792,981.00		-		-	11.00	12,616,989.00	-	-	-	-		-		-		-	2.00	2,293,998.00	6.00	6,881,994.00	19.00	21,792,981.00	-	1,146,999.00	-
NP-28	Suministro e instalación lavamanos blanco tipo cascada de baru o similar, no incluye grifería no incluye puch	UND	22.00	613,653.00	13,500,366.00		-		-	9.00	5,522,877.00	-	-	-	-		-		-		-	12.00	7,363,836.00	1.00	613,653.00	22.00	13,500,366.00	-	613,653.00	-
NP-29	Suministro e instalacion de carpa en lona para control de acceso en zona de recepcion	UND	1.00	3,605,351.00	3,605,351.00		-		-	1.00	3,605,351.00	-	-	-	-		-		-		-		-		-	1.00	3,605,351.00	-	3,605,351.00	-
NP-30	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	32.00	121,212.00	3,878,784.00		-		-	3.00	363,636.00	13.00	1,575,756.00	-	-		-		-	16.00	1,938,392.00		-		-	32.00	3,878,784.00	-	121,212.00	-
NP-31	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UND	20.00	163,414.00	3,268,280.00		-		-	1.00	163,414.00	10.00	1,634,140.00	-	-		-		-	9.00	1,470,726.00		-		-	20.00	3,268,280.00	-	163,414.00	-
NP-32	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	40.00	109,459.00	4,378,360.00		-		-	2.00	218,918.00	12.00	1,313,508.00	-	-		-		-	10.00	1,094,590.00		-	16.00	1,751,344.00	40.00	4,378,360.00	-	109,459.00	-
NP-33	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	0.00	129,358.00	-		-		-		-	-	-	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	129,358.00	-
NP-34	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	58.00	148,922.00	8,613,116.00		-		-	10.00	1,489,220.00	-	-	-	-	48.00	7,128,096.00		-		-		-		-	58.00	8,613,116.00	-	148,922.00	-
NP-35	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UND	8.00	109,645.00	877,160.00		-		-	4.00	438,580.00	-	-	-	-		-		-		-		-	4.00	438,580.00	8.00	877,160.00	-	109,645.00	-
NP-36	RED SANITARIA PVC-S 4"	ml	212.13	74,903.00	15,889,173.39		-		-	17.80	1,333,273.40	-	-	-	-	174.08	13,039,114.24	20.25	1,516,785.75		-		-		-	212.13	15,889,173.39	-	74,903.00	-
NP-37	RED SANITARIA PVC-S 3"	ml	20.71	61,047.00	1,264,283.37		-		-		-	-	-	-	-		-	20.71	1,264,283.37		-		-		-	20.71	1,264,283.37	-	61,047.00	-
NP-38	RED SANITARIA PVC-S 2"	ml	14.80	49,310.00	729,788.00		-		-		-	-	-	-	-		-		-		-		-	14.80	729,788.00	14.80	729,788.00	-	49,310.00	-
NP-39	RED SANITARIA PVC-VENTILACION 2"	ml	60.00	31,024.00	1,861,440.00		-		-	24.70	766,292.80	-	-	-	-		-		-	35.30	1,095,147.20		-		-	60.00	1,861,440.00	-	31,024.00	-
NP-40	Red suministro 1 1/4"	ml	89.68	36,089.00	3,236,461.52		-		-		-	-	-	-	-		-		-		-		-	89.68	3,236,461.52	89.68	3,236,461.52	-	36,089.00	-
NP-41	Red suministro 1"	ml	39.92	27,219.00	1,086,562.48		-		-		-	-	-	-	-		-		-		-		-	39.92	1,086,562.48	39.92	1,086,562.48	-	27,219.00	-
NP-42	Red suministro 3/4"	ml	9.11	20,862.00	190,052.82		-		-		-	-	-	-	-		-		-		-		-	9.11	190,052.82	9.11	190,052.82	-	20,862.00	-
NP-43	Red suministro 1/2"	ml	27.09	18,245.00	494,257.05		-		-		-	-	-	-	-		-		-		-		-	27.09	494,257.05	27.09	494,257.05	-	18,245.00	-
NP-44	Registro PVC-P 1 - 1/4"	UND	9.00	145,520.00	1,309,680.00		-		-		-	8.00	1,164,160.00	-	-		-		-		-		-		-	9.00	1,309,680.00	-	145,520.00	-
NP-45	Registro PVC-P 1"	UND	6.00	111,417.00	668,502.00		-		-		-	-	-	-	-		-		-		-		-		-	6.00	668,502.00	-	111,417.00	-
NP-46	Trasiego incluye traslado a sitio de acopio en bolsas de aproximadamente 25 kilos	m3	147.03	52,788.00	7,761,419.64		-		-		-	-	-	-	-		-		-		-	75.95	4,009,248.60	71.08	3,752,171.04	147.03	7,761,419.64	-	52,788.00	-

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 10

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	miércoles 20 de mayo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5,142,932,606.00
VALOR CORTE 10	$ 1,199,971,940.00
	martes, 31 de marzo de 2026

1-03-2026 AL 30-03-2026

658,033,276.00 658,033,276.00

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 10			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		CORTE 07		CORTE 08		CORTE 09		CORTE 10		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
NP-47	Construccion de Media caña en mortero 1:3	ml	296.37	47,206.00	13,990,442.22		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	296.37	13,990,442.22		-		-	296.37	13,990,442.22	-	47,206.00	-
NP-48	Suministro e instalación orinal tipo gotta o similar de entrada posterior no incluye grigeria ni incluye patch	un	6.00	1,037,619.00	6,225,714.00		-	-	-	-	-	4.00	4,150,476.00	-	-		-		-		-		2.00	2,075,238.00	6.00	6,225,714.00	-	1,037,619.00	-
NP-49	Desmonte de cubierta en lamina de zinc en cubierta de convenciones incluye estructura metalica de soporte, incluye retiro a sitio de acopio y disposición final.	m2	869.57	58,611.00	50,966,367.27		-	-	-	-	-	100.42	5,885,716.62	-	-		-		-		-		769.15	45,080,650.65	869.57	50,966,367.27	-	58,611.00	-
NP-50	Desmonte de ductos de aire acondicionado (incluye fibra de vidrio, transporte y disposición final)	ml	498.88	49,313.00	24,601,269.44		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	273.82	13,502,189.61	12.00	596,194.17	212.57	10,502,189.61	498.88	24,601,269.44	-	49,313.00	-
NP-51	Desmonte de ductos de red contraincendio en tuberia CPVC de varios diametros incluye soporteria. (Incluye traslego y disposición final)	ml	569.13	17,193.00	9,779,360.79		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	275.58	4,736,291.14		-	293.55	5,044,069.65	569.13	9,779,360.79	-	17,193.00	-
NP-52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Impermeabilización de placa poliurea pura RESISTENTE A RAYOS UV DANOCOAT 250 incluye suministro y aplicación de POLIUREA en 80 MILS +- 10%, ESPESOR TEXTURIZADA PREVIA IMPRIMACION EPOXICA BICOMPONENTE CON ARENA DE QUARZO EN UNA CAPA (si se requieren más se cobrarán por aparte), INCLUYE REACTOR GRACO, MATERIALES Y EQUIPOS CERTIFICADOS, PREVIO tratamiento de fisuras existentes. Acabado original gris cambia por rayos UV. Suministro y aplicación esmalte uretano gris o blanco resistente a Rayos UV color homogéneo como protección del sistema Poliurea.	M2	994.57	225,935.00	224,708,172.95		-	-	-	-	-	-	-	994.57	224,708,172.95		-		-		-		-		994.57	224,708,172.95	-	225,935.00	-
NP-53	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRATO DE MORTERO SECO CON BAJO CONTENIDO DE AGUA PARA NIVELACION DE CUBIERTAS CON ESPESORES PROMEDIO DE 8cm, SOBRE SUPERFICIE IRREGULAR RESULTADO DE DEMOLICION DE ELEMENTOS NO DESMONTADOS Y RETIRADOS EN LAS AREAS A INTERVENIR zona de cubiertas, granizando pendientes de desagues hacia los sifones. INCLUYE TRASEGO DE MATERIALES A SITIOS DE FUNDIDAS	M2	1581.38	138,890.00	219,637,868.20		-	-	-	-	-	-	-	768.71	106,766,131.90		-		-		-		-	812.67	112,871,736.30	1,581.38	219,637,868.20	-	138,890.00	-
NP-54	Demolicion de dados de concreto de 0.3 x 0.3 x 0.25 m, los cuales se encuentran en zona de cubierta incluye traslego y disposición final.	Und	80.00	57,437.00	4,594,960.00		-	-	-	-	-	-	-	80.00	4,594,960.00		-		-		-		-		80.00	4,594,960.00	-	57,437.00	-
NP-55	Desmonte de ducto de extrator incluye retiro 2 extractores tipo hongo incluye retiro y disposición final.	Und	3.00	223,054.00	669,162.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	3.00	669,162.00		-		-	3.00	669,162.00	-	223,054.00	-
NP-56	Desmonte de bandeja bandeja tipo escalera incluye cableado estructurado, cableado normal, cableado regulado y voz y datos correspondiente a alimentacion de puestos de trabajo existentes (incluye clasificación y entrega a la Entidad)	ml	293.19	50,217.00	14,723,122.23		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	206.61	10,375,334.37		-	86.58	4,347,787.86	293.19	14,723,122.23	-	50,217.00	-
NP-57	Suministro e instalación de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado de 30 x 10 x 1 m galvanizada con separador incluye curvas, soporteria y conductor de tierra para bandeja.	ml	295.54	151,533.00	44,794,062.82		-	-	-	-	-	-	-	251.62	38,128,733.46		-		-		-		-	43.92	6,655,329.36	295.54	44,794,062.82	-	151,533.00	-
NP-58	Suministro e instalación de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado de 15 x 10 x 1 m galvanizada, incluye curvas, soporteria y conductor de tierra para bandeja.	ml	181.00	129,520.00	23,443,120.00		-	-	-	-	-	-	-	88.42	11,452,158.40		-		-		-		-	92.58	11,990,961.60	181.00	23,443,120.00	-	129,520.00	-
NP-59	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 " SEGÚN DISEÑO DESARROLLO DE HASTA 1m	Und	129.04	165,000.00	21,291,600.00		-	-	-	-	-	-	-	129.04	21,291,600.00		-		-		-		-		-	129.04	21,291,600.00	-	165,000.00	-
NP-60	Punto hidraulico para rociador automatico de 1/2"	Und	75.00	114,984.00	8,623,800.00		-	-	-	-	-	-	-	75.00	8,623,800.00		-		-		-		-		-	75.00	8,623,800.00	-	114,984.00	-
NP-61	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K-5.6 PENDIENTE UL-FM	Und	75.00	63,827.00	4,787,025.00		-	-	-	-	-	-	-	75.00	4,787,025.00		-		-		-		-		-	75.00	4,787,025.00	-	63,827.00	-
NP-62	Suministro e instalacion TEE MECANICA RANURADA DE 3" X 1 1/2"	Und	17.00	60,791.00	1,033,447.00		-	-	-	-	-	-	-	17.00	1,033,447.00		-		-		-		-		-	17.00	1,033,447.00	-	60,791.00	-
NP-63	Suministro e instalacion STRAP DE 3" X 1"	Und	30.00	52,697.00	1,580,910.00		-	-	-	-	-	-	-	30.00	1,580,910.00		-		-		-		-		-	30.00	1,580,910.00	-	52,697.00	-
NP-64	Suministro e instalación de soporte tipo pera con varilla 3/8" con perno bean clamb para tuberia 1"	Und	76.00	33,022.00	2,509,672.00		-	-	-	-	-	-	-	76.00	2,509,672.00		-		-		-		-		-	76.00	2,509,672.00	-	33,022.00	-
NP-65	Suministro e instalación de soporte tipo pera con varilla 3/8" con perno bean clamb para tuberia 1-1/2"	Und	26.00	31,794.00	826,384.00		-	-	-	-	-	-	-	26.00	826,384.00		-		-		-		-		-	26.00	826,384.00	-	31,794.00	-
NP-66	Suministro e instalación de soporte tipo pera con varilla 3/8" con perno bean clamb para tuberia 3"	Und	95.00	33,033.00	3,138,135.00		-	-	-	-	-	-	-	95.00	3,138,135.00		-		-		-		-		-	95.00	3,138,135.00	-	33,033.00	-
NP-67	Suministro e instalación de soporte transversal sismoresitente para tuberia 3"	Und	16.00	234,807.00	3,756,912.00		-	-	-	-	-	-	-	16.00	3,756,912.00		-		-		-		-		-	16.00	3,756,912.00	-	234,807.00	-

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 10

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

1-03-2026 AL 31-03-2026

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	miércoles 20 de mayo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5,142,932,606.00
VALOR CORTE 10	$ 1,199,971,940.00
martes, 31 de marzo de 2026	

658,033,276.00 658,033,276.00

ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 10			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		CORTE 07		CORTE 08		CORTE 09		CORTE 10		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
NP-68	Suministro e instalación de soporte LONGITUDINAL sismoresistente para tubería 3"	Und	20.00	202,663.00	4,053,260.00		-		-		-		-	20.00	4,053,260.00		-		-		-		-		-	20.00	4,053,260.00	-	202,663.00	-
NP-69	SOPORTE ANTISISMICO 4 VIAS	Und	6.00	389,851.00	2,339,106.00		-		-		-		-	6.00	2,339,106.00		-		-		-		-		-	6.00	2,339,106.00	-	389,851.00	-
NP-70	TUBERIA ACC ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y PINTURA)	ml	146.61	66,346.00	9,726,987.06		-		-		-		-	134.20	8,903,633.20	12.41	823,353.86		-		-		-		-	146.61	9,726,987.06	-	66,346.00	-
NP-71	Tubería de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diametro 1-1/2", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	ml	28.55	100,995.00	2,883,407.25		-		-		-		-	28.55	2,883,407.25		-		-		-		-		-	28.55	2,883,407.25	-	100,995.00	-
NP-72	Tubería de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diametro 3", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	ml	192.71	224,347.00	43,233,910.37		-		-		-		-	192.71	43,233,910.37		-		-		-		-		-	192.71	43,233,910.37	-	224,347.00	-
NP-73	Suministro e instalacion codo ranurado acero al Carbono ASTM-A53 SCH 40 diametro 3", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	Und	9.00	98,325.00	884,925.00		-		-		-		-	9.00	884,925.00		-		-		-		-		-	9.00	884,925.00	-	98,325.00	-
NP-74	Suministro e instalacion TEE ranurado acero al Carbono ASTM-A53 SCH 40 diametro 3", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	Und	8.00	144,525.00	1,156,200.00		-		-		-		-	8.00	1,156,200.00		-		-		-		-		-	8.00	1,156,200.00	-	144,525.00	-
NP-75	Suministro e instalación de estación de control para red contra incendios	Und	1.00	3,271,755.00	3,271,755.00		-		-		-		-	1.00	3,271,755.00		-		-		-		-		-	1.00	3,271,755.00	-	3,271,755.00	-
NP-76	Suministro e instalación de Gabinete Tipo 3 para red contra incendios	Und	1.00	2,442,914.00	2,442,914.00		-		-		-		-	1.00	2,442,914.00		-		-		-		-		-	1.00	2,442,914.00	-	2,442,914.00	-
NP-77	Suministro e instalación de ventosa automática para red contra incendios	Und	2.00	707,363.00	1,414,726.00		-		-		-		-	2.00	1,414,726.00		-		-		-		-		-	2.00	1,414,726.00	-	707,363.00	-
NP-78	Suministro e Instalacion AVISO 1 - INGRESO DE FUNCIONARIOS: Suministro e instalación de aviso tipo caja de luz, 15 cm de cantonera, logo en relieve acrílico, cantonera de 4 cm - iluminación LED - Textos en acrílico 4m sobre puestas con interruptor encendido y apagado. (7m*90cm)	Und	1.00	10,729,783.00	10,729,783.00		-		-		-		-	1.00	10,729,783.00		-		-		-		-		-	1.00	10,729,783.00	-	10,729,783.00	-
NP-79	Suministro e Instalacion AVISO 2 INTERNO - AVISO TEXTO - JUNTOS HACEMOS REALIDAD EL HOGAR DE LOS COLOMBIANOS - Suministro e instalación de aviso en acrílico 3mm letra a letra volumetrico - cantonera de 5 cm - (3,2m*40cm)	Und	1.00	8,652,770.00	8,652,770.00		-		-		-		-	1.00	8,652,770.00		-		-		-		-		-	1.00	8,652,770.00	-	8,652,770.00	-
NP-80	Suministro e Instalacion AVISO 3 - LOGO INTERNO FNA - Suministro e instalación de aviso en acrílico 3mm letra a letra volumentrico - cantonera de 5 cm - (80cm*80cm)	Und	1.00	4,130,770.00	4,130,770.00		-		-		-		-	1.00	4,130,770.00		-		-		-		-		-	1.00	4,130,770.00	-	4,130,770.00	-
NP-81	Suministro e Instalacion AVISO 4 - LOGO INTERNO FNA - Suministro e instalación de aviso en acrílico 3mm letra a letra Volumentrico - cantonera de 5 cm - (120cm*120cm)	Und	1.00	4,844,770.00	4,844,770.00		-		-		-		-	1.00	4,844,770.00		-		-		-		-		-	1.00	4,844,770.00	-	4,844,770.00	-
NP-82	Suministro e instalación de señales en acrílico cal 3m + impresión digital full color - corte laser + instalación - (Opciones: hale, empuje, rack, barbs mixtos, Ref Entrada FNA (11cm*29 cm))	Und	14.00	116,946.00	1,637,244.00		-		-		-		-		-		-		-	14.00	1,637,244.00		-		-	14.00	1,637,244.00	-	116,946.00	-
NP-83	Pañete impermeabilizado con mortero 1:3 y sika 1 o similar (no incluye lineales)	M2	407.24	42,254.00	17,207,518.96		-		-		-		-		-		-	380.00	16,056,520.00		-		-	27.24	1,150,998.96	407.24	17,207,518.96	-	42,254.00	-
NP-84	Pañete impermeabilizado con mortero 1:3 y sika 1 o similar	ML	306.61	23,802.00	7,297,931.22		-		-		-		-		-		-	306.61	7,297,931.22		-		-		-	306.61	7,297,931.22	-	23,802.00	-
NP-85	Placa contrapiso de 10 cm de espesor, en concreto de 2500 PSI, No incluye acero de refuerzo	m2	38.02	78,487.00	2,984,075.74		-		-		-		-		-		-	20.63	1,619,186.81		-		-	17.39	1,364,888.93	38.02	2,984,075.74	-	78,487.00	-
NP-86	Mamposteria en bloque de arcilla no. 4 (no incluye lineales)	M2	47.94	64,001.00	3,068,207.94		-		-		-		-		-		-	47.94	3,068,207.94		-		-		-	47.94	3,068,207.94	-	64,001.00	-
NP-87	Mamposteria en bloque de arcilla no. 4 ancho max <0.70cm	ML	47.41	47,115.00	2,233,722.15		-		-		-		-		-		-	47.41	2,233,722.15		-		-		-	47.41	2,233,722.15	-	47,115.00	-
NP-88	Anclaje 1/2" L=50 cm	Und	262.00	26,778.00	7,015,836.00		-		-		-		-		-		-	262.00	7,015,836.00		-		-		-	262.00	7,015,836.00	-	26,778.00	-
NP-89	Viga de amarre de 0,12 x 0,20 NO incluye acero de refuerzo, alambre negro, incluye formaleta y concreto de 2500 psi.	ML	103.27	63,617.00	6,590,381.59		-		-		-		-		-		-	100.00	6,361,700.00		-		-	3.27	208,681.59	103.27	6,590,381.59	-	63,617.00	-

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 10

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

1-03-2026 AL 30-03-2026

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	miércoles 20 de mayo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5,142,932,606.00
VALOR CORTE 10	$ 1,199,971,940.00
	martes, 31 de marzo de 2026

658,033,276.00 658,033,276.00

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 10			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		CORTE 07		CORTE 08		CORTE 09		CORTE 10		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V /UNITARIO	SUBTOTAL
NP-90	Columnata de confinamiento (0.12*0.20) NO incluye acero de refuerzo, alambre negro, INCLUYE fomaleta y concreto de 2500 psi.	ML	44.22	54,823.00	2,424,273.06		-		-		-		-		-		-	44.22	2,424,273.06		-		-		-	44.22	2,424,273.06	-	54,823.00	-
NP-91	Suministro e Instalacion de soporte para tuberia de 1/2" a 4" para tuberias hidrosanitarias	Und	106.00	27,237.00	2,887,122.00		-		-		-		-		-		-	106.00	2,887,122.00		-		-		-	106.00	2,887,122.00	-	27,237.00	-
NP-92	Dovela en concreto tipo gruting de 3000 psi NO incluye acero de refuerzo	ML	70.08	8,375.00	586,920.00		-		-		-		-		-		-	70.08	586,920.00		-		-		-	70.08	586,920.00	-	8,375.00	-
NP-93	Construccion de Placa de entrepiso de 2.5 m x 2.5 m, con lámina colaborante 2", cal 22, h=10cm de acuerdo a detalle expresado en justificacion, incluye acero de refuerzo, concreto de 3000 psi y lamina colaborante (Incluye Cerramiento de protección en tercer piso, trasciego de insumos por 4 pisos en sentido vertical y 50 m en sentido horizontal)	UND	2.00	2,496,403.00	4,992,806.00		-		-		-		-		-		-	2.00	4,992,806.00		-		-		-	2.00	4,992,806.00	-	2,496,403.00	-
NP-94	Demolición de muro en mampostería en bloque de arcilla de 15 cm (incluye trasciego de materiales desde unas distancias superiores a 50 ml y niveles superiores a un piso a punto de acopio de acuerdo a horarios establecidos por entidad)	M2	60.65	28,701.00	1,740,715.65		-		-		-		-		-		-	60.65	1,740,715.65		-		-		-	60.65	1,740,715.65	-	28,701.00	-
NP-95	Desmonte de ductos de extracción de aire desde terraza hasta nivel de piso cuarto piso (Cerramiento preventivo en 3 piso, ductos de 1,60*0,90. Incluye trasiego desde cubierta ubicada a cinco pisos y disposición final).	ML	19.50	210,361.00	4,102,039.50		-		-		-		-		-		-	19.50	4,102,039.50		-		-		-	19.50	4,102,039.50	-	210,361.00	-
NP-96	Suministro e instalacion de gravilla lavada para transiciones entre enchapes y / o pisos laminados o urbanismo (ancho promedio 15 cm)	ML	63.70	72,837.00	4,639,716.90		-		-		-		-		-		-	63.70	4,639,716.90		-		-		-	63.70	4,639,716.90	-	72,837.00	-
NP-97	Desmonte de antena existente (incluye trasiego y disposición)	Und	1.00	2,558,429.00	2,558,429.00		-		-		-		-		-		-	1.00	2,558,429.00		-		-		-	1.00	2,558,429.00	-	2,558,429.00	-
NP-98	Mamposteria en bloque de arcilla estructural No. 4 de perforacion vertical (no incluye linsales, ni elementos no estructurales)	M2	42.35	70,975.00	3,005,791.25		-		-		-		-		-		-	42.35	3,005,791.25		-		-		-	42.35	3,005,791.25	-	70,975.00	-
NP-99	Mamposteria en bloque de arcilla estructural No. 4 de perforacion vertical, ancho max <0.60 cm (No incluye elementos no estructurales)	ML	12.43	51,514.00	640,319.02		-		-		-		-		-		-	12.43	640,319.02		-		-		-	12.43	640,319.02	-	51,514.00	-
NP-100	Suministro e instalacion de linsal en super board contra la ventaneria existente	MI	157.81	93,616.00	14,773,540.96		-		-		-		-		-		-		-		-	157.81	14,773,540.96		-	157.81	14,773,540.96	-	93,616.00	-
NP-101	Suministro e instalacion de Marco para luminaria led de 60 x 60 para cielo raso en Dry Wall	UND	153.00	77,136.00	11,801,808.00		-		-		-		-		-		-		-	150.00	11,570,400.00		-	3.00	231,408.00	153.00	11,801,808.00	-	77,136.00	-
NP-102	Suministro e instalacion de Espejo en 4mm con bordes pulidos,brillados y flotado con tubular en aluminio con luz led calida de 120 v	M2	18.60	550,099.00	10,231,841.40		-		-		-		-		-		-	12.37	6,804,724.63		-		-	6.23	3,427,116.77	18.60	10,231,841.40	-	550,099.00	-
NP-103	Suministro e instalación de platina 150x150x6 mm con tornillo pasante de 1/2" L=0,40m, 6 tuercas y arandelas para instalación de estructura metalica de los micro ondas	UND	14.00	132,577.00	1,856,078.00		-		-		-		-		-		-		-	12.00	1,590,924.00		-	2.00	265,154.00	14.00	1,856,078.00	-	132,577.00	-
NP-104	Suministro e instalacion de luminaria led de 60 x 60 de 4000 k NO INCLUYE marco para luminaria de 60 x 60 para cielo raso en Dry Wall	UND	110.00	171,691.00	18,886,010.00		-		-		-		-		-		-		-	110.00	18,886,010.00		-		-	110.00	18,886,010.00	-	171,691.00	-
NP-105	Desmonte de puerta de vidrio laminado 5+5 MM, trasiego a punto de acopio y disposicion final a botadero certificado, suministro e instalacion de puerta en vidrio templado laminado 5 + 5 MM, con pelicula tipo bronce, incluye reinstalacion de postes de giro e instalacion de topes de piso, adecuación a los herrajes existentes (Incluye el transporte e instalación en horario nocturno).	M2	3.75	1,715,072.00	6,431,520.00		-		-		-		-		-		-	3.75	6,431,520.00		-		-		-	3.75	6,431,520.00	-	1,715,072.00	-
NP-106	Ajuste de puertas de acceso en vidrio templado incluye cambio de montante y cambio de bisagras hidráulicas	M2	10.83	1,343,902.00	14,554,458.66		-		-		-		-		-		-	10.83	14,554,458.66		-		-		-	10.83	14,554,458.66	-	1,343,902.00	-
NP-107	Suministro e instalacion de Tapa registro en acero inoxidable de 30 x 30 cm incluye mortero de caja, estuco y pintura	Und	13.00	290,521.00	3,776,773.00		-		-		-		-		-		-	13.00	3,776,773.00		-		-		-	13.00	3,776,773.00	-	290,521.00	-
NP-108	Suministro de mesón para cubierta de lavamanos con perforaciones para poceta de sobre poner en Cuarzstone Blanco Polar de 0,80 40,50 mt, con baberos de 30 cms a los costados, salpicadero de 80 cms x 8 cms y frente con reengrueso de 5 cms y tapa frontal en sinterizado color madera, instalación con pie de amigo. (Recepción)	Und	1.00	1,876,500.00	1,876,500.00		-		-		-		-		-		-	1.00	1,876,500.00		-		-		-	1.00	1,876,500.00	-	1,876,500.00	-
NP-109	Suministro e instalacion de mesón para lavamanos con perforaciones para poceta de sobre poner en Cuarzstone Blanco Polar de 55 cm de ancho con baberos laterales y frontal de 30 cms con su respectivo salpicadero en escuadra de 8 cms, fijado con pie de amigo.	ml	23.27	1,359,000.00	31,623,930.00		-		-		-		-		-		-	11.58	15,737,220.00		-		-	11.69	15,886,710.00	23.27	31,623,930.00	-	1,359,000.00	-
NP-110	Suministro de caseta para puesto de vigilancia temporal en zona de acceso vehicular y rehubicable en cualquier sector que disponga la entidad, en estructura metalica calibre 18 con pintura esmalte negra.	UND	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00		-		-		-		-		-		-	1.00	3,000,000.00		-		-		-	1.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-
NP-111	Suministro e instalación de sanitario SMART AL SINGLE BLANCO o similar	UND	1.00	714,259.00	714,259.00		-		-		-		-		-		-	1.00	714,259.00		-		-		-	1.00	714,259.00	-	714,259.00	-
NP-112	Construccion de cajas de inspeccion sanitarias DE 80 X 80, incluye marco y tapa	UND	1.00	721,565.00	721,565.00		-		-		-		-		-		-	1.00	721,565.00		-		-		-	1.00	721,565.00	-	721,565.00	-

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 10

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	miércoles 20 de mayo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5,142,932,606.00
VALOR CORTE 10	$ 1,199,971,940.00
martes, 31 de marzo de 2026	

1-03-2026 AL 20-03-2026

658,033,276.00 658,033,276.00

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 10			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		CORTE 07		CORTE 08		CORTE 09		CORTE 10		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
NP-113	Suministro, corte, doblado e instalación acero figurado 60000 PSI	Kg	557.08	7,899.00	4,400,374.92		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	250.00	1,974,750.00		-	307.08	2,425,624.92	557.08	4,400,374.92	-	7,899.00	-
NP-114	Suministro e instalación de pirlan en aluminio de 5.5 cm de ancho fijado con chazo puntilla	Ml	25.91	53,466.00	1,385,304.06		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	20.98	1,121,716.68		-	4.93	263,587.39	25.91	1,385,304.06	-	53,466.00	-
NP-115	Suministro e instalacion dilatación dry wall en Z	ML	794.70	19,049.00	15,138,240.30		-	-	-		-	-	-	-	-		-	208.33	3,968,476.17	325.21	6,194,925.29		-	261.16	4,974,836.84	794.70	15,138,240.30	-	19,049.00	-
NP-116	Refuerzo filos y dilataciones en muros y columnas	ML	722.55	16,823.00	12,155,458.65		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	229.56	3,861,887.88	492.99	8,293,570.77		-	722.55	12,155,458.65	-	16,823.00	-
NP-117	Resanes y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre pañete o repello liso. A todo costo.	ML	96.16	23,356.00	2,245,912.96		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-		-		-	96.16	2,245,912.96	96.16	2,245,912.96	-	23,356.00	-
NP-118	Presurización de la RCI mediante cargue de la red, para evaluación de la resistencia de las tuberías, uniones, válvulas y accesorios frente a presiones superiores a las de operación normal, según normas como NFPA 24 y NFPA 13 o ASME B31.1, bajo pruebas hidrostáticas a no menos de 200 psi (13,8 bar)	M2	935.50	4,166.00	3,897,293.00		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-		-		-	935.50	3,897,293.00	935.50	3,897,293.00	-	4,166.00	-
NP-119	Desmonte de redes eléctricas existentes. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	M2	99.37	14,421.00	1,433,014.77		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-		-		-	99.37	1,433,014.77	99.37	1,433,014.77	-	14,421.00	-
NP-120	DESMONTE DE PUERTAS EN MADERA. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	Und	18.00	31,864.00	573,552.00		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	15.00	477,960.00		-	3.00	95,592.00	18.00	573,552.00	-	31,864.00	-
NP-121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PARA INTERIORES CON ANCHO MAYOR A 0,60 M	M2	786.99	22,348.00	17,587,852.52		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	524.21	11,715,045.08		-	262.78	5,872,807.44	786.99	17,587,852.52	-	22,348.00	-
NP-122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PARA INTERIORES CON ANCHO MENOR A 0,60 M (ml)	ML	794.36	13,760.00	10,930,393.60		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	704.01	9,687,177.60		-	90.35	1,243,216.00	794.36	10,930,393.60	-	13,760.00	-
NP-123	Suministro e instalacion de acometida electrica en: tubo emt 2 de 3" y cable 2(3#350+1#500+1#2T cu)desde tablero ppal casino 1er piso a cuarto tecnico 4° piso.	ML	94.56	2,532,624.00	239,484,925.44		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	43.23	109,485,335.52		-	51.33	129,999,589.92	94.56	239,484,925.44	-	2,532,624.00	-
NP-124	Suministro e instalacion de tablero electico para cuarto tecnico 4° piso de acuerdo a diagrama unifilar y cargas requeridas	Und	-	31,130,536.00	-		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-		-		-		-	-	-	-	31,130,536.00	-
NP-125	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS Y/O PISOS, ANCHO <= 10CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	Ml	58.11	30,462.00	1,770,146.82		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	58.11	1,770,146.82		-		-	58.11	1,770,146.82	-	30,462.00	-
NP-126	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA METÁLICA CUADRADA DE 3X2" CON SOSCO	Und	12.00	46,795.00	561,540.00		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	12.00	561,540.00		-		-	12.00	561,540.00	-	46,795.00	-
NP-127	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATES DE ESQUINA PARA ENCHAPES EN WING EN ALUMINIO	ML	98.27	28,550.00	2,805,608.50		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-		-	98.27	2,805,608.50		-	98.27	2,805,608.50	-	28,550.00	-
NP-128	DECAPADO, PULIDA Y SELLADO DE PISOS EN GRANO DE MARMOL	M2	-	83,737.00	-		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-		-		-		-	-	-	-	83,737.00	-
NP-129	DECAPADO, PULIDA Y SELLADO DE PISOS EN GRANO DE MARMOL	ML	-	51,384.00	-		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-		-		-		-	-	-	-	51,384.00	-
NP-130	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERÁMICA PARED CALIDAD PRIMERA, CON ANCHO < = A 0,60 ML (LINEAL)	Ml	124.55	87,589.00	10,909,209.95		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	124.55	10,909,209.95		-		-	124.55	10,909,209.95	-	87,589.00	-
NP-131	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METÁLICA TIPO CUPULA 4 X 3" SOSCO	Und	46.00	71,795.00	3,302,570.00		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-		-		-	46.00	3,302,570.00	46.00	3,302,570.00	-	71,795.00	-
NP-132	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPÓXICA CON UN ANCHO MAYOR A 60CM (NO INCLUYE LINEALES)	M2	95.84	54,106.00	5,185,519.04		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-		-		-	95.84	5,185,519.04	95.84	5,185,519.04	-	54,106.00	-
NP-133	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPÓXICA CON UN ANCHO MENOR A 60CM (LINEALES)	Ml	15.35	33,211.00	509,788.85		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-		-		-	15.35	509,788.85	15.35	509,788.85	-	33,211.00	-
NP-134	SUMINISTRO EL INSTALACION DE ALISTADO PISOS 1:3, E= 0.04 (INCLUYE TRASCIEGO DE INSUMOS A LOS DIFERENTES FRENTES DE OBRA	M2	111.53	45,403.00	5,063,796.59		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-		-		-	111.53	5,063,796.59	111.53	5,063,796.59	-	45,403.00	-
NP-135	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO DE 18 CTS, 3F. 9H 225AMP. CON PUERTA Y CON TOTALIZADOR BASE GALVANIZADA TAPA BLANCA	Und	1.00	1,283,059.00	1,283,059.00		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	1.00	1,283,059.00		-		-	1.00	1,283,059.00	-	1,283,059.00	-
NP-136	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO DE 12 CTS, 3F. 9H 225AMP. CON PUERTA Y CON TOTALIZADOR BASE GALVANIZADA TAPA BLANCA	Und	2.00	894,089.00	1,788,178.00		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	1.00	894,089.00		-	1.00	894,089.00	2.00	1,788,178.00	-	894,089.00	-
NP-137	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PVC-P 1 1/2", INCLUYE UNIVERSALES	Und	6.00	167,925.00	1,007,550.00		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-		-		-	6.00	1,007,550.00	6.00	1,007,550.00	-	167,925.00	-
NP-138	RED DE SUMINISTRO PVC-P 1 1/2"	Ml	24.17	46,404.00	1,121,584.68		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-		-		-	24.17	1,121,584.68	24.17	1,121,584.68	-	46,404.00	-
NP-139	SUMINISTRO E INSTALACION DEREGISTRO PVC-P 3/4", INCLUYE UNIVERSALES	Und	4.00	72,291.00	289,164.00		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-		-		-	4.00	289,164.00	4.00	289,164.00	-	72,291.00	-
NP-140	Suministro e instalación de cielorraso en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo de vinilo. A todo costo.	ML	36.85	79,032.00	2,912,329.20		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-		-		-	36.85	2,912,329.20	36.85	2,912,329.20	-	79,032.00	-
NP-141	Suministro e instalación de muro en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo.	ML	13.80	58,732.00	810,501.60		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-		-		-	13.80	810,501.60	13.80	810,501.60	-	58,732.00	-
NP-142	Suministro e instalación de puerta en madecor entamborada de 0,85 m de ancho por 2.20 m de alto, sistema corredizo Ducasse. incluye marcos, chapa tipo pico de loro con su respectiva cantonera, guia de corrediza, tapa de guia en madecory todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	Und	3.00	1,755,000.00	5,265,000.00		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	3.00	5,265,000.00		-		-	3.00	5,265,000.00	-	1,755,000.00	-
NP-143	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 30 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	UND	3.00	106,655.00	319,965.00		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	3.00	319,965.00		-		-	3.00	319,965.00	-	106,655.00	-
NP-144	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 18 w, luz neutra 4000K. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	UND	27.00	103,655.00	2,798,685.00		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	27.00	2,798,685.00		-		-	27.00	2,798,685.00	-	103,655.00	-
NP-145	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 9 w, luz neutra 4000K. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	UND	23.00	88,855.00	2,043,665.00		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	23.00	2,043,665.00		-		-	23.00	2,043,665.00	-	88,855.00	-
NP-146	Suministro e instalacion salida electrica para toma corriente doble normal GFCI Incluye: Tuberia sch-40 de 3/4"(max 6mts) + caja metalica + terminales + cable trenzado (LSZH) 3x12 + autodisformes + TOMA GFCI FUTURA.	UND	7.00	247,692.00	1,733,844.00		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	7.00	1,733,844.00		-		-	7.00	1,733,844.00	-	247,692.00	-
NP-147	Suministro e instalacion de salida para HDMI incluye: tuberia pvc sch-40 de 1-1/4 + caja 10x10 doble fondo con suplemento + caja 2400 + terminales. NO INCLUYE CABLE	UND	25.00	207,747.00	5,193,675.00		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	20.00	4,154,940.00		-	5.00	1,038,735.00	25.00	5,193,675.00	-	207,747.00	-

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 10

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

1-03-2026 AL 31-03-2026

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	miércoles 20 de mayo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5,142,932,606.00
VALOR CORTE 10	$ 1,199,971,940.00
martes, 31 de marzo de 2026	

658,033,276.00 658,033,276.00

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 10			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		CORTE 07		CORTE 08		CORTE 09		CORTE 10		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
NP-148	Suministro e instalacion de alimentador 3N°8 Fase+ 1N°8 Neutro+ 1N°10 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ML	89.04	65,825.00	5,861,058.00		-	-	-		-		-		-		-		-		-		-	89.04	5,861,058.00	89.04	5,861,058.00	-	65,825.00	-
NP-149	SENSOR PRESENCIA MULTITECNOLOGIA LEVITON OSC10-MOW	UND	9.00	742,527.00	6,682,743.00		-	-	-		-		-		-		-		-		-		-	9.00	6,682,743.00	9.00	6,682,743.00	-	742,527.00	-
NP-150	SENSOR MULTITECNOLOGIA PIR MONTAJE EN TECHO LEVITON OSC15-10W CON FUENTE RELEVO-PISENSOR LEVITON OSP20-RDO	UND	3.00	735,982.00	2,207,946.00		-	-	-		-		-		-		-		-		-		-	3.00	2,207,946.00	3.00	2,207,946.00	-	735,982.00	-
NP-151	Suministro e instalacion de perfiles WPC DE 100 X 50 MM, EN COLOR ASIGNADO POR LA ENTIDAD, INCLUYE SOPORTE GIRATORIO DE EXTREMOS	ML	92.48	80,486.00	7,443,345.28		-	-	-		-		-		-		-		-		-		-	92.48	7,443,345.28	92.48	7,443,345.28	-	80,486.00	-
NP-152	Suministro e instalacion de piso tipo DECK en WPC de acuerdo a detalle suministrado por la entidad (incluye estructura y accesorios de fijacion y bocel de terminacion)	M2	11.26	979,125.00	11,024,947.50		-	-	-		-		-		-		-		-		-		-	11.26	11,024,947.50	11.26	11,024,947.50	-	979,125.00	-
NP-153	Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada cla. 18 de 1.2 m de desarrollo incluye soporte de fijacion	ML	-	255,000.00	-		-	-	-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	255,000.00	-
NP-154	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LÁMINA ALFAJOR Y ÁNGULO A CON PESTAÑAS DE 10cm POR LOS LADOS, PARA SELLAR DUCTO EN CUBIERTA	M2	7.18	472,000.00	3,388,960.00		-	-	-		-		-		-		-		-	7.18	3,388,960.00		-		-	7.18	3,388,960.00	-	472,000.00	-
NP-155	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 * SEGÚN DISEÑO DESARROLLO DE 0.4 M HASTA 0.7 M	ML	82.30	121,275.00	9,980,932.50		-	-	-		-		-		-		-		-	82.30	9,980,932.50		-		-	82.30	9,980,932.50	-	121,275.00	-
NP-156	Suministro e instalacion de salida para toma de datos y/o corriente incluye: tuberia pvc sch 40 de 3/4 (5 m) + caja 2400 + terminales. NO INCLUYE CABLE	UND	25.00	135,978.00	3,399,450.00		-	-	-		-		-		-		-		-	20.00	2,719,560.00		-	5.00	679,890.00	25.00	3,399,450.00	-	135,978.00	-
NP-157	Suministro e instalacion salida electrica para toma secadores Incluye: Tuberia sch-40 de 3/4"(max.6mts) + caja metalica + terminales + cable trenzado (LSZH) 3x10 (20 mts). NO INCLUYE TOMA.	UND	6.00	248,325.00	1,489,950.00		-	-	-		-		-		-		-		-	6.00	1,489,950.00		-		-	6.00	1,489,950.00	-	248,325.00	-
NP-158	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISOS EN FORMA DE FIGURA PARA SEÑALIZACION DE BAÑOS DE 30 CM DE ALTO, EN ACRILICO EN VOLUMEN DE 3 CM	UND	4.00	355,500.00	1,422,000.00		-	-	-		-		-		-		-		-	2.00	711,000.00		-	2.00	711,000.00	4.00	1,422,000.00	-	355,500.00	-
NP-159	Desmonte gabinetes (NORMAL, REGULADO Y RACK) cuarto tecnico 4° piso incluye: desconexiones acometidas principales regulada y normal, desconexion circuitos de distribucion, retiro de tableros del cuarto tecnico, traslado de tableros del 4° piso al 1er piso y entrega de elementos internos de los tableros.	UND	4.00	991,349.00	3,965,396.00		-	-	-		-		-		-		-		-	4.00	3,965,396.00		-		-	4.00	3,965,396.00	-	991,349.00	-
NP-160	ASEO FINAL DE OBRA	M2	2,098.25	3,097.00	6,498,280.25		-	-	-		-		-		-		-		-	987.81	3,059,247.57		-	1,110.44	3,439,032.68	2,098.25	6,498,280.25	-	3,097.00	-
NP-161	Suministro, instalacion y conexiones de breaker siemens regulable 440/630 amp capacidad de ruptura 55 ka/220 totalizador en tablero electrico de distribuccion	UND	1.00	4,756,482.00	4,756,482.00		-	-	-		438,580.00		-		-		-		-		-		-	1.00	4,756,482.00	1.00	4,756,482.00	-	4,756,482.00	-
NP-162	Suministro e instalacion de tablero general EDIFICIO DE CONVENCIONES CUARTO PISO, de acuerdo a diagrama unifilar, incluye breker totalizador, breaker secundarios y Fusibles y Accesorios (cables, terminales, canaleta, tornilleria, funda, marcacion de cables, Acrilicos, Aisladores, etc)	UND	1.00	75,749,723.00	75,749,723.00		-	-	-		1,333,273.40		-		-		-		-		-		-	1.00	75,749,723.00	1.00	75,749,723.00	-	75,749,723.00	-
NP-163	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DOBLES EN VIDRIO DE 10MM DE SEGURIDAD TEMPLADO, BISAGRAS ESQUINERAS EN ALUMINIO SUPERIOR E INFERIOR, CHAPA Y RECIBIDOR CENTRAL EN ALUMINIO, CERRADURA YALE, MANIJA TIPO RONA 40-20, CERROJO DE PISO Y BISAGRA HIDRAHULICA MARCA SPEEDY.	M2	15.95	1,607,739.00	25,643,437.05		-	-	-		-		-		-		-		-		-		-	15.95	25,643,437.05	15.95	25,643,437.05	-	1,607,739.00	-
NP-164	Suministro e instalacion de GUARDAESCOBA CERÁMICA	MI	102.25	24,449.00	2,499,910.25		-	-	-		-		-		-		-		-		-		-	102.25	2,499,910.25	102.25	2,499,910.25	-	24,449.00	-
NP-165	Suministro e instalacion de Perfil REDUCTOR - en PVC estandar con foil en pvc termolaminado / 2440X45X12mm y / o Perfil T - en PVC estandar con foil en pvc termolaminado / 2440X45X12mmPara cumplir con la junta de dilatación requerida en pisos flotados laminados, de mantener dilatación cada 8mts en la medida mas larga22 mts de largo. (3	ML	452.16	36,615.00	16,555,838.40		-	-	-		766,292.80		-		-		-		-		-		-	452.16	16,555,838.40	452.16	16,555,838.40	-	36,615.00	-
NP-166	Pintura exterior tipo coraza para muros sobre parhete menores a 60 cm, incluye toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.	MI	488.51	25,413.00	12,414,504.63		-	-	-		-		-		-		-		-		-		-	488.51	12,414,504.63	488.51	12,414,504.63	-	25,413.00	-
NP-167	Suministro e instalación de relleno en mortero estructural en arras de desmontes de piso desmontado o demolido para nivelacion previa a la instalacion de piso laminado.	M2	170.00	40,996.00	6,969,320.00		-	-	-		-		-		-		-		-		-		-	170.00	6,969,320.00	170.00	6,969,320.00	-	40,996.00	-
NP-168	DIAGNOSTICO Y ANALISIS ESTRUCTURAL DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA DEL EDIFICIO DENOMINADO CNA, INCLUYE DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE MEJORA	GLB	1.00	39,890,960.00	39,890,960.00		-	-	-		-		-		-		-		-		-		-	1.00	39,890,960.00	1.00	39,890,960.00	-	39,890,960.00	-
NP-169	MANTENIMIENTO CUARTO TABLEROS CONVENCIONES PISO 1, CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION TABLERO ELETRICO POR FILTRACION DE AGUA Y PUESTA EN MARCHA NUEVAMENTE DEL SISTEMA ELECTRICO	GLB	1.00	892,214.00	892,214.00		-	-	-		-		-		-		-		-		-		-	1.00	892,214.00	1.00	892,214.00	-	892,214.00	-
NP-170	DIAGNOSTICO ELECTRICO DE ILUMINACION DE LOS EDIFICIOS DENOMINADO CNA, CONVENCIONES Y RECEPCIO, INCLUYE DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE CUMPLIMIENTO RETILAP	GLB	1.00	9,773,469.00	9,773,469.00		-	-	-		-		-		-		-		-		-		-	1.00	9,773,469.00	1.00	9,773,469.00	-	9,773,469.00	-
NP-171	DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO Y RCI DE LOS EDIFICIOS DENOMINADO CNA, CONVENCIONES Y RECEPCIO, INCLUYE DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	GLB	1.00	3,975,832.00	3,975,832.00		-	-	-		-		-		-		-		-		-		-	1.00	3,975,832.00	1.00	3,975,832.00	-	3,975,832.00	-
NP-172	Suministro e instalacion AVISO - LOGO INTERNO FNA - CONVERTIMOS LAS CESANTIAS Y EL AHORRO DE LOS COLOMBIANOS EN VIVIENDA PROPIA aviso en acrilico 3mm letra a letra volumentrico - Letras independientes - cantonera de 5 cm - (3,10 m x 40 cm)	UND	1.00	5,754,840.00	5,754,840.00		-	-	-		-		-		-		-		-		-		-	1.00	5,754,840.00	1.00	5,754,840.00	-	5,754,840.00	-
NP-173	Suministro e instalacion - AVISO TEXTO - INVERTIMOS EN BIENESTAR, CONSTRUIMOS FUTURO - Aviso en acrilico 3mm letra a letra volumentrico - cantonera de 5 cm - Letras independientes - (3,10 m x 20 cm)	UND	1.00	3,480,750.00	3,480,750.00		-	-	-		766,292.80		-		-		-		-		-		-	1.00	3,480,750.00	1.00	3,480,750.00	-	3,480,750.00	-
NP-174	Suministro e instalacion - AVISO TEXTO - DONDE EL ESFUERZO SE TRANSFORMA EN BIENESTAR - Aviso en acrilico 3mm letra a letra volumentrico - cantonera de 5 cm - Letras independientes - (2,10 m x 40 cm)	UND	1.00	3,898,440.00	3,898,440.00		-	-	-		-		-		-		-		-		-		-	1.00	3,898,440.00	1.00	3,898,440.00	-	3,898,440.00	-
NP-175	Suministro e instalacion aviso - LOGO INTERNO FNA - Aviso en acrilico 3mm letra a letra volumentrico - cantonera de 5 cm - (0,70 m x 0,7 m)	UND	2.00	2,274,090.00	4,548,180.00		-	-	-		-		-		-		-		-		-		-	2.00	4,548,180.00	2.00	4,548,180.00	-	2,274,090.00	-
NP-176	Suministro e instalacion aviso - LOGO INTERNO FNA - Aviso en acrilico 3mm letra a letra volumentrico - cantonera de 5 cm + Base acrilico- (1.46 m x 1.12 m)	UND	1.00	7,588,963.00	7,588,963.00		-	-	-		-		-		-		-		-		-		-	1.00	7,588,963.00	1.00	7,588,963.00	-	7,588,963.00	-
NP-177	Suministro e instalacion de SEÑALIZACION INTERNA OFICINAS - Acrilico 8m + acrilico 3mm + 4 bujes color negro + decoración tipo chapilla según muetra (0,11 m x 0,2 m)	UND	72.00	123,760.00	8,910,720.00		-	-	-		-		-		-		-		-		-		-	72.00	8,910,720.00	72.00	8,910,720.00	-	123,760.00	-

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 10

NUMERO PROCESO	FNA-VIGHA-CP-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

1-03-2026 AL 31-03-2026

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	miércoles 20 de mayo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5,142,932,606.00
VALOR CORTE 10	$ 1,199,971,940.00
martes, 31 de marzo de 2026	

658,033,276.00 658,033,276.00

ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 10			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		CORTE 07		CORTE 08		CORTE 09		CORTE 10		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
NP-178	Suministro e instalacion de IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR - sobre vinilo frosted + full color + laminación mate sgún muestra - vidrios exteros de las oficinas principales y decoración interneria de los vidrios	M2	246.05	193,375.00	47,579,918.75		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.05	47,579,918.75	246.05	47,579,918.75	-	193,375.00	-
NP-179	Suministro e instalacion de Luminaria para uso interior tipo Led lineal MINICONTINUUM 36 W con driver integrado, distribución de luz homogénea sin sombras. Proporciona un sistema de iluminación continuo, limpio y sencillo.	UND	29.00	385,516.00	11,179,964.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.00	11,179,964.00	29.00	11,179,964.00	-	385,516.00	-
NP-180	Suministro e instalación de puerta en madecor entamborada de diferentes medidas, incluye marcos, chapa con su respectiva cantonera, y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	M2	6.04	578,992.00	3,497,111.68		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.04	3,497,111.68	6.04	3,497,111.68	-	578,992.00	-
NP-181	Suministro e instalación de mueble escalonado de acuerdo con diseño suministrado por la entidad (incluye estructura metálica de soporte soldada en tubería 5x5x 2.5 mm y 5x2.5x2 mm, escalones melaminica 36 mm, puertas y laterales en melaminica 15 mm y recubrimientos internos melaminica en 15 mm, 14 casilleros con chapas, herrajes y entrepaños, cojines, cajoneras con chapas , herrajes y transporte de sitio de preensamble a sitio de ubicacion del mueble)	UND	1.00	42,313,890.00	42,313,890.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	42,313,890.00	1.00	42,313,890.00	-	42,313,890.00	-
NP-182	Suministro e InstalacionAviso con imágenes en full color montadas sobre acrílico cal 8 tipo triangulo - (JUNTOS HACEMOS REALIDAD EL HOGAR DE LOS COLOMBIANOS) textos laser cal 8mm color en azul - (1.8 x 1.1 m)	UND	1.00	5,753,650.00	5,753,650.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	5,753,650.00	1.00	5,753,650.00	-	5,753,650.00	-
					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL COSTO DIRECTO				4,170,058,081.36		399,961,521.14		102,051,339.62		189,294,173.01		236,145,469.15		595,529,172.18		131,158,235.65		253,971,797.96		533,554,914.74		169,402,963.73		972,976,518.01		3,575,742,645.50		594,315,435.83		
	ADMINISTRACIÓN	12.00%		500,406,967.36		A.I.U.	47,995,382.54	A.I.U.	12,246,160.75	A.I.U.	22,715,300.76	A.I.U.	28,337,455.10	A.I.U.	70,863,500.66	A.I.U.	15,739,108.28	A.I.U.	30,476,614.55	A.I.U.	64,026,589.77	A.I.U.	20,328,355.65	A.I.U.	116,757,182.16	A.I.U.	429,089,117.46	A.I.U.	71,317,849.90	
	IMPREVISTOS	3.00%		125,101,741.84			11,998,845.63		3,061,540.19		5,678,825.19		7,084,363.77		17,715,875.17		3,934,777.07		7,619,153.64		16,008,647.44		5,082,088.91		29,189,295.54		107,272,279.37		17,829,462.47	
	UTILIDAD	7.00%		291,904,064.29			27,997,306.48		7,143,593.77		13,250,592.11		16,530,182.14		41,337,042.05		9,181,146.50		17,778,025.15		37,348,844.03		11,858,207.46		68,108,356.26		250,301,985.19		41,602,079.11	
	IVA SOBRE UTILIDAD	19.00%		55,461,772.22			5,319,488.23		1,357,282.82		2,517,612.50		3,140,734.61		7,854,037.99		1,744,417.84		3,377,824.78		7,096,280.37		2,253,059.42		12,940,587.69		47,557,377.19		7,904,385.03	
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				972,974,545.71		93,311,022.88		23,808,577.53		44,162,330.56		55,092,735.62		137,770,455.87		30,598,449.89		59,251,618.12		124,478,361.61		39,521,711.44		226,995,421.65		834,220,759.21		138,653,786.51	
	VALOR TOTAL PROYECTO				5,142,932,606.00		493,272,544.00		125,859,917.00		233,456,504.00		291,238,195.00		733,299,628.05		161,756,685.00		313,223,416.00		658,033,276.00		208,924,675.00		1,199,971,940.00		4,409,963,405.00		732,969,202.00	
							CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 10		CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		CORTE 06		CORTE 07		CORTE 08		CORTE 09		CORTE 10		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		

ESTADO DE PAGOS DE CONTRATISTA

ACTA No.	PERIODO	ESTADO	VALOR CORTES	PORCENTAJE	PAGADO	SALDO
	VALOR CONTRATO		$ 5,142,932,606		$ -	$ 5,142,932,606
1	(07 MARZO AL 30 ABRIL DE 2025)	PAGADO	$ 493,272,544.00	9.59%	$ 493,272,544.00	$ 4,649,660,062.00
2	(01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2025)	PAGADO	$ 125,859,917.00	2.45%	$ 619,132,461.00	$ 4,523,800,145.00
3	(01 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2025)	PAGADO	$ 233,456,504.00	4.54%	$ 852,588,965.00	$ 4,290,343,641.00
4	(01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025)	PAGADO	$ 291,238,195.00	5.66%	$ 1,143,827,160.00	$ 3,999,105,446.00
5	(01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025)	PAGADO	$ 728,299,628	14.16%	$ 1,872,126,788.05	$ 3,270,805,817.95
6	(01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025)	PAGADO	$ 161,756,685	3.15%	$ 2,033,883,473.05	$ 3,109,047,132.95
7	(01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025)	PAGADO	$ 313,223,416	6.09%	$ 2,347,106,879.05	$ 2,795,823,716.95
8	(01 DIENERO AL 31 DE ENERO DE 2026)	PAGADO	$ 658,033,276	12.79%	$ 3,005,142,155.05	$ 2,137,790,450.95
9	(01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026)	PAGADO	$ 208,924,675	4.06%	$ 3,214,066,830.05	$ 1,928,865,775.95
10	(01 DE MARZO AL 20 DE MARZO DEL 2026)	TRAMITE	$ 1,199,971,940	23.33%	$ 4,414,038,770.05	$ 728,893,835.95
	TOTAL		$ 4,414,038,770.05	85.83%	$ 7,828,105,600.10	

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 972,976,518.01
ADMINISTRACIÓN	12.00%	$ 116,757,182.16
IMPREVISTOS	3.00%	$ 29,189,295.54
UTILIDAD	7.00%	$ 68,108,356.26
IVA SOBRE UTILIDAD	19.00%	$ 12,940,587.69
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 226,995,421.65
VALOR TOTAL CORTE 09 DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026		$ 1,199,971,940.00

1.00
5,142,932,607.00
1.00

INGEBYP S.A.S. / CTO FNA - 166 - 2024

INGEBYP S.A.S. / CTO FNA - 166 - 2024

BIODECCO S.A.S. / CTO FNA - 022 - 2025

BIODECCO S.A.S. / CTO FNA - 022 - 2025

Dr. VANESA PACHECO GOMEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR CTO INTERVENTORIA FNA-022 2025
FONDO NACIONAL DEL AHORRO FNA SA

ACTA PARCIAL No. 10


MEMORIAS DE CANTIDADES - PRIMER PISO - BANCOLOMBIA - EDIFICIO RECEPCION

PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA 20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	3.2.	DESCRIPCION ITEM:	Mantenimiento de cielo raso en fibra mineral. Incluye cambio, pintura y/o reutilización de láminas en fibra mineral, instalación de anclajes y arreglo de perfilería descolgada y colocación de soportes.		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

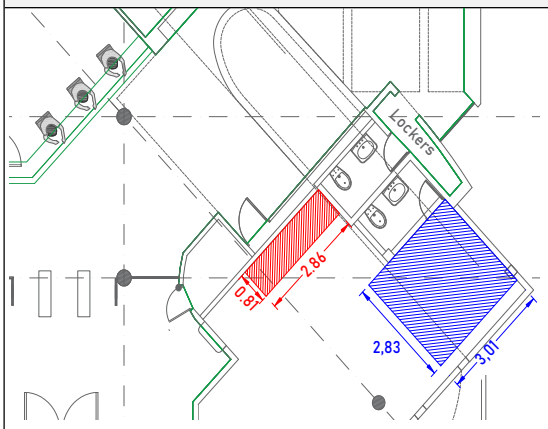

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO RECEPCION					-
PRIMER PISO					-
ZONA DE BANCOLOMBIA					-
ENTRADA A OFICINA		0.81	2.86	1.00	2.32
OFICINA BANCOLOMBIA		3.01	2.83	1.00	8.52
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					10.84
VIENE					24.99
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					35.83
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 9					- 28.03
PRESENTE ACTA					7.80








OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. ANA MIREYA ARAGON RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 10


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA 20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	4.1.	DESCRIPCION ITEM:	Cambio de válvula antivandálica de empotrar tipo push para sanitarios institucionales de consumo de agua 4.85 lpf (1.28 gpf) tipo corona o similar. Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. A todo costo con la instalación de un enchape de similares caracteristicas a las originales.		UNIDAD:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

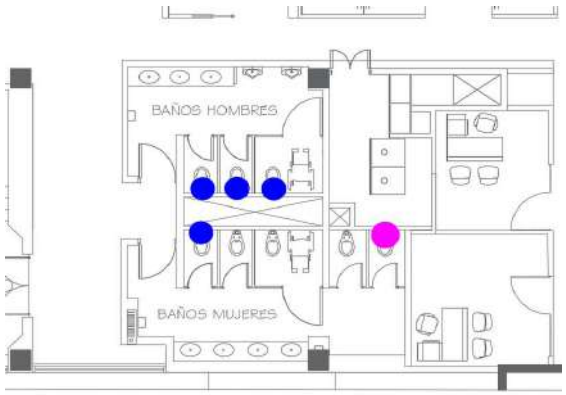

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CUARTO PISO					-
					-
BAÑO MUJERES				1.00	1.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					1.00
VIENE					21.00
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					22.00
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 9					- 21.00
PRESENTE ACTA					1.00







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. ANA MIREYA ARAGON RESIDENTE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 10


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA 20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	1.1.	DESCRIPCION ITEM:	Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.			UNIDAD: M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

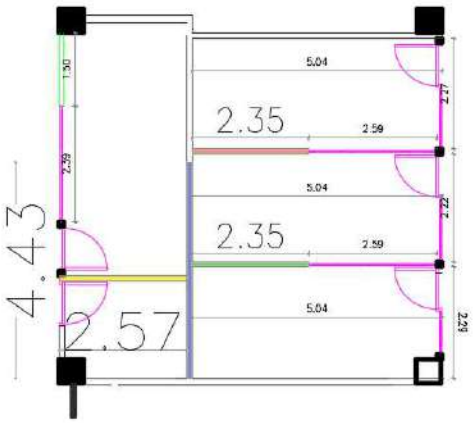

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CUARTO PISO					-
ZONA CREATIVA					-
	2.44	2.35		1.00	5.73
	2.44	2.35		1.00	5.73
	2.44	4.43		1.00	10.82
	2.44	2.57		1.00	6.27
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					28.55
VIENE					293.71
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					322.26
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 9					- 193.56
PRESENTE ACTA					128.70











OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. ANA MIREYA ARAGON RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 10


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	2 DE 3

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA 20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	1.1.	DESCRIPCION ITEM:	Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

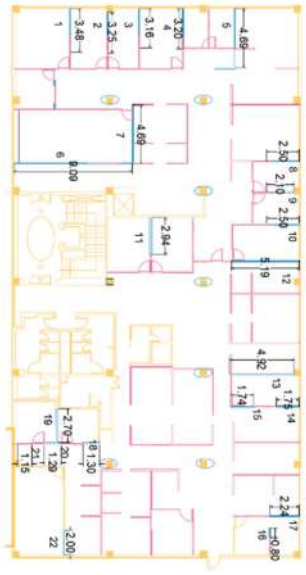

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Cuarto PISO edificio Convenciones					-
Muro 1	2.38		3.48	2.00	16.56
Muro 2	2.38		3.25	2.00	15.47
Muro 3	2.38		3.16	2.00	15.04
Muro 4	2.38		3.20	2.00	15.23
Muro 5	2.38		4.69	2.00	22.32
Muro 6	1.13		9.09	2.00	20.54
Muro 7	2.38		4.69	2.00	22.32
Muro 8	2.38		2.50	1.00	5.95
Muro 9	2.38		2.10	1.00	5.00
Muro 10	2.38		2.50	1.00	5.95
Muro 11	2.38		2.94	1.00	7.00
Muro 12	2.38		5.19	3.00	37.06
Muro 13	2.38		4.92	2.00	23.42
Muro 14	2.38		1.75	1.00	4.17
Muro 15	2.38		1.74	1.00	4.14
Muro 16	2.38		0.80	1.00	1.90
Muro 17	2.38		2.24	1.00	5.33
Muro 18	1.13		1.30	1.00	1.47
Muro 19	2.38		2.70	1.00	6.43
Muro 20	2.38		1.29	1.00	3.07
Muro 21	2.38		1.15	1.00	2.74
Muro 22	2.38		2.00	1.00	4.76
(columna)	2.38		3.35	6.00	47.84
					-
					-
				SUBTOTAL	293.71
				VIENE	-
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADO	293.71

REGISTRO FOTOGRÁFICO

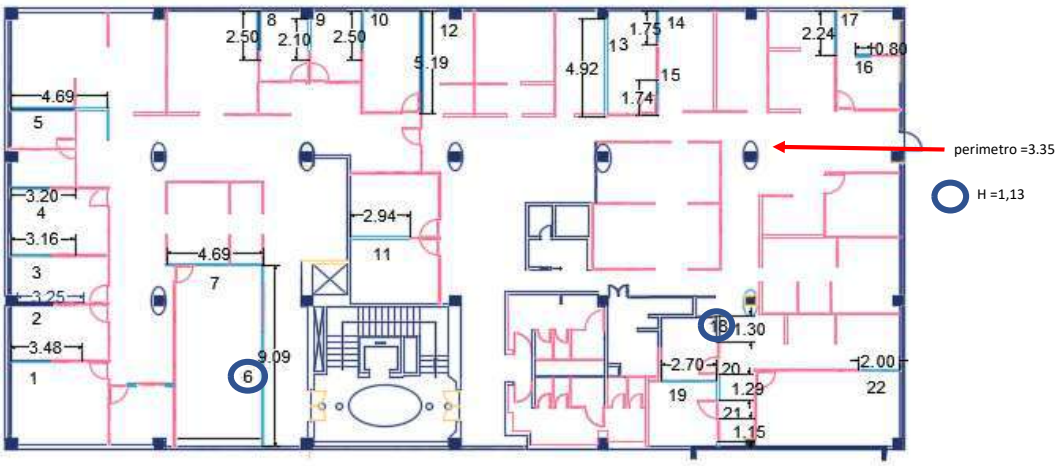

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. ANA MIREYA ARAGON RESIDENTE DE INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 10				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	3 DE 3	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA 20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	1.1.	DESCRIPCION ITEM:	Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.		UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. ANA MIREYA ARAGON RESIDENTE DE INTERVENTORIA


ACTA PARCIAL No. 10

MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - EDF CONVENCIONESFNA

PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	1 DE 11

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA	20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	1.2.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.			UNIDAD:	M2

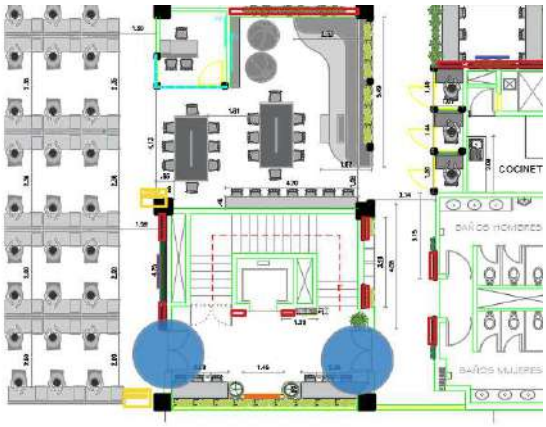PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						-
	EDIFICIO CONVENCIONES					-
	PISO 4					-
	PUNTO FIJO					-
	ACCESO PRINCIPAL	1.97	2.32		2.00	9.14
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	9.14
					VIENE	655.59
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	664.73
					COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 9	- 526.07
					PRESENTE ACTA	138.66







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. ANA MIREYA ARAGON RESIDENTE DE INTERVENTORIA


ACTA PARCIAL No. 10

MEMORIAS DE CANTIDADES - PIMER PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	2 DE 11

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA	20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	1.2.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.			UNIDAD:	M2

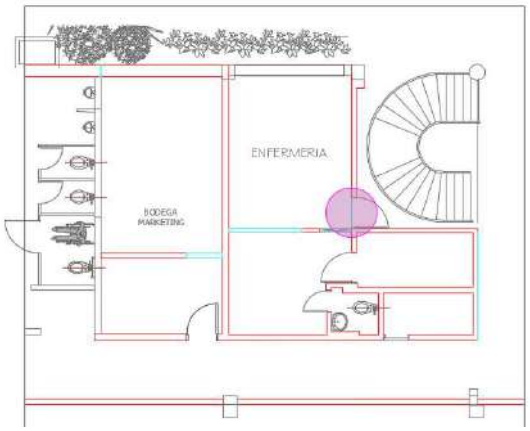PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						-
	EDIFICIO CNA					-
	PISO 1					-
	ACCESO PUNTO DE ATENCION PRIMARIO	2.2	0.9		1.00	1.98
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL		1.98
				VIENE		653.61
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA		655.59

REGISTRO FOTOGRÁFICO








OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. ANA MIREYA ARAGON
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 10				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - PIMER PISO - BAÑOS GESTION DOCUMENTAL - EDF. TECNOLOGIA FNA				
	PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	3 DE 11	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA 20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	1.2.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.			UNIDAD: M2

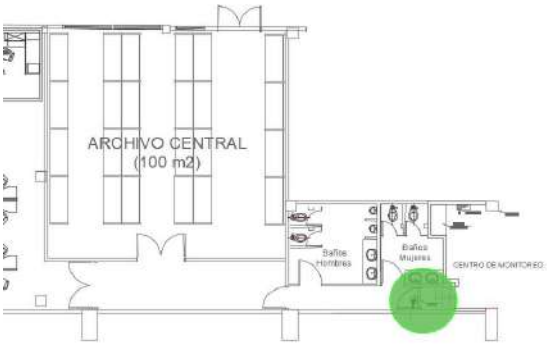PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						-
	EDIFICIO TECNOLOGIA					-
	PISO 1					-
	GESTION DOCUMENTAL					-
	ACCESO A CONTROL Y SEGURIDAD MONITOREO	2.7	0.94		1.00	2.54
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	2.54
					VIENE	651.07
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	653.61

REGISTRO FOTOGRÁFICO








OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. ANA MIREYA ARAGON
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORPA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 10				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - PRIMER PISO - CASINO - EDF. CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	4 DE 11	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA 20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	1.2.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.			UNIDAD: M2

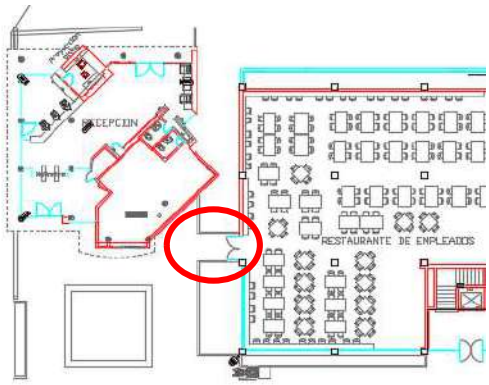PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						-
	EDIFICIO CONVENCIONES					-
	PISO 1					-
	ACCESO CASINO	2.12	2.28		1.00	4.83
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	4.83
					VIENE	646.24
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	651.07

REGISTRO FOTOGRÁFICO








OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUE	ING. ANA MIREYA ARAGON PINZON
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 10				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - SEGUNDO PISO - BAÑO - EDIFICIO CNA FNA				
	PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	5 DE 11	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA 20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	1.2.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.			UNIDAD: M2

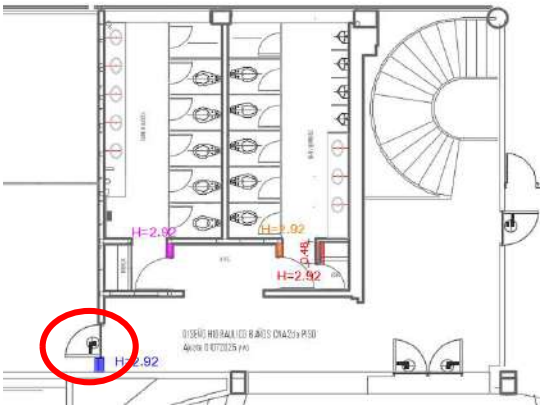PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						-
	EDIFICIO CNA					-
	PISO 2					-
	ACCESO A CONTROL Y SEGURIDAD	2	0.94		1.00	1.88
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	1.88
					VIENE	644.36
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	646.24

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. ANA MIREYA ARAGON
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA


ACTA PARCIAL No. 10

MEMORIAS DE CANTIDADES - PRIMER PISO - CNA FNA

PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	6 DE 11

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA 20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	1.2.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.			UNIDAD: M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

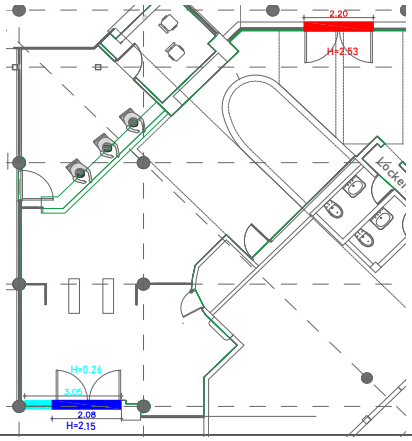

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	Und	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO RECEPCION					-
					-
PUERTA DE ACCESO A RECEPCION	2.53		2.20	1.00	5.57
PUERTA DE SALIDA DE RECEPCION	2.08		2.15	1.00	4.47
MONTANTE PUERTA DE SALIDA	0.26		3.05	1.00	0.79
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	10.83
				VIENE	633.53
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	644.36

REGISTRO FOTOGRÁFICO






OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. ANA MIREYA ARAGON RESIDENTE DE INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 10				INGEBYP NIT. 830.121.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - EDIFICIO DE CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	7 DE 11	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA 20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	1.2.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			Nº ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Cuarto PISO edificio Convenciones					-
	División 1	2.38		12.87	2.00	61.26
	División 2	2.38		2.69	1.00	6.40
	División 3	2.38		2.70	1.00	6.43
	División 4	2.38		2.72	1.00	6.47
	División 5	2.38		1.60	1.00	3.81
	División 6	2.38		3.13	1.00	7.45
	División 7	2.38		5.47	2.00	26.04
	División 8	2.38		1.70	1.00	4.05
	División 9	2.38		5.14	2.00	24.47
	División 10	2.38		3.10	1.00	7.38
	División 11	2.38		2.67	1.00	6.35
	División 12	2.38		3.21	1.00	7.64
	División 13	2.38		1.00	1.00	2.38
	División 14	2.38		4.98	2.00	23.70
	División 15	2.38		3.08	2.00	14.66
	División 16	2.38		2.84	1.00	6.76
	División 17	2.38		2.74	1.00	6.52
	División 18	2.38		9.08	3.00	64.83
	División 19	2.38		1.50	1.00	3.57
	División 20	2.38		1.50	1.00	3.57
					SUBTOTAL	293.74
					VIENE	339.79
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADO	633.53

REGISTRO FOTOGRÁFICO

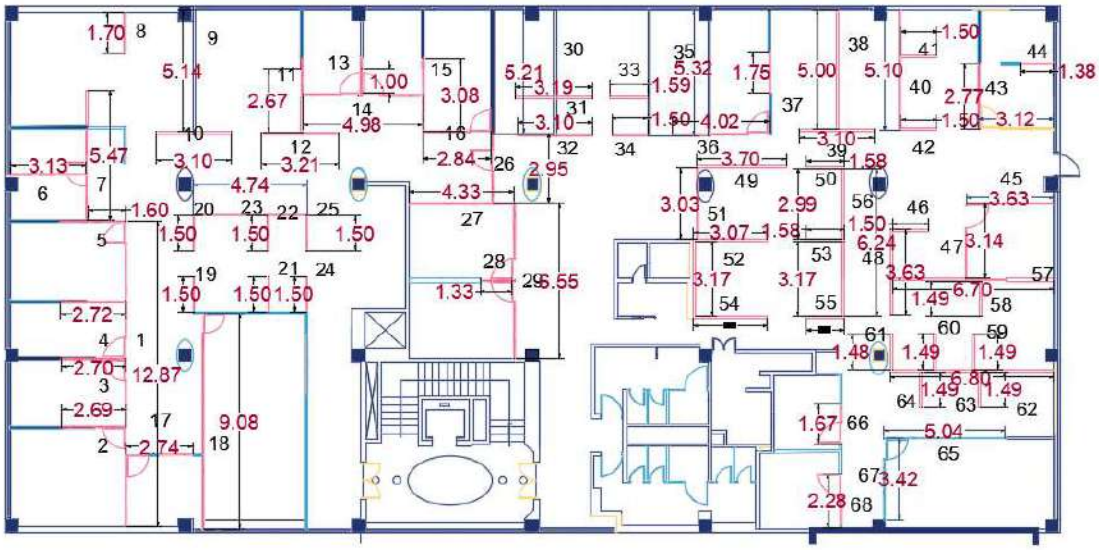

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING ANA MIREYA ARAGON RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 10


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - EDIFICIO DE CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	8 DE 11

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA 20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	1.2.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			Nº ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Cuarto PISO edificio Convenciones					-
	División 21	2.38		1.50	1.00	3.57
	División 22	2.38		1.50	1.00	3.57
	División 23	2.38		4.74	1.00	11.28
	División 24	2.38		1.50	1.00	3.57
	División 25	2.38		1.50	1.00	3.57
	División 26	2.38		2.95	1.00	7.02
	División 27	2.38		4.33	1.00	10.31
	División 28	2.38		1.33	1.00	3.17
	División 29	2.38		6.55	1.00	15.59
	División 30	2.38		5.21	1.00	12.40
	División 31	2.38		3.19	1.00	7.59
	División 32	2.38		3.10	1.00	7.38
	División 33	2.38		1.59	1.00	3.78
	División 34	2.38		1.50	1.00	3.57
	División 35	2.38		5.32	1.00	12.66
	División 36	2.38		4.02	1.00	9.57
	División 37	2.38		1.75	1.00	4.17
	División 38	2.38		5.00	1.00	11.90
	División 39	2.38		3.10	1.00	7.38
	División 40	2.38		5.10	1.00	12.14
					SUBTOTAL	154.19
					VIENE	185.60
					SUBTOTAL ACUMULADO	339.79

REGISTRO FOTOGRÁFICO

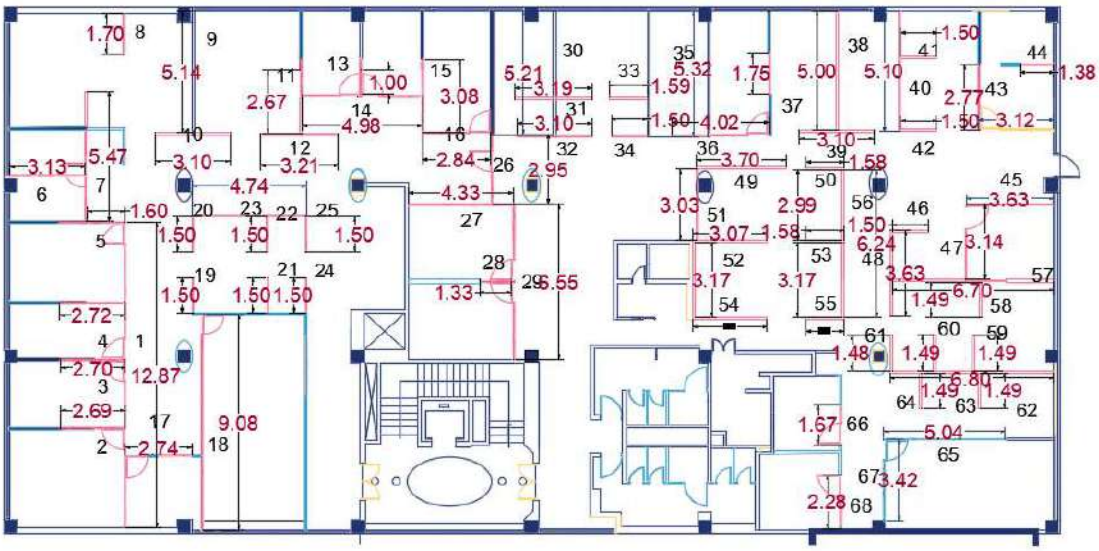

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN RONQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. ANA MIREYA ARAGON RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 10


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - EDIFICIO DE CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	9 DE 11

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA 20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	1.2.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Cuarto PISO edificio Convenciones					-
	División 41	2.38		1.50	1.00	3.57
	División 42	2.38		1.50	1.00	3.57
	División 43	2.38		2.77	1.00	6.59
	División 44	2.38		1.38	1.00	3.28
	División 45	2.38		3.63	1.00	8.64
	División 46	2.38		1.50	1.00	3.57
	División 47	2.38		3.14	1.00	7.47
	División 48	2.38		3.63	1.00	8.64
	División 49	2.38		3.70	1.00	8.81
	División 50	2.38		1.58	1.00	3.76
	División 51	2.38		3.07	1.00	7.31
	División 52	2.38		3.17	1.00	7.54
	División 53	2.38		1.58	1.00	3.76
	División 54	2.38		3.17	1.00	7.54
	División 55	2.38		1.58	1.00	3.76
	División 56	2.38		6.24	1.00	14.85
	División 57	2.38		6.70	1.00	15.95
	División 58	2.38		1.49	1.00	3.55
	División 59	2.38		1.49	1.00	3.55
	División 60	2.38		1.49	1.00	3.55
					SUBTOTAL	129.26
					VIENE	56.34
					SUBTOTAL ACUMULADO	185.60

REGISTRO FOTOGRÁFICO

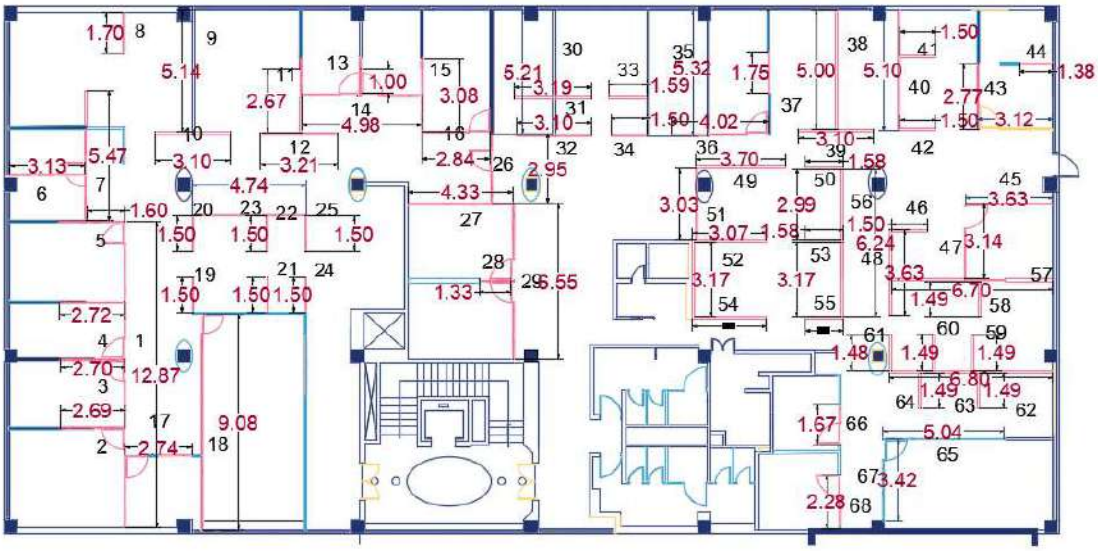

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. ANA MIREYA ARAGON RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 10

MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - EDIFICIO DE CONVENCIONES FNA


PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	10 DE 11

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S	ACTA PARCIAL	10	FECHA	20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO				
ITEM No.	1.2.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Cuarto PISO edificio Convenciones					-
	División 61	2.38		1.48	1.00	3.52
	División 62	2.38		1.49	1.00	3.55
	División 63	2.38		6.80	1.00	16.18
	División 64	2.38		1.49	1.00	3.55
	División 65	2.38		5.04	1.00	12.00
	División 66	2.38		1.67	1.00	3.97
	División 67	2.38		3.42	1.00	8.14
	División 68	2.38		2.28	1.00	5.43
						-
						-
						-
						-
					-	-
					-	-
					-	-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	56.34
					VIENE	-
					SUBTOTAL ACUMULADO	56.34

REGISTRO FOTOGRÁFICO

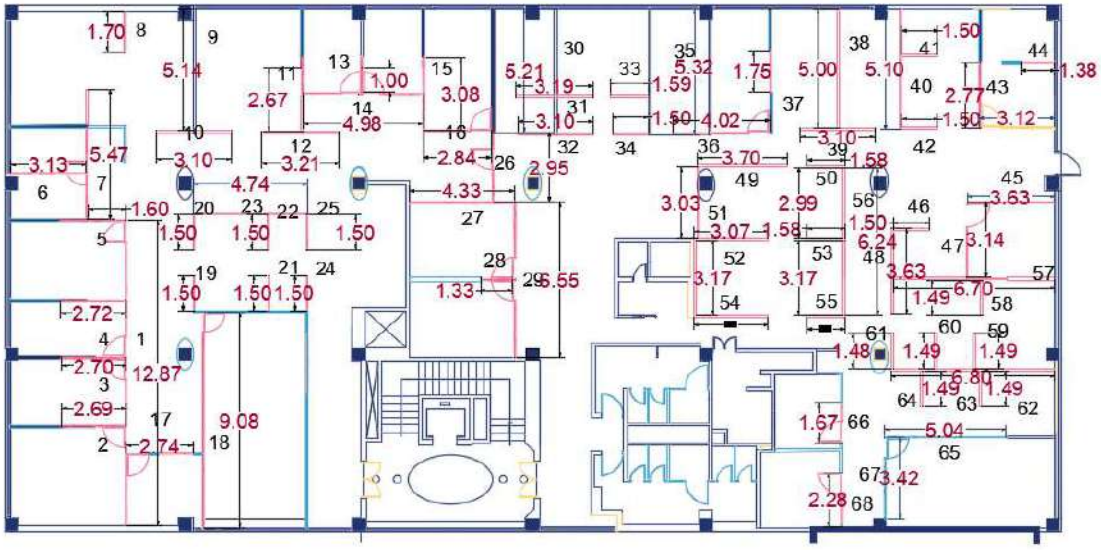

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. ANA MIREYA ARAGON RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	ACTA PARCIAL No. 10		
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - EDIFICIO DE CONVENCIONES FNA		
PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	11 DE 11

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA	20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	1.2.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.			UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO






REGISTRO FOTOGRÁFICO







REGISTRO FOTOGRÁFICO

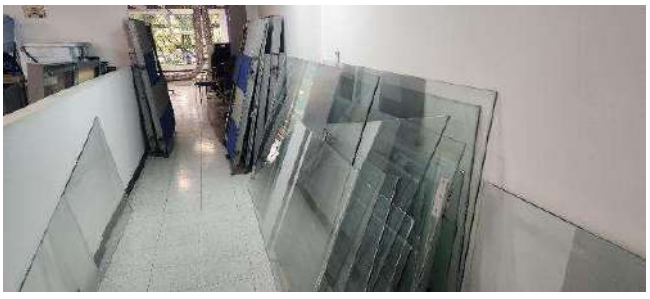



OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. ANA MIREYA ARAGON RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 10

MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - EDF CONVENCIONESFNA

PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA 20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	1.3.	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros.		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					-
Convenciones cuarto piso					-
					-
COSTADO SUR ORIENTAL					-
		8.98	9.13	1.00	81.99
		3.38	3.24	1.00	10.95
ZONA CREATIVA					-
		7.47	6.83	1.00	51.02
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	143.96
				VIENE	986.86
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADO	1,130.82
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 9	- 986.86
				PRESENTE ACTA	143.96

REGISTRO FOTOGRÁFICO








OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. ANA MIREYA ARAGON
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 10		INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES -BAÑOS - CUARTO PISO - EDIFICIO CONVENCIONES FNA		
	PERIODO: 1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA: 1 DE 1	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA: 20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	2.1.	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	Suministro e instalación de columnetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre 12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye platina soldada a la base y anclajes a placa de piso y retiro de escombros.		**UNIDAD:**	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

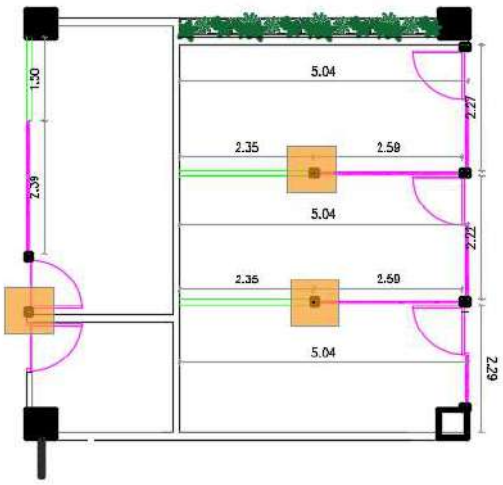

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
CONVENCIONES CUARTO PISO					-
ZONA CREATIVA					-
Columnas	2.54			3.00	7.62
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	7.62
				VIENE	157.48
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	165.10
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 9	- 157.48
				PRESENTE ACTA	7.62

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. ANA MIREYA ARAGON RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 09


MEMORIAS DE CANTIDADES -BAÑOS - CUARTO PISO - EDIFICIO CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA 20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	2.2	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación de viguetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye soldadura a columnetas y retiro de escombros.			UNIDAD: ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

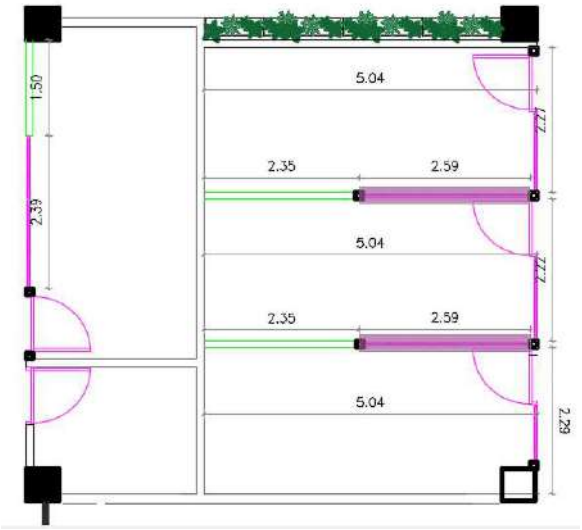

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					-
Vigas enmarcación divisiones y puertas					-
			2.59	2.00	5.18
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	5.18
				VIENE	122.50
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	127.68
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 9	- 122.50
				PRESENTE ACTA	5.18

REGISTRO FOTOGRÁFICO











OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. ANA MIREYA ARAGON RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 10


MEMORIAS DE CANTIDADES -OFICINA ABIERTA - CUARTO PISO - EDIFICIO CONVENCIONES FNA


PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	1 DE 2

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA 20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	3.1	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de muro en Superboard, altura 2.40 m. a dos caras incluye estructura, anclaje, cinta, estuco y fondeo de acabado en pintura en vinilo tipo 1.		UNIDAD:	M2


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

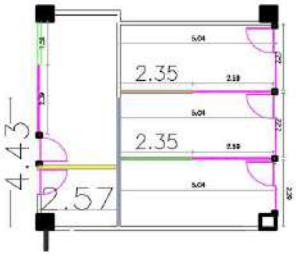


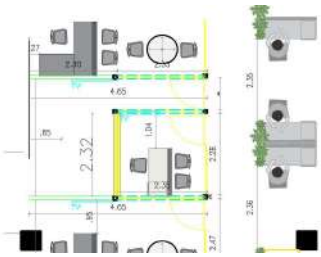

LOCALIZACION	DIMENSIONES ELEMENTO	ANCHO	ALTO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CUARTO PISO					-
ZONA CREATIVA					-
	2.44	2.35		1.00	5.73
	2.44	2.35		1.00	5.73
	2.44	4.43		1.00	10.82
	2.44	2.57		1.00	6.27
					-
OFICINAS COSTADO NORTE	2.44	2.32		1.00	5.66
					-
OFICINAS COSTATO SUR OCCIDENTAL	2.44	1.41		1.00	3.44
	2.44	2.01		1.00	4.90
					-
OFICINAS COSTATO SUR ORIENTAL	1.80	1.53		1.00	2.75
	1.80	1.50		1.00	2.70
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					48.00
VIENE					136.44
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					184.44
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 9					-136.44
PRESENTE ACTA					48.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

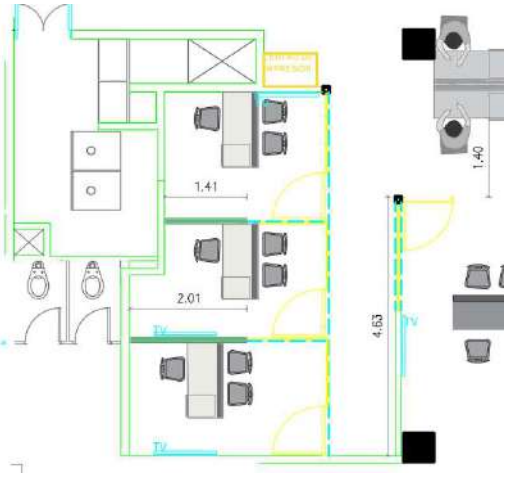

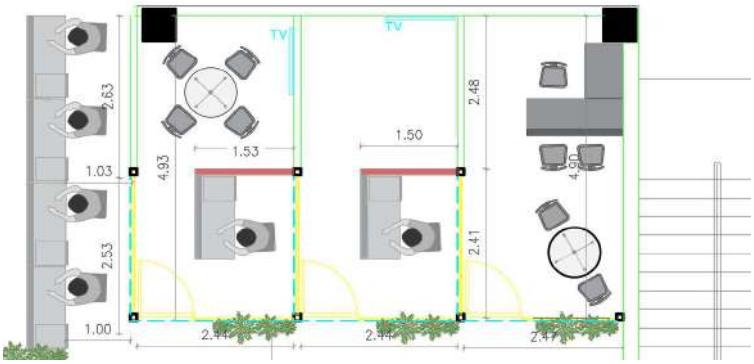

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. ANA MIREYA ARAGON RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 10

MEMORIAS DE CANTIDADES -OFICINA ABIERTA - CUARTO PISO - EDIFICIO CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	1 DE 2

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA 20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	3.1	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de muro en Superboard, altura 2.40 m. a dos caras incluye estructura, anclaje, cinta, estuco y fondeo de acabado en pintura en vinilo tipo 1.		UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. ANA MIREYA ARAGON RESIDENTE DE INTERVENTORIA


ACTA PARCIAL No. 10

MEMORIAS DE CANTIDADES -OFICINA - CUARTO PISO - EDIFICIO CONVENCIONES FNA


PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	1 DE 3

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA 20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6.1.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de alimentador 1N°12 Fase+1N°12 Neutro+1N°12 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.		UNIDAD:	ML

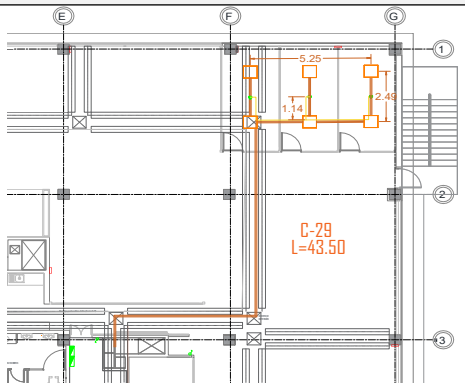PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	Und	MEDIDA TOTAL
	EDIFICIO CONVENCIONES 4 PISO					-
	ALUMBRADO OFICINAS SUR ORIENTE					-
	Circuito - 29			43.50	2.00	87.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL		87.00
				VIENE		1,555.48
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA		1,642.48
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 9		-1300.00
				PRESENTE ACTA		342.48

REGISTRO FOTOGRÁFICO

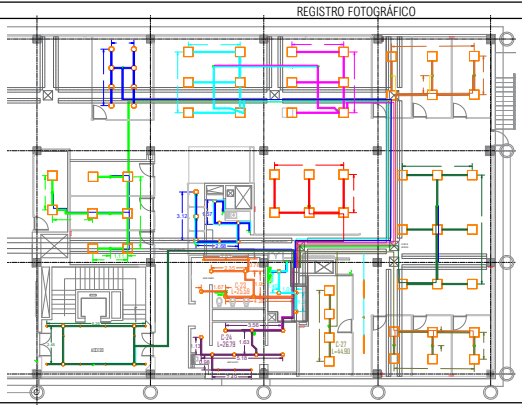

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. ANA MIREYA ARAGON RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 10

MEMORIAS DE CANTIDADES -OFICINA - CUARTO PISO - EDIFICIO CONVENCIONES FNA


PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	2 DE 3

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA	20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	6.1.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de alimentador 1N°12 Fase+1N°12 Neutro+1N°12 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.			UNIDAD:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			Und	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	EDIFICIO CONVENCIONES 4 PISO					-
	ALUMBRADO OFICINAS SUR ORIENTE					-
	Circuito - iluminacion			34.80	4.00	139.20
				14.04	4.00	56.16
				15.03	4.00	60.12
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL		255.48
				VIENE		1,300.00
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA		1,555.48

REGISTRO FOTOGRÁFICO

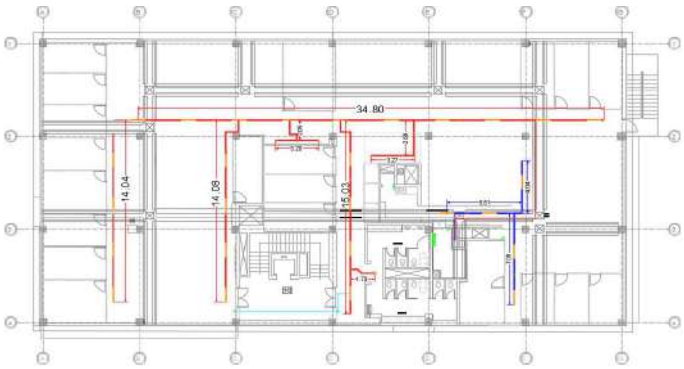

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. ANA MIREYA ARAGON RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 10

MEMORIAS DE CANTIDADES -OFICINAS - CUARTO PISO - EDIFICIO CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	3 DE 3

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S	ACTA PARCIAL	10	FECHA	20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO				
ITEM No.	6.1.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de alimentador 1N°12 Fase+1N°12 Neutro+1N°12 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	UNIDAD:	ML

REGISTRO FOTOGRÁFICO









OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. ANA MIREYA ARAGON RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 10


MEMORIAS DE CANTIDADES - PRIMER PISO - ATENCION PRIMARIA - EDIFICIO CNA

PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	1 DE 2

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA 20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6.3	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.			UNIDAD: UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

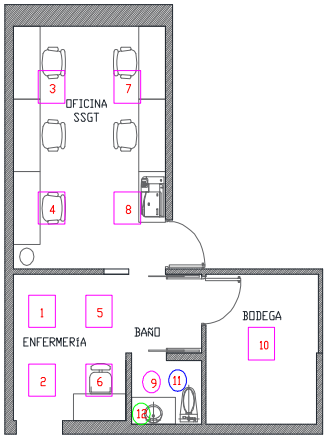

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CNA					-
PRIMER PISO					-
ATENCION PRIMERIA					-
LUMINARIAS (1-10)				10.00	10.00
SENSOR (11)				1.00	1.00
ESPEJO (12)				1.00	1.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	12.00
				VIENE	305.00
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	317.00
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 10	- 305.00
				PRESENTE ACTA	12.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO








OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. ANA MIREYA ARAGON RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 10


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - EDIFICIO CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	2 DE 2

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA 20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6.3	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.			UNIDAD: UND


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

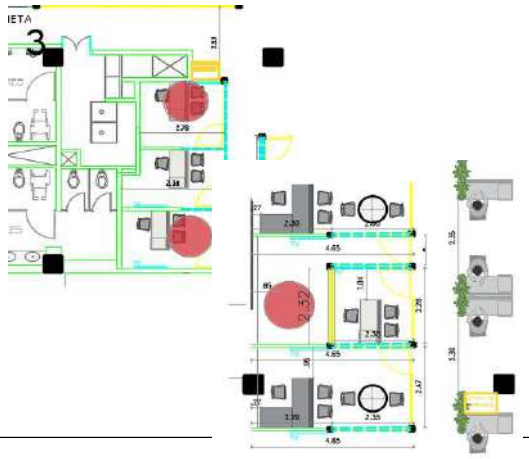

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES 4 PISO					-
COMPLEMENTARIOS POR AJUSTE EN DISEÑO					-
OFICINAS SUR ORIENTAL SENSOR				2.00	2.00
					-
OFICINAS NORTE SENSOR				1.00	1.00
					-
NICHO FRENTE A BAÑOS				3.00	3.00
					-
ESPEJOS BAÑOS HOMBRES Y MUJERES				3.00	3.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	9.00
				VIENE	296.00
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	305.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO









OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. ANA MIREYA ARAGON RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 10


MEMORIAS DE CANTIDADES -BAÑOS - CUARTO PISO - EDIFICIO CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA 20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	6.8.	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.			UNIDAD: UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

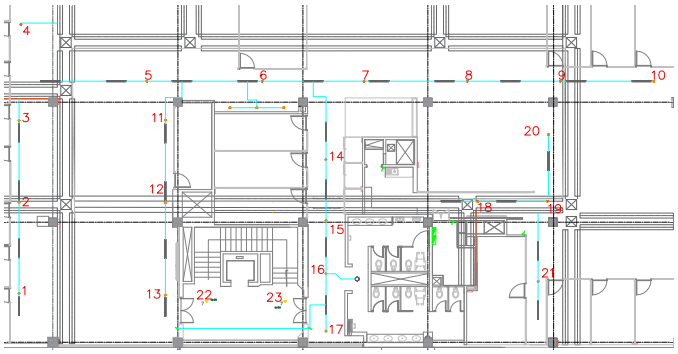

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					-
Vigas enmarcación divisiones y puertas					-
				23.00	23.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	23.00
				VIENE	
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	23.00
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 9	
				PRESENTE ACTA	23.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. ANA MIREYA ARAGON RESIDENTE DE INTERVENTORIA


ACTA PARCIAL No. 10


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA


PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	1 DE 17

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA 20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6.11.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.		UNIDAD:	ML

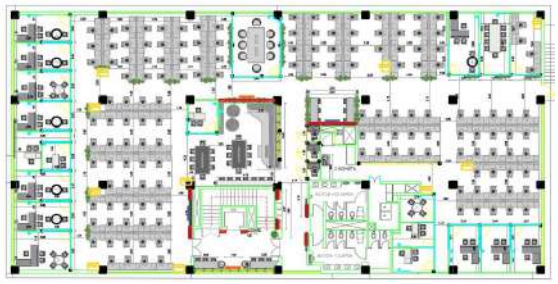PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	EDIFICIO CONVENCIONES					-
	CUARTO PISO					-
	DUCTOS PARA ALIMENTACION					-
	AREAS COMUNES C35			9.47	1.00	9.47
				1.20	1.00	1.20
				4.88	1.00	4.88
				1.42	1.00	1.42
				1.20	1.00	1.20
	Luminarias C-35			3.00	8.00	24.00
				3.00	- 8.00	- 24.00
	SALA DE JUNTAS C 37			2.03	1.00	2.03
	Luminarias C-37			3.00	8.00	24.00
				3.00	- 8.00	- 24.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	20.20
					VIENE	420.99
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	441.19
					COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 9	- 138.11
					PRESENTE ACTA	303.08

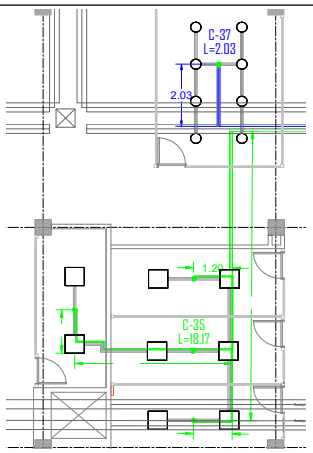

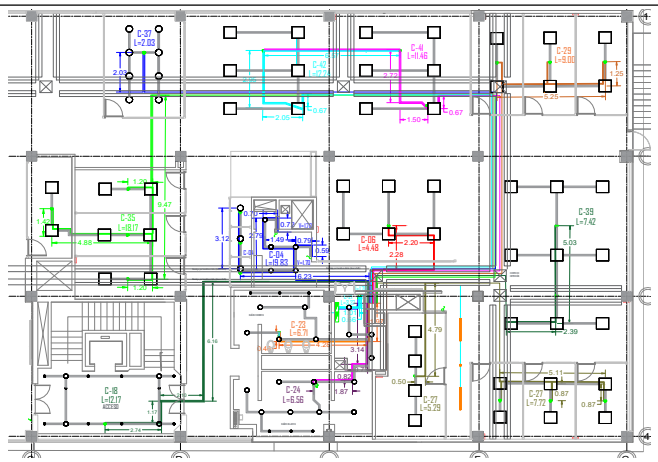

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 10


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	2 DE 17

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA 20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6.11.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.		UNIDAD:	ML


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

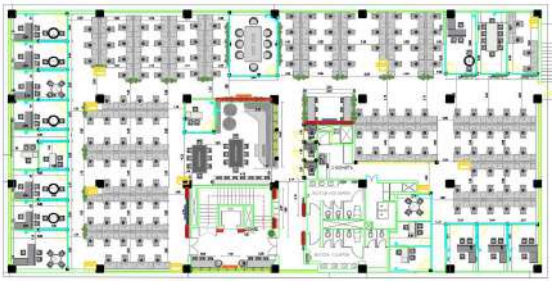

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CUARTO PISO					-
DUCTOS PARA ALIMENTACION					-
AREAS COMUNES C42			0.67	1.00	0.67
			2.05	1.00	2.05
			2.95	1.00	2.95
			6.57	1.00	6.57
Luminarias C-42			3.00	6.00	18.00
			3.00	- 6.00	- 18.00
					-
					-
					-
					-
SALA DE JUNTAS C 41			0.67	1.00	0.67
			1.50	1.00	1.50
			2.72	1.00	2.72
			6.57	1.00	6.57
Luminarias C-41			3.00	6.00	18.00
			3.00	- 6.00	- 18.00
					-
					-
				SUBTOTAL	23.70
				VIENE	397.29
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	420.99

REGISTRO FOTOGRÁFICO

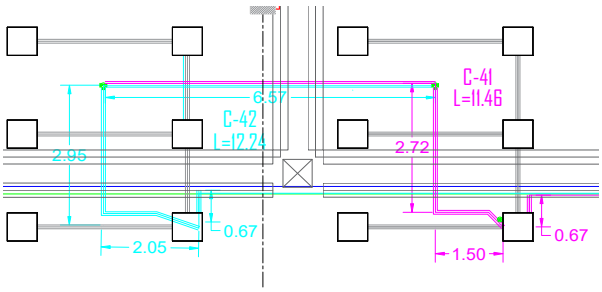

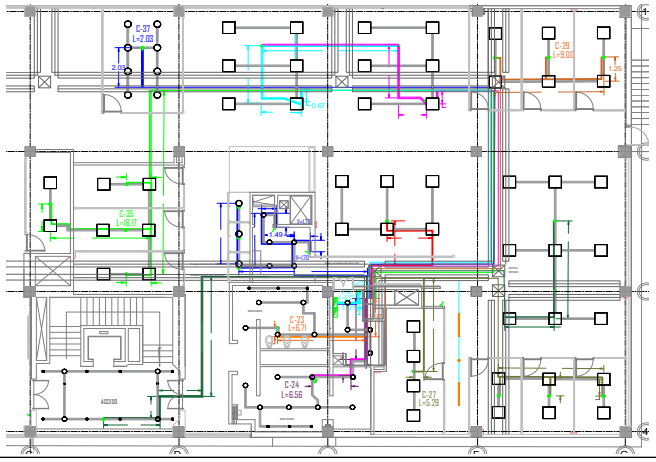

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. ANA MIREYA ARAGON
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 10


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	3 DE 17

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA 20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6.11.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.		UNIDAD:	ML


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

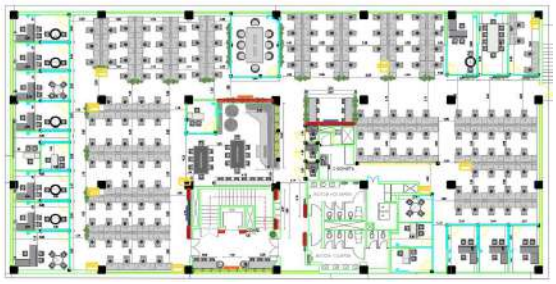

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CUARTO PISO					-
DUCTOS PARA ALIMENTACION					-
AREAS COMUNES C29			5.25	1.00	5.25
			1.25	3.00	3.75
Luminarias C-29			3.00	4.00	12.00
			3.00	- 4.00	- 12.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	9.00
				VIENE	388.29
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	397.29

REGISTRO FOTOGRÁFICO

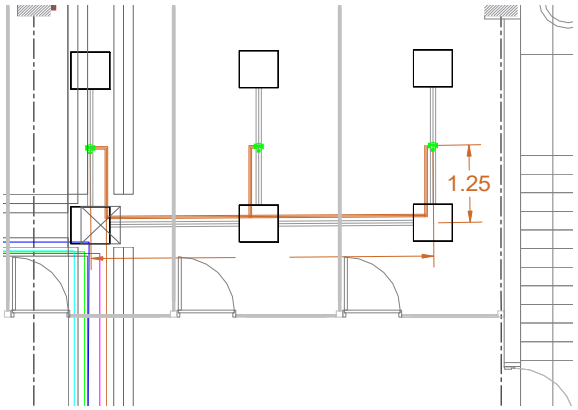

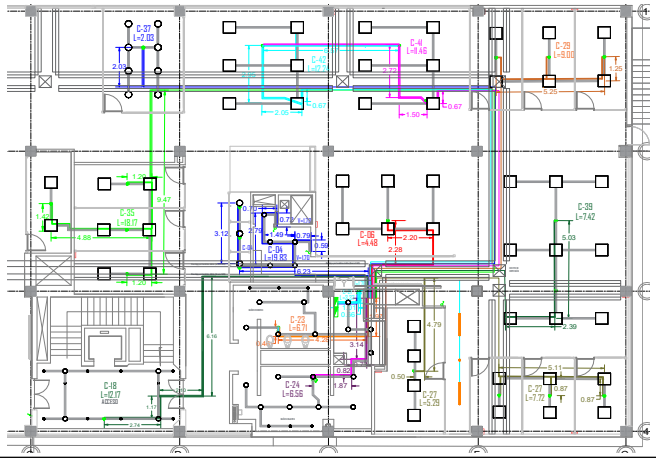

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. ANA MIRAYA ARAGON
COORDINADOR DE PROYECTO GERENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 10


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	4 DE 17

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA 20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6.11.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.		UNIDAD:	ML


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

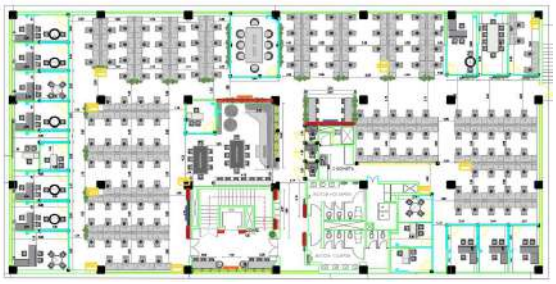

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CUARTO PISO					-
DUCTOS PARA ALIMENTACION					-
AREAS COMUNES C 39			2.39	1.00	2.39
			5.03	1.00	5.03
Luminarias C-39			3.00	3.00	9.00
			3.00	- 3.00	- 9.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	7.42
				VIENE	380.87
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	388.29

REGISTRO FOTOGRÁFICO

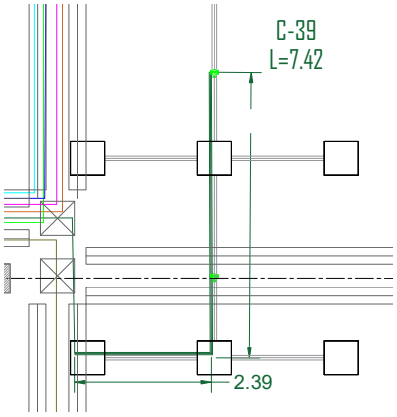

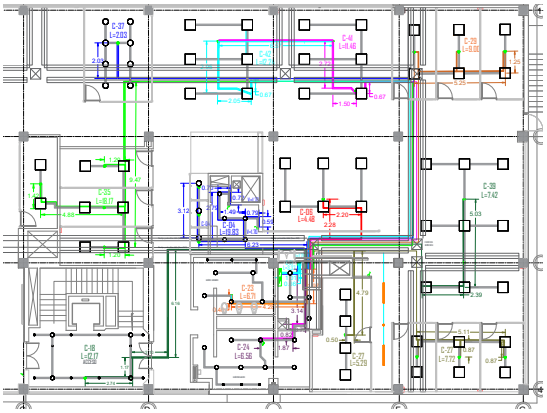

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. ANA MIREYA ARAGON
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 10


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	5 DE 17

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA 20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6.11.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.		UNIDAD:	ML


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

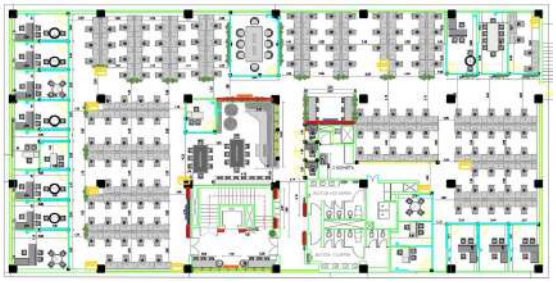

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CUARTO PISO					-
DUCTOS PARA ALIMENTACION					-
SALA DE JUNTAS C27			4.79	1.00	4.79
			0.50	1.00	0.50
Luminarias C-27			3.00	4.00	
			3.00	- 4.00	- 12.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
OFICINAS C27			5.11	1.00	5.11
			0.87	3.00	2.61
Luminarias C-27			3.00	6.00	18.00
			3.00	- 6.00	- 18.00
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	1.01
				VIENE	379.86
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	380.87

REGISTRO FOTOGRÁFICO

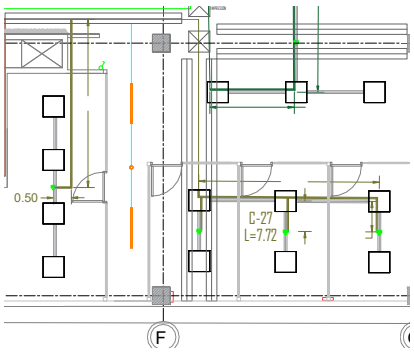

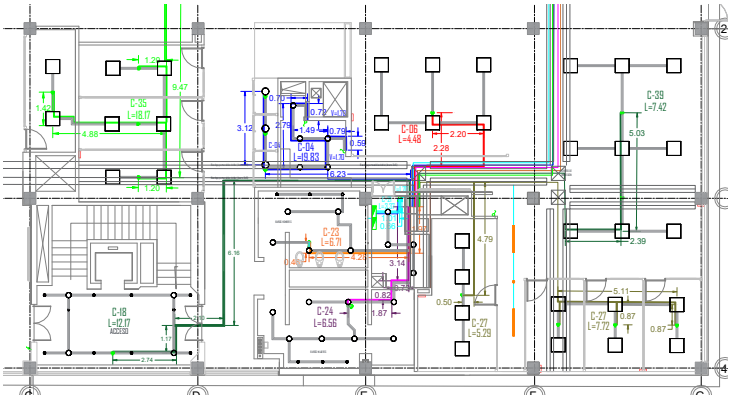

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. ANA MIREYA ARAGON
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 10


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	6 DE 17

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA 20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6.11.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.		UNIDAD:	ML


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

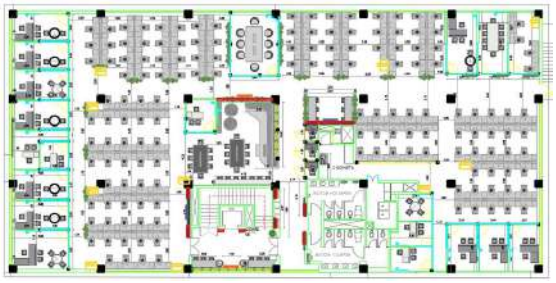

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CUARTO PISO					-
DUCTOS PARA ALIMENTACION					-
AREAS COCINA C 04			6.23	1.00	6.23
			3.12	1.00	3.12
			2.79	1.00	2.79
			1.49	1.00	1.49
			0.70	1.00	0.70
			0.72	1.00	0.72
			1.70	1.00	1.70
			0.79	1.00	0.79
			0.59	1.00	0.59
			1.70	1.00	1.70
Luminarias C-04			3.00	8.00	24.00
			3.00	- 8.00	- 24.00
					-
					-
OFICINA CENTRAL C 06			2.28	1.00	2.28
			2.20	1.00	2.20
Luminarias C-06			3.00	3.00	9.00
			3.00	- 3.00	- 9.00
				SUBTOTAL	24.31
				VIENE	355.55
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	379.86

REGISTRO FOTOGRÁFICO



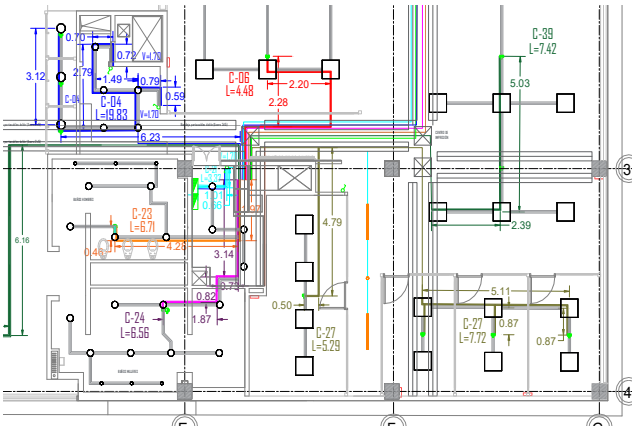

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. ANA MIREYA ARAGON
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 10


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	7 DE 17

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA 20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6.11.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.		UNIDAD:	ML


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

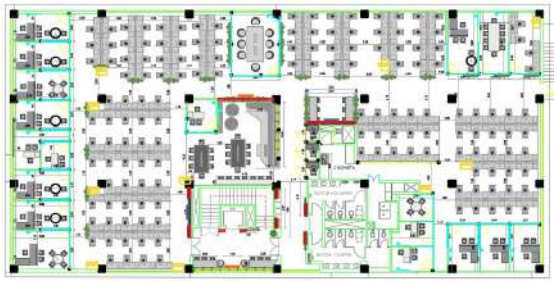

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CUARTO PISO					-
DUCTOS PARA ALIMENTACION					-
CUARTO DE RACK C 21			1.01	1.00	1.01
			0.66	1.00	0.66
			1.70	1.00	1.70
Luminarias C-21			3.00	4.00	12.00
			3.00	- 4.00	- 12.00
					-
BAÑO DE HOMBRES C 23			1.97	1.00	1.97
			4.28	1.00	4.28
			0.46	1.00	0.46
Luminarias C-23			3.00	5.00	15.00
			3.00	- 5.00	- 15.00
BAÑO DE MUJERES C 24			1.87	1.00	1.87
			0.82	1.00	0.82
			0.73	1.00	0.73
			3.14	1.00	3.14
Luminarias C-24			3.00	3.00	9.00
			3.00	- 3.00	- 9.00
					-
				SUBTOTAL	16.64
				VIENE	338.91
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	355.55

PLANO

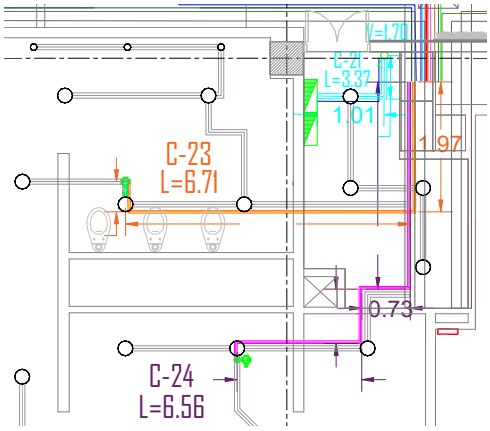

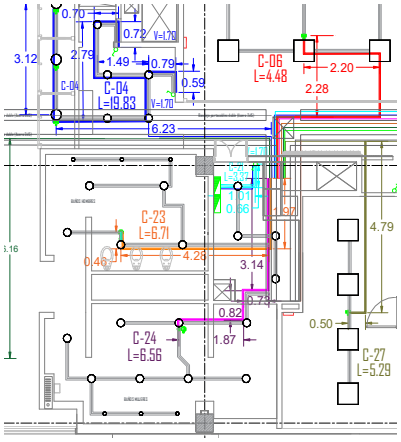

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. ANA MIREYA ARAGON
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 10


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	8 DE 17

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA 20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6.11.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.		UNIDAD:	ML


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

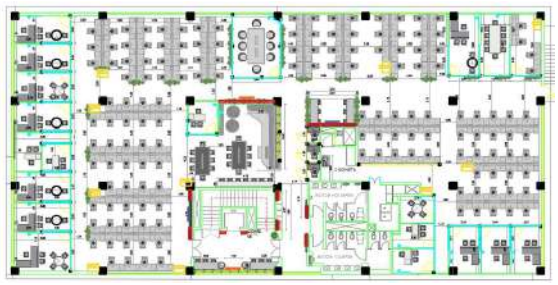

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CUARTO PISO					-
DUCTOS PARA ALIMENTACION					-
HALL DE ACCESO C18			2.74	1.00	2.74
			1.17	1.00	1.17
			2.10	1.00	2.10
			6.16	1.00	6.16
Luminarias C-18			3.00	3.00	9.00
			3.00	- 3.00	- 9.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					12.17
VIENE					326.74
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					338.91

PLANO

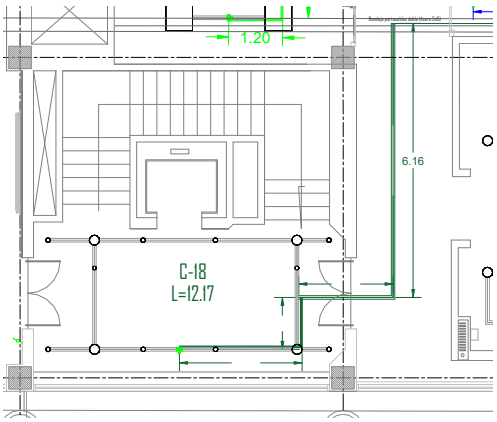

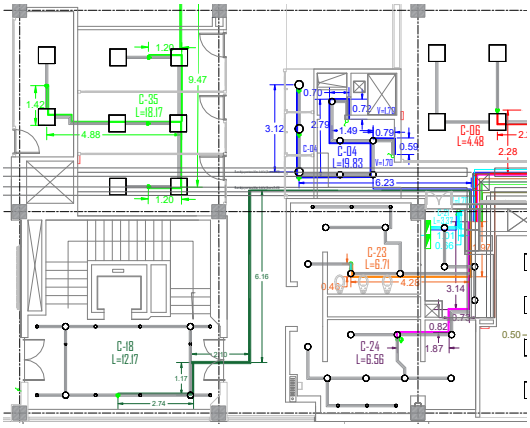

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. ANA MIREYA ARAGON
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 10


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	9 DE 17

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA 20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6.11.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.		UNIDAD:	ML


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

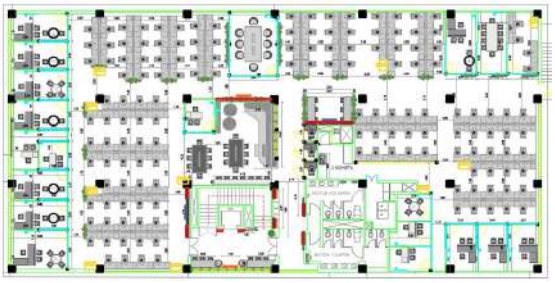

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CUARTO PISO					-
DUCTOS PARA ALIMENTACION					-
OFICINAS TRAS ASCENSOR C35			9.47	1.00	9.47
			1.20	1.00	1.20
			4.88	1.00	4.88
			1.42	1.00	1.42
			1.20	1.00	1.20
Luminarias C-35			3.00	7.00	21.00
			3.00	- 7.00	- 21.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					18.17
VIENE					308.57
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					326.74

PLANO

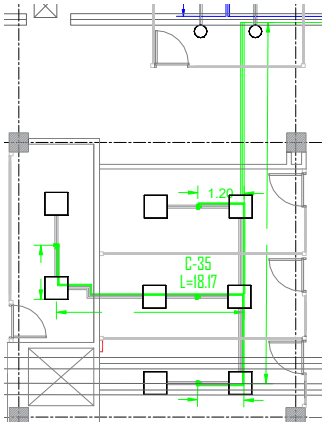

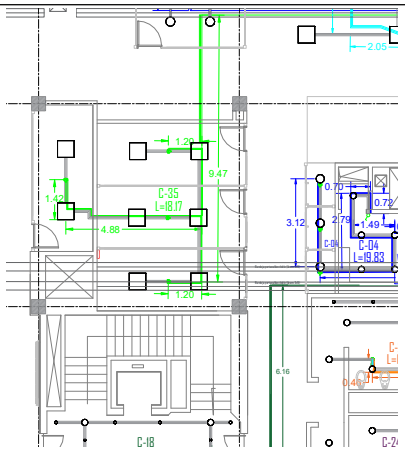

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. ANA MIREYA ARAGON
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 10


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	10 DE 17

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA 20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6.11.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.		UNIDAD:	ML


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

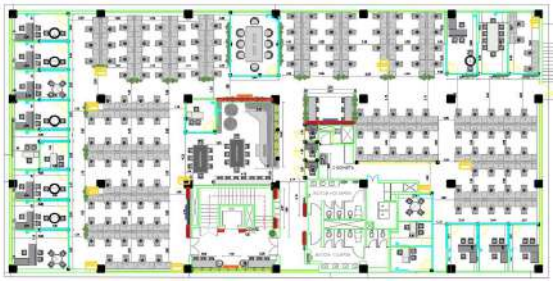

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CUARTO PISO					-
DUCTOS PARA ALIMENTACION					-
OFICINAS NORTE C31			0.56	1.00	0.56
			11.67	1.00	11.67
			1.16	5.00	5.80
Luminarias C-31			3.00	10.00	30.00
			3.00	- 10.00	- 30.00
					-
					-
					-
OFICINAS NORTE C 02			7.19	1.00	7.19
			3.00	1.00	3.00
Luminarias C-02			3.00	12.00	36.00
			3.00	- 12.00	- 36.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	28.22
				VIENE	280.35
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	308.57

PLANO

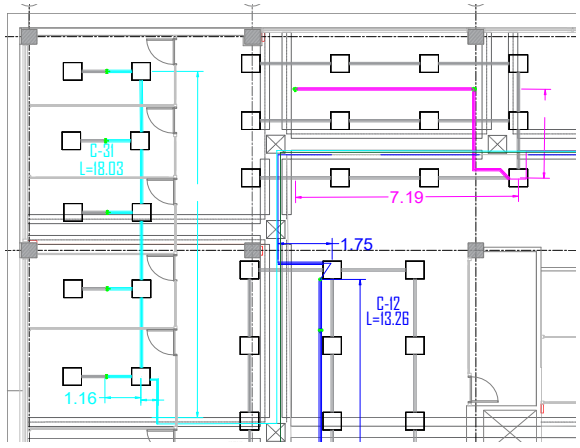

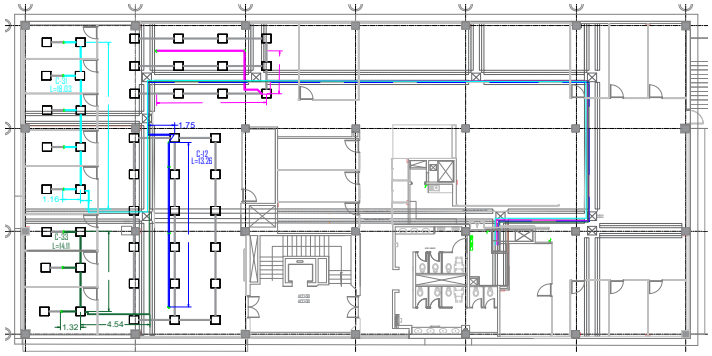

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. ANA MIREYA ARAGON
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 10


MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-03-2026 AL 20-03-2026	HOJA	11 DE 17

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	10	FECHA 20/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	6.11.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.		UNIDAD:	ML


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

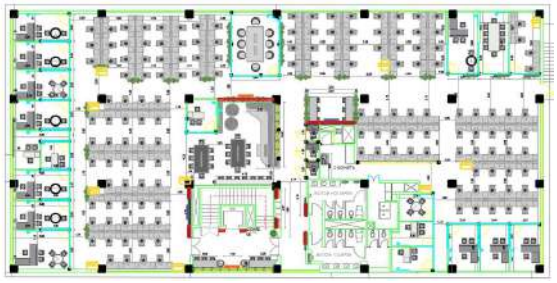

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CONVENCIONES					-
CUARTO PISO					-
DUCTOS PARA ALIMENTACION					-
PASILLO CENTRAL C 12			1.75	1.00	1.75
			11.51	1.00	11.51
Luminarias C-12			3.00	12.00	36.00
			3.00	- 12.00	- 36.00
					-
					-
					-
OFICINAS NORTE C 33			4.54	1.00	4.54
			5.61	1.00	5.61
			1.32	3.00	3.96
Luminarias C-33			3.00	6.00	18.00
			3.00	- 6.00	- 18.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	27.37
				VIENE	252.98
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	280.35

PLANO

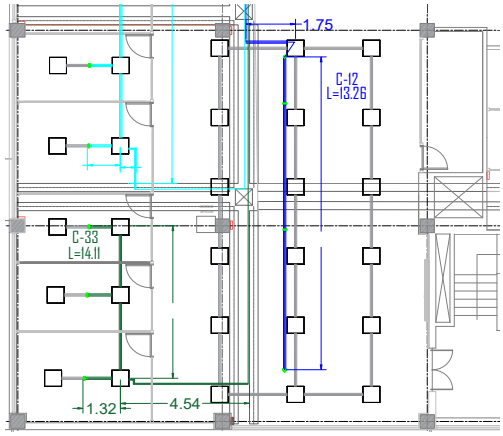

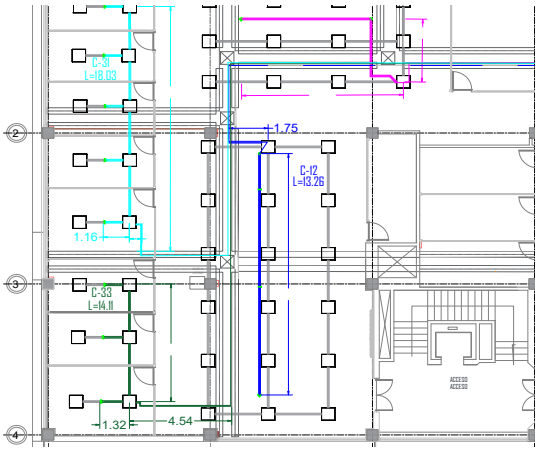

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. ANA MIREYA ARAGON
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
