	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. -	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES ACTUALIZADA	
CONTRATO FNA-166-2024	OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA - CNA EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	FECHA	26 DE AGOSTO DE 2025

ITEM	DESCRIPCION	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES			BALANCE DE OBRA N°1 (ACTA DE FIJACIÓN N°1) : 3 DE JUNIO DE 2025						BALANCE DE OBRA N°2 (ACTA DE FIJACIÓN N°2) 1 DE JULIO DE 2025						BALANCE DE OBRA N°3 26 de agosto 2025					
						CANTIDADES		VALORES				CANTIDADES		VALORES				CANTIDADES		VALORES			
			Cantidad	Vr Unitario	Vr Total	Mayores +	Menores -	Mayores +	Menores -	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL	Mayores +	Menores -	Mayores +	Menores -	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL	Mayores +	Menores -	Mayores +	Menores -	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
6.2.	Suministro e instalación de alimentador a tableros en 3N°2/0 Fase+1N°2/0 Neutro+1N°2 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE	mt	200	$ 363,569.00	$ 72,713,800.00			$ -	$ -	200.00	$ 72,713,800.00			$ -	$ -	200.00	$ 72,713,800.00			$ -	$ -	200.00	$ 72,713,800.00
6.3.	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble, cumpliendo norma RETIE.	und	240	$ 153,691.00	$ 36,885,840.00			$ -	$ -	240.00	$ 36,885,840.00			$ -	$ -	240.00	$ 36,885,840.00	70		$ 10,758,370.00	$ -	310.00	$ 47,644,210.00
6.4.	Suministro e instalación de salida interruptor sencillo o doble 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH40 3/4" elementos de fijación y conductores. Cumpliendo norma RETIE.	und	60	$ 173,282.00	$ 10,396,920.00			$ -	$ -	60.00	$ 10,396,920.00			$ -	$ -	60.00	$ 10,396,920.00			$ -	$ -	60.00	$ 10,396,920.00
6.5.	Suministro e instalación de lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones 120x4x7cm. Largo de la guaya: 100cm, incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	82	$ 318,520.00	$ 26,118,640.00			$ -	$ -	82.00	$ 26,118,640.00			$ -	$ -	82.00	$ 26,118,640.00			$ -	$ -	82.00	$ 26,118,640.00
6.6.	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	90	$ 224,564.00	$ 20,210,760.00			$ -	$ -	90.00	$ 20,210,760.00			$ -	$ -	90.00	$ 20,210,760.00	50		$ 11,228,200.00	$ -	140.00	$ 31,438,960.00
6.7.	Suministro e instalación de panel LED de gran formato redondo de 24W, luz neutra 4000K, dimensiones 100 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	7	$ 190,825.00	$ 1,335,775.00			$ -	$ -	7.00	$ 1,335,775.00			$ -	$ -	7.00	$ 1,335,775.00			$ -	$ -	7.00	$ 1,335,775.00
6.8.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	22	$ 176,599.00	$ 3,885,178.00			$ -	$ -	22.00	$ 3,885,178.00			$ -	$ -	22.00	$ 3,885,178.00			$ -	$ -	22.00	$ 3,885,178.00
6.9.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia de aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	10	$ 195,508.00	$ 1,955,080.00			$ -	$ -	10.00	$ 1,955,080.00			$ -	$ -	10.00	$ 1,955,080.00			$ -	$ -	10.00	$ 1,955,080.00
6.10.	Suministro e instalación de salida tomacorriente doble polo a tierra (red normal), monofásico 120V 15A, 3m prom en cable No 12 LSHF AWG, elementos de fijación y conductores.	und	43	$ 173,606.00	$ 7,465,058.00			$ -	$ -	43.00	$ 7,465,058.00			$ -	$ -	43.00	$ 7,465,058.00	40		$ 6,944,240.00	$ -	83.00	$ 14,409,298.00
6.11.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. Cumpliendo norma RETIE	m	300	$ 16,035.00	$ 4,810,500.00			$ -	$ -	300.00	$ 4,810,500.00			$ -	$ -	300.00	$ 4,810,500.00			$ -	$ -	300.00	$ 4,810,500.00
6.12.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit EMT ø 3" oculta sobre cielo o en muros.	mt	180	$ 155,392.00	$ 27,970,560.00			$ -	$ -	180.00	$ 27,970,560.00			$ -	$ -	180.00	$ 27,970,560.00			$ -	$ -	180.00	$ 27,970,560.00
6.13.	Suministro e instalación de ducto cerrado de 400ß galvanizado o con pintura electrostática.	mt	220	$ 293,413.00	$ 64,550,860.00			$ -	$ -	220.00	$ 64,550,860.00			$ -	$ -	220.00	$ 64,550,860.00			$ -	$ -	220.00	$ 64,550,860.00
6.14.	Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico tetrafilar con espacio para totalizador y barraje neutro y tierra. Incluye totalizador y protecciones.	und	2	$ 3,460,340.00	$ 6,920,680.00			$ -	$ -	2.00	$ 6,920,680.00			$ -	$ -	2.00	$ 6,920,680.00			$ -	$ -	2.00	$ 6,920,680.00
7.1.	Suministro e instalación de Vidrios Templado 8 mm para divisiones de oficina incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	300	$ 830,396.00	$ 249,118,800.00			$ -	$ -	300.00	$ 249,118,800.00			$ -	$ -	300.00	$ 249,118,800.00		200	$ -	$ 166,079,200.00	100.00	$ 83,039,600.00
7.2.	Suministro e instalación de Puerta en Vidrio Templado 8 mm con Pivote, incluye topes de piso, accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento a todo costo.	m2	30	$ 856,303.00	$ 25,689,090.00			$ -	$ -	30.00	$ 25,689,090.00			$ -	$ -	30.00	$ 25,689,090.00	3.12		$ 2,671,665.36	$ -	33.12	$ 28,360,755.36
7.3.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho a todo costo de uso interior y exterior.	mt	60	$ 85,101.00	$ 5,106,060.00			$ -	$ -	60.00	$ 5,106,060.00			$ -	$ -	60.00	$ 5,106,060.00	43.4		$ 3,693,383.40	$ -	103.40	$ 8,799,443.40
7.4.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho de uso interior y exterior, con corte de letras para identificar las oficinas en vidrio. A todo costo.	und	41	$ 139,113.00	$ 5,703,633.00			$ -	$ -	41.00	$ 5,703,633.00			$ -	$ -	41.00	$ 5,703,633.00		26	$ -	$ 3,616,938.00	15.00	$ 2,086,695.00
8.1.	Suministro e instalación de Puerta en madecor enlaminorada de 0,90 m de ancho por 2.20 m de alto, incluye marcos, chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	1	$ 1,145,405.00	$ 1,145,405.00			$ -	$ -	1.00	$ 1,145,405.00			$ -	$ -	1.00	$ 1,145,405.00			$ -	$ -	1.00	$ 1,145,405.00
9.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores blancos. A todo costo, incluye lineales.	m2	1000	$ 37,195.00	$ 37,195,000.00			$ -	$ -	1000.00	$ 37,195,000.00			$ -	$ -	1000.00	$ 37,195,000.00		69.719	$ -	$ 2,593,198.21	930.28	$ 34,601,801.80
9.2.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos cielo falsos blanco. A todo costo, incluye lineales.	m2	230.61	$ 40,033.00	$ 9,232,010.13			$ -	$ -	230.61	$ 9,232,010.13			$ -	$ -	230.61	$ 9,232,010.13	1431.07		$ 57,290,025.31	$ -	1661.68	$ 66,522,035.44
	TOTAL REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CNA - PISO 2				**$ 1,212,934,890.00**			**$ -**	**$ -**		**$ 1,212,934,890.00**						**$ 1,212,934,890.00**						**$ 1,199,187,649.00**
	REPARACIONES LOCATIVAS CASINO - EDIFICIO CONVENCIONES																						
5.5.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad, para la zona de mesas del restaurante Incluye nivelación en zonas puntuales, plástico aislante, yumbolon de acuerdo con las características técnicas y el guardaescobas.	m2	450	$ 189,748.00	$ 85,386,600.00			$ -	$ -	450.00	$ 85,386,600.00			$ -	$ -	450.00	$ 85,386,600.00		90	$ -	$ 17,077,320.00	360.00	$ 68,309,280.00
9.1.	Suministro e instalación de estructura decorativa para plantas colgantes de 6,85m ancho x 1,00 m de profundo con viguetas cada 0,76 m en tubería metálica cuadrada 50x50x2.0mm con acabado en pintura electrostática negro mate incluye 6 puntos de apoyo en guaya de tipo colgante. Incluye 3 lamparas segun imagen.	und	2	$ 3,245,844.00	$ 6,491,688.00			$ -	$ -	2.00	$ 6,491,688.00			$ -	$ -	2.00	$ 6,491,688.00			$ -	$ -	2.00	$ 6,491,688.00
9.2.	Suministro e instalación de estructura para microondas con módulos de 0,71 m de largo, 0,56 m de profundo y 0,40 m de alto en tubería metálica cuadrada 50x50x3.0mm en pintura electrostática negro mate incluye 2 superficies en madera tipo madecor RH de 1" cada módulo y anclajes a la pared no visibles.	und	12	$ 835,627.00	$ 10,027,524.00			$ -	$ -	12.00	$ 10,027,524.00			$ -	$ -	12.00	$ 10,027,524.00		1	$ -	$ 835,627.00	11.00	$ 9,191,897.00
11.1.	Resanes y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre pañete o repello liso. Incluyen andamios, escaleras y sistemas de seguridad de operación. A todo costo.	m2	222.23	$ 33,744.00	$ 7,498,929.12			$ -	$ -	222.23	$ 7,498,929.12			$ -	$ -	222.23	$ 7,498,929.12		150	$ -	$ 5,061,600.00	72.23	$ 2,437,329.12
	TOTAL REPARACIONES LOCATIVAS CASINO - EDIFICIO CONVENCIONES				**$ 109,404,741.00**			**$ -**	**$ -**		**$ 109,404,741.00**						**$ 109,404,741.00**						**$ 86,430,194.00**
	REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CONVENCIONES - PISO 4																						
1.1.	Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.	m2	161.58	$ 47,734.00	$ 7,712,859.72			$ -	$ -	161.58	$ 7,712,859.72			$ -	$ -	161.58	$ 7,712,859.72	300		$ 14,320,200.00	$ -	461.58	$ 22,033,059.72
1.2.	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	m2	246.96	$ 95,354.00	$ 23,548,623.84			$ -	$ -	246.96	$ 23,548,623.84			$ -	$ -	246.96	$ 23,548,623.84			$ -	$ -	246.96	$ 23,548,623.84
1.3.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros	m2	888.84	$ 35,224.00	$ 31,308,500.16			$ -	$ -	888.84	$ 31,308,500.16			$ -	$ -	888.84	$ 31,308,500.16			$ -	$ -	888.84	$ 31,308,500.16
1.4.	Desmonte de redes eléctricas existentes. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	glb	1	$ 6,775,716.00	$ 6,775,716.00			$ -	$ -	1.00	$ 6,775,716.00			$ -	$ -	1.00	$ 6,775,716.00			$ -	$ -	1.00	$ 6,775,716.00
1.5.	Desmonte puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el Fondo Nacional del Ahorro S.A. indique.	und	150	$ 93,786.00	$ 14,067,900.00			$ -	$ -	150.00	$ 14,067,900.00			$ -	$ -	150.00	$ 14,067,900.00			$ -	$ -	150.00	$ 14,067,900.00
1.6.	Suministro e instalación de muro provisional en Dry wall de 1/2" en una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo	m2	37.5	$ 92,676.00	$ 3,475,350.00			$ -	$ -	37.50	$ 3,475,350.00			$ -	$ -	37.50	$ 3,475,350.00	38.052		$ 3,526,597.15	$ -	75.55	$ 7,001,857.15
2.1.	Suministro e instalación de columnetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre 12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye platina soldada a la base y anclajes a placa de piso y retiro de escombros.	ml	121	$ 198,521.00	$ 24,021,041.00			$ -	$ -	121.00	$ 24,021,041.00			$ -	$ -	121.00	$ 24,021,041.00	42.2		$ 8,377,586.20	$ -	163.20	$ 32,398,627.20
2.2.	Suministro e instalación de viguetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye soldadura a columnetas y retiro de escombros.	ml	145	$ 181,351.00	$ 26,295,895.00			$ -	$ -	145.00	$ 26,295,895.00			$ -	$ -	145.00	$ 26,295,895.00		22.5	$ -	$ 4,080,397.50	122.50	$ 22,215,497.50
2.3.	Suministro e instalación perfiles WPC/textura madera. Para instalar en muros divisorios de dimenes. 10 cm x 5 cm. Incluye estructura anclajes y retiro de escombros.	m2	40	$ 234,409.00	$ 9,376,360.00			$ -	$ -	40.00	$ 9,376,360.00			$ -	$ -	40.00	$ 9,376,360.00		11.56	$ -	$ 2,709,768.04	28.44	$ 6,666,591.96
3.1.	Suministro e instalación de muro en Superboard, altura 2.40 m a dos caras incluye estructura, anclaje, cinta, estuco y fondeo de acabado en pintura en vinilo tipo 1.	m2	5	$ 156,903.00	$ 784,515.00			$ -	$ -	5.00	$ 784,515.00			$ -	$ -	5.00	$ 784,515.00	24.232		$ 3,802,073.50	$ -	29.23	$ 4,586,588.50
4.1.	Suministro e instalación de cielo raso en Dry-wall de 1/2" en diferentes niveles a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura a 3 manos. A todo costo.	m2	888.84	$ 113,010.00	$ 100,447,808.40			$ -	$ -	888.84	$ 100,447,808.40			$ -	$ -	888.84	$ 100,447,808.40		15.56	$ -	$ 1,758,435.60	873.28	$ 98,689,372.80
5.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad. Incluye plastico aislante y yumbolon, de acuerdo a las caracteristicas técnicas y el guardaescobas.	m2	888.84	$ 189,748.00	$ 168,655,612.32			$ -	$ -	888.84	$ 168,655,612.32			$ -	$ -	888.84	$ 168,655,612.32	170		$ 32,257,160.00	$ -	1058.84	$ 200,912,772.32
6.1.	Suministro e instalación de alimentador 1N°12 Fase+1N°12 Neutro+1N°12 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE	mt	1800	$ 19,842.00	$ 35,715,600.00			$ -	$ -	1800.00	$ 35,715,600.00			$ -	$ -	1800.00	$ 35,715,600.00			$ -	$ -	1800.00	$ 35,715,600.00

	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. -	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES ACTUALIZADA	
CONTRATO FNA-166-2024	OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA - CNA EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	FECHA	26 DE AGOSTO DE 2025

ITEM	DESCRIPCION	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES			BALANCE DE OBRA N°1 (ACTA DE FIJACIÓN N°1) : 3 DE JUNIO DE 2025						BALANCE DE OBRA N°2 (ACTA DE FIJACIÓN N°2) 1 DE JULIO DE 2025						BALANCE DE OBRA N°3 26 de agosto 2025					
						CANTIDADES		VALORES				CANTIDADES		VALORES				CANTIDADES		VALORES			
			Cantidad	V/ Unitario	Vr Total	Mayores +	Menores -	Mayores +	Menores -	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL	Mayores +	Menores -	Mayores +	Menores -	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL	Mayores +	Menores -	Mayores +	Menores -	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
6.2.	Suministro e instalación de alimentador a tableros en 3N°2/0 Fase+1N°2/0 Neutro+1N°2 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	mt	50	$ 220,320.00	$ 11,016,000.00			$ -	$ -	50.00	$ 11,016,000.00			$ -	$ -	50.00	$ 11,016,000.00			$ -	$ -	50.00	$ 11,016,000.00
6.3.	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	180	$ 147,631.00	$ 26,573,580.00			$ -	$ -	180.00	$ 26,573,580.00			$ -	$ -	180.00	$ 26,573,580.00		29	$ -	$ 4,281,299.00	151.00	$ 22,292,281.00
6.4.	Suministro e instalación de salida interruptor sencillo o doble 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH40 3/4", elementos de fijación y conductores. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	60	$ 166,320.00	$ 9,979,200.00			$ -	$ -	60.00	$ 9,979,200.00			$ -	$ -	60.00	$ 9,979,200.00		28	$ -	$ 4,656,960.00	32.00	$ 5,322,240.00
6.5.	Suministro e instalación de Lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz., acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x4x7cm. Largo de la guaya: 100cm incluye acomelida eléctrica y accesorios.	und	42	$ 300,264.00	$ 12,611,088.00			$ -	$ -	42.00	$ 12,611,088.00			$ -	$ -	42.00	$ 12,611,088.00		2	$ -	$ 600,528.00	40.00	$ 12,010,560.00
6.6.	Reinstalación de panel LED cuadrado de dimensiones 60x60 cm prerecalentes. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	88	$ 103,354.00	$ 9,095,152.00			$ -	$ -	88.00	$ 9,095,152.00			$ -	$ -	88.00	$ 9,095,152.00	1		$ 103,354.00	$ -	89.00	$ 9,198,506.00
6.7.	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluya acomelida eléctrica y accesorios.	und	22	$ 209,700.00	$ 4,613,400.00			$ -	$ -	22.00	$ 4,613,400.00			$ -	$ -	22.00	$ 4,613,400.00			$ -	$ -	22.00	$ 4,613,400.00
6.8.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	14	$ 220,546.00	$ 3,087,644.00			$ -	$ -	14.00	$ 3,087,644.00			$ -	$ -	14.00	$ 3,087,644.00	8		$ 1,764,368.00	$ -	22.00	$ 4,852,012.00
6.9.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	11	$ 198,472.00	$ 2,183,192.00			$ -	$ -	11.00	$ 2,183,192.00			$ -	$ -	11.00	$ 2,183,192.00	3		$ 595,416.00	$ -	14.00	$ 2,778,608.00
6.10.	Suministro e instalación Salida tomacorriente doble polo a tierra (red normal), monofásico 120V 15A, 3m prom en cable No 12 LSHF AWG, elementos de fijación y conductores. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	23	$ 173,606.00	$ 3,992,938.00			$ -	$ -	23.00	$ 3,992,938.00			$ -	$ -	23.00	$ 3,992,938.00	10		$ 1,736,060.00	$ -	33.00	$ 5,728,998.00
6.11.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	mt	150	$ 16,035.00	$ 2,405,250.00			$ -	$ -	150.00	$ 2,405,250.00			$ -	$ -	150.00	$ 2,405,250.00			$ -	$ -	150.00	$ 2,405,250.00
6.12.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit EMT ø 3" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	mt	50	$ 155,392.00	$ 7,769,600.00			$ -	$ -	50.00	$ 7,769,600.00			$ -	$ -	50.00	$ 7,769,600.00			$ -	$ -	50.00	$ 7,769,600.00
6.13.	Suministro e instalación de ducto cerrado de 40X8 galvanizado o con pintura electrostática. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	mt	120	$ 317,627.00	$ 38,115,240.00			$ -	$ -	120.00	$ 38,115,240.00			$ -	$ -	120.00	$ 38,115,240.00			$ -	$ -	120.00	$ 38,115,240.00
6.14.	Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico tetrafilar con espacio para totalizador y barraje neutro y tierra, incluye totalizador y protectores. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	1	$ 3,460,340.00	$ 3,460,340.00			$ -	$ -	1.00	$ 3,460,340.00			$ -	$ -	1.00	$ 3,460,340.00			$ -	$ -	1.00	$ 3,460,340.00
7.1.	Suministro e instalación de barra de comida en acero inoxidable calibre 22, de 45 cms de ancho incluye soporte en estructura metálica a pared.	mt	3.22	$ 1,416,162.00	$ 4,560,041.64			$ -	$ -	3.22	$ 4,560,041.64			$ -	$ -	3.22	$ 4,560,041.64			$ -	$ -	3.22	$ 4,560,041.64
7.2.	Suministro e instalación de mueble de cocina de 1.60x0.60x0.90m en madera RH y en acero inoxidable, incluye grifería y accesorios de desagüe.	und	1	$ 2,569,025.00	$ 2,569,025.00			$ -	$ -	1.00	$ 2,569,025.00			$ -	$ -	1.00	$ 2,569,025.00			$ -	$ -	1.00	$ 2,569,025.00
8.1.	Suministro e instalación de vidrio templado 8 mm para divisiones de oficina incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	279.84	$ 856,266.00	$ 239,617,477.44			$ -	$ -	279.84	$ 239,617,477.44			$ -	$ -	279.84	$ 239,617,477.44	37.248		$ 31,894,195.97	$ -	317.09	$ 271,511,673.41
8.2.	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado 8 mm con pivote, incluye topes de piso, accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento a todo costo.	m2	40	$ 858,737.00	$ 34,349,480.00			$ -	$ -	40.00	$ 34,349,480.00			$ -	$ -	40.00	$ 34,349,480.00	7.52		$ 6,457,702.24	$ -	47.52	$ 40,807,182.24
8.3.	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de 8 mm con sistema antipanico. Incluye topes de piso y accesorios para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	8	$ 1,607,886.00	$ 12,863,104.00			$ -	$ -	8.00	$ 12,863,104.00			$ -	$ -	8.00	$ 12,863,104.00		0.32	$ -	$ 514,524.16	7.68	$ 12,348,579.84
8.4.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho, de uso interior y exterior. A todo costo.	mt	60	$ 82,644.00	$ 4,958,640.00			$ -	$ -	60.00	$ 4,958,640.00			$ -	$ -	60.00	$ 4,958,640.00			$ -	$ -	60.00	$ 4,958,640.00
8.5.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho, de uso interior y exterior, con corte de letras para identificar las oficinas en vidrio. A todo costo.	und	46	$ 139,113.00	$ 6,399,198.00			$ -	$ -	46.00	$ 6,399,198.00			$ -	$ -	46.00	$ 6,399,198.00		29	$ -	$ 4,634,277.00	17.00	$ 2,364,921.00
9.1.	Suministro e instalación de puerta en madecor enlaminborada de 0,90 m de ancho por 2,20 m de alto, incluye marcos chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	1	$ 1,145,405.00	$ 1,145,405.00			$ -	$ -	1.00	$ 1,145,405.00			$ -	$ -	1.00	$ 1,145,405.00			$ -	$ -	1.00	$ 1,145,405.00
9.2.	Suministro e instalación de superficie de madera ancho 40cm y 3 cm de espesor, para instalar en muros bajos, correspondientes a la barra para computadores y zonas de estancia.	mt	30	$ 354,159.00	$ 10,624,770.00			$ -	$ -	30.00	$ 10,624,770.00			$ -	$ -	30.00	$ 10,624,770.00			$ -	$ -	30.00	$ 10,624,770.00
10.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores blanco. A todo costo, incluye lineales.	m2	509.69	$ 32,772.00	$ 16,703,560.68			$ -	$ -	509.69	$ 16,703,560.68			$ -	$ -	509.69	$ 16,703,560.68		189.314	$ -	$ 6,204,198.41	320.38	$ 10,499,362.27
10.2.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos cielo falsos blanco. A todo costo, incluye lineales.	m2	100	$ 39,060.00	$ 3,906,000.00			$ -	$ -	100.00	$ 3,906,000.00			$ -	$ -	100.00	$ 3,906,000.00	220.376		$ 8,607,886.56	$ -	320.38	$ 12,513,886.56
10.3.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores azul institucional. A todo costo, incluye lineales.	m2	40	$ 37,195.00	$ 1,487,800.00			$ -	$ -	40.00	$ 1,487,800.00			$ -	$ -	40.00	$ 1,487,800.00			$ -	$ -	40.00	$ 1,487,800.00
10.4.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores verde institucional. A todo costo, incluye lineales.	m2	25	$ 37,195.00	$ 929,875.00			$ -	$ -	25.00	$ 929,875.00			$ -	$ -	25.00	$ 929,875.00		25	$ -	$ 929,875.00	0.00	$ -
	TOTAL REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CONVENCIONES - PISO A				**$ 927,202,782.00**			**$ -**	**$ -**		**$ 927,202,782.00**						**$ 927,202,782.00**						**$ 1,010,075,029.00**
	REPARACIONES LOCATIVAS - TORRE DE TECNOLOGIA - PISO 2				$ -																		
1.1.	Desmonta de cielo raso en fibra mineral o en dry-wall, incluye desmonte de 113 luminarias tipo panel Led de 60 x 60 luz neutra 4000K y retiro con su disposición final de escombros.	m2	860	$ 37,322.00	$ 32,096,920.00			$ -	$ -	860.00	$ 32,096,920.00			$ -	$ -	860.00	$ 32,096,920.00			$ -	$ -	860.00	$ 32,096,920.00
1.2.	Desmonte de puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	und	180	$ 93,786.00	$ 16,881,480.00			$ -	$ -	180.00	$ 16,881,480.00			$ -	$ -	180.00	$ 16,881,480.00	80		$ 7,502,880.00	$ -	260.00	$ 24,384,360.00
1.3.	Suministro e instalación de muro provisional en Dry-all de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo.	m2	4	$ 92,676.00	$ 370,704.00			$ -	$ -	4.00	$ 370,704.00			$ -	$ -	4.00	$ 370,704.00			$ -	$ -	4.00	$ 370,704.00
2.1.	Suministro e instalación de cielorraso en Dry-all de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco y capa fondeo pintura. A todo costo.	m2	860	$ 127,159.00	$ 109,356,740.00			$ -	$ -	860.00	$ 109,356,740.00			$ -	$ -	860.00	$ 109,356,740.00			$ -	$ -	860.00	$ 109,356,740.00
3.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 8Ø0 a 1200 Kg/m x cm3 y resistencia a la humedad. Incluye plástico aislante y yombolon de acuerdo a las características técnicas y el guardaescobas.	m2	860	$ 189,748.00	$ 163,183,280.00			$ -	$ -	860.00	$ 163,183,280.00			$ -	$ -	860.00	$ 163,183,280.00			$ -	$ -	860.00	$ 163,183,280.00
4.1.	Suministro e instalación de luminaria de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x4x7cm. Largo de la guaya: 100cm, incluye acomelida eléctrica y accesorios.	und	20	$ 311,065.00	$ 6,221,300.00			$ -	$ -	20.00	$ 6,221,300.00			$ -	$ -	20.00	$ 6,221,300.00			$ -	$ -	20.00	$ 6,221,300.00
4.2.	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluya acomelida eléctrica y accesorios.	und	20	$ 227,693.00	$ 4,553,860.00			$ -	$ -	20.00	$ 4,553,860.00			$ -	$ -	20.00	$ 4,553,860.00			$ -	$ -	20.00	$ 4,553,860.00
4.3.	Reinstalación de panel LED cuadrado de dimensiones 60x60 cm luz neutra 4000K prerecalentes. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	113	$ 96,211.00	$ 10,871,843.00			$ -	$ -	113.00	$ 10,871,843.00			$ -	$ -	113.00	$ 10,871,843.00			$ -	$ -	113.00	$ 10,871,843.00
4.4.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	8	$ 210,033.00	$ 1,680,264.00			$ -	$ -	8.00	$ 1,680,264.00			$ -	$ -	8.00	$ 1,680,264.00			$ -	$ -	8.00	$ 1,680,264.00
4.5.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia de aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	4	$ 195,508.00	$ 782,032.00			$ -	$ -	4.00	$ 782,032.00			$ -	$ -	4.00	$ 782,032.00			$ -	$ -	4.00	$ 782,032.00
5.1.	Suministro e instalación de Puerta en madecor enlaminborada de 0,90 m de ancho por 2,20 m de alto, incluye marcos, chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	1	$ 997,838.00	$ 997,838.00			$ -	$ -	1.00	$ 997,838.00			$ -	$ -	1.00	$ 997,838.00			$ -	$ -	1.00	$ 997,838.00
6.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores blancos. A todo costo, incluye lineales.	m2	880	$ 34,883.00	$ 30,697,040.00			$ -	$ -	880.00	$ 30,697,040.00			$ -	$ -	880.00	$ 30,697,040.00			$ -	$ -	880.00	$ 30,697,040.00
	TOTAL REPARACIONES LOCATIVAS - TORRE DE TECNOLOGIA - PISO 2				**$ 377,693,301.00**			**$ -**	**$ -**		**$ 377,693,301.00**						**$ 377,693,301.00**						**$ 385,196,181.00**

	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. -	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES ACTUALIZADA	
CONTRATO FNA-166-2024	OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA - CNA EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	FECHA	26 DE AGOSTO DE 2025

ITEM	DESCRIPCION	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES			BALANCE DE OBRA Nº1 (ACTA DE FIJACIÓN Nº1) : 3 DE JUNIO DE 2025						BALANCE DE OBRA Nº2 (ACTA DE FIJACIÓN Nº2) 1 DE JULIO DE 2025						BALANCE DE OBRA Nº3 26 de agosto 2025					
						CANTIDADES		VALORES				CANTIDADES		VALORES				CANTIDADES		VALORES			
			Cantidad	Vr Unitario	Vr Total	Mayores +	Menores -	Mayores +	Menores -	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL	Mayores +	Menores -	Mayores +	Menores -	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL	Mayores +	Menores -	Mayores +	Menores -	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
	BOLSA DE ITEMS NO PREVISTOS (10%)				$ 379,096,187.00			$ -															
	SALDO BOLSA Nº 5				$ 45,302.00						$ 93,802,260.00						$ 45,302.00						$ 45,302.00
NP-1	Demolición placa maciza 0.15 mt en horarios autorizado por la entidad (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	m2	56	$ 49,331.00	$ 2,762,536.00			$ -	$ -	56.00	$ 2,762,536.00			$ -	$ -	56.00	$ 2,762,536.00	900		$ 44,397,900.00	$ -	956.00	$ 47,160,436.00
NP-2	Suministro e instalación de mortero premezclado de nivelación bombeable, acelerado a 7 días con baja permeabilidad para zona de cubiertas, garantizando pendientes de desagues hacia los sifones.	m2	1805	$ 104,277.00	$ 188,219,985.00			$ -	$ -	1805.00	$ 188,219,985.00			$ -	$ -	1805.00	$ 188,219,985.00		1550.00	$ -	$ 161,629,350.00	255.00	$ 26,590,635.00
NP-3	Demolición baldosa muro en horarios autorizados por la ENTIDAD (incluye retiro de material desde frente de obra al sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	m2	225	$ 27,952.00	$ 6,289,200.00			$ -	$ -	225.00	$ 6,289,200.00			$ -	$ -	225.00	$ 6,289,200.00			$ -	$ -	225.00	$ 6,289,200.00
NP-4	Baldosa ceramica pared 30x60.	m2	105	$ 142,571.00	$ 14,969,955.00			$ -	$ -	105.00	$ 14,969,955.00			$ -	$ -	105.00	$ 14,969,955.00	550.43		$ 78,475,331.68	$ -	655.43	$ 93,445,286.68
NP-5	Baldosa ceramica piso 60x60.	m2	150	$ 154,546.00	$ 23,181,900.00			$ -	$ -	150.00	$ 23,181,900.00			$ -	$ -	150.00	$ 23,181,900.00			$ -	$ -	150.00	$ 23,181,900.00
NP-6	Suministro e instalacion de cinta led en parte baja de gabinete superior de mesita de cocina.	und	1	$ 280,334.00	$ 280,334.00			$ -	$ -	1.00	$ 280,334.00			$ -	$ -	1.00	$ 280,334.00			$ -	$ -	1.00	$ 280,334.00
NP-7	Desmonte y reinstalacion de rejillas de extraccion aire en cocina residencia.	und	8	$ 45,000.00	$ 360,000.00			$ -	$ -	8.00	$ 360,000.00			$ -	$ -	8.00	$ 360,000.00			$ -	$ -	8.00	$ 360,000.00
NP-8	Desmonte redes eléctricas existentes, incluye la disposición final fondo Nacional del Ahorro indique. (Zona de recepcion).	glb	1	$ 930,686.00	$ 930,686.00			$ -	$ -	1.00	$ 930,686.00			$ -	$ -	1.00	$ 930,686.00			$ -	$ -	1.00	$ 930,686.00
NP-9	Demolición de guardaescobs, (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	mt	120	$ 14,785.00	$ 1,774,200.00			$ -	$ -	120.00	$ 1,774,200.00			$ -	$ -	120.00	$ 1,774,200.00	100		$ 1,478,500.00	$ -	220.00	$ 3,252,700.00
NP-10	Desmonte espejo.	und	10	$ 23,790.00	$ 237,900.00			$ -	$ -	10.00	$ 237,900.00			$ -	$ -	10.00	$ 237,900.00			$ -	$ -	10.00	$ 237,900.00
NP-11	Desmonte de cubierta en policarbonato.	m2	35	$ 52,335.00	$ 1,831,725.00			$ -	$ -	35.00	$ 1,831,725.00			$ -	$ -	35.00	$ 1,831,725.00			$ -	$ -	35.00	$ 1,831,725.00
NP-12	Suministro e instalación de Policarbonato alveolar 8 mm para cubierta curva, incluye conectores y accesorios para su correcta instalación. No incluye estructura de soporte.	m2	25	$ 443,800.00	$ 11,095,000.00			$ -	$ -	25.00	$ 11,095,000.00			$ -	$ -	25.00	$ 11,095,000.00			$ -	$ -	25.00	$ 11,095,000.00
NP-13	Mantenimiento marquesina cubierta de vidrio acceso, incluye: Revisión general, limpieza perimetral y limpieza de vidrios.	m2	45	$ 58,150.00	$ 2,616,750.00			$ -	$ -	45.00	$ 2,616,750.00			$ -	$ -	45.00	$ 2,616,750.00			$ -	$ -	45.00	$ 2,616,750.00
NP-14	Lavado e hidrofugado de fachadas, muros en piedra y/o acabado abujardado	m2	232	$ 51,032.00	$ 11,839,424.00			$ -	$ -	232.00	$ 11,839,424.00			$ -	$ -	232.00	$ 11,839,424.00			$ -	$ -	232.00	$ 11,839,424.00
NP-15	Suministro e instalacion de revestimiento interior de fachada en WPC Panel Castro, de acuerdo a muestra seleccionada.	m2	50	$ 249,987.00	$ 12,499,350.00			$ -	$ -	50.00	$ 12,499,350.00			$ -	$ -	50.00	$ 12,499,350.00			$ -	$ -	50.00	$ 12,499,350.00
NP-16	Desmonte de aparatos sanitarios (Incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio (hasta 50 m) y desde sitio de acopio a escombrera).	UND	50	$ 40,607.00	$ 2,030,350.00			$ -	$ -	50.00	$ 2,030,350.00			$ -	$ -	50.00	$ 2,030,350.00			$ -	$ -	50.00	$ 2,030,350.00
NP-17	Desmonte de muro fachada imitacion madera (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera)	m2	12	$ 16,161.00	$ 193,932.00			$ -	$ -	12.00	$ 193,932.00			$ -	$ -	12.00	$ 193,932.00			$ -	$ -	12.00	$ 193,932.00
NP-18	Suministro e instalación de sensor de presencia Infrarrojo 360° de cobertura, montaje en techo, detección de movimiento hasta 4 metros radiales a una altura de instalación de 2.4 metros.	UND	20	$ 210,035.00	$ 4,200,700.00			$ -	$ -	20.00	$ 4,200,700.00			$ -	$ -	20.00	$ 4,200,700.00			$ -	$ -	20.00	$ 4,200,700.00
NP-19	Suministro e instalación de encerea mobles de inferior 220 X 90 X 63 y superior de 200X70X35 incluye campana extractora, puertas, manijas en acero tabular, bisagras de parche, entrepaños, patas de 8 cm y manija en acero tubular. Modulo bore hornos de 200 X 60 X 60 con dos puertas parte alta y dos cajones parte baja central para horno. Tapa barra de 130 x 50 con patas en acero de 100 cm y anclaje a la pared. Todo elaborado en melamina de 15mm, color arena o glacial Fabricado e instalado.	UND	1	$ 12,900,000.00	$ 12,900,000.00			$ -	$ -	0.00	$ -				$ -	1.00	$ 12,900,000.00			$ -	$ -	1.00	$ 12,900,000.00
NP-20	Mesón en quartzone blanco polar con hueco para estufa y lavaplatos, incluye pulida, poceta, salpicadero 8 cm y estufa a 4 puestos challenger para uso con gas propano.	UND	1	$ 6,850,000.00	$ 6,850,000.00			$ -	$ -	0.00	$ -				$ -	1.00	$ 6,850,000.00			$ -	$ -	1.00	$ 6,850,000.00
NP-21	Suministro e instalación punto de gas propano para estufa de presidencia, en tubería pe al pe de 1/2" , con corraza de protección a la vista y accesorios de conexión con pases por muros. incluye suministro de 2 cilindros de 100 libras en gas propano, con valvula reguladora para cada cilindro, base (poyo) soporte para cilindros y caja metalica de protección de cilindros para la intemperie.	GLB	1	$ 6,155,883.00	$ 6,155,883.00			$ -	$ -	0.00	$ -				$ -	1.00	$ 6,155,883.00			$ -	$ -	1.00	$ 6,155,883.00
NP-22	Suministro e instalacion registro 1/2" agua potable	UND	4	$ 89,688.00	$ 358,752.00			$ -	$ -	0.00	$ -				$ -	4.00	$ 358,752.00			$ -	$ -	4.00	$ 358,752.00
NP-23	Jardineras artificiales de acuerdo a render incluye amarre plastico	mt	20	$ 141,213.00	$ 2,824,260.00			$ -	$ -	0.00	$ -				$ -	20.00	$ 2,824,260.00	20		$ 2,824,260.00	$ -	40.00	$ 5,648,520.00
NP-24	Suministro e instalacion de extractor para cocina y baños (16 x 16 x 9 cm)	UND	1	$ 196,410.00	$ 196,410.00			$ -	$ -	0.00	$ -				$ -	1.00	$ 196,410.00			$ -	$ -	1.00	$ 196,410.00
NP-25	Demolicion de meson en grano de marmol de ventanilla bancolombia	UND	1	$ 89,351.00	$ 89,351.00			$ -	$ -	0.00	$ -				$ -	1.00	$ 89,351.00			$ -	$ -	1.00	$ 89,351.00
NP-26	Desmonte de aviso de fachada en recepción	UND	1	$ 283,054.00	$ 283,054.00			$ -	$ -	0.00	$ -				$ -	1.00	$ 283,054.00			$ -	$ -	1.00	$ 283,054.00
NP-27	Suministro e instalación de sanitario blanco institucional tipo adriatica o similar de entrada posterior no incluye push	UND	20	$ 1,146,999.00	$ 22,939,980.00			$ -	$ -	0.00	$ -				$ -	20.00	$ 22,939,980.00	10		$ 11,469,990.00	$ -	30.00	$ 34,409,970.00
NP-28	Suministro e instalación lavamanos blanco tipo cascada de baru o similar, no incluye griferia no incluye push	UND	12	$ 613,653.00	$ 7,363,836.00			$ -	$ -	0.00	$ -				$ -	12.00	$ 7,363,836.00	20		$ 12,273,060.00	$ -	32.00	$ 19,636,896.00
NP-29	Suministro e instalacion de carpa en lona para control de acceso en zona de recepcion	UND	1	$ 3,605,351.00	$ 3,605,351.00			$ -	$ -	0.00	$ -				$ -	1.00	$ 3,605,351.00			$ -	$ -	1.00	$ 3,605,351.00
NP-30	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	14	$ 121,212.00	$ 1,696,968.00			$ -	$ -	0.00	$ -				$ -	14.00	$ 1,696,968.00	18		$ 2,181,816.00	$ -	32.00	$ 3,878,784.00
NP-31	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UND	20	$ 163,414.00	$ 3,268,280.00			$ -	$ -	0.00	$ -				$ -	20.00	$ 3,268,280.00	10		$ 1,634,140.00	$ -	30.00	$ 4,902,420.00
NP-32	SALIDA SANITARIA P/C-S/PARAL 2"	UND	4	$ 109,459.00	$ 437,836.00			$ -	$ -	0.00	$ -				$ -	4.00	$ 437,836.00	20		$ 2,189,180.00	$ -	24.00	$ 2,627,016.00
NP-33	SALIDA SANITARIA P/C-S/PARAL 3"	UND	8	$ 129,358.00	$ 1,034,864.00			$ -	$ -	0.00	$ -				$ -	8.00	$ 1,034,864.00			$ -	$ -	8.00	$ 1,034,864.00

	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. -	
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES ACTUALIZADA	
CONTRATO FNA-166-2024	OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA - CNA EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
FECHA	26 DE AGOSTO DE 2025	

						BALANCE DE OBRA N°1 (ACTA DE FIJACIÓN N°1) 3 DE JUNIO DE 2025						BALANCE DE OBRA N°2 (ACTA DE FIJACIÓN N°2) 1 DE JULIO DE 2025						BALANCE DE OBRA N°3 26 de agosto 2025					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL	CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL	CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			Cantidad	Vr Unitario	Vr Total	Mayores +	Menores -	Mayores +	Menores -			Mayores +	Menores -	Mayores +	Menores -			Mayores +	Menores -	Mayores +	Menores -		
NP-34	SALIDA SANITARIA P/C-S/PARAL 4"	UND	20	$ 148,502.00	$ 2,970,040.00			$ -	$ -	0.00	$ -				$ -	20.00	$ 2,970,040.00	10		$ 1,485,020.00	$ -	30.00	$ 4,455,060.00
NP-35	SALIDA SANITARIA P/C-S/SIFON 3"	UND	8	$ 109,645.00	$ 877,160.00			$ -	$ -	0.00	$ -				$ -	8.00	$ 877,160.00	10		$ 1,096,450.00	$ -	18.00	$ 1,973,610.00
NP-36	RED SANITARIA P/C-S 4"	ml	60	$ 74,903.00	$ 4,494,180.00			$ -	$ -	0.00	$ -				$ -	60.00	$ 4,494,180.00			$ -	$ -	60.00	$ 4,494,180.00
NP-37	RED SANITARIA P/C-S 3"	ml	60	$ 61,047.00	$ 3,662,820.00			$ -	$ -	0.00	$ -				$ -	60.00	$ 3,662,820.00			$ -	$ -	60.00	$ 3,662,820.00
NP-38	RED SANITARIA P/C-S 2"	ml	70	$ 49,310.00	$ 3,451,700.00			$ -	$ -	0.00	$ -				$ -	70.00	$ 3,451,700.00			$ -	$ -	70.00	$ 3,451,700.00
NP-39	RED SANITARIA P/C-VENTILACION 2"	ml	60	$ 31,024.00	$ 1,861,440.00			$ -	$ -	0.00	$ -				$ -	60.00	$ 1,861,440.00			$ -	$ -	60.00	$ 1,861,440.00
NP-40	Red suministro 1 1/4"	ml	35	$ 36,089.00	$ 1,263,115.00			$ -	$ -	0.00	$ -				$ -	35.00	$ 1,263,115.00			$ -	$ -	35.00	$ 1,263,115.00
NP-41	Red suministro 1"	ml	50	$ 27,219.00	$ 1,360,950.00			$ -	$ -	0.00	$ -				$ -	50.00	$ 1,360,950.00			$ -	$ -	50.00	$ 1,360,950.00
NP-42	Red suministro 3/4"	ml	60	$ 20,862.00	$ 1,251,720.00			$ -	$ -	0.00	$ -				$ -	60.00	$ 1,251,720.00			$ -	$ -	60.00	$ 1,251,720.00
NP-43	Red suministro 1/2"	ml	60	$ 18,245.00	$ 1,094,700.00			$ -	$ -	0.00	$ -				$ -	60.00	$ 1,094,700.00			$ -	$ -	60.00	$ 1,094,700.00
NP-44	Registro P/C-P.1 - 1/4"	UND	7	$ 145,520.00	$ 1,018,640.00			$ -	$ -	0.00	$ -				$ -	7.00	$ 1,018,640.00	10		$ 1,455,200.00	$ -	17.00	$ 2,473,840.00
NP-45	Registro P/C-P.1"	UND	4	$ 111,417.00	$ 445,668.00			$ -	$ -	0.00	$ -				$ -	4.00	$ 445,668.00	6		$ 668,502.00	$ -	10.00	$ 1,114,170.00
					$ 379,050,885.00			$ -	$ -		$ 379,096,187.00			$ -	$ -		$ 379,050,885.00			$ 161,629,349.68	$ 161,629,350.00		$ 379,050,884.68
	SALDO ACTIVIDADES CONTRACTUALES (sin AIU)																						$ 206,686,336.00
	COSTOS DIRECTOS				$ 4,170,058,061.00			$ -	$ -		$ 4,170,058,061.00						$ 4,170,058,061.00						$ 4,170,058,061.00
	COSTOS INDIRECTOS				$ 972,874,545.00			$ -	$ -		$ 972,874,545.00						$ 972,874,545.00						$ 972,874,545.00
	ADMINISTRACIÓN	12%			$ 500,406,967.00			$ -	$ -		$ 500,406,967.00						$ 500,406,967.00						$ 500,406,967.00
	IMPREVISTOS	3%			$ 125,101,742.00			$ -	$ -		$ 125,101,742.00						$ 125,101,742.00						$ 125,101,742.00
	UTILIDAD	7%			$ 291,904,064.00			$ -	$ -		$ 291,904,064.00						$ 291,904,064.00						$ 291,904,064.00
	IVA SOBRE UTILIDAD	19%			$ 55,461,772.00			$ -	$ -		$ 55,461,772.00						$ 55,461,772.00						$ 55,461,772.00
	COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				$ 5,142,932,606.00			$ -	$ -		$ 5,142,932,606.00						$ 5,142,932,606.00						$ 5,142,932,606.00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
ING. JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES

FIRMA COORDINADOR DE OBRA CONTRATISTA
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS

RICARDO BARRETO GARCIA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA COORDINADOR DE INTERVENTORIA
ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN

FIRMA APOYO SUPERVISION FNA
ING JAIME HERNANDO PRIETO

FIRMA SUPERVISOR FNA
Dra. VANESA PACHECO GOMEZ

	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. -	
	BALANCE GENERAL DEL CONTRATO N°4	
CONTRATO FNA-166-2024	OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA - CNA EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

						BALANCE DE OBRA N°1 (ACTA DE FUACIÓN N°1) 3 DE JUNIO DE 2025						BALANCE DE OBRA N°2 (ACTA DE FUACIÓN N°2) 1 DE JULIO DE 2025						BALANCE DE OBRA N°3 30 de agosto 2025						BALANCE DE OBRA N°4 30 de septiembre 2025					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL	CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL	CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL	CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			Cantidad	Vr Unitario	Vr Total	Mayores +	Menores -	Mayores +	Menores -			Mayores +	Menores -	Mayores +	Menores -			Mayores +	Menores -	Mayores +	Menores -			Mayores +	Menores -	Mayores +	Menores -		
	REPARACIONES LOCATIVAS GENERALES SEDE PRINCIPAL																												
1.1.	Retiro, reparación y reposicion puntual de junta entre laminas (junta con factor forma 2cms/1cm), mediante el uso de fondo de junta tipo sika rod y sello elastomérico de poliuretano en color negro, con alta resistencia a la intemperie incluye andamio colgante o toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.	ml	2000	$ 15.908,00	$ 31.816.000,00			$ -	$ -	2000,00	$ 31.816.000,00			$ -	$ -	2000,00	$ 31.816.000,00		1950	$ -	$ 31.020.600,00	50,00	$ 795.400,00		30	$ -	$ 477.240,00	20,00	$ 318.160,00
1.2.	Pintura exterior tipo coraza para muros sobre pañete incluye toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.	m2	300	$ 42.081,00	$ 12.624.300,00			$ -	$ -	300,00	$ 12.624.300,00			$ -	$ -	300,00	$ 12.624.300,00			$ -	$ -	300,00	$ 12.624.300,00			$ -	$ -	300,00	$ 12.624.300,00
2.1.	Retiro de impermeabilización existente y mortero de nivelación. Incluye el retiro y disposición final de escombros (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").	m2	2332,42	$ 29.570,00	$ 68.969.659,40			$ -	$ -	2332,42	$ 68.969.659,40			$ -	$ -	2332,42	$ 68.969.659,40			$ -	$ -	2332,42	$ 68.969.659,40		802,42	$ -	$ 23.727.559,00	1530,00	$ 45.242.100,00
2.2.	Instalación de mortero de nivelación con materiales de SIKA o similares caracteristicas, previo a la instalación de la impermeabilización (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").	m2	2332,42	$ 62.971,00	$ 146.874.819,82			$ -	$ -	2332,42	$ 146.874.819,82			$ -	$ -	2332,42	$ 146.874.819,82		2332,42	$ -	$ 146.874.819,82	0,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -
2.3.	Impermeabilización de placa de cubierta plana transitable, no ventilada, con piso fijo, tipo convencional, para tráfico peatonal privado. Tipo Sika o de similares caracteristicas con uso de mantos asfálticos, tipo bicapa (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L")	m2	2332,42	$ 126.524,00	$ 295.107.108,08			$ -	$ -	2332,42	$ 295.107.108,08			$ -	$ -	2332,42	$ 295.107.108,08			$ -	$ -	2332,42	$ 295.107.108,08		2100	$ -	$ 265.700.400,00	232,42	$ 29.406.708,08
2.4.	Desmonte de ventaneria con vidrios en celosía ubicados en culata de cubierta en el edificio CNA.	m2	150	$ 52.493,00	$ 7.873.950,00			$ -	$ -	150,00	$ 7.873.950,00			$ -	$ -	150,00	$ 7.873.950,00	170		$ 8.923.810,00	$ -	320,00	$ 16.797.760,00			$ -	$ -	320,00	$ 16.797.760,00
2.5.	Suministro e instalación de sistema de ventanas en vidrio fijas (sin basculante) en reemplazo de las ventanas en vidrio retiradas, ubicados en culata de cubierta en el edificio CNA.	m2	150	$ 297.835,00	$ 44.675.250,00			$ -	$ -	150,00	$ 44.675.250,00			$ -	$ -	150,00	$ 44.675.250,00	170		$ 50.631.950,00	$ -	320,00	$ 95.307.200,00			$ -	$ -	320,00	$ 95.307.200,00
2.6.	Retiro de canaletas existentes y suministro e instalación de canaletas metálicas de sección trapezoidal elaboradas en acero galvanizado calibre 16 de acuerdo con las necesidades técnicas de la cubierta de aguas lluvia, incluye la instalación de la soportería para el anclaje de la canaleta en el edificio CNA.	ml	231	$ 121.951,00	$ 28.170.681,00			$ -	$ -	231,00	$ 28.170.681,00			$ -	$ -	231,00	$ 28.170.681,00		30	$ -	$ 3.658.530,00	201,00	$ 24.512.151,00			$ -	$ -	201,00	$ 24.512.151,00
2.7.	Retiro de instalación existente y suministro e instalación de soscos para la bajante de agua lluvia e 4" en PVC con su respectivo sifón para evitar malos olores, incluye la instalación de la soportería para el anclaje en el edificio CNA.	und	50	$ 86.553,00	$ 4.327.650,00			$ -	$ -	50,00	$ 4.327.650,00			$ -	$ -	50,00	$ 4.327.650,00			$ -	$ -	50,00	$ 4.327.650,00			$ -	$ -	50,00	$ 4.327.650,00
2.8.	Limpieza y mantenimientos de tubería bajante de agua lluvia e 4" en PVC, en el edificio CNA.	und	50	$ 94.430,00	$ 4.721.500,00			$ -	$ -	50,00	$ 4.721.500,00			$ -	$ -	50,00	$ 4.721.500,00			$ -	$ -	50,00	$ 4.721.500,00			$ -	$ -	50,00	$ 4.721.500,00
3.1.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros.	m2	80	$ 37.322,00	$ 2.985.760,00			$ -	$ -	80,00	$ 2.985.760,00			$ -	$ -	80,00	$ 2.985.760,00	100		$ 3.732.200,00	$ -	180,00	$ 6.717.960,00			$ -	$ -	180,00	$ 6.717.960,00
3.2.	Mantenimiento de cielo raso en fibra mineral. Incluye cambio, pintura y/o reutilización de laminas en fibra mineral, instalación de anclajes y arreglo de perfilería descolgada y colocación de soportes.	m2	1800	$ 34.073,00	$ 61.331.400,00			$ -	$ -	1800,00	$ 61.331.400,00			$ -	$ -	1800,00	$ 61.331.400,00		1500	$ -	$ 51.109.500,00	300,00	$ 10.221.900,00			$ -	$ -	300,00	$ 10.221.900,00
3.3.	Suministro e instalación cielo raso PVC de 10 mm de espesor, incluye estructura, perforaciones para las luminarias. A todo costo.	m2	80	$ 94.144,00	$ 7.531.520,00			$ -	$ -	80,00	$ 7.531.520,00			$ -	$ -	80,00	$ 7.531.520,00			$ -	$ -	80,00	$ 7.531.520,00			$ -	$ -	80,00	$ 7.531.520,00
3.4.	Suministro e instalación cielo raso en drywall de 1/2" de espesor a una sola cara, incluye estructura, perforaciones luminarias. A todo costo.	m2	80	$ 127.042,00	$ 10.163.360,00			$ -	$ -	80,00	$ 10.163.360,00			$ -	$ -	80,00	$ 10.163.360,00			$ -	$ -	80,00	$ 10.163.360,00	70		$ 8.892.940,00	$ -	150,00	$ 19.056.300,00
4.1.	Cambio de válvula antivandálica de empotrar tipo push para sanitarios institucionales de consumo de agua 4.85 lpf (1.28 gpf) tipo corona o similar. Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. A todo costo con la instalación de un enchape de similares caracteristicas a las originales.	und	100	$ 1.200.516,00	$ 120.051.600,00			$ -	$ -	100,00	$ 120.051.600,00			$ -	$ -	100,00	$ 120.051.600,00		60	$ -	$ 72.030.960,00	40,00	$ 48.020.640,00			$ -	$ -	40,00	$ 48.020.640,00
4.2.	Cambio de grifería para lavamanos de empotrar a muro tipo push aplicación institucional de consumo 0.4 - 1.9 litros, tipo corona o similar incluye desmonte y reinstalación de aparatos. A todo costo con la instalación de un enchape de similares caracteristicas a las originales.	und	85	$ 729.335,00	$ 61.993.475,00			$ -	$ -	85,00	$ 61.993.475,00			$ -	$ -	85,00	$ 61.993.475,00		55	$ -	$ 40.113.425,00	30,00	$ 21.880.050,00			$ -	$ -	30,00	$ 21.880.050,00
4.3.	Cambio de válvula antivandálica de empotrar tipo push para orinales institucionales de consumo de agua 0.5 a 1.9 lpf (0.13 a 0.5 gpf), tipo corona o similar. Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. A todo costo con la instalación de un enchape de similares caracteristicas a las originales.	und	20	$ 1.209.112,00	$ 24.182.240,00			$ -	$ -	20,00	$ 24.182.240,00			$ -	$ -	20,00	$ 24.182.240,00			$ -	$ -	20,00	$ 24.182.240,00			$ -	$ -	20,00	$ 24.182.240,00
4.4.	Desmonte de divisiones metálicas para baños. Incluye soportería, tornillos, herrajes, retiro y disposición final.	m2	45	$ 39.579,00	$ 1.781.055,00			$ -	$ -	45,00	$ 1.781.055,00			$ -	$ -	45,00	$ 1.781.055,00	30		$ 1.187.370,00	$ -	75,00	$ 2.968.425,00	50		$ 1.978.950,00	$ -	125,00	$ 4.947.375,00
4.5.	Suministro e instalación de divisiones de baño en acero inoxidable por ambas caras calibre 22, aleación 304 acabado satinado tipo SOCODA o similar. Con puerta, anclajes y accesorios necesarios para su instalación y correcto funcionamiento.	m2	45	$ 1.005.111,00	$ 45.229.995,00			$ -	$ -	45,00	$ 45.229.995,00			$ -	$ -	45,00	$ 45.229.995,00	30		$ 30.153.330,00	$ -	75,00	$ 75.383.325,00	50		$ 50.255.550,00	$ -	125,00	$ 125.638.875,00
4.6.	Limpieza con sonda de tuberia sanitaria en diferentes diámetros, actividad para ejecutar por punto.	und	275	$ 109.625,00	$ 30.146.875,00			$ -	$ -	275,00	$ 30.146.875,00			$ -	$ -	275,00	$ 30.146.875,00		100	$ -	$ 10.962.500,00	175,00	$ 19.184.375,00			$ -	$ -	175,00	$ 19.184.375,00
5.1.	Desmonte de puerta en madera de 1.44 m x2.47 m, incluye marco y retiro.	und	1	$ 127.673,00	$ 127.673,00			$ -	$ -	1,00	$ 127.673,00			$ -	$ -	1,00	$ 127.673,00			$ -	$ -	1,00	$ 127.673,00			$ -	$ -	1,00	$ 127.673,00
5.2.	Suministro e instalación de puerta de acceso a cubierta en aluminio de dos hojas: una de 0.90 m x 2.47 m y otra de 0.54 m x 2.47 m. Incluye bisagras cerradura, cantonera marco y accesorios necesarios para su funcionamiento.	und	1	$ 1.192.289,00	$ 1.192.289,00			$ -	$ -	1,00	$ 1.192.289,00			$ -	$ -	1,00	$ 1.192.289,00			$ -	$ -	1,00	$ 1.192.289,00			$ -	$ -	1,00	$ 1.192.289,00
6.1.	Resanes y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre pañete o repello liso. A todo costo.	m2	4500	$ 33.744,00	$ 151.848.000,00			$ -	$ -	4500,00	$ 151.848.000,00			$ -	$ -	4500,00	$ 151.848.000,00			$ -	$ -	4500,00	$ 151.848.000,00		416,75	$ -	$ 14.062.953,00	4083,25	$ 137.785.046,89
	TOTAL REPARACIONES LOCATIVAS GENERALES SEDE PRINCIPAL				**$ 1.163.726.160,00**			**$ -**	**$ -**		**$ 1.163.726.160,00**						**$ 1.163.726.160,00**						**$ 902.584.485,00**						**$ 659.743.773,00**
	REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CNA - PISO 2																												
1.1.	Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.	m2	250	$ 47.734,00	$ 11.933.500,00			$ -	$ -	250,00	$ 11.933.500,00			$ -	$ -	250,00	$ 11.933.500,00	7,8666		$ 375.504,28	$ -	257,87	$ 12.309.004,28			$ -	$ -	257,87	$ 12.309.004,28
1.2.	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	m2	61	$ 49.324,00	$ 3.008.764,00			$ -	$ -	61,00	$ 3.008.764,00			$ -	$ -	61,00	$ 3.008.764,00	5,971		$ 294.513,60	$ -	66,97	$ 3.303.277,60			$ -	$ -	66,97	$ 3.303.277,60
1.3.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros.	m2	1070	$ 35.224,00	$ 37.689.680,00			$ -	$ -	1070,00	$ 37.689.680,00			$ -	$ -	1070,00	$ 37.689.680,00	327,624		$ 11.540.227,78	$ -	1397,62	$ 49.229.907,78			$ -	$ -	1397,62	$ 49.229.907,78
1.4.	Desmonte de redes eléctricas existentes. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	glb	1	$ 12.717.035,00	$ 12.717.035,00			$ -	$ -	1,00	$ 12.717.035,00			$ -	$ -	1,00	$ 12.717.035,00			$ -	$ -	1,00	$ 12.717.035,00			$ -	$ -	1,00	$ 12.717.035,00
1.5.	Desmonte de puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	und	135	$ 93.786,00	$ 12.661.110,00			$ -	$ -	135,00	$ 12.661.110,00			$ -	$ -	135,00	$ 12.661.110,00	46		$ 4.314.156,00	$ -	181,00	$ 16.975.266,00			$ -	$ -	181,00	$ 16.975.266,00
1.6.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo.	m2	78	$ 92.676,00	$ 7.228.728,00			$ -	$ -	78,00	$ 7.228.728,00			$ -	$ -	78,00	$ 7.228.728,00	11,424		$ 1.058.730,62	$ -	89,42	$ 8.287.458,62			$ -	$ -	89,42	$ 8.287.458,62
2.1.	Suministro e instalación de columnetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre 12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye platina soldada a la base y anclajes a placa de piso y retiro de escombros.	ml	100	$ 198.521,00	$ 19.852.100,00			$ -	$ -	100,00	$ 19.852.100,00			$ -	$ -	100,00	$ 19.852.100,00	36,8		$ 7.305.572,80	$ -	136,80	$ 27.157.672,80			$ -	$ -	136,80	$ 27.157.672,80
2.2.	Suministro e instalación de viguetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye soldadura a columnetas y retiro de escombros.	ml	130	$ 181.351,00	$ 23.575.630,00			$ -	$ -	130,00	$ 23.575.630,00			$ -	$ -	130,00	$ 23.575.630,00		6,08	$ -	$ 1.102.614,08	123,92	$ 22.473.015,92			$ -	$ -	123,92	$ 22.473.015,92
3.1.	Suministro e instalación de muro en Superboard de 8 mm, altura 2.40 m a dos caras. Incluye estructura metálica, anclaje, cinta, estuco y fondeo de acabado en pintura en vinilo tipo 1.	m2	30	$ 199.697,00	$ 5.990.910,00			$ -	$ -	30,00	$ 5.990.910,00			$ -	$ -	30,00	$ 5.990.910,00	8,448		$ 1.687.040,26	$ -	38,45	$ 7.677.950,26			$ -	$ -	38,45	$ 7.677.950,26
4.1.	Suministro e instalación de cielorraso en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura. A todo costo.	m2	1301	$ 128.125,00	$ 166.690.625,00			$ -	$ -	1301,00	$ 166.690.625,00			$ -	$ -	1301,00	$ 166.690.625,00	360,68		$ 46.212.125,00	$ -	1661,68	$ 212.902.750,00			$ -	$ -	1661,68	$ 212.902.750,00
4.2.	Suministro e instalación de Frescasa Eco Sin Papel 3 1/2" para cielorraso en Drywall. A todo costo.	m2	1301	$ 32.499,00	$ 42.281.199,00			$ -	$ -	1301,00	$ 42.281.199,00			$ -	$ -	1301,00	$ 42.281.199,00	119,09		$ 3.870.305,91	$ -	1420,09	$ 46.151.504,91			$ -	$ -	1420,09	$ 46.151.504,91
5.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad. Incluye plástico aislante y zumbolon de acuerdo a las caracteristicas técnicas y el guardaescobas.	m2	1070	$ 189.748,00	$ 203.030.360,00			$ -	$ -	1070,00	$ 203.030.360,00			$ -	$ -	1070,00	$ 203.030.360,00		50,59	$ -	$ 9.599.351,32	1019,41	$ 193.431.008,68			$ -	$ -	1019,41	$ 193.431.008,68
6.1.	Suministro e instalación de alimentador 1N°12 Fase+1N°12 Neutro+1N°12 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	2400	$ 19.944,00	$ 47.865.600,00			$ -	$ -	2400,00	$ 47.865.600,00			$ -	$ -	2400,00	$ 47.865.600,00			$ -	$ -	2400,00	$ 47.865.600,00			$ -	$ -	2400,00	$ 47.865.600,00
6.2.	Suministro e instalación de alimentador a tableros en 3N°2/0 Fase+1N°2/0 Neutro+1N°2 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	200	$ 363.569,00	$ 72.713.800,00			$ -	$ -	200,00	$ 72.713.800,00			$ -	$ -	200,00	$ 72.713.800,00			$ -	$ -	200,00	$ 72.713.800,00			$ -	$ -	200,00	$ 72.713.800,00
6.3.	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble, cumpliendo norma RETIE.	und	240	$ 153.691,00	$ 36.885.840,00			$ -	$ -	240,00	$ 36.885.840,00			$ -	$ -	240,00	$ 36.885.840,00	70		$ 10.758.370,00	$ -	310,00	$ 47.644.210,00			$ -	$ -	310,00	$ 47.644.210,00
6.4.	Suministro e instalación de salida interruptor sencillo o doble 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH40 3/4", elementos de fijación y conductores. Cumpliendo norma RETIE.	und	60	$ 173.282,00	$ 10.396.920,00			$ -	$ -	60,00	$ 10.396.920,00			$ -	$ -	60,00	$ 10.396.920,00			$ -	$ -	60,00	$ 10.396.920,00			$ -	$ -	60,00	$ 10.396.920,00
6.5.	Suministro e instalación de lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x4x7cm. Largo de la guaya: 100cm, incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	82	$ 318.520,00	$ 26.118.640,00			$ -	$ -	82,00	$ 26.118.640,00			$ -	$ -	82,00	$ 26.118.640,00			$ -	$ -	82,00	$ 26.118.640,00			$ -	$ -	82,00	$ 26.118.640,00

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. -

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO N°4

CONTRATO FNA-166-2024	OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA - CNA EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	FECHA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

6.6.	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	90	$ 224.564,00	$ 20.210.760,00			$ -	$ -	90,00	$ 20.210.760,00			$ -	$ -	90,00	$ 20.210.760,00	50		$ 11.228.200,00	$ -	140,00	$ 31.438.960,00			$ -	$ -	140,00	$ 31.438.960,00
6.7.	Suministro e instalación de panel LED de gran formato redondo de 24W, luz neutra 4000K, dimensiones 100 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	7	$ 190.825,00	$ 1.335.775,00			$ -	$ -	7,00	$ 1.335.775,00			$ -	$ -	7,00	$ 1.335.775,00			$ -	$ -	7,00	$ 1.335.775,00			$ -	$ -	7,00	$ 1.335.775,00
6.8.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	22	$ 176.599,00	$ 3.885.178,00			$ -	$ -	22,00	$ 3.885.178,00			$ -	$ -	22,00	$ 3.885.178,00			$ -	$ -	22,00	$ 3.885.178,00			$ -	$ -	22,00	$ 3.885.178,00
6.9.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia de aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	10	$ 195.508,00	$ 1.955.080,00			$ -	$ -	10,00	$ 1.955.080,00			$ -	$ -	10,00	$ 1.955.080,00			$ -	$ -	10,00	$ 1.955.080,00			$ -	$ -	10,00	$ 1.955.080,00
6.10.	Suministro e instalación de salida tomacorriente doble polo a tierra (red normal), monofásico 120V 15A, 3m prom en cable No 12 LSHF AWG, elementos de fijación y conductores.	und	43	$ 173.606,00	$ 7.465.058,00			$ -	$ -	43,00	$ 7.465.058,00			$ -	$ -	43,00	$ 7.465.058,00	40		$ 6.944.240,00	$ -	83,00	$ 14.409.298,00			$ -	$ -	83,00	$ 14.409.298,00
6.11.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. Cumpliendo norma RETIE.	m	300	$ 16.035,00	$ 4.810.500,00			$ -	$ -	300,00	$ 4.810.500,00			$ -	$ -	300,00	$ 4.810.500,00			$ -	$ -	300,00	$ 4.810.500,00			$ -	$ -	300,00	$ 4.810.500,00
6.12.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit EMT ø 3" oculta sobre cielo o en muros.	ml	180	$ 155.392,00	$ 27.970.560,00			$ -	$ -	180,00	$ 27.970.560,00			$ -	$ -	180,00	$ 27.970.560,00			$ -	$ -	180,00	$ 27.970.560,00			$ -	$ -	180,00	$ 27.970.560,00
6.13.	Suministro e instalación de ducto cerrado de 40X8 galvanizado o con pintura electrostática.	ml	220	$ 293.413,00	$ 64.550.860,00			$ -	$ -	220,00	$ 64.550.860,00			$ -	$ -	220,00	$ 64.550.860,00			$ -	$ -	220,00	$ 64.550.860,00			$ -	$ -	220,00	$ 64.550.860,00
6.14.	Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico tetrafilar con espacio para totalizador y barraje neutro y tierra. Incluye totalizador y protecciones.	und	2	$ 3.460.340,00	$ 6.920.680,00			$ -	$ -	2,00	$ 6.920.680,00			$ -	$ -	2,00	$ 6.920.680,00			$ -	$ -	2,00	$ 6.920.680,00			$ -	$ -	2,00	$ 6.920.680,00
7.1.	Suministro e instalación de Vidrios Templado 8 mm para divisiones de oficina incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	300	$ 830.396,00	$ 249.118.800,00			$ -	$ -	300,00	$ 249.118.800,00			$ -	$ -	300,00	$ 249.118.800,00		200	$ -	$ 166.079.200,00	100,00	$ 83.039.600,00			$ -	$ -	100,00	$ 83.039.600,00
7.2.	Suministro e instalación de Puerta en Vidrio Templado 8 mm con Pivote, incluye topes de piso, accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento a todo costo.	m2	30	$ 856.303,00	$ 25.689.090,00			$ -	$ -	30,00	$ 25.689.090,00			$ -	$ -	30,00	$ 25.689.090,00	3,12		$ 2.671.665,36	$ -	33,12	$ 28.360.755,36			$ -	$ -	33,12	$ 28.360.755,36
7.3.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho a todo costo de uso interior y exterior.	ml	60	$ 85.101,00	$ 5.106.060,00			$ -	$ -	60,00	$ 5.106.060,00			$ -	$ -	60,00	$ 5.106.060,00	43,4		$ 3.693.383,40	$ -	103,40	$ 8.799.443,40			$ -	$ -	103,40	$ 8.799.443,40
7.4.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho de uso interior y exterior, con corte de letras para identificar las oficinas en vidrio. A todo costo.	und	41	$ 139.113,00	$ 5.703.633,00			$ -	$ -	41,00	$ 5.703.633,00			$ -	$ -	41,00	$ 5.703.633,00		26	$ -	$ 3.616.938,00	15,00	$ 2.086.695,00			$ -	$ -	15,00	$ 2.086.695,00
8.1.	Suministro e instalación de Puerta en madecor entamborada de 0,90 m de ancho por 2.20 m de alto, incluye marcos, chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	1	$ 1.145.405,00	$ 1.145.405,00			$ -	$ -	1,00	$ 1.145.405,00			$ -	$ -	1,00	$ 1.145.405,00			$ -	$ -	1,00	$ 1.145.405,00			$ -	$ -	1,00	$ 1.145.405,00
9.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores blancos. A todo costo, incluye lineales.	m2	1000	$ 37.195,00	$ 37.195.000,00			$ -	$ -	1000,00	$ 37.195.000,00			$ -	$ -	1000,00	$ 37.195.000,00		69,719	$ -	$ 2.593.198,21	930,28	$ 34.601.801,80			$ -	$ -	930,28	$ 34.601.801,80
9.2.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos cielo falsos blanco. A todo costo, incluye lineales.	m2	230,61	$ 40.033,00	$ 9.232.010,13			$ -	$ -	230,61	$ 9.232.010,13			$ -	$ -	230,61	$ 9.232.010,13	1431,07		$ 57.290.025,31	$ -	1661,68	$ 66.522.035,44			$ -	$ -	1661,68	$ 66.522.035,44
	TOTAL REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CNA - PISO 2				**$ 1.212.934.890,00**			**$ -**	**$ -**		**$ 1.212.934.890,00**						**$ 1.212.934.890,00**						**$ 1.199.187.649,00**						**$ 1.199.187.649,00**
	REPARACIONES LOCATIVAS CASINO - EDIFICIO CONVENCIONES																												
5.5.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad, para la zona de mesas del restaurante Incluye nivelación en zonas puntuales, plástico aislante, yumbolon de acuerdo con las características técnicas y el guardaescobas.	m2	450	$ 189.748,00	$ 85.386.600,00			$ -	$ -	450,00	$ 85.386.600,00			$ -	$ -	450,00	$ 85.386.600,00		90	$ -	$ 17.077.320,00	360,00	$ 68.309.280,00			$ -	$ -	360,00	$ 68.309.280,00
9.1.	Suministro e instalación de estructura decorativa para plantas colgantes de 6,85m ancho x 1,00 m de profundo con viguetas cada 0,76 m en tubería metálica cuadrada 50x50x2.0mm con acabado en pintura electrostática negro mate incluye 6 puntos de apoyo en guaya de tipo colgante. incluye 3 lamparas segun imagen.	und	2	$ 3.245.844,00	$ 6.491.688,00			$ -	$ -	2,00	$ 6.491.688,00			$ -	$ -	2,00	$ 6.491.688,00			$ -	$ -	2,00	$ 6.491.688,00			$ -	$ -	2,00	$ 6.491.688,00
9.2.	Suministro e instalación de estructura para microondas con módulos de 0,71 m de largo 0,56 m de profundo y 0,40 m de alto en tubería metálica cuadrada 50x50x3.0mm en pintura electrostática negro mate incluye 2 superficies en madera tipo madecor RH de 1" cada módulo y anclajes a la pared no visibles.	und	12	$ 835.627,00	$ 10.027.524,00			$ -	$ -	12,00	$ 10.027.524,00			$ -	$ -	12,00	$ 10.027.524,00		1	$ -	$ 835.627,00	11,00	$ 9.191.897,00			$ -	$ -	11,00	$ 9.191.897,00
11.1.	Resanes y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre parlete o repello liso. Incluyen andamios, escaleras y sistemas de seguridad de operación. A todo costo.	m2	222,23	$ 33.744,00	$ 7.498.929,12			$ -	$ -	222,23	$ 7.498.929,12			$ -	$ -	222,23	$ 7.498.929,12		150	$ -	$ 5.061.600,00	72,23	$ 2.437.329,12			$ -	$ -	72,23	$ 2.437.329,12
	TOTAL REPARACIONES LOCATIVAS CASINO - EDIFICIO CONVENCIONES				**$ 109.404.741,00**			**$ -**	**$ -**		**$ 109.404.741,00**						**$ 109.404.741,00**						**$ 86.430.194,00**						**$ 86.430.194,00**
	REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CONVENCIONES - PISO 4																												
1.1.	Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.	m2	161,58	$ 47.734,00	$ 7.712.859,72			$ -	$ -	161,58	$ 7.712.859,72			$ -	$ -	161,58	$ 7.712.859,72	300		$ 14.320.200,00	$ -	461,58	$ 22.033.059,72			$ -	$ -	461,58	$ 22.033.059,72
1.2.	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	m2	246,96	$ 95.354,00	$ 23.548.623,84			$ -	$ -	246,96	$ 23.548.623,84			$ -	$ -	246,96	$ 23.548.623,84			$ -	$ -	246,96	$ 23.548.623,84			$ -	$ -	246,96	$ 23.548.623,84
1.3.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros	m2	888,84	$ 35.224,00	$ 31.308.500,16			$ -	$ -	888,84	$ 31.308.500,16			$ -	$ -	888,84	$ 31.308.500,16			$ -	$ -	888,84	$ 31.308.500,16			$ -	$ -	888,84	$ 31.308.500,16
1.4.	Desmonte de redes eléctricas existentes. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	glb	1	$ 6.775.716,00	$ 6.775.716,00			$ -	$ -	1,00	$ 6.775.716,00			$ -	$ -	1,00	$ 6.775.716,00			$ -	$ -	1,00	$ 6.775.716,00			$ -	$ -	1,00	$ 6.775.716,00
1.5.	Desmonte puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el Fondo Nacional del Ahorro S.A. indique.	und	150	$ 93.786,00	$ 14.067.900,00			$ -	$ -	150,00	$ 14.067.900,00			$ -	$ -	150,00	$ 14.067.900,00			$ -	$ -	150,00	$ 14.067.900,00			$ -	$ -	150,00	$ 14.067.900,00
1.6.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" á una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo	m2	37,5	$ 92.676,00	$ 3.475.350,00			$ -	$ -	37,50	$ 3.475.350,00			$ -	$ -	37,50	$ 3.475.350,00	38,052		$ 3.526.507,15	$ -	75,55	$ 7.001.857,15			$ -	$ -	75,55	$ 7.001.857,15
2.1.	Suministro e instalación de columnetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre 12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye platina soldada a la base y anclajes a placa de piso y retiro de escombros.	ml	121	$ 198.521,00	$ 24.021.041,00			$ -	$ -	121,00	$ 24.021.041,00			$ -	$ -	121,00	$ 24.021.041,00	42,2		$ 8.377.586,20	$ -	163,20	$ 32.398.627,20			$ -	$ -	163,20	$ 32.398.627,20
2.2.	Suministro e instalación de viguetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye soldadura a columnetas y retiro de escombros.	ml	145	$ 181.351,00	$ 26.295.895,00			$ -	$ -	145,00	$ 26.295.895,00			$ -	$ -	145,00	$ 26.295.895,00		22,5	$ -	$ 4.080.397,50	122,50	$ 22.215.497,50			$ -	$ -	122,50	$ 22.215.497,50
2.3.	Suministro e instalación perfiles WPC textura madera. Para instalar en muros divisorios de dimensiones 10 cm x 5 cm. Incluye estructura anclajes y retiro de escombros.	m2	40	$ 234.409,00	$ 9.376.360,00			$ -	$ -	40,00	$ 9.376.360,00			$ -	$ -	40,00	$ 9.376.360,00		11,56	$ -	$ 2.709.768,04	28,44	$ 6.666.591,96			$ -	$ -	28,44	$ 6.666.591,96
3.1.	Suministro e instalación de muro en Superboard, altura 2.40 m. a dos caras incluye estructura, anclaje, cinta, estuco y fondeo de acabado en pintura en vinilo tipo 1.	m2	5	$ 156.903,00	$ 784.515,00			$ -	$ -	5,00	$ 784.515,00			$ -	$ -	5,00	$ 784.515,00	24,232		$ 3.802.073,50	$ -	29,23	$ 4.586.588,50			$ -	$ -	29,23	$ 4.586.588,50
4.1.	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall de 1/2" en diferentes niveles a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura a 3 manos. A todo costo.	m2	888,84	$ 113.010,00	$ 100.447.808,40			$ -	$ -	888,84	$ 100.447.808,40			$ -	$ -	888,84	$ 100.447.808,40		15,56	$ -	$ 1.758.435,60	873,28	$ 98.689.372,80			$ -	$ -	873,28	$ 98.689.372,80
5.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad Incluye plastico aislante y yumbolon, de acuerdo a las características técnicas y el guardaescobas.	m2	888,84	$ 189.748,00	$ 168.655.612,32			$ -	$ -	888,84	$ 168.655.612,32			$ -	$ -	888,84	$ 168.655.612,32	170		$ 32.257.160,00	$ -	1058,84	$ 200.912.772,32			$ -	$ -	1058,84	$ 200.912.772,32
6.1.	Suministro e instalación de alimentador 1N°12 Fase+1N°12 Neutro+1N°12 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumplendo norma RETIE.	ml	1800	$ 19.842,00	$ 35.715.600,00			$ -	$ -	1800,00	$ 35.715.600,00			$ -	$ -	1800,00	$ 35.715.600,00			$ -	$ -	1800,00	$ 35.715.600,00			$ -	$ -	1800,00	$ 35.715.600,00
6.2.	Suministro e instalación de alimentador a tableros en 3N°2/0 Fase+1N°2/0 Neutro+1N°2 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumplendo norma RETIE.	ml	50	$ 220.320,00	$ 11.016.000,00			$ -	$ -	50,00	$ 11.016.000,00			$ -	$ -	50,00	$ 11.016.000,00			$ -	$ -	50,00	$ 11.016.000,00			$ -	$ -	50,00	$ 11.016.000,00
6.3.	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble. A todo costo, cumplendo norma RETIE.	und	180	$ 147.631,00	$ 26.573.580,00			$ -	$ -	180,00	$ 26.573.580,00			$ -	$ -	180,00	$ 26.573.580,00		29	$ -	$ 4.281.299,00	151,00	$ 22.292.281,00			$ -	$ -	151,00	$ 22.292.281,00
6.4.	Suministro e instalación de salida interruptor sencillo o doble 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH40 3/4", elementos de fijación y conductores. A todo costo, cumplendo norma RETIE.	und	60	$ 166.320,00	$ 9.979.200,00			$ -	$ -	60,00	$ 9.979.200,00			$ -	$ -	60,00	$ 9.979.200,00		28	$ -	$ 4.656.960,00	32,00	$ 5.322.240,00			$ -	$ -	32,00	$ 5.322.240,00
6.5.	Suministro e instalación de Lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x4x7cm. Largo de la guaya: 100cm incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	42	$ 300.264,00	$ 12.611.088,00			$ -	$ -	42,00	$ 12.611.088,00			$ -	$ -	42,00	$ 12.611.088,00		2	$ -	$ 600.528,00	40,00	$ 12.010.560,00			$ -	$ -	40,00	$ 12.010.560,00
6.6.	Reinstalación de panel LED cuadrado de dimensiones 60x60 cm preexistentes. A todo costo, cumplendo norma RETIE.	und	88	$ 103.354,00	$ 9.095.152,00			$ -	$ -	88,00	$ 9.095.152,00			$ -	$ -	88,00	$ 9.095.152,00	1		$ 103.354,00	$ -	89,00	$ 9.198.506,00			$ -	$ -	89,00	$ 9.198.506,00
6..7	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	22	$ 209.700,00	$ 4.613.400,00			$ -	$ -	22,00	$ 4.613.400,00			$ -	$ -	22,00	$ 4.613.400,00			$ -	$ -	22,00	$ 4.613.400,00			$ -	$ -	22,00	$ 4.613.400,00
6.8.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	14	$ 220.546,00	$ 3.087.644,00			$ -	$ -	14,00	$ 3.087.644,00			$ -	$ -	14,00	$ 3.087.644,00	8		$ 1.764.368,00	$ -	22,00	$ 4.852.012,00			$ -	$ -	22,00	$ 4.852.012,00
6.9.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	11	$ 198.472,00	$ 2.183.192,00			$ -	$ -	11,00	$ 2.183.192,00			$ -	$ -	11,00	$ 2.183.192,00	3		$ 595.416,00	$ -	14,00	$ 2.778.608,00			$ -	$ -	14,00	$ 2.778.608,00

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. -

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO N°4

CONTRATO FNA-166-2024				OBJETO DEL CONTRATO			REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA - CNA EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.																FECHA		30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
6.10.	Suministro e instalación Salida tomacorriente doble polo a tierra (red normal), monofásico 120V 15A, 3m prom em cable No 12 LSHF AWG, elementos de fijación y conductores. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	23	$ 173.606,00	$ 3.992.938,00		$ -	$ -	23,00	$ 3.992.938,00		$ -	$ -	23,00	$ 3.992.938,00	10		$ 1.736.060,00	$ -	33,00	$ 5.728.998,00		$ -	$ -	33,00	$ 5.728.998,00
6.11.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	150	$ 16.035,00	$ 2.405.250,00		$ -	$ -	150,00	$ 2.405.250,00		$ -	$ -	150,00	$ 2.405.250,00			$ -	$ -	150,00	$ 2.405.250,00		$ -	$ -	150,00	$ 2.405.250,00
6.12.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit EMT ø 3" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	50	$ 155.392,00	$ 7.769.600,00		$ -	$ -	50,00	$ 7.769.600,00		$ -	$ -	50,00	$ 7.769.600,00			$ -	$ -	50,00	$ 7.769.600,00		$ -	$ -	50,00	$ 7.769.600,00
6.13.	Suministro e instalación de ducto cerrado de 40X8 galvanizado o con pintura electrostática. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	120	$ 317.627,00	$ 38.115.240,00		$ -	$ -	120,00	$ 38.115.240,00		$ -	$ -	120,00	$ 38.115.240,00			$ -	$ -	120,00	$ 38.115.240,00		$ -	$ -	120,00	$ 38.115.240,00
6.14.	Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico tetrafilar con espacio para totalizador y barraje neutro y tierra, incluye totalizador y protecciones. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	1	$ 3.460.340,00	$ 3.460.340,00		$ -	$ -	1,00	$ 3.460.340,00		$ -	$ -	1,00	$ 3.460.340,00			$ -	$ -	1,00	$ 3.460.340,00		$ -	$ -	1,00	$ 3.460.340,00
7.1.	Suministro e instalación de barra de comida en acero inoxidable calibre 22, de 45 cms de ancho incluye soporte en estructura metálica a pared.	ml	3,22	$ 1.416.162,00	$ 4.560.041,64		$ -	$ -	3,22	$ 4.560.041,64		$ -	$ -	3,22	$ 4.560.041,64			$ -	$ -	3,22	$ 4.560.041,64		$ -	$ -	3,22	$ 4.560.041,64
7.2.	Suministro e instalación de mueble de cocina de 1.60x0.60x0.90m en madera RH y en acero inoxidable, incluye grifería y accesorios de desagüe.	und	1	$ 2.569.025,00	$ 2.569.025,00		$ -	$ -	1,00	$ 2.569.025,00		$ -	$ -	1,00	$ 2.569.025,00			$ -	$ -	1,00	$ 2.569.025,00		$ -	$ -	1,00	$ 2.569.025,00
8.1.	Suministro e instalación de vidrio templado 8 mm para divisiones de oficina incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	279,84	$ 856.266,00	$ 239.617.477,44		$ -	$ -	279,84	$ 239.617.477,44		$ -	$ -	279,84	$ 239.617.477,44	37,248		$ 31.894.195,97	$ -	317,09	$ 271.511.673,41		$ -	$ -	317,09	$ 271.511.673,41
8.2.	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado 8 mm con pivote, incluye topes de piso, accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento a todo costo.	m2	40	$ 858.737,00	$ 34.349.480,00		$ -	$ -	40,00	$ 34.349.480,00		$ -	$ -	40,00	$ 34.349.480,00	7,52		$ 6.457.702,24	$ -	47,52	$ 40.807.182,24		$ -	$ -	47,52	$ 40.807.182,24
8.3.	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de 8 mm con sistema antipánico. Incluye topes de piso y accesorios para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	8	$ 1.607.888,00	$ 12.863.104,00		$ -	$ -	8,00	$ 12.863.104,00		$ -	$ -	8,00	$ 12.863.104,00		0,32	$ -	$ 514.524,16	7,68	$ 12.348.579,84		$ -	$ -	7,68	$ 12.348.579,84
8.4.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho, de uso interior y exterior. A todo costo.	ml	60	$ 82.644,00	$ 4.958.640,00		$ -	$ -	60,00	$ 4.958.640,00		$ -	$ -	60,00	$ 4.958.640,00			$ -	$ -	60,00	$ 4.958.640,00		$ -	$ -	60,00	$ 4.958.640,00
8.5.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho, de uso interior y exterior, con corte de letras para identificar las oficinas en vidrio. A todo costo.	und	46	$ 139.113,00	$ 6.399.198,00		$ -	$ -	46,00	$ 6.399.198,00		$ -	$ -	46,00	$ 6.399.198,00		29	$ -	$ 4.034.277,00	17,00	$ 2.364.921,00		$ -	$ -	17,00	$ 2.364.921,00
9.1.	Suministro e instalación de puerta en madecor entamborada de 0,90 m de ancho por 2.20 m de alto, incluye marcos chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	1	$ 1.145.405,00	$ 1.145.405,00		$ -	$ -	1,00	$ 1.145.405,00		$ -	$ -	1,00	$ 1.145.405,00			$ -	$ -	1,00	$ 1.145.405,00		$ -	$ -	1,00	$ 1.145.405,00
9.2.	Suministro e instalación de superficie de madera ancho 40cm y 3 cm de espesor, para instalar en muros bajos, correspondientes a la barra para computadores y zonas de estancia.	ml	30	$ 354.159,00	$ 10.624.770,00		$ -	$ -	30,00	$ 10.624.770,00		$ -	$ -	30,00	$ 10.624.770,00			$ -	$ -	30,00	$ 10.624.770,00		$ -	$ -	30,00	$ 10.624.770,00
10.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores blanco. A todo costo, incluye lineales.	m2	509,69	$ 32.772,00	$ 16.703.560,68		$ -	$ -	509,69	$ 16.703.560,68		$ -	$ -	509,69	$ 16.703.560,68		189,314	$ -	$ 6.204.198,41	320,38	$ 10.499.362,27		$ -	$ -	320,38	$ 10.499.362,27
10.2.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos cielo falsos blanco. A todo costo, incluye lineales.	m2	100	$ 39.060,00	$ 3.906.000,00		$ -	$ -	100,00	$ 3.906.000,00		$ -	$ -	100,00	$ 3.906.000,00	220,376		$ 8.607.886,56	$ -	320,38	$ 12.513.886,56		$ -	$ -	320,38	$ 12.513.886,56
10.3.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores azul institucional. A todo costo, incluye lineales.	m2	40	$ 37.195,00	$ 1.487.800,00		$ -	$ -	40,00	$ 1.487.800,00		$ -	$ -	40,00	$ 1.487.800,00			$ -	$ -	40,00	$ 1.487.800,00		$ -	$ -	40,00	$ 1.487.800,00
10.4.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores verde institucional. A todo costo, incluye lineales.	m2	25	$ 37.195,00	$ 929.875,00		$ -	$ -	25,00	$ 929.875,00		$ -	$ -	25,00	$ 929.875,00		25	$ -	$ 929.875,00	0,00	$ -		$ -	$ -	0,00	$ -
	TOTAL REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CONVENCIONES - PISO 4				**$ 927.202.782,00**		**$ -**	**$ -**		**$ 927.202.782,00**					**$ 927.202.782,00**						**$ 1.010.875.029,00**					**$ 1.010.875.029,00**
	REPARACIONES LOCATIVAS - TORRE DE TECNOLOGIA - PISO 2				$ -																					
1.1.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall, incluye desmonte de 113 luminarias tipo panel Led de 60 x 60 luz neutra 4000K y retiro con su disposición final de escombros.	m2	860	$ 37.322,00	$ 32.096.920,00		$ -	$ -	860,00	$ 32.096.920,00		$ -	$ -	860,00	$ 32.096.920,00			$ -	$ -	860,00	$ 32.096.920,00		$ -	$ -	860,00	$ 32.096.920,00
1.2.	Desmonte de puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	und	180	$ 93.786,00	$ 16.881.480,00		$ -	$ -	180,00	$ 16.881.480,00		$ -	$ -	180,00	$ 16.881.480,00	80		$ 7.502.880,00	$ -	260,00	$ 24.384.360,00		$ -	$ -	260,00	$ 24.384.360,00
1.3.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo.	m2	4	$ 92.676,00	$ 370.704,00		$ -	$ -	4,00	$ 370.704,00		$ -	$ -	4,00	$ 370.704,00			$ -	$ -	4,00	$ 370.704,00		$ -	$ -	4,00	$ 370.704,00
2.1.	Suministro e instalación de cielorraso en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco y capa fondeo pintura. A todo costo.	m2	860	$ 127.159,00	$ 109.356.740,00		$ -	$ -	860,00	$ 109.356.740,00		$ -	$ -	860,00	$ 109.356.740,00			$ -	$ -	860,00	$ 109.356.740,00		$ -	$ -	860,00	$ 109.356.740,00
3.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad. Incluye plástico aislante y yumbolon de acuerdo a las características técnicas y el guardaescobas.	m2	860	$ 189.748,00	$ 163.183.280,00		$ -	$ -	860,00	$ 163.183.280,00		$ -	$ -	860,00	$ 163.183.280,00			$ -	$ -	860,00	$ 163.183.280,00		$ -	$ -	860,00	$ 163.183.280,00
4.1.	Suministro e instalación de lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x4x7cm. Largo de la guaya: 100cm, incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	20	$ 311.065,00	$ 6.221.300,00		$ -	$ -	20,00	$ 6.221.300,00		$ -	$ -	20,00	$ 6.221.300,00			$ -	$ -	20,00	$ 6.221.300,00		$ -	$ -	20,00	$ 6.221.300,00
4.2.	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	20	$ 227.693,00	$ 4.553.860,00		$ -	$ -	20,00	$ 4.553.860,00		$ -	$ -	20,00	$ 4.553.860,00			$ -	$ -	20,00	$ 4.553.860,00		$ -	$ -	20,00	$ 4.553.860,00
4.3.	Reinstalación de panel LED cuadrado de dimensiones 60x60 cm luz neutra 4000K preexistentes. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	113	$ 96.211,00	$ 10.871.843,00		$ -	$ -	113,00	$ 10.871.843,00		$ -	$ -	113,00	$ 10.871.843,00			$ -	$ -	113,00	$ 10.871.843,00		$ -	$ -	113,00	$ 10.871.843,00
4.4.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	8	$ 210.033,00	$ 1.680.264,00		$ -	$ -	8,00	$ 1.680.264,00		$ -	$ -	8,00	$ 1.680.264,00			$ -	$ -	8,00	$ 1.680.264,00		$ -	$ -	8,00	$ 1.680.264,00
4.5.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia de aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	4	$ 195.508,00	$ 782.032,00		$ -	$ -	4,00	$ 782.032,00		$ -	$ -	4,00	$ 782.032,00			$ -	$ -	4,00	$ 782.032,00		$ -	$ -	4,00	$ 782.032,00
5.1.	Suministro e instalación de Puerta en madecor entamborada de 0,90 m de ancho por 2.20 m de alto, incluye marcos, chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	1	$ 997.838,00	$ 997.838,00		$ -	$ -	1,00	$ 997.838,00		$ -	$ -	1,00	$ 997.838,00			$ -	$ -	1,00	$ 997.838,00		$ -	$ -	1,00	$ 997.838,00
6.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores blancos. A todo costo, incluye lineales.	m2	880	$ 34.883,00	$ 30.697.040,00		$ -	$ -	880,00	$ 30.697.040,00		$ -	$ -	880,00	$ 30.697.040,00			$ -	$ -	880,00	$ 30.697.040,00		$ -	$ -	880,00	$ 30.697.040,00
	TOTAL REPARACIONES LOCATIVAS - TORRE DE TECNOLOGIA - PISO 2				**$ 377.693.301,00**		**$ -**	**$ -**		**$ 377.693.301,00**					**$ 377.693.301,00**						**$ 385.196.181,00**					**$ 385.196.181,00**
	BOLSA DE ITEMS NO PREVISTOS (10%)				$ 379.096.187,00		$ -																			
	SALDO BOLSA NP´S				$ 45.302,00					$ 93.802.260,00											$ 45.302,00				$ 206.733.638,00	
NP-1	Demolición placa maciza 0.15 mt en horarios autorizado por la entidad (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	m2	56	$ 49.331,00	$ 2.762.536,00		$ -	$ -	56,00	$ 2.762.536,00		$ -	$ -	56,00	$ 2.762.536,00	900		$ 44.397.900,00	$ -	956,00	$ 47.160.436,00	144	$ 7.103.664,00	$ -	1100,00	$ 54.264.100,00
NP-2	Suministro e instalación de mortero premezclado de nivelación bombeable, acelerado a 7 das con baja permeabilidad para zona de cubiertas, garantizando pendientes de desagues hacia los sifones.	m2	1805	$ 104.277,00	$ 188.219.985,00		$ -	$ -	1805,00	$ 188.219.985,00		$ -	$ -	1805,00	$ 188.219.985,00		1550,00	$ -	$ 161.629.350,00	255,00	$ 26.590.635,00		$ -	$ -	255,00	$ 26.590.635,00
NP-3	Demolición baldosa muro en horarios autorizados por la ENTIDAD (incluye retiro de material desde frente de obra al sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	m2	225	$ 27.952,00	$ 6.289.200,00		$ -	$ -	225,00	$ 6.289.200,00		$ -	$ -	225,00	$ 6.289.200,00			$ -	$ -	225,00	$ 6.289.200,00		$ -	$ -	225,00	$ 6.289.200,00
NP-4	Baldosa ceramica pared 30x60.	m2	105	$ 142.571,00	$ 14.969.955,00		$ -	$ -	105,00	$ 14.969.955,00		$ -	$ -	105,00	$ 14.969.955,00	550,43		$ 78.475.331,68	$ -	655,43	$ 93.445.286,68	300	$ -	$ 42.771.300,00	355,43	$ 50.673.986,68
NP-5	Baldosa ceramica piso 60x60.	m2	150	$ 154.546,00	$ 23.181.900,00		$ -	$ -	150,00	$ 23.181.900,00		$ -	$ -	150,00	$ 23.181.900,00			$ -	$ -	150,00	$ 23.181.900,00		$ -	$ -	150,00	$ 23.181.900,00
NP-6	Suministro e instalacion de cinta led en parte baja de gabinete superior de mueble de cocina.	und	1	$ 260.334,00	$ 260.334,00		$ -	$ -	1,00	$ 260.334,00		$ -	$ -	1,00	$ 260.334,00			$ -	$ -	1,00	$ 260.334,00		$ -	$ -	1,00	$ 260.334,00
NP-7	Desmonte y reinstalacion de rejillas de extraccion aire en cocina presidencia.	und	8	$ 45.000,00	$ 360.000,00		$ -	$ -	8,00	$ 360.000,00		$ -	$ -	8,00	$ 360.000,00			$ -	$ -	8,00	$ 360.000,00		$ -	$ -	8,00	$ 360.000,00
NP-8	Desmonte redes electricas existentes, incluye la disposición final fondo Nacional del Ahorro indique. (Zona de recepcion).	glb	1	$ 930.686,00	$ 930.686,00		$ -	$ -	1,00	$ 930.686,00		$ -	$ -	1,00	$ 930.686,00			$ -	$ -	1,00	$ 930.686,00		$ -	$ -	1,00	$ 930.686,00
NP-9	Demolición de guardaescoba, (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	ml	120	$ 14.785,00	$ 1.774.200,00		$ -	$ -	120,00	$ 1.774.200,00		$ -	$ -	120,00	$ 1.774.200,00	100		$ 1.478.500,00	$ -	220,00	$ 3.252.700,00		$ -	$ -	220,00	$ 3.252.700,00
NP-10	Desmonte espejo.	und	10	$ 23.790,00	$ 237.900,00		$ -	$ -	10,00	$ 237.900,00		$ -	$ -	10,00	$ 237.900,00			$ -	$ -	10,00	$ 237.900,00		$ -	$ -	10,00	$ 237.900,00
NP-11	Desmonte de cubierta en policarbonato.	m2	35	$ 52.335,00	$ 1.831.725,00		$ -	$ -	35,00	$ 1.831.725,00		$ -	$ -	35,00	$ 1.831.725,00			$ -	$ -	35,00	$ 1.831.725,00		$ -	$ -	35,00	$ 1.831.725,00
NP-12	Suministro e instalación de Policarbonato alveolar 8 mm para cubierta curva, incluye conectores y accesorios para su correcta instalación. No incluye estructura de soporte.	m2	25	$ 443.800,00	$ 11.095.000,00		$ -	$ -	25,00	$ 11.095.000,00		$ -	$ -	25,00	$ 11.095.000,00			$ -	$ -	25,00	$ 11.095.000,00		$ -	$ -	25,00	$ 11.095.000,00
NP-13	Mantenimiento marquesina cubierta de vidrio acceso, incluye: Revisión general, limpieza perimetral y limpieza de vidrios.	m2	45	$ 58.150,00	$ 2.616.750,00		$ -	$ -	45,00	$ 2.616.750,00		$ -	$ -	45,00	$ 2.616.750,00			$ -	$ -	45,00	$ 2.616.750,00		$ -	$ -	45,00	$ 2.616.750,00
NP-14	Lavado e hidrofugado de fachadas, muros en piedra y/o acabado abuzardado	m2	232	$ 51.032,00	$ 11.839.424,00		$ -	$ -	232,00	$ 11.839.424,00		$ -	$ -	232,00	$ 11.839.424,00			$ -	$ -	232,00	$ 11.839.424,00		$ -	$ -	232,00	$ 11.839.424,00
NP-15	Suministro e instalacion de revestimiento interior de fachada en WPC Panel Casino, de acuerdo a muestra seleccionada.	m2	50	$ 249.987,00	$ 12.499.350,00		$ -	$ -	50,00	$ 12.499.350,00		$ -	$ -	50,00	$ 12.499.350,00			$ -	$ -	50,00	$ 12.499.350,00		$ -	$ -	50,00	$ 12.499.350,00

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. -

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO N°4

CONTRATO FNA-166-2024	OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA - CNA EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	FECHA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NP-16	Desmonte de aparatos sanitarios (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio (hasta 50 mi) y desde sitio de acopio a escombrera).	UND	50	$ 40.607,00	$ 2.030.350,00			$ -	$ -	50,00	$ 2.030.350,00			$ -	$ -	50,00	$ 2.030.350,00			$ -	$ -	50,00	$ 2.030.350,00			$ -	$ -	50,00	$ 2.030.350,00
NP-17	Desmonte de muro fachada imitacion madera (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera)	m2	12	$ 16.161,00	$ 193.932,00			$ -	$ -	12,00	$ 193.932,00			$ -	$ -	12,00	$ 193.932,00			$ -	$ -	12,00	$ 193.932,00			$ -	$ -	12,00	$ 193.932,00
NP-18	Suministro e instalación de sensor de presencia Infrarrojo 360° de cobertura, montaje en techo, detección de movimiento hasta 4 metros radiales a una altura de instalación de 2.4 metros.	UND	20	$ 210.035,00	$ 4.200.700,00			$ -	$ -	20,00	$ 4.200.700,00			$ -	$ -	20,00	$ 4.200.700,00			$ -	$ -	20,00	$ 4.200.700,00			$ -	$ -	20,00	$ 4.200.700,00
NP-19	Suministro e instalación de enceres mobiles de inferior 220 X 90 X 63 y superior de 200X76X35 incluye campana extractora, puertas, mamjas en acero tabular, bisagras de parche, entrepaños, patas de 8 cm y manija en acero tubular. Modulo torre hornos de 200 X 60 X 60 con dos puertas parte alta y dos cajones parte baja central para horno. Tapa barra de 130 x 50 con patas en acero de 100 cm y anclaje a la pared. Todo elaborado en melamina de 15mm, color arena o glacial fabricado e instalado.	UND	1	$ 12.900.000,00	$ 12.900.000,00			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	1,00	$ 12.900.000,00			$ -	$ -	1,00	$ 12.900.000,00			$ -	$ -	1,00	$ 12.900.000,00
NP-20	Mesón en quartzone blanco polar con hueco para estufa y lavaplatos, incluye pulida, poceta, salpicadero 8 cm y estufa x 4 puestos challenger para uso con gas propano.	UND	1	$ 6.850.000,00	$ 6.850.000,00			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	1,00	$ 6.850.000,00			$ -	$ -	1,00	$ 6.850.000,00			$ -	$ -	1,00	$ 6.850.000,00
NP-21	Suministro e instalación punto de gas propano para estufa de presidencia, en tuberia pe al pe de 1/2" , con coraza de protección a la vista y accesorios de conexión con pases por muros. incluye suministro de 2 cilindros de 100 libras en gas propano, con valvula regladora para cada cilindro, base (poyo) soporte para cilindros y caja metalica de protección de cilindros para la intemperie.	GLB	1	$ 6.155.883,00	$ 6.155.883,00			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	1,00	$ 6.155.883,00			$ -	$ -	1,00	$ 6.155.883,00			$ -	$ -	1,00	$ 6.155.883,00
NP-22	Suministro e instalacion registro 1/2" agua potable	UND	4	$ 89.688,00	$ 358.752,00			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	4,00	$ 358.752,00			$ -	$ -	4,00	$ 358.752,00			$ -	$ -	4,00	$ 358.752,00
NP-23	Jardineras artificiales de acuerdo a render incluye amarre plastico	ml	20	$ 141.213,00	$ 2.824.260,00			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	20,00	$ 2.824.260,00	20		$ 2.824.260,00	$ -	40,00	$ 5.648.520,00			$ -	$ -	40,00	$ 5.648.520,00
NP-24	Suministro e instalacion de extractor para cocina y baños (16 x 16 x 9 cm)	UND	1	$ 196.410,00	$ 196.410,00			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	1,00	$ 196.410,00			$ -	$ -	1,00	$ 196.410,00	19		$ 3.731.790,00	$ -	20,00	$ 3.928.200,00
NP-25	Demolicion de meson en grano de marmol de ventanilla bancolombia	UND	1	$ 89.351,00	$ 89.351,00			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	1,00	$ 89.351,00			$ -	$ -	1,00	$ 89.351,00			$ -	$ -	1,00	$ 89.351,00
NP-26	Desmonte de aviso de fachada en recepción	UND	1	$ 283.054,00	$ 283.054,00			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	1,00	$ 283.054,00			$ -	$ -	1,00	$ 283.054,00			$ -	$ -	1,00	$ 283.054,00
NP-27	Suministro e instalación de santiario blanco institucional tipo adriatica o similar de entrada posterior no incluye puach	UND	20	$ 1.146.999,00	$ 22.939.980,00			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	20,00	$ 22.939.980,00	10		$ 11.469.990,00	$ -	30,00	$ 34.409.970,00			$ -	$ -	30,00	$ 34.409.970,00
NP-28	Suministro e instalacion lavamanos blanco tipo cascada de baru o similar, no incluye griferia no incluye puach	UND	12	$ 613.653,00	$ 7.363.836,00			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	12,00	$ 7.363.836,00	20		$ 12.273.060,00	$ -	32,00	$ 19.636.896,00			$ -	$ -	32,00	$ 19.636.896,00
NP-29	Suministro e instalacion de carpa en lona para control de acceso en zona de recepcion	UND	1	$ 3.605.351,00	$ 3.605.351,00			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	1,00	$ 3.605.351,00			$ -	$ -	1,00	$ 3.605.351,00			$ -	$ -	1,00	$ 3.605.351,00
NP-30	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	14	$ 121.212,00	$ 1.696.968,00			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	14,00	$ 1.696.968,00	18		$ 2.181.816,00	$ -	32,00	$ 3.878.784,00			$ -	$ -	32,00	$ 3.878.784,00
NP-31	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UND	20	$ 163.414,00	$ 3.268.280,00			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	20,00	$ 3.268.280,00	10		$ 1.634.140,00	$ -	30,00	$ 4.902.420,00			$ -	$ -	30,00	$ 4.902.420,00
NP-32	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	4	$ 109.459,00	$ 437.836,00			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	4,00	$ 437.836,00	20		$ 2.189.180,00	$ -	24,00	$ 2.627.016,00			$ -	$ -	24,00	$ 2.627.016,00
NP-33	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	8	$ 129.358,00	$ 1.034.864,00			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	8,00	$ 1.034.864,00			$ -	$ -	8,00	$ 1.034.864,00			$ -	$ -	8,00	$ 1.034.864,00
NP-34	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	20	$ 148.502,00	$ 2.970.040,00			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	20,00	$ 2.970.040,00	10		$ 1.485.020,00	$ -	30,00	$ 4.455.060,00	30		$ 4.455.060,00	$ -	60,00	$ 8.910.120,00
NP-35	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UND	8	$ 109.645,00	$ 877.160,00			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	8,00	$ 877.160,00	10		$ 1.096.450,00	$ -	18,00	$ 1.973.610,00			$ -	$ -	18,00	$ 1.973.610,00
NP-36	RED SANITARIA PVC-S 4"	ml	60	$ 74.903,00	$ 4.494.180,00			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	60,00	$ 4.494.180,00			$ -	$ -	60,00	$ 4.494.180,00			$ -	$ -	60,00	$ 4.494.180,00
NP-37	RED SANITARIA PVC-S 3"	ml	60	$ 61.047,00	$ 3.662.820,00			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	60,00	$ 3.662.820,00			$ -	$ -	60,00	$ 3.662.820,00			$ -	$ -	60,00	$ 3.662.820,00
NP-38	RED SANITARIA PVC-S 2"	ml	70	$ 49.310,00	$ 3.451.700,00			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	70,00	$ 3.451.700,00			$ -	$ -	70,00	$ 3.451.700,00			$ -	$ -	70,00	$ 3.451.700,00
NP-39	RED SANITARIA PVC-VENTILACION 2"	ml	60	$ 31.024,00	$ 1.861.440,00			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	60,00	$ 1.861.440,00			$ -	$ -	60,00	$ 1.861.440,00			$ -	$ -	60,00	$ 1.861.440,00
NP-40	Red suministro 1 1/4"	ml	35	$ 36.089,00	$ 1.263.115,00			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	35,00	$ 1.263.115,00			$ -	$ -	35,00	$ 1.263.115,00			$ -	$ -	35,00	$ 1.263.115,00
NP-41	Red suministro 1"	ml	50	$ 27.219,00	$ 1.360.950,00			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	50,00	$ 1.360.950,00			$ -	$ -	50,00	$ 1.360.950,00			$ -	$ -	50,00	$ 1.360.950,00
NP-42	Red suministro 3/4"	ml	60	$ 20.862,00	$ 1.251.720,00			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	60,00	$ 1.251.720,00			$ -	$ -	60,00	$ 1.251.720,00			$ -	$ -	60,00	$ 1.251.720,00
NP-43	Red suministro 1/2"	ml	60	$ 18.245,00	$ 1.094.700,00			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	60,00	$ 1.094.700,00			$ -	$ -	60,00	$ 1.094.700,00			$ -	$ -	60,00	$ 1.094.700,00
NP-44	Registro PVC-P 1 - 1/4"	UND	7	$ 145.520,00	$ 1.018.640,00			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	7,00	$ 1.018.640,00	10		$ 1.455.200,00	$ -	17,00	$ 2.473.840,00			$ -	$ -	17,00	$ 2.473.840,00
NP-45	Registro PVC-P 1"	UND	4	$ 111.417,00	$ 445.668,00			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	4,00	$ 445.668,00	6		$ 668.502,00	$ -	10,00	$ 1.114.170,00			$ -	$ -	10,00	$ 1.114.170,00
NP-46	Trasiego incluye traslado a sitio de acopio en bolsas de aproximadamente 25 kilos	m3		$ 52.788,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -	50		$ 2.639.400,00	$ -	50,00	$ 2.639.400,00
NP-47	Construccion de Media caña en mortero 1:3	ml		$ 47.206,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -	350		$ 16.522.100,00	$ -	350,00	$ 16.522.100,00
NP-48	Suministro e instalación orinal tipo gotta o similar de entrada posterior no incluye grigeria ni incluye puach	un		$ 1.037.619,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -	4		$ 4.150.476,00	$ -	4,00	$ 4.150.476,00
NP-49	Desmonte de cubierta en lamina de zinc en cubierta de convenciones incluye estructura metalica de soporte, incluye retiro a sitio de acopio y disposición final.	m2		$ 58.611,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -	120		$ 7.033.320,00	$ -	120,00	$ 7.033.320,00
NP-50	Desmonte de ductos de aire acondicionado (incluye fibra de vidrio, transporte y disposición final)	ml		$ 49.313,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -	350		$ 17.259.550,00	$ -	350,00	$ 17.259.550,00
NP-51	Desmonte de ductos de red contraincendio en tuberia CPVC de varios diametros incluye soporteria. (Incluye trasiego y disposición final)	ml		$ 17.183,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -	380		$ 6.529.540,00	$ -	380,00	$ 6.529.540,00
NP-52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE impermeabilización de placa poliurea pura RESISTENTE A RAYOS UV DANOCOAT 250 incluye suministro y aplicación de POLIUREA en 80 MILS +-10%, ESPESOR TEXTURIZADA PREVIA IMPRIMACION EPOXICA BICOMPONENTE CON ARENA DE QUARZO EN UNA CAPA (si se requieren más se cobrarán por aparte), INCLUYE REACTOR GRACO, MATERIALES Y EQUIPOS CERTIFICADOS, PREVIO tratamiento de fisuras existentes. Acabado original gris cambia por rayos UV. Suministro y aplicación esmalte uretano gris o blanco resistente a Rayos UV color homogéneo como protección del sistema Poliurea.	M2		$ 225.935,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -	1136,80		$ 256.842.908,00	$ -	1136,80	$ 256.842.908,00
NP-53	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRATO DE MORTERO SECO CON BAJO CONTENIDO DE AGUA PARA NIVELACION DE CUBIERTAS CON ESPESORES PROMEDIO DE 8cm. SOBRE SUPERFICIE IRREGULAR RESULTADO DE DEMOLICION DE ELEMENTOS NO DESMONTADOS Y RETIRADOS EN LAS AREAS A INTERVENIR. zona de cubiertas, granizando pendientes de desagues hacia los sifones. INCLUYE TRASIEGO DE MATERIALES A SITIOS DE FUNDIDAS	M2		$ 138.890,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -	1100		$ 152.779.000,00	$ -	1100,00	$ 152.779.000,00
NP-54	Demolicion de dados de concreto de 0.3 x 0.3 x 0.25 m, los cuales se encuentran en zona de cubierta incluye trasiego y disposición final.	Und		$ 57.437,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -	80		$ 4.594.960,00	$ -	80,00	$ 4.594.960,00
NP-55	Desmonte de ducto de extrator incluye retiro 2 extractores tipo hongo incluye retiro y disposición final.	Und		$ 223.054,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -	3		$ 669.162,00	$ -	3,00	$ 669.162,00
NP-56	Desmonte de bandeja tipo escalera incluye cableado estructurado, cableado normal, cableado regulado y voz y datos correspondiente a alimentación de puestos de trabajo existentes (incluye clasificación, trasiego y entrega a la Entidad) puestos de trabajo existentes (incluye clasificación y entrega a la Entidad)	ml		$ 50.217,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -	160		$ 8.034.720,00	$ -	160,00	$ 8.034.720,00
					$ 379.050.885,00			**$ -**	**$ -**		**$ 379.096.187,00**			**$ -**	**$ -**		**$ 379.050.885,00**			**$ 161.629.349,68**	**$ 161.629.350,00**		**$ 379.050.884,68**			**$ 553.473.090,00**	**$ 553.473.090,00**		**$ 828.626.235,00**
	SALDO ACTIVIDADES CONTRACTUALES																						**$ 206.688.336,00**						
	COSTOS DIRECTOS				**$ 4.170.058.061,00**			**$ -**	**$ -**		**$ 4.170.058.061,00**						**$ 4.170.058.061,00**						**$ 4.170.058.061,00**						**$ 4.170.058.061,00**
	COSTOS INDIRECTOS				**$ 972.874.545,00**			**$ -**	**$ -**		**$ 972.874.545,00**						**$ 972.874.545,00**						**$ 972.874.545,00**						**$ 972.874.545,00**
	ADMINISTRACIÓN		12%		$ 500.406.967,00			$ -	$ -		$ 500.406.967,00						$ 500.406.967,00						$ 500.406.967,00						$ 500.406.967,00
	IMPREVISTOS		3%		$ 125.101.742,00			$ -	$ -		$ 125.101.742,00						$ 125.101.742,00						$ 125.101.742,00						$ 125.101.742,00
	UTILIDAD		7%		$ 291.904.064,00			$ -	$ -		$ 291.904.064,00						$ 291.904.064,00						$ 291.904.064,00						$ 291.904.064,00
	IVA SOBRE UTILIDAD		19%		$ 55.461.772,00			$ -	$ -		$ 55.461.772,00						$ 55.461.772,00						$ 55.461.772,00						$ 55.461.772,00
	COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				**$ 5.142.932.606,00**			**$ -**	**$ -**		**$ 5.142.932.606,00**						**$ 5.142.932.606,00**						**$ 5.142.932.606,00**						**$ 5.142.932.606,00**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
ING. JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES

FIRMA COORDINADOR DE OBRA CONTRATISTA
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS

RICARDO MORENO GARCIA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA COORDINADOR DE OBRA INTERVENTORIA
ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN

FIRMA SUPERVISION CTO INT FNA-022-2025
Dra. VANESA PACHECO GOMEZ

FIRMA APOYO DE SUPERVISION CTO INT FNA-022-2025
ING. JAIME HERNANDO PRIETO

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO E.S. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO N12		INCIEVI
CONSTRUCTORA COLOCCA	OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACIÓN REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ... Sede FL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	FECHA	1 DE JULIO DE 2025

| | | |

| | | |

FONDO NACIONAL DEL AHORRO E.S.A.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO V12

CONSTRUCTIVA INGENIERIA

CONSTRUCTIVA CALIDAD

OBJETO DEL CONTRATO

RENOVACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ... Grupo N. FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

FECHA

1 DE JULIO DE 2025

| | | |

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.		
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO N°3		
CONTRATO FNA.140.2024	OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA - Cra. 6L FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2025

ITEM	DESCRIPCION	Un	CONDICIONES CONTRACTUALES			BALANCE DE OBRA N°1 (ACTA DE PLIACIÓN N°1) 1 DE JUNIO DE 2025					BALANCE DE OBRA N°2 (ACTA DE PLIACIÓN N°2) 1 DE JULIO DE 2025					BALANCE DE OBRA N°3 30 de agosto 2025					BALANCE DE OBRA N°4 30 de septiembre 2025					BALANCE DE OBRA N°5 23 de octubre 2025				
						CANTIDADES		VALORES			CANTIDADES		VALORES			CANTIDADES		VALORES			CANTIDADES		VALORES			CANTIDADES		VALORES		
			Cantidad	Vr Unitario	Vr Total	Mayores +	Menores -	Mayores +	Menores -	CANTIDAD FINAL	Mayores +	Menores -	Mayores +	Menores -	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL	Mayores +	Menores -	Mayores +	Menores -	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL	Mayores +	Menores -	Mayores +	Menores -	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL	Mayores +	Menores -	Mayores +	Menores -	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
	ADECUACIONES LOCATIVAS (GENERALES) DEL EDIFICIO CENTRAL																															
1.1.	Retiro, reparación y reposicion puntual de juntas entre tarcheas (junta con tablon forma Zancuhan), entablado el cual de tiene de junta tipo chia roof y retiro puntual de pintura vinilotex satin color negro, con alta resistencia a la abrasión, incluye alquiler andamios y todo instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.	mt	2000	$ 19.908,00	$ 31.816.000,00			$ -	$ -	2000,00	$ 31.816.000,00			$ -	$ -	2000,00	$ 31.816.000,00		1900	$ -	$ 31.020.600,00	100,00	$ 798.400,00		30	$ -	$ 477.240,00	20,00	$ 318.160,00			$ -	$ -	20,00	$ 318.160,00
1.2.	Pintura exterior tipo sosaa para muros sobre pañete incluye toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.	m2	300	$ 42.061,00	$ 12.624.300,00			$ -	$ -	300,00	$ 12.624.300,00			$ -	$ -	300,00	$ 12.624.300,00			$ -	$ -	300,00	$ 12.624.300,00			$ -	$ -	300,00	$ 12.624.300,00			$ -	$ -	300,00	$ 12.624.300,00
2.1.	Retiro de impermeabilización existente y montaje de cielotaja. Incluye el retiro y disposición final de escombros (Edificio Comerciones y Edificio Cielo anexo 1).	m2	2332,42	$ 29.070,00	$ 69.969.659,40			$ -	$ -	2332,42	$ 69.969.659,40			$ -	$ -	2332,42	$ 69.969.659,40			$ -	$ -	2332,42	$ 69.969.659,40	802,42		$ -	$ 23.737.559,00	1530,00	$ 45.242.100,00	38,34		$ -	$ 1.133.333,00	1491,76	$ 44.110.767,00
2.2.	Instalación de muebre de elaelación con waterstop de 2050, a ventanes caracteristicas, previa a la instalación de la impermeabilización (Edificio Comerciones y Edificio CIELAnexo 1).	m2	2332,42	$ 62.971,00	$ 146.874.819,82			$ -	$ -	2332,42	$ 146.874.819,82			$ -	$ -	2332,42	$ 146.874.819,82		2332,42	$ -	$ 146.874.819,82	0,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -
2.3.	Impermeabilización de placa de cubierta planta transitable, no ventilada, con pico lijo, tipo convencional, para tráfico peatonal privado. Tipo Sika o de similares caracteristicas con uso de mantas asfálticas, tipo bicapa (Edificio Comerciones y Edificio CIELAnexo 1).	m2	2332,42	$ 126.024,00	$ 293.107.108,08			$ -	$ -	2332,42	$ 293.107.108,08			$ -	$ -	2332,42	$ 293.107.108,08			$ -	$ -	2332,42	$ 293.107.108,08	2100		$ -	$ 265.700.400,00	232,42	$ 29.406.708,08			$ -	$ -	232,42	$ 29.406.708,08
2.4.	Desmonte de ventaneria con vidrios en celosia colocados en cubie de cubierta en el edificio CIAL	m2	160	$ 52.283,00	$ 7.973.990,00			$ -	$ -	160,00	$ 7.973.990,00	170		$ 8.623.810,00	$ -	330,00	$ 16.797.790,00			$ -	$ -	330,00	$ 16.797.790,00			$ -	$ -	330,00	$ 16.797.790,00			$ -	$ -	330,00	$ 16.797.790,00
2.5.	Suministro e instalación de sistema de ventanas en vidrio fijos (con laboratorio) en reemplazo de las ventanas en vidrio celosias, colocadas en cubie de cubierta en el edificio CIAL	m2	160	$ 267.809,00	$ 44.870.250,00			$ -	$ -	160,00	$ 44.870.250,00	170		$ 60.631.590,00	$ -	330,00	$ 105.307.200,00			$ -	$ -	330,00	$ 105.307.200,00			$ -	$ -	330,00	$ 105.307.200,00			$ -	$ -	330,00	$ 105.307.200,00
2.6.	Retiro de ventanas existente y suministro e instalación de ventanas caracteristicas, previa a la instalación de la impermeabilización en cubierta (ítem 10 de acuerdo con las necesidades técnicas de la cubierta de aguas lluvia, incluye la instalación de la superficie para el anclaje de la cubierta en el edificio CIAL	m2	231	$ 121.991,00	$ 28.170.681,00			$ -	$ -	231,00	$ 28.170.681,00		30	$ -	$ 3.659.530,00	201,00	$ 24.512.151,00			$ -	$ -	201,00	$ 24.512.151,00			$ -	$ -	201,00	$ 24.512.151,00			$ -	$ -	201,00	$ 24.512.151,00
2.7.	Retiro de instalación existente y suministro e instalación de soseas para la lejante de aguas lluvia a 4" en PVC con su respectivo vifio para evitar malos olores, incluye la instalación de la superficie para el anclaje en el edificio CIAL	und	63	$ 88.563,00	$ 5.577.850,00			$ -	$ -	63,00	$ 5.577.850,00			$ -	$ -	63,00	$ 5.577.850,00			$ -	$ -	63,00	$ 5.577.850,00			$ -	$ -	63,00	$ 5.577.850,00			$ -	$ -	63,00	$ 5.577.850,00
2.8.	Limpieza y mantenimientos de tubería bajante de agua lluvia a 4" en PVC, en el edificio CIAL	und	63	$ 64.000,00	$ 4.721.000,00			$ -	$ -	63,00	$ 4.721.000,00			$ -	$ -	63,00	$ 4.721.000,00			$ -	$ -	63,00	$ 4.721.000,00			$ -	$ -	63,00	$ 4.721.000,00			$ -	$ -	63,00	$ 4.721.000,00
3.1.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte estructuras, retiro y disposición final de escombros	m2	80	$ 37.322,00	$ 2.985.760,00			$ -	$ -	80,00	$ 2.985.760,00	100		$ 3.732.200,00	$ -	180,00	$ 6.717.960,00			$ -	$ -	180,00	$ 6.717.960,00			$ -	$ -	180,00	$ 6.717.960,00			$ -	$ -	180,00	$ 6.717.960,00
3.2.	Mantenimiento de cielo raso en fibra mineral. Incluye sanchilo, pintura pistolización de tarrajeo en fibra mineral, instalación de anclajes y perfilería desculgada y colocación de soportes.	m2	5600	$ 34.079,00	$ 61.331.400,00			$ -	$ -	1800,00	$ 61.331.400,00			$ -	$ -	1800,00	$ 61.331.400,00		1500	$ -	$ 51.109.500,00	300,00	$ 10.221.900,00			$ -	$ -	300,00	$ 10.221.900,00			$ -	$ -	300,00	$ 10.221.900,00
3.3.	Suministro e instalación cielo raso PVC de 10 mm de espesor, incluye retroduro, perfilaneriores para las luminarias. Ataldo cielo.	m2	80	$ 94.144,00	$ 7.531.520,00			$ -	$ -	80,00	$ 7.531.520,00			$ -	$ -	80,00	$ 7.531.520,00			$ -	$ -	80,00	$ 7.531.520,00			$ -	$ -	80,00	$ 7.531.520,00			$ -	$ -	80,00	$ 7.531.520,00
3.4.	Suministro e instalación cielo raso en drywall de 1/2" de espesor a una sola cara, incluye retroduro, perfilaneriores luminarias. Ataldo cielo.	m2	80	$ 127.042,00	$ 10.163.360,00			$ -	$ -	80,00	$ 10.163.360,00			$ -	$ -	80,00	$ 10.163.360,00	70		$ -	$ 8.892.940,00	150,00	$ 19.056.300,00	13,66		$ -	$ 1.776.047,00	136,22	$ 17.280.252,64			$ -	$ -	136,22	$ 17.280.252,64
4.1.	Cambio de válvula antiretrolflujo en empotrar tipo push para sanitarios institucionales de consumo de agua 0,65 lpf (1,248 gpf) tipo cisterna o similar incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. Incluye la instalación de un enchape de similares caracteristicas a los originales.	und	100	$ 1.260.916,00	$ 120.091.600,00			$ -	$ -	100,00	$ 120.091.600,00		60	$ -	$ 72.330.960,00	40,00	$ 48.030.640,00			$ -	$ -	40,00	$ 48.030.640,00			$ -	$ -	40,00	$ 48.030.640,00			$ -	$ -	40,00	$ 48.030.640,00
4.2.	Cambio de grifería para lavamanos de empotrar a mura tipo push aplicación institucional de consumo 0,2 - 1,0 litros, tipo cisterna o similar incluye desmonte y reinstalación de aparatos. Ataldo cada uno la instalación de un enchape de similares caracteristicas a los originales.	und	85	$ 709.300,00	$ 61.965.475,00			$ -	$ -	85,00	$ 61.965.475,00		55	$ -	$ 40.113.425,00	30,00	$ 21.860.050,00			$ -	$ -	30,00	$ 21.860.050,00			$ -	$ -	30,00	$ 21.860.050,00			$ -	$ -	30,00	$ 21.860.050,00
4.3.	Cambio de válvula antiretrolflujo en empotrar tipo push para sanitarios institucionales de consumo de agua 0,6 a 1,6 lpf (2,1 a 5,3 gpf), tipo semisa o similar incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. Ataldo cada uno la instalación de un enchape de similares caracteristicas a los originales.	und	20	$ 1.209.112,00	$ 24.182.240,00			$ -	$ -	20,00	$ 24.182.240,00			$ -	$ -	20,00	$ 24.182.240,00			$ -	$ -	20,00	$ 24.182.240,00			$ -	$ -	20,00	$ 24.182.240,00			$ -	$ -	20,00	$ 24.182.240,00
4.4.	Desmonte de divisiones sveltiblaa para baños. Incluye suspetería, bimillas, tornillos, retiro y disposición final	m2	45	$ 39.979,00	$ 1.791.055,00			$ -	$ -	45,00	$ 1.791.055,00	30		$ 1.197.370,00	$ -	75,00	$ 2.988.425,00	53		$ -	$ 1.879.860,00	128,00	$ 4.947.375,00			$ -	$ -	128,00	$ 4.947.375,00			$ -	$ -	128,00	$ 4.947.375,00
4.5.	Suministro e instalación de divisiones de baño en acero inoxidable por paneles de 1220mm x 2440mm x 30mm, calibre 304 acabado en satinado No. 4/240GRIT o similar. Con puerta, anclajes y accesorios necesarios para su instalación y correcto funcionamiento.	m2	45	$ 1.005.111,00	$ 45.229.995,00			$ -	$ -	45,00	$ 45.229.995,00	30		$ 30.153.330,00	$ -	75,00	$ 75.383.325,00	53		$ -	$ 50.255.550,00	128,00	$ 125.638.875,00			$ -	$ -	128,00	$ 125.638.875,00			$ -	$ -	128,00	$ 125.638.875,00
4.6.	Limpieza con sonda de tubería sanitaria en diferentes diámetros, adicional para ejercitar por punto	und	275	$ 109.625,00	$ 30.146.875,00			$ -	$ -	275,00	$ 30.146.875,00		100	$ -	$ 10.962.500,00	175,00	$ 19.184.375,00			$ -	$ -	175,00	$ 19.184.375,00			$ -	$ -	175,00	$ 19.184.375,00			$ -	$ -	175,00	$ 19.184.375,00
5.1.	Desmonte de puertas en madera de 1,40 m x2,47 m, incluye marco y rejilla.	und	1	$ 127.873,00	$ 127.873,00			$ -	$ -	1,00	$ 127.873,00			$ -	$ -	1,00	$ 127.873,00			$ -	$ -	1,00	$ 127.873,00			$ -	$ -	1,00	$ 127.873,00			$ -	$ -	1,00	$ 127.873,00			$ -	$ -	1,00	$ 127.873,00
5.2.	Suministro e instalación de puerta de acceso a cubierta en aluminio de dos hojas, una de 0,90 m x 2,47 y otra de 0,50 m x 2,47 m, incluye bisagras cerradura, cabinero marco y accesorios necesarios para su funcionamiento.	und	1	$ 1.192.299,00	$ 1.192.299,00			$ -	$ -	1,00	$ 1.192.299,00			$ -	$ -	1,00	$ 1.192.299,00			$ -	$ -	1,00	$ 1.192.299,00			$ -	$ -	1,00	$ 1.192.299,00	1		$ -	$ 1.192.299,00	0,00	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -
6.1.	Retiramo y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre pañete o repello liso. Ataldo cielo	m2	4500	$ 33.744,00	$ 151.848.000,00			$ -	$ -	4500,00	$ 151.848.000,00			$ -	$ -	4500,00	$ 151.848.000,00			$ -	$ -	4500,00	$ 151.848.000,00	416,75616817		$ -	$ 14.062.653,00	4083,25	$ 137.785.346,99	3977,00		$ -	$ 134.189.778,00	106,25	$ 3.595.572,77			$ -	$ -	106,25	$ 3.595.572,77
	TOTAL ADECUACIONES LOCATIVAS (GENERALES) DEL EDIFICIO CENTRAL				**$ 1.161.724.169,49**			**$ -**	**$ -**		**$ 1.161.724.169,49**						**$ 902.884.469,49**						**$ 699.743.771,06**						**$ 621.444.539,09**						**$ 621.444.539,09**
	REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CIAL - PISO 2																															
1.1.	Demolición muro Drywall incluye la disposición final de los escombros.	m2	260	$ 47.754,00	$ 11.603.500,00			$ -	$ -	260,00	$ 11.603.500,00	7,8898		$ 376.934,28	$ -	267,87	$ 12.309.934,28			$ -	$ -	267,87	$ 12.309.934,28			$ -	$ -	267,87	$ 12.309.934,28			$ -	$ -	267,87	$ 12.309.934,28
1.2.	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique	m2	61	$ 49.324,00	$ 3.008.764,00			$ -	$ -	61,00	$ 3.008.764,00	5,971		$ 294.513,65	$ -	66,97	$ 3.303.277,65			$ -	$ -	66,97	$ 3.303.277,65			$ -	$ -	66,97	$ 3.303.277,65			$ -	$ -	66,97	$ 3.303.277,65
1.3.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte estructuras, retiro y disposición final de escombros	m2	1070	$ 34.224,00	$ 37.689.660,00			$ -	$ -	1070,00	$ 37.689.660,00	327,6224		$ 11.640.227,78	$ -	1397,62	$ 49.329.887,78			$ -	$ -	1397,62	$ 49.329.887,78			$ -	$ -	1397,62	$ 49.329.887,78			$ -	$ -	1397,62	$ 49.329.887,78
1.4.	Desmonte de retiro eléctricos existentes. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	glb	1	$ 12.717.039,00	$ 12.717.039,00			$ -	$ -	1,00	$ 12.717.039,00			$ -	$ -	1,00	$ 12.717.039,00			$ -	$ -	1,00	$ 12.717.039,00			$ -	$ -	1,00	$ 12.717.039,00			$ -	$ -	1,00	$ 12.717.039,00			$ -	$ -	1,00	$ 12.717.039,00
1.5.	Desmonte de puertas de bisagra tales como divisiones sveltiblaa, superficie, siguiente en. Incluye disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	und	135	$ 83.766,00	$ 12.661.110,00			$ -	$ -	135,00	$ 12.661.110,00	46		$ 4.314.196,00	$ -	181,00	$ 16.975.306,00			$ -	$ -	181,00	$ 16.975.306,00			$ -	$ -	181,00	$ 16.975.306,00			$ -	$ -	181,00	$ 16.975.306,00
1.6.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye retroduro, cinta, enlaze. Ataldo cielo.	m2	78	$ 92.676,00	$ 7.228.728,00			$ -	$ -	78,00	$ 7.228.728,00	11,424		$ 1.058.730,62	$ -	89,42	$ 8.287.458,62			$ -	$ -	89,42	$ 8.287.458,62			$ -	$ -	89,42	$ 8.287.458,62			$ -	$ -	89,42	$ 8.287.458,62
2.1.	Suministro e instalación de volanerias metálicas en tubería soldada reforzado de 150mmx450mm, calibre 12 soldado en pintura color negro, incluye tubería soldada a la base y anclajes a placa de piso y retiro de escombros.	mt	100	$ 198.521,00	$ 19.852.100,00			$ -	$ -	100,00	$ 19.852.100,00	36,8		$ 7.305.572,80	$ -	136,80	$ 27.157.672,80			$ -	$ -	136,80	$ 27.157.672,80			$ -	$ -	136,80	$ 27.157.672,80			$ -	$ -	136,80	$ 27.157.672,80
2.2.	Suministro e instalación de riguales metálicas en tubería soldada reforzado de 150mmx450mm, calibre12 soldado en pintura color negro, tomo mate. Incluye soldadura a volanerias y retiro de escombros	mt	130	$ 181.201,00	$ 23.976.630,00			$ -	$ -	130,00	$ 23.976.630,00		6,06	$ -	$ 1.102.614,06	123,92	$ 22.473.515,92			$ -	$ -	123,92	$ 22.473.515,92			$ -	$ -	123,92	$ 22.473.515,92			$ -	$ -	123,92	$ 22.473.515,92
3.1.	Suministro e instalación de muro en Superboard de 8 mm, altura 2.30 m a una cara. Incluye montaura metálica, anclaje, cinta, enlaze y fondeo de superficie para recibir acabados.	m2	93	$ 199.897,00	$ 9.990.910,00			$ -	$ -	50,00	$ 9.990.910,00	8,448		$ 1.687.640,26	$ -	58,45	$ 7.677.992,26			$ -	$ -	58,45	$ 7.677.992,26			$ -	$ -	58,45	$ 7.677.992,26			$ -	$ -	58,45	$ 7.677.992,26
4.1.	Suministro e instalación de volanerias en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, retiros, capa fondeo y pintura. Ataldo cielo.	m2	1301	$ 128.129,00	$ 166.690.429,00			$ -	$ -	1301,00	$ 166.690.429,00	340,68		$ 46.212.126,00	$ -	1641,68	$ 212.902.750,00			$ -	$ -	1641,68	$ 212.902.750,00			$ -	$ -	1641,68	$ 212.902.750,00			$ -	$ -	1641,68	$ 212.902.750,00
4.2.	Suministro e instalación de Retiramo Eco Sin Papel 3 1/2" para volanerias en Drywall. Ataldo cielo.	m2	1301	$ 32.496,00	$ 42.281.196,00			$ -	$ -	1301,00	$ 42.281.196,00	119,09		$ 3.870.306,91	$ -	1420,09	$ 46.151.554,91			$ -	$ -	1420,09	$ 46.151.554,91			$ -	$ -	1420,09	$ 46.151.554,91			$ -	$ -	1420,09	$ 46.151.554,91
5.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 850 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad. Incluye pisotas anchas y perfilaria de acuerdo a las caracteristicas técnicas y el guardamuebles.	m2	1070	$ 189.748,00	$ 203.030.360,00			$ -	$ -	1070,00	$ 203.030.360,00		60,99	$ -	$ 9.999.361,32	1019,01	$ 193.431.058,68			$ -	$ -	1019,01	$ 193.431.058,68			$ -	$ -	1019,01	$ 193.431.058,68			$ -	$ -	1019,01	$ 193.431.058,68
6.1.	Suministro e instalación de aforradores 19*31 Fuser/19*33 Sinder/19*32 Puesta a tierra. Calle de sobre LSHF, AWG. Ataldo cielo, cumpliendo norma RETIE.	mt	2400	$ 19.944,00	$ 47.865.600,00			$ -	$ -	2400,00	$ 47.865.600,00			$ -	$ -	2400,00	$ 47.865.600,00			$ -	$ -	2400,00	$ 47.865.600,00			$ -	$ -	2400,00	$ 47.865.600,00			$ -	$ -	2400,00	$ 47.865.600,00
6.2.	Suministro e instalación de aforradores a tableros en 3N/3S Fuser/19*2/0 Sinder/19*2 Puesta a tierra. Calle de sobre LSHF, AWG. Ataldo cielo, cumpliendo norma RETIE.	mt	200	$ 363.699,00	$ 72.713.800,00			$ -	$ -	200,00	$ 72.713.800,00			$ -	$ -	200,00	$ 72.713.800,00			$ -	$ -	200,00	$ 72.713.800,00			$ -	$ -	200,00	$ 72.713.800,00			$ -	$ -	200,00	$ 72.713.800,00
6.3.	Suministro e instalación de salida de aforrimado 3m green en cable 6x 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4" alrededor de Epoxio, conductores y tomacorriente doble, cumpliendo norma RETIE.	und	240	$ 183.661,00	$ 38.865.840,00			$ -	$ -	240,00	$ 38.865.840,00	70		$ 10.798.370,00	$ -	310,00	$ 47.664.210,00			$ -	$ -	310,00	$ 47.664.210,00			$ -	$ -	310,00	$ 47.664.210,00			$ -	$ -	310,00	$ 47.664.210,00
6.4.	Suministro e instalación de salida interruptor sencillo o doble 3m green en cable 6x 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH40 3/4" alrededor de Epoxio, conductores y tomacorriente. Cumpliendo norma RETIE.	und	60	$ 173.262,00	$ 10.396.920,00			$ -	$ -	60,00	$ 10.396.920,00			$ -	$ -	60,00	$ 10.396.920,00			$ -	$ -	60,00	$ 10.396.920,00			$ -	$ -	60,00	$ 10.396.920,00			$ -	$ -	60,00	$ 10.396.920,00
6.5.	Suministro e instalación de bloques de techo colgado (cielo) estilo cortes 600mm x 600mm, incluye perfilaria de aluminio para su correcto funcionamiento. Largo de el grupo 100mm. Incluye suministro eléctrico y accesorios.	und	82	$ 316.520,00	$ 26.119.640,00			$ -	$ -	82,00	$ 26.119.640,00			$ -	$ -	82,00	$ 26.119.640,00			$ -	$ -	82,00	$ 26.119.640,00			$ -	$ -	82,00	$ 26.119.640,00			$ -	$ -	82,00	$ 26.119.640,00
6.6.	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo avalado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones: diámetro 30 cm. Incluye suministro eléctrico y accesorios.	und	90	$ 224.964,00	$ 20.210.760,00			$ -	$ -	90,00	$ 20.210.760,00	50		$ 11.226.200,00	$ -	140,00	$ 31.436.960,00			$ -	$ -	140,00	$ 31.436.960,00			$ -	$ -	140,00	$ 31.436.960,00			$ -	$ -	140,00	$ 31.436.960,00
6.7.	Suministro e instalación de panel LED de gran formato redondo de 2300, luz neutra 4000K, dimensiones: 1800 mm. Incluye suministro eléctrico y accesorios.	und	7	$ 190.825,00	$ 1.335.775,00			$ -	$ -	7,00	$ 1.335.775,00			$ -	$ -	7,00	$ 1.335.775,00			$ -	$ -	7,00	$ 1.335.775,00			$ -	$ -	7,00	$ 1.335.775,00			$ -	$ -	7,00	$ 1.335.775,00
6.8.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia de aviso de evacuación con autonomia de 90 minutos certificada RETILAP	und	22	$ 178.699,00	$ 3.865.178,00			$ -	$ -	22,00	$ 3.865.178,00			$ -	$ -	22,00	$ 3.865.178,00			$ -	$ -	22,00	$ 3.865.178,00			$ -	$ -	22,00	$ 3.865.178,00			$ -	$ -	22,00	$ 3.865.178,00
6.9.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia de aviso de evacuación con autonomia de 60 minutos certificada RETILAP	und	10	$ 193.008,00	$ 1.930.080,00			$ -	$ -	10,00	$ 1.930.080,00			$ -	$ -	10,00	$ 1.930.080,00			$ -	$ -	10,00	$ 1.930.080,00			$ -	$ -	10,00	$ 1.930.080,00			$ -	$ -	10,00	$ 1.930.080,00
6.10.	Suministro e instalación de salida bemaramente doble polo a tierra (red regulada) 3m green en cable 6x 12 LSHF AWG y tubería PVC SCH40 3/4" alrededor de Epoxio y conductores.	und	43	$ 173.626,00	$ 7.465.018,00			$ -	$ -	43,00	$ 7.465.018,00	40		$ 6.942.240,00	$ -	83,00	$ 14.409.298,00			$ -	$ -	83,00	$ 14.409.298,00			$ -	$ -	83,00	$ 14.409.298,00			$ -	$ -	83,00	$ 14.409.298,00
6.11.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 en 3/4" incluyendo cable solo a en muros. Cumpliendo norma RETIE.	m	300	$ 16.035,00	$ 4.810.500,00			$ -	$ -	300,00	$ 4.810.500,00			$ -	$ -	300,00	$ 4.810.500,00			$ -	$ -	300,00	$ 4.810.500,00			$ -	$ -	300,00	$ 4.810.500,00			$ -	$ -	300,00	$ 4.810.500,00
6.12.	Suministro e instalación de acometividad en tubería conduit EMT en 3" incluyendo cable solo a en muros.	mt	180	$ 169.392,00	$ 27.970.680,00			$ -	$ -	180,00	$ 27.970.680,00			$ -	$ -	180,00	$ 27.970.680,00			$ -	$ -	180,00	$ 27.970.680,00			$ -	$ -	180,00	$ 27.970.680,00			$ -	$ -	180,00	$ 27.970.680,00
6.13.	Suministro e instalación de ducto cerrado de 400ft galvanizado o con pintura electrostática	mt	220	$ 263.415,00	$ 64.550.880,00			$ -	$ -	220,00	$ 64.550.880,00			$ -	$ -	220,00	$ 64.550.880,00			$ -	$ -	220,00	$ 64.550.880,00			$ -	$ -	220,00	$ 64.550.880,00			$ -	$ -	220,00	$ 64.550.880,00
6.14.	Suministro e instalación de tableros de 42 circuitos bifásicos tetrafilar con barraje de neutro, totalizador y barraje neutro y tierra. Incluye totalizador y protectores.	und	2	$ 3.460.342,00	$ 6.920.680,00			$ -	$ -	2,00	$ 6.920.680,00			$ -	$ -	2,00	$ 6.920.680,00			$ -	$ -	2,00	$ 6.920.680,00			$ -	$ -	2,00	$ 6.920.680,00			$ -	$ -	2,00	$ 6.920.680,00
7.1.	Suministro e instalación de Vidrio Templado 8 mm para divisiones de oficina incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento. A todo cielo.	m2	900	$ 832.366,00	$ 249.119.800,00			$ -	$ -	300,00	$ 249.119.800,00		200	$ -	$ 166.079.200,00	100,00	$ 83.039.600,00			$ -	$ -	100,00	$ 83.039.600,00			$ -	$ -	100,00	$ 83.039.600,00			$ -	$ -	100,00	$ 83.039.600,00
7.2.	Suministro e instalación de Puerta en Vidrio Templado 8 mm con Puerta, incluye bisagras cerradura, en aluminio para su correcto funcionamiento a todo cielo.	m2	33	$ 866.323,00	$ 29.689.090,00			$ -	$ -	30,00	$ 29.689.090,00	3,12		$ 2.671.688,36	$ -	33,12	$ 26.360.755,36			$ -	$ -	33,12	$ 26.360.755,36			$ -	$ -	33,12	$ 26.360.755,36			$ -	$ -	33,12	$ 26.360.755,36
7.3.	Suministro e instalación de pelicula de sandblasting mate translucido solido de 1,2 m de ancho a todo cielo de una interior y exterior.	mt	60	$ 80.101,00	$ 5.100.060,00			$ -	$ -	60,00	$ 5.100.060,00	43,4		$ 3.650.365,40	$ -	103,40	$ 8.799.423,40			$ -	$ -	103,40	$ 8.799.423,40			$ -	$ -	103,40	$ 8.799.423,40			$ -	$ -	103,40	$ 8.799.423,40
7.4.	Suministro e instalación de pelicula de sandblasting mate translucido solido de 1,2 m de ancho a todo cielo de una interior, con corte de letras para identificar las oficinas en cielo. A todo cielo.	und	41	$ 139.113,00	$ 5.703.633,00			$ -	$ -	41,00	$ 5.703.633,00		26	$ -	$ 3.616.938,00	15,00	$ 2.086.695,00			$ -	$ -	15,00	$ 2.086.695,00			$ -	$ -	15,00	$ 2.086.695,00			$ -	$ -	15,00	$ 2.086.695,00
8.1.	Suministro e instalación de Puerta en madera enlaminada de 0,90 m de ancho por 2,20 m de alto, incluye marcos, chapa, cerradura y bala lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	1	$ 1.143.439,00	$ 1.143.439,00			$ -	$ -	1,00	$ 1.143.439,00			$ -	$ -	1,00	$ 1.143.439,00			$ -	$ -	1,00	$ 1.143.439,00			$ -	$ -	1,00	$ 1.143.439,00			$ -	$ -	1,00	$ 1.143.439,00
9.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores blancos. Ataldo cielo. Incluye bimetro.	m2	1600	$ 37.789,00	$ 37.789.000,00			$ -	$ -	1000,00	$ 37.789.000,00		66,716	$ -	$ 2.993.194,21	933,28	$ 34.801.801,80			$ -	$ -	933,28	$ 34.801.801,80			$ -	$ -	933,28	$ 34.801.801,80			$ -	$ -	933,28	$ 34.801.801,80
9.2.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos vinilo blanco blanco. Ataldo cielo. Incluye bimetro.	m2	230,61	$ 40.033,00	$ 9.232.010,13			$ -	$ -	230,61	$ 9.232.010,13	1431,07		$ 57.290.529,31	$ -	1661,68	$ 66.522.539,44			$ -	$ -	1661,68	$ 66.522.539,44			$ -	$ -	1661,68	$ 66.522.539,44			$ -	$ -	1661,68	$ 66.522.539,44
	TOTAL REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CIAL - PISO 2				**$ 1.212.934.890,00**			**$ -**	**$ -**		**$ 1.212.934.890,00**						**$ 1.169.187.648,00**						**$ 1.169.187.648,00**						**$ 1.169.187.648,00**						**$ 1.169.187.648,00**
	**ADECUACIONES LOCATIVAS (GENERALES)

| | | |

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO N°0

CONTRATO FNA.140.2024 | OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA - CMA EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. | FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2025

| | | |

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO N°2

CONTRATO FNA.140.2024	OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA - Cra 6L FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2025

| | | |

	PASO ANCHO, DEL NORTE S.A.	
	SOLIDAD MORAL DEL NORTE FT	
CONTRATO FNA-165-2024	**OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y CONTROL DE LA SOCAVACIÓN FASE III LA - CAÑO EL PASO ANCHO, DEL NORTE S.A.**	**FECHA 10/01/2025**

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES CONTRATADAS			PLANOS DE OBRA PT1 (PUNTO DE PLANCHA PT1) DE 2022 AL 2023					PLANOS DE OBRA PT2 (PUNTO DE PLANCHA PT2) DE 2023 AL 2024					PLANOS DE OBRA PT3 DE Septiembre 2024					MALLAZO DE OBRA PT4 DE Octubre 2024					SOLICITUD DE OBRA PT5 DE Noviembre 2024					ADICIONAL DE OBRA PT6 DE Diciembre 2024					PLANOS DE OBRA PT7 DE Enero 2025				
			Cantidad	Vr Unitario	Vr Total	CANTIDADES		VALORES			CANTIDADES		VALORES			CANTIDADES		VALORES			CANTIDADES		VALORES			CANTIDADES		VALORES			CANTIDADES		VALORES			CANTIDADES		VALORES		
						Ejecutado +	Ejecutar =	Ejecutado +	Ejecutar =	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

MALLAS GENERAL DEL EMPUJE PTE

CONTRATO TRA- 194-2024 | **PARTE DEL CONTRATO** | **REALIZAR LAS INTERVENCIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA - UNA EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.** | **FECHA** | **DIVISIÓN**

| | | |

	FONDO NACIONAL DE AHORRO S.A.	
	RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA - CELL 4	
CONTRATO TMA 109-2022	RELLENO SANITARIO LOCATIONS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ... VIAL EL PARQUE NACIONAL DEL AHORRO S.A.	FECHA: 6/06/2022

| ITEM | DESCRIPCION | UD | CANTIDAD CONTRACTUAL | | |

| | | |

| | | |

INGEBYP SAS

NIT : 830,121,507 - 2
CRA 68D No 25B-86
BOGOTA - COLOMBIA
7561194 5717946
ingebypltda@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4290 Tarifa 7,36

Cliente	FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA.		
NIT	899,999,284 - 4	**Vendedor**	
Dirección	CARRERA 65 No 11 83	**Teléfono**	6013077070
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	100
Correo	facturacionelectronica@fna.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INB 258

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-06-25	14:46:14
Expedición	2025-06-25	14:52:11
Vencimiento	2025-07-25	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4130101000	ACTA PARCIAL No 01 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2025 CONTRATO DE OBRA FNA-166-2024 que tiene por objeto ?REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." "		0.00	0.00	399,961,521.37
2	4130101000	ADMINISTRACION 12%		0.00	0.00	47,995,382.56
3	4130101000	IMPREVISTOS 3%		0.00	0.00	11,998,845.64
4	4130100100	UTLIDAD 7%		0.00	0.00	27,997,306.49

Total Items 4

Total Bruto		487,953,056.06
IVA 19%	**19%**	5,319,488.23
Total a Pagar		**$ 493.272.544,29**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito 30 Dias Efectivo Cuota 1 F - 002- 258 Vence el 2025-07-25 493.272.544,29

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Noventa Y Tres Millones Doscientos Setenta Y Dos Mil Quinientos Cuarenta Y Cuatro Pesos Mcte Con 29/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : LUZ AIDA MARQUI

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764092637655 **aprobado en** 2025-04-30 **hasta el** 2026-04-25, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** INB **desde el número** 252 **al** 500

CUFE :23814de8755e6ec449c489ae9c6e3f390d5021e5813cd85fc709f0023bf55922a9b287d0f71d643adaaace04120d385d

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INGEBYP SAS

NIT : 830,121,507 - 2
CRA 68D No 25B-86
BOGOTA - COLOMBIA
7561194 5717946
ingebypltda@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4290 Tarifa 7,60

FACTURA PROFORMA
INB 016

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-05-16	14:02:47
Expedición	2025-05-16	14:04:02
Vencimiento	2025-05-16	

Cliente	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
NIT	899,999,284 - 2	**Teléfono**	6013077070
Dirección	CARRERA 65 No 11 83	**Vendedor**	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	100
Correo			

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4130101000	ACTA PARCIAL No 01 DEL 07 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2025 CONTRATO DE OBRA FNA-166-2024 que tiene por objeto “REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.” "		0.00	0.00	363.601.383,00
2	4130101000	BOLSA DE ITEMS NO IMPREVISTOS 10%		0.00	0.00	36.360.138,30
3	4130100100	ADMINISTRACION 12%		0.00	0.00	47.995.383,00
4	4130100100	IMPREVISTOS 3%		0.00	0.00	11.998.846,00
5	4130100100	UTLIDAD 7%		0.00	0.00	27.997.306,00
6	24080502	IVA SOBRE LA UTILIDAD				5.319.488,00

Total Items

Total Bruto	487.953.056,30
IVA 19%	5.319.488,00
Total a Pagar	**$493.272.544,30**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito 30 Dias Efectivo Cuota 1 FP - 002-016 Vence el 2025-05-16 493.272.544,30

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos noventa y tres millones doscientos setenta y dos mil quinientos cuarenta y cuatro pesos con 30 centavos m/cte.

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : LUZ AIDA MARQUI

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764092637655 **aprobado en** 2025-04-30 **hasta el** 2026-04-30 , **vigencia** 12 Meses, **prefijo** INB **desde el número** 216 **al** 500

CUFE :a946a27096da2fbc40338b5830a9b8e47f8d96c79855c7d9075762a406c7f8ac6252c78406be17696a4942b6fce55720

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INGEBYP SAS

NIT : 830,121,507 - 2
CRA 68D No 25B-86
BOGOTA - COLOMBIA
7561194 5717946
ingebypltda@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4290 Tarifa 7,60

FACTURA PROFORMA
INB 018

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-07-30	14:02:47
Expedición	2025-07-30	14:04:02
Vencimiento	2025-07-30	

Cliente	FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA.		
NIT	899,999,284 - 4	**Teléfono**	6013077070
Dirección	CARRERA 65 No 11 83	**Vendedor**	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	100
Correo			

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4130101000	ACTA PARCIAL No 02 DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025 CONTRATO DE OBRA FNA-166-2024 que tiene por objeto “REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.” "		0.00	0.00	102.051.341,00
3	4130100100	ADMINISTRACION 12%		0.00	0.00	12.246.160,92
4	4130100100	IMPREVISTOS 3%		0.00	0.00	3.061.540,23
5	4130100100	UTLIDAD 7%		0.00	0.00	7.143.593,87
6	24080502	IVA SOBRE LA UTILIDAD				1.357.282,84

Total Items

Total Bruto	124.502.636,16
IVA 19%	1.357.282,84
Total a Pagar	**$125.859.919,00**

FORMA DE PAGO Credito — Credito 30 Dias

MEDIO DE PAGO Efectivo — Cuota 1 FP - 002-018 Vence el 2025-07-30 — 125.859.919,00

VALOR EN LETRAS

Ciento veinticinco millones ochocientos cincuenta y nueve mil novecientos diecinueve pesos m/cte.

OBSERVACIONES

Vista

Firma Elaborado por : LUZ AIDA MARQUI

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764092637655 **aprobado en** 2025-04-30 **hasta el** 2026-04-30 , **vigencia** 12 Meses, **prefijo** INB **desde el número** 216 **al** 500

CUFE :a946a27096da2fbc40338b5830a9b8e47f8d96c79855c7d9075762a406c7f8ac6252c78406be17696a4942b6fce55720

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INGEBYP SAS

NIT : 830,121,507 - 2
CRA 68D No 25B-86
BOGOTA - COLOMBIA
7561194 5717946
ingebypltda@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4290 Tarifa 7,36

Cliente	FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA.		
NIT	899,999,284 - 4	**Vendedor**	
Dirección	CARRERA 65 No 11 83	**Teléfono**	6013077070
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1.105
Correo	facturacionelectronica@fna.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INB 269

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-22	09:36:29
Expedición	2025-09-22	09:36:53
Vencimiento	2025-10-22	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4130101000	ACTA PARCIAL No 02 DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025 CONTRATO DE OBRA FNA-166-2024 que tiene por objeto ?REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." Números de aceptacion: 1000057663-1000057664.		0.00	0.00	102,051,341.00
2	4130101000	ADMINISTRACION 12%		0.00	0.00	12,246,160.92
3	4130101000	IMPREVISTOS 3%		0.00	0.00	3,061,540.23
4	4130100100	UTILIDAD 7%		0.00	0.00	7,143,593.87

Total Items 4

Total Bruto		124,502,636.02
IVA 19%	**19%**	1,357,282.84
Total a Pagar		**$ 125.859.918,86**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito 30 Dias Efectivo Cuota 1 F - 002- 269 Vence el 2025-10-22 125.859.918,86

VALOR EN LETRAS

Ciento Veinticinco Millones Ochocientos Cincuenta Y Nueve Mil Novecientos Dieciocho Pesos Mcte Con 86/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : LUZ AIDA MARQUI

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764092637655 **aprobado en** 2025-04-30 **hasta el** 2026-04-25, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** INB **desde el número** 252 **al** 500

CUFE :b2e53e8f9d9743916c298539e37a41937c4a8b66b72f0321c79e28ee0b312e4ac603bfafa5b55e56808fa18f4977be59

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INGEBYP SAS

NIT : 830,121,507 - 2
CRA 68D No 25B-86
BOGOTA - COLOMBIA
7561194 5717946
ingebypltda@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4290 Tarifa 7,36

Cliente	FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA.		
NIT	899,999,284 - 4	**Vendedor**	
Dirección	CARRERA 65 No 11 83	**Teléfono**	6013077070
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1.105
Correo	facturacionelectronica@fna.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INB 270

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-25	12:13:15
Expedición	2025-09-25	12:14:30
Vencimiento	2025-10-25	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4130101000	ACTA PARCIAL No 03 DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CONTRATO DE OBRA FNA-166-2024 que tiene por objeto ?REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." Numeros de Aceptacion 1000057803 y 1000057804.		0.00	0.00	185,989,734.00
2	4130100100	ADMINISTRACION 12%		0.00	0.00	22,318,768.08
3	4130101000	IMPREVISTOS 3%		0.00	0.00	5,579,692.02
4	4130100100	UTLIDAD 7%		0.00	0.00	13,019,281.38

Total Items 4

Total Bruto		226,907,475.48
IVA 19%	**19%**	2,473,663.46
Total a Pagar		**$ 229.381.138,94**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito 30 Dias Efectivo Cuota 1 F - 002- 270 Vence el 2025-10-25 229.381.138,94

VALOR EN LETRAS

Doscientos Veintinueve Millones Trescientos Ochenta Y Un Mil Ciento Treinta Y Ocho Pesos Mcte Con 94/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : LUZ AIDA MARQUI

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764092637655 **aprobado en** 2025-04-30 **hasta el** 2026-04-25, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** INB **desde el número** 252 **al** 500

CUFE :c64f0d7921859ac20b0c990e939ec81afe06afa09ceacece938915f9e6ee68c7206f253b2ff8977a2005a4a2ff66290e

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



INGEBYP SAS

NIT : 830,121,507 - 2
CRA 68D No 25B-86
BOGOTA - COLOMBIA
7561194 5717946
ingebypltda@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4290 Tarifa 7,36

Cliente	FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA.		
NIT	899,999,284 - 4	**Vendedor**	
Dirección	CARRERA 65 No 11 83	**Teléfono**	6013077070
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1.105
Correo	facturacionelectronica@fna.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INB 274

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-02	14:24:13
Expedición	2025-12-02	14:25:08
Vencimiento	2026-01-01	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4130101000	ACTA PARCIAL No 04 DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONTRATO DE OBRA FNA-166-2024 que tiene por objeto ?REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." Numeros de aprobacion 1000058659,1000058661,1000058663,1000058664		0.00	0.00	236,145,460.00
2	4130101000	ADMINISTRACION 12%		0.00	0.00	28,337,455.20
3	4130101000	IMPREVISTOS 3%		0.00	0.00	7,084,363.80
4	4130100100	UTLIDAD 7%		0.00	0.00	16,530,182.20

Total Items 4

Total Bruto		288,097,461.20
IVA 19%	**19%**	3,140,734.62
Total a Pagar		**$ 291.238.195,82**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito 30 Dias Efectivo Cuota 1 F - 002- 275 Vence el 2026-01-01 291.238.195,82

VALOR EN LETRAS

Doscientos Noventa Y Un Millones Doscientos Treinta Y Ocho Mil Ciento Noventa Y Cinco Pesos Mcte Con 82/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : LUIS ENRIQUE FE

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764092637655 **aprobado en** 2025-04-30 **hasta el** 2026-04-25, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** INB **desde el número** 252 **al** 500

CUFE :428837dbc40c198973260142b480e90392aa988d2d60e96089cc29401c12defaacafa50c191d01e3e08f021a8f03ebc9

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



INGEBYP SAS

NIT : 830,121,507 - 2
CRA 68D No 25B-86
BOGOTA - COLOMBIA
7561194 5717946
ingebypltda@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4290 Tarifa 7,36

Cliente	FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA.		
NIT	899,999,284 - 4	**Vendedor**	
Dirección	CARRERA 65 No 11 83	**Teléfono**	6013077070
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1.105
Correo	facturacionelectronica@fna.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INB 280

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-15	12:06:18
Expedición	2025-12-15	16:58:17
Vencimiento	2026-01-15	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4130101000	ACTA PARCIAL No 05 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 CONTRATO DE OBRA FNA-166-2024 que tiene por objeto ?REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." Numeros de Aprobacion 1000058880,1000058882,1000058884,1000058885,1000058886,1000058887.		0.00	0.00	590,529,172.18
2	4130101000	ADMINISTRACION 12%		0.00	0.00	70,863,500.66
3	4130101000	IMPREVISTOS 3%		0.00	0.00	17,715,875.17
4	4130100100	UTLIDAD 7%		0.00	0.00	41,337,042.05

Total Items 4

Total Bruto		720,445,590.06
IVA 19%	**19%**	7,854,037.99
Total a Pagar		**$ 728.299.628,05**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito 30 Dias Efectivo Cuota 1 F - 002- 280 Vence el 2026-01-15 728.299.628,05

VALOR EN LETRAS

Setecientos Veintiocho Millones Doscientos Noventa Y Nueve Mil Seiscientos Veintiocho Pesos Mcte Con 05/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : LUZ AIDA MARQUI

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764092637655 **aprobado en** 2025-04-30 **hasta el** 2026-04-25, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** INB **desde el número** 252 **al** 500

CUFE :b928b7b3fb818f6f4cbda5015ae0e620e9130738e18619c6e4e78298ab5a96c5c3652a818a16a3d3fdff20cba91b28ec

COPIA

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



INGEBYP SAS

NIT : 830,121,507 - 2
CRA 68D No 25B-86
BOGOTA - COLOMBIA
7561194 5717946
ingebypltda@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4290 Tarifa 7,36

Cliente	FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA.		
NIT	899,999,284 - 4	**Vendedor**	
Dirección	CARRERA 65 No 11 83	**Teléfono**	6013077070
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1.105
Correo	facturacionelectronica@fna.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INB 293

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-12	15:37:17
Expedición	2026-02-12	15:37:38
Vencimiento	2026-03-12	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4130101000	ACTA PARCIAL No 06 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONTRATO DE OBRA FNA-166-2024 que tiene por objeto REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." Numeros de aprobacion 1000059777,1000059778		0.00	0.00	131,159,235.65
2	4130101000	ADMINISTRACION 12%		0.00	0.00	15,739,108.28
3	4130101000	IMPREVISTOS 3%		0.00	0.00	3,934,777.07
4	4130100100	UTLIDAD 7%		0.00	0.00	9,181,146.50

Total Items 4

Total Bruto		160,014,267.50
IVA 19%	**19%**	1,744,417.84
Total a Pagar		**$ 161.758.685,34**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito 30 Dias Efectivo Cuota 1 F - 002- 293 Vence el 2026-03-12 161.758.685,34

VALOR EN LETRAS

Ciento Sesenta Y Un Millones Setecientos Cincuenta Y Ocho Mil Seiscientos Ochenta Y Cinco Pesos Mcte Con 34/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : LUZ AIDA MARQUI

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764092637655 **aprobado en** 2025-04-30 **hasta el** 2026-04-25, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** INB **desde el número** 252 **al** 500

CUFE :1bab6650ebe1c9dccf11a235ab021ff8f39c311ba71fc70ae47ed760811c7191e33f1a6ea01b54f6727e5ddc686ff634

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INGEBYP SAS

NIT : 830,121,507 - 2
CRA 68D No 25B-86
BOGOTA - COLOMBIA
7561194 5717946
ingebypltda@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4290 Tarifa 7,36

Cliente	FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA.		
NIT	899,999,284 - 4	**Vendedor**	
Dirección	CARRERA 65 No 11 83	**Teléfono**	6013077070
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1.105
Correo	facturacionelectronica@fna.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INB 295

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-03-17	14:18:41
Expedición	2026-03-17	14:18:52
Vencimiento	2026-04-17	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4130101000	ACTA PARCIAL No 07 DEL 01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025 CONTRATO DE OBRA FNA-166-2024 que tiene por objeto REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." Numeros de aceptacion 1000060244-1000060245-1000060246-1000060247		0.00	0.00	253,971,787.90
2	4130101000	ADMINISTRACION 12%		0.00	0.00	30,476,614.55
3	4130101000	IMPREVISTOS 3%		0.00	0.00	7,619,153.64
4	4130100100	UTLIDAD 7%		0.00	0.00	17,778,025.15

Total Items 4

Total Bruto		309,845,581.24
IVA 19%	**19%**	3,377,824.78
Total a Pagar		**$ 313.223.406,02**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito 30 Dias Efectivo Cuota 1 F - 002- 295 Vence el 2026-04-17 313.223.406,02

VALOR EN LETRAS

Trescientos Trece Millones Doscientos Veintitres Mil Cuatrocientos Seis Pesos Mcte Con 02/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : LUZ AIDA MARQUI

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764092637655 **aprobado en** 2025-04-30 **hasta el** 2026-04-25, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** INB **desde el número** 252 **al** 500

CUFE :0cf53350b3cfa3f65b2983ae4ac296f2406adeafc4afdac62aea07b1cca4ea0952fbf042cb26c041fd3d0b438f4889e3

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INGEBYP SAS

NIT : 830,121,507 - 2
CRA 68D No 25B-86
BOGOTA - COLOMBIA
7561194 5717946
ingebypltda@gmail.com

Cliente	FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA.		
NIT	899,999,284 - 4	**Vendedor**	
Dirección	CARRERA 65 No 11 83	**Teléfono**	6013077070
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1.105
Correo	facturacionelectronica@fna.gov.co		

FACTURA PROFORMA
INB 303
Fecha
2026-02-23

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4130101000	ACTA PARCIAL No 07 DEL 01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025 CONTRATO DE OBRA FNA-166-2024 que tiene por objeto ?REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." "		0.00	0.00	253,971.787.90
2	4130101000	ADMINISTRACION 12%		0.00	0.00	30,476.614.55
3	4130101000	IMPREVISTOS 3%		0.00	0.00	7,619.153.64
4	4130100100	UTLIDAD 7%		0.00	0.00	17,778.025.15

Total Items 4

Total Bruto		309,845,581.24
IVA 19%	**19%**	3,377,824.78
Total a Pagar		**$ 313.223.406.02**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito 30 Dias Efectivo Cuota 1 F - 002- 275 Vence el 2026-02-23 313.223.406,02

VALOR EN LETRAS

Trescientos trece millones doscientos veinte tres mil cuatrocientos seis pesos con dos centavos m/cte.

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : LUZ AIDA MARQUI

Firma Recibido

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Este es un borrador de la factura para fines informativos, no reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

COPIA

INGEBYP SAS

NIT : 830,121,507 - 2
CRA 68D No 25B-86
BOGOTA - COLOMBIA
7561194 5717946
ingebypltda@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4290 Tarifa 7,36

Cliente	FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA.		
NIT	899,999,284 - 4	**Vendedor**	
Dirección	CARRERA 65 No 11 83	**Teléfono**	6013077070
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1.105
Correo	facturacionelectronica@fna.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INB 301

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-15	17:07:59
Expedición	2026-05-15	17:08:10
Vencimiento	2026-06-15	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4130101000	ACTA PARCIAL No 08 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026 CONTRATO DE OBRA FNA-166-2024 que tiene por objeto REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." Numeros de aceptacion 1000061210-1000061211-1000061212-1000061205-1000061206-1000061209		0.00	0.00	533,554,914.39
2	4130101000	ADMINISTRACION 12%		0.00	0.00	64,026,589.77
3	4130101000	IMPREVISTOS 3%		0.00	0.00	16,006,647.44
4	4130100100	UTLIDAD 7%		0.00	0.00	37,348,844.03

Total Items 4

Total Bruto		650,936,995.63
IVA 19%	**19%**	7,096,280.37
Total a Pagar		**$ 658.033.276,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito 30 Dias Efectivo Cuota 1 F - 002- 301 Vence el 2026-06-15 658.033.276,00

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Cincuenta Y Ocho Millones Treinta Y Tres Mil Doscientos Setenta Y Seis Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : LUIS ENRIQUE FE

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764109846529 **aprobado en** 2026-05-15 **hasta el** 2027-05-15, **vigencia** 1 Años, **prefijo** INB **desde el número** 301 **al** 500

CUFE :7ebfebfcb1ce9dc378d9ece1a554389add0a7197fc0887f81808bb35421885cedeb25feb5db42057ecb1d307b102b2e9

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



INGEBYP SAS

NIT : 830,121,507 - 2
CRA 68D No 25B-86
BOGOTA - COLOMBIA
7561194 5717946
ingebypltda@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4290 Tarifa 7,36

Cliente	FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA.		
NIT	899,999,284 - 4	**Vendedor**	
Dirección	CARRERA 65 No 11 83	**Teléfono**	6013077070
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1.105
Correo	facturacionelectronica@fna.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INB 303

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-19	16:53:08
Expedición	2026-06-19	16:53:18
Vencimiento	2026-07-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4130101000	ACTA PARCIAL No 09 DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026 CONTRATO DE OBRA FNA-166-2024 que tiene por objeto ?REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." Numeros de aceptacion: 1000061707,1000061705,1000061706		0.00	0.00	169,431,826.73
2	4130101000	ADMINISTRACION 12%		0.00	0.00	20,331,819.21
3	4130101000	IMPREVISTOS 3%		0.00	0.00	5,082,954.80
4	4130100100	UTLIDAD 7%		0.00	0.00	11,860,227.87

Total Items 4

Total Bruto		206,706,828.61
IVA 19%	**19%**	2,253,443.30
Total a Pagar		**$ 208.960.271,91**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito 30 Dias Efectivo Cuota 1 F - 002- 303 Vence el 2026-07-19 208.960.271,91

VALOR EN LETRAS

Doscientos Ocho Millones Novecientos Sesenta Mil Doscientos Setenta Y Un Pesos Mcte Con 91/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : LUZ AIDA MARQUI

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764109846529 **aprobado en** 2026-05-15 **hasta el** 2027-05-15, **vigencia** 1 Años, **prefijo** INB **desde el número** 301 **al** 500

CUFE :8a1df01048920cc2973040487084c18fcbf3dac28db054a951d22b57e44a051fbd370be3aeb642f959742ff10bea7ea8

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INGEBYP SAS

NIT : 830,121,507 - 2
CRA 68D No 25B-86
BOGOTA - COLOMBIA
7561194 5717946
ingebypltda@gmail.com

Cliente	FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA.		
NIT	899,999,284 - 4	**Vendedor**	
Dirección	CARRERA 65 No 11 83	**Teléfono**	6013077070
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1.105
Correo	facturacionelectronica@fna.gov.co		

FACTURA PROFORMA
INB 32
Fecha
2026-06-19

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4130101000	ACTA PARCIAL No 10 DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026 CONTRATO DE OBRA FNA-166-2024 que tiene por objeto ?REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." "		0.00	0.00	972,976.518.01
2	4130101000	ADMINISTRACION 12%		0.00	0.00	116,757.182.16
3	4130101000	IMPREVISTOS 3%		0.00	0.00	29,189.295.54
4	4130100100	UTLIDAD 7%		0.00	0.00	68,108.356.26

Total Items 4

Total Bruto		1.187.031,351.97
IVA 19%	**19%**	12,940,587.69
Total a Pagar		**$ 1.199.971.940.00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito 30 Dias Efectivo Cuota 1 F - 002- 275 Vence el 2026-06-19 1.199.971.940,0

VALOR EN LETRAS

Mil ciento noventa y nueve millones novecientos setenta y un mil novecientos cuarenta pesos m/cte.

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : LUZ AIDA MARQUI

Firma Recibido

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Este es un borrador de la factura para fines informativos, no reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

COPIA

BioDecco

Nit: 900965653-5

02-4801-202506110737083
Fecha 11/06/2025 10:50:31 a. m. | Usuario esierraj
Remitente BIODECCO
Área o dependencia 1 14 1 Gerencia Administrativa
Numero de folios 2

Bogotá, 11 de jun de 2025.

Doctora
VANNESA PACHECO GOMEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA FNA
Supervisora
Ciudad

FNA-INTV-022-2025-066

REFERENCIA: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL) PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."

ASUNTO: 066- TEC-INT-022-2025-APROBACIÓN Y RECOMENDACIÓN ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS N°1

Teniendo en cuenta que la empresa **CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE SAS** se encuentra a cargo de la interventoría del contrato **FNA-166-2024** cuyo objeto es: **"Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A."**

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y en atención al comunicado con asunto **"MODIFICACIÓN ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS - ACTIVIDADES NO PREVISTAS - GRUPO I"**, remitido por el contratista de obra **INGEBYP S.A.S.**, nos permitimos **aprobar y recomendar la aprobación del Acta de Fijación de Precios N.º 1**, junto con los anexos que la acompañan (APU de las obras no previstas del ítem 1 al 18 y balance de obra). Esta aprobación se sustenta en la verificación técnica, administrativa y financiera realizada, así como en las necesidades identificadas para el correcto y normal desarrollo de las actividades en el marco del contrato de obra 166 de 2024.

Adicionalmente, se **avala el retiro del ítem no previsto (NP)** correspondiente a la inclusión de la poliurea **como método de impermeabilización** en dicha acta, considerando las conclusiones de las mesas de trabajo y reuniones sostenidas entre las partes involucradas (contratista de obra, interventoría y supervisión designada por la Entidad contratante). Desde los componentes administrativos y financieros, no se considera viable su inclusión debido a la afectación presupuestal que esto implicaría, de acuerdo con lo establecido en **la cláusula 7 "FORMA DE PAGO"**, parágrafo 6 del contrato, que indica:

(...)

"Parágrafo 6: Las reparaciones locativas se pagarán conforme a la oferta económica del contrato. En caso de que alguna actividad o elemento no se encuentre en la oferta económica, la interventoría y/o la supervisión designada por el Fondo Nacional del Ahorro S.A. solicitará cotización del producto o servicio a dos (2) empresas del sector y solicitará una (1) cotización al contratista, a fin de que la entidad realice el comparativo del mercado, y se pagará el precio descrito en la cotización de menor valor. ***Por lo tanto, el contratista estará obligado a prestar el servicio o a suministrar el elemento conforme al valor aprobado, el cual será pagado con cargo a la bolsa de ítems no previstos."***

Powered by CamScanner

BioDecco Holding

Nit: 900965653-5

Dado lo anterior, **la inclusión de este único ítem consumiría la totalidad de la bolsa destinada a actividades no previstas,** lo que no solo impediría la inclusión de otros NP necesarios y prioritarios para la Entidad, sino que además generaría un **desbalance presupuestal** dentro del contrato.

Por lo tanto, se resuelve continuar con el **método de impermeabilización contractual originalmente establecido**, y se procede con la **recomendación de los 18 ítems no previstos incluidos en el Acta de Fijación de Precios Unitarios N.º 1.**

Sin otro particular, quedamos atentos a sus comentarios.

RICARDO MORENO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. – BIODECCO SAS
Proyectó: JLNA

Ing. Edgar Enrique Espitia – Apoyo de la supervisión
eespitia@fna.gov.co

Powered by CamScanner

Bogotá D.C. 06 de junio de 2025

Señores
CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC
BIODECCO
Cl 57 6 - 18 Of 201
ING. Agustín Muñoz
Interventoría del Contrato

OFC. No. FNA-166-2024-119

Referencia: Contrato FNA-166-2024 que tiene por objeto "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A." ".

ASUNTO: MODIFICACIÓN ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS - ACTIVIDADES NO PREVISTAS - GRUPO I

Estimados señores,

En atención al asunto de referencia, nos permitimos remitir la documentación correspondiente, en el marco del cumplimiento del Contrato No. FNA-166-2024, relacionado con el proyecto **"Reparaciones locativas de la infraestructura física de la sede principal CNA del Fondo Nacional del Ahorro"**, en observancia de los requisitos contractuales y normativos vigentes.

La presente documentación se entrega en desarrollo del **comunicado sobre la Modificación del Acta de Fijación de Precios – Actividades No Previstas – Grupo I**, de conformidad con lo solicitado durante la reunión del Comité de Obra llevada a cabo el día **03 de junio de 2025**.

Adjuntamos los siguientes documentos:

1. APUS Actividades No Previstas Grupo I

Ítem	Descripción
NP - 01	Demolición placa maciza 0.15 mt en horarios autorizado por la entidad (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).
NP - 02	Suministro e instalación de mortero premezclado de nivelación bombeable, acelerado a 7 días con baja permeabilidad para zona de cubiertas, garantizando pendientes de desagües hacia los sifones.
NP - 03	Demolición baldosa muro en horarios autorizados por la ENTIDAD (incluye retiro de material desde frente de obra al sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).

ELABORO APROBÓ

NP - 04	Baldosa cerámica pared 30x60.
NP - 05	Baldosa cerámica piso 60x60.
NP - 06	Suministro e instalación de cinta led en parte baja de gabinete superior de mueble de cocina.
NP - 07	Desmonte y reinstalación de rejillas de extracción aire en cocina presidencia.
NP - 08	Desmonte redes eléctricas existentes, Incluye la disposición final fondo Nacional del Ahorro indique. (Zona de recepción).
NP - 09	Demolición de guardaescoba, (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).
NP - 10	Desmonte espejo.
NP - 11	Desmonte de cubierta en policarbonato.
NP - 12	Suministro e instalación de Policarbonato alveolar 8 mm para cubierta curva, incluye conectores y accesorios para su correcta instalación. No incluye estructura de soporte.
NP - 13	Mantenimiento marquesina cubierta de vidrio acceso, incluye: Revisión general, limpieza perimetral y limpieza de vidrios.
NP - 14	Lavado e hidrofugado de fachadas, muros en piedra y/o acabado abuzardado
NP - 15	Suministro e instalación de revestimiento interior de fachada en WPC Panel Casino, de acuerdo a muestra seleccionada.
NP - 16	Desmonte de aparatos sanitarios (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio (hasta 50 m) y desde sitio de acopio a escombrera).
NP - 17	Desmonte de muro fachada imitación madera (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera)
NP - 18	Suministro e instalación de sensor de presencia Infrarrojo 360° de cobertura, montaje en techo, detección de movimiento hasta 4 metros radiales a una altura de instalación de 2.4 metros.

1. ***Acta de Fijación de Precios***
2. ***Acta de Mayores y Menores Cantidades***

Agradecemos confirmar la recepción de los documentos enviados y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

Ing. Msc JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
Representante Legal INGEBYP S.A.S.

ELABORO APROBÓ

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

CONTRATO No. FNA - 166 - 2024

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No.1

CONTRATO DE OBRA N° 166 **DE** 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."

CONTRATISTA INGEBYP S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 022 DE 2025

INTERVENTOR BIODECCO S.A.S.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA VANESSA PACHECO GÓMEZ

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Aproximada	Costo directo
NP - 01	Demolición placa maciza 0.15 mt en horarios autorizado por la entidad (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	m2	56.00	$ 49,331
NP - 02	Suministro e instalación de mortero premezclado de nivelación bombeable, acelerado a 7 dias con baja permeabilidad para zona de cubiertas, garantizando pendientes de desagues hacia los sifones.	m2	1,805.00	$ 104,277
NP - 03	Demolición baldosa muro en horarios autorizados por la ENTIDAD (incluye retiro de material desde frente de obra al sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	m2	225.00	$ 27,952
NP - 04	Baldosa ceramica pared 30x60.	m2	105.00	$ 142,571
NP - 05	Baldosa ceramica piso 60x60.	m2	150.00	$ 154,546
NP - 06	Suministro e instalacion de cinta led en parte baja de gabinete superior de mueble de cocina.	und	1.00	$ 260,334
NP - 07	Desmonte y reinstalacion de rejillas de extraccion aire en cocina presidencia.	und	8.00	$ 45,000
NP - 08	Desmonte redes eléctricas existentes, Incluye la disposición final fondo Nacional del Ahorro indique. (Zona de recepcion).	glb	1.00	$ 930,686
NP - 09	Demolición de guardaescoba, (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	ml	120.00	$ 14,785
NP - 10	Desmonte espejo.	und	10.00	$ 23,790
NP - 11	Desmonte de cubierta en policarbonato.	m2	35.00	$ 52,335
NP - 12	Suministro e instalación de Policarbonato alveolar 8 mm para cubierta curva, incluye conectores y accesorios para su correcta instalación. No incluye estructura de soporte.	m2	25.00	$ 443,800
NP - 13	Mantenimiento marquesina cubierta de vidrio acceso, incluye: Revisión general, limpieza perimetral y limpieza de vidrios.	m2	45.00	$ 58,150
NP - 14	Lavado e hidrofugado de fachadas, muros en piedra y/o acabado abuzardado	m2	232.00	$ 51,032
NP - 15	Suministro e instalacion de revestimiento interior de fachada en WPC Panel Casino, de acuerdo a muestra seleccionada.	m2	50.00	$ 249,987

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

NP - 16	Desmonte de aparatos sanitarios (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio (hasta 50 m) y desde sitio de acopio a escombrera).	und	50.00	$ 40,607
NP - 17	Desmonte de muro fachada imitacion madera (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera)	m2	12.00	$ 16,161
NP - 18	Suministro e instalación de sensor de presencia Infrarrojo 360° de cobertura, montaje en techo, detección de movimiento hasta 4 metros radiales a una altura de instalación de 2.4 metros.	und	20.00	$ 210,035

Se anexa y hace parte de la presente acta, el cuadro de revisión de precios de acuerdo con lo establecido en el contrato anteriormente mencionado y el análisis de precios unitarios

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

TRES (3) días del mes de **Junio** de **2025**

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) ING JEFFERSON O. BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL
INGEBYP S.A.S.
Contratista de obra

(Firma)

(Nombre) ING RICARDO MORENO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
BIODECCO S.A.S.
Interventor

(Firma)

(Nombre) VANESSA PACHECO GÓMEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SUPERVISIÓN CTO 022 DE 2025
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

CONTRATO No. FNA - 166 - 2024

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No.2

CONTRATO DE OBRA N° 166 **DE** 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."

CONTRATISTA INGEBYP S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 022 DE 2025

INTERVENTOR BIODECCO S.A.S.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA VANESSA PACHECO GÓMEZ

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Aproximada	Costo directo
NP - 19	Suministro e instalación de enceres mobiles de inferior 220 X 90 X 63 y superior de 200X76X35 incluye campana extractora, puertas, manijas en acero tabular, bisagras de parche, entrepaños, patas de 8 cm y manija en acero tubular. Modulo torre hornos de 200 X 60 X 60 con dos puertas parte alta y dos cajones parte baja central para horno. Tapa barra de 130 x 50 con patas en acero de 100 cm y anclaje a la pared. Todo elaborado en melamina de 15mm, color arena o glacial fabricado e instalado.	UND	1,00	$ 12.900.000,00
NP - 20	Mesón en quartzone blanco polar con hueco para estufa y lavaplatos, incluye pulida, poceta, salpicadero 8 cm y estufa x 4 puestos challenger para uso con gas propano.	UND	1,00	$ 6.850.000,00
NP - 21	Suministro e instalación punto de gas propano para estufa de presidencia, en tuberia pe al pe de 1/2" , con coraza de protección a la vista y accesorios de conexión con pases por muros. incluye suministro de 2 cilindros de 100 libras en gas propano, con valvula reguladora para cada cilindro, base (poyo) soporte para cilindros y caja metalica de protección de cilindros para la intemperie.	GLB	1,00	$ 6.155.883,00
NP - 22	Suministro e instalacion registro 1/2" agua potable	UND	4,00	$ 89.688,00
NP - 23	Jardineras artificiales de acuerdo a render incluye amarre plastico	ML	20,00	$ 141.213,00
NP - 24	Suministro e instalacion de extractor para cocina y baños (16 x 16 x 9 cm)	UND	1,00	$ 196.410,00
NP - 25	Demolicion de meson en grano de marmol de ventanilla bancolombia	UND	1,00	$ 89.351,00
NP - 26	Desmonte de aviso de fachada en recepción	UND	1,00	$ 283.054,00
NP - 27	Suministro e instalación de sanitario blanco institucional tipo adriatica o similar de entrada posterior no incluye pusch	UND	20,00	$ 1.146.999,00
NP - 28	Suministro e instalación lavamanos blanco tipo cascada de baru o similar, no incluye griferia no incluye push	UND	12,00	$ 613.653,00
NP - 29	Suministro e instalacion de carpa en lona para control de acceso en zona de recepcion	UND	1,00	$ 3.605.351,00
NP - 30	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	14,00	$ 121.212,00
NP - 31	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UND	20,00	$ 163.414,00
NP - 32	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	4,00	$ 109.459,00
NP - 33	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	8,00	$ 129.358,00
NP - 34	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	20,00	$ 148.502,00
NP - 35	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UND	8,00	$ 109.645,00
NP - 36	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	60,00	$ 74.903,00
NP - 37	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	60,00	$ 61.047,00
NP - 38	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	70,00	$ 49.310,00
NP - 39	RED SANITARIA PVC-VENTILACION 2"	ML	60,00	$ 31.024,00
NP - 40	Red suministro 1 1/4"	ML	35,00	$ 36.089,00
NP - 41	Red suministro 1"	ML	50,00	$ 27.219,00
NP - 42	Red suministro 3/4"	ML	60,00	$ 20.862,00
NP - 43	Red suministro 1/2"	ML	60,00	$ 18.245,00
NP - 44	Registro PVC-P 1 - 1/4"	UND	7,00	$ 145.520,00
NP - 45	Registro PVC-P 1"	UND	4,00	$ 111.417,00

Se anexa y hace parte de la presente acta, el cuadro de revisión de precios de acuerdo con lo establecido en el contrato anteriormente mencionado y el análisis de precios unitarios

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

UNO (Día en letras) (1) (Día en números) días del mes de **Julio** (Mes en que se firma el acta) de **2025** (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) ING JEFFERSON O BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL
INGEBYP SAS
Contratista de obra

(Firma)

(Nombre) VANESSA PACHECO GÓMEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SUPERVISIÓN CTO 022 DE 2025
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

(Firma)

(Nombre) ING RICARDO MORENO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
BIODECCO S.A.S.
Interventor

BioDecco Holding

Nit: 900965653-5

Bogotá, 30 de sep de 2025.

02-4601-202509301127078

Fecha: 30/09/2025 03:43:12 p.m. | Usuario: esierraj
Remitente: BIODECCO
Área o dependencia: 1.14.1 Gerencia Administrativa
Numero de folios: 1

Doctora
VANNESA PACHECO GOMEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA FNA
Supervisora
Ciudad

FNA-INTV-022-2025-191

REFERENCIA: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL) PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."

ASUNTO: 191-FIN-INT-022-2025-APROBACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS N°3

Teniendo en cuenta que la empresa **CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE SAS** se encuentra a cargo de la interventoría del contrato **FNA-166-2024** cuyo objeto es: **"Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A."**

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y en atención al comunicado con asunto **"REMISIÓN DE DOCUMENTOS – RADICADO OBSERVACIONES DEL ACTA DE FIJACIÓN 03",** remitido por el contratista de obra **INGEBYP S.A.S.**, nos permitimos **aprobar y recomendar la aprobación del Acta de Fijación de Precios N.º 3**, junto con los anexos que la acompañan (APU de las obras no previstas del ítem 46 al 56 y balance de obra). Esta aprobación se sustenta en la verificación técnica, administrativa y financiera realizada, así como en las necesidades identificadas para el correcto y normal desarrollo de las actividades en el marco del contrato de obra 166 de 2024.

Sin otro particular, quedamos atentos a sus comentarios.

RICARDO MORENO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. – BIODECCO SAS
Proyectó: JLNA

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

CONTRATO No. FNA - 166 - 2024

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No.3

CONTRATO DE OBRA N° 166 **DE** 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."

CONTRATISTA INGEBYP S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 022 DE 2025

INTERVENTOR BIODECCO S.A.S.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA VANESSA PACHECO GÓMEZ

APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA JAIME HERNANDO PRIETO ALVAREZ

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Aproximada	Costo directo
NP - 46	Trasiego incluye traslado a sitio de acopio en bolsas de aproximadamente 25 kilos	m3	50	$ 52,788.00
NP - 47	Construcción de Media caña en mortero 1:3	ml	350	$ 47,206.00
NP - 48	Suministro e instalación orinal tipo gotta o similar de entrada posterior no incluye grifería ni incluye pusch	un	4	$ 1,037,619.00
NP - 49	Desmonte de cubierta en lamina de zinc en cubierta de convenciones incluye estructura metálica de soporte, incluye retiro a sitio de acopio y disposición final.	m2	120	$ 58,611.00
NP - 50	Desmonte de ductos de aire acondicionado (incluye fibra de vidrio, transporte y disposición final)	ml	350	$ 49,313.00
NP - 51	Desmonte de ductos de red contraincendios en tubería CPVC de varios diámetros incluye soportería. (Incluye trasiego y disposición final)	ml	380	$ 17,183.00
NP - 52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Impermeabilización de placa Poliurea pura RESISTENTE A RAYOS UV DANOCOAT 250 incluye suministro y aplicación de POLIUREA en 80 MILS +-10%, ESPESOR TEXTURIZADA PREVIA IMPRIMACION EPOXICA BICOMPONENTE CON ARENA DE QUARZO EN UNA CAPA (si se requieren más se cobrarán por aparte), INCLUYE REACTOR GRACO, MATERIALES Y EQUIPOS CERTIFICADOS, PREVIO tratamiento de fisuras existentes. Acabado original gris cambia por rayos UV. Suministro y aplicación esmalte uretano gris o blanco resistente a Rayos UV color homogéneo como protección del sistema Poliurea.	m2	1136.8	$ 225,935.00
NP - 53	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRATO DE MORTERO SECO CON BAJO CONTENIDO DE AGUA PARA NIVELACION DE CUBIERTAS CON ESPESORES PROMEDIO DE 8cm, SOBRE SUPERFICIE IRREGULAR RESULTADO DE DEMOLICION DE ELEMENTOS NO DESMONTADOS Y RETIRADOS EN LAS AREAS A INTERVENIR zona de cubiertas, garantizando pendientes de desagües hacia los sifones. INCLUYE TRASIEGO DE MATERIALES A SITIOS DE FUNDIDAS	M2	1100	$ 138,890.00
NP - 54	Demolición de dados de concreto de 0.3 x 0.3 x 0.25 m, los cuales se encuentran en zona de cubierta incluye trasiego y disposición final.	Und	80	$ 57,437.00
NP - 55	Desmonte de ducto de extrator incluye retiro 2 extractores tipo hongo incluye retiro y disposición final.	Und	3	$ 223,054.00
NP - 56	Desmonte de bandeja tipo escalera incluye cableado estructurado, cableado normal, cableado regulado y voz y datos correspondiente a alimentación de puestos de trabajo existentes (incluye clasificación, trasiego y entrega a la Entidad)	ml	160	$ 50,217.00

Se anexa y hace parte de la presente acta, el cuadro de revisión de precios de acuerdo con lo establecido en el contrato anteriormente mencionado y el análisis de precios unitarios

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

TREINTA (Día en letras) (30) (Día en números) días del mes de **SEPTIEMBRE** (Mes en que se firma el acta) de **2025** (Año en que se firma el acta)

(Firma)

(Nombre) ING JEFFERSON O BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL
INGEBYP SAS
Contratista de obra

(Firma)

(Nombre) ING RICARDO MORENO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
BIODECCO S.A.S.
Interventor

(Firma)

(Nombre) VANESSA PACHECO GÓMEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SUPERVISIÓN CTO 022 DE 2025
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

(Firma)

(Nombre) JAIME HERNANDO PRIETO ALVAREZ
PROFESIONAL EJECUTIVO NIVEL 2
APOYO SUPERVISIÓN CTO 022 DE 2025
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

03-2303-202509030017943

MEMORANDO

PARA **SANDRA MILENA BURGOS**
1.3. Secretaria General

DE **1.14.1. Gerencia Administrativa**

ASUNTO Acta de mayores y menores cantidades del contrato No. FNA-166-2024.

FECHA 03/09/2025

Cordial saludo.

En cumplimiento de las funciones de supervisión e interventoría asignadas en el marco del Contrato No. FNA-166 de 2024, y de conformidad con lo dispuesto en el literal X del numeral 2.6.1. del anexo 2 del Manual de Contratación (GLC-CONT-MN-CON - Versión 5), relativo a las reglas para la supervisión e interventoría, el cual dispone lo siguiente:

> ***2.6.1. Funciones generales***
>
> *x. Elaborar y suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran:*
>
> *vii. "Actas de mayores o menores cantidades de obra, servicios o actividades. Estos ítems tienen precios unitarios pactados en el contrato y, por tanto, el supervisor puede ordenar su ejecución con la aprobación del ordenador del gasto o su delegado, el contratista está en la obligación de realizarlos (…)"*

Me permito remitir para su conocimiento y aprobación las actas relacionadas con las mayores y menores cantidades de obra derivadas de la ejecución contractual, las cuales cuentan con el respectivo soporte técnico y presupuestal.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
VANESSA PACHECO GOMEZ
Fecha: 03-09-2025
Hora: 17:17:18

VANESSA PACHECO GOMEZ

IEZ

Anexos: Acta de mayores y menores cantidades y acta de Comité.
Copia: N/A.
Proyectó: Jaime Hernando Prieto Álvarez - Profesional Ejecutivo Nivel 02. G.A.
Reviso: Pedro José Palacio Pardo - Profesional Universitario 1 – G.A.

INGEBYP	**ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS**	fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO

CONTRATO No. FNA - 166 - 2024

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No.4

CONTRATO DE OBRA N° 166 **DE** 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."

CONTRATISTA INGEBYP S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 022 DE 2025

INTERVENTOR BIODECCO S.A.S.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA VANESSA PACHECO GÓMEZ

APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA JAIME HERNANDO PRIETO ALVAREZ

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Aproximada	Costo directo
NP - 57	Suministro e instalación de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado de 30 x 10 x 1 m galvanizada con separador incluye curvas, soporteria y conductor de tierra para bandeja.	ml	252,00	$ 151.533,00
NP - 58	Suministro e instalación de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado de 15 x 10 x 1 m galvanizada, incluye curvas, soporteria y conductor de tierra para bandeja.	ml	252,00	$ 129.520,00
NP - 59	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 " SEGÚN DISEÑO DESARROLLO DE HASTA 1m	Und	132,00	$ 165.000,00
NP-60	Punto hidraulico para rociador automatico de 1/2"	Und	75,00	$ 114.984,00
NP-61	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	Und	75,00	$ 63.827,00
NP.62	Suministro e instalacion TEE MECANICA RANURADA DE 3" X 1 1/2"	Und	23,00	$ 60.791,00
NP - 63	Suministro e instalacion STRAP DE 3" X 1"	Und	35,00	$ 52.687,00
NP-64	Suministro e instalación de soporte tipo pera con varilla 3/8" con perno bean clamb para tubería 1"	Und	76,00	$ 33.022,00
NP-65	Suministro e instalación de soporte tipo pera con varilla 3/8" con perno bean clamb para tubería 1-1/2"	Und	26,00	$ 31.784,00
NP-66	Suministro e instalación de soporte tipo pera con varilla 3/8" con perno bean clamb para tubería 3"	Und	95,00	$ 33.033,00
NP-67	Suministro e instalación de soporte transversal sismoresitente para tubería 3"	Und	22,00	$ 234.807,00
NP-68	Suministro e instalación de soporte LONGITUDINAL sismoresitente para tubería 3"	Und	20,00	$ 202.663,00
NP-69	SOPORTE ANTISISMICO 4 VIAS	Und	6,00	$ 389.851,00
NP-70	TUBERIA ACC ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y PINTURA)	ml	134,20	$ 66.346,00
NP-71	Tuberia de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diametro 1-1/2", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	ml	52,25	$ 100.995,00
NP-72	Tuberia de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diametro 3", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	ml	203,50	$ 224.347,00
NP-73	Suministro e instalacion codo ranurado acero al Carbono ASTM-A53 SCH 40 diametro 3". Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	Und	10,00	$ 98.325,00
NP-74	Suministro e instalacion TEE ranurado acero al Carbono ASTM-A53 SCH 40 diametro 3", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	Und	9,00	$ 144.525,00
NP-75	Suministro e instalación de estación de control para red contra incendios	Und	1,00	$ 3.271.755,00
NP-76	Suministro e instalación de Gabinete Tipo 3 para red contra incendios	Und	1,00	$ 2.442.914,00
NP-77	Suministro e instalación de ventosa automática para red contra incendios	Und	2,00	$ 707.363,00
NP-78	Suministro e Instalacion AVISO 1 - INGRESO DE FUNCIONARIOS: Suministro e instalación de aviso tipo caja de luz, 15 cm de cantonera, logo en relieve acrilico, cantonera de 4 cm - iluminación LED - Textos en acrilico 4m sobre puestas con interruptor encendido y apagado. (7m*60cm)	Und	1,00	$ 10.729.783,00
NP-79	Suministro e Instalacion AVISO 2 INTERNO - AVISO TEXTO - JUNTOS HACEMOS REALIDAD EL HOGAR DE LOS COLOMBIANOS - Suministro e instalación de aviso en acrilico 3mm letra a letra volumentrico - cantonera de 5 cm - . (3,2m*40cm)	Und	1,00	$ 8.652.770,00
NP-80	Suministro e Instalacion AVISO 3 - LOGO INTERNO FNA - Suministro e instalación de aviso en acrilico 3mm letra a letra volumentrico - cantonera de 5 cm - (80cm*80cm)	Und	1,00	$ 4.130.770,00
NP-81	Suministro e Instalacion AVISO 4 - LOGO INTERNO FNA - Suministro e instalación de aviso en acrilico 3mm letra a letra Volumentrico - cantonera de 5 cm - (120cm*120cm)	Und	1,00	$ 4.844.770,00
NP-82	Suministro e instalación de señales en acrilico cal 3m + impresión digital full color - corte laser + instalación -(Opciones: hale, empuje, rack, baños mixtos, Ref Entrada FNA (11cm*29 cm))	Und	15,00	$ 116.946,00

Se anexa y hace parte de la presente acta, el cuadro de revisión de precios de acuerdo con lo establecido en el contrato anteriormente mencionado y el análisis de precios unitarios

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTITRÉS	(23)	días del mes de	OCTUBRE	de	2025
(Día en letras)	(Día en números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) ING JEFFERSON O BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL
INGEBYP SAS
Contratista de obra

(Firma)

(Nombre) ING RICARDO MORENO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
BIODECCO S.A.S.
Interventor

(Firma)

(Nombre) VANESSA PACHECO GÓMEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SUPERVISIÓN CTO 022 DE 2025
FONDO NACIONAL DEL AHORRO

(Firma)

(Nombre) JAIME HERNANDO PRIETO ALVAREZ
PROFESIONAL EJECUTIVO NIVEL 2
APOYO SUPERVISIÓN CTO 022 DE 2025
FONDO NACIONAL DEL AHORRO

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

CONTRATO No. **FNA - 166 - 2024**

CONTRATO DE OBRA N° 166 DE 2024

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No.5

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."

CONTRATISTA INGEBYP S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 022 DE 2025

INTERVENTOR BIODECCO S.A.S.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA VANESSA PACHECO GÓMEZ

APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA JAIME HERNANDO PRIETO ALVAREZ

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Aproximada	Costo directo
NP-83	Pañete impermeabilizado con mortero 1:3 y sika 1 o similar (no incluye lineales)	M2	380	$ 42.254,00
NP-84	Pañete impermeabilizado con mortero 1:3 y sika 1 o similar	ML	450	$ 23.802,00
NP-85	Placa contrapiso de 10 cm de espesor, en concreto de 2500 PSI, No ncluye acero de refuerzo	m2	30	$ 78.487,00
NP-86	Mampostería en bloque de arcilla no. 4 (no incluye lineales)	M2	110	$ 64.001,00
NP-87	Mampostería en bloque de arcilla no. 4 ancho max <0.70cm	ML	60	$ 47.115,00
NP-88	Anclaje 1/2" L=50 cm	Und	300	$ 26.778,00
NP-89	Viga de amarre de 0,12 x 0,20 NO incluye acero de refuerzo, alambre negro, incluye fomaleta y concreto de 2500 psi.	ML	100	$ 63.817,00
NP-90	Columneta de confinamiento (0,12*0.20) NO incluye acero de refuerzo, alambre negro, INCLUYE fomaleta y concreto de 2500 psi.	ML	80	$ 54.823,00
NP-91	Suministro e Instalacion de soporte para tuberia de 1/2" a 4" para tuberias hidrosanitarias	Und	130	$ 27.237,00
NP-92	Dovela en concreto tipo gruting de 3000 psi NO incluye acero de refuerzo	ML	75	$ 8.375,00
NP-93	Construccion de Placa de entrepiso de 2.5 m x 2.5 m, con lámina colaborante 2", cal 22, h=10cm de acuerdo a detalle expresado en justificacion, incluye acero de refuerzo, concreto de 3000 psi y lamina colaborante (Incluye Cerramiento de protección en tercer piso, trasciego de insumos por 4 pisos en sentido vertical y 50 m en sentido horizontal)	UND	2	$ 2.496.403,00
NP-94	Demolición de muro en mampostería en bloque de arcilla de 15 cm (incluye trasciego de materiales desde unas disistancias superiores a 50 ml y niveles superiores a un piso a punto de acopio de acuerdo a horarios establecidos por entidad)	M2	80	$ 28.701,00
NP-95	Desmonte de ductos de extracción de aire desde terraza hasta nivel de piso cuarto piso (Cerramiento preventivo en 3 piso, ductos de 1,60*0,90. Incluye trasiego desde cubierta ubicada a cinco pisos y disposición final).	ML	20	$ 210.361,00
NP-96	Suministro e instalacion de gravilla lavada para transiciones entre enchapes y / o pisos laminados o urbanismo (ancho promedio 15 cm)	ML	100	$ 72.837,00
NP-97	Desmonte de antena existente (incluye trasiego y disposición)	Und	1	$ 2.558.429,00
NP-98	Mampostería en bloque de arcilla estructural No. 4 de perforacion vertical (no incluye lineales, ni elementos no estructurales)	M2	60	$ 70.975,00
NP-99	Mampostería en bloque de arcilla estructural No. 4 de perforacion vertical, ancho max <0.60 cm (No incluye elementos no estructurales)	ML	20	$ 51.514,00
NP-100	Suministro e instalacion de lineal en super board contra la ventaneria existente	Ml	300	$ 93.616,00
NP-101	Suministro e instalacion de Marco para luminaria led de 60 x 60 para cielo raso en Dry Wall	UND	350	$ 77.136,00
NP-102	Suministro e instalacion de Espejo en 4mm con bordes pulidos,brillados y flotado con tubular en aluminio con luz led calida de 120 v	M2	35	$ 550.099,00
NP-103	Suministro e instalación de platina 150x150x6 mm con tornillo pasante de 1/2" L=0,40m, 6 tuercas y arandelas para instalación de estructura metalica de los micro ondas	UND	12	$ 132.577,00
NP-104	Suministro e instalacion de luminaria led de 60 x 60 de 4000 k NO INCLUYE marco para luminaria de 60 x 60 para cielo raso en Dry Wall	UND	350	$ 171.691,00
NP-105	Desmonte de puerta de vidrio laminado 5+5 MM, trasiego a punto de acopio y disposicion final a botadero certificado, suministro e instalacion de puerta en vidrio templado laminado 5 + 5 MM, con pelicula tipo bronce, incluye reinstalacion de postes de giro e instalacion de topes de piso, adecuación a los herrajes existentes (Incluye el transporte e instalación en horario nocturno).	M2	7	$ 1.715.072,00
NP-106	Ajuste de puertas de acceso en vidrio templado incluye cambio de montante y cambio de bisagras hidráulicas	M2	35	$ 1.343.902,00
NP-107	Suministro e instalacion de Tapa registro en acero inoxidable de 30 x 30 cm incluye mortero de caja, estuco y pintura	Und	20	$ 290.521,00

NP-108	Suministro de mesón para cubierta de lavamanos con perforaciones para poceta de sobre poner en Quarzstone Blanco Polar de 0.80 x0.55 mt, con baberos de 30 cms a los costados, salpicadero de 80 cms x 8 cms y frente con reengruese de 5 cms y tapa frontal en sinterizado color madera, instalación con pie de amigo. (Recepción)	Und	1	$ 1.876.500,00
NP-109	Suministro e instalacion de mesón para lavamanos con perforaciones para poceta de sobre poner en Quarzstone Blanco Polar de 55 cm de ancho con baberos laterales y frontal de 30 cms con su respectivo salpicadero en escuadra de 8 cms, fijado con pie de amigo.	ml	50	$ 1.359.000,00
NP-110	Suministro de caseta para puesto de vigilancia temporal en zona de acceso vehicular y rehubicable en cualquier sector que dispoga la entidad, en estructura metalica calibre 18 con pintura esmalte negra.	UND	1	$ 3.000.000,00
NP-111	Suministro e instalación de sanitario SMART AL SINGLE BLANCO o similar	UND	1	$ 714.259,00
NP-112	Construccion de cajas de inspeccion sanitarias DE 80 X 80, incluye marco y tapa	UND	1	$ 721.565,00
NP-113	Suministro, corte, doblado e instalación acero figurado 60000 PSI	Kg	250	$ 7.899,00
NP-114	Suministro e instalación de pirlan en aluminio de 5.5 cm de ancho fijado con chazo puntilla	MI	40	$ 53.466,00
NP-115	Suministro e instalacion dilatación dry wall en Z	ML	1000	$ 19.049,00
NP-116	Refuerzo filos y dilataciones en muros y columnas	ML	600	$ 16.823,00
NP-117	Resanes y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre pañete o repello liso. A todo costo.	ML	800	$ 23.356,00
NP-118	Presurización de la RCI mediante cargue de la red, para evaluación de la resistencia de las tuberías, uniones, válvulas y accesorios frente a presiones superiores a las de operación normal, según normas como NFPA 24 y NFPA 13 o ASME B31.1, bajo pruebas hidrostáticas a no menos de 200 psi (13.8 bar)	M2	1000	$ 4.166,00

Se anexa y hace parte de la presente acta, el cuadro de revisión de precios de acuerdo con lo establecido en el contrato anteriormente mencionado y el análisis de precios unitarios

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

TREINTA (30) días del mes de **NOVIEMBRE** de **2025**

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) Año de firma del acta

(Firma)

(Nombre) ING JEFFERSON O BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL
INGEBYP SAS
Contratista de obra

(Firma)

(Nombre) VANESSA PACHECO GOMEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SUPERVISIÓN CTO 022 DE 2025
FONDO NACIONAL DEL AHORRO

(Firma)

(Nombre) ING RICARDO MORENO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
BIODECCO S.A.S.
Interventor

(Firma)

(Nombre) JAIME HERNANDO PRIETO ALVAREZ
PROFESIONAL EJECUTIVO NIVEL 2
APOYO SUPERVISIÓN CTO 022 DE 2025
FONDO NACIONAL DEL AHORRO

INGEBYP	**ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS**	fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO

CONTRATO No. **FNA - 166 - 2024**

CONTRATO DE OBRA N° 166 DE 2024

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No.6

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."

CONTRATISTA INGEBYP S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 022 DE 2025

INTERVENTOR BIODECCO S.A.S.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA VANESSA PACHECO GÓMEZ

APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA JAIME HERNANDO PRIETO ALVAREZ

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Aproximada	Costo directo
NP-119	Desmonte de redes eléctricas existentes. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	M2	300.00	$ 14,421.00
NP-120	DESMONTE DE PUERTAS EN MADERA. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	Und	15.00	$ 31,864.00
NP-121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PARA INTERIORES CON ANCHO MAYOR A 0,60 M	M2	2,200.00	$ 22,348.00
NP-122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PARA INTERIORES CON ANCHO MENOR A 0,60 M (ml)	ML	1,500.00	$ 13,760.00
NP-123	Suministro e instalacion de acometida electrica en: tubo emt 2 de 3" y cable 2(3#350+1#500+1#2T cu)desde tablero ppal casino 1er piso a cuarto tecnico 4° piso.	ML	50.00	$ 2,532,624.00
NP-124	Suministro e instalacion de tablero electico para cuarto tecnico 4° piso de acuerdo a diagrama unifiliar y cargas requeridas	Und	1.00	$ 31,130,536.00
NP-125	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS Y/O PISOS, ANCHO <= 10CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	MI	150.00	$ 30,462.00
NP-126	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA METÁLICA CUADRADA DE 3X2" CON SOSCO	Und	15.00	$ 46,795.00
NP-127	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATES DE ESQUINA PARA ENCHAPES EN WING EN ALUMINIO	ML	80.00	$ 28,550.00
NP-128	DECAPADO, PULIDA Y SELLADO DE PISOS EN GRANO DE MARMOL	M2	320.00	$ 83,737.00
NP-129	DECAPADO, PULIDA Y SELLADO DE PISOS EN GRANO DE MARMOL	ML	450.00	$ 51,384.00
NP-130	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERÁMICA PARED CALIDAD PRIMERA, CON ANCHO < = A 0.60 ML (LINEAL)	MI	180.00	$ 87,589.00
NP-131	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METÁLICA TIPO CUPULA 4 X 3" SOSCO	Und	50.00	$ 71,795.00
NP-132	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPÓXICA CON UN ANCHO MAYOR A 60CM (NO INCLUYE LINEALES)	M2	60.00	$ 54,106.00
NP-133	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPÓXICA CON UN ANCHO MENOR A 60CM (LINEALES)	MI	25.00	$ 33,211.00
NP-134	SUMINISTRO EL INSTALACION DE ALISTADO PISOS 1:3, E= 0.04 (INCLUYE TRASCIEGO DE INSUMOS A LOS DIFERENTES FRENTES DE OBRA	M2	100.00	$ 45,403.00
NP-135	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO DE 18 CTS. 3F. 5H 225AMP. CON PUERTA Y CON TOTALIZADOR BASE GALVANIZADA TAPA BLANCA	Und	1.00	$ 1,283,059.00
NP-136	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO DE 12 CTS. 3F. 5H 225AMP. CON PUERTA Y CON TOTALIZADOR BASE GALVANIZADA TAPA BLANCA	Und	2.00	$ 894,089.00
NP-137	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PVC-P 1 1/2", INCLUYE UNIVERSALES	Und	6.00	$ 167,925.00
NP-138	RED DE SUMINISTRO PVC-P 1 1/2"	MI	25.00	$ 46,404.00
NP-139	SUMINISTRO E INSTALACION DEREGISTRO PVC-P 3/4", INCLUYE UNIVERSALES	Und	6.00	$ 72,291.00
NP-140	Suministro e instalación de cielorraso en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo de vinilo. A todo costo.	ML	60.00	$ 79,032.00
NP-141	Suministro e instalación de muro en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo.	ML	50.00	$ 58,732.00

NP-142	Suministro e instalación de puerta en madecor entamborada de 0,85 m de ancho por 2.20 m de alto, sistema corredizo Ducasse. incluye marcos, chapa tipo pico de loro con su respectiva cantonera, guia de corrediza, tapa de guia en madecory todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	Und	3.00	$	1,755,000.00
NP-143	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 30 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	UND	5.00	$	106,655.00
NP-144	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 18 w, luz neutra 4000K. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	UND	40.00	$	103,655.00
NP-145	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 9 w, luz neutra 4000K. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	UND	40.00	$	88,855.00
NP-146	Suministro e instalacion salida electrica para toma corriente doble normal GFCI Incluye: Tuberia sch-40 de 3/4"(max.6mts) + caja metalica + terminales + cable trenzado (LSZH) 3x12 + autodesforres + TOMA GFCI FUTURA.	UND	8.00	$	247,692.00
NP-147	Suministro e instalacion de salida para HDMI incluye: tuberia pvc sch-40 de 1-1/4 + caja 10x10 doble fondo con suplemento + caja 2400 + terminales. NO INCLUYE CABLE	UND	20.00	$	207,747.00
NP-148	Suministro e instalación de alimentador 3N°8 Fase+1N°8 Neutro+1N°10 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ML	100.00	$	65,825.00
NP-149	SENSOR PRESENCIA MULTITECNOLOGIA LEVITON OSC10-M0W	UND	10.00	$	742,527.00
NP-150	SENSOR MULTITECNOLOGIA PIR MONTAJE EN TECHO LEVITON OSC15-10W CON FUENTE RELEVO-P/SENSOR LEVITON OSP20-RDO	UND	10.00	$	735,982.00
NP-151	Suministro e instalacion de perfiles WPC DE 100 X 50 MM, EN COLOR ASIGNADO POR LA ENTIDAD, INCLUYE SOPORTE GIRATORIO DE EXTREMOS	ML	95.00	$	80,486.00
NP-152	Suministro e instalacion de piso tipo DECK en WPC de acuerdo a detalle suministrado por la entidad (incluye estructura y accesorios de fijaccion y bocel de terminacion)	M2	15.00	$	979,125.00
NP-153	Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada cla. 18 de 1.2 m de desarrollo incluye soporte de fijacion	ML	140.00	$	255,000.00
NP-154	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LÁMINA ALFAJOR Y ÁNGULO A CON PESTAÑAS DE 10cm POR LOS LADOS, PARA SELLAR DUCTO EN CUBIERTA	M2	9.00	$	472,000.00
NP-155	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 " SEGÚN DISEÑO DESARROLLO DE 0.4 M HASTA 0.7 M	ML	95.00	$	121,275.00
NP-156	Suministro e instalacion de salida para toma de datos y/o corriente incluye: tuberia pvc sch-40 de 3/4 (5 m) + caja 2400 + terminales. NO INCLUYE CABLE	UND	20.00	$	135,978.00
NP-157	Suministro e instalacion salida electrica para toma secadores Incluye: Tuberia sch-40 de 3/4"(max.6mts) + caja metalica + terminales + cable trenzado (LSZH) 3x10 (20 mts). NO INCLUYE TOMA.	UND	6.00	$	248,325.00
NP-158	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS EN FORMA DE FIGURA PARA SEÑALIZACION DE BAÑOS DE 30 CM DE ALTO, EN ACRILICO EN VOLUMEN DE 3 CM	UND	4.00	$	355,500.00
NP-159	Desmonte gabinetes (NORMAL, REGULADO Y RACK) cuarto tecnico 4° piso incluye: desconexiones acometidas principales regulada y normal, desconexion circuitos de distribucion, retiro de tableros del cuarto tecnico, traslado de tableros del 4° piso al 1er piso y entrega de elementos internos de los tableros.	UND	4.00	$	991,349.00
NP-160	ASEO FINAL DE OBRA	M2	1,200.00	$	3,097.00

Se anexa y hace parte de la presente acta, el cuadro de revisión de precios de acuerdo con lo establecido en el contrato anteriormente mencionado y el análisis de precios unitarios

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

QUINCE (Día en letras) (15) (Día en números) días del mes de **ENERO** (Mes en que se firma el acta) de **2026** (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) ING JEFFERSON O BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL
INGEBYP SAS
Contratista de obra

(Firma) Vanessa Pacheco Gómez Firmado digitalmente por Vanessa Pacheco Gómez

(Nombre) VANESSA PACHECO GÓMEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SUPERVISIÓN CTO 022 DE 2025
FONDO NACIONAL DEL AHORRO

(Firma)

(Nombre) ING RICARDO MORENO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
BIODECCO S.A.S.
Interventor

(Firma)

(Nombre) JAIME HERNANDO PRIETO ALVAREZ
PROFESIONAL EJECUTIVO NIVEL 2
APOYO SUPERVISIÓN CTO 022 DE 2025
FONDO NACIONAL DEL AHORRO

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

CONTRATO No. **FNA - 166 - 2024**

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No.7

CONTRATO DE OBRA N° 166 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."

CONTRATISTA INGEBYP S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 022 DE 2025

INTERVENTOR BIODECCO S.A.S.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA VANESSA PACHECO GÓMEZ

APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Aproximada	Costo directo
NP-161	Suministro, instalacion y conexiones de breaker siemens regulable 440/630 amp capacidad de ruptura 55 ka/220 totalizador en tablero electrico de distribuccion	UND	1	$ 4.756.482,00
NP-162	Suministro e instalacion de tablero general EDIFICIO DE CONVENCIONES CUARTO PISO, de acuerdo a diagrama unifiliar, incluye breker totalizador, breaker secundarios y Fungibles y Accesorios (cables, terminales, canaleta, tornilleria, funda, marcacion de cables, Acrilicos, Aisladores, etc)	UND	1	$ 75.749.723,00
NP-163	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DOBLES EN VIDRIO DE 10MM DE SEGURIDAD TEMPLADO, BISAGRAS ESQUINERAS EN ALUMINIO SUPERIOR E INFERIOR, CHAPA Y RECIBIDOR CENTRAL EN ALUMINIO, CERRADURA YALE, MANIJA TIPO ROMA 40-20, CERROJO DE PISO Y BISAGRA HIDRAHULICA MARCA SPEEDY.	M2	10	$ 1.607.739,00
NP-164	Suministro e instalacion de GUARDAESCOBA CERÁMICA	MI	20	$ 24.449,00
NP-165	Suministro e instalacion de Perfil REDUCTOR - en PVC estandar con foil en pvc termolaminado / 2440X45X12mm y / o Perfil T - en PVC estandar con foil en pvc termolaminado / 2440X45X12mmPara cumplir con la junta de dilatación requerida en pisos flotados laminados, de mantener dilatación cada 8mts en la medida mas larga22 mts de largo = 3	ML	440	$ 36.615,00
NP-166	Pintura exterior tipo coraza para muros sobre pañete menores a 60 cm, incluye toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.	MI	120	$ 25.413,00
NP-167	Suministro e instalación de relleno en mortero estructural en areas de desmontes de piso desmontado o demolido para nivelacion previa a la instalacion de piso laminado.	M2	650	$ 40.996,00
NP-168	DIAGNOSTICO Y ANALISIS ESTRUCTURAL DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA DEL EDIFICIO DENOMINADO CNA, INCLUYE DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE MEJORA	GLB	1	$ 39.890.960,00
NP-169	MANTENIMIENTO CUARTO TABLEROS CONVENCIONES PISO 1, CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION TABLERO ELETRICO POR FILTRACION DE AGUA Y PUESTA EN MARCHA NUEVAMENTE DEL SISTEMA ELECTRICO	GLB	1	$ 892.214,00
NP-170	DIAGNOSTICO ELECTRICO DE ILUMINACION DE LOS EDIFICIOS DENOMINADO CNA, CONVENCIONES Y RECEPCIO, INCLUYE DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE CUMPLIMIENTO RETILAP	GLB	1	$ 9.773.469,00
NP-171	DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO Y RCI DE LOS EDIFICIOS DENOMINADO CNA, CONVENCIONES Y RECEPCIO, INCLUYE DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	GLB	1	$ 3.975.832,00

Se anexa y hace parte de la presente acta, el cuadro de revisión de precios de acuerdo con lo establecido en el contrato anteriormente mencionado y el análisis de precios unitarios

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Veintitres (Día en letras) (23) (Día en números) días del mes de Febrero (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) ING JEFFERSON O BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL
INGEBYP SAS
Contratista de obra

(Firma)

(Nombre) VANESSA PACHECO GÓMEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SUPERVISIÓN CTO 022 DE 2025
FONDO NACIONAL DEL AHORRO

(Firma)

(Nombre) ING RICARDO MORENO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
BIODECCO S.A.S.
Interventor

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

CONTRATO No. **FNA - 166 - 2024**

CONTRATO DE OBRA N° 166 DE 2024

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No.8

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."

CONTRATISTA INGEBYP S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 022 DE 2025

INTERVENTOR BIODECCO S.A.S.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA VANESSA PACHECO GÓMEZ

APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Aproximada	Costo directo
NP-172	Suministro e Instalacion AVISO - LOGO INTERNO FNA - CONVERTIMOS LAS CESANTIAS Y EL AHORRO DE LOS COLOMBIANOS EN VIVIENDA PROPIA aviso en acrilico 3mm letra a letra volumentrico - Letras independientes - cantonera de 5 cm - (3,10 m x 40 cm)	UND	1	$ 5,754,840.00
NP-173	Suministro e Instalacion - AVISO TEXTO - INVERTIMOS EN BIENESTAR, CONSTRUIMOS FUTURO - Aviso en acrilico 3mm letra a letra volumentrico - cantonera de 5 cm - Letras independientes - (3,10 m x 20 cm)	UND	1	$ 3,480,750.00
NP-174	Suministro e Instalacion - AVISO TEXTO - DONDE EL ESFUERZO SE TRANSFORMA EN BIENESTAR - Aviso en acrilico 3mm letra a letra volumentrico - cantonera de 5 cm - Letras independientes - (2,10 m x 40 cm)	UND	1	$ 3,898,440.00
NP-175	Suministro e Instalacion aviso- LOGO INTERNO FNA - Aviso en acrilico 3mm letra a letra volumentrico - cantonera de 5 cm - (0.70 m x 0.7 m)	UND	2	$ 2,274,090.00
NP-176	Suministro e Instalacion aviso - LOGO INTERNO FNA - Aviso en acrilico 3mm letra a letra volumentrico - cantonera de 5 cm + Base acrilica- (1.46 m x 1.12 m)	UND	1	$ 7,588,963.00
NP-177	Suministro e instalacion de SEÑALIZACION INTERNA OFICINAS - Acrilico 8m + acrilico 3mm + 4 bujes color negro + decoración tipo chapilla según muetra (0.11 m x 0.2 m)	UND	73	$ 123,760.00
NP-178	Suministro e instalacion de IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR - sobre vinilo froasted + full color + laminación mate sgún muestra - vidrios extenos de las oficinas prcnipales y decoraciòn internerna de los vidrios	M2	263	$ 193,375.00
NP-179	Suministro e instalacion de Luminaria para uso interior tipo Led lineal MINICONTINIUM 36 W con driver integrado, distribución de luz homogénea sin sombras. Proporciona un sistema de iluminación continuo, limpio y sencillo.	UND	30	$ 385,516.00
NP-180	Suministro e instalación de puerta en madecor entamborada de diferentes medidas, incluye marcos, chapa con su respectiva cantonera, y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	M2	7	$ 578,992.00
NP-181	Suministro e instalación de mueble escalonado de acuerdo con diseño suministrado por la entidad (incluye estructura metálica de soporte soldada en tubería 5x5x 2.5 mm y 5x2.5x2 mm, escalones melaminica 36 mm, puertas y laterales en melaminica 15 mm y recubrimientos internos melaminica en 15 mm, 14 casilleros con chapas, herrajes y entrepaños, cojines, cajoneras con chapas , herrajes y trasporte de sitio de preemsamble a sitio de ubicacion del mueble)	UND	1	$ 42,313,890.00
NP-182	Suministro e InstalacionAviso con imágenes en full color montadas sobre acrilico cal 8 tipo triangulo - (JUNTOS HACEMOS REALIDAD EL HOGAR DE LOS COLOMBIANOS) textos laser cal 8mm color en azul - (1.8 x 1.1 m)	UND	1	$ 5,753,650.00

Se anexa y hace parte de la presente acta, el cuadro de revisión de precios de acuerdo con lo establecido en el contrato anteriormente mencionado y el análisis de precios unitarios

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Nueve (Día en letras) (9) (Día en números) días del mes de Marzo (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) ING JEFFERSON O BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL
INGEBYP SAS
Contratista de obra

(Firma)


(Nombre) ING RICARDO MORENO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
BIODECCO S.A.S.
Interventor

(Firma)

(Nombre) VANESSA PACHECO GÓMEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SUPERVISIÓN CTO 022 DE 2025
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

Id	Modo de tarea	Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1			**REPARACIONES LOCATIVAS GENERALES FONDO NACIONAL DEL AHORRO**	**339 días**	**vie 7/03/25**	**sáb 21/03/26**	**$ 5,142,932,605.63**
2			**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**30 días**	**vie 7/03/25**	**jue 10/04/25**	**$ 0.00**
3			PRELIMINARES	30 días	vie 7/03/25	jue 10/04/25	$ 0.00
4			**REPARACIONES LOCATIVAS GENERALES SEDE PRINCIPAL**	**256.5 días**	**jue 22/05/25**	**jue 5/03/26**	**$ 323,658,223.82**
5		1.1.	Retiro, reparación y reposicion puntual de junta entre laminas (junta con factor forma 2cmx1cm), mediante el uso de fondo de junta tipo sika rod y sello elastomérico de poliuretano en color negro, con alta resistencia a la intemperie incluye andamio colga	29 días	lun 2/02/26	jue 5/03/26	$ 0.00
6		1.2.	Pintura exterior tipo coraza para muros sobre pañete incluye toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.	210 días	lun 23/06/25	jue 12/02/26	$ 25,845,345.26
7		2.1.	Retiro de impermeabilización existente y mortero de nivelación. Incluye el retiro y disposición final de escombros (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").	90 días	lun 9/06/25	mié 17/09/25	$ 44,966,248.35
8		2.2.	Instalación de mortero de nivelación con materiales de SIKA o similares características, previo a la instalación de la impermeabilización (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").	1 día	mar 16/09/25	mié 17/09/25	$ 0.00
9		2.3.	Impermeabilización de placa de cubierta plana transitable, no ventilada, con piso fijo, tipo convencional, para tráfico peatonal privado. Tipo Sika o de similares características con uso de mantos asfálticos, tipo bicapa (Edificio Convenciones y Edificio	20 días	vie 11/07/25	lun 4/08/25	$ 25,338,107.94
10		2.4.	Desmonte de ventaneria con vidrios en celosía ubicados en culata de cubierta en el edificio CNA.	20 días	lun 26/01/26	mar 17/02/26	$ 0.00
11		2.5.	Suministro e instalación de sistema de ventanas en vidrio fijas (sin basculante) en reemplazo de las ventanas en vidrio retiradas, ubicados en culata de cubierta en el edificio CNA.	20 días	jue 5/02/26	vie 27/02/26	$ 0.00
12		2.6.	Retiro de canaletas existentes y suministro e instalación de canaletas metálicas de sección trapezoidal elaboradas en acero galvanizado calibre 16 de acuerdo con las necesidades técnicas de la cubierta de aguas lluvia, incluye la instalación de la soporte	20 días	vie 30/01/26	lun 23/02/26	$ 0.00
13		2.7.	Retiro de instalación existente y suministro e instalación de soscos para la bajante de agua lluvia e 4" en PVC con su respectivo sifón para evitar malos olores, incluye la instalación de la soportería para el anclaje en el edificio CNA.	10 días	mié 11/02/26	lun 23/02/26	$ 0.00
14		2.8.	Limpieza y mantenimientos de tubería bajante de agua lluvia ø 4" en PVC, en el edificio CNA.	10 días	lun 23/02/26	jue 5/03/26	$ 0.00
15		3.1.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros.	200 días	lun 23/06/25	lun 2/02/26	$ 5,210,968.29
16		3.2.	Mantenimiento de cielo raso en fibra mineral. Incluye cambio, pintura y/o reutilización de láminas en fibra mineral, instalación de anclajes y arreglo de perfilería descolgada y colocación de soportes.	90 días	lun 17/11/25	mié 25/02/26	$ 1,050,135.55
17		3.3.	Suministro e instalación cielo raso PVC de 10 mm de espesor, incluye estructura, perforaciones para las luminarias. A todo costo.	30 días	vie 23/01/26	mié 25/02/26	$ 0.00
18		3.4.	Suministro e instalación cielo raso en drywall de 1/2" de espesor a una sola cara, incluye estructura, perforaciones luminarias. A todo costo.	80 días	lun 17/11/25	sáb 14/02/26	$ 21,311,735.82
19		4.1.	Cambio de válvula antivandálica de empotrar tipo push para sanitarios institucionales de consumo de agua 4.85 lpf (1.28 gpf) tipo corona o similar. Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. A todo costo con la instalación de un enchape de s	230 días	lun 9/06/25	vie 20/02/26	$ 32,573,120.41
20		4.2.	Cambio de grifería para lavamanos de empotrar a muro tipo push aplicación institucional de consumo 0,4 - 1.9 litros, tipo corona o similar incluye desmonte y reinstalación de aparatos. A todo costo con la instalación de un enchape de similares caracterist	230 días	mié 11/06/25	mar 24/02/26	$ 19,788,754.81
21		4.3.	Cambio de válvula antivandálica de empotrar tipo push para orinales institucionales de consumo de agua 0.5 a 1.9 lpf (0.13 a 0.5 gpf). tipo corona o similar. Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. A todo costo con la instalación de un en	180 días	lun 11/08/25	vie 27/02/26	$ 8,947,186.97
22		4.4.	Desmonte de divisiones metálicas para baños. Incluye soportería, tornillos, herrajes, retiro y disposición final.	170 días	jue 22/05/25	vie 28/11/25	$ 4,649,905.49
23		4.5.	Suministro e instalación de divisiones de baño en acero inoxidable por ambas caras calibre 22, aleación 304 acabado satinado tipo SOCODA o similar. Con puerta, anclajes y accesorios necesarios para su instalación y correcto funcionamiento.	180 días	vie 13/06/25	jue 1/01/26	$ 121,245,608.16
24		4.6.	Limpieza con sonda de tubería sanitaria en diferentes diámetros, actividad para ejecutar por punto.	120 días	lun 11/08/25	mar 23/12/25	$ 12,573,647.66
25		5.1.	Desmonte de puerta en madera de 1.44 m x2.47 m, incluye marco y retiro.	10 días	lun 20/10/25	jue 30/10/25	$ 157,459.11
26		5.2.	Suministro e instalación de puerta de acceso a cubierta en aluminio de dos hojas: una de 0.90 m x 2.47 m y otra de 0.54 m x 2.47 m. Incluye bisagras cerradura, cantonera marco y accesorios necesarios para su funcionamiento.	20 días	lun 17/11/25	mar 9/12/25	$ 0.00
27		6.1.	Resanes y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre pañete o repello liso. A todo costo.	80 días	vie 28/11/25	mié 25/02/26	$ 0.00
28			**REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CNA - PISO 2**	**110 días**	**mar 4/11/25**	**vie 6/03/26**	**$ 109,313,767.99**
29			Nota: El inicio de las intervenciones de esta zona estan sujetas a que se cuenten con todos los diseños requeridos y rehubicacion de personal por parte de la entidad	1 día	mié 12/11/25	jue 13/11/25	$ 0.00
30			Nota: La programacion de esta zona esta sujeta a cambios y ajustes teniendo en cuenta la definicion de alcance de actividades a desarrollar y ajustes estructurales de la estructura metalica.	1 día	mié 12/11/25	jue 13/11/25	$ 0.00
31			**Piso 2 Edif. CNA**	**110 días**	**mar 4/11/25**	**vie 6/03/26**	**$ 109,313,767.99**
32		1.1.	Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.	3 días	mié 12/11/25	sáb 15/11/25	$ 4,914,496.17
33		1.2.	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	3 días	lun 10/11/25	mié 12/11/25	$ 1,042,039.98
34		1.3.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros.	3 días	sáb 15/11/25	mié 19/11/25	$ 30,326,692.09
35		1.4.	Desmonte de redes eléctricas existentes. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	2 días	mié 19/11/25	vie 21/11/25	$ 5,175,693.36
36		1.5.	Desmonte de puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	3 días	jue 6/11/25	lun 10/11/25	$ 12,260,625.02
37		1.6.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo.	2 días	mar 4/11/25	mié 5/11/25	$ 4,459,881.07
38		2.1.	Suministro e instalación de columnetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre 12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye platina soldada a la base y anclajes a placa de piso y retiro de escombros.	7 días	mar 10/02/26	mié 18/02/26	$ 0.00
39		2.2.	Suministro e instalación de viguetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye soldadura a columnetas y retiro de escombros.	5 días	mié 18/02/26	mar 24/02/26	$ 0.00
40		3.1.	Suministro e instalación de muro en Superboard de 8 mm, altura 2.40 m a dos caras. Incluye estructura metálica, anclaje, cinta, estuco y fondeo de acabado en pintura en vinilo tipo 1.	8 días	mié 18/02/26	jue 26/02/26	$ 0.00
41		4.1.	Suministro e instalación de cielorraso en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura. A todo costo.	15 días	mar 17/02/26	jue 5/03/26	$ 4,037,323.17
42		4.2.	Suministro e instalación de Frescasa Eco Sin Papel 3 1/2" para cielorraso en Drywall. A todo costo.	11 días	sáb 21/02/26	jue 5/03/26	$ 0.00
43		5.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad. Incluye plástico aislante y rymbolon de acuerdo a las características técnicas y el guardaescobas.	6 días	mar 24/02/26	lun 2/03/26	$ 0.00
44		6.1.	Suministro e instalación de alimentador 1N°12 Fase+1N°12 Neutro+1N°12 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	3 días	vie 27/02/26	mar 3/03/26	$ 0.00
45		6.2.	Suministro e instalación de alimentador a tableros en 3N°2/0 Fase+1N°2/0 Neutro+1N°2 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	2 días	mar 3/03/26	jue 5/03/26	$ 0.00
46		6.3.	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tuberia PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble, cumpliendo norma RETIE.	20 días	jue 5/02/26	vie 27/02/26	$ 15,542,863.04
47		6.4.	Suministro e instalación de salida interruptor sencillo o doble 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tuberia PVC SCH40 3/4", elementos de fijación y conductores. Cumpliendo norma RETIE.	3 días	vie 27/02/26	mar 3/03/26	$ 0.00

Id	Modo de tarea	Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
48		6.5.	Suministro e instalación de lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x4x7cm. Largo de la guaya: 100cm, incluye acometida eléctrica y accesorios.	3 días	mar 3/03/26	vie 6/03/26	$ 0.00
49		6.6.	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	4 días	mar 3/03/26	vie 6/03/26	$ 10,524,281.68
50		6.7.	Suministro e instalación de panel LED de gran formato redondo de 24W, luz neutra 4000K, dimensiones 100 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	1 día	jue 5/03/26	vie 6/03/26	$ 0.00
51		6.8.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	2 días	mié 4/03/26	vie 6/03/26	$ 0.00
52		6.9.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia de aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	2 días	mié 4/03/26	vie 6/03/26	$ 0.00
53		6.10.	Suministro e instalación de salida tomacorriente doble polo a tierra (red normal), monofásico 120V 15A, 3m prom en cable No 12 LSHF AWG, elementos de fijación y conductores.	30 días	lun 2/02/26	vie 6/03/26	$ 4,282,165.59
54		6.11.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 a 3/4" oculta sobre cielo o en muros. Cumpliendo norma RETIE.	15 días	mié 18/02/26	vie 6/03/26	$ 0.00
55		6.12.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit EMT a 3" oculta sobre cielo o en muros.	3 días	vie 27/02/26	mar 3/03/26	$ 0.00
56		6.13.	Suministro e instalación de ducto cerrado de 40X8 galvanizado o con pintura electrostática.	3 días	vie 27/02/26	mar 3/03/26	$ 0.00
57		6.14.	Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico tetrafilar con espacio para totalizador y barraje neutro y tierra. Incluye totalizador y protecciones.	2 días	mar 3/03/26	jue 5/03/26	$ 0.00
58		7.1.	Suministro e instalación de Vidrios Templado 8 mm para divisiones de oficina incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento. A todo costo.	5 días	lun 2/03/26	vie 6/03/26	$ 0.00
59		7.2.	Suministro e instalación de Puerta en Vidrio Templado 8 mm con Pivote, incluye topes de piso, accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento a todo costo.	5 días	lun 2/03/26	vie 6/03/26	$ 0.00
60		7.3.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho a todo costo de uso interior y exterior.	2 días	mié 4/03/26	vie 6/03/26	$ 0.00
61		7.4.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho de uso interior y exterior, con corte de letras para identificar las oficinas en vidrio. A todo costo.	2 días	mié 4/03/26	vie 6/03/26	$ 0.00
62		8.1.	Suministro e instalación de Puerta en madecor entamborada de 0,90 m de ancho por 2,20 m de alto, incluye marcos, chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	10 días	mar 24/02/26	vie 6/03/26	$ 0.00
63		9.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores blancos. A todo costo, incluye	15 días	mié 18/02/26	vie 6/03/26	$ 8,774,509.68
64		9.2.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos cielo falsos blanco. A todo costo, incluye lineales.	10 días	lun 23/02/26	jue 5/03/26	$ 7,973,197.14
65			**REPARACIONES LOCATIVAS CASINO - EDIFICIO CONVENCIONES**	**51 días**	**lun 24/03/25**	**mar 20/05/25**	**$ 103,035,439.57**
66		5.5.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad, para la zona de mesas del restaurante Incluye nivelación en zonas puntuales, plástico aislante, yumbolon de acuerdo con la	30 días	lun 24/03/25	vie 25/04/25	$ 82,457,951.17
67		9.1.	Suministro e instalación de estructura decorativa para plantas colgantes de 6,85m ancho x 1,00 m de profundo con viguetas cada 0,76 m en tubería metálica cuadrada 50x50x2.0mm con acabado en pintura electrostática negro mate incluye 6 puntos de apoyo en gu	6 días	mar 13/05/25	mar 20/05/25	$ 6,404,959.05
68		9.2.	Suministro e instalación de estructura para microondas con módulos de 0,71 m de largo 0,56 m de profundo y 0,40 m de alto en tubería metálica cuadrada 50x50x3.0mm en pintura electrostática negro mate incluye 2 superficies en madera tipo madecor RH de 1" c	15 días	vie 25/04/25	mar 13/05/25	$ 11,336,366.57
69		11.1.	Resanes y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre pañete o repello liso. Incluyen andamios, escaleras y sistemas de seguridad de operación. A todo costo.	6 días	mar 13/05/25	mar 20/05/25	$ 2,836,162.78
70			**REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CONVENCIONES - PISO 4**	**277.5 días**	**mié 30/04/25**	**vie 6/03/26**	**$ 1,429,891,613.27**
71			Nota: La ejecucion de actividades en esta zona se en ejecuccion pero se siguen generando actividades No previstas que generan ajustes en la programacion de obra, tambien se evidencia que se encuentran pendientes la entrega de diseños para cumplimiento no	1 día	mié 30/04/25	jue 1/05/25	$ 0.00
72		1.1.	Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.	15 días	mié 30/04/25	vie 16/05/25	$ 14,188,929.87
73		1.2.	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	18 días	jue 15/05/25	jue 5/06/25	$ 61,865,878.38
74		1.3.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros	6 días	jue 5/06/25	mié 11/06/25	$ 42,870,934.47
75		1.4.	Desmonte de redes eléctricas existentes. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	6 días	vie 6/06/25	vie 13/06/25	$ 8,356,490.54
76		1.5.	Desmonte puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el Fondo Nacional del Ahorro S.A. indique.	30 días	mié 11/06/25	mar 15/07/25	$ 17,349,941.06
77		1.6.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo	6 días	lun 19/05/25	sáb 24/05/25	$ 3,038,022.52
78		2.1.	Suministro e instalación de columnetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre 12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye platina soldada a la base y anclajes a placa de piso y retiro de escombros.	9 días	mar 17/02/26	jue 26/02/26	$ 40,348,964.43
79		2.2.	Suministro e instalación de viguetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye soldadura a columnetas y retiro de escombros.	8 días	lun 23/02/26	mar 3/03/26	$ 28,556,932.83
80		2.3.	Suministro e instalación perfiles WPC textura madera. Para instalar en muros divisorios de dimensiones 10 cm x 5 cm. Incluye estructura anclajes y retiro de escombros.	6 días	mar 24/02/26	mar 3/03/26	$ 0.00
81		3.1.	Suministro e instalación de muro en Superboard, altura 2.40 m. a dos caras incluye estructura, anclaje, cinta, estuco y fondeo de acabado en pintura en viniltipo 1.	3 días	mié 4/03/26	vie 6/03/26	$ 45,282,917.03
82		4.1.	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall de 1/2" en diferentes niveles a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura a 3 manos. A todo costo.	45 días	jue 27/11/25	vie 16/01/26	$ 135,553,564.07
83		5.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad Incluye plastico aislante y yumbolon, de acuerdo a las caracteristicas técnicas y el guardaescobas.	15 días	lun 26/01/26	mié 11/02/26	$ 262,109,854.14
84		6.1.	Suministro e instalación de alimentador 1N°12 Fase+1N°12 Neutro+1N°12 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	10 días	jue 22/01/26	mar 3/02/26	$ 35,696,049.86
85		6.2.	Suministro e instalación de alimentador a tableros en 3N°2/0 Fase+1N°2/0 Neutro+1N°2 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	10 días	mar 3/02/26	vie 13/02/26	$ 10,868,826.24
86		6.3.	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	6 días	jue 20/11/25	jue 27/11/25	$ 55,532,360.23
87		6.4.	Suministro e instalación de salida interruptor sencillo o doble 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH40 3/4", elementos de fijación y conductores. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	30 días	jue 27/11/25	mié 31/12/25	$ 1,230,734.74
88		6.5.	Suministro e instalación de Lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x4x7cm. Largo de la guaya: 100cm incluye acometida eléctrica y accesorios.	6 días	mar 3/02/26	lun 9/02/26	$ 0.00
89		6.6.	Reinstalación de panel LED cuadrado de dimensiones 60x60 cm preexistentes. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	6 días	lun 19/01/26	lun 26/01/26	$ 0.00
90		6..7	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	6 días	lun 26/01/26	lun 2/02/26	$ 2,068,984.08
91		6.8.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	24 días	jue 1/01/26	mié 28/01/26	$ 6,527,985.16
92		6.9.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	10 días	mié 21/01/26	lun 2/02/26	$ 0.00
93		6.10.	Suministro e instalación Salida tomacorriente doble polo a tierra (red normal), monofásico 120V 15A, 3m prom en cable No 12 LSHF AWG, elementos de fijación y conductores. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	6 días	lun 26/01/26	lun 2/02/26	$ 111,122,197.18
94		6.11.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 a 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	10 días	lun 10/11/25	jue 20/11/25	$ 8,108,145.85

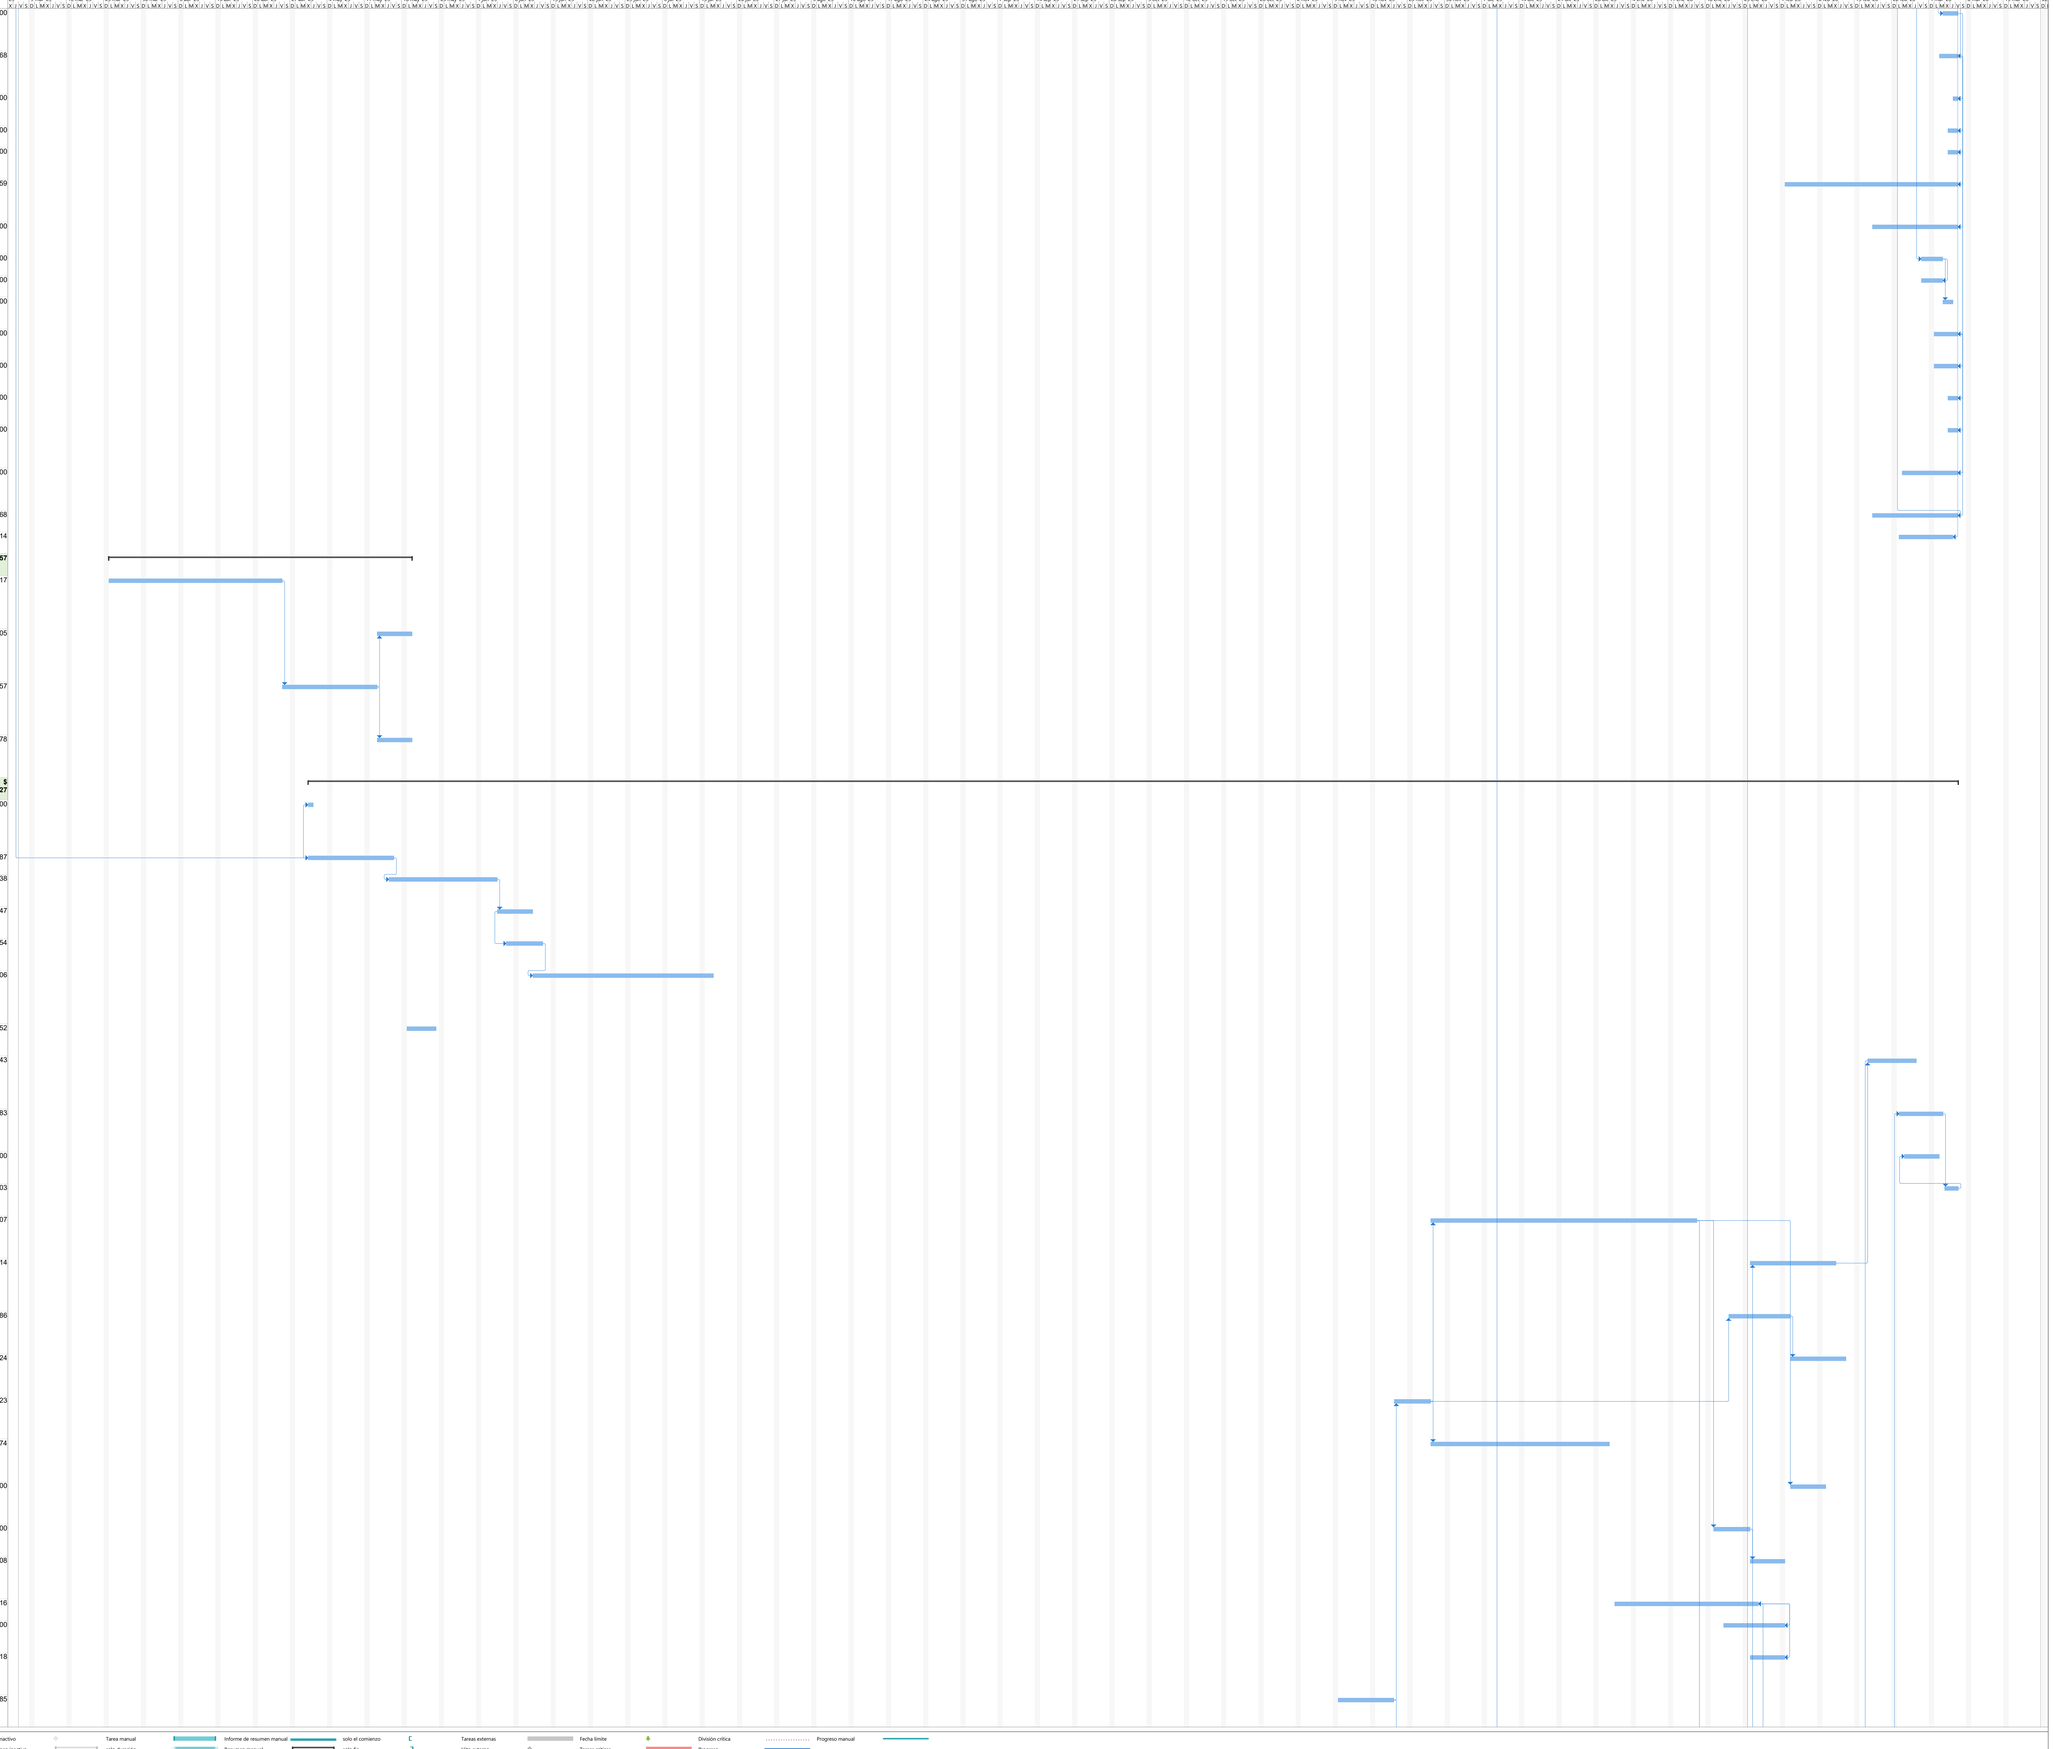

Id	Modo de tarea	Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
95		6.12.	Suministro e instalación de canalización en tuberia conduit EMT ø 3" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	6 días	jue 20/11/25	jue 27/11/25	$ 0.00
96		6.13.	Suministro e instalación de ducto cerrado de 40X8 galvanizado o con pintura electrostática. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	8 días	jue 27/11/25	vie 5/12/25	$ 0.00
97		6.14.	Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico tetrafilar con espacio para totalizador y barraje neutro y tierra, incluye totalizador y proteccione. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	3 días	mié 3/12/25	vie 5/12/25	$ 0.00
98		7.1.	Suministro e Instalación de barra de comida en acero inoxidable calibre 22. de 45 cms de ancho incluye soporte en estructura metálica a pared.	1 día	jue 5/03/26	vie 6/03/26	$ 0.00
99		7.2.	Suministro e instalación de mueble de cocina de 1.60x0.60x0.90m en madera RH y en acero inoxidable, incluye grifería y accesorios de desagüe.	5 días	lun 2/03/26	vie 6/03/26	$ 0.00
100		8.1.	Suministro e instalación de vidrio templado 8 mm para divisiones de oficina incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento. A todo costo.	10 días	lun 23/02/26	jue 5/03/26	$ 263,124,610.56
101		8.2.	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado 8 mm con pivote, incluye topes de piso, acesorios en aluminio para su correcto funcionamiento a todo costo.	10 días	lun 23/02/26	jue 5/03/26	$ 51,386,578.18
102		8.3.	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de 8 mm con sistema antipanico. Incluye topes de piso y accesorios para su correcto funcionamiento. A todo costo.	12 días	vie 20/02/26	jue 5/03/26	$ 0.00
103		8.4.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho, de uso interior y exterior. A todo costo.	6 días	vie 27/02/26	jue 5/03/26	$ 0.00
104		8.5.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho, de uso interior y exterior, con corte de letras para identificar las oficinas en vidrio. A todo costo.	6 días	vie 27/02/26	jue 5/03/26	$ 0.00
105		9.1.	Suministro e instalación de puerta en madecor entamborada de 0,90 m de ancho por 2.20 m de alto, incluye marcos chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	2 días	mié 4/03/26	jue 5/03/26	$ 25,427,303.75
106		9.2.	Suministro e instalación de superficie de madera ancho 40cm y 3 cm de espesor, para instalar en muros bajos, correspondientes a la barra para computadores y zonas de estancia.	4 días	lun 2/03/26	jue 5/03/26	$ 38,244,832.83
107		10.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores blanco. A todo costo, incluye lineales.	5 días	mar 20/01/26	lun 26/01/26	$ 71,554,539.49
108		10.2.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos cielo falsos blanco. A todo costo, incluye lineales.	3 días	vie 16/01/26	mar 20/01/26	$ 88,674,182.85
109		10.3.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores azul institucional. A todo costo, incluye lineales.	5 días	mar 20/01/26	lun 26/01/26	$ 801,852.93
110		10.4.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores verde institucional. A todo costo, incluye lineales.	6 días	lun 19/01/26	lun 26/01/26	$ 0.00
111			**REPARACIONES LOCATIVAS - TORRE DE TECNOLOGIA - PISO 2**	**316.5 días**	**vie 7/03/25**	**mié 25/02/26**	**$ 2,102,876.45**
112			Nota: La definicion de alcance en las actividades de esta zona al igual que la ejecucion de actividades en esta zona de acuerdo a la entrega de area a intervenir y definiciones por parte de la entidad y la generacion de actividades No previstas, generara	1 día	vie 7/03/25	sáb 8/03/25	$ 0.00
113		1.1.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall, incluye desmonte de 113 luminarias tipo panel Led de 60 x 60 luz neutra 4000K y retiro con su disposición final de escombros.	4 días	jue 15/01/26	mar 20/01/26	$ 0.00
114		1.2.	Desmonte de puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	10 días	lun 5/01/26	jue 15/01/26	$ 0.00
115		1.3.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo.	4 días	lun 29/12/25	jue 1/01/26	$ 0.00
116		2.1.	Suministro e instalación de cielorraso en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco y capa fondeo pintura. A todo costo.	10 días	lun 26/01/26	jue 5/02/26	$ 0.00
117		3.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad. Incluye plástico aislante y yumbolon de acuerdo a las características técnicas y el guardaescobas.	5 días	mar 17/02/26	lun 23/02/26	$ 0.00
118		4.1.	Suministro e instalación de lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x4x7cm. Largo de la guaya: 100cm, incluye acometida eléctrica y accesorios.	4 días	jue 19/02/26	mar 24/02/26	$ 0.00
119		4.2.	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	5 días	jue 5/02/26	mié 11/02/26	$ 0.00
120		4.3.	Reinstalación de panel LED cuadrado de dimensiones 60x60 cm luz neutra 4000K preexistentes. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	7 días	mié 11/02/26	jue 19/02/26	$ 0.00
121		4.4.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	5 días	vie 13/02/26	jue 19/02/26	$ 0.00
122		4.5.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia de aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	5 días	vie 13/02/26	jue 19/02/26	$ 0.00
123		5.1.	Suministro e instalación de Puerta en madecor entamborada de 0,90 m de ancho por 2.20 m de alto, incluye marcos, chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	8 días	lun 16/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
124		6.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores blancos. A todo costo, incluye lineales.	10 días	jue 5/02/26	mar 17/02/26	$ 2,102,876.45
125			**BOLSA DE ITEMS NO PREVISTOS**	**339 días**	**vie 7/03/25**	**sáb 21/03/26**	**$ 3,174,930,684....**
126			Nota: Cualquier alteracion en las fechas de entrega de espacios puede generar afectaciones a la programacion presentada lo que generara modificacion en la entrega final	1 día	vie 7/03/25	sáb 8/03/25	$ 0.00
127			**Nota: Las actividades NO CONTEMPLADAS generan ajustes en programacion ya que no fuesen contempladas dentro de los contractuales priorizados**	**11.13 días**	**mar 10/03/26**	**sáb 21/03/26**	**$ 727,540,034.62**
128			**SALDO EN BOLSA**	**11.13 días**	**mar 10/03/26**	**sáb 21/03/26**	**$ 727,540,034.62**
129		NP-1	Demolición placa maciza 0.15 mt en horarios autorizado por la entidad (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopioaescombrera).	100 días	mié 4/06/25	mié 24/09/25	$ 52,645,484.41
130		NP-2	Suministro e instalación de mortero premezclado de nivelación bombeable, acelerado a 7 días con baja permeabilidad para zona de cubiertas, garantizando pendientes de desagues hacia los sifones.	11.13 días	mié 4/06/25	lun 16/06/25	$ 17,720,754.50
131		NP-3	Demolición baldosa muro en horarios autorizados por la ENTIDAD (incluye retiro de material desde frente de obra al sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	220 días	mié 4/06/25	jue 5/02/26	$ 13,712,088.24
132		NP-4	Baldosa ceramica pared 30x60.	200 días	lun 14/07/25	lun 23/02/26	$ 57,266,707.94
133		NP-5	Baldosa ceramica piso 60x60.	186 días	mar 5/08/25	sáb 28/02/26	$ 26,861,480.91
134		NP-6	Suministro e instalacion de cinta led en parte baja de gabinete superior de mueble de cocina.	10 días	mié 4/06/25	sáb 14/06/25	$ 321,069.92
135		NP-7	Desmonte y reinstalacion de rejillas de extraccion aire en cocina presidencia.	2 días	mié 4/06/25	jue 5/06/25	$ 166,495.50
136		NP-8	Desmonte redes eléctricas existentes, Incluye la disposición final fondo Nacional del Ahorro indique. (Zona de recepcion).	20 días	mié 4/06/25	jue 26/06/25	$ 1,147,815.04
137		NP-9	Demolición de guardaescoba, (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	30 días	mié 4/06/25	mar 8/07/25	$ 3,520,139.43
138		NP-10	Desmonte espejo.	200 días	mié 4/06/25	mié 14/01/26	$ 264,061.86
139		NP-11	Desmonte de cubierta en policarbonato.	10 días	mié 4/06/25	sáb 14/06/25	$ 2,550,808.74
140		NP-12	Suministro e instalación de Policarbonato alveolar 8 mm para cubierta curva, incluye conectores y accesorios para su correcta instalación. No incluye estructura de soporte.	10 días	lun 16/06/25	jue 26/06/25	$ 19,578,299.57
141		NP-13	Mantenimiento marquesina cubierta de vidrio acceso, incluye: Revisión general, limpieza perimetral y limpieza de vidrios.	10 días	lun 16/06/25	jue 26/06/25	$ 1,251,486.95
142		NP-14	Lavado e hidrofugado de fachadas, muros en piedra y/o acabadoabuzardado	10 días	lun 16/06/25	jue 26/06/25	$ 13,865,189.76
143		NP-15	Suministro e instalacion de revestimiento interior de fachada en WPC Panel Casino, de acuerdo a muestra seleccionada.	15 días	jue 26/06/25	sáb 12/07/25	$ 27,217,823.92
144		NP-16	Desmonte de aparatos sanitarios (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio (hasta 50 m) y desde sitio de acopio a escombrera).	210 días	mié 4/06/25	sáb 24/01/26	$ 3,054,917.40
145		NP-17	Desmonte de muro fachada imitacion madera (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera)	5 días	mié 4/06/25	mar 10/06/25	$ 197,719.10
146		NP-18	Suministro e instalación de sensor de presencia Infrarrojo 360° de cobertura, montaje en techo, detección de movimiento hasta 4 metros radiales a una altura de instalación de 2.4 metros.	210 días	jue 5/06/25	lun 26/01/26	$ 10,102,410.45
147		NP-19	Suministro e instalación de enceres mobiles de inferior 220 X 90 X 63 y superior de 200X76X35 incluye campana extractora, puertas, manijas en acero tabular, bisagras de parche, entrepaños, patas de 8 cm y manija en acero tubular. Modulo torre hornos de 20	10 días	jue 3/07/25	lun 14/07/25	$ 31,819,139.99

Id	Modo de tarea	Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
148		NP-20	Mesón en quartzone blanco polar con hueco para estufa y lavaplatos, incluye pulida, poceta, salpicadero 8 cm y estufa x 4 puestos challenger para uso con gas propano.	10 días	mar 15/07/25	vie 25/07/25	$ 8,448,105.00
149		NP-21	Suministro e instalación punto de gas propano para estufa de presidencia, en tuberia pe al pe de 1/2" , con coraza de protección a la vista y accesorios de conexión con pases por muros. incluye suministro de 2 cilindros de 100 libras en gas propano, con v	10 días	vie 25/07/25	mié 6/08/25	$ 7,592,050.50
150		NP-22	Suministro e instalacion registro 1/2" agua potable	210 días	vie 4/07/25	mar 24/02/26	$ 331,836.63
151		NP-23	Jardineras artificiales de acuerdo a render incluye amarre plastico	210 días	vie 4/07/25	mar 24/02/26	$ 8,666,101.72
152		NP-24	Suministro e instalacion de extractor para cocina y baños (16 x 16 x 9 cm)	210 días	jue 10/07/25	lun 2/03/26	$ 2,180,092.08
153		NP-25	Demolicion de meson en grano de marmol de ventanilla bancolombia	5 días	vie 4/07/25	jue 10/07/25	$ 110,196.59
154		NP-26	Desmonte de aviso de fachada en recepción	5 días	vie 4/07/25	jue 10/07/25	$ 349,090.50
155		NP-27	Suministro e instalación de sanitario blanco institucional tipo adriatica o similar de entrada posterior no incluye pusch	210 días	lun 14/07/25	jue 5/03/26	$ 26,877,283.46
156		NP-28	Suministro e instalación lavamanos blanco tipo cascada de baru o similar, no incluye griferia no incluye push	210 días	jue 10/07/25	lun 2/03/26	$ 16,650,001.38
157		NP-29	Suministro e instalacion de carpa en lona para control de acceso en zona de recepcion	5 días	vie 4/07/25	jue 10/07/25	$ 4,446,479.39
158		NP-30	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	210 días	jue 10/07/25	lun 2/03/26	$ 4,783,704.31
159		NP-31	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	210 días	jue 10/07/25	lun 2/03/26	$ 4,030,769.72
160		NP-32	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	210 días	jue 10/07/25	lun 2/03/26	$ 4,184,869.32
161		NP-33	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	210 días	jue 10/07/25	lun 2/03/26	$ 1,276,297.77
162		NP-34	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	210 días	jue 10/07/25	lun 2/03/26	$ 11,721,441.06
163		NP-35	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	210 días	jue 10/07/25	lun 2/03/26	$ 1,217,026.61
164		NP-36	RED SANITARIA PVC-S 4"	210 días	jue 10/07/25	lun 2/03/26	$ 19,596,117.54
165		NP-37	RED SANITARIA PVC-S 3"	210 días	jue 10/07/25	lun 2/03/26	$ 1,559,240.68
166		NP-38	RED SANITARIA PVC-S 2"	210 días	jue 10/07/25	lun 2/03/26	$ 589,896.02
167		NP-39	RED SANITARIA PVC-VENTILACION 2"	210 días	jue 10/07/25	lun 2/03/26	$ 2,295,713.95
168		NP-40	Red suministro 1 1/4"	210 días	jue 10/07/25	lun 2/03/26	$ 4,005,770.73
169		NP-41	Red suministro 1"	210 días	jue 10/07/25	lun 2/03/26	$ 1,340,082.17
170		NP-42	Red suministro 3/4"	210 días	jue 10/07/25	lun 2/03/26	$ 234,392.14
171		NP-43	Red suministro 1/2"	210 días	jue 10/07/25	lun 2/03/26	$ 616,092.67
172		NP-44	Registro PVC-P 1 - 1/4"	210 días	jue 10/07/25	lun 2/03/26	$ 1,615,228.34
173		NP-45	Registro PVC-P 1"	210 días	jue 10/07/25	lun 2/03/26	$ 824,463.52
174		NP-46	Trasiego incluye traslado a sitio de acopio en bolsas de aproximadamente 25 kilos	130 días	jue 2/10/25	mié 25/02/26	$ 4,944,606.30
175		NP-47	Construccion de Media caña en mortero 1:3	130 días	mié 1/10/25	mar 24/02/26	$ 17,254,412.38
176		NP-48	Suministro e instalación orinal tipo gotta o similar de entrada posterior no incluye grigeria ni incluye pusch	90 días	mié 8/10/25	vie 16/01/26	$ 5,118,782.05
177		NP-49	Desmonte de cubierta en lamina de zinc en cubierta de convenciones incluye estructura metalica de soporte, incluye retiro a sitio de acopio y disposición final.	15 días	mié 8/10/25	vie 24/10/25	$ 7,258,854.31
178		NP-50	Desmonte de ductos de aire acondicionado (incluye fibra de vidrio, transporte y disposición final)	30 días	mié 8/10/25	lun 10/11/25	$ 17,388,395.15
179		NP-51	Desmonte de ductos de red contraincendio en tuberia CPVC de varios diametros incluye soporteria. (Incluye trasiego y disposición final)	30 días	mié 8/10/25	lun 10/11/25	$ 5,840,034.56
180		NP-52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Impermeabilización de placa poliurea pura RESISTENTE A RAYOS UV DANOCOAT 250 incluye suministro y aplicación de POLIUREA en 80 MILS +-10%, ESPESOR TEXTURIZADA PREVIA IMPRIMACION EPOXICA BICOMPONENTE CON ARENA DE CUARZO EN UNA C	20 días	jue 30/10/25	vie 21/11/25	$ 277,132,589.62
181		NP-53	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRATO DE MORTERO SECO CON BAJO CONTENIDO DE AGUA PARA NIVELACION DE CUBIERTAS CON ESPESORES PROMEDIO DE 8cm. SOBRE SUPERFICIE IRREGULAR RESULTADO DE DEMOLICION DE ELEMENTOS NO DESMONTADOS Y RETIRADOS EN LAS AREAS A INTERVENIR	20 días	mié 8/10/25	jue 30/10/25	$ 131,674,670.43
182		NP-54	Demolicion de dados de concreto de 0.3 x 0.3 x 0.25 m, los cuales se encuentran en zona de cubierta incluye trasiego y disposición final.	15 días	mié 8/10/25	vie 24/10/25	$ 5,666,964.17
183		NP-55	Desmonte de ducto de extrator incluye retiro 2 extractores tipo hongo incluye retiro y disposición final.	15 días	mié 8/10/25	vie 24/10/25	$ 825,277.49
184		NP-56	Desmonte de bandeja bandeja tipo escalera incluye cableado estructurado, cableado norr mal, cableado regulado y voz y datos correspondiente a alimentacion de puestos de trabajo existentes (incluye clasificación y entrega a la Entidad)	30 días	mié 8/10/25	lun 10/11/25	$ 12,795,899.87
185		NP-57	Suministro e instalación de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado de 30 x 10 x 1 m galvanizada con separador incluye curvas, soporteria y conductor de tierra para bandeja.	30 días	mié 22/10/25	mar 25/11/25	$ 53,378,279.02
186		NP-58	Suministro e instalación de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado de 15 x 10 x 1 m galvanizada, incluye curvas, soporteria y conductor de tierra para bandeja.	30 días	lun 3/11/25	vie 5/12/25	$ 45,464,349.48
187		NP-59	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 " SEGÚN DISEÑO DESARROLLO DE HASTA 1m	15 días	mié 19/11/25	vie 5/12/25	$ 26,258,930.27
188		NP-60	Punto hidraulico para rociador automatico de 1/2"	6 días	vie 12/12/25	jue 18/12/25	$ 10,635,732.54
189		NP-61	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTEUL-FM	5 días	jue 18/12/25	mié 24/12/25	$ 5,903,837.93
190		NP-62	Suministro e instalacion TEE MECANICA RANURADA DE 3" X 1 1/2"	6 días	mar 28/10/25	lun 3/11/25	$ 1,274,550.18
191		NP-63	Suministro e instalacion STRAP DE 3" X 1"	5 días	vie 12/12/25	mié 17/12/25	$ 1,949,366.31
192		NP-64	Suministro e instalación de soporte tipo pera con varilla 3/8" con perno bean clamb para tubería 1"	5 días	sáb 6/12/25	jue 11/12/25	$ 3,095,178.48
193		NP-65	Suministro e instalación de soporte tipo pera con varilla 3/8" con perno bean clamb para tubería 1-1/2"	4 días	lun 3/11/25	jue 6/11/25	$ 1,019,179.39
194		NP-66	Suministro e instalación de soporte tipo pera con varilla 3/8" con perno bean clamb para tubería 3"	10 días	jue 23/10/25	lun 3/11/25	$ 3,870,261.89
195		NP-67	Suministro e instalación de soporte transversal sismoresitente para tubería 3"	5 días	mié 29/10/25	lun 3/11/25	$ 4,633,399.57
196		NP-68	Suministro e instalación de soporte LONGITUDINAL sismoresistente para tubería 3"	5 días	mié 29/10/25	lun 3/11/25	$ 4,998,885.56
197		NP-69	SOPORTE ANTISISMICO 4 VIAS	2 días	mar 4/11/25	jue 6/11/25	$ 2,884,819.43
198		NP-70	TUBERIA ACC ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y PINTURA)	3 días	mar 9/12/25	jue 11/12/25	$ 11,996,293.14
199		NP-71	Tuberia de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diametro 1-1/2", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	3 días	mar 4/11/25	jue 6/11/25	$ 3,556,106.16
200		NP-72	Tuberia de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diametro 3", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	10 días	jue 23/10/25	lun 3/11/25	$ 53,320,381.64
201		NP-73	Suministro e instalacion codo ranurado acero al Carbono ASTM-A53 SCH 40 diametro 3", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	3 días	jue 30/10/25	lun 3/11/25	$ 1,091,378.00
202		NP-74	Suministro e instalacion TEE ranurado acero al Carbono ASTM-A53 SCH 40 diametro 3", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	3 días	jue 30/10/25	lun 3/11/25	$ 1,425,941.46
203		NP-75	Suministro e instalación de estación de control para red contra incendios	2 días	lun 22/12/25	mié 24/12/25	$ 4,035,055.44
204		NP-76	Suministro e instalación de Gabinete Tipo 3 para red contra incendios	3 días	lun 22/12/25	mié 24/12/25	$ 3,012,845.84
205		NP-77	Suministro e instalación de ventosa automática para red contra incendios	2 días	lun 22/12/25	mié 24/12/25	$ 1,744,781.58
206		NP-78	Suministro e Instalacion AVISO 1 - INGRESO DE FUNCIONARIOS: Suministro e instalación de aviso tipo caja de luz, 15 cm de cantonera, logo en relieve acrilico, cantonera de 4 cm - iluminación LED - Textos en acrílico 4m sobre puestas con interruptor encendi	3 días	lun 27/10/25	mié 29/10/25	$ 13,233,041.37
207		NP-79	Suministro e Instalacion AVISO 2 INTERNO - AVISO TEXTO - JUNTOS HACEMOS REALIDAD EL HOGAR DE LOS COLOMBIANOS - Suministro e instalación de aviso en acrilico 3mm letra a letra volumentrico - cantonera de 5 cm - (3,2m*40cm)	3 días	mié 29/10/25	sáb 1/11/25	$ 10,671,461.24
208		NP-80	Suministro e Instalacion AVISO 3 - LOGO INTERNO FNA - Suministro e instalación de aviso en acrilico 3mm letra a letra volumentrico - cantonera de 5 cm - (80cm*80cm)	3 días	lun 3/11/25	mié 5/11/25	$ 5,094,478.64
209		NP-81	Suministro e Instalacion AVISO 4 - LOGO INTERNO FNA - Suministro e instalación de aviso en acrilico 3mm letra a letra Volumentrico - cantonera de 5 cm - (120cm*120cm)	3 días	mié 5/11/25	sáb 8/11/25	$ 5,975,054.84
210		NP-82	Suministro e instalación de señales en acrilico cal 3m + impresión digital full color - corte laser + instalación -(Opciones: hale, empuje, rack, baños mixtos, Ref Entrada FNA (11cm*29 cm))	100 días	sáb 8/11/25	sáb 28/02/26	$ 2,019,213.02
211		NP-83	Pañete impermeabilizado con mortero 1:3 y sika 1 o similar (no incluye lineales)	40 días	lun 24/11/25	mié 7/01/26	$ 21,237,666.68
212		NP-84	Pañete impermeabilizado con mortero 1:3 y sika 1 o similar	40 días	vie 28/11/25	mar 13/01/26	$ 9,000,538.57
213		NP-85	Placa contrapiso de 10 cm de espesor, en concreto de 2500 PSI, No incluye acero de refuerzo	20 días	vie 21/11/25	sáb 13/12/25	$ 2,964,923.26
214		NP-86	Mampostería en bloque de arcilla no. 4 (no incluye lineales)	40 días	vie 28/11/25	lun 12/01/26	$ 3,784,020.85
215		NP-87	Mampostería en bloque de arcilla no. 4 ancho max =0.70cm	40 días	mié 3/12/25	sáb 17/01/26	$ 2,754,849.53

Id	Modo de tarea	Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
216		NP-88	Anclaje 1/2" L=50 cm	30 días	mar 9/12/25	lun 12/01/26	$ 8,652,630.54
217		NP-89	Viga de amarre de 0,12 x 0,20 NO incluye acero de refuerzo, alambre negro, incluye fomaleta y concreto de 2500 psi.	30 días	lun 8/12/25	sáb 10/01/26	$ 8,127,917.61
218		NP-90	Columneta de confinamiento (0,12*0,20) NO incluye acero de refuerzo, alambre negro, INCLUYE fomaleta y concreto de 2500 psi.	30 días	mar 9/12/25	lun 12/01/26	$ 2,989,855.96
219		NP-91	Suministro e Instalacion de soporte para tuberia de 1/2" a 4" para tuberias hidrosanitarias	15 días	vie 21/11/25	lun 8/12/25	$ 3,560,687.56
220		NP-92	Dovela en concreto tipo gruting de 3000 psi NO incluye acero de refuerzo	30 días	mié 3/12/25	mar 6/01/26	$ 723,848.44
221		NP-93	Construccion de Placa de entrepiso de 2.5 m x 2.5 m, con lámina colaborante 2", cal 22, h=10cm de acuerdo a detalle expresado en justificacion, incluye acero de refuerzo, concreto de 3000 psi y lamina colaborante (Incluye Cerramiento de protección en terc	10 días	lun 15/12/25	jue 25/12/25	$ 6,157,627.64
222		NP-94	Demolición de muro en mampostería en bloque de arcilla de 15 cm (incluye trasciego de materiales desde unas disistancias superiores a 50 ml y niveles superiores a un piso a punto de acopio de acuerdo a horarios establecidos por entidad)	5 días	vie 28/11/25	mié 3/12/25	$ 2,146,824.61
223		NP-95	Desmonte de ductos de extracción de aire desde terraza hasta nivel de piso cuarto piso (Cerramiento preventivo en 3 piso, ductos de 1,60*0,90. Incluye trasiego desde cubierta ubicada a cinco pisos y disposición final).	6 días	vie 5/12/25	vie 12/12/25	$ 5,059,045.31
224		NP-96	Suministro e instalacion de gravilla lavada para transiciones entre enchapes y / o pisos laminados o urbanismo (ancho promedio 15 cm)	80 días	vie 28/11/25	mié 25/02/26	$ 5,722,162.85
225		NP-97	Desmonte de antena existente (incluye trasiego y disposición)	10 días	vie 28/11/25	mar 9/12/25	$ 3,155,310.48
226		NP-98	Mampostería en bloque de arcilla estructural No. 4 de perforacion vertical (no incluye lineales, ni elementos no estructurales)	20 días	vie 28/11/25	sáb 20/12/25	$ 3,707,042.35
227		NP-99	Mampostería en bloque de arcilla estructural No. 4 de perforacion vertical, ancho max <0.60 cm (No incluye elementos no estructurales)	20 días	mié 3/12/25	jue 25/12/25	$ 789,705.45
228		NP-100	Suministro e instalacion de lineal en super board contra la verdaneria existente	25 días	jue 5/02/26	jue 5/03/26	$ 27,143,849.66
229		NP-101	Suministro e instalacion de Marco para luminaria led de 60 x 60 para cielo raso en Dry Wall	60 días	lun 29/12/25	jue 5/03/26	$ 14,555,169.80
230		NP-102	Suministro e instalacion de Espejo en 4mm con bordes pulidos,brillados y flotado con tubular en aluminio con luz led calida de 120 v	80 días	vie 28/11/25	mié 25/02/26	$ 15,380,168.98
231		NP-103	Suministro e instalación de platina 150x150x6 mm con tornillo pasante de 1/2" L=0,40m, 6 tuercas y arandelas para instalación de estructura metalica de los micro ondas	12 días	vie 28/11/25	jue 11/12/25	$ 2,289,101.00
232		NP-104	Suministro e instalacion de luminaria led de 60 x 60 de 4000 k NO INCLUYE marco para luminaria de 60 x 60 para cielo raso en Dry Wall	45 días	mié 14/01/26	jue 5/03/26	$ 23,292,116.13
233		NP-105	Desmonte de puerta de vidrio laminado 5+5 MM, trasiego a punto de acopio y disposicion final a botadero certificado, suministro e instalacion de puerta en vidrio templado laminado 5 + 5 MM, con pelicula tipo bronce, incluye reinstalacion de postes de giro	10 días	vie 28/11/25	mar 9/12/25	$ 7,931,993.61
234		NP-106	Ajuste de puertas de acceso en vidrio templado incluye cambio de montante y cambio de bisagras hidráulicas	12 días	vie 28/11/25	jue 11/12/25	$ 17,950,013.86
235		NP-107	Suministro e instalacion de Tapa registro en acero inoxidable de 30 x 30 cm incluye mortero de caja, estuco y pintura	30 días	vie 23/01/26	mié 25/02/26	$ 4,657,894.14
236		NP-108	Suministro de mesón para cubierta de lavamanos con perforaciones para poceta de sobre poner en Quarzstone Blanco Polar de 0.80 x0.55 mt, con baberos de 30 cms a los costados, salpicadero de 80 cms x 8 cms y frente con reengruese de 5 cms y tapa frontal en	5 días	vie 28/11/25	mié 3/12/25	$ 2,314,287.45
237		NP-109	Suministro e instalacion de mesón para lavamanos con perforaciones para poceta de sobre poner en Quarzstone Blanco Polar de 55 cm de ancho con baberos laterales y frontal de 30 cms con su respectivo salpicadero en escuadra de 8 cms, fijado con pie de amig	75 días	vie 28/11/25	jue 19/02/26	$ 47,901,643.31
238		NP-110	Suministro de caseta para puesto de vigilancia temporal en zona de acceso vehicular y rehubicable en cualquier sector que disponga la entidad, en estructura metalica calibre 18 con pintura esmalte negra.	10 días	vie 28/11/25	mar 9/12/25	$ 3,699,900.00
239		NP-111	Suministro e instalación de sanitario SMART AL SINGLE BLANCO o similar	2 días	mar 9/12/25	jue 11/12/25	$ 880,895.62
240		NP-112	Construccion de cajas de inspeccion sanitarias DE 80 X 80, incluye marco y tapa	5 días	mar 9/12/25	lun 15/12/25	$ 889,906.11
241		NP-113	Suministro, corte, doblado e instalación acero figurado 60000 PSI	40 días	mar 9/12/25	jue 22/01/26	$ 5,426,982.39
242		NP-114	Suministro e instalación de pirlan en aluminio de 5.5 cm de ancho fijado con chazo puntilla	50 días	mar 9/12/25	mar 3/02/26	$ 1,978,188.53
243		NP-115	Suministro e instalacion dilatación dry wall en Z	70 días	mar 9/12/25	mié 25/02/26	$ 13,580,674.64
244		NP-116	Refuerzo filos y dilataciones en muros y columnas	60 días	sáb 20/12/25	mié 25/02/26	$ 14,991,327.15
245		NP-117	Resanes y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre pañete o repello liso. A todo costo.	60 días	sáb 20/12/25	mié 25/02/26	$ 28,804,954.79
246		NP-118	Presurización de la RCI mediante cargue de la red, para evaluación de la resistencia de las tuberías, uniones, válvulas y accesorios frente a presiones superiores a las de operación normal, según normas como NFPA 24 y NFPA 13 o ASME B31.1, bajo pruebas hi	10 días	vie 28/11/25	mar 9/12/25	$ 5,035,169.24
247		NP-119	Desmonte de redes eléctricas existentes. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	40 días	lun 19/01/26	mié 4/03/26	$ 5,335,625.79
248		NP-120	DESMONTE DE PUERTAS EN MADERA. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	40 días	lun 19/01/26	mié 4/03/26	$ 707,361.68
249		NP-121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PARA INTERIORES CON ANCHO MAYOR A 0,60 M	40 días	lun 19/01/26	mié 4/03/26	$ 17,123,863.51
250		NP-122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PARA INTERIORES CON ANCHO MENOR A 0,60 M (ml)	40 días	lun 19/01/26	mié 4/03/26	$ 13,014,961.62
251		NP-123	Suministro e instalacion de acometida electrica en: tubo emt 2 de 3" y cable 2(3#350+1#500+1#2T cu)desde tablero ppal casino 1er piso a cuarto tecnico 4° piso.	15 días	lun 16/02/26	mié 4/03/26	$ 320,426,113.74
252		NP-124	Suministro e instalacion de tablero electico para cuarto tecnico 4° piso de acuerdo a diagrama unifiliar y cargas requeridas	5 días	sáb 28/02/26	vie 6/03/26	$ 0.00
253		NP-125	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS Y/O PISOS, ANCHO <= 10CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	30 días	jue 29/01/26	mié 4/03/26	$ 2,183,122.07
254		NP-126	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA METÁLICA CUADRADA DE 3X2" CON SOSCO	15 días	lun 16/02/26	mié 4/03/26	$ 692,547.28
255		NP-127	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATES DE ESQUINA PARA ENCHAPES EN WING EN ALUMINIO	15 días	lun 16/02/26	mié 4/03/26	$ 3,460,156.96
256		NP-128	DECAPADO, PULIDA Y SELLADO DE PISOS EN GRANO DE MARMOL	10 días	vie 20/02/26	mié 4/03/26	$ 0.00
257		NP-129	DECAPADO, PULIDA Y SELLADO DE PISOS EN GRANO DE MARMOL	10 días	vie 20/02/26	mié 4/03/26	$ 0.00
258		NP-130	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERÁMICA PARED CALIDAD PRIMERA, CON ANCHO < = A 0.60 ML (LINEAL)	25 días	mié 4/02/26	mié 4/03/26	$ 13,454,328.63
259		NP-131	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METÁLICA TIPO CUPULA 4 X 3" SOSCO	10 días	lun 19/01/26	jue 29/01/26	$ 4,427,238.67
260		NP-132	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPÓXICA CON UN ANCHO MAYOR A 60CM (NO INCLUYE LINEALES)	25 días	mié 4/02/26	mié 4/03/26	$ 5,138,127.59
261		NP-133	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPÓXICA CON UN ANCHO MENOR A 60CM (LINEALES)	25 días	mié 4/02/26	mié 4/03/26	$ 655,346.02
262		NP-134	SUMINISTRO EL INSTALACION DE ALISTADO PISOS 1:3, E= 0.04 (INCLUYE TRASCIEGO DE INSUMOS A LOS DIFERENTES FRENTES DE OBRA	15 días	mié 4/02/26	vie 20/02/26	$ 6,719,462.39
263		NP-135	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO DE 18 CTS. 3F. 5H 225AMP. CON PUERTA Y CON TOTALIZADOR BASE GALVANIZADA TAPA BLANCA	10 días	lun 23/02/26	vie 6/03/26	$ 1,582,396.66
264		NP-136	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO DE 12 CTS. 3F. 5H 225AMP. CON PUERTA Y CON TOTALIZADOR BASE GALVANIZADA TAPA BLANCA	10 días	lun 23/02/26	vie 6/03/26	$ 2,205,359.93
265		NP-137	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PVC-P 1 1/2", INCLUYE UNIVERSALES	15 días	lun 16/02/26	mié 4/03/26	$ 1,242,611.41
266		NP-138	RED DE SUMINISTRO PVC-P 1 1/2"	15 días	lun 16/02/26	mié 4/03/26	$ 1,382,678.08
267		NP-139	SUMINISTRO E INSTALACION DEREGISTRO PVC-P 3/4", INCLUYE UNIVERSALES	15 días	lun 16/02/26	mié 4/03/26	$ 534,938.94
268		NP-140	Suministro e instalación de cielorraso en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo de vinilo. A todo costo.	40 días	lun 19/01/26	mié 4/03/26	$ 5,848,209.93
269		NP-141	Suministro e instalación de muro en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo.	40 días	lun 19/01/26	mié 4/03/26	$ 3,621,708.78
270		NP-142	Suministro e instalación de puerta en madecor entamborada de 0,85 m de ancho por 2.20 m de alto, sistema corredizo Ducasse. incluye marcos, chapa tipo pico de loro con su respectiva cantonera, guia de corredizo, tapa de guia en madecory todo lo necesario	40 días	lun 19/01/26	mié 4/03/26	$ 6,493,324.50
271		NP-143	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 30 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	30 días	jue 29/01/26	mié 4/03/26	$ 394,612.83

Id	Modo de tarea	Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
272		NP-144	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 18 w, luz neutra 4000K. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	30 días	jue 29/01/26	mié 4/03/26	$ 3,451,618.21
273		NP-145	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 9 w, luz neutra 4000K. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	30 días	jue 29/01/26	mié 4/03/26	$ 2,520,452.04
274		NP-146	Suministro e instalacion salida electrica para toma corriente doble normal GFCI Incluye: Tuberia sch-40 de 3/4"(max.6mts) + caja metalica + terminales + cable trenzado (LSZH) 3x12 + autodesforres + TOMA GFCI FUTURA	15 días	mié 18/02/26	vie 6/03/26	$ 2,443,828.35
275		NP-147	Suministro e instalacion de salida para HDMI incluye: tuberia pvc sch-40 de 1-1/4 + caja 10x10 doble fondo con suplemento + caja 2400 + terminales. NO INCLUYE CABLE	15 días	lun 16/02/26	mié 4/03/26	$ 5,892,930.63
276		NP-148	Suministro e instalación de alimentador 3N°8 Fase+1N°8 Neutro+1N°10 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	25 días	vie 6/02/26	vie 6/03/26	$ 3,409,642.84
277		NP-149	SENSOR PRESENCIA MULTITECNOLOGIA LEVITON OSC10-MOW	15 días	lun 16/02/26	mié 4/03/26	$ 8,241,826.94
278		NP-150	SENSOR MULTITECNOLOGIA PIR MONTAJE EN TECHO LEVITON OSC15-10W CON FUENTE RELEVO-P/SENSOR LEVITON OSP20-RDO	15 días	lun 16/02/26	mié 4/03/26	$ 2,723,059.80
279		NP-151	Suministro e instalacion de perfiles WPC DE 100 X 50 MM. EN COLOR ASIGNADO POR LA ENTIDAD, INCLUYE SOPORTE GIRATORIO DE EXTREMOS	15 días	jue 29/01/26	lun 16/02/26	$ 9,430,021.46
280		NP-152	Suministro e instalacion de piso tipo DECK en WPC de acuerdo a detalle suministrado por la entidad (incluye estructura y accesorios de fijacion y bocel de terminacion)	15 días	mié 18/02/26	vie 6/03/26	$ 11,963,487.53
281		NP-153	Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada cla. 18 de 1.2 m de desarrollo incluye sorverte de flujo	5 días	sáb 28/02/26	vie 6/03/26	$ 0.00
282		NP-154	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LÁMINA ALFAJOR Y ANGULO A CON PESTAÑAS DE 10cm POR LOS LADOS, PARA SELLAR DUCTO EN CUBIERTA	20 días	jue 29/01/26	vie 20/02/26	$ 4,651,119.62
283		NP-155	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 " SEGUN DISEÑO DESARROLLO DE 0.4 M HASTA 0.7 M	25 días	jue 29/01/26	jue 26/02/26	$ 12,309,484.05
284		NP-156	Suministro e instalacion de salida para toma de datos y/o corriente incluye: tuberia pvc sch-40 de 3/4 (5 m) + caja 2400 + terminales. NO INCLUYE CABLE	15 días	lun 16/02/26	mié 4/03/26	$ 3,857,138.35
285		NP-157	Suministro e instalacion salida electrica para toma secadores Incluye: Tuberia sch-40 de 3/4"(max.6mts) + caja metalica + terminales + cable trenzado (LSZH) 3x16 (20 mts). NO INCLUYE TOMA.	10 días	vie 20/02/26	mié 4/03/26	$ 1,837,555.33
286		NP-158	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS EN FORMA DE FIGURA PARA SEÑALIZACION DE BAÑOS DE 30 CM DE ALTO, EN ACRILICO EN VOLUMEN DE 3 CM	10 días	vie 20/02/26	mié 4/03/26	$ 1,753,752.60
287		NP-159	Desmonte gabinetes (NORMAL, REGULADO Y RACK) cuarto tecnico 4° piso incluye: desconexiones acometidas principales regulada y normal, desconexion circuitos de distribucion, retiro de tableros del cuarto tecnico, traslado de tableros del 4° piso al 1er piso	10 días	jue 29/01/26	mar 10/02/26	$ 4,890,522.89
288		NP-160	ASEO FINAL DE OBRA	45 días	jue 15/01/26	vie 6/03/26	$ 7,836,950.05
289		NP-161	Suministro, instalacion y conexiones de breaker siemens regulable 440/630 amp capacidad de ruptura 55 ka/220 totalizador en tablero electrico de distribuccion	3 días	lun 2/03/26	jue 5/03/26	$ 5,866,169.25
290		NP-162	Suministro e instalacion de tablero general EDIFICIO DE CONVENCIONES CUARTO PISO, de acuerdo a diagrama unifiliar, incluye breker totalizador, breaker secundarios y Fungibles y Accesorios (cables, terminales, canaleta, tornilleria, funda, marcacion de cab	12 días	jue 19/02/26	jue 5/03/26	$ 93,422,133.35
291		NP-163	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DOBLES EN VIDRIO DE 10MM DE SEGURIDAD TEMPLADO, BISAGRAS ESQUINERAS EN ALUMINIO SUPERIOR E INFERIOR, CHAPA Y RECIBIDOR CENTRAL EN ALUMINIO, CERRADURA YALE, MANIJA TIPO ROMA 40-20, CERROJO DE PISO Y BISAGRA HIDRAHULICA M	12 días	jue 19/02/26	jue 5/03/26	$ 19,828,245.08
292		NP-164	Suministro e instalacion de GUARDAESCOBA CERÁMICA	12 días	jue 19/02/26	jue 5/03/26	$ 603,059.03
293		NP-165	Suministro e instalacion de Perfil REDUCTOR - en PVC estandar con foil en pvc termolaminado / 2440X45X12mm y / o Perfil T - en PVC estandar con foil en pvc termolaminado / 2440X45X12mmPara cumplir con la junta de dilatación requerida en pisos flotados lam	12 días	jue 19/02/26	jue 5/03/26	$ 19,869,202.97
294		NP-166	Pintura exterior tipo coraza para muros sobre pañete menores a 60 cm, incluye toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.	12 días	jue 19/02/26	jue 5/03/26	$ 3,761,022.35
295		NP-167	Suministro e instalación de relleno en mortero estructural en areas de desmontes de piso desmontado o demolido para nivelacion previa a la instalacion de piso laminado.	12 días	jue 19/02/26	jue 5/03/26	$ 32,864,238.41
296		NP-168	DIAGNOSTICO Y ANALISIS ESTRUCTURAL DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA DEL EDIFICIO DENOMINADO CNA, INCLUYE DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE MEJORA	12 días	jue 19/02/26	jue 5/03/26	$ 49,197,520.95
297		NP-169	MANTENIMIENTO CUARTO TABLEROS CONVENCIONES PISO 1, CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION TABLERO ELETRICO POR FILTRACION DE AGUA Y PUESTA EN MARCHA NUEVAMENTE DEL SISTEMA ELECTRICO	12 días	jue 19/02/26	jue 5/03/26	$ 1,100,367.53
298		NP-170	DIAGNOSTICO ELECTRICO DE ILUMINACION DE LOS EDIFICIOS DENOMINADO CNA, CONVENCIONES Y RECEPCIO, INCLUYE DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE CUMPLIMIENTO RETILAP	12 días	jue 19/02/26	jue 5/03/26	$ 12,053,619.31
299		NP-171	DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO Y RCI DE LOS EDIFICIOS DENOMINADO CNA, CONVENCIONES Y RECEPCIO, INCLUYE DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	12 días	jue 19/02/26	jue 5/03/26	$ 4,903,393.60
300		NP-172	Suministro e Instalacion AVISO - LOGO INTERNO FNA - CONVERTIMOS LAS CESANTIAS Y EL AHORRO DE LOS COLOMBIANOS EN VIVIENDA PROPIA aviso en acrilico 3mm letra a letra volumentrico - Letras independientes - cantonera de 5 cm - (3,10 m x 40 cm)	11 días	mar 10/03/26	sáb 21/03/26	$ 7,097,444.17
301		NP-173	Suministro e Instalacion - AVISO TEXTO - INVERTIMOS EN BIENESTAR, CONSTRUIMOS FUTURO - Aviso en acrilico 3mm letra a letra volumentrico - cantonera de 5 cm - Letras independientes - (3,10 m x 20 cm)	11 días	mar 10/03/26	sáb 21/03/26	$ 4,292,808.97
302		NP-174	Suministro e Instalacion - AVISO TEXTO - DONDE EL ESFUERZO SE TRANSFORMA EN BIENESTAR - Aviso en acrilico 3mm letra a letra volumentrico - cantonera de 5 cm - Letras independientes - (2,10 m x 40 cm)	11 días	mar 10/03/26	sáb 21/03/26	$ 4,807,946.05
303		NP-175	Suministro e Instalacion aviso- LOGO INTERNO FNA - Aviso en acrilico 3mm letra a letra volumentrico - cantonera de 5 cm - (0.70 m x 0.7 m)	11 días	mar 10/03/26	sáb 21/03/26	$ 5,609,270.39
304		NP-176	Suministro e Instalacion aviso - LOGO INTERNO FNA - Aviso en acrilico 3mm letra a letra volumentrico - cantonera de 5 cm + Base acrilica- (1.46 m x 1.12 m)	11 días	mar 10/03/26	sáb 21/03/26	$ 9,359,468.07
305		NP-177	Suministro e instalacion de SEÑALIZACION INTERNA OFICINAS - Acrilico 8m + acrilico 3mm + 4 bujes color negro + decoración tipo chapilla según muetra (0.11 m x 0.2 m)	11 días	mar 10/03/26	sáb 21/03/26	$ 11,142,224.18
306		NP-178	Suministro e instalacion de IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR - sobre vinilo froasted + full color + laminación mate sgún muestra - vidrios extenos de las oficinas principales y decoración interneria de los vidrios	11 días	mar 10/03/26	sáb 21/03/26	$ 62,722,708.90
307		NP-179	Suministro e instalacion de Luminaria para uso interior tipo Led lineal MINICONTINIUM 36 W con driver integrado, distribución de luz homogénea sin sombras. Proporciona un sistema de iluminación continuo, limpio y sencillo.	11 días	mar 10/03/26	sáb 21/03/26	$ 14,263,706.48
308		NP-180	Suministro e instalación de puerta en madecor entamborada de diferentes medidas, incluye marcos, chapa con su respectiva cantonera, y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	11 días	mar 10/03/26	sáb 21/03/26	$ 4,998,495.83
309		NP-181	Suministro e instalación de mueble escalonado de acuerdo con diseño suministrado por la entidad (incluye estructura metálica de soporte soldada en tubería 5x5x 2.5 mm y 5x2.5x2 mm, escalones melaminica 36 mm, puertas y laterales en melaminica 15 mm y recu	11 días	mar 10/03/26	sáb 21/03/26	$ 52,185,720.52
310		NP-181	Suministro e InstalacionAviso con imágenes en full color montadas sobre acrilico cal 8 tipo triangulo - (JUNTOS HACEMOS REALIDAD EL HOGAR DE LOS COLOMBIANOS) textos laser cal 8mm color en azul - (1.8 x 1.1 m)	11.13 días	mar 10/03/26	sáb 21/03/26	$ 7,095,976.54

Coordinador de obra INGEBYP

COORDINADOR DE INTERVENTORÍA

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · sólo el comienzo · sólo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

Proyecto: PROGRAMACION FN

FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FLUJO DE CAJA - ACTA DE FIJACION DE PRECIOS II

Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	S-0	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-6	S-7	S-8	S-9	S-10	S-11	S-12	S-13	S-14	S-15	S-16	S-17	S-18	S-19	S-20	S-21	S-22	S-23	S-24	S-25	S-26	S-27	S-28	S-29	S-30	S-31	S-32	S-33	S-34	S-35	S-36	S-37	S-38	S-39	S-40	S-41	S-42	S-43	S-44	S-45	S-46	S-47	S-48	S-49	S-50	S-51	S-52	S-53	S-54	S-55
	REPARACIONES LOCATIVAS GENERALES FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**328 días**	**vie 7/03/25**	**sab 21/03/26**	**$ 6.142.922.666,63**					$ 14.493.330,21	$ 17.178.739,83	$ 17.178.739,83	$ 17.178.739,83	$ 13.389.889,22	$ 8.834.236,37	$ 10.623.540,18	$ 20.295.604,73	$ 24.356.004,86	$ 23.853.540,18	$ 24.356.044,33	$ 24.356.044,67	$ 24.356.044,67	$ 24.356.044,67	$ 39.313.488,40	$ 34.630.758,06	$ 36.018.633,58	$ 32.218.891,06	$ 33.382.549,49	$ 23.844.281,21	$ 20.967.899,68	$ 24.356.021,42	$ 24.356.021,42	$ 24.356.021,42	$ 13.127.853,56	$ 13.905.659,63	$ 13.230.288,94	$ 48.558.023,44	$ 78.266.280,40	$ 56.916.567,64	$ 34.467.039,59	$ 15.243.368,66	$ 17.185.243,66	$ 17.185.243,66	$ 17.185.243

FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FLUJO DE CAJA - ACTA DE FIJACION DE PRECIOS 8

| Item | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo | S-0 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | S-17 | S-18 | S-19 | S-20 | S-21 | S-22 | S-23 | S-24 | S-25 | S-26 | S-27 | S-28 | S-29 | S-30 | S-31 | S-32 | S-33 | S-34 | S-35 | S-36 | S-37 | S-38 | S-39 | S-40 | S-41 | S-42 | S-43 | S-44 | S-45 | S-46 | S-47 | S-48 | S-49 | S-50 | S-51 | S-52 | S-53 | S-54 | S-55 |
|---|---|---

FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FLUJO DE CAJA - ACTA DE FIJACION DE PRECIOS 8

Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	S-0	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-6	S-7	S-8	S-9	S-10	S-11	S-12	S-13	S-14	S-15	S-16	S-17	S-18	S-19	S-20	S-21	S-22	S-23	S-24	S-25	S-26	S-27	S-28	S-29	S-30	S-31	S-32	S-33	S-34	S-35	S-36	S-37	S-38	S-39	S-40	S-41	S-42	S-43	S-44	S-45	S-46	S-47	S-48	S-49	S-50	S-51	S-52	S-53	S-54	S-55
NF-42	Red suministro 3/4"	210 días	jue 10/07/25	lun 2/03/26	$ 234,392.14																				$ 3,569.42	$ 6,975.96	$ 6,975.96	$ 6,975.96

FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FLUJO DE CAJA - ACTA DE FIJACION DE PRECIOS 8

Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	S-0	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-6	S-7	S-8	S-9	S-10	S-11	S-12	S-13	S-14	S-15	S-16	S-17	S-18	S-19	S-20	S-21	S-22	S-23	S-24	S-25	S-26	S-27	S-28	S-29	S-30	S-31	S-32	S-33	S-34	S-35	S-36	S-37	S-38	S-39	S-40	S-41	S-42	S-43	S-44	S-45	S-46	S-47	S-48	S-49	S-50	S-51	S-52	S-53	S-54	S-55
NP-123	Suministro e instalacion de acometida electrica en 'cobre' para 2 de 3" y cable 2/0AWG+1#5/0+1#2T cu ,desde tablero piso caseta 1er piso a cuarto tecnico 4° piso	15 días	lun 16/02/26	mié 4/03/26	$ 320.426.113,74																																																								$ 128.170.445,50	$ 153.530.890,70	$ 38.744.767,52		
NP-124	Suministro e instalacion de tablero electrico para cuarto tecnico 4° piso de acuerdo a diagrama unifilar y cargas requeridas	5 días	sáb 28/02/26	mié 4/03/26	$ 0,00																																																																						
NP-125	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS Y/O PISOS, ANCHO >= 10CM, PROFUNDIDAD >= 10CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, CERTIFICADO, CUIDADO Y RETIROS DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	30 días	jue 26/01/26	mié 4/03/26	$ 2.163.122,07																																																																																
NP-126	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA METALICA CUADRADA DE 3X2" CON BORDO	15 días	lun 16/02/26	mié 4/03/26	$ 882.947,28																																																																																
NP-127	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATES DE ESQUINA PARA ENCHAPES EN WING EN ALUMINIO	10 días	lun 16/02/26	mié 4/03/26	$ 3.460.158,96																																																																																
NP-128	DECAPADO, PULIDA Y SELLADO DE PISOS EN GRANO DE MARMOL	10 días	vie 20/02/26	mié 4/03/26	$ 0,00																																																																																
NP-129	DECAPADO, PULIDA Y SELLADO DE PISOS EN GRANO DE MARMOL	10 días	vie 20/02/26	mié 4/03/26	$ 0,00																																																																																
NP-130	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA PARED CALIDAD PRIMERA, CON ANCHO = > A 0,60 ML (UNIDAD)	25 días	mié 4/02/26	mié 4/03/26	$ 13.454.328,63																																																																																	
NP-131	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA TIPO CUPULA 4 X 8" NOVILO	10 días	lun 16/01/26	jue 29/01/26	$ 4.427.238,67																																																																																
NP-132	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPÓXICA CON UN ANCHO MAYOR A 60CM (NO INCLUYE LIMOLEO)	25 días	mié 4/02/26	mié 4/03/26	$ 5.136.127,56																																																																																
NP-133	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPÓXICA CON UN ANCHO MENOR A 60CM (UNIDLES)	25 días	mié 4/02/26	mié 4/03/26	$ 855.346,02																																																																															
NP-134	SUMINISTRO EL INSTALACION DE ALISTADO PISOS 1:3, E= 0.04 INCLUYE TRASCIEGO DE INSUMOS A LOS DIFERENTES PRENTES DE OBRA	10 días	mié 4/02/26	vie 20/02/26	$ 6.719.462,39																																																																																
NP-135	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO DE 10 CTS. 3F 3H 120/208F, CON PUERTA Y CON TOTALIZADOR BASE GALVANIZADA TAPA BLANCA	10 días	lun 23/02/26	vie 6/03/26	$ 1.992.396,96																																																																																
NP-136	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO DE 10 CTS. 3F 3H 120/208F, CON PUERTA Y CON TOTALIZADOR BASE GALVANIZADA TAPA BLANCA	10 días	lun 23/02/26	vie 6/03/26	$ 2.205.359,93																																																																																
NP-137	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PVC-P 1 1/2", INCLUYE UNIVERSALES	15 días	lun 16/02/26	mié 4/03/26	$ 1.242.611,41																																																																															
NP-138	RED DE SUMINISTRO PVC-P 1 1/2"	15 días	lun 16/02/26	mié 4/03/26	$ 1.382.678,99																																																																																
NP-139	SUMINISTRO E INSTALACION DERESISTRO PVC-P 3/4", INCLUYE UNIVERSALES	15 días	lun 16/02/26	mié 4/03/26	$ 534.938,94																																																																														
NP-140	Suministro e instalacion de cielorraso en Drywall de 1/2" y una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo de vinilo. A todo costo.	40 días	lun 16/01/26	mié 4/03/26	$ 3.144.255,53																																																																															
NP-141	Suministro e instalacion de muro en Drywall de 1/2" o una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo.	40 días	lun 16/01/26	mié 4/03/26	$ 3.621.756,70																																																																															
NP-142	Suministro e instalacion de puerta en madecor entamborada de 0.80 m de ancho, incluye: marco en madecor de 0.15 m de ancho, con tapajuntas de 0.05 m de ancho por lo tres con su respectivo cerradura, guia de corrediza, tapa de guia en madecory todo lo necesario	40 días	lun 16/01/26	mié 4/03/26	$ 6.460.534,50																																																																															
NP-143	Suministro e instalacion de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 30 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida electrica y accesorios.	30 días	jue 29/01/26	mié 4/03/26	$ 394.812,83																																																																																
NP-144	Suministro e instalacion de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 18 w, luz neutra 4000K, Incluye acometida electrica y accesorios.	30 días	jue 29/01/26	mié 4/03/26	$ 3.401.618,21																																																																														
NP-145	Suministro e instalacion de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 9 w, luz neutra 4000K, Incluye acometida electrica y accesorios.	30 días	jue 29/01/26	mié 4/03/26	$ 2.520.452,04																																																																															
NP-146	Suministro e instalacion salida electrica para toma corriente doble normal GFCI Incluye: Tubería sch-40 de 3/4"(mas 8mts) + caja metalica + terminales + cable trenzado (LSZH) 3x12 + suavizadoras + ITEMS GFCI/ FUTURA.	15 días	mié 18/02/26	vie 6/03/26	$ 2.443.828,93																																																																															
NP-147	Suministro e instalacion de salida para HDMI incluye: tubería pvc sch-40 de 1-1/4 + caja TAYA doble fondo con suplemento + caja 2400 + terminales. NO INCLUYE CABLE	15 días	lun 16/02/26	mié 4/03/26	$ 3.892.930,63																																																																															
NP-148	Suministro e instalacion de alimentador 3N°8 Fase+3N°8 Neutro+1N°10 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	25 días	vie 6/02/26	vie 6/03/26	$ 3.409.642,84																																																																															
NP-149	SENSOR PRESENCIA MULTITECNOLOGIA LEVITON OSC10-MDW	15 días	lun 16/02/26	mié 4/03/26	$ 8.241.826,94																																																																														
NP-150	SENSOR MULTITECNOLOGIA PIR MONTAJE EN TECHO LEVITON OSC10-10W CON FUENTE RELEVO-PISENSOR LEVITON OSP30-RDO	15 días	lun 16/02/26	mié 4/03/26	$ 2.733.059,80																																																																																
NP-151	Suministro e instalacion de perfiles RPC DE 102 X 50 MM, EN COLOR ARENADO POR LA ENTIDAD, INCLUYE SOPORTE GRAFONO DE EXTREMOS	15 días	jue 29/01/26	lun 16/02/26	$ 9.430.021,46																																																																															
NP-152	Suministro e instalacion de piso tipo DECK en RPC de acuerdo a detalle constructivo e instalacion incluye estructura y accesorios de fijacion y base de nivelacion	15 días	mié 18/02/26	vie 6/03/26	$ 11.963.487,52																																																																															
NP-153	Suministro e instalacion de canal en terrina galvanizada cla. 18 de 1.2 m de desarrollo incluye soporte de fijacion	5 días	sáb 28/02/26	vie 6/03/26	$ 0,00																																																																													
NP-154	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR Y ANGULO A CON PESTAÑAS DE 10cm POR LOS LADOS, PARA SELLAR DUCTO EN CUBIERTA	20 días	jue 29/01/26	vie 20/02/26	$ 4.021.116,62																																																																															
NP-155	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 " SEGÚN DISEÑO DESARROLLO DE 0.4 M HASTA 0.7 M	25 días	jue 29/01/26	jue 26/02/26	$ 12.305.464,01																																																																															
NP-156	Suministro e instalacion de salida para toma de datos ,incl.corriente incluye: tubería pvc sch-40 de 3/4 (2 1/2 + caja 2400 + terminales. NO INCLUYE CABLE	15 días	lun 16/02/26	mié 4/03/26	$ 3.857.136,30																																																																															
NP-157	Suministro e instalacion salida electrica para toma secadores incluye: Tubería sch-40 de 3/4"(mas 8mts) + caja metalica + terminales + cable trenzado (LSZH) 3x10 (20 mts). NO INCLUYE TOMA.	15 días	vie 20/02/26	mié 4/03/26	$ 1.337.083,55																																																																															
NP-158	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS EN FORMA DE FIGURA PARA SEÑALIZACION DE BAÑOS DE 30 CM DE ALTO, EN ACRILICO EN VOLUMEN, CM 3 D	10 días	vie 20/02/26	mié 4/03/26	$ 1.753.702,66																																																																															
NP-159	Desmonte gabinetes (NORMAL, REGULADO Y RACK) cuarto tecnico 4° piso Incluye: desconexiones acometidas principales regulada y normal, desconexion, desmonte y retiro de sitio, retiro de tableros de cuarto tecnico, traslado de tableros piso 4° piso al 1er piso	15 días	jue 29/01/26	mar 10/02/26	$ 4.890.022,99																																																																															
NP-160	ASEO FINAL DE OBRA	45 días	lun 16/01/26	vie 6/03/26	$ 7.236.393,00																																																																															
NP-161	Suministro e instalacion de cielo raso en lamina galvanizada cla. 18 de 1.2 m de desarrollo incluye soporte de fijacion	5 días	sáb 28/02/26	vie 6/03/26	$ 0,00																																																																														
NP-162	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON PESTAÑAS DE 10cm POR LOS LADOS, PARA SELLAR DUCTO EN CUBIERTA	20 días	jue 29/01/26	vie 20/02/26	$ 3.629.250,96																																																																														
NP-163	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 " SEGÚN DISEÑO DESARROLLO DE 0.4 M HASTA 0.7 M	25 días	jue 29/01/26	jue 26/02/26	$ 12.305.464,01																																																																															
NP-164	Suministro e instalacion de salida para toma de datos ,incl.corriente incluye: tubería pvc sch-40 de 3/4 (2 1/2 + caja 2400 + terminales. NO INCLUYE CABLE	15 días	lun 16/02/26	mié 4/03/26	$ 3.857.136,30																																																																														
NP-165	Suministro e instalacion salida electrica para toma secadores incluye: Tubería sch-40 de 3/4"(mas 8mts) + caja metalica + terminales + cable trenzado (LSZH) 3x10 (20 mts). NO INCLUYE TOMA.	15 días	vie 20/02/26	mié 4/03/26	$ 1.337.083,55																																																																														
NP-166	Suministro e instalacion de salida para toma de datos ,incl.corriente incluye: tubería pvc sch-40 de 3/4 (2 1/2 + caja 2400 + terminales. NO INCLUYE CABLE	15 días	lun 16/02/26	mié 4/03/26	$ 3.857.136,30																																																																														
NP-167	Suministro e instalacion de salida para HDMI incluye: tubería pvc sch-40 de 1-1/4 + caja TAYA doble fondo con suplemento + caja 2400 + terminales. NO INCLUYE CABLE	15 días	lun 16/02/26	mié 4/03/26	$ 3.892.930,63																																																																														
NP-168	Suministro e instalacion de alimentador 3N°8 Fase+3N°8 Neutro+1N°10 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	25 días	vie 6/02/26	vie 6/03/26	$ 3.409.642,84																																																																														
NP-169	Suministro e instalacion de puerta en madecor entamborada de diferentes medida, incluye marco, chapa con su respectiva cerradura, y todo lo necesario para su instalacion y funcionamiento.	15 días	mié 18/02/26	sáb 21/03/26	$ 4.896.495,63																																																																															
NP-170	Suministro e instalacion de muro en Drywall de 1/2" y una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo.	40 días	lun 16/01/26	mié 4/03/26	$ 3.621.756,70																																																																														
NP-171	Suministro e instalacion de puerta en madecor entamborada de 0.80 m de ancho, incluye: marco en madecor de 0.15 m de ancho, con tapajuntas de 0.05 m de ancho por lo tres con su respectiva cerradura, guia de corrediza, tapa de guia en madecory todo lo necesario	40 días	lun 16/01/26	mié 4/03/26	$ 6.460.534,50																																																																															
NP-172	Suministro e instalacion AVISO - LOGO INTERIOR FNA - CONVENTIONES LAS CESANTIAS Y EL HOGAR2.3E LOS COLOMBIANOS EN VIVIENDA PROPIA area en acrilico 3mm letra y vlets volumetrico - Letra independiente - cantonera de 5 cm - (0.70 m ¥ 46 cm)	17 días	mar 10/03/26	sáb 21/03/26	$ 7.267.444,17																																																																															
NP-173	Suministro e instalacion - AVISO TEXTO - INVIERNOS EN BENECTAR, CONSTRUIMOS FUTURO - Aviso en acrilico 3mm letra y vlets volumetrico - cantonera de 5 cm - Letra independiente - (3.70 m ¥ 20 cm)	11 días	mar 10/03/26	sáb 21/03/26	$ 4.292.808,97																																																																															
NP-174	Suministro e instalacion - AVISO TEXTO - SOMOS EL ESFUERZO DE TRABOTJRAMA EN BENECTARIA - Aviso en acrilico 3mm letra y vlets volumetrico - cantonera de 5 cm - Letra independiente - (2.70 m ¥ 40 cm)	11 días	mar 10/03/26	sáb 21/03/26	$ 4.827.946,03																																																																															
NP-175	Suministro e instalacion aviso - LOGO INTERIOR FNA - Aviso en acrilico 3mm letra y vlets volumetrico - cantonera de 5 cm - (0.70 m ¥ 0.7 m)	11 días	mar 10/03/26	sáb 21/03/26	$ 3.809.273,78																																																																															
NP-176	Suministro e instalacion aviso - LOGO INTERIOR FNA - Aviso en acrilico 3mm letra y vlets volumetrico - cantonera de 5 cm + Base acrilico (1.80 m ¥ 1.10 m)	11 días	mar 10/03/26	sáb 21/03/26	$ 5.244.460,07																																																																															
NP-177	Suministro e instalacion de SEÑALIZACION INTERNA SPOKANE - Acrilico 3m - acrilico 3mm + 2 capa color negro + laserado luz chapilla segun muela (0.71 m ¥ 4.23 m)	11 días	mar 10/03/26	sáb 21/03/26	$ 11.142.224,10																																																																															
NP-178	Suministro e instalacion de IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR - sobre vinilo finadeli - full color impresion digital sobre vinilo - vinilos sobre los de oficinas principales y descanso interiores de los edificio	11 días	mar 10/03/26	sáb 21/03/26	$ 62.722.708,92																																																																															
NP-179	Suministro e instalacion de Luminaria para pus interior tipo Led lineal MINICENTRONIK 30 W con driver integrado, distribución de luz homogénea sin sombras. Proporciona un sistema de luminación continuo, lineal y perfilo.	11 días	mar 10/03/26	sáb 21/03/26	$ 14.263.758,40																																																																															
NP-180	Suministro e instalacion de puerta en madecor entamborada de diferentes medida, incluye marco, chapa con su respectiva cerradura, y todo lo necesario para su instalacion y funcionamiento.	11 días	mar 10/03/26	sáb 21/03/26	$ 4.896.495,63																																																																															
NP-181	Suministro e instalacion de muebl de cocina en acrilico de puerta con cuarto cuchillos en acrilico 3mm + 2 capa color negro + laserado luz chapilla segun muela (0.71 m ¥ 4.23 m) incluye: cantonera 30 mts, puertas y cajones en melamina 30 mts, puertas y cajones en melamina 15 mts y otros	11 días	mar 10/03/26	sáb 21/03/26	$ 52.165.735,02																																																																															
NP-182	Suministro e instalacion de cielo raso en lamina galvanizada cla. 18 de 1.2 m de desarrollo incluye soporte de fijacion - (CIELO INCISIVOS REALIZAD O, HOJAR 3E LOS COLOMBIANOS) tenia laser cut 5mm de espe de acer - (12.2 m ¥ 7.7 m)	11.13 días	mar 03/03/26	sáb 21/03/26	$ 7.295.975,14																																																																															
	Nota: Esta programacion esta sujeta a cambios y ajustes en tiempo teniendo en cuenta que esta vargando ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS las cuales deben ser incluidas en esta	1 día	vie 1/05/26	sáb 6/05/26	$ 0,00																																																																															
	Nota: Esta programacion se ajustara en el momento en que se requiera validar cantidades de cuanto o no sirven por la de para por dentidas	1 día	vie 1/05/26	sáb 6/05/26	$ 0,00																																																																														
	Nota:lots ajuste en diario, plomeria o requerimiento de la entidad contratante seran objeto de ajuste de esta programacion	1 día	vie 1/05/26	sáb 6/05/26	$ 0,00																																																																													
	Nota: Esta programacion se ajuste teniendo en cuenta las edificaciones intervenidas y dejando cantidades el ajuste de acuerdo a los alcances que se den en los diversos contitos que se van llevando a cabo semanalmente	1 día	vie 1/05/26	sáb 6/05/26	$ 0,00																																																																														

Coordinador de obra ANGEBYP

COORDINADOR DE INTERVENTORÍA

INGEBYP S.A.S	INFORME MENSUAL No. 13 PROGRAMADO VS EJECUTADO	fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO


NÚMERO DE CONTRATO	FNA-166-2024
OBJETO	"REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."

Valor del contrato	5,142,932,606.00
Valor del contrato	0
Valor Adicion	0
Valor del contrato obra civil	5,142,932,606.00
Programacion Versión y fecha:	fecha 15 de enero de 2026

Informe Mes :	Marzo - 2026

SEM.	Fecha Inicio	Fecha Terminación	PROGRAMADO ACUMULADO	PROGRAMADO PERIODO	EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO PERIODO	DIFERENCIA
1	7/3/2025	14/3/2025	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	14/3/2025	21/3/2025	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3	21/3/2025	28/3/2025	0.00%	0.00%	0.08%	0.08%	0.08%
4	28/3/2025	4/4/2025	0.32%	0.32%	0.25%	0.17%	-0.07%
5	4/4/2025	11/4/2025	0.65%	0.33%	1.76%	1.51%	1.11%
6	11/4/2025	18/4/2025	0.99%	0.33%	2.77%	1.01%	1.78%
7	18/4/2025	25/4/2025	1.32%	0.33%	6.60%	3.83%	5.28%
8	25/4/2025	2/5/2025	1.62%	0.30%	9.61%	3.01%	8.00%
9	2/5/2025	9/5/2025	1.77%	0.16%	9.92%	0.30%	8.14%
10	9/5/2025	16/5/2025	1.98%	0.21%	10.11%	0.20%	8.13%
11	16/5/2025	23/5/2025	2.38%	0.39%	10.44%	0.33%	8.06%
12	23/5/2025	30/5/2025	2.89%	0.52%	10.99%	0.55%	8.10%
13	30/5/2025	6/6/2025	3.31%	0.42%	11.32%	0.32%	8.01%
14	6/6/2025	13/6/2025	4.15%	0.84%	11.73%	0.41%	7.58%
15	13/6/2025	20/6/2025	5.21%	1.05%	12.13%	0.40%	6.93%
16	20/6/2025	27/6/2025	6.01%	0.80%	12.42%	0.28%	6.41%
17	27/6/2025	4/7/2025	6.71%	0.70%	13.47%	1.05%	6.76%
18	4/7/2025	11/7/2025	7.48%	0.77%	13.70%	0.23%	6.22%
19	11/7/2025	18/7/2025	8.55%	1.07%	14.04%	0.34%	5.49%
20	18/7/2025	25/7/2025	9.25%	0.70%	14.60%	0.57%	5.36%
21	25/7/2025	1/8/2025	9.87%	0.63%	16.30%	1.69%	6.42%
22	1/8/2025	8/8/2025	10.49%	0.62%	17.31%	1.01%	6.82%
23	8/8/2025	15/8/2025	10.92%	0.43%	17.71%	0.40%	6.79%
24	15/8/2025	22/8/2025	11.32%	0.41%	18.37%	0.66%	7.05%
25	22/8/2025	29/8/2025	11.73%	0.41%	20.39%	2.01%	8.65%
26	29/8/2025	5/9/2025	12.14%	0.41%	22.02%	1.63%	9.87%
27	5/9/2025	12/9/2025	12.55%	0.41%	23.38%	1.36%	10.83%
28	12/9/2025	19/9/2025	12.96%	0.41%	24.74%	1.36%	11.78%
29	19/9/2025	26/9/2025	13.33%	0.37%	26.10%	1.36%	12.77%
30	26/9/2025	3/10/2025	13.64%	0.31%	27.59%	1.49%	13.95%
31	3/10/2025	10/10/2025	13.94%	0.30%	28.37%	0.78%	14.43%
32	10/10/2025	17/10/2025	14.90%	0.96%	29.34%	0.97%	14.44%
33	17/10/2025	24/10/2025	16.27%	1.37%	30.51%	1.17%	14.24%
34	24/10/2025	31/10/2025	18.04%	1.77%	31.48%	0.97%	13.44%
35	31/10/2025	7/11/2025	21.24%	3.20%	33.02%	1.54%	11.78%
36	7/11/2025	14/11/2025	24.65%	3.41%	33.70%	0.68%	9.05%
37	14/11/2025	21/11/2025	27.32%	2.67%	34.38%	0.68%	7.06%
38	21/11/2025	28/11/2025	30.65%	3.33%	36.23%	1.85%	5.58%
39	28/11/2025	5/12/2025	32.57%	1.92%	39.30%	3.07%	6.74%
40	5/12/2025	12/12/2025	34.41%	1.85%	40.57%	1.26%	6.15%
41	12/12/2025	19/12/2025	36.18%	1.76%	42.22%	1.65%	6.04%
42	19/12/2025	26/12/2025	37.56%	1.38%	43.97%	1.75%	6.41%
43	26/12/2025	2/1/2026	39.00%	1.44%	45.33%	1.36%	6.33%
44	2/1/2026	9/1/2026	40.15%	1.15%	48.25%	2.92%	8.09%
45	9/1/2026	16/1/2026	41.23%	1.08%	51.55%	3.31%	10.32%
46	16/1/2026	23/1/2026	42.86%	1.63%	54.47%	2.92%	11.61%
47	23/1/2026	30/1/2026	46.14%	3.28%	58.55%	4.08%	12.41%
48	30/1/2026	6/2/2026	51.67%	5.53%	62.83%	4.28%	11.16%

49	6/2/2026	13/2/2026	55.27%	3.60%	67.11%	4.28%	11.83%
50	13/2/2026	20/2/2026	57.77%	2.50%	71.00%	3.89%	13.22%
51	20/2/2026	27/2/2026	62.99%	5.21%	75.86%	4.86%	12.87%
52	27/2/2026	6/3/2026	73.79%	10.80%	80.72%	4.86%	6.93%
53	6/3/2026	13/3/2026	82.28%	8.50%	84.22%	3.50%	1.93%
54	13/3/2026	20/3/2026	90.06%	7.78%	88.50%	4.28%	-1.57%
55	20/3/2026	27/3/2026	100.00%	9.94%	88.50%	0.00%	
				90.06%		**88.50%**	

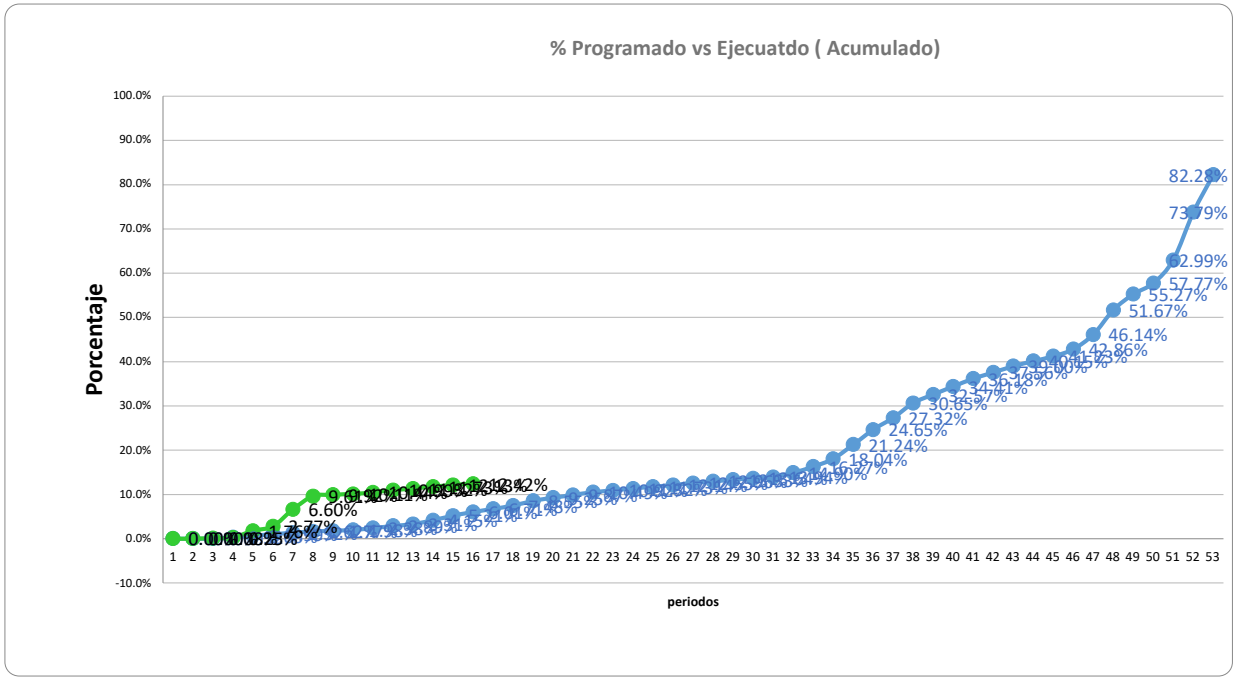

REPORTE DE CONTRATISTA:

El presente informe mensual tiene como objetivo reportar por parte de la firma contratista el estado de avance de la obra durante la etapa de ejecución:

* Porcentaje Programado : 90.06 %
* Porcentaje Ejecutado : 88.50 %
* Porcentaje de adelanto : - 4.09 %

ANEXOS

ING. RODOLFO BARRETO VARGAS
COORDINADOR DE OBRA INGEBYP
CONTRATISTA

ING. ANA MIREYA ARAGON
RESIDENTE DE INTERVENTORIA BIODECO
INTERVENTORIA

INGEBYP S.A.S	INFORME MENSUAL No. 13	
	FLUJO DE CAJA	


NÚMERO DE CONTRATO	FNA-166-2024
OBJETO	"REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."

Valor del contrato actualizado	5,142,932,606.00			
Plazo	12	Meses	**Fecha Inicio**	**7/3/2025**
DÍAS TRANSCURRIDOS	**378.00**	%	**103.56%**	

FECHA REPORTE	20/3/2026

No.	Fecha	PROGRAMADO ACUMULADO	PROGRAMADO PERIODO	EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO PERIODO
1	7/3/2025	$ 0.00		$ 0.00	
2	14/3/2025	$ 0.00		$ 0.00	
3	21/3/2025	$ 0.00		$ 4,110,358.00	$ 4,110,358.00
4	28/3/2025	$ 16,491,590.23	$ 16,491,590.23	$ 12,833,121.00	$ 8,722,763.00
5	4/4/2025	$ 33,670,330.06	$ 17,178,739.83	$ 90,634,959.00	$ 77,801,838.00
6	11/4/2025	$ 50,849,069.89	$ 17,178,739.83	$ 142,492,501.00	$ 51,857,542.00
7	18/4/2025	$ 68,027,809.72	$ 17,178,739.83	$ 339,503,726.00	$ 197,011,225.00
8	25/4/2025	$ 83,213,708.94	$ 15,185,899.22	$ 494,491,128.00	$ 154,987,402.00
9	2/5/2025	$ 91,247,945.31	$ 8,034,236.37	$ 510,016,575.00	$ 15,525,447.00
10	9/5/2025	$ 101,883,485.49	$ 10,635,540.18	$ 520,151,282.00	$ 10,134,707.00
11	16/5/2025	$ 122,173,122.20	$ 20,289,636.71	$ 536,940,285.00	$ 16,789,003.00
12	23/5/2025	$ 148,679,129.08	$ 26,506,006.88	$ 565,370,526.00	$ 28,430,241.00
13	30/5/2025	$ 170,331,289.26	$ 21,652,160.18	$ 582,052,684.00	$ 16,682,158.00
14	6/6/2025	$ 213,639,435.59	$ 43,308,146.33	$ 603,242,276.00	$ 21,189,592.00
15	13/6/2025	$ 267,829,870.26	$ 54,190,434.67	$ 624,041,900.00	$ 20,799,624.00
16	20/6/2025	$ 309,018,974.82	$ 41,189,104.56	$ 638,551,071.00	$ 14,509,171.00
17	27/6/2025	$ 345,029,943.51	$ 36,010,968.69	$ 692,770,582.52	$ 54,219,511.52
18	4/7/2025	$ 384,545,343.91	$ 39,515,400.40	$ 704,550,107.32	$ 11,779,524.81
19	11/7/2025	$ 439,472,102.27	$ 54,926,758.36	$ 721,812,900.95	$ 17,262,793.63
20	18/7/2025	$ 475,491,024.85	$ 36,018,922.58	$ 751,072,054.29	$ 29,259,153.34
21	25/7/2025	$ 507,709,915.91	$ 32,218,891.06	$ 838,134,743.04	$ 87,062,688.75
22	1/8/2025	$ 539,511,480.40	$ 31,801,564.49	$ 890,057,289.08	$ 51,922,546.04
23	8/8/2025	$ 561,455,671.62	$ 21,944,191.22	$ 910,752,541.60	$ 20,695,252.52
24	15/8/2025	$ 582,423,571.30	$ 20,967,899.68	$ 944,941,262.38	$ 34,188,720.78
25	22/8/2025	$ 603,430,092.72	$ 21,006,521.42	$ 1,048,487,907.76	$ 103,546,645.38
26	29/8/2025	$ 624,436,614.14	$ 21,006,521.42	$ 1,132,281,052.62	$ 83,793,144.86
27	5/9/2025	$ 645,443,135.56	$ 21,006,521.42	$ 1,202,281,052.62	$ 70,000,000.00
28	12/9/2025	$ 666,449,656.98	$ 21,006,521.42	$ 1,272,281,052.62	$ 70,000,000.00
29	19/9/2025	$ 685,707,490.96	$ 19,257,833.98	$ 1,342,281,052.62	$ 70,000,000.00
30	26/9/2025	$ 701,617,150.57	$ 15,909,659.61	$ 1,418,999,999.62	$ 76,718,947.00
31	3/10/2025	$ 716,808,239.51	$ 15,191,088.94	$ 1,458,999,999.62	$ 40,000,000.00
32	10/10/2025	$ 766,406,890.95	$ 49,598,651.44	$ 1,508,999,999.62	$ 50,000,000.00
33	17/10/2025	$ 836,806,171.44	$ 70,399,280.49	$ 1,568,999,999.62	$ 60,000,000.00
34	24/10/2025	$ 927,724,239.08	$ 90,918,067.64	$ 1,618,999,999.62	$ 50,000,000.00
35	31/10/2025	$ 1,092,391,279.07	$ 164,667,039.99	$ 1,698,248,205.11	$ 79,248,205.48
36	7/11/2025	$ 1,267,637,267.97	$ 175,245,988.90	$ 1,733,248,205.11	$ 35,000,000.00
37	14/11/2025	$ 1,404,922,678.90	$ 137,285,410.93	$ 1,768,248,205.11	$ 35,000,000.00
38	21/11/2025	$ 1,576,152,852.67	$ 171,230,173.77	$ 1,863,248,205.11	$ 95,000,000.00
39	28/11/2025	$ 1,674,855,855.42	$ 98,703,002.75	$ 2,021,248,205.11	$ 158,000,000.00
40	5/12/2025	$ 1,769,883,982.02	$ 95,028,126.60	$ 2,086,248,205.11	$ 65,000,000.00
41	12/12/2025	$ 1,860,517,805.31	$ 90,633,823.29	$ 2,171,248,205.11	$ 85,000,000.00
42	19/12/2025	$ 1,931,634,752.15	$ 71,116,946.84	$ 2,261,248,205.11	$ 90,000,000.00
43	26/12/2025	$ 2,005,739,731.68	$ 74,104,979.53	$ 2,331,248,205.11	$ 70,000,000.00
44	2/1/2026	$ 2,064,938,042.16	$ 59,198,310.48	$ 2,481,248,205.11	$ 150,000,000.00
45	9/1/2026	$ 2,120,323,515.25	$ 55,385,473.09	$ 2,651,248,205.11	$ 170,000,000.00
46	16/1/2026	$ 2,204,206,628.77	$ 83,883,113.52	$ 2,801,248,205.11	$ 150,000,000.00
47	23/1/2026	$ 2,373,021,250.03	$ 168,814,621.26	$ 3,011,248,205.11	$ 210,000,000.00
48	30/1/2026	$ 2,657,518,848.97	$ 284,497,598.94	$ 3,231,248,205.11	$ 220,000,000.00

49	6/2/2026	$ 2,842,591,550.51	$ 185,072,701.54	$ 3,451,248,205.11	$ 220,000,000.00
50	13/2/2026	$ 2,971,269,304.01	$ 128,677,753.50	$ 3,651,248,205.11	$ 200,000,000.00
51	20/2/2026	$ 3,239,364,551.53	$ 268,095,247.52	$ 3,901,248,205.11	$ 250,000,000.00
52	27/2/2026	$ 3,794,793,150.97	$ 555,428,599.44	$ 4,151,248,205.11	$ 250,000,000.00
53	6/3/2026	$ 4,231,816,800.17	$ 437,023,649.20	$ 4,331,248,205.11	$ 180,000,000.00
54	13/3/2026	$ 4,631,948,586.90	$ 400,131,786.73	$ 4,551,248,205.11	$ 220,000,000.00
55	20/3/2026	$ 5,142,932,604.89	$ 510,984,017.99	$ 4,551,248,205.11	
0					
0					
0					
0					
			$ 4,631,948,586.90		**4,551,248,205.11**

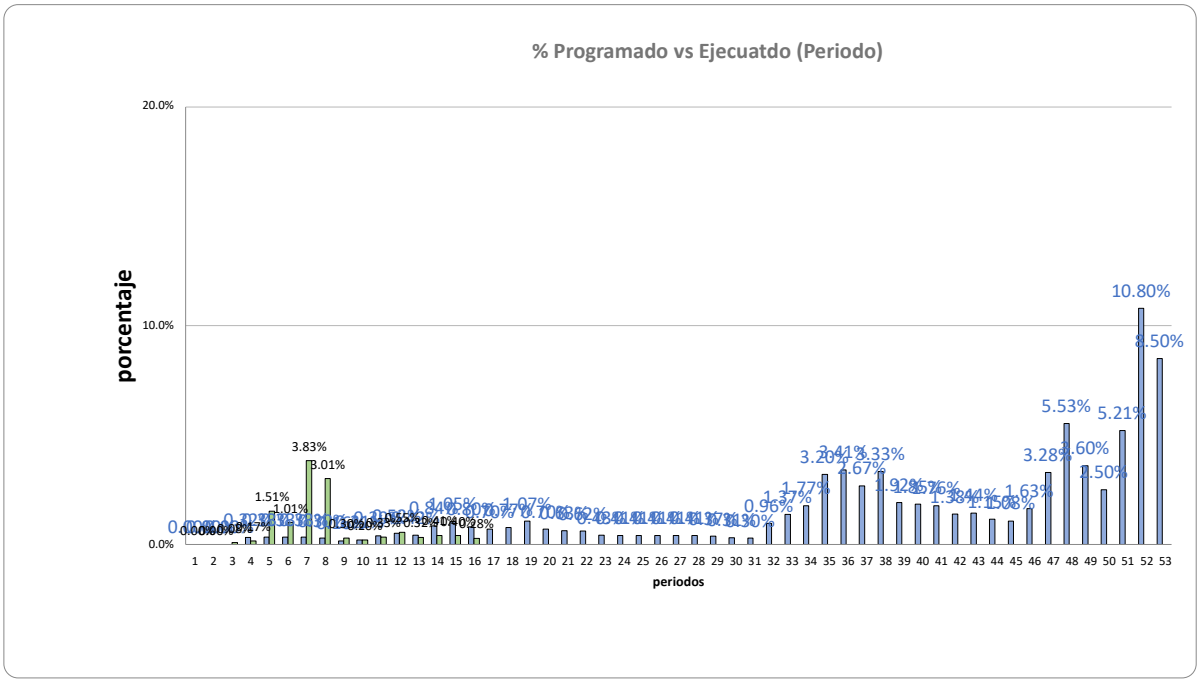

REPORTE DE CONTRATISTA:

El presente informe mensual tiene como objetivo reportar el porcentaje de inversión realizado a la fecha.
La gráfica muestra que para este periodo el flujo de caja del proyecto corresponde a:
Flujo de caja programado: $ 4.631.948.586.9
Flujo de caja ejecutado : $ 4.551.248.205.10

ING. RODOLFO BARRETO VARGAS
COORDINADOR DE OBRA INGEBYP
CONTRATISTA

ING. ANA MIREYA ARAGON
RESIDENTE DE INTERVENTORIA BIODECO
INTERVENTORIA

INFORME MESUAL No. 13

CONTROL DE EQUIPOS
MARZO 2026

ASPECTOS TÉCNICOS

CONTRATO No. FNA-166-2024

CONTRATISTA INGEBYP S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA F SICA DE LA - CNA EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

No.	MAQUINARIA Y EQUIPO	PLACA	SERIE	MODELO	MOTOR	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	NOVEDADES
1	Container tipo bodega	N/A	N/A	N/A	N/A	08-03-2025	EN OBRA	
2	Container tipo oficina	N/A	N/A	N/A	N/A	08-03-2025	EN OBRA	
3	Baño portatil	N/A	N/A	N/A	N/A	16-04-2025	EN OBRA	
4	Pulidora 4"	N/A	N/A	N/A	N/A	16-04-2025	EN OBRA	
5	Taladro	N/A	N/A	N/A	N/A	21-04-2025	EN OBRA	
6	ESTIBADOR MANUAL PARA CARGA PESADA 3 TN	N/A	N/A	N/A	N/A	24-04-2025	27-04-2025	Se cuenta con 3 unidades
7	ANDAMIO SECCIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	16-05-2025	EN OBRA	
8	Demoledor electrico	N/A	N/A	N/A	N/A	27-05-2025	EN OBRA	
9	Demoledor electrico	N/A	N/A	N/A	N/A	10-06-2025	EN OBRA	
10	Autobomba de mega concreto	LUL 536	N/A	N/A	N/A	21-06-2025	21-06-2025	
11	Mezcladora de concreto (MIXER)	KZV 681	N/A	N/A	N/A	21-06-2025	21-06-2025	
12	Demoledor electrico	N/A	N/A	N/A	N/A	27-06-2025	19-10-2025	
13	Mezcladora de Mortero Electrica para un bulto	N/A	N/A	N/A	N/A	01-07-2025	19-10-2025	
14	Reactor 2 E-XP2 Sistema de alto rendimiento para la aplicación de mezclas 1:1 que requieren alta temperatura y presión. EQUIPO PARA APLICACIÓN DE POLIUREA	N/A	N/A	N/A	N/A	27/10/2025	03-03-2026	
15	Compreso de 100 lb	N/A	N/A	N/A	N/A	27/10/2025	03-03-2026	

INFORME MESUAL No. 13

CONTROL DE EQUIPOS
MARZO 2026

ASPECTOS TÉCNICOS

CONTRATO No. FNA-166-2024

CONTRATISTA INGEBYP S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA F SICA DE LA - CNA EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

16	ANDAMIO SECCIÓN (5)	N/A	N/A	N/A	N/A	20/11/2025	03-03-2026	
17	Taladro inalambrico	N/A	N/A	N/A	N/A	1/12/2025	EN OBRA	
18	Pulidora 4"	N/A	N/A	N/A	N/A	1/12/2025	EN OBRA	
19	lijadora de cielo raso	N/A	N/A	N/A	N/A	10/12/2025	EN OBRA	

ING. RODOLFO BARRETO
COORDINADOR DE OBRA INGEBYP
CONTRATISTA

ING. ANA MIREYA ARAGON
RESIDENTE DE INTERVENTORIA BIODECO
INTERVENTORIA

PISOS CORONA

PISO JUAREZ OXIDO CD

Referencia: 604772741
Formato: 60X60 Cm
Color: OXIDO



TRÁFICO | TRAFFIC	**Comercial Moderado / Moderate Commercial**
ACABADO |FINISH	Mate / Matte
ASPECTO	CD / Caras diferenciadas
M2 POR CAJA SQ FT APPROX	1,8 19,3
UNIDADES | PIECES	5
PESO BRUTO CAJA kg WEIGTH LB APPROX	31,5 69,3
ESPESOR NOMINAL NOMINAL THICKNESS	9.0 +/- 0.3
CAJAS POR ESTIBA CARTONS PER PALLET	60
VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS	0

El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.
The color represented in the photograph is an approximation to the real color.

Pisos para uso en áreas comerciales sin acceso directo de la calle, tales como: oficinas, consultorios, habitaciones en general, puntos fijos y zonas comunes de edificios residenciales.
Para pisos de acabado mate el tráfico debe ser inferior a 500 personas diarias promedio y para pisos con acabado brillante el tráfico debe ser inferior a 200 personas diarias promedio.
Estos pisos también son aptos para todas las áreas de viviendas.
Importante: No usar en áreas comerciales tales como súper e hipermercados, industrias, oficinas públicas, pasillos y zonas comunes de centros comerciales.
Precaución: A excepción de los productos Corona ARD®, los productos cerámicos al contacto con el agua disminuyen su resistencia al deslizamiento. En áreas húmedas son recomendados productos con alto coeficiente de fricción.

CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y BENEFICIOS:

Piso Exterior Mate JUAREZ color Oxido de formato 60X60, diseño inspirado en piedras tipo pizarra oxidada con estructura de piedras grandes rectangulares de diferentes tamaños en tonalidades grises con acentos cobrizos. Nuevo acabado con alta resistencia al deslizamiento con bajo nivel de ensuciamiento. posee caras diferenciadas (CD) baldosas con diferencias sutiles entre una pieza y otra para dar mayor realismo y naturalidad al producto.
Tecnología Perdura que le confiere al producto mayor resistencia al desgaste y a los rayones con el paso del tiempo.
La Tecnología de Impresión Digital (HIGH DEFINITION HD) le brinda al producto mayor nitidez y realismo en su diseño, logrando un alto grado de naturalidad.

Garantía Corona | Corona quality guaranteed: 10 Años/Years

Mayor información de garantía consulte www.corona.co/garantia

PISO JUAREZ OXIDO CD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS		ENSAYO |TEST	ESPECIFICACIÓN SPECIFITACION NTC 919 / ISO 13006	MEDICIONES LOTES PROMEDIO CORONA/ CORONA AVERAGE LOT MEASUREMENTS
ANCHO Y LARGO LENGHT AND WIDTH		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 2.00% del tamaño de fabricación; hasta máximo 5 mm	(±) 2.00% del tamaño de fabricación; hasta máximo 5 mm
PLANIRADIDAD DE LA SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	**Curvatura Central** Central Curvature	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación	(±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación
	Curvatura del lado Edge Curvature	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 0.50% relativa al correspondiente tamaño de fabricación	(±) 0.30% relativa al correspondiente tamaño de fabricación
	Ortogonalidad Warpage	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación	(±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación
DEFECTOS SUPERFICIALES SURFACE DEFECTS		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	Minimo 95% libre de defectos/ Minimun 95% without deffects	Minimo 95% libre de defectos/ Minimun 95% without deffects
ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION		NTC 4321 - 3 ISO 10545 - 3	Mínimo 6% Máximo 10%	Mínimo 6% Máximo 10%
RESISTENCIA A LA ROTURA BREAKING STRENGHT		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mínimo 800 N / Minimum 800 N	Mínimo 1000 N / Minimun 1000 N
MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mínimo 18 N/mm2 / Minimum 18 N/mm2	Mínimo 25 N/mm2 / Minimum 25 N/mm2
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ABRASION RESISTANCE		NTC 4321 - 7 ISO 10545 - 7	Informe de cumplimiento de la clase de abrasión y los ciclos	Clase 3 / Class 3
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION		NTC 4321 - 17 ISO 10545 - 17	Declarado por el fabricante / Metodo de ensayo disponible	Clase 2 / Class 2
RESISTENCIA AL MANCHADO RESISTANCE TO STAINING		NTC 4321 - 14 NTC 4321 - 14	Mínimo clase 3 / Minimum class 3	Mínimo clase 4 / Minimum class 4
RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS RESISTACE TO CHEMICALS		NTC 4321 - 13 NTC 4321-2 - 13	Mínimo clase B / Mimimum B class	Mínimo Clase A / Mimimun A Class
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE		NTC 4321-2 - 9 NTC 4321 - 9	La indicada por el fabricante/Manufacturer to state classification	Mínimo clase BA / Mimimum BA class

Descargar recomendaciones de uso en: http://www.corona.co/instructivos/pisos-y-paredes
Este producto es elaborado en Colombia, en el Parque Industrial de Sopó Cundinamarca.

FUENTES DE MATERIA PRIMA RESPONSABLES:
Corona tiene un reporte sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report.
Puede encontrarlo aquí: http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible

PUSH PICO EXPUESTO

Grifería Tipo Push - **Para Lavamanos**

Referencia: 701310001



- Consumo de agua de **0.36** Lpf (Litros por ciclo)

Nuestra grifería para lavamanos institucional de pared, tiene sistema de accionamiento suave tipo push de cierre automático y cuenta con regadera de pico expuesto, lo que la convierte en aliada perfecta para las necesidades de instituciones o lugares públicos de alto tráfico y está diseñada para un óptimo funcionamiento y durabilidad.

Características y Beneficios

- Pico con diseño minimalista acorde con los nuevos diseños de baños.
- Diseño robusto y adecuado para alto tráfico con un grado elevado de antivandalismo.
- Funcionamiento silencioso.
- Cuerpo en latón resistente a la corrosión.
- Válvula compacta que ahorra espacio.
- Temporizador que evita el desperdicio de agua.
- Accionamiento fácil y cómodo.
- Higiénica y fácil de limpiar.
- Cierre automático temporizado entre 5 a 9 segundos.
- Graduación de caudal por facilidad de las 7 posiciones que trae el cartucho.

Información Técnica

Material :	
Cuerpo :	Latón acabado natural
Botón :	Latón con recubrimiento de cromo
Escudo y Portaescudo :	Latón con recubrimiento de cromo
Acabado :	Cromado
Peso Neto :	77gr. / 1,70Lb
Peso Bruto :	860gr. / 1,90Lb
Diámetro de tubería para la instalación :	1/2" NPT
Presión de trabajo :	20 - 80 PSI
Torque de cierre :	Ajustar con una llave hasta obtener un selle perfecto.
Ciclo de Vida y Desempeño de la descarga :	150,000 ciclos

Cuidados y Limpieza

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

Repuestos

Referencia	Descripción
O21121111	UNIDAD DE CONTROL LVM/ORINAL
O21341111	ESCUDO VÁLVULA LVM/ ORINAL
O21371111	PORTA-ESCUDO VÁLVULA LVM/ORINAL
O22071111	LLAVE BOCA FIJA INSTITUCIONAL

Cumplimiento de Normas

Este producto cumple con los requerimientos y especificaciones de :

icontec
Sello de Calidad
NTC 1644
Accesorios de Suministro fontanería

SERVICIO TÉCNICO

AHORRO DE AGUA

3 AÑOS DE GARANTÍA DE PRODUCTO

2 AÑOS DE GARANTÍA (ACABADOS)

Corona tiene un informe de Sostenibilidad corporativo anual que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. Puedes encantarlo en el siguente link: https://empresa.corona.co/sos

corona.co


corona

PUSH PICO EXPUESTO

Grifería Tipo Push - **Para Lavamanos**

Ref.: 701310001

Plano de Explosión

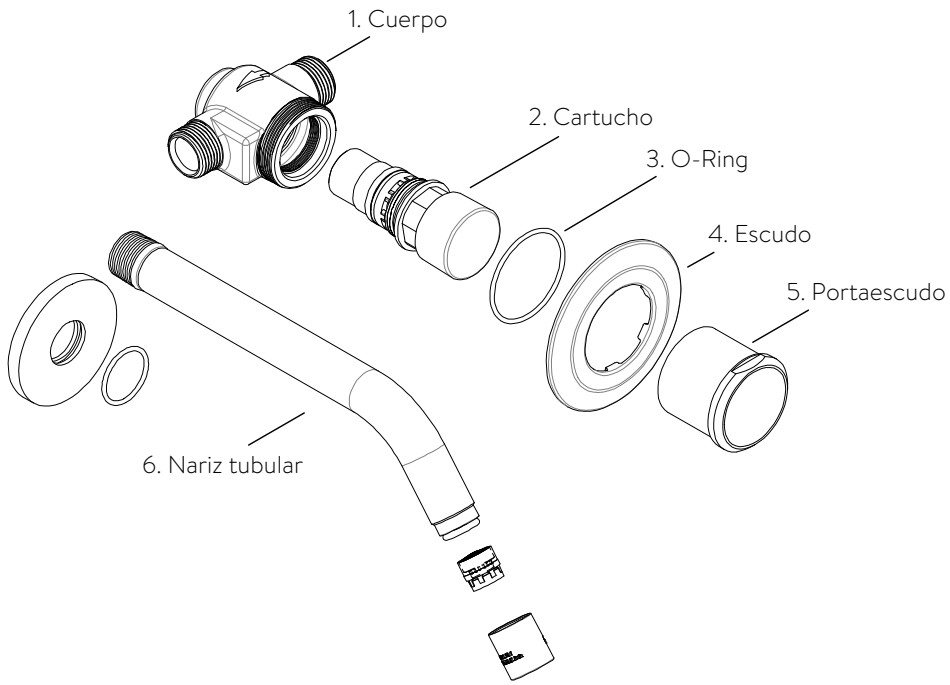

Planos Técnicos

*Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Unidades: mm


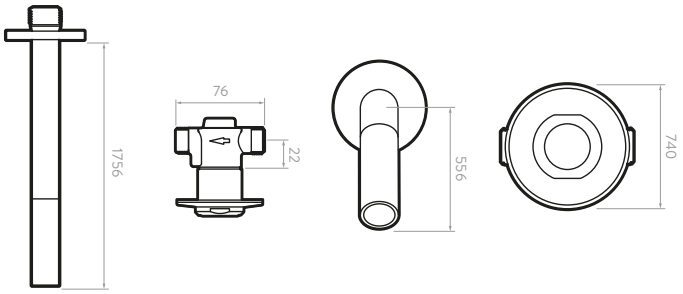


Diagrama de Consumo

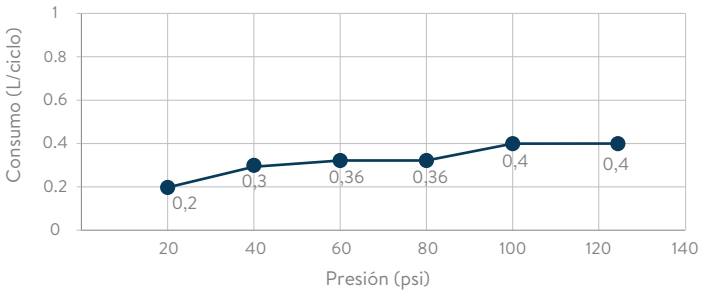

Líneas de atención al cliente:
Colombia: Bogotá (601) 404 88 84 / Resto del país 01 8000 5120 30

Centro America: Guatemala (502) 1-800-6240-109 / Nicaragua (505) 2249-5521
El Salvador (503) 2274-4620 / Honduras San Pedro Sula (504) 9470-9391
Honduras Tegucigalpa (504) 9441-1968 / Costa Rica (506) 4001-4966 /
Panamá (50n 8000-202 **contacto_ ca(.ci)corona.co.com**

México: Directo (81) 8125 2000 / LADA sin costo 01 800 705 1020
Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

BAÑOS **CORONA** | **LAVAMANOS**

CASCADE BARU

Lavamanos vessel en porcelana sanitaria

Ref. O12909331

La línea Cascade nace a partir de la propuesta de CORONA de entregar un diseño amigable, sorprendente, que busca facilitar la tareas y funciones del espacio del baño a nuestros consumidores, su diseño se inspira en la caída del agua, por lo tanto, su forma es fluida, pero con una mezcla de robustez que hace de la línea CASCADE un producto funcional, altamente resistente brindando mayor comodidad en su uso. los lavamanos vessel de esta línea se caracterizan por sus Pozos amplios de 46cm y profundidad de 14cm que permite mayor comodidad al realizar diferentes actividades cotidianas, además de minimizar el salpique al momento del uso. Cuenta con un acabado artesanal, por lo que permite tener una pieza única para dar ese toque personalizado al baño.


- Diseño guiado por la forma y la función.
- Acabado artesanal, que te permitirá tener una pieza única.
- Tecnología AQUAFLOW®, superficie homogénea que impide la acumulación de agua y residuos.
- Tecnología COVERGLOSS®, alta resistencia al rayado y a cambios de temperatura.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PESO APROX.
O12909331	Lavamanos vessel en porcelana sanitaria.	9,5 kg

PLANOS TÉCNICOS

SUPERIOR LATERAL FRONTAL



Unidades: mm.

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Material	Porcelana sanitaria
Dimensiones generales del producto	5,9" x 14,8" x 18,1" (15,1 cm x 37,6 cm x 46 cm)
Dimensiones generales del Producto empacado	6,6" x 15,5" x 18,8" (17 cm x 39,5 cm x 48 cm)
Dimensiones generales del pozo	5" x 13,1" x 16,3" (12,8 cm x 33,5 cm x 41,6 cm)
Diámetro del desagüe	1,7" (4,3 cm)
Peso neto aproximado	19,9 Lb (9 kg)
Peso bruto aproximado	21,3 Lb (9,7 kg)
Altura de instalación	34" (86,4 cm)

SERVICIO TÉCNICO

REPUESTOS ORIGINALES

El desempeño y las especificaciones de este producto cumplen o exceden la normaASME/ANSI A112.19.2.

Estas dimensiones son nominales y cumplen con las tolerancia admitidas por la norma: ASME/ANSI A112.19.2M.

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS

COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

Colores Disponibles:

- Blanco
- 154 gris antiguo
- Barú
- Tatacoa
- 176 taupe
- Pacífico
- Negro mate
- Páramo
- Negro brillante
- Duna

LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

corona

CASCADE VESSEL BARU


Lavamanos vessel en porcelana sanitaria


Ref. O12909331








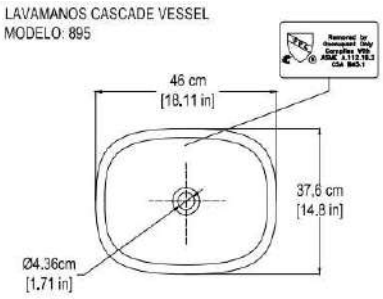



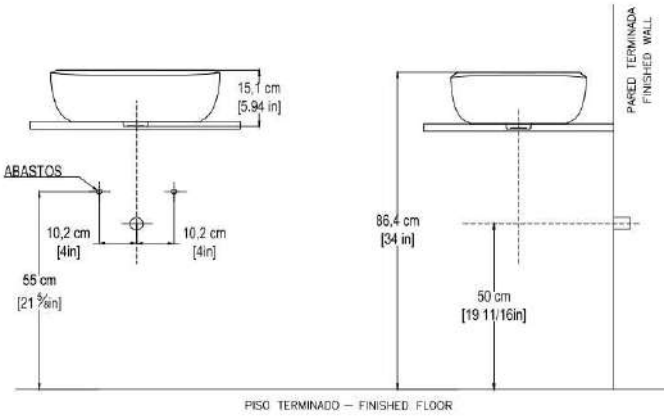

CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Para la limpieza, utilice un detergente suave como jabón líquido de PH neutro y agua tibia.
- No utilice limpiadores abrasivos que puedan rayar u opacar la superficie.
- No use limpiadores que contengan CLORO, este químico puede causarle daños a la pieza.
- Siempre pruebe la solución de limpieza en un área oculta antes de aplicarla a toda la superficie.
- Limpie con un trapo y enjuague completa e inmediatamente con agua después de aplicar limpiadores.
- Enjuague y seque las superficies cercanas que se hayan rociado.

Garantía Limitada de por vida CORONA

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. www.corona.com.co/web/Files/Uploads/Corona/Home/Informe-Sostenibilidad-2012/
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

corona.co

corona

GRIFERÍAS **CORONA** | **INSTITUCIONAL**

VÁLVULA PUSH

Válvula Push Orinal Empotrada Ref. 703020001

Las válvulas para orinal Corona son el aliado perfecto para las necesidades de las instituciones de alto tráfico, están diseñadas para un óptimo funcionamiento y durabilidad debido a sus características antivandálicas.

- Válvula empotrada de accionamiento automático tipo Push.
- Consumo de agua desde 0.5 L hasta 1.9 L.
- Cierre automático temporizado entre 4 y 7 segundos.
- Diseño adecuado con un grado elevado de antivandalismo para tráfico alto.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

· Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
· Recubrimientos no tóxicos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Acabado: Natural-Cromado.
· Tipo de Instalación: Empotrar a muro.
· Material:
· Cuerpo: Latón acabado natural.
· Boton: Latón con recubrimiento de cromo.
· Escudo y Portaescudo: latón con recubrimiento de cromo.
· Manguera: Flexible.
· Peso Neto aproximado: 795g 1,75lb.
· Peso Bruto aproximado: 900g 1,98lb.
· Diámetro de Tubería para la instalación:
· Entrada Mínimo: 1/2" NPT.
· Salida: 1-1/2" NPT.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO


· Productos para uso institucional de alto tráfico.
· Válvula empotrada de accionamiento automático tipo Push.
· Incluye sistema de instalación:
75129001 - Válvula push Entrada superior
703010001 - Válvula push Entrada posterior
· Consumo de agua desde 0.5 L hasta 1.9 L.
· Cierre automático temporizado entre 4 y 7 segundos.
· Diseño adecuado con un grado elevado de antivandalismo para tráfico alto.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

· Presión mínima: 20 Psi.
· Presión de trabajo: 20 - 80 Psi.
· Presión máxima: 80 Psi.
· Capacidad de flujo máximo por norma: 9,68 L/min - 0,49 L/Descarga.
· Capacidad de flujo estimada real: 6,35 - 9,68 L/min - 0,33 - 0,49 L/Descarga.
· Vida útil de la unidad de cierre: 150 Mil Ciclos.

SERVICIO TÉCNICO | CORONA Y GRIVAL COMPATIBLES | AHORRO DE AGUA | 2 AÑOS DE GARANTÍA DEL ACABADO

PLANOS TÉCNICOS

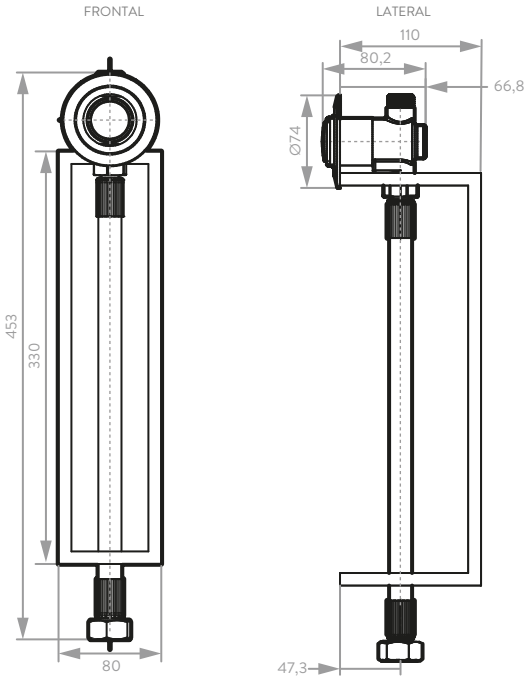

Unidades: mm.
Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Disponible en acabado:

Cromado

Accesorios:


· Escudo
· Caja molde

LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**
Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

VÁLVULA PUSH

Válvula push EP empotrada


DIAGRAMA DE CAUDAL

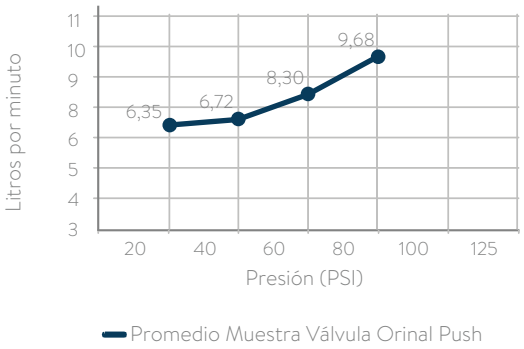

Promedio Muestra Válvula Orinal Push

Los valores dados en esta gráfica son promedios tomados en fabrica. Los caudales pueden variar según las condiciones de instalación, calidad de agua o variación de presiones de la red hidráulica.

Grafica de consumo lavamanos sensor (ciclo de 10 segundos)

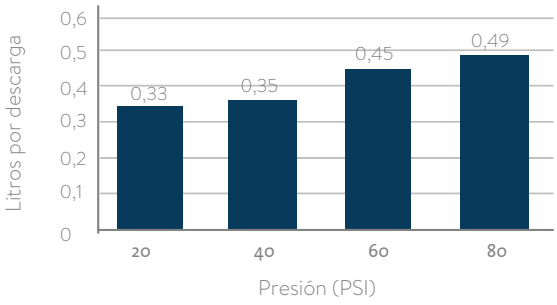

	Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx/Mín
REQUISITO DE NORMA: NTC 1644	20-80	6,35-9,68	Máx/Mín

	PRESIÓN (psi)	PROM. MUESTRA (Regadera)
REQUISITO DE NORMA: NTC No. 1644	20	6,35
	40	6,72
	60	8,30
	80	9,68

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

REPUESTOS

- **Ref. O21121111** "Cartucho Push"
- **Ref. O21081111** "Empaques O-ring Cratucho Push"
- **Ref. O21341111** "Escudo"
- **Ref. O21371111** "Porta-Escudo"
- **Ref. O21391111** "Empaque O-ring Escudo"
- **Ref. O22071111** "Llave Boca Fija Institucional"

corona

PAREDES CORONA

PISO PARED AMADEO BEIGE MT

Referencia: 604862031
Formato: 30X60 cm
Color: BEIGE\BEIGE



	TRÁFICO | TRAFFIC	Comercial Moderado / Moderate Commercial
	ACABADO |FINISH	Mate / Matte
	ASPECTO	MT / Multitono
	M2 POR CAJA SQ FT APPROX	1,62 17,44
	UNIDADES | PIECES	9
	PESO BRUTO CAJA kg WEIGTH LB APPROX	28,35 62,50
	ESPESOR NOMINAL NOMINAL THICKNESS	8.0 +/- 0.3
	CAJAS POR ESTIBA CARTONS PER PALLET	54
	VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS	0

El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.
The color represented in the photograph is an approximation to the real color.

TRÁFICO COMERCIAL MODERADO
Pisos para uso en áreas comerciales sin acceso directo de la calle, tales como: oficinas, consultorios, habitaciones en general, puntos fijos y zonas comunes de edificios residenciales.
Para pisos de acabado mate el tráfico debe ser inferior a 500 personas diarias promedio y para pisos con acabado brillante el tráfico debe ser inferior a 200 personas diarias promedio.
Estos pisos también son aptos para todas las áreas de viviendas.
Importante: No usar para pisos de aeropuertos, terminales de transporte, industrias que utilizan maquinaria pesada, áreas comerciales tales como súper e hipermercados, industrias, oficinas públicas, pasillos y zonas comunes de centros comerciales.
Precaución: A excepción de los productos Corona ARD® y ARD® PRO, los productos cerámicos al contacto con el agua disminuyen su resistencia al deslizamiento. En áreas húmedas son recomendados productos con alto coeficiente de fricción.

CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y BENEFICIOS:

Piso Natural Mate AMADEO color Beige de formato 30X60, permite crear ambientes de mayor realismo y naturalidad. Por su versatilidad puede ser utilizada en espacios diferentes al baño y la cocina. es un producto multitono (MT), con tonos y diferencias sutiles entre una pieza y otra.
La Tecnología de Impresión Digital (HIGH DEFINITION HD) le brinda al producto mayor nitidez y realismo en su diseño, logrando un alto grado de naturalidad.

Garantía Corona | Corona quality guaranteed: 10 Años/Years

Este producto cumple con las siguientes normas:
Norma Técnica Colombiana NTC - 919 Versión 2022 anexo K
Norma Técnica Internacional ISO 13006 Anexo K

Mayor información de garantía consulte www.corona.co/garantias

Orchid Ceramics®

ADHESIÓN GARANTIZADA DE POR VIDA

corona

PISO PARED AMADEO BEIGE MT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS		ENSAYO |TEST	ESPECIFICACIÓN SPECIFITACION NTC 919 / ISO 13006	MEDICIONES LOTES PROMEDIO CORONA/ CORONA AVERAGE LOT MEASUREMENTS
ANCHO Y LARGO LENGHT AND WIDTH		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 2.00% del tamaño de fabricación; hasta máximo 5 mm	(±) 2.00% del tamaño de fabricación; hasta máximo 5 mm
PLANIRADIDAD DE LA SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	**Curvatura Central** Central Curvature	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación	(±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación
	Curvatura del lado Edge Curvature	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 0.50% del del tamaño de fabricación	(±) 0.30% del tamaño de fabricación
	Ortogonalidad Warpage	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación	(±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación
DEFECTOS SUPERFICIALES SURFACE DEFECTS		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	Minimo 95% libre de defectos / Minimum 95% without deffects	Minimo 95% libre de defectos / Minimum 95% without deffects
ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION		NTC 4321 - 3 ISO 10545 - 3	Mínimo 6% Máximo 10%	Mínimo 6% Máximo 10%
RESISTENCIA A LA ROTURA BREAKING STRENGHT		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mínimo 800 N / Minimum 800 N	Mínimo 900 N / Minimum 900 N
MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mínimo 18 N/mm2, Mínimo indivudual 16 N/mm2, Mínimum 18 N/mm2	Mínimo 25 N/mm2 / Minimum 25 N/mm2
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ABRASION RESISTANCE		NTC 4321 - 7 ISO 10545 - 7	Informe de cumplimiento de la clase de abrasión y los ciclos	Clase 4 / Class 4
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION		NTC 4321 - 17 ISO 10545 - 17	Declarado por el fabricante / Metodo de ensayo disponible	Clase 1 / Class 1
RESISTENCIA AL MANCHADO RESISTANCE TO STAINING		NTC 4321 - 14 NTC 4321 - 14	Mínimo clase 3 / Mínimum class 3	Mínimo clase 5 / Mínimum class 5
RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS RESISTACE TO CHEMICALS		NTC 4321 - 13 NTC 4321-2 - 13	Mínimo clase GB / Minimum GB class	Mínimo Clase GA / Minimun GA Class
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE		NTC 4321-2 - 9 NTC 4321 - 9	La indicada por el fabricante/Manufacturer to state classification	Mínimo clase GLA/ Mimimum GLA class

Descargar recomendaciones de uso en: https://www.corona.co/instructivos/pisos-y-paredes
Este producto es elaborado en Colombia, en el Parque Industrial de Sopó, Cundinamarca.

FUENTES DE MATERIA PRIMA RESPONSABLES:

Corona tiene un reporte sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report.
Puede encontrarlo aquí: http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible

Colombia

Orchid Ceramics®

ADHESIÓN GARANTIZADA DE POR VIDA

corona

PISOS CORONA

PISO VANCOUVER GRIS CD

Referencia: 607942501
Formato: 60X60 cm
Color: GRIS\GRAY



TRÁFICO | TRAFFIC	Comercial Moderado / Moderate Commercial
ACABADO |FINISH	Mate / Matte
ASPECTO	CD / Caras diferenciadas
M2 POR CAJA SQ FT APPROX	1,8 19,38
UNIDADES | PIECES	5
PESO BRUTO CAJA kg WEIGTH LB APPROX	31 68,34
ESPESOR NOMINAL NOMINAL THICKNESS	7,90 a 8,50 mm
CAJAS POR ESTIBA CARTONS PER PALLET	60
VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS	0

El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.
The color represented in the photograph is an approximation to the real color.

TRÁFICO COMERCIAL MODERADO
Pisos para uso en áreas comerciales sin acceso directo de la calle, tales como: oficinas, consultorios, habitaciones en general, puntos fijos y zonas comunes de edificios residenciales.
Para pisos de acabado mate el tráfico debe ser inferior a 500 personas diarias promedio y para pisos con acabado brillante el tráfico debe ser inferior a 200 personas diarias promedio.
Estos pisos también son aptos para todas las áreas de viviendas.
Importante: No usar para pisos de aeropuertos, terminales de transporte, industrias que utilizan maquinaria pesada, áreas comerciales tales como súper e hipermercados, industrias, oficinas públicas, pasillos y zonas comunes de centros comerciales.
Precaución: A excepción de los productos Corona ARD® y ARD® PRO, los productos cerámicos al contacto con el agua disminuyen su resistencia al deslizamiento. En áreas húmedas son recomendados productos con alto coeficiente de fricción.

CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y BENEFICIOS:

El piso Natural Corona VANCOUVER de acabado Mate en color Gris y formato 60x60, Piso que recrea las vibraciones de la cultura urbana contemporánea a través de su diseño inspirado en el concreto y expresado sútilmente. Tecnología Perdura que le confiere al producto mayor resistencia al desgaste y a los rayones con el paso del tiempo. La tecnología de Impresión Digital (HIGH DEFINITION HD) le confiere al producto mayor nitidez y realismo en su diseño, logrando un alto grado de naturalidad. Ideal para uso Comercial Moderado.
Posee tres (3) caras diferenciadas (CD), baldosas con diferencias sutiles entre una pieza y otra para dar mayor realismo y naturalidad al producto. Con tecnología Perdura, tambien cuenta con tecnología de Impresión Digital (HIGH DEFINITION HD) .

Garantía Corona | Corona quality guaranteed: 10 Años/Years

Este producto cumple con las siguientes normas:
Norma Técnica Colombiana NTC - 919 Versión 2022 anexo K
Norma Técnica Internacional ISO 13006 Anexo K

Mayor información de garantía consulte www.corona.co/garantias

Orchid Ceramics®

ADHESIÓN GARANTIZADA DE POR VIDA
PARA REVESTIMIENTOS CORONA INSTALADOS CON PEGACOR®

corona

PISO VANCOUVER GRIS CD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS		ENSAYO |TEST	ESPECIFICACIÓN SPECIFITACION NTC 919 / ISO 13006	MEDICIONES LOTES PROMEDIO CORONA/ CORONA AVERAGE LOT MEASUREMENTS
ANCHO Y LARGO LENGHT AND WIDTH		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 2.00% del tamaño de fabricación; hasta máximo 5 mm	(±) 2.00% del tamaño de fabricación; hasta máximo 5 mm
PLANIRADIDAD DE LA SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	**Curvatura Central** Central Curvature	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación	(±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación
	Curvatura del lado Edge Curvature	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 0.50% del del tamaño de fabricación	(±) 0.30% del tamaño de fabricación
	Ortogonalidad Warpage	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación	(±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación
DEFECTOS SUPERFICIALES SURFACE DEFECTS		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	Minimo 95% libre de defectos / Minimum 95% without deffects	Minimo 95% libre de defectos / Minimum 95% without deffects
ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION		NTC 4321 - 3 ISO 10545 - 3	Mínimo 6% Máximo 10%	Mínimo 6% Máximo 10%
RESISTENCIA A LA ROTURA BREAKING STRENGHT		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mínimo 800 N / Minimum 800 N	Mínimo 900 N / Minimum 900 N
MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mínimo 18 N/mm2, Mínimo indivudual 16 N/mm2, Mínimum 18 N/mm2	Mínimo 25 N/mm2 / Minimum 25 N/mm2
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ABRASION RESISTANCE		NTC 4321 - 7 ISO 10545 - 7	Informe de cumplimiento de la clase de abrasión y los ciclos	Clase 2 / Class 2
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION		NTC 4321 - 17 ISO 10545 - 17	Declarado por el fabricante / Metodo de ensayo disponible	Clase 2 / Class 2
RESISTENCIA AL MANCHADO RESISTANCE TO STAINING		NTC 4321 - 14 NTC 4321 - 14	Mínimo clase 3 / Mínimum class 3	Mínimo clase 5 / Mínimum class 5
RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS RESISTACE TO CHEMICALS		NTC 4321 - 13 NTC 4321-2 - 13	Mínimo clase B / Minimum B class	Mínimo Clase A / Minimun A Class
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE		NTC 4321-2 - 9 NTC 4321 - 9	La indicada por el fabricante/Manufacturer to state classification	Mínimo clase BA/ Mimimum BA class

Descargar recomendaciones de uso en: https://www.corona.co/instructivos/pisos-y-paredes
Este producto es elaborado en Colombia, en el Parque Industrial de Sopó, Cundinamarca.

FUENTES DE MATERIA PRIMA RESPONSABLES:

Corona tiene un reporte sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report.
Puede encontrarlo aquí: http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible

Colombia

Orchid Ceramics®

ADHESIÓN GARANTIZADA DE POR VIDA
PARA REVESTIMIENTOS CORONA INSTALADOS CON PEGACOR®

corona


LED PANEL REDONDO **INCRUSTAR**

IP20




Características

- Luminaria redonda tipo panel de alta eficacia con diseño ultra delgado y moderno para iluminación interior, oficinas, comercios e instalaciones educativas.
- Bajo consumo de energía, logrando más del 50% de ahorro en comparación con productos de tecnologías tradicionales.
- Marco moldeado a presión con difusor opalizado.
- Tipo de distribución: Directo Simétrico.
- Tipo de montaje: Incrustar (resortes incluidos).



Watt	Ø (mm)	Watt	Ø (mm)
3W	Ø83x20	**12W**	Ø170x20
6W	Ø120x20	**18W**	Ø220x20
9W	Ø145x20	**24W**	Ø295x20



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	ÁNGULO	VIDA ÚTIL
	(W)	(V)	(lm)		(Lm/W)	(k)		°	(h)
P27360	3	100-240	150	>0.4	50	6500	70	120	25000
P27359	3	100-240	110	>0.4	37	3000	70	120	25000
P26544	6	100-240	350	>0.5	58	6500	70	120	25000
P26865	6	100-240	320	>0.5	53	3000	70	120	25000
P24337	12	100-240	840	>0.5	70	6500	70	120	25000
P24628	12	100-240	745	>0.5	62	4000	70	120	25000
P24612	12	100-240	780	>0.5	65	3000	70	120	25000
P24338	18	100-240	1260	>0.5	70	6500	70	120	25000
P24629	18	100-240	1260	>0.5	70	4000	70	120	25000
P24613	18	100-240	1170	>0.5	65	3000	70	120	25000
P24339	24	100-240	1680	>0.5	70	6500	70	120	25000
P24614	24	100-240	1620	>0.5	68	3000	70	120	25000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).



La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

DANOCOAT 250



EPD S-P-03356

ETE 17/ 0401

Membrana aromática, de poliurea 100% pura, de dos componentes, libre de disolventes y plastificantes, con 100% de contenido en sólidos, que cura en pocos segundos; para una impermeabilización con elevada elasticidad, capacidad de puenteo de fisuras, excelente resistencia química y a la abrasión. Es una membrana versátil, apta para la impermeabilización, el revestimiento y protección de diversos tipos de soporte contra impactos, desgaste o abrasión. Se aplica mediante un equipo de proyección a alta presión y alta temperatura.

Presentación

- Peso (kg): 225
- Color: Amarillo
- Código de producto: 750753

Datos Técnicos

Concepto	Valor	Norma
Adherencia al hormigón (con DANOPRIMER EP) (N/mm²)	3.7	ASTM D4541
Elongación a rotura (%)	>400	ASTM D412
Relación A/B (en peso)	106	-
Relación A/B (Volumen)	100	-
Resistencia a la penetración de raíces	Pasa	-
Resistencia a tracción (N/mm²)	15	ASTM D412
Resistencia al choque térmico (MPa)	3,6	-
Resistencia al impacto (Nm)	24.5 (Clase III)	UNE-EN ISO 6272-1:2012
Secado al tacto a 70ºC (s)	15	-

Concepto	Valor	Norma
Shore D A/D 15s	90/43	ISO 868
Tiempos de secado (23ºC y 50% HR). Tiempo para tráfico rodado (horas)	24	-
Tiempos de secado. Tiempo para tránsito peatonal ligero (min)	10	-
Viscosidad mezcla a 23ºC (mPA.s.)	750±150	-
Ensayo desgarro iniciado (N/mm)	165	UNE-EN 12310-2
Ensayo desgarro tipo clavo (N/mm)	109	UNE-EN 12310-1
Resistencia a la abrasión Taber	21 mg	ASTM D4060
Dureza (Shore A)	90	ASTM 2240

Datos Técnicos Adicionales

Concepto	Valor	Norma
Adherencia por tracción indirecta (Hormigón con DANOPRIMER EP)	3,7 N/mm²	ASTM D4541
Resistencia al desgaste Taber	21 mg	ASTM D4060
Dureza Shore A	90	ASTM 2240
Resistencia a la tracción	15 N/mm²	ASTM D412
Elongación	> 400 %	ASTM D412

Datos Técnicos Adicionales

Concepto	Valor	Norma
Compatibilidad con agua potable	Pasa	UNE-EN 12873-2 Parte 2
Compatibilidad con agua potable según RD 3/2023	Apto	UNE-EN 12873-2 Parte 2
Contenido en sólidos (%)	100	-
Densidad a 23 ºC (kg/dm³)	1,11±0,02	-
Viscosidad a 23ºC (mPA.s)	750±150	-

Datos de aplicación

Concepto	Valor
Humedad relativa (%)	<85
Presión de aplicación (bar)	160
Temperatura de componente (ºC)	70
Temperatura de manguera (ºC)	70
Temperatura de soporte / ambiente (ºC)	+5ªC / +40ºC (3ºC por encima del punto de rocío)
Tiempo gelificación a 70ºC (s)	5

Campo de Aplicación

- Impermeabilización de balcones y terrazas.
- Impermeabilización de cubiertas.
- Impermeabilización de graderíos y escaleras de acceso.
- Impermeabilización de pasarelas peatonales.
- Pavimentos y cubiertas de aparcamientos.
- Impermeabilización de piscinas, cubetos de retención, tanques y silos.
- Impermeabilización y protección contra la abrasión de las superficies metálicas.
- Protección de hormigón, acero y otros materiales en ambientes químicamente agresivos.

Ventajas y Beneficios

- Gran resistencia a la penetración de raices.
- Impermeabilidad excelente y estanqueidad total.
- Membrana continua sin solapes, de excelente adherencia y adaptable a cualquier geometría del soporte.
- Buena resistencia química, especialmente al agua estancada e hidrólisis.
- Excelente resistencia mecánica a la abrasión, tracción y cambios de temperatura (-40ºC a +140ºC).
- Elevada elasticidad capaz de puentear fisuras incluso a bajas temperaturas
- Curado y secado instantáneo en apenas unos segundos.
- Ejecución de obra muy rápida sin generar molestias.
- Apto para tráfico rodado y peatonal.
- Aplicación de altos espesores con una sola pasada. Acabado estético con multiples colores y texturas.
- Respetuoso con el medio ambiente: Libre de disolventes y sin plastificantes.

Soporte

- Hormigón, cerámica, acero, chapa, aluminio, PVC envejecido (Contactar con el Departamento Técnico para un análisis del sistema), láminas asfálticas, espuma de poliuretano densidad >50 kg/m³, madera, etc.

Preparación del soporte

- Cualquier revestimiento anterior deberá ser eliminado.
- El soporte deberá ser cohesivo, sin partículas sueltas, con textura superficial regular.
- Los soportes deberán estar limpios y sanos, exentos de grasas, pinturas u otras sustancias que impidieran una correcta adherencia.

Modo de empleo

- Antes de aplicar del producto compruebe que la superficie de aplicación está seca, limpia y libre de restos sólidos e irregularidades.
- Protéjase adecuadamente para manipular los componentes con guantes y mascarilla apropiadas. Consulte ficha de seguridad.
- Mezcle los dos componentes en el envase de plástico hasta lograr una masa uniforme.
- Aplique primero en las fisuras y las juntas. Recomendamos usar armadura de fibra de vidrio 4×4 mm (Malla PX160).
- Use una llana/rodillo para aplicar la primera capa y coloque en fresco armadura Malla PX160 también en los ángulos
- Aplique el resto de capas de forma cruzada a la anterior para un mejor resultado (consulte Tiempo de Secado)

Manipulación, Almacenaje y Conservación

- Mantener los recipientes herméticamente cerrados y no expuestos a temperaturas extremas (almacenar entre 15 °C y 25 °C) durante un período no superior a 12 meses a 20 °C / 50% H.R. Los cuatro últimos dígitos del número de lote indicados en la etiqueta corresponden a la fecha de fabricación del producto (mes/año).

Limpieza de las herramientas

- Si el producto está fresco: con agua
- Si el producto está seco: acción mecánica, raspado.

Seguridad e higiene

- Consulte la ficha de seguridad de los dos componentes.

Aviso

- Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La información aquí contenida no exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la aplicación y uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos

reflejados en la presente documentación.Página web: **www.danosa.com** E-mail: **info@danosa.com** Teléfono: **+34 949 88 82 10**

DANOCOAT 250



EPD S-P-03356

ETE 17/ 0401

Membrana aromática, de poliurea 100% pura, de dos componentes, libre de disolventes y plastificantes, con 100% de contenido en sólidos, que cura en pocos segundos; para una impermeabilización con elevada elasticidad, capacidad de puenteo de fisuras, excelente resistencia química y a la abrasión. Es una membrana versátil, apta para la impermeabilización, el revestimiento y protección de diversos tipos de soporte contra impactos, desgaste o abrasión. Se aplica mediante un equipo de proyección a alta presión y alta temperatura.

Presentación

- Peso (kg): 210
- Color: Gris
- Código de producto: 750782

Datos Técnicos

Concepto	Valor	Norma
Adherencia al hormigón (con DANOPRIMER EP) (N/mm²)	3.7	ASTM D4541
Elongación a rotura (%)	>400	ASTM D412
Relación A/B (en peso)	106	-
Relación A/B (Volumen)	100	-
Resistencia a la penetración de raíces	Pasa	-
Resistencia a tracción (N/mm²)	15	ASTM D412
Resistencia al choque térmico (MPa)	3.6	-
Resistencia al impacto (Nm)	24,5 (Clase III)	UNE-EN ISO 6272-1:2012
Secado al tacto a 70ºC (s)	15	-

Concepto	Valor	Norma
Shore D A/D 15s	90/43	ISO 868
Tiempos de secado (23ºC y 50% HR). Tiempo para tráfico rodado (horas)	24	-
Tiempos de secado. Tiempo para tránsito peatonal ligero (min)	10	-
Viscosidad mezcla a 23ºC (mPA.s.)	550±100	-
Ensayo desgarro iniciado (N/mm)	165	UNE-EN 12310-2
Ensayo desgarro tipo clavo (N/mm)	109	UNE-EN 12310-1
Resistencia a la abrasión Taber	21 mg	ASTM D4060
Dureza (Shore A)	90	ASTM 2240

Datos Técnicos Adicionales

Concepto	Valor	Norma
Adherencia por tracción indirecta (Hormigón con DANOPRIMER EP)	3,7 N/mm²	ASTM D4541
Resistencia al desgaste Taber	21 mg	ASTM D4060
Dureza Shore A	90	ASTM 2240
Resistencia a la tracción	15 N/mm²	ASTM D412
Elongación	> 400 %	ASTM D412

Datos Técnicos Adicionales

Concepto	Valor	Norma
Compatibilidad con agua potable	Pasa	UNE-EN 12873-2 Parte 2
Compatibilidad con agua potable según RD 3/2023	Apto	UNE-EN 12873-2 Parte 2
Contenido en sólidos (%)	100	-
Densidad a 23 ºC (kg/dm³)	1,05±0,02	-
Viscosidad a 23ºC (mPA.s)	550±100	-

Datos de aplicación

Concepto	Valor
Humedad relativa (%)	<85
Presión de aplicación (bar)	160
Temperatura de componente (ºC)	65
Temperatura de manguera (ºC)	70
Temperatura de soporte / ambiente (ºC)	+5ªC / +40ºC (3ºC por encima del punto de rocío)
Tiempo gelificación a 70ºC (s)	5

Campo de Aplicación

- Impermeabilización de balcones y terrazas.
- Impermeabilización de cubiertas.
- Impermeabilización de graderíos y escaleras de acceso.
- Impermeabilización de pasarelas peatonales.
- Pavimentos y cubiertas de aparcamientos.
- Impermeabilización de piscinas, cubetos de retención, tanques y silos.
- Impermeabilización y protección contra la abrasión de las superficies metálicas.
- Protección de hormigón, acero y otros materiales en ambientes químicamente agresivos.

Ventajas y Beneficios

- Gran resistencia a la penetración de raices.
- Impermeabilidad excelente y estanqueidad total.
- Membrana continua sin solapes, de excelente adherencia y adaptable a cualquier geometría del soporte.
- Buena resistencia química, especialmente al agua estancada e hidrólisis.
- Excelente resistencia mecánica a la abrasión, tracción y cambios de temperatura (-40ºC a +140ºC).
- Elevada elasticidad capaz de puentear fisuras incluso a bajas temperaturas
- Curado y secado instantáneo en apenas unos segundos.
- Ejecución de obra muy rápida sin generar molestias.
- Apto para tráfico rodado y peatonal.
- Aplicación de altos espesores con una sola pasada. Acabado estético con multiples colores y texturas.
- Respetuoso con el medio ambiente: Libre de disolventes y sin plastificantes.

Soporte

- Hormigón, cerámica, acero, chapa, aluminio, PVC envejecido (Contactar con el Departamento Técnico para un análisis del sistema), láminas asfálticas, espuma de poliuretano densidad >50 kg/m³, madera, etc.

Preparación del soporte

- Cualquier revestimiento anterior deberá ser eliminado.
- El soporte deberá ser cohesivo, sin partículas sueltas, con textura superficial regular.
- Los soportes deberán estar limpios y sanos, exentos de grasas, pinturas u otras sustancias que impidieran una correcta adherencia.

Modo de empleo

- Antes de aplicar del producto compruebe que la superficie de aplicación está seca, limpia y libre de restos sólidos e irregularidades.
- Protéjase adecuadamente para manipular los componentes con guantes y mascarilla apropiadas. Consulte ficha de seguridad.
- Mezcle los dos componentes en el envase de plástico hasta lograr una masa uniforme.
- Aplique primero en las fisuras y las juntas. Recomendamos usar armadura de fibra de vidrio 4×4 mm (Malla PX160).
- Use una llana/rodillo para aplicar la primera capa y coloque en fresco armadura Malla PX160 también en los ángulos
- Aplique el resto de capas de forma cruzada a la anterior para un mejor resultado (consulte Tiempo de Secado)

Manipulación, Almacenaje y Conservación

- Mantener los recipientes herméticamente cerrados y no expuestos a temperaturas extremas (almacenar entre 15 °C y 25 °C) durante un período no superior a 12 meses a 20 °C / 50% H.R. Los cuatro últimos dígitos del número de lote indicados en la etiqueta corresponden a la fecha de fabricación del producto (mes/año).

Limpieza de las herramientas

- Si el producto está fresco: con agua
- Si el producto está seco: acción mecánica, raspado.

Seguridad e higiene

- Consulte la ficha de seguridad de los dos componentes.

Aviso

- Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La información aquí contenida no exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la aplicación y uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos

reflejados en la presente documentación.Página web: **www.danosa.com** E-mail: **info@danosa.com** Teléfono: **+34 949 88 82 10**

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCIÓN 1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Esta FDS cumple con la legislación colombiana, según la fecha de revisión arriba mencionada.

1.1. IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO QUÍMICO

Nombre del Producto:	Mortero Seco.
Otros nombres:	Mortero seco, Mortero Tipo N 75, Mortero Tipo S 125 Estructural, Mortero M 175 Estructural, Mortero 125 Grouting, Mortero 175 Grouting, Mortero 125 Pisos y Mortero 140 Pisos.
Descripción del Producto:	Material conformado por arena, cemento, aditivos químicos y ceniza.
Usos recomendados:	Material para construcción, componente estructural para elementos constructivos.

1.2. INFORMACIÓN SOBRE EL FABRICANTE

Productor/Fabricante:	CEMEX Colombia S.A. Mina Tunjuelo AV. Al Llano N.º 74-02 sur. Bogotá- Colombia.
Información Técnica:	+57 (1) 6039000 ext. 49404

SECCIÓN 2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1. CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA.

Sistema Globalmente Armonizado:

Corrosivo cutánea, Categoría 1.
Lesiones oculares graves. Categoría 1.
Sensibilización cutánea. Categoría 1.
Carcinógeno (inhalación). Categoría 1A
Toxicidad específica de órganos diana (exposición única) (irritación del tracto respiratorio). Categoría 3.
Toxicidad especificada de órganos diana (exposición repetida). Categoría 1

2.2. ELEMENTOS DE LA ETIQUETA

Pictogramas de Peligro:



Palabra de advertencia: Peligro

Frases de Peligro (Frases H):	H314	Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares graves
	H317	Puede causar reacciones alérgicas en la piel
	H335	Puede irritar las vías respiratorias
	H350	Puede provocar cáncer (Vía respiratoria)
	H372	Puede provocar daño en los órganos (pulmones/sistema respiratorio) tras exposiciones prolongadas o repetidas (Vía dérmica, respiratoria).
Frases de Prudencia (Frases P):	Prevención	
	P201	Leer instrucciones antes del uso
	P202	No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad

P260	Evitar respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles
P264	Lavarse…cuidadosamente después de la manipulación
P270	No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto
P271	Utilizar solo al aire libre o en un lugar bien ventilado
P272	La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo
P280	Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/cara
Intervención	
P301+P330 +P331	EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vomito
P303+P361 +P353	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Enjuagarse la piel con agua
P304+P340	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración
P305+P351 +P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado
P308+P313	EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un medico
P333+P313	En caso de irritación de la piel o sarpullido: consultar a un medico
P363	Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla
Almacenamiento	
P403+P233	Almacenar en un lugar bien ventilado. Guardar el recipiente herméticamente cerrado
Eliminación	
P501	Eliminar el contenido conforme la reglamentación local

SECCIÓN 3 COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 SUSTANCIA/MEZCLA

Mortero Seco, mezcla de diversos componentes.

Nombre	# CAS	Concentración (% en masa)
Agregados (Arena rio, arena peña)	Varios	0 - 80
Cemento	65997-15-1	0-20
Ceniza Volante	Varios	
Aditivos Químicos	Varios	
Cuarzo (Sílice Cristalina)	14808-60-7	
Sílice Amorfa	61790-53-2	

Notas

- La ceniza volante se cataloga como una adición cementicia la cual contiene ingredientes peligrosos como oxido de calcio y sílice amorfa.
- Cualquier concentración ilustrada como un rango se usa para proteger la confidencialidad como también se debe a las variaciones en los registros de cargue de la producción.
- **Aditivos químicos** pueden ser utilizados y estar presentes en rangos promedio menores a 1%. Las composiciones individuales de ingredientes peligrosos pueden variar entre los diferentes tipos de diseños de Mortero seco.
- No hay ingredientes adicionales presentes que, dentro del conocimiento actual del fabricante y en las concentraciones aplicables, sean clasificados como peligrosos a la salud o al medio ambiente y que requieran ser reportados en esta sección.

SECCIÓN 4 PRIMEROS AUXILIOS

4.1 DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

General Asegurar que personal médico esté al tanto del material o materiales involucrados y tomar las precauciones para protegerse.

Inhalación	Busque ayuda médica si la tos u otros síntomas persisten. La inhalación de grandes cantidades de mortero seco requiere atención médica inmediata. Llame a un centro toxicológico o médico. Retire a la víctima y desplácela a un lugar donde haya aire fresco y manténgala en reposo en una posición cómoda para respirar. Si la persona no respira, o su respiración es irregular u ocurre un paro respiratorio, proporcione respiración artificial u oxigeno mediante personal entrenado. Puede ser peligroso para la persona entrenada dar reanimación boca a boca. Si la persona esta inconsciente, colóquela en un lugar seguro obtenga atención médica inmediata. Mantenga el área ventilada.
Contacto con la piel	Obtenga atención médica inmediata. Lave inmediatamente con agua tibia completamente la zona afectada usando también un jabón de pH neutro no abrasivo. Busque atención médica en caso de presentarse erupciones cutáneas, quemaduras, irritación, dermatitis y exposiciones prolongadas sin protección al mortero en estado humedecido (fresco) o a fluidos provenientes de este. Las quemaduras deberían ser tratadas como quemaduras cáusticas. La exposición prolongada al polvo del mortero seco (endurecido) producido por molienda o cortes de este, mortero húmedo (fresco) o impregnado con agua requieren pronta atención. Rápidamente remueva la ropa contaminada, zapatos y artículos de cuero contaminados tales como bandas de relojes y cinturones. Limpie rápidamente y con suavidad el exceso de mezcla de mortero.
Contacto ocular	Obtener atención médica inmediata. Llame a un centro toxicológico o médico. Enjuague los ojos con abundante agua levantando ocasionalmente los parpados superiores e inferiores. Compruebe la presencia de lentes de contacto y retírelos. Continúe enjuagando por lo menos 15 minutos. De presentarse quemaduras químicas, estas deben tratarse prontamente por un médico.
Ingestión	Obtenga atención médica inmediata. Llame a un centro toxicológico o médico. Haga que la víctima se enjuague muy bien la boca con agua. NO INDUZCA AL VOMITO a menos que lo indique el personal médico. Llevar a la víctima a un lugar ventilado y mantenerla en reposo en una posición cómoda para respirar. Si el material ha sido tragado y la persona expuesta está consciente, de pequeñas cantidades de agua para beber. Haga que la víctima beba de 60 a 240 ml (2 a 8 Onzas) de agua. Deje de dar agua si la persona expuesta se siente muy mal ya que se debe evitar que vomite debido a que esto es peligroso. Si el vómito se presenta, mantenga la cabeza hacia abajo para que el vómito no entre a los pulmones. Las quemaduras químicas deben ser tratadas rápidamente por un médico. Nunca ofrezca nada por la boca a la persona si esta inconsciente. Si esta inconsciente, colóquelo en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediata. Mantenga el área ventilada.

4.2 SÍNTOMAS/EFECTOS POR EXPOSICIONES AGUDAS

Inhalación	Puede causar irritación respiratoria.
Contacto con la piel	Causa quemaduras graves. No se puede confiar en la ausencia de molestias o dolor para alertar a una persona de una lesión grave. Es posible que no sienta dolor o no se evidencie el impacto de la quemadura sino hasta horas después de la exposición. Las quemaduras químicas deben ser tratadas rápidamente por un médico. Puede provocar reacciones alérgicas en la piel.
Contacto con los ojos	Causa lesiones serias en los ojos.

Ingestión	Puede causar quemaduras en la boca, garganta y estómago.

4.3 SÍNTOMAS/EFECTOS POR SOBREEXPOSICIÓN

Inhalación	Síntomas adversos pueden incluir: Irritación de las vías respiratorias y tos.
Contacto con la piel	Síntomas adversos pueden incluir: Dolor o irritación, enrojecimiento y presencia de ampollas, quemaduras en la piel, ulceración y necrosis.
Contacto con los ojos	Síntomas adversos pueden incluir: dolor, enrojecimiento y lagrimeo.
Ingestión	Síntomas adversos pueden incluir: Dolores de estómago.

4.4 RECOMENDACIONES PARA ATENCIÓN MEDICA INMEDIATA

Si grandes cantidades han sido inhaladas o digeridas	Buscar atención médica y contactar a un centro toxicológico inmediatamente.
Notas para el especialista medico	Tratar sintomáticamente.
Protección para los socorristas	Ninguna acción deberá ser tomada que pueda implicar un riesgo para el personal o para aquellos son entrenamiento adecuado. Puede ser peligroso para la persona que proporciona la ayuda dar reanimación respiratoria boca a boca. Lave la ropa contaminada con agua antes de retirarla, o use guantes.

SECCIÓN 5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.2 MEDIOS DE EXTINCIÓN

Medios de extinción adecuados:	Material no inflamable. Usar un extinguidor adecuado para el fuego circundante. Agua en forma de roció, genera hidratación.
Medios de extinción no adecuados:	No disponible

5.3 PELIGROS ESPECIALES PROCEDENTES DE LA SUSTANCIA O MEZCLA

Peligros específicos:	Sin peligro especifico por incendio o explosión.
Productos de Combustión Peligrosos:	Pueden incluir los siguientes materiales: Dióxido de Carbono, monóxido de carbono, óxidos de azufre y óxidos metálicos.

5.4 CONSEJOS PARA BOMBEROS

Equipos de Protección Especial:	Elementos de respiración autónoma de presión positiva (SCBA) y ropa protectora ante el fuego.

Precauciones Especiales: Evacuar el área. Luchar contra el fuego con las precauciones normales a una distancia razonable. Mover los contenedores presentes en el área incendiada si estos presentan un riesgo.

SECCIÓN 6 MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

6.1 PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Para personal que no sea de emergencia: Ninguna acción deberá tomarse si está involucrado personal que pueda afectarse o sin entrenamiento adecuado. Llevar el protector respiratorio apropiado si no hay una ventilación adecuada. Colocarse el equipo de protección personal adecuado. Para conocer los requisitos de la ropa de protección personal, consulte la sección 8. El personal involucrado con el manejo de mortero fresco (húmedo) debe evitar el contacto con los ojos y con la piel usando gafas y ropa protectora de acuerdo con lo descrito en la sección 8. Siga los controles de protección descritos en la sección 8 cuando se maneje el producto.
Para los socorristas: Para los equipos de protección personal, por favor remitirse a la sección 8

Para personal socorrista Para los socorristas: Para los equipos de protección personal, por favor remitirse a la sección 8.

6.2 PRECAUCIONES MEDIOAMBIENTALES

Precauciones ambientales El mortero (húmedo) debería ser reaprovechado o dejar que se endurezca para posteriormente disponerlo. No lavar el mortero con el fin de evitar que entre al alcantarillado, desagües o cuerpos de agua cercanos (como lagos, ríos y otros).

6.3 MÉTODOS Y MATERIALES DE AISLAMIENTO Y LIMPIEZA

Derrames pequeños Colocar el material derramado en un área contenida y permitir que el mortero (húmedo) se endurezca y disponerlo en una escombrera como un residuo solido común. Si es posible reaprovechar el material fresco hacerlo. Seguir las regulaciones federales, estatales, departamentales y locales para la disposición.
Aislar rápidamente la escena retirando a todas las personas que se encuentren cerca del incidente. No se tomarán medidas que impliquen algún riesgo al personal sin una capacitación adecuada.

Derrames grandes Se ejecuta el mismo procedimiento indicado para derrames pequeños.

Contención sí es posible sin generar ningún riesgo, pare la fuga o cierre la fuente del derrame.

SECCIÓN 7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 PRECAUCIONES PARA LA MANIPULACIÓN Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Medidas de protección Usar los elementos de protección personal recomendados (Ver sección 8). Personas con un historial de problemas de piel sensible no deberían emplear ni manejar el producto directamente. Evitar la exposición al producto siguiendo y entendiendo previamente el manejo de este. No manejar hasta que todas las precauciones de seguridad hayan sido leídas y entendidas. No dejar que el producto entre en contacto con los ojos, piel o ropa. No aspirar los polvos. No digerir. Usar solamente con ventilación adecuada. Llevar equipos de respiración adecuados cuando la ventilación es inadecuada.

Consejos de higiene Comer, beber y fumar está prohibido en las áreas donde este material se maneje, almacene y procese. Trabajadores deberán lavar sus manos y rostro antes de comer, beber y fumar.

Condiciones para almacenamiento seguro

Una clave para usar el producto de forma segura requiere que el usuario reconozca con que puede reaccionar el mortero incluyendo incompatibilidades. Químicamente el mortero con agua produce hidróxido de calcio el cual puede causar quemaduras químicas severas. Cada contacto o manejo se debe hacer evitando el contacto con piel y ojos. No permitir que entre mortero dentro de las botas, zapatos o guantes. No permitir que la ropa húmeda o saturada con mortero entre en contacto con la piel. Remover rápidamente la ropa y zapatos que tienen polvo o mortero fresco. Lavar/limpiar las ropas y zapatos antes de utilizarlos nuevamente.

Almacenar y manipular de acuerdo con las reglamentaciones y normas actuales.
El mortero a granel debe almacenarse en lugar seco (minimizando la condensación), a cubierto, limpio y a salvo de contaminación.
Peligro de sepultamiento: El mortero puede acumularse o adherirse a las paredes de los espacios confinados, pudiendo soltarse, derrumbarse o caer inesperadamente. Para prevenir el riesgo de enterramiento o de asfixia no entrar en espacios confinados como silos, contenedores, cubas u otros recipientes que se utilicen para almacenar o contengan mortero sin adoptar las medidas de seguridad apropiadas.
El producto envasado, debe almacenarse en sacos cerrados, en un entorno fresco, seco, protegido de corrientes de aire excesivas que puedan afectar a la calidad del mortero.
Los sacos deben apilarse de manera estable.
No utilizar recipientes de aluminio para el almacenamiento o el transporte de mezclas que contengan mortero húmedo debido a la incompatibilidad de los materiales.

SECCIÓN 8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 VALORES LIMITES OCUPACIONALES

NOMBRE DEL COMPONENTE	No. CAS	ACGIH TLV (8 horas)
Cemento	65997-15-1	1 mg/m^3 (Fracción Respirable)
Cuarzo (Sílice Cristalina)	14808-60-7	0,025 mg/m^3 (Fracción Respirable)
Sílice Amorfa	61790-53-2	No establecido
Partículas (Insoluble o poco soluble) no definidas de otra manera	No establecido	3 mg/m^3 (Fracción Respirable) 10 mg/m^3 (Fracción Total o Inhalable)

8.2 CONTROLES DE INGENIERÍA APROPIADOS

Usar solamente con ventilación adecuada. Si en la operación durante el manejo se generan polvos, usar elementos que bloquen la expansión de los polvos, extractores locales u otros controles de Ingeniería que mantengan al trabajador en un ambiente seguro donde los límites a la exposición estén por debajo de los valores establecidos.

Las emisiones derivadas de la ventilación o de los procesos durante el trabajo con el material deberían ser revisados para asegurar que estos cumplan con los requerimientos y legislación de protección ambiental.

8.3 MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Protección ojos/rostro	**Pictograma de obligación de la Unión Europea** 	**Características** Monogafas de seguridad resistentes a salpicadura de químicos y a la presencia de gases y vapores.	**Recomendaciones** Limpiar a diario y desinfectar periódicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante
Protección para manos	**Pictograma de obligación de la Unión Europea** 	**Características** Guantes resistentes a productos químicos.	**Recomendaciones** Material de los guantes: Vitón/ /Nitrilo. Reemplazar los guantes ante cualquier indicio de deterioro
Protección para el cuerpo	**Pictograma de obligación de la Unión Europea**  	**Características** Overol o delantal resistente a salpicaduras de químicos y a la presencia de gases y vapores. Calzado de seguridad con propiedades antiestáticas y resistentes a químicos.	**Recomendaciones** Material del overol o delantal: PVC/Vitón/Teflón/Nitrilo. Protección limitada frente a llama. Reemplazar el calzado ante cualquier indicio de deterioro
Protección respiratoria	**Pictograma de obligación de la Unión Europea** 	**Características** Respirador de media cara con filtro para particulas.	**Recomendaciones** Limpiar a diario y desinfectar periódicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

SECCIÓN 9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Nota: Las propiedades físicas y químicas se proporcionan únicamente para consideraciones de seguridad, salud y medio ambiente y pueden no representar por completo las especificaciones del producto. Consulte al proveedor para información adicional.

9.1 INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS FUNDAMENTALES

Estado físico	Sólidos suspendidos (pasta)	Comentarios
Color	Gris amarillo	-
Olor	Característico	-
Umbral de olor	No disponible	-
Volatilidad % peso	20	-
pH (en agua)	10-14	-
Punto de fusión	No disponible	-
Punto de ebullición	No disponible	-
Punto de inflamabilidad	No aplica	-
Tiempo de combustión	No disponible	-
Velocidad de combustión	No disponible	-
Velocidad de evaporación	No aplica	-
Inflamabilidad (Solido, gas)	No aplica	-
Límite superior e inferior explosivo (Inflamable)	No aplica	-
Presión de vapor	No aplica	-
Densidad del vapor	No aplica	-
Densidad relativa	1.5– 1.8 g/ml	-
Solubilidad	No aplica	-
Coeficiente de partición Octanol/Agua	No aplica	-
Temperatura de auto ignición	No aplica	-
Temperatura de descomposición	No disponible	-
SADT	No disponible	-
Viscosidad	No aplica	-

SECCIÓN 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	Reacciona lentamente con el agua formando compuestos hidratados, liberando calor y produciendo una solución altamente alcalina hasta que la reacción se completa.
Estabilidad química	El producto es estable.
Posibilidad de reacciones peligrosas	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, la descomposición en productos peligrosos no debería producirse.
Condiciones por evitar	Ningún dato especifico.
Materiales incompatibles	Reactivo o incompatible con los siguientes materiales: Materiales oxidantes, ácidos, sales de aluminio y amonio. El mortero seco es altamente alcalino y reaccionara con ácidos para producir una reacción violenta generando calor. Reacciona con ácidos, metales de aluminio y sales de amonio. El polvo de aluminio y otro elemento alcalino o alcalinotérreo reaccionaran en mortero, liberando gases de hidrogeno. La caliza es inflamable en contacto con flúor y es incompatible con ácidos, alumbre, sales de amonio y magnesio. La sílice reacciona violentamente con agentes oxidantes fuertes como el flúor, trifluoruro de boro, trifluoruro de cloro, trifluoruro de manganeso, y difluoruro de oxígeno produciendo fuego y/o explosión. Los silicatos se disuelven rápidamente en ácido fluorhídrico produciendo un gas corrosivo – tetra fluoruro de sílice.
Productos de descomposición peligrosos	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no deberían presentarse por descomposición productos peligrosos.

SECCIÓN 11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 VÍAS PROBABLES DE EXPOSICIÓN

Inhalación	La inhalación de polvo de sílice puede tener efectos crónicos graves en la salud. Puede causar irritación respiratoria. Síntomas adversos pueden incluir: irritación del tracto respiratorio y tos.
Contacto con la piel	Causa quemaduras severas. Puede causar reacción alérgica. Síntomas adversos pueden incluir dolor o irritación, enrojecimiento, presencia de ampollas, quemaduras de piel, ulceraciones y necrosis (puede ocurrir).
Contacto con los ojos	Causa daño serio en los ojos. Síntomas adversos pueden incluir: dolor, lagrimeo y enrojecimiento.
Ingestión	Puede causar quemaduras en boca, garganta y estómago. Síntomas adversos pueden incluir dolor de estómago.

11.2 EFECTOS AGUDOS Y CRÓNICOS

Efectos inmediatos (Agudos)	Provoca lesiones oculares graves. Puede causar irritación respiratoria. Provoca quemaduras graves. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Ingestión:

	Puede causar quemaduras en la boca, la garganta y el estómago. Puede causar náuseas, dolor de estómago y vómitos.
Efectos crónicos potenciales	La inhalación prolongada o repetida de polvo puede provocar irritación respiratoria crónica. Debido a la sensibilidad por cromo hexavalente, una reacción alérgica severa en la piel puede ocurrir cuando se está expuesto continuamente a muy bajos niveles.
Carcinogenicidad	El cuarzo (Sílice cristalina) es considerado un riesgo por inhalación. IARC ha clasificado el cuarzo (Sílice cristalina) como una sustancia del grupo 1, carcinogénico para humanos. Esta clasificación se basa en los resultados de laboratorio obtenidos en animales (Inhalación e implantación) y estudios epidemiológicos que fueron considerados suficientes para carcinogenicidad. La exposición excesiva al cuarzo (Sílice cristalina) puede causar silicosis, una enfermedad no cancerígena en los pulmones.
Mutagenicidad	No disponible.
Teratogenicidad	No disponible.
Efectos en la fertilidad	No disponible.

11.3 DATOS NUMÉRICO-TOXICOLÓGICOS

Toxicidad Aguda (Inhalación CL 50)	No disponible.
Toxicidad Aguda (Oral DL 50)	No disponible.
Toxicidad Aguda (Dérmica DL 50)	No disponible.

SECCIÓN 12 INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Ecotoxicidad	**Acuática** No disponible. **Terrestre** No disponible.
Persistencia y degradabilidad	No hay información disponible.
Bioacumulación potencial	No hay información disponible.
Movilidad en suelos	Coeficiente de parición suelo/agua: No disponible.
Otros efectos adversos	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SECCIÓN 13 INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Reciclar si es posible. El mortero es estable el material no contaminado debidamente almacenado puede ser guardado para su futuro uso. Disponga el material de acuerdo con las leyes y reglamentos locales, estatales y federales.

SECCIÓN 14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

No. UN	No disponible
Clase de peligro en el transporte	Ninguno.
Grupo de embalaje/envase	No aplica


Peligros para el medio ambiente	Ninguno
Precauciones especiales	Ninguno

SECCIÓN 15 INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

Ley 55 de 1993 Presidencia de la Republica	Por medio de la cual se aprueba el convenio No. 170 y la recomendación No. 177 sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.
Decreto 1973 de 1995 Ministerio de relaciones exteriores	Por el cual se promulga el Convenio 170 sobre la Seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 25 de junio de 1990
Decreto 1609 de 2002 Ministerio de Transporte	Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.
Decreto 4741 de 2005. Presidencia de la Republica	Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
Decreto 1079 de 2015 Ministerio de Transporte	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.
Decreto 1076 de 2015 Presidencia de la Republica	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Decreto 1496 de 2018 Ministerio del Trabajo	Por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.
Resolución 1023 de 2005 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial	Por el cual se adoptan las guías ambientales como instrumento de autogestión y autorregulación. En las cuales se incluye la siguiente guía: Guías ambientales de almacenamiento y transporte por carreteras de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos

SECCIÓN 16 OTRAS INFORMACIONES

Calificaciones de NFPA 704 (Asociación Nacional de Protección contra Incendios)
Salud: 3
Inflamabilidad: 0
Inestabilidad: 1



Aviso al lector

Los datos incluidos en este documento se presentan de acuerdo con diversas normativas sobre medio ambiente, salud y seguridad. Esta ficha refleja los conocimientos disponibles en la actualidad y se recomienda que el producto no se utilice para ningún otro propósito que no sea el previsto (consulte la Sección 1.1), incluido su utilización junto con otros productos o en otros procesos; para estos casos se hará bajo la exclusiva responsabilidad del usuario. Dado que las condiciones específicas del uso del aditivo están fuera del control de Cemex, es responsabilidad del usuario adaptar las condiciones requeridas con base a las leyes y regulaciones locales. La información de seguridad describe el producto en términos de seguridad y, por lo tanto, no puede considerarse información técnica sobre el producto. Lo consignado en esta ficha de seguridad (FDS) no puede ser transferido a otros productos.

Es responsabilidad del usuario tomar las medidas de protección adecuadas, utilizar el aditivo dentro de su plazo recomendado y cumplir con todos los requisitos legales que sean aplicables a su actividad. Sin embargo, Cemex no ofrece ninguna garantía de comercialización ni otras garantías, expresas o implícitas, con respecto a dicha información, y no asume ninguna

responsabilidad derivada de su uso. Los usuarios deben realizar su propia investigación para determinar la idoneidad de la información para sus fines particulares. En ningún caso, Cemex será responsable por reclamos, pérdidas o daños de terceros o por la pérdida de beneficios o cualquier daño especial, indirecto, incidental, cualquiera que sea el caso, incluso si Cemex ha sido informado de la posibilidad de tales daños y perjuicios. Cemex no asume ninguna responsabilidad por lesiones o daños que resulten de la alteración o manipulación inapropiada de esta ficha de seguridad (FDS) y su contenido original.

Abreviaciones

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists = Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
 # CAS - Chemical Abstract Service = Número del Servicio de Resúmenes Químicos
CFR - Code of Federal Regulations = Código de Regulaciones Federales
IARC - International Agency for Research on Cancer = Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer
OSHA — Occupational Safety and Health Administration = Administración de Seguridad y Salud Ocupacional
TLV - Threshold Limit Value = Valor Límite Umbral
TWA - Time-Weighted Averag = Tiempos Medios Ponderado
UN- Naciones unidas

MAPECOAT PU 20 N

Acabado bicomponente de poliuretano alifático coloreado para membranas de la gama Purtop







CAMPOS DE APLICACIÓN

Mapecoat PU 20 N es un acabado protector coloreado para membranas de la gama Purtop con un alto nivel de elasticidad y una excelente resistencia a la abrasión.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Mapecoat PU 20 N es un acabado coloreado de poliuretano alifático bicomponente en base disolvente, desarrollado en los laboratorios de I+D de MAPEI con las siguientes características:

- Elasticidad, lo que lo hace adecuado para el recubrimiento de las membranas de la gama **Purtop**;
- Resistente a los rayos UV y a los agentes atmosféricos;
- Resistente a la hidrólisis;
- Excelente resultado estético con acabado brillante;
- Fácil de limpiar y resistente a la proliferación de mohos y hongos;
- Disponible en varios colores RAL.

OTRAS VENTAJAS DEL RAL 9003 (blanco altamente reflectante)

Mapecoat PU 20 N RAL 9003 ha sido específicamente formulado para ofrecer altos valores de reflectancia y emisividad e índice de reflexión solar (ISR) de 108.
Mapecoat PU 20 N RAL 9003 permite crear un "Cool Roof" o cubierta de colores claros que reducen el efecto "isla de calor", así como reducir considerablemente la temperatura en ejercicio de la propia cubierta. Al hacerlo, la habitabilidad dentro de los edificios se mejora significativamente.
Mapecoat PU 20 N RAL 9003 cumple con el Crédito de SS 7.2 Efecto isla de calor: (Heat Island Effect— Roof) del protocolo de construcción sostenible LEED v4.1.

AVISOS IMPORTANTES

- Aplicar **Mapecoat PU 20 N** únicamente si la temperatura del soporte es al menos 3 °C superior a la de punto de rocío.
- Aplicar **Mapecoat PU 20 N** dentro de las 24 horas posteriores a la aplicación de membranas de la gama Purtop.

MAPEI

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Preparación del soporte

El soporte a revestir, tratado con membranas de la gama **Purtop**, debe ser estructuralmente sano y libre de partes sueltas, polvo, suciedad, grasa, aceite y cualquier otro material o sustancia que pueda afectar a la adherencia del acabado al soporte. Al aplicar **Mapecoat PU 20 N** por pulverización sobre membranas de poliuretano de la gama **Purtop** que se han instalado transcurridas más de 24 horas, se deberá abrir el poro mediante un ligero lijado (posteriormente se retirará todo el polvo generado con una aspiradora).
A continuación, aplicar **Primer PU60**, imprimación de poliuretano monocomponente.

Preparación del producto

Preparar **Mapecoat PU 20 N** con un mezclador eléctrico.
Para la preparación del producto, mezclar cada componente por separado con una batidora eléctrica a baja velocidad, seguidamente verter el contenido del componente B en el contenedor del componente A y mezclar durante unos minutos hasta su completa homogeneización;
Asegúrese sólo de preparar una cantidad que puede ser utilizada dentro del tiempo máximo de trabajabilidad (aproximadamente 60 minutos a +23°C). En el caso inevitable de tener que efectuar mezclas parciales, deberá respetarse estrictamente la proporción en peso de los componentes. Si se requiere un acabado con mayor grado antideslizante, agregue poliamida micronizada **Mapecoat Filler** a **Mapecoat PU 20 N** en una dosificación del 7% sobre el peso del componente A mientras se mezcla a baja velocidad.

Aplicación del producto:

Aplicar dos capas de **Mapecoat PU 20 N** con un rodillo, asegurándose que el consumo total nunca sea inferior a 0,3 kg/m². El producto también se puede aplicar por pulverización; en tal caso debe diluirse con un máximo del 5% de diluyente PU.
Si la capa superior se aplica con un rodillo, es recomendable extenderlo uniformemente y aplicarlo en capas cruzadas para garantizar un buen efecto estético.

Limpieza de las herramientas:

Las herramientas utilizadas para mezclar y aplicar el producto pueden limpiarse con disolvente antes de que este endurezca. Una vez endurecido, solo se puede eliminar de las herramientas y mezcladores mecánicamente.

CONSUMO

0,15-0,2 kg/m² por capa.
En general, los datos de consumo indicados corresponden a una película uniforme sin juntas sobre una superficie plana, pueden ser más altos en soportes irregulares.

PRESENTACIÓN

Mapecoat PU 20 N está disponible en botes metálicos comp. A = 12,9 kg y comp. B = 2,1 kg

ALMACENAMIENTO

Mapecoat PU 20 N, puede almacenarse durante 12 meses en su embalaje original, en un ambiente cubierto y seco con una temperatura comprendida entre 5°C y 35°C.

DATOS TÉCNICOS (valores Típicos)		
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO		
	componente A	**componente B**
Consistencia:	liquida	liquida

Color:	Según el color RAL disponible	neutro
Densidad (g/cm³):	1,25	1,07
Residuo sólido (%):	71	75
Viscosidad Brookfield a +23°C (mPa·s):	1350 (rotor 4, RPM 50)	320 (rotor 3, RPM 50)
DATOS DE APLICACIÓN (a +23°C y 50% U.R.)		
Relación de la mezcla:	comp. A : comp. B = 4,3 : 0,7	
Consistencia de la mezcla:	liquida	
Densidad de la mezcla (g/cm³):	1,20	
Viscosidad Brookfield de la mezcla (mPa·s):	1200 (rotor 4 - rpm 50)	
Vida de la mezcla (min.):	aprox. 60	
Temperatura de aplicación:	de +10°C a +35°C	
Tiempo para tráfico peatonal (h):	24	

ADVERTENCIA

Las indicaciones y las prescripciones arriba descritas, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas y deberán ser confirmadas mediante aplicaciones prácticas concluyentes; por lo tanto, antes de emplear el producto, quien vaya a usarlo deberá determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso.
Consulte siempre la última versión actualizada de la Ficha Técnica, disponible en la página web www.mapei.com

INFORMACIÓN LEGAL

El contenido de esta Ficha Técnica puede ser reproducido en otros documentos de proyecto, pero el documento resultante no podrá, de ninguna manera, reemplazar o integrar la Ficha Técnica vigente en el momento de la aplicación del producto MAPEI.
La Ficha Técnica más actualizada está disponible en nuestro sitio web www.mapei.com
CUALQUIER ALTERACIÓN DEL TEXTO O DE LAS CONDICIONES ACTUALES CONTENIDAS EN ESTA FICHA TÉCNICA O DE ELLA DERIVADAS, EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE MAPEI.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Suministro e instalación de acabado de poliuretano alifático coloreado bicomponente (tipo **Mapecoat PU 20 N** de MAPEI S.p.A.), con un índice de reflexión solar (SRI) de 108 en color blanco RAL 9003.Una vez mezclados los dos componentes, el producto se puede aplicar con rodillo o pistola airless.
El producto debe tener las siguientes características:

Relación de mezcla A : B: 4,3 :	0,7
Densidad de la mezcla (g/cm³):	1,2
Viscosidad Brookfield (mPa·s):	1200 (rotor 4, RPM 50)

7487-04-2023-ES

La reproducción de textos, fotografías e ilustraciones de esta publicación está totalmente prohibida y será perseguida por la ley.

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE PRODUCTO

PRODUCT CERTIFICATE

Esquema de Certificación
Certification Scheme
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Esquema 5 RETIE

No. CP25_AA00103

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	FAMILIA	REFERENCIA
CAJAS DE CONEXIÓN (CONDUIT)	**METÁLICAS**	**2400(4x4) 5800 (2x4) 10x10(10x10) OCTAGONAL(OCTAG)**

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 3 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Producido/Comercializado para Colombia y Fabricado por
Produced/Commercialized for Colombia by:

SOLUCIONES MDS S.A.S.
Calle 12 A No. 21 – 39 / Bogotá DC, Colombia

Satisface los requisitos certificados, aplicables al producto en mención:
satisfies the assessmented requirements, applicable to the product in mention:

RESOLUCIÓN 40117 DE 02 DE ABRIL DE 2024 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DE COLOMBIA – RETIE,
2.3.4. CAJAS Y CONDULETAS
2.3.4.2. CAJAS Y ARMARIOS PARA MEDIDORES Y CAJAS DE DERIVACIÓN

Fecha de Certificación: 2025/02/21
Fecha de Vencimiento: 2030/02/20

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2026/02/20 y 2028/09/20

JULIO ARMANDO BONILLA GUTIERREZ
Firmado digitalmente por JULIO ARMANDO BONILLA GUTIERREZ
Fecha: 2025.02.21 11:29:22 -05'00'

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operation Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page www.cidet.org.co/consulta-certificados.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00103

Fecha de Certificación: 2025/02/21
Fecha de Vencimiento: 2030/02/20

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CAJAS DE CONEXIÓN (CONDUIT)

Denominación		CAJAS DE CONEXIÓN (CONDUIT)			
Familia		Metálicas			
Categoría		Conexiones de circuitos eléctricos			
Modelo		CONDUIT Metálicas			
Referencia		2400(4x4) /	5800 (2x4)	10x10(10x10)	OCTAGONAL(OCTAG)
Material de construcción y Calibre		Lamina cold rolled calibre 20 BWG (0.9 mm)			
Geometría		Cuadrado	Rectangular	Cuadrada	Octagonal
Dimensiones Internas	**Ancho**	101.0 mm	53.9 mm	102.6 mm	89.5 mm
	Largo	101.0 mm	101.8 mm	102.6 mm	89.5 mm
	Profundo	35.8 mm	47.6 mm	66 mm	38 mm
Volumen interno		376.52 cm3	241.70 cm3	660 cm3	241.70 cm3
Grado de protección		IK 05			
Característica de la pintura (Tipo, Color)		Zincadas y galvanizadas			
Resistencia a cámara salina		Mínimo 12 horas			
Montaje		Superficial, semiempotrado o empotrado			
Marca		SOLUCIONES MDS S.A.S.			
País de origen		COLOMBIA			
Usos permitidos		Para instalaciones eléctricas			
prohibiciones del producto		Alcance no definido dentro del presente certificado			
Referencial		RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.4 Artículo Cajas y conduletas Artículo 2.3.4			

REPORTE DE ENSAYOS	
OTORGAMIENTO	
Numero de reporte	**Laboratorio**
50046E01	CIDET 11-LAB-024

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page www.cidet.org.co/consulta-certificados.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00103

Fecha de Certificación: 2025/02/21
Fecha de Vencimiento: 2030/02/20

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CAJAS DE CONEXIÓN (CONDUIT)

FABRICANTE	
Fábrica	**Dirección / País de Origen**
SOLUCIONES MDS S.A.S.	Calle 12 A No. 21 – 39 / Bogota DC, Colombia

Atentamente,

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operation Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page www.cidet.org.co/consulta-certificados.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

certecnica
Más que certificaciones técnicas

ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002

CERTIFICADO DE PRODUCTO

No. 2481 **ESQUEMA:** 5 RETIE

17065 Certecnica S.A.S.

Certifica que el producto

SISTEMAS DE TUBOS METÁLICOS

Referencias: Anexo 1 Referencias Certificadas

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ECOENERGIA TECNOLOGIA INNOVACION S.A.S

NIT: 900.762.116 – 1

Es conforme con los requisitos de la

RESOLUCIÓN 40117 DE 02 DE ABRIL DE 2024 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DE COLOMBIA " POR LA CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS- RETIE" LIBRO 2. TÍTULO 2 - REQUISITOS GENERALES PARA LOS PRODUCTOS UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. (ARTÍCULO. 2.2.1. ARTÍCULO. 2.2.2.) ARTÍCULO 2.3.29 SISTEMAS DE BANDEJAS PORTACABLES Y SISTEMAS DE CANALIZACIONES CON SUS ACCESORIOS Y SOPORTES ARTÍCULO 2.3.29.4 SISTEMAS DE TUBOS

Dirección / Adress:
CARRERA 54 # 59-05 BOGOTA D.C, COLOMBIA

País de Origen / Country of origin:
CHINA

Marca / Brand:
AMERICAN STEEL

Fecha de aprobación:
22 de diciembre de 2025

Fecha del primer seguimiento:
Antes de 22 de diciembre de 2026

Fecha del segundo seguimiento:
Antes de 21 de agosto de 2028

Fecha de vencimiento:
21 de diciembre de 2030

Autorizado por:
Firmado digitalmente por MORALES AVILA JORGE ALEJANDRO
Fecha: 2025.12.23 07:57:05 -05'00'

Jorge Alejandro Morales Ávila
Gerente General

Consulta tu certificado

Este Certificado tendrá validéz siempre y cuando se encuentre firmado digitalmente y la identidad del firmante pueda ser validada.

Calle 72A # 66 – 11 | PBX. (601) 215 70 53
Bogotá - Colombia
certecnica.com

ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1	SISTEMAS DE TUBOS METÁLICOS	FAMILIA Tubería EMT; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Tubería EMT Tipo ACERO desde 1/2" hasta 4". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 4"	1/2"
2		FAMILIA Tubería EMT; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Tubería EMT Tipo ACERO desde 1/2" hasta 4". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 4"	3/4"
3		FAMILIA Tubería EMT; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Tubería EMT Tipo ACERO desde 1/2" hasta 4". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 4"	1"
4		FAMILIA Tubería EMT; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Tubería EMT Tipo ACERO desde 1/2" hasta 4". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 4"	1-1/4"
5		FAMILIA Tubería EMT; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Tubería EMT Tipo ACERO desde 1/2" hasta 4". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 4"	1-1/2"
6		FAMILIA Tubería EMT; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Tubería EMT Tipo ACERO desde 1/2" hasta 4". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 4"	2
7		FAMILIA Tubería EMT; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Tubería EMT Tipo ACERO desde 1/2" hasta 4". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 4"	3
8		FAMILIA Tubería EMT; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Tubería EMT Tipo ACERO desde 1/2" hasta 4". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 4"	4
9		FAMILIA Tuberia IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Tubería IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	1/2"
10		FAMILIA Tuberia IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Tubería IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	3/4"

11		FAMILIA Tuberia IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Tubería IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	1"
12		FAMILIA Tuberia IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Tubería IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	1-1/4"
13		FAMILIA Tuberia IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Tubería IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	1-1/2"
14		FAMILIA Tuberia IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Tubería IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	2
15		FAMILIA Tuberia IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Tubería IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	3
16		FAMILIA Tuberia IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Tubería IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	4
17		FAMILIA Tuberia IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Tubería IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	6
18		FAMILIA Curvas EMT; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Curva EMT Tipo ACERO desde 1/2" hasta 4". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 4"	1/2"
19		FAMILIA Curvas EMT; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Curva EMT Tipo ACERO desde 1/2" hasta 4". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 4"	3/4"
20		FAMILIA Curvas EMT; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Curva EMT Tipo ACERO desde 1/2" hasta 4". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 4"	1"
21		FAMILIA Curvas EMT; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Curva EMT Tipo ACERO desde 1/2" hasta 4". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 4"	1-1/4"

22		FAMILIA Curvas EMT; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Curva EMT Tipo ACERO desde 1/2" hasta 4". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 4"	1-1/2"
23		FAMILIA Curvas EMT; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Curva EMT Tipo ACERO desde 1/2" hasta 4". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 4"	2
24		FAMILIA Curvas EMT; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Curva EMT Tipo ACERO desde 1/2" hasta 4". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 4"	3
25		FAMILIA Curvas EMT; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Curva EMT Tipo ACERO desde 1/2" hasta 4". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 4"	4
26		FAMILIA Curvas IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Curva IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	1/2"
27		FAMILIA Curvas IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Curva IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	3/4"
28		FAMILIA Curvas IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Curva IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	1"
29		FAMILIA Curvas IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Curva IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	1-1/4"
30		FAMILIA Curvas IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Curva IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	1-1/2"
31		FAMILIA Curvas IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Curva IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	2
32		FAMILIA Curvas IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Curva IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	3

33		FAMILIA Curvas IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Curva IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	4
34		FAMILIA Curvas IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Curva IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	6
35		FAMILIA Conectores EMT; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Conectores EMT Tipo ACERO desde 1/2" hasta 4". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 4"	1/2"
36		FAMILIA Conectores EMT; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Conectores EMT Tipo ACERO desde 1/2" hasta 4". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 4"	3/4"
37		FAMILIA Conectores EMT; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Conectores EMT Tipo ACERO desde 1/2" hasta 4". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 4"	1"
38		FAMILIA Conectores EMT; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Conectores EMT Tipo ACERO desde 1/2" hasta 4". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 4"	1-1/4"
39		FAMILIA Conectores EMT; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Conectores EMT Tipo ACERO desde 1/2" hasta 4". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 4"	1-1/2"
40		FAMILIA Conectores EMT; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Conectores EMT Tipo ACERO desde 1/2" hasta 4". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 4"	2
41		FAMILIA Conectores EMT; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Conectores EMT Tipo ACERO desde 1/2" hasta 4". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 4"	3
42		FAMILIA Conectores EMT; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Conectores EMT Tipo ACERO desde 1/2" hasta 4". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 4"	4
43		FAMILIA Conectores IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Conectores IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	1/2"

44		FAMILIA Conectores IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Conectores IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	3/4"
45		FAMILIA Conectores IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Conectores IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	1"
46		FAMILIA Conectores IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Conectores IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	1-1/4"
47		FAMILIA Conectores IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Conectores IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	1-1/2"
48		FAMILIA Conectores IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Conectores IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	2
49		FAMILIA Conectores IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Conectores IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	3
50		FAMILIA Conectores IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Conectores IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	4
51		FAMILIA Conectores IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Conectores IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	6
52		FAMILIA Terminales EMT; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Terminales EMT Tipo ACERO desde 1/2" hasta 4". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 4"	1/2"
53		FAMILIA Terminales EMT; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Terminales EMT Tipo ACERO desde 1/2" hasta 4". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 4"	3/4"
54		FAMILIA Terminales EMT; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Terminales EMT Tipo ACERO desde 1/2" hasta 4". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 4"	1"

55		FAMILIA Terminales EMT; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Terminales EMT Tipo ACERO desde 1/2" hasta 4". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 4"	1-1/4"
56		FAMILIA Terminales EMT; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Terminales EMT Tipo ACERO desde 1/2" hasta 4". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 4"	1-1/2"
57		FAMILIA Terminales EMT; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Terminales EMT Tipo ACERO desde 1/2" hasta 4". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 4"	2
58		FAMILIA Terminales EMT; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Terminales EMT Tipo ACERO desde 1/2" hasta 4". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 4"	3
59		FAMILIA Terminales EMT; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Terminales EMT Tipo ACERO desde 1/2" hasta 4". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 4"	4
60		FAMILIA Terminales IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Terminales IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	1/2"
61		FAMILIA Terminales IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Terminales IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	3/4"
62		FAMILIA Terminales IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Terminales IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	1"
63		FAMILIA Terminales IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Terminales IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	1-1/4"
64		FAMILIA Terminales IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Terminales IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	1-1/2"
65		FAMILIA Terminales IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Terminales IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	2

66		FAMILIA Terminales IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Terminales IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	3
67		FAMILIA Terminales IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Terminales IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	4
68		FAMILIA Terminales IMC; SUB-FAMILIA NA; CATEGORIA Tipo ACERO; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Terminales IMC Tipo ACERO desde 1/2" hasta 6". Conectores, curvas, terminales. desde 1/2" hasta 6".	6

USOS PERMITIDOS Y PROHIBICIONES

USOS PERMITIDOS

- Instalación en espacios internos y externos
- Uso de herramientas adecuadas para su manipulación
- Uso para instalaciones residenciales, comerciales, industriales.

PROHIBICIONES

- No almacenar en espacios húmedos.
- Instalación corte y doblado únicamente por personal especializado y guiado bajo la normativa Retie.

****

ANEXO 2. REPORTES DE ENSAYO

ITEM	ID DEL REPORTE DE ENSAYO	LABORATORIO
1	RC-23-25	EMTEST
2	RC-24-25	
3	51676E00	CIDET

FABRICADO POR:
JINJIANG WEIYECHENG METAL PRODUCTS CO., LTD
WULI INDUSTRIAL ZONE. JINJIANG CITY, CHINA

****

Notas:

1. El presente certificado cubre únicamente las referencias o unidades descritas en el anexo.
2. La vigencia y validez del presente certificado está sujeto a cumplimiento de los requisitos estipulado en el CER-DI-05 “Términos y Condiciones para certificación”.
3. CERTECNICA S.A.S. realiza seguimiento para verificar la conformidad del producto de acuerdo con los estipulado el CER-DI-05 “Términos y Condiciones para certificación.

4. Las modificaciones al presente certificado que no sean aprobadas por 17065 CERTECNICA S.A.S, así como su utilización indebida, son inválidas y están sujetas a sanciones legales.
5. Este certificado de producto no implica juicios sobre otros productos distintos a los mencionados en el listado de referencias certificadas, ni tampoco sobre otros productos que fabrique, comercialice, integre o importe el titular del certificado.
6. Para verificar la validez y novedades del presente certificado puede consultar la página www.certecnica.com. Para los certificados del campo reglamentario también podrá verificar la validez a través del menú consulta pública en SICERCO.
7. Este certificado tendrá validez siempre y cuando se encuentre firmado digitalmente y la identidad del firmante pueda ser validada



Firmado digitalmente por MORALES AVILA JORGE ALEJANDRO
Fecha: 2025.12.23 07:56:48 -05'00'

JORGE ALEJANDRO MORALES AVILA
Gerente, CERTECNICA S.A.S
Calle 72a No. 66-11, Bogotá D.C., Colombia

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 02363

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS	VER ANEXO	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado y fabricado por
Commercialized and fabricated by:

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.

Calle 20 No. 68B - 71, Bogotá D.C., Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 5521/2020 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 2006/06/23
Fecha de Renovación: 2024/06/17
Fecha de Actualización: 2025/07/29
Fecha de Vencimiento: 2027/06/16

Fecha máxima para la finalización de la próxima auditoría de seguimiento: 2026/06/16

Mauricio Rojas Herrera
Líder Certificación de Productos
CIDET Product Certification Leader

Firmado digitalmente por HERNAN MAURICIO ROJAS HERRERA
Fecha: 2025.07.29 16:04:54 -05'00'

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The news and validity of this certificate can be consulted on the **www.cidet.org.co/consulta-certificados** webpage. This certificate only can be reproduced in its entirety.

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02363

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2006/06/23
FECHA DE RENOVACIÓN: 2024/06/17
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2025/07/29
FECHA DE VENCIMIENTO: 2027/06/16

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Tipo	Cables multiconductores de cobre suave flexibles tipo dúplex CPE-SPT y tipo termoflex con aislamiento PVC – NYLON para 90 °C y chaqueta en PVC para 600 V	
Referencia	Calibres del 18 AWG al 10 AWG	Calibres del 18 AWG al 2 AWG
	Dúplex	Encauchetado
Designación	CPE-SPT	Termoflex
Voltaje	300 V	600 V
Temperatura de operación	60 °C	90 °C
Construcción	Hasta 3 conductores aislados integralmente, disposición plana	Hasta 5 conductores aislados, disposición cableados y protegidos con chaqueta común de PVC
Aislamientos	PVC 60 °C	PVC con cubierta de Nylon 90 °C
Cubierta	PVC no resistente al aceite	PVC resistente al aceite
Referencial	NTC 5521/2020 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2)	

Nota: Este certificado se unifica con el 03332.

Fábrica	Planta
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.	BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Atentamente,

Mauricio Rojas Herrera
Líder Certificación de Productos
CIDET Product Certification Leader

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the **www.cidet.org.co/consulta-certificados** webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 01268

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS	VER ANEXO	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado y fabricado por
Commercialized and fabricated by:

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.

Calle 20 No. 68B - 71, Bogotá D.C., Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 1099-1/2011, ICEA S-95-658/2009 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 2003/06/12
Fecha de Renovación: 2024/06/17
Fecha de Vencimiento: 2027/06/16

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2025/06/16 y 2026/06/16

JULIO ARMANDO BONILLA GUTIERREZ
Firmado digitalmente por JULIO ARMANDO BONILLA GUTIERREZ
Fecha: 2024.06.13 14:17:52 -05'00'

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operations Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety..

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 01268

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2003/06/12
FECHA DE RENOVACIÓN: 2024/06/17
FECHA DE VENCIMIENTO: 2027/06/16

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Tipo	Cables monopolares y multiconductores de cobre suave o aluminio serie 8000, para fuerza. 600V. Aptos para uso en CT (cable TRAY)					
Referencia	Monopolares calibres desde 14 AWG hasta 1000 kcmil y Multiconductores calibres desde 14 AWG hasta 4/0 AWG					
Marca	PROCABLES					
Voltaje	600 V / 2 kV					
Conductor	Conductores cobre suave cableado, aluminio 1350 o aluminio serie 8000, clase B o C					
Configuración multiconductor	Hasta 5 conductores					
Aislamiento	PVC	PE	PVC/Nylon	XLPE	LSHF Low Smoke Libre de Halógenos	Polietileno de alta densidad HMWPE
Temperatura	75°C		90°C		75°C	75°C
Cubierta	PVC		PVC		LSHF Low Smok Libre de Halógenos	No aplica
Marcación de uso aprobada	PVC Resistencia a la luz (SUN LIGHT RESISTANT) "SR". Aptos para uso CT				Aptos para uso CT	No aplica
Aplicación	Cables para distribución (TTU), fuerza y protección catódica.					
Referencial	NTC 1099-1/2011, ICEA S-95-658/2009 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2)					

Nota: Este certificado se unifica con el 01872 y 06091.

Fábrica	Planta
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.	BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Atentamente,

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operations Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety..

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE PRODUCTO

PRODUCT CERTIFICATE

Esquema de Certificación
Certification Scheme
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Esquema 5 RETIE

No. CP25_AA00224

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	MODELO	REFERENCIA
CONDUCTORES Y CABLES	ALAMBRES Y CABLES TERMOPLÁSTICOS	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 4 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Producido/Comercializado para Colombia y Fabricado por
Produced/Commercialized for Colombia and fabricated by:

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.
Calle 20 No. 68B-71, Bogotá – Colombia

Satisface los requisitos certificados, aplicables al producto en mención:
Meets the certified requirements, applicable to the product in question:

RESOLUCIÓN 40117 DE 02 DE ABRIL DE 2024 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DE COLOMBIA – RETIE, ARTÍCULO 2.3.10 CONDUCTORES Y CABLES
2.3.10.3 CABLES AISLADOS DE BAJA TENSIÓN

Fecha de Certificación: 2025/07/28
Fecha de Vencimiento: 2030/07/27

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento 2026/07/27 y 2028/03/27

Mauricio Rojas Herrera
Líder Certificación de Productos
CIDET Product Certification Lader

Firmado digitalmente por HERNAN MAURICIO ROJAS HERRERA
Fecha: 2025.07.28 10:25:26 -05'00'

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page
http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00224

Fecha de Certificación: 2025/07/28
Fecha de Vencimiento: 2030/07/27

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES Y CABLES

Denominación	Conductores y Cables	
Familia	Norma de fabricación: NTC 1332: 2019	
Categoría	N.A.	
Modelo	Alambres y cables termoplásticos	
Referencia	Alambres y Cables de Cobre: Calibres 14 AWG al 1000 kcmil Cables de AA Serie 8000: Calibres 12 AWG al 1000 kcmil	
Marca	PROCABLES	
País de origen	Colombia	
Voltaje	600 V	
Conductor	Cobre suave o aluminio serie 8000	
Cableado	Concéntrico y compactado, clase B y C, Flexible clase J Construcción UDC y SIW Rígidos (solo cobre)	
Designación	THHW	THHN/THWN-2
Aislamiento	PVC	
Máxima temperatura de operación	90°C Seco, 75°C mojado	90°C Seco o mojado
Cubierta	No Aplica	Nylon
Autorizaciones	Apto para bandejas portacables THHN/THWN-2 Resistencia a la intemperie THHN/THWN-2 Resistente a gasolina y aceite THHN/THWN-2 Resistencia a la llama vertical VW-1 THHN/THWN-2	
Usos permitidos	Instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales, en sitios secos y mojados	
Prohibiciones del producto	Aplicación diferente al uso permitido	
Referencial	Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia Artículo 2.3.10 Conductores y cables 2.3.10.3 Cables aislados de baja tensión	

REPORTE DE ENSAYOS	
OTORGAMIENTO	
Numero de reporte	**Laboratorio**
31701, 31702, 31703, 31704, 32213, 32214, 33601 y 33602	PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.
LECER0055/25 y LECER0056/25	GENERAL CABLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
50226E00	CIDET
RP 29810I	QTEST

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page
http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00224

Fecha de Certificación: 2025/07/28
Fecha de Vencimiento: 2030/07/27

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES Y CABLES

FABRICANTE	
Fábrica	**Dirección / País de Origen**
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.	Calle 20 No. 68B-71, Bogotá / Colombia

Atentamente,



Mauricio Rojas Herrera
Líder Certificación de Productos
CIDET Product Certification Lader

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page
http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados This certificate only can be reproduced in its entirety.

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Nº. CS-LCO-17543-2025/105

LENOR COLOMBIA S.A.S

CERTIFICA

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO (*)	DESCRIPCIÓN
DUCTO CERRADO DE SECCIÓN NO CIRCULAR	(*) Referencias: Ver Anexo No. 1

Titular del Certificado

KENZOR S.A.S

FABRICANTE

Diagonal 46 Sur # 13 L 27, Bogotá D.C.

NIT: 800.232.748-8

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo:

República de Colombia. Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia " Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE Artículo 2.3.29.3

Esquema de Certificación Nº 5 RETIE Determinado en función de la realización de las actividades de evaluación mínimas establecidas en el Reglamento

Marca: KENZOR SAS
País de origen: COLOMBIA

(*) Todas las características e identificación del producto se encuentran detalladas en los documentos anexos: ANEXO Nº 1 que consta de cinco (5) páginas, y ANEXO Nº 2 que consta de una (1) páginas y corresponde a la información del fabricante y de los reportes de ensayo.

Fecha de expedición: 7 de Marzo de 2025
Fecha seguimiento N.º 1: Antes de 6 de Marzo de 2026
Fecha seguimiento N.º 2: Antes de 6 de Noviembre de 2027
Fecha de vencimiento: 6 de Marzo de 2030

Vigencia: cinco (5) años a partir de la fecha de emisión del certificado sujeto a seguimientos periódicos.
**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con cuatro meses de anticipación a la fecha indicada, en los meses 12 y 32 según el esquema que corresponda

Director de Certificación

LEONARDO MARIÑO ANGARITA

Firmado digitalmente por LEONARDO MARIÑO ANGARITA
Fecha: 2025.03.07 16:39:38 -05'00'

Consulte aquí el certificado

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

www.lenor.com.co
Carrera 15 No. 93A. - 62 - Oficina 501 Tel +57 1 744 65 44 - Bogotá, D.C. Colombia

ANEXO N.º 1
Certificado de producto Nº. . CS-LCO-17543-2025/105
Producto: DUCTO CERRADO DE SECCIÓN NO CIRCULAR
Categoría: Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA	FAMILIA
1	CANALETA DE 8X4X240cm EN LAMINA COLD ROLLED, ACCESORIOS DE UNION, TROQUELES ELECTRICOS Y DATOS ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: CCR 8-4	CCR 8-4	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
2	CANALETA DE 8X5X240cm EN LAMINA COLD ROLLED, ACCESORIOS DE UNION, TROQUELES ELECTRICOS Y DATOS ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: CCR 8-5	CCR 8-5	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
3	CANALETA DE 10X4X240cm EN LAMINA COLD ROLLED, ACCESORIOS DE UNION, TROQUELES ELECTRICOS Y DATOS ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: CCR 10-4	CCR 10-4	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
4	CANALETA DE 10X5X240cm EN LAMINA COLD ROLLED, ACCESORIOS DE UNION, TROQUELES ELECTRICOS Y DATOS ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: CCR 10-5	CCR 10-5	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
5	CANALETA DE 12X4X240cm EN LAMINA COLD ROLLED, ACCESORIOS DE UNION, TROQUELES ELECTRICOS Y DATOS ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: CCR 12-4	CCR 12-4	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
6	CANALETA DE 12X5X240cm EN LAMINA COLD ROLLED, ACCESORIOS DE UNION, TROQUELES ELECTRICOS Y DATOS ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: CCR 12-5	CCR 12-5	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
7	CANALETA DE 15X5X240cm EN LAMINA COLD ROLLED, ACCESORIOS DE UNION, TROQUELES ELECTRICOS Y DATOS ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: CCR 15-5	CCR 15-5	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
8	CANALETA DE 8X4X240cm EN PREGALVANIZADA, ACCESORIOS DE UNION, TROQUELES ELECTRICOS Y DATOS. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: CPG 8-4	CPG 8-4	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
9	CANALETA DE 8X5X240cm EN PREGALVANIZADA, ACCESORIOS DE UNION, TROQUELES ELECTRICOS Y DATOS. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: CPG 8-5	CPG 8-5	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular

Consulte aquí el certificado

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO N.º 1
Certificado de producto Nº. . CS-LCO-17543-2025/105
Producto: DUCTO CERRADO DE SECCIÓN NO CIRCULAR
Categoría: Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular

10	CANALETA DE 10X4X240cm EN PREGALVANIZADA, ACCESORIOS DE UNION, TROQUELES ELECTRICOS Y DATOS. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: CPG 10-4	CPG 10-4	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
11	CANALETA DE 10X5X240cm EN PREGALVANIZADA, ACCESORIOS DE UNION, TROQUELES ELECTRICOS Y DATOS. . cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: CPG 10-5	CPG 10-5	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
12	CANALETA DE 12X4X240cm EN PREGALVANIZADA, ACCESORIOS DE UNION, TROQUELES ELECTRICOS Y DATOS. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: CPG 12-4	CPG 12-4	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
13	CANALETA DE 12X5X240cm EN PREGALVANIZADA, ACCESORIOS DE UNION, TROQUELES ELECTRICOS Y DATOS. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: CPG 12-5	CPG 12-5	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
14	CANALETA DE 15X5X240cm EN PREGALVANIZADA, ACCESORIOS DE UNION, TROQUELES ELECTRICOS Y DATOS. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: CPG-15-5	CPG-15-5	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
15	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 10X8X240 EN LAMINA COLD ROLLED, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPCR 10-8	DPCR 10-8	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
16	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 10X10X240 EN LAMINA COLD ROLLED, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPCR 10-10	DPCR 10-10	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
17	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 20X8X240 EN LAMINA COLD ROLLED, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPCR 20-8	DPCR 20-8	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
18	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 20X10X240 EN LAMINA COLD ROLLED, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPCR 20-10	DPCR 20-10	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular

Consulte aquí el certificado

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO N.º 1 Certificado de producto Nº. . CS-LCO-17543-2025/105 Producto: DUCTO CERRADO DE SECCIÓN NO CIRCULAR Categoría: Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular			
19	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 30X8X240 EN LAMINA COLD ROLLED, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPCR 30-8	DPCR 30-8	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
20	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 30X10X240 EN LAMINA COLD ROLLED, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPCR 30-10	DPCR 30-10	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
21	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 40X8X240 EN LAMINA COLD ROLLED, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPCR 40-8	DPCR 40-8	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
22	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 40X10X240 EN LAMINA COLD ROLLED, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPCR 40-10	DPCR 40-10	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
23	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 50X8X240 EN LAMINA COLD ROLLED, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPCR 50-8	DPCR 50-8	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
24	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 50X10X240 EN LAMINA COLD ROLLED, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPCR 50-10	DPCR 50-10	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
25	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 60X8X240 EN LAMINA COLD ROLLED, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPCR 60-8	DPCR 60-8	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular

Consulte aquí el certificado

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO N.º 1 Certificado de producto Nº. . CS-LCO-17543-2025/105 Producto: DUCTO CERRADO DE SECCIÓN NO CIRCULAR Categoría: Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular			
26	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 60X10X240 EN LAMINA COLD ROLLED, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPCR 60-10	DPCR 60-10	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
27	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 10X8X240 EN LAMINA PREGALVANIZADA, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPPG 10-8	DPPG 10-8	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
28	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 10X10X240 EN LAMINA PREGALVANIZADA, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPPG 10-10	DPPG 10-10	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
29	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 20X8X240 EN LAMINA PREGALVANIZADA, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPPG 20-8	DPPG 20-8	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
30	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 20X10X240 EN LAMINA PREGALVANIZADA, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPPG 20-10	DPPG 20-10	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
31	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 30X8X240 EN LAMINA PREGALVANIZADA, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPPG 30-8	DPPG 30-8	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
32	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 30X10X240 EN LAMINA PREGALVANIZADA, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPPG 30-10	DPPG 30-10	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
33	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 40X8X240 EN LAMINA PREGALVANIZADA, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPPG 40-8	DPPG 40-8	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
34	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 40X10X240 EN LAMINA PREGALVANIZADA, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPPG 40-10	DPPG 40-10	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular

Consulte aquí el certificado

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO N.º 1
Certificado de producto Nº. . CS-LCO-17543-2025/105
Producto: DUCTO CERRADO DE SECCIÓN NO CIRCULAR
Categoría: Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular

35	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 50X8X240 EN LAMINA PREGALVANIZADA, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPPG 50-8	DPPG 50-8	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
36	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 50X10X240 EN LAMINA PREGALVANIZADA, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPPG 50-10	DPPG 50-10	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
37	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 60X8X240 EN LAMINA PREGALVANIZADA, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPPG 60-8	DPPG 60-8	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
38	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 60X10X240 EN LAMINA PREGALVANIZADA, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPPG 60-10	DPPG 60-10	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
39	Canaleta de 8.10.12.15 cm * 4 o 5 cm * 240cm, en lamina cold rolled y/o en lamina galvanizada y ducto portacable metalico de 10,20,30,40,50,60 cm * 8º10 cm * 240cm en lamina cold rolled y/o en lamina galvanizada, accesorios de union, troqueles electricos y de datos terminada en pintura electroestatica en polvo. Cámara salina 450 h IEC 61084-1 Modelo: CDK 8 - 60	CDK 8 - 60	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular

Usos permitidos	Instalación de cables de datos (internet, telefonía) y servidores, conductores eléctricos en instalaciones industriales, comerciales y/o residenciales. Uso interior o exterior de acuerdo con el material de fabricación solicitado
Prohibiciones	Usar soportes inadecuados para la instalación. Fijar otro tipo de estructura a la canaleta, bandeja/ducto portacable. No hacer correcto uso de las platinas de unión con la tornillería suministrada. Cortar el producto exponiendo la superficie a la corrosión y no generar una barrera de protección con pintura o anticorrosivo.

FIN DEL ANEXO N.º 1

Consulte aquí el certificado

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO N.º 2
Información adicional del certificado de producto N°. CS-LCO-17543-2025/105

Razón Social del fabricante: KENZOR SAS
Dirección del fabricante: DIAGONAL 46 SUR # 13 L 27, Bogotá D.C.

Información de los reportes de ensayo:

N° ACREDITACIÓN	NOMBRE DEL LABORATORIO	N° DE REPORTE DE ENSAYO
11-LAB-024	CIDET	41583E00ACT01
19-LAB-006	NYCE	LENC - 24 - I 1204 ENC - 24 - I 1205

FIN DEL ANEXO N.º 2

Consulte aquí el certificado

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

Ofrecemos
La mejor SOLUCIÓN
para sus Proyectos Energéticos



CARTA DE GARANTÍA TABLERO MOD.2 PISO 4

CLIENTE: INGEBYP S.A.S

info@vygingenieria.com
Carrera 67 # 11 – 42 Bodega 1 Bogotá
Tel: (60)1 805 64 36 - Cels:3158525822 / 3158995920

1. CARTA DE GARANTÍA TABLEROS BAJA TENSIÓN

Bogotá D.C. mayo 21 de 2026.

Señores:
INGEBYP S.A.S

Departamento de Proyectos.

CARTA DE GARANTÍA

PRODUCTOS

1. TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PISO 4

CÓDIGO DE FABRICACIÓN: OT-1938

V&G Ingeniería Especializada S.A.S. garantiza que el producto cumple con las especificaciones técnicas exigidas por el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, de igual manera se aseguran las dimensiones, posiciones, características y calidad de cada uno de los elementos que componen el tablero.

TÉRMINOS:

V&G Ingeniería Especializada S.A.S garantiza el servicio de reparación y/o servicio técnico sin costo por repuesto ni mano de obra, por un periodo de 12 meses los cuales inician a partir del 21/05/2026.

El servicio quedará sujeto al diagnóstico técnico. En caso de encontrarse que el problema es generado por motivos externos al tablero y configuración del mismo, los gastos de transportes, viáticos, mano de obra y repuestos será asumido por el cliente.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

- Para hacer efectiva esta garantía se deberá presentar la factura de venta, junto con el presente certificado de garantía.

- El servicio de garantía solo lo podrá prestar el personal de V&G Ingeniería Especializada S.A.S. o en su defecto personal ajeno que deberá contar con la debida autorización certificada.
- El cliente será responsable por los daños ocasionados en el trasporte e instalación del producto.

LA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- El tablero presente daños por maltrato o uso inadecuado.
- Daños ocasionados por catástrofes naturales (terremotos, inundaciones, etc.), accidentes, uso en condiciones ambientales extremas, daños causados por animales en el interior o exterior del equipo.
- Cuando el tablero ha sido intervenido en cuanto a modificación interna de cableado, equipos y lógica de funcionamiento por personal ajeno a V&G INGENIERÍA S.A.S. o que no cuente con la debida autorización.
- Por fluctuaciones de voltaje en el suministro eléctrico, por conexión a voltajes diferentes a los indicados en la placa de datos técnicos, y/o equipos que conforman el tablero, y los causados por descargas eléctricas o rayos.
- Cuando el tablero no tiene placa de datos técnicos o la misma ha sido alterada.
- Al no presentar la factura de venta acompañada con el protocolo de pruebas FAT, junto con el certificado de garantía.
- Cuando se ha vencido el termino de tiempo especificado.
- Cuando al realizar el diagnóstico técnico se encuentre que el problema fue ocasionado por causas ajenas al tablero.

LA GARANTÍA NO CUBRE:

- Mantenimiento y limpieza del tablero.
- Desgaste por uso y operación normal de partes mecánicas y eléctricas.
- Accesorios adicionales al tablero.

PASOS PARA SOLICITAR GARANTÍA:

- Comunicarse con la línea de atención (+57) 315 8525822, fijo 805 64 36 o enviar solicitud al correo electrónico: info@vygingenieria.com
- Tener a mano la información de la factura, referencia y número serial.
- Informar la ubicación exacta del producto para ser atendido.
- Informar el daño o problema que presenta el producto.
- En caso de tener alguna queja o sugerencia enviarla a: info@vygingenieria.com

2. CERTIFICADOS DE PRODUCTO

a. CERTIFICADO RETIE V&G INGENIERÍA ESPECIALIZADA S.A.S



certecnica
Más que certificaciones técnicas

CERTIFICADO DE PRODUCTO

No. 2506 **ESQUEMA:** 4 RETIE

17065 Certecnica S.A.S.

Certifica que el producto

TABLEROS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN

Referencias: Anexo 1 Referencias Certificadas

FABRICADO Y COMERCIALIZADO POR:

V&G INGENIERIA ESPECIALIZADA SAS

NIT: 900.669.744-8

Es conforme con los requisitos de la

RESOLUCIÓN 40117 DE 02 DE ABRIL DE 2024 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DE COLOMBIA " POR LA CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS- RETIE" LIBRO 2. TÍTULO 2 - REQUISITOS GENERALES PARA LOS PRODUCTOS UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. (ARTÍCULO. 2.2.1. ARTÍCULO. 2.2.2.) ARTÍCULO 2.3.31 TABLEROS ELÉCTRICOS Y CELDAS ARTÍCULO 2.3.31.2 TABLEROS DE BAJA TENSIÓN

IAF ONAC ACREDITADO certecnica

ISO/IEC 17065:2012
31-CPR-002

Dirección / Adress:
CARRERA 67 # 11 – 42 BOGOTA D.C, COLOMBIA

País de Origen / Country of origin:
COLOMBIA

Marca / Brand:
VYG INGENIERIA ESPECIALIZADA

Fecha de expedición:
22 de diciembre de 2025

Fecha del primer seguimiento:
Antes de 22 de diciembre de 2026

Fecha de vencimiento:
22 de diciembre de 2027

Autorizado por:
Firmado digitalmente por MORALES AVILA JORGE ALEJANDRO
Fecha: 2025.12.23 14:24:30 -05'00'

Jorge Alejandro Morales Ávila
Gerente General

Consulta tu certificado

Este Certificado tendrá validéz siempre y cuando se encuentre firmado digitalmente y la identidad del firmante pueda ser validada.

CER-FO-31 V2 / 2025-11-24

Calle 72A # 66 – 11 | PBX. (601) 215 70 53
Bogotá - Colombia
certecnica.com

Página 1 de 6

certecnica
Más que certificaciones técnicas

Anexo del Certificado No. 2506 V:0

ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1	TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION	FAMILIA Tableros de potencia; SUB-FAMILIA Banco de condensadores para corrección del factor de potencia; CATEGORIA BAJA TENSION; MODELO TP; DESCRIPCIÓN GENERAL Vn = 12 V hasta 1000 V In = hasta 6,000 A Icc = 85 kA IP = hasta 66 IK = 10	Tablero banco de condensadores
2		FAMILIA Tableros de potencia; SUB-FAMILIA Centro de control de motores CCM; CATEGORIA BAJA TENSION; MODELO TP; DESCRIPCIÓN GENERAL Vn = 12 V hasta 1000 V In = hasta 6,000 A Icc = 85 kA IP = hasta 66 IK = 10	Tablero control de motores
3		FAMILIA Tableros de potencia; SUB-FAMILIA General de acometidas; CATEGORIA BAJA TENSION; MODELO TP; DESCRIPCIÓN GENERAL Vn = 12 V hasta 1000 V In = hasta 6,000 A Icc = 85 kA IP = hasta 66 IK = 10	TGA
4		FAMILIA Tableros de potencia; SUB-FAMILIA Tablero de distribución; CATEGORIA BAJA TENSION; MODELO TP; DESCRIPCIÓN GENERAL Vn = 12 V hasta 1000 V In = hasta 6,000 A Icc = 85 kA IP = hasta 66 IK = 10	Tablero de distribución

Consulta tu certificado

IAF

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002

certecnica
Más que certificaciones técnicas

certecnica.com

info@vygingenieria.com
Carrera 67 # 11 – 42 Bodega 1 Bogotá
Tel: (60)1 805 64 36 - Cels:3158525822 / 3158995920



certecnica
Más que certificaciones técnicas

Anexo del Certificado No. 2506 V:0

5		FAMILIA Tableros de potencia; SUB-FAMILIA Armarios y tableros para uno o más medidores; CATEGORIA BAJA TENSION; MODELO TP; DESCRIPCIÓN GENERAL Vn = 12 V hasta 1000 V In = hasta 6,000 A Icc = 85 kA IP = hasta 66 IK = 10	Tablero de medidores
6		FAMILIA Tableros de potencia; SUB-FAMILIA Tablero para control de alumbrado; CATEGORIA BAJA TENSION; MODELO TP; DESCRIPCIÓN GENERAL Vn = 12 V hasta 1000 V In = hasta 6,000 A Icc = 85 kA IP = hasta 66 IK = 10	Tablero de Alumbrado
7		FAMILIA Tableros de potencia; SUB-FAMILIA Tableros para energías renovables; CATEGORIA BAJA TENSION; MODELO TP; DESCRIPCIÓN GENERAL Vn = 12 V hasta 1000 VIn = hasta 6,000 AIcc = 85 kAIP = hasta 66IK = 10	Tablero String
8		FAMILIA Tableros de potencia; SUB-FAMILIA Tableros para energías renovables; CATEGORIA BAJA TENSION; MODELO TP; DESCRIPCIÓN GENERAL Vn = 12 V hasta 1000 V In = hasta 6,000 A Icc = 85 kA IP = hasta 66 IK = 10	Tablero para sistemas eólicos
9		FAMILIA Tableros de potencia; SUB-FAMILIA Tableros para energías renovables; CATEGORIA BAJA TENSION; MODELO TP; DESCRIPCIÓN GENERAL Vn = 12 V hasta 1000 V In = hasta 6,000 A Icc = 85 kA IP = hasta 66 IK = 10	Tablero para baterías o inversores

Consulta tu certificado
IAF
ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002
certecnica
Más que certificaciones técnicas
certecnica.com
CER-FO-31 V2 / 2025-11-24
Página 3 de 6

info@vygingenieria.com
Carrera 67 # 11 – 42 Bodega 1 Bogotá
Tel: (60)1 805 64 36 - Cels:3158525822 / 3158995920

certecnica
Más que certificaciones técnicas

Anexo del Certificado No. 2506 V:0

10		FAMILIA Tableros de control, Automatización e instrumentación; SUB-FAMILIA Tablero de Automatización con PLC; CATEGORIA BAJA TENSION; MODELO TC; DESCRIPCIÓN GENERAL Vn = 12 V hasta 1000 V In = hasta 6,000 A Icc = 85 kA IP = hasta 66 IK = 10	Tablero automatizado
11		FAMILIA Tableros de control, Automatización e instrumentación; SUB-FAMILIA Tablero de sincronismo; CATEGORIA BAJA TENSION; MODELO TC; DESCRIPCIÓN GENERAL Vn = 12 V hasta 1000 V In = hasta 6,000 A Icc = 85 kA IP = hasta 66 IK = 10	Tablero sincronismo
12		FAMILIA Tableros de control, Automatización e instrumentación; SUB-FAMILIA Tablero de control; CATEGORIA BAJA TENSION; MODELO TC; DESCRIPCIÓN GENERAL Vn = 12 V hasta 1000 V In = hasta 6,000 A Icc = 85 kA IP = hasta 66 IK = 10	Tablero de control manual o automático

USOS PERMITIDOS Y PROHIBICIONES

USOS PERMITIDOS:

- Industria Pesada y Manufactura: Suministran energía a maquinaria de gran escala, líneas de producciones completas, motores de alta potencia y sistemas de automatización industrial.
- Grandes Edificios Comerciales y Corporativos: Controlan la distribución principal de energía a múltiples pisos, sistemas de climatización centralizados, ascensores, data centers y equipos críticos.
- Infraestructura Pública y de Servicios: Se utilizan en hospitales, aeropuertos, centros de datos, plantas de tratamiento de agua, estaciones de bombeo y subestaciones eléctricas para gestionar flujos de energía significativos.
- Generación y Distribución de Energía: Forman parte de las instalaciones de plantas generadoras (solares, eólicas, hidroeléctricas), estaciones de distribución y subestaciones, donde manejan la interconexión con la red.
- Centros de Control de Motores (CCMs): Agrupan arrancadores de motores, contactores y protecciones para el control centralizado de numerosos motores en un proceso industrial.


Consulta tu certificado

IAF · ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17065:2012 21-CPR-002 · certecnica Más que certificaciones técnicas

CER-FO-31 V2 / 2025-11-24

certecnica.com

Página 4 de 6

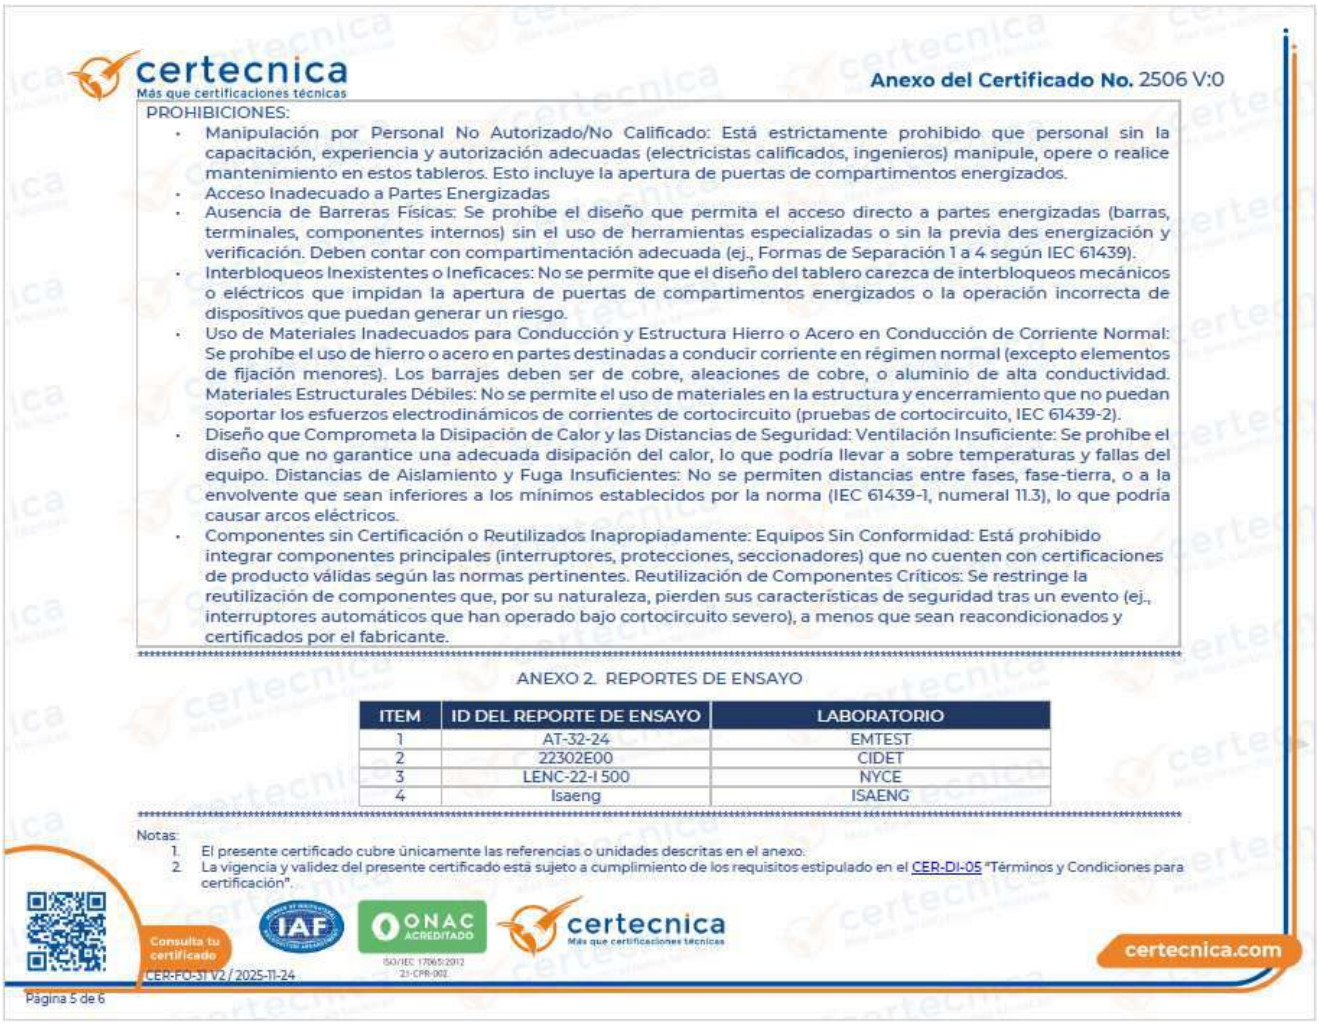

certecnica
Más que certificaciones técnicas

Anexo del Certificado No. 2506 V:0

PROHIBICIONES:

- Manipulación por Personal No Autorizado/No Calificado: Está estrictamente prohibido que personal sin la capacitación, experiencia y autorización adecuadas (electricistas calificados, ingenieros) manipule, opere o realice mantenimiento en estos tableros. Esto incluye la apertura de puertas de compartimentos energizados.
- Acceso Inadecuado a Partes Energizadas
- Ausencia de Barreras Físicas: Se prohíbe el diseño que permita el acceso directo a partes energizadas (barras, terminales, componentes internos) sin el uso de herramientas especializadas o sin la previa des energización y verificación. Deben contar con compartimentación adecuada (ej., Formas de Separación 1 a 4 según IEC 61439).
- Interbloqueos Inexistentes o Ineficaces: No se permite que el diseño del tablero carezca de interbloqueos mecánicos o eléctricos que impidan la apertura de puertas de compartimentos energizados o la operación incorrecta de dispositivos que puedan generar un riesgo.
- Uso de Materiales Inadecuados para Conducción y Estructura Hierro o Acero en Conducción de Corriente Normal: Se prohíbe el uso de hierro o acero en partes destinadas a conducir corriente en régimen normal (excepto elementos de fijación menores). Los barrajes deben ser de cobre, aleaciones de cobre, o aluminio de alta conductividad. Materiales Estructurales Débiles: No se permite el uso de materiales en la estructura y encerramiento que no puedan soportar los esfuerzos electrodinámicos de corrientes de cortocircuito (pruebas de cortocircuito, IEC 61439-2).
- Diseño que Comprometa la Disipación de Calor y las Distancias de Seguridad: Ventilación Insuficiente: Se prohíbe el diseño que no garantice una adecuada disipación del calor, lo que podría llevar a sobre temperaturas y fallas del equipo. Distancias de Aislamiento y Fuga Insuficientes: No se permiten distancias entre fases, fase-tierra, o a la envolvente que sean inferiores a los mínimos establecidos por la norma (IEC 61439-1, numeral 11.3), lo que podría causar arcos eléctricos.
- Componentes sin Certificación o Reutilizados Inapropiadamente: Equipos Sin Conformidad: Está prohibido integrar componentes principales (interruptores, protecciones, seccionadores) que no cuenten con certificaciones de producto válidas según las normas pertinentes. Reutilización de Componentes Críticos: Se restringe la reutilización de componentes que, por su naturaleza, pierden sus características de seguridad tras un evento (ej., interruptores automáticos que han operado bajo cortocircuito severo), a menos que sean reacondicionados y certificados por el fabricante.

ANEXO 2. REPORTES DE ENSAYO

ITEM	ID DEL REPORTE DE ENSAYO	LABORATORIO
1	AT-32-24	EMTEST
2	22302E00	CIDET
3	LENC-22-I 500	NYCE
4	Isaeng	ISAENG

Notas:
1. El presente certificado cubre únicamente las referencias o unidades descritas en el anexo.
2. La vigencia y validez del presente certificado está sujeto a cumplimiento de los requisitos estipulado en el CER-DI-05 "Términos y Condiciones para certificación".

Consulta tu certificado

IAF

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002

certecnica
Más que certificaciones técnicas

certecnica.com

CER-FO-31 V2 / 2025-11-24

Página 5 de 6



certecnica
Más que certificaciones técnicas

Anexo del Certificado No. 2506 V:0

3. CERTECNICA S.A.S. realiza seguimiento para verificar la conformidad del producto de acuerdo con los estipulado el CER-DI-05 "Términos y Condiciones para certificación.
4. Las modificaciones al presente certificado que no sean aprobadas por 17065 CERTECNICA S.A.S, así como su utilización indebida, son inválidas y están sujetas a sanciones legales.
5. Este certificado de producto no implica juicios sobre otros productos distintos a los mencionados en el listado de referencias certificadas, ni tampoco sobre otros productos que fabrique, comercialice, integre o importe el titular del certificado.
6. Para verificar la validez y novedades del presente certificado puede consultar la página www.certecnica.com. Para los certificados del campo reglamentario también podrá verificar la validez a través del menú consulta pública en SICERCO.
7. Este certificado tendrá validez siempre y cuando se encuentre firmado digitalmente y la identidad del firmante pueda ser validada

Firmado digitalmente por MORALES AVILA JORGE ALEJANDRO
Fecha: 2025.12.23 14:24:14 -05'00'

JORGE ALEJANDRO MORALES AVILA
Gerente, CERTECNICA S.A.S
Calle 72a No. 66-11, Bogotá D.C., Colombia

Consulta tu certificado

IAF

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002

certecnica
Más que certificaciones técnicas

certecnica.com

CER-FO-31 V2 / 2025-11-24

Página 6 de 6

Bogotá D.C. Mayo 28 de 2025

SRES. PREMIUM GLASS S.A.S.
La ciudad

CERTIFICACION DE CALIDAD VIDRIO DE SEGURIDAD VITELSA (28042025)

Apreciado cliente,

Los vidrios de seguridad son procesados en VITELSA, de acuerdo con los parámetros de las siguientes normas técnicas:

- NTC 1578 VIDRIOS DE SEGURIDAD UTILIZADOS EN CONSTRUCCIONES
- NTC 5756 VIDRIO PLANO TRATADO CON CALOR, CATEGORIA TEMPLADO
- NTC 5783 VIDRIO PLANO LAMINADO

Adicionalmente nos permitimos certificar que en nuestros procesos utilizamos vidrio flotado de proveedores como Vidrio Andino (Colombia), PPG (México) y, Cebrace (Brasil), los cuales nos garantizan el cumplimento de la norma NTC 1909 VIDRIO PLANO FLOTADO.

Adjunto detalle de las OP:850005146

ITEM	MATERIAL	ESP. m.m.	CANT.	ANCHO x ALTO	D.T.	PESO UNID	AREA	PER.	DES.	BOQ.	BPM (AxH)	BPB (AxH)	CHA (AxH)	BROCAS
1	INC	10	1	0.900 x 2.020	P1	45.45	1.82	5	0	1	0 0	2 2	0 0	18
2	INC	10	1	0.900 x 2.020	P2	45.45	1.82	5	0	2	0 0	2 2	0 0	18
PESO Kgr:		***90.90***		***2***			***3.64***	***10***		***3***	**0.00**	**11.68**	**0.00**	

Los vidrios suministrados a **PREMIUM GLASS S.A.S.,** se cortaron los modulos y se realizo el tratamiento termico de temple, posterior a ello se ensamblaron en la linea de Laminado y colocando la pelicula de seguridad (PVB Polivinil Butyral) como lo indica la orden de producción.

Para cada uno de los procesos realizados en Vitelsa nos apoyamos de las Normas Tecnicas antes mencionadas y la informacion tecnica suministrada por nuestros proveedores.

Para cualquier información adicional relacionada con temas de calidad por favor comunicarse con la Coordinación de calidad al siguiente correo: coordinadorcalidadmosquera@vitelsa.com.co.

Sin otro particular me subscribo de usted.

Atentamente:



JOHN LOPEZ
JEFE DE CALIDAD
VITELSA S.A.

INFORME MENSUAL No. 13

CONTROL DE CALIDAD

ASPECTOS TÉCNICOS

CONTRATO No. FNA-166-2024

CONTRATISTA INGEBYP S.A.S

OBJETO REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA - CNA EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

No.	Ítem	Descripción Presupuesto	Material a inspeccionar	Certificado de calidad / Ficha tecnica	Parámetro a verificar	Cumplimiento
1	5.1	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad. Incluye plástico aislante y yumbolon de acuerdo a las características técnicas y el guardaescobas.	Piso laminado	Pisos laminados de Colombia	Resistencia	ok
2	8.1	Suministro e instalación de vidrio templado 8 mm para divisiones de oficina incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento. A todo costo.	Vidrio templado 8	N/A	N/A	N/A
3	NP- 12	Suministro e instalación de Policarbonato alveolar 8 mm para cubierta curva, incluye conectores y accesorios para su correcta instalación. No incluye estructura de soporte.	Policarbonato alveolar 8 mm	AJOVER	Calidad	ok
4	NP- 05	Baldosa ceramica piso 60 x 60	PISO JUAREZ OXIDO CD	CORONA	Calidad	ok
5	NP- 15	Suministro e instalacion de revestimiento interior de fachada en WPC de acuerdo a muestra seleccionada	Revesitimiento interior WPC	N/A	N/A	N/A
6	NP- 29	Suministro e instalacion de carpa en lona para control de acceso en zona de resepcion	Carpa en lona de 3x 6	N/A	N/A	N/A
7	NP - 27	Suministro e instalación sanitario de fluxometro (incluye grifería)	ADRIÁTICA PLUS Taza Institucional alongada - Entrada Posterior	CORONA	Calidad	ok
8	4.1	Cambio de válvula antivandálica de empotrar tipo push para sanitarios institucionales de consumo de agua 4.85 lpf (1.28 gpf) tipo corona o similar. Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. A todo costo con la instalación de un enchape de s	FT-751250001-VALVULA-SANITARIO-PUSH-EMPOTRADA-4.8L	CORONA	N/A	N/A
9	4.2	Cambio de grifería para lavamanos de empotrar a muro tipo push aplicación institucional de consumo 0,4 - 1.9 litros, tipo corona o similar incluye desmonte y reinstalación de aparatos. A todo costo con la instalación de un enchape de similares caracterist	FT-701310001-GF-LVM-INST-EMPO-PUSH-PICOEXPUESTO	CORONA	N/A	N/A
10	NP-28	Suministro e instalación lavamanos blanco tipo cascada de baru o similar incluye griferia de desague no incluye push	O12909331-lavamanos-cascade-Baru-vessel-ficha-tecnica	CORONA	N/A	N/A
11	4.3	Cambio de válvula antivandálica de empotrar tipo push para orinales institucionales de consumo de agua 0.5 a 1.9 lpf (0.13 a 0.5 gpf). tipo corona o similar. Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios. A todo costo con la instalación de un en	703020001-valvula-para-orinal-push-entrada-posterior-empotrada	CORONA	N/A	N/A
12	11.1	Resanes y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre pañete o repello liso. Incluyen andamios, escaleras y sistemas de seguridad de operación. A todo costo.	VINILO TIPO 1	PINTULAND	N/A	N/A
13	11.2	Pintura exterior tipo coraza para muros sobre pañete incluye toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.	KORAZA	PINTULAND	N/A	N/A
14	NP-04	Baldosa ceramica pared 30x60.	604862031-piso-pared-amadeo-beige-mt-ft	CORONA	N/A	N/A
15	NP-05	Baldosa ceramica piso 60x60.	FICHA TECNICA piso-vancouver-gris-cd-ft	CORONA	N/A	N/A
16	NP-04	Baldosa ceramica pared 30x60.	corona-garantia-pegacor-v1	CORONA	N/A	N/A
17	NP-04	Baldosa ceramica pared 30x60.	corona-garantia-concolor-v1	CORONA	N/A	N/A
18	6.6.	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	LED-PANEL-REDONDO-INCRUSTAR	SILVANIA	N/A	N/A

19	NP-52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Impermeabilización de placa poliurea pura RESISTENTE A RAYOS UV DANOCOAT 250 incluye suministro y aplicación de POLIUREA en 80 MILS +-10%, ESPESOR TEXTURIZADA PREVIA IMPRIMACION EPOXICA BICOMPONENTE CON ARENA DE QUARZO EN UNA CAPA (si se requieren más se cobrarán por aparte), INCLUYE REACTOR GRACO, MATERIALES Y EQUIPOS CERTIFICADOS, PREVIO tratamiento de fisuras existentes. Acabado original gris cambia por rayos UV.	Poliurea pura RESISTENTE A RAYOS UV DANOCOAT 250	DANOSA	N/A	N/A
20	NP-53	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRATO EN MORTERO FABRICADO EN SITIO para zona de cubiertas, grantizando pendientes de desagues hacia los sifonescon materiales. H prom 8 cm	Mortero seco	CEMEX / TOXEMENT	N/A	N/A
21	NP-52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Impermeabilización de placa poliurea pura RESISTENTE A RAYOS UV DANOCOAT 250 incluye suministro y aplicación de POLIUREA en 80 MILS +-10%, ESPESOR TEXTURIZADA PREVIA IMPRIMACION EPOXICA BICOMPONENTE CON ARENA DE QUARZO EN UNA CAPA (si se requieren más se cobrarán por aparte), INCLUYE REACTOR GRACO, MATERIALES Y EQUIPOS CERTIFICADOS, PREVIO tratamiento de fisuras existentes. Acabado original gris cambia por rayos UV.	Acabado bicomponente de poliuretano alifático	DANOSA	N/A	N/A

Anexos

1	Ficha tecnica Piso laminado
2	Ficha tecnica vidrio templado
3	Ficha tecnica Policarbonato alveolar 8 mm
4	Ficha tecnica PISO JUAREZ OXIDO CD
7	Ficha tecnica ADRIÁTICA PLUS Taza Institucional alongada - Entrada Posterior
8	FT-751250001-VALVULA-SANITARIO-PUSH-EMPOTRADA-4.8L
9	FT-701310001-GF-LVM-INST-EMPO-PUSH-PICOEXPUESTO
10	Lavamanos blanco tipo cascada de baru
11	Válvula antivandálica de empotrar tipo push para orinales institucionales de consumo de agua 0.5 a 1.9 lpf
12	VINILO TIPO 1
13	KORAZA
14	604862031-piso-pared-amadeo-beige-mt-ft
15	FICHA TECNICA piso-vancouver-gris-cd-ft
16	corona-garantia-pegacor-v1
17	corona-garantia-concolor-v1
18	LED-PANEL-REDONDO-INCRUSTAR
19	Ficha tecnica poliurea
20	Mortero seco
21	Acabado bicomponente de poliuretano alifático
22	CAJAS CONDUIT METALICAS
23	CERTIFICADO (TUBO EMT)
24	ENCAUCHETADO CPE-SPT- C. Flexible
25	CABLE Multindoductor PVC - PVC NY - LS 600V
26	CABLE THHN THWN-2 C. Cu Al Aisl. PVC
27	CERTIFICADO BANDEJA TIPO DUCTOS
28	CERTIFICADO RETIE OT (TABLERO TGD)

ING. RODOLFO BARRETO VARGAS
COORDINADOR DE OBRA INGEBYP
CONTRATISTA

ING. ANA MIREYA ARAGON
RESIDENTE DE INTERVENTORIA BIODECO
INTERVENTORIA

INGEBYP NIT: 830.121.507-2	**INFORME MENSUAL No. 13** **CONTROL ESTADO DEL TIEMPO**	fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO

CONTRATO No. / Y NOMBRE DEL PROYECTO	FNA-166-2024 - REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA - CNA EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.																													
INTERVENTOR	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC																													
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S																													
ENTIDAD CONTRATANTE	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.																													
PERIODO	**DD**	1	**MES**	3	**AÑO**	2026	AL	**DD**	20	**MES**	3	**AÑO**	2026																	

		DIAS																																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
HORAS	1:00																																0	0	0	0	0
	2:00																																0	0	0	0	0
	3:00																																0	0	0	0	0
	4:00																																0	0	0	0	0
	5:00																																0	0	0	0	0
	6:00	DN	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS												19	1	0	0	0
	7:00	DN	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS												19	1	0	0	0
	8:00	DN	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS												19	1	0	0	0
	9:00	DN	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS												19	1	0	0	0
	10:00	LLF	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS												19	0	1	0	0
	11:00	LLF	DS	DS	DS	DN	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS												18	1	1	0	0
	12:00	LLF	DS	DS	DS	LLM	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS												18	0	1	1	0
	13:00	LLF	DS	DS	DS	LLM	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS												18	0	1	1	0
	14:00	LLF	DS	DS	DS	LLF	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS												18	0	2	0	0
	15:00	LLF	DS	DS	DS	LLF	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS												18	0	2	0	0
	16:00	LLF	DS	DS	DS	LLF	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS												18	0	2	0	0
	17:00	LLF	DS	DS	DS	LLM	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS												18	0	1	1	0

INGEBYP NIT: 830.121.507-2	**INFORME MENSUAL No. 13** **CONTROL ESTADO DEL TIEMPO**	fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO

CONTRATO No. / Y NOMBRE DEL PROYECTO	FNA-166-2024 - REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA - CNA EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
INTERVENTOR	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S
ENTIDAD CONTRATANTE	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

PERIODO — **DD** 1 **MES** 3 **AÑO** 2026 AL **DD** 20 **MES** 3 **AÑO** 2026

| | | |

-Aplicacion de pintula cielo raso.
-Instalacion de guarda escobas

Apoyo Sec Inv.

Firma Contratista.
Coordinacion Obra.
Febrero 28 de 2026

Personal de Obra.
Contratista
Administrativos 3
Operativos 4
Hora de inicio: 6:30 p.m.
Hora Finalizacion 8:00 p.m.
Clima Soleado.

Equipos de Obra: 2 Container
1 Baño portatil.
Taladro
Pulidora
Lijadora
Herramienta menor.

Actividades.
Convenciones 4 piso
-Demolicion de anchapa baños 4 piso.
-Aplicacion de pintula cielo raso.
-Instalacion de guarda escobas.

Apoyo Sec Inv

Firma Contratista.
Coordinacion de Obra.
Marzo 02 de 2026.

Personal de Obra.
Contratista
Administrativos. 3
Operativos 9
Hora de inicio: 6:30 a.m
Hora finalizacion 7:00 p.m.

Powered by CamScanner

Equipos de Obra: 2 Container
1 Baño portatil
Taladro
Pulidora
Acolilladora
Herramienta de Mano y/o menor

Actividades
Convenciones 4 piso
- Damdicion de enchappe 4 piso en el area de baño
- Aplicacion de pintura en cielo raso
- Instalacion de guarda escobas.
- Tranzado del Cableado

Firma Contratista

Apoyo Re. Ing.

Coordinacion de obra.
Marzo 3 de 2026

Personal de obra
Contratista
3 Administrativo
9 Operativo
Hora de inicio: 6:30 a.m
Hora finalizacion: 6:00 p.m
Clima Soleado.

Equipos de Obra: 2 Container.
1 Baño portatil
Taladro
Pulidora.
Acolilladora.
Herramienta manor.

Actividades
Convenciones 4 piso.
-Demolicion de enchapa baño piso 4.
-Demolicion de muros en superboard.
-Instalacion de guarda escobas
-Aplicacion de pintura en cielo raso.

Powered by CamScanner

Recomendaciones Interventoría:

① Se solicita al contratista de obra realizar verificación de los EPP del personal, de igual manera se solicita que las herramientas a utilizar cuenten con todos los seguros respectivos.

② Se reitera al contratista de obra que no se han realizado los remates de la PCI lo cual se ha solicitado en reiteradas oraciones.

③ No se presentan rendimientos en obra de acuerdo a las necesidades para la entrega del frente en el cuarto piso de conversiones, toda vez que el personal rota de acuerdo a las actividades específicas en cada punto del frente, se reitera la necesidad de aumentar el personal.

④ No se han realizado actividades de instalación de divisiones en vidrio se reitera al contratista la solicitud de realizar la actividad de forma inmediata.

⑤ Se solicita verificar acabado de pintura y resanes por escalera de acceso del cuarto piso para su recibimiento.

Apoyo Tec INT.

Marzo 4 de 2026

Personal de Obra.
Contratista.
3 Administrativos
8 Operativos.
Hora de Inicio: 6:30 a.m.
Hora finalización: 6:00 p.m.
Clima Soleado.

Equipo de Obra: 2 Contenedores
1 Baño portátil.
Taladro
Pulidora
Acolilladora
Cizalladora
Herramienta menor

Actividades:

- Conversiones 4 piso
- Resana cielo raso
- Demolicion de enchape baño 4 piso.
- Instalacion guarda escobas

Powered by CamScanner

200

- Instalacion cableado

Firma Contratista
Coordinacion de Obra
Marzo 5 de 2026

Personal de Obra
Contratista
3 Administrativos
4 Operativos
Hora de Inicio: 6:30 a.m
Hora finalizacion: 6:00 p.m
Clima Soleado

Equipo de obra: 2 Container
1 Baño portatil.
Taladro
Polidora
Acolilladora
Ujadora
Herramienta de mano

Actividades
convencional 4 piso
- Demolicion enchape 4 piso baños.
- Resane cielo raso
- Instalacion guarda escobas
- Replanteo de luminarias
- Ajuste de puntos de muros
- Instalacion de cielo raso en punto fijo.

Firma Contratista
Coordinacion de Obra
Marzo 6 de 2026

Personal de Obra
Contratista.
3 Administrativos

Powered by CamScanner

5 Operativos.
Hora de inicio: 6:30 a.m
Hora finalizacion: 6:00 p.m
Clima Soleado
Equipo de Obra: 2 Container
1 Baño portatil
Taladro
Pulidora.
Acolilladora.
Ujadora.
Herramienta de mano.

Actividades.
-Instalacion de guarda escoba.
-Ajuste de pintoo de muros

Observaciones generales
- Se genera prorroga, al contrato por 15 dias calendario, basado en que se han presentado ajustes, cambios en diseños del cuarto piso del edificio de convenciones, de igual forma se requirio hacer ajuste y validacion del estado de la estructura metalica el cual requiere un tipo de mantenimiento especifico para poder guardar la integridad de la estructura fisica y las personas que laboran en esta zona.
Igualmente y en atencion a lo expresado anteriormente se esta solicitando una adicion para atender los mantenimientos requeridos para el mantenimiento de la cubierta
- Sin Visto bueno Interventoria.
Se reitera al contratista de dar la necesidad de iniciar, continuar y finalizar las actividades complementarias pendientes en el cuarto piso del edificio de convenciones, entre las cuales se encuentran la alimentacion por columna para PCI, finalizacion de pisos laminado y cielo raso, instalacion de divisiones de vidrio y aluminio e instalacion de superficies de madera en muros logia, entre otras. Se insta al contratista de disponer de mayor personal.

Marzo 07 de 2026
Personal en Obra
Contratista
Administrativos
Operativos
Hora inicio
Hora finalización
Clima Dia nublado sin lluvias.
durante la jornada
Equipos en obra 2 Container
1 Baño portatil
Taladros
Pulidoras
Herramienta menor

Actividades
- Demoliciones Cuarto piso
- Demolición de concha de concreto de pozos de acuerdo a lo analizado y solicitado en comite
- Resane de muros.
- Perforaciones en cielo raso para acceder a bandeja porta cables
- Instalación de cableado electrico para alimentación

Residente Ing. Residente Ing.

Marzo 09 de 2026
Personal en Obra
Contratista
Administrativos
Operativos
Hora inicio
Hora finalización
Clima. Se presentan fuertes lluvias en horas de la tarde

Equipos en Obra 2 Contenedor
1 Baño portatil
Taladros
Pulidoras
Herramienta menor

Actividades
- Demoliciones cuarto piso.
- Traslados, embalsado de materiales de demolición
- Conformación de redes de cableado electrico para puestas de trabajo
- Validación de puntos de acceso a bandeja metalica, porta Cables.

Se realiza reunión donde se muestra la distribucion delos diferentes tableros que conforman el cuarto electrico. el cual queda bajo acta de comite en acuerdo con supervicion, interventoria y personal de TI

Recomendaciones Interventoria: ① Se solicita al contratista de obra realizar las labores de retiro de RCD's en bajo hacia sitio de acopio ② Se solicita aumentar personal y rendimiento de obra para acabados de muros, enchapes, pisos, pintura RCI y demas. ③ Se solicita al contratista de obra realizar la instalación de los difusores en yeso.

Apoyo Sec Int. Residente Int.

Marzo 10 de 2026
Personal en obra
Contratista
Administrativos
Operativos

Hora inicio
Hora finalizacion
Clima. Se presentan fuertes lluvias en la zona generando afectaciones en traslado y el ingreso de insumos.

Equipos en obra 2 Continer
1 Baño portatil
Taladro
Pulidora
Herramienta menor

Actividades
- Comencemos Cuarto Piso
- Termino instalacion de enchape con muros en baño de mujeres sector sanitarios
- Instalacion de cableado para lamparas normales y regladas con puntos de trabajo
- Resane muros
- Llegada de piezas de madera que van contra el perimetral de la fachada en la zona de ventanas

Supervisor Apoyo Ing Ind.
Residente Ind.

Marzo 11 de 2026
Personal en Obra.
Contratista
Administrativos
Operativos
Hora inicio 6:30 Am
Hora finalizacion 6:30 Pm
Clima Dia nublado con lluvias aisladas durante la jornada laboral
Equipos en Obra 2 Continer.
1 Baño portatil
Taladros
Pulidoras
Herramienta menor

Actividades
→ Comencemos 4to piso.
- Ligada de muros
- Instalacion de enchape en baños mujeres

- Instalacion de cableado para lamas marmoladas y reguladas
- Se continua con tramite documental para gestion y prorroga del contrato teniendo en cuenta los actas mes definidos por la entidad contratante y documentos de soporte

Firma Contratista
Coordinador de Obra
Marzo 12 de 2026

Apoyo Sec Int.
Residente Int.

Personal en obra
Contratista
Administrativos
Operativos

Hora inicio 6:30 Am
Hora finalizacion 11:00 Pm
Clima Dia Lluvioso
Equipos en Obra Container
Baño portatil
Taladros
Pulidoras
Herramienta menor

Actividades

⇒ Continuamos 4to piso.
- Ligado de muros
- Instalacion de embalse para muros
- Cambio de punch sanitario ya que se evidencia goteo el cual se informa a la interventoria
- Instalacion de cableado para lamas Normales y reguladas
- Instalacion de soportes para acometida

Firma Contratista

Apoyo Sec Int.
Residente Int.

Marzo 13 de 2026
Personal con Obra
Contratista.
Administrativos
Operativos
Hora inicio
Hora finalizacion
Clima Dia nublado
Equipos con Obra 2 Container
1 Baño portatil
Taladros
Pulidoras
Herramienta menor.
Actividades
- Conversaciones 4to piso
- Instalacion de pvch sanitario
- Resane de muros y lijado
- Instalacion de enchape
- Instalacion de cable para salidas normales y reguladas
- Instalacion de soportes para tuberia de acometida principal en el cuarto piso

Residente Ing. Residente Ltda.

Firma contratista
Coordinador de Obra

Marzo 14 de 2026
Personal con Obra
Contratista
Administrativos
Operativos
Hora inicio 6:30
Hora finalizacion 5:00 Pm
Clima Dia Soleado
Equipos en Obra 2 Container
1 Baño portatil

Taladros
Pulidoras
Herramienta menor

Actividades
⇒ Comunicaciones 4to piso
- Instalacion de tubera EMT 3" para. acometida principal
- Ligado de muros.
- Resane de muros.

Apoyo Tec Int. Residente Int.

Firma Contratista
Coordinador de Obra
Marzo 15 de 2026

Personal En Obra
Administrativos 1
Operativos 3

Clima Soleado
Hora inicio 8:00 Am
Hora finalizacion 4:00 Pm

Actividades
- Instalacion de tubería correspondiente a la acometida principal para el cuarto piso

Apoyo Tec Int. Residente Int.

Firma Contratista
Coordinador de Obra
Marzo 16 de 2026

Personal en Obra.
Contratista
Administrativos 3
Operativos.

Hora inicio 6:30 Am
Hora finalizacion 6:00 Pm
Clima dia Soleado con ligeras lluvia en la

Sorde.
Equipos en Obra. 2 Container
1 Baño portatil
Taladro
Pulidora.
Herramienta menor

Actividades
→ Comunicaciones 1° piso.
- Instalacion de enchape en baño mujeres
- Resane muros. costado norte.
- Inicio de instalacion de cable de datos de acuerdo a especificacion entregado por la entidad

Observación
Se injora por parte de la entidad la instalacion de mobiliario. en costado norte


Firma Contratista
Coordinador de Obra
Marzo 17 de 2026

Personal Obra
Contratista
Administrativos
Operativos
Hora inicio 6:30 Am
Hora finalizacion 5:30 Pm
Clima Dia parcialmente nublado
Equipos En Obra
2 Container
1 Baño portatil
Taladro
Pulidora
Herramienta menor

Actividades

→ Conmutaciones 4to Piso

- Instalación de Cableado de datos UTP
- Se realizo reunion para validar la cantidad y ubicacion de impresoras de la entidad. se dispusieron de 10 puntos y se anexa plano, quedan pendiente la entrega de la ficha tecnica por parte de la entidad.

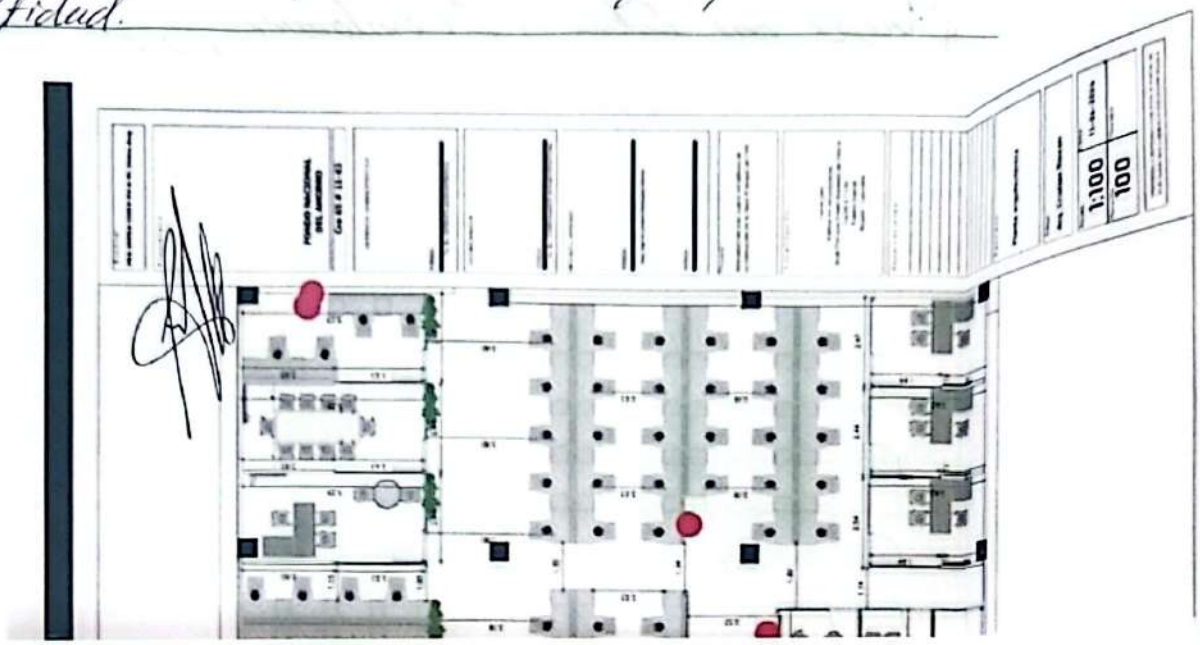

Firma Contratista

Apoyo Tec Int.

Residente Int.

Powered by CamScanner

Marzo 18 de 2026
Personal en Obra.
Contratistas
Administrativos
Operativos
Hora inicio 6:30 Am
Hora finalización
Clima Dia Lluvioso
Equipos en Obra Contenedor
1 Baño portatil
Taladro
Pulidora
Herramienta menor.
Actividades

Convenciones: 4to piso

Se programó una reunión con el Contratista encargado de las instalaciones eléctricas de TI para revisar las necesidades eléctricas para tomacorrientes normales, tomacorrientes regulados y tomacorrientes especiales. Dicha reunión estaba programada para el 19-03-2026 a las 15:00, pero por inasistencia del contratista de TI se canceló la reunión.

El tablero TGD del piso 4 está fabricado y en pruebas de laboratorio.

De la acometida para el tablero TGD ya se instaló en su totalidad la tubería. Está en proceso de instalación el cableado correspondiente y la maniobra para instalar el breakak totalizador en el TGD del Edificio de convenciones.

Especialista Eléctrico — Apoyo Ing. SST — Residente

- Resane de muros perimetrales
- Instalación de enchape
- Instalación de cableado estructurado

Marzo 19 de 2026

Personal en Obra
- Contratista
- Administrativos
- Operativos

Hora inicio
Hora finalización
Clima Dia soleado
Equipos en obra
- 2 Contenedor
- 1 Baño portatil
- Taladro
- Pulidora
- Herramienta menor

Actividades
Convencionales 4to piso
- Demolición de enchape de piso
- Cambio de punch de sanitarios
- Instalacion de enchape en muros
- Resane de muros
- Aplicacion de pintura
- Instalacion de cableado para Datos, red normal y regulada
- Se inicia por parte de la entidad la instalacion de mobiliario.

Observaciones generales
Se tiene pendiente por parte de la entidad, la definicion del alcance a ejecutar en edificio CNA piso 2 lo que esta generando una validacion de actividades no previstas y una solicitud de prorroga al contrato y una adicion al mismo teniendo en cuenta la definicion de la entidad.

Coordinador de Obra — Apoyo Tec Ind. — Residente Ind

Marzo 20 de 2026

Personal en Obra
Contratista
Administrativos
Operativos

. Hora inicio
Hora finalización
Clima Dia soleado
Equipos en Obra 2 Container
1 Baño portatil
Taladro
Pulidora
Herramienta menor

Actividades
- Comvencuenes 4to piso
- Instalacion cerchape
- Remocion de enchape de piso
- Instalacion de cableado estructurado

Observaciones generales
Se suspende el contrato toda vez que se tiene pendiente la definicion de alcance a ejecutar en el segundo piso del edificio CNA en lo que refiere a la estructura metalica y concepto por respecto de curaduria a la validacion de si se requiere licenciamiento para ejecutar la actividad

Apoyo Sst.

Recomendaciones Intervenciones
Se recomienda verificar proteccion de piso, toda vez que por el desarrollo de las actividades se puede realizar afectacion.
Para la entrega de las actividades se recomienda realizar a las partes proceso de levantamiento de planes recad.

Residente Sst

INFORME SEMANAL DE OBRA

FONDO NACIONAL DEL AHORRO FINA

INFORME SEMANAL DE OBRA No. 53

Entidad Contratante: **Fondo Nacional Del ahorro** Semana del **6/03/2026** al **12/03/2026** Fecha **12/03/2026**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

NUMERO DE CONTRATO	FNA-166-2024
OBJETO DEL PROYECTO	"REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Localidad (16) de Puente Aranda, Carrera 65 No 11-83
ÁREA A CARGO DE LA SED	INFRAESTRUCTURA
INTERVENTORIA	Consultores, Desarrollo y Ambiente S.A.S. BIC **NIT**
SUPERVISOR	Dr. VANESA PACHECO GOMEZ **APOYO A LA SUPERVISION** ING. JAIME HERNANDO PRIETO ALVAREZ
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.			FNA-166-2024
Contratista			INGEBYP S.A.S
Valor inicial	$		5,142,932,606.00
Valor actual	$		5,142,932,606.00
Variación del valor	$		-
Fecha de Inicio			7/3/2025
Plazo inicial (Días)			365 Días
Plazo actual (Días)	365 Días		100.00%
Variación en plazo			Días
Fecha Contractual de terminación			7/03/2026
Tiempo Transcurrido (días)	370 Días		101.37%
Días remanentes del Contrato	-5 Días		-1.37%
Acumulado a última acta pagada	$		2,343,033,514.05
Estimado ejecutado por llevar a acta	$		-

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 5,142,932,606.00

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 3,922,829,341.37	76.28%	$ 4,151,248,205.11	80.72%	$ 228,418,863.74	4.44%
Durante el Periodo	$ 428,336,008.55	8.33%	$ 180,000,000.00	3.50%	-$ 248,336,008.55	-4.83%
Acumulado a la Fecha	**$ 4,351,165,349.92**	**84.60%**	**$ 4,331,248,205.11**	**84.22%**	**-$ 19,917,144.81**	**-0.39%**

Desviación en días





Observaciones al desempeño del proyecto

Durante la presente semana, se encuentra adelantado actividades de acuerdo con las reparaciones locativas generales en los siguientes frentes de obra:

REPARACIONES LOCATIVAS EDIFICIO CONVENCIONES PISO 4
REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CNA PISO 2 -
ACTIVIDADES SUSPENDIDAS POR DEFINICION DE ALCANCE
REPARACIONES LOCATIVAS EDIFICIO CONVENCIONES PISO 4- PENDIENTE POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE DE LA DEFINICION DEL ALCANCE EN LO QUE REFIERE AL CABLEADO ESTRUCTURADO
Se evidencia los siguientes avances:
Avance programado: 84.60 %
Avance ejecutado: 84.22 %

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

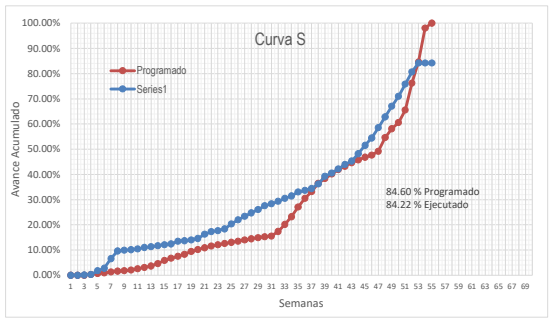

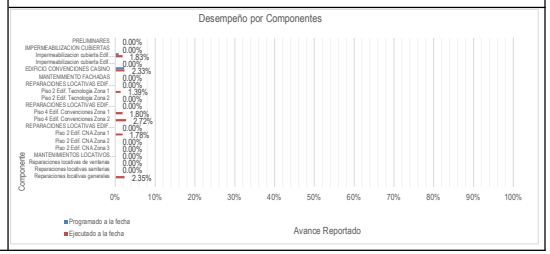

INFORME SEMANAL DE OBRA

FONDO NACIONAL DEL AHORRO FINA

INFORME SEMANAL DE OBRA No. 53

Entidad Contratante: **Fondo Nacional Del ahorro** Semana del **6/03/2026** al **12/03/2026** Fecha **12/03/2026**

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LINEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

Se realizo ajuste a la programación teniendo encuentra que :


Las actividades de convenciones cuarto piso se continua con el proceso de actividades de acabados de acuerdo a item generados contractualmente por la entidad y tramitados bajo acta de actividades no contemplados.

Se trabaja proyecto con balance de obra basado en ACTA DE FIJACION DE PRECIOS No. 8 en base a las actividades NO CONTEMPLADAS que han surgido y que han requerido gestionar APU debido a que se requieren para garantizar funcionabilidad de las areas intervenidas, generando que se realice ajuste de la bolsa de actividades NO CONTEMPLADAS dejando actividades pendientes por ejecutar hasta tanto no se defina un alcance de ejecucciony por ende una adicion presupuestal al contrato.
Se continuan suspendedidas actividades en el area de intervencion del EDIFICIO CNA PISO 2 toda vez que en atencion a solicitud de la interventoria se debia realizar diagnostico a la estuctura metalica de la cubierta debido al estado evidenciado, teniendo en cuenta lo anterior se debe definir alcance de la intervencion, esto generara solicitud de prorroga modificacion de programacion y dependiendo de alcance un ajuste al presupuesto de obra.
Esto ha generado que se requiera un ajuste a la programación y dependiendo de que se se defina un alcance de ejecucciony por ende una adicion presupuestal se requiera una prorroga al contrato

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado		Desviación	Semáforo
	%		%	
Acumulado Anterior	76.28%	80.72%	4.44%	
Durante el Periodo	8.33%	3.50%	-4.83%	
Acumulado a la Fecha	**84.60%**	**84.22%**	**-0.39%**	

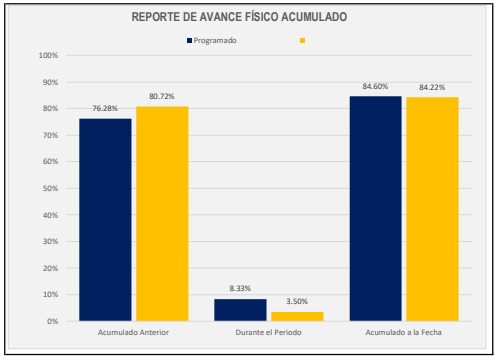


AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 5,142,932,606.00	$ 5,142,932,606.00		$ -	$ -	$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
1	$ 3,362,488,187.05	65.38%	0	$ 2,343,033,514.05	45.56%	0/01/1900	$ -

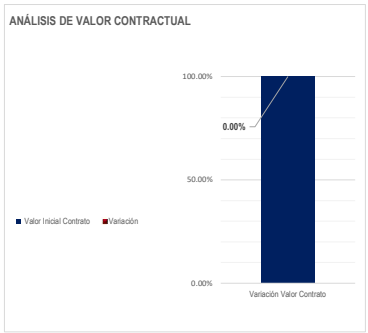





INFORME SEMANAL DE OBRA

FONDO NACIONAL DEL AHORRO FINA

INFORME SEMANAL DE OBRA No. 53

Entidad Contratante: **Fondo Nacional Del ahorro** Semana del **6/03/2026** al **12/03/2026** Fecha **12/03/2026**

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

- El 10 de Marzo del 2026 se realizo comité de obra semanal validar acta

REPARACIONES LOCATIVAS CUARTO PISO - EDIFICIO CONVENCIONES
- Tapado con lamina de dry wall
- Lijado de cielo raso
- Tapado de muros divisorios
- Instalacion de lineal en super board
- Instalacion de vidrios laminados divisorios entre oficinas junto con lamina frosted
- Instalacion de muebletipo tarima de acuerdo a diseño suministrado
- Perforacion de cielo raso para instalacion de luminaria, incluye instalacion de marco y reforzado del mismo
- Instalacion de luminaria y prueba de la misma

REPARACIONES EDIFICIO CNA - PISO 2
- Actividades suspendidas

REPARACIONES LOCATIVAS BAÑOS - EDIFICIO TECNOLOGIA PISO 1
- Entrega de area ejecutada en su totalidad se entregan las respectivas llaves y de puertas en madera, se atienden observaciones para recibo a satisfaccion

Nos encontramos en tramite de aprobación de actividades no previstas que han surgido de acuerdo a la intervención general que se esta llevando acabo en las instalaciones del fondo nacional del ahorro.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

1. Para la siguiente semana, se tiene previsto continuar con las actividades previas al inicio del contrato como lo son validación de cantidades para balance de obra y la validación con la entidad de áreas a intervenir.
2. Convenciones cuarto piso avance en cielo raso y detallado de muros

6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	1
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	941	0	941	100.0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0.0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0.0%
4	Operativos	0	0	0	0.0%
5	Accidentes	0	0	0	0.0%
6	Administrativos	0	0	0	0.0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0.0%
8	Interesados	0	0	0	0.0%
9	Otros. Cuál?			0	0.0%
	Total	**941**	**0**	**941**	**100.00%**



OBSERVACIONES

INFORME SEMANAL DE OBRA

FONDO NACIONAL DEL AHORRO FINA

INFORME SEMANAL DE OBRA No. 53

Entidad Contratante: **Fondo Nacional Del ahorro** Semana del **6/03/2026** al **12/03/2026** Fecha **12/03/2026**

7. PERSONAL MATERIALES Y EQUIPOS PROYECTO

	Contratista de Obra	TOTAL
Personal Directo	5	5
Personal Operativo	17	17
Menores de 28 años	0	0
Total Mujeres	0	0
Mujeres Cabeza de Hogar	0	0
TOTAL PERSONAL	22	

OBSERVACIONES

MATERIALES	Cantidad	Programado	En sitio	EQUIPOS	Cantidad	Programado	En sitio
Piso laminado	1343	345	1343	CONTAINER TIPO CAMPAMENTO	2	SI	SI
vidrio templado 8 mm para divisiones de oficina	99.2	0	99.2	BAÑO PORTÁTIL	1	SI	SI
estructura para microondas con módulos de 0,71 m de largo 0,56 m de profundo y 0,40 m de alto	11	12	11	HERRAMIENTA MENOR		SI	SI
estructura decorativa para plantas colgantes de 6,85 m ancho x 1,00 m de profundo con viguetas cada 0,76 m en tubería metálica cuadrada 50 x 50 x 2.0 mm	1	1	1	TALADRO	2	SI	SI
Mortero premezclado de nivelación bombeable, acelerado a 7 días con baja permeabilidad	14	14	14	DEMOLEDOR ELÉCTRICO	3	SI	SI
válvula antivandálica de empotrar tipo pusch para sanitarios institucionales de consumo de agua 4.85 lpf (1.28 gpf)	10	10	10	MEZCLADORA D MORTERO	1	SI	SI
Grifería para lavamanos de empotrar a muro tipo pusch aplicación institucional de consumo 0,4 - 1.9 litros	8	8	8	REACTOR QUIMICO	1	SI	SI
Divisiones de baño en acero inoxidable por ambas caras calibre 22, aleación 304 acabado satinado	60	60	60	COMPRESOR	1	SI	SI

8. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
Modificatorio para ajuste de valor de actividades NO CONTEMPLADAS (APROBADO)	Gestión entre la entidad interventoría y contratista para generar documento	Documento que permita ajustar alcance presupuestal	Entidad/interventoría/contratista		
Pendientes diseños de diferentes especialidades tales como redes eléctricas bajo normativa RETIE Y	Gestión de la entidad	Planos y memorias de calculo	Entidad		
Alcance de ejecución actividades de cableado estructurado, red regulada y red normal para puestos	Gestión de la entidad	Presupuesto de ejecución (departamento de TI)	Entidad		

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**INFORME SEMANAL DE OBRA** **FONDO NACIONAL DEL AHORRO FINA**	INGEBYP NIT. 830.121.507-2

INFORME SEMANAL DE OBRA No. 53

Entidad Contratante: **Fondo Nacional Del ahorro** Semana del **6/03/2026** al **12/03/2026** Fecha **12/03/2026**

9. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA






EDIFICIO CONVENCIONES - CUARTO PISO





EDIFICIO CONVENCIONES - CUARTO PISO





EDIFICIO CONVENCIONES - CUARTO PISO





EDIFICIO CONVENCIONES - CUARTO PISO

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	**Firma**
Nombre ING. RODOLFO ENRIQUE BARRETO VARGAS COORDINADOR DE OBRA INGEBYP SAS	Nombre ING. YILBER YANIN VARGAS ORTIZ RESIDENTE DE OBRA INGEBYP SAS

INFORME SEMANAL DE OBRA

FONDO NACIONAL DEL AHORRO FINA

INFORME SEMANAL DE OBRA No. 54

Entidad Contratante: **Fondo Nacional Del ahorro** Semana del **13/03/2026** al **19/03/2026** Fecha **19/03/2026**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

NUMERO DE CONTRATO	FNA-166-2024
OBJETO DEL PROYECTO	"REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Localidad (16) de Puente Aranda, Carrera 65 No 11-83
ÁREA A CARGO DE LA SED	INFRAESTRUCTURA
INTERVENTORIA	Consultores, Desarrollo y Ambiente S.A.S. BIC — **NIT**
SUPERVISOR	Dr. VANESA PACHECO GOMEZ — **APOYO A LA SUPERVISION** ING. JAIME HERNANDO PRIETO ALVAREZ
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.			FNA-166-2024
Contratista			INGEBYP S.A.S
Valor inicial	$		5,142,932,606.00
Valor actual	$		5,142,932,606.00
Variación del valor	$		-
Fecha de Inicio			7/3/2025
Plazo inicial (Días)			365 Días
Plazo actual (Días)	365 Días		100.00%
Variación en plazo			Días
Fecha Contractual de terminación			7/03/2026
Tiempo Transcurrido (días)	377 Días		103.29%
Días remanentes del Contrato	-12 Días		-3.29%
Acumulado a última acta pagada	$		2,343,033,514.05
Estimado ejecutado por llevar a acta	$		-

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 5,142,932,606.00

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 4,351,165,349.92	84.60%	$ 4,331,248,205.11	84.22%	-$ 19,917,144.81	-0.39%
Durante el Periodo	$ 392,495,907.92	7.63%	$ 220,000,000.00	4.28%	-$ 172,495,907.92	-3.35%
Acumulado a la Fecha	**$ 4,743,661,257.84**	**92.24%**	**$ 4,551,248,205.11**	**88.50%**	-$ 192,413,052.73	**-3.74%**

Desviación en días





Observaciones al desempeño del proyecto

Durante la presente semana, se encuentra adelantado actividades de acuerdo con las reparaciones locativas generales en los siguientes frentes de obra:

REPARACIONES LOCATIVAS EDIFICIO CONVENCIONES PISO 4
REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CNA PISO 2 - ACTIVIDADES SUSPENDIDAS POR DEFINICION DE ALCANCE
REPARACIONES LOCATIVAS EDIFICIO CONVENCIONES PISO 4- PENDIENTE POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE DE LA DEFINICION DEL ALCANCE EN LO QUE REFIERE AL CABLEADO ESTRUCTURADO
Se evidencia los siguientes avances:
Avance programado: 92.24 %
Avance ejecutado: 88.50 %

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

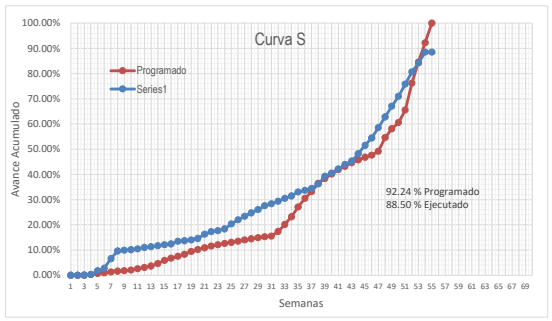

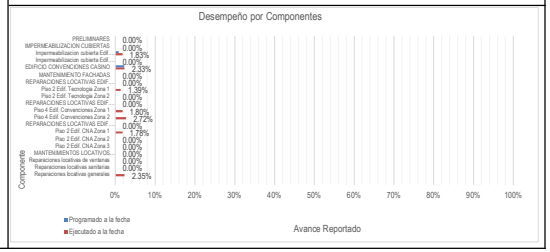

INFORME SEMANAL DE OBRA

FONDO NACIONAL DEL AHORRO FINA

INFORME SEMANAL DE OBRA No. 54

Entidad Contratante: **Fondo Nacional Del ahorro** Semana del **13/03/2026** al **19/03/2026** Fecha **19/03/2026**

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LINEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

Se realizo ajuste a la programación teniendo encuentra que :


Las actividades de convenciones cuarto piso se continua con el proceso de actividades de acabados de acuerdo a item generados contractualmente por la entidad y tramitados bajo acta de actividades no contemplados.

Se trabaja proyecto con balance de obra basado en ACTA DE FIJACION DE PRECIOS No. 8 en base a las actividades NO CONTEMPLADAS que han surgido y que han requerido gestionar APU debido a que se requieren para garantizar funcionabilidad de las areas intervenidas, generando que se realice ajuste de la bolsa de actividades NO CONTEMPLADAS dejando actividades pendientes por ejecutar hasta tanto no se defina un alcance de ejecucciony por ende una adicion presupuestal al contrato.
Se continuan suspendedidas actividades en el area de intervencion del EDIFICIO CNA PISO 2 toda vez que en atencion a solicitud de la interventoria se debia realizar diagnostico a la estuctura metalica de la cubierta debido al estado evidenciado, teniendo en cuenta lo anterior se debe definir alcance de la intervencion, esto generara solicitud de prorroga modificacion de programacion y dependiendo de alcance un ajuste al presupuesto de obra.
Esto ha generado que se requiera un ajuste a la programación y dependiendo de que se se defina un alcance de ejecucciony por ende una adicion presupuestal se requiera una prorroga al contrato

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado		Desviación	Semáforo
	%		%	
Acumulado Anterior	84.60%	84.22%	-0.39%	
Durante el Periodo	7.63%	4.28%	-3.35%	
Acumulado a la Fecha	**92.24%**	**88.50%**	**-3.74%**	

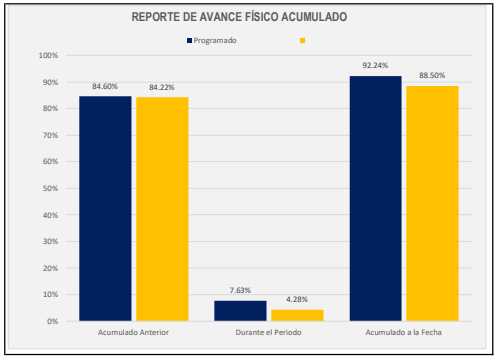


AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 5,142,932,606.00	$ 5,142,932,606.00		$ -	$ -	$ -

Valor Pagos tramitados			Valor Pagos realizados				
No. Pagos tramitados	Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
1	$ 3,362,488,187.05	65.38%	0	$ 2,343,033,514.05	45.56%	0/01/1900	$ -

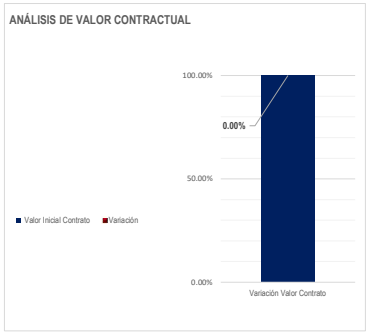





INFORME SEMANAL DE OBRA

FONDO NACIONAL DEL AHORRO FINA

INFORME SEMANAL DE OBRA No. 54

Entidad Contratante: **Fondo Nacional Del ahorro** Semana del **13/03/2026** al **19/03/2026** Fecha **19/03/2026**

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

- El 17 de Marzo del 2026 se realizo comité de obra semanal validar acta

REPARACIONES LOCATIVAS CUARTO PISO - EDIFICIO CONVENCIONES

- Aplicacion de pintura en detallado de espacios pendientes
- Instalacion de vidrios laminados divisorios entre oficinas junto con lamina frosted
- Instalacion de mueble tipo tarima de acuerdo a diseño suministrado
- Instalacion de luminaria y prueba de la misma

-pendiente la definicion de alcance por parte de la entidad en lo que refiere a la ejecuccion de actividades de cableado estructurado para lo cual se tramitara acta de fijacion de precios No. 9

REPARACIONES EDIFICIO CNA - PISO 2

- Actividades suspendidas

Nos encontramos en tramite de aprobación de actividades no previstas que han surgido de acuerdo a la intervención general que se esta llevando acabo en las instalaciones del fondo nacional del ahorro.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

1. Para la siguiente semana, se tiene previsto continuar con las actividades previas al inicio del contrato como lo son validación de cantidades para balance de obra y la validación con la entidad de áreas a intervenir.
2. Se suspendera el contrato toda ves que se tiene pendiente la definicion del alcance de las actividades referidas a cableeado estructurado lo que garantiza la fncionabilidad de total del piso, para lo cual se tramitara analisis dd precios unitarios de actividades de acuerdo a las especificacioness suministradas por la entidad contratante y por ende se tramitara el acta de fijacion de precios No. 9

6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	1
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	941	0	941	100.0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0.0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0.0%
4	Operativos	0	0	0	0.0%
5	Accidentes	0	0	0	0.0%
6	Administrativos	0	0	0	0.0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0.0%
8	Interesados	0	0	0	0.0%
9	Otros. Cuál?			0	0.0%
	Total	**941**	**0**	**941**	**100.00%**



OBSERVACIONES

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**INFORME SEMANAL DE OBRA** **FONDO NACIONAL DEL AHORRO FINA**	INGEB/P NIT. 830.121.507-2

INFORME SEMANAL DE OBRA No. 54

Entidad Contratante: **Fondo Nacional Del ahorro** Semana del **13/03/2026** al **19/03/2026** Fecha **19/03/2026**

7. PERSONAL MATERIALES Y EQUIPOS PROYECTO

	Contratista de Obra	TOTAL
Personal Directo	5	5
Personal Operativo	17	17
Menores de 28 años	0	0
Total Mujeres	0	0
Mujeres Cabeza de Hogar	0	0
TOTAL PERSONAL	22	

OBSERVACIONES

MATERIALES	Cantidad	Programado	En sitio	EQUIPOS	Cantidad	Programado	En sitio
Piso laminado	1343	345	1343	CONTAINER TIPO CAMPAMENTO	2	SI	SI
vidrio templado 8 mm para divisiones de oficina	99.2	0	99.2	BAÑO PORTÁTIL	1	SI	SI
estructura para microondas con módulos de 0,71 m de largo 0,56 m de profundo y 0,40 m de alto	11	12	11	HERRAMIENTA MENOR		SI	SI
estructura decorativa para plantas colgantes de 6,85 m ancho x 1,00 m de profundo con viguetas cada 0,76 m en tubería metálica cuadrada 50 x 50 x 2.0 mm	1	1	1	TALADRO	2	SI	SI
Mortero premezclado de nivelación bombeable, acelerado a 7 días con baja permeabilidad	14	14	14	DEMOLEDOR ELÉCTRICO	3	SI	SI
válvula antivandálica de empotrar tipo pusch para sanitarios institucionales de consumo de agua 4.85 lpf (1.28 gpf)	10	10	10	MEZCLADORA D MORTERO	1	SI	SI
Grifería para lavamanos de empotrar a muro tipo pusch aplicación institucional de consumo 0,4 - 1.9 litros	8	8	8	REACTOR QUIMICO	1	SI	SI
Divisiones de baño en acero inoxidable por ambas caras calibre 22, aleación 304 acabado satinado	60	60	60	COMPRESOR	1	SI	SI

8. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
Modificatorio para ajuste de valor de actividades NO CONTEMPLADAS (APROBADO)	Gestión entre la entidad interventoría y contratista para generar documento	Documento que permita ajustar alcance presupuestal	Entidad/interventoría/contratista		
Pendientes diseños de diferentes especialidades tales como redes eléctricas bajo normativa RETIE Y	Gestión de la entidad	Planos y memorias de calculo	Entidad		
Alcance de ejecución actividades de cableado estructurado, red regulada y red normal para puestos	Gestión de la entidad	Presupuesto de ejecución (departamento de TI)	Entidad		

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**INFORME SEMANAL DE OBRA** **FONDO NACIONAL DEL AHORRO FINA**	INGEBYP NIT. 830.121.507-2

INFORME SEMANAL DE OBRA No. 54

Entidad Contratante: **Fondo Nacional Del ahorro** Semana del **13/03/2026** al **19/03/2026** Fecha **19/03/2026**

9. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA





EDIFICIO CONVENCIONES - CUARTO PISO





EDIFICIO CONVENCIONES - CUARTO PISO





EDIFICIO CONVENCIONES - CUARTO PISO








EDIFICIO CONVENCIONES - CUARTO PISO

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	**Firma**
Nombre ING. RODOLFO ENRIQUE BARRETO VARGAS COORDINADOR DE OBRA INGEBYP SAS	Nombre ING. YULBER YANITH VARGAS ORTIZ RESIDENTE DE OBRA INGEBYP SAS

ACTA DE VECINDAD

FECHA			
18	AGOSTO	2025	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº FNA-100 2024 - OBJETO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."
Entidad contratante:			FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA — Entidad Interventora: CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S - BIODECCO SAS
Entidad ejecutora de la Obra:			INGEBYP S.A.S

INVENTARIO EDIFICIO DE CONVENCIONES CUARTO PISO COSTADO NORTE

ITEM	TIPO	PUESTOS DE TRABAJO / TIPO	MOBILIARIO								APARATOS							ELECTRICO																							OBSERVACIONES
1	VER PLANO ADJUNTO	ESCRITORIO EN L MADERA M 1.50 X 1.50 M	3	7	1			1		1			1	1				1	1	1	1		1		1	1	1				1				1						2 UNIFORMADOS
		MESA DE MADERA CIRCULAR DE D= 1.20 M	1																																					
2	VER PLANO ADJUNTO	ESCRITORIO EN L	3	3	1						1		1					1	1	1	1	1			1						2										
		MESA DE MADERA DE 70X80	3																																					
3	VER PLANO ADJUNTO	ESCRITORIO EN L	3	3	1											1			1		1			1			1													
		MESA DE MADERA DE 70X80	3																																					
		PUNTO ECOLOGICO	3																																					
		PUFF	3																																					
4	VER PLANO ADJUNTO	ESCRITORIO EN L	3	3	1					1			1	1				1		1		1			1						1									
		MESA REDONDA D= 80 CM	3																																					
5	VER PLANO ADJUNTO	ESCRITORIO EN L	3	3	1			1			1							1		1		1			1						1									
		MESA REDONDA D= 80 CM	3																																					
6	VER PLANO ADJUNTO	ESCRITORIO EN L	1		1																																			
7	VER PLANO ADJUNTO	ESCRITORIO EN L	1		1																																			
8	VER PLANO ADJUNTO																1	1		1		1			1	1														
															1																										
9	VER PLANO ADJUNTO	ESCRITORIO EN L	3	3	3					3			1					1		1		1			1						1									
10	VER PLANO ADJUNTO	ESCRITORIO EN L	3	3	1					1			1					1		1	1	1			1						1	1								
11	VER PLANO ADJUNTO	ESCRITORIO EN L	3	3	3													1		1		1			1															
12	VER PLANO ADJUNTO	ESCRITORIO LINEAL	2	2	2					2				1				10		10		10		2	2	4					2									
13	VER PLANO ADJUNTO	ESCRITORIO LINEAL	2		2	2				2								7		6		6		2		4					4	4							
14	VER PLANO ADJUNTO	ESCRITORIO LINEAL	2		1	1		1		1	2							2		2		2				1													
15	VER PLANO ADJUNTO	ESCRITORIO EN L	2		1			1		1			1					1		1						1													LUMINARIA ESPECIAL DE 60X60
		MESA REDONDA D= 80 CM	2																																				
16	VER PLANO ADJUNTO	ESCRITORIO EN L	2		1	2												1		1		1			1														
17	VER PLANO ADJUNTO	MESA REDONDA D= 80 CM SEMIRONDA	3	3						2								4		6		2			2	1					1								LUMINARIA 24 W NO SIRVE
18	VER PLANO ADJUNTO	ESCRITORIO EN L	3	3	1		1									1			1		1																		
		MESA Cuadrada de 1M	1																																					
		PUNTO ECOLOGICO	1																																					
19	VER PLANO ADJUNTO	ESCRITORIO LINEAL	6	4	6		6		2				2					1	6		6		6				6												
20	VER PLANO ADJUNTO	ESCRITORIO LINEAL	4	3	4														4		4		4	4	3						3	3	3						
21	VER PLANO ADJUNTO	ESCRITORIO EN L	4		4	4													4		4		4		4														
22	VER PLANO ADJUNTO	ESCRITORIO LINEAL	10	8	10	8		1		1							1		10		10		10		9	1	2					2							
23	VER PLANO ADJUNTO	PUNTO ECOLOGICO	1															1		1		2		2		2					1								
		SUMATORIA	75	68	64	28	2	6	2	28	3	6	3	1	1	2	3	33	48	33	48	33	45	32	38	8	48	1	4	2	1	1	2	32	4		

OBSERVACIONES GENERALES

LA LUMINARIA QUE SE ENCUENTRA EN EL SITIO NO PRESENTA UNIFORMIDAD DE LOS LUMENES DE ILUMINACION NI EN EL TONO DE LUZ QUE EMITE LA LAMPARA
LOS APARATOS ELECTRONICOS NO SE VALIDA FUNCIONAMIENTO
SE EVIDENCIA ENSERES DE PAPELERIA QUE NO FUERON RETIRADOS EN SU MOMENTO Y QUE FUE SOLICITADO SU RETIRO PERO NO FUE ATENDIDO Y QUE NO SERA RESPONSABILIDAD DE INGEBYP SU DISPOSICION FINAL

ING. SERGIO DAVID	ING. JOHAN [illegible]	ING. JORGE [illegible]
RESIDENTE DE OBRA	INTERVENTORIA	JEFE SUPERVISOR

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

FECHA			DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - RECEPCIÓN PORTERIA
14	ABRIL	2025	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FNA-166-2024 - OBJETO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."
ACTA No.:	2		

Entidad contratante: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA
Entidad Interventora CONSULTORES, DESARROLLOY AMBIENTE S.A.S - BIODECCO SAS
Entidad ejecutora de la Obra: INGEBYP S.A.S
Localidad: PUENTE ARANDA Barrio:

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: FONDO NACIONAL DEL AHORRO . FNA
Tenencia: Propietario __X Arrendatario _____ Poseedor ____ Otro Cual?____
Nombre del Propietario FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA
Dirección CARRERFA 65 No. 11-83
Teléfono No. de pisos UNO (1)
Long. del frente (mts) FACHADA PRINCIPAL ACCESO EN 13,90M APROX

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas		NO	
6. Televisión cable	X		
7, Otros			Cuál? CAMARAS

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI	NO
2. Comercial	X	6. Baldio	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	Cuál?_____		comercio SI ☐	NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas circuares y vigas de concreto	GRIETAS Y FISURAS: No presenta fisuramientos
MUROS: muros internos en bloque de arcilla pañetados, estucados y pintados. muros de fachada parcial en ladrillo a la vista y un volumen envolvente enchapado en piedra muñeca.	HUMEDADES: filtraciones por cubierta de policarbonato en esquina sur occidental del vacio, en cubierta de vidrio por flanche superior, ventana sur contra el casino en los rincones de la alfagia.
CUBIERTA: Placa plana impermeabilizada con manto asfaltico recubierto con foil de aluminio. En vacios presenta cubierta tipo marquesina en vidrio al costado oriental y cubierta curva en policarbonato hacia el interior del proyecto.	HUNDIMIENTO PISO: En terraza de acceso desde el interior del proyecto el adoquin presenta empozamientos.
PISOS: ceramico 60x60	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
FACHADA: Muros enchapados en piedra y muros en ladrillo a la vista, columnas circulares en granito lavado, ventaneria en aluminio y vidrio.	OTRO:_Cuál?

4. ANEXOS

Fotografias (archivo fotografico o filmico) Se realiza registro de video y registro fotografico

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

FECHA			DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - RECEPCIÓN PORTERIA
14	ABRIL	2025	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FNA-166-2024 - OBJETO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."
ACTA No.:	2		

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")
Se realiza registro fotografico desde el acceso principal a la edificación presenta desprendimiento de baldosas de piso laterales en la entrada, mocheta sur de ladrillo en acceso principal se encuentra fogueada de pintura de la reja, tambien presenta imperfeccion en la junta con el alero de granito lavado, de igual forma la junta del alero de la porteria contra el muro de piedra esta mal rematado. falta tapa o aparato electrico en el mismo muro de piedra. los muros de ladrillo a la vista requieren de mantenimiento.
La terraza de acceso desde el interior del proyecto presenta deterioro normal por el tiempo, el adoquin de ladrillo evidencia áreas donde se ha perdido el emboquillado, presenta una regata de tubo mal resanada y tubo a la vista parcialmente, deterioro de piso perimetralmente a sumidero, este sumidero se encuentra taponado. se encuentra un vidrio roto en montante de la puerta de acceso.
El piso interior ceramico presenta algunas baldosas desportilladas en los sitios de cajas y zona donde van los controles de acceso individual del personal regateado y mal resanado, presencia de perforaciones para chazos que al parecer no se utilizaron.
Muros interiores estucados y pintados, no manifiestan fisuras, requieren de mantenimiento normal de pintura.
Los muros de fachada Tanto los de ladrillo a la vista y los de piedra muñeca se encuentran con suciedad normal por el clima y el tiempo, requieren de mantenimiento como reemboquillado, lavado e hidrofugado. La pintura exterior se encuentra en buen estado.
Las ventanas de aluminio se encuentran en terminos generales en buen estado, en puerta de la plazoleta interior hay un vidrio roto en el montante. Ventana sur contra Casino presenta filtración de agua en los rincones de la alfagia.
Los cielo rasos de Drywall descolgados en el area central se encuentran en buen estado, el descolgado de la barra de atención presenta remiendo como una caja de inspección mal elaborada.
Se encuentra un nicho de tableros electricos, breakers, mal organizado y cables que llegan por fuera desde la terraza.
Cubierta curva de policarbonato esta percudida y presenta filtraciones de agua por el rincon sur del vacio, la marquesina en vidrio refleja rastros de filtraciones por el costado sur y su flanche esta incompleto, la impermeabilización en manto asfaltico de la placa plana de cubierta refleja un area colindante a la cubierta curva con colchon de agua y se encuentra uana punta levantada.
El cuarto de rack se encuentra en funcionamiento, los equipos no se ven organizados y existe rollos de cable sobrantes sobre los equipos.

FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor	Firma Coordinador de obra	Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre: Edgar Enrique Espitia	Nombre: Ing. Rodolfo Barreto Vargas	Nombre: Ing. Jose Cres Nope A.
C.C. O NIT		

ACTA DE VECINDAD

FECHA			DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - RECEPCIÓN PORTERIA
14	ABRIL	2025	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FNA-166-2024 - OBJETO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."
ACTA No.:	2		













FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor:
Nombre: Edgar Enrique Espitia
C.C. O NIT

Firma Coordinador de obra:
Nombre: Ing. Rodolfo Barreto Vargas

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre: Ing. Jose Luis Najera

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO

ACTA DE VECINDAD

INGEBRP

FECHA			DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - RECEPCIÓN PORTERIA
14	ABRIL	2025	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FNA-166-2024 - OBJETO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."
ACTA No.:	2		









FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor
Nombre
C.C. O NIT

Firma Coordinador de Obra
Nombre: Ing. Rodolfo Barreto Vargas

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Ing. Jose (ec) Mope R.

ACTA DE VECINDAD

FECHA			DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - RECEPCIÓN PORTERIA
14	ABRIL	2025	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FNA-166-2024 - OBJETO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."
ACTA No.:	2		













FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor	Firma Coordinador de obra	Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre: Edgar Enrique Espitia	Nombre: Ing. Rodolfo Barreto Vargas	Nombre: Ing. Jose Luis Vega Arevalo
C.C. O NIT		

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

FECHA			DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - CONVENCIONES CNA PISO 4 - ZONA SUR
2	Abril	2025	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FNA-166-2024 - OBJETO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."
DD	MM	AA	
ACTA No.:			

Entidad contratante: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA
Entidad Interventora CONSULTORES, DESARROLLOY AMBIENTE S.A.S - BIODECCO SAS
Entidad ejecutora de la Obra: INGEBYP S.A.S
Localidad: PUENTE ARANDA **Barrio:**

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: FONDO NACIONAL DEL AHORRO . FNA
Tenencia: Propietario __X Arrendatario ____ Poseedor____ Otro Cual?____
Nombre del Propietario FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA
Dirección CARRERFA 65 No. 11-83
Teléfono No. de pisos CUATRO (4)
Long. del frente (mts) FACHADA AREA SUR 22,20 M APROX - CUARTO PISO

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas		NO	
6. Televisión cable		NO	
7. Otros			Cuál?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI	NO
2. Comercial	X	6. Baldío	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	Cuál?_____		comercio SI ☐	NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Edificio aporticado, columnas (Encajonadas con super board), vigas y viguetas de concreto	GRIETAS Y FISURAS: presencia de fisura en muro en hall acceso entre ventana y baño de mujeres.
MUROS: muros internos divisorios en dry wall con secciones piso - techo en vidrio templado	HUMEDADES: Presenta multiples filtraciones desde la placa de cubierta
CUBIERTA: Cubierta en placa plana aligerada con casetones retirados (impermeabilizada con membrana PVC y sectores con manto asfaltico)	HUNDIMIENTO PISO: no presenta
PISOS: Hall ascensor en granito pulido dilatado con varillas de bronce. Area deoficinas Zona sur piso vinilico en tabletas	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
FACHADA: fachada Flotante del Edificio en vidrio y paneles de aluminio alucobon. Fachadas internas areas de servicios muros terminados en estuco y pintura.	OTRO: _Cuál?

4. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico) Se realiza registro de video y registro fotografico

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

FECHA		
2	Abril	2025
DD	MM	AA
ACTA No.:		

DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - CONVENCIONES CNA PISO 4 - ZONA SUR

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FNA-166-2024 - OBJETO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")
Se realiza registro desde el Hall de acceso (ascensor) hacia el interior del Area de oficinas zona sur: Se evidencio que el acabado de piso en granito se encuentra porociado por deterioro normal a trves del tiempo. La platina de la Bisagra hidraulica en la puerta de acceso al area sur se encuentra doblada.
El piso interior del Area de Oficinas de baldosa 30x30 de caucho tipo vinilico esta en 2 colores , se encuentra en terminos generales en buen estado de conservación. Presenta deterioro en juntas contra otros tipos de pisos, manchas como de oxido en las huellas de las divisiones de oficina, deterioro en algunas cajas de salidas de tomas electricas.
Los muros internos en general presentan deterioro normal por el tiempo y por falta de mantenimiento, muros sucios, filos desportillados en zona de cocineta.
El Area de oficinas presenta dos tipos de cielo raso: Algunos diseños curvos en drywall y la mayor parte en fibra mineral, presentan deterioro normal por el tiempo, deterioro en alto grado donde se presentan las filtraciones de agua desde la cubierta.
El Sistema de divisiones de oficina modular se encuentra en regular estado, la tela azul de acabado de estos paneles esta percudida, algunos paneles estan desajustados, las tapas de las canaletas de las instalaciones electricas se encuentran desprendidas, algunas estan desplomadas. Algunos puestos de trabajo no estan completos con archivador colgante y repisas.
Las divisiones de oficina que van en vidrio estan en buen estado, Algunas puertas de intercomunicación de oficinas estan descolgadas y rozan con el piso.
Los basculantes de la ventaneria de fachada se encuentran desajustados y muchos no cierran, algunos basculantes le falta la manija, hay un basculante que no es de ese sistema.
En baño de mujeres faltan escudos en las griferias de sanitarios, falta dos griferias de lavamanos, las puertas de las divisiones de baños falta cerrojos y hay una puerta golpeada en la parte superior. igualmente en el baño de hombres faltan escudos en las griferias de los sanitarios, cerrojos de las puertas de acero de las divisiones de baños estan incompletos.
Las puertas de acceso de los baños en madecor se encuentran deterioradas por falta de canto rigido, madera podrida por humedad en la parte inferior de estas
En el baño de mujeres faltan 2 griferias de lavamanos, faltan seguros de cerrojos en puertas de división de baños, faltan escudos de griferias de sanitarios, una puerta de sanitario se encuentra abollada en la parte superior. De igual forma en el baño de hombres falta escudo de griferia de sanitario, cerrojos de divisiones incompletos, puerta acceso podrida por humedad.
Las luminarias cuadradas de 60x60 aunque funcionancasi todas menos 2 un , la iluminación no es pareja algunas luminarias iluminan con menos intensidad.

FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor
Nombre:
C.C. O NIT
Edgar Enrique Espitia

Firma Coordinador de obra
Nombre: Ing. Rafael Barreto Vargas

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Ing. Jose Luis Mejia A.

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

FECHA		
2	Abril	2025
DD	MM	AA
ACTA No.:		

DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - CONVENCIONES CNA PISO 4 - ZONA SUR

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FNA-166-2024 - OBJETO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."













FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor
Nombre: Edgar Enrique Espitia
C.C. O NIT

Firma Coordinador de obra
Nombre: Ing. Rodolfo Barreto Vargas

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre Ing. Jose Luis Mope A.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

FECHA		
2	Abril	2025
DD	MM	AA
ACTA No.:		

DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - CONVENCIONES CNA PISO 4 - ZONA SUR

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FNA-166-2024 - OBJETO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."















FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor
Nombre:
C.C. O NIT

Firma Coordinador de obra
Nombre: Ing. Rodolfo Barreto Vargas

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre Ing. Jose Luis Lopez A

ACTA DE VECINDAD

FECHA			DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - RECEPCIÓN PORTERIA
19	AGOSTO	2025	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA N° FNA-166-2024 - OBJETO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."
ACTA No.:	2		

Entidad contratante: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA
Entidad Interventora CONSULTORES, DESARROLLOY AMBIENTE S.A.S - BIODECCO SAS
Entidad ejecutora de la Obra: INGEBYP S.A.S
Localidad: PUENTE ARANDA Barrio:

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: FONDO NACIONAL DEL AHORRO . FNA
Tenencia: Propietario __X Arrendatario _____ Poseedor ____ Otro Cual?____
Nombre del Propietario FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA
Dirección CARRERA 65 No. 11-83
Teléfono No. de pisos Cuatro (4)
Long. del frente (mts) FACHADA PRINCIPAL 44.69 M - LATERAL 25.08 M

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		No todos los servicios publicos estan en le piso que se va a intervenir
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6, Televisión cable	X		
7, Otros			Cuál? CAMARAS

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI	NO
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐	NO ☐
4. Institucional	X	Cuál? Bancario			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura aporticada Columnas rectangulares y placa aligerada

MUROS: muros internos en bloque de arcilla pañetados y pintados con deterioro de pintura, muros en dry wall y muros en vidrio templado

CUBIERTA: Placa plana en sistema aligerado en concreto con vigas, viguetas, riostras y torta superior, impermeabilizada con manto asfaltico recubierto con foil de aluminio.

PISOS: Piso tipo vinilo con dos oficina con un sobre piso en tipo laminado

FACHADA: Fachada en vidrio flotante con estructura en aluminio y ventanas basculantes de las cuales 14 elementos de estos presentan averias en sus bisagras y elementos de aseguramiento entre otros.

GRIETAS Y FISURAS: No presenta fisuramientos

HUMEDADES: filtraciones por cubierta de por placa en varias zonas incluyendo alrededor de sifones, generando afectaciones en el 30% del area aproximadamente y el cual a medida que se desmonte se validara este porcentaje y los m2 afectados

HUNDIMIENTO PISO: El piso tiene desniveles minimos los cuales no son perseptibles en su totalidad

DESPLAZAMIENTOS: No presenta

OTRO: Cuál?

4. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico) Se realiza registro de video y registro fotografico

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

FECHA			DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - RECEPCIÓN PORTERIA
19	AGOSTO	2025	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FNA-166-2024 - OBJETO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."
ACTA No.:	2		

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")
Se realiza registro fotografico desde el punto fijo donde se observa el deterioro normal de la edificacion por tema de uso en lo que refiere a pintura, muros divisorios y pisos existentes.
El area era utilizada como oficinas abiertas y unas sub oficinas construidas en vidrio y dry wall se encuentra instalado mobiliario y divisiones en metal madera forradas con paños
El piso interior tipo vinilo presenta desgaste de uso por desplazamiento de sillas y paso peatonal
Muros interiores estucados y pintados, no manifiestan fisuras, requieren de mantenimiento normal de resane y aplicación de pintura.
Los muros de fachada es flotante no se tiene prevista la intervencion de esta
Los cielo rasos en estructura de 60 x 60 con fibra mineral bastante deteriorada por temas de humedad y filtraciones se videncia falta de mantenimientos
De acuerdo al contrato se realizara desmonte de todos lo elementos relacionados y se evidenciara que otras actividades adicionales se requieran y que no estan contempladas dentro del mismo.
Se evidencia que algunas divisines fueron desmontadas por personal del FNA
Se encuentra dos oficinas gerenciales con piso laminado color cafe instalado sobre el piso vinilico existente
Ver cuadro adjunto de relacion de insumos encontrados en area

FIRMAS

INGEBYP S.A.S CONTRATISTA ING. RODOLFO BARRETO COORDINADOR DE OBRA	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S - BIODECCO SAS INTERVENTORIA ING. AGUSTIN MUÑOZ COORDINADOR INTERVENTORIA	ENTIDAD CONTRATANTE FONDO NACIONAL DEL AHORRO ING. JAIME PRIETO APOYO SUPERVISION CTO-FNA-022-2025

REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTA DE VECINDAD

FECHA			DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - RECEPCIÓN PORTERIA
19	AGOSTO	2025	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FNA-166-2024 - OBJETO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."
ACTA No.:	2		














FIRMAS

INGESYP S.A.S CONTRATISTA ING. RODOLFO BARRETO COORDINADOR DE OBRA	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S - BIODECCO SAS INTERVENTORIA ING. AGUSTIN MUÑOZ COORDINADOR INTERVENTORIA	ENTIDAD CONTRATANTE FONDO NACIONAL DEL AHORRO ING. JAIME PRIETO APOYO SUPERVISION

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

FECHA			DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - RECEPCIÓN PORTERIA
19	AGOSTO	2025	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FNA-166-2024 - OBJETO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."
ACTA No.:		2	

REGISTRO FOTOGRAFICO














FIRMAS

INGECYP S.A.S CONTRATISTA ING. RODOLFO BARRETO COORDINADOR DE OBRA	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S - BIODECCO SAS INTERVENTORIA ING. AGUSTIN MUÑOZ COORDINADOR INTERVENTORIA	ENTIDAD CONTRATANTE FONDO NACIONAL DEL AHORRO ING. JAIME PRIETO APOYO SUPERVISION

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

FECHA			DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - RECEPCIÓN PORTERIA
19	AGOSTO	2025	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FNA-166-2024 - OBJETO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."
ACTA No.:		2	

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMAS

INGEBYP S.A.S CONTRATISTA ING. RODOLFO BARRETO COORDINADOR DE OBRA	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S - BIODECCO SAS INTERVENTORIA ING. AGUSTIN MUÑOZ COORDINADOR INTERVENTORIA	ENTIDAD CONTRATANTE FONDO NACIONAL DEL AHORRO ING. JAIME PRIETO APOYO SUPERVISION


ACTA DE VECINDAD

FECHA			DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - RECEPCIÓN PORTERIA
19	AGOSTO	2025	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FNA-166-2024 - OBJETO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."
ACTA No.:	2		

REGISTRO FOTOGRAFICO














FIRMAS

INGEBYP S.A.S CONTRATISTA ING. RODOLFO BARRETO COORDINADOR DE OBRA	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S - BIODECCO SAS INTERVENTORIA ING. AGUSTIN MUÑOZ COORDINADOR INTERVENTORIA	ENTIDAD CONTRATANTE FONDO NACIONAL DEL AHORRO ING. JAIME PRIETO APOYO SUPERVISION

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO

ACTA DE VECINDAD

INGEBYP

FECHA		
19	AGOSTO	2025
ACTA No.:	2	

DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - RECEPCIÓN PORTERIA

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FNA-166-2024 - OBJETO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."

REGISTRO FOTOGRAFICO














FIRMAS

INGEBYP S.A.S CONTRATISTA ING. RODOLFO BARRETO COORDINADOR DE OBRA	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S - BIODECCO SAS INTERVENTORIA ING. AGUSTIN MUÑOZ COORDINADOR INTERVENTORIA	ENTIDAD CONTRATANTE FONDO NACIONAL DEL AHORRO ING. JAIME PRIETO APOYO SUPERVISION

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

FECHA			DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - RECEPCIÓN PORTERIA
19	AGOSTO	2025	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FNA-186-2024 - OBJETO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."
ACTA No.:	2		

REGISTRO FOTOGRAFICO














FIRMAS

INGEBYP S.A.S CONTRATISTA ING. RODOLFO BARRETO COORDINADOR DE OBRA	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S - BIODECCO SAS INTERVENTORIA ING. AGUSTIN MUÑOZ COORDINADOR INTERVENTORIA	ENTIDAD CONTRATANTE FONDO NACIONAL DEL AHORRO ING. JAIME PRIETO APOYO SUPERVISION

ACTA DE VECINDAD

DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - PUNTO DE ATENCION PRIMARIO Y BODEGA DE MARKETING

FECHA			
1	OCTUBRE	2025	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA N° FNA-166-2024 - OBJETO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."
DD	MM	AA	
ACTA No.:			

Entidad contratante: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA

Entidad Interventora: CONSULTORES, DESARROLLOY AMBIENTE S.A.S - BIODECCO SAS

Entidad ejecutora de la Obra: INGEBYP S.A.S

Localidad: PUENTE ARANDA

Barrio:

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: FONDO NACIONAL DEL AHORRO . FNA

Tenencia: Propietario __X Arrendatario _____ Poseedor _____ Otro Cual?_____

Nombre del Propietario: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA

Dirección: CARRERFA 65 No. 11-83

Teléfono: _____ No. de pisos: DOS (2)

Long. del frente (mts): FACHADA INTERNA 6,10M APROX

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		NO	
5. Gas		NO	
6. Televisión cable		NO	
7. Otros			Cuál?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI	NO
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI	☐ NO ☐
4. Institucional	X	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Se perciben unas columnas de concreto en el eje de fachada	GRIETAS Y FISURAS: En la bodega de papelería e insumos, los muros continuos a la matera externa presentan humedad, canaleta portacables presenta deterioro.
MUROS: La zona de la enfermería del CNA piso 1, estan construidos en mamposteria en ladrillo recocido de arcilla, los muros principales de la bodega contra el pasillo se encuentran en drywall, los muros internos del baño en la enfermería se encuentran en bloque.	HUMEDADES: En la bodega de papelería e insumos, los muros colindantes a la matera exterior presentan humedad y deterioro en la pintura.
CUBIERTA: Placa de entrepiso en concreto con tota superior afectada por ajustes en zona de baterías de baños realizada con anterioridad a la intervencion por parte de INGEBYP, se observa una serie de tuberías y redes las cuales no cumplen normatividad.	HUNDIMIENTO PISO: se presenta un desnivel en el piso en contrapendiente de la puerta de acceso, generando aposamientos en el fondo de la bodega
PUERTA: El acceso al punto de atencion primario se encuentra puerta en vidrio templado con alto deterior, en el caso de la bodega de marketing se encuentra puerta en madera con deterioro en la parte iferior por humedad	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
PISOS: Area Hall de llegada al piso 1 en granito, el hall de acceso a la enfermería en piso de enchape de baldosa.	OTRO:_Cuál?
FACHADA: los muros en drywall se encuentran pintados, en la Fachada interna del hall en pintura de esmalte	

4. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico): Se realiza registro de video y registro fotografico

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - PUNTO DE ATENCION PRIMARIO Y BODEGA DE MARKETING

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")
Se realiza registro desde el acceso a la edificación desde la zona de parqueadero: Se evidencio que el acabado de piso en granito de la rampa que accede al interior de la edificación esta fisurada en sentido norte sur.
El piso de baldosa 30x30 del hall de acceso a esta área, se encuentra inicialmente con tabletas mal reparadas con rastro o huellas de que hubo instalado algún tipo de control de acceso, hacia el interior de la enfermería se encuentra el piso desgastado y con reparcheos en tabletas
La escalera metálica que lleva al segundo piso y al segundo piso del CNA presenta deterioro total de las cintas antideslizantes, se sugiere cambio, el pasamanos presenta deterioro en la pintura de acabado, con peladuras representativas, la contra huella de la grada 1 es fraccionada y su junta está separada o suelta.
Los muros en general del hall del piso 1 presentan deterioro normal por el tiempo y falta de mantenimiento, muros sucios, se evidencian resanes con masilla sin terminar en la llegada de la escalera, filos desportillados en el paso hacia el hall de baños y es en general.
El piso de baldosa de caucho o vinisol se encuentra en un alto grado de deterioro, el enchape presenta craquelamiento ya por el tiempo, baldosas faltantes en el inicio del hall y algunas rotas cerca al acceso a la enfermería. .
El cielo raso en dry wall presenta deterioro normal por el tiempo, humedad en partes, algunos parches de pintura y desniveles por humedad.
Se evidencia un baño enchapado a media altura con enchapes ya deteriorados por el tiempo, el espejo presenta humedad, y sanitario de tanque con manchas.
Se encuentran muebles fijos de almacenamiento de archivo en madera la cual esta en mal estado, con humedad. Pintura levantada y zonas con moho contra los muros laterales.

FIRMAS

INCEBYP S.A.S
CONTRATISTA
ING. RODOLFO BARRETO
COORDINADOR DE OBRA

CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S - BIODECCO SAS
INTERVENTORIA
ING. AGUSTIN MUÑOZ
COORDINADOR INTERVENTORIA

ENTIDAD CONTRATANTE
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
ING. JAIME PRIETO
APOYO SUPERVISION CONTRATO - FNA-022-2025

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES – PUNTO DE ATENCION PRIMARIO Y BODEGA DE MARKETING
















FIRMAS

BIOESYP S.A.S
CONTRATISTA
ING. RODOLFO BARRETO
COORDINADOR DE OBRA

CONSULTORES, DESARROLLOY AMBIENTE S.A.S – BIODECCO SAS
INTERVENTORIA
ING. AGUSTIN MUÑOZ
COORDINADOR INTERVENTORIA

ENTIDAD CONTRATANTE
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
ING. JAIME PRIETO
APOYO SUPERVISION CONTRATO - FNA-022-2025

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - PUNTO DE ATENCION PRIMARIO Y BODEGA DE MARKETING












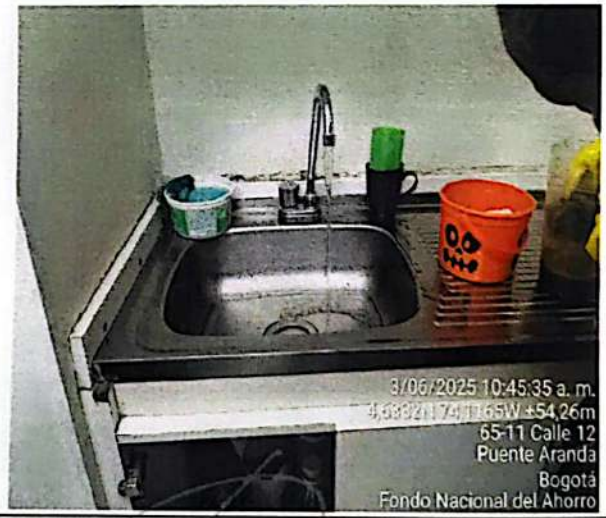



FIRMAS

INGEBYP S.A.S.
CONTRATISTA
ING. RODOLFO BARRETO
COORDINADOR DE OBRA

CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S - BIODECCO SAS
INTERVENTORIA
ING. AGUSTIN MUÑOZ
COORDINADOR INTERVENTORIA

ENTIDAD CONTRATANTE
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
ING. JAIME PRIETO
APOYO SUPERVISION CONTRATO - FNA-022-2025

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD


DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - PUNTO DE ATENCION PRIMARIO Y BODEGA DE MARKETING









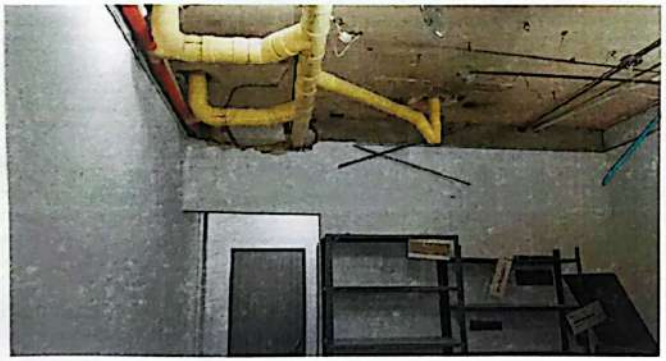



FIRMAS

INGEBYP S.A.S
CONTRATISTA
ING. RODOLFO BARRETO
COORDINADOR DE OBRA

CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S - BIODECCO SAS
INTERVENTORIA
ING. AGUSTIN MUÑOZ
COORDINADOR INTERVENTORIA

ENTIDAD CONTRATANTE
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
ING. JAIME PRIETO
APOYO SUPERVISION CONTRATO FNA-022-2025

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - CNA PISO 2 - COSTADO NORTE

FECHA		
18	NOVIEMBRE	2025
DD	MM	AA

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA N° FNA-186-2024 - OBJETO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."

ACTA No.:

Entidad contratante: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA

Entidad Interventora: CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S - BIODECCO SAS

Entidad ejecutora de la Obra: INGEBYP S.A.S

Localidad: PUENTE ARANDA

Barrio:

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: FONDO NACIONAL DEL AHORRO . FNA

Tenencia: Propietario __X Arrendatario _____ Poseedor _____ Otro Cual?____

Nombre del Propietario: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA

Dirección: CARRERA 65 No. 11-83

Teléfono: No. de pisos: DOS (2)

Long. del frente (mts): 71 m largo por 20 m de ancho

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		NO	
5. Gas		NO	
6, Televisión cable		NO	
7, Otros			Cuál?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI	NO
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐	NO ☐
4. Institucional	X	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: El edificio consta de una estuctura aporticada en concreto, el area a intervenir se encuentra sobre un mesanine en estructura metalica y placa en steel deck

MUROS: La zona del CNA piso, estan construidos en mamposteriarecubierta con muros en drywall cubierto con vinilo color balnco la cual se observa con alto deterioro por tema de uso del edificio.

CUBIERTA: La cubierta corresponde a lamina de aluzinc acanalada sencilla sin aislaminto acustico, apoyado sobre una estructura metalica la cual es objeto de analisis estructural correspondiente a perfiles metalicos y varillas con canales las cuales recogen las aguas lluvias.

PUERTA: Se encuentra puertas en vidrio templado en la zona de acceso y en las oficinas que se encuentran en el area, de igual manera se encuentra una puerta en madera la cual aisla el cuarto electrico

PISOS: Area Hall de llegada al piso 1 en granito, el hall de acceso a la enfermeria en piso de enchape de baldosa.

FACHADA: El area a intervenir se encuentra colindando con otros espacios correspondientes a oficinas razon por la cual no se contemplan fachadas

GRIETAS Y FISURAS: El area a intervenir no se evidencian grietas que tengan afectacion estructural en los pisos se observa fisuras pequeñas las cuales se ven reflejado en el piso de acabado

HUMEDADES: Se observa humedades a lo lago de los muros debido a que se evidencia que las bajantes no estan garantizando la escorrentia total de las canales al igual que en el cielo raso

HUNDIMIENTO PISO: Se evidencia que el piso no tiene planicidad total

Luminaria: luminaria de 60 x 60 la cual no presenta uniformidad y se presentan varias dañadas presentandose baja luminosidad, de igual forma se evidencia que esta luminaria se encuentra instalada en forma descolgada con gualla.

DESPLAZAMIENTOS: No presenta

OTRO: Cuál?

4. ANEXOS

Fotografias (archivo fotográfico o filmico): Se realiza registro de video y registro fotografico

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES – CNA PISO 2 – COSTADO NORTE

6. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")
Se realiza registro desde el acceso a la edificación desde la zona de parqueadero: Se evidencio que el acabado de piso en granito de la rampa que accede al interior de la edificación esta fisurada en sentido norte sur.
El piso de baldosa 30x30 del hall de acceso a esta área, se encuentra inicialmente con tabletas mal reparadas con rastro o huellas de que hubo instalado algún tipo de control de acceso, hacia el interiorse encuentra piso en tableta tipo vinilico
La escalera metálica que lleva al segundo piso y al segundo piso del CNA presenta deterioro total de las cintas antideslizantes, se sugiere cambio, el pasamanos presenta deterioro en la pintura de acabado, con peladuras representativas, la contra huella de la grada 1 es fraccionada y su junta está separada o suelta.
Los muros en general presentan deterioro normal por el tiempo y falta de mantenimiento, muros sucios, se evidencian resanes con masilla sin terminar en la llegada de la escalera, filos desportillados en el paso hacia el el interior se evidencia muros en dry wall afectados tambien por uso y por tema de humedades por escorrentias procedentes de la cubierta
El piso de baldosa de caucho o vinisol se encuentra en un alto grado de deterioro.
El cielo raso en dry wall presenta deterioro normal por el tiempo, humedad en partes, algunos parches de pintura y desniveles por humedad principalmente en la zona de canales.
Se encuentran ventanas en cubierta con alto deterioro las cuales no son funcionales ya que permiten paso de agua por la celocia que se evidencia en algunos elementos y por otra parte se encuentra vidrio crudo el cual no cumple normas de seguridad sobre las zonas de trabajo
Se evidencia mobiliario de oficina en estructurametalicaca forrado con paño con alto deterioro, igualmente se evidencia los puestos de trabajo en superficies de maderacon melamina y archivadores metalicos con alto grado de deterioro.
Se evidencia que la entidad no realizo el retiro total de elementos tales como papeleria , televisores, escaner, botellones de agua y papeleria general los cuales son de competencia de manuipulacion por parte de la entidad.
Se evidencia luminaria especular de 60 x60 la cual no se mantiene uniformida varias estan dañadas o en mal fucionamiento instalada con cuelga en acero asegurada a cubierta

FIRMAS

INGEBYP S.A.S
CONTRATISTA
ING. RODOLFO BARRETO
COORDINADOR DE OBRA

CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S – BIODECCO SAS
INTERVENTORIA
ING. AGUSTIN MUÑOZ
COORDINADOR INTERVENTORIA

ENTIDAD CONTRATANTE
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
ING. JAIME PRIETO
APOYO SUPERVISION CONTRATO – FNA-022-2025

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - CNA PISO 2 - COSTADO NORTE













FIRMAS

INGEBYP S.A.S
CONTRATISTA
ING. RODOLFO BARRETO
COORDINADOR DE OBRA

CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S - BIODECCO SAS
INTERVENTORIA
ING. AGUSTIN MUÑOZ
COORDINADOR INTERVENTORIA

ENTIDAD CONTRATANTE
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
ING. JAIME PRIETO
APOYO SUPERVISION CONTRATO - FNA-022-2025

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - CNA PISO 2 - COSTADO NORTE











FIRMAS

INGEBYP S.A.S
CONTRATISTA
ING. RODOLFO BARRETO
COORDINADOR DE OBRA


CONSULTORES, DESARROLLOY AMBIENTE S.A.S - BIODECCO SAS
INTERVENTORIA
ING. AGUSTIN MUÑOZ
COORDINADOR INTERVENTORIA

ENTIDAD CONTRATANTE
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
ING. JAIME PRIETO
APOYO SUPERVISION CONTRATO - FNA-022-2025

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - CRA PISO 2 - COSTADO NORTE

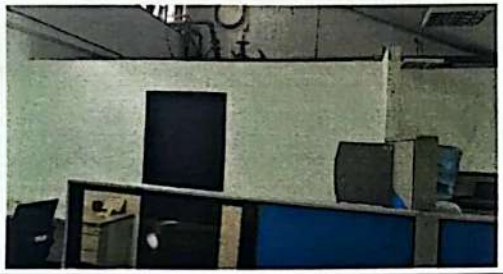






FIRMAS

INGEBYP S.A.S.
CONTRATISTA
ING. RODOLFO BARRETO
COORDINADOR DE OBRA

CONSULTORES, DESARROLLOY AMBIENTE S.A.S - BIODECCO SAS
INTERVENTORIA
ING. AGUSTIN MUÑOZ
COORDINADOR INTERVENTORIA


ENTIDAD CONTRATANTE
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
ING. JAIME PRIETO
APOYO SUPERVISION CONTRATO - FNA-022-2025


Powered by CamScanner

DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - CNA PISO 2 - COSTADO NORTE





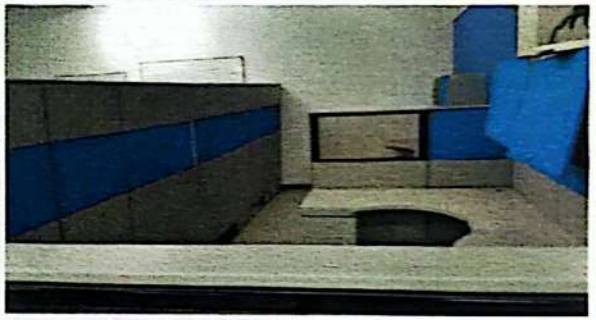

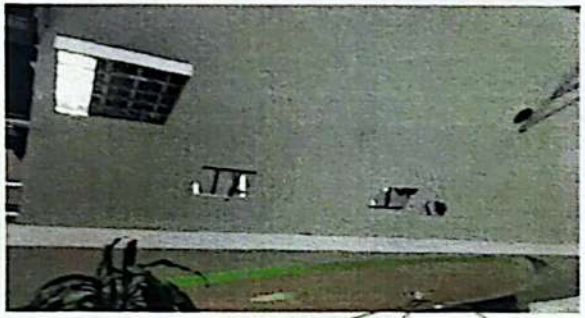
FIRMAS

INGEBYP S.A.S.
CONTRATISTA
ING. RODOLFO BARRETO
COORDINADOR DE OBRA

CONSULTORES, DESARROLLOY AMBIENTE S.A.S - BIODECCO SAS
INTERVENTORIA
ING. AGUSTIN MUÑOZ
COORDINADOR INTERVENTORIA

ENTIDAD CONTRATANTE
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
ING. JAIME PRIETO
APOYO SUPERVISION CONTRATO - FNA-022-2025

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

FECHA			DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - CASINO
14	marzo	2025	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FNA-166-2024 - OBJETO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."
ACTA No.:	2		

Entidad contratante: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA
Entidad Interventora CONSULTORES, DESARROLLOY AMBIENTE S.A.S - BIODECCO SAS
Entidad ejecutora de la Obra: INGEBYP S.A.S
Localidad: PUENTE ARANDA Barrio:

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: FONDO NACIONAL DEL AHORRO . FNA
Tenencia: Propietario __X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____
Nombre del Propietario FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA
Dirección CARRERFA 65 No. 11-83
Teléfono No. de pisos UNO (1)
Long. del frente (mts) FACHADA NORTE CONTRA BANCO 22,00M APROX

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energia	X		
4. Teléfonos		NO	
5. Gas		NO	
6, Televisión cable	X		
7, Otros			Cuál? ROCIADORES RCI

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI	NO
2. Comercial	X	6. Baldío	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐	NO ☐
4. Institucional	☐	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de concreto	GRIETAS Y FISURAS: Presenta fisuramiento ortogonal en la totalidad del piso de granito, muro de ladrillo mocheta ventana zona de servicio barra fisurado verticalmente
MUROS: muros internos en ladrillo a la vista, muros de fachada perimetral salon en vidrio piso techo.	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Cubierta en policarbonato en acceso, Placa de entrepiso de concreto	HUNDIMIENTO PISO: a simple vista no presenta
PISOS: Granito pulido dilatado con varillas de bronce	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
FACHADA: Vidrio reflectivo bronce piso techo perimetral al salon	OTRO:_Cuál?

4. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico) Se realiza registro de video y registro fotografico

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

FECHA		
14	marzo	2025
ACTA No.:	2	

DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - CASINO

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FNA-166-2024 - OBJETO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Se realiza registro desde el acceso a la edificación desde la plazoleta del Banco, la cubierta de policarbonato del porche del acceso presenta laminas de policarbonato desprendiendose de su estructura, Se evidencia deterioro normal por el tiempo del adoquin de ladrillo, áreas donde se ha perdido el emboquillado, presenta resane de regata de tuberia deteriorada, gravilla lavada de remate contra cajas de inspección levantada y en muy mal estado, colindante al porche de acceso al salon.

jardineras del costado oriental presenta las baldosas de remate del bordillo en tablon de gres, desprendidas o sueltas del murete, gran cantidad de baldosas rotas y desportillas, un buen numero de baldosas faltantes. Cable electrico atravesado sin ningun tipo de protección, un cable de acometida encauchetado de buen calibre esta ingresando por una ventana al salon del casino para alimentar un tablero.

Jardineras del costado occidental presenta algunas baldosas de remate del bordillo en tablon de gres desportillas, se aprecio que los bordillos en gravilla se encuentran con agrietaamientos y deterioro por el tiempo. El adoquin presenta dilatación y fisuramiento en sentido logitudinal tanto en el costado contra la edificación, como contra las jardineras de los parqueaderos. En caja electrica los bordes de las tapas se han desportillado los filos de los adoquines.

El piso de del salon presenta fisuramiento en ambos sentidos, entre columnas e intermedio a las luces de columnas, practicamente fisurado la totalidad del salon.

Los muros de fachada perimetrales del salon se encuentra en vidrio templado laminado 5+5 espejo de piso a techo y presenta solo suciedad, los muros interiores son en ladrillo a la vista forrando las columnas, contra la ultima ventana sur occidental presenta fisura vertical, en la mocheta oriental del acceso parte superior se encuentra ladrillos rotos y deportillados contra la sirena de incendio. muro sur occidental zona de hornos se encuentra otrs unidades desportilladas y deterioradas.

Las barras en melaminico instaladas en los vanos de las ventanas se encuentran en terminos generales en buen estado, algunas desniveladas. En la ventaneria oriental faltan manijas de apertura en cuatro (4) batientes.

Los cielo rasos de Drywall descolgados en los vanos de las ventanas orientales se encuentan en mal estado, pandeados, ondulados, desprendidos y con rastros de humedades en varios puntos.

Se encuentra una caja de tablero electrico que ingresa su acometida por la ventana con un cable encauchetado de 3#8+1t#8, caja oxidada, se encuentran tambien tres (3) pantallas de televisión en funcionamiento, se encontro una de las vitrinas del casino con rayaduras pronunciadas, del mobiliario se encuentran 19 sillas de las barras desoldadas en los apoya pies y varias mesas inestables, una con la tapa suelta.

Tomas electricas con las tapas sueltas.

FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor
Nombre: Edgar Enrique Espitia
C.C. O NIT

Firma Coordinador de obra
Nombre: Ing. Rodolfo Barreto Vargas

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre Ing. Jose Luis Nope A.

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

FECHA		
14	marzo	2025
ACTA No.:	2	

DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - CASINO

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FNA-166-2024 - OBJETO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."












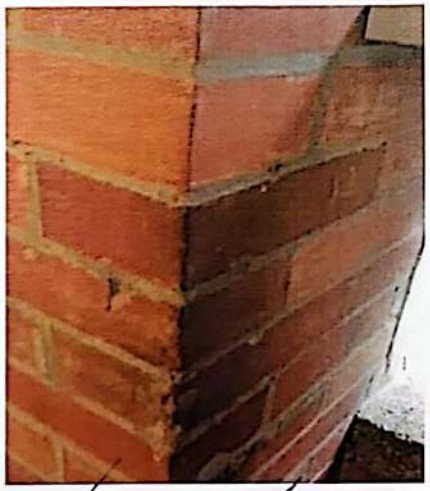





FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor
Nombre:
C.C. O NIT
Edgar Enrique Espitia

Firma Coordinador de obra
Nombre: Ing. Rodolfo Barreto Vargas

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Ing. Jose Luis Nape A.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

FECHA			DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - CASINO
14	marzo	2025	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FNA-166-2024 - OBJETO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."
ACTA No.:	2		










FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor
Nombre: Edgar Enrique Espitia
C.C. O NIT

Firma Coordinador de obra
Nombre: Ing. Rodolfo Barreto Vargas

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre Ing. Jose Luis Nope A.

Powered by CamScanner

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO

ACTA DE VECINDAD

INGEBYP NIT. 830.121.507-2

FECHA		
14	marzo	2025
ACTA No.:	2	

DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - CASINO

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FNA-166-2024 - OBJETO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."










FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor
Nombre: Edgar Enrique Espitia
C.C. O NIT

Firma Coordinador de Obra
Nombre: Ing. Rodolfo Barreto Vargas

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Ing. Jose Luis Mope Acevedo

ACTA DE VECINDAD

FECHA		
10	AGOSTO	2025
DD	MM	AA

ACTA No.:

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE EDIFICACIONES COLINDANTES

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FNA-166-2024 - OBJETO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."

Entidad contratante: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA

Entidad Interventora CONSULTORES, DESARROLLOY AMBIENTE S.A.S - BIODECCO SAS

Entidad ejecutora de la Obra: INGEBYP S.A.S

Localidad: PUENTE ARANDA Barrio:

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA











2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: **FONDO NACIONAL DEL AHORRO**

Tenencia: Propietario **__X___** Arrendatario _____ Poseedor _____ Otro Cual?_____

Nombre del Propietario **FONDO NACIONAL DEL AHORRO**

Dirección **CARRERA 65 #11 - 83**

Teléfono _____ No. de pisos _____

Long. del frente (mts) **1,26 mts * 1,18 H- 2.27**

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	X	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6, Televisión cable	☐	☐	
7, Otros	☐	☐	Cuál?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐	NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	X	Cuál?_____		comercio SI ☐	NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: **ELEMENTO METALICO CONFINADO DENTRO DE UNA ESTRUCTURA DE CONCRETO CONVENCIONAL REFERENTE AL PUNTO FIJO**

MUROS: **EXTERNOS EN CONCRETO**

MUROS INTERNOS: COFORMADO POR LAMINAS EN**ACEROS INOXIDABLES Y OTROS CON ACABADO TIPO MADERA**

CUBIERTA: **ACERO INOXIDABLE**

PISOS: **EN ACERO INOXIDABLE RECUBIERTO CON UN PISO VINILICO, SE EVIDENCIA QUE TANTO EL PISO COMO LAS PAREDES PRESENTAN DESGASTES ASOCIADOS AL USO Y TRAFICO CONSTANTE.**

FACHADA: **MURO EN CONCRETO CON ACABADO EN PINTURA COLOR AZUL, EN EL ACCESO PRINCIPAL SE OBSERVA UN MARCO EN MARMOL COLOR NEGRO, EL CUAL PRESENTA DESPORTILLAMIENTOS VISIBLES, EVIDENCIANDO DETERIORO EN SU SUPERFICIE**

GRIETAS Y FISURAS: **NO PRESENTA**

HUMEDADES: **NO PRESENTA**

HUNDIMIENTO PISO: **NO PRESENTA**

DESPLAZAMIENTOS: **NO PRESENTA**

OTRO: _Cuál?

ACTA DE VECINDAD

FECHA		
10	AGOSTO	2025
DD	MM	AA
ACTA No.:		

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE EDIFICACIONES COLINDANTES

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FNA-166-2024 - OBJETO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."

4. ANEXOS

Fotografias (archivo fotográfico o fílmico)

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No es posible observar la estructura interna del ascensor, por lo tanto no se puede determinar visualmente si presenta fallas o deterioro en sus componentes estructurales internos.

Durante la inspeccion se evidenciaron las siguientes observaciones en el ascensor:

1. Marco de acceso: el marco en cuarzo color negro presenta desportillamientos.

2. Puerta de acceso: Se observan rayones en la superficie.

3. Piso interno: La lamina presenta golpes, rayones y desportillamiento en su superficie.

4. Espejo interior: Elaborado en material de acero, presenta manchas visibles.

5. Techo interior: Elaborado en material de acero, presenta manchas visibles.

6. Sistema de Iluminacion: La luz interna refleja baja luminosidad.

FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor	Firma Coordinador de obra	Vo.Bo. Coordinador de la Interventoría
Nombre:	Nombre: ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	Nombre: ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
C.C. O NIT		

ACTA DE VECINDAD

FECHA		
19	Abril	2025
DD	MM	AA
ACTA No.:		

DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - BAÑOS CNA PISO 2

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FNA-166-2024 - OBJETO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."

Entidad contratante: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA

Entidad Interventora CONSULTORES, DESARROLLOY AMBIENTE S.A.S - BIODECCO SAS

Entidad ejecutora de la Obra: INGEBYP S.A.S

Localidad: PUENTE ARANDA Barrio:

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA





2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: FONDO NACIONAL DEL AHORRO . FNA

Tenencia: Propietario __X Arrendatario _____ Poseedor _____ Otro Cual?_____

Nombre del Propietario FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA

Dirección CARRERFA 65 No. 11-83

Teléfono No. de pisos DOS (2)

Long. del frente (mts) FACHADA INTERNA 6,10M APROX

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		NO	
5. Gas		NO	
6, Televisión cable		NO	
7, Otros			Cuál? ROCIADORES RCI, 1 DETECTOR DE HUMO

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI	NO
2. Comercial	X	6. Baldío	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	Cuál?_____		comercio SI ☐	NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Se perciben unas columnas de concreto en el eje de fachada	GRIETAS Y FISURAS: El baño de mujeres presenta una fisura muy abierta en el muro norte contra la sala contigua de computadores, Presenta fisuramiento en los pisos de caucho, craquelamiento en las baldosas por el tiempo
MUROS: La zona de baños del CNA piso 2, estan construidos en mamposteria en bloque de arcilla los muros principales y muros transversales contra el hall y cuarto de aseo en drywall.	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Cubierta en placa plana de concreto	HUNDIMIENTO PISO: no presenta
PISOS: Area Hall de llegada al piso 2 en granito, hall baños en piso de caucho baldosa de vinisol	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
FACHADA: muros en drywall pintados en la Fachada interna del hall	OTRO:_Cuál?

4. ANEXOS

Fotografias (archivo fotográfico o fílmico) Se realiza registro de video y registro fotografico

ACTA DE VECINDAD

FECHA		
19	Abril	2025
DD	MM	AA
ACTA No.:		

DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - BAÑOS CNA PISO 2

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FNA-166-2024 - OBJETO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Se realiza registro desde el acceso a la edificación desde la zona de parqueadero: Se evidencio que el acabado de piso en granito de la rampa que accede al interior de la edificación esta fisurada en sentido norte sur.

El piso de baldosa 30x30 del hall de acceso a esta área, se encuentra inicialmente con tabletas mal reparadas con rastro o huellas de que hubo instalado algun tipo de control de acceso, hacia el interior del hall se aprecia fisuramiento del piso en sentido norte sur hacia el local de OMA, y tambien colindante al punto de escalera. aproximadamente son 24 unidades de baldosas fisuradas y desportilladas

La Escalera metalica que lleva al segundo piso y a la bateria de baños en mención presenta deterioro total de las cintas antideslizantes, se sugiere cambio, el pasamanos presenta deterioro en la pintura de acabado, con peladuras representativas, la contra huella de la grada 1 es fracionada y su junta esta separada o suelta.

Los muros en general de los halles del piso 2 presnta deterioro normal por el tiempo y falta de mantenimiento, muros sucios,resane con masilla sin terminar en la llegada de la escalera, filos despotillados en el paso hacia el hall de baños y esn general.

El piso de baldosa de caucho o vinisol se encuentra en un alto grado de deterioro, las baldosas presentan craquelamiento ya por el tiempo, baldosas faltantes en el inicio del hall y algunas rotas cerca al acceso al baño de mujeres.

El cielo raso en fibra mineral presenta deterioro normal por el tiempo, modulos corridos, algunos paneles levantados, retales faltantes.

Falta tapa interruptor triple en la llegada escalera, falta tapas o aparatos en cajas de cableado de señal, las luminarias 60x60 estan en funcionamiento 4 UN en el hall a sala de CNA, 3 UN en hall de baños. Los demas aparatos electricos se encuentran completos.

Se encuentra en el hall a la Sala de CNA, un extintor, una camilla con cabecero, una alarma y sirena de prevención de incendio,

FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor

Nombre:

C.C. O NIT

Firma Residente de obra

Nombre:

Vo.Bo. Representante de la Interventoría

Nombre

ACTA DE VECINDAD

FECHA		
19	Abril	2025
DD	MM	AA
ACTA No.:		

DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - BAÑOS CNA PISO 2

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FNA-166-2024 - OBJETO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."

















FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor

Nombre:

C.C. O NIT

Firma Residente de obra

Nombre:

Vo.Bo. Representante de la Interventoría

Nombre

ACTA DE VECINDAD

FECHA		
19	Abril	2025
DD	MM	AA
ACTA No.:		

DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - BAÑOS CNA PISO 2

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FNA-166-2024 - OBJETO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."












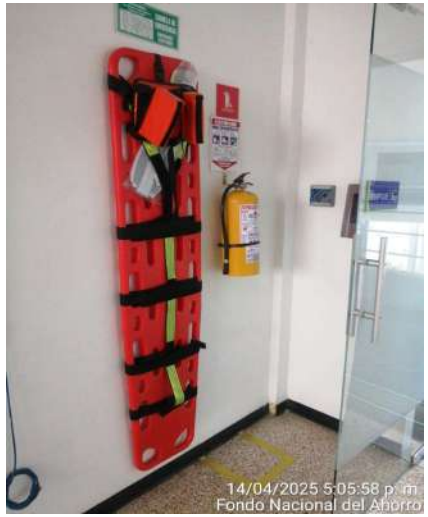

FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor
Nombre:
C.C. O NIT

Firma Residente de obra
Nombre:

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre

ACTA DE VECINDAD

FECHA			DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - EDIFICIO TECNOLOGIA, GESTION DOCUMENTAL PISO - ZONA SUR
04	12	2025	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº FNA-168-2024 - OBJETO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."
ACTA No:			

Entidad contratante: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA — Entidad Interventora: CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S - BIODECCO SAS

Entidad ejecutora de la Obra: INGEBYP S.A.S — Localidad: PUENTE ARANDA — Barrio:

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA

Tenencia: Propietario X — Arrendatario ____ — Poseedor ____ — Otro Cual? ____

Nombre del Propietario: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA

Dirección: CARRERA 65 No 11-83

Teléfono: ____ — No. de pisos: DOS (2)

Long. del frente (mts): FACHADA INTERNA 6.10M APROX.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas		NO	
6. Televisión cable		NO	
7. Otros			Cual?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje	Si NO
2. Comercial	X	6. Baldío	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	Si ☐ NO ☐
4. Institucional	☐	Cual?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Edificio aporticado, columnas (Discapacidad con aspel Dueto), Vigas y viguetas de concreto

MUROS: Muros internos divisorios y fachada en ladrillo con acabado pleo - tarrito, en mampostería perimetral.

CUBIERTA: Cubierta en placa plana aligerada con casetones retirados en la parte superior se presentan tuberías del baño existente.

PISOS: pisos en vinilo sobre enchapes con fisuras y grietas, pisos no presentan desniveles o hundimientos, se evidencian: daños en vinilo, enchapes y pegos.

FACHADA: fachada en muros en drywall enlucidos a plomo pero en enchapes en la parte superior presenta puerta en madera con humedad y desgaste de tiempo.

GRIETAS Y FISURAS: presencia de fisura en muro en hall acceso, enchapes fisurados y piso con grietas.

HUMEDADES: Presenta multiples filtraciones en los muros perimetrales de los baños.

HUNDIMIENTO PISO: no presenta

DESPLAZAMIENTOS: No presenta

OTRO: Cual?: se presenta pintura deteriorada en el hall de acceso, y en la oficina de gestion documental por el cual se genera el acceso posible al baño, el piso se presenta en buen estado pero las paredes estan sucias y con pintura desgastada.

4. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico): Se realizo registro de video y registro fotografico

ACTA DE VECINDAD

FECHA			DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - EDIFICIO TECNOLOGIA, GESTION DOCUMENTAL PISO - ZONA SUR
1			
DD	MM	AA	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FNA-166-2024 - OBJETO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."
ACTA No.:			

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")
Se realiza registro desde el hall de acceso, hacia el interior del área de los baños de gestión documental: se evidencio que el acabado de piso es en un material similar al vinilos el cual se encuentra porociado por deterioro normal a traves del tiempo. la pintura del hall de acceso se encuentra con manchas del mugre, deterioro y desgaste normal por el tiempo, el techo se encuentra en fibra mineral, recubierto de polvo y manchas. presenta desnivelacion
El piso interior del área de baños de baldosa 30x30 de caucho tipo vinílico está en 2 colores, se encuentra en términos generales en regular estado de conservación. presenta deterioro en juntas contra otros tipos de pisos, manchas como de oxido en las huellas de las divisiones de los sanitarios. deterioro en divisiones de lámina de los sanitarios.
Los muros internos en general presentan enchape con deterioro normal por el tiempo a una altura en promedio de 1.20, después de esa altura se evidencia pintura vinilo con falta de mantenimiento, muros sucios, filos desportillados en baño de hombres.
Los muros internos en el baño de mujeres en general presentan pintura de esmalte en buen estado desde una altura de 1.20 al techo, del 1.20 al piso se evidencia enchape blanco con desgaste, manchas amarillas por humedad
El sistema de divisiones de los sanitarios para ambos baños presenta desgaste por oxidación en la parte inferior. pintura en mal estado por el óxido, se presenta superficies con humedad y porosidades, se evidencian algunas laminas desajustadas.
Las puertas de acceso a los baños son en madera, con pintura desgastadas en la parte inferior por la humedad, las chapas se encuentran desajustadas, y los marcos sueltos de las paredes.
Los lavamanos se evidencian en material negro similar al mármol soportados en estructura metálica en mal estado, la cual presenta humedad y corrosión, y generan un peligro para su desmonte, los lavamanos incrustados no se pueden desmontar en buen estado, se rompen al poder desmontarlos.
En baño de mujeres faltan escudos en las griferias de sanitarios, falta dos griferias de lavamanos, las puertas de las divisiones de baños faltan cerrojos y hay una puerta golpeada en la parte superior. igualmente, en el baño de hombres faltan escudos en las griferias de los sanitarios, cerrojos de las puertas de acero de las divisiones de baños están incompletos.
Las puertas de acceso de los baños en madera sin protección se encuentran deterioradas por falta de canto rigido, madera podrida por humedad en la parte inferior de estas
Se encuentran 5 sanitarios de tanque en regular estado, pero no cumplen con lo solicitado por la entidad.
El techo se presenta en fibra mineral para ambos baños, se evidencian manchas por humedad y rejillas de ventilación, conectadas a ductos de aire acondicionado pero los cuales no están en funcionamiento para la entidad

FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor
Nombre:
C.C. O NIT

Firma Residente de obra
Nombre: yulber Vargas Ortiz

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre Jose Luis Noguera Arevalo

ACTA DE VECINDAD

FECHA			DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - EDIFICIO TECNOLOGIA, GESTION DOCUMENTAL PISO - ZONA SUR
1			
DD	MM	AA	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FNA-166-2024 - OBJETO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."
ACTA No.:			














FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor	Firma Residente de obra	Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre:	Nombre: Yilber Vargas Ortiz	Nombre Jose Luis Lopez Rueda
C.C. O NIT		

ACTA DE VECINDAD

FECHA			DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES - EDIFICIO TECNOLOGIA, GESTION DOCUMENTAL PISO - ZONA SUR
1			
DD	MM	AA	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FNA-166-2024 - OBJETO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."
ACTA No.:			



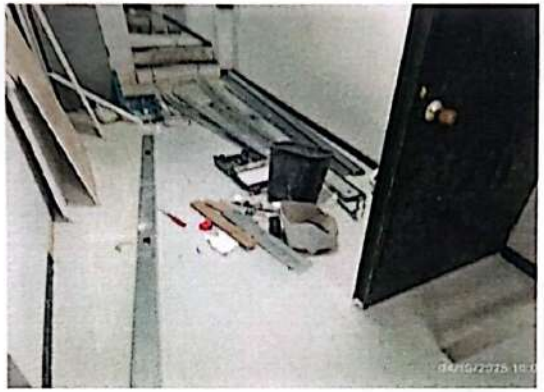









FIRMAS

Firma Responsable Propetario/poseedor
Nombre:
C.C. O NIT

Firma Residente de obra
Nombre: Yilber Vargas Ortiz

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

Acta N°	61	**Tema:**	Comité Semanal de Obra Contrato 166 de 2024
Fecha:	03/032026	**Ubicación:**	Gerencia Administrativa
Hora inicio:	8:30 am	**Hora fin:**	12:00 pm
Objetivo	Comité periódico de seguimiento.		

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Se anexa Formato de Asistencia	Gerencia Administrativa	NA	NA

1. OBJETIVO COMITÉ

Realizar el seguimiento semanal a los compromisos, actividades técnicas, administrativas y presupuestales del Contrato de Obra No. 166 de 2024, verificando el estado de avance de los compromisos adquiridos en el comité del día veinticuatro (24) de febrero de 2026, así como la revisión de balances, actas de mayores y menores cantidades, postventas y estado de entrega de las áreas intervenidas.

2. DESARROLLO COMITÉ

1. Informe y corte de obra correspondiente al mes de enero de 2026

Durante el desarrollo del comité se realizó el seguimiento al estado de elaboración, revisión y consolidación del informe de obra y corte correspondiente al mes de enero de 2026. Sobre este particular, la interventoría y el contratista de obra informaron que se han venido desarrollando diversas mesas de trabajo orientadas a la revisión detallada de las actividades ejecutadas, cantidades de obra, soportes técnicos y demás documentos requeridos para la consolidación definitiva del respectivo corte.

Como resultado de las reuniones adelantadas entre las partes, se acordó establecer como fecha objetivo para la entrega oficial del informe y del corte de obra para los próximos días del presente mes, plazo dentro del cual se espera culminar satisfactoriamente el proceso de validación y conciliación de la información técnica, administrativa y financiera asociada al período evaluado.

La interventoría manifestó que continuará realizando el acompañamiento y seguimiento correspondiente a las mesas de trabajo programadas, con el fin de garantizar que la documentación sea presentada de manera completa, consistente y conforme a las condiciones contractuales establecidas.

2. Actividades complementarias requeridas para la terminación del cuarto piso del Edificio de Convenciones

En el marco del comité se abordó el estado de las actividades complementarias identificadas como necesarias para la culminación integral del cuarto piso del Edificio de Convenciones. Al respecto, la interventoría informó que dichas actividades corresponden a obras no previstas inicialmente dentro del alcance contractual y que actualmente están siendo objeto de análisis y estructuración mediante el Acta de Fijación de Precios No. 8.

Se informó igualmente que la interventoría y el contratista de obra han venido desarrollando mesas de trabajo técnicas encaminadas a la revisión, ajuste y validación de los Análisis de Precios Unitarios (APU) correspondientes a las actividades propuestas, con el propósito de definir de manera clara los alcances, cantidades y costos asociados a su eventual ejecución.

Considerando que la ejecución de estas actividades resulta necesaria para garantizar la funcionalidad y terminación adecuada de los espacios intervenidos, la interventoría ha solicitado formalmente al contratista de obra la presentación de la respectiva solicitud de prórroga y adición contractual por un término de quince (15) días, con el fin de contar con el tiempo requerido para adelantar los trámites administrativos correspondientes y ejecutar las actividades complementarias que lleguen a ser aprobadas por la Entidad.

3. Revisión del estado de los ponderables ofertados por el contratista de obra

La supervisión designada por la Entidad contratante consultó durante el comité sobre el estado actual de cumplimiento de los ponderables ofertados por el contratista de obra dentro del proceso licitatorio, con el fin de verificar su materialización antes del cierre contractual.

En atención a dicha solicitud, la interventoría y el contratista de obra presentaron el estado actualizado de cada uno de los compromisos ofertados, indicando lo siguiente:

- Metros cuadrados de pintura: Se informó que este ponderable se encuentra cumplido en un ciento por ciento (100%). La interventoría y el contratista manifestaron que la totalidad de las cantidades ofertadas se encuentran plenamente identificadas dentro de las memorias de cálculo y control de pintura ejecutadas durante el proyecto. Asimismo, se aclaró que dichas cantidades fueron asumidas conforme a las condiciones de la propuesta presentada y no constituyeron objeto de cobro dentro de las cantidades contractuales ejecutadas.

- Bicicleteros: Respecto a este ponderable, el contratista de obra manifestó que remitirá a la Entidad contratante el diseño definitivo, las especificaciones técnicas y la propuesta de implantación en sitio para su correspondiente revisión y aprobación. Cabe resaltar que el contratista ya cuenta con las unidades a suministrar , para la instalación y cierre de esta actividad, dando cumplimiento a las condiciones ofertadas durante el proceso de selección.

- Gerente de obra: La interventoría certificó que el contratista ha dispuesto durante la ejecución contractual del profesional designado como gerente de obra, cumpliendo con el perfil exigido y garantizando su participación y acompañamiento en las diferentes etapas de ejecución, seguimiento y coordinación del proyecto.

- Personal disponible: Se informó que el contratista de obra dispuso oportunamente de dos auxiliares de obra de acuerdo con los perfiles establecidos en la propuesta presentada. Dicho personal ha permanecido a disposición de la Entidad contratante durante el período requerido, desarrollando las actividades asignadas conforme a la programación y necesidades definidas por la Gerencia Administrativa encargada del seguimiento al Contrato de Obra No. 166 de 2024 y al Contrato de Interventoría No. 022 de 2025.

Finalmente, la supervisión, la interventoría y el contratista de obra acordaron continuar realizando el seguimiento al cumplimiento de los compromisos pendientes, con el propósito de garantizar la materialización de la totalidad de los ponderables ofertados y su respectiva verificación.

3. CONCLUSIONES

Como resultado de los temas abordados durante el presente comité de seguimiento, se evidenció un avance significativo en la consolidación de los aspectos técnicos, administrativos y contractuales necesarios para el cierre satisfactorio del proyecto.

- En relación con las actividades complementarias requeridas para la terminación del cuarto piso del Edificio de Convenciones, la interventoría informó que se ha avanzado en la estructuración y revisión del Acta de Fijación de Precios No. 8, producto de las diferentes mesas de trabajo realizadas conjuntamente con el contratista de obra. Actualmente se encuentran consolidados los análisis y soportes técnicos requeridos, con el propósito de presentar la documentación correspondiente ante la Entidad para su evaluación y trámite respectivo.

- De igual manera, se informó que se han adelantado las gestiones necesarias para la formalización de la solicitud de prórroga y adición contractual requerida para la ejecución de las actividades complementarias identificadas. Sobre este aspecto, el contratista de obra manifestó que la solicitud formal será radicada ante la Entidad durante los próximos días, adjuntando los soportes técnicos, administrativos y presupuestales correspondientes para su análisis y consideración.

- Respecto al informe y corte de obra del mes de enero pendiente de aprobación, las partes reiteraron el compromiso adquirido de continuar desarrollando las mesas de trabajo necesarias para culminar la revisión y conciliación de la información, manteniendo como objetivo la entrega oficial del informe y corte durante la primera semana del mes de marzo de 2026.

- Finalmente, se concluye que la interventoría, la supervisión y el contratista de obra continuarán articulando esfuerzos para garantizar la culminación de los trámites pendientes, el cumplimiento de los compromisos contractuales y la adecuada finalización de las actividades requeridas para el cierre técnico, administrativo y financiero del proyecto.

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Registro fotográfico N°1: Comité del 3 de marzo de 2026.	**Registro fotográfico N°2: C**omité del 3 de marzo de 2026.

5. COMPROMISOS COMITÉ

No	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA DE COMPROMISO
1	Radicar ante la Interventoría la solicitud formal de prórroga y adición contractual, acompañada de los respectivos soportes técnicos, administrativos y presupuestales requeridos para su evaluación y trámite.	Contratista de Obra	6 de marzo de 2026
2	Consolidar y presentar a la Entidad el Acta de Fijación de Precios No. 8, junto con los Análisis de Precios Unitarios (APU) y demás soportes técnicos correspondientes a las actividades complementarias requeridas para la terminación del cuarto piso del Edificio de Convenciones.	Contratista de Obra	6 de marzo de 2026
3	Continuar desarrollando las mesas de trabajo para la revisión, conciliación y cierre del informe y corte de obra correspondiente al mes de enero de 2026, con el fin de efectuar su entrega oficial dentro del plazo acordado entre las partes.	Contratista de Obra e interventoría	INMEDIATO
4	Ponderables	Contratista de Obra	INMEDIATO

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

REVISÓ	ELABORÓ
FABIAN BOHORQUEZ Gerente de obra NGEBYP S.A.S.	**AGUSTÍN MUÑOZ** Coordinador de interventoría Consultores, Desarrollo y Ambiente S.A.S. - Biodecco SAS
VANESSA PACHECO GOMEZ Supervisora contrato de interventoría 022 de 2025 Fondo Nacional del Ahorro S.A.S.	

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

• • ▪▪ ▪▪ • •	**• • ▪▪**	**Tema:**	Comité Revisión APUS N°8
Fecha:	09/03/2026	**Ubicación:**	Gerencia Administrativa
Hora inicio:	8:30 am	**Hora fin:**	12:00 pm
Objetivo		Comité periódico de seguimiento.	

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Se anexa Formato de Asistencia	Gerencia Administrativa	NA	NA

1. COMPROMISOS ANTERIORES

2. TEMAS TRATADOS

El día nueve (09) de marzo de 2026 se llevó a cabo una reunión entre el Contratista de Obra **INGEBYP S.A.S.**, la Interventoría y la Supervisión designada por la Entidad Contratante, en la cual se desarrolló una mesa de trabajo orientada a la revisión técnica y económica de los **Análisis de Precios Unitarios (APUs)** correspondientes al Acta de Fijación de Precios No. 8, asociados a obras no previstas requeridas para atender las necesidades del proyecto.

Durante la jornada se efectuó la verificación integral de los APUs presentados por el Contratista, logrando la modificación, ajuste y depuración de los Nuevos Precios (NP) comprendidos entre los números 172 y 182. Así mismo, se dejó proyectada la incorporación de nuevos NP, cuya estructuración técnica y presupuestal será consolidada conforme a los lineamientos definidos en la sesión.

En el proceso de revisión se analizaron y validaron aspectos esenciales tales como rendimientos de mano de obra, cantidades de materiales, unidades de medida, equipos requeridos, transporte, herramientas e insumos necesarios para la adecuada ejecución de cada actividad, garantizando su coherencia con los alcances técnicos establecidos para cada ítem y con las condiciones reales de obra.

Como resultado de la reunión, la Interventoría dejó constancia de que las observaciones y recomendaciones previamente formuladas fueron atendidas de manera satisfactoria, permitiendo ajustar de forma adecuada la estructura técnica y económica de los NP revisados.

El listado de APUs aprobados por la Interventoría y la Supervisión designada por la Entidad Contratante en la reunión del nueve (09) de marzo de 2026 corresponde a los siguientes:

NP-172 Suministro e Instalacion AVISO - LOGO INTERNO FNA - CONVERTIMOS LAS CESANTIAS Y EL AHORRO DE LOS COLOMBIANOS EN VIVIENDA PROPIA aviso en acrilico 3mm letra a letra volumentrico - Letras independientes - cantonera de 5 cm - (3,10 m x 40 cm)

NP-173 Suministro e Instalacion - AVISO TEXTO - INVERTIMOS EN BIENESTAR, CONSTRUIMOS FUTURO - Aviso en acrilico 3mm letra a letra volumentrico - cantonera de 5 cm - Letras independientes - (3,10 m x 20 cm))

NP-174 Suministro e Instalacion - AVISO TEXTO - DONDE EL ESFUERZO SE TRANSFORMA EN BIENESTAR - Aviso en acrilico 3mm letra a letra volumentrico - cantonera de 5 cm - Letras independientes - (2,10 m x 40 cm)

NP-175 Suministro e Instalacion aviso- LOGO INTERNO FNA - Aviso en acrilico 3mm letra a letra volumentrico - cantonera de 5 cm - (0.70 m x 0.7 m)

NP-176 Suministro e Instalacion aviso - LOGO INTERNO FNA - Aviso en acrilico 3mm letra a letra volumentrico - cantonera de 5 cm + Base acrilica- (1.46 m x 1.12 m)

NP-177 Suministro e instalacion de SEÑALIZACION INTERNA OFICINAS - Acrilico 8m + acrilico 3mm + 4 bujes color negro + decoración tipo chapilla según muetra (0.11 m x 0.2 m)

NP-178 Suministro e instalacion de IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR - sobre vinilo froasted + full color + laminación mate sgún muestra - vidrios extenos de las oficinas pricnipales y decoraciòn internerna de los vidrios

NP-179 Suministro e instalacion de Luminaria para uso interior tipo Led lineal MINICONTINIUM 36 W con driver integrado, distribución de luz homogénea sin sombras. Proporciona un sistema de iluminación continuo, limpio y sencillo.

NP-180 Suministro e instalación de puerta en madecor entamborada de diferentes medidas, incluye marcos, chapa con su respectiva cantonera, y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.

NP-181 Suministro e instalación de mueble escalonado de acuerdo con diseño suministrado por la entidad (incluye estructura metálica de soporte soldada en tubería 5x5x 2.5 mm y 5x2.5x2 mm, escalones melaminica 36 mm, puertas y laterales en melaminica 15 mm y recubrimientos internos melaminica en 15 mm, 14 casilleros con chapas, herrajes y entrepaños, cojines, cajoneras con chapas , herrajes y trasporte de sitio de preemsamble a sitio de ubicacion del mueble)

NP-182 Suministro e InstalacionAviso con imágenes en full color montadas sobre acrilico cal 8 tipo triangulo - (JUNTOS HACEMOS REALIDAD EL HOGAR DE LOS COLOMBIANOS) textos laser cal 8mm color en azul - (1.8 x 1.1 m)


	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

Nota: Los Analisis de precios unitarios aprobados durante la mesa de trabajo corresponden a las actividades complementarias y en atención a los requerimientos de la Entidad contratante, dicho lo anterior se firma por las partes:


AGUSTIN MUÑOZ
Coordinador de interventoría



FABIAN BOHORQUEZ
Gerente contratista de obra



VANESSA PACHECHO GOMEZ
Supervisión contrato INT 022-2025



	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

Acta N°	62	**Tema:**	Comité Semanal de Obra Contrato 166 de 2024
Fecha:	10/032026	**Ubicación:**	Gerencia Administrativa
Hora inicio:	8:30 am	**Hora fin:**	12:00 pm
Objetivo	Comité periódico de seguimiento.		

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Se anexa Formato de Asistencia	Gerencia Administrativa	NA	NA

1. OBJETIVO COMITÉ

Realizar el seguimiento semanal a los compromisos, actividades técnicas, administrativas y presupuestales del Contrato de Obra No. 166 de 2024, verificando el estado de avance de los compromisos adquiridos en el comité del día tres (3) de marzo de 2026, así como la revisión de balances, actas de mayores y menores cantidades, postventas y estado de entrega de las áreas intervenidas.

2. DESARROLLO COMITÉ

1. Informe y corte de obra correspondiente al mes de enero de 2026

Durante el desarrollo del comité se realizó seguimiento al estado actual del informe y corte de obra correspondiente al mes de enero de 2026. Sobre este aspecto, la interventoría informó que continúan desarrollándose mesas de trabajo con el contratista de obra orientadas a la revisión, conciliación y validación de las cantidades ejecutadas, soportes técnicos, registros de obra y demás documentos que hacen parte integral del proceso de consolidación del respectivo corte.

Si bien se han presentado avances significativos en la revisión de la información y en la depuración de las observaciones formuladas durante las reuniones de seguimiento, a la fecha aún se encuentra pendiente la entrega definitiva del informe y corte de obra correspondiente a dicho período.

La interventoría manifestó que continuará realizando el acompañamiento técnico y administrativo requerido, con el fin de culminar satisfactoriamente el proceso de revisión y lograr la entrega formal de la documentación en los próximos días, garantizando que la misma cumpla con los requisitos contractuales y los criterios de calidad exigidos por la Entidad.

2. Aprobación de la prórroga y del Acta de Fijación de Precios No. 8

La interventoría informó que, como resultado de las mesas de trabajo adelantadas entre las partes y de la gestión realizada ante la Entidad contratante, fue aprobada la solicitud de prórroga requerida por 16 días para la ejecución de las actividades complementarias necesarias para la culminación del cuarto piso del Edificio de Convenciones.

De igual manera, se informó que el Acta de Fijación de Precios No. 8 fue revisada, ajustada y aprobada, permitiendo incorporar los precios correspondientes a las actividades no previstas inicialmente dentro del alcance contractual y que resultan indispensables para garantizar la terminación integral de las áreas intervenidas.

La aprobación de estos instrumentos contractuales permite contar con las herramientas técnicas, administrativas y presupuestales necesarias para continuar con la ejecución de las actividades complementarias identificadas durante el desarrollo del proyecto, asegurando la continuidad de los trabajos y el cumplimiento de los objetivos establecidos por la Entidad.

3. Estado de ejecución de las actividades del cuarto piso del Edificio de Convenciones

Durante el comité se realizó seguimiento al avance de las actividades actualmente en ejecución en el cuarto piso del Edificio de Convenciones, las cuales corresponden a los trabajos complementarios aprobados mediante el Acta de Fijación de Precios No. 8.

La interventoría informó que, una vez obtenida la aprobación de la prórroga contractual y de los precios asociados a las actividades adicionales, el contratista de obra ha venido adelantando las labores requeridas para la culminación de los espacios pendientes, de conformidad con la programación establecida.

No obstante, se indicó que aún se encuentra pendiente la finalización total de las actividades previstas para este nivel, razón por la cual la interventoría continuará realizando el seguimiento permanente a la ejecución de los trabajos, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los rendimientos programados y la calidad de las actividades ejecutadas, con el propósito de garantizar la entrega satisfactoria y funcional del cuarto piso del Edificio de Convenciones.

4. Evaluación de una segunda prórroga contractual para la culminación de actividades pendientes

Durante el desarrollo del comité se analizó el estado actual de las actividades pendientes de ejecución dentro del proyecto, particularmente aquellas relacionadas con la culminación del cuarto piso del Edificio de Convenciones y las actividades aún pendientes en el segundo piso del edificio CNA.

La interventoría informó que, teniendo en cuenta el alcance de los trabajos que aún se encuentran en ejecución y aquellos que requieren ser finalizados para garantizar la completa funcionalidad de los espacios intervenidos, se vienen adelantando mesas de trabajo técnicas y administrativas con el contratista de obra orientadas a evaluar la necesidad de tramitar una segunda prórroga contractual.

En dichas mesas de trabajo se está realizando la revisión de las actividades pendientes, los tiempos requeridos para su ejecución, la disponibilidad de recursos y la programación actualizada de obra, con el propósito de determinar el plazo adicional necesario para culminar de manera adecuada las actividades remanentes del proyecto.

Por lo anterior, la interventoría y el contratista de obra continuarán efectuando el análisis correspondiente y consolidando la información técnica y administrativa requerida para presentar ante la Entidad la justificación y soporte de una eventual segunda prórroga contractual, en caso de que esta sea requerida para garantizar la terminación integral de las obras pendientes en el cuarto piso del Edificio de Convenciones y el segundo piso del edificio CNA.

3. CONCLUSIONES

Como resultado de los temas tratados durante el presente comité de seguimiento, se evidenció el avance de las gestiones técnicas, administrativas y contractuales requeridas para la culminación del proyecto y su correspondiente proceso de cierre.

La interventoría informó que la solicitud de prórroga requerida para la ejecución de las actividades complementarias fue aprobada por la Entidad contratante, permitiendo ampliar el plazo de ejecución y garantizando la continuidad de las actividades pendientes para la terminación del cuarto piso del Edificio de Convenciones.

De igual manera, se confirmó la aprobación del Acta de Fijación de Precios No. 8, mediante la cual se incorporaron las actividades complementarias identificadas durante la ejecución del contrato, permitiendo contar con los soportes técnicos y presupuestales necesarios para la ejecución de las obras requeridas para la culminación integral de las áreas intervenidas.

Respecto al informe y corte de obra correspondiente al mes de enero de 2026, se informó que continúan desarrollándose mesas de trabajo entre la interventoría y el contratista de obra con el propósito de finalizar la revisión, conciliación y validación de la información técnica, administrativa y financiera asociada al período evaluado, encontrándose pendiente su entrega definitiva.

Las partes concluyen que, debido a las actividades que aún se encuentran pendientes para la culminación del cuarto piso del Edificio de Convenciones y del segundo piso del edificio CNA, resulta necesario continuar evaluando las condiciones técnicas, administrativas y de programación que permitan garantizar la terminación integral del proyecto. En este sentido, la interventoría y el contratista de obra continuarán desarrollando mesas de trabajo para consolidar la información requerida y determinar la viabilidad de tramitar una segunda prórroga ante la Entidad, de acuerdo con las necesidades reales identificadas durante la ejecución de las obras pendientes.

Finalmente, las partes coincidieron en la necesidad de continuar realizando seguimiento permanente a la ejecución de las actividades del cuarto piso del Edificio de Convenciones, con el fin de garantizar su culminación dentro del plazo aprobado, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la calidad de los trabajos ejecutados y la adecuada terminación del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Registro fotográfico N°1: Comité del 10 de marzo de 2026.	**Registro fotográfico N°2: C**omité del 10 de marzo de 2026.

6. COMPROMISOS COMITÉ

No	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA DE COMPROMISO
1	Continuar con las mesas de trabajo técnicas y administrativas necesarias para culminar la revisión, conciliación y entrega definitiva del informe y corte de obra correspondiente al mes de enero de 2026.	Contratista de Obra	16 de marzo de 2026
2	Ejecutar y finalizar las actividades complementarias aprobadas mediante el Acta de Fijación de Precios No. 8, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la calidad requerida para la terminación del cuarto piso del Edificio de Convenciones.	Contratista de Obra	21 de marzo de 2026
3	Realizar seguimiento permanente al avance de las actividades pendientes y verificar el cumplimiento de los compromisos contractuales necesarios para el cierre técnico, administrativo y financiero del proyecto.	interventoría	INMEDIATO
4	Consolidar la programación actualizada de las actividades pendientes del cuarto piso del Edificio de Convenciones y del segundo piso del edificio CNA, junto con los soportes técnicos y administrativos requeridos para evaluar y, de ser procedente, presentar ante la Entidad la solicitud de una segunda prórroga.	Contratista de Obra	INMEDIATO

REVISÓ	ELABORÓ
FABIAN BOHORQUEZ Gerente de obra NGEBYP S.A.S.	**AGUSTÍN MUÑOZ** Coordinador de interventoría Consultores, Desarrollo y Ambiente S.A.S. - Biodecco SAS
VANESSA PACHECO GOMEZ Supervisora contrato de interventoría 022 de 2025 Fondo Nacional del Ahorro S.A.S.	

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

Acta N°	63	**Tema:**	Comité Semanal de Obra Contrato 166 de 2024
Fecha:	17/03/2026	**Ubicación:**	Gerencia Administrativa
Hora inicio:	8:30 am	**Hora fin:**	12:00 pm
Objetivo	Comité periódico de seguimiento.		

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Se anexa Formato de Asistencia	Gerencia Administrativa	NA	NA

1. OBJETIVO COMITÉ

Realizar el seguimiento semanal a los compromisos, actividades técnicas, administrativas y presupuestales del Contrato de Obra No. 166 de 2024, verificando el estado de avance de los compromisos adquiridos en el comité del día diez (10) de marzo de 2026, así como la revisión de balances, actas de mayores y menores cantidades, postventas y estado de entrega de las áreas intervenidas.

2. DESARROLLO COMITÉ

1. Estado de la solicitud de segunda prórroga contractual

Durante el desarrollo del comité, la interventoría informó que, como resultado de las mesas de trabajo adelantadas con el contratista de obra y del análisis de las actividades pendientes por ejecutar, se consolidó y radicó ante la Entidad contratante la solicitud de una segunda prórroga contractual.

La solicitud presentada se encuentra sustentada en la necesidad de culminar las actividades pendientes en el cuarto piso del Edificio de Convenciones y en el segundo piso del edificio CNA, las cuales resultan indispensables para la terminación integral del proyecto y la puesta en funcionamiento de las áreas intervenidas.

A la fecha del presente comité, la solicitud se encuentra en proceso de revisión por parte de la Entidad y pendiente de aprobación. La interventoría manifestó que realizará el respectivo seguimiento al trámite, con el fin de conocer oportunamente la decisión que adopte la Entidad frente a la ampliación del plazo contractual solicitada.

2. Seguimiento a la ejecución de actividades en el cuarto piso del Edificio de Convenciones

Durante el comité se presentaron los resultados de las visitas de inspección y seguimiento realizadas al cuarto piso del Edificio de Convenciones, evidenciándose avances significativos en las actividades que actualmente se encuentran en ejecución.

La interventoría informó que los trabajos desarrollados han permitido un progreso importante en la terminación de las áreas intervenidas, observándose avances en las actividades constructivas programadas y en la implementación de las obras complementarias aprobadas mediante el Acta de Fijación de Precios No. 8.

No obstante, se indicó que aún existen actividades pendientes por culminar para lograr la terminación integral del nivel intervenido, razón por la cual se continuará realizando seguimiento permanente a los rendimientos, calidad de ejecución y cumplimiento de la programación establecida, con el propósito de garantizar la entrega satisfactoria de los espacios.

3. Estado del informe y corte de obra correspondiente al mes de enero de 2026

La interventoría y el contratista de obra informaron que continúan adelantándose mesas de trabajo orientadas a la revisión, conciliación y validación de la información técnica, administrativa y financiera correspondiente al informe y corte de obra del mes de enero de 2026.

Durante estas reuniones se han venido revisando las cantidades ejecutadas, soportes de obra, memorias de cálculo, registros fotográficos y demás documentos necesarios para la consolidación definitiva del corte, con el fin de garantizar la consistencia y trazabilidad de la información presentada.

Las partes manifestaron que continuarán desarrollando las actividades de revisión y ajuste requeridas hasta lograr la culminación satisfactoria del proceso, permitiendo la posterior presentación y aprobación del informe y corte correspondiente al período evaluado.

3. CONCLUSIONES

Como resultado de los temas analizados durante el presente comité de seguimiento, se evidenció la continuidad de las gestiones técnicas, administrativas y contractuales requeridas para la culminación del proyecto.

La interventoría informó que la solicitud de segunda prórroga contractual fue radicada ante la Entidad contratante y actualmente se encuentra en proceso de revisión y aprobación. Esta solicitud busca garantizar la culminación de las actividades pendientes en el cuarto piso del Edificio de Convenciones y en el segundo piso del edificio CNA, permitiendo concluir adecuadamente los alcances contractuales previstos.

De igual manera, se concluyó que las actividades ejecutadas en el cuarto piso del Edificio de Convenciones presentan avances significativos, evidenciando el progreso de las labores complementarias requeridas para la terminación de los espacios intervenidos. No obstante, se identificó la necesidad de continuar con la ejecución de las actividades pendientes hasta alcanzar la culminación total de las obras programadas.

Respecto al informe y corte de obra correspondiente al mes de enero de 2026, las partes informaron que continúan desarrollando mesas de trabajo para la revisión y conciliación de la información técnica, administrativa y financiera asociada al período evaluado, manteniéndose como prioridad la culminación de este proceso para su posterior presentación y aprobación.

Finalmente, la interventoría, el contratista y la supervisión acordaron continuar articulando esfuerzos para garantizar el cumplimiento de los compromisos pendientes y avanzar en el proceso de cierre técnico, administrativo y contractual del proyecto.

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Registro fotográfico N°1: Comité del 17 de marzo de 2026.	**Registro fotográfico N°2: C**omité del 17 de marzo de 2026.

5. COMPROMISOS COMITÉ

No	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA DE COMPROMISO
1	Realizar seguimiento al trámite de aprobación de la segunda prórroga contractual radicada ante la Entidad y atender oportunamente los requerimientos u observaciones que puedan generarse durante el proceso de revisión.	Interventoría	INMEDIATO
2	Realizar seguimiento al avance de obra ejecutada en el cuarto piso del edificio de convenciones	Interventoría	INMEDIATO
3	Mantener las mesas de trabajo para la revisión, conciliación y cierre del informe y corte de obra correspondiente al mes de enero de 2026, con el fin de consolidar y presentar la documentación definitiva para su respectiva aprobación.	Contratista de Obra e Interventoría	INMEDIATO

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

REVISÓ	**ELABORÓ**
FABIAN BOHORQUEZ Gerente de obra NGEBYP S.A.S.	**AGUSTÍN MUÑOZ** Coordinador de interventoría Consultores, Desarrollo y Ambiente S.A.S. - Biodecco SAS
VANESSA PACHECO GOMEZ Supervisora contrato de interventoría 022 de 2025 Fondo Nacional del Ahorro S.A.S.	

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830121507-2	INGEBYP SAS	CRA 68D No 25B-86 OF 327-3	6017561194	ingebypltda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	04/03/2025	84135769	$6.779.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	252.000	0		0		0	0	0	0	252.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	260.000	0		0		0	0	0	0	260.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	688.000	0	0	0	0	0	0		688.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	867.800	0	0	0	0	0	0		867.800	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.600.000	0	0	0	0	0	0		1.600.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.686.000				1.686.000	0	0	1.686.000			16.860	1.686.000	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	969.000	0	0	969.000	8

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830121507-2	INGEBYP SAS		CRA 68D No 25B-86 OF 327-3	6017561194	ingebypltda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	04/03/2025	84135769	$6.779.800	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	969.000	969.000
Pensión	3	3.155.800	3.155.800
Riesgos Laborales	1	1.686.000	1.686.000
CCF	1	969.000	969.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	6.779.800	6.779.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	830121507-2	INGEBYP SAS		CRA 68D No 25B-86 OF 327-3	6017561194	ingebypltda@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					8	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-03	2025-02	E	04/03/2025	84135769	$6.779.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	10182018	ROSAS JURADO FREDY WILLMAN	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1122723202	MARTINEZ MOSQUERA CARLOS ABDON	1	0			S																	231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
3	CC	11516005	PEREZ CELY JOSE MIGUEL	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF24	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
4	CC	26430367	PERDOMO SANTOS MARIA LALY	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
5	CC	36307265	MARQUIN MARQUIN LUZ AIDA	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
6	CC	52093566	TRUJILLO SALAMANCA ADRIANA MARCELA	1	0			S																	231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
7	CC	79894001	BOHORQUEZ LESMES JEFFERSON ODILIO	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS002	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	5	348.000	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
8	CC	79952110	BOHORQUEZ LESMES FABIAN OSWALDO	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS001	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	5	348.000	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830121507-2	INGEBYP SAS	CRA 68D No 25B-86 OF 327-3	6017561194	ingebypltda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	04/03/2025	84135769	$6.779.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	252.000	0		0		0	0	0	0	252.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	260.000	0		0		0	0	0	0	260.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	688.000	0	0	0	0	0	0		688.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	867.800	0	0	0	0	0	0		867.800	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.600.000	0	0	0	0	0	0		1.600.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.686.000				1.686.000	0	0	1.686.000			16.860	1.686.000	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	969.000	0	0	969.000	8

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830121507-2	INGEBYP SAS		CRA 68D No 25B-86 OF 327-3	6017561194	ingebypltda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	04/03/2025	84135769	$6.779.800	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	969.000	969.000
Pensión	3	3.155.800	3.155.800
Riesgos Laborales	1	1.686.000	1.686.000
CCF	1	969.000	969.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	6.779.800	6.779.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	830121507-2	INGEBYP SAS		CRA 68D No 25B-86 OF 327-3	6017561194	ingebypltda@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					8	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-03	2025-02	E	04/03/2025	84135769	$6.779.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	10182018	ROSAS JURADO FREDY WILLMAN	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1122723202	MARTINEZ MOSQUERA CARLOS ABDON	1	0			S																	231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
3	CC	11516005	PEREZ CELY JOSE MIGUEL	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF24	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
4	CC	26430367	PERDOMO SANTOS MARIA LALY	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
5	CC	36307265	MARQUIN MARQUIN LUZ AIDA	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
6	CC	52093566	TRUJILLO SALAMANCA ADRIANA MARCELA	1	0			S																	231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
7	CC	79894001	BOHORQUEZ LESMES JEFFERSON ODILIO	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS002	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	5	348.000	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
8	CC	79952110	BOHORQUEZ LESMES FABIAN OSWALDO	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS001	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	5	348.000	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830121507-2	INGEBYP SAS	CRA 68D No 25B-86 OF 327-3	6017561194	ingebypltda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	05/05/2025	86289600	$6.841.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	252.000	0		0		0	0	0	0	252.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	268.000	0		0		0	0	0	0	268.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	688.000	0	0	0	0	0	0		688.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	899.800	0	0	0	0	0	0		899.800	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.600.000	0	0	0	0	0	0		1.600.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.700.000				1.700.000	0	0	1.700.000			17.000	1.700.000	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	977.000	0	0	977.000	8

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830121507-2	INGEBYP SAS		CRA 68D No 25B-86 OF 327-3	6017561194	ingebypltda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	05/05/2025	86289600	$6.841.800	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	977.000	977.000
Pensión	3	3.187.800	3.187.800
Riesgos Laborales	1	1.700.000	1.700.000
CCF	1	977.000	977.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	6.841.800	6.841.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830121507-2	INGEBYP SAS		CRA 68D No 25B-86 OF 327-3	6017561194	ingebypltda@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	05/05/2025	86289600	$6.841.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10182018	ROSAS JURADO FREDY WILLMAN	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1122723202	MARTINEZ MOSQUERA CARLOS ABDON	1	0			S																	231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
3	CC	11516005	PEREZ CELY JOSE MIGUEL	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF24	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
4	CC	26430367	PERDOMO SANTOS MARIA LALY	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
5	CC	79894001	BOHORQUEZ LESMES JEFFERSON ODILIO	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS002	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	5	348.000	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
6	CC	79952110	BOHORQUEZ LESMES FABIAN OSWALDO	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS001	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	5	348.000	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
7	CC	36307265	MARQUIN MARQUIN LUZ AIDA	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
8	CC	52093566	TRUJILLO SALAMANCA ADRIANA MARCELA	1	0			S							X										231001	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901028177-5	BL INGENIERIA SAS	CARRERA 22 No 40 44	4596689	blingenieriasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	FONDO NACIONAL	004	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	20/06/2025	87390036	$2.884.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	264.500	0		0		0	1	200	0	264.700	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	108.000	0		0		0	1	100	0	108.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	1	200	0	228.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.261.800	0	0	0	0	1	900	0	1.262.700	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	648.100				648.100	1	500	648.600			6.481	648.600	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	372.500	1	300	372.800	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	372.500	372.800
Pensión	2	1.489.600	1.490.700
Riesgos Laborales	1	648.100	648.600
CCF	1	372.500	372.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	2.882.700	2.884.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901028177-5	BL INGENIERIA SAS		CARRERA 22 No 40 44	4596689	blingenieriasas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	FONDO NACIONAL	004	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	20/06/2025	87390036	$2.884.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002193140	LEOTTAU CHAVEZ JESUS DAVID	1	0			S	X																230301	1.186.250	189.800	0	0	0	0	EPS005	1.186.250	47.500	14-11	1.186.250	5	82.600	CCF24	1.186.250	47.500	0	0	0	0	0
2	CC	1193522871	ROJAS GALINDO DANILO ALBERTO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	28541354	PAIVA SUSUNAGA MARIA DEL PILAR	1	0			S																	230301	2.700.000	432.000	0	0	0	0	EPS010	2.700.000	108.000	14-11	2.700.000	5	188.000	CCF24	2.700.000	108.000	0	0	0	0	0
4	CC	79909184	BARRETO VARGAS RODOLFO ENRIQUE	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	5	278.400	CCF24	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901028177-5	BL INGENIERIA SAS	CARRERA 22 No 40 44	4596689	blingenieriasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	20/06/2025	87390069	$3.268.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	88.000	0		0		0	1	100	0	88.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	80.000	0		0		0	1	100	0	80.100	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	120.000	0		0		0	1	100	0	120.100	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	68.000	0		0		0	1	100	0	68.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	80.000	0		0		0	1	100	0	80.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	272.000	0	0	0	0	1	200	0	272.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	672.000	0	0	0	0	1	500	0	672.500	2
231001	Colfondos	800227940-6	320.000	0	0	0	0	1	300	0	320.300	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	480.000	0	0	0	0	1	400	0	480.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	649.300				649.300	1	500	649.800			6.493	649.800	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	436.000	1	300	436.300	5

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901028177-5	BL INGENIERIA SAS		CARRERA 22 No 40 44	4596689	blingenieriasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	20/06/2025	87390069	$3.268.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	436.000	436.500
Pensión	4	1.744.000	1.745.400
Riesgos Laborales	1	649.300	649.800
CCF	1	436.000	436.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	3.265.300	3.268.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901028177-5	BL INGENIERIA SAS		CARRERA 22 No 40 44	4596689	blingenieriasas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	20/06/2025	87390069	$3.268.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001067386	BOHORQUEZ CASTILLO JUAN DAVID	1	0			S																	230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS001	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
2	CC	80076132	BALLESTEROS QUINTERO CARLOS EDUARDO	1	0			S																	231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
3	CC	80207119	BOHORQUEZ LESMES HAMILTON FERNEY	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
4	CC	1072168501	PEREZ VARON DEISY JOHANA	1	0			S							X										230201	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS010	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	1	8.900	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
5	CC	1026570158	VALENCIA SUAREZ JUAN FERNANDO	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901590075-0	CONSORCIO BS INGENIERIA		CR 68 D 25 B 86	6017561194	contabilidadbsingenieriasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	24/06/2025	87389466	$4.262.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	97.700	0		0		0	6	400	0	98.100	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	69.700	0		0		0	6	300	0	70.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	317.400	0		0		0	6	1.300	0	318.700	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	79.900	0		0		0	6	400	0	80.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	783.700	0	0	0	0	6	3.100	0	786.800	2
230301	Porvenir	800224808-8	458.800	0	0	0	0	6	1.800	0	460.600	2
231001	Colfondos	800227940-6	224.500	0	0	0	0	6	900	0	225.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	710.000	0	0	0	0	6	2.800	0	712.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	947.200				947.200	6	3.700	950.900			9.472	950.900	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	544.500	6	2.200	546.700	7

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901590075-0	CONSORCIO BS INGENIERIA		CR 68 D 25 B 86	6017561194	contabilidadbsingenieriasas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	24/06/2025	87389466	$4.262.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
4.800	6	100	4.900	1
ICBF				
7.200	6	100	7.300	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	564.700	567.100
Pensión	4	2.177.000	2.185.600
Riesgos Laborales	1	947.200	950.900
CCF	1	544.500	546.700
ESAP	0	0	0
ICBF	1	7.200	7.300
MEN	0	0	0
SENA	1	4.800	4.900
TOTALES	12	4.245.400	4.262.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901590075-0	CONSORCIO BS INGENIERIA		CR 68 D 25 B 86	6017561194	contabilidadbsingenieriasas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	24/06/2025	87389466	$4.262.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	11350203	PEÑA MARTINEZ GERMAN LEONARDO	1	0			N	X																230301	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS017	237.250	29.700	14-11	237.250	5	16.600	CCF24	237.250	9.500	237.250	4.800	7.200	0	0
2	CC	3133559	GONZALEZ VANEGAS MAURICIO	1	0			S	X	X						X									231001	1.402.899	224.500	0	0	0	0	EPS017	1.402.899	56.200	14-11	1.402.899	5	97.700	CCF24	1.402.899	56.200	0	0	0	0	0
3	CC	86052493	HERRERA HERRERA JOSE ALFONSO	1	0			S								X									25-14	1.995.652	319.400	0	0	0	0	EPS037	1.995.652	79.900	14-11	1.995.652	5	138.900	CCF24	1.995.652	79.900	0	0	0	0	0
4	CC	1031135149	VARGAS ORTIZ YILBER YANIN	1	0			S																	230201	3.156.000	505.000	0	0	0	0	EPS017	3.156.000	126.300	14-11	3.156.000	5	219.700	CCF24	3.156.000	126.300	0	0	0	0	0
5	CC	52716243	LOPEZ PEREZ SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	2.440.640	390.600	0	0	0	0	EPS008	2.440.640	97.700	14-11	2.440.640	5	169.900	CCF24	2.440.640	97.700	0	0	0	0	0
6	CC	80087133	MATABANCHOY LUNA GIOVANI FERNANDO	1	0			S								X									230201	1.741.685	278.700	0	0	0	0	EPS010	1.741.685	69.700	14-11	1.741.685	5	121.300	CCF24	1.741.685	69.700	0	0	0	0	0
7	CC	1033781847	REYES LOPEZ ERIKA YURLEY	1	0			S																	230301	2.630.000	420.800	0	0	0	0	EPS017	2.630.000	105.200	14-11	2.630.000	5	183.100	CCF24	2.630.000	105.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830121507-2	INGEBYP SAS	CRA 68D No 25B-86 OF 327-3	6017561194	ingebypltda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	05/06/2025	86580826	$6.846.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	200.000	0		0		0	1	200	0	200.200	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	200.000	0		0		0	1	200	0	200.200	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	252.000	0		0		0	1	200	0	252.200	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	268.000	0		0		0	1	200	0	268.200	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	1	100	0	57.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	688.000	0	0	0	0	1	500	0	688.500	2
231001	Colfondos	800227940-6	899.800	0	0	0	0	1	600	0	900.400	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.600.000	0	0	0	0	1	1.100	0	1.601.100	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.700.000				1.700.000	1	1.100	1.701.100			17.000	1.701.100	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	977.000	1	700	977.700	8

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830121507-2	INGEBYP SAS		CRA 68D No 25B-86 OF 327-3	6017561194	ingebypltda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	05/06/2025	86580826	$6.846.700	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	977.000	977.900
Pensión	3	3.187.800	3.190.000
Riesgos Laborales	1	1.700.000	1.701.100
CCF	1	977.000	977.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	6.841.800	6.846.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830121507-2	INGEBYP SAS		CRA 68D No 25B-86 OF 327-3	6017561194	ingebypltda@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	05/06/2025	86580826	$6.846.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10182018	ROSAS JURADO FREDY WILLMAN	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1122723202	MARTINEZ MOSQUERA CARLOS ABDON	1	0			S																	231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
3	CC	11516005	PEREZ CELY JOSE MIGUEL	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF24	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
4	CC	26430367	PERDOMO SANTOS MARIA LALY	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
5	CC	36307265	MARQUIN MARQUIN LUZ AIDA	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
6	CC	52093566	TRUJILLO SALAMANCA ADRIANA MARCELA	1	0			S																	231001	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
7	CC	79894001	BOHORQUEZ LESMES JEFFERSON ODILIO	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS002	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	5	348.000	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
8	CC	79952110	BOHORQUEZ LESMES FABIAN OSWALDO	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS001	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	5	348.000	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018479241		ORTIZ SALAZAR NESTOR VICENCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 22 122-85	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7597220	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1468839162	9485862215	I	2025/06/11	2025/05/09	BANCO DE BOGOTA	0	$989,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$3,197,600	$511,700			$3,197,600	$399,700			$0	$0			$3,197,600		$77,900		$0	$0		$989,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$3,197,600	$511,700			$3,197,600	$399,700			$0	$0			$3,197,600		$77,900		$0	$0		$989,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$3,197,600	$511,700			$3,197,600	$399,700			$0	$0			$3,197,600		$77,900		$0	$0		$989,300
1	CC	1018479241 ORTIZ NESTOR																		25-14	30	$3,197,600	$511,700	EPS005	30	$3,197,600	$399,700		0	$0	$0	14-23	30	$3,197,600	2.436%	$77,900	0	$0	$0	No	$989,300
Total		**Afiliados(1)**																				$3,197,600	$511,700			$3,197,600	$399,700			$0	$0			$3,197,600		$77,900		$0	$0		$989,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018479241		ORTIZ SALAZAR NESTOR VICENCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 22 122-85	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7597220	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1468839162	9485862215	I	2025/06/11	2025/05/09	BANCO DE BOGOTA	0	$989,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$511,700	$0	$0	$511,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$511,700	$0	$0	$511,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$77,900	$0	$0	$77,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$77,900	$0	$0	$77,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$399,700	$0	$0	$399,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$399,700	$0	$0	$399,700
TOTAL				**1**	**$989,300**	**$0**	**$0**	**$989,300**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79406468	JOSE MAURICIO GONZALEZ CAYCEDO	CL 150A # 96A-71 INT 09 APTO 201	3002843352	scorpionmg@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-05	I	12/06/2025	87080634	$567.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	111.400				111.400	0	0	111.400			1.114	111.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	200.000	200.000
Pensión	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	1	111.400	111.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	567.400	567.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79406468	JOSE MAURICIO GONZALEZ CAYCEDO	CL 150A # 96A-71 INT 09 APTO 201	3002843352	scorpionmg@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-05	I	12/06/2025	87080634	$567.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79406468	GONZALEZ CAYCEDO JOSE MAURICIO	57	0			N																	230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	200.000	14-23	1.600.000	5	111.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830121507-2	INGEBYP SAS	CRA 68D No 25B-86 OF 327-3	6017561194	ingebypltda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	02/07/2025	87292226	$6.841.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	252.000	0		0		0	0	0	0	252.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	268.000	0		0		0	0	0	0	268.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	688.000	0	0	0	0	0	0		688.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	899.800	0	0	0	0	0	0		899.800	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.600.000	0	0	0	0	0	0		1.600.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.700.000				1.700.000	0	0	1.700.000			17.000	1.700.000	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	977.000	0	0	977.000	8

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830121507-2	INGEBYP SAS		CRA 68D No 25B-86 OF 327-3	6017561194	ingebypltda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	02/07/2025	87292226	$6.841.800	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	977.000	977.000
Pensión	3	3.187.800	3.187.800
Riesgos Laborales	1	1.700.000	1.700.000
CCF	1	977.000	977.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	6.841.800	6.841.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830121507-2	INGEBYP SAS		CRA 68D No 25B-86 OF 327-3	6017561194	ingebypltda@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	02/07/2025	87292226	$6.841.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10182018	ROSAS JURADO FREDY WILLMAN	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1122723202	MARTINEZ MOSQUERA CARLOS ABDON	1	0			S																	231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
3	CC	11516005	PEREZ CELY JOSE MIGUEL	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF24	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
4	CC	26430367	PERDOMO SANTOS MARIA LALY	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
5	CC	36307265	MARQUIN MARQUIN LUZ AIDA	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
6	CC	52093566	TRUJILLO SALAMANCA ADRIANA MARCELA	1	0			S																	231001	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
7	CC	79894001	BOHORQUEZ LESMES JEFFERSON ODILIO	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS002	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	5	348.000	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
8	CC	79952110	BOHORQUEZ LESMES FABIAN OSWALDO	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS001	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	5	348.000	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018479241		ORTIZ SALAZAR NESTOR VICENCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 22 122-85	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7597220	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1619722375	9488834869	I	2025/08/12	2025/07/11	BANCO DE BOGOTA	0	$989,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																													
1	CC	1018479241	ORTIZ NESTOR																	25-14	30	EPS005	30		0	14-23	30	2.436%	0	No
Total	**Afiliados(1)**																													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018479241		ORTIZ SALAZAR NESTOR VICENCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 22 122-85	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7597220	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1619722375	9488834869	I	2025/08/12	2025/07/11	BANCO DE BOGOTA	0	$989,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$511,700	$0	$0	$511,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$511,700	$0	$0	$511,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$77,900	$0	$0	$77,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$77,900	$0	$0	$77,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$399,700	$0	$0	$399,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$399,700	$0	$0	$399,700
TOTAL				**1**	**$989,300**	**$0**	**$0**	**$989,300**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79406468	JOSE MAURICIO GONZALEZ CAYCEDO	CL 150A # 96A-71 INT 09 APTO 201	3002843352	scorpionmg@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-06	I	15/07/2025	87847994	$567.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	111.400				111.400	0	0	111.400			1.114	111.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	200.000	200.000
Pensión	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	1	111.400	111.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	567.400	567.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
CC	79406468	JOSE MAURICIO GONZALEZ CAYCEDO	CL 150A # 96A-71 INT 09 APTO 201	3002843352	scorpionmg@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL** / **CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-06	2025-06	I	15/07/2025	87847994	$567.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	79406468	GONZALEZ CAYCEDO JOSE MAURICIO	57	0			N																	230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	200.000	14-23	1.600.000	5	111.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901028177-5	BL INGENIERIA SAS	CARRERA 22 No 40 44	4596689	blingenieriasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	20/06/2025	87390069	$3.268.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	88.000	0		0		0	1	100	0	88.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	80.000	0		0		0	1	100	0	80.100	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	120.000	0		0		0	1	100	0	120.100	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	68.000	0		0		0	1	100	0	68.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	80.000	0		0		0	1	100	0	80.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	272.000	0	0	0	0	1	200	0	272.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	672.000	0	0	0	0	1	500	0	672.500	2
231001	Colfondos	800227940-6	320.000	0	0	0	0	1	300	0	320.300	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	480.000	0	0	0	0	1	400	0	480.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	649.300				649.300	1	500	649.800			6.493	649.800	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	436.000	1	300	436.300	5

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901028177-5	BL INGENIERIA SAS		CARRERA 22 No 40 44	4596689	blingenieriasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	20/06/2025	87390069	$3.268.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	436.000	436.500
Pensión	4	1.744.000	1.745.400
Riesgos Laborales	1	649.300	649.800
CCF	1	436.000	436.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	3.265.300	3.268.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901028177-5	BL INGENIERIA SAS		CARRERA 22 No 40 44	4596689	blingenieriasas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	20/06/2025	87390069	$3.268.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001067386	BOHORQUEZ CASTILLO JUAN DAVID	1	0			S																	230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS001	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
2	CC	80076132	BALLESTEROS QUINTERO CARLOS EDUARDO	1	0			S																	231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
3	CC	80207119	BOHORQUEZ LESMES HAMILTON FERNEY	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
4	CC	1072168501	PEREZ VARON DEISY JOHANA	1	0			S							X										230201	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS010	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	1	8.900	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
5	CC	1026570158	VALENCIA SUAREZ JUAN FERNANDO	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901028177-5	BL INGENIERIA SAS	CARRERA 22 No 40 44	4596689	blingenieriasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	FONDO NACIONAL	004	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	21/07/2025	88227164	$2.963.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	274.000	0		0		0	4	700	0	274.700	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	108.000	0		0		0	4	300	0	108.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	4	600	0	228.400	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.299.800	0	0	0	0	4	3.300	0	1.303.100	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	664.600				664.600	4	1.700	666.300			6.646	666.300	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	382.000	4	1.000	383.000	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	382.000	383.000
Pensión	2	1.527.600	1.531.500
Riesgos Laborales	1	664.600	666.300
CCF	1	382.000	383.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	2.956.200	2.963.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901028177-5	BL INGENIERIA SAS		CARRERA 22 No 40 44	4596689	blingenieriasas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	FONDO NACIONAL	004	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	21/07/2025	88227164	$2.963.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002193140	LEOTTAU CHAVEZ JESUS DAVID	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1193522871	ROJAS GALINDO DANILO ALBERTO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	28541354	PAIVA SUSUNAGA MARIA DEL PILAR	1	0			S																	230301	2.700.000	432.000	0	0	0	0	EPS010	2.700.000	108.000	14-11	2.700.000	5	188.000	CCF24	2.700.000	108.000	0	0	0	0	0
4	CC	79909184	BARRETO VARGAS RODOLFO ENRIQUE	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	5	278.400	CCF24	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901590075-0	CONSORCIO BS INGENIERIA		CR 68 D 25 B 86	6017561194	contabilidadbsingenieriasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	18/07/2025	88226927	$5.396.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	53.200	0		0		0	2	100	0	53.300	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	28.500	0		0		0	2	100	0	28.600	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	97.700	0		0		0	2	200	0	97.900	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	59.600	0		0		0	2	100	0	59.700	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	427.900	0		0		0	2	600	0	428.500	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	142.100	0		0		0	2	200	0	142.300	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	955.900	0	0	0	0	2	1.200	0	957.100	3
230301	Porvenir	800224808-8	998.600	0	0	0	0	2	1.300	0	999.900	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	746.000	0	0	0	0	2	1.000	0	747.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.125.400				1.125.400	2	1.500	1.126.900			11.254	1.126.900	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	675.500	2	900	676.400	9

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901590075-0	CONSORCIO BS INGENIERIA		CR 68 D 25 B 86	6017561194	contabilidadbsingenieriasas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	18/07/2025	88226927	$5.396.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
31.500	2	100	31.600	1
ICBF				
47.200	2	100	47.300	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	809.000	810.300
Pensión	3	2.700.500	2.704.000
Riesgos Laborales	1	1.125.400	1.126.900
CCF	1	675.500	676.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	47.200	47.300
MEN	0	0	0
SENA	1	31.500	31.600
TOTALES	13	5.389.100	5.396.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901590075-0	CONSORCIO BS INGENIERIA		CR 68 D 25 B 86	6017561194	contabilidadbsingenieriasas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	18/07/2025	88226927	$5.396.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1077149719	GORDILLO RODRIGUEZ LEIDY DANIELA	1	0			S	X																230301	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS002	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	5	92.500	CCF24	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
2	CC	1092342885	TORRES AFANADOR GRACE KELLY	1	0			S	X	X															230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS005	711.750	28.500	14-11	711.750	5	49.600	CCF24	711.750	28.500	0	0	0	0	0
3	CC	11350203	PEÑA MARTINEZ GERMAN LEONARDO	1	0			N								X									230301	1.570.492	251.300	0	0	0	0	EPS017	1.570.492	196.400	14-11	1.570.492	5	109.400	CCF24	1.570.492	62.900	1.570.492	31.500	47.200	0	0
4	PT	6956462	REDONDO PEÑA MARY EUGENIA	1	0			S	X																230201	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS037	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	5	92.500	CCF24	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
5	CC	86052493	HERRERA HERRERA JOSE ALFONSO	1	0			S								X									25-14	2.220.652	355.400	0	0	0	0	EPS037	2.220.652	88.900	14-11	2.220.652	5	154.600	CCF24	2.220.652	88.900	0	0	0	0	0
6	CC	1031135149	VARGAS ORTIZ YILBER YANIN	1	0			S																	230201	3.156.000	505.000	0	0	0	0	EPS017	3.156.000	126.300	14-11	3.156.000	5	219.700	CCF24	3.156.000	126.300	0	0	0	0	0
7	CC	52716243	LOPEZ PEREZ SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	2.440.640	390.600	0	0	0	0	EPS008	2.440.640	97.700	14-11	2.440.640	5	169.900	CCF24	2.440.640	97.700	0	0	0	0	0
8	CC	80087133	MATABANCHOY LUNA GIOVANI FERNANDO	1	0			S								X									230201	777.259	124.400	0	0	0	0	EPS010	777.259	31.100	14-11	777.259	5	54.100	CCF24	777.259	31.100	0	0	0	0	0
9	CC	80087133	MATABANCHOY LUNA GIOVANI FERNANDO	1	0			S												X					230201	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS010	711.750	28.500	14-11	711.750	5	0	CCF24	711.750	28.500	0	0	0	0	0
10	CC	1033781847	REYES LOPEZ ERIKA YURLEY	1	0			S																	230301	2.630.000	420.800	0	0	0	0	EPS017	2.630.000	105.200	14-11	2.630.000	5	183.100	CCF24	2.630.000	105.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830121507-2	INGEBYP SAS	CRA 68D No 25B-86 OF 327-3	6017561194	ingebypltda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	02/07/2025	87292226	$6.841.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	252.000	0		0		0	0	0	0	252.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	268.000	0		0		0	0	0	0	268.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	688.000	0	0	0	0	0	0		688.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	899.800	0	0	0	0	0	0		899.800	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.600.000	0	0	0	0	0	0		1.600.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.700.000				1.700.000	0	0	1.700.000			17.000	1.700.000	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	977.000	0	0	977.000	8

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830121507-2	INGEBYP SAS		CRA 68D No 25B-86 OF 327-3	6017561194	ingebypltda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	02/07/2025	87292226	$6.841.800	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	977.000	977.000
Pensión	3	3.187.800	3.187.800
Riesgos Laborales	1	1.700.000	1.700.000
CCF	1	977.000	977.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	6.841.800	6.841.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830121507-2	INGEBYP SAS		CRA 68D No 25B-86 OF 327-3	6017561194	ingebypltda@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	02/07/2025	87292226	$6.841.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10182018	ROSAS JURADO FREDY WILLMAN	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1122723202	MARTINEZ MOSQUERA CARLOS ABDON	1	0			S																	231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
3	CC	11516005	PEREZ CELY JOSE MIGUEL	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF24	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
4	CC	26430367	PERDOMO SANTOS MARIA LALY	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
5	CC	36307265	MARQUIN MARQUIN LUZ AIDA	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
6	CC	52093566	TRUJILLO SALAMANCA ADRIANA MARCELA	1	0			S																	231001	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
7	CC	79894001	BOHORQUEZ LESMES JEFFERSON ODILIO	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS002	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	5	348.000	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
8	CC	79952110	BOHORQUEZ LESMES FABIAN OSWALDO	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS001	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	5	348.000	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830121507-2	INGEBYP SAS	CRA 68D No 25B-86 OF 327-3	6017561194	ingebypltda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	04/08/2025	88723949	$6.841.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	252.000	0		0		0	0	0	0	252.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	268.000	0		0		0	0	0	0	268.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	688.000	0	0	0	0	0	0		688.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	899.800	0	0	0	0	0	0		899.800	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.600.000	0	0	0	0	0	0		1.600.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.700.000				1.700.000	0	0	1.700.000			17.000	1.700.000	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	977.000	0	0	977.000	8

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830121507-2	INGEBYP SAS		CRA 68D No 25B-86 OF 327-3	6017561194	ingebypltda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	04/08/2025	88723949	$6.841.800	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	977.000	977.000
Pensión	3	3.187.800	3.187.800
Riesgos Laborales	1	1.700.000	1.700.000
CCF	1	977.000	977.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	6.841.800	6.841.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830121507-2	INGEBYP SAS		CRA 68D No 25B-86 OF 327-3	6017561194	ingebypltda@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	04/08/2025	88723949	$6.841.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10182018	ROSAS JURADO FREDY WILLMAN	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1122723202	MARTINEZ MOSQUERA CARLOS ABDON	1	0			S																	231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
3	CC	11516005	PEREZ CELY JOSE MIGUEL	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF24	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
4	CC	26430367	PERDOMO SANTOS MARIA LALY	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
5	CC	79894001	BOHORQUEZ LESMES JEFFERSON ODILIO	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS002	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	5	348.000	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
6	CC	79952110	BOHORQUEZ LESMES FABIAN OSWALDO	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS001	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	5	348.000	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
7	CC	36307265	MARQUIN MARQUIN LUZ AIDA	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
8	CC	52093566	TRUJILLO SALAMANCA ADRIANA MARCELA	1	0			S																	231001	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901028177-5	BL INGENIERIA SAS	CARRERA 22 No 40 44	4596689	blingenieriasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	FONDO NACIONAL	004	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	18/09/2025	89856965	$3.046.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	285.400	0		0		0	1	200	0	285.600	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	108.000	0		0		0	1	100	0	108.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	250.500	0	0	0	0	1	200	0	250.700	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.322.500	0	0	0	0	1	900	0	1.323.400	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	684.400				684.400	1	500	684.900			6.844	684.900	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	393.400	1	300	393.700	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	393.400	393.700
Pensión	2	1.573.000	1.574.100
Riesgos Laborales	1	684.400	684.900
CCF	1	393.400	393.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	3.044.200	3.046.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901028177-5	BL INGENIERIA SAS		CARRERA 22 No 40 44	4596689	blingenieriasas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	FONDO NACIONAL	004	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	18/09/2025	89856965	$3.046.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002193140	LEOTTAU CHAVEZ JESUS DAVID	1	0			S								X								230301	1.565.041	250.500	0	0	0	0	EPS005	1.565.041	62.700	14-11	1.565.041	5	109.000	CCF24	1.565.041	62.700	0	0	0	0	0
2	CC	1193522871	ROJAS GALINDO DANILO ALBERTO	1	0			S								X								230201	1.565.041	250.500	0	0	0	0	EPS005	1.565.041	62.700	14-11	1.565.041	5	109.000	CCF24	1.565.041	62.700	0	0	0	0	0
3	CC	28541354	PAIVA SUSUNAGA MARIA DEL PILAR	1	0			S																230301	2.700.000	432.000	0	0	0	0	EPS010	2.700.000	108.000	14-11	2.700.000	5	188.000	CCF24	2.700.000	108.000	0	0	0	0	0
4	CC	79909184	BARRETO VARGAS RODOLFO ENRIQUE	1	0			S																230301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	5	278.400	CCF24	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901590075-0	CONSORCIO BS INGENIERIA		CR 68 D 25 B 86	6017561194	contabilidadbsingenieriasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	17/09/2025	89858572	$4.827.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	7.600	0		0		0	1	100	0	7.700	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	10.800	0		0		0	1	100	0	10.900	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	97.700	0		0		0	1	100	0	97.800	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	78.800	0		0		0	1	100	0	78.900	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	275.600	0		0		0	1	200	0	275.800	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	153.000	0		0		0	1	100	0	153.100	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.116.300	0	0	0	0	1	800	0	1.117.100	3
230301	Porvenir	800224808-8	598.800	0	0	0	0	1	400	0	599.200	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	777.600	0	0	0	0	1	500	0	778.100	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.084.600				1.084.600	1	700	1.085.300			10.846	1.085.300	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	623.500	1	400	623.900	9

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901590075-0	CONSORCIO BS INGENIERIA		CR 68 D 25 B 86	6017561194	contabilidadbsingenieriasas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	17/09/2025	89858572	$4.827.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	623.500	624.200
Pensión	3	2.492.700	2.494.400
Riesgos Laborales	1	1.084.600	1.085.300
CCF	1	623.500	623.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	4.824.300	4.827.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901590075-0	CONSORCIO BS INGENIERIA		CR 68 D 25 B 86	6017561194	contabilidadbsingenieriasas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD: SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					9	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-09	2025-08	E	17/09/2025	89858572	$4.827.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1077149719	GORDILLO RODRIGUEZ LEIDY DANIELA	1	0			S		X						X									230301	268.196	43.000	0	0	0	0	EPS002	268.196	10.800	14-11	268.196	5	18.700	CCF24	268.196	10.800	0	0	0	0	0
2	CC	11350203	PEÑA MARTINEZ GERMAN LEONARDO	1	0			S		X						X									230301	843.269	135.000	0	0	0	0	EPS017	843.269	33.800	14-11	843.269	5	58.700	CCF24	843.269	33.800	0	0	0	0	0
3	PT	6122135	REDONDO PEÑA MARLENE COROMOTO	1	0			S	X																25-14	189.800	30.400	0	0	0	0	CCFC55	189.800	7.600	14-11	189.800	5	13.300	CCF24	189.800	7.600	0	0	0	0	0
4	PT	6956462	REDONDO PEÑA MARY EUGENIA	1	0			S								X									230201	1.593.701	255.000	0	0	0	0	EPS037	1.593.701	63.800	14-11	1.593.701	5	111.000	CCF24	1.593.701	63.800	0	0	0	0	0
5	CC	86052493	HERRERA HERRERA JOSE ALFONSO	1	0			S								X									25-14	2.228.478	356.600	0	0	0	0	EPS037	2.228.478	89.200	14-11	2.228.478	5	155.200	CCF24	2.228.478	89.200	0	0	0	0	0
6	CC	1031135149	VARGAS ORTIZ YILBER YANIN	1	0			S								X									230201	3.413.283	546.200	0	0	0	0	EPS017	3.413.283	136.600	14-11	3.413.283	5	237.600	CCF24	3.413.283	136.600	0	0	0	0	0
7	CC	52716243	LOPEZ PEREZ SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	2.440.640	390.600	0	0	0	0	EPS008	2.440.640	97.700	14-11	2.440.640	5	169.900	CCF24	2.440.640	97.700	0	0	0	0	0
8	CC	80087133	MATABANCHOY LUNA GIOVANI FERNANDO	1	0			S								X									230201	1.969.093	315.100	0	0	0	0	EPS010	1.969.093	78.800	14-11	1.969.093	5	137.100	CCF24	1.969.093	78.800	0	0	0	0	0
9	CC	1033781847	REYES LOPEZ ERIKA YURLEY	1	0			S																	230301	2.630.000	420.800	0	0	0	0	EPS017	2.630.000	105.200	14-11	2.630.000	5	183.100	CCF24	2.630.000	105.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830121507-2	INGEBYP SAS	CRA 68D No 25B-86 OF 327-3	6017561194	ingebypltda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	03/09/2025	89467292	$6.846.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	200.000	0		0		0	1	200	0	200.200	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	200.000	0		0		0	1	200	0	200.200	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	252.000	0		0		0	1	200	0	252.200	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	268.000	0		0		0	1	200	0	268.200	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	1	100	0	57.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	688.000	0	0	0	0	1	500	0	688.500	2
231001	Colfondos	800227940-6	899.800	0	0	0	0	1	600	0	900.400	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.600.000	0	0	0	0	1	1.100	0	1.601.100	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.700.000				1.700.000	1	1.100	1.701.100			17.000	1.701.100	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	977.000	1	700	977.700	8

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830121507-2	INGEBYP SAS		CRA 68D No 25B-86 OF 327-3	6017561194	ingebypltda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	03/09/2025	89467292	$6.846.700	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	977.000	977.900
Pensión	3	3.187.800	3.190.000
Riesgos Laborales	1	1.700.000	1.701.100
CCF	1	977.000	977.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	6.841.800	6.846.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830121507-2	INGEBYP SAS		CRA 68D No 25B-86 OF 327-3	6017561194	ingebypltda@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	03/09/2025	89467292	$6.846.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10182018	ROSAS JURADO FREDY WILLMAN	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1122723202	MARTINEZ MOSQUERA CARLOS ABDON	1	0			S																	231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
3	CC	11516005	PEREZ CELY JOSE MIGUEL	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF24	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
4	CC	26430367	PERDOMO SANTOS MARIA LALY	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
5	CC	79894001	BOHORQUEZ LESMES JEFFERSON ODILIO	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS002	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	5	348.000	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
6	CC	79952110	BOHORQUEZ LESMES FABIAN OSWALDO	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS001	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	5	348.000	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
7	CC	36307265	MARQUIN MARQUIN LUZ AIDA	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
8	CC	52093566	TRUJILLO SALAMANCA ADRIANA MARCELA	1	0			S																	231001	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79406468	JOSE MAURICIO GONZALEZ CAYCEDO	CL 150A # 96A-71 INT 09 APTO 201	3002843352	scorpionmg@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	15/09/2025	89476874	$567.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	111.400				111.400	0	0	111.400			1.114	111.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	200.000	200.000
Pensión	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	1	111.400	111.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	567.400	567.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79406468	JOSE MAURICIO GONZALEZ CAYCEDO	CL 150A # 96A-71 INT 09 APTO 201	3002843352	scorpionmg@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	15/09/2025	89476874	$567.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79406468	GONZALEZ CAYCEDO JOSE MAURICIO	57	0			N																	230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	200.000	14-23	1.600.000	5	111.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018479241		ORTIZ SALAZAR NESTOR VICENCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 22 122-85	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7597220	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1728963232	9490902826	I	2025/09/09	2025/08/27	BANCO DE BOGOTA	0	$989,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																													
1	CC	1018479241	ORTIZ NESTOR																	25-14	30	EPS005	30		0	14-23	30	2.436%	0	No
Total	**Afiliados(1)**																													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018479241		ORTIZ SALAZAR NESTOR VICENCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 22 122-85	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7597220	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1728963232	9490902826	I	2025/09/09	2025/08/27	BANCO DE BOGOTA	0	$989,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$511,700	$0	$0	$511,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$511,700	$0	$0	$511,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$77,900	$0	$0	$77,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$77,900	$0	$0	$77,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$399,700	$0	$0	$399,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$399,700	$0	$0	$399,700
TOTAL				**1**	**$989,300**	**$0**	**$0**	**$989,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018479241		ORTIZ SALAZAR NESTOR VICENCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 22 122-85	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7597220	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1774032546	9491760744	I	2025/10/09	2025/09/15	BANCO DE BOGOTA	0	$440,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																													
1	CC 1018479241	ORTIZ NESTOR		X																25-14	30	EPS005	30		0	14-23	30	2.436%	0	No
Total	**Afiliados(1)**																													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018479241		ORTIZ SALAZAR NESTOR VICENCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 22 122-85	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7597220	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1774032546	9491760744	I	2025/10/09	2025/09/15	BANCO DE BOGOTA	0	$440,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,700	$0	$0	$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$440,500	$0	$0	$440,500

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79406468	JOSE MAURICIO GONZALEZ CAYCEDO	CL 150A # 96A-71 INT 09 APTO 201	3002843352	scorpionmg@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	15/10/2025	90302314	$567.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	111.400				111.400	0	0	111.400			1.114	111.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	200.000	200.000
Pensión	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	1	111.400	111.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	567.400	567.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
CC	79406468	JOSE MAURICIO GONZALEZ CAYCEDO	CL 150A # 96A-71 INT 09 APTO 201	3002843352	scorpionmg@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL** / **CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-09	2025-09	I	15/10/2025	90302314	$567.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	79406468	GONZALEZ CAYCEDO JOSE MAURICIO	57	0			N																	230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	200.000	14-23	1.600.000	5	111.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018479241		ORTIZ SALAZAR NESTOR VICENCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 22 122-85	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7597220	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1774032546	9491760744	I	2025/10/09	2025/09/15	BANCO DE BOGOTA	0	$440,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500
1	CC	1018479241 ORTIZ NESTOR		X																25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	0	$0	$0	No	$440,500
Total		**Afiliados(1)**																			$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018479241		ORTIZ SALAZAR NESTOR VICENCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 22 122-85	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7597220	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1774032546	9491760744	I	2025/10/09	2025/09/15	BANCO DE BOGOTA	0	$440,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,700	$0	$0	$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$440,500	$0	$0	$440,500

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901028177-5	BL INGENIERIA SAS	CARRERA 22 No 40 44	4596689	blingenieriasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	FONDO NACIONAL	004	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	21/10/2025	90715203	$2.964.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	274.800	0		0		0	1	200	0	275.000	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	108.000	0		0		0	1	100	0	108.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	231.000	0	0	0	0	1	200	0	231.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.299.800	0	0	0	0	1	800	0	1.300.600	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	666.000				666.000	1	500	666.500			6.660	666.500	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	382.800	1	300	383.100	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	382.800	383.100
Pensión	2	1.530.800	1.531.800
Riesgos Laborales	1	666.000	666.500
CCF	1	382.800	383.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	2.962.400	2.964.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901028177-5	BL INGENIERIA SAS		CARRERA 22 No 40 44	4596689	blingenieriasas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	FONDO NACIONAL	004	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	21/10/2025	90715203	$2.964.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002193140	LEOTTAU CHAVEZ JESUS DAVID	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1193522871	ROJAS GALINDO DANILO ALBERTO	1	0			S								X									230201	1.443.720	231.000	0	0	0	0	EPS005	1.443.720	57.800	14-11	1.443.720	5	100.500	CCF24	1.443.720	57.800	0	0	0	0	0
3	CC	28541354	PAIVA SUSUNAGA MARIA DEL PILAR	1	0			S																	230301	2.700.000	432.000	0	0	0	0	EPS010	2.700.000	108.000	14-11	2.700.000	5	188.000	CCF24	2.700.000	108.000	0	0	0	0	0
4	CC	79909184	BARRETO VARGAS RODOLFO ENRIQUE	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	5	278.400	CCF24	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901028177-5	BL INGENIERIA SAS	CARRERA 22 No 40 44	4596689	blingenieriasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	21/10/2025	90715166	$3.267.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	88.000	0		0		0	1	100	0	88.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	80.000	0		0		0	1	100	0	80.100	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	120.000	0		0		0	1	100	0	120.100	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	68.000	0		0		0	1	100	0	68.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	80.000	0		0		0	1	100	0	80.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	272.000	0	0	0	0	1	200	0	272.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	672.000	0	0	0	0	1	500	0	672.500	2
231001	Colfondos	800227940-6	320.000	0	0	0	0	1	200	0	320.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	480.000	0	0	0	0	1	300	0	480.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	649.300				649.300	1	400	649.700			6.493	649.700	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	436.000	1	300	436.300	5

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
