ACTA PARCIAL DE OBRA

Kr 53 #131a – 72 Int 3 Of 302 Bogotá D.C.
Tel. (601) 6145878
Cel. 3163477044

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 007

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACION Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,988.75	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ 3,542,460,878.33	FECHA TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2026
VALOR FINAL:	$ 11,009,779,867.08	FECHA DEL ACTA:	31 de julio de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 5		MODIFICATORIO 6		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
										ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
	TRABAJOS PRELIMINARES				**$ 469,824,659.32**		**$ 427,858,779.79**		**$ 428,278,369.41**		**$ 420,897,100.94**		**$ 2,409,035.80**		**$ 423,306,137**			**$ 4,972,232.67**
1.1	Demoliciones	m2	798.40	$60,486.00	$ 48,292,215.96	875.700	$ 52,967,590.20	980.71	$ 59,319,309.74	875.70	$ 52,967,782.94	39.83	$ 2,409,036	915.53	$ 55,376,819	93%	65.18	$ 3,942,491.00
1.2	Construcción, Montaje, Mantenimiento y Desmonte de Campamentos y Cerramientos (incluye todas las adecuaciones provisionales en obra, incluye cargue y retiro a centro de disposición autorizado)	Und	1.00	$96,677,827.00	$ 96,677,827.00	1.00	$ 96,677,827.00	1.00	$ 96,677,827.00	1.00	$ 96,677,825.00		$ -	1.00	$ 96,677,825	100%	0.00	$ 2.00
1.3	Construcción de provisionales de energía y acueducto, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	Und	1.00	$73,341,428.00	$ 73,341,428.00	1.00	$ 73,341,428.00	1.00	$ 73,341,428.00	1.00	$ 73,341,426.00		$ -	1.00	$ 73,341,426	100%	0.00	$ 2.00
1.4	Obras Plan de Manejo de Ambiental, incluye todo lo necesario, contemplado el PGAS	gb	1.00	$11,029,422.00	$ 11,029,422.00	1.00	$ 11,029,422.00	1.00	$ 11,029,422.00	1.00	$ 11,029,420.00		$ -	1.00	$ 11,029,420	100%	0.00	$ 2.00
1.5	Obras Plan de Manejo de Tráfico	gb	1.00	$5,839,106.00	$ 5,839,106.00	1.00	$ 5,839,106.00	1.00	$ 5,839,106.00	1.00	$ 5,839,104.00		$ -	1.00	$ 5,839,104	100%	0.00	$ 2.00
1.6	Señalización de zonas intervenidas	un	50.00	$14,381.00	$ 719,050.00	50.00	$ 719,050.00	50.00	$ 719,050.00	50.00	$ 719,048.00		$ -	50.00	$ 719,048	100%	0.00	$ 2.00
1.7	Barrera de delimitación con delineador tubular, tela sintética verde y cinta reflectiva plástica de seguridad	m	200.00	$70,321.00	$ 14,064,200.00	201.56	$ 14,173,900.76	201.56	$ 14,173,900.76	201.56	$ 14,173,898.00		$ -	201.56	$ 14,173,898	100%	0.00	$ 2.76
1.8	Desmonte de puertas (todos los materiales y estructuras - incluye marcos) incluye todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado	un	21.00	$43,968.00	$ 923,328.00	21.00	$ 923,328.00	25.00	$ 1,099,200.00	21.00	$ 923,326.00		$ -	21.00	$ 923,326	84%	4.00	$ 175,874.00
1.9	Desmonte de cielo-raso (todos los materiales y estructuras) incluye cargue y retiro a centro de disposición autorizado	m2	1762.00	$18,003.00	$ 31,721,286.00	495.67	$ 8,923,547.01	495.67	$ 8,923,547.01	495.67	$ 8,923,545.00		$ -	495.67	$ 8,923,545	100%	0.00	$ 2.01
1.1	Desmonte teja fibro-cemento y otros materiales, incluye todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado	m2	461.00	$22,434.00	$ 10,342,074.00	452.67	$ 10,155,198.78	452.67	$ 10,155,198.78	452.67	$ 10,155,196.00		$ -	452.67	$ 10,155,196	100%	0.00	$ 2.78
1.11	Demolición placa de contrapiso hasta e<0.15m, incluye todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado	m2	390.00	$60,759.00	$ 23,696,010.00	422.14	$ 25,648,804.26	422.14	$ 25,648,804.26	422.14	$ 25,648,802.00		$ -	422.14	$ 25,648,802	100%	0.00	$ 2.26
1.12	Demolición de vigas y columnas (vigas de cubierta), incluye todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado	m3	80.00	$341,516.00	$ 27,321,280.00	62.37	$ 21,300,352.92	44.36	$ 15,149,991.28	41.86	$ 14,296,199.00		$ -	41.86	$ 14,296,199	94%	2.50	$ 853,792.28
1.13	Demolición de muros con mampostería de arcilla o cemento espesor máx. de 0.20m, incluye todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado	m2	1735.00	$18,814.00	$ 32,642,290.00	1793.61	$ 33,744,978.54	1795.86	$ 33,787,338.26	1795.86	$ 33,787,289.00		$ -	1795.86	$ 33,787,289	100%	0.00	$ 49.26
1.14	Desmonte de aparatos sanitarios	un	20.00	$35,313.00	$ 706,260.00	6.00	$ 211,878.00	6.00	$ 211,878.00	6.00	$ 211,876.00		$ -	6.00	$ 211,876	100%	0.00	$ 2.00
1.15	Reparación afectacion reforz columnas internas incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	un	27.00	$533,933.00	$ 14,416,191.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	-$ 2.00		$ -	0.00	-$ 2		0.00	$ 2.00
1.16	Demolicion de Tortas placas aereas, incluye todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado	m2	1139.64	$68,524.00	$ 78,092,691.36	1053.68	$ 72,202,368.32	1053.68	$ 72,202,368.32	1053.68	$ 72,202,366.00		$ -	1053.68	$ 72,202,366	100%	0.00	$ 2.32
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				**$ 26,018,278.77**		**$ 35,609,905.45**		**$ 35,832,321.82**		**$ 35,609,366.00**		**$ 221,739.25**		**$ 35,831,105**			**$ 1,216.57**
2.1	Excavacion mecanica a cielo abierto Sotano 1	m3	431.75	$56,031.00	$ 24,191,384.25	346.37	$ 19,407,457.47	346.37	$ 19,407,457.47	346.37	$ 19,407,457.00		$ -	346.37	$ 19,407,457	100%	0.00	$ 0.47
2.2	Excavacion manual vigas/zapatas	m3	9.36	$107,633.00	$ 1,007,444.88	147.32	$ 15,856,493.56	147.32	$ 15,857,010.20	147.32	$ 15,855,955.00		$ -	147.32	$ 15,855,955	100%	0.01	$ 1,055.20
2.3	Relleno material seleccionado	m3	30.84	$26,571.00	$ 819,449.64	13.02	$ 345,954.42	21.37	$ 567,854.16	13.02	$ 345,954.00	8.35	$ 221,739	21.37	$ 567,693	100%	0.01	$ 160.91
3	**CIMENTACIÓN**				**$ 149,493,472.89**		**$ 144,749,538.62**		**$ 142,073,720.01**		**$ 116,733,338.00**		**$ 175,663.55**		**$ 116,909,002**			**$ 25,164,718.46**
3.1	Zapata en concreto de 28 Mpa (4000 psi), incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	m3	9.16	$1,143,096.00	$ 10,470,759.36	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
3.2	Pedestal en concreto de 28 Mpa (4000 psi), incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	m3	0.25	$1,143,096.00	$ 285,774.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
3.3	Suministro, transporte e instalción de Acero Figurado 1/4" - 1", incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	kg	7170.00	$5,889.00	$ 42,224,130.00	12853.10	$ 75,691,905.90	12360.62	$ 72,791,695.30	8360.61	$ 49,235,659.00		$ -	8360.61	$ 49,235,659	68%	4000.01	$ 23,556,036.30
3.4	Bombeo de concreto. incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	m3	68.21	$49,177.00	$ 3,354,363.17	70.00	$ 3,442,390.00	70.00	$ 3,442,390.00	70.00	$ 3,442,390.00		$ -	70.00	$ 3,442,390	100%	0.00	$ -
3.5	Localizacion y replanteo, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	m2	123.36	$9,783.00	$ 1,206,830.88	128.76	$ 1,259,659.08	146.72	$ 1,435,381.33	128.76	$ 1,259,639.00	17.96	$ 175,664	146.71	$ 1,435,303	100%	0.01	$ 78.78
3.6	Concreto de Limpieza 1500 PSi, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	m2	123.36	$49,663.00	$ 6,126,427.68	92.00	$ 4,568,996.00	92.98	$ 4,617,665.74	92.00	$ 4,568,996.00		$ -	92.00	$ 4,568,996	99%	0.98	$ 48,669.74
3.7	Concreto Tanque 28 Mpa (4000 psi), incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	m3	56.84	$1,493,039.00	$ 84,864,336.76	39.40	$ 58,825,736.60	39.40	$ 58,825,736.60	39.00	$ 58,226,654.00		$ -	39.00	$ 58,226,654	99%	0.40	$ 599,082.60
3.8	Perfilada Excavación, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	m2	123.36	$7,789.00	$ 960,851.04	123.36	$ 960,851.04	123.36	$ 960,851.04	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	123.36	$ 960,851.04
4	**ESTRUCTURA**				**$ 468,325,806.23**		**$ 268,502,773.35**		**$ 285,300,025.43**		**$ 214,136,634.00**		**$ 2,782,035.38**		**$ 216,918,669**			**$ 68,381,356.05**
4.1	Acero Figurado 1/4" - 1". Incluye suministro, corte, figuración, amarre y colocación.	kg	17143.00	$5,889.00	$ 100,955,127.00	17143.00	$ 100,955,127.00	17009.61	$ 100,169,575.80	9478.50	$ 55,818,912.00	55.71	$ 328,102	9534.22	$ 56,147,014	56%	7475.39	$ 44,022,561.70
4.2	Ensayo Rotura Cilindros a compresión	un	40.00	$8,113.00	$ 324,520.00	123.00	$ 997,899.00	150.00	$ 1,216,950.00	123.00	$ 997,899.00		$ -	123.00	$ 997,899	82%	27.00	$ 219,051.00
4.3	Bombeo de concreto	m3	54.00	$49,177.00	$ 2,655,558.00	153.15	$ 7,531,457.55	144.50	$ 7,106,076.50	139.50	$ 6,860,191.00		$ -	139.50	$ 6,860,191	97%	5.00	$ 245,885.50
4.4	Placa aérea vigas descolgadas H=0.40 m en concreto de 28 Mpa (4000 psi). , Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación.	m2	399.11	$413,492.00	$ 165,028,792.12		$ 0.00		$ 0.00		$ -			0.00	$ -		0.00	$ -
4.5	Escaleras en concreto de 21 Mpa (3000 psi). Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, formaleta, retiro y disposición de los sobrantes.	m3	13.00	$2,242,852.00	$ 29,157,076.00	13.29	$ 29,807,503.08	13.29	$ 29,807,794.65	10.32	$ 23,151,301.00		$ -	10.32	$ 23,151,301	78%	2.97	$ 6,656,493.65
4.6	Muros en concreto y columnas en concreto de 31 Mpa (4500 psi). Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, formaleta, retiro y disposición de los sobrantes.	m3	32.65	$1,326,092.00	$ 43,296,903.80	0.00	$ 0.00	1.17	$ 1,551,527.64	1.17	$ 1,551,527.00		$ -	1.17	$ 1,551,527	100%	0.00	$ 0.64
4.7	Conector empalme mecánico	un	60.00	$22,002.00	$ 1,320,120.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
4.8	Localizacion y replanteo	m2	108.15	$9,783.00	$ 1,058,031.45	1928.90	$ 18,870,428.70	1723.25	$ 16,858,556.71	1651.33	$ 16,154,955.00		$ -	1651.33	$ 16,154,955	96%	71.92	$ 703,601.71
4.9	Escarificación de superficies de elementos estructurales (vigas y columnas). Incluye todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado.	m2	1630.00	$8,278.00	$ 13,493,140.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 007

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACION Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,988.75	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ 3,542,460,878.33	FECHA TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2026
VALOR FINAL:	$ 11,009,779,867.08	FECHA DEL ACTA:	31 de julio de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 5		MODIFICATORIO 6		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
										ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
4.10	Concreto recalce placas/Losas/Escaleras. Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado.	m3	16.82	$1,131,650.00	$ 19,034,353.00	8.42	$ 9,528,493.00	8.42	$ 9,528,493.00	7.77	$ 8,792,920.00		$ -	7.77	$ 8,792,920	92%	0.65	$ 735,573.00
4.11	Concreto recalce columnas. Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado.	m3	1.89	$1,272,098.00	$ 2,404,265.22		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
4.12	Concreto recalce vigas aéreas. Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado.	m3	11.69	$1,279,624.00	$ 14,958,804.56	35.83	$ 45,848,927.92	44.83	$ 57,360,092.72	35.83	$ 45,846,368.00		$ -	35.83	$ 45,846,368	80%	9.00	$ 11,513,724.72
4.13	Anclaje de acero de vigas en columnas (Incluye perforación hasta 0.15m y epóxico) Ø 7/8. Incluye perforación, puente de adherencia, instalación y todo lo requerido para la correcta ejecución.	un	1263.00	$24,835.00	$ 31,366,605.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
4.14	Acero Figurado 1/4" - 1". Incluye suministro, corte, figuración, amarre y colocación.	kg	2730.60	$5,889.00	$ 16,080,503.40	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
4.15	Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia liquida, color contrastante, resistente a humedad y de aplicación con brocha o rodillo, con un rendimiento aproximado de 0.5 kg/m². Incluye preparación de superficies, herramientas, aplicación, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	60.00	$146,570.00	$ 8,794,200.00	21.66	$ 3,174,706.20	25.64	$ 3,758,054.80	21.66	$ 3,174,352.00	3.98	$ 582,982	25.64	$ 3,757,334	100%	0.00	$ 720.62
4.16	Suministro y aplicación de inhibidor migratorio de corrosión para acero embebido en concreto, base aminas orgánicas, compatible con estructuras de concreto armado, de baja viscosidad, aplicación por aspersión o brocha, con capacidad de penetración mínima de 20 mm, que actúe por migración hacia la superficie del acero, formando una capa protectora que reduzca la velocidad de corrosión. Incluye preparación de superficies, aplicación y materiales auxiliares.	kg	60.00	$30,329.00	$ 1,819,740.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
4.17	Anclajes Epoxicos. Incluye perforación, puente de adherencia, instalación y todo lo requerido para la correcta ejecución.	un	1061.00	$10,927.00	$ 11,593,547.00	1897.00	$ 20,728,519.00	2100.00	$ 22,946,700.00	1897.00	$ 20,728,519.00	159.00	$ 1,737,393	2056.00	$ 22,465,912	98%	44.00	$ 480,788.00
4.18	Malla electrosoldada estandar.Incluye suministro, corte, amarre y colocación.	kg	783.36	$6,363.00	$ 4,984,519.68	4881.30	$ 31,059,711.90	5499.95	$ 34,996,203.61	4881.30	$ 31,059,690.00	20.99	$ 133,558	4902.29	$ 31,193,248	89%	597.67	$ 3,802,955.51
5	**INSTALACIONES HIDRAULICA Y SANITARIA - HYS**						**$ 176,438,158.00**		**$ 183,993,905.84**		**$ 59,576,716.00**		**$ 12,220,552.25**		**$ 71,797,268.25**			**$ 112,196,637.59**
5.1	**CUARTO DE BOMBAS**				**$ 40,008,414.00**		**$ 50,027,336.00**		**$ 50,027,336.00**		**$ 18,429,022.00**		**$ 0.00**		**$ 18,429,022**			**$ 31,598,314.00**
5.101	TUBERIA POLIPROPILENO 3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación	ML	13.00	$83,167.00	$ 1,081,171.00	13.00	$ 1,081,171.00	13.00	$ 1,081,171.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	13.00	$ 1,081,171.00
5.102	ACCESORIOS POLIPROPILENO 3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación	UN	9.00	$59,362.00	$ 534,258.00	9.00	$ 534,258.00	9.00	$ 534,258.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	9.00	$ 534,258.00
5.103	TUBERIA POLIPROPILENO 2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación	ML	16.00	$69,306.00	$ 1,108,896.00	16.00	$ 1,108,896.00	16.00	$ 1,108,896.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.00	$ 1,108,896.00
5.104	ACCESORIOS POLIPROPILENO 2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación	UN	28.00	$49,468.00	$ 1,385,104.00	28.00	$ 1,385,104.00	28.00	$ 1,385,104.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	28.00	$ 1,385,104.00
5.105	TUBERIA POLIPROPILENO 2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación	ML	2.00	$55,445.00	$ 110,890.00	2.00	$ 110,890.00	2.00	$ 110,890.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.00	$ 110,890.00
5.106	ACCESORIOS POLIPROPILENO 2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación	UN	5.00	$39,574.00	$ 197,870.00	5.00	$ 197,870.00	5.00	$ 197,870.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	5.00	$ 197,870.00
5.107	TUBERIA POLIPROPILENO 6.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación	ML	4.00	$46,524.00	$ 186,096.00	4.00	$ 186,096.00	4.00	$ 186,096.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.00	$ 186,096.00
5.108	ACCESORIOS POLIPROPILENO 6.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación	UN	9.00	$36,236.00	$ 326,124.00	9.00	$ 326,124.00	9.00	$ 326,124.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	9.00	$ 326,124.00
5.109	VALVULA DE PIE 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$1,397,234.00	$ 1,397,234.00	1.00	$ 1,397,234.00	1.00	$ 1,397,234.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 1,397,234.00
5.110	VALVULA PASO DIRECTO 3"	UN	3.00	$2,006,350.00	$ 6,019,050.00	3.00	$ 6,019,050.00	3.00	$ 6,019,050.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.00	$ 6,019,050.00
5.111	VALVULA PASO DIRECTO 2.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$1,561,626.00	$ 6,246,504.00	4.00	$ 6,246,504.00	4.00	$ 6,246,504.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.00	$ 6,246,504.00
5.112	VALVULA PASO DIRECTO 2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$959,042.00	$ 959,042.00	1.00	$ 959,042.00	1.00	$ 959,042.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 959,042.00
5.113	VALVULA PASO DIRECTO 6.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$597,491.00	$ 1,194,982.00	2.00	$ 1,194,982.00	2.00	$ 1,194,982.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.00	$ 1,194,982.00
5.114	VALVULA CHEQUE 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$2,452,897.00	$ 4,905,794.00	2.00	$ 4,905,794.00	2.00	$ 4,905,794.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.00	$ 4,905,794.00
5.115	VALVULA CHEQUE 1.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$453,550.00	$ 453,550.00	1.00	$ 453,550.00	1.00	$ 453,550.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 453,550.00
5.116	JUNTA DE EXPANSIÓN 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$474,908.00	$ 949,816.00	2.00	$ 949,816.00	2.00	$ 949,816.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.00	$ 949,816.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 007

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACION Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,988.75	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ 3,542,460,878.33	FECHA TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2026
VALOR FINAL:	$ 11,009,779,867.08	FECHA DEL ACTA:	31 de julio de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 5		MODIFICATORIO 6		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
										ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
5.117	JUNTA DE EXPANSIÓN 2.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$474,908.00	$ 1,424,724.00	3.00	$ 1,424,724.00	3.00	$ 1,424,724.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.00	$ 1,424,724.00
5.118	BRIDA 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$126,789.00	$ 507,156.00	4.00	$ 507,156.00	4.00	$ 507,156.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.00	$ 507,156.00
5.119	BRIDA 2.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	6.00	$105,659.00	$ 633,954.00	6.00	$ 633,954.00	6.00	$ 633,954.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	6.00	$ 633,954.00
5.120	SOPORTE 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	11.00	$21,369.00	$ 235,059.00	11.00	$ 235,059.00	11.00	$ 235,059.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	11.00	$ 235,059.00
5.121	SOPORTE 2.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	14.00	$20,586.00	$ 288,204.00	14.00	$ 288,204.00	14.00	$ 288,204.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	14.00	$ 288,204.00
5.122	SOPORTE 2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$20,287.00	$ 40,574.00	2.00	$ 40,574.00	2.00	$ 40,574.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.00	$ 40,574.00
5.123	SOPORTE 1.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$19,527.00	$ 78,108.00	4.00	$ 78,108.00	4.00	$ 78,108.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.00	$ 78,108.00
5.124	MANÓMETRO. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$127,217.00	$ 381,651.00	3.00	$ 381,651.00	3.00	$ 381,651.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.00	$ 381,651.00
5.125	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$952,503.00	$ 952,503.00	1.00	$ 952,503.00	1.00	$ 952,503.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 952,503.00
5.126	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE 4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$2,145,096.00	$ 2,145,096.00	4.00	$ 8,580,384.00	4.00	$ 8,580,384.00	4.00	$ 8,580,384.00		$ -	4.00	$ 8,580,384	100%	0.00	$ -
5.127	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$1,608,822.00	$ 4,826,466.00	5.00	$ 8,044,110.00	5.00	$ 8,044,110.00	5.00	$ 8,044,110.00		$ -	5.00	$ 8,044,110	100%	0.00	$ -
5.128	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE 2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$1,072,548.00	$ 1,072,548.00	1.00	$ 1,072,548.00	1.00	$ 1,072,548.00	1.00	$ 1,072,548.00		$ -	1.00	$ 1,072,548	100%	0.00	$ -
5.129	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE 1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$365,990.00	$ 365,990.00	2.00	$ 731,980.00	2.00	$ 731,980.00	2.00	$ 731,980.00		$ -	2.00	$ 731,980	100%	0.00	$ -
5.200	**ACOMETIDA**				**$ 4,367,385.00**		**$ 4,367,385.00**		**$ 4,869,667.92**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		$ -			**$ 4,869,667.92**
5.201	TUBERÍA PVC-P Ø=1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	26.00	$10,126.00	$ 263,276.00	26.00	$ 263,276.00	73.92	$ 748,513.92	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	73.92	$ 748,513.92
5.202	ACCESORIO PVC-P Ø=1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	12.00	$2,435.00	$ 29,220.00	12.00	$ 29,220.00	19.00	$ 46,265.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	19.00	$ 46,265.00
5.203	TUBERIA POLIPROPILENO 1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	16.00	$12,016.00	$ 192,256.00	16.00	$ 192,256.00	16.00	$ 192,256.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.00	$ 192,256.00
5.204	ACCESORIOS POLIPROPILENO 1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	23.00	$10,901.00	$ 250,723.00	23.00	$ 250,723.00	23.00	$ 250,723.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	23.00	$ 250,723.00
5.205	REGISTRO PASO DIRECTO O COMPUERTA Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$120,668.00	$ 482,672.00	4.00	$ 482,672.00	4.00	$ 482,672.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.00	$ 482,672.00
5.206	VALVULA CHEQUE 1/2. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$109,992.00	$ 109,992.00	1.00	$ 109,992.00	1.00	$ 109,992.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 109,992.00
5.207	MEDIDOR 1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$1,203,935.00	$ 1,203,935.00	1.00	$ 1,203,935.00	1.00	$ 1,203,935.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 1,203,935.00
5.208	FILTRO Y 1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$184,604.00	$ 184,604.00	1.00	$ 184,604.00	1.00	$ 184,604.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 184,604.00
5.209	CAJA PARA MEDIDOR. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$855,619.00	$ 855,619.00	1.00	$ 855,619.00	1.00	$ 855,619.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 855,619.00
5.210	VALVULA Y FLOTADOR. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$397,544.00	$ 795,088.00	2.00	$ 795,088.00	2.00	$ 795,088.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.00	$ 795,088.00
5.300	**RED DE AGUA FRIA**				**$ 7,527,146.00**		**$ 7,849,398.00**		**$ 10,414,136.92**		**$ 4,852,544.00**		**$ 1,830,135.25**		**$ 6,682,679**			**$ 3,731,457.67**
5.301	TUBERÍA PVC-P Ø=2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	14.00	$43,177.00	$ 604,478.00	14.00	$ 604,478.00	43.65	$ 1,884,676.05	13.91	$ 600,592.00	18.60	$ 803,092	32.51	$ 1,403,684	74%	11.14	$ 480,991.85
5.302	TUBERÍA PVC-P Ø=2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	14.00	$35,347.00	$ 494,858.00	14.00	$ 494,858.00	14.00	$ 494,858.00	8.24	$ 291,259.00		$ -	8.24	$ 291,259	59%	5.76	$ 203,599.00
5.303	TUBERÍA PVC-P Ø=1.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	17.00	$23,695.00	$ 402,815.00	17.00	$ 402,815.00	35.43	$ 839,513.85	17.00	$ 402,815.00	8.43	$ 199,749	25.43	$ 602,564	72%	10.00	$ 236,950.00
5.304	TUBERÍA PVC-P Ø=1.1/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	91.00	$18,956.00	$ 1,724,996.00	91.00	$ 1,724,996.00	92.10	$ 1,745,847.60	48.95	$ 927,896.00		$ -	48.95	$ 927,896	53%	43.15	$ 817,951.60
5.305	TUBERÍA PVC-P Ø=1". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	7.00	$18,956.00	$ 132,692.00	24.00	$ 454,944.00	24.00	$ 454,944.00	18.36	$ 348,032.00		$ -	18.36	$ 348,032	77%	5.64	$ 106,912.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 007

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACION Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,988.75	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ 3,542,460,878.33	FECHA TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2026
VALOR FINAL:	$ 11,009,779,867.08	FECHA DEL ACTA:	31 de julio de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 5		MODIFICATORIO 6		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
										ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
5.306	TUBERÍA PVC-P Ø=1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	53.00	$10,126.00	$ 536,678.00	53.00	$ 536,678.00	134.67	$ 1,363,668.42	52.97	$ 536,374.00	81.70	$ 827,294	134.67	$ 1,363,668	100%	0.00	$ 0.22
5.307	ACCESORIO PVC-P Ø=2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	13.00	$48,410.00	$ 629,330.00	13.00	$ 629,330.00	13.00	$ 629,330.00	13.00	$ 629,330.00		$ -	13.00	$ 629,330	100%	0.00	$ -
5.308	ACCESORIO PVC-P Ø=2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	11.00	$16,721.00	$ 183,931.00	11.00	$ 183,931.00	11.00	$ 183,931.00	4.00	$ 66,884.00		$ -	4.00	$ 66,884	36%	7.00	$ 117,047.00
5.309	ACCESORIO PVC-P Ø=1.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	10.00	$14,603.00	$ 146,030.00	10.00	$ 146,030.00	10.00	$ 146,030.00	6.00	$ 87,618.00		$ -	6.00	$ 87,618	60%	4.00	$ 58,412.00
5.310	ACCESORIO PVC-P Ø=1.1/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	153.00	$10,431.00	$ 1,595,943.00	153.00	$ 1,595,943.00	153.00	$ 1,595,943.00	50.00	$ 521,550.00		$ -	50.00	$ 521,550	33%	103.00	$ 1,074,393.00
5.311	ACCESORIO PVC-P Ø=1". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	20.00	$5,524.00	$ 110,480.00	20.00	$ 110,480.00	20.00	$ 110,480.00	12.00	$ 66,288.00		$ -	12.00	$ 66,288	60%	8.00	$ 44,192.00
5.312	ACCESORIO PVC-P Ø=1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	79.00	$2,435.00	$ 192,365.00	79.00	$ 192,365.00	79.00	$ 192,365.00	76.00	$ 185,060.00		$ -	76.00	$ 185,060	96%	3.00	$ 7,305.00
5.313	SOPORTE 2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$14,878.00	$ 59,512.00	4.00	$ 59,512.00	4.00	$ 59,512.00	4.00	$ 59,512.00		$ -	4.00	$ 59,512	100%	0.00	$ -
5.314	SOPORTE 1.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	6.00	$13,143.00	$ 78,858.00	6.00	$ 78,858.00	6.00	$ 78,858.00	2.00	$ 26,286.00		$ -	2.00	$ 26,286	33%	4.00	$ 52,572.00
5.315	SOPORTE 1.1/4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	35.00	$12,881.00	$ 450,835.00	35.00	$ 450,835.00	35.00	$ 450,835.00	8.00	$ 103,048.00		$ -	8.00	$ 103,048	23%	27.00	$ 347,787.00
5.316	SOPORTE 1". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$12,623.00	$ 37,869.00	3.00	$ 37,869.00	3.00	$ 37,869.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.00	$ 37,869.00
5.317	SOPORTE 1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	12.00	$12,123.00	$ 145,476.00	12.00	$ 145,476.00	12.00	$ 145,476.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	12.00	$ 145,476.00
5.400	**VALVULAS**				**$ 6,825,748.00**		**$ 6,825,748.00**		**$ 6,825,748.00**		**$ 5,184,464.00**		**$ 0.00**		**$ 5,184,464**			**$ 1,641,284.00**
5.401	REGISTRO PASO DIRECTO O COMPUERTA Ø=1.1/4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	14.00	$289,640.00	$ 4,054,960.00	14.00	$ 4,054,960.00	14.00	$ 4,054,960.00	13.00	$ 3,765,320.00		$ -	13.00	$ 3,765,320	93%	1.00	$ 289,640.00
5.402	REGISTRO PASO DIRECTO O COMPUERTA Ø=1". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$231,712.00	$ 926,848.00	4.00	$ 926,848.00	4.00	$ 926,848.00	3.00	$ 695,136.00		$ -	3.00	$ 695,136	75%	1.00	$ 231,712.00
5.403	REGISTRO PASO DIRECTO O COMPUERTA Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	13.00	$120,668.00	$ 1,568,684.00	13.00	$ 1,568,684.00	13.00	$ 1,568,684.00	6.00	$ 724,008.00		$ -	6.00	$ 724,008	46%	7.00	$ 844,676.00
5.404	VALVULA EXPULSORA DE AIRE Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$68,814.00	$ 275,256.00	4.00	$ 275,256.00	4.00	$ 275,256.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.00	$ 275,256.00
5.500	**PUNTOS HIDRAULICOS AGUA POTABLE**				**$ 4,661,409.00**		**$ 4,661,409.00**		**$ 4,920,704.00**		**$ 2,823,530.00**		**$ 259,295.00**		**$ 3,082,825**			**$ 1,837,879.00**
5.501	PUNTO HIDRAULICO PARA LAVAMANOS Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	16.00	$51,859.00	$ 829,744.00	16.00	$ 829,744.00	21.00	$ 1,089,039.00	16.00	$ 829,744.00	5.00	$ 259,295	21.00	$ 1,089,039	100%	0.00	$ -
5.502	PUNTO HIDRAULICO PARA SANITARIO DE PUSH ANTIVANDALICO Ø=1.1/4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	16.00	$138,319.00	$ 2,213,104.00	16.00	$ 2,213,104.00	16.00	$ 2,213,104.00	10.00	$ 1,383,190.00		$ -	10.00	$ 1,383,190	63%	6.00	$ 829,914.00
5.503	PUNTO HIDRAULICO PARA LLAVE MANGUERAØ=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$51,859.00	$ 155,577.00	3.00	$ 155,577.00	3.00	$ 155,577.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.00	$ 155,577.00
5.504	PUNTO HIDRAULICO PARA POCETAS Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$51,859.00	$ 207,436.00	4.00	$ 207,436.00	4.00	$ 207,436.00	3.00	$ 155,577.00		$ -	3.00	$ 155,577	75%	1.00	$ 51,859.00
5.505	PUNTO HIDRAULICO PARA LAVAPLATOS Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$51,859.00	$ 103,718.00	2.00	$ 103,718.00	2.00	$ 103,718.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.00	$ 103,718.00
5.506	PUNTO HIDRAULICO PARA RECAMARA DE AIRE pvcp 1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	41.00	$23,034.00	$ 944,394.00	41.00	$ 944,394.00	41.00	$ 944,394.00	13.00	$ 299,442.00		$ -	13.00	$ 299,442	32%	28.00	$ 644,952.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 007

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACION Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,988.75	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ 3,542,460,878.33	FECHA TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2026
VALOR FINAL:	$ 11,009,779,867.08	FECHA DEL ACTA:	31 de julio de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 5		MODIFICATORIO 6		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
										ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
5.507	PUNTO HIDRAULICO PARA ORINAL ø1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$51,859.00	$ 207,436.00	4.00	$ 207,436.00	4.00	$ 207,436.00	3.00	$ 155,577.00		$ -	3.00	$ 155,577	75%	1.00	$ 51,859.00
5.600	**SALIDAS SANITARIAS**				**$ 7,201,369.00**		**$ 7,201,369.00**		**$ 8,721,786.00**		**$ 6,954,353.00**		**$ 760,691.00**		**$ 7,715,044**			**$ 1,006,742.00**
5.601	PUNTO SANITARIO PARA LAVAMANOS Ø=2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	16.00	$123,508.00	$ 1,976,128.00	16.00	$ 1,976,128.00	16.00	$ 1,976,128.00	16.00	$ 1,976,128.00		$ -	16.00	$ 1,976,128	100%	0.00	$ -
5.602	PUNTO SANITARIO PARA SANITARIO DE FLUXOMETRO Ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	16.00	$145,486.00	$ 2,327,776.00	16.00	$ 2,327,776.00	16.00	$ 2,327,776.00	16.00	$ 2,327,776.00		$ -	16.00	$ 2,327,776	100%	0.00	$ -
5.603	PUNTO SANITARIO PARA LAVAPLATOS Ø=2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$123,508.00	$ 247,016.00	2.00	$ 247,016.00	2.00	$ 247,016.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.00	$ 247,016.00
5.604	PUNTO SANITARIO PARA ORINAL Ø=2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$123,508.00	$ 494,032.00	4.00	$ 494,032.00	4.00	$ 494,032.00	4.00	$ 494,032.00		$ -	4.00	$ 494,032	100%	0.00	$ -
5.605	PUNTO SANITARIO PARA SIFONES 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	5.00	$126,621.00	$ 633,105.00	5.00	$ 633,105.00	14.00	$ 1,772,694.00	5.00	$ 633,105.00	3.00	$ 379,863	8.00	$ 1,012,968	57%	6.00	$ 759,726.00
5.606	PUNTO SANITARIO PARA SIFONES 2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	16.00	$95,207.00	$ 1,523,312.00	16.00	$ 1,523,312.00	20.00	$ 1,904,140.00	16.00	$ 1,523,312.00	4.00	$ 380,828	20.00	$ 1,904,140	100%	0.00	$ -
5.700	**VENTILACIONES Y REVENTILACIONES**				**$ 1,583,942.00**		**$ 1,583,942.00**		**$ 1,583,942.00**		**$ 1,583,942.00**		**$ 0.00**		**$ 1,583,942**			**$ 0.00**
5.701	TUBERÍA PVC-L ø=2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	49.00	$21,086.00	$ 1,033,214.00	49.00	$ 1,033,214.00	49.00	$ 1,033,214.00	49.00	$ 1,033,214.00		$ -	49.00	$ 1,033,214	100%	0.00	$ -
5.702	TUBERÍA PVC-L ø=3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	18.00	$30,596.00	$ 550,728.00	18.00	$ 550,728.00	18.00	$ 550,728.00	18.00	$ 550,728.00		$ -	18.00	$ 550,728	100%	0.00	$ -
5.8	**RED GENERAL DE AGUAS RESIDUALES**				**$ 32,324,270.00**		**$ 32,358,256.00**		**$ 33,065,575.00**		**$ 10,229,195.00**		**$ 408,054.00**		**$ 10,637,249**			**$ 22,428,326.00**
5.801	TUBERÍA PVC-S Ø=4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	95.00	$40,442.00	$ 3,841,990.00	95.00	$ 3,841,990.00	95.00	$ 3,841,990.00	95.00	$ 3,841,990.00		$ -	95.00	$ 3,841,990	100%	0.00	$ -
5.802	TUBERÍA PVC-S Ø=3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	38.00	$32,308.00	$ 1,227,704.00	38.00	$ 1,227,704.00	38.00	$ 1,227,704.00	16.65	$ 537,928.00		$ -	16.65	$ 537,928	44%	21.35	$ 689,776.00
5.803	TUBERÍA PVC-S Ø=2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	60.00	$22,284.00	$ 1,337,040.00	60.00	$ 1,337,040.00	60.00	$ 1,337,040.00	25.40	$ 566,013.00		$ -	25.40	$ 566,013	42%	34.60	$ 771,027.00
5.804	ACCESORIOS PVC-S Ø=4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	120.00	$30,875.00	$ 3,705,000.00	120.00	$ 3,705,000.00	120.00	$ 3,705,000.00	96.00	$ 2,964,000.00		$ -	96.00	$ 2,964,000	80%	24.00	$ 741,000.00
5.805	ACCESORIOS PVC-S Ø=3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	15.00	$19,951.00	$ 299,265.00	15.00	$ 299,265.00	48.00	$ 957,648.00	15.00	$ 299,265.00	18.00	$ 359,118	33.00	$ 658,383	69%	15.00	$ 299,265.00
5.806	ACCESORIOS PVC-S Ø=2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	144.00	$12,234.00	$ 1,761,696.00	144.00	$ 1,761,696.00	148.00	$ 1,810,632.00	144.00	$ 1,761,696.00	4.00	$ 48,936	148.00	$ 1,810,632	100%	0.00	$ -
5.807	TUBERÍA PVC-ALC Ø=6". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	13.00	$68,382.00	$ 888,966.00	13.00	$ 888,966.00	13.00	$ 888,966.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	13.00	$ 888,966.00
5.808	ABRAZADERAS Ø=2 Y 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	20.00	$6,640.00	$ 132,800.00	20.00	$ 132,800.00	20.00	$ 132,800.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	20.00	$ 132,800.00
5.809	ABRAZADERAS Ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	25.00	$14,777.00	$ 369,425.00	25.00	$ 369,425.00	25.00	$ 369,425.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	25.00	$ 369,425.00
5.810	JUNTA EXPANSIÓN Ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	8.00	$45,316.00	$ 362,528.00	8.00	$ 362,528.00	8.00	$ 362,528.00	3.00	$ 135,948.00		$ -	3.00	$ 135,948	38%	5.00	$ 226,580.00
5.811	JUNTA EXPANSIÓN Ø=3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$33,986.00	$ 101,958.00	4.00	$ 135,944.00	4.00	$ 135,944.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.00	$ 135,944.00
5.812	TAPÓN DE INSPECCIÓN Ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	6.00	$40,785.00	$ 244,710.00	6.00	$ 244,710.00	6.00	$ 244,710.00	3.00	$ 122,355.00		$ -	3.00	$ 122,355	50%	3.00	$ 122,355.00
5.813	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MINIVENT Ø2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$172,150.00	$ 688,600.00	4.00	$ 688,600.00	4.00	$ 688,600.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.00	$ 688,600.00
5.814	TUBERÍA PVC-P Ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	18.00	$115,340.00	$ 2,076,120.00	18.00	$ 2,076,120.00	18.00	$ 2,076,120.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	18.00	$ 2,076,120.00
5.815	ACCESORIO PVC-P Ø=4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	22.00	$89,821.00	$ 1,976,062.00	22.00	$ 1,976,062.00	22.00	$ 1,976,062.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	22.00	$ 1,976,062.00
5.816	VALVULA PASO DIRECTO TIPO PESADO 4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$3,570,884.00	$ 7,141,768.00	2.00	$ 7,141,768.00	2.00	$ 7,141,768.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.00	$ 7,141,768.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 007

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,988.75	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ 3,542,460,878.33	FECHA TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2026
VALOR FINAL:	$ 11,009,779,867.08	FECHA DEL ACTA:	31 de julio de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 5		MODIFICATORIO 6		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
										ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
5.817	VALVULA CHEQUE TIPO PESADO ø4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$2,356,643.00	$ 4,713,286.00	2.00	$ 4,713,286.00	2.00	$ 4,713,286.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.00	$ 4,713,286.00
5.818	VÁLVULA UNIVERSAL ø4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$727,676.00	$ 1,455,352.00	2.00	$ 1,455,352.00	2.00	$ 1,455,352.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.00	$ 1,455,352.00
5.9	**RED GENERAL DE AGUAS LLUVIAS**				**$ 27,518,763.00**		**$ 27,518,763.00**		**$ 27,518,763.00**		**$ 6,759,305.00**		**$ -**		**$ 6,759,305.00**			**$ 20,759,458.00**
5.901	TUBERÍA PVC-S ø=4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	136.00	$40,442.00	$ 5,500,112.00	136.00	$ 5,500,112.00	150.20	$ 6,074,335.80	60.00	$ 2,426,520.00		$ -	60.00	$ 2,426,520	40%	90.20	$ 3,647,815.80
5.902	TUBERÍA PVC-S ø=3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	70.00	$32,308.00	$ 2,261,560.00	70.00	$ 2,261,560.00	70.00	$ 2,261,560.00	12.00	$ 387,696.00		$ -	12.00	$ 387,696	17%	58.00	$ 1,873,864.00
5.903	ACCESORIOS PVC-S ø=4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	74.00	$30,875.00	$ 2,284,750.00	74.00	$ 2,284,750.00	74.00	$ 2,284,750.00	30.00	$ 926,250.00		$ -	30.00	$ 926,250	41%	44.00	$ 1,358,500.00
5.904	ACCESORIOS PVC-S ø=3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	42.00	$19,951.00	$ 837,942.00	42.00	$ 837,942.00	42.00	$ 837,942.00	4.00	$ 79,804.00		$ -	4.00	$ 79,804	10%	38.00	$ 758,138.00
5.905	TUBERÍA PVC-C ø=4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	3.00	$40,442.00	$ 121,326.00	3.63	$ 146,883.80	4.00	$ 161,768.00	3.63	$ 146,804.00		$ -	3.63	$ 146,804	91%	0.37	$ 14,964.00
5.906	GRAVA PARA FILTRO	M3	3.00	$253,503.00	$ 760,509.00	2.40	$ 608,407.20	2.40	$ 608,407.20	2.40	$ 608,407.00		$ -	2.40	$ 608,407	100%	0.00	$ 0.20
5.907	GEOTEXTIL NO TEJIDO REF. 1600. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	10.00	$31,636.00	$ 316,360.00	14.00	$ 442,904.00	14.00	$ 442,904.00	14.00	$ 442,904.00		$ -	14.00	$ 442,904	100%	0.00	$ -
5.908	GEODREN H TOTAL 4.50m. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	5.00	$286,554.00	$ 1,432,770.00	5.00	$ 1,432,770.00	5.00	$ 1,432,770.00	5.00	$ 1,432,770.00		$ -	5.00	$ 1,432,770	100%	0.00	$ -
5.909	ABRAZADERAS ø=3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	30.00	$6,640.00	$ 199,200.00	30.00	$ 199,200.00	30.00	$ 199,200.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	30.00	$ 199,200.00
5.910	ABRAZADERAS ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	16.00	$14,777.00	$ 236,432.00	16.00	$ 236,432.00	16.00	$ 236,432.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.00	$ 236,432.00
5.911	JUNTA EXPANSIÓN ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	18.00	$45,316.00	$ 815,688.00	18.00	$ 815,688.00	5.00	$ 226,580.00	5.00	$ 226,580.00		$ -	5.00	$ 226,580	100%	0.00	$ -
5.912	TAPÓN DE INSPECCIÓN ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$40,785.00	$ 81,570.00	2.00	$ 81,570.00	2.00	$ 81,570.00	2.00	$ 81,570.00		$ -	2.00	$ 81,570	100%	0.00	$ -
5.913	TAPÓN DE INSPECCIÓN ø=3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$30,588.00	$ 91,764.00	3.00	$ 91,764.00	3.00	$ 91,764.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.00	$ 91,764.00
5.914	TUBERÍA PVC-P ø=3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	24.00	$58,032.00	$ 1,392,768.00	24.00	$ 1,392,768.00	24.00	$ 1,392,768.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	24.00	$ 1,392,768.00
5.915	ACCESORIO PVC-P ø=3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	48.00	$67,366.00	$ 3,233,568.00	48.00	$ 3,233,568.00	48.00	$ 3,233,568.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	48.00	$ 3,233,568.00
5.916	CODO 4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$145,486.00	$ 436,458.00	3.00	$ 436,458.00	3.00	$ 436,458.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.00	$ 436,458.00
5.917	SIFONES 4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	6.00	$145,486.00	$ 872,916.00	6.00	$ 872,916.00	6.00	$ 872,916.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	6.00	$ 872,916.00
5.918	SIFONES 3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	5.00	$126,621.00	$ 633,105.00	5.00	$ 633,105.00	5.00	$ 633,105.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	5.00	$ 633,105.00
5.919	CODO 3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	5.00	$126,621.00	$ 633,105.00	5.00	$ 633,105.00	5.00	$ 633,105.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	5.00	$ 633,105.00
5.920	VALVULA PASO DIRECTO TIPO PESADO ø3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$1,248,415.00	$ 2,496,830.00	2.00	$ 2,496,830.00	2.00	$ 2,496,830.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.00	$ 2,496,830.00
5.921	VALVULA CHEQUE TIPO PESADO ø3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$894,258.00	$ 1,788,516.00	2.00	$ 1,788,516.00	2.00	$ 1,788,516.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.00	$ 1,788,516.00
5.922	VÁLVULA UNIVERSAL ø3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$545,757.00	$ 1,091,514.00	2.00	$ 1,091,514.00	2.00	$ 1,091,514.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.00	$ 1,091,514.00
5.10	**ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERIA Y CONCRETO**				**$ 5,998,949.00**		**$ 5,998,949.00**		**$ 5,998,949.00**		**$ 1,636,846.00**		**$ 0.00**		**$ 1,636,846**			**$ 4,362,103.00**
5.101	CAJA DE INSPECCION 0,70*0,70. Incluye tapa en concreto y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación.	UN	2.00	$818,423.00	$ 1,636,846.00	2.00	$ 1,636,846.00	2.00	$ 1,636,846.00	2.00	$ 1,636,846.00		$ -	2.00	$ 1,636,846	100%	0.00	$ -
5.102	POZO DE BOMBEO CUARTO DE BOMBAS. Incluye todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación.	UN	1.00	$3,690,043.00	$ 3,690,043.00	1.00	$ 3,690,043.00	1.00	$ 3,690,043.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 3,690,043.00
5.103	CONEXIÓN A RED EXISTENTE. Incluye todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación.	UN	1.00	$672,060.00	$ 672,060.00	1.00	$ 672,060.00	1.00	$ 672,060.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 672,060.00
5.11	**MONTAJE DE APARATOS**				**$ 4,106,674.00**		**$ 4,106,674.00**		**$ 4,106,674.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**			**$ 4,106,674.00**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 007

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,988.75	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ 3,542,460,878.33	FECHA TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2026
VALOR FINAL:	$ 11,009,779,867.08	FECHA DEL ACTA:	31 de julio de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 5		MODIFICATORIO 6		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
										ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
5.111	LAVAMANOS Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	16.00	$84,890.00	$ 1,358,240.00	16.00	$ 1,358,240.00	16.00	$ 1,358,240.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.00	$ 1,358,240.00
5.112	SANITARIO DE FLUXOMETRO Ø=1.1/4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	16.00	$102,804.00	$ 1,644,864.00	16.00	$ 1,644,864.00	16.00	$ 1,644,864.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.00	$ 1,644,864.00
5.113	LLAVE MANGUERAØ=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$84,890.00	$ 254,670.00	3.00	$ 254,670.00	3.00	$ 254,670.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.00	$ 254,670.00
5.114	POCETAS Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$84,890.00	$ 339,560.00	4.00	$ 339,560.00	4.00	$ 339,560.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.00	$ 339,560.00
5.115	LAVAPLATOS Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$84,890.00	$ 169,780.00	2.00	$ 169,780.00	2.00	$ 169,780.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.00	$ 169,780.00
5.116	ORINAL ø1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$84,890.00	$ 339,560.00	4.00	$ 339,560.00	4.00	$ 339,560.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.00	$ 339,560.00
5.12	**EXCAVACIONES**				**$ 14,976,552.00**		**$ 14,976,552.00**		**$ 14,976,552.00**		**$ 1,123,515.00**		**$ 0.00**		**$ 1,123,515**			**$ 13,853,037.00**
5.121	EXCAVACIÓN EN TERRENO COMÚN	M3	103.00	$28,358.00	$ 2,920,874.00	103.00	$ 2,920,874.00	103.00	$ 2,920,874.00	16.37	$ 464,333.00		$ -	16.37	$ 464,333	16%	86.63	$ 2,456,541.00
5.122	RELLENO EN ARENA	M3	66.00	$109,967.00	$ 7,257,822.00	66.00	$ 7,257,822.00	66.00	$ 7,257,822.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	66.00	$ 7,257,822.00
5.123	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	32.00	$48,785.00	$ 1,561,120.00	32.00	$ 1,561,120.00	32.00	$ 1,561,120.00	13.51	$ 659,182.00		$ -	13.51	$ 659,182	42%	18.49	$ 901,938.00
5.124	RETIRO DE SOBRANTES	M3	128.00	$25,287.00	$ 3,236,736.00	128.00	$ 3,236,736.00	128.00	$ 3,236,736.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	128.00	$ 3,236,736.00
5.13	**EQUIPOS**				**$ 8,962,377.00**		**$ 8,962,377.00**		**$ 8,962,377.00**		**$ 0.00**		**$ 8,962,377.00**		**$ 8,962,377**			**$ 0.00**
5.131	EQUIPO EYECTOR CUARTO DE BOMBAS 2 BOMBAS SUMERGIBLES TIPO PIRAÑA AUTOCEBANTES PARA EL 100% CON ALTERNANCIA AUTOMÁTICA QT=7,9 L/S; CDT= 9 M.C.A. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	GL	1.00	$8,962,377.00	$ 8,962,377.00	1.00	$ 8,962,377.00	1.00	$ 8,962,377.00	0.00	$ -	1.00	$ 8,962,377	1.00	$ 8,962,377	100%	0.00	$ -
5.14	**DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE**				**$ 1,390,408.00**		**$ 0.00**		**$ 1,390,408.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**			**$ 1,390,408.00**
5.141	DESINFECCIÓN	GL	1.00	$1,390,408.00	$ 1,390,408.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1,390,408.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 1,390,408.00
5.15	**ELABORACIÓN DE PLANOS RÉCORD**				**$ 4,865,928.00**		**$ 0.00**		**$ 611,287.00**		$ -		**$ 0.00**		$ -			**$ 611,287.00**
5.151	PLANOS RÉCORD SEGÚN ESPECIFICACIONES	UN	18.00	$250,273.00	$ 4,504,914.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 250,273.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 250,273.00
5.152	MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	UN	1.00	$361,014.00	$ 361,014.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 361,014.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 361,014.00
6	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						**$ 336,678,116.00**		**$ 356,947,562.50**		**$ 141,565,841.60**		**$ 31,448,178.16**		**$ 173,014,019.76**			**$ 183,933,542.74**
6.1	**SALIDAS DE ALUMBRADO**				**$ 63,078,821.00**		**$ 63,078,821.00**		**$ 62,029,693.00**		**$ 42,883,107.00**		**$ 10,360,139.00**		**$ 53,243,246.00**			**$ 8,786,447.00**
6.101	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo tuberíaEMT Ø ½, conduletas, cajas, interruptor, toma corriente y clavija monofasica normal con polo a tierra,15 A, 120V,y seguro de giro, cable encauchetado 3x14AGW, para derivacion del tomacorriete a la clavija de conexión de la luminaria ,conductor de cobre CABLE 3No12 AWG THHN TC LS-ZH, (FASE-NEUTRO-TIERRA) para elcircuito ramal según lo mostrado en los planos, conectores tipo resorte, marquillas de identificacion y demásaccesorios que hagan parte de esta actividad. (LONGITUD PROMEDIO DE LA SALIDA 5m PARA DUCTO YCABLEADO)	UN	481.00	$131,141.00	$ 63,078,821.00	481.00	$ 63,078,821.00	473.00	$ 62,029,693.00	327.00	$ 42,883,107.00	79.00	$ 10,360,139	406.00	$ 53,243,246	86%	67.00	$ 8,786,447.00
6.20	**SALIDAS PARA TOMAS**				**$ 45,480,648.00**		**$ 45,480,648.00**		**$ 47,822,340.00**		**$ 34,222,401.00**		**$ 0.00**		**$ 34,222,401**			**$ 13,599,939.00**
6.201	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica normal, incluyendo ducto EMT, de ½", cajas, conductor CABLE de cobre 3No12 AWG, TC LS-ZH(FASE-NEUTRO-TIERRA), toma corriente doble con polo a tierra,15 A, 120V(5-15R) conectores tipo resortemarquillas de identificacion y demás accesorios. (LONGITUD PROMEDIO DE LA SALIDA 5m PARA DUCTO YCABLEADO)	UN	253.00	$116,728.00	$ 29,532,184.00	253.00	$ 29,532,184.00	269.00	$ 31,399,832.00	191.00	$ 22,295,048.00		$ -	191.00	$ 22,295,048	71%	78.00	$ 9,104,784.00
6.202	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasicaregulada, incluyendo ducto EMT, de ½", cajas, conductor CABLE de cobre 3No12 AWG, TC LS-ZH TC(FASE-NEUTRO Y TIERRA AISLADA) toma corriente doble con polo a tierra,15 A, 120V(5-15R), tipohospitalario conductor de cobre desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte marquillas deidentificacion y demás accesorios. (LONGITUD PROMEDIO DE LA SALIDA 5m PARA DUCTO Y CABLEADO)	UN	112.00	$118,511.00	$ 13,273,232.00	112.00	$ 13,273,232.00	116.00	$ 13,747,276.00	95.00	$ 11,258,545.00		$ -	95.00	$ 11,258,545	82%	21.00	$ 2,488,731.00
6.203	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica conproteccion de falla de puesta a tierra,(GFCI). incluyendo cajas, ducto EMT, de ½", conductor de cobre CABLE 3No12 AWG, TC LS-ZH TC LS-ZH (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra, GFCI, 20 A,120V, conectores tipo resorte marquillas de identificacion y demás accesorios. (LONGITUD PROMEDIO DE LASALIDA 5m PARA DUCTO Y CABLEADO)	UN	16.00	$167,202.00	$ 2,675,232.00	16.00	$ 2,675,232.00	16.00	$ 2,675,232.00	4.00	$ 668,808.00		$ -	4.00	$ 668,808	25%	12.00	$ 2,006,424.00
6.3	**ALIMENTADORES A TABLEROS ELECTRICOS**				**$ 83,745,090.00**		**$ 83,745,090.00**		**$ 88,932,186.50**		**$ 19,889,255.60**		**$ 6,299,601.00**		**$ 26,188,857**			**$ 62,743,329.90**
6.301	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N°4+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1½" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-PLANTA hastaTI-1	ML	5.00	$125,131.00	$ 625,655.00	5.00	$ 625,655.00	12.50	$ 1,564,137.50	5.00	$ 625,655.00		$ -	5.00	$ 625,655	40%	7.50	$ 938,482.50

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 007

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACION Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,988.75	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ 3,542,460,878.33	FECHA TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2026
VALOR FINAL:	$ 11,009,779,867.08	FECHA DEL ACTA:	31 de julio de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 5		MODIFICATORIO 6		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
										ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
6.302	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N°4+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1¼" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-PLANTA hastaTI-2	ML	20.00	$125,131.00	$ 2,502,620.00	20.00	$ 2,502,620.00	24.00	$ 3,003,144.00	20.00	$ 2,502,620.00		$ -	20.00	$ 2,502,620	83%	4.00	$ 500,524.00
6.303	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N°4+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1¼" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-PLANTA hastaTI-3	ML	25.00	$125,131.00	$ 3,128,275.00	25.00	$ 3,128,275.00	27.00	$ 3,378,537.00	25.00	$ 3,128,275.00		$ -	25.00	$ 3,128,275	93%	2.00	$ 250,262.00
6.304	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N°4+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1¼" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-PLANTA hastaTI-4	ML	30.00	$125,131.00	$ 3,753,930.00	30.00	$ 3,753,930.00	30.00	$ 3,753,930.00	30.00	$ 3,753,930.00		$ -	30.00	$ 3,753,930	100%	0.00	$ -
6.305	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N°4+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1¼" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-PLANTA hastaT-ASCENSOR	ML	25.00	$125,131.00	$ 3,128,275.00	25.00	$ 3,128,275.00	42.00	$ 5,255,502.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	42.00	$ 5,255,502.00
6.306	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N°8+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1¼" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-GEN hastaTT-1	ML	5.00	$101,526.00	$ 507,630.00	5.00	$ 507,630.00	12.50	$ 1,269,075.00	5.00	$ 507,630.00	7.50	$ 761,445	12.50	$ 1,269,075	100%	0.00	$ -
6.307	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N°8+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1¼" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-GEN hastaTT-2	ML	20.00	$101,526.00	$ 2,030,520.00	20.00	$ 2,030,520.00	24.00	$ 2,436,624.00	20.00	$ 2,030,520.00	4.00	$ 406,104	24.00	$ 2,436,624	100%	0.00	$ -
6.308	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N°8+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1¼" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-GEN hastaTT-3	ML	25.00	$101,526.00	$ 2,538,150.00	25.00	$ 2,538,150.00	27.00	$ 2,741,202.00	25.00	$ 2,538,150.00	2.00	$ 203,052	27.00	$ 2,741,202	100%	0.00	$ -
6.309	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N°8+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1¼" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-GEN hastaTT-4	ML	30.00	$101,526.00	$ 3,045,780.00	30.00	$ 3,045,780.00	30.00	$ 3,045,780.00	30.00	$ 3,045,780.00		$ -	30.00	$ 3,045,780	100%	0.00	$ -
6.310	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1No4+1No8TA+1No8TD, AWG, THHN-THHWcobre en 1Ø1½", incluyendo conductores, ducto de EMT,conexionado,accesorios y pruebas desde, CD-REG hasta TR-1	ML	5.00	$125,131.00	$ 625,655.00	5.00	$ 625,655.00	5.00	$ 625,655.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	5.00	$ 625,655.00
6.311	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1No4+1No8TA+1No8TD, AWG, THHN-THHWcobre en 1Ø1½", incluyendo conductores, ducto de EMT,conexionado,accesorios y pruebas desde, CD-REG hasta TR-2	ML	30.00	$125,131.00	$ 3,753,930.00	30.00	$ 3,753,930.00	30.00	$ 3,753,930.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	30.00	$ 3,753,930.00
6.312	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1No4+1No8TA+1No8TD, AWG, THHN-THHWcobre en 1Ø1½", incluyendo conductores, ducto de EMT,conexionado,accesorios y pruebas desde, CD-REG hasta TR-3	ML	35.00	$125,131.00	$ 4,379,585.00	35.00	$ 4,379,585.00	35.00	$ 4,379,585.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	35.00	$ 4,379,585.00
6.313	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1No4+1No8TA+1No8TD, AWG, THHN-THHWcobre en 1Ø1½", incluyendo conductores, ducto de EMT,conexionado,accesorios y pruebas desde, CD-REG hasta TR-4	ML	40.00	$125,131.00	$ 5,005,240.00	40.00	$ 5,005,240.00	40.00	$ 5,005,240.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	40.00	$ 5,005,240.00
6.314	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 2No8+1No10T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, T-BOMBAS hastaTN-BOMBAS	ML	10.00	$77,868.00	$ 778,680.00	10.00	$ 778,680.00	10.00	$ 778,680.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.00	$ 778,680.00
6.315	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 2No8+1No10T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-PLANTA hastaT-CASILLA	ML	10.00	$77,868.00	$ 778,680.00	10.00	$ 778,680.00	10.00	$ 778,680.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.00	$ 778,680.00
6.316	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N°8+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1¼" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, T-BOMBAS hastaT-BO-JOCKEY	ML	10.00	$101,526.00	$ 1,015,260.00	10.00	$ 1,015,260.00	10.00	$ 1,015,260.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.00	$ 1,015,260.00
6.317	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N°8+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1¼" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, T-BOMBAS hastaT-BO-EYEC	ML	10.00	$101,526.00	$ 1,015,260.00	10.00	$ 1,015,260.00	10.00	$ 1,015,260.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.00	$ 1,015,260.00
6.318	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N°8+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1¼" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, T-BOMBAS hastaT-BO-AGPO	ML	10.00	$101,526.00	$ 1,015,260.00	10.00	$ 1,015,260.00	10.00	$ 1,015,260.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.00	$ 1,015,260.00
6.319	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No2+1No2+1No6T AWG, THHN-THHW, cobre en 1Ø2"incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-PLANTA hasta T-BOMBAS	ML	10.00	$229,872.00	$ 2,298,720.00	10.00	$ 2,298,720.00	10.00	$ 2,298,720.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.00	$ 2,298,720.00
6.320	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No1/0+1No4/0+1No2T AWG, THHN-THHW, cobreinstalado en carcamo, incluyendo conductores, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-PLANTA hastaCD-REG, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	ML	10.00	$330,086.00	$ 3,300,860.00	10.00	$ 3,300,860.00	10.00	$ 3,300,860.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.00	$ 3,300,860.00
6.321	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No250kcmil+1No250kcmil+1No2T, AWG,THHN-THHW cobre, instalado en carcamo, incluyendo conductores, conexionado,accesorios y pruebas desde,PLANTA ELECTRICA hasta CD-PLANTA	ML	10.00	$513,699.00	$ 5,136,990.00	10.00	$ 5,136,990.00	10.00	$ 5,136,990.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.00	$ 5,136,990.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 007

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACION Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,988.75	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ 3,542,460,878.33	FECHA TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2026
VALOR FINAL:	$ 11,009,779,867.08	FECHA DEL ACTA:	31 de julio de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 5		MODIFICATORIO 6		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
										ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
6.322	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 2(3No250kcmil+1No250kcmil+1No2T, AWG,THHN-THHW, Ø3" cobre), incluyendo conductores, conexionado,accesorios y pruebas desde, BORNES DETRASFORMADOR hasta CD-GEN	ML	25.00	$513,699.00	$ 12,842,475.00	25.00	$ 12,842,475.00	25.00	$ 12,842,475.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	25.00	$ 12,842,475.00
6.323	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No10+1N"10+1No10T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, T-BO-EYEC hastaBOMBAS	ML	20.00	$82,154.00	$ 1,643,080.00	20.00	$ 1,643,080.00	20.00	$ 1,643,080.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	20.00	$ 1,643,080.00
6.324	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No10+1N"10+1No10T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, T-BO-AGPO hastaBOMBAS	ML	20.00	$82,154.00	$ 1,643,080.00	20.00	$ 1,643,080.00	20.00	$ 1,643,080.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	20.00	$ 1,643,080.00
6.325	Suministro, transporte e instalación de cable siete hilos 3No12 cobre, AWG, TC LS-2H instalado enDUCTO PORTACABLES, desde tableros de distribucion circuitos ramales tomas e iluminacion hasta caja depaso para salida de circuitos ramales, incluyendo conductores, conexionado,accesorios y pruebas.	ML	3500.00	$4,929.00	$ 17,251,500.00	3500.00	$ 17,251,500.00	3500.00	$ 17,251,500.00	356.40	$ 1,756,695.60	1000.00	$ 4,929,000	1356.40	$ 6,685,696	39%	2143.60	$ 10,565,804.40
6.4	**TABLEROS DE DISTRIBUCION**				**$ 2,473,544.00**		**$ 2,473,544.00**		**$ 2,473,544.00**		**$ 1,551,210.00**		**$ 719,702.00**		**$ 2,270,912**			**$ 202,632.00**
6.401	Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribución trifasico con espacio para totalizador de 18circuitos de 5 hilos, 220V con cerradura,chapa y tapa, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$254,788.00	$ 1,019,152.00	4.00	$ 1,019,152.00	4.00	$ 1,019,152.00	3.00	$ 764,364.00	1.00	$ 254,788	4.00	$ 1,019,152	100%	0.00	$ -
6.402	Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribución trifasico con espacio para totalizador de 24circuitos de 5 hilos, 220V con cerradura,chapa y tapa, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$262,282.00	$ 1,049,128.00	4.00	$ 1,049,128.00	4.00	$ 1,049,128.00	3.00	$ 786,846.00	1.00	$ 262,282	4.00	$ 1,049,128	100%	0.00	$ -
6.403	Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribución monofasico de 6 circuitos de 3 hilos, 125V, incluye accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$202,632.00	$ 405,264.00	2.00	$ 405,264.00	2.00	$ 405,264.00	0.00	$ -	1.00	$ 202,632	1.00	$ 202,632	50%	1.00	$ 202,632.00
6.5	**BREAKERS**				**$ 4,831,726.00**		**$ 0.00**		**$ 7,363,112.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**			**$ 7,363,112.00**
6.501	Suministro, transporte e instalacion Breaker tipo enchufable de 1x15A 10KA, incluye accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	32.00	$19,783.00	$ 633,056.00	0.00	$ 0.00	32.00	$ 633,056.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	32.00	$ 633,056.00
6.502	Suministro, transporte e instalacion Breaker tipo enchufable de 1x20A 10KA, incluye accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	62.00	$23,881.00	$ 1,480,622.00	0.00	$ 0.00	168.00	$ 4,012,008.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	168.00	$ 4,012,008.00
6.503	Suministro, transporte e instalacion Breaker tipo industrial de 3x40A 25kA, incluye accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	8.00	$339,756.00	$ 2,718,048.00	0.00	$ 0.00	8.00	$ 2,718,048.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	8.00	$ 2,718,048.00
6.6	**TABLEROS GENERALES**				**$ 21,273,669.00**		**$ 3,672,406.00**		**$ 10,099,080.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**			**$ 10,099,080.00**
6.601	Suministro, transporte e instalación de gabinetes metálicos construidos en lámina Cold Rolled calibre No16 (mínimo); refuerzos estructurales en perfil; con tratamiento superficial para protegerlos de la oxidaciónY lograr mayor adherencia de la pintura, con acabado final color gris claro al horno de los siguientestableros segun el diagrama unifilar:		0.00	$0.00	$ -		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
6.602	Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribución CD-GEN con totalizador general de 3X500A, TERMICO AJUSTABLE 0,8-1In 25kA1 breaker tipo industrial de 3x200A 25kA4 breaker tipo industrial de 3x40A 25kA1 breaker tipo industrial de 3x30A 25kACaracteristicas DPS clase I Tablero general (Protección contra rayos)Corriente de descarga =12,5 kACorriente de impulso 50kATensión máxima de operación continua =132VacNivel de protección =2,5kV3 X DPS con Uc =132Vac1 X DPS con Uc =132VacCorriente interna admisible de cortocircuito: 25 KAUn sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en forma secuencial Amps., Volts., Hz, KW, KVA, KVAR, KWH Y KVARH tipo LOVATO y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía, conectado a la red con fusibles en riel din de 2A..4 reservasUn barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.Barraje equipotencial en cobre rojo electrolítico	UN	1.00	$8,530,780.00	$ 8,530,780.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 007

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACION Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,988.75	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ 3,542,460,878.33	FECHA TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2026
VALOR FINAL:	$ 11,009,779,867.08	FECHA DEL ACTA:	31 de julio de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 5		MODIFICATORIO 6		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
										ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
6.603	Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribución CD-PLANTA con totalizador general de 3X200A, TERMICO AJUSTABLE 0,8-1In 25kA1 breaker tipo industrial de 3x100A 25kA1 breaker tipo industrial de 3x80A 25kA4 breaker tipo industrial de 3x40A 25kA1 breaker tipo industrial de 3x30A 25kA1 Breaker tipo RIEL de 1x30A 10KACaracterísticas DPS clase II Tableros de distribución (Protección contra sobre tensiones)Capacidad de derivación 10kATensión máxima de operación continua =132VacNivel de protección =1,8 kV3 X DPS con Uc =132Vac1 X DPS con Uc =132VacCorriente interna admisible de cortocircuito: 25 KA4 reservasUn sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en forma secuencial Amps., Volts., Hz, KW, KVA, KVAR, KWH Y KVARH tipo LOVATO y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía, conectado a la red con fusibles en riel din de 2A..Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico	UN	1.00	$6,426,674.00	$ 6,426,674.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 6,426,674.00	0.00	$ -	$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 6,426,674.00
6.604	Suministro, transporte e instalacion de tablero regulado CD-REG dos totalizadores entrada y salida UPS, de 3X100A, 25kA, TIPO INDUSTRIAL 4 breaker tipo industrial de 3x40A 25kA1 breaker tipo industrial de 3x30A 25kAUn barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.Un control de transferencia manual de 125A Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.4 reservasUn sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en forma secuencial Amps., Volts., Hz, KW, KVA, KVAR, KWH Y KVARH tipo LOVATO y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía, conectado a la red con fusibles en riel din de 2A..Características DPS clase II Tableros regulados (Protección contra sobre tensiones)Capacidad de derivación 1,5kATensión máxima de operación continua =132VacNivel de protección =1,5 kV3 X DPS con Uc 132V1 X DPS con Uc 120V, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	UN	1.00	$3,672,406.00	$ 3,672,406.00	1.00	$ 3,672,406.00	1.00	$ 3,672,406.00	0.00	$ -	$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 3,672,406.00
6.605	Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribución IP65, T-BOMBAS con totalizador generalTIPO INDUSTRIAL de 3X80A, 25KA4 breaker tipo industrial de 3x40A 25kA1 Breaker tipo RIEL de 1x30A 10KAUn barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico	UN	1.00	$2,643,809.00	$ 2,643,809.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ -	$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
6.7	**TABLEROS REGULADOS**				**$ 7,167,059.00**		**$ 7,167,059.00**		**$ 7,167,059.00**		**$ 0.00**		**$ 7,167,059.00**		**$ 7,167,059**	#DIV/0!		**$ 0.00**
6.701	Suministro, transporte e instalacion de tablero regulado TR-1 totalizadorde 3X40A, 25kA, TIPO RIEL 9 breaker tipo riel de 1x20A, 10KAUn barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico9 reservas	UN	1.00	$1,659,125.00	$ 1,659,125.00	1.00	$ 1,659,125.00	1.00	$ 1,659,125.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,659,125	1.00	$ 1,659,125	100%	0.00	$ -
6.702	Suministro, transporte e instalacion de tablero regulado TR-2 totalizadorde 3X40A, 25kA, TIPO RIEL 10 breaker tipo riel de 1x20A, 10KAUn barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico8 reservas, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	UN	1.00	$1,747,551.00	$ 1,747,551.00	1.00	$ 1,747,551.00	1.00	$ 1,747,551.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,747,551	1.00	$ 1,747,551	100%	0.00	$ -
6.703	Suministro, transporte e instalacion de tablero regulado TR-3 totalizadorde 3X40A, 25kA, TIPO RIEL 10 breaker tipo riel de 1x20A, 10KAUn barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico8 reservas	UN	1.00	$1,747,551.00	$ 1,747,551.00	1.00	$ 1,747,551.00	1.00	$ 1,747,551.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,747,551	1.00	$ 1,747,551	100%	0.00	$ -
6.704	Suministro, transporte e instalacion de tablero regulado TR-4 totalizadorde 3X40A, 25kA, TIPO RIEL 13 breaker tipo riel de 1x20A, 10KAUn barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico5 reservas	UN	1.00	$2,012,832.00	$ 2,012,832.00	1.00	$ 2,012,832.00	1.00	$ 2,012,832.00	0.00	$ -	1.00	$ 2,012,832	1.00	$ 2,012,832	100%	0.00	$ -
6.8	**CANALETA**				**$ 25,186,700.00**		**$ 25,186,700.00**		**$ 25,186,700.00**		**$ 4,391,121.00**		**$ 2,448,866.86**		**$ 6,839,988**			**$ 18,346,712.14**
6.801	Suministro, transporte e instalación de canaleta metálica con división de 12x5 cm incluyendo todoslos elementos de fijacion y cable desnudo No 10 todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	350.00	$71,962.00	$ 25,186,700.00	350.00	$ 25,186,700.00	350.00	$ 25,186,700.00	61.02	$ 4,391,121.00	34.03	$ 2,448,867	95.05	$ 6,839,988	27%	254.95	$ 18,346,712.14
6.9	**DUCTO PORTACABLES CERRADO**				**$ 28,523,340.00**		**$ 28,523,340.00**		**$ 28,523,340.00**		**$ 7,528,577.00**		**$ 4,452,810.30**		**$ 11,981,387**			**$ 16,541,952.70**
6.901	Suministro, transporte e instalacion de ducto portacables, galvanizado de 80x300mm , con division según lo mostrado en planos incluye soportes, codos, tees, accesorios, de montaje, sujeción y anclaje para tomas e iluminacion , incluyendo cable desnudo No 6.	ML	150.00	$158,463.00	$ 23,769,450.00	150.00	$ 23,769,450.00	150.00	$ 23,769,450.00	47.51	$ 7,528,577.00	28.10	$ 4,452,810	75.61	$ 11,981,387	50%	74.39	$ 11,788,062.70
6.902	Suministro, transporte e instalacion de ducto portacables, galvanizado de 80x300mm , sin division según lo mostrado en planos incluye soportes, codos, tees, accesorios, de montaje, sujeción y anclaje para circuitos alimentadores , incluyendo cable desnudo No 6.	ML	30.00	$158,463.00	$ 4,753,890.00	30.00	$ 4,753,890.00	30.00	$ 4,753,890.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	30.00	$ 4,753,890.00
6.10	**SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA**				**$ 21,678,431.00**		**$ 21,678,431.00**		**$ 21,678,431.00**		**$ 21,678,431.00**		**$ 0.00**		**$ 21,678,431**			**$ 0.00**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 007

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,988.75	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ 3,542,460,878.33	FECHA TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2026
VALOR FINAL:	$ 11,009,779,867.08	FECHA DEL ACTA:	31 de julio de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 5		MODIFICATORIO 6		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
										ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
6.101	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EQUIPO DE MEDIDA CD-GENERAL Malla de puesta a tierra para el CD-GEN, independiente según ART 15 RETIE, incluyendo 4 varillas de cobrede 5/8" x 2.44 m, 50m de conductor de cobre desnudo No 2/0, preparación de tierra, y 1 pozo de inspeccion, y conexiones con soldadura tipo cadwell	UN	1.00	$21,678,431.00	$ 21,678,431.00	1.00	$ 21,678,431.00	1.00	$ 21,678,431.00	1.00	$ 21,678,431.00		$ -	1.00	$ 21,678,431	100%	0.00	$ -
6.11	**SISTEMA DE PARARRAYOS**				**$ 26,932,187.00**		**$ 26,932,187.00**		**$ 26,932,187.00**		**$ 8,999,524.00**		**$ 0.00**		**$ 8,999,524**			**$ 17,932,663.00**
6.111	Tendido de tubería Ø 3/4" IMC, desde la cubierta hasta el terreno. Incluye suministro, instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	80.00	$41,672.00	$ 3,333,760.00	80.00	$ 3,333,760.00	80.00	$ 3,333,760.00	48.00	$ 2,000,256.00		$ -	48.00	$ 2,000,256	60%	32.00	$ 1,333,504.00
6.112	Tendido de conductor de cobre THHN # 1/0 AWG, desde la cubierta hasta el terreno por las bajantes. Incluye suministro, instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	100.00	$61,586.00	$ 6,158,600.00	100.00	$ 6,158,600.00	100.00	$ 6,158,600.00	37.00	$ 2,278,682.00		$ -	37.00	$ 2,278,682	37%	63.00	$ 3,879,918.00
6.113	Tendido de alambre sólido de alambron de aluminio desnudo de 8mm, sobrepuesto en los bordes de la cubierta para interconexión de puntas captadoras y bajantes a malla a tierra, incluyendo soportes, aisladores, conectores y abrazaderas para sujetar el conductor al muro. Incluye suministro, instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	120.00	$9,954.00	$ 1,194,480.00	120.00	$ 1,194,480.00	120.00	$ 1,194,480.00	90.30	$ 898,846.00		$ -	90.30	$ 898,846	75%	29.70	$ 295,634.00
6.114	Suministro de un kit de montaje para punta captadora compuesto de los siguientes elementos: Base en bronce con tornillos de fijación a la superficie. Punta captadora Franklin de 0.60 m. De altura. en cobre de ø 5/8 " . Abrazadera para fijación de cable, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	UN	11.00	$127,694.00	$ 1,404,634.00	11.00	$ 1,404,634.00	11.00	$ 1,404,634.00	9.00	$ 1,149,246.00		$ -	9.00	$ 1,149,246	82%	2.00	$ 255,388.00
6.115	Tendido de conductor de cobre desnudo # 2/0 AWG, para equipotencializar los sistemas de puesta a tierra, incluyendo preparacion del terreno, canalizacion, y soldaduras tipo cadwell, y todoslos accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	120.00	$88,561.00	$ 10,627,320.00	120.00	$ 10,627,320.00	120.00	$ 10,627,320.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	120.00	$ 10,627,320.00
6.116	Electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8"x 8' + conector. Incluye suministro, instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	5.00	$442,577.00	$ 2,212,885.00	5.00	$ 2,212,885.00	5.00	$ 2,212,885.00	2.00	$ 885,154.00		$ -	2.00	$ 885,154	40%	3.00	$ 1,327,731.00
6.117	Conexión exotérmica varilla-cable, cable -cable calibre # 1/0 AWG. Incluye suministro de molde fúndente y demás accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	5.00	$291,103.00	$ 1,455,515.00	5.00	$ 1,455,515.00	5.00	$ 1,455,515.00	5.00	$ 1,455,515.00		$ -	5.00	$ 1,455,515	100%	0.00	$ -
6.118	Pozo de inspeccion en mamposteria de 30x 30 cm, con marco y tapa, para albergar un electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8" x 8' . Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$331,825.00	$ 331,825.00	1.00	$ 331,825.00	1.00	$ 331,825.00	1.00	$ 331,825.00		$ -	1.00	$ 331,825	100%	0.00	$ -
6.119	Via de chispas de separacion para interconectar la puesta a tierra del pararrayos y la puesta a tierra del sistema electrico	UN	1.00	$48,035.00	$ 48,035.00	1.00	$ 48,035.00	1.00	$ 48,035.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 48,035.00
6.120	Suministro un barraje de 5mm x 50mm x 400mm, para equipotencializar los sistemas de puesta a tierra, las conexiones al barraje serán con conectores certificados de compresión de dos huecos o soldadura exotérmica, y debe ser aislada de su soporte por lo menos 50mm. Incluye suministro, instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$165,133.00	$ 165,133.00	1.00	$ 165,133.00	1.00	$ 165,133.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 165,133.00
6.12	**CANALIZACIONES**				**$ 1,281,520.00**		**$ 1,281,520.00**		**$ 1,281,520.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**			**$ 1,281,520.00**
6.121	Canalización subterránea en dos (2) ductos de P.V.C. DB de 3" con excavación rellenos y compactación, según norma del operador de red, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	ML	20.00	$64,076.00	$ 1,281,520.00	20.00	$ 1,281,520.00	20.00	$ 1,281,520.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	20.00	$ 1,281,520.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 007

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,988.75	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ 3,542,460,878.33	FECHA TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2026
VALOR FINAL:	$ 11,009,779,867.08	FECHA DEL ACTA:	31 de julio de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 5		MODIFICATORIO 6		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
										ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
6.13	**REGATAS**				**$ 4,977,000.00**		**$ 4,977,000.00**		**$ 4,977,000.00**		**$ 422,215.00**		**$ 0.00**		**$ 422,215**			**$ 4,554,785.00**
6.131	Construccion de regatas. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	ML	600.00	$8,295.00	$ 4,977,000.00	600.00	$ 4,977,000.00	600.00	$ 4,977,000.00	50.90	$ 422,215.00		$ -	50.90	$ 422,215	8%	549.10	$ 4,554,785.00
6.14	**CERTIFICACION RETIE Y DERECHOS DE CONEXIÓN**				**$ 22,481,370.00**		**$ 22,481,370.00**		**$ 22,481,370.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**			**$ 22,481,370.00**
6.141	Certificacion RETIE y RETILAP	UN	1.00	$15,736,959.00	$ 15,736,959.00	1.00	$ 15,736,959.00	1.00	$ 15,736,959.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 15,736,959.00
6.142	Derechos de conexión ante el operador de red	UN	1.00	$6,744,411.00	$ 6,744,411.00	1.00	$ 6,744,411.00	1.00	$ 6,744,411.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 6,744,411.00
7	**RED CONTRA INCENDIO**						**$ 327,329,597.00**		**$ 356,071,523.66**		**$ 180,771,470.00**		**$ 32,512,922.85**		**$ 213,284,392.85**			**$ 142,787,130.81**
7.1	**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**				**$ 56,575,895.00**		**$ 63,643,327.00**		**$ 70,843,744.81**		**$ 4,987,167.00**		**$ 3,033,724.02**		**$ 8,020,891**			**$ 62,822,853.79**
7.101	TUBERIA ACERO SCH 40 ASTM A 53 DE 3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	19.00	$149,026.00	$ 2,831,494.00	19.00	$ 2,831,494.00	19.00	$ 2,831,494.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	19.00	$ 2,831,494.00
7.102	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	16.00	$119,133.00	$ 1,906,128.00	16.00	$ 1,906,128.00	16.00	$ 1,906,128.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.00	$ 1,906,128.00
7.103	TUBERIA ACERO SCH 40 ASTM A 53 DE 2 1/2" . Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	2.00	$130,345.00	$ 260,690.00	2.00	$ 260,690.00	2.00	$ 260,690.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.00	$ 260,690.00
7.104	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$90,252.00	$ 90,252.00	1.00	$ 90,252.00	1.00	$ 90,252.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 90,252.00
7.105	TUBERIA ACERO SCH 40 ASTM A 53 DE 2" . Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	6.00	$73,527.00	$ 441,162.00	30.00	$ 2,205,810.00	74.03	$ 5,443,203.81	18.30	$ 1,345,544.00	41.26	$ 3,033,724	59.56	$ 4,379,268	80%	14.47	$ 1,063,935.79
7.106	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	6.00	$54,288.00	$ 325,728.00	6.00	$ 325,728.00	79.00	$ 4,288,752.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	79.00	$ 4,288,752.00
7.107	TUBERIA ACERO GALVANIZADO DE 3/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	4.00	$27,417.00	$ 109,668.00	4.00	$ 109,668.00	4.00	$ 109,668.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.00	$ 109,668.00
7.108	ACCESORIOS ROSCADOS ASME B.16.3 DE 3/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$5,456.00	$ 10,912.00	2.00	$ 10,912.00	2.00	$ 10,912.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.00	$ 10,912.00
7.109	TUBERIA ACERO GALVANIZADO DE 1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	18.00	$27,417.00	$ 493,506.00	18.00	$ 493,506.00	18.00	$ 493,506.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	18.00	$ 493,506.00
7.110	ACCESORIOS ROSCADOS ASME B.16.3 DE 1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	10.00	$5,456.00	$ 54,560.00	10.00	$ 54,560.00	10.00	$ 54,560.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.00	$ 54,560.00
7.111	TUBERIA CU TL ASTM B 88 DE 1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	16.00	$59,047.00	$ 944,752.00	16.00	$ 944,752.00	16.00	$ 944,752.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.00	$ 944,752.00
7.112	ACCESORIOS CU TK ASTM B 88 DE 1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	11.00	$13,761.00	$ 151,371.00	11.00	$ 151,371.00	11.00	$ 151,371.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	11.00	$ 151,371.00
7.113	VALVULA OS&Y 3" LISTADA UL CON SUPERVISIÓN. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$2,098,176.00	$ 8,392,704.00	4.00	$ 8,392,704.00	4.00	$ 8,392,704.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.00	$ 8,392,704.00
7.114	VALVULA CHEQUE LISTADA UL 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$799,708.00	$ 1,599,416.00	2.00	$ 1,599,416.00	2.00	$ 1,599,416.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.00	$ 1,599,416.00
7.115	VALVULA CHEQUE LISTADA UL 2.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$623,369.00	$ 623,369.00	1.00	$ 623,369.00	1.00	$ 623,369.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 623,369.00
7.116	VALVULA CHEQUE BRONCE DE CORTINA 2" PARA 200 PSI. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$311,751.00	$ 311,751.00	1.00	$ 311,751.00	1.00	$ 311,751.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 311,751.00
7.117	VALVULA BRONCE DE ALIVIO 3/4" x 1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$470,365.00	$ 470,365.00	1.00	$ 470,365.00	1.00	$ 470,365.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 470,365.00
7.118	JUNTA ACERO INOXIDABLE 3" UNION BRIDA. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$1,891,306.00	$ 3,782,612.00	2.00	$ 3,782,612.00	2.00	$ 3,782,612.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.00	$ 3,782,612.00
7.119	JUNTA ACERO INOXIDABLE 2" UNION BRIDA. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$1,162,967.00	$ 2,325,934.00	2.00	$ 2,325,934.00	2.00	$ 2,325,934.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.00	$ 2,325,934.00
7.120	CHEQUE PERFORADO (3/32") DE CORTINA 1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$93,178.00	$ 372,712.00	4.00	$ 372,712.00	4.00	$ 372,712.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.00	$ 372,712.00
7.121	VALVULA BRONCE DE COMPUERTA 2" PARA 200 PSI. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$660,559.00	$ 1,321,118.00	2.00	$ 1,321,118.00	2.00	$ 1,321,118.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.00	$ 1,321,118.00
7.122	COPA EXCENTRICA 3"x2.1/2" HF (SEGÚN BOMBA). Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$777,215.00	$ 777,215.00	1.00	$ 777,215.00	1.00	$ 777,215.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 777,215.00
7.123	COPA CONCENTRICA 3"x2.1/2" HF (SEGÚN BOMBA). Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$741,888.00	$ 741,888.00	1.00	$ 741,888.00	1.00	$ 741,888.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 741,888.00
7.124	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 3" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZINCADA Y CHAZO EXPANSIVO). Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	5.00	$16,380.00	$ 81,900.00	5.00	$ 81,900.00	5.00	$ 81,900.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	5.00	$ 81,900.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 007

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACION Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,988.75	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ 3,542,460,878.33	FECHA TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2026
VALOR FINAL:	$ 11,009,779,867.08	FECHA DEL ACTA:	31 de julio de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 5		MODIFICATORIO 6		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
										ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
7.125	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 2.1/2" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZINCADA Y CHAZO EXPANSIVO). Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$16,380.00	$ 16,380.00	1.00	$ 16,380.00	1.00	$ 16,380.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 16,380.00
7.126	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 2" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZINCADA Y CHAZO EXPANSIVO). Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$15,527.00	$ 15,527.00	1.00	$ 15,527.00	1.00	$ 15,527.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 15,527.00
7.127	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 3/4" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZINCADA Y CHAZO EXPANSIVO). Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$14,066.00	$ 28,132.00	2.00	$ 28,132.00	2.00	$ 28,132.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.00	$ 28,132.00
7.128	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 1/2" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZINCADA Y CHAZO EXPANSIVO). Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	12.00	$13,747.00	$ 164,964.00	12.00	$ 164,964.00	12.00	$ 164,964.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	12.00	$ 164,964.00
7.129	PINTURA ANTICORROSIVA 3". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	19.00	$18,399.00	$ 349,581.00	19.00	$ 349,581.00	19.00	$ 349,581.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	19.00	$ 349,581.00
7.130	PINTURA ANTICORROSIVA 2.1/2". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	2.00	$18,399.00	$ 36,798.00	2.00	$ 36,798.00	2.00	$ 36,798.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.00	$ 36,798.00
7.131	PINTURA ANTICORROSIVA 2". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	6.00	$16,760.00	$ 100,560.00	6.00	$ 100,560.00	6.00	$ 100,560.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	6.00	$ 100,560.00
7.132	PINTURA ANTICORROSIVA 3/4" . Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	4.00	$15,420.00	$ 61,680.00	4.00	$ 61,680.00	4.00	$ 61,680.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.00	$ 61,680.00
7.133	PINTURA ANTICORROSIVA 1/2". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	34.00	$15,239.00	$ 518,126.00	34.00	$ 518,126.00	34.00	$ 518,126.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	34.00	$ 518,126.00
7.134	PINTURA ESMALTE ROJO 3" . Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	19.00	$18,399.00	$ 349,581.00	19.00	$ 349,581.00	19.00	$ 349,581.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	19.00	$ 349,581.00
7.135	PINTURA ESMALTE ROJO 2.1/2" . Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	2.00	$18,399.00	$ 36,798.00	2.00	$ 36,798.00	2.00	$ 36,798.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.00	$ 36,798.00
7.136	PINTURA ESMALTE ROJO 2" . Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	6.00	$17,796.00	$ 106,776.00	6.00	$ 106,776.00	6.00	$ 106,776.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	6.00	$ 106,776.00
7.137	PINTURA ESMALTE ROJO 3/4" . Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	4.00	$12,848.00	$ 51,392.00	4.00	$ 51,392.00	4.00	$ 51,392.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.00	$ 51,392.00
7.138	PINTURA ESMALTE ROJO 1/2". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	34.00	$12,848.00	$ 436,832.00	34.00	$ 436,832.00	34.00	$ 436,832.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	34.00	$ 436,832.00
7.139	BRIDA ACERO ANSI B 16.5 PARA 150 PSI 3" RANURADA. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$183,901.00	$ 735,604.00	4.00	$ 735,604.00	4.00	$ 735,604.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.00	$ 735,604.00
7.140	BRIDA ACERO ANSI B 16.5 PARA 150 PSI 2" RANURADA. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$151,416.00	$ 605,664.00	4.00	$ 605,664.00	4.00	$ 605,664.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.00	$ 605,664.00
7.141	SIAMESA BRONCE 4" X 2.1/2" X 2.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$2,735,972.00	$ 2,735,972.00	1.00	$ 2,735,972.00	1.00	$ 2,735,972.00	1.00	$ 2,735,972.00		$ -	1.00	$ 2,735,972	100%	0.00	$ -
7.142	VALVULA CHEQUE LISTADA UL DE 4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$905,651.00	$ 905,651.00	1.00	$ 905,651.00	1.00	$ 905,651.00	1.00	$ 905,651.00		$ -	1.00	$ 905,651	100%	0.00	$ -
7.143	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE DE 4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$2,190,674.00	$ 6,572,022.00	3.00	$ 6,572,022.00	3.00	$ 6,572,022.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.00	$ 6,572,022.00
7.144	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE DE 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$1,643,006.00	$ 4,929,018.00	6.00	$ 9,858,036.00	6.00	$ 9,858,036.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	6.00	$ 9,858,036.00
7.145	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE DE 3/4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$422,774.00	$ 422,774.00	1.00	$ 422,774.00	1.00	$ 422,774.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 422,774.00
7.146	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE DE 1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$373,766.00	$ 373,766.00	2.00	$ 747,532.00	2.00	$ 747,532.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.00	$ 747,532.00
7.147	DESFOGUE MOTOR DIESEL ACERO ø4"	ML	18.00	$339,160.00	$ 6,104,880.00	18.00	$ 6,104,880.00	18.00	$ 6,104,880.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	18.00	$ 6,104,880.00
7.148	RECUBRIMIENTO DESFOGUE MOTOR DIESEL EN FRIBRA DE VIDRIO, FORRADO CON LIENCILLO	ML	10.00	$147,421.00	$ 1,474,210.00	10.00	$ 1,474,210.00	10.00	$ 1,474,210.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.00	$ 1,474,210.00
7.149	LÁMINA DE ALUMINIO PARA DESFOGUE MOTOR DIESEL. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	10.00	$102,200.00	$ 1,022,000.00	10.00	$ 1,022,000.00	10.00	$ 1,022,000.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.00	$ 1,022,000.00
7.2	**RED INTERNA**				**$ 219,911,154.00**		**$ 256,165,754.00**		**$ 277,707,262.85**		**$ 175,784,303.00**		**$ 29,479,198.83**		**$ 205,263,502**			**$ 72,443,761.02**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 007

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACION Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,988.75	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ 3,542,460,878.33	FECHA TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2026
VALOR FINAL:	$ 11,009,779,867.08	FECHA DEL ACTA:	31 de julio de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 5		MODIFICATORIO 6		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
										ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
7.201	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	68.00	$236,030.00	$ 16,050,040.00	68.00	$ 16,050,040.00	81.27	$ 19,182,158.10	67.94	$ 16,035,878.00	13.33	$ 3,146,280	81.27	$ 19,182,158	100%	0.00	$ 0.20
7.202	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	65.00	$158,845.00	$ 10,324,925.00	65.00	$ 10,324,925.00	65.00	$ 10,324,925.00	65.00	$ 10,324,925.00		$ -	65.00	$ 10,324,925	100%	0.00	$ -
7.203	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	34.00	$149,026.00	$ 5,066,884.00	34.00	$ 5,066,884.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
7.204	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	14.00	$119,133.00	$ 1,667,862.00	14.00	$ 1,667,862.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
7.205	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	122.00	$130,345.00	$ 15,902,090.00	122.00	$ 15,902,090.00	134.73	$ 17,561,381.85	122.00	$ 15,902,090.00	12.73	$ 1,659,292	134.73	$ 17,561,382	100%	0.00	$ -
7.206	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	145.00	$90,252.00	$ 13,086,540.00	350.00	$ 31,588,200.00	475.00	$ 42,869,700.00	350.00	$ 31,588,200.00	125.00	$ 11,281,500	475.00	$ 42,869,700	100%	0.00	$ -
7.207	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	70.00	$130,345.00	$ 9,124,150.00	70.00	$ 9,124,150.00	65.00	$ 8,472,425.00	36.85	$ 4,803,213.00		$ -	36.85	$ 4,803,213	57%	28.15	$ 3,669,212.00
7.208	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	57.00	$90,252.00	$ 5,144,364.00	100.00	$ 9,025,200.00	100.00	$ 9,025,200.00	87.00	$ 7,851,924.00		$ -	87.00	$ 7,851,924	87%	13.00	$ 1,173,276.00
7.209	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 1.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	128.00	$67,490.00	$ 8,638,720.00	128.00	$ 8,638,720.00	170.83	$ 11,529,316.70	128.00	$ 8,638,720.00	42.83	$ 2,890,597	170.83	$ 11,529,317	100%	0.00	$ -
7.210	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 1.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	160.00	$35,054.00	$ 5,608,640.00	400.00	$ 14,021,600.00	479.00	$ 16,790,866.00	400.00	$ 14,021,600.00	79.00	$ 2,769,266	479.00	$ 16,790,866	100%	0.00	$ -
7.211	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 1.1/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	98.00	$49,396.00	$ 4,840,808.00	98.00	$ 4,840,808.00	123.70	$ 6,110,285.20	98.00	$ 4,840,808.00	25.70	$ 1,269,477	123.70	$ 6,110,285	100%	0.00	$ -
7.212	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 1.1/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	152.00	$29,038.00	$ 4,413,776.00	340.00	$ 9,872,920.00	367.00	$ 10,656,946.00	340.00	$ 9,872,920.00	27.00	$ 784,026	367.00	$ 10,656,946	100%	0.00	$ -
7.213	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 1". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	232.00	$35,678.00	$ 8,277,296.00	232.00	$ 8,277,296.00	300.00	$ 10,703,400.00	232.00	$ 8,277,296.00	54.31	$ 1,937,672	286.31	$ 10,214,968	95%	13.69	$ 488,431.82
7.214	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 1". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	208.00	$25,857.00	$ 5,378,256.00	208.00	$ 5,378,256.00	280.00	$ 7,239,960.00	208.00	$ 5,378,256.00	51.00	$ 1,318,707	259.00	$ 6,696,963	93%	21.00	$ 542,997.00
7.215	VALVULA MARIPOSA LISTADA UL CON SUPERVISIÓN E INDICADOR DE POSICIÓN 2.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$892,849.00	$ 3,571,396.00	4.00	$ 3,571,396.00	4.00	$ 3,571,396.00	4.00	$ 3,571,396.00		$ -	4.00	$ 3,571,396	100%	0.00	$ -
7.216	VALVULA RISER CHECK + TRIM LISTADA UL DE 2,1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$2,574,865.00	$ 10,299,460.00	4.00	$ 10,299,460.00	4.00	$ 10,299,460.00	4.00	$ 10,299,460.00		$ -	4.00	$ 10,299,460	100%	0.00	$ -
7.217	SENSOR DE FLUJO PARA TUBERIA DE ACERO DE 2.1/2". LISTADO UL. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$771,305.00	$ 3,085,220.00	4.00	$ 3,085,220.00	4.00	$ 3,085,220.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.00	$ 3,085,220.00
7.218	GABINETE CLASE III, INCLUYE, CAJA EN LAMINA DE ACERO, VIDRIO TEMPLADO DE 4mm, VALVULA ANGULO UL/FM 1.1/2", VALVULA DE ANGULO UL/FM DE 2.1/2", HACHA DE 2LBS, LLAVE PARA LAS VALVULAS, EXTINTOR DE 20 LBS. 30METROS DE MANGUERA DE POLIURETANO Y BOQUILLA DE POLICARBONATO DE 1.1/2" y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$2,027,455.00	$ 8,109,820.00	4.00	$ 8,109,820.00	4.00	$ 8,109,820.00	4.00	$ 8,109,820.00		$ -	4.00	$ 8,109,820	100%	0.00	$ -
7.219	VALVULA de ANGULO 2,1/2". ENTRADA ROSCA HEMBRA NPT, SALIDA ROSCA MACHO NH, BRONCE PARA 300 PSI, BRONCE LISTADA UL. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	8.00	$814,437.00	$ 6,515,496.00	8.00	$ 6,515,496.00	8.00	$ 6,515,496.00	6.00	$ 4,886,622.00	2.00	$ 1,628,874	8.00	$ 6,515,496	100%	0.00	$ -
7.220	REGADERA ESTANDAR 1/2 LISTADA UL, K=5.6 RESPUESTA RAPIDA ORIENTACIÓN PENDIENTE O MONTANTE. TEMPERATURA DE ACTIVACIÓN 68°C. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	182.00	$85,679.00	$ 15,593,578.00	182.00	$ 15,593,578.00	182.00	$ 15,593,578.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	182.00	$ 15,593,578.00
7.221	REGADERA ESTANDAR 1/2 LISTADA UL, K=5.6 RESPUESTA RAPIDA ORIENTACIÓN LATERAL. TEMPERATURA DE ACTIVACIÓN 68°C. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	5.00	$106,209.00	$ 531,045.00	5.00	$ 531,045.00	5.00	$ 531,045.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	5.00	$ 531,045.00
7.222	PUNTO ROCIADOR. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	187.00	$86,806.00	$ 16,232,722.00	187.00	$ 16,232,722.00	187.00	$ 16,232,722.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	187.00	$ 16,232,722.00
7.223	VALVULA DE ANGULO DE BRONCE PARA DRENAJE 1.1/4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$580,383.00	$ 2,321,532.00	4.00	$ 2,321,532.00	4.00	$ 2,321,532.00	4.00	$ 2,321,532.00		$ -	4.00	$ 2,321,532	100%	0.00	$ -
7.224	VALVULA BOLA DE BRONCE PARA 200 PSI EN 1". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$624,533.00	$ 1,873,599.00	3.00	$ 1,873,599.00	3.00	$ 1,873,599.00	3.00	$ 1,873,599.00		$ -	3.00	$ 1,873,599	100%	0.00	$ -
7.225	VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 1". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$859,206.00	$ 2,577,618.00	3.00	$ 2,577,618.00	3.00	$ 2,577,618.00	3.00	$ 2,577,618.00		$ -	3.00	$ 2,577,618	100%	0.00	$ -

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 007

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACION Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,988.75	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ 3,542,460,878.33	FECHA TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2026
VALOR FINAL:	$ 11,009,779,867.08	FECHA DEL ACTA:	31 de julio de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 5		MODIFICATORIO 6		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
										ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
7.226	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 4" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	23.00	$16,618.00	$ 382,214.00	23.00	$ 382,214.00	23.00	$ 382,214.00	23.00	$ 382,214.00		$ -	23.00	$ 382,214	100%	0.00	$ -
7.227	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 2.1/2" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	41.00	$16,380.00	$ 671,580.00	41.00	$ 671,580.00	51.00	$ 835,380.00	41.00	$ 671,580.00	10.00	$ 163,800	51.00	$ 835,380	100%	0.00	$ -
7.228	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 2" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	24.00	$15,527.00	$ 372,648.00	24.00	$ 372,648.00	24.00	$ 372,648.00	7.00	$ 108,689.00		$ -	7.00	$ 108,689	29%	17.00	$ 263,959.00
7.229	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 1.1/2" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	43.00	$14,377.00	$ 618,211.00	43.00	$ 618,211.00	91.00	$ 1,308,307.00	43.00	$ 618,211.00	18.00	$ 258,786	61.00	$ 876,997	67%	30.00	$ 431,310.00
7.230	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 1.1/4" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	59.00	$14,268.00	$ 841,812.00	59.00	$ 841,812.00	59.00	$ 841,812.00	49.00	$ 699,132.00	5.00	$ 71,340	54.00	$ 770,472	92%	5.00	$ 71,340.00
7.231	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 1" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	134.00	$14,066.00	$ 1,884,844.00	134.00	$ 1,884,844.00	134.00	$ 1,884,844.00	58.00	$ 815,828.00	7.00	$ 98,462	65.00	$ 914,290	49%	69.00	$ 970,554.00
7.232	SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL UL DE 4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$131,443.00	$ 262,886.00	2.00	$ 262,886.00	2.00	$ 262,886.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.00	$ 262,886.00
7.233	SOPORTE SISMORESISTENTE TRANSVERSAL UL DE 4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$129,785.00	$ 389,355.00	3.00	$ 389,355.00	3.00	$ 389,355.00	1.00	$ 129,785.00		$ -	1.00	$ 129,785	33%	2.00	$ 259,570.00
7.234	SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL UL DE 2,1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	9.00	$131,443.00	$ 1,182,987.00	9.00	$ 1,182,987.00	9.00	$ 1,182,987.00	9.00	$ 1,182,987.00		$ -	9.00	$ 1,182,987	100%	0.00	$ -
7.235	SOPORTE SISMORESISTENTE TRANSVERSAL UL DE 2,1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	12.00	$129,785.00	$ 1,557,420.00	12.00	$ 1,557,420.00	12.00	$ 1,557,420.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	12.00	$ 1,557,420.00
7.236	SOPORTE SISMORESISTENTE 4 VIAS UL DE 4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	6.00	$197,165.00	$ 1,182,990.00	6.00	$ 1,182,990.00	6.00	$ 1,182,990.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	6.00	$ 1,182,990.00
7.237	PINTURA ANTICCORROSIVA 4". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	68.00	$19,761.00	$ 1,343,748.00	68.00	$ 1,343,748.00	68.00	$ 1,343,748.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	68.00	$ 1,343,748.00
7.238	PINTURA ANTICCORROSIVA 3". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	34.00	$18,399.00	$ 625,566.00	34.00	$ 625,566.00	34.00	$ 625,566.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	34.00	$ 625,566.00
7.239	PINTURA ANTICORROSIVA 2.1/2". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	145.00	$18,399.00	$ 2,667,855.00	145.00	$ 2,667,855.00	145.00	$ 2,667,855.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	145.00	$ 2,667,855.00
7.240	PINTURA ANTICORROSIVA 2". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	70.00	$17,796.00	$ 1,245,720.00	70.00	$ 1,245,720.00	70.00	$ 1,245,720.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	70.00	$ 1,245,720.00
7.241	PINTURA ANTICORROSIVA 1.1/2". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	160.00	$16,760.00	$ 2,681,600.00	160.00	$ 2,681,600.00	160.00	$ 2,681,600.00	0.00	$ -	6.00	$ 100,560	6.00	$ 100,560	4%	154.00	$ 2,581,040.00
7.242	PINTURA ANTICORROSIVA 1.1/4". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	98.00	$16,520.00	$ 1,618,960.00	98.00	$ 1,618,960.00	98.00	$ 1,618,960.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	98.00	$ 1,618,960.00
7.243	PINTURA ANTICORROSIVA 1". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	232.00	$12,848.00	$ 2,980,736.00	232.00	$ 2,980,736.00	232.00	$ 2,980,736.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	232.00	$ 2,980,736.00
7.244	PINTURA ESMALTE ROJO 4". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	68.00	$19,761.00	$ 1,343,748.00	68.00	$ 1,343,748.00	68.00	$ 1,343,748.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	68.00	$ 1,343,748.00
7.245	PINTURA ESMALTE ROJO 3". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	34.00	$18,399.00	$ 625,566.00	34.00	$ 625,566.00	34.00	$ 625,566.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	34.00	$ 625,566.00
7.246	PINTURA ESMALTE ROJO 2.1/2". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	145.00	$18,399.00	$ 2,667,855.00	145.00	$ 2,667,855.00	145.00	$ 2,667,855.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	145.00	$ 2,667,855.00
7.247	PINTURA ESMALTE ROJO 2". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	70.00	$17,796.00	$ 1,245,720.00	70.00	$ 1,245,720.00	70.00	$ 1,245,720.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	70.00	$ 1,245,720.00
7.248	PINTURA ESMALTE ROJO 1.1/2". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	160.00	$16,760.00	$ 2,681,600.00	160.00	$ 2,681,600.00	160.00	$ 2,681,600.00	0.00	$ -	6.00	$ 100,560	6.00	$ 100,560	4%	154.00	$ 2,581,040.00
7.249	PINTURA ESMALTE ROJO 1.1/4". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	98.00	$16,520.00	$ 1,618,960.00	98.00	$ 1,618,960.00	98.00	$ 1,618,960.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	98.00	$ 1,618,960.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 007

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACION Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,988.75	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ 3,542,460,878.33	FECHA TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2026
VALOR FINAL:	$ 11,009,779,867.08	FECHA DEL ACTA:	31 de julio de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 5		MODIFICATORIO 6		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
										ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
7.250	PINTURA ESMALTE ROJO 1" . Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	232.00	$12,848.00	$ 2,980,736.00	232.00	$ 2,980,736.00	232.00	$ 2,980,736.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	232.00	$ 2,980,736.00
7.3	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**				**$ 14,016,777.00**		**$ 7,520,516.00**		**$ 7,520,516.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		$ -			**$ 7,520,516.00**
7.301	MANUAL DE MANTENIMIENTO	UN	1.00	$519,253.00	$ 519,253.00	1.00	$ 519,253.00	1.00	$ 519,253.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 519,253.00
7.302	PLANOS RECORD DE OBRA	UN	11.00	$340,236.00	$ 3,742,596.00	11.00	$ 3,742,596.00	11.00	$ 3,742,596.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	11.00	$ 3,742,596.00
7.303	GABINETE PARA ROCIADORES DE RESERVA. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$456,993.00	$ 456,993.00	1.00	$ 456,993.00	1.00	$ 456,993.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 456,993.00
7.304	PRUEBAS	GL	1.00	$720,286.00	$ 720,286.00	1.00	$ 720,286.00	1.00	$ 720,286.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 720,286.00
7.305	EXTINTOR PQS 20 LB. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	10.00	$217,967.00	$ 2,179,670.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
7.306	EXTINTOR CO2 20 LB. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$1,967,733.00	$ 1,967,733.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
7.307	EXTINTOR AFFF 40B. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$2,164,506.00	$ 2,164,506.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
7.308	EXTINTOR H2O 20 LB. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$184,352.00	$ 184,352.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
7.309	CÁRCAMO PROTECCIÓN TUBERÍAS RCI. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	4.00	$520,347.00	$ 2,081,388.00	4.00	$ 2,081,388.00	4.00	$ 2,081,388.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.00	$ 2,081,388.00
8	**MAMPOSTERIA**				**$ 223,584,269.44**		**$ 154,383,974.13**		**$ 172,801,280.36**		**$ 64,473,237.00**		**$ 9,944,977.55**		**$ 74,418,215**			**$ 98,383,065.81**
8.1	Muro en Bloque Arcilla No. 3 y No.4 (m2). Incluye refuerzo y anclaje, según indicaciones de plano de elementos no estructurales, y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	445.82	$63,838.00	$ 28,460,257.16	836.36	$ 53,391,549.68	977.55	$ 62,404,575.16	685.64	$ 43,769,816.00	46.22	$ 2,950,548	731.86	$ 46,720,364	75%	245.69	$ 15,684,211.49
8.2	Bloque Arcilla No. 3 y No.4 (ml). Incluye refuerzo y anclaje, según indicaciones de plano de elementos no estructurales, y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	115.00	$41,800.00	$ 4,807,000.00	115.00	$ 4,807,000.00	115.00	$ 4,807,000.00	11.41	$ 476,938.00	4.00	$ 167,200	15.41	$ 644,138	13%	99.59	$ 4,162,862.00
8.3	Dinteles en concreto 21 Mpa (3000 psi). Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, formaleta, retiro y disposición de los sobrantes	ml	591.30	$39,964.00	$ 23,630,713.20	591.30	$ 23,630,713.20	591.30	$ 23,630,713.20	35.18	$ 1,405,933.00		$ -	35.18	$ 1,405,933	6%	556.12	$ 22,224,780.20
8.4	Bordillos concreto 21 Mpa (3000 psi). Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, formaleta, retiro y disposición de los sobrantes	ml	278.61	$37,028.00	$ 10,316,371.08	43.93	$ 1,626,640.04	80.50	$ 2,980,754.00	0.00	$ -	53.59	$ 1,984,331	53.59	$ 1,984,331	67%	26.91	$ 996,423.48
8.5	Acero Figurado 1/4" - 1". Incluye suministro, corte, figuración, amarre y colocación.	kg	3388.00	$5,889.00	$ 19,951,932.00	3388.00	$ 19,951,932.00	3005.00	$ 17,696,468.56	1051.44	$ 6,191,937.00	76.45	$ 450,195	1127.89	$ 6,642,132	38%	1877.12	$ 11,054,336.94
8.6	Ensayos (Morteros, muretes, ladrillo, bloque, acero, elementos no estructurales)	un	1.00	$7,308,265.00	$ 7,308,265.00	1.00	$ 7,308,265.00	1.00	$ 7,308,265.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 7,308,265.00
8.7	Enchape ladrillo borde placa H=0.40m Gran Formato. Incluye angulos y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	60.00	$160,349.00	$ 9,620,940.00	22.55	$ 3,615,869.95	86.82	$ 13,921,500.18	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	86.82	$ 13,921,500.18
8.8	Grafil 4.0 mm. Incluye suministro, corte, figuración, amarre y colocación.	kg	1445.00	$5,810.00	$ 8,395,450.00	219.75	$ 1,276,747.50	219.75	$ 1,276,747.50	179.13	$ 1,040,769.00	30.10	$ 174,883	209.23	$ 1,215,652	95%	10.52	$ 61,095.76
8.9	Muro en concreto 28 Mpa (4000 psi) no estructural fundido en sitio. Incluye refuerzo y anclaje y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m3	4.00	$1,712,454.00	$ 6,849,816.00	4.00	$ 6,849,816.00	4.00	$ 6,849,816.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.00	$ 6,849,816.00
8.10	Muro en Ladrillo en gran formato (ml). Muro en mamposteria a la vista de arcilla de fachada extruida gran formato tipo "santafe" ladrillo gran formato cobrizo 39cmx11cmx5cmo similar. Incluye anclajes según indicaciones de plano de elementos no estructurales, y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	162.00	$118,323.00	$ 19,168,326.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
8.11	Muro bloque Cemento gris 12x19x39cm tipo "Decoblock bloque liso divisorio de 9cm" o similar, incluye refuerzo y anclaje según indicaciones de plano de elementos no estructurales, y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	325.98	$82,397.00	$ 26,859,774.06	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
8.12	Enchape Ladrillo Gran Formato - m2. Incluye angulos y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	71.05	$201,472.00	$ 14,314,585.60	111.33	$ 22,429,877.76	111.33	$ 22,429,877.76	34.19	$ 6,889,234.00		$ -	34.19	$ 6,889,234	31%	77.14	$ 15,540,643.76
8.13	Muro en Ladrillo Gran Formato (M2). Muro en mamposteria a la vista de arcilla de fachada extruida gran formato tipo "santafe" ladrillo gran formato cobrizo 39cmx11cmx5cmo similar. Incluye anclajes según indicaciones de plano de elementos no estructurales, y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	82.14	$191,931.00	$ 15,765,212.34	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
8.14	Dovelas en Grouting. Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	1216.00	$15,329.00	$ 18,640,064.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
8.15	Anclajes Epoxicos. Incluye perforación, puente de adherencia, instalación y todo lo requerido para la correcta ejecución.	un	869.00	$10,927.00	$ 9,495,563.00	869.00	$ 9,495,563.00	869.00	$ 9,495,563.00	430.00	$ 4,698,610.00	386.00	$ 4,217,822	816.00	$ 8,916,432	94%	53.00	$ 579,131.00
9	**CUBIERTA**				**$ 271,920,299.30**		**$ 248,620,603.69**		**$ 254,982,170.48**		**$ 238,977,252.00**		**$ 6,104,345.32**		**$ 245,081,597**			**$ 9,900,573.16**
9.1	Marquesina en cubierta policarbonato incluye Estructura. Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	27.99	$574,040.00	$ 16,067,379.60	27.99	$ 16,067,379.60	27.99	$ 16,067,379.60	25.46	$ 14,615,058.00		$ -	25.46	$ 14,615,058	91%	2.53	$ 1,452,321.60
9.2	Canal metalica tipo amazonas. Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	112.10	$179,980.00	$ 20,175,758.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 007

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,988.75	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ 3,542,460,878.33	FECHA TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2026
VALOR FINAL:	$ 11,009,779,867.08	FECHA DEL ACTA:	31 de julio de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 5		MODIFICATORIO 6		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
										ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
9.3	Flanche metalico con pintura Electrostatica. Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	139.02	$101,737.00	$ 14,143,477.74	139.02	$ 14,143,477.74	168.43	$ 17,135,562.91	139.02	$ 14,143,477.00	29.41	$ 2,992,085	168.43	$ 17,135,562	100%	0.00	$ 0.74
9.4	Suministro e instalación de cubierta liviana, sistema compuesto de cubierta en teja metálica sin traslapo tipo "Metal roof Grado 40" o similar, con cama de aislamiento termoacústico en poliuretano y capa superior de impermeabilización con membrana TPO. Incluye estructura y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	250.20	$794,567.00	$ 198,800,663.40	251.40	$ 199,754,143.80	254.48	$ 202,201,410.16	250.20	$ 198,800,663.00		$ -	250.20	$ 198,800,663	98%	4.28	$ 3,400,747.16
9.5	Media caña con mortero. Incluye instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	248.00	$13,243.00	$ 3,284,264.00	248.00	$ 3,284,264.00	248.00	$ 3,284,264.00	203.95	$ 2,700,909.00	23.80	$ 315,183	227.75	$ 3,016,092	92%	20.25	$ 268,171.60
9.6	Regata con mortero. Incluye instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	248.00	$20,044.00	$ 4,970,912.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
9.7	Bordillo fundido en sitio - Cubierta en concreto 21 Mpa (3000 psi). Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, formaleta, retiro y disposición de los sobrantes	ml	23.72	$29,398.00	$ 697,320.56	23.72	$ 697,320.56	55.09	$ 1,619,535.82	0.00	$ -	26.27	$ 772,285	26.27	$ 772,285	48%	28.82	$ 847,250.36
9.8	Afinado pisos impermeabilizado - Cubierta. Incluye suministro, nivelación, vaciado y extendida de mortero, impermeabilizante y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	132.00	$76,959.00	$ 10,158,588.00	143.61	$ 11,052,081.99	143.61	$ 11,052,081.99	113.27	$ 8,717,145.00	26.31	$ 2,024,791	139.58	$ 10,741,936	97%	4.03	$ 310,145.70
9.9	Gancho Anclajes certificados. Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	un	12.00	$301,828.00	$ 3,621,936.00	12.00	$ 3,621,936.00	12.00	$ 3,621,936.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	12.00	$ 3,621,936.00
10	**PAÑETES, REVOQUES Y RESANES**				**$ 193,001,244.53**		**$ 158,385,147.23**		**$ 166,852,058.37**		**$ 86,374,643.00**		**$ 10,323,969.10**		**$ 96,698,612**			**$ 70,153,446.27**
10.1	Filos y Dilataciones en pañete Fachada	ml	246.43	$9,120.00	$ 2,247,441.60	246.43	$ 2,247,441.60	246.43	$ 2,247,441.60	217.30	$ 1,981,776.00	29.13	$ 265,666	246.43	$ 2,247,442	100%	0.00	$ -
10.2	Pañete borde placa h=0.50. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	436.21	$27,073.00	$ 11,809,513.33	436.21	$ 11,809,513.33	436.21	$ 11,809,513.33	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	436.21	$ 11,809,513.33
10.3	Pañete Muros de fachada (m2). Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	283.25	$41,239.00	$ 11,680,946.75	283.25	$ 11,680,946.75	398.74	$ 16,443,473.90	150.67	$ 6,213,397.00	120.88	$ 4,984,999	271.55	$ 11,198,396	68%	127.19	$ 5,245,077.71
10.4	Pañete Muros de fachada (ml). Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	192.90	$30,096.00	$ 5,805,518.40	192.90	$ 5,805,518.40	283.15	$ 8,521,682.40	192.90	$ 5,805,518.00	90.25	$ 2,716,164	283.15	$ 8,521,682	100%	0.00	$ 0.40
10.5	Pañete Bajo Escalera. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	40.60	$39,030.00	$ 1,584,618.00	40.60	$ 1,584,618.00	40.60	$ 1,584,618.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	40.60	$ 1,584,618.00
10.6	Repello Interior Tanque. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	51.04	$26,340.00	$ 1,344,393.60	51.04	$ 1,344,393.60	86.84	$ 2,287,297.12	31.14	$ 820,159.00	54.84	$ 1,444,486	85.98	$ 2,264,645	99%	0.86	$ 22,652.52
10.7	Filos y Dilataciones en Revoque/pañete Interior. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	1137.95	$7,216.00	$ 8,211,476.07	1137.95	$ 8,211,476.07	1144.23	$ 8,256,792.54	546.15	$ 3,941,018.00		$ -	546.15	$ 3,941,018	48%	598.08	$ 4,315,774.54
10.8	Pañete/Revoque Muros - Impermeable Interior. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	49.62	$45,547.00	$ 2,260,042.14	49.62	$ 2,260,042.14	49.62	$ 2,260,042.14	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	49.62	$ 2,260,042.14
10.9	Pañete/Revoque Muros Interior. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	2479.16	$39,038.00	$ 96,781,448.08	2479.16	$ 96,781,448.08	2479.16	$ 96,781,448.08	1516.37	$ 59,195,946.00	21.70	$ 847,291	1538.07	$ 60,043,237	62%	941.09	$ 36,738,211.57
10.10	Pañete/Revoque Muros (ml) Interior. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	337.76	$29,711.00	$ 10,035,187.36	337.76	$ 10,035,187.36	337.76	$ 10,035,187.36	283.29	$ 8,416,829.00	2.20	$ 65,364	285.49	$ 8,482,193	85%	52.27	$ 1,552,994.16
10.11	Pañete bajo placa. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	1056.64	$39,030.00	$ 41,240,659.20	169.73	$ 6,624,561.90	169.73	$ 6,624,561.90	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	169.73	$ 6,624,561.90
11	**ENCHAPES CERAMICOS Y PORCELANATO**				**$ 119,658,065.82**		**$ 156,914,755.59**		**$ 233,276,320.47**		**$ 62,821,293.00**		**$ 65,951,371.40**		**$ 128,772,664**			**$ 104,503,656.07**
11.1	Enchape Muros en Porcelanato de 30x60cm, incluye pega, boquilla y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	80.66	$189,616.00	$ 15,294,426.56	274.36	$ 52,023,045.76	274.36	$ 52,023,045.76	218.13	$ 41,361,544.00		$ -	218.13	$ 41,361,544	80%	56.23	$ 10,661,501.76
11.2	Piso en marmol Royal veta 20mm, instalado según despiece de planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	93.05	$234,479.00	$ 21,818,270.95	93.05	$ 21,818,270.95	94.29	$ 22,109,024.91	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	94.29	$ 22,109,024.91
11.3	Piso Terrazo grano de marmol fundido en sitio, destroncado, pulido y brillado, espesor 30mm, con dilatadores en bronce. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	324.62	$237,838.00	$ 77,206,971.56	324.62	$ 77,206,971.56	570.44	$ 135,673,164.94	75.07	$ 17,854,498.00	233.14	$ 55,449,551	308.21	$ 73,304,049	54%	262.23	$ 62,369,115.62
11.4	Guardaescoba Marmol royal veta 20x70mm acabado pulido sobre puesto en muro. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	38.59	$44,413.00	$ 1,713,897.67	50.48	$ 2,241,968.24	56.05	$ 2,489,348.65	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	56.05	$ 2,489,348.65
11.5	Mediacaña Granito fundido en sitio, pulida y brillada. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	84.06	$43,118.00	$ 3,624,499.08	84.06	$ 3,624,499.08	486.61	$ 20,981,736.22	83.61	$ 3,605,251.00	243.56	$ 10,501,820	327.17	$ 14,107,071	67%	159.44	$ 6,874,665.14
12	**PISOS**				**$ 204,736,415.10**		**$ 57,990,444.33**		**$ 130,120,371.67**		**$ 386,147.00**		**$ 967,493.87**		**$ 1,353,641**			**$ 128,766,730.80**
12.1	Afinado pisos con mortero seco. Incluye todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	1097.88	$56,266.00	$ 61,773,316.08	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
12.2	Afinado Tanque con mortero seco. Incluye todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	58.46	$56,266.00	$ 3,289,310.36	25.01	$ 1,407,212.66	25.01	$ 1,407,212.66	6.86	$ 386,147.00	17.20	$ 967,494	24.06	$ 1,353,641	96%	0.95	$ 53,571.79
12.3	Afinado escalera Descansos con mortero seco. Incluye todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	18.77	$56,266.00	$ 1,056,112.82	124.08	$ 6,981,485.28	124.08	$ 6,981,485.28	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	124.08	$ 6,981,485.28

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 007

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACION Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,988.75	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ 3,542,460,878.33	FECHA TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2026
VALOR FINAL:	$ 11,009,779,867.08	FECHA DEL ACTA:	31 de julio de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 5		MODIFICATORIO 6		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
										ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
12.4	Afinado paso escalera con mortero seco. Incluye todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	28.56	$22,226.00	$ 634,774.56	137.92	$ 3,065,409.92	137.92	$ 3,065,409.92	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	137.92	$ 3,065,409.92
12.5	Piso Vinilo de 2mm de espesor, referencia "Imparck Pixel clear". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	736.54	$148,091.00	$ 109,074,945.14	89.93	$ 13,317,823.63	688.73	$ 101,994,714.43	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	688.73	$ 101,994,714.43
12.6	Concreto 21 Mpa (3000 psi) endurecido pisos, pulido, esmaltado y brillado. Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, formaleta, malla electrosoldada, retiro y disposición de los sobrantes, y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	257.71	$101,530.00	$ 26,165,296.30	190.58	$ 19,349,587.40	29.18	$ 2,962,797.70	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	29.18	$ 2,962,797.70
12.7	Guardaescobas madera pieza en aglomerado MDF 70x10mm sellada con acabado en pintura esmalte color blanco mate instalada sobrepuesta en muro fijada con tornillería oculta. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	108.56	$25,264.00	$ 2,742,659.84	548.96	$ 13,868,925.44	542.62	$ 13,708,751.68	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	542.62	$ 13,708,751.68
13	**IMPERMEABILIZACION**				**$ 57,804,106.99**		**$ 71,713,791.83**		**$ 46,170,372.41**		**$ 24,737,491.00**		**$ 14,201,485.00**		**$ 38,938,976**			**$ 7,231,396.41**
13.1	Impermeabilización Foso de Ascensor según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	18.58	$115,256.00	$ 2,141,456.48	18.58	$ 2,141,456.48	18.58	$ 2,141,456.48	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	18.58	$ 2,141,456.48
13.2	Impermeabilizacion piso/muro zonas humedas según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	120.05	$41,652.00	$ 5,000,322.60	288.62	$ 12,021,600.24		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
13.3	Impermeabilizacion cubiertas según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	132.00	$151,904.00	$ 20,051,328.00	148.95	$ 22,626,100.80	162.21	$ 24,639,861.75	128.12	$ 19,461,530.00	27.65	$ 4,200,146	155.77	$ 23,661,676	96%	6.44	$ 978,186.15
13.4	Impermeabilización Interior Tanque según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	109.50	$138,840.00	$ 15,202,980.00	133.23	$ 18,497,653.20	110.17	$ 15,295,364.14	38.00	$ 5,275,961.00	72.04	$ 10,001,339	110.04	$ 15,277,300	100%	0.13	$ 18,063.74
13.5	Impermeabilización Exterior Igol denso Tanque según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	51.04	$24,146.00	$ 1,232,411.84	93.24	$ 2,251,373.04	0.00	$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
13.6	Impermeabilización Muros Ladrillo según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	146.53	$19,565.00	$ 2,866,859.45	146.53	$ 2,866,859.45	111.33	$ 2,178,101.02	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	111.33	$ 2,178,101.02
13.7	Impermeabilizacion de Balcones y terrazas según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	77.87	$145,226.00	$ 11,308,748.62	77.87	$ 11,308,748.62	13.19	$ 1,915,589.03	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	13.19	$ 1,915,589.03
14	**CIELO RASOS Y PARTICIONES LIVIANAS**				**$ 246,349,058.40**		**$ 256,329,364.49**		**$ 242,999,315.52**		**$ 43,605,290.00**		**$ 95,533,368.24**		**$ 139,138,658**			**$ 103,860,657.28**
14.1	Cielos rasos fibrocemento/superboard 6mm según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	162.81	$134,271.00	$ 21,860,661.51	90.62	$ 12,167,638.02	123.24	$ 16,547,558.04	69.08	$ 9,275,185.00		$ -	69.08	$ 9,275,185		54.16	$ 7,272,373.04
14.2	Dilatacion cielos Z. Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	378.00	$14,324.00	$ 5,414,472.00	378.00	$ 5,414,472.00	378.00	$ 5,414,472.00	103.79	$ 1,486,687.00		$ -	103.79	$ 1,486,687	27%	274.21	$ 3,927,785.00
14.3	Cielo Raso en drywall según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	293.27	$106,783.00	$ 31,316,250.41	1154.29	$ 123,258,549.07	1620.15	$ 173,003,943.54	200.42	$ 21,401,448.00	894.65	$ 95,533,368	1095.07	$ 116,934,816	68%	525.08	$ 56,069,127.30
14.4	Tapas inspeccion cielo raso 20x20cm. Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	un	16.00	$229,389.00	$ 3,670,224.00	16.00	$ 3,670,224.00	16.00	$ 3,670,224.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.00	$ 3,670,224.00
14.5	Dinteles Especiales en Estructura Metalica 0.10 x 0.32. Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	85.00	$164,224.00	$ 13,959,040.00	85.00	$ 13,959,040.00	85.00	$ 13,959,040.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	85.00	$ 13,959,040.00
14.6	tapas cielo rasos. Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	120.00	$36,182.00	$ 4,341,840.00	120.00	$ 4,341,840.00	120.00	$ 4,341,840.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	120.00	$ 4,341,840.00
14.7	Muro Super board - fibrocemento dos cara 10mm según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	361.20	$157,143.00	$ 56,760,051.60	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
14.8	Muro Super board - fibrocemento una cara 8mm según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	763.11	$112,781.00	$ 86,064,308.91	763.11	$ 86,064,308.91	207.73	$ 23,428,722.69	101.45	$ 11,441,970.00		$ -	101.45	$ 11,441,970	49%	106.28	$ 11,986,252.69
14.9	Cielo raso en yeso perforado 12,5mm según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	83.91	$184,828.00	$ 15,508,917.48	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
14.10	Superboad de fachada 10mm según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	47.43	$157,143.00	$ 7,453,292.49	47.43	$ 7,453,292.49	16.76	$ 2,634,015.25	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.76	$ 2,634,015.25
15	**VENTANERIA Y VIDRIO**				**$ 519,867,712.69**		**$ 519,867,712.69**		**$ 807,898,782.97**		**$ 0.00**		**$ 169,611,779.14**		**$ 169,611,779**			**$ 638,287,003.83**
15.1	Rejillas en aluminio según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	45.00	$498,647.00	$ 22,439,115.00	45.00	$ 22,439,115.00	33.88	$ 16,895,307.25	0.00	$ -	7.20	$ 3,590,258	7.20	$ 3,590,258	21%	26.68	$ 13,305,048.85
15.2	Ventaneria en vidrio en Aluminio según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	264.30	$855,984.00	$ 226,236,571.20	264.30	$ 226,236,571.20	748.41	$ 640,626,985.44	0.00	$ -	193.95	$ 166,021,521	193.95	$ 166,021,521	26%	554.46	$ 474,605,464.70

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 007

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACION Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,988.75	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ 3,542,460,878.33	FECHA TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2026
VALOR FINAL:	$ 11,009,779,867.08	FECHA DEL ACTA:	31 de julio de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 5		MODIFICATORIO 6		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
										ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
15.3	Puertas Ventanas y puertas en Vidrio según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	74.94	$966,492.00	$ 72,428,910.48	74.94	$ 72,428,910.48	74.94	$ 72,428,910.48	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	74.94	$ 72,428,910.48
15.4	Fachada vidrio Ascensor según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	100.09	$1,207,069.00	$ 120,815,536.21	100.09	$ 120,815,536.21		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
15.5	Divisiones En vidrio según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	80.65	$966,492.00	$ 77,947,579.80	80.65	$ 77,947,579.80	80.65	$ 77,947,579.80	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	80.65	$ 77,947,579.80
16	**CARPINTERIA METALICA**				**$ 130,441,622.34**		**$ 130,441,622.34**		**$ 106,038,678.34**		**$ 0.00**		**$ 19,202,640.00**		**$ 19,202,640**			**$ 86,836,038.34**
16.1	Pasamanos metalico según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	51.62	$152,266.00	$ 7,859,970.92	51.62	$ 7,859,970.92	63.46	$ 9,662,800.36	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	63.46	$ 9,662,800.36
16.2	Baranda metalica Escalera según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	24.84	$327,782.00	$ 8,142,104.88	24.84	$ 8,142,104.88	32.93	$ 10,793,861.26	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	32.93	$ 10,793,861.26
16.3	Escotilla según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	und	3.00	$370,765.00	$ 1,112,295.00	3.00	$ 1,112,295.00	3.00	$ 1,112,295.00	0.00	$ -	3.00	$ 1,112,295	3.00	$ 1,112,295	100%	0.00	$ -
16.4	Puertas de emergencia Cortafuego (0.9-1.2 X 2.4) según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	und	11.00	$2,414,625.00	$ 26,560,875.00	11.00	$ 26,560,875.00	9.00	$ 21,731,625.00	0.00	$ -	1.00	$ 2,414,625	1.00	$ 2,414,625	11%	8.00	$ 19,317,000.00
16.5	Puerta Metalicas Sencillas según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	und	22.00	$954,688.00	$ 21,003,136.00	22.00	$ 21,003,136.00	21.00	$ 20,048,448.00	0.00	$ -	8.00	$ 7,637,504	8.00	$ 7,637,504	38%	13.00	$ 12,410,944.00
16.6	Puerta Metalicas Doble hoja (1.10 - 2.55) según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	und	14.00	$1,459,140.00	$ 20,427,960.00	14.00	$ 20,427,960.00	13.00	$ 18,968,820.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,459,140	1.00	$ 1,459,140	8%	12.00	$ 17,509,680.00
16.7	Puerta Metalica Emergencia Doble cortafuego según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	un	1.00	$5,028,457.00	$ 5,028,457.00	1.00	$ 5,028,457.00	1.00	$ 5,028,457.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 5,028,457.00
16.8	Puerta metalica Corrediza según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	un	4.00	$1,134,076.00	$ 4,536,304.00	4.00	$ 4,536,304.00	4.00	$ 4,536,304.00	0.00	$ -	4.00	$ 4,536,304	4.00	$ 4,536,304	100%	0.00	$ -
16.9	Puerta acceso Peatonal según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	un	1.00	$3,325,247.00	$ 3,325,247.00	1.00	$ 3,325,247.00	2.00	$ 6,650,494.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.00	$ 6,650,494.00
16.10	Escalera Gato según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	un	2.00	$1,430,665.00	$ 2,861,330.00	2.00	$ 2,861,330.00	2.00	$ 2,861,330.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.00	$ 2,861,330.00
16.11	Barandas terrazas/vacios según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	9.78	$851,155.00	$ 8,324,295.90	9.78	$ 8,324,295.90		$ 0.00	0.00	$ -	2.40	$ 2,042,772	2.40	$ 2,042,772		-2.40	-$ 2,042,772.00
16.12	Fachadas metalicas/celosia según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	39.12	$543,447.00	$ 21,259,646.64	39.12	$ 21,259,646.64	8.55	$ 4,644,243.72	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	8.55	$ 4,644,243.72
17	**CARPINTERIA MADERA**				**$ 11,866,063.00**		**$ 11,866,063.00**		**$ 10,787,330.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**			**$ 10,787,330.00**
17.1	Puerta sencilla en madera sencilla según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	un	11.00	$1,078,733.00	$ 11,866,063.00	11.00	$ 11,866,063.00	10.00	$ 10,787,330.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.00	$ 10,787,330.00
18	**APARATOS SANITARIOS**				**$ 96,293,982.00**		**$ 77,544,033.00**		**$ 80,136,794.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**			**$ 80,136,794.00**
18.1	Rejilla piso -baño redonda 3" X 2" plastica. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	30.00	$15,230.00	$ 456,900.00	30.00	$ 456,900.00	17.00	$ 258,910.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	17.00	$ 258,910.00
18.2	Sanitario Institucional. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	16.00	$995,321.00	$ 15,925,136.00	16.00	$ 15,925,136.00	16.00	$ 15,925,136.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.00	$ 15,925,136.00
18.3	Lavamanos Institucional. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	16.00	$735,934.00	$ 11,774,944.00	16.00	$ 11,774,944.00	16.00	$ 11,774,944.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.00	$ 11,774,944.00
18.4	Griferia lavamanos Institucional. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	16.00	$332,857.00	$ 5,325,712.00	16.00	$ 5,325,712.00	16.00	$ 5,325,712.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.00	$ 5,325,712.00
18.5	Meson Baños. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	25.00	$803,180.00	$ 20,079,500.00	25.00	$ 20,079,500.00	25.00	$ 20,079,500.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	25.00	$ 20,079,500.00
18.6	Rejilla ventilacion. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	6.00	$31,318.00	$ 187,908.00	6.00	$ 187,908.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
18.7	Sensor Lavamanos/Sanitario/Orinal. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	32.00	$587,755.00	$ 18,808,160.00	35.00	$ 20,571,425.00	32.00	$ 18,808,160.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	32.00	$ 18,808,160.00
18.8	Extractor baños. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	5.00	$229,389.00	$ 1,146,945.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
18.9	Orinal institucional. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	4.00	$793,811.00	$ 3,175,244.00	0.00	$ 0.00	4.00	$ 3,175,244.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.00	$ 3,175,244.00
18.10	Secador de manos. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	13.00	$550,512.00	$ 7,156,656.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
18.11	Barras de seguridad en L. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	4.00	$391,670.00	$ 1,566,680.00	0.00	$ 0.00	4.00	$ 1,566,680.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.00	$ 1,566,680.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 007

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACION Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,988.75	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ 3,542,460,878.33	FECHA TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2026
VALOR FINAL:	$ 11,009,779,867.08	FECHA DEL ACTA:	31 de julio de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 5		MODIFICATORIO 6		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
										ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
18.12	Dispensador De Jabon. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	13.00	$164,843.00	$ 2,142,959.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
18.13	Percha. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	15.00	$33,515.00	$ 502,725.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
18.14	Dispensador de papel higienico. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	14.00	$174,843.00	$ 2,447,802.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
18.15	Dispensador de toallas de papel. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	13.00	$182,631.00	$ 2,374,203.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
18.16	Poceta de aseo. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	4.00	$805,627.00	$ 3,222,508.00	4.00	$ 3,222,508.00	4.00	$ 3,222,508.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.00	$ 3,222,508.00
19	**COCINAS**				**$ 5,885,880.60**		**$ 2,601,185.30**		**$ 12,023,136.25**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**			**$ 12,023,136.25**
19.1	Meson cocina quarztone. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	2.38	$1,092,935.00	$ 2,601,185.30	2.38	$ 2,601,185.30	4.00	$ 4,371,740.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.00	$ 4,371,740.00
19.2	Salpicadero en quarztone. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	2.38	$1,092,935.00	$ 2,601,185.30	0.00	$ 0.00	5.75	$ 6,284,376.25	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	5.75	$ 6,284,376.25
19.3	Grifería lavaplatos. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	1.00	$361,065.00	$ 361,065.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 722,130.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.00	$ 722,130.00
19.4	lavaplatos submontar. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	1.00	$322,445.00	$ 322,445.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 644,890.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.00	$ 644,890.00
20	**OBRAS EXTERIORES**				**$ 142,537,851.00**		**$ 1,858,776.79**		**$ 124,960,895.35**		**$ 608,538.00**		**$ 998,356.08**		**$ 1,606,894**			**$ 123,354,001.27**
20.1	Paisajismo	un	1.00	$64,093,890.00	$ 64,093,890.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 64,093,890.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 64,093,890.00
20.2	Obra de Urbanismo Externo	un	1.00	$48,292,509.00	$ 48,292,509.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 48,292,509.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 48,292,509.00
20.3	Bordillo en concreto 21 Mpa (3000 psi) fundido en sitio -Pisos. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación.	ml	97.00	$29,398.00	$ 2,851,606.00	20.70	$ 608,538.60	59.83	$ 1,758,882.34	20.70	$ 608,538.00	33.96	$ 998,356	54.66	$ 1,606,894	91%	5.17	$ 151,988.26
20.4	Andenes en Adoquin en Concreto 10cm x 8cm x 20cm. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación.	M2	135.00	$150,385.00	$ 20,301,975.00	0.00	$ 0.00	71.92	$ 10,815,614.01	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	71.92	$ 10,815,614.01
20.5	Sardineles prefabricado bordillos. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación.	ml	97.00	$72,143.00	$ 6,997,871.00	17.33	$ 1,250,238.19		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
21	**EQUIPOS ESPECIALES**				**$ 481,589,895.00**		**$ 408,995,346.00**		**$ 408,995,346.00**		**$ 354,626,284.00**		**$ 54,369,061.30**		**$ 408,995,345.30**			**$ 0.70**
21.1	Equipo Presion Agua potable según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	un	1.00	$35,704,520.00	$ 35,704,520.00	1.00	$ 35,704,520.00	1.00	$ 35,704,520.00	0.00	$ -	1.00	$ 35,704,520	1.00	$ 35,704,520	100%	0.00	$ -
21.2	Desmontaje y reinstalación de ascensor existente. Incluye el desmontaje cuidadoso del ascensor existente, compuesto por cabina, motor, rieles, puertas, contrapesos y demás componentes mecánicos y eléctricos. Se realizarán las labores de almacenamiento temporal en sitio o área designada, garantizando la integridad de los elementos. Posteriormente, se llevará a cabo la reinstalación en la misma ubicación, con ajuste y nivelación de rieles, conexión eléctrica, pruebas de funcionamiento y calibración del sistema, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes de seguridad y operatividad del equipo.	un	1.00	$22,470,021.00	$ 22,470,021.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
21.3	Equipo Incendio según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	un	1.00	$373,290,826.00	$ 373,290,826.00	1.00	$ 373,290,826.00	1.00	$ 373,290,826.00	0.95	$ 354,626,284.00	0.05	$ 18,664,541	1.00	$ 373,290,825	100%	0.00	$ 0.70
21.4	UPS 30 KVA 208-120V según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	un	1.00	$50,124,528.00	$ 50,124,528.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
22	**ILUMINACION**				**$ 70,970,829.00**		**$ 20,198,874.00**		**$ 69,688,643.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**			**$ 69,688,643.00**
22.1	Suministro, transporte e instalación de Luminaria LED PANEL DE 60x60cm, 40W, color 4000K (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS), incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta instalación	un	173.00	$144,285.00	$ 24,961,305.00	0.00	$ 0.00	166.00	$ 23,951,310.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	166.00	$ 23,951,310.00
22.2	Suministro, transporte e instalación de Luminaria LED PANEL CIRCULAR DE 18W, color 4000K RD 18W (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS). Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta instalación	un	120.00	$25,861.00	$ 3,103,320.00	0.00	$ 0.00	122.00	$ 3,155,042.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	122.00	$ 3,155,042.00
22.3	Suministro, transporte e instalación de Luminaria LED HERMETICA DE SOBREPONER 40W, IP65, color 4000K (VER ESPECIFICACIONES TECNCIAS). Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	un	43.00	$128,463.00	$ 5,523,909.00	0.00	$ 0.00	57.00	$ 7,322,391.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	57.00	$ 7,322,391.00
22.4	Suministro, transporte e instalación de proyector LED 100W 120V. (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS). Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta instalación	un	3.00	$214,236.00	$ 642,708.00	0.00	$ 0.00	3.00	$ 642,708.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.00	$ 642,708.00
22.5	Suministro, transporte e instalación de proyector LED 70W 120V. (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS). Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta instalación	un	4.00	$108,527.00	$ 434,108.00	0.00	$ 0.00	4.00	$ 434,108.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.00	$ 434,108.00
22.6	Suministro, transporte e instalación de Luminaria APLIQUE DE PARED LED 7W, IP 65 para uso exterior, TIPO TORTUGA. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta instalación	un	4.00	$128,146.00	$ 512,584.00	0.00	$ 0.00	4.00	$ 512,584.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.00	$ 512,584.00
22.7	Suministro, transporte e instalación de luminaria de EVACUACION Y EMERGENCIA , LED 4W 120V.(VER ESPECIFICACIONES TECNICAS). Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta instalación	un	109.00	$117,444.00	$ 12,801,396.00	0.00	$ 0.00	109.00	$ 12,801,396.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	109.00	$ 12,801,396.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 007

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACION Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,988.75	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ 3,542,460,878.33	FECHA TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2026
VALOR FINAL:	$ 11,009,779,867.08	FECHA DEL ACTA:	31 de julio de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 5		MODIFICATORIO 6		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
										ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
22.8	Suministro, transporte e instalación de luminaria de EVACUACION Y EMERGENCIA , LED CON AVISO DE SALIDA LUMINOSO Fabricada por SYLVANIA REF: P33718 (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS). Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	un	25.00	$111,705.00	$ 2,792,625.00	0.00	$ 0.00	6.00	$ 670,230.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	6.00	$ 670,230.00
22.9	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de INTERRUPTOR SENCILLO, incluyendo ducto EMT, de ½", cajas, conductor CABLE de cobre 3No12 AWG, THHN, TC LS-ZH(FASE-TIERRA), interruptor sencillo 15A, 120V conectores tipo resorte y demás accesorios. (LONGITUD PROMEDIO DE LA SALIDA 5m PARA DUCTO Y CABLEADO), incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correctainstalación	un	48.00	$113,161.00	$ 5,431,728.00	48.00	$ 5,431,728.00	48.00	$ 5,431,728.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	48.00	$ 5,431,728.00
22.10	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de INTERRUPTOR DOBLE, incluyendo ducto EMT, de ½", cajas, conductor CABLE de cobre 3No12 AWG, THHN, TC LS-ZH(FASE-TIERRA), interruptor doble 15A, 120V conectores tipo resorte y demás accesorios. (LONGITUD PROMEDIO DE LA SALIDA 5m PARA DUCTO Y CABLEADO). Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta instalación	un	15.00	$116,728.00	$ 1,750,920.00	15.00	$ 1,750,920.00	15.00	$ 1,750,920.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	15.00	$ 1,750,920.00
22.11	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de INTERRUPTOR TRIPLE, incluyendo ducto EMT, de ½", cajas, conductor CABLE de cobre 3No12 AWG, THHN, TC LS-ZH(FASE-TIERRA), interruptor doble 15A, 120V conectores tipo resorte y demás accesorios. (LONGITUD PROMEDIO DE LA SALIDA 5m PARA DUCTO Y CABLEADO). Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta instalación	un	6.00	$118,511.00	$ 711,066.00	6.00	$ 711,066.00	6.00	$ 711,066.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	6.00	$ 711,066.00
22.12	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para sensor de ocupacion ubicado en techo, infrarrojo-ultrasonico, amplitud de 360º, 1000W (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS) incluyendo ducto EMT, de ½", cajas, conductor CABLE de cobre 3No12 AWG, THHN, TC LS-ZHconectores tipo resorte y demás accesorios. (LONGITUD PROMEDIO DE LA SALIDA 5m PARA DUCTO YCABLEADO). Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta instalación	un	56.00	$219,735.00	$ 12,305,160.00	56.00	$ 12,305,160.00	56.00	$ 12,305,160.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	56.00	$ 12,305,160.00
23	**COMUNICACIONES**						**$ 212,051,758.00**		**$ 221,161,009.00**		**$ 102,740,223.00**		**$ 16,129,568.00**		**$ 118,869,791.00**			**$ 102,291,218.00**
23.1	**SALIDAS**				**$ 30,823,171.00**		**$ 30,823,171.00**		**$ 30,823,171.00**		**$ 1,755,056.00**		**$ 0.00**		**$ 1,755,056.00**			**$ 29,068,115.00**
23.101	Salida de Datos	Und	281.00	$109,691.00	$ 30,823,171.00	281.00	$ 30,823,171.00	281.00	$ 30,823,171.00	16.00	$ 1,755,056.00		$ -	16.00	$ 1,755,056	6%	265.00	$ 29,068,115.00
23.2	**CABLEADO ESTRUCTURADO**				**$ 155,325,571.00**		**$ 152,345,146.00**		**$ 152,345,146.00**		**$ 86,896,992.00**		**$ 16,129,568.00**		**$ 103,026,560**			**$ 49,318,586.00**
23.201	Cable UTP Cat 6A LZOH. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	9760.00	$ 10,556.00	$ 103,026,560.00	9760.00	$ 103,026,560.00	9760.00	$ 103,026,560.00	8232.00	$ 86,896,992.00	1528.00	$ 16,129,568	9760.00	$ 103,026,560	100%	0.00	$ -
23.202	Toma RJ45 Cat 6A para Puestos de trabajo. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	281.00	$ 13,984.00	$ 3,929,504.00	281.00	$ 3,929,504.00	281.00	$ 3,929,504.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	281.00	$ 3,929,504.00
23.203	Toma RJ45 Cat 6A para herraje en Rack. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	281.00	$ 13,984.00	$ 3,929,504.00	281.00	$ 3,929,504.00	281.00	$ 3,929,504.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	281.00	$ 3,929,504.00
23.204	Faceplate doble para cat 6A. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	175.00	$ 16,731.00	$ 2,927,925.00	175.00	$ 2,927,925.00	175.00	$ 2,927,925.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	175.00	$ 2,927,925.00
23.205	Modulo Angulado para faceplete doble. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	175.00	$ 7,578.00	$ 1,326,150.00	175.00	$ 1,326,150.00	175.00	$ 1,326,150.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	175.00	$ 1,326,150.00
23.206	Herraje de 24 Puertos Cat 6A. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	14.00	$ 273,448.00	$ 3,828,272.00	14.00	$ 3,828,272.00	14.00	$ 3,828,272.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	14.00	$ 3,828,272.00
23.207	Organizador de 2UR. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	14.00	$ 129,926.00	$ 1,818,964.00	14.00	$ 1,818,964.00	14.00	$ 1,818,964.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	14.00	$ 1,818,964.00
23.208	Patch Cord Cat 6A de 1,5 mts azul para rack. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	281.00	$ 31,173.00	$ 8,759,613.00	281.00	$ 8,759,613.00	281.00	$ 8,759,613.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	281.00	$ 8,759,613.00
23.209	Patch Cord Cat 6A de 3 mts azul para rack. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	281.00	$ 39,017.00	$ 10,963,777.00	281.00	$ 10,963,777.00	281.00	$ 10,963,777.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	281.00	$ 10,963,777.00
23.210	Certificación de punto de red e informe impreso, validando el cumplimiento de las características dispuestas por el fabricante y los mínimos dispuestos en el documento de especificaciones técnicas. (La certificación debe ser realizada con el equipo debidamente calibrado)	Und	281.00	$ 23,532.00	$ 6,612,492.00	281.00	$ 6,612,492.00	281.00	$ 6,612,492.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	281.00	$ 6,612,492.00
23.211	Marcación	Und	281.00	$ 18,585.00	$ 5,222,385.00	281.00	$ 5,222,385.00	281.00	$ 5,222,385.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	281.00	$ 5,222,385.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 007

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,988.75	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ 3,542,460,878.33	FECHA TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2026
VALOR FINAL:	$ 11,009,779,867.08	FECHA DEL ACTA:	31 de julio de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 5		MODIFICATORIO 6		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
										ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
23.212	Rack de cableado de 60x60cm de 40UR. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	3.00	$ 993,475.00	$ 2,980,425.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
23.3	**SALAS DE AUDIENCIA**				**$ 11,339,800.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**			**$ 0.00**
23.301	Rack para salas de Audiencia de piso. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	6.00	$ 524,707.00	$ 3,148,242.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
23.302	Cámaras para grabación salas de audiencia. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	6.00	$ 273,760.00	$ 1,642,560.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
23.303	Micrófonos de salas de audiencia. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	31.00	$ 211,258.00	$ 6,548,998.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
23.4	**EQUIPOS IT**				**$ 19,117,917.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**			**$ 0.00**
23.401	Switch de 48 Puertos administrable para montaje en Rack (debe contar con puertos POE para alimentar las cámaras). Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	7.00	$2,731,131.00	$ 19,117,917.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
23.5	**BACKBONE FIBRA**				**$ 3,040,138.00**		**$ 3,040,138.00**		**$ 1,421,628.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**			**$ 1,421,628.00**
23.501	Fibra Óptica multimodo de 6 Hilos para interior OM4 - Back bone en Piso. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	30.00	$ 40,470.00	$ 1,214,100.00	30.00	$ 1,214,100.00	30.00	$ 1,214,100.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	30.00	$ 1,214,100.00
23.502	Conector SC para fibra óptica. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	24.00	$ 8,647.00	$ 207,528.00	24.00	$ 207,528.00	24.00	$ 207,528.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	24.00	$ 207,528.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 007

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACION Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,988.75	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ 3,542,460,878.33	FECHA TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2026
VALOR FINAL:	$ 11,009,779,867.08	FECHA DEL ACTA:	31 de julio de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 5		MODIFICATORIO 6		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
										ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
23.503	Bandeja de Fibra óptica para tres módulos cada uno con 6 espacios. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	3.00	$ 132,822.00	$ 398,466.00	3.00	$ 398,466.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
23.504	Modulo para fibra óptica de 6 espacios. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	4.00	$ 305,011.00	$ 1,220,044.00	4.00	$ 1,220,044.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
23.6	**CCTV**				**$ 12,136,697.00**		**$ 0.00**		**$ 1,328,176.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**			**$ 1,328,176.00**
23.601	Cámara tipo domo de interior verificar. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	36.00	$ 273,760.00	$ 9,855,360.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
23.602	Cámara tipo PTZ para exterior ubicada en piso 4. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	1.00	$ 335,950.00	$ 335,950.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
23.603	NVR con disco duro para grabación de mínimo 2 meses. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	1.00	$ 617,211.00	$ 617,211.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
23.604	Puesta en marcha por personar cetificado por el fabricante	Und	1.00	$ 1,328,176.00	$ 1,328,176.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1,328,176.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 1,328,176.00
23.7	**CONTROL DE ACCESO**				**$ 20,559,776.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**			**$ 0.00**
23.701	Lectora de pared para control de acceso. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	20.00	$ 202,351.00	$ 4,047,020.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
23.702	Electroimán. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	10.00	$ 471,893.00	$ 4,718,930.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
23.703	Botón para Salida de Emergencia. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	10.00	$ 273,760.00	$ 2,737,600.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
23.704	Controladora para 4 puertas, incluye fuentes de poder (2 fuentes por controladora). Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	3.00	$ 648,774.00	$ 1,946,322.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
23.705	Tarjeta de proximidad para controladora. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	100.00	$ 21,094.00	$ 2,109,400.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
23.706	Estación de enrolamiento para tarjetas. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	1.00	$ 1,484,744.00	$ 1,484,744.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
23.707	Puesta en marcha por personar cetificado por el fabricante	Und	1.00	$ 3,515,760.00	$ 3,515,760.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
23.8	**CANALIZACION**				**$ 25,843,303.00**		**$ 25,843,303.00**		**$ 35,242,888.00**		**$ 14,088,175.00**		**$ 0.00**		**$ 14,088,175**			**$ 21,154,713.00**
23.801	Tubería EMT de 1" para red de cableado estructurado, incluye accesorios de montaje. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	719.00	$ 32,488.00	$ 23,358,872.00	719.00	$ 23,358,872.00	719.00	$ 23,358,872.00	400.00	$ 12,995,200.00		$ -	400.00	$ 12,995,200	56%	319.00	$ 10,363,672.00
23.802	Tubería EMT de 1-1/2" para ingreso proveedores. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	25.00	$ 43,719.00	$ 1,092,975.00	25.00	$ 1,092,975.00	240.00	$ 10,492,560.00	25.00	$ 1,092,975.00		$ -	25.00	$ 1,092,975	10%	215.00	$ 9,399,585.00
23.803	Caja de paso de 15x15cm. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	5.00	$ 74,221.00	$ 371,105.00	5.00	$ 371,105.00	5.00	$ 371,105.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	5.00	$ 371,105.00
23.804	Gabinete de 60x60 ingreso de proveedores telecomunicaciones, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	Und	1.00	$ 336,419.00	$ 336,419.00	1.00	$ 336,419.00	1.00	$ 336,419.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 336,419.00
23.805	Caja de piso exterior de 60x60 para ingreso de proveedores de telecomunicaciones. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	1.00	$ 586,272.00	$ 586,272.00	1.00	$ 586,272.00	1.00	$ 586,272.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 586,272.00
23.806	Tubería PVC para comunicación de caja exterior con Gabinete de ingreso proveedores 1-1/2".Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	5.00	$ 19,532.00	$ 97,660.00	5.00	$ 97,660.00	5.00	$ 97,660.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	5.00	$ 97,660.00
24	**SEGURIDAD Y CONTROL**						**$ 37,884,966.00**		**$ 110,300,139.00**		**$ 19,190,047.00**		**$ 2,917,830.00**		**$ 22,107,877.00**			**$ 88,192,262.00**
24.1	**DETECCIÓN DE INCENDIO**				**$ 72,415,173.00**		**$ 0.00**		**$ 72,415,173.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**			**$ 72,415,173.00**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 007

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACION Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,988.75	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ 3,542,460,878.33	FECHA TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2026
VALOR FINAL:	$ 11,009,779,867.08	FECHA DEL ACTA:	31 de julio de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 5		MODIFICATORIO 6		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
										ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
24.101	Detector de humo fotoeléctrico. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	90.00	$ 316,722.00	$ 28,504,980.00	0.00	$ 0.00	90.00	$ 28,504,980.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	90.00	$ 28,504,980.00
24.102	Detector de Temperatura. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	2.00	$ 257,621.00	$ 515,242.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 515,242.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.00	$ 515,242.00
24.103	Estación Manual. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	12.00	$ 666,784.00	$ 8,001,408.00	0.00	$ 0.00	12.00	$ 8,001,408.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	12.00	$ 8,001,408.00
24.104	Alarma Audición visual. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	19.00	$ 530,397.00	$ 10,077,543.00	0.00	$ 0.00	19.00	$ 10,077,543.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	19.00	$ 10,077,543.00
24.105	Modulo de Relé simple para integración con control de acceso, Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	3.00	$ 507,968.00	$ 1,523,904.00	0.00	$ 0.00	3.00	$ 1,523,904.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.00	$ 1,523,904.00
24.106	Panel de incendio, incluye baterías y accesorios para su correcto funcionamiento, debe contar con al menos 2 nacs 1 loops para 250 equipos y tarjeta expansora para un loop adiciona para 250 equipos, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	Und	1.00	$ 10,911,025.00	$ 10,911,025.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 10,911,025.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 10,911,025.00
24.107	Puesta en marcha por ingeniero certificado	GL	1.00	$ 12,881,071.00	$ 12,881,071.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 12,881,071.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 12,881,071.00
24.2	**INFRAESTRUCTURA**				**$ 37,884,966.00**		**$ 37,884,966.00**		**$ 37,884,966.00**		**$ 19,190,047.00**		**$ 2,917,830.00**		**$ 22,107,877**			**$ 15,777,089.00**
24.201	Cableado 2x16. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	920.00	$ 10,238.00	$ 9,418,960.00	920.00	$ 9,418,960.00	920.00	$ 9,418,960.00	515.00	$ 5,272,570.00	285.00	$ 2,917,830	800.00	$ 8,190,400	87%	120.00	$ 1,228,560.00
24.202	Tuberías EMT de 3/4" con accesorios de instalación. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	580.00	$ 26,519.00	$ 15,381,020.00	580.00	$ 15,381,020.00	580.00	$ 15,381,020.00	312.20	$ 8,279,231.00		$ -	312.20	$ 8,279,231	54%	267.80	$ 7,101,789.00
24.203	Salidas para sensor, incluye cajas y accesorios de conexión. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	92.00	$ 106,382.00	$ 9,787,144.00	92.00	$ 9,787,144.00	92.00	$ 9,787,144.00	35.00	$ 3,723,370.00		$ -	35.00	$ 3,723,370	38%	57.00	$ 6,063,774.00
24.204	Salidas para estación manual o señal audiovisual, incluye cajas y accesorios de conexión	Und	31.00	$ 106,382.00	$ 3,297,842.00	31.00	$ 3,297,842.00	31.00	$ 3,297,842.00	18.00	$ 1,914,876.00		$ -	18.00	$ 1,914,876	58%	13.00	$ 1,382,966.00
25	**VENTILACION MECANICA Y AIRE ACONDICIONADO**				**$ 101,065,840.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**			**$ 0.00**
25.1	Minsplit 24000 BTU. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	20.00	$ 5,053,292.00	$ 101,065,840.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
26	**CERRADURAS**				**$ 4,245,669.00**		**$ 1,737,747.00**		**$ 4,245,669.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**			**$ 4,245,669.00**
26.1	Tope Puertas. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	113.00	$ 22,194.00	$ 2,507,922.00	0.00	$ 0.00	113.00	$ 2,507,922.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	113.00	$ 2,507,922.00
26.2	Cerraduras puertas en madera. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	11.00	$ 157,977.00	$ 1,737,747.00	11.00	$ 1,737,747.00	11.00	$ 1,737,747.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	11.00	$ 1,737,747.00
27	**VIDRIOS Y ESPEJOS**				**$ 12,616,418.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**			**$ 0.00**
27.1	Espejos 4 mm dilatado con marco negro. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	38.00	$ 332,011.00	$ 12,616,418.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.00	$ -
28	**PINTURA**				**$ 173,074,001.23**		**$ 165,202,371.89**		**$ 250,069,045.72**		**$ 7,045,957.00**		**$ 88,865,415.25**		**$ 95,911,372**			**$ 154,157,673.47**
28.1	Pintura Bajo Escalera, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	m2	40.60	$11,142.00	$ 452,365.20	40.60	$ 452,365.20	40.60	$ 452,365.20	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	40.60	$ 452,365.20
28.2	Filos y dilataciones en pintura (Fachada). Incluye todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	246.43	$9,473.00	$ 2,334,431.39	246.43	$ 2,334,431.39	246.43	$ 2,334,431.39	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	246.43	$ 2,334,431.39
28.3	Filos y dilataciones en pintura. Incluye todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	1137.95	$8,477.00	$ 9,646,402.15	1120.02	$ 9,494,372.75	1137.95	$ 9,646,402.15	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1137.95	$ 9,646,402.15
28.4	Estuco y pintura 3 manos. Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	m2	2462.14	$38,571.00	$ 94,967,201.94	2262.00	$ 87,247,602.00	4458.33	$ 171,962,246.43	182.68	$ 7,045,957.00	2238.93	$ 86,357,615	2421.60	$ 93,403,572	54%	2036.73	$ 78,558,674.68
28.5	Pintura bajo placa y cielo rasos. Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	m2	1762.00	$23,008.00	$ 40,540,096.00	1762.00	$ 40,540,096.00	1762.00	$ 40,540,096.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1762.00	$ 40,540,096.00
28.6	Pintura borde placa (Fachadas). Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ml	436.21	$17,053.00	$ 7,438,689.13	436.21	$ 7,438,689.13	436.21	$ 7,438,689.13	0.00	$ -	10.80	$ 184,172	10.80	$ 184,172	2%	425.41	$ 7,254,516.73

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 007

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACION Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,988.75	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ 3,542,460,878.33	FECHA TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2026
VALOR FINAL:	$ 11,009,779,867.08	FECHA DEL ACTA:	31 de julio de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 5		MODIFICATORIO 6		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
										ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
28.7	Pintura (Fachadas). Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	m2	283.25	$27,068.00	$ 7,667,011.00	283.25	$ 7,667,011.00	283.25	$ 7,667,011.00	0.00	$ -	85.84	$ 2,323,628	85.84	$ 2,323,628	30%	197.41	$ 5,343,382.90
28.8	Demarcaciones. Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	un	1.00	$7,105,633.00	$ 7,105,633.00	1.00	$ 7,105,633.00	1.00	$ 7,105,633.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 7,105,633.00
28.9	Pintura antihongo. Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	m2	49.62	$58,891.00	$ 2,922,171.42	49.62	$ 2,922,171.42	49.62	$ 2,922,171.42	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	49.62	$ 2,922,171.42
29	**ASEO-LIMPIEZA-MANTENIMIENTO**				**$ 53,441,316.52**		**$ 0.00**		**$ 53,441,316.52**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		$ -			**$ 53,441,316.52**
29.1	Limpieza escaleras	tra	6.00	$978,374.00	$ 5,870,244.00	0.00	$ 0.00	6.00	$ 5,870,244.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	6.00	$ 5,870,244.00
29.2	Limpieza 3 manos	m2	1762.00	$13,546.00	$ 23,868,052.00	0.00	$ 0.00	1762.00	$ 23,868,052.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1762.00	$ 23,868,052.00
29.3	Limpieza vidrios	m2	1415.00	$13,095.00	$ 18,529,425.00	0.00	$ 0.00	1415.00	$ 18,529,425.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1415.00	$ 18,529,425.00
29.4	Limpieza Cubierta	m2	410.00	$6,906.00	$ 2,831,460.00	0.00	$ 0.00	410.00	$ 2,831,460.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	410.00	$ 2,831,460.00
29.5	Limpieza aseo ladrillo	m2	146.53	$15,984.00	$ 2,342,135.52	0.00	$ 0.00	146.53	$ 2,342,135.52	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	146.53	$ 2,342,135.52
30	**NO PREVISTOS**				$ -	**$ 0.02**	**$ 1,033,278,128.67**	1,733,004,885.03	**$ 1,733,004,885.05**		**$ 870,818,173.00**		**$ 248,856,815**		**$ 1,119,674,988**	0%		**$ 613,329,897**
NP01	DESMONTE DE LAMPARAS, consiste en el desmote técnico de las luminarias, y su posterior traslado a sitio de recolección por parte del contratante, incluye mano de obra, Epp, Andamios y demás elementos para el desarrollo de la actividad	Und		$25,069.00		54.00	$ 1,353,726.00	54.00	$ 1,353,726.00	54.00	$ 1,353,726.00		$ -	54.00	$ 1,353,726	100%	0.00	$ -
NP02	DESMONTE DE VENTANERIA, consiste en el desmote técnico de las ventanas existentes, y su posterior traslado a sitio de recolección por parte del contratante, incluye mano de obra, Epp, Andamios y demás elementos para el desarrollo de la actividad.	M2		$27,576.00		132.35	$ 3,649,545.72	132.35	$ 3,649,545.72	132.35	$ 3,649,545.00		$ -	132.35	$ 3,649,545	100%	0.00	$ 0.72
NP03	RETIRO CASETON EN GUADUA EXISTENTE, consiste en el desmote técnico de los casetones de guadua incrustados en las placas de contrapiso existentes, incluye mano de obra, Epp, Andamios, retiro y disposición final de los residuos y demás elementos para el desarrollo de la actividad.	M		$19,070.00		1301.54	$ 24,820,367.80	1,132.61	$ 21,598,872.70	1132.51	$ 21,596,965.00		$ -	1132.51	$ 21,596,965	100%	0.10	$ 1,907.70
NP04	RECUBRIMIENTO DE ACERO DE REFUERZO EN VIGUETAS, debido a problemas constructivos evidenciados en el momento de retirar la torta inferior de las placas aligeradas de entrepiso existentes, como hormigueos por vibrado, y otros derivados del retiro de los casetones, y por recomendación del Ing. Consultor se deben hacer reparaciones puntuales en la sección de las viguetas para resolver los aceros expuestos mediante la aplicación de un mortero de reparación que garantice el recubrimiento mínimo, según las evidencias encontradas en obra las viguetas deben ser reparadas en aproximadamente el 30% de su área superficial, la tarea consiste en aplicación de Mortero tixotrópico, para la reparación del concreto, que no requiere puente de adherencia, en espesor mínimo de 2.5 cm sobre aceros expuestos, esta intervencion no garantiza niveles hilos o filos por lo que su finalidad es unicamente la proteccion de los aceros en un area que luego sera recubierta por cielorasos, incluye limpieza y retiro de material suelto, aplicacion de mortero de reparacion con llana de madera, mano de obra Epp, Andamios, y demás elementos necesarios para su correcta aplicación, se pagara por el total de las viguetas existentes en el proyecto.	M		$85,513.00		1301.54	$ 111,298,590.02	1,301.54	$ 111,298,590.02	1301.54	$ 111,298,590.00		$ -	1301.54	$ 111,298,590	100%	0.00	$ 0.02
NP05	DESMANTELAMIENTO REDES ELECTRICAS EXISTENTES, consiste en la desconexión y retiro de conductores existentes en el proyecto.	GL		$1,003,080.00		1.00	$ 1,003,080.00	1.00	$ 1,003,080.00	1.00	$ 1,003,080.00		$ -	1.00	$ 1,003,080	100%	0.00	$ -
NP06	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ACABADOS DE PISO Y AFINADOS, consiste en la demolición técnica de acabados de tableta de granito o cerámicos y su consecuente afinado de piso, en las placas de la edificación existente que buscan llegara el nivel original de la placa de entrepiso o contrapiso existentes para lograr las alturas de máximas, esta labor incluye herramienta menor y equipos y retiro de escombros	M2		$46,105.53		1259.77	$ 58,082,363.53	1,259.77	$ 58,082,363.53	1259.77	$ 58,082,363.00		$ -	1259.77	$ 58,082,363	100%	0.00	$ 0.53
NP07	CONTRAPLACA EN LOSAS DE ENTREPISO, se requiere la construcción de contraplaca para garantizar una losa resistente toda vez que las existentes en el proyecto carecen de aceros de refuerzo, esta actividad consiste en aplicacion de concreto para recalce de placas de 3.000 PSI grava comun de concreto bombeable, en espesor de 50 mm, incluye acero de refuerzo en malla electrosoldada Q2 (4mmX4mm 150mmX150mm) y mano de obra, sobre la misma se requiere pendientados afinados de piso pues no es de acabado final	M2		$85,749.00		883.16	$ 75,730,086.84	883.16	$ 75,730,086.84	883.16	$ 75,730,086.00		$ -	883.16	$ 75,730,086	100%	0.00	$ 0.84
NP08	ESPESOR ADICIONAL EN CONCRETO PARA FUNDIR PLACAS MONOLÍTICAS AL ÍTEM NP007 CONTRAPLACA LOSAS DE ENTREPISOS, AJUSTANDO NIVELES EN ÁREAS CON PISOS VINÍLICOS, INCLUYE AFINADO CON LLANA DE MADERA Y LECHADA DE CEMENTO	M2		$48,574.00		756.42	$ 36,742,345.08	756.42	$ 36,742,345.08	756.42	$ 36,742,345.00		$ -	756.42	$ 36,742,345	100%	0.00	$ 0.08
NP009	Construcción de cárcamo porta cable en concreto de 3000 psi, con sección libre de 30x30, espesor de muros 10cm, incluye excavación manual, relleno en material seleccionado y compactación, concreto de limpieza, acero de refuerzo formaletas y en general todos los materiales y accesorios para su correcta construcción, se paga por ml a eje de cárcamo construido.	ML		$344,171.00		8.05	$ 2,770,576.55	8.05	$ 2,770,576.55	8.05	$ 2,770,576.00		$ -	8.05	$ 2,770,576	100%	0.00	$ 0.55

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 007

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACION Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,988.75	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ 3,542,460,878.33	FECHA TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2026
VALOR FINAL:	$ 11,009,779,867.08	FECHA DEL ACTA:	31 de julio de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 5		MODIFICATORIO 6		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
										ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
NP010	Concreto superfluido para recalce, concreto grava fina 1/2", con plastificante y acelerante resistencia a la compresión de 4.000 psi mezclado en obra.	M3		$4,280,157.00		3.25	$ 13,910,510.25	3.25	$ 13,910,510.25	2.68	$ 11,470,820.00		$ -	2.68	$ 11,470,820	82%	0.57	$ 2,439,690.25
NP011	Demolicion controlada de superficies de concreto para llegar a aceros de refuerzo en elementos a reforzar	M3		$2,171,554.00		6.48	$ 14,071,669.92	6.48	$ 14,071,669.92	6.48	$ 14,069,368.00		$ -	6.48	$ 14,069,368	100%	0.00	$ 2,301.92
NP012	Construccion de columnetas o vigas de coronacion en concreto de 3000 psi con seccion base menor a 0.12 altura menor a 0.12	ML		$75,548.00		530.00	$ 40,040,440.00	640.25	$ 48,369,607.00	530.00	$ 40,040,440.00	74.53	$ 5,630,592	604.53	$ 45,671,032	94%	35.72	$ 2,698,574.56
NP013	Placa aérea vigas descolgadas H= 0.30 a 0.40 m en concreto de 21 Mpa (3000 psi). Edificio ampliado. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	M2		$403,984.73		156.10	$ 63,062,016.36	156.10	$ 63,062,016.35	155.95	$ 63,003,357.00		$ -	155.95	$ 63,003,357	100%	0.15	$ 58,659.35
NP014	SUMINISTRO E INSTALACION PLÁSTICO NEGRO CAL 3.5 EN SUPERFIECIE PLACAS DE CONRAPISO	M2		$2,625.00		388.10	$ 1,018,762.50	420.71	$ 1,104,355.72	388.10	$ 1,018,754.00		$ -	388.10	$ 1,018,754	92%	32.61	$ 85,601.72
NP015	CONCRETO DE 3000 P.S.I PLACA DE CONTRAPISO 10CM	M2		$132,935.00		409.92	$ 54,492,715.20	454.92	$ 60,474,790.20	409.92	$ 54,493,366.00	20.34	$ 2,703,499	430.26	$ 57,196,865	95%	24.66	$ 3,277,925.10
NP016	Recuperación de equipo ascensor	UND		$3,539,363.45		1.00	$ 3,539,363.45	1.00	$ 3,539,363.45	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 3,539,363.45
NP017	Acompañamiento certificación equipo	UND		$2,690,818.48		1.00	$ 2,690,818.48	1.00	$ 2,690,818.48	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 2,690,818.48
NP018	Suministro e instalación de poste de concreto de 12mts x 1500kg. Trabajos con cuadrilla de linea energizada.	UN		$5,205,000.00		1.00	$ 5,205,000.00	1.00	$ 5,205,000.00	1.00	$ 5,205,000.00		$ -	1.00	$ 5,205,000	100%	0.00	$ -
NP019	Suministro e instalación de estructura de paso sencillo pin trifásica en bandera 523A para 13.2kv. Trabajos con cuadrilla de linea energizada.	UN		$2,902,800.00		1.00	$ 2,902,800.00	1.00	$ 2,902,800.00	1.00	$ 2,902,800.00		$ -	1.00	$ 2,902,800	100%	0.00	$ -
NP020	Desmonte de estructuras y postes existentes con cuadrilla de linea energizada.	UN		$3,785,000.00		1.00	$ 3,785,000.00	1.00	$ 3,785,000.00	1.00	$ 3,785,000.00		$ -	1.00	$ 3,785,000	100%	0.00	$ -
NP021	Traslado de estructura de derivación alimentador transformador Davivienda, con cuadrilla de linea energizada	UN		$3,415,000.00		1.00	$ 3,415,000.00	1.00	$ 3,415,000.00	1.00	$ 3,415,000.00		$ -	1.00	$ 3,415,000	100%	0.00	$ -
NP022	Cierre de puentes de cortacircuitos con cuadrilla de linea energizada.	UN		$905,000.00		3.00	$ 2,715,000.00	3.00	$ 2,715,000.00	3.00	$ 2,715,000.00		$ -	3.00	$ 2,715,000	100%	0.00	$ -
NP023	Fundida de bases de postes de concreto de 12 mts	UN		$186,836.00		1.00	$ 186,836.00	1.00	$ 186,836.00	1.00	$ 186,836.00		$ -	1.00	$ 186,836	100%	0.00	$ -
NP024	Suministro e instalacion de transformador trifásico convencional de 150 KVA 13200/220-127V. Incluye estructura para montaje de equipo separado de fachada para cumplimiento de distancias de seguridad.	UN		$27,454,400.00		1.00	$ 27,454,400.00	1.00	$ 27,454,400.00	1.00	$ 27,454,400.00		$ -	1.00	$ 27,454,400	100%	0.00	$ -
NP025	Suministro e instalación de protecciones para transformador trifásico tipo 711 hasta 13.2 KV y SPT. Incluye cortacircuitos con camara apagachispa.	UN		$4,750,500.00		1.00	$ 4,750,500.00	1.00	$ 4,750,500.00	1.00	$ 4,750,500.00		$ -	1.00	$ 4,750,500	100%	0.00	$ -
NP026	Suministro e instalación de dos (2) ductos conduit galvanizados imc de 4"	ML		$610,080.00		6.00	$ 3,660,480.00	6.00	$ 3,660,480.00	6.00	$ 3,660,480.00		$ -	6.00	$ 3,660,480	100%	0.00	$ -
NP027	Suministro e instalación de banco de tres (3) ductos conduit pvc de 4". Incluye demolición de piso de concreto, excavación, compactación y resanes.	ML		$106,200.00		8.00	$ 849,600.00	8.00	$ 849,600.00	8.00	$ 849,600.00		$ -	8.00	$ 849,600	100%	0.00	$ -
NP028	Suministro e instalación de ocho 2x(3F+1N) conductores en cable de cobre THHN 2x(3No. 4/0 +1No. 4/0 awg) + 1No. 2T awg, desde bornes del transformador hasta protección principal en celda de dsitribución general de BT.	ML		$1,103,600.00		20.00	$ 22,072,000.00	20.00	$ 22,072,000.00	20.00	$ 22,072,000.00		$ -	20.00	$ 22,072,000	100%	0.00	$ -
NP029	Suministro e instalación de grupo de medida indirecta para nivel 2, 3 elementos para 13.2 KV, uso exterior y calibrado.	UN		$33,131,000.00		1.00	$ 33,131,000.00	1.00	$ 33,131,000.00	1.00	$ 33,131,000.00		$ -	1.00	$ 33,131,000	100%	0.00	$ -
NP030	Elaboración de memorias de calculo, planos eléctricos y tramites de aprobacion diseño ante el operador de red.	UN		$7,740,000.00		1.00	$ 7,740,000.00	1.00	$ 7,740,000.00	1.00	$ 7,740,000.00		$ -	1.00	$ 7,740,000	100%	0.00	$ -
NP031	Antepechos cubierta, en panel Kinwall E=60mm 28/26 acanalado y/o liso, incluye perfil de soporte inferior e intermedio en Angulo Gal C-16 de 5x5 ctms	M2		$375,000.00		87.57	$ 32,838,750.00	87.57	$ 32,838,750.00	84.87	$ 31,825,912.00		$ -	84.87	$ 31,825,912	97%	2.70	$ 1,012,838.00
NP032	Relleno en recebo común compactado mecánicamente	M3		$156,285.00		215.43	$ 33,668,477.55	215.43	$ 33,668,477.55	215.43	$ 33,668,196.00		$ -	215.43	$ 33,668,196	100%	0.00	$ 281.55
NP033	Demolición y retiro de elementos masivos de comcreto en cimentaciones profundas	M3		$913,101.00		35.00	$ 31,958,535.00	35.00	$ 31,958,535.00	30.83	$ 28,154,556.00		$ -	30.83	$ 28,154,556	88%	4.17	$ 3,803,979.00
NP034	Muro en Superboad 8mm dos caras con frescasa según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	M2		$154,810.00		424.57	$ 65,727,681.70	644.57	$ 99,785,169.57	410.74	$ 63,587,185.00	10.27	$ 1,589,279	421.01	$ 65,176,464	65%	223.56	$ 34,608,705.11
NP035	Relleno en bloque de arcilla No 4 / 5 como material aligerante en placas de contrapiso	M3		$459,448.00		11.76	$ 5,403,108.48	11.76	$ 5,403,108.48	9.21	$ 4,231,516.00		$ -	9.21	$ 4,231,516	78%	2.55	$ 1,171,592.48
NP036	Revisión integral y validacion cambios en recorridos para la red contraincendios, apoyo técnico en la definición de los parámetros hidráulicos y constructivos requeridos para mantener el sistema, en consecuencia de cambios en el diseño arquitectónico de cielorrasos y validación de alturas libres de la edificación. Incluye Planos de nuevo recorrido de RCI- Memorias de Cálculo (verificación de la presión y caudal del punto crítico de la red).	UN		$9,579,500.00		1.00	$ 9,579,500.00	1.00	$ 9,579,500.00	1.00	$ 9,579,500.00		$ -	1.00	$ 9,579,500	100%	0.00	$ -
NP037	Zapata en concreto de 21 Mpa (3000 psi), incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	M3		$1,210,150.00		2.84	$ 3,436,826.00	2.84	$ 3,438,641.23	2.84	$ 3,438,641.00		$ -	2.84	$ 3,438,641	100%	0.00	$ 0.23
NP038	Vigas de Cimentación en concreto de 21 Mpa (3000 psi), incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	M3		$1,433,053.00		2.48	$ 3,553,971.44	4.22	$ 6,052,499.35	2.48	$ 3,548,239.00		$ -	2.48	$ 3,548,239	59%	1.75	$ 2,504,260.35
NP039	Suministro e instalacion cinta PVC O22 o similar	ML		$113,293.00		35.00	$ 3,965,255.00	35.00	$ 3,965,255.00	35.00	$ 3,965,255.00		$ -	35.00	$ 3,965,255	100%	0.00	$ -
NP040	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE DE 1". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN		$785,600.00		2.00	$ 1,571,200.00	2.00	$ 1,571,200.00	2.00	$ 1,571,200.00		$ -	2.00	$ 1,571,200	100%	0.00	$ -
NP041	Muros en concreto y columnas en concreto de 21 Mpa (3000 psi). Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, formaleta, retiro y disposición de los sobrantes.	M3		$1,283,791.00		58.80	$ 75,486,910.80	58.80	$ 75,486,910.80	56.91	$ 73,056,976.00		$ -	56.91	$ 73,056,976	97%	1.89	$ 2,429,934.80
NP042	Barra antipánico tipo "Yale Tampa de 1 punto" o similar instalada con manija metálica tpo "Ya Versailles" cierra puarta hidráulico instalado en la parte superior de la hoja	UN		$1,634,217.00		10.00	$ 16,342,170.00	10.00	$ 16,342,170.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.00	$ 16,342,170.00
NP043	Cerradura pico loro para puerta corredera de baño tipo "Yale serie 835" o similar acabado satinado	UN		$246,297.00		4.00	$ 985,188.00	4.00	$ 985,188.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.00	$ 985,188.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 007

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACION Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,988.75	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ 3,542,460,878.33	FECHA TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2026
VALOR FINAL:	$ 11,009,779,867.08	FECHA DEL ACTA:	31 de julio de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 5		MODIFICATORIO 6		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
										ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
NP044	Manija metálica para baño tipo "Yale Institucional" o similar, acabado satinado	UN		$454,967.00		17.00	$ 7,734,439.00	17.00	$ 7,734,439.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	17.00	$ 7,734,439.00
NP045	Manija metálica tipo "Yale Institucional" o similar con llave para espacios interiores, acabado satinado	UN		$454,967.00		9.00	$ 4,094,703.00	9.00	$ 4,094,703.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	9.00	$ 4,094,703.00
NP046	Manija metálica tipo "Yale Institucional" o similar con llave para espacios interiores, acabado satinado y cerrojo de pestillo fijo con llave por ambas caras	UN		$615,800.00		1.00	$ 615,800.00	1.00	$ 615,800.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 615,800.00
NP047	Manija metálica tipo "Yale Versailles Institucional" o similar con llave para espacios interiores, acabado satinado	UN		$445,000.00		4.00	$ 1,780,000.00	4.00	$ 1,780,000.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.00	$ 1,780,000.00
NP048	Barra antipánico de 1 punto tipo "Yale tampa" con manija tipo "Yale Vesrailles" institucional por la parte exterior, hoja opuesta con cerrojo operado con mariposa en la parte interior instalado en la parte inferior de la puerta	UN		$1,673,550.00		2.00	$ 3,347,100.00	2.00	$ 3,347,100.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.00	$ 3,347,100.00
NP049	Manija en tubular de acero ø 38 mm según detalle	UN		$465,500.00		4.00	$ 1,862,000.00	4.00	$ 1,862,000.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.00	$ 1,862,000.00
NP050	Manija metálica tipo institucional para baños	UN		$479,967.00		1.00	$ 479,967.00	1.00	$ 479,967.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.00	$ 479,967.00
NP051	Manija metálica tipo "Yale Versailles institucional" o similar con llave para espacios interiores, acabado satinado	UN		$423,000.00		9.00	$ 3,807,000.00	9.00	$ 3,807,000.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	9.00	$ 3,807,000.00
NP052	Tablero de distribución CD-GEN con totalizador general de 3X500A, Ajustable 0,8-1In, 25kA, 2 breaker tipo industrial de 3x200A 25kA, 1 breaker tipo industrial de 3x40A 25kA. Caracteristicas DPS clase I Tablero general (Protección contra rayos) Corriente de descarga =12,5 kA Corriente de impulso 50kA Tensión máxima de operación continua =132Vac Nivel de protección =2,5kV3 X DPS con Uc =132Vac1 X DPS con Uc =132Vac Corriente interna admisible de cortocircuito: 25 KA. Un sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante un analizador de red digital que permita leer en forma secuencial Amps., Volts., Hz, KW, KVA, KVAR, KWH Y KVARH tipo LOVATO y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía, conectado a la red con fusibles en riel din de 2A.. 4 reservas. Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina. Alambrado interior del armario según diagrama unifilar. Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico.	UN		$24,851,587.00		1.00	$ 24,851,587.00	1.00	$ 24,851,587.00	0.00	$ -	1.00	$ 24,851,587	1.00	$ 24,851,587	100%	0.00	$ -
NP053	Tablero de transferencia Automatica de 3X200A. Un sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en forma secuencial Amps., Volts., Hz, KW, KVA, KVAR, KWH Y KVARH tipo LOVATO y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía, conectado a la red con fusibles en riel din de 2A. Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina. Alambrado interior del armario según diagrama unifilar. Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico.	UN		$41,904,466.00		1.00	$ 41,904,466.00	1.00	$ 41,904,466.00	0.00		1.00	$ 41,904,466	1.00	$ 41,904,466	100%	0.00	$ -
NP054	Suministro e instalacion tablero de distribución IP65, T-BOMBAS con totalizador general TIPO INDUSTRIAL de 3X60A, 25KA, 4 breaker tipo industrial de 3x40A 25kA, 1 Breaker tipo RIEL de 1x30A 10KA. Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina. Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico	UN		$7,695,445.00		1.00	$ 7,695,445.00	1.00	$ 7,695,445.00	0.00		1.00	$ 7,695,445	1.00	$ 7,695,445	100%	0.00	$ -
NP055	Suministro e instalacion de tablero de distribución CD-HVAC con totalizador general de 3X200A, Ajustable 0,8-1In 25kA, 20 Breaker tipo RIEL de 2x16A 10KA. 4 reservas. Un sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en forma secuencial Amps., Volts., Hz, KW, KVA, KVAR, KWH Y KVARH tipo LOVATO y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía, conectado a la red con fusibles en riel din de 2A. Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina. Alambrado interior del armario según diagrama unifilar. Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico.	UN		$12,820,180.00		1.00	$ 12,820,180.00	1.00	$ 12,820,180.00	0.00		1.00	$ 12,820,180	1.00	$ 12,820,180	100%	0.00	$ -
NP056	Suministro e instalación de estructura metalica, incluye pintura en acticorrosivo y esmalte colores a definir, , andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	KG		$26,297.00		442.00	$ 11,623,274.00	625.14	$ 16,439,256.93	0.00		594.52	$ 15,634,106	594.52	$ 15,634,106	95%	30.62	$ 805,151.34
NP072	TAPA REGISTRO PLASTICA DE 25 x 25 cm	un		$79,000.00				21.00	$ 1,659,000.00							0%	21.00	$ 1,659,000.00
NP073	Rejilla piso -baño redonda 4" X 3" plastica. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN		$64,400.00				5.00	$ 322,000.00							0%	5.00	$ 322,000.00
NP074	REJILLA DE ALUMINIO DE CUPULA DE 6"x4"	UN		$87,900.00				11.00	$ 966,900.00							0%	11.00	$ 966,900.00
NP075	Rejilla aluminio de cúpula 4"x3"	UN		$61,283.00				2.00	$ 122,566.00							0%	2.00	$ 122,566.00
NP076	REJILLA EN ACERO PARA POZO EYECTOR, 1,10X0,70. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO	UN		$1,304,019.12				1.00	$ 1,304,019.12							0%	1.00	$ 1,304,019.12

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 007

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACION Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,988.75	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ 3,542,460,878.33	FECHA TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2026
VALOR FINAL:	$ 11,009,779,867.08	FECHA DEL ACTA:	31 de julio de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 5		MODIFICATORIO 6		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
										ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
NP077	ESCOTILLA DE CUARTO DE BOMBAS, 1,60X2,16. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO	UN		$3,891,341.96				1.00	$ 3,891,341.96							0%	1.00	$ 3,891,341.96
NP078	CAJA METALICA PARA ESTACION DE CONTROL RCI (0,95 X 0,55 X 0,40)	UN		$575,000.00				4.00	$ 2,300,000.00							0%	4.00	$ 2,300,000.00
NP079	MANOMETRO DE GLICERINA DE 2" - 2 1/2" (0,-300 psi)	UN		$130,252.00				4.00	$ 521,008.00							0%	4.00	$ 521,008.00
NP080	MATERA EN CONCRETO ENTRADA EDIFICIO	UN		$1,352,285.00				1.00	$ 1,352,285.00							0%	1.00	$ 1,352,285.00
NP081	MUEBLE EN CONCRETO PARA ASTAS DE BANDERAS	UN		$1,275,956.00				1.00	$ 1,275,956.00							0%	1.00	$ 1,275,956.00
NP082	Suministro e instalacion de Unidad condensadora de refrigerante variable 870 a 220/3ph/60hz incluye Instalacion de equipos, instalacion de soporterias, izaje de unidades exteriores, izaje de unidades interiores, acoples a equipos, vacio, cargas, logistica, transporte de material	Und		$50,284,484.81				4.00	$ 201,137,939.24							0%	4.00	$ 201,137,939.24
NP083	Suministro e instalacion de Unidad manejadora tipo cassette 1 via de 3 Trincluye Instalacion de equipos, instalacion de soporterias, izaje de unidades exteriores, izaje de unidades interiores, acoples a equipos, vacio, cargas, logistica, transporte de material	Und		$5,989,307.34				7.00	$ 41,925,151.38							0%	7.00	$ 41,925,151.38
NP084	Suministro e instalacion de Unidad manejadora tipo cassette 1 via de 2 Trincluye Instalacion de equipos, instalacion de soporterias, izaje de unidades exteriores, izaje de unidades interiores, acoples a equipos, vacio, cargas, logistica, transporte de material	Und		$5,447,539.44				14.00	$ 76,265,552.16							0%	14.00	$ 76,265,552.16
NP085	Suministro e instalacion de Unidad manejadora tipo cassette 1 via de 1.5 Trincluye Instalacion de equipos, instalacion de soporterias, izaje de unidades exteriores, izaje de unidades interiores, acoples a equipos, vacio, cargas, logistica, transporte de material	Und		$5,278,288.08				2.00	$ 10,556,576.16							0%	2.00	$ 10,556,576.16
NP086	Suministro e instalacion de Unidad manejadora tipo cassette 1 via de 0.9 Trincluye Instalacion de equipos, instalacion de soporterias, izaje de unidades exteriores, izaje de unidades interiores, acoples a equipos, vacio, cargas, logistica, transporte de material	Und		$4,934,349.19				1.00	$ 4,934,349.19							0%	1.00	$ 4,934,349.19
NP087	Suministro e instalacion de Unidad manejadora tipo cassette/pared de 0.6 Trincluye Instalacion de equipos, instalacion de soporterias, izaje de unidades exteriores, izaje de unidades interiores, acoples a equipos, vacio, cargas, logistica, transporte de material	Und		$4,342,337.34				18.00	$ 78,162,072.12							0%	18.00	$ 78,162,072.12
NP088	Suministro e instalacion de Unidad tipo pared de 1 Tr incluye Instalacion de equipos, instalacion de soporterias, izaje de unidades exteriores, izaje de unidades interiores, acoples a equipos, vacio, cargas, logistica, transporte de material	Und		$3,995,861.46				3.00	$ 11,987,584.38							0%	3.00	$ 11,987,584.38
NP089	Suministro e instalacion de Cortina de aire cubierta de tiroincluye Instalacion de equipos, instalacion de soporterias, izaje de unidades exteriores, izaje de unidades interiores, acoples a equipos, vacio, cargas, logistica, transporte de material	Und		$3,806,031.13				3.00	$ 11,418,093.39							0%	3.00	$ 11,418,093.39
NP090	Tuberia de cobre aislada, diametro inferior a 1/2" con pared ais de 1/2" y 3/4"	Ml		$142,912.72				261.00	$ 37,300,219.92			235.60	33,670,236.83	235.60	$ 33,670,237	90%	25.40	$ 3,629,983.09
NP091	Tuberia de cobre aislada, diametro entre 1/2" a 7/8" con pared ais de 1/2" y 3/4"	Ml		$131,990.55				328.00	$ 43,292,900.40			230.30	30,397,423.67	230.30	$ 30,397,424	70%	97.70	$ 12,895,476.73
NP092	Tuberia de cobre aislada, diametro mayor a 7/8" con pared ais de 1/2" y 3/4" y llegadas a condensadoras	Ml		$206,227.60				99.00	$ 20,416,532.40			66.00	13,611,021.60	66.00	$ 13,611,022	67%	33.00	$ 6,805,510.80
NP093	Tuberia de desagues 1" aislada y accesorios	ML		$35,050.00				245.00	$ 8,587,250.00			162.00	5,678,100.00	162.00	$ 5,678,100	66%	83.00	$ 2,909,150.00
NP094	Acometida electrica de señal, incluye: (Tuberia emt 1/2", cable blindado apantallado con recubrimiento 2x18 + 20 foil) incluye soporteria con riel chanel, abrazaderas, terminales, tornilleria menor y fijacion	ML		$76,754.58				720.00	$ 55,263,297.60			480.00	36,842,198.40	480.00	$ 36,842,198	67%	240.00	$ 18,421,099.20
NP095	Tuberías EMT de 1/2" con accesorios de instalación. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML		$23,508.00				580.00	$ 13,634,640.00							0%	580.00	$ 13,634,640.00
NP096	Suministro e instalación de un (1) tanque cilindrico horizontal para almacenamiento de ACPM con capacidad de 119 galones, elevado sobre estructura soportante. Incluye sistema de conexiones (llenado, retorno, drenaje, parallama, flotador e indicador de nivel), válvula de control de salida, de acuerdo con los planos de detalle del proyecto.	UN		$12,666,666.67				1.00	$ 12,666,666.67			1.00	$ 12,666,667	1.00	$ 12,666,667	100%	0.00	$ -
NP097	Refuerzo en madera para soporte superior ventanas interiores	ML		$40,466.00				146.14	$ 5,913,701.24			78.14	$ 3,162,013	78.14	$ 3,162,013	53%	68.00	$ 2,751,688.00
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 5,445,033,534.17		**$ 5,445,033,534.16**		**$ 7,028,450,988.12**		**$ 3,045,695,041.55**		**$ 885,748,602.49**		**$ 3,931,443,644.01**			**$ 3,097,007,344.10**
	Administracion			26%	$ 1,415,708,718.88		$ 1,415,708,718.88		$ 1,827,397,256.91		$ 791,880,710.80		$ 230,294,636.65		$ 1,022,175,347.44			$ 805,221,909.47
	Imprevistos			4%	$ 217,801,341.37		$ 217,801,341.37		$ 281,138,039.53		$ 121,827,801.67		$ 35,429,944.10		$ 157,257,745.76			$ 123,880,293.76
	Utilidad			6%	$ 326,702,012.05		$ 326,702,012.05		$ 421,707,059.29		$ 182,741,702.49		$ 53,144,916.15		$ 235,886,618.64			$ 185,820,440.65
	IVA sobre Utilidad			19%	$ 62,073,382.29		$ 62,073,382.29		$ 80,124,341.27		$ 34,720,923.47		$ 10,097,534.07		$ 44,818,457.54			$ 35,305,883.72
	Total Obras				**$ 7,467,318,988.75**		**$ 7,467,318,988.75**		**$ 9,638,817,685.12**		**$ 4,176,866,179.98**		**$ 1,214,715,633.46**		**$ 5,391,581,813.39**			**$ 4,247,235,871.70**

ITEMS PARA INGRESO A INVENTARIO

ITEM	DESCRIPCIÓN	Und		VR. UNITARIO BASICO				CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	%	Cant.	Vr. Parcial
	SUMINISTROS CONTRACTUALES								**$131,238,612.61**		**$0.00**		**$0.00**		**$0.00**			**$131,238,612.61**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 007

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,988.75	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ 3,542,460,878.33	FECHA TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2026
VALOR FINAL:	$ 11,009,779,867.08	FECHA DEL ACTA:	31 de julio de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 5		MODIFICATORIO 6		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
										ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
18.100	Secador de manos. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un		$ 698,454.47				16.00	$11,175,271.52					0.00	$ -	0%	16.00	$ 11,175,271.52
18.120	Dispensador De Jabon. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un		$ 209,142.27				16.00	$3,346,276.32					0.00	$ -	0%	16.00	$ 3,346,276.32
18.140	Dispensador de papel higienico. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un		$ 221,829.63				16.00	$3,549,274.08					0.00	$ -	0%	16.00	$ 3,549,274.08
18.150	Dispensador de toallas de papel. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un		$ 231,710.55				15.00	$3,475,658.25					0.00	$ -	0%	15.00	$ 3,475,658.25
21.400	UPS 30 KVA 208-120V según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	un		$ 63,594,799.90				1.00	$63,594,799.90					0.00	$ -	0%	1.00	$ 63,594,799.90
23.212	Rack de cableado de 60x60cm de 40UR. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und		$ 1,260,457.63				3.00	$3,781,372.89					0.00	$ -	0%	3.00	$ 3,781,372.89
23.401	Switch de 48 Puertos administrable para montaje en Rack (debe contar con puertos POE para alimentar las cámaras). Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und		$ 3,465,084.59				7.00	$24,255,592.13					0.00	$ -	0%	7.00	$ 24,255,592.13
23.503	Bandeja de Fibra óptica para tres módulos cada uno con 6 espacios. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und		$ 168,516.07				3.00	$505,548.21					0.00	$ -	0%	3.00	$ 505,548.21
23.504	Modulo para fibra óptica de 6 espacios. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und		$ 386,978.48				4.00	$1,547,913.91					0.00	$ -	0%	4.00	$ 1,547,913.91
27.100	Espejos 4 mm dilatado con marco negro. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2		$ 421,234.35				38.00	$16,006,905.40					0.00	$ -	0%	38.00	$ 16,006,905.40
	SUMINISTROS NO PREVISTOS								**$1,020,830,447.85**		**$0.00**		**$0.00**		**$0.00**			**$1,020,830,447.85**
NP057	SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁMARA TIPO DOMO INTERIOR 4 MP INCLUYE MANO DE OBRA, EPPS, HERRAMIENTA MENOR Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DEBIDA INSTALACION	UN		$ 6,422,672.18				35.00	$224,793,526.44					0.00	$ -	0%	35.00	$ 224,793,526.44
NP058	SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁMARA TIPO DOMO PTZ EXTERIOR 4 MP INCLUYE MANO DE OBRA, EPPS, HERRAMIENTA MENOR Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DEBIDA INSTALACION	UN		$ 28,426,439.09				3.00	$85,279,317.26					0.00	$ -	0%	3.00	$ 85,279,317.26
NP059	SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁMARA DOMO RECONOCIMIENTO FACIAL 4 MP INCLUYE MANO DE OBRA, EPPS, HERRAMIENTA MENOR Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DEBIDA INSTALACION	UN		$ 12,082,897.39				1.00	$12,082,897.39					0.00	$ -	0%	1.00	$ 12,082,897.39
NP060	SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁMARA PANORAMICA INTERIOR 4 LENTES DE 4 MP INCLUYE MANO DE OBRA, EPPS, HERRAMIENTA MENOR Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DEBIDA INSTALACION	UN		$ 18,313,825.48				6.00	$109,882,952.88					0.00	$ -	0%	6.00	$ 109,882,952.88
NP061	SUMINISTRO E INSTALACION DE JOYSTICK INCLUYE MANO DE OBRA, EPPS, HERRAMIENTA MENOR Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DEBIDA INSTALACION	UN		$ 13,260,538.27				1.00	$13,260,538.27					0.00	$ -	0%	1.00	$ 13,260,538.27
NP062	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE 65" INCLUYE MANO DE OBRA, EPPS, HERRAMIENTA MENOR Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DEBIDA INSTALACION	UN		$ 35,898,419.49				1.00	$35,898,419.49					0.00	$ -	0%	1.00	$ 35,898,419.49
NP063	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE TRABAJO INCLUYE MANO DE OBRA, EPPS, HERRAMIENTA MENOR Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DEBIDA INSTALACION	UN		$ 72,353,953.71				1.00	$72,353,953.71					0.00	$ -	0%	1.00	$ 72,353,953.71
NP064	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO FACIAL INCLUYE MANO DE OBRA, EPPS, HERRAMIENTA MENOR Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DEBIDA INSTALACION	UN		$ 13,028,029.68				1.00	$13,028,029.68					0.00	$ -	0%	1.00	$ 13,028,029.68
NP068	SUMINISTRO E INSTALACION DE NVR 64 CANALES (INCLUYE LOS DISCOS DUROS) INCLUYE MANO DE OBRA, EPPS, HERRAMIENTA MENOR Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DEBIDA INSTALACION	UN		$ 88,132,831.70				1.00	$88,132,831.70					0.00	$ -	0%	1.00	$ 88,132,831.70
NP069	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE 48 PUERTOS L3 INCLUYE MANO DE OBRA, EPPS, HERRAMIENTA MENOR Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DEBIDA INSTALACION	UN		$ 40,223,985.03				1.00	$40,223,985.03					0.00	$ -	0%	1.00	$ 40,223,985.03
NP070	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE 24 PUERTOS L3 INCLUYE MANO DE OBRA, EPPS, HERRAMIENTA MENOR Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DEBIDA INSTALACION	UN		$ 27,864,794.98				3.00	$83,594,384.93					0.00	$ -	0%	3.00	$ 83,594,384.93
NP071	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOFTWARE DE ACCESO (16 canales) INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	UN		$ 242,299,611.06				1.00	$242,299,611.06					0.00	$ -	0%	1.00	$ 242,299,611.06
	TOTAL COSTOS SIN IVA								**$1,152,069,060.46**		**$0.00**		**$0.00**		**$0.00**			**$1,152,069,060.46**
	IVA			19.00%					$218,893,121.49		$0.00		$0.00		$0.00			$218,893,121.49

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 007

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,988.75	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ 3,542,460,878.33	FECHA TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2026
VALOR FINAL:	$ 11,009,779,867.08	FECHA DEL ACTA:	31 de julio de 2026

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 5		MODIFICATORIO 6		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
										ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
	TOTAL COSTOS CON IVA								$1,370,962,181.95		$0.00		$0.00		$0.00			$1,370,962,181.95
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO								$11,009,779,867.07		$4,176,866,179.98	37.94%	$1,214,715,633.46	11.03%	$5,391,581,813.39	48.97%		$5,618,198,053.68

VALOR TOTAL				$ 7,467,318,989	7467318988.75
AMORTIZACION DEL ANTICIPO		30%		$ 2,240,195,696.00	2240195696.00
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO				$ 3,542,460,878.33	
VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICIÓN				$ 11,009,779,867.08	
SALDO DEL CONTRATO				$ 5,618,198,053.66	
SALDO POR AMORTIZAR				$ 622,721,152.00	

					$ 1,214,715,633.46		$ 5,391,581,813.39	
					$ 364,414,690.00		$ 1,617,474,544.00	
					$ 5,618,198,053.68		$ 5,618,198,053.69	
					$ 622,721,152.00		$ 622,721,152.00	

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 7,467,318,989	VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$ 4,176,866,179.98
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 3,542,460,878.33	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO ACTAS ANTERIORES	$ 1,253,059,853.99
PORCENTAJE DEL ANTICIPO	30%	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 1,214,715,633.46
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO	$ 2,240,195,696.00	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA	$ 364,414,690.00

VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	$ 850,300,943.46	SALDO POR EJECUTAR A LA FECHA:	$ 5,618,198,053.66
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 622,721,152.00
		SALDO POR LIBERAR:	$ -

ING. NICOLÁS ÁLVAREZ GONZÁLEZ
C.C. 80.182.734 DE BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ARQ. JULIO ANDRES CASTRO GONZÁLEZ
C.C. 79.696.673
INTERVENTOR


ING. MARIA FERNANDA RIVEROS MOGOLLÓN
SUPERVISOR DEL CONTRATO


	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.: 1,1	Demoliciones	UNIDAD: M3	FECHA: 31 de julio de 2026


HOJA 1 DE 1

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

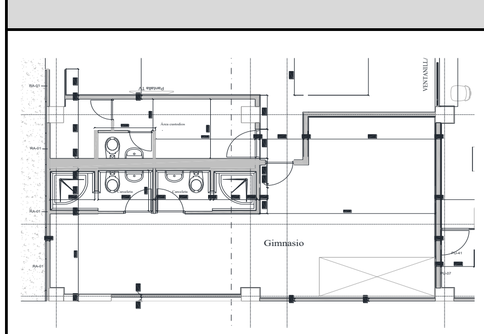

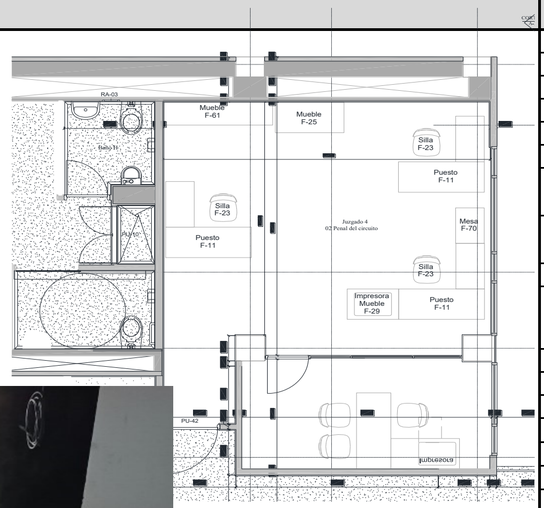

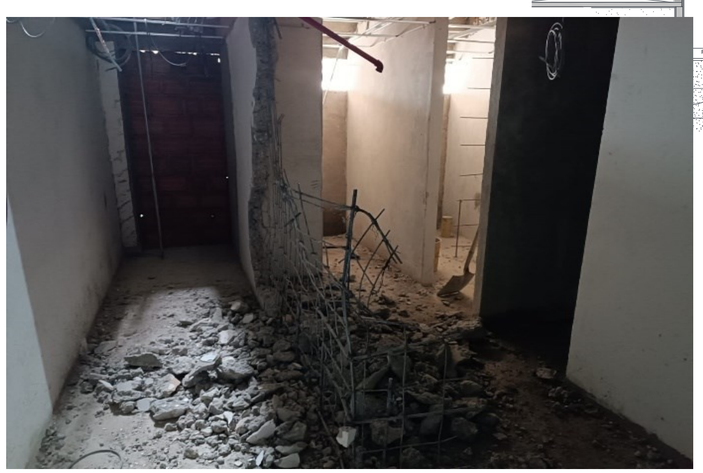

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones: Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
	Demolición de muro en fibrocemento por cambio de diseño solicitado por la Judicatura para oficina del	2,05		2,4	4,92		1,00	4,92
		3,52		1,05	3,70		1,00	3,70
		3,07		1,05	3,22		1,00	3,22
		6,95		2,44	16,96		1,00	16,96
	Demolicion de muro en concreto de carceleta poar cambio de diseño para construcción gimnasio	2,7		2,64	7,13		1,00	7,13
		0,6		2,64	1,58		1,00	1,58
	Demolición muros en mampostería cuarto piso por cambio diseño para oficina juez	2,70		2,77	7,48		31%	2,32
								39,83
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	39,83

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:	
2,3	Relleno material seleccionado	m3	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Vol total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	alto				
ANDEN FACHADA	BANDERAS	2,60	0,47	0,63				0,77
	GRADA 1	11,10	1,20	0,30				4,00
	GRADA 2	9,70	0,60	0,30				1,75
	GRADA 3	9,70	0,63	0,30				1,83
								8,35
								8,35

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	3,5	Localizacion y replanteo, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	m2	31 de julio de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
ANDEN FACHADA	GRADA 1	11,10	1,20		13,32			13,32
	GRADA 2	9,70	0,60		5,82			5,82
	GRADA 3	9,70	0,63		6,11			6,11
	GRADA 4	11,80	1,06		12,51			12,51
	RAMPA	1,30	1,35		1,76			1,76
	FRENTE A BANDERAS	4,10	4,10		16,81			16,81
	PLACA BANDERAS	0,46	2,70		1,24			1,24
	DESCONTAR PAGADO EN ACTA 6							-39,61
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								17,96
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**17,96**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 4,1	Acero Figurado 1/4" - 1". Incluye suministro, corte, figuración, amarre y colocación.		UNIDAD: kg	FECHA: 31 de julio de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

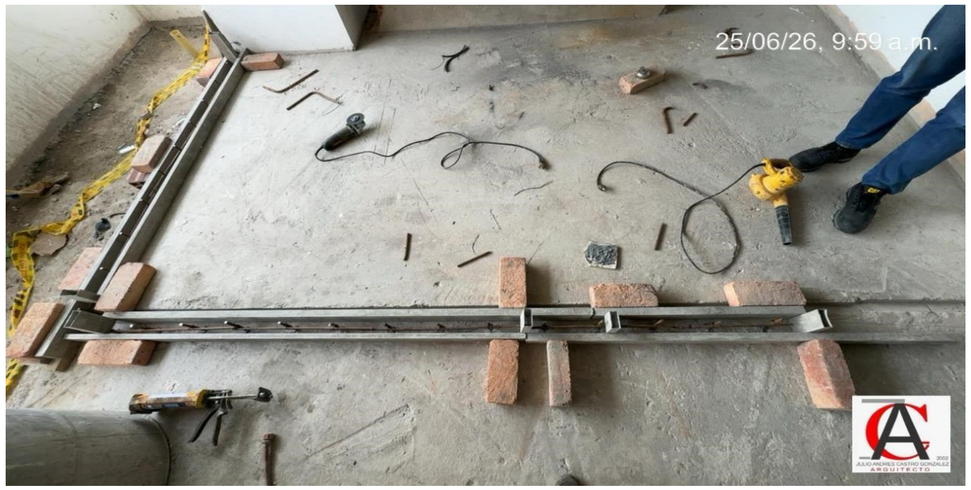

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Diam	Peso				
BORDILLOS INTERNO	PASILLO CETRAL 3ER PISO	0,15	3/8"	0,56			50,00	4,20
		0,15	3/8"	0,56			81,00	6,80
		22,55	3/8"	0,56			1,00	12,63
BORDILLOS INTERNO	PASILLO CETRAL 3ER PISO	0,15	3/8"	0,56			90,00	7,56
		18,24	3/8"	0,56			1,00	10,21
BORDILLOS INTERNO	PASILLO CETRAL 4TO PISO	0,15	3/8"	0,56			85,00	7,14
		12,80	3/8"	0,56			1,00	7,17

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	4,15	Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, color contrastante, resistente a humedad y de aplicación con brocha o rodillo, con un rendimiento aproximado de 0.5kg/m². Incluye preparación de superficies, herramientas, aplicación, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	31 de julio de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	alto	Área total (m2)	Vol total (m3)		
PANTALLA A1	RECALCE A1		0,74	3,80			1,00	2,81
FACHADA EJE 1(A-B)	VIGA SUPERIOR	3,90	0,15				1,00	0,59
FACHADA EJE 1(C-C')	VIGA SUPERIOR	3,87	0,15				1,00	0,58
								3,98
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		3,98

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Anclajes Epoxicos. Incluye perforación, puente de adherencia, instalación y todo lo requerido para la correcta ejecución.		UNIDAD	FECHA:
4,17			un	31 de julio de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

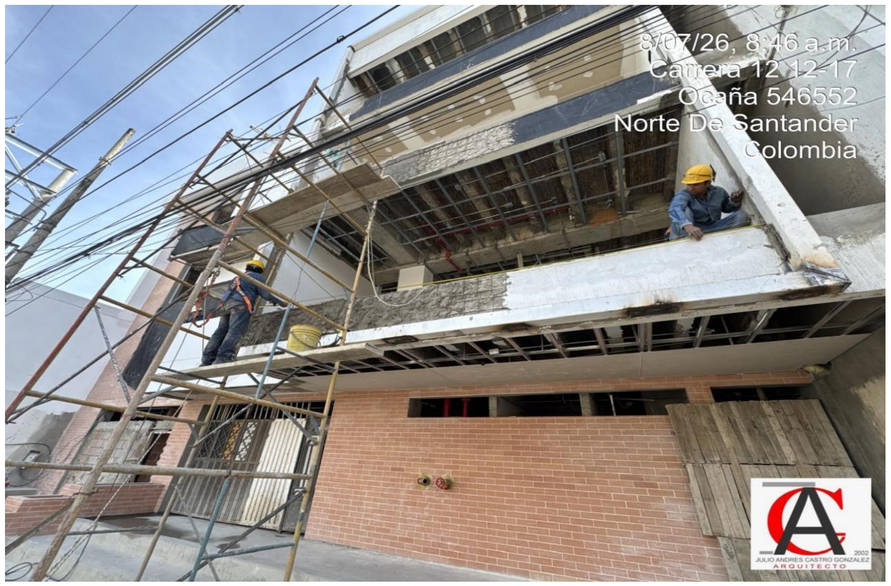

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	alto	Área total (m2)	Vol total (m3)		
FACHADA EJE 1(A-B)	DINTEL						14,00	14,00
							4,00	4,00
FACHADA EJE 1(C-C')	DINTEL						11,00	11,00
							2,00	2,00
ANDEN FACHADA	ANDEN FACHADA A'-C'						4,00	4,00
BORDILLO ANDEN	BORDILLO						30,00	30,00
	GRADA 3						2,00	2,00
	GRADA BANDERA						6,00	6,00
2 Y 3 PISO VACIO	PARA ANCLAR MALLA						12,00	12,00
ANDEN FACHADA	JARDINERA						18,00	18,00
PRIMER PISO	VIGA EJE D(2'-3)						16,00	16,00
FACHADA FRONTAL	PAÑETE BORDE PLACA						40,00	40,00
								159,00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		159,00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 4,18	Malla electrosoldada estandar.Incluye suministro, corte, amarre y colocación.		UNIDAD: kg	FECHA: 31 de julio de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Diam	Pero	Volumen total (m3)		
FACHADA FRONTAL	PAÑETE BORDE PLACA	5,85	0,60	6mm	2,99		2,00	20,99
								20,99
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**20,99**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 5,301	**TUBERÍA PVC-P Ø=2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.**	**UNIDAD**	**FECHA:**	
		ML	**31 de julio de 2026**	

HOJA 1 DE 1

OBJETO:	**"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"**	**CONTRATO DE OBRA** C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
1ER PISO	RED SUMINISTRO	9,80						9,80
1ER PISO	ZONA NUEVA	2,70						2,70
		2,60						2,60
		0,30						0,30
		3,20						3,20
								18,60
								18,60

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ITEM No.: 5,303	TUBERIA PVC-P Ø=1.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	ML	FECHA: 31 de julio de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
1ER PISO	REPARTO	5,40						5,40
		5,50						5,50
	DESCONTAR PAGADO EN ACTA 6							-2,47
								8,43
								8,43

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 5,306	TUBERÍA PVC-P Ø=1.1/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD ML	FECHA: 31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
	1ER PISO	CARCELETAS	2,60						2,60
			0,50						0,50
			1,30						1,30
			3,70						3,70
			2,50						2,50
			2,10						2,10
			3,30						3,30
			5,30						5,30
			2,10						2,10
			2,50						2,50
		SUMINISTRO TANQUES	2,60						2,60
			2,10						2,10
			20,70						20,70
		ZONA NUEVA	7,50						7,50
			1,80						1,80
			2,10						2,10
			1,80						1,80
			1,30						1,30
			2,10						2,10
			8,00						8,00
			3,70						3,70
			2,10						2,10
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									81,70
									81,70

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ITEM No.: 5,501	PUNTO HIDRAULICO PARA LAVAMANOS Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	ML	FECHA: 31 de julio de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
	1ER PISO	CARCELETAS						2,00	2,00
								2,00	2,00
								2,00	2,00
								2,00	2,00
		ZONA NUEVA						1,00	1,00
								1,00	1,00
								1,00	1,00
		DESCONTAR PAGADO EN ACTA 6							-6,00
									
								5,00	
								5,00	

ELABORÓ:



CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:




JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.:	PUNTO SANITARIO PARA SIFONES 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:
5,605		UN	31 de julio de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

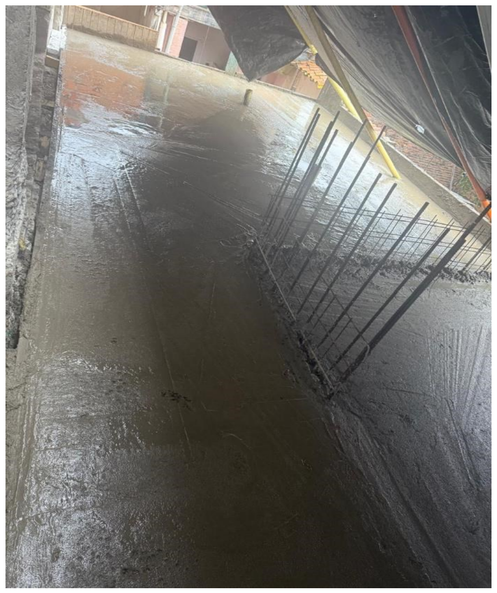DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	ALTURA	Pero	Volumen total (m3)		
	2DO PISO	**PLACA ZONA NUEVA**						3,00	3,00

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	PUNTO SANITARIO PARA SIFONES 2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
5,606		UN	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025


DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	ALTURA	Pero	Volumen total (m3)		
	ANDEN FACHADA	DESAGUE JARDINERA						4,00	4,00
								4,00	
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		4,00

ELABORÓ:



CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:



JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	ACCESORIOS PVC-S Ø=3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
5,805		UN	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	ALTURA	Pero	Volumen total (m3)		
	2DO PISO	DESAGUE DE PLACA NIVEL+5,92							
	1ER PISO	SHUT DE BASURAS						6,00	6,00
		SALA AMIGA Y ARCHIVO						12,00	12,00

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	ACCESORIOS PVC-S Ø=2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
5,806		UN	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	ALTURA	Pero	Volumen total (m3)		
ANDEN FACHADA	DESAGUE JARDINERA						8,00	8,00
1ER PISO	DESAGUE PASILLA SAL. EMER. 2						4,00	4,00
	DESCONTAR MAYOR CANTIDAD							-8,00

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	EQUIPO EYECTOR CUARTO DE BOMBAS 2 BOMBAS SUMERGIBLES TIPO PIRANA AUTOCEBANTES PARA EL 100% CON ALTERNANCIA AUTOMATICA QT=7,9 L/S; CDT= 9 M.C.A. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:
5,131		UN	31 de julio de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	ALTURA	Pero	Volumen total (m3)		
	POZO EYECTOR	BOMBAS SUMERGIBLES						1,00	1,00
									1,00
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA							1,00

ELABORÓ:
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:
JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	6,101	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo tuberíaEMT Ø ½, conduletas, cajas, interruptor, toma corriente y clavija monofasica normal con polo a tierra,15 A, 120V,y seguro de giro, cable encauchetado 3x14AGW, para derivacion del tomacorriete a la clavija de conexión de la luminaria ,conductor de cobre CABLE 3No12 AWG THHN TC LS-ZH, (FASE-NEUTRO-TIERRA) para elcircuito ramal según lo mostrado en los planos, conectores tipo resorte, marquillas de identificacion y demásaccesorios que hagan parte de esta actividad. (LONGITUD PROMEDIO DE LA SALIDA 5m PARA DUCTO YCABLEADO)	UN	31 de julio de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Diam	Pero	Volumen total (m3)		
PRIMER PISO	PLANTA ELECTRICA						3,00	3,00
	FACHADA						5,00	5,00
	RECEPCION						5,00	5,00
	CUARTO TECNICO						1,00	1,00
	CARCELETA						1,00	1,00
	PASILLO EMERGENCIA						6,00	6,00
	PASILLO DIRECTOR						3,00	3,00
	REPARTO						4,00	4,00
	DIRECTOR						4,00	4,00
	PASILLO CENTRAL						4,00	4,00
	ZONA NUEVA PASILLOS						7,00	7,00
	SALA AUDIENCIA 1						5,00	5,00
	SALA AUDIENCIA 2						5,00	5,00
	HALL ASCENSOR						4,00	4,00
	SALA AUDIENCIA 3						5,00	5,00
	PASILLO ZONA NUEVA						1,00	1,00
	CAFETERIA						1,00	1,00
	PASILLO SALAS AUDIENCIA						3,00	3,00
	EMERGENCIA RECEPCION						5,00	5,00
3ER PISO	MOVIMIENTO DE PUNTOS ILUM.					0,38	8,00	3,00
	REINSTALACION					0,50	8,00	4,00
								79,00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**79,00**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ITEM No.:	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N°8+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1½" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-GEN hastaTT-1	UNIDAD	FECHA:	
6,306		ML	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025


DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
	CUARTO TECNICO	TABLERO TOMAS 1PISO	12,50						12,50
		DESCONTAR PAGADO EN ACTA 6							-5,00
									-
									-
									7,50
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**7,50**

ELABORÓ:



CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:



JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ITEM No.:	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N°8+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1½" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-GEN hastaTT-2	UNIDAD	FECHA:	
6,307		ML	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025


DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
	CUARTO TECNICO	TABLERO TOMAS 2PISO	24,00						24,00
		DESCONTAR PAGADO EN ACTA 6							-20,00
									-
									-
									4,00
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**4,00**

ELABORÓ:



CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:



JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:			UNIDAD	FECHA:
6,308	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N°8+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1½" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-GEN hastaTT-3		ML	31 de julio de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones						
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
	CUARTO TECNICO	TABLERO TOMAS 3PISO	27,00						27,00
		DESCONTAR PAGADO EN ACTA 6							-25,00
									-
									-
									2,00
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**2,00**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Suministro, transporte e instalación de cable siete hilos 3No12 cobre, AWG, TC LS-ZH instalado enDUCTO PORTACABLES, desde tableros de distribucion circuitos ramales tomas e iluminacion hasta caja depaso para salida de circuitos ramales, incluyendo conductores, conexionado,accesorios y pruebas.	UNIDAD	FECHA:	
6,325		ML	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

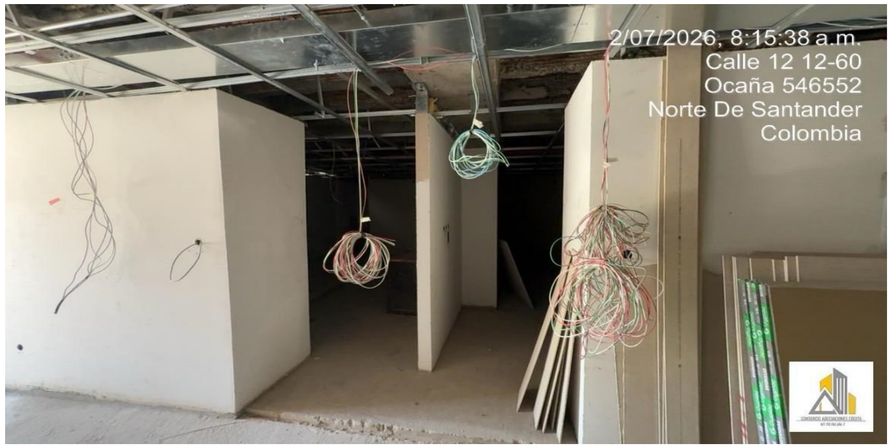

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
PRIMER PISO	PLANTA ELECTRICA	50,00						50,00
	FACHADA	50,00						50,00
	RECEPCION	50,00						50,00
	CUARTO TECNICO	50,00						50,00
	CARCELETA	50,00						50,00
	PASILLO EMERGENCIA	80,00						50,00
	PASILLO DIRECTOR	50,00						50,00
	REPARTO	50,00						50,00
	DIRECTOR	50,00						50,00
	PASILLO CENTRAL	50,00						50,00
	ZONA NUEVA PASILLOS	80,00						80,00
	SALA AUDIENCIA 1	50,00						50,00
	SALA AUDIENCIA 2	50,00						50,00
	HALL ASCENSOR	50,00						50,00
	SALA AUDIENCIA 3	50,00						50,00
	PASILLO ZONA NUEVA	50,00						50,00
	CAFETERIA	50,00						50,00
	PASILLO SALAS AUDIENCIA	50,00						50,00
	EMERGENCIA RECEPCION	70,00						70,00
								1.000,00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**1.000,00**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribución trifasico con espacio para totalizador de 18circuitos de 5 hilos, 220V con cerradura,chapa y tapa, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
6,401		UN	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones						
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
	1er piso	TABLERO TRIFASICO 18 CIRCUITOS						1	1
									1,00
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA							1,00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA


Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:	Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribución trifasico con espacio para totalizador de 24circuitos de 5 hilos, 220V con cerradura,chapa y tapa, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:
	6,402		UN	31 de julio de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

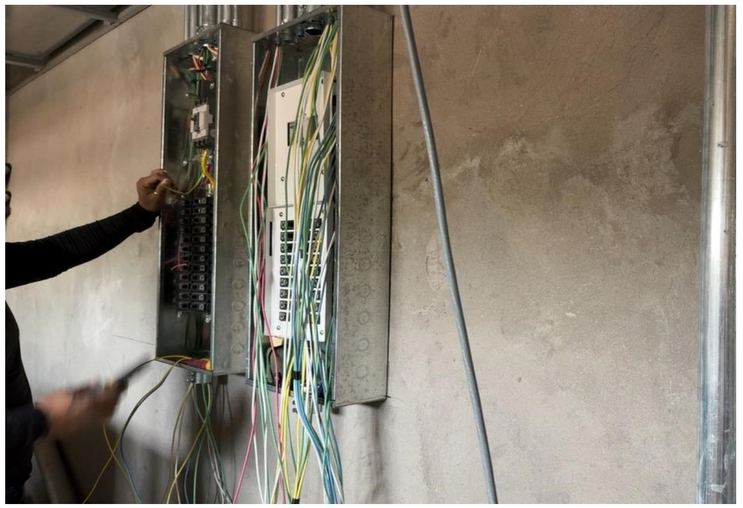DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones						
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
	1er piso	TABLERO TRIFASICO 24 CIRCUITOS						1	1
									1,00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		1,00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribución monofasico de 6 circuitos de 3 hilos, 125V, incluye accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
6,403		UN	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
		TABLERO MONOFASICO 6 CIRCUITOS						1	1
									1,00
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1,00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Suministro, transporte e instalacion de tablero regulado TR-1 totalizadorde 3X40A, 25kA, TIPO RIEL 9 breaker tipo riel de 1x20A, 10KAUn barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico9 reservas	UNIDAD	FECHA:	
6,701		UN	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
		TABLERO EGULADO TR-1						1	1
									1,00
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1,00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Suministro, transporte e instalacion de tablero regulado TR-2 totalizadorde 3X40A, 25kA, TIPO RIEL 10 breaker tipo riel de 1x20A, 10KAUn barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico8 reservas, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	UNIDAD	FECHA:	
6,702		UN	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
		TABLERO EGULADO TR-2						1	1
									1,00
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1,00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Suministro, transporte e instalacion de tablero regulado TR-3 totalizadorde 3X40A, 25kA, TIPO RIEL 10 breaker tipo riel de 1x20A, 10KAUn barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico8 reservas	UNIDAD	FECHA:	
6,703		UN	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
		TABLERO EGULADO TR-3						1	1
									1,00
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1,00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Suministro, transporte e instalacion de tablero regulado TR-4 totalizadorde 3X40A, 25kA, TIPO RIEL 13 breaker tipo riel de 1x20A, 10KAUn barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico5 reservas	UNIDAD	FECHA:	
6,704		UN	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
		TABLERO EGULADO TR-4						1	1
									1,00
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**1,00**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	6,801	Suministro, transporte e instalación de canaleta metálica con división de 12x5 cm incluyendo todoslos elementos de fijacion y cable desnudo No 10 todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	31 de julio de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

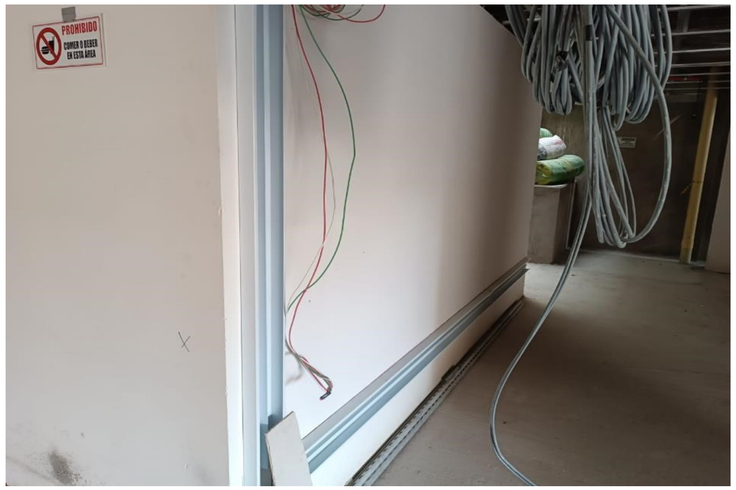

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
3ER PISO	JUZ 2	2,97						2,97
		0,60						0,6
		0,98						0,98
		1,9						1,9
		0,62						0,62
		0,67						0,67
3ER PISO		0,82						0,82
	JUZ 8	2,06						2,06
		2,83						2,83
		2,83						2,83
		2,21						2,21
	OFICINA SEGURIDAD	1,64						1,64
		2,12						2,12
	JUZ 13	11,78						11,78
								34,03
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**34,03**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	6,901	Suministro, transporte e instalacion de ducto portacables, galvanizado de 80x300mm , con division según lo mostrado en planos incluye soportes, codos, tees, accesorios, de montaje, sujeción y anclaje para tomas e iluminacion , incluyendo cable desnudo No 6.	ML	31 de julio de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
	1ER PISO	PLANTA ELECTRICA	6,30						6,30
			0,40						0,40
			20,00						20,00
			1,40						1,40
									28,10
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**28,10**

ELABORÓ:



CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:



JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:	**TUBERIA ACERO SCH 40 ASTM A 53 DE 2" . Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.**	**UNIDAD**	**FECHA:**
	7,105		ML	**31 de julio de 2026**

HOJA 1 DE 1

OBJETO:	**"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"**	**CONTRATO DE OBRA** C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
	PRIMER PISO	RED DE LLENADO TANQUE DE ACPM	41,26					1,00	41,26
									41,26
									41,26

ELABORO

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Yo. Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 7,201	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD: ML	FECHA: 31 de julio de 2026	

HOJA 1 DE 1

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
		CABEZAL DE PRUEBAS	6,00						6,00
	PRIMER PISO	ZONA NUEVA	2,80						2,80
			3,40						3,40
			1,30						1,30
			1,30						1,30
			1,30						1,30
			2,95						2,95
		CABEZAL DE PRUEBAS	4,60						4,60
			1,40						1,40
		DESCONTAR MAYOR CANTIDAD							-11,72
									13,33
									13,33

ELABORO

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA


Yo. Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
	ÍTEM No.: 7,202	**ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.**	**FECHA:** **31 de julio de 2025**

OBJETO:	**"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"**	**CONTRATO DE OBRA** C - 019 DE 2025
CAPÍTULO	**ENCHAPES CERAMICOS Y PORCELANATO**	
ÍTEM	**ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.**	**UNIDAD** **UND**

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

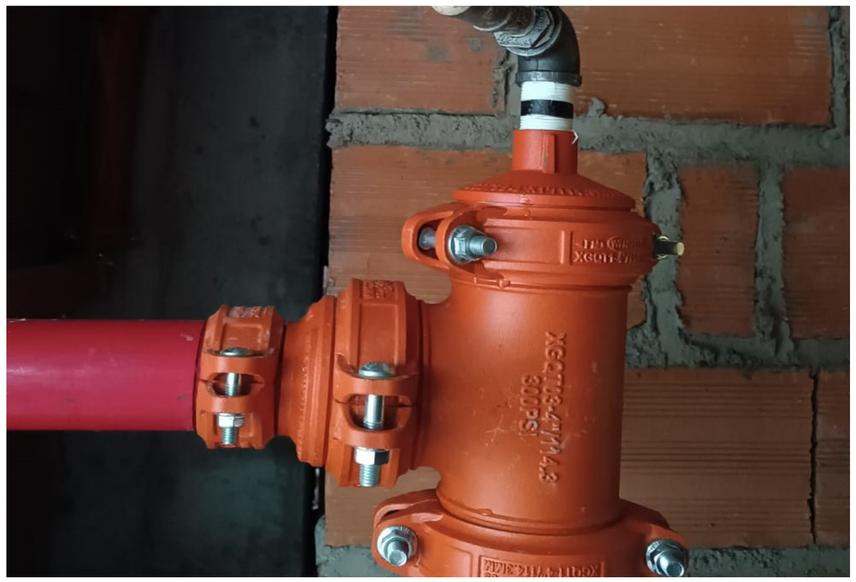

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
PRIMER PISO	ZONA NUEVA						23,00	23,00
							5,00	5,00
	FACHADA						10,00	10,00
							2,00	2,00
							2,00	2,00
	SALA AUDIENCIA 2						2,00	2,00

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ITEM No.: 7,205	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD: ML	FECHA: 31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO





REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
PRIMER PISO	PASILLO CENTRAL	19,00					1,00	19,00
	zona nueva	1,80						1,80
SEGUNDO PISO	PASILLO CENTRAL	1,40						1,40
PRIMER PISO	SALA AUDIENCIA 2	0,60						0,60
		3,60						3,60
		0,70						0,70
	zona nueva	3,60						3,60
		1,30						1,30
		2,95						2,95
		0,50						0,50
		1,50						1,50
	FACHADA	1,40						1,40
		0,80						0,80
	DESCONTAR PAGADO EN ACTA 6							-14,47
	DESCONTAR CANTIDAD MAYOR							-11,95
								12,73
								12,73

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ITEM No.: 7,206	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD: UN	FECHA: 31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

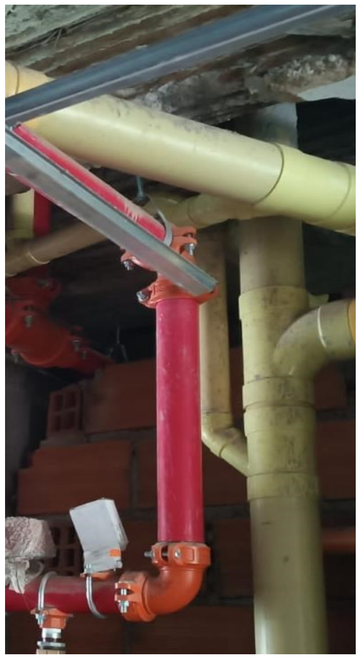



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
PRIMER PISO	PASILLO CENTRAL						92,00	92,00
	SALA AUDIENCIA 3						4,00	4,00
	RECEPCION						2,00	2,00
	ZONA NUEVA						12,00	12,00
SEGUNDO PISO	PASILLO CENTRAL						3,00	3,00
PRIMER PISO	zona nueva						11,00	11,00
							7,00	7,00
	SALA AUDIENCIA 2						7,00	7,00
	FACHADA						10,00	10,00
	DESCONTAR PAGADO EN ACTA 6							-18,00
	DESCONTAR CANTIDAD MAYOR							-5,00
								125,00
								125,00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ITEM No.: 7,209	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 1.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN: ML	FECHA: 31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO





REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
PRIMER PISO	HALL ASCENSOR	2,70						2,70
	SALA AUDIENCIA 2	3,80						3,80
	SALA AUDIENCIA 1	6,40						6,40
	REPARTO	2,60						2,60
	PASILLO CARCELETAS	9,90						9,90
	BANOS	0,90						0,90
		2,20						2,20
	PASILLO AREA NUEVA	3,10						3,10
		4,50						4,50
SEGUNDO PISO	JUZGADO 14	1,00						1,00
	DESCONTAR PAGADO EN ACTA 6							-0,27
SEGUNDO PISO	ZONA NUEVA	3,10						3,10
TERCER PISO	ZONA NUEVA	1,50						1,50
CUARTO PISO	ZONA NUEVA	2,70						2,70
2DO PISO	DEPOSITO MOVIMIENTO	7,20					0,30	2,16
2DO PISO	DEPOSITO REINSTALACION	7,20					0,50	3,60
3ER PISO	JUZ 2 MOVIMIENTO	6,80					0,30	2,04
	JUZ 2 REINSTALACION	6,80					0,50	3,40
	DESCONTAR MAYOR CANTIDAD							-12,50
								42,83
								42,83

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ITEM No.:	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 1.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	FECHA:	
7,210		UN	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025
CAPÍTULO	ENCHAPES CERAMICOS Y PORCELANATO	
ÍTEM	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 1.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD: UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO





REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
PRIMER PISO	HALL ASCENSOR						6,00	6,00
	SALA AUDIENCIA 2						4,00	4,00
	SALA AUDIENCIA 1						5,00	5,00
	REPARTO						7,00	7,00
	PASILLO CARCELETAS						15,00	15,00
	BAÑOS						19,00	19,00
	PASILLO AREA NUEVA						3,00	3,00
							3,00	3,00
SEGUNDO PISO	JUZGADO 14						4,00	4,00
	DESCONTAR PAGADO EN ACTA 6							-30,00
SEGUNDO PISO	ZONA NUEVA						24,00	24,00
TERCER PISO	ZONA NUEVA						21,00	21,00
CUARTO PISO	ZONA NUEVA						9,00	9,00
	DESCONTAR MAYOR CANTIDAD							-11,00
								79,00
								79,00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 1.1/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	FECHA:	
7,211		ML	31 de julio de 2026	

HOJA 1 DE 1

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO





REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
PRIMER PISO	SALA DE AUDIENCIA 3	2,70					2,00	5,40
	PASILLO INGRESO ESCALER	1,60						1,60
	RECEPCION	0,50						0,50
		3,20						3,20
		3,20						3,20
	SALIDA EMERGENCIA	1,90						1,90
	REPARTO	2,10						2,10
	SALA AUDIENCIA 1	2,40						2,40
PRIMER PISO	SALA DE AUDIENCIA 2	2,80						2,80
	PASILLO AREA NUEVA	2,60						2,60
								25,70
								25,70

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.: 7,211	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 1.1/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN: ML	FECHA: 31 de julio de 2026

HOJA 1 DE 1

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
	PRIMER PISO	SALA DE AUDIENCIA 2	2,80						2,80
		PASILLO AREA NUEVA	2,60						2,60
		DESCONTAR MAYOR CANTIDAD							-5,40
									
									-
									25,70

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ITEM No.:	**UN**	**FECHA:**	
	7,212	**ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 1.1/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.**	UN	**31 de julio de 2026**

OBJETO:	**"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"**	**CONTRATO DE OBRA** C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
	PRIMER PISO	SALA DE AUDIENCIA 3						8,00	8,00
		ESCALERAS						5,00	5,00
		RECEPCION						5,00	5,00
								8,00	8,00
								5,00	5,00
		SALIDA EMERGENCIA						7,00	7,00
		REPARTO						5,00	5,00
		SALA AUDIENCIA 1						6,00	6,00
		SALA AUDIENCIA 2						5,00	5,00
		PASILLO ZONA NUEVA						5,00	5,00
		DESCONTAR PAGADO EN ACTA 6							-32,00
									27,00
									27,00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 1". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	FECHA:	
7,213		ML	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
 	4TO PISO	JUZ 4	0,38					7,00	2,66
		JUZ 15	0,30					4,00	1,20
		CUARTO TECNICO	1,15						1,15
		BAÑO U	1,20						1,20
		SALA DE AUDIENCIA 4	0,30					3,00	0,90
			3,03						3,03
			1,43						1,43
		SALA DE AUDIENCIA 5	4,30						4,30
			3,00						3,00
	PRIMER PISO	ESCALERAS	5,80						5,80
		SALIDA EMERGENCIA 1	1,10						1,10
		CUARTO TECNICO	1,40					2,00	2,80
		AREA CUSTODIOS	1,40						1,40
		SALIDA EMERGENCIA 2	0,90						0,90
			0,80						0,80
		REPARTO	0,40						0,40
		DIRECTOR	2,60						2,60
		PASILLO EJE D	1,30						1,30
			2,40						2,40
		BAÑOS	2,30						2,30
			2,30						2,30
			1,30						1,30
		ZONA NUEVA	3,60						3,60
			3,70						3,70
			1,70						1,70
			1,60						1,60
		DESCONTAR PAGADO EN ACTA 6							-19,04
									35,83
									35,83

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 1". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	FECHA:	
7,213		ML	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
	CUARTO PISO	NIPLES	0,15						0,15
			0,14						0,14
			0,16						0,16
			0,20						0,20
			0,25						0,25
	SEGUNDO PISO	ZONA NUEVA	0,50						0,50
			0,79						0,79
			1,30						1,30
			1,00						1,00
			0,59						0,59
	TERCER PISO	ZONA NUEVA	3,70						3,70
			0,30						0,30
	CUARTO PISO	ZONA NUEVA	3,20						3,20
			0,60						0,60
			0,30						0,30
			0,30						0,30
	SEGUNDO PISO	JUZ 2	3,00					0,50	1,50
		OFI. SEG.	3,00					0,50	1,50
		JUZ 13	1,00					0,50	0,50
		JUZ 9	3,00					0,50	1,50
									18,48
									54,31

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.: 7,214	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 1". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN: UN	FECHA: 31 de julio de 2026

HOJA 1 DE 1

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
 	2DO PISO	JUZ 10						3,00	3,00
	4TO PISO	JUZ 4						9,00	3,00
		JUZ 15						5,00	3,00
		CUARTO TECNICO						1,00	3,00
		BAÑO U						1,00	3,00
		SALA DE AUDIENCIA 4						6,00	3,00
		SALA DE AUDIENCIA 5						3,00	3,00
	PRIMER PISO	ESCALERAS						2,00	2,00
		SALIDA EMERGENCIA 1						1,00	1,00
		CUARTO TECNICO						2,00	2,00
		AREA CUSTODIOS						1,00	1,00
		SALIDA EMERGENCIA 2						1,00	1,00
								1,00	1,00
		REPARTO						1,00	1,00
		DIRECTOR						1,00	1,00
		PASILLO EJE D						1,00	1,00
								2,00	2,00
		HALL ASCENSOR						1,00	1,00
		SALA AUDIENCIA 3						2,00	2,00
		baños						3,00	3,00
		zona nueva						2,00	2,00
								2,00	2,00
								2,00	2,00
								2,00	2,00
		DESCONTAR PAGADO EN ACTA 6							-8,00
	SEGUNDO PISO	ZONA NUEVA						5,00	5,00
	TERCER PISO	ZONA NUEVA						3,00	3,00
	CUARTO PISO	ZONA NUEVA						3,00	3,00
									51,00
									51,00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 7,219	VALVULA de ANGULO 2,1/2". ENTRADA ROSCA HEMBRA NPT, SALIDA ROSCA MACHO NH, BRONCE PARA 300 PSI, BRONCE LISTADA UL. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN: UN	FECHA: 31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA: C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO





REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
SEGUNDO PISO	ZONA NUEVA						1,00	1,00
TERCER PISO	ZONA NUEVA						1,00	1,00
CUARTO PISO	ZONA NUEVA						1,00	1,00
	DESCONTAR PAGADO EN ACTA 6							-1,00
								2,00
								2,00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ITEM No.:	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 2.1/2" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UNIDAD	FECHA:
	7,227		UN	31 de julio de 2026

HOJA 1 DE 1

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO





REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
PRIMER PISO	PASILLO						10,00	10,00
	ZONA NUEVA						2,00	2,00
PRIMER PISO	ZONA NUEVA						2,00	2,00
PRIMER PISO	zona nueva						2,00	2,00
	FACHADA						1,00	1,00
	SALA AUDIENCIA 2						2,00	2,00
	DESCONTAR PAGADO EN ACTA 6							-4,00
	DESCONTAR MAYOR CANTIDAD							-5,00
								10,00
								10,00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 1.1/2" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UNIDAD	FECHA:	
7,229		UN	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



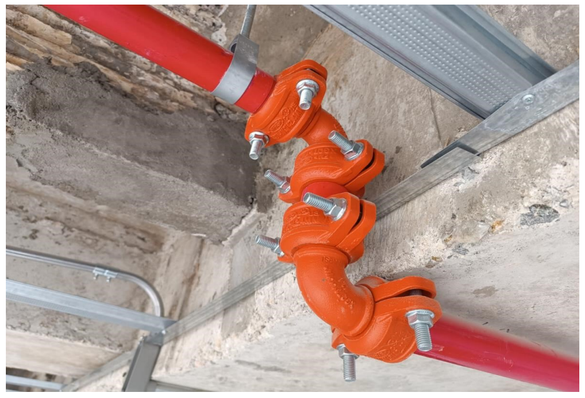

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
PRIMER PISO	HALL ASCENSOR						1,00	1,00
	SALA AUDIENCIA 2						1,00	1,00
	SALA AUDIENCIA 1						2,00	2,00
	REPARTO						4,00	4,00
	BAÑOS						3,00	3,00
	ZONA NUEVA						2,00	2,00
PRIMER PISO	ZONA NUEVA						1,00	1,00
SEGUNDO PISO	ZONA NUEVA						2,00	2,00
TERCER PISO	ZONA NUEVA						1,00	1,00
CUARTO PISO	ZONA NUEVA						1,00	1,00
							18,00	
								18,00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 1.1/4" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UNIDAD	FECHA:	
7,230		UN	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025


DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
 	SEGUNDO PISO	ZONA NUEVA						2,00	2,00
	TERCER PISO	ZONA NUEVA						1,00	1,00
	CUARTO PISO	ZONA NUEVA						2,00	2,00

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA NIT: 901.961.696-7	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 1" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los		UNIDAD	FECHA:
7,231	materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)		UN	31 de julio de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



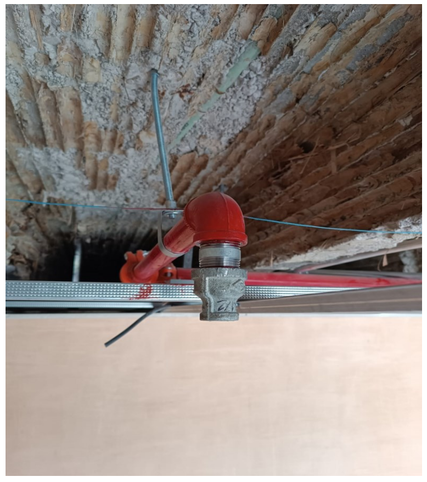

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
SEGUNDO PISO	ZONA NUEVA						4,00	4,00
TERCER PISO	ZONA NUEVA						1,00	1,00
CUARTO PISO	ZONA NUEVA						2,00	2,00
							7,00	
								7,00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA NIT: 901.961.696-7	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ITEM No.: 7,241	PINTURA ANTICORROSIVA 1.1/2". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	UNIDAD ML	FECHA: 31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
	TUBERIA RCI	ZONA NUEVA	6,00						6,00
									6,00
									6,00

ELABORÓ:


CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA NIT: 901.961.696-7	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ITEM No.: 7,248	PINTURA ESMALTE ROJO 1.1/2". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	UNIDAD: ML	FECHA: 31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

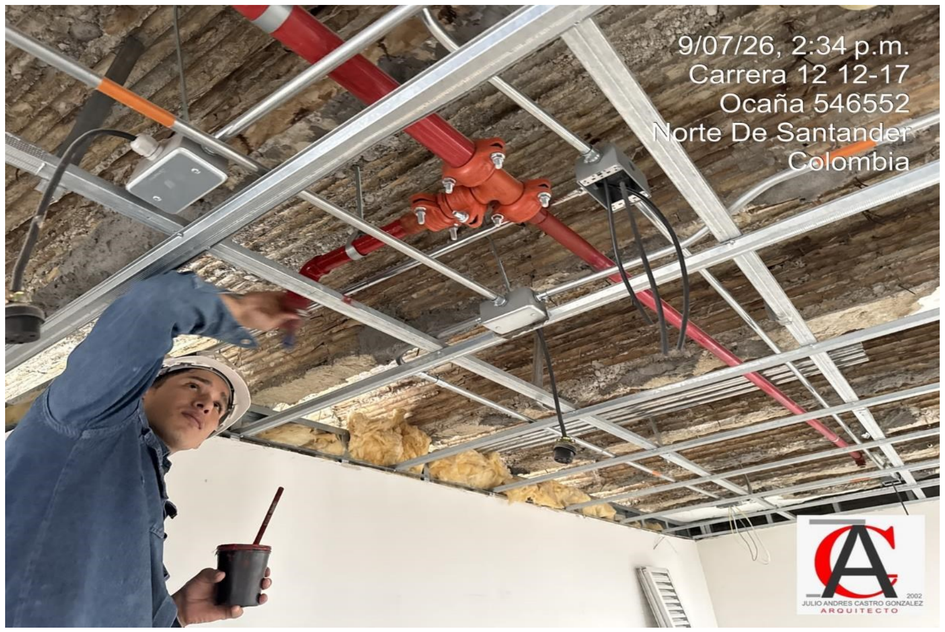DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
	TUBERIA RCI	ZONA NUEVA	6,00						6,00
									6,00
									6,00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Muro en Bloque Arcilla No. 3 y No.4 (m2). Incluye refuerzo y anclaje, según indicaciones de plano de elementos no estructurales, y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD	FECHA:	
8,1		m2	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO





REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Vol total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	alto				
ZONA NUEVA 2DO PIS	PERSONAL	1,63		2,40				3,91
		0,95		2,70				2,57
	COL C5	0,74		2,20				1,63
ZONA NUEVA 3ER	ZONA AMIGA	1,77		2,30				4,07
	COL C5	0,63		2,17				1,37
ZONA NUEVA 1ER	ESCALERAS POSTERIOR	2,30		2,50				5,75
	ESCALERAS FRONTAL	2,26		2,52				5,70
SEGUNDO PISO	PANTALLA 5A	1,17		2,24				2,62
	PANTALLA 5D	1,20		2,24				2,69
2DO PISO	EJE A-2	2,38		1,22				2,90
3ER PISO	EJE A-2	2,33		1,27				2,96
	EJE 5-A	2,10		1,00				2,10
4to piso	eje D-5	2,37		0,80				1,90
	ZONA NUEVA EJE 6	2,35		1,67				3,92
PRIMER PISO	FACHADA EJE 1-D	2,30		0,93				2,14
								46,22
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**46,22**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ITEM No.:	Bloque Arcilla No. 3 y No.4 (ml). Incluye refuerzo y anclaje, según indicaciones de plano de elementos no estructurales, y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD	FECHA:	
8,2		ml	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	alto	Área total (m2)	Vol total (m3)		
ZONA NUEVA 3ER	GRADAS	2,00					1,00	2,00
ZONA NUEVA 2DO	GRADAS	2,00					1,00	2,00

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 8,4	Bordillos concreto 21 Mpa (3000 psi). Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, formaleta, retiro y disposición de los sobrantes	UNIDAD: ml	FECHA: 31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	alto	Área total (m2)	Vol total (m3)		
	BORDILLOS INTERNO	PASILLO CETRAL 3ER PISO	0,50						0,50
			4,80						4,80
			2,25						2,25
			2,85						2,85
			1,85						1,85
			5,15						5,15
			5,15						5,15
	BORDILLOS INTERNO	PASILLO CETRAL 2DO PISO	1,61						1,61
			0,47						0,47
			4,74						4,74
			3,22						3,22
			3,30						3,30
			2,83						2,83
			2,07						2,07
	BORDILLOS INTERNOS	PASILLO CENTRAL 4TO PISO	1,35						1,35
			2,85						2,85
			2,00						2,00
			6,60						6,60
									53,59
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**53,59**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:			**UNIDAD**	**FECHA:**
8,5	**Acero Figurado 1/4" - 1". Incluye suministro, corte, figuración, amarre y colocación.**		kg	**31 de julio de 2026**

OBJETO:	**"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"**	**CONTRATO DE OBRA** C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	PESO (KG/ML)	Alto				
ZONA NUEVA 2DO PIS	PERSONAL	1,00	1/2"	0,99			2,00	1,98
		2,10	3/8"	0,56			2,00	2,35
	COL C5	1,00	1/2"	0,99			2,00	1,98
		2,40	3/8"	0,56			2,00	2,69
	COL C5	1,00	1/2"	0,99			2,00	1,98
		1,90	3/8"	0,56			2,00	2,13
ZONA NUEVA 3ER	ZONA AMIGA	1,00	1/2"	0,99			2,00	1,98
		2,00	3/8"	0,56			2,00	2,24
	COL C5	1,00	1/2"	0,99			2,00	1,98
		1,87	3/8"	0,56			2,00	2,09
ZONA NUEVA 3ER	GRADAS	1,00	1/2"	0,99			2,00	1,98
		1,70	3/8"	0,56			2,00	1,90
ZONA NUEVA 2DO	GRADAS	1,00	1/2"	0,99			2,00	1,98
		1,70	3/8"	0,56			2,00	1,90
ZONA NUEVA 1ER	ESCALERAS POSTERIOR	1,00	1/2"	0,99			2,00	1,98
		2,20	3/8"	0,56			2,00	2,46
	ESCALERAS FRONTAL	1,00	1/2"	0,99			2,00	1,98
		2,22	3/8"	0,56			2,00	2,49
SEGUNDO PISO	PANTALLA 5A	0,15	1/2"	0,99			9,00	1,34
		1,17	3/8"	0,56			3,00	1,97
	PANTALLA 5D	0,15	1/2"	0,99			9,00	1,34
		1,17	3/8"	0,56			3,00	1,97
2DO PISO	EJE A2	1,00	1/2"	0,99			1,00	0,99
		2,08	3/8"	0,56			1,00	1,16
3ER PISO	EJE A2	1,00	1/2"	0,99			1,00	0,99
		2,03	3/8"	0,56			1,00	1,14
	EJE 5A	1,00	1/2"	0,99			2,00	1,98
		1,80	3/8"	0,56			2,00	2,02
4to piso	eje D-5	1,00	1/2"	0,99			1,00	0,99
		2,07	3/8"	0,56			1,00	1,16
	ZONA NUEVA EJE 6	1,00	1/2"	0,99			2,00	1,98
								57,09
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**57,09**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:			UNIDAD	FECHA:
8,5	Acero Figurado 1/4" - 1". Incluye suministro, corte, figuración, amarre y colocación.		kg	#¡REF!

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	PESO (KG/ML)	Alto				
		2,05	3/8"	0,56			2,00	2,30
1ER PISO	PUERTA Y PORTON FACHADA	2,22	1/2"	0,99			1,00	2,20
		1,44	1/2"	0,99			1,00	1,43
		1,60	1/2"	0,99			1,00	1,58
		2,18	1/2"	0,99			1,00	2,16
		2,22	1/2"	0,99			1,00	2,20
		1,25	1/2"	0,99			1,00	1,24
		0,58	3/8"	0,56			15,00	4,87
		0,20	1/2"	0,99			7,00	1,39
								19,35
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		76,45

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ITEM No.: 8,8	Grafil 4.0 mm. Incluye suministro, corte, figuración, amarre y colocación.		UNIDAD kg	FECHA: 31 de julio de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		ML/M2	PESO (KG/ML)	Alto	AREA. MURO	Volumen total (m3)		
ZONA NUEVA 2DO PIS	PERSONAL	1,30	0,10		3,91		2,00	7,82
		1,30	0,10		2,57		2,00	2,57
	COL C5	1,30	0,10		1,63		2,00	1,63
ZONA NUEVA 3ER	ZONA AMIGA	1,30	0,10		4,07		2,00	4,07
	COL C5	1,30	0,10		1,37		2,00	1,37
ZONA NUEVA 3ER	GRADAS	1,30	0,10		0,60		2,00	0,60
ZONA NUEVA 2DO	GRADAS	1,30	0,10		0,60		2,00	0,60
ZONA NUEVA 1ER	ESCALERAS POSTERIOR	1,30	0,10		5,75		2,00	5,75
	ESCALERAS FRONTAL	1,30	0,10		5,70		2,00	5,70
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								30,10
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**30,10**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ITEM No.: 8,15	Anclajes Epoxicos. Incluye perforación, puente de adherencia, instalación y todo lo requerido para la correcta ejecución.	UNIDAD: un	FECHA: 31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

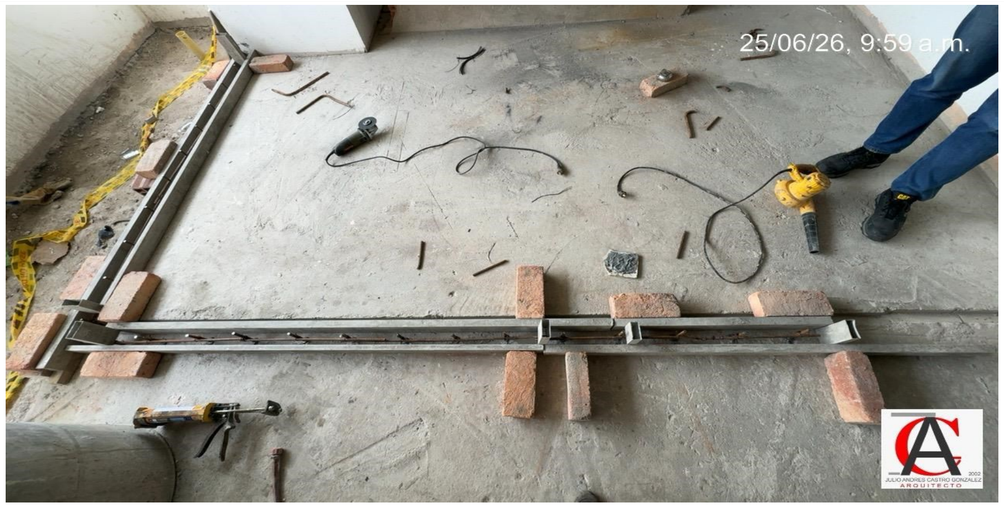

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		CANTIDAD	Ancho	alto	Área total (m2)	Vol total (m3)		
ZONA NUEVA 2DO PIS	PERSONAL						8,00	8,00
	COL C5						4,00	4,00
BORDILLOS INTERNO	PASILLO CETRAL 3ER PISO						50,00	50,00
							81,00	81,00
BORDILLOS INTERNO	PASILLO CETRAL 2DO PISO						90,00	90,00
ZONA NUEVA 3ER	ZONA AMIGA						4,00	4,00
	COL C5						4,00	4,00
ZONA NUEVA 3ER	GRADAS						4,00	4,00
ZONA NUEVA 2DO	GRADAS						4,00	4,00
ZONA NUEVA 1ER	ESCALERAS POSTERIOR						4,00	4,00
	ESCALERAS FRONTAL						4,00	4,00
SEGUNDO PISO	PANTALLA 5A						9,00	9,00
	PANTALLA 5D						9,00	9,00
2DO PISO	EJE A2						2,00	2,00
3ER PISO	EJE A2						2,00	2,00
	EJE 5A						4,00	4,00
BORDILLOS INTERNO	PASILLO CETRAL 4TO PISO						85,00	85,00
4to piso	eje D-5						2,00	2,00
	ZONA NUEVA EJE 6						4,00	4,00
1ER PISO	PUERTA Y PORTON FACHADA						5,00	5,00
							4,00	4,00
							3,00	3,00
								386,00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		386,00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Flanche metalico con pintura Electrostatica. Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD	FECHA:	
9,3		ml	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Vol total (m3)	No Elem.	Medida Total
		LARGO	Ancho	alto				
CUBIERTA	EJE 0	6,16						6,16
	EJE B'	2,28						2,28
	EJE C'	2,28						2,28
	EJE 1' (A''-B')	6,43						6,43
	EJE B'(1'-2'')	5,90						5,90
	EJE 2' (A''-B')	6,43						6,43
	EJE 2' (A-A''')	2,30						2,30
	EJE 2' (A'''-B')	4,10						4,10
	EJE A''(2'-3)	3,64						3,64
	EJE 3(A-A''')	2,30						2,30
	EJE 3 (A'''-B')	4,10						4,10
	EJE 3 (A''-B')	6,43						6,43
	EJE (B-B')(3'-3'')	2,50					2,00	5,00
		1,10					2,00	2,20
	EJE 4''(A''-B')	6,43						6,43
	EJE B'(3-4'')	8,17						8,17
	EJE 1'(B''-C'')	8,50						8,50
	EJE B''(1'-4'')	17,77						17,77
	EJE 4'''(B''-C'')	8,50						8,50
	EJE (C''-D)(2-3)	2,70					2,00	5,40
		3,40						3,40
	EJE 1 INFERIOR	6,12						6,12
	EJE B' INFERIOR	0,33						0,33
	EJE C' INFERIOR	0,33						0,33
	EJE 1'(B''-C'') INFERIOR	8,50						8,50
	EJE 4'''(B''-C'') INFERIOR	8,50						8,50
	EJE B'(1'-2'') INFERIOR	5,90						5,90
	EJE B'(3-4'') INFERIOR	8,17						8,17
	EJE 1' (A''-B') INFERIOR	6,43						6,43
	EJE 4''(A''-B') INFERIOR	6,43						6,43
	DESCONTAR PAGADO EN ACTA 6							-139,02
								29,41
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**29,41**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ITEM No.: 9,5	Media caña con mortero. Incluye instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD: ml	FECHA: 31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		LARGO	Ancho	alto	Área total (m2)	Vol total (m3)		
TANQUE A. RCI	ZONA NUEVA EJE (7-8)	8,50					2,00	17,00
		1,90					1,00	1,90
		0,55					2,00	1,10
		1,90					2,00	3,80
								23,80
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**23,80**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ


OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ITEM No.:			UNIDAD	FECHA:
9,7	Bordillo fundido en sitio - Cubierta en concreto 21 Mpa (3000 psi). Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, formaleta, retiro y disposición de los sobrantes		ml	31 de julio de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



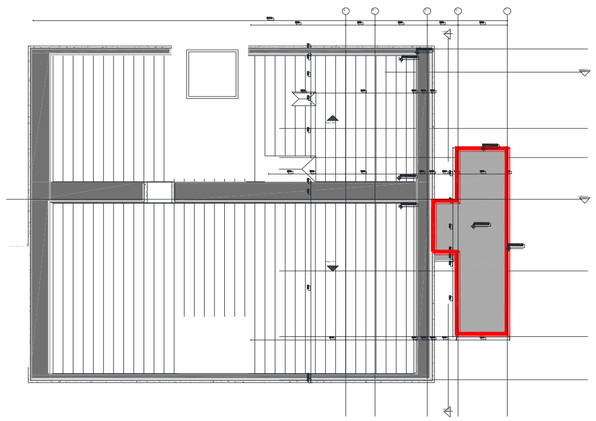

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		LARGO	Ancho	alto	Área total (m2)	Vol total (m3)		
PLANO A-105	CUBIERTA EDIF ANEXO. EJES (5-7)(B-C')	26,27					1,00	26,27
								26,27
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**26,27**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ


OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ITEM No.:	Afinado pisos impermeabilizado - Cubierta. Incluye suministro, nivelación, vaciado y extendida de mortero, impermeabilizante y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD	FECHA:	
9,8		M2	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



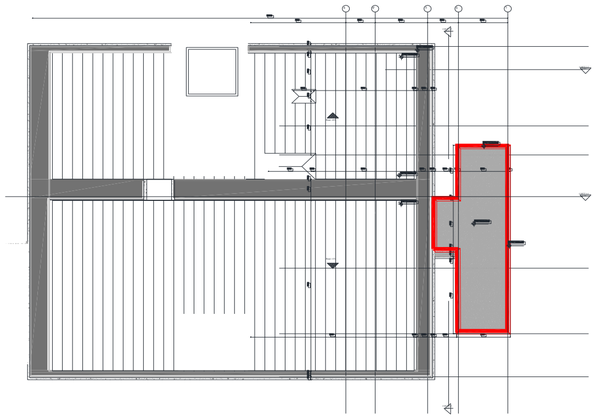

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		LARGO	Ancho	alto	Área total (m2)	Vol total (m3)		
PLANO A-105	CUBIERTA EDIF ANEXO. EJES (5-7)(B-C')				26,31		1,00	26,31
								26,31
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		26,31

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ITEM No.: 10,1	Filos y Dilataciones en pañete Fachada	UNIDAD: ml	FECHA: 31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO





REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		LARGO	Ancho	alto	Área total (m2)	Vol total (m3)		
FACHADA NORTE	PAÑETE FACHADA TRASERA	2,70					11,00	29,70
		0,80					2,00	1,60
		1,85					1,00	1,85
		2,40					6,00	14,40
		2,11					6,00	12,66
		8,35					1,00	8,35
	MAYOR CANTIDAD							-39,43
								29,13
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**29,13**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ITEM No.:		UNIDAD	FECHA:	
10,3	Pañete Muros de fachada (m2). Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO





REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		LARGO	Ancho	alto	Área total (m2)	Vol total (m3)		
FACHADA NORTE	PAÑETE FACHADA TRASERA	0,76	11,49				1,00	8,73
		1,48	11,49				1,00	17,01
		0,74	2,52				4,00	7,46
	LATERAL EJE D Y EJE A	2,66	8,35				2,00	44,34
FACHADA FRONTAL	BORDE PLACA DERECHA +3,14	5,85	0,60				2,00	7,02
	BORDE PLACA DERECHA +5,92	5,85	0,60				2,00	7,02
FACHADA NORTE	PAÑETE FACHADA TRASERA	8,35	1,40				1,00	11,69
		2,39	3,14				1,00	7,50
		1,02	3,14				1,00	3,20
		1,20	3,14				1,00	3,77
		1,00	3,14				1,00	3,14
								120,88
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**120,88**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ITEM No.:		UNIDAD	FECHA:	
10,40	Pañete Muros de fachada (ml). Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

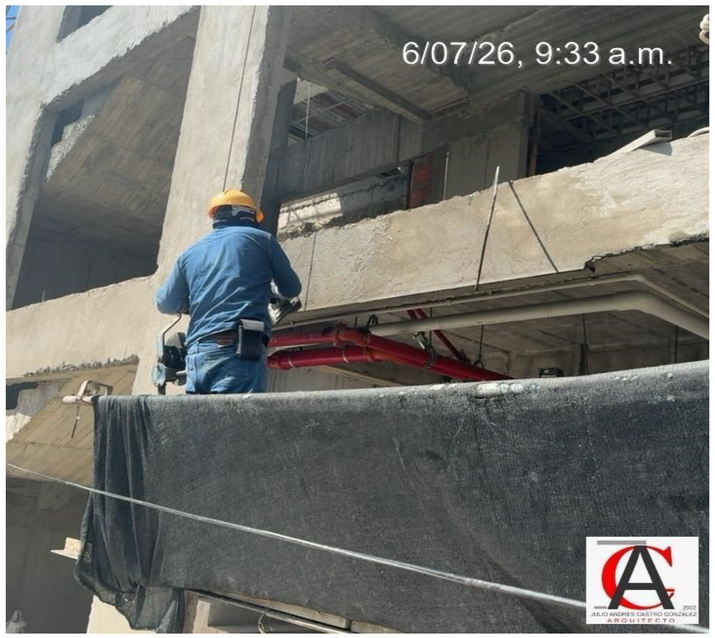

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Vol total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	alto				
FACHADA 1ER PISO	MURO EJE 1(A-B)	3,90					2,00	7,80
	MURO EJE 1(B-B')	2,84					2,00	5,68
	MURO EJE 1(B'-C')	3,87					3,00	11,61
		1,00					1,00	1,00
	COLUMNETAS ENTRADA	2,57					4,00	10,28
4to PISO	PAÑETE VACIO EXTERIOR	8,60					1,00	8,60
3ro PISO	PAÑETE VACIO EXTERIOR	8,70					1,00	8,70
2do PISO	PAÑETE VACIO EXTERIOR	5,85					1,00	5,85
2DO PISO	COLUMNA D4	2,15					2,00	4,30
3ro PISO	COLUMNA D4	2,15					2,00	4,30
	VIGA D(3'-4)	3,10					3,00	9,30
4to PISO	COLUMNA D4	2,40					2,00	4,80
	VIGA D(3'-4)	3,10					3,00	9,30
FACHADA FRONTAL	DINTEL CARA EXTERIOR	4,80					1,00	4,80
2do piso	vIGA D(2'-3)	3,05					2,00	6,10
	VIGUETA VACIO D(2'-3)	1,00					4,00	4,00
	DESCONTAR PAGADO EN ACTA 6							-74,65
FACHADA NORTE	PAÑETE FACHADA TRASERA	2,70					7,00	18,90
		0,80					4,00	3,20
		1,85					2,00	3,70
FACHADA NORTE	PAÑETE FACHADA TRASERA	3,72					4,00	14,88
		2,40					6,00	14,40
		2,11					6,00	12,66
		2,52					2,00	5,04
2DO PISO	ENTRADA ESCALERA	2,28					3,00	6,84
	DESCONTAR mayor cantidad							-21,14
								90,25
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**90,25**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Repello Interior Tanque. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD	FECHA:	
10,6		m2	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		LARGO	Ancho	alto	Área total (m2)	Vol total (m3)		
TANQUE A. RCI	ZONA NUEVA EJE (7-8)	1,10		2,50				2,75
		5,70		2,50				14,25
		7,00		2,50				17,50
		2,30		2,50				5,75
		4,66		2,50				11,65
		0,55		0,60			2,00	0,66
		1,90		0,60			2,00	2,28
								54,84
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		54,84

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:	
10,9	Pañete/Revoque Muros Interior. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Vol total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	alto				
3ER PISO	EJE 5-C	2,10		0,87				1,83
1ER PISO	MURO ESCALERA EJE 6 EXT.	2,79		2,55				7,11
	MURO ESCALERA EJE 7 INT.	2,55	2,51	2,00				5,75
	MURO ESCALERA EJE 7 EXT.	2,75		2,55				7,01
								21,70
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**21,70**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Pañete/Revoque Muros (ml) Interior. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD	FECHA:	
10,10		ml	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Vol total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	alto				
2DO PISO	EJE 5-C	2,20					1,00	2,20
								2,20
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	2,20

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 11,3	**Piso Terrazo grano de marmol fundido en sitio, destroncado, pulido y brillado, espesor 30mm, con dilatadores en bronce. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación**	**UNIDAD** M2	**FECHA: 31 de julio de 2026**	

OBJETO:	**"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"**	**CONTRATO DE OBRA** C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

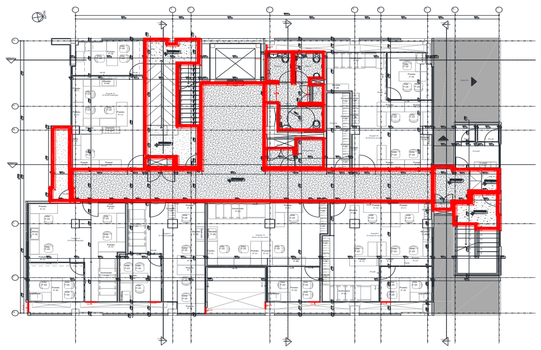



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones						
		Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
	SEGUNDO PISO							
AD-102	BATERIA BAÑOS. EJES (3-4)(A-B)				13,84		1,00	13,84
	CUARTO TECNICO. EJES (3-4)(A-B)				4,78		1,00	4,78
	CIRCULACION CENTRAL EDIF REFORZADO				57,58		1,00	57,58
	CIRCULACION CENTRAL EDIF NUEVO				6,85		1,00	6,85
	BALCON				4,48		1,00	4,48
	DESCANSO ESCALERA 2do P EDIF REFORZADO				17,45		1,00	17,45
								104,98
								104,98

ELABORO

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA


Yo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: **11,3**	**Piso Terrazo grano de marmol fundido en sitio, destroncado, pulido y brillado, espesor 30mm, con dilatadores en bronce. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación**	**UNIDAD** M2	**FECHA:** **31 de julio de 2026**	

OBJETO:	**"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"**	**CONTRATO DE OBRA** C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

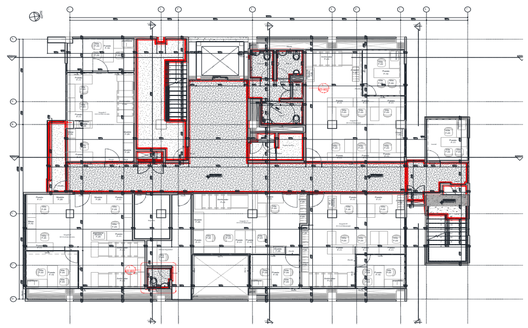



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones						
		Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
	TERCER PISO							
AD-103	BATERIA BAÑOS. EJES (3-4)(A-B)				13,84		1,00	13,84
	CUARTO TECNICO. EJES (3-4)(A-B)				5,51		1,00	5,51
	CIRCULACION CENTRAL EDIF REFORZADO				57,58		1,00	57,58
	CIRCULACION CENTRAL EDIF NUEVO				6,79		1,00	6,79
	BALCON				4,63		1,00	4,63
	DUCTO TABLEROS				1,02		1,00	1,02
	DESCANSO ESCALERA 2do P EDIF REFORZADO				17,45		1,00	17,45
	BAÑO SEGURIDAD				1,90		1,00	1,90
								108,72
								213,70

ELABORO

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA


Yo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 11,3	**Piso Terrazo grano de marmol fundido en sitio, destroncado, pulido y brillado, espesor 30mm, con dilatadores en bronce. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación**	**UNIDAD** M2	**FECHA:** 31 de julio de 2026	

OBJETO:	**"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"**	**CONTRATO DE OBRA** C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

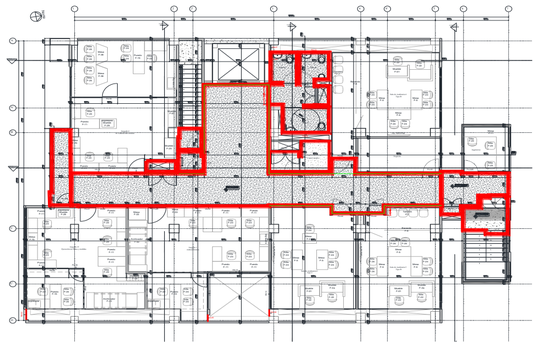

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	CUARTO PISO							
AD-104	BATERIA BAÑOS. EJES (3-4)(A-B)				13,84		1,00	13,84
	CUARTO TECNICO. EJES (3-4)(A-B)				5,51		1,00	5,51
	CIRCULACION CENTRAL EDIF REFORZADO				59,90		1,00	59,90
	DUCTO TABLEROS				1,02		1,00	1,02
	ACCESO ESCALERA CUBIERTA				1,58		1,00	1,58
	CIRCULACION CENTRAL EDIF NUEVO				6,38		1,00	6,38
	BALCON				4,68		1,00	4,68
	DESCANSO ESCALERA 2do P EDIF REFORZADO				1,56		1,00	1,56
	DESCONTAR PAGADO ACTAS ANTERIORES							-75,03
								19,44
								233,14

ELABORO

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA


Yo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 11,5	Mediacaña Granito fundido en sitio, pulida y brillada. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD	FECHA:	
		ML	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

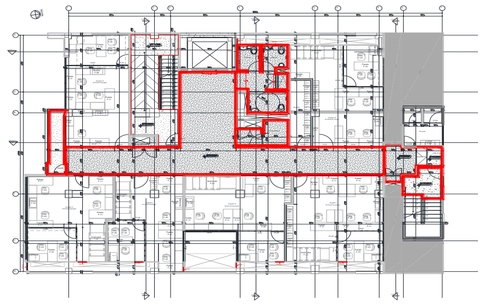



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	SEGUNDO PISO							
AD-102	BATERIA BAÑOS. EJES (3-4)(A-B)	25,55					1,00	25,55
	ENTRADA	1,23					-1,00	-1,23
	POCETA ASEO	1,14					2,00	2,28
	CUARTO TECNICO. EJES (3-4)(A-B)	10,70					1,00	10,70
	ENTRADA	0,90					-1,00	-0,90
	GABINETE	1,46					-1,00	-1,46
	CIRCULACION CENTRAL EDIF REFORZADO	24,73					1,00	24,73
	ENTRADA	3,93					-1,00	-3,93
	CIRCULACION CENTRAL EDIF NUEVO						1,00	-
		4,78					-1,00	-4,78
	BALCON	11,55					1,00	11,55
	ENTRADAS	0,80					-2,00	-1,60
	DESCANSO ESCALERA 2do P EDIF REFORZADO						1,00	-
	ENTRADAS	7,16					-1,00	-7,16
								53,75
								53,75

ELABORO


CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Yo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 11,5	Mediacaña Granito fundido en sitio, pulida y brillada. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD	FECHA:	
		ML	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

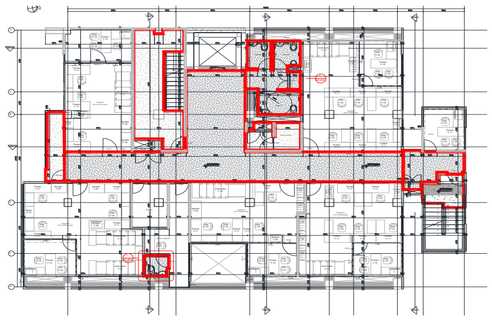DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
 		**TERCER PISO**							
	AD-103	BATERIA BAÑOS. EJES (3-4)(A-B)	25,55					1,00	25,55
		ENTRADA	1,23					-1,00	-1,23
		POCETA ASEO	1,14					2,00	2,28
		CUARTO TECNICO. EJES (3-4)(A-B)	10,70					1,00	10,70
		ENTRADA	0,90					-1,00	-0,90
		GABINETE	1,46					-1,00	-1,46
		CIRCULACION CENTRAL EDIF REFORZADO	24,73					1,00	24,73
		ENTRADA	3,93					-1,00	-3,93
		CIRCULACION CENTRAL EDIF NUEVO						1,00	-
		ENTRADAS	4,78					-1,00	-4,78
		BALCON	11,55					1,00	11,55
		ENTRADAS	0,80					-2,00	-1,60
		DESCANSO ESCALERA 2do P EDIF REFORZADO						1,00	-
		ENTRADAS	7,16					-1,00	-7,16
									53,75
									107,50

ELABORO

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA


Yo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 11,5	Mediacaña Granito fundido en sitio, pulida y brillada. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD: ML	FECHA: 31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

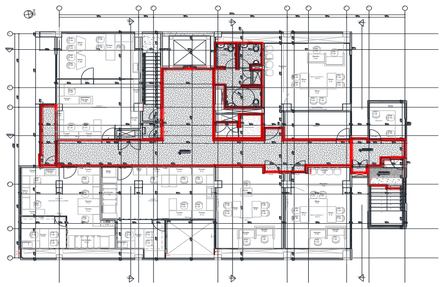

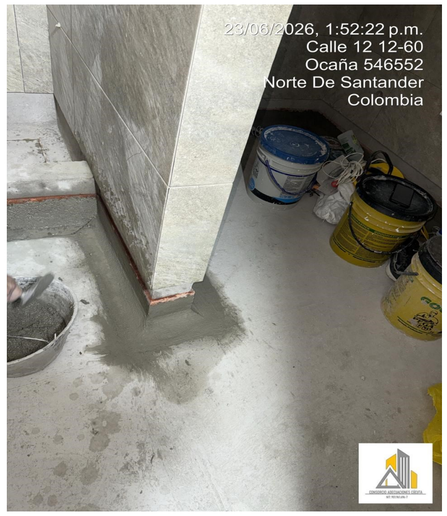

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	CUARTO PISO							
AD-104	BATERIA BAÑOS. EJES (3-4)(A-B)	25,57					1,00	25,57
	ENTRADAS	1,23					-1,00	-1,23
	POCETA ASEO	1,28					2,00	2,56
	CUARTO TECNICO. EJES (3-4)(A-B)							
	ENTRADA	0,90					1,00	0,90
	CIRCULACION CENTRAL EDIF REFORZADO	36,76					1,00	36,76
	ENTRADA	8,61					-1,00	-8,61
	CIRCULACION CENTRAL EDIF NUEVO	12,39					1,00	12,39
	ENTRADAS	4,78					-1,00	-4,78
	BALCON	11,38					1,00	11,38
	ENTRADAS	0,90					-2,00	-1,80
	DESCANSO ESCALERA 2do P EDIF REFORZADO	5,03					1,00	5,03
	ENTRADAS	2,10					-1,00	-2,10
								76,07
								183,57

ELABORO


CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA


Yo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.: 11,5	Mediacaña Granito fundido en sitio, pulida y brillada. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD: ML	FECHA: 31 de julio de 2026
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"			CONTRATO DE OBRA: C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

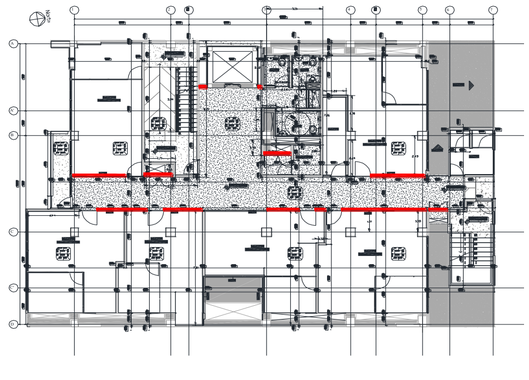

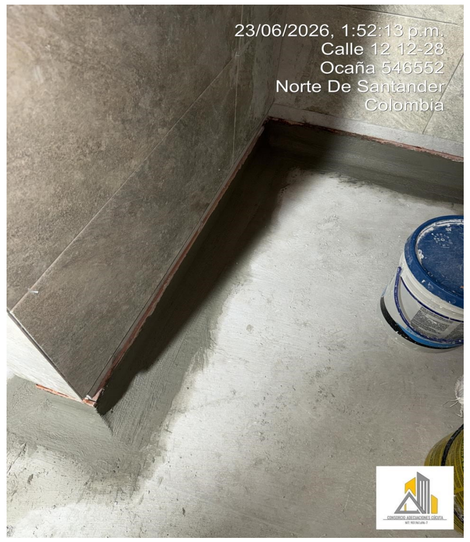

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	SEGUNDO PISO							
AD-302	EJES A'(2'-3). ASCENSOR	0,43					2,00	0,86
	EJES B'(3-3'). DUCTO CUARTO TECNICO	1,50					1,00	1,50
	EJE B'. JUZGADO 14	2,96					1,00	2,96
	EJE B'. DUCTO TABLEROS	1,58					1,00	1,58
	EJE B'. JUZGADO 10	3,00					1,00	3,00
	EJE B". JUZGADO 11	2,79					1,00	2,79
	EJE B". JUZGADO 6	2,17					1,00	2,17
	EJE B". JUZGADO 16	2,39					1,00	2,39
	EJE B". JUZGADO 7	4,70					1,00	4,70
								21,95
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		205,52

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA


Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.: 11,5	Mediacaña Granito fundido en sitio, pulida y brillada. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD: ML	FECHA: 31 de julio de 2026
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"			CONTRATO DE OBRA: C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

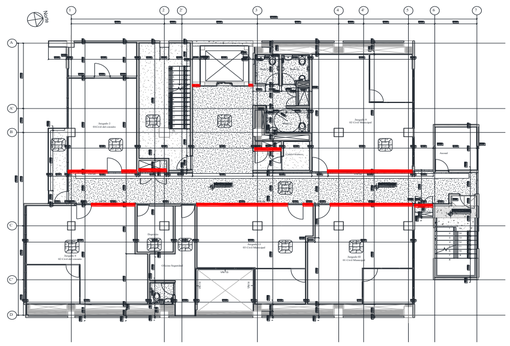

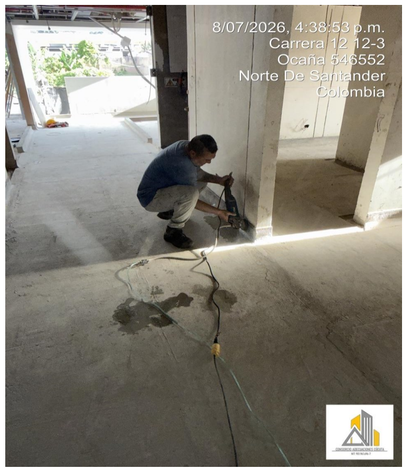

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	TERCER PISO							
AD-303	EJES A'(2'-3). ASCENSOR	0,43					2,00	0,86
	EJES B'(3-3'). DUCTO CUARTO TECNICO	1,50					1,00	1,50
	EJE B'. JUZGADO 2	2,23					1,00	2,23
		0,85					1,00	0,85
	EJE B'. DUCTO TABLEROS	1,58					1,00	1,58
	JUZGADO 9	4,84					1,00	4,84
	JUZGADO 8	2,50					1,00	2,50
	JUZGADO 13	5,18					1,00	5,18
		0,68					1,00	0,68
	JUZGADO 3	4,69					1,00	4,69
								24,91
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**230,43**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA


Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.: 11,5	Mediacaña Granito fundido en sitio, pulida y brillada. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD: ML	FECHA: 31 de julio de 2026
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"			CONTRATO DE OBRA: C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

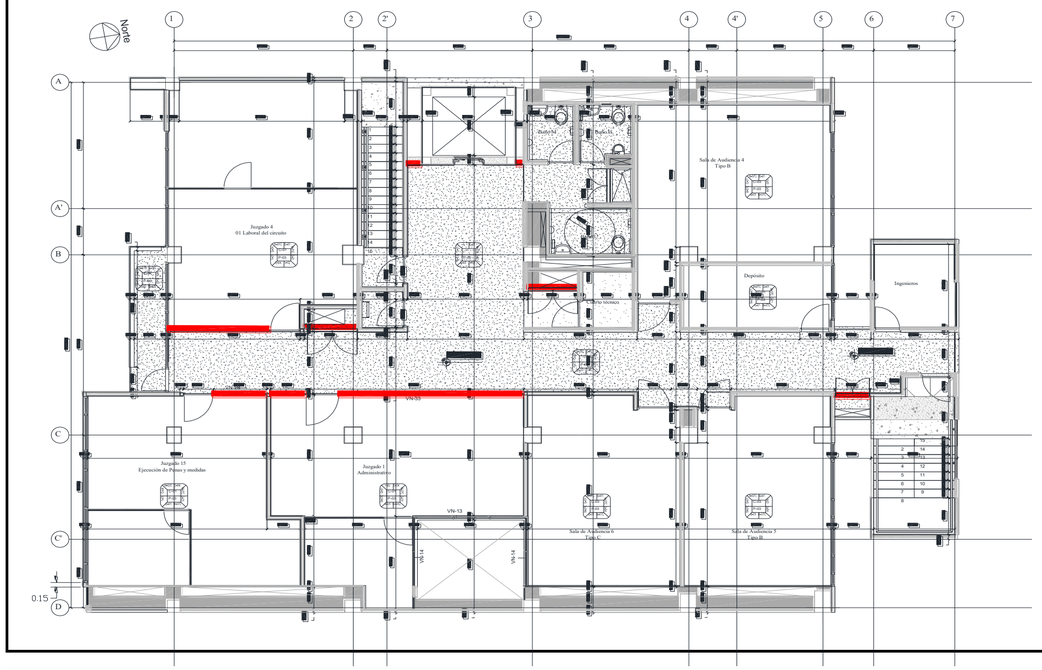

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	CUARTO PISO							
AD-304	EJES A'(2'-3). ASCENSOR	0,43					1,00	0,43
	EJES B'(3-3'). DUCTO CUARTO TECNICO	1,50					1,00	1,50
	JUZGADO 4	3,05					1,00	3,05
	JUZGADO 15	1,61					1,00	1,61
	JUZGADO 1	1,06					1,00	1,06
		5,48					1,00	5,48
								13,13
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	243,56

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 12,2	Afinado Tanque con mortero seco. Incluye todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD: m2	FECHA: 31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Vol total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	alto				
TANQUE A. RCI	ZONA NUEVA EJE (7-8)	8,50		1,90			1,00	16,15
		0,55		1,90			1,00	1,05
								17,20
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	17,20

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Impermeabilizacion cubiertas según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD	FECHA:	
13,3		m2	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

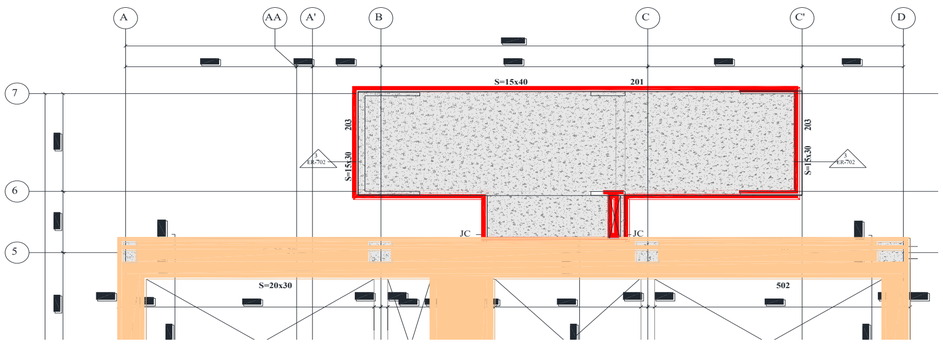



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Vol total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	alto				
CUBIERTA EDIF AMPLIADO	EJES (5-7)(B-C')				27,65		1,00	27,65
								27,65
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		27,65

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Impermeabilización Interior Tanque según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD	FECHA:	
13,4		m2	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Vol total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	alto				
TANQUE A. RCI	ZONA NUEVA EJE (7-8)	1,10		2,50				2,75
	REPELLO	5,70		2,50				14,25
		7,00		2,50				17,50
		2,30		2,50				5,75
		4,66		2,50				11,65
		0,55		0,60			2,00	0,66
		1,90		0,60			2,00	2,28
	AFINADO DE PISO	8,50		1,90			1,00	16,15
		0,55		1,90			1,00	1,05
								72,04
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**72,04**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ITEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	14,3	Cielo Raso en drywall según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	31 de julio de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	alto	Área total (m2)	Vol total (m3)		
3ER PISO	EJE 4	4,45	0,90					4,01
		5,10	0,90					4,59
		4,87	0,73					3,56
	EJE C (3'-5)	3,85	0,60					2,31
	EJE B (3'-5)	3,80	0,60					2,28
	EJE 1(B-D)	3,85	0,71					2,73
		5,40	0,76					4,10
3ER PISO	CARA EXTERNA VACIO EJE D	3,08				0,60	3,00	5,54
		2,70				0,60	3,00	4,86
4TO PISO	CARA EXTERNA VACIO EJE D	2,7				0,60	1,00	1,62
		3,1				0,60	1,00	1,86
		3				0,60	1,00	1,80
2DO PISO	BAÑOS	3,04				0,60	1,00	1,82
		2,62				0,60	1,00	1,57
	BALCON	4,4				0,60	1,00	2,64
3ER PISO	BAÑOS	3,04				0,60	1,00	1,82
		2,62				0,60	1,00	1,57
	BALCON	4,4				0,60	1,00	2,64
4TO PISO	BAÑOS	1,55				0,60	2,00	1,86
		1,27				0,60	1,00	0,76
	FACHADA EJE 1 (A-B)	5,4				0,60	3,00	9,72
								63,68
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**63,68**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Cielo Raso en drywall según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD	FECHA:	
14,3		m2	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	alto	Área total (m2)	Vol total (m3)		
		0,90				0,60	2,00	1,08
3ER PISO	EJE 4	4,45				0,60	2,00	5,34
		5,10				0,60	2,00	6,12
		4,87				0,60	2,00	5,84
	EJE C (3'-5)	3,85				0,60	2,00	4,62
	EJE B (3'-5)	3,80				0,60	2,00	4,56
	EJE 1(B-D)	9,85				0,60	2,00	11,82
2DO PISO	PASILLO ESCALERAS	5,13				0,60	3,00	9,23
		1,36				0,60	2,00	1,63
		0,8				0,60	1,00	0,48
		2,9				0,60	1,00	1,74
	EJE 5 (A-D)	4,4				0,60	3,00	7,92
		5,13				0,60	3,00	9,23
		5,2				0,60	3,00	9,36
3ER PISO	PASILLO ESCALERAS	4,95				0,60	3,00	8,91
		1,39				0,60	2,00	1,67
		0,67				0,60	1,00	0,40
		2,9				0,60	1,00	1,74
	HALL ASCENSOR	5,55				0,60	2,00	6,66
	JUZGADO 8	3,42				0,60	3,00	6,16
	EJE 5 (A-D)	4,4				0,60	3,00	7,92
								112,44
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		176,12

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Cielo Raso en drywall según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD	FECHA:	
14,3		m2	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Vol total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	alto				
		5,13				0,60	3,00	9,23
		5,2				0,60	3,00	9,36
3ER PISO	JUZGADO 2 CIVIL				30,95		1,00	30,95
3ER PISO	JUZGADO 9 CIVIL				41,53		1,00	41,53
3ER PISO	JUZGADO 3 CIVIL				35,77		1,00	35,77
3ER PISO	JUZGADO 13 CIVIL				31,49		1,00	31,49
3ER PISO	OFICINA SEGURIDAD				10,00		1,00	10,00
3ER PISO	DEPÓSITO				5,98		1,00	5,98
								174,31
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**350,43**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA


Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Cielo Raso en drywall según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD	FECHA:	
14,3		m2	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

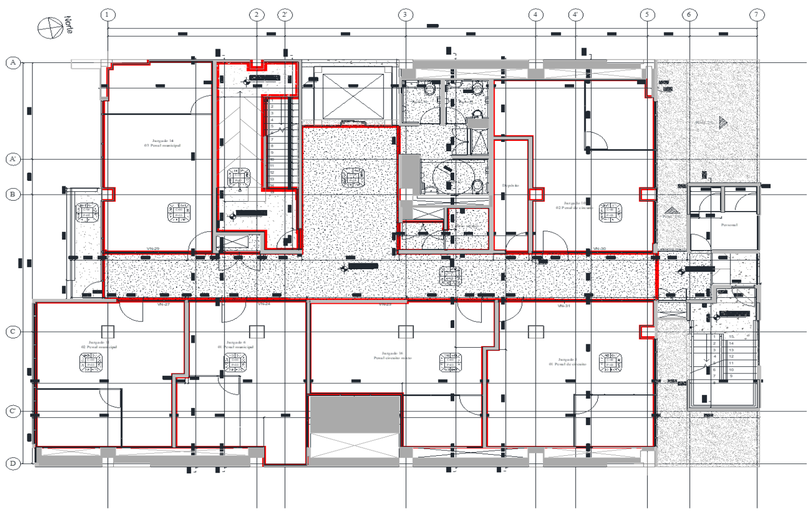DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Vol total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	alto				
	2do PISO	JUZGADO 14				30,85		1,00	30,85
	2do PISO	DEPOSITO				6,13		1,00	6,13
	2do PISO	JUZGADO 10				34,64		1,00	34,64
	2do PISO	CORREDOR Y HALL ASCENSOR				57,61		1,00	57,61
	2do PISO	JUZGADO 11				31,52		1,00	31,52
	2do PISO	JUZGADO 6				28,79		1,00	28,79
	2do PISO	JUZGADO 16				31,48		1,00	31,48
	2do PISO	JUZGADO 5				36,11		1,00	36,11
	2do PISO	CUARTO TECNICO				4,80		1,00	4,80
									261,93
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		612,36

ELABORÓ:


CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:	OBSERVACIONES
JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ	

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Cielo Raso en drywall según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD	FECHA:	
14,3		m2	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

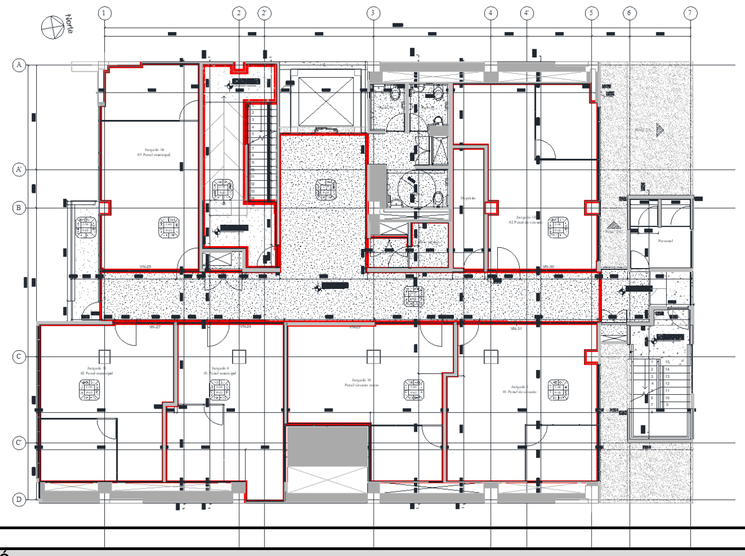

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Vol total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	alto				
4to PISO	JUZGADO 4				43,23		1,00	43,23
4to PISO	SALA DE AUDIENCIA 4				30,99		1,00	30,99
4to PISO	DEPOSITO				8,96		1,00	8,96
4to PISO	SALA DE AUDIENCIA 5				25,72		1,00	25,72
4to PISO	SALA DE AUDIENCIA 6				27,34		1,00	27,34
4to PISO	JUZGADO 1				37,97		1,00	37,97
4to PISO	JUZGADO 15				35,08		1,00	35,08
4to PISO	PASILLO Y HALL ASCENSOR				60,00		1,00	60,00
4to PISO	ESCALERA				8,20		1,00	8,20
4to PISO	CUARTO TECNICO				4,80		1,00	4,80
								282,29
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		894,65

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ


OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ITEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	15,1	Rejillas en aluminio según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	M2	31 de julio de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



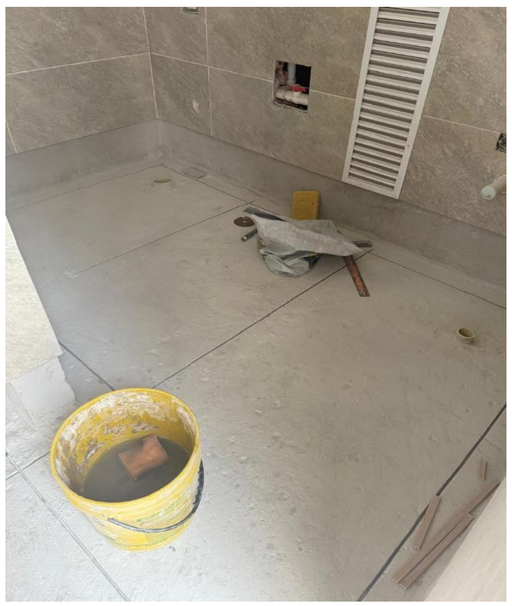

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	alto	Área total (m2)	Vol total (m3)		
BAÑOS 1er PISO	RA-03	2	0,30		0,60		3,00	1,80
BAÑOS 2do PISO	RA-03	2	0,30		0,60		3,00	1,80
BAÑOS 3er PISO	RA-03	2	0,30		0,60		3,00	1,80
BAÑOS 4to PISO	RA-03	2	0,30		0,60		3,00	1,80
								7,20
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**7,20**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ITEM No.:		**UNIDAD**	**FECHA:**
	15,2	**Ventaneria en vidrio en Aluminio según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación**	**M2**	**31 de julio de 2026**

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

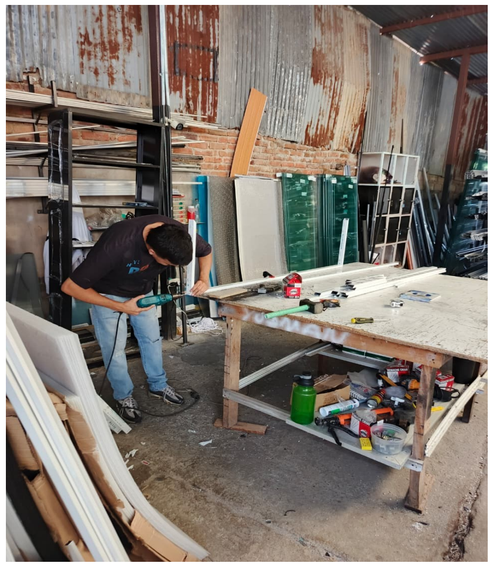



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Vol total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	alto				
FACHADA SUR	VENTANA VN-02	6,05	7,72				1,00	46,71
FACHADA SUR	VENTANA VN-01						55,14	55,14
TERCER PISO	VN-24. JUSZGADO 2 CIVIL	2,18		2,20			1,00	4,80
	VN-21. JUSZGADO 2 CIVIL	0,81		2,20			1,00	1,78
	VN-42. JUSZGADO 2 CIVIL	2,99		2,20			1,00	6,58
	VN-32. JUZGADO 9	4,81		2,20			1,00	10,58
	VN-48. JUZGADO 9	2,45		2,20			1,00	5,39
	VN-46. JUZGADO 9	2,22		2,20			1,00	4,88
	VN-31. JUZGADO 3	4,66		2,20			1,00	10,25
	VN-50. JUZGADO 3	2,89		2,20			1,00	6,36
	VN-41. JUZGADO 3	1,41		2,20			1,00	3,10
	VN-33. JUZGADO 13	5,17		2,20			1,00	11,37
	VN-45. JUZGADO 13	2,04		2,20			1,00	4,49
	VN-14. JUZGADO 13	2,23		1,20			1,00	2,68
	VN-13. JUZGADO 13	3,32		1,20			1,00	3,98
	VN-25. JUZGADO 8	2,46		2,20			1,00	5,41
	VN-46. JUZGADO 8	2,26		2,20			1,00	4,97
	VN-48. JUZGADO 8	2,49		2,20			1,00	5,48
								193,95
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**193,95**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ITEM No.:		UNIDAD	FECHA:	
16,3	Escotilla según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UND	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Vol total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	alto				
 									
		TANQUE AGUA POTABLE						1,00	1,00
		TANQUE RCI						1,00	1,00
		ESCOTILLA CUBIERTA						1,00	1,00
									3,00
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	3,00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ITEM No.:		UNIDAD	FECHA:	
16,4	Puertas de emergencia Cortafuego (0.9-1.2 X 2.4) según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UND	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Vol total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	alto				
									
		ENTRADA PRICIPAL 1er PISO						1,00	1,00
									1,00
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**1,00**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA


Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ITEM No.:		UNIDAD	FECHA:	
16,5	Puerta Metalicas Sencillas según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UND	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

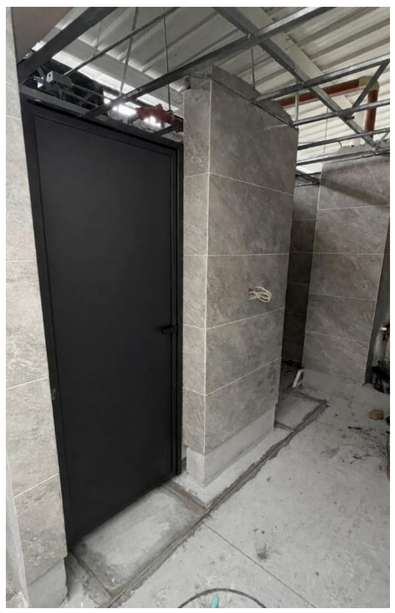DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	alto	Área total (m2)	Vol total (m3)		
									
		BATERíA BAÑOS 1ER PISO						2,00	2,00
		BATERíA BAÑOS 2DO PISO						2,00	2,00
		BATERíA BAÑOS 3ER PISO						2,00	2,00
		BATERíA BAÑOS 4TO PISO						2,00	2,00
									8,00
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**8,00**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ITEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	16,6	Puerta Metalicas Doble hoja (1.10 - 2.55) según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UND	31 de julio de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	alto	Área total (m2)	Vol total (m3)		
1ER PISO	ENTRADA A CUARTO PLANTA ELECTRICA						1,00	1,00
								1,00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		1,00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ITEM No.:		UNIDAD	FECHA:	
16,8	Puerta metalica Corrediza según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ML	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025


DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Vol total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	alto				
									
	1ER PISO	BAÑO DISCAPACITADOS						1,00	1,00
	2DO PISO	BAÑO DISCAPACITADOS						1,00	1,00
	3ER PISO	BAÑO DISCAPACITADOS						1,00	1,00
	4TO PISO	BAÑO DISCAPACITADOS						1,00	1,00
									4,00
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**4,00**

ELABORÓ:



CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:



JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ITEM No.:		**UNIDAD**	**FECHA:**
	16,11	**Barandas terrazas/vacios según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación**	**ML**	**31 de julio de 2026**

OBJETO:	**"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"**	**CONTRATO DE OBRA** C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Vol total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	alto				
2DO PISO	BALCON FACHADA PPAL	0,8					1,00	0,80
3ER PISO	BALCON FACHADA PPAL	0,8					1,00	0,80
4TO PISO	BALCON FACHADA PPAL	0,8					1,00	0,80
								2,40
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**2,40**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ


OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ITEM No.:	Bordillo en concreto 21 Mpa (3000 psi) fundido en sitio -Pisos. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación.	UNIDAD	FECHA:
20,3		ml	31 de julio de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



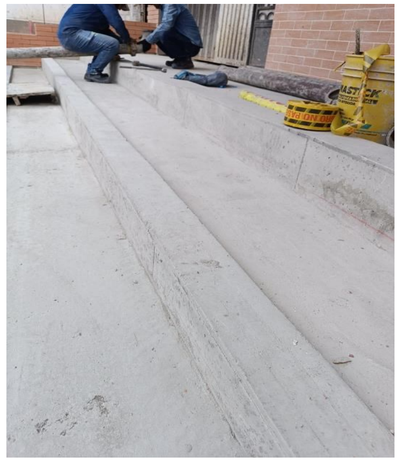

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	alto	Área total (m2)	Vol total (m3)		
ANDEN FACHADA	BORDILLO CALLE	11,80	0,16	0,15				11,80
	BORDILLO GRADA 1	11,10	0,19	0,30				11,10
	BORDILLO GRADA 2	10,33	0,16	0,30				10,33
	BORDILLO GRADA 3	10,33	0,16	0,30				10,33
	BORDILLO GRADA BANDERA	3,40	0,16	0,25				3,40
ANDEN FACHADA	JARDINERA 1	2,74	0,08	0,30				2,74
		0,42	0,08	0,30				0,42
	JARDINERA 2	1,30	0,08	0,30				1,30
		0,42	0,08	0,30				0,42
	JARDINERA 3	1,30	0,08	0,30				1,30
		0,42	0,08	0,30				0,42
ANDEN FACHADA	RAMPA	1,10	0,10	0,20				1,10
	DESCONTAR PAGADO EN ACTA 6							-20,70
								33,96
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**33,96**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:	Equipo Presion Agua potable según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD	FECHA:
	21,1		UN	31 de julio de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	alto	Área total (m2)	Vol total (m3)		
									
		INSTALACIÓN AGUA POTABLE						1,00	1,00
								1,00	
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		1,00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Equipo Incendio según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD	FECHA:	
21,3		UN	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	alto	Área total (m2)	Vol total (m3)		
		INSTALACIÓN EQUIPO DE INCENDIO						0,05	0,05
									0,05
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**0,05**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ


OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Cable UTP Cat 6A LZ0H. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
23,201		ml	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

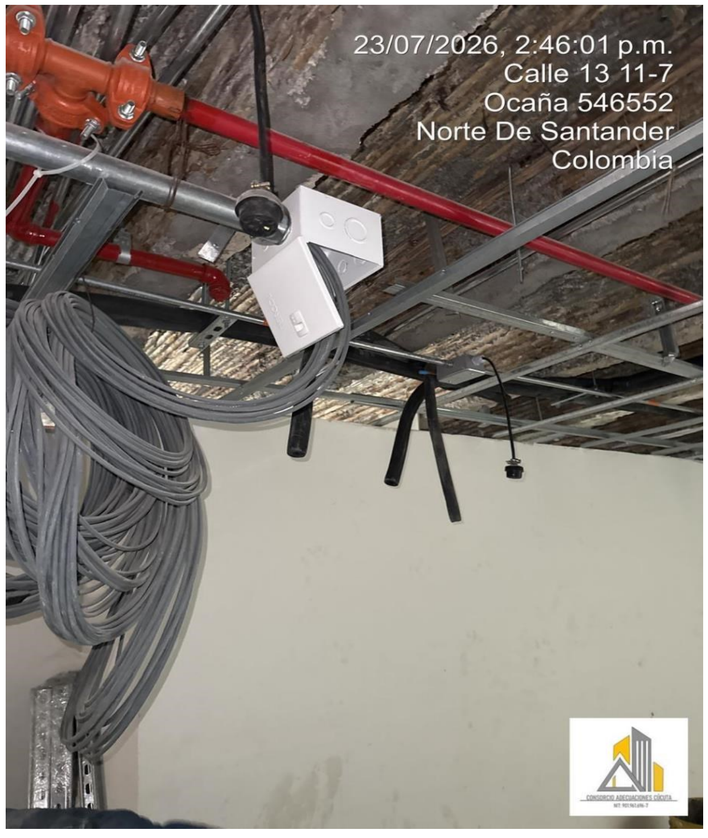

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
TODOS LOS PISOS	DESINSTALACION	750					0,6	450
	REINSTALACION	1.200,00						1.200,00
	DESCONTAR MAYOR CANTIDAD							-122,00
								1.528,00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**1.528,00**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Cableado 2x16. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
24,201		Und	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
	PISO 1	HALL ASCENSOR						25,00	25,00
		SALA AUDIENCIA 3						25,00	25,00
		SUBE A PISO 3						35,00	35,00
		PASILLO EMERGENCIA						15,00	15,00
		DIRECTOR						30,00	30,00
		SALA AUDIENCIA 1						35,00	35,00
		SALA AUDIENCIA 2						35,00	35,00
		PASILLO SALAS DE AUDIENCIAS						40,00	40,00
		PASILLO ZONA NUEVA						45,00	45,00

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Estuco y pintura 3 manos. Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	UNIDAD	FECHA:	
28,4		M2	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO





REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (mL)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
Item 8.1	Muro en bloque				1.709,04		0,60	1.025,42
Item 14.1	Cielorasoe en fibrocemento				123,24		0,50	61,62
Item 14.3	Cielorasoe en drywall				1.069,75		0,50	534,88
Item 14.3	Muro superboard una cara				167,73		0,50	83,87
Item 14.10	Muro superboard fachada				39,43		0,60	23,66
NP034	Muro superboard				849,14		0,60	509,48
								2.238,93
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	2.238,93

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Pintura borde placa (Fachadas). Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	UNIDAD	FECHA:	
28,6		ml	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Vol total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	alto				
FACHADA	MUROS DE FACHADA	4	0,90					3,60
		4,00	0,900					3,60
		4,00	0,900					3,60
								10,80
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		10,80

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	28,7	Pintura (Fachadas). Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	m2	31 de julio de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Vol total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	alto				
FACHADA	MUROS DE FACHADA	9,99	0,94					9,39
		3,77	1,740					6,56
		0,77	0,650					0,50
		6,54	0,65					4,25
		3,77	1,66					6,26
		0,77	0,72					0,55
		6,54	0,72					4,71
		3,77	1,780					6,71
		0,77	0,80					0,62
		6,54	0,80					5,23
		9,85	1,30					12,81
		1,04	1,78					1,85
		1,04	1,66					1,73
		1,04	1,74					1,81
		5,80	2,95					17,11
		4,00	0,72					2,88
		4,00	0,72					2,88
								85,84
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**85,84**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: NP012	Construccion de columnetas o vigas de coronacion en concreto de 3000 psi con seccion base menor a 0.12 altura menor a 0.12	UNIDAD: ML	FECHA: 31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Vol total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	alto				
ANDEN FACHADA	MURO BANDERAS	0,75	0,17	0,10			4,00	3,00
PRIMER PISO	BUITRON C3	2,60	0,13	0,10			5,00	13,00
SEGUNDO PISO	ENTRADA ESCALERAS	2,30	0,20	0,10			1,00	2,30
PRIMER PISO	MURO ESCALERA CARA ASCENSOR	2,68	0,13	0,10			4,00	10,72
PRIMER PISO	MURO BUITRON B2	2,68	0,13	0,10			3,00	8,04
PRIMER PISO	BUITRON B2	2,68	0,13	0,10			2,00	5,36
Z. N. N+0,0 - N+3,14	ARC. GRAL Y SALA AMIGA	2,70	0,13	0,10			10,00	27,00
DESCONTAR PAGADO EN ACTA 6								-51,25
ZONA NUEVA 2DO PIS	PERSONAL	2,40	0,13	0,10			2,00	4,80
		2,70	0,13	0,10			2,00	5,40
	COL C5	2,20	0,13	0,10			2,00	4,40
ZONA NUEVA 3ER	ZONA AMIGA	2,30	0,13	0,10			2,00	4,60
	COL C5	2,17	0,13	0,10			2,00	4,34
ZONA NUEVA 3ER	GRADAS	2,00	0,13	0,10			2,00	4,00
ZONA NUEVA 2DO	GRADAS	2,00	0,13	0,10			2,00	4,00
ZONA NUEVA 1ER	ESCALERAS POSTERIOR	2,50	0,13	0,10			2,00	5,00
	ESCALERAS FRONTAL	2,52	0,13	0,10			2,00	5,04
2DO PISO	EJE A2	2,08	0,13	0,10			1,00	2,08
3ER PISO	EJE A2	2,03	0,13	0,10			1,00	2,03
	EJE 5A	1,80	0,13	0,10			2,00	3,60
4to piso	eje D-5	2,37	0,13	0,10			1,00	2,37
	ZONA NUEVA EJE 6	2,35	0,13	0,10			2,00	4,70
								74,53
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**74,53**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: NP015	CONCRETO DE 3000 P.S.I PLACA DE CONTRAPISO 10CM		UNIDAD M2	FECHA: 31 de julio de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO







REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Vol total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	alto				
PRIMER PISO	PLACA BANDERAS	2,70	0,60					1,62
	GRADA 1 ENTRADA	11,10	1,20					13,32
	GRADA 2 ENTRADA	9,70	0,46					4,46
	GRADA 3 ENTRADA	9,70	0,46					4,46
	GRADA 4 ENTRADA	11,80	1,06					12,51
	RAMPA	1,30	1,35					1,76
	FRENTE A BANDERAS	4,10	4,10					16,81
	GRADA BANDERAS	2,70	0,46					1,24
ANDEN PRIMER	FRENTE A BANDERAS	1,40	1,27					1,78
DESCONTAR PAGADO EN ACTA 6								-37,62
								20,34
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**20,34**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Muro en Superboad 8mm dos caras con frescasa según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD	FECHA:	
NP034		M2	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	alto	Área total (m2)	Vol total (m3)		
1ER PISO	DIRECTOR	2,36		2,15				5,07
	SALA AUD. 1 Y 2	1,10		2,36			2,00	5,19
								10,27
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		10,27

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	NP052	Tablero de distribución CD-GEN con totalizador general de 3X500A, Ajustable 0,8-1In, 25kA, 2 breaker tipo industrial de 3x200A 25kA, 1 breaker tipo industrial de 3x40A 25kA. Caracteristicas DPS clase I Tablero general (Protección contra rayos) Corriente de descarga =12,5 kA Corriente de impulso 50kA Tensión máxima de operación continua =132Vac Nivel de protección =2,5kV3 X DPS con Uc =132Vac1 X DPS con Uc =132Vac Corriente interna admisible de cortocircuito: 25 KA. Un sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante un analizador de red digital que permita leer en forma secuencial Amps., Volts., Hz, KW, KVA, KVAR, KWH Y KVARH tipo LOVATO y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía, conectado a la red con fusibles en riel din de 2A.. 4 reservas. Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina. Alambrado interior del armario según diagrama unifilar. Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico.	UN	31 de julio de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Peso (kg/ml)	Volumen total (m3)		
		TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÂTICA						1	1,00
									1,00
									CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 1,00

ELABORÓ:
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:	OBSERVACIONES
JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ	

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	NP053	Tablero de transferencia Automatica de 3X200A. Un sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en forma secuencial Amps., Volts., Hz, KW, KVA, KVAR, KWH Y KVARH tipo LOVATO y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía, conectado a la red con fusibles en riel din de 2A. Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina. Alambrado interior del armario según diagrama unifilar. Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico.	UN	31 de julio de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Peso (kg/ml)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
		TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÂTICA						1	1,00
									1,00
									1,00

ELABORÓ:
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:	OBSERVACIONES
JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ	

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	NP054	Suministro e instalacion tablero de distribución IP65, T-BOMBAS con totalizador general TIPO INDUSTRIAL de 3X60A, 25KA, 4 breaker tipo industrial de 3x40A 25kA, 1 Breaker tipo RIEL de 1x30A 10KA. Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina. Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico	UN	31 de julio de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Peso (kg/ml)	Volumen total (m3)		
		TABLERO BOMBAS						1	1,00
									1,00
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1,00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA


Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	NP055	Suministro e instalacion de tablero de distribución CD-HVAC con totalizador general de 3X200A, Ajustable 0,8-1In 25kA, 20 Breaker tipo RIEL de 2x16A 10KA. 4 reservas. Un sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en forma secuencial Amps., Volts., Hz, KW, KVA, KVAR, KWH Y KVARH tipo LOVATO y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía, conectado a la red con fusibles en riel din de 2A. Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina. Alambrado interior del armario según diagrama unifilar. Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico.	UN	31 de julio de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

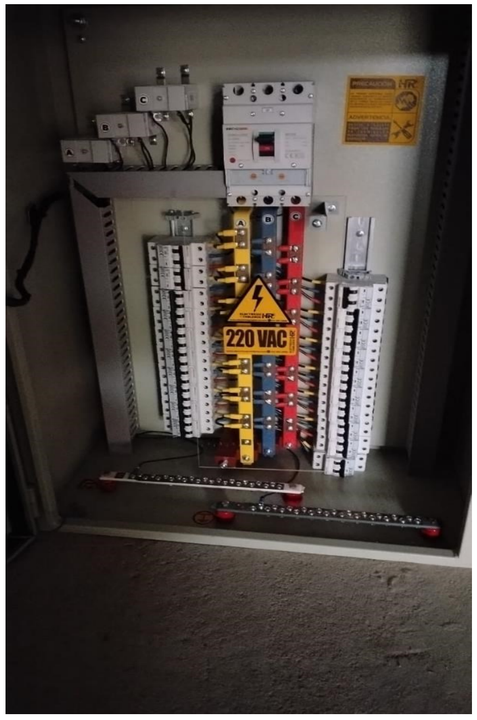DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Peso (kg/ml)	Volumen total (m3)		
									
		TABLERO HVAC						1	1,00
									1,00
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1,00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Suministro e instalación de estructura metalica, incluye pintura en acticorrosivo y esmalte colores a definir, , andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD	FECHA:	
NP056		KG	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA
		C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto	Peso (kg/ml)	Volumen total (m3)		
PERFILES	PERFIL HORIZONTAL 150X150X3 MM	6,03			14,25		2	171,86
	PERFIL VERTICAL 150X150X3 MM	9,8			14,25		2	279,30
SOPORTES PERFILES VERTICALES	PLATINAS 150X300X3 MM	0,15	0,3		39,73		12	21,45
	PLATINAS 50X300X3 MM	0,15	0,3		39,73		24	42,91
SOPORTES PERFIL INFERIOR	PLATINAS DE 150X300X3 MM	0,15	0,3		39,73		6	10,73
	PLATINAS DE 150X1500X3 MM	0,15	0,3		39,73		8	14,30
SOPORTES PERFIL INFERIOR	PLATINAS DE 280X50X5MM	0,28			2,06		10	5,77
	ANGULO DE 3"X3"X1/4" X25 CM	0,25			11,3		5	14,13
	PLATINA DE 600X3"X5/16' MM	0,6			28,4		2	34,08
								594,52
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		594,52

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Tuberia de cobre aislada, diametro inferior a 1/2" con pared ais de 1/2" y 3/4"	UNIDAD	FECHA:	
NP090		ML	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Peso (kg/ml)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
2DO	JUZ 11	9,20					1,00	9,20
	JUZ 14	11,40					1,00	11,40
	JUZ 6	8,50					1,00	8,50
	JUZ 16	4,80					1,00	4,80
	JUZ 5	7,80					1,00	7,80
	JUZ 10	7,00					1,00	7,00
	JUZ 11	6,50					1,00	6,50
	PASILLO	1,70					1,00	1,70
	JUZ 14	3,30					1,00	3,30
	PASILLO	2,20					1,00	2,20
	JUZ 6	7,30					1,00	7,30
	PASILLO	3,00					1,00	3,00
	JUZ 16	5,40					1,00	5,40
	PASILLO	4,20					1,00	4,20
	JUZ 5	4,60					1,00	4,60
	PASILLO	3,00					1,00	3,00
	JUZ 10	2,60					1,00	2,60
	PASIILLO	7,30					1,00	7,30
	PASILLO	3,90					1,00	3,90
		8,30					1,00	8,30
		4,20					1,00	4,20
3ER PISO	JUZ 8	10,00					1,00	10,00
	OFI SEG	6,40					1,00	6,40
	JUZ 13	4,60					1,00	4,60
	JUZ 3	7,40					1,00	7,40
	JUZ 2	7,70					1,00	7,70
	JUZ 9	8,90					1,00	8,90
	ASONAL ZONA NUEVA	5,30					1,00	5,30
3ER PISO	JUZ 8	3,70					1,00	3,70
	PASILLO	4,20					1,00	4,20
	JUZ 2	8,40					1,00	8,40
								182,80
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	182,80

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:	
NP090	Tuberia de cobre aislada, diametro inferior a 1/2" con pared ais de 1/2" y 3/4"	ML	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto	Peso (kg/ml)	Volumen total (m3)		
		4,20					1,00	4,20
	JUZ 13	4,60					1,00	4,60
		4,80					1,00	4,80
	JUZ 3	2,40					1,00	2,40
		3,50					1,00	3,50
	JUZ 9	4,20					1,00	4,20
		6,20					1,00	6,20
	PASILLO	6,20					1,00	6,20
	PASILLO	7,00					1,00	7,00
	PASILLO	4,90					1,00	4,90
		4,80					1,00	4,80
							52,80	
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		235,60

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Tuberia de cobre aislada, diametro entre 1/2" a 7/8" con pared ais de 1/2" y 3/4"		UNIDAD	FECHA:
NP091			ML	31 de julio de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Peso (kg/ml)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
2DO	JUZ 11	9,2					1	9,2
	JUZ 14	11,4					1	11,4
	JUZ 6	8,5					1	8,5
	JUZ 16	4,8					1	4,8
	JUZ 5	7,8					1	7,8
	JUZ 10	7					1	7
	JUZ 11	6,5					1	6,5
	PASILLO	1,7					1	1,7
	JUZ 14	3,3					1	3,3
	PASILLO	2,2					1	2,2
	JUZ 6	7,3					1	7,3
	PASILLO	3					1	3
	JUZ 16	5,4					1	5,4
	PASILLO	4,2					1	4,2
	JUZ 5	4,6					1	4,6
	PASILLO	3					1	3
	JUZ 10	2,6					1	2,6
	PASIILLO	7,3					1	7,3
	PASILLO	3,9					1	3,9
		8,3					1	8,3
		4,2					1	4,2
	PASILLO	4,4					1	4,4
3ER PISO	JUZ 8	10,00					1,00	10,00
	OFI SEG	6,40					1,00	6,40
	JUZ 13	4,60					1,00	4,60
	JUZ 3	7,40					1,00	7,40
	JUZ 2	7,70					1,00	7,70
	JUZ 9	8,90					1,00	8,90
	ASONAL ZONA NUEVA	5,30					1,00	5,30
3ER PISO	JUZ 8	3,70					1,00	3,70
	PASILLO	4,20					1,00	4,20
								178,80
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	178,80

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:			UNIDAD	FECHA:
NP091	Tuberia de cobre aislada, diametro entre 1/2" a 7/8" con pared ais de 1/2" y 3/4"		ML	31 de julio de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto	Peso (kg/ml)	Volumen total (m3)		
	JUZ 2	8,40					1,00	8,40
		4,20					1,00	4,20
	JUZ 13	4,60					1,00	4,60
		4,80					1,00	4,80
	JUZ 3	2,40					1,00	2,40
		3,50					1,00	3,50
	JUZ 9	4,20					1,00	4,20
		6,20					1,00	6,20
	PASILLO	6,20					1,00	6,20
	PASILLO	7,00					1,00	7,00
								51,50
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		230,30

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Tuberia de cobre aislada, diametro mayor a 7/8" con pared ais de 1/2" y 3/4" y llegadas a condensadoras	UNIDAD	FECHA:	
NP092		ML	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Peso (kg/ml)	Volumen total (m3)		
	SEGUNDO PISO	RED DE AIRE ACONDICIONADO	33,00					1	33,00
	TERCER PISO	RED DE AIRE ACONDICIONADO	33,00					1	33,00
									66,00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		66,00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Tuberia de desagues 1" aislada y accesorios	UNIDAD	FECHA:	
NP093		ML	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Peso (kg/ml)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
SEGUNDO PISO	RED DE AIRE ACONDICIONADO	81,00					1	81,00
TERCER PISO	RED DE AIRE ACONDICIONADO	81,00					1	81,00
								162,00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		162,00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Acometida electrica de señal, incluye: (Tuberia emt 1/2", cable blindado apantallado con recubrimiento 2x18 + 20 foil) incluye soporteria con riel chanel, abrazaderas, terminales, tornilleria menor y fijacion	UNIDAD	FECHA:	
NP094		ML	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Peso (kg/ml)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
	SEGUNDO PISO	RED DE AIRE ACONDICIONADO	240,00					1	240,00
	TERCER PISO	RED DE AIRE ACONDICIONADO	240,00					1	240,00
									480,00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		480,00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:	**Suministro e instalación de un (1) tanque cilíndrico horizontal para almacenamiento de ACPM con capacidad de 119 galones, elevado sobre estructura soportante. Incluye sistema de conexiones (llenado, retorno, drenaje, parallama, flotador e indicador de nivel), válvula de control de salida, de acuerdo con los planos de detalle del proyecto.**	**UNIDAD**	**FECHA:**
	NP096		UN	**31 de julio de 2026**

OBJETO:	**"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"**	**CONTRATO DE OBRA** C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Peso (kg/ml)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
CUARTO DE BOMBAS	TANQUE DE ACPM						1	1,00
								1,00
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA								**1,00**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:	
NP097	Refuerzo en madera para soporte superior ventanas interiores	ML	31 de julio de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

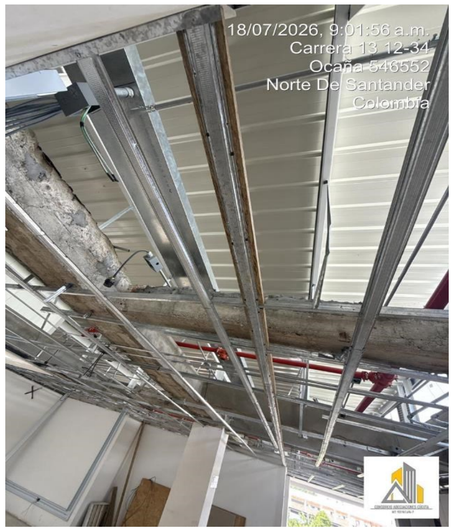



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Vol total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	alto				
1ER PISO	SALA AUD. 3 P.	2,3					2,00	4,60
	SALA AUD. 1 P.	2,3					2,00	4,60
	SALA AUD. 2 P.	2,3					1,00	2,30
	DIRECTOR P.	2,3					2,00	4,60
3ER PISO	JUZ. 2 P.	2,18					1,00	2,18
	JUZ. 2 V.	3,3					1,00	3,30
	JUZ. 8. P.	2,18					1,00	2,18
	JUZ. 8. V.	3,17					1,00	3,17
	DEPOSITO P.	2,18					1,00	2,18
	OFI. SEG. P.	2,18					2,00	4,36
	JUZ. 13. V.	5,28					1,00	5,28
	JUZ. 13. P.	2,18					1,00	2,18
	JUZ. 3. V.	3,58					1,00	3,58
	JUZ. 9. V.	3,58					1,00	3,58
4TO PISO	JUZ. 4. V.	2,1					1,00	2,10
		3,7					1,00	3,70
	JUZ. 15. V.	3,25					1,00	3,25
	JUZ. 15. P.	2,25					1,00	2,25
	JUZ. 1. V.	7,5					1,00	7,50
	SALA. AUD. 5 Y 6	2,25					4,00	9,00
	DEPOSITO P.	2,25					1,00	2,25
								78,14
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**78,14**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES
