

PROYECTO:
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000893
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ".

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2 PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

FLORENCIA, NOVIEMBRE DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1	**INTRODUCCIÓN**		**6**
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		**7**
	2.1	Localización	7
	2.2	Características del proyecto	8
3	**DATOS GENERALES**		**13**
	3.1	Datos del contrato objeto de interventoría	13
	3.2	Datos de la interventoría	14
	3.3	Obligaciones del contrato de interventoría	14
4	**GARANTÍAS**		**19**
	4.1	Seguimiento de garantías y seguros del Contrato de Obra	19
	4.2	Seguimiento de garantías y seguros del Contrato de Interventoría	20
5	**VERIFICACIÓN DE PERSONAL MÍNIMO CONTRACTUAL**		**22**
	5.1	Verificación de personal mínimo contractual del Contratista de obra	22
	5.2	Verificación de pago de seguridad social y aportes legales	22
	5.3	Verificación de personal mínimo contractual del Contratista de interventoría	23
	5.4	Verificación de pago de seguridad social y aportes legales	24
6	**ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRA**		**25**
	6.1	Descripción de actividades ejecutadas en el mes	25
	6.2	Resumen de cantidades ejecutadas.	29
	6.3	Informe de avance físico de la obra	31
7	**INFORMACIÓN FINANCIERA**		**33**
	7.1	Informe de avance financiero de la obra	33
	7.2	Información de manejo del anticipo	33
8	**INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA**		**35**
	8.1	Problemas presentados y mecanismos de solución propuestos	35
	8.2	Control de calidad	35
	8.3	Documentos suscritos	36

9 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 39

10 SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 48

10.1 Desarrollo e implementación de la gestión ambiental 48

10.2 Programa de actividades constructivas 48

10.3 Biodiversidad y servicios ecosistémicos 49

10.4 Programa de gestión social 50

10.5 Gestión de salud y seguridad en el trabajo. 50

11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 53

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Actividades incluidas en el alcance del proyecto. 8
Tabla 2. Ficha técnica del Contrato objeto de interventoría 13
Tabla 3. Ficha técnica del Contrato de Interventoría. 14
Tabla 4. Póliza de cumplimiento contrato de obra, condiciones iniciales. 19
Tabla 5. Póliza de cumplimiento contrato de obra, condiciones actualizadas. 19
Tabla 6. Póliza de responsabilidad civil extracontractual contrato de obra, condiciones iniciales. 20
Tabla 7. Póliza de responsabilidad civil extracontractual de contrato de obra, condiciones actualizadas. 20
Tabla 8. Resumen de actualización de pólizas contrato de obra. 20
Tabla 9. Póliza de cumplimiento contrato de interventoría, condiciones iniciales. 21
Tabla 10. Póliza de cumplimiento contrato de interventoría, condiciones actualizadas. 21
Tabla 11. Personal mínimo requerido del Contratista de obra. 22
Tabla 12. Personal del Contrato de Obra. 22
Tabla 13. Personal de apoyo y operativo. 23
Tabla 14. Personal mínimo requerido de interventoría. 23
Tabla 15. Personal de Interventoría. 23
Tabla 16. Resumen de cantidades ejecutadas en el periodo. 29
Tabla 17. Resumen de cantidades ejecutadas a la fecha de corte del presente informe. 30
Tabla 18. Tabla de programación 31
Tabla 19. Avance financiero 33
Tabla 20. Plan de inversión del anticipo del contrato de obra. 34
Tabla 21. Relación de equipo empleado en obra. 36
Tabla 22. Documentación del contrato de obra. 36
Tabla 23. Comités de seguimiento del proyecto 36
Tabla 24. Relación de correspondencia. 37
Tabla 25. Verificación de cumplimiento de obligaciones 39

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Localización del municipio de Florencia 7
Figura 2. Lugar de internvención. 8
Figura 3. Planta arquitectónica primer nivel edificio Gobernación. 26
Figura 4. Curva S - Contrato de obra 31

GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S

1 INTRODUCCIÓN

La sede central de la Gobernación del Caquetá constituye un espacio fundamental para la atención al público y el desarrollo de las actividades administrativas del departamento. No obstante, los espacios destinados a la atención ciudadana presentan un deterioro físico y funcional, producto del uso continuo, la falta de mantenimiento periódico y la obsolescencia de algunos elementos constructivos e instalaciones, lo cual incide de manera directa en la calidad del servicio prestado y en las condiciones laborales de los funcionarios.

En respuesta a esta situación, la Gobernación del Caquetá adelantó el proceso de contratación de construcción de obras civiles para el proyecto, mediante el proceso de Licitación Pública No DC-GE-LP.016-2025 cuyo objeto consiste en "Adecuación y Mejoramiento Integral de Espacios de Atención al Público en el Edificio Central de la Gobernación del Caquetá" que fue adjudicado al Consorcio Caquetá 2025. La contratación de la interventoría se adelantó mediante Concurso de Méritos Abierto No DC-GE-CMA-012-2025, del cual resulto adjudicatario la empresa Geovial ingeniería Zomac S:A:S

El presente documento corresponde al Informe Mensual de Interventoría No.2, que abarca el periodo comprendido entre el 9 de noviembre al 8 de diciembre de 2025. En este informe se describe el avance de las actividades ejecutadas como parte de la interventoría Técnica, Administrativa Jurídica y Financiera del Contrato cuyo Objeto Consiste en: "Adecuación y Mejoramiento Integral de Espacios de Atención al Público en el Edificio Central de la Gobernación del Caquetá"., e igualmente describe las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento al Contrato No. 202500000893.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO


2.1 Localización

El proyecto de Adecuación y Mejoramiento Integral de Espacios de Atención al Público en el Edificio Central de la Gobernación del Caquetá se ejecutará en el Municipio de Florencia, Caquetá, en la Carrera 13 con Calle 15, barrio el Centro.

El Municipio de Florencia está localizado en el departamento del Caquetá, a los 01°37'03" de latitud norte y 75°37'03" de longitud oeste y a una altura de 242 metros sobre el nivel del mar.

El municipio de Florencia, limita por el Norte con el departamento del Huila, al Sur con los municipios Milán y Morelia, al Este con el Municipio de La Montañita y al Oeste con los Municipios de Belén de los Andaquíes y Departamento del Huila. La extensión es de 2.292 km2 aproximadamente, el cual es equivalente a 229.200 has y con relación al resto del país ocupa el 0.2% del territorio.

Figura 1. Localización del municipio de Florencia

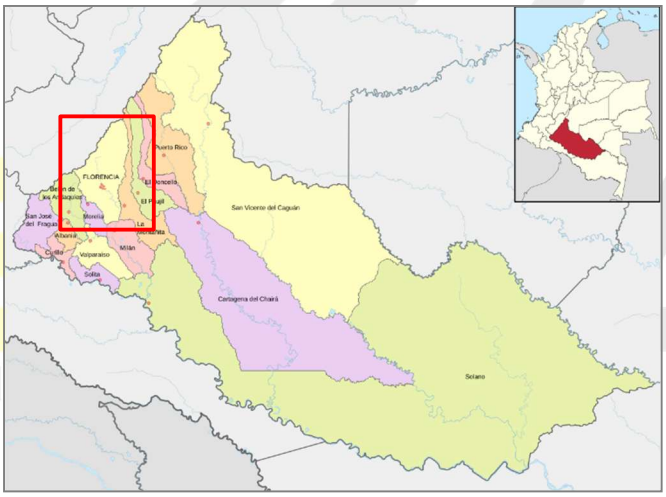

Nota: Tomado de Mapa de Caquetá (Wikipedia, 2025)

Figura 2. Lugar de internvención.



Nota: Tomado de Google Maps, 2025

2.2 Características del proyecto

El contrato de interventoría define el objeto del contrato así: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ"., el cual contempla las siguientes actividades:

Tabla 1. Actividades incluidas en el alcance del proyecto.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.
1	**REALIZAR OBRAS PRELIMINARES**		
1.1	Localización y replanteo	M²	1,015.00
1.2	Cerramiento en tela verde	ML	102.00
1.3	Limpieza de fachada	M²	2,230.00
2	**REALIZAR DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE**		
2.1	Desmonte de marcos y puertas.	UND	35.00
2.2	Desmonte de aparatos sanitarios con recuperación	UND	3.00
2.3	Demolición de muro mampostería E=0,15m .	M²	3.50

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.
2.4	Desmonte de cielo raso existente	M²	1,015.00
2.5	Demolición de baldosa cerámica	M²	76.13
2.6	Desmonte o desinstalación de aires acondicionados existentes	UND	15.00
2.7	Desmonte de vidrio templado	M²	53.00
2.8	Desmonte y/o demolición de granito y adoquín	M²	167.00
2.9	Demolición de muro en drywall y/o superboard.	M²	109.54
2.10	Retiro de material cargue y descargue fuera de las instalaciones, incluye transporte a escombrera	M³	18.00
2.11	Desmonte de divisiones en aluminio y vidrio	M²	23.08
3	**INSTALAR REDES HIDROSANITARIAS**		
3.1	Caja de inspección en concreto reforzado de .80*.80 m	UND	1.00
3.2	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 4".	ML	26.00
4	**INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA**		
4.1	Suministro e instalación de sanitario. Incluye: grifería y acople.	UND	3.00
4.2	Suministro e instalación de lavamanos	UND	3.00
4.3	Reposición de rejilla metálica de piso 3" anti cucarachas	UND	3.00
5	**INSTALAR PISOS Y ENCHAPES**		
5.1	Enchape cerámica pared	M²	60.70
5.2	Enchape cerámica antideslizante piso	M²	14.78
5.3	Mantenimiento de piso en tableta tipo Alpha.	M²	1,324.00
5.4	Mantenimiento de guarda escoba en granito pulido.	ML	205.00
5.5	Suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato negro	ML	152.00
5.6	Suministro e instalación de piso en adoquín de gres de 20*10*6 cm (tránsito peatonal)	M²	180.00
5.7	Suministro e instalación de mortero nivelación e impermeabilizante para placa exterior	M²	126.50
6	**INSTALAR ESTUCO Y PINTURA**		
6.1	Pintura tipo 1 para muros interiores.	M²	584.00
6.2	Estuco para muros.	M²	584.00
6.3	Pintura, muros exteriores tipo 1 a 3 manos (fachada)	M²	1,734.48
6.4	Pintura esmalte color a convenir para portón metálico. Incluye: lijado y anticorrosivo.	M²	17.00
7	**INSTALAR CIELO RASO Y DIVISIONES EN DRYWALL**		
7.1	Cielorraso plano en drywall según diseño. Incluye estructura, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación.	M²	1,015.00
7.2	Carteras ornamentales para iluminación indirecta en cielorraso. Incluye estructura, filetes, masilla, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación.	ML	462.00
7.3	Muro liviano en superboard e=8mm 2 caras (incluye estructura y todo lo necesario para su correcta instalación)	M²	202.57
8	**INSTALAR PUERTAS Y VENTANAS**		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.
8.1	Suministro e instalación de puerta alas batientes de 0.85*2.10 m, marco ref. VP-1102 y marco puerta Ref. U-57, con vidrio de 6mm transparente. Incluye todos los materiales para su correcta instalación	UND	4.00
8.2	Suministro e instalación Puertas en vidrio templado 10 MM	M^2	25.60
8.3	Suministro e instalación Ventana en aluminio con vidrio 6 MM	M^2	9.24
8.4	Suministro e instalación División en vidrio templado 10 MM	M^2	24.11
8.5	Suministro e instalación baranda en tubo de acero inox. 2" y 1/2" 3 hilos según diseño.	ML	11.00
8.6	Suministro e instalación de puerta alas batientes de 0.9*2.15m, marco ref. VP-1102 y marco puerta Ref. U-57, con vidrio de 6mm transparente. Incluye todos los materiales para su correcta instalación	UND	15.00
8.7	Suministro e instalación de puerta alas batientes de 1.0*2.15m, marco ref. VP-1102 y marco puerta Ref. U-57, con vidrio de 6mm transparente. Incluye todos los materiales para su correcta instalación	UND	6.00
9	**INSTALAR MAMPOSTERÍA, PAÑETE CONCRETOS**		
9.1	Pañete 1:4	M^2	5.26
9.2	Relleno con material granular (Incluye compactación)	M^3	34.00
9.3	Zapata en concreto reforzado 4000 PSI	M^3	8.38
9.4	Vigas de cimentación en concreto reforzado 4000 PSI	M^3	5.48
9.5	Pañete filos marcos puertas o ventanas	ML	94.45
9.6	Acero de refuerzo resistencia Fy=420 MPa (60000 PSI)	KG	381.80
9.7	Excavación manual	M^3	41.44
10	**OBRAS ELÉCTRICAS**		
10.1	Suministro e instalación de tablero general de fuerza energía normal y red regulada para pisos 1 y 2 TGD 1 según diagrama unifilar	UND	1.00
10.2	Suministro e instalación de tablero general de distribución regulado para pisos 1 y 2 TRD según diagrama unifilar	UND	1.00
10.3	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red normal uso general de 24 circuitos con espacio para totalizador. Incluye: Un breaker industrial totalizador hasta 50A y breackers enchufables de unos, dos y tres polos según diagrama general de tableros.	UND	5.00
10.4	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red normal uso general de 36 circuitos con espacio. Incluye: Un breacker industrial totalizador hasta 100A y breackers enchufables de uno, dos y tres polos según diagrama general de tableros	UND	1.00
10.5	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico para red regulada de 12 circuitos con espacio para totalizador. Incluye: Un breacker industrial totalizador de hasta 50A y breackers enchufables de uno, dos y tres polos según diagrama general de tableros.	UND	4.00
10.6	Suministro e instalación de circuito ramal en cable de cobre aislado HFFRLS 3X12 AWG y tubo PVC Sch40 1/2"	ML	655.68
10.7	Suministro e instalación de salida tomacorriente monofásico 120 V en tubería PVC Sch 40 y cable de cobre aislado HFFRLS No 12	UND	172.00
10.8	Suministro e instalación de salida para iluminación en tubería PVC Sch40 y cable de cobre aislado HFFRLS No. 12.	UND	389.00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.
10.9	Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED de incrustar hasta 15w certificada alto CRI 4100°K y factor de potencia 80 Lm/w 50.000h L70	UND	344.00
10.10	Suministro e instalación de salida para control de iluminación por interruptor manual en tubería Sch 40 y cable de cobre aislado HFFRLS No. 12	UND	37.00
10.11	Suministro e instalación de luminaria tipo panel LED de incrustar hasta 15w certificada alto CRI 4100°K y alto factor de potencia 80 Lm/w 50.000h L70	UND	20.00
10.12	Suministro e instalación de Pantalla LED cabinet 96X80X12 cm. Cada cabinet compuesto por 15 paneles LED P8 exterior 2 fuentes de voltaje 5v-70a, una tarjeta repetidora R-712m con sus cables de poder que alimentan los paneles desde las fuentes y correas de datos (Ribbon) para transmitir información entre paneles.	UND	58.00
10.13	Desmonte de aparatos de salidas eléctricas	UND	190.00
10.14	Suministro e instalación de unidad condensadora tecnología inverter para aire acondicionado tipo cassette o minisplit de 76000 BTU 127-220v	UND	8.00
10.15	Suministro e instalación de Unidad manejadora tipo cassette en techo 360° para aire acondicionado de 24.000 BTU. No incluye la unidad condensadora respectiva	UND	15.00
10.16	Suministro e instalación de unidad manejadora tipo cassette en techo 360° para aire acondicionado de 18.000 BTU. No incluye la unidad condensadora respectiva.	UND	12.00
10.17	Suministro e instalación de luminaria lineal tipo cinta LED de 9w/m 4100°K-1H	ML	796.00
10.18	Suministro e instalación de Salida tomacorriente regulado 120 V.	UND	172.00
10.19	Luminaria de emergencia de incrustar o sobreponer LED de 4w certificada 50.000h L70 autonomía de 60 minutos	UND	25.00
10.20	Suministro e instalación de Acometidas parciales desde TGD1 a tableros de distribución TD1, TD2 ,TD3, TD5, TD6, TDR2, TDR3 y TDR4 en cable de cobre aislado HFFRLS , 3#8F+1#8N+1#8T - AWG, en ducto PVC SCH 40 de 1+1/4".	ML	208.00
10.21	Suministro e instalación de Acometidas parciales desde TGD1 a tableros de distribución TD4 y TDR1 en cable de cobre aislado HFFRLS , 3#6F+1#6N+1#8T - AWG, en ducto PVC SCH 40 de 1+1/2"	ML	49.00
10.22	Suministro e instalación de Acometida parcial de TGD1 a TRD en cable de cobre aislado THWN, 3#2F+1#1/0N+1#6T en ducto PVC SCH 40 de 2"	ML	36.77
10.23	Suministro e instalación de acometida parcial de TGD a TGC (A. A. condensadoras), en cable de cobre aislado THWN, 3#2/0F+1#2/0N+1#4T en ducto EMT de 3"	ML	83.48
10.24	Suministro e instalación de acometida parcial de TGD a TGD1 (Tablero general pisos 1 Y 2), en cable de cobre aislado THWN, 3#4/0F+1#4/0N+1#4T en ducto EMT de 3".	ML	30.00
10.25	Suministro e instalación de tablero general condensadoras de A. A. para pisos 1 y 2 TGDC según diagrama unifilar	UND	1.00
10.26	Suministro e instalación de acometidas parciales desde TGDC a cada condensadora de aire UCA1, UCA2 , UCA3, UCA4, UCA5, UCA6, en	ML	100.00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.
	cable de cobre aislado THWN, 3#8F+1#10N+1#10T - AWG, en ducto IMC SCH 40 de 1"		
11	**INSTALAR ESTRUCTURA METÁLICA**		
11.1	Policarbonato alveolar para cubierta	M^2	159.00
11.2	Celosías hexagonales CR cal 16 de cubierta flotante. Incluye corte láser según diseño y pintura.	UND	87.00
11.3	Canal en lámina galvanizada cal. 16, long de desarrollo 0.8m, incluye pintura	ML	16.93
11.4	Suministro e instalación de estructura metálica en acero ASTM-A572 Gr. 50 (incluye esquema de pintura)	KG	2179.64
11.5	Suministro e instalación de estructura metálica en acero ASTM A500 Grado C (Incluye esquema de pintura)	KG	3518.00
11.6	Lámina galvanizada Cal. 16 para protección de pantallas LED, long de desarrollo 2.40m, incluye pintura	ML	26.13
11.7	Pieza en lámina CR cal 16. Incluye corte láser según diseño y pintura.	UND	2.00
11.8	Anclaje en platina 300*300mm e 1/2"	UND	4.00
11.9	Anclaje en platina 300*450mm e 5/8"	UND	2.00

GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S

3 DATOS GENERALES

FECHA:	Diciembre de 2025	**INFORME No.**	2

PERIODO No.	2	**DEL:**	9 de noviembre de 2025	**AL:**	8 de diciembre de 2025

OBJETO DEL CONTRATO:	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Florencia, Caquetá

3.1 Datos del contrato objeto de interventoría

Tabla 2. Ficha técnica del Contrato objeto de interventoría

No. DEL PROCESO	DC-GE-LP-016-2025				
TIPO DE CONTRATO:	OBRA PÚBLICA				
CONTRATO No:	202500000874				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	12/09/2025				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAQUETÁ 2025				
NIT/CC:	901.987.427-5				
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS ($2.401.062.171) MCTE				
ANTICIPO:	$ 960,484,868.00				
ADICIONES:	N. A.				
MODIFICACIONES:	N. A.				
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025, a partir de la legalización del contrato y suscripción del Acta de Inicio por el Contratista y el Supervisor del contrato.				
AMPLIACIÓN 1:	N. .A.				
PLAZO ACTUALIZADO:	N. A.				
FECHA ACTA DE INICIO:	09/10/2025				
PLAZO ACTUALIZADO:	-				
PLAZO TRANSCURRIDO:	Sesenta (60) días				
No. CDP	2025071266	Fecha exp.	4/07/2024	Valor ($)	2,571,206,371.00
No. RP	2025094328	Fecha exp.	15/09/2025	Valor ($)	2,401,062,171.00

3.2 Datos de la interventoría

Tabla 3. Ficha técnica del Contrato de Interventoría.

No. DEL PROCESO	DC-GE-LP-016-2025				
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA				
CONTRATO No:	2022500000893 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025				
CONTRATISTA:	GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S				
NIT/CC:	901.390.155-3				
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ				
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($168.209.800) M/CTE.				
ANTICIPO:	N. A				
ADICIONES:	N. A.				
MODIFICACIONES:					
PLAZO DE INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025, a partir de la legalización del contrato y suscripción del Acta de Inicio por el Contratista y el Supervisor del contrato.				
AMPLIACIÓN 1:	N. .A.				
PLAZO ACTUALIZADO:	N. A.				
FECHA ACTA DE INICIO:	09/10/2025				
PLAZO ACTUALIZADO:	-				
PLAZO TRANSCURRIDO:	Sesenta (60) días				
No. CDP	2025071266	Fecha exp.	4/07/2025	Valor ($)	2,571,206,371.00
No. RP	2025094490	Fecha exp.	25/09/2025	Valor ($)	168,209,800.00

3.3 Obligaciones del contrato de interventoría

Obligaciones generales

De acuerdo con el contrato de interventoría, el interventor asume las siguientes obligaciones:

Además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y los convenidos en el presente contrato el Contratista deberá:

a. Presentar las garantías exigidas
b. Suscribir el Acta de Inicio del contrato
c. Cumplir con el objeto del Contrato en los términos pactados
d. Cumplir con las características técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas.

e. Informar oportunamente (dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes) al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo.
f. Permitir al supervisor asignado por el Departamento, realizar la inspección del contrato y ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el cumplimiento del contrato.
g. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la ejecución del contrato, ejecutar el mismo y para hacer efectivo el pago. El incumplimiento de estas obligaciones, será causal para que el municipio, le imponga multas sucesivas por valor del Uno por ciento (1%) del valor del contrato, sin superar el Diez por ciento (10%) del mismo, hasta tanto éste dé cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la respectiva entidad administradora, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
h. Tratándose de personas naturales la base para el pago de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y de los parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) no podrá ser inferior al cuarenta por ciento (40%) del valor total final del contrato.
i. El contratista se obliga a prorrogar la vigencia de la garantía única por un término igual a la suspensión o ampliación del contrato si a ello hay lugar.
j. Garantizar la calidad del trabajo o servicio realizado.
k. Presentar un informe final de ejecución del contrato.
l. Suscribir el Acta de Liquidación del contrato.
m. Las demás que deriven de la ejecución contractual.

Obligaciones específicas

- Obligaciones Técnicas

a. Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el contrato, igualmente constatar, según corresponda, la existencia de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de iniciación y la ejecución del objeto pactado,

b. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo cuando fuere necesario,
c. Verificar el cumplimiento del alcance del objeto contractual,
d. Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones estas deberán someterse a la decisión de la autoridad correspondiente (Ordenador del Gasto), previo concepto escrito de la Interventoría o la supervisión,
e. Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes a que haya lugar,
f. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos; ordenar y supervisar los ensayos o pruebas necesarias para el control de los mismos,
g. Verificar, cuando a ello hubiere lugar, el reintegro a la entidad de los equipos, elementos y documentos suministrados por él; constatar su estado y cantidad,
h. Abrir y llevar el libro o bitácora para registrar en él las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato,
i. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los requerimientos técnicos pertinentes,
j. Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución,
k. Previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos, recibir para su revisión y aprobación las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el Contratista, diferente al que fue objeto de evaluación por parte del Departamento en desarrollo del proceso de selección. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los criterios y metodología establecida en la invitación publica que dieron origen al contrato objeto de interventoría.

- **Obligaciones Administrativas:**

a. Acopiar la documentación producida en la etapa precontractual que requiera, a fin de contar con el máximo de información sobre el origen del contrato;
b. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su cargo,
c. Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las acciones del contratista,
d. Verificar que existan los permisos y licencias necesarios para la ejecución del objeto contractual,

e. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, durante la ejecución del contrato, de tal forma que la entidad intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas,
f. Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, manteniéndola a disposición de los interesados,
g. Coordinar con las dependencias de la entidad que tengan relación con la ejecución del contrato, para que éstas cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta función se entiende incorporada la de efectuar seguimiento a las actuaciones contractuales,
h. Procurar que por causas atribuibles a la entidad no sobrevenga mayor onerosidad, es decir, se rompa el equilibrio financiero del contrato,
i. Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución y avance del contrato,
j. Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance del contrato, con la periodicidad que se requiera, atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos,
k. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables,
l. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del contrato.

- Obligaciones Financieras:

a. Verificar que el contratista cumpla con los requisitos para la entrega del anticipo pactado, y constatar su correcta inversión (Cuando Aplique). Para este efecto deberá exigir, según corresponda, la presentación del programa de utilización de personal y equipos durante la ejecución del contrato, el programa de flujos de fondos del contrato y el programa de inversión del anticipo,
b. Revisar, aprobar y tramitar ante la dependencia de la entidad correspondiente, las solicitudes de pago formuladas por el contratista, y llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuados,
c. Verificar que el contratista este al día en los pagos de pensiones, ARP, parafiscales y salud de conformidad con lo establecido en las normas pertinentes,

d. Constatar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos y en ese sentido, informar o solicitar a quien corresponda, a fin de obtener los certificados de disponibilidad, registro y reserva presupuestal cuando se requiera.

4 GARANTÍAS

4.1 Seguimiento de garantías y seguros del Contrato de Obra

De conformidad con lo establecido en el Contrato de Obra suscrito entre la Entidad Contratante y el Consorcio Caquetá 2025, en la cláusula decima se definieron las características que deben cumplir las garantías expedidas por el contratista. Dichas garantías se describen a continuación y se incluyen como anexo al presente informe.

Tabla 4. Póliza de cumplimiento contrato de obra, condiciones iniciales.

CONTROL DE GARANTÍAS Póliza de cumplimiento – Anexo 0				
Amparo	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato	$ 240,106,217.10	61-44-101061224	12/09/2025	31/12/2030
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 120,053,108.55	61-44-101061224	12/09/2025	31/12/2028
Estabilidad y calidad de la obra	$ 480,212,434.20	61-44-101061224	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 960,424,868.40	61-44-101061224	12/09/2025	31/12/2025

Tabla 5. Póliza de cumplimiento contrato de obra, condiciones actualizadas.

CONTROL DE GARANTÍAS Póliza de cumplimiento – Anexo 2				
Amparo	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.	$ 240,106,217.10	61-44-101061224	9/10/2025	28/07/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal.	$ 120,053,108.55	61-44-10101224	9/10/2025	27/01/2026
Estabilidad y calidad de la obra	$ 480,212,434.20	61-44-10101224	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 960,424,868.40	61-44-10101224	9/10/2025	27/01/2026

Tabla 6. Póliza de responsabilidad civil extracontractual contrato de obra, condiciones iniciales.

CONTROL DE GARANTÍAS Póliza de responsabilidad civil extracontractual – Anexo 0				
Amparo	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios laborales y operaciones	$ 569,400,000.00	61-40-101022183	12/09/2025	31/12/2025
Contratistas y subcontratistas	$ 569,400,000.00	61-40-101022183	12/09/2025	31/12/2025
Vehículos propios y no propios	$ 569,400,000.00	61-40-101022183	12/09/2025	31/12/2025

Tabla 7. Póliza de responsabilidad civil extracontractual de contrato de obra, condiciones actualizadas.

CONTROL DE GARANTÍAS Póliza de responsabilidad civil extracontractual – Anexo 2				
Amparo	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios laborales y operaciones	$ 569,400,000.00	61-40-101022183	9/10/2025	27/01/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 569,400,000.00	61-40-101022183	9/10/2025	27/01/2026
Vehículos propios y no propios	$ 569,400,000.00	61-40-101022183	9/10/2025	27/01/2026

Tabla 8. Resumen de actualización de pólizas contrato de obra.

Tipo Garantía	Póliza No.	Anexo	Tipo Modificación	Expedición
Cumplimiento	61-44-101061224	0	Original	19/09/2025
Responsabilidad civil	61-40-101022183	0	Original	19/09/2025
Cumplimiento	61-44-101061224	1	Según acta de inicio	27/10/2025
Responsabilidad civil	61-40-101022183	1	Según acta de inicio	27/10/2025
Cumplimiento	61-44-101061224	2	Según acta de inicio	27/10/2025
Responsabilidad civil	61-40-101022183	2	Según acta de inicio	27/10/2025

4.2 Seguimiento de garantías y seguros del Contrato de Interventoría

De conformidad con lo establecido en el Contrato de Interventoría suscrito entre la Entidad Contratante y Geovial Ingeniería Zomac S.A.S, en la cláusula decima se definieron las características que deben cumplir

las garantías expedidas por el contratista. Dichas garantías se describen a continuación y se incluyen como anexo al presente informe.

Tabla 9. Póliza de cumplimiento contrato de interventoría, condiciones iniciales.

CONTROL DE GARANTÍAS Póliza de cumplimiento - Anexo 0				
Amparo	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento general del contrato	$ 16,820,980.00	CHU-100057685	25/09/2025	30/06/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal.	$ 8,410,490.00	CHU-100057685	25/09/2025	31/12/2028
Calidad del servicio	$ 16,820,980.00	CHU-100057685	31/12/2025	31/12/2030

Tabla 10. Póliza de cumplimiento contrato de interventoría, condiciones actualizadas.

CONTROL DE GARANTÍAS Póliza de cumplimiento - Anexo 2				
Amparo	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento general del contrato	$ 16,820,980.00	CHU-100057685	9/10/2025	14/07/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal.	$ 8,410,490.00	CHU-100057685	9/10/2025	14/01/2029
Calidad del servicio	$ 16,820,980.00	CHU-100057685	14/01/2026	14/01/2031

INGENIERIA ZOMAC S.A.S

5 VERIFICACIÓN DE PERSONAL MÍNIMO CONTRACTUAL

5.1 Verificación de personal mínimo contractual del Contratista de obra

De acuerdo con los documentos del proyecto el Contratista de obra deberá contar con el personal profesional mínimo y operacional requerido para el cumplimiento del objeto del contrato.

Tabla 11. Personal mínimo requerido del Contratista de obra.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN MES (%)
Director de obra	1	50%
Residente de obra	1	100%
Especialista en estructuras	1	20%
Ingeniero electricista	1	25%
Profesional SISO	1	50%
Especialista ambiental	1	20%

El contratista de obra presentó el equipo de trabajo que hará parte del proyecto durante la ejecución del proyecto en cumplimiento con el personal mínimo requerido en los documentos del proyecto.

Tabla 12. Personal del Contrato de Obra.

CARGO	NOMBRE
Director de obra	German Alonso Lozada Lozada
Residente de obra	Diego Alexander Ijaji Figueroa
Especialista en estructuras	German Alonso Lozada Lozada
Ingeniero electricista	Jorge Alonso Romero Giraldo
Profesional SISO	Oriana Andrea Murillo Cotamo
Especialista ambiental	German Alonso Lozada Lozada

El contratista de obra ha realizado el pago de seguridad social del personal anteriormente mencionado, la verificación se realizó para la elaboración del presente informe. Al final de este informe se anexa las planillas de seguridad social donde se vincula el personal de obra y personal mínimo requerido propuesto por el contratista en el contrato.

5.2 Verificación de pago de seguridad social y aportes legales

Durante el periodo de ejecución, el contratista de obra contó con el siguiente personal operativo y de apoyo además del personal administrativo del proyecto.

Tabla 13. Personal de apoyo y operativo.

Nombre	Cédula	Cargo	Planilla No.
German Alonso Lozada Lozada	12.134.265	Director	9496087696
Diego Alexander Ijaji Figueroa	1.061.792.456	Residente de Obra	
Jorge Alonso Romero Giraldo	10.251.613	Especialista Eléctrico	
German Alonso Lozada Lozada	12.134.265	Especialista Estructural	
Oriana Andrea Murillo Cotamo	1.117.543.616	Profesional Siso	
German Alonso Lozada Lozada	12.134.265	Especialista Ambiental	
José Elías Rincón Flórez	17.324.685	Maestro	9496295522
Mario Ernesto Alvira Oviedo	1.119.586.124	Oficial	9496295522
Wilson Javier Alvis Alape	96.362.521	Técnico electricista	
Miller Hernán Aguilar Rodríguez	93.342.731	Paletero	
Nicacio Alvira Oviedo	1.119.581.906	Ayudante	

5.3 Verificación de personal mínimo contractual del Contratista de interventoría

De acuerdo con los documentos del proyecto el interventor deberá contar con el equipo que se relaciona a continuación.

Tabla 14. Personal mínimo requerido de interventoría.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN MES(%)
Personal de supervisión		
Director de Interventoría	1	50%
Residente de Interventoría	1	100%
Profesional SISO	1	100%
Ingeniero eléctrico	1	50%
Especialista en estructuras	1	50%

La Interventoría presentó el equipo de trabajo que hará parte del proyecto durante el periodo de ejecución en cumplimiento con el personal mínimo requerido en los documentos del proyecto.

Tabla 15. Personal de Interventoría.

CARGO	DEDICACIÓN	NOMBRE	PROFESIÓN
Director de Interventoría	50%	Jhonattan Hoyos Márquez	Ingeniero Civil – Especialista en Estructuras
Residente de Interventoría	100%	Mayerly Molina Zambrano	Ingeniera Civil

CARGO	DEDICACIÓN	NOMBRE	PROFESIÓN
Profesional SISO	100%	Jennifer Salazar	Administradora en Seguridad y Salud en el Trabajo
Ingeniero eléctrico	50%	Yoylan Torres	Ingeniero Eléctrico
Especialista en estructuras	50%	Jhonattan Hoyos Márquez	Ingeniero Civil – Especialista en Estructuras

5.4 Verificación de pago de seguridad social y aportes legales

Durante el periodo de ejecución, el contratista de interventoría contó con el siguiente personal operativo y de apoyo además del personal administrativo del proyecto.

Nombre	Cédula	Cargo	Planilla No.
Jhonattan Hoyos Márquez	1.018.439.570	Director de Interventoría	9497213121
Mayerly Molina Zambrano	1.053.825.751	Residente de Interventoría	9497213121
Jennifer Salazar	1.126.422.347	Profesional SISO	9497213121
Yoylan Torres	74.242.089	Ingeniero eléctrico	9497213121
Jhonattan Hoyos Márquez	1.018.439.570	Especialista en estructuras	9497213121

6 ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

6.1 Descripción de actividades ejecutadas en el mes

Durante desarrollo del proyecto se han ejecutado las siguientes actividades de obra:

REALIZAR OBRAS PRELIMINARES

- Cerramiento en tela verde

REALIZAR DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE

- Desmonte de cielo raso existente

INSTALAR PISOS Y ENCHAPES

- Mantenimiento de piso en tableta tipo Alpha


INSTALAR CIELO RASO Y DIVISIONES EN DRYWALL

- Cielo raso plano en drywall según diseño. Incluye estructura, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación
- Muro liviano en superboard e= 8mm 2 caras (incluye estructura y todo lo necesario para su correcta instalación)

OBRAS ELÉCTRICAS

- Suministro e instalación de salida tomacorriente monofásico 120 V en tubería PVC SCH 40 y cable de cobre aislado HFFRLS No. 12
- Suministro e instalación de salida para iluminación en tubería PVC Sch 40 y cable de cobre aislado HFFRLS No. 12.
- Suministro e instalación de Salida tomacorriente regulado 120 V

Figura 3. Planta arquitectónica primer nivel edificio Gobernación.

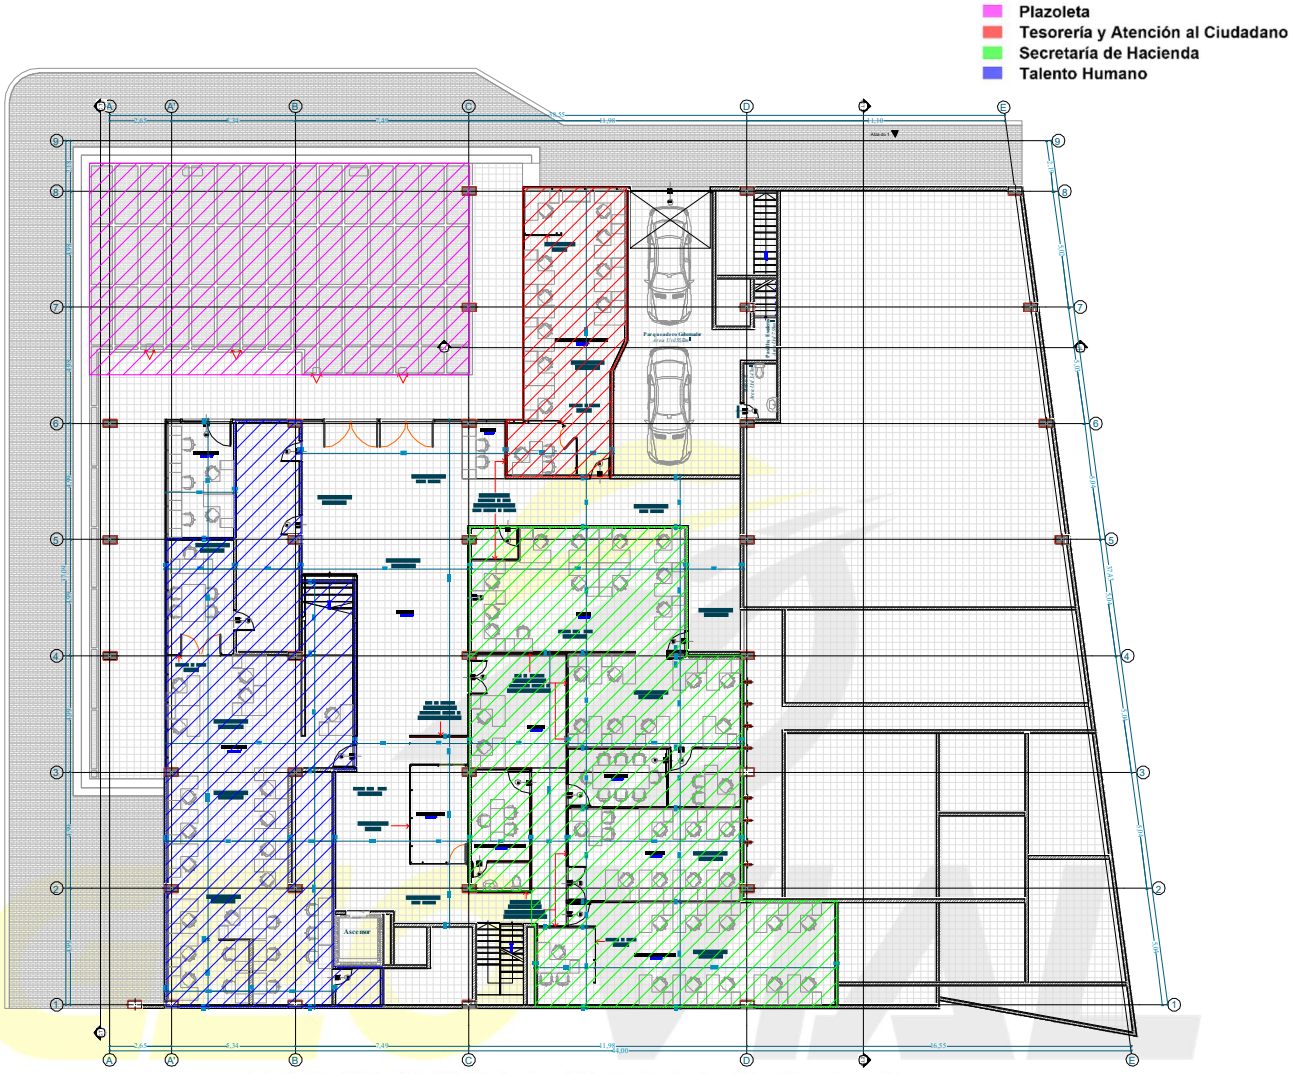

A continuación, se presenta el avance del contratista de obra en el periodo comprendido entre el **9 de noviembre de 2025 y el 8 de diciembre de 2025.**

6.1.1 Cerramiento en tela verde

El contratista realizó el cerramiento provisional en tela verde en las áreas destinadas para la intervención del proyecto, conforme a la localización y especificaciones previamente definidos en los documentos del proyecto, en la Plazoleta y en algunas zonas del primer piso del edificio. Asimismo, se implementaron

accesos controlados y se dispuso la señalización preventiva correspondiente hacia el exterior del cerramiento.

La actividad se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas contractuales y a los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo, garantizando la adecuada delimitación del área intervenida y la mitigación de riesgos para las personas que circulan por el sector.

6.1.2 Desmonte de cielo raso existente

Durante el periodo de ejecución se realizó el desmonte de cielo raso existente en las áreas designadas del primer piso del edificio central de la Gobernación, se ejecutó la labor en el pasillo de acceso al edificio de la Gobernación.

La actividad se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas contractuales y a los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo.

6.1.3 Mantenimiento de piso en tableta piso Alpha

Durante el período de ejecución, el contratista realizó las actividades correspondientes al mantenimiento del piso en tableta tipo Alpha de acuerdo con las áreas definidas en los documentos del proyecto.

Se realizó la intervención en las áreas destinadas a Tesorería y atención al ciudadano y en las oficinas de la Secretaría de hacienda. Las actividades ejecutadas se desarrollaron conforme a las especificaciones técnicas del contrato y bajo condiciones adecuadas de seguridad y orden en el área intervenida.

6.1.4 .Cielo raso plano en drywall según diseño. Incluye estructura, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación

El contratista de obra realizó la instalación de la estructura del cielo raso plano en drywall según el diseño y de acuerdo a los lineamientos de los documentos del proyecto, la actividad se desarrolló en las áreas de Tesorería y atención al ciudadano, Talento humano y en las oficinas que hacen parte de la Secretaría de hacienda.

6.1.5 Muro liviano en superboard e= 8mm 2 caras (incluye estructura y todo lo necesario para su correcta instalación)

El contratista de obra ejecutó la actividad correspondiente a la construcción de muro liviano en Superboard de 8 mm de espesor a dos caras, en las áreas definidas dentro del alcance contractual. En particular en las

áreas correspondientes a Tesorería y Atención al Ciudadano y en las oficinas que hacen parte de la Secretaría de hacienda.

La actividad fue desarrollada conforme a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos del proyecto y en cumplimiento de los lineamientos aplicables, garantizando la adecuada ejecución de la actividad.

6.1.6 Suministro e instalación de salida tomacorriente monofásico 120 V en tubería PVC SCH 40 y cable de cobre aislado HFFRLS No. 12

Durante el periodo de ejecución se realizó la correcta instalación de salidas para tomacorrientes monofásicos de 120 V conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y en los puntos definidos en los planos del proyecto, se continuó con las labres de instalación en las áreas de donde se propone quedar las oficinas de la Secretaría de Hacienda y el área de Talento Humano.

Los trabajos fueron realizados bajo condiciones de seguridad y orden en el área intervenida, cumpliendo con los lineamientos aplicables en materia de instalaciones eléctricas.

6.1.7 Suministro e instalación de salida para iluminación en tubería PVC Sch 40 y cable de cobre aislado HFFRLS No. 12.

Se suministro e instaló correctamente las salidas para iluminación la actividad se desarrolló en el primer piso del edificio Central de La Gobernación, en las áreas de donde se propone quedar las oficinas de la Secretaría de Hacienda y el área de talento Humano, siguiendo las especificaciones del reglamento técnico de instalaciones eléctricas. Los trabajos fueron realizados bajo condiciones de seguridad y orden en el área intervenida, cumpliendo con los lineamientos aplicables en materia de instalaciones eléctricas.

6.1.8 Suministro e instalación de Salida tomacorriente regulado 120 V

Durante el periodo de ejecución se realizó la correcta instalación de salidas para tomacorrientes regulados conforme a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos del proyecto y en los puntos definidos en los planos eléctricos, se continuó con las labres de instalación en las áreas destinadas para el funcionamiento de la Secretaría de Hacienda y las oficinas de Talento Humano.

Los trabajos fueron realizados bajo condiciones de seguridad y orden en el área intervenida, cumpliendo con los lineamientos aplicables en materia de instalaciones eléctricas.

6.2 Resumen de cantidades ejecutadas.

Tabla 16. Resumen de cantidades ejecutadas en el periodo.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.
1	**REALIZAR OBRAS PRELIMINARES**		
1.2	Cerramiento en tela verde	ML	59.90
2	**REALIZAR DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE**		
2.4	Desmonte de cielo raso existente	M^2	16.50
5	**INSTALAR PISOS Y ENCHAPES**		
5.3	Mantenimiento de piso en tableta tipo Alpha.	M^2	350.00
7	**INSTALAR CIELO RASO Y DIVISIONES EN DRYWALL**		
7.1	Cielorraso plano en drywall según diseño. Incluye estructura, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación.	M^2	28.13
7.3	Muro liviano en superboard e=8mm 2 caras (incluye estructura y todo lo necesario para su correcta instalación)	M^2	20.00
10	**OBRAS ELÉCTRICAS**		
10.7	Suministro e instalación de salida tomacorriente monofásico 120 V en tubería PVC Sch 40 y cable de cobre aislado HFFRLS No 12	UND	32.00
10.8	Suministro e instalación de salida para iluminación en tubería PVC Sch40 y cable de cobre aislado HFFRLS No. 12.	UND	170.00
10.18	Suministro e instalación de Salida tomacorriente regulado 120 V.	UND	22.00

Tabla 17. Resumen de cantidades ejecutadas a la fecha de corte del presente informe.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.
1	**REALIZAR OBRAS PRELIMINARES**		
1.1	Localización y replanteo	M^2	498.58
1.2	Cerramiento en tela verde	ML	59.59
2	**REALIZAR DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE**		
2.1	Desmonte de marcos y puertas.	UND	13.00
2.2	Desmonte de aparatos sanitarios con recuperación	UND	1.00
2.3	Demolición de muro mampostería E=0,15m .	M^2	2.81
2.4	Desmonte de cielo raso existente	M^2	515.08
2.5	Demolición de baldosa cerámica	M^2	5.43
2.9	Demolición de muro en drywall y/o superboard.	M^2	19.65
2.10	Retiro de material cargue y descargue fuera de las instalaciones, incluye transporte a escombrera	M^3	12.00
2.11	Desmonte de divisiones en aluminio y vidrio	M^2	21.93
5	**INSTALAR PISOS Y ENCHAPES**		
5.3	Mantenimiento de piso en tableta tipo Alpha	M^2	350.00
7	**INSTALAR CIELO RASO Y DIVISIONES EN DRYWALL**		
7.1	Cielorraso plano en drywall según diseño. Incluye estructura, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalación.	M^2	128.13
7.3	Muro liviano en superboard e=8mm 2 caras (incluye estructura y todo lo necesario para su correcta instalación)	M^2	42.75
10	**OBRAS ELÉCTRICAS**		
10.7	Suministro e instalación de salida tomacorriente monofásico 120 V en tubería PVC Sch 40 y cable de cobre aislado HFFRLS No 12	UND	57.00
10.8	Suministro e instalación de salida para iluminación en tubería PVC Sch40 y cable de cobre aislado HFFRLS No. 12.	UND	265.00
10.13	Desmonte de aparatos de salidas electrias	UND	190.00
10.18	Suministro e instalación de Salida tomacorriente regulado 120 V.	UND	47.00


6.3 Informe de avance físico de la obra

A continuación, se muestra el avance físico de la obra durante el período de ejecución, el cual incluye el análisis comparativo entre el avance programado y el avance ejecutado, identificando variaciones, posibles retrasos o adelantos. Lo anterior se realizó a partir del seguimiento y control del cronograma aprobado del proyecto, el cual se incluye como documento anexo al presente informe.

Tabla 18. Tabla de programación

Fecha de Inicio	9 de octubre de 2025
Fecha Final de corte (según el presente informe)	8 de diciembre de 2025
% Avance de obra programado	48.18 %
% Avance de obra ejecutado	6.18 %
% Avance durante el periodo	3.43 %

Figura 4. Curva S - Contrato de obra

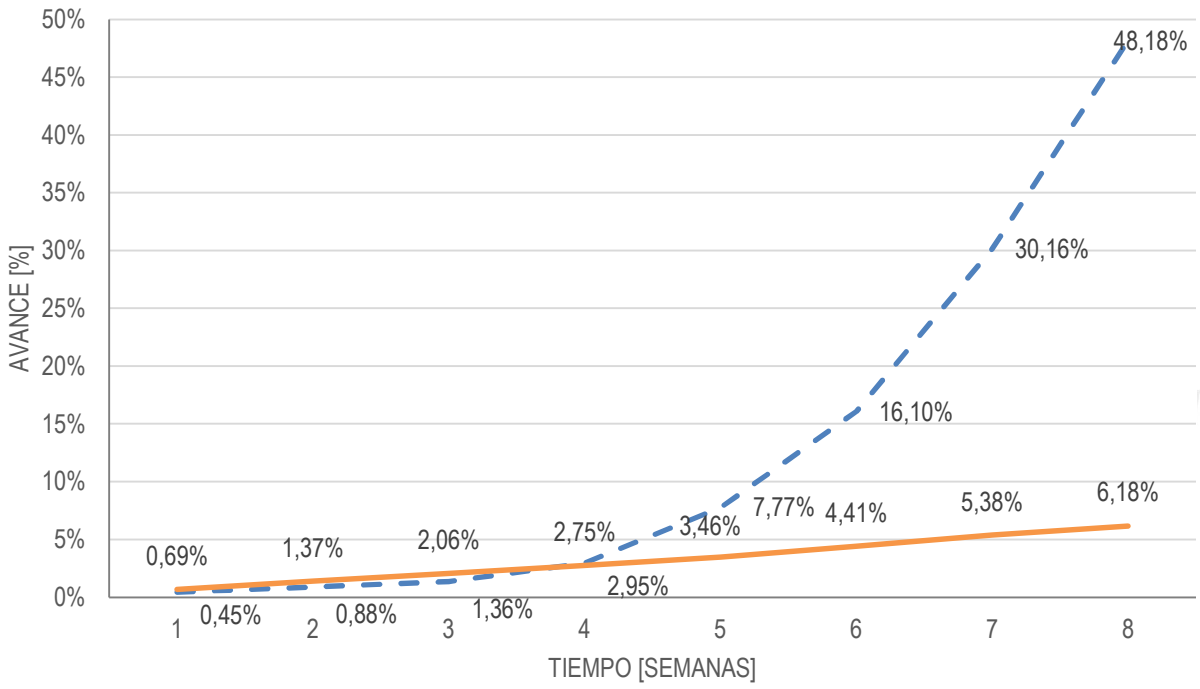

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que a la fecha de corte del 8 de diciembre de 2025 el avance físico ejecutado alcanza el 6,18%, frente a un 48,18% programado, lo que representa un desfase significativo

respecto a la línea base del proyecto. Durante el periodo evaluado se registró un avance del 3,43%, rendimiento que resulta insuficiente para cumplir con la meta programada para el periodo.

Esta situación obedece, entre otros factores, a demoras en el suministro de materiales, a procesos preliminares que han demandado más tiempo del previsto y a que el tiempo definido para la ejecución resulta insuficiente con el alcance real de las actividades programadas.

En consecuencia, se considera necesario solicitar la reprogramación del cronograma, priorizar las actividades críticas y fortalecer los frentes de trabajo mediante el incremento de personal y recursos, con el propósito de mitigar el atraso acumulado y encaminar el proyecto hacia el cumplimiento de las metas contractuales establecidas.

7 INFORMACIÓN FINANCIERA

7.1 Informe de avance financiero de la obra

Tabla 19. Avance financiero

Descripción	Valor	Valor	Porcentaje
Valor del contrato	$ 2,401,062,171.00		100%
Anticipo		$ 960,424,868.00	40%

7.2 Información de manejo del anticipo

En el contrato de obra No. 202500000874, en la cláusula octava **Forma de Pago** se estipula lo siguiente:

"El sistema de pago es a través de precios unitarios El Departamento del Caquetá, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución, pagará al Contratista el valor del contrato, de la siguiente manera:

(i) UN ANTICIPO hasta del cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, previa presentación y aprobación de las garantías correspondientes, constitución de una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable, para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, conforme a lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, presentación de un plan de inversión del anticipo, el cual deberá ser aprobado por el interventor y supervisor designado por la entidad.

El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista.

La amortización del anticipo se realizará mediante deducciones del 40% del valor de cada acta parcial de pago, hasta completar el 100% de la suma recibida a título de anticipo. De igual manera el valor restante del contrato se pagará mediante actas parciales de avance de obra, hasta completar el monto del noventa por ciento (90%) del valor total del contrato previa amortización del porcentaje que se entrega a título de anticipo, presentación de informe de actividades en medio físico y magnético, con registros fotográficos y certificación de cumplimiento expedida por el interventor externo del contrato; lo anterior sin perjuicio de la facultad que tiene el interventor o el supervisor de solicitar informes cuando lo considere necesario."

El anticipo fue desembolsado a la cuenta del contratista el 19 de noviembre de 2025. El valor del anticipo es del cuarenta por ciento (40%) correspondiente a novecientos sesenta millones cuatrocientos veinticuatro mil ochocientos sesenta y ocho pesos ($ 960,424,848.00) M/CTE para lo cual se presentó el siguiente plan de inversión del anticipo.

Tabla 20. Plan de inversión del anticipo del contrato de obra.

No.	Descripción	Valor	Porcentaje
1	Compra de materiales	$ 620,318,651.00	64.59%
2	Mano de obra	$ 282,480,725.00	29.41%
3	Transporte o alquiler de maquinaria y equipo	$ 57,625,492.00	6.00%
	TOTAL	$ 960,424,868.00	100%

8 INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA

8.1 Problemas presentados y mecanismos de solución propuestos

- Se evidenció una cantidad reducida de personal ejecutando las actividades del proyecto, situación que limita el avance físico de las obras y podría generar afectaciones en el cumplimiento del cronograma establecido. Ante esta situación, se recomendó al contratista de obra aumentar el número de frentes de trabajo con el fin de optimizar los rendimientos, evitar atrasos y garantizar el desarrollo oportuno de las actividades programadas, minimizando el riesgo de incumplimientos en los plazos contractuales.
- Durante el seguimiento al avance del proyecto, se evidenció atraso en las actividades correspondientes a la adecuación de algunos espacios. Esta situación se origina principalmente en la imposibilidad de intervenir todas las zonas de manera simultánea, dado que las instalaciones se encuentran en funcionamiento y prestando atención permanente al público. Considerando lo anterior se hace necesario solicitar la reprogramación del cronograma, priorizar las actividades críticas y fortalecer los frentes de trabajo mediante el incremento de personal y recursos, con el propósito de mitigar el atraso acumulado y encaminar el proyecto hacia el cumplimiento de las metas contractuales establecidas.

8.2 Control de calidad

Para garantizar la calidad de las actividades desarrolladas como parte de la Adecuación y mejoramiento de espacios de atención al público en el edificio central de la gobernación se verificó lo siguiente:

8.2.1 Control de acceso de materiales

Durante el periodo de ejecución ser realizaron controles a los materiales tales como revisión de los mismos, solicitud de fichas técnicas, verificación del modo de almacenamiento.

8.2.2 Soporte de los ensayos, pruebas y certificados de calidad de materiales

Durante el periodo de ejecución no se realizó ningún tipo de ensayo ni análisis ya que no se ha requerido y debido a que la mayor parte de las actividades desarrolladas corresponden a la construcción de estructuras en sistema liviano y la ejecución de obras eléctricas.

8.2.3 Control de maquinaria y equipos.

Se realizó el control de equipos utilizados durante la ejecución de actividades incluidas en el presente informe

Tabla 21. Relación de equipo empleado en obra.

Equipo	Cumple
Herramienta menor	Sí
Andamios metálicos por sección	Sí

8.3 Documentos suscritos

8.3.1 Documentación del contrato de obra

Tabla 22. Documentación del contrato de obra.

No.	Referencia	Fecha	Descripción
1	Contrato de obra No. 202500000874	12/09/2025	Contrato suscrito entre la Gobernación del Caquetá y el Consorcio Caquetá 2025.
2	Acta de inicio	9/10/2025	Acta mediante la cual se da inicio a las actividades del contrato de obre No. 202500000874.
3	Acta de pago anticipo	27/10/2025	Acta mediante la cual se autoriza el desembolso del pago del anticipo.

8.3.2 Comités de seguimiento

Tabla 23. Comités de seguimiento del proyecto

No	Referencia	Fecha	Objeto
1	Acta de comité No. 1	21/10/2025	• Realizar seguimiento al avance físico y técnico del proyecto • Verificar el estado de ejecución en las distintas áreas de trabajo • Revisar la documentación requerida • Definir compromisos clave para asegurar el cumplimiento de los plazos, la calidad de la obra y los requisitos administrativos, incluyendo la gestión de permisos, la radicación del anticipo, la actualización de pólizas y la coordinación de próximas actividades operativas y técnicas.
2	Acta de comité No. 2	27/11/2025	• Verificar los compromisos del Acta Anterior • Socializar el avance del proyecto con respecto a la programación • Verificar el estado del trámite de la licencia de construcción • Socializar las actividades no previstas y los motivos que han generado retraso en la ejecución de las obras, para la solicitud de prórroga del contrato de obra • Analizar la solicitud de Adición presupuestal por parte del contratista de obra

8.3.3 Relación de correspondencia

Tabla 24. Relación de correspondencia.

No.	Referencia	Asunto	Fecha	Envía	Recibe
1	CQ25-CO0874-0001-09-10-2025	Radicación afiliaciones personal de obra y personal profesional, para el inicio del contrato de obra.	9/10/2025	Consorcio Caquetá 2025	Gobernación del Caquetá Geovial Ingeniería Zomac SAS
2	GV-CI-00893-001-09-10-2025	Radicación afiliaciones personal, para el inicio de los contratos de obra e interventoría. (Contratos 202500000874 y 202500000893)	9/10/2025	Geovial Ingeniería Zomac SAS	Gobernación del Caquetá
3	GV-CI-00893-001A-20-10-2025	Invitación a primer comité técnico de obra	20/10/2025	Geovial Ingeniería Zomac SAS	Gobernación del Caquetá Consorcio Caquetá 2025
4	CQ25-CO0874-003-27-10-2025	Entrega certificación bancaria fiducia	27/10/2025	Consorcio Caquetá 2025	Gobernación del Caquetá Geovial Ingeniería Zomac SAS
5	GV-CI-00893-002-27-10-2025	Radicación plan de inversión aprobado contrato de obra N° 202500000874	27/10/2025	Geovial Ingeniería Zomac SAS	Gobernación del Caquetá
6	CQ25-CO074-004-05-11-2025	Radicación plan de inversión del anticipo	5/11/2025	Consorcio Caquetá 2025	Gobernación del Caquetá Geovial Ingeniería Zomac SAS
7	GV-CI-00893-003-10-11-2025	Informe ejecutivo de ejecución	10/11/2025	Geovial Ingeniería Zomac SAS	Gobernación del Caquetá
8	3764	Reiteración por Segunda oportunidad de cumplimiento obligaciones contractuales y compromisos adquiridos en comité técnico del 21 de octubre de 2025 del contrato de obra No. 202500000874	11/11/2025	Gobernación del Caquetá	Geovial Ingeniería Zomac SAS

No.	Referencia	Asunto	Fecha	Envía	Recibe
9	CQ25-CO0874-005-11-11-2025	Solicitud de adición presupuestal y prorroga al contrato de obra N° 202500000874	11/11/2025	Consorcio Caquetá 2025	Geovial Ingeniería Zomac SAS
10	GV-CI-00893-004-19-11-2025	Aval solicitud de prórroga en tiempo a los contratos de Obra e Interventoría (202500000874 y 202500000893)	19/11/2025	Geovial Ingeniería Zomac SAS	Gobernación del Caquetá
11	GV-CI-00893-005-25-11-2025	Invitación a segundo comité técnico de obra	25/11/2025	Geovial Ingeniería Zomac SAS	Gobernación del Caquetá Consorcio Caquetá 2025
12	CQ25-CO0874-006-28-11-2025	Solicitud de prorroga No. 1	28/11/2025	Consorcio Caquetá 2025	Gobernación del Caquetá Geovial Ingeniería Zomac SAS
13	CQ25-CO0874-007-02-12-2025	invitación a primera socialización del contrato de obra	2/12/2025	Consorcio Caquetá 2025	Gobernación del Caquetá

9 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Tabla 25. Verificación de cumplimiento de obligaciones

Ítem	Actividad	Cumple
OBLIGACIONES GENERALES		
a	Cumplir el objeto del Contrato, ejecutar y entregar la obra contratada en el plazo estipulado, conforme a los criterios de calidad exigible, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción, con sujeción a los precios unitarios estipulados.	Si
b	Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para evitar poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, durante la ejecución del Contrato.	SI, se adoptan los planes de Tránsito y Manejo Ambiental.
c	Acreditar en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 adicionado mediante el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, la afiliación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y las cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, respecto al personal vinculado a la ejecución de la obra.	Si, se presenta las planillas de pago de seguridad social.
d	Mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas y proveedores y demás servicios requeridos para la ejecución del Contrato.	N/A
e	Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, como por los hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen daño o perjuicio a la entidad o a un tercero, de conformidad con la Ley 80 de 1993.	N/A
f	Indemnizar y asumir todo daño que cause a terceros o al personal contratado para la ejecución del Contrato.	N/A
g	Asumir el pago de los costos y gastos directos e indirectos que se causen o llegasen a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del Contrato.	N/A
h	Notificar a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	N/A
i	Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, conforme a los requisitos pactados en el Contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.	Si, se presenta las garantías con las características establecidas en el contrato de obra.
j	Presentar los documentos que le solicite el supervisor e Interventor.	Si
k	Asumir los riesgos previsibles de la ejecución del Contrato, y adoptar todas las medidas necesarias para mitigarlos.	N/A
l	Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en su Oferta durante la ejecución del Contrato.	Si
m	Presentar todos los documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio ante el supervisor y el Interventor.	Si
n	Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato y antes de suscribir el acta de iniciación de obra respectiva, el contratista deberá presentar los documentos técnicos que solicite el interventor y supervisor del contrato.	Si
o	Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.	SI, se presenta el cronograma de obra del proyecto.

Ítem	Actividad	Cumple
p	Rendir y elaborar los informes, conceptos y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.	Si
q	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la entidad.	Si
r	Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución contractual, evitando dilaciones y retrasos.	Si
s	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho	N/A
t	Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.	Si
u	Cumplir con los procesos y procedimientos fijados en el Manual de Contratación de la entidad los cuales hacen parte del presente Contrato, sin perjuicio del cumplimiento a las leyes que rigen la materia.	Si
v	Informar oportunamente a la interventoría, supervisión y a la entidad sobre cualquier situación que pueda presentarse en la ejecución del contrato.	Si
w	Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.	SI, se presenta el cronograma de obra del proyecto.
x	Rendir y elaborar los informes, conceptos y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.	Si
y	Acatar las instrucciones y recomendaciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del DEPARTAMENTO, la INTERVENTORÍA.	Si
z	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y retrasos.	Si
aa	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.	N/a
bb	Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.	Si
cc	El contratista deberá contar con los documentos necesarios que acrediten la procedencia lícita de minerales, y deberá dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente con relación a las actividades a ejecutar en el presente contrato.	N/a
dd	Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos convenidos y de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato.	N/a
ee	Constituir y mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.	Si, se presenta las garantías vigentes con las características establecidas en el contrato de obra.
ff	Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado garantizando los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. En este orden de ideas, será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal del CONTRATISTA con EL DEPARTAMENTO.	Si

Ítem	Actividad	Cumple
gg	Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros, operarios, profesionales y todo el personal de intervienen en cada una de las obras a ejecutar, b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes y d) Todo el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por escarapela o por uniformes.	Si
hh	Es responsabilidad del contratista ubicar una valla por la obra, con las siguientes características: Dimensiones: Vallas rectangulares de dos (2) metros de ancho por uno metro de altura. Texto: Elaboración del texto en tipografía familia formato, color negro. Contenido: Deberá contener como mínimo el escudo del Departamento del Caquetá, el eslogan del gobierno "OBRAS Y NO PROMESAS", nombre del proyecto, lugar, población beneficiada, tipo de proyecto, contratista, presupuesto vigencia, valor proyecto, interventor y fecha de inicio y terminación del proyecto. Instalación de la valla: Se instalará en sitio visible previamente determinados por el interventor. El contratista instalará la valla en un plazo no mayor de veinte (20) días calendario contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación de la obra.	Si
ii	EL CONTRATISTA, su cónyuge, compañero o compañera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas, deberá abstenerse de celebrar contratos de interventoría con EL DEPARTAMENTO, durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del presente contrato.	Si
jj	Cumplir con los procesos y procedimientos fijados en el Manual de Interventoría de EL DEPARTAMENTO, los cuales hacen parte del presente Contrato, sin perjuicio del cumplimiento a las leyes que rigen la materia.	Si
kk	Informar oportunamente a la interventoría y al DEPARTAMENTO sobre cualquier situación que pueda presentarse en la ejecución del contrato de obra.	Si
Respecto a la obra		
a	Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigible, el anexo técnico las especificaciones de construcción que hacen parte del objeto contractual, con sujeción al presupuesto contratado y dentro del plazo establecido.	Si
b	Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.	SI, se adoptan los planes de Tránsito y Manejo Ambiental.
c	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.	N/a
d	EL CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.	Si
e	EL CONTRATISTA de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas.	N/a

Ítem	Actividad	Cumple
f	Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten adicionales son responsabilidad de EL CONTRATISTA.	SI, se tramito el permiso de El permiso de Obra Menor.
g	El contratista suministrará junto con cada equipo, una copia de todos aquellos detalles constructivos principales incluyendo también un diagrama unifilar de las redes construidas.	Si
Respecto del personal requerido para la ejecución del objeto contractual		
a	Suministrar y mantener, durante la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido en los estudios previos y pliegos de condiciones definitivos para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigidas en el proceso de selección del cual se derivó el presente contrato y ofrecidos.	Si
b	En todo caso, EL CONTRATISTA deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo o la dedicación requerida en otros contratos en ejecución con EL DEPARTAMENTO o con terceros. Además de lo anterior, deberá contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.	Si
c	El Director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.	Si
d	El CONTRATISTA, se obliga durante el desarrollo de la Obra a mantener al frente de la obra al Director de obra, al Ingeniero Residente, Ingenieros y demás personal de especialistas aprobados por EL DEPARTAMENTO. El Ingeniero Residente deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.	Si
e	Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un setenta por ciento (70%) del personal no calificado, a individuos de la región de influencia de la misma.	SI, el 100% del personal no calificado corresponde a personas de la región.
f	Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo un cinco por ciento (5%) del personal no calificado, a individuos que se hayan acogido al programa de desmovilización y reinserción impulsado por el Gobierno Nacional o a individuos en condición de desplazamiento.	No
g	Mantener al frente de las obras al profesional idóneo, quien será el director de proyecto y representante de EL CONTRATISTA para decidir, con el interventor, sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución de la obra.	Si
h	Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en las reglas de participación, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo requerido.	N/a
i	Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de	Si

Ítem	Actividad	Cumple
	los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y EL DEPARTAMENTO.	
j	Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra EL DEPARTAMENTO, por causa o con ocasión del contrato.	N/A
Respecto de los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construcción.		
a	Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios para la adecuada ejecución del contrato.	Si
b	Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos ofrecidos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra.	Si
c	Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.	Si
d	Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.	Si
e	Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: A) Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra. B) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. C) Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual.	Si
OBLIGACIONES ESPECIFICAS		
a	Realizar los trabajos en las condiciones contratadas	Si
b	Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción y protección de las obras contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Asimismo, deberá tomar las debidas precauciones a fin de conservar el estado de los inmuebles aledaños, las estructuras e Instalaciones y redes de servicio superficiales y subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o Instalaciones	Si
c	Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el Interventor, relacionadas con el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la imposición de medidas que este considere necesaria para garantizar la buena calidad y correcta ejecución de las obras	Si
d	Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan con todas las licencias y permisos exigidos según la normatividad vigente, para lo cual el Contratista entregará la entidad, antes de la suscripción del acta de inicio, copia de ellos, si aplica. Esta documentación deberá ser actualizada cuando lo requiera la Secretaría de Planeación o el Interventor	Si
e	Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el desarrollo del Contrato	Si
f	Resolver dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo, los requerimientos relacionados con la ejecución del Contrato que le formule el Interventor, la entidad o la comunidad	Si

Ítem	Actividad	Cumple
g	Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los análisis de laboratorio antes de iniciar las obras y en el transcurso de ejecución de las mismas	N/A
h	Adelantar todas las gestiones ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por la entidad, tales como cruce o cierre temporal de vías, accesos, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones o cualquier intervención del espacio público, entre otros.	Si, se realizó el trámite del Permiso de Obra Menor ante la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de la Alcaldía de Florencia
i	Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.	Si
j	Mantener tanto al personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención donde se ejecute la obra.	Si
k	Ejecutar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la garantía de estabilidad de la obra.	N/A
l	Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor o la entidad, toda obra ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad exigidas.	N/A
m	Ubicar la señalización preventiva necesaria para la circulación en condiciones de seguridad de los personales de obra, vecinos y terceros.	Si
n	Cuando para la ejecución del contrato, se requieran labores o desplazamientos a 1.5 metros o más sobre el nivel inferior, el contratista deberá cumplir con lo señalado en el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas.	Si
o	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.	N/A
p	EL CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.	Si
q	EL CONTRATISTA será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas.	Si
r	Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten adicionales son responsabilidad de EL CONTRATISTA.	Si, se realizó el trámite del Permiso de Obra Menor ante la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de la Alcaldía de Florencia
s	Realizar ajuste a los diseños, si diere lugar a ello, por algún evento que la obra presente afectación por inestabilidad o necesidad para garantizar su uso o cambio de normas.	N/A
t	Suministrar y mantener, durante la obra, conforme a los porcentajes de dedicación el personal ofrecido y requerido para el proyecto.	Si
u	En todo caso, EL CONTRATISTA deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más	Si

Ítem	Actividad	Cumple
	del 100% de su tiempo o la dedicación requerida en otros contratos en ejecución con la entidad o con terceros.	
v	El Director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.	Si
w	El CONTRATISTA, se obliga durante el desarrollo de la Obra a mantener al frente de la obra al Director de obra, al Ingeniero Residente, Ingenieros y demás personal de especialistas aprobados por la entidad. El Ingeniero Residente deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.	Si
x	Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un ochenta por ciento (80%) del personal no calificado, a individuos de la región de influencia de la misma.	Si, el 100% del personal no calificado corresponde a personas de la región.
y	EL CONTRATISTA deberá presentar al interventor del contrato, con cinco (5) días de antelación al inicio de la etapa donde desarrollará las actividades que le correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato en los términos en que fue viabilizado el proyecto.	Si
z	Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en las reglas de participación, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo requerido.	N/A
aa	Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y la entidad.	Si
bb	Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la obra y garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones frente a estos Sistemas.	Si
cc	Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra la entidad, por causa o con ocasión del contrato.	N/A
dd	Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del contrato, utilizando para ello los frentes de trabajo que sean necesarios de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1682 de 2013.	Si
ee	Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. Deberá tener la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la segura	Si

Ítem	Actividad	Cumple
	circulación de los personales de obra, vecinos y terceros. De igual forma, deberá realizar el mantenimiento del cerramiento, durante toda la ejecución de la obra.	
ff	Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar a la interventoría los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades: A) Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación. B) Ajustar o reajustarse, según sea necesario. C) Identificarse para poder determinar el estado de calibración. D) Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento.	N/A
gg	Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, tales como: cruce de vías, cierre temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio público.	N/A
hh	El contratista deberá entregar a la entidad, copia de las licencias y permisos requeridos para la ejecución de las obras.	Si, se presenta copia del Permiso de Obra Menor.
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS		
a	Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por la entidad, el interventor o de los organismos de control.	Si
b	Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría integral y deberá contener: A) Avance de cada una de las actividades programadas. B) Registros fotográficos. C) Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. D) Fotocopia de la bitácora de obra. E) Resumen de las actividades realizadas. F) Relación del personal empleado en la ejecución de las obras. G) Actualización del programa de ejecución del contrato. H) Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.	Si, se presenta el informe mensual de ejecución con los requisitos establecidos
c	Participar mensualmente en las reuniones de seguimiento con la asistencia del director del proyecto, el Ingeniero residente de la obra, el director de la Interventoría, y el Supervisor del contrato de interventoría, sin perjuicio de que participen otros empleados de las diferentes áreas. De cada una de estas reuniones se levantará un acta, la cual será mantenida en custodia por la Rectoría.	Si, se incluye copia de las actas de comité realizadas durante el periodo de ejecución.
d	Evaluar, juntamente con el interventor, semanalmente la ejecución del contrato, revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantará un acta, suscrita por los ingenieros residentes del contratista y de la Interventoría, donde se consignará el estado real de los trabajos; en caso de presentarse algún atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en una modificación al programa de obra que no podrá contemplar la disminución de las cantidades de obra programadas para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente establecido.	Si

Ítem	Actividad	Cumple
e	Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y deberá contener: A) Resumen de actividades y desarrollo del contrato. B) Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra. Planos récord de obra, aprobados por la interventoría. C) Actualización de la Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran. D) Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. E) Actualización final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participación. F) Registro fotográficos definitivos.	N/A
f	Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, en él se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relación del equipo de trabajo avance de la obra, accidentes de trabajo, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de la entidad.	Si, se está llevando la bitácora de obra de acuerdo con el requisito exigido.
g	Realizar el registro fotográfico del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.	Si
h	Solicitar y justificar con la debida antelación a la interventoría cualquier necesidad de adición de recursos, prórrogas, mayores cantidades de obra o inclusión de ítems no previstos, cuando estos resulten indispensables para la adecuada terminación de la obra. Estas solicitudes deberán ser sustentadas técnica, financiera y jurídicamente, y no darán lugar a modificación contractual alguna mientras no cuenten con la aprobación expresa por parte de la entidad contratante.	N/A
i	Deberá contar con una oficina central en la ciudad de Florencia Departamento del Caquetá, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.	Si
OBLIGACIONES FINANCIERAS		
a	Verificar junto con el Interventor el programa de flujo de fondos del Contrato, lo cual deberá constar en acta.	Si
b	Ejecutar el contrato de conformidad con el valor definido para cada actividad en el proyecto aprobado.	Si
c	Reportar de forma oportuna a la entidad contratante cualquier variación o desbalance en el flujo de recursos que pueda comprometer el normal desarrollo de la obra.	N/A
d	Realizar la legalización del anticipo recibido (si aplica) dentro de los plazos establecidos, mediante la presentación de los documentos contables y financieros que soporten su correcta inversión, conforme a las actividades ejecutadas.	N/A
e	Cumplir con las obligaciones tributarias, parafiscales y de seguridad social derivadas de la ejecución del contrato, y allegar a la entidad los soportes de pago correspondientes, cuando así se requiera.	Si, se presenta las planillas de pago de seguridad social.
f	Abstenerse de efectuar modificaciones presupuestales internas o reasignaciones de recursos entre actividades sin autorización previa y por escrito de la entidad contratante.	Si
g	Conservar y custodiar los documentos contables y financieros relacionados con el contrato por el término legal, poniéndolos a disposición de la entidad contratante o de los entes de control cuando sean requeridos.	Si

10 SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

10.1 Desarrollo e implementación de la gestión ambiental

10.1.1 Conformación del grupo de gestión social y ambiental

El contratista ha realizado la entrega del Plan de Manejo Ambiental, el cual se ciñe y adapta a la ejecución del presente proyecto. Se elaboró bajo la lógica de optimizar, cuidar y racionalizar el uso de los recursos naturales y físicos afectados por el proyecto, desarrollando las medidas necesarias para prevenir, mitigar, controlar y/o compensar los impactos negativos que pueda ocasionar el proyecto durante su ejecución. Definir las acciones a seguir para asegurar la ejecución y cumplimiento de los programas propuestos en el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, tendientes a controlar los impactos generados por el proyecto.

10.1.2 Capacitación y concienciación del personal en obra

Se verificó la ejecución de capacitaciones orientadas a la divulgación del Plan de Manejo Ambiental, protección y cuidado de la flora y fauna de la región, manejo adecuado de materiales y escombros, gestión integral de residuos sólidos, uso correcto de los elementos de protección personal y prevención de accidentes y enfermedades laborales. Lo anterior se comprobó mediante la revisión de los registros de asistencia y evidencias fotográficas, verificando el cumplimiento de las metas establecidas en el subprograma. De acuerdo con el seguimiento efectuado, se evidenció coherencia entre las actividades ejecutadas y las obligaciones correspondientes al periodo evaluado. Se recomienda mantener la periodicidad de las jornadas de capacitación y reforzar la cultura de prevención y control ambiental de todos los involucrados en la obra.

10.2 Programa de actividades constructivas

10.2.1 Señalización de frentes de obra

Se realizó seguimiento al subprograma de señalización de frentes de obra, verificando la adecuada instalación y mantenimiento de la señalización y de aislamiento en las áreas intervenidas durante el periodo evaluado. Se verificó que el contratista implementara el aislamiento y la demarcación de los frentes de trabajo mediante el uso de malla para cerramiento y cintas demarcadoras, garantizando la separación entre las zonas intervenidas y las áreas de circulación peatonal y vehicular. Durante el periodo de ejecución se verificó que los elementos de la señalización permanecieran en condiciones adecuadas de visibilidad, alineación y estabilidad, contribuyendo a la prevención de riesgos laborales y a la mitigación de posibles afectaciones al

entorno. Adicionalmente, se recomendó al contratista mantener el control permanente sobre el estado de la señalización instalada y efectuar la reposición inmediata de los elementos que presenten deterioro o desplazamiento.

10.2.2 Manejo y disposición final de residuos sólidos

Se realizó seguimiento al subprograma de Manejo y disposición final de residuos sólidos, verificando la implementación de las medidas establecidas para la clasificación, almacenamiento temporal y disposición final de los residuos generados en los frentes de trabajo. Se comprobó que el contratista dispusiera recipientes debidamente identificados para la separación en la fuente, diferenciando residuos ordinarios, reciclables y residuos metálicos, conforme a lo definido en el programa ambiental. Así mismo, se evidenció que los residuos ordinarios son entregados al sistema de recolección municipal para su disposición final y que los materiales reciclables y residuos metálicos son entregados para su aprovechamiento, evitando su acumulación en obra. Durante las visitas técnicas se verificó el adecuado almacenamiento temporal, el orden en las zonas de acopio y la no disposición de residuos en sitios no autorizados, observándose coherencia entre las actividades ejecutadas y las obligaciones establecidas en los documentos del contrato.

10.3 Biodiversidad y servicios ecosistémicos

10.3.1 Protección de ecosistemas sensibles

Durante el período de ejecución se realizó el seguimiento a las actividades relacionadas con el subprograma de protección de ecosistemas sensibles mediante la verificación de la implementación de medidas orientadas a la sensibilización y prevención de posibles afectaciones sobre los ecosistemas identificados en el área de influencia del proyecto. Para tal fin se verificó el desarrollo de jornadas de capacitación dirigidas al personal de obra sobre la importancia de la preservación y conservación de los ecosistemas estratégicos y sensibles, así como sobre las buenas prácticas ambientales durante la ejecución de las actividades constructivas. Se revisaron los registros de asistencia y evidencias fotográficas correspondientes, verificando el cumplimiento de las metas establecidas en el programa.

10.3.2 Recuperación de áreas afectadas

Durante el período de ejecución no se aplicó el programa de Recuperación de Áreas Afectadas ya que las actividades de adecuación y mejoramiento de las oficinas y de la plazoleta se encuentran en desarrollo y no se ha realizado la entrega formal de los espacios intervenidos. En consecuencia, las labores de limpieza

final, desmonte de instalaciones temporales y restitución de áreas a condiciones iguales o mejores a las iniciales se verificarán una vez se concluya la totalidad de las actividades constructivas programadas en dichos espacios.

No obstante, se realizó el seguimiento permanente a las condiciones generales de orden y aseo en las áreas intervenidas, verificando la correcta disposición temporal de los residuos generados y el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental establecidas, con el fin de prevenir impactos negativos durante la ejecución del proyecto.

10.4 Programa de gestión social

10.4.1 Información y divulgación

Se realizó el seguimiento al subprograma de Información y Divulgación, verificando la implementación de las acciones orientadas a garantizar que la población del área de influencia directa (A.I.D.) se mantenga informada de manera clara y oportuna sobre las actividades del proyecto.

Durante el periodo evaluado se evidenció cumplimiento frente a las reuniones programadas, observándose coherencia entre las actividades desarrolladas y las metas establecidas en el programa. Se verificó la ejecución de espacios de socialización, en los cuales se presentó la descripción del proyecto, sus actividades, cronograma y medidas de manejo ambiental aplicables. Se realizó el seguimiento a la logística de las reuniones de información y divulgación, verificando la adecuada programación, convocatoria y disponibilidad de los espacios y recursos necesarios para su desarrollo. Durante el periodo de ejecución no se realizaron reuniones con la comunidad.

10.5 Gestión de salud y seguridad en el trabajo.

Durante el periodo de ejecución la gestión del contratista se enfocó principalmente en la charla rutinaria de aspectos relacionados con uso de los implementos de seguridad personal y el manejo de herramientas dentro de los sitios de trabajo, así como la regulación con el orden y el aseo de los sitios de trabajo.

Se verificó la gestión respecto a la afiliación al sistema general de seguridad social de los trabajadores cuyas certificaciones se encuentran anexas en el presente informe.

10.5.1 Afiliaciones y seguimiento de pagos de seguridad social y aportes legales

Se revisó que todo el personal contratado por el contratista de obra contara con la debida vinculación y afiliación laboral al sistema de seguridad social integral (ARL; EPS y AFP) verificándose que se encuentra al día en cuanto a los pagos de seguridad social y aportes legales para el periodo correspondiente al presente informe. Anexo se encuentra los soportes de afiliación y de planillas de pago del personal relacionado.

10.5.2 Exámenes médicos

Durante el período de ejecución, se verificó el cumplimiento de los requisitos relacionados con los exámenes médicos ocupacionales del personal vinculado al contrato de obra. En este sentido, se revisó que el contratista cuenta con los certificados de aptitud laboral vigentes para el personal asignado a las actividades del proyecto, los cuales son expedidos por una entidad competente en salud ocupacional.

El contratista de obra presentó los reportes de los exámenes médicos de salud ocupacional al personal que ingresó y estuvo laborando durante el periodo de ejecución. La documentación fue revisada y se encuentra conforme con lo exigido por la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y se incluye como anexo al presente informe.

10.5.3 Capacitaciones

Durante el periodo de ejecución el contratista de obra realizo las capacitaciones de inducción dirigidas por la SISO acerca de la identificación de peligros, la evaluación y control de riesgos presentes en el frente de trabajo, el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP), los procedimientos seguros de trabajo, el reporte de actos y condiciones inseguras, y las medidas de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Se verifico los formatos de asistencia firmados por el personal con lo que se establece que las actividades realizadas por el contratista de obra se encuentran alienadas con lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST.

10.5.4 Elementos de protección personal

Al inicio de las actividades se verificó la entrega de los elementos de protección personal a cada uno de los trabajadores por parte del contratista de obra, como soporte se entrega los registros de entrega de dotación

y EPP. De igual manera se verifico el correcto uso de los elementos de protección de personal de los trabajadores que participaron en el proyecto durante el periodo de ejecución.

10.5.5 Inspecciones de seguridad

El contratista de obra implementó medidas de prevención y control en los frentes de trabajo, mediante la demarcación de las áreas intervenidas. De igual manera, se evidenció la aplicación de controles para la regulación del flujo peatonal y vehicular en las zonas de influencia del proyecto, y la realización de inspecciones periódicas a los elementos de protección personal (EPP), con el fin de garantizar su correcto uso y estado de conservación.

11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- De acuerdo con el análisis comparativo entre el avance programado y el avance ejecutado, se evidencia que a la fecha de corte del 8 de diciembre de 2025 el avance físico ejecutado alcanza el 6,18%, frente a un 48,18% programado, lo que representa un desfase significativo respecto a la línea base del proyecto. Durante el periodo evaluado se registró un avance del 3,43%, rendimiento que resulta insuficiente para cumplir con la meta programada para el periodo. Esta situación obedece, entre otros factores, a demoras en el suministro de materiales, a procesos preliminares que han demandado más tiempo del previsto y a que el tiempo definido para la ejecución resulta insuficiente con el alcance real de las actividades programadas. Considerando lo anterior se hace necesario solicitar la reprogramación del cronograma, priorizar las actividades críticas y fortalecer los frentes de trabajo mediante el incremento de personal y recursos, con el propósito de mitigar el atraso acumulado y encaminar el proyecto hacia el cumplimiento de las metas contractuales establecidas.
- Se evidenció una cantidad reducida de personal ejecutando las actividades del proyecto, situación que limita el avance físico de las obras y podría generar afectaciones en el cumplimiento del cronograma establecido. Ante esta situación, se recomendó al contratista de obra aumentar el número de frentes de trabajo con el fin de optimizar los rendimientos, evitar atrasos y garantizar el desarrollo oportuno de las actividades programadas, minimizando el riesgo de incumplimientos en los plazos contractuales.
- La documentación soporte de la ejecución del proyecto, incluyendo registros fotográficos, informes de avance y actas de seguimiento, fue revisada y validada por la interventoría, evidenciando trazabilidad y control sobre las actividades ejecutadas.

JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS
CC 17.652.312 de Florencia
RL GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 202500000893 DE 2025

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ".

REGISTRO FOTOGRÁFICO

GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S

30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

CONTRATO 202500000893	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INFORME		
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	30	11	2025
INTERVENTORÍA		D	M	A
CONTRATISTA		SUPERVISOR		
GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S		NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

1	SOCIALIZACIÓN DE INICIO



FOTOGRAFÍA 1.
Socialización de Inicio



FOTOGRAFÍA 2.
Socialización de Inicio



FOTOGRAFÍA 3.
Socialización de Inicio




FOTOGRAFÍA 4.
Socialización de Inicio

CONTRATO 202500000893	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INFORME		
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	30	11	2025
INTERVENTORÍA		D	M	A
CONTRATISTA		SUPERVISOR		
GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S		NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		


1	ACTIVIDADES PRELIMINARES



FOTOGRAFÍA 5.
Cerramiento en tela verde

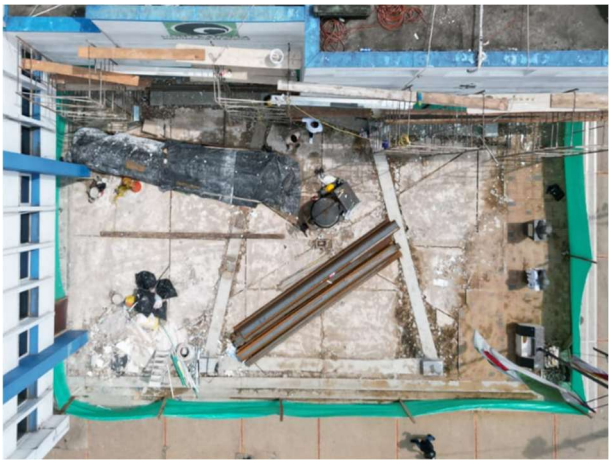

FOTOGRAFÍA 6.
Cerramiento en tela verde

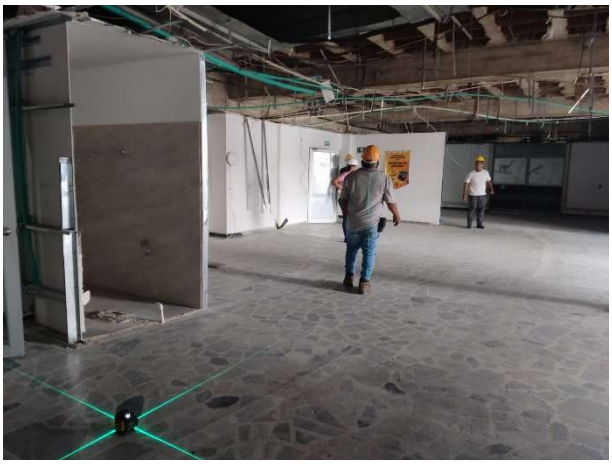

FOTOGRAFÍA 7.
Localización y Replanteo



FOTOGRAFÍA 8.
Localización y replanteo

CONTRATO 202500000893	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INFORME		
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	30	11	2025
INTERVENTORÍA		D	M	A
CONTRATISTA		SUPERVISOR		
GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S		NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

1	REALIZAR OBRAS PRELIMINARES



FOTOGRAFÍA 9.
Limpieza de Fachada



FOTOGRAFÍA 10.
Limpieza de fachada



FOTOGRAFÍA 11.
Desmonte de Puertas



FOTOGRAFÍA 12.
Desmonte de Puertas

CONTRATO 202500000893	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INFORME		
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	30	11	2025
INTERVENTORÍA		D	M	A
CONTRATISTA		SUPERVISOR		
GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S		NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

2	REALIZAR DEMOLICIÓN Y DESMONTE



FOTOGRAFÍA 13.
Desmonte de aparatos sanitarios con recuperación



FOTOGRAFÍA 14.
Desmonte de aparatos sanitarios con recuperación



FOTOGRAFÍA 15.
Demolición de muro mampostería E=0,15m .



FOTOGRAFÍA 16.
Demolición de muro mampostería E=0,15m .

CONTRATO 202500000893	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INFORME		
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	30	11	2025
INTERVENTORÍA		D	M	A
CONTRATISTA		SUPERVISOR		
GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S		NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

2	REALIZAR DEMOLICIÓN Y DESMONTE



FOTOGRAFÍA 17.
Desmonte de cielo raso existente



FOTOGRAFÍA 18.
Desmonte de cielo raso existente



FOTOGRAFÍA 19.
Demolición de baldosa cerámica.



FOTOGRAFÍA 20.
Demolición de baldosa cerámica.

CONTRATO 202500000893	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INFORME		
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	30	11	2025
INTERVENTORÍA		D	M	A
CONTRATISTA		SUPERVISOR		
GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S		NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

2	REALIZAR DEMOLICIÓN Y DESMONTE




FOTOGRAFÍA 21.
Desmonte de vidrio Templado



FOTOGRAFÍA 22.
Desmonte de vidrio Templado



FOTOGRAFÍA 23.
Demolición de muro en drywall y/o superboard.

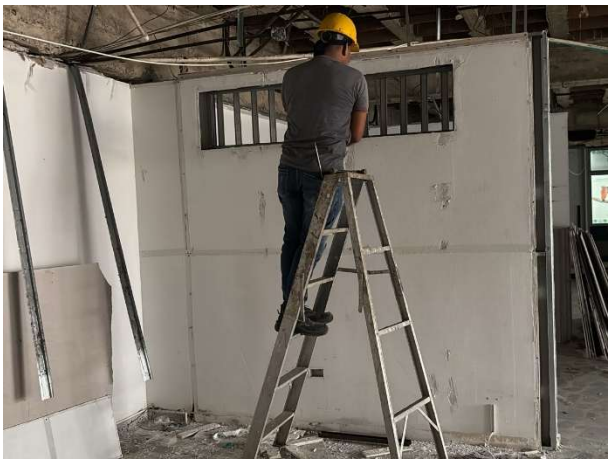

FOTOGRAFÍA 24.
Demolición de muro en drywall y/o superboard.

CONTRATO 202500000893	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INFORME		
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	30	11	2025
INTERVENTORÍA		D	M	A
CONTRATISTA		SUPERVISOR		
GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S		NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

2	REALIZAR DEMOLICIÓN Y DESMONTE



FOTOGRAFÍA 25.
Retiro de material cargue y descargue fuera de las instalaciones, incluye transporte a escombrera



FOTOGRAFÍA 26.
Retiro de material cargue y descargue fuera de las instalaciones, incluye transporte a escombrera



FOTOGRAFÍA 27.
Desmonte de divisiones en aluminio y vidrio



FOTOGRAFÍA 28.
Desmonte de divisiones en aluminio y vidrio

CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INFORME		
202500000893				
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	30	11	2025
INTERVENTORÍA		D	M	A
CONTRATISTA		SUPERVISOR		
GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S		NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

2	REALIZAR DEMOLICIÓN Y DESMONTE



FOTOGRAFÍA 29.
Desmonte de divisiones



FOTOGRAFÍA 30.
Desmonte de divisiones



FOTOGRAFÍA 31.
Demolición de cielo raso y divisiones existentes



FOTOGRAFÍA 32.
Retiro de material cargue y descargue fuera de las instalaciones, incluye transporte a escombrera

CONTRATO 202500000893	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INFORME		
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	30	11	2025
INTERVENTORÍA		D	M	A
CONTRATISTA		SUPERVISOR		
GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S		NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

7	INSTALAR CIELO RASO Y DIVISIONES EN DRYWALL



FOTOGRAFÍA 33.
Retiro de material cargue y descargue fuera de las instalaciones, incluye transporte a escombrera



FOTOGRAFÍA 34.
Instalación de estructura para muros livianos



FOTOGRAFÍA 35.
Instalación de estructura para muros livianos




FOTOGRAFÍA 36.
Instalación de estructura para muros livianos

CONTRATO 202500000893	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INFORME		
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	30	11	2025
INTERVENTORÍA		D	M	A
CONTRATISTA		SUPERVISOR		
GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S		NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		


7	INSTALAR CIELO RASO Y DIVISIONES EN DRYWALL



FOTOGRAFÍA 37.
Instalación de estructura para muros livianos y canalización eléctrica

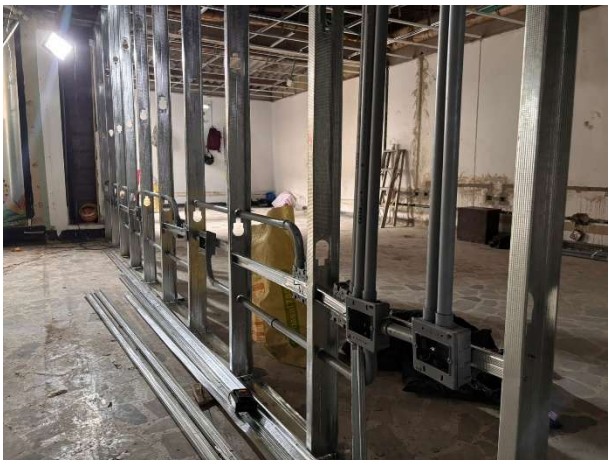

FOTOGRAFÍA 38.
Instalación de tubería para red eléctrica

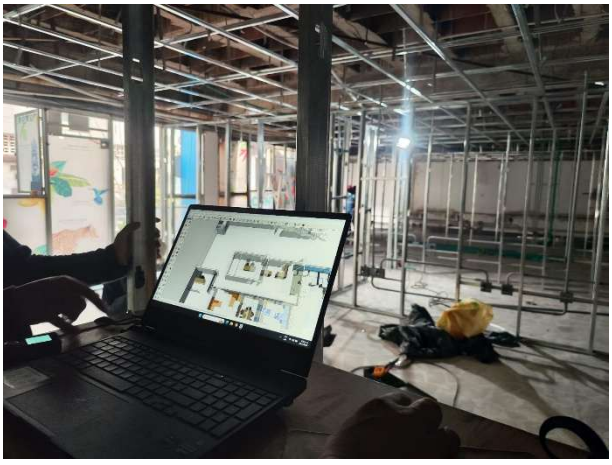


FOTOGRAFÍA 39.
Instalación de estructura para muros livianos



FOTOGRAFÍA 40.
Instalación de tubería para red eléctrica

CONTRATO 202500000893	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INFORME		
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	30	11	2025
INTERVENTORÍA		D	M	A
CONTRATISTA		SUPERVISOR		
GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S		NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

7	INSTALAR CIELO RASO Y DIVISIONES EN DRYWALL

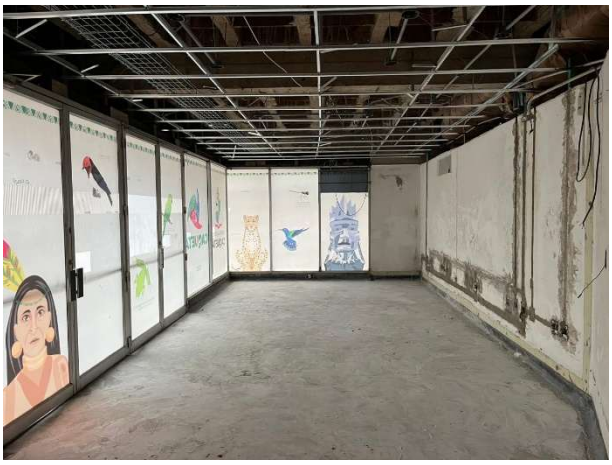

FOTOGRAFÍA 41.
Instalación de estructura para cielo raso



FOTOGRAFÍA 42.
Instalación de tableros



FOTOGRAFÍA 43.
Demolición de muros en mampostería



FOTOGRAFÍA 44.
Demolición de muros en mampostería

CONTRATO 202500000893	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INFORME		
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	30	11	2025
INTERVENTORÍA		D	M	A
CONTRATISTA		SUPERVISOR		
GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S		NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

7	INSTALAR CIELO RASO Y DIVISIONES EN DRYWALL



FOTOGRAFÍA 45.
Mantenimiento de piso



FOTOGRAFÍA 46.
Apertura de muros para tableros




FOTOGRAFÍA 47.
Instalación de canalización eléctrica para iluminación



FOTOGRAFÍA 48.
Estructura para cielo raso y muros livianos

CONTRATO 202500000893	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INFORME		
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	30	11	2025
INTERVENTORÍA		D	M	A
CONTRATISTA		SUPERVISOR		
GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S		NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		


7	INSTALAR CIELO RASO Y DIVISIONES EN DRYWALL

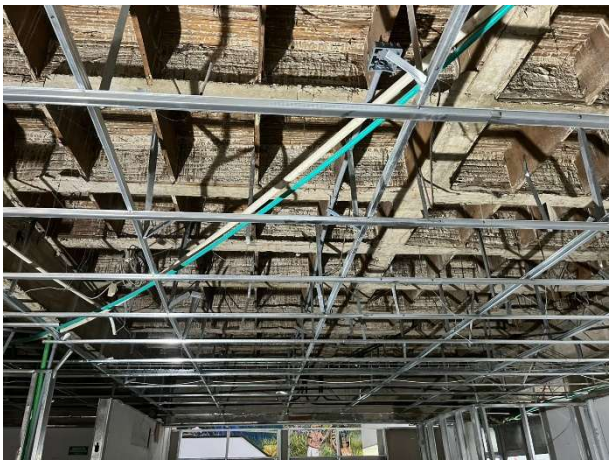


FOTOGRAFÍA 49.
Estructura para cielo raso



FOTOGRAFÍA 50.
Estructura para cielo raso

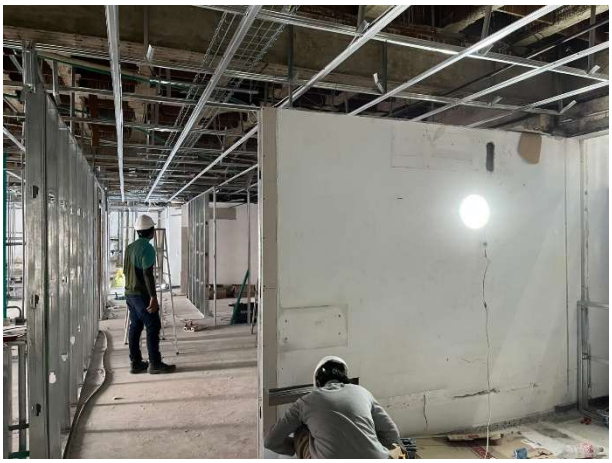

FOTOGRAFÍA 51.
Instalación de estructura para muros livianos

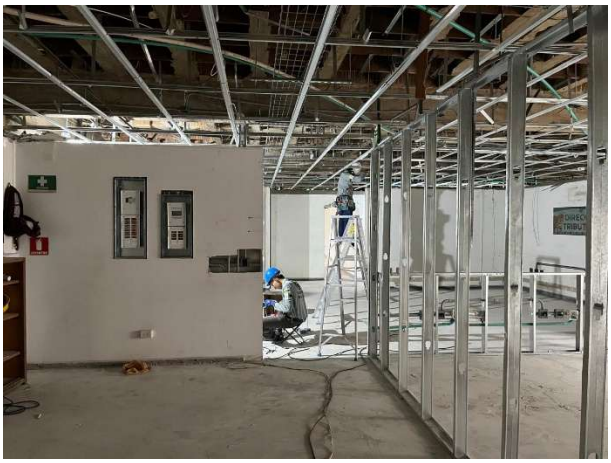

FOTOGRAFÍA 52.
Instalación de estructura para muros livianos

CONTRATO 202500000893	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INFORME		
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	30	11	2025
INTERVENTORÍA		D	M	A
CONTRATISTA		SUPERVISOR		
GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S		NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

7	INSTALAR CIELO RASO Y DIVISIONES EN DRYWALL



FOTOGRAFÍA 53.
Instalación de estructura para muros livianos
Y canalización red eléctrica



FOTOGRAFÍA 54.
Instalación de estructura para muros livianos



FOTOGRAFÍA 55.
Desmonte de cielo raso existente en área de recepción



FOTOGRAFÍA 56.
Desmonte de cielo raso existente en área de recepción

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000893

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ".

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2
PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

ANEXO 2

CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900815455	0	ALTING INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ALTING OPERATIVO	CR 8 6 59 BRR LA ESTRELLA	FLORENCIA-CAQUETA	7444444	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1984968709	9496087696	E	2025/12/12	2025/12/05	BANCOLOMBIA	0	$4,532,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ALTING OPERATIVO (7 Afiliados)																							$14,827,234	$2,372,400			$17,674,234	$707,100			$17,674,234	$707,100			$17,674,234		$746,100		$0	$0		$4,532,700
Centro de Trabajo: OPERATIVO RIESGO 1 (3 Afiliados)																							$6,100,000	$976,000			$7,523,500	$301,000			$7,523,500	$301,000			$7,523,500		$39,500		$0	$0		$1,617,500
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (3 Afiliados)																							$6,100,000	$976,000			$7,523,500	$301,000			$7,523,500	$301,000			$7,523,500		$39,500		$0	$0		$1,617,500
1	CC	60310217	COTAMO ROSA																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$121,500
2	CC	1061792456	IJAJI DIEGO																		230301	30	$3,300,000	$528,000	EPS037	30	$3,300,000	$132,000	CCF13	30	$3,300,000	$132,000	14-23	30	$3,300,000	0.522%	$17,300	30	$0	$0	Si	$809,300
3	CC	40670772	VALDERRAMA EVELYN		X																230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF13	30	$2,800,000	$112,000	14-23	30	$2,800,000	0.522%	$14,700	30	$0	$0	Si	$686,700
Centro de Trabajo: OPERATIVO RIESGO 5 (4 Afiliados)																							$8,727,234	$1,396,400			$10,150,734	$406,100			$10,150,734	$406,100			$10,150,734		$706,600		$0	$0		$2,915,200
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (4 Afiliados)																							$8,727,234	$1,396,400			$10,150,734	$406,100			$10,150,734	$406,100			$10,150,734		$706,600		$0	$0		$2,915,200
4	CC	79638721	JIMENEZ JOHNNY							X											25-14	30	$1,977,234	$316,400	EPS005	30	$1,977,234	$79,100	CCF13	30	$1,977,234	$79,100	14-23	30	$1,977,234	6.960%	$137,700	30	$0	$0	Si	$612,300
5	CC	12234265	LOZADA GERMAN																		25-14	30	$3,250,000	$520,000	EPS005	30	$3,250,000	$130,000	CCF13	30	$3,250,000	$130,000	14-23	30	$3,250,000	6.960%	$226,200	30	$0	$0	Si	$1,006,200
6	CC	1117543616	MURILLO ORIANA																		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF13	30	$3,500,000	$140,000	14-23	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
7	CC	10251613	ROMERO JORGE																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$213,100
Total	**Afiliados(7)**																						$14,827,234	$2,372,400			$17,674,234	$707,100			$17,674,234	$707,100			$17,674,234		$746,100		$0	$0		$4,532,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900815455	0	ALTING INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ALTING OPERATIVO	CR 8 6 59 BRR LA ESTRELLA	FLORENCIA-CAQUETA	7444444	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1984968709	9496087696	E	2025/12/12	2025/12/05	BANCOLOMBIA	0	$4,532,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$2,372,400	$0	$0	$2,372,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$836,400	$0	$0	$836,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,536,000	$0	$0	$1,536,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$746,100	$0	$0	$746,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$746,100	$0	$0	$746,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$707,100	$0	$0	$707,100
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	7	$707,100	$0	$0	$707,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$707,100	$0	$0	$707,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$272,000	$0	$0	$272,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$435,100	$0	$0	$435,100
TOTAL				7	$4,532,700	$0	$0	$4,532,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17324685		RINCON FLOREZ JOSE ELIAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	parcela 6 vda limonar	FLORENCIA-CAQUETA	4354640	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: JOSE ELIAS RINCON (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: JOSE ELIAS RINCON (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC 17324685	RINCON FLOREZ JOSE ELIAS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	95706937	9495706937	I	2025/12/19	2025/12/11	BANCO AV VILLAS	0	$504,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$504,900**	**$0**	**$0**	**$504,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 17324685	8	JOSE ELIAS RINCON FLOREZ	A - 200 O MAS COTIZANTES	SUCURSAL 1	CRA 12 16 15	FLORENCIA-CAQUETA	4350000	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SUCURSAL 1 (4 Afiliados)						$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$396,400		$0	$0
Centro de Trabajo: JOSE ELIAS (4 Afiliados)						$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$396,400		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (4 Afiliados)						$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$396,400		$0	$0
1	CC	93342731	AGUILAR RODRIGUEZ MILLER HERNAN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	1119586124	ALVIRA OVIEDO MARIO ERNESTO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	1119581906	ALVIRA OVIEDO NICACIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	96362521	ALVIS ALAPE WILSON JAVIER	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$396,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	96295522	9496295522	E	2025/12/19	2025/12/12	BANCO AV VILLAS	0	$1,763,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$911,200	$0	$0	$911,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$683,400	$0	$0	$683,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$396,400	$0	$0	$396,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$396,400	$0	$0	$396,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$228,000	$0	$0	$228,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	4	$228,000	$0	$0	$228,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$228,000	$0	$0	$228,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$114,000	$0	$0	$114,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$114,000	$0	$0	$114,000
TOTAL				**4**	**$1,763,600**	**$0**	**$0**	**$1,763,600**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000893

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ".

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2
PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

ANEXO 3

SEGURIDAD SOCIAL DE INTERVENTORÍA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901390155	3	GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TV 5 B 9 180 BRR LA ESTRELLA	FLORENCIA-CAQUETA	3112267727	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2047836419	9497213121	E	2025/12/12	2025/12/30	BANCOLOMBIA	18	$6,398,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (7 Afiliados)																								$20,238,800	$3,298,400			$20,238,800	$809,600			$20,238,800	$809,600			$20,238,800		$1,408,900		$0	$0		$6,326,500
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 2 (7 Afiliados)																								$20,238,800	$3,298,400			$20,238,800	$809,600			$20,238,800	$809,600			$20,238,800		$1,408,900		$0	$0		$6,326,500
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (7 Afiliados)																								$20,238,800	$3,298,400			$20,238,800	$809,600			$20,238,800	$809,600			$20,238,800		$1,408,900		$0	$0		$6,326,500
1	CC	6802749	CANO CARLOS	X	X																	230201	8	$379,600	$60,800	EPS005	8	$379,600	$15,200	CCF13	8	$379,600	$15,200	14-23	8	$379,600	6.960%	$26,500	8	$0	$0	Si	$117,700
2	CC	1018439570	HOYOS JHONATTAN																			230301	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF13	30	$6,000,000	$240,000	14-23	30	$6,000,000	6.960%	$417,600	30	$0	$0	Si	$1,917,600
3	CC	1115792224	MAPE JOHNER	X	X																	25-14	8	$379,600	$60,800	EPS005	8	$379,600	$15,200	CCF13	8	$379,600	$15,200	14-23	8	$379,600	6.960%	$26,500	8	$0	$0	Si	$117,700
4	CC	1053825751	MOLINA MAYERLY																			230301	30	$4,800,000	$768,000	EPS005	30	$4,800,000	$192,000	CCF13	30	$4,800,000	$192,000	14-23	30	$4,800,000	6.960%	$334,100	30	$0	$0	Si	$1,486,100
5	CC	1126422347	SALAZAR JENNIFER																			230301	30	$3,800,000	$608,000	EPS037	30	$3,800,000	$152,000	CCF13	30	$3,800,000	$152,000	14-23	30	$3,800,000	6.960%	$264,500	30	$0	$0	Si	$1,176,500
6	CC	74242089	TORRES YOYLAN																			25-14	30	$4,500,000	$720,000	EPS005	30	$4,500,000	$180,000	CCF13	30	$4,500,000	$180,000	14-23	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	Si	$1,393,200
7	CC	7550802	VELASCO LUIS	X	X																	230301	8	$379,600	$60,800	EPS037	8	$379,600	$15,200	CCF13	8	$379,600	$15,200	14-23	8	$379,600	6.960%	$26,500	8	$0	$0	Si	$117,700
Total			**Afiliados(7)**																					$20,238,800	$3,298,400			$20,238,800	$809,600			$20,238,800	$809,600			$20,238,800		$1,408,900		$0	$0		$6,326,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$3,298,400	$37,600	$0	$3,336,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$780,800	$8,900	$0	$789,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$2,456,800	$28,000	$0	$2,484,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$60,800	$700	$0	$61,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,408,900	$16,000	$0	$1,424,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$1,408,900	$16,000	$0	$1,424,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$809,600	$9,200	$0	$818,800
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	7	$809,600	$9,200	$0	$818,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$809,600	$9,200	$0	$818,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$167,200	$1,900	$0	$169,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$642,400	$7,300	$0	$649,700
TOTAL				**7**	**$6,326,500**	**$72,000**	**$0**	**$6,398,500**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000893

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ".

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2
PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

ANEXO 4

BITÁCORA DE OBRA

FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
OBJETO DEL CONTRATO	**ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**	**ANOTACIONES 1 NOVIEMBRE/2025**	
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	$ 2.401.062.171		**CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

PERSONAL	
Director de Obra, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes	
EQUIPOS	**CLIMA**
Herramienta menor	**Soleado**

ACTIVIDADES

Activivades: sabado 1 de noviembre, se continua con la instalación de la estructura metalica para muro liviano en superboard, cortando y atornillando la estructura según los diseños ya estipulados y aprobrados. Al mismo tiempo, se continua con las activiades para las intalaciones electricas, para salidas de tomaccorientes, lo que implica la perforacion de paredes, esto hace que se generen residuos y escombros, los cuales se acumulan en una parte donde quede facil su retiro cuando se tenga el suficiente. se hace un desmonte de muro liviano al costado izquierdo de recepción en el primer piso. se hace demolición de muro en mampostería para la entrada del area de lo que va a serla oficina de Tesorería. por lo que se acumulan mas escombros y se hace retiro de estos a un lugar autorizado en una volqueta sencilla. todas estas actividades se hacen tieniendo en cuenta las medidas de seguridad, cumpliendo los parametros del PMT y PMA, igualmente el personal usando los implementos de seguridad, cascos, guantes, tapabocas, gafas y el calzado adecuado.

Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría
Diego Ijaji F		
DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA** Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**JHONATTAN HOYOS MARQUEZ** Ingeniero Civil **GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S**

FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		
OBJETO DEL CONTRATO	**ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**	**ANOTACIONES 3 NOVIEMBRE/2025**	GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	$ 2.401.062.171		**CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

PERSONAL	
Especialista Estructural, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes, Profesional SISO, Especialista Eléctrico	
EQUIPOS	**CLIMA**
Herramienta menor	**Soleado**

ACTIVIDADES

Actividades, lunes 3 de noviembre. Se continua con las instalaciones electricas para salidas de tomacorrientes, tambien se sigue con el desmonte de cielo raso existente en el pasillo que dirige hacia el patio. Las actividades que se ejecutan estan supervisadas y aprobadas por interventoria. igualmente el personal de obra utiliza todos los implementos de seguridad adecuados, cascos, gafas, tapabocas en algunos casos, guantes y el canzado debido.

Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría
Diego Ijaji F		
DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA** Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**JHONATTAN HOYOS MARQUEZ** Ingeniero Civil **GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S**

FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		
OBJETO DEL CONTRATO	**ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**	**ANOTACIONES 4 NOVIEMBRE/2025**	GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	$ 2.401.062.171		**CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

PERSONAL	
Especialista Ambiental, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes	
EQUIPOS	**CLIMA**
Herramienta menor	**Soleado**

ACTIVIDADES

Actividades: martes 4 de noviembre, se continuan actividades de desmonte de estrctura del cielo raso, tambien se hizo desmonte de de cubiculo en muro liviano que se encontraba al lado del despacho de secretaria de hacienda, igualmente se hace desmonte de ductos de aire acondicionados. al mismo tiempo, se sigue con la instalación de las redes electricas, para salidas de tomacorrientes e iluminación, tambien se continua con la instalación de la estructura de muro liviano en superboard. estas actividades son aprobadas por el personal de supervisión de interventoria. el personal de obra, cumple las medidas de seguridad utilizando los implementos como casco, gafas, tapabocas en algunos casos, guantes y calzado adecuado.

Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría
Diego Ijaji F		
DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA** Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**JHONATTAN HOYOS MARQUEZ** Ingeniero Civil **GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S**

FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	ANOTACIONES 5 NOVIEMBRE/2025
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025	
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ	
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS	
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS	
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	
PLAZO :	31-dic-25	
VALOR :	$ 2.401.062.171	
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO	

GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ

PERSONAL

Director de Obra, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes, Profesional SISO, Especialista Eléctrico

EQUIPOS	CLIMA
Herramienta menor	lluvias moderadas

ACTIVIDADES

Actividades: miercoles 5 de noviembre, se continuan desmontando los ductos de aires acondicionados, se rompió el piso en cerámica donde se encontraba el sanitario con recuperación. Se continua con la instalación de redes electricas, para salidas de tomacorrientes e iluminación, igualmente, se sigue con la instalación de la estructura para muro liviano en superboard, tambien la estructura para cielo raso se sigue instalando. llega material para la instalación de redes de voz y datos. todas las actividades que se ejecutaron, estan supervisadas y previamente aprobadas por interventoria. el personal de obra cumple con las medidas de seguridad, usando los implementos como casco, gafas, tapabocas, guantes y calzado.

Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría
Diego Ijaji F		
DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA	**GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA**	**JHONATTAN HOYOS MARQUEZ**
Ingeniero Civil	Ingeniero Civil	Ingeniero Civil
CONSORCIO CAQUETA 2025	**CONSORCIO CAQUETA 2025**	**GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S**

FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		
OBJETO DEL CONTRATO	**ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**	**ANOTACIONES 6 NOVIEMBRE/2025**	GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	$ 2.401.062.171		**CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

PERSONAL	
Especialista Estructural, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes	
EQUIPOS	**CLIMA**
Herramienta menor	**Soleado**

ACTIVIDADES

Actividades: jueves 6 de noviembre, se continua con la instalación de redes electricas, salidas para iluminación y tomacorrientes. Asi mismo, se continua con la instalación de la estructura metalica para muro liviano en superboard. Estas activiades se ejecutan con la supervisión y previa aprobación de interventoria. el personal de obra cumple las medidas de seguridad utilizando la herramienta y los implementos de proteccion adecuados, casco, gafas, tapabocas, guantes y calzado.

Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría
Diego Ijaji F		
DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA	**GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA**	**JHONATTAN HOYOS MARQUEZ**
Ingeniero Civil	Ingeniero Civil	Ingeniero Civil
CONSORCIO CAQUETA 2025	**CONSORCIO CAQUETA 2025**	**GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S**

FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		
OBJETO DEL CONTRATO	**ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**	**ANOTACIONES 7 NOVIEMBRE/2025**	GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	$ 2.401.062.171		**CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

PERSONAL

Especialista Ambiental, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes, Profesional SISO, Especialista Eléctrico

EQUIPOS	CLIMA
Herramienta menor	**Soleado**

ACTIVIDADES

Actividades: viernes 7 de noviembre, se continua con la instalación de redes electricas, salidas para iluminacion, tomacorrientes de 220 voltios para aires. Igualmente, se continua con la instalación de la estructura para muro liviano en superboard. estas actividades ejecutadas estan supervisadas y aprobadas por interventoria. por otro lado, el personal de obra cumple con las medidas de seguridad utilizando la herramienta e implementos de seguridad adecuados, casco, gafas, tapabocas, guantes y calzado.

Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría
Diego Ijaji F		
DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA** Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**JHONATTAN HOYOS MARQUEZ** Ingeniero Civil **GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S**

FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		
OBJETO DEL CONTRATO	**ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**	**ANOTACIONES 8 NOVIEMBRE/2025**	GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	$ 2.401.062.171		**CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

PERSONAL	
Director de Obra, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes	
EQUIPOS	**CLIMA**
Herramienta menor	**Soleado**

ACTIVIDADES

Actividades: sabado 8 de noviembre, se hace un acordonamiento en pasillo afuera de la gobernación por caida de cielo raso, para evitar un accidente con usuario. En cuanto a las activiades en ejecución se continua con la instalación de la estructura para muro liviano en superboard, tambien la instalación de redes electricas, salidas para tomacorrientes e iluminación. estas actividades so supervisadas y aprobadas por interventoria. por otro lado el personal de obra cumple con las medidas de seguridad utilizando la herramienta e implementos de proteccion adecuados, como casco, gafas, tapabocas, guantes y calzado.

Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría
Diego Ijaji F		
DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA** Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**JHONATTAN HOYOS MARQUEZ** Ingeniero Civil **GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S**

FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	ANOTACIONES 10 NOVIEMBRE/2025
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025	
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ	
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS	
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS	
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	
PLAZO :	31-dic-25	
VALOR :	$ 2.401.062.171	
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO	

GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ

PERSONAL
Especialista Estructural, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes, Profesional SISO, Especialista Eléctrico

EQUIPOS	CLIMA
Herramienta menor	lluvias moderadas

ACTIVIDADES

Actividades: lunes 10 de noviembre, Se continuaron activiades de instalación de la estructura de cielo raso, teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad para el personal con sus implementos como casco, guantes y gafas, igualmente con la herramienta adecuada para esta labor. Tambien, se continuó instalando la estructura metalica para los muros livianos en superboard, igualmanete con el personal de obra debidamente capacitado y dotado de sus implementos de seguridad. Por oro lado, se iniciaron actividades de destronque de piso, esta actividad consiste en pulir fuerte una superficie para alisar y nivelar, eliminando asi irregularidades, residuos de adhesivos o recubrimientos antiguos. para esto se utiliza una maquina especial para debastar el piso y lograr una superficie mas uniforme, en este caso una pulidora industrial, para que este proceso quede bien hecho, se adicionan algunos elementos quimicos y tambien se hace un regado de agua. en cuanto a la parte electrica, se esta instalando la tubería para salida de luminarias, salidas para tomacorreintes monofásicos y regulares, salidas para aires acondicionados de 220 voltios. Estas actividades se estan realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación.

Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría
Diego Ijaji F		
DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA** Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**JHONATTAN HOYOS MARQUEZ** Ingeniero Civil **GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S**

FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025	
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ	
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS	**ANOTACIONES** **11 NOVIEMBRE/2025**
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS	
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	
PLAZO :	31-dic-25	
VALOR :	$ 2.401.062.171	
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO	

GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ

PERSONAL	
Especialista Ambiental, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes	
EQUIPOS	**CLIMA**
Herramienta menor	**Soleado**

ACTIVIDADES

Actividades: martes 11 de noviembre, Se continuaron activiades de instalación de la estructura de cielo raso, teniendo en cuenta todas las medidas de seuridad para el personal con sus implementos como casco, guantes y gafas, igualmente con la herramienta adecuada para esta labor. Tambien, se continuó instalando la estructura metalica para los muros livianos en superboard, igualmanete con el personal de obra debidamente capacitado y dotado de sus implementos de seguridad. Por oro lado, se continuaron actividades de destronque de piso, esta actividad consiste en pulir fuerte una superficie para alisar y nivelar, eliminando asi irregularidades, residuos de adhesivos o recubrimientos antiguos. para esto se utiliza una maquina especial para debastar el piso y lograr una superficie mas uniforme, en este caso una pulidora industrial, para que este proceso quede bien hecho, se adicionan algunos elementos quimicos y tambien se hace un regado de agua. en cuanto a la parte electrica, se esta instalando la tubería para salida de luminarias, salidas para tomacorreintes monofásicos y regulares, salidas para aires acondicionados de 220 voltios. estas actividades se estan realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación.

Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría
Diego Ijaji F		
DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA	**GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA**	**JHONATTAN HOYOS MARQUEZ**
Ingeniero Civil	Ingeniero Civil	Ingeniero Civil
CONSORCIO CAQUETA 2025	**CONSORCIO CAQUETA 2025**	**GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S**

FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		
OBJETO DEL CONTRATO	**ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**	**ANOTACIONES 12 NOVIEMBRE/2025**	GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	$ 2.401.062.171		**CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

PERSONAL

Director de Obra, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes, Profesional SISO, Especialista Eléctrico

EQUIPOS	**CLIMA**
Herramienta menor	**lluvias moderadas**

ACTIVIDADES

Actividades: miercoles 12 de noviembre, Se continuaron activiades de instalación de la estructura de cielo raso, teniendo en cuenta todas las medidas de seuridad para el personal con sus implementos como casco, guantes y gafas, igualmente con la herramienta adecuada para esta labor. Tambien, se continuó instalando la estructura metalica para los muros livianos en superboard, igualmanete con el personal de obra debidamente capacitado y dotado de sus implementos de seguridad. Por oro lado, se continuaron actividades de destronque de piso, esta actividad consiste en pulir fuerte una superficie para alisar y nivelar, eliminando asi irregularidades, residuos de adhesivos o recubrimientos antiguos. para esto se utiliza una maquina especial para debastar el piso y lograr una superficie mas uniforme, en este caso una pulidora industrial, para que este proceso quede bien hecho, se adicionan algunos elementos quimicos y tambien se hace un riego de agua, el personal utilizando medidas de seguridad como es debido. en cuanto a la parte electrica, se esta instalando la tubería para salida de luminarias, salidas para tomacorreintes monofásicos y regulares, salidas para aires acondicionados de 220 voltios. estas actividades se estan realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación.

Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría
Diego Ijaji F		
DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA** Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**JHONATTAN HOYOS MARQUEZ** Ingeniero Civil **GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S**

FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	ANOTACIONES 13 NOVIEMBRE/2025	GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	$ 2.401.062.171		CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

PERSONAL

Especialista Estructural, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes

EQUIPOS	CLIMA
Herramienta menor	Soleado

ACTIVIDADES

Actividades: jueves 13 de noviembre, Se continuaron activiades de instalación de la estructura de cielo raso, teniendo en cuenta todas las medidas de seuridad para el personal con sus implementos como casco, guantes y gafas, igualmente con la herramienta adecuada para esta labor. Tambien, se continuó instalando la estructura metalica para los muros livianos en superboard, igualmanete con el personal de obra debidamente capacitado y dotado de sus implementos de seguridad. Por oro lado, se continuaron actividades de destronque de piso, esta actividad consiste en pulir fuerte una superficie para alisar y nivelar, eliminando asi irregularidades, residuos de adhesivos o recubrimientos antiguos. para esto se utiliza una maquina especial para debastar el piso y lograr una superficie mas uniforme, en este caso una pulidora industrial, para que este proceso quede bien hecho, se adicionan algunos elementos quimicos y tambien se hace un riego de agua, el personal utilizando medidas de seguridad como es debido. en cuanto a la parte electrica, se esta instalando la tubería para salida de luminarias, salidas para tomacorreintes monofásicos y regulares, para esto se debe romper las paredes minimanete para la correcta instalación, el personal utiliza la herramienta decuada para esta actividad y utilizando los implementos de seguridad como casco, guantes y gafas, salidas para aires acondicionados de 220 voltios. asi mismo, se instalan los tableros de distribución trifasicos de usos general de 24 y 12 circuitos. estas actividades se estan realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación.

Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría
Diego Ijaji F		
DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA** Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**JHONATTAN HOYOS MARQUEZ** Ingeniero Civil **GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S**

FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		
OBJETO DEL CONTRATO	**ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**	**ANOTACIONES 14 NOVIEMBRE/2025**	GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	$ 2.401.062.171		**CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

PERSONAL

Especialista Ambiental, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes, Profesional SISO, Especialista Eléctrico

EQUIPOS	**CLIMA**
Herramienta menor	**lluvias fuertes**

ACTIVIDADES

Actividades: viernes 14 de noviembre, Se continuaron activiades de instalación de la estructura de cielo raso, teniendo en cuenta todas las medidas de seuridad para el personal con sus implementos como casco, guantes y gafas, igualmente con la herramienta adecuada para esta labor. Tambien, se continuó instalando la estructura metalica para los muros livianos en superboard, igualmanete con el personal de obra debidamente capacitado y dotado de sus implementos de seguridad. Por oro lado, se continuaron actividades de destronque de piso, realizando primero de las orillas de cada area con una pulidora pequeña, esta actividad consiste en pulir fuerte una superficie para alisar y nivelar, eliminando asi irregularidades, residuos de adhesivos o recubrimientos antiguos. para esto se utiliza una maquina especial para debastar el piso y lograr una superficie mas uniforme, en este caso una pulidora industrial, para que este proceso quede bien hecho, se adicionan algunos elementos quimicos y tambien se hace un riego de agua, el personal utilizando sus debidos implementos de seguridad. en cuanto a la parte electrica, se esta instalando la tubería para salida de luminarias, salidas para tomacorreintes monofásicos y regulares, para esto se debe romper las paredes minimanete para la correcta instalación, el personal utiliza la herramienta decuada para esta actividad y utilizando los implementos de seguridad como casco, guantes y gafas, salidas para aires acondicionados de 220 voltios. asi mismo, se instalan los tableros de distribución trifasicos de usos general de 24 y 12 circuitos. estas actividades se estan realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación.

Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría
Diego Ijaji F		
DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA** Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**JHONATTAN HOYOS MARQUEZ** Ingeniero Civil **GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S**

FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
OBJETO DEL CONTRATO	**ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**	**ANOTACIONES 15 NOVIEMBRE/2025**	
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	$ 2.401.062.171		**CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

PERSONAL	
Director de Obra, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes	
EQUIPOS	**CLIMA**
Herramienta menor	**lluvias fuertes**

ACTIVIDADES

Actividades: sabado 15 de noviembre, Se continuaron activiades de instalación de la estructura de cielo raso, teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad para el personal con sus implementos como casco, guantes y gafas, igualmente con la herramienta adecuada para esta labor. Tambien, se continuó instalando la estructura metalica para los muros livianos en superboard, igualmanete con el personal de obra debidamente capacitado y dotado de sus implementos de seguridad. Por otro lado, se continuaron actividades de destronque de piso, realizando primero de las orillas de cada area con una pulidora pequeña, esta actividad consiste en pulir fuerte una superficie para alisar y nivelar, eliminando asi irregularidades, residuos de adhesivos o recubrimientos antiguos. para esto se utiliza una maquina especial para debastar el piso y lograr una superficie mas uniforme, en este caso una pulidora industrial, para que este proceso quede bien hecho, se adicionan algunos elementos quimicos y tambien se hace un riego de agua, el personal utilizando sus debidos implementos de seguridad. en cuanto a la parte electrica, se esta instalando la tubería para salida de luminarias, salidas para tomacorreintes monofásicos y regulares, para esto se debe romper las paredes minimanete para la correcta instalación, el personal utiliza la herramienta decuada para esta actividad y utilizando los implementos de seguridad como casco, guantes y gafas, salidas para aires acondicionados de 220 voltios. estas actividades se estan realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación. el personal de obra realiza actividades hasta medio dia.

Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría
Diego Ijaji F		
DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA** Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**JHONATTAN HOYOS MARQUEZ** Ingeniero Civil **GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S**

FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
OBJETO DEL CONTRATO	**ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**	**ANOTACIONES 16 NOVIEMBRE/2025**	
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	$ 2.401.062.171		**CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

PERSONAL	
Director de Obra, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes	
EQUIPOS	**CLIMA**
Herramienta menor	**lluvias ligeras**

ACTIVIDADES

Actividades: domingo 16 de noviembre, Se continuaron actividades de destronque de piso, realizando primero de las orillas de cada area con una pulidora pequeña, esta actividad consiste en pulir fuerte una superficie para alisar y nivelar, eliminando asi irregularidades, residuos de adhesivos o recubrimientos antiguos. para esto se utiliza una maquina especial para debastar el piso y lograr una superficie mas uniforme, en este caso una pulidora industrial, para que este proceso quede bien hecho, se adicionan algunos elementos quimicos y tambien se hace un riego de agua, el personal utilizando sus debidos implementos de seguridad. Estas actividades se realizan en el primer piso del edificio central de La Gobernación. el personal de obra efectua actividades hasta medio dia.

Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría
Diego Ijaji F		
DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA** Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**JHONATTAN HOYOS MARQUEZ** Ingeniero Civil **GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S**

FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		
OBJETO DEL CONTRATO	**ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**	**ANOTACIONES 17 NOVIEMBRE/2025**	GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	$ 2.401.062.171		**CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

PERSONAL

Especialista Estructural, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes, Profesional SISO, Especialista Eléctrico

EQUIPOS	**CLIMA**
Herramienta menor	**Soleado**

ACTIVIDADES

Actividades: lunes 17 de noviembre, Se continuaron actividades de destronque de piso, realizando primero de las orillas de cada area con una pulidora pequeña, esta actividad consiste en pulir fuerte una superficie para alisar y nivelar, eliminando asi irregularidades, residuos de adhesivos o recubrimientos antiguos. para esto se utiliza una maquina especial para debastar el piso y lograr una superficie mas uniforme, en este caso una pulidora industrial, para que este proceso quede bien hecho, se adicionan algunos elementos quimicos y tambien se hace un riego de agua, el personal utilizando sus debidos implementos de seguridad. Estas actividades se realizan en el primer piso del edificio central de La Gobernación. el personal de obra efectua actividades hasta medio dia siendo lunes festivo.

Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría
Diego Ijaji F		
DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA** Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**JHONATTAN HOYOS MARQUEZ** Ingeniero Civil **GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S**

FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		
OBJETO DEL CONTRATO	**ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**	**ANOTACIONES 18 NOVIEMBRE/2025**	GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	$ 2.401.062.171		**CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

PERSONAL	
Especialista Ambiental, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes	
EQUIPOS	**CLIMA**
Herramienta menor	**lluvias moderadas**

ACTIVIDADES

Actividades: martes 18 de noviembre, Se continuaron activiades de instalación de la estructura de cielo raso, teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad para el personal con sus implementos como casco, guantes y gafas, igualmente con la herramienta adecuada para esta labor. Tambien, se continuó instalando la estructura metalica para los muros livianos en superboard, igualmanete con el personal de obra debidamente capacitado y dotado de sus implementos de seguridad. Por oro lado, se continuaron actividades de destronque de piso, realizando primero de las orillas de cada area con una pulidora pequeña, esta actividad consiste en pulir fuerte una superficie para alisar y nivelar, eliminando asi irregularidades, residuos de adhesivos o recubrimientos antiguos. para esto se utiliza una maquina especial para debastar el piso y lograr una superficie mas uniforme, en este caso una pulidora industrial, para que este proceso quede bien hecho, se adicionan algunos elementos quimicos y tambien se hace un riego de agua, el personal utilizando sus debidos implementos de seguridad. en cuanto a la parte electrica, se esta instalando la tubería para salida de luminarias, salidas para tomacorreintes monofásicos y regulares, para esto se debe romper las paredes minimanete para la correcta instalación, el personal utiliza la herramienta decuada para esta actividad y utilizando los implementos de seguridad como casco, guantes y gafas, salidas para aires acondicionados de 220 voltios. estas actividades se estan realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación. el personal de obra realiza actividades hasta medio dia.

Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría
Diego Ijaji F		
DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA** Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**JHONATTAN HOYOS MARQUEZ** Ingeniero Civil **GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S**

FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		
OBJETO DEL CONTRATO	**ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**	**ANOTACIONES 19 NOVIEMBRE/2025**	GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	$ 2.401.062.171		**CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

PERSONAL

Director de Obra, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes, Profesional SISO, Especialista Eléctrico

EQUIPOS	**CLIMA**
Herramienta menor	**Soleado**

ACTIVIDADES

Actividades: miercoles 19 de noviembre, Se continuaron activiades de instalación de la estructura de cielo raso, teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad para el personal con sus implementos como casco, guantes y gafas, igualmente con la herramienta adecuada para esta labor. Tambien, se continuó instalando la estructura metalica para los muros livianos en superboard, igualmanete con el personal de obra debidamente capacitado y dotado de sus implementos de seguridad. en cuanto a la parte electrica, se esta instalando la tubería para salida de luminarias, salidas para tomacorreintes monofásicos y regulares, para esto se debe romper las paredes minimamente para la correcta instalación, el personal utiliza la herramienta decuada para esta actividad y utilizando los implementos de seguridad como casco, guantes y gafas, salidas para aires acondicionados de 220 voltios. estas actividades se estan realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación. el personal de obra realiza actividades hasta medio dia.

Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría
Diego Ijaji F		
DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA** Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**JHONATTAN HOYOS MARQUEZ** Ingeniero Civil **GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S**

FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
OBJETO DEL CONTRATO	**ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**	**ANOTACIONES 20 NOVIEMBRE/2025**	
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	$ 2.401.062.171		**CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

PERSONAL	
Especialista Estructural, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes	
EQUIPOS	**CLIMA**
Herramienta menor	**Soleado**

ACTIVIDADES

Actividades: jueves 20 de noviembre, se continuan actividades para instalaciones electricas, tableros trifasicos de 36 y 12 circuitos, salidas para tomacorrientes y salidas para iluminación. Igualmente, los funcionarios de la entidad continuan con la instalación de canastillas para las redes de voz y datos. estas actividades ejecutadas se hacen siguiendo los diseños establecidos, con la herramienta debida y el personal calificado, estos ultimos usando los implementos de seguridad, como casco, gafas, tapabocas, guantes y calzado, que brinden protección.

Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría
Diego Ijaji F		
DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA** Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**JHONATTAN HOYOS MARQUEZ** Ingeniero Civil **GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S**

FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		
OBJETO DEL CONTRATO	**ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**	**ANOTACIONES 21 NOVIEMBRE/2025**	GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	$ 2.401.062.171		**CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

PERSONAL	
Especialista Ambiental, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes, Profesional SISO, Especialista Eléctrico	
EQUIPOS	**CLIMA**
Herramienta menor	**Soleado**

ACTIVIDADES

Actividades: viernes, 21 de noviembre se continuan con las instalaciones electricas, salidas para iluminación, tomacorrientes monofasicos, regulares y de 220 para los aires acondicionados. Los funcionarios de la entidad continuan instalando las canastillas para los cables de voz y datos. estas actividades se realizan respetando los diseños estipulados y siguiendo los parametro que dicta la norma. asi mismo, se realizan siguiendo los parametros de seguridad, utilizando la herramienta adecuada para cada actividad y el personal calificado, usando los implementos de seguridad, casco, gafas, tapabocas, guantes y calzado.

Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría
Diego Ijaji F		
DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA	**GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA**	**JHONATTAN HOYOS MARQUEZ**
Ingeniero Civil	Ingeniero Civil	Ingeniero Civil
CONSORCIO CAQUETA 2025	**CONSORCIO CAQUETA 2025**	**GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S**

FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		
OBJETO DEL CONTRATO	**ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**	**ANOTACIONES 22 NOVIEMBRE/2025**	GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	$ 2.401.062.171		**CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

PERSONAL	
Director de Obra, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes	
EQUIPOS	**CLIMA**
Herramienta menor	**lluvias moderadas**

ACTIVIDADES

Actividades: sabado 22 de noviembre, se continuan con las instalaciones electricas, se coloca la tubería para salida de iluminacion, salidas para tomacorreintes monofásicos y regulares, para esto se debe romper las paredes minimamente para la correcta instalación, el personal utiliza la herramienta decuada para esta actividad y utilizando los implementos de seguridad como casco, guantes y gafas, salidas para aires acondicionados de 220 voltios. por otro lado, se hace demolición de mampostería en la entrada frente al cubiculo de secretaria de hacienda y se hace retiro de escombros cumpliendo los parametros de seguridad. estas actividades se estan realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación. el personal de obra realiza actividades hasta medio dia.

Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría
Diego Ijaji F		
DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA** Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**JHONATTAN HOYOS MARQUEZ** Ingeniero Civil **GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S**

FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		
OBJETO DEL CONTRATO	**ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**	**ANOTACIONES 24 NOVIEMBRE/2025**	GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	$ 2.401.062.171		**CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

PERSONAL	
Especialista Estructural, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes, Profesional SISO, Especialista Eléctrico	
EQUIPOS	**CLIMA**
Herramienta menor	**lluvias moderadas**

ACTIVIDADES

Actividades: lunes 24 de noviembre, Se continuaron activiades de instalaciones electricas, colocando tubería para salida de iluminación, salidas para tomacorreintes monofásicos y regulares, para esto se debe romper las paredes minimamente para la correcta instalación, el personal utiliza la herramienta adecuada para esta actividad y utilizando los implementos de seguridad como casco, guantes, gafas y calzado, tambien se hace la instalación de salidas para aires acondicionados de 220 voltios. estas actividades se estan realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación. tambien se realizan actividades de destronque en el area donde se tiene planteado que va a quedar Talento Humano.

Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría
Diego Ijaji F		
DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA** Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**JHONATTAN HOYOS MARQUEZ** Ingeniero Civil **GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S**

FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		
OBJETO DEL CONTRATO	**ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**	**ANOTACIONES 25 NOVIEMBRE/2025**	GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	$ 2.401.062.171		**CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

PERSONAL

Especialista Ambiental, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes

EQUIPOS	**CLIMA**
Herramienta menor	**lluvias moderadas**

ACTIVIDADES

Actividades: martes 25 de noviembre, se continua la instalaciones electricas, se esta colocando la tubería para salida de iluminación, salidas para tomacorrientes monofásicos y regulares, para estos ultimos se debe romper las paredes minimamente para la correcta instalación, el personal utiliza la herramienta adecuada para esta actividad y utilizando los implementos de seguridad como casco, guantes y gafas y calzado, tambien se instalan salidas para aires acondicionados de 220 voltios. igualmente, se hace marcación de la tubería electrica como lo exige la norma. por otro parte, se continuan actividades de destronque en el area donde se tiene planteado el talento humano. tambien, se estucan algunas paredes en mampostería. estas actividades se estan realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación.

Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría
Diego Ijaji F		
DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA** Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**JHONATTAN HOYOS MARQUEZ** Ingeniero Civil **GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S**

FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		
OBJETO DEL CONTRATO	**ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**	**ANOTACIONES 26 NOVIEMBRE/2025**	GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	$ 2.401.062.171		**CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

PERSONAL	
Director de Obra, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes, Profesional SISO, Especialista Eléctrico	
EQUIPOS	**CLIMA**
Herramienta menor	**Soleado**

ACTIVIDADES

Actividades: miercoles 26 de noviembre, se continuan las instalaciones electricas, se coloca tubería para salidas de iluminación, salidas para tomacorreintes monofásicos y regulares, para esto se debe romper las paredes minimamente para la correcta instalación, se hace el cableado de toda el area de Tesoreía, para estas actividades el personal usa la herramienta decuada y los implementos de seguridad como casco, guantes, gafas y calzado. por otra parte, en el area de donde se tiene planteado Tesoreria y atención al ciudadano, se esta estucando. tambien se sigue el destronque en estas areas. estas actividades se estan realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación.

Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría
Diego Ijaji F		
DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA** Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**JHONATTAN HOYOS MARQUEZ** Ingeniero Civil **GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S**

FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		
OBJETO DEL CONTRATO	**ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**	**ANOTACIONES 27 NOVIEMBRE/2025**	GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	$ 2.401.062.171		**CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

PERSONAL	
Especialista Estructural, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes	
EQUIPOS	**CLIMA**
Herramienta menor	**lluvias moderadas**

ACTIVIDADES

Actividades: jueves 27 de noviembre, se continuan las instalaciones electricas, se coloca tubería para salidas de iluminación, salidas para tomacorreintes monofásicos y regulares, se continua con el cableado del area de Tesorería, para estas actividades el personal usa la herramienta decuada y los implementos de seguridad como casco, guantes, gafas y calzado. por otra parte, en el area de donde se tiene planteado Tesoreria y atención al ciudadano, se esta estucando. tambien se sigue el destronque en estas areas. estas actividades se estan realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación. por otro lado, en horas de la tarde se realiza comite #02, se espera el personal invitado en obra, se hace recorrido por los frentes de trabajo y se continua la reunion en la oficina de secretaria de infraestructura.

Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría
Diego Ijaji F		
DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA** Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**JHONATTAN HOYOS MARQUEZ** Ingeniero Civil **GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S**

FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		
OBJETO DEL CONTRATO	**ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**	**ANOTACIONES 28 NOVIEMBRE/2025**	GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	$ 2.401.062.171		**CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

PERSONAL	
Especialista Ambiental, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes, Profesional SISO, Especialista Eléctrico	
EQUIPOS	**CLIMA**
Herramienta menor	**luvias fuertes**

ACTIVIDADES

Actividades: viernes 28 de noviembre, se continuan las instalaciones electricas, se coloca tubería para salidas de iluminación, salidas para tomacorreintes monofásicos y regulares, se continua con el cableado del area de Tesorería, para estas actividades el personal usa la herramienta decuada y los implementos de seguridad como casco, guantes, gafas y calzado. por otra parte, en el area de donde se tiene planteado Tesoreria y atención al ciudadano, se esta estucando. tambien se sigue el destronque en estas areas. estas actividades se estan realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación. algunas actividades como el rompimiento de paredes para las salidas de tomacorrientes requieren utilizar herramienta que ocasionan ruidos fuertes por lo que en horas de la mañana se hace una pausa en las actividades para no afectar afectar una asamblea que se estaba desarrollando en el segundo piso.

Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría
Diego Ijaji F		
DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA** Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**JHONATTAN HOYOS MARQUEZ** Ingeniero Civil **GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S**

FORMATO No 1 V -1 10/06/2025	BITACORA DE OBRA		GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
OBJETO DEL CONTRATO	**ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**	**ANOTACIONES 29 NOVIEMBRE/2025**	
CONTRATISTA	CONSORCIO CAQUETA 2025		
RL	JOSÉ ELÍAS RINCÓN FLÓREZ		
INTEREVENTORIA	GEOVIAL INGENIERIA SAS		
RL	JOSÉ GREGORIO VANEGAS MONTESINOS		
LUGAR:	EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ		
PLAZO :	31-dic-25		
VALOR :	$ 2.401.062.171		**CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**
SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO		

PERSONAL	
Director de Obra, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes	
EQUIPOS	**CLIMA**
Herramienta menor	**Soleado**

ACTIVIDADES

Actividades: sabado 29 de noviembre, se continuan actividades de destronque en el area de donde se tiene planteado Tesoreria y atención al ciudadano, tambien se sigue estucando algunos muros de mampostería. estas actividades se estan realizando en el primer piso del edificio central de La Gobernación. se hace desmonte de cielo raso en el area frente al cubiculo de secretaria de hacienda.

Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría
Diego Ijaji F		
DIEGO ALEXANDER IJAJI FIGUEROA Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**GERMÁN ALONSO LOZADA LOZADA** Ingeniero Civil **CONSORCIO CAQUETA 2025**	**JHONATTAN HOYOS MARQUEZ** Ingeniero Civil **GEOVIAL INGENIERÍA ZOMAC S.A.S**
