

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1		**1**	**PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL "MÓDULO B" Y CULMINACIÓN DEL "MODULO A" Y AREA DE I**	**106,11 días**	**mar 28/07/26**	**mar 15/12/26**		**$ 4.778.391.397,00**
2		**1.1**	**ACTA DE INICIO**	**8 días**	**mar 28/07/26**	**jue 6/08/26**		**$ 0,00**
3		1.1.1	FIRMA DE ACTA DE INICIO	0 días	mar 28/07/26	mar 28/07/26		$ 0,00
4		1.1.2	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	8 días	mar 28/07/26	jue 6/08/26	3	$ 0,00
5		**1.2**	**1. PRELIMINARES**	**41,22 días**	**lun 10/08/26**	**jue 1/10/26**		**$ 55.783.976,00**
6		1.2.1	1.1 CAMPAMENTO DE 72 M2	5 días	lun 10/08/26	vie 14/08/26	3FC+5 días	$ 14.736.194,00
7		1.2.2	1.2 DESCAPOTE H= 0.20 MTS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	3 días	lun 10/08/26	mié 12/08/26	3FC+5 días	$ 35.224.526,00
8		1.2.3	1.3 DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 6" A Ø 10"	2 días	jue 13/08/26	vie 14/08/26	7	$ 207.202,00
9		1.2.4	1.4 DEMOLICION ANDEN. E=10CM. INCLUYE RETIRO	2 días	vie 25/09/26	mar 29/09/26	28	$ 1.587.150,00
10		1.2.5	1.5 DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA E=10CM. INCLUYE RETIRO	2 días	mar 29/09/26	jue 1/10/26	9	$ 4.028.904,00
11		**1.3**	**2. MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**68,44 días**	**vie 14/08/26**	**jue 12/11/26**		**$ 206.351.649,00**
12		1.3.1	2.1 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE. RETIRO Y D	9 días	vie 14/08/26	mié 26/08/26	7FC+1 día	$ 37.582.965,00
13		1.3.2	2.2 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO	5 días	mar 29/09/26	lun 5/10/26	10FC-2 días	$ 19.642.860,00
14		1.3.3	2.3 TRANSPORTE DE MATERIAL/SOBRANTE U OTRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	8 días	mar 29/09/26	vie 6/11/26	13FC-5 días	$ 68.973.169,00
15		1.3.4	2.4 CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA.	5 días	sáb 31/10/26	lun 9/11/26	14FC-4 días	$ 38.128.663,00
16		1.3.5	2.5 EXCAVACION MECANICA, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE EXC	2 días	jue 5/11/26	lun 9/11/26	15FC-2 días	$ 18.537.733,00
17		1.3.6	2.6 NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-RASANTE HASTA OBTEN	3 días	jue 5/11/26	mar 10/11/26	16FC-2 días	$ 19.627.670,00
18		1.3.7	2.7 NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-RASANTE PARA ANDEN	3 días	lun 9/11/26	jue 12/11/26	17FC-1 día	$ 3.845.589,00
19		**1.4**	**3. CIMENTACION**	**34,22 días**	**mar 18/08/26**	**mié 30/09/26**		**$ 133.778.317,00**
20		1.4.1	3.1 COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR>95% DEL PROCTOR M	3 días	sáb 19/09/26	mié 23/09/26	22	$ 8.515.533,00
21		1.4.2	3.2 SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS. INCL	2 días	mar 8/09/26	mié 9/09/26	33	$ 2.379.471,00
22		1.4.3	3.3 VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLA	6 días	sáb 12/09/26	sáb 19/09/26	21FC-7 días	$ 39.314.892,00
23		1.4.4	3.4 CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI (60% CONCRETO Y 40% PIEDRA PEQUEÑA) SEGÚN S	5 días	mar 18/08/26	lun 24/08/26	12FC-7 días	$ 7.766.310,00
24		1.4.5	3.5 RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE B-200 SE	3 días	vie 25/09/26	mié 30/09/26	25	$ 71.010.008,00
25		1.4.6	3.6 GEOTEXTIL NT2500 O SIMILAR	2 días	mié 23/09/26	vie 25/09/26	20	$ 4.792.103,00
26		**1.5**	**4. ESTRUCTURAS**	**51,22 días**	**mié 26/08/26**	**sáb 31/10/26**		**$ 541.601.757,00**
27		**1.5.1**	**4.1 ESTRUCTURA EN CONCRETO**	**51,22 días**	**mié 26/08/26**	**sáb 31/10/26**		**$ 343.120.224,00**
28		1.5.1.1	4.1.1 COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA S	5 días	sáb 19/09/26	vie 25/09/26	22,21	$ 41.756.737,00
29		1.5.1.2	4.1.2 VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE C	6 días	mié 30/09/26	mié 7/10/26	41;42;28	$ 49.897.449,00
30		1.5.1.3	4.1.3 PLACA DE ENTREPISO ALIGERADO EN CONCRETO DE 4.000 PSI E=0.35 M SEGÚN F	6 días	mié 7/10/26	vie 16/10/26	41;42;29	$ 57.637.766,00
31		1.5.1.4	4.1.4 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN	10 días	vie 25/09/26	jue 8/10/26	41;42;28	$ 124.761.652,00
32		1.5.1.5	4.1.5 CONSTRUCCION DE PLACA DE MACIZA EN CONCRETO DE 3.000 PSI SEGÚN PLANOS	5 días	vie 25/09/26	vie 2/10/26	41;42;28	$ 3.306.460,00
33		1.5.1.6	4.1.6 CONSTRUCCION DE ZAPATA EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEG	6 días	mar 26/08/26	jue 3/09/26	12;23FC-2 día	$ 26.824.181,00
34		1.5.1.7	4.1.7 CONSTRUCCION DE ESCALERA EN CONCRETO DE 4.000 PSI. INCLUYE, MANO DE	15 días	mié 7/10/26	jue 15/10/26	29	$ 7.539.234,00
35		1.5.1.8	4.1.8 JUNTA DE DILATACIÓN CUBREJUNTAS SERIE CUBIERTA RHT-CU500; EN LAUMINIC	3 días	vie 16/10/26	mar 20/10/26	30	$ 4.344.084,00
36		1.5.1.9	4.1.9 JUNTA DE DILATACIÓN SERIE CUBREJUNTA FABRICACION NACIONAL RHT-500 ; EN	3 días	mar 20/10/26	vie 23/10/26	35	$ 14.751.682,00
37		1.5.1.10	4.1.10 ATRAQUE PARA ALCANTARILLA	3 días	vie 16/10/26	mar 20/10/26	30	$ 4.156.429,00
38		1.5.1.11	4.1.11 COLUMNETAS EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE	4 días	mar 20/10/26	lun 26/10/26	37	$ 6.523.368,00
39		1.5.1.12	4.1.12 CARCAMO EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0.15M INCLUYE MANO DE OBRA, FORMA	5 días	lun 26/10/26	sáb 31/10/26	38	$ 1.482.182,00
40		**1.5.2**	**4.2 ACERO DE REFUERZO - ANCLAJES**	**20 días**	**mar 1/09/26**	**vie 25/09/26**		**$ 198.481.533,00**
41		1.5.2.1	4.2.1 ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60- NTC 2289 INCLUYE ALA	20 días	mar 1/09/26	vie 25/09/26	4	$ 166.221.557,00
42		1.5.2.2	4.2.2 MALLA ELECTROSOLDADA FY 485 MPA -NTC 5806, INCLUYE ALAMBRE NEGRO TR	5 días	mar 1/09/26	lun 7/09/26	4	$ 28.014.814,00
43		1.5.2.3	4.2.3 ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60- NTC 2289 INCLUYE EPC	15 días	mar 1/09/26	vie 18/09/26	4	$ 4.245.162,00
44		**1.6**	**5. MAMPOSTERIA**	**11 días**	**jue 8/10/26**	**vie 23/10/26**		**$ 111.968.526,00**
45		1.6.1	5.1 DINTELES CONCRETO DE 3000 PSI 0,15 X0,20, INCLUYE ACERO DE REFUERO	4 días	lun 19/10/26	vie 23/10/26	47	$ 8.578.339,00
46		1.6.2	5.2 ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000 PSI A=0,25. (INCLUYE REFUERZO	4 días	lun 19/10/26	vie 23/10/26	47	$ 23.752.520,00
47		1.6.3	5.3 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA N°5 PV E=0,12 MTS. , INCLUYE , MORTERO RELLENO DI	7 días	jue 8/10/26	lun 19/10/26	43;31	$ 58.942.385,00
48		1.6.4	5.4 MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUARDADO E= 0,15 MTS, INCLUYE CONCRETO DE	5 días	jue 8/10/26	vie 16/10/26	43;31	$ 11.410.991,00
49		1.6.5	5.5 POYO CONCRETO DE 3000 PSI ALTURA HASTA 0.30 ANCHO HASTA DE 0.80 MTS, INCLU	2 días	mié 21/10/26	vie 23/10/26	47;50	$ 345.154,00
50		1.6.6	5.6 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 PERFORACIÓN HORIZONTAL E=0.12 MTS @.33MO	7 días	mar 13/10/26	mié 21/10/26	43;31FC+2 día	$ 8.699.137,00
51		**1.7**	**6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**51,89 días**	**lun 21/09/26**	**vie 27/11/26**		**$ 487.081.211,00**
52		**1.7.1**	**6.1 INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS**	**44 días**	**mié 30/09/26**	**vie 27/11/26**		**$ 68.838.494,00**
53		1.7.1.1	6.1.1 TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTA	2 días	mié 30/09/26	vie 2/10/26	24	$ 4.480.860,00
54		1.7.1.2	6.1.2 TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTA	2 días	vie 2/10/26	lun 5/10/26	53	$ 1.863.720,00
55		1.7.1.3	6.1.3 TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTA	2 días	lun 5/10/26	mié 7/10/26	54	$ 3.836.744,00
56		1.7.1.4	6.1.4 TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 6", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTA	2 días	mié 7/10/26	vie 9/10/26	55	$ 2.736.385,00
57		1.7.1.5	6.1.5 PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓ	2 días	vie 9/10/26	mié 14/10/26	56	$ 1.851.195,00
58		1.7.1.6	6.1.6 PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓ	2 días	mié 14/10/26	vie 16/10/26	57	$ 878.747,00
59		1.7.1.7	6.1.7 SIFÓN Ø 3X2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	2 días	vie 16/10/26	lun 19/10/26	58	$ 1.010.990,00
60		1.7.1.8	6.1.8 TAPÓN SANITARIO SOLDADO PVC Ø 3"	1 día	lun 19/10/26	mar 20/10/26	59	$ 103.750,00
61		1.7.1.9	6.1.9 TAPÓN SANITARIO SOLDADO PVC Ø 4"	1 día	mar 20/10/26	mié 21/10/26	60	$ 192.165,00
62		1.7.1.10	6.1.10 TAPÓN SANITARIO SOLDADO PVC Ø 6"	1 día	mié 21/10/26	jue 22/10/26	61	$ 104.286,00
63		1.7.1.11	6.1.11 BAJANTE PVC AGUAS NEGRAS Ø 6" (INCLUYE SOPORTE METALICO PARA BAJAN	1 día	jue 22/10/26	vie 23/10/26	62	$ 788.122,00
64		1.7.1.12	6.1.12 TUBERÍA NOVAFORT 6", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓ	4 días	vie 23/10/26	jue 29/10/26	63	$ 19.759.869,00
65		1.7.1.13	6.1.13 CAJA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,6M H= 0 -1,0M, INCLUYE TAPA EN CONCRETO (un)	3 días	jue 29/10/26	mar 3/11/26	64	$ 14.585.782,00
66		1.7.1.14	6.1.14 CAJA DE INSPECCIÓN 0,80 X 0,8M H=1,0 -1,5M. INCLUYE TAPA EN CONCRETO (un)	3 días	mar 3/11/26	vie 6/11/26	65	$ 10.807.484,00
67		1.7.1.15	6.1.15 CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE	4 días	vie 6/11/26	mié 11/11/26	66	$ 149.316,00
68		1.7.1.16	6.1.16 TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA	4 días	mar 10/11/26	vie 13/11/26	67FC-2 días	$ 290.991,00
69		1.7.1.17	6.1.17 TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INS	4 días	jue 12/11/26	mié 18/11/26	68FC-2 días	$ 1.385.722,00
70		1.7.1.18	6.1.18 TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INS	4 días	sáb 14/11/26	vie 20/11/26	69FC-2 días	$ 254.998,00
71		1.7.1.19	6.1.19 VALVULAMINIVENT 2"	4 días	jue 19/11/26	mar 24/11/26	70FC-1 día	$ 2.542.682,00
72		1.7.1.20	6.1.20 VALVULA MAXIVENT 4"	4 días	lun 23/11/26	vie 27/11/26	71FC-1 día	$ 1.174.686,00
73		**1.7.2**	**6.2 INSTALACIONES HIDRAÚLICAS AGUA FRIA**	**40 días**	**mié 30/09/26**	**mar 24/11/26**		**$ 36.470.743,00**
74		1.7.2.1	6.2.1 TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13,5 Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORREC	3 días	mié 30/09/26	sáb 3/10/26	24	$ 496.497,00
75		1.7.2.2	6.2.2 TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3/4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECT	3 días	lun 5/10/26	mié 7/10/26	74	$ 862.840,00
76		1.7.2.3	6.2.3 TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA	3 días	jue 8/10/26	mar 13/10/26	75	$ 485.136,00
77		1.7.2.4	6.2.4 TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1-1/4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORREC	2 días	mar 13/10/26	jue 15/10/26	76	$ 133.410,00
78		1.7.2.5	6.2.5 TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1-1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORREC	2 días	jue 15/10/26	sáb 17/10/26	77	$ 486.764,00
79		1.7.2.6	6.2.6 TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA	3 días	sáb 17/10/26	mié 21/10/26	78	$ 2.255.397,00
80		1.7.2.7	6.2.7 TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA	3 días	mié 21/10/26	lun 26/10/26	79	$ 19.294.599,00
81		1.7.2.8	6.2.8 PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTAL	2 días	lun 26/10/26	mié 28/10/26	80	$ 564.162,00
82		1.7.2.9	6.2.9 PUNTO DE AGUA FRIA Ø 3/4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTAL	2 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26	81	$ 234.690,00
83		1.7.2.10	6.2.10 REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 3/4"	1 día	vie 30/10/26	sáb 31/10/26	82	$ 681.261,00
84		1.7.2.11	6.2.11 REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1"	1 día	sáb 31/10/26	mar 3/11/26	83	$ 361.469,00
85		1.7.2.12	6.2.12 REGISTRO DE AGUA 2" INCLUYE CAJA PARA EXTERIORES	1 día	mar 3/11/26	mié 4/11/26	84	$ 1.542.713,00
86		1.7.2.13	6.2.13 VALVULA DE CHEQUE CORTINA Ø 2"	3 días	mié 4/11/26	lun 9/11/26	85	$ 1.307.253,00
87		1.7.2.14	6.2.14 DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 3" A Ø 6"	3 días	lun 5/11/26	jue 12/11/26	86	$ 3.635.712,00
88		1.7.2.15	6.2.15 DESINFECCIÓN RED HIDRÁULICA	3 días	jue 12/11/26	mar 17/11/26	87	$ 2.759.653,00
89		1.7.2.16	6.2.16 CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 2"	1 día	mar 17/11/26	mié 18/11/26	88	$ 87.838,00
90		1.7.2.17	6.2.17 TUBERIA PARA DESAGUE EN PVC RDE 21 DE Ø 1" CON AISLACIÓN RUBATEX	2 días	mié 18/11/26	vie 20/11/26	89	$ 889.024,00
91		1.7.2.18	6.2.18 TUBERIA PARA DESAGUE EN PVC RDE 21 DE Ø 3/4" CON AISLACIÓN RUBATEX	2 días	vie 20/11/26	mar 24/11/26	90	$ 392.125,00
92		**1.7.3**	**6.3 INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS**	**51,33 días**	**lun 21/09/26**	**vie 27/11/26**		**$ 197.343.764,00**
93		1.7.3.1	6.3.1 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC Ø 4"	2 días	mar 3/11/26	mié 4/11/26	313	$ 5.147.653,00
94		1.7.3.2	6.3.2 SIFÓN CON REJILLA TRAGANTE Ø 4" ALUMINIO	2 días	jue 5/11/26	vie 6/11/26	93	$ 603.525,00
95		1.7.3.3	6.3.3 SIFÓN Ø 4X3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	2 días	sáb 7/11/26	mar 10/11/26	94	$ 1.913.042,00
96		1.7.3.4	6.3.4 TUBERÍA NOVAFORT 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓ	2 días	mar 10/11/26	jue 12/11/26	95	$ 4.116.158,00
97		1.7.3.5	6.3.5 TUBERÍA NOVAFORT 6" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓ	2 días	jue 12/11/26	sáb 14/11/26	96	$ 11.797.307,00
98		1.7.3.6	6.3.6 TUBERÍA NOVAFORT 8" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓ	2 días	jue 12/11/26	sáb 14/11/26	97FC-2 días	$ 4.923.282,00
99		1.7.3.7	6.3.7 TUBERÍA NOVAFORT 10" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓ	2 días	jue 12/11/26	sáb 14/11/26	98FC-2 días	$ 1.179.944,00
100		1.7.3.8	6.3.8 GARGOLA TIPO BALCÓN 0,65*0,26*07"	2 días	sáb 14/11/26	mié 18/11/26	99	$ 383.014,00
101		1.7.3.9	6.3.9 TUBERIA CONCRETO 14"	2 días	mié 18/11/26	vie 20/11/26	100	$ 20.798.142,00
102		1.7.3.10	6.3.10 POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE Ø 1,20 H = 1,50 Y 2,50 M INCLUYE CON	5 días	mié 18/11/26	mié 25/11/26	101FC-2 días	$ 14.442.554,00
103		1.7.3.11	6.3.11 POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE Ø 1,20 H = 0M Y 1,50 M INCLUYE CONO	5 días	mié 18/11/26	mié 25/11/26	102FC-5 días	$ 5.093.249,00
104		1.7.3.12	6.3.12 RELLENO CON MATERIAL DRENANTE	4 días	mié 18/11/26	mar 24/11/26	103FC-5 días	$ 14.611.136,00
105		1.7.3.13	6.3.13 GEODREN PERMADRAIN 450 TUBULAR O SIMILAR, H=0.0 - 1.00m, CON FUNDA PAI	3 días	vie 20/11/26	mié 25/11/26	104FC-2 días	$ 40.383.860,00
106		1.7.3.14	6.3.14 GEODREN PERMADRAIN 450 TUBULAR O SIMILAR, H=0.0 - 1.00 m, CON FUNDA PA	4 días	lun 23/11/26	vie 27/11/26	105FC-2 días	$ 26.365.812,00
107		1.7.3.15	6.3.15 CAJA DE INSPECCIÓN 1.30 X 1.30m INCLUYE 02 TAPAS EN LAMINA DE ALFAJOR Y	2 días	mié 25/11/26	vie 27/11/26	106FC-2 días	$ 1.464.477,00
108		1.7.3.16	6.3.16 ZANJA CON RECUBRIMIENTO EN GEOTEXTIL IMPERMEABLE DE ALTA RESISTENC	5 días	lun 21/09/26	vie 25/09/26		$ 13.642.477,00
109		1.7.3.17	6.3.17 EXCAVACIÓN Y PENDIENTADO DE VALLADO SECCIÓN TRAPEZOIDAL. B=0.4m, b=0.6	6 días	mar 29/09/26	mar 6/10/26	108	$ 993.150,00

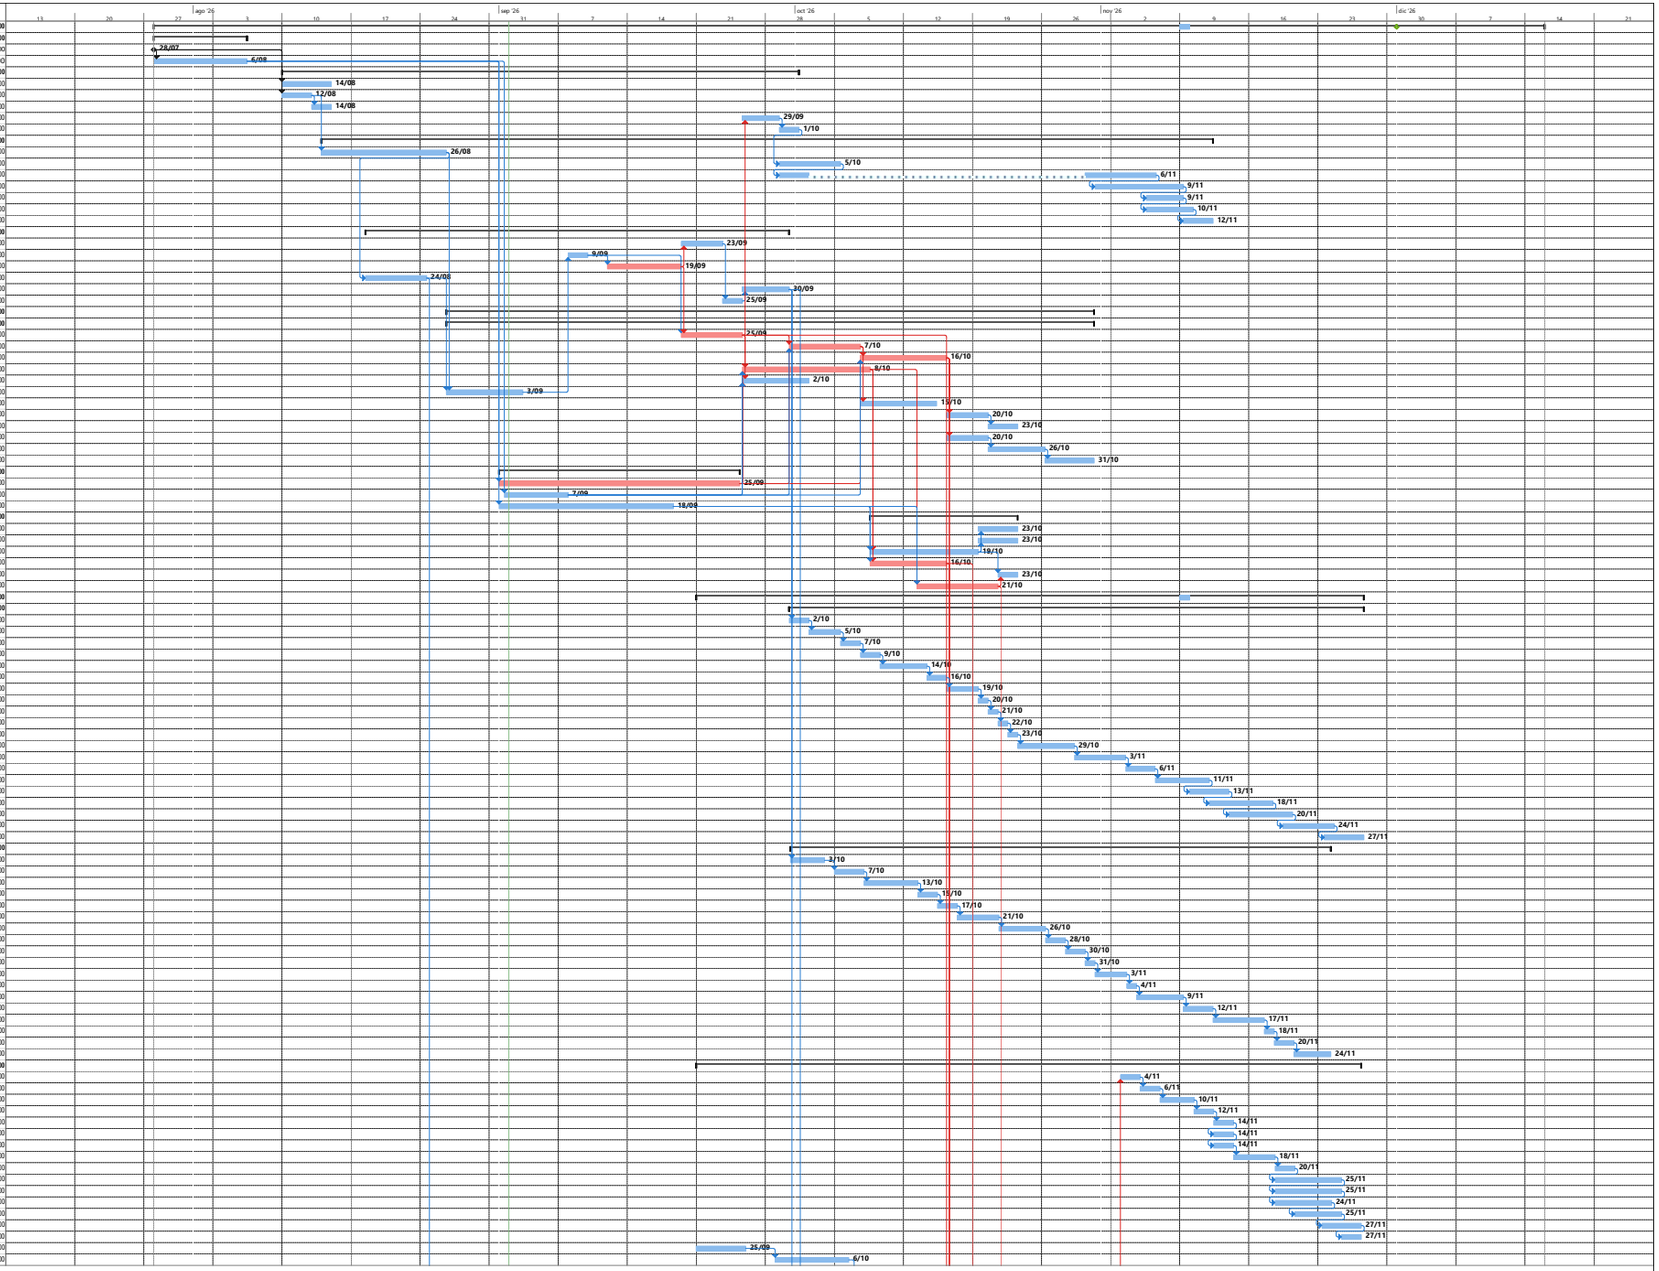


Proyecto: 3. 031-00-A-COFAC-D
Fecha: mié 2/09/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
110		1.7.3.18	6.3.18 EXCAVACIÓN Y PENDIENTADO DE VALLADO SECCIÓN TRAPEZOIDAL, B=1.5m, b=0.5m,	10 días	mié 7/10/26	mar 20/10/26	109	$ 14.588.670,00
111		1.7.3.19	6.3.19 TAPÓN PVC 4" - TUB PERFORADA	2 días	mié 21/10/26	jue 22/10/26	110	$ 230.649,00
112		1.7.3.20	6.3.20 TAPÓN PVC 6" - TUB PERFORADA	2 días	vie 23/10/26	lun 26/10/26	111	$ 211.079,00
113		1.7.3.21	6.3.21 REJILLA PLASTICA 73.5 X 4.5 X 10 TRAFICO PESADO	2 días	lun 26/10/26	mar 27/10/26		$ 3.921.213,00
114		1.7.3.22	6.3.22 ENTIBADO TIPO 2	5 días	mié 28/10/26	mié 4/11/26	113	$ 10.533.371,00
115		**1.7.4**	**6.4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS**	**21 días**	**vie 16/10/26**	**jue 12/11/26**		**$ 139.456.645,00**
116		1.7.4.1	6.4.1 TUBERIA PVC- C 900 4" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	3 días	vie 16/10/26	mar 20/10/26	30	$ 20.117.514,00
117		1.7.4.2	6.4.2 TUBERÍA ACERO AL CARBÓN SCH 40 12", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRE	1 día	mar 20/10/26	mié 21/10/26	116	$ 1.951.089,00
118		1.7.4.3	6.4.3 TUBERÍA ACERO AL CARBÓN SCH 40 11", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORREC	1 día	mié 21/10/26	jue 22/10/26	117	$ 3.749.854,00
119		1.7.4.4	6.4.4 TUBERÍA ACERO AL CARBÓN SCH 40 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU COR	1 día	jue 22/10/26	vie 23/10/26	118	$ 3.010.097,00
120		1.7.4.5	6.4.5 TUBERÍA ACERO AL CARBÓN SCH 40 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORREC	1 día	vie 23/10/26	lun 26/10/26	119	$ 5.396.705,00
121		1.7.4.6	6.4.6 TUBERÍA ACERO AL CARBÓN SCH 40 2 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORR	1 día	lun 26/10/26	mar 27/10/26	120	$ 2.740.343,00
122		1.7.4.7	6.4.7 TUBERÍA ACERO AL CARBÓN SCH 40 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORREC	1 día	mar 27/10/26	mié 28/10/26	121	$ 1.910.189,00
123		1.7.4.8	6.4.8 TUBERÍA ACERO AL CARBÓN SCH 40 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORREC	1 día	mié 28/10/26	jue 29/10/26	122	$ 791.000,00
124		1.7.4.9	6.4.9 SIAMESA BRONCE 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	1 día	jue 29/10/26	vie 30/10/26	123	$ 1.589.745,00
125		1.7.4.10	6.4.10 GABINETE CONTRA INCENDIOS CLASE III	1 día	vie 30/10/26	sáb 31/10/26	124	$ 2.315.645,00
126		1.7.4.11	6.4.11 ROCIADOR PENDET K=5.6 RESPUESTA RAPIDA 1/2"	2 días	sáb 31/10/26	mié 4/11/26	125	$ 3.635.398,00
127		1.7.4.12	6.4.12 SISTEMA CONTROLADOR,INCLUYE (VALVULA OS&Y 3", SENSOR DE FLUJO 3", CH	1 día	mié 4/11/26	jue 5/11/26	126	$ 2.238.980,00
128		1.7.4.13	6.4.13 SENSOR DE FLUJO 1 1/2"	1 día	jue 5/11/26	vie 6/11/26	127	$ 411.522,00
129		1.7.4.14	6.4.14 SENSOR DE FLUJO 2 1/2"	1 día	vie 6/11/26	sáb 7/11/26	128	$ 2.283.353,00
130		1.7.4.15	6.4.15 VALVULA DE ALIVIO 2 1/2"	1 día	lun 9/11/26	lun 9/11/26	129	$ 4.379.552,00
131		1.7.4.16	6.4.16 VALVULA DE DESAGUE 1" PARA ESTACIONES DE ALARMA Y CONTROL	1 día	mar 10/11/26	mar 10/11/26	130	$ 346.123,00
132		1.7.4.17	6.4.17 ESTACIÓN DE CONTROL 2" UL/FM	1 día	mié 11/11/26	mié 11/11/26	131	$ 1.618.329,00
133		1.7.4.18	6.4.18 SOPORTE ANTISISMICO 3"	1 día	mar 20/10/26	mié 21/10/26	116	$ 1.596.093,00
134		1.7.4.19	6.4.19 SOPORTE ANTISISMICO 2"	1 día	mié 21/10/26	jue 22/10/26	117	$ 1.781.157,00
135		1.7.4.20	6.4.20 SOPORTE ANTISISMICO 1 1/2"	1 día	jue 22/10/26	vie 23/10/26	118	$ 2.275.565,00
136		1.7.4.21	6.4.21 SOPORTE ANTISISMICO 1"	1 día	vie 23/10/26	lun 26/10/26	119	$ 4.044.141,00
137		1.7.4.22	6.4.22 CODO 90° PVC (CAM X CAM) 4" C900	1 día	lun 26/10/26	mar 27/10/26	120	$ 9.183.491,00
138		1.7.4.23	6.4.23 COLUMNA DE DISTRIBUCIÓN SCH 40 3"	1 día	mar 10/11/26	mar 10/11/26	121	$ 705.026,00
139		1.7.4.24	6.4.24 TEE PVC (CAM X CAMX CAM) 4" C900, INCLUYE RESTRICTORES	1 día	mié 28/10/26	jue 29/10/26	122	$ 7.881.236,00
140		1.7.4.25	6.4.25 KIT DE TRANSICIÓN C900 A SCH 40 3" CON RESTRICTOR	1 día	jue 29/10/26	vie 30/10/26	123	$ 2.277.963,00
141		1.7.4.26	6.4.26 KIT DE TRANSICIÓN C900 A SCH 40 4" CON RESTRICTOR	1 día	vie 30/10/26	sáb 31/10/26	124	$ 3.880.807,00
142		1.7.4.27	6.4.27 CABEZAL DE PRUEBA 4" CON 2 SALIDAS DE 2 1/2"	1 día	sáb 31/10/26	mar 3/11/26	125	$ 1.693.380,00
143		1.7.4.28	6.4.28 HIDRANTE 4" EXTREMO LISO (A TODO COSTO) INCLUYE ESE DE NIVELACIÓN EX	1 día	mié 4/11/26	jue 5/11/26	126	$ 9.924.714,00
144		1.7.4.29	6.4.29 RESTRICTOR HD TUBO PVC x TUBO PVC 4"	2 días	jue 5/11/26	sáb 7/11/26	127	$ 15.746.069,00
145		1.7.4.30	6.4.30 UNIÓN REPARACIÓN CXC PVC RED CONTRA INCENDIO C900 4"	2 días	vie 6/11/26	lun 9/11/26	128	$ 4.448.150,00
146		1.7.4.31	6.4.31 UNIÓN RÍGIDA RANURADA 1"	1 día	lun 9/11/26	lun 9/11/26	129	$ 1.295.250,00
147		1.7.4.32	6.4.32 UNIÓN FLEXIBLE RANURADA 1 1/2"	1 día	mar 10/11/26	mar 10/11/26	130	$ 178.373,00
148		1.7.4.33	6.4.33 UNIÓN FLEXIBLE RANURADA 2"	1 día	mié 11/11/26	mié 11/11/26	131	$ 142.771,00
149		1.7.4.34	6.4.34 UNIÓN FLEXIBLE RANURADA 2 1/2"	1 día	jue 12/11/26	jue 12/11/26	132	$ 334.405,00
150		1.7.4.35	6.4.35 UNIÓN FLEXIBLE RANURADA 3"	1 día	mar 27/10/26	mar 27/10/26	133	$ 563.804,00
151		1.7.4.36	6.4.36 UNIÓN FLEXIBLE RANURADA DE 4"	1 día	mié 28/10/26	mié 28/10/26	134	$ 194.960,00
152		1.7.4.37	6.4.37 UNIÓN RÍGIDA RANURADA 3"	1 día	jue 29/10/26	jue 29/10/26	135	$ 308.473,00
153		1.7.4.38	6.4.38 CODO RANURADO 1 1/2" 90°	1 día	vie 30/10/26	vie 30/10/26	136	$ 202.391,00
154		1.7.4.39	6.4.39 CODO RANURADO 2" 90°	1 día	sáb 31/10/26	mar 3/11/26	137	$ 81.730,00
155		1.7.4.40	6.4.40 CODO RANURADO 3" 90°	1 día	mié 11/11/26	mié 11/11/26	138	$ 192.187,00
156		1.7.4.41	6.4.41 CODO RANURADO 2 1/2" 90°	1 día	mié 4/11/26	mié 4/11/26	139	$ 297.517,00
157		1.7.4.42	6.4.42 TEE MECÁNICA ROSCADA TIPO PERNO EN U 1 1/2 X 1"	1 día	jue 5/11/26	jue 5/11/26	140	$ 987.018,00
158		1.7.4.43	6.4.43 TEE MECANICA RANURADA 2X1"	1 día	vie 6/11/26	vie 6/11/26	141	$ 9.190.113,00
159		1.7.4.44	6.4.44 TEE MECÁNICA RANURADA DE 3 X 1 1/2	1 día	sáb 7/11/26	lun 9/11/26	142	$ 993.822,00
160		1.7.4.45	6.4.45 TEE MECÁNICA RANURADA DE 3 X 2"	1 día	lun 9/11/26	lun 9/11/26	143	$ 350.818,00
161		1.7.4.46	6.4.46 TEE RANURADA 3"	1 día	mar 10/11/26	mar 10/11/26	144	$ 50.713,00
162		1.7.4.47	6.4.47 REDUCCIÓN EXCENTRICA 3"X2" SCH 40 RANURADA, INCLUYE ACOPLES.	1 día	mié 11/11/26	mié 11/11/26	145	$ 86.533,00
163		1.7.4.48	6.4.48 REDUCCIÓN EXCENTRICA 3" X 1-1/2" SCH 40 RANURADA, INCLUYE ACOPLES.	1 día	jue 12/11/26	jue 12/11/26	146	$ 82.587,00
164		**1.7.5**	**6.5 INSTALACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS**	**2 días**	**sáb 14/11/26**	**mié 18/11/26**	**147**	**$ 44.971.565,00**
165		1.7.5.1	6.5.1 INSTALACIÓN DE EQUIPO INCENDIOS NORMALIZADO 30 HP, (INCLUYE 1 BOMBA Q	2 días	sáb 14/11/26	mié 18/11/26	148	$ 44.971.565,00
166		**1.8**	**7. INSTALACIONES ELECTRICAS**	**46,11 días**	**mié 30/09/26**	**mar 1/12/26**		**$ 468.688.860,00**
167		**1.8.1**	**7.1 PRELIMINARES**	**2 días**	**lun 19/10/26**	**mar 20/10/26**		**$ 379.251,00**
168		1.8.1.1	7.1.1 PASAMURO PARA PASO DE DUCTERIA, INCLUYE PERFORACIÓN, RESANE Y PINTU	2 días	lun 19/10/26	mar 20/10/26	48	$ 379.251,00
169		**1.8.2**	**7.2 BANCO DE DUCTERÍAS INTERNAS - EXTERNAS TIPO CONDUIT PVC, EMT, IMC, CAJAS**	**19 días**	**mié 30/09/26**	**lun 26/10/26**		**$ 21.103.223,00**
170		1.8.2.1	7.2.1 DUCTERÍA TIPO PVC DE 1 Ø Ø3/4" INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTO	4 días	mié 30/09/26	lun 5/10/26	24	$ 4.828.172,00
171		1.8.2.2	7.2.2 DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 Ø Ø2" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CAJAS D	2 días	lun 5/10/26	mié 7/10/26	170	$ 996.411,00
172		1.8.2.3	7.2.3 DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 Ø Ø2" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CAJAS D	2 días	mié 7/10/26	vie 9/10/26	171	$ 2.107.187,00
173		1.8.2.4	7.2.4 DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 Ø Ø 3/4" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CAJAS	4 días	vie 9/10/26	vie 16/10/26	172	$ 6.123.711,00
174		1.8.2.5	7.2.5 BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA ELECTROZINCADA DE 54X300 MMJALTO X ANS	3 días	vie 16/10/26	mar 20/10/26	173	$ 6.513.910,00
175		1.8.2.6	7.2.6 CORAZA FLEXIBLE LIQUID TIGHT 1¼Ø 2", INCLUYE TERMINALES, UNIONES, SOPO	2 días	mar 20/10/26	jue 22/10/26	174	$ 429.337,00
176		1.8.2.7	7.2.7 CORAZA FLEXIBLE LIQUID TIGHT 1¼Ø 3/4", INCLUYE TERMINALES, UNIONES, SOPO	2 días	jue 22/10/26	lun 26/10/26	175	$ 104.495,00
177		**1.8.3**	**7.3 TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN Y CAJAS DE CONTROL**	**19,11 días**	**jue 5/11/26**	**mar 1/12/26**		**$ 25.822.692,00**
178		1.8.3.1	7.3.1 GABINETE LAMINADO EN FRIO TRIFÁSICO TIPO INDUSTRIAL GRADO DE PROTECC	2 días	jue 5/11/26	sáb 7/11/26	168	$ 4.828.287,00
179		1.8.3.2	7.3.2 TABLERO ENCHUFABLE DE TRIFASICO CON 30 CIRCUITOS MONOFASICOS, CON T	2 días	lun 9/11/26	mar 10/11/26	178FC-1 día	$ 335.736,00
180		1.8.3.3	7.3.3 TABLERO ENCHUFABLE DE TRIFASICO CON 24 CIRCUITOS MONOFASICOS, CON T	2 días	mar 10/11/26	jue 12/11/26	179FC-1 día	$ 3.678.694,00
181		1.8.3.4	7.3.4 TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO, ENCHUFABLES, DOCE (12) CIRCUITOS, PO	2 días	jue 12/11/26	sáb 14/11/26	180FC-1 día	$ 1.382.193,00
182		1.8.3.5	7.3.5 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE MONOPOLAR HOM, 20 A, ICU 10 2	2 días	sáb 14/11/26	mié 18/11/26	181FC-1 día	$ 1.137.398,00
183		1.8.3.6	7.3.6 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE BIPOLAR HOM, 20 A, ICU 10 Ka a2	2 días	mié 18/11/26	vie 20/11/26	182FC-1 día	$ 637.695,00
184		1.8.3.7	7.3.7 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE TRIPOLAR HOM, 20 A, ICU 10 Ka 2	2 días	vie 20/11/26	lun 23/11/26	183FC-1 día	$ 1.509.936,00
185		1.8.3.8	7.3.8 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL EASYPACT EZC TRIPOLAR, 40 A, I 2	2 días	lun 23/11/26	mar 24/11/26	184FC-1 día	$ 1.456.409,00
186		1.8.3.9	7.3.9 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL EASYPACT EZC TRIPOLAR, 50 A, I 2	2 días	mar 24/11/26	mié 25/11/26	185FC-1 día	$ 723.398,00
187		1.8.3.10	7.3.10 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL EASYPACT EZC TRIPOLAR, 63 A, 2	2 días	mié 25/11/26	jue 26/11/26	186FC-1 día	$ 715.023,00
188		1.8.3.11	7.3.11 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL EASYPACT EZC TRIPOLAR, 80 A, 2	2 días	jue 26/11/26	vie 27/11/26	187FC-1 día	$ 2.911.277,00
189		1.8.3.12	7.3.12 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL EASYPACT EZC TRIPOLAR, 150 A2	2 días	vie 27/11/26	lun 30/11/26	188FC-1 día	$ 1.754.231,00
190		1.8.3.13	7.3.13 DPS CLASE II, SEGÚN NORMA IEC 61643-1, (3P+N), CORRIENTE DE IMPULSO POR	2 días	sáb 28/11/26	mar 1/12/26	189FC-1 día	$ 2.753.013,00
191		**1.8.4**	**7.4 ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**	**23 días**	**mié 21/10/26**	**vie 20/11/26**		**$ 173.354.763,00**
192		1.8.4.1	7.4.1 ACOMETIDA EN CABLE 4N250 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 2N250 Cu AWG PE-H3	3 días	mié 21/10/26	vie 23/10/26	168	$ 145.607.272,00
193		1.8.4.2	7.4.2 ACOMETIDA EN CABLE 3N2 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N2 Cu AWG PE-HFFR-2 días		sáb 24/10/26	mar 27/10/26	192	$ 2.102.801,00
194		1.8.4.3	7.4.3 ACOMETIDA EN CABLE 3N4 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N4 Cu AWG PE-HFFR-3 días		mar 27/10/26	vie 30/10/26	193	$ 3.561.605,00
195		1.8.4.4	7.4.4 ACOMETIDA EN CABLE 3N8 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N8 Cu AWG PE-HFFR-3 días		vie 30/10/26	mié 4/11/26	194	$ 956.403,00
196		1.8.4.5	7.4.5 ACOMETIDA EN CABLE 3N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-HFF3 días		mié 4/11/26	lun 9/11/26	195	$ 3.774.151,00
197		1.8.4.6	7.4.6 ACOMETIDA EN CABLE 2N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-HFF3 días		lun 9/11/26	jue 12/11/26	196	$ 2.837.020,00
198		1.8.4.7	7.4.7 ACOMETIDA EN CABLE 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-HFF3 días		jue 12/11/26	mar 17/11/26	197	$ 14.031.617,00
199		1.8.4.8	7.4.8 ACOMETIDA EN CABLE 3N6 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N6 Cu AWG PE-HFFR-3 días		mar 17/11/26	vie 20/11/26	198	$ 483.894,00
200		**1.8.5**	**7.6 SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VA**	**13 días**	**sáb 24/10/26**	**mié 11/11/26**		**$ 26.829.176,00**
201		1.8.5.1	7.6.1 INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG2 días		sáb 24/10/26	mar 27/10/26	192	$ 2.391.519,00
202		1.8.5.2	7.6.2 INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE 15A, 120V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1 día		mar 27/10/26	mié 28/10/26	201	$ 222.356,00
203		1.8.5.3	7.6.3 TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/120V (1Ø-N+PT) (RED NORMAL), INCL 2 días		mié 28/10/26	vie 30/10/26	202	$ 7.497.256,00
204		1.8.5.4	7.6.4 TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø-N+PT) CON PROTECCIÓN P/1 día		vie 30/10/26	sáb 31/10/26	203	$ 3.951.980,00
205		1.8.5.5	7.6.5 TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø-N+PT AISLADO) GRADO HO/1 día		sáb 31/10/26	mar 3/11/26	204	$ 5.210.255,00
206		1.8.5.6	7.6.6 LUMINARIA LED SYLVANIA HERMETICA 2X18W T8 PC DL, 6500K, 3600LM, 100-277V, 1 día		mar 3/11/26	mié 4/11/26	205	$ 2.556.959,00
207		1.8.5.7	7.6.7 LUMINARIA LED SYLVANIA EMERGENCIA R3 COMPACT, 2X1W, 6000K, 2X130LM, 10/1 día		mié 4/11/26	jue 5/11/26	206	$ 906.171,00
208		1.8.5.8	7.6.8 CAJA CON TAPACIEGA, INCLUYE TAPACIEGA, PRENSAESTOPAS Y TODOS LOS ACI 1 día		jue 5/11/26	vie 6/11/26	207	$ 302.325,00
209		1.8.5.9	7.6.9 TOMACORRIENTE Y CLAVIJA 32A/250V (2Ø-N+PT), INCLUYE TODOS LOS ELEMENT 2 días		vie 6/11/26	mar 10/11/26	208	$ 2.997.972,00
210		1.8.5.10	7.6.10 TOMACORRIENTE Y CLAVIJA 32A/250V (3Ø-N+PT), INCLUYE TODOS LOS ELEMEN 1 día		mar 10/11/26	mié 11/11/26	209	$ 791.983,00
211		**1.8.6**	**7.7 PROTECCIONES, PARARRAYOS Y PUESTAS A TIERRA**	**18,11 días**	**jue 1/10/26**	**lun 26/10/26**		**$ 50.813.377,00**
212		1.8.6.1	7.7.1 PUESTA TIERRA MEDIANTE UNA (01) VARILLAS CW 5/8 COBRE- 95%, INCLUYE EXC 2 días		jue 1/10/26	sáb 3/10/26	24	$ 3.771.718,00
213		1.8.6.2	7.7.2 CAJA DE INSPECCIÓN DE (0.30X0.30)M CON TAPA Y TODO LO NECESARIO PARA S/2 días		lun 5/10/26	mar 6/10/26	212	$ 927.539,00
214		1.8.6.3	7.7.3 CABLE DE COBRE DESNUDO AWG NO. 2/0 PARA INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEM/3 días		mié 7/10/26	vie 9/10/26	213	$ 12.596.089,00
215		1.8.6.4	7.7.4 PUNTO DE INTERCONEXIÓN PARA EL CABLEADO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIER2 días		sáb 10/10/26	mié 14/10/26	214	$ 442.620,00
216		1.8.6.5	7.7.5 PUNTA CAPTADORA DE 600 MM EN ALUMINIO DE 5/8", INCLUYE SOPORTE AISLAD/2 días		mié 14/10/26	vie 16/10/26	215	$ 3.050.164,00
217		1.8.6.6	7.7.6 ALAMBRÓN DE ALUMINIO DE 8 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE SOPORTES, CONECTC 3 días		vie 16/10/26	mar 20/10/26	216	$ 4.406.451,00
218		1.8.6.7	7.7.7 BAJANTE DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRIC/2 días		mié 21/10/26	jue 22/10/26	217	$ 20.725.816,00

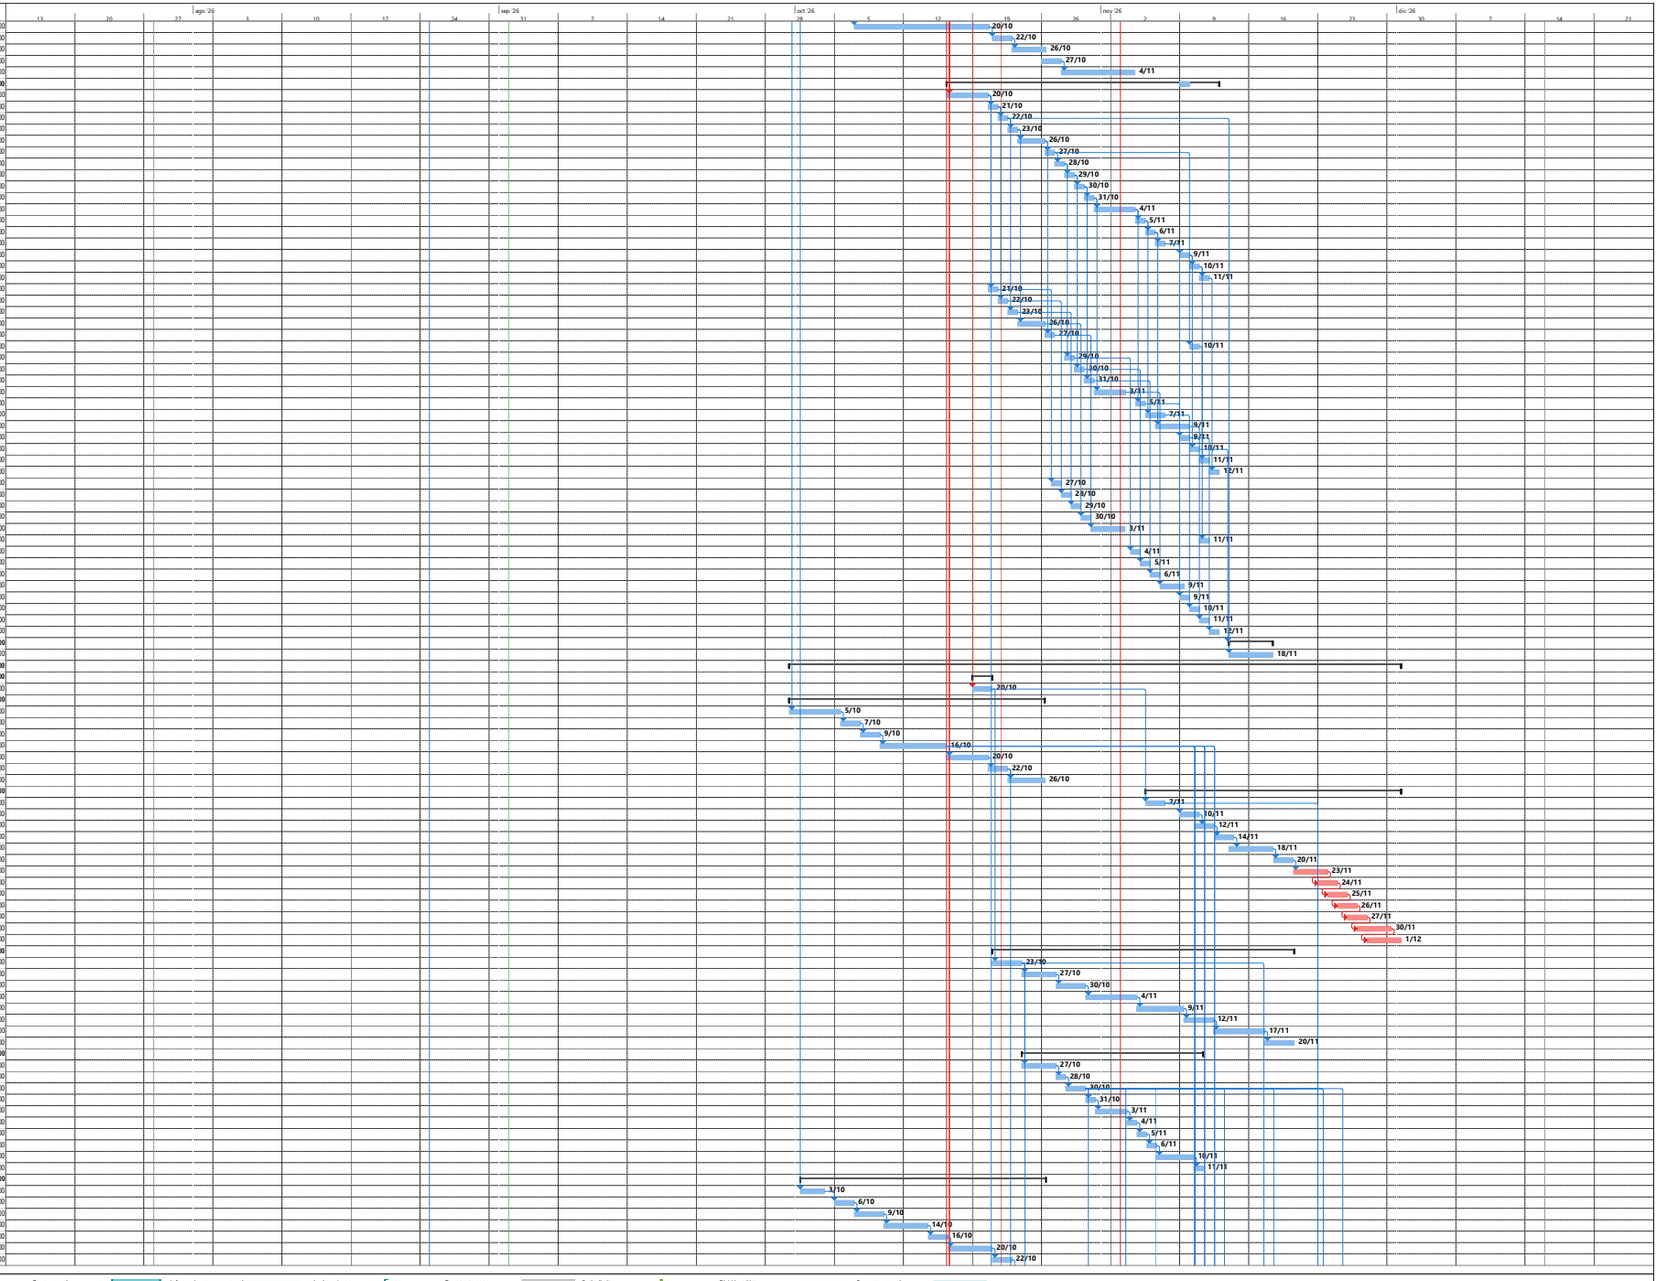

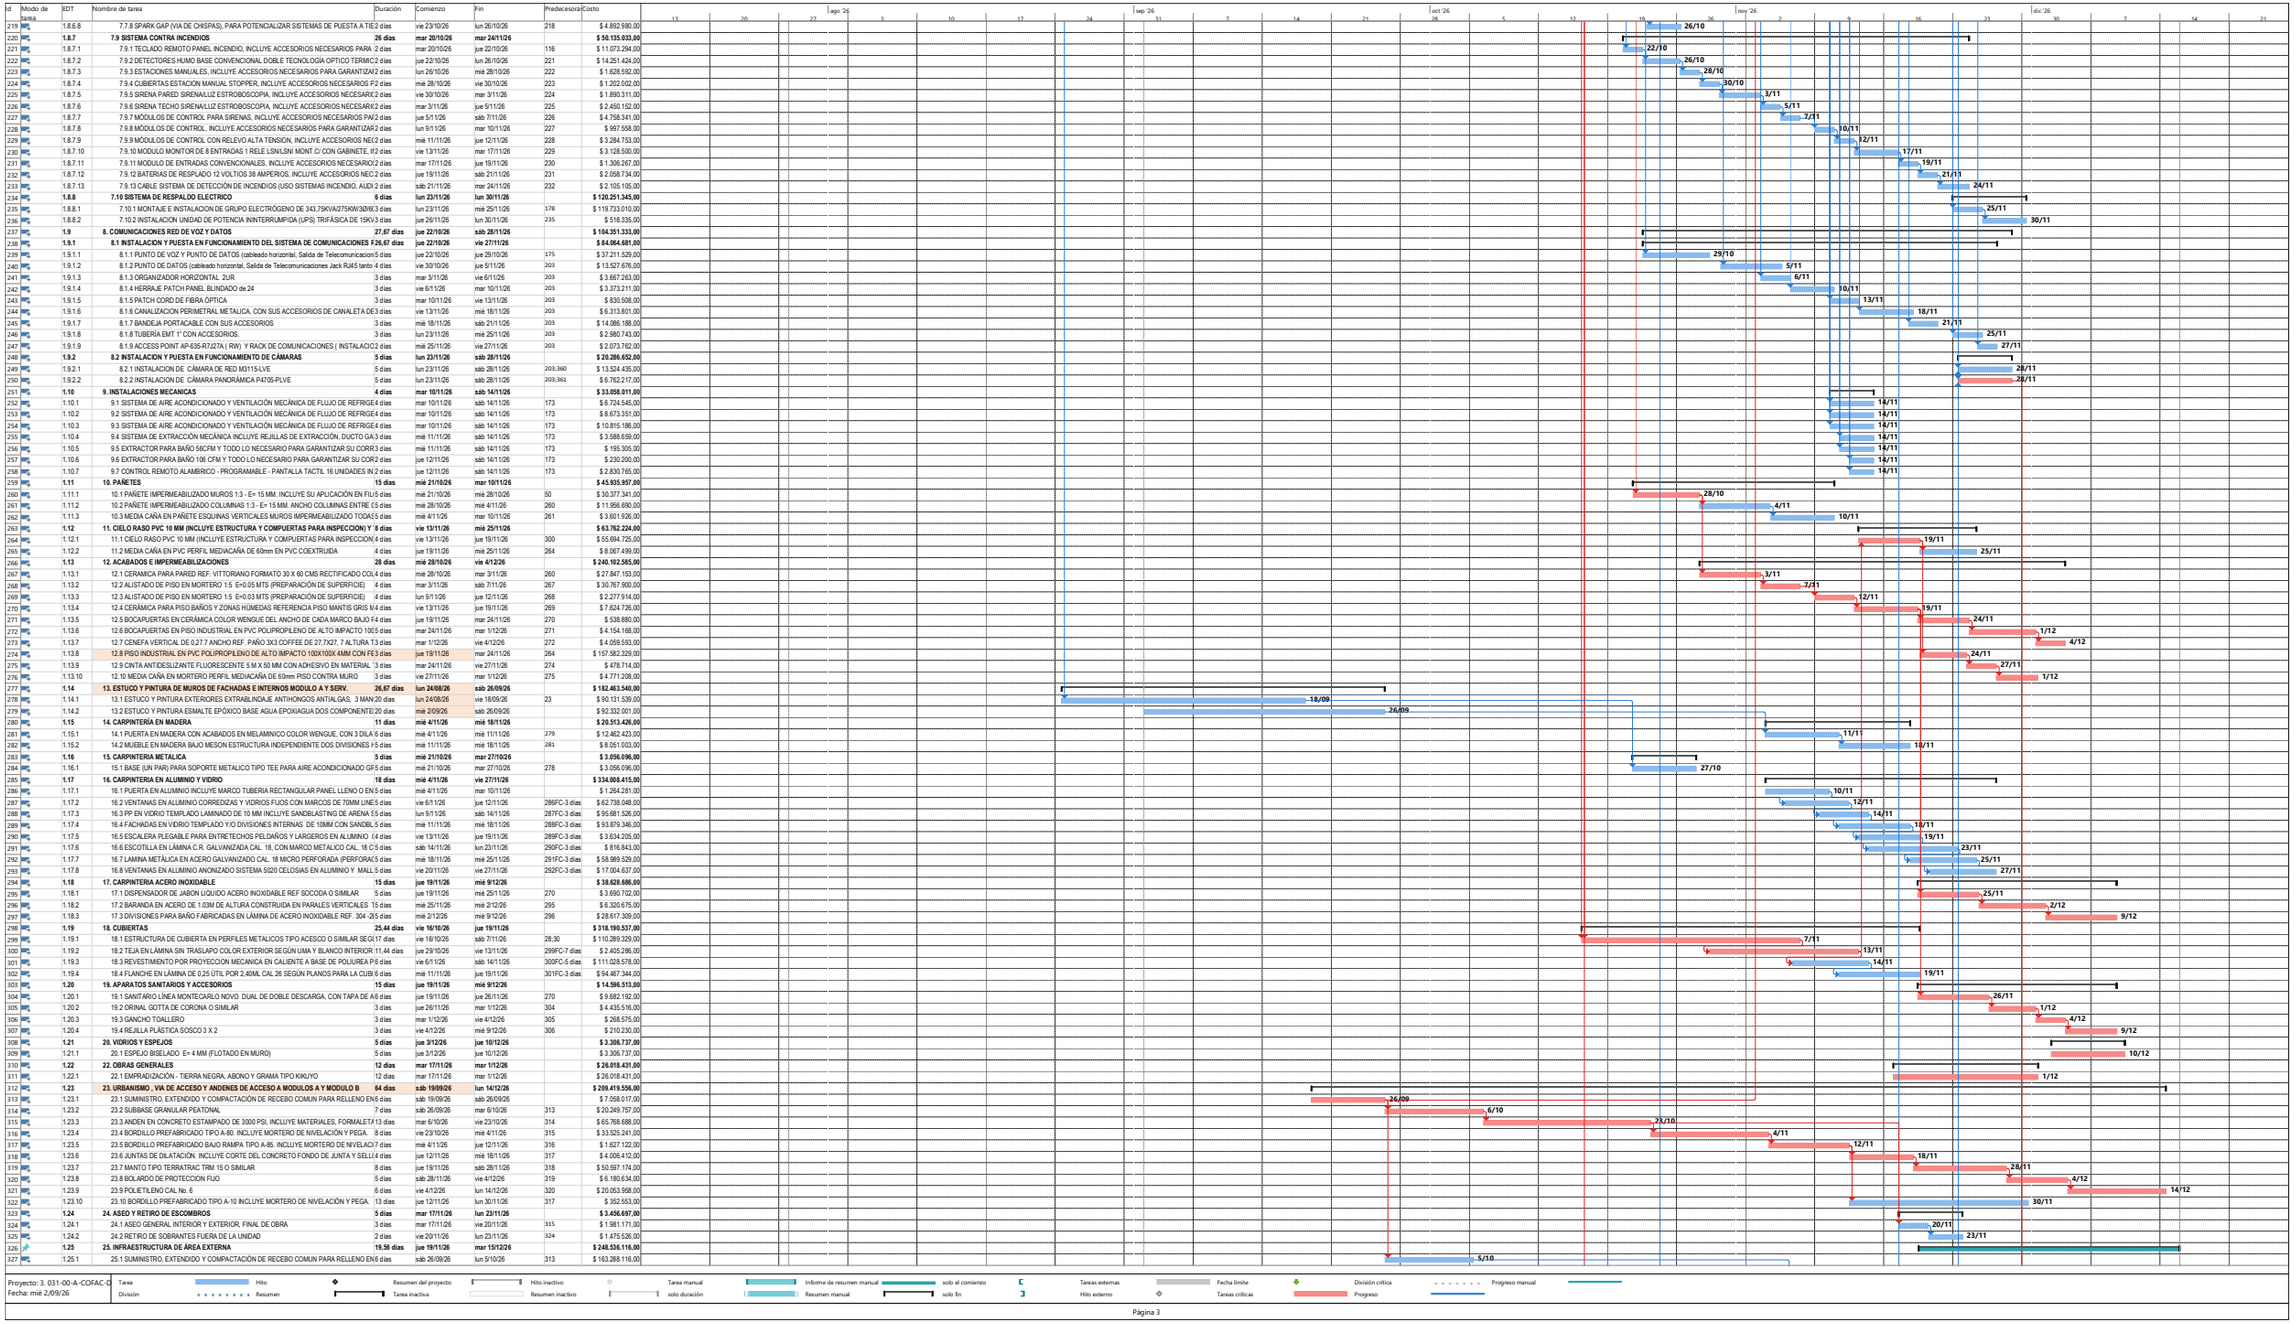

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
219		1.6.6.8	7.7.8 SPARK GAP (VIA DE CHISPAS), PARA POTENCIALIZAR SISTEMAS DE PUESTA A TIE	2 días	vie 23/10/26	lun 26/10/26	218	$ 4.892.680,00
220		**1.6.7**	**7.9 SISTEMA CONTRA INCENDIOS**	**26 días**	**mar 20/10/26**	**mar 24/11/26**		**$ 50.135.033,00**
221		1.6.7.1	7.9.1 TECLADO REMOTO PANEL INCENDIO, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA	2 días	mar 20/10/26	jue 22/10/26	116	$ 11.073.294,00
222		1.6.7.2	7.9.2 DETECTORES HUMO BASE CONVENCIONAL DOBLE TECNOLOGÍA OPTICO TERMIC	2 días	jue 22/10/26	lun 26/10/26	221	$ 14.251.424,00
223		1.6.7.3	7.9.3 ESTACIONES MANUALES, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR	2 días	lun 26/10/26	mié 28/10/26	222	$ 1.628.592,00
224		1.6.7.4	7.9.4 CUBIERTAS ESTACION MANUAL STOPPER, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS P	2 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26	223	$ 1.202.002,00
225		1.6.7.5	7.9.5 SIRENA PARED SIRENA/LUZ ESTROBOSCOPIA, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIO	2 días	vie 30/10/26	mar 3/11/26	224	$ 1.890.311,00
226		1.6.7.6	7.9.6 SIRENA TECHO SIRENA/LUZ ESTROBOSCOPIA, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIO	2 días	mar 3/11/26	jue 5/11/26	225	$ 2.450.152,00
227		1.6.7.7	7.9.7 MÓDULOS DE CONTROL PARA SIRENAS, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PAR	2 días	jue 5/11/26	sáb 7/11/26	226	$ 4.758.341,00
228		1.6.7.8	7.9.8 MÓDULOS DE CONTROL, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR	2 días	lun 9/11/26	mar 10/11/26	227	$ 997.558,00
229		1.6.7.9	7.9.9 MÓDULOS DE CONTROL CON RELEVO ALTA TENSION, INCLUYE ACCESORIOS NEC	2 días	mié 11/11/26	jue 12/11/26	228	$ 3.284.753,00
230		1.6.7.10	7.9.10 MODULO MONITOR DE 8 ENTRADAS 1 RELE LSN/LSN/ MONT.C/ CON GABINETE,	2 días	vie 13/11/26	mar 17/11/26	229	$ 3.128.500,00
231		1.6.7.11	7.9.11 MODULO DE ENTRADAS CONVENCIONALES, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIO	2 días	mar 17/11/26	jue 19/11/26	230	$ 1.306.267,00
232		1.6.7.12	7.9.12 BATERIAS DE RESPLADO 12 VOLTIOS 38 AMPERIOS, INCLUYE ACCESORIOS NEC	2 días	jue 19/11/26	sáb 21/11/26	231	$ 2.058.734,00
233		1.6.7.13	7.9.13 CABLE SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (USO SISTEMAS INCENDIO, AUDI	2 días	sáb 21/11/26	mar 24/11/26	232	$ 2.105.105,00
234		**1.6.8**	**7.10 SISTEMA DE RESPALDO ELECTRICO**	**6 días**	**lun 23/11/26**	**lun 30/11/26**		**$ 120.251.345,00**
235		1.6.8.1	7.10.1 MONTAJE E INSTALACION DE GRUPO ELECTRÓGENO DE 343,75KVA/275KW/3Ø/6	3 días	lun 23/11/26	mié 25/11/26	178	$ 119.733.010,00
236		1.6.8.2	7.10.2 INSTALACION UNIDAD DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS), TRIFÁSICA DE 15K	3 días	jue 26/11/26	lun 30/11/26	235	$ 518.335,00
237		**1.9**	**8. COMUNICACIONES RED DE VOZ Y DATOS**	**27,67 días**	**jue 22/10/26**	**sáb 28/11/26**		**$ 104.351.333,00**
238		**1.9.1**	**8.1 INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES**	**26,67 días**	**jue 22/10/26**	**vie 27/11/26**		**$ 84.064.681,00**
239		1.9.1.1	8.1.1 PUNTO DE VOZ Y PUNTO DE DATOS (cableado horizontal, Salida de Telecomunicacion	5 días	jue 22/10/26	jue 29/10/26	175	$ 37.211.529,00
240		1.9.1.2	8.1.2 PUNTO DE DATOS (cableado horizontal, Salida de Telecomunicaciones Jack RJ45 tanto	4 días	vie 30/10/26	jue 5/11/26	203	$ 13.527.676,00
241		1.9.1.3	8.1.3 ORGANIZADOR HORIZONTAL 2UR	3 días	mar 3/11/26	vie 6/11/26	203	$ 3.667.263,00
242		1.9.1.4	8.1.4 HERRAJE PATCH PANEL BLINDADO de 24	3 días	vie 6/11/26	mar 10/11/26	203	$ 3.373.211,00
243		1.9.1.5	8.1.5 PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA	3 días	mar 10/11/26	vie 13/11/26	203	$ 830.508,00
244		1.9.1.6	8.1.6 CANALIZACION PERIMETRAL METALICA, CON SUS ACCESORIOS DE CANALETA DE	3 días	vie 13/11/26	mié 18/11/26	203	$ 6.313.801,00
245		1.9.1.7	8.1.7 BANDEJA PORTACABLE CON SUS ACCESORIOS	3 días	mié 18/11/26	sáb 21/11/26	203	$ 14.086.188,00
246		1.9.1.8	8.1.8 TUBERÍA EMT Y CON ACCESORIOS	3 días	lun 23/11/26	mié 25/11/26	203	$ 2.860.743,00
247		1.9.1.9	8.1.9 ACCESS POINT AP-635-R12ITA (RW) Y RACK DE COMUNICACIONES (INSTALACIO	2 días	mié 25/11/26	vie 27/11/26	203	$ 2.073.762,00
248		**1.9.2**	**8.2 INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CÁMARAS**	**5 días**	**lun 23/11/26**	**sáb 28/11/26**		**$ 20.286.652,00**
249		1.9.2.1	8.2.1 INSTALACION DE CÁMARA DE RED M3115-LVE	5 días	lun 23/11/26	sáb 28/11/26	203;360	$ 13.524.435,00
250		1.9.2.2	8.2.2 INSTALACION DE CÁMARA PANORÁMICA P4705-PLVE	5 días	lun 23/11/26	sáb 28/11/26	203;361	$ 6.762.217,00
251		**1.10**	**9. INSTALACIONES MECANICAS**	**4 días**	**mar 10/11/26**	**sáb 14/11/26**		**$ 33.056.011,00**
252		1.10.1	9.1 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE FLUJO DE REFRIGE	4 días	mar 10/11/26	sáb 14/11/26	173	$ 6.724.545,00
253		1.10.2	9.2 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE FLUJO DE REFRIGE	4 días	mar 10/11/26	sáb 14/11/26	173	$ 8.673.351,00
254		1.10.3	9.3 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE FLUJO DE REFRIGE	4 días	mar 10/11/26	sáb 14/11/26	173	$ 10.815.186,00
255		1.10.4	9.4 SISTEMA DE EXTRACCIÓN MECÁNICA INCLUYE REJILLAS DE EXTRACCIÓN, DUCTO GA	3 días	mié 11/11/26	sáb 14/11/26	173	$ 3.588.659,00
256		1.10.5	9.5 EXTRACTOR PARA BAÑO 56CFM Y TODO LO NECESARIO PARA GARANTIZAR SU CORR	3 días	mié 11/11/26	sáb 14/11/26	173	$ 195.305,00
257		1.10.6	9.6 EXTRACTOR PARA BAÑO 106 CFM Y TODO LO NECESARIO PARA GARANTIZAR SU COR	2 días	jue 12/11/26	sáb 14/11/26	173	$ 230.000,00
258		1.10.7	9.7 CONTROL REMOTO ALAMBRICO - PROGRAMABLE - PANTALLA TACTIL 16 UNIDADES IN	2 días	jue 12/11/26	sáb 14/11/26	173	$ 2.830.765,00
259		**1.11**	**10. PAÑETES**	**15 días**	**mié 21/10/26**	**mar 10/11/26**		**$ 45.935.957,00**
260		1.11.1	10.1 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILS	5 días	mié 21/10/26	mié 28/10/26	50	$ 30.377.341,00
261		1.11.2	10.2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO COLUMNAS 1:3 - E= 15 MM. ANCHO COLUMNAS ENTRE	5 días	mié 28/10/26	mié 4/11/26	260	$ 11.956.690,00
262		1.11.3	10.3 MEDIA CAÑA EN PAÑETE ESQUINAS VERTICALES MUROS IMPERMEABILIZADO TODAS	5 días	mié 4/11/26	mar 10/11/26	261	$ 3.601.926,00
263		**1.12**	**11. CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION)**	**Y 9 días**	**vie 13/11/26**	**mié 25/11/26**		**$ 63.762.224,00**
264		1.12.1	11.1 CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION	4 días	vie 13/11/26	jue 19/11/26	300	$ 55.694.725,00
265		1.12.2	11.2 MEDIA CAÑA EN PVC PERFIL MEDIACAÑA DE 60mm EN PVC COEXTRUIDA	4 días	jue 19/11/26	mié 25/11/26	264	$ 8.067.499,00
266		**1.13**	**12. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**26 días**	**mié 28/10/26**	**vie 4/12/26**		**$ 240.102.585,00**
267		1.13.1	12.1 CERAMICA PARA PARED REF. VITTORIANO FORMATO 30 X 60 CMS RECTIFICADO COL	4 días	mar 28/10/26	mar 3/11/26	260	$ 27.847.153,00
268		1.13.2	12.2 ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	4 días	mar 3/11/26	sáb 7/11/26	267	$ 30.767.900,00
269		1.13.3	12.3 ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.03 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	4 días	lun 9/11/26	jue 12/11/26	268	$ 2.277.914,00
270		1.13.4	12.4 CERÁMICA PARA PISO BAÑOS Y ZONAS HÚMEDAS REFERENCIA PISO MANTIS GRIS M	4 días	vie 13/11/26	jue 19/11/26	269	$ 7.624.726,00
271		1.13.5	12.5 BOCAPUERTAS EN CERÁMICA COLOR WENGUE DEL ANCHO DE CADA MARCO BAJO F	4 días	jue 19/11/26	mar 24/11/26	270	$ 538.880,00
272		1.13.6	12.6 BOCAPUERTAS EN PISO INDUSTRIAL EN PVC POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO 100	5 días	mar 24/11/26	mar 1/12/26	271	$ 4.154.168,00
273		1.13.7	12.7 CENEFA VERTICAL DE 0,2/7,7 ANCHO REF. PAÑO 3X3 COFFEE DE 27,7X27, 7 ALTURA T	3 días	mar 1/12/26	vie 4/12/26	272	$ 4.059.553,00
274		1.13.8	12.8 PISO INDUSTRIAL EN PVC POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO 100X100X 4MM CON FE	3 días	jue 19/11/26	mar 24/11/26	264	$ 157.582.329,00
275		1.13.9	12.9 CINTA ANTIDESLIZANTE FLUORESCENTE 5 M X 50 MM CON ADHESIVO EN MATERIAL	3 días	mar 24/11/26	vie 27/11/26	274	$ 478.714,00
276		1.13.10	12.10 MEDIA CAÑA EN MORTERO PERFIL MEDIACAÑA DE 60mm PISO CONTRA MURO	3 días	vie 27/11/26	mar 1/12/26	275	$ 4.771.208,00
277		**1.14**	**13. ESTUCO Y PINTURA DE MUROS DE FACHADAS E INTERNOS MODULO A Y SERV.**	**26,67 días**	**lun 24/08/26**	**sáb 26/09/26**		**$ 182.463.540,00**
278		1.14.1	13.1 ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MAN	20 días	lun 24/08/26	vie 18/09/26	23	$ 90.131.539,00
279		1.14.2	13.2 ESTUCO Y PINTURA ESMALTE EPÓXICO BASE AGUA EPOXIAGUA DOS COMPONENTE	20 días	mié 26/09/26	mié 26/09/26		$ 92.332.001,00
280		**1.15**	**14. CARPINTERÍA EN MADERA**	**11 días**	**mié 4/11/26**	**mié 18/11/26**		**$ 20.513.426,00**
281		1.15.1	14.1 PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO COLOR WENGUE, CON 3 DILA	6 días	mié 4/11/26	mié 11/11/26	279	$ 12.462.423,00
282		1.15.2	14.2 MUEBLE EN MADERA BAJO MESON ESTRUCTURA INDEPENDIENTE DOS DIVISIONES I	5 días	mié 11/11/26	mié 18/11/26	281	$ 8.051.003,00
283		**1.16**	**15. CARPINTERIA METALICA**	**5 días**	**mié 21/10/26**	**mar 27/10/26**		**$ 3.056.096,00**
284		1.16.1	15.1 BASE (UN PAR) PARA SOPORTE METALICO TIPO TEE PARA AIRE ACONDICIONADO GF-5	5 días	mié 21/10/26	mar 27/10/26	278	$ 3.056.096,00
285		**1.17**	**16. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**	**18 días**	**mié 4/11/26**	**vie 27/11/26**		**$ 334.008.415,00**
286		1.17.1	16.1 PUERTA EN ALUMINIO INCLUYE MARCO TUBERIA RECTANGULAR PANEL LLENO O EN	5 días	mié 4/11/26	mar 10/11/26		$ 1.264.281,00
287		1.17.2	16.2 VENTANAS EN ALUMINIO CORREDIZAS Y VIDRIOS FIJOS CON MARCOS DE 70MM LINE	5 días	vie 6/11/26	jue 12/11/26	286FC-3 días	$ 62.738.048,00
288		1.17.3	16.3 PP EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 10 MM INCLUYE SANDBLASTING DE ARENA	5 días	lun 9/11/26	sáb 14/11/26	287FC-3 días	$ 95.681.526,00
289		1.17.4	16.4 FACHADAS EN VIDRIO TEMPLADO Y/O DIVISIONES INTERNAS DE 10MM CON SANDBL	5 días	mié 11/11/26	mié 18/11/26	288FC-3 días	$ 93.879.346,00
290		1.17.5	16.5 ESCALERA PLEGABLE PARA ENTRETECHOS PELDAÑOS Y LARGEROS EN ALUMINIO	4 días	vie 13/11/26	jue 19/11/26	289FC-3 días	$ 3.634.205,00
291		1.17.6	16.6 ESCOTILLA EN LÁMINA C.R. GALVANIZADA CAL. 18, CON MARCO METALICO CAL. 18 C	5 días	sáb 14/11/26	lun 23/11/26	290FC-3 días	$ 816.843,00
292		1.17.7	16.7 LAMINA METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO CAL. 18 MICRO PERFORADA (PERFORA	5 días	mié 18/11/26	mié 25/11/26	291FC-3 días	$ 58.989.529,00
293		1.17.8	16.8 VENTANAS EN ALUMINIO ANONIZADO SISTEMA 5020 CELOSIAS EN ALUMINIO Y MALL	5 días	vie 20/11/26	vie 27/11/26	292FC-3 días	$ 17.004.637,00
294		**1.18**	**17. CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE**	**15 días**	**jue 19/11/26**	**mié 9/12/26**		**$ 38.628.686,00**
295		1.18.1	17.1 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE REF SOCODA O SIMILAR	5 días	jue 19/11/26	mié 25/11/26	270	$ 3.690.702,00
296		1.18.2	17.2 BARANDA EN ACERO DE 1.03M DE ALTURA CONSTRUIDA EN PARALES VERTICALES	15 días	mié 25/11/26	mié 2/12/26	295	$ 6.320.675,00
297		1.18.3	17.3 DIVISIONES PARA BAÑO FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE REF. 304 -3	5 días	mié 2/12/26	mié 9/12/26	296	$ 28.617.309,00
298		**1.19**	**18. CUBIERTAS**	**25,44 días**	**vie 16/10/26**	**jue 19/11/26**		**$ 318.190.537,00**
299		1.19.1	18.1 ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEG	17 días	vie 16/10/26	sáb 7/11/26	28;30	$ 110.289.329,00
300		1.19.2	18.2 TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR SEGÚN UMA Y BLANCO INTERIOR	11,44 días	jue 29/10/26	vie 13/11/26	299FC-7 días	$ 2.403.286,00
301		1.19.3	18.3 REVESTIMIENTO POR PROYECCION MECANICA EN CALIENTE A BASE DE POLIUREA P	8 días	vie 6/11/26	sáb 14/11/26	300FC-5 días	$ 111.028.578,00
302		1.19.4	18.4 FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL POR 2.40ML CAL 26 SEGÚN PLANOS PARA LA CUBI	8 días	mié 11/11/26	jue 19/11/26	301FC-3 días	$ 94.467.344,00
303		**1.20**	**19. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**15 días**	**jue 19/11/26**	**mié 9/12/26**		**$ 14.596.513,00**
304		1.20.1	19.1 SANITARIO LÍNEA MONTECARLO NOVO DUAL DE DOBLE DESCARGA, CON TAPA DE AS	6 días	jue 19/11/26	jue 26/11/26	270	$ 9.682.192,00
305		1.20.2	19.2 ORINAL GOTTA DE CORONA O SIMILAR	3 días	jue 26/11/26	mar 1/12/26	304	$ 4.435.516,00
306		1.20.3	19.3 GANCHO TOALLERO	3 días	mar 1/12/26	vie 4/12/26	305	$ 268.575,00
307		1.20.4	19.4 REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3 X 2	3 días	vie 4/12/26	mié 9/12/26	306	$ 210.230,00
308		**1.21**	**20. VIDRIOS Y ESPEJOS**	**5 días**	**jue 3/12/26**	**jue 10/12/26**		**$ 3.306.737,00**
309		1.21.1	20.1 ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN MURO)	5 días	jue 3/12/26	jue 10/12/26		$ 3.306.737,00
310		**1.22**	**22. OBRAS GENERALES**	**12 días**	**mar 17/11/26**	**mar 1/12/26**		**$ 26.018.431,00**
311		1.22.1	22.1 EMPRADIZACION - TIERRA NEGRA, ABONO Y GRAMA TIPO KIKUYO	12 días	mar 17/11/26	mar 1/12/26		$ 26.018.431,00
312		**1.23**	**23. URBANISMO , VIA DE ACCESO Y ANDENES DE ACCESO A MODULOS A Y MODULO B**	**64 días**	**sáb 19/09/26**	**lun 14/12/26**		**$ 209.419.556,00**
313		1.23.1	23.1 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE RECEBO COMUN PARA RELLENO EN	6 días	sáb 19/09/26	sáb 26/09/26		$ 7.058.017,00
314		1.23.2	23.2 SUBBASE GRANULAR PEATONAL	7 días	sáb 26/09/26	mar 6/10/26	313	$ 20.249.757,00
315		1.23.3	23.3 ANDEN EN CONCRETO ESTAMPADO DE 3000 PSI, INCLUYE MATERIALES, FORMALETA	13 días	mar 6/10/26	vie 23/10/26	314	$ 65.768.688,00
316		1.23.4	23.4 BORDILLO PREFABRICADO TIPO A-80. INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN Y PEGA	8 días	vie 23/10/26	mié 4/11/26	315	$ 33.525.241,00
317		1.23.5	23.5 BORDILLO PREFABRICADO BAJO RAMPA TIPO A-85. INCLUYE MORTERO DE NIVELACI	7 días	mié 4/11/26	jue 12/11/26	316	$ 1.627.122,00
318		1.23.6	23.6 JUNTAS DE DILATACIÓN. INCLUYE CORTE DEL CONCRETO FONDO DE JUNTA Y SELL	4 días	jue 12/11/26	mié 18/11/26	317	$ 4.006.412,00
319		1.23.7	23.7 MANTO TIPO TERRATRAC TRM 15 O SIMILAR	8 días	jue 19/11/26	sáb 28/11/26	318	$ 50.597.174,00
320		1.23.8	23.8 BOLARDO DE PROTECCION FIJO	5 días	sáb 28/11/26	vie 4/12/26	319	$ 6.180.634,00
321		1.23.9	23.9 POLIETILENO CAL No. 6	6 días	vie 4/12/26	lun 14/12/26	320	$ 20.053.958,00
322		1.23.10	23.10 BORDILLO PREFABRICADO TIPO A-10 INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN Y PEGA	13 días	jue 12/11/26	lun 30/11/26	317	$ 352.553,00
323		**1.24**	**24. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS**	**5 días**	**mar 17/11/26**	**lun 23/11/26**		**$ 3.456.697,00**
324		1.24.1	24.1 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	3 días	mar 17/11/26	vie 20/11/26	315	$ 1.981.171,00
325		1.24.2	24.2 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	2 días	vie 20/11/26	lun 23/11/26	324	$ 1.475.526,00
326		**1.25**	**25. INFRAESTRUCTURA DE ÁREA EXTERNA**	**19,56 días**	**jue 19/11/26**	**mar 15/12/26**		**$ 248.536.116,00**
327		1.25.1	25.1 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE RECEBO COMUN PARA RELLENO EN	6 días	sáb 26/09/26	lun 5/10/26	313	$ 163.288.116,00

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
329		1.25.2	25.2 SUBBASE GRANULAR CLASE A	3 días	vie 6/11/26	mar 10/11/26	327FC-3 días	$ 10.737.170,00
329		1.25.3	25.3 BASE GRANULAR CLASE A	3 días	vie 27/11/26	mar 1/12/26	328FC-1 día	$ 10.931.721,00
330		1.25.4	25.4 GEOTEXTIL TEJIDO T-1800 O SIMILAR.	3 días	mar 1/12/26	jue 3/12/26	329FC-3 días	$ 2.967.197,00
331		1.25.5	25.5 IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFALTICA (CRL)	2 días	jue 3/12/26	vie 4/12/26	330FC-3 días	$ 6.129.940,00
332		1.25.6	25.6 PAVIMENTO ASFÁLTICO (MDC - 19 INVIAS)	3 días	vie 4/12/26	mié 9/12/26	331FC-1 día	$ 34.331.935,00
333		1.25.7	25.7 MARCAS VIALES CON PINTURA TRAFICO BLANCO Y AMARILLO REFLECTIVA CON MIC	3 días	mié 9/12/26	vie 11/12/26	332FC-3 días	$ 2.235.929,00
334		1.25.8	25.8 SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-10. INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN Y PEGA	3 días	vie 11/12/26	mar 15/12/26	333FC-3 días	$ 17.914.108,00
335		**1.26**	**26. SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN, ESTUDIOS TÉCNICOS REPRESENTA**	**5 días**	**lun 30/11/26**	**vie 4/12/26**		**$ 15.604.374,00**
336		1.26.1	26.1 LICENCIA SOR CAM	5 días	lun 30/11/26	vie 4/12/26	250	$ 15.604.374,00
337		**1.27**	**27. EQUIPOS**	**41,22 días**	**vie 16/10/26**	**jue 10/12/26**		**$ 783.878.266,00**
338		**1.27.1**	**27.1 EQUIPOS ELECTRICOS**	**40,56 días**	**vie 16/10/26**	**jue 10/12/26**		**$ 378.982.101,00**
339		1.27.1.1	27.1.1 UNIDAD DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS) TRIFÁSICA DE 15KVA, TECNOLOG	5 días	vie 16/10/26	jue 22/10/26	48	$ 89.660.871,00
340		1.27.1.2	27.1.2 GRUPO ELECTRÓGENO DE 343,75KVA/275KW/3Ø/60HZ/208VAC, FP: 0.8, MODO ST	36,22 días	jue 22/10/26	jue 10/12/26		$ 289.321.230,00
341		**1.27.2**	**27.2 EQUIPOS MECÁNICOS**	**36,22 días**	**jue 22/10/26**	**jue 10/12/26**		**$ 152.775.167,00**
342		1.27.2.1	27.2.1 UNIDAD CONDENSADORA VRF DESCARGA VERTICAL CON CAPACIDAD NOMINAL	3 días	jue 22/10/26	mar 27/10/26	339	$ 53.483.408,00
343		1.27.2.2	27.2.2 UNIDAD EVAPORADORA VRF TIPO CASSETTE 4 VÍAS CON CAPACIDAD NOMINAL	3 días	mar 27/10/26	vie 30/10/26	342	$ 13.225.213,00
344		1.27.2.3	27.2.3 UNIDAD EVAPORADORA VRF TIPO HIGH WALL CON CAPACIDAD NOMINAL DE EN	3 días	vie 30/10/26	mié 4/11/26	343	$ 4.640.057,00
345		1.27.2.4	27.2.4 UNIDAD EVAPORADORA VRF TIPO CASSETTE 4 VÍAS CON CAPACIDAD NOMINAL	3 días	jue 5/11/26	lun 9/11/26	344	$ 6.612.606,00
346		1.27.2.5	27.2.5 UNIDAD EVAPORADORA VRF TIPO HIGH WALL CON CAPACIDAD NOMINAL DE EN	4 días	mar 10/11/26	vie 13/11/26	345	$ 2.320.034,00
347		1.27.2.6	27.2.6 UNIDAD CONDENSADORA VRF DESCARGA VERTICAL CON CAPACIDAD NOMINAL	3 días	sáb 14/11/26	jue 19/11/26	346	$ 26.741.704,00
348		1.27.2.7	27.2.7 UNIDAD EVAPORADORA VRF TIPO CASSETTE 4 VÍAS CON CAPACIDAD NOMINAL	3 días	jue 19/11/26	lun 23/11/26	347	$ 3.985.960,00
349		1.27.2.8	27.2.8 UNIDAD EVAPORADORA VRF TIPO CASSETTE 4 VÍAS CON CAPACIDAD NOMINAL	3 días	mar 24/11/26	jue 26/11/26	348	$ 3.939.969,00
350		1.27.2.9	27.2.9 EXTRACTOR AXIAL HXM200 INSTALACIÓN MURO METAL	3 días	vie 27/11/26	mar 1/12/26	349	$ 879.243,00
351		1.27.2.10	27.2.10 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT TECNOLOGIA INVERTER DE	3 días	mié 2/12/26	vie 4/12/26	350	$ 2.118.412,00
352		1.27.2.11	27.2.11 COMPRESOR INDUSTRIAL DE ALTA PRESION TIPO PISTON 5,5HP CON TANQUE	3 días	lun 7/12/26	jue 10/12/26	351	$ 34.828.551,00
353		**1.27.3**	**27.3 EQUIPOS HIDRAULICOS**	**4 días**	**mar 17/11/26**	**sáb 21/11/26**		**$ 172.120.998,00**
354		1.27.3.1	27.3.1 EQUIPO INCENDIOS NORMALIZADO 30 HP, (INCLUYE 1 BOMBA Q: 250 GPM, CFT	14 días	mar 17/11/26	sáb 21/11/26	192	$ 172.120.998,00
355		**1.28**	**28. EQUIPOS EXENTOS DE IVA**	**2 días**	**sáb 24/10/26**	**mar 27/10/26**		**$ 164.229.601,00**
356		**1.28.1**	**28.1 EQUIPOS DE COMUNICACIONES, VOZ Y DATOS**	**2 días**	**sáb 24/10/26**	**mar 27/10/26**		**$ 83.036.401,00**
357		1.28.1.1	28.1.1 SWICH DE 48 PUERTOS INCLUYE LICENCIA Y SFP	1 día	sáb 24/10/26	lun 26/10/26	192	$ 59.534.875,00
358		1.28.1.2	28.1.2 ACCESS POINT AP-635-R72JTA (RW) DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉ	1 día	lun 26/10/26	mar 27/10/26	357	$ 23.501.526,00
359		**1.28.2**	**28.2 EQUIPOS DE SISTEMA ELECTRONICOS DE SEGURIDAD**	**2 días**	**sáb 24/10/26**	**mar 27/10/26**		**$ 81.193.200,00**
360		1.28.2.1	28.2.1 CÁMARA DE RED M3115-LVE	1 día	sáb 24/10/26	lun 26/10/26	192	$ 51.645.000,00
361		1.28.2.2	28.2.2 CÁMARA PANORÁMICA P4705-PLVE	1 día	lun 26/10/26	mar 27/10/26	360	$ 29.548.200,00

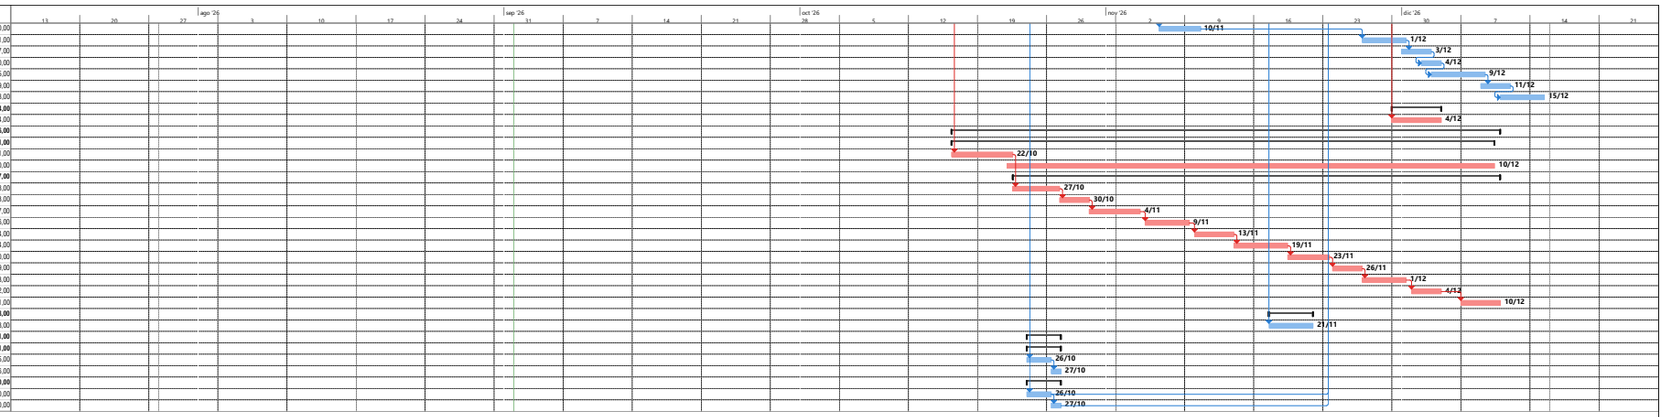

MIGUEL ALEJANDRO PINZÓN AGUILAR
Representante Legal
CONSORCIO ROOSTER.

ING.CÉSAR ALEJANDRO ZAMUDIO AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANIDAD 2026

Proyecto: 3. 031-00-A-COFAC-D
Fecha: mié 2/09/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso
