AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

HOJA CONTROL DOCUMENTAL

131-GDC-FR-001-V04
11/06/2026

CONTROL DE DILIGENCIAMIENTO:	
Hoja No.	De
1	1

CÓDIGO Y NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	100 GERENCIA
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA OFICINA PRODUCTORA	120 SUBGERENCIA DE GESTION CONTRACTUAL Y JURIDICA
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	120-10 CONTRATOS
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA SUBSERIE DOCUMENTAL	120-10.04 Contrato de Obra
NOMBRE DEL EXPEDIENTE	**Consorcio Lumen Fidei** Nit. 9020194861 Contrato N° 0707-2025 BPIN 2024005500041 Parcial N°1 C1-3 C22

Ítem	Fecha de incorporación al expediente	Fecha del Documento	Tipo Documental (Descripción)	Folios	Funcionario que ingresa el documento	Observaciones
1.	2026-08-25	2026-08-09	Lista de chequeo	3179-3180		
2.	2026-08-25	2026-08-25	Plan de cobros obra	3181-3182		
3.	2026-08-25	2026-08-25	Acta pago de obra	3183-3186		
4.	2026-08-25	2026-08-25	Memoria de calculo obra	3187-3241		
5.	2026-08-25	2026-08-25	Informe de obra	3242-3282		
6.	2026-08-25	2026-08-25	Bitácora de obra	3283-3349		

RESPONSABLES	
Elaborado por	
Nombres y Apellidos: Hernando Ayala Villamil	**Nombres y Apellidos: Holman W. Suarez Niño**
Cargo: Director de Obra	**Cargo: Director de Interventoría**
Firma:	Firma:

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

LISTA DE CHEQUEO CONTRATO DE OBRA
PAGO PARCIAL

112-ECP-FR-173-V05
09/09/2024

3179.

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

PAGO PARCIAL	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
PLAN DE COBROS OBRA (Aplica en el primer pago)	112-ECP-FR-009	SI
ACTA PAGO DE OBRA	112-ECP-FR-029	SI
MEMORIA DE CALCULO OBRA (Cantidades totales Ejecutadas por cada item contractual)	112-ECP-FR-027	SI
INFORME DE OBRA	112-ECP-FR-013	SI
BITACORA DE OBRA (Copia)	112-ECP-FR-022	SI
INFORME PLAN DE INVERSION ANTICIPO OBRA (Si Aplica)	112-ECP-FR-030	SI
FACTURA	-	SI
CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA (Vigencia 30 Dias)	-	SI
COPIA DE TARJETA PROFESIONAL Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE CONTADORES DE OBRA E INTERVENTORIA	-	SI
INFORME INTERVENTORÍA	112-ECP-FR-017	SI
ACTA RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO OBRA	112-ECP-FR-018	SI
ACTA RELACIÓN PERSONAL OBRA.	112-ECP-FR-008	SI
ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA. Del periodo a realizar el cobro, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal.	112-ECP-FR-021	SI
CERTIFICADO DONDE INDIQUE CUAL ES EL PORCENTAJE (%) Y EL VALOR EJECUTADO DEL PROYECTO EN CADA MUNICIPIO. Lo anterior firmado por el Representante Legal de la Interventoria con el fin de calcular la retencion de ICA	-	SI
VERIFICACIÓN EN SIGA: ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA 112-ECP-FR-021. Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal.	-	SI
CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	112-ECP-FR-019	SI
ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL	112-ECP-FR-020	SI
ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO (Elabora el Contratista)	130-GFI-FR-017	SI
VERIFICACIÓN EN SIGA - Cargue de INFORME MENSUAL OBRA (Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Acta de vecindad, Plan de manejo de trafico, formato entrega de dotación y elementos de protección personal, implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, informe implementación PMA, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA (Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Acta de resumen de ensayos y pruebas de laboratorio, control de seguridad industrial, acta de seguimiento ambiental, acta control y seguimiento de seguridad social y parafiscal obra, bitacora, informe de especialistas) y todos los demas procedimientos o actos administrativos realizados en cumplimiento de la ejecución del proyecto. Todos los documentos de soporte del pago parcial, deben ser digitalizados y cargados a la carpeta del contrato de obra que se encuentra en la plataforma SIGA, en cumplimiento de la Resolución 82 del 6 de Abril de 2017.	Anexar Pantallazo	SI
VERIFICACIÓN EN GESPROY -SGR - De conformidad con la Circular 062 de 2013 del DNP, con el objeto de facilitar la gestión y monitoreo a la ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR ; el responsable del proyecto debera realizar el registro de la información de ejecución con el detalle definido en cada uno de los componentes de la plataforma y presentar a la AIM el reporte del estado actual del proyecto. (Anexar Pantallazo)	-	SI
ENTREGA DOCUMENTACION AL RESPECTIVO RESPONSABLE DE ARCHIVO		SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

LISTA DE CHEQUEO CONTRATO DE OBRA
PAGO PARCIAL

112-ECP-FR-173-V05
09/09/2024

3180

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041
PAGO PARCIAL		CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A

NOTAS

*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA Y A COLOR, SERÁN RADICADOS ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR A LA GERENCIA DONDE DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A LAS PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD .

*LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUI ESTABLECIDOS.

***ANEXAR PANTALLAZO DEL CARGUE A SECOP Y CARGUE A SIGA**

OBSERVACIONES

Firma
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL
DIRECTOR DE OBRA
M.P. 25205-17615

Firma
Nombre: HOLMAN W. SUAREZ NIÑO
DIRECTOR INTERVENTORIA
M.P. CN205-54694

Firma
Nombre: GINA TATIANA ELAICA NIETO
DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS
M.P. 5202-193880CDN

Firma
Nombre: ALEJANDRA MARIA DUQUE
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N. 180 DE 2025
M.P. RS205-07500

Firma
Nombre:
RESPONSABLE DEL ARCHIVO
M.P.

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Nota: Una vez cumplido el proceso de verificación por cada responsable se debe firmar la lista de chequeo.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

PLAN DE COBROS OBRA

112-ECP-FR-009-V04
09/09/2024

3/81

CONTRATO N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041

OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCIÒN ELECTRIFICACIÒN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÒPEZ DEPARTAMENTO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 2.225.223.401,00
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÒN ELECTRIFICACIÒN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÒPEZ DEPARTAMENTO
VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 2.225.223.401,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO LUMEN FIDEI
NIT:	902019486-1
CORREO ELECTRONICO:	Contratación.oie2012@gmail.com
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	180 de 2025
INTERVENTORÍA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELÉCTRICO S.A.S.
CORREO ELECTRONICO:	info@sincrel.com.co
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	ALEJANDRA MARIA DUQUE
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS:	GINA TATIANA ELAICA NIETO

VIGENCIA			
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	3	Meses	Días
FECHA DE INICIACIÓN:			10/04/2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:			9/07/2026
PRORROGA 1:	2	Meses	Días
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			9/09/2026

NUMERO RP	FECHA DE COMPROMISO	RUBRO PRESUPUESTAL (IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION (CONCEPTO)	OBJETO DEL PROYECTO	VALOR
1664	31/12/2025	1003-23212102.1900.002.2.3.2.02.02.005-05	Adquisición de servicios Construccion y servicios de construccion	CONSTRUCCIÒN ELECTRIFICACIÒN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÒPEZ DEPARTAMENTO DEL META.	$ 2.225.223.401,00

PLAN DE COBROS			
CUENTA	MES	VALOR	%
1	AGOSTO DE 2026	$ 1.629.408.595,64	73,22
2	OCTUBRE DE 2026	$ 595.814.805,36	26,78
	TOTAL	**$ 2.225.223.401,00**	**$ 100,00**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **25/08/2026**

Firma

Nombre: LICETH FARLEY LEAL PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

Firma

Nombre: YESICA FERNANDA BOLIVAR LADINO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma

Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-17615

Firma

Nombre: HOLMAN WBEIMAR SUAREZ NIÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54694

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

ACTA PAGO DE OBRA

112-ECP-FR-029-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	2	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	10/04/2026 a 19/08/2026
OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 2.225.223.401,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 2.225.223.401,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO LUMEN FIDEI	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	180 de 2025
NIT:	902019486-1	INTERVENTORIA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELECTRICO S.A.S.
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	Contratación.oie2012@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	info@sincrel.com.co
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	ALEJANDRA MARIA DUQUE	DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS:	GINA TATIANA ELAICA NIETO
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	info@sincrel.com.co	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	10/04/2026	FECHA PRESENTE ACTA:	26/08/2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1 de fecha 08/07/2026		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
1	PRELIMINARES													
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	KM	42,81	$ 460.640	$ 19.719.998	44,49	$ 20.494.795	0,00	$ -	41,73	$ 19.220.665	41,73	$ 19.220.665	93,78%
	SUBTOTAL PRELIMINARES				$ 19.719.998		$ 20.494.795		$ -		$ 19.220.665		$ 19.220.665	
2	POSTES													
2,1	POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 8 M X 510 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	17,00	$ 913.596	$ 15.531.132	24,00	$ 21.926.304	0,00	$ -	20,00	$ 18.271.920	20,00	$ 18.271.920	83,33%
2,2	POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 12 M X 510 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	436,00	$ 1.505.546	$ 656.418.056	401,00	$ 603.723.946	0,00	$ -	357,00	$ 537.479.922	357,00	$ 537.479.922	89,03%
	SUBTOTAL POSTES				$ 671.949.188		$ 625.650.250		$ -		$ 555.751.842		$ 555.751.842	
3	ESTRUCTURAS													
3,1	ESTRUCTURA EN H CIRCUITO SIMPLE RETENCIÓN TIPO IPSE RH-231-02 CRUCETA DOBLE DE 4 MTS. CON CABLE DE GUARDA HASTA 44KV ANG. MÁX. 45° SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN	5,00	$ 3.140.058	$ 15.700.290	4,00	$ 12.560.232	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3,2	ESTRUCTURA EN H CIRCUITO SIMPLE RETENCIÓN TIPO IPSE RH-231-02 CRUCETA DOBLE DE 4 MTS. HASTA 44KV ANG. MÁX. 45° SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA CIRCUITO BIFASICO	UN	36,00	$ 2.383.762	$ 85.815.432	23,00	$ 54.826.526	0,00	$ -	19,00	$ 45.291.478	19,00	$ 45.291.478	82,61%
3,3	ESTRUCTURA EN H TERMINAL TIPO IPSE RH-240 DISPOSICIÓN HORIZONTAL, CIRCUITO TRIFÁSICO DOBLE CRUCETA DE 4 MTS. SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN	1,00	$ 1.580.496	$ 1.580.496	1,00	$ 1.580.496	0,00	$ -	1,00	$ 1.580.496	1,00	$ 1.580.496	100,00%
3,4	ESTRUCTURA EN H TERMINAL TIPO IPSE NC RH-240 DISPOSICIÓN HORIZONTAL, CIRCUITO BIFÁSICO DOBLE CRUCETA DE 4 MTS. SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN	2,00	$ 1.407.746	$ 2.815.492	6,00	$ 8.446.476	0,00	$ -	6,00	$ 8.446.476	6,00	$ 8.446.476	100,00%
3,5	ESTRUCTURA TIPO PH 202 CIRCUITO BIFÁSICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	30,00	$ 555.484	$ 16.664.520	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3,6	ESTRUCTURA LA461 RED COMPACTA 11,4 KV CIRCUITO TANGENCIAL CON ÁNGULOS HASTA DE 6°. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA	UN	8,00	$ 956.857	$ 7.654.856	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3,7	ESTRUCTURA LA461 RED COMPACTA 11,4 KV CIRCUITO TANGENCIAL CON ÁNGULOS HASTA DE 6°.SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA. 2 HILOS	UN	9,00	$ 948.870	$ 8.539.830	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3,8	ESTRUCTURA LA462 CIRCUITO CON RED COMPACTA DE MT INSTALACIÓN DE SEPARADORES 15 kV EN VANO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA.	UN	22,00	$ 454.957	$ 10.009.054	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3,9	ESTRUCTURA LA464 RED COMPACTA 11,4 kV. FINAL DE CIRCUITO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA	UN	4,00	$ 1.193.200	$ 4.772.800	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3,10	ESTRUCTURA LA464M RED COMPACTA 11,4 kV. FINAL DE CIRCUITO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA.CIRCUITO BIFASICO	UN	2,00	$ 1.083.126	$ 2.166.252	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3,11	ESTRUCTURA LA466 RED COMPACTA PARA ÁNGULOS DE 61° A 90° CON DOBLE AISLADOR 11,4 KV. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA	UN	1,00	$ 1.159.172	$ 1.159.172	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3,12	ESTRUCTURA LA466M RED COMPACTA PARA ÁNGULOS DE 61° A 90° CON DOBLE AISLADOR 11,4 KV. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA. CIRCUITO BIFASICO	UN	1,00	$ 884.837	$ 884.837	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

263

CONTRATO N°	707 DE 2025					PROYECTO N°	2024006500041									
3,13	ESTRUCTURA TIPO RA2-602M NORMA EPM SUSPENSION, DISPOSICIÓN VERTICAL CON LINEA DE GUARDA, 3 HILOS, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN	130,00	$ 886.210	$ 115.207.300	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3,14	ESTRUCTURA TIPO RA2-602 NORMA EPM SUSPENSION, DISPOSICIÓN VERTICAL CON LINBEA DE GUARDA, 2 HILOS, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN	84,00	$ 713.898	$ 59.967.432	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3,15	ESTRUCTURA TIPO RA2-603M NORMA EPM CIRCUITO TRIFÁSICO TERMINAL DISPOSICIÓN VERTICAL CON LINEA DE GUARDA, 3 HILOS, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	UN	18,00	$ 788.710	$ 14.196.780	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3,16	ESTRUCTURA TIPO RA2-603 NORMA EPM CIRCUITO BIFÁSICO TERMINAL DISPOSICIÓN VERTICAL CON LINEA DE GUARDA, 2 HILOS, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN	22,00	$ 636.351	$ 13.999.722	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3,17	ESTRUCTURA TIPO RA2-604M NORMA EPM CIRCUITO TRIFÁSICO RETENCIÓN DISPOSICIÓN VERTICAL CON LINEA DE GUARDA, 3 HILOS, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	UN	21,00	$ 1.619.771	$ 34.015.191	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3,18	ESTRUCTURA TIPO RA2-604 NORMA EPM CIRCUITO BIFÁSICO RETENCIÓN DISPOSICIÓN VERTICAL CON LINEA DE GUARDA, 2 HILOS, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	UN	14,00	$ 1.223.201	$ 17.124.814	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3,19	ESTRUCTURA TIPO RA2-640M NORMA EPM PROTECCION PARARRAYO LINEA DE GUARDA. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN	66,00	$ 784.397	$ 51.770.202	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3,20	ESTRUCTURA TIPO 710-02 NORMA ICEL MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO EN POSTE PESO MÁXIMO 500 KG B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN	18,00	$ 1.556.625	$ 28.019.250	20,00	$ 31.132.500	0,00	$ -	9,00	$ 14.009.625	9,00	$ 14.009.625	45,00%
3,21	CONVERTIR ESTRUCTURA CODENSA 510 A P103	UN	11,00	$ 174.507	$ 1.919.577	11,00	$ 1.919.577	0,00	$ -	11,00	$ 1.919.577	11,00	$ 1.919.577	100,00%
3,22	CONVERTIR ESTRUCTURA CODENSA 512 A P112	UN	3,00	$ 251.296	$ 753.888	3,00	$ 753.888	0,00	$ -	3,00	$ 753.888	3,00	$ 753.888	100,00%
3,23	CONVERTIR ESTRUCTURA CODENSA 514 A 550	UN	1,00	$ 378.144	$ 378.144	2,00	$ 756.288	0,00	$ -	2,00	$ 756.288	2,00	$ 756.288	100,00%
3,24	CONVERTIR ESTRUCTURA CODENSA 731 A 730	UN	1,00	$ 660.091	$ 660.091	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3,25	ESTRUCTURA TIPO 730 NORMA ICEL DERIVACIÓN TRIFÁSICA CON CORTACIRCUITO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN	1,00	$ 1.983.031	$ 1.983.031	2,00	$ 3.966.062	0,00	$ -	2,00	$ 3.966.062	2,00	$ 3.966.062	100,00%
3,26	ESTRUCTURA TIPO 731 NORMA ICEL DERIVACIÓN MONOFÁSICA CON CORTACIRCUITO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN	2,00	$ 1.527.840	$ 3.055.680	18,00	$ 27.501.120	0,00	$ -	17,00	$ 25.973.280	17,00	$ 25.973.280	94,44%
3,27	ESTRUCTURA TIPO LA 221 NORMA CODENSA CIRCUITO TRIFASICO PRIMARIO SENCILLO SUBTERRANIZACIÓN DEL CIRCUITO PRINCIPAL, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN	2,00	$ 11.176.772	$ 22.353.544	4,00	$ 44.707.088	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3,28	ESTRUCTURA TIPO LA 221M NORMA CODENSA CIRCUITO BIFASICO PRIMARIO SENCILLO SUBTERRANIZACIÓN DEL CIRCUITO PRINCIPAL, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN	2,00	$ 8.206.230	$ 16.412.460	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3,29	ESTRUCTURA LA320m CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA. SIN CAJA DE DERIVACION	UN	6,00	$ 141.996	$ 851.976	10,00	$ 1.419.960	0,00	$ -	8,00	$ 1.135.968	8,00	$ 1.135.968	80,00%
3,30	ESTRUCTURA LA321m FINAL DE CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN.NORMA CODENSA.. SIN CAJA DE DERIVACION	UN	28,00	$ 164.311	$ 3.286.220	28,00	$ 4.600.708	0,00	$ -	26,00	$ 4.272.086	26,00	$ 4.272.086	92,86%
3,31	ESTRUCTURA LA324m CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO CONSTRUCCIÓN ANGULAR SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA SIN CAJA DE DERIVACION	UN	1,00	$ 219.216	$ 219.216	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL ESTRUCTURAS				**$ 543.937.549**		**$ 194.170.921**		**$ -**		**$ 108.105.224**		**$ 108.105.224**	
4	CONDUCTORES													
4,1	CONDUCTOR ACSR 3 No. 2 AWG	ML	16.883,88	$ 13.667,00	$ 230.751.988	13.542,88	$ 185.099.541	0,00	$ -	11.703,00	$ 159.944.901	11.703,00	$ 159.944.901	86,41%
4,2	CONDUCTOR ACSR 2 No. 2 AWG	ML	22.330,00	$ 10.180,00	$ 227.319.400	29.446,80	$ 299.768.437	0,00	$ -	27.383,00	$ 278.758.940	27.383,00	$ 278.758.940	92,99%
4,3	CONDUCTOR ACSR 1 No. 2 AWG	ML	1.466,00	$ 6.693,00	$ 9.811.938	1.466,00	$ 9.811.938	0,00	$ -	1.466,00	$ 9.811.938	1.466,00	$ 9.811.938	100,00%
4,4	CABLE SEMIAISLADO 3 NO. 2 PARA RED COMPACTA EN 15 KV	ML	535,49	$ 69.046,00	$ 36.973.443	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
4,5	CABLE SEMIAISLADO 2 NO. 2 PARA RED COMPACTA EN 15 KV	ML	550,46	$ 44.076,00	$ 24.262.956	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
4,6	SUMINISTRO, TENDIDO, TENSIONADO Y AMARRE DE CABLE MENSAJERO DE ACERO 3/8	ML	1.085,97	$ 12.073,00	$ 13.110.916	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
4,7	CABLE DE COBRE MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 3 X NO. 2 AWG	ML	75,49	$ 238.060,00	$ 17.971.149	227,49	$ 54.156.269	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
4,8	CABLE DE COBRE MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 2 X NO. 2 AWG	ML	65,42	$ 164.135,00	$ 10.737.712	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
4,9	CABLE TRIPLEX 2*2+1*2 (2*35+1*35MM)	ML	899,01	$ 24.056,00	$ 21.626.585	1.278,01	$ 30.743.809	0,00	$ -	1.016,00	$ 24.440.896	1.016,00	$ 24.440.896	79,50%
	SUBTOTAL CONDUCTORES				**$ 592.566.087**		**$ 579.570.994**		**$ -**		**$ 472.956.675**		**$ 472.956.675**	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

98

CONTRATO N°	707 DE 2026			PROYECTO N°				2024005500041						
5	TEMPLETES													
5,1	TEMPLETE DIRECTO A TIERRA RED B.T. TIPO LAR412 NORMA CODENSA RETENIDA POSTE A VARILLA DE ANCLAJE TERMINAL O EN ÁNGULO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	21,00	$ 427.379,00	$ 8.974.959	28,00	$ 11.966.612	0,00	$ -	26,00	$ 11.111.854	26,00	$ 11.111.854	92,86%
5,2	PUESTA A TIERRA EN RED DE MEDIA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	69,00	$ 552.186,00	$ 38.100.834	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
5,3	PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR	UN	18,00	$ 2.606.413,00	$ 46.915.434	19,00	$ 49.521.847	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
5,4	TEMPLETE DIRECTO A TIERRA RED M.T. TIPO LAR412 NORMA CODENSA RETENIDA POSTE A VARILLA DE ANCLAJE TERMINAL O EN ÁNGULO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	291,00	$ 430.468,00	$ 125.266.188	307,00	$ 132.153.676	0,00	$ -	283,00	$ 121.822.444	283,00	$ 121.822.444	92,18%
5,5	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10,00	$ 589.755,00	$ 5.897.550	14,00	$ 8.256.570	0,00	$ -	13,00	$ 7.666.815	13,00	$ 7.666.815	92,86%
	SUBTOTAL TEMPLETES				**$ 225.154.965**		**$ 201.898.705**		**$ -**		**$ 140.601.113**		**$ 140.601.113**	
6	TRANSFORMADORES													
6,1	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 5 kVA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	18,00	$ 4.720.893,00	$ 84.976.074	20,00	$ 94.417.860	0,00	$ -	9,00	$ 42.488.037	9,00	$ 42.488.037	45,00%
	SUBTOTAL TRANSFORMADORES				**$ 84.976.074**		**$ 94.417.860**		**$ -**		**$ 42.488.037**		**$ 42.488.037**	
7	CAJAS Y CANALIZACIONES													
7,1	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	UN	4,00	$ 1.406.760,00	$ 5.627.040	4,00	$ 5.627.040	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
7,2	CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3 ZONA VERDE	UN	100,00	$ 35.538,00	$ 3.553.800	160,00	$ 5.686.080	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL CAJAS Y CANALIZACIONES				**$ 9.180.840**		**$ 11.313.120**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
8	MANIOBRA EN LINEA VIVA													
8,1	MANIOBRA EN LINEA VIVA	HR	20,00	$ 1.278.335,00	$ 25.566.700	20,00	$ 25.566.700	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL MANIOBRA EN LINEA VIVA				**$ 25.566.700**		**$ 25.566.700**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
9	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA													
9,1	CERTIFICACION RETIE	KM	42,81	$ 1.200.000,00	$ 51.372.000	45,96	$ 55.152.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
9,2	TRAMITE LEGALIZACION EMSA	UN	1,00	$ 800.000,00	$ 800.000	11,00	$ 8.800.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTALSERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA				**$ 52.172.000**		**$ 63.952.000**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
10	ITEMS NO PREVISTOS													
N.P.1	ESTRUCTURA TIPO 510-02 NORMA ICEL CIRCUITO BIFÁSICO AISLAMIENTO EN ESPIGO ÁNGULOS DE 0° A 5°. B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN		$ 506.211,00	$ -	131,00	$ 66.313.641	0,00	$ -	112,00	$ 56.695.632	112,00	$ 56.695.632	85,50%
N.P.2	ESTRUCTURA TIPO 514-02 NORMA ICEL CIRCUITO BIFÁSICO ESTRUCTURA TERMINAL. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN		$ 1.095.859,00	$ -	40,00	$ 43.834.360	0,00	$ -	39,00	$ 42.738.501	39,00	$ 42.738.501	97,50%
N.P.3	ESTRUCTURA TIPO 515-02 NORMA ICEL CIRCUITO BIFÁSICO ESTRUCTURA DE RETENCIÓN. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN		$ 1.628.916,00	$ -	26,00	$ 42.351.816	0,00	$ -	24,00	$ 39.093.984	24,00	$ 39.093.984	92,31%
N.P.4	ESTRUCTURA TIPO 523-02 NORMA ICEL CIRCUITO TRIFÁSICO AISLAMIENTO EN ESPIGO DISPOSICIÓN EN SEMIBANDERA ÁNGULO DE 0° A 5°. B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN		$ 519.519,00	$ -	80,00	$ 41.561.520	0,00	$ -	80,00	$ 41.561.520	80,00	$ 41.561.520	100,00%
N.P.5	ESTRUCTURA TERMINAL TIPO 550-02 NORMA ICEL CIRCUITO TRIFÁSICO B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN		$ 1.368.867,00	$ -	13,00	$ 17.795.271	0,00	$ -	12,00	$ 16.426.404	12,00	$ 16.426.404	92,31%
N.P.6	ESTRUCTURA DE RETENCIÓN TIPO 560-02 NORMA ICEL CIRCUITO TRIFÁSICO CON NEUTRO B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN		$ 2.439.653,00	$ -	13,00	$ 31.715.489	0,00	$ -	13,00	$ 31.715.489	13,00	$ 31.715.489	100,00%
N.P.7	ESTRUCTURA EN H CIRCUITO SIMPLE RETENCION TIPO IPSE RH-230 CRUCETAS DE 2 Y 4 MTS CABLE DE GUARDA NEUTRO (OPCIONALES) HASTA 44 kV, ANG. MAX. 45°, UMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN		$ 2.316.139,00	$ -	7,00	$ 16.212.973	0,00	$ -	4,00	$ 9.264.556	4,00	$ 9.264.556	57,14%
N.P.8	ESTRUCTURA EN H CIRCUITO BIFASICO SIMPLE SUSPENSION TIPO IPSE SH-229M CRUCETA DE 4 MTS CABLE DE GUARDA – NEUTRO (OPCIONAL) HASTA 44 kV, ANG. MÁX. 3°, UMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN		$ 1.799.375,00	$ -	18,00	$ 32.388.750	0,00	$ -	18,00	$ 32.388.750	18,00	$ 32.388.750	100,00%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

3185

CONTRATO N°		707 DE 2025			PROYECTO N°										
N.P.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE AMORTIGUADOR TIPO STOCK BRIDGE PARA CABLE # 2 AWG	UN		$ 242.458,00	$ -	276,00	$ 66.918.408	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.10	PRUBA VLF - VERY LOW FREQUENCY PARA CABLE XLPE	UN		$ 4.119.163,00	$ -	2,00	$ 8.238.326	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.11	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3		$ 109.092,00	$ -	278,00	$ 30.327.576	0,00	$ -	187,00	$ 20.400.204	187,00	$ 20.400.204	67,27%
N.P.12	MODULO TRIFASICO DE CORTACIRCUITO DE REPETICION DE TRES ETAPA	UN		$ 10.529.926,00	$ -	1,00	$ 10.529.926	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL ÍTEMS NO PREVISTOS				$ -		$ 408.188.056		$ -		$ 290.285.040		$ 290.285.040	
	VALOR TOTAL OBRA				$ 2.225.223.401,00		$ 2.225.223.401,00		$ 0,00		$ 1.629.408.595,64		$ 1.629.408.595,64	

CONDICIONES GENERALES		
VALOR CONDICIONES ORIGINALES	$	2.225.223.401,00
VALOR ADICIONAL	$	-
VALOR TOTAL	$	2.225.223.401,00
CONDICIONES ACTUALIZADAS	$	2.225.223.401,00
ANTICIPO 20%	$	445.044.680,20
PRESENTE ACTA	$	1.629.408.595,64
ACUMULADO	$	1.629.408.595,64

CONDICIONES ACTUALIZADAS				
	RELACIÓN DE ACTAS		AMORTIZACIONES	NETO PARCIAL
ACTA 1	$	-	$ -	$ -
ACTA 2			$ -	$ -
ACTA 3			$ -	$ -
PRESENTE ACTA	$	1.629.408.595,64	$ 325.881.719,13	$ 1.303.526.876,51
TOTALES	$	1.629.408.595,64	$ 325.881.719,13	$ 1.303.526.876,51

RESUMEN			%
EJECUTADO	$	1.629.408.595,64	73,22
POR EJECUTAR	$	595.814.805,36	26,78
POR AMORTIZAR	$	119.162.961,07	26,78
TOTALES	$	2.225.223.401,00	100

RELACIÓN DE PAGOS PROYECTO N° XXX (Registro Presupuestal No. Xxxxxxx de 20xx)					
ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ANTICIPO	$ 445.044.680,20			$ 445.044.680,20
2	PAGO PARCIAL N°1	$ -	$ -	$ -	$ 445.044.680,20
3	PRESENTE ACTA	$ 1.629.408.595,64	$ 325.881.719,13	$ 1.303.526.876,51	$ 1.748.571.556,71
4	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ 595.814.805,36			

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

NOTAS
1: El contador del contratista e interventor, Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.
3. Que la interventoria certifica que el contratista xxxxxx identificado con el NIT xxxxx cumplio con la clausula xxxx forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los periodos relacionados en la presente acta.
4. El contrato de obra N°707 de 2025 representado legalmente por el CONSORCIO LUMEN FIDEI , durante su ejecución ha tenido modificaciones en su conformación o cesión de derechos por parte de los consorciados: SI____ de fecha _____ NO___

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día: **martes, 25 de agosto de 2026**

Firma:
Nombre: LICETH DARLEY LEAL PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-17615

Firma:
Nombre: PAULA JIMENA ALVARADO
CONTADOR DEL CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 330918-T

Firma:
Nombre: YESICA FERNANDA BOLIVAR LADINO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: HOLMAN WBEIMAR SUAREZ NIÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54604

Firma:
Nombre: LINA YANINNE RUBIANO
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 201920-T

Nota: en la presente acta se debera adjuntar el certificado bancario y las respectivas tarjetas y antecedentes de los contadores.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co


CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041
FECHA DE INICIÓ:	10/04/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	9/09/2026
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO LUMEN FIDEI		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	180 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELÉCTRICO S.A.S.		

ACTA:	Acta parcial No. 1	
CAPITULO:	Preliminares	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	KM

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
E000 A E001				16,2	16,2
E000 A E001-1				37,8	37,8
E001 A E016				1465,6	1465,6
E016 A E079				3379,1	3379,1
E041 A E065				2426,2	2426,2
E065 A E066				39,2	39,2
E070 A E074				572	572
E079 A E080				120,2	120,2
E080 A E185				5971,1	5971,1
E083 A E083-13				2147,6	2147,6
E110 A E157				1664,9	1664,9
E157 A E159				89,1	89,1
E119 A E139				1874,8	1874,8
E139 A E140				59,6	59,6
E138 A E148				853,4	853,4
E148 A E149				45,1	45,1
E185 A E205				1491,9	1491,9
E205 A E207				103,3	103,3
E191 A E195				412,4	412,4
E195 A E196				48,1	48,1
E185 A E232				1900,9	1900,9
E215 A E217				189,1	189,1
E225 A E229				380,4	380,4
E230 A E230-4				513,6	513,6
E233 A E238				299,3	299,3
E185 A E258				2057,9	2057,9
E258 A E260				85,8	85,8
E080 A E286				1466,9	1466,9
E274 A E285				1062,1	1062,1
E286 A E287				38,1	38,1
E287 A E290				886,1	886,1
E290 A E297				2540,1	2540,1
E290 A E325				6688,7	6688,7
E301 A E303				244,5	244,5
E303 A E304				57	57
E308 A E310				346,1	346,1
E310 A E312				93,3	93,3
E325 A E326				58,8	58,8
					0
PASAN:				SUBTOTAL	
				TOTAL	41,73

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

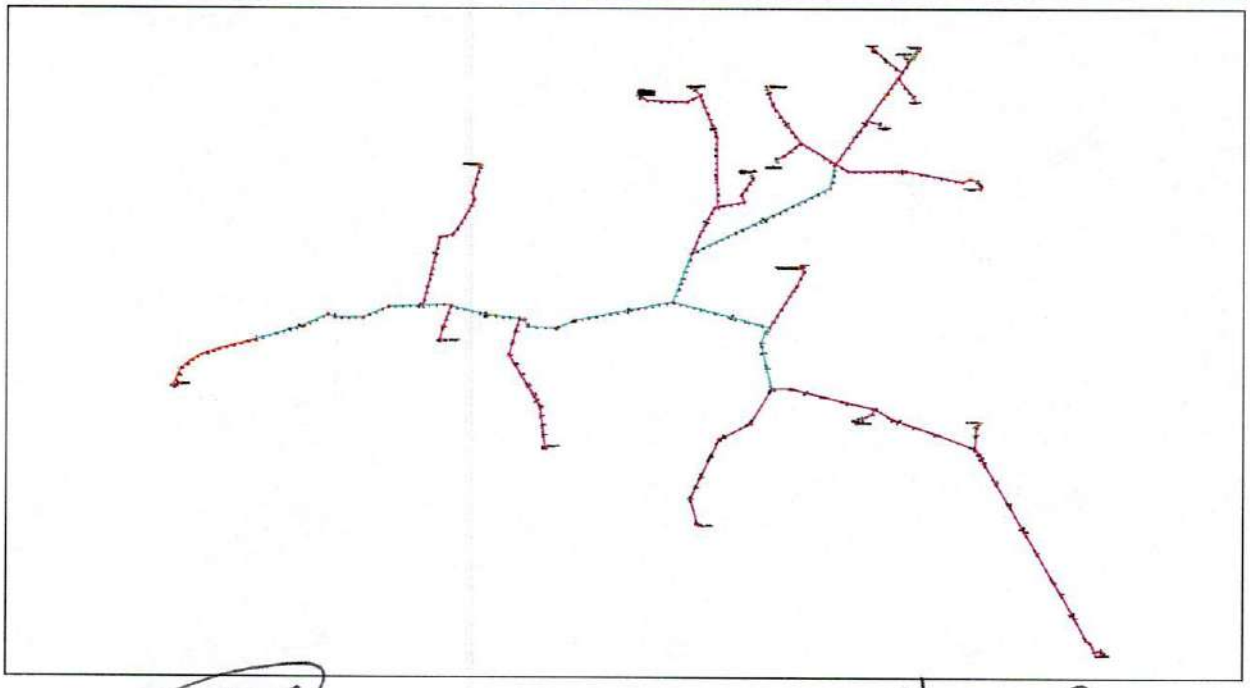

Firma
Nombre: Hernando Ayala Villamil
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-17615

Firma
Nombre: Holman Suarez Niño
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54694

Firma
Nombre: Orlando Baquero Martínez
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-7068

Firma
Nombre: Ivan Alejandro Gordillo Quiñones
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54604

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041
FECHA DE INICIÓ:	10/04/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	9/09/2026
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO LUMEN FIDEI		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	180 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELÉCTRICO S.A.S.		

ACTA:	Acta parcial No. 1


CAPITULO:	Postes	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,1	**POSTE DE CONCRETO LINEA DE 8 M X 510 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN**	**UN**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
E066				1	1
E158-E159				2	2
E140				1	1
E149				1	1
E196				1	1
E206-E207				2	2
E233-E238				6	6
E259-E260				2	2
E304				1	1
E311-E312				2	2
E326				1	1
					0
PASAN:				SUBTOTAL	
				TOTAL	20

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

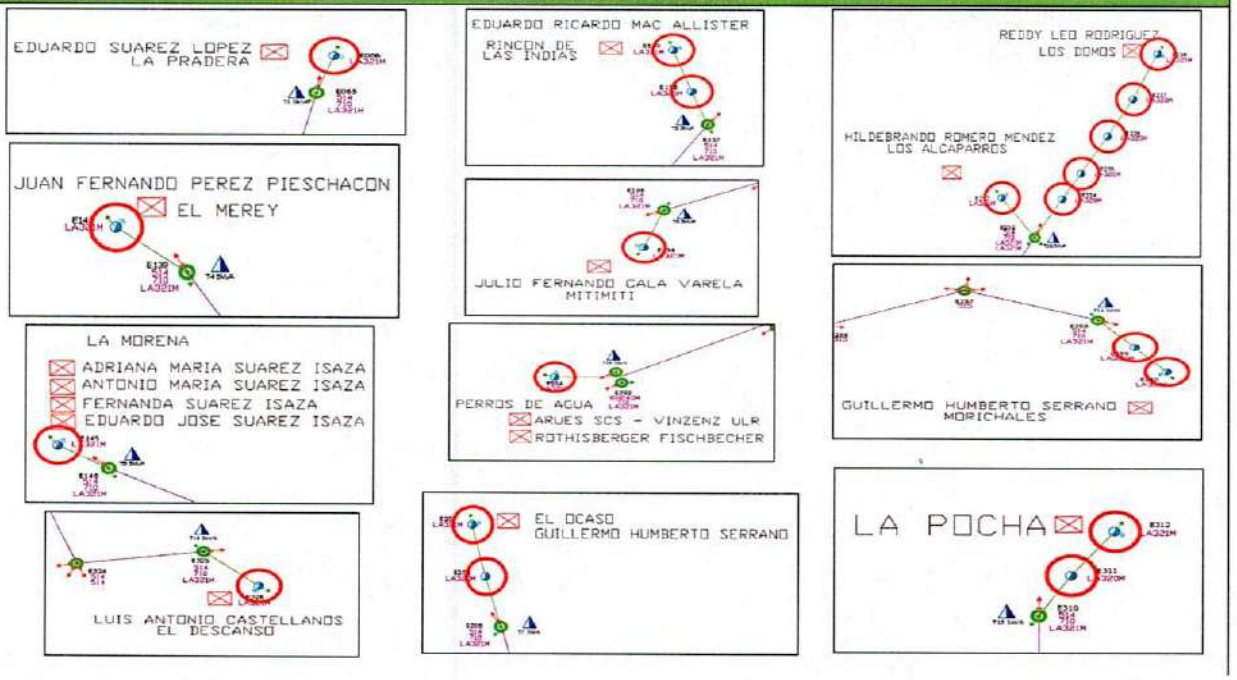

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

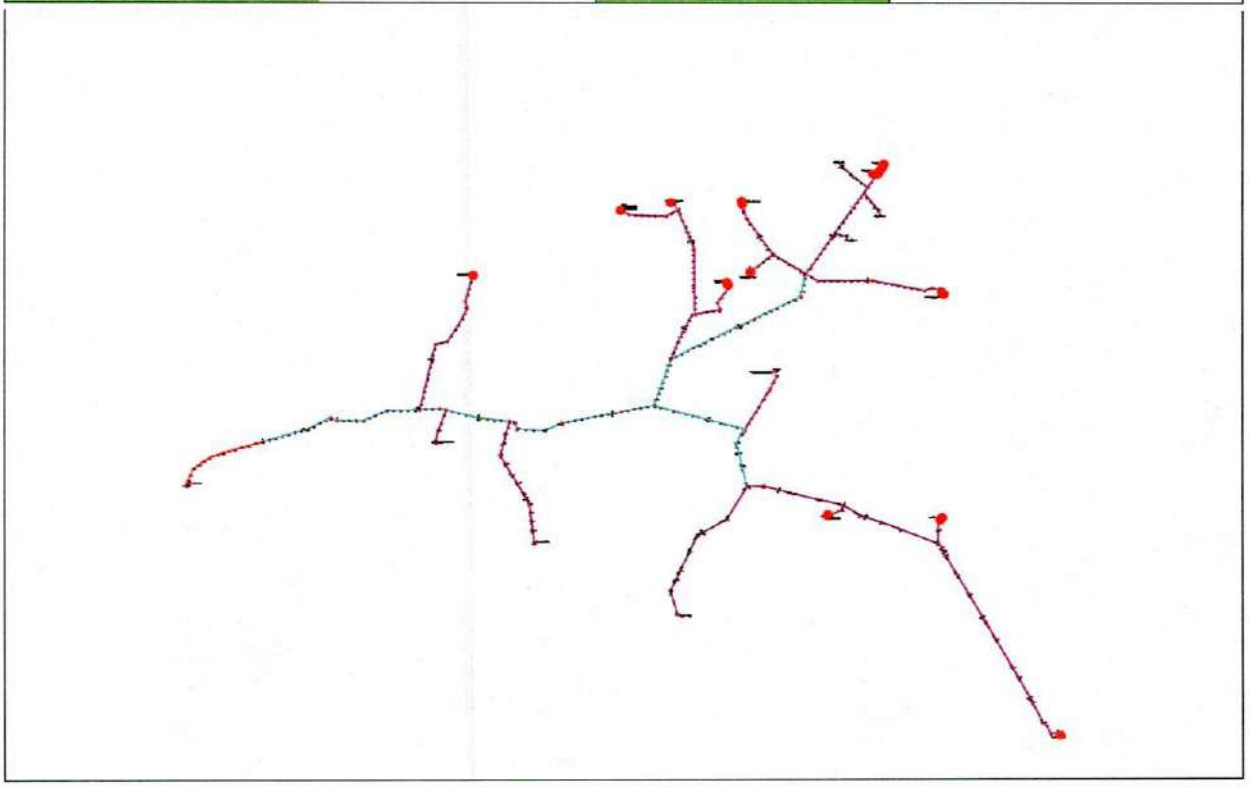

Firma
Nombre: Hernando Ayala Villamil
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-17615

Firma
Nombre: Holman Suarez Niño
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54694

Firma
Nombre: Orlando Baquero Martínez
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-7068

Firma
Nombre: Iván Alejandro Gordillo Quiñones
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54604


Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041
FECHA DE INICIÓ:	10/04/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	9/09/2026
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO LUMEN FIDEI		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	180 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELÉCTRICO S.A.S.		

ACTA:	Acta parcial No. 1	
CAPITULO:	Postes	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,2	**POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 12 M X 510 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN**	**UN**


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
E000				1	1
E017 A E065				49	49
E067 A E074				10	10
E075 A E083-13				32	32
E084 A E139				59	59
E141 A E148				8	8
E150 A E157				8	8
E160 A E232				45	45
E186 A E205				15	15
E192 A E195				4	4
E216 A E217				2	2
E226 A E229				4	4
E230-1 A E230-4				6	6
E239 A E258				20	20
E261 A E285				25	25
E286 A E297				23	23
E298 A E303				12	12
E305 A E310				11	11
E313 A E325				23	23
					0
PASAN:				SUBTOTAL	
				TOTAL	357

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

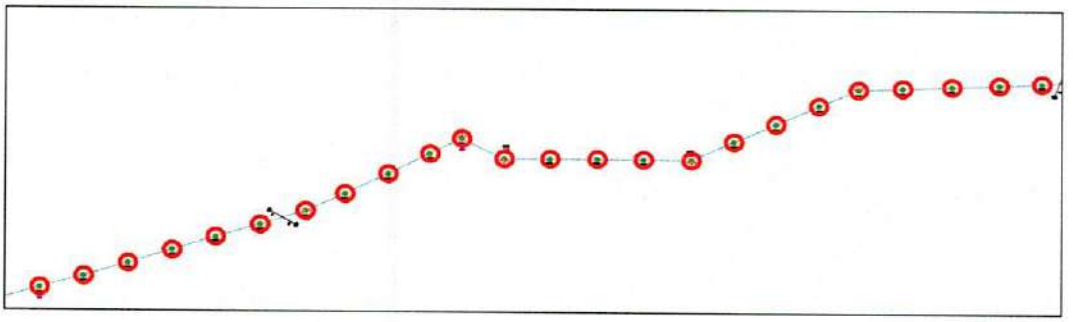


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co


CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

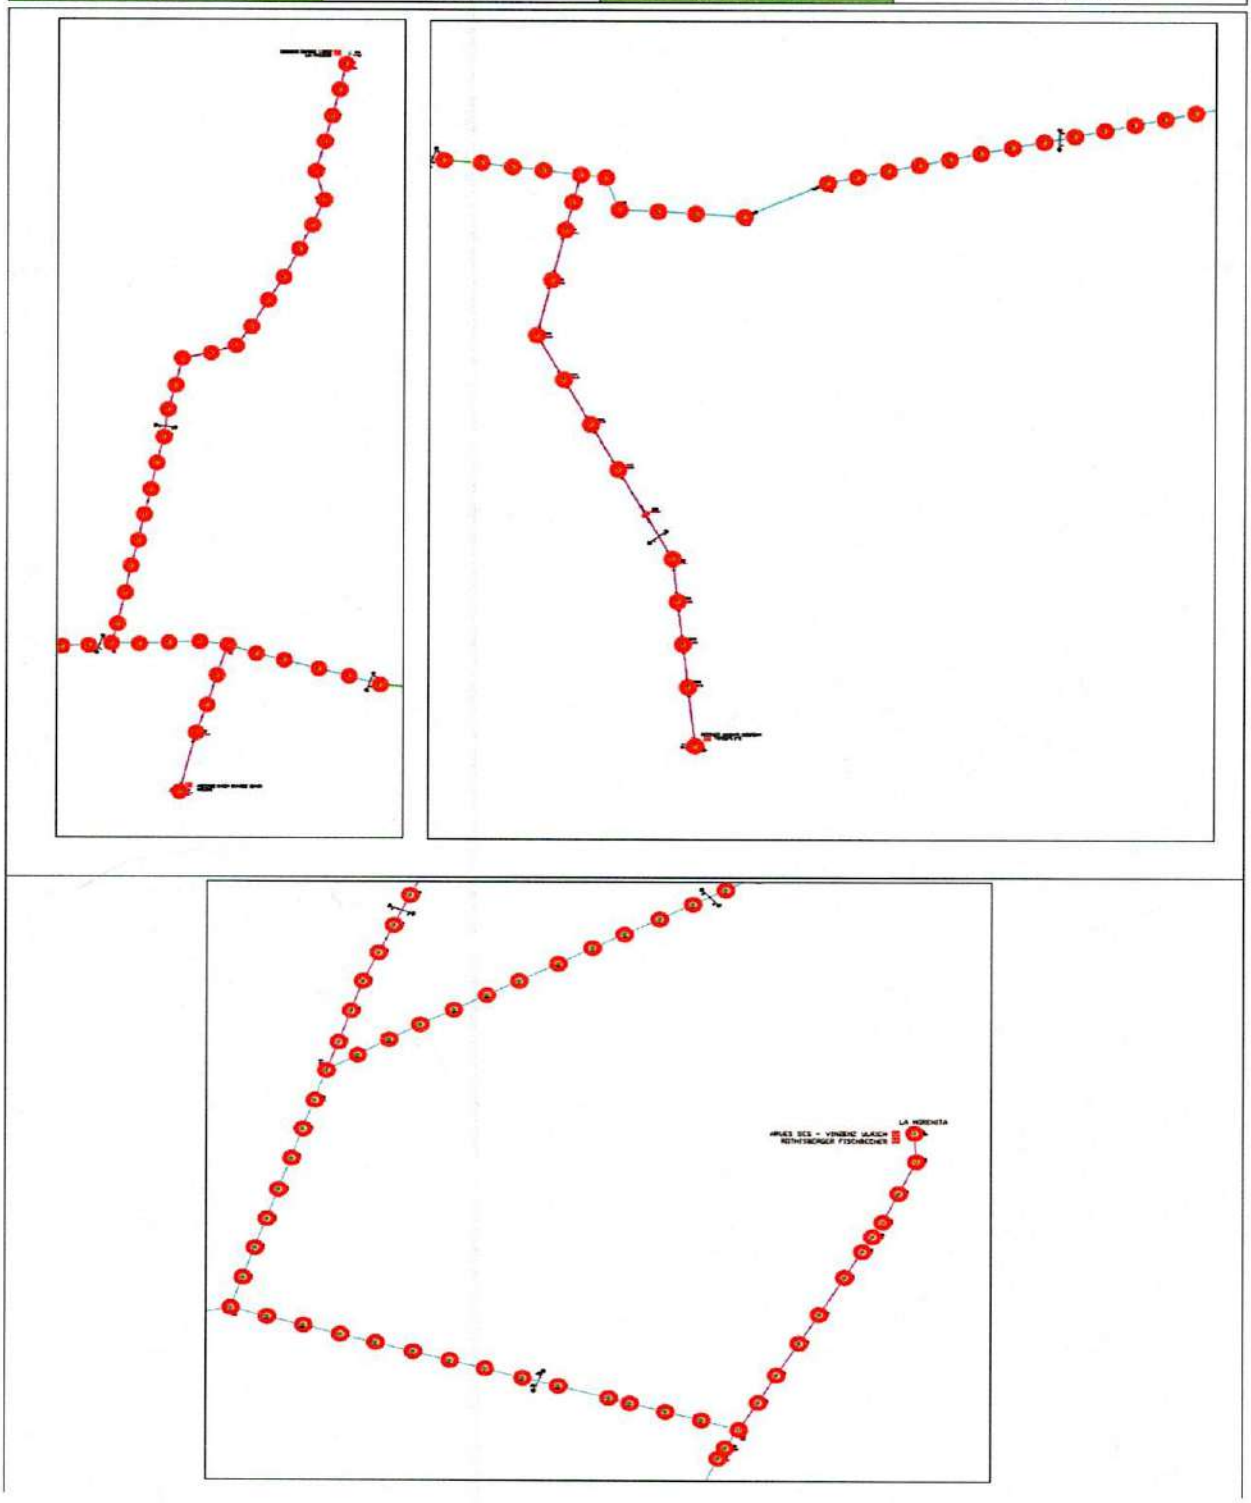

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

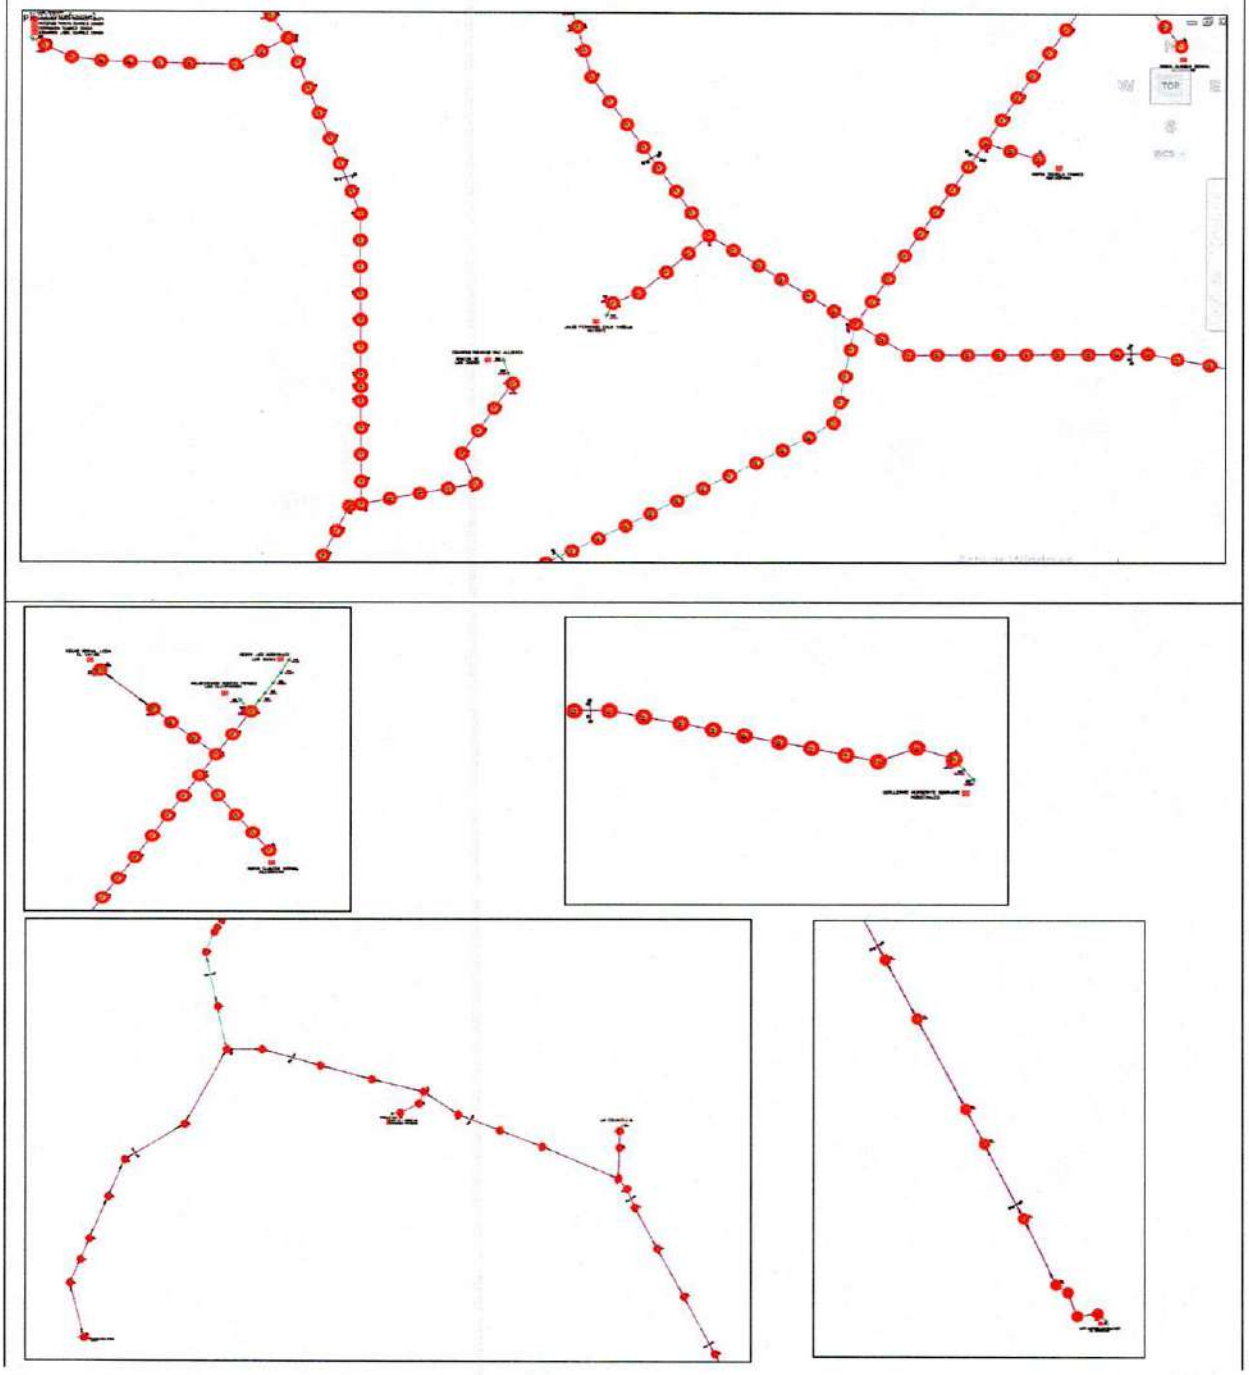

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

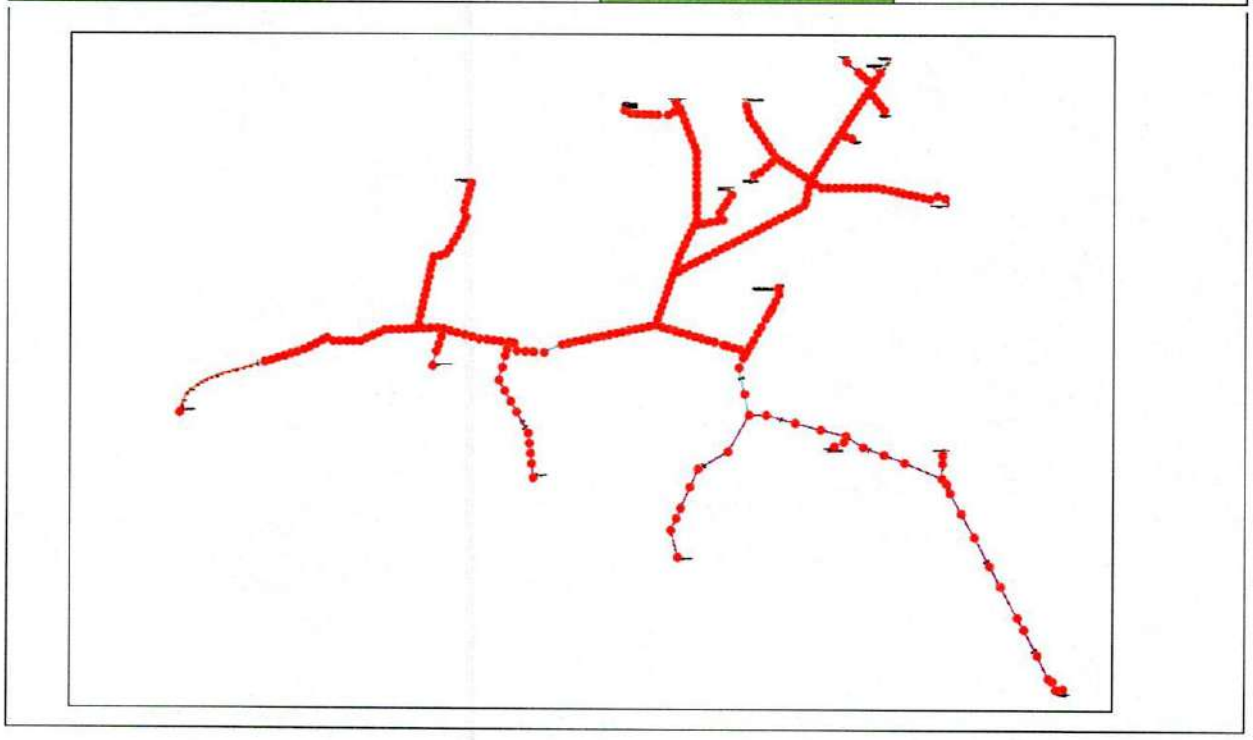

Firma
Nombre: Hernando Ayala Villamil
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-17615

Firma
Nombre: Holman Suarez Niño
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54694

Firma
Nombre: Orlando Baquero Martínez
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-7068

Firma
Nombre: Ivan Alejandro Gordillo Quiñones
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54604

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041


FECHA DE INICIÓ:	10/04/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	9/09/2026
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO LUMEN FIDEI		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	180 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELÉCTRICO S.A.S.		

ACTA:	Acta parcial No. 1


CAPITULO:	Estructuras	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.2	**ESTRUCTURA EN H CIRCUITO SIMPLE RETENCIÓN TIPO IPSE RH-231-02 CRUCETA DOBLE DE 4 MTS. HASTA 44KV ANG. MÁX. 45° SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA CIRCUITO BIFASICO**	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
E073				1	1
E083-4				1	1
E083-9				1	1
E291				1	1
E292				1	1
E294				1	1
E296				1	1
E298				1	1
E299				1	1
E300				1	1
E302				1	1
E305				1	1
E307				1	1
E308				1	1
E313				1	1
E314				1	1
E317				1	1
E319				1	1
E322				1	1
PASAN:				SUBTOTAL	
				TOTAL	19

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

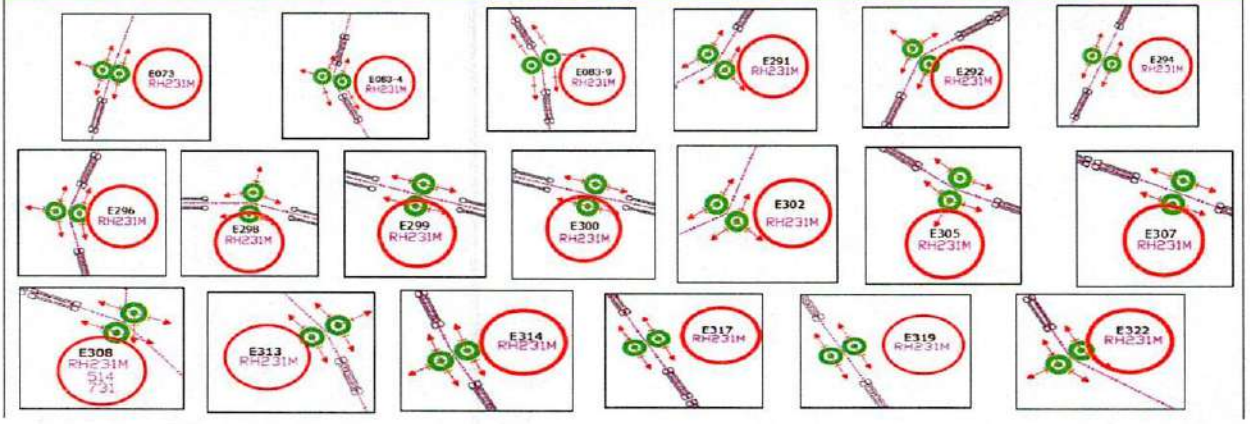

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

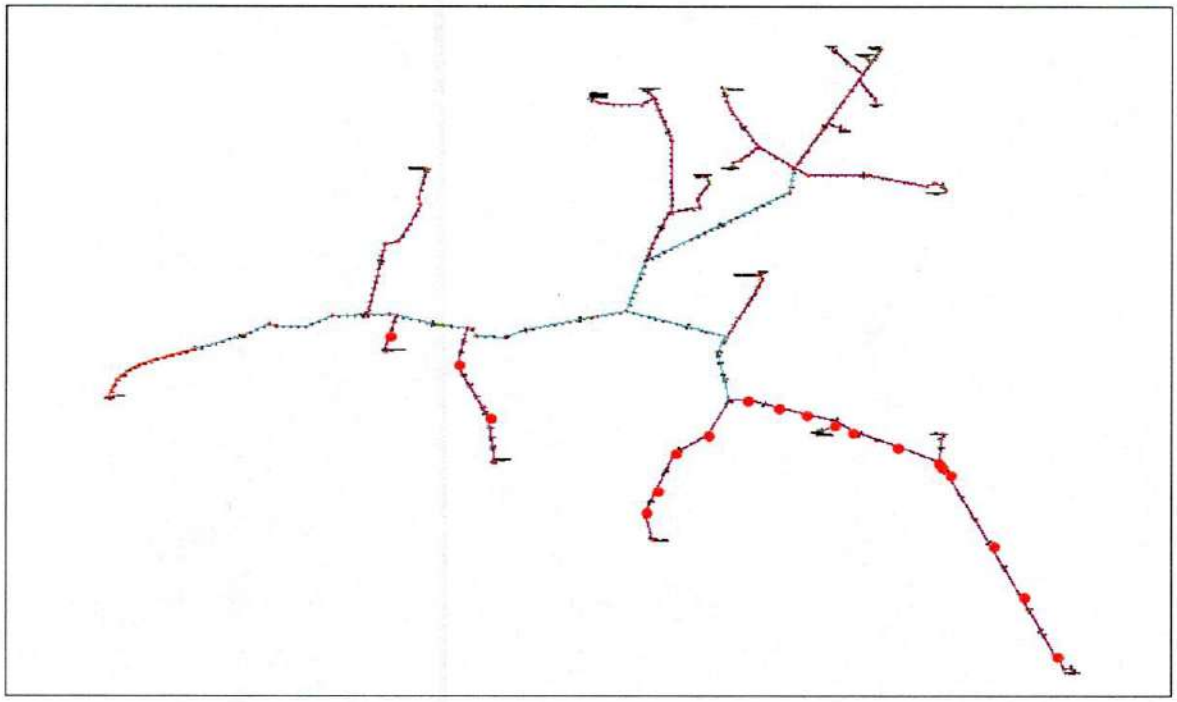

Firma
Nombre: Hernando Ayala Villamil
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-17615

Firma
Nombre: Orlando Baquero Martínez
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-7068

Firma
Nombre:Holman Suarez Niño
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54694

Firma
Nombre: Ivan Alejandro Gordillo Quiñones
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54604

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041
FECHA DE INICIÓ:	10/04/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	9/09/2026
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO LUMEN FIDEI		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	180 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELÉCTRICO S.A.S.		


ACTA:	Acta parcial No. 1

CAPITULO:	Estructuras	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3,3	**ESTRUCTURA EN H TERMINAL TIPO IPSE RH-240 DISPOSICIÓN HORIZONTAL, CIRCUITO TRIFÁSICO DOBLE CRUCETA DE 4 MTS. SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA**	**UN**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
E290				1	1
PASAN:				SUBTOTAL	
				TOTAL	1

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

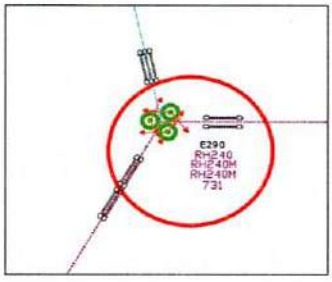

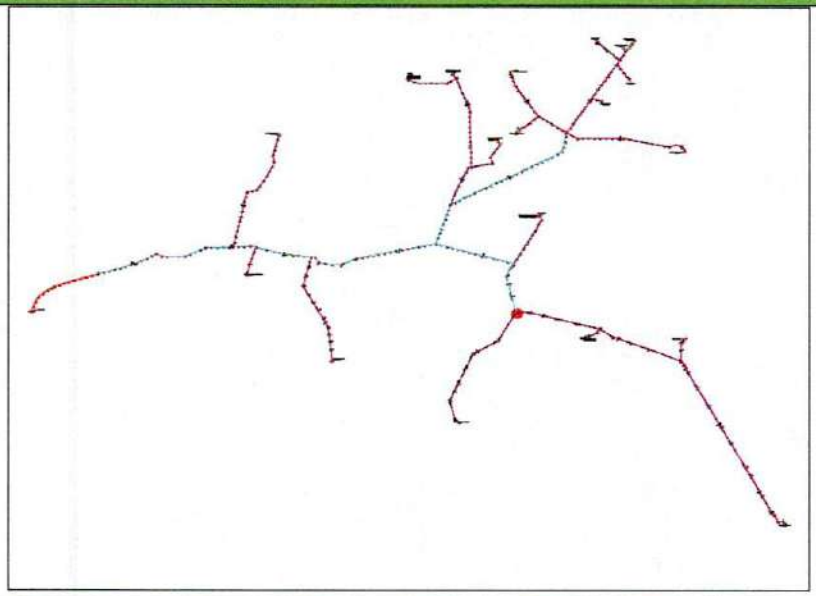

Firma
Nombre: Hernando Ayala Villamil
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-17615

Firma
Nombre: Orlando Baquero Martínez
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-7068

Firma
Nombre:Holman Suarez Niño
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54694

Firma
Nombre: Ivan Alejandro Gordillo Quiñones
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54604

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041
FECHA DE INICIÓ:	10/04/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	9/09/2026
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO LUMEN FIDEI		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	180 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELÉCTRICO S.A.S.		

ACTA:	Acta parcial No. 1
CAPITULO:	Estructuras

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3,4	ESTRUCTURA EN H TERMINAL TIPO IPSE NC RH-240 DISPOSICIÓN HORIZONTAL, CIRCUITO BIFÁSICO DOBLE CRUCETA DE 4 MTS. SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
E083-13				1	1
E290				2	2
E297				1	1
E301				2	2
PASAN:				SUBTOTAL	
				TOTAL	6

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

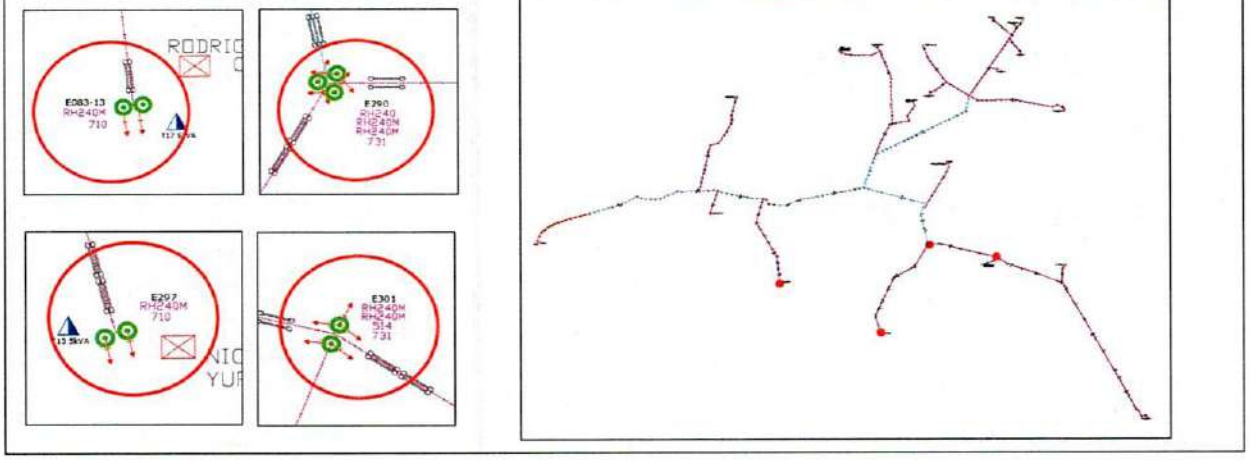

Firma
Nombre: Hernando Ayala Villamil
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-17615

Firma
Nombre:Holman Suarez Niño
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54694

Firma
Nombre: Orlando Baquero Martínez
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-7068

Firma
Nombre: Ivan Alejandro Gordillo Quiñones
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54604

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041
FECHA DE INICIÓ:	10/04/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	9/09/2026
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO LUMEN FIDEI		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	180 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELÉCTRICO S.A.S.		

ACTA:	Acta parcial No. 1


CAPITULO:	Estructuras	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3,20	ESTRUCTURA TIPO 710-02 NORMA ICEL MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO EN POSTE PESO MÁXIMO 500 KG B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
E000				1	1
E065				1	1
E074				1	1
E083-13				1	1
E157				1	1
E139				1	1
E148				1	1
E195				1	1
E205				1	1
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
PASAN:				SUBTOTAL	
				TOTAL	9

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

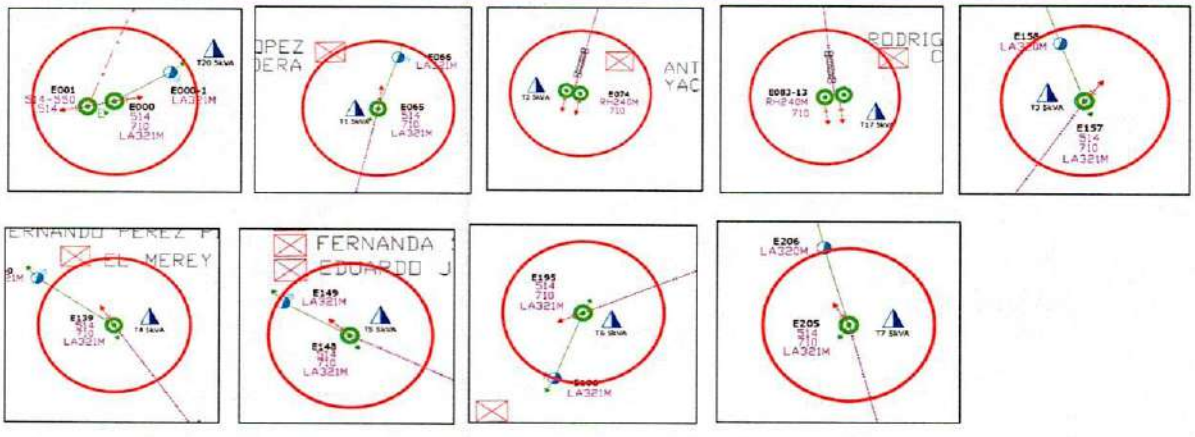

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

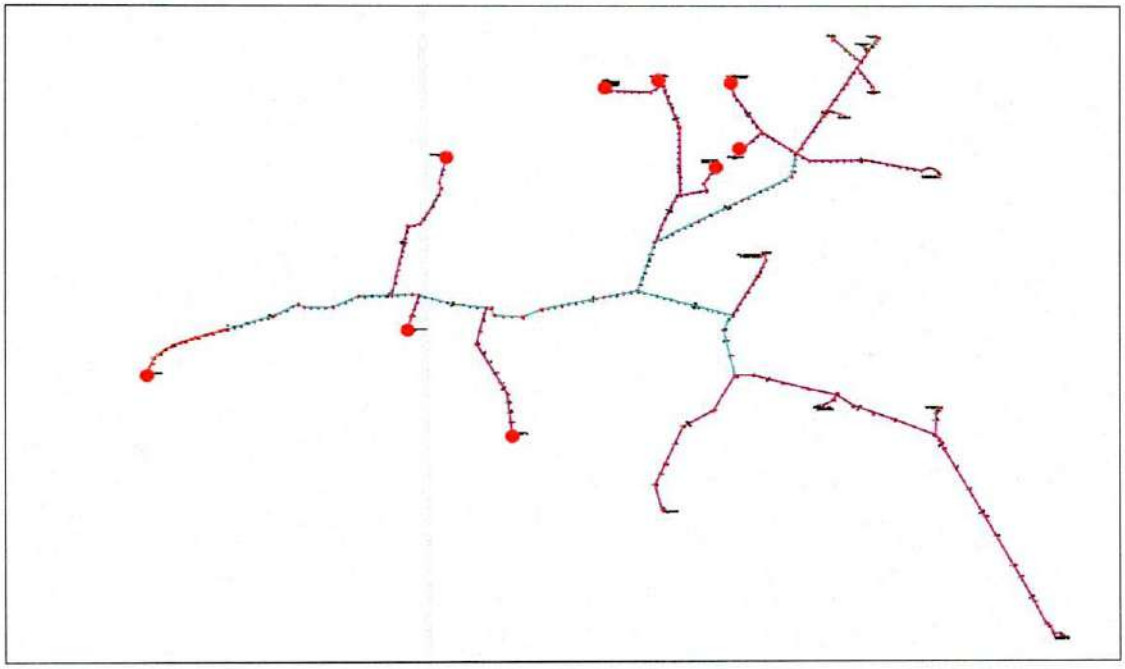

Firma
Nombre: Hernando Ayala Villamil
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-17615

Firma
Nombre: Orlando Baquero Martínez
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-7068

Firma
Nombre:Holman Suarez Niño
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54694

Firma
Nombre: Ivan Alejandro Gordillo Quiñones
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54604

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041


FECHA DE INICIÓ:	10/04/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	9/09/2026
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO LUMEN FIDEI		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	180 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELÉCTRICO S.A.S.		

ACTA:	Acta parcial No. 1

CAPITULO:	Estructuras	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3,21	CONVERTIR ESTRUCTURA CODENSA 510 A P103	UN


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
E002				1	1
E003				1	1
E005				1	1
E006				1	1
E007				1	1
E009				1	1
E010				1	1
E012				1	1
E013				1	1
E014				1	1
E015				1	1
PASAN:				SUBTOTAL	
				TOTAL	11

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

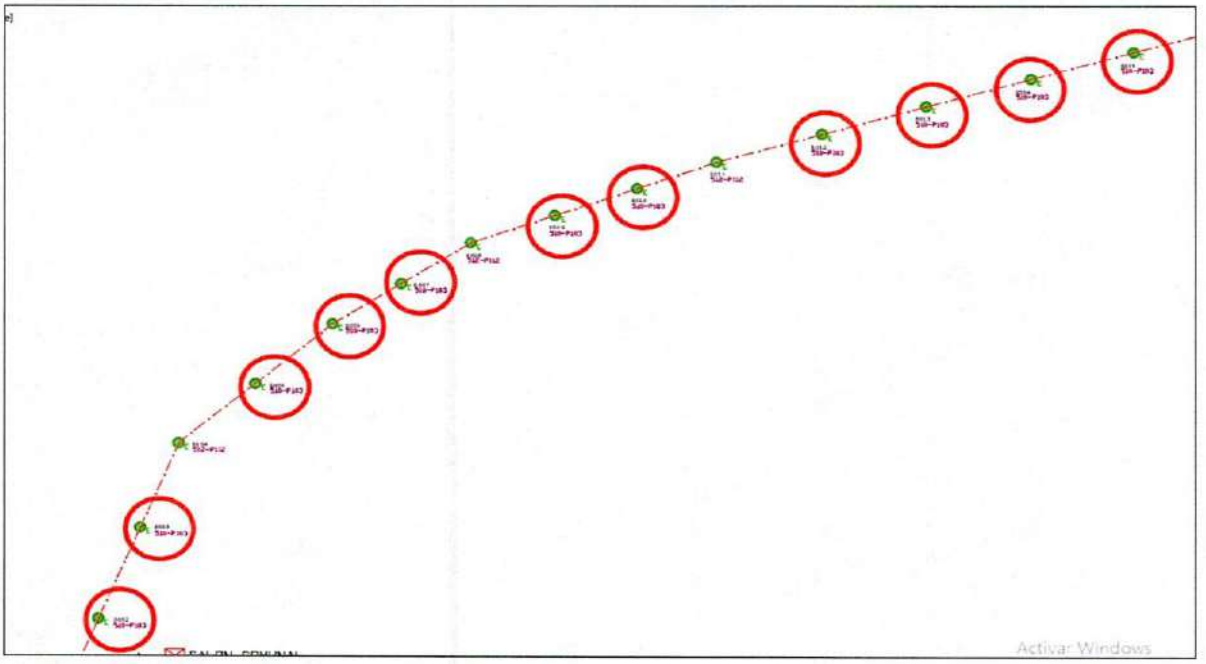

3202

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

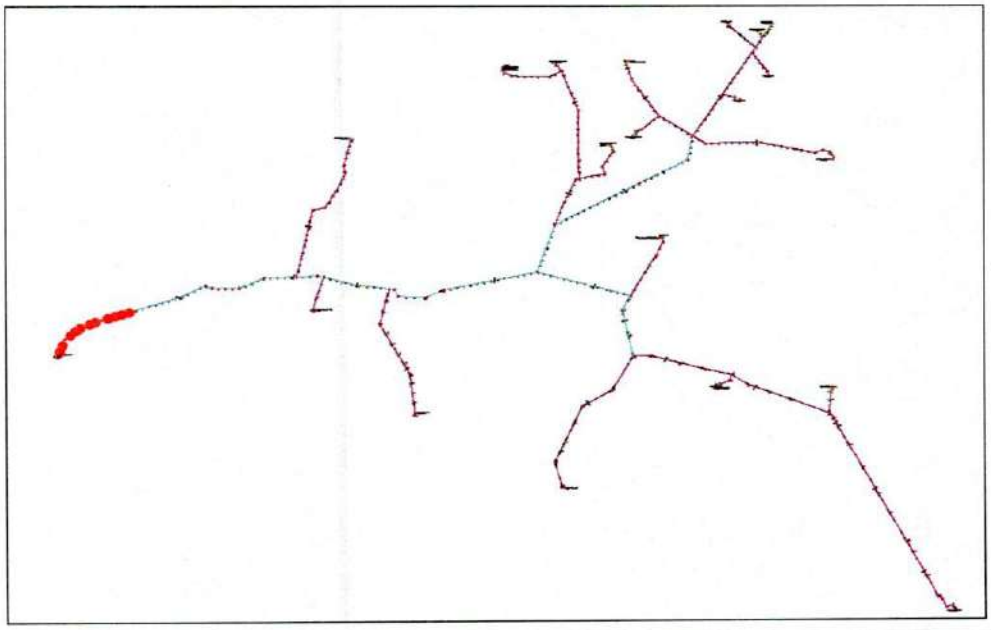

Firma
Nombre: Hernando Ayala Villamil
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-17615

Firma
Nombre:Holman Suarez Niño
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54694

Firma
Nombre: Orlando Baquero Martínez
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-7068

Firma
Nombre: Ivan Alejandro Gordillo Quiñones
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54604

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co


CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041
FECHA DE INICIÓ:	10/04/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	9/09/2026
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO LUMEN FIDEI		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	180 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELÉCTRICO S.A.S.		


ACTA:	Acta parcial No. 1

CAPITULO:	Estructuras	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3,22	CONVERTIR ESTRUCTURA CODENSA 512 A P112	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
E004				1	1
E008				1	1
E011				1	1
PASAN:				SUBTOTAL	
				TOTAL	3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

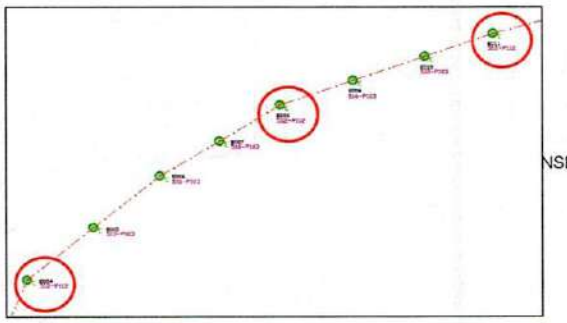

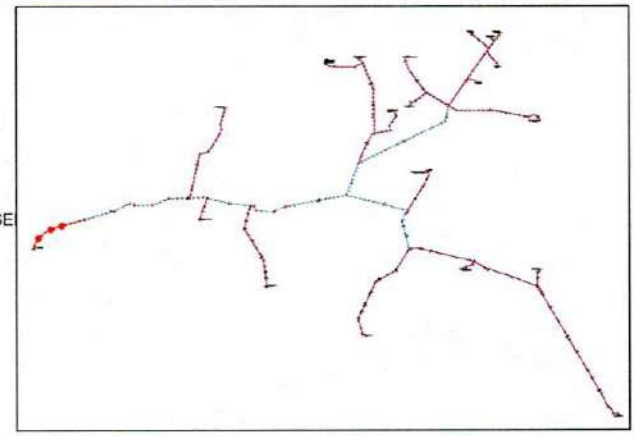

Firma
Nombre: Hernando Ayala Villamil
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-17615

Firma
Nombre: Orlando Baquero Martínez
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-7068

Firma
Nombre:Holman Suarez Niño
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54694


Firma
Nombre: Ivan Alejandro Gordillo Quiñones
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54604


Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041
FECHA DE INICIÓ:	10/04/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	9/09/2026
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO LUMEN FIDEI		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	180 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELÉCTRICO S.A.S.		
ACTA:	Acta parcial No. 1		
CAPITULO:	Estructuras		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
3,23	CONVERTIR ESTRUCTURA CODENSA 514 A 550		UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
E001				1	1
E016				1	1
PASAN:				SUBTOTAL	
				TOTAL	2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

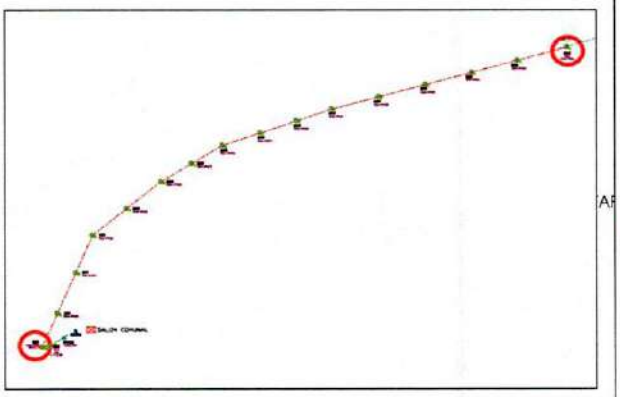

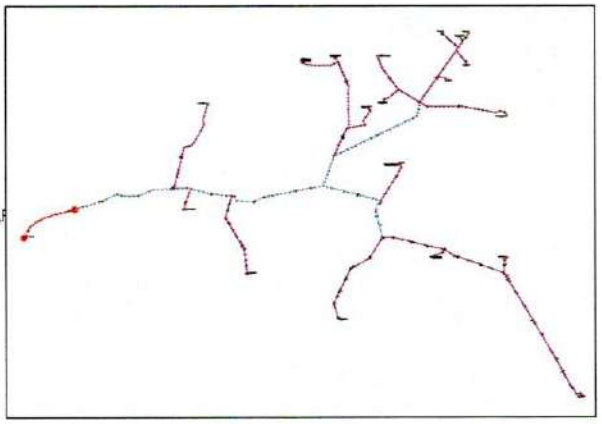

Firma
Nombre: Hernando Ayala Villamil
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-17615

Firma
Nombre:Holman Suarez Niño
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54694

Firma
Nombre: Orlando Baquero Martínez
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-7068

Firma
Nombre: Ivan Alejandro Gordillo Quiñones
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54604


Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041
FECHA DE INICIÓ:	10/04/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	9/09/2026
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO LUMEN FIDEI		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	180 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELÉCTRICO S.A.S.		
ACTA:	Acta parcial No. 1		
CAPITULO:	Estructuras		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3,25	ESTRUCTURA TIPO 730 NORMA ICEL DERIVACIÓN TRIFÁSICA CON CORTACIRCUITO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
E017				1	1
E102				1	1
PASAN:				SUBTOTAL	
				TOTAL	2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

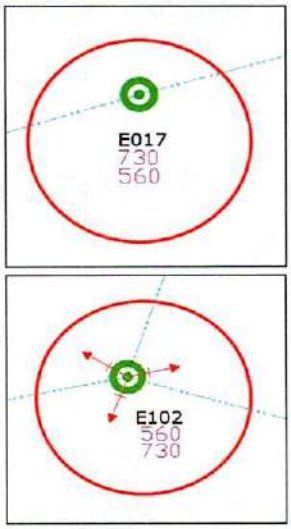

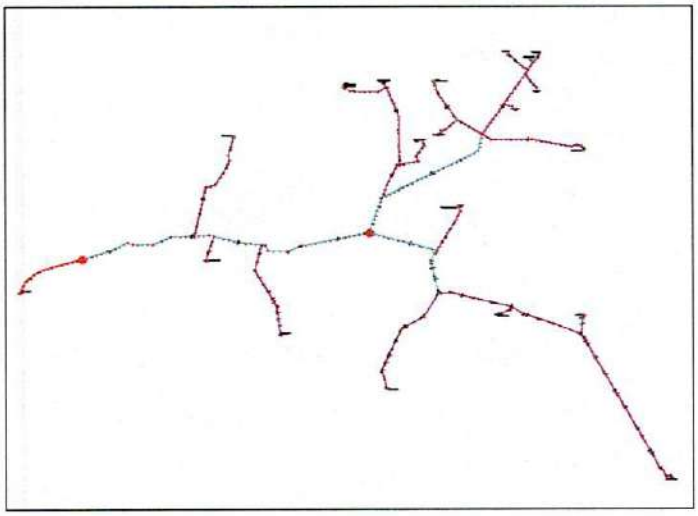

Firma
Nombre: Hernando Ayala Villamil
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-17615

Firma
Nombre: Orlando Baquero Martínez
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-7068

Firma
Nombre:Holman Suarez Niño
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54694

Firma
Nombre: Ivan Alejandro Gordillo Quiñones
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54604

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041
FECHA DE INICIÓ:	10/04/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	9/09/2026
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO LUMEN FIDEI		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	180 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELÉCTRICO S.A.S.		

ACTA:	Acta parcial No. 1
CAPITULO:	Estructuras


N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3,26	ESTRUCTURA TIPO 731 NORMA ICEL DERIVACIÓN MONOFÁSICA CON CORTACIRCUITO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
E041				1	1
E070				1	1
E083				1	1
E110				1	1
E119				1	1
E138				1	1
E185				1	1
E186				1	1
E208				1	1
E191				1	1
E215				1	1
E225				1	1
E230				1	1
E274				1	1
E290				1	1
E301				1	1
E308				1	1
PASAN:				SUBTOTAL	
				TOTAL	17

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

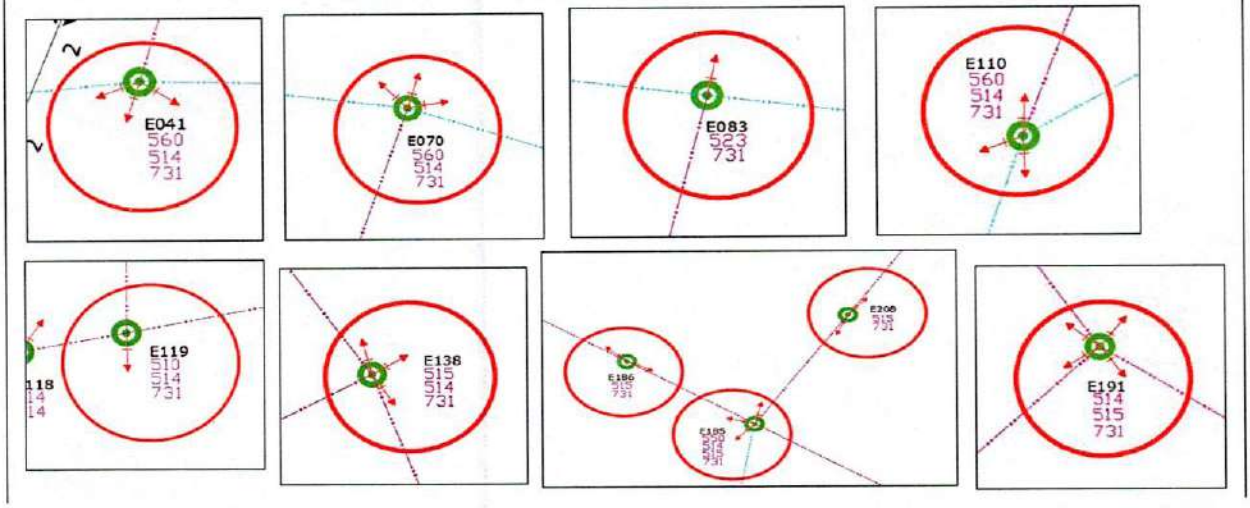

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

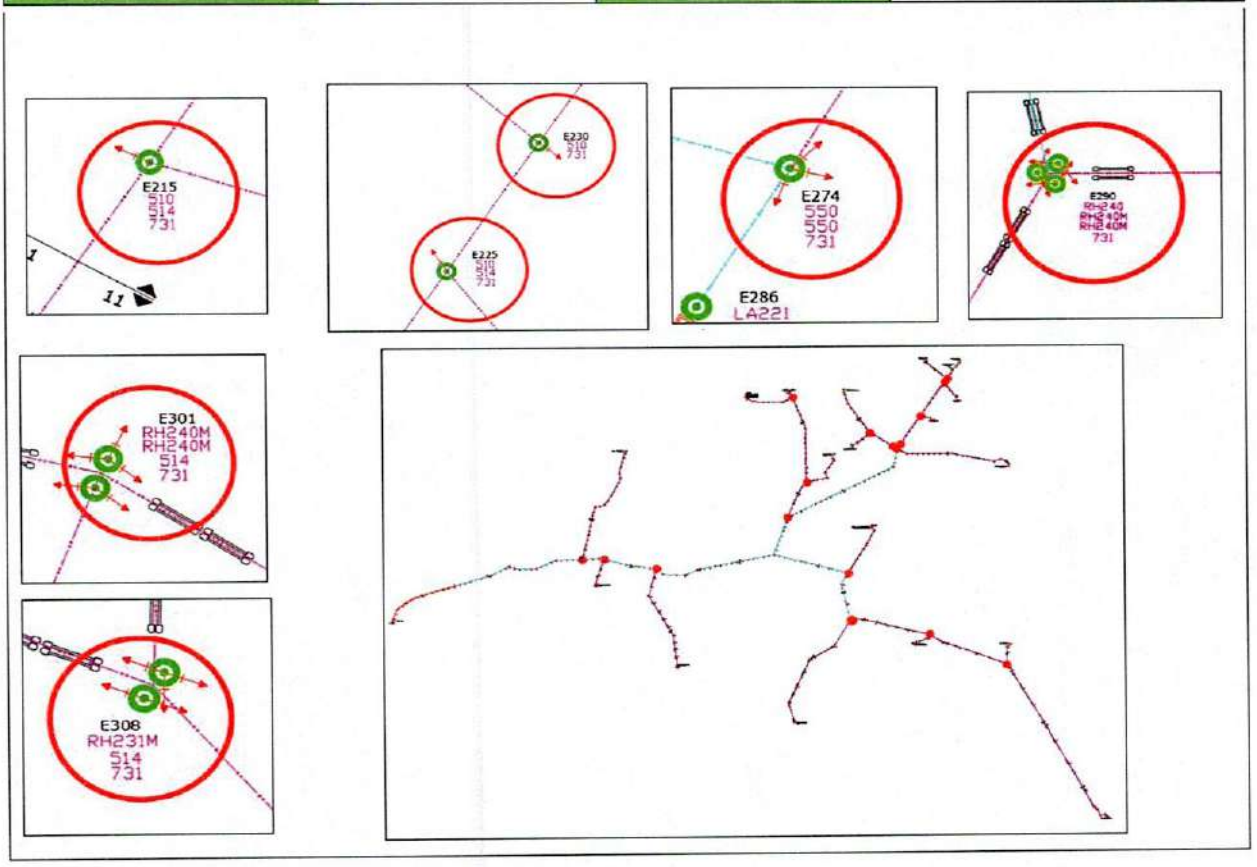

Firma
Nombre: Hernando Ayala Villamil
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-17615

Firma
Nombre:Holman Suarez Niño
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54694

Firma
Nombre: Orlando Baquero Martínez
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-7088

Firma
Nombre: Ivan Alejandro Gordillo Quiñones
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54604

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041
FECHA DE INICIÓ:	10/04/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	9/09/2026
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO LUMEN FIDEI		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	180 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELÉCTRICO S.A.S.		

ACTA:	Acta parcial No. 1

CAPITULO:	Estructuras	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3,29	**ESTRUCTURA LA320m CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA. SIN CAJA DE DERIVACION**	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
E158				1	1
E206				1	1
E234 A E237				4	4
E259				1	1
E311				1	1
PASAN:				SUBTOTAL	
				TOTAL	8

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

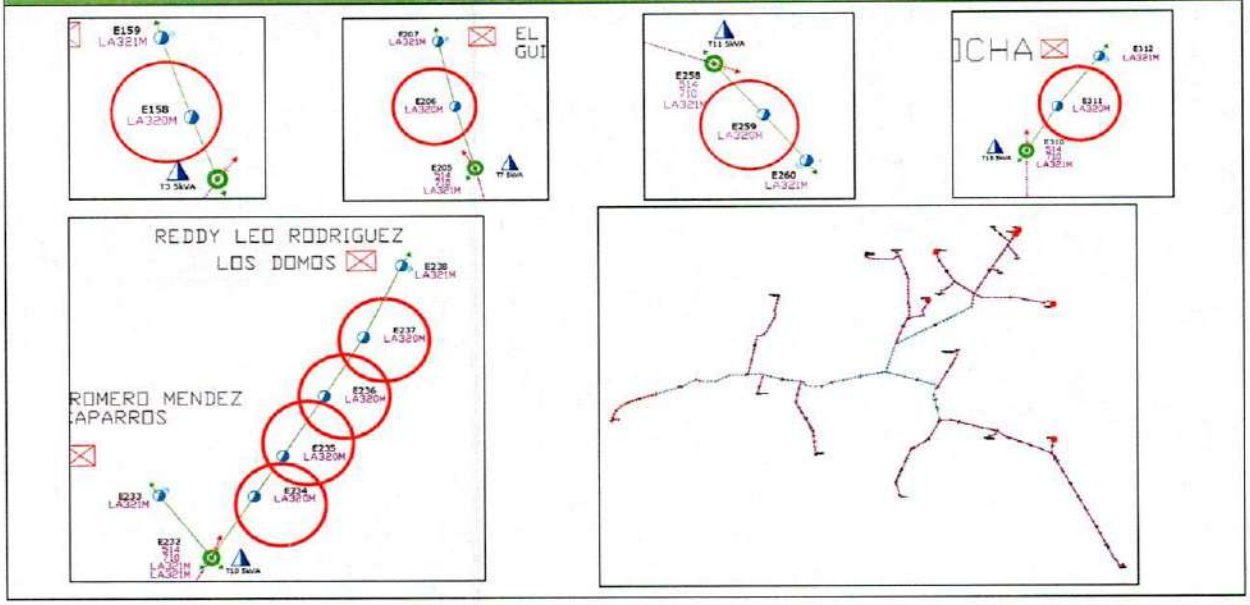

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

Firma
Nombre: Hernando Ayala Villamil
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-17615

Firma
Nombre:Holman Suarez Niño
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54694

Firma
Nombre: Orlando Baquero Martínez
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-7068

Firma
Nombre: Ivan Alejandro Gordillo Quiñones
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54604

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041
FECHA DE INICIÓ:	10/04/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	9/09/2026
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO LUMEN FIDEI		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	180 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELÉCTRICO S.A.S.		

ACTA:	Acta parcial No. 1
CAPITULO:	Estructuras

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3,30	**ESTRUCTURA LA321m FINAL DE CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN.NORMA CODENSA.. SIN CAJA DE DERIVACION**	**UN**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
E000 A E000-1				2	2
E065 A E066				2	2
E157 A E159				2	2
E139 A E140				2	2
E148 A E149				2	2
E195 A E196				2	2
E205 A E207				2	2
E232 - E233 -E238				4	4
E258 A E260				2	2
E303 A E304				2	2
E310 A E312				2	2
E325 A E326				2	2
PASAN:				SUBTOTAL	
				TOTAL	26

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





















CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

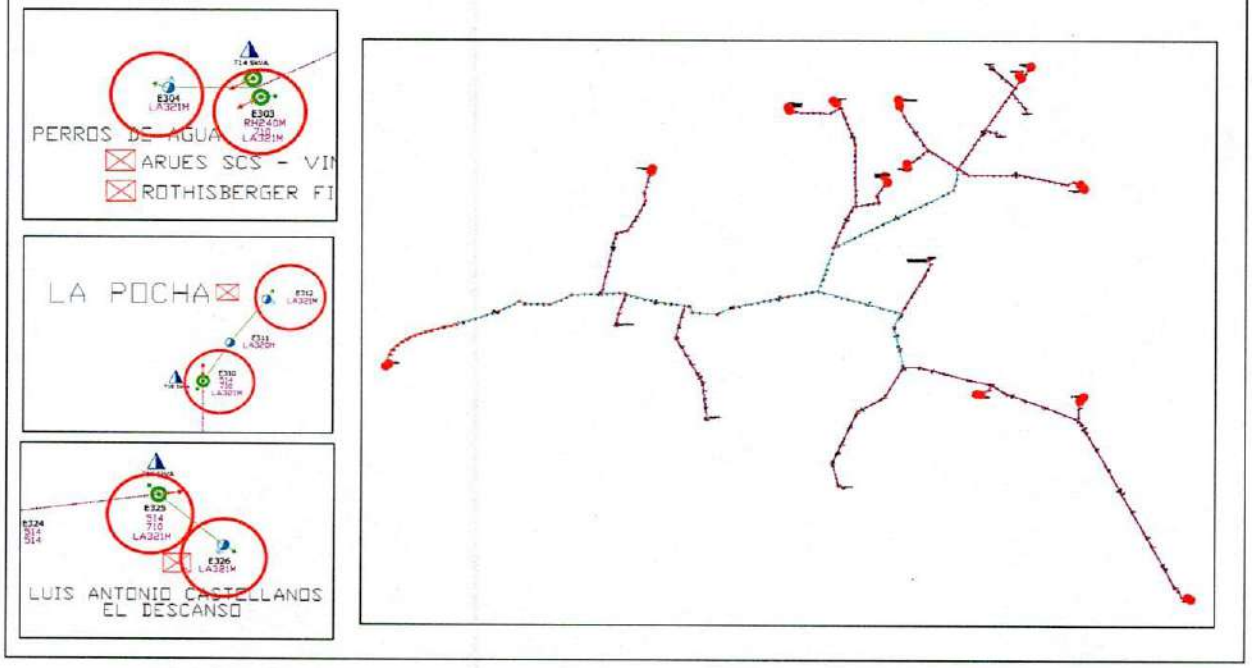

Firma
Nombre: Hernando Ayala Villamil
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-17615

Firma
Nombre: Holman Suarez Niño
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54694

Firma
Nombre: Orlando Baquero Martínez
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-7068

Firma
Nombre: Ivan Alejandro Gordillo Quiñones
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54604


Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041
FECHA DE INICIÓ:	10/04/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	9/09/2026
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO LUMEN FIDEI		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	180 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELÉCTRICO S.A.S.		

ACTA:	Acta parcial No. 1	
CAPITULO:	Conductores	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4,1	CONDUCTOR ACSR 3 No. 2 AWG	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
E016 A E079				3.379,10	3.379,10
E080 A E185				5.971,10	5.971,10
E080 A E286				1.466,90	1.466,90
E287 A E290				886,10	886,10
PASAN:				SUBTOTAL	
				TOTAL	11.703,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

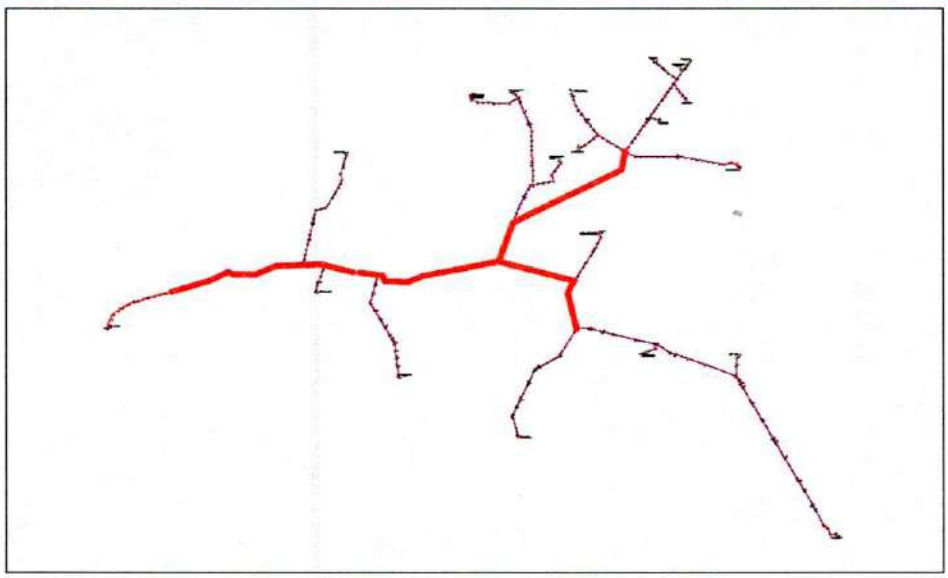

Firma
Nombre: Hernando Ayala Villamil
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-17615

Firma
Nombre: Orlando Baquero Martínez
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-7068

Firma
Nombre:Holman Suarez Niño
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54694

Firma
Nombre: Ivan Alejandro Gordillo Quiñones
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54604

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041
FECHA DE INICIÓ:	10/04/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	9/09/2026
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO LUMEN FIDEI		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	180 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELÉCTRICO S.A.S.		


ACTA:	Acta parcial No. 1
CAPITULO:	Conductores

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4,2	CONDUCTOR ACSR 2 No. 2 AWG	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
E000 A E001				16,20	16,20
E041 A E065				2.426,20	2.426,20
E070 A E074				572,00	572,00
E083 A E083-13				2.147,60	2.147,60
E110 A E157				1.664,90	1.664,90
E119 A E139				1.874,80	1.874,80
E138 A E148				853,40	853,40
E185 A E205				1.491,90	1.491,90
E191 A E195				412,40	412,40
E185 A E232				1.900,90	1.900,90
E215 A E217				189,10	189,10
E225 A E229				380,40	380,40
E230 A E230-4				513,60	513,60
E185 A E258				2.057,90	2.057,90
E274 A E285				1.062,10	1.062,10
E290 A E297				2.540,10	2.540,10
E290 A E325				6.688,70	6.688,70
E301 A E303				244,50	244,50
E308 A E310				346,10	346,10
PASAN:				SUBTOTAL	
				TOTAL	27.383,00

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

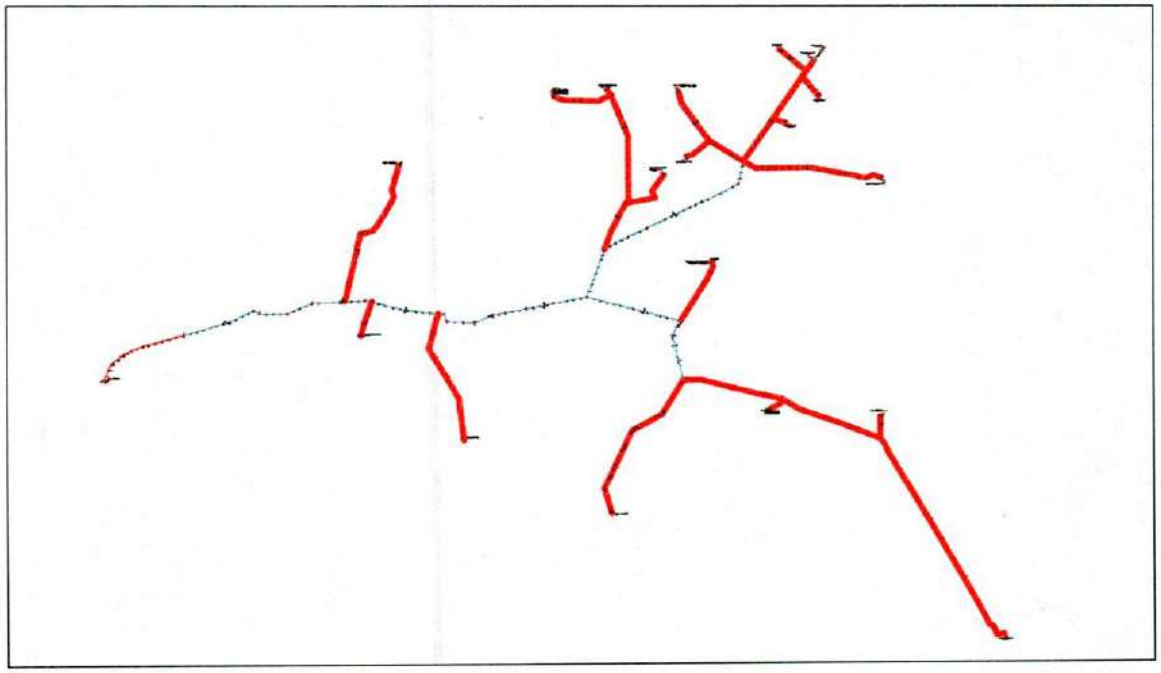

Firma
Nombre: Hernando Ayala Villamil
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-17615

Firma
Nombre: Holman Suarez Niño
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54694

Firma
Nombre: Orlando Baquero Martínez
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-7068

Firma
Nombre: Ivan Alejandro Gordillo Quiñones
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54604


Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041
FECHA DE INICIÓ:	10/04/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	9/09/2026
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO LUMEN FIDEI		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	180 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELÉCTRICO S.A.S.		

ACTA:	Acta parcial No. 1	
CAPITULO:	Conductores	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4,3	CONDUCTOR ACSR 1 No. 2 AWG	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
E001-E016				1466	1466
PASAN:				SUBTOTAL	
				TOTAL	1466

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

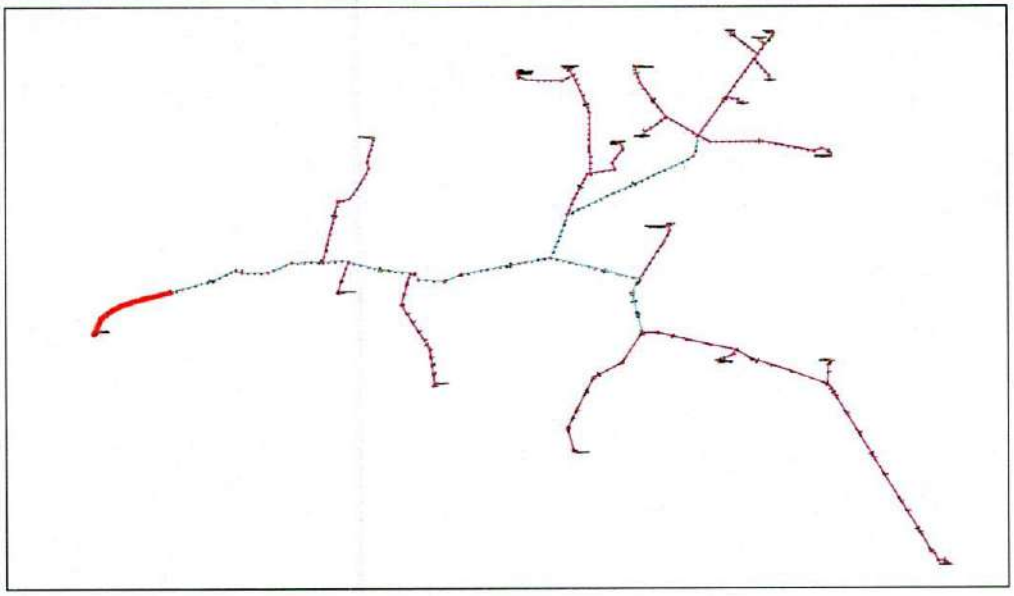

Firma
Nombre: Hernando Ayala Villamil
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-17615

Firma
Nombre: Orlando Baquero Martínez
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-7068

Firma
Nombre:Holman Suarez Niño
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54694

Firma
Nombre: Ivan Alejandro Gordillo Quiñones
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54604


Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041
FECHA DE INICIÓ:	10/04/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	9/09/2026
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO LUMEN FIDEI		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	180 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELÉCTRICO S.A.S.		


ACTA:	Acta parcial No. 1	
CAPITULO:	Conductores	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4,9	CABLE TRIPLEX 2*2+1*2 (2*35+1*35MM)	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
E000 A E001-1				37,8	37,8
E065 A E066				39,2	39,2
E157 A E159				89,1	89,1
E139 A E140				59,6	59,6
E148 A E149				45,1	45,1
E205 A E207				103,3	103,3
E195 A E196				48,1	48,1
E233 A E238				299,3	299,3
E258 A E260				85,8	85,8
E303 A E304				57	57
E310 A E312				93,3	93,3
E325 A E326				58,8	58,8
PASAN:				SUBTOTAL	
				TOTAL	1.016,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

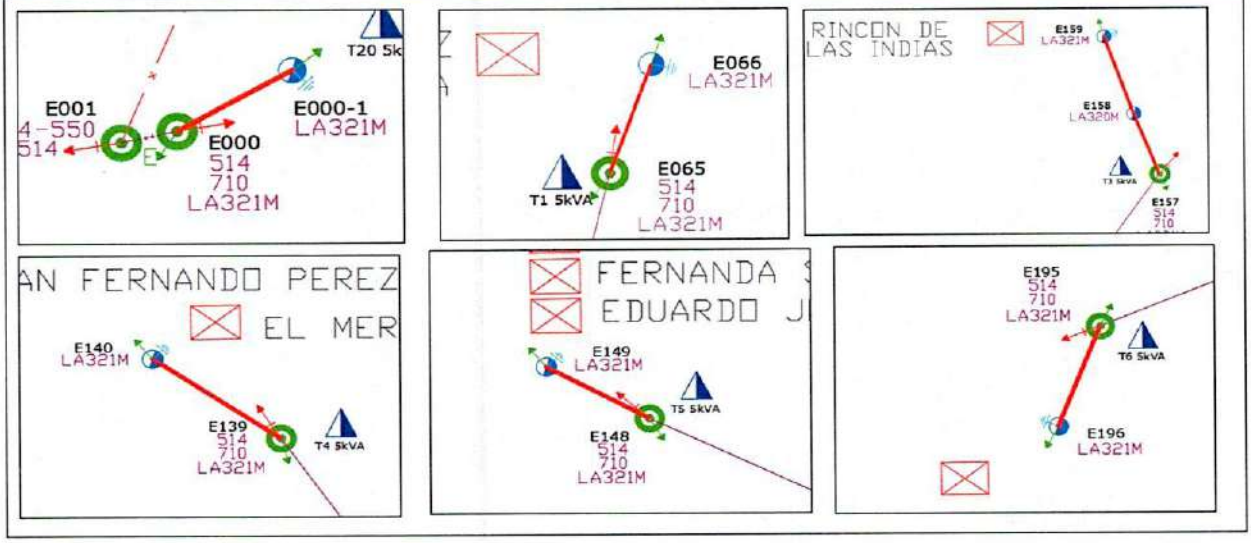

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

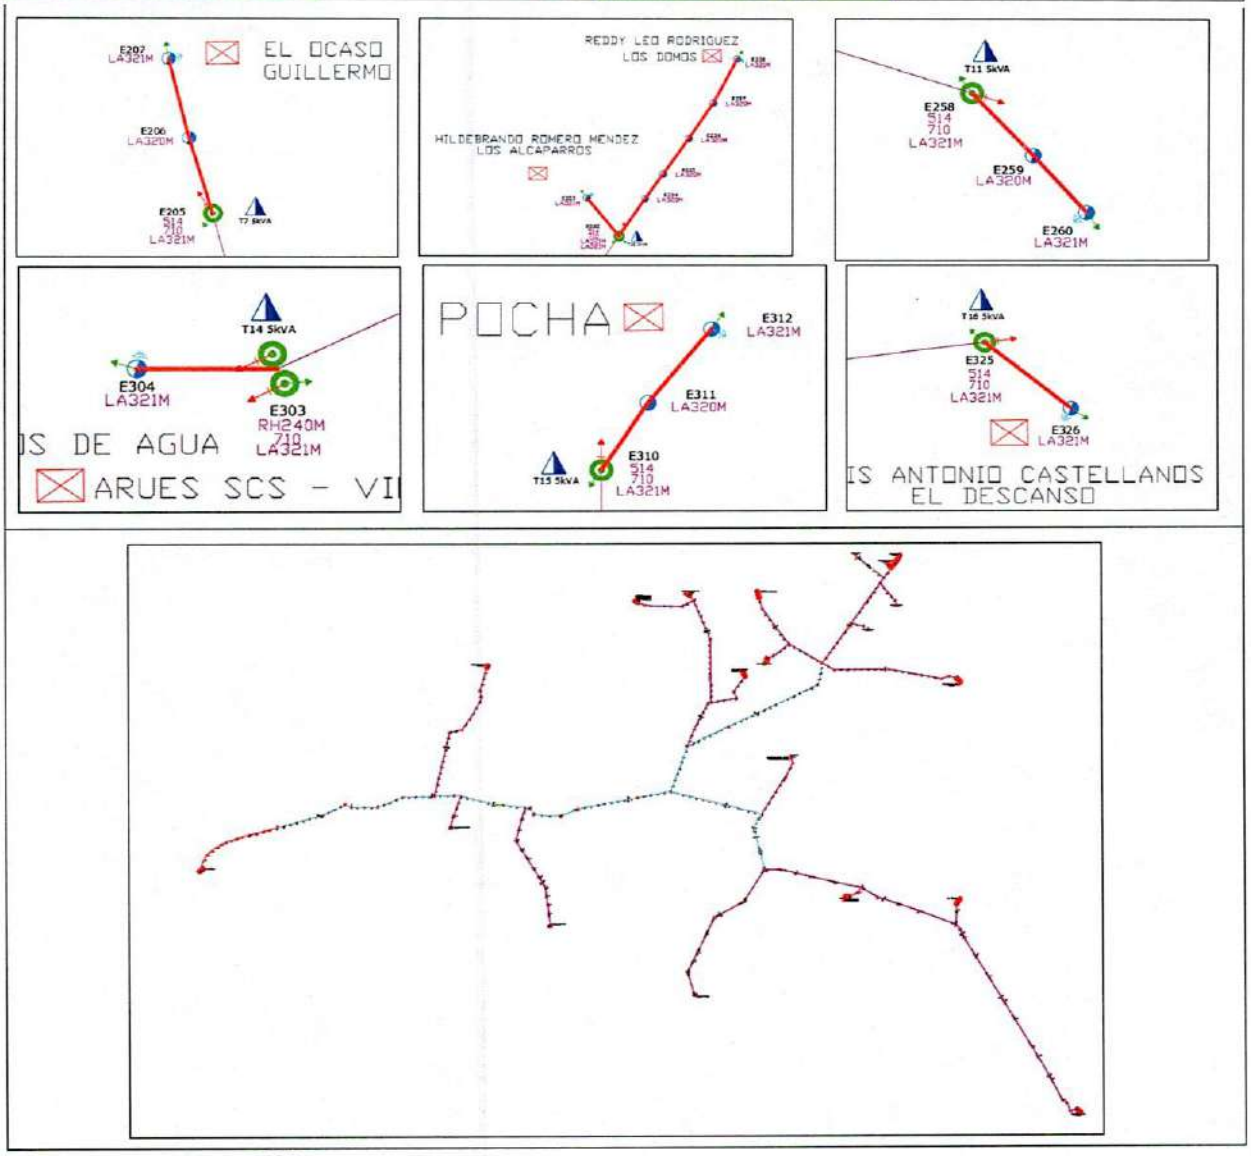

Firma
Nombre: Hernando Ayala Villamil
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-17615

Firma
Nombre: Holman Suarez Niño
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54694

Firma
Nombre: Orlando Baquero Martínez
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-7068

Firma
Nombre: Ivan Alejandro Gordillo Guiñones
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54604

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041
FECHA DE INICIÓ:	10/04/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	9/09/2026
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO LUMEN FIDEI		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	180 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELÉCTRICO S.A.S.		

ACTA:	Acta parcial No. 1
CAPITULO:	Templetes


N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5,1	TEMPLETE DIRECTO A TIERRA RED B.T. TIPO LAR412 NORMA CODENSA RETENIDA POSTE A VARILLA DE ANCLAJE TERMINAL O EN ÁNGULO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
E000 A E000-1				2	2
E065 A E066				2	2
E157 A E159				2	2
E139 A E140				2	2
E148 A E149				2	2
E195 A E196				2	2
E205 A E207				2	2
E232 - E233 -E238				4	4
E258 A E260				2	2
E303 A E304				2	2
E310 A E312				2	2
E325 A E326				2	2
PASAN:				SUBTOTAL	
				TOTAL	26


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

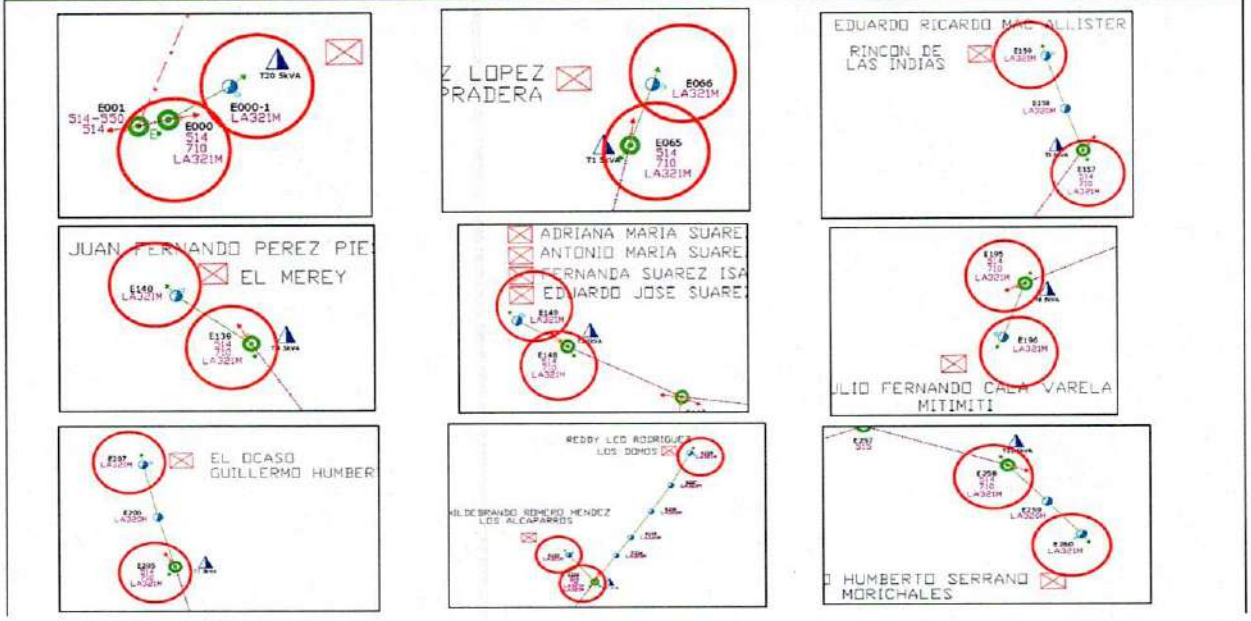

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041





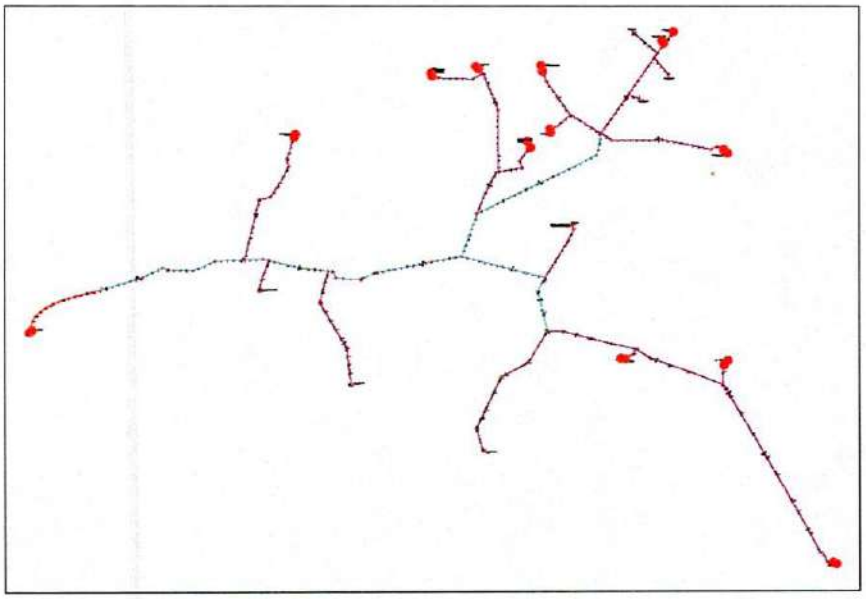

Firma
Nombre: Hernando Ayala Villamil
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-17615

Firma
Nombre: Orlando Baquero Martinez
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-7068

Firma
Nombre: Holman Suarez Niño
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54694

Firma
Nombre: Ivan Alejandro Gordillo Quiñones
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54604

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041
FECHA DE INICIÓ:	10/04/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	9/09/2026
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO LUMEN FIDEI		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	180 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELÉCTRICO S.A.S.		


ACTA:	Acta parcial No. 1	
CAPITULO:	Templetes	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5,4	**TEMPLETE DIRECTO A TIERRA RED M.T. TIPO LAR412 NORMA CODENSA RETENIDA POSTE A VARILLA DE ANCLAJE TERMINAL O EN ÁNGULO SUMINISTRO E INSTALACIÓN**	**UN**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
E000 A E000-1				2	2
E017 A E065				33	33
E067 A E074				13	13
E075 A E083-13				15	15
E084 A E139				37	37
E141 A E148				7	7
E150 A E157				7	7
E160 A E232				20	20
E186 A E205				10	10
E192 A E195				4	4
E216 A E217				1	1
E226 A E229				1	1
E230-1 A E230-4				2	2
E239 A E258				13	13
E261 A E285				12	12
E286 A E297				36	36
E298 A E303				25	25
E305 A E310				15	15
E313 A E325				30	30
PASAN:				SUBTOTAL	
				TOTAL	283

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

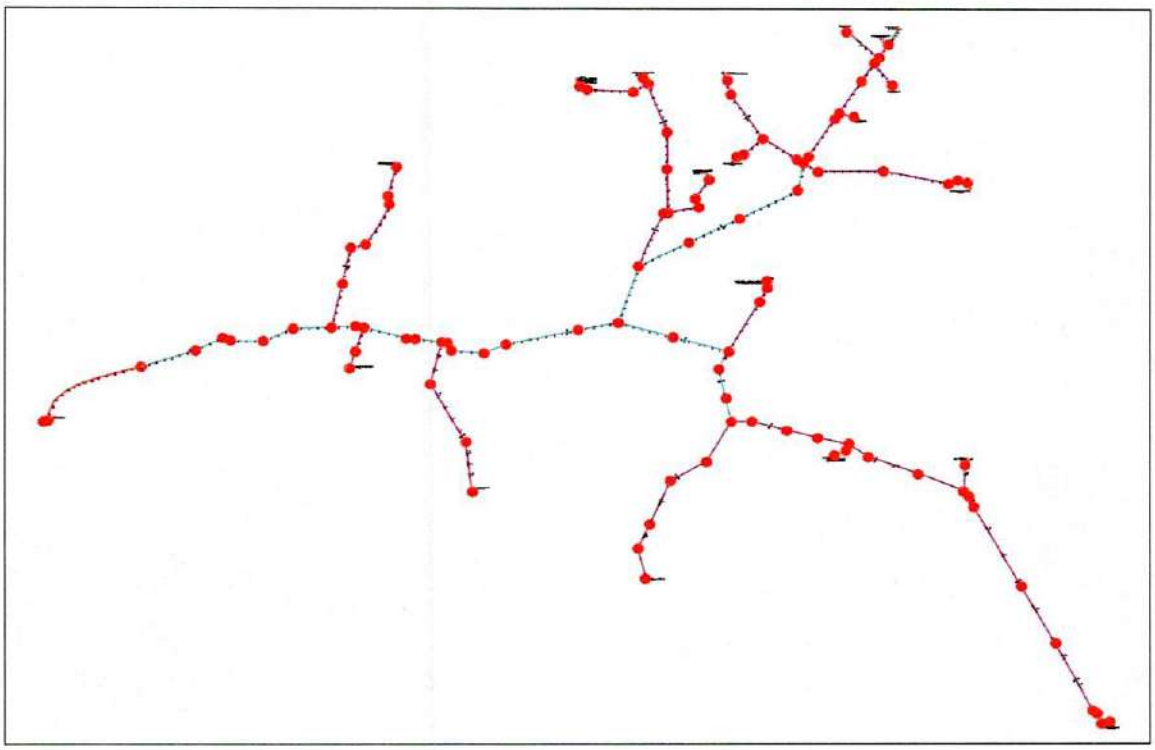

Firma
Nombre: Hernando Ayala Villamil
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-17615

Firma
Nombre:Holman Suarez Niño
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54694

Firma
Nombre: Orlando Baquero Martínez
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-7068

Firma
Nombre: Iván Alejandro Gordillo Cuñones
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54604

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041
FECHA DE INICIÓ:	10/04/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	9/09/2026
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO LUMEN FIDEI		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	180 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELÉCTRICO S.A.S.		

ACTA:	Acta parcial No. 1
CAPITULO:	Templetes


N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5,5	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
E000-1				1	1
E066				1	1
E159				1	1
E140				1	1
E149				1	1
E196				1	1
E207				1	1
E233				1	1
E238				1	1
E260				1	1
E304				1	1
E312				1	1
E326				1	1
PASAN:				SUBTOTAL	
				TOTAL	13

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

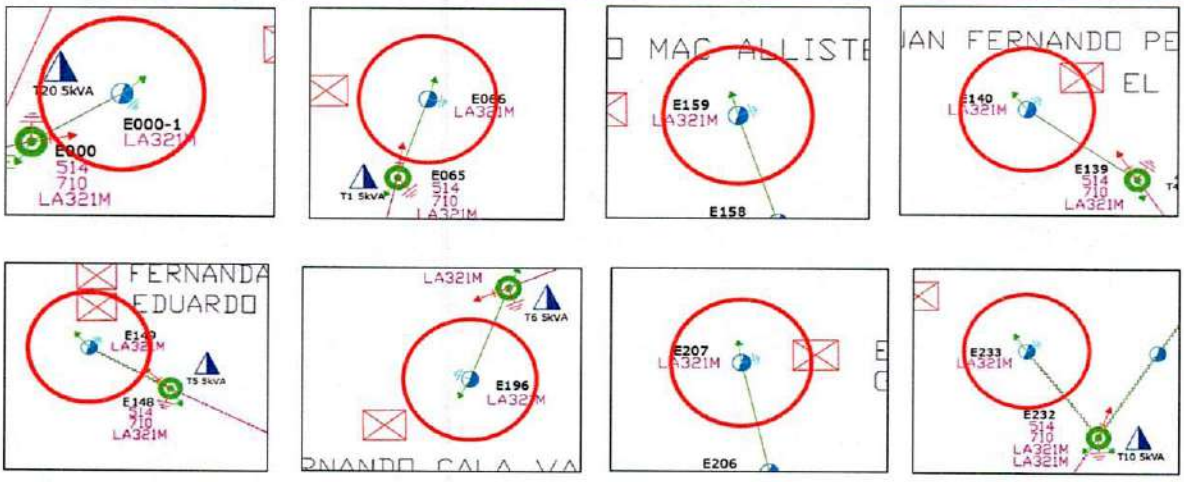

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

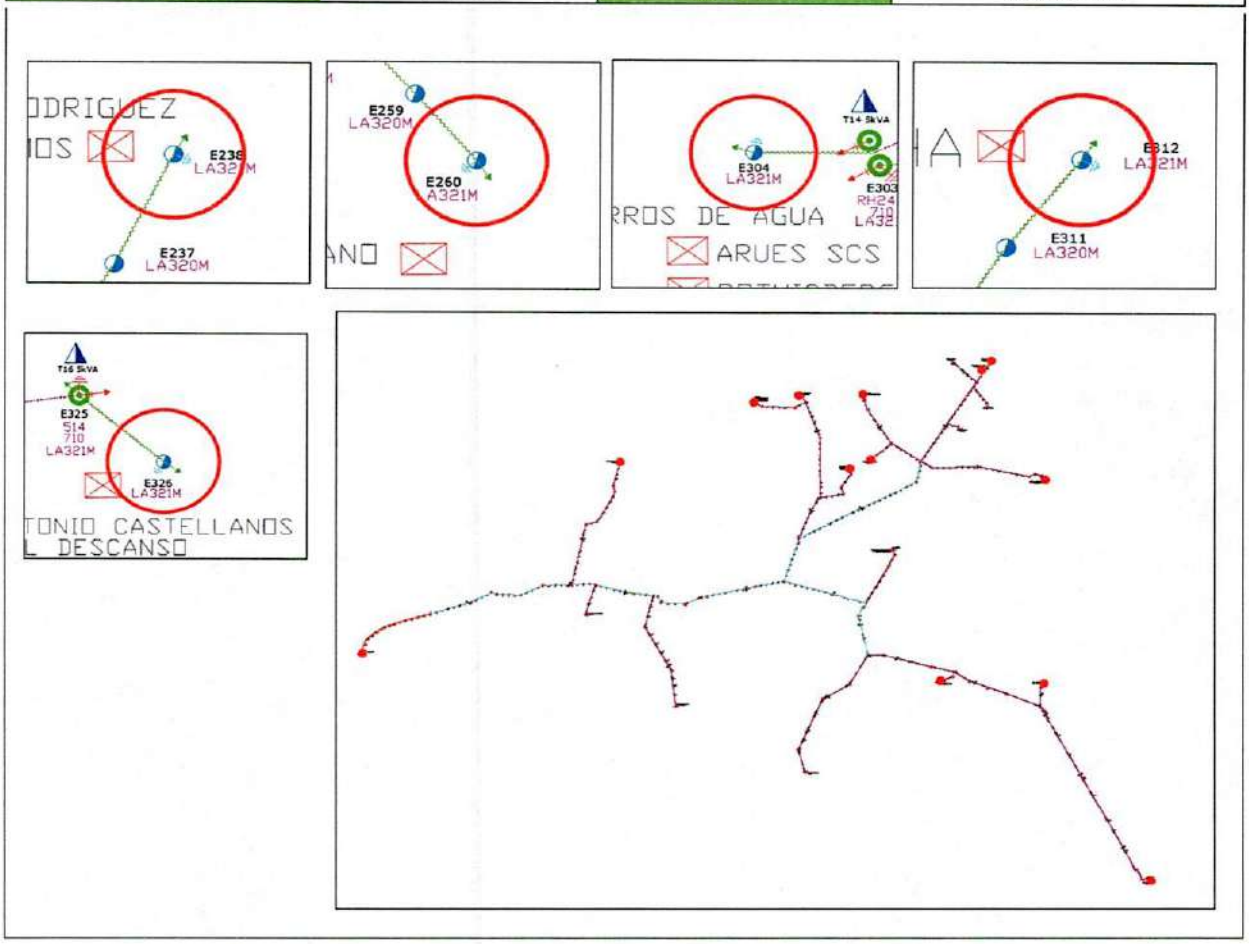

Firma
Nombre: Hernando Ayala Villamil
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-17615

Firma
Nombre:Holman Suarez Niño
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54694

Firma
Nombre: Orlando Baquero Martínez
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-7068

Firma
Nombre: Ivan Alejandro Gordillo Quiñones
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54604


Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041
FECHA DE INICIÓ:	10/04/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	9/09/2026
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO LUMEN FIDEI		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	180 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELÉCTRICO S.A.S.		


ACTA:	Acta parcial No. 1	
CAPITULO:	Transformadores	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6,1	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 5 kVA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
E000				1	1
E065				1	1
E074				1	1
E083-13				1	1
E157				1	1
E139				1	1
E148				1	1
E195				1	1
E205				1	1
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
PASAN:				SUBTOTAL	
				TOTAL	9

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

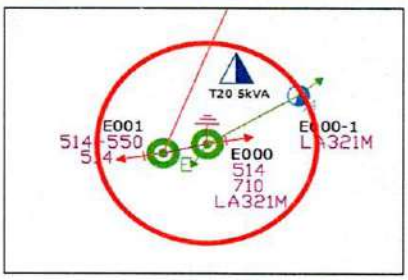


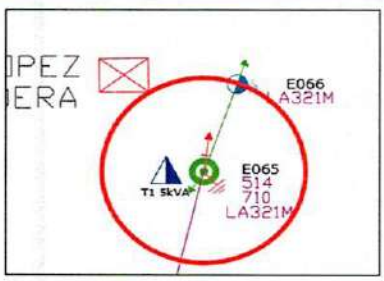

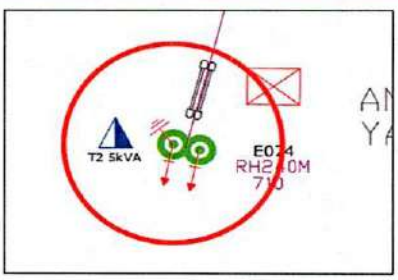

3225

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

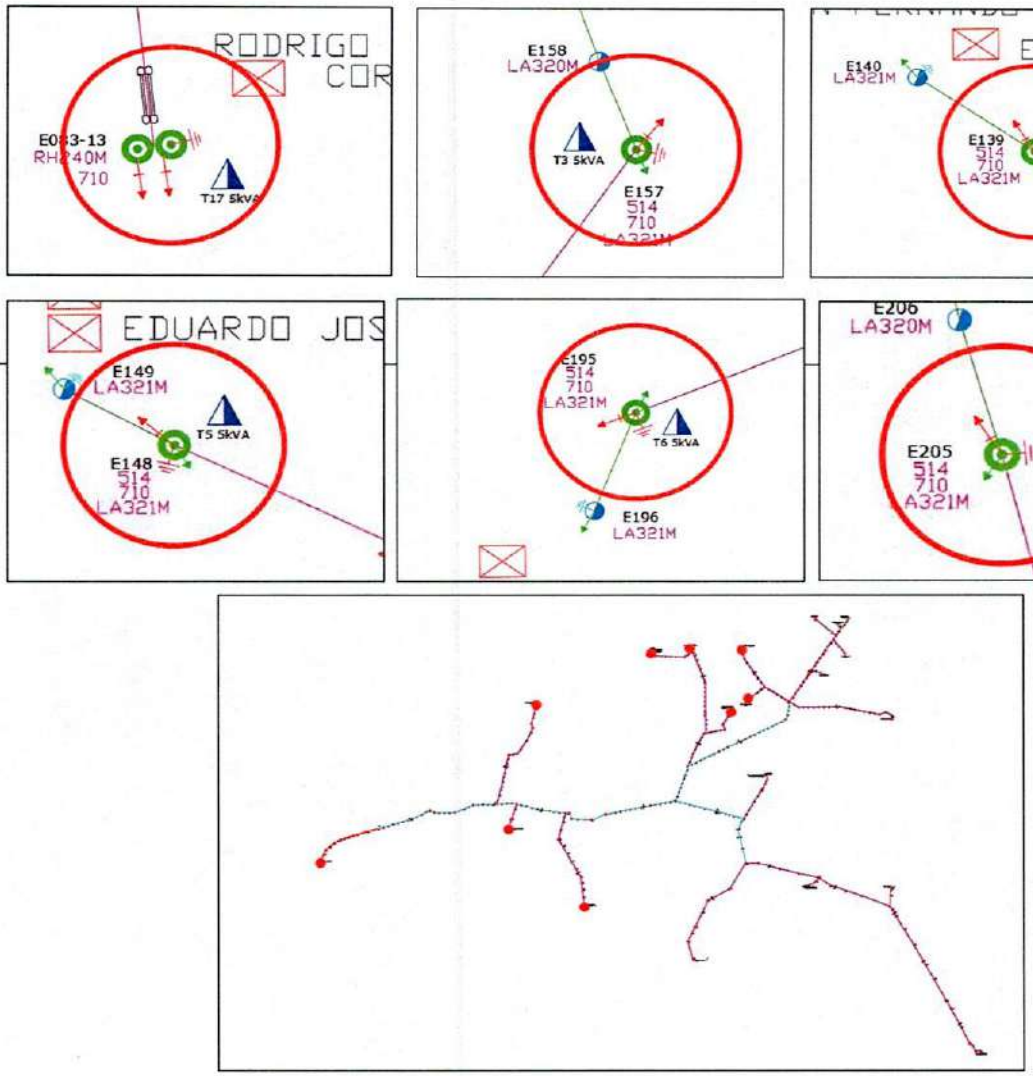

Firma

Nombre: Hernando Ayala Villamil
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-17615

Firma

Nombre:Holman Suarez Niño
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54694

Firma

Nombre: Orlando Baquero Martínez
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-7068

Firma

Nombre: Ivan Alejandro Gordillo Quiñones
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54604

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041
FECHA DE INICIÓ:	10/04/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	9/09/2026
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO LUMEN FIDEI		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	180 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELÉCTRICO S.A.S.		

ACTA:	Acta parcial No. 1
CAPITULO:	Items no previstos


N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP1	ESTRUCTURA TIPO 510-02 NORMA ICEL CIRCUITO BIFÁSICO AISLAMIENTO EN ESPIGO ÁNGULOS DE 0° A 5°. B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
E041 A E065				18	18
E070 A E074				2	2
E083 A E083-13				1	1
E110 A E139				24	24
E141 A E148				5	5
E150 A E157				5	5
E185 A E205				11	11
E192 A E195				2	2
E208 A E232				15	15
E216 A E217				1	1
E226 A E229				3	3
E230-1 A E230-4				2	2
E239 A E258				15	15
E274 A E285				8	8
PASAN:				SUBTOTAL	
				TOTAL	112

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

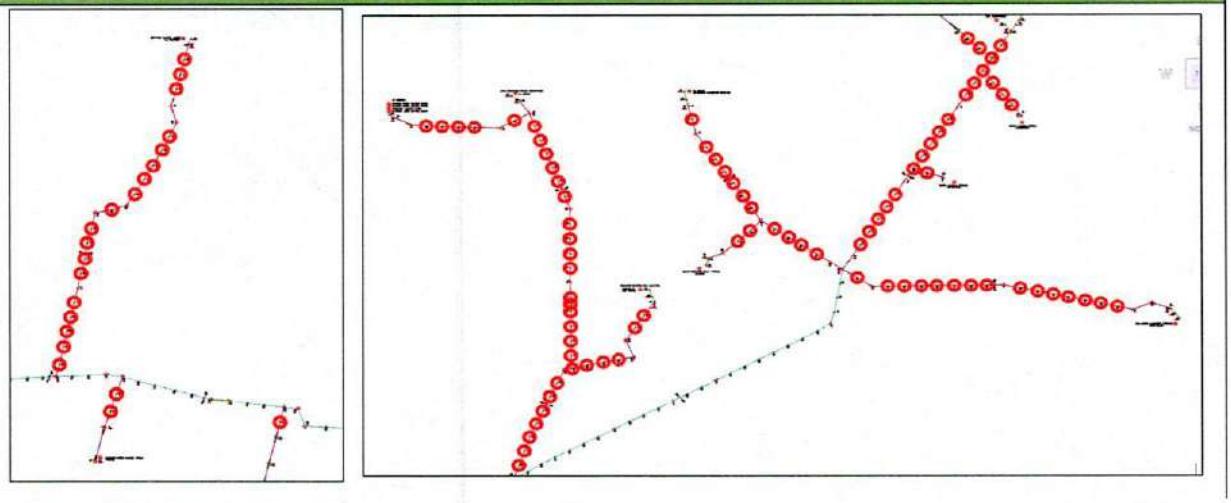

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

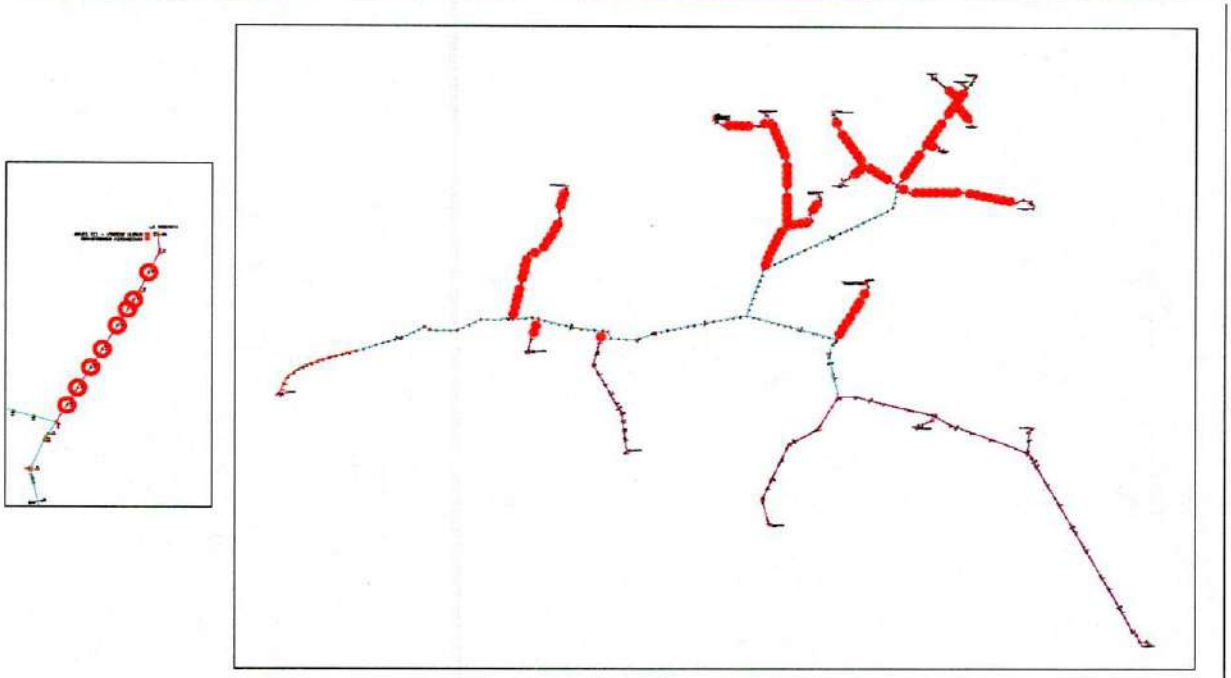

Firma
Nombre: Hernando Ayala Villamil
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-17615

Firma
Nombre:Holman Suarez Niño
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54694

Firma
Nombre: Orlando Baquero Martínez
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-7068

Firma
Nombre: Ivan Alejandro Gordillo Quiñones
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54604


Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041
FECHA DE INICIÓ:	10/04/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	9/09/2026
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO LUMEN FIDEI		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	180 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELÉCTRICO S.A.S.		
ACTA:	Acta parcial No. 1		

CAPITULO:	Items no previstos	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP2	ESTRUCTURA TIPO 514-02 NORMA ICEL CIRCUITO BIFÁSICO ESTRUCTURA TERMINAL. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
E000 A E001				2	2
E041 A E065				4	4
E070 A E074				1	1
E083 A E083-13				1	1
E110 A E139				6	6
E141 A E148				1	1
E150 A E157				5	5
E185 A E205				3	3
E192 A E195				1	1
E208 A E232				4	4
E216 A E217				1	1
E226 A E229				1	1
E239 A E258				1	1
E274 A E285				2	2
E301 A E310				3	3
E313 A E325				3	3
PASAN:				SUBTOTAL	
				TOTAL	39


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

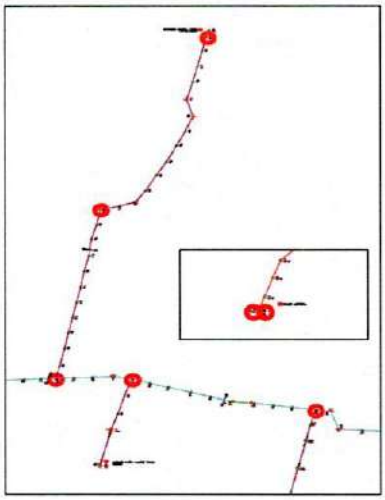


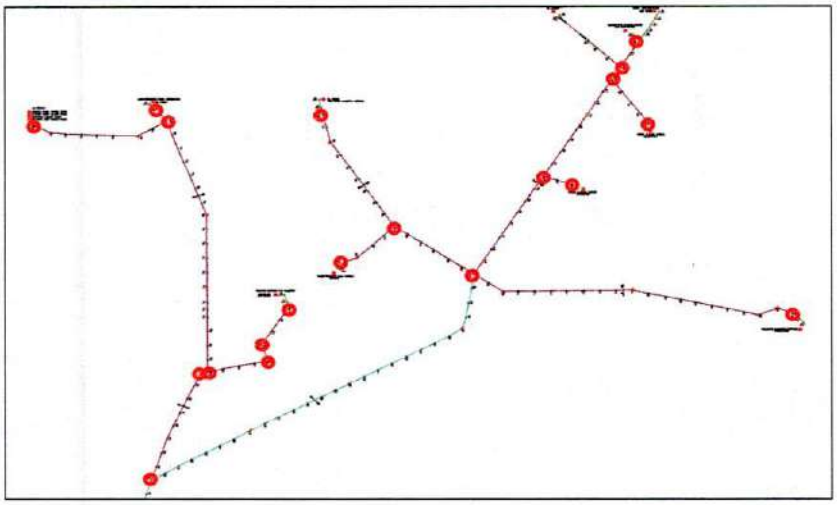

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

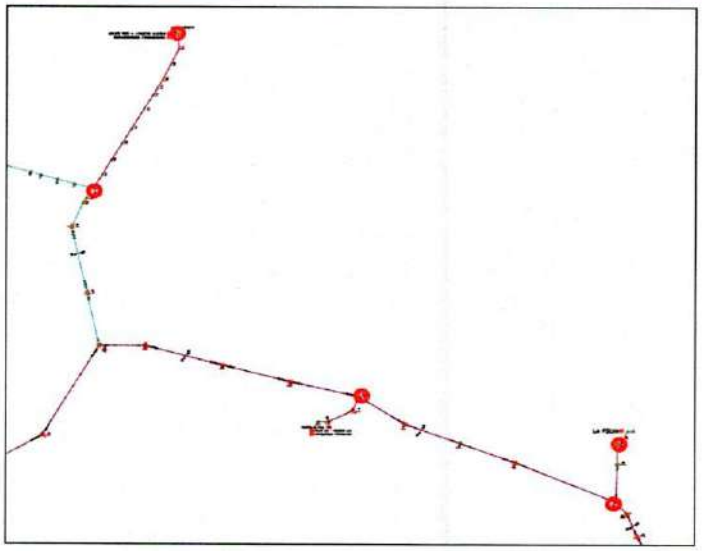

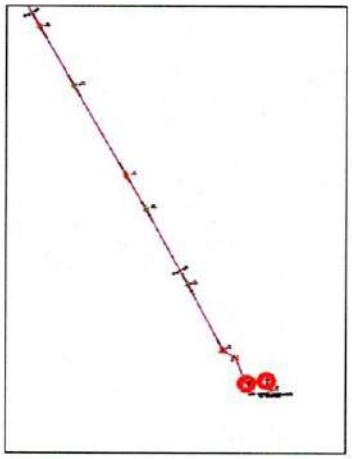

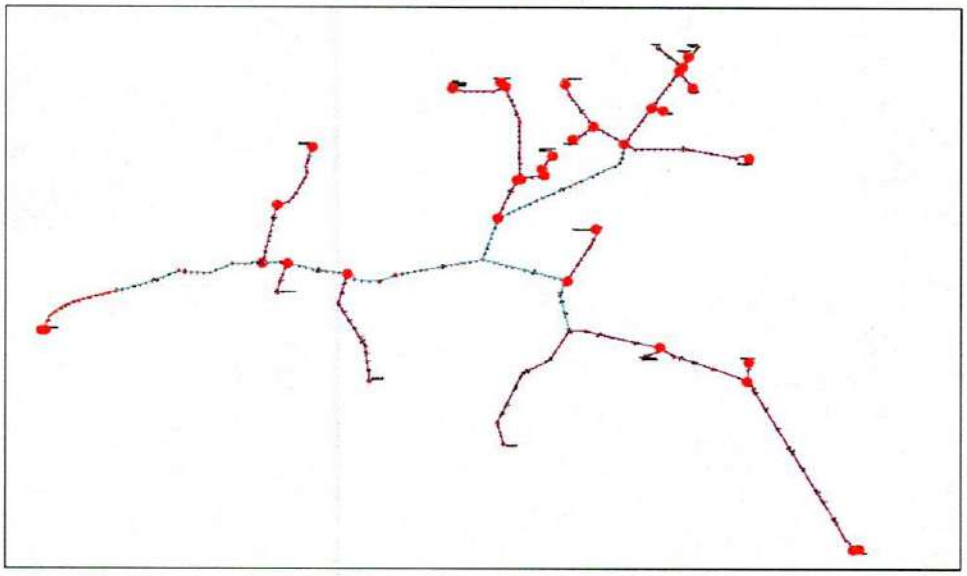

Firma
Nombre: Hernando Ayala Villamil
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-17615

Firma
Nombre:Holman Suarez Niño
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54694

Firma
Nombre: Orlando Baquero Martínez
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-7068

Firma
Nombre: Ivan Alejandro Gordillo Quiñones
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54604

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041
FECHA DE INICIÓ:	10/04/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	9/09/2026
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO LUMEN FIDEI		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	180 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELÉCTRICO S.A.S.		

ACTA:	Acta parcial No. 1
CAPITULO:	Items no previstos


N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP3	ESTRUCTURA TIPO 515-02 NORMA ICEL CIRCUITO BIFÁSICO ESTRUCTURA DE RETENCIÓN. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
E041 A E065				4	4
E110 A E139				3	3
E141 A E148				2	2
E185 A E205				4	4
E192 A E195				1	1
E208 A E232				3	3
E239 A E258				4	4
E274 A E285				2	2
E323				1	1
PASAN:				SUBTOTAL	
				TOTAL	24

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

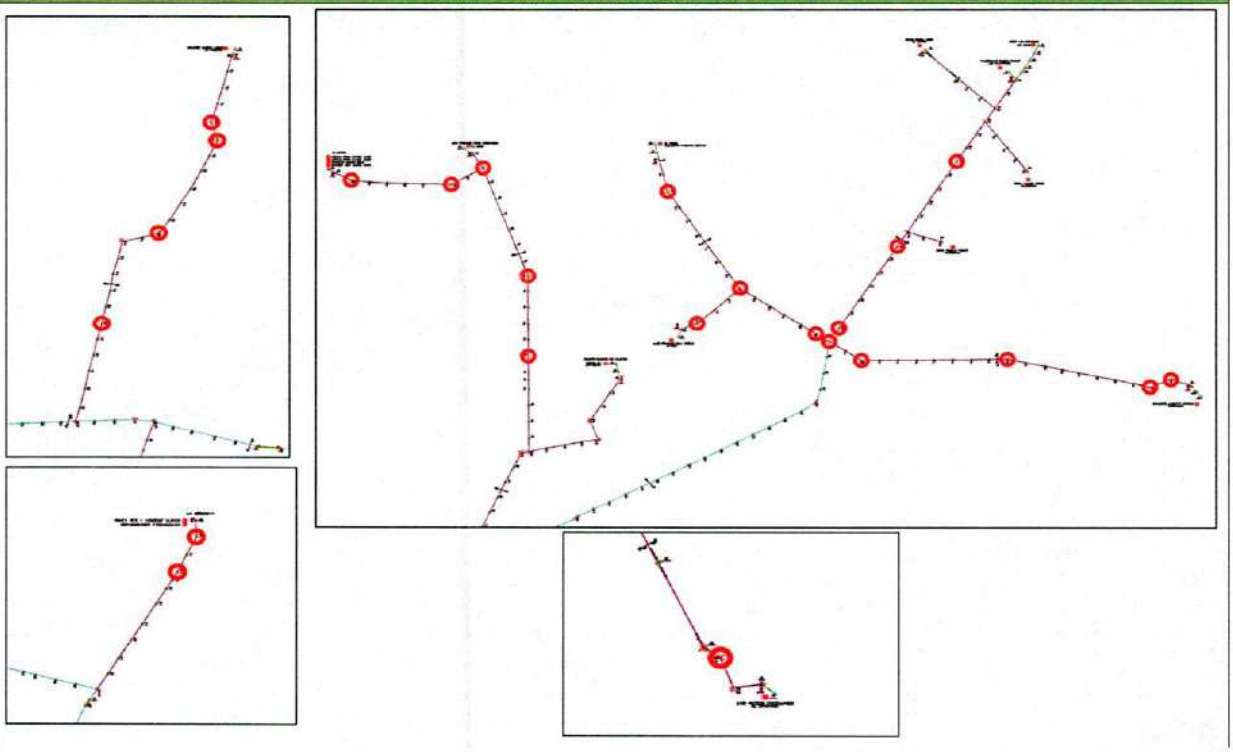

CONTRATO Nº	707-2025	PROYECTO Nº	2024005500041

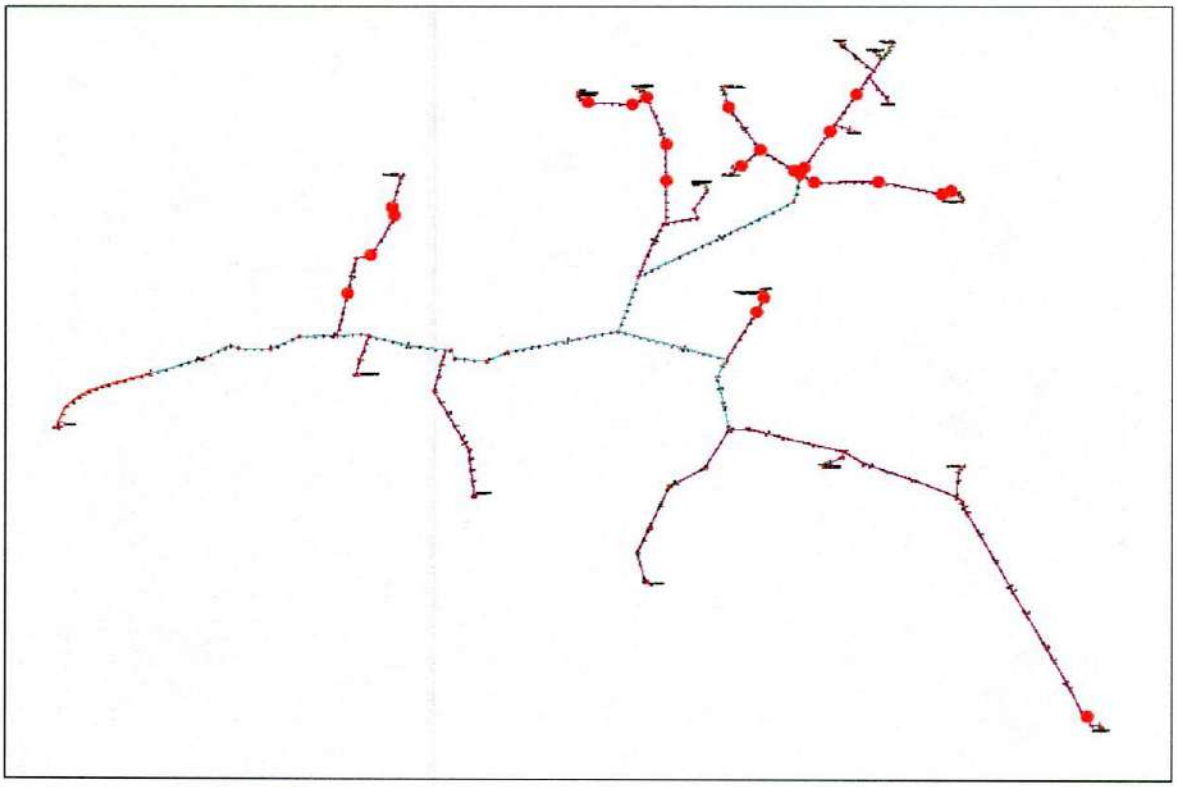

Firma
Nombre: Hernando Ayala Villamil
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-17615

Firma
Nombre: Orlando Baquero Martínez
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-7068

Firma
Nombre:Holman Suarez Niño
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54694

Firma
Nombre: Ivan Alejandro Gordillo Quiñones
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54604

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

3232


CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041
FECHA DE INICIÓ:	10/04/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	9/09/2026
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO LUMEN FIDEI		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	180 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELÉCTRICO S.A.S.		


ACTA:	Acta parcial No. 1
CAPITULO:	Items no previstos

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP4	ESTRUCTURA TIPO 523-02 NORMA ICEL CIRCUITO TRIFÁSICO AISLAMIENTO EN ESPIGO DISPOSICIÓN EN SEMIBANDERA ÁNGULO DE 0° A 5°. B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
E016 A E185				70	70
E26 A E274				10	10
PASAN:				SUBTOTAL	
				TOTAL	80

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

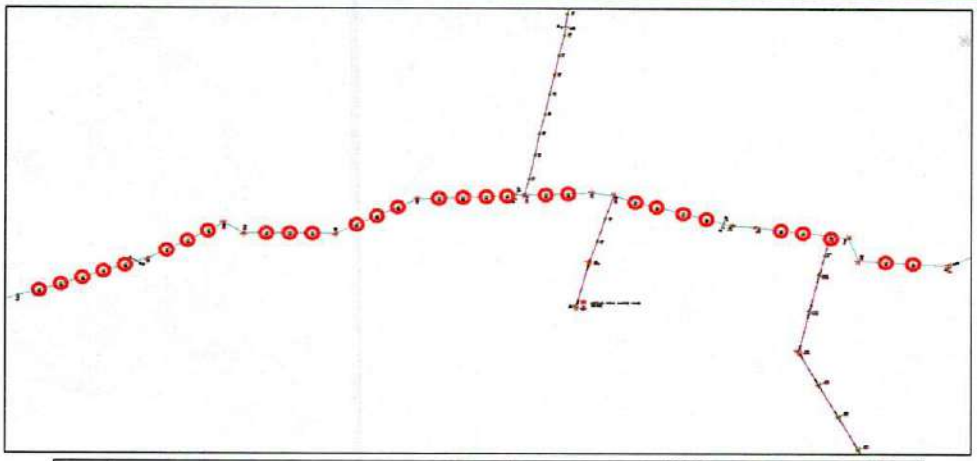

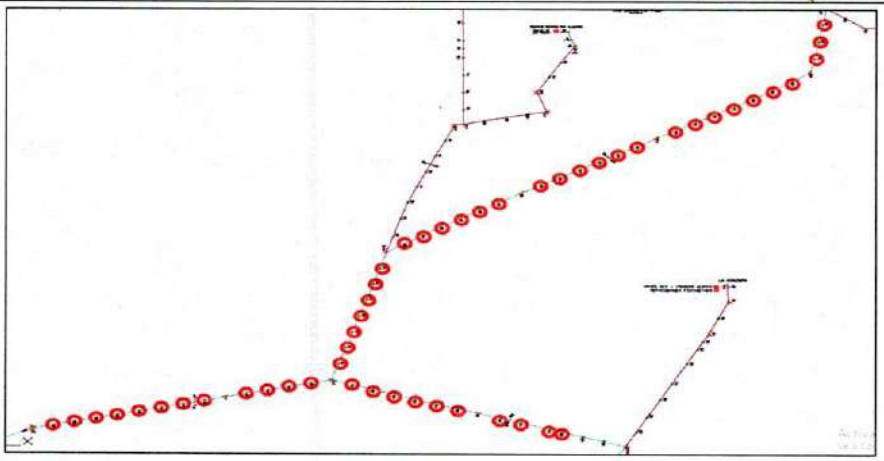

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

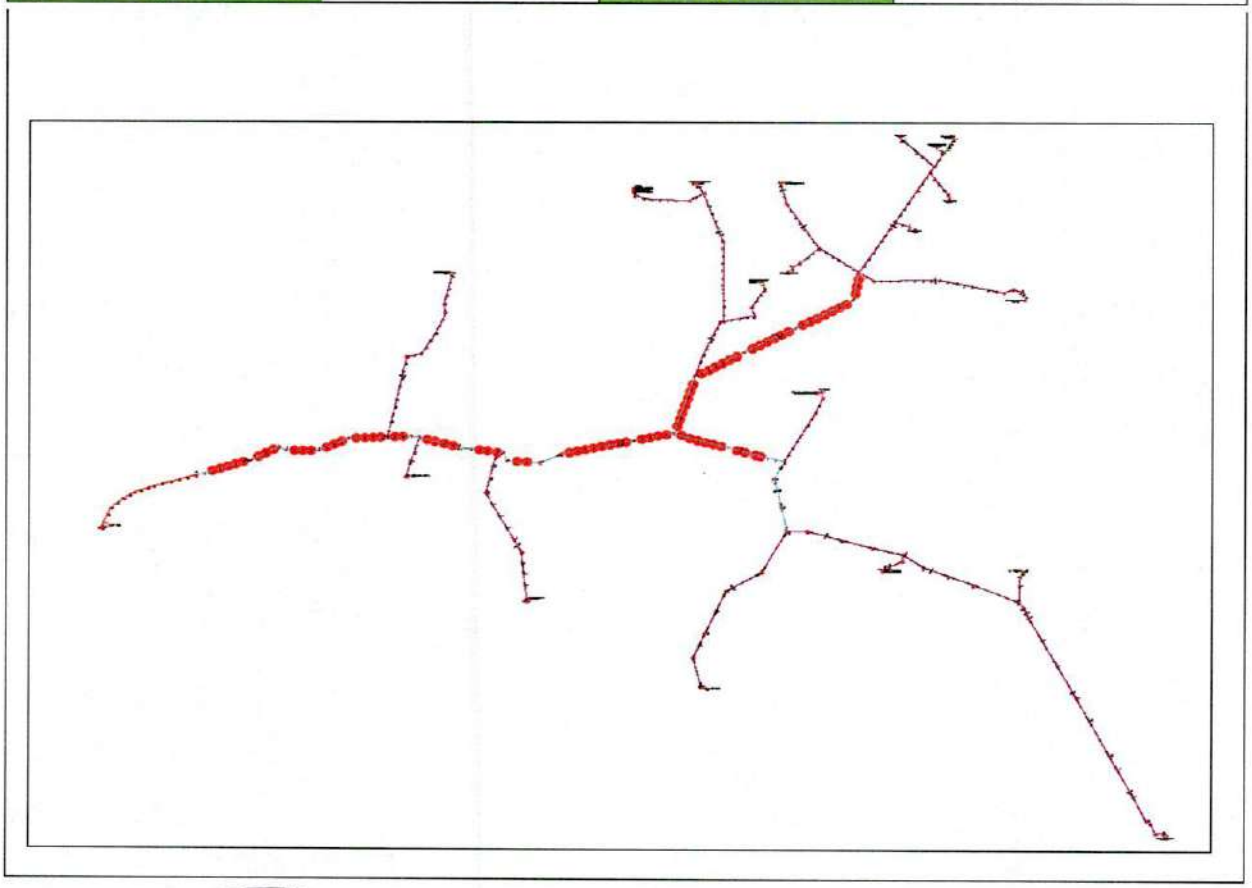

Firma
Nombre: Hernando Ayala Villamil
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-17615

Firma
Nombre: Orlando Baquero Martínez
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-7068

Firma
Nombre:Holman Suarez Niño
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54694

Firma
Nombre: Ivan Alejandro Gordillo Quiñones
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54604

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041
FECHA DE INICIÓ:	10/04/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	9/09/2026
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO LUMEN FIDEI		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	180 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELÉCTRICO S.A.S.		

ACTA:	Acta parcial No. 1
CAPITULO:	Items no previstos


N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP5	ESTRUCTURA TERMINAL TIPO 550-02 NORMA ICEL CIRCUITO TRIFÁSICO B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
E016				1	1
E027				2	2
E028				2	2
E084				2	2
E085				2	2
E185				1	1
E274				2	2
PASAN:				SUBTOTAL	
				TOTAL	12

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

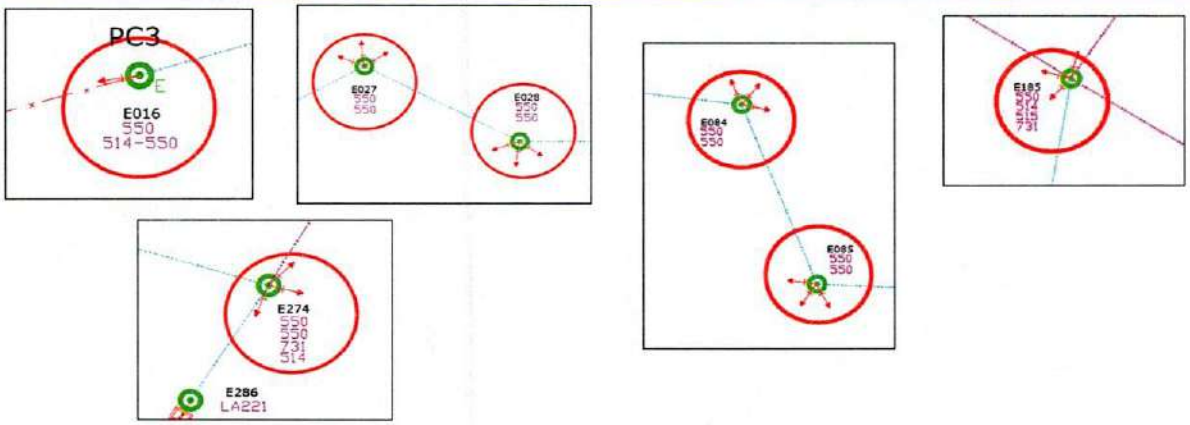

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

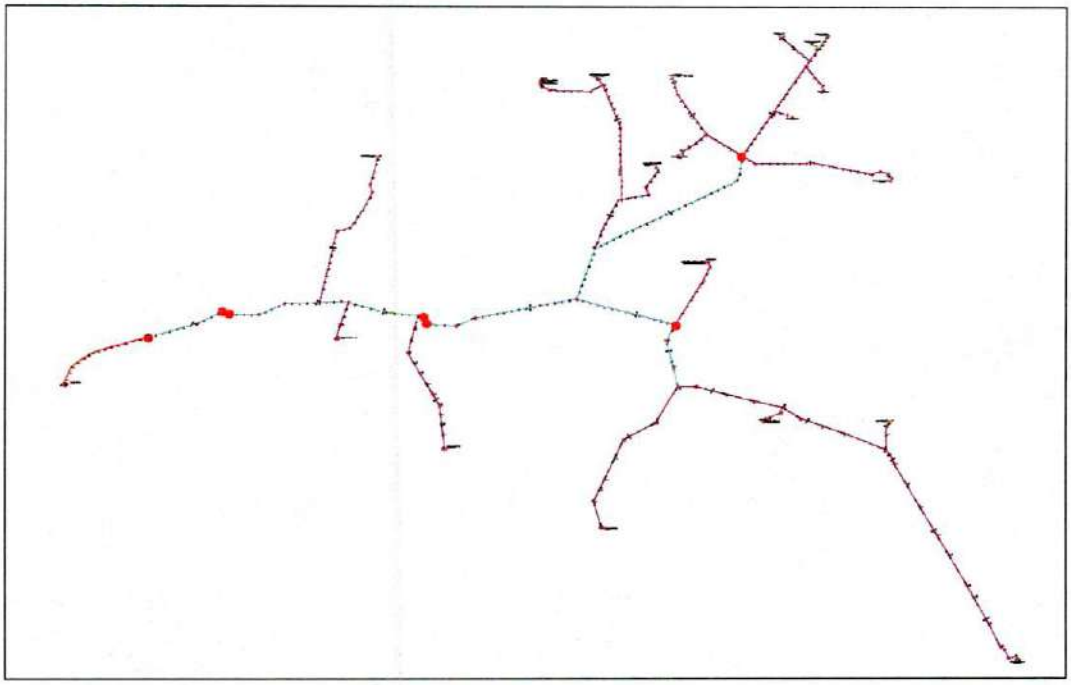

Firma
Nombre: Hernando Ayala Villamil
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-17615

Firma
Nombre:Holman Suarez Niño
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54694

Firma
Nombre: Orlando Baquero Martínez
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-7068

Firma
Nombre: Ivan Alejandro Gordillo Quiñones
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54604

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041
FECHA DE INICIÓ:	10/04/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	9/09/2026
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO LUMEN FIDEI		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	180 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELÉCTRICO S.A.S.		

ACTA:	Acta parcial No. 1
CAPITULO:	Items no previstos


N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP6	ESTRUCTURA DE RETENCIÓN TIPO 560-02 NORMA ICEL CIRCUITO TRIFÁSICO CON NEUTRO B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
E017				1	1
E023				1	1
E032				1	1
E036				1	1
E041				1	1
E069				1	1
E070				1	1
E097-1				1	1
E102				1	1
E110				1	1
E166				1	1
E173				1	1
E181				1	1
PASAN:				SUBTOTAL	
				TOTAL	13

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

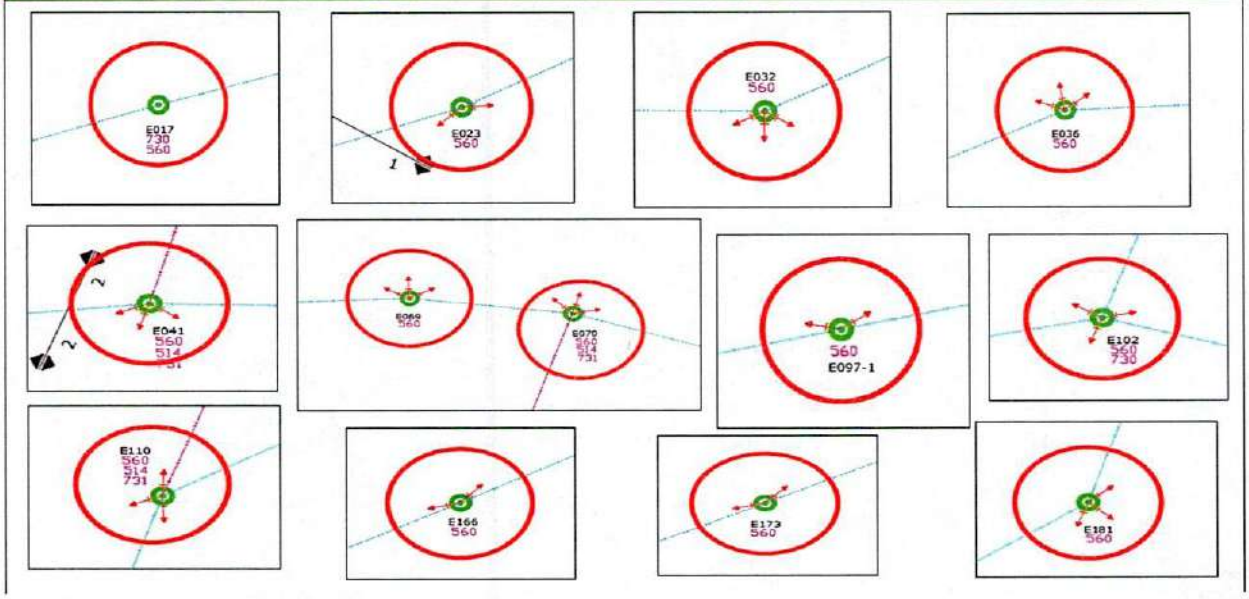

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

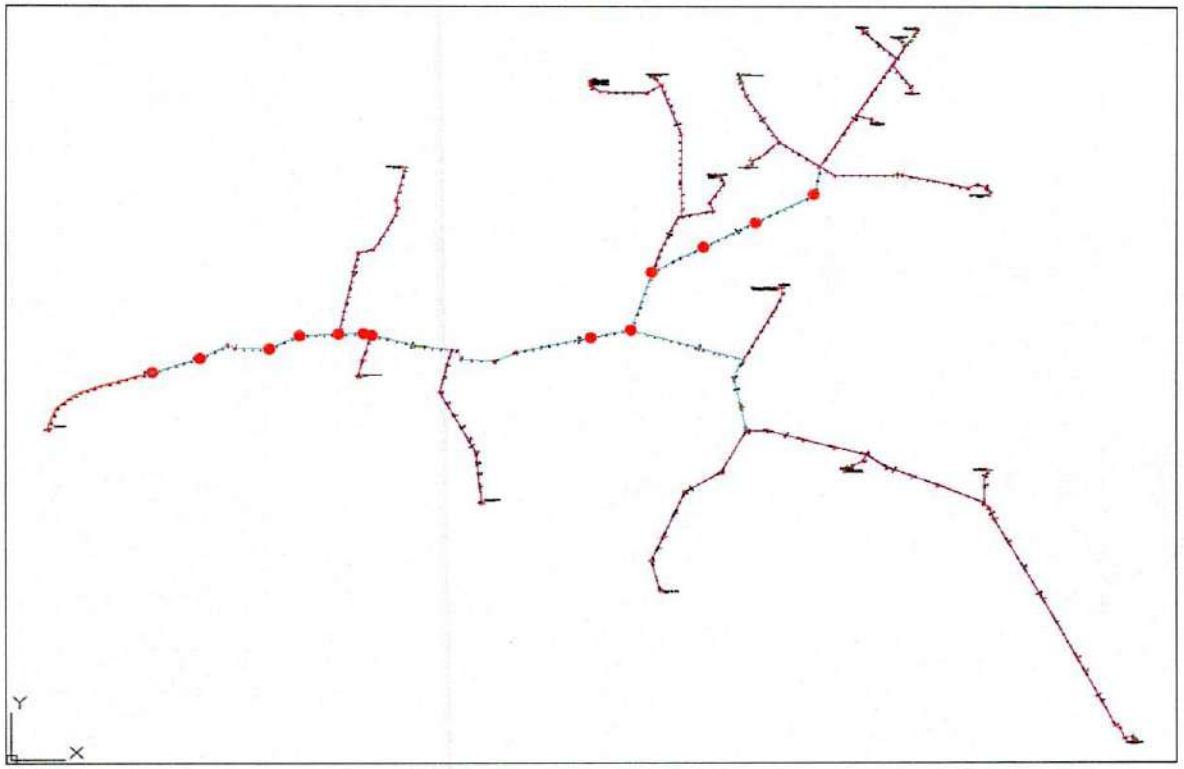

Firma
Nombre: Hernando Ayala Villamil
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-17615

Firma
Nombre: Orlando Baquero Martínez
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-7068

Firma
Nombre:Holman Suarez Niño
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54694

Firma
Nombre: Ivan Alejandro Gordillo Quiñones
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54604

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041
FECHA DE INICIÓ:	10/04/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	9/09/2026
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO LUMEN FIDEI		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	180 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELÉCTRICO S.A.S.		

ACTA:	Acta parcial No. 1
CAPITULO:	Items no previstos

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP7	ESTRUCTURA EN H CIRCUITO SIMPLE RETENCION TIPO IPSE RH-230 CRUCETAS DE 2 Y 4 MTS CABLE DE GUARDA NEUTRO (OPCIONALES) HASTA 44 kV, ANG. MÁX. 45°, UMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
E088 A E089				2	2
E288 A E289				2	2
PASAN:				SUBTOTAL	
				TOTAL	4

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

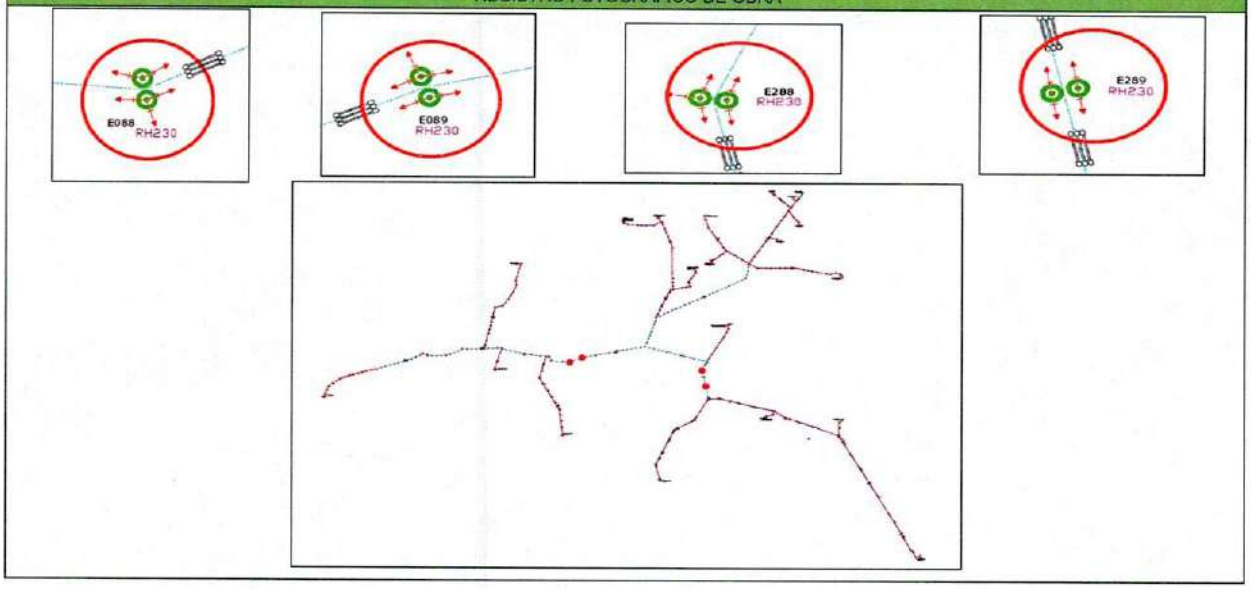

Firma
Nombre: Hernando Ayala Villamil
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-17615

Firma
Nombre: Orlando Baquero Martínez
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-7068

Firma
Nombre:Holmán Suarez Niño
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54694

Firma
Nombre: Ivan Alejandro Gordillo Quiñones
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54604


Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041
FECHA DE INICIÓ:	10/04/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	9/09/2026
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO LUMEN FIDEI		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	180 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELÉCTRICO S.A.S.		

ACTA:	Acta parcial No. 1	
CAPITULO:	Items no previstos	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP8	ESTRUCTURA EN H CIRCUITO BIFASICO SIMPLE SUSPENSION TIPO IPSE SH-226M CRUCETA DE 4 MTS CABLE DE GUARDA – NEUTRO (OPCIONAL) HASTA 44 kV, ANG. MÁX. 3°, UMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
E083 A E083-1				9	9
E290 A E297				2	2
E306 A E310				2	2
E313-E325				5	5
PASAN:				SUBTOTAL	
				TOTAL	18

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

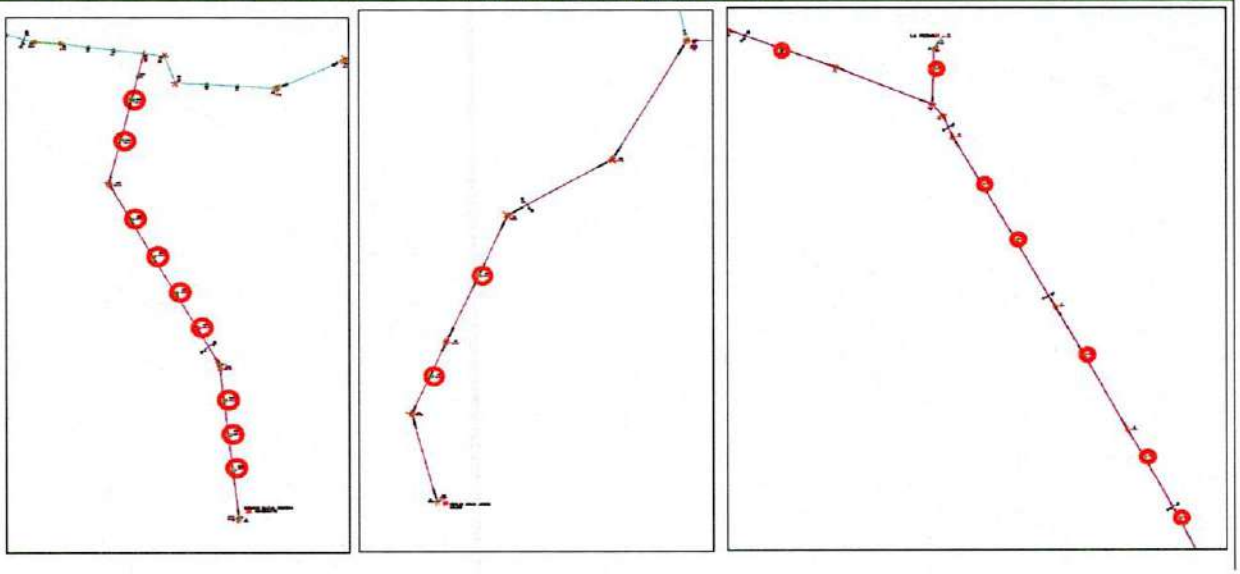

3240

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

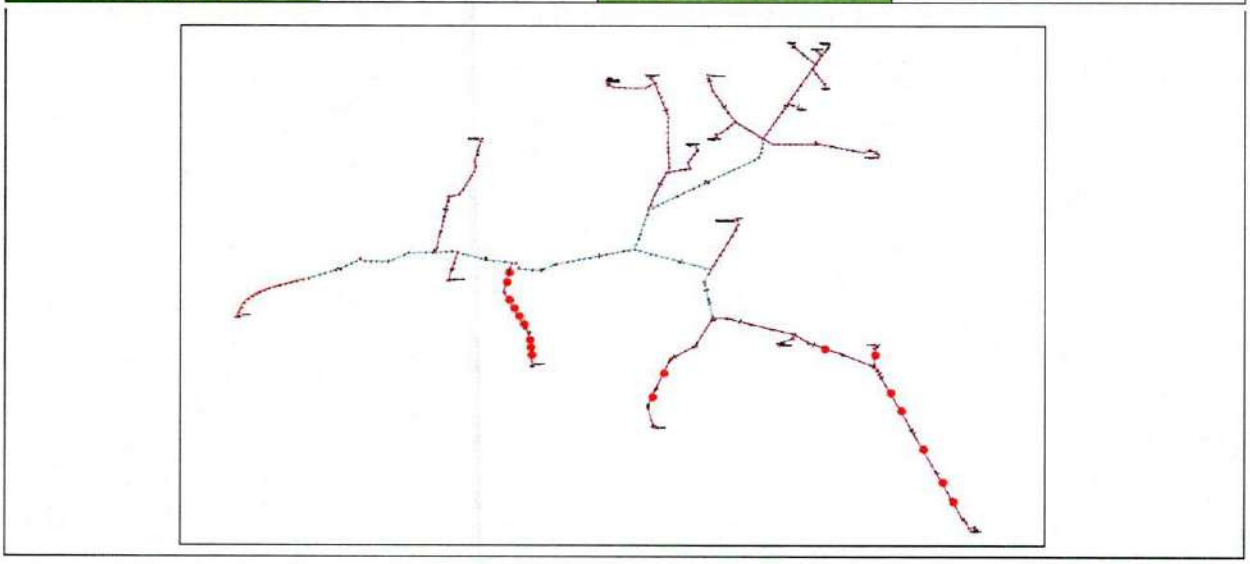

Firma
Nombre: Hernando Ayala Villamil
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-17615

Firma
Nombre: Holman Suarez Niño
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54694

Firma
Nombre: Orlando Baquero Martínez
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-7068

Firma
Nombre: Ivan Alejandro Gordillo Quiñones
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54604

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041
FECHA DE INICIÓ:	10/04/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	9/09/2026
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO LUMEN FIDEI		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	180 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELÉCTRICO S.A.S.		

ACTA:	Acta parcial No. 1
CAPITULO:	Items no previstos

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP11	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DIAMETRO	PROFUNDIDAD	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
POSTE DE CONCRETO DE 12 M X 510 KG	0,6	1,8	12	357	181,691
POSTE DE CONCRETO DE 8 M X 510 KG	0,5	1,4	8	20	5,498
PASAN:				SUBTOTAL	
				TOTAL	187,000

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

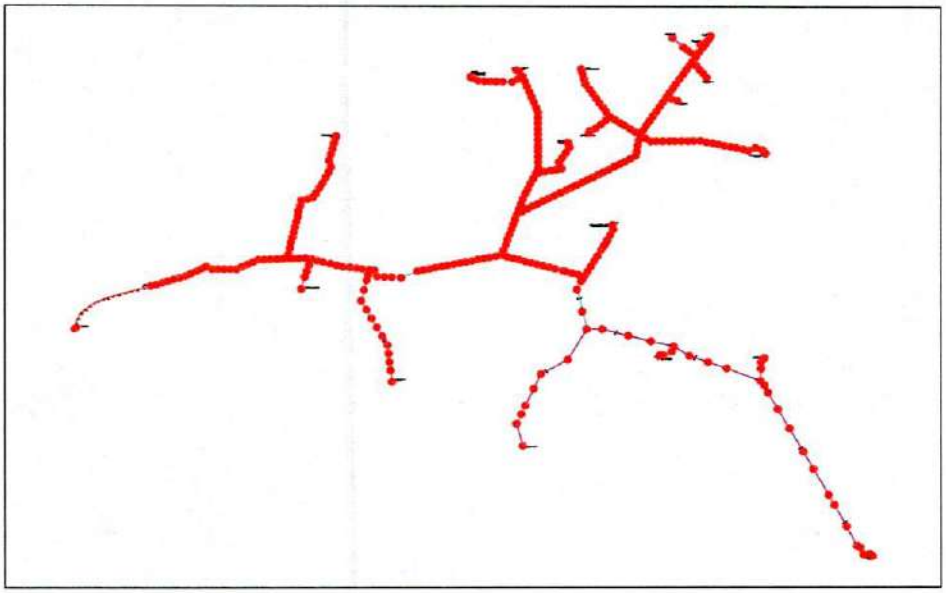

Firma
Nombre: Hernando Ayala Villamil
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-17615

Firma
Nombre:Holman Suarez Niño
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54694

Firma
Nombre: Orlando Baquero Martínez
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-7068

Firma
Nombre: Ivan Alejandro Gordillo Quiñones
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-54604

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

3242

INFORME ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

INFORME ACTA PARCIAL No. 1
Periodo de 10/04/2026 a 19/08/2026
Fecha de Presentación: 25/08/2026

INFORMACIÓN BÁSICA	
OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META
VALOR DEL CONTRATO:	$ 2.225.223.401,00
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META
VALOR DEL PROYECTO:	$ 2.225.223.401,00
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	$ 2.225.223.401,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO LUMEN FIDEI
CORREO ELECTRÓNICO:	contratacion.oie2012@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	180 DE 2025
INTERVENTORÍA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS RAMO ELÉCTRICO S.A.S.
CORREO ELECTRÓNICO:	info@sincrel.com.co

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIACIÓN:	10 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	09 DE JULIO DE 2026
FECHA DE PRORROGA 1:	8 DE JULIO DE 2026
PERIODO DE LA PRORROGA 1:	2 MESES
SUSPENSIÓN:	N/A
TIEMPO:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	09 DE SEPTIEMBRE DE 2026
5 Meses	Días

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	Puerto López	**VEREDA:**	Yucao
COORDENADAS:	PUNTO DE CONEXIÓN 1: (E-515), 4° 7'17.54"N 72°35'22.75"O PUNTO DE CONEXIÓN 2: (E-510), 4° 6'36.52"N 72°33'48.94"O PUNTO DE CONEXIÓN 3: (E-510), 4° 3'58.42"N 72°33'56.88"O		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO



Ilustración 1. Ubicación geográfica municipio de Puerto López.



Ilustración 2. Ubicación red a construir vereda Yucao, sector triangulo del puma.

INFORME ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

A. INFORME TÉCNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA

Avance físico

AVANCE FÍSICO				
ITEM	ACTIVIDADES	AVANCE MENSUAL PERIODO DE 10/06/2026 A 09/07/2026		
		CANTIDAD	VALOR TOTAL	%
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO RED ELÉCTRICA	41,73	$ 19.220.665	93,78%
2.1	POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 8 M X 510 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	20,0	$ 18.271.920	83,33%
2.2	POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 12 M X 510 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	357,00	$ 537.479.922	89,03%
3,2	ESTRUCTURA EN H CIRCUITO SIMPLE RETENCIÓN TIPO IPSE RH-231-02 CRUCETA DOBLE DE 4 MTS. HASTA 44KV ANG. MÁX. 45° SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA CIRCUITO BIFASICO	19,00	$ 45.291.478	82,61
3,3	ESTRUCTURA EN H CIRCUITO SIMPLE RETENCIÓN TIPO IPSE RH-231-02 CRUCETA DOBLE DE 4 MTS. HASTA 44KV ANG. MÁX. 45° SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA CIRCUITO BIFASICO	1,00	$ 1.580.496	100,00%
3,4	ESTRUCTURA EN H TERMINAL TIPO IPSE NC RH-240 DISPOSICIÓN HORIZONTAL, CIRCUITO BIFÁSICO DOBLE CRUCETA DE 4 MTS. SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	6,00	$ 8.446.476	100,00%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

3,20	ESTRUCTURA TIPO 710-02 NORMA ICEL MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO EN POSTE PESO MÁXIMO 500 KG B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	9,00	$ 14.009.625	45,00%
3,21	CONVERTIR ESTRUCTURA CODENSA 510 A P103	11,00	$ 1.919.577	100,00%
3,22	CONVERTIR ESTRUCTURA CODENSA 512 A P112	3,00	$ 753.888	100,00%
3,23	CONVERTIR ESTRUCTURA CODENSA 514 A 550	2,00	$ 756.288	100,00%
3,25	ESTRUCTURA TIPO 730 NORMA ICEL DERIVACIÓN TRIFÁSICA CON CORTACIRCUITO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	2,00	$ 3.966.062	100,00%
3,26	ESTRUCTURA TIPO 731 NORMA ICEL DERIVACIÓN MONOFÁSICA CON CORTACIRCUITO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	17,00	$ 25.973.280	94,44%
3,29	ESTRUCTURA LA320m CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA. SIN CAJA DE DERIVACION	8,00	$ 1.135.968	80,00%
3,30	ESTRUCTURA LA321m FINAL DE CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN.NORMA CODENSA. SIN CAJA DE DERIVACION	26,00	$ 4.272.086	92,86%
4,1	CONDUCTOR ACSR 3 No. 2 AWG	11.703,00	$ 159.944.901	86,41%
4,2	CONDUCTOR ACSR 2 No. 2 AWG	27.383,00	$ 278.758.940	92,99%

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

4,3	CONDUCTOR ACSR 1 No. 2 AWG	1.466,00	$ 9.811.938	100,00%
4,9	CABLE TRIPLEX 2*2+1*2 (2*35+1*35MM)	1.016,00	$ 24.440.896	79,50%
5,1	TEMPLETE DIRECTO A TIERRA RED B.T. TIPO LAR412 NORMA CODENSA RETENIDA POSTE A VARILLA DE ANCLAJE TERMINAL O EN ÁNGULO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	26,00	$ 11.111.854	92,86%
5,4	TEMPLETE DIRECTO A TIERRA RED M.T. TIPO LAR412 NORMA CODENSA RETENIDA POSTE A VARILLA DE ANCLAJE TERMINAL O EN ÁNGULO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	283,00	$ 121.822.444	92,18%
5,5	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	13,00	$ 7.666.815	92,86%
6,1	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 5 kVA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	9,00	$ 42.488.037	45,00%
N.P.1	ESTRUCTURA TIPO 510-02 NORMA ICEL CIRCUITO BIFÁSICO AISLAMIENTO EN ESPIGO ÁNGULOS DE 0° A 5°. B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	112,00	$ 56.695.632	85,50%
N.P.2	ESTRUCTURA TIPO 514-02 NORMA ICEL CIRCUITO BIFÁSICO ESTRUCTURA TERMINAL. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	39,00	$ 42.738.501	97,50%
N.P.3	ESTRUCTURA TIPO 515-02 NORMA ICEL CIRCUITO BIFÁSICO ESTRUCTURA DE RETENCIÓN. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	24,00	$ 39.093.984	92,31%

INFORME ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

N.P.4	ESTRUCTURA TIPO 523-02 NORMA ICEL CIRCUITO TRIFÁSICO AISLAMIENTO EN ESPIGO DISPOSICIÓN EN SEMIBANDERA ÁNGULO DE 0° A 5°. B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	80,00	$ 41.561.520	100,00%
N.P.5	ESTRUCTURA TERMINAL TIPO 550-02 NORMA ICEL CIRCUITO TRIFÁSICO B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	12,00	$ 16.426.404	92,31%
N.P.6	ESTRUCTURA DE RETENCIÓN TIPO 560-02 NORMA ICEL CIRCUITO TRIFÁSICO CON NEUTRO B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	13,00	$ 31.715.489	100,00%
N.P.7	ESTRUCTURA EN H CIRCUITO SIMPLE RETENCION TIPO IPSE RH-230 CRUCETAS DE 2 Y 4 MTS CABLE DE GUARDA NEUTRO (OPCIONALES) HASTA 44 kV, ANG. MÁX. 45°, UMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	4,00	$ 9.264.556	57,14%
N.P.8	ESTRUCTURA EN H CIRCUITO BIFASICO SIMPLE SUSPENSION TIPO IPSE SH-226M CRUCETA DE 4 MTS CABLE DE GUARDA – NEUTRO (OPCIONAL) HASTA 44 kV, ANG. MÁX. 3°, UMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	18,00	$ 32.388.750	100,00%
N.P.11	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	187,00	$ 20.400.204	67,27%
		VALOR TOTAL	$ 1.629.408.595,64	73,22%

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

PERIODO	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
Mes 1	0.89%	$ 19.719.998	0.89%	$ 19.719.998	0.89%	$ 19.719.998	0.89%	$ 19.719.998
Mes 2	51.86%	$ 1.153.892.259	52.74%	$ 1.173.612.257	0.00%	$ 0	0.89%	$ 19.719.998

Cronograma según modificatoria No 1 y prorroga No 1

PERIODO	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
Mes 3	4.30%	$ 95.753.074	6.13%	$ 136.466.253	2.42%	$ 53.893.740	3.34%	$74.388.535
Mes 4	42.94%	$ 955.462.456	49.07%	$ 1.091.928.709	51.54%	$ 1.139.325.428	54.5%	$1.213.713.963
PARCIAL 1	30.47%	$ 678.025.570,2	73.41%	$ 1.633.485.004	18.68%	$ 415.671.731,31	73.22%	$ 1.629.408.595
Mes 5	50.93%	$ 1.133.294.691	100%	$ 2.225.223.401				

Grafica Avance Físico

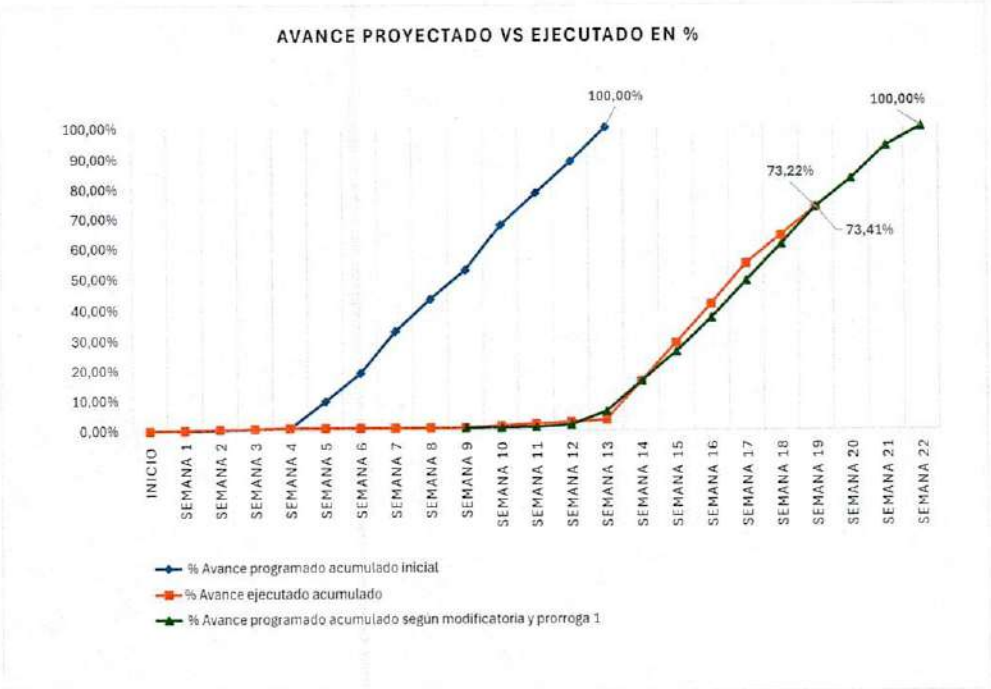


Ilustración 3. Avance Proyectado VS Ejecutado en %

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041



Ilustración 4. Avance Proyectado VS Ejecutado en $

2. GESTIÓN TÉCNICA Y DOCUMENTAL

Oficios y documentos elaborados por el contrato de obra sobre el desarrollo de los proyectos, Comités realizados, solicitudes comunidad, entidades, temas varios e Informes presentados.

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
03/03/2026		Se socializa el proyecto con la comunidad, para poder dar inicio a las actividades de ejecución del proyecto de obra.	Contratista de obra, interventoría y AIM	Alejandra María Duque, Luz Mireya González Perdomo, Supervisor Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM.
10/03/2026		Comité acta de inicio: Realizar la revisión documental del alcance del proyecto, efectuar la entrega y socialización de los estudios y diseños, así como verificar las acciones	Contratista de obra, interventoría y AIM	Alejandra María Duque, Luz Mireya González Perdomo, Supervisor Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM.

INFORME ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

		preparatorias necesarias para el inicio de las actividades, garantizando el conocimiento y aplicación de los manuales, normas internas y formatos establecidos por la entidad para la adecuada ejecución y seguimiento del proyecto		
21/04/2026		Informar sobre el inicio de las actividades de campo, la revisión documental preliminar y el estado inicial del proceso de replanteo y validación de usuarios.	Contratista de obra, interventoría y AIM	Alejandra María Duque, Luz Mireya González Perdomo, Supervisor Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM.
05/05/2026		Informar sobre el avance del proceso de replanteo del proyecto.	Contratista de obra, interventoría y AIM	Alejandra María Duque, Luz Mireya González Perdomo, Supervisor Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM.
19/05/2026		Informar novedades presentadas en el proceso de replanteo	Contratista de obra, interventoría y AIM	Alejandra María Duque, Luz Mireya González Perdomo, Supervisor Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM.
02/06/2026		Culminación proceso de replanteo	Contratista de obra, interventoría y AIM	Alejandra María Duque, Luz Mireya González Perdomo, Supervisor Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM.
16/06/2026		Comité para informar sobre el avance en elaboración de documentación para solicitar el acta modificatoria y prorroga	Contratista de obra, interventoría y AIM	Alejandra María Duque, Luz Mireya González Perdomo, Supervisor Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM.
30/06/2026		Comité para informar sobre radicado al AIM de documentación de solicitud de acta modificatoria y prorroga	Contratista de obra, interventoría y AIM	Alejandra María Duque, Luz Mireya González Perdomo, Supervisor Agencia

				para la Infraestructura del Meta – AIM.
14/07/2026		Comité para informar sobre el avance de obra, hincada de postería	Contratista de obra, interventoría y AIM	Alejandra María Duque, Luz Mireya González Perdomo, Supervisor Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM.
28/07/2026		Comité para informar sobre el avance de obra, hincada de postería, instalación de estructuras y cable	Contratista de obra, interventoría y AIM	Alejandra María Duque, Luz Mireya González Perdomo, Supervisor Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM.

3. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN PROPUESTOS

Durante el presente período se presentaron algunas dificultades derivadas de las condiciones climáticas, principalmente por las lluvias registradas en la zona, las cuales ocasionaron retrasos puntuales en determinadas actividades de campo. No obstante, mediante la adecuada planificación y reorganización de las labores, estas situaciones fueron mitigadas oportunamente, sin afectar el normal desarrollo de la obra ni el cumplimiento de las actividades programadas para el período.

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. PROCESO CONSTRUCTIVO

A continuación, se presentan las actividades realizadas durante el presente periodo:

PROCESO DE AHOYADO PARA POSTERIA DE CONCRETO DE 8 Y 12 METROS

Se continuo con el proceso de ahoyado para postes de 12 y 8 metros. Se realiza la excavación de los huecos utilizando herramientas manuales, según las características del terreno, las condiciones de acceso y la profundidad requerida para cada tipo de poste. Durante esta actividad se controló el diámetro y la profundidad de la excavación para garantizar la estabilidad de la estructura y el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.

INFORME ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

PROCESO DE HINCADO Y APLOMADO DE POSTERÍA DE CONCRETO DE 8 Y 12 METROS

Se continuo con el proceso de hincado y aplomado de la postería de concreto de 8 y 12 metros. Una vez localizado el poste en el sitio se debió realizar el izaje para su respectiva hincada. El izaje se realizó de manera manual o mecánica, dependiendo de las condiciones de acceso del equipo requerido. Una vez realizada la actividad de izaje e hincada del poste, el personal procedió a realizar el aplome rellenando el hueco con piedras y elementos que presionen la base del poste teniendo en cuenta la buena alienación del mismo.

INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN

Se dio inicio al proceso de instalación de estructuras de media y baja tensión. Para las estructuras de media y baja tensión se tuvo en cuenta las especificaciones técnicas, ya que cada estructura cuenta con un inventario detallado de materiales, modo de instalación y su aplicación en el trayecto de la red de distribución, asegurando de manera correcta las instalaciones ejecutadas. El personal calificado procedió a ascender al apoyo de concreto con el arnés de seguridad, se posiciono y se aseguró en el área del poste donde se instaló la estructura con sus respectivos accesorios de instalación.

INSTALACIÓN DE TEMPLETES DE MEDIA Y BAJA TENSION

Se dio inicio al proceso de instalación de los templetes de media y baja tensión. Se tuvieron en cuentas las fuerzas de tensión previstas por el cable conductor de la red de distribución para la instalación de los templetes y así evitar movimientos e inclinaciones en los postes y daños futuros a la red. El personal amarro en la parte superior del poste uno de los extremos del cable de tensionamiento (templete) y el otro extremo del cable lo amarro junto con un guarda cabo y los pernos de amarre a una vigueta de concreto previamente instalada en el suelo.

TENDIDO Y TENSIONADO DEL CABLE ACSR Nº 2 AWG Y CABLE TRIPLEX 2*35+1*35mm

Se realizó el regado del cable en el suelo de acuerdo a los tramos correspondientes a instalar, y a su vez el personal que se encontraba posicionado en la parte superior del poste iba dejando tendido sobre las estructuras los tramos de conductor. Una vez tendido el cable sobre las estructuras se procedió a realizar los amarres del cable en las estructuras de tensionamiento y de esta manera se pudo garantizar las conexiones requeridas para un buen funcionamiento de la red con un aislamiento correcto de los aisladores instalados.

INSTALACION DE AMORTIGUADOR TIPO STOCK BRIDGE PARA CABLE # 2 AWG

El personal realiza el ascenso al poste utilizando los elementos de protección personal y equipos certificados para trabajo en alturas. Posteriormente, se identifica el punto de

instalación del amortiguador tipo Stock bridge, de acuerdo con las distancias establecidas en el diseño o las especificaciones del operador de red. A continuación, se instala el amortiguador sujetando firmemente su abrazadera al conductor y verificando que los contrapesos queden correctamente orientados y libres de obstrucciones para garantizar la adecuada absorción de las vibraciones eólicas. Finalizada la instalación, se inspecciona el ajuste de los elementos de fijación, se comprueba que el conductor no presente daños mecánicos y que el amortiguador haya quedado correctamente posicionado, asegurando así la protección del conductor y de los accesorios de la red frente a los efectos de la vibración.

INSTALACIÓN DE PUESTAS A TIERRA EN BAJA TENSIÓN

Una vez el personal se encontró posicionado sobre el poste y equipado con los elementos de protección personal y el sistema para trabajo seguro en alturas, se procedió con la instalación de la bajante del sistema de puesta a tierra. Inicialmente, la cinta fue fijada al conductor de baja tensión mediante el conector correspondiente. De manera simultánea, el personal de apoyo en tierra ejecutó la excavación de una zanja destinada a la instalación de la varilla de puesta a tierra. Posteriormente, el liniero instaló aproximadamente dos (2) metros de cinta Band-It sobre el poste, asegurando la bajante mediante amarres distribuidos a lo largo de la estructura con una separación aproximada de 1,5 metros entre sí, garantizando su correcta fijación. Finalmente, el personal en tierra conectó el extremo inferior de la bajante al conector previamente soldado a la varilla de puesta a tierra y procedió a su instalación dentro de la excavación, dejando la cabeza de la varilla a una profundidad aproximada de quince (15) centímetros por debajo del nivel del terreno, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

INSTALACIONES DE TRANSFORMADORES

Una vez posicionado el personal en el poste con su respectivo equipo para trabajo en alturas se realizó la instalación de los collarines y estructuras de soporte para el transformador de distribución, a su vez el personal en el suelo amarro el transformador para ser subido hasta el punto de instalación en el poste teniendo en cuenta las distancias de seguridad, procediendo luego a conectar el cable conductor de la bajante a la malla de puesta a tierra según las especificaciones del diseño eléctrico detallado.

INSTALACIÓN DE PUESTAS A TIERRA PARA TRANSFORMADOR

Una vez señalizada y asegurada el área de trabajo, el personal procede a ubicar el punto de instalación del sistema de puesta a tierra junto al poste de concreto de 12 metros, donde se realiza la excavación y la instalación de las 3 varillas de puesta a tierra hasta la profundidad establecida en el diseño. Posteriormente, el liniero instala el conductor de bajada, fijándolo al poste mediante cintas Band-It, y lo conecta al borne de puesta a tierra del tanque del transformador, así como a los descargadores de sobretensión. En la parte inferior del poste, el conductor se une a la varilla mediante soldadura exotérmica, verificando

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

la firmeza y continuidad de todas las conexiones. Finalmente, se rellena y compacta la excavación, se inspecciona el sistema instalado. finalmente se mide la resistencia de puesta a tierra para confirmar el cumplimiento de los valores establecidos en el diseño y la normativa técnica vigente.

2. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

A continuación, se listan los CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO de los materiales utilizados en la ejecución del proyecto, certificados expedidos por la CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SECTOR ELÉCTRICO – CIDET, entre otros:

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No.	DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
01342	Transformadores Monofásicos	Convencionales Serie 15/1.2 Kv Devanados En Cobre O Aluminio	Desde 5 Kva Hasta 75 Kva
02605	Conductores Eléctricos	Cables Múltiplex De Aluminio Con Neutro Mensajero En Acsr/Ga, Aaac O Aac, Aislados En Xlpe O Polietileno De Baja Densidad (Ldpe 75 °c), 600 V	Calibres 6 Awg Al 477 Kcmil
07135	Aisladores De Porcelana	Carrete	53 – 1, 53 – 2, 53 - 3, 53 – 4, 53 - 5
07136	Aisladores De Porcelana	Tensor	Ansi 54-1, 54-2, 54-3, 54-4
07138	Aisladores De Porcelana	Espiga De A.T. (Pin Doble Y Pin Unitario)	Pin Doble, Pin Unitario
07141	Aisladores Poliméricos En Silicona	Suspensión	Ps 015, Ps 025, Ps 035, Ps 045, Ps 069
No. CP25_AA00233	Conductores Y Cables	Cables Acsr/Ga	Calibres Desde 25,69 Kcmil Hasta 1510,5 Kcmil
No. CP25_AA00237	Conductores Y Cables	Cables De Acerogalvanizado	Diámetros Desde 1/4" Hasta 1/2"
3136	Aisladores Suspensión De Media Y Alta Tensión En Material Polimérico	Aisladores Eléctricos Poliméricos Tipo Suspensión	15kv, 70 Kn
3922	Dps De Media, Alta Y Extra Alta Tensión	Dps En Aislamiento Polimérico Para Redes De Media Y Alta Tensión	10 Kv A 36 Kv
3923	Cortacircuitos Para Redes De Distribución	Cortacircuitos Para Redes De Distribución Tipo Expulsión, Caída Libre (Dropout)	Expulsión, Caída Libre (Dropout)

INFORME ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

25E4-1479-01	Herrajes Para Redes Eléctricas	Abrazaderas O Collarines	Sin Salida, De Una, Dos Salidas Y De Transformador En Diámetro Desde 100 Mm Hasta 380 Mm
25E4-1479-04	Herrajes Para Redes Eléctricas	Crucetas Metálicas Y Estructuras De Soportes Angulares Para Sistemas De Redes Compactas.	Crucetas Metálicas En Longitudes Desde 0,5 M Hasta 6 M, En Perfil Angular De Ancho Desde 2 ½" Hasta 4", Y De Espesor Desde 3/16" Hasta 3/8" Y Soportes Angulares En Perfil En U De 3" X 1 ½".
25E4-1479-05	Herrajes Para Redes Eléctricas	Diagonales	Diagonal Angular Recta, Angular Con Doblez, Tipo Bandera, Tipo Bandera Con Doblez (Pieamigos), En V Para Cruceta De Madera Y Cruceta Metálica (Tirantas), Y De Arriostramiento En Longitudes Desde 0,60 M Hasta 6 M Perfil Angular De Ancho Desde 1 1/4" Hasta 3" Y De Espesor Desde 3/16" Hasta 3/8". Diagonal En Varilla En Longitudes Entre Centros De Perforaciones Desde 0,60 M Hasta 1 M Y En Varilla De Diámetro Desde: 1/2" Hasta 7/8".
25E4-1479-06	Herrajes Para Redes Eléctricas	Eslabones Y Adaptadores	Eslabones: Sencillo, En U Con Pasador Ojal, En U Pasador Ojal Torcido Y Recto Desde ½" Hasta 1 ¼", Platina De Dos Ojales En Espesores Desde 3/16" Hasta 3/8".
25E4-1479-07	Herrajes Para Redes Eléctricas	Espigo Porta Aislador	Con Diámetros Desde 5/8" Hasta 53/64", Con Rosca Unc Desde ½" Hasta ¾" Y Longitudes Totales Desde 6 ¼" Hasta 18"
25E4-1479-13	Herrajes Para Redes Eléctricas	Guardacabos	Guardacabos Para Cable Desde: ¼" Hasta 5/8"
25E4-1479-14	Herrajes Para Redes Eléctricas	Perchas	Percha Porta Aisladores Para Redes De Baja Tensión Abiertas

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

			Medianas Cortas Y Medianas Largas Desde Uno (1) Hasta Cinco (5) Puestos Con Y Sin Soporte Alumbrado.
25E4-1479-16	Herrajes Para Redes Eléctricas	Pernos De Máquina Pernos De Carruaje Espárragos Tuercas Hexagonales	Espárragos: Desde ½" Hasta ¾" Longitud Desde 4" Hasta 24". Pernos De Maquina: Diámetro 3/8" Longitud Desde 1" Hasta 6". Pernos De Carruaje: Diámetro De 3/8" Longitudes Desde 1 1/2" Hasta 6". Tuercas Hexagonales: Desde 1/4" Hasta 11/4".
25E4-1479-11	Herrajes Para Redes Eléctricas	Grapa Prensora	Tipo 1 De: 3/8" X 1 ½" X 6" Y Tipo 2 De: 3/8" X 2" X 6".
25E4-1479-23	Herrajes Para Redes Eléctricas	Tuerca De Ojo	Redondas Y Alargadas Con Diámetro De Rosca Desde ½" Hasta ¾".
25E4-1479-24	Herrajes Para Redes Eléctricas	Varillas De Anclaje	Desde ½" Hasta 1-¼" En Longitud Desde 1,5 M Hasta 3 metros.
2602	Herrajes Y Accesorios Para Líneas De Transmisión Y Redes De Distribución	Amortiguadores	Amortiguador Para Cable 600 A 795kcmil - 477 Kcmil - 336,4 Kcmil Y 266.8kacmil, Amortiguador Para Cable Acsr4/0-2/0-1/0-Cable De Guarda ¼-3/8 Y Acsr No 2.
2002	Grapas De Retención Y Suspensión	Grapas De Retención Y Suspensión	Grapas Fabricadas En Aluminio O En Cobre, Grapas Tipo Pistola En Acero, Grapas Suspensión Acero

De acuerdo con las características del proyecto, no se contempla la realización de ensayos de laboratorio durante la ejecución de la obra. Lo anterior obedece a que los materiales y equipos empleados cuentan con sus respectivos certificados de calidad y conformidad emitidos por los fabricantes, los cuales garantizan el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas. Asimismo, las actividades constructivas previstas en el alcance del proyecto no requieren la ejecución de pruebas de laboratorio para verificar su calidad, por lo que el control de los materiales se fundamenta en la revisión documental de los

certificados, las inspecciones de campo y la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
N/A	N/A	N/A

3. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
13/04/2026	Capacitación en riesgo público y físico	Medidas de prevención y autocuidado, desplazamientos seguros, atención al entorno, seguridad en instalaciones
20/04/2026	Capacitación en riesgo natural y riesgo ergonómico	Identificación de peligros, resguardarse de fuerte lluvias, tormentas eléctricas entre otras
13/05/2026	Entrega de dotación y EPP	Se realiza la entrega de dotación y EPP al personal operativo.
15/05/2026	Capacitación	Capacitación en identificación de riesgo eléctrico, riesgo trabajo en alturas, riesgo biomecánico, riego físico, condiciones inseguras.
15/05/2026	Inducción	Inducción en reglamento interno, políticas SG-SST, políticas de alcohol y no drogas, políticas de seguridad vial, comité de convivencia laboral.
15/05/2026	Evaluación	Se hace una evaluación de la inducción realizada.
24/06/2027	Inspección de vehículos	Se realiza la inspección de vehículo tipo camioneta
25/06/2026	Inspección de EPP	Se realiza la inspección a todos los elementos de protección personal
02/07/2026	Entrega de dotación y EPP	Se realiza la entrega de dotación y EPP al personal operativo.
06/07/2026	Evaluación	Se hace una evaluación de la inducción realizada
06/07/2026	Inducción	Inducción en reglamento interno, políticas SG-SST, políticas de alcohol y no drogas, políticas de seguridad vial, comité de convivencia laboral
14/07/2026	Inspección de vehículos	Se realiza la inspección de vehículo tipo camioneta
15/07/2026	Entrega de dotación y EPP	Se realiza la entrega de dotación y EPP al personal operativo.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

16/07/2026	Inspección de herramientas manuales	Se capacita al personal en manejo de herramientas de impacto.
19/07/2026	Inducción	Inducción en reglamento interno, políticas SG-SST, políticas de alcohol y no drogas, políticas de seguridad vial, comité de convivencia laboral
19/07/2026	Evaluación	Se hace una evaluación de la inducción realizada
22/07/2026	Inspección de EPP	Se realiza la inspección a todos los elementos de protección personal
05/08/2026	Inspección de grúa	Se realiza la inspección de vehículo tipo camión grúa

4. MANEJO AMBIENTAL

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
Desarrollo e implementación del sistema de gestión ambiental	100%	Se realizaron actividades de ahoyado e hincado de apoyos, instalación de estructuras y templetes, tendido de cable y amortiguadores, implementación del sistema de puesta a tierra e instalación de transformadores.
Manejo integral de residuos sólidos	100%	Se cuenta con punto ecológico en el frente de obra según la resolución 2184 del 2019.
Manejo integral de materiales de construcción	100%	Se realizaron excavaciones para el hincado de la postería, lo cual genero el residuo de excavación que posteriormente será reutilizado en el proceso de compactación o se realizará paisajismo en la misma zona.
Manejo integral de aguas y residuos líquidos	100%	El proyecto no requiere del uso integral de agua, pero si cuenta con un baño ya existente.
Control de erosión, estabilidad de taludes y laderas	100%	Durante la ejecución de las actividades, las excavaciones realizadas no han requerido la implementación de medidas específicas para el control de la erosión, debido a que no se han evidenciado condiciones que generen procesos erosivos significativos.
Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamento y sitios de acopio temporal	100%	Se tiene buen orden y aseo en el punto de acopio
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	100%	Se cuenta con toda la documentación correspondiente a los vehículos utilizados en la obra.

INFORME ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

Manejo de Vegetación	100%	Para la ejecución de las actividades de excavación ha sido necesaria la remoción puntual de cobertura vegetal herbácea, limitada exclusivamente a las áreas donde se realizarán las intervenciones, procurando minimizar cualquier afectación sobre la vegetación existente.
Manejo de fauna	100%	Durante la ejecución de las actividades, las excavaciones se realizaron de manera manual, con el propósito de minimizar posibles afectaciones sobre la fauna presente en el área de intervención y prevenir su desplazamiento.
Protección de áreas sensibles	100%	Las actividades de obra se desarrollaron fuera de la proximidad de cuerpos hídricos y áreas protegidas, por lo que no se presentaron afectaciones sobre estos recursos o zonas de especial importancia ambiental.

C. INFORME ADMINISTRATIVO

1. PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO QUE LABORO DEL 10 DE ABRIL DE 2026 AL 19 DE AGOSTO DE 2026

DEL 10 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DE 2026

NOMBRE	CARGO	% DEDICACIÓN PERSONA- MES
Hernando Ayala Villamil	Director de obra	30%
Orlando Baquero Martínez	Residente de obra	100%
Alexander Mora Torres	Ingeniero ambiental	20%
Cristian Alexis Castañeda	Siso	30%

DEL 10 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2026

NOMBRE	CARGO	% DEDICACIÓN PERSONA- MES
Hernando Ayala Villamil	Director de obra	30%
Orlando Baquero Martínez	Residente de obra	100%
Alexander Mora Torres	Ingeniero ambiental	20%
Cristian Alexis Castañeda	Siso	30%
Mario Pineda Jiménez	Ayudante de obra	100%

INFORME ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

José Murcia Leal	Capataz de obra	100%
Aron Blanco Cristancho	Ayudante de obra	100%
Carlos García Murcia	Ayudante de obra	100%
Ángel Rodríguez Gamboa	Técnico electricista	100%
Juan Castillo Sandoval	Conductor	100%
Juan Urrea Ramírez	Ayudante de obra	100%
Juan Suarez Murcia	Ayudante de obra	100%

DEL 10 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2026

NOMBRE	CARGO	% DEDICACIÓN PERSONA- MES
Hernando Ayala Villamil	Director de obra	30%
Orlando Baquero Martínez	Residente de obra	100%
Alexander Mora Torres	Ingeniero ambiental	20%
Cristian Alexis Castañeda	Siso	30%
José Murcia Leal	Capataz de obra	100%
Aron Blanco Cristancho	Ayudante de obra	100%
Carlos García Murcia	Ayudante de obra	100%
Ángel Rodríguez Gamboa	Técnico electricista	100%
Juan Castillo Sandoval	Conductor	100%
Juan Urrea Ramírez	Ayudante de obra	100%
Juan Suarez Murcia	Ayudante de obra	100%

DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DE 2026

NOMBRE	CARGO	% DEDICACIÓN PERSONA- MES
Hernando Ayala Villamil	Director de obra	30%
Orlando Baquero Martínez	Residente de obra	100%
Alexander Mora Torres	Ingeniero ambiental	20%
Cristian Alexis Castañeda	Siso	30%
José Murcia Leal	Capataz de obra	100%
Aron Blanco Cristancho	Ayudante de obra	100%
Carlos García Murcia	Ayudante de obra	100%
Ángel Rodríguez Gamboa	Técnico electricista	100%
Juan Castillo Sandoval	Conductor	100%
Juan Urrea Ramírez	Técnico electricista	100%
Juan Suarez Murcia	Ayudante de obra	100%
Edgar Alfonso Pardo Mosquera	Ayudante de obra	100%
Noe Cruz Ramírez	Técnico electricista	100%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

Carlos Alberto Cárdenas Rojas	Ayudante de obra	100%
Jhojan Estiben Monroy	Ayudante de obra	100%
Yofren Andrés Hurtado	Ayudante de obra	100%
Miguel Ángel Garavito Ormaza	Ayudante de obra	100%
Daniel Felipe Estefen Murcia	Ayudante de obra	100%
Henry Rodríguez Carrillo	Técnico electricista	100%

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se presenta planilla de pago N°: 9505134662, 9502340902, 9503674321, 9507334299, 9505663602, 9505270330, 9508189069, 9506850854, 9505735048, 9509215422, 9508470477

Anexo: Formato 112-ECP-FR-021-V01-ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	VALOR APORTE	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE
SALUD	9505134662	$164.100,00	Abril 2026
PENSIÓN	9505134662	$ 0,00	Abril 2026
ARL	9505134662	$285.300,00	Abril 2026
CCF	9505134662	$164.100,00	Abril 2026
SALUD	9502340902	$250.000,00	Abril 2026
PENSIÓN	9502340902	$320.000,00	Abril 2026
ARL	9502340902	$10.500,00	Abril 2026
CCF	9502340902	$0,00	Abril 2026
SALUD	9503674321	$261.700,00	Abril 2026
PENSIÓN	9503674321	$335.000,00	Abril 2026
ARL	9503674321	$11.000,00	Abril 2026
CCF	9503674321	$0,00	Abril 2026
SALUD	9507334299	$577.400,00	Mayo 2026
PENSIÓN	9507334299	$1.440.600,00	Mayo 2026
ARL	9507334299	$1.004.100,00	Mayo 2026
CCF	9507334299	$577.300,00	Mayo 2026
SALUD	9505663602	$250.000,00	Mayo 2026
PENSIÓN	9505663602	$320.000,00	Mayo 2026
ARL	9505663602	$10.500,00	Mayo 2026
CCF	9505663602	$0,00	Mayo 2026
SALUD	9505270330	$261.700,00	Mayo 2026
PENSIÓN	9505270330	$334.100,00	Mayo 2026
ARL	9505270330	$11.000,00	Mayo 2026
CCF	9505270330	$0,00	Mayo 2026
SALUD	9508189069	$811.900,00	Junio 2026
PENSIÓN	9508189069	$2.385.400,00	Junio 2026
ARL	9508189069	$1.412.200,00	Junio 2026
CCF	9508189069	$811.900,0	Junio 2026
SALUD	9505735048	$250.000,00	Junio 2026

INFORME ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

PENSIÓN	9505735048	$320.000,00	Junio 2026
ARL	9505735048	$10.500,00	Junio 2026
CCF	9505735048	$0,00	Junio 2026
SALUD	9506850854	$261.700,00	Junio 2026
PENSIÓN	9506850854	$334.100,00	Junio 2026
ARL	9506850854	$11.000,00	Junio 2026
CCF	9506850854	$0,00	Junio 2026
SALUD	9509215422	$1.076.200,00	Julio 2026
PENSIÓN	9509215422	$3.441.100,00	Julio 2026
ARL	9509215422	$1.871.900,00	Julio 2026
CCF	9509215422	$1.076.200,00	Julio 2026
SALUD	9507343460	$250.000,00	Julio 2026
PENSIÓN	9507343460	$320.000,00	Julio 2026
ARL	9507343460	$10.500,00	Julio 2026
CCF	9507343460	$0,00	Julio 2026
SALUD	9508470477	$260.200,00	Julio 2026
PENSIÓN	9508470477	$333.100,00	Julio 2026
ARL	9508470477	$11.000,00	Julio 2026
CCF	9508470477	$0,00	Julio 2026

3. GESTIÓN SOCIAL

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	21
Empleos directos generados:	19
Empleos indirectos generados:	2

4. CLASIFICACIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS EMPLEOS GENERADOS

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (Edad)	15 a 19 años	
Etaria (Edad)	20 a 59 años	21
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	
Grupos étnicos	Población Indígena	
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	
Grupos étnicos	Población Raizal	
Género	Masculino	
Género	Femenino	
Población Vulnerable	Desplazados	
Población Vulnerable	Discapacitados	
Población Vulnerable	Víctimas	
Total		21

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

D. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	**TIEMPO (MESES / DÍAS)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
Prorroga No. 1 (8/07/2026)	Dos (2) meses	Durante el proceso de replanteo del proyecto, se detectó que deben realizarse modificaciones técnicas para ajustar a las condiciones reales del sitio de la obra, como lo son la inclusión de dos nuevos usuarios y cambios en algunos tramos de red de media tensión para evitar el paso por zonas arborizadas y evitar el uso de red aérea compacta. Dado a que las modificaciones requieren de tiempo adicional se realiza la solicitud de la prórroga por dos (2) meses	

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	**VALOR ($)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	**VALOR ACTUALIZADO ($)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
Modificatoria No. 1 (8/07/2026)	$2.225.223.401,00	Una vez finalizado el proceso de replanteo, se detectó la necesidad de realizar modificaciones técnicas con el fin de ajustar el proyecto a las condiciones reales en los sitios de las obras, se vio la necesidad de modificar el trazado de la red por restricciones ambientales y optimizar recursos, cambiar estructuras verticales a estructuras horizontales,	**N/A**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

3264

INFORME ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

		e incluir dos nuevos beneficiarios que cumplen con los criterios para ser incluidos en el proyecto.	

2. GARANTÍAS:

PÓLIZA CONTRACTUAL

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	14-44-101252195
ANEXO N°	0
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	14-40-101078757
ANEXO N°	0
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento Del Contrato	24/12/2025	04/04/2026	$ 222.522.341,00
Salarios Y Prestaciones Sociales	24/12/2025	04/04/2029	$ 111.261.171,00
Correcto Funcionamiento De Los Equipos y/o bienes	SE AMPARA 1 AÑO, 1 MESES Y 15 DÍAS		$ 222.522.341,00
Estabilidad Y Calidad De La Obra	SE AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS		$ 222.522.341,00
Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo	24/12/2025	04/08/2026	$ 445.044.681,00
Responsabilidad Civil Extracontractual	24/12/2025	04/04/2026	$ 427.050.000,00

PÓLIZA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	14-44-101252195
ANEXO N°	1-2
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	14-40-101078757
ANEXO N°	1-2-3
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento Del Contrato	10/04/2025	19/11/2026	$ 222.522.341,00
Salarios Y Prestaciones Sociales	10/04/2025	20/07/2029	$ 111.261.171,00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

3265

INFORME ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

Correcto Funcionamiento De Los Equipos y/o bienes	SE AMPARA 1 AÑO, 1 MESES Y 15 DÍAS		$ 222.522.341,00
Estabilidad Y Calidad De La Obra	SE AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS		$ 222.522.341,00
Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo	10/04/2025	19/11/2026	$ 445.044.681,00
Responsabilidad Civil Extracontractual	10/04/2026	30/07/2026	$ 427.050.000,00

PÓLIZA DE PRORROGA NO 1 Y MODIFICATORIA NO 1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	14-44-101252195
ANEXO N°	3
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	14-40-101078757
ANEXO N°	5
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento Del Contrato	10/04/2025	19/01/2027	$ 222.522.341,00
Salarios Y Prestaciones Sociales	10/04/2025	20/09/2029	$ 111.261.171,00
Correcto Funcionamiento De Los Equipos y/o bienes	10/04/2025	20/09/2027	$ 222.522.341,00
Estabilidad Y Calidad De La Obra	09/07/2025	09/07/2031	$ 222.522.341,00
Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo	10/04/2025	19/01/2027	$ 445.044.681,00
Responsabilidad Civil Extracontractual	10/04/2026	20/09/2026	$ 525.271.500,00

E. INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCIÓN	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
1	805	24/4/2026	0,00%	$445.044.680,20	$0,00	$0,00	$445.044.680,20
		TOTALES	0,00%	$445.044.680,20	$0,00	$0,00	$445.044.680,20

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: 10/04/2026 AL 18/08/2026

Avance físico ejecutado 73,22% y avance financiero ejecutado $0,00

INFORME ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1,1	**PRELIMINARES**	**EJECUTADO**	**%**
	LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	41,73	93,78%






OBSERVACIONES

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2,1	**POSTES**	**EJECUTADO**	**%**
	POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 8 M X 510 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	20,00	83,33%



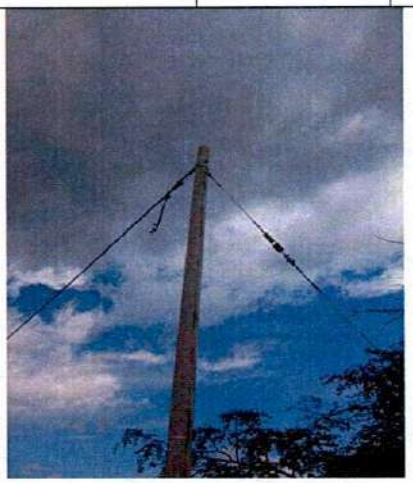


OBSERVACIONES



GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

3267

INFORME ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041


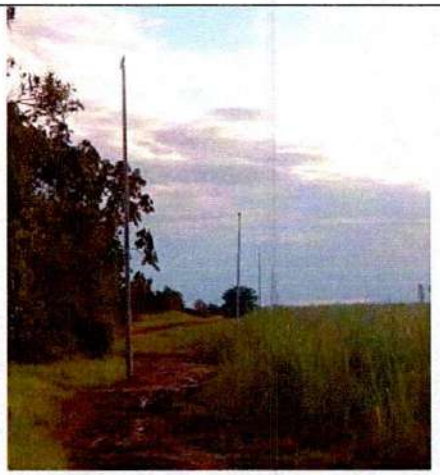
ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2,2	**POSTES**	**EJECUTADO**	**%**
	POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 12 M X 510 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	357,00	89,03%
	 		
	OBSERVACIONES		

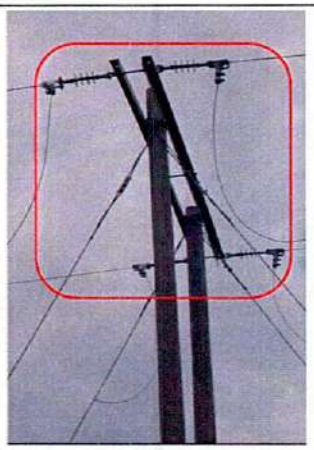
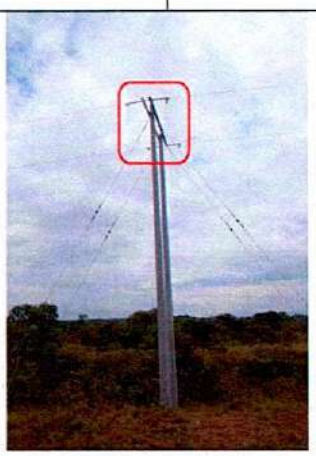
ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3,2	**ESTRUCTURAS**	**EJECUTADO**	**%**
	ESTRUCTURA EN H CIRCUITO SIMPLE RETENCIÓN TIPO IPSE RH-231-02 CRUCETA DOBLE DE 4 MTS. HASTA 44KV ANG. MÁX. 45° SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA CIRCUITO BIFASICO	19,00	82,61%
	 		
	OBSERVACIONES		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

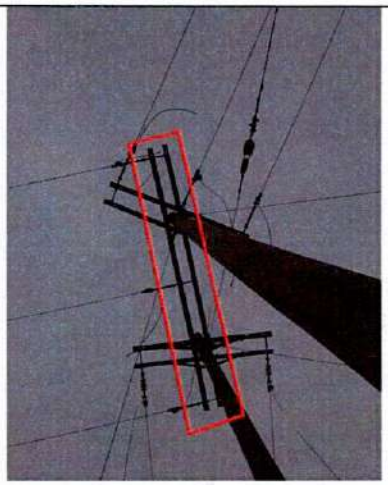
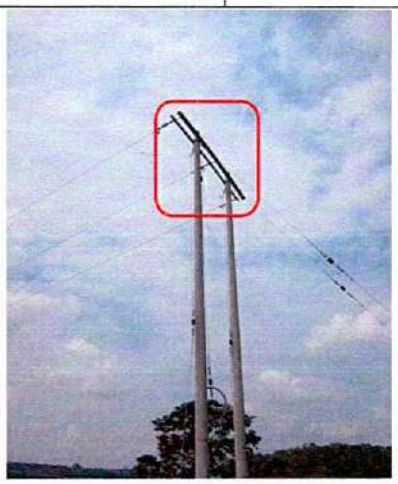
ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3,3	**ESTRUCTURAS**	**EJECUTADO**	**%**
	ESTRUCTURA EN H TERMINAL TIPO IPSE RH-240 DISPOSICIÓN HORIZONTAL, CIRCUITO TRIFÁSICO DOBLE CRUCETA DE 4 MTS. SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	1,00	100%
	 		

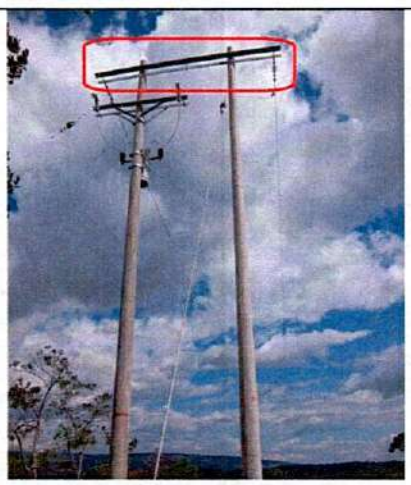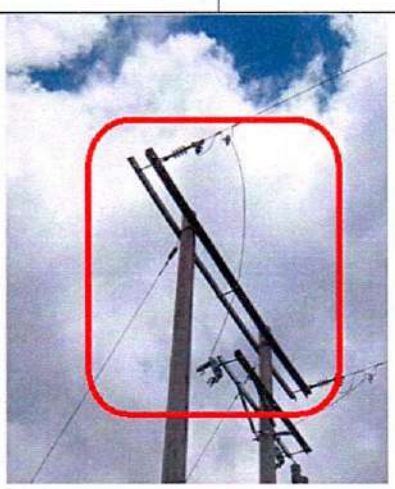ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3,4	**ESTRUCTURAS**	**EJECUTADO**	**%**
	ESTRUCTURA EN H TERMINAL TIPO IPSE NC RH-240 DISPOSICIÓN HORIZONTAL, CIRCUITO BIFÁSICO DOBLE CRUCETA DE 4 MTS. SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	6,00	100%
	 		

INFORME ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041


ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3,20	**ESTRUCTURAS**	**EJECUTADO**	**%**
	ESTRUCTURA TIPO 710-02 NORMA ICEL MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO EN POSTE PESO MÁXIMO 500 KG B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	9,00	45,00%
	 		
	OBSERVACIONES		

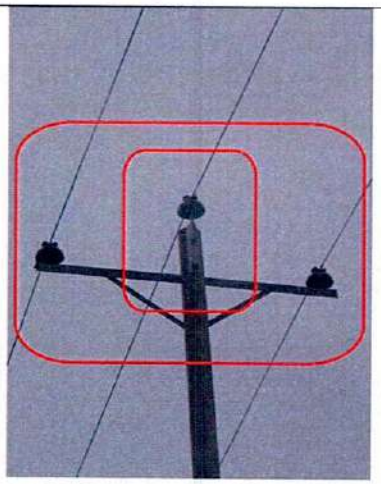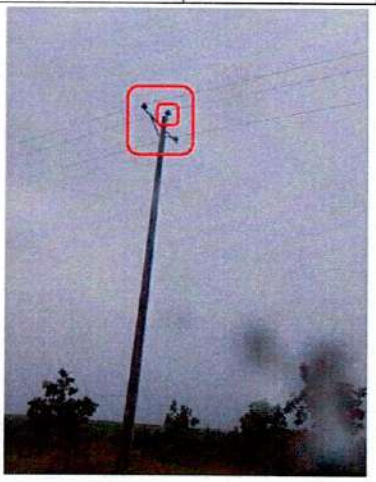ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3,21	**ESTRUCTURAS**	**EJECUTADO**	**%**
	CONVERTIR ESTRUCTURA CODENSA 510 A P103	11,00	100%
	 		
	OBSERVACIONES		

INFORME ACTA PARCIAL No. 1



CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3,22	**ESTRUCTURAS**	**EJECUTADO**	**%**
	CONVERTIR ESTRUCTURA CODENSA 512 A P112	3,00	100%

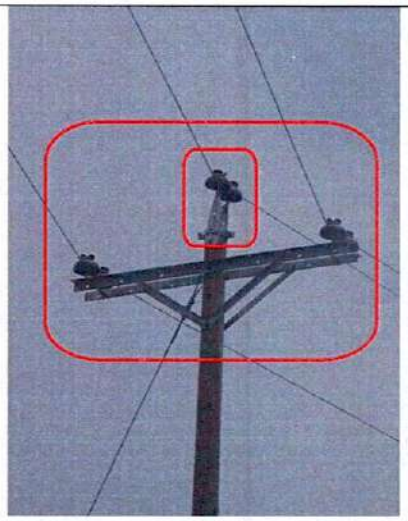


OBSERVACIONES

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3,23	**ESTRUCTURAS**	**EJECUTADO**	**%**
	CONVERTIR ESTRUCTURA CODENSA 514 A 550	2,00	100%

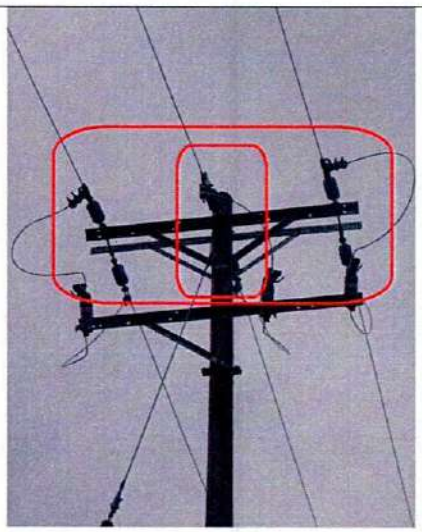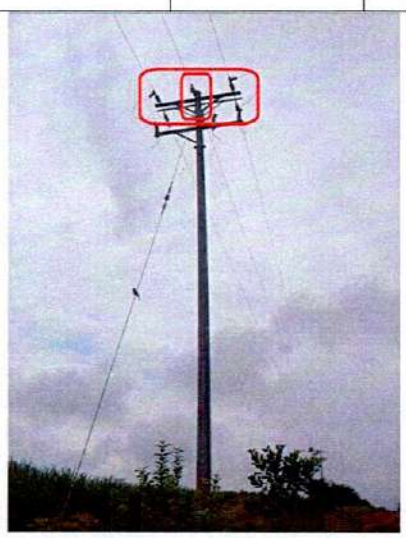



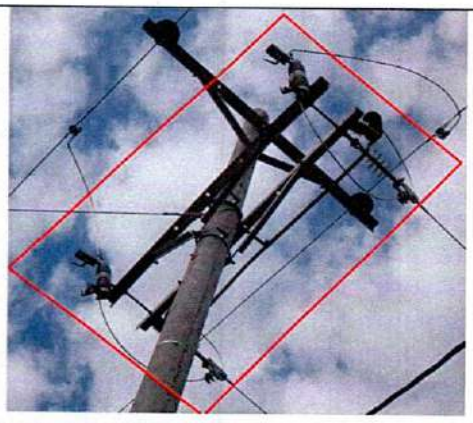
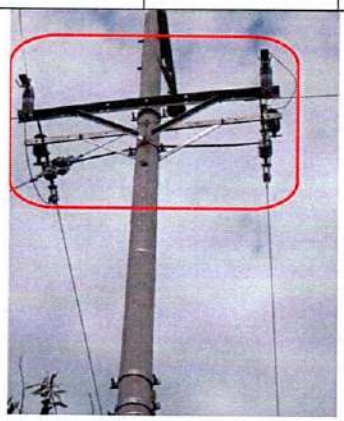
OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

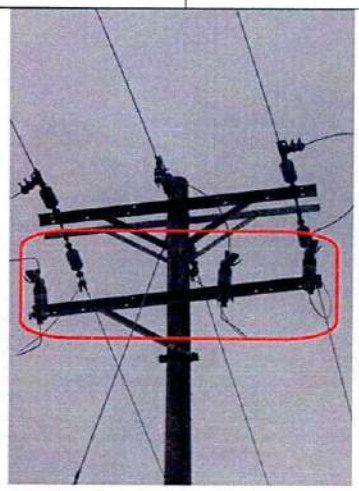ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3,25	**ESTRUCTURAS**	**EJECUTADO**	**%**
	ESTRUCTURA TIPO 730 NORMA ICEL DERIVACIÓN TRIFÁSICA CON CORTACIRCUITO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	2,00	100%
	 		
	OBSERVACIONES		



ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3,26	**ESTRUCTURAS**	**EJECUTADO**	**%**
	ESTRUCTURA TIPO 731 NORMA ICEL DERIVACIÓN MONOFÁSICA CON CORTACIRCUITO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	17,00	94,44%
	 		
	OBSERVACIONES		

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

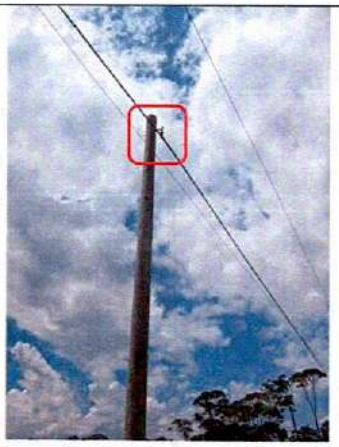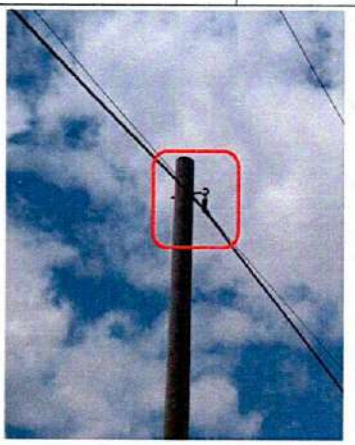ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3,29	**ESTRUCTURAS**	**EJECUTADO**	**%**
	ESTRUCTURA LA320m CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA. SIN CAJA DE DERIVACION	8,00	80,00%
	 		
	OBSERVACIONES		


ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3,30	**ESTRUCTURAS**	**EJECUTADO**	**%**
	ESTRUCTURA LA321m FINAL DE CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN.NORMA CODENSA. SIN CAJA DE DERIVACION	26,00	92,86%
	 		
	OBSERVACIONES		

INFORME ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
4,1	**CONDUCTORES**	**EJECUTADO**	**%**
	CONDUCTOR ACSR 3 No. 2 AWG	11.703,00	86,41%




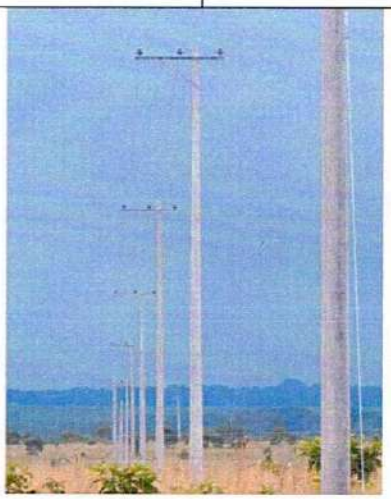

OBSERVACIONES

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
4,2	**CONDUCTORES**	**EJECUTADO**	**%**
	CONDUCTOR ACSR 2 No. 2 AWG	27.383,00	92,99%



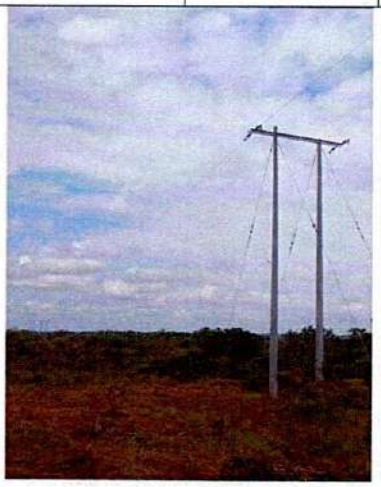


OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041


ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
4,3	**CONDUCTORES**	**EJECUTADO**	**%**
	CONDUCTOR ACSR 1 No. 2 AWG	1.466,00	100%

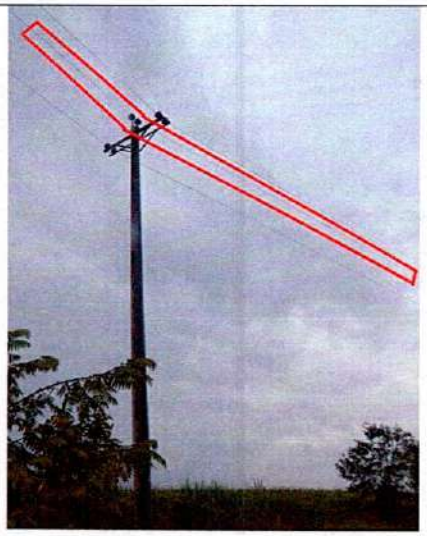



OBSERVACIONES

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
4,9	**CONDUCTORES**	**EJECUTADO**	**%**
	CABLE TRIPLEX 2*2+1*2 (2*35+1*35MM)	1.016,00	79,50%

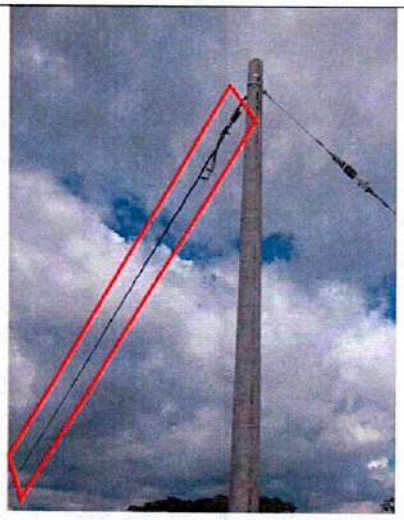





OBSERVACIONES



GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

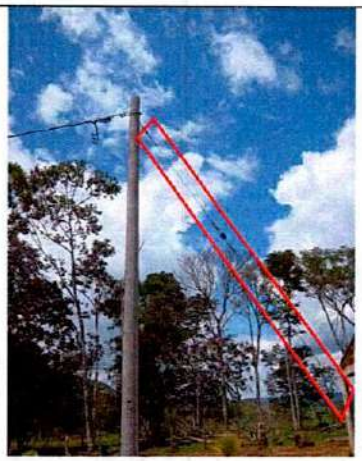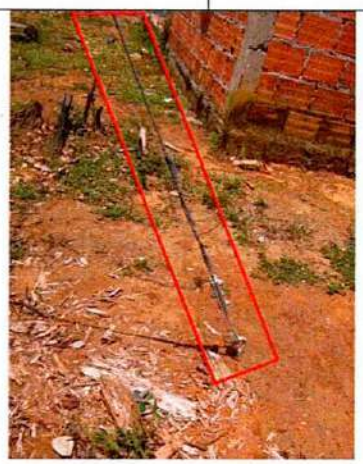
ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
5,1	**TEMPLETES**	**EJECUTADO**	**%**
	TEMPLETE DIRECTO A TIERRA RED B.T. TIPO LAR412 NORMA CODENSA RETENIDA POSTE A VARILLA DE ANCLAJE TERMINAL O EN ÁNGULO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	26,00	92,86%
	 		
	OBSERVACIONES		

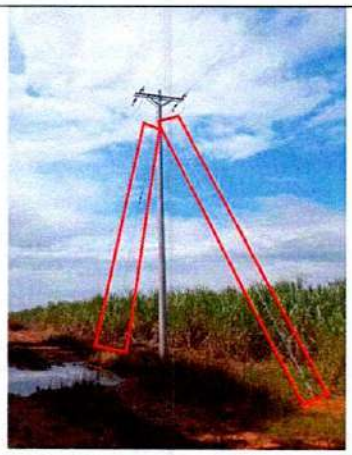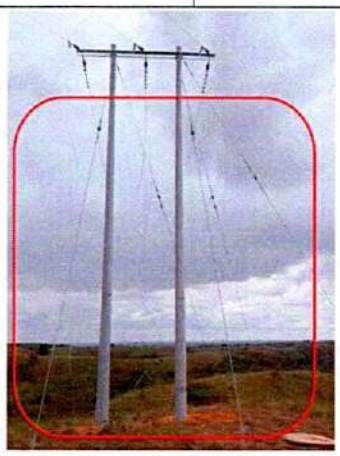ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
5,4	**TEMPLETES**	**EJECUTADO**	**%**
	TEMPLETE DIRECTO A TIERRA RED M.T. TIPO LAR412 NORMA CODENSA RETENIDA POSTE A VARILLA DE ANCLAJE TERMINAL O EN ÁNGULO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	283,00	92,18%
	 		
	OBSERVACIONES		

INFORME ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
5,5	**TEMPLETES**	**EJECUTADO**	**%**
	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	13,00	92,86%
			
	OBSERVACIONES		

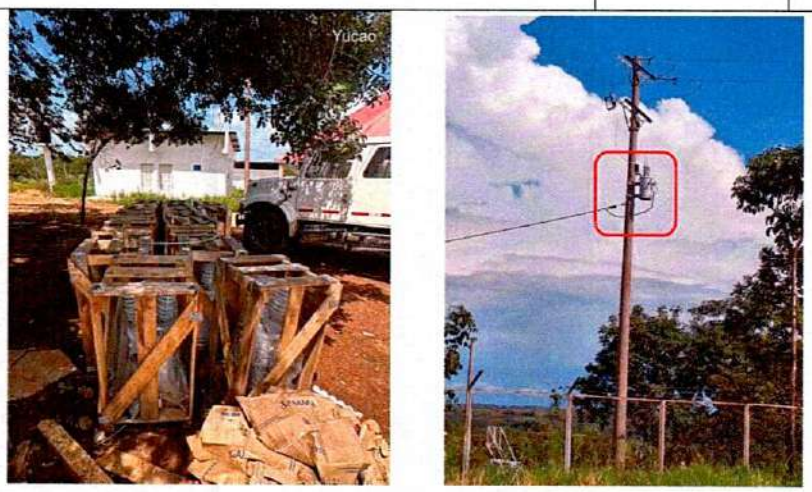ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
6,1	**TRANSFORMADORES**	**EJECUTADO**	**%**
	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 5 kVA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	9,00	45,00%
			
	OBSERVACIONES		


GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co



INFORME ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P.1	ÍTEMS NO PREVISTOS	EJECUTADO	%
	ESTRUCTURA TIPO 510-02 NORMA ICEL CIRCUITO BIFÁSICO AISLAMIENTO EN ESPIGO ÁNGULOS DE 0° A 5°. B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	112,00	85,50%

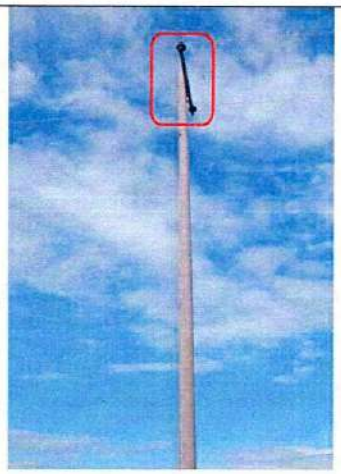


ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P.2	ÍTEMS NO PREVISTOS	EJECUTADO	%
	ESTRUCTURA TIPO 514-02 NORMA ICEL CIRCUITO BIFÁSICO ESTRUCTURA TERMINAL. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	39,00	97,50%

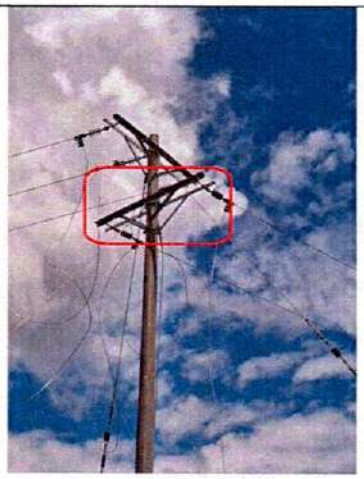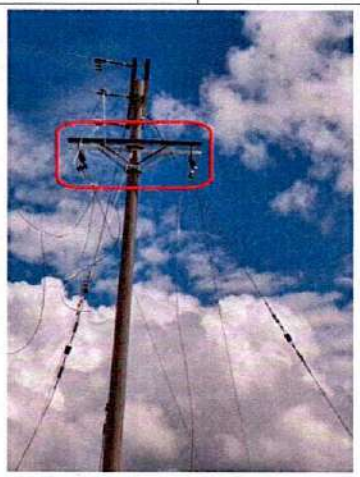



3278

INFORME ACTA PARCIAL No. 1


CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P.3	ÍTEMS NO PREVISTOS	EJECUTADO	%
	ESTRUCTURA TIPO 515-02 NORMA ICEL CIRCUITO BIFÁSICO ESTRUCTURA DE RETENCIÓN. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	24,00	92,31%

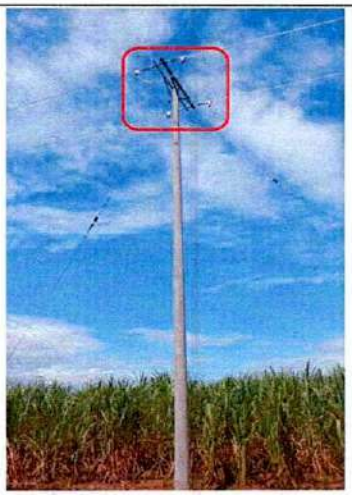



ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P.4	ÍTEMS NO PREVISTOS	EJECUTADO	%
	ESTRUCTURA TIPO 523-02 NORMA ICEL CIRCUITO TRIFÁSICO AISLAMIENTO EN ESPIGO DISPOSICIÓN EN SEMIBANDERA ÁNGULO DE 0° A 5°. B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	80,00	100%

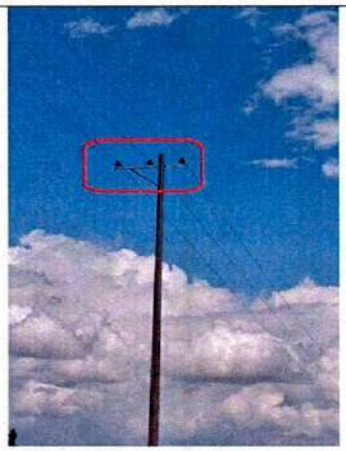



INFORME ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P.5	ÍTEMS NO PREVISTOS	EJECUTADO	%
	ESTRUCTURA TERMINAL TIPO 550-02 NORMA ICEL CIRCUITO TRIFÁSICO B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	12,00	92,31%





ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P.6	ÍTEMS NO PREVISTOS	EJECUTADO	%
	ESTRUCTURA DE RETENCIÓN TIPO 560-02 NORMA ICEL CIRCUITO TRIFÁSICO CON NEUTRO B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	13,00	100%







INFORME ACTA PARCIAL No. 1


CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041


ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P.7	ÍTEMS NO PREVISTOS	EJECUTADO	%
	ESTRUCTURA EN H CIRCUITO SIMPLE RETENCION TIPO IPSE RH-230 CRUCETAS DE 2 Y 4 MTS CABLE DE GUARDA NEUTRO (OPCIONALES) HASTA 44 kV, ANG. MÁX. 45°, UMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	4,00	57,14%

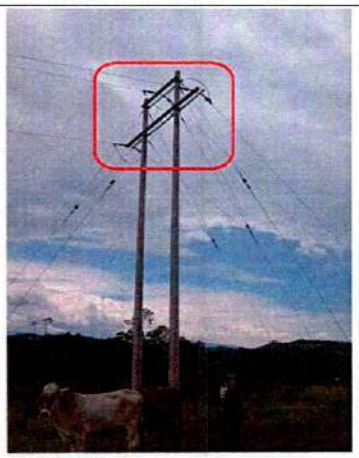

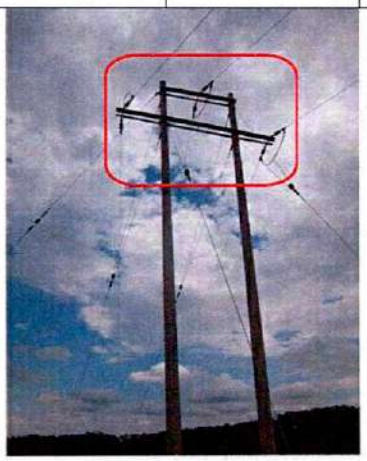

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P.8	ÍTEMS NO PREVISTOS	EJECUTADO	%
	ESTRUCTURA EN H CIRCUITO BIFASICO SIMPLE SUSPENSION TIPO IPSE SH-226M CRUCETA DE 4 MTS CABLE DE GUARDA – NEUTRO (OPCIONAL) HASTA 44 kV, ANG. MÁX. 3°, UMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	18,00	100%

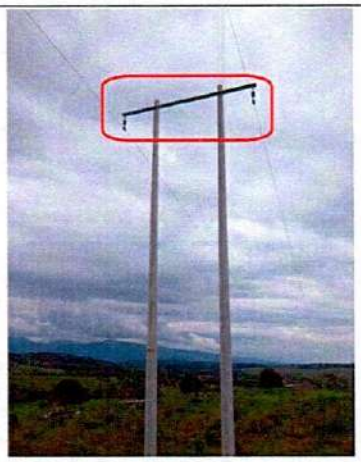

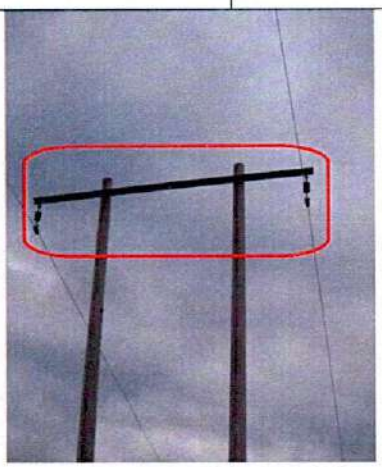

INFORME ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P.11	ÍTEMS NO PREVISTOS	EJECUTADO	%
	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	187,00	67,27%
	 		
	OBSERVACIONES		

G. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

El presente informe se presenta como soporte para el trámite del pago del acta parcial No. 1, correspondiente a las actividades ejecutadas y verificadas durante el periodo objeto de corte. El valor del presente pago asciende a MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.629.408.595,64), equivalente al 73,22 % del valor total del contrato. Al corresponder este al primer pago efectuado en el marco del proyecto, el valor del presente corte constituye igualmente el valor acumulado ejecutado y cobrado a la fecha, correspondiente al 73,22 % de avance contractual.

Durante el periodo objeto de la presente acta parcial No. 1 se ejecutaron actividades correspondientes al avance físico del proyecto, entre las que se destacan el ahoyado, hincado y aplomado de postería de concreto de 8 y 12 metros, la instalación de estructuras y templetes de media y baja tensión, el tendido y tensionado de conductores, así como la instalación de sistemas de puesta a tierra y transformadores de distribución. Las actividades

3282

INFORME ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO N°	707-2025	PROYECTO N°	2024005500041

fueron desarrolladas de acuerdo con las condiciones encontradas en campo y conforme a las especificaciones técnicas establecidas para la ejecución del proyecto.

El avance alcanzado y las cantidades ejecutadas durante este periodo constituyen el soporte técnico para el reconocimiento y cobro de las actividades incluidas en la presente acta parcial No. 1, previa verificación y aprobación por parte de la interventoría.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los veinticinco (25) días del mes agosto del 2026

Firma

Nombre: Hernando Ayala Villamil
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-17615

Firma

Nombre: Orlando Baquero Martínez
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25205-7068

Nota: El informe y sus anexos, deben ser cargados a la plataforma para la gestión de archivos SIGA, una vez sea presentado a la entidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Vobo Interventoría

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	10	4	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	1 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia lluvioso
TORMENTA				
LLUVIOSO	x	x		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		1	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia lluvios, por este motivo solo se logro replantear 1 kilometro

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUETO LOPEZ	11	4	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	2 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	x	x		Dia nublado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		2	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia nublado, se repaintea 2 kilometros, se hace la validacion del usuario ANTONIO MARIA SUAREZ ISAZA del predio YACARE. No se encontró a nadie en el lugar, pero se pudo evidenciar que la vivienda esta habitada

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUETO LOPEZ	12	4	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	3 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		0		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se trabaja, dia domingo

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

3286

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUETO LOPEZ	13	4	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	4 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia lluvioso
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		1	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia lluvioso, solo se logra replantear 1 km de la red

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17815	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	14	4	2025	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	5 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	x	x		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		2	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia soleado, se repalntea 2 kilometros, se hace la validacion del usuarioEDUARDO SUAREZ LOPEZ del predio la PRADERA. no se encontró a nadie en el lugar, pero se pudo evidenciar que la vivienda esta habitada.
Se identificó que, para continuar con el replanteo de la línea de media tensión desde los usuarios del predio Praderas hasta los usuarios del predio La Morena, el trazado propuesto inicial atraviesa una extensa área boscosa, lo que dificulta su ejecución y podría generar mayores impactos ambientales. Por tal motivo, se determinó modificar el trazado de la línea en este tramo, con el fin de establecer un recorrido más viable desde el punto de vista técnico, constructivo y ambiental.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17515	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

3266

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	15	4	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	6 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia lluvioso
TORMENTA				
LLUVIOSO	x	x		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		0		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia lluvioso, solo se hace la validacion del usuario EDUARDO RICARDO MAC ALLISTER del predio el RICON DE LAS INDIAS. Vivienda habitada, Propietario EDUARDO MACALISTER

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

3289

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	16	4	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	7 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Día soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	x	x		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		2	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia soleado, se repaintea 2 kilometros, se hace la validacion del usuario JUAN FERNANDO PEREZ PIESCHACON del predio el MEREY. Vivienda habitad, Residente del lugar MARCOS TELLEZ, C.C. 3.198.873

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17515	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUETO LOPEZ	17	4	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	8 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia lluvioso
TORMENTA				
LLUVIOSO	x	x		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		1	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia lluvioso, se repaintea 1 kilometros, se hace la validacion del usuario ADRIANA MARIA SUAREZ ISAZA del predio la MORENA. Vivienda habitad, Residente del lugar MAURICIO BASTIDAS, C.C. 1.120.866.584

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	18	4	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	9 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	x	x		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		2	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia soleado, se repaintea 2 kilometros, se hace la validacion del usuario JULIO FERNANDO CALA VARELA del predio MITI MITI. Vivienda habitad, Vivienda habitada, residente del lugar PEDRO RODRIGUEZ, C.C. 17.343.733, propietario JULIO FERNANDO CALA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	19	4	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	10 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		0		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se trabaja, dia domingo

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	20	4	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	11 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	x	x		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		2	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia soleado, se repaintea 2 kilometros, se hace la validacion del usuario GUILLERMO HUMBERTO SERRANO CAMACHO del predio el OCASO. No se encontró a nadie en el lugar, pero se pudo evidenciar que la vivienda esta habitada

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	21	4	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	12 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia lluvioso
TORMENTA				
LLUVIOSO	x	x		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		2	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia lluvioso, se repaintea 2 kilometros, se hace la validacion del usuario MARIA CLAUDIA BERNAL del predio ALCARAVAN. No se encontró a nadie en el lugar, pero se pudo evidenciar que la vivienda esta habitada

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	22	4	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	13 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	x	x		Dia nublado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		2	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia nublado, se repaintea 2 kilometros, se hace la validacion del usuario HILDEBRANDO ROMERO MENDEZ del predio los ALCAPARROS. No se encontró a nadie en el lugar, pero se pudo evidenciar que la vivienda esta habitada

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	23	4	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	14 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	x	x		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		2	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia soleado, se repaintea 2 kilometros, se hace la validacion del usuario REDDY LEO RODRIGUEZ ARANGO del predio los DOMOS. No se encontró a nadie en el lugar, pero se pudo evidenciar que la vivienda esta habitada

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	24	4	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	15 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	x	x		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		2	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia soleado, se repaintea 2 kilometros, se hace la validacion del usuario GUILLERMO HUMBERTO SERRANO del predio MORICHALES. No se encontró a nadie en el lugar, pero se pudo evidenciar que la vivienda esta habitada

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	25	4	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	16 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia lluvioso
TORMENTA				
LLUVIOSO	x	x		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		1	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia lluvioso, solo se repaintea 1 kilometros de la red

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	26	4	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	17 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	x	x		Dia nublado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		0		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se trabaja, dia domingo

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	27	4	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	18 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia lluvioso
TORMENTA				
LLUVIOSO	x	x		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		0		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia lluvioso, no se pudo laborar por las condiciones climaticas

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	28	4	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	19 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia con tormenta
TORMENTA	x	x		
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		0		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia con tormenta, no se pudo laborar por las condiciones climaticas

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUETO LOPEZ	29	4	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	20 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia lluvioso
TORMENTA				
LLUVIOSO	x	x		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		1	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia lluvioso. solo se repaintea 1 kilometros de la red, se hace la validacion del usuario ARUES SCS – VINZENZ ULRICH del predio la MORENITA. Vivienda habitada, Residente del lugar PABLO BETANCOURT, C.C. 14.276.649

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	30	4	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	21 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	x	x		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		2	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia soleado, se repaintea 2 kilometros de la red, se hace la validacion del usuario ARUES SCS – VINZENZ ULRICH del predio PERROS DE AGUA. Vivienda habitada, Residente del lugar GABRIEL BONILLA, C.C 1.006.499.384, propietario ARUE SOCIEDAD COMANDITA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	1	5	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	22 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	x	x		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		2	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia soleado, se repalntea 2 kilometros de la red, se hace la validacion del usuario LUIS ALFONSO HERNANDEZ GUEVARA del predio la POCHA. Vivienda habitada, Residente del lugar JOSE MARTINEZ, C.C. 1.115.917.849

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	2	5	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	23 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia con tormenta
TORMENTA	x	x		
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		0		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia con tormenta, no se pudo laborar por las condiciones climaticas

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	3	5	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	24 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia lluvioso
TORMENTA				
LLUVIOSO	x	x		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		0		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se trabaja, dia domingo

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	4	5	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	25 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia lluvioso
TORMENTA				
LLUVIOSO	x	x		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		0		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia lluvioso, no se pudo laborar por las condiciones climaticas

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	5	5	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	26 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	x	x		Dia nublado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		1	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia nublado, se repalntea 1 kilometros, se hace la validacion del usuario LUIS ANTONIO CASTELLANOS SUAREZ del predio el DESCANSO. Vivienda habitada, Residente del lugar UNDA INOCENC, C.C. 1.115.917.849, Propietario LUIS ANTONIO CASTELLANOS

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	6	5	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	27 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia con tormenta
TORMENTA	x	x		
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		0		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia con tormenta, no se pudo laborar por las condiciones climaticas

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	7	5	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	28 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	x	x		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		2	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia soleado, se repaintea 2 kilometros, se hace la validacion del usuario MIGUEL ANGEL PLATA MORA del predio SANTA MARTA. No se encontró a nadie en el lugar, pero se pudo evidenciar que la vivienda esta habitada

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	8	5	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	29 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	x	x		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		2	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia soleado, se repaintea 2 kilometros, se hace la validacion del usuario GERMAN ANTONIO ESPINOZA RESTREPO del predio LAS VEGAS. Vivienda habitada, Residente del lugar JOHN JAIRO CHAVEZ, C.C. 17.388.295, Propietario GERMÁN ESPINOZA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	9	5	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	30 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	x	x		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		2	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia soleado, se repaintea 2 kilometros de la red

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	10	5	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	31 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	x	x		Dia nublado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		0		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se trabaja, dia domingo

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	11	5	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	32 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	x	x		Dia nublado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		1	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia nublado. Se realizó el replanteo de 1 km de la red. Las labores de desplazamiento en campo se vieron dificultadas debido al estado del terreno como consecuencia de las lluvias. Se hace la validacion del usuario RODRIGO NASSAR MONTOYA del predio COROZALITO. Vivienda habitada.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	12	5	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	33 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	x	x		Dia nublado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		1	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia nublado, Se realizó el replanteo de 1 km de la red. Las labores de desplazamiento en campo se vieron dificultadas debido al estado del terreno como consecuencia de las lluvias. Se hace la validacion de los usuarios ANTONIO MARIA SUAREZ ISAZA, FERNANDA SUAREZ ISAZA y EDUARDO JOSE SUAREZ ISAZA del predio la MORENA. Viviendas habitadas.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	13	5	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	34 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia lluvioso
TORMENTA				
LLUVIOSO	x	x		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		0		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia lluvioso, no se pudo laborar por las condiciones climaticas

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	14	5	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	35 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	x	x		Dia nublado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		1	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia nublado, Se realizó el replanteo de 1 km de la red. Las labores de desplazamiento en campo se vieron dificultadas debido al estado del terreno como consecuencia de las lluvias.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	15	5	2025	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	36 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia lluvioso
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		1	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia lluvioso. Se realizó el replanteo de 1 km de la red. Las labores de desplazamiento en campo se vieron dificultadas debido al estado del terreno como consecuencia de las lluvias.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUETO LOPEZ	16	5	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	37 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia lluvioso
TORMENTA				
LLUVIOSO	x	x		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		0		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia lluvioso, no se pudo laborar por las condiciones climaticas

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	17	5	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	38 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia nublado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	x	x		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		0		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se trabaja, dia domingo

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	18	5	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	39 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia lluvioso
TORMENTA				
LLUVIOSO	x	x		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		1	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia lluvioso, Se realizó el replanteo de 1 km de la red. Las labores de desplazamiento en campo se vieron dificultadas debido al estado del terreno como consecuencia de las lluvias.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	19	5	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	40 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	x	x		Dia nublado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		1	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia nublado, Se realizó el replanteo de 1 km de la red. Las labores de desplazamiento en campo se vieron dificultadas debido al estado del terreno como consecuencia de las lluvias. Se hace la validacion del usuario NICOLAS UMAÑA JIMENO del predio YURUMI. Vivienda habitada.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUETO LOPEZ	20	5	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	41 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	x	x		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		2	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia soleado, Se realizó el replanteo de 2 km de la red. Las labores de desplazamiento en campo se vieron dificultadas debido al estado del terreno como consecuencia de las lluvias.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUETO LOPEZ	21	5	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	42 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia lluvioso
TORMENTA				
LLUVIOSO	x	x		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		1	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia lluvioso. Se realizó el replanteo de 1 km de la red. Las labores de desplazamiento en campo se vieron dificultadas debido al estado del terreno como consecuencia de las lluvias.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUETO LOPEZ	22	5	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	43 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia lluvioso
TORMENTA				
LLUVIOSO	x	x		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		1	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia lluvioso, Se realizó el replanteo de 1 km de la red. Las labores de desplazamiento en campo se vieron dificultadas debido al estado del terreno como consecuencia de las lluvias. Se hace la validacion del usuario ROTHISBERGER FISCHBECHERO del predio PERROS DE AGUA. Vivienda habitada.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUETO LOPEZ	23	5	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	44 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	x	x		Dia nublado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		1	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia lluvioso, Se realizó el replanteo de 1 km de la red. Las labores de desplazamiento en campo se vieron dificultadas debido al estado del terreno como consecuencia de las lluvias.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUETO LOPEZ	24	5	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	45 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia lluvioso
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		0		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se trabaja, dia domingo

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	25	5	2025	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	46 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia con tormenta
TORMENTA	X	X		
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		0		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia con tormenta, no se pudo laborar por las condiciones climaticas

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUETO LOPEZ	26	5	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	47 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia con tormenta
TORMENTA	x	x		
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		0		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia con tormenta, no se pudo laborar por las condiciones climaticas

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17815	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUETO LOPEZ	27	5	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	48 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia lluvioso
TORMENTA				
LLUVIOSO	x	x		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		1	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia lluvioso, Se realizó el replanteo de 1 km de la red. Las labores de desplazamiento en campo se vieron dificultadas debido al estado del terreno como consecuencia de las lluvias.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUETO LOPEZ	28	5	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	49 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia con tormenta
TORMENTA	X	X		
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		0		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia con tormenta, no se pudo laborar por las condiciones climaticas

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUETO LOPEZ	29	5	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	50 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia lluvioso
TORMENTA				
LLUVIOSO	x	x		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		1	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia lluvioso, Se realizó el replanteo de 1 km de la red. Las labores de desplazamiento en campo se vieron dificultadas debido al estado del terreno como consecuencia de las lluvias.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	30	5	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	51 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia lluvioso
TORMENTA				
LLUVIOSO	x	x		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		2	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia lluvioso, Se realizó el replanteo de 2 km de la red. Las labores de desplazamiento en campo se vieron dificultadas debido al estado del terreno como consecuencia de las lluvias.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUETO LOPEZ	31	5	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	52 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia lluvioso
TORMENTA				
LLUVIOSO	x	x		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		0		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se trabaja, dia domingo

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17515	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	1	6	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	53 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia lluvioso
TORMENTA				
LLUVIOSO	x	x		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		1	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia lluvioso, Se realizó el replanteo de 1 km de la red. Las labores de desplazamiento en campo se vieron dificultadas debido al estado del terreno como consecuencia de las lluvias.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17815	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y, se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUETO LOPEZ	2	6	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	54 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	x	x		Dia nublado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		1	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia nublado, Se realizó el replanteo de 1 km de la red, Las labores de desplazamiento en campo se vieron dificultadas debido al estado del terreno como consecuencia de las lluvias. Se hace la validacion del usuario ROTHISBERGER FISCHBECHERO del predio la MORENITA. Vivienda habitada.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUETO LOPEZ	3	6	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	**PROYECTO N°**	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	55 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia lluvioso
TORMENTA				
LLUVIOSO	x	x		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		1	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia lluvioso, Se realizó el replanteo de 1 km de la red. Las labores de desplazamiento en campo se vieron dificultadas debido al estado del terreno como consecuencia de las lluvias.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUETO LOPEZ	4	6	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	56 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia lluvioso
TORMENTA				
LLUVIOSO	x	x		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		1	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia lluvioso, Se realizó el replanteo de 1 km de la red. Las labores de desplazamiento en campo se vieron dificultadas debido al estado del terreno como consecuencia de las lluvias.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	5	6	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	57 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia con tormenta
TORMENTA	X	X		
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		0		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia con tormenta, no se pudo laborar por las condiciones climaticas

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUETO LOPEZ	6	6	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	58 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	x	x		Dia con tormenta
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		1	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia nublado, Se realizó el replanteo de 1 km de la red. Las labores de desplazamiento en campo se vieron dificultadas debido al estado del terreno como consecuencia de las lluvias. Se levanta la informacion del suario nuevo SALON COMUNAL para posible beneficiario. El salon comunal es una infraestructura de interés colectivo que constituye el principal espacio para la realización de reuniones comunitarias, actividades sociales, capacitaciones y jornadas institucionales.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUETO LOPEZ	7	6	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	59 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia lluvioso
TORMENTA				
LLUVIOSO	x	x		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		0		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se trabaja, dia domingo

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUETO LOPEZ	6	6	2025	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	60 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	x	x		Dia nublado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		1	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia nublado, Se realizó el replanteo de 1 km de la red. Las labores de desplazamiento en campo se vieron dificultadas debido al estado del terreno como consecuencia de las lluvias.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUETO LOPEZ	9	6	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	61 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	x	x		Dia nublado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		1	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Dia nublado, Se realizó el replanteo de 1 km de la red. Las labores de desplazamiento en campo se vieron dificultadas debido al estado del terreno como consecuencia de las lluvias. Se levanta la informacion del suario nuevo MARTA ISABELA FRANCO del predio MAPIRIPANA para posible beneficiario. Se considera pertinente incluir como posible beneficiaria a la señora MARTA ISABELA FRANCO, debido a que las redes de media tensión proyectadas para suministrar energía a los usuarios iniciales predio el Alcaraván, predio Los Alcaparros) y predio Los Domos atraviesan su propiedad. En este sentido, su vinculación al proyecto facilitaría la obtención de la autorización de servidumbre o permiso de paso requerido.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	10	6	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	62 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	x	x		Dia nublado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza trabajo de oficina, una vez culminada la actividad de replanteo se procedio a comparar los diseños iniciales y las condiciones reales.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	11	6	2025	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	63 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	x	x		Dia nublado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	Km		1	si	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza trabajo de oficina, se realizo la identificación de las actividades que requieren modificación.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	12	5	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	64 DÍA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	x	x		Dia nublado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza trabajo de oficina, se realizo la evaluación de riesgos técnicos y constructivos.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
PUETO LOPEZ	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	13	6	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	65 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia lluvioso
TORMENTA				
LLUVIOSO	x	x		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza trabajo de oficina, se realizo ajustes a los planos y diseños iniciales.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUETO LOPEZ	14	6	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	66 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia con tormenta
TORMENTA	x	x		
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se trabajo por ser dia domingo

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUETO LOPEZ	15	6	2026	8:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	707 DE 2025	PROYECTO N°	2024005500041
CONTRATO INTERVENTORIA N°	180 DE 2025		
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LA VEREDA YUCAO SECTOR TRIANGULO DEL PUMA MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL		
TIEMPO DE EJECUCION	67 DIA		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO			
TORMENTA			
LLUVIOSO	x	x	
SOLEADO			
Tiempo de standby por lluvias			

OBSERVACIONES:
Dia lluvioso

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se trabajo por ser dia festivo

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: ORLANDO BAQUERO MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-7068	
Nombre: IVAN ALEJANDRO GORDILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-54604	
Nombre: HERNANDO AYALA VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-17615	
Nombre: JOSE LUIS PÁEZ PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: CN205-9804	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co
