CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES N°.07 DEL CONTRATO DE OBRA 481 DE 2024 PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025



CONTRATO DE OBRA 481 DE 2024

OBJETO:
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

ELABORADO POR:
CONSORCIO RIO BANADIA
R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA

ENTREGADO A:
CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
R/L. JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

MUNICIPIO DE SARAVENA
2025

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

Contenido

INTRODUCCIÓN 5
1. ASPECTOS CONTRACTUALES 6
1.1. PROCESO DE SELECCIÓN 6
1.2. CELEBRACION DEL CONTRATO 7
2. ANTECEDENTES Y REVISIÓN DEL PROYECTO 7
2.1. DESCRIPCION GENERAL 7
2.2. LOCALIZACIÓN 8
2.3. ALCANCE DEL PROYECTO 9
3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 10
3.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO 10
3.1.1. Informe Contractual – Ficha Técnica del contrato de obra. 10
3.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 11
3.3. IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES 13
3.4. ACTOS ADMINISTRATIVOS 14
3.4.1. Modificación y /o adiciones al contrato 15
3.4.2. Compensación de mayores y menores cantidades 15
3.5. ACTAS DE COMITÉ TÉCNICOS 15
3.6. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA. 18
3.7. BITACORA DIARIA DE OBRA 23
3.8. CONTROL SOCIAL DE LA OBRA 24
3.8.1. Socialización De La Obra. 24
3.8.2. Conformación De La Veeduría Ciudadana 25
3.8.3. Actas de reuniones suscritas por la veeduría 25
3.9. VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES 26
3.9.1. Personal Administrativo 26
3.9.2. Personal Operativo De La Obra 27
3.9.3. Pagos Salariales Y Liquidación Del Personal 27
3.10. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 27
3.10.1. Dotación Del Personal 27
3.10.2. Señalización De La Obra 28

3.10.3 Valla Informativa del Proyecto 29
3.10.4 Accidentalidad En La Obra. 30
3.10.5 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 30
3.11. PERMISOS Y LICENCIAS 30
3.12. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA 31
4. ASPECTOS TECNICOS 37
4.1. CONDICIONES CONTRACTUALES 37
4.2. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA 37
4.3. AVANCE DE LA OBRA 39
4.3.1. Avance Físico De La Obra 39
4.4. ACTIVIDADES DE OBRAS EJECUTADAS 39
4.5. IMPREVISTOS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA 42
4.6. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADA 46
4.7. CONTROL DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 48
5. ASPECTOS FINANCIEROS 49
5.1. MANEJO DEL ANTICIPO 49
6. ASPECTOS AMBIENTALES 50
6.1 SEGUIMIENTO A PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES 50
6.2 SEGUIMIENTO AL PMA 51
6.3 IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 51
7. CONCLUSIONES 53
8. ANEXOS 54

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 coordenadas del proyecto 8
Tabla 2 ficha técnica 10
Tabla 3 póliza de contrato de obra anexo 0 11
Tabla 4 póliza de contrato de obra anexo 1 12
Tabla 5 póliza de contrato de obra anexo 2 12
Tabla 6 póliza de cumplimiento reinicio 1 anexo 5 13
Tabla 7 Relación de correspondencia enviada por la Interventoría del Contrato de Obra No. 481 de 2024 18
Tabla 8 Relación de correspondencia recibida por la Interventoría del Contrato de Obra No481 de 2024 20
Tabla 9 Conformación de la veeduría ciudadana para el control social del contrato de obra No. 481 del 2024 25
Tabla 10 Personal administrativo del contrato de obra No. 481 de 2024 en el mes de julio de 2025. 26
Tabla 11 Personal operativo del contrato de obra No. 481 de 2024 en el mes de julio de 2025. 27
Tabla 12 Dotación del personal en obra de elementos de protección-Contrato de Obra No. 481 de 2024 27
Tabla 13 Señalización instalada en la obra por el contratista- Contrato de Obra No. 481 de 2024 29
Tabla 14 Seguimiento y control de la maquinaria y equipos utilizado en la ejecución del contrato del contrato No. 481 del 2024 36
Tabla 15 presupuesto contractual 37
Tabla 16 Porcentaje de avance de obra Programado Vs Ejecutado del Contrato de Obra No. 481 de 2024. 39
Tabla 17 Manejo de Anticipo 49
Tabla 18 Presupuesto de la mitigación o control ambiental del contrato de obra No. 481 del 2024. 51

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización especifica 9
Ilustración 2 socialización del contrato 481 de 2024 24
Ilustración 3 entrega de epp 28
Ilustración 4 señalización de la obra. 29
Ilustración 5 valla informativa. 30
Ilustración 6 Equipo tipo volqueta 31
Ilustración 7 Equipo tipo volqueta 2 32
Ilustración 8 equipo tipo volqueta 3 32
Ilustración 9 Equipo tipo volqueta 4 33
Ilustración 10 Equipo tipo retroexcavadora 1 34
Ilustración 11 Equipo retroexcavadora 2 34
Ilustración 12 Equipo retroexcavadora 3 35
Ilustración 13 equipo retroexcavadora 36
Ilustración 14 grafica avance de obra 39
Ilustración 15 Avance financiero programado Vs avance Ejecutado del Contrato de Obra No. 481 de 2024 40
Ilustración 16 Avance físico programado Vs Ejecutado del Contrato de Obra No. 481 de 2024 41
Ilustración 17 conformación del Jarillón 43
Ilustración 18 afectación del jarillón por creciente del río banadía 44
Ilustración 19 colocación de enrocado como medida de contingencia 45
Ilustración 20 manejo de aguas 47
Ilustración 21 filtro o dren francés PVC 100 mm (0.6x0.8) m 48
Ilustración 22 Avance financiero de la obra 51
Ilustración 23 Sequimiento de la plantas 53

REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RÍO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", ejecutado por el **CONSORCIO RÍO BANADÍA** (NIT: 901.902.273-3) representado legalmente por JEISSON RENE VILLARREAL ROA con cedula de ciudadanía N.º 1.018.444.460, de Bogotá D.C. Y supervisado por el CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN representado legalmente por JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCÓN a través del contrato 473 de 2024 cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**

El objetivo principal del proyecto es la ejecución de obras de protección que permitan la reducción del riesgo de inundaciones en la zona del río Banadía, mejorando la seguridad hídrica y la estabilidad del terreno mediante la implementación de soluciones técnicas de infraestructura.

A la fecha del presente informe desde el día 01 de septiembre del 2025 hasta el 19 de septiembre del 2025 **el avance físico acumulado del proyecto es del 36.18%,** y el avance del presente mes de del **0.46%** con la ejecución de diversas actividades en cumplimiento con el cronograma previsto. Entre las tareas se ha avanzado con la instalación del filtro o dren francés de PVC de 100 mm (0.6 x 0.8 m) así como el manejo adecuado de aguas pluviales para mitigar el riesgo de erosión y desbordamientos. El avance financiero del presente informe es del **40.00%** del valor total del proyecto, Este informe presenta el estado detallado de las actividades realizadas, las cuales se están ejecutando conforme a las especificaciones técnicas y dentro de los plazos establecidos en el plan de contingencia, garantizando la correcta evolución del proyecto hacia sus objetivos de protección y prevención.

1. ASPECTOS CONTRACTUALES

1.1. PROCESO DE SELECCIÓN

El Departamento de Arauca adelantó el proceso de selección del contratista mediante la licitación de obra pública número LO-02-RE-001-2024, de conformidad con lo establecido en la Ley 80/93, numeral 1 del art. 2 de la ley 1150 de 2007, art 14 y 15 del decreto 2474 de 2008 y demás normatividad concordante, para lo cual

la Gerencia de Contratación realizó oportunamente las publicaciones pertinentes en la página WEB www.contratos.gov.co, Departamento de Arauca, llevándose a cabo el cierre del proceso de selección de acuerdo al cronograma y realizando la respectiva evaluación de las ofertas presentadas por los proponentes por parte del Comité Evaluador. Una vez se llevó a cabo las evaluaciones jurídicas, técnica y financiera de las propuestas y se estableció el orden de elegibilidad, se procedió a adjudicar el contrato al CONSORCIO RIO BANADIA, representado legalmente por JHONN FREDY GARCIA BELTRAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.752. 791 expedida en Bucaramanga mediante Resolución No. 4877 del 31 de diciembre de 2024.

1.2. CELEBRACION DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta la Resolución de Adjudicación No. 4877 del 31 de diciembre de 2024, se procedió a la suscripción del contrato de obra (No. 481 de 2024 el día 31 de diciembre de 2024 entre la doctora *LUZ LILIANA MARCHENA PINZON* y la firma CONSORCIO RIO BANADIA, representada por JHONN FREDY GARCIA BELTRAN, el cual tiene por objeto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RÍO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, con un plazo de ejecución de seis (06) meses y un valor de CATORCE MIL TRESCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($14.312.241.291,66).

2. ANTECEDENTES Y REVISIÓN DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION GENERAL

El Río Banadía cuenta con aproximadamente 30.6 kilómetros de longitud de los cuales el 100% pueden catalogarse como susceptibles a inundación. En el área de estudio se ha identificado un sector crítico en la vereda Bajo Banadía, en el cual se presenta vulnerabilidad al riesgo de inundación por desbordamiento debido al fenómeno creciente de lluvias torrenciales que se ha intensificado por fenómenos antrópicos y naturales como el fenómeno de la niña, lo que sumado a los procesos erosivos y de socavación ha afectado a las comunidades de la zona, un (1) puesto de salud en Puerto Nariño, una (1) institución educativa en Puerto Nariño, una (1) vía secundaria en caño Tigre entre Puerto Nariño y la Esmeralda. El punto donde se presenta la problemática es un sector crítico ubicado en un meandro pronunciado sobre el rio Banadía en el Municipio de Saravena, en áreas de la vereda Bajo Banadía. En este sector es crítico por razones dinámicas propias del comportamiento hidráulico del cauce del rio, lo cual ha provocado la degradación de la margen izquierda aguas abajo y perdida de la bancada natural por el fenómeno de socavación lateral y la constante sedimentación que ha acumulado bancos de

arena en la sección del cauce, disminuyendo su capacidad hidráulica y ocasionando el desbordamiento del afluente en temporada de lluvias.
Que la alternativa de solución viabilizada es el "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA, DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA". La cual beneficiara a las veredas aledañas a dicho proyecto en especial el centro poblado de Puerto Nariño.

2.2. LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra localizado en zona rural en territorio del municipio de Saravena en el Departamento de Arauca, y está definido por las siguientes coordenadas

Tabla 1 coordenadas del proyecto

Id	Coordenadas geográficas WGS84		Coordenadas planas-Magna-SIRGAS Origen Este - Norte		Coordenadas origen nacional CTM12	
	Latitud	**Longitud**	**Norte**	**Este**	**Norte**	**Este**
Inicio estructura colineal tipo / Jarillón flexocreto	6°59'14.76"N	71° 46' 56.00"O	1264494,527	922128,435	2330273,985	5134464,468
Fin estructura colineal tipo / Jarillón flexocreto	6°59'20.11"N	71° 46' 30.07"O	1264657,704	922924,630	2330440,303	5135259,474
Inicio estructura colineal tipo / Jarillón con sección escalonada flexocreto	6°59'8.76"N	71° 47' 1.78"O	1264310,461	921950,734	2330089,316	5134287,635
Fin estructura colineal tipo / Jarillón con sección escalonada flexocreto	6°59'14.76"N	71° 46' 56.00"O	1264494,527	922128,435	2330273,985	5134464,468

Ilustración 1 Localización especifica



2.3. ALCANCE DEL PROYECTO

En virtud del citado Plan Participativo de Desarrollo Departamental de Arauca 2024-2027, en el eje estratégico recursos naturales sostenibilidad ambiental ecosistemas estratégicos y gestión del riesgo, se estableció como metas e indicadores "obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas", mediante la iniciativa priorizada "construcción de obras de protección contra inundaciones y erosión de los cuerpos hídricos en el departamento de Arauca" para la construcción de obras de protección en el Departamento de Arauca y dar solución a la problemática planteada.

Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas Con la intervención, el Departamento de Arauca mediante el presente proceso de selección y la consecuente celebración del contrato de obra pública para la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA, DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", busca mejorar las condiciones de protección de la ronda hídrica del rio Banadía, para el desarrollo económico y social del municipio de Saravena, Departamento de Arauca, impactando a 1.220 personas según lo descrito en el documento MGA del presente proyecto "Población afectada y objetivo".

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

3.1.1. Informe Contractual – Ficha Técnica del contrato de obra.

Tabla 2 ficha técnica

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE ARAUCA
INTERVENTOR EXTERNO:	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
SUPERVISOR:	CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO RESOLUCION 001 DE 2025 DEL 03 DE ENERO 2025
CONTRATO No:	481 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA:	CONSORCIO RIO BANADIA
REPRESENTANTE LEGAL:	JEISSON RENE VILLARREAL ROA R/L
NIT. No:	901.902.273-3
VALOR DEL CONTRATO:	$ 14.312.241.291,66
PLAZO CONTRACTUAL:	SEIS (6) MESES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	SGR202324-00420 DE 11/12/2024 SGR202324-00422 DE 11/12/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	SGR202324-00401 DE 31/12/2024 SGR202324-00402 DE 31/12/2024
FECHA INICIO:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSION N° 1	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA PRORROGA SUSPENSION N° 1	22 DE MAYO DE 2025
FECHA PRORROGA SUSPENSION N° 2	20 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO	21 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION DEFINITIVA	27 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION N° 2	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PERIODO DEL INFORME	
FECHA DE CORTE DEL INFORME:	DEL 01/09/2025 AL 19/09/2025
DIAS TRANSCURRIDOS:	174

Anexo 1 Acta de Suspensión No. 2

(acta de suspensión N° 1 contrato 481-2024 reposa en el anexo 1 del informe 5)
(acta de suspensión N° 1 y prologa N° 1 y N° 2 contrato 481-2024 reposa en el anexo 2 del informe 5)
(acta de reinicio N° 1 contrato 481-2024contrato 481-2024 reposa en el anexo 3 del informe 5)
(Contrato De Obra 481 De 2024 reposa en el anexo 1 del informe 1)
(Acta de inicio reposa en el anexo 2 del informe 1)
(Resolución De Asignación Del Supervisor reposa en el anexo 3 del informe 1)
(Solicitud Y Aceptación De Cambio De Representante Legal reposa en el anexo 1 del informe 2)

3.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO

De acuerdo con las garantías exigidas por el Departamento de Arauca en el Contrato de Obra No. 481 de 2024, se suscribe con la compañía de seguros ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO, las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual en la CLÁUSULA 18 del Contrato así:

Pólizas de Legalización

Las pólizas iniciales fueron expedidas el **(31/12/2024)** por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, tomadas por CONSORCIO RIO BANADIA y como beneficiario el Departamento de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por la Gerente de Contratación LUZ LILIANA MARCHENA PINZON el 31/12/2024.

(Póliza Del Contrato De Obra Anexo 0 Y Aprobación reposa en el anexo 5 del informe 1)

Tabla 3 póliza de contrato de obra anexo 0

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
0	31/12/2024	BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-44-101035208	$5.724.896.516,66	31/12/2024	31/12/2025	POLIZA APROBADA POR LA GERENTE DE CONTRATACION EL 31/12/2024
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			$ 2.862.448.258,33	31/12/2024	31/12/2025	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$2.862.448.258.33	30/06/2025	30/06/2027	
		SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES			$ 2.146.836.193.75	31/12/2024	30/06/2028	
0	31/12/2024	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-40-101011266	$715,612,064.58	31/12/2024	30/06/2025	PÓLIZA APROBADA POR EL GERENTE DE CONTRATACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

Pólizas Ampliadas Según Acta de Inicio

Las pólizas fueron ampliadas según **acta de inicio del (31/12/2024)** por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, **expedidas el 10/03/2025 y aprobadas el 19/03/2025** por la Gerente de Contratación Administrativa mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación LUZ LILIANA MARCHENA PINZON.

Tabla 4 póliza de contrato de obra anexo 1

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
1	*10/03/2025*	BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-44-101035208	$5.724.896.516,66	31/12/2024	31/12/2025	P POLIZA APROBADA POR LA GERENTE DE CONTRATACION EL 19/03/2025
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			$ 2.862.448.258,33	31/12/2024	31/12/2025	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$2.862.448.258.33	30/06/2025	30/06/2027	
		SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES			$ 2.146.836.193.75	31/12/2024	30/06/2028	
1	*10/03/2025*	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-40-101011266	$715,612,064.58	31/12/2024	30/06/2025	PÓLIZA APROBADA POR EL GERENTE DE CONTRATACIÓN P POLIZA APROBADA POR LA GERENTE DE CONTRATACION EL 19/03/2025

ACLARACION DE POLIZA

Aclaración: En el presente anexo se aclara integrantes del consorcio rio banadia identificado con Nit: 901902273-3 **según cesión del contrato de fecha 27/02/2025** Participantes del consorcio: Fundación nueva castellana con Nit:901358987-1 participación 45% Proyectos y servicios integrales Psi S.A.S identificado con Nit:900827849-0 participación 45% BCH ENGINEERING S.A.S identificado con Nit:901393606-7 participación del 10% Todos los demás términos y condiciones no modificados por el presente anexo continúan en vigor.

Tabla 5 póliza de contrato de obra anexo 2

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
2	*13/03/2025*	BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-44-101035208	$5.724.896.516,66	31/12/2024	31/12/2025	POLIZA APROBADA POR LA GERENTE DE CONTRATACION EL 13/03/2025
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			$2.862.448.258,33	31/12/2024	31/12/2025	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$2.862.448.258.33	30/06/2025	30/06/2027	
		SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES			$ 2.146.836.193.75	31/12/2024	30/06/2028	
2	*13/03/2025*	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	49-40-101011266	$715,612,064.58	31/12/2024	30/06/2025	PÓLIZA APROBADA POR EL GERENTE DE CONTRATACIÓN EL *13/03/2025*

Pólizas Ampliadas Según Acta de Reinicio No. 1

Las pólizas fueron ampliadas según **acta de reinicio del (21/07/2025)** por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, **expedidas el 22/07/2025 y aprobadas el 12/08/2025** por la Gerente de Contratación Administrativa mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación LUZ LILIANA MARCHENA PINZON.

Tabla 6 póliza de cumplimiento reinicio 1 anexo 5

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
5	22/07/2025	Buen Manejo e Inversión del Anticipo	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-44-101035208	$5.724.896.516,66	31/12/2024	31/03/2026	POLIZA APROBADA POR LA GERENTE DE CONTRATACION EL 12/08/2025
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			$ 2.862.448.258,33	31/12/2024	31/12/2025	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$2.862.448.258,33	30/06/2025	30/06/2027	
		SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES			$ 2.146.836.193,75	31/12/2024	30/06/2028	
4	22/07/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	49-40-101011266	$715,612,064.58	31/12/2024	30/09/2025	PÓLIZA APROBADA POR EL GERENTE DE CONTRATACIÓN EL 12/08/2025

Nota: *Se relaciona anexo 5 según acta de reinicio No. 01 debido a que los anexos 3 y 4 amparaban la suspensión y sus prorrogas y dichas polizas no fueron aprobadas, porque en el anexo No. 5 estas actas quedaron vinculadas.*

3.3. IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES

Hasta la fecha del presente informe no se han impuesto multas y sanciones al consorcio Rio Banadia.

3.4. ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se han suscrito los siguientes actos administrativos:

TABLA 7 ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATO DE OBRA 481 DE 2024

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
31/12/2024	Resolución 4877 de 2024" Por medio del cual la administración departamental ordena la adjudicación del contrato resultante del proceso de licitación pública N°LO-02-RE-001-2024 y su publicación en la página web"	*Celebración del contrato de obra 481 de 2024*	*LUZ LILIANA MERCHENA PINZON GERENTE DE CONTRATACIÓN JHONN FREDY GARCIA BELTRAN R/L. CONSORCIO RIO BANADIA*
31/12/2024	ACTA DE INICIO	*SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA DE INICIO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CITADO CONTRATO*	*NASSER CRUZ MATUS SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL JHONN FREDY GARCIA BELTRAN R/L. CONSORCIO RIO BANADIA JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION*
22/04/2025	ACTA DE SUSPENSIÓN 1	*ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1 CONTRATO DE OBRA NO. 431-2024*	*NASSER CRUZ MATUS SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL JEISSON RENE VILLAREAL ROA R/L. CONSORCIO RIO BANADIA JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DEL 03/01/2025*
22/05/2025	PRORROGA No. 01 AL ACTA DE SUSPENSION No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 481.2024	*PRORROGA No. 1*	*GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL JEISSON RENE VILLAREAL ROA R/L. CONSORCIO RIO BANADIA JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DEL 03/01/2025*
20/06/2025	PRORROGA No. 02 AL ACTA DE SUSPENSION No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 481.2024	*PRORROGA No. 2*	*GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL JEISSON RENE VILLAREAL ROA R/L. CONSORCIO RIO BANADIA JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DEL 03/01/2025*
21/07/2025	ACTA DE REINICIO No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 481.2024	*ACTA DE REINICIO No.1*	*GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL JEISSON RENE VILLAREAL ROA R/L. CONSORCIO RIO BANADIA JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DEL 03/01/2025*

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
19/09/2025	ACTA DE SUSPENSIÓN 2	*ACTA DE SUSPENSION No.2*	*GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL JEISSON RENE VILLAREAL ROA R/L. CONSORCIO RIO BANADIA JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DEL 03/01/2025*

3.4.1. Modificación y /o adiciones al contrato

Durante el periodo del 01 de septiembre al 19 de septiembre de 2025 no se han presentado modificación y/o adiciones a las condiciones contractuales del contrato N°481/2024.

3.4.2. Compensación de mayores y menores cantidades

No se han presentado actas de mayores y menores cantidades durante el periodo del presente informe.

3.5. ACTAS DE COMITÉ TÉCNICOS

Durante el periodo reportado no se realizó comité técnico de obra, sin embargo, se llevó a cabo una mesa técnica entre la Interventoría, el Contratista y la Supervisión, con el fin de revisar los aspectos técnicos, operativos y de avance del proyecto, así como definir acciones relacionadas con el cumplimiento del cronograma y las condiciones del plan de contingencia.

TABLA 8 ACTAS DE COMITE TECNICOS

FECHA	No. DE ACTA DE COMITE	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES DEL COMITÉ
FEBRERO 2025			
14/02/2025	1	SE SOCIALIZÓ LA VISITA TÉCNICA REALIZADA EL DÍA 28 DE ENERO DE 2025.	*NASSER CRUZ MATUS* (SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL) JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION (INTERVENTTOR EXTERNO) FERNEY ALFONSO PAEZ GARCÍA. (CONTRATISTA DE OBRA)

FECHA	No. DE ACTA DE COMITE	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES DEL COMITÉ
			CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO (COORDINADOR DE OFICINA DE GESTION DEL RIESGO) JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA (ESPECIALISTA HIDRAULICO)
25/02/2025	2	SE PRESENTARON LAS INQUIETUDES GENERADAS EN LA MESA TÉCNICA 001.	*NASSER CRUZ MATUS* (SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL) JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION (INTERVENTTOR EXTERNO) JEISSON RENE VILLARREAL ROA (CONTRATISTA DE OBRA) CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO (COORDINADOR DE OFICINA DE GESTION DEL RIESGO) JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA (ESPECIALISTA HIDRAULICO), (ASISTIO DE MANERA REMOTA)
27/02/2025	3	SE LEVANTÓ UN ACTA EN LA CUAL LA SECRETARÍA DE GOBIERNO RECOMENDÓ MANTENERSE FIRMES EN LO ESTIPULADO EN LA MGA Y EN LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS. EN ESTA SESIÓN SE CONCLUYÓ PROGRAMAR UNA NUEVA VISITA AL SITIO DE LA OBRA Y SE SOLICITÓ LA ENTREGA DE INFORMES CORRESPONDIENTES.	*NASSER CRUZ MATUS* (SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL) JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION (INTERVENTTOR EXTERNO) JEISSON RENE VILLARREAL ROA (CONTRATISTA DE OBRA) CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO (COORDINADOR DE OFICINA DE GESTION DEL RIESGO) JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA (ESPECIALISTA HIDRAULICO)
MARZO 2025			
20/03/2025	4	SE LLEVÓ A CABO LA MESA TÉCNICA 004 SOBRE EL PROYECTO DE OBRAS DE PROTECCIÓN DEL RÍO BANADÍA. EL CONTRATISTA PRESENTÓ	*NASSER CRUZ MATUS* (SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL) JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION (INTERVENTTOR EXTERNO)

FECHA	No. DE ACTA DE COMITE	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES DEL COMITÉ
		AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, MANTENIENDO LAS CONDICIONES INICIALES SIN AFECTAR EL PRESUPUESTO. SE ACORDÓ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN AJUSTADA A PLANEACIÓN EL 21 DE MARZO. COMO COMPROMISOS, SE ESTABLECIÓ: ACTA DE LA COMUNIDAD ASUMIENDO RESPONSABILIDADES, RADICACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE PLANEACIÓN EL 25 DE MARZO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES DE OBRA. LA REUNIÓN FINALIZÓ A LAS 4:00 P.M.	FERNEY ALFONSO PAEZ GARCÍA. (CONTRATISTA DE OBRA) CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO (COORDINADOR DE OFICINA DE GESTION DEL RIESGO) JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA (ESPECIALISTA HIDRAULICO)
ABRIL 2025			
22/04/2025	5	SUSPENSION N°01	*NASSER CRUZ MATUS* (SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL) JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION (INTERVENTTOR EXTERNO) FERNEY ALFONSO PAEZ GARCÍA. (CONTRATISTA DE OBRA) CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO (COORDINADOR DE OFICINA DE GESTION DEL RIESGO) JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA (ESPECIALISTA HIDRAULICO)
JULIO 2025			
22/07/2025	6	ACTA DE REINICIO N°01	*NASSER CRUZ MATUS* (SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL) JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION (INTERVENTOR EXTERNO) JEISSON RENE VILLAREAL ROA. (CONTRATISTA DE OBRA) CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO (COORDINADOR DE OFICINA DE GESTION DEL RIESGO) JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA (ESPECIALISTA HIDRAULICO)
AGOSTO 2025			

FECHA	No. DE ACTA DE COMITE	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES DEL COMITÉ
22/08/2025	7	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y PRESENTACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA	*NASSER CRUZ MATUS* (SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL) JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION (INTERVENTOR EXTERNO) JEISSON RENE VILLAREAL ROA. (CONTRATISTA DE OBRA) CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO (COORDINADOR DE OFICINA DE GESTION DEL RIESGO) JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA (ESPECIALISTA HIDRAULICO)

3.6. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se ha enviado y recibido la siguiente correspondencia entre la Interventoría, el contratista.

Anexo 2 Correspondencia enviada y recibida

Tabla 9 Relación de correspondencia enviada por la Interventoría del Contrato de Obra No. 481 de 2024

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
ENERO 2025			
14/01/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	VISITA DE INSPECCION PRELIMINAR
29/01/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL
FEBRERO 2025			
05/02/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	REPROGRAMACION DE OBRA
06/02/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	DOCUMENTACION PRELIMINAR DE ACEPTACION DE ANTICIPO
10/02/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	RESPUESTA A SOLICITUD DE DOCUMENTACION
24/02/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	SE LE CONFIRMA EL MEDIO DE COMUNICACIÓN A LA SECRETARIA DE GOBIERNO

CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
24/02/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	COORDINADOR DE GESTION DE RIESGO	SE LE CONFIRMA EL MEDIO DE COMUNICACIÓN A LA SECRETARIA DE GOBIERNO
25/02/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	ESTADO DEL CONTRATO
26/02/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	INFORMACION DE ANTICIPO
MARZO 2025			
05/03/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	INFORMACION DE ACTIVIDADES
13/03/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	AJUSTE TÉCNICO DE OBRA
19/03/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	REQUERIMIENTO DE COMITÉ TÉCNICO
20/03/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE MANEJO ANTICIPO
21/03/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	INDICACIONES DE ACCIÓN FIDUCIARIA
ABRIL 2025			
05/04/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	INFORME DEL MES DE ENERO CON LAS CORRECIONES ENVIADAS DESDE LA ENTIDAD CONTRATANTE.
09/04/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	INFORME DEL MES DE FEBRERO Y MARZO CON LAS CORRECIONES ENVIADAS DESDE LA ENTIDAD CONTRATANTE.
JULIO 2025			
06/05/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	ENTREGA DE INFORME MES DE ABRIL 2025.
09/05/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	ENTREGA DE INFORME MES DE MARZO 2025.
20/06/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	SOLICITUD DE SEGUNDA PRORROGA A LA SUSPENSIÓN.

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
08/07/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN 1, ACTAS DE PRÓRROA 1 Y 2 A LA SUSPENSIÓN 1.
23/07/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE REINICIO.
04/08/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	ACTUALIZACIÓN DE INFORMES ENTREGADOS - SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES
AGOSTO 2025			
04/08/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	ACTUALIZACIÓN DE INFORMES ENTREGADOS - SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES
13/08/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	ACLARACIÓN ACTUALIZACIÓN PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO.
19/08/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE COMITÉ TÉCNICO
21/08/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	ENTREGA DE INFORMES Y PLAN DE CONTINGENCIA – CONTRATO 481 DE 2024
21/08/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	ENTREGA DE INFORMES Y PLAN DE CONTINGENCIA – CONTRATO 481 DE 2024
SEPTIEMBRE 2025			
07/09/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	INFORME AGOSTO Y PLAN DE CONTIGENCIA

Tabla 10 Relación de correspondencia recibida por la Interventoría del Contrato de Obra No481 de 2024

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
ENERO			
15/01/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	INVITACION A LA SOCIALIZACION

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
28/01/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA INTERBENTORIA EXTERNA	NOTIFICACION CAMBIO R/L – RIO BANADIA
FEBRERO			
05/02/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA INICIO DE ACTIVIDADES
12/02/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	RESPUESTA CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL
12/02/2025	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA	INVITACION PARA EL PRIMER COMITÉ TECNICO
14/02/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	RESPUESTA CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL
24/02/2025	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA	REPROGRAMACION DEL SEGUNDO COMITÉ TECNICO DEL 2025
25/02/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD PARA EL TERCER COMITÉ DE OBRA
MARZO			
10/03/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	DOCUMENTOS SOLICITADOS POR PARTE DE LA FIDUCIARIA
19/03/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD PARA EL CUARTO COMITÉ TÉCNICO
27/03/2025	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA	OBSERVACIONES SOBRE DOCUMENTOS TECNICOS
ABRIL 2025			
04/04/2025	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA	DEVOLUCION DE INFORMES 1 Y 2
07/04/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	REQUERIMIENTOS DE INFORMES DEL MES DE MARZO

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
11/04/2025	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA	ACTAS DE COMITÉ MES DE FEBRERO Y MARZO
21/04/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD DE COMITÉ DE OBRA PRESENCIAL
21/04/2025	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA	CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA A INVITACIÓN DEL QUINTO COMITÉ TÉCNICO PROGRAMADO PARA EL 22/04/2025.
JULIO 2025			
21/05/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	AVANCE Y ESTADO DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO DE PERMISOS AMBIENTALES
02/07/02	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO, ACTAS DE PRÓRROGA 1 Y 2 A LA SUSPENSIÓN 1.
03/07/02	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO, ACTAS DE PRÓRROGA 1 Y 2 A LA SUSPENSIÓN 1.
08/07/02	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO, ACTAS DE PRÓRROGA 1 Y 2 A LA SUSPENSIÓN 1.
19/07/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	INVITACIÓN COMITÉ ACTA DE REINICIO 01.
21/07/2025	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA	INVITACIÓN COMITÉ ACTA DE REINICIO 01.
22/07/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE REINICIO
30/07/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD DE REPROGRAMACION Y PLAN DE CONTINGENCIA
AGOSTO 2025			
12/08/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	REITERACIÓN DE SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE OBRA, PLAN DE CONTINGENCIA–

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
			CONTRATO DE OBRA 481 DEL 2024
19/08/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD COMITÉ TÉCNICO DE OBRA PRESENCIAL
21/08/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	REPROGRAMACIÓN DE COMITÉ TÉCNICO
SEPTIEMBRE 2025			
16/09/2025	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA	CONVOCATORIA DE MESA TECNICA DE SEQUIMIENTO
18/09/2025	COORDINADOR CDGRD-ARAUCA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL	CONSORCIO RIO BANADIA	INVITACIÓN A MESA DE SEGUIMIENTO PARA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025

3.7. BITACORA DIARIA DE OBRA

La bitácora de obra correspondiente al contrato número 481 de 2024 será gestionada y actualizada de manera periódica por los residentes de obra y el director de obra, quienes se encargarán de registrar de forma detallada todas las actividades realizadas, los avances de obra, los problemas presentados y las incidencias que puedan surgir durante el proceso de ejecución. El residente de interventoría y el director de interventoría serán responsables de realizar la supervisión y validación de los registros en la bitácora, asegurando que se cumpla con las especificaciones técnicas, los plazos establecidos y las normativas aplicables. La coordinación entre los equipos de obra e interventoría garantizará la correcta documentación y trazabilidad de la obra, permitiendo un seguimiento adecuado del desarrollo del proyecto y su cumplimiento conforme a los estándares establecidos.
Es relevante señalar que el día 20 de enero de 2025, se dio apertura formal al proyecto del contrato número 481 de 2024, marcando el inicio de las actividades correspondientes para la ejecución de las obras.

Anexo 3 Bitácoras De Obra Del 01 De Septiembre Del 2025 Al 19 De septiembre De 2025

3.8. CONTROL SOCIAL DE LA OBRA

3.8.1. Socialización De La Obra.

El 18/01/2025, se realizó la socialización del proyecto para la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, en el sitio de obra en la vereda bajo Banadia del municipio de Saravena departamento de Arauca, previa convocatoria realizada por el Departamento de Arauca a través de la Secretaría de Gobierno.
En dicha reunión participaron representantes de la gobernación de Arauca, de la firma contratista de la obra, de la Interventoría externa y de la comunidad beneficiada con el proyecto, a quienes se les dio a conocer el alcance físico y financiero del contrato, el plazo de ejecución del mismo y el cronograma de la obra presentado por el contratista; de igual forma se atendieron las observaciones e inquietudes de los participantes y se presentaron los profesionales que van a estar frente a la ejecución del proyecto por parte del contratista, la Interventoría externa y la supervisión del Departamento de Arauca.
En la socialización de la obra correspondiente al contrato número 481 de 2024, se recogió información relevante del acta de socialización de la obra. Durante esta reunión, se llevó a cabo la conformación de la veeduría ciudadana, permitiendo la participación activa de la comunidad en el seguimiento y control del proyecto. En la reunión se levantó como soporte el Acta de Socialización de la obra, la cual se presenta en el ANEXO 9 del informe 1.

(Acta De Socialización reposa en el anexo 9 del informe 1))

Ilustración 2 socialización del contrato 481 de 2024





3.8.2. Conformación De La Veeduría Ciudadana

En la reunión de socialización del proyecto se llevó a cabo por parte de la comunidad que asistió a la convocatoria, el nombramiento de las personas que hacen parte de la veeduría ciudadana y que serán los voceros de la comunidad durante toda la etapa de ejecución de la obra ante el contratista, la Interventoría externa, entidad contratante, entes de control y demás instituciones.

(Resolución de conformación de veeduría ciudadana reposa en el anexo 10 del informe 1)

Tabla 11 Conformación de la veeduría ciudadana para el control social del contrato de obra No. 481 del 2024

Fuente 1 autor propio

VEEDURIA CIUDADANA					
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	CARGO	VEREDA/BARRIO
1	*OSCAR JAVIER RIOS GOMEZ.*	*1.115.722.421*	*3195035254*	*VOCERO*	*Bajo Banadia*
2	*WILLIAM PEÑALOZA PEÑALOZA*	*96.185.880*	*3058818465*	*VEEDOR*	*Puerto Nariño*
3	*LEIRA NAYARIT PEDRAZA URIBE*	*1.115.744.872*	*3022027500*	*VEEDOR*	*Puerto Nariño*

La veeduría ciudadana fue reconocida por el Ministerio Público del Municipio de Saravena, mediante Resolución No. 005 del (28/01/2025) siendo nombrado como VOCERO o representante del Comité Veedor al señor OSCAR JAVIER RIOS GOMEZ.

3.8.3. Actas de reuniones suscritas por la veeduría

A la fecha del presente informe no se han suscrito ningún acta de reunión.

3.8.3.1. Acta de veeduría de inicio de obra.

Con el fin de dar inicio a la ejecución física de las obras, el (20/01/2025) se suscribe con la veeduría ciudadana del contrato de obra No. 481 del 2024, el acta de veeduría de inicio de obra, en la cual se da a conocer por parte del contratista y la Interventoría externa aspectos como el cronograma de trabajo, vinculación del personal, acopio de materiales, fecha prevista para la terminación de las actividades, entre otros.

(acta de inicio de veeduría reposa en el anexo 11 del informe 1)

3.9. VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

El contratista vinculó el personal requerido para la administración y ejecución de los trabajos de acuerdo al alcance de la obra, realizando previamente la afiliación al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales. La Interventoría antes del ingreso del personal a la obra verificó las respectivas afiliaciones, así como el pago mensual de los aportes a salud, pensión, riesgos y aportes parafiscales conforme a las planillas de pago entregadas por el contratista.

(exámenes de Ingreso y afiliaciones reposa en el anexo 12 del informe 5)

3.9.1. Personal Administrativo

El personal profesional y administrativo que laboró en la obra para el periodo del presente informe, es el mismo que fue ofertado por el contratista en el proceso de selección y no ha sido modificado hasta la fecha.
A continuación, se relaciona el personal administrativo del contratista:

Tabla 12 Personal administrativo del contrato de obra No. 481 de 2024 en el mes de julio de 2025.

DATOS GENERALES										
	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	FECHA REINGRESO	DIAS LABORADOS
1	VILLAREAL	ROA	JEISSON RENE	1.018.444.460	REPRESENTANTE LEGAL	$1.423.500	14-2-2024	22/04/2025	21/07/2025	129
2	VILA	SARABIA	JAIR LEANDRO	1.091.659.018	DIRECTOR DE OBRA	$ 8.000.000	31-12-2024	22/04/2025	21/07/2025	174
3	BARRAGAN	MENDOZA	JAIRO ALEXANDER	80.109.920	ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA	$ 2.250.000	31-12-2024	22/04/2025	21/07/2025	174
4	GARCIA	BELTRAN	JHONNATHAN ALEXIS	1.098.716.716	ING RESIDENTE	$ 5.000.000	31-12-2024	22/04/2025	21/07/2025	174
5	GARCIA	BELTRAN	JHONN FREDY	1.098.752.791	ING RESIDENTE	$ 5.000.000	31-12-2024	22/04/2025	21/07/2025	174
6	OLAYA	BAYONA	LAURA CRISTINA	1.094.283.275	ING AMBIENTAL	$ 5.000.000	31-12-2024	22/04/2025	21/07/2025	174
7	BOTIA	CHONA	MARLYN YVETTE	1.020.810.816	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3.000.000	31-12-2024	22/04/2025	21/07/2025	174
8	GARRIDO	RIVERO	CAMILO ANDRES	1.094.269.468	HSEQ	$ 3.000.000	31-12-2024	22/04/2025	21/07/2025	174
9	GUTIERREZ	VACCA	HORLEYDA	1.116.496.517	CONTADORA	$ 1.500.000	31-12-2024	22/04/2025	21/07/2025	174
10	PAEZ	GARCÍA.	FERNEY	1.098.684.323	INSPECTOR DE OBRA	$ 3.000.000	31-12-2024	22/04/2025	21/07/2025	174
11	OCHOA		JESSICA LILIBETH	1.098.658.689	SECRETARIA	$ 2.000.000	31-12-2024	22/04/2025	21/07/2025	174
12	DELGADO	MONTAGUT	JOAQUIN EDUARDO	88.215.089	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$2.750.000	31-12-2024	22/04/2025	21/07/2025	174

3.9.2. Personal Operativo De La Obra

El contratista utilizó mano de obra no calificada de la región con lo cual fue posible generar empleo en la zona de influencia del proyecto. Así mismo vinculó mano de obra calificada para dirigir las actividades de acuerdo a los requerimientos técnicos de la obra.
A continuación, se relaciona el personal operativo del contratista.

Tabla 13 Personal operativo del contrato de obra No. 481 de 2024 en el mes de julio de 2025.

DATOS GENERALES										
	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	FECHA REINGRESO	DIAS LABORADOS
1	QUINTERO	VILLAMIZAR	JUAN VICENTE	9.466.736	OFICIAL	$ 1.755.000	20-01-2025	22/04/2025	21/07/2025	154
2	JOYA	TAMARA	EDWIN GABRIEL	1.119.185.219	OFICIAL	$ 1.755.000	21/07/2025	----	----	61
3	CASTAÑEDA	MENDOZA	NELSON ARLEY	1.115.722.498	AYUDANTE	$ 1.423.500	20-01-2025	22/04/2025	21/07/2025	154
4	MONCADA	CORONEL	JESUS ANTONIO	1.125.760.100	AYUDANTE	$ 1.423.500	18/02/2025	22/04/2025	21/07/2025	125
5	GELVIS	PEÑALOZA	DERIAN	1.148.703.169	AYUDANTE	$ 1.423.500	18/02/2025	22/04/2025	21/07/2025	125
6	TORREZ	VELANDIA	DAVISON	1.115.740.780	AYUDANTE	$ 1.423.500	18/02/2025	22/04/2025	21/07/2025	125
7	RIVERO	VILLAMIZAR	JOSE PABLO	88.311.695	AYUDANTE	$ 1.423.500	18/02/2025	22/04/2025	21/07/2025	125
8	ZAPATA		ALEXANDER	96.194.216	AYUDANTE	$ 1.423.500	27/02/2025	22/04/2025	21/07/2025	112
9	ORTEGA	CONTRERAS	CARLOS	88.219.552	AYUDANTE	$ 1.423.500	27/02/2025	22/04/2025	21/07/2025	112
10	BERNAL	RODRIGUEZ	JESUS GUILLERMO	1.115.742.269	AYUDANTE	$ 1.423.500	21/07/2025	----	----	61
11	PABON	GOMEZ	DAVINSON ANDRES	1.234.339.637	AYUDANTE	$ 1.423.500	21/07/2025	----	----	61
12	MEDINA	GOMEZ	DIEGO ANDRES	1.006.407.775	AYUDANTE	$ 1.423.500	21/07/2025	----	----	61

Anexo 4 Planillas De Seguridad Social del mes de Septiembre 2025

3.9.3. Pagos Salariales Y Liquidación Del Personal

El contratista realizó los pagos salariales de los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra, conforme al contrato laboral (verbal o escrito) entre las fechas comprendidas del 01 de septiembre al 19 de septiembre 2025.

Anexo 5 Nóminas De Pagos Mensual mes de Septiembre 2025

3.10. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

3.10.1. Dotación Del Personal

La firma contratista llevó a cabo la dotación del personal que labora en la obra con los elementos de protección requeridos en el desarrollo de sus labores diarias, de acuerdo a las necesidades de cada trabajador, haciendo entrega de los siguientes elementos:

Tabla 14 Dotación del personal en obra de elementos de protección-Contrato de Obra No. 481 de 2024

ELEMENTOS DE PROTECCION	ENTREGADOS		ESTADO			BENEFICIARIOS
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
CASCO	X		X			Ingenieros, operarios, Oficiales, ayudantes.
GUANTES	X		X			Oficiales, ayudantes.
BOTAS DE SEGURIDAD	X		X			Ingenieros, operarios, Oficiales, ayudantes.
BOTAS DE CAUCHO						
GAFAS DE PROTECCION	X		X			Ingenieros, operarios, Oficiales, ayudantes.
OVEROL/CAMISA/PANTALON	X		X			Ingenieros, operarios, Oficiales, ayudantes.
TAPA BOCAS	X		X			Ingenieros, operarios, Oficiales, ayudantes.
MASCARA						

La Interventoría verificó diariamente en campo la utilización de los elementos de protección por parte del personal en obra, haciendo los respectivos requerimientos a los trabajadores que en determinado momento no los estaban usando. En obra se firmaron actas de entrega de dotación que reposan en el ANEXO 15. del informe N° 5 del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del mes de Julio (SG-SST).

Ilustración 3 entrega de epp





3.10.2. Señalización De La Obra

En la ejecución de los trabajos, se implementaron las señalizaciones requeridas para el aislamiento de las zonas de trabajo, así como la instalación de las señales preventivas y vallas necesarias en la ejecución de la obra.

Tabla 15 Señalización instalada en la obra por el contratista- Contrato de Obra No. 481 de 2024

ELEMENTOS DE SEÑALIZACION	INSTALADOS		ESTADO			LOCALIZACION EN OBRA
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
AVISOS PREVENTIVOS	x		x			
AVISOS INFORMATIVOS	x		x			

La Interventoría diariamente verificó que dichas señales se encontraran debidamente instaladas en todos los frentes de trabajo de la obra y en buen estado, haciendo las recomendaciones del caso al contratista para subsanar cualquier inconveniente frente a la falta de señalización o mal estado de la misma.

Ilustración 4 señalización de la obra.





3.10.3 Valla Informativa del Proyecto

En cumplimiento de la normatividad vigente y como parte de las medidas de señalización, se instaló la valla informativa en el acceso principal al área de intervención. Esta contiene la información general del contrato (número, objeto, plazo y valor), así como los datos de la entidad contratante, contratista e interventoría, asegurando la visibilidad y transparencia hacia la comunidad.



Ilustración 5 valla informativa.

3.10.4 Accidentalidad En La Obra.

El profesional idóneo por parte de obra e interventoría estuvieron muy atentos, lo cual hizo posible que dentro el transcurso del presente informe no se presentara ningún accidente laboral dentro de la obra. cabe destacar que durante este periodo tampoco se vieron involucrados terceras personas en ningún tipo de accidente.

3.10.5 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Teniendo en cuenta la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo (Decreto 1072 de 2015) establecida por el Ministerio de Trabajo, todos los empleadores deben implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) el cual "consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales.

Anexo 6 Informe del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)

3.11. PERMISOS Y LICENCIAS

Ante la Autoridad Ambiental Regional CORPORINOQUIA se obtuvieron los permisos ambientales necesarios para el desarrollo del proyecto, conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 700.36.250082 del 18 de julio de 2025, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y con el fin de asegurar la

legalidad y sostenibilidad de las actividades proyectadas, Los permisos obtenidos de ocupación de cauce, y concepción de aguas

3.12. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA

La interventoría verificó que el contratista utilizara en la ejecución de las actividades del contrato, la maquinaria y equipos requeridos según los APU y especificaciones técnicas del proyecto. Así mismo constató el estado físico y de operación de la maquinaria y equipo solicitando al contratista sustituirlo por mal estado o realizarle mantenimiento preventivo y/o correctivo, cada vez que fue necesario.

(Hojas de vida de los equipos y documentación adicional reposa en el anexo 16 del informe 1 e informe 5)

La maquinaria y equipo que el contratista utilizó durante el periodo del presente informe fue el siguiente:

Tipo:	VOLQUETA
Marca:	CHEVROLET
Referencia:	KODIAK
Días en obra:	135
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de operarios:	IDONEO



Ilustración 6 Equipo tipo volqueta

Tipo:	VOLQUETA
Marca:	INTERNATIONAL
Días en obra:	135

Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de operarios:	IDONEO



Ilustración 7 Equipo tipo volqueta 2

Tipo:	VOLQUETA
Marca:	FORD
Referencia:	F 600
Días en obra:	42
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de operarios:	IDONEO



Ilustración 8 equipo tipo volqueta 3

Tipo:	VOLQUETA
Marca:	DODGE
Referencia:	D 600
Días en obra:	42
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de operarios:	IDONEO

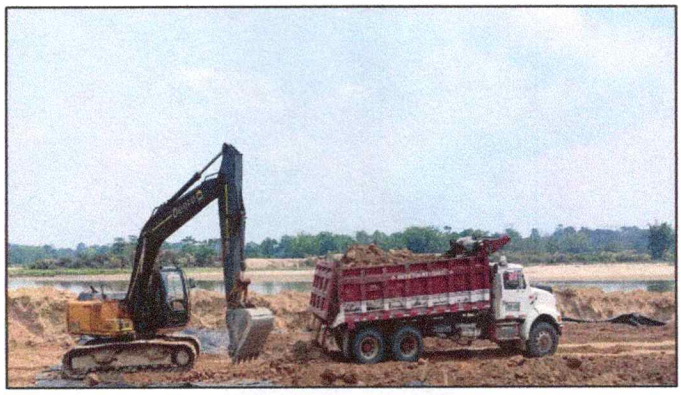


Ilustración 9 Equipo tipo volqueta 4

Tipo:	RETROEXCAVADORA
Marca:	CATERPILLAR
Referencia:	320D3GC
Días en obra:	135
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	QUINCENAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de operarios:	IDONEO



Ilustración 10 Equipo tipo retroexcavadora 1

Tipo:	RETROEXCAVADORA
Marca:	JHON DEERE
Referencia:	160LC
Días en obra:	135
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	QUINCENAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA



Ilustración 11 Equipo retroexcavadora 2

Tipo:	RETROEXCAVADORA
Marca:	KOMASUT
Referencia:	PC200

Días en obra:	42
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	QUINCENAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA



Ilustración 12 Equipo retroexcavadora 3

Tipo:	RETROEXCAVADORA
Marca:	CATERPILLAR
Referencia:	320D3GC
Días en obra:	42
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	QUINCENAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de operarios:	IDONEO



Ilustración 13 equipo retroexcavadora

Por otro lado, la interventoría realizó un seguimiento y control a la maquinaria y equipos propios y/o alquilados por el contratista verificando que los seguros se encuentren vigentes.

(Contratos De Equipos Utilizados Reposa en el anexo 17 del informe 1)

Tabla 16 Seguimiento y control de la maquinaria y equipos utilizado en la ejecución del contrato del contrato No. 481 del 2024

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO				OBSERVACIONES
	MES 1				
	SI	NO	SI	NO	
El contratista cuenta con los contratos de alquiler de la maquinaria y equipo que no son de su propiedad debidamente suscritos con terceros.	x				NINGUNA
Los vehículos maquinaria y equipo que el contratista tiene en la obra cumplen con los siguientes requisitos: • SOAT • Tarjeta de propiedad • Licencia de conducción de la persona responsable	x				NINGUNA

Anexo 7 Informe de seguimiento implementación del PMA/PAGA

4. ASPECTOS TECNICOS

4.1. CONDICIONES CONTRACTUALES

El contrato de obra suscrito entre el Departamento de Arauca y la firma contratista CONSORCIO RIO BANADIA contempla las siguientes actividades a desarrollar dentro del plazo contractual establecido de 06 (SEIS) meses.

Tabla 17 presupuesto contractual

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**OBRAS DE PROTECCIÓN RIO BANADIA**				
1,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD	M3	16.298,68	$ 19.239,00	$ 313.570.304,52
1,2	ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL	M3	16.298,68	$ 23.478,00	$ 382.660.409,04
1,3	CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN	M3	25.673,470	$127.588,00	$ 3.275.626.690,36
1,4	GEOTEXTIL NT 2400	M2	91.742,40	$ 19.172,00	$ 1.758.885.292,80
1,5	GEOTEXTIL NT 3000	M2	10.858,40	$ 23.242,00	$ 252.370.932,80
1,6	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	20.420,44	$ 17.337,00	$ 354.029.168,28
1,7	MANEJO DE AGUAS	MES	6,00	$ 4.293.354,00	$ 25.760.124,00
1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEXOCRETO	M2	19.944,00	$ 127.609,00	$ 2.545.033.896,00
1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	3.722,88	$ 940.227,00	$ 3.500.352.293,76
1,10	Filtro o Dren Frances PVC 100 mm (0.6x0.8) m	M	1.108,00	$ 249.909,00	$ 276.899.172,00
1,11	RELLENOS TALUD DERECHO ANCLAJE DIQUE	M3	13.674,94	$ 118.615,00	$ 1.622.053.008,10
				SUB-TOTAL COSTO OBRA FÍSICA (INCLUYE A.I.U)	**$ 14.307.241.291,66**
				APLICACIÓN AL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEA	**$ 5.000.000,00**
				TOTAL, OBRA FÍSICA	**$ 14.312.241.291,66**

4.2. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

Para el periodo del presente informe de obra comprendido del 01 de septiembre del 2025 al 19 de septiembre del 2025, se han ejecutado las siguientes cantidades para cada uno de los ítems del contrato:

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD PRESENTE INFORME	VALOR PRESENTE INFORME	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	OBRAS DE PROTECCIÓN RIO BANADIA								
1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD	M3	16,298.68	$ 19,239.00	$ 313,570,304.52	0.00	$ -	14268.68	$ 274,515,211.48
1.2	ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL	M3	16,298.68	$ 23,478.00	$ 382,660,409.04	0.00	$ -	14268.70	$ 335,000,538.60
1.3	CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN	M3	25,673.47	$ 127,588.00	$ 3,275,626,690.36	0.00	$ -	19695.35	$ 2,512,890,315.80
1.4	GEOTEXTIL NT 2400	M2	91,742.40	$ 19,172.00	$ 1,758,885,292.80	0.00	$ -	70380.00	$ 1,349,325,360.00
1.5	GEOTEXTIL NT 3000	M2	10,858.40	$ 23,242.00	$ 252,370,932.80	0.00	$ -	8380.00	$ 194,767,960.00
1.6	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	20,420.44	$ 17,337.00	$ 354,029,168.28	0.00	$ -	15665.50	$ 271,592,773.50
1.7	MANEJO DE AGUAS	MES	6.00	$ 4,293,354.00	$ 25,760,124.00	0.63	$ 2,704,813.02	5.73	$ 24,600,918.42
1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEXOCRETO	M2	19,944.00	$ 127,609.00	$ 2,545,033,896.00	0.00	$ -	0.00	$ -
1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	3,722.88	$ 940,227.00	$ 3,500,352,293.76	0.00	$ -	0.00	$ -
1.10	Filtro o Dren Frances PVC 100 mm (0.6x0.8)m	M	1,108.00	$ 249,909.00	$ 276,899,172.00	250.00	$ 62,477,250.00	850.00	$ 212,422,650.00
1.11	RELLENOS TALUD DERECHO ANCLAJE DIQUE	M3	13,674.94	$ 118,615.00	$ 1,622,053,008.1000	0.00	$ -	0.00	$ -
	SUB-TOTAL COSTO OBRA FÍSICA (INCLUYE A.I.U)				**$ 14,307,241,291.66**		**$ 65,182,063.02**		**$ 5,175,115,727.80**
	APLICACIÓN AL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEA				**$ 5,000,000.00**				**$ 3,444,349.00**
	TOTAL OBRA FÍSICA				**$ 14,312,241,291.66**		**$ 65,182,063.02**		**$ 5,178,560,076.80**


CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

4.3. AVANCE DE LA OBRA

4.3.1. Avance Físico De La Obra

De acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas en el periodo del presente informe No. 7 del 01 de septiembre del 2025 al 19 de septiembre del 2025, se presenta un avance de ejecución del 0.46% y un avance de obra acumulado del 36.18%, haciendo falta por ejecutar un 63.82% para completar la totalidad de las actividades establecidas en la minuta del contrato.

Ilustración 14 grafica avance de obra

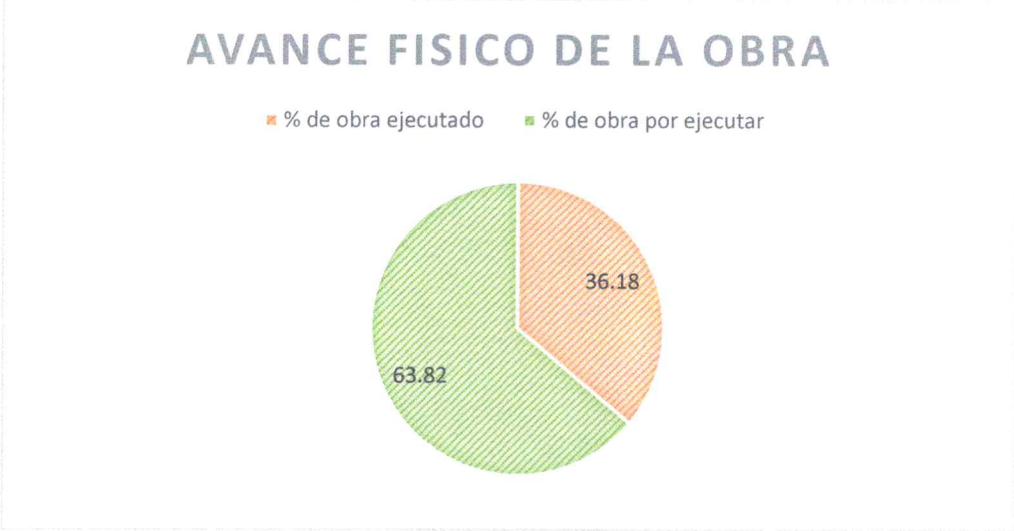

4.4. ACTIVIDADES DE OBRAS EJECUTADAS

Para el control de la programación, el contratista presentó a la Interventoría el respectivo cronograma de trabajo con cada uno de los ítems a ejecutar, con el cual se hizo seguimiento semanal y mensual al avance en la ejecución de todas las actividades y del contrato en general; A continuación, se presenta la siguiente tabla con los % de obra ejecutada a la fecha de corte del presente informe, comparando lo programado con lo ejecutado.

Tabla 18 Porcentaje de avance de obra Programado Vs Ejecutado del Contrato de Obra No. 481 de 2024.

	SEMANAS		% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	% AVANCE EJECUTADO	% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO
INICIO	SEM 1	31-12-2024 AL 05-01-2025	0,12%	0,12%	0,00%	0,00%

	SEMANAS		% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	% AVANCE EJECUTADO	% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO
	SEM 2	06-01-2025 AL 12-01-2025	0,12%	0,24%	0,00%	0,00%
	SEM 3	13-01-2025 AL 19-01-2025	0,12%	0,36%	0,00%	0,00%
	SEM 4	20-01-2025 AL 26-01-2025	0,12%	0,48%	0,59%	0,59%
	SEM 5	27-01-2025 AL 31-01-2025	0,12%	0,60%	0,59%	1,18%
	SEM 6	01-02-2025 AL 09-02-2025	0,36%	0,96%	0,34%	1,52%
	SEM 7	10-02-2025 AL 16-02-2025	0,35%	1,31%	0,35%	1,87%
	SEM 8	17-02-2025 AL 23-02-2025	0,36%	1,67%	0,35%	2,22%
	SEM 9	24-02-2025 AL 28-02-2025	0,35%	2,02%	0,34%	2,56%
	SEM 10	01-03-2025 AL 09- 03-2025	5,56%	7,58%	0,64%	3,20%
	SEM 11	10-03-2025 AL 16- 03-2025	5,56%	13,14%	0,63%	3,83%
	SEM 12	17-03-2025 AL 23- 03-2025	5,55%	18,69%	0,64%	4,47%
	SEM 13	24-03-2025 AL 31- 03-2025	5.56%	24,25%	0,64%	5,11%
	SEM 14	01-04-2025 AL 06-04-2025	7,74%	31,99%	0,08%	5,19%
	SEM 15	07-04-2025 AL 13 -04-2025	7,73%	39,72%	0,08%	5,27%
	SEM 16	14-04-2025 AL 20-04-2025	7,74%	47,46%	0,09%	5,36%
	SEM 17	21-04-2025 AL 22-04-2025	7,73%	55,19%	0,08%	5,44%
	SEM 18	21-07-2025 AL 27-07-2025	7,17%	62,36%	9.52%	14,96%
	SEM 19	28-07-2025 AL 31-07-2025	4,1%	66,46%	5.43%	20,39%
	SEM 20	01-08-2025 AL 10-08-2025	3,66%	70,12%	3,83%	24,22%
	SEM 21	11-08-2025 AL 17-08-2025	3,65%	73,77%	3,84%	28,06%
	SEM 22	18-08-2025 AL 24-08-2025	3.66%	77,43%	3,83%	31,89%
	SEM 23	25-08-2025 AL 31-08-2025	3.65%	81,08%	3,83%	35,72%
	SEM 24	01-09-2025 AL 07-09-2025	3.66%	84.74%	1,22%	35,87%
	SEM 25	08-09-2025 AL 14-09-2025	3.66%	88.40%	1,23%	36,02%
CORTE DE INFORME	**SEM 26**	15-09-2025 AL 19-09-2025	3.65%	92.05%	0.16%	36,18%

Ilustración 15 Avance financiero programado Vs avance Ejecutado del Contrato de Obra No. 481 de 2024

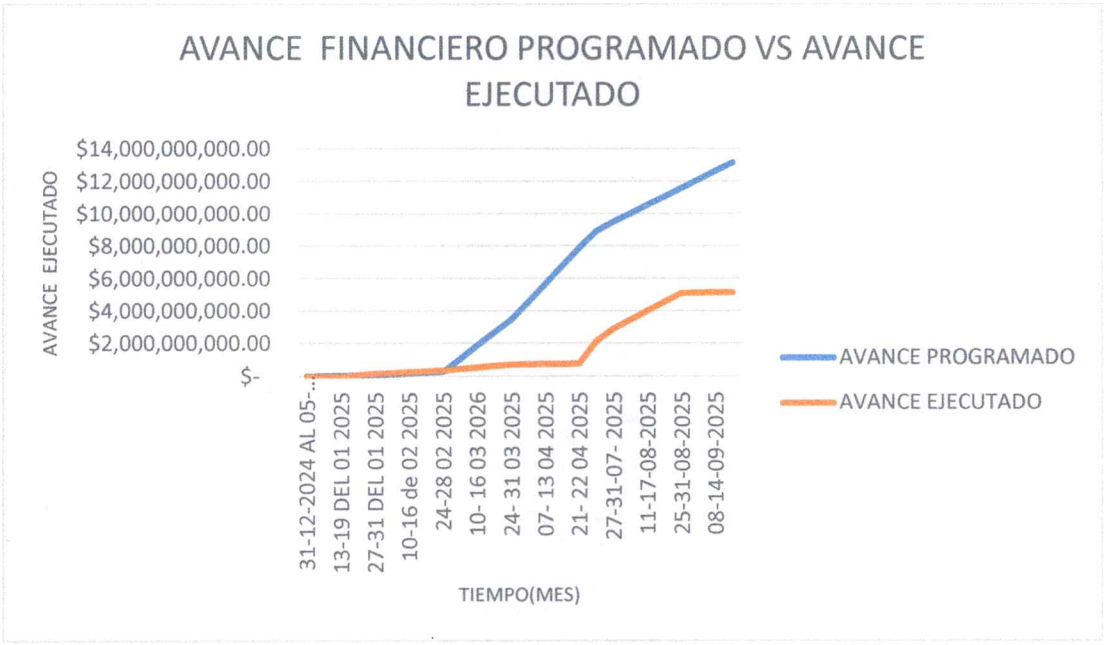


Ilustración 16 Avance físico programado Vs Ejecutado del Contrato de Obra No. 481 de 2024



Nota: Durante el mes de septiembre se tenía programado un avance del **92,05%**; sin embargo, el avance ejecutado alcanzó el **36,18%**, presentándose una diferencia del **55,88%** por debajo de lo previsto.

Causas de la diferencia entre lo programado y lo ejecutado en septiembre:

- Las actividades correspondientes a la conformación del Jarillón, rellenos, flexocreto y bolsacretos requieren trabajos dentro del cauce. Según lo establecido por el IDEAM, dichas actuaciones solo pueden ejecutarse con una lámina de agua menor a un (1) metro, condición que limitó la ejecución y generó retrasos en el avance programado.

- Las precipitaciones constantes y el incremento del caudal del río dificultaron el acceso a las zonas de trabajo y la correcta ejecución de actividades relacionadas con la conformación del Jarillón, manejo de aguas y colocación de flexocreto, generando retrasos en el cronograma.

Acciones para mejorar el rendimiento y recuperar el atraso:

- Se ajustará el cronograma de trabajo, priorizando las actividades críticas como la instalación de Flexocreto Y Bolsacreto, la ejecución del dren francés y el manejo de aguas, de acuerdo con las condiciones del terreno y el nivel de saturación del área intervenida.

- Reforzar los frentes de trabajo con mayor personal y maquinaria cuando las condiciones lo permitan, para acelerar la ejecución.

4.5. IMPREVISTOS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA

A la fecha del presente informe, comprendido entre el 1 de septiembre y el 19 de septiembre de 2025, como medida de contingencia ante la erosión generada por las crecientes del río Banadía y la afectación del jarillón con geotextil, fue necesario ejecutar trabajos adicionales de protección marginal mediante enrocado, actividad no prevista en el presupuesto inicial del contrato. Estas labores consistieron en la colocación de material pétreo de gran tamaño (bloques de roca y canto rodado) en los puntos críticos del talud, con el propósito de disipar la energía del flujo del río y evitar la socavación y pérdida del material conformado. La actividad se ejecutó con el apoyo de maquinaria pesada tipo excavadora hidráulica, realizando la selección, transporte y ubicación de las rocas de forma controlada, siguiendo criterios técnicos de estabilidad y seguridad.

Dichos trabajos fueron necesarios para garantizar la integridad de las obras existentes y mitigar el riesgo de un mayor deterioro estructural, constituyéndose como un imprevisto técnico-operativo derivado de condiciones hidrometeorológicas extremas.

Cabe resaltar que el jarillón aún no se encontraba completamente finalizado con todas las actividades contempladas en el presupuesto contractual, ya que faltaban por ejecutar las capas de protección en Flexocreto, la instalación de Bolsacreto y los rellenos del talud derecho. Por tal motivo, la estructura no contaba todavía con la estabilidad ni la protección hidráulica definitiva, lo que la hizo vulnerable ante el incremento del caudal y las crecientes del río Banadía ocurridas durante el mes de septiembre. Esta condición explica que las afectaciones registradas no correspondan a fallas constructivas, sino a una exposición prematura del jarillón en etapa parcial de ejecución, agravada por las condiciones hidrometeorológicas extremas presentadas en la zona.

Justificación técnica y administrativa

La ejecución del enrocado se consideró técnica y operativamente necesaria para salvaguardar las obras en ejecución y prevenir un daño mayor sobre el jarillón y sus estructuras asociadas. Dicha intervención se enmarca dentro de las acciones de contingencia previstas en el contrato, ejecutadas con el fin de preservar la estabilidad del sistema de protección y evitar pérdidas de inversión pública.

Desde el punto de vista técnico, la instalación del enrocado permitió estabilizar los sectores críticos afectados por la socavación, reduciendo la velocidad del flujo del río y evitando la erosión regresiva en el talud.

Administrativamente, esta actividad se clasifica como un imprevisto no presupuestado, originado por causas naturales y condiciones hidrometeorológicas extremas, cuya ejecución fue indispensable para garantizar la continuidad del proyecto y proteger las obras existentes mientras se completan las fases faltantes de Flexocreto, Bolsacreto y rellenos de talud.

Ilustración 17 conformación del Jarillón

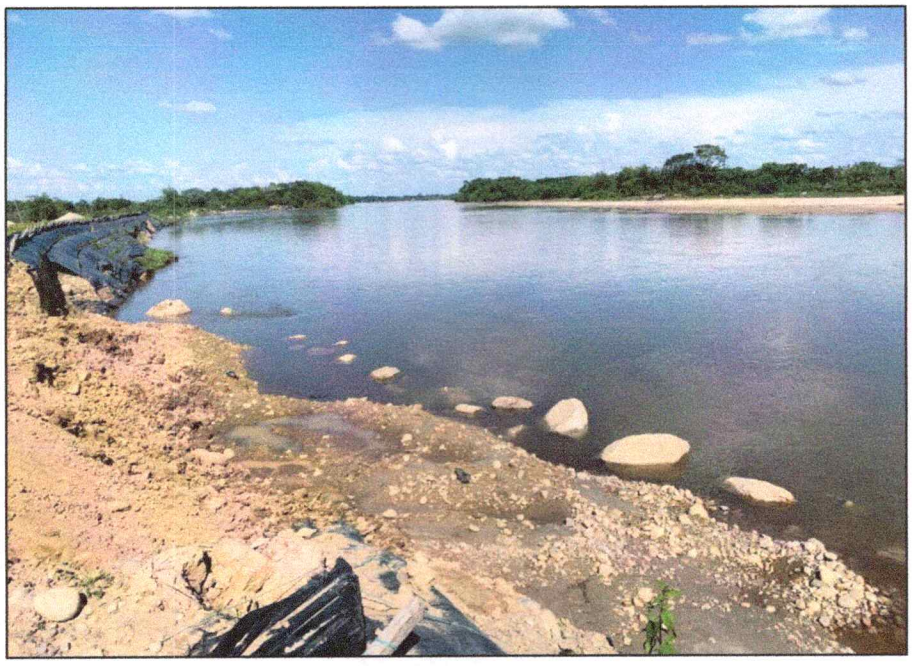


Ilustración 18 afectación del jarillón por creciente del río banadía





Ilustración 19 colocación de enrocado como medida de contingencia





Pérdida de material conformado por erosión

Durante el periodo reportado se presentó la pérdida parcial del material conformado en el jarillón, ocasionada por la acción erosiva de las lluvias continuas y las crecientes del río Banadía.

El incremento del caudal generó socavación en la base del talud y arrastre del material de relleno, debido a que aún no se habían instalado las capas de protección en Flexocreto y Bolsacreto, actividades contempladas dentro del presupuesto, pero pendientes de ejecución al momento del evento.

La ausencia de la protección superficial definitiva, sumada a la saturación del terreno por el alto nivel freático, provocó que el agua erosionara el material conformado del jarillón y exhibiera el geotextil instalado, afectando la estabilidad del talud y la continuidad de los trabajos programados.

Estas afectaciones corresponden a imprevistos de tipo ambiental y técnico, derivados de condiciones hidrometeorológicas extremas, y no son atribuibles a deficiencias constructivas, dado que la estructura se encontraba en etapa de ejecución y aún no contaba con su sistema de protección hidráulica final.

4.6. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADA

Para el periodo del presente informe comprendido entre el 01/09/2025 y 19/09/2025, la firma contratista bajo la supervisión y control de la Interventoría externa, ha ejecutado las siguientes actividades de los ítems del contrato:

ITEM 1.7 MANEJO DE AGUAS

Durante la preparación del terreno para la conformación del Jarillón, se implementó el manejo de aguas subterráneas mediante el uso de motobombas, con el fin de controlar el nivel freático en la zona de intervención. Las motobombas fueron instaladas en puntos estratégicos del área afectada para extraer el agua acumulada y reducir el nivel freático a un rango seguro que permitiera las excavaciones y trabajos de cimentación. El proceso consistió en la extracción continua del agua, la cual fue dirigida hacia sistemas de drenaje temporales establecidos previamente para evitar inundaciones y garantizar un ambiente de trabajo seco y estable.

Este manejo de aguas fue monitoreado de manera constante por el equipo técnico y supervisado por la interventoría, quienes aseguraron que las motobombas operaran de manera eficiente y en conformidad con las normas de seguridad y

ambientales vigentes. La correcta gestión del agua permitió el avance seguro de las actividades de excavación.

Materiales utilizados: no se utilizaron materiales.
Equipos y Maquinaria: moto bomba 4"
Personal: ayudantes.

ACTIVIDAD:	MANEJO DE AGUAS		
ITEM: 1.7		UNIDAD: MES	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	6,00	CANTIDAD ACUMULADA:	5,73
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	0,63	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,27
PORCENTAJE EJECUTADO:	95.50%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	4.50%



Ilustración 20 manejo de aguas

ITEM 1.10 FILTRO O DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6X0.8) M

Se construyó un filtro francés con una zanja de 0.6 m de ancho por 0.8 m de profundidad, donde se colocó una capa de triturado 3/4" en el fondo. Sobre esta capa se instaló una tubería perforada de PVC, la cual fue cubierta nuevamente con más material de triturado 3/4" para asegurar el drenaje eficiente del agua. El sistema fue protegido con geotextil y la zanja se cerró con tierra compactada. Todo el

proceso fue supervisado y aprobado por la interventoría, quien verificó el cumplimiento de los estándares técnicos y de seguridad requeridos.

Materiales utilizados: triturado ¾, tubería perforada en PVC de 4", geotextil.
Equipos y Maquinaria: retroexcavadora.
Personal: ayudantes y oficiales.

ACTIVIDAD:	FILTRO O DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6X0.8) M		
ITEM: 1.10		UNIDAD: M	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	1.108,00	CANTIDAD ACUMULADA:	850,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	250,00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	258,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	76,71%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	23.29%



Ilustración 21 filtro o dren francés PVC 100 mm (0.6x0.8) m

4.7. CONTROL DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el desarrollo de las actividades de conformación de la barrera tipo Jarillón, se implementaron procedimientos de control de calidad con el fin de garantizar la seguridad, estabilidad y correcta ejecución de los trabajos. Se verificó de manera permanente que la maquinaria empleada (retroexcavadoras, vibrocompactador, motoniveladora y carrotanque) se encontrara en óptimas condiciones de funcionamiento, y que la conformación del Jarillón se realizara conforme a los planos y a las especificaciones técnicas establecidas. Asimismo, se efectuó la instalación de geotextiles NT 2400, NT 3000 y tejido 2100, bajo la supervisión de la

interventoría, la cual validó que los procedimientos de instalación cumplieran con los requerimientos técnicos. Adicionalmente, se llevaron a cabo inspecciones periódicas para asegurar que las condiciones del terreno no representaran riesgos para la estabilidad de la obra, garantizando un manejo adecuado de las aguas pluviales con el propósito de mitigar procesos de erosión y posibles desbordamientos.

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1. MANEJO DEL ANTICIPO

Hasta la fecha del presente informe, se ha tramitado el plan de manejo del anticipo con la entidad contratante de la siguiente manera.

Tabla 19 Manejo de Anticipo

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	
ENTIDAD CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA NIT:901.902.273-3
CONTRATO DE OBRA N°	481 DE 2024
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN NIT. 901.901.368-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	473 DE 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$14.312.241.291,66
PORCENTAJE DEL ANTICIPO	40%
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO	$5.724.896.516,66

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	%
1	MATERIALES E INSUMOS	$ 3.721.182.735,00	65,00%
2	EQUIPOS Y MAQUINARIA	$ 300.000.000,66	5,24%

3	TRANSPORTE	$ 1.302.971.025,00	22,76%
4	NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL	$ 400.742.756,00	7,00%
TOTAL		**$ 5.724.896.516,66**	**100%**
SON: CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISÉIS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE			

Nombre producto	ACCION FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS FA 6449 FIDEICOMISO ANTICIPO RIO BANADIA
NIT:	805012921
Tipo producto	AHORROS
No. producto	04000010797
Fecha apertura	18/03/2025
Estado	ACTIVA
Código sucursal	40 - CENTRO 93

5.2. AVANCE FINANCIERO

El avance financiero del Contrato N.° 481 de 2024 corresponde al **40.00%** que comprende el anticipo del **2 de abril de 2025**. La ejecución financiera registrada hasta la fecha se relaciona con las actividades desarrolladas durante la obra y presenta correspondencia con el avance físico alcanzado, de acuerdo con la programación establecida. Asimismo, dicho avance financiero ha sido tramitado conforme a los procedimientos contractuales vigentes y cuenta con la aprobación de la interventoría, constituyéndose en un referente para el seguimiento y control financiero del proyecto durante su ejecución.

VALOR DEL CONTRATO	$14,312,241,291.66
VALOR DEL ANTICIPO (40%)	$5,724,896,516.66
VALOR POR COBRAR (60.00%)	$8,587,344,0775

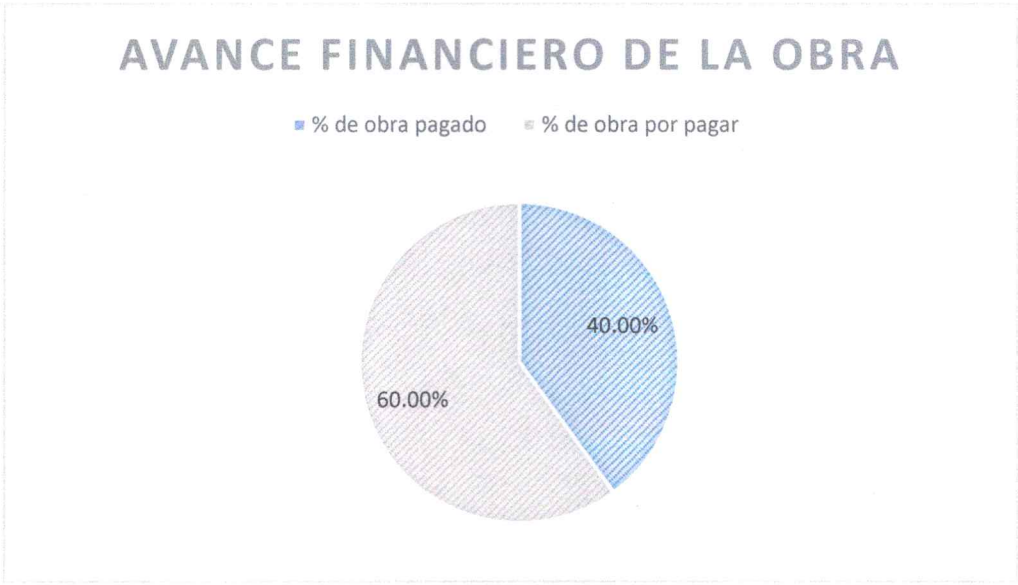


Ilustración 22 Avance financiero de la obra

6. ASPECTOS AMBIENTALES

6.1 SEGUIMIENTO A PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES

Ante la Autoridad Ambiental Regional CORPORINOQUIA se obtuvieron los permisos ambientales necesarios para el desarrollo del proyecto, conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 700.36.250082 del 18 de julio de 2025, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y con el fin de asegurar la legalidad y sostenibilidad de las actividades proyectadas. Los permisos obtenidos corresponden a:

- **Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos:** Se cuenta con la autorización correspondiente para intervenir y hacer uso de los cauces, playas y lechos de cuerpos de agua, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución No. 700.36.250082 del 18 de julio de 2025, cumpliendo con las disposiciones técnicas y ambientales exigidas por la entidad competente.

- **Concesión de aguas superficiales:** Se cuenta con el derecho de uso y aprovechamiento de aguas provenientes de fuentes superficiales, conforme a la Resolución No. 700.36.250082 del 18 de julio de 2025, en cumplimiento de los parámetros técnicos y ambientales establecidos por la autoridad competente.

6.2 SEGUIMIENTO AL PMA

El documento PMA que hace parte integral del proyecto, que reposa en el anexo 19 del informe 1, y el informe detallado con cada uno de los soportes, se presenta en el ANEXO 8. **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PMA/PAGA**, de acuerdo al documento ambiental entregado por el DEPARTAMENTO DE ARAUCA al contratista y a la interventoría externa, para la ejecución del contrato de obra No. 481 del 2024, cuyo objeto corresponde a: **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA, DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".**

6.3 IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

De acuerdo al cuadro de costos del proyecto y PMA, se deben implementar las siguientes actividades como medidas de mitigación o compensación ambiental:

Tabla 20 Presupuesto de la mitigación o control ambiental del contrato de obra No. 481 del 2024.

1	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL
SIEMBRA DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS					
1	Realizar siembra de especies nativas (tamaño mínimo de 70cm)	Plántula	250	$16,590	$4,147,423
2	Servicio de monitoreo a las acciones implementadas	Und.	1	$852,577	$ 852,577
COSTO TOTAL					**$5,000,000**

Nota: "Durante el mes de septiembre se avanzó en la consolidación del proceso de revegetalización con especies nativas (samán y bucare). Las observaciones realizadas permitieron evidenciar que los ejemplares presentan un desarrollo estable, mostrando buena adaptación a las condiciones locales y resistencia frente a las variaciones climáticas del periodo. Las actividades se enfocaron en labores de inspección, registro del crecimiento y mantenimiento básico, con el propósito de asegurar la continuidad del proceso de establecimiento de la cobertura vegetal.



Ilustración 23 Sequimiento de la plantas

7. CONCLUSIONES

- Se hizo la respectiva revisión de los diseños del contrato de obra No.481 de 2024 los cuales se ejecutaron dentro de los parámetros técnicos requeridos, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas generales del Contrato, garantizando así, la calidad de cada una de las actividades de obra ejecutadas.

- Se aseguró el cumplimiento de todas las normativas vigentes tanto técnicas como de seguridad, lo cual fue fundamental para mantener la integridad del proyecto y evitar contratiempos en su desarrollo. El control de calidad en cada etapa de las actividades permitió que el proceso constructivo se realizara de manera eficiente y conforme a los estándares establecidos.

- La correcta ejecución de las actividades de construcción del dren francés y el manejo adecuado de las aguas superficiales contribuyeron al desarrollo ordenado y seguro del proyecto, garantizando la estabilidad de las obras de protección, la funcionalidad del sistema de drenaje y la mitigación de riesgos asociados a la erosión o a la saturación del terreno, asegurando de esta manera la eficiencia técnica de las intervenciones

- Avance en tiempo (95,60 %)
- Avance físico general (36,18%)
- Avance Financiero (40,00%)

ING. JEISSON RENE VILLARREAL ROA
R/L CONSORCIO RIO BANADIA

8. ANEXOS

Anexo 1 Acta de Suspensión No. 2 10
Anexo 2 Correspondencia enviada y recibida 18
Anexo 3 Bitácoras De Obra Del 01 De Septiembre Del 2025 Al 19 De septiembre De 2025 23
Anexo 4 Planillas De Seguridad Social del mes de Septiembre 2025.....27
Anexo 5 Nóminas De Pagos Mensual mes de Septiembre 2025 27
Anexo 6 Informe del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 30
Anexo 7 Informe de seguimiento implementación del PMA/PAGA 36

Aprobación del Informe:	
Elaboró: JAIR LEANDRO VILA SARABIA *DIRECTOR DE OBRA*	Aprobó: JEISSON RENE VILLARREAL ROA R/L CONSORCIO RIO BANADIA

ANEXO 1 ACTA DE SUSPENSION No. 2

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

ACTA DE SUSPENSION No 2
CONTRATO DE OBRA No. 481-2024

ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE ARAUCA
INTERVENTOR EXTERNO:	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
SUPERVISOR:	CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO RESOLUCION 001 DE 2025 DEL 03 DE ENERO 2025
CONTRATO No:	481 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA:	CONSORCIO RIO BANADIA
REPRESENTANTE LEGAL:	JEISSON RENE VILLARREAL ROA R/L
NIT. No:	901.902.273-3
VALOR DEL CONTRATO:	$ 14.312.241.291,66
PLAZO CONTRACTUAL:	SEIS (6) MESES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	SGR202324-00420 DE 11/12/2024 SGR202324-00422 DE 11/12/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	SGR202324-00401 DE 31/12/2024 SGR202324-00402 DE 31/12/2024
FECHA INICIO:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSION N° 1	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA PRORROGA SUSPENSION N°	22 DE MAYO DE 2025
FECHA PRORROGA SUSPENSION N°	20 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO	21 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	27 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Powered by CamScanner

En Arauca, a los diecinueve (19) días de septiembre de 2025, se reunieron las siguientes personas: **NASSER CRUZ MATUS** Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental, el Ingeniero **CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO,** Supervisor del Contrato de Interventoría No. 473 de 2024, según Resolución No 001 de 2025, el Señor **JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON** Representante Legal del **CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN,** en calidad de Interventor Externo y el Señor **JEISSON RENE VILLAREAL ROA** Representante Legal del **CONSORCIO RIO BANADIA,** en calidad de Contratista de Obra, con el fin de suscribir la presente Acta de Suspensión No. 2 del Contrato de Obra de la referencia en atención a las siguientes consideraciones:

PRIMERA. Las obras objeto del presente proyecto consisten en la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RÍO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

SEGUNDA: El Contrato tuvo inicio el día 31 de diciembre del año 2024, con la suscripción del Acta de Inicio del mismo día, donde se reunieron las siguientes personas: **NASSER CRUZ MATUS** Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental, **JHONN FREDY GARCIA BELTRAN,** para esa fecha fungiendo como Representante Legal del **CONSORCIO RIO BANADIA** como Contratista de Obra. La ejecución física del Contrato inició con las actividades de prealistamiento consistentes en las adecuaciones, campamento, valla informativa, movimiento de equipos, EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 02 M DE PROFUNDIDAD, ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL, MANEJO DE AGUAS, FILTRO O DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6X0.8) entre otras, actividades acordadas según el Cronograma de Trabajo o Programación de Obra para la ejecución física. Estas actividades se adelantan mientras se surten los procesos iniciados por la administración departamental sobre el permiso de concesión de aguas y ocupación de cauce para las actividades que requieran de la utilización del recurso natural.

TERCERA: Que mediante comité técnico de obra realizado el día 18 de septiembre presente año, se analizó entre las partes intervinientes del contrato de obra 481 de 2024, unidad ejecutora, firma contratista e interventoría externa, el avance del contrato, y se pudo determinar que se presenta una demora en las actividades relacionadas con trabajos dentro del cauce en razón a las condiciones meteorológicas y su condicionamiento en el proceso constructivo.

CUARTA: La firma contratista expone los siguientes argumentos "*a) Condiciones climáticas adversas, que han ocasionado una lámina de agua superior a 2,20 m en el cauce, lo cual impide realizar excavaciones y movimientos de tierra con la estabilidad*

Powered by CamScanner

requerida. b) Restricciones normativas, como lo establecido en la Guía Metodológica del IDEAM (2017), que limita los trabajos dentro de cauces cuando la lámina de agua es mayor a un (1) metro. c) Exigencias técnicas de la NSR-10, que establecen la necesidad de un control estricto en el vaciado y curado de elementos de concreto, condiciones que actualmente no se pueden garantizar debido a la persistencia de lluvias e inundaciones. d) Accesibilidad reducida a la zona de intervención, ocasionada por anegamiento de vías, lo cual afecta el transporte de materiales y el ingreso de maquinaria pesada. e) Los datos de la estación ARAUQUITA [37050010] confirman la persistencia de un patrón de lluvias intensas (hasta 32 mm/día) con frecuencia promedio de 3-4 días entre eventos, lo que mantiene la lámina de agua del Río Banadía por encima de 1 metro de profundidad, superando el umbral de seguridad operativa establecido por el IDEAM (2017). f) La ejecución de trabajos dentro del cauce (conformación de jarillón, rellenos, instalación de bolsacretos y flexocretos) requiere condiciones de lámina de agua <1 metro para garantizar la seguridad del personal, la estabilidad de la maquinaria y la calidad de las obras. g) La saturación de los suelos y la alta lámina de agua imposibilitan la compactación adecuada, aumentan el riesgo de lavado de materiales y comprometen la integridad estructural de las obras. h) La Declaratoria de Calamidad Pública (Decreto Municipal No. 49 del 24/06/2025) refuerza la gravedad de las condiciones climáticas, las cuales han generado inundaciones, desbordamientos y saturación de vías, afectando directamente la zona de intervención del proyecto. i) El comité técnico de obra (18/09/2025) concluyó de manera unánime la necesidad de suspender temporalmente las actividades debido a los riesgos identificados y la imposibilidad de ejecutar los trabajos bajo las condiciones actuales."

QUINTA: En comité técnico de obra (18/09/2025), la interventoría externa del contrato de obra 481 de 2024, considera viable y procedente efectuar la suspensión respectiva.

SESTA: En virtud de lo expuesto, las partes consideran prudente suspender el contrato de obra No. 481 de 2024, por el término de cuarenta y cinco (45) días o antes si se superan las motivaciones expuestas.

SÉPTIMA: La presente acta no modifica las demás condiciones establecidas en el contrato tales como precios y ajustes y esto no generara mayores costos para el departamento; para lo cual el contratista, libre y espontáneamente renuncia expresamente, en el momento de solicitar la suspensión del contrato, a reclamar judicial o extrajudicialmente mayores costos generados por: lucro cesante y/o daños emergentes; desequilibrios económicos por interrupción de secuencia constitutiva, desequilibrio económico por disponibilidad o traslado de personal; desequilibrio económico por mayor permanencia y/o funcionamiento de la infraestructura propia durante el periodo de suspensión número 2.

OCTAVO: Se deja expresa constancia que queda vigente para las partes, las obligaciones adquiridas por ellas en el contrato original. Las actividades se reiniciarán oportunamente

Powered by CamScanner

en el término establecido o antes si son superados los inconvenientes que motivaron la suspensión, para lo cual, se suscribirá de manera inmediata la respectiva acta de reinicio en donde se hará constar la nueva fecha de terminación y se procederá a la actualización de las garantías por los términos establecidos en la minuta del contrato, con vigencia a partir de la fecha.

Para constancia se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron a los diecinueve (19) días de septiembre de 2025.

JEISSON RENE VILLAREAL ROA
R/ CONSORCIO RIO BANADIA
Contratista De Obra

CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO
Supervisor Contrato de Interventoría
No.473/2024
Resolución No. 001 del 03/01/2025

JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON
R/ Consorcio Inter Obras De Protección
Interventor Externo

NASSER CRUZ MATUS
Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana
Dptal

Powered by CamScanner

ANEXO 2 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

Gmail Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>

INFORME AGOSTO Y PLAN DE CONTIGENCIA

1 mensaje

Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com> 7 de septiembre de 2025, 20:25
Para: INTER OBRAS DE PROTECCION <interobrasdeproteccion1@gmail.com>

INFORME AGOSTO.pdf

PLAN DE CONTIGENCIA.pdf

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

GOBERNACIÓN DE
ARAUCA

Arauca, 16 de septiembre de 2025

CONVOCATORIA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO	
PARA:	Contratista - Interventoría - Supervisión – Apoyo la Supervisión.
DE:	**Nasser Cruz Matus**-Secretario de Gobierno Y Seguridad Ciudadana Departamental.
ASUNTO:	Convocatoria Mesa Técnica de seguimiento
FECHA:	16 de septiembre de 2025
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA, DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Cordial saludo:

Como Secretario de Gobierno Y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, me permito convocarlos a una Mesa Técnica de seguimiento y coordinación de acciones , respecto del proyecto cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA, DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

La reunión se desarrollará de la siguiente manera:

FECHA: Jueves 18 de septiembre de 2025
LUGAR: Sala de Juntas Secretaría de Gobierno Y Seguridad Ciudadana.
HORA: 9:00 A.M

NASSER ANTONIO CRUZ MATUS
Secretario de Gobierno Y Seguridad Ciudadana
Departamento de Arauca

GOBERNACIÓN DE
ARAUCA

Arauca, 26 de septiembre de 2025

Señores
CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCÓN
Calle 20 No. 19-35 Barrio Centro Oficina 07
Cel. 3114430280
interobrasdeproteccion1@gmail.com

CONSORCIO RIO BANADIA
R/L JEISSON RENE VILLAREAL ROA
Calle No. 8-49 Barrio San Luis
consorcioriobanadia@gmail.com

Ref.: Contrato de Interventoría No. 473-2024 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA" y Contrato de Obra No. 481-2024 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Asunto: Acompañamiento a visita de seguimiento del DNP – Proyecto BPIN 2024005810056

Buenas tardes,

Para su conocimiento, nos permitimos informar que el próximo jueves 2 de octubre del presente año, se llevará a cabo una visita de seguimiento por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el marco del proyecto identificado con el BPIN 2024005810056, cuyo objeto es:

"Construcción de obras de protección para la reducción del riesgo y prevención de inundaciones sobre el río Banadía, en el municipio de Saravena, departamento de Arauca."

Con el fin de brindar un panorama más claro a los profesionales encargados de dicha visita, se solicita muy amablemente, pero con carácter obligatorio, la presencia del equipo técnico de obra e interventoría el día de la visita, a las 2:00 p.m. en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Saravena.

Agradecemos de antemano su atención y colaboración para el buen desarrollo de esta jornada.

Cordialmente,

ING. CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO
Supervisor SGSCD – Dirección de Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Proyectó: Ing. Juan Sebastian Ayala Imbett
Apoyo a la Supervisión al CTO 481-2024

GOBERNACIÓN DE
ARAUCA

Arauca, 18 de septiembre de 2025

Señores
CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCÓN
Calle 20 No. 19-35 Barrio Centro Oficina 07
Cel. 3114430280
interobrasdeproteccion1@gmail.com
CONSORCIO RIO BANADIA
R/L JEISSON RENE VILLAREAL ROA
Calle No. 8-49 Barrio San Luis
consorcioriobanadia@gmail.com

Ref.: Ejecución del Contrato de Interventoría No. 473-2024 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA" y del Contrato de Obra No. 481-2024 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Asunto: Invitación a Mesa de Seguimiento para el 22 de septiembre de 2025, solicitado por la Secretaría de Planeación Departamental

Cordial Saludo;

Por medio del presente, me permito invitarlos de manera presencial a la Mesa de Seguimiento del proyecto "CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO Y PREVENCION DE INUNDACION SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA", el cual se desarrollará el día lunes 22 de septiembre de 2025, a las 10:00 am en las instalaciones de la sala de juntas de la Secretaría de Planeación Departamental; dicho comité fue convocado por la Unidad Técnica de Regalías de dicha Secretaría.

Es de indicar que **LA PRESENCIA ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO, DEBERÁN ASISTIR CON EL EQUIPO TÉCNICO DE CADA UNA DE LAS PARTES**. Por otro lado, se solicita a las dos firmas contratistas que dispongan de una presentación en diapositivas del estado y avance en la ejecución técnica, física, administrativa, legal y financiera de los contratos con corte al último mes reportado.

Agradezco su valiosa presencia.

Cordialmente,

CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO
Profesional Universitario SGSCD – Supervisor CTO 473-2024

ANEXO 3 BITACORAS DE OBRA

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901.901.369-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	LUNES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FOLIO	156

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO		
CARROTANQUE	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS	X	
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		X
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE CONTINUA CON FILTRO O DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6X0.8)M REALIZANDO 13 ML
SE INICIA RECONSTRUCCION DE JARILLON PERDIDO POR EROSION

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS: LLUVIAS CONSTANTES Y AUMENTO DE LA LÁMINA DE AGUA DEL RÍO BANADÍA.

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT. 901.901.369-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	MARTES 02 DE AGOSTO DE 2025	FOLIO	157

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO		
CARROTANQUE	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO	X	
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		X
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE CONTINUA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE CONTINUA CON FILTRO O DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6X0.8)M REALIZANDO 13 ML
SE CONTINUA RECONSTRUCCION DE JARILLON PERDIDO POR EROSION
SE INICIA MEDIDA DE SEGURIDAD DE INSTALACION MECANICA DE ENROCADO DE GRAN TAMAÑO EN ZONA EROSIONADA POR OLA INVERNAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA NIT 901.902.273	**BITACORA DE OBRA**	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION NIT. 901.901.368-1

CONTRATO DE OBRA N°:	**481 DE 2024**
OBJETO	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	**MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	**FOLIO**	**158**

RECURSO EQUIPO		**RECURSO HUMANO**		**MATERIALES**	**ESTADO DEL TIEMPO**		
EQUIPOS	**CANT**	**PERSONAL**	**CANT**	**DESCRIPCION**	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO		
CARROTANQUE	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS	X	
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		X
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE CONTINUA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE CONTINUA CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEXOCRETO
SE CONTINUA CON FILTRO O DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6X0.8)M REALIZANDO 13 ML

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS: LLUVIAS CONSTANTES Y AUMENTO DE LA LÁMINA DE AGUA DEL RÍO BANADÍA.

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901 901 368-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	JUEVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FOLIO	159

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO		
CARROTANQUE	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO	X	X
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE CONTINUA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE CONTINUA CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEXOCRETO
SE CONTINUA CON FILTRO O DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6X0.8)M REALIZANDO 13 ML
SE CONTINUA RECONSTRUCCION DE JARILLON PERDIDO POR EROSION
SE CONTINUA MEDIDA DE SEGURIDAD DE INSTALACION MECANICA DE ENROCADO DE GRAN TAMAÑO EN ZONA EROSIONADA POR OLA INVERNAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901.901.368-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA		
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FOLIO	160

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO		
CARROTANQUE	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico el	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE	X	X
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE CONTINUA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE CONTINUA CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEXOCRETO
SE CONTINUA CON FILTRO O DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6X0.8)M REALIZANDO 13 ML
SE CONTINUA RECONSTRUCCION DE JARILLON PERDIDO POR EROSION
SE CONTINUA MEDIDA DE SEGURIDAD DE INSTALACION MECANICA DE ENROCADO DE GRAN TAMAÑO EN ZONA EROSIONADA POR OLA INVERNAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT. 901.901.368-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA *R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA*	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN *R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON*

FECHA:	SABADO 06 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FOLIO	161

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1		SOLEADO SECO		
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2		NUBLADO SECO		
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1		LLUVIAS PASAJERAS	X	
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		LLUVIA INTERMITENTE		X
CARROTANQUE	1	Ingeniero Ambiental	1		LLUVIA FUERTE		
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1				
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1				
		Secretaria	1				
		Oficial	2				
		Ayudante	10				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE CONTINUA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE CONTINUA CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEXOCRETO
SE CONTINUA CON FILTRO O DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6X0.8)M REALIZANDO 13 ML
SE CONTINUA RECONSTRUCCION DE JARILLON PERDIDO POR EROSION
SE CONTINUA MEDIDA DE SEGURIDAD DE INSTALACION MECANICA DE ENROCADO DE GRAN TAMAÑO EN ZONA EROSIONADA POR OLA INVERNAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT. 901.901.369-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	DOMINGO 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FOLIO	162

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO		
CARROTANQUE	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS	X	
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		X
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE OBRA POR SER DIA DOMINICAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901.901.368-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FOLIO	163

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO		X
CARROTANQUE	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO	X	
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE CONTINUA CON FILTRO O DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6X0.8)M REALIZANDO 13 ML
SE CONTINUA RECONSTRUCCION DE JARILLON PERDIDO POR EROSION
SE CONTINUA MEDIDA DE SEGURIDAD DE INSTALACION MECANICA DE ENROCADO DE GRAN TAMAÑO EN ZONA EROSIONADA POR OLA INVERNAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT. 901.903.368-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FOLIO	164

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO		
CARROTANQUE	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS	X	X
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE CONTINUA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE CONTINUA CON FILTRO O DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6X0.8)M REALIZANDO 13 ML
SE CONTINUA RECONSTRUCCION DE JARILLON PERDIDO POR EROSION
SE CONTINUA MEDIDA DE SEGURIDAD DE INSTALACION MECANICA DE ENROCADO DE GRAN TAMAÑO EN ZONA EROSIONADA POR OLA INVERNAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS: LLUVIAS PASAJERAS Y LEVE AUMENTO DE LA LAMINA DE AGUA DEL RIO BANADIA

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT. 901.901.568-3

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FOLIO	165

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO		
CARROTANQUE	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico el	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE	X	
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		X

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE CONTINUA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE CONTINUA CON FILTRO O DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6X0.8)M REALIZANDO 13 ML
SE CONTINUA RECONSTRUCCION DE JARILLON PERDIDO POR EROSION
SE CONTINUA MEDIDA DE SEGURIDAD DE INSTALACION MECANICA DE ENROCADO DE GRAN TAMAÑO EN ZONA EROSIONADA POR OLA INVERNAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS: LLUVIAS CONSTANTES Y AUMENTO DE LA LÁMINA DE AGUA DEL RÍO BANADÍA.

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901.901.568-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FOLIO	166

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO		
CARROTANQUE	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE	X	X
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE CONTINUA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE CONTINUA CON FILTRO O DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6X0.8)M REALIZANDO 13 ML
SE CONTINUA RECONSTRUCCION DE JARILLON PERDIDO POR EROSION
SE CONTINUA MEDIDA DE SEGURIDAD DE INSTALACION MECANICA DE ENROCADO DE GRAN TAMAÑO EN ZONA EROSIONADA POR OLA INVERNAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS: LLUVIAS CONSTANTES Y AUMENTO DE LA LÁMINA DE AGUA DEL RÍO BANADÍA.

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT. 901.901.368-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA *R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA*	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN *R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON*

FECHA:	VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FOLIO	167

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO		
CARROTANQUE	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS	X	
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		X
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE CONTINUA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE CONTINUA CON FILTRO O DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6X0.8)M REALIZANDO 13 ML
SE CONTINUA RECONSTRUCCION DE JARILLON PERDIDO POR EROSION
SE CONTINUA MEDIDA DE SEGURIDAD DE INSTALACION MECANICA DE ENROCADO DE GRAN TAMAÑO EN ZONA EROSIONADA POR OLA INVERNAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS: LLUVIAS CONSTANTES Y AUMENTO DE LA LÁMINA DE AGUA DEL RÍO BANADÍA.

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901.961.360-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	SABADO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FOLIO	168

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO		
CARROTANQUE	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico el	1		LLUVIAS PASAJERAS		X
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE	X	
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE CONTINUA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE CONTINUA CON FILTRO O DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6X0.8)M REALIZANDO 13 ML
SE CONTINUA RECONSTRUCCION DE JARILLON PERDIDO POR EROSION
SE CONTINUA MEDIDA DE SEGURIDAD DE INSTALACION MECANICA DE ENROCADO DE GRAN TAMAÑO EN ZONA EROSIONADA POR OLA INVERNAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS: LLUVIAS CONSTANTES Y AUMENTO DE LA LÁMINA DE AGUA DEL RÍO BANADÍA.

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT. 901.901.368-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FOLIO	169

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO		
CARROTANQUE	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico el	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE	X	X
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE OBRA POR SER DIA DOMINICAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901.901.368-1

CONTRATO DE OBRA N°: 481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**FOLIO**	170

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO		
CARROTANQUE	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE	X	X
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE CONTINUA CON FILTRO O DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6X0.8)M REALIZANDO 13 ML
SE CONTINUA RECONSTRUCCION DE JARILLON PERDIDO POR EROSION
SE CONTINUA MEDIDA DE SEGURIDAD DE INSTALACION MECANICA DE ENROCADO DE GRAN TAMAÑO EN ZONA EROSIONADA POR OLA INVERNAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS: LLUVIAS CONSTANTES Y AUMENTO DE LA LÁMINA DE AGUA DEL RÍO BANADÍA.

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901.901.268-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	MARTES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FOLIO	171

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO		
CARROTANQUE	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS	X	
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		X
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM

SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS

SE CONTINUA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA

SE CONTINUA CON FILTRO O DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6X0.8)M REALIZANDO 13 ML

SE CONTINUA RECONSTRUCCION DE JARILLON PERDIDO POR EROSION

SE CONTINUA MEDIDA DE SEGURIDAD DE INSTALACION MECANICA DE ENROCADO DE GRAN TAMAÑO EN ZONA EROSIONADA POR OLA INVERNAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS: LLUVIAS CONSTANTES Y AUMENTO DE LA LÁMINA DE AGUA DEL RÍO BANADÍA.

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA NIT 901.902.273	BITACORA DE OBRA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION NIT 901.903.368-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FOLIO	172

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO		
CARROTANQUE	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS	X	
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		X
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE CONTINUA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE CONTINUA CON FILTRO O DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6X0.8)M REALIZANDO 13 ML
SE CONTINUA RECONSTRUCCION DE JARILLON PERDIDO POR EROSION
SE CONTINUA MEDIDA DE SEGURIDAD DE INSTALACION MECANICA DE ENROCADO DE GRAN TAMAÑO EN ZONA EROSIONADA POR OLA INVERNAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS: LLUVIAS CONSTANTES Y AUMENTO DE LA LÁMINA DE AGUA DEL RÍO BANADÍA.

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901 901 569-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FOLIO	173

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	*Residente de Interventoria*	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO		
CARROTANQUE	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico et	1		LLUVIAS PASAJERAS		X
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE	X	
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE CONTINUA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE CONTINUA CON FILTRO O DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6X0.8)M REALIZANDO 13 ML
SE CONTINUA RECONSTRUCCION DE JARILLON PERDIDO POR EROSION
SE CONTINUA MEDIDA DE SEGURIDAD DE INSTALACION MECANICA DE ENROCADO DE GRAN TAMAÑO EN ZONA EROSIONADA POR OLA INVERNAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS: LLUVIAS CONSTANTES Y AUMENTO DE LA LÁMINA DE AGUA DEL RÍO BANADÍA.

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT. 901.901.369-3

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA *R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA*	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN *R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON*

FECHA:	VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FOLIO	174

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO		
CARROTANQUE	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR.	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico el	1		LLUVIAS PASAJERAS	X	
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		X
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE CONTINUA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE CONTINUA CON FILTRO O DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6X0.8)M REALIZANDO 16 ML
SE CONTINUA RECONSTRUCCION DE JARILLON PERDIDO POR EROSION
SE CONTINUA MEDIDA DE SEGURIDAD DE INSTALACION MECANICA DE ENROCADO DE GRAN TAMAÑO EN ZONA EROSIONADA POR OLA INVERNAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS: LLUVIAS CONSTANTES Y AUMENTO DE LA LÁMINA DE AGUA DEL RÍO BANADÍA.

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049396199
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ALBERTO SANTAFE CASTELLANOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	SARAVENA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	BARRIO SAN RAFAEL	TELÉFONO:	3144518
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4916756862**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTE
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/09/16	NÚMERO AUTORIZACION:	9998574839

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS042	EPS042 - COOSALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 99.100
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99.100**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES					
																											PENSIÓN									SALUD								ARP																		
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1049396199	SANTAFE CASTELLANOS CARLOS ALBERTO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS042 - COOSALUD	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 104939619	$ 99.100	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 504.900

Planilla Pagada

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35021122
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-10-14

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO RIO BANADIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901902273	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 30 8 49	DEPARTAMENTO	ARAUCA	MUNICIPIO	SARAVENA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CONSORCIORIOBANADIA@GMAIL.COM	TELÉFONO	3142788531
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1018444460	PRIMER APELLIDO	VILLARREAL	SEGUNDO APELLIDO	ROA
PRIMER NOMBRE	JEISSON	SEGUNDO NOMBRE	RENE		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 09	Año: 2025	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
30		$42.381.035		35021122

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-80109920	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	BARRAGAN MENDOZA JAIRO ALEXANDER	$2.750.000
CC-1115742269	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	BERNAL RODRIGUEZ JESUS GUILLERMO	$1.423.500
CC-1020810816	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	BOTIA CHONA MARLYN YVETTE	$3.000.000
CC-1115722498	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	CASTAÑEDA MENDOZA NELSON ARLEY	$1.423.500
CC-88215089	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	DELGADO MONTAGUT JOAQUIN EDUARDO	$2.750.000
CC-1098752791	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	GARCIA BELTRAN JHONN FREDY	$5.000.000
CC-1098716716	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	GARCIA BELTRAN JHONNATHAN ALEXIS	$5.000.000
CC-1094269468	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	GARRIDO RIVERO CAMILO ANDRES	$3.000.000
CC-1148703169	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	GELVIS PEÑALOZA DERIAN	$1.423.500
CC-1116496517	01	No	No	No	81	736	1711001	Fijo	GUTIERREZ VACCA HORLEYDA	$1.500.000
CC-1119185219	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	JOYA TAMARA EDWIN GABRIEL	$1.755.000
CC-1006407775	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	MEDINA GOMEZ DIEGO ANDRES	$1.423.500
CC-96189408	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	MENDOZA ARIZA ERNESTO	$1.423.500
CC-1125760100	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	MONCADA CORONEL JESUS ANTONIO	$1.423.500
CC-1098658689	01	No	No	No	81	736	1711001	Fijo	OCHOA JESSICA LILIBETH	$2.000.000
CC-1094283275	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	OLAYA BAYONA LAURA CRISTINA	$5.000.000
CC-88219552	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	ORTEGA CONTRERAS CARLOS	$1.423.500
CC-88033595	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	PABON ANDRADE HENRY	$1.423.500
CC-1234339637	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	PABON GOMEZ DAVINSON ANDRES	$1.423.500
CC-1098684323	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	PAEZ GARCIA FERNEY ALFONSO	$3.000.000
CC-9466736	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	QUINTERO VILLAMIZAR JUAN VICENTE	$1.755.000
CC-1115726704	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	RAMON ZUÑIGA OSCAR ARLEY	$1.423.500
CC-88311695	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	RIVERO VILLAMIZAR JOSE PABLO	$1.423.500
CC-1115738994	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	ROJAS MANRIQUE CARLOS ABEL	$1.423.500
CC-1006407690	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	SALCEDO ANGARITA HEINER	$1.423.500
CC-88216004	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	TOLOZA ORTIZ LUIS FERNANDO	$1.423.500
CC-1115740780	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	TORRES VELANDIA DAVISON	$1.423.500
CC-1091659018	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	VILA SARABIA JAIR LEANDRO	$8.000.000
CC-1018444460	01	No	No	No	81	736	1711001	Fijo	VILLARREAL ROA JEISSON RENE	$1.423.500
CC-96194216	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	ZAPATA ALEXANDER	$1.423.500

NOVEDADES																																		
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 80109920			X	2025-09-19																									0		
CC - 1115742269			X	2025-09-19																									0		
CC - 1020810816			X	2025-09-19																									0		
CC - 1115722498			X	2025-09-19																									0		
CC - 88215089			X	2025-09-19																									0		
CC - 1098752791			X	2025-09-19																									0		
CC - 1098716716			X	2025-09-19																									0		
CC - 1094269468			X	2025-09-19																									0		
CC - 1148703169			X	2025-09-19																									0		
CC - 1116496517																													0		
CC - 1119185219			X	2025-09-19																									0		
CC - 1006407775			X	2025-09-19																									0		
CC - 96189408	X	2025-09-30	X	2025-09-30																									0		
CC - 1125760100			X	2025-09-30																									0		
CC - 1098658689																													0		
CC - 1094283275																													0		
CC - 88219552			X	2025-09-19																									0		
CC - 88033595	X	2025-09-25	X	2025-09-25																									0		
CC - 1234339637			X	2025-09-19																									0		
CC - 1098684323			X	2025-09-19																									0		
CC - 9466736			X	2025-09-25																									0		
CC - 1115726704	X	2025-09-30	X	2025-09-30																									0		
CC - 88311695			X	2025-09-19																									0		
CC - 1115738994	X	2025-09-30	X	2025-09-30																									0		
CC - 1006407690	X	2025-09-25	X	2025-09-25																									0		
CC - 88216004	X	2025-09-25	X	2025-09-25																									0		
CC - 1115740780			X	2025-09-19																									0		
CC - 1091659018			X	2025-09-19																									0		
CC - 1018444460			X	2025-09-19																									0		
CC - 96194216			X	2025-09-19																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 80109920	PORVENIR	19	$1.741.667	0.1600000	$278.700	$0	$0	$278.700	$0	$0	$0
CC - 1115742269	PORVENIR	19	$901.550	0.1600000	$144.300	$0	$0	$144.300	$0	$0	$0
CC - 1020810816	PORVENIR	19	$1.900.000	0.1600000	$304.000	$0	$0	$304.000	$0	$0	$0
CC - 1115722498	PORVENIR	19	$901.550	0.1600000	$144.300	$0	$0	$144.300	$0	$0	$0
CC - 88215089	PROTECCION	19	$1.741.667	0.1600000	$278.700	$0	$0	$278.700	$0	$0	$0
CC - 1098752791	PORVENIR	19	$3.166.667	0.1600000	$506.700	$0	$0	$506.700	$0	$0	$0
CC - 1098716716	COLPENSIONES	19	$3.166.667	0.1600000	$506.700	$0	$0	$506.700	$0	$0	$0
CC - 1094269468	PORVENIR	19	$1.900.000	0.1600000	$304.000	$0	$0	$304.000	$0	$0	$0
CC - 1148703169	PORVENIR	19	$901.550	0.1600000	$144.300	$0	$0	$144.300	$0	$0	$0
CC - 1116496517	COLPENSIONES	30	$1.500.000	0.1600000	$240.000	$0	$0	$240.000	$0	$0	$0
CC - 1119185219	PORVENIR	19	$1.111.500	0.1600000	$177.900	$0	$0	$177.900	$0	$0	$0
CC - 1006407775	PORVENIR	19	$901.550	0.1600000	$144.300	$0	$0	$144.300	$0	$0	$0
CC - 96189408	PORVENIR	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	$0
CC - 1125760100	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1098658689	PORVENIR	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 1094283275	PORVENIR	30	$5.000.000	0.1600000	$800.000	$0	$0	$800.000	$0	$0	$0
CC - 88219552	PORVENIR	19	$901.550	0.1600000	$144.300	$0	$0	$144.300	$0	$0	$0
CC - 88033595	COLPENSIONES	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	$0
CC - 1234339637	PORVENIR	19	$901.550	0.1600000	$144.300	$0	$0	$144.300	$0	$0	$0
CC - 1098684323	COLPENSIONES	19	$1.900.000	0.1600000	$304.000	$0	$0	$304.000	$0	$0	$0
CC - 9466736	PORVENIR	25	$1.462.500	0.1600000	$234.000	$0	$0	$234.000	$0	$0	$0
CC - 1115726704	COLPENSIONES	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	$0
CC - 88311695	PROTECCION	19	$901.550	0.1600000	$144.300	$0	$0	$144.300	$0	$0	$0
CC - 1115738994	PORVENIR	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	$0
CC - 1006407690	PORVENIR	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	$0
CC - 88216004	COLPENSIONES	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	$0
CC - 1115740780	PORVENIR	19	$901.550	0.1600000	$144.300	$0	$0	$144.300	$0	$0	$0
CC - 1091659018	PORVENIR	19	$5.066.667	0.1600000	$810.700	$0	$0	$810.700	$0	$0	$0
CC - 1018444460	PORVENIR	19	$901.550	0.1600000	$144.300	$0	$0	$144.300	$0	$0	$0
CC - 96194216	PORVENIR	19	$901.550	0.1600000	$144.300	$0	$0	$144.300	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 80109920	SALUD TOTAL	19	$1.741.667	0.0400000	$69.700	$0	0	$0	0	$0	19	$1.741.667	54290001	0.0696000	$121.300
CC - 1115742269	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	19	$901.550	0.0400000	$36.100	$0	0	$0	0	$0	19	$901.550	54290001	0.0696000	$62.800
CC - 1020810816	NUEVA E.P.S. S.A.	19	$1.900.000	0.0400000	$76.000	$0	0	$0	0	$0	19	$1.900.000	54290001	0.0696000	$132.300
CC - 1115722498	NUEVA E.P.S. S.A.	19	$901.550	0.0400000	$36.100	$0	0	$0	0	$0	19	$901.550	54290001	0.0696000	$62.800
CC - 88215089	NUEVA E.P.S. S.A.	19	$1.741.667	0.0400000	$69.700	$0	0	$0	0	$0	19	$1.741.667	54290001	0.0696000	$121.300
CC - 1098752791	NUEVA E.P.S. S.A.	19	$3.166.667	0.0400000	$126.700	$0	0	$0	0	$0	19	$3.166.667	54290001	0.0696000	$220.500
CC - 1098716716	NUEVA E.P.S. S.A.	19	$3.166.667	0.0400000	$126.700	$0	0	$0	0	$0	19	$3.166.667	54290001	0.0696000	$220.500
CC - 1094269468	NUEVA E.P.S. S.A.	19	$1.900.000	0.0400000	$76.000	$0	0	$0	0	$0	19	$1.900.000	54290001	0.0696000	$132.300
CC - 1148703169	NUEVA E.P.S. S.A.	19	$901.550	0.0400000	$36.100	$0	0	$0	0	$0	19	$901.550	54290001	0.0696000	$62.800
CC - 1116496517	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.500.000	17110001	0.0052200	$7.900

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1119185219	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	19	$1.111.500	0.0400000	$44.500	$0	0	$0	0	$0	19	$1.111.500	54290001	0.0696000	$77.400
CC - 1006407775	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	19	$901.550	0.0400000	$36.100	$0	0	$0	0	$0	19	$901.550	54290001	0.0696000	$62.800
CC - 96189408	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$47.450	0.1250000	$6.000	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	54290001	0.0696000	$3.400
CC - 1125760100	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	54290001	0.0696000	$99.100
CC - 1098658689	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	17110001	0.0052200	$10.500
CC - 1094283275	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$5.000.000	0.0400000	$200.000	$0	0	$0	0	$0	30	$5.000.000	54290001	0.0696000	$348.000
CC - 88219552	NUEVA E.P.S. S.A.	19	$901.550	0.0400000	$36.100	$0	0	$0	0	$0	19	$901.550	54290001	0.0696000	$62.800
CC - 88033595	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	54290001	0.0696000	$3.400
CC - 1234339637	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	19	$901.550	0.0400000	$36.100	$0	0	$0	0	$0	19	$901.550	54290001	0.0696000	$62.800
CC - 1098684323	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	19	$1.900.000	0.0400000	$76.000	$0	0	$0	0	$0	19	$1.900.000	54290001	0.0696000	$132.300

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 9466736	EPS-S COOSALUD	25	$1.462.500	0.0400000	$58.500	$0	0	$0	0	$0	25	$1.462.500	54290001	0.0696000	$101.800
CC - 1115726704	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	54290001	0.0696000	$3.400
CC - 88311695	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	19	$901.550	0.0400000	$36.100	$0	0	$0	0	$0	19	$901.550	54290001	0.0696000	$62.800
CC - 1115738994	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	54290001	0.0696000	$3.400
CC - 1006407690	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	54290001	0.0696000	$3.400
CC - 88216004	EPS-S COOSALUD	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	54290001	0.0696000	$3.400
CC - 1115740780	NUEVA E.P.S. S.A.	19	$901.550	0.0400000	$36.100	$0	0	$0	0	$0	19	$901.550	54290001	0.0696000	$62.800
CC - 1091659018	NUEVA E.P.S. S.A.	19	$5.066.667	0.0400000	$202.700	$0	0	$0	0	$0	19	$5.066.667	54290001	0.0696000	$352.700
CC - 1018444460	NUEVA E.P.S. S.A.	19	$901.550	0.0400000	$36.100	$0	0	$0	0	$0	19	$901.550	17110001	0.0052200	$4.800
CC - 96194216	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	19	$901.550	0.0400000	$36.100	$0	0	$0	0	$0	19	$901.550	54290001	0.0696000	$62.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-80109920	COMFIAR	19	$1.741.667	0.0400000	$69.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1115742269	COMFIAR	19	$901.550	0.0400000	$36.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1020810816	COMFIAR	19	$1.900.000	0.0400000	$76.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1115722498	COMFIAR	19	$901.550	0.0400000	$36.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88215089	COMFIAR	19	$1.741.667	0.0400000	$69.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1098752791	COMFIAR	19	$3.166.667	0.0400000	$126.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1098716716	COMFIAR	19	$3.166.667	0.0400000	$126.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1094269468	COMFIAR	19	$1.900.000	0.0400000	$76.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1148703169	COMFIAR	19	$901.550	0.0400000	$36.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1116496517	COMFIAR	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1119185219	COMFIAR	19	$1.111.500	0.0400000	$44.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1006407775	COMFIAR	19	$901.550	0.0400000	$36.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-96189408	COMFIAR	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0200000	$1.000	0.0300000	$1.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1125760100	COMFIAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1098658689	COMFIAR	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1094283275	COMFIAR	30	$5.000.000	0.0400000	$200.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88219552	COMFIAR	19	$901.550	0.0400000	$36.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88033595	COMFIAR	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1234339637	COMFIAR	19	$901.550	0.0400000	$36.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1098684323	COMFIAR	19	$1.900.000	0.0400000	$76.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9466736	COMFIAR	25	$1.462.500	0.0400000	$58.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1115726704	COMFIAR	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88311695	COMFIAR	19	$901.550	0.0400000	$36.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1115738994	COMFIAR	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1006407690	COMFIAR	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-88216004	COMFIAR	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1115740780	COMFIAR	19	$901.550	0.0400000	$36.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1091659018	COMFIAR	19	$5.066.667	0.0400000	$202.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1018444460	COMFIAR	19	$901.550	0.0400000	$36.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-96194216	COMFIAR	19	$901.550	0.0400000	$36.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	2	$423.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$423.000
COLPENSIONES	6	$1.073.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.073.500
PORVENIR	22	$5.285.300	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$5.285.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	$69.700	$0	0	$0	0	$0	$69.700	0	$0	$0	$69.700	$0	0	$0	$0	$69.700	$0	$0	$69.700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	14	$451.600	$0	0	$0	0	$0	$451.600	0	$0	$0	$451.600	$0	0	$0	$0	$451.600	$0	$0	$451.600
EPS-S COOSALUD	2	$60.400	$0	0	$0	0	$0	$60.400	0	$0	$0	$60.400	$0	0	$0	$0	$60.400	$0	$0	$60.400
NUEVA E.P.S. S.A.	13	$1.118.300	$0	0	$0	0	$0	$1.118.300	0	$0	$0	$1.118.300	$0	0	$0	$0	$1.118.300	$0	$0	$1.118.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	30	$2.668.300	0	$0	$0	$2.668.300	0	$0	$2.668.300	0	$0	$0	$2.668.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFIAR	30	$1.695.900	0	$0	$1.695.900
SENA	1	$1.000	0	$0	$1.000
ICBF	1	$1.500	0	$0	$1.500
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$1.700.000
PENSIONES	3	$6.781.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$2.668.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.695.900
SENA	1	$1.000
ICBF	1	$1.500
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$12.848.500

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8638317854
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8637026466
Fecha Pago Planilla: 2025-10-06

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	DIEGO FERNANDO MEDINA ORTEGA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	91530796	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 30 NO 8 49	DEPARTAMENTO	ARAUCA	MUNICIPIO	SARAVENA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4390	CORREO ELECTRÓNICO	DM533806@GMAIL.COM	TELÉFONO	3208034850
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 09	Año: 2025	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		8638317854

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-91530796	57	No	No	No	81	736	0	Salario	MEDINA ORTEGA DIEGO FERNANDO	$1.423.500

NOVEDADES																																		
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 91530796																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 91530796	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 91530796	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	81 60 10	0.0696000	$99.100

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-91530796	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$227.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$227.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$178.000	$0	0	$0	0	$0	$178.000	0	$0	$0	$178.000	$0	0	$0	$0	$178.000	$0	$0	$178.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$99.100	0	$0	$0	$99.100	0	$0	$99.100	0	$0	$0	$99.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$178.000
PENSIONES	1	$227.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$99.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$504.900

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8638317795
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8655837037
Fecha Pago Planilla: 2025-10-07

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	EDWIN YULANDY RINCON GONZALEZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1119183735	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 27 7 31	DEPARTAMENTO	ARAUCA	MUNICIPIO	FORTUL
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7490	CORREO ELECTRÓNICO	REDWINYULANDY@GMAIL.COM	TELÉFONO	3144631201
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 09	Año: 2025	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		8638317795

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1119183735	57	No	No	No	81	300	0	Salario	RINCON GONZALEZ EDWIN YULANDY	$1.423.500

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1119183735																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1119183735	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1119183735	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	80013606 9	0.0696000	$99.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1119183735	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$227.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$227.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$178.000	$0	0	$0	0	$0	$178.000	0	$0	$0	$178.000	$0	0	$0	$0	$178.000	$0	$0	$178.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$99.100	0	$0	$0	$99.100	0	$0	$99.100	0	$0	$0	$99.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$178.000
PENSIONES	1	$227.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$99.100

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$504.900
