INFORME DE OBRA FINAL

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SAMC-MGA-002 DE 2026

MUNICIPIO DE MALAGA - SANTANDER

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: EN UN TRAMO DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 8; UN TRAMO EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERA 3A Y CARRERA 3B; CALLE 18C ENTRE CARRERA 10 Y LA TRONCAL CENTRAL DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER**."**

EDWIN RAMIRO SIERRA MESA

CONTRATISTA

ING. WINSTON JAVIER NIÑO

INTERVENTOR DEL CONTRATO

Contrato de interventoría No. MC-MGA-031 DE 2026

ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

PERIODO 26 DE MAYO AL 26 DE JULIO DE 2026

MALAGA – SANTANDER,

CONTENIDO

Página

INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 6
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
4. ASPECTOS GENERALES DE LOS CONTRATOS 7
4.1 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 7
4.2 PRESUPUESTO OFICIAL 8
5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS 9
5.1 MODIFICACIONES AL CONTRATO 9
5.2 FUNCIONES PERSONAL DE OBRA 9
5.3 BALANCE DE LA OBRA 10
6. ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTROL DE PRESUPUESTO 10
6.1 VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. 10
6.2 VALOR ADICIONAL AL CONTRATO – OTRO SÍ. 11
6.3 OBRAS CONTRATADAS. 11
6.4 OBRAS ADICIONALES. 11
6.5 ANTICIPO. 11
7. ASPECTOS TÉCNICOS 11
7.1 INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 11
7.1.1 PROCESOS CONSTRUCTIVOS 11
7.1.2 ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRA **¡Error! Marcador no definido.**
7.1.3 EQUIPO UTILIZADO. 14
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 14

LISTA DE TABLAS

Página

Tabla 1. Resumen Contrato de Obra Pública No. 162 de 2025.....
Tabla 2. Presupuesto oficial contrato obra pública No. 162– 2025.....
Tabla 3. Funciones personal de Obra.....
Tabla 4. Presupuesto Ejecutado en el presente periodo. .....
Tabla 5. Equipos y/o herramientas utilizados en obra. .....
Tabla 6. Seguridad social contratista.....

LISTA DE IMÁGENES

Página

Imagen 1. Localizacion del proyecto .....

LISTA DE ANEXOS

Anexo No. 01. Anexo Acta entrega y recibo final de Obra

Anexo No. 02. Registro Fotográfico.

Anexo No. 03. Pagos a Seguridad Social y Riesgos Profesionales.

INTRODUCCIÓN

Este documento contiene el informe de obra que corresponde al período entre el Veintiséis (26) de Mayo al veintiséis (26) de Julio de 2026, en desarrollo del contrato de obra No. SAMC-MGA-002 DE 2026 suscrito entre el MUNICIPIO DE MALAGA - SANTANDER Y EDWIN RAMIRO SIERRA MESA., cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: EN UN TRAMO DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 8; UN TRAMO EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERA 3A Y CARRERA 3B; CALLE 18C ENTRE CARRERA 10 Y LA TRONCAL CENTRAL DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER."

En este informe se describen las actividades elaboradas por el contratista de obra que correspondieron al presente periodo de ejecución de obra que comprenden las fechas ya mencionadas con anterioridad.

Este informe es presentado por el ingeniero EDWIN RAMIRO SIERRA MESA, siendo el contratista de obra del presente proyecto.

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Uno de los retos más importantes que debe encarar el municipio de málaga será el de gestionar el mejoramiento y ampliación de su red vial a gran escala. Por esta razón el municipio es la entidad responsable del diseño, construcción, reparación y mantenimiento de toda la infraestructura vial, de parques, escenarios deportivos, obras de saneamiento básico, estabilidad y bienes del municipio, entre otros en cumplimiento al plan de desarrollo y de su misión institucional por eso se vienen desarrollando actividades de planeación para mejorar la infraestructura vial a través del mejoramiento, adecuación, de las vías peatonales y que se encuentran en pésimo estado.

El estado actual de deterioro en el que se encuentran las vías y las cercanías de las mismas con las vías principales del municipio, genera incremento en los tiempos de traslado y dificulta el acceso a los productos y servicios que se ofrecen en cada uno de las zonas afectadas, lo que genera un impacto negativo y una disminución de la imagen favorable del municipio para residentes y turistas.

De acuerdo con diagnósticos realizados, las arterias de ingreso a los principales lugares del municipio se encuentran en mal estado debido al alto tráfico de vehículos y al cumplimiento de la vida útil del pavimento, lo que ocasiona que se conviertan en vías intransitables y generen accidentes tanto a vehículos como a peatones.

Actualmente, los habitantes de los sectores El Tajamar, Poveda Flórez y Naranjitos en el municipio de Málaga enfrentan una crítica deficiencia en la intercomunicación terrestre. La ausencia de pavimentación en las vías principales y secundarias ha generado un aislamiento funcional de la población urbana, dificultando el tránsito fluido y limitando el desarrollo social y económico de estas comunidades, que ven mermada su calidad de vida ante la precariedad de la infraestructura actual.

Finalmente, esta situación de desatención vial requiere una intervención técnica urgente por parte de la administración municipal. La pavimentación no debe ser vista solo como una mejora estética, sino como una inversión necesaria para garantizar el derecho a la movilidad segura, el acceso a la salud y la competitividad urbana de Málaga, integrando de manera efectiva a los sectores de El Tajamar, Poveda Flórez y Naranjitos con el resto del casco urbano.

La solución a esta necesidad es que la Administración Municipal actual, logre la construcción, mantenimiento y/o reparación de las vías urbanas del municipio como estrategia para el fortalecimiento de la productividad, la dignificación de las condiciones, reducir las brechas y de la misma manera dinamizar la economía entorno a actividades que se constituyen como multidisciplinarias para el desarrollo del Municipio de Málaga, que se proyecta en este Programa de Gobierno 2024-2027, como ciudad Región para la Provincia de García Rovira, departamento de Santander.


Meta: Construcción de 194 metros lineales de doble vía en concreto rígido en el casco urbano del municipio de Málaga.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto para la CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: EN UN TRAMO DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 8; UN TRAMO EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERA 3A Y CARRERA 3B; CALLE 18C ENTRE CARRERA 10 Y LA TRONCAL CENTRAL DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER, se llevo a cabo en el área Urbana del municipio.

AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MALAGA - SANTANDER

Imagen 1. Localización de la obra.

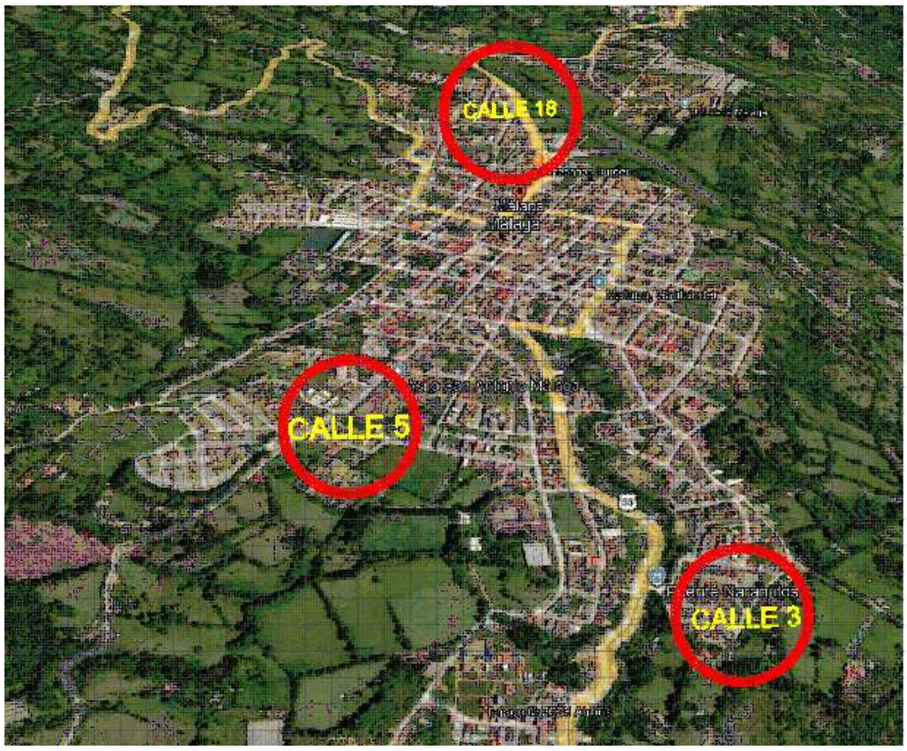

4. ASPECTOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

Se presenta a continuación un resumen del estado actual del contrato de obra pública No. SAMC-MGA-002 DE 2026.

4.1 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO DEL PROCESO	SAMC-MGA-002 DE 2026
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FECHA DEL CONTRATO	08/05/2026
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: EN UN TRAMO DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 8; UN TRAMO EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERA 3A Y CARRERA 3B; CALLE 18C ENTRE CARRERA 10 Y LA TRONCAL CENTRAL DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER
VALOR INICIAL	$ 479.441.751,oo M/CTE
ADICIÓN EN VALOR	N/A
PLAZO INICIAL	DESDE 26 MAYO HASTA 26 DE JULIO DE 2026
PLAZO ADICIONAL	0 DIAS CALENDARIO
CONTRATISTA	EDWIN RAMIRO SIERRA MESA C.C. 13.719.731 EXPEDIDA BUCARAMANGA
INTERVENTOR	ING. WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO
SUPERVISOR	ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO JEFE DE PLANEACION MUNICIPAL

ANTICIPO				SI ____ NO __X__ VALOR $ _____ (PORCENTAJE ____ %)		
FECHA DE INICIACIÓN:				14/11/2025		
ACTAS DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº		DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
ACTA DE REINICIO	Nº	Nº	Nº		DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE TERMINACIÓN:				26/07/2026		

Tabla 1. Resumen Contrato de Obra Pública No. SAMC-MGA-002 DE 2026.

4.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial aprobado para el proyecto se enuncia a continuación

PRESUPUESTO OFICIAL

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0 PRELIMINARES								
1.1	1.01.01		1.01.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PAVIMENTO	m2	984.23	$ 8,132.00	$ 8,003,758.00
							Subtotal	**$ 8,003,758.00**
2.0 ESTRUCTURA PAVIMENTO								
2.1	330.1.2	330,1,2		CAJEO EN MATERIAL COMÚN PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE (INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO)	m3	508.29	$ 44,110.00	$ 22,420,672.00
2.2	310.1			CONFORMACION DE SUBRASANTE	m2	973.42	$ 2,202.00	$ 2,143,471.00
2.3	330.1.2	330,1,2		SUMINISTRO INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR CLASE A	m3	279.26	$ 248,811.00	$ 69,482,960.00
2.4	500.2	500.2		PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 4,2 Mpa	m3	177.16	$ 1,473,682.00	$ 261,077,503.00
2.5	640.1	640.1		ACERO LISO N° 7 PARA DOVELAS f'y 4200 Mpa (INCLUYE CANASTILLA EN GRAFIL 6MM)	kg	966.84	$ 18,391.00	$ 17,781,154.00
2.6	640.2	640.2		ACERO DE REFUERZO N° 4 f'y 4200 Mpa (BARRAS DE AMARRE, LOSAS REFORZADAS Y POZOS DE INSPECCIÓN)	kg	1,311.94	$ 11,723.00	$ 15,379,873.00
2.7	500.1.1			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDON Y SELLANTE PARA JUNTAS	m	511.12	$ 27,271.00	$ 13,938,754.00
2.8	311.13			SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACIÓN DE CRUDO DE RIO PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE TAMAÑO MAXIMO 4"	m3	53.81	$ 203,167.00	$ 10,932,416.00
2.9	673.1.1			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO RESISTENCIA 40KN/m (INCLUYE TRASLAPE MINIMO DE 30 CM), PARA MEJORAMIENTO SUBRASANTE CALLE 18 C LIBERTADORES	m2	231.46	$ 12,348.00	$ 2,858,068.00
2.10	1.01.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO SARDINEL A-85 BAJO RAMPA (INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO)	ml	70.49	$ 120,185.00	$ 8,471,841.00
2.11				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 DE 80x50x20 (INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE	ml	265.70	$ 133,412.00	$ 35,447,568.00
2.12				CONCRETO CLASE D (3000 PSI) PARA FABRICACIÓN DE BORDILLO	ml	13.09	$ 98,851.00	$ 1,293,960.00
2.13		700.1		DEMARCACIÓN VIAL EN LINEAS CON ANCHO 12 CM CON PINTURA ACRÍLICA TIPO TRAFICO (BLANCA O AMARILLA)	ml	378.00	$ 9,061.00	$ 3,425,058.00
2.14				ASEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE)	m2	492.12	$ 3,376.00	$ 1,661,397.00
							Subtotal	**$ 466,314,695.00**
							SUBTOTAL OBRAS	

VALOR TOTAL=(A)	$	474,318,453.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL = (B)	$	996,860.00
PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO = ©	$	4,126,438.00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**N/A**	
VALOR TOTAL	**$**	**479,441,751.00**

Tabla 2. Presupuesto oficial contrato obra pública No. SAMC-MGA-002 DE 2026

5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS

Esta sección contiene los principales aspectos administrativos y jurídicos en el seguimiento del contrato de obra pública No. SAMC-MGA-002 DE 2026, para la "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: EN UN TRAMO DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 8; UN TRAMO EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERA 3A Y CARRERA 3B; CALLE 18C ENTRE CARRERA 10 Y LA TRONCAL CENTRAL DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER."

5.1 MODIFICACIONES AL CONTRATO

N/A

5.2 FUNCIONES PERSONAL DE OBRA

El personal dispuesto por parte del contratista para ejecutar y administrar las actividades del contrato de obra pública No. SAMC-MGA-002 DE 2026 se relaciona a continuación. Los documentos que soportan las afiliaciones del personal de obra así como los pagos correspondientes al periodo del informe al sistema de seguridad social y parafiscal. Ver Anexo No. 04.

NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA	OCUPACION	FECHA INGRESO	SALUD	PENSION	RIESGOS	CAJA COMPENSAC
EDWIN RAMIRO SIERRA MESA	13.719.731	RESIDENTE	27/05/2026	Nueva EPS	porvenir	Sura	
MARIA FERNANDA CAMPEROS ARDILA	1,096,950,980	SISO	01/06/2026	compensar	skandia	Positiva	Confenalco
LAURA FERNANDA VEGA LEIVA	1,007,917,168	INSPECTORA HSEQ AUX	27/05/2026	Sanitas	Colpensiones	Positiva	Confenalco
WILMER SIERRA MESA	1,098,630,870	Ayudante	27/05/2026	Nueva eps	porvenir	Positiva	Confenalco
CARLOS MAURICIO BLANCO GUIO	1,015,314,223	Ayudante	27/05/2026	Sanitas	porvenir	Positiva	Confenalco
EDUAR ALEXIS JAIMES JAIMES	13,907,062	Maestro	27/05/2026	Sanitas	Colfondos	Positiva	Confenalco
JESUS ARCANGEL CACERES RANGEL	1,098,132,731	Ayudante	27/05/2026	Nueva EPS	Colpensiones	Positiva	Confenalco
DAVID FELIPE JOYA MARIN	1,000,063,187	Ayudante	28/05/2026	Sanitas	Protección	Positiva	Confenalco
JHON ALEXANDER CAMARGO RODRIGUEZ	1,005,231,274	Ayudante	01/06/2026	Suramericana de servicios de salud	Protección	Positiva	Confenalco
PEREZ PEÑA VICTOR LEONARDO	1,096,946,566	Ayudante	01/06/2026	Salud Total	Colpensiones	Positiva	Confenalco
NIXON ASCANIO ORTIZ	88,282,927	Ofcial de O	09/06/2026	Salud Total	Porvenir	Positiva	Confenalco

Tabla 3. Funciones personal de Obra.

5.3 BALANCE DE LA OBRA

A continuación, se suministra el resumen del presupuesto ejecutado durante el tiempo del presente informe.

ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAGA	ANEXO AL ACTA DE MAYORES Y MENORES 01 DEL CONTRATO SAMC-MGA-002-2026
	ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAGA
	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: EN UN TRAMO DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 8; UN TRAMO EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERA 3A Y CARRERA 3B; CALLE 18C ENTRE CARRERA 10 Y LA TRONCAL CENTRAL DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER."

VALOR CONTRATO PRINCIPAL		$ 479,441,751.00		
VALOR CONTRATO ADICIONAL		$ 0.00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 479,441,751.00		

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICACION 1				CONDICIONES FINALES	
			CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	MAYORES	VALOR PARCIAL	MENORES	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1.00	PRELIMINARES										
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PAVIMENTO	m2	984.23	$ 8,132.00	$ 8,003,758.00	-	$ -	-		984.23	$ 8,003,758.00
	SUBTOTAL CAPITULO				$ 8,003,758.00	-					$ 8,003,758.00
2.00	ESTRUCTURA PAVIMENTO										
2.1	CAJEO EN MATERIAL COMÚN PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE (INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO)	m3	508.29	$ 44,110.00	$ 22,420,672.00	43.94	$ 1,938,193.00	-		552.23	$ 24,358,865.00
2.2	CONFORMACION DE SUBRASANTE	m2	973.42	$ 2,202.00	$ 2,143,471.00	67.87	$ 149,450.00	-		1,041.29	$ 2,292,921.00
2.3	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR CLASE A	m3	279.26	$ 248,811.00	$ 69,482,960.00	11.82	$ 2,940,946.00	-	$ -	291.08	$ 72,423,906.00
2.4	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 4,2 Mpa	m3	177.16	$ 1,473,682.00	$ 261,077,503.00	-		4.97	$ 7,324,199.54	172.19	$ 253,753,304.00
2.5	ACERO LISO N° 7 PARA DOVELAS Fy 4200 Mpa (INCLUYE CANASTILLA EN GRAFIL 6MM)	kg	966.84	$ 18,391.00	$ 17,781,154.00	-		84.31	$ 1,550,489.12	882.53	$ 16,230,665.00
2.6	ACERO DE REFUERZO N° 4 Fy 4200 Mpa (BARRAS DE AMARRE, LOSAS REFORZADAS Y POZOS DE INSPECCIÓN)	kg	1311.94	$ 11,723.00	$ 15,379,873.00	324.64	$ 3,805,755.00	-		1,636.58	$ 19,185,627.00
2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDON Y SELLANTE PARA JUNTAS	m	511.12	$ 27,271.00	$ 13,938,754.00	-		3.88	$ 105,811.48	507.24	$ 13,832,942.00
2.8	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACIÓN DE CRUDO DE RIO PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE TAMAÑO MAXIMO 4"	m3	53.81	$ 203,167.00	$ 10,932,416.00	-		10.06	$ 2,043,860.02	43.75	$ 8,888,556.00
2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO RESISTENCIA 40KN/m (INCLUYE TRASLAPE MINIMO DE 30 CM), PARA MEJORAMIENTO SUBRASANTE CALLE 18 C LIBERTADORES	m2	231.46	$ 12,348.00	$ 2,858,068.00	-		50.94	$ 629,007.12	180.52	$ 2,229,061.00
2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO SARDINEL A-85 BAJO RAMPA (INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO)	ml	70.49	$ 120,185.00	$ 8,471,841.00	10.18	$ 1,223,483.00	-		80.67	$ 9,695,324.00
2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 DE 80x50x20 (INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO)	ml	265.7	$ 133,412.00	$ 35,447,568.00	24.42	$ 3,257,921.00	-		290.12	$ 38,705,489.00
2.12	CONCRETO CLASE D (3000 PSI) PARA FABRICACIÓN DE BORDILLO	ml	13.09	$ 98,851.00	$ 1,293,960.00	-		13.09	$ 1,293,959.59	-	$ -
2.13	DEMARCACIÓN VIAL EN LINEAS CON ANCHO 12 CM CON PINTURA ACRÍLICA TIPO TRAFICO (BLANCA O AMARILLA)	ml	378	$ 9,061.00	$ 3,425,058.00	-		233.00	$ 2,111,213.00	145.00	$ 1,313,845.00
2.14	ASEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE)	m2	492.12	$ 3,376.00	$ 1,661,397.00	516.23	$ 1,742,793.00	-		1,008.35	$ 3,404,190.00
	SUBTOTAL CAPITULO				$ 466,314,695.00		$ 15,058,541.00		- 15,058,539.87		$ 466,314,695.00
	SUBTOTAL OBRAS				$ 474,318,453.00						$ 474,318,453.00
	VALOR TOTAL=(A)				$ 474,318,453.00						$ 474,318,453.00
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL = (B)				996,860.00						$ 996,860.00
	PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO = ©				4,126,438.00						$ 4,126,438.00
	VALOR TOTAL=				$ 479,441,751.00						$ 479,441,751.00

Tabla 4. Presupuesto Ejecutado en el presente periodo.

6. ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTROL DE PRESUPUESTO

6.1 VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

El valor del contrato principal es de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($479.441.751,00), donde el contratista se obligó a ejecutar para el municipio de MALAGA las cantidades de obra por el sistema de precios unitarios, conforme al pliego de condiciones y a la propuesta presentada, y será cancelado mediante actas de avance parcial de obra.

6.2 VALOR ADICIONAL AL CONTRATO – OTRO SÍ.

N/A

6.3 OBRAS CONTRATADAS.

En el numeral 4.2 se indica el cuadro de cantidades de obra contratadas, el cual comprende la descripción de cada ítem, precios unitarios y costo del proyecto para la *"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: EN UN TRAMO DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 8; UN TRAMO EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERA 3A Y CARRERA 3B; CALLE 18C ENTRE CARRERA 10 Y LA TRONCAL CENTRAL DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER.""*

6.4 OBRAS ADICIONALES.

N/A

6.5 ANTICIPO.

En el contrato se pactó un anticipo del 0% .

6.6 VALOR FINAL OBRAS EJECUTADAS

El valor de las obras ejecutadas en el presente contrato es de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($479.441.751,00).

7. ASPECTOS TÉCNICOS

7.1 INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

7.1.1 PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Durante el periodo del presente informe se realizó la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y normas vigentes que garanticen todos los requerimientos que el Municipio de Malaga ha hecho a la supervisión y al contratista con el fin de satisfacer el nivel de calidad de los trabajos ejecutados.

actividades ejecutadas.

- LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO: Previo al inicio de las obras, se ejecutaron los trabajos topográficos que incluyeron el estacado del abscisado, la nivelación de precisión y todas las labores inherentes a la localización y el replanteo del proyecto en el terreno.
- CAJEO EN MATERIAL COMÚN PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE: se iniciaron las labores de excavación mediante cajeo a través de maquinaria pesada (retroexcavadora de oruga) y el retiro y disposición final del material de excavación.
- CONFORMACION DE SUBRASANTES: se realizaron trabajos de compactación mecánica a la subrasante mediante maquinaria tipo vibro compactador de 9

toneladas, controlando las densidades de campo mediante ensayos de densidad in situ y el muestreo del material para su respectivo análisis de laboratorio

- SUMINISTRO INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR CLASE A: se procedió con la colocación y extendido de la subbase (o base) granular para el mejoramiento estructural del pavimento. Asimismo, se ejecutó la compactación mecánica de la capa, controlando las densidades de campo mediante ensayos de densidad in situ y el muestreo del material para su respectivo análisis de laboratorio.
- ACERO DE REFUERZO N° 4 f'y 4200 Mpa (BARRAS DE AMARRE, LOSAS REFORZADAS Y POZOS DE INSPECCIÓN): Esta actividad comprende el suministro, habilitado e instalación de barras de transferencia de carga (pasajuntas) mediante el uso de conjuntos de soporte tipo canastilla. Dichos elementos estructurales garantizan el correcto alineamiento, nivelación y paralelismo de las barras lisas de acero No. 7 (Ø 7/8"), asegurando la continuidad estructural y una eficiente transferencia de esfuerzos cortantes entre losas contiguas de pavimentos rígidos, sin restringir los movimientos de expansión y contracción térmica.
- PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 4,2 Mpa: Se ejecutó la construcción de las losas de concreto hidráulico para la estructura de la vía, garantizando el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto y las propiedades reológicas y mecánicas definidas en el diseño de mezcla optimizado.

  Moldeo de especímenes cilíndricos (resistencia a la compresión,) y vigas (resistencia a la flexo tracción - Módulo de Rotura, MR) para su posterior fallo en laboratorio a las edades de control (7, 14 y 28 días).

  Ejecución del estriado transversal en el estado plástico óptimo para garantizar el índice de fricción internacional (IRI) y la seguridad vial.

  Aplicación inmediata de membrana de curado (compuesto químico de base parafínica u homologado) tras la pérdida del brillo superficial del concreto, asegurando la retención de agua para la correcta hidratación del cemento.

  Corte mecánico de las juntas de contracción dentro de la ventana de tiempo crítica (antes del inicio del fraguado final) para inducir las fisuras y controlar los esfuerzos de contracción por secado.

  Restricción absoluta del tráfico vehicular hasta que los ensayos de laboratorio certifiquen que el concreto alcanzó la resistencia mecánica de diseño especificada.

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDON Y SELLANTE PARA JUNTAS

  El suministro e instalación de cordón de respaldo y sellante elástico es un procedimiento técnico fundamental para garantizar la impermeabilidad, flexibilidad y durabilidad de las juntas de dilatación en pisos de concreto.

  Cordón de Respaldo: Elemento de espuma de polietileno de celda cerrada. Evita que el sellante se adhiera al fondo de la junta y controla la profundidad de la aplicación

  Sellante Elástico: Poliuretano, silicona de alto rendimiento o híbridos, seleccionados según la exposición (tráfico, intemperie o químicos).

- SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACIÓN DE CRUDO DE RIO PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE TAMAÑO MAXIMO 4"

  Se realizo la aplicación de crudo de rio en la calle 18 con la finalidad de mejorar la estructura de la vía para la aplicación del pavimento rígido toda vez que esta sector presenta alto niveles freáticos debido a ser una zona bastante húmeda, por tal motivo se vio la necesidad de realizar el mejoramiento mediante la Extensión del material en capas uniformes controlando el espesor suelto para garantizar la compactación.

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO RESISTENCIA 40KN/m (INCLUYE TRASLAPE MINIMO DE 30 CM), PARA MEJORAMIENTO SUBRASANTE CALLE 18 C LIBERTADORES.

  Este actividad de obra corresponde al suministro y colocación de un geotextil tejido de polipropileno con resistencia a la tensión de 40 kN/m, traslapes longitudinales y transversales de 30 cm como mínimo, destinado a la estabilización mecánica, separación y refuerzo de la subrasante en proyectos viales como el de la Calle 18C en el sector de Los Libertadores.

  Tipo de material: Geotextil tejido plano a base de cintas o monofilamentos de polipropileno (PP).

  Resistencia a la tracción: Mínimo 40 kN/m en dirección principal (longitudinal y transversal).

  Función principal: Separación de suelos finos blandos y refuerzo estructural de la subrasante para reducir deformaciones verticales.

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO SARDINEL A-85 BAJO RAMPA
  Estos trabajos comprendieron las actividades de suministro, transporte, manejo, almacenamiento, adecuación de la superficie de soporte, colocación y acabado del bordillo sardinel prefabricado de concreto tipo **A-85 (Bajo Rampa)**. El elemento cumple la función de confinamiento, transición topográfica y delimitación geométrica en los accesos vehiculares, vados peatonales o rebajes de andén, garantizando la continuidad del espacio público y la seguridad en el flujo peatonal y vehicular de acuerdo con los planos del proyecto y las especificaciones la entidad contratante.

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 DE 80x50x20
  Se procede a marcar las líneas guías y niveles de acabado utilizando hilos, estacas y equipo topográfico de acuerdo con los planos, Se fija la altura final, garantizando que el elemento sobresalga la distancia reglamentaria respecto al pavimento: Se remueve el material lateral a la calzada con el ancho y profundidad necesarios para albergar la base y el cuerpo del sardinel, Se retira el suelo orgánico o contaminado y se reemplaza si es necesario, : Se apisona y nivela firmemente la superficie de apoyo (subrasante) para evitar asentamientos futuros, Se extiende un colchón de mortero húmedo de 1 a 2 cm sobre la base, : Se asientan las piezas utilizando un mazo de goma, verificando la perfecta alineación horizontal y vertical con el hilo guía Se rellena y compacta con suelo seleccionado o concreto el espacio posterior del sardinel para fijar estructuralmente la pieza contra los empujes laterales.

- DEMARCACIÓN VIAL EN LINEAS CON ANCHO 12 CM CON PINTURA ACRÍLICA TIPO TRAFICO (BLANCA O AMARILLA)
  Este trabajo consistió en la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la ejecución del pintado y demarcación sobre la superficie del pavimento. Las líneas se trazaron con un ancho continuo y uniforme de 12 centímetros, utilizando pintura acrílica base solvente o base agua de alta resistencia al desgaste, diseñada específicamente para resistir el tráfico vehicular pesado y los factores climáticos. El color empleado fue el amarillo, según lo especificado en los planos de señalización horizontal del proyecto.

- ASEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN: Ejecución periódica de labores de orden, aseo y recolección de residuos y materiales sobrantes generados por las actividades de construcción. Incluye el acopio interno, cargue, transporte y disposición final en sitios autorizados, garantizando las condiciones de seguridad y gestión ambiental de la obra.

7.1.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO.

A continuación, se presenta el equipo empleado durante el periodo que comprende el presente informe:

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD
retroexcavadora	1	Retroexcavadora de llanta tipo pajarita mod 2001
compactador	1	Vibro compactador de rodillo de 9 ton mod 2015
minicargador	1	Tipo bocat mod 2018
hormigonera	1	Tipo carmix mod 2016
mezcladora	2	Capacidad 2 bultos a gasolina
Herramienta menor	12	Palas, picas, barras, porras, seguetas, carretillas, etc.
Pulidoras	2	Pulidora 9” y pulidora 4”.
Equipo compactación manual	1	Tipo rana o apisonador a gasolina

Tabla 5. Equipos y/o herramientas utilizadas en obra

RELACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE OBRA

NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA	OCUPACION	PLANILLA MAYO	PLANILLA JUNIO	PLANILLA JULIO
EDWIN RAMIRO SIERRA MESA	13.719.731	RESIDENTE	6016328456 SOI	6022439103 SOI	6025831187 SOI
MARIA FERNANDA CAMPEROS ARDILA	1,096,950,980	SISO		6023470446 SOI	6030857674 SOI
LAURA FERNANDA VEGA LEIVA	1,007,917,168	INSPECTORA HSEQ AUX	6022042807 SOI	6023470446 SOI	6030857674 SOI
WILMER SIERRA MESA	1,098,630,870	Ayudante	1751197976 SOI	6025817419 SOI	1751658612 SOI
CARLOS MAURICIO BLANCO GUIO	1,015,314,223	Ayudante	1751197976 SOI	6025817419 SOI	1751658612 SOI
EDUAR ALEXIS JAIMES JAIMES	13,907,062	Maestro	6022042807 SOI	6023470446 SOI	6030857674 SOI
JESUS ARCANGEL CACERES RANGEL	1,098,132,731	Ayudante	6022042807 SOI	6023470446 SOI	6030857674 SOI
DAVID FELIPE JOYA MARIN	1,000,063,187	Ayudante	6022042807 SOI	6023470446 SOI	6030857674 SOI
JHON ALEXANDER CAMARGO RODRIGUEZ	1,005,231,274	Ayudante		6023470446 SOI	6030857674 SOI
PEREZ PEÑA VICTOR LEONARDO	1,096,946,566	Ayudante		6023470446 SOI	6030857674 SOI
NIXON ASCANIO ORTIZ	88,282,927	Ofcial de O		6023470446 SOI	6030857674 SOI

Tabla 6. SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se evidencia una ejecución de la obra del 100% recibidas a satisfacción del interventor del contrato y del supervisor por parte de la entidad contratante.


- Se ha ejecutado las actividades descritas en el acta de entrega y recibo final de obra No. 01-2026, según las especificaciones técnicas del contrato garantizando los correctos procesos constructivos, cualquier inquietud se llevó ante el supervisor del contrato buscando la solución más adecuada posible y su respectiva aprobación.

- Se realizó la visita de obra con el interventor de obra el Ingeniero WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO y el Arquitecto ALEJANDRO MELGAREJO supervisor de contrato por parte de la entidad contratante , para verificar las obras ejecutadas, correspondientes al presente informe.

- Se anexa la planilla de pago de seguridad social, riesgos laborales y pensión del personal de obra correspondientes al mes de Mayo, Junio y Julio Ver
  En constancia de entrega, firmó.

- Se anexa informe de seguridad y salud en el trabajo con sus respectivos anexos.

- Se anexa informe ambiental con sus respectivos anexos.



EDWIN RAMIRO SIERRA MESA

Contratista de Obra

Contrato de obra pública No. 162-2025

Anexo No. 01. Anexo Acta entrega y recibo final de obra No.01-2026.

ingesantander@hotmail.com
Teléfono: (7) 695 62 43
Móvil: 311 853 78 07

Bucaramanga:
Calle 37 No. 23-77 Apt 1503 Palmar 37

Málaga:
Calle 13 No. 7 - 84 Barrio Centro

Santander - Colombia

ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAGA

ANEXO AL ACTA DE PAGO Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA SAMC-MGA-002-2026

ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAGA

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: EN UN TRAMO DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 8; UN TRAMO EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERA 3A Y CARRERA 3B; CALLE 18C ENTRE CARRERA 10 Y LA TRONCAL CENTRAL DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER."

VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$ 479,441,751.00
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 479,441,751.00

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICACION 1				CONDICIONES FINALES	
			CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	MAYORES	VALOR PARCIAL	MENORES	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1.00	PRELIMINARES										
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PAVIMENTO	m2	984.23	$ 8,132.00	$ 8,003,758.00	-	$ -	-		984.23	$ 8,003,758.00
	SUBTOTAL CAPITULO				$ 8,003,758.00	-					$ 8,003,758.00
2.00	ESTRUCTURA PAVIMENTO										
2.1	CAJEO EN MATERIAL COMÚN PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE (INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO)	m3	508.29	$ 44,110.00	$ 22,420,672.00	43.94	$ 1,938,193.00	-		552.23	$ 24,358,865.00
2.2	CONFORMACION DE SUBRASANTE	m2	973.42	$ 2,202.00	$ 2,143,471.00	67.87	$ 149,450.00	-		1,041.29	$ 2,292,921.00
2.3	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR CLASE A	m3	279.26	$ 248,811.00	$ 69,482,960.00	11.82	$ 2,940,946.00	-	$ -	291.08	$ 72,423,906.00
2.4	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 4,2 Mpa	m3	177.16	$ 1,473,682.00	$ 261,077,503.00	-		4.97	$ 7,324,199.54	172.19	$ 253,753,304.00
2.5	ACERO LISO N° 7 PARA DOVELAS f'y 4200 Mpa (INCLUYE CANASTILLA EN GRAFIL 6MM)	kg	966.84	$ 18,391.00	$ 17,781,154.00	-		84.31	$ 1,550,489.12	882.53	$ 16,230,665.00
2.6	ACERO DE REFUERZO N° 4 f'y 4200 Mpa (BARRAS DE AMARRE, LOSAS REFORZADAS Y POZOS DE INSPECCIÓN)	kg	1311.94	$ 11,723.00	$ 15,379,873.00	324.64	$ 3,805,755.00	-		1,636.58	$ 19,185,627.00
2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDON Y SELLANTE PARA JUNTAS	m	511.12	$ 27,271.00	$ 13,938,754.00	-		3.88	$ 105,811.48	507.24	$ 13,832,942.00
2.8	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACIÓN DE CRUDO DE RIO PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE TAMAÑO MAXIMO 4"	m3	53.81	$ 203,167.00	$ 10,932,416.00	-		10.06	$ 2,043,860.02	43.75	$ 8,888,556.00
2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO RESISTENCIA 40KN/m (INCLUYE TRASLAPE MINIMO DE 30 CM), PARA MEJORAMIENTO SUBRASANTE CALLE 18 C LIBERTADORES	m2	231.46	$ 12,348.00	$ 2,858,068.00	-		50.94	$ 629,007.12	180.52	$ 2,229,061.00
2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO SARDINEL A-85 BAJO RAMPA (INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO)	ml	70.49	$ 120,185.00	$ 8,471,841.00	10.18	$ 1,223,483.00	-		80.67	$ 9,695,324.00
2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 DE 80x50x20 (INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO)	ml	265.7	$ 133,412.00	$ 35,447,568.00	24.42	$ 3,257,921.00	-		290.12	$ 38,705,489.00
2.12	CONCRETO CLASE D (3000 PSI) PARA FABRICACIÓN DE BORDILLO	ml	13.09	$ 98,851.00	$ 1,293,960.00	-		13.09	$ 1,293,959.59	-	$ -
2.13	DEMARCACIÓN VIAL EN LINEAS CON ANCHO 12 CM CON PINTURA ACRÍLICA TIPO TRAFICO (BLANCA O AMARILLA)	ml	378	$ 9,061.00	$ 3,425,058.00	-		233.00	$ 2,111,213.00	145.00	$ 1,313,845.00
2.14	ASEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE)	m2	492.12	$ 3,376.00	$ 1,661,397.00	516.23	$ 1,742,793.00	-		1,008.35	$ 3,404,190.00
	SUBTOTAL CAPITULO				$ 466,314,695.00		$ 15,058,541.00		- 15,058,539.87		$ 466,314,695.00
	SUBTOTAL OBRAS				$ 474,318,453.00						$ 474,318,453.00
	VALOR TOTAL=(A)				$ 474,318,453.00						$ 474,318,453.00
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL = (B)				996,860.00						$ 996,860.00
	PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO = ©				4,126,438.00						$ 4,126,438.00
	VALOR TOTAL=				$ 479,441,751.00						$ 479,441,751.00

Anexo No. 02. Registro Fotográfico.

ingesantander@hotmail.com
Teléfono: (7) 695 62 43
Móvil: 311 853 78 07

Bucaramanga:
Calle 37 No. 23-77 Apt 1503 Palmar 37

Málaga:
Calle 13 No. 7 - 84 Barrio Centro

Santander - Colombia

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PAVIMENTO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PAVIMENTO
	
CAJEO EN MATERIAL COMÚN PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE (INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO)	CAJEO EN MATERIAL COMÚN PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE (INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO)
	
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR CLASE A	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR CLASE A

	
CONFORMACION DE SUBRASANTE	CONFORMACION DE SUBRASANTE
	
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 4,2 Mpa	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 4,2 Mpa
	
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 4,2 Mpa	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 4,2 Mpa
	
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 4,2 Mpa	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 4,2 Mpa

	
ACERO LISO N° 7 PARA DOVELAS f'y 4200 Mpa (INCLUYE CANASTILLA EN GRAFIL 6MM)	ACERO LISO N° 7 PARA DOVELAS f'y 4200 Mpa (INCLUYE CANASTILLA EN GRAFIL 6MM)
	
ACERO DE REFUERZO N° 4 f'y 4200 Mpa (BARRAS DE AMARRE, LOSAS REFORZADAS Y POZOS DE INSPECCIÓN)	ACERO DE REFUERZO N° 4 f'y 4200 Mpa (BARRAS DE AMARRE, LOSAS REFORZADAS Y POZOS DE INSPECCIÓN)
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDON Y SELLANTE PARA JUNTAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDON Y SELLANTE PARA JUNTAS
	
SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACIÓN DE CRUDO DE RIO PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE TAMAÑO MAXIMO 4"	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACIÓN DE CRUDO DE RIO PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE TAMAÑO MAXIMO 4"

	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO RESISTENCIA 40KN/m (INCLUYE TRASLAPE MINIMO DE 30 CM), PARA MEJORAMIENTO SUBRASANTE CALLE 18 C LIBERTADORES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO RESISTENCIA 40KN/m (INCLUYE TRASLAPE MINIMO DE 30 CM), PARA MEJORAMIENTO SUBRASANTE CALLE 18 C LIBERTADORES
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO SARDINEL A-85 BAJO RAMPA (INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO SARDINEL A-85 BAJO RAMPA (INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO)
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 DE 80x50x20 (INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 DE 80x50x20 (INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO)
	
DEMARCACIÓN VIAL EN LINEAS CON ANCHO 12 CM CON PINTURA ACRÍLICA TIPO TRAFICO (BLANCA O AMARILLA)	DEMARCACIÓN VIAL EN LINEAS CON ANCHO 12 CM CON PINTURA ACRÍLICA TIPO TRAFICO (BLANCA O AMARILLA)

	
ASEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE)	ASEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE)

REGISTRO FOTOGRAFICO

ASPECTO GENERAL POR CALLE

CALLE 5 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 BARRIO POVEDA FLOREZ	
	

CALLE 3 BARRIO LOS NARANJITOS





CALLE 18 BARRIO LOS LIBERTADORES





ingesantander@hotmail.com
Teléfono: (7) 695 62 43
Móvil: 311 853 78 07

Bucaramanga:
Calle 37 No. 23-77 Apt 1503 Palmar 37

Málaga:
Calle 13 No. 7 - 84 Barrio Centro

Santander - Colombia

ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAGA

ANEXO AL ACTA DE MAYORES Y MENORES 01 DEL CONTRATO SAMC-MGA-002-2026

ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAGA

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: EN UN TRAMO DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 8; UN TRAMO EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERA 3A Y CARRERA 3B; CALLE 18C ENTRE CARRERA 10 Y LA TRONCAL CENTRAL DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER."

VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$ 479.441.751,00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 0,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 479.441.751,00	

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICACION 1				CONDICIONES FINALES	
			CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	MAYORES	VALOR PARCIAL	MENORES	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1,00	PRELIMINARES										
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PAVIMENTO	m2	984,23	$ 8.132,00	$ 8.003.758,00	-	$ -	-		984,23	$ 8.003.758,00
				SUBTOTAL CAPITULO	$ 8.003.758,00	-					$ 8.003.758,00
2,00	ESTRUCTURA PAVIMENTO										
2,1	CAJEO EN MATERIAL COMÚN PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE (INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO)	m3	508,29	$ 44.110,00	$ 22.420.672,00	43,94	$ 1.938.193,00	-		552,23	$ 24.358.865,00
2,2	CONFORMACION DE SUBRASANTE	m2	973,42	$ 2.202,00	$ 2.143.471,00	67,87	$ 149.450,00	-		1.041,29	$ 2.292.921,00
2,3	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR CLASE A	m3	279,26	$ 248.811,00	$ 69.482.960,00	11,82	$ 2.940.946,00	-	$ -	291,08	$ 72.423.906,00
2,4	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 4,2 Mpa	m3	177,16	$ 1.473.682,00	$ 261.077.503,00	-		4,97	$ 7.324.199,54	172,19	$ 253.753.304,00
2,5	ACERO LISO N° 7 PARA DOVELAS f'y 4200 Mpa (INCLUYE CANASTILLA EN GRAFIL 6MM)	kg	966,84	$ 18.391,00	$ 17.781.154,00	-		84,31	$ 1.550.489,12	882,53	$ 16.230.665,00
2,6	ACERO DE REFUERZO N° 4 f'y 4200 Mpa (BARRAS DE AMARRE, LOSAS REFORZADAS Y POZOS DE INSPECCIÓN)	kg	1311,94	$ 11.723,00	$ 15.379.873,00	324,64	$ 3.805.755,00	-		1.636,58	$ 19.185.627,00
2,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDON Y SELLANTE PARA JUNTAS	m	511,12	$ 27.271,00	$ 13.938.754,00	-		3,88	$ 105.811,48	507,24	$ 13.832.942,00
2,8	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACIÓN DE CRUDO DE RIO PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE TAMAÑO MAXIMO 4"	m3	53,81	$ 203.167,00	$ 10.932.416,00	-		10,06	$ 2.043.860,02	43,75	$ 8.888.556,00
2,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO RESISTENCIA 40KN/m (INCLUYE TRASLAPE MINIMO DE 30 CM), PARA MEJORAMIENTO SUBRASANTE CALLE 18 C LIBERTADORES	m2	231,46	$ 12.348,00	$ 2.858.068,00	-		50,94	$ 629.007,12	180,52	$ 2.229.061,00
2,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO SARDINEL A-85 BAJO RAMPA (INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO)	ml	70,49	$ 120.185,00	$ 8.471.841,00	10,18	$ 1.223.483,00	-		80,67	$ 9.695.324,00
2,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 DE 80x50x20 (INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO)	ml	265,7	$ 133.412,00	$ 35.447.568,00	24,42	$ 3.257.921,00	-		290,12	$ 38.705.489,00
2,12	CONCRETO CLASE D (3000 PSI) PARA FABRICACIÓN DE BORDILLO	ml	13,09	$ 98.851,00	$ 1.293.960,00	-		13,09	$ 1.293.959,59	-	$ -
2,13	DEMARCACIÓN VIAL EN LINEAS CON ANCHO 12 CM CON PINTURA ACRÍLICA TIPO TRAFICO (BLANCA O AMARILLA)	ml	378	$ 9.061,00	$ 3.425.058,00	-		233,00	$ 2.111.213,00	145,00	$ 1.313.845,00
2,14	ASEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE)	m2	492,12	$ 3.376,00	$ 1.661.397,00	516,23	$ 1.742.793,00	-		1.008,35	$ 3.404.190,00
				SUBTOTAL CAPITULO	$ 466.314.695,00		$ 15.058.541,00		- 15.058.539,87		$ 466.314.695,00
				SUBTOTAL OBRAS	$ 474.318.453,00						$ 474.318.453,00
				VALOR TOTAL=(A)	$ 474.318.453,00						$ 474.318.453,00
				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL = (B)	996.860,00						$ 996.860,00
				PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO = ©	4.126.438,00						$ 4.126.438,00
				VALOR TOTAL=	$ 479.441.751,00						$ 479.441.751,00


ING. EDWIN RAMIRO SIERRA MESA
CONTRATISTA OBRA


ING. WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO
INTERVENTOR


ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA
SUPERVISOR
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial


MEMORIA DE CANTIDADES


Item	1,1
Descripción	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PAVIMENTO
Unidad	m2

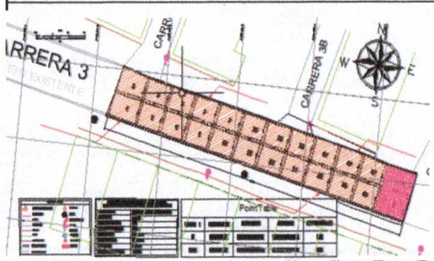

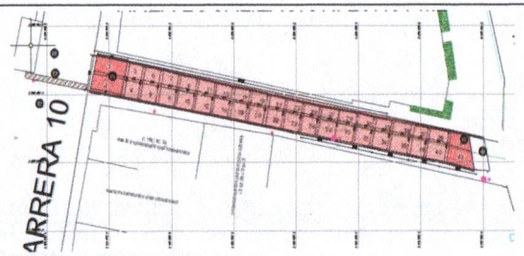

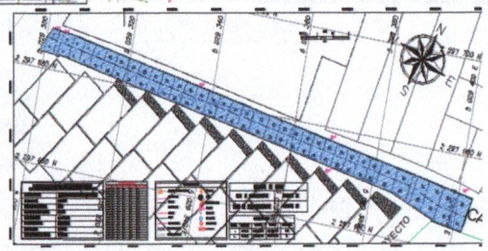

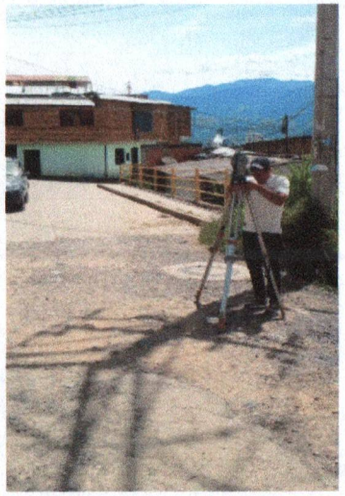

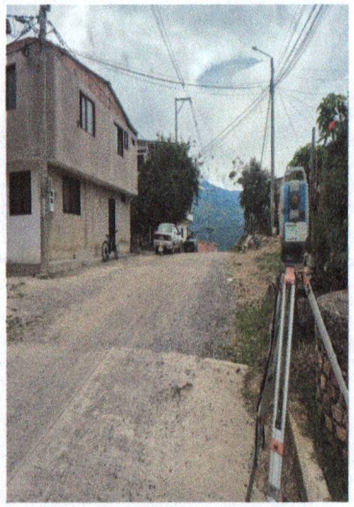

N°	Descripción		Largo (m)	Altura (m)	Ancho (m)	área (m2)	Cantidad Estructuras	Total (m2)
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE PAVIMENTO CALLE 18 C LA TRINIDAD					215,22	1	215,22
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PAVIMENTO CALLE 3 HASTA CARRERA 3A BARRIO NARANJITOS					255,33	1	255,33
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PAVIMENTO CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 CARRERA 8					513,68	1	513,68
						Total		984,23


ING EDWIN RAMIRO SIERRA MESA
CONTRATISTA


ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA
SUPERVISOR
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial


ING WISTON JAVIER NIÑO GUERRERO
INTERVENTOR

MEMORIA DE CANTIDADES

Item	2,1
Descripción	CAJEO EN MATERIAL COMÚN PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE (INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO)
Unidad	m3





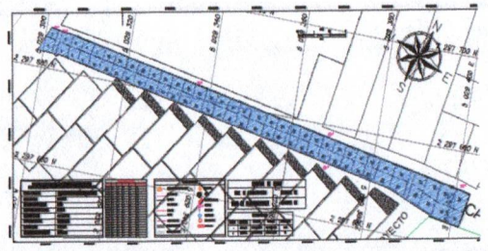





N°	Descripción		Largo (m)	Altura (m)	Ancho (m)	área (m2)	Cantidad Estructuras	Total (m3)
1	CAJEO EN MATERIAL COMÚN CALLE 18 C LIBERTADORES			0,48		200,26	1	96,12
1	CAJEO EN MATERIAL COMÚN PARA MEJORAMIENTO EN SUB-BASE CALLE 3 HASTA CARRERA 3A BARRIO NARANJITOS			0,43		277,08	1	119,14
1	CAJEO MATERIAL ROCOSO		12,00	0,45	3	16,20		16,20
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PAVIMENTO CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 CARRERA 8			0,48		563,95	1	270,70
1	CAJEO EN MATERIAL COMÚN PARA MEJORAMIENTO EN CRUDO DE RIO CALLE 18C			0,25		200,26	1	50,07
2								
						Total		552,23


ING EDWIN RAMIRO SIERRA MESA
CONTRATISTA


ING WISTON JAVIER NIÑO GUERRERO
INTERVENTOR


ARQ ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA
SUPERVISOR
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial

MEMORIA DE CANTIDADES


Item	2.2
Descripción	CONFORMACION DE SUBRASANTE
Unidad	m2









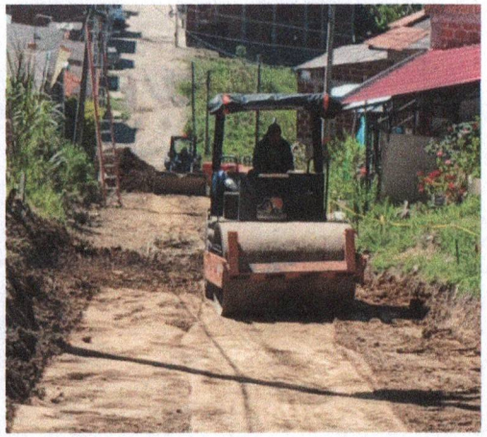

N°	Descripción		Largo (m)	Altura (m)	Ancho (m)	área (m2)	Cantidad Estructuras	Total (m3)
1	CALLE 18 C LIBERTADORES					200,26	1	200,26
2	CALLE 3 HASTA CARRERA 3A BARRIO NARANJITOS					277,08	1	277,08
3	CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 CARRERA 8					563,95	1	563,95
						Total		1.041,29


ING EDWIN RAMIRO SIERRA MESA
CONTRATISTA


ARQ ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA
SUPERVISOR
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial


ING WISTON JAVIER NIÑO GUERRERO
INTERVENTOR


MEMORIA DE CANTIDADES

Item	2,3
Descripción	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR CLASE A
Unidad	m3







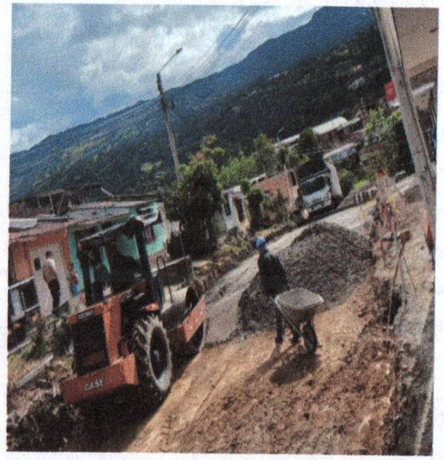



N°	Descripción	FACROR	Largo (m)	Altura (m)	Ancho (m)	área (m2)	Cantidad Estructuras	Total (m3)
1	BASE GRANULAR CALLE 18 C LIBERTADORES			0,30		207,81	1	62,34
1	BASE GRANULAR CALLE 3 HASTA CARRERA 3A BARRIO NARANJITOS			0,25		277,08	1	69,27
1	BASE GRANULAR CALLE 3 HASTA CARRERA 3A BARRIO NARANJITOS DE LA EXCAVCION EN ROCA		12,00	0,20	3	7,20	1	7,20
1	BASE GRANULAR CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 CARRERA 8			0,27		563,95	1	152,27
						Total		291,08


ING EDWIN RAMIRO SIERRA MESA
CONTRATISTA


ARQ ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA
SUPERVISOR
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial


ING WISTON JAVIER NIÑO GUERRERO
INTERVENTOR


MEMORIA DE CANTIDADES


Item	2,4
Descripción	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 4,2 Mpa
Unidad	m3

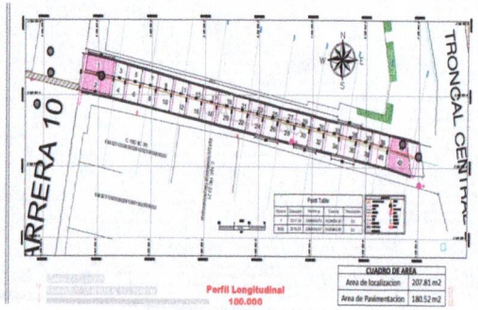

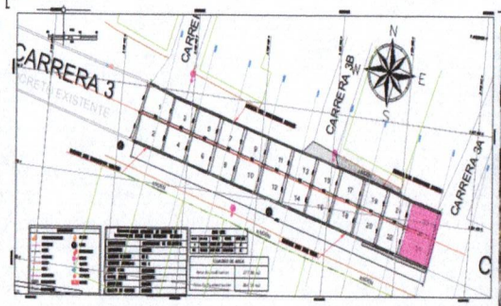

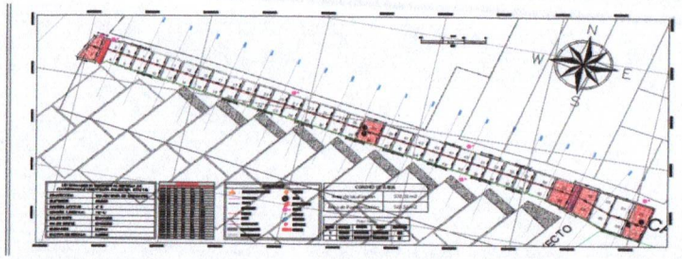

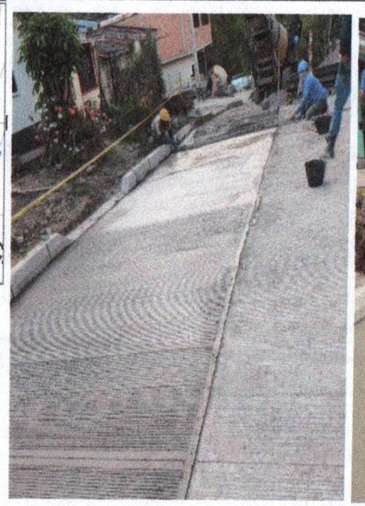

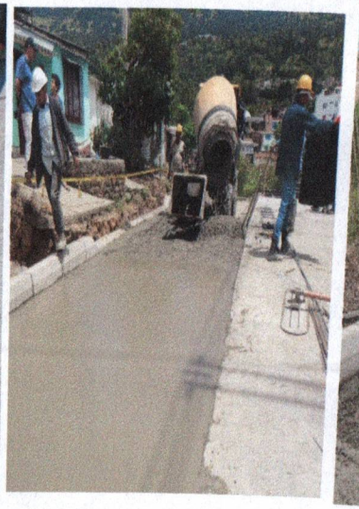




N°	Descripción		Largo (m)	Altura (m)	Ancho (m)	área (m2)	Cantidad Estructuras	Total (m3)
1	PAVIMENTO HIDRAULICO 4,2 MPA CALLE 18 C LIBERTADORES			0,18		180,52	1	32,49
1	PAVIMENTO HIDRAULICO 4,2 MPA CALLE 3 HASTA CARRERA 3A BARRIO NARANJITOS			0,18		264,58	1	47,62
1	PAVIMENTO HIDRAULICO 4,2 MPA CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 CARRERA 8			0,18		511,50	1	92,07
						Total		172,19


ING EDWIN RAMIRO SIERRA MESA
CONTRATISTA

ARQ ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA
SUPERVISOR
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial


ING WISTON JAVIER NIÑO GUERRERO
INTERVENTOR


MEMORIA DE CANTIDADES	
Item	2,5
Descripción	ACERO LISO N° 7 PARA DOVELAS f'y 4200 Mpa (INCLUYE CANASTILLA EN GRAFIL 6MM)
Unidad	kg







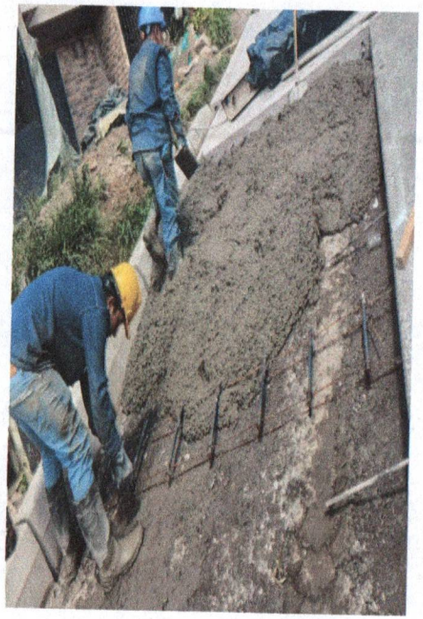

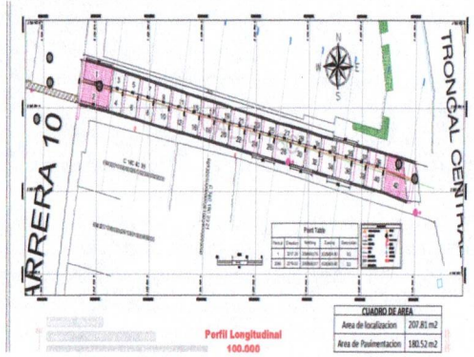





N°	Descripción	Separacion	Largo Losa (m)	PESO BARRA (kg/m)	cantidad	Largo Barra(m)	Cantidad Estructuras	Peso (kg)
	DOVELAS CALLE 18 C LIBERTADORES							
1 A 3	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,72	3,049	6	0,35	1	6,40
2 A 4	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,72	3,049	6	0,35	1	6,40
3 A 5	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,68	3,049	6	0,35	1	6,40
4 A 6	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,68	3,049	6	0,35	1	6,40
5 A 7	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,65	3,049	6	0,35	1	6,40
6 A 8	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,65	3,049	6	0,35	1	6,40
7 A 9	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,62	3,049	5	0,35	1	5,34
8 A 10	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,62	3,049	5	0,35	1	5,34
9 A 11	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,59	3,049	5	0,35	1	5,34
10 A 12	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,59	3,049	5	0,35	1	5,34
11 A 13	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,55	3,049	5	0,35	1	5,34
12 A 14	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,55	3,049	5	0,35	1	5,34
13 A 15	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,54	3,049	5	0,35	1	5,34
14 A 16	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,54	3,049	5	0,35	1	5,34
15 A 17	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,52	3,049	5	0,35	1	5,34
16 A 18	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,52	3,049	5	0,35	1	5,34
17 A 19	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,52	3,049	5	0,35	1	5,34
18 A 20	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,52	3,049	5	0,35	1	5,34
19 A 21	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,48	3,049	5	0,35	1	5,34
20 A 22	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,48	3,049	5	0,35	1	5,34
21 A 23	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,47	3,049	5	0,35	1	5,34
22 A 24	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,47	3,049	5	0,35	1	5,34
23 A 25	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,46	3,049	5	0,35	1	5,34
24 A 16	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,46	3,049	5	0,35	1	5,34
25 A 27	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,43	3,049	5	0,35	1	5,34
26 A 28	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,43	3,049	5	0,35	1	5,34
27 A 29	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,44	3,049	5	0,35	1	5,34
28 A 30	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,44	3,049	5	0,35	1	5,34
29 A 31	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,44	3,049	5	0,35	1	5,34
30 A 32	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,44	3,049	5	0,35	1	5,34
31 A 33	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,41	3,049	5	0,35	1	5,34
32 A 34	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,41	3,049	5	0,35	1	5,34
33 A 35	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,44	3,049	5	0,35	1	5,34
34 A 36	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,44	3,049	5	0,35	1	5,34
35 A 37	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,45	3,049	5	0,35	1	5,34
36 A 38	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,45	3,049	5	0,35	1	5,34
37 A 39	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,47	3,049	5	0,35	1	5,34
38 A 40	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,47	3,049	5	0,35	1	5,34
39 A 41	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,47	3,049	5	0,35	1	5,34
40 A 42	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	1,47	3,049	5	0,35	1	5,34
	DOVELAS CALLE 3 HASTA CARRERA 3A BARRIO NARANJITOS							
1 A 3	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,74	3,049	7	0,35	1	7,47
2 A 4	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,61	3,049	7	0,35	1	7,47
3 A 5	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,70	3,049	7	0,35	1	7,47
4 A 6	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,63	3,049	7	0,35	1	7,47
5 A 7	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,68	3,049	7	0,35	1	7,47
6 A 8	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,67	3,049	7	0,35	1	7,47
7 A 9	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,70	3,049	7	0,35	1	7,47
8 A 10	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,66	3,049	7	0,35	1	7,47
9 A 11	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,73	3,049	7	0,35	1	7,47
10 A 12	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,61	3,049	7	0,35	1	7,47
11 A 13	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,70	3,049	7	0,35	1	7,47
12 A 14	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,64	3,049	7	0,35	1	7,47
13 A 15	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,75	3,049	7	0,35	1	7,47

14 A 16	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,64	3,049	7	0,35	1	7,47
15 A 17	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,75	3,049	7	0,35	1	7,47
16 A 18	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,73	3,049	7	0,35	1	7,47
17 A 19	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,72	3,049	7	0,35	1	7,47
18 A 20	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,63	3,049	7	0,35	1	7,47
19 A 21	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,70	3,049	7	0,35	1	7,47
20 A 22	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,62	3,049	7	0,35	1	7,47
21 A 23	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,65	3,049	7	0,35	1	7,47
22 A 24	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,65	3,049	7	0,35	1	7,47
DOVELAS CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 CARRERA 8								
3 A 5	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
4 A 6	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
5 A 7	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
6 A 8	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
7 A 9	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
8 A 10	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
9 A 11	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
10 A 12	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
11 A 13	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
12 A 14	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
13 A 15	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
14 A 16	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
15 A 17	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
16 A 18	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
17 A 19	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
18 A 20	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
19 A 21	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
20 A 22	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
21 A 23	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
22 A 24	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
23 A 25	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
24 A 16	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
25 A 27	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
26 A 28	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
27 A 29	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
28 A 30	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
29 A 31	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
30 A 32	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
31 A 33	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
32 A 34	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
33 A 35	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
34 A 36	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
35 A 37	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
36 A 38	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
37 A 39	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
38 A 40	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
39 A 41	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
40 A 42	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
41 A 43	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
42 A 44	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
43 A 45	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
44 A 46	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
45 A 47	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
46 A 48	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
47 A 49	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
48 A 50	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
49 A 51	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
50 A 52	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
51 A 53	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
52 A 54	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
53 A 55	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
54 A 56	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
55 A 57	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
56 A 58	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
27 A 59	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47

58 A 60	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
59 A 61	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,05	3,049	7	0,35	1	7,47
60 A 62	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,25	3,049	8	0,35	1	8,54
61	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,49	3,049	8	0,35	1	8,54
62	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,93	3,049	10	0,35	1	10,67
63 A 65	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,79	3,049	10	0,35	1	10,67
64 A 66	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	2,87	3,049	10	0,35	1	10,67
65 A 67	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	3,66	3,049	12	0,35	1	12,81
66 A 68	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	3,18	3,049	10	0,35	1	10,67
67 A 69	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	3,66	3,049	10	0,35	1	10,67
68 A 70	BARRAS DE DOVELAS N7	0,3	3,14	3,049	10	0,35	1	10,67
						Total		**882,53**


ING EDWIN RAMIRO SIERRA MESA
CONTRATISTA


ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA
SUPERVISOR
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial


ING WISTON JAVIER MIÑO GUERRERO
INTERVENTOR


MEMORIA DE CANTIDADES


Item	2,6
Descripción	ACERO DE REFUERZO Nº 4 f'y 4200 Mpa (BARRAS DE AMARRE, LOSAS REFORZADAS Y POZOS DE INSPECCIÓN)
Unidad	kg







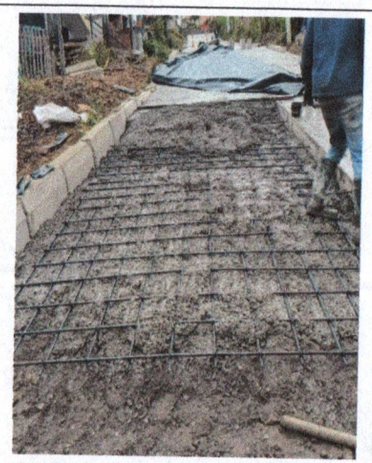

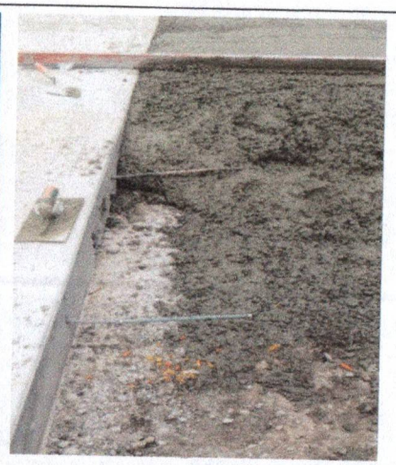



Nº	Descripción	m2	kg/m2	Separacion	Largo Losa (m)	PESO BARRA (kg/m)	cantidad	Largo Barra(m)	Cantidad Estructuras	Peso (kg)
1	ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA LONGITUDINAL CALLE 18 C LIBERTADORES			1,2	54,12	1,00	46	0,85	1	39,10
	ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA LONGITUDINAL CALLE 3 HASTA CARRERA 3A BARRIO NARANJITOS			1,2	42,87	1,00	36	0,85	1	30,60
	ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA LONGITUDINAL CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 CARRERA 8			1,2	102,22	1,00	86	0,85	1	73,10
1	ACERO DE REFUERZO Nº 4 fy 4200 MPa PARA LOSAS LIBERTADORES	27,219	10				1		1	272,19
1	ACERO DE REFUERZO Nº 4 fy 4200 MPa PARA LOSAS CALLE 3 NARANJITOS	25,55	10				1		1	255,50
1	ACERO DE REFUERZO Nº 4 fy 4200 MPa PARA LOSAS CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 CARRERA 8	93,41	10				1		1	934,09
1	ACERO DE REFUERZO PARA ;POZOS DE INPECCION CALLE 18 C LIBERTADORES						8			
1	ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA LONGITUDINAL CALLE 3 HASTA CARRERA 3A BARRIO NARANJITOS						8			
1	ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA LONGITUDINAL CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 CARRERA 8						8		4	32,00
								Total		1.636,58


ING EDWIN RAMIRO SIERRA MESA
CONTRATISTA


ARQ ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA
SUPERVISOR
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial


ING WISTON JAVIER NIÑO GUERRERO
INTERVENTOR


MEMORIA DE CANTIDADES


Item	2,7
Descripción	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDON Y SELLANTE PARA JUNTAS
Unidad	m







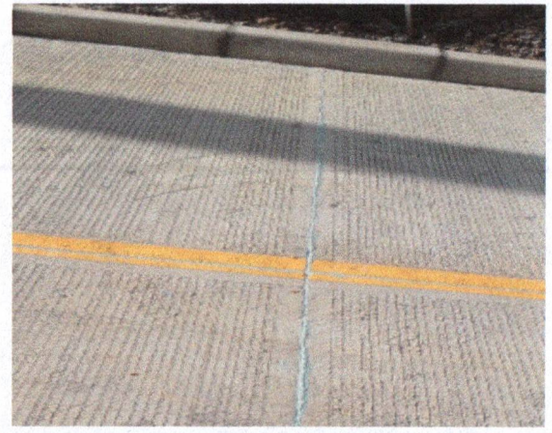

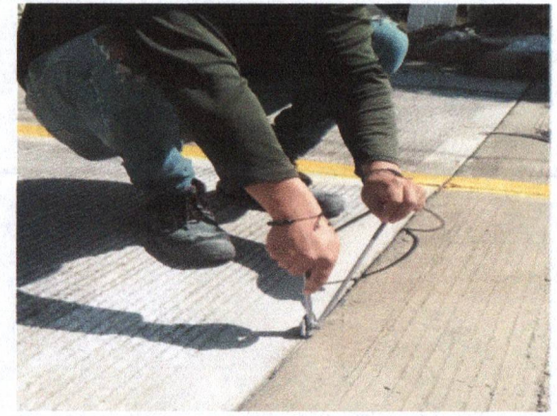

N°	Descripción		Largo (m)	Altura (m)	Ancho (m)		Cantidad Estructuras	Total (ml)
1	Juntas longitudinales y transversales CALLE 18 C LIBERTADORES		126,71				1	**126,71**
1	Juntas longitudinales y transversales CALLE 3 HASTA CARRERA 3A BARRIO NARANJITOS		114,69				1	**114,69**
1	Juntas longitudinales y transversales CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 CARRERA 8		265,84				1	**265,84**
						Total		**507,24**


ING EDWIN RAMIRO SIERRA MESA
CONTRATISTA


ARQ ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA
SUPERVISOR
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial

ING WISTON JAVIER NIÑO GUERRERO
INTERVENTOR

MEMORIA DE CANTIDADES

Item	2,8
Descripción	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACIÓN DE CRUDO DE RIO PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE TAMAÑO MAXIMO 4"
Unidad	m3

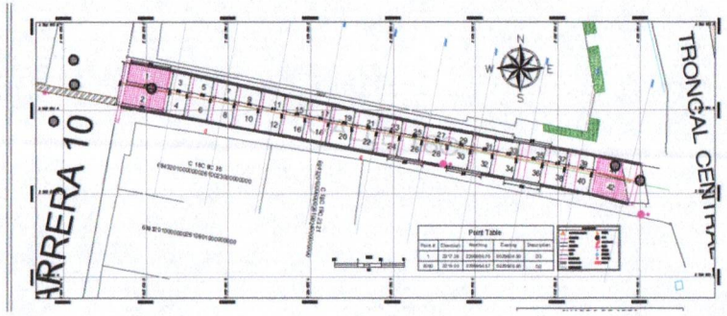

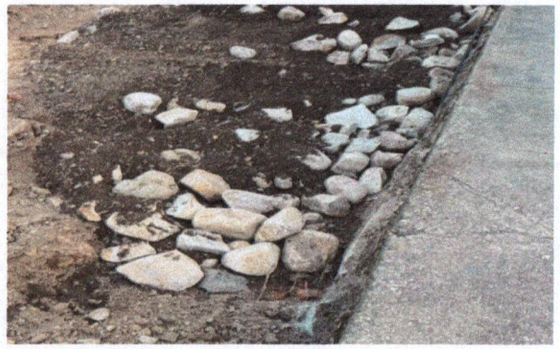



N°	Descripción		Largo (m)	Altura (m)	Ancho (m)	área (m2)	Cantidad Estructuras	Total (m3)
1	MEJORAMIENTO			0,25		175	1	43,75
						Total		43,75


ING EDWIN RAMIRO SIERRA MESA
CONTRATISTA


ARQ ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA
SUPERVISOR
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial

ING WISTON JAVIER NIÑO GUERRERO
INTERVENTOR

MEMORIA DE CANTIDADES

Item	2,9
Descripción	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO RESISTENCIA 40KN/m (INCLUYE TRASLAPE MINIMO DE 30 CM), PARA MEJORAMIENTO SUBRASANTE CALLE 18 C LIBERTADORES
Unidad	m2

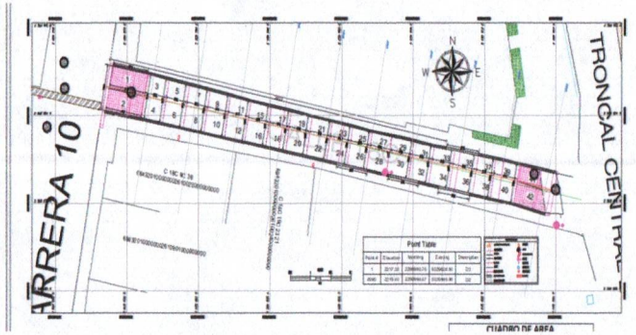

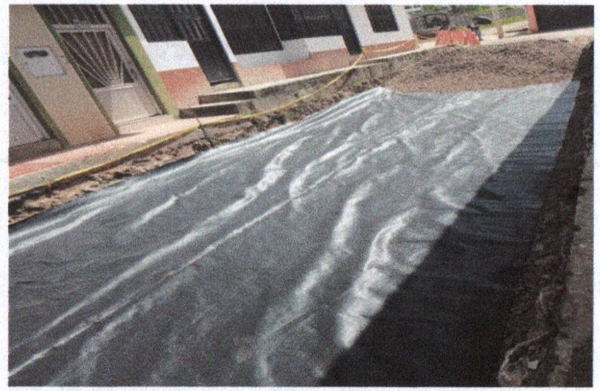



N°	Descripción		Largo (m)	Altura (m)	Ancho (m)	área (m2)	Cantidad Estructuras	Total (m2)
1	AREA CALLE 18C					180,52	1	180,52
							1	-
						Total		180,52


ING EDWIN RAMIRO SIERRA MESA
CONTRATISTA


ARQ ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA
SUPERVISOR
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial


ING WISTON JAVIER NIÑO GUERRERO
INTERVENTOR


MEMORIA DE CANTIDADES

Item	2.10
Descripción	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO SARDINEL A-85 BAJO RAMPA (INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO)
Unidad	ml





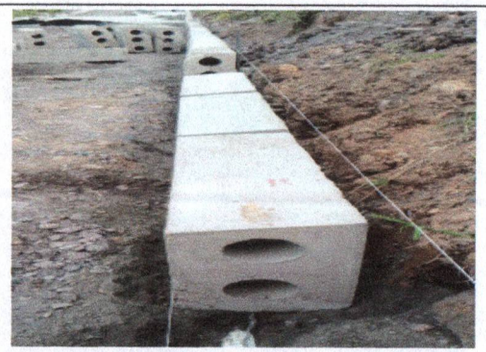

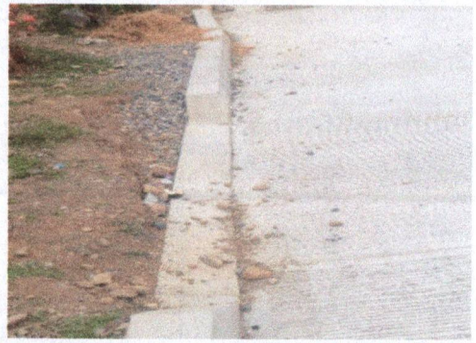

N°	Descripción	Factor	Largo (m)	Altura (m)	Ancho (m)	volumen (m3)	Cantidad Estructuras	Total (und)
1	SARDINEL PREFABRICADO BAJO RAMPA CALLE 18 C LIBERTADORES DERECHA		10,50				1	**10,50**
	SARDINEL PREFABRICADO BAJO RAMPA CALLE 18 C LIBERTADORES IZQUIERDA		3,52				1	**3,52**
1	SARDINEL PREFABRICADO BAJO RAMPA CALLE 3 HASTA CARRERA 3A BARRIO NARANJITOS Izquierda						1	**0,00**
2	SARDINEL PREFABRICADO BAJO RAMPA CALLE 3 HASTA CARRERA 3A BARRIO NARANJITOS derecha		16,26				1	**16,26**
	SARDINEL PREFABRICADO BAJO RAMPA CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 CARRERA 8 derecha		30,68				1	**30,68**
	SARDINEL PREFABRICADO BAJO RAMPA CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 CARRERA 8 Izquierda		19,71				1	**19,71**
						Total		**80,67**


ING EDWIN RAMIRO SIERRA MESA
CONTRATISTA


ARQ ALEJANDRO MELGAREJO ZARATA
SUPERVISOR
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial

ING WISTON JAVIER NIÑO GUERRERO
INTERVENTOR

MEMORIA DE CANTIDADES

Item	2,11
Descripción	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 DE 80x50x20 (INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO)
Unidad	ml











Nº	Descripción	Factor	Largo (m)	Altura (m)	Ancho (m)	volumen (m3)	Cantidad Estructuras	Total (und)
1	SARDINEL PREFABRICADO A-10 (80x50x20) CALLE 18 C LIBERTADORES derecha		41,10				1	**41,10**
	SARDINEL PREFABRICADO A-10 (80x50x20) CALLE 18 C LIBERTADORES Izquierda		47,11				1	**47,11**
1	SARDINEL PREFABRICADO A-10 (80x50x20) CALLE 3 HASTA CARRERA 3A BARRIO NARANJITOS Izquierda		23,32				1	**23,32**
2	SARDINEL PREFABRICADO A-10 (80x50x20) CALLE 3 HASTA CARRERA 3A BARRIO NARANJITOS derecha		32,05				1	**32,05**
	SARDINEL PREFABRICADO A-10 (80x50x20) CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 CARRERA 8 derecha		62,77				1	**62,77**
	SARDINEL PREFABRICADO A-10 (80x50x20) CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 CARRERA 8 Izquierda		83,77				1	**83,77**
						Total		**290,1**


ING EDWIN RAMIRO SIERRA MESA
CONTRATISTA


ARQ ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA
SUPERVISOR
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial


ING WISTON JAVIER NIÑO GUERRERO
INTERVENTOR


MEMORIA DE CANTIDADES

Item	2,13
Descripción	DEMARCACIÓN VIAL EN LINEAS CON ANCHO 12 CM CON PINTURA ACRÍLICA TIPO TRAFICO (BLANCA O AMARILLA)
Unidad	ml

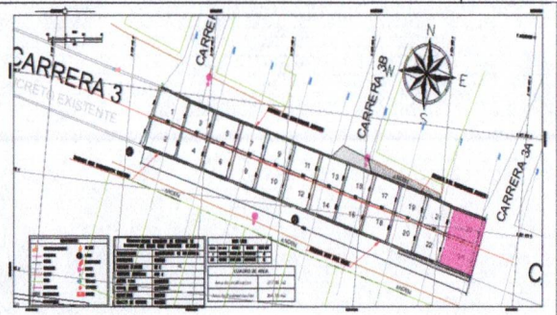

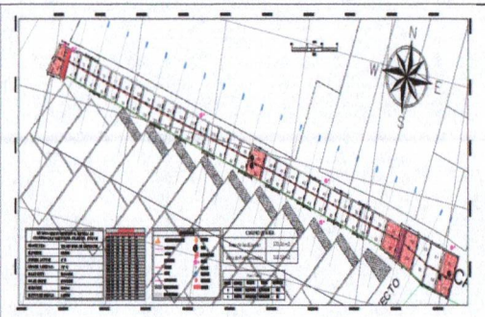

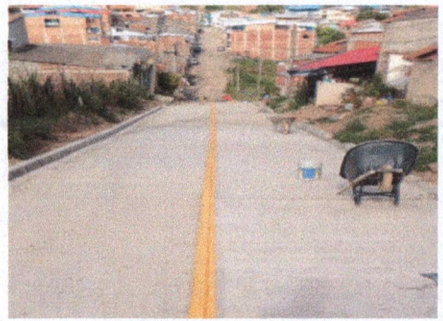

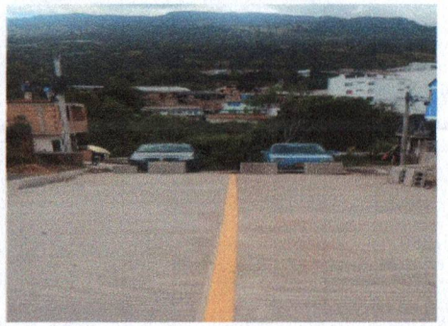

N°	Descripción			Altura (m)	Ancho (m)	Largo (ml)	Cantidad Estructuras	Total (m2)
1	DEMARCACIÓN VIAL (BLANCA - AMARILLA) CALLE 18 C LIBERTADORES					0,00	1	-
	DEMARCACIÓN VIAL (BLANCA - AMARILLA)CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 CARRERA 8					43,00	1	43,00
	DEMARCACIÓN VIAL (BLANCA - AMARILLA) CALLE 3 HASTA CARRERA 3A BARRIO NARANJITOS					102,00	1	102,00
							Total	145,00


ING. EDWIN RAMIRO SIERRA MESA
CONTRATISTA


ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA
SUPERVISOR
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial


ING. WISTON JAVIER NIÑO GUERRERO
INTERVENTOR


MEMORIA DE CANTIDADES

Item	2,14
Descripción	ASEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE)
Unidad	m2

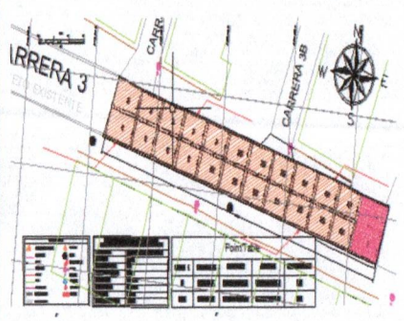

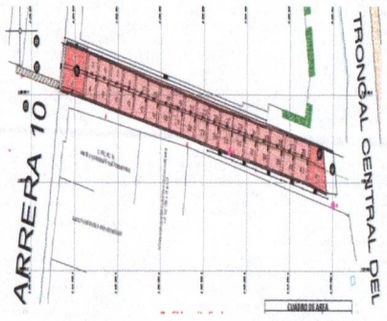

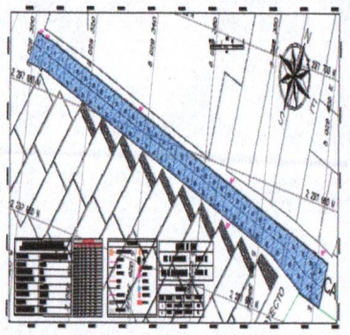

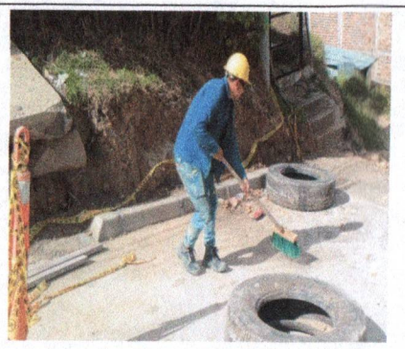



Nº	Descripción		Largo (m)	Altura (m)	Ancho (m)	área (m2)	Cantidad Estructuras	Total (m2)
1	PAVIMENTO HIDRAULICO 4,2 MPA CALLE 18 C LIBERTADORES					197,10	1	197,10
2	PAVIMENTO HIDRAULICO 4,2 MPA CALLE 3 HASTA CARRERA 3A BARRIO NARANJITOS					281,16	1	281,16
3	PAVIMENTO HIDRAULICO 4,2 MPA CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 CARRERA 8					530,09	1	530,09
						Total		1.008,35

ING EDWIN RAMIRO SIERRA MESA
CONTRATISTA

ARQ ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA
SUPERVISOR
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial

ING WISTON JAVIER NIÑO GUERRERO
INTERVENTOR

EDWIN SIERRA INGENIERO CIVIL

ACTA DE IMPREVISTOS DE OBRA

Código: FMT 002
Versión: 0
Fecha: 03/06/25
Página: 1 de 1

FECHA ELABORACIÓN: 26 / 7 / 2026 — No. ACTA DE IMPREVISTOS: 1

CONTRATO OBRA No: SAMC-MGA-002-2026 — FECHA FIRMA CONTRATO: 8 / 5 / 2026 — VALOR CONTRATO: $ 479,441,751.00

FECHA ACTA INICIO: 26 / 5 / 2026 — FECHA DE TERMINACIÓN: 26 / 7 / 2026 — PLAZO: 2 meses

PRÓRROGAS: 0 Meses/días — SUSPENSIONES: 0 Meses/días — ADICIONES: $ -

OBJETO DEL CONTRATO OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: EN UN TRAMO DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 8; UN TRAMO EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERA 3A Y CARRERA 3B; CALLE 18C ENTRE CARRERA 10 Y LA TRONCAL CENTRAL DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER."

CONTRATISTA: EDWIN RAMIRO SIERRA MESA

REPRESENTANTE LEGAL: EDWIN RAMIRO SIERRA MESA

PORCENTAJE TOTAL DE IMPREVISTOS SOBRE C.D: 100% — VALOR TOTAL IMPREVISTOS APROX: $ 3,551,420.00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN GENERAL	No. ACTA	FECHA	%DEL VALOR TOTAL DEL PROYECTO	VALOR TOTAL PAGADO
1	REPORTE DE IMPREVISTOS TOTAL	1	26/07/2027	100.00%	$ 3,551,420.00
	TOTAL IMPREVISTOS PAGADOS			100.00%	$ 3,551,420.00
	SALDO IMPREVISTOS POR PAGAR			0.00%	$ -

No. ACTA: 1 — PERÍODO DEL ACTA: DEL 26 / 5 / 2026 AL 26 / 7 / 2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	SUBTOTAL
1	REPARACION TUBERIA D E 2 PULGADAS EXPUESTAS , SE REALIZARON EL CAMBIO DE 6 TUBOS DE 2 PULGADAS Y SE INSTALARON 5 UNIONES DE REPARACION 2 PULGADAS ENTRE OTRAS COLLARINES NUEVOS PARA CAMBIO DE DIRECCON DE ACOMETIDAS SE PROFUNDIZO EN EL CRUCE DE LA CARRERA 7 UN TRAMO DE TUBERIA DE 2 Y SE REALIZARON LOS ATRAQUES	GBL	1	$ 2,302,516.00	$ 2,302,516.00
2	ADECUACION POZOS DE INSPECCION	UND	4	$ 312,226.00	$ 1,248,904.00
					$ -
					$ -
				TOTAL	$ 3,551,420.00
	PORCENTAJE Y VALOR A PAGAR EN ESTE PERÍODO MEDIANTE ACTA No.			1 100%	$ 3,551,420.00
	PAGOS ACUMULADOS DE IMPREVISTOS EN ACTAS ANTERIORES			0.00%	

WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO
INTERVENTOR

EDWIN RAMIRO SIERRA MESA
CONTRATISTA

ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial
SUPERVISOR

	MUNICIPIO DE MÁLAGA - SANTANDER				
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: **EN UN TRAMO DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 8; UN TRAMO EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERA 3A Y CARRERA 3B; CALLE 18C ENTRE CARRERA 10 Y LA TRONCAL CENTRAL DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER.**	VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				

	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA [ ] **ITEMS NO PREVISTOS** [X]

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
IMPREV-1	REPARACION TUBERIA D E 2 PULGADAS EXPUESTAS , SE REALIZARON EL CAMBIO DE 6 TUBOS DE 2 PULGADAS Y SE INSTALARON 5 UNIONES DE REPARACION 2 PULGADAS ENTRE OTRAS COLLARINES NUEVOS PARA CAMBIO DE DIRECCON DE ACOMETIDAS SE PROFUNDIZO EN EL CRUCE DE LA CARRERA 7 UN TRAMO DE TUBERIA DE 2 Y SE REALIZARON LOS ATRAQUES	GLOBAL	1.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					$ -
HERRAMIENTA MENOR				10%	
				SUBTOTAL $	$ 9,987.50

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TUBO 2" PVC PRESION TIPO PESADO	UND	6.0	$ 101,300.00	$ 607,800.00
UNION REPARACION PVC PRESION 2"	UND	6.0	$ 65,000.00	$ 390,000.00
EXCAVACION MANUAL PARA REPOSICION Y ATRAQUES	M3	8.0	$ 42,000.00	$ 336,000.00
CONCRETO 3000 PSI ATRAQUES	M3	0.4	$ 650,000.00	$ 260,000.00
ACESORIOS PVC PRESION	GLOBAL	1	$ 1,903.67	1,903.67
			SUBTOTAL $	$ 1,595,704.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	m^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Oficial	$ 99,217.95	1.85	$ 183,553.21	4	$ 45,888.30
Obrero (2)	$ 116,727.00	185%	$ 215,944.95	4	53,986.24
				SUBTOTAL $	$ 99,875.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 1,705,567.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	29%	$ 494,614.00	
IMPREVISTOS	1%	$ 17,056.00	
UTILIDAD	5%	$ 85,278.00	
		SUBTOTAL $	$ 596,948.00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	**$ 2,302,516.00**

	MUNICIPIO DE MÁLAGA - SANTANDER				
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: **EN UN TRAMO DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 8; UN TRAMO EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERA 3A Y CARRERA 3B; CALLE 18C ENTRE CARRERA 10 Y LA TRONCAL CENTRAL DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER.**	VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				

	FECHA	DD	MM	AA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA [ ] **ITEMS NO PREVISTOS** [X]

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
IMPREV -2	ADECUACION POZOS DE INSPECCION	UND.	6.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					$ -
HERRAMIENTA MENOR				5%	
				SUBTOTAL $	$ 3,995.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
MORTERO 1:3	M3	0.12	$ 440,000.00	$ 51,333.33
LADRILLOS TEMOSA	UND	60	$ 1,600.00	$ 96,000.00
DEMOLICION TAPAS Y EXTRACCION DE AROS	UND	1.0	$ 40,000.00	$ 40,000.00
			SUBTOTAL $	$ 187,333.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA


TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Oficial	$ 99,217.95	1.85	$ 183,553.21	10	$ 18,355.32
Obrero (2)	$ 116,727.00	185%	$ 215,944.95	10	$ 21,594.50
				SUBTOTAL $	$ 39,950.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 231,278.00


V. COSTOS INDIRECTOS



Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	29%	$ 67,071.00	
IMPREVISTOS	1%	$ 2,313.00	
UTILIDAD	5%	$ 11,564.00	
		SUBTOTAL $	$ 80,948.00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ **312,226.00**

MEMORIA DE CANTIDADES

Item	imprevistos 1
Descripción	REPARACION TUBERIA D E 2 PULGADAS EXPUESTAS , SE REALIZARON EL CAMBIO DE 6 TUBOS DE 2 PULGADAS Y SE INSTALARON 5 UNIONES DE REPARACION 2 PULGADAS ENTRE OTRAS COLLARINES NUEVOS PARA CAMBIO D EDIRECCON DE ACOMETIDAS SE PROFUNDIZO EN EL CRUCE DE LA CARRERA 7 UN TRAMO DE TUBERIA DE 2 Y SE REALIZARO LOS ATRAQUES
Unidad	global

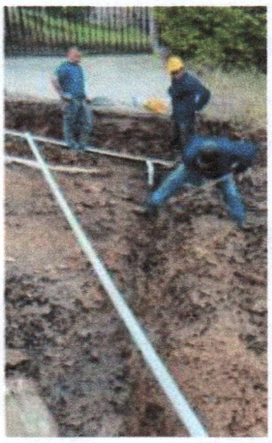





N°	Descripción	Factor	Largo (m)	Altura (m)	Ancho (m)	volumen (m3)	Cantidad Estructura	Total (und)
1	CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 CARRERA 8							
			-					
			-					
						Total		1.000

MEMORIA DE CANTIDADES

Item	imprevistos 2
Descripción	ADECUACION DE POSOS DE INSPEECION
Unidad	UND

N°	Descripción	Factor	Largo (m)	Altura (m)	Ancho (m)	volumen (m3)	Cantidad Estructura	Total (und)
1	CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 CARRERA 8		4.00				1	4.00
			-				1	
			-				1	
			-				1	
						Total		4.000

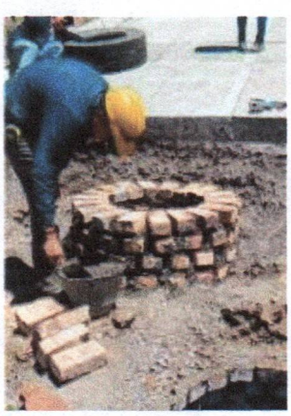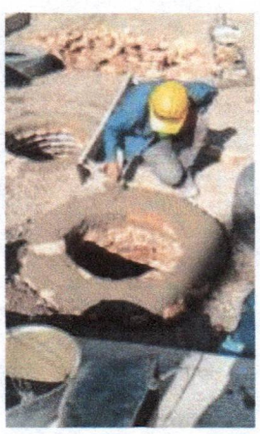PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13719731
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDWIN RAMIRO SIERRA MESA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 13 7 42	TELÉFONO:	6617676
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - INDEPENDIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6016328456**			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/30			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	266801972		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 420.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.300	$ 0	$ 420.300
SUBTOTALES:										**$ 420.300**	**$ 0**	**$ 420.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 328.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.300	$ 0	$ 0	$ 328.300
SUBTOTALES:													**$ 328.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 328.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.800	$ 13.800	$ 0	$ 0	$ 13.800
SUBTOTALES:									**$ 13.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 13.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 13719731	SIERRA MESA EDWIN RAMIRO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 3.501.810				NO								01-30										230301-PORVENIR	30	$ 2.626.358	$ 420.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 420.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.626.358	$ 328.300	$ 0	$ 328.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.626.358	13719731	$ 13.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 762.400

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13719731
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDWIN RAMIRO SIERRA MESA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 13 7 42	TELÉFONO:	6617676
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - INDEPENDIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6022439103**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/06/09		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		375917027	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 420.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.300	$ 0	$ 420.300
SUBTOTALES:										**$ 420.300**	**$ 0**	**$ 420.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 328.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.300	$ 0	$ 0	$ 328.300
SUBTOTALES:													**$ 328.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 328.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.800	$ 13.800	$ 0	$ 0	$ 13.800
SUBTOTALES:									**$ 13.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 13.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD					ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 13719731	SIERRA MESA EDWIN RAMIRO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 3.501.810				NO								01-30										230301-PORVENIR	30	$ 2.626.358	$ 420.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 420.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.626.358	$ 328.300	$ 0	$ 328.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.626.358	13719731	$ 13.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 762.400

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13719731
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDWIN RAMIRO SIERRA MESA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 13 7 42	TELÉFONO:	6617676
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - INDEPENDIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6025831187**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/30			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	434531188

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 420.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.300	$ 0	$ 420.300
SUBTOTALES:										**$ 420.300**	**$ 0**	**$ 420.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 328.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.300	$ 0	$ 0	$ 328.300
SUBTOTALES:													**$ 328.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 328.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.800	$ 13.800	$ 0	$ 0	$ 13.800
SUBTOTALES:									**$ 13.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 13.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 13719731	SIERRA MESA EDWIN RAMIRO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 3.501.810				NO								01-30										230301-PORVENIR	30	$ 2.626.358	$ 420.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 420.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.626.358	$ 328.300	$ 0	$ 328.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.626.358	13719731	$ 13.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 762.400

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13719731
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDWIN RAMIRO SIERRA MESA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 13 7 42	TELÉFONO:	6617676
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - CONTRATO SAN MIGUEL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1751197976**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/09			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997069960

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 0	$ 560.400
SUBTOTALES:										**$ 560.400**	**$ 0**	**$ 560.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 140.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 140.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 131.100	$ 131.100	$ 0	$ 0	$ 131.100
SUBTOTALES:									**$ 131.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 131.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	2	$ 140.200	$ 0	$ 140.200
SUBTOTALES:			**$ 140.200**	**$ 0**	**$ 140.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD						ARP										CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																																				
1	CC 1015413223	BLANCO GUIO CARLOS MAURICIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	13719731	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1098630870	SIERRA MESA WILMER EDUARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	13719731	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 971.900

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13719731
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDWIN RAMIRO SIERRA MESA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 13 7 42	TELÉFONO:	6617676
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - CONTRATO SAN MIGUEL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6025817419**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/30			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	434612704

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 0	$ 560.400
SUBTOTALES:										**$ 560.400**	**$ 0**	**$ 560.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 140.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 140.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 131.100	$ 131.100	$ 0	$ 0	$ 131.100
SUBTOTALES:									**$ 131.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 131.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	2	$ 140.200	$ 0	$ 140.200
SUBTOTALES:			**$ 140.200**	**$ 0**	**$ 140.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD						ARP										CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																																				
1	CC 1015413223	BLANCO GUIO CARLOS MAURICIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	13719731	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1098630870	SIERRA MESA WILMER EDUARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	13719731	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 971.900

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13719731
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDWIN RAMIRO SIERRA MESA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 13 7 42	TELÉFONO:	6617676
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - CONTRATO SAN MIGUEL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1751658612**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997667300

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 0	$ 560.400
SUBTOTALES:										**$ 560.400**	**$ 0**	**$ 560.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 140.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 140.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 131.100	$ 131.100	$ 0	$ 0	$ 131.100
SUBTOTALES:									**$ 131.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 131.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	2	$ 140.200	$ 0	$ 140.200
SUBTOTALES:			**$ 140.200**	**$ 0**	**$ 140.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																																	
1	CC 1015413223	BLANCO GUIO CARLOS MAURICIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	13719731	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1098630870	SIERRA MESA WILMER EDUARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	13719731	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 971.900

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13719731
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDWIN RAMIRO SIERRA MESA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 13 7 42	TELÉFONO:	6617676
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	004 - OBRAS CONSTRUCCION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6022042807**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	375951913

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.100	$ 0	$ 28.100
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.400	$ 0	$ 37.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 120.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.400	$ 0	$ 120.400
SUBTOTALES:										**$ 185.900**	**$ 0**	**$ 185.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 25.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.900	$ 0	$ 0	$ 25.900
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 9.400
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 7.100
SUBTOTALES:													**$ 42.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 42.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 73.300	$ 73.300	$ 0	$ 0	$ 73.300
SUBTOTALES:									**$ 73.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 73.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	5	$ 42.400	$ 0	$ 42.400
SUBTOTALES:			**$ 42.400**	**$ 0**	**$ 42.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13719731
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDWIN RAMIRO SIERRA MESA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 13 7 42	TELÉFONO:	6617676
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	004 - OBRAS CONSTRUCCION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**6023470446**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/06/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			434567634

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 868.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 868.700	$ 0	$ 868.700
230201	230201- PROTECCION	2	$ 298.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 298.900	$ 0	$ 298.900
230301	230301-PORVENIR	3	$ 261.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 261.700	$ 0	$ 261.700
SUBTOTALES:										**$ 1.989.700**	**$ 0**	**$ 1.989.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 128.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.600	$ 0	$ 0	$ 128.600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 84.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.300	$ 0	$ 0	$ 84.300
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 144.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.900	$ 0	$ 0	$ 144.900
SUBTOTALES:													**$ 498.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 498.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	11		$ 0	$ 0		$ 0	$ 865.600	$ 865.600	$ 0	$ 0	$ 865.600
SUBTOTALES:									**$ 865.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 865.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	11	$ 498.000	$ 0	$ 498.000
SUBTOTALES:			**$ 498.000**	**$ 0**	**$ 498.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1000063187	JOYA MARIN DAVID FELIPE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		02															230201-PROTECCION	2	$ 116.727	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.700	EPS005-SANITAS S.A	2	$ 116.727	$ 4.700	$ 0	$ 4.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	2	$ 116.727	13719731	$ 8.200	2	$ 116.727	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1005231274	CAMARGO RODRIGUEZ JHON ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	01																230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	13719731	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1007917168	VEGA LEIVA LAURA FERNANDA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	13719731	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1096946566	PEREZ PEÑA VICTOR LEONARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	01																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	13719731	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1096950980	CAMPEROS ARDILA MARIA FERNANDA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	01																230901-SKANDIA OBLIGATORIO	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	13719731	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13719731
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDWIN RAMIRO SIERRA MESA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 13 7 42	TELÉFONO:	6617676
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	004 - OBRAS CONSTRUCCION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6023470446**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	434567634

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
6	CC 1098132731	CACERES RANGEL JESUS ARCANGEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	13719731	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1099662191	SILVA MANRIQUE VICTOR MANUEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	10	12															230301-PORVENIR	3	$ 175.091	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28.100	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 7.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	3	$ 175.091	13719731	$ 12.200	3	$ 175.091	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1099662192	SILVA PEÑA BRAYAN ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	10	12															230301-PORVENIR	3	$ 175.091	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28.100	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 7.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	3	$ 175.091	13719731	$ 12.200	3	$ 175.091	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 13907062	JAIMES JAIMES EDUAR ALEXIS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	13719731	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 13928982	HERNANDEZ QUINTERO LIBARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	23	25															25-14 COLPENSIONES	3	$ 175.091	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28.100	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 7.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	3	$ 175.091	13719731	$ 12.200	3	$ 175.091	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 88282927	ASCANIO ORTIZ NIXON	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	09																230301-PORVENIR	22	$ 1.283.997	$ 205.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.500	EPS002-SALUD TOTAL	22	$ 1.283.997	$ 51.400	$ 0	$ 51.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	22	$ 1.283.997	13719731	$ 89.400	22	$ 1.283.997	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 3.851.300

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13719731
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDWIN RAMIRO SIERRA MESA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 13 7 42	TELÉFONO:	6617676
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	004 - OBRAS CONSTRUCCION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6030857674**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/10			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	551030539		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	4	$ 663.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 663.200	$ 0	$ 663.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 803.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 803.200	$ 0	$ 803.200
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 242.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 242.800	$ 0	$ 242.800
230301	230301-PORVENIR	3	$ 597.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 597.800	$ 0	$ 597.800
230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 2.587.200**	**$ 0**	**$ 2.587.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 140.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 226.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 226.600	$ 0	$ 0	$ 226.600
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 140.200
SUBTOTALES:													**$ 647.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 647.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.125.800	$ 1.125.800	$ 0	$ 0	$ 1.125.800
SUBTOTALES:									**$ 1.125.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.125.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	12	$ 647.100	$ 0	$ 647.100
SUBTOTALES:			**$ 647.100**	**$ 0**	**$ 647.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1005231274	CAMARGO RODRIGUEZ JHON ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	13719731	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1007917168	VEGA LEIVA LAURA FERNANDA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	13719731	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1096946566	PEREZ PEÑA VICTOR LEONARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	13719731	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1096947100	GARCIA GALVIS MARTHA ISABEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	14																230201-PROTECCION	17	$ 992.180	$ 158.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 158.800	EPS037-NUEVA EPS	17	$ 992.180	$ 39.700	$ 0	$ 39.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	17	$ 992.180	13719731	$ 69.100	17	$ 992.180	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1096947518	GOMEZ GOMEZ LEO ANTONIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	14																230301-PORVENIR	17	$ 992.180	$ 158.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 158.800	EPS005-SANITAS S.A	17	$ 992.180	$ 39.700	$ 0	$ 39.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	17	$ 992.180	13719731	$ 69.100	17	$ 992.180	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13719731
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDWIN RAMIRO SIERRA MESA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 13 7 42	TELÉFONO:	6617676
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	004 - OBRAS CONSTRUCCION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6030857674**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	551030539

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
6	CC 1096950980	CAMPEROS ARDILA MARIA FERNANDA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	13719731	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1098132731	CACERES RANGEL JESUS ARCANGEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		26															25-14 COLPENSIONES	26	$ 1.517.451	$ 242.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 242.800	EPS037-NUEVA EPS	26	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 60.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	26	$ 1.517.451	13719731	$ 105.700	26	$ 1.517.451	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1099302209	CARDENAS ROJAS MARLON ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	24																230201-PROTECCION	7	$ 408.545	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 65.400	EPS005-SANITAS S.A	7	$ 408.545	$ 16.400	$ 0	$ 16.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	7	$ 408.545	13719731	$ 28.500	7	$ 408.545	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 16.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 13907062	JAIMES JAIMES EDUAR ALEXIS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		26															231001-COLFONDOS	26	$ 1.517.451	$ 242.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 242.800	EPS005-SANITAS S.A	26	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 60.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	26	$ 1.517.451	13719731	$ 105.700	26	$ 1.517.451	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 5634727	CARDENAS BONILLA ABELARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	14																230201-PROTECCION	17	$ 992.180	$ 158.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 158.800	EPS005-SANITAS S.A	17	$ 992.180	$ 39.700	$ 0	$ 39.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	17	$ 992.180	13719731	$ 69.100	17	$ 992.180	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 88282927	ASCANIO ORTIZ NIXON	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	13719731	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 91498712	LONDOÑO JAIMES ALDO FARID	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	14																230301-PORVENIR	17	$ 992.180	$ 158.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 158.800	EPS037-NUEVA EPS	17	$ 992.180	$ 39.700	$ 0	$ 39.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	17	$ 992.180	13719731	$ 69.100	17	$ 992.180	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 5.007.200

Planilla Pagada
