PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA

INFORME SEMANAL No. 47

CO1.PCCNTR.8155097

LOTE COP No.16

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SEMANA N°	47	DEL	22/08/2026 (DD-MM-AA)	AL	28/08/2026 (DD-MM-AA)	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato	329 dias
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CO1.PCCNTR.8168931 (Numero del contrato)			CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°	CO1.PCCNTR.8155097 (Numero del contrato)	LOTE COP	16

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
RL del consorcio	RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155097
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"

VALOR DEL CONTRATO		$	2,455,237,837.00
AIU	33.88%	$	831,834,579.18
COSTO DIRECTO		$	1,623,403,257.82
OFERTADO		$	2,176,484,644.00
EMERGENCIAS		$	100,000,000.00
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS		$	2,276,484,644.00
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS		$	178,743,193.00
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)		$	278,743,193.00
Valor adicional No. 1:		$	380,000,000.00
Valor inicial No. 1 emergencias:		$	200,000,000.00
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:		$	180,000,000.00
Valor adicional No. 2:		$	635,129,689.00
Valor inicial No. 2 emergencias:		$	-
Valor adicional No.2 Obras Contractuales:		$	635,129,689.00
Valor adicional No. 3:		$	-
Valor inicial No. 3 emergencias:		$	400,000,000.00
Valor adicional No.3 Obras Contractuales:		$	-
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA		$	3,870,367,526.00
VALOR TOTAL EMERGENCIAS		$	878,743,193.00
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES		$	2,991,624,333.00

PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 02	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	CATORCE (14) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE TERMINACION	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°2	2/08/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°3	2/12/2026

INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S
RL de interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6

VALOR INICIAL	$	796,278,922.00
VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	$	139,026,666.00
VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	$	219,541,737.00
VALOR TOTAL CONTRATO	$	1,154,847,325.00


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Prooramada (%)	0.00%	100.00%	Obra Física Ejecutada (%)	0.16%	99.78%
Valor de la Obra Prooramada:	$ -	$ 3,870,367,526.00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 4,637,018.00	$ 3,861,659,199.00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	100.00%	99.62%	
Durante el periodo	0.00%	0.16%	-0.22%
Acumulado actual	100.00%	99.78%	

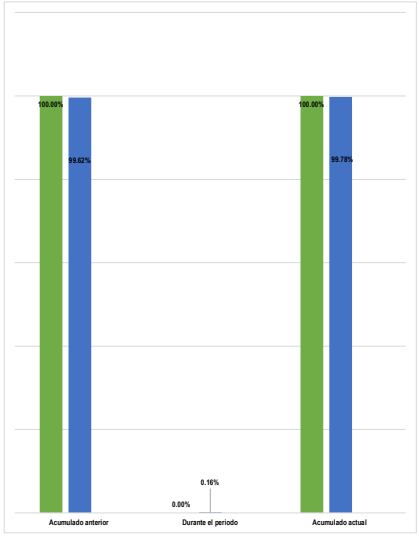

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
		FRENTES CONTRACTUALES						
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1603	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
		TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
		FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02						
	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A	0.00%	0.21%	0.21%	100.00%	100.00%	0.00%
	PUENTE ARANDA	SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE B	0.00%	1.34%	1.34%	100.00%	97.83%	-2.17%
		TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02	0.00%	0.52%	0.52%	100.00%	99.28%	-0.72%
		TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 02	0.00%	0.16%	0.16%	100.00%	99.78%	-0.22%

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
		EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS						
1616	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 17,578,413.00		
1609	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 8,789,206.00		
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
914	FONTIBON	RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 8,717,991.00		
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 3,906,314.00		
925	FONTIBON	LA FELICIDAD - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 5,859,471.00		
	SUBA	RAMON DE ZUBIRIA - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,171,894.00		
929	FONTIBON	MARIA JOSEFA CANELONES - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 9,318,316.00		
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 11,260,411.00		
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE B (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 121,172,363.00		
	PUENTE ARANDA	LA MERCED - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 50,507,407.00		
923	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C (OBRA N°1)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 45,542,577.00		
	FONTIBON	CARLO FEDERICI - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 5,932,800.00		
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 19,666,574.00		
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 61,609,623.00		
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B (OBRA)	100.00%	97.00%	-3.00%	$ 33,821,137.00		
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 15,292,215.00		
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ 5,346,647.00		
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ 15,811,089.00		
	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A	80.00%	80.00%	0.00%	$ 51,712,689.00		
1402	LOS MARTIRES	EDUARDO SANTOS - SEDE A	20.00%	20.00%	0.00%	$ -		
908	FONTIBON	COSTA RICA - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
		TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS	84.62%	84.50%	-0.12%	$ 498,876,608.00	$ 878,743,193.00	$ 379,866,585.00

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA		$ 3,870,367,526.00
VALOR PARCIAL N°1	$	88,202,201.00
VALOR PARCIAL N°2	$	500,169,705.00
VALOR PARCIAL N°3	$	509,104,595.00
VALOR PARCIAL N°4	$	327,265,136.00
VALOR PARCIAL N°5	$	266,133,285.00
VALOR PARCIAL N°6	$	620,841,807.00
VALOR PARCIAL N°7	$	263,529,060.00
VALOR PARCIAL N°8	$	431,609,822.00
TOTAL VALOR FACTURADO	$	3,008,855,611.00
SUMAS IGUALES		$ 861,511,915.00


INDICADOR FINACIERO	VALOR FACTURADO	% DE AVANCE FINANCIERO
	$ 3,008,855,611.00	77.74%
	VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	
	$ 861,511,915.00	

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - % ADELANTO +
	100.00%	99.78%	-0.22%

INDICADOR TIEMPO (DIAS)	DIAS TOTAL DEL CONTRATO	RETRASO
	426	-0.92

CURVA S

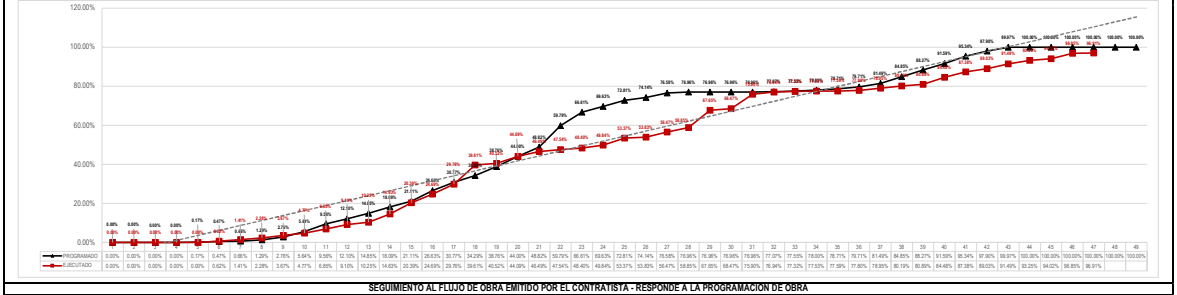

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	12/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
2	SEM 2	19/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
3	SEM 3	26/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
4	SEM 4	2/11/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
5	SEM 5	9/11/2025	$ 4,755,494.21	0.17%	0.00%	$ -	$ 4,755,494.21	0.17%	$ 4,755,494.21	0.00%	$ -
6	SEM 6	16/11/2025	$ 8,125,912.59	0.29%	0.62%	$ 16,977,206.64	-$ 8,851,294.05	0.47%	$ 12,881,406.80	0.62%	$ 16,977,206.64
7	SEM 7	23/11/2025	$ 5,288,020.00	0.19%	0.79%	$ 21,771,422.72	-$ 16,483,402.72	0.66%	$ 18,169,426.80	1.41%	$ 38,748,629.36
8	SEM 8	30/11/2025	$ 17,444,983.27	0.63%	0.87%	$ 23,997,772.21	-$ 6,552,788.94	1.29%	$ 35,614,410.07	2.28%	$ 62,746,401.57
9	SEM 9	7/12/2025	$ 40,343,446.53	1.46%	1.39%	$ 38,340,052.51	$ 2,003,394.02	2.76%	$ 75,957,856.60	3.67%	$ 101,086,454.08
10	SEM 10	14/12/2025	$ 79,444,682.79	2.88%	1.10%	$ 30,382,417.28	$ 49,062,265.51	5.64%	$ 155,402,539.39	4.77%	$ 131,468,871.36
11	SEM 11	21/12/2025	$ 108,209,197.15	3.92%	2.08%	$ 57,402,366.83	$ 50,806,830.32	9.56%	$ 263,611,736.54	6.85%	$ 188,871,238.19
12	SEM 12	28/12/2025	$ 69,900,889.80	2.54%	2.25%	$ 62,085,827.21	$ 7,815,062.59	12.10%	$ 333,512,626.34	9.10%	$ 250,957,065.40
13	SEM 13	4/01/2026	$ 75,956,528.24	2.76%	1.15%	$ 31,686,383.67	$ 44,270,144.57	14.85%	$ 409,469,154.58	10.25%	$ 282,643,449.07
14	SEM 14	11/01/2026	$ 89,212,283.49	3.24%	4.37%	$ 120,616,837.44	-$ 31,404,553.95	18.09%	$ 498,681,438.07	14.63%	$ 403,260,286.51
15	SEM 15	18/01/2026	$ 83,223,770.74	3.02%	5.76%	$ 158,783,369.63	-$ 75,559,598.89	21.11%	$ 581,905,208.81	20.39%	$ 562,043,656.14
16	SEM 16	25/01/2026	$ 152,231,709.97	5.52%	4.30%	$ 118,625,799.96	$ 33,605,910.01	26.63%	$ 734,136,918.78	24.69%	$ 680,669,456.10
17	SEM 17	1/02/2026	$ 114,051,601.68	4.14%	5.07%	$ 139,680,056.20	-$ 25,628,454.52	30.77%	$ 848,188,520.46	29.76%	$ 820,349,512.30
18	SEM 18	8/02/2026	$ 97,149,131.29	3.52%	9.85%	$ 271,555,749.04	-$ 174,406,617.75	34.29%	$ 945,337,651.75	39.61%	$ 1,091,905,261.34
19	SEM 19	15/02/2026	$ 123,336,874.83	4.47%	0.92%	$ 25,293,497.30	$ 98,043,377.53	38.76%	$ 1,068,674,526.58	40.52%	$ 1,117,198,758.64
20	SEM 20	22/02/2026	$ 144,354,651.09	5.24%	3.57%	$ 98,397,025.80	$ 45,957,625.29	44.00%	$ 1,213,029,177.67	44.09%	$ 1,215,595,784.44
21	SEM 21	1/03/2026	$ 133,044,130.87	4.83%	2.39%	$ 65,986,851.22	$ 67,057,279.65	48.82%	$ 1,346,073,308.54	46.49%	$ 1,281,582,635.66
22	SEM 22	8/03/2026	$ 302,192,068.33	10.96%	1.05%	$ 28,959,518.19	$ 273,232,550.14	59.79%	$ 1,648,265,376.87	47.54%	$ 1,310,542,153.85
23	SEM 23	15/03/2026	$ 188,077,906.58	6.82%	0.86%	$ 23,746,298.25	$ 164,331,608.33	66.61%	$ 1,836,343,283.45	48.40%	$ 1,334,288,452.10
24	SEM 24	22/03/2026	$ 83,278,260.58	3.02%	1.44%	$ 39,714,826.84	$ 43,563,433.74	69.63%	$ 1,919,621,544.03	49.84%	$ 1,374,003,278.94
25	SEM 25	29/03/2026	$ 87,605,509.23	3.18%	3.54%	$ 97,485,710.00	-$ 9,880,200.77	72.81%	$ 2,007,227,053.26	53.37%	$ 1,471,488,988.94
26	SEM 26	5/04/2026	$ 36,671,729.02	1.33%	0.46%	$ 12,586,346.12	$ 24,085,382.90	74.14%	$ 2,043,898,782.28	53.83%	$ 1,484,075,335.06
27	SEM 27	12/04/2026	$ 67,465,761.55	2.45%	2.64%	$ 72,654,892.31	-$ 5,189,130.76	76.58%	$ 2,111,364,543.83	56.47%	$ 1,556,730,227.37
28	SEM 28	19/04/2026	$ 10,504,787.87	0.38%	2.38%	$ 65,673,691.00	-$ 55,168,903.13	76.96%	$ 2,121,869,331.70	58.85%	$ 1,622,403,918.37
29	SEM 29	26/04/2026	$ -	0.00%	8.81%	$ 242,792,425.00	-$ 242,792,425.00	76.96%	$ 2,121,869,331.70	67.65%	$ 1,865,196,343.37
30	SEM 30	3/05/2026	$ -	0.00%	0.82%	$ 22,593,456.00	-$ 22,593,456.00	76.96%	$ 2,121,869,331.70	68.47%	$ 1,887,789,799.37
31	SEM 31	10/05/2026	$ -	0.00%	7.43%	$ 204,830,616.00	-$ 204,830,616.00	76.96%	$ 2,121,869,331.70	75.90%	$ 2,092,620,415.37
32	SEM 32	17/05/2026	$ 2,939,616.46	0.11%	1.04%	$ 28,542,222.29	-$ 25,602,605.83	77.07%	$ 2,124,808,948.16	76.94%	$ 2,121,162,637.66
33	SEM 33	24/05/2026	$ 13,157,394.66	0.48%	0.38%	$ 10,486,451.43	$ 2,670,943.23	77.55%	$ 2,137,966,342.82	77.32%	$ 2,131,649,089.09
34	SEM 34	31/05/2026	$ 12,548,751.03	0.46%	0.21%	$ 5,874,529.72	$ 6,674,221.31	78.00%	$ 2,150,515,093.85	77.53%	$ 2,137,523,618.81
35	SEM 35	7/06/2026	$ 19,593,618.07	0.71%	0.06%	$ 1,598,978.52	$ 17,994,639.55	78.71%	$ 2,170,108,711.92	77.59%	$ 2,139,122,597.33
36	SEM 36	14/06/2026	$ 27,411,758.80	0.99%	0.21%	$ 5,775,725.09	$ 21,636,033.71	79.71%	$ 2,197,520,470.72	77.80%	$ 2,144,898,322.42
37	SEM 37	21/06/2026	$ 49,017,622.18	1.78%	1.15%	$ 31,821,056.27	$ 17,196,565.91	81.49%	$ 2,246,538,092.90	78.95%	$ 2,176,719,378.69
38	SEM 38	28/06/2026	$ 92,689,422.33	3.36%	1.24%	$ 34,157,077.65	$ 58,532,344.68	84.85%	$ 2,339,227,515.23	80.19%	$ 2,210,876,456.34
39	SEM 39	5/07/2026	$ 94,464,846.21	3.43%	0.70%	$ 19,295,707.59	$ 75,169,138.62	88.27%	$ 2,433,692,361.44	80.89%	$ 2,230,172,163.93
40	SEM 40	12/07/2026	$ 91,363,907.55	3.31%	3.59%	$ 98,989,618.19	-$ 7,625,710.64	91.59%	$ 2,525,056,268.99	84.48%	$ 2,329,161,782.12
41	SEM 41	19/07/2026	$ 103,561,399.66	3.76%	2.90%	$ 79,872,634.44	$ 23,688,765.22	95.34%	$ 2,628,617,668.65	87.38%	$ 2,409,034,416.56
42	SEM 42	26/07/2026	$ 70,486,269.07	2.56%	1.65%	$ 45,378,952.96	$ 25,107,316.11	97.90%	$ 2,699,103,937.72	89.03%	$ 2,454,413,369.52
43	SEM 43	2/08/2026	$ 57,127,153.06	2.07%	2.46%	$ 67,903,696.24	-$ 10,776,543.18	99.97%	$ 2,756,231,090.78	91.49%	$ 2,522,317,065.76
44	SEM 44	9/08/2026	$ 733,972.09	0.03%	1.76%	$ 48,598,205.98	-$ 47,864,233.89	100.00%	$ 2,756,965,062.87	93.25%	$ 2,570,915,271.74
45	SEM 45	16/08/2026		0.00%	0.77%	$ 21,260,114.90	-$ 21,260,114.90	100.00%	$ 2,756,965,062.87	94.02%	$ 2,592,175,386.64
46	SEM 46	23/08/2026		0.00%	2.82%	$ 77,844,021.32	-$ 77,844,021.32	100.00%	$ 2,756,965,062.87	96.85%	$ 2,670,019,407.96
47	SEM 47	30/08/2026		0.00%	0.06%	$ 1,778,534.51	-$ 1,778,534.51	100.00%	$ 2,756,965,062.87	96.91%	$ 2,671,797,942.47
48	SEM 48	6/09/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
49	SEM 49	13/09/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
			$ 2,756,965,062.87								

NOTA: EL VALOR REPORTADO EN EL FLUJO ESTA BASADO EN LOS PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIONES DE LAS OBRAS CONTRACTUALES, ESTO NO INCLUYE CANTIDADES ADICIONALES Y NP´S QUE SON OBJETO DE MODIFICACIÓN EN LOS RECORRIDOS DE OBRA.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 47 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 47 (Consecutivo) **DEL** 24/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 30/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 331 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100% de las obras solicitadas inicialmente.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana se efectuó la reparación del filo del cárcamo, el cual presentaba agrietamiento y desprendimiento, seguido de la aplicación de pintura azul. Sin embargo, se evidenció diferencia de tonalidad respecto a la pintura existente, por lo que la interventoría solicita realizar el acabado con una tonalidad similar a la existente, con el fin de garantizar la uniformidad del acabado y evitar diferencias visibles en el área intervenida.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: No se realizan actividades

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoria de obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Sede entregada sin novedad.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad:

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Por temas de garantia se solicito la pintura en el cuarto de almacen ubicado en el primer nivel.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Frente ejecutado y entregado

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se evidencia que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: De acuerdo a las observaciones presentadas por la institucion se programa que el contratista realice subsanaciones de posventa por dilatacion de juntas.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 47 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 47 (Consecutivo) **DEL** 24/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 30/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 331 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Se realizó resane y pintura en punto fijo. Asimismo, se ejecutaron actividades de enchape y sobrepiso en la parte superior del tanque. De igual manera, se evidenció una fuga en el tanque, la cual actualmente se encuentra en revisión por parte del contratista.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la continuación de las labores de enchape e instalación de piso sobre la placa del tanque. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se recomendó al contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP, de acuerdo con los riesgos asociados a las actividades ejecutadas.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: La evaluación se realiza con base en el cronograma presentado por el contratista.

4.2 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con cerramiento perimetral, al igual se ha realizado jornadas de aseo y se implementó todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Algunas de las actividades ejecutadas en obra no se encuentran contempladas dentro de la programación presentada por el contratista, debido a que corresponden a actividades nuevas que han surgido durante la ejecución. No obstante, estas se encuentran en proceso de ejecución, entre las cuales se incluyen el resane y pintura del punto fijo, así como las actividades de sobrepiso y enchape realizadas en la parte superior del tanque.
Se solicita corregir la pintura aplicada en perfileria de policarbonato con aspersor, toda vez que los parales y soportes presentan textura irregular y escurrimientos de pintura. De igual manera, se requiere corregir la aplicación de Sikaflex en la zona del flanche y asegurar los puntos donde se evidencia separación

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JAZMIN SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se realizaron retoques de pintura y se efectuó la instalación de la estructura metálica y la madera correspondiente para la conformación de las mesas ubicadas en el salón de informática. De igual manera, se ejecutaron labores de aseo y se realizó la reparación y reposición del tubo de agua que fue afectado durante las labores desarrolladas en la zona de acopio.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la ejecución de actividades correspondientes a la instalación de soportes metálicos en el aula de informática, así como la instalación de la superficie de madera sobre la estructura metálica y labores de limpieza en áreas del tercer y cuarto piso, además de otras actividades complementarias.
Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se recomendó al contratista continuar fortaleciendo las jornadas de orden y aseo, especialmente en la zona del jardín, garantizando el retiro oportuno de residuos, materiales y elementos que puedan generar condiciones inseguras. Asimismo, se recomendó mejorar y reforzar el cerramiento perimetral, verificando periódicamente su estabilidad y condiciones, con el fin de garantizar una adecuada delimitación del área de trabajo y prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Las cantidades de obra se actualizan conforme al proceso constructivo, con base en el balance presentado por el contratista de obra.

4.2 Actividades programadas NO ejecutadas:

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencio el traslado de residuos de los otros colegios a este frente, por lo que se le hace un llamado de atención al contratista por el desorden en la zona de acopio, al igual no se evidencio el cerramiento adecuado de los individuos arbóreos y se vio afectado, por lo que se recomienda realizar la debida disposición, recuperar la zona verde y la debida protección a los individuos arbóreos, al igual que realizar labores de orden y aseo en las áreas intervenidas e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: La supervisión solicita realizar el retiro y evacuación del material acopiado, con el fin de liberar y mantener despejados los espacios intervenidos.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

1. Actividades Tecnicas: El contratista finalizó las actividades correspondientes al apantallamiento. Por solicitud de la supervisión, se tiene programada la pintura y demarcación de los parqueaderos de bicicletas durante los fines de semana, con el fin de evitar interferencias con los estudiantes. Sin embargo, la actividad no ha podido ejecutarse debido a las lluvias presentadas, pese a la presencia del contratista en sitio.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la ejecución de actividades correspondientes a la aplicación de pintura en la placa exterior ubicada junto a la cancha de la institución. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se recomendó al contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP, de acuerdo con los riesgos asociados a la actividad.
Asimismo, se recomendó realizar jornadas de orden y aseo durante y al finalizar las labores, efectuando el retiro oportuno de residuos, materiales y herramientas utilizadas, con el fin de mantener condiciones seguras en las áreas intervenidas.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: La evaluación se realiza con base en el cronograma presentado por el contratista.

4.2 Actividades programadas NO ejecutadas:
MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, no se evidencian residuos, se realizó jornadas de orden y aseo al igual se garantizó el cumplimiento todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: El supervisor solicita incluir dentro del alcance la instalación de la baranda, la pérgola y la demarcación de la losa de contrapiso. El contratista deberá remitir el procedimiento constructivo y la evidencia correspondiente al tratamiento ejecutado en las juntas de la losa de contrapiso.
Asimismo, permanecen pendientes de atención las observaciones formuladas por la interventoría relacionadas con la calidad de los acabados, el desprendimiento de pintura en placas y las labores de limpieza y aseo al finalizar las actividades.

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA PROYECTOS SILVICULTURALES

° **SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE A:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

° **SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE B:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

° **EL JAZMIN - SEDE A:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

° **RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

° **VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

° **REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

° **INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A:** Ficha SAE remitida el 11 de Agosto de 2026, labores finalizadas.

° **LA FELICIDAD - SEDE A:** Ficha SAE remitida el 10 de Agosto de 2026, labores finalizadas.

° **RAMON DE ZUBIRIA - SEDE A:** Labores finalizadas. El contratista realiza labores de corte y retiro de material vegetal. La interventoria esta a la espera de la Ficha SAE para legalizar el procedimiento

1. Actividades Tecnicas:

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Una vez verificadas las labores se concilian horario de intervención para ingresar a la sede; No requiere programación por ser una obra menor.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: El contratista debe remitir el Informe de Ejecución de Actividades Silviculturales con el fin de proceder con la autorización del pago. La Actividad será verificada por el Profesional Ambiental de la Interventoría

6. Generales: Se realiza visita de verificación y reporte en porcentaje de las intervenciones efectuadas dentro del proceso.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 47 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 47 (Consecutivo) **DEL** 24/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 30/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 331 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES

1. Actividades Tecnicas: Se finalizaron las labores en esta sede

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se finalizan las obras diseñadas para reparar las filtraciones en cubierta y se realiza la entrega sin novedad.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO EL JAZMIN - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Frente de obra entregado

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Queda pendiente por parte del contratista la reposición de la cobertura vegetal mediante la siembra de árboles y especies ornamentales en las zonas afectadas por la ejecución de la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LA MERCED - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Obra finalizada y entregada sin novedad.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Se evidencia afectacion en tuberia de desague la cual debe ser corregida, lo que incluye cambio de tuberia y reparacion de puntos de drenaje, para lo cual el contratista se encuentra revisando presupuesto teniendo en cuenta que es tuberia CPVC

2. Seguridad Social y SST:

4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental:
6. Generales: Se espera que la supervisión verifique el balance presupuestal y, con base en este, defina la viabilidad de realizar la intervención correspondiente en la sede. No se realizará la intervención hasta contar con el aval correspondiente por parte de la supervisión.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CARLO FEDERICI -SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Labores finalizadas

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se instalo la canal, flanche y el desagüe. Se verifico arreglo de filtracion de sanitario, sin novedad.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA- SEDE B

1. Actividades Tecnicas: El alcance de la intervencion es Mantenimiento cerramiento metálico existente incluye cimentacion, Alistado de piso en terraza, media caña, Mortero de Nivelacion Tipo Sikafloor, suministro e instalacion de flanches y Reparacion de filtracion en la placa de cubierta

El contratista realizó la instalación del flanche en la cubierta, así como la pintura del techo y muros de los baños. Respecto al cielo raso de la biblioteca, se presentan observaciones en los remates, por lo que la interventoría y la supervisión solicitaron al contratista realizar las respectivas correcciones.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la aplicación de pintura en tonalidad azul en diferentes áreas de la cancha de la institución, así como trabajos de reparación del pavimento ubicado junto al cárcamo, en un sector que presentaba agrietamientos y desprendimientos, además de otras actividades complementarias.
De igual manera, se recomendó mantener condiciones adecuadas de orden y aseo, realizar el retiro oportuno de los residuos y materiales producto de las actividades de reparación y pintura, y verificar previamente el estado de las herramientas y equipos utilizados. Se indicó al contratista mantener las medidas de seguridad implementadas durante la ejecución de las labores, especialmente en las áreas de circulación de la comunidad educativa.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se recomendó realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: En cielo raso de la ludoteca se presentan observaciones en los remates, por lo que la interventoría y la supervisión solicitaron al contratista realizar las respectivas correcciones. Se espera que el contratista subsane.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 47 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 47 (Consecutivo) **DEL** 24/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 30/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 331 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON

1. Actividades Tecnicas: El alcance contempla las labores de apuntalamiento requeridas para sostener el muro de fachada del bloque denominado "la casona"

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Labores ejecutadas sin novedad

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA MARCO ANTONIO CARREÑO- PRIORITARIA

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

Se realizo mesa de trabajo en conjunto con el ingeniero apoyo a la supervision con el fin de unificar criterios entre las partes y asi radicar paquetes finales al departamento de estudios previos de la SED.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Labores finalizadas y entregadas

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: La intervencion incluye las labores de pintura en la fachada posterior y la fachada lateral interna efectuadas en el bloque principal, lo anterior con el fin de unificar la apariencia del bloque; labores finalizadas sin novedad .

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JAZMIN SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se efectuan labores de pintura base en muros de primer y segundo piso.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: El alcance de la intervencion incluye la pintura de muros, puertas y esmalte punto fijos de primer y segundo nivel

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO EDUARDO SANTOS SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se realizó el desmonte del cielorraso, luminarias y tanques existentes en el área de intervención.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes al desmonte del cielo raso existente, desmonte de 3 luminarias ubicadas en el área intervenida y desmonte de 6 tanques con capacidad de 500 litros cada uno.
Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se recomendó al contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP, de acuerdo con los riesgos asociados a las actividades de desmonte y manipulación de elementos. Asimismo, se recomendó realizar el adecuado acopio y organización de los materiales, luminarias y tanques retirados, evitando su disposición en zonas de circulación o áreas que puedan generar condiciones inseguras.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se realizo el desmonte del cielo raso, luminarias y tanques, por lo que se recomendó acopiarlos adecuadamente, retirarlos si es necesario, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Ficha SAE remitida el 03 de Agosto de 2026. Se aclara que la cubierta no se encuentra contemplada dentro del alcance de la intervención. No obstante, durante la visita se evidenciaron perforaciones en la cubierta, presencia de humedad en la parte superior del área intervenida y el ingreso de aves, principalmente palomas, a través de una rejilla ubicada en la cubierta.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO COSTA RICA

1. Actividades Tecnicas:

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se programa visita de verificacion el dia martes primero de septiembre, en conjunto con interventoria y contratista con el fin de determinar y presupuestar la intervencion.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CULTURA POPULAR SEDE B

1. Actividades Tecnicas: A la espera que el contratista remita presupuesto de obra, con el fin de que este sea evaluado por la interventoria y la supervision para dar inicio a las obras.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO VAN UDEN SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Se realiza visita de verificacion el dia viernes en compañía de la supervision y el contratista de obra, lo anterior con el fin de verificar el alcance de las labores, realizar presupuestos y programar el inicio de la intervencion.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIRMAS

ARQ.LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

ING. KATHERINE CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO
ESPECIALISTA ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
ESPECIALISTA HIDRAULICO

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

DRA.SILVIA JULIANA BETANCUR RODRIGUEZ
ASESOR JURÍDICO

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 47 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 47 (Consecutivo) **DEL** 24/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 30/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 315 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA



Instalación de flanche en la parte central de la cubierta de la institución.



Instalación perimetral de flanche en la cubierta de la institución.



Ajuste y corrección del flotador del tanque para eliminar desbordamientos de agua.



Pintura de red metálica en tonalidad azul.



Ejecución de resanes y remates en cielo raso, los cuales presentan acabado deficiente.



Retiro de soporte de cielo raso.

1.



Aplicación de pintura azul en el área del cárcamo.



Aplicación de pintura azul en sector de la cancha de la institución.

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 47 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 47 (Consecutivo) **DEL** 24/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 30/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 314 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO EL JAZMIN SEDE A



Instalación de flanche en culata y completamiento del sistema de flanchado.



Instalación de flanche total.



Corrección y puesta en funcionamiento de tomacorriente que se encontraba en mal estado.



Instalación de estructura metálica y base en madera en el área de informática.



Ejecución de aseo en salones del tercer piso.



No se evidencia aplicación de primera capa de pintura blanca en el segundo piso.


1.



Limpieza general del cerramiento de la institución.



Traslado de acopios y elementos del cerramiento al jardín de la institución.

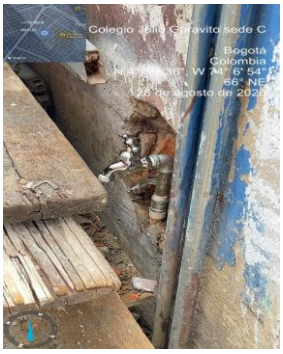

Reparación de tubería afectada por el traslado de materiales y acopios.

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 47 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 47 (Consecutivo) **DEL** 24/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 30/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 315 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO FRANCISCO DE ASIS SEDE B




No se evidencia aplicación de pintura en la placa de la cancha.



Se evidencia apantalllamiento en todo el perimetro de la cubierta de la institución.



Se evidencia correcto anclaje

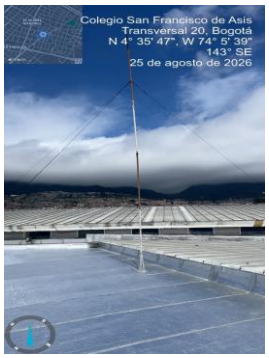

Se evidencia adecuada instalación del pararrayos central.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 47 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 47 (Consecutivo) **DEL** 24/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 30/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 3015 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16


ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE C



Instalación de nuevo balón boya en bronce para el sistema de flotador.



Inicio de enchape e instalación de piso en el sobrepiso del tanque.



Continúa la instalación de piso en el área del tanque.



Se evidencia disminución de 10 cm en el nivel del agua respecto a la marca inicial realizada el día martes.



Corrección y pintura de patinas en pérgola, con acabado no satisfactorio.



Se evidencia humedad en muro contiguo al tanque, asociada a posible filtración de agua.

1.



Emboquillado y enchape en el área del sobrepiso del tanque.
