Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	1	de 4
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	10	8	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL	DD	MM	AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA	CONTRATO No.	18	DE 2025

INFORME No. 40 INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

DATOS DEL CONTRATO

Semana Número: 40 del : 03/08/2026 al 09/08/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 278 días calendario

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS YOPAL
R/L WILVER FRANCINY RUSSY LADINO

NOMBRE DEL INTERVENTOR: EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA RAMA JUDICIAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, UBICADO EN LA CALLE 7 NO. 19 – 07"

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y ADECUACIONES DE LA SEDE JUDICIAL UBICADA EN CALLE 7 # 19 – 07 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE"


VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**$ 422,655,000.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR ADICIONAL	**$ -** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ACTUALIZADO	**$ 422,655,000.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR INCIAL DEL CONTRATO DE OBRA	**$ 6,763,547,277.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR FASE I	**$ 598,761,250.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR FASE II	**$ 6,164,786,027.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR ADICIONAL	**$ -** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA ACTUALIZADO	**$ 6,763,547,277.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)


PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	7.44%	69.84%
Valor obra programada:	$ 458,689,388.23	$ 4,305,637,516.63
Porcentaje proyectado	7.44%	

EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física ejecutada (%)	2.67%	62.52%
Valor de la obra ejecutada:	$ 164,599,786.92	$ 3,854,090,986.37
Porcentaje ejecutado	2.67%	
Atraso semanal	**-4.77%**	

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**REPUBLICA DE COLOMBIA**	**Hoja No.**	2	de 4
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	10	8	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL	**DD**	**MM**	**AA**
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA	**CONTRATO No.**	18	DE 2025

GRAFICA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO

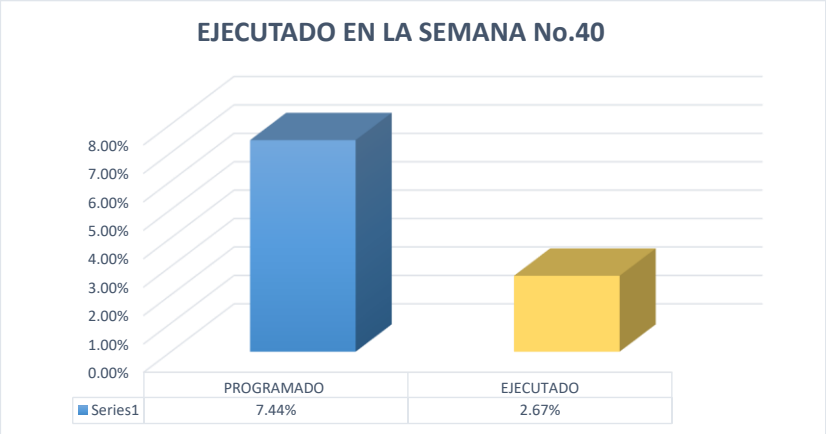

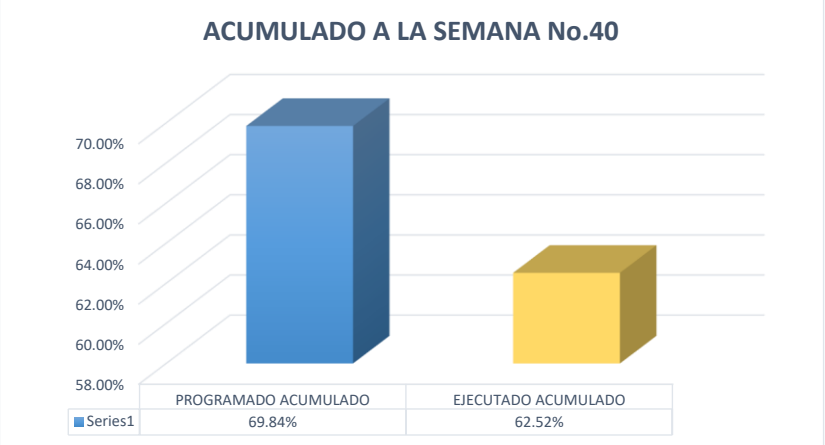

Para el ejecutado de la semana No.40 se presenta un atraso del **-4.77%**

Para el acumulado hasta la semana No.40 se presenta un atraso del **-7.32%**

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.		031 DE 2025
Valor Inicial:	$	6,763,547,277.00
valor adicional:	$	-
Valor Actualizado:	$	6,763,547,277.00
Plazo Inicial:		SIETE(7) MESES
Fecha de Iniciación:		26 DE JUNIO DE 2025
Fecha de Inicio Fase II:		04 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha Prórroga No.1		31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha Prórroga No.2		20 DE ABRIL DE 2026
Fecha Prórroga No.3		17 DE JULIO DE 2026
Fecha Actual Terminación:		19 DE SEPTIEMBRE DE 2026

,

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.		018 DE 2025
Valor Inicial:	$	422,655,000.00
valor adicional:	$	-
Valor Actualizado:	$	422,655,000.00
Plazo Inicial:		SIETE (7) MESES
Fecha de Iniciación:		04 DE JUNIO DE 2025
Fecha de Inicio Fase II:		04 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha Prórroga No.1		31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha Prórroga No.2		20 DE ABRIL DE 2026
Fecha Prórroga No.2		17 DE JULIO DE 2026
Fecha Actual Terminación		19 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**REPUBLICA DE COLOMBIA**	**Hoja No.**	3	de 4
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	10	8	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL	**DD**	**MM**	**AA**
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA	**CONTRATO No.**	18	DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En el presente apartado se describen las actividades realizadas durante la semana N.º 40:

Se continuó con actividades de preparación de superficies en fachada, mediante retiro de pañete en antepechos de ventanas, limpieza de zonas intervenidas con equipo hidrófugo, alistamiento de bloque para estuco y aplicación de pintura en vanos previamente preparados.

Se continuó con actividades de instalaciones eléctricas en diferentes áreas del proyecto, mediante instalación de cable CABLE CU AISLADO LSZH No. 12, instalación de tomas monofásicas SYS normal, GFCI e interruptores, además de adecuación de puntos eléctricos y sensores del sistema contra incendios.

Se continuó con actividades de obra civil en primer piso, aplicación de estuco y pintura en muros y cielo raso

Se continuó con actividades de acabados arquitectónicos en pisos 2 y 3, incluyendo instalación de enchapes en baños, aplicación de pintura en juzgados, instalación de luminarias interiores, adecuación de espacios administrativos y distribución de puestos de trabajo.

Se continuó con actividades mecánicas correspondientes a la instalación y conexión de unidades condensadoras del sistema de aire acondicionado.

El día **04 de agosto de 2026** se envió requerimiento **No. EB-SJ-018-25-222** con asunto: “REQUERIMIENTO PERENTORIO – REITERACIÓN DE COMPROMISOS Y ADVERTENCIA DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. 031 DE 2025”, mediante el cual se requirió al contratista atender los atrasos evidenciados en la ejecución de las actividades contractuales, dar cumplimiento a los compromisos establecidos y disponer de los recursos necesarios para la recuperación del avance de obra.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

01.01.02 DEMOLICION Y RETIRO DE MUROS QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)
01.01.09 DEMOLICION Y RETIRO DE CERRAMIENTO EXISTENTE QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)
01.01.10 DEMOLICION Y RETIRO DE ANDEN EXISTENTE , NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)
01.02.04 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y/O LAVAMANOS INCLUYE SELLO DE PUNTO EXISTENTE
01.02.05 Desmonte instalaciones sanitarias pvc Ø 2",3",4",con retiro y disposicion final
01.02.06 Desmonte instalaciones hidraulicas pvc Ø 1/2",3/4",1", 1 1/2" con retiro y disposicion final
01.02.07 Desmonte de registros y valvulas hidraulicas internas Ø 1/2" a 2"
01.02.08 DEMOLICION DE ACABADO DE PISO 0
01.02.09 Desmantelamiento y disposicion final de red de baja tension
01.02.10 DESMONTE DE TEJA DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE REMATES Y ESTRUCTURA DE SOPORTE
01.02.11 DESMONTE DE MARQUESINA EXISTENTE
01.02.12 DESMONTE DE BARANDAS METALICAS EXISTENTE
01.02.15 DESMONTE DE EQUIPOS MECANICOS/HIDRAULICOS/ELECTRICOS
01.02.19 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA
01.02.20 DESMONTE APARATOS ELECTRICOS: Incluye aparatos, luminarias, canaletas, tomacorrientes, interruptores. incluye retiro y disposicion final
01.02.21 Desmonte tableros electricos, incluye retiro y disposicion final

El contratista se compromete a realiza las actividades programadas para la siguiente semana,
Las actividades a ejecutar para la proxima semana corresponden a la programación presentada.
El contratista se compromete a ejecutar la obra de manera eficaz y eficiente, poniendose al día con el avance de obra.

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	4	de 4
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	10	8	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL	DD	MM	AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA	CONTRATO No.	18	DE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Actividades de fachada



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Instalación de alistado para área de escaleras



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Instalación de enchape en área humeda



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Instalación de tomacorrientes GFCI en cocineta segundo piso



Instalación de cielo raso drywall en primer piso



Aplicación de estuco y pintura en cielo raso rywall

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	1	de 4
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	17	8	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL	DD	MM	AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA	CONTRATO No.	18	DE 2025

INFORME No. 41 INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

DATOS DEL CONTRATO

Semana Número: 41 del : 10/08/2026 al 16/08/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 285 días calendario

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS YOPAL
R/L WILVER FRANCINY RUSSY LADINO

NOMBRE DEL INTERVENTOR: EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA RAMA JUDICIAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, UBICADO EN LA CALLE 7 NO. 19 – 07"

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y ADECUACIONES DE LA SEDE JUDICIAL UBICADA EN CALLE 7 # 19 – 07 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE"


VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**$ 422,655,000.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR ADICIONAL	**$ -** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ACTUALIZADO	**$ 422,655,000.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR INCIAL DEL CONTRATO DE OBRA	**$ 6,763,547,277.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR FASE I	**$ 598,761,250.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR FASE II	**$ 6,164,786,027.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR ADICIONAL	**$ -** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA ACTUALIZADO	**$ 6,763,547,277.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)


PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	15.13%	84.98%
Valor obra programada:	$ 932,906,654.00	$ 5,238,544,170.62
Porcentaje proyectado	15.13%	

EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física ejecutada (%)	2.38%	64.90%
Valor de la obra ejecutada:	$ 146,721,907.44	$ 4,000,812,893.81
Porcentaje ejecutado	2.38%	
Atraso semanal	**-12.75%**	

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	2	de 4
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	17	8	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL	DD	MM	AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA	CONTRATO No.	18	DE 2025

GRAFICA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO

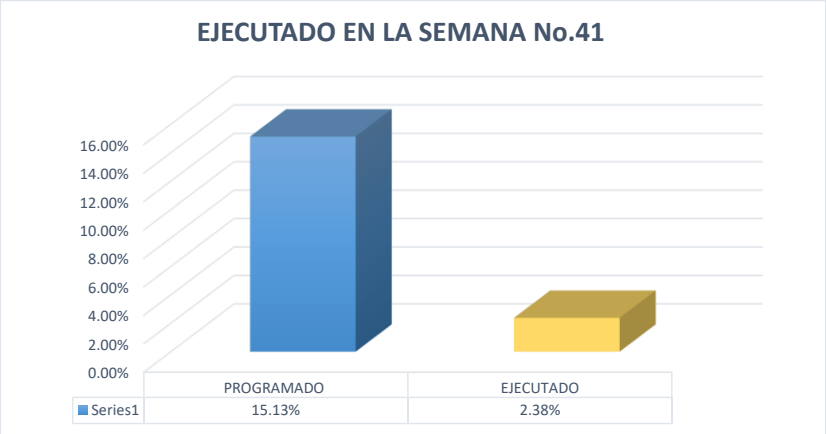

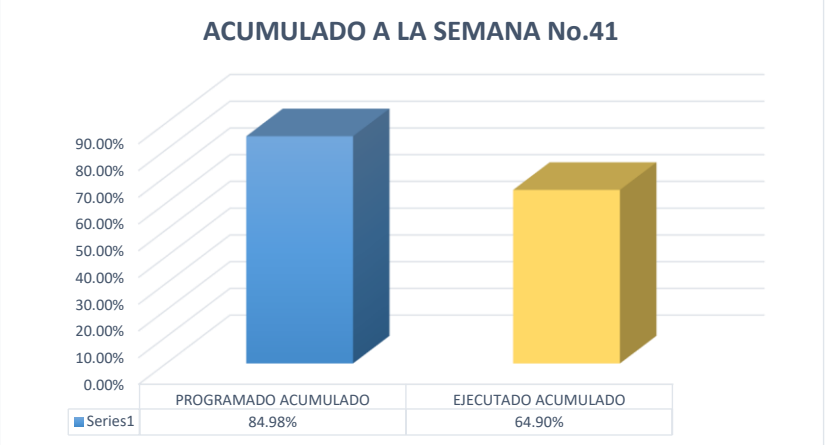

Para el ejecutado de la semana No.41 se presenta un atraso del **-12.75%**

Para el acumulado hasta la semana No.41 se presenta un atraso del **-20.08%**

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.		031 DE 2025
Valor Inicial:	$	6,763,547,277.00
valor adicional:	$	-
Valor Actualizado:	$	6,763,547,277.00
Plazo Inicial:		SIETE(7) MESES
Fecha de Iniciación:		26 DE JUNIO DE 2025
Fecha de Inicio Fase II:		04 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha Prórroga No.1		31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha Prórroga No.2		20 DE ABRIL DE 2026
Fecha Prórroga No.3		17 DE JULIO DE 2026
Fecha Actual Terminación:		19 DE SEPTIEMBRE DE 2026

,

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.		018 DE 2025
Valor Inicial:	$	422,655,000.00
valor adicional:	$	-
Valor Actualizado:	$	422,655,000.00
Plazo Inicial:		SIETE (7) MESES
Fecha de Iniciación:		04 DE JUNIO DE 2025
Fecha de Inicio Fase II:		04 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha Prórroga No.1		31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha Prórroga No.2		20 DE ABRIL DE 2026
Fecha Prórroga No.2		17 DE JULIO DE 2026
Fecha Actual Terminación		19 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**REPUBLICA DE COLOMBIA**	**Hoja No.**	3	de 4
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	17	8	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL	**DD**	**MM**	**AA**
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA	**CONTRATO No.**	18	DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En el presente apartado se describen las actividades realizadas durante la semana N.º 41:

Se continuó con actividades de acabados arquitectónicos en diferentes áreas del proyecto, mediante aplicación de estuco, pintura, instalación de enchapes, instalación de muros en sistema drywall, masillado y preparación de superficies.

Se continuó con actividades de instalaciones eléctricas en pisos 2 y 3, mediante instalación de tomas monofásicas SYS normal, GFCI, interruptores, adecuación de puntos para puestos de trabajo e instalación de sistemas de emergencia

Inicaron actividades de obra civil mediante adecuaciones para cárcamo de subestación

Iniciaron actividades de desmonte de anden existente en área de parquedero

Se continuó con actividades hidrosanitarias y mecánicas, mediante instalación de aparatos sanitarios, revisión de equipos de aire acondicionado e impermeabilización con membrana PVC en tanque inyector.

Se continuó con actividades de carpintería y ventanería mediante instalación de ventanas internas, marcos para puertas y adecuaciones en áreas administrativas.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

01.01.02 DEMOLICION Y RETIRO DE MUROS QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)
01.01.09 DEMOLICION Y RETIRO DE CERRAMIENTO EXISTENTE QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)
01.01.10 DEMOLICION Y RETIRO DE ANDEN EXISTENTE , NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)
01.02.04 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y/O LAVAMANOS INCLUYE SELLO DE PUNTO EXISTENTE
01.02.05 Desmonte instalaciones sanitarias pvc Ø 2",3",4",con retiro y disposicion final
01.02.06 Desmonte instalaciones hidraulicas pvc Ø 1/2",3/4",1", 1 1/2" con retiro y disposicion final
01.02.07 Desmonte de registros y valvulas hidraulicas internas Ø 1/2" a 2"
01.02.08 DEMOLICION DE ACABADO DE PISO 0
01.02.09 Desmantelamiento y disposicion final de red de baja tension
01.02.10 DESMONTE DE TEJA DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE REMATES Y ESTRUCTURA DE SOPORTE
01.02.11 DESMONTE DE MARQUESINA EXISTENTE
01.02.12 DESMONTE DE BARANDAS METALICAS EXISTENTE
01.02.15 DESMONTE DE EQUIPOS MECANICOS/HIDRAULICOS/ELECTRICOS
01.02.19 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA
01.02.20 DESMONTE APARATOS ELECTRICOS: Incluye aparatos, luminarias, canaletas, tomacorrientes, interruptores. incluye retiro y disposicion final
01.02.21 Desmonte tableros electricos, incluye retiro y disposicion final

El contratista se compromete a realiza las actividades programadas para la siguiente semana,
Las actividades a ejecutar para la proxima semana corresponden a la programación presentada.
El contratista se compromete a ejecutar la obra de manera eficaz y eficiente, poniendose al día con el avance de obra.

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	4	de 4
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	17	8	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL	DD	MM	AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA	CONTRATO No.	18	DE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Inicio de actividades de excavación par cárcamo de subestación



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Desmonte de anden existente en área de parqueadero



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Instalación de muro divisorio en drywall para recepción




DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Instalación de impermeabilización en membrana para tanque subterraneo



Instalaciones electricas y sistema manual de emergencia

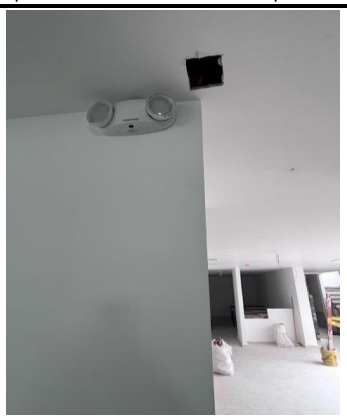

Instalación de luminarias de emergencia

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	1	de 4
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	24	8	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL	DD	MM	AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA	CONTRATO No.	18	DE 2025

INFORME No. 42 INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

DATOS DEL CONTRATO

Semana Número: 42 del : 17/08/2026 al 23/08/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 292 días calendario

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS YOPAL
R/L WILVER FRANCINY RUSSY LADINO

NOMBRE DEL INTERVENTOR: EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA RAMA JUDICIAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, UBICADO EN LA CALLE 7 NO. 19 – 07"

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y ADECUACIONES DE LA SEDE JUDICIAL UBICADA EN CALLE 7 # 19 – 07 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE"


VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**$ 422,655,000.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR ADICIONAL	**$ -** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ACTUALIZADO	**$ 422,655,000.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR INCIAL DEL CONTRATO DE OBRA	**$ 6,763,547,277.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR FASE I	**$ 598,761,250.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR FASE II	**$ 6,164,786,027.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR ADICIONAL	**$ -** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA ACTUALIZADO	**$ 6,763,547,277.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)


PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	5.36%	90.34%
Valor obra programada:	$ 330,607,798.86	$ 5,569,151,969.48
Porcentaje proyectado	5.36%	

EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física ejecutada (%)	2.62%	67.52%
Valor de la obra ejecutada:	$ 161,517,393.91	$ 4,162,330,287.72
Porcentaje ejecutado	2.62%	
Atraso semanal	**-2.74%**	

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	2	de 4
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	24	8	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL	DD	MM	AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA	CONTRATO No.	18	DE 2025

GRAFICA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO

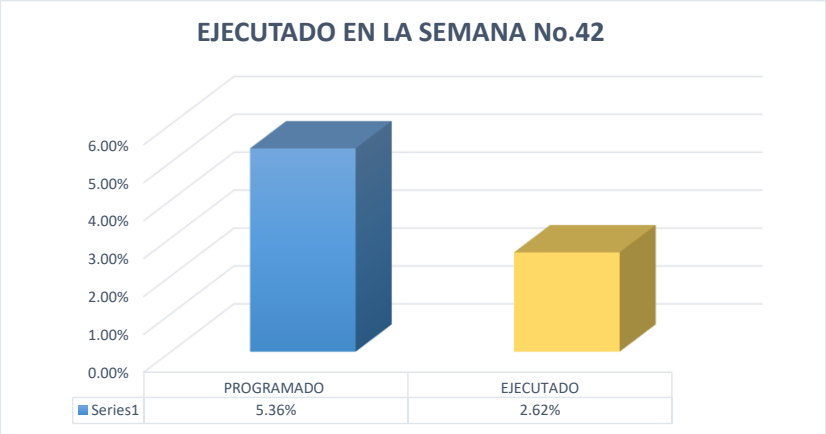

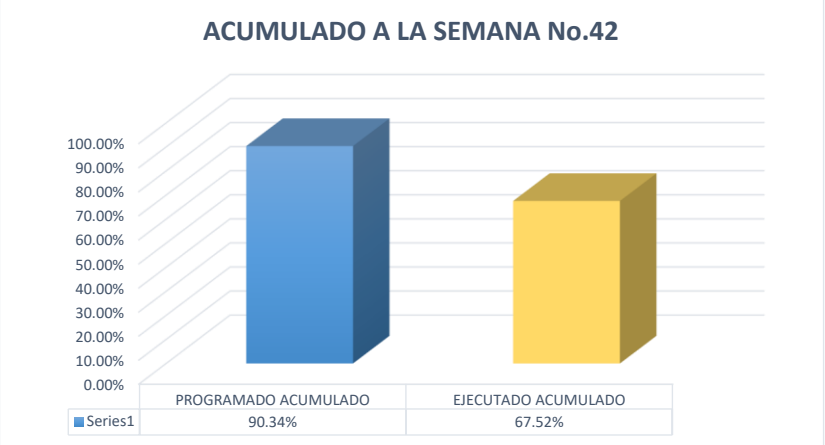

Para el ejecutado de la semana No.42 se presenta un atraso del **-2.74%**

Para el acumulado hasta la semana No.42 se presenta un atraso del **-22.82%**

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.		031 DE 2025
Valor Inicial:	$	6,763,547,277.00
valor adicional:	$	-
Valor Actualizado:	$	6,763,547,277.00
Plazo Inicial:		SIETE(7) MESES
Fecha de Iniciación:		26 DE JUNIO DE 2025
Fecha de Inicio Fase II:		04 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha Prórroga No.1		31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha Prórroga No.2		20 DE ABRIL DE 2026
Fecha Prórroga No.3		17 DE JULIO DE 2026
Fecha Actual Terminación:		19 DE SEPTIEMBRE DE 2026

,

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.		018 DE 2025
Valor Inicial:	$	422,655,000.00
valor adicional:	$	-
Valor Actualizado:	$	422,655,000.00
Plazo Inicial:		SIETE (7) MESES
Fecha de Iniciación:		04 DE JUNIO DE 2025
Fecha de Inicio Fase II:		04 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha Prórroga No.1		31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha Prórroga No.2		20 DE ABRIL DE 2026
Fecha Prórroga No.2		17 DE JULIO DE 2026
Fecha Actual Terminación		19 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**REPUBLICA DE COLOMBIA**	**Hoja No.**	3	de 4
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	24	8	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL	**DD**	**MM**	**AA**
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA	**CONTRATO No.**	18	DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En el presente apartado se describen las actividades realizadas durante la semana N.º 42:

Se continuó con actividades de preparación de superficies en fachada, mediante retiro de pañete en antepechos de ventanas, limpieza de zonas intervenidas con equipo hidrófugo, aplicación de estuco y pintura en áreas previamente alistadas.

Se continuó con actividades de obra civil y adecuaciones estructurales en piso 1 y parqueadero, mediante demolición para cárcamo de subestación, instalación de tubería para sistema eléctrico del ascensor, adecuación de redes principales, instalación de sistema de bombeo, nivelación de superficies e instalación de granito en escalera de ingreso.

Se continuó con actividades de instalaciones eléctricas en diferentes áreas del proyecto, mediante instalación de tomas monofásicas SYS normal, GFCI, interruptores, elaboración de cajas para puntos eléctricos, instalación de avisos de salida y luces de emergencia.

Se continuó con actividades de acabados arquitectónicos en pisos 2 y 3, mediante instalación de muros en drywall, instalación de aislantes, aplicación de boquilla en recalces, instalación de marcos para puertas, adecuación de espacios administrativos y preparación de superficies para acabados finales.

Seiniciaron actividades hidrosanitarias y mecánicas, mediante instalación y pruebas del sistema de bombeo, adecuación de redes hidráulicas y actividades complementarias para la puesta en funcionamiento de equipos.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


01.01.02 DEMOLICION Y RETIRO DE MUROS QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)
01.01.09 DEMOLICION Y RETIRO DE CERRAMIENTO EXISTENTE QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)
01.01.10 DEMOLICION Y RETIRO DE ANDEN EXISTENTE , NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)
01.02.04 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y/O LAVAMANOS INCLUYE SELLO DE PUNTO EXISTENTE
01.02.05 Desmonte instalaciones sanitarias pvc Ø 2",3",4",con retiro y disposicion final
01.02.06 Desmonte instalaciones hidraulicas pvc Ø 1/2",3/4",1", 1 1/2" con retiro y disposicion final
01.02.07 Desmonte de registros y valvulas hidraulicas internas Ø 1/2" a 2"
01.02.08 DEMOLICION DE ACABADO DE PISO 0
01.02.09 Desmantelamiento y disposicion final de red de baja tension
01.02.10 DESMONTE DE TEJA DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE REMATES Y ESTRUCTURA DE SOPORTE
01.02.11 DESMONTE DE MARQUESINA EXISTENTE
01.02.12 DESMONTE DE BARANDAS METALICAS EXISTENTE
01.02.15 DESMONTE DE EQUIPOS MECANICOS/HIDRAULICOS/ELECTRICOS
01.02.19 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA
01.02.20 DESMONTE APARATOS ELECTRICOS: Incluye aparatos, luminarias, canaletas, tomacorrientes, interruptores. incluye retiro y disposicion final
01.02.21 Desmonte tableros electricos, incluye retiro y disposicion final

El contratista se compromete a realiza las actividades programadas para la siguiente semana,
Las actividades a ejecutar para la proxima semana corresponden a la programación presentada.
El contratista se compromete a ejecutar la obra de manera eficaz y eficiente, poniendose al día con el avance de obra.

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	4	de 4
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	24	8	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL	DD	MM	AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA	CONTRATO No.	18	DE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO

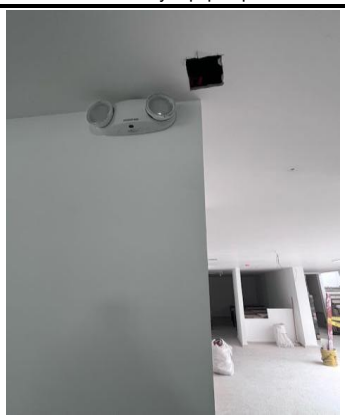	
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM**
Actividades de excavación par cárcamo de subestación	Instalación de tubería PVC para redes electricas subestación
	
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM**
Instalación de sistema de bombeo	Instalación de redes electricas y equipos para sistema de bombeo
	
Actividaes de fachada	Instalación de luminarias de emergencia

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	1	de 4
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	31	8	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL	DD	MM	AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA	CONTRATO No.	18	DE 2025

INFORME No. 43 INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

DATOS DEL CONTRATO

Semana Número: 43 del : 24/08/2026 al 30/08/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 299 días calendario

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS YOPAL
R/L WILVER FRANCINY RUSSY LADINO

NOMBRE DEL INTERVENTOR: EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA RAMA JUDICIAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, UBICADO EN LA CALLE 7 NO. 19 – 07"

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y ADECUACIONES DE LA SEDE JUDICIAL UBICADA EN CALLE 7 # 19 – 07 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE"


VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**$ 422,655,000.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR ADICIONAL	**$ -** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ACTUALIZADO	**$ 422,655,000.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR INCIAL DEL CONTRATO DE OBRA	**$ 6,763,547,277.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR FASE I	**$ 598,761,250.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR FASE II	**$ 6,164,786,027.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR ADICIONAL	**$ -** (Indique el valor del contrato suscrito en números)
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA ACTUALIZADO	**$ 6,763,547,277.00** (Indique el valor del contrato suscrito en números)


PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2.14%	92.48%
Valor obra programada:	$ 132,072,583.79	$ 5,701,224,553.27
Porcentaje proyectado	2.14%	

EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física ejecutada (%)	2.53%	70.05%
Valor de la obra ejecutada:	$ 155,969,086.48	$ 4,318,541,644.48
Porcentaje ejecutado	2.53%	
Atraso semanal	**0.39%**	

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	2	de 4
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	31	8	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL	DD	MM	AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA	CONTRATO No.	18	DE 2025

GRAFICA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO

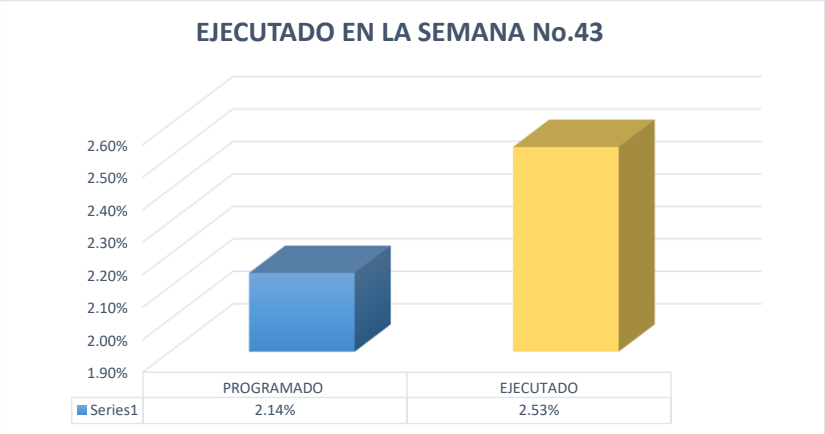

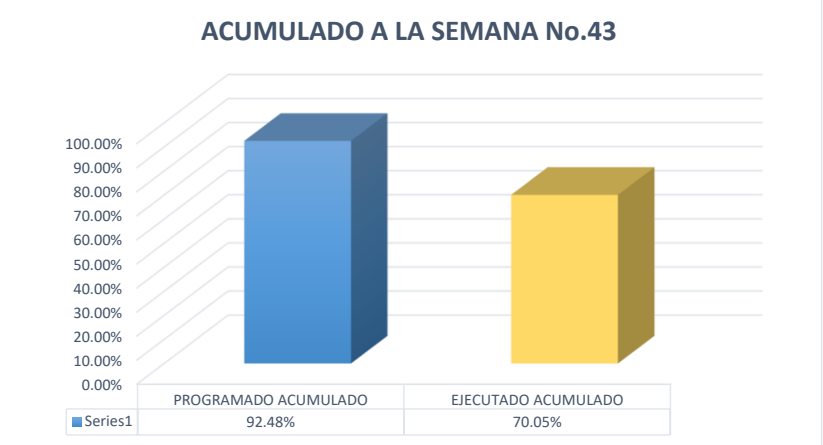

Para el ejecutado de la semana No.43 se presenta un avance del **0.39%**

Para el acumulado hasta la semana No.43 se presenta un atraso del **-22.43%**

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.		031 DE 2025
Valor Inicial:	$	6,763,547,277.00
valor adicional:	$	-
Valor Actualizado:	$	6,763,547,277.00
Plazo Inicial:		SIETE(7) MESES
Fecha de Iniciación:		26 DE JUNIO DE 2025
Fecha de Inicio Fase II:		04 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha Prórroga No.1		31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha Prórroga No.2		20 DE ABRIL DE 2026
Fecha Prórroga No.3		17 DE JULIO DE 2026
Fecha Actual Terminación:		19 DE SEPTIEMBRE DE 2026

,

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.		018 DE 2025
Valor Inicial:	$	422,655,000.00
valor adicional:	$	-
Valor Actualizado:	$	422,655,000.00
Plazo Inicial:		SIETE (7) MESES
Fecha de Iniciación:		04 DE JUNIO DE 2025
Fecha de Inicio Fase II:		04 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha Prórroga No.1		31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha Prórroga No.2		20 DE ABRIL DE 2026
Fecha Prórroga No.2		17 DE JULIO DE 2026
Fecha Actual Terminación		19 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**REPUBLICA DE COLOMBIA**	**Hoja No.**	3	de 4
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	31	8	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL	**DD**	**MM**	**AA**
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA	**CONTRATO No.**	18	DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En el presente apartado se describen las actividades realizadas durante la semana N.º 43:

Se continuó con actividades de preparación de superficies en fachada, mediante retiro de pañete en antepechos de ventanas, limpieza, aplicación de estuco y pintura en zonas previamente intervenidas.

Se continuó con actividades de obra civil en piso 1 y parqueadero, mediante excavaciones para cajas eléctricas, adecuaciones para planta eléctrica y subestación, fundida de placas en parqueadero, levantamiento de muros y actividades de nivelación y adecuación de áreas técnicas.

Se continuó con actividades de instalaciones eléctricas en pisos 2 y 3, mediante instalación de tomas monofásicas SYS normal, GFCI, interruptores, demarcación de luminarias, instalación de marcos para luminarias y adecuación de puntos eléctricos en oficinas y áreas administrativas.

Se continuó con actividades de acabados arquitectónicos en diferentes áreas del proyecto, mediante masillado y lijado de muros y cielos rasos, instalación de puertas, ventanería, chapas y adecuación de espacios interiores.

Se continuó con actividades de carpintería y adecuación funcional, mediante armado y distribución de escritorios, organización de puestos de trabajo y ajustes finales en oficinas y áreas administrativas.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

01.01.02 DEMOLICION Y RETIRO DE MUROS QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)
01.01.09 DEMOLICION Y RETIRO DE CERRAMIENTO EXISTENTE QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)
01.01.10 DEMOLICION Y RETIRO DE ANDEN EXISTENTE , NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)
01.02.04 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y/O LAVAMANOS INCLUYE SELLO DE PUNTO EXISTENTE
01.02.05 Desmonte instalaciones sanitarias pvc Ø 2",3",4",con retiro y disposicion final
01.02.06 Desmonte instalaciones hidraulicas pvc Ø 1/2",3/4",1", 1 1/2" con retiro y disposicion final
01.02.07 Desmonte de registros y valvulas hidraulicas internas Ø 1/2" a 2"
01.02.08 DEMOLICION DE ACABADO DE PISO 0
01.02.09 Desmantelamiento y disposicion final de red de baja tension
01.02.10 DESMONTE DE TEJA DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE REMATES Y ESTRUCTURA DE SOPORTE
01.02.11 DESMONTE DE MARQUESINA EXISTENTE
01.02.12 DESMONTE DE BARANDAS METALICAS EXISTENTE
01.02.15 DESMONTE DE EQUIPOS MECANICOS/HIDRAULICOS/ELECTRICOS
01.02.19 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA
01.02.20 DESMONTE APARATOS ELECTRICOS: Incluye aparatos, luminarias, canaletas, tomacorrientes, interruptores. incluye retiro y disposicion final
01.02.21 Desmonte tableros electricos, incluye retiro y disposicion final

El contratista se compromete a realiza las actividades programadas para la siguiente semana,
Las actividades a ejecutar para la proxima semana corresponden a la programación presentada.
El contratista se compromete a ejecutar la obra de manera eficaz y eficiente, poniendose al día con el avance de obra.

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	4	de 4
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	31	8	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL	DD	MM	AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA	CONTRATO No.	18	DE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Instalación de muro en bloque para cuarto de subestación



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Actividades de placa exterior para parqueadero



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Instalación de enchape en pared para área de sala amiga




DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Instalación de mobiliario archivo rodante, tercer piso



Actividaes de fachada

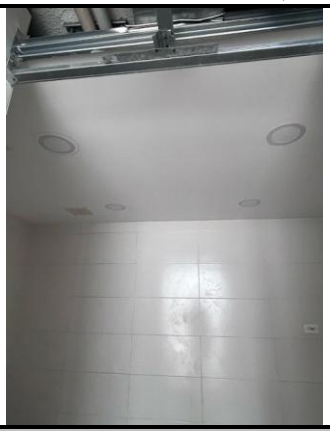

Instalación de luminarias redondas para área de baños
