

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		ETAPA 2 EJECUCION DE OBR/	33,88 días	lun 16/02/26	jue 2/04/26	
2		**CAPITULO PISOS**	**27 días**	**lun 16/02/26**	**mar 24/03/2**	
3		Desmonte y reinstalación aparatos sanitarios, orinales y divisiones de baño - reinstalación incluye sello con sikaflex color blanco	1 día	lun 16/02/26	lun 16/02/26	
4		Desmonte y reinstalación de lavamanos, grifería y accesorios, aparatos y mobiliario cocina con medios manuales, acopio del material desmontado y posterior montaje	1 día	lun 16/02/26	lun 16/02/26	
5		Demolición piso acabado existente y base en placa de fibrocemento - incluye retiro y disposición de escombros - (Demolición Acabado de Piso)	3 días	mar 17/02/26	jue 19/02/26	3;4
6		Reparación puntual estructura piso existente incluye arreglo perfiles existentes (soldaduras y refuerzos) - CORDON SOLDADURA 6010 (L=2 1/2" garg3/16" normal**	3 días	vie 20/02/26	mar 24/02/26	5
7		Suministro e instalación estructura piso (VIGUETAS) nueva de refuerzo - Tubo rectangular 40 x 20 x 0,8 mm C18 x 6 mts rectangular lamina cold rolled	3 días	vie 20/02/26	mar 24/02/26	5
8		Suministro e instalación estructura piso PRINCIPAL nueva de refuerzo perfil 5' x 5' Pulgadas cuadrado lamina cold rolled	4 días	mié 25/02/26	lun 2/03/26	6;7
9		Suministro y aplicación 2 manos Anticorrosivo (1a Mano verde 2a mano gris) a estructura pisos con compresor (ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL), incluye lijado limpieza y materiales	3 días	mar 3/03/26	jue 5/03/26	8
10		Suministro e instalación Placa Fibrocemento 10 mm 244x122cm 62.10Kg Aprox. Eterboard / Superboard -	4 días	vie 6/03/26	mié 11/03/26	9
11		Aplicación de Sello de juntas placa fibrocemento de piso con Aplicación de Sikaflex gris o blanco incluyendo materiales. (Ancho =0,01 Prof= 0,01) rend = 6 ml	3 días	vie 6/03/26	mar 10/03/26	9

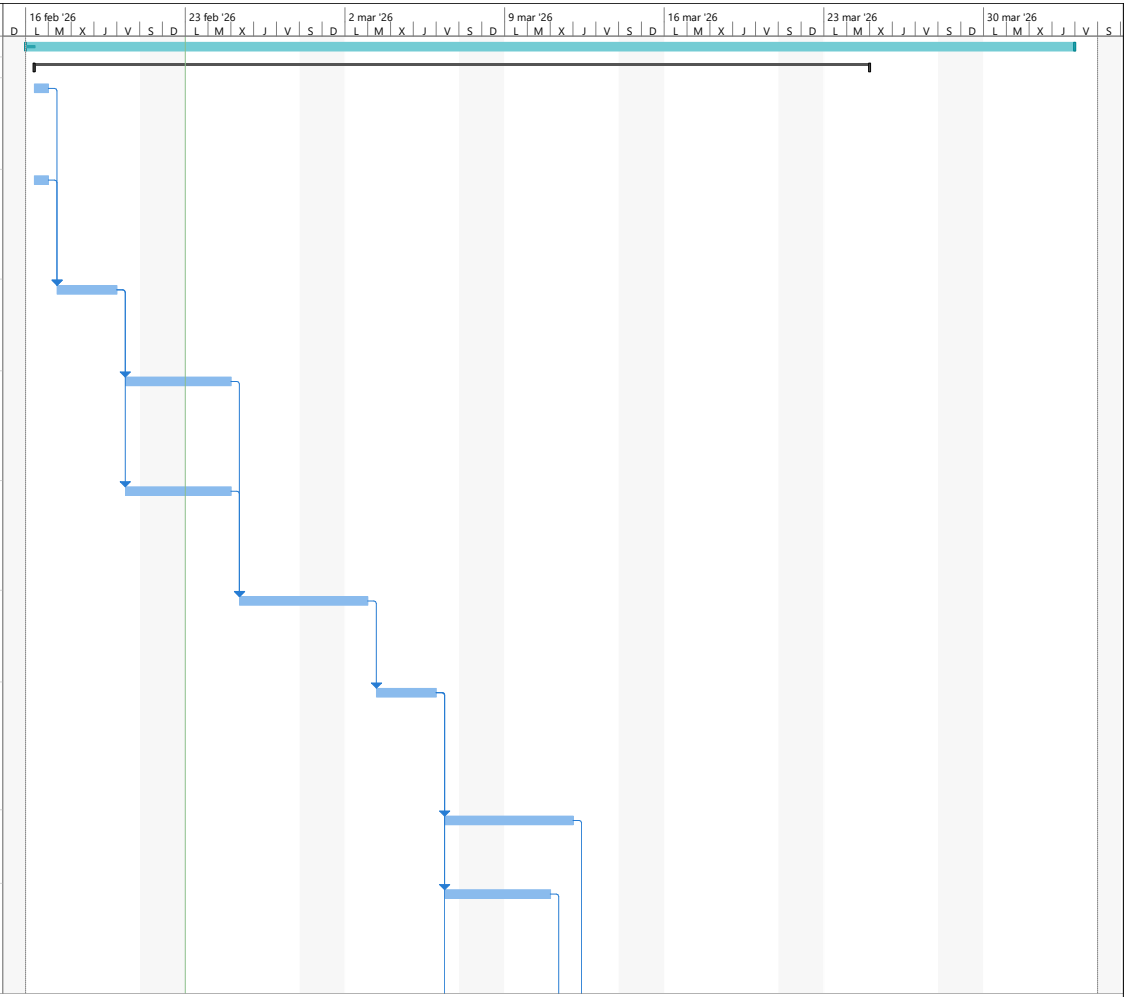

Proyecto: Proyecto Jardin Infan
Fecha: lun 23/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
12		Suministro e instalación piso acabado para zonas húmedas (Baños y cocina) - PISO CERA MICO ANTIDESLIZANTE COLOR CLARO	3 días	jue 12/03/26	lun 16/03/26	10
13		Suministro e instalación piso acabado - Liston de Piso SPC tráfico Comercial color a definir. Espesor entre 4 mm a 7 mm - resistencia trá fico AC4 - AC5 ancho entre 18 y 23 cms x 1.20 cm de largo (Comedor, Aula 6 contigua a baños niños, Salón caminadores,	4 días	mié 11/03/26	lun 16/03/26	11
14		Suministro e instalación Guardaescobas ceramico en zonas donde se instale piso cerámico (Zona Baños y cocina)	3 días	mar 17/03/26	jue 19/03/26	12
15		Suministro e instalación Guardaescobas PVC en zonas donde se instale piso Spc (Zonas Come dor, Aula 6 contigua a baños niños, Salon cami nadores, Modulo administrativo)	3 días	vie 20/03/26	mar 24/03/26	14;13
16		**CAPITULO REPARACIONES Canales y cubierta**	**19 días**	**vie 6/03/26**	**mié 1/04/26**	
17		Reparación puntos específicos estructura cu bierta, barandas (soldaduras y refuerzos) - CORDON SOLDADURA 6010 (L=2 1/2" para2/16" normal**	3 días	vie 6/03/26	mar 10/03/26	9
18		Limpieza y lijado estructura cubierta	4 días	mié 11/03/26	lun 16/03/26	17
19		Raspado lijado y limpieza estructura BARAN DAS	2 días	mar 17/03/26	mié 18/03/26	18
20		Aplicación 2 manos Anticorrosivo (1a Mano verde 2a mano gris) ESTRUCTURA CUBIERTA Y BARANDAS con compresor (ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL)	8 días	mar 17/03/26	jue 26/03/26	18
21		Reparación puntos específicos CANALES Desarrollo lamina 15x40x15 = 70 cms (Soldadura estaño +	2 días	jue 19/03/26	vie 20/03/26	19
22		Limpieza y lijado interior y exterior CANALES	2 días	mar 17/03/26	mié 18/03/26	18
23		Aplicación 2 manos Anticorrosivo lado externo e interno canales (1a Mano verde 2a mano gris) con compresor (ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL)	3 días	jue 19/03/26	lun 23/03/26	22

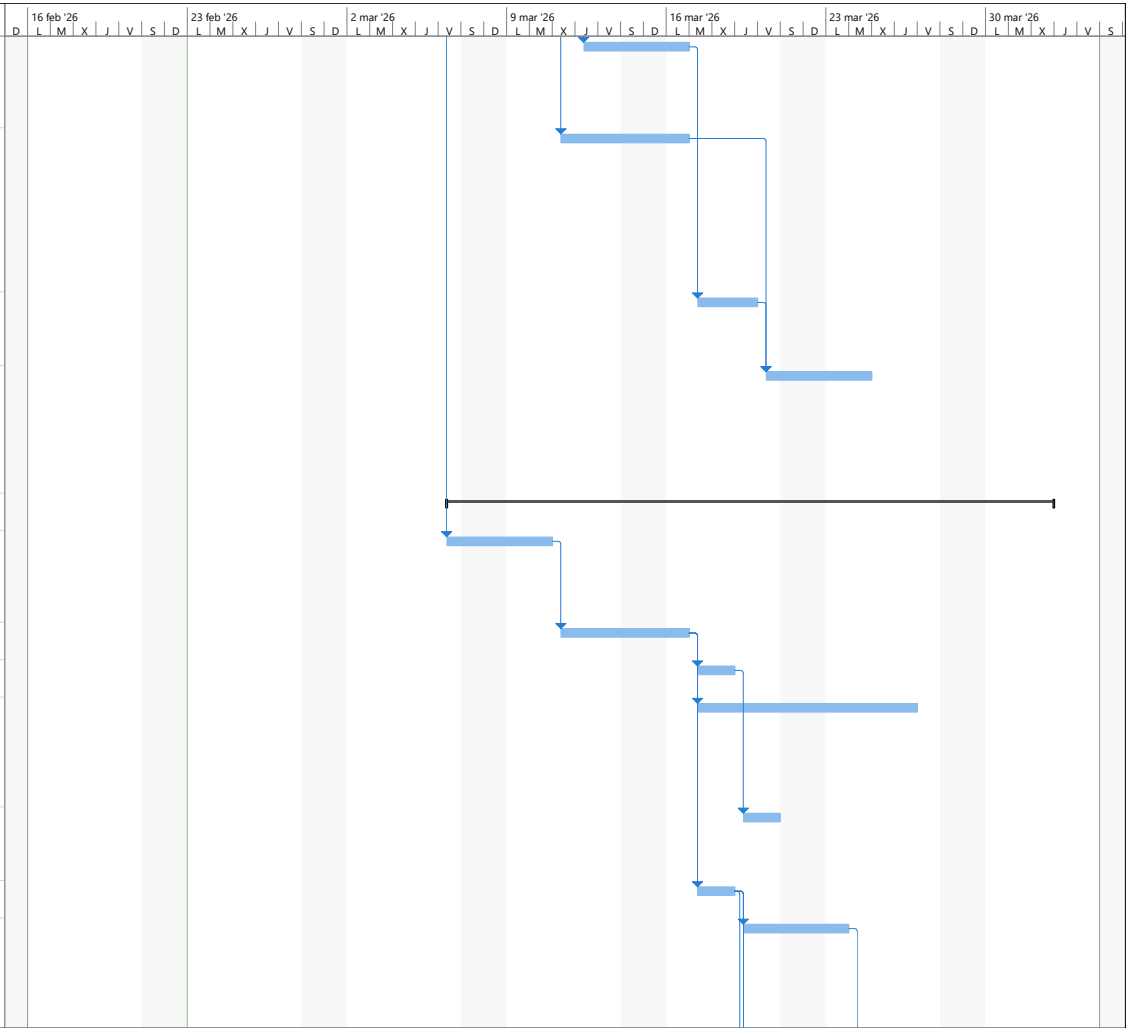

Proyecto: Proyecto Jardin Infan
Fecha: lun 23/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
24		Aplicación pintura bituminosa o similar lado interno - Impermeabilización Canales	2 días	mar 24/03/26	mié 25/03/26	23
25		Aplicación esmalte blanco estructura cubierta, barandas y canales lado externo (ESMALTE EXTERIOR	4 días	jue 26/03/26	mar 31/03/26	24
26		Remplazo accesorios de remate de la cubierta tipo sandwish (flanches, remate lateral , pla tina corona etc)	1 día	mié 1/04/26	mié 1/04/26	25
27		Suministro e instalación membrana cpvc para reparación de remates de cubierta- HASTA 60 CM de	1 día	mié 1/04/26	mié 1/04/26	25
28		Reparación goteras en teja tipo sandwish Instalación cinta foil aluminio tiras desde cumbrera a canal	1 día	mié 1/04/26	mié 1/04/26	25
29		**CAPITULO PINTURA Muros, estructura, Canales, Baranda**	**6 días**	**jue 19/03/26**	**jue 26/03/26**	
30		Limpieza, lijado y preparación muros secos (Dry Wall)	2 días	jue 19/03/26	vie 20/03/26	22
31		Limpieza páneles PVC muros aulas (afectados por pegantes de cinta)	2 días	jue 19/03/26	vie 20/03/26	22
32		Suministro y aplicación pintura tipo ESMALTE sobre muros secos internos aulas	1 día	jue 19/03/26	jue 19/03/26	22
33		Suministro y aplicación pintura tipo ESMALTE sobre muros secos internos aulas	0 días	jue 19/03/26	jue 19/03/26	32
34		Suministro y aplicación Pintura fachada exterior Tipo 1 superlavable para exteriores tipo Koraza o similar	0 días	jue 19/03/26	jue 19/03/26	33
35		Suministro y aplicación Pintura fachada exterior Tipo 1 superlavable tipo Koraza o similar	0 días	jue 19/03/26	jue 19/03/26	34
36		Suministro y aplicación Pintura TIPO ESMALTE sobre muros internos y externos de la zona de aseo y	5 días	vie 20/03/26	jue 26/03/26	32
37		**CAPITULO LIMPIEZA Y ASEO**	**4,63 días**	**vie 27/03/26**	**jue 2/04/26**	**36**
38		Limpieza ventaneria INTERNA Y EXTERNA - (incluye marcos en aluminio y	3 días	vie 27/03/26	mar 31/03/26	35
39		LIMPIEZA Y ASEO GENERAL (durante la ejecución y para la entrega	2 días	mié 1/04/26	jue 2/04/26	38
40		**Reuniones**	**26,75 días**	**jue 26/02/26**	**vie 3/04/26**	
41		Presentacion a la JAL	1 día	jue 26/02/26	jue 26/02/26	
42		Seguimiento al 50% con SIDIS	1 día	vie 20/03/26	vie 20/03/26	41
43		Finalizacion y entrega al SIDIS	1 día	vie 3/04/26	vie 3/04/26	42

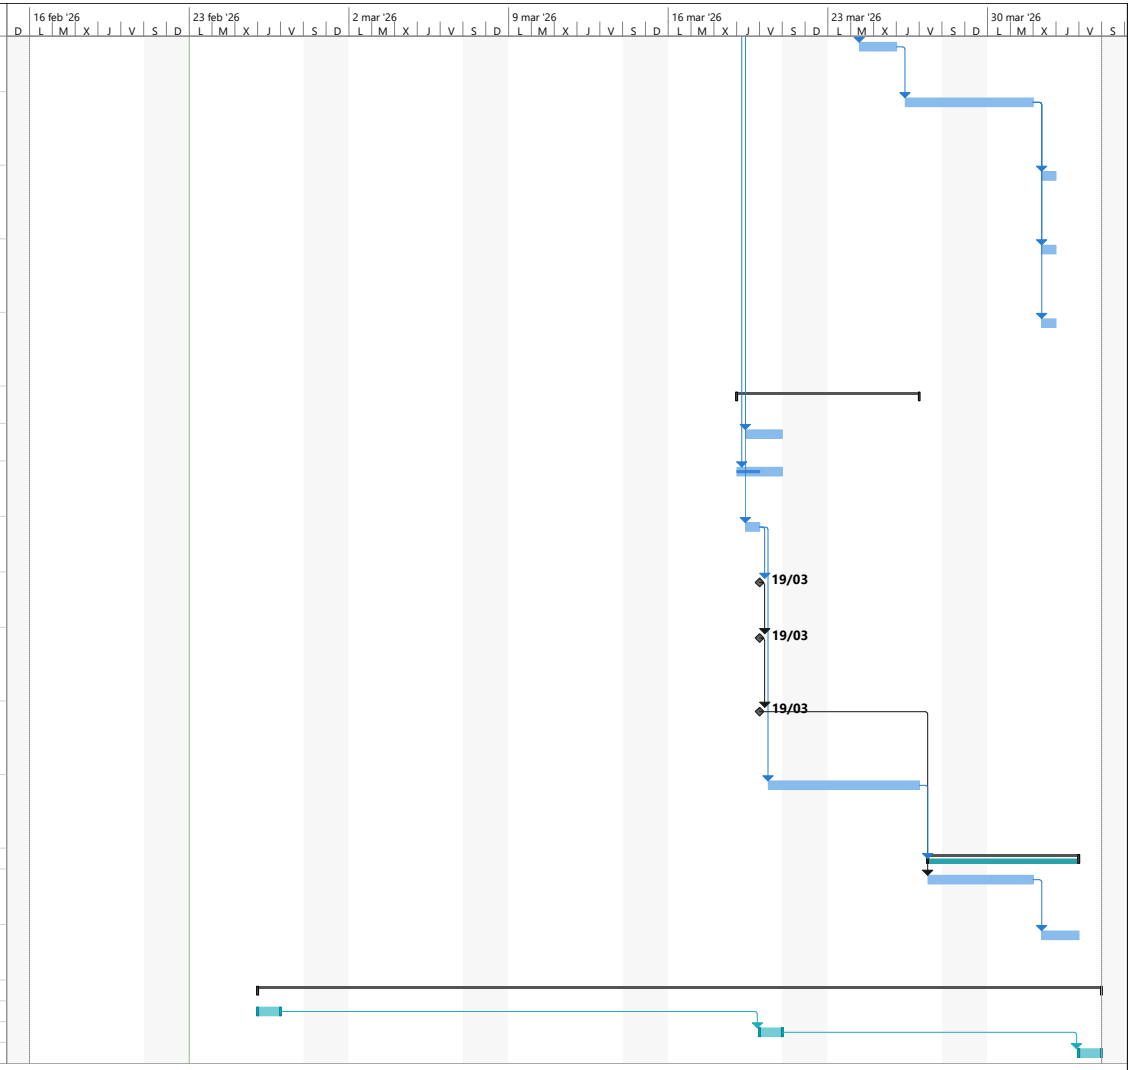

Proyecto: Proyecto Jardin Infan
Fecha: lun 23/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
