CONSORCIO ACUEDUCTO DS 2026	**INFORME EJECUTIVO**	CFS-044-2025
		24/4/2025

FECHA	13/7/2026	**EJECUTIVO No.**	23	DEL	**6/7/2026**	AL	**12/7/2026**

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.:	COP-1094-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y HASTA MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR 2025
LOCALIZACIÓN:	CIUDAD BOLÍVAR - BOGOTÁ
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO DS 2026
INTERVENTORIA:	INGENIERIA Y SOLUCIONES HIDRAHULICAS RJ SAS

CONTRATO DE OBRA		**VIGENCIA DE LAS POLIZAS**		
PLAZO INICIAL:	Seis (6) meses	**AMPARO**	**DESDE**	**HASTA**
FECHA DE INICIACIÓN:	2/2/2026	CUMPLIMIENTO	2/2/2026	3/12/2026
*FECHA DE SUSPENSIÓN:		SALARIOS Y PRESTACIONES	2/2/2026	2/8/2026
*FECHA DE REINICIACIÓN:		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	3/8/2026	3/8/2031
FECHA DE TERMINACIÓN:	1/8/2026	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	NA	NA
PLAZO ACTUALIZADO:	Seis (6) meses	RESPONSABILIDAD CIVIL	2/2/2026	3/8/2026
PLAZO TRANSCURRIDO:	Ciento cuarenta y seis (146) días	**AVANCE DEL CONTRATO**		
		AVANCE	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
VALOR INICIAL :	$ 1,216,912,481.00	**TIEMPO %**	88.9%	88.9%
VALOR ADICION(ES):				
VALOR FINAL:		**OBRA FISICA %**	41%	13%
VALOR PAGADO:				
VALOR POR PAGAR:	$ 1,216,912,481.00	**FINANCIERO%**	0%	0.00%


3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA

No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION
1	**Excavaciones mecánicas**	Se realiza excavación mecánica con una retroexcavadora de pala, capacidad 8 TON
2	**Instalación Arena de peña**	Se realiza instalación de arena de peña según el diseño aprobado
3	**Instalación de tubería PEAD**	Se realiza la instalación de tubería en Polietileno de 1"
4	**Instalación recebo cumún**	Se realiza instalación de recebo común

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Sin observaciones.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

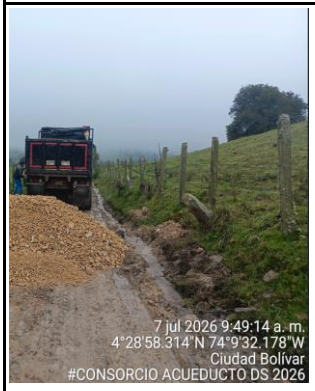











Elaboro:

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
