MEMORIAS DE OBRA
CORTE No. 14

SEDE CALLE 1

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

SEDE_CALLE_1

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

		HOJA	**1**

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**13**	**FECHA:**	**30/06/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**10,2**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**M2**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 1 CARRERA 14B #056 SUR





SEDE CALLE 1 (ZONA CASETA)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	**DIMENSIONES**			MEDIDA PARCIAL	**No DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL**
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE CALLE 1. (AREAS INTERVENIDAS)						
MURO CASETA (DOS CARAS)						
MURO A		3,38	2,38	8,05	2,00	16,10
Descuento ventana		1,50	0,93	1,40	-2,00	-2,80
MURO B		4,68	2,50	11,7	2,00	23,40
MURO C		3,38	2,38	8,05	2,00	16,10
Descuento ventana		0,50	0,50	0,25	-4,00	-1,00
MURO D		4,68	2,14	10,02	2,00	20,04
Descuento ventana		1,01	0,92	0,93	-2,00	-1,86
Descuento puerta		0,90	2,00	1,80	-2,00	-3,60
MURO E		1,14	2,32	2,64	2,00	5,28
Descuento puerta		0,70	2,00	1,40	-2,00	-2,80
MURO F		1,86	2,43	4,52	2,00	9,04
MURO G		1,70	2,30	3,91	2,00	7,82
Descuento puerta		0,70	2,00	1,40	-2,00	-2,80
LATERALES TABLERO		0,32	0,68	0,22	2,00	0,44
PLACAS SUP. E INF. TABLERO	0,31	0,32		0,10	2,00	0,20
DESCUENTO AREA CON PAÑETE						
BAÑO		1,86	1,50	2,79	-2,00	-5,58
		1,10	1,50	1,65	-1,00	-1,65
		0,40	1,50	0,6	-1,00	-0,60
CARTERAS						
VENTANAS BAÑOS	0,12	0,50		0,06	8,00	0,48
VENTANAS OFICINA DE VIGILANCIA	0,12	1,01		0,12	2,00	0,24
	0,12	0,93		0,11	2,00	0,22
	0,12	1,50		0,18	2,00	0,36
	0,12	1,03		0,12	2,00	0,25
PUERTA PRINCIPAL	0,12	0,90		0,11	1,00	0,11
	0,12	2,00		0,24	2,00	0,48
PUERTA VESTIER Y BAÑO	0,12	0,70		0,08	2,00	0,17
	0,12	2,00		0,24	4,00	0,96
TOTAL ITEM						**79,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**147,95**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**-68,95**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA 1

SEDE_CALLE_1

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	13	FECHA:	30/06/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	10.4	DESCRIPCION ITEM:	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)			UNIDAD DE MEDIDA:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 1, CARRERA 14B #056 SUR

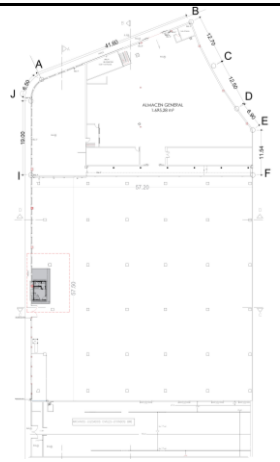

SEDE CALLE 1 (PLANTA GENERAL)



SEDE CALLE 1 (ZONA CASETA)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE CALLE 1. (AREAS INTERVENIDAS)						
MURO CASETA						
MURO A		3,38	2,38	8,05	2,00	16,10
Descuento ventana		1,50	0,93	1,40	-2,00	-2,80
MURO B		4,68	2,50	11,7	1,00	11,70
MURO C		3,38	2,38	8,05	1,00	8,05
Descuento ventana		0,50	0,50	0,25	-2,00	-0,50
MURO D		4,68	2,50	11,7	1,00	11,70
Descuento ventana		1,01	0,92	0,93	-1,00	-0,93
Descuento puerta		0,90	2,00	1,80	-1,00	-1,80
MURO E		1,14	2,32	2,64	1,00	2,64
Descuento puerta		0,70	2,00	1,40	-1,00	-1,40
MURO F		1,86	2,43	4,52	1,00	4,52
MURO G		1,70	2,30	3,91	1,00	3,91
Descuento puerta		0,70	2,00	1,40	-1,00	-1,40
LATERALES TABLERO		0,32	0,68	0,22	2,00	0,44
PLACAS SUP. E INF. TABLERO	0,31	0,32		0,10	2,00	0,20
DESCUENTO AREA CON PAÑETE				0	-1,00	0,00
BAÑO		1,86	1,50	2,79	-2,00	-5,58
		1,10	1,50	1,65	-2,00	-3,30
		0,40	1,50	0,6	-1,00	-0,60
CARTERAS						
VENTANAS BAÑOS	0,12	0,50		0,06	8,00	0,48
VENTANAS OFICINA DE VIGILANCIA	0,12	1,01		0,12	2,00	0,24
	0,12	0,93		0,11	2,00	0,22
	0,12	1,50		0,18	2,00	0,36
	0,12	1,03		0,12	2,00	0,25
PUERTA PRINCIPAL	0,12	0,90		0,11	1,00	0,11
	0,12	2,00		0,24	2,00	0,48
PUERTA VESTIER Y BAÑO	0,12	0,70		0,08	2,00	0,17
	0,12	2,00		0,24	4,00	0,96
TOTAL ITEM						**44,22**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**71,50**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**-27,28**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA	1

SEDE_CALLE_1

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	13	FECHA:	30/06/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	10.8	DESCRIPCION ITEM:	Pintura exterior tipo Koraza, tres manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)			UNIDAD DE MEDIDA:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 1 CARRERA 14B #056 SUR



SEDE CALLE 1 (PLANTA GENERAL)



SEDE CALLE 1 (ZONA CASETA)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE CALLE 1. (AREAS INTERVENIDAS)						
MUROs CASETA (UNA CARA)						
MURO A		3,38	2,38	8,05	1,00	8,05
Descuento ventana		1,50	1,03	1,55	-1,00	-1,55
MURO B		4,68	2,50	11,7	1,00	11,70
MURO C		3,38	2,38	8,05	1,00	8,05
Descuento ventana		0,50	0,50	0,25	-2,00	-0,50
MURO D		4,68	2,14	10,02	1,00	10,02
Descuento ventana		1,01	0,92	0,93	-1,00	-0,93
Descuento puerta		0,90	2,00	1,80	-1,00	-1,80
ZÓCALO		10,39	0,50	5,2	1,00	5,20
TOTAL ITEM						**38,24**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**71,56**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**-33,32**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma: Saydee M. Bechara L.	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA	1

SEDE_CALLE_1

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	13.6	DESCRIPCION ITEM:	Mueble en madera tipo cocina. (bajo/alto). h=0,60-0,80 m ancho=0,30- 0,60 m. (Suministro e instalación. Incluye soportes, herrajes, pintura, accesorios necesarios)			UNIDAD DE MEDIDA:	ML


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 1, CARRERA 14B #056 SUR

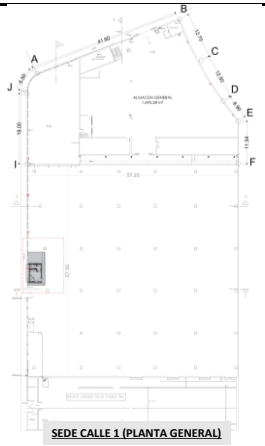

SEDE CALLE 1 (PLANTA GENERAL)

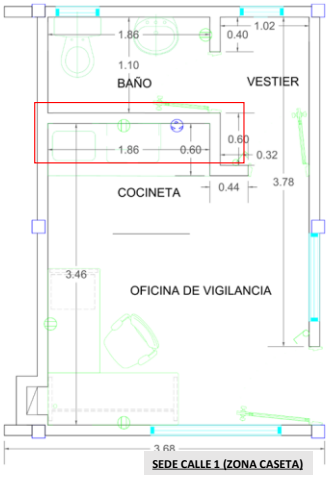

SEDE CALLE 1 (ZONA CASETA)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE CALLE 1. (AREAS INTERVENIDAS)						
M. SUPERIOR E INFERIOR	1,86			1,86	1,00	1,86
TOTAL ITEM						1,86
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD CORTE ACTUAL						1,86

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES			SEDE_CALLE_1	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
		HOJA	1		

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	14.1	DESCRIPCION ITEM:	Puerta metálica entamborada en lámina CR cal.18. 0,90x2,20 m, con acabado enpintura electrostática. (Suministro e instalación. Incluye marco)			UNIDAD DE MEDIDA:	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 1, CARRERA 14B #056 SUR



SEDE CALLE 1 (PLANTA GENERAL)



SEDE CALLE 1 (ZONA CASETA)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE CALLE 1. (AREAS INTERVENIDAS)						
ZONA CASETA						
ACCESO					1,00	1,00
TOTAL ITEM						1,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD CORTE ACTUAL						1,00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA	1

SEDE_CALLE_1

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	14.14	DESCRIPCION ITEM:	Ventanería en aluminio proyectante con vidrio 5mm. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)			UNIDAD DE MEDIDA:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 1, CARRERA 14B #056 SUR



SEDE CALLE 1 (PLANTA GENERAL)



SEDE CALLE 1 (ZONA CASETA)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE CALLE 1. (AREAS INTERVENIDAS)						
ZONA CASETA						
BAÑO	0,5		0,5		2,00	0,50
TOTAL ITEM						**0,50**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**0,50**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES			SEDE_CALLE_1	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
		HOJA	1		

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	14.15	DESCRIPCION ITEM:	Ventanería en aluminio con vidrio laminado incoloro 3+3 mm. (Suminstro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)			UNIDAD DE MEDIDA:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

UBICACION SEDE CALLE 1, CARRERA 14B #056 SUR



SEDE CALLE 1 (PLANTA GENERAL)



SEDE CALLE 1 (ZONA CASETA)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE CALLE 1. (AREAS INTERVENIDAS)						
ZONA CASETA						
OFICINA VIGILANCIA	1,01		0,93		1,00	0,94
	1,5		1,03		1,00	1,55
TOTAL ITEM						**2,48**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**2,48**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	SEDE_CALLE_1	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	15.1	DESCRIPCION ITEM:	Cerradura tipo baño tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)			UNIDAD DE MEDIDA:	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

UBICACION SEDE CALLE 1, CARRERA 14B #056 SUR



SEDE CALLE 1 (PLANTA GENERAL)

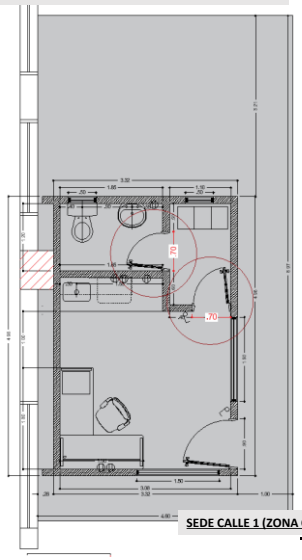

SEDE CALLE 1 (ZONA CASETA)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE CALLE 1. (AREAS INTERVENIDAS)						
ZONA CASETA						
PUERTA BAÑO					1,00	1,00
PUERTA VESTIER					1,00	1,00
TOTAL ITEM						**2,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**2,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES			SEDE_CALLE_1	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
		HOJA	1		

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	15.4	DESCRIPCION ITEM:	Cerradura tipo puerta principal. (Suministro e instalación)			UNIDAD DE MEDIDA:	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

UBICACION SEDE CALLE 1, CARRERA 14B #056 SUR

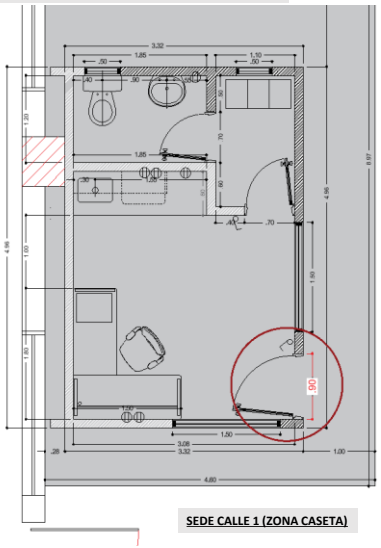

SEDE CALLE 1 (ZONA CASETA)



SEDE CALLE 1 (PLANTA GENERAL)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE CALLE 1. (AREAS INTERVENIDAS)						
ZONA CASETA						
ACCESO					1,00	1,00
TOTAL ITEM						**1,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**1,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	SEDE_CALLE_1	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	18.4	DESCRIPCION ITEM:	Redes PVC Sanitaria 3". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)			UNIDAD DE MEDIDA:	ML


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

UBICACION SEDE CALLE 1, CARRERA 14B #056 SUR

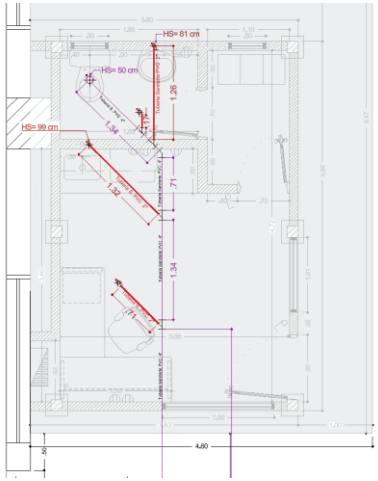



SEDE CALLE 1 (PLANTA GENERAL)



SEDE CALLE 1 (ZONA CASETA)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE CALLE 1. (AREAS INTERVENIDAS)						
ZONA CASETA						
CONEXIÓN BAJANTE ALL		9,50			1,00	9,50
TOTAL ITEM						9,50
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD CORTE ACTUAL						9,50

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	SEDE_CALLE_1	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	18.17	DESCRIPCION ITEM:	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 3". (Suministro e instalación. Incluye anclajes)			UNIDAD DE MEDIDA:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

UBICACION SEDE CALLE 1, CARRERA 14B #056 SUR



SEDE CALLE 1 (PLANTA GENERAL)

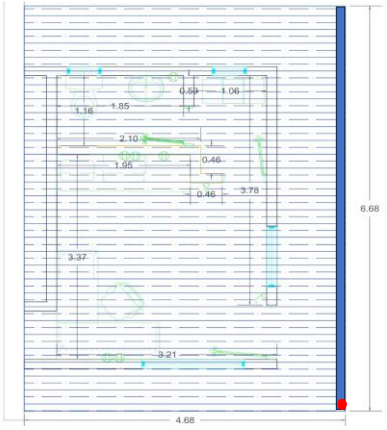

SEDE CALLE 1 (ZONA CASETA)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE CALLE 1. (AREAS INTERVENIDAS)						
ZONA CASETA						
BAJANTE ALL CANAL		2,50			1,00	2,50
TOTAL ITEM						2,50
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD CORTE ACTUAL						2,50

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	SEDE_CALLE_1	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	22,1	DESCRIPCION ITEM:	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)			UNIDAD DE MEDIDA:	M2


CASETA DE VIGILANCIA

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

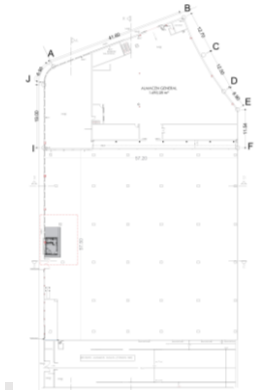

SEDE CALLE 1 (PLANTA GENERAL)

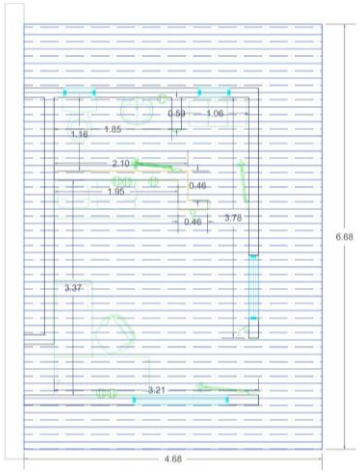



SEDE CALLE 1 (ZONA CASETA)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
SEDE CALLE 1. (AREAS INTERVENIDAS)						
ZONA CASETA	4,68	6,68		31,26	1,00	31,26
ENTRADA PORTON	4,05	3,90		15,8	1,00	15,80
TOTAL ITEM						47,06
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD CORTE ACTUAL						47,06

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA	1

SEDE_CALLE_1


Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**NP-13**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Descapote y limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, maleza, hasta una profundidad de la capa de tierra vegetal de 25 cm. (incluye trasiego y disposicion final)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**M2**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

UBICACION SEDE CALLE 1, CARRERA 14B #056 SUR

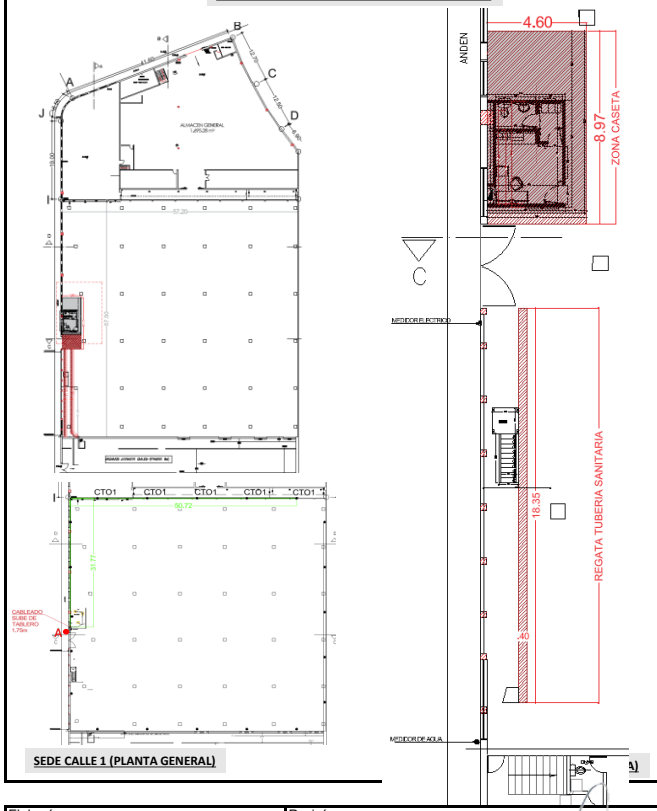

SEDE CALLE 1 (PLANTA GENERAL)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE CALLE 1. (AREAS INTERVENIDAS)						
ZONA CASETA	4,60	8,97		41,26	1,00	41,26
REGATA TUBERIA HIDROSANITARIA	0,40	18,35		7,34	1,00	7,34
PERIMETRO EXTERIOR						
CIRCUITO 1	2,00	31,77		63,54	1,00	63,54
	2,00	50,72		101,44	1,00	101,44
TOTAL ITEM						**213,58**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**48,60**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**164,98**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA	1

SEDE_CALLE_1

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	NP-18	DESCRIPCION ITEM:	Puerta en aluminio entamborada 0.70 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2 m. Incluye marco)			UNIDAD DE MEDIDA:	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

UBICACION SEDE CALLE 1, CARRERA 14B #056 SUR



SEDE CALLE 1 (ZONA CASETA)



SEDE CALLE 1 (PLANTA GENERAL)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE CALLE 1. (AREAS INTERVENIDAS)						
ZONA CASETA						
PUERTA BAÑO					1,00	1,00
PUERTA VESTIER					1,00	1,00
TOTAL ITEM						**2,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**2,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	SEDE_CALLE_1	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**NP-96**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Salida 20 amp monofasica en cable awg 1x10f+1x10N+1x12T en ducto EMT 3/4" incluye accesorio hasta un metro de longitud, no incluye obras civiles. (Incluye suministro e instalación)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

CASETA VIGILANCIA

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

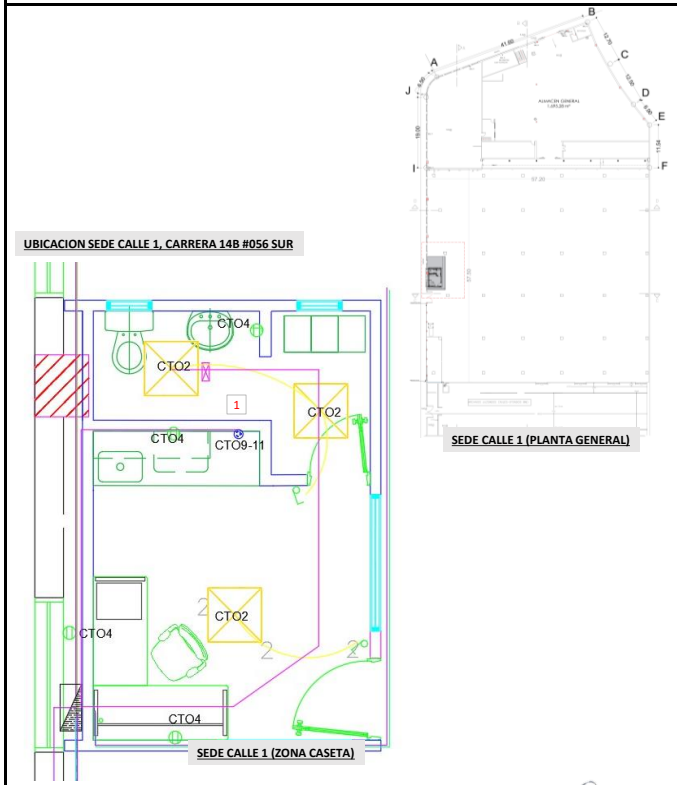

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES Ancho	DIMENSIONES Longitud	DIMENSIONES Altura	MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
SEDE CALLE 1. (AREAS INTERVENIDAS)						
MICROONDAS					1,00	1,00
TOTAL ITEM						**1,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**1,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE OBRA
CORTE No. 13
SEDE ANEXA-PISO 2


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA		Carrera 8 No. 12A-19	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**30/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**1,56**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**M2**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 2

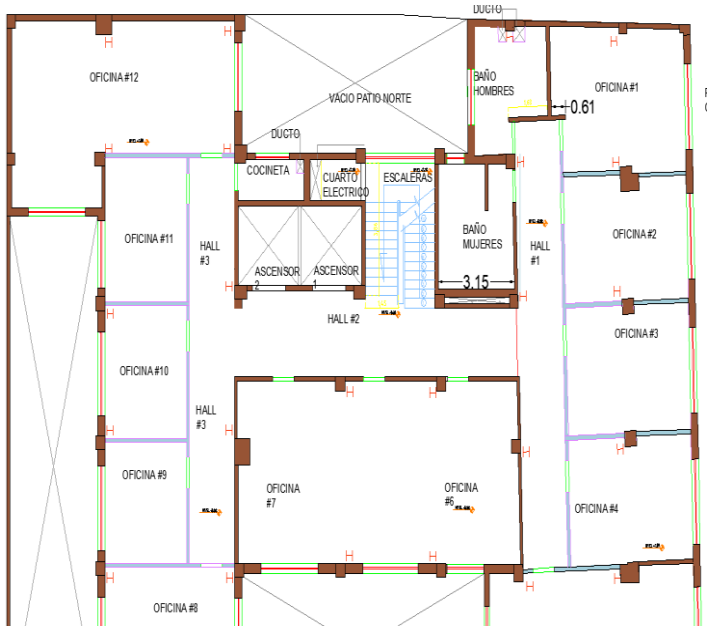

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
PISO 2						
Oficina 1		0,61	2,80	1,71	1	1,71
Baño Mujeres		3,15	2,65	8,35	1	8,35
TOTAL ITEM						**10,06**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**10,06**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA

Carrera 8 No. 12A-19


Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**30/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**1,59**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Demolición de muro en fibrocemento. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**M2**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 2

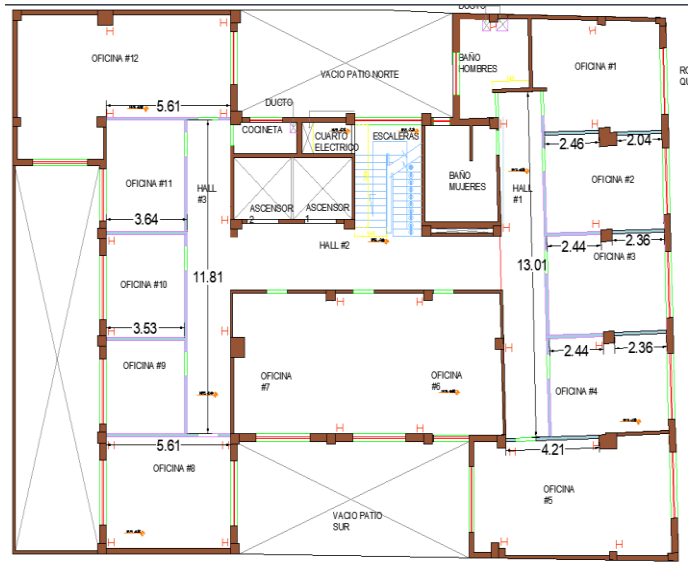

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
PISO 2						
Oficina 1		2,46	2,42	5,9532	1	5,95
Oficina 1		2,04	2,42	4,9368	1	4,94
Oficina 2		2,44	2,42	5,9048	1	5,90
Oficina 2		2,36	2,42	5,7112	1	5,71
Oficina 3		2,44	2,42	5,90	1	5,90
Oficina 3		2,36	2,42	5,71	1	5,71
Oficina 5		4,21	2,42	10,19	1	10,19
Vano puerta		1,00	2,40	2,40	-1	-2,40
Hall 1		13,01	2,80	36,43	1	36,43
Vano puerta		1,00	2,40	2,40	-4	-9,60
Oficina 8		5,61	2,62	14,70	1	14,70
Vano puerta		1,00	2,40	2,40	-1	-2,40
Oficina 10		3,53	2,62	9,25	1	9,25
Oficina 11		3,64	2,62	9,54	1	9,54
Oficina 12		5,61	2,62	14,70	1	14,70
Vano puerta		1,00	2,40	2,40	-1	-2,40
Hall 3		11,81	2,93	34,60	1	34,60
Vano puerta		1,00	2,40	2,4	-3	-7,20
TOTAL ITEM						**139,52**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**139,52**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA		Carrera 8 No. 12A-19	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**30/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**5,7**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Corte en muro o piso con máquina. en material rígido con o sin acabado de enchape**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**ML**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 2

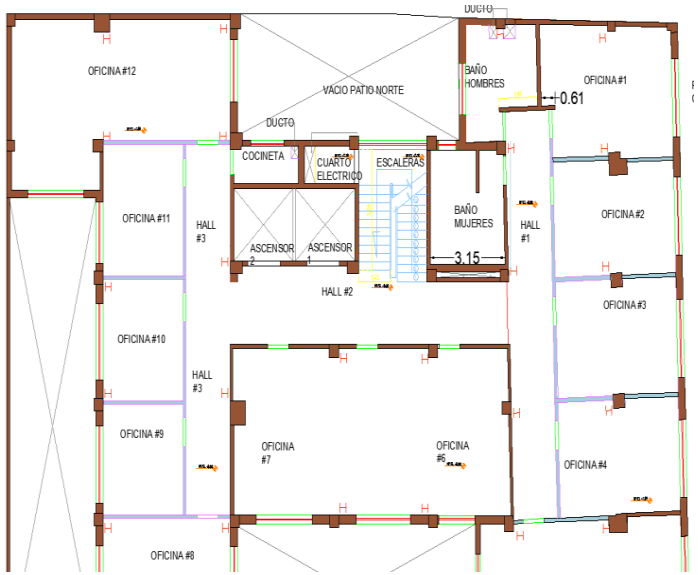

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
PISO 2						
Oficina 1			2,80	2,80	2	5,60
TOTAL ITEM						**5,60**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**5,60**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA		Carrera 8 No. 12A-19	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**30/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**6,1**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Muro en Drywall doble cara. e= 12 cm. con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano (Suministro e instalación Incluye perfilería. frescasa. malla. cinta papel. cinta metálica filos. pintura)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**M2**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 2

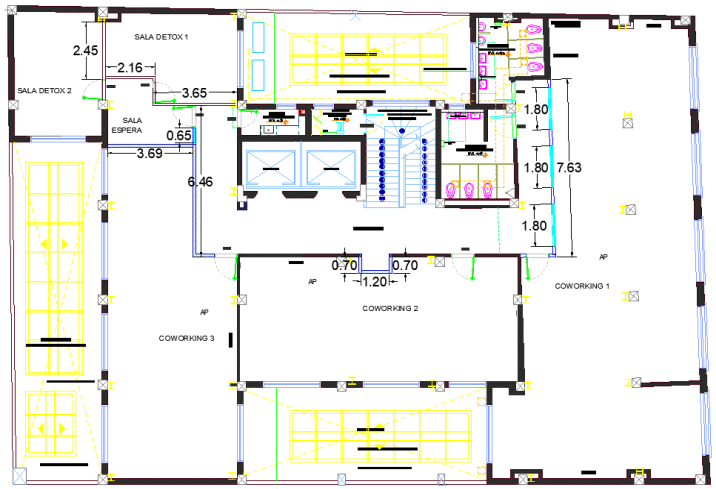

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
PISO 2						
Coworking 1		7,63	2,81	21,44	1,00	21,44
Vano Ventana		1,80	1,00	1,80	-3,00	-5,40
Coworking 2		0,70	2,92	2,04	1,00	2,04
		0,70	2,92	2,04	1,00	2,04
		1,20	2,92	3,50	1,00	3,50
Coworking 3		6,46	2,95	19,06	1,00	19,06
Vano ventana		0,65	1,00	0,65	-1,00	-0,65
Vano puerta		1,00	2,40	2,40	-1,00	-2,40
		3,69	2,95	10,89	1,00	10,89
Sala detox 1		3,65	2,95	10,77	1,00	10,77
		2,16	2,95	6,37	1,00	6,37
Sala detox 2		2,45	2,95	7,23	1,00	7,23
TOTAL ITEM						**74,89**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**74,89**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA		Carrera 8 No. 12A-19	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**30/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**6,1**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Muro en Drywall doble cara. e= 12 cm. ancho<50 cm. con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano (Suministro e instalación Incluye perfilería. frescasa. malla. cinta papel. cinta metálica filos. pintura)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**ML**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 2



DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
PISO 2						
Coworking 1						
Dintel 1			1,00	1,00	1,00	1,00
Mocheta 1			2,45	2,45	1,00	2,45
Mocheta 2			2,63	2,63	1,00	2,63
Coworking 3						
Dintel 2			1,00	1,00	1,00	1,00
Mocheta 3			2,61	2,61	1,00	2,61
Sala de espera						
Dintel 3			1,00	1,00	1,00	1,00
Sala detox 1						
Dintel 4			1,00	1,00	1,00	1,00
Mocheta 4			2,61	2,61	1,00	2,61
Sala detox 2			1,00	1,00	1,00	1,00
Dintel 5			1,00	1,00	1,00	1,00
TOTAL ITEM						**16,30**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**16,30**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA		Carrera 8 No. 12A-19	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	30/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	6,7	DESCRIPCION ITEM:	Refuerzo en listón de madera 3x11/2 en pino (suministro e instalación)			UNIDAD DE MEDIDA:	ML

PISO 4



DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
PISO 2						
Coworking 1						
Puerta 1			2,40	2,40	2,00	4,80
Ventana 1			1,00	1,00	2,00	2,00
Ventana 2			1,00	1,00	2,00	2,00
Ventana 3			1,00	1,00	2,00	2,00
Coworking 3						
Puerta 2			2,40	2,40	1,00	2,40
Sala de espera						
Puerta 3			2,40	2,40	2,00	4,80
Ventana 4			1,00	1,00	2,00	2,00
Sala detox 1						
Puerta 4			2,40	2,40	2,00	4,80
Sala detox 2						
Puerta 5			2,40	2,40	2,00	4,80
TOTAL ITEM						**29,60**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**29,60**


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Carrera 8 No. 12A-19	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**30/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**8,12**	**DESCRIPCION ITEM:**	Regata sobre muro. (Incluye equipos)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**ML**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA PISO 2

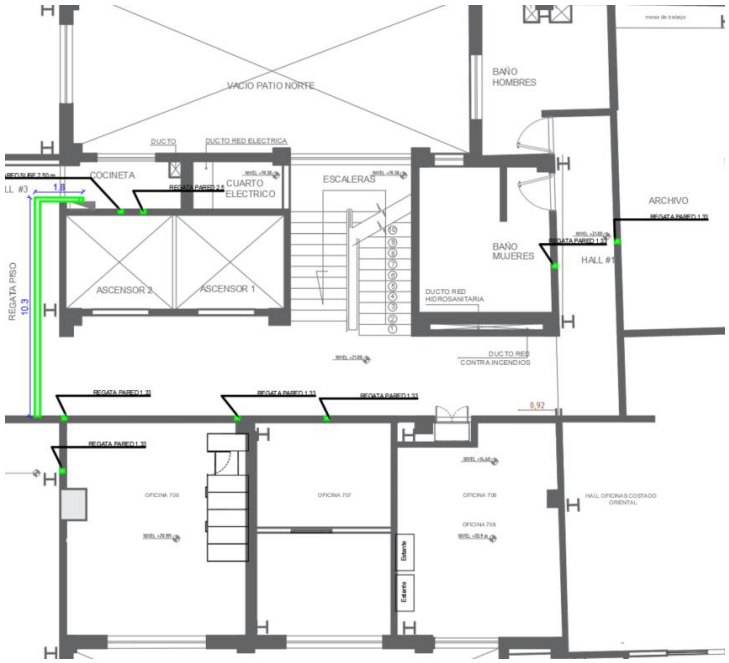

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Cocineta		2,5			2,00	5,00
Hall #3		12,10			1,00	12,10
Pasillo		1,33			6,00	7,99
				TOTAL ITEM		**25,09**
				CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES		**0,00**
				CANTIDAD CORTE ACTUAL		**25,09**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA


Carrera 8 No. 12A-19

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**LP-04-2025**	**OBJETO:**	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**13,1**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Mantenimiento puerta en madera. (incluye lijado, tapaporos, pintura, cambio de herrajes necesarios)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA BAÑOS Y COCINA PISO 2

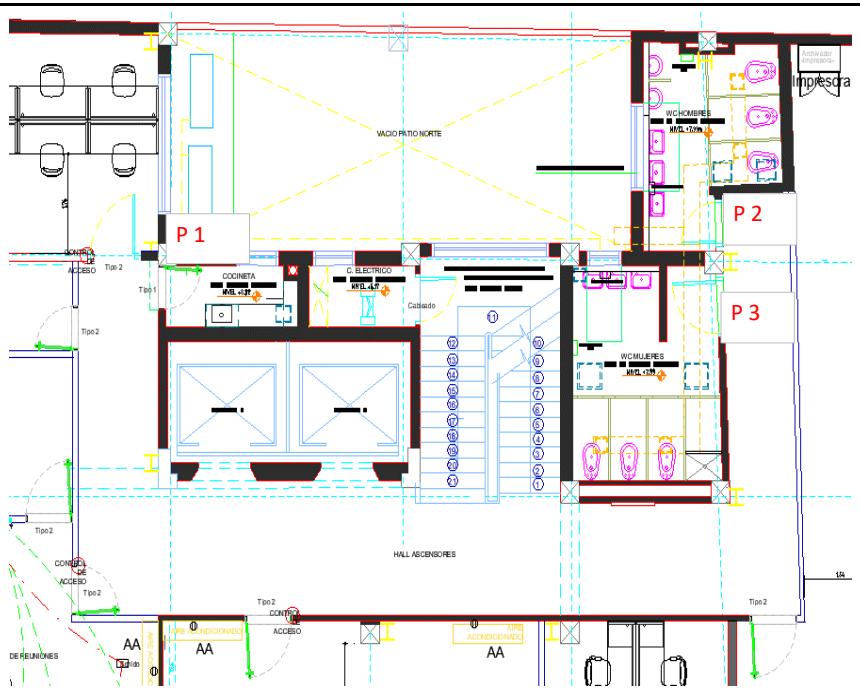

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
PISO 3						
BAÑO HOMBRES					1	1
BAÑO MUJERES					1	1
COCINETA					1	1
TOTAL ITEM						**3,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**3,00**


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA		Carrera 8 No. 12A-19	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**14,33**	**DESCRIPCION ITEM:**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA FENOLICA DE 12MM PARA BAÑOS (INCLUYE HERRAJES)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**M2**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA PISO 2

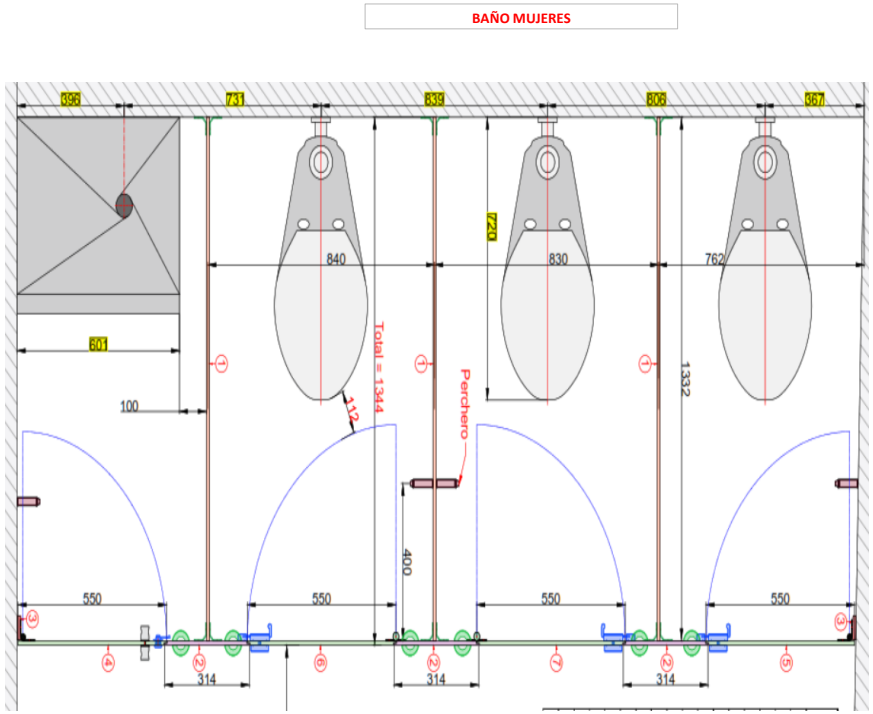

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
PISO 2						
BAÑO MUJERES						
Division central 1		1,332	1,7	2,26	3	6,79
Pilastra central 2		0,314	1,7	0,53	3	1,60
Puertas		0,550	1,7	0,94	4	3,74
Anclaje puerta muro		0,06	1,7	0,10	2	0,20

BAÑO HOMBRES

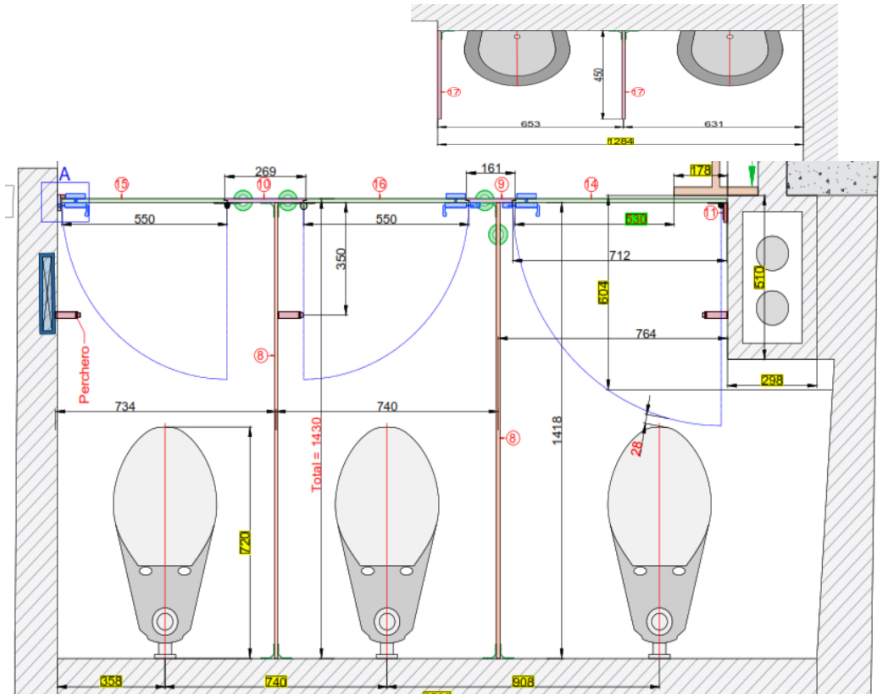

PISO 2						
BAÑO HOMBRES						
Division central 1		1,418	1,7	2,41	2	4,82
Pilastra central 1		0,269	1,8	0,48	1	0,48
Pilastra central 2		0,161	1,8	0,29	1	0,29
Puerta tipo 1		0,550	1,7	0,94	2	1,87
Puerta tipo 2		0,712	1,7	1,21	1	1,21
Division orinal		0,450	1,2	0,54	2	1,08
Anclaje puerta muro		0,06	1,7	0,10	2	0,20
TOTAL ITEM						**22,30**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**22,30**


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA		ANEXA PISO 3	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	16,8	DESCRIPCION ITEM:	Sistema de descarga de tazas (fluxometro ó válvula), sumin. e inst.			UNIDAD DE MEDIDA:	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

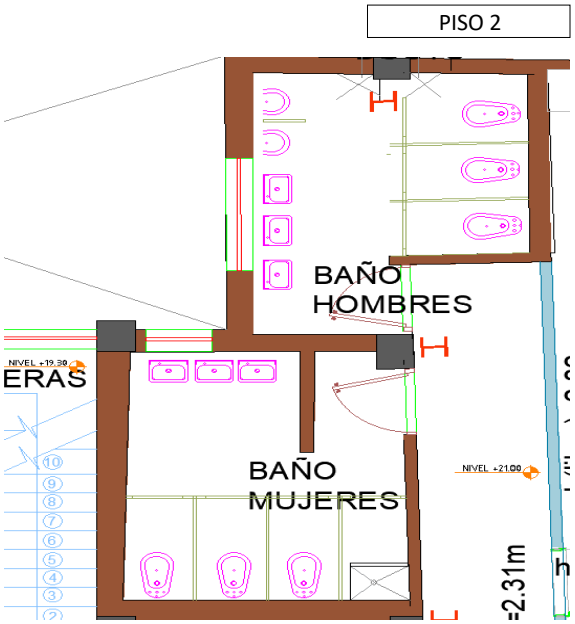

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
PISO 2						
BAÑO HOMBRES						
SANITARIO					3	3,00
BAÑO MUJERES						
SANITARIO					3	3,00
TOTAL ITEM						6,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD CORTE ACTUAL						6,00


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA		ANEXA PISO 2	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	17,34	DESCRIPCION ITEM:	Punto hidráulico 1-1/4" para Sanitario con fluxómetro/válvula antivandálica. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)			UNIDAD DE MEDIDA:	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

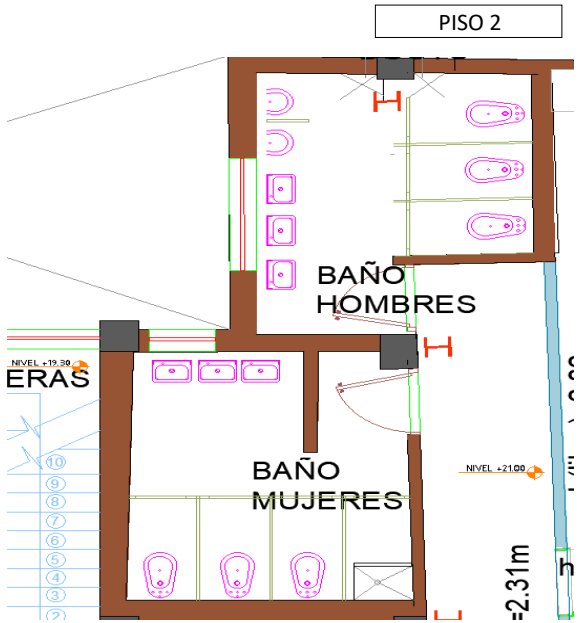

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
PISO 3						
BAÑO HOMBRES						
SANITARIO					3	3,00
BAÑO MUJERES						
SANITARIO					3	3,00
TOTAL ITEM						6,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD CORTE ACTUAL						6,00


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA		ANEXA PISO 2	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**17,37**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Punto hidráulico 1/2" para lavamanos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

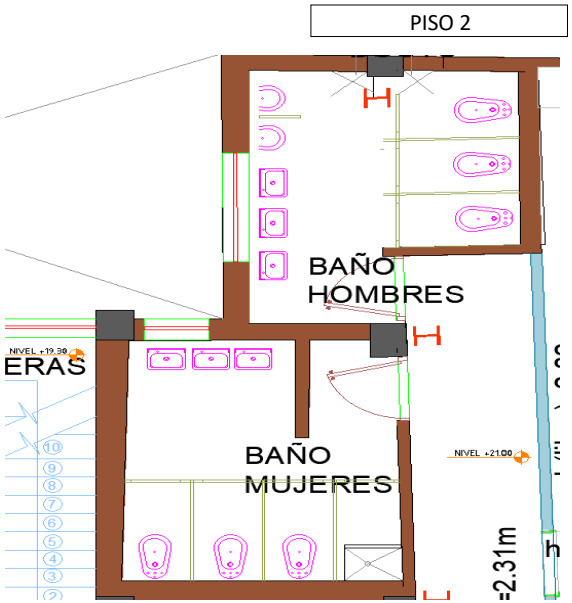

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
PISO 3						
BAÑO HOMBRES						
LAVAMANOS					3	3,00
BAÑO MUJERES						
LAVAMANOS					3	3,00
TOTAL ITEM						**6,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**6,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA


ANEXA PISO 2

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**17,38**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Punto hidráulico 1/2" para lavaplatos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

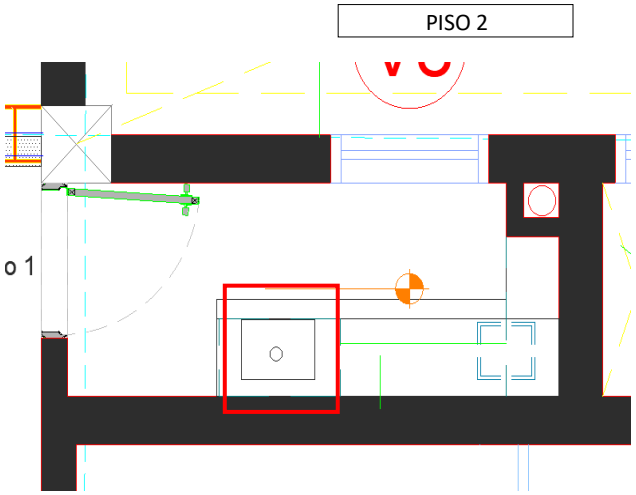

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
PISO 3						
COCINA						
LAVAPLATOS					1	1,00
TOTAL ITEM						**1,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**1,00**


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA		ANEXA PISO 3	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	17,39	DESCRIPCION ITEM:	Punto hidráulico 1/2" para orinal. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)			UNIDAD DE MEDIDA:	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

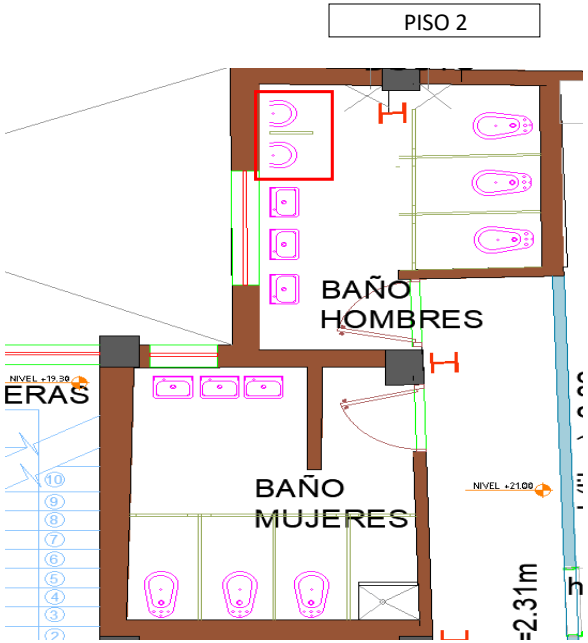

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
PISO 3						
BAÑO HOMBRES						
ORINAL					2	2,00
TOTAL ITEM						2,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD CORTE ACTUAL						2,00


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: Vasquez DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA		ANEXA PISO 3	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	17,40	DESCRIPCION ITEM:	Punto hidráulico 1/2" para llave terminal manguera (Suministro e instalación Incluye tubería y accesorios)			UNIDAD DE MEDIDA:	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

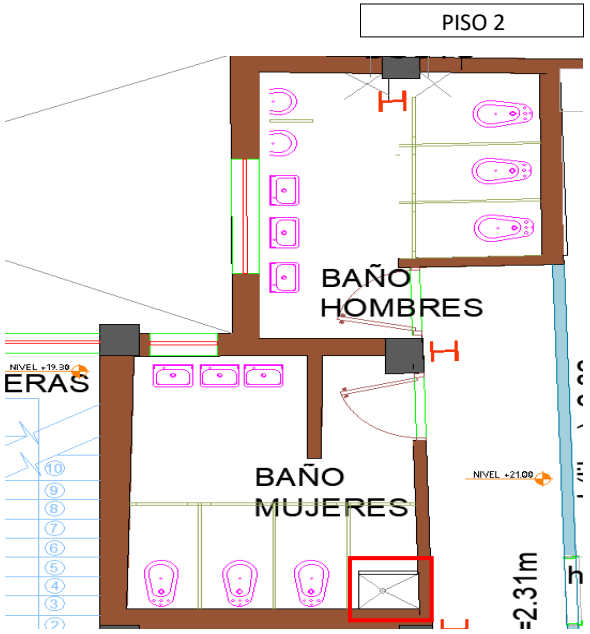

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
PISO 3						
BAÑO MUJERES						
POCETA					1	1,00
TOTAL ITEM						1,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD CORTE ACTUAL						1,00


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: Vasquez DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	ANEXA PISO 3	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	19,9	DESCRIPCION ITEM:	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 24 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)			UNIDAD DE MEDIDA:	UNI

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

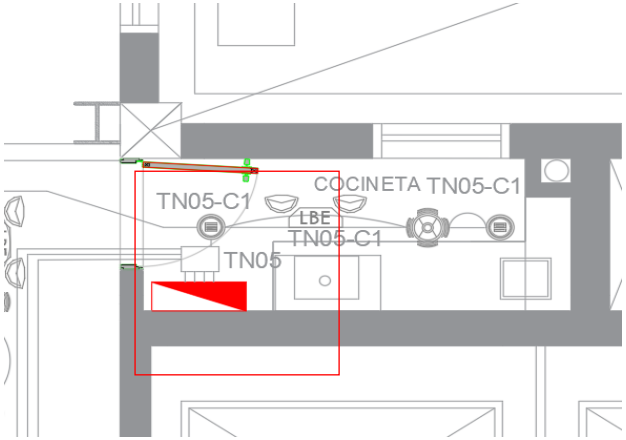

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Cocineta					1,00	1,00
TOTAL ITEM						1,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD CORTE ACTUAL						1,00


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: RICARDO J. MANSILLA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Carrera 8 No. 12A-19	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**19,33**	**DESCRIPCION ITEM:**	Coraza Americana de 2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios necesarios)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**ML**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA PISO 2

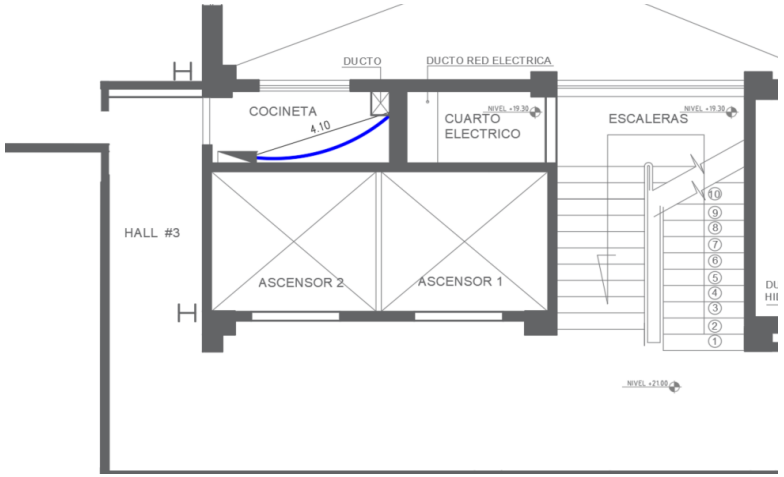

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Cocineta a cuarto electrico		4,1				4,10

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

Carrera 8 No. 12A-19


Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

HOJA 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**	**CORTE No.**	**14**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**	**FECHA:**	**31/07/2026**
ITEM No.	**19,99**	**DESCRIPCION ITEM:**	Totalizador de 50 AMP (Suministro e instalación)
		UNIDAD DE MEDIDA:	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

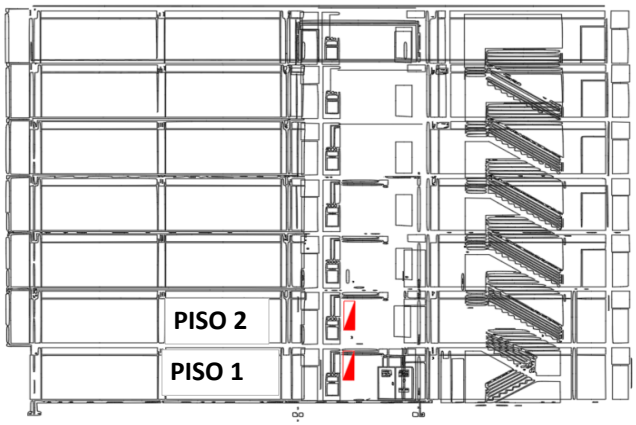

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Cocineta piso 2					1,00	1,00
Tablero general primer piso					1,00	1,00
TOTAL ITEM						**2,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**2,00**


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA 1	Carrera 8 No. 12A-19	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**NP-34**	**DESCRIPCION ITEM:**	Suministro e instalación de soporte tipo Pera para tubería de 2"			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA PISO 2

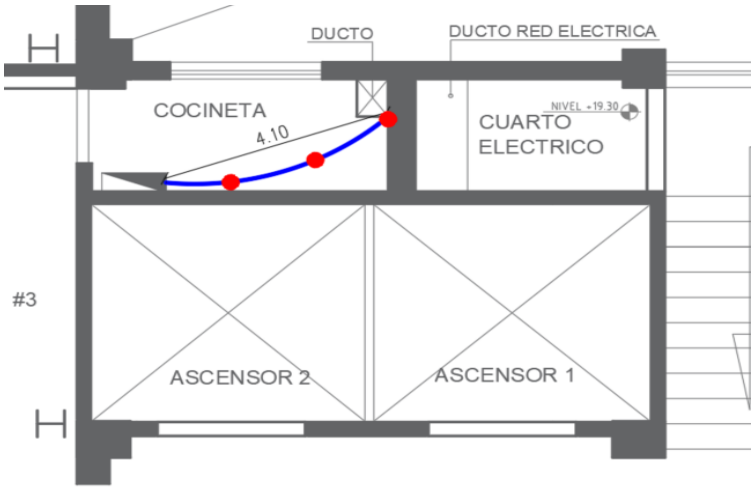

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Cocineta a cuarto electrico					3,00	3,00
TOTAL ITEM						**3,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**3,00**


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA		Carrera 8 No. 12A-19	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**LP-04-2025**	**OBJETO:**	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**NP-72**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Mantenimiento de puerta madera alma en vidrio dimensiones 1.0 m x 2.4m incluye desmonte y reinstalación. Incluye lijado total, masilla, tintilla, sellado). No incluye cambio de piezas ni chapas ni bisagras, ni cambio de vidrio existente.**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA PISO 2

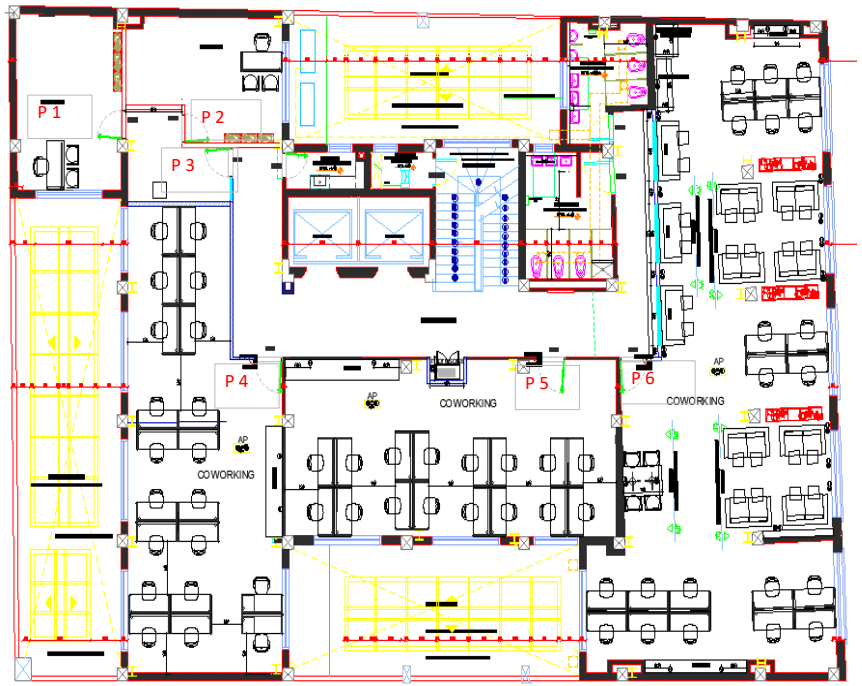

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
PISO 2						
PUERTA 1					1	1
PUERTA 2					1	1
PUERTA 3					1	1
PUERTA 4					1	1
PUERTA 5					1	1
PUERTA 6					1	1
TOTAL ITEM						**6,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**6,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE OBRA
CORTE No. 13
SEDE ANEXA-PISO 3

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA 1


Carrera 8 No. 12A-19

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**8,12**	**DESCRIPCION ITEM:**	Regata sobre muro. (Incluye equipos)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**ML**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA PISO 3

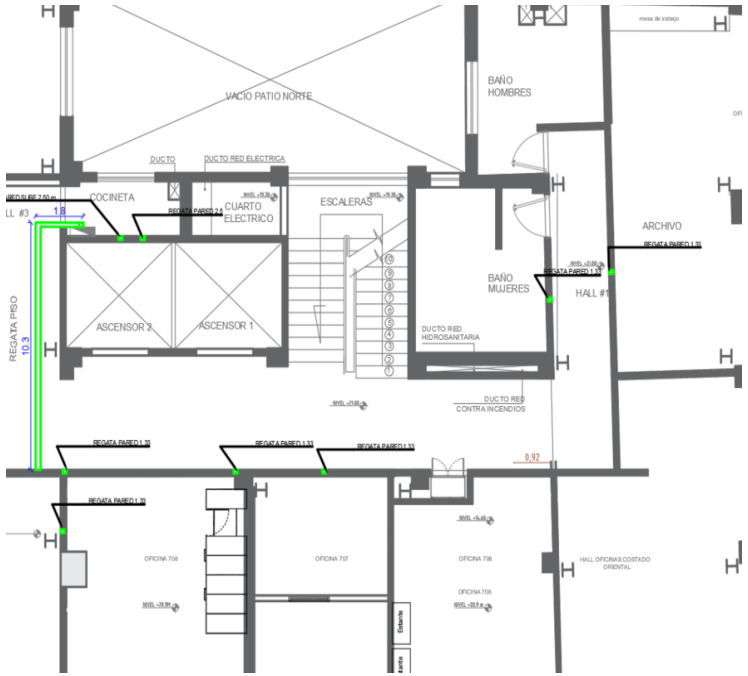

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Cocineta		2,5			2,00	5,00
Hall #3		12,10			1,00	12,10
Pasillo		1,33			6,00	7,99
TOTAL ITEM						**25,09**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**25,09**


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA		Carrera 8 No. 12A-19	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**LP-04-2025**	**OBJETO:**	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**13,1**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Mantenimiento puerta en madera. (incluye lijado, tapaporos, pintura, cambio de herrajes necesarios)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA BAÑOS Y COCINA PISO 3

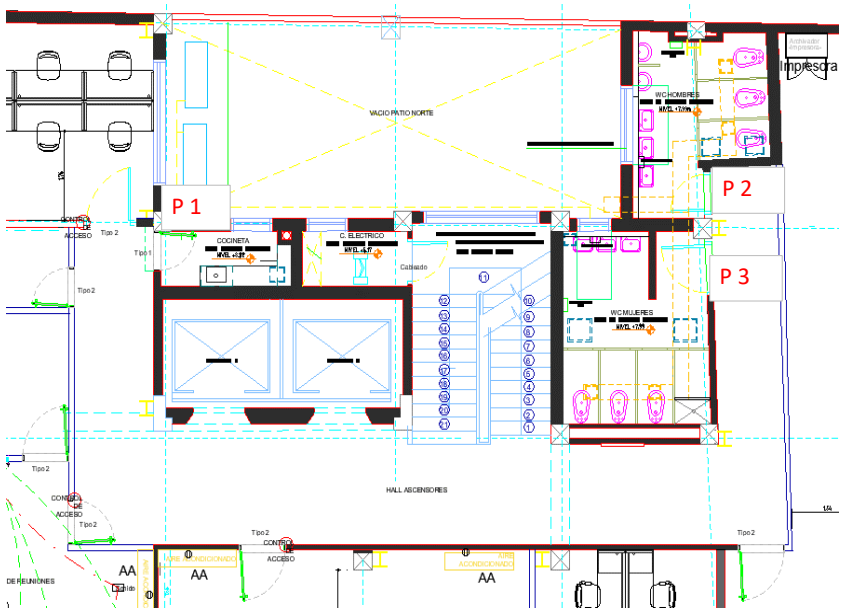

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
PISO 3						
BAÑO HOMBRES					1	1
BAÑO MUJERES					1	1
COCINETA					1	1
TOTAL ITEM						**3,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**3,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA		Carrera 8 No. 12A-19	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**14,33**	**DESCRIPCION ITEM:**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA FENOLICA DE 12MM PARA BAÑOS (INCLUYE HERRAJES)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**M2**


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA PISO 3

BAÑO MUJERES

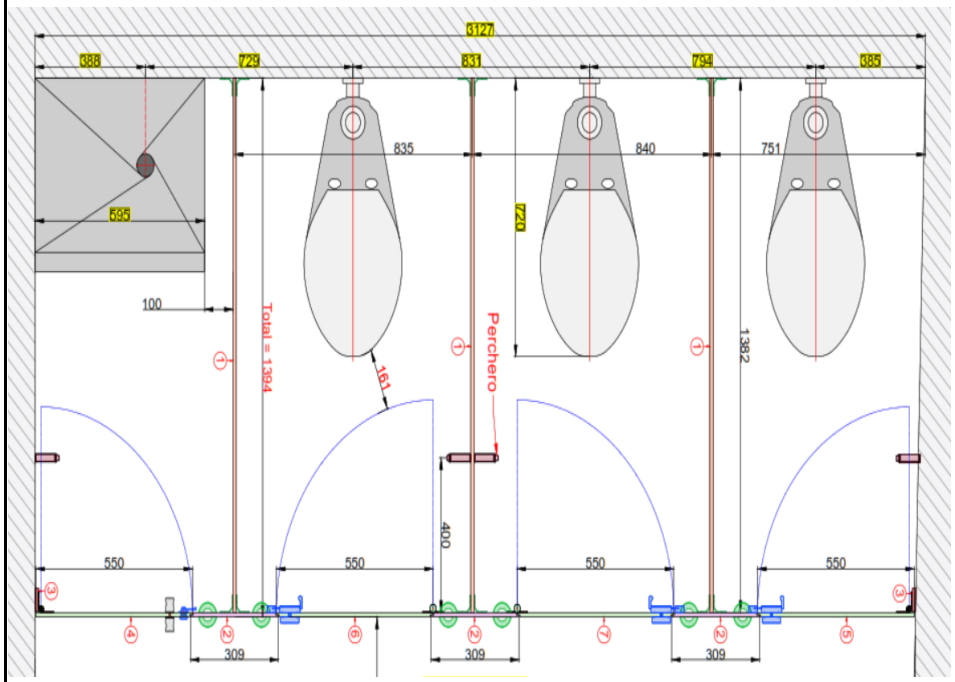

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
PISO 3						
BAÑO MUJERES						
Division central 1		1,382	1,7	2,35	3	7,05
Pilastra central 2		0,309	1,7	0,53	3	1,58
Puertas		0,550	1,7	0,94	4	3,74
Anclaje puerta muro		0,06	1,7	0,10	2	0,20

BAÑO HOMBRES

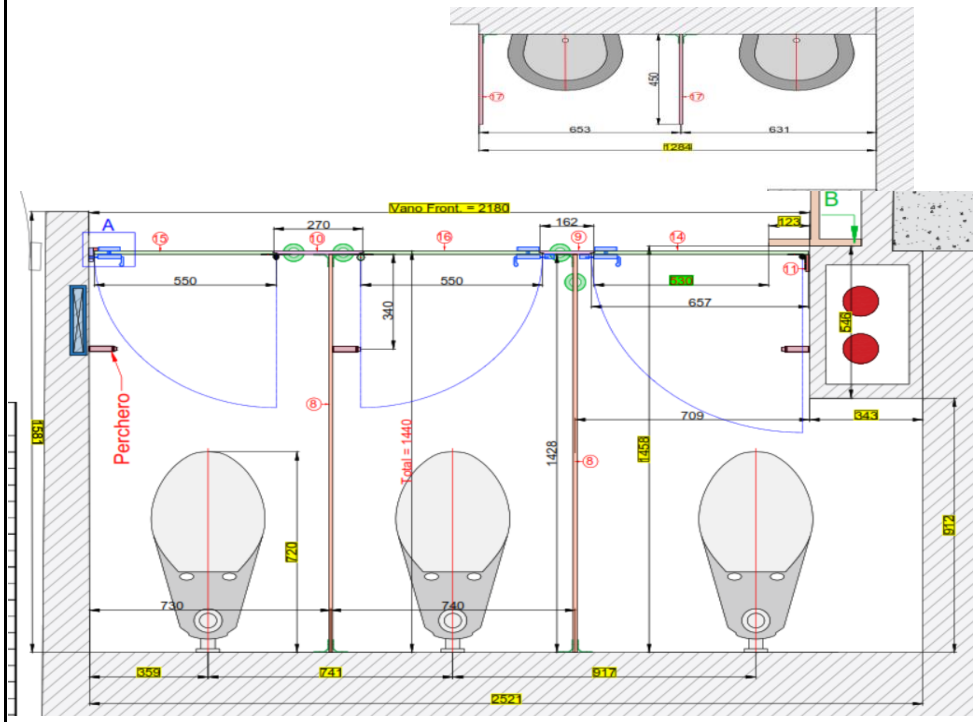

PISO 3						
BAÑO HOMBRES						
Division central 1		1,428	1,7	2,43	2	4,86
Pilastra central 1		0,270	1,8	0,49	1	0,49
Pilastra central 2		0,162	1,8	0,29	1	0,29
Puerta tipo 1		0,550	1,7	0,94	2	1,87
Puerta tipo 2		0,657	1,7	1,12	1	1,12
Division orinal		0,450	1,2	0,54	2	1,08
Anclaje puerta muro		0,06	1,7	0,10	2	0,20
TOTAL ITEM						**22,47**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**22,47**


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA 1	Carrera 8 No. 12A-19	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**19,33**	**DESCRIPCION ITEM:**	Coraza Americana de 2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios necesarios)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**ML**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA PISO 3

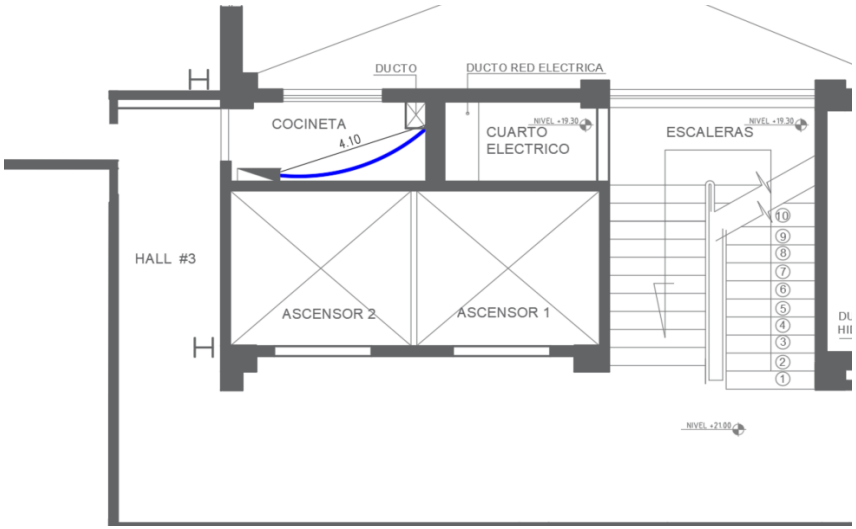

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Cocineta a cuarto electrico		4,1				4,10
TOTAL ITEM						**4,10**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**4,10**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

Carrera 8 No. 12A-19


Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

		HOJA	**1**

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**19,99**	**DESCRIPCION ITEM:**	Totalizador de 50 AMP (Suministro e instalación)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA PISO 3

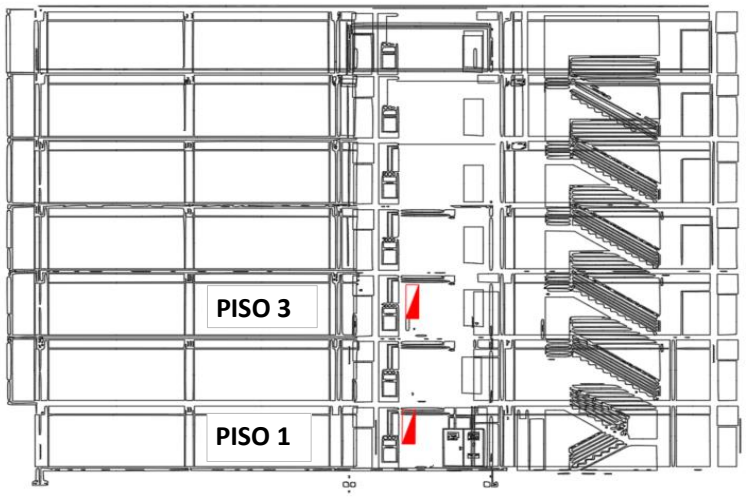

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Cocineta piso 3					1,00	1,00
Tablero general primer piso					1,00	1,00
TOTAL ITEM						**2,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**2,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA 1


Carrera 8 No. 12A-19

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**NP-34**	**DESCRIPCION ITEM:**	Suministro e instalación de soporte tipo Pera para tubería de 2"			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA PISO 3

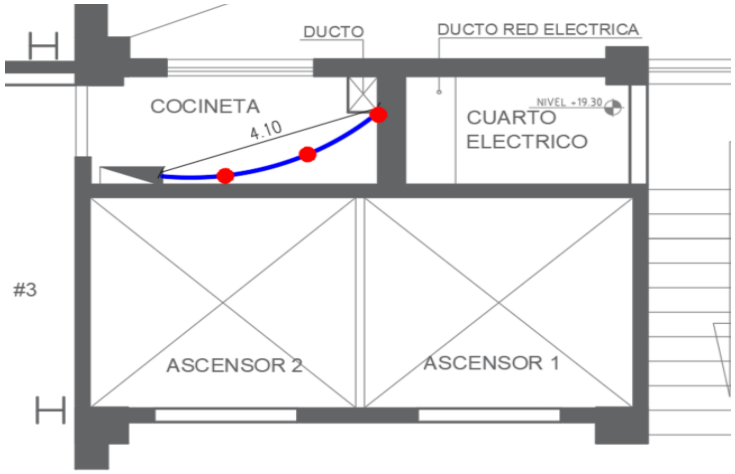

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Cocineta a cuarto electrico					3,00	3,00
TOTAL ITEM						**3,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**3,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA		Carrera 8 No. 12A-19	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**LP-04-2025**	**OBJETO:**	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**NP-72**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Mantenimiento de puerta madera alma en vidrio dimensiones 1.0 m x 2.4m incluye desmonte y reinstalación. Incluye lijado total, masilla, tintilla, sellado). No incluye cambio de piezas ni chapas ni bisagras, ni cambio de vidrio existente.**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA PISO 3



DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
PISO 3						
PUERTA 1					1	1
PUERTA 2					1	1
PUERTA 3					1	1
PUERTA 4					1	1
PUERTA 5					1	1
PUERTA 6					1	1
PUERTA 7					1	1
TOTAL ITEM						**7,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**7,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE OBRA
CORTE No. 13
SEDE ANEXA-PISO 4

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

Carrera 8 No. 12A-19


Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

HOJA 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**8,12**	**DESCRIPCION ITEM:**	Regata sobre muro. (Incluye equipos)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**ML**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA PISO 4

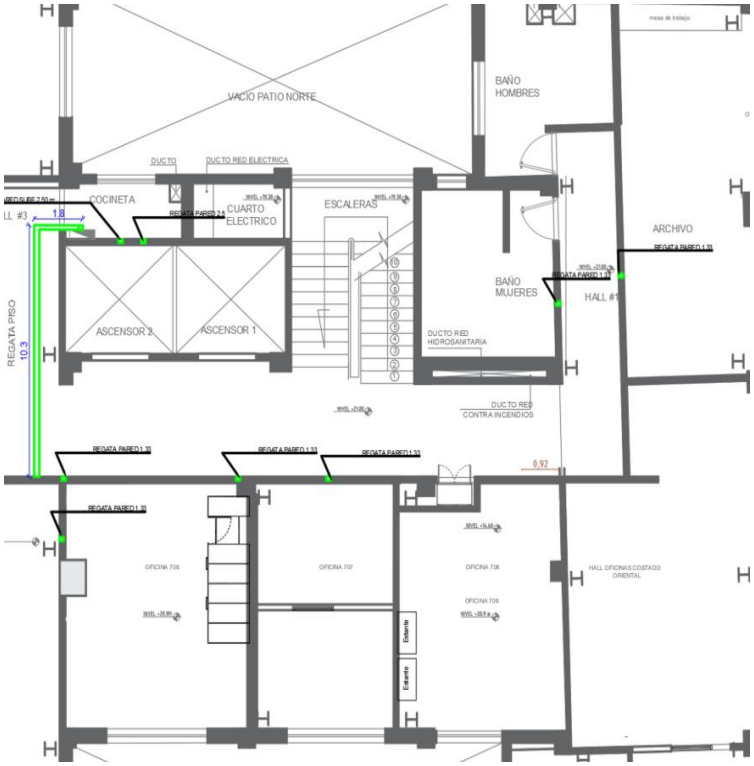

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Cocineta		2,5			2,00	5,00
Hall #3		12,10			1,00	12,10
Pasillo		1,33			6,00	7,99
TOTAL ITEM						**25,09**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**25,09**


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA		Carrera 8 No. 12A-19	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**LP-04-2025**	**OBJETO:**	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**13,1**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Mantenimiento puerta en madera. (incluye lijado, tapaporos, pintura, cambio de herrajes necesarios)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA BAÑOS Y COCINA PISO 4

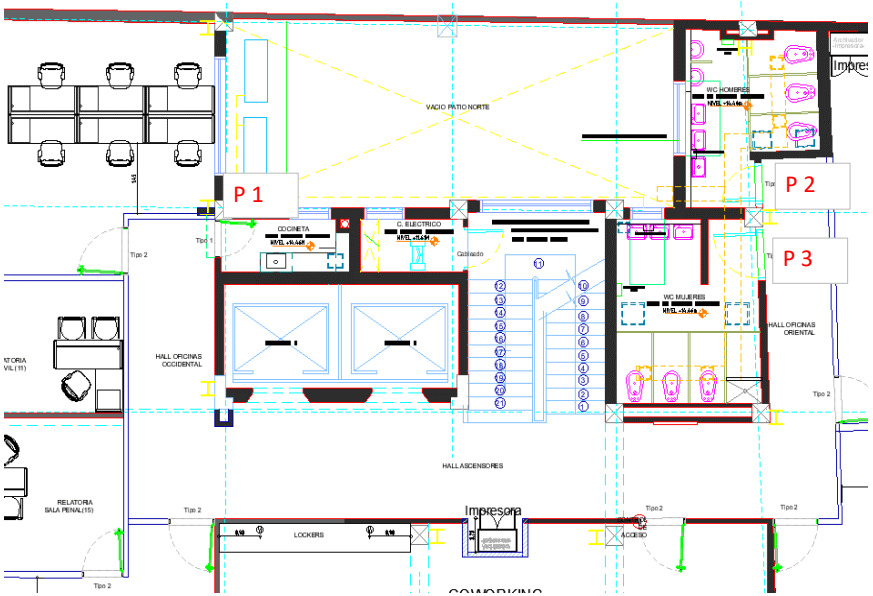

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
PISO 4						
BAÑO HOMBRES					1	1
BAÑO MUJERES					1	1
COCINETA					1	1
TOTAL ITEM						**3,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**3,00**


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA		Carrera 8 No. 12A-19	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	14,33	DESCRIPCION ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA FENOLICA DE 12MM PARA BAÑOS (INCLUYE HERRAJES)			UNIDAD DE MEDIDA:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA PISO 4

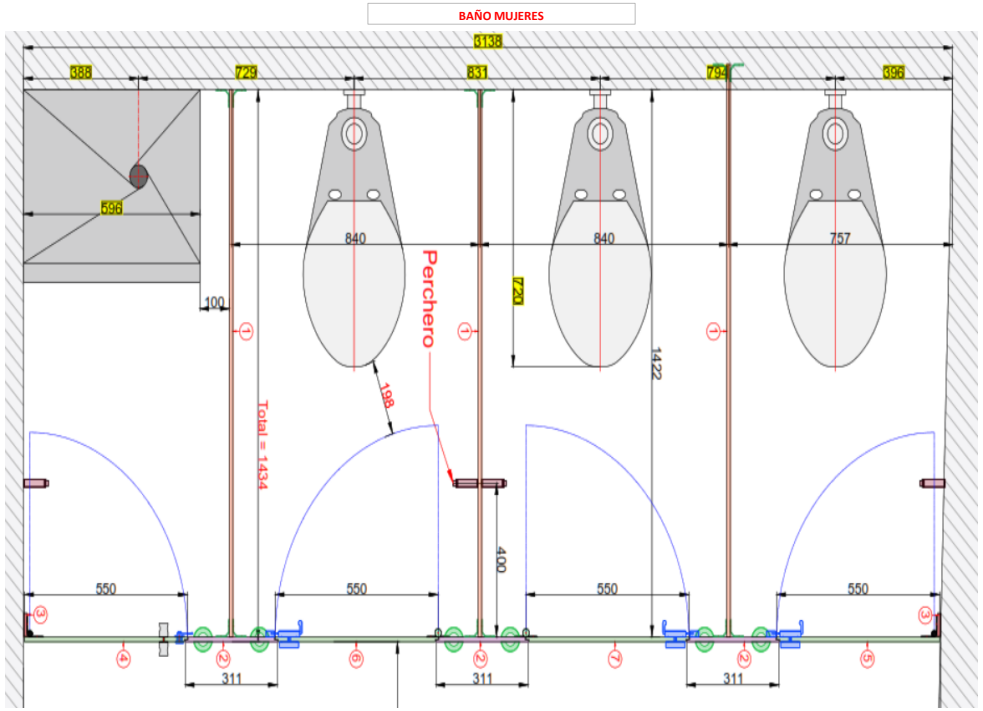

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
PISO 4						
BAÑO MUJERES						
Division central 1		1,422	1,7	2,42	3	7,25
Pilastra central 2		0,311	1,7	0,53	3	1,59
Puertas		0,55	1,7	0,94	4	3,74
Anclaje puerta muro		0,06	1,7	0,10	2	0,20

BAÑO HOMBRES

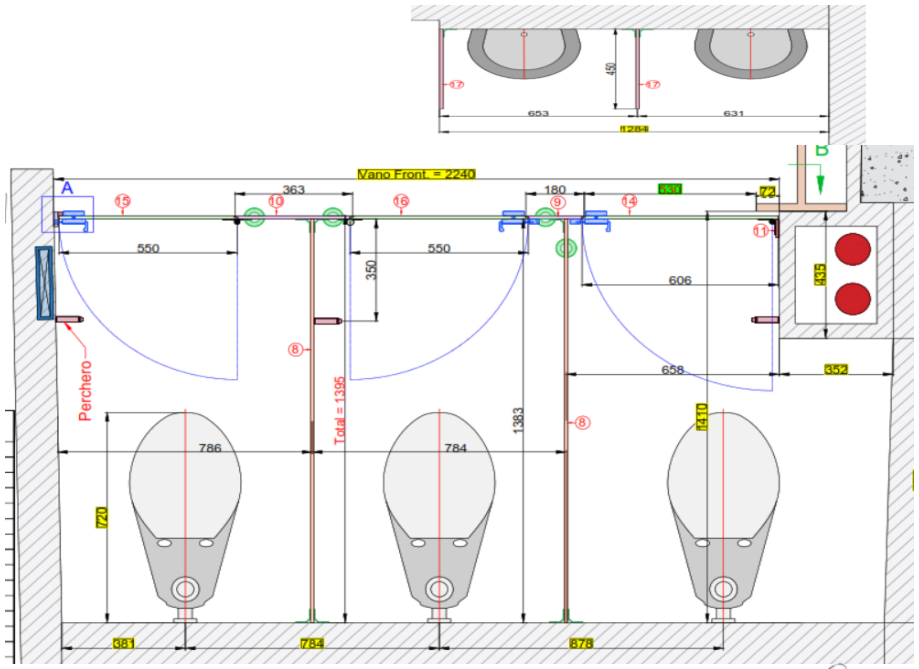

PISO 4						
BAÑO HOMBRES						
Division central 1		1,383	1,7	2,35	2	4,70
Pilastra central 1		0,363	1,8	0,65	1	0,65
Pilastra central 2		0,180	1,8	0,32	1	0,32
Puerta tipo 1		0,550	1,7	0,94	2	1,87
Puerta tipo 2		0,606	1,7	1,03	1	1,03
Division orinal		0,450	1,2	0,54	2	1,08
Anclaje puerta muro		0,06	1,7	0,10	2	0,20
TOTAL ITEM						**22,65**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**22,65**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA	1

Carrera 8 No. 12A-19

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**

CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**	**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**				

ITEM No.	**19,33**	**DESCRIPCION ITEM:**	Coraza Americana de 2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios necesarios)	**UNIDAD DE MEDIDA:**	**ML**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA PISO 4

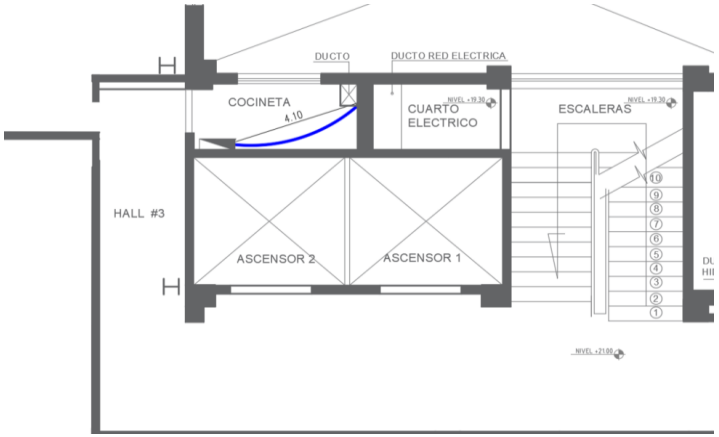

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Cocineta a cuarto electrico		4,1				4,10

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

Carrera 8 No. 12A-19


Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

		HOJA	**1**

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**	**CORTE No.**	**14**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**	**FECHA:**	**31/07/2026**
ITEM No.	**19,99**	**DESCRIPCION ITEM:**	Totalizador de 50 AMP (Suministro e instalación)
UNIDAD DE MEDIDA:	**UN**		

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

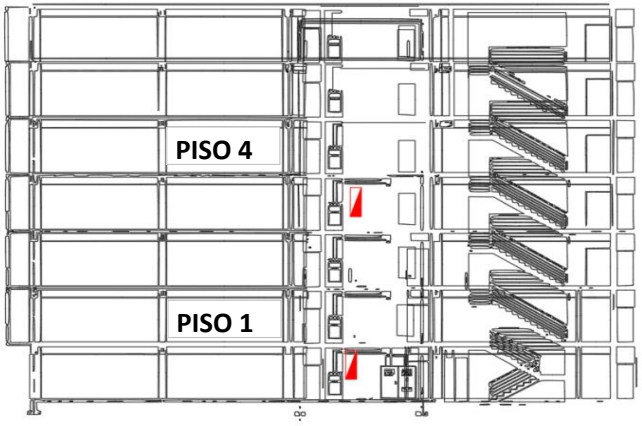

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Cocineta piso 4					1,00	1,00
Tablero general primer piso					1,00	1,00
TOTAL ITEM						**2,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**2,00**


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Carrera 8 No. 12A-19	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**NP-34**	**DESCRIPCION ITEM:**	Suministro e instalación de soporte tipo Pera para tubería de 2"			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA PISO 4

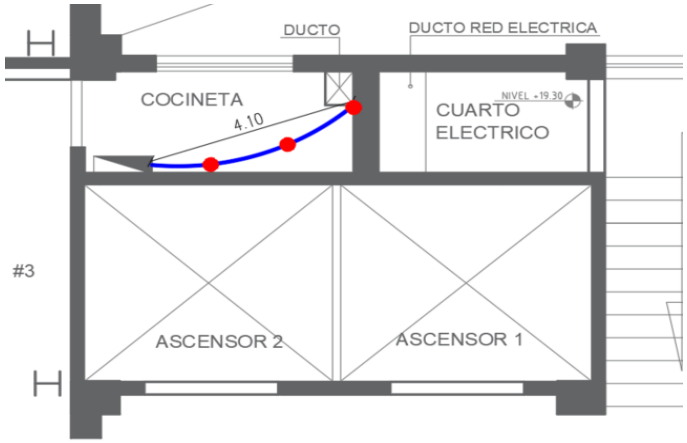

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Cocineta a cuarto electrico					3,00	3,00
TOTAL ITEM						**3,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**3,00**


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA		Carrera 8 No. 12A-19	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**LP-04-2025**	**OBJETO:**	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**NP-72**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Mantenimiento de puerta madera alma en vidrio dimensiones 1.0 m x 2.4m incluye desmonte y reinstalación. Incluye lijado total, masilla, tintilla, sellado). No incluye cambio de piezas ni chapas ni bisagras, ni cambio de vidrio existente.**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA PISO 4

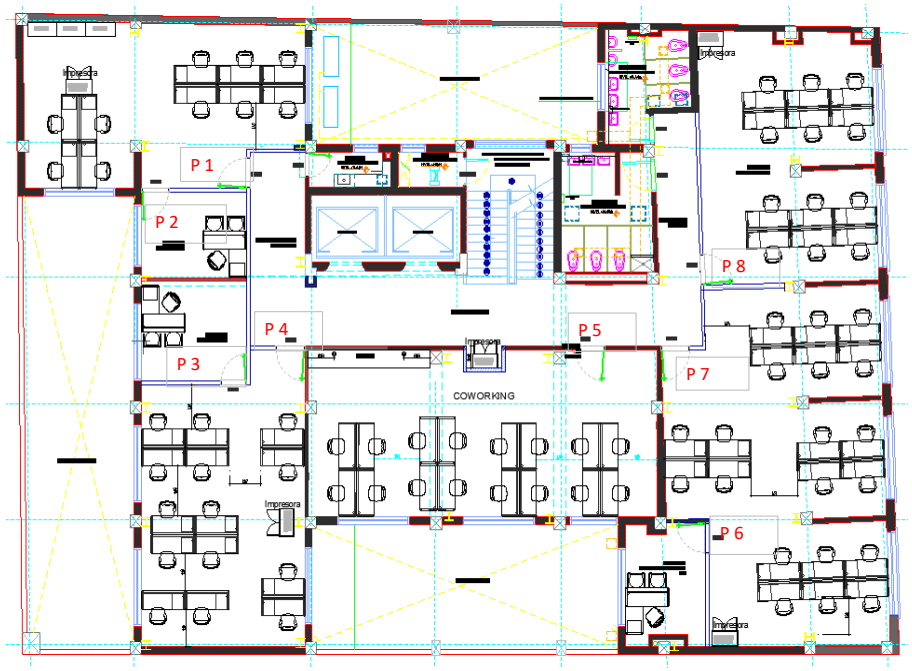

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
PISO 4						
PUERTA 1					1	1
PUERTA 2					1	1
PUERTA 3					1	1
PUERTA 4					1	1
PUERTA 5					1	1
PUERTA 6					1	1
PUERTA 7					1	1
PUERTA 8					1	1
TOTAL ITEM						**8,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**8,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE OBRA
CORTE No. 13
SEDE ANEXA-PISO 5

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

Carrera 8 No. 12A-19


Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

		HOJA	**1**

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**8,12**	**DESCRIPCION ITEM:**	Regata sobre muro. (Incluye equipos)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**ML**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA PISO 5

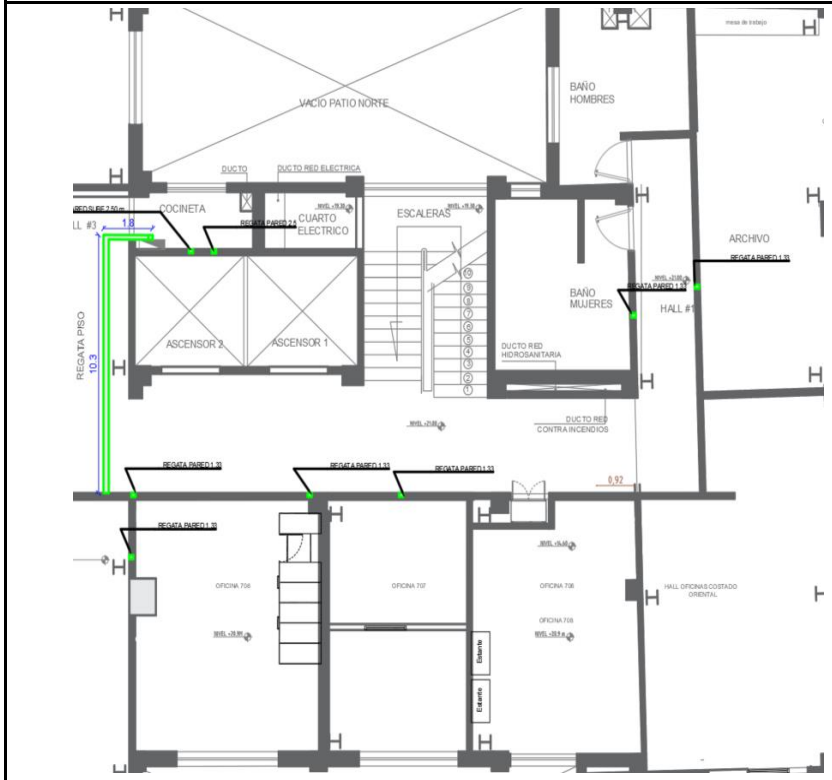

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	**DIMENSIONES**			MEDIDA PARCIAL	**No DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL**
	Ancho	Longitud	Altura			
Cocineta		2,5			2,00	5,00
Hall #3		12,10			1,00	12,10
Pasillo		1,33			6,00	7,99
TOTAL ITEM						**25,09**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**25,09**


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA		Carrera 8 No. 12A-19	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**LP-04-2025**	**OBJETO:**	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**13,1**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Mantenimiento puerta en madera. (incluye lijado, tapaporos, pintura, cambio de herrajes necesarios)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA BAÑOS Y COCINA PISO 5

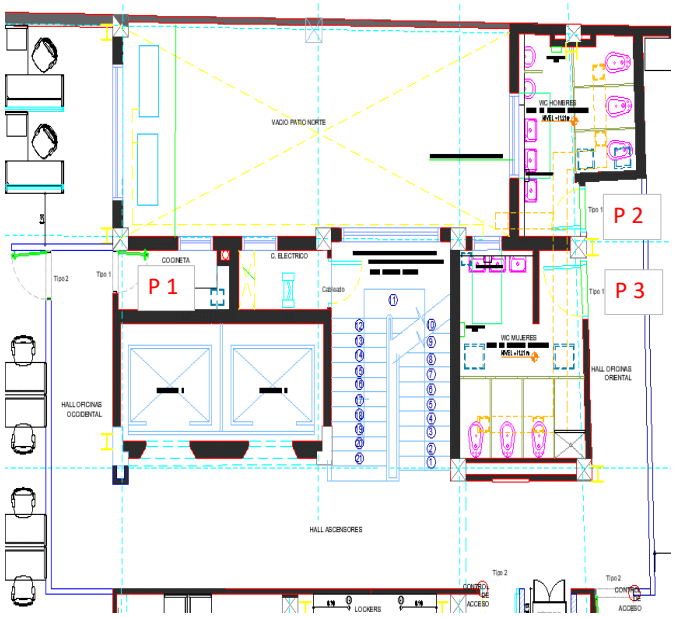

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
PISO 5						
BAÑO HOMBRES					1	1
BAÑO MUJERES					1	1
COCINETA					1	1
TOTAL ITEM						**3,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**3,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA		Carrera 8 No. 12A-19	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**14,33**	**DESCRIPCION ITEM:**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA FENOLICA DE 12MM PARA BAÑOS (INCLUYE HERRAJES)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**M2**


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

BAÑO MUJERES

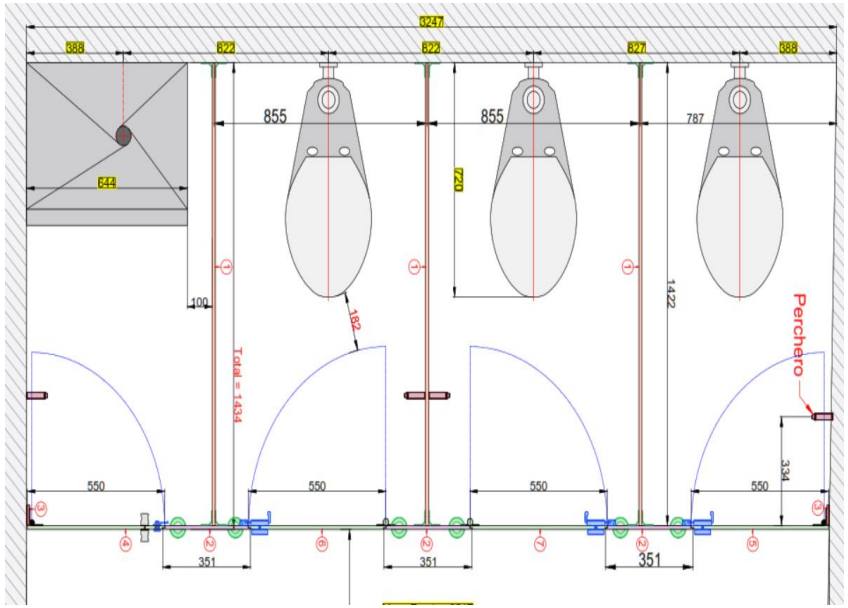

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
PISO 5						
BAÑO MUJERES						
Division central 1		1,422	1,7	2,42	3	7,25
Pilastra central 2		0,351	1,7	0,60	3	1,79
Puertas		0,550	1,7	0,94	4	3,74
Anclaje puerta muro		0,06	1,7	0,10	2	0,20

BAÑO HOMBRES

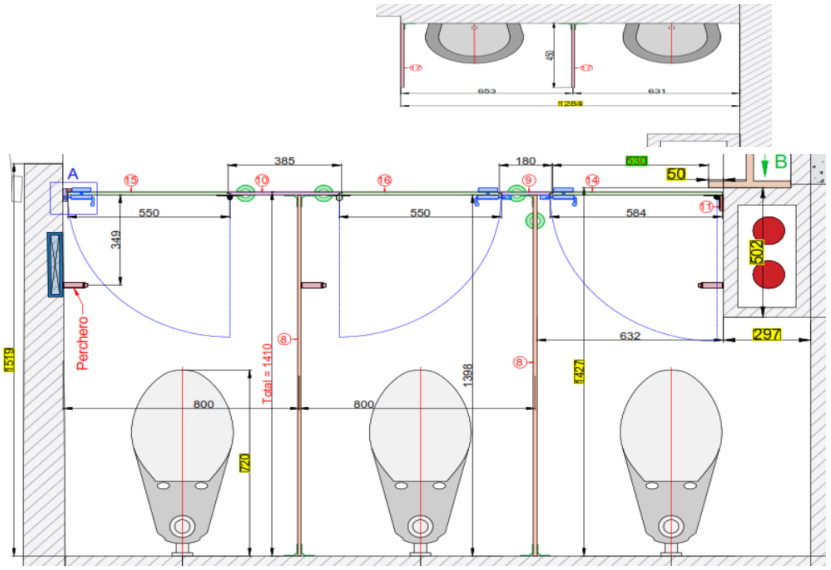

PISO 5						
BAÑO HOMBRES						
Division central 1		1,398	1,7	2,38	2	4,75
Pilastra central 1		0,385	1,8	0,69	1	0,69
Pilastra central 2		0,180	1,8	0,32	1	0,32
Puerta tipo 1		0,550	1,7	0,94	2	1,87
Puerta tipo 2		0,584	1,7	0,99	1	0,99
Division orinal		0,450	1,2	0,54	2	1,08
Anclaje puerta muro		0,06	1,7	0,10	2	0,20
TOTAL ITEM						**22,90**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**22,90**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

Carrera 8 No. 12A-19


Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

HOJA 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**	**CORTE No.** 14	**FECHA:** 31/07/2026
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**		
ITEM No.	**19,33**	**DESCRIPCION ITEM:**	Coraza Americana de 2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios necesarios) — **UNIDAD DE MEDIDA:** **ML**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

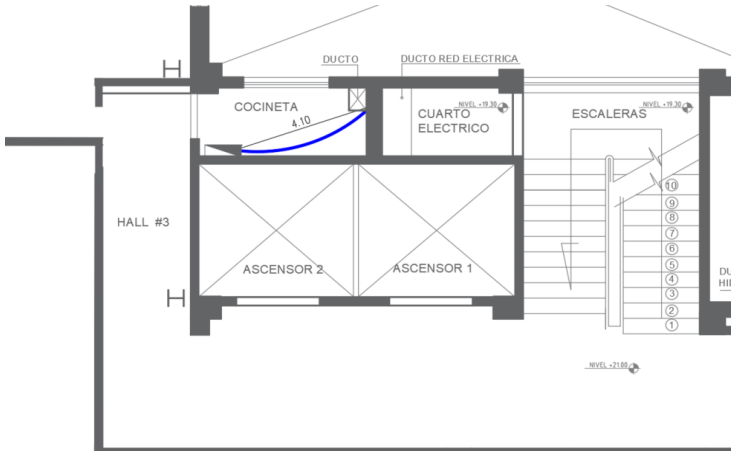


DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Cocineta a cuarto electrico		4,1				4,10

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Carrera 8 No. 12A-19	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**19,99**	**DESCRIPCION ITEM:**	Totalizador de 50 AMP (Suministro e instalación)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

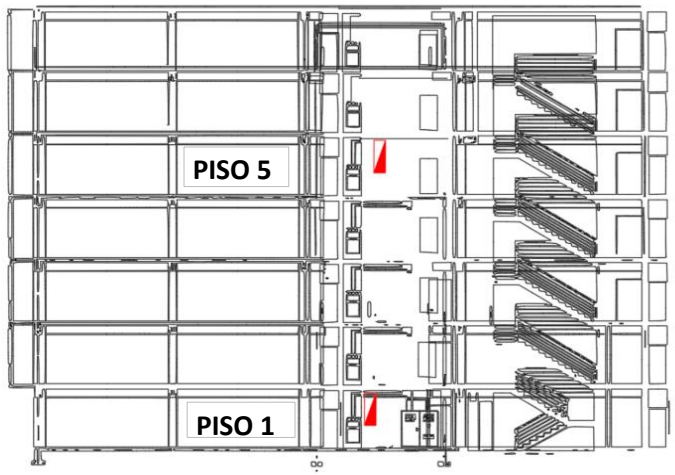

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Cocineta piso 5					1,00	1,00
Tablero general primer piso					1,00	1,00
TOTAL ITEM						**2,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**2,00**


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA 1	Carrera 8 No. 12A-19	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**NP-34**	**DESCRIPCION ITEM:**	Suministro e instalación de soporte tipo Pera para tubería de 2"			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

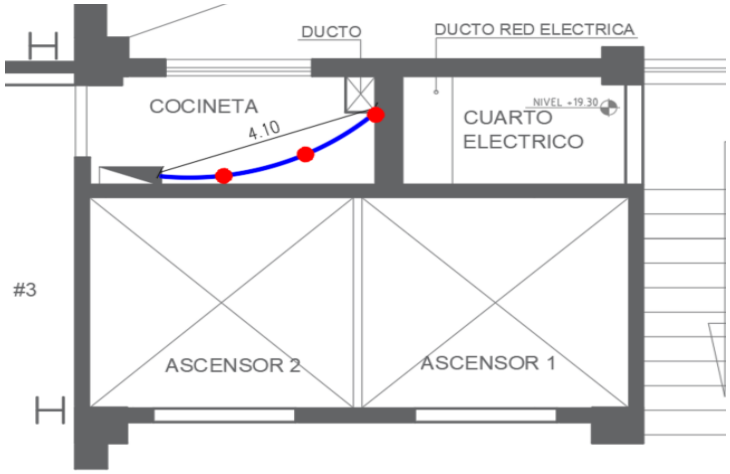


DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Cocineta a cuarto electrico					3,00	3,00

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA		Carrera 8 No. 12A-19	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**LP-04-2025**	**OBJETO:**	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**NP-72**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Mantenimiento de puerta madera alma en vidrio dimensiones 1.0 m x 2.4m incluye desmonte y reinstalación. Incluye lijado total, masilla, tintilla, sellado). No incluye cambio de piezas ni chapas ni bisagras, ni cambio de vidrio existente.**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA BAÑOS Y COCINA PISO 5

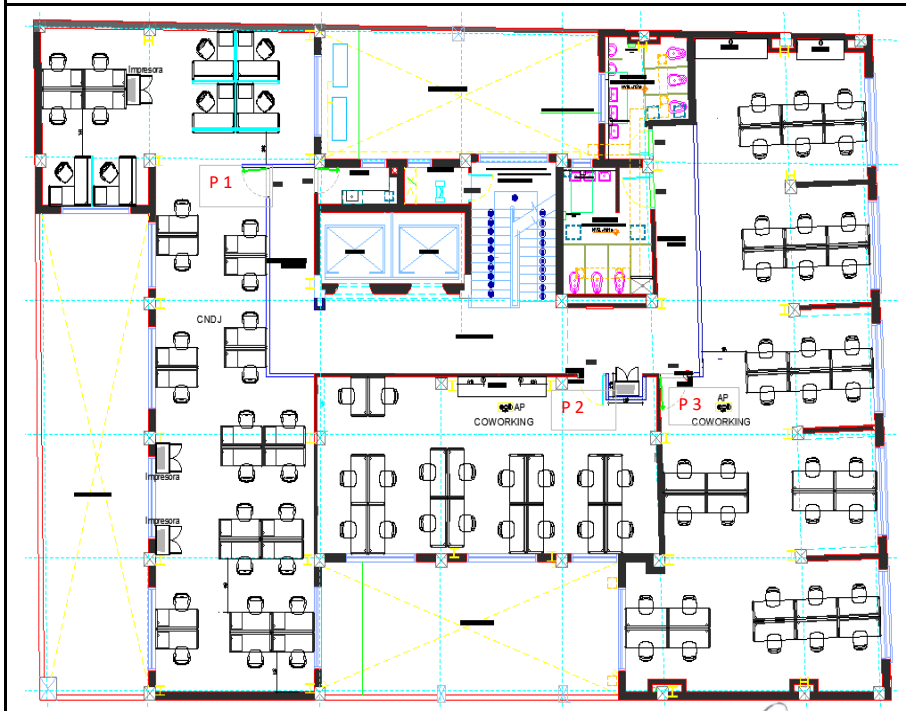

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
PISO 5						
PUERTA 1					1	1
PUERTA 2					1	1
PUERTA 3					1	1
TOTAL ITEM						**3,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**3,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


MEMORIAS DE OBRA
CORTE No. 13
SEDE ANEXA-PISO 6

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA 1	Carrera 8 No. 12A-19	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**8,12**	**DESCRIPCION ITEM:**	Regata sobre muro. (Incluye equipos)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**ML**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

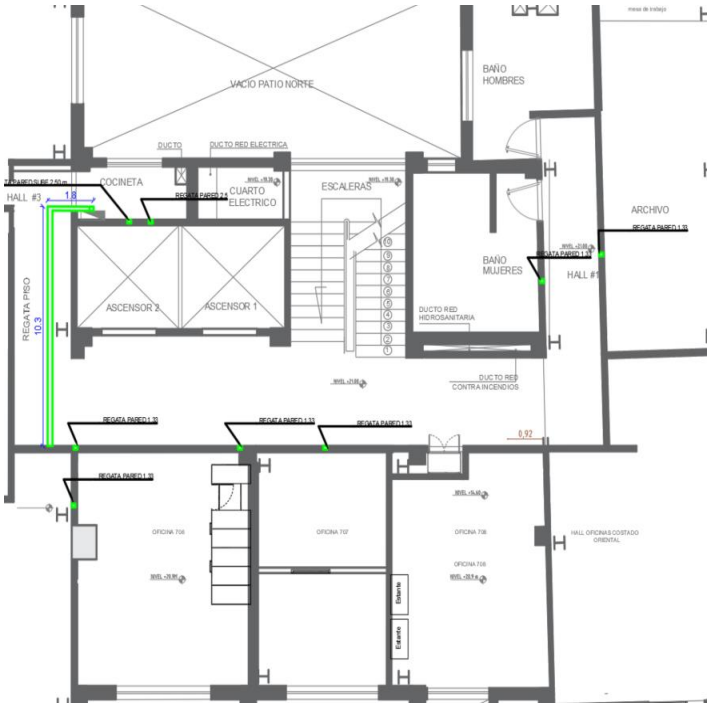

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Cocineta		2,5			2,00	5,00
Hall #3		12,10			1,00	12,10
Pasillo		1,33			6,00	7,99
TOTAL ITEM						**25,09**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**25,09**


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA		Carrera 8 No. 12A-19	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**LP-04-2025**	**OBJETO:**	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**	
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**13,1**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Mantenimiento puerta en madera. (incluye lijado, tapaporos, pintura, cambio de herrajes necesarios)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA BAÑOS Y COCINA PISO 6

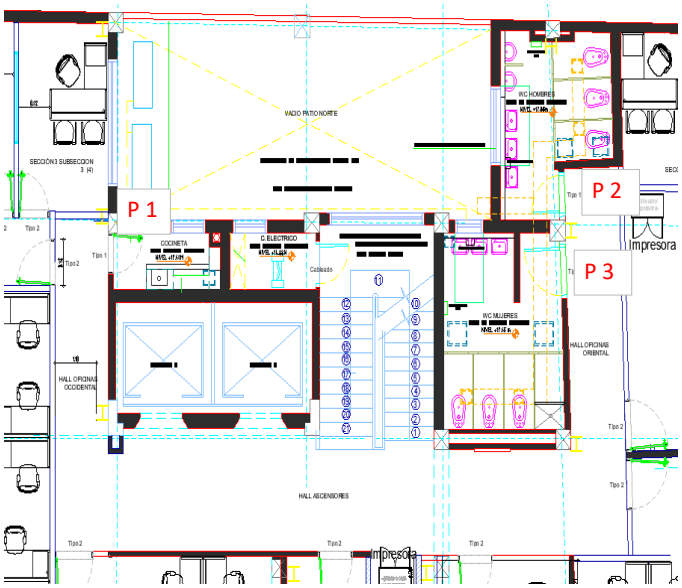

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
PISO 6						
BAÑO HOMBRES					1	1
BAÑO MUJERES					1	1
COCINETA					1	1
TOTAL ITEM						**3,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**3,00**


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA		Carrera 8 No. 12A-19	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**14,33**	**DESCRIPCION ITEM:**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA FENOLICA DE 12MM PARA BAÑOS (INCLUYE HERRAJES)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**M2**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

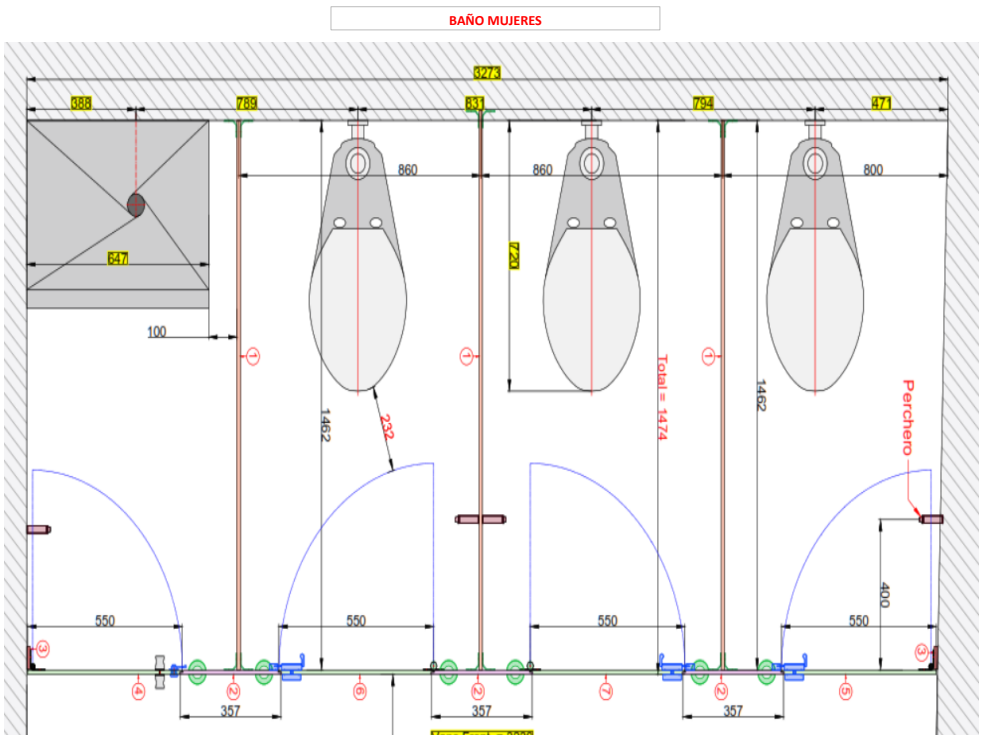

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
PISO 6						
BAÑO MUJERES						
Division central 1		1,462	1,7	2,49	3	7,46
Pilastra central 2		0,357	1,7	0,61	3	1,82
Puertas		0,550	1,7	0,94	4	3,74
Anclaje puerta muro		0,06	1,7	0,10	2	0,20

BAÑO HOMBRES

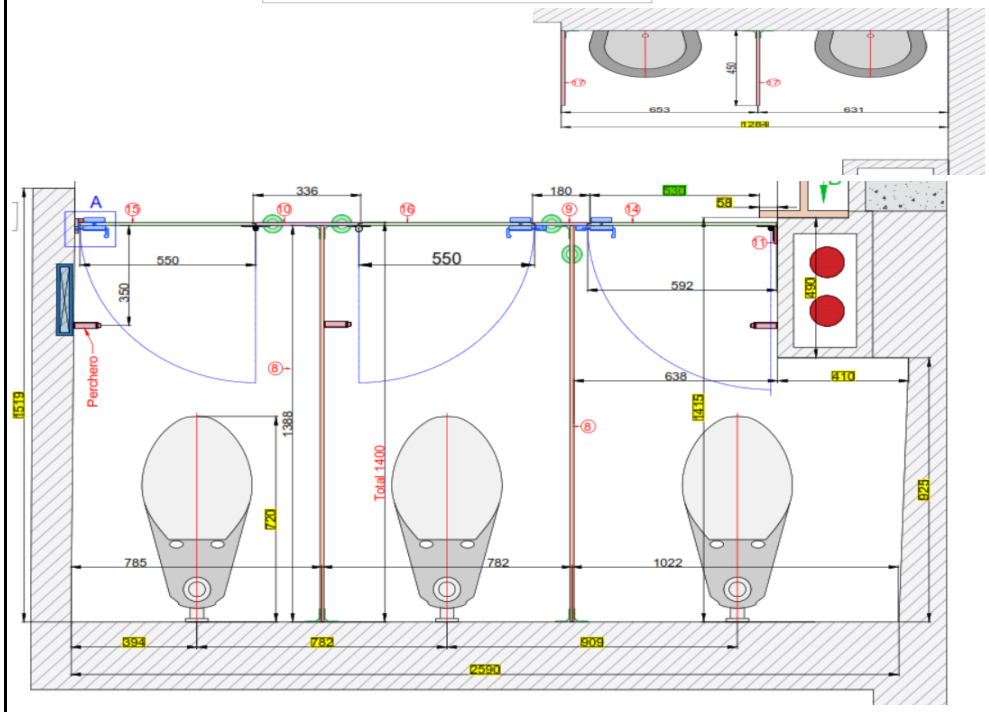

PISO 6						
BAÑO HOMBRES						
Division central 1		1,388	1,7	2,36	2	4,72
Pilastra central 1		0,336	1,8	0,60	1	0,60
Pilastra central 2		0,180	1,8	0,32	1	0,32
Puerta tipo 1		0,550	1,7	0,94	2	1,87
Puerta tipo 2		0,592	1,7	1,01	1	1,01
Division orinal		0,450	1,2	0,54	2	1,08
Anclaje puerta muro		0,06	1,7	0,10	2	0,20
TOTAL ITEM						**23,03**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**23,03**


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Carrera 8 No. 12A-19	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**19,33**	**DESCRIPCION ITEM:**	Coraza Americana de 2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios necesarios)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**ML**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

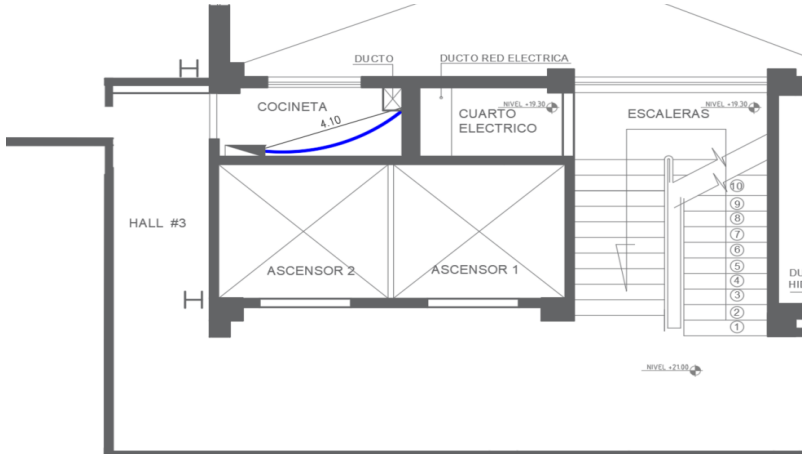


DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Cocineta a cuarto electrico		4,1				4,10

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Carrera 8 No. 12A-19	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**19,99**	**DESCRIPCION ITEM:**	Totalizador de 50 AMP (Suministro e instalación)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

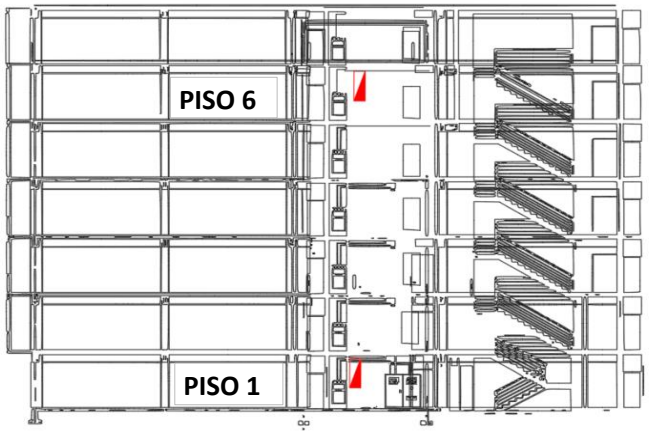


DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Cocineta piso 6					1,00	1,00
Tablero general primer piso					1,00	1,00

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Carrera 8 No. 12A-19	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**NP-34**	**DESCRIPCION ITEM:**	Suministro e instalación de soporte tipo Pera para tubería de 2"			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

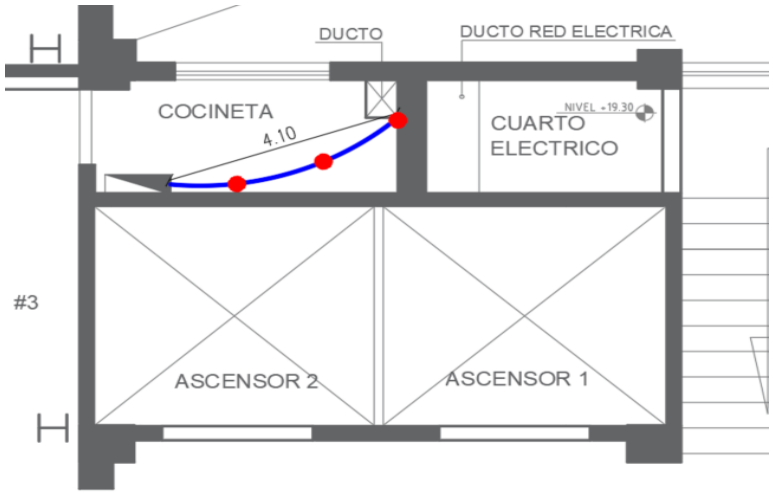


DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Cocineta a cuarto electrico					3,00	3,00

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA		Carrera 8 No. 12A-19	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**LP-04-2025**	**OBJETO:**	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**NP-72**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Mantenimiento de puerta madera alma en vidrio dimensiones 1.0 m x 2.4m incluye desmonte y reinstalación. Incluye lijado total, masilla, tintilla, sellado). No incluye cambio de piezas ni chapas ni bisagras, ni cambio de vidrio existente.**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA BAÑOS Y COCINA PISO 6

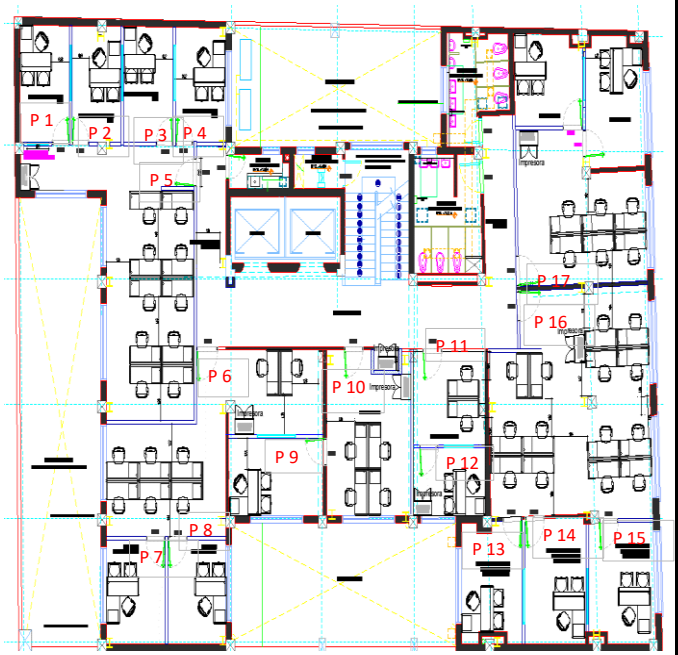

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
PISO 6						
PUERTA 1					1	1
PUERTA 2					1	1
PUERTA 3					1	1
PUERTA 4					1	1
PUERTA 5					1	1
PUERTA 6					1	1
PUERTA 7					1	1
PUERTA 8					1	1
PUERTA 9					1	1
PUERTA 10					1	1
PUERTA 11					1	1
PUERTA 12					1	1
PUERTA 13					1	1
PUERTA 14					1	1
PUERTA 15					1	1
PUERTA 16					1	1
PUERTA 17					1	1
TOTAL ITEM						**17,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**17,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE OBRA
CORTE No. 13
SEDE ANEXA-PISO 7

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

Carrera 8 No. 12A-19


Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

HOJA 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**	**CORTE No.** 14	**FECHA:** 31/07/2026
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**		
ITEM No.	**8,12**	**DESCRIPCION ITEM:**	Regata sobre muro. (Incluye equipos) — **UNIDAD DE MEDIDA:** **ML**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

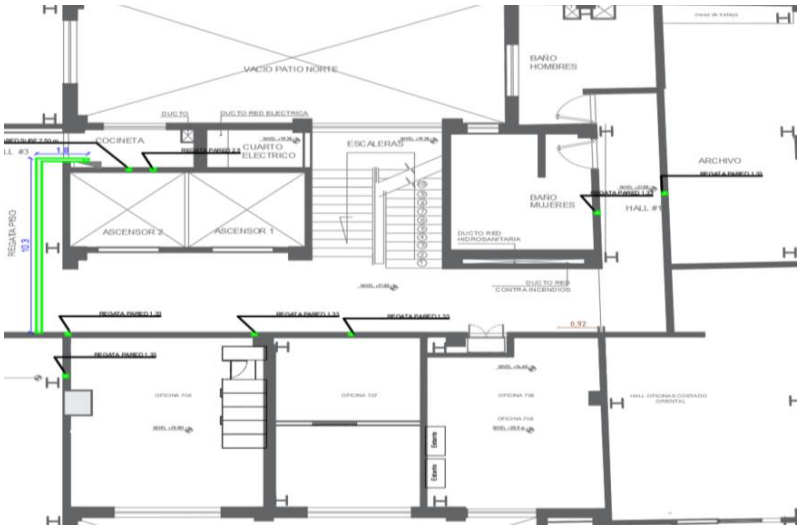

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Cocineta		2,5			2,00	5,00
Hall #3		12,10			1,00	12,10
Pasillo		1,33			6,00	7,99

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA


Carrera 8 No. 12A-19

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**LP-04-2025**	**OBJETO:**	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**13,1**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Mantenimiento puerta en madera. (incluye lijado, tapaporos, pintura, cambio de herrajes necesarios)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA BAÑOS Y COCINA PISO 7

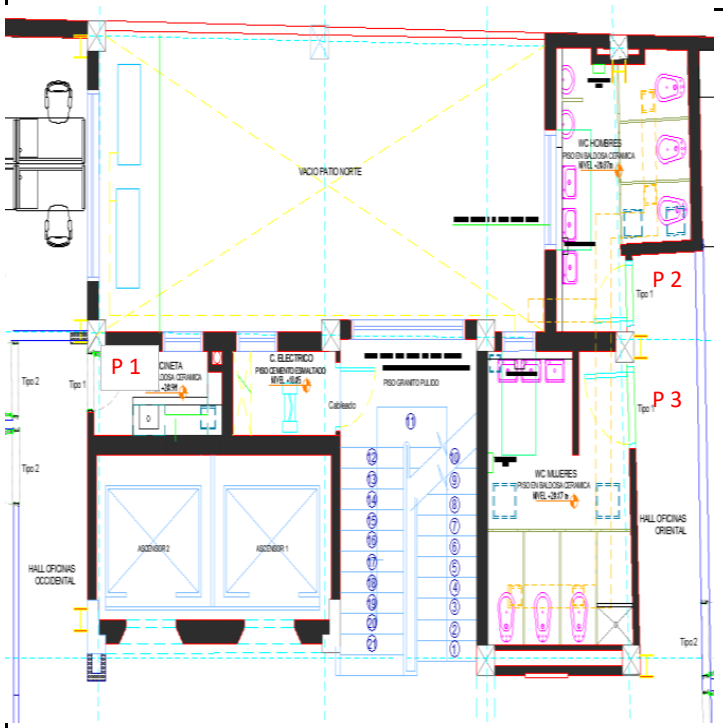

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
PISO 7						
BAÑO HOMBRES					1	1
BAÑO MUJERES					1	1
COCINETA					1	1
TOTAL ITEM						**3,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**3,00**


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA		Carrera 8 No. 12A-19	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	14,33	DESCRIPCION ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA FENOLICA DE 12MM PARA BAÑOS (INCLUYE HERRAJES)			UNIDAD DE MEDIDA:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

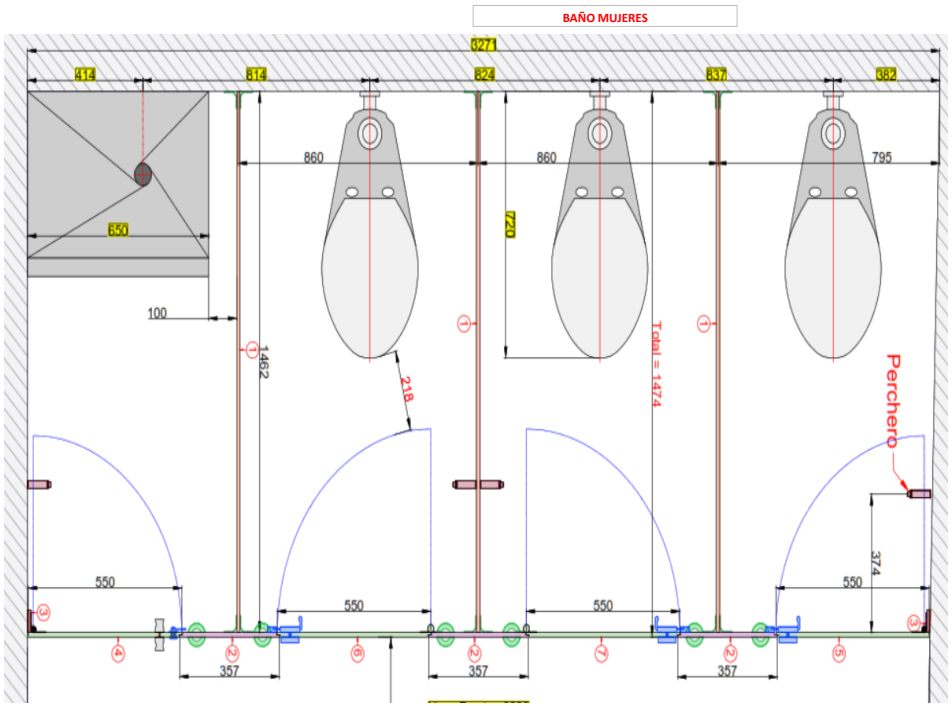

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
PISO 7						
BAÑO MUJERES						
Division central 1		1,462	1,7	2,49	3	7,46
Pilastra central 2		0,357	1,7	0,61	3	1,82
Puertas		0,55	1,7	0,94	4	3,74
Anclaje puerta muro		0,06	1,7	0,10	2	0,20

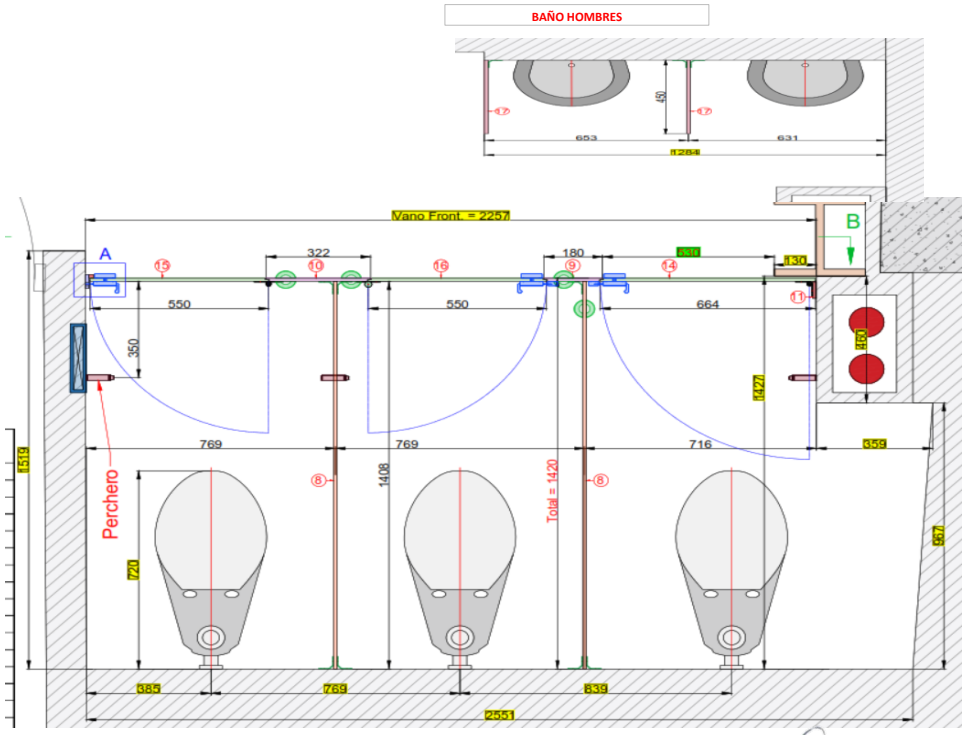

			BAÑO HOMBRES			
Division central 1		1,408	1,7	2,39	2	4,79
Pilastra central 1		0,322	1,8	0,58	1	0,58
Pilastra central 2		0,180	1,8	0,32	1	0,32
Puerta tipo 1		0,550	1,7	0,94	2	1,87
Puerta tipo 2		0,664	1,7	1,13	1	1,13
Division orinal		0,450	1,2	0,54	2	1,08
Anclaje puerta muro		0,06	1,7	0,10	2	0,20
					TOTAL ITEM	**23,19**
					CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES	**0,00**
					CANTIDAD CORTE ACTUAL	**23,19**


Elaboró: Saydee M. Bechouros L.	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Carrera 8 No. 12A-19	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**19,33**	**DESCRIPCION ITEM:**	Coraza Americana de 2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios necesarios)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**ML**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

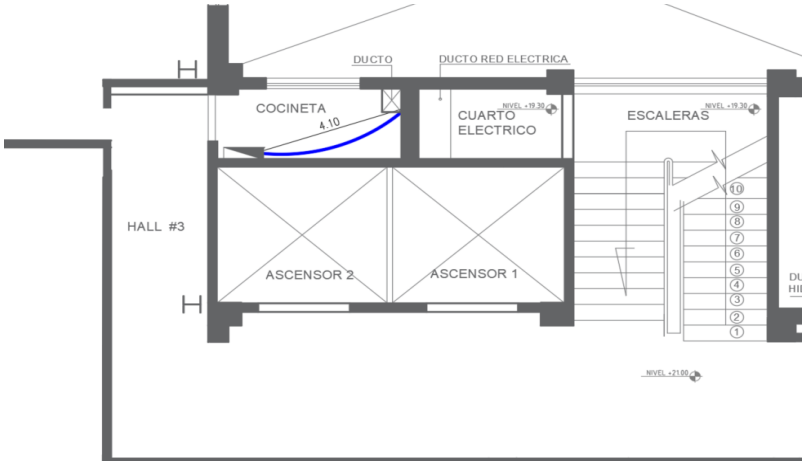


DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Cocineta a cuarto electrico		4,1				4,10

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA 1	Carrera 8 No. 12A-19	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**19,99**	**DESCRIPCION ITEM:**	Totalizador de 50 AMP (Suministro e instalación)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

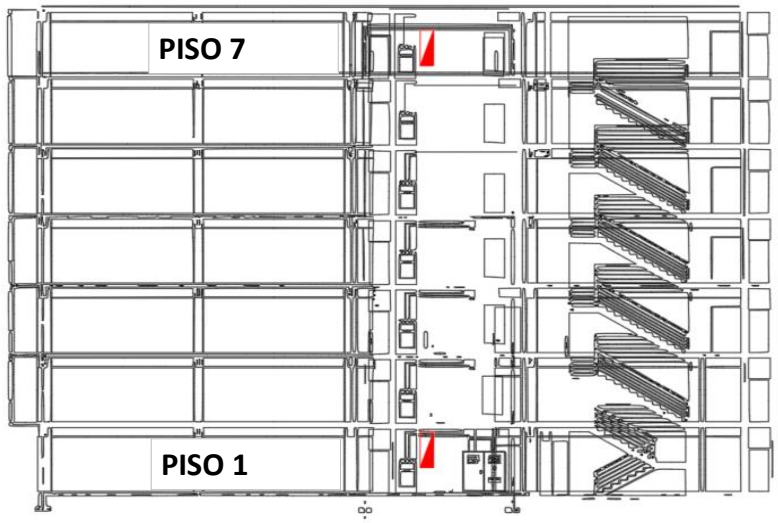

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Cocineta piso 7					1,00	1,00
Tablero general primer piso					1,00	1,00
TOTAL ITEM						**2,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**2,00**


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Carrera 8 No. 12A-19	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**NP-34**	**DESCRIPCION ITEM:**	Suministro e instalación de soporte tipo Pera para tubería de 2"			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

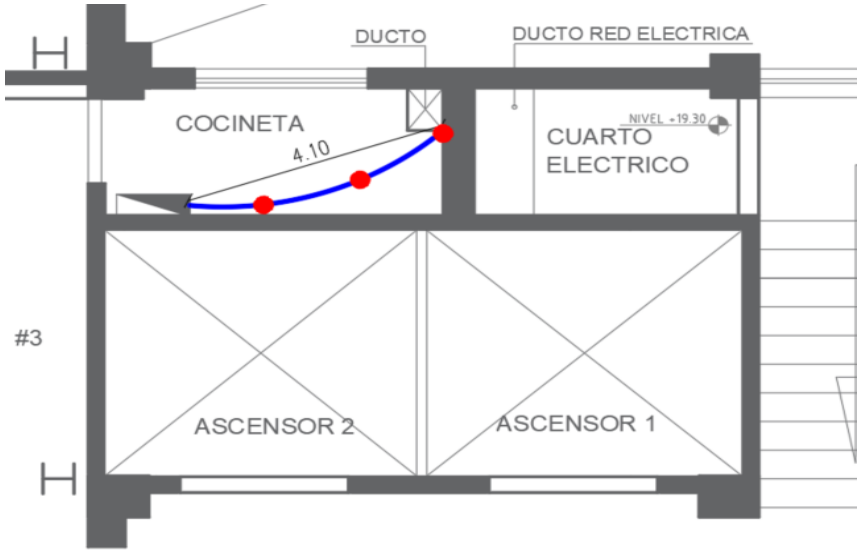


DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Cocineta a cuarto electrico					3,00	3,00

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA		Carrera 8 No. 12A-19	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**LP-04-2025**	**OBJETO:**	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**NP-72**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Mantenimiento de puerta madera alma en vidrio dimensiones 1.0 m x 2.4m incluye desmonte y reinstalación. Incluye lijado total, masilla, tintilla, sellado). No incluye cambio de piezas ni chapas ni bisagras, ni cambio de vidrio existente.**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA BAÑOS Y COCINA PISO 7

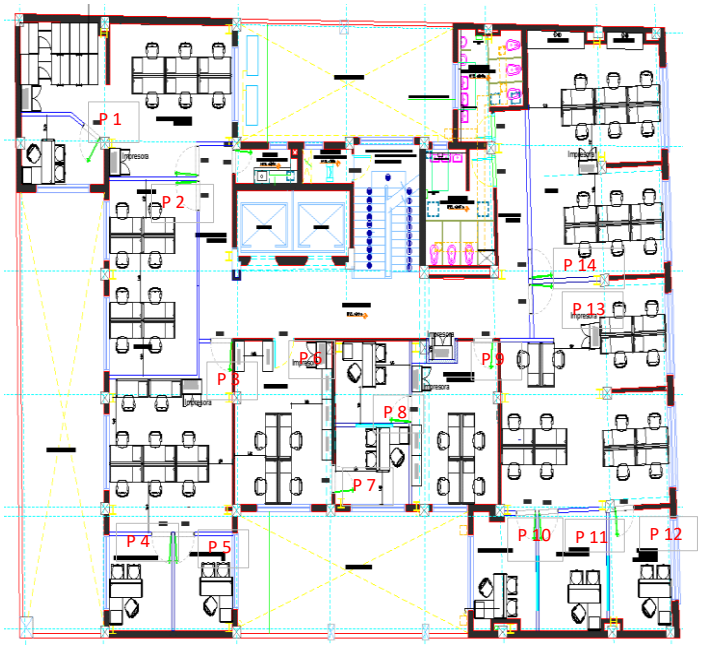

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
PISO 7						
PUERTA 1					1	1
PUERTA 2					1	1
PUERTA 3					1	1
PUERTA 4					1	1
PUERTA 5					1	1
PUERTA 6					1	1
PUERTA 7					1	1
PUERTA 8					1	1
PUERTA 9					1	1
PUERTA 10					1	1
PUERTA 11					1	1
PUERTA 12					1	1
PUERTA 13					1	1
PUERTA 14					1	1
TOTAL ITEM						**14,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**14,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE OBRA
CORTE No. 14

SEDE CALLE 18

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	SEDE_ALMACEN_CALLE_18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**5.60**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Poceta de aseo en mampostería, enchapada en ceramica. (Incluye fabricación, afinado, pañete y acabado enchape cerámica)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90



PLANTA GENERAL (PISO 1)

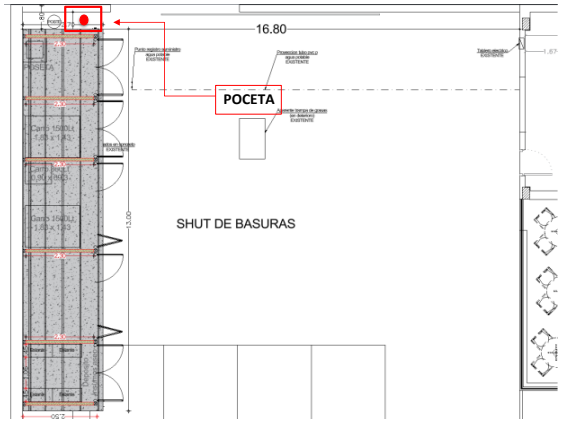

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE ALMACEN CALLE 18. SHUT DE BASURAS						
ZONA SHUT BASURAS					1,00	1,00

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	SEDE_ALMACEN_ CALLE_18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	10.6	DESCRIPCION ITEM:	Pintura muros vinilo tipo 1 a 3 manos ancho<0,50m. (Incluye equipos, filos y dilataciones)			UNIDAD DE MEDIDA:	ML


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90

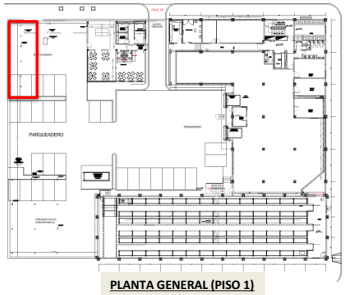

PLANTA GENERAL (PISO 1)

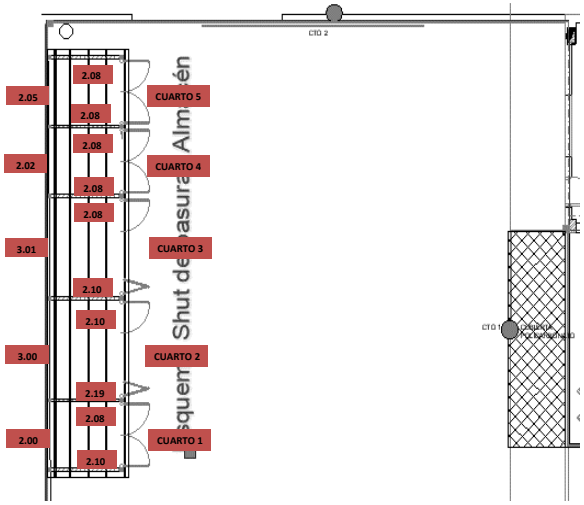

ZONA SHUT BASURAS (PISO 1)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
SEDE ALMACEN CALLE 18. SHUT DE BASURAS						
SHUT DE BASURAS						
CUARTO 1		2,10		2,10	1,00	2,10
		2,00		2,00	2,00	4,00
		2,08		2,08	1,00	2,08
CUARTO 2		2,09		2,09	1,00	2,09
		3,00		3,00	2,00	6,00
		2,10		2,10	1,00	2,10
CUARTO 3		2,10		2,10	1,00	2,10
		3,01		3,01	2,00	6,02
		2,08		2,08	1,00	2,08
CUARTO 4		2,08		2,08	1,00	2,08
		2,02		2,02	2,00	4,04
		2,08		2,08	1,00	2,08
CUARTO 5		2,08		2,08	1,00	2,08
		2,05		2,05	2,00	4,10
		2,08		2,08	1,00	2,08
TOTAL ITEM						45,02
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD CORTE ACTUAL						45,02

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma: Saydee M. Bechara L.	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	SEDE_ALMACEN_ CALLE_18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	10.8	DESCRIPCION ITEM:	Pintura exterior tipo Koraza, tres manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)			UNIDAD DE MEDIDA:	M2


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90

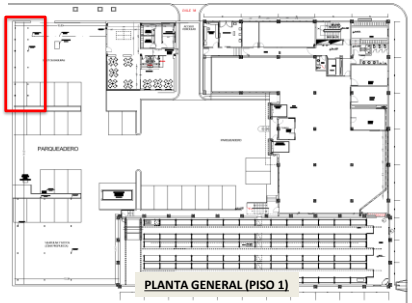

PLANTA GENERAL (PISO 1)

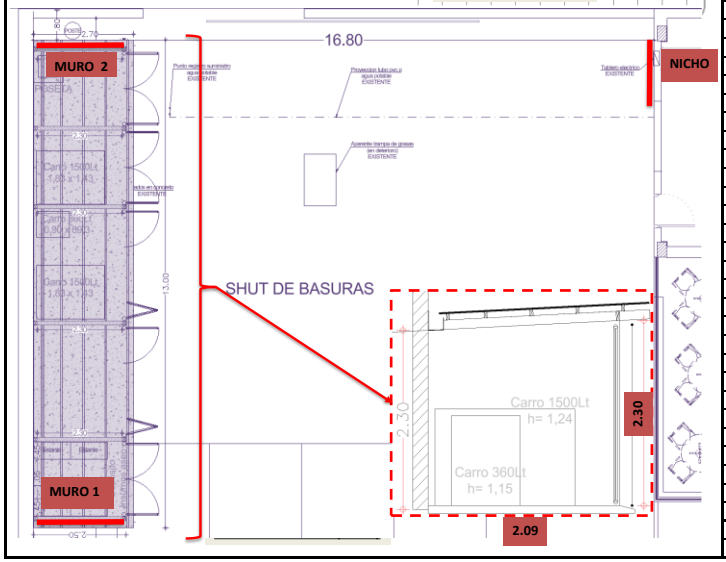

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
SEDE ALMACEN CALLE 18. SHUT DE BASURAS						
PISO 1						
SHUT DE BASURAS		2,09	2,30	4,81	2,00	9,61
NICHO TABLERO		1,50	3,00	4,50	1,00	4,50
TOTAL ITEM						14,11
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD CORTE ACTUAL						14,11

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	SEDE_ALMACEN_ CALLE_18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**10.11**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Pintura esmalte lámina lineal. (Suministro y aplicación)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**ML**


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90

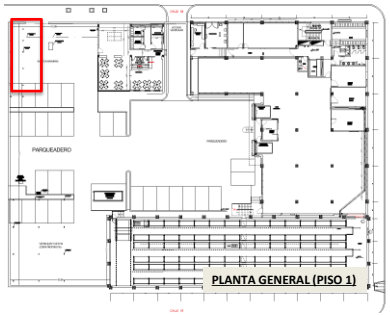

PLANTA GENERAL (PISO 1)

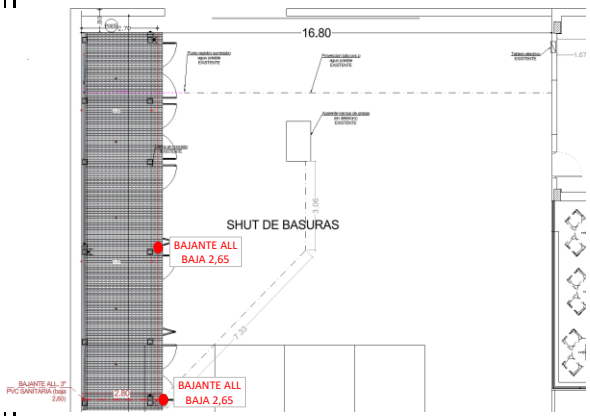

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE ALMACEN CALLE 18. SHUT DE BASURAS						
SHUT BASURAS		0,40		0,40	2,00	0,80
		2,25		2,25	2,00	4,50
TOTAL ITEM						**5,30**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**5,30**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma: Saydee M. Bechara L.	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA 1	SEDE_ALMACEN_ CALLE_18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	11.12	DESCRIPCION ITEM:	Piso en cerámica 60x60 cm o similar. (Suministro e instalación.)			UNIDAD DE MEDIDA:	M2


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90

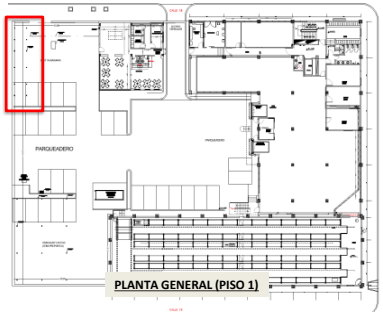

PLANTA GENERAL (PISO 1)

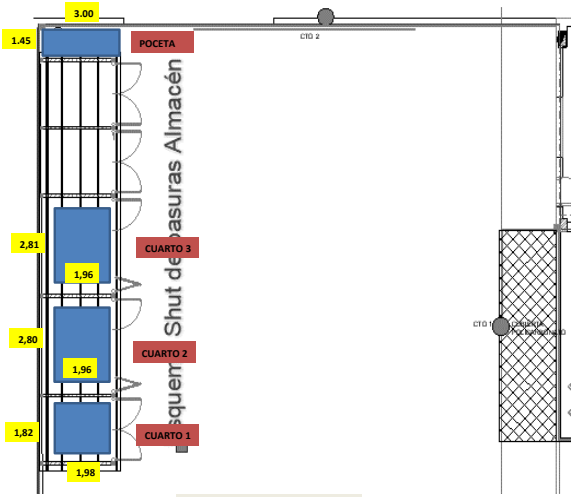

ZONA SHUT BASURAS (PISO 1)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE ALMACEN CALLE 18. SHUT DE BASURAS						
PISO 1						
CUARTO 1	1,82	1,98		3,60	1,00	3,60
CUARTO 2	2,80	1,96		5,49	1,00	5,49
CUARTO 3	2,81	1,96		5,51	1,00	5,51
COBRADO EN ACTAS ANTERIORES						14,60
POCETA	1,45	3,00		4,35	1,00	4,35
DESCUENTO POCETA	0,4	0,40		0,16	-1,00	-0,16
COBRADO EN ACTA PRESENTE						4,19
TOTAL ITEM						18,79
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						14,60
CANTIDAD CORTE ACTUAL						4,19

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	SEDE_ALMACEN_ CALLE_18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	11.14	DESCRIPCION ITEM:	Guardaescoba en Cerámica. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)			UNIDAD DE MEDIDA:	ML


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90

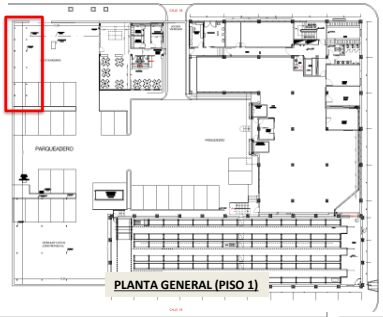

PLANTA GENERAL (PISO 1)

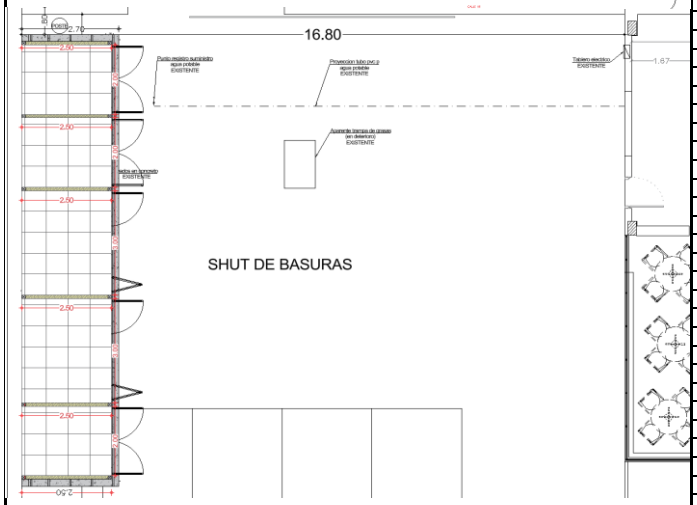

ZONA SHUT BASURAS (PISO 1)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
SEDE ALMACEN CALLE 18. SHUT DE BASURAS						
SHUT BASURAS		3,00		3,00	1,00	3,00
		1,40		1,40	1,00	1,40
		2,00		2,00	1,00	2,00
TOTAL ITEM						6,40
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD CORTE ACTUAL						6,40

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	SEDE_ALMACEN_ CALLE_18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	11.37	DESCRIPCION ITEM:	Media caña en mortero impermeabilizado 1:4. (Incluye impermeabilizante integral)			UNIDAD DE MEDIDA:	ML


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90



PLANTA GENERAL (PISO 1)

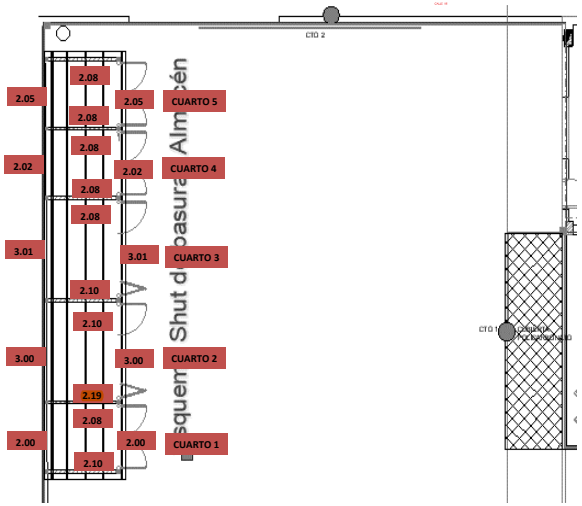

ZONA SHUT BASURAS (PISO 1)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
SEDE ALMACEN CALLE 18. SHUT DE BASURAS						
SHUT DE BASURAS						
CUARTO 1		2,10		2,10	1,00	2,10
		2,00		2,00	2,00	4,00
		2,08		2,08	1,00	2,08
CUARTO 2		2,09		2,09	1,00	2,09
		3,00		3,00	2,00	6,00
		2,10		2,10	1,00	2,10
CUARTO 3		2,10		2,10	1,00	2,10
		3,01		3,01	2,00	6,02
		2,08		2,08	1,00	2,08
CUARTO 4		2,08		2,08	1,00	2,08
		2,02		2,02	2,00	4,04
		2,08		2,08	1,00	2,08
		2,02		2,02	1,00	2,02
CUARTO 5		2,08		2,08	1,00	2,08
		2,05		2,05	2,00	4,10
		2,08		2,08	1,00	2,08
		2,05		2,05	1,00	2,05
TOTAL ITEM						**49,09**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**49,09**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma: Saydee M. Bechara L.	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	SEDE_ALMACEN_ CALLE_18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	12.20	DESCRIPCION ITEM:	Flanche en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 50 cm. (Suministro e instalación			UNIDAD DE MEDIDA:	ML


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90

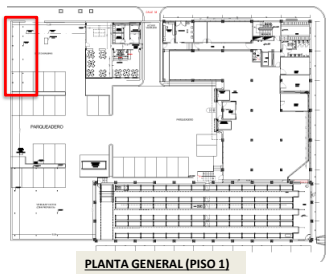

PLANTA GENERAL (PISO 1)

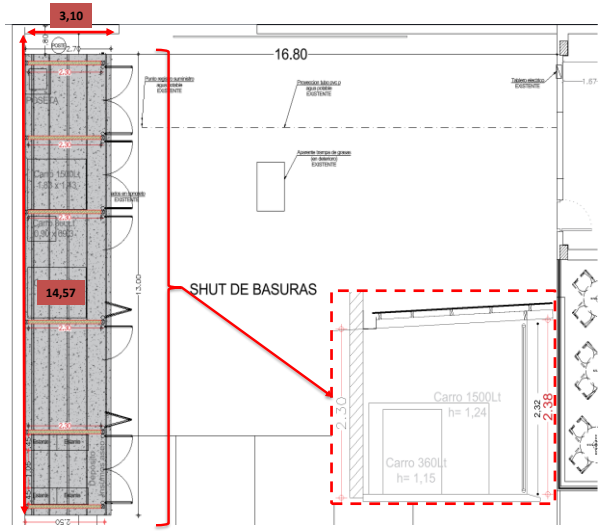

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE ALMACEN CALLE 18. SHUT DE BASURAS						
CUBIERTA		13,17		13,17	1,00	13,17
EXTENSION		1,40		1,40	2,00	2,80
FLANCHE LATERAL		3,10		3,10	3,00	9,30
TOTAL ITEM						25,27
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						17,62
CANTIDAD CORTE ACTUAL						7,65

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	SEDE_ALMACEN_CALLE_18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**15.4**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Cerradura tipo puerta principal. (Suministro e instalación)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90

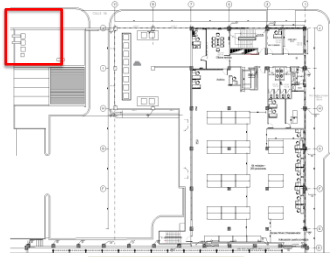

PLANTA GENERAL (PISO 1)

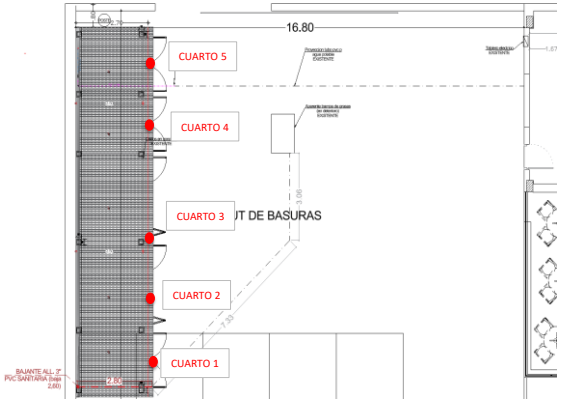

SHUT

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE ALMACEN CALLE 18. SHUT DE BASURAS						
PISO 1						
SHUT BASURAS					5,00	5,00
TOTAL ITEM						**5,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**5,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	SEDE_ALMACEN_ CALLE_18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**16.17**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Llave terminal de jardín, metálica 1/2"x3/4" para manguera. (Suministro e instalación)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90

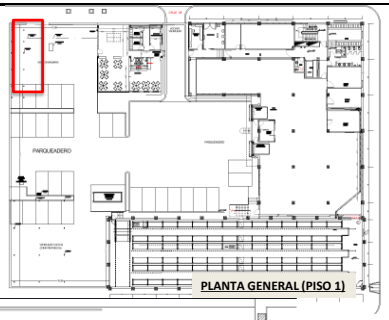

PLANTA GENERAL (PISO 1)

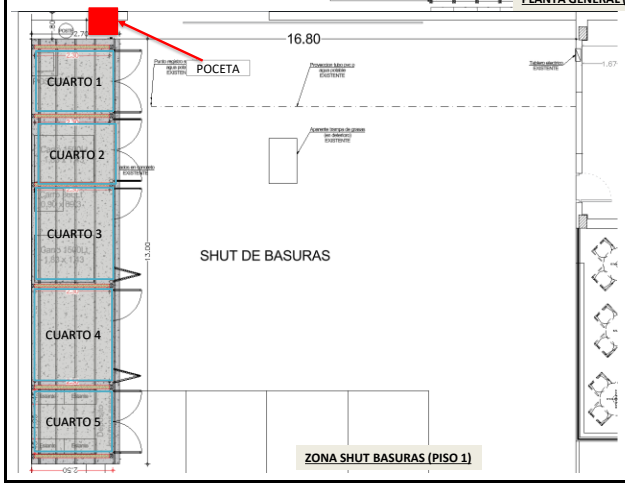

ZONA SHUT BASURAS (PISO 1)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE ALMACEN CALLE 18. SHUT DE BASURAS						
SHUT BASURAS						
LLAVE POSETA					1,00	1,00
TOTAL ITEM						**1,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**1,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma: Saydee M. Bechara L.	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	SEDE_ALMACEN_ CALLE_18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**16.18**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Tapa registro plástica 15x15 cm. (Suministro e instalación)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90

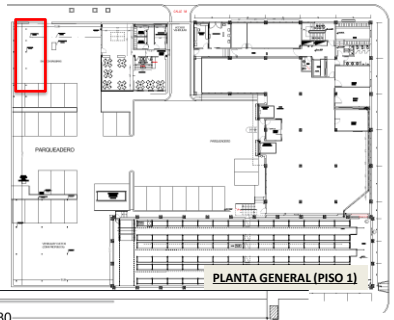

PLANTA GENERAL (PISO 1)

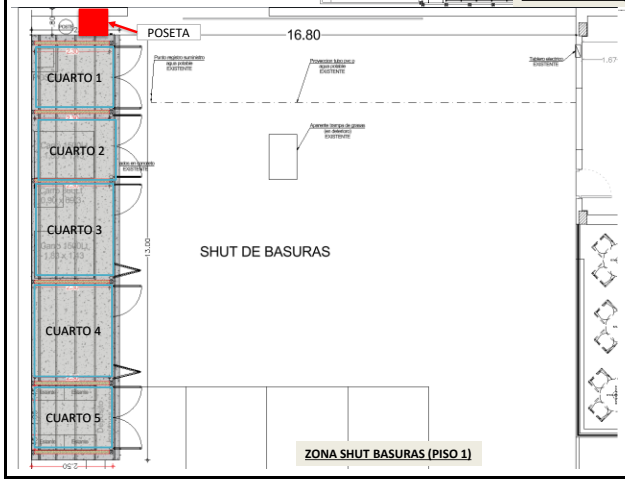

ZONA SHUT BASURAS (PISO 1)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE ALMACEN CALLE 18. SHUT DE BASURAS						
SHUT BASURAS						
REGISTRO POSETA					1,00	1,00
TOTAL ITEM						**1,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**1,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	SEDE_ALMACEN_ CALLE_18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**16.27**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Rejilla metálica con sosco 5x3". (Suministro e instalación)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90



PLANTA GENERAL (PISO 1)

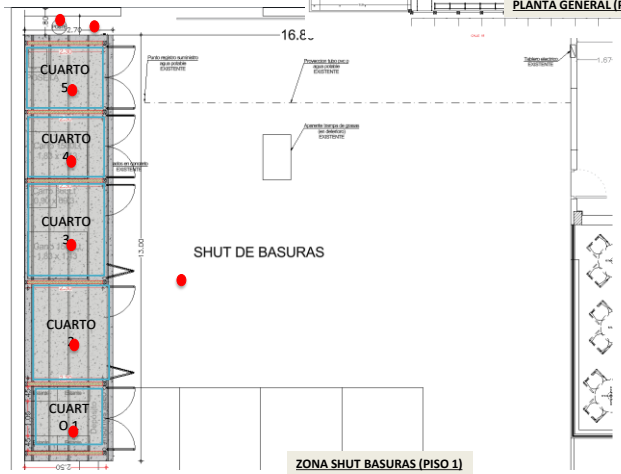

ZONA SHUT BASURAS (PISO 1)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE ALMACEN CALLE 18. SHUT DE BASURAS						
SHUT DE BASURA						
1º CUARTO DEL SHUT					1,00	1,00
2º CUARTO DEL SHUT					1,00	1,00
3º CUARTO DEL SHUT					1,00	1,00
4º CUARTO DEL SHUT						
5º CUARTO DEL SHUT						
POCETA					2,00	2,00
EXXTERIOR					1,00	1,00
TOTAL ITEM						**6,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**6,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma: Saydee M. Becharos L.	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	SEDE_ALMACEN_ CALLE_18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**17.44**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Registro metálico de 1/2". (Suministro e instalación)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90



PLANTA GENERAL (PISO 1)

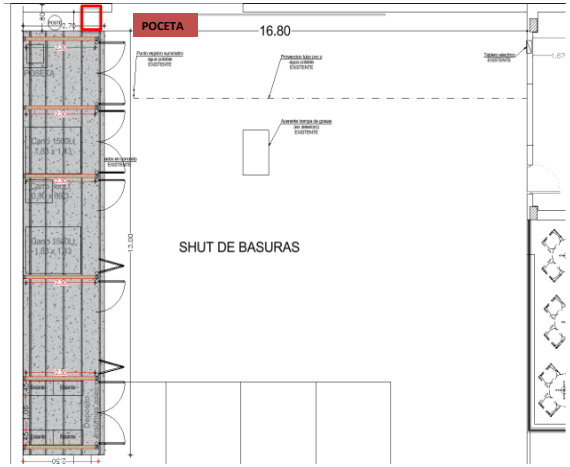

ZONA SHUT BASURAS (PISO 1)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
SEDE ALMACEN CALLE 18. SHUT DE BASURAS						
SHUT BASURAS						
LLAVE POSETA					1,00	1,00
TOTAL ITEM						**1,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**1,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	SEDE_ALMACEN_CALLE_18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**18.3**	**DESCRIPCION ITEM:**	Redes PVC Sanitaria 2". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**ML**


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90



PLANTA GENERAL (PISO 1)

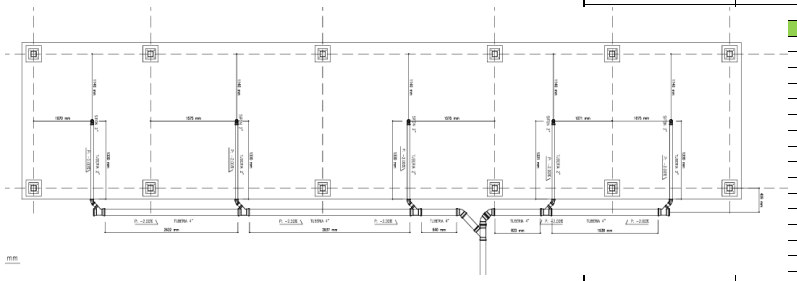

ZONA SHUT BASURAS (PISO 1)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES Ancho	DIMENSIONES Longitud	DIMENSIONES Altura	MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
SEDE ALMACEN CALLE 18. SHUT DE BASURAS						
SHUT DE BASURA						
1º CUARTO DEL SHUT		0,20		0,20	1,00	0,20
		1,33		1,33	1,00	1,33
2º CUARTO DEL SHUT		0,20		0,20	1,00	0,20
		1,33		1,33	1,00	1,33
3º CUARTO DEL SHUT		0,20		0,20	1,00	0,20
		1,33		1,33	1,00	1,33
4º CUARTO DEL SHUT		0,20		0,20	1,00	0,20
		1,33		1,33	1,00	1,33
5º CUARTO DEL SHUT		0,20		0,20	1,00	0,20
		1,33		1,33	2,00	2,66
COBRADO EN ACTAS ANTERIORES						**8,98**
POCETA		0,40		0,40	1,00	0,40
		1,50		1,50	2,00	3,00
						3,40
TOTAL ITEM						**12,38**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**8,98**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**3,40**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: ELIANA AMAYA A. RESIDENTE DE OBRA	Nombre: HOSMAN LECHUGA N. DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA 1	SEDE_ALMACEN_ CALLE_18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**18.5**	**DESCRIPCION ITEM:**	Redes PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**ML**


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90

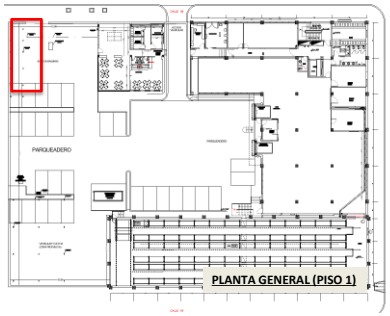

PLANTA GENERAL (PISO 1)

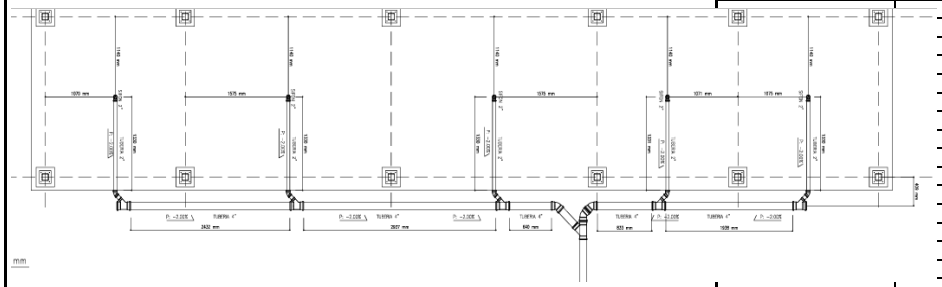

ZONA SHUT BASURAS (PISO 1)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES Ancho	DIMENSIONES Longitud	DIMENSIONES Altura	MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
SEDE ALMACEN CALLE 18. SHUT DE BASURAS						
SHUT DE BASURA						
1º CUARTO DEL SHUT		2,43		2,43	1,00	2,43
2º CUARTO DEL SHUT		2,94		2,94	1,00	2,94
		0,64		0,64	1,00	0,64
3º CUARTO DEL SHUT		0,83		0,83	1,00	0,83
4º CUARTO DEL SHUT		1,94		1,94	1,00	1,94
PARQUEO CARROS						
		6,81		6,81	1,00	
		7,25		7,25	1,00	
				0,00	1,00	
PARQUEO MOTOS		4,00		4,00	1,00	
		6,00		6,00	1,00	
SHUT		3,00		3,00	1,00	
		2,05		2,05	1,00	
		2,30		2,30	1,00	
		6,50		6,50	1,00	
TOTAL ITEM						**8,78**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**8,78**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	SEDE_ALMACEN_ CALLE_18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**18.13**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye anclajes)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**ML**


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90

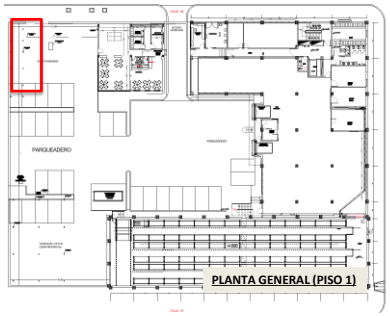

PLANTA GENERAL (PISO 1)

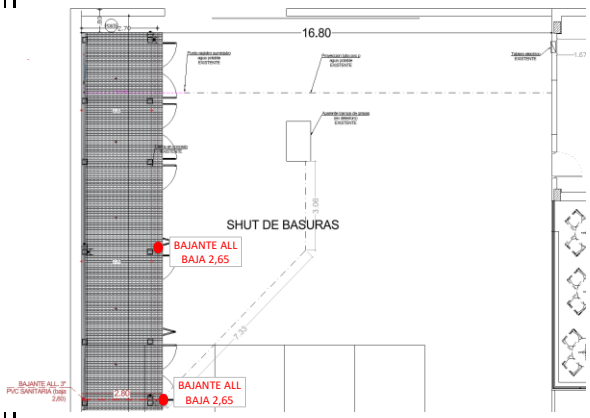

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE ALMACEN CALLE 18. SHUT DE BASURAS						
SHUT BASURAS		0,40		0,40	2,00	0,80
		2,25		2,25	2,00	4,50
TOTAL ITEM						**5,30**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**5,30**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma: Saydee M. Bechara L.	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	SEDE_ALMACEN_ CALLE_18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**18.14**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Sifón de piso PVC Sanitario 2"**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90

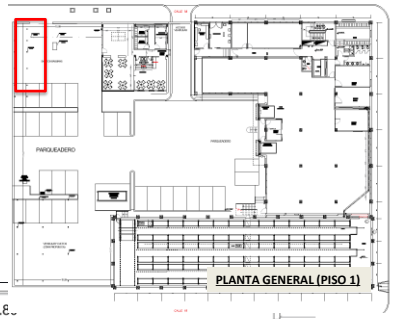

PLANTA GENERAL (PISO 1)

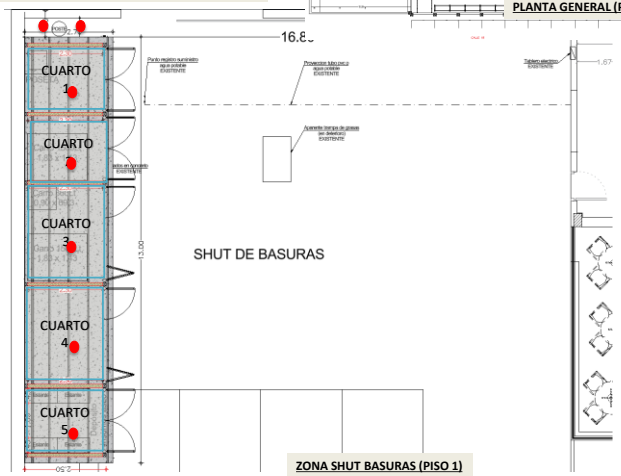

ZONA SHUT BASURAS (PISO 1)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE ALMACEN CALLE 18. SHUT DE BASURAS						
SHUT DE BASURA						
1º CUARTO DEL SHUT					1,00	1,00
2º CUARTO DEL SHUT					1,00	1,00
3º CUARTO DEL SHUT					1,00	1,00
4º CUARTO DEL SHUT					1,00	1,00
5º CUARTO DEL SHUT					1,00	1,00
COBRADO EN ACTAS ANTERIORES						**5,00**
POCETA					2,00	2,00
COBRADO PRESENTE ACTA						**2,00**
TOTAL ITEM						**7,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**5,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**2,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma: Saydee M. Bechara L.	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	SEDE_ALMACEN _CALLE_18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	19.42	DESCRIPCION ITEM:	Salidas interruptor con sensor de movimiento. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)			UNIDAD DE MEDIDA:	UN


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90



PLANTA GENERAL (PISO 1)

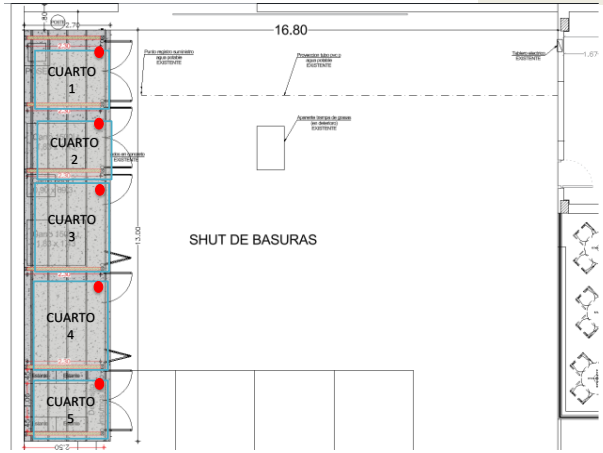

ZONA SHUT DE BASURAS (PISO 1)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE ALMACEN CALLE 18. SHUT DE BASURAS						
MPARTIEMIENTOS SHUT BASURAS						
1					1,00	1,00
2					1,00	1,00
3					1,00	1,00
4					1,00	1,00
5					1,00	1,00
LL						
TOTAL ITEM						5,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD CORTE ACTUAL						5,00


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma: Saydee M. Bechara L.	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA	HOJA		FRENTE_CALLE_18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia


A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**NP-19**	**DESCRIPCION ITEM:**	Suministro e instalación Estructura metálica tipo pérgola desmontable (pernada) con columnas, vigas y viguetas r, incluyendo pernos y platinas de conexión con fijación en soldadura, a una altura de hasta 3.5 m. Incluye lijado, anticorrosivo y pintura de todos los elementos.			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**kg**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

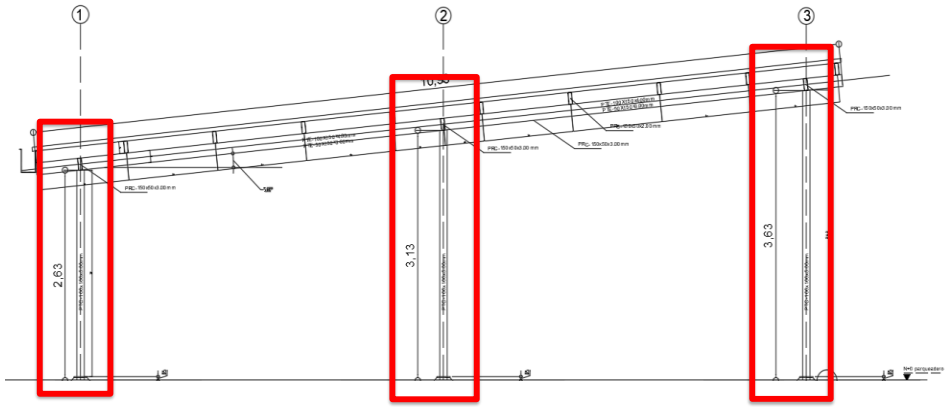

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (kg)	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Area			
PARQUEADERO CARROS						
EJE 1 100x100x4,5mm		2,57		35,05	4	
EJE 2 100x100x4,5mm		3,08		42,01	4	
EJE 3 100x100x4,5mm		3,57		48,69	4	
PARQUEADERO CARROS						
VIGA EJE A 50X150X3mm		11,05		101,86	1,00	

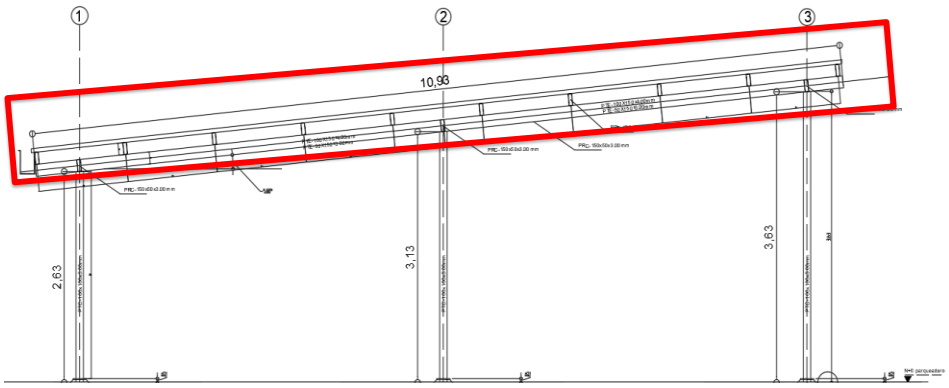

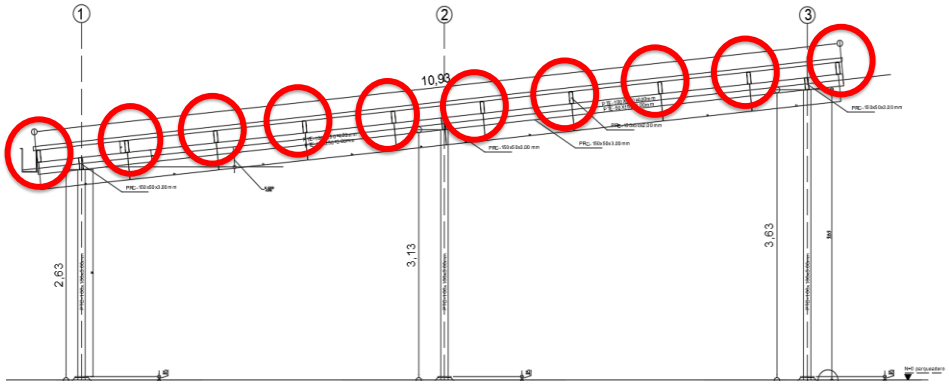



VIGA EJE B 100X150X4mm		11,05		138,68	1,00	
VIGA EJE C 100X150X4mm		11,05		138,68	1,00	
VIGA EJE D 50X150X3mm		11,05		101,86	1,00	
PARQUEADERO CARROS						
CORREAS 150X50X2mm		15,46		96,19	10,00	
PARQUEADERO CARROS						
Platinas Superiores de columnas 4.5mm	**0,26**	**0,26**	**0,0003042**	2,38797	12	
Platinas Inferiores de columnas 4.5mm	**0,2**	**0,2**	**0,000508**	3,9878	12	
Platinas de Pedestales 12.7mm	**0,2**	**0,2**	**0,000508**	3,9878	12	

FICHA TECNICA
TABLA PESOS PERNOS A-325


EUROPER


DESCRIPCION	MEDIDAS	PESO(grs.)
PER HEX A325T1 UNC TN	1/2-13 X 1.1/4	51,07
PER HEX A325T1 UNC TN	1/2-13 X 1.1/2	57,42
PER HEX A325T1 UNC TN	1/2-13 X 1.3/4	61,5
PER HEX A325T1 UNC TN	1/2-13 X 2	68,2
PER HEX A325T1 UNC TN	1/2-13 X 2.1/4	74,9
PER HEX A325T1 UNC TN	1/2-13 X 2.1/2	79
PER HEX A325T1 UNC TN	5/8-11 X 1.1/4	83,2
PER HEX A325T1 UNC TN	5/8-11 X 1.1/2	89,2
PER HEX A325T1 UNC TN	5/8-11 X 1.3/4	100,2
PER HEX A325T1 UNC TN	5/8-11 X 2	110,6
PER HEX A325T1 UNC TN	5/8-11 X 2.1/4	121
PER HEX A325T1 UNC TN	5/8-11 X 2.1/2	131,4
PER HEX A325T1 UNC TN	5/8-11 X 2.3/4	141,8
PER HEX A325T1 UNC TN	5/8-11 X 3	155,13

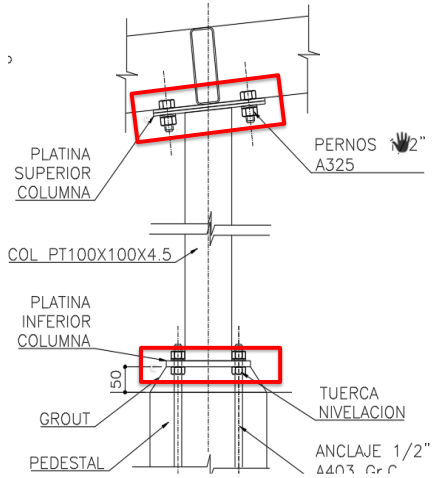





Tuercas de platina superior de columnas				0,0300	48	
tuercas de platina inferior de columna				0,0300	48	
Tornillo de platina superior de columnas				0,0511	48	
Platina de conexión entre vigas eje A 4MM	**0,26**	**0,14**	**0,0001456**	1,14296	2	
Platina de conexión entre vigas eje B 4MM	**0,26**	**0,14**	**0,0001456**	1,14296	2	
Platina de conexión entre vigas eje C 4MM	**0,26**	**0,14**	**0,0001456**	1,14296	2	
Platina de conexión entre vigas eje D 4MM	**0,26**	**0,14**	**0,0001456**	1,14296	2	
Platina de conexión entre correas 4MM	**0,26**	**0,14**	**0,0001456**	1,14296	40	
tuercas de platina inferior de columna				0,0300	384	
Tornillo de platina superior de columnas				0,1050	384	





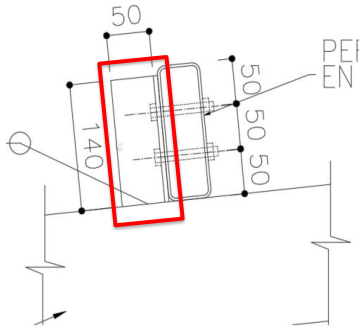

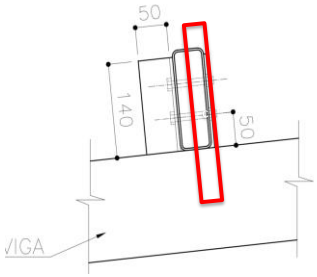


Platina de conexión entre columna y viga 4.5mm	**0,26**	**0,26**	**0,0003042**	2,38797	12	
Tapas de vigas Eje A 4.5mm	**0,15**	**0,05**	**0,00003375**	0,2649375	2	
Tapas de vigas Eje B 4.5mm	**0,15**	**0,1**	**0,0000675**	0,529875	2	
Tapas de vigas Eje C 4.5mm	**0,15**	**0,1**	**0,0000675**	0,529875	2	
Tapas de vigas Eje A 4.5mm	**0,15**	**0,05**	**0,00003375**	0,2649375	2	
Tapas de correas 4.5mm	**0,15**	**0,05**	**0,00003375**	0,2649375	20	
portacorreas de 15x5 en L de e= 4.76mm	**0,14**	**0,05**	**0,00006664**	0,523124	40	
portacorreas Posterior de 15x5 e= 4.76mm	**0,14**	**0,05**	**0,00003332**	0,261562	20	

ESTRUCTURAL RECTANGULAR


TUBERÍA RECTANGULAR	DIMENSIÓN EXTERIOR										
ESPESOR	80 X 40MM	100 X 40MM	100 X 50MM	120 X 60MM	150 X 50MM	150 X 100MM	200 X 70MM	200 X 100MM	250 X 100MM	300 X 100MM	300 X 150MM
1,50MM	16,87KG	19,69KG	21,12KG	24,72KG	-	-	-	-	-	-	-
2,00MM	22,26KG	26,03KG	27,88KG	33,48KG	37,33KG	-	-	-	-	-	-
2,50MM	27,54KG	32,25KG	34,60KG	41,67KG	46,38KG	-	-	69,76KG	-	-	-
3,00MM	32,70KG	38,35KG	41,10KG	49,66KG	55,31KG	70,14KG	75,78KG	84,30KG	98.40KG	-	-
4,00MM	-	-	51,54KG	66,51KG	75,30KG	92,64KG	100,14KG	111,48KG	-	-	-
4,50MM	-	-	-	-	78,48KG	99,72KG	111,53KG	124,26KG	-	-	-
6,00MM	-	-	-	-	101,88KG	139,40KG	147,48KG	164,46KG	-	-	-
7,00MM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256,66KG	289,72KG
8,00MM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292,08KG	328,62KG
10,00MM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423,09KG


ESTRUCTURAL CUADRADO

TUBERÍA CUADRADO	DIMENSIÓN EXTERIOR										
ESPESOR	40 X 40MM	50 X 50MM	60 X 60MM	70 X 70MM	90 X 90MM	100 X 100MM	120 X 120MM	135 X 135MM	150 X 150MM	200 X 200MM	250 X 250MM
1,50mm	11,21kg	13,98kg	-	19,69kg	-	27,54kg	-	-	-	-	-
2,00mm	14,72kg	18,42kg	22,20kg	25,92kg	33,48kg	37,20kg	-	-	-	-	-
2,50mm	18,12kg	22,80kg	27,48kg	32,16kg	41,58kg	46,38kg	55,63kg	-	-	-	-
3,00mm	-	27,05kg	32,64kg	38,28kg	49,70kg	55,20kg	66,54kg	73,91kg	83,52kg	-	-
4,00mm	-	-	-	47,82kg	62,88kg	74,13kg	88,11kg	100,14kg	111,48kg	148,44kg	-
4,50mm	-	-	-	-	-	81,84kg	-	-	126,26kg	166,62kg	-
6,00mm	-	-	-	-	-	107,90kg	124,50kg	147,48kg	166,31kg	221,92kg	-
7,00mm	-	-	-	-	-	124,79kg	-	-	-	256,84kg	322,50kg
8,00mm	-	-	-	-	-	-	-	-	216,73kg	292,50kg	-

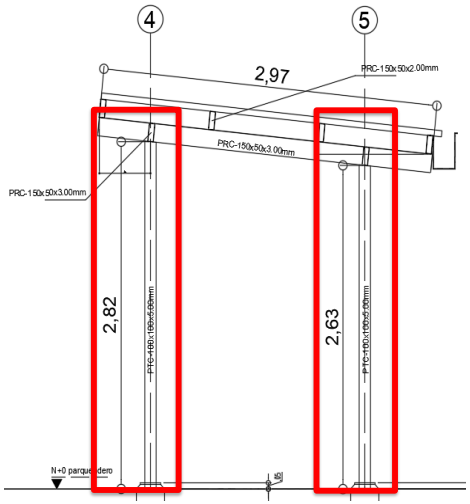



PARQUEADERO MOTOS						
EJE 4 100x100x4,5mm		2,77		37,78	3	
EJE 5 100x100x4,5mm		2,57		35,05	3	

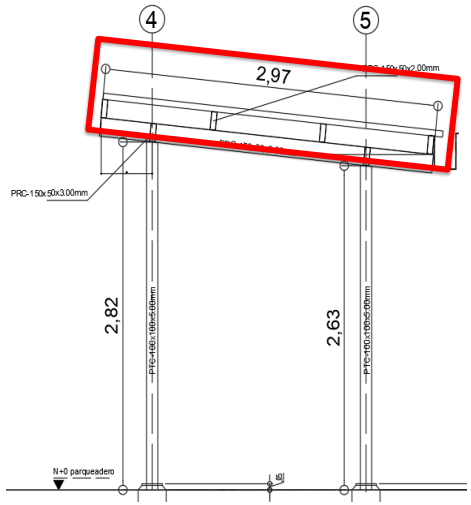

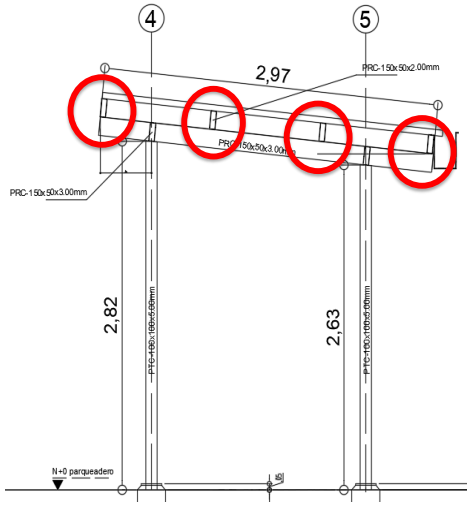



PARQUEADERO MOTOS						
EJE C 100X150X4mm		3		27,66	1	
EJE B 100X150X4mm		3		27,66	1	
EJE C 100X150X4mm		3		27,66	1	
PARQUEADERO MOTOS						
150X50X2mm		10,37		64,52	1	
150X50X2mm		10,37		64,52	1	
150X50X2mm		10,37		64,52	1	

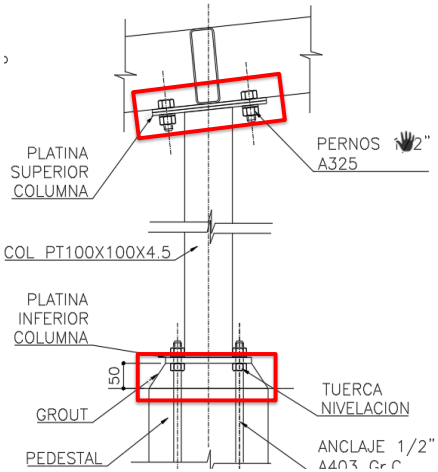





150X50X2mm		10,37		64,52	1	
PARQUEADERO MOTOS						
Platinas Superiores de columnas 4.5mm	**0,26**	**0,26**	**0,0003042**	2,38797	6	
Platinas Inferiores de columnas 4.5mm	**0,2**	**0,2**	**0,000508**	3,9878	6	
Platinas de Pedestales 12.7mm	**0,2**	**0,2**	**0,000508**	3,9878	3	
Tuercas de platina superior de columnas				0,0300	24	
tuercas de platina inferior de columna				0,0300	24	
Tornillo de platina superior de columnas				0,0511	24	
Platina de conexión entre correas 4MM	**0,26**	**0,14**	**0,0001456**	1,14296	4	
tuercas de platina inferior de columna				0,0300	32	
Tornillo de platina superior de columnas				0,1050	32	









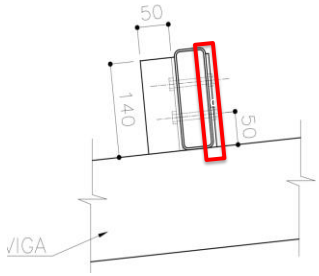


Platina de conexión entre columna y viga 4.5mm	**0,26**	**0,26**	**0,0003042**	2,38797	6	
Tapas de vigas Eje A 4.5mm	**0,15**	**0,1**	**0,0000675**	0,529875	6	
Tapas de correas 4.5mm	**0,15**	**0,05**	**0,00003375**	0,2649375	8	
portacorreas de 15x5 en L de e= 4.76mm	**0,14**	**0,05**	**0,00006664**	0,523124	12	
portacorreas Posterior de 15x5 e= 4.76mm	**0,14**	**0,05**	**0,00003332**	0,261562	8	

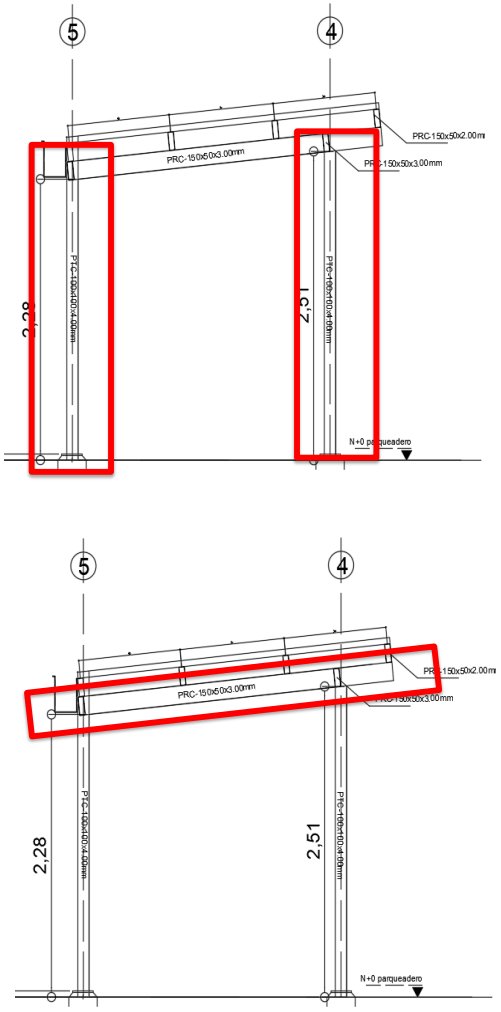


SHUT BASURAS						
EJE 4 100X100X4.5mm		2,66		36,28	6	**217,69**
EJE 5 100X100X4.5mm		2,44		33,28	6	**199,69**
SHUT BASURAS						
EJE H 150X50X3mm		2,7		24,89	1,00	**24,89**
EJE I 150X50X3mm		2,7		24,89	1,00	**24,89**
EJE J 150X50X3mm		2,7		24,89	1,00	**24,89**
EJE K 150X50X3mm		2,7		24,89	1,00	**24,89**
EJE L 150X50X3mm		2,7		24,89	1,00	**24,89**
EJE M 150X50X3mm		2,7		24,89	1,00	**24,89**

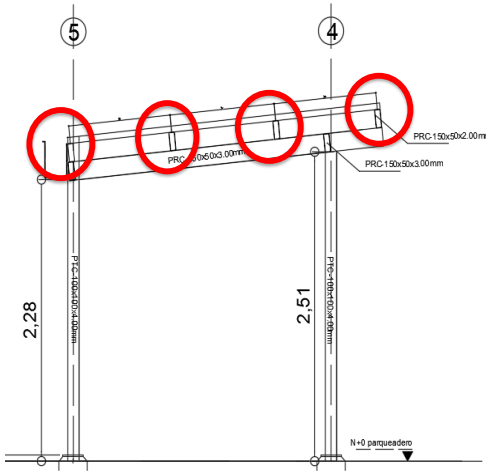


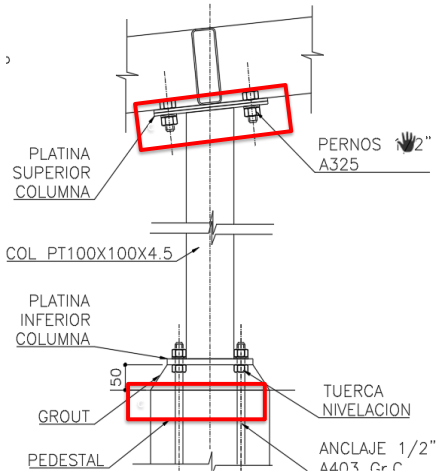

SHUT BASURAS						
150X50X2mm		**12,86**		80,01	1	**80,01**
150X50X2mm		**12,86**		80,01	1	**80,01**
150X50X2mm		**12,86**		80,01	1	**80,01**
150X50X2mm		**12,86**		80,01	1	**80,01**
SHUT BASURAS						
Platinas Superiores de columnas 4.5mm	**0,26**	**0,26**	**0,0003042**	2,38797	12	**28,66**
Platinas Inferiores de columnas 4.5mm	**0,2**	**0,2**	**0,000508**	3,9878	12	**47,85**
Platinas de Pedestales 12.7mm	**0,2**	**0,2**	**0,000508**	3,9878	12	**47,85**
Tuercas de platina superior de columnas				0,0300	48	**1,44**
tuercas de platina inferior de columna				0,0300	48	**1,44**
Tornillo de platina superior de columnas				0,0511	48	**2,45**

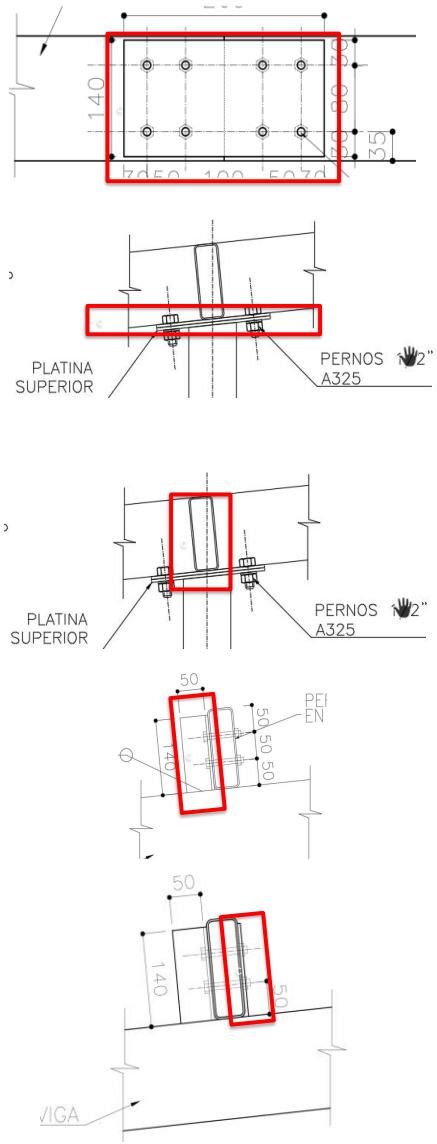

PARQUEADERO CARROS	0,18	0,18		3,23	12	
PARQUEADERO MOTOS	0,18	0,18		3,23	6	
SHUT BASURAS	0,18	0,18		3,23	12	**38,76**
Platina de conexión entre correas 4MM	**0,26**	**0,14**	**0,0001456**	1,14296	16	**18,29**
tuercas de platina inferior de columna				0,0300	128	**3,84**
Tornillo de platina superior de columnas				0,1050	128	**13,44**
Platina de conexión entre columna y viga 4.5mm	**0,26**	**0,26**	**0,0003042**	2,38797	12	**28,66**
Tapas de vigas Eje A 4.5mm	**0,15**	**0,1**	**0,0000675**	0,529875	12	**6,36**
Tapas de correas 4.5mm	**0,15**	**0,05**	**0,00003375**	0,2649375	8	**2,12**
portacorreas de 15x5 en L de e= 4.76mm	**0,14**	**0,05**	**0,00006664**	0,523124	16	**8,37**

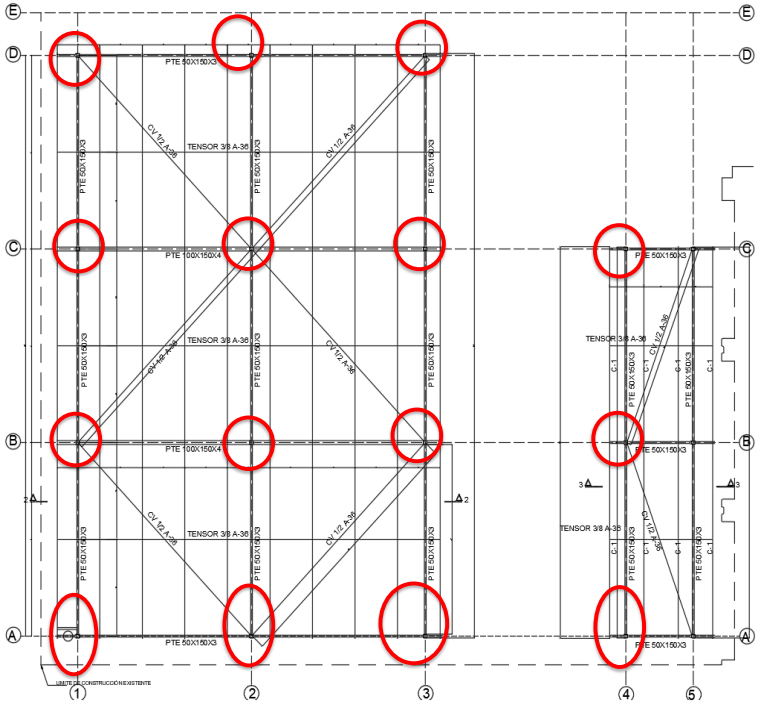

portacorreas Posterior de 15x5 e= 4.76mm	**0,14**	**0,05**	**0,00003332**	0,261562	8	**2,09**
TENSORES PARQUEADERO CARROS		**11,60**	**11,486475**		3	**34,46**
varilla de anclajes de platinas 50cm largo de 1/2		**0,50**	**0,495**		72	**35,64**
Soldadura general de la estructura 7% del peso total						**84,59**

AMPLIACION						
150X50X2mm		**1,55**		9,64	4	**38,57**
TOTAL ITEM						**1.331,65**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**1.293,08**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**38,57**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: Ferney Peña DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA 1	SEDE_ALMACEN _CALLE_18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia


A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	NP-26	DESCRIPCION ITEM:	Ajustes a los diseños de redes Hidrosanitaras. Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.			UNIDAD DE MEDIDA:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90

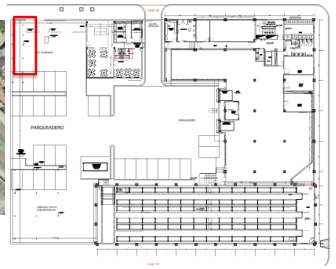

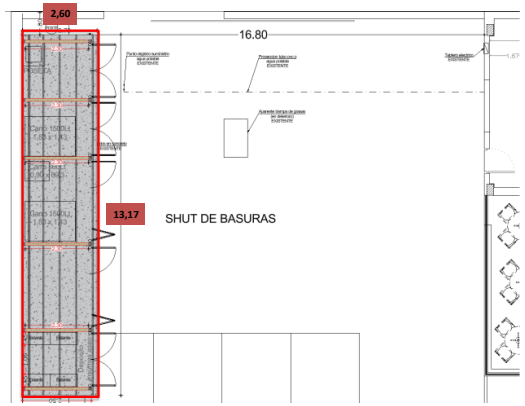

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Peso			
SEDE ALMACEN CALLE 18. SHUT DE BASURAS						
SHUT BASURAS	2,6	13,17		34,24	1,00	34,24
TOTAL ITEM						34,24
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD CORTE ACTUAL						34,24

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA	1

SEDE_ALMACEN _CALLE_18

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**NP-41**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 4000k, 100- 240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios).**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90



PLANTA GENERAL (PISO 1)



Esquema Shut de basuras Almacén

ZONA SHUT DE BASURAS (PISO 1)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE ALMACEN CALLE 18. SHUT DE BASURAS						
SHUT BASURAS						
COMPARTIMEINTO SHUT				**1,00**	5,00	5,00
TOTAL ITEM						**5,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**5,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA: 1

SEDE_ALMACEN _CALLE_18

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	NP-55	DESCRIPCION ITEM:	Ajuste a los diseños Estructurales, para la adecuación de elementos existentes . Incluye planos y memorias de diseño.			UNIDAD DE MEDIDA:	M2


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90



PLANTA GENERAL (PISO 1)

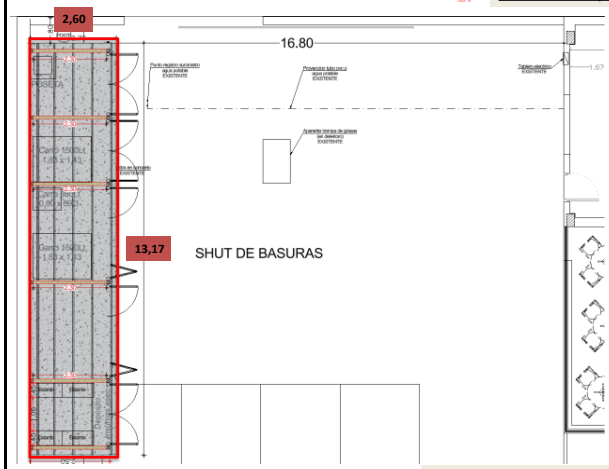

ZONA SHUT DE BASURAS (PISO 1)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE ALMACEN CALLE 18. SHUT DE BASURAS						
SHUT BASURAS						
PLACA	2,60	13,17		**34,24**	1,00	34,24
TOTAL ITEM						**34,24**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**34,24**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma: Saydee M. Bechara L.	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA 1	SEDE_ALMACEN _CALLE_18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia


A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	NP-69	DESCRIPCION ITEM:	Sensor de movimiento 15 minutos de duración sobre muro o techo según sea la necesidad. (Incluye suministro e instalación)			UNIDAD DE MEDIDA:	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90

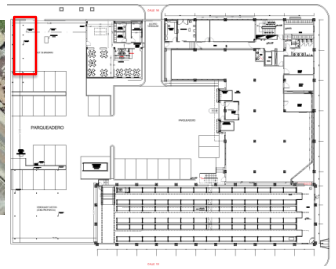

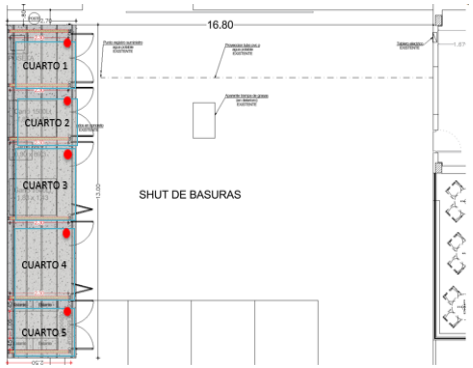

ZONA SHUT DE BASURAS (PISO 1)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Peso			
SEDE ALMACEN CALLE 18. (SHUT-BASURAS)						
SHUT					5,00	5,00
TOTAL ITEM						5,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD CORTE ACTUAL						5,00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	FRENTE CALLE 18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	1.16	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)			UNIDAD DE MEDIDA:	UN


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90

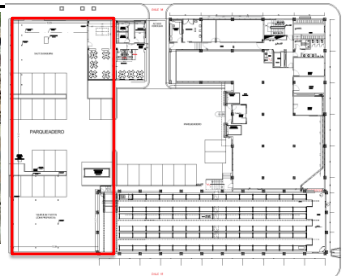

SEDE CALLE 18, PISO 2

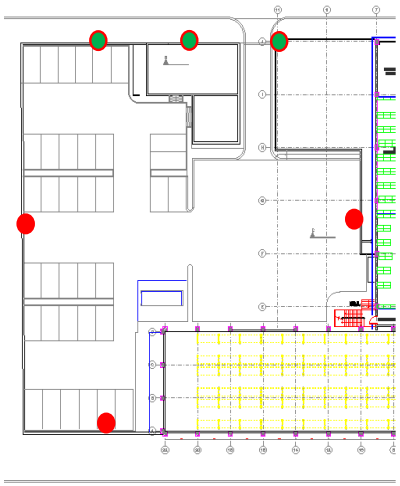

PISO 1

PERIMETRAL (PISO 1)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
SEDE ALMACEN CALLE 18. PARQUEADERO						
EXTERIOR-SOBRE CARRERA					3,00	3,00
INTERIOR					3,00	3,00
TOTAL ITEM						6,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						4,00
CANTIDAD CORTE ACTUAL						2,00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA	1

FRENTE CALLE 18


Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**1.19**	**DESCRIPCION ITEM:**	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**M**


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



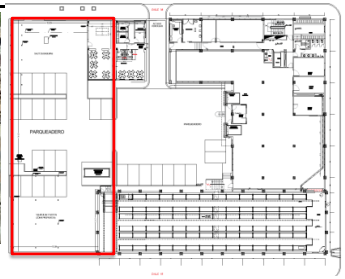

UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90

SEDE CALLE 18, PISO 2

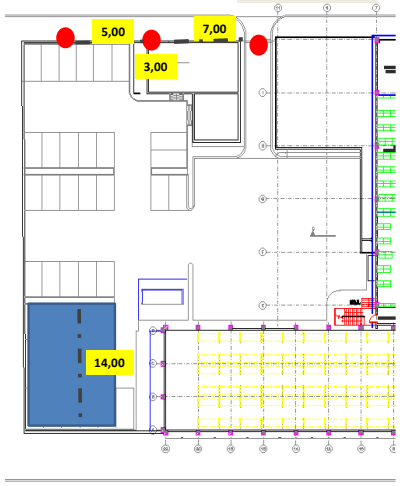

PISO 1

PERIMETRAL (PISO 1)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE ALMACEN CALLE 18. PARQUEADERO						
EXTERIOR			3,00	3,00	1,00	3,00
INTERIOR		5,00		5,00	1,00	5,00
		7,00		7,00	1,00	7,00
REQUERIMIENTO PARQUEADERO		14,00		14,00	1,00	14,00
TOTAL ITEM						**29,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**15,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**14,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA	1

FRENTE CALLE 18

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**1.21**	**DESCRIPCION ITEM:**	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90

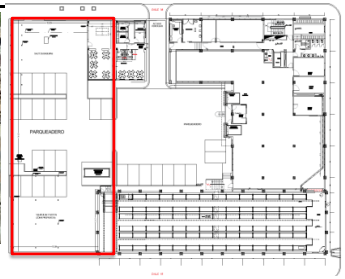

SEDE CALLE 18, PISO 2

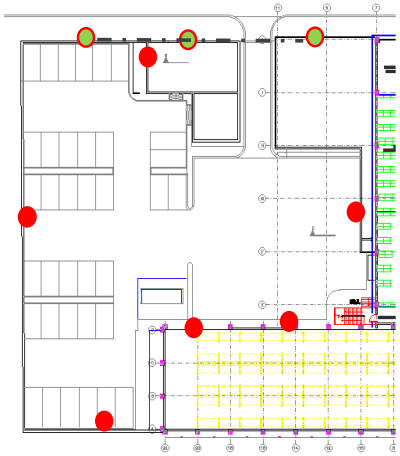

PISO 1

PERIMETRAL (PISO 1)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
SEDE ALMACEN CALLE 18. PARQUEADERO						
EXTERIOR					3,00	3,00
INTERIOR					3,00	3,00
					3,00	3,00
REQUERMIENTO PARQUEADEROS					7,00	7,00
INSTLACION SENSOR						
TOTAL ITEM						**16,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**9,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**7,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma: Saydee M. Bechara L.	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	FRENTE CALLE 18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**3.2**	**DESCRIPCION ITEM:**	Placa contrapiso en concreto h=12 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida, polietileno. No incluye refuerzo)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**M2**


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90

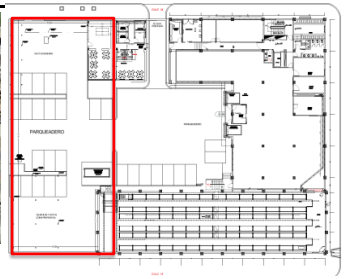

SEDE CALLE 18, PISO 2

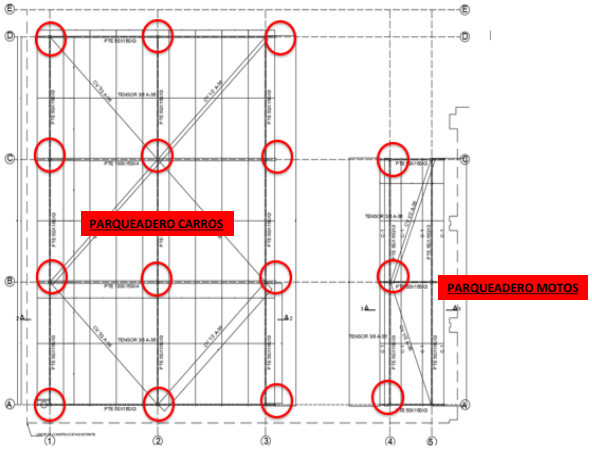

PERIMETRAL (PISO 1)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE ALMACEN CALLE 18. PARQUEADERO						
BASE DE DADOS PARQUEADEROS						
MOTOS	0,85	0,85		0,72	3,00	2,17
CARROS	0,85	0,85		0,73	12,00	8,71
TOTAL ITEM						**10,88**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**10,88**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma: Saydee M. Bechara L.	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA	**1**


FRENTE CALLE 18

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**8.11**	**DESCRIPCION ITEM:**	Regata con pulidora en piso. (Incluye equipos)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

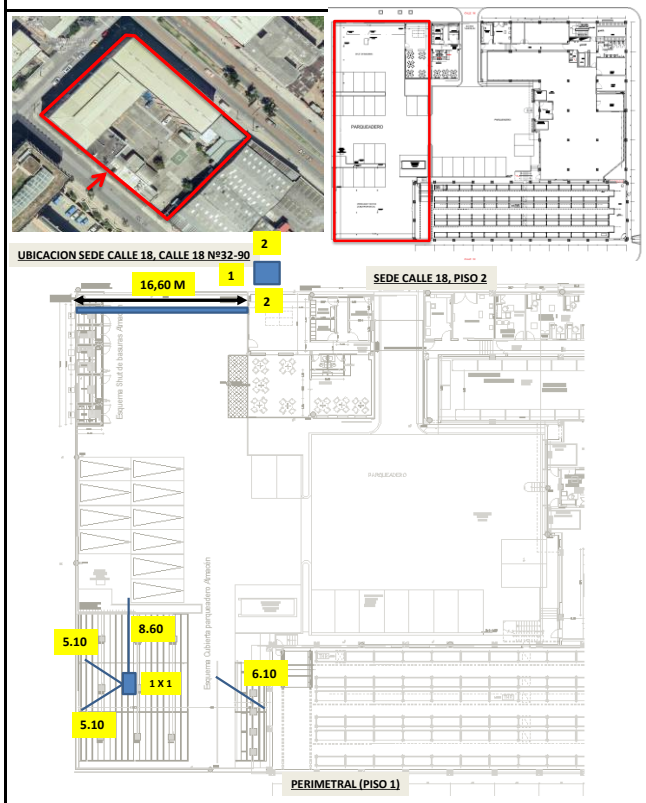

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE ALMACEN CALLE 18. PARQUEADERO						
ELECTRICA		16,60		16,60	1,00	16,60
PARQUEADERO CARROS		5,10		5,10	1,00	5,10
		5,10		5,10	1,00	5,10
		8,60		8,60	1,00	8,60
CAJA		1,00		1,00	4,00	4,00
PARQUEADERO MOTOS		6,10		6,10	1,00	6,10
EXTERIOR		1,00		1,00	1,00	1,00
		2,00		2,00	2,00	4,00
TOTAL ITEM						**50,50**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**16,60**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**33,90**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	SEDE_ALMACEN_ CALLE_18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**10.11**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Pintura esmalte lámina lineal. (Suministro y aplicación)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**ML**


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90

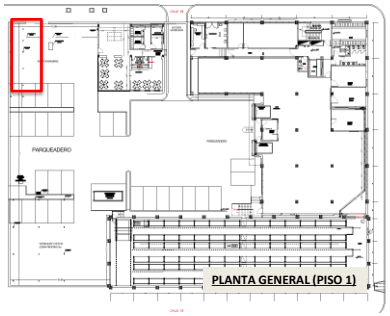

PLANTA GENERAL (PISO 1)

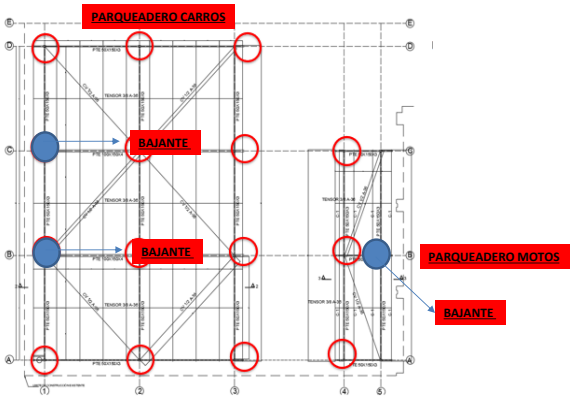

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE ALMACEN CALLE 18. SHUT DE BASURAS						
PARQUEADERO						
VEHICU LO			0,50	0,50	2,00	1,00
			2,17	2,17	2,00	4,34
MOTOS			0,50	0,50	1,00	0,50
			2,17	2,17	1,00	2,17
TOTAL ITEM						**8,01**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**8,01**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA 1	SEDE_ALMACEN_CALLE_18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	12.20	DESCRIPCION ITEM:	Flanche en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 50 cm. (Suministro e instalación)			UNIDAD DE MEDIDA:	M


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90

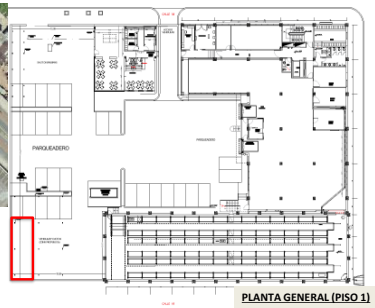

PLANTA GENERAL (PISO 1)

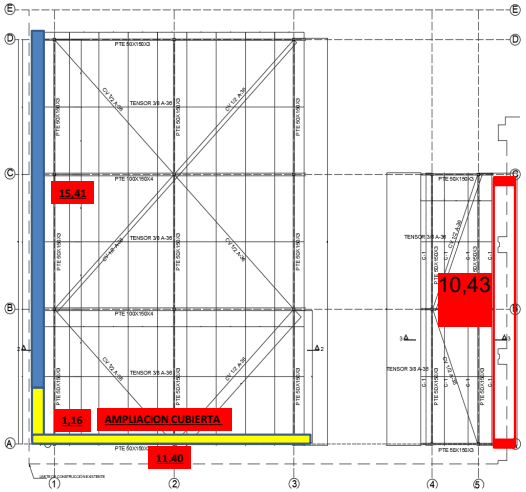

ACCESO VEHICULAR (PARQUEADERO)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES Ancho	DIMENSIONES Longitud	DIMENSIONES Altura	MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
SEDE ALMACEN CALLE 18. PARQUEADERO						
PARQUEADERO						
VEHICULO		16,57		16,57	1,00	16,57
VEHICULO		11,40		11,4	1,00	11,40
MOTOS		10,43		10,43	1,00	10,43
TOTAL ITEM						**38,40**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**26,20**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**12,20**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	SEDE_ALMACEN_ CALLE_18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**18.13**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye anclajes)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**M**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90



PLANTA GENERAL (PISO 1)

PLANTA GENERAL (PISO 1)

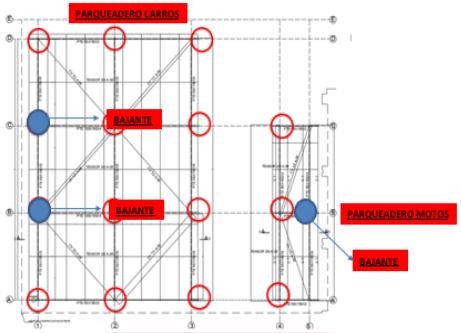

ACCESO VEHICULAR (PARQUEADERO)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE ALMACEN CALLE 18. PARQUEADERO						
PARQUEADERO						
VEHICU LO			0,50	0,50	2,00	1,00
			2,17	2,17	2,00	4,34
MOTOS			0,50	0,50	1,00	0,50
			2,17	2,17	1,00	2,17
TOTAL ITEM						**8,01**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**8,01**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma: Saydee M. Bechara L.	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90 | SHUT DE BASURAS (PISO 1) | PLANTA GENERAL (PISO 1)

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA	1

SEDE_ALMACEN_CALLE_18

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	19.42	DESCRIPCION ITEM:	Salidas interruptor con sensor de movimiento. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)			UNIDAD DE MEDIDA:	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90

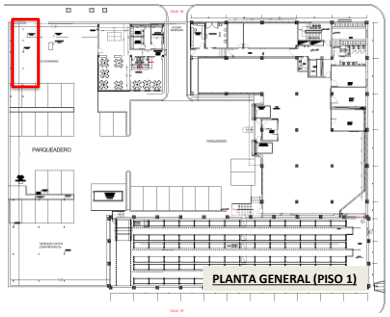

PLANTA GENERAL (PISO 1)



OFICINA CENTRAL DE ARCHIVOS (PISO 2)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
SEDE ALMACEN CALLE 18. PARQUEADERO						
PARQ. MOTOS					2,00	2,00
PARQ. CARROS					6,00	6,00

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	E_ALMACEN_CALL	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	NP05	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos (1#12F + 1#12N + 1#12T)			UNIDAD DE MEDIDA:	M


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90

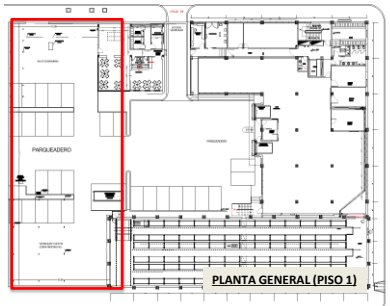

PLANTA GENERAL (PISO 1)

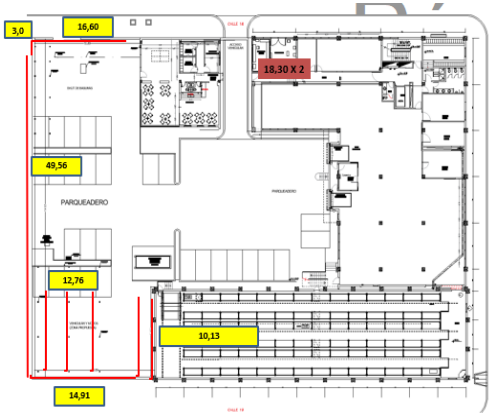

PARQUEADER0 (PISO 1)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES Ancho	DIMENSIONES Longitud	DIMENSIONES Altura	MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
SEDE ALMACEN CALLE 18. PARQUEADERO						
ZONAS A INTERVENIR						
PARQUEADERO						
		16,60		16,60	2,00	33,20
VERTICAL		3,00		3,00	2,00	6,00
		49,56		49,56	2,00	99,12
		14,91		14,91	2,00	29,81
		10,13		10,13	2,00	20,26
		12,76		12,76	3,00	38,28
REQUERMIEINTO PARQUEADERO		14,00		14,00	3,00	42,00
DESCUENTO DE SALIDAS		3,00		3,00	-6,00	-18,00
		3,00		3,00	-2,00	-6,00
TOTAL ITEM						244,67
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						221,65
CANTIDAD CORTE ACTUAL						23,02

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	SEDE_ALMACEN _CALLE_18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	NP-14	DESCRIPCION ITEM:	Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios manuales hasta 50 cm de profundidad (incluye trasiego y disposicion final)			UNIDAD DE MEDIDA:	M3


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90



PLANTA GENERAL (PISO 1)

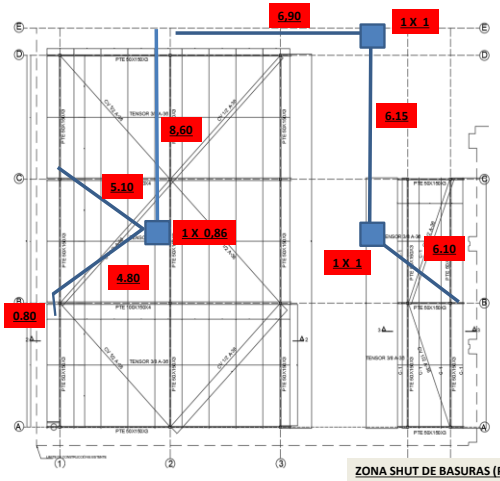

ZONA SHUT DE BASURAS (PISO 1)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE ALMACEN CALLE 18. PARQUEADERO						
PARQUEADERO CARROS						
	0,40	0,80	0,25	**0,08**	1,00	0,08
	0,25	4,80	0,25	**0,30**	1,00	0,30
CAJA	1	0,86	0,30	**0,26**	1,00	0,26
	0,25	5,10	0,25	**0,32**	1,00	0,32
	0,35	8,60	0,38	**1,14**	1,00	1,14
PARQUEADERO MOTOS	0,2	6,10	0,30	**0,37**	1,00	0,37
CAJA	1	1,00	0,30	**0,30**	1,00	0,30
	0,4	6,15	0,30	**0,738**	1,00	0,74
CAJA	1	1,00	0,30	**0,3**	1,00	0,30
	0,4	6,90	0,46	**1,2696**	1,00	1,27
TOTAL ITEM						**5,07**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,38**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**4,69**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA 1	SEDE_ALMACEN _CALLE_18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	NP-16	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de acero figurado de refuerzo, 60.000 PSI para concreto armado. Incluye alambre de atar y separadores			UNIDAD DE MEDIDA:	KG


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90

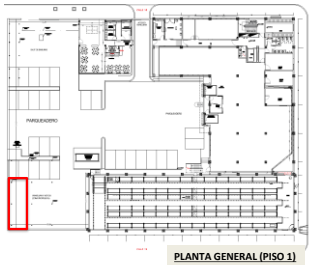

PLANTA GENERAL (PISO 1)

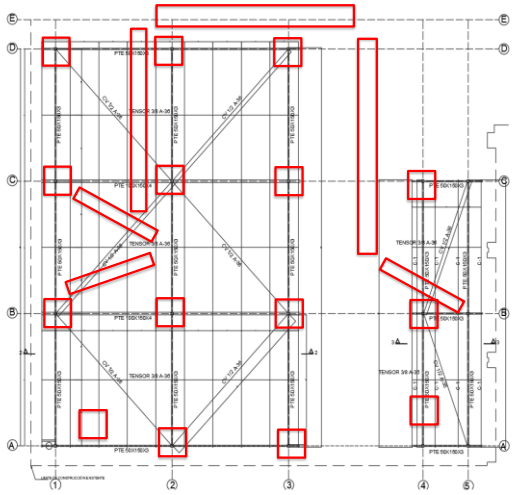

PARQUEADERO

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Peso			
SEDE ALMACEN CALLE 18. PARQUEADERO						
MALLA ELECTROSOLDADA						
MALLA COMPLETA	6	2,35	2,04	**28,80**	1,00	28,80
MEDIA MALLA	3	2,35	2,04	**14,40**	1,00	14,40
TOTAL ITEM						**43,20**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**43,20**


Elaboró: Ma. Alejandra Velandia	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA	HOJA		FRENTE_CALLE_18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia


A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**NP-19**	**DESCRIPCION ITEM:**	Suministro e instalación Estructura metálica tipo pérgola desmontable (pernada) con columnas, vigas y viguetas r, incluyendo pernos y platinas de conexión con fijación en soldadura, a una altura de hasta 3.5 m. Incluye lijado, anticorrosivo y pintura de todos los elementos.			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**kg**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

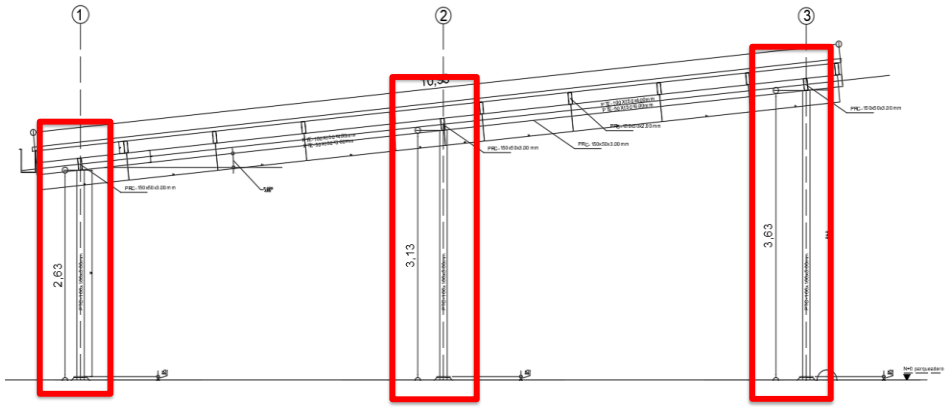

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (kg)	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Area			
PARQUEADERO CARROS						
EJE 1 100x100x4,5mm		2,57		35,05	4	**140,22**
EJE 2 100x100x4,5mm		3,08		42,01	4	**168,04**
EJE 3 100x100x4,5mm		3,57		48,69	4	**194,78**
PARQUEADERO CARROS						
VIGA EJE A 50X150X3mm		11,05		101,86	1,00	**101,86**

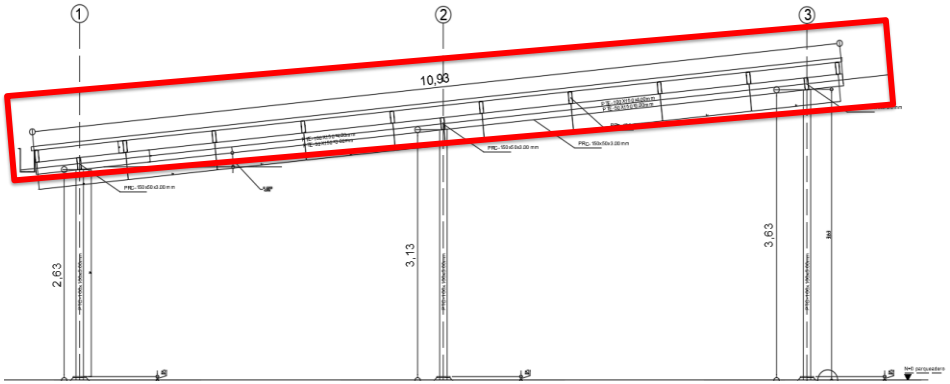

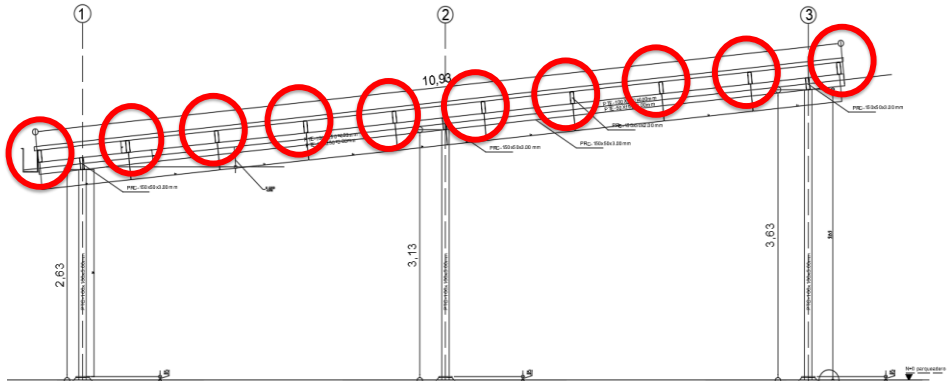



VIGA EJE B 100X150X4mm		11,05		138,68	1,00	**138,68**
VIGA EJE C 100X150X4mm		11,05		138,68	1,00	**138,68**
VIGA EJE D 50X150X3mm		11,05		101,86	1,00	**101,86**
PARQUEADERO CARROS						
CORREAS 150X50X2mm		15,46		96,19	10,00	**961,87**
PARQUEADERO CARROS						
Platinas Superiores de columnas 4.5mm	**0,26**	**0,26**	**0,0003042**	2,38797	12	**28,66**
Platinas Inferiores de columnas 4.5mm	**0,2**	**0,2**	**0,000508**	3,9878	12	**47,85**
Platinas de Pedestales 12.7mm	**0,2**	**0,2**	**0,000508**	3,9878	12	**47,85**

FICHA TECNICA
TABLA PESOS PERNOS A-325


EUROPER


DESCRIPCION	MEDIDAS	PESO(grs.)
PER HEX A325T1 UNC TN	1/2-13 X 1.1/4	51,07
PER HEX A325T1 UNC TN	1/2-13 X 1.1/2	57,42
PER HEX A325T1 UNC TN	1/2-13 X 1.3/4	61,5
PER HEX A325T1 UNC TN	1/2-13 X 2	68,2
PER HEX A325T1 UNC TN	1/2-13 X 2.1/4	74,9
PER HEX A325T1 UNC TN	1/2-13 X 2.1/2	79
PER HEX A325T1 UNC TN	5/8-11 X 1.1/4	83,2
PER HEX A325T1 UNC TN	5/8-11 X 1.1/2	89,2
PER HEX A325T1 UNC TN	5/8-11 X 1.3/4	100,2
PER HEX A325T1 UNC TN	5/8-11 X 2	110,6
PER HEX A325T1 UNC TN	5/8-11 X 2.1/4	121
PER HEX A325T1 UNC TN	5/8-11 X 2.1/2	131,4
PER HEX A325T1 UNC TN	5/8-11 X 2.3/4	141,8
PER HEX A325T1 UNC TN	5/8-11 X 3	155,13

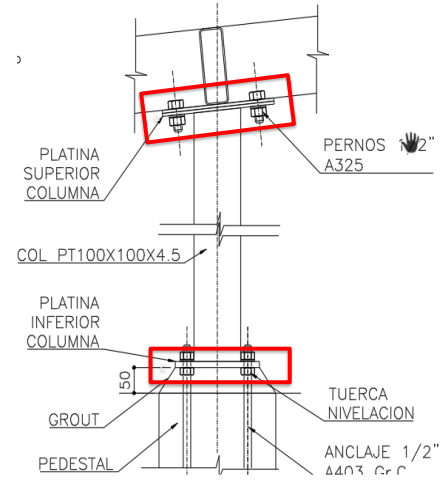





Tuercas de platina superior de columnas				0,0300	48	**1,44**
tuercas de platina inferior de columna				0,0300	48	**1,44**
Tornillo de platina superior de columnas				0,0511	48	**2,45**
Platina de conexión entre vigas eje A 4MM	**0,26**	**0,14**	**0,0001456**	1,14296	2	**2,29**
Platina de conexión entre vigas eje B 4MM	**0,26**	**0,14**	**0,0001456**	1,14296	2	**2,29**
Platina de conexión entre vigas eje C 4MM	**0,26**	**0,14**	**0,0001456**	1,14296	2	**2,29**
Platina de conexión entre vigas eje D 4MM	**0,26**	**0,14**	**0,0001456**	1,14296	2	**2,29**
Platina de conexión entre correas 4MM	**0,26**	**0,14**	**0,0001456**	1,14296	40	**45,72**
tuercas de platina inferior de columna				0,0300	384	**11,52**
Tornillo de platina superior de columnas				0,1050	384	**40,32**





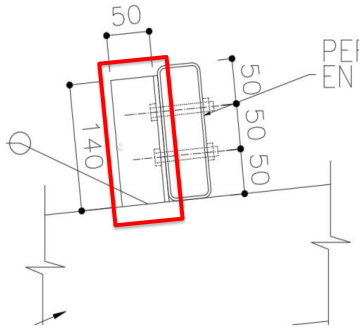

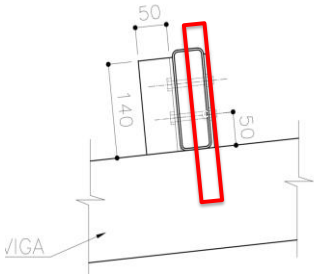


Platina de conexión entre columna y viga 4.5mm	**0,26**	**0,26**	**0,0003042**	2,38797	12	**28,66**
Tapas de vigas Eje A 4.5mm	**0,15**	**0,05**	**0,00003375**	0,2649375	2	**0,53**
Tapas de vigas Eje B 4.5mm	**0,15**	**0,1**	**0,0000675**	0,529875	2	**1,06**
Tapas de vigas Eje C 4.5mm	**0,15**	**0,1**	**0,0000675**	0,529875	2	**1,06**
Tapas de vigas Eje A 4.5mm	**0,15**	**0,05**	**0,00003375**	0,2649375	2	**0,53**
Tapas de correas 4.5mm	**0,15**	**0,05**	**0,00003375**	0,2649375	20	**5,30**
portacorreas de 15x5 en L de e= 4.76mm	**0,14**	**0,05**	**0,00006664**	0,523124	40	**20,92**
portacorreas Posterior de 15x5 e= 4.76mm	**0,14**	**0,05**	**0,00003332**	0,261562	20	**5,23**

ESTRUCTURAL RECTANGULAR


TUBERÍA RECTANGULAR	DIMENSIÓN EXTERIOR										
ESPESOR	80 X 40MM	100 X 40MM	100 X 50MM	120 X 60MM	150 X 50MM	150 X 100MM	200 X 70MM	200 X 100MM	250 X 100MM	300 X 100MM	300 X 150MM
1,50MM	16,87KG	19,69KG	21,12KG	24,72KG	-	-	-	-	-	-	-
2,00MM	22,26KG	26,03KG	27,88KG	33,48KG	37,33KG	-	-	-	-	-	-
2,50MM	27,54KG	32,25KG	34,60KG	41,67KG	46,38KG	-	-	69,76KG	-	-	-
3,00MM	32,70KG	38,35KG	41,10KG	49,66KG	55,31KG	70,14KG	75,78KG	84,30KG	98,40KG	-	-
4,00MM	-	-	51,54KG	66,51KG	75,30KG	92,64KG	100,14KG	111,48KG	-	-	-
4,50MM	-	-	-	-	78,48KG	99,72KG	111,53KG	124,26KG	-	-	-
6,00MM	-	-	-	-	101,88KG	139,40KG	147,48KG	164,46KG	-	-	-
7,00MM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256,66KG	289,72KG
8,00MM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292,08KG	328,62KG
10,00MM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423,09KG


ESTRUCTURAL CUADRADO

TUBERÍA CUADRADO	DIMENSIÓN EXTERIOR										
ESPESOR	40 X 40MM	50 X 50MM	60 X 60MM	70 X 70MM	90 X 90MM	100 X 100MM	120 X 120MM	135 X 135MM	150 X 150MM	200 X 200MM	250 X 250MM
1,50mm	11,21kg	13,98kg	-	19,69kg	-	27,54kg	-	-	-	-	-
2,00mm	14,72kg	18,42kg	22,20kg	25,92kg	33,48kg	37,20kg	-	-	-	-	-
2,50mm	18,12kg	22,80kg	27,48kg	32,16kg	41,58kg	46,38kg	55,63kg	-	-	-	-
3,00mm	-	27,05kg	32,64kg	38,28kg	49,70kg	55,20kg	66,54kg	73,91kg	83,52kg	-	-
4,00mm	-	-	-	47,82kg	62,88kg	74,13kg	88,11kg	100,14kg	111,48kg	148,44kg	-
4,50mm	-	-	-	-	-	81,84kg	-	-	126,26kg	166,62kg	-
6,00mm	-	-	-	-	-	107,90kg	124,50kg	147,48kg	166,31kg	221,92kg	-
7,00mm	-	-	-	-	-	124,79kg	-	-	-	256,84kg	322,50kg
8,00mm	-	-	-	-	-	-	-	-	216,73kg	292,50kg	-

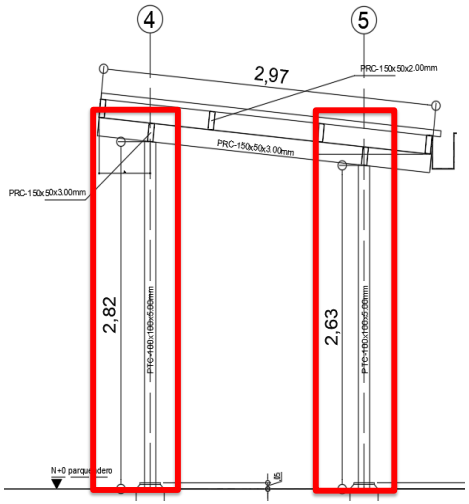



PARQUEADERO MOTOS						
EJE 4 100x100x4,5mm		2,77		37,78	3	**113,35**
EJE 5 100x100x4,5mm		2,57		35,05	3	**105,16**

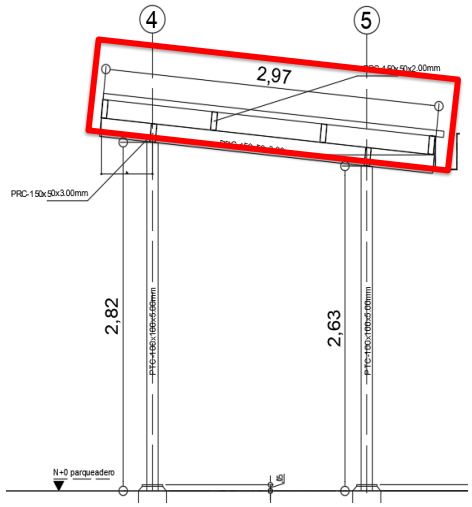

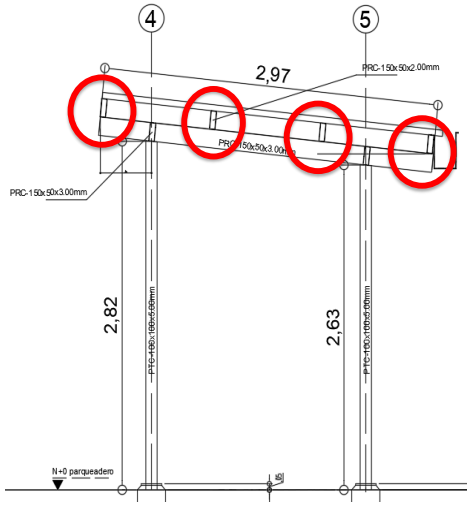



PARQUEADERO MOTOS						
EJE C 100X150X4mm		3		27,66	1	**27,66**
EJE B 100X150X4mm		3		27,66	1	**27,66**
EJE C 100X150X4mm		3		27,66	1	**27,66**
PARQUEADERO MOTOS						
150X50X2mm		10,37		64,52	1	**64,52**
150X50X2mm		10,37		64,52	1	**64,52**
150X50X2mm		10,37		64,52	1	**64,52**

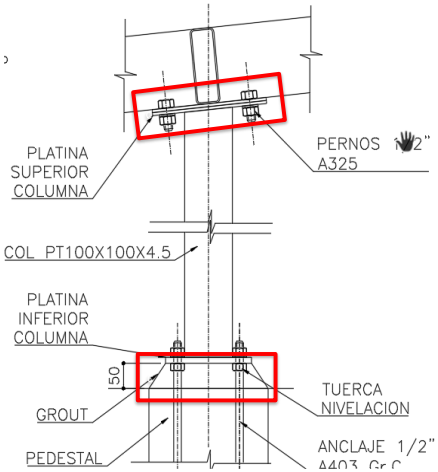





150X50X2mm		10,37		64,52	1	**64,52**
PARQUEADERO MOTOS						
Platinas Superiores de columnas 4.5mm	**0,26**	**0,26**	**0,0003042**	2,38797	6	**14,33**
Platinas Inferiores de columnas 4.5mm	**0,2**	**0,2**	**0,000508**	3,9878	6	**23,93**
Platinas de Pedestales 12.7mm	**0,2**	**0,2**	**0,000508**	3,9878	3	**11,96**
Tuercas de platina superior de columnas				0,0300	24	**0,72**
tuercas de platina inferior de columna				0,0300	24	**0,72**
Tornillo de platina superior de columnas				0,0511	24	**1,23**
Platina de conexión entre correas 4MM	**0,26**	**0,14**	**0,0001456**	1,14296	4	**4,57**
tuercas de platina inferior de columna				0,0300	32	**0,96**
Tornillo de platina superior de columnas				0,1050	32	**3,36**









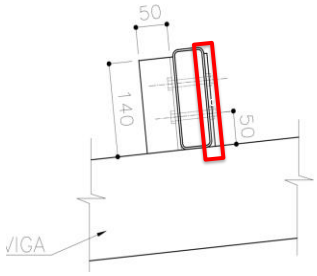



Platina de conexión entre columna y viga 4.5mm	**0,26**	**0,26**	**0,0003042**	2,38797	6	**14,33**
Tapas de vigas Eje A 4.5mm	**0,15**	**0,1**	**0,0000675**	0,529875	6	**3,18**
Tapas de correas 4.5mm	**0,15**	**0,05**	**0,00003375**	0,2649375	8	**2,12**
portacorreas de 15x5 en L de e= 4.76mm	**0,14**	**0,05**	**0,00006664**	0,523124	12	**6,28**
portacorreas Posterior de 15x5 e= 4.76mm	**0,14**	**0,05**	**0,00003332**	0,261562	8	**2,09**

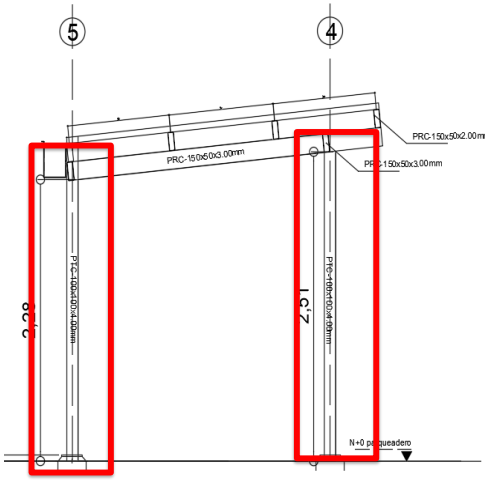

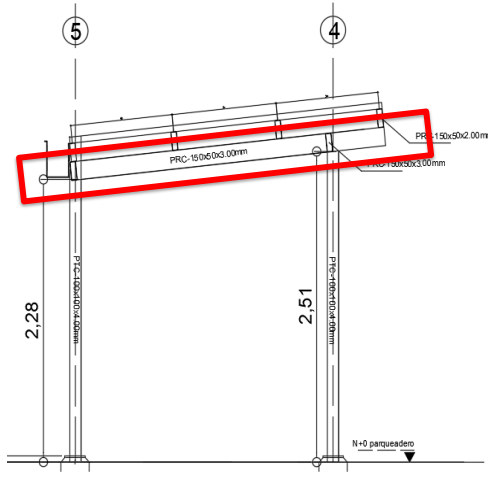



SHUT BASURAS						
EJE 4 100X100X4.5mm		2,66		36,28	6	
EJE 5 100X100X4.5mm		2,44		33,28	6	
SHUT BASURAS						
EJE H 150X50X3mm		2,7		24,89	1,00	
EJE I 150X50X3mm		2,7		24,89	1,00	
EJE J 150X50X3mm		2,7		24,89	1,00	
EJE K 150X50X3mm		2,7		24,89	1,00	
EJE L 150X50X3mm		2,7		24,89	1,00	
EJE M 150X50X3mm		2,7		24,89	1,00	

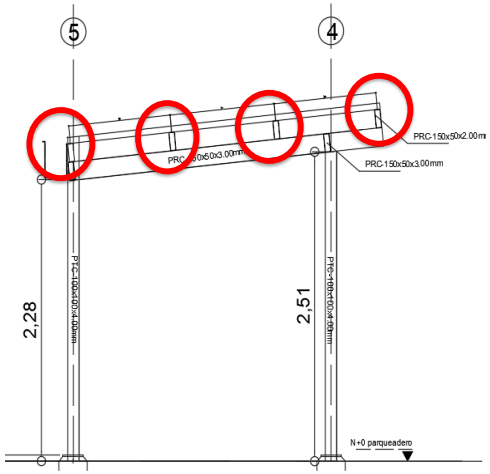


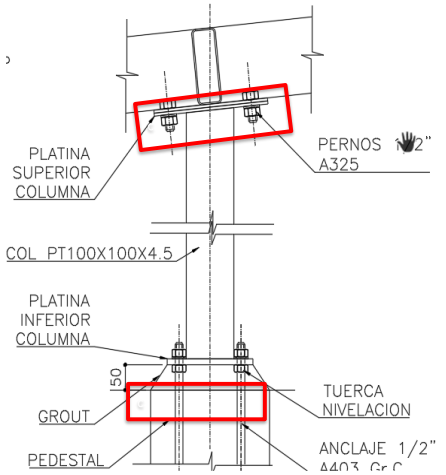


SHUT BASURAS						
150X50X2mm		**12,86**		80,01	1	
150X50X2mm		**12,86**		80,01	1	
150X50X2mm		**12,86**		80,01	1	
150X50X2mm		**12,86**		80,01	1	
SHUT BASURAS						
Platinas Superiores de columnas 4.5mm	**0,26**	**0,26**	**0,0003042**	2,38797	12	
Platinas Inferiores de columnas 4.5mm	**0,2**	**0,2**	**0,000508**	3,9878	12	
Platinas de Pedestales 12.7mm	**0,2**	**0,2**	**0,000508**	3,9878	12	
Tuercas de platina superior de columnas				0,0300	48	
tuercas de platina inferior de columna				0,0300	48	
Tornillo de platina superior de columnas				0,0511	48	








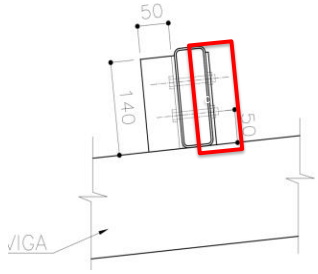

PARQUEADERO CARROS	0,18	0,18		3,23	12	**38,76**
PARQUEADERO MOTOS	0,18	0,18		3,23	6	**19,38**
SHUT BASURAS	0,18	0,18		3,23	12	
Platina de conexión entre correas 4MM	**0,26**	**0,14**	**0,0001456**	1,14296	16	
tuercas de platina inferior de columna				0,0300	128	
Tornillo de platina superior de columnas				0,1050	128	
Platina de conexión entre columna y viga 4.5mm	**0,26**	**0,26**	**0,0003042**	2,38797	12	
Tapas de vigas Eje A 4.5mm	**0,15**	**0,1**	**0,0000675**	0,529875	12	
Tapas de correas 4.5mm	**0,15**	**0,05**	**0,00003375**	0,2649375	8	
portacorreas de 15x5 en L de e= 4.76mm	**0,14**	**0,05**	**0,00006664**	0,523124	16	

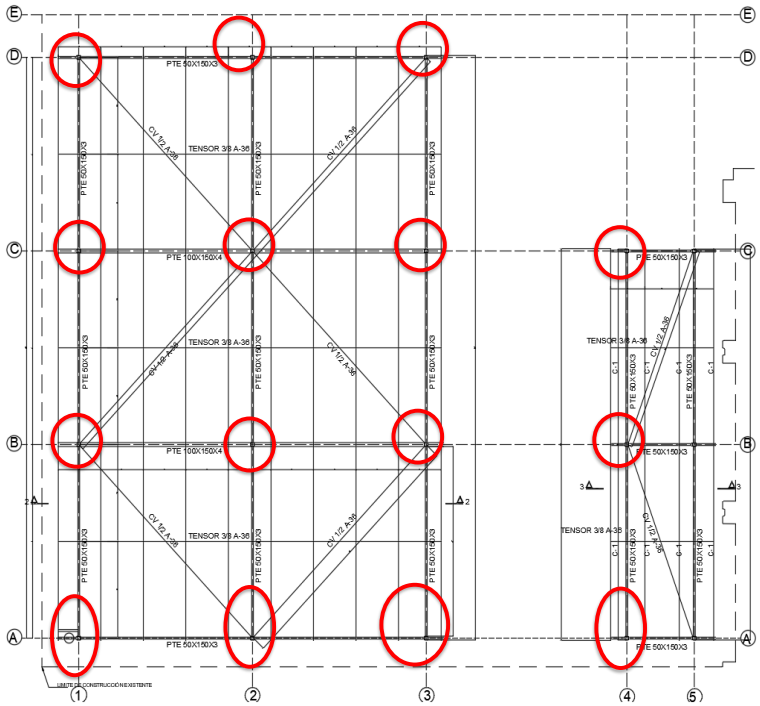

portacorreas Posterior de 15x5 e= 4.76mm	**0,14**	**0,05**	**0,00003332**	0,261562	8	
TENSORES PARQUEADERO CARROS		**11,60**	**11,486475**		3	
varilla de anclajes de platinas 50cm largo de 1/2		**0,50**	**0,495**		72	
Soldadura general de la estructura 7% del peso total						**206,72**

AMPLIACION						
150X50X2mm		1		6,22	4	**24,89**
TOTAL ITEM						**3.184,75**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**3.159,87**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**24,89**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA 1	SEDE_ALMACEN _CALLE_18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	NP-69	DESCRIPCION ITEM:	Sensor de movimiento 15 minutos de duración sobre muro o techo según sea la necesidad. (Incluye suministro e instalación)			UNIDAD DE MEDIDA:	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



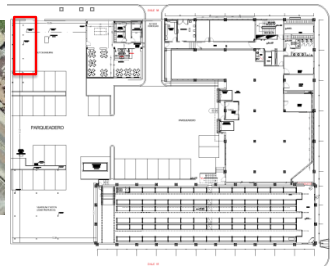

UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90

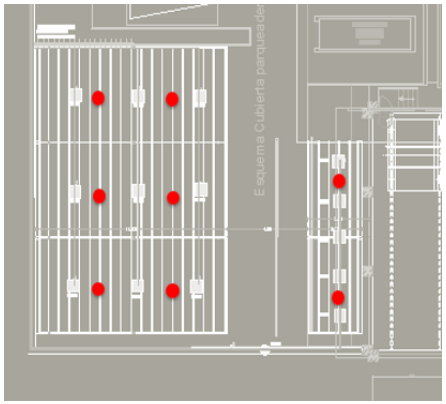

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES Ancho	DIMENSIONES Longitud	DIMENSIONES Peso	MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
SEDE ALMACEN CALLE 18. PARQUEADERO						
MOTOS					2,00	2,00
CARROS					6,00	6,00
TOTAL ITEM						8,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD CORTE ACTUAL						8,00

Elaboró: Ma. Alejandra Velandia	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA 1	FRENTE CALLE 18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	NP-95	DESCRIPCION ITEM:	Grouting entre platina de soporte de pedestal y columneta existente en volumen de 0.25m x 0.25m x 0.05m. (Incluye suministro e instalación)			UNIDAD DE MEDIDA:	UN


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90

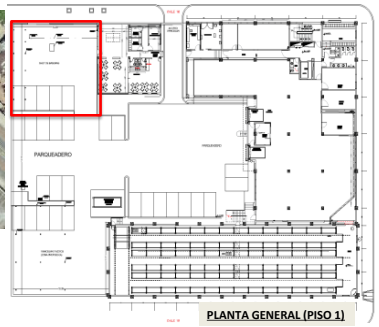

PLANTA GENERAL (PISO 1)

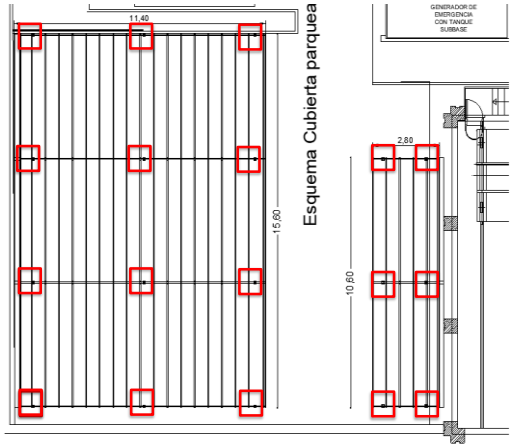

PARQUEADEROS (PISO 1)

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
SEDE ALMACEN CALLE 18. PARQUEADERO						
MOTOS					6,00	6,00
CARROS					12,00	12,00
TOTAL ITEM						18,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD CORTE ACTUAL						18,00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA 1	FRENTE CALLE 18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	1.16	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)			UNIDAD DE MEDIDA:	UN


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90

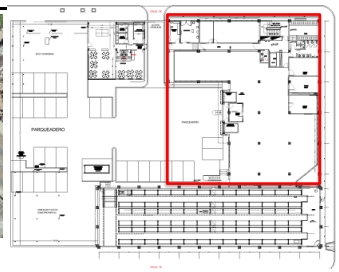

SEDE CALLE 18, PISO 2

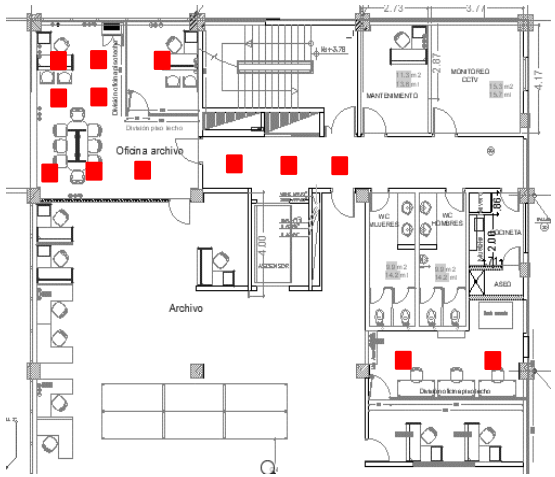

PISO 2

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE ALMACEN CALLE 18. PISO 2						
OFICINA ARCHIVO					8,00	8,00
PASILLO					3,00	3,00
LABORATORIO					2,00	2,00
TOTAL ITEM						13,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						5,00
CANTIDAD CORTE ACTUAL						8,00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma: Saydee M. Bechara L.	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: HOSMAN LECHUGA N. DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA 1	FRENTE CALLE 18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	1.19	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)			UNIDAD DE MEDIDA:	ML


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90

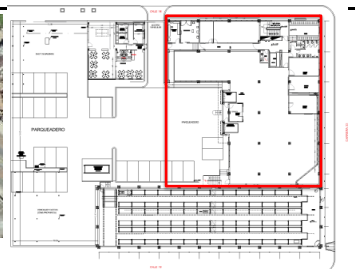

SEDE CALLE 18, PISO 2

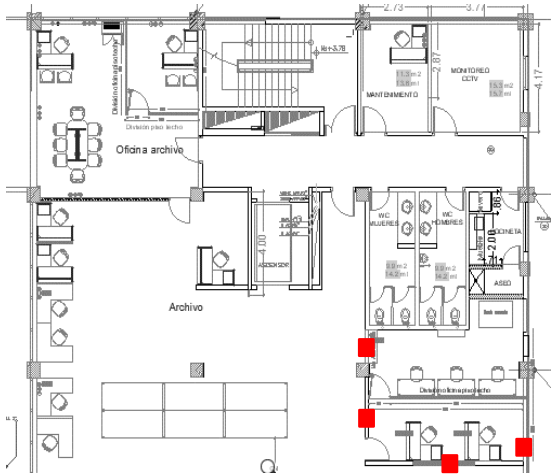

PISO 2

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE ALMACEN CALLE 18. PISO 2						
LABORATORIO - VERTICAL			2,80	**2,80**	1,00	2,80
HORIZONTAL			0,30	**0,30**	3,00	0,90
HORIZONTAL			0,50	**0,50**	4,00	2,00
HORIZONTAL			0,15	**0,15**	2,00	0,30
TOTAL ITEM						**6,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**6,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma: Saydee M. Bechara L.	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA 1	FRENTE CALLE 18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	1.28	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)			UNIDAD DE	M2


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90

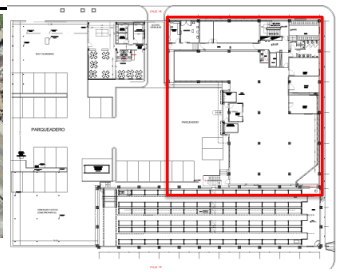

SEDE CALLE 18, PISO 2

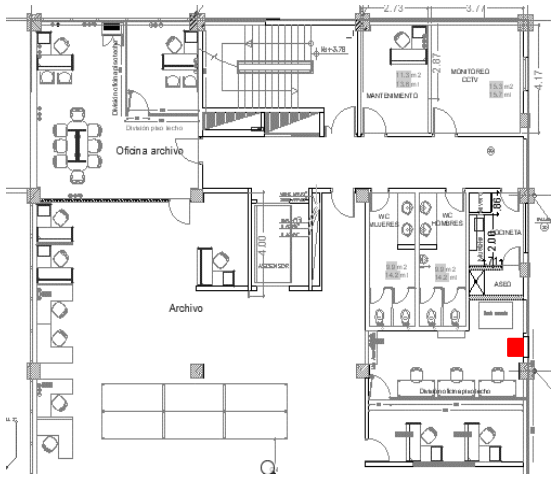

PISO 2

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE ALMACEN CALLE 18. PISO 2						
LABORATORIO	1,00	1,00		**1,00**	1,00	1,00
TOTAL ITEM						**1,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**1,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma: Saydee M. Bechara L.	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA 1	FRENTE CALLE 18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	1.60	DESCRIPCION ITEM:	Demolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)			UNIDAD DE MEDIDA:	M2


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90

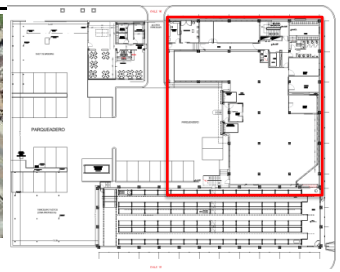

SEDE CALLE 18, PISO 2

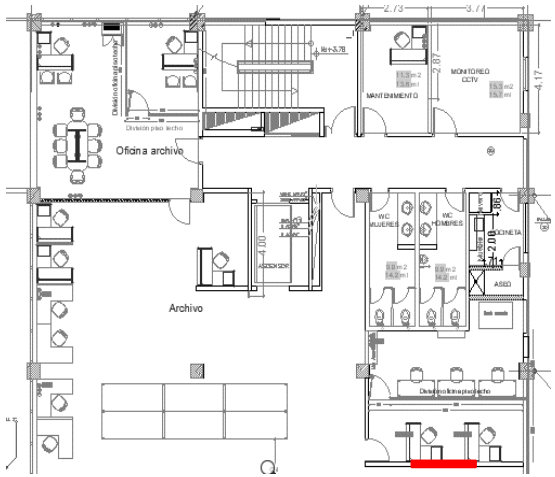

PISO 2

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE ALMACEN CALLE 18. PISO 2						
LABORATORIO	2,50	1,61		**4,03**	1,00	4,03

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA 1

E_ALMACEN_CALLE

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	10.4	DESCRIPCION ITEM:	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)			UNIDAD DE MEDIDA:	M2


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90

PLANTA GENERAL (PISO 2)

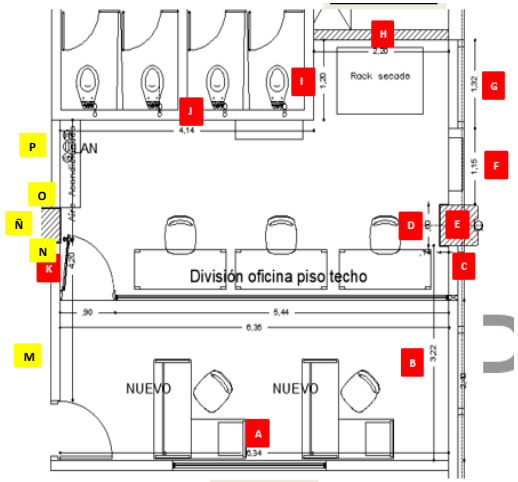

PISO 2
LABORATORIO

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
	SEDE ALMACEN CALLE 18. PISO 2					
LABORATORIO INTERIOR	A	6,35	2,71	17,2085	1,00	17,21
descuento vano ventana	A	2,50	1,61	4,025	-1,00	-4,03
	B	3,22	1,10	3,542	1,00	3,54
	C-E	0,14	2,71	0,3794	2,00	0,76
	D	0,60	2,71	1,626	1,00	1,63
	F	1,15	2,71	3,1165	1,00	3,12
	G	1,32	1,50	1,98	1,00	1,98
	H	2,20	2,71	5,962	1,00	5,96
	I	1,20	2,71	3,252	1,00	3,25
	J	4,14	2,71	11,2194	1,00	11,22
	K	5,10	2,71	13,821	1,00	13,82
descuento de vano puerta	K	0,90	2,10	1,89	-1,00	-1,89
				0		0,00
				0		0,00
LABORATORIO EXTERIOR	L	6,45	3,57	23,0265	1,00	23,03
descuento vano ventana	L	2,50	1,61	4,025	-1,00	-4,03
	M	3,41	3,57	12,1737	1,00	12,17
descuento de vano puerta	M	0,90	2,10	1,89	-1,00	-1,89
COLUMNA	N	0,36	3,57	1,2852	1,00	1,29
COLUMNA	Ñ	0,58	3,57	2,0706	1,00	2,07
COLUMNA	O	0,38	3,57	1,3566	1,00	1,36
	P	1,31	3,57	4,6767	1,00	4,68
TOTAL ITEM						**95,25**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**95,25**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Revisó:
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: HOSMAN LECHUGA N. DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA 1	FRENTE CALLE 18	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	14.15	DESCRIPCION ITEM:	Ventanería en aluminio con vidrio laminado incoloro 3+3 mm. (Suminstro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)			UNIDAD DE MEDIDA:	M2


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



UBICACION SEDE CALLE 18, CALLE 18 Nº32-90

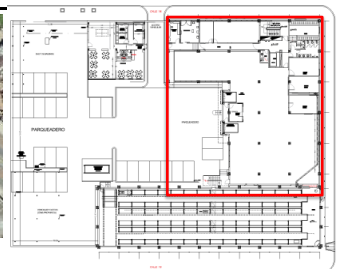

SEDE CALLE 18, PISO 2

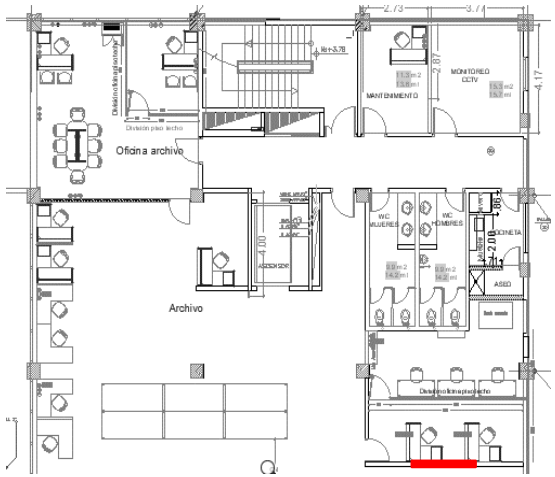

PISO 2

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE ALMACEN CALLE 18. PISO 2						
LABORATORIO	2,50	1,61		**4,03**	1,00	4,03

MEMORIAS DE OBRA
CORTE No. 14

CONSULTORIOS PALACIO

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA 1


PALACIO CONSULTORIOS

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**1,19**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**ML**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

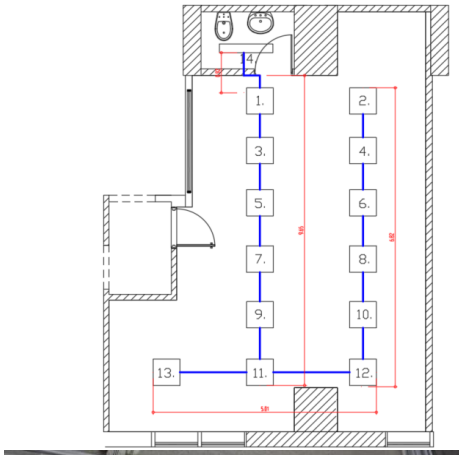



DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Desmonte de tuberia electrica en oficinas		5,01				
		6,82				
		9,65				21,48
Baño		0,92				0,92
TOTAL ITEM						**22,40**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**22,40**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	PALACIO CONSULTORIOS	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	1,21	**DESCRIPCION ITEM:**	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

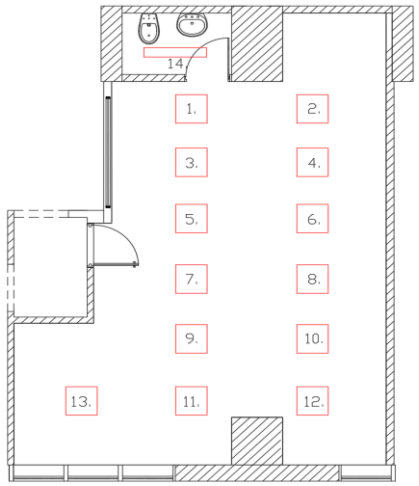

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Desmonte luminarias 60x60					13,00	13,00
Desmonte luminaria hermetica					1,00	1,00
TOTAL ITEM						**14,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**14,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA 1

PALACIO CONSULTORIOS

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**1,83**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Ajustes a los diseños de redes cableado estructurado, voz y datos. (Incluye diseños de racks y red de repartición por Pisos, Especificaciones de cableados, switchs, pach panels y demás elementos de integración y entregables para su ejecución). Planos en Medio Físico y Magnético, Presupuesto y Especificaciones.**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**M2**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Zona intervenida				58,20		58,20
TOTAL ITEM						**58,20**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**58,20**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	PALACIO CONSULTORIOS	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	6,1	**DESCRIPCION ITEM:**	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

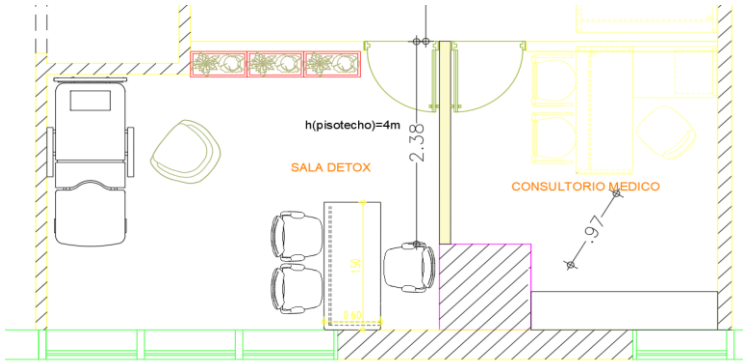

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
		2,38	4,00			9,52
TOTAL ITEM						**9,52**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**9,52**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	PALACIO CONSULTORIOS	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	9,1	**DESCRIPCION ITEM:**	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

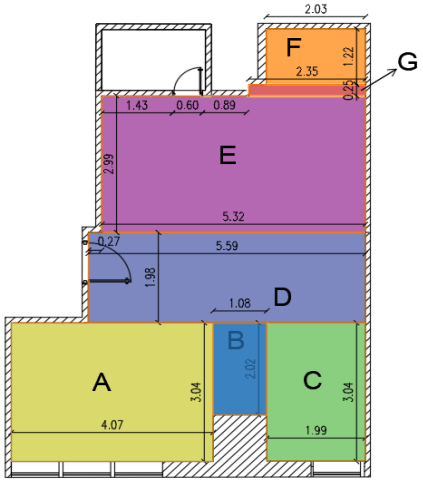

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
A	4,07	3,04		12,37	1,00	12,37
B	1,08	2,02		2,18	1,00	2,18
C	1,99	3,04		6,05	1,00	6,05
D	5,59	1,98		11,07	1,00	11,07
E	5,32	2,99		15,91	1,00	15,91
F	2,03	1,22		2,48	1,00	2,48
G	2,35	0,25		0,59	1,00	0,59
TOTAL ITEM						**50,64**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**50,64**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	PALACIO CONSULTORIOS	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	9,3	**DESCRIPCION ITEM:**	Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

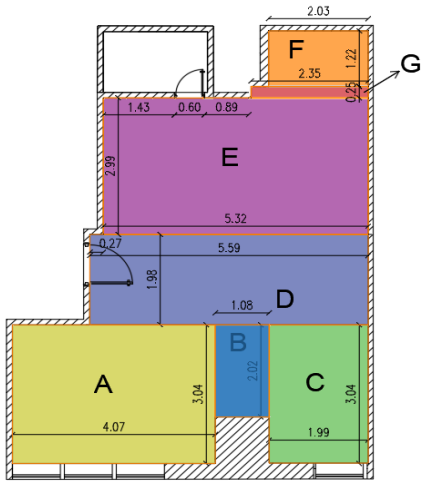

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
A		1,55		1,55		1,55
		3,04		3,04		3,04
		4,07		4,07		4,07
		3,38		3,38		3,38
B		2,38		2,38		2,38
		0,96		0,96		0,96
C		1,00		1,00		1,00
		1,99		1,99		1,99
		3,04		3,04		3,04
D		1,98		1,98		1,98
		1,98		1,98		1,98
E		2,99		2,99		2,99
		2,99		2,99		2,99
		1,43		1,43		1,43
		0,60		0,60		0,60
		0,89		0,89		0,89
G		0,25		0,25		0,25
		0,25		0,25		0,25
		0,32		0,32		0,32
F		2,03		2,03		2,03
		1,22		1,22		1,22
		1,22		1,22		1,22
TOTAL ITEM						**39,56**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**39,56**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	PALACIO CONSULTORIOS	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	9,5	**DESCRIPCION ITEM:**	Ventana de inspección en cielo raso DryWall. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilería, refuerzos, marco, tapa requeridos)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

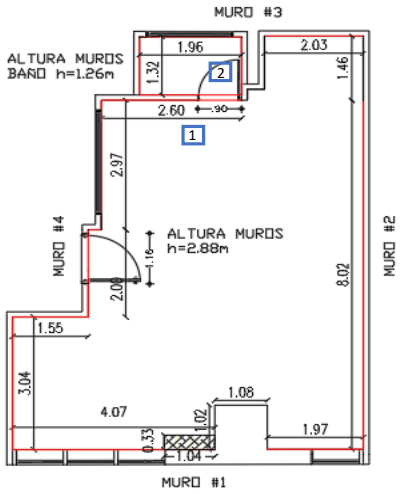

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Baño					1,00	1,00
Sala de espera					1,00	1,00
TOTAL ITEM						**2,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**2,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA 1	PALACIO CONSULTORIOS	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	10,4	**DESCRIPCION ITEM:**	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

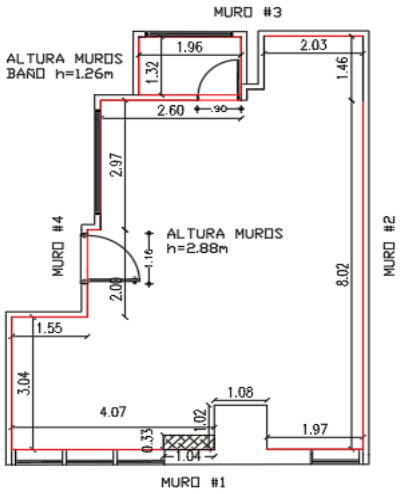

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
MURO #1	4,07		2,88	11,72	1,00	11,72
	1,97		2,88	5,67	1,00	5,67
MURO #2	8,02		2,88	23,10	1,00	23,10
MURO #3	2,03		2,88	5,85	1,00	5,85
	2,60		2,88	7,49	1,00	7,49
	0,14		2,88	0,40	1,00	0,40
MURO #4	2,97		2,88	8,55	1,00	8,55
	0,27		2,88	0,78	1,00	0,78
	2,00		2,88	5,76	1,00	5,76
	1,55		2,88	4,46	1,00	4,46
	3,04		2,88	8,76	1,00	8,76
BAÑO	1,96		1,26	2,47	2,00	4,94
	1,32		1,26	1,66	2,00	3,33
Descuento ventana baño	1,00		0,33	0,33	-1,00	-0,33
Descuento ventanas muro #1	3,03		1,20	3,64	-1,00	-3,64
	0,95		1,20	1,14	-1,00	-1,14
Descuento puerta muro #3	0,84		1,99	1,67	-1,00	-1,67
Descuento ventana muro #4	2,39		1,46	3,49	-1,00	-3,49
Descuento puerta muro #4	1,16		2,44	2,82	-1,00	-2,82
TOTAL ITEM						**77,72**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**77,72**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA 1	PALACIO CONSULTORIOS	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	10,5	**DESCRIPCION ITEM:**	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

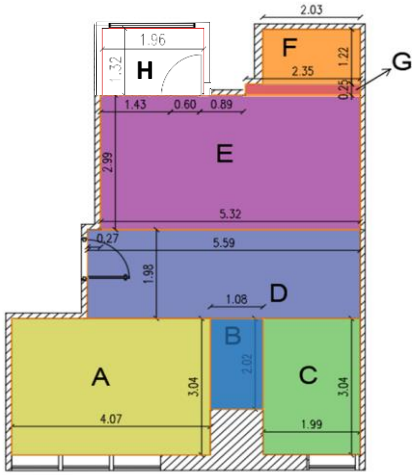

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Pintura techo						
A	4,07	3,04		12,37	1,00	12,37
B	1,08	2,02		2,18	1,00	2,18
C	1,99	3,04		6,05	1,00	6,05
D	5,59	1,98		11,07	1,00	11,07
E	5,32	2,99		15,91	1,00	15,91
F	2,03	1,22		2,48	1,00	2,48
G	2,35	0,25		0,59	1,00	0,59
H	1,96	1,32		2,59	1,00	2,59
TOTAL ITEM						**53,23**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**53,23**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	PALACIO CONSULTORIOS	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia


A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	10,11	**DESCRIPCION ITEM:**	Pintura esmalte lámina lineal. (Suministro y aplicación)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá







DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VENTANA 1						
Marco Perimetral Exterior (Lados Verticales)		1,20		1,20	2,00	2,40
Marco Perimetral Exterior (Lados Horizontales)		0,96		0,96	2,00	1,92
Perfil Travesaño Horizontal (Divisor Cabezal)		0,96		0,96	1,00	0,96
Marco Interno de la hoja del Vidrio		0,86		0,86	2,00	1,72
		1,10		1,10	2,00	2,20
Aletas Horizontales de la Persiana Superior		0,86		0,86	3,00	2,58
					SUBTOTAL	**11,78**
VENTANA 2						
Marcos Horizontales Principales (Superior e Inferior)		3,03		3,03	2,00	6,06
Parales Verticales / Columnetas (Ancho 0.13m)		1,20		1,20	4,00	4,80
Travesaño Horizontal Divisor (Persiana Superior)		3,03		3,03	1,00	3,03
Marcos Internos de Naves de Vidrio (3 módulos)		0,91		0,91	6,00	5,46
		0,95		0,95	6,00	5,70
Aletas Horizontales de Persiana Superior módulo 1		0,91		0,91	3,00	2,73
Aletas Horizontales de Persiana Superior		0,91		0,91	3,00	2,73
Aletas Horizontales de Persiana Superior		0,91		0,91	3,00	2,73
					SUBTOTAL	**33,24**
REJILLA DE VENTILACION						
BAÑO						
Marco Exterior Vertical		0,33		0,33	2,00	0,66
Marco Exterior Horizontal		1,00		1,00	2,00	2,00
Divisor Vertical Central		0,33		0,33	1,00	0,33
Aletas Horizontales de Rejilla		1,00		1,00	6,00	6,00
					SUBTOTAL	**8,99**
					TOTAL ITEM	**54,01**
					CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES	**0,00**
					CANTIDAD CORTE ACTUAL	**54,01**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA 1


PALACIO CONSULTORIOS

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**14,11**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Marco en perfil de aluminio para lámparas y escotillas en cielo raso de 60x60 cm. (Suminstro e instalación)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

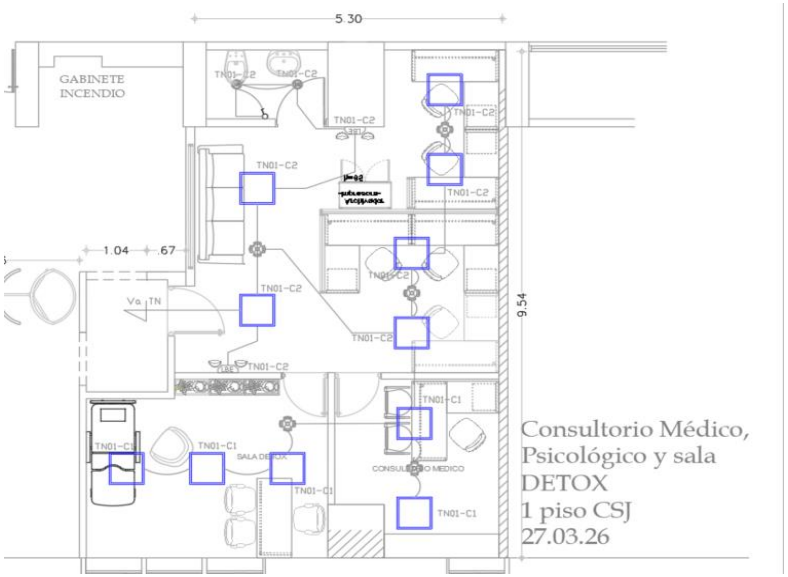

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	**DIMENSIONES**			MEDIDA PARCIAL	**No DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL**
	Ancho	Longitud	Altura			
Sala detox					3,00	3,00
Consultorio medico					2,00	2,00
Sala de espera					6,00	6,00
TOTAL ITEM						**11,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**11,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA 1

PALACIO CONSULTORIOS


Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	15,11	**DESCRIPCION ITEM:**	Espejos flotados y biselados de 4 mm. (Suministro e instalación)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

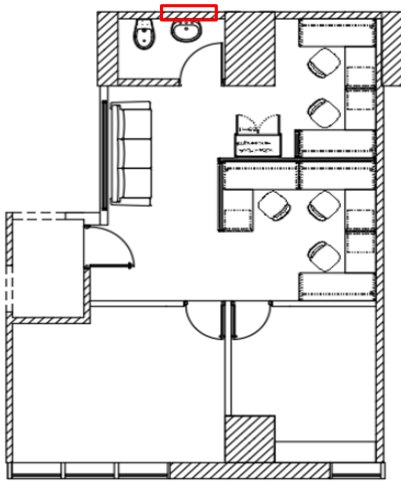

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Baño	1,16		1,20	1,39	1,00	1,39
TOTAL ITEM						**1,39**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**1,39**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA 1

PALACIO CONSULTORIOS


Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	16.26	**DESCRIPCION ITEM:**	Rejilla metálica con sosco 3x2". (Suministro e instalación)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

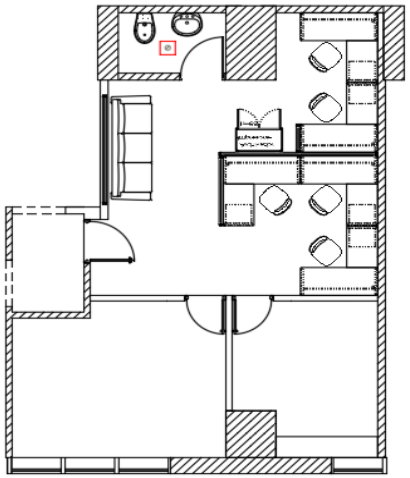

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	**DIMENSIONES**			MEDIDA PARCIAL	**No DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL**
	Ancho	Longitud	Altura			
Baño					1,00	1,00
TOTAL ITEM						**1,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**1,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA 1

PALACIO CONSULTORIOS


Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	16,4	**DESCRIPCION ITEM:**	Sanitario de piso linea institucional. (Suministro e instalación)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

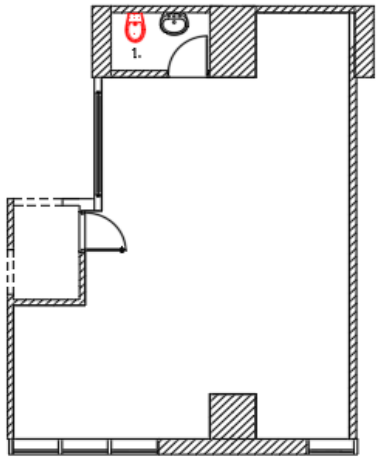


DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Sanitario					1,00	1,00
TOTAL ITEM						**1,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**1,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	PALACIO CONSULTORIOS	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	16,8	**DESCRIPCION ITEM:**	Sistema de descarga de tazas (fluxometro ó válvula), sumin. e inst.			**UNIDAD DE MEDIDA:**	UN

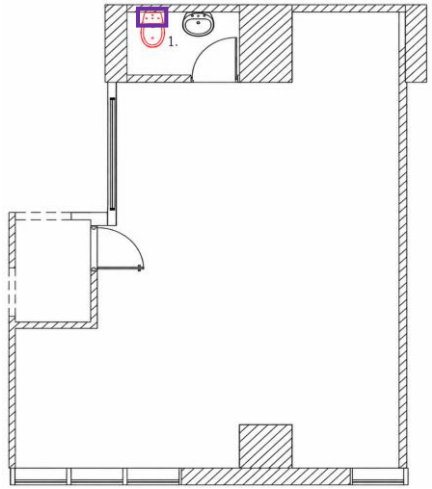PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá	Fluxómetro					1,00	1,00
							
	TOTAL ITEM						**1,00**
	CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
	CANTIDAD CORTE ACTUAL						**1,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	PALACIO CONSULTORIOS	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	16,10	**DESCRIPCION ITEM:**	Lavamanos de incrustar tipo Aquajet o similar con grifería tipo push. (Suministro e instalación. Incluye sifón, desague, accesorios necesarios)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

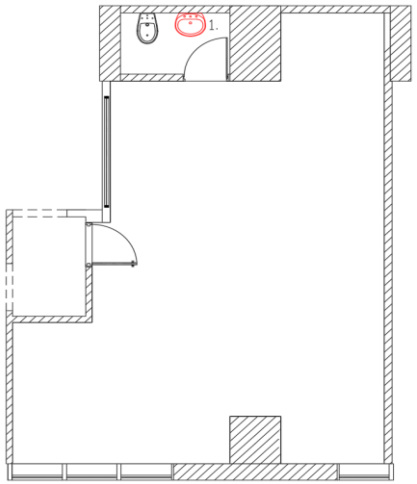


DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Lavamanos					1,00	1,00
TOTAL ITEM						**1,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**1,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	PALACIO CONSULTORIOS	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	16,18	**DESCRIPCION ITEM:**	Tapa registro plástica 15x15 cm. (Suministro e instalación)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	UN

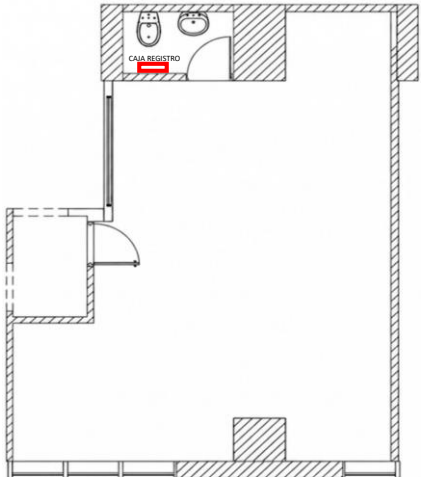PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	**DESCRIPCIÓN /ESPACIO**	**DIMENSIONES**			MEDIDA PARCIAL	**No DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL**
		Ancho	Longitud	Altura			
Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá	BAÑO					1,00	1,00
							
	TOTAL ITEM						**1,00**
	CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
	CANTIDAD CORTE ACTUAL						**1,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA 1

PALACIO CONSULTORIOS


Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	16,33	**DESCRIPCION ITEM:**	Suministro e instalación de asientos para sanitario institucional.			**UNIDAD DE MEDIDA:**	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

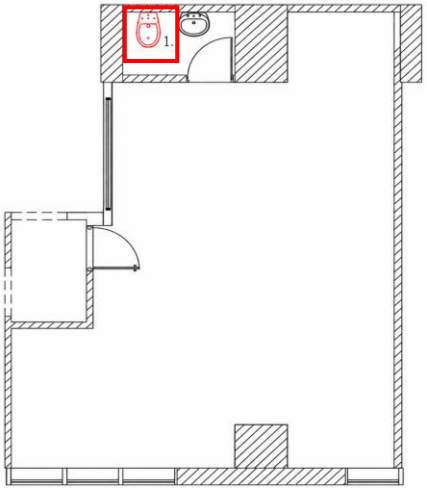

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	**DIMENSIONES**			MEDIDA PARCIAL	**No DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL**
	Ancho	Longitud	Altura			
Sanitario					1,00	1,00
TOTAL ITEM						**1,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**1,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA	1

PALACIO CONSULTORIOS


Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**19,14**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

CIRCUITO DE ILUMINACIÓN

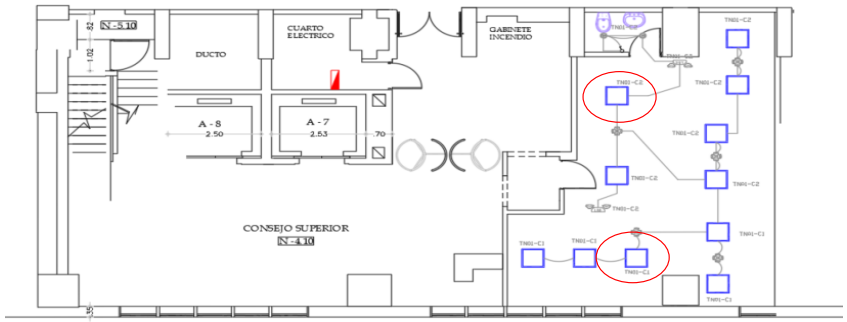



DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
CIRCUITOS ILUMINACIÓN						
TN-C1					1,00	1,00
TN-C2					1,00	1,00
TOTAL ITEM						**2,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**2,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA	1


PALACIO CONSULTORIOS

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**19,36**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Caja de paso metálica 30x30 cm. (Suministro e instalación)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

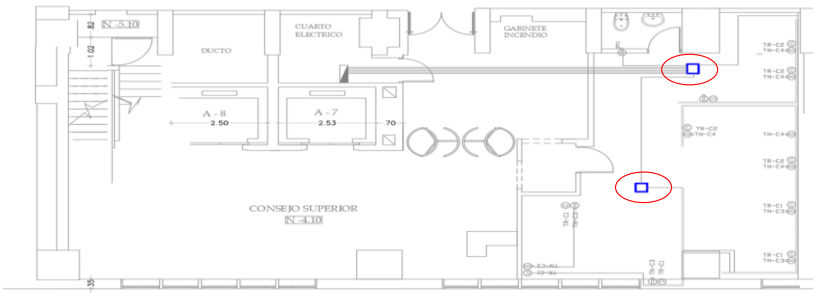

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SALA DE ESPERA					1,00	1,00
SALA DETOX					1,00	1,00
TOTAL ITEM						**2,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**2,00**


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	PALACIO CONSULTORIOS	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**19,39**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

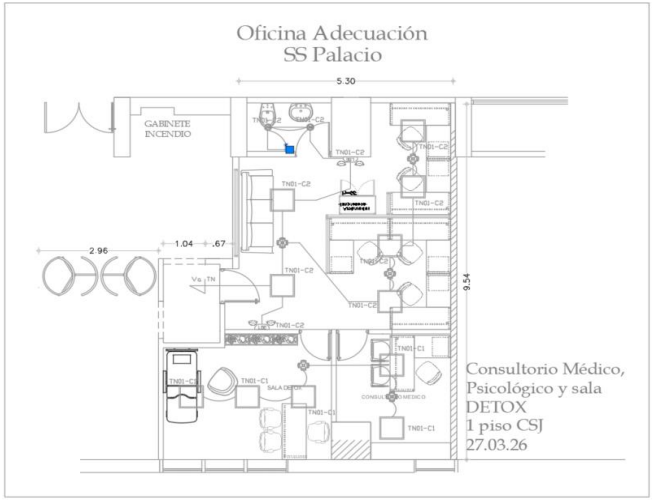


DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Baño					1,00	1,00

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	PALACIO CONSULTORIOS	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	19,48	DESCRIPCION ITEM:	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, cable, toma, accesorios 3m)			UNIDAD DE MEDIDA:	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

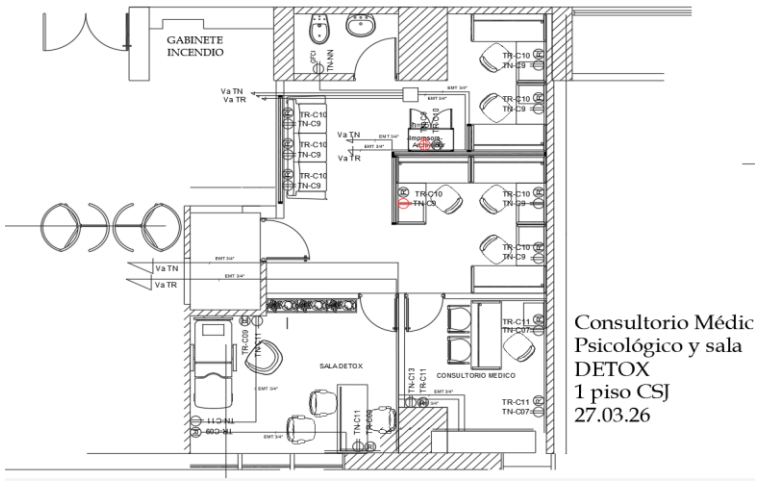

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES Ancho	DIMENSIONES Longitud	DIMENSIONES Altura	MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
TN-C9						
Impresora					1,00	1,00
Puesto de trabajo					1,00	1,00
TOTAL ITEM						2,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD CORTE ACTUAL						2,00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	PALACIO CONSULTORIOS	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	19,49	DESCRIPCION ITEM:	Toma doble P/T- 120V-GFCI. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, accesorios)			UNIDAD DE MEDIDA:	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
TN-NN						
Baño					1,00	1,00

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	PALACIO CONSULTORIOS	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	19,50	DESCRIPCION ITEM:	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios necesarios)			UNIDAD DE MEDIDA:	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

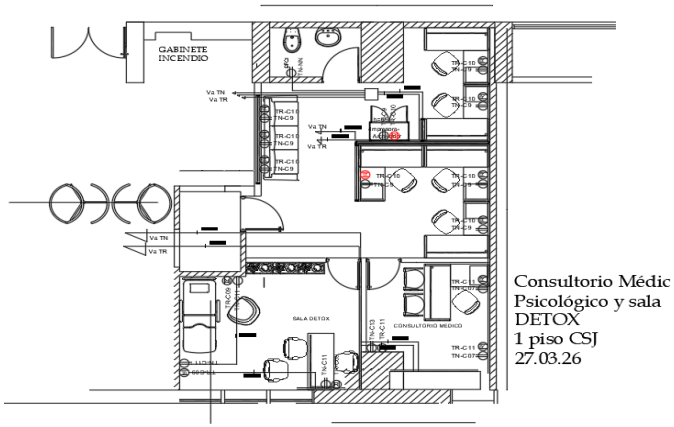

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
TR-C10						
Impresora					1,00	1,00
Puesto de trabajo					1,00	1,00
TOTAL ITEM						2,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD CORTE ACTUAL						2,00


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	PALACIO CONSULTORIOS	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	19,54	DESCRIPCION ITEM:	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)			UNIDAD DE MEDIDA:	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

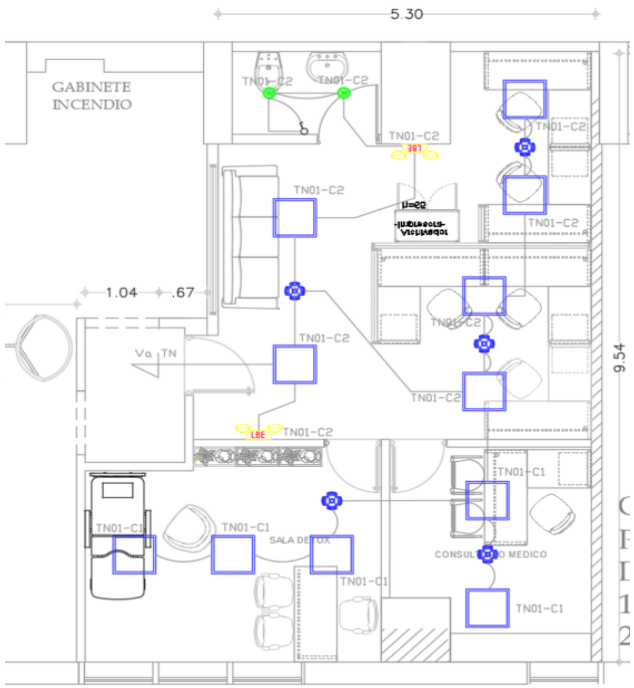

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SALIDA DE LÁMPARA 60X60						
Consultorio medico					2,00	2,00
Sala detox					3,00	3,00
Sala de espera					6,00	6,00
SALIDA DE LÁMPARA REDONDA						
Baños					2,00	2,00
SALIDA DE SENSORES						
Sala detox					1,00	1,00
Sala consultorio					1,00	1,00
Sala de espera					3,00	3,00
SALIDA DE LÁMPARAS DE EMERGENCIA						
Sala de espera					2,00	2,00
TOTAL ITEM						**20,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**20,00**


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	PALACIO CONSULTORIOS	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**19,71**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Lámpara de emergencia con batería de autonomía de 1.5 horas (2x5,4W), instaladas en pared. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

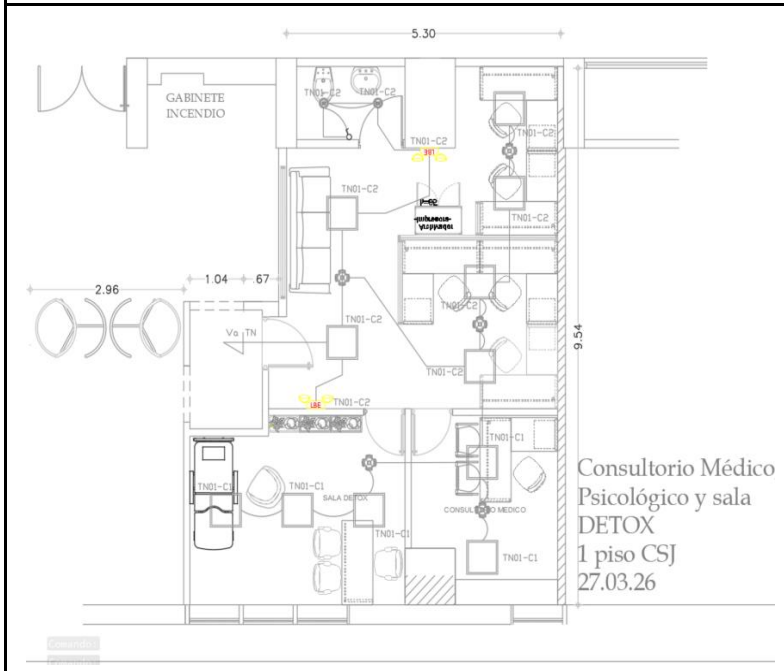

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Sala de espera					2,00	2,00

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA 1


PALACIO CONSULTORIOS

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**19,84**	**DESCRIPCION ITEM:**	Lámpara panel LED, de empotrar redonda 6" 12w 720lm 6500k. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

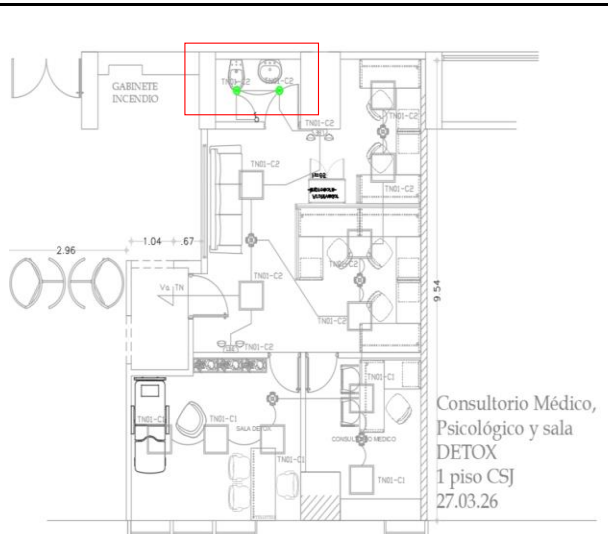

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	**DIMENSIONES**			MEDIDA PARCIAL	**No DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL**
	Ancho	Longitud	Altura			
Baño					2,00	2,00
TOTAL ITEM						**2,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**2,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA 1


PALACIO CONSULTORIOS

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	20,10	DESCRIPCION ITEM:	Troquel de 12 cm triple piramidal JAF. (Suministro e instalación)			UNIDAD DE MEDIDA:	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

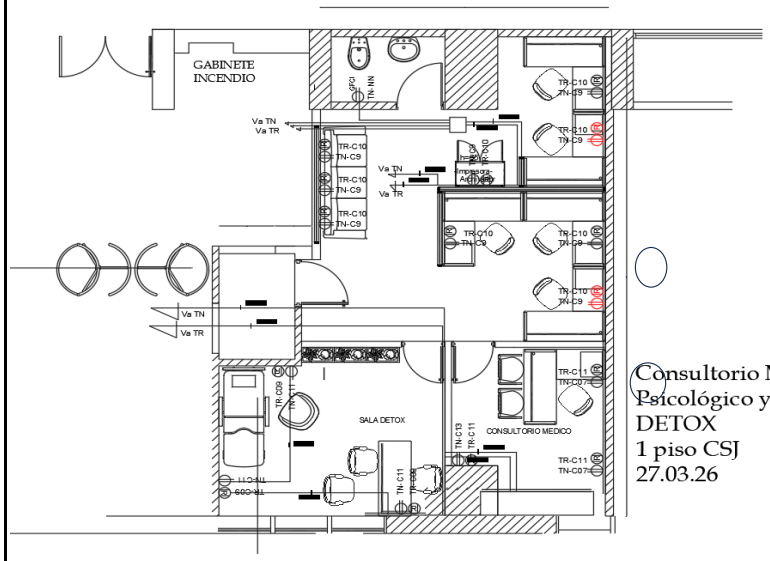

Consultorio Médico,
Psicológico y sala
DETOX
1 piso CSJ
27.03.26

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Puetos de trabajo s					2,00	2,00
TOTAL ITEM						2,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD CORTE ACTUAL						2,00


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	PALACIO CONSULTORIOS	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**20,26**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Face plate doble, blanco marfil. (Suministro e instalación)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

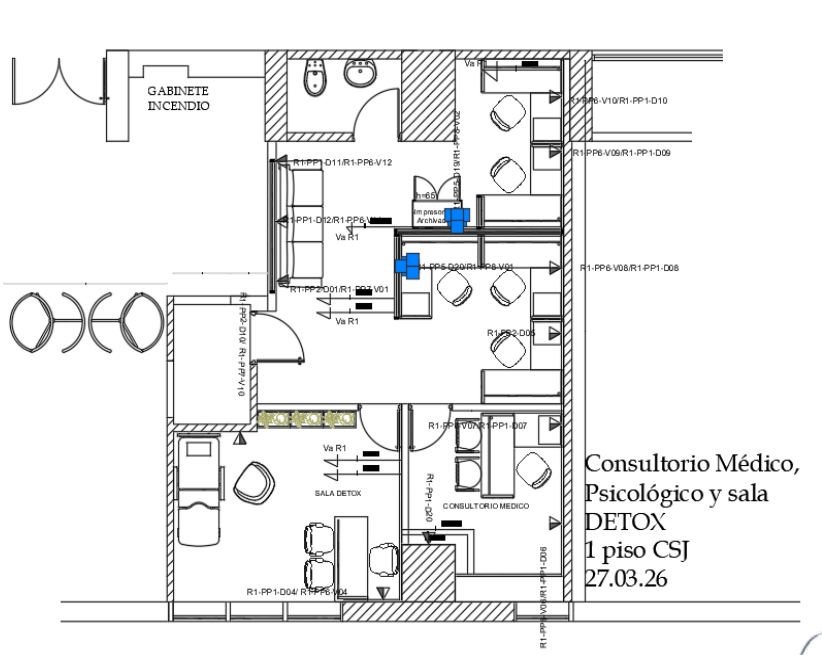

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Impresora					1,00	1,00
Puesto de trabajo					1,00	1,00

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

PALACIO CONSULTORIOS


Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


HOJA 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**20,31**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Certificacion de puntos de voz y datos.**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

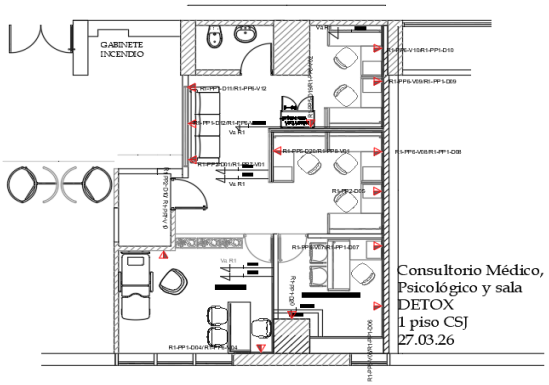

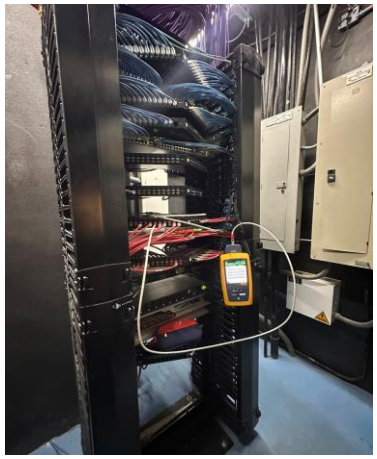

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
R1-PP2-D10/R1-PP7-V7					2,00	2,00
R1-PP1-D4/R1-PP6-V4					2,00	2,00
R1-PP1-D20					1,00	1,00
R1-PP1-D6/R1-PP6-V6					2,00	2,00
R1-PP1-D7/R1-PP6-V7					2,00	2,00
R1-PP2-D5					1,00	1,00
R1-PP1-D8/R1-PP6-V8					2,00	2,00
R1-PP1-D9/R1-PP6-V9					2,00	2,00
R1-PP1-D10/R1-PP6-V10					2,00	2,00
R1-PP5-D20/R1-PP8-V2					2,00	2,00
R1-PP1-D11/R1-PP6-V12					2,00	2,00
R1-PP1-D12/R1-PP6-V11					2,00	2,00
R1-PP2-D1/R1-PP7-V1					2,00	2,00
R1-PP5-D20/R1-PP8-V1					2,00	2,00
TOTAL ITEM						**26,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**26,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	PALACIO CONSULTORIOS	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	20,32	DESCRIPCION ITEM:	Marquillas en Puntos Electricos y Datos tipo anillo plástico. (Suministro e instalación)			UNIDAD DE MEDIDA:	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

MARQUILLA ELECTRICA

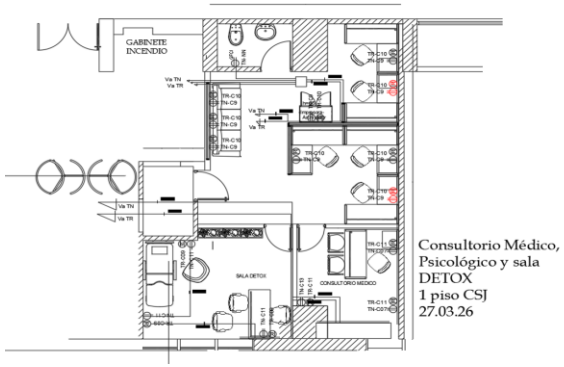

MARQUILLA DATOS

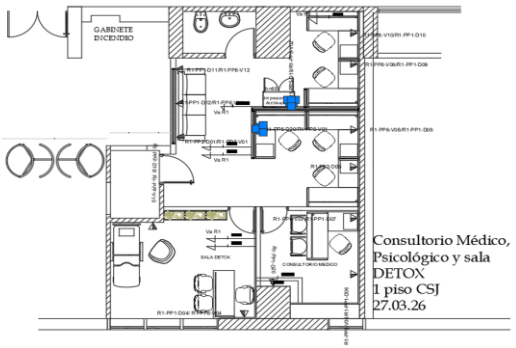

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Impresora					3,00	3,00
Puesto de trabajo					3,00	3,00
TOTAL ITEM						6,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD CORTE ACTUAL						6,00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	PALACIO CONSULTORIOS	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**22,1**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**M2**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Zona intervenida				58,20		58,20
TOTAL ITEM						**58,20**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**58,20**


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	PALACIO CONSULTORIOS	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**NP-12**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Desmonte de cableado electrico red monofasica f12 + t12 + n12, incluye disposicion final.**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

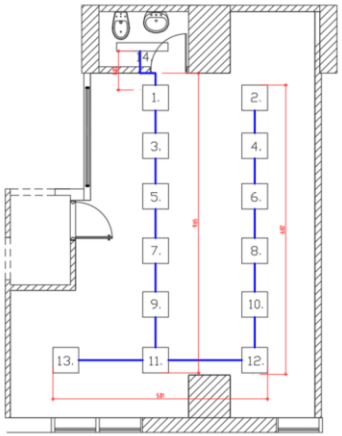



DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Consultorio		22,24		22,4		22,4
|	||					

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA	1


PALACIO CONSULTORIOS

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**	**CORTE No.**	**14**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**	**FECHA:**	**31/07/2026**
ITEM No.	**NP-22**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Ajustes a los diseños de redes elécricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.**
UNIDAD DE MEDIDA:	**M2**		

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

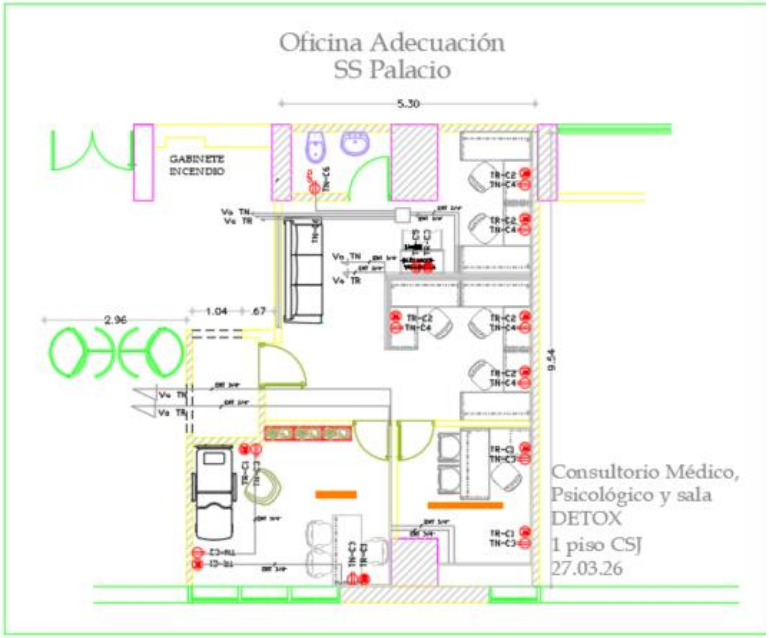


DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Zona intervenida				58,2		58,20
TOTAL ITEM						**58,20**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**58,20**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	PALACIO CONSULTORIOS	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**NP-27**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Suministro e instalacion de perfileria perimetral para soporte de marco 60 x 60 en cielo rasos**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

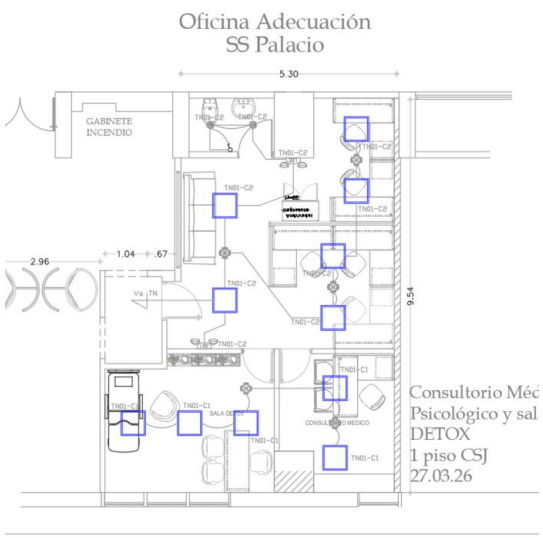PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Consultorio medico					2,00	2,00
	Sala detox					3,00	3,00
	Sala de espera					6,00	6,00
	TOTAL ITEM						**11,00**
	CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
	CANTIDAD CORTE ACTUAL						**11,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA 1


PALACIO CONSULTORIOS

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**NP-29**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Traslado de puntos de voz y datos, incluyendo troquelado de canaleta existente**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

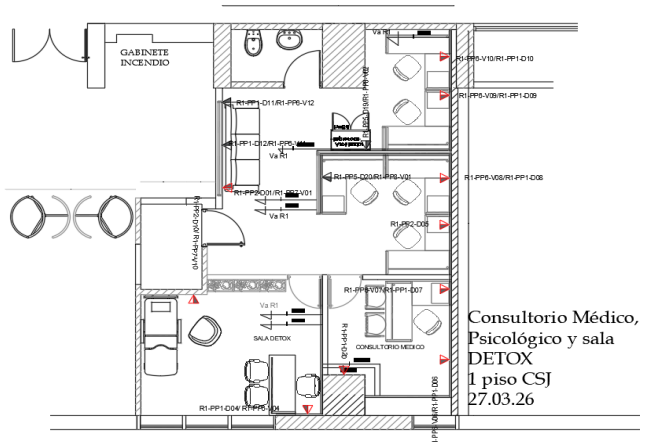

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Puestos de trabajo						4
Consultorio médico						3
Sala Detox						2
Sala de espera						1
TOTAL ITEM						**10,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**10,00**


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	PALACIO CONSULTORIOS	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	NP-30	DESCRIPCION ITEM:	Traslado de puntos de red eléctrica			UNIDAD DE MEDIDA:	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

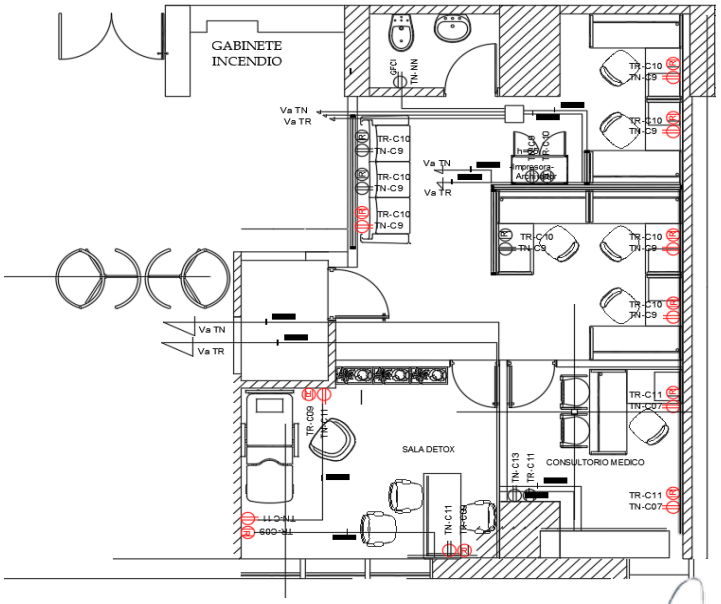


DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Tomas normales					10,00	10,00
Tomas regulares					10,00	10,00
TOTAL ITEM						20,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD CORTE ACTUAL						20,00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	PALACIO CONSULTORIOS	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**NP-34**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Suministro e instalación de soporte tipo Pera para tubería de 2"**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

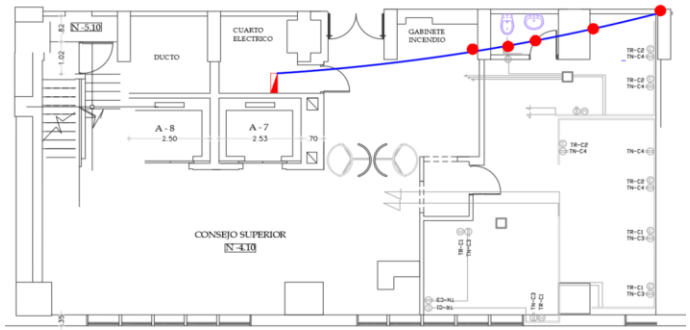PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Coraza					5,00	5,00
	TOTAL ITEM						**5,00**
	CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
	CANTIDAD CORTE ACTUAL						**5,00**


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	PALACIO CONSULTORIOS	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**NP-41**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 4000k, 100- 240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios).**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

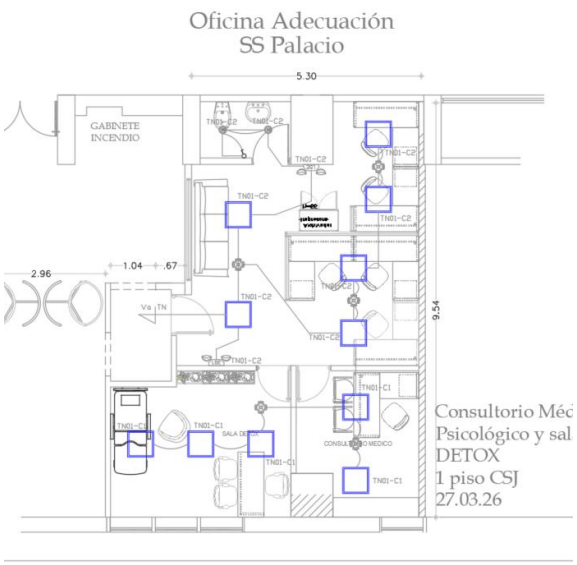


DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Consultorio medico					2,00	2,00
Sala detox					3,00	3,00
Sala de espera					6,00	6,00
TOTAL ITEM						**11,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**11,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	PALACIO CONSULTORIOS	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**NP-69**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Sensor de movimiento 15 minutos de duración sobre muro o techo según sea la necesidad. (Incluye suministro e instalación)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

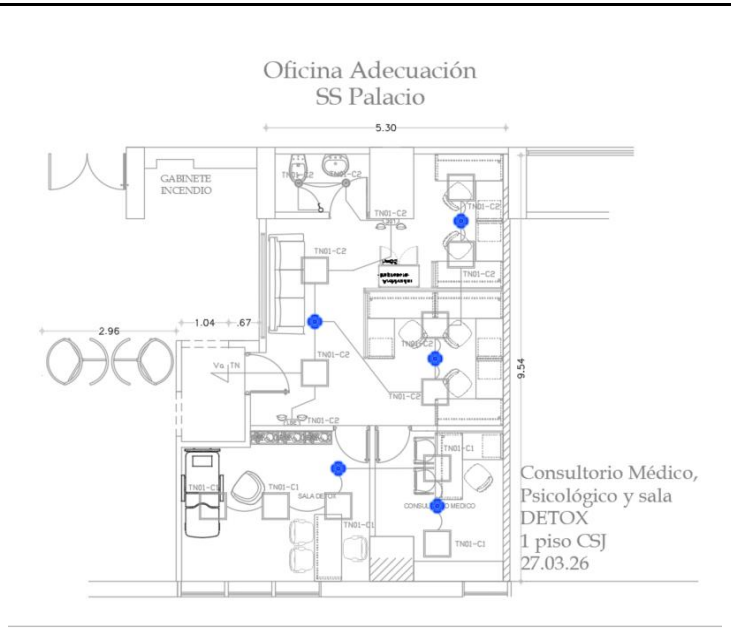PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Sala detox					1,00	1,00
	Sala consultorio					1,00	1,00
	Sala de espera					3,00	3,00
	TOTAL ITEM						**5,00**
	CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
	CANTIDAD CORTE ACTUAL						**5,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA	1


PALACIO CONSULTORIOS

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**31/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	**NP-85**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Jack categoria 6A blindado. (Incluye suministro e instalación)**			**UNIDAD DE MEDIDA:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

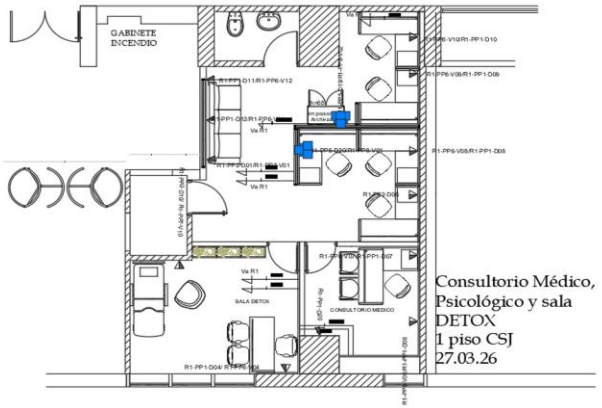

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Impresora					2,00	2,00
Puesto de trabajo					2,00	2,00
Rack					4,00	4,00
TOTAL ITEM						**8,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**8,00**


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA 1	PALACIO CONSULTORIOS	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	167 DE 2025	OBJETO:	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL			CORTE No.	14	FECHA:	31/07/2026
INTERVENTORIA:	TOTALL CORPORATION SAS BIC						
ITEM No.	NP-102	DESCRIPCION ITEM:	Ajustes a los diseños fotométricos para iluminación de espacios interiores			UNIDAD DE MEDIDA:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

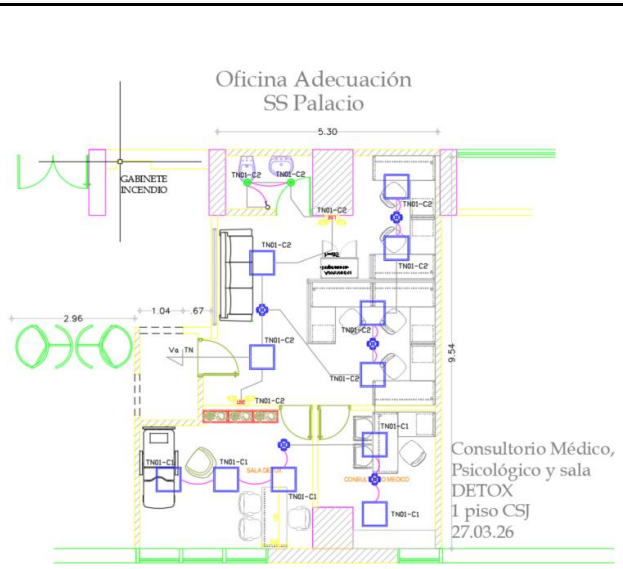

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Zona intervenida				58,2		58,20
TOTAL ITEM						58,20
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD CORTE ACTUAL						58,20

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE OBRA
CORTE No. 14

OFICINA DE SEGURIDAD


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Cl. 12 #7-65 PALACIO DE JUSTICIA	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**30/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	1,4	**DESCRIPCION ITEM:**	Desmonte de espejos. (Incluye trasiego y disposición final)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

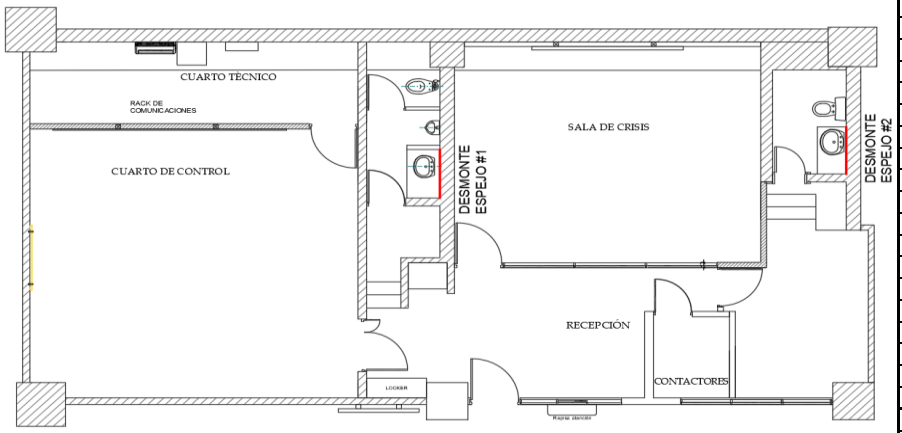

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Desmonte de espejos					2,00	2,00
				TOTAL ITEM		**2,00**
				CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES		**0,00**
				CANTIDAD CORTE ACTUAL		**2,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Cl. 12 #7-65 PALACIO DE JUSTICIA	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**30/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	1,6	**DESCRIPCION ITEM:**	Desmonte divisiones baño. (Incluye trasiego y disposición final)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

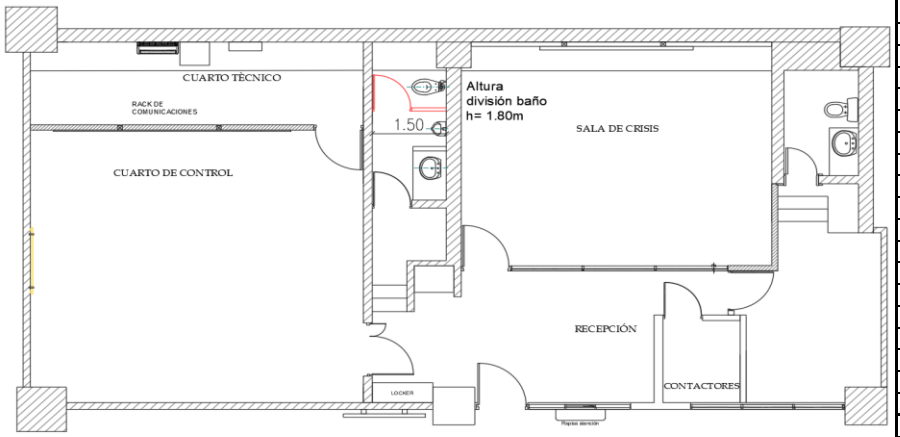

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Desmonte division de baño	1,50		1,80	2,70	1,00	2,70
TOTAL ITEM						**2,70**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**2,70**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Cl. 12 #7-65 PALACIO DE JUSTICIA	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**30/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	1,8	**DESCRIPCION ITEM:**	Desmonte de aparatos sanitarios. aplica para lavamanos, orinal y sanitario. (Incluye trasiego y disposición final)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

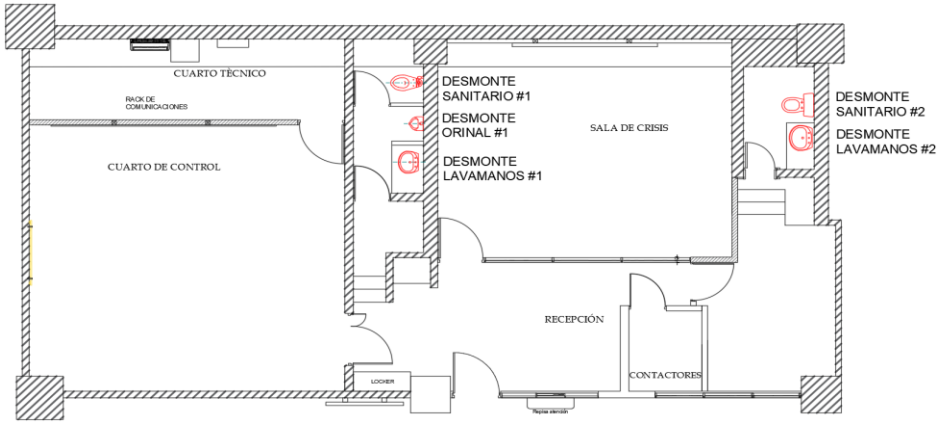

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Sanitario #1					1,00	1,00
Sanitario #2					1,00	1,00
Orinal #1					1,00	1,00
TOTAL ITEM						**3,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**3,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Cl. 12 #7-65 PALACIO DE JUSTICIA	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**30/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	1,9	**DESCRIPCION ITEM:**	Desmonte de grifería de sanitario y orinal.			**UNIDAD DE MEDIDA:**	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

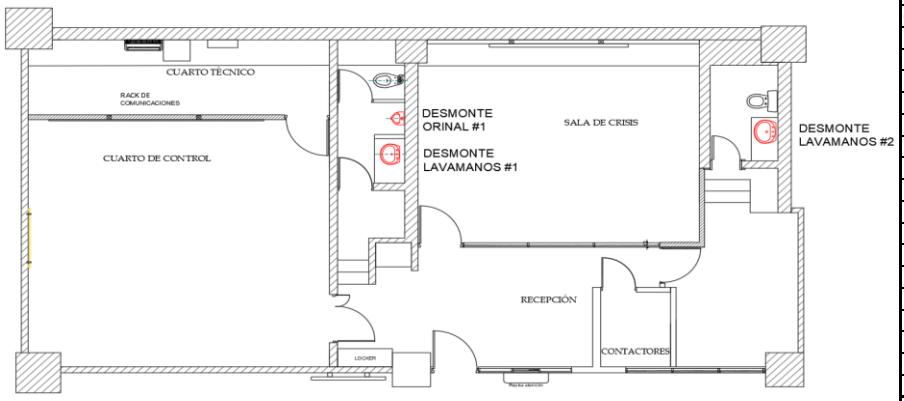

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Lavamanos #1					1,00	1,00
Lavamanos #2					1,00	1,00
Orinal #1					1,00	1,00
TOTAL ITEM						**3,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**3,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Cl. 12 #7-65 PALACIO DE JUSTICIA	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**30/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	1,13	**DESCRIPCION ITEM:**	Desmonte de puerta metálicas. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

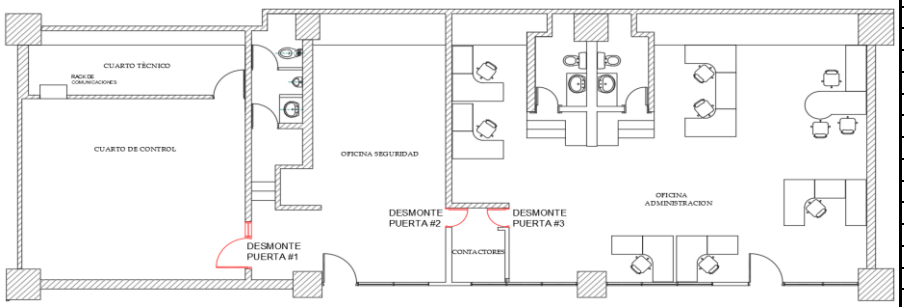

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Puerta #1					1,00	1,00
puerta #2					1,00	1,00
puerta #3					1,00	1,00
TOTAL ITEM						**3,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**3,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Cl. 12 #7-65 PALACIO DE JUSTICIA	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**30/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	1,16	**DESCRIPCION ITEM:**	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

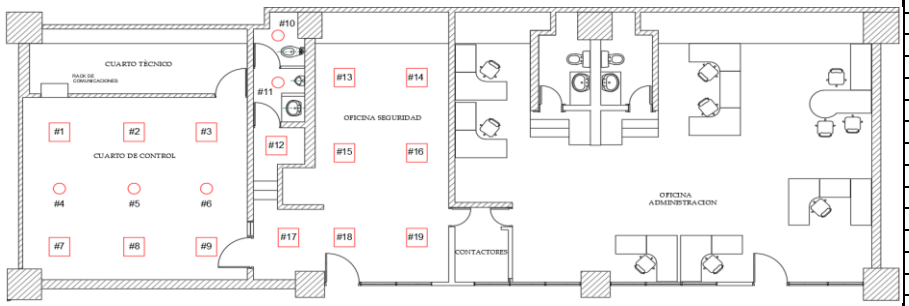

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Desmonte luminarias					19,00	19,00
TOTAL ITEM						**19,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**19,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Cl. 12 #7-65 PALACIO DE JUSTICIA	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**30/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	1,28	**DESCRIPCION ITEM:**	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

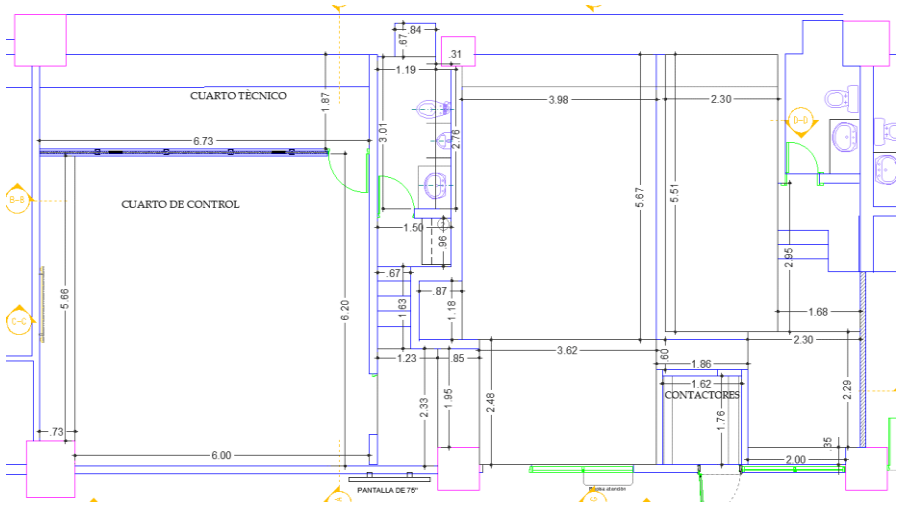

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
A	1,87	6,73		12,59	1,00	12,59
B	0,73	5,66		4,13	1,00	4,13
C	6,00	6,20		37,20	1,00	37,20
D	0,67	0,84		0,56	1,00	0,56
E	1,19	3,01		3,58	1,00	3,58
F	0,31	2,76		0,86	1,00	0,86
G	0,96	1,50		1,44	1,00	1,44
H	0,67	1,63		1,09	1,00	1,09
I	1,23	2,33		2,87	1,00	2,87
J	0,85	1,95		1,66	1,00	1,66
K	2,48	3,62		8,98	1,00	8,98
L	0,87	1,18		1,03	1,00	1,03
M	3,98	5,67		22,57	1,00	22,57
N	0,60	1,86		1,12	1,00	1,12
O	1,62	1,76		2,85	1,00	2,85
P	0,35	2,00		0,70	1,00	0,70
Q	1,68	2,95		4,96	1,00	4,96
R	2,30	5,51		12,67	1,00	12,67
TOTAL ITEM						**120,84**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**120,84**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Cl. 12 #7-65 PALACIO DE JUSTICIA	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**30/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	1,45	**DESCRIPCION ITEM:**	Desmonte de piso técnico incluye estructura metálica y gatos.			**UNIDAD DE MEDIDA:**	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

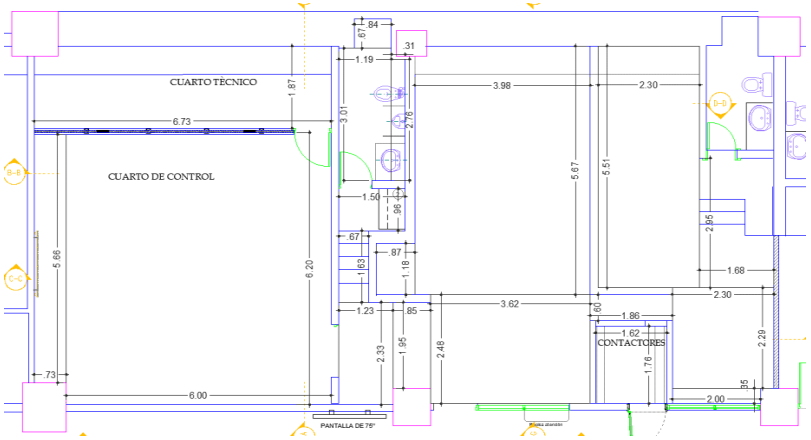

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Cuarto tecnico	6,73	1,87		12,59	1,00	12,59
Cuarto de control	0,73	5,66		4,13	1,00	4,13
	6,00	6,20		37,20	1,00	37,20
TOTAL ITEM						**53,92**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**53,92**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Cl. 12 #7-65 PALACIO DE JUSTICIA	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**30/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	1,51	**DESCRIPCION ITEM:**	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

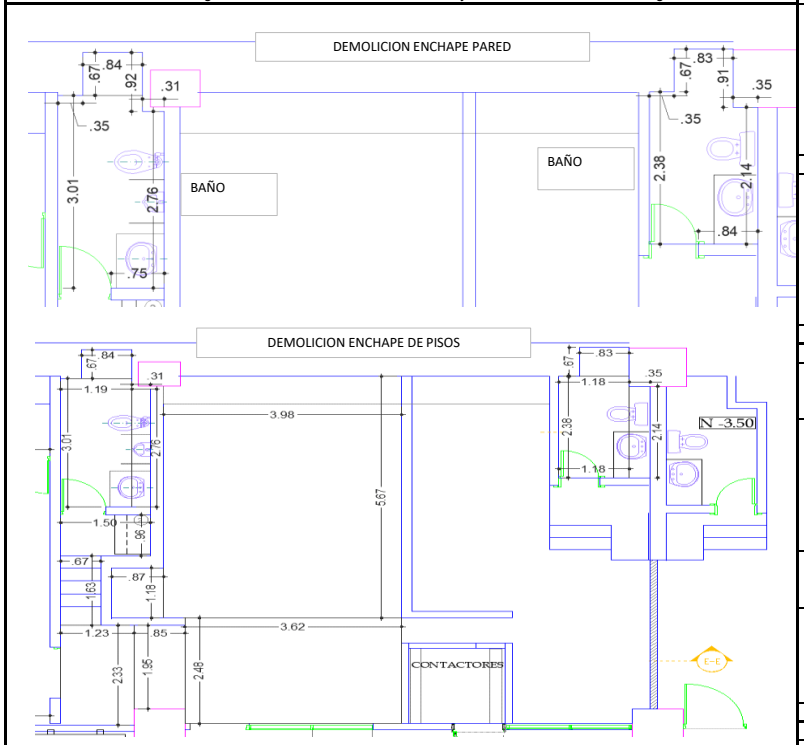

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
DEMOLICION ENCHAPE PARED						
Enchape baño oficinas seguridad	3,01		1,80	5,42	1,00	5,42
	0,35		1,80	0,63	1,00	0,63
	0,67		1,80	1,21	1,00	1,21
	0,84		1,80	1,51	1,00	1,51
	0,92		1,80	1,66	1,00	1,66
	0,31		1,80	0,56	1,00	0,56
	2,76		1,80	4,97	1,00	4,97
	0,75		1,80	1,35	1,00	1,35
Enchape baño oficina direccion.	2,38		1,80	4,28	1,00	4,28
	0,35		1,80	0,63	1,00	0,63
	0,67		1,80	1,21	1,00	1,21
	0,83		1,80	1,49	1,00	1,49
	0,91		1,80	1,64	1,00	1,64
	0,35		1,80	0,63	1,00	0,63
	2,14		1,80	3,85	1,00	3,85
	0,84		1,80	1,51	1,00	1,51
DEMOLICION ENCHAPE PISOS						
Enchape baño oficinas seguridad	0,67	0,84		0,56	1,00	0,56
	1,19	3,01		3,58	1,00	3,58
	0,31	2,76		0,86	1,00	0,86
Oficinas	0,96	1,50		1,44	1,00	1,44
	0,67	1,63		1,09	1,00	1,09
	1,23	2,33		2,87	1,00	2,87
	0,85	1,95		1,66	1,00	1,66
	2,48	3,62		8,98	1,00	8,98
	0,87	1,18		1,03	1,00	1,03
	3,98	5,67		22,57	1,00	22,57
Enchape baño oficina direccion.	1,18	2,38		2,81	1,00	2,81
	0,67	0,83		0,56	1,00	0,56
	0,35	2,11		0,74	1,00	0,74
TOTAL ITEM						**81,27**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**81,27**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Cl. 12 #7-65 PALACIO DE JUSTICIA	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**30/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	1,55	**DESCRIPCION ITEM:**	Demolición de mediacaña en concreto/mortero. (Incluye trasiego y disposición final)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

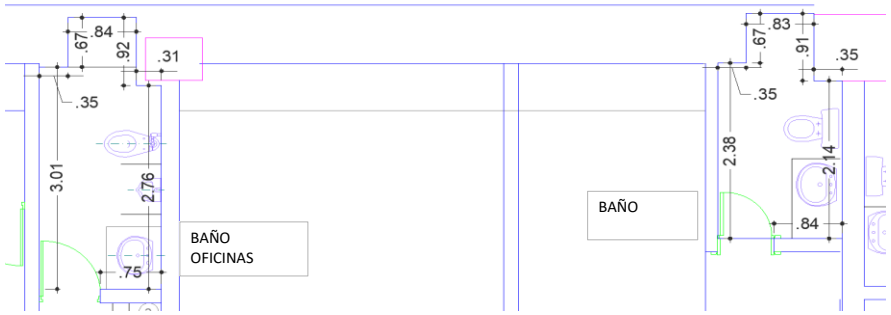

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Baño oficina de seguridad		3,01			1,00	3,01
		0,35			1,00	0,35
		0,67			1,00	0,67
		0,84			1,00	0,84
		0,92			1,00	0,92
		0,31			1,00	0,31
		2,76			1,00	2,76
		0,75			1,00	0,75
Baño oficina de administracion		2,38			1,00	2,38
		0,35			1,00	0,35
		0,67			1,00	0,67
		0,83			1,00	0,83
		0,91			1,00	0,91
		0,35			1,00	0,35
		2,14			1,00	2,14
		0,84			1,00	0,84
TOTAL ITEM						**18,08**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**18,08**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Cl. 12 #7-65 PALACIO DE JUSTICIA	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**30/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	1,56	**DESCRIPCION ITEM:**	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

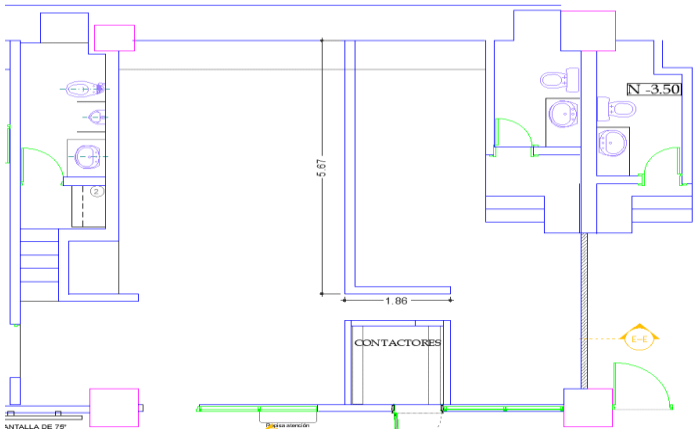

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
		5,67	3,51	19,90	1,00	19,90
		1,86	3,51	6,53	1,00	6,53
TOTAL ITEM						**26,43**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**26,43**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Cl. 12 #7-65 PALACIO DE JUSTICIA	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**30/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	1,60	**DESCRIPCION ITEM:**	Demolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

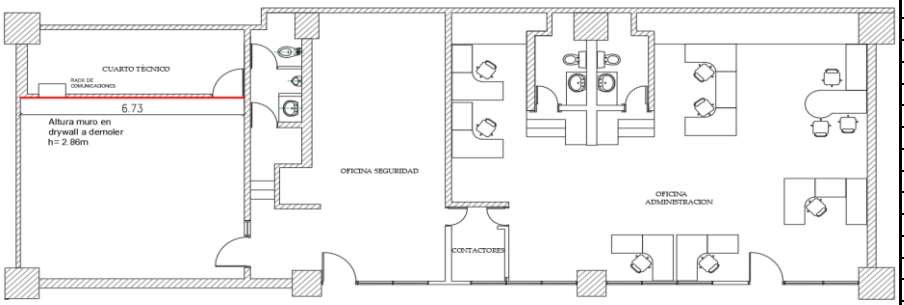

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Demolicion muro Drywall	6,73		2,86	19,25	1,00	19,25
TOTAL ITEM						**19,25**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**19,25**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Cl. 12 #7-65 PALACIO DE JUSTICIA	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**30/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	1,78	**DESCRIPCION ITEM:**	Escarificado de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

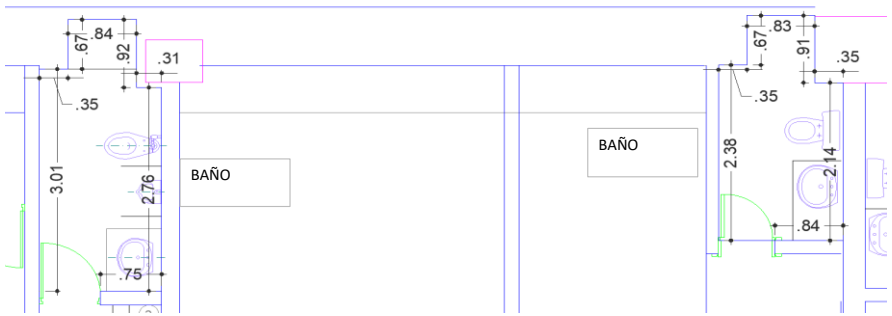

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Enchape baño oficinas seguridad	3,01		1,80	5,42	1,00	5,42
	0,35		1,80	0,63	1,00	0,63
	0,67		1,80	1,21	1,00	1,21
	0,84		1,80	1,51	1,00	1,51
	0,92		1,80	1,66	1,00	1,66
	0,31		1,80	0,56	1,00	0,56
	2,76		1,80	4,97	1,00	4,97
	0,75		1,80	1,35	1,00	1,35
Enchape baño oficina direccion.	2,38		1,80	4,28	1,00	4,28
	0,35		1,80	0,63	1,00	0,63
	0,67		1,80	1,21	1,00	1,21
	0,83		1,80	1,49	1,00	1,49
	0,91		1,80	1,64	1,00	1,64
	0,35		1,80	0,63	1,00	0,63
	2,14		1,80	3,85	1,00	3,85
	0,84		1,80	1,51	1,00	1,51
TOTAL ITEM						**32,54**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**32,54**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Cl. 12 #7-65 PALACIO DE JUSTICIA	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**30/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	1,79	**DESCRIPCION ITEM:**	Escarificado de superficies en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

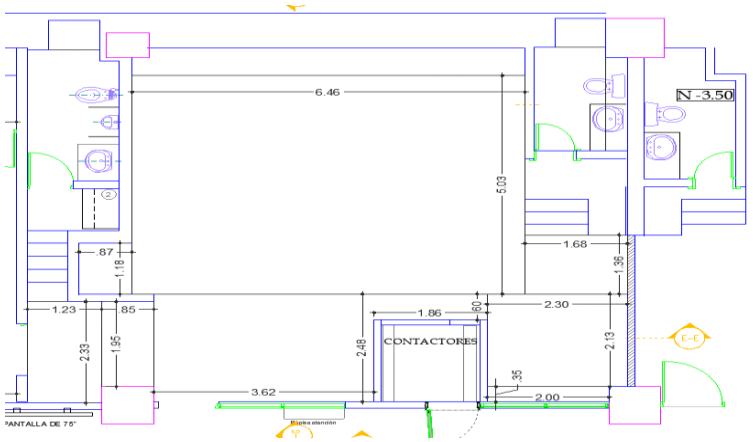

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Escarificado de superficie	1,23	2,33		2,87	1,00	2,87
	0,85	1,95		1,66	1,00	1,66
	2,48	3,62		8,98	1,00	8,98
	0,87	1,18		1,03	1,00	1,03
	5,03	6,46		32,49	1,00	32,49
TOTAL ITEM						**47,02**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**47,02**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Cl. 12 #7-65 PALACIO DE JUSTICIA	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**30/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	6,4	**DESCRIPCION ITEM:**	Muro en Super Board doble cara, e= 12 cm placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

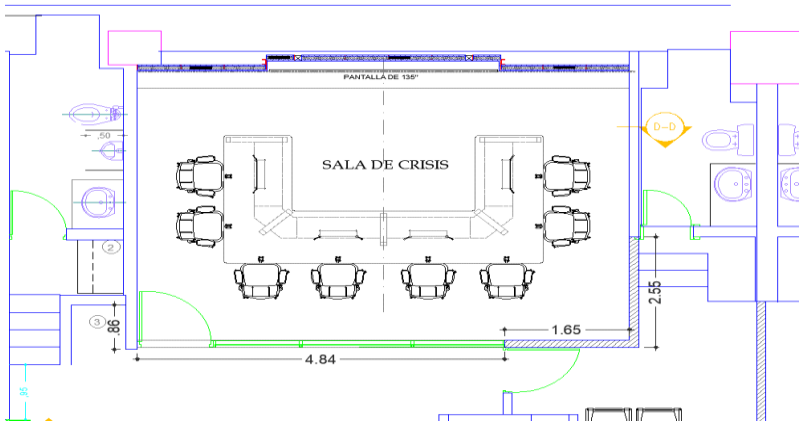

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Muro #1	0,86		3,51	3,02	1,00	3,02
Muro #2	1,65		3,51	5,79	1,00	5,79
Muro #3	2,55		3,51	8,95	1,00	8,95
DINTEL	4,86		0,82	3,99	1,00	3,99
TOTAL ITEM						**21,75**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**21,75**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Cl. 12 #7-65 PALACIO DE JUSTICIA	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**30/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	6,7	**DESCRIPCION ITEM:**	Refuerzo en listón de madera 3x11/2 en pino (suministro e instalación)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

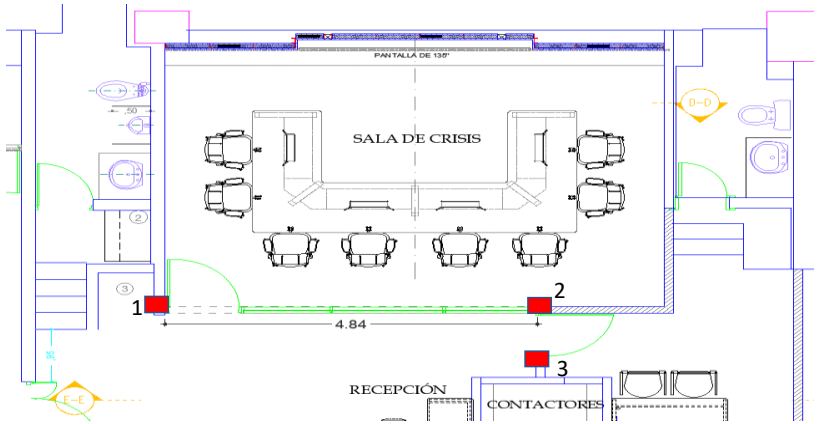

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Dintel			4,84		1,00	4,84
Refuerzo 1			2,70		1,00	2,70
Refuerzo 2			2,70		1,00	2,70
Refuerzo 3			2,70		1,00	2,70
TOTAL ITEM						**12,94**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**12,94**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Cl. 12 #7-65 PALACIO DE JUSTICIA	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**30/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	11,15	**DESCRIPCION ITEM:**	Piso en porcelanato sellado 60x60 o similar, tráfico comercial (PEI V). (Suministro e instalación)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

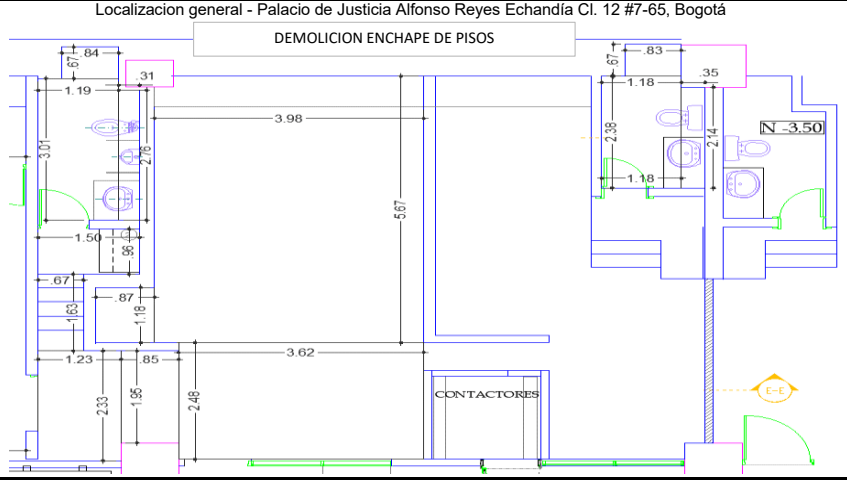

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Enchape baño oficinas seguridad	0,67	0,84		0,56	1,00	0,56
	1,19	3,01		3,58	1,00	3,58
	0,31	2,76		0,86	1,00	0,86
Enchape baño oficina direccion.	1,18	2,38		2,81	1,00	2,81
	0,67	0,83		0,56	1,00	0,56
	0,35	2,11		0,74	1,00	0,74
TOTAL ITEM						**9,10**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**9,10**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Cl. 12 #7-65 PALACIO DE JUSTICIA	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**30/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	11,41	**DESCRIPCION ITEM:**	Enchape pared cerámica 60x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

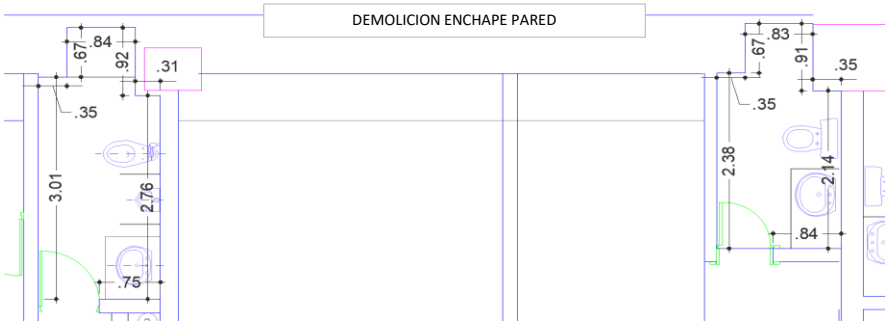

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Enchape baño oficinas seguridad	3,01		2,10	6,32	1,00	6,32
	0,35		2,10	0,74	1,00	0,74
	0,67		2,10	1,41	1,00	1,41
	0,84		2,10	1,76	1,00	1,76
	0,92		2,10	1,93	1,00	1,93
	0,31		2,10	0,65	1,00	0,65
	2,76		2,10	5,80	1,00	5,80
	0,75		2,10	1,58	1,00	1,58
Enchape baño oficina direccion.	2,38		2,10	5,00	1,00	5,00
	0,35		2,10	0,74	1,00	0,74
	0,67		2,10	1,41	1,00	1,41
	0,83		2,10	1,74	1,00	1,74
	0,91		2,10	1,91	1,00	1,91
	0,35		2,10	0,74	1,00	0,74
	2,14		2,10	4,49	1,00	4,49
	0,84		2,10	1,76	1,00	1,76
TOTAL ITEM						**37,97**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**37,97**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Cl. 12 #7-65 PALACIO DE JUSTICIA	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**30/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	16,8	**DESCRIPCION ITEM:**	Sistema de descarga de tazas (fluxometro ó válvula). sumin e instalacion			**UNIDAD DE MEDIDA:**	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

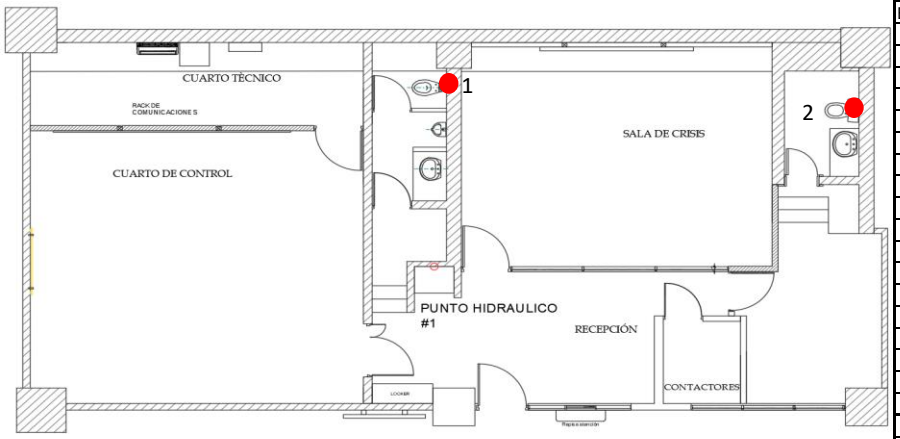

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Baño oficinas					1,00	1,00
Baño Director					1,00	1,00
TOTAL ITEM						**2,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**2,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Cl. 12 #7-65 PALACIO DE JUSTICIA	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**30/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	17,34	**DESCRIPCION ITEM:**	Punto hidráulico 1-1/4" para Sanitario con fluxómetro/válvula antivandálica (Suministro e instalación Incluye tubería y accesorios)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

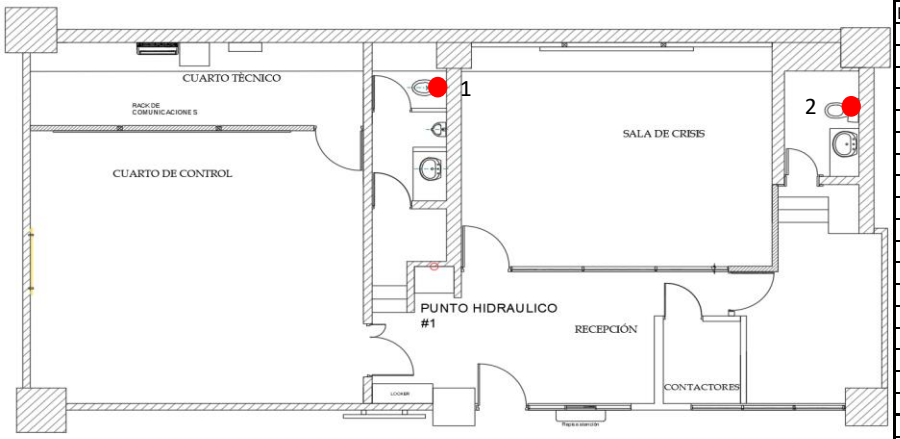

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Baño oficinas					1,00	1,00
Baño Director					1,00	1,00
TOTAL ITEM						**2,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**2,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Cl. 12 #7-65 PALACIO DE JUSTICIA	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**30/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	17,37	**DESCRIPCION ITEM:**	Punto hidráulico 1/2" para lavamanos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

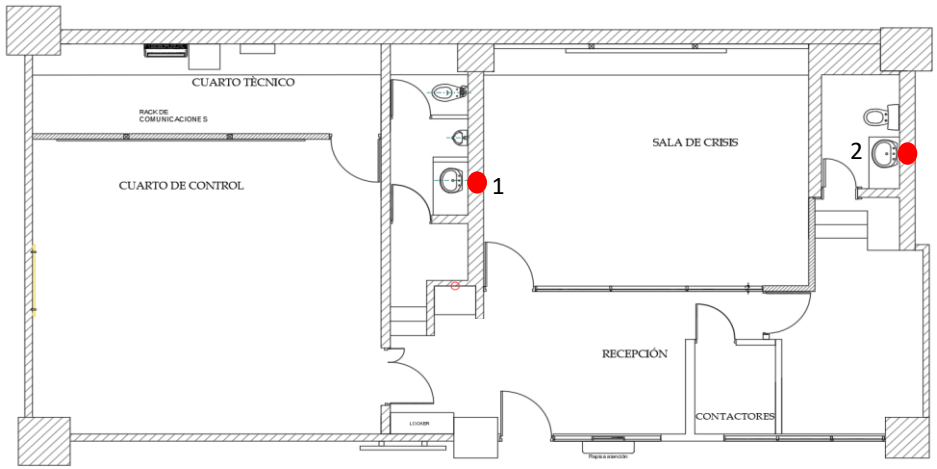

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Baño oficinas					1,00	1,00
Baño Director					1,00	1,00
TOTAL ITEM						**2,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**2,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Cl. 12 #7-65 PALACIO DE JUSTICIA	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**30/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	17,39	**DESCRIPCION ITEM:**	Punto hidráulico 1/2" para orinal. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

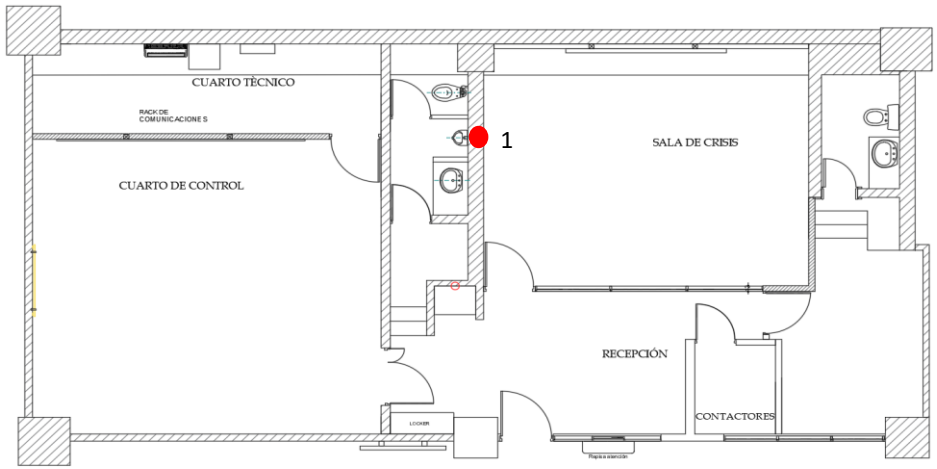

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Baño oficinas					1,00	1,00
TOTAL ITEM						**1,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**1,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Cl. 12 #7-65 PALACIO DE JUSTICIA	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**30/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	17,40	**DESCRIPCION ITEM:**	Punto hidráulico 1/2" para llave terminal manguera. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)			**UNIDAD DE MEDIDA:**	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

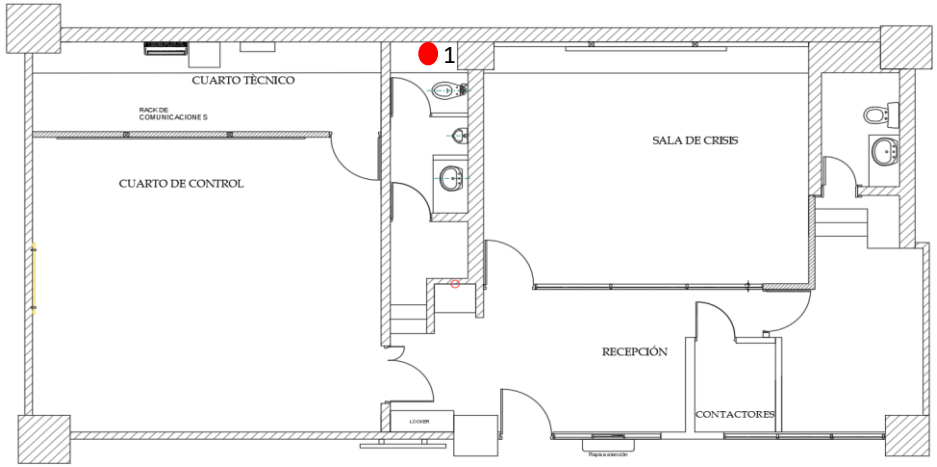

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Baño oficinas lava traperos					1,00	1,00
TOTAL ITEM						**1,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**1,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Cl. 12 #7-65 PALACIO DE JUSTICIA	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**30/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	18,11	**DESCRIPCION ITEM:**	Punto desague PVC Sanitario 2"			**UNIDAD DE MEDIDA:**	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

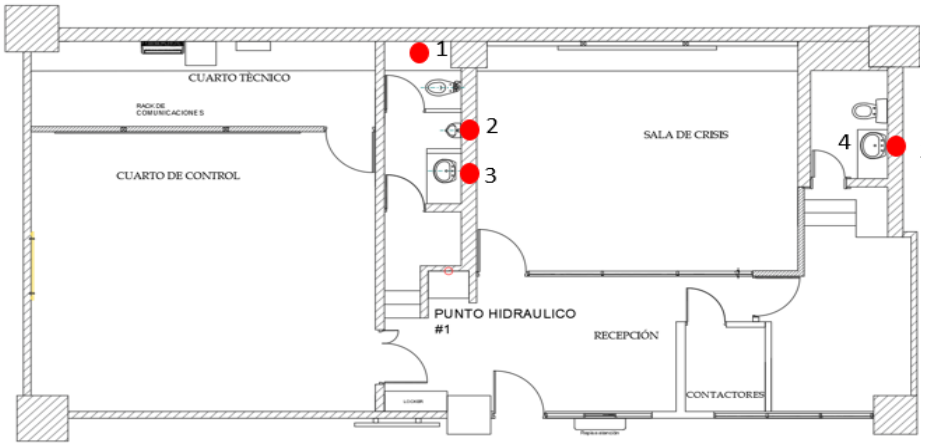

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Baño oficinas					3,00	3,00
Baño Director					1,00	1,00
TOTAL ITEM						**4,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**4,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Cl. 12 #7-65 PALACIO DE JUSTICIA	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**14**	**FECHA:**	**30/07/2026**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	18,13	**DESCRIPCION ITEM:**	Punto desague PVC Sanitario 4"			**UNIDAD DE MEDIDA:**	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

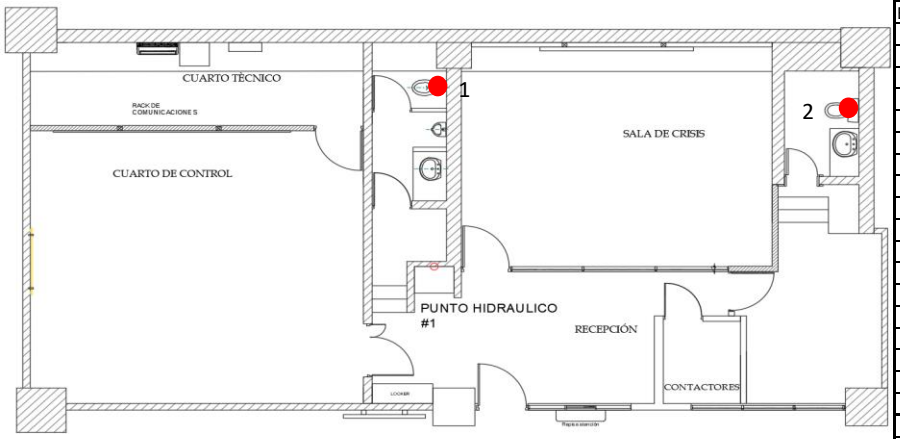

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Baño oficinas					1,00	1,00
Baño Director					1,00	1,00
TOTAL ITEM						**2,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**2,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
