9711

ANEXO 4. COMITÉ DE SEGUIMIENTO

9712

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRA No. 001

Seguimiento del Contrato de Obra No. 326 de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de Obra No.	326 de 2025
Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Entidad contratante	Alcaldía Municipal de Saravena – NIT 800.102.799-6
Unidad ejecutora	Secretaría de Planeación e Infraestructura
Contratista	Consorcio Vías Sarare 2025 – NIT 901.997.518-1
Representante legal contratista	Harley Davidson Arciniegas Arias
Interventoría externa	Consorcio Intervial Saravena. – Nit 902.008.158-3
Representante legal interventoría	Arlen Yohanna Ramirez Gamboa
Supervisión del contrato de Interventoría	Secretaría de Planeación e Infraestructura – resolución No. 3165 del 17 de diciembre de 2025
Acto de adjudicación	Resolución No. 2139 del 29 de septiembre de 2025
Valor inicial del contrato	$ 17.247.908.710,84
Plazo de ejecución	Doce (12) meses
Fecha de inicio	17 de diciembre de 2025
Lugar y fecha del comité	Saravena, Arauca — 31 de agosto de 2026

2. ASISTENTES

En el municipio de Saravena, departamento de Arauca, a los Treinta y Un (31) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026), se reunieron en Comité Técnico de Obra los siguientes profesionales, en representación de la Entidad Contratante, el Contratista y la Interventoría del Contrato de Obra No. 326 de 2025:

Nombre	Cargo	Entidad
Ing. Maria Fernando Coba Palomino	Profesional de Apoyo – Secretaría de Planeación e Infraestructura	Alcaldía Municipal de Saravena
Arley Davidson Arciniegas Arias	Representante Legal Obra	Consorcio Vías Sarare 2025
Ing. Jonsson Julian Contreras	Residente de Obra	Consorcio Vías Sarare 2025
Ing. Arlen Yohanna Ramirez Gamboa	Representante Legal de Interventoría	Consorcio Intervial Saravena
Ing. Luis Carlos Acevedo Villamizar	Residente de Interventoría	Consorcio Intervial Saravena

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES							CANTIDADES EJECUTADAS PARCIAL No. 01		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
1		**REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES DE OBRA**				**387.772.324,00**		**380.462.324,00**		**0,00**		**380.462.324,00**
1,1	72141103	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN CON RETIRO A UNA DISTANCIA DE 8,2KM	M3	768,52	$ 57.000,00	$ 43.805.640,00	768,52	$ 43.805.640,00	0,00	$ -	768,52	$ 43.805.640,00
1,2	72141103	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 8,2KM	M3	166,63	$ 170.000,00	$ 28.327.100,00	166,63	$ 28.327.100,00	0,00	$ -	166,63	$ 28.327.100,00
1,3	72141103	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	46.586,96	$ 5.400,00	$ 251.569.584,00	46.586,96	$ 251.569.584,00	0,00	$ -	46.586,96	$ 251.569.584,00
1,4	72141103	TALA DE ARBOL 0.10 M > Ø < 0.50 M; INCLUYE APEO, DESRAMADO, TROCEO, PELADO, REPIQUE, APILADO Y RETIRO A UNA DISTANCIA DE 8,2KM	UND	298,00	$ 215.000,00	$ 64.070.000,00	264,00	$ 56.760.000,00	0,00	$ -	264,00	$ 56.760.000,00
2		**CONSTRUIR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**				**12.614.292.687,37**		**6.693.469.926,26**		**3.692.117.500,94**		**10.385.587.427,20**
2,1	72141103	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLEN EN MATERIAL CRUDO TAMAÑO 4"	M3	18.679,94	$ 162.556,00	$ 3.036.536.326,64	18.679,94	$ 3.036.536.326,64	0,00	$ -	18.679,94	$ 3.036.536.326,64
2,2	72141103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL DE T-2400	M2	41.523,16	$ 16.589,00	$ 688.827.701,24	41.523,16	$ 688.827.701,24	0,00	$ -	41.523,16	$ 688.827.701,24

9713

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES							CANTIDADES EJECUTADAS PARCIAL No. 01		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
		COLORES. (TIPO E)										
4		**REALIZAR AMPLIACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EXISTENTES**				**111.289.384,60**		**111.289.384,60**		**0,00**		**111.289.384,60**
4,1	72141103	EXCAVACIÓN MANUAL COMÚN CON RETIRO A UNA DISTANCIA DE 8,2KM	M3	19,52	$ 88.796,00	$ 1.733.297,92	19,52	$ 1.733.297,92	0,00	$ -	19,52	$ 1.733.297,92
4,2	72141103	CONCRETO DE LIMPIEZA F'C=2000 PSI E=0.05 M (SOLADO) ELABORADO IN SITU	M2	47,14	$ 44.586,00	$ 2.101.784,04	47,14	$ 2.101.784,04	0,00	$ -	47,14	$ 2.101.784,04
4,3	72141103	CONCRETO CLASE C F'C=21 Mpa - 3000 PSI ELABORADO IN SITU	M3	7,70	$ 1.144.839,00	$ 8.815.260,30	7,70	$ 8.815.260,30	0,00	$ -	7,70	$ 8.815.260,30
4,4	72141103	CONCRETO CLASE C F'C=28 Mpa - 4000 PSI ELABORADO IN SITU	M3	19,42	$ 1.218.152,00	$ 23.656.511,84	19,42	$ 23.656.511,84	0,00	$ -	19,42	$ 23.656.511,84
4,5	72141103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V15 SIKA O SIMILAR	M	31,88	$ 125.381,00	$ 3.997.146,28	31,88	$ 3.997.146,28	0,00	$ -	31,88	$ 3.997.146,28
4,6	72141103	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 "	M3	4,80	$ 130.055,00	$ 624.264,00	4,80	$ 624.264,00	0,00	$ -	4,80	$ 624.264,00
4,7	72141103	ACERO DE REFUERZO Fy= 60000 PSI	KG	3.761,63	$ 13.794,00	$ 51.887.924,22	3.761,63	$ 51.887.924,22	0,00	$ -	3.761,63	$ 51.887.924,22

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES							CANTIDADES EJECUTADAS PARCIAL No. 01		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
5,8	72141103	SUBBASE GRANULAR PARA ATRAQUE Y RELLENO DE TUBERIA	M3	127,04	$ 168.150,00	$ 21.361.776,00	127,04	$ 21.361.776,00	0,00	$ -	127,04	$ 21.361.776,00
5,9	72141103	TUBERIA DE PLÁSTICO PVC DE 36 PULGADAS	M	117,00	$ 2.187.522,00	$ 255.940.074,00	117,00	$ 255.940.074,00	0,00	$ -	117,00	$ 255.940.074,00
6		**CONSTRUIR ESTRUCTURAS ESPECIALES (PUENTE)**				**1.082.726.565,50**		**775.235.709,50**		**37.539.914,00**		**812.775.623,50**
6,1	72141103	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL CONGLOMERADO CON MANEJO DE AGUAS POR BOMBEO INCLUYE RETIRO A UNA DISTANCIA DE 8,2KM	M3	711,79	$ 94.000,00	$ 66.908.260,00	711,79	$ 66.908.260,00	0,00	$ -	711,79	$ 66.908.260,00
6,2	72141103	CONCRETO CLASE C F'C= 28 MPa - 4000 PSI ELABORADO IN SITU INCLUYE FORMALETA METALICA	M3	298,49	$ 1.615.700,00	$ 482.270.293,00	171,91	$ 277.754.987,00	12,30	$ 19.873.110,00	184,21	$ 297.628.097,00
6,3	72141103	DRENAJE EN TUBERIA PVC DE 6 PULGADAS L=0.40M	UND	20,00	$ 28.959,00	$ 579.180,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,4	72141103	BARANDA METÁLICA EN TUBO Ø4" SCH 40	M	48,00	$ 1.322.877,00	$ 63.498.096,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,5	72141103	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 "	M3	245,62	$ 130.000,00	$ 31.930.600,00	122,81	$ 15.965.300,00	122,81	$ 15.965.300,00	245,62	$ 31.930.600,00

9775

CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA


CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES							CANTIDADES EJECUTADAS PARCIAL No. 01		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
7,1	72141103	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL CONGLOMERADO CON MANEJO DE AGUAS POR BOMBEO INCLUYE RETIRO A UNA DISTANCIA DE 8,2KM	M3	436,24	$ 94.000,00	$ 41.006.560,00	436,24	$ 41.006.560,00	0,00	$ -	436,24	$ 41.006.560,00
7,2	72141103	CONCRETO CLASE C F'C= 28 MPa - 4000 PSI ELABORADO IN SITU INCLUYE FORMALETA METALICA	M3	354,16	$ 1.615.700,00	$ 572.216.312,00	279,60	$ 451.749.720,00	74,56	$ 120.466.592,00	354,16	$ 572.216.312,00
7,3	72141103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE NT-2000	M2	311,60	$ 14.000,00	$ 4.362.400,00	246,00	$ 3.444.000,00	65,60	$ 918.400,00	311,60	$ 4.362.400,00
7,4	72141103	DRENAJE EN TUBERIA PVC DE 2 PULGADAS L=0.45 M	UND	128,00	$ 17.000,00	$ 2.176.000,00	0,00	$ -	128,00	$ 2.176.000,00	128,00	$ 2.176.000,00
7,5	72141103	DRENAJE EN TUBERIA PVC DE 4 PULGADAS	M	76,00	$ 31.000,00	$ 2.356.000,00	0,00	$ -	76,00	$ 2.356.000,00	76,00	$ 2.356.000,00
7,6	72141103	BARANDA METÁLICA EN TUBO Ø3" SCH 40	M	76,00	$ 1.045.000,00	$ 79.420.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,7	72141103	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 "	M3	714,10	$ 130.000,00	$ 92.833.000,00	563,76	$ 73.288.800,00	150,34	$ 19.544.200,00	714,10	$ 92.833.000,00
7,8	72141103	ACERO DE REFUERZO Fy = 60000 PSI	KG	24.923,84	$ 13.794,00	$ 343.799.448,96	24.923,84	$ 343.799.448,96	0,00	$ -	24.923,84	$ 343.799.448,96

2176

6. BALANCE FISICO Y FINANCIERO

De acuerdo con las cantidades ejecutadas parcialmente, se presenta el siguiente balance financiero del contrato de obra No. 326 de 2025.

VALOR DEL CONTRATO	**$ 17.247.908.710,84**	**PORCENTAJE DE EJECUCION**
VALOR DEL ANTICIPO (50% VR CONTRATO)	$ 8.623.954.355,42	
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	$ 10.414.617.710,02	60,38%
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO SEGÚN ACTA PARCIAL No. 01	$ 5.207.143.639,80	
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL No. 01	$ 5.207.474.070,22	
VALOR ACTA PARCIAL No. 02	$ 3.938.442.713,26	22,83%
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO SEGÚN ACTA PARCIAL No. 02	$ 1.968.848.779,34	
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 1.969.593.933,92	
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 14.353.060.423,28	83,21%

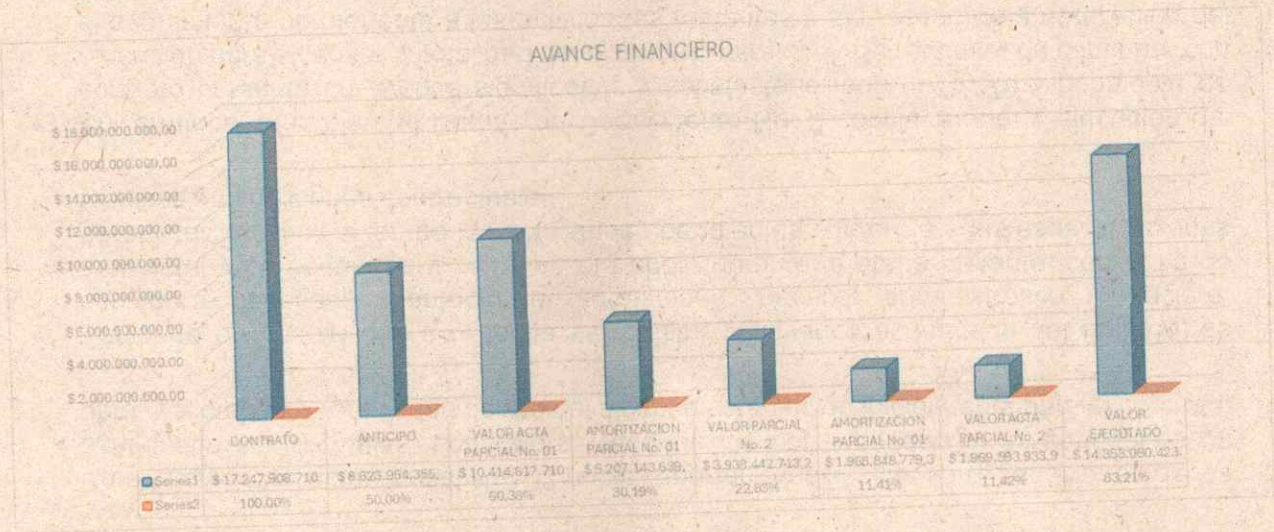

7. CONCLUSIONES

- De acuerdo con el seguimiento realizado durante el periodo objeto de la presente Acta Parcial No. 02, se evidenció la continuidad en la ejecución de las actividades contempladas dentro del alcance contractual, alcanzando un avance físico acumulado del **83,21%.** Este porcentaje corresponde a un avance anterior del **60,38%, registrado en el Acta Parcial No. 01**, y un avance adicional del 22,83% correspondiente a la presente acta.

- El valor del Contrato de Obra No. 326 de 2025 asciende a $17.247.908.710,84. Con la presente Acta Parcial No. 02 se acredita un valor de obra ejecutada de $3.938.442.713,26, correspondiente al 22,83% del valor contractual, para un valor ejecutado acumulado a la fecha de $14.353.060.423,28, equivalente al 83,21% del contrato.

6 de 6

Ing. Arlen Yohanna Ramirez Gamboa *Representante Legal* CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA	**Ing. Luis Carlos Villamizar** *Residente de Interventoría* CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA
Ing. Maria Fernanda Coba Palomino *Profesional de Apoyo – Secretaría de Planeación e Infraestructura* Alcaldía Municipal de Saravena	
