10452

CONSORCIO VIAS SARARE 2025 NIT: 901997518-1	SEPARADORES	CODIGO	CVS-SVNA-SEP-001	
		N° VER	F. APROB.	F. REV
		1	17/12/2025	17/12/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO
PARCIAL No. 02

10453

REGISTRO FOTOGRAFICO PARCIAL No. 02

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
01	01/09/2026	Creación del documento	Jonsson Julian Contreras	Javier Francisco Pineda	Oneximo Hanry Jaimes
Cargo			Ingeniero Residente	Director de Obra	Director de Interventoría

10455

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL CONTRATO DE OBRA 326 DE 2025



PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

OBJETO:
"MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

ELABORADO POR:
CONSORCIO VIAS SARARE 2025
R/L HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS

ENTREGADO A:
CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA
R/L. ARLEN YOHANNA RAMIREZ GAMBOA

MUNICIPIO DE SARAVENA
SEPTIEMBRE, 2026

INTRODUCCIÓN

El presente registro fotográfico documenta las actividades ejecutadas en el marco del Contrato de Obra No. 326 de 2025, cuyo objeto corresponde al **MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA DE ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**

Las imágenes presentadas evidencian el estado de avance de las obras desarrolladas durante el período comprendido entre el 01 de julio de 2026 y el 31 de agosto de 2026, incluyendo actividades relacionadas con obras preliminares, conformación de la estructura vial, obras de drenaje, estructuras especiales y demás intervenciones ejecutadas dentro del alcance contractual.

1.1. LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra localizado en zona rural en territorio del municipio de Saravena en el Departamento de Arauca, y está definido por las siguientes coordenadas:

Tabla 1 Coordenadas Del Proyecto

TRAMO A INTERVENIR									
Descripción		Coordenadas							
Tramo	Dirección	ID	Abscisa	Coordenadas Planas		Coordenadas elipsoidales		Simbología	Longitud (m)
				Norte	Este	Latitud	Longitud		
Tramo 1	Vía vereda Unión Alto de Satoca – Planta de tratamiento	Inicio	K2+850	1256443.41	910083.73	6°54'52.14"	71°53'28.20"		5063.8
		Fin	K7+913.80	1254239.91	906383.63	6°53'40.40"	71°55'28.72"		
Longitud Total (m)									5063.8

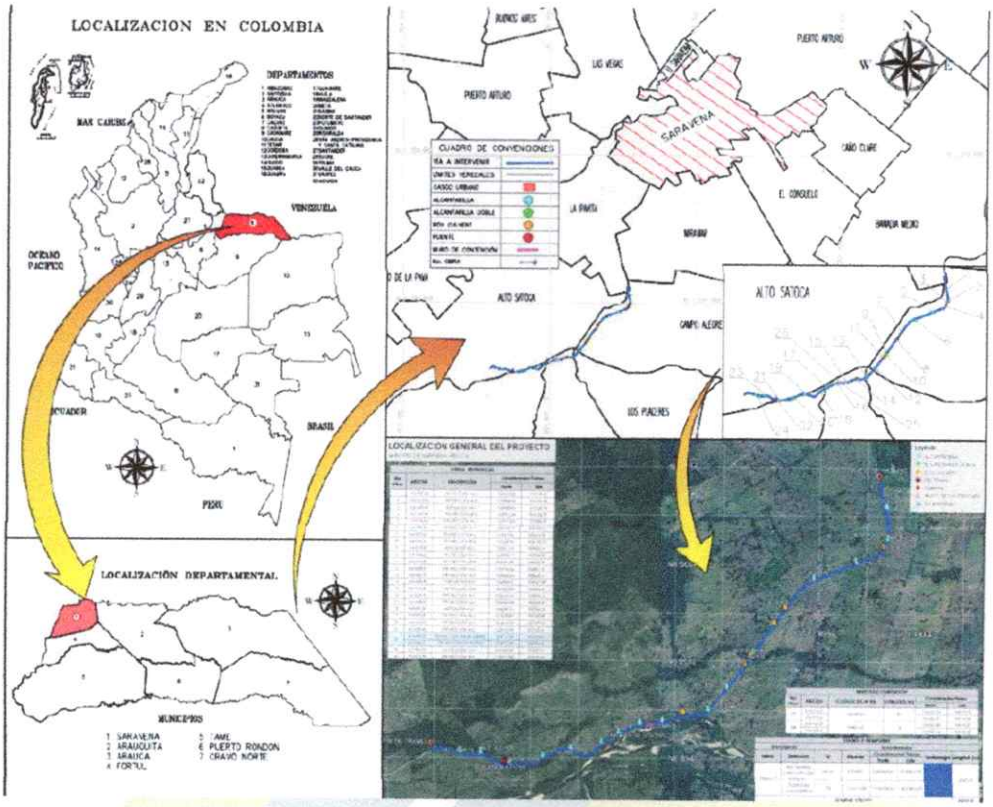


Ilustración 1 Localizacion específica

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

2.1.1. Informe Contractual – Ficha Técnica del contrato de obra.

Tabla 2 Ficha Técnica

FICHA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA 326/2025	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE SARAVENA**
INTERVENTOR EXTERNO:	**CONSORCIO INTERVIAL SARAVENA**
APOYO A LA SUPERVISION:	**MARIA FERNANDA COBA PALOMINO**
CONTRATO No:	**326 DE 2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA**

FICHA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA 326/2025	
	POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA:	**CONSORCIO VÍAS SARARE 2025**
REPRESENTANTE:	**HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS**
NIT. No:	**900.997.518-1**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 17.247.908.710,84**
PLAZO CONTRACTUAL:	**DOCE (12) MESES**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**SGR2125 DEL 27/03/2025 MPIO 20250277DEL 27/03/2025**
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**SGR2925 DEL 27/11/2025 MPIO 20251410 DEL 27/11/2025**
FECHA INICIO:	**17/12/2025**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**16/12/2026**
PERIODO DEL INFORME	
PERIODO DE INFORME	**DEL 01 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE AGOSTO DE 2026**
DIAS TRANSCURRIDOS:	**258**

3. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADA

Para el periodo comprendido entre el **01 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE AGOSTO DE 2026**, la firma contratista bajo la supervisión y control de la Interventoría externa, ha ejecutado las siguientes actividades de los ítems del contrato:

ITEM 2.4 BASE GRANULAR CLASE C

ACTIVIDAD:	BASE GRANULAR CLASE C		
ITEM: 2.4		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	5934.95	CANTIDAD ACUMULADA:	5934.95
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	1832.95	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%





ACTIVIDAD:	BASE GRANULAR CLASE C
ITEM: 2.4	UNIDAD: M3





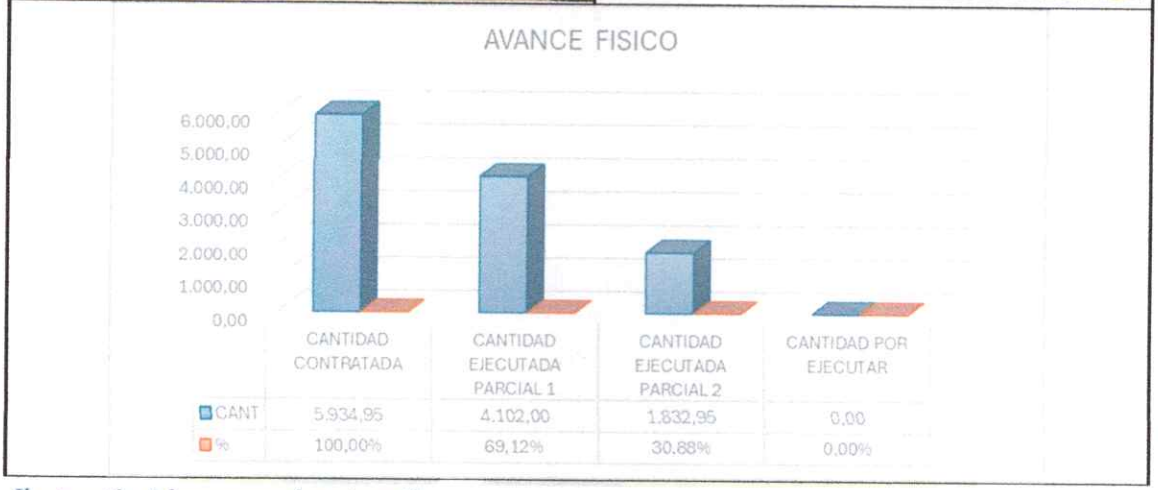



Ilustración 1 base granular clase C

ITEM 2.5 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-57

ACTIVIDAD:	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-57		
ITEM: 2.5		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	37.978,50	CANTIDAD ACUMULADA:	22.500
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	22.500,00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	15.478,50
PORCENTAJE EJECUTADO:	59.24%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	40.76%

ACTIVIDAD:	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-57
ITEM: 2.5	UNIDAD: M2



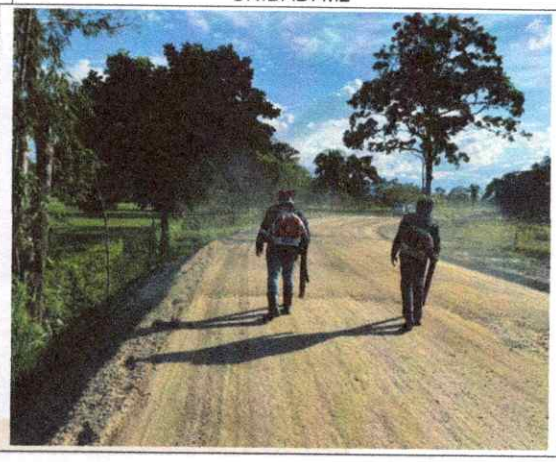

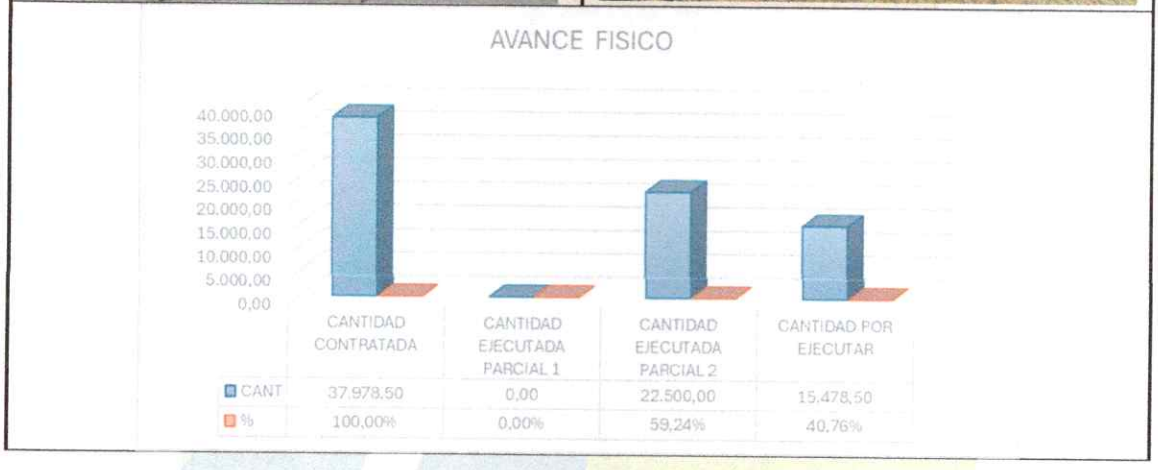


Ilustración 17 Riego De Imprimación Con Emulsión Asfaltica Crl-57

ITEM 2.6 MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19

ACTIVIDAD:	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19		
ITEM: 2.6		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	3071.06	CANTIDAD ACUMULADA:	1.819,49
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	1.819,49	CANTIDAD POR EJECUTAR:	1.252,11
PORCENTAJE EJECUTADO:	59.24%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	40.76%

ACTIVIDAD:	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19
ITEM: 2.6	UNIDAD: M3







Ilustración 17 Mezcla Asfáltica Densa En Caliente Tipo Mdc-19

ITEM 6.2 CONCRETO CLASE C F'C= 28 MPa - 4000 PSI ELABORADO IN SITU INCLUYE FORMALETA METALICA

ACTIVIDAD:	CONCRETO CLASE C F'C= 28 MPa - 4000 PSI ELABORADO IN SITU INCLUYE FORMALETA METALICA		
ITEM: 6.2		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	298.49	CANTIDAD ACUMULADA:	184.21
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	12.30	CANTIDAD POR EJECUTAR:	114.28
PORCENTAJE EJECUTADO:	61.72%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	38.28%

ACTIVIDAD:	CONCRETO CLASE C F'C= 28 MPa - 4000 PSI ELABORADO IN SITU INCLUYE FORMALETA METALICA
ITEM: 6.2	UNIDAD: M3





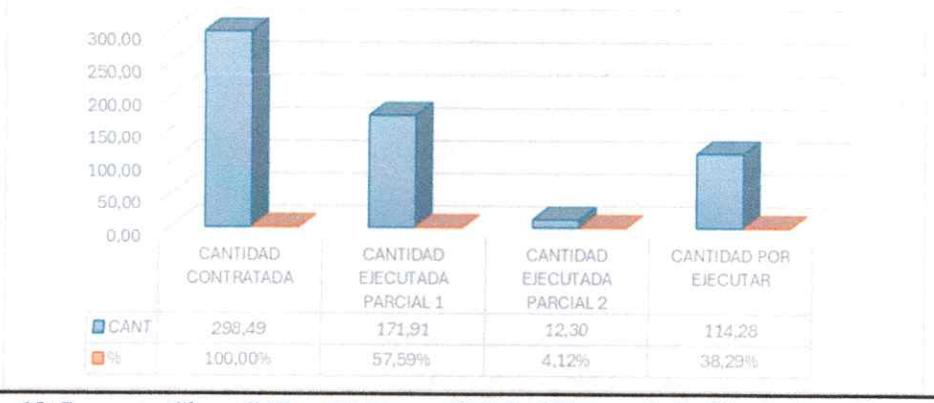


Ilustración 18 Concreto Clase C F'c= 28 Mpa - 4000 Psi Elaborado In Situ Incluye Formaleta Metalica

ITEM 6.5 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 "

ACTIVIDAD:	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 "		
ITEM: 6.5		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	245.62	CANTIDAD ACUMULADA:	245.62
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	122.81	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100.00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	100.00%

ACTIVIDAD:	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 "
ITEM: 6.5	UNIDAD: M3





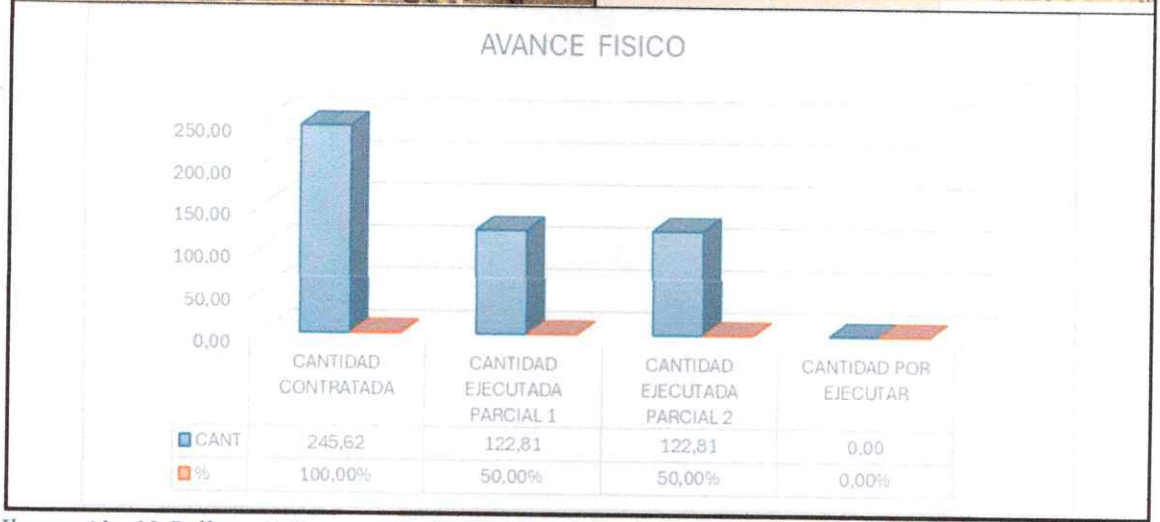


Ilustración 19 Relleno Y Compactación Con Material Crudo De Rio Tamaño 4 "

ITEM 6.13 DRENAJE EN TUBERIA PVC DE 4 PULGADAS

ACTIVIDAD:	DRENAJE EN TUBERIA PVC DE 4 PULGADAS		
ITEM: 6.13		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	27.20	CANTIDAD ACUMULADA:	27.20
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	27.20	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	100%

ACTIVIDAD:	DRENAJE EN TUBERIA PVC DE 4 PULGADAS
ITEM: 6.13	UNIDAD: ML

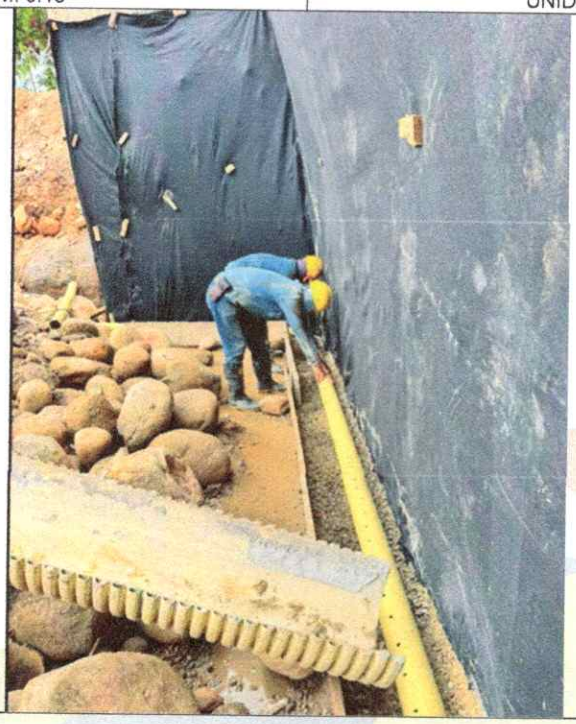


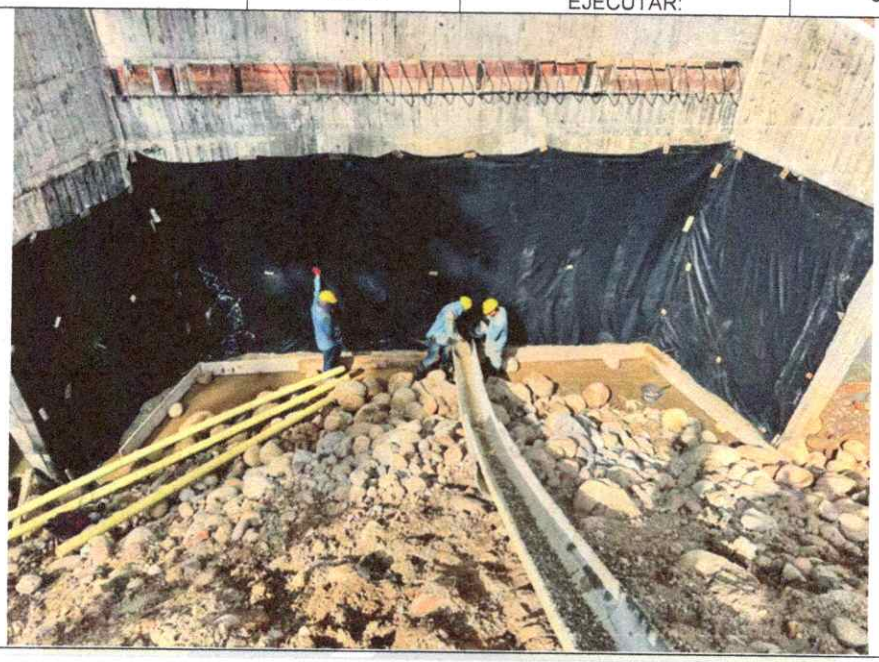


Ilustración 18 Drenaje En Tuberia Pvc De 4 Pulgadas

ITEM 6.14 DRENAJE EN TUBERIA PVC DE 2 PULGADAS L=0.70 M

ACTIVIDAD:	DRENAJE EN TUBERIA PVC DE 2 PULGADAS L=0.70 M		
ITEM: 6.14		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	32.00	CANTIDAD ACUMULADA:	32.00

ACTIVIDAD:	DRENAJE EN TUBERIA PVC DE 2 PULGADAS L=0.70 M		
ITEM: 6.14		UNIDAD: UND	
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	32.00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



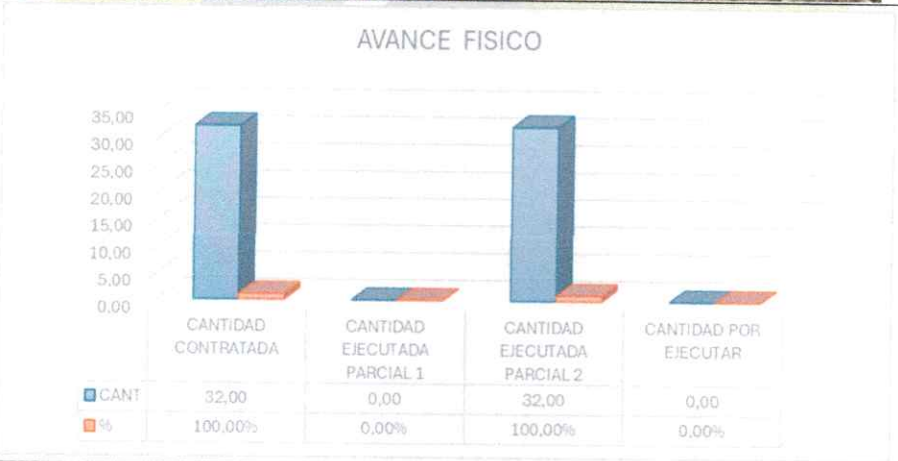


Ilustración 19 Drenaje En Tuberia Pvc De 2 Pulgadas L=0.70 M

ITEM 7.2 CONCRETO CLASE C F'C= 28 MPa - 4000 PSI ELABORADO IN SITU INCLUYE FORMALETA METALICA

ACTIVIDAD:	CONCRETO CLASE C F'C= 28 MPa - 4000 PSI ELABORADO IN SITU INCLUYE FORMALETA METALICA		
ITEM: 7.2		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	354.16	CANTIDAD ACUMULADA:	354.16

ACTIVIDAD:	CONCRETO CLASE C F'C= 28 MPa - 4000 PSI ELABORADO IN SITU INCLUYE FORMALETA METALICA		
ITEM: 7.2		UNIDAD: M3	
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	74.56	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100.00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%





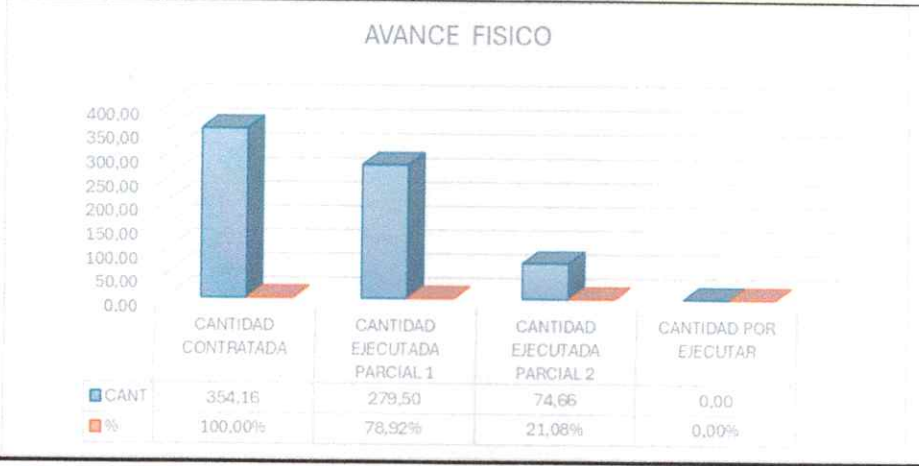


Ilustración 20 Concreto Clase C F'c= 28 Mpa - 4000 Psi Elaborado In Situ Incluye Formaleta Metalica

ITEM 7.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE NT-2000

ACTIVIDAD:	CONCRETO DE LIMPIEZA F'C=2000 PSI E=0.05M (SOLADO) ELABORADO IN SITU		
ITEM: 7.3		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	311.60	CANTIDAD ACUMULADA:	311.60
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	65.60	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100.00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

ACTIVIDAD:	CONCRETO DE LIMPIEZA F'C=2000 PSI E=0.05M (SOLADO) ELABORADO IN SITU	
ITEM: 7.3		UNIDAD: M2





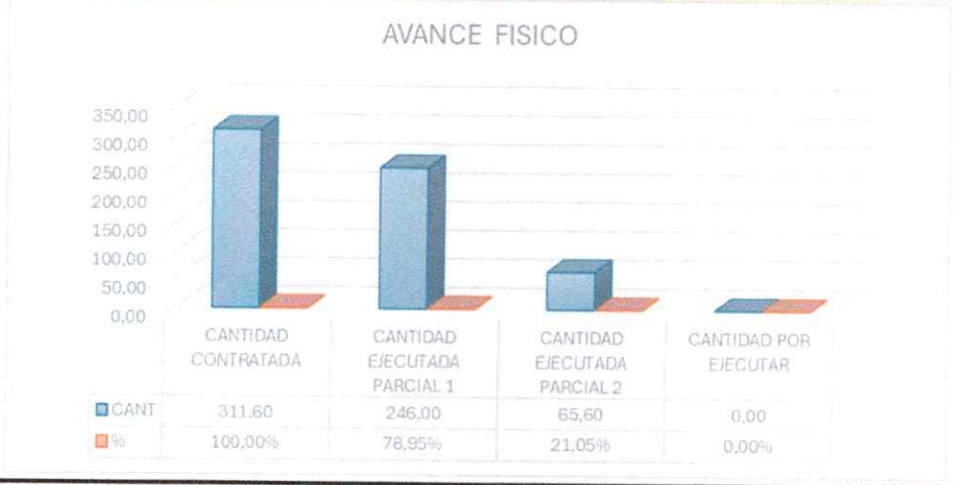


Ilustración 21 Suministro E Instalación De Geotextil No Tejido De Nt-2000

ITEM 7.4 DRENAJE EN TUBERIA PVC DE 2 PULGADAS L=0.45 M

ACTIVIDAD:	DRENAJE EN TUBERIA PVC DE 2 PULGADAS L=0.45 M		
ITEM: 7.4		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	128.00	CANTIDAD ACUMULADA:	128.00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	128.00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

ACTIVIDAD:	DRENAJE EN TUBERIA PVC DE 2 PULGADAS L=0.45 M
ITEM: 7.4	UNIDAD: UND




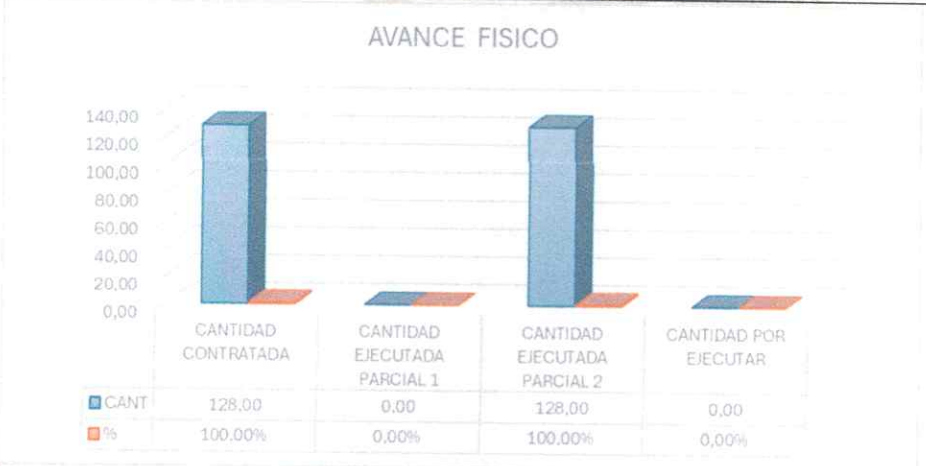


Ilustración 22 Drenaje En Tuberia Pvc De 2 Pulgadas L=0.45 M

ITEM 7.5 DRENAJE EN TUBERIA PVC DE 4 PULGADAS

ACTIVIDAD:	DRENAJE EN TUBERIA PVC DE 4 PULGADAS		
ITEM: 7.5		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	76.00	CANTIDAD ACUMULADA:	76.00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	76.00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

ACTIVIDAD:	DRENAJE EN TUBERIA PVC DE 4 PULGADAS
ITEM: 7.5	UNIDAD: ML

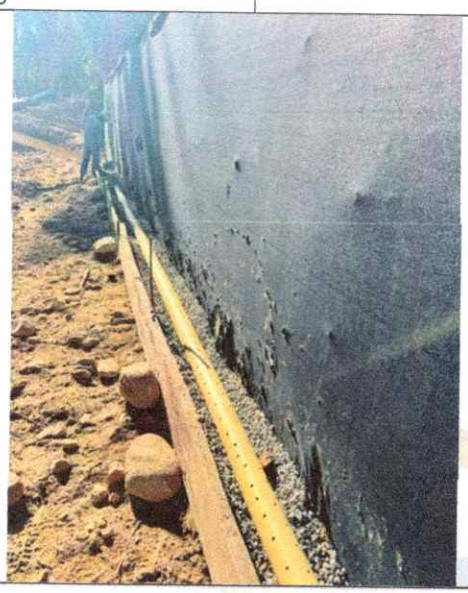

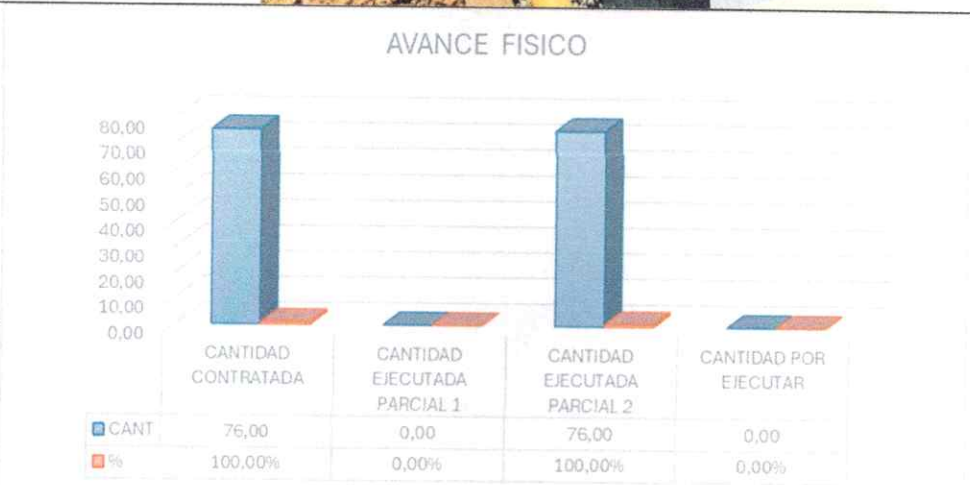


Ilustración 23 Drenaje En Tuberia Pvc De 4 Pulgadas

ITEM 7.7 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 "

ACTIVIDAD:	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 "		
ITEM: 7.7		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	714.10	CANTIDAD ACUMULADA:	714.70
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	150.34	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100.00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

ACTIVIDAD:	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 "
ITEM: 7.7	UNIDAD: M3



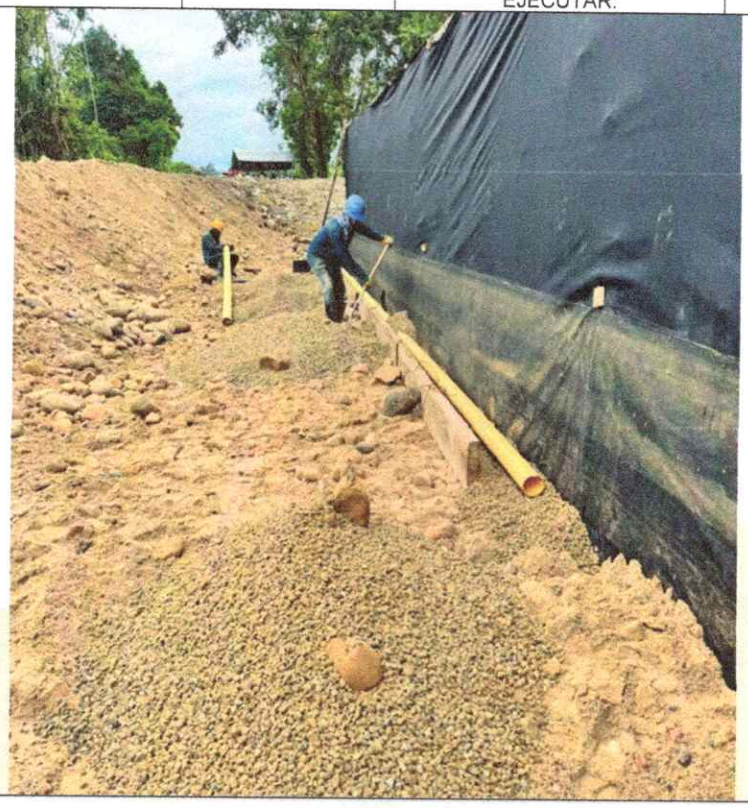


Ilustración 24 Relleno Y Compactación Con Material Crudo De Rio Tamaño 4 "

ITEM 7.9 SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL FILTRANTE

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL FILTRANTE		
ITEM: 7.9		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	114.30	CANTIDAD ACUMULADA:	114.30
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	24.06	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL FILTRANTE		
ITEM: 7.9		UNIDAD: M3	
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



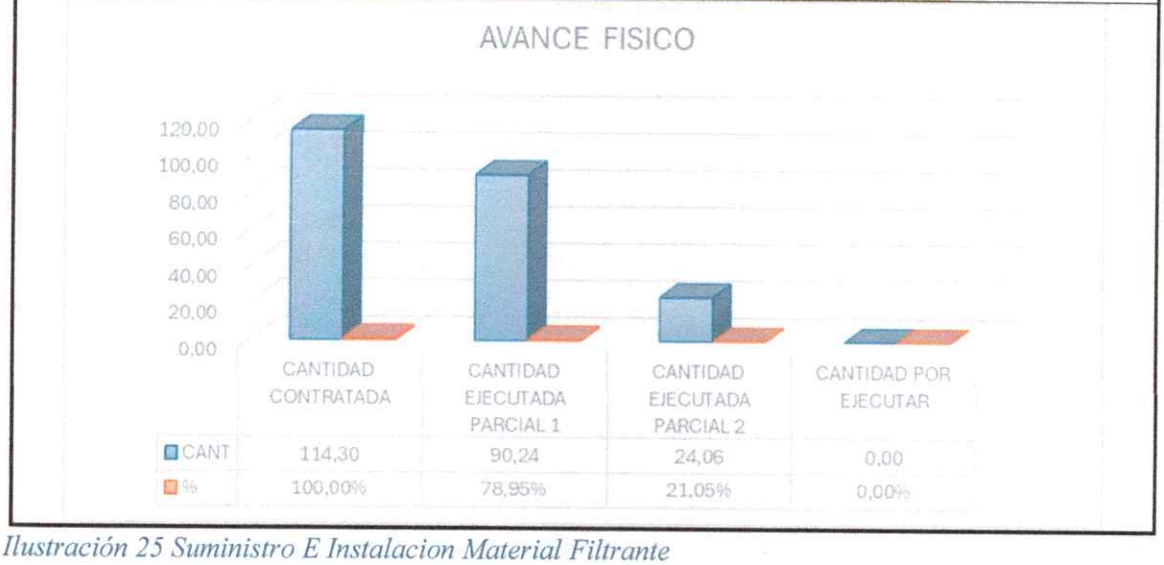



Ilustración 25 Suministro E Instalacion Material Filtrante

10472

- **Resumen General:**
- **Conformación Estructura Pavimento**



CONSORCIO VIAS SARARE 2025 NIT: 901997518-1	REGISTRO FOTOGRAFICO	CODIGO	CVS-SVNA-REG-FOT-002	
		N° VER	F. APROB.	F. REV
	Página 21 de 23	1	17/12/2025	17/12/2025

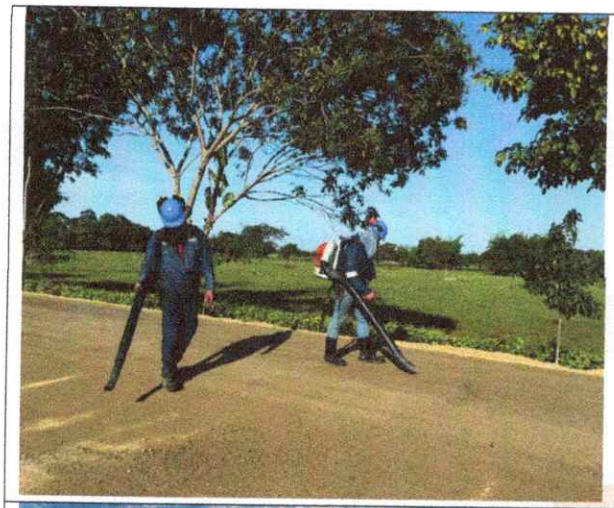











- **Puente Especial L= 24 M**



10475

- **MURO DE CONTENCIÓN:**



Elaboró:

JONSSON JULIAN CONTRERAS CELON
Ingeniero Residente De Obra
M.P. 54202-403893 NTS
