INFORME MENSUAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 178-2025

CONTRATISTA: GENSA S.A. E.S.P.

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE

MANIZALES, CALDAS, COLOMBIA

ABRIL DE 2026

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS 3
3. ALCANCE 3
4. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO: 4
5. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA 6
6. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO: 7
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO 17
8. GESTIÓN FINANCIERA 22
9. ASPECTOS JURÍDICOS 24
10. COMPONENTE TÉCNICO 24
11. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 28
12. INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE CONTRATOS SUSCRITOS. 28
13. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 29
14. COMPONENTE SOCIAL 29
15. CONCLUSIONES 29
16. ANEXOS: 32


1. INTRODUCCIÓN

El IPSE y GENSA S.A. ESP., suscribieron el Contrato interadministrativo IPSE No. 178-2025 el 20 de mayo de 2025, cuyo objeto es “REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y GERENCIA DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL”.

En ejecución del Contrato en mención, se presenta a continuación el informe de las actividades adelantadas por GENSA durante el mes de noviembre de 2025.

2. LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS

Los proyectos asociados al contrato interadministrativo se encuentran distribuidas en el territorio nacional, así:

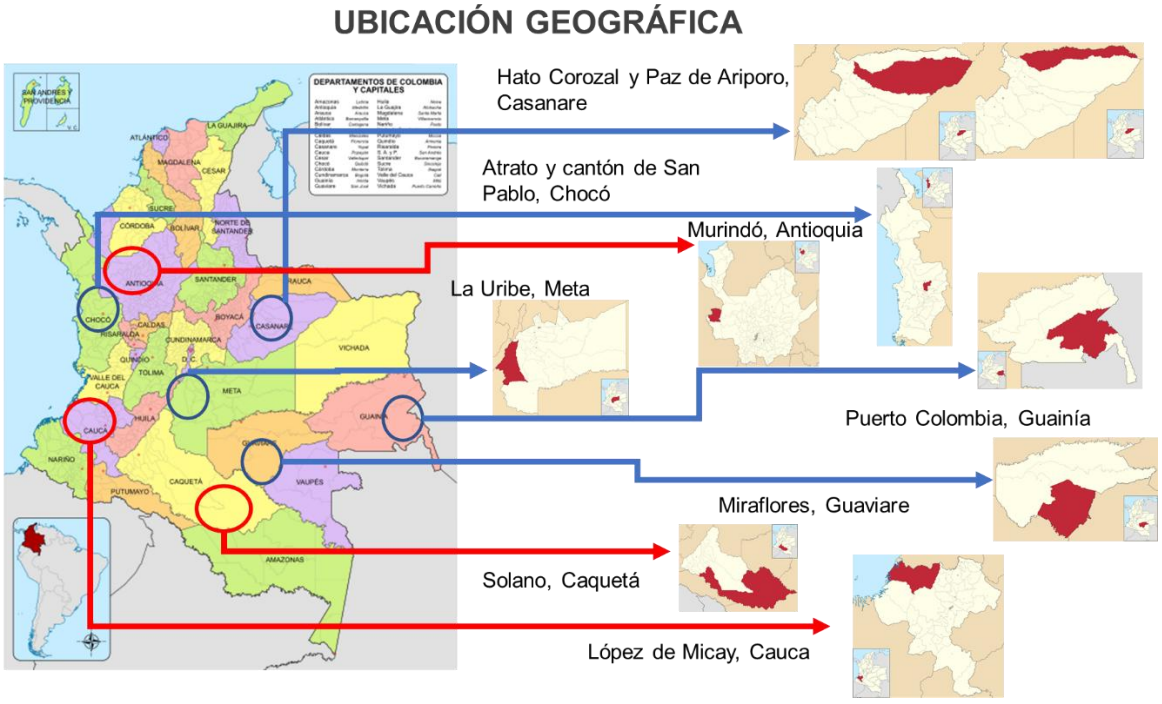

3. ALCANCE

Realizar la asistencia técnica y gerencia de proyectos para la Implementación de las Soluciones energéticas sostenibles (Individuales Solares Fotovoltaicas – SISFV, híbridos o mejoramiento) en las comunidades que a continuación se enuncian, garantizando el suministro, transporte, instalación, implementación, puesta a punto, pruebas, con las características técnicas conforme a los Anexos Técnicos:

TIPO DE SOLUCIÓN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
HIBRIDO Y MEJORAMIENTO	GUAINÍA	PUERTO COLOMBIA
HÍBRIDO	CHOCO	ATRATO Y CANTÓN DE SAN PABLO
MEJORAMIENTO	META	URIBE
HIBRIDO	CASANARE	HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO
MEJORAMIENTO	GUAVIARE	MIRAFLORES
HÍBRIDO	CAUCA	LÓPEZ DE MICAY
MEJORAMIENTO	CAQUETÁ	SOLANO
MEJORAMIENTO	ANTIOQUIA	MURINDÓ

4. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 20 de mayo de 2025.

ACTA DE INICIO: 29 de julio de 2025.

PLAZO INICIAL: 31 de diciembre de 2025.

MODIFICACIÓN 01: El 29 de octubre de 2025 se suscribió la modificación 01 al Contrato Interadministrativo 178-2025, mediante la cual se incorporó al alcance contractual la implementación de soluciones energéticas sostenibles con fuentes no convencionales en las comunidades pertenecientes a los municipios de Solano - Caquetá y López de Micay – Cauca.

En ese sentido el nuevo valor del contrato se relaciona a continuación, con su respectivo detalle:

VALOR DEL CONTRATO: CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($47.950.391.338) según Modificación 01 suscrita.

DPTO	MUNICIPIO	USUARIOS	VALOR TOTAL ASIGNADO $
GUAINÍA	PUERTO COLOMBIA (HÍBRIDO Y MEJORAMIENTO)	59	$ 4.772.820.458
CHOCO	ATRATO Y EL CANTÓN DEL SAN PABLO	68	$ 3.576.838.459
META	URIBE	17	$ 532.221.328
CASANARE	HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO	707	$ 28.814.964.361
GUAVIARE	MIRAFLORES	1	$ 88.500.000
CAUCA	LÓPEZ DE MICAY	66	$ 4.002.082.879
CAQUETÁ	SOLANO	92	$ 6.162.963.853
TOTALES		**1.010**	**$ 47.950.391.338**

Resumen del valor del Contrato 178-2025 según Modificación 01

MODIFICACIÓN 02: Mediante la cual se aclara la adición del contrato realizada en la modificación No. 1 y se ajusta el valor del contrato en sesenta y cinco pesos, con el siguiente detalle:

PROYECTO	PRESUPUESTO
PUERTO COLOMBIA (HÍBRIDO Y MEJORAMIENTO)	$4.772.820.458
ATRATO Y EL CANTÓN DEL SAN PABLO	$3.576.838.459
URIBE	$532.221.328
HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO	$28.814.964.361
MIRAFLORES	$88.500.000
SOLANO	$6.162.963.788
LÓPEZ DE MICAY	$4.002.082.879
TOTAL	**$47.950.391.273**

Resumen del valor del Contrato 178-2025 según Modificación 02

MODIFICACIÓN 03: Mediante la cual se incluyó dentro del alcance contractual el proyecto de Murindó, Antioquia, y se amplió el plazo del contrato, que quedará así hasta el treinta (30) de septiembre de 2026:

PROYECTO	PRESUPUESTO
PUERTO COLOMBIA (HÍBRIDO Y MEJORAMIENTO)	$4.772.820.458
ATRATO Y EL CANTÓN DEL SAN PABLO	$3.576.838.459
URIBE	$532.221.328
HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO	$28.814.964.361
MIRAFLORES	$88.500.000
SOLANO	$6.162.963.788
LÓPEZ DE MICAY	$4.002.082.879
MURINDÓ	$997.914.990
TOTAL	**$48.948.306.263**

Resumen del valor del Contrato 178-2025 según Modificación 03

PÓLIZAS (Actualizadas en valor y vigencia según Modificación 03 suscrita)

Pólizas contrato IPSE 178-2025

GARANTIA		SUMA ASEGURADA	VIGENCIA	
No. 91525/0	AMPARO		DESDE	HASTA
BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA. Cumplimiento en favor de entidades estatales	Cumplimiento del contrato	$14.684.491.878,90	13/05/2025	30/03/2027
	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$4.894.830.626,30	13/05/2025	30/09/2029
	Calidad del servicio	$14.684.491.878,90	13/05/2025	30/03/2030

5. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

A continuación, se relaciona el listado de contratos suscritos al 31 de marzo de 2026:

CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA
140-13.06-0214-2025	Contratar la "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO Y CANTON DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, Y EL MUNICIPIO DE LA URIBE EN EL DEPARTAMENTO DEL META"	CORPORACIÓN ECOPROJECTS
140-13.05-0220-2025	Servicios de interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y social, para la ejecución de obras, ingeniería de detalles y entrega en operación de los siguientes proyectos: 1. IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO Y CANTÓN DE SAN PABLO - CHOCÓ. 2. IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN URIBE – META.	REDECOM INGENIERÍA S.A.S.
140-13.06-0209-2025	Contratar la "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE MIRAFLORES - GUAVIARE, HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO - CASANARE".	HG INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
140-13.05-0177-2025	Contratar los servicios de interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y social, para la ejecución de obras, ingeniería de detalles y entrega en operación de los siguientes proyectos: 1. Implementación de soluciones energéticas sostenibles para la ampliación y mejoramiento de cobertura a las comunidades ubicadas en los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo – Casanare y, 2.Implementación de soluciones energéticas sostenibles para la ampliación y mejoramiento de cobertura a las comunidades ubicadas en Miraflores – Guaviare.	SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES S.A.S. SECOB S.A.S. NIT 900.115.339-0
140-13.06-0139-2025	Contratar la "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES	CONSORCIO GUAINÍA SOLAR AREEM&GIL.

	UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE LA PUERTO COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA	
140-13.05-0178-2025	Contratar la "INTERVENTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE LA PUERTO COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA".	ORGANIZACIÓN ACREDITADORA DE PROYECTOS S.A.S. – OCAP S.A.S.
140-13.06-0363-2025	Contratar la IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY	CORPORACIÓN ECOPROJECTS
140-13.05-0109-2026	INTERVENTORÍA A LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY	SOLUCIONES ENERGETICAS FORESTALES INTEGRALES S.A.S.
140-13.05-0366-2025	Contratar la INTERVENTORÍA A LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA LA COMUNIDAD DE COEMANÍ, MUNICIPIO DE SOLANO - DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	H&V INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.
140-13.06-0375-2025	Contratar la IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA LA COMUNIDAD DE COEMANÍ, MUNICIPIO DE SOLANO - DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	CONSORCIO SOLAR COEMANÍ
140-13.06-0161-2026	Contratar la IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MURINDÓ - DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA	CORPORACIÓN ECOPROJECTS
140-13.05-0190-2026	INTERVENTORÍA A LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE MURINDÓ, ANTIOQUIA.	SOLUCIONES ENERGETICAS FORESTALES INTEGRALES S.A.S.

6. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO:

Durante el mes de abril de 2026 se llevaron a cabo las siguientes actividades:

IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE MIRAFLORES - GUAVIARE, HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO - CASANARE

HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO

Durante el presente período de reporte, el contratista realizó la entrega formal del informe de replanteo del proyecto, el cual consolida las actividades ejecutadas en campo durante los meses anteriores en los municipios de Paz de Ariporo y Hato Corozal. Este informe incluye la validación técnica de usuarios, georreferenciación de viviendas, verificación de

condiciones reales del terreno y revisión de los trazados proyectados de redes de media y baja tensión, constituyéndose en un insumo fundamental para la actualización de la ingeniería del proyecto.

A partir de la información remitida, se evidenciaron variaciones frente a los diseños iniciales, principalmente asociadas a la dispersión de usuarios, cambios en su localización, condiciones de vegetación y restricciones de acceso, lo cual implica la necesidad de realizar ajustes técnicos en los sistemas energéticos planteados. En este sentido, el informe de replanteo establece las bases para la optimización de trazados eléctricos, redefinición de cantidades de obra y evaluación de soluciones individuales tipo SSFVI, en aquellos casos donde la extensión de red no resulta técnica ni económicamente viable.

Al respecto se realizó una socialización del replanteo al IPSE, el 16 de abril de 2026. Como resultado de esta socialización se acordaron unas mesas técnicas entre el IPSE, GENSA y los contratistas de Obra e Interventoría, que tuvieron lugar el 22 y el 23 de abril de 2026 con el fin de analizar y aprobar los aspectos técnicos y económicos del proyecto en función de las novedades encontradas en el replanteo.

Como compromisos de estas reuniones se deben adelantar unas gestiones en territorio con la comunidad y un nuevo recorrido del proyecto, los cuales se estiman llevar a cabo en la segunda semana de mayo de 2026, de conformidad con las conversaciones adelantadas con el líder indígena.

CRONOGRAMA HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO

CRONOGRAMA - PLAN DE TRABAJO						
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IPSE 178-2025						
PROYECTO	REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y GERENCIA DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL.					
	"IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS COMUNIDADES DEL RESGUARDO INDÍGENA CAÑO MOCHUELO, EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE PAZ DE ARIPORO Y HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"					
ADMINISTRADOR:		GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. ESP				
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CONTRATO						
FECHA SUSCRIPCION DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		20-May-25				
FECHA ACTA DE INICIO		29-Jul-25				
FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO		30-Sep-26				
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL		23%				
Item	Actividad	Duración (dias)	Fecha Inicio	Fecha Final	PORCENTAJE POR ACTIVIDAD	PORCENTAJE AVANCE
Actividades previas a la contratación					10%	10%
1	SUSCRIPCIÓN DEL ENCARGO FIDUCIARIO.	30	29/07/2025	28/08/2025	2,0%	2,0%
2	INCORPORACIÓN DE LOS RECURSOS AL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD.	10	29/07/2025	8/08/2025	2,0%	2,0%
3	REVISIÓN, ACEPTACIÓN DE DISEÑOS.	10	29/07/2025	8/08/2025	2,0%	2,0%
4	REVISION Y ACEPTACION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	10	29/07/2025	8/08/2025	2,0%	2,0%
6	ELABORACION DE PLIEGOS CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA	12	8/08/2025	20/08/2025	2,0%	2,0%
Actividades de contratación					10%	10%
1	PUBLICACIÓN DE PLIEGOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	30	20/08/2025	19/09/2025	2,0%	2,0%
2	RECIBO, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OFERTAS.	30	19/09/2025	19/10/2025	2,0%	2,0%
3	FIRMA DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA Y OBRA Y LEGALIZACIÓN.	20	19/10/2025	8/11/2025	4,0%	4,0%
4	SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA.	20	8/11/2025	28/11/2025	1,5%	1,5%
5	CRONOGRAMA DE OBRA	5	28/11/2025	3/12/2025	0,5%	0,5%
Actividades de suministro y construcción de obras y liquidación					80%	3%
1	VERIFICACION DE USUARIOS, REPLANTEO Y SOCIALIZACION	75	3/12/2025	16/02/2026	3,0%	3,0%
2	APROBACIÓN DE REPLANTEO	30	16/02/2026	18/03/2026	4,0%	0,0%
3	ORDENES DE COMPRA DE MATERIALESY EQUIPOS NACIONALES	30	16/02/2026	18/03/2026	2,0%	0,0%
4	ORDENES DE COMPRA DE MATERIALESY EQUIPOS IMPORTADOS	30	16/02/2026	18/03/2026	3,0%	0,0%
5	FABRICACIÓN Y TRANSPORTE, DE EQUIPOS Y MATERALES NACIONALES	30	18/03/2026	17/04/2026	14,0%	0,0%
6	FABRICACIÓN, TRANSPORTE, Y NACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS IMPORTADOS	90	18/03/2026	16/06/2026	3,0%	0,0%
7	CONSTRUCCION Y ENSAMBLE DE GABINETES CON EQUIPOS IMPORTADOS	90	16/06/2026	14/09/2026	3,0%	0,0%
8	TRANSPORTE EQUIPOS ENSAMBLADOS A CENTROS DE ACOPIO DE LOS MUNICIPIOS DEL PROYECTO.	90	14/09/2026	13/12/2026	4,0%	0,0%
9	ADQUISICION Y TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS NACIONALES A CENTROS DE ACOPIO DE LOS MUNICIPIOS DEL PROYECTO (postes, cables, internas y material menor).	90	16/06/2026	14/09/2026	3,0%	0,0%
10	HINCADO DE MÁSTILES SSFV.	90	14/09/2026	13/12/2026	6,0%	0,0%
11	ARMADO DE ESTRUCTURAS	90	14/09/2026	13/12/2026	5,0%	0,0%
12	ADECUACION DE TERRENO PARA INSTALACION GABINETE Y ACOMETIDAS	90	14/09/2026	13/12/2026	5,0%	0,0%
13	INSTALACIONES INTERNAS, INSTALACION MEDIDORES CAPACITACION	90	13/12/2026	13/03/2027	5,0%	0,0%
14	CONSTRUCCION, PRUEBAS ENERGIZACION Y PUESTA EN SERVICIO Y CAPACITACION DE USUARIOS.	15	13/03/2027	28/06/2027	8,0%	0,0%
15	ACTA DE RECEPCION DE OBRA ENTRE LA INTERVENTORIA Y CONTRATISTA DE OBRA.	15	14/09/2026	29/09/2026	2,0%	0,0%
16	ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE INVENTARIOS ENTRE EL IPSE Y GENSA	15	14/09/2026	29/09/2026	2,0%	0,0%
17	REVISION AJUSTE, VALIDACION Y ENTREGA A QUIEN DEFINA EL IPSE DEL ESQUEMA DE SOSTENIBILIDAD.	15	14/09/2026	29/09/2026	2,0%	0,0%
18	ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA AL OPERADOR DE AOM QUIEN DEFINA EL IPSE.	15	14/09/2026	29/09/2026	2,0%	0,0%
19	ACTA DE RECIBO DE INFRAESTRUCTURA Y ENTREGA DE INVENTARIOS A QUIEN DEFINA EL IPSE, PARA LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AOM.	10	20/09/2026	30/09/2026	2,0%	0,0%
20	ACTAS DE LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS OBRA E INTERVENTORIA	10	20/09/2026	30/09/2026	2,0%	0,0%

De acuerdo con el cronograma, el proyecto cuenta con un avance del 23%.

MIRAFLORES

En el municipio de Miraflores se ejecutaron actividades puntuales asociadas a la instalación y reposición de paneles solares en la central existente, permitiendo restablecer las condiciones operativas del sistema fotovoltaico. La Interventoría realizó la respectiva verificación, evidenciando la correcta ejecución de las actividades y la normalización en la generación de energía.

CRONOGRAMA MIRAFLORES

CRONOGRAMA - PLAN DE TRABAJO						
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IPSE 178-2025						
PROYECTOS	REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y GERENCIA DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL.					
	Mejoramiento de infraestructura propiedad del IPSE en el Municipio de Miraflores - Guaviare, a partir de la implementación de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable -					
ADMINISTRADOR:		GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. ESP				
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CONTRATO						
FECHA SUSCRIPCION DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		20-May-25				
FECHA ACTA DE INICIO		29-Jul-25				
FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO		30-Sep-26				
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL		91%				
Item	Actividad	Duración (dias)	Fecha Inicio	Fecha Final	PORCENTAJE POR ACTIVIDAD	PORCENTAJE AVANCE
Actividades previas a la contratación					10%	10%
1	SUSCRIPCIÓN DEL ENCARGO FIDUCIARIO.	30	29/07/2025	28/08/2025	2,0%	2,0%
2	INCORPORACIÓN DE LOS RECURSOS AL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD.	10	29/07/2025	8/08/2025	2,0%	2,0%
3	REVISIÓN, ACEPTACIÓN DE DISEÑOS.	10	29/07/2025	8/08/2025	2,0%	2,0%
4	REVISION Y ACEPTACION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	10	29/07/2025	8/08/2025	2,0%	2,0%
6	ELABORACION DE PLIEGOS CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA	12	8/08/2025	20/08/2025	2,0%	2,0%
Actividades de contratación					10%	10%
1	PUBLICACIÓN DE PLIEGOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	30	20/08/2025	19/09/2025	2,0%	2,0%
2	RECIBO, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OFERTAS.	30	19/09/2025	19/10/2025	2,0%	2,0%
3	FIRMA DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA Y OBRA Y LEGALIZACIÓN.	20	19/10/2025	8/11/2025	4,0%	4,0%
4	SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA.	20	8/11/2025	28/11/2025	1,5%	1,5%
5	CRONOGRAMA DE OBRA	5	28/11/2025	3/12/2025	0,5%	0,5%
Actividades de suministro y construcción de obras y liquidación					80%	71%
1	VERIFICACION DE USUARIOS, REPLANTEO Y SOCIALIZACION	15	3/12/2025	18/12/2025	3,0%	3,0%
2	APROBACIÓN DE REPLANTEO	15	18/12/2025	2/01/2026	4,0%	4,0%
3	ORDENES DE COMPRA DE MATERIALESY EQUIPOS NACIONALES	15	2/01/2026	17/01/2026	2,0%	2,0%
4	ORDENES DE COMPRA DE MATERIALESY EQUIPOS IMPORTADOS	15	2/01/2026	17/01/2026	3,0%	3,0%
5	FABRICACIÓN Y TRANSPORTE, DE EQUIPOS Y MATERALES NACIONALES	15	17/01/2026	1/02/2026	14,0%	14,0%
6	FABRICACIÓN, TRANSPORTE, Y NACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS IMPORTADOS	10	17/01/2026	27/01/2026	8,0%	8,0%
9	ADQUISICION Y TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS NACIONALES A CENTROS DE ACOPIO DE LOS MUNICIPIOS DEL PROYECTO (postes, cables, internas y material menor).	10	27/01/2026	6/02/2026	4,0%	4,0%
10	CONSTRUCCION, PRUEBAS ENERGIZACION Y PUESTA EN SERVICIO Y CAPACITACION DE	25	6/02/2026	3/03/2026	30,0%	30,0%
11	ACTA DE RECEPCION DE OBRA ENTRE LA INTERVENTORIA Y CONTRATISTA DE OBRA.	15	3/03/2026	18/03/2026	2,0%	0,5%
12	ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE INVENTARIOS ENTRE EL IPSE Y GENSA	15	3/03/2026	18/03/2026	2,0%	0,5%
13	REVISION AJUSTE, VALIDACION Y ENTREGA A QUIEN DEFINA EL IPSE DEL ESQUEMA DE SOSTENIBILIDAD.	15	3/03/2026	18/03/2026	2,0%	0,5%
14	ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA AL OPERADOR DE AOM QUIEN DEFINA EL IPSE.	15	3/03/2026	18/03/2026	2,0%	0,5%
15	ACTA DE RECIBO DE INFRAESTRUCTURA Y ENTREGA DE INVENTARIOS A QUIEN DEFINA EL IPSE, PARA LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AOM.	15	3/03/2026	18/03/2026	2,0%	0,5%
16	ACTAS DE LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS OBRA E INTERVENTORIA	15	3/03/2026	18/03/2026	2,0%	0,0%

De acuerdo con el cronograma, el proyecto cuenta con un avance del 91%.

IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO Y CANTON DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, Y EL MUNICIPIO DE LA URIBE EN EL DEPARTAMENTO DEL META

ATRATO Y CANTÓN DE SAN PABLO

Durante el mes de abril se desarrollaron actividades de ajuste técnico, documental y logístico del proyecto, en atención a los requerimientos realizados por la interventoría de GENSA. Entre las actividades ejecutadas se realizó la corrección y actualización del listado final de usuarios beneficiarios obtenido durante el proceso de replanteo.

De igual manera, se elaboró una infografía informativa para socializar con las comunidades el proceso de ejecución del proyecto y el funcionamiento de las soluciones energéticas propuestas. Finalmente, se avanzó en el proceso de adquisición de treinta y cinco (35) soluciones fotovoltaicas individuales, incluyendo la revisión técnica y consolidación de sus respectivos listados de materiales.

Con respecto a los equipos para las soluciones individuales se realizó el proceso de ensamble de estos en los gabinetes, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones requeridas para su correcta implementación en campo.

CRONOGRAMA ATRATO Y CANTÓN DE SAN PABLO:

CRONOGRAMA - PLAN DE TRABAJO						
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IPSE 178-2025						
PROYECTO	REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y GERENCIA DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL.					
	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS CENTRALIZADOS EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE ATRATO Y CANTÓN DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ					
ADMINISTRADOR:		GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. ESP				
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CONTRATO						
FECHA SUSCRIPCION DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		20-May-25				
FECHA ACTA DE INICIO		29-Jul-25				
FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO		30-Sep-26				
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL		36%				
Item	Actividad	Duración (dias)	Fecha Inicio	Fecha Final	PORCENTAJE POR ACTIVIDAD	PORCENTAJE AVANCE
Actividades previas a la contratación					10%	10%
1	SUSCRIPCIÓN DEL ENCARGO FIDUCIARIO.	30	29/07/2025	28/08/2025	2,0%	2,0%
2	INCORPORACIÓN DE LOS RECURSOS AL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD.	10	29/07/2025	8/08/2025	2,0%	2,0%
3	REVISIÓN, ACEPTACIÓN DE DISEÑOS.	10	29/07/2025	8/08/2025	2,0%	2,0%
4	REVISION Y ACEPTACION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	10	29/07/2025	8/08/2025	2,0%	2,0%
6	ELABORACION DE PLIEGOS CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA	12	8/08/2025	20/08/2025	2,0%	2,0%
Actividades de contratación					10%	10%
1	PUBLICACIÓN DE PLIEGOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	30	20/08/2025	19/09/2025	2,0%	2,0%
2	RECIBO, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OFERTAS.	30	19/09/2025	19/10/2025	2,0%	2,0%
3	FIRMA DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA Y OBRA Y LEGALIZACIÓN.	20	19/10/2025	8/11/2025	4,0%	4,0%
4	SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA.	20	8/11/2025	28/11/2025	1,5%	1,5%
5	CRONOGRAMA DE OBRA	5	28/11/2025	3/12/2025	0,5%	0,5%
Actividades de suministro y construcción de obras y liquidación					80%	16%
1	VERIFICACION DE USUARIOS, REPLANTEO Y SOCIALIZACION	75	3/12/2025	16/02/2026	3,0%	3,0%
2	APROBACIÓN DE REPLANTEO	30	16/02/2026	18/03/2026	4,0%	2,0%
3	ORDENES DE COMPRA DE MATERIALESY EQUIPOS NACIONALES	30	16/02/2026	18/03/2026	2,0%	1,0%
4	ORDENES DE COMPRA DE MATERIALESY EQUIPOS IMPORTADOS	30	16/02/2026	18/03/2026	3,0%	1,0%
5	FABRICACIÓN Y TRANSPORTE, DE EQUIPOS Y MATERALES NACIONALES	30	18/03/2026	17/04/2026	14,0%	5,0%
6	FABRICACIÓN, TRANSPORTE, Y NACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS IMPORTADOS	90	18/03/2026	16/06/2026	3,0%	1,0%
7	CONSTRUCCION Y ENSAMBLE DE GABINETES CON EQUIPOS IMPORTADOS	90	16/06/2026	14/09/2026	3,0%	1,0%
8	TRANSPORTE EQUIPOS ENSAMBLADOS A CENTROS DE ACOPIO DE LOS MUNICIPIOS DEL PROYECTO.	90	14/09/2026	13/12/2026	4,0%	1,0%
9	ADQUISICION Y TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS NACIONALES A CENTROS DE ACOPIO DE LOS MUNICIPIOS DEL PROYECTO (postes, cables, internas y material menor).	90	16/06/2026	14/09/2026	3,0%	0,5%
10	HINCADO DE MÁSTILES SSFV.	90	14/09/2026	13/12/2026	6,0%	0,0%
11	ARMADO DE ESTRUCTURAS	90	14/09/2026	13/12/2026	5,0%	0,0%
12	ADECUACION DE TERRENO PARA INSTALACION GABINETE Y ACOMETIDAS	90	14/09/2026	13/12/2026	5,0%	0,0%
13	INSTALACIONES INTERNAS, INSTALACION MEDIDORES CAPACITACION	90	13/12/2026	13/03/2027	5,0%	0,0%
14	CONSTRUCCION, PRUEBAS ENERGIZACION Y PUESTA EN SERVICIO Y CAPACITACION DE USUARIOS.	15	13/03/2027	28/03/2027	8,0%	0,0%
15	ACTA DE RECEPCION DE OBRA ENTRE LA INTERVENTORIA Y CONTRATISTA DE OBRA.	15	14/09/2026	29/09/2026	2,0%	0,0%
16	ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE INVENTARIOS ENTRE EL IPSE Y GENSA	15	14/09/2026	29/09/2026	2,0%	0,0%
17	REVISION AJUSTE, VALIDACION Y ENTREGA A QUIEN DEFINA EL IPSE DEL ESQUEMA DE SOSTENIBILIDAD.	15	14/09/2026	29/09/2026	2,0%	0,0%
18	ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA AL OPERADOR DE AOM QUIEN DEFINA EL IPSE.	15	14/09/2026	29/09/2026	2,0%	0,0%
19	ACTA DE RECIBO DE INFRAESTRUCTURA Y ENTREGA DE INVENTARIOS A QUIEN DEFINA EL IPSE, PARA LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AOM.	10	20/09/2026	30/09/2026	2,0%	0,0%
20	ACTAS DE LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS OBRA E INTERVENTORIA	10	20/09/2026	30/09/2026	2,0%	0,0%

De acuerdo con el cronograma, el proyecto cuenta con un avance del 36%.

URIBE

Para el proyecto de Uribe en el departamento del Meta, se realizó el proceso de ensamble de equipos en los gabinetes, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones requeridas para su correcta implementación en campo.

CRONOGRAMA URIBE

CRONOGRAMA - PLAN DE TRABAJO						
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IPSE 178-2025						
PROYECTO	REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y GERENCIA DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL.					
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SSFVI PARA USUARIOS EN ZONA RURAL VEREDA PLANES, EN EL MUNICIPIO DE URIBE EN EL DEPARTAMENTO DEL META					
ADMINISTRADOR:		GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. ESP				
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CONTRATO						
FECHA SUSCRIPCION DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		20-May-25				
FECHA ACTA DE INICIO		29-Jul-25				
FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO		30-Sep-26				
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL		40%				
Item	Actividad	Duración (dias)	Fecha Inicio	Fecha Final	PORCENTAJE POR ACTIVIDAD	PORCENTAJE AVANCE
Actividades previas a la contratación					10%	10%
1	SUSCRIPCIÓN DEL ENCARGO FIDUCIARIO.	30	29/07/2025	28/08/2025	2,0%	2,0%
2	INCORPORACIÓN DE LOS RECURSOS AL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD.	10	29/07/2025	8/08/2025	2,0%	2,0%
3	REVISIÓN, ACEPTACIÓN DE DISEÑOS.	10	29/07/2025	8/08/2025	2,0%	2,0%
4	REVISION Y ACEPTACION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	10	29/07/2025	8/08/2025	2,0%	2,0%
6	ELABORACION DE PLIEGOS CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA	12	8/08/2025	20/08/2025	2,0%	2,0%
Actividades de contratación					10%	10%
1	PUBLICACIÓN DE PLIEGOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	30	20/08/2025	19/09/2025	2,0%	2,0%
2	RECIBO, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OFERTAS.	30	19/09/2025	19/10/2025	2,0%	2,0%
3	FIRMA DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA Y OBRA Y LEGALIZACIÓN.	20	19/10/2025	8/11/2025	4,0%	4,0%
4	SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA.	20	8/11/2025	28/11/2025	1,5%	1,5%
5	CRONOGRAMA DE OBRA	5	28/11/2025	3/12/2025	0,5%	0,5%
Actividades de suministro y construcción de obras y liquidación					80%	20%
1	VERIFICACION DE USUARIOS, REPLANTEO Y SOCIALIZACION	75	3/12/2025	16/02/2026	3,0%	3,0%
2	APROBACIÓN DE REPLANTEO	30	16/02/2026	18/03/2026	4,0%	4,0%
3	ORDENES DE COMPRA DE MATERIALESY EQUIPOS NACIONALES	30	16/02/2026	18/03/2026	2,0%	1,0%
4	ORDENES DE COMPRA DE MATERIALESY EQUIPOS IMPORTADOS	30	16/02/2026	18/03/2026	3,0%	2,0%
5	FABRICACIÓN Y TRANSPORTE, DE EQUIPOS Y MATERALES NACIONALES	30	18/03/2026	17/04/2026	14,0%	4,0%
6	FABRICACIÓN, TRANSPORTE, Y NACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS IMPORTADOS	90	18/03/2026	16/06/2026	3,0%	1,5%
7	CONSTRUCCION Y ENSAMBLE DE GABINETES CON EQUIPOS IMPORTADOS	90	16/06/2026	14/09/2026	3,0%	2,0%
8	TRANSPORTE EQUIPOS ENSAMBLADOS A CENTROS DE ACOPIO DE LOS MUNICIPIOS DEL PROYECTO.	90	14/09/2026	13/12/2026	4,0%	1,5%
9	ADQUISICION Y TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS NACIONALES A CENTROS DE ACOPIO DE LOS MUNICIPIOS DEL PROYECTO (postes, cables, internas y material menor).	90	16/06/2026	14/09/2026	3,0%	1,0%
10	HINCADO DE MÁSTILES SSFV.	90	14/09/2026	13/12/2026	6,0%	0,0%
11	ARMADO DE ESTRUCTURAS	90	14/09/2026	13/12/2026	5,0%	0,0%
12	ADECUACION DE TERRENO PARA INSTALACION GABINETE Y ACOMETIDAS	90	14/09/2026	13/12/2026	5,0%	0,0%
13	INSTALACIONES INTERNAS, INSTALACION MEDIDORES CAPACITACION	90	13/12/2026	13/03/2027	5,0%	0,0%
14	CONSTRUCCION, PRUEBAS ENERGIZACION Y PUESTA EN SERVICIO Y CAPACITACION DE USUARIOS.	15	13/03/2027	28/03/2027	8,0%	0,0%
15	ACTA DE RECEPCION DE OBRA ENTRE LA INTERVENTORIA Y CONTRATISTA DE OBRA.	15	14/09/2026	29/09/2026	2,0%	0,0%
16	ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE INVENTARIOS ENTRE EL IPSE Y GENSA	15	14/09/2026	29/09/2026	2,0%	0,0%
17	REVISION AJUSTE, VALIDACION Y ENTREGA A QUIEN DEFINA EL IPSE DEL ESQUEMA DE SOSTENIBILIDAD.	15	14/09/2026	29/09/2026	2,0%	0,0%
18	ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA AL OPERADOR DE AOM QUIEN DEFINA EL IPSE.	15	14/09/2026	29/09/2026	2,0%	0,0%
19	ACTA DE RECIBO DE INFRAESTRUCTURA Y ENTREGA DE INVENTARIOS A QUIEN DEFINA EL IPSE, PARA LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AOM.	10	20/09/2026	30/09/2026	2,0%	0,0%
20	ACTAS DE LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS OBRA E INTERVENTORIA	10	20/09/2026	30/09/2026	2,0%	0,0%

De acuerdo con el cronograma, el proyecto cuenta con un avance del 40%.

IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE LA PUERTO COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA

La situación de orden público continúa, por lo que los contratistas de obra e interventoría reiteraron la solicitud realizada a GENSA donde solicitan la suspensión de sus contratos por 30 días calendario o el tiempo que se requiera para que se pueda iniciar la implementación del proyecto.

CRONOGRAMA PUERTO COLOMBIA:

CRONOGRAMA - PLAN DE TRABAJO						
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IPSE 178-2025						
PROYECTO	REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y GERENCIA DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL.					
	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA USUARIOS PERTENECIENTES A PUERTO COLOMBIA – DEPARTAMENTO DE GUAINÍA.					
ADMINISTRADOR:		GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. ESP				
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CONTRATO						
FECHA SUSCRIPCION DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		20-May-25				
FECHA ACTA DE INICIO		29-Jul-25				
FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO		30-Sep-26				
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL		22%				
Item	Actividad	Duración (dias)	Fecha Inicio	Fecha Final	PORCENTAJE POR ACTIVIDAD	PORCENTAJE AVANCE
Actividades previas a la contratación					10%	10%
1	SUSCRIPCIÓN DEL ENCARGO FIDUCIARIO.	30	29/07/2025	28/08/2025	2,0%	2,0%
2	INCORPORACIÓN DE LOS RECURSOS AL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD.	10	29/07/2025	8/08/2025	2,0%	2,0%
3	REVISIÓN, ACEPTACIÓN DE DISEÑOS.	10	29/07/2025	8/08/2025	2,0%	2,0%
4	REVISION Y ACEPTACION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	10	29/07/2025	8/08/2025	2,0%	2,0%
6	ELABORACION DE PLIEGOS CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA	12	8/08/2025	20/08/2025	2,0%	2,0%
Actividades de contratación					10%	10%
1	PUBLICACIÓN DE PLIEGOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	30	20/08/2025	19/09/2025	2,0%	2,0%
2	RECIBO, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OFERTAS.	30	19/09/2025	19/10/2025	2,0%	2,0%
3	FIRMA DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA Y OBRA Y LEGALIZACIÓN.	20	19/10/2025	8/11/2025	4,0%	4,0%
4	SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA.	20	8/11/2025	28/11/2025	1,5%	1,5%
5	CRONOGRAMA DE OBRA	5	28/11/2025	3/12/2025	0,5%	0,5%
Actividades de suministro y construcción de obras y liquidación					80%	2%
1	VERIFICACION DE USUARIOS, REPLANTEO Y SOCIALIZACION	75	3/12/2025	16/02/2026	3,0%	2,0%
2	APROBACIÓN DE REPLANTEO	30	16/02/2026	18/03/2026	4,0%	0,0%
3	ORDENES DE COMPRA DE MATERIALESY EQUIPOS NACIONALES	30	16/02/2026	18/03/2026	2,0%	0,0%
4	ORDENES DE COMPRA DE MATERIALESY EQUIPOS IMPORTADOS	30	16/02/2026	18/03/2026	3,0%	0,0%
5	FABRICACIÓN Y TRANSPORTE, DE EQUIPOS Y MATERALES NACIONALES	30	18/03/2026	17/04/2026	14,0%	0,0%
6	FABRICACIÓN, TRANSPORTE, Y NACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS IMPORTADOS	90	18/03/2026	16/06/2026	3,0%	0,0%
7	CONSTRUCCION Y ENSAMBLE DE GABINETES CON EQUIPOS IMPORTADOS	90	16/06/2026	14/09/2026	3,0%	0,0%
8	TRANSPORTE EQUIPOS ENSAMBLADOS A CENTROS DE ACOPIO DE LOS MUNICIPIOS DEL PROYECTO.	90	14/09/2026	13/12/2026	4,0%	0,0%
9	ADQUISICION Y TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS NACIONALES A CENTROS DE ACOPIO DE LOS MUNICIPIOS DEL PROYECTO (postes, cables, internas y material menor).	90	16/06/2026	14/09/2026	3,0%	0,0%
10	HINCADO DE MÁSTILES SSFV.	90	14/09/2026	13/12/2026	6,0%	0,0%
11	ARMADO DE ESTRUCTURAS	90	14/09/2026	13/12/2026	5,0%	0,0%
12	ADECUACION DE TERRENO PARA INSTALACION GABINETE Y ACOMETIDAS	90	14/09/2026	13/12/2026	5,0%	0,0%
13	INSTALACIONES INTERNAS, INSTALACION MEDIDORES CAPACITACION	90	13/12/2026	13/03/2027	5,0%	0,0%
14	CONSTRUCCION, PRUEBAS ENERGIZACION Y PUESTA EN SERVICIO Y CAPACITACION DE USUARIOS.	15	13/03/2027	28/06/2027	8,0%	0,0%
15	ACTA DE RECEPCION DE OBRA ENTRE LA INTERVENTORIA Y CONTRATISTA DE OBRA.	15	14/09/2026	29/09/2026	2,0%	0,0%
16	ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE INVENTARIOS ENTRE EL IPSE Y GENSA	15	14/09/2026	29/09/2026	2,0%	0,0%
17	REVISION AJUSTE, VALIDACION Y ENTREGA A QUIEN DEFINA EL IPSE DEL ESQUEMA DE SOSTENIBILIDAD.	15	14/09/2026	29/09/2026	2,0%	0,0%
18	ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA AL OPERADOR DE AOM QUIEN DEFINA EL IPSE.	15	14/09/2026	29/09/2026	2,0%	0,0%
19	ACTA DE RECIBO DE INFRAESTRUCTURA Y ENTREGA DE INVENTARIOS A QUIEN DEFINA EL IPSE, PARA LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AOM.	10	20/09/2026	30/09/2026	2,0%	0,0%
20	ACTAS DE LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS OBRA E INTERVENTORIA	10	20/09/2026	30/09/2026	2,0%	0,0%

De acuerdo con el cronograma, el proyecto cuenta con un avance del 22%.

IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA LA COMUNIDAD DE COEMANÍ, MUNICIPIO DE SOLANO - DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

El miércoles 08 de abril se finalizó la actividad de replanteo en campo, con la información recopilada se procedió a organizar la misma y fue presentada a la interventoría para revisión.

CRONOGRAMA SOLANO:

CRONOGRAMA - PLAN DE TRABAJO						
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IPSE 178-2025						
PROYECTO	REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y GERENCIA DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL.					
	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLANO EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ					
ADMINISTRADOR:		GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. ESP				
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CONTRATO						
FECHA SUSCRIPCION DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		20-May-25				
FECHA ACTA DE INICIO		29-Jul-25				
FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO		30-Sep-26				
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL		23%				
Item	Actividad	Duración (dias)	Fecha Inicio	Fecha Final	PORCENTAJE POR ACTIVIDAD	PORCENTAJE AVANCE
Actividades previas a la contratación					10%	10%
1	SUSCRIPCIÓN DEL ENCARGO FIDUCIARIO.	30	29/10/2025	28/11/2025	2,0%	2,0%
2	INCORPORACIÓN DE LOS RECURSOS AL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD.	10	29/10/2025	8/11/2025	2,0%	2,0%
3	REVISIÓN, ACEPTACIÓN DE DISEÑOS.	10	29/10/2025	8/11/2025	2,0%	2,0%
4	REVISION Y ACEPTACION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	10	29/10/2025	8/11/2025	2,0%	2,0%
6	ELABORACION DE PLIEGOS CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA	12	8/11/2025	20/11/2025	2,0%	2,0%
Actividades de contratación					10%	10%
1	PUBLICACIÓN DE PLIEGOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	30	20/11/2025	20/12/2025	2,0%	2,0%
2	RECIBO, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OFERTAS.	30	20/12/2025	19/01/2026	2,0%	2,0%
3	FIRMA DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA Y OBRA Y LEGALIZACIÓN.	20	19/01/2026	8/02/2026	4,0%	4,0%
4	SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA.	20	8/02/2026	28/02/2026	1,5%	1,5%
5	CRONOGRAMA DE OBRA	5	28/02/2026	5/03/2026	0,5%	0,5%
Actividades de suministro y construcción de obras y liquidación					80%	3%
1	VERIFICACION DE USUARIOS, REPLANTEO Y SOCIALIZACION	30	5/03/2026	4/04/2026	3,0%	3,0%
2	APROBACIÓN DE REPLANTEO	15	4/04/2026	19/04/2026	4,0%	0,0%
3	ORDENES DE COMPRA DE MATERIALESY EQUIPOS NACIONALES	15	19/04/2026	4/05/2026	2,0%	0,0%
4	ORDENES DE COMPRA DE MATERIALESY EQUIPOS IMPORTADOS	15	19/04/2026	4/05/2026	3,0%	0,0%
5	FABRICACIÓN Y TRANSPORTE, DE EQUIPOS Y MATERALES NACIONALES	15	4/05/2026	19/05/2026	14,0%	0,0%
6	FABRICACIÓN, TRANSPORTE, Y NACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS IMPORTADOS	60	4/05/2026	3/07/2026	3,0%	0,0%
7	CONSTRUCCION Y ENSAMBLE DE GABINETES CON EQUIPOS IMPORTADOS	90	3/07/2026	1/10/2026	3,0%	0,0%
8	TRANSPORTE EQUIPOS ENSAMBLADOS A CENTROS DE ACOPIO DE LOS MUNICIPIOS DEL PROYECTO.	10	1/10/2026	11/10/2026	4,0%	0,0%
9	ADQUISICION Y TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS NACIONALES A CENTROS DE ACOPIO DE LOS MUNICIPIOS DEL PROYECTO (postes, cables, internas y material menor).	10	19/05/2026	29/05/2026	3,0%	0,0%
10	HINCADO DE MÁSTILES SSFV.	20	29/05/2026	18/06/2026	6,0%	0,0%
11	ARMADO DE ESTRUCTURAS	20	29/05/2026	18/06/2026	5,0%	0,0%
12	ADECUACION DE TERRENO PARA INSTALACION GABINETE Y ACOMETIDAS	20	11/10/2026	31/10/2026	5,0%	0,0%
13	INSTALACIONES INTERNAS, INSTALACION MEDIDORES CAPACITACION	20	11/10/2026	31/10/2026	5,0%	0,0%
14	CONSTRUCCION, PRUEBAS ENERGIZACION Y PUESTA EN SERVICIO Y CAPACITACION DE USUARIOS.	30	11/10/2026	10/11/2026	8,0%	0,0%
15	ACTA DE RECEPCION DE OBRA ENTRE LA INTERVENTORIA Y CONTRATISTA DE OBRA.	5	20/09/2026	25/09/2026	2,0%	0,0%
16	ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE INVENTARIOS ENTRE EL IPSE Y GENSA	5	20/09/2026	25/09/2026	2,0%	0,0%
17	REVISION AJUSTE, VALIDACION Y ENTREGA A QUIEN DEFINA EL IPSE DEL ESQUEMA DE SOSTENIBILIDAD.	5	20/09/2026	25/09/2026	2,0%	0,0%
18	ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA AL OPERADOR DE AOM QUIEN DEFINA EL IPSE.	5	25/09/2026	30/09/2026	2,0%	0,0%
19	ACTA DE RECIBO DE INFRAESTRUCTURA Y ENTREGA DE INVENTARIOS A QUIEN DEFINA EL IPSE, PARA LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AOM.	5	25/09/2026	30/09/2026	2,0%	0,0%
20	ACTAS DE LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS OBRA E INTERVENTORIA	5	25/09/2026	30/09/2026	2,0%	0,0%

De acuerdo con el cronograma, el proyecto cuenta con un avance del 23%.

IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY – DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Se está a la espera de la remisión del informe de replanteo consolidado.

CRONOGRAMA LÓPEZ DE MICAY

CRONOGRAMA - PLAN DE TRABAJO						
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IPSE 178-2025						
PROYECTO	REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y GERENCIA DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL.					
	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS CENTRALIZADOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA					
ADMINISTRADOR:		GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. ESP				
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CONTRATO						
FECHA SUSCRIPCION DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		20-May-25				
FECHA ACTA DE INICIO		29-Jul-25				
FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO		30-Sep-26				
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL		23%				
Item	Actividad	Duración (dias)	Fecha Inicio	Fecha Final	PORCENTAJE POR ACTIVIDAD	PORCENTAJE AVANCE
Actividades previas a la contratación					10%	10%
1	SUSCRIPCIÓN DEL ENCARGO FIDUCIARIO.	30	29/10/2025	28/11/2025	2,0%	2,0%
2	INCORPORACIÓN DE LOS RECURSOS AL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD.	10	29/10/2025	8/11/2025	2,0%	2,0%
3	REVISIÓN, ACEPTACIÓN DE DISEÑOS.	10	29/10/2025	8/11/2025	2,0%	2,0%
4	REVISION Y ACEPTACION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	10	29/10/2025	8/11/2025	2,0%	2,0%
6	ELABORACION DE PLIEGOS CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA	12	8/11/2025	20/11/2025	2,0%	2,0%
Actividades de contratación					10%	10%
1	PUBLICACIÓN DE PLIEGOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	30	20/11/2025	20/12/2025	2,0%	2,0%
2	RECIBO, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OFERTAS.	30	20/12/2025	19/01/2026	2,0%	2,0%
3	FIRMA DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA Y OBRA Y LEGALIZACIÓN.	20	19/01/2026	8/02/2026	4,0%	4,0%
4	SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA.	20	8/02/2026	28/02/2026	1,5%	1,5%
5	CRONOGRAMA DE OBRA	5	28/02/2026	5/03/2026	0,5%	0,5%
Actividades de suministro y construcción de obras y liquidación					80%	3%
1	VERIFICACION DE USUARIOS, REPLANTEO Y SOCIALIZACION	30	5/03/2026	4/04/2026	3,0%	3,0%
2	APROBACIÓN DE REPLANTEO	15	4/04/2026	19/04/2026	4,0%	0,0%
3	ORDENES DE COMPRA DE MATERIALESY EQUIPOS NACIONALES	15	19/04/2026	4/05/2026	2,0%	0,0%
4	ORDENES DE COMPRA DE MATERIALESY EQUIPOS IMPORTADOS	15	19/04/2026	4/05/2026	3,0%	0,0%
5	FABRICACIÓN Y TRANSPORTE, DE EQUIPOS Y MATERALES NACIONALES	15	4/05/2026	19/05/2026	14,0%	0,0%
6	FABRICACIÓN, TRANSPORTE, Y NACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS IMPORTADOS	60	4/05/2026	3/07/2026	3,0%	0,0%
7	CONSTRUCCION Y ENSAMBLE DE GABINETES CON EQUIPOS IMPORTADOS	90	3/07/2026	1/10/2026	3,0%	0,0%
8	TRANSPORTE EQUIPOS ENSAMBLADOS A CENTROS DE ACOPIO DE LOS MUNICIPIOS DEL PROYECTO.	10	1/10/2026	11/10/2026	4,0%	0,0%
9	ADQUISICION Y TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS NACIONALES A CENTROS DE ACOPIO DE LOS MUNICIPIOS DEL PROYECTO (postes, cables, internas y material menor).	10	19/05/2026	29/05/2026	3,0%	0,0%
10	HINCADO DE MÁSTILES SSFV.	20	29/05/2026	18/06/2026	6,0%	0,0%
11	ARMADO DE ESTRUCTURAS	20	29/05/2026	18/06/2026	5,0%	0,0%
12	ADECUACION DE TERRENO PARA INSTALACION GABINETE Y ACOMETIDAS	20	11/10/2026	31/10/2026	5,0%	0,0%
13	INSTALACIONES INTERNAS, INSTALACION MEDIDORES CAPACITACION	20	11/10/2026	31/10/2026	5,0%	0,0%
14	CONSTRUCCION, PRUEBAS ENERGIZACION Y PUESTA EN SERVICIO Y CAPACITACION DE USUARIOS.	30	11/10/2026	10/11/2026	8,0%	0,0%
15	ACTA DE RECEPCION DE OBRA ENTRE LA INTERVENTORIA Y CONTRATISTA DE OBRA.	5	20/09/2026	25/09/2026	2,0%	0,0%
16	ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE INVENTARIOS ENTRE EL IPSE Y GENSA	5	20/09/2026	25/09/2026	2,0%	0,0%
17	REVISION AJUSTE, VALIDACION Y ENTREGA A QUIEN DEFINA EL IPSE DEL ESQUEMA DE SOSTENIBILIDAD.	5	20/09/2026	25/09/2026	2,0%	0,0%
18	ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA AL OPERADOR DE AOM QUIEN DEFINA EL IPSE.	5	25/09/2026	30/09/2026	2,0%	0,0%
19	ACTA DE RECIBO DE INFRAESTRUCTURA Y ENTREGA DE INVENTARIOS A QUIEN DEFINA EL IPSE, PARA LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AOM.	5	25/09/2026	30/09/2026	2,0%	0,0%
20	ACTAS DE LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS OBRA E INTERVENTORIA	5	25/09/2026	30/09/2026	2,0%	0,0%

De acuerdo con el cronograma, el proyecto cuenta con un avance del 23%.

IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE MURINDÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

El 14 de abril de 2026 se suscribió el contrato de obra 140-13.06-0161-2026 con la firma CORPORACION ECOPROJECTS. Este contrato se encuentra debidamente legalizado y con acta de inicio fechada del 22 de abril de 2026.

Respecto de la interventoría al proyecto, se recibieron ofertas el 24 de abril de 2026 y se adelanta el proceso de evaluación.

CRONOGRAMA MURINDÓ

CRONOGRAMA - PLAN DE TRABAJO						
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IPSE 178-2025						
PROYECTO	REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y GERENCIA DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL.					
	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MURINDÓ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA					
ADMINISTRADOR:		GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. ESP				
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CONTRATO						
FECHA SUSCRIPCION DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		20-May-25				
FECHA ACTA DE INICIO		29-Jul-25				
FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO		30-Sep-26				
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL		17%				
Item	Actividad	Duración (dias)	Fecha Inicio	Fecha Final	PORCENTAJE POR ACTIVIDAD	PORCENTAJE AVANCE
Actividades previas a la contratación					10%	10%
1	SUSCRIPCIÓN DEL ENCARGO FIDUCIARIO.	30	10/12/2025	9/01/2026	2,0%	2,0%
2	INCORPORACIÓN DE LOS RECURSOS AL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD.	30	10/12/2025	9/01/2026	2,0%	2,0%
3	REVISIÓN, ACEPTACIÓN DE DISEÑOS.	10	10/12/2025	20/12/2025	2,0%	2,0%
4	REVISION Y ACEPTACION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	30	10/12/2025	9/01/2026	2,0%	2,0%
6	ELABORACION DE PLIEGOS CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA	30	9/01/2026	8/02/2026	2,0%	2,0%
Actividades de contratación					10%	7%
1	PUBLICACIÓN DE PLIEGOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	30	8/02/2026	10/03/2026	2,0%	2,0%
2	RECIBO, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OFERTAS.	15	10/03/2026	25/03/2026	2,0%	1,0%
3	FIRMA DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA Y OBRA Y LEGALIZACIÓN.	20	25/03/2026	14/04/2026	4,0%	2,0%
4	SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA.	5	14/04/2026	19/04/2026	1,5%	1,0%
5	CRONOGRAMA DE OBRA	5	19/04/2026	24/04/2026	0,5%	0,5%
Actividades de suministro y construcción de obras y liquidación					80%	1%
1	VERIFICACION DE USUARIOS, REPLANTEO Y SOCIALIZACION	30	24/04/2026	24/05/2026	3,0%	0,5%
2	APROBACIÓN DE REPLANTEO	15	24/05/2026	8/06/2026	4,0%	0,0%
3	ORDENES DE COMPRA DE MATERIALESY EQUIPOS NACIONALES	30	8/06/2026	8/07/2026	2,0%	0,0%
4	ORDENES DE COMPRA DE MATERIALESY EQUIPOS IMPORTADOS	30	8/06/2026	8/07/2026	3,0%	0,0%
5	FABRICACIÓN Y TRANSPORTE, DE EQUIPOS Y MATERALES NACIONALES	30	8/07/2026	7/08/2026	14,0%	0,0%
6	FABRICACIÓN, TRANSPORTE, Y NACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS IMPORTADOS	60	8/07/2026	6/09/2026	3,0%	0,0%
7	CONSTRUCCION Y ENSAMBLE DE GABINETES CON EQUIPOS IMPORTADOS	15	6/09/2026	21/09/2026	3,0%	0,0%
8	TRANSPORTE EQUIPOS ENSAMBLADOS A CENTROS DE ACOPIO DE LOS MUNICIPIOS DEL PROYECTO.	5	21/09/2026	26/09/2026	4,0%	0,0%
9	ADQUISICION Y TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS NACIONALES A CENTROS DE ACOPIO DE LOS MUNICIPIOS DEL PROYECTO (postes, cables, internas y material menor).	5	6/09/2026	11/09/2026	3,0%	0,0%
10	HINCADO DE MÁSTILES SSFV.	90	7/08/2026	5/11/2026	6,0%	0,0%
11	ARMADO DE ESTRUCTURAS	90	7/08/2026	5/11/2026	5,0%	0,0%
12	ADECUACION DE TERRENO PARA INSTALACION GABINETE Y ACOMETIDAS	90	7/08/2026	5/11/2026	5,0%	0,0%
13	INSTALACIONES INTERNAS, INSTALACION MEDIDORES CAPACITACION	90	7/08/2026	5/11/2026	5,0%	0,0%
14	CONSTRUCCION, PRUEBAS ENERGIZACION Y PUESTA EN SERVICIO Y CAPACITACION DE USUARIOS.	15	11/09/2026	26/09/2026	8,0%	0,0%
15	ACTA DE RECEPCION DE OBRA ENTRE LA INTERVENTORIA Y CONTRATISTA DE OBRA.	15	14/09/2026	29/09/2026	2,0%	0,0%
16	ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE INVENTARIOS ENTRE EL IPSE Y GENSA	15	14/09/2026	29/09/2026	2,0%	0,0%
17	REVISION AJUSTE, VALIDACION Y ENTREGA A QUIEN DEFINA EL IPSE DEL ESQUEMA DE SOSTENIBILIDAD.	15	14/09/2026	29/09/2026	2,0%	0,0%
18	ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA AL OPERADOR DE AOM QUIEN DEFINA EL IPSE.	15	14/09/2026	29/09/2026	2,0%	0,0%
19	ACTA DE RECIBO DE INFRAESTRUCTURA Y ENTREGA DE INVENTARIOS A QUIEN DEFINA EL IPSE, PARA LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AOM.	10	20/09/2026	30/09/2026	2,0%	0,0%
20	ACTAS DE LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS OBRA E INTERVENTORIA	10	20/09/2026	30/09/2026	2,0%	0,0%

De acuerdo con el cronograma, el proyecto cuenta con un avance del 17%.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Atrato, Cantón de San Pablo y Uribe:



Fabricación de placa base y pernos de anclaje para estructura fotovoltaica individual.



Gabinete eléctrico ensamblado para sistemas fotovoltaicos individuales del Chocó y Meta.



Embalaje y alistamiento de materiales eléctricos adquiridos para soluciones individuales fotovoltaicas.




Evidencia de adquisición, ensamblaje y preparación de gabinetes destinados a las soluciones individuales fotovoltaicas proyectadas en los departamentos del Chocó y Meta.

Miraflores





Logística de transporte de los paneles

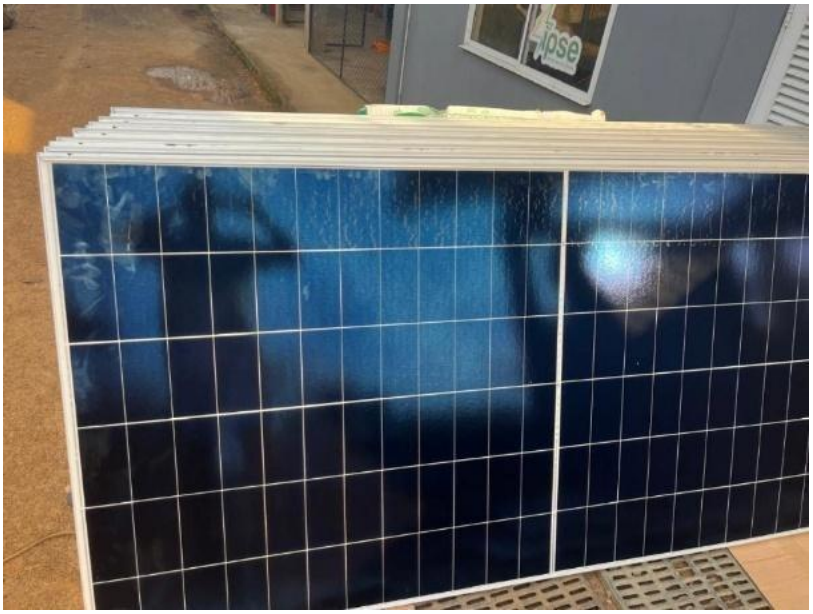

Acopio de módulos nuevos en perfecto estado en bodega Central de Miraflores



Desconexión eléctrica y desmonte mecánico de módulos fotovoltaicos afectados



Instalación de módulos fotovoltaicos nuevos



Instalación de módulos fotovoltaicos nuevos

López de Micay



Socialización del proyecto comunidad de La Playita



Socialización del proyecto en la comunidad de La Vuelta

8. GESTIÓN FINANCIERA

ENCARGO FIDUCIARIO: GENSA suscribió el 10 de julio de 2025, el contrato de encargo fiduciario de administración y pagos con la FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A., identificada con NIT 800.182.281-5.

BALANCE DE RECURSOS

Cuentas de cobro radicadas por GENSA al IPSE al 30 de abril de 2026:

PRIMER DESEMBOLSO DE RECURSOS

PROYECTO	CUENTA DE COBRO	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN EN EL IPSE
PUERTO COLOMBIA	159-2025	$972.808.219	24/09/2025
ATRATO Y EL CANTÓN	160-2025	$1.073.051.538	
URIBE	161-2025	$159.666.398	
HATO COROZAL - PAZ DE ARIPORO	162-2025	$8.722.300.289	
MIRAFLORES	163-2025	$26.550.000	
LÓPEZ DE MICAY	212-2026	$1.200.624.863	11/02/2026
SOLANO	211-2026	$1.848.889.156	
MURINDÓ	216-2026	$ 299.374.497	20/04/2026

SEGUNDO DESEMBOLSO DE RECURSOS

PROYECTO	CUENTA DE COBRO	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN EN EL IPSE
PUERTO COLOMBIA	189-2025	$1.652.243.033	27/11/2025
ATRATO Y EL CANTÓN	190-2025	$894.209.615	
URIBE	191-2025	$133.055.332	
HATO COROZAL - PAZ DE ARIPORO	192-2025	$7.125.930.110	
MIRAFLORES	193-2025	$22.125.000	
LÓPEZ DE MICAY	217-2026	$1.000.520.720	13/04/2025
SOLANO	215-2026	$1.540.740.963	

Desembolsos efectuados por el IPSE al 30 de abril de 2026:

PRIMER DESEMBOLSO DE RECURSOS

PROYECTO	VALOR	FECHA DE REALIZACIÓN DEL DESEMBOLSO
PUERTO COLOMBIA	$ 972.808.219	29/10/2025
ATRATO Y EL CANTÓN	$1.073.051.538	
URIBE	$159.666.398	
HATO COROZAL - PAZ DE ARIPORO	$8.722.300.289	
MIRAFLORES	$26.550.000	
LÓPEZ DE MICAY	$1.200.624.863	24/03/2026
SOLANO	$1.848.889.156	

SEGUNDO DESEMBOLSO DE RECURSOS

PROYECTO	VALOR	FECHA DE REALIZACIÓN DEL DESEMBOLSO
PUERTO COLOMBIA	$1.652.243.033	24/03/2023
ATRATO Y EL CANTÓN	$894.209.615	
URIBE	$133.055.332	
HATO COROZAL - PAZ DE ARIPORO	$7.125.930.110	
MIRAFLORES	$22.125.000	

RELACION PAGOS CONTRATOS SUSCRITOS CON TERCEROS DE OBRA E INTERVENTORIA

Con corte al 30 de abril de 2026, GENSA ha gestionado los siguientes pagos a los contratistas derivados:

CONTRATO DERIVADO	CONTRATISTA	TIPO	PROYECTOS	PAGO ANTICIPADO	FECHA
140-13.06-0214-2025	CORPORACIÓN ECOPROJECTS	OBRA	ATRATO CANTÓN DE SAN PABLO URIBE	$1.110.544.118	dic-25
140-13.05-0220-2025	REDECOM INGENIERÍA S.A.S	INTERVENTORÍA		$63.282.177	

140-13.06-0209-2025	HG INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	OBRA	HATO COROZAL PAZ DE ARIPORO MIRAFLORES	$7.518.967.297	
140-13.05-0177-2025	SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES S.A.S. SECOB S.A.S.	INTERVENTORÍA		$424.532.206	
140-13.06-0139-2025	CONSORCIO GUAINÍA SOLAR AREEM&GIL	OBRA	PUERTO COLOMBIA	$860.486.389	ene-26
140-13.05-0178-2025	ORGANIZACIÓN ACREDITADORA DE PROYECTOS S.A.S. – OCAP S.A.S.	INTERVENTORÍA		$61.443.122	
140-13.06-0375-2025	CONSORCIO SOLAR COEMANÍ	OBRA	SOLANO	$1.668.110.263	abr-26
140-13.05-0366-2025	H&V INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.	INTERVENTORÍA		$92.614.011	
140-13.06-0363-2025	CORPORACIÓN ECOPROJECTS	OBRA	LÓPEZ DE MICAY	$1.074.924.935	
140-13.05-0109-2026	SOLUCIONES ENERGETICAS FORESTALES INTEGRALES S.A.S	INTERVENTORÍA		$68.222.343	

9. ASPECTOS JURÍDICOS

El 10 de diciembre de 2025 se suscribió la modificación 03 al Contrato.

10. COMPONENTE TÉCNICO

a. PUERTO COLOMBIA (GUAINIA):

Implementar las instalaciones eléctricas para los sistemas de generación de energía solar fotovoltaica comunitarias, con capacidad de 155 kW, en el municipio de Puerto Colombia cumpliendo lo dictaminado en el RETIE, la NTC 2050 y demás normatividad colombiana que aplique para el sistema en mención en el departamento de Guainía:

b. ATRATO Y CANTÓN DE SAN PABLO (CHOCÓ):

Implementar sistemas solares fotovoltaicos centralizados en diferentes comunidades de los municipios de Atrato y Cantón de San Pablo en el departamento del Chocó:

RESUMEN GENERAL		
Nº DE USUARIOS	CENTRALIZADOS	50
	INDIVIDUALES	18

CENTRALIZADOS 10kWp				
PANELES	**INVERSORES**	**CONTROLADORES**	**BATERÍAS**	**SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO**
36 paneles Solares de 670 W Mono PERC	2 inversores de onda pura de 5000 VA 120V, FP 0.8, eficiencia del 94% y función de trabajo en paralelo.	2 controladores MPPT RS 450/200A, tensiones de trabajo a 48V	3 bancos de baterías de 32kWh a 51,2V.	Suministro e instalación de medidor AMI prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120V, calibrado. Incluye sistema de gestión de recaudo y equipos de comunicación online.

CENTRALIZADOS 5kWp				
PANELES	**INVERSORES**	**CONTROLADORES**	**BATERÍAS**	**SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO**
18 paneles Solares de 670 W Mono PERC	Inversor de onda pura de 5000 VA 120V	Controlador MPPT RS 450/200A, tensiones de trabajo a 48V	Banco de baterías de 32 kWh a 51,2V	Suministro e instalación de medidor AMI prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120V, calibrado. Incluye sistema de gestión de recaudo y equipos de comunicación online.

INDIVIDUALES				
PANELES	**INVERSORES**	**CONTROLADORES**	**BATERÍAS**	**SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO**
3 paneles Solares de 670 W Mono PERC	Inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 2000 W, 48 VDC entrada - 120 VAC salida, f=60 Hz	Controlador de carga, 50A/48V MPPT Solar	Batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah – 51.2 VDC - ≥6000 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado	Medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado. Incluye sistema de gestión de recaudo y equipos de comunicación standalone.

c. URIBE (META):

Mejoramiento de la infraestructura en la vereda Planes, municipio de Uribe, departamento del Meta. Esta mejora se realizará mediante la implementación de recursos renovables para atender la demanda energética de los usuarios de la zona. Estos usuarios corresponden a viviendas que actualmente cuentan con un Sistema Solar Fotovoltaico Individual (SSFVI).

RESUMEN GENERAL				
Nº DE USUARIOS	INDIVIDUALES			17
PANELES	**INVERSORES**	**CONTROLADORES**	**BATERÍAS**	**SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO**
3 paneles Solares de 670 W Mono PERC	Inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 2000 W, 48 VDC entrada - 120 VAC salida, f=60 Hz	Controlador de carga, 50A/48V MPPT Solar	Batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah – 51.2 VDC - ≥6000 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado	Medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado. Incluye sistema de gestión de recaudo y equipos de comunicación standalone.

d. HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO (CASANARE):

Implementar sistemas de generación de energía solar fotovoltaica comunitarias en los municipios de Paz de Ariporo y Hato Corozal; cumpliendo lo dictaminado en el RETIE, la NTC 2050 y demás normatividad colombiana que aplique para el sistema en mención en el departamento de Casanare.

SSVF microred 5 kw		
Sistema de generación de 18090Wp	UN	2
SSVF microred 10 kw		
Sistema de generación de 36180Wp	UN	1
SSVF microred 15 kw		
Sistema de generación de 54270Wp	UN	3
SSVF Especial (BETANIA)		
Sistema de generación Especial de 75040 Wp	UN	1
SSVF Especial (MORICHITO)		
Sistema de generación Especial de 789260 Wp	UN	1
SSVF Especial (SAN JOSÉ)		
Sistema de generación Especial de 168840 Wp	UN	1
SSVF Especial (LA ESMERALDA)		
Sistema de generación Especial de 136680 Wp	UN	1

e. MIRAFLORES (GUAVIARE):

Implementar la reposición y puesta en marcha de los equipos e instalaciones eléctricas afectados por la detonación de un artefacto explosivo en la central de generación híbrida del municipio de Miraflores, departamento de Guaviare.

f. LOPEZ DE MICAY (CAUCA):

Implementación de soluciones energéticas a partir de fuentes no convencionales de energía para el mejoramiento de la infraestructura eléctrica en los Resguardos Indígenas Playita San Francisco y La Vuelta en el municipio de López de Micay, Cauca.

RESUMEN GENERAL			
Nº DE USUARIOS	CENTRALIZADO SAN FRANCISCO		22
	CENTRALIZADO LA PLAYITA		44
CENTRALIZADO SAN FRANCISCO			
PANELES	**INVERSORES**	**BATERÍAS**	**SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO**
60 paneles solares DE 715 Wp c/u a 24 Vdc	Un Inversor All in one cargador de baterías 3F de 30 KW, 200 - 1000 VDC / 220 VAC, 60 Hz, onda senoidal pura con display LCD, eficiencia >98%	Banco de baterías de ión-litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 280Ah - 382 Vdc (107 kWh) - 6000 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado	Medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado Sistema de gestión de recaudo, incluye equipos de comunicación "on-line y off-line" para medición prepago San Francisco
CENTRALIZADO LA PLAYITA			

PANELES	INVERSORES	BATERÍAS	SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO
96 paneles solares DE 715 Wp c/u a 24 Vdc	Inversor All in one cargador de baterías 3F de 50 KW, 200 - 1000 VDC / 220 VAC, 60 Hz, onda senoidal pura con display LCD, eficiencia >98%,	banco de baterías de ión-litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 280Ah - 768 Vdc (161 kWh) - 6000 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado	Medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado Sistema de gestión de recaudo, incluye equipos de comunicación "on-line y off-line" para medición prepago La Playita

g. SOLANO (CAQUETÁ):

Implementación de soluciones energéticas con fuentes no convencionales de energía para la comunidad de Coemaní, municipio de Solano - departamento del Caquetá.

ESCUELA				
PANELES	**INVERSORES**	**CONTROLADORES**	**BATERÍAS**	**SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO**
Suministro, transporte e instalación de Panel Solar de 670 W Mono PERC (27 unidades)	inversor de onda pura de 5000 VA 120V, FP 0.8, eficiencia del 94% y función de trabajo en paralelo (1)	controlador MPPT RS 450/200A, tensiones de trabajo a 48V, eficiencia de conversión 96% (1)	banco de baterías de 57,6 kWh a 51,2 V. con baterías de ion - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 125 Ah - 51,2 VDC - 6.000 ciclos hasta el 80% DOD (1)	medidor AMI prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado. Incluye sistema de gestión de recaudo y equipos de comunicación online.
CENTRALIZADO				
PANELES	**INVERSORES**	**CONTROLADORES**	**BATERÍAS**	**SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO**
Suministro, transporte e instalación de Panel Solar de 670 W Mono PERC (54 unidades)	inversor de onda pura de 5000 VA 120V, FP 0.8, eficiencia del 94% y función de trabajo en paralelo (2)	controlador MPPT RS 450/200A, tensiones de trabajo a 48V, eficiencia de conversión 96% (2)	banco de baterías de 57,6 kWh a 51,2 V. con baterías de ion - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 125 Ah - 51,2 VDC - 6.000 ciclos hasta el 80% DOD (2)	medidor AMI prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado. Incluye sistema de gestión de recaudo y equipos de comunicación online.
INDIVIDUALES				
PANELES	**INVERSORES**	**CONTROLADORES**	**BATERÍAS**	**Sistema de medición y gestión de energía**
Panel Solar de 670 W Mono PERC (3 unidades)	inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 2000 W, 48 VDC entrada - 120 VAC salida, f=60 Hz	regulador (controlador) de carga, 50A/48V MPPT Solar, eficiencia mínima del 96%, debe ser apto para cargar baterías tipo LiFePO4	batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah – 51.2 VDC - ≥6000 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado	Medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V

h. MURINDÓ (ANTIOQUIA):

Implementación de soluciones energéticas con fuentes no convencionales de energía SISFV para el municipio de Murindó - departamento de Antioquia.

RESUMEN GENERAL				
Nº DE USUARIOS	INDIVIDUALES			33
PANELES	**INVERSORES**	**CONTROLADORES**	**BATERÍAS**	**SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO**
3 paneles Solares de 670 W Mono PERC	Inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 2000 W, 48 VDC entrada - 120 VAC salida, f=60 Hz	Regulador (controlador) de carga, 60A/150Vdc MPPT Solar, eficiencia mínima del 96%, debe ser apto para cargar baterías tipo LiFePO4.	Batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah – 51.2 VDC - ≥6000 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado hasta el 80% DOD, con BMS integrado	Medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado Sistema de gestión de recaudo, incluye equipos de comunicación "on-line y off-line" para medición prepago

11. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En la siguiente tabla se relacionan los profesionales de GENSA S.A. ESP que tienen a cargo la supervisión del contrato Interadministrativo IPSE 178-2025.

- Se anexa el certificado de pago de seguridad social del mes de enero de 2026.
- A la fecha no se han presentado incidentes ni accidentes de trabajo.

RELACIÓN DEL PERSONAL DE GENSA

GENSA S.A.	CARGO
Julio Mauricio Arce Posso	Líder de Proyectos de Infraestructura en el Sector Eléctrico
Mónica Alejandra González Londoño	Profesional Especializado en Estructuración de Proyectos
Carlos Alberto Triana Grajales	Profesional Especializado en Proyectos
Julián Santiago Mejía Zuluaga	Profesional de Proyectos

12. INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE CONTRATOS SUSCRITOS.

Para el periodo correspondiente se ha verificado el cumplimiento en materia de documentación legal y administrativa, se relaciona el personal vinculado para el desarrollo de las obras y se verifica que, en cumplimiento de la ley 100 de 1993 los trabajadores se encuentran afiliados a EPS, ARL y AFP, lo que garantiza que los trabajadores se encuentran amparados frente a un accidente o enfermedad laboral, que ponga en riesgo su salud o su vida.

13. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Para el periodo correspondiente a este informe no se han generado actividades del componente ambiental.

14. COMPONENTE SOCIAL


En cuanto al componente social los contratistas de obra se encuentran elaborando sus matrices de gestión social para el desarrollo de las actividades inherentes durante la ejecución de los proyectos.

Se anexan a este informe las matrices entregadas a la fecha.


15. CONCLUSIONES

- El avance general del Contrato Interadministrativo 178-2025 a 30 de abril de 2026, de acuerdo con el cronograma, es del 34,3%, como se detalla a continuación:

CRONOGRAMA - PLAN DE TRABAJO				
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IPSE 178-2025				
PROYECTOS	REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y GERENCIA DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL.			
ADMINISTRADOR:		**GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. ESP**		
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CONTRATO				
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		20-May-25		
FECHA ACTA DE INICIO		29-Jul-25		
FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO		30-Sep-26		
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL		**34,3%**		
Item	**Actividad**	**Duración (dias)**	**Fecha Inicio**	**Fecha Final**
Actividades previas a la contratación				
1	SUSCRIPCIÓN DEL ENCARGO FIDUCIARIO.	30	29/10/2025	28/11/2025
2	INCORPORACIÓN DE LOS RECURSOS AL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD.	10	29/10/2025	8/11/2025
3	REVISIÓN, ACEPTACIÓN DE DISEÑOS.	10	29/10/2025	8/11/2025
4	REVISION Y ACEPTACION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	10	29/10/2025	8/11/2025
5	ELABORACION DE PLIEGOS CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA	12	8/11/2025	20/11/2025
Actividades de contratación				
1	PUBLICACIÓN DE PLIEGOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	30	20/11/2025	20/12/2025
2	RECIBO, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OFERTAS.	30	20/12/2025	19/01/2026
3	FIRMA DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA Y OBRA Y LEGALIZACIÓN.	20	19/01/2026	8/02/2026
4	SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA.	20	8/02/2026	28/02/2026
5	CRONOGRAMA DE OBRA	5	28/02/2026	5/03/2026
Actividades de suministro y construcción de obras y liquidación				
1	VERIFICACION DE USUARIOS, REPLANTEO Y SOCIALIZACION	75	5/03/2026	19/05/2026
2	INFORME DE SOCIALIZACIÓN y APROBACIÓN DE REPLANTEO	30	19/05/2026	18/06/2026
3	ORDENES DE COMPRA DE MATERIALESY EQUIPOS NACIONALES	30	19/05/2026	18/06/2026
4	ORDENES DE COMPRA DE MATERIALESY EQUIPOS IMPORTADOS	30	19/05/2026	18/06/2026
5	FABRICACIÓN Y TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERALES NACIONALES	30	18/06/2026	18/07/2026
6	FABRICACIÓN, TRANSPORTE, Y NACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS IMPORTADOS	90	18/06/2026	16/09/2026
7	CONSTRUCCION Y ENSAMBLE DE GABINETES CON EQUIPOS IMPORTADOS	90	16/09/2026	15/12/2026
8	TRANSPORTE EQUIPOS ENSAMBLADOS A CENTROS DE ACOPIO DE LOS MUNICIPIOS DEL PROYECTO.	90	15/12/2026	15/03/2027
9	ADQUISICION Y TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS NACIONALES A CENTROS DE ACOPIO DE LOS MUNICIPIOS DEL PROYECTO (postes, cables, internas y material menor).	90	16/09/2026	15/12/2026
10	HINCADO DE MÁSTILES SSFV.	90	15/12/2026	15/03/2027
11	ARMADO DE ESTRUCTURAS	90	15/12/2026	15/03/2027
12	INSTALACION GABINETE Y ACOMETIDAS	90	15/12/2026	15/03/2027
13	INSTALACIONES INTERNAS, INSTALACION MEDIDORES CAPACITACION	90	15/03/2027	13/06/2027
14	CONSTRUCCION, PRUEBAS, ENERGIZACION Y PUESTA EN SERVICIO Y CAPACITACION DE USUARIOS.	15	13/06/2027	28/06/2027
15	ACTA DE RECEPCION DE OBRA ENTRE LA INTERVENTORIA Y CONTRATISTA DE OBRA.	15	14/09/2026	29/09/2026
16	ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE INVENTARIOS ENTRE EL IPSE Y GENSA	15	14/09/2026	29/09/2026
17	REVISION AJUSTE, VALIDACION Y ENTREGA A QUIEN DEFINA EL IPSE DEL ESQUEMA DE SOSTENIBILIDAD.	15	14/09/2026	29/09/2026
18	ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA AL OPERADOR DE AOM QUIEN DEFINA EL IPSE.	15	14/09/2026	29/09/2026
19	ACTA DE RECIBO DE INFRAESTRUCTURA Y ENTREGA DE INVENTARIOS A QUIEN DEFINA EL IPSE, PARA LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AOM.	10	20/09/2026	30/09/2026
20	ACTAS DE LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS OBRA E INTERVENTORIA	10	20/09/2026	30/09/2026

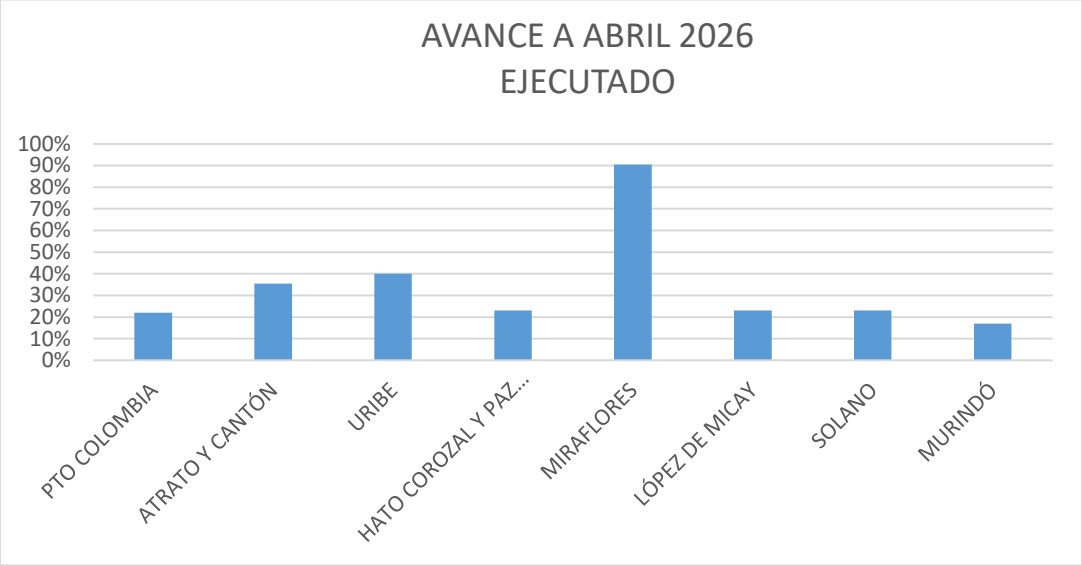

Gráfica 1. Porcentaje de avance por proyecto.

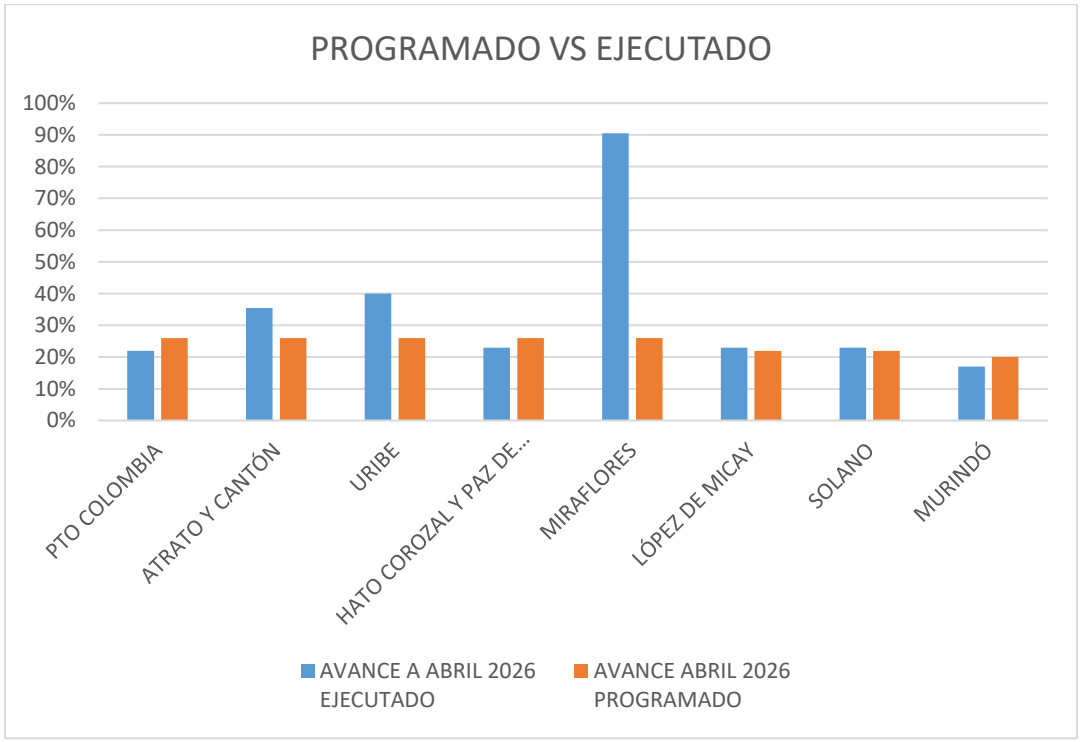

Gráfica 2. Comparativo porcentaje de ejecución programado vs ejecutado.

16. ANEXOS:

- Pago de seguridad social GENSA S.A.
- Cronograma Gral. IPSE 178-2025.
- Informe de la fiduciaria.

Elaborado por: Mónica Alejandra González Londoño–Profesional Especializado en Diseño y Estructuración de Proyectos.

Julián Santiago Mejía Zuluaga - Profesional de Proyectos.

Revisado por: Julio Mauricio Arce Posso - Líder de Proyectos de Infraestructura Sector Eléctrico.
