G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

Puerto Rondón, Arauca
28/07/2026

Señores:
MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN
Secretaria de Planeación e Infraestructura

Recibí Jorge A
Hora: 9:10am Jorge Alvarez

Asunto: **REMISIÓN HOJA DE VIDA DEL PROFESIONAL – CONTRATO DE OBRA NO. 105 DE 2026**

Cordial saludo, Por medio de la presente me permito hacer allegar la hoja de vida del profesional que estará vinculado al desarrollo del Contrato de Obra No. 105 de 2026, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", El profesional presentado cumple con los perfiles, requisitos técnicos y experiencia exigidos para la correcta ejecución de las actividades contempladas en el contrato, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la calidad de los trabajos y los tiempos establecidos, Adjunto a la presente se remiten los siguientes documentos:

- Hoja de vida del profesional
- Soportes de formación académica
- Certificaciones de experiencia
- Copia de documento de identidad
- Tarjeta profesional

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

G&C CONSTRUCCIONES,
SERVICIOS Y SUMINISTROSSAS
R/L CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO
Contratista

CERTIFICACIONES
Procesos MPR-MIC-044-2026 TRD. 102.04.06

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN-ARAUCA

HACE CONSTAR:

Que una vez revisada la hoja de vida del profesional propuesto para la ejecución del contrato cuyo objeto es: "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", se evidencia que CUMPLE con los requisitos exigidos para el perfil solicitado, por lo cual SE APRUEBA su vinculación al proyecto, el profesional corresponde al siguiente perfil:

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

PREGRADO CON TÍTULO	REQUISITOS DE EXPERIENCIA GENERAL	REQUISITOS DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA
Ingeniero civil y/o arquitecto residente de obra	Veinticuatro (24) meses	Doce (12) meses

El personal relacionado es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la ejecución del contrato derivado del presente Proceso de Contratación.

CERTIFICACIONES
Procesos MPR-MIC-044-2026 TRD. 102.04.06

Requisitos del personal:

Todos los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:

Ingeniero civil y/o arquitecto residente de obra	1	100%	Dos (2) años de experiencia	Un (1) año	Haberse desempeñado como Contratista y/o Supervisor, y/o Director y/o Residente de Obra civiles y/o Inspector de Obra y/o Interventoría en mínimo dos (2) Contratos de Obra y/o interventoría de proyecto de edificaciones

En virtud de lo anterior, se deja constancia de que el profesional cumple con las condiciones técnicas, académicas y de experiencia exigidas para el desarrollo del contrato en mención.

CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
Secretario de Planeación E Infraestructura

Proyectó:	Aprobó aspectos técnicos:
Nombre: JUAN GABRIEL COTRINA RIVEROS **Cargo:** Profesional de apoyo No.112 - 2026	**Nombre:** Arquitecto Carlo Brian Riaño Carreño **Cargo:** Secretario de Planeación e Infraestructura

JUAN ADOLFO ORJUELA RODRÍGUEZ

Ingeniero Civil – Especialista en Gerencia Integral de Obras
Bogotá D.C. | Celular: 312 257 49 38 | aorjuela03@gmail.com
CC. 79.135.493

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Civil y Especialista en Gerencia Integral de Obras con un perfil técnico-administrativo respaldado por más de 25 años de experiencia en el sector de la construcción. Sólida trayectoria en la dirección, interventoría y control de proyectos de infraestructura vial, edificaciones institucionales, reforzamientos estructurales y obras civiles complejas. Con capacidades en la planeación presupuestal, control de costos, gestión de subcontratistas, facturación y liderazgo de equipos multidisciplinarios en campo. Destacada habilidad de comunicación, enfoque en resultados y cumplimiento de cronogramas.

EXPERIENCIA LABORAL

CONSORCIO SAN JOSÉ

- **Cargo:** Director de Obra
- **Periodo:** Febrero 2022 – Marzo 2026
- **Proyecto:** Contrato de Obra 400 de 2021 (USPEC). Construcción y adecuación de bloques de alojamiento y obras complementarias en los centros penitenciarios EPAMS Girón y EPAMS Ipiales, grupo Ipiales
- **Funciones y logros:**
    - Dirección técnica, administrativa y financiera del proyecto bajo el sistema de precios unitarios.
    - Control estricto de presupuestos, costos, requisiciones y flujos de pago a proveedores.
    - Gestión, conciliación y aprobación de actas parciales de obra ante la interventoría y la supervisión del proyecto.
    - Coordinación de la apertura, seguimiento contractual y liquidación de subcontratos.

CONSORCIO ACERTA-CONSULTEC JBB 2020

- **Cargo:** Ingeniero Residente de Interventoría.

- **Periodo:** Abril 2021 – Febrero 2022
- **Proyecto:** Interventoría integral al reforzamiento estructural y obras complementarias del Jardín Botánico José Celestino Mutis.
- **Funciones y logros:**
    - Supervisión técnica, jurídica, administrativa y ambiental del contratista de obra.
    - Control del cronograma de ejecución, aprobación de actas parciales y estructuración del cierre definitivo.

DMM – DARIO MONTOYA MIER

- **Cargo:** Ingeniero Residente de Interventoría.
- **Periodo:** Diciembre 2019 – Diciembre 2020.
- **Proyecto:** Contrato Fondo Adaptación. Interventoría integral a la construcción de nuevas sedes educativas en el municipio de Liborina, Antioquia.
- **Funciones y logros:**
    - Control del avance de ejecución, calidad de materiales y seguimiento financiero de los frentes de obra.
    - Elaboración de informes técnicos periódicos para la supervisión delegada por la entidad estatal.

CONSTRUCCIONES KYOTO

- **Cargo:** Director de Obra
- **Periodo:** Abril 2019 – Octubre 2019
- **Proyecto:** Construcción estructural de la Parroquia Niño Jesús de Praga - Fase III (Bogotá)
- **Funciones y logros:**
    - Coordinación integral del suministro de materiales, calidad de los procesos constructivos y rendimiento de la mano de obra.
    - Control de costos del proyecto y legalización de actas de obra ante la gerencia.

CONSORCIO SAN JOSÉ

- **Cargo:** Ingeniero Residente de Obra
- **Periodo:** Diciembre 2016 – Febrero 2019
- **Proyecto:** Demolición y construcción de los bloques A y B de la sede central de la Defensoría del Pueblo (Bogotá).

- **Funciones y logros:**
    - Coordinación técnica de subcontratistas en las disciplinas de estructuras de concreto, redes hidrosanitarias, redes eléctricas, voz y datos, y acabados.
    - Control de cortes de obra y liquidación de contratos de mano de obra y especialidades.

DMM – DARIO MONTOYA MIER

- **Cargo:** Ingeniero Residente de Interventoría
- **Periodo:** Julio 2013 – Diciembre 2016
- **Proyecto:** Proyectos de construcción de infraestructura para el Ejército Nacional de Colombia.

UNIÓN ELÉCTRICA S.A.

- **Cargo:** Ingeniero Líder de Proyecto (Cuenta: ECOPETROL)
- **Periodo:** Febrero 2013 – Mayo 2013
- **Proyecto:** Infraestructura básica para centros de procesamiento de datos y telecomunicaciones de Ecopetrol.

EXPERIENCIA PREVIA COMPLEMENTARIA

- **CONSORCIO H & S 2006** | Residente de Obra – Adecuación Edificio Confucio Universidad Jorge Tadeo Lozano (2012–2013).
- **CONSORCIO S + C** | Residente de Obra – Construcción Escuadrón de Armamento CATAM - Fuerza Aérea (2012).
- **PYMAN CORP. (Panamá)** | Coordinador de Proyectos – Construcción de más de 60,000 m^2 de pisos industriales de alta planitud y pavimentos en Ciudad de Panamá (2011).
- **PISOS Y MANTENIMIENTOS PYMAN S.A.S.** | Coordinador de Proyectos (2010–2011).
- **CONSORCIO PACÍFICO** | Residente de Obra – Construcción Centro Agroindustrial SENA Tumaco (2009–2010).
- **CONSTRUCCIONES BARSA LTDA.** | Residente de Obra – Alojamiento de Oficiales EMAVI Cali (2009).
- **ING. JOSÉ LUIS NATES DULCE** | Director de Interventoría – Proyectos Federación Nacional de Cafeteros en el Meta (2008–2009).
- **CONSORCIO CH&S / OMEGA / UT MONSERRATE / CIVCO S.A.** | Ingeniero Residente de Obra e Interventoría en diversos proyectos institucionales, educativos y distritos de riego (1998–2008).

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

- **Especialista en Gerencia Integral de Obras**
  Escuela de Ingenieros Militares (ESING), Bogotá | 2015
- **Ingeniero Civil**
  Universidad Católica de Colombia, Bogotá | 1997

EDUCACIÓN CONTINUA Y SOFTWARE

- **Estudios de Inglés General:** Evendine College, Londres, Inglaterra (Idioma: Inglés 60%).
- **Herramientas de Ingeniería:** Conocimientos operativos en AutoCAD, MS Project y Microsoft Excel (SENA).
- **Seminarios:** Interventoría de Obras Civiles (60 hrs) y Obras de Arte para Carreteras (60 hrs) - Universidad Católica de Colombia.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.135.493**

ORJUELA RODRIGUEZ
APELLIDOS

JUAN ADOLFO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-DIC-1969**
FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80	B+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-AGO-1988 FONTIBON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura

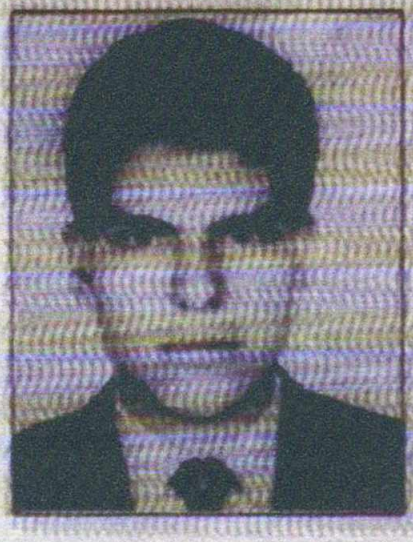

MATRICULA No. 25202593888CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 19/12/97
APELLIDOS
ORJUELA RODRIGUEZ
NOMBRES
JUAN ADOLFO
C.C. 79,135,493
UNIV. CATOLICA DE COLOMBIA

Presidente del Consejo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4543308

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79135493, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-69388 desde el 19 de Diciembre de 1997, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1082.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintitres (23) días del mes de Junio del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



República d

Y en su

Escuela de Ingeni

Registro SN

Confi

Juan Adolfo G

Cédula No. 79.1

Quien ha cumplido los requisitos establecidos
le otorga, en nombre de la Republica
Ministerio de Educació

Especialista en Gerenc

En constancia, se firma el presente diploma en Bogot

Teniente Coronel Rodrigo Andrés Gamba Rojas
Director

Teniente Rodr

N°

Universidad Católica de Colombia

con Personería Jurídica No. 2271 de julio 7 de 1970 emanada del Ministerio de Justicia y de conformidad con las disposiciones legales

Confiere el título de

Ingeniero Civil

a

Juan Adolfo Orjuela Rodríguez

C.C. 79.135.493 de Fontibon, Bogotá, D.E.

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos exigidos.
En testimonio de ello le confiere el siguiente

Diploma

Expedido en Santafé de Bogotá D.C., a los 26 del mes de Noviembre de mil novecientos noventa y siete 1997.

Rector | Secretario General | Decano

Registro No. 78112-1 del 26
de Nov. de 1997

13719

CONSORCIO SAN JOSÉ
NIT. 901.551.483-6

CERTIFICA QUE

El señor, JUAN ADOLFO ORJUELA RODRÍGUEZ, identificado con documento de identidad número 79.135.493 laboró para el Consorcio San José desde el 08 de feb-2022 hasta el 24 de mar-2026 como director de obra del contrato N° 400-2021. "*Construcción de un bloque de alojamiento de guardia y obras complementarias en los establecimientos epams girón y epmsc Ipiales, por el sistema de precios unitarios con formula de ajuste, para lo cual se requiere actualizar y complementar los estudios, diseños, planos y especificaciones suministrados por la Uspec – grupo Ipiales - suscrito entre la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios Uspec y Consorcio San José".*

Lugar de ejecución:	Cárcel de Ipiales - Nariño
Tiempo de ejecución:	08-FEB-2022 al 24-MAR-2026
Area Construida edificada:	2.547.51 M2
Area Construida urbanismo:	387.87 M2
Valor final ejecutado:	$ 9,856´929,673.00

Actividades ejecutadas: Preliminares y replanteos, excavación manual y mecánica, rellenos compactados, cimentación tipo placa flotante aligerada h=1.0 m, estructura en concreto a la vista 4 pisos, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y gas, mampostería estructural en concreto, pañetes, estuco y pintura, cielos rasos drywall, carpintería metálica y de aluminio, enchapes de cerámica y pisos en granito pulido, acometida de media tensión MT, instalación de equipo transformador, planta eléctrica, acometidas y tableros generales de distribución y transferencia, ducterías para cableados eléctricos, comunicaciones, fibra óptica y detección, instalación de luminarias tipo led interiores e intemperie, instalación de rack y swith enlazado al sistema interno inpec, instalación de sistema de bombas red potable, instalación calentadores para duchas, adecuaciones e impermeabilización de tanques, muros

mampostería y terrazas con poliurea, construcción de placa en concreto para cancha polifuncional con demarcación en pintura para tres disciplinas.

La presente se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Ipiales – Nariño, el día catorce (14) del mes de abril del año 2026.

ING OMAR DAVID RODRÍGUEZ
R/L CONSORCIOSAN JOSÉ
Cel 310 8814424

CONSORCIO ACERTA CONSULTEC JBB 2020

CERTIFICA

Que el señor JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía número 79.135.493, trabajó con el CONSORCIO ACERTA – CONSULTEC JBB 2020, desde el 19 de abril de 2021 y hasta el 07 de febrero de 2022, ejerciendo el cargo de Ingeniero Civil- Residente de Interventoría.

Contrato: JBB-JCM 1067-2020

Objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental al contrato cuyo objeto "contratar las obras civiles para realizar el reforzamiento estructural de las edificaciones del Jardín Botánico José Celestino Mutis, por el sistema de precios unitarios fijos, incluyendo las obras complementarias para garantizar la funcionalidad de la infraestructura intervenida".

Área intervenida: 2.048,67 m2

- * Científica: 100%
- * Laboratorio Infantil: 100%
- * Aula Ambiental: 100%
- * Administrativa bloque 1 y 2: 100%
- * Portería: 100%
- * Técnica: 30% únicamente cimentación en dos edificios
- * Cafetería: 20% únicamente demoliciones y desmontes

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Bogotá D.C., a los Quince (15) días del mes de febrero de 2022.

Cordialmente

JORGE ANDRÉS NAVAS PEREZ

Representante Legal

DMM

DARIO MONTOYA MIER
INGENIERO CIVIL

DARIO MONTOYA MIER

NIT. 17.147.055-9

CERTIFICA QUE:

El Ingeniero JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.135.493 de Bogotá, y matrícula profesional MT 25202-69388 CND, prestó sus servicios como INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA para el contrato de nuestra firma con el Fondo Adaptación

Contrato N°:	No. FA-CD-I-218-2019
Objeto:	INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR EL FENOMENO DE LA NIÑA 2010-2011, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. CONSTRUCCION SEDE IER LA HONDA MUNICIPIO LIBORINA
Contrato Obra N°:	FA-CD-I-223-2019
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR EL FENOMENO DE LA NIÑA 2010-2011, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. CONSTRUCCION SEDE IER LA HONDA MUNICIPIO LIBORINA
Valor contrato obra:	$1.254´823.304
Área Construida:	654 m2
Fecha de inicio:	12 diciembre de 2019
Fecha terminación:	15 diciembre de 2020
Actividades:	Preliminares, excavaciones, cimentación, rellenos, estructura,

Mampostería, pañetes, estructura metálica, cubiertas, aparatos sanitarios, enchapes, pinturas, acabado de pisos, carpintería metálica, instalaciones hidráulicas, sanitarias, equipos de bombeo, red contra incendio, instalaciones eléctricas, equipos especiales.

Funciones:

Control de calidad de obra. Control laboratorio.
Control de cantidad de obra. Control Topografía.
Control de programación de obra.
Comparación y análisis de datos, elaboración y coordinación de programas y control de obra por fuentes de trabajo.
Elaboración de informes mensuales y técnicos de actividades.
Elaboración de Actas de Recibo de obra del constructor.
Liquidación del contrato de construcción y demás Actas administrativas y técnicas derivadas de la ejecución del contrato

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los cuatro (04) días del mes de febrero de 2021.

Atentamente,

DARIO MONTOYA MIER
Representante Legal

CONSTRUCCIONES KYOTO SAS

CONSTRUCCIONES
KYOTO SAS.

CERTIFICA QUE

El Ingeniero JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 79.135.453 de Bogotá, laboró para la compañia desempeñando el cargo de DIRECTOR DE OBRA para el contrato de las siguientes especificaciones:

Contrato No:	01/2018
Objeto:	CONSTRUCCION DE LA CIMENTACIÓN EJE A AL E, ESTRUCTURA COLUMNAS Y PANTALLAS SOTANO, PLACA ESTREPISO 1, INSTALCIONES SANITARIAS, SEGPUN DISEÑOS ESTRUCTURALES & HIDROSANITARIOS
Lugar:	Bogotá
Valor del Contrato:	$ 1.507.915.791
Área intervenida:	1050 m²
Fecha de inicio:	29 de abril de 2019
Fecha de terminación:	30 de octubre de 2019

Actividades Ejecutadas: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE GASTOS, COSTOS Y PESUPUESTO DEL PROYECTO, COORDINAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL, CALIDAD DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA, CONTROL DE FACTURACIÓN DE OBRA MEDIANTE ACTAS PARCIALES ANTE LA INTERVENTORÍA Y GERENCIA DEL PROYECTO, GENERAR INFORMES DE AVANCES DE OBRA PARA LA GERENCIA DE OBRA Y LA INTERVENTORÍA,CONTROL DE REQUISICIONES Y PAGOS A PROVEEDORES, EJECUTAR LA APERTURA, SEGUIMIENTO Y CIERRE DE SUBCONTRATOS

CONSTRUCCIONES KYOTO SAS

CONSTRUCCIONES
KYOTO SAS.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el día 17 de noviembre de 2019

Cordialmente,

ING. HERNAN JAUREGUI REINA
Representante Legal

Calle 113 No 7- 84 Ofic 1017 Edificio Teleport Tels: 6292865-6293467, E-mail:
construccioneskyoto@hotmail.co
Bogotá Colombia

EL SUSCRITO
DIRECTOR DE OBRA
DEL CONSORCIO SAN JOSE
NIT 900.920.263-2

CERTIFICA QUE

El señor **JUAN ADOLFO ORJUELA RODRÍGUEZ**, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 79.135.493 de Fontibón, laboro con el **CONSORCIO SAN JOSE**, NIT **900.920.263-2**, desde el día 21 de diciembre de 2016, hasta el 01 de febrero de 2019, con contrato a término de OBRA O LABOR, desempeñando el cargo de **INGENIERO RESIDENTE**.

Contratante:	DEFENSORIA DEL PUEBLO
Objeto del Contrato:	LLEVAR A CABO LA DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LOS BLOQUES A Y B DE LA SEDE DEL NIVEL CENTRAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA EN LA CALLE 55 No 10-32 ADELANTAR SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU AMUEBLAMIENTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y VALORES UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.
Nro. Contrato:	380 DE 2015
Valor del Contrato:	41.992.855.000,93

La presente se expide a solicitud de la interesado en la ciudad de Bogotá, al primer día (1) del mes de febrero de 2019.

Ing. OMAR DAVID RODRIGUEZ
Director de Obra.
CONSORCIO SAN JOSE
Teléfono 4929628 - 3123863392

Calle 134 N°15-20 Oficina 101 teléfonos 310 480 53 60 - 633 42 61 Bogotá D.C.

El suscrito Ingeniero **JOSÉ ALBERTO SERRANO SUÁREZ**, integrante del Consorcio H&S 2006 con N.I.T. N°900.122.901-1,

CERTIFICA:

Que el Ingeniero Civil **JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ** identificado con la cedula de ciudadanía N°79'135.493 de Bogotá y Matricula Profesional N° 25202 69388 CND ejerció las funciones de Ingeniero Residente, en la ejecución del siguiente contrato de obra:

CONTRATO N°:	396g/12
OBJETO	"ADECUACIÓN EDIFICIO CONFUCIO DE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO UBICADO EN LA CARRERA 4 Nº 23 - 48 BOGOTA"
FECHA DE INICIACIÓN	19 de diciembre de 2012
FECHA DE TERMINACIÓN	28 de febrero de 2013
ÁREA INTERVENIDA:	620.00 M2
PRINCIPALES ACTIVIDADES:	➢ Demoliciones y desmonte de puertas, ventanas y puntos eléctricos ➢ Anclajes Estructurales ➢ Vaciado de Vigas ➢ Estructura en concreto reforzado ➢ Reforzamiento estructural ➢ Cambio de Cubiertas ➢ Acabados Arquitectónicos ➢ Instalaciones hidráulicas, sanitarias ➢ Instalaciones eléctricas e iluminación ➢ Cableado Estructurado ➢ Carpintería metálica ➢ Mampostería en Bloque y dry wall

El Ingeniero Orjuela cumplió a cabalidad las funciones encomendadas.

Para constancia se firma en Bogotá D.C. a los 28 días del mes de febrero de 2013

Cordialmente,

Ingeniero **JOSÉ ALBERTO SERRANO SUÁREZ**
Consorcio H&S 2006

Consorcio S+C
Calle 134 N° 15 - 20 Oficina 101 Telefax 633 42 61 Bogotá D. C.
sycconstrucciones@gmail.com

El suscrito Ingeniero **JOSÉ ALBERTO SERRANO SUÁREZ**, Representante Legal del Consorcio S + C con NIT. 900.329.505-6

CERTIFICA:

Que el Ingeniero **JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79'135.493 de Bogotá y Matricula Profesional No. 25202-69388 CND, ejerció las funciones de Ingeniero Residente de Obra del contrato que se relaciona a continuación:

Contrato:	553-00-A-COFAC-DINSA-2011
Objeto:	Construcción Escuadrón de Armamento Aéreo – CATAM - Bogotá.
Área construida:	420 m2
Fecha de Inicio:	Enero 9 de 2012
Fecha de Terminación:	Octubre 10 de 2012
Valor final del Contrato:	$1.080.524.689

Actividades ejecutadas: Preliminares, Excavación y rellenos compactados, cimentación y estructura en concreto, placa de entrepiso, estructura metálica para cubierta, instalaciones hidro-sanitarias, eléctricas normales y reguladas, cableado estructurado, enchapes de piso y pared, pintura y acabados, instalación de equipos de comunicación, fibra óptica, UPS, transformador y racks.

Se expide a solicitud del interesado a los 17 días del mes de junio de 2012.

Cordialmente,

Ingeniero **JOSÉ ALBERTO SERRANO SUÁREZ**
Representante Legal Consorcio S+C

American Concrete Institute

pyman s.a.s

su aliado en soluciones concretas

Concrete Flatwork Technician. Abril 2007

LA SUSCRITA DIRECTORA DE GESTION DE TALENTO HUMANO

C E R T I F I C A:

Que el señor **JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ**, identificado con cedula de ciudadanía N° 79.135.493 de Fusagasugá, labora en nuestra compañía desde el 15 de octubre de 2010, desempeñando el cargo de **INGENIERO COORDINADOR DE PROYECTOS DE OBRA EN COLOMBIA Y PANAMA**, con una asignación mensual de $3.000.000 (Tres millones de pesos ml) con contrato de prestación de servicios.

Se expide la presente certificación en Bogotá, a los veinte dos (26) días del mes de Octubre de 2011, a solicitud del interesado.

Cordialmente,

SONIA BIBIANA JUTINICO RICO

Dir. Gestión del Talento Humano
Pyman S.A.S
313 835 8462
Cra 11ª N 93ª – 62 Ofc 303

CONSORCIO PACIFICO

CERTIFICACION

Consorcio Pacifico Certifica que el ingeniero **JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ**, con cedula de ciudadania 79.135.493 de Bogotá, y Matricula Profesional 25202-69388 CND, se desempeñó como Ingeniero Residente de Obra en el contrato que se relaciona a continuación:

Objeto del Contrato:	Contrato 544 de 2009 - Construcción Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica SENA –Tumaco – Nariño.
Área Construida:	2089 m2
Área Andenes:	520 m2
Área de Via:	5234 m2
Valor del Contrato:	$5.662.958.131
Tiempo de Ejecución:	7 meses
F. Inicio:	3 Enero de 2010

Se expide a solicitud del interesado a los 15 días del mes de Agosto de 2010.

Ing. ALEJANDRO ARAMBURO
Director de Obra

CONSTRUCCIONES
BARSA

CERTIFICA:

Que, El Ingeniero **JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ**, Identificado con CC 79.135.493 de Bogotá D.C. y M.P. 25202-69388 CND, Laboró en nuestra empresa desempeñando el cargo de Ingeniero Residente de Obra cuyo objeto es:

Objeto del Contrato:	Construcción y Dotación de un Alojamiento de Reacción para Oficiales en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Santiago de Cali - Valle del Cauca.
Área Construida:	983 m2
Fecha de Inicio:	Mayo 17 de 2009
Finalización:	Diciembre 27 de 2009
Valor del Contrato:	$1.112.312.024

Se expide a solicitud del interesado a los 28 días del mes de diciembre de 2009 en la ciudad de Cali – Valle del Cauca.

JOSÉ ALEJANDRO FUYA HERNÁNDEZ
Arq. Director de Obra
Cel. 313 817 83 31

C/C. Archivo.

San Juan de Pasto - Nariño

CERTIFICACIÒN:

Con la siguiente se certifica que el Ingeniero **JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ** identificado con cédula de ciudadanía 79´135.493 de Bogotá y MP 25202-69388 CND., prestó sus servicios profesionales como Director de Interventoría desde diciembre 15 de 2008 hasta Abril 03 de 2009, para las proyectos del convenio PNUD 00058867 – Federación Nacional de Cafeteros para el departamento del Meta, Contrato de Interventoría No. 324 de 2008 con los siguientes proyectos.

M1 - AMPLIACIÓN DE DOS DORMITORIOS PARA ESTUDIANTES – SAN JUAN DE ARAMA.
M2 - AMPLIACIÓN DEL CAMPUS UNIVERSITARIO CON AULAS – SAN JUAN DE ARAMA.
M6 - CONSTRUCCIÓN CASA DE LA CULTURA "CASA CURI" – URIBE.
M10 - CONSTRUCCIÓN CASA HOGAR ADULTO MAYOR – PUERTO RICO.
M24 - CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA – VISTA HERMOSA.
M26 - REHABILITACIÓN DE LA VÍA VISTAHERMOSA- LA COOPERATIVA Y VISTAHERMOSA-SANTO DOMINGO, CON PUENTE COLGANTE EN PIÑALITO – VISTA HERMOSA.
M32 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA VERSALLES, SANTANDER DEL K1+400 AL K6+300 – URIBE

Se expide a solicitud del interesado a los 6 días del mes de abril de 2009.

Ing. **JOSÉ LUÍS NATES DULCE**
Contratista.

C/C Archivo

CONSORCIO CH&S
Carrera 70 B No. 112 – 35 Telefa x: 2261737 Cel. 312 5834133 E-mail : edbepa@yahoo.com

EL SUSCRITO REPRSENTANTE LEGAL
DEL CONSORCIO CH&S

CERTIFICA QUE :

El Ingeniero JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.135.493 de Bogotá, laboró con el Consorcio, prestando el Servicio como Residente de Obra, durante el periodo comprendido entre marzo 4 a noviembre 30 de 2.008, caracterizándose por ser una persona cumplida, seria, responsable y honesta.

La presente se expide en Bogotá D.C., a solicitud del interesado (a) los doce (12) días del mes de diciembre de 2.008

Cordialmente,

EDUARDO BENITEZ PACHON
Representante Legal CONSORCIO CH&S

CIVCO S. A. NIT. 830.031.184-0

Ingenieros Civiles Constructores

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Certifica que el ingeniero JUAN ADOLFO ORJUELA RODRÍGUEZ identificado con C.C. 79'135.493 de Bogotá, estuvo vinculado con la compañía desde junio 14 de 1998 hasta junio 30 de 1999, desempeñando el cargo de Ingeniero Residente en los proyectos que a continuación se describen:

Construcción del distrito de riego a Pequeña Escala La Tuna en el municipio de Zambrano – Bolívar.

Construcción final del distrito de riego a Pequeña Escala El Flechal en el municipio de Ovejas – Sucre.

Construcción fase final del distrito de riego a Pequeña Escala La Esperanza en el municipio de Toluviejo – Sucre.

Se expide el día 10 julio del año 1999 en la Ciudad de Bogotá.

Atentamente,

Ing BENJAMÍN CARRASCAL MARTINEZ
Gerente General CIVCO S. A.

AXIOMA

CONSORCIO OMEGA
NIT. 900.166.179-7

CERTIFICACIÒN:

Certificamos que el Ingeniero **JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ** identificado con cédula de ciudadanía 79´135.493 de Bogotá, laboró en esta compañía desde 01 de agosto de 2007 hasta el 28 de febrero de 2008 desempeñándose como Residente de Obra en el siguiente contrato:

Contrato de Obra 1257/07 – Objeto – Elevación y adecuación muro sector huerta, reconstrucción muro de cerramiento escuela militar, adecuación y mantenimiento de baterías sanitarias pabellones 2, 3, 4, 5 y 6, adecuación y habilitación de lavaderos en pabellones 3 y 5, adecuación y mejoramiento de rancho, adecuación y cambio de tablero general interno, cambio de luminarias y adecuaciones de instalaciones internas en área administrativas y adecuaciones generales y cerramiento celda 72 horas en la reclusión de mujeres de Bogota.

Se expide a solicitud del interesado a los 4 días del mes de marzo de 2008.

Ing. **DIEGO MORALES NUÑEZ**
Representante legal Consorcio Omega.

C/C ARCHIVO OBRA.

UNION TEMPORAL FARALLONES

CERTIFICACION

U. T. FARALLONES certifica que el ingeniero JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ, con CC 79`135.493 y M. P. 25200269388-CND laboró en esta compañía como ingeniero residente en la obra:

Objeto:	Construcción de 8 alojamientos para oficiales y sub- oficiales en la Escuela Militar de Aviación EMAVI Marco Fidel Suárez - Cali (Valle del Cauca)
Tiempo laborado:	Febrero 14 de 2005 - Agosto 15 de 2005
Actividades:	Excavación y replanteo, cimentación, estructura en concreto y metálica, mampostería, inst. eléctricas, hidráulicas y sanitarias, cubierta, pañetes, pisos, pintura y acabados, aseo general y entrega final.

Se expide el día 27 de agosto de 2005 a solicitud del interesado.

Cr. (R) Ing. LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO NUEVO ORIENTE

CERTIFICAMOS:

El Ingeniero JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ identificado con Cédula No. 79.135.493 y MP 25202-69388 CND, se desempeño como Ingeniero Residente de obra del siguiente proyecto:

OBJETO: Construcción del alojamiento de tropa en "H" No1 y alojamiento de tropa en "H" No 2 en el batallón de Infantería No 19 "Joaquín Paris".

VALOR EJECUTADO: $694.122.288,10

PLAZO DE EJECUCIÓN: 110 DÍAS

FECHA DE INICIACIÓN: 01 ABRIL DE 2003

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DICIEMBRE DE 2003

ÁREA CONSTRUIDA: 1.583 M2

ACTIVIDADES EJECUTADAS: actividades preliminares, cimientos, mampostería, pañetes, estructura en concreto – metálica, cubiertas, pisos bases y pisos acabados, instalación eléctrica, enchapes y accesorios, instalación sanitarias – hidráulica, carpintería madera y metálica, pintura, aparatos sanitarios, vidrios y espejos, obras exteriores, obras adicionales, obras no previstas, limpieza en general.

La presente certificación se expide a los cinco (05) días del mes de Enero de dos mil cinco (2005).

ING. HERNAN JÁUREGUI REINA
GERENTE GENERAL

CALLE 117 # 7 – 83 OFICINA 409
Teléfono: 6121539

PISOCRETO S.A.

262 - DA&F – RH / CC

Bogotá D.C., 30 de Abril de 2006

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente hacemos constar que el(a) señor(a) JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ, identificado con CC. No. 79.135.493. laboró con PISOCRETO S.A. mediante un contrato individual de trabajo por la Duración de una obra o labor determinada, desde el día 13 de Febrero de 2006 hasta el día 30 de Abril de 2006, desempeñándose en el cargo de INGENIERO RESIDENTE DE OBRA.

Adicionalmente nos permitimos recomendarle como una persona honorable. responsable y cumplidora en todo momento de sus deberes y obligaciones.

Se expide la presente, a los 30 días del mes de Abril de 2006.

Cordialmente.

CLAUDIA ISABELLA ZAMUDIO GUTIERREZ
Gerente Administrativo y Financiero

UNION TEMPORAL REDES

Nit. 900.026.864-4

CERTIFICACION

La U. T. Redes certifica que el ingeniero JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ, con CC 79`135.493 se desempeñó como ingeniero residente en la Obra: Conexión Alojamientos a la Red de Acueducto y Alcantarillado Municipal en el Batallón Pichincha de Cali (Valle del Cauca).

- Valor del Contrato: $184´140.000
- Longitud de Tubería: 1.000 m
- Fecha de inicio: Julio 23 de 2005
- Fecha de terminación: Diciembre 20 de 2005

Esta certificación se expide el día 22 de agosto de 2005 a solicitud del interesado.

Ing. RAUL RODRIGUEZ RUEDA
REPRESENTANTE LEGAL

UNIÓN TEMPORAL MONSERRATE
NIT. 830.146.414-4

CERTIFICA QUE:

El Ingeniero JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ identificado con Cédula No. 79.135.493 y MP 25202-69388 CND, se desempeño como Ingeniero Residente de obra del siguiente proyecto:

OBJETO:	Mantenimiento Unidades Tácticas del Ejército en Bogotá – Cundinamarca. Proyecto uno (01) "Adecuación Instalaciones SILOG"
VALOR DEL CONTRATO:	$239.700.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	75 DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN:	SEPTIEMBRE 22 DE 2004
FECHA DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE 01 DE 2004

ACTIVIDADES EJECUTADAS: preliminares, cimientos, mampostería, pañetes, estructura en concreto, desagues e instalaciones subterráneas, cubiertas, cielos rasos, pisos, enchapes, acabados, carpintería, pintura, instalaciones hidráulicas y eléctricas.

La presente certificación se expide a los cinco (05) días del mes de Enero de dos mil cinco (2005).

ING. LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO
GERENTE GENERAL

CALLE 117 # 7 – 83 OFICINA 404 - Teléfono: 2152833

CERTIFICACIONES
Proceso MPR-MIC-044-2026 TRD. 102.04.06

CONTRATO No.:	**105-2026**
OBJETO:	**"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**
FECHA RECIBO FINAL:	**28/08/2026**

Para tramitar la presente Acta de Liquidación de Obra, se aportaron los siguientes Documentos:

	NOMBRE DOCUMENTO	OBRA		OBSERVACIÓN	No. PAGINA
		SI	NO		
1.	Copia Disponibilidad Presupuestal				
2.	Copia Minuta del Contrato de Obra				
3.	Copia Registro Presupuestal				
4.	Copia Pólizas de Legalización y Certificado de Aprobación				
5.	Copia Resolución de Designación del Supervisor				
6.	Copia del Contrato de Interventoría				
7.	Copia Acta de Inicio de la Obra				
8.	Copia Pólizas de Ampliación y Certificado de Aprobación por Acta de Inicio				
9.	Copia Actas de Suspensión y Reinicio				
10.	Copia Pólizas de Ampliación y Certificado de Aprobación por Suspensiones y Reinicios				
11.	Copia Adicionales de Valor y/o Plazo				
12.	Copia Pólizas de Ampliación y Certificado de Aprobación por Adicionales de Valor y/o Plazo				
13.	Copia Otrosíes Modificatorios del Contrato de Obra con sus Anexos				
14.	Copia Actas de Mayores y Menores Cantidades del Contrato de Obra				
15.	Copia Licencia de Construcción u Otro Tipo de Licencia o Permisos de Construcción				
16.	Copia Licencias y/o Permisos Ambientales que Requiere el Proyecto				
17.	Acta de Socialización y Conformación de la Veeduría Ciudadana ante la Personería Municipal	x			

CERTIFICACIONES
Proceso MPR-MIC-044-2026 TRD. 102.04.06

	NOMBRE DOCUMENTO	OBRA		OBSERVACIÓN	No. PAGINA
		SI	NO		
18.	Acta de Veeduría de Inicio de Obra				
19.	Acta de Veeduría de Ejecución y Recibo Final de Obra	x			
20.	Acta de entrega del Bien o Servicio En caso de llevar ítems de Suministros, deben anexarse entradas y salidas de almacén municipal	x			
21.	Actas de vecindad				
22.	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA (Adjuntar Soportes de Ejecución de Acuerdo a las Actividades Establecidas en el Contrato, Ensayos de Laboratorio originales, Certificados de Calidad de Materiales, Entre Otros) Firmado por el Director y/o Residente de Obra y el Representante del Contratista	X			
23.	INFORME DE LA SUPERVISION PARA RECIBO FINAL DE OBRA, de Acuerdo al Formato Aprobado por Calidad	x			
24.	Certificado de la Supervisión del Cumplimiento del Porcentaje de Ejecución Final de la Obra	x			
25.	Memorias de Cálculo de las Cantidades Totales Ejecutadas por Cada Ítem, Firmadas por el Director y Residente de Obra y por el Director y Residente de Interventoría	x			
26.	Bitácora Diaria de Obra del Periodo de Ejecución del Contrato	x			
27.	Planos Record de las Actividades Ejecutadas de Acuerdo al Acta de Recibo Final, Debidamente Rotulados y Firmados, en Físico y Medio Magnético	x			
28.	Registro Fotográfico de la Valla Informativa y/o Certificación de las Cuñas Radiales Según sea el Caso				
29.	Registro Fotográfico de las Actividades Ejecutadas	x			
30.	Ensayos de Laboratorio Originales de la Interventoría con el Respectivo Informe de	x			

2

CERTIFICACIONES
Proceso MPR-MIC-044-2026 TRD. 102.04.06

	NOMBRE DOCUMENTO	OBRA		OBSERVACIÓN	No. PAGINA
		SI	NO		
	Análisis e Interpretación de los Resultados				
31.	Programación de Obra Inicial y Actualización del Cronograma por Reprogramación Firmada por el Representante del Contratista de Obra con el Visto Bueno de la Interventoría	x			
32.	Copia de Planillas de Nómina firmadas por el Personal	x			
33.	Copia de Planillas de Pago de la Seguridad Social de la Empresa Contratista, Representante del Contratista, del Personal Profesional al Servicio del Contrato o de Empresas Consorciadas o en Unión Temporal	x			
34.	Certificado de Pago de Aportes Parafiscales en Original que Incluya todo el Periodo de Ejecución del Contrato de las Entidades Competentes como el SENA, COMFIAR, ICBF	x			
35.	Certificado del SENA de Aportes a FIC	x			
36.	Certificado de la Supervisión del Cumplimiento de Aportes de Seguridad Social y Parafiscales Durante el Periodo de Ejecución	x			
37.	Relación Mensual del Personal que Laboró en la obra durante el Periodo de Ejecución del Contrato, Indicando Fecha de Ingreso y Fecha de Retiro	x			
38.	Paz y Salvo del Personal que Laboró en la Obra	x			
39.	Certificado de la Supervisión de que el Contratista se Encuentra a Paz y Salvo con el Personal que Laboró en la Obra Durante el Periodo de Ejecución de la Obra	x			
40.	Certificado de paz y salvo con las empresas de servicios Públicos (Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Energía)	x			

3

CERTIFICACIONES
Proceso MPR-MIC-044-2026 TRD. 102.04.06

	NOMBRE DOCUMENTO	OBRA		OBSERVACIÓN	No. PAGINA
		SI	NO		
41.	Informe del Contratista de Cumplimiento en la Aplicación del SG-SST	x			
42.	Certificado de la Supervisión de Aplicación del SG-SST por parte del Contratista de la Obra	x			
43.	Copia del PMA o PAGA de la Obra				
44.	Informe Final del Seguimiento a la Implementación del PMA o PAGA por parte del Contratista firmado por un Ingeniero Ambiental, el Representante del Contratista y la Interventoría Externa	x			
45.	Certificado de la Interventoría Externa y/o Supervisión del Cumplimiento de la Implementación del PMA o PAGA	x			
46.	Copia Certificado de Apertura del Encargo Fiduciario o de la Cuenta Bancaria				
47.	Copia Certificado Bancario de Cancelación de la Cuenta o Fiducia y Reintegro de los Rendimientos Financieros				
48.	Copia Plan de Inversión del Anticipo del Contrato de Obra				
49.	Copia del Comprobante de Egreso y Orden de Pago del Anticipo del Contrato Principal y/o Adicionales de Valor				
50.	Relación de Gastos del Anticipo Consolidado firmado por el Representante del Contratista y el Contador Público con sus Respectivos Soportes				
51.	Copia Ordenes de Operación de la Fiducia o Retiros de la Cuenta Bancaria				
52.	Copia Extractos de la Cuenta Bancaria y/o Informes de Fiducia				
53.	INFORME FINAL DE IMPREVISTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA Firmado el Representante Legal y Aprobado por la Supervisión	x			
54.	Certificado de la Supervisión del Correcto Manejo e Inversión del Anticipo por parte del Contratista de Obra				
55.	Copia de Actas Parciales de Obra				

4

CERTIFICACIONES
Proceso MPR-MIC-044-2026 TRD. 102.04.06

	NOMBRE DOCUMENTO	OBRA		OBSERVACIÓN	No. PAGINA
		SI	NO		
56.	Copia del Comprobante de Egreso y Orden de Pago de las Actas Parciales				
57.	Acta de Recibo Final de Obra	x			
58.	Ampliación de la Póliza según Acta de Recibo Final de la Obra y Certificado de Aprobación	X			
59.	Acta de Liquidación del Contrato de Obra	x			
60.	Formatos del Enfoque Diferencial	x			
61.	Factura Cambiaria del Acta Presentada (Factura con los Requisitos Exigidos en el Artículo 617 del Estatuto Tributario y el Artículo 774 del Código de Comercio); dicha Factura se Emitirá y será Entregada a la Oficina de Contabilidad una vez sea Aprobada el Acta de Recibo Final por la Unidad Ejecutora	x			
62.	Solicitud de Giro (Incluye Certificado de la Cuenta Bancaria)	x			

Número de folios: _____( )

5

NOTA 1. EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ORGANIZA POR ORDEN CRONOLÓGICO ATENDIENDO LO ORDENADO POR LA LEY DE ARCHIVO. EN LOS CASOS QUE AFECTE EL CONSECUTIVO DE LA LISTA DE CHEQUEO PREVALECE EL ORDEN CRONOLÓGICO.
NOTA 2. TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES A EXCEPCIÓN DE AQUELLOS QUE EN LA LISTA DE CHEQUEO SE ESPECIFICA QUE SON COPIA.
NOTA 3. EL SUPERVISOR PARA EL TRAMITE DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN, INDICARÁ EN LA LISTA DE CHEQUEO CUALES SOPORTES SE DEBEN ANEXAR, A FIN DE EVITAR DUCPLICIDAD DE DOCUMENTOS QUE YA SE ENCUENTREN EN EL EXPEDIENTE DEL ACTA PARCIAL O ACTAS PARCIALES ANTERIORES.

En Constancia da fe de la entrega de la totalidad de documentos y de su correspondencia con las exigencias legales.

APROBADO POR: Secretario de Planeación e Infraestructura

17. ACTA DE SOCIALIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA CIUDADANA ANTE LA PERSONERÍA MUNICIPAL

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

Puerto Rondón, 27 de julio 2026

PUERTO RONDON ALCALDÍA MUNICIPAL

Recibí Jorge Manrique No. _____
Hora 10 Firma Jorge Alvarez.

Señores
MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN
Secretaria de planeación e infraestructura
Arq. Carlo Brian Riaño Carreño

Asunto: Autorización representación en la socialización del contrato de obra 105-2026.

Yo **CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.254.335 de Cúcuta, R/L G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS con NIT 900.511.676-6 por medio de la presente otorgo poder amplio y suficiente a la señora **LINA TATIANA PEROZA RAMIREZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.116.790.945 de Arauca, para que, en mi nombre y representación, se presente y actúe en la socialización del contrato de obra 105-2026, cuyo objeto es para "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Este poder se otorga con carácter especial y temporal, con vigencia hasta la culminación del procedimiento referido, salvo revocatoria expresa previa por escrito.

En constancia de lo anterior, firmo la presente autorización a los 27 días del mes de julio de 2026.

Cordialmente,

G&C CONSTRUCCIONES,
SERVICIOS Y SUMINISTROSSAS
R/L CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO
Contratista

ACTA DE SOCIALIZACION
Contrato No. 105 de 2026 Minima Cuantia

FECHA DE EMISIÓN: 28/07/2026

A. GESTIÓN DOCUMENTAL

DEPENDENCIA RESPONSABLE	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
TIPO DOCUMENTO	ACTA DE SOCIALIZACIÓN

B. CONDICIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
No. CONTRATO	105 DE 2026
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA
CONTRATISTA	G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS No. 900.511.676-6.
	R/L CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO identificado con C.C No. 88.254.335 expedida en Cúcuta.
OBJETO	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (01) MES
LUGAR DE EJECUCIÓN	CANCHA FUTBOL 7, BARRIO NUEVO-MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($49.000.000,00).
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 DE JULIO DE 2026
FECHA DE INICIO	28 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE AGOSTO DE 2026
SUPERVISIÓN	CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Siendo las 04:00 P.m. del día 28 de julio de 2026, se reunieron en la cancha futbol 7, barrio nuevo del **Puerto Rondón – Arauca**, representantes de la Secretaría de Planeación e Infraestructura, en cabeza del **ARQ. CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO** en calidad de supervisor del contrato; **la firma contratista G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS**, representada por su representante legal **CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO**, y miembros de la comunidad del municipio, con el propósito de realizar la socialización del **Contrato de Obra No. 105-2026**.

NOMBRE COMPLETO	No. DOCUMENTO	REPRESENTACIÓN
William Alberto Boada P.	1.020.788.200	Secretario Planeación
lina tatiana Peroza Reyes	1.116.790.945	Representante Contratista

ACTA DE SOCIALIZACION
Contrato No. 105 de 2026 | Minima Cuantia

La lista de asistencia completa de los asistentes a la reunión se anexa como parte integral de la presente acta.

1. ORDEN DEL DÍA

La reunión se desarrolló dentro del siguiente orden del día:

a. Presentación de los asistentes a la reunión y saludo de la entidad contratante.
b. Presentación de la firma contratista y de la supervisión del Municipio.
c. Exposición del alcance técnico y financiero del contrato y descripción de las actividades a desarrollar.
d. Intervención de las firmas contratistas, presentación de sus planes de trabajo.
e. Explicación de las funciones y compromisos que debe cumplir el comité veedor.
f. Conformación de la veeduría ciudadana y nombramiento del representante del comité veedor.
g. Intervención de la comunidad.
h. Proposiciones y varios.
i. Compromisos.

2. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

El desarrollo del orden del día fue el siguiente:

2.1. Presentación de los asistentes a la reunión y saludo de la entidad contratante.

Se realizo la Presentacion de los asistentes a la Jornada de socializacion, Contando con la Participacion del Ing. William Bocanegra, Profesional de apoyo de la Secretaria de Planeacion e Infraestructura, quien participo en la representacion de supervisor del Contrato, por parte del contratista participo la Señora Lina Fabiana Peroza Ramirez quien asistio en representacion de BBC Construcciones Servicios y Suministros SAS por designacion de RL.

2.2. Presentación de las firmas contratistas y de la supervisión del municipio.

Se realizo la Presentacion de la firma contratista BBC Construcciones, Servicios y Suministros SAS, representada Para la Presente Jornada por la Señora Lina Fabiana Peroza Ramirez y la de la Supervision Municipal, representada por el Ing. William Bocanegra en Calidad de delegado del supervisor del Contrato de Obra.

2.3. Exposición del alcance técnico y financiero del contrato

Se explica a la comunidad que el contrato tiene como objetivo:

Se explico a la comunidad que el Contrato tiene por objeto "Construccion y Mejoramiento de la Cancha de futbol 7 de Barrio Nuevo en el Municipio de Puerto Rondon, Departamento de Arauca. con un Plazo

ACTA DE SOCIALIZACION
Contrato No. 105 de 2026 | Minima Cuantia

de ejecucion de 1 Mes y un valor contractual de $149.000.000,00 se informo que las actividades contemplan las obras, Precios en las especificaciones tecnicas y Presupuesto contractual.

3. Intervención de la firma contratista

La representante legal de la firma contratista presenta el plan de trabajo, indicando como se desarrollaras las actividades:

la representante de la firma contratista E&C Construcciones, Servicios y Suministros SAS, Genova Lyn Fabiana Perez Carpintero presenta el plan de trabajo para la ejecucion del contrato indicando que las actividades se desarrollaran de manera Programada y conforme a las especificaciones tecnicas, Presupuesto y Plazo contractual, Salvaguardando la calidad y correcta ejecucion de las obras.

Igualmente, se explica que durante la ejecución se procurará minimizar cualquier afectación a la comunidad y se mantendrá comunicación permanente con la supervisión del contrato.

4. Explicación de las funciones y compromisos del Comité Veedor

Se explica a la comunidad que el Comite Veedor tendra como funcion realizar seguimiento y vigilancia ciudadana al desarrollo del contrato, Verificando el cumplimiento del objeto, las actividades Programadas y el uso adecuado de los recursos Publicos dentro del marco de sus competencias. Asimismo, se explica la importancia de informar oportunamente a la entidad contratante Cualquier observacion o situacion que pueda afectar la adecuada ejecucion del Proyecto.

5. Conformación de la veeduría ciudadana y nombramiento del comité

NOMBRE COMPLETO	No. DOCUMENTO	REPRESENTACIÓN	TELEFONO
N/A	N/A	N/A	N/A

Siendo designado como vocero del comité veedor el señor(a):

ACTA DE SOCIALIZACION
Contrato No. 105 de 2026 | Minima Cuantia

6. Intervención de la comunidad

La comunidad manifesto su interes en la ejecucion del proyecto y realizo consultas relacionadas con el desarrollo de las actividades, tiempos de ejecucion y alcance de las obras. las inquietudes fueron atendidas por los representantes de la entidad contratante y del contratista, aclarando claridad sobre los aspectos tecnicos y contractuales del proyecto.

7. Proposiciones y varios

En este punto se reitera la importancia de mantener comunicación constante entre la comunidad, la supervisión del contrato y la firma contratista, con el fin de atender oportunamente cualquier inquietud que se presente durante la ejecución del proyecto:

Se reitero la importancia de mantener una comunicacion permanente entre la comunidad, la supervision y la firma contratista, con el fin de informar y atender oportunamente cualquier inquietud, observacion o situacion que pueda presentarse durante la ejecucion del proyecto, contribuyendo al adecuado desarrollo de la obra.

8. Compromisos

Como compromisos de la reunión quedan los siguientes:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
N/A	N/A	N/A

La Supervisión del Municipio de Puerto Rondón será garante de que los compromisos pactados en la presente acta se cumplan dentro de las fechas establecidas.

ACTA DE SOCIALIZACION
Contrato No. 105 de 2026 Minima Cuantia

Siendo las 05:00 P.m., y una vez agotado el orden del día, se da por finalizada la reunión. En constancia de lo anterior, firman quienes participaron.

LISTADO DE ASISTENCIA

PROYECTO: "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."

NOMBRE COMPLETO	No. DOCUMENTO	FIRMA
JAVIER ARAUJO G.	96 194 885	
Graciela Garcia	30022371	Graciela Garcia
Lucia Ramirez Garcia	1119 511 149	Lucia Ramirez
Yuribel Ramirez Garcia	1119511730	Yuribel Ramirez
FABIAN MONROY PEROZA	1119510812	
Julio Araujo García	96122767	
Hector Daniel Ramirez	1119511511	
JAVIER ARAUJO G.	96194885	
Tatiana Peroza	1.116.740.945	
Yenitza Peroza	1066624459	Yenitza P

ACTA DE SOCIALIZACION
Contrato No. 105 de 2026 Minima Cuantia

Jeison Jose Sanabria Plata	1093951020	
Edinson Vargas Tovar	1116796091	
Denny Solimar Garcia	1116862457	
Angel Saul Maldonado	66.11.131	
Silbana Adeliza Sossa P.	30021898	Silbana
Leidy Graciela R. G.	1119511840	Leidy R

MINISTERIO PÚBLICO
PERSONERÍA MUNICIPAL
PUERTO RONDÓN – ARAUCA
NIT: 900.054.360 - 3

LA SUSCRITA SECRETARIA DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE PUERTO RONDÓN - ARAUCA

CERTIFICA:

Que, revisados los archivos de esta personería, no reposa solicitud, ni resolución de veeduría, para el contrato de Obra No. 105 de 2026, cuyo objeto es **"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".**

Para constancia de lo anterior se firma en Puerto Rondón – Arauca, a los diecinueve (19) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

DORA PATRICIA MESA QUIÑONES
Secretaria de la Personería Municipal de Puerto Rondón

22. INFORME FINAL DE EJECUCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA

INFORME FINAL DE OBRA

PERIODO: DEL 28 DE JULIO DE 2026 AL 18 DE AGOSTO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No 105 DE 2026

CONTRATISTA: G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS
R/L CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO

OBJETO: " CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA ".

SUPERVISOR: CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO.
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA.

PUERTO RONDÓN – ARAUCA.

CONTENIDO

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 6
1.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA. 6
1.1.1. Informe Contractual - Ficha Técnica del contrato de obra. 6
1.2. GARANTÍA DEL CONTRATO DE OBRA. 7
1.3. ACTAS DE COMITÉ. 8
1.4. BITÁCORA DIARIA DE OBRA. 8
1.5. VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES 8
1.6. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL. 9
1.6.1. Dotación del personal. 9
1.6.2. Accidentalidad en la obra 9
1.6.3. Otros Permisos requeridos 9
1.7. CONDICIONES CONTRACTUALES. 9
1.8. AVANCE DE OBRA. 9
1.8.1. Avance físico de las obras. 11
1.8.2. Avance del plazo contractual. 12
1.9. PROGRAMACIÓN DE LA OBRA. 13
IMPREVISTOS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA 14
ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS 14
ITEM 1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO 14
ITEM 2.1 EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMÚN ENTRE 0 - 2 M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE RETIRO) 16
ITEM 2.2 RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN COMPACTADO 17
CAPITULO 3.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 19
ITEM 3.1 CONCRETO DE LIMPIEZA E = 0.05 M (SOLADO). 19
CAPITULO 3.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 20
ITEM 3.2 ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.70*0.70*0.30 M. 20

CAPITULO 3.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 21
ITEM 3.3 PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.30*0.30 M. 21
CAPITULO 3.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 23
ITEM 3.4 VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI 0.30*0.30 M. 23
CAPITULO 3.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 24
ITEM 3.5 ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI 24
CAPITULO 4.0 ESTRUCTURA METALICA 26
ITEM 4.1 MALLA DE NYLON 26
CAPITULO 4.0 ESTRUCTURA METALICA 27
ITEM 4.2 TUBERIA AGUANEGRA TIPO HN 3 MM* 6M. INCLUYE INSTALACION 27
CAPITULO 4.0 ESTRUCTURA METALICA 28
ITEM 4.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUAYA ACERADA 1/4 PULG INC. ACCESORIOS TENSORES 28
CAPITULO 4.0 ESTRUCTURA METALICA 29
ITEM 4.4 ASIENTO EN LAMINA METALICA ANTIDESLIZANTE LARGO=1,00 M X ANCHO=0,3 M ALTO=0.42M 29
CAPITULO 4.0 ESTRUCTURA METALICA 31
ITEM 4.5 MANTENIMIENTO Y REPARACION PORTERIA DE FUTBOL 7-INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA 31
2. CONCLUSIONES 32

LISTA DE TABLAS

TABLA 1. POLIZAS INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA N° 105 DEL 2026

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL
ANEXO 2. CERTIFICADOS DE CALIDAD Y ENSAYOS DE LABORATORIO
ANEXO 3. BITACORA DE OBRA

INTRODUCCIÓN

El presente Informe Final de Obra tiene como finalidad documentar y consolidar las actividades ejecutadas durante el desarrollo del Contrato de Obra No. 105 de 2026, cuyo objeto corresponde a la "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", celebrado entre el Municipio de Puerto Rondón y G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS, representada legalmente por el señor Carlos Rubén Granados Quintero, el periodo objeto del presente informe comprende desde el 28 de julio de 2026 hasta el 18 de agosto de 2026, tiempo durante el cual se desarrollaron las actividades contempladas en el alcance contractual, de acuerdo con las especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto aprobado y demás condiciones establecidas en el contrato, el proyecto tuvo como propósito contribuir al mejoramiento de la infraestructura deportiva del Barrio Nuevo, mediante la construcción y adecuacion de una cancha de fútbol 7 que permita disponer de un espacio apropiado para la práctica deportiva, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y el fortalecimiento de las actividades comunitarias y deportivas del municipio.

En el presente documento se realiza una descripción de las actividades desarrolladas, el avance y cumplimiento de las cantidades de obra contratadas, los aspectos técnicos y administrativos relevantes, así como las acciones implementadas en materia de seguridad y salud en el trabajo, manejo ambiental y demás aspectos asociados a la ejecución del proyecto, de igual manera, el informe presenta el balance final de la ejecución contractual, permitiendo evidenciar el desarrollo de las actividades previstas y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, bajo el seguimiento y supervisión de la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Puerto Rondón, a través del supervisor del contrato, Carlo Brian Riaño Carreño, Secretario de Planeación e Infraestructura.

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

1.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA.

El Municipio de Puerto Rondón adelantó el proceso de selección del contratista mediante la apertura del proceso en modalidad de Minima Cuantia No. **MPR-MIC-044-2026**. Una vez se llevó a cabo las evaluaciones jurídicas, técnica y financiera de las propuestas y se estableció el orden de elegibilidad, se procedió a adjudicar el contrato al proponente **G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS** representado legalmente por el señor **CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO**. Posteriormente, se procedió a la suscripción del contrato de obra No. 105 de 2026 el día 17 DE JULIO DE 2026 entre el señor alcalde Municipal de Puerto Rondón y la firma **G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS** No. 900.511.676-6 representado legalmente por el señor **CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO**, el cual tiene por objeto el " **CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA ".** con un plazo de ejecución de UN (01) MES, con un valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($49.000.000,00).

1.1.1. Informe Contractual – Ficha Técnica del contrato de obra.

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN.
SUPERVISOR	ARQ. CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
CONTRATO DE OBRA No:	105-2026 DEL 17 DE JULIO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
CONTRATISTA:	G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS
REPRESENTANTE:	CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO
NIT. No:	900.511.676-6
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($49.000.000,00).
PLAZO CONTRACTUAL:	UN (01) MES

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
VALOR DEL ANTICIPO:	$ 0,00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	06090002 DEL 09/06/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:	07210004 DEL 21/07/2026
FECHA ACTA DE INICIO:	28 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	27 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:	18 DE AGOSTO DE 2026
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	18 DE AGOSTO DE 2026

1.2. GARANTÍA DEL CONTRATO DE OBRA.

La Garantía Única Constituida por el Contratista a favor del Municipio de Puerto Rondón que amparan los riesgos exigidos en la Cláusula GARANTÍA Y SANCIONES del Contrato, fueron aprobadas por la Oficina Jurídica, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

A. PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN, Aprobada mediante constancia de aprobación del día 27 de julio de 2026.

Fecha de expedición: 23/07/2026

AMPAROS DE LA GARANTÍA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
Garantía de Cumplimiento.	100009818	$4.900.000,00	17-07-2026	17-12-2026
Pago de prestaciones Sociales e indemnizaciones legales.	ANEXO 0	$2.450.000,00	17-07-2026	17-08-2029
Estabilidad y calidad de la obra.		$4.900.000,00	17-08-2026	17-08-2028
Responsabilidad civil.	100002449 ANEXO 0	$350.181.000,00	17-07-2026	17-08-2026

B. PÓLIZAS ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE INICIO, Aprobada mediante constancia de aprobación del día 13 de agosto de 2026.

Fecha de expedición: 29/07/2026

AMPAROS DE LA GARANTÍA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
Garantía de Cumplimiento.	100009818	$4.900.000,00	28-07-2026	28-12-2026

Pago de prestaciones Sociales e indemnizaciones legales.	ANEXO 2	$2.450.000,00	28-07-2026	28-08-2029
Estabilidad y calidad de la obra.		$4.900.000,00	28-08-2026	28-08-2028
Responsabilidad civil.	100002449 ANEXO 2	$350.181.000,00	28-07-2026	28-08-2026

C. PÓLIZAS ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL, Aprobada mediante constancia de aprobación del día 26 de agosto de 2026.

Fecha de expedición: 24/08/2026

AMPAROS DE LA GARANTÍA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
Garantía de Cumplimiento.	100009818	$4.900.000,00	18-08-2026	28-12-2026
Pago de prestaciones Sociales e indemnizaciones legales.	ANEXO 3	$2.450.000,00	18-08-2026	28-08-2029
Estabilidad y calidad de la obra.		$4.900.000,00	18-08-2026	18-08-2028

1.3. ACTAS DE COMITÉ.

Durante el desarrollo de las actividades del contrato de obra N° 105 del 2026 con corte a la fecha del presente informe no se generaron las actas de comité.

1.4. BITÁCORA DIARIA DE OBRA.

La bitácora de obra se continua desde el 28 DE JULIO DE 2026 AL 18 DE AGOSTO DE 2026, el responsable de su diligenciamiento diario es el ingeniero residente JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ.

1.5. VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

El contratista procedió a la vinculación del personal necesario para la administración y ejecución de las labores contempladas dentro del alcance del proyecto, garantizando previamente su afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral y al régimen de riesgos laborales. Antes del inicio de las actividades, la supervisión verificó el cumplimiento de dichas afiliaciones y posteriormente realizó el seguimiento al pago mensual de los aportes correspondientes a salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales, conforme a las planillas presentadas por el contratista.

1.6. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.

1.6.1. Dotación del personal.

Se realizó la entrega de la dotación correspondiente al personal vinculado a la obra, suministrando los elementos de protección necesarios para el adecuado desarrollo de sus actividades diarias. Dichos elementos fueron asignados conforme a las necesidades y funciones específicas de cada trabajador, garantizando así condiciones seguras durante la ejecución de los trabajos.

Tabla 4 Dotación del personal en obra de elementos de protección-Contrato de Obra No. 105 de 2026.

ELEMENTOS DE PROTECCION	ENTREGADOS		ESTADO			BENEFICIARIOS
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
CASCO	X		X			Ingenieros, ayudantes.
GUANTES	X		X			Ingenieros, ayudantes
BOTAS DE SEGURIDAD.	X		X			Ingenieros, ayudantes
GAFAS DE PROTECCION	X		X			Ingenieros, ayudantes
CAMISA / PANTALÓN	X		X			Ingenieros, ayudantes
TAPA BOCAS	X		X			Ingenieros, ayudantes

1.6.2. Accidentalidad en la obra

Para el periodo del presente informe NO se presentaron accidentes laborales, así como tampoco accidentes que se hubiesen podido ocasionar a terceros, durante la ejecución de actividades de contrato de obra No 105 de 2026.

1.6.3. Otros Permisos requeridos

El contrato de obra número 105 de 2026 no requiere de permisos.

ASPECTOS TÉCNICOS

1.7. CONDICIONES CONTRACTUALES.

El contrato de obra suscrito entre Municipio de Puerto Rondón y la firma contratista G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS *contempla las siguientes actividades a desarrollar:*

Tabla 5 Presupuesto Contractual del contrato de obra N° 105 de 2026.

1.8. AVANCE DE OBRA.

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1,0	PRELIMINARES			$	258.120,00

1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	20.00	$	12.906.00	$	258.120,00
2,0	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**					**$**	**868.448,44**
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMÚN ENTRE 0 - 2 M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE RETIRO)	M3	7.46	$	72.666.00	$	542.088,36
2,2	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN COMPACTADO	M3	7.46	$	43.748.00	$	326.360,08
3,0	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**					**$**	**15.158.633,06**
3,1	CONCRETO DE LIMPIEZA E = 0.05 M (SOLADO)	M2	9.17	$	70.978.00	$	650.868,26
3,2	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.70*0.70*0.30 M	UND	8.00	$	493.155.00	$	3.945.240,00
3,3	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.30*0.30 M	ML	9.60	$	192.118,00	$	1.844.332,80
3,4	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI 0.30*0.30 M	ML	17.50	$	170.136.00	$	2.977.380,00
3,5	ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI	KG	376.20	$	15.260,00	$	5.740.812,00
4,0	**ESTRUCTURA METALICA**					**$**	**32.368.683,00**
4,1	MALLA DE NYLON	M2	87.50	$	45.650.00	$	3.994.375,00
4,2	TUBERIA AGUANEGRA TIPO HN 3 MM* 6M. INCLUYE INSTALACION	ML	65.50	$	293.614,00	$	19.231.717,00
4,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUAYA ACERADA 1/4 PULG INC. ACCESORIOS TENSORES	ML	35,00	$	37.058,00	$	1.297.030,00
4,4	ASIENTO EN LAMINA METALICA ANTIDESLIZANTE LARGO=1.00 M X ANCHO=0.3 M ALTO=0,42M	UND	5,00	$	1.173.025.00	$	5.865.125,00
4,5	MANTENIMIENTO Y REPARACION PORTERIA DE FUTBOL 7-INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	UND	2,00	$	990.218.00	$	1.980.436,00

MITIGACIÓN AMBIENTAL	GL	1.00	$	346.115,50	$	346.115,50
				SUB TOTAL VALOR	$	49.000.000,00
				VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$	49.000.000,00

1.8.1. Avance físico de las obras.

Según el reporte de cantidades ejecutadas correspondiente al mes de diciembre, la obra alcanza un avance físico acumulado del 100%, sin actividades pendientes por ejecutar, cumpliendo en su totalidad con lo establecido en la minuta contractual.

1,0	**PRELIMINARES**				$	258.120,00
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	20,00	$ 12.906,00	$	258.120,00
2,0	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**				**$**	**868.448,44**
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMÚN ENTRE 0 - 2 M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE RETIRO)	M3	7,46	$ 72.666,00	$	542.088,36
2,2	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN COMPACTADO	M3	7,46	$ 43.748,00	$	326.360,08
3,0	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$**	**15.158.633,06**
3,1	CONCRETO DE LIMPIEZA E = 0.05 M (SOLADO)	M2	9,17	$ 70.978,00	$	650.868,26
3,2	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.70*0.70*0.30 M	UND	8,00	$ 493.155,00	$	3.945.240,00
3,3	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.30*0.30 M	ML	9,60	$ 192.118,00	$	1.844.332,80
3,4	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI 0.30*0.30 M	ML	17,50	$ 170.136,00	$	2.977.380,00
3,5	ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI	KG	376,20	$ 15.260,00	$	5.740.812,00
4,0	**ESTRUCTURA METALICA**				**$**	**32.368.683,00**
4,1	MALLA DE NYLON	M2	87,50	$ 45.650,00	$	3.994.375,00
4,2	TUBERIA AGUANEGRA TIPO HN 3 MM* 6M. INCLUYE INSTALACION	ML	65,50	$ 293.614,00	$	19.231.717,00

4,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUAYA ACERADA 1/4 PULG INC. ACCESORIOS TENSORES	ML	35.00	$	37.058.00	$	1.297.030,00
4,4	ASIENTO EN LAMINA METALICA ANTIDESLIZANTE LARGO=1.00 M X ANCHO=0.3 M ALTO=0.42M	UND	5.00	$	1.173.025.00	$	5.865.125,00
4,5	MANTENIMIENTO Y REPARACION PORTERIA DE FUTBOL 7-INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	UND	2.00	$	990.218.00	$	1.980.436,00
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	GL	1,00	**$**	**346.115,50**	**$**	**346.115,50**
					SUB TOTAL VALOR	**$**	**49.000.000,00**
					VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$**	**49.000.000,00**

1.8.2. Avance del plazo contractual.

En relación con el plazo contractual estipulado en la minuta del contrato, se ha cumplido en su totalidad el tiempo previsto, contabilizado desde la fecha de inicio hasta la fecha de corte del presente informe de obra final, lo que representa el 100% del plazo establecido.

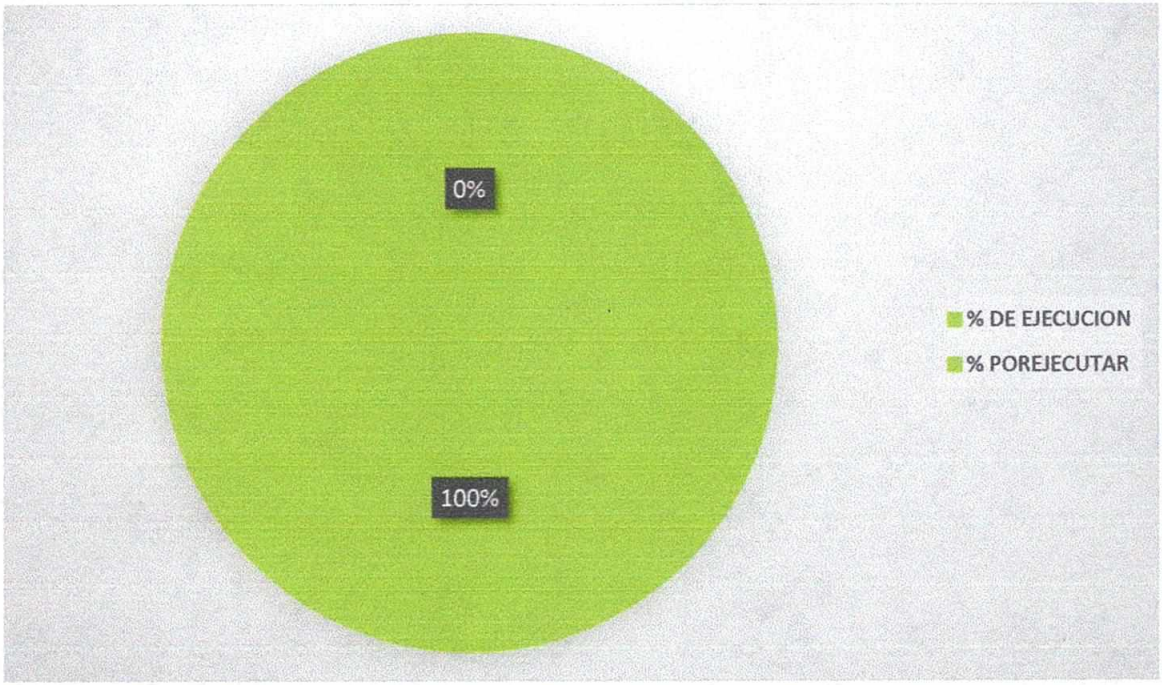

PLAZO CONTRACTUAL	*01 MES*
PLAZO EJECUTADO	*21 DIAS*
PLAZO POR EJECUTAR	*9 DIAS*
% PLAZO EJECUTADO	*70 %*

1.9. PROGRAMACIÓN DE LA OBRA.

Para el control de la programación, G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS, presentó a la supervisión el respectivo cronograma de trabajo con cada uno de los ítems a ejecutar, con el cual se realiza el seguimiento semanal y mensual al avance en la ejecución de todas las actividades y del contrato en general, Se presentó programación inicial de obra según acta de inicio, se reprogramaron las actividades de obra de acuerdo a las condiciones del rendimiento.

A continuación, se presenta la siguiente tabla con los porcentajes de obra ejecutada a la fecha de corte del presente informe final, comparando lo programado con lo ejecutado.

Tabla 6 Porcentaje de avance de obra programado vs Ejecutado del Contrato de Obra No.105 de 2026

ACTIVIDAD	PERIODO			% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADOACUMULADO
JULIO	SEM 1	28/07/2026	31/07/2026	12%	12%
AGOSTO	SEM 2	01/08/2026	08/08/2026	23%	35%
AGOSTO	SEM 3	09/08/2026	15/08/2026	52%	87%
AGOSTO	SEM 4	16/08/2026	18/08/2026	13%	100%

IMPREVISTOS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA

En la ejecución de las obras si se han presentado imprevistos a la presente fecha.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS.

Para el periodo del presente informe final de obra comprendido entre el 28 DE JULIO DE 2026 AL 18 DE AGOSTO DE 2026, G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS, ha ejecutado las siguientes actividades de los ítems del contrato:

CAPITULO 1.0 PRELIMINARES
ITEM 1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO

La actividad de localización y replanteo correspondió a la materialización en terreno de las dimensiones, ejes, alineamientos y puntos de referencia necesarios para la correcta ejecución de las obras contempladas en el proyecto, para el desarrollo de esta actividad se realizó la verificación de las condiciones existentes del área de intervención y, posteriormente, se efectuó el replanteo de acuerdo con las medidas y referencias establecidas en los planos y especificaciones técnicas del proyecto, garantizando la correcta ubicación de los elementos que conforman la obra.

Para el presente contrato se ejecutó una cantidad de 20,00 m², correspondiente a la totalidad de la cantidad contractual prevista para este ítem. La cantidad acumulada y la cantidad ejecutada durante el periodo corresponden igualmente a 20,00 m², quedando una cantidad de 0,00 m² por ejecutar, por lo cual se considera esta actividad ejecutada al 100 %.

ITEM:	*1.1*	UNIDAD:	*M2*
CANTIDAD TOTAL:	*20,00*	CANTIDAD ACUMULADA:	*20,00*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	*20,00*	CANTIDAD POR EJECUTAR:	*0.00*







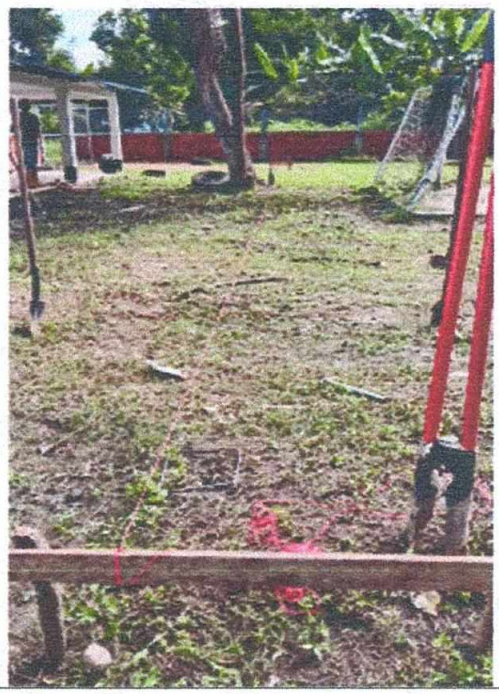

CAPITULO 2.0 MOVIMIENTOS DE TIERRA

ITEM 2.1 EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMÚN ENTRE 0 - 2 M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE RETIRO)

La actividad consistió en la excavación manual del terreno en material común, con profundidades comprendidas entre 0 y 2 metros, de acuerdo con las dimensiones, niveles y localización requeridos para la ejecución de los elementos de cimentación contemplados en el proyecto, los trabajos se realizaron mediante herramientas manuales, efectuando la remoción del material existente hasta alcanzar las cotas y dimensiones establecidas. Durante la ejecución se verificaron las condiciones del terreno y la conformación de las excavaciones, procurando mantener sus dimensiones y niveles conforme a los requerimientos técnicos de la obra, Asimismo, la actividad incluyó el retiro del material producto de la excavación, dejando las áreas intervenidas despejadas y preparadas para la ejecución de las actividades posteriores de cimentación.

Durante el periodo objeto del presente informe se ejecutó una cantidad de 7,46 m³, correspondiente a la totalidad de la *cantidad contractual prevista para este ítem. La cantidad acumulada es de 7,46 m³, la cantidad ejecutada en el presente* periodo es de 7,46 m³ y queda una cantidad de 0,00 m³ por ejecutar, equivalente a un 100 % de ejecución de la actividad.

ITEM:	*2.1*	UNIDAD:	*M3*
CANTIDAD TOTAL:	*7,46*	CANTIDAD ACUMULADA:	*7,46*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	*7,46*	CANTIDAD POR EJECUTAR:	*0.00*

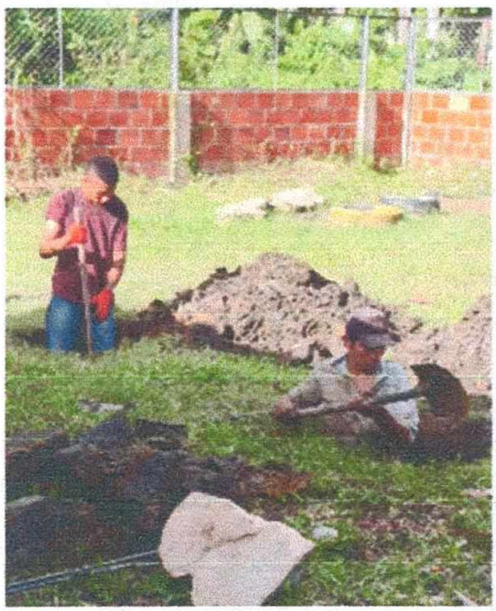



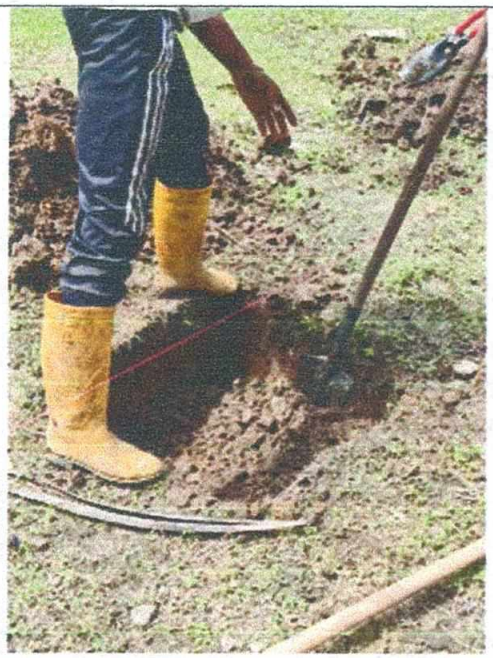



CAPITULO 2.0 MOVIMIENTOS DE TIERRA
ITEM 2.2 RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN COMPACTADO.

La actividad consistió en el relleno de las áreas resultantes de las excavaciones, utilizando material proveniente de la excavación previamente seleccionado y considerado apto para su reutilización, de acuerdo con las condiciones y requerimientos técnicos establecidos para la obra, el material fue dispuesto de manera uniforme en las zonas requeridas, realizando su extendido, nivelación y compactación por capas, con el propósito de garantizar una adecuada estabilidad y conformación del terreno. Durante el proceso se verificaron los niveles y condiciones finales de las áreas intervenidas, dejándolas preparadas para la continuidad de las actividades constructivas.

La ejecución de esta actividad permitió recuperar y conformar los espacios laterales y zonas requeridas alrededor de los elementos construidos, garantizando condiciones adecuadas de estabilidad y acabado del terreno, durante el periodo objeto del presente informe se ejecutó una cantidad de 7,46 m³, correspondiente al 100 % de la cantidad contractual prevista para este ítem. La cantidad acumulada es de 7,46 m³, la cantidad ejecutada en la presente acta corresponde a 7,46 m³ y queda una cantidad de 0,00 m³ por ejecutar. Por lo anterior, se establece que la actividad fue ejecutada en su totalidad.

ITEM:	*2.2*	UNIDAD:	*M3*
CANTIDAD TOTAL:	*7,46*	CANTIDAD ACUMULADA:	*7,46*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	*7,46*	CANTIDAD POR EJECUTAR:	*0.00*

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6









G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

CAPITULO 3.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
ITEM 3.1 CONCRETO DE LIMPIEZA E = 0,05 M (SOLADO).

La actividad consistió en la ejecución de concreto de limpieza o solado con un espesor de 0,05 m, dispuesto sobre el fondo de las excavaciones previamente realizadas, con el propósito de proporcionar una superficie regular, limpia y estable para la posterior construcción de los elementos de cimentación contemplados en el proyecto, previo a la colocación del concreto, se verificaron las condiciones del terreno, niveles y dimensiones de las áreas a intervenir. Posteriormente, se realizó el suministro, colocación y distribución uniforme del concreto hasta alcanzar el espesor especificado de 5 cm, garantizando una superficie adecuada para el posterior armado y fundida de los elementos estructurales.

La ejecución del solado permitió aislar los elementos de cimentación del contacto directo con el terreno natural, facilitar las labores de construcción y contribuir a mantener las condiciones de limpieza y nivelación requeridas durante la ejecución de la cimentación, durante el periodo objeto del presente informe se ejecutó una cantidad de 9,17 m², correspondiente al 100 % de la cantidad contractual prevista para este ítem. La cantidad acumulada es de 9,17 m², la cantidad ejecutada en la presente acta corresponde a 9,17 m² y queda una cantidad de 0,00 m² por ejecutar, por lo cual la actividad se encuentra ejecutada en su totalidad.

ITEM:	*3.1*	UNIDAD:	*M2*
CANTIDAD TOTAL:	*9,17*	CANTIDAD ACUMULADA:	*9,17*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	*9,17*	CANTIDAD POR EJECUTAR:	*0.00*



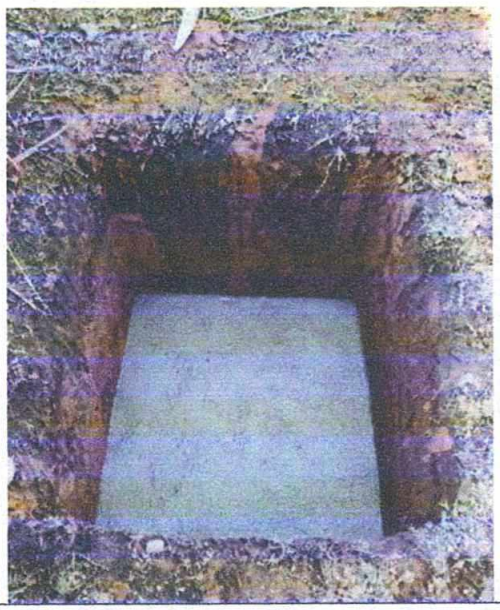

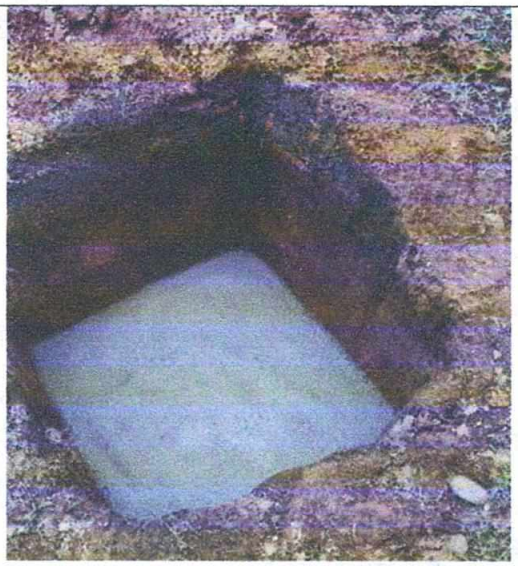



CAPITULO 3.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
ITEM 3.2 ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.70*0.70*0.30 M.

La actividad consistió en la construcción de zapatas aisladas en concreto de resistencia 3.000 PSI, con dimensiones de 0,70 m × 0,70 m × 0,30 m, destinadas a conformar los elementos de cimentación de la estructura contemplada dentro del proyecto, para su ejecución se verificaron previamente la ubicación, dimensiones, niveles y condiciones del solado, de acuerdo con los requerimientos establecidos en los planos y especificaciones técnicas. Posteriormente, se realizaron las actividades correspondientes a la preparación, colocación y conformación del concreto, garantizando las dimensiones especificadas para cada elemento.

Las zapatas fueron ejecutadas sobre el concreto de limpieza previamente dispuesto, procurando una adecuada nivelación, geometría y conformación de los elementos. El proceso permitió conformar una base estructural estable para la transmisión de las cargas de los elementos superiores hacia el terreno, durante el periodo objeto del presente informe se ejecutaron 8,00 unidades, correspondientes al 100 % de la cantidad contractual prevista para este ítem. La cantidad acumulada es de 8,00 UND, la cantidad ejecutada en la presente acta corresponde a 8,00 UND y queda una cantidad de 0,00 UND por ejecutar, por lo cual la actividad se encuentra ejecutada en su totalidad.

ITEM:	*3.2*	UNIDAD:	*UND*
CANTIDAD TOTAL:	*8,00*	CANTIDAD ACUMULADA:	*8,00*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	*8,00*	CANTIDAD POR EJECUTAR:	*0.00*



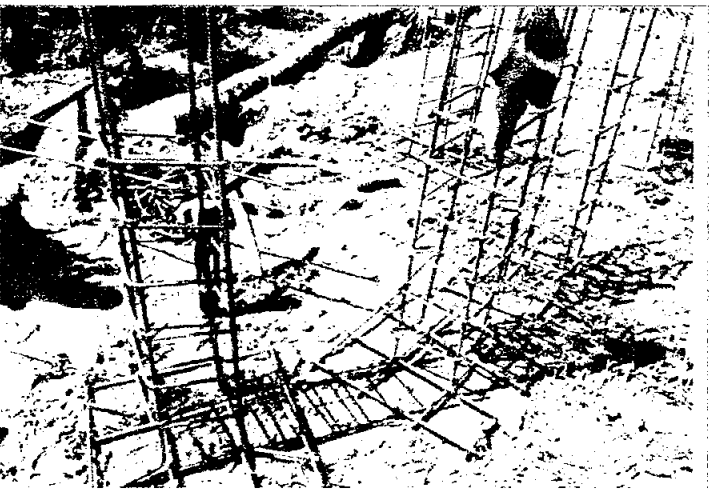

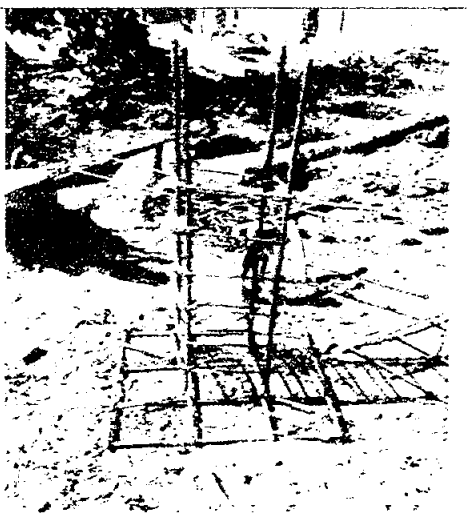

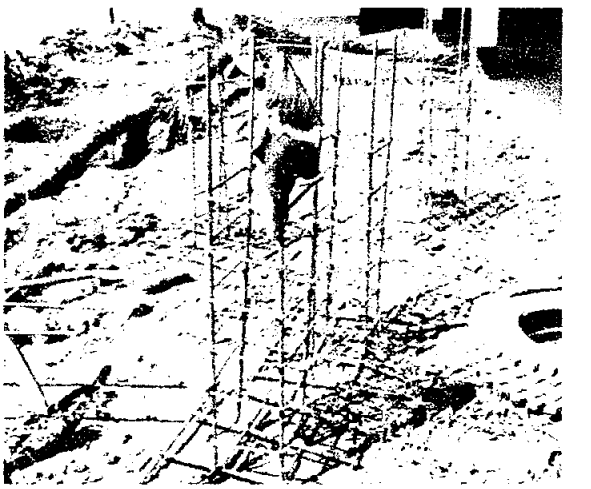

CAPITULO 3.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
ITEM 3.3 PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.30*0.30 M.

La actividad consistió en la construcción de pedestales en concreto de resistencia 3.000 PSI, con sección de 0,30 m × 0,30 m, destinados a servir como elementos verticales de apoyo y transición entre las zapatas de cimentación y los elementos estructurales superiores contemplados en el proyecto, para su ejecución se realizó previamente la verificación de la ubicación, alineamiento, niveles y dimensiones de cada elemento, tomando como referencia las zapatas ejecutadas y las especificaciones técnicas establecidas para la obra. Posteriormente, se procedió con la conformación y fundida de los pedestales, garantizando la correcta geometría y estabilidad de los elementos.

Durante el proceso constructivo se verificó la adecuada colocación y consolidación del concreto, procurando obtener superficies uniformes y elementos correctamente alineados y nivelados, de manera que permitieran la continuidad de los trabajos estructurales posteriores, durante el periodo objeto del presente informe se ejecutó una cantidad de 9,60 metros lineales, correspondiente al 100 % de la cantidad contractual prevista para este ítem. La cantidad acumulada es de 9,60 ml, la cantidad ejecutada en la presente acta corresponde a 9,60 ml y queda una cantidad de 0,00 ml por ejecutar, por lo cual la actividad se encuentra ejecutada en su totalidad.

ITEM:	*3.3*	UNIDAD:	*ML*
CANTIDAD TOTAL:	*9,60*	CANTIDAD ACUMULADA:	*9,60*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	*9,60*	CANTIDAD POR EJECUTAR:	*0.00*









CAPITULO 3.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
ITEM 3.4 VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI 0.30*0.30 M.

La actividad consistió en la construcción de vigas de cimentación en concreto de resistencia 3.000 PSI, con sección de 0,30 m × 0,30 m, destinadas a proporcionar continuidad y estabilidad al sistema de cimentación, así como a servir de elemento de conexión entre los apoyos estructurales, para la ejecución de esta actividad se verificaron previamente los niveles, alineamientos, dimensiones y ubicación de las vigas, tomando como referencia los elementos de cimentación previamente construidos y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto. Posteriormente, se realizaron las labores de preparación, colocación y conformación del concreto, garantizando la sección y geometría requeridas.

La ejecución de las vigas permitió conformar un sistema de cimentación continuo y estable, asegurando la correcta transmisión de las cargas entre los elementos estructurales y proporcionando las condiciones necesarias para la continuidad de las actividades posteriores de construcción, durante el periodo objeto del presente informe se ejecutó una cantidad de 17,50 metros lineales, correspondiente al 100 % de la cantidad contractual prevista para este ítem. La cantidad acumulada es de 17,50 ml, la cantidad ejecutada en la presente acta corresponde a 17,50 ml y queda una cantidad de 0,00 ml por ejecutar, por lo cual la actividad se encuentra ejecutada en su totalidad.

ITEM:	*3.4*	UNIDAD:	*ML*
CANTIDAD TOTAL:	*17,50*	CANTIDAD ACUMULADA:	*17,50*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	*17,50*	CANTIDAD POR EJECUTAR:	*0.00*









CAPITULO 3.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
ITEM 3.5 ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI

La actividad consistió en el suministro, corte, figurado, armado y colocación de acero de refuerzo con límite de fluencia FY = 60.000 PSI, destinado al refuerzo de los diferentes elementos estructurales de concreto contemplados en el proyecto, de acuerdo con las dimensiones, diámetros, cantidades, formas y disposiciones establecidas en los planos y especificaciones técnicas, para la ejecución de esta actividad se realizaron previamente las labores de medición, corte y figurado del acero, de acuerdo con los requerimientos de cada elemento estructural. Posteriormente, las barras fueron





CAPITULO 4.0 ESTRUCTURA METALICA
ITEM 4.1 MALLA DE NYLON

La actividad correspondió al suministro e instalación de malla de nylon para el cerramiento del área destinada a la práctica deportiva, complementando el sistema de protección perimetral de la cancha de fútbol 7, los trabajos comprendieron la disposición, extensión, tensionamiento y fijación de la malla sobre los elementos de soporte previamente instalados, verificando su correcta alineación, continuidad y sujeción. La instalación se realizó procurando que la malla quedara debidamente tensionada y sin deformaciones que pudieran afectar su funcionalidad.

La colocación de este elemento permite contener los balones dentro del área de juego, reducir su salida hacia las zonas exteriores y mejorar las condiciones de seguridad y funcionalidad de la cancha, contribuyendo a la adecuada utilización del escenario deportivo, durante el periodo objeto del presente informe se ejecutó una cantidad de 87,50 m², correspondiente al 100 % de la cantidad contractual prevista para este ítem. La cantidad acumulada es de 87,50 m², la cantidad ejecutada en la presente acta corresponde a 87,50 m² y queda una cantidad de 0,00 m² por ejecutar, por lo cual la actividad se encuentra ejecutada en su totalidad.

ITEM:	*4.1*	UNIDAD:	*M2*
CANTIDAD TOTAL:	*87,50*	CANTIDAD ACUMULADA:	*87,50*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	*87,50*	CANTIDAD POR EJECUTAR:	*0.00*





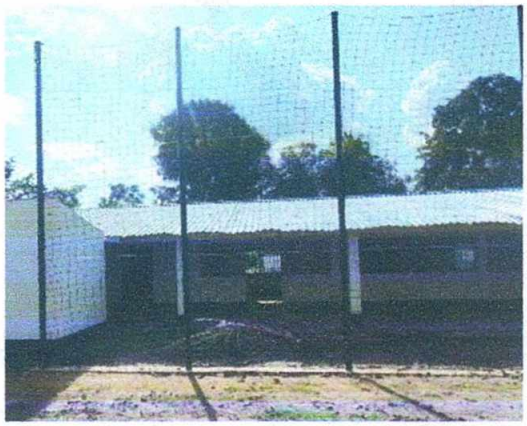



CAPITULO 4.0 ESTRUCTURA METALICA
ITEM 4.2 TUBERIA AGUANEGRA TIPO HN 3 MM* 6M. INCLUYE INSTALACION

La actividad consistió en el suministro e instalación de tubería aguanegra tipo HN, de 3 mm de espesor y longitud comercial de 6 m, utilizada como elemento constitutivo de la estructura metálica destinada al cerramiento y soporte de la cancha de fútbol 7, para la ejecución de los trabajos se realizó la medición, corte y disposición de los elementos de tubería de acuerdo con las dimensiones y configuraciones requeridas en el proyecto. Posteriormente, se efectuó su instalación y fijación en los puntos establecidos, verificando su correcta ubicación, alineamiento, nivelación y estabilidad.

Los elementos metálicos instalados conforman parte de la estructura de soporte necesaria para la colocación de la malla de nylon, garantizando una adecuada rigidez y estabilidad del cerramiento. Durante el proceso se verificaron las uniones y puntos de fijación, procurando que la estructura quedara correctamente conformada y apta para cumplir con su función, durante el periodo objeto del presente informe se ejecutó una cantidad de 65,50 metros lineales, correspondiente al 100 % de la cantidad contractual prevista para este ítem. La cantidad acumulada es de 65,50 ml, la cantidad ejecutada en la presente acta corresponde a 65,50 ml y queda una cantidad de 0,00 ml por ejecutar, por lo cual la actividad se encuentra ejecutada en su totalidad.

ITEM:	*4.2*	UNIDAD:	*ML*
CANTIDAD TOTAL:	*65,50*	CANTIDAD ACUMULADA:	*65,50*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	*65,50*	CANTIDAD POR EJECUTAR:	*0.00*







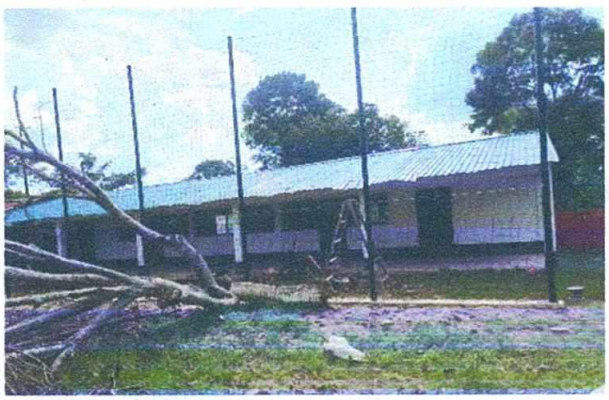

CAPITULO 4.0 ESTRUCTURA METALICA
ITEM 4.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUAYA ACERADA 1/4 PULG INC. ACCESORIOS TENSORES

La actividad consistió en el suministro e instalación de guaya acerada de 1/4 de pulgada, incluyendo los accesorios de fijación y tensores necesarios para su correcta instalación, como parte del sistema de soporte y tensionamiento de la estructura metálica y de la malla de nylon de la cancha de fútbol 7, para la ejecución de esta actividad se realizó el tendido de la guaya en los puntos previamente definidos, efectuando su fijación mediante los accesorios y elementos de sujeción correspondientes. Posteriormente, se realizó el tensionamiento de la guaya mediante los tensores, procurando obtener una instalación firme, uniforme y estable.

La guaya instalada permite proporcionar soporte y estabilidad al sistema de cerramiento, contribuyendo a mantener la malla de nylon correctamente posicionada y tensionada durante el uso del escenario deportivo. Se verificaron los puntos de anclaje y la tensión final del sistema, garantizando su adecuada funcionalidad, durante el periodo objeto del presente informe se ejecutó una cantidad de 35,00 metros lineales, correspondiente al 100 % de la cantidad contractual prevista para este ítem. La cantidad acumulada es de 35,00 ml, la cantidad ejecutada en la presente acta corresponde a 35,00 ml y queda una cantidad de 0,00 ml por ejecutar, por lo cual la actividad se encuentra ejecutada en su totalidad.

ITEM:	*4.3*	UNIDAD:	*ML*
CANTIDAD TOTAL:	*35,00*	CANTIDAD ACUMULADA:	*35,00*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	*35,00*	CANTIDAD POR EJECUTAR:	*0.00*









CAPITULO 4.0 ESTRUCTURA METALICA
ITEM 4.4 ASIENTO EN LAMINA METALICA ANTIDESLIZANTE LARGO=1,00 M X ANCHO=0,3 M ALTO=0,42M

La actividad consistió en el suministro, fabricación e instalación de asientos en lámina metálica antideslizante, con dimensiones aproximadas de 1,00 m de longitud, 0,30 m de ancho y 0,42 m de altura, destinados a proporcionar espacios adecuados para el descanso y permanencia de los usuarios y acompañantes durante las actividades deportivas

desarrolladas en la cancha de fútbol 7, para la ejecución de esta actividad se realizó la fabricación y conformación de los asientos de acuerdo con las dimensiones establecidas, verificando la correcta disposición de la lámina metálica y de los elementos de soporte. Posteriormente, los asientos fueron instalados y fijados en los puntos definidos para tal fin, garantizando su estabilidad, resistencia y adecuada funcionalidad.

La utilización de lámina metálica antideslizante permite mejorar las condiciones de seguridad durante el uso de los asientos, reduciendo el riesgo de deslizamiento y proporcionando una superficie apropiada para los usuarios. Se verificó que los elementos quedaran correctamente nivelados, firmes y con acabados adecuados para su utilización, durante el periodo objeto del presente informe se ejecutaron 5,00 unidades, correspondientes al 100 % de la cantidad contractual prevista para este ítem. La cantidad acumulada es de 5,00 UND, la cantidad ejecutada en la presente acta corresponde a 5,00 UND y queda una cantidad de 0,00 UND por ejecutar, por lo cual la actividad se encuentra ejecutada en su totalidad.

ITEM:	*4.4*	UNIDAD:	*UND*
CANTIDAD TOTAL:	*5,00*	CANTIDAD ACUMULADA:	*5,00*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	*5,00*	CANTIDAD POR EJECUTAR:	*0.00*







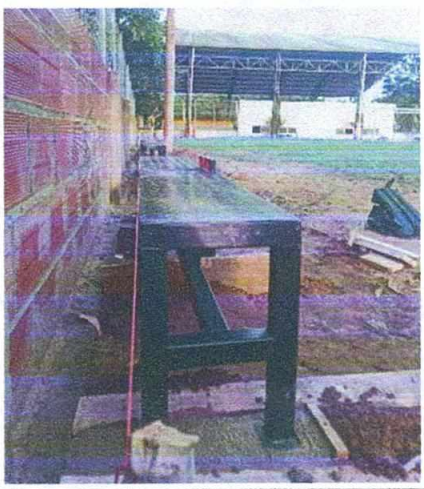

CAPITULO 4.0 ESTRUCTURA METALICA
ITEM 4.5 MANTENIMIENTO Y REPARACION PORTERIA DE FUTBOL 7-INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA

La actividad consistió en el mantenimiento y reparación de las porterías existentes de la cancha de fútbol 7, con el propósito de recuperar sus condiciones de estabilidad, funcionalidad y presentación, garantizando su adecuada utilización durante el desarrollo de las actividades deportivas, los trabajos comprendieron la inspección de las condiciones de las porterías, la realización de las reparaciones y ajustes necesarios en los elementos que presentaban deterioro y, posteriormente, la preparación de las superficies metálicas para la aplicación del tratamiento de protección.

Como parte de la actividad se realizó la aplicación de pintura anticorrosiva sobre las superficies metálicas, con el fin de proteger los elementos frente a procesos de oxidación y deterioro. Posteriormente, se aplicó la pintura de acabado, obteniendo una superficie uniforme y con mejores condiciones de protección y presentación, Una vez finalizados los trabajos, se verificó la estabilidad, fijación y condiciones generales de las porterías, dejándolas aptas para su utilización en la cancha de fútbol 7.

Durante el periodo objeto del presente informe se ejecutaron 2,00 unidades, correspondientes al 100 % de la cantidad contractual prevista para este ítem. La cantidad acumulada es de 2,00 UND, la cantidad ejecutada en la presente acta corresponde a 2,00 UND y queda una cantidad de 0,00 UND por ejecutar, por lo cual la actividad se encuentra ejecutada en su totalidad.

ITEM:	*4.5*	UNIDAD:	*UND*
CANTIDAD TOTAL:	*2,00*	CANTIDAD ACUMULADA:	*2,00*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	*2,00*	CANTIDAD POR EJECUTAR:	*0.00*

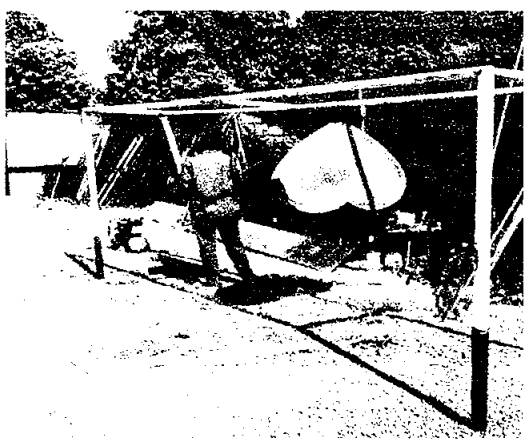

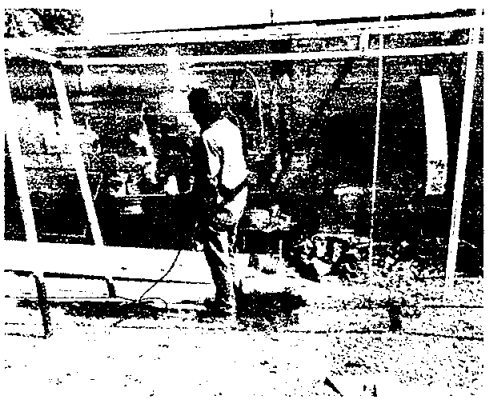

	

2. CONCLUSIONES

- De acuerdo con la verificación realizada durante el periodo de ejecución del Contrato de Obra No. 105 de 2026, se evidenció el desarrollo y culminación de las actividades contempladas en el alcance contractual para la construcción y mejoramiento de la cancha de fútbol 7 de Barrio Nuevo, las cantidades ejecutadas corresponden a las cantidades contractuales previstas en los diferentes ítems, sin registrarse cantidades pendientes de ejecución al cierre del contrato.
- Las actividades ejecutadas se desarrollaron atendiendo las dimensiones, especificaciones y características técnicas establecidas para cada uno de los componentes de la obra. Se verificó la correcta conformación de los elementos de cimentación, estructuras en concreto y estructura metálica, así como la adecuada instalación de los elementos complementarios, permitiendo entregar los trabajos en condiciones apropiadas para su funcionamiento y uso.
- Al finalizar el periodo comprendido entre el 28 de julio de 2026 y el 18 de agosto de 2026, se verificó la terminación de las actividades previstas en el contrato, encontrándose una ejecución física correspondiente al 100 % de las cantidades contratadas, en términos técnicos, las obras ejecutadas permiten disponer de un escenario deportivo mejorado y funcional para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas de la comunidad del Barrio Nuevo y del municipio de Puerto Rondón, Arauca.

FIRMAS.

G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS R/L CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO Contratista	
JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ ING RESIDENTE DE OBRA	

25. MEMORIAS DE CÁLCULO DE LAS CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS POR CADA ÍTEM, RESIDENTE DE OBRA.

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

CAPITULO	1,0	PRELIMINARES	ITEM 1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	UNIDAD:	M2



	DIMENSIONES					Nº DE ELEMENTOS	CANT. TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (m^2)	UNIDAD		
LOCALIZACION Y REPLANTEO				20,00		1,00	20,00
					CANTIDAD PROYECTADA:		20,00

OBSERVACIONES:

Aprobó:

CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
Secetario de Planeación E Infraestructura

Formuló:

JUAN ADOLFO ORGUELA RODRIGUEZ
ING RESIDENTE DE OBRA

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

CAPITULO	2,0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	ITEM 2,1	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMÚN ENTRE 0 - 2 M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE RETIRO)					UNIDAD:	M3
					DIMENSIONES				Nº DE ELEMENTOS	CANT. TOTAL
					LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	VOL (m^3)	UNIDAD	
				ZAPATAS	0,70	0,70	0,30	0,15	8,00	1,00	1,18
				PEDESTALES MODULOS	0,70	0,70	1,20	0,59	8,00	1,00	4,70
				VIGA CIMENTACION INC SOLADO	17,50	0,30	0,30	1,58	1,00	1,00	1,58

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

CAPITULO	2,0	MOVIMIENTOS DE TIERRA	ITEM 2,2	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN COMPACTADO					UNIDAD:	M3
					DIMENSIONES				Nº DE ELEMENTOS	CANT. TOTAL
					LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	VOL. (m^3)	UNIDAD		
				ZAPATAS	0,70	0,70	0,30	0,15	8,00	1,00	1,18
				PEDESTALES MODULOS	0,70	0,70	1,20	0,59	8,00	1,00	4,70
				VIGA CIMENTACION INC SOLADO	17,50	0,30	0,30	1,58	1,00	1,00	1,58

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

CAPITULO	3,0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	ITEM 3,1	CONCRETO DE LIMPIEZA E = 0,05 M (SOLADO)					UNIDAD:	M2
					DIMENSIONES				Nº DE ELEMENTOS	CANT. TOTAL
					LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (m^2)	UNIDAD	
				ZAPATAS	0,70	0,70		0,49	8,00	3,92
				VIGA CIMENTACION INC SOLADO	17,50	0,30		5,25	1,00	5,25
						CANTIDAD PROYECTADA:				9,17



OBSERVACIONES:

Aprobó:

CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
Secetario de Planeación E Infraestructura

Formuló:

JUAN ADRIAN CHAPARRO RODRIGUEZ
ING RESIDENTE DE OBRA

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

CAPITULO	3,0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	ITEM 3,2	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.70*0.70*0.30 M					UNIDAD: UND	
					DIMENSIONES				Nº DE ELEMENTOS	CANT. TOTAL
					LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (m^2)	UNIDAD		
				ZAPATAS					8,00	1,00	8,00

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

CAPITULO	3,0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	ITEM 3,3	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,30*0.30 M					UNIDAD:	ML
					DIMENSIONES				Nº DE ELEMENTOS	CANT. TOTAL
					LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (m^2)	UNIDAD		
				PEDESTALES MODULOS			1,20			8,00	9,60
									CANTIDAD PROYECTADA:		9,60



OBSERVACIONES:

Aprobó:

CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
Secetario de Planeación E Infraestructura

Formuló:

JUAN ARQUIMEDES VILLA RODRIGUEZ
ING RESIDENTE DE OBRA

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

CAPITULO	3,0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	ITEM 3,4	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI 0.30*0.30 M					UNIDAD:	ML
					DIMENSIONES				Nº DE ELEMENTOS	CANT. TOTAL
					LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (m^2)	UNIDAD		
				VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI 0.30*0.30 M	17,50					1,00	17,50

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

CAPITULO	3,0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	ITEM 3,5



ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI	DIMENSIONES				UNIDAD:	KG
	DIAMETRO	KG/M	LONG	CANT	Nº DE ELEMENTOS	CANT. TOTAL
ZAPATAS	1/2"	0,996	1,00	12,00	8,00	95,62
PEDESTALES LONG	1/2"	0,996	1,20	4,00	8,00	38,25
PEDESTALES ESTRIBOS	3/8"	0,556	1,04	15,00	8,00	69,39
VIGA CIMENTACION LONGITUDINAL	1/2"	0,996	2,50	4,00	7,00	69,72
VIGA CIMENTACION ESTRIBOS	3/8"	0,556	1,02	26,00	7,00	103,22
				CANTIDAD PROYECTADA:		376,20

OBSERVACIONES:

Aprobó:

CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
Secetario de Planeación E Infraestructura

Formuló:

JUAN ARTURO MIQUELA RODRIGUEZ
ING RESIDENTE DE OBRA

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

CAPITULO	4,0	ESTRUCTURA METALICA	ITEM	4,1	MALLA DE NYLON						UNIDAD:	M2
						DIMENSIONES					Nº DE ELEMENTOS	CANT. TOTAL
						LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (m^2)	UNIDAD		
					MODULO CONTRAIMPACTO EN MALLA DE NAYLON	2,50		5,00	12,50		7,00	87,50

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

CAPITULO	4,0	ESTRUCTURA METALICA	ITEM 4,2	TUBERIA AGUANEGRA TIPO HN 3 MM* 6M. INCLUYE INSTALACION	UNIDAD:	ML



	DIMENSIONES					Nº DE ELEMENTOS	CANT. TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (m^2)	UNIDAD		
TUBERIA AGUANEGRA TIPO HN 3 MM* 6M. INCLUYE INSTALACION	6,00					8,00	48,00
TUBERIA AGUANEGRA TIPO HN 3 MM* 6M. INCLUYE INSTALACION	17,50					1,00	17,50
					CANTIDAD PROYECTADA:		65,50

OBSERVACIONES:

Aprobó:

CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
Secetario de Planeación E Infraestructura

Formuló:

JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ
ING RESIDENTE DE OBRA

182

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

CAPITULO	4,0	ESTRUCTURA METALICA	ITEM 4,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUAYA ACERADA 1/4 PULG INC. ACCESORIOS TENSORES	UNIDAD:	ML

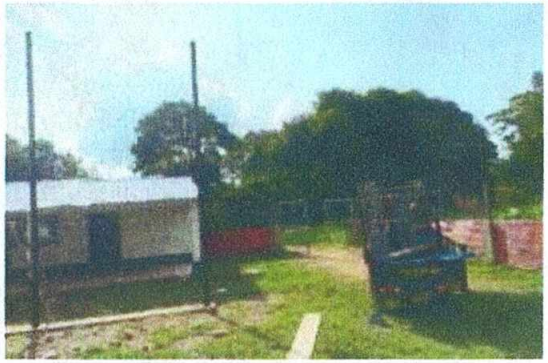

	DIMENSIONES					Nº DE ELEMENTOS	CANT. TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (m^2)	UNIDAD		
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUAYA ACERADA 1/4 PULG INC. ACCESORIOS TENSORES	17,50					2,00	35,00
				CANTIDAD PROYECTADA:			35,00

OBSERVACIONES:

Aprobó:

CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
Secetario de Planeación E Infraestructura

Formuló:

JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ
ING RESIDENTE DE OBRA

202

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

CAPITULO	4,0	ESTRUCTURA METALICA	ITEM 4,4	ASIENTO EN LAMINA METALICA ANTIDESLIZANTE LARGO=1,00 M X ANCHO=0,3 M ALTO=0,42M	UNIDAD:	UND



	DIMENSIONES					Nº DE ELEMENTOS	CANT. TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (m^2)	UNIDAD		
ASIENTO EN LAMINA METALICA ANTIDESLIZANTE LARGO=1,00 M X ANCHO=0,3 M ALTO=0,42M						5,00	5,00
				CANTIDAD PROYECTADA:			5,00

OBSERVACIONES:

Aprobó:

CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
Secetario de Planeación E Infraestructura

Formuló:

JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ
INGENIERO DE OBRA

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

CAPITULO	4,0	ESTRUCTURA METALICA	ITEM 4,5	MANTENIMIENTO Y REPARACION PORTERIA DE FUTBOL 7-INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	UNIDAD:	UND



	DIMENSIONES					Nº DE ELEMENTOS	CANT. TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (m^2)	UNIDAD		
MANTENIMIENTO Y REPARACION PORTERIA DE FUTBOL 7-INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA						2,00	2,00
				CANTIDAD PROYECTADA:			2,00

OBSERVACIONES:

Aprobó:

CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
Secetario de Planeación E Infraestructura

Formuló:

JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ
ING RESIDENTE DE OBRA

26. BITÁCORA DIARIA DE OBRA DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE PUERTO RONDON

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	martes, 28 de julio de 2026	Localizacion: Barrio nuevo-Municipio de Puerto Rondón	Hoja Número:	1

Contratista: G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

CONTRATO DE OBRA No 105 DE 2026	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Residente de Obra	x		
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial	x		
Ayudantes			
Soldador			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	x	x
Seco	x	x
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: Botas: Guantes: Gafas: Cintas: reflectivas: Conos: Carnet:

Señalización

Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

*SE INICIA EL DIA SIN CONTRATIEMPOS

*SE REALIZA LA SOCIALIZACION DEL CONTRATO DE OBRA 105 DEL 2026 EN EL BARRIO NUEVO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON

*SE TERMINA EL DIA SIN CONTRATIEMPOS

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba

Hubo Lesión?

Si		No	x

EXCELENTE... 1 BUENO ... 2 DEFICIENTE... 3

ARQ. CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ING RESIDENTE. JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ
G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE PUERTO RONDON

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	miércoles, 29 de julio de 2026	**Localizacion: Barrio nuevo-Municipio de Puerto Rondón**	**Hoja Número:**	**2**

Contratista: G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

CONTRATO DE OBRA No 105 DE 2026	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Personal en Obra

Cargo	**Cant.**	**Cargo**	**Cant.**
Residente de Obra	x		
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial	x		
Ayudantes			
Soldador			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	**Cant. (L)**

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	**p.m**
Soleado	x	x
Seco	x	x
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: Botas: Guantes: Gafas: Cintas: reflectivas: Conos: Carnet:

Señalización

Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

*SE INICIA EL DIA REALIZANDO DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA ENTRE RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL.

*SE TERMINA EL DIA SIN CONTRATIEMPOS

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado

EXCELENTE... 1 BUENO ... 2 DEFICIENTE ... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesion?			
Si		No	x

ARQ. CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ING RESIDENTE JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGU
ING RESIDENTE JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE PUERTO RONDON
CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	jueves, 30 de julio de 2026	Localizacion: Barrio nuevo-Municipio de Puerto Rondón	Hoja Numero:	3

Contratista: G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

CONTRATO DE OBRA No 105 DE 2026	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Residente de Obra	x		
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial	x		
Ayudantes	x		
Soldador			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado		
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: Botas: Guantes: Gafas: Cintas: reflectivas: Conos: Carnet:

Señalización

Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

*SE INICIA EL DIA SIN CONTRATIEMPOS
*SE DA INICIO A LAS ACTIVIDADES DE LOCALIZACION Y REPLANTEO
*SE TERMINA EL DIA SIN CONTRA TIEMPOS

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado

EXCELENTE...1 BUENO...2 REGULAR...3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:
Nombre:
Cargo:
Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesion?

Si		No	x

ARQ. CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ING RESIDENTE JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ
ING RESIDENTE: JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE PUERTO RONDON

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	viernes, 31 de julio de 2026	Localizacion: Barrio nuevo-Municipio de Puerto Rondón	Hoja Número:	4

Contratista: G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

CONTRATO DE OBRA No 105 DE 2026	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Residente de Obra	x		
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial	x		
Ayudantes	x		
Soldador			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	x	x
Seco	x	x
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: X Botas: X Guantes: X Gafas: X Cintas: X reflectivas: Conos: Carnet:

Señalización

Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

*SE INICIA EL DIA SIN CONTRATIEMPOS

*SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE LOCALIZACION Y REPLANTEO

*SE DA INICIO A LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN ENTRE 0 - 2 M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE RETIRO)

*SE TERMINA EL DIA SIN CONTRATIEMPOS

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado

EXCELENTE ... 1 BUENO ... 2 DEFICIENTE ... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba

Hubo Lesion?

Si		No	x

ARQ. CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ING RESIDENTE JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ
ING RESIDENTE. JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE PUERTO RONDON

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	sábado, 1 de agosto de 2026	Localizacion: Barrio nuevo-Municipio de Puerto Rondón	Hoja Número:	5

Contratista: G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

CONTRATO DE OBRA No 105 DE 2026	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Residente de Obra			
Supervisor			
Tecnico Electricista			
Oficial			
Ayudantes			
Soldador			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado		
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: Botas: Guantes: Gafas: Cintas: reflectivas: Conos: Carnet:

Señalización

Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

*DIA NO LABORAL

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado

EXCELENTE... 1 BUENO... 2 DEFICIENTE... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	x

ARQ. CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ING RESIDENTE JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ
G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE PUERTO RONDON

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	domingo, 2 de agosto de 2026	**Localizacion: Barrio nuevo-Municipio de Puerto Rondón**	**Hoja Número:**	**6**

Contratista: G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

CONTRATO DE OBRA No 105 DE 2026	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Personal en Obra

Cargo	**Cant.**	**Cargo**	**Cant.**
Residente de Obra			
Supervisor			
Tecnico Electricista			
Oficial			
Ayudantes			
Soldador			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	**Cant. (L)**

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	**p.m**
Soleado		
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: Botas: Guantes: Gafas: Cintas: reflectivas: Conos: Carnet:

Señalización

Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

*DIA DOMINICAL

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado

EXCELENTE 1 BUENO 2 DEFICIENTE 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	x

ARQ. CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ING RESIDENTE. JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ
G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE PUERTO RONDON

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	lunes, 3 de agosto de 2026	**Localizacion: Barrio nuevo-Municipio de Puerto Rondón**	**Hoja Número:**	**7**

Contratista: G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

CONTRATO DE OBRA No 105 DE 2026	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Residente de Obra	x		
Supervisor			
Tecnico Electricista			
Oficial	x		
Ayudantes	x		
Soldador			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	x	x
Seco	x	x
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: X Botas: X Guantes: X Gafas: X Cintas: X reflectivas: Conos: Carnet: Señales preventivas:

Señalización

Actividades Desarrolladas

*SE INICIA EL DIA SIN CONTRATIEMPOS

*SE DA LA BIENVENIDA AL PERSONAL DE OBRA, EXPLICANDO LOS PUNTOS A INTERVENIR

*SE DA INICIO CON LA ACTIVIDAD DE CONCRETO DE LIMPIEZA E = 0,05 M (SOLADO)

*SE DA INICIO CON LA ACTIVIDAD DE AMARRE DEL ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI

*SE TERMINA EL DIA SIN CONTRATIEMPOS

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	x

EXCELENTE ... 1 BUENO ... 2 DEFICIENTE ... 3

ARQ. CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ING. RESIDENTE. JUAN PABLO FONSECA RODRIGUEZ
G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE PUERTO RONDON

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	martes, 4 de agosto de 2026	Localizacion: Barrio nuevo-Municipio de Puerto Rondón	Hoja Número:	8

Contratista: G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

CONTRATO DE OBRA No 105 DE 2026	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Personal en Obra				**Consumo De Agua**		**Estado del Tiempo / Duración**		
Cargo	**Cant.**	**Cargo**	**Cant.**	**Detalle y/o elemento utilizado**	**Cant. (L)**		**a.m.**	**p.m**
Residente de Obra	x					Soleado	x	x
Supervisor						Seco	x	x
Tecnico Electricista						Nublado		
Oficial	x					Lluvia Pasajera		
Ayudante	x					Lluvioso		
Soldador						Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial	**Señalización**
Cascos: X Botas: X Guantes: X Gafas: X Cintas: X reflectivas: Conos: Carnet:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

*SE INICIA EL DIA SIN CONTRATIEMPOS

*SE DA LA BIENVENIDA AL PERSONAL DE OBRA, EXPLICANDO LOS PUNTOS A INTERVENIR

*SE DA CONTINUIDAD CON LA ACTIVIDAD DE CONCRETO DE LIMPIEZA F´c = 0,05 M (SOLADO)

*SE DA CONTINUIDAD CON LA ACTIVIDAD DE AMARRE DEL ACERO DE REFUERZO FY= 6000 PS.

*SE TERMINA EL DIA SIN CONTRATIEMPOS

Maquinaria y Equipos en Obra			**Accidentes en Obra**			
Descripción	Cant.	Estado	Ocurrió Algún Accidente?			
			Si		No	x
			Hora:			
			Nombre:			
			Cargo:			
			Actividad que Desempeñaba:			
			Hubo Lesión?			
			Si		No	x

EXCELENTE 1 BUENO 2 DEFICIENTE 3

ARQ. CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ING RESIDENTE. JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ
G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE PUERTO RONDON

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	miércoles, 5 de agosto de 2026	Localizacion: Barrio nuevo-Municipio de Puerto Rondón	Hoja Número:	9

Contratista: G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

CONTRATO DE OBRA No 105 DE 2026	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Residente de Obra	x		
Supervisor			
Tecnico Electricista			
Oficial	x		
Ayudantes	x		
Soldador			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	x	x
Seco	x	x
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: X Botas: X Guantes: X Gafas: X Cintas: X reflectivas: Conos: Carnet:

Señalización

Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

*SE INICIA EL DIA SIN CONTRATIEMPOS

*SE DA LA BIENVENIDA AL PERSONAL DE OBRA, EXPLICANDO LOS PUNTOS A INTERVENIR

*SE DA INICIO CON LA ACTIVIDAD DE ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.70*0.70*0.30 M

*SE DA CONTINUIDAD CON LA ACTIVIDAD DE AMARRE DEL ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI

*SE TERMINA EL DIA SIN CONTRATIEMPOS

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	x

EXCELENTE.... 1 BUENO .. 2 DEFICIENTE .. 3

ARQ. CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ING RESIDENTE. JUAN ADOLFO GABRIELA RODRIGUEZ
G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE PUERTO RONDON

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	jueves, 6 de agosto de 2026	**Localizacion: Barrio nuevo-Municipio de Puerto Rondón**	**Hoja Número:**	**10**

Contratista: G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

CONTRATO DE OBRA No 105 DE 2026	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Residente de Obra	x		
Supervisor			
Tecnico Electricista			
Oficial	x		
Ayudantes	x		
Soldador			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado		
Seco		
Nublado	X	
Lluvia Pasajera		X
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: X Botas: X Guantes: X Gafas: X Cintas: X reflectivas: Conos: Carnet:

Señalización

Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

*SE INICIA EL DIA SIN CONTRATIEMPOS

*SE DA LA BIENVENIDA AL PERSONAL DE OBRA, EXPLICANDO LOS PUNTOS A INTERVENIR

*SE DA INICIO CON LA ACTIVIDAD DE PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.30*0.30 M

*SE DA CONTINUIDAD CON LA ACTIVIDAD DE AMARRE DEL ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI

*SE TERMINA EL DIA SIN CONTRATIEMPOS

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba

Hubo Lesión?

Si		No	x

ARQ. CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ING RESIDENTE. JUAN ADOLFO OSUELA RODRIGUEZ
G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE PUERTO RONDON

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	viernes, 7 de agosto de 2026	**Localizacion: Barrio nuevo-Municipio de Puerto Rondón**	**Hoja Numero:**	**11**

Contratista: G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

CONTRATO DE OBRA No 105 DE 2026	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Personal en Obra

Cargo	**Cant.**	**Cargo**	**Cant.**
Residente de Obra	x		
Supervisor			
Tecnico Electricista			
Oficial	x		
Ayudantes	x		
Soldador			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	**Cant. (L)**

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	**p.m**
Soleado	x	x
Seco	x	x
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: X Botas: X Guantes: X Gafas: X Cintas: X reflectivas: Conos: Carnet:

Señalización

Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

*SE INICIA EL DIA SIN CONTRATIEMPOS

*SE DA LA BIENVENIDA AL PERSONAL DE OBRA, EXPLICANDO LOS PUNTOS A INTERVENIR

*SE DA INICIO CON LA ACTIVIDAD DE PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.30*0.30 M.

*SE DA CONTINUIDAD CON LA ACTIVIDAD DE AMARRE DEL ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI

*SE TERMINA EL DIA SIN CONTRATIEMPOS

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba

Hubo Lesión?

Si		No	x

EXCELENTE .... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE 3

ARQ. CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ING RESIDENTE. JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ
G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE PUERTO RONDON

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	sábado, 8 de agosto de 2026	Localizacion: Barrio nuevo-Municipio de Puerto Rondón	**Hoja Número:**	**12**

Contratista: G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

CONTRATO DE OBRA No 105 DE 2026	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Personal en Obra

Cargo	**Cant.**	**Cargo**	**Cant.**
Residente de Obra			
Supervisor			
Tecnico Electricista			
Oficial			
Ayudantes			
Soldador			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	**Cant. (L)**

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	**p.m**
Soleado		
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: Botas: Guantes: Gafas: Cintas: reflectivas: Conos: Carnet:

Señalización

Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

*DIA NO LABORAL

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado

EXCELENTE ... 1 | BUENO ... 2 | DEFICIENTE ... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba

Hubo Lesión?

Si		No	x

ARQ. CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ING RESIDENTE. JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ
G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE PUERTO RONDON

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	domingo, 9 de agosto de 2026	**Localizacion: Barrio nuevo-Municipio de Puerto Rondón**	**Hoja Número:**	**13**

Contratista: G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

CONTRATO DE OBRA No 105 DE 2026	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Personal en Obra

Cargo	**Cant.**	**Cargo**	**Cant.**
Residente de Obra			
Supervisor			
Tecnico Electricista			
Oficial			
Ayudantes			
Soldador			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	**Cant. (L)**

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	**p.m**
Soleado	x	x
Seco	x	x
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: Botas: Guantes: Gafas: Cintas: reflectivas: Conos: Carnet:

Señalización

Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

*DIA DOMINICAL

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado

EXCELENTE .... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	x

ARQ. CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ING RESIDENTE: JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ
G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE PUERTO RONDON

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	lunes, 10 de agosto de 2026	**Localizacion: Barrio nuevo-Municipio de Puerto Rondón**	**Hoja Número:**	**14**

Contratista: G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

CONTRATO DE OBRA No 105 DE 2026	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Residente de Obra	x		
Supervisor			
Tecnico Electricista			
Oficial	x		
Ayudantes	x		
Soldador			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado		
Seco		X
Nublado	X	X
Lluvia Pasajera	X	
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: X Botas: X Guantes: X Gafas: X Cintas: X reflectivas: Conos: Carnet:

Señalización

Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

*SE INICIA EL DIA SIN CONTRATIEMPOS

*SE DA LA BIENVENIDA AL PERSONAL DE OBRA, EXPLICANDO LOS PUNTOS A INTERVENIR

*SE DA INICIO CON LA ACTIVIDAD DE VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI 0.30*0.30 M

*SE DA INCIO CON LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PORTERIA DE FUTBOL 7-INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA

*SE TERMINA EL DIA SIN CONTRATIEMPOS

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	x

ARQ. CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ING RESIDENTE. JUAN ADOLFO CUBILLA RODRIGUEZ
G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE PUERTO RONDON

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	martes, 11 de agosto de 2026	Localizacion: Barrio nuevo-Municipio de Puerto Rondón	Hoja Número:	15

Contratista: G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

CONTRATO DE OBRA No 105 DE 2026	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Residente de Obra	x		
Supervisor			
Tecnico Electricista			
Oficial	x		
Ayudantes	x		
Soldador			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado		
Seco		
Nublado	X	
Lluvia Pasajera	X	X
Lluvioso		X
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: X Botas: X Guantes: X Gafas: X Cintas: X reflectivas: Conos: Carnet:

Señalización

Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

*SE INICIA EL DIA SIN CONTRATIEMPOS

*SE DA LA BIENVENIDA AL PERSONAL DE OBRA, EXPLICANDO LOS PUNTOS A INTERVENIR

*SE DA INICIO CON LA ACTIVIDAD DE VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI 0.30*0.30 M

SE DA INICIO CON LA ACTIVIDAD DE TUBERIA AGUANEGRA TIPO TIN 3 MM 6M. INCLUYE INSTALACION

*SE DA INICIO CON LA ACTIVIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE GUAYA ACERADA 1/4 PULG INC. ACCESORIOS TENSORES

*SE TERMINA EL DIA SIN CONTRA TIEMPOS

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado

EXCELENTE ... 1 BUENO ... 2 DEFICIENTE ... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	x

ARQ. CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ING RESIDENTE JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ
G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE PUERTO RONDON

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	miércoles, 12 de agosto de 2026	**Localizacion:** Barrio nuevo-Municipio de Puerto Rondón	**Hoja Número:**	16

Contratista: G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

CONTRATO DE OBRA No 105 DE 2026	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Residente de Obra	x		
Supervisor			
Tecnico Electricista			
Oficial	x		
Ayudantes	x		
Soldador			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	x	x
Seco	x	x
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: X Botas: X Guantes: X Gafas: X Cintas: X reflectivas: Conos: Carnet:

Señalización

Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

*SE INICIA EL DIA SIN CONTRATIEMPOS

*SE DA LA BIENVENIDA AL PERSONAL DE OBRA, EXPLICANDO LOS PUNTOS A INTERVENIR

*SE DA CONTINUIDAD CON LA ACTIVIDAD DE VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI 0.30*0.30 M

SE DA CONTINUIDAD CON LA ACTIVIDAD DE TUBERIA AGUANEGRA TIPO HN 3 MM 6M. INCLUYE INSTALACION

*SE DA CONTINUIDADCON LA ACTIVIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE GUAYA ACERADA 1/4 PULG INC. ACCESORIOS TENSORES

*SE TERMINA EL DIA SIN CONTRA TIEMPOS

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado

EXCELENTE.... 1 | BUENO ... 2 | DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	x

ARQ. CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ING RESIDENTE JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ
G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE PUERTO RONDON

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	jueves, 13 de agosto de 2026	**Localizacion: Barrio nuevo-Municipio de Puerto Rondón**	**Hoja Número:**	**17**

Contratista: G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

CONTRATO DE OBRA No 105 DE 2026	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Personal en Obra				**Consumo De Agua**		**Estado del Tiempo / Duración**		
Cargo	**Cant.**	**Cargo**	**Cant.**	**Detalle y/o elemento utilizado**	**Cant. (L)**		**a.m.**	**p.m**
Residente de Obra	x					Soleado		
Supervisor						Seco		
Tecnico Electricista						Nublado		
Oficial						Lluvia Pasajera		
Ayudantes	x					Lluvioso		
Soldador	x					Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial	**Señalización**
Cascos: X Botas: X Guantes: X Gafas: X Cintas: X reflectivas: Conos: Carnet:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

*SE INICIA EL DIA SIN CONTRATIEMPOS

*SE DA LA BIENVENIDA AL PERSONAL DE OBRA, EXPLICANDO LOS PUNTOS A INTERVENIR

*SE DA CONTINUIDAD CON LA ACTIVIDAD DE VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI 0.30*0.30 M

SE DA CONTINUIDAD CON LA ACTIVIDAD DE TUBERIA AGUANEGRA TIPO HN 3 MM 6M. INCLUYE INSTALACION

*SE DA CONTINUIDADCON LA ACTIVIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE GUAYA ACERADA 1/4 PULG INC. ACCESORIOS TENSORES

*SE TERMINA EL DIA SIN CONTRA TIEMPOS

Maquinaria y Equipos en Obra		
Descripción	Cant.	Estado

Accidentes en Obra			
Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	x

EXCELENTE.... 1	BUENO 2	DEFICIENTE.... 3

ARQ. CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ING RESIDENTE. JUAN ADOLFO OLIUELA RODRIGUEZ
G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE PUERTO RONDON

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	viernes, 14 de agosto de 2026	Localizacion: Barrio nuevo-Municipio de Puerto Rondón	Hoja Número:	18

Contratista: G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

CONTRATO DE OBRA No 105 DE 2026	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Residente de Obra	x		
Supervisor			
Tecnico Electricista			
Oficial	x		
Ayudantes	x		
Soldador			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	x	x
Seco	x	x
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: X Botas: X Guantes: X Gafas: X Cintas: X reflectivas: Conos: Carnet:

Señalización

Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

*SE INICIA EL DIA SIN CONTRATIEMPOS

*SE DA LA BIENVENIDA AL PERSONAL DE OBRA, EXPLICANDO LOS PUNTOS A INTERVENIR

SE DA CONTINUIDAD CON LA ACTIVIDAD DE TUBERIA AGUA/NEGRA TIPO RN 3 MM 6M, INCLUYE INSTALACION

*SE TERMINA EL DIA SIN CONTRATIEMPOS

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado

EXCELENTE... 1 BUENO ... 2 DEFICIENTE... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba

Hubo Lesión?

Si		No	x

ARQ. CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ING RESIDENTE. JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ
G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE PUERTO RONDON

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	sábado, 15 de agosto de 2026	Localizacion: Barrio nuevo-Municipio de Puerto Rondón	Hoja Número:	19

Contratista: G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

CONTRATO DE OBRA No 105 DE 2026	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Residente de Obra			
Supervisor			
Tecnico Electricista			
Oficial			
Ayudantes			
Soldador			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	x	x
Seco	x	x
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: Botas: Guantes: Gafas: Cintas: reflectivas: Conos: Carnet:

Señalización

Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

*DIA NO LABORAL

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado

EXCELENTE.... 1 BUENO ... 2 DEFICIENTE. ... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	x

ARQ. CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ING RESIDENTE. JUAN ADOLFO [illegible] RODRIGUEZ
G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE PUERTO RONDON

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	domingo, 16 de agosto de 2026	**Localizacion: Barrio nuevo-Municipio de Puerto Rondón**	**Hoja Número:**	**20**

Contratista: G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

CONTRATO DE OBRA No 105 DE 2026	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Residente de Obra	x		
Supervisor			
Tecnico Electricista			
Oficial	x		
Ayudantes	x		
Soldador			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	x	x
Seco	x	x
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: X Botas: X Guantes: X Gafas: X Cintas: X reflectivas: Conos: Carnet:

Señalización

Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

*DIA DOMINICAL

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba

Hubo Lesión?

Si		No	x

EXCELENTE.... 1	BUENO 2	DEFICIENTE.. 3

ARQ. CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ING RESIDENTE. JUAN ADOLFO ORTUELA RODRIGUEZ
G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE PUERTO RONDON

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	lunes, 17 de agosto de 2026	Localizacion: Barrio nuevo-Municipio de Puerto Rondón	Hoja Número:	21

Contratista: G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

CONTRATO DE OBRA No 105 DE 2026	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Residente de Obra			
Supervisor			
Tecnico Electricista			
Oficial			
Ayudantes			
Soldador			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	x	x
Seco	x	x
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: X Botas: X Guantes: X Gafas: X Cintas: X reflectivas: Conos: Carnet:

Señalización

Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

*DIA FERIADO

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba

Hubo Lesión?

Si		No	x

ARQ. CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ING RESIDENTE. JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ
G&C CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE PUERTO RONDON

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	martes, 18 de agosto de 2026	Localizacion: Barrio nuevo-Municipio de Puerto Rondón	Hoja Número:	22

Contratista: G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

CONTRATO DE OBRA No 105 DE 2026	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Residente de Obra	x		
Supervisor			
Tecnico Electricista			
Oficial	x		
Ayudantes	x		
Soldador			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	x	x
Seco	x	x
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: X Botas: X Guantes: X Gafas: X Cintas: X reflectivas: Conos: Carnet:

Señalización

Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

*SE INICIA EL DIA SIN CONTRATIEMPOS

*SE DA LA BIENVENIDA AL PERSONAL DE OBRA, EXPLICANDO LOS PUNTOS A INTERVENIR

*SE INICIO CON LA ACTIVIDAD DE MALLA DE NYLON.

*SE INICIO CON LA ACTIVIDAD ASIENTO EN LAMINA METALICA ANTIDESLIZANTE LARGO=1,00 M X ANCHO=0,4 M ALTO=0,43M

*SE INICIO CON LA ACTIVIDAD DE RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION COMPACTADO

*SE TERMINA EL DIA SIN CONTRATIEMPOS

*UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO, SE REALIZO LA VERIFICACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS, EVIDENCIANDO QUE ESTAS FUERON DESARROLLADAS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS. POR LO ANTERIOR, SE DEJA CONSTANCIA DE QUE LA OBRA FUE RECIBIDA Y ENTREGADA A SATISFACCIÓN, SIN PRESENTARSE OBSERVACIONES QUE IMPIDAN SU RECIBO.

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado

EXCELENTE 1 BUENO 2 DEFICIENTE 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba

Hubo Lesion?

Si		No	x

ARQ. CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ING RESIDENTE. JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ
G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

29. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

REGISTRO FOTOGRAFICO

PERIODO: DEL 28 DE JULIO DE 2026 AL 18 DE AGOSTO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No 105 DE 2026

CONTRATISTA: G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS
R/L CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO

OBJETO: "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

SUPERVISOR:
CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO.
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA.

PUERTO RONDÓN – ARAUCA.

CALLE 18 No. 25 – 85 Barrio La Esperanza Cel 314-3222324

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS.

Para el periodo del presente informe final de obra comprendido entre el DEL 28 DE JULIO DE 2026 AL 18 DE AGOSTO DE 2026, G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS, ha ejecutado las siguientes actividades de los ítems del contrato:

CAPITULO 1.0 PRELIMINARES
ITEM 1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO

ITEM:	*1.1*	UNIDAD:	*M2*
CANTIDAD TOTAL:	*20,00*	CANTIDAD ACUMULADA:	*20,00*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	*20,00*	CANTIDAD POR EJECUTAR:	*0.00*





G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6



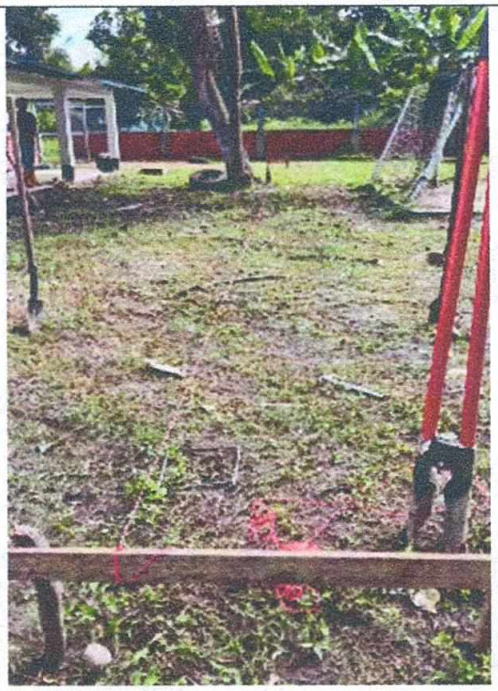

CAPITULO 2.0 MOVIMIENTOS DE TIERRA
ITEM 2.1 EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMÚN ENTRE 0 - 2 M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE RETIRO)

ITEM:	*2.1*		UNIDAD:	*M3*
CANTIDAD TOTAL:		*7,46*	CANTIDAD ACUMULADA:	*7,46*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:		*7,46*	CANTIDAD POR EJECUTAR:	*0.00*

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6





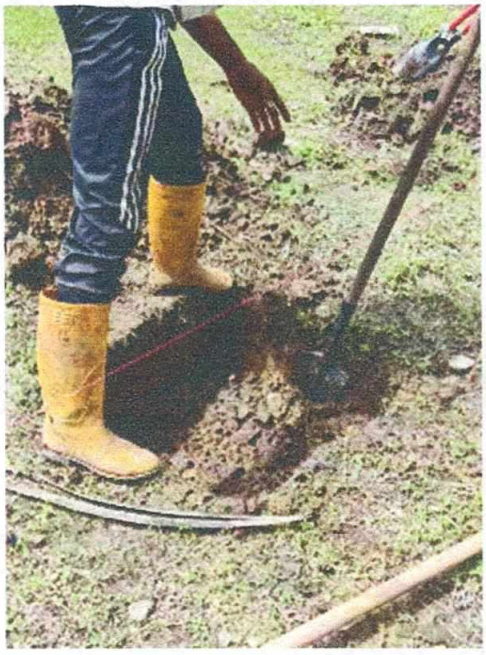



CAPITULO 2.0 MOVIMIENTOS DE TIERRA
ITEM 2.2 RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN COMPACTADO.

ITEM:	2.2	UNIDAD:	M3

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

CANTIDAD TOTAL:	*7,46*	CANTIDAD ACUMULADA:	*7,46*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	*7,46*	CANTIDAD POR EJECUTAR:	*0.00*









CAPITULO 3.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

CALLE 18 No. 25 – 85 Barrio La Esperanza Cel 314-3222324
gycsas12@hotmail.com

ITEM 3.1 CONCRETO DE LIMPIEZA E = 0,05 M (SOLADO).

ITEM:	*3.1*	UNIDAD:	*M2*
CANTIDAD TOTAL:	*9,17*	CANTIDAD ACUMULADA:	*9,17*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	*9,17*	CANTIDAD POR EJECUTAR:	*0.00*









CAPITULO 3.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
ITEM 3.2 ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.70*0.70*0.30 M.

ITEM:	*3.2*	UNIDAD:	*UND*
CANTIDAD TOTAL:	*8,00*	CANTIDAD ACUMULADA:	*8,00*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	*8,00*	CANTIDAD POR EJECUTAR:	*0.00*



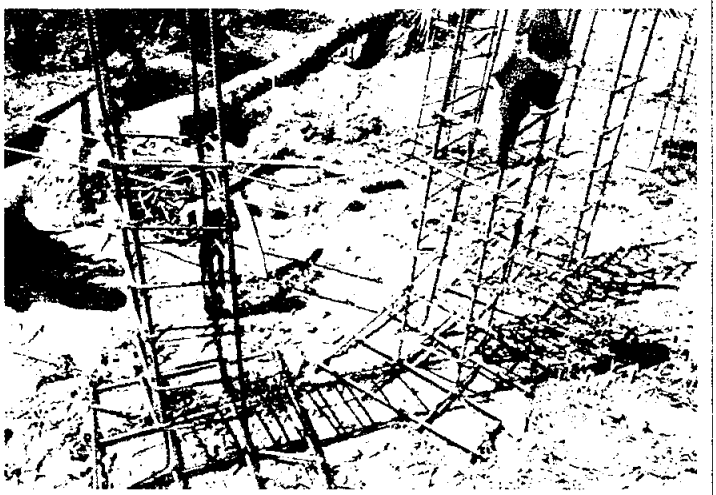

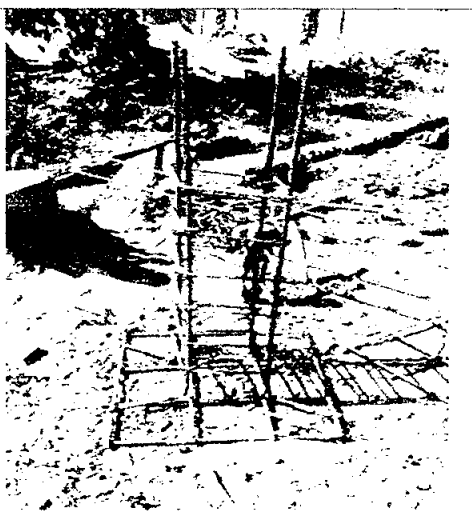

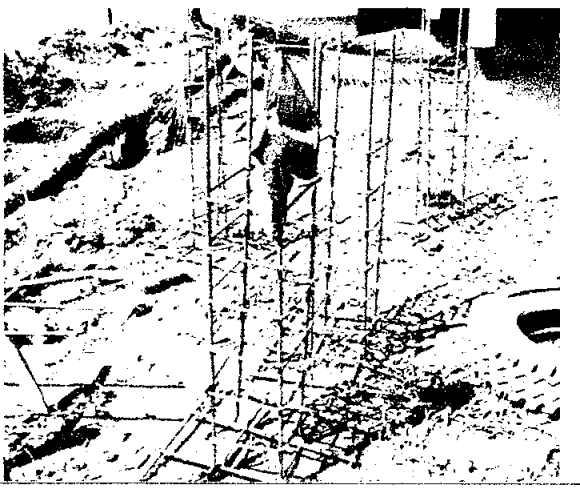

CAPITULO 3.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
ITEM 3.3 PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.30*0.30 M.

ITEM:	*3.3*	UNIDAD:	*ML*
CANTIDAD TOTAL:	*9,60*	CANTIDAD ACUMULADA:	*9,60*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	*9,60*	CANTIDAD POR EJECUTAR:	*0.00*

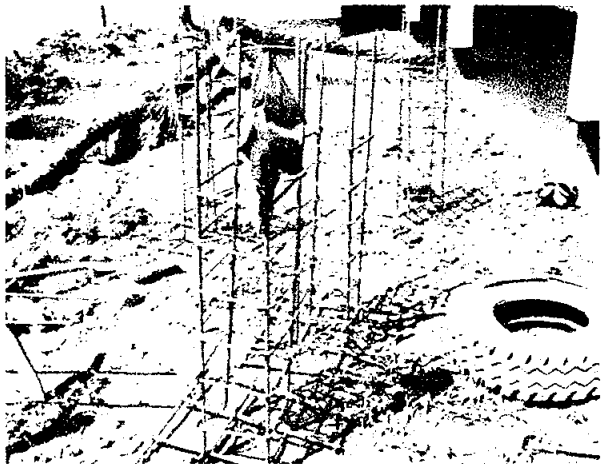



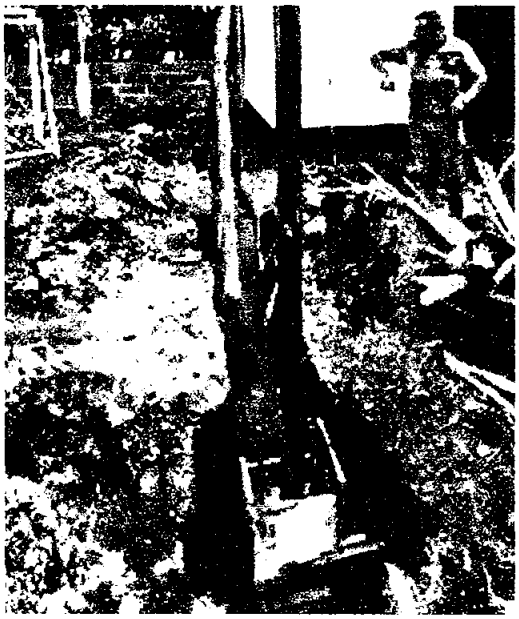



G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

CAPITULO 3.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
ITEM 3.4 VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI 0.30*0.30 M.

ITEM:	*3.4*	UNIDAD:	*ML*
CANTIDAD TOTAL:	*17,50*	CANTIDAD ACUMULADA:	*17,50*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	*17,50*	CANTIDAD POR EJECUTAR:	*0.00*









CALLE 18 No. 25 – 85 Barrio La Esperanza Cel 314-3222324
gycsas12@hotmail.com

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

CAPITULO 3.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
ITEM 3.5 ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI

ITEM:	3.5	UNIDAD:	KG
CANTIDAD TOTAL:	376,20	CANTIDAD ACUMULADA:	376,20
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	376,20	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00









CAPITULO 4.0 ESTRUCTURA METALICA
ITEM 4.1 MALLA DE NYLON

CALLE 18 No. 25 – 85 Barrio La Esperanza Cel 314-3222324
gycsas12@hotmail.com

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

ITEM:	4.1		UNIDAD:	M2
CANTIDAD TOTAL:		87,50	CANTIDAD ACUMULADA:	87,50
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:		87,50	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00



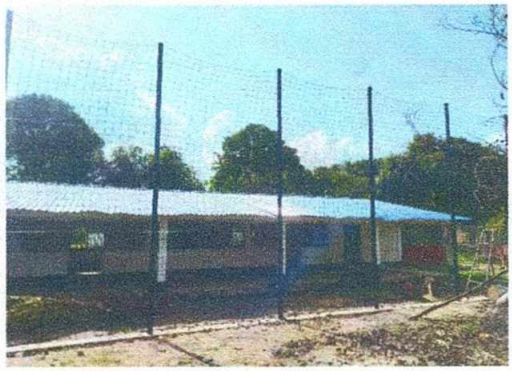

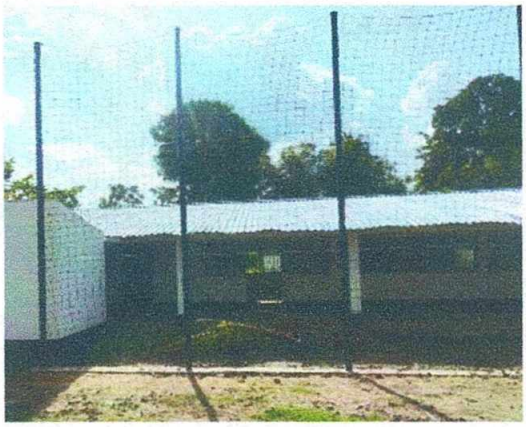



CAPITULO 4.0 ESTRUCTURA METALICA
ITEM 4.2 TUBERIA AGUANEGRA TIPO HN 3 MM* 6M. INCLUYE INSTALACION

ITEM:	4.2		UNIDAD:	ML
CANTIDAD TOTAL:		65,50	CANTIDAD ACUMULADA:	65,50
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:		65,50	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6









CAPITULO 4.0 ESTRUCTURA METALICA
ITEM 4.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUAYA ACERADA 1/4 PULG INC. ACCESORIOS TENSORES

ITEM:	*4.3*		UNIDAD:	*ML*
CANTIDAD TOTAL:		*35,00*	CANTIDAD ACUMULADA:	*35,00*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:		*35,00*	CANTIDAD POR EJECUTAR:	*0.00*

CALLE 18 No. 25 – 85 Barrio La Esperanza Cel 314-3222324
gycsas12@hotmail.com

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6









CAPITULO 4.0 ESTRUCTURA METALICA
ITEM 4.4 ASIENTO EN LAMINA METALICA ANTIDESLIZANTE LARGO=1,00 M X ANCHO=0,3 M ALTO=0,42M

ITEM:	*4.4*		UNIDAD:	*UND*
CANTIDAD TOTAL:		*5,00*	CANTIDAD ACUMULADA:	*5,00*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:		*5,00*	CANTIDAD POR EJECUTAR:	*0.00*

CALLE 18 No. 25 – 85 Barrio La Esperanza Cel 314-3222324
gycsas12@hotmail.com

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6







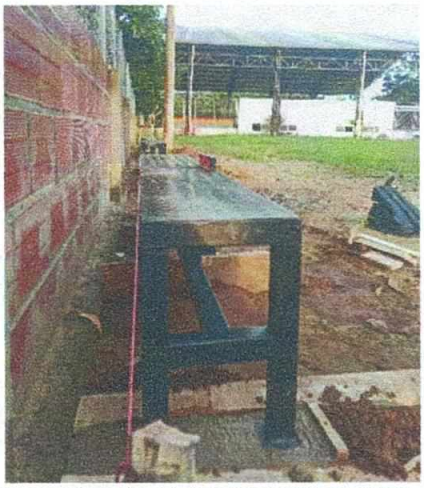

CAPITULO 4.0 ESTRUCTURA METALICA
ITEM 4.5 MANTENIMIENTO Y REPARACION PORTERIA DE FUTBOL 7-INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA

ITEM:	*4.5*		UNIDAD:	*UND*
CANTIDAD TOTAL:		*2,00*	CANTIDAD ACUMULADA:	*2,00*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:		*2,00*	CANTIDAD POR EJECUTAR:	*0.00*

CALLE 18 No. 25 – 85 Barrio La Esperanza Cel 314-3222324
gycsas12@hotmail.com

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

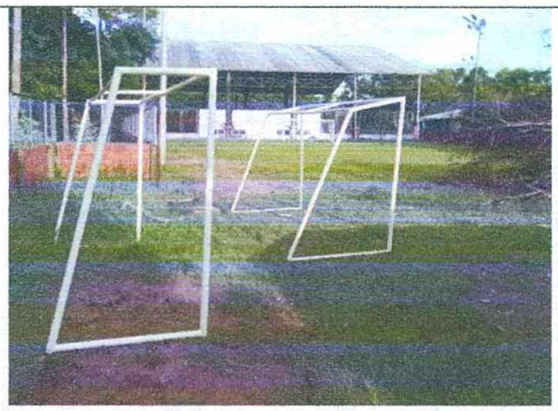	
	

FIRMAS.

G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS R/L CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO Contratista	
JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ ING RESIDENTE DE OBRA	

CALLE 18 No. 25 – 85 Barrio La Esperanza Cel 314-3222324
gycsas12@hotmail.com

30. ENSAYOS DE LABORATORIO.

COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO

NIT. 13502885-3

PROYECTO:	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON,DEPARTAMENTO DE ARAUCA".
CONTRATISTA	G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S R/L CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO
LOCALIZACIÓN:	CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
NORMA ASOCIADA:	NTC 2871 - ASTM C 293
FECHA RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2026-08-15
EQUIPO UTILIZADO:	PRENSA HIDRAULICA

PROBETA No.	DESCRIPCION	ALTURA cm.	DIÁMETRO cm.	AREA cm^2	PESO PROBETA(g)	PESO UNITARIO CONCRETO	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DIAS DE FALLADO	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Mpa	TIPO FALLA
1	CONCRETO 3,000 PSI-ELEMENTO ESTRUCTURAL PEDESTAL 0,30*0,30 M , ASENTAMIENTO: 3,0"	30,48	15,24	182,41	12966	2,332	2026-08-08	2026-08-15	7	2214	15,5	A
2		30,48	15,24	182,41	13033	2,344	2026-08-08	2026-08-15	7	2140	14,8	A
3		30,48	15,24	182,41	0	0,000	2026-08-08	2026-09-05	28	0	0,0	
4		30,48	15,24	182,41	0	0,000	2026-08-08	2026-09-05	28	0	0,0	

NOTA:



GERARDO OLIVOS GARCIA
Laboratorista

ING. LABORATORIO
VICTOR E. DELGADO
M.P 08202-71546 ATL

COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO

NIT. 13502885-3

PROYECTO:	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANOHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON,DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
CONTRATISTA	G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S R/L CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO
LOCALIZACIÓN:	CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
NORMA ASOCIADA:	NTC 2871 - ASTM C 293
FECHA RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2026-08-15
EQUIPO UTILIZADO:	PRENSA HIDRAULICA

PROBETA No.	DESCRIPCION	ALTURA cm.	DIÁMETRO cm.	AREA cm^2	PESO PROBETA(g)	PESO UNITARIO CONCRETO	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DIAS DE FALLADO	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Mpa	TIPO FALLA
1	CONCRETO 3,000 PSI-ELEMENTO ESTRUCTURAL VIGA DE CIMENTACION 0,30*0,30 M , ASENTAMIENTO: 3,5"	30,48	15,24	182,41	13169	2,369	2026-08-08	2026-08-15	7	2276	15,7	D
2		30,48	15,24	182,41	13078	2,352	2026-08-08	2026-08-15	7	2159	14,9	D
3		30,48	15,24	182,41	0	0,000	2026-08-08	2026-09-05	28	0	0,0	
4		30,48	15,24	182,41	0	0,000	2026-08-08	2026-09-05	28	0	0,0	

NOTA:



CONO | CONO Y HENDEDURA | CONO Y CORTE | CORTE | COLUMNAR

GERARDO OLIVOS GARCIA
Laboratorista

ING. LABORATORIO
VICTOR E. DELGADO
M P 08202-71546 ATL

COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO

NIT. 13502885-3

PROYECTO:	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON,DEPARTAMENTO DE ARAUCA".
CONTRATISTA	G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S R/L CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO
LOCALIZACIÓN:	CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
NORMA ASOCIADA:	NTC 2871 - ASTM C 293
FECHA RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2026-08-12
EQUIPO UTILIZADO:	PRENSA HIDRAULICA

PROBETA No.	DESCRIPCION	ALTURA cm.	DIÁMETRO cm.	AREA cm^2	PESO PROBETA(g)	PESO UNITARIO CONCRETO	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DIAS DE FALLADO	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Mpa	TIPO FALLA
1	CONCRETO 3,000 PSI-ELEMENTO ESTRUCTURAL ZAPATAS 0,70*0,70*0,30 M , ASENTAMIENTO: 3,0"	30,48	15,24	182,41	13152	2,365	2026-08-05	2026-08-12	7	2222	15,3	A
2		30,48	15,24	182,41	13033	2,344	2026-08-05	2026-08-12	7	2155	14,9	B
3		30,48	15,24	182,41	0	0,000	2026-08-05	2026-09-02	28	0	0,0	
4		30,48	15,24	182,41	0	0,000	2026-08-05	2026-09-02	28	0	0,0	

NOTA:



GERARDO OLIVOS GARCIA
Laboratorista

ING. LABORATORIO
VICTOR E. DELGADO
M.P 08202-71546 ATL

COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO

NIT. 13502885-3

PROYECTO:	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON.DEPARTAMENTO DE ARAUCA".
CONTRATISTA	G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S R/L CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO
LOCALIZACIÓN:	CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
NORMA ASOCIADA:	NTC 2871 - ASTM C 293 — FECHA RECEPCIÓN DE MUESTRAS: 2026-08-12
EQUIPO UTILIZADO:	PRENSA HIDRAULICA.

PROBETA No.	DESCRIPCION	ALTURA cm.	DIÁMETRO cm.	AREA cm^2	PESO PROBETA(g)	PESO UNITARIO CONCRETO	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DIAS DE FALLADO	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Mpa	TIPO FALLA
1	CONCRETO 3,000 PSI-ELEMENTO ESTRUCTURAL ZAPATAS 0,70*0,70*0,30 M , ASENTAMIENTO: 3,0"	30,48	15,24	182,41	13152	2,365	2026-08-05	2026-08-12	7	2222	15,3	A
2		30,48	15,24	182,41	13033	2,344	2026-08-05	2026-08-12	7	2155	14,9	B
3		30,48	15,24	182,41	13088	2,354	2026-08-05	2026-09-02	28	3196	22,0	D
4		30,48	15,24	182,41	13120	2,360	2026-08-05	2026-09-02	28	3089	21,3	E

NOTA:



GERARDO OLIVOS GARCIA
Laboratorista

ING. LABORATORIO
VICTOR E. DELGADO
M P 08202-71548 ATL

CamScanner

COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO

NIT. 13502885-3

PROYECTO:	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON,DEPARTAMENTO DE ARAUCA".		
CONTRATISTA	G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S R/L CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO		
LOCALIZACIÓN:	CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO		
NORMA ASOCIADA:	NTC 2871 - ASTM C 293	FECHA RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2026-08-15
EQUIPO UTILIZADO:	PRENSA HIDRAULICA.		

PROBETA No.	DESCRIPCION	ALTURA cm	DIÁMETRO cm	AREA cm^2	PESO PROBETA(g)	PESO UNITARIO CONCRETO	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DIAS DE FALLADO	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Mpa	TIPO FALLA
1	CONCRETO 3,000 PSI-ELEMENTO ESTRUCTURAL VIGA DE CIMENTACION 0,30*0,30 M , ASENTAMIENTO: 3,5"	30,48	15,24	182,41	13169	2,359	2026-08-08	2026-08-15	7	2276	15,7	D
2		30,48	15,24	182,41	13078	2,352	2026-08-08	2026-08-15	7	2159	14,9	D
3		30,48	15,24	182,41	12965	2,332	2026-08-08	2026-09-05	28	3190	22,0	B
4		30,48	15,24	182,41	13044	2,346	2026-08-08	2026-09-05	28	3254	22,4	A

NOTA:



GERARDO OLIVOS GARCIA
Laboratorista

ING. LABORATORIO
VICTOR E. DELGADO
M.P 08202-71548 ATL

CamScanner

COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO

NIT. 13502885-3

PROYECTO:	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON,DEPARTAMENTO DE ARAUCA".		
CONTRATISTA	G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS S A S R/L CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO		
LOCALIZACIÓN:	CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO		
NORMA ASOCIADA:	NTC 2871 - ASTM C 293	FECHA RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2026-08-15
EQUIPO UTILIZADO:	PRENSA HIDRAULICA.		

PROBETA No.	DESCRIPCION	ALTURA cm.	DIÁMETRO cm.	AREA cm^2	PESO PROBETA(g)	PESO UNITARIO CONCRETO	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DIAS DE FALLADO	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Mpa	TIPO FALLA
1	CONCRETO 3,000 PSI- ELEMENTO ESTRUCTURAL PEDESTAL 0,30*0,30 M , ASENTAMIENTO: 3,0"	30,48	15,24	182,41	12966	2,332	2026-08-08	2026-08-15	7	2244	15,5	A
2		30,48	15,24	182,41	13033	2,344	2026-08-08	2026-08-15	7	2140	14,8	A
3		30,48	15,24	182,41	13185	2,371	2026-08-08	2026-09-05	28	3269	22,5	D
4		30,48	15,24	182,41	13205	2,375	2026-08-08	2026-09-05	28	3262	22,5	E

NOTA:



GERARDO OLIVOS GARCIA
Laboratorista

ING. LABORATORIO
VICTOR E. DELGADO
M P 08202-71546 ATL

CamScanner

31. PROGRAMACIÓN DE OBRA INICIAL Y ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA POR REPROGRAMACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA		JULIO	AGOSTO			
		S1 (28-31)	S2 (1-8)	S3 (9-15)	S4 (16-22)	S5 (23-28)
1	PRELIMINARES					
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	■				
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA					
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMÚN ENTRE 0 - 2 M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE RETIRO)	■	■			
2,2	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN COMPACTADO					■
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO					
3,1	CONCRETO DE LIMPIEZA E = 0,05 M (SOLADO)		■			
3,2	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.70*0.70*0.30 M		■			
3,3	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.30*0.30 M		■			
3,4	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI 0.30*0.30 M			■	■	
3,5	ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI		■	■		
4	ESTRUCTURA METALICA					
4,1	MALLA DE NYLON					■
4,2	TUBERIA AGUANEGRA TIPO HN 3 MM* 6M. INCLUYE INSTALACION			■		
4,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUAYA ACERADA 1/4 PULG INC. ACCESORIOS TENSORES			■		
4,4	ASIENTO EN LAMINA METALICA ANTIDESLIZANTE LARGO=1,00 M X ANCHO=0,3 M ALTO=0,42M				■	
4,5	MANTENIMIENTO Y REPARACION PORTERIA DE FUTBOL 7-INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA		■			

JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA		JULIO		AGOSTO	
		S1 (28-31)	S2 (1-8)	S3 (9-15)	S4 (16-18)
1	PRELIMINARES				
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO				
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA				
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMÚN ENTRE 0 - 2 M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE RETIRO)				
2,2	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN COMPACTADO				
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
3,1	CONCRETO DE LIMPIEZA E = 0,05 M (SOLADO)				
3,2	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.70*0.70*0.30 M				
3,3	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.30*0.30 M				
3,4	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI 0.30*0.30 M				
3,5	ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI				
4	ESTRUCTURA METALICA				
4,1	MALLA DE NYLON				
4,2	TUBERIA AGUANEGRA TIPO HN 3 MM* 6M. INCLUYE INSTALACION				
4,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUAYA ACERADA 1/4 PULG INC. ACCESORIOS TENSORES				
4,4	ASIENTO EN LAMINA METALICA ANTIDESLIZANTE LARGO=1,00 M X ANCHO=0,3 M ALTO=0,42M				
4,5	MANTENIMIENTO Y REPARACION PORTERIA DE FUTBOL 7-INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA				

JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

32. COPIA DE PLANILLAS DE NÓMINA FIRMADAS POR EL PERSONAL.

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S

NIT. 900.511.676-6

PERSONAL DE NOMINA JULIO

ITEM	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	FECHA INGRESO	DIAS LABORADOS	SALARIO BASICO MENSUAL	HORAS EXTRAS	VALOR HR EXTRA	HORAS EXTRAS NOCTURNAS	VALOR HR EXTRAS NOCTURNAS	HORAS EXTRAS DOMINICAL O FESTIVO	VALOR EXTRAS DOMINICAL O FESTIVO	HORAS EXTRAS DOMINICAL O FESTIVA NOCTURNA	VALOR HR EXTRA DOMINICAL O FESTIVO NOCTURAS	SUBTOTAL HR EXTRAS	BONIFICACION	TOTAL SUELDO PERIODO	FIRMA
1	JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ	ING. RESIDENTE	28/07/2026	3	$ 1.750.905,00	0,0	$ 9.313		$ 13.039	0,0	$ 13.039	0,0	$ 15.646	$ -		$ 175.091,00	
2	LUIS FERNANDO MEDINA NUÑEZ	OFICIAL DE OBRA	28/07/2026	3	$ 1.750.905,00	0,0	$ 9.313		$ 13.039	0,0	$ 13.039	0,0	$ 15.646	$ -		$ 175.091,00	
3	CESAR FABIAN SARMIENTO PEÑA	AYUDANTE DE OBRA	30/07/2026	1	$ 1.750.905,00	0,0	$ 9.313		$ 13.039	0,0	$ 13.039	0,0	$ 15.646	$ -		$ 58.364,00	
4	CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO	REPRESENTANTE LEGAL	30/07/2026	3	$ 1.750.905,00	0,0	$ 9.313		$ 13.039	0,0	$ 13.039	0,0	$ 15.646	$ -		$ 175.091,00	
	OBSERVACIOENS															$ -	
									TOTAL							$ 583.637,00	

G&CCONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S R/L CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO

Cotratista

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S

NIT. 900.511.676-6

PERSONAL DE NOMINA AGOSTO

ITEM	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	FECHA INGRESO	DIAS LABORADOS	SALARIO BASICO MENSUAL	HORAS EXTRAS	VALOR HR EXTRA	HORAS EXTRAS NOCTURNAS	VALOR HR EXTRAS NOCTURNAS	HORAS EXTRAS DOMINICAL O FESTIVO	VALOR EXTRAS DOMINICAL O FESTIVO	HORAS EXTRAS DOMINICAL O FESTIVA NOCTURNA	VALOR HR EXTRA DOMINICAL O FESTIVO NOCTURNAS	SUBTOTAL HR EXTRAS	BONIFICACION	TOTAL SUELDO PERIODO	FIRMA
1	JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ	ING. RESIDENTE	1/08/2026	18	$ 1.750.905,00	0,0	$ 9.313		$ 13.039	0,0	$ 13.039	0,0	$ 15.646	$ -		$ 1.050.543,00	
2	LUIS FERNANDO MEDINA NUÑEZ	OFICIAL DE OBRA	1/08/2026	18	$ 1.750.905,00	0,0	$ 9.313		$ 13.039	0,0	$ 13.039	0,0	$ 15.646	$ -		$ 1.050.543,00	
3	CESAR FABIAN SARMIENTO PEÑA	AYUDANTE DE OBRA	1/08/2026	18	$ 1.750.905,00	0,0	$ 9.313		$ 13.039	0,0	$ 13.039	0,0	$ 15.646	$ -		$ 1.050.543,00	
4	CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO	REPRESENTANTE LEGAL	1/08/2026	18	$ 1.750.905,00	0,0	$ 9.313		$ 13.039	0,0	$ 13.039	0,0	$ 15.646	$ -		$ 1.050.543,00	
	OBSERVACIOENS :															$ -	
							TOTAL									$ 4.202.172,00	

G&CCONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS R/L CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO

Cotratista

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

33. COPIA DE PLANILLAS DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			
CIUDAD MUNICIPIO:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE [illegible] ARAUCA	TELÉFONO:	
TIPO APORTANTE:	EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL O DEPENDENCIA:	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	603367547	TIPO DE PLANILLA:			
PERIODO CAUSACIÓN MES:	MES	AÑO	AÑO	PERIODO APORTE PENSIONES:	MES AÑO
DÍAS DE MORA:	7				
FECHA PAGO:	2025/06/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230301	[illegible]	1	$ 317.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 317.700	$ 1.700	$ 0	$ 319.400
SUBTOTALES:										**$ 317.700**	**$ 1.700**		**$ 319.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EGC/ ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AFP/ES	COTIZACIÓN	VALOR AFP/ES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS040	EPS SANITAS S.A.			$ 0		$ 0		$ 0	$ 7.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.700	$ 0	$ 0	$ 7.700
EPS047	EPS SURA COLOMBIA	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 7.100	$ 0	$ 100	$ 0	$ 7.100	$ 100	$ 0	$ 7.200
EPS917	EPS MUTUAL SER	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 7.100	$ 0	$ 100	$ 0	$ 7.100	$ 100	$ 0	$ 7.200
SUBTOTALES:													**$ 86.700**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 87.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-01	ARL SURA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0		$ 0	$ 37.700	$ 0	$ 37.700	$ 200	$ 0	$ 37.900
SUBTOTALES:									**$ 37.700**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 37.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
14707	COMFIAR ARAUCA	1	$ 86.700	$ 500	$ 87.200	
SUBTOTALES:			**$ 86.700**	**$ 500**	**$ 87.200**	

| N | DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900511676
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		GC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS GC SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 16 NO 28 - 24 ARAUCA	TELÉFONO:	8851545
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	81736 - RONDON19
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6033675747**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: julio AÑO: 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: agosto AÑO: 2026		
DÍAS DE MORA:	7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	603506970		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	$ 319.400
		SUBTOTAL:	3	**$ 319.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 7.200
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2	$ 72.900
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 7.200
		SUBTOTAL:	4	**$ 87.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002194884	CCF67	CCF67-COMFIAR	4	$ 87.200
		SUBTOTAL:	4	**$ 87.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	4	$ 37.900
		SUBTOTAL:	4	**$ 37.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 528.800**
VALOR MORA:	**$ 3.000**
TOTAL PAGADO:	**$ 531.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900541979
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		GD CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS	GD SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 16 NO 23 - 24 ARAUCA	TELEFONO:	8851545
TIPO APORTANTE:	EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	EMPLEADOR BENEFICIARIO DE LA LEY 1429
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	4290
FORMA DE EXENTACIÓN:	SECURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	81236 - RONDON19
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (LEY 1607 DE 2012 Y ART. 114-1 ET):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	60336761 31	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES agosto AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2026
DIAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/20	NUMERO AUTORIZACIÓN:	535549208

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 616.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 616.400	$ 0	$ 616.400
SUBTOTALES:										$ 616.400	$ 0	$ 616.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 42.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.100	$ 0	$ 0	$ 42.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 42.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.100	$ 0	$ 0	$ 42.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 112.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.200	$ 0	$ 0	$ 112.200
SUBTOTALES:													$ 196.400	$ 0	$ 0	$ 196.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-LIBERTY SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 228.800	$ 228.800	$ 228.800	$ 0	$ 0	$ 228.800
SUBTOTALES:										$ 228.800	$ 0	$ 0	$ 228.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF07	CCF07-COMFIAR	2	$ 196.400	$ 0	$ 196.400
SUBTOTALES:			$ 196.400	$ 0	$ 196.400

N°	DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES				
	TIPO IDENTIFICACIÓN	NUMERO IDENTIFICACIÓN	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	SLP	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD							ARP					CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																											ADMIN	ING/RET	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS APLAZADA	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	ING/RET	IBC	COTIZACIÓN	VALOR APRES	TOTAL APORTE	ADMIN	ING/RET	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ING/RET	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1065622460	ANGIE LORENA CUEVA ARIAS	1-DEPENDIENTE	0-NINGUNO	$ 1.750.400	X																				230301-PORVENIR		$ 1.050.540	$ 616.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	No Indi	$ 616.400	EPS005-SANITAS S.A.		$ 1.050.540	$ 42.100	$ 0	$ 42.100	14-23-LIBERTY SEGUROS S.A.		$ 1.050.540		$ 73.200		$ 1.050.540	CCF07-COMFIAR	$ 42.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1067702486	JUANITA [illegible]	1-DEPENDIENTE	0-NINGUNO	$ 1.750.400	X																				230301-PORVENIR		$ 1.050.540	$ 616.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	No Indi	$ 616.400	EPS037-NUEVA EPS		$ 1.050.540	$ 42.100	$ 0	$ 42.100	14-23-LIBERTY SEGUROS S.A.		$ 1.050.540		$ 73.200		$ 1.050.540	CCF07-COMFIAR	$ 42.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 7614569	[illegible]	1-DEPENDIENTE	0-NINGUNO	$ 1.750.400	X																						$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS017-FAMISANAR		$ 1.050.540	$ 42.100	$ 0	$ 42.100	14-23-LIBERTY SEGUROS S.A.		$ 1.050.540		$ 73.200		$ 1.050.540	CCF07-COMFIAR	$ 42.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1082943191	[illegible]	1-DEPENDIENTE	0-NINGUNO	$ 1.750.400	X																				230301-PORVENIR		$ 1.750.935	$ 616.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	No Indi	$ 616.400	EPS005-SANITAS S.A.		$ 1.750.935	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-LIBERTY SEGUROS S.A.		$ 1.750.935		$ 91.533		$ 1.750.935	CCF07-COMFIAR	$ 73.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.238.000

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900511676
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		GC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS GC SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:		ARAUCA DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 16 NO 28 - 24 ARAUCA	TELÉFONO:	8851545
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	81736 - RONDON19
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6033676131**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/08/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		603549328

LIQUIDACIÓN GENERAL

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	$ 616.400
		SUBTOTAL:	3	**$ 616.400**
SALUD				
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 42.100
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2	$ 112.200
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 42.100
		SUBTOTAL:	4	**$ 196.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
8002194884	CCF67	CCF67-COMFIAR	4	$ 196.400
		SUBTOTAL:	4	**$ 196.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	4	$ 228.800
		SUBTOTAL:	4	**$ 228.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.238.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.238.000**

37. RELACIÓN MENSUAL DEL PERSONAL QUE LABORÓ EN LA OBRA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, INDICANDO FECHA DE INGRESO Y FECHA DE RETIRO.

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

RELACIÓN PERSONAL

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	INGRESO	RETIRO
1	JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ	79145493	ING. RESIDENTE	28-07-2026	18-08-2026
2	LUIS FERNANDO MEDINA NUÑEZ	1099202483	OFICIAL DE OBRA	28-07-2026	18-08-2026
3	CESAR FABIAN SARMIENTO PEÑA	1006629466	AYUDANTE DE OBRA	30/07/2026	18/08/2026
3	CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO	88254335	REPRESENTANTE LEGAL	28-07-2026	18/08/2026

G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS
R/L CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO
Contratista

38. PAZ Y SALVO DEL PERSONAL QUE LABORÓ EN LA OBRA.

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

CONTRATO DE OBRA N° 105-2026

"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

PAZ Y SALVO

YO, **CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO** identificado con cedula de ciudadanía número 88.254.335 de Cúcuta, en calidad de REPRESENTANTE LEGAL, me permito certificar que la empresa **G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS** identificado con NIT 900.511.676-6, se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con nomina, seguridad social, prestaciones sociales y demás pagos por los servicios prestados durante la ejecución del contrato N° 105 de 2026 cuyo objeto es "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA" con el suscrito; este PAZ Y SALVO es válido por el periodo del 28/07/2026 al 18/08/2026.

Para constancia se firma en Puerto Rondón a los 27 días del mes de agosto de 2026

CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO
R/L G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS
Contratista

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

CONTRATO DE OBRA N° 105-2026

"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

PAZ Y SALVO

YO, JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadania número 79135493, en calidad de residente de obra, me permito certificar que la empresa G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS identificado con NIT 900.511.676-6, se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con nomina, seguridad social, prestaciones sociales y demás pagos por los servicios prestados durante la ejecución del contrato N° 105 de 2026 cuyo objeto es "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA" con el suscrito; este PAZ Y SALVO es válido por el periodo del 28/07/2026 al 18/08/2026.

Para constancia se firma en Puerto Rondón a los 27 días del mes de agosto de 2026

JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

CONTRATO DE OBRA N° 105-2026

"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

PAZ Y SALVO

YO, Luis Fernando Medina Nuñez identificado con cedula de ciudadanía número 1099202483, en calidad de oficial de obra, me permito certificar que la empresa G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS identificado con NIT 900.511.676-6, se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con nomina, seguridad social, prestaciones sociales y demás pagos por los servicios prestados durante la ejecución del contrato N° 105 de 2026 cuyo objeto es "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA" con el suscrito; este PAZ Y SALVO es válido por el periodo del 28/07/2026 al 18/08/2026.

Para constancia se firma en Puerto Rondón a los 27 días del mes de agosto de 2026

Luis Medina
LUIS FERNANDO MEDINA NUÑEZ
OFICIAL DE OBRA

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

CONTRATO DE OBRA N° 105-2026

"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

PAZ Y SALVO

YO, cesar fabian sarmiento peña identificado con cedula de ciudadanía número 1006629466, en calidad de oficial de obra, me permito certificar que la empresa G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS identificado con NIT 900.511.676-6, se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con nomina, seguridad social, prestaciones sociales y demás pagos por los servicios prestados durante la ejecución del contrato N° 105 de 2026 cuyo objeto es "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA" con el suscrito; este PAZ Y SALVO es válido por el periodo del 30/07/2026 al 18/08/2026.

Para constancia se firma en Puerto Rondón a los 27 días del mes de agosto de 2026

CESAR FABIAN SARMIENTO PEÑA
AYUDANTE DE OBRA

40. CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS.

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN
AGUAS RONDÓN S.A.S E.S.P

CERTIFICA QUE:

La persona jurídica **G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S** identificada con **NIT 900.511.676-6** con contrato de obra **No. 105 de 2026 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"** no tiene cuentas pendientes como suscriptor de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo por tal motivo se encuentra a **PAZ Y SALVO** con esta entidad.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 19 días del mes de agosto de 2026.

JERLYS HERNANDO FLÓREZ MARTÍNEZ
Gerente y/o Representante Legal
"AGUAS RONDÓN S.A.S ESP"

41. INFORME DEL CONTRATISTA DE CUMPLIMIENTO EN LA APLICACIÓN DEL SG-SST.

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

INFORME DE INSPECCIÓN Y CAPACITACION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 105-2026

G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS
R/L CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO
Contratista

CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
Supervisor

PUERTO RONDON, AGOSTO DE 2026

Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN..... 3
1.1 OBJETIVO GENERAL..... 4
1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS..... 4
2. MARCO LEGAL..... 4
3. ALCANCE..... 4
4. MARCO CONCEPTUAL..... 5
5. METODOLOGIA..... 5

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad documentar las acciones implementadas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 105 de 2026, cuyo objeto corresponde a la "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", La Seguridad y Salud en el Trabajo constituye un componente fundamental dentro de la ejecución de proyectos de infraestructura, debido a que permite identificar, prevenir y controlar los peligros y riesgos asociados a las diferentes actividades desarrolladas en obra, contribuyendo a la protección de la integridad física de los trabajadores y al establecimiento de condiciones adecuadas para el desarrollo de las labores.

Teniendo en cuenta las características y alcance de las actividades ejecutadas en el presente contrato, las acciones en materia de SST estuvieron orientadas principalmente a la verificación de las condiciones generales de seguridad, la identificación de peligros y riesgos, el suministro de elementos de protección personal y la implementación de medidas preventivas y de señalización en las áreas de trabajo, Durante la ejecución contractual se realizó el suministro de elementos de protección personal requeridos para el desarrollo de las actividades, entre ellos cascos de seguridad, guantes y gafas de protección, así como elementos para la señalización y delimitación de las zonas de trabajo, tales como cinta de peligro. Estas medidas estuvieron encaminadas a reducir la exposición del personal a los riesgos propios de las actividades constructivas y a mantener condiciones adecuadas de seguridad en las áreas intervenidas, De igual manera, se efectuó seguimiento a las condiciones de seguridad presentes durante el desarrollo de las actividades, verificando aspectos relacionados con el uso de los elementos de protección personal, la delimitación de las áreas de trabajo y las condiciones generales del entorno donde se ejecutaron las labores.

1.1. OBJETIVO GENERAL

Verificar y promover el cumplimiento de las condiciones básicas de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del proyecto, mediante el seguimiento de las condiciones de seguridad en las áreas intervenidas, la identificación de peligros y riesgos, el suministro y utilización de elementos de protección personal y la implementación de medidas preventivas y de señalización, con el propósito de prevenir accidentes y reducir la exposición a riesgos laborales.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar las condiciones generales de seguridad presentes en las áreas intervenidas durante la ejecución del proyecto.
- Identificar los principales peligros y factores de riesgo asociados a las actividades desarrolladas en la obra.
- Verificar la disponibilidad y utilización de los elementos de protección personal suministrados al personal vinculado al proyecto.
- Implementar medidas preventivas mediante la delimitación y señalización de las áreas de trabajo.
- Verificar el uso de elementos de protección personal tales como casco, guantes y gafas de seguridad.
- Realizar seguimiento a las condiciones generales de trabajo y a las medidas de prevención implementadas durante la ejecución de las actividades.
- Promover prácticas de autocuidado y prevención de riesgos durante el desarrollo de las labores constructivas.
- Formular recomendaciones orientadas al fortalecimiento de las condiciones de seguridad y prevención de riesgos laborales durante la ejecución contractual.

2. MARCO LEGAL

Las actividades desarrolladas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo para el presente proyecto se encuentran soportadas en la normatividad colombiana aplicable, entre la cual se destacan:

Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.

Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, en lo relacionado con las disposiciones aplicables al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Resolución 0312 de 2019, por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.

Resolución 2400 de 1979, por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo, en lo que resulte aplicable a las actividades desarrolladas.

Guía Técnica Colombiana GTC 45, como referente para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo.

NTC 4114, relacionada con la realización de inspecciones planeadas de seguridad.

3. ALCANCE

El presente informe comprende las actividades de inspección, seguimiento y prevención en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrolladas durante la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 105 de 2026, relacionadas con las condiciones generales de seguridad de las áreas intervenidas, la identificación de peligros y riesgos, el suministro de elementos de protección personal y la implementación de medidas de señalización y delimitación.

Las actividades objeto de seguimiento comprendieron:

- Inspección visual de las condiciones generales de seguridad en las áreas intervenidas.
- Identificación de peligros y riesgos asociados a las actividades constructivas.
- Verificación de las condiciones del entorno de trabajo.
- Suministro de elementos de protección personal al personal vinculado al proyecto.
- Verificación del uso de casco, guantes y gafas de seguridad.
- Suministro y utilización de cinta de peligro para la delimitación de las zonas de trabajo.
- Seguimiento a las condiciones generales de seguridad durante el desarrollo de las actividades.
- Implementación de medidas preventivas para disminuir la exposición a los riesgos identificados.

- Registro fotográfico de las medidas y elementos de seguridad implementados.
- Formulación de recomendaciones para el fortalecimiento de las condiciones de seguridad en obra.

4. MARCO CONCEPTUAL

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) comprende el conjunto de actividades encaminadas a la prevención de accidentes y enfermedades laborales mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos presentes en los diferentes ambientes de trabajo, en el desarrollo de proyectos de construcción se presentan diferentes peligros asociados a las actividades ejecutadas, al uso de herramientas y equipos, a las condiciones del terreno, al tránsito de personal y a las condiciones propias de las áreas de intervención. Por esta razón, resulta necesario establecer medidas de prevención y control orientadas a proteger la integridad de los trabajadores.

Las inspecciones de seguridad constituyen una herramienta preventiva que permite identificar condiciones inseguras, situaciones de riesgo y aspectos que puedan afectar la seguridad del personal durante el desarrollo de las actividades. A partir de estas verificaciones pueden establecerse medidas preventivas y correctivas encaminadas a mejorar las condiciones de trabajo, los Elementos de Protección Personal (EPP) constituyen una medida de control destinada a reducir la exposición de los trabajadores frente a determinados peligros cuando estos no pueden ser eliminados completamente mediante otras medidas de control.

Para el desarrollo del presente proyecto se suministraron elementos de protección personal, entre ellos cascos de seguridad, guantes y gafas de protección, de acuerdo con las necesidades de las actividades ejecutadas, Asimismo, la señalización y delimitación de las áreas de trabajo constituye una medida preventiva que permite advertir sobre la presencia de zonas de intervención y restringir el acceso a áreas donde puedan existir condiciones de riesgo. Para este propósito se utilizó cinta de peligro, contribuyendo a mantener delimitadas las zonas de trabajo.

5. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo se implementó una metodología basada en la observación directa, inspección visual y verificación de las condiciones de seguridad presentes en las áreas de intervención.

Las actividades desarrolladas comprendieron:

- Inspección visual de las áreas donde se ejecutaron las actividades constructivas.
- Verificación de las condiciones generales de seguridad del entorno de trabajo.
- Identificación de los principales peligros y riesgos asociados a las labores ejecutadas.
- Verificación de la implementación de medidas preventivas en las áreas intervenidas.
- Suministro de elementos de protección personal al personal vinculado a la ejecución de la obra.
- Verificación de la disponibilidad y utilización de cascos, guantes y gafas de seguridad.
- Implementación de cinta de peligro para la delimitación y señalización de las áreas de trabajo.
- Seguimiento a las condiciones generales de seguridad durante la ejecución de las actividades.
- Registro fotográfico de los elementos de protección personal y de las medidas de señalización implementadas.
- Formulación de recomendaciones preventivas orientadas a minimizar la ocurrencia de accidentes y fortalecer las condiciones de seguridad durante la ejecución del proyecto

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

REGISTRO FOTOGRAFICO



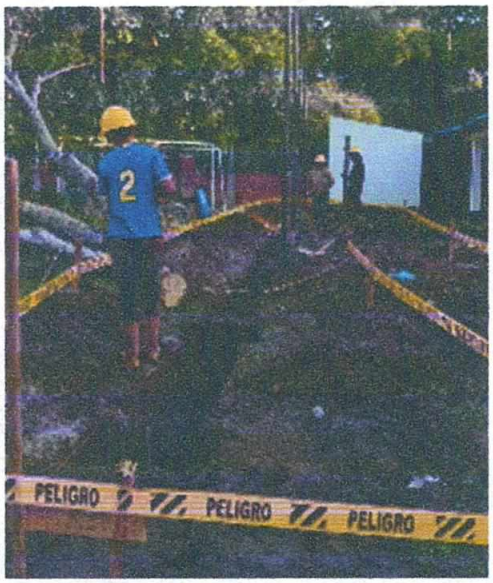



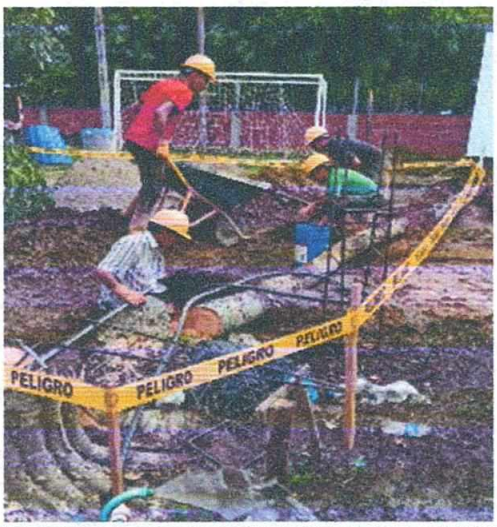

CALLE 18 No. 25 – 85 Barrio La Esperanza Cel 314-3222324
gycsas12@hotmail.com

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

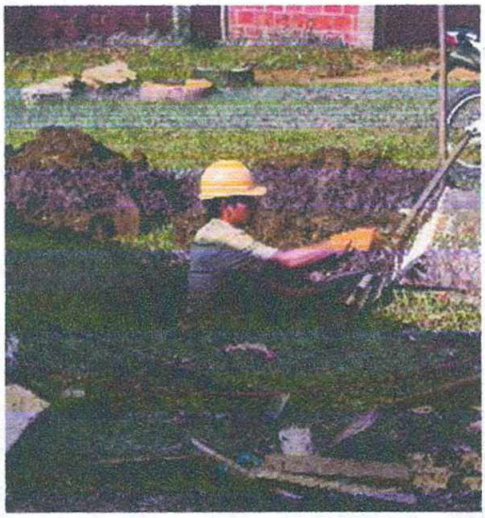

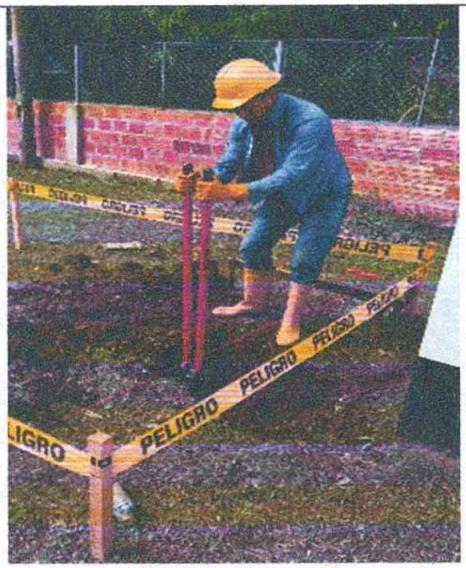





FIRMAS.

G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS R/L CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO Contratista	
JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ ING RESIDENTE DE OBRA	

CALLE 18 No. 25 – 85 Barrio La Esperanza Cel 314-3222324
gycsas12@hotmail.com

44. INFORME FINAL DEL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMA O PAGA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

INFORME SEGUIMIENTO DE LA MITIGACIÓN AMBIENTAL

"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

CONTRATISTA
G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS
R/L CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO

Arq. CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
Supervisor
2026

INTRODUCCIÓN

El presente Informe Consolidado de Cumplimiento Ambiental tiene como propósito documentar las medidas de manejo ambiental implementadas durante la ejecución del contrato de obra "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", verificando las acciones adoptadas para prevenir, controlar y minimizar los posibles impactos ambientales asociados al desarrollo de las actividades constructivas, el proyecto contempló actividades relacionadas con la construcción y mejoramiento de la infraestructura deportiva, incluyendo labores de adecuación del área, manejo y utilización de materiales de construcción, ejecución de actividades propias de obra civil, utilización de herramientas y equipos y generación de residuos derivados de las actividades desarrolladas.

Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto, las medidas de manejo ambiental estuvieron orientadas principalmente al adecuado manejo de materiales, residuos sólidos y residuos propios de las actividades constructivas, protección del suelo, prevención de afectaciones al recurso hídrico, control de material particulado y ruido, mantenimiento de condiciones de orden y aseo y limpieza de las áreas intervenidas, como medida específica para el manejo de residuos sólidos, se dispuso un punto ecológico para la separación en la fuente, conformado por recipientes diferenciados de acuerdo con el código de colores aplicable para la clasificación de residuos. Esta medida permitió disponer de un espacio organizado para la separación y almacenamiento temporal de los residuos generados durante las actividades de obra, las acciones implementadas buscaron que las actividades contractuales se desarrollaran de manera organizada y responsable, procurando minimizar las afectaciones ambientales temporales propias de la ejecución de una obra de infraestructura deportiva.

OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento y verificación de las medidas de manejo ambiental implementadas durante la ejecución del contrato de obra "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", con el propósito de prevenir, controlar y minimizar los posibles impactos ambientales generados por las actividades constructivas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental implementadas durante la ejecución del proyecto.
- Realizar seguimiento a las condiciones ambientales del área intervenida.
- Verificar el manejo adecuado de los materiales utilizados durante las actividades constructivas.
- Verificar la recolección y manejo de los residuos generados durante la ejecución del contrato.
- Promover la separación en la fuente mediante la utilización del punto ecológico dispuesto en el área de trabajo.
- Prevenir la contaminación del suelo como consecuencia de las actividades constructivas.
- Prevenir posibles afectaciones sobre el recurso hídrico.
- Minimizar los efectos asociados a la generación temporal de material particulado y ruido.
- Verificar las condiciones de orden y aseo del frente de obra.
- Formular recomendaciones orientadas al fortalecimiento de las buenas prácticas ambientales.

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Durante la ejecución del proyecto se implementaron acciones encaminadas a minimizar los posibles impactos ambientales asociados a las actividades de construcción y mejoramiento de la cancha de fútbol 7.

Las medidas de manejo estuvieron relacionadas principalmente con:

- Manejo integral de materiales de construcción.
- Manejo de residuos de construcción.
- Manejo de residuos sólidos convencionales.
- Separación en la fuente mediante punto ecológico.
- Protección del suelo.
- Manejo preventivo del recurso hídrico.

- Prevención de derrames de sustancias contaminantes.
- Control de material particulado y ruido.
- Mantenimiento del orden y aseo.
- Limpieza y recuperación de las áreas intervenidas.

A continuación, se presenta la relación general entre las actividades desarrolladas, los aspectos ambientales asociados, los posibles impactos y las medidas implementadas:

ACTIVIDAD DEL PROYECTO	ASPECTO AMBIENTAL	POSIBLE IMPACTO	MEDIDA DE MANEJO IMPLEMENTADA
Adecuación y preparación del área	Intervención del suelo	Alteración temporal de las condiciones del suelo	Limitar la intervención a las áreas requeridas para el proyecto y mantener condiciones adecuadas de orden y limpieza.
Manejo y almacenamiento de materiales	Acumulación y manipulación de materiales	Dispersión de materiales y afectación del entorno	Organización y almacenamiento adecuado de los materiales dentro del área de trabajo.
Actividades de construcción	Generación de residuos de construcción	Contaminación del suelo y afectación visual	Recolección, almacenamiento temporal y disposición adecuada de los residuos generados.
Actividades de obra	Generación de residuos sólidos	Contaminación y disposición inadecuada	Implementación de punto ecológico y separación en la fuente.
Utilización de herramientas y equipos	Generación de ruido	Molestias temporales a la comunidad y usuarios del sector	Desarrollo organizado de las actividades y control de las condiciones del frente de obra.
Manipulación de materiales	Generación de material particulado	Alteración temporal de la calidad del aire	Orden y limpieza del área de trabajo y manejo adecuado de materiales.
Utilización de agua	Consumo del recurso hídrico	Uso inadecuado o desperdicio del recurso	Uso racional del agua y prevención de desperdicios.
Manejo de combustibles, aceites o lubricantes	Posibles derrames	Contaminación del suelo y recurso hídrico	Manejo preventivo y controlado de sustancias potencialmente contaminantes.

Finalización de actividades	Residuos y materiales sobrantes	Afectación del área intervenida	Limpieza y organización de las áreas utilizadas.

PROGRAMA DE DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Cumplimiento de los requisitos ambientales

De acuerdo con la naturaleza y alcance de las actividades ejecutadas, se realizó seguimiento a los aspectos ambientales relacionados directamente con el desarrollo de la obra, las actividades se concentraron en el área destinada para la construcción y mejoramiento de la cancha de fútbol 7, procurando limitar las intervenciones a los sectores necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, durante la ejecución se aplicaron medidas preventivas relacionadas con el manejo de residuos, materiales, suelo, agua y condiciones de orden y aseo. No se evidenciaron situaciones que generaran afectaciones ambientales significativas diferentes a aquellas propias y temporales de las actividades constructivas desarrolladas.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

El programa de actividades constructivas estuvo orientado al manejo adecuado de los materiales y residuos generados durante la ejecución del proyecto.

ACTIVIDAD DE MANEJO	MEDIDA IMPLEMENTADA	CUMPLIMIENTO
Manejo integral de materiales	Organización y almacenamiento adecuado de los materiales dentro del área de trabajo.	Cumplido
Manejo de residuos de construcción	Recolección y almacenamiento temporal controlado de los residuos generados.	Cumplido
Manejo de residuos sólidos	Separación y disposición en el punto ecológico.	Cumplido
Orden y aseo	Limpieza periódica de las áreas de trabajo.	Cumplido
Manejo del suelo	Prevención de disposición directa de residuos y sustancias contaminantes.	Cumplido
Limpieza final	Retiro de residuos y organización de las áreas intervenidas.	Cumplido

Manejo integral de materiales de construcción

Los materiales utilizados durante la ejecución del proyecto fueron manejados y almacenados procurando mantener condiciones adecuadas de orden y organización, se procuró evitar la dispersión de materiales hacia las áreas aledañas y su acumulación en sectores que pudieran generar afectaciones al entorno o interferir con las actividades de obra, Asimismo, se procuró utilizar los materiales de acuerdo con las necesidades del proyecto, reduciendo pérdidas y desperdicios.

Manejo de residuos de construcción

Los residuos generados como consecuencia de las actividades constructivas fueron recolectados y manejados de manera controlada, se evitó la acumulación indiscriminada de residuos dentro del área de intervención y se realizaron actividades de limpieza y organización de los sectores de trabajo, los residuos fueron almacenados temporalmente de manera organizada para posteriormente realizar su disposición correspondiente, procurando evitar su abandono en áreas aledañas al proyecto.

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Durante la ejecución del proyecto se implementaron medidas para garantizar el adecuado manejo de los residuos sólidos generados por las actividades de construcción y por el personal vinculado a la obra, como medida principal se dispuso un punto ecológico para la separación en la fuente de residuos sólidos, conformado por recipientes diferenciados, la implementación de este punto permitió mejorar las condiciones de almacenamiento temporal de los residuos y evitar su disposición indiscriminada sobre el suelo.

Punto ecológico y separación en la fuente

El punto ecológico dispuesto en el área de trabajo contó con recipientes diferenciados de acuerdo con el código de colores establecido para la separación de residuos, los colores permitieron identificar de manera visual las diferentes categorías de residuos y facilitar su clasificación en el lugar donde fueron generados.

COLOR DEL RECIPIENTE	TIPO DE RESIDUO	MANEJO
Blanco	Residuos aprovechables	Separación y almacenamiento para facilitar su aprovechamiento o disposición correspondiente.

Verde	Residuos orgánicos aprovechables	Separación de residuos de carácter orgánico.
Negro	Residuos no aprovechables	Almacenamiento temporal para su posterior disposición.

La implementación del punto ecológico contribuyó a:

- Evitar la disposición indiscriminada de residuos.
- Mantener condiciones adecuadas de limpieza.
- Facilitar la separación en la fuente.
- Reducir la dispersión de residuos dentro del área de intervención.
- Mejorar las condiciones de organización del frente de obra.
- Promover buenas prácticas de manejo de residuos.

PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

Manejo de aguas superficiales

Durante la ejecución del proyecto se procuró evitar la disposición de materiales, residuos o sustancias contaminantes en zonas donde pudieran ser arrastrados hacia sistemas de drenaje o cuerpos de agua, se mantuvieron condiciones de limpieza en las áreas intervenidas, evitando la acumulación de residuos que pudieran obstruir sistemas de evacuación de aguas, no se evidenciaron afectaciones significativas sobre fuentes hídricas como consecuencia directa de las actividades ejecutadas.

Manejo de residuos líquidos

Se adoptaron medidas preventivas para evitar derrames de combustibles, aceites, lubricantes u otras sustancias potencialmente contaminantes, el manejo de este tipo de sustancias se realizó de manera controlada, procurando evitar su contacto directo con el suelo y prevenir posibles afectaciones al recurso hídrico.

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL SUELO

Las actividades fueron desarrolladas dentro del área definida para la ejecución del proyecto, procurando limitar la intervención a los sectores requeridos para la construcción y mejoramiento de la cancha, se implementaron medidas de orden y limpieza para evitar la acumulación de residuos sobre el suelo y prevenir posibles procesos de contaminación asociados a materiales o sustancias utilizadas durante las actividades.

ASPECTO	MEDIDA DE MANEJO	RESULTADO
Intervención del suelo	Limitar las actividades al área requerida para el proyecto.	Se evitó intervenir áreas innecesarias.
Residuos sólidos	Utilización del punto ecológico y recolección de residuos.	Se redujo la presencia de residuos dispersos.
Materiales	Almacenamiento organizado.	Se redujo la dispersión de materiales.
Sustancias potencialmente contaminantes	Manejo preventivo.	No se evidenciaron derrames significativos.
Limpieza	Recolección y retiro de residuos.	Se conservaron condiciones adecuadas de orden y aseo.

PROGRAMA DE CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO Y RUIDO

Las actividades propias de la construcción y mejoramiento de la cancha generaron de manera temporal material particulado y ruido asociados al uso de herramientas, equipos y labores constructivas, como medida preventiva se mantuvieron condiciones adecuadas de orden y limpieza en las áreas intervenidas, procurando minimizar la dispersión de materiales y polvo.

La generación de ruido estuvo relacionada con las actividades propias de la obra y se presentó de manera temporal durante el periodo de ejecución.

ASPECTO	POSIBLE IMPACTO	MEDIDA IMPLEMENTADA
Material particulado	Alteración temporal de la calidad del aire	Manejo organizado de materiales y mantenimiento de condiciones de limpieza.
Ruido	Molestias temporales a la comunidad	Desarrollo organizado de las actividades y utilización adecuada de herramientas y equipos.
Dispersión de materiales	Afectación de áreas aledañas	Almacenamiento y manejo organizado de materiales.

PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES

Las actividades desarrolladas no requirieron la construcción de campamentos permanentes que generaran impactos ambientales significativos, las áreas utilizadas temporalmente para almacenamiento de materiales y desarrollo de las actividades fueron manejadas procurando conservar condiciones adecuadas de orden y limpieza.

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL Y BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

Durante la ejecución del proyecto se promovieron buenas prácticas relacionadas con el manejo adecuado de los residuos, conservación del orden y aseo, protección del área intervenida y uso responsable de los recursos, la disposición del punto ecológico contribuyó a fortalecer las condiciones de manejo de residuos dentro del frente de obra y a mantener una mejor organización del área de trabajo.

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Durante la ejecución del contrato se realizó seguimiento a las condiciones ambientales del área de intervención, teniendo en cuenta las actividades desarrolladas y los posibles impactos asociados, la verificación se concentró principalmente en el manejo de materiales, residuos, suelo, recurso hídrico, orden y aseo, así como en la implementación del punto ecológico.

MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	VERIFICACIÓN
Manejo adecuado de materiales	Cumplido	Se mantuvieron los materiales organizados dentro del área de trabajo.
Manejo de residuos de construcción	Cumplido	Se realizó recolección y manejo de los residuos generados.
Punto ecológico	Cumplido	Se dispuso un punto ecológico con recipientes diferenciados.
Separación en la fuente	Cumplido	Se contó con recipientes para facilitar la clasificación de residuos.
Orden y aseo	Cumplido	Se realizaron actividades de limpieza y organización.
Protección del suelo	Cumplido	Se evitó la disposición indiscriminada de residuos y sustancias contaminantes.
Protección del recurso hídrico	Cumplido	No se evidenciaron afectaciones significativas asociadas a las actividades ejecutadas.
Manejo de residuos líquidos	Cumplido	Se implementaron medidas preventivas para evitar derrames.
Manejo de material particulado	Cumplido	Se mantuvieron condiciones de orden y limpieza.
Manejo de ruido	Cumplido	La generación fue temporal y estuvo asociada a las actividades propias de la obra.
Limpieza de las áreas intervenidas	Cumplido	Se realizaron actividades de limpieza y organización.

CONCLUSIONES

- Las principales acciones estuvieron relacionadas con el manejo adecuado de materiales, residuos de construcción y residuos sólidos, protección del suelo, prevención de afectaciones al recurso hídrico, control de las condiciones de orden y aseo y manejo preventivo de los impactos temporales asociados a la generación de material particulado y ruido.
- Se destaca especialmente la implementación de un punto ecológico para la separación en la fuente de residuos sólidos, conformado por recipientes diferenciados mediante el código de colores correspondiente, esta medida permitió fortalecer el manejo de los residuos generados durante la ejecución del proyecto y mantener mejores condiciones de limpieza y organización dentro del área de intervención.
- No se evidenciaron afectaciones ambientales significativas diferentes a aquellas propias y temporales de las actividades constructivas desarrolladas.
- En términos generales, las medidas implementadas permitieron ejecutar las actividades de construcción y mejoramiento de la cancha de fútbol 7 bajo condiciones adecuadas de manejo ambiental, procurando prevenir, controlar y minimizar los posibles impactos generados sobre el entorno inmediato del proyecto.

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

REGISTRO FOTOFRAFICO

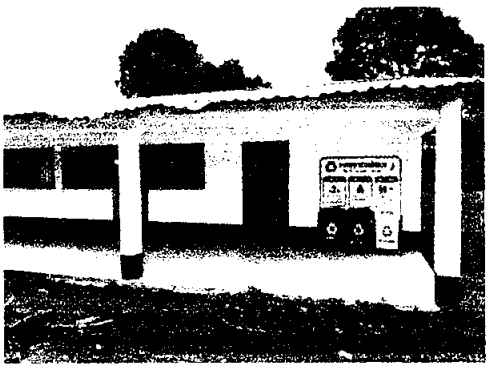

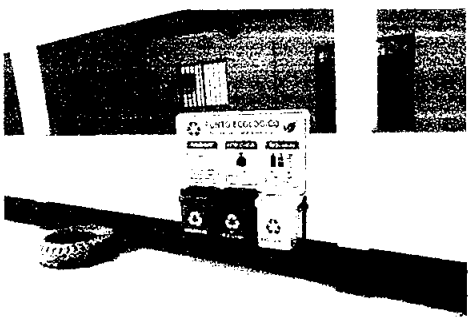

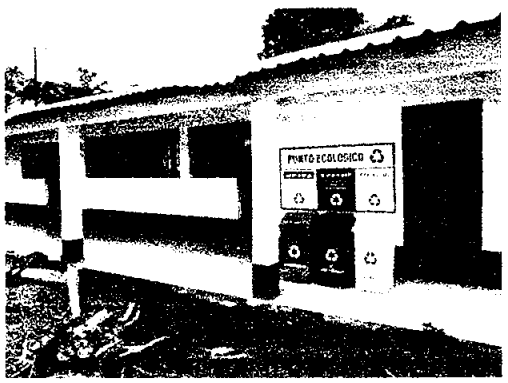

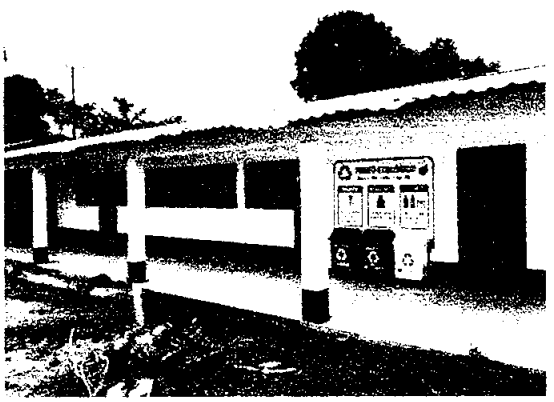

Cordialmente;

FIRMAS.

G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS R/L CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO Contratista	
JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ ING RESIDENTE DE OBRA	

53. INFORME FINAL DE IMPREVISTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA.

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

INFORME DE IMPREVISTOS

PERIODO: DEL 28 DE JULIO DE 2026 AL 18 DE AGOSTO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No 105 DE 2026

CONTRATISTA: G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS
R/L CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO

OBJETO: "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

SUPERVISOR: CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO.
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA.

PUERTO RONDÓN – ARAUCA.

CONTENIDO

1.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA. 4
1.1.1. Informe Contractual – Ficha Técnica del contrato de obra. 5
1.2. CONDICIONES CONTRACTUALES. 6
1.3. IMPREVISTOS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA 8
2. CONCLUSIONES 12

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Presupuesto Contractual del contrato de obra N° 105 de 2026. 6

INTRODUCCIÓN

El presente Informe de Imprevistos corresponde al periodo comprendido entre el 28 de julio de 2026 y el 18 de agosto de 2026, en el marco de la ejecución del Contrato de Obra No. 105 de 2026, suscrito entre el Municipio de Puerto Rondón, Arauca, y G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S., cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

El informe tiene como finalidad dejar constancia de la identificación, seguimiento y manejo de las situaciones imprevistas que pudieran presentarse durante el desarrollo de las actividades contractuales, así como verificar que estas hayan sido atendidas de manera oportuna, procurando garantizar la continuidad de la obra y el cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas y de calidad establecidas en el contrato.

Durante el periodo objeto del presente informe se realizó seguimiento a la ejecución de las actividades previstas, verificando las condiciones de desarrollo de la obra y la posible ocurrencia de situaciones que pudieran afectar su normal ejecución. En este sentido, se documentan las novedades e imprevistos presentados durante el periodo y las medidas adoptadas para su atención, de acuerdo con las necesidades evidenciadas en obra.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

1.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA.

El Municipio de Puerto Rondón adelantó el proceso de selección del contratista mediante la modalidad de Mínima Cuantía No. MPR-MIC-105-2026, de conformidad con las disposiciones legales aplicables a la contratación estatal. Una vez surtidas las etapas correspondientes de evaluación jurídica, técnica y económica de la propuesta, se procedió a seleccionar al contratista G&C CONSTRUCCIONES. SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S., correspondiente y representado legalmente por el señor CARLOS RUBÉN GRANADOS QUINTERO, Posteriormente, se procedió a la suscripción del Contrato de Obra No. 105 de 2026, cuyo objeto corresponde a la "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", con el propósito de ejecutar las actividades necesarias para el mejoramiento de la infraestructura deportiva y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas de la comunidad. El presente Informe de Imprevistos se elabora en el marco del Contrato de Obra No. 105 de 2026, con el fin de dejar constancia de las situaciones no previstas que pudieran presentarse durante el desarrollo de las actividades contractuales y que pudieran incidir en la ejecución normal de la obra.

Durante el periodo comprendido entre el 28 de julio de 2026 y el 18 de agosto de 2026, se realizó seguimiento al desarrollo de las actividades contempladas en el contrato, verificando las condiciones técnicas, operativas, logísticas y administrativas relacionadas con la ejecución de la obra. En este sentido, se efectuó el seguimiento correspondiente a las situaciones que pudieran generar afectaciones al normal desarrollo de las actividades y, cuando fue necesario, se adoptaron las medidas pertinentes para garantizar la continuidad de los trabajos y el cumplimiento del objeto contractual.

El presente documento tiene como finalidad describir y documentar los imprevistos que se hayan presentado durante el periodo objeto de seguimiento, así como las medidas adoptadas para su atención y control, permitiendo mantener un adecuado seguimiento técnico y administrativo de la ejecución contractual, El contrato cuenta con un valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($49.000.000,00) y un plazo de ejecución de un (1) mes, de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato y los documentos que hacen parte integral del mismo..

1.1.1. Informe Contractual – Ficha Técnica del contrato de obra.

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN.
SUPERVISOR	ARQ. CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
CONTRATO DE OBRA No:	105-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".
CONTRATISTA:	G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS
REPRESENTANTE:	CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO
NIT. No:	900.511.676-6
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($49.000.000,00).
PLAZO CONTRACTUAL:	UN (01) MES
VALOR DEL ANTICIPO:	$ 0,00
FECHA ACTA DE INICIO:	28 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	27 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:	18 DE AGOSTO DE 2026
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	18 DE AGOSTO DE 2026

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

ASPECTOS TÉCNICOS

1.2. CONDICIONES CONTRACTUALES.

El contrato de obra suscrito entre Municipio de Puerto Rondón y la firma contratista G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS contempla las siguientes actividades a desarrollar dentro del plazo contractual establecido de un (01) MES:

Tabla 1 *Presupuesto Contractual del contrato de obra N° 105 de 2026.*

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1,0	**PRELIMINARES**				$ 258.120,00
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	20,00	$ 12.906,00	$ 258.120,00
2,0	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**				**$ 868.448,44**
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMÚN ENTRE 0 - 2 M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE RETIRO)	M3	7,46	$ 72.666,00	$ 542.088,36
2,2	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN COMPACTADO	M3	7,46	$ 43.748,00	$ 326.360,08
3,0	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 15.158.633,06**
3,1	CONCRETO DE LIMPIEZA E = 0,05 M (SOLADO)	M2	9,17	$ 70.978,00	$ 650.868,26
3,2	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.70*0.70*0.30 M	UND	8,00	$ 493.155,00	$ 3.945.240,00
3,3	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.30*0.30 M	ML	9,60	$ 192.118,00	$ 1.844.332,80
3,4	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO	ML	17,50	$ 170.136,00	$ 2.977.380,00

	3000 PSI 0.30*0.30 M					
3,5	ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI	KG	376,20	$	15.260,00	$ 5.740.812,00
4,0	**ESTRUCTURA METALICA**					**$ 32.368.683,00**
4,1	MALLA DE NYLON	M2	87,50	$	45.650,00	$ 3.994.375,00
4,2	TUBERIA AGUANEGRA TIPO HN 3 MM* 6M. INCLUYE INSTALACION	ML	65,50	$	293.614,00	$ 19.231.717,00
4,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUAYA ACERADA 1/4 PULG INC. ACCESORIOS TENSORES	ML	35,00	$	37.058,00	$ 1.297.030,00
4,4	ASIENTO EN LAMINA METALICA ANTIDESLIZANTE LARGO=1,00 M X ANCHO=0,3 M ALTO=0,42M	UND	5,00	$	1.173.025,00	$ 5.865.125,00
4,5	MANTENIMIENTO Y REPARACION PORTERIA DE FUTBOL 7- INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	UND	2,00	$	990.218,00	$ 1.980.436,00
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	GL	1,00	**$ 346.115,50**	**$**	**346.115,50**
					SUB TOTAL VALOR	**$ 49.000.000,00**
					VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 49.000.000,00**

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

1.3. IMPREVISTOS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA

EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMÚN ENTRE 0 - 2 M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE RETIRO).

Durante la ejecución de las actividades de excavación manual se presentaron fuertes lluvias en el área de intervención, ocasionando el ingreso y acumulación de agua dentro de las excavaciones realizadas. Esta situación provocó el llenado parcial de las excavaciones y el reblandecimiento del material del terreno, generando pérdida de las condiciones inicialmente conformadas, Como consecuencia de las precipitaciones, fue necesario retirar el agua acumulada y volver a realizar labores de excavación y conformación en los sectores afectados, con el fin de recuperar las dimensiones y condiciones requeridas para continuar con las actividades constructivas posteriores. Esta situación generó la necesidad de ejecutar trabajos adicionales de limpieza, retiro de material y reexcavación, afectando el normal desarrollo de la actividad y los rendimientos inicialmente previstos.



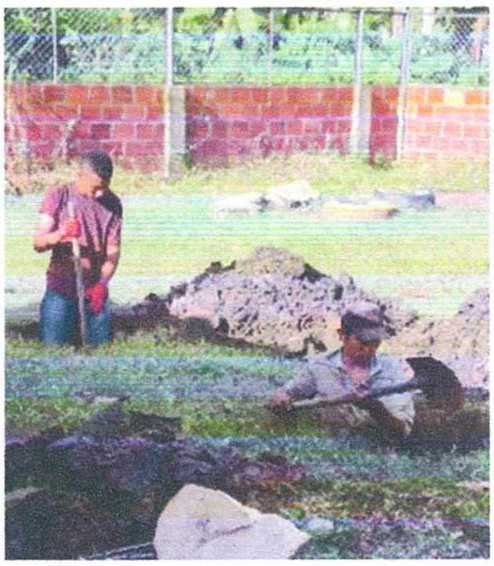

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6



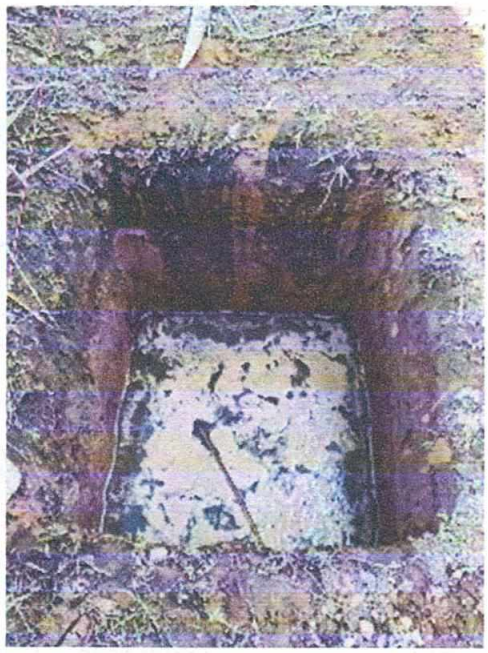

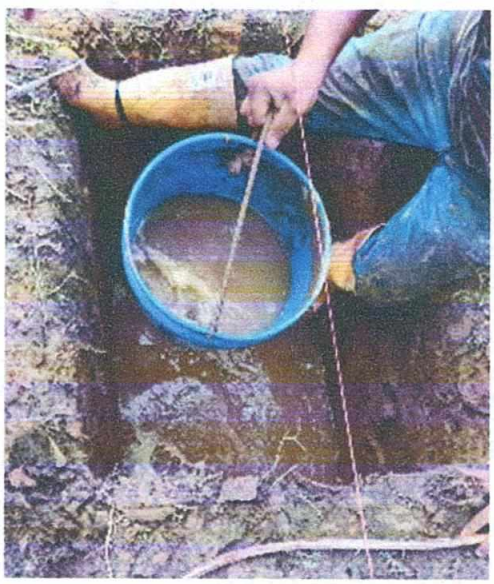

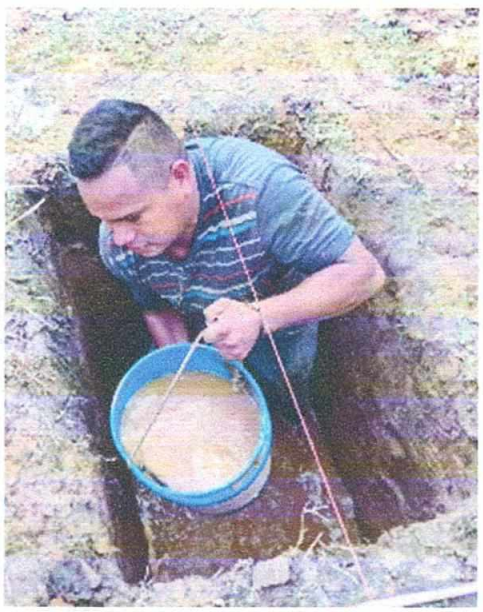

CALLE 18 No. 25 – 85 Barrio La Esperanza Cel 314-3222324
gycsas12@hotmail.com

CAPITULO:	2,00	ITEM:	2,10	Código:	
UNIDAD:	M3	ACTIVIDAD:	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMÚN ENTRE 0 - 2 M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE RETIRO)		

I - EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/DIA	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR			$ 38.933,33	10%	$ 3.893,33
VOLQUETA 7 M3	HORA	1	$ 143.000,00	14,00	$ 10.214,29

SUBTOTAL EQUIPOS	$ 14.107,62

II - MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.
DESPERDICIO		5%		$ -

SUBTOTAL MATERIALES	$ -

III - TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	VOLUMEN - PESO - CANTIDAD	DIST/KM	M3/KM O TON/KM	TAR. M3/KM O TON/KM	VR. UNIT.
			-		
			-		
			-		

SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

IV - MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	JORNAL	% PREST.	SALARIO	REDN/DIA	VR. UNIT.
OBRERO	1,00	$ 58.400,00	1,80	$ 105.120,00	2,70	$ 38.933,33

SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 38.933,33
TOTAL COSTOS DIRECTOS			$ 53.040,95
COSTOS INDIRECTOS	ADMINISTRACIÓN	29,00%	$ 15.381,88
	IMPREVISTOS	1,00%	$ 530,41
	UTILIDAD	7,00%	$ 3.712,87
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		37,00%	$ 19.625,16
VALOR PRECIO UNITARIO (AJUSTADO AL CERO)			$ 72.666,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLOR UNITARIO	VLOR TOTAL
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMÚN ENTRE 0 - 2 M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE RETIRO)	M2	6.2	$72.666,00	$450.529,20

2. CONCLUSIONES

- Durante la ejecución del proyecto se presentaron situaciones imprevistas asociadas principalmente a las condiciones climáticas adversas, especialmente por la ocurrencia de fuertes lluvias durante el desarrollo de las actividades de excavación.

- Las precipitaciones ocasionaron la acumulación de agua en las excavaciones realizadas, provocando el llenado de algunos sectores y el reblandecimiento del material del terreno, lo que hizo necesario realizar labores adicionales de retiro de agua, limpieza, retiro de material afectado y reexcavación, con el fin de recuperar las condiciones requeridas para continuar con las actividades constructivas.

- Los imprevistos presentados generaron afectaciones en el rendimiento inicialmente previsto para las actividades de excavación, debido a la necesidad de repetir parcialmente trabajos que ya habían sido ejecutados y de implementar medidas adicionales para garantizar la correcta conformación de las excavaciones.

FIRMAS.

G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS R/L CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO Contratista	
JUAN ADOLFO ORJUELA RODRIGUEZ ING RESIDENTE DE OBRA	

58. AMPLIACIÓN DE LA PÓLIZA SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA Y CERTIFICADO DE APROBACIÓN.

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.08.24 15:59:23 -05:00

Código de Seguridad: . puquAqB1HntPBxLv3612lw==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTA
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	COQ-100009818	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	680019438	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	24/08/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA		

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/07/2026	24:00 Horas Del	28/08/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	G&C CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.511.676-6
DIRECCIÓN	CLL 16 NO. 28-28 GUARATAROS	**TELÉFONO**	3143222324
ASEGURADO	MUNICIPIO DE PUERTO RONDON	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.102.798-9
DIRECCIÓN	CL 2 6 12	**TELÉFONO**	3203409589
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE PUERTO RONDON	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.102.798-9
DIRECCIÓN	CL 2 6 12	**TELÉFONO**	3203409589

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 18/08/2026.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 105 - 2026 , CUYO OBJETO ES

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 18/08/2026	24:00 Horas Del 28/12/2026	4.900.000,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 18/08/2026	24:00 Horas Del 28/08/2029	2.450.000,00	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 18/08/2026	24:00 Horas Del 18/08/2028	4.900.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 12.250.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
BELQUIS CALDERON GARCIA	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/08/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100009818	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	680019438	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/08/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/07/2026	24:00 Horas Del	28/08/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantia de Cumplimiento contenida en la póliza **COQ-100009818** y endoso, 3 cuyo afianzado es: **G&C CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE PUERTO RONDON / MUNICIPIO DE PUERTO RONDON** , expedida por la Compañia en **24/08/2026**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN ORINOQUIA a los **24** días del mes **AGOSTO** del año **2026**.

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS
Mínima Cuantía TRD. 102.04.06

FECHA DE EMISIÓN: 26/08/2026

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

HACE CONSTAR:

Qué, **G&C CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS** identificado con NIT 900511676-6 **R/L: CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO** cédula de ciudadanía No. 88.254.335 expedida en Cúcuta N/S, ha presentado las siguientes pólizas, expedidas por **SEGUROS MUNDIAL,** Póliza No. -100009818 /-100002449, Anexo 3, *mediante el presente anexo se ajustan las vigencias según acta de recibo final de fecha 18/08/2026. Los demás términos y condiciones no modificados, continúan vigentes,* que garantizan las coberturas que amparan el Contrato de Obra No. 105-2026. Cuyo objeto es: **"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA",** las cuales se describen a continuación;

AMPARO	CONDICIONES SEGÚN EL CONTRATO	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Suficiencia de la garantía de cumplimiento.	**Igual al plazo estimado del contrato + cuatro (4) meses más (hasta la liquidación del contrato).** *(Debe prorrogarse dentro de los cinco (5) días anteriores al vencimiento, si no cubre los 4 meses adicionales posteriores a la terminación efectiva del contrato.)- Diez por ciento (10%) del valor del contrato*	18/08/2026	28/12/2026	$ 4.900.000,00
Suficiencia de la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	**Igual al plazo total estimado del contrato + tres (3) años más.** *(Debe prorrogarse dentro de los cinco (05) días anteriores al vencimiento, si no cubre los 3 años adicionales posteriores a la terminación efectiva del contrato.) - Cinco por ciento (5%) del valor del contrato.*	18/08/2026	28/08/2029	$ 2.450.000,00
Estabilidad y calidad de las obras	Dos (02) años a partir del acta de recibo final de la obra - *Diez por ciento (10%) del valor del contrato*	18/08/2026	18/08/2028	$ 4.900.000,00

Que, según lo establecido en la Circular Conjunta No 001 del 20/08/2021, la Entidad verificó la garantía de Cumplimiento entregada por el contratista, dicha verificación se realizó en la página oficial de la Aseguradora en mención.

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS

Mínima Cuantía TRD. 102.04.06

puquAqB1HntPBxLv3612lw==	
100009818	3
CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	24/08/2026
28/07/2026	28/08/2029
C&C CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS	
MUNICIPIO DE PUERTO RONDON	12.250.000,00
	MODIFICACION SIN COBRO DE PRIMA

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 105 - 2026 , CUYO OBJETO ES

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 18/08/2026.

Que, una vez revisados los amparos, porcentajes y las vigencias de las pólizas presentadas dentro del contrato de la referencia, las mismas cumplen con los requisitos exigidos por la ley 80 de 1993, y demás normas concordantes.

DARIO ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA
Jefe Oficina Asesora Jurídica

ACCIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Yoel Ojeda Robins	Profesional de Apoyo Esp. Cps. No 106-2026	
Revisó y Aprobó	Dario Antonio Martínez Garcia	Jefe Oficina Asesora Jurídica	

60. FORMATOS DEL ENFOQUE DIFERENCIAL.

PLANILLAS DE ASISTENCIA

FECHA: 28/07/2026 LUGAR Barrio Nuevo

PROGRAMA: ACTIVIDAD: Escuela Escuela RESPONSABLE

No	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION		APELLIDO 1	APELLIDO 2	NOMBRE 1	NOMBRE 2	N° TELEFONICO	EDAD		GENERO	AREA DE RESIDENCIA	ASEGURAMIENTO	NOMBRE EPS	ETNIA	PUEBLOS INDIGENAS	MUJER CABEZA DE HOGAR	LGTBI	GESTANTE	LACTANTE	Poblacion Migrante	Hecho Victimizante en el Marco del Conflicto	Discapacidad	FIRMAS
	Tipo de Identificacion	NUMERO						EDAD	1= AÑOS, 2= MESES, 3= DIAS														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21	23
1		30022371	Garcia	Nuñez	Graciela				1														Graciela G
2		1119511149	Garcia	Ramirez	Lucia	Mabel			1														Lucia Ramirez
3		1119511730	Ramirez	Garcia	Yoribel				1														Yoribel R.
4		1119511511	Ramirez	Garcia	Hector	Daniel			1														
5		1119310812	Yandry	Perez A	Fabian	Aldemas			1														
6		1095931026	Sanabria	Plata	Jeison	Jose			1														
7		1116740445	Perez A	Ramirez	Lina	Fatiana			1														
8		1006661459	Perez A	Gomez	Yesitza	Jenara			1														Yesitza P.
9		1116746041	Vargas	Tovar	Edinson				1														
10		1119511846	Ramirez	Garcia	Leidy	Graciela			1														Leidy R
11									1														
12									1														
13									1														
14									1														
15									1														
16									1														

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

61. FACTURA CAMBIARIA DEL ACTA PRESENTADA.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
03494f85edc63a134e311996436155b66b17a27d2decbe7971dee27e197e6da52ee68ef099538d3a91753a9e2699ab2f

Número de Factura: GYC-120
Fecha de Emisión: 25/08/2026
Fecha de Vencimiento: 25/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S
Nombre Comercial: G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S
Nit del Emisor: 900511676
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4290
País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: Puerto Rondón
Dirección: CL 1 8 64 BRR LA VIRGEN
Teléfono / Móvil: 6078851545
Correo: gycsas12@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE PUERTO RONDON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800102798
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: Puerto Rondón
Dirección: Calle 2 # 6 -12
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: tesoreria@puertorondon-arauca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1052026	1 1 LOCALIZACION Y REP LANTEO	MTK	20,00	$ 12.906,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 258.120,00
2	1052026	2 1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN ENTRE 0 2 M DE PROFUNDIDAD I NCLUYE RETIRO	MTQ	7,46	$ 72.666,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 542.088,36
3	1052026	2 2 RELLENO CON MATER IAL DE EXCAVACION COM PACTADO	MTQ	7,46	$ 43.748,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 326.360,08
4	1052026	3 1 CONCRETO DE LIMPIE ZA E 005 M SOLADO	MTK	9,17	$ 70.978,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 650.868,26
5	1052026	3 2 ZAPATA EN CONCRET O DE 3000 PSI 070 X 070 X 030 M	94	8,00	$ 493.155,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.945.240,00
6	1052026	3 3 PEDESTAL EN CONCR ETO DE 3000 PSI 030 X 03 0 M	MMT	9,60	$ 192.118,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.844.332,80
7	1052026	3 4 VIGA DE CIMENTACIO N EN CONCRETO 3000 PS I 030 X 030 M	MMT	17,50	$ 170.136,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.977.380,00
8	1052026	3 5 ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI	KGM	376,20	$ 15.260,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.740.812,00
9	1052026	4 1 MALLA DE NYLON	MTK	87,50	$ 45.650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.994.375,00
10	1052026	4 2 TUBERIA AGUANEGRA TIPO HN 3 MM X 6M INCL UYE INSTALACION	MMT	65,50	$ 293.614,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.231.717,00
11	1052026	4 3 SUMINISTRO E INSTA LACION DE GUAYA ACER ADA 1 4 PULG INC ACCES ORIOS TENSORES	MMT	35,00	$ 37.058,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.297.030,00
12	1052026	4 4 ASIENTO EN LAMINA METALICA ANTIDESLIZAN TE LARGO IGUAL 100 M X ANCHO IGUAL 03 M ALTO IGUAL 042M	94	5,00	$ 1.173.025,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.865.125,00
13	1052026	4 5 MANTENIMIENTO Y RE PARACION PORTERIA DE FUTBOL 7 INCLUYE ANTIC ORROSIVO Y PINTURA	94	2,00	$ 990.218,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.980.436,00
14	1052026	MITIGACION DE MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL	94	1,00	$ 346.115,50	$ 0,00	$ 0,00					$ 346.115,50

Notas Finales

CTO DE OBRA No. 105 DE 2026 "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

ea de negocio:



Documento generado el:
25/08/2026 20:23:52
Documento validado por la DIAN:
25/08/2026 20:23:52
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA			COP
TASA DE CAMBIO			0
Subtotal			49000000
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			49000000
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0
Total impuesto (=)			0
Total neto factura (=)			49000000
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	49000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA			COP
TASA DE CAMBIO			
Subtotal			49.000.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			49.000.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			49.000.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	49.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764110115949 Rango desde: 117 Rango hasta: 150 Vigencia: 2027-05-22



G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

62. SOLICITUD DE GIRO (INCLUYE CERTIFICADO DE LA CUENTA BANCARIA).

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

Puerto Rondón – Arauca 28/08/2026

Señores:
MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN
Secretaria de Planeación e Infraestructura

Asunto: Radicación soportes de liquidación contrato de obra No. 105—2026
Referencia. Contrato de Obra No. 105-2026 Cuyo Objeto es: "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Yo CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO identificado con la cedula de ciudadania Nº. 88.254.335 de Cúcuta, radico formalmente al municipio de PUERTO RONDÓN los soportes para acta de recibo final del contrato de obra No.105 de 2026, suscrito entre la alcaldía municipal de PUERTO RONDÓN y la empresa G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS, la cual represento legalmente conforme a la lista de chequeo de la administración Municipal.

Cordialmente:

G&C CONSTRUCCIONES,
SERVICIOS Y SUMINISTROSSAS
R/L CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO
Contratista

G&C Construcciones, Servicios y Suministros S.A.S
NIT. 900.511.676-6

Puerto Rondón – Arauca 28/08/2026

Señores:
MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN
TESORERIA

Asunto: Solicitud de Giro pago liquidación contrato de obra No. 105—2026
Referencia. Contrato de Obra No. 105-2026 Cuyo Objeto es: "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Yo CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO identificado con la cedula de ciudadanía No. 88.254.335 de Cúcuta, solicito al municipio de PUERTO RONDÓN que gire los recursos económicos correspondientes al acta de recibo final del contrato de obra No. 105-2026 por un valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA ($49.000.000,00), suscrito entre la alcaldía municipal de PUERTO RONDÓN y la empresa G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS la cual represento legalmente, a la cuenta de ahorros de BANCO AGRARIO DE COLOMBIA N° 3-730-30-00217-5 a nombre de empresa G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS Nit. 900.511.676-6

Cordialmente:

G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROSSAS
R/L CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO
Contratista

Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 9005116766, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: CTE - CUENTAS -CORRIENTES, número 3-730-30-00217-5, con una antigüedad de ONCE (11) año(s).

Se expide en ARAUCA, a los veinte y tres (23) días del mes de enero de 2025, con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR

