Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	**FORMATO** **ACTA PAGO DE INTERVENTORÍA**	Código: F-GPR-08 Versión: 03 Fecha: 03/11/2023

OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA INTERVENCIÓN Y EJECUCION DE OBRAS HIDRÁULICAS EN PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RÍO ABURRÁ MEDELLÍN"							**ACTA DE PAGO No.11**
CONTRATISTA:	**Consorcio Rio CM 005 de 2025 (Construcciones E Inversiones Asociativas S.A.S 800.217.663-8 50% - Camilo Andrés Ángel Saldarriaga 98.546.133 50%)**					**ANTICIPO:**	**N.A**	
CONTRATO N°.:	**CM 323 de 2025**	**NIT N°**	**901.840.768-1**	**PLAZO:**	**Dieciséis (16) meses**	**RUBRO:**	**2.3.2.02.02.009**	**FECHA:** **11/08/2026**
VALOR:	**2793219593**	**ACTA DE INICIO:**	**11 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	**SUPERVISOR AMVA:**	**JOHN JAIRO DE JESUS VARGAS ROLDAN**			

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						**MODIFICACIONES PACTADAS**								**ACTA PAGO N°11**		**TOTAL PAGADO ACUMULADO**	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIORES		**ACTA DE CAMBIO DE OBRA No. 01 del 15/04/2026**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**Julio de 2026**			
								NO SE EJECUTA		**SI SE EJECUTA**							
ITEM	**DEDICACIÓN**	**TIEMPO TOTAL REQUERIDO (MESES)**	**CANTIDAD PERSONAL REQUERIDO**	**SALARIO MES**	**COSTO TOTA ($)**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**CANT**	**Valor**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
COSTOS RECURSO HUMANO:						**COSTOS RECURSO HUMANO:**								**COSTOS RECURSO HUMANO:**			
Director de Interventoria	50%	16	1	$ 13.523.250	$ 108.186.000	16,00	$ 108.186.000		$ -		$ -	16,00	$ 108.186.000	1,00	$ 6.761.625	10,67	72.124.000,00
Residente de Interventoria-Obra	100%	16	1	$ 9.252.759	$ 148.044.144	16,00	$ 148.044.144		$ -		$ -	16,00	$ 148.044.144	1,00	$ 9.252.759	10,67	98.696.096,00
Residente de Interventoria-Ambiental	100%	16	1	$ 7.829.250	$ 125.268.000	16,00	$ 125.268.000		$ -		$ -	16,00	$ 125.268.000	1,00	$ 7.829.250	10,67	83.512.000,00
Residente de Interventoría Social	100%	16	1	$ 7.829.250	$ 125.268.000	16,00	$ 125.268.000		$ -		$ -	16,00	$ 125.268.000	1,00	$ 7.829.250	10,20	79.858.350,00
Residente de Interventoría en Seguridad y Salud en el trabajo	100%	16	1	$ 7.829.250	$ 125.268.000	16,00	$ 125.268.000		$ -		$ -	16,00	$ 125.268.000	1,00	$ 7.829.250	10,67	83.512.000,00
Auxiliar de Ingeniería	100%	16	2	$ 5.694.000	$ 182.208.000	20,23	$ 230.379.240		$ -		$ -	20,23	$ 230.379.240	2,00	$ 22.776.000	14,10	160.570.800,00
Auxiliar Ambiental	100%	16	1	$ 5.694.000	$ 91.104.000	16,00	$ 91.104.000		$ -		$ -	16,00	$ 91.104.000	1,00	$ 5.694.000	9,87	56.180.800,00
Auxiliar Social	100%	16	1	$ 5.694.000	$ 91.104.000	16,00	$ 91.104.000		$ -		$ -	16,00	$ 91.104.000	1,00	$ 5.694.000	10,53	59.976.800,00
Auxiliar en Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	16	1	$ 5.694.000	$ 91.104.000	16,00	$ 91.104.000		$ -		$ -	16,00	$ 91.104.000	1,00	$ 5.694.000	10,53	59.976.800,00
			SUBTOTAL COSTOS RECURSO HUMANO (1)		**$ 1.087.554.144**		**$ 1.135.725.384**		**$ -**		**$ -**		**$ 1.135.725.384,00**		**$ 79.360.134,00**	**$ -**	**$ 754.407.646,00**
			FACTOR MULTIPLICADOR (FM) (2)		**1,88**												
			TOTAL COSTOS RECURSO HUMANO INCLUYENDO FM (3)- (1)*(2)		**$ 2.044.601.791**		**$ 2.135.163.722,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 2.135.163.722,00**		**$ 149.197.052,00**	**$ -**	**$ 1.418.286.374,00**

COSTOS COMPLEMENTARIOS Y DE CONTROL - INSUMOS PARA LA OPERACIÓN - (REEMBOLSABLES: Pagados contra factura o soporte idoneo - siendo el tope máximo para su reconocimiento el valor total ofertado para cada ítem)					**COSTOS COMPLEMENTARIOS Y DE CONTROL - INSUMOS PARA LA OPERACIÓN**								**COSTOS COMPLEMENTARIOS Y DE CONTROL - INSUMOS PARA LA OPERACIÓN**			
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**COSTO TOTA ($)**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**
Servicio de Transporte de personal (Incluye costos de Conductor, mantenimiento y demás gastos de sostenimiento del Vehículo)	Mes	$ 15	$ 7.000.000	$ 105.000.000	**15**	$ 105.000.000		$ -		$ -	**15**	$ 105.000.000	1,00	$ 7.000.000	10,67	74.690.000,00
Comisión de Topografía para localización, trazado y replanteo con equipo de precisión con estación total, 1 topógrafo, 2 cadeneros, equipo de comision de topografia,1obrero; incluye demarcación, pintura línea de trazado, memorias de cálculo, copia de carteras, también transporte, archivos digitales, salarios, prestaciones. (10 dias por mes)	Día	$ 120	$ 756.915	$ 90.829.800	**120**	$ 90.829.800		$ -	**5,85**	$ 4.427.953	**126**	$ 95.257.753	10,85	$ 8.212.528	125,85	95.257.753,00
Vuelos con Dron para seguimiento periodico quincenal que incluye todos los frentes. Especificación técnica: Realizar vuelos con drones para obtener datos imágenes de alta resolución, videos y ortoimágenes georreferenciadas para el seguimiento de las obras Cada vuelo deberá certificar previamente las debidas autorizaciones incluyendo permisos para volar y piloto certificado cumplimiento con normativas locales de la Aerocivil vigente.	Unidad	$ 30	$ 1.000.000	$ 30.000.000	**1**	$ 1.000.000	**(1,00)**	-$ 1.000.000		$ -	**-**	$ -		$ -	0,00	0,00

OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA INTERVENCIÓN Y EJECUCION DE OBRAS HIDRÁULICAS EN PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RÍO ABURRÁ MEDELLÍN"					**ACTA DE PAGO No.11**	
CONTRATISTA:	**Consorcio Rio CM 005 de 2025 (Construcciones E Inversiones Asociativas S.A.S 800.217.663-8 50% - Camilo Andrés Ángel Saldarriaga 98.546.133 50%)**			**ANTICIPO:**	**N.A**		
CONTRATO N°.:	**CM 323 de 2025**	**NIT N°**	**901.840.768-1**	**PLAZO:**	**Dieciséis (16) meses**	**RUBRO:**	**2.3.2.02.02.009**	**FECHA:**	**11/08/2026**
VALOR:	**2793219593**	**ACTA DE INICIO:**	**11 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	**SUPERVISOR AMVA:**	**JOHN JAIRO DE JESUS VARGAS ROLDAN**		

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						**MODIFICACIONES PACTADAS**								**ACTA PAGO N°11**		**TOTAL PAGADO ACUMULADO**	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIORES		**ACTA DE CAMBIO DE OBRA No. 01 del 15/04/2026**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**Julio de 2026**			
								NO SE EJECUTA		**SI SE EJECUTA**							
ITEM	**DEDICACIÓN**	**TIEMPO TOTAL REQUERIDO (MESES)**	**CANTIDAD PERSONAL REQUERIDO**	**SALARIO MES**	**COSTO TOTA ($)**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**CANT**	**Valor**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
Ensayos de laboratorio para concretos, estudios de suelos, verificacion de calidad de materiales. Incluye determinacion de humedades de los materiales, determinacion de granulometrias por hidrometro desde tamiz #10, determinacion de limite liquido y limite plastico, ensayos de compresion simple, densidad de campo y humedad, exploraciones de campo y todo lo necesario para la correcta ejecucion y calidad de la obra.	**GL**	VALOR DEL COSTO DIRECTO definido por la ENTIDAD COMO FIJO, INMODIFICABLE Y REEMBOLSABLE con la finalidad que serán ejecutados en la proporción y durante los tiempos en que se presenten las necesidades que el mismo busca satisfacer. Por ello, durante la ejecución del contrato la Entidad cancelará dichos ítems única y exclusivamente sobre los montos que el contratista logre demostrar su ejecución en desarrollo del objeto contractual, presentando para ello el respectivo soporte del gasto realizado para adquirir el bien o prestar el servicio requerido previa autorización de la Supervisión. Por lo tanto son valores Fijos e Inmodificables por el Oferente en su Propuesta.		$ 15.000.000	**1**	$ 900.000	**(0,06)**	-$ 900.000		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00
Asesoria Especializadas (Hidraulicas, Geotecnicas,Suelos,Pavimentos,Estructurales,Geologicas o cualquiera adicional que se requiera. Se pagan contra factura), incluye informe por visita de diagnostico, conclusiones y analisis de resultados	**GL**				$ 50.000.000	**1**	$ 2.500.000	**(0,05)**	-$ 2.500.000		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00
TOTAL COSTOS COMPLEMENTARIOS Y DE CONTROL - INSUMOS PARA LA OPERACIÓN (4)					**$ 290.829.800**		**$ 200.229.800**		**-$ 4.400.000**		**$ 4.427.953**		**$ 200.257.753**		**$ 15.212.528**		**169.947.753,00**
OTROS COSTOS TRANSVERSALES - PÓLIZAS (REEMBOLSABLES - Pagados contra factura o soporte idoneo del valor de la Póliza - siendo el tope máximo para su reconocimiento el valor total ofertado)						**OTROS COSTOS TRANSVERSALES - PÓLIZAS**								**OTROS COSTOS TRANSVERSALES - PÓLIZAS**			
PÓLIZAS: REEMBOLSABLE La Entidad estableció el costo de las Pólizas a suscribir con el Contrato, como un VALOR REEMBOLSABLE hasta por el tope ofertado por el Contratista adjudicatario previa presentación de facturas de pago de la póliza y los costos de su ajuste si hubiere lugar a ello. Por lo tanto, este ítem se cancelará en un único pago contra soporte del valor real de la Póliza, siendo el tope máximo para su reconocimiento el valor ofertado por EL ADJUDICATARIO.					**$ 11.811.765,00**		$ 11.811.765		$ -		$ -	**$ -**	$ 11.811.765			0,00	4.955.432,64
TOTAL OTROS COSTOS - COMPONENTE TRANSVERSAL - PÓLIZAS (5)					**$ 11.811.765**		**$ 11.811.765**		$ -		$ -		**$ 11.811.765**		$ -		4.955.432,64
VALOR PARCIAL ACTA (6) =(3)+(4)+(5)					**$ 2.347.243.356**		**$ 2.347.205.287**		**-$ 4.400.000**		**$ 4.427.953**		**$ 2.347.233.240**		**$ 164.409.580**		**$ 1.593.189.560**
VALOR IVA 19% (7)= (6)*0,19%					**$ 445.976.237,35**		**$ 445.969.004**		**-$ 836.000**		**$ 841.311**		**$ 445.974.315**		**$ 31.237.820**		**$ 302.706.016**
Ajuste Decimal							**$ 45.302**		**-$ 33.264**				**$ 12.038**				
VALOR IVA 19% (8)= (6)+(7)					**$ 2.793.219.593**		**$ 2.793.219.593**		**-$ 5.269.264**		**$ 5.269.264**		**$ 2.793.219.593**		**$ 195.647.400**		**$ 1.895.895.576**

PAGOS REALIZADOS

PAGOS PARCIALES REALIZADOS	**VALOR**	**Iva**	**NETO PAGADO**	**%**
Acta 1	76.906.768	$ 14.612.285	$ 91.519.053	3,28%
Acta 2	137.544.982	$ 26.133.547	$ 163.678.529	5,86%
Acta 3	143.870.592	$ 27.335.412	$ 171.206.004	6,13%
Acta 4	138.572.187	$ 26.328.716	$ 164.900.903	5,90%
Acta 5	147.655.167	$ 28.054.482	$ 175.709.649	6,29%
Acta 6	146.898.252	$ 27.910.668	$ 174.808.920	6,26%
Acta 7	148.412.082	$ 28.198.296	$ 176.610.378	6,32%
Acta 8	158.359.887	$ 30.088.379	$ 188.448.266	6,75%
Acta 9	164.523.117	$ 31.259.392	$ 195.782.509	7,01%
Acta 10	166.036.947	$ 31.547.020	$ 197.583.967	7,07%
Acta 11	164.409.580	$ 31.237.820	$ 195.647.400	7,00%
Acta 12				0,00%
Acta 13				0,00%
Acta 14				0,00%
Acta 15				0,00%
Acta 16				0,00%
Valor Pagado	**1.593.189.561**	**$ 302.706.016**	**$ 1.895.895.577**	**67,87%**

OBSERVACIONES:
* LOS VALORES Y LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN LA PRESENTE ACTA SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA INTERVENTOR Y SUPERVISOR QUIENES HAN EJERCIDO CONTROL DIRECTO DEL PROYECTO COMO ESTA REGISTRADO EN EL INFORMO Y ACTAS

La Inversion Por municipio fue la siguiente:

Municipio	%	VALOR	%	VALOR
Muncipio Bello	7,00%	$ 13.695.318,00	10,39%	$ 290.349.831,00
Distrito de Medellin	40,00%	$ 78.258.960,00	33,91%	$ 947.175.431,00
Municipio De Itagui	53,00%	$ 103.693.122,00	23,51%	$ 656.804.056,00
Municipio de Envigado		$ -	0,06%	$ 1.566.260,00
Total Inversion	100,00%	$ 195.647.400,00	67,87%	$ 1.895.895.578,00

Responsables:

ANDREA ALZATE RENDON
Representante legal Interventoria
Conosrcio Rio CM 005 de 2025

Revisó

JOHN JAIRO DE JESUS VARGAS ROLDAN
Supervisor del Contato
Area Metropolitana del Valle de Aburra

Revisó

Lider de Programa Ejecución de

Aprabó

Subdirector de Proyectos

No. CONTRATO:	CM 323 de 2025		
OBJETO:	"Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Ambiental Y Contable A La Intervención Y Ejecución De Obras Hidráulicas En Puntos Críticos Identificados En El Canal Del Río Aburrá Medellín."		
CONTRATISTA:	Consorcio Rio CM 005 de 2025 - Construcciones E Inversiones Asociativas S.A.S 800.217.663-8 50% - Camilo Andrés Ángel Saldarriaga 98.546.133 50%	**NIT O CEDULA:**	901.840.768-1
DEPENDENCIA:	Subdirección de proyectos	**VALOR:**	$2.793.219.593,00 incluido IVA equivalentes a 1.962,22 SMMLV
PLAZO:	Dieciséis (16) meses	**FECHA DE INICIO:**	Septiembre 11 de 2025

En la Ciudad de Medellín a los quince (15) días del mes de Julio del año 2026 a 10:00 a.m., se reunieron **Adriana Patricia Grisales Rendon** identificada con cedula 43 569.793 Subdirectora de Proyectos, **John Jairo de Jesús Vargas Roldan** identificado con cedula 71.022.409 Supervisor del Contrato En representación del Á**rea Metropolitana del Valle de Aburra** y **Andrea Álzate Rendon** identificada con cedula No. 43.184.154 Representante Legal Consorcio Rio CM 005 de 2025 con Nit 901.984.505-8, en su calidad de Contratista interventor del contrato con el fin de determinar el siguiente cambio.

CONSIDERACIONES

1. Se justifica modificar las cantidades del contrato inicial a las condiciones actualizadas y necesarias para la correcta ejecución del proyecto en los siguientes ítems:

Recursos Que No Se Ejecutan

- **Vuelos con Dron para seguimiento periódico quincenal que incluye todos los frentes. Especificación técnica: Realizar vuelos con drones para obtener datos imágenes de alta resolución, videos y orto imágenes georreferenciadas para el seguimiento de las obras Cada vuelo deberá certificar previamente las debidas autorizaciones incluyendo permisos para volar y piloto certificado cumplimiento con normativas locales de la Aerocivil vigente**: Dado que la oficina de Comunicaciones del AMVA está realizando estos vuelos de acuerdo a las necesidades que qe la Entidad ha requerido, no ha sido necesario por parte de la Interventoría implementar esta actividad.
- **Ensayos de laboratorio para concretos, estudios de suelos, verificación de calidad de materiales. Incluye determinación de humedades de los materiales, determinación de granulometrías por hidrómetro desde tamiz #10, determinación de limite líquido y limite plástico, ensayos de compresión simple, densidad de campo y humedad, exploraciones de campo y todo lo necesario para la correcta ejecución y calidad de la obra.**: a la fecha se esta realizando la verificación de los materiales y los ensayos por

parte del contratista, al cual se le ha solicitado la presentación de estos ensayos para el recibo de las actividades, y en consideración que se cuenta con el apoyo de laboratorio certificado para dichas actividades de corroboración.

- **Asesoría Especializadas (Hidráulicas, Geotécnicas, Suelos, Pavimentos, Estructurales, Geológicas o cualquiera adicional que se requiera. Se pagan contra factura), incluye informe por visita de diagnóstico, conclusiones y análisis de resultados:** El Área Metropolitana cuenta con el convenio interadministrativo con la Universidad Nacional para la Elaboración de Diseños que incluye el acompañamiento durante la ejecución del contrato de los profesionales especialistas para la atención de observaciones seguimiento a los procesos constructivos y las aclaraciones y/o actualización de los diseños de ser necesario, por tanto por parte de la Interventoría no ha sido necesario utilizar estos recursos.

Ítems Que Se Ejecutan En Mayor Cantidad

- **Comisión de Topografía para localización, trazado y replanteo:** Dada la dinámica en la ejecución de las actividades del contrato de obra LP297 de 2025 para el cual el Consorcio Rio CM 005 es Interventor. Se ha requerido implementar contar con 4 frentes de obra activos, En el formulario de Interventoría se cuenta con el recurso de 120 días de comisión de topografía, los cuales han sido necesario utilizar con una mayor frecuencia, dadas las diversas actividades y condiciones dinámicas de los frentes de obra para el mes de julio se requiero aumentar la cantidad contractual en 5,85 dias.

2. En el siguiente cuadro se relacionan cada uno de los ítems con el ajuste mencionado:

ITEM QUE NO SE EJECUTA O SE REQUIEREN MENOR CANTIDAD DE ACUERDO DE DISEÑOS:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Vuelos con Dron para seguimiento periódico quincenal que incluye todos los frentes. Especificación técnica: Realizar vuelos con drones para obtener datos imágenes de alta resolución, videos y orto imágenes georreferenciadas para el seguimiento de las obras Cada vuelo deberá certificar previamente las debidas autorizaciones incluyendo permisos para volar y piloto certificado cumplimiento con normativas locales de la Aerocivil vigente.	Unidad	-1	$ 1.000.000	-$ 1.000.000
	Ensayos de laboratorio para concretos, estudios de suelos, verificación de calidad de materiales. Incluye determinación de humedades de los materiales, determinación de granulometrías por hidrómetro desde tamiz #10, determinación de limite líquido y limite plástico, ensayos de compresión simple, densidad de campo y humedad, exploraciones de campo y todo lo necesario para la correcta ejecución y calidad de la obra.	GL	- 0,06	$ 15.000.000	-$ 900.000

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Asesoría Especializadas (Hidráulicas, Geotécnicas, Suelos, Pavimentos, Estructurales, Geológicas o cualquiera adicional que se requiera. Se pagan contra factura), incluye informe por visita de diagnóstico, conclusiones y análisis de resultados.	GL	- 0,05	$ 50.000.000	-$ 2.500.000
VALOR COSTO RECURSOS QUE NO SE EJECUTAN					**-$ 4.400.000**
Valor IVA (19%)					**-$ 836.000**
Ajuste por decimales					**-$332.64**
VALOR TOTAL RECURSOS QUE NO SE EJECUTAN					**-$ 5.269.264**

ITEM QUE SI SE EJECUTA:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Comisión de Topografía para localización, trazado y replanteo con equipo de precisión con estación total, 1 topógrafo, 2 cadeneros, equipo de comisión de topografia,1obrero; incluye demarcación, pintura línea de trazado, memorias de cálculo, copia de carteras, también transporte, archivos digitales, salarios, prestaciones. (10 dias por mes)	día	5.85	$ 756.915	$ 4.427.953
	VALOR COSTO RECURDOS QUE SE EJECUTAN				$ 4.427.953
	Valor IVA (19%)				$ 841.311
	Ajuste Decimal				
	VALOR TOTAL RECURSO HUMANO ADICIONALES				$ 5.269.264

DESCRIPCION	VALOR
Valor Total Recursos Que No Se Ejecutan	-$ 5.269.264
Valor Total Recurso Humano Adicionales	**$ 5.269.264**
Ajuste a decimal	
Resultado del ejercicio	$0.00

Luego de realizar un estudio previo, balancear el presupuesto, evidenciar la necesidad de cambio y/o ajustar algunos ítems en las cantidades del contrato de la referencia; se pacta que el valor acordado es CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M.L.**($5.269.264**), reflejados la redistribución de recursos.

3. Tanto el supervisor y contratista interventor convienen que es necesario realizar dicha modificación, dejando constancia de que.

- Se ha mantenido el objeto y el alcance del contrato.
- Se conservan las condiciones técnicas y el valor total del contrato.
- Se ha guardado para ambas partes el equilibrio económico.
- No se realiza modificación alguna a las especificaciones técnicas de los ítems o actividades del contrato.

- Que mediante este documento no se altera ninguna otra cláusula estipulada en el contrato, permaneciendo obligadas las partes a dar cabal cumplimiento a lo pactado.

NOTA: Se deja constancia que esta acta debe estar acompañada de los documentos soporte y la debida justificación técnica.

Verificado lo anterior por el supervisor y/o interventor, en constancia firman las personas que intervienen, a los quince días del mes de julio de 2026.

ANDREA ALZATE RENDON

Andrea Álzate Rendon
RL Consorcio Rio CM 0058 de 2025
Interventor

Fernando Mauricio Upegui Rivillas
Director de Interventoría
Consorcio Rio CM 0058 de 2025

Vo.Bo.
Adriana Patricia Grisales Rendon
Subdirectora de Proyectos
Área Metropolitana del Valle de Aburra

Vo.Bo.
John Jairo de Jesús Vargas Roldan
Supervisor contrato
Área Metropolitana del Valle de Aburra

Nota: El original de esta Acta se expide con destino al Archivo de la Entidad, expediente contractual No. CM323 de 2025.

ANDREA ALZATE RENDON

Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	**FORMATO** **ACTA PAGO DE INTERVENTORÍA**	Código: F-GPR-08 Versión: 03 Fecha: 03/11/2023

OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA INTERVENCIÓN Y EJECUCION DE OBRAS HIDRÁULICAS EN PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RÍO ABURRÁ MEDELLÍN"						**ACTA DE PAGO No.11**
CONTRATISTA:	**Consorcio Rio CM 005 de 2025 (Construcciones E Inversiones Asociativas S.A.S 800.217.663-8 50% - Camilo Andrés Ángel Saldarriaga 98.546.133 50%)**					**ANTICIPO:**	
CONTRATO N°.:	**CM 323 de 2025**	**NIT N°**	**901.840.768-1**	**PLAZO:**	**Dieciséis (16) meses**	**RUBRO:**	**FECHA:** **11/08/2026**
VALOR:	**2793219593**	**ACTA DE INICIO:**	**11 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	**SUPERVISOR AMVA:**	**JOHN JAIRO DE JESUS VARGAS ROLDAN**		

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						**MODIFICACIONES PACTADAS**								**TOTAL PAGADO ACUMULADO**	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIORES		**ACTA DE CAMBIO DE OBRA No. 01 del 15/04/2026**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**			
								NO SE EJECUTA		**SI SE EJECUTA**					
ITEM	**DEDICACIÓN**	**TIEMPO TOTAL REQUERIDO (MESES)**	**CANTIDAD PERSONAL REQUERIDO**	**SALARIO MES**	**COSTO TOTA ($)**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**CANT**	**Valor**	**CANT**	**VALOR**
COSTOS RECURSO HUMANO:						**COSTOS RECURSO HUMANO:**								**COSTOS RECURSO HUMANO:**	
Director de Interventoria	50%	16	1	$ 13.523.250	$ 108.186.000	16,00	$ 108.186.000		$ -		$ -	16,00	$ 108.186.000	10,67	72.124.000,00
Residente de Interventoria-Obra	100%	16	1	$ 9.252.759	$ 148.044.144	16,00	$ 148.044.144		$ -		$ -	16,00	$ 148.044.144	10,67	98.696.096,00
Residente de Interventoria-Ambiental	100%	16	1	$ 7.829.250	$ 125.268.000	16,00	$ 125.268.000		$ -		$ -	16,00	$ 125.268.000	10,67	83.512.000,00
Residente de Interventoría Social	100%	16	1	$ 7.829.250	$ 125.268.000	16,00	$ 125.268.000		$ -		$ -	16,00	$ 125.268.000	10,20	79.858.350,00
Residente de Interventoría en Seguridad y Salud en el trabajo	100%	16	1	$ 7.829.250	$ 125.268.000	16,00	$ 125.268.000		$ -		$ -	16,00	$ 125.268.000	10,67	83.512.000,00
Auxiliar de Ingeniería	100%	16	2	$ 5.694.000	$ 182.208.000	20,23	$ 230.379.240		$ -		$ -	20,23	$ 230.379.240	14,10	160.570.800,00
Auxiliar Ambiental	100%	16	1	$ 5.694.000	$ 91.104.000	16,00	$ 91.104.000		$ -		$ -	16,00	$ 91.104.000	9,87	56.180.800,00
Auxiliar Social	100%	16	1	$ 5.694.000	$ 91.104.000	16,00	$ 91.104.000		$ -		$ -	16,00	$ 91.104.000	10,53	59.976.800,00
Auxiliar en Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	16	1	$ 5.694.000	$ 91.104.000	16,00	$ 91.104.000		$ -		$ -	16,00	$ 91.104.000	10,53	59.976.800,00
				SUBTOTAL COSTOS RECURSO HUMANO (1)	**$ 1.087.554.144**		**$ 1.135.725.384**		**$ -**		**$ -**		**$ 1.135.725.384,00**	**-**	**$ 754.407.646,00**
				FACTOR MULTIPLICADOR (FM) (2)	**1,88**										
				TOTAL COSTOS RECURSO HUMANO INCLUYENDO FM (3)- (1)*(2)	**$ 2.044.601.791**		**$ 2.135.163.722,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 2.135.163.722,00**	**-**	**$ 1.418.286.374,00**

COSTOS COMPLEMENTARIOS Y DE CONTROL - INSUMOS PARA LA OPERACIÓN - (REEMBOLSABLES: Pagados contra factura o soporte idoneo - siendo el tope máximo para su reconocimiento el valor total ofertado para cada ítem)					**COSTOS COMPLEMENTARIOS Y DE CONTROL - INSUMOS PARA LA OPERACIÓN**								**COSTOS COMPLEMENTARIOS Y DE CONTROL - INSUMOS PARA LA OPERACIÓN**	
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**COSTO TOTA ($)**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**
Servicio de Transporte de personal (Incluye costos de Conductor, mantenimiento y demás gastos de sostenimiento del Vehículo)	Mes	$ 15	$ 7.000.000	$ 105.000.000	**15**	$ 105.000.000		$ -		$ -	**15**	$ 105.000.000	10,67	74.690.000,00
Comisión de Topografía para localización, trazado y replanteo con equipo de precisión con estación total, 1 topógrafo, 2 cadeneros, equipo de comision de topografia,1obrero; incluye demarcación, pintura línea de trazado, memorias de cálculo, copia de carteras, también transporte, archivos digitales, salarios, prestaciones. (10 dias por mes)	Día	$ 120	$ 756.915	$ 90.829.800	**120**	$ 90.829.800		$ -	**5,85**	$ 4.427.953	**126**	$ 95.257.753	125,85	95.257.753,00

OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA INTERVENCIÓN Y EJECUCION DE OBRAS HIDRÁULICAS EN PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RÍO ABURRÁ MEDELLÍN"														**ACTA DE PAGO No.11**	
CONTRATISTA:	**Consorcio Rio CM 005 de 2025 (Construcciones E Inversiones Asociativas S.A.S 800.217.663-8 50% - Camilo Andrés Ángel Saldarriaga 98.546.133 50%)**											**ANTICIPO:**					
CONTRATO N°.:	**CM 323 de 2025**		**NIT N°**	**901.840.768-1**			**PLAZO:**	**Dieciséis (16) meses**				**RUBRO:**		**FECHA:**	**11/08/2026**		
VALOR:	**2793219593**		**ACTA DE INICIO:**	**11 DE SEPTIEMBRE DE 2025**			**SUPERVISOR AMVA:**	**JOHN JAIRO DE JESUS VARGAS ROLDAN**									

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						**MODIFICACIONES PACTADAS**								**TOTAL PAGADO ACUMULADO**	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIORES		**ACTA DE CAMBIO DE OBRA No. 01 del 15/04/2026**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**			
								NO SE EJECUTA		**SI SE EJECUTA**					
ITEM	**DEDICACIÓN**	**TIEMPO TOTAL REQUERIDO (MESES)**	**CANTIDAD PERSONAL REQUERIDO**	**SALARIO MES**	**COSTO TOTA ($)**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**CANT**	**Valor**	**CANT**	**VALOR**
Vuelos con Dron para seguimiento periodico quincenal que incluye todos los frentes. Especificación técnica: Realizar vuelos con drones para obtener datos imágenes de alta resolución, videos y ortoimágenes georreferenciadas para el seguimiento de las obras Cada vuelo deberá certificar previamente las debidas autorizaciones incluyendo permisos para volar y piloto certificado cumplimiento con normativas locales de la Aerocivil vigente.	Unidad	$ 30	$ 1.000.000	$ 30.000.000	**1**	$ 1.000.000	**(1,00)**	-$ 1.000.000		$ -	**-**	$ -	-	0,00
Ensayos de laboratorio para concretos, estudios de suelos, verificacion de calidad de materiales. Incluye determinacion de humedades de los materiales, determinacion de granulometrias por hidrometro desde tamiz #10, determinacion de limite liquido y limite plastico, ensayos de compresion simple, densidad de campo y humedad, exploraciones de campo y todo lo necesario para la correcta ejecucion y calidad de la obra.	**GL**	VALOR DEL COSTO DIRECTO definido por la ENTIDAD COMO FIJO, INMODIFICABLE Y REEMBOLSABLE con la finalidad que serán ejecutados en la proporción y durante los tiempos en que se presenten las necesidades que el mismo busca satisfacer. Por ello, durante la ejecución del contrato la Entidad cancelará dichos ítems única y exclusivamente sobre los montos que el contratista logre demostrar su ejecución en desarrollo del objeto contractual, presentando para ello el respectivo soporte del gasto realizado para adquirir el bien o prestar el servicio requerido previa autorización de la Supervisión. Por lo tanto son valores Fijos e Inmodificables por el Oferente en su Propuesta.		$ 15.000.000	**1**	$ 900.000	**(0,06)**	-$ 900.000		$ -		$ -	-	0,00
Asesoria Especializadas (Hidraulicas, Geotecnicas,Suelos,Pavimentos,Estructurales,Geologicas o cualquiera adicional que se requiera. Se pagan contra factura), incluye informe por visita de diagnostico, conclusiones y analisis de resultados	**GL**			$ 50.000.000	**1**	$ 2.500.000	**(0,05)**	-$ 2.500.000		$ -		$ -	-	0,00
TOTAL COSTOS COMPLEMENTARIOS Y DE CONTROL - INSUMOS PARA LA OPERACIÓN (4)				**$ 290.829.800**		**$ 200.229.800**		**-$ 4.400.000**		**$ 4.427.953**		**$ 200.257.753**		**169.947.753,00**
OTROS COSTOS TRANSVERSALES - PÓLIZAS (REEMBOLSABLES - Pagados contra factura o soporte idoneo del valor de la Póliza - siendo el tope máximo para su reconocimiento el valor total ofertado)						**OTROS COSTOS TRANSVERSALES - PÓLIZAS**								**ROS COSTOS TRANSVERSALES - PÓLI**	
PÓLIZAS: REEMBOLSABLE La Entidad estableció el costo de las Pólizas a suscribir con el Contrato, como un VALOR REEMBOLSABLE hasta por el tope ofertado por el Contratista adjudicatario previa presentación de facturas de pago de la póliza y los costos de su ajuste si hubiere lugar a ello. Por lo tanto, este ítem se cancelará en un único pago contra soporte del valor real de la Póliza, siendo el tope máximo para su reconocimiento el valor ofertado por EL ADJUDICATARIO.				**$ 11.811.765,00**		$ 11.811.765		$ -		$ -	**$ -**	$ 11.811.765	-	4.955.432,64
TOTAL OTROS COSTOS - COMPONENTE TRANSVERSAL - PÓLIZAS (5)				**$ 11.811.765**		**$ 11.811.765**		$ -		$ -		**$ 11.811.765**		4.955.432,64
VALOR PARCIAL ACTA (6) =(3)+(4)+(5)				**$ 2.347.243.356**		**$ 2.347.205.287**		**-$ 4.400.000**		**$ 4.427.953**		**$ 2.347.233.240**		**$ 1.593.189.560**
VALOR IVA 19% (7)= (6)*0,19%				**$ 445.976.237,35**		**$ 445.969.004**		**-$ 836.000**		**$ 841.311**		**$ 445.974.315**		**$ 302.706.016**
Ajuste Decimal						**$ 45.302**		**-$ 33.264**				**$ 12.038**		
VALOR IVA 19% (8)= (6)+(7)				**$ 2.793.219.593**		**$ 2.793.219.593**		**-$ 5.269.264**		**$ 5.269.264**		**$ 2.793.219.593**		**$ 1.895.895.576**
PAGOS REALIZADOS						OBSERVACIONES: * LOS VALORES Y LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN LA PRESENTE ACTA SON									

OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA INTERVENCIÓN Y EJECUCION DE OBRAS HIDRÁULICAS EN PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RÍO ABURRÁ MEDELLÍN"						**ACTA DE PAGO No.11**	
CONTRATISTA:	**Consorcio Rio CM 005 de 2025 (Construcciones E Inversiones Asociativas S.A.S 800.217.663-8 50% - Camilo Andrés Ángel Saldarriaga 98.546.133 50%)**					**ANTICIPO:**		
CONTRATO N°.:	**CM 323 de 2025**	**NIT N°**	**901.840.768-1**	**PLAZO:**	**Dieciséis (16) meses**	**RUBRO:**	**FECHA:**	**11/08/2026**
VALOR:	**2793219593**	**ACTA DE INICIO:**	**11 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	**SUPERVISOR AMVA:**	**JOHN JAIRO DE JESUS VARGAS ROLDAN**			

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						**MODIFICACIONES PACTADAS**								**TOTAL PAGADO ACUMULADO**	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIORES		**ACTA DE CAMBIO DE OBRA No. 01 del 15/04/2026**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**			
								NO SE EJECUTA		**SI SE EJECUTA**					
ITEM	**DEDICACIÓN**	**TIEMPO TOTAL REQUERIDO (MESES)**	**CANTIDAD PERSONAL REQUERIDO**	**SALARIO MES**	**COSTO TOTA ($)**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**CANT**	**Valor**	**CANT**	**VALOR**

PAGOS PARCIALES REALIZADOS	**VALOR**	**Iva**	**NETO PAGADO**	**%**
Acta 1	76.906.768	$ 14.612.285	$ 91.519.053	3,28%
Acta 2	137.544.982	$ 26.133.547	$ 163.678.529	5,86%
Acta 3	143.870.592	$ 27.335.412	$ 171.206.004	6,13%
Acta 4	138.572.187	$ 26.328.716	$ 164.900.903	5,90%
Acta 5	147.655.167	$ 28.054.482	$ 175.709.649	6,29%
Acta 6	146.898.252	$ 27.910.668	$ 174.808.920	6,26%
Acta 7	148.412.082	$ 28.198.296	$ 176.610.378	6,32%
Acta 8	158.359.887	$ 30.088.379	$ 188.448.266	6,75%
Acta 9	164.523.117	$ 31.259.392	$ 195.782.509	7,01%
Acta 10	166.036.947	$ 31.547.020	$ 197.583.967	7,07%
Acta 11	164.409.580	$ 31.237.820	$ 195.647.400	7,00%
Acta 12				0,00%
Acta 13				0,00%
Acta 14				0,00%
Acta 15				0,00%
Acta 16				0,00%
Valor Pagado	**1.593.189.561**	**$ 302.706.016**	**$ 1.895.895.577**	**67,87%**

RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA INTERVENTOR Y SUPERVISOR QUIENES HAN EJERCIDO CONTROL DIRECTO DEL PROYECTO COMO ESTA REGISTRADO EN EL INFORMO Y ACTAS

La inversión Por municipio fue la siguiente:

Municipio	%	VALOR
Muncipio Bello	0,10	$ 290.349.831,00
Distrito de Medellin	0,34	$ 947.175.431,00
Municipio De Itagui	0,24	$ 656.804.056,00
Municipio de Envigado	0,00	$ 1.566.260,00
Total Inversion	0,68	$ 1.895.895.578,00

Responsables:	Revisó	Aprabó
ANDREA ALZATE RENDON Representante legal Interventoria Conosrcio Rio CM 005 de 2025	JOHN JAIRO DE JESUS VARGAS ROLDAN Supervisor del Contato Area Metropolitana del Valle de Aburra	Subdirector de Proyectos

CONSORCIO RIO
CM 005 2025
NIT 901984505-8

RELACIÓN DE PERSONAL Y NOMINA
Consorcio Rio CM 005 de 2025 NIT 901.840.768-1

CONTRATO CM 323 DE 2025 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA INTERVENCIÓN Y EJECUCION DE OBRAS HIDRÁULICAS EN PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RÍO ABURRÁ MEDELLÍN"

PERIODO DEL 1/07/2026 AL 31/07/2026

No.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SALARIO	% DEDICACION	No.días	SUBTotal	EPS 4%	EPS 4%	FONDO SOLIDARIDAD 1%	VALOR NETO NOMINA
1	Fernando Mauricio Upegui Rivillas	71734111	Director de Interventoría	Camilo Andres Angel Saldarriaga	11/09/2025		$ 13.523.250,00	50%	30,00	6.761.625,00	$ 270.465	$ 270.465	$ 67.616	$ 6.153.079
2	Gaudelia Cristina Jaramillo Lopez	43828454	Residente de interventoría Obra	Camilo Andres Angel Saldarriaga	7/10/2025		$ 9.252.759,00	100%	30,00	9.252.759,00	$ 370.110	$ 370.110	$ 92.528	$ 8.420.011
3	Aracelly Santos Velásquez	32182430	Residente Ambiental	Camilo Andres Angel Saldarriaga	11/09/2025		$ 7.829.250,00	100%	30,00	7.829.250,00	$ 313.170	$ 313.170	$ 78.293	$ 7.124.618
4	Luisa Fernanda Burgos Araque	1128481476	Residente de Interventoría Social	Construcciones e Inversiones Asociativas	26/09/2025		$ 7.829.250,00	100%	30,00	7.829.250,00	$ 313.170	$ 313.170	$ 78.293	$ 7.124.618
5	Dina Mileny Garcia Marmolejo	1028008669	Residente de Interventoría en Seguridad y Salud en el Trabajo	Construcciones e Inversiones Asociativas	11/09/2025		$ 7.829.250,00	100%	30,00	7.829.250,00	$ 313.170	$ 313.170	$ 78.293	$ 7.124.618
6	Fabian Ramiro Gomez Molina	70415440	Auxiliar de Ingeniería	Camilo Andres Angel Saldarriaga	7/10/2025		$ 5.694.000,00	100%	30,00	5.694.000,00	$ 227.760	$ 227.760	$ 56.940	$ 5.181.540
7	Brayan Estiven Munera Montoya.	1040754671	Auxiliar de Ingeniería	Consorcio Rio CM 005 de 2025	15/09/2025		$ 5.694.000,00	100%	30,00	5.694.000,00	$ 227.760	$ 227.760	$ 56.940	$ 5.181.540
8	José Ricardo Martínez Montealegre	18261918	Auxiliar de Ingeniería	Consorcio Rio CM 005 de 2025	15/04/2026		$ 5.694.000,00	100%	30,00	5.694.000,00	$ 227.760	$ 227.760	$ 56.940	$ 5.181.540
9	Michael Alexisi Londoño Suaza	11128427485	Auxiliar de Ingeniería	Consorcio Rio CM 005 de 2025	15/04/2026		$ 5.694.000,00	100%	30,00	5.694.000,00	$ 227.760	$ 227.760	$ 56.940	$ 5.181.540
10	Jessica Lorena Saldarriaga Higinio	1035390338	Auxiliar de Ambiental	Consorcio Rio CM 005 de 2025	6/10/2025		$ 5.694.000,00	100%	30,00	5.694.000,00	$ 227.760	$ 227.760	$ 56.940	$ 5.181.540
11	Lilibeth Barrios Rodriguez	1069492217	Auxiliar Social	Consorcio Rio CM 005 de 2025	30/09/2025		$ 5.694.000,00	100%	30,00	5.694.000,00	$ 227.760	$ 227.760	$ 56.940	$ 5.181.540
11	María Caralina Martínez	32106185	Auxiliar Social	Camilo Andres Angel Saldarriaga	25/06/2026		$ 5.694.000,00	100%	30,00	5.694.000,00	$ 227.760	$ 227.760	$ 56.940	$ 5.181.540
12	Shirly Vanesa Valencia Rendon	1017215422	Auxiliar en Seguridad y Salud en el Trabajo	Consorcio Rio CM 005 de 2025	1/07/2026		$ 5.694.000,00	100%	30,00	5.694.000,00	$ 227.760	$ 227.760	$ 56.940	$ 5.181.540
TOTAL NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026										**$ 85.054.134**	**$ 3.402.165**	**$ 3.402.165**	**$ 850.541**	**$ 77.399.263**

FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025

Bancolombia
Sucursal Virtual Negocios

Acero Y Concreto Ltda - Nit: 811026401
Martes, 21 de julio de 2026, 9:13:09 a.m.

Número del registro
14

Fecha de aplicación
15 Jul 2026

Nombre del destinatario
Fernando Mauricio

Identificación destinatario
71734111

Producto destino
101 - 494952 - 96

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 11.097.408,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.249.156.53

Bancolombia
Sucursal Virtual Negocios

Acero Y Concreto Ltda - Nit: 811026401
Lunes, 03 de agosto de 2026, 9:44:36 a.m.

Número del registro
17

Fecha de aplicación
30 Jul 2026

Nombre del destinatario
Fernando Mauricio

Identificación destinatario
71734111

Producto destino
101 - 494952 - 96

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 10.476.537,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.249.156.53

Bancolombia
Sucursal Virtual Negocios

Acero Y Concreto Ltda - Nit: 811026401
Martes, 21 de julio de 2026, 9:16:48 a.m.

Número del registro
40

Fecha de aplicación
15 Jul 2026

Nombre del destinatario
Gaudelia Cristina

Identificación destinatario
43828454

Producto destino
105 - 670471 - 95

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 4.658.375,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia
Sucursal Virtual Negocios

Acero Y Concreto Ltda - Nit: 811026401
Lunes, 03 de agosto de 2026, 9:50:09 a.m.

Número del registro
42

Fecha de aplicación
30 Jul 2026

Nombre del destinatario
Gaudelia Cristina

Identificación destinatario
43828454

Producto destino
105 - 670471 - 95

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 4.037.504,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia
Sucursal Virtual Negocios

Acero Y Concreto Ltda - Nit: 811026401
Martes, 21 de julio de 2026, 9:17:49 a.m.

Número del registro
44

Fecha de aplicación
15 Jul 2026

Nombre del destinatario
Aracelly Santos

Identificación destinatario
32182430

Producto destino
342 - 304546 - 73

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 4.177.058,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.249.156.53

Bancolombia
Sucursal Virtual Negocios

Acero Y Concreto Ltda - Nit: 811026401
Lunes, 03 de agosto de 2026, 9:52:01 a.m.

Número del registro
46

Fecha de aplicación
30 Jul 2026

Nombre del destinatario
Aracelly Santos

Identificación destinatario
32182430

Producto destino
342 - 304546 - 73

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.956.187,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.249.156.53

Bancolombia
Sucursal Virtual Negocios

Acero Y Concreto Ltda - Nit: 811026401
Martes, 21 de julio de 2026, 9:18:02 a.m.

Número del registro
45

Fecha de aplicación
15 Jul 2026

Nombre del destinatario
Luisa Fernanda Bur

Identificación destinatario
1128481476

Producto destino
994 - 5366 - 30

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 3.965.790,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.249.156.53

Bancolombia
Sucursal Virtual Negocios

Acero Y Concreto Ltda - Nit: 811026401
Lunes, 03 de agosto de 2026, 9:52:19 a.m.

Número del registro
47

Fecha de aplicación
30 Jul 2026

Nombre del destinatario
Luisa Fernanda Bur

Identificación destinatario
1128481476

Producto destino
994 - 5366 - 30

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 3.344.919,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.249.156.53

Bancolombia
Sucursal Virtual Negocios

Acero Y Concreto Ltda - Nit: 811026401
Martes, 21 de julio de 2026, 9:17:08 a.m.

Número del registro
41

Fecha de aplicación
15 Jul 2026

Nombre del destinatario
Dina Mileny Garcia

Identificación destinatario
1028008669

Producto destino
645 - 494957 - 60

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 3.965.790,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia
Sucursal Virtual Negocios

Acero Y Concreto Ltda - Nit: 811026401
Lunes, 03 de agosto de 2026, 9:51:27 a.m.

Número del registro
43

Fecha de aplicación
30 Jul 2026

Nombre del destinatario
Dina Mileny Garcia

Identificación destinatario
1028008669

Producto destino
645 - 494957 - 60

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 3.344.919,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia
Sucursal Virtual Negocios

Acero Y Concreto Ltda - Nit: 811026401
Martes, 21 de julio de 2026, 9:19:01 a.m.

Número del registro
48

Fecha de aplicación
15 Jul 2026

Nombre del destinatario
Fabian Ramiro Gome

Identificación destinatario
70415440

Producto destino
106 - 970979 - 49

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.966.697,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.249.156.53

Bancolombia
Sucursal Virtual Negocios

Acero Y Concreto Ltda - Nit: 811026401
Lunes, 03 de agosto de 2026, 9:53:39 a.m.

Número del registro
50

Fecha de aplicación
30 Jul 2026

Nombre del destinatario
Fabian Ramiro Gome

Identificación destinatario
70415440

Producto destino
106 - 970979 - 49

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.245.826,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.249.156.53

Bancolombia
Sucursal Virtual Negocios

Acero Y Concreto Ltda - Nit: 811026401
Martes, 21 de julio de 2026, 9:17:19 a.m.

Número del registro
42

Fecha de aplicación
15 Jul 2026

Nombre del destinatario
Brayan Estiven Mun

Identificación destinatario
1040754671

Producto destino
360 - 000144 - 21

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.966.697,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.249.156.53

Bancolombia
Sucursal Virtual Negocios

Acero Y Concreto Ltda - Nit: 811026401
Lunes, 03 de agosto de 2026, 9:51:44 a.m.

Número del registro
45

Fecha de aplicación
30 Jul 2026

Nombre del destinatario
Brayan Estiven Mun

Identificación destinatario
1040754671

Producto destino
360 - 000144 - 21

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.245.826,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.249.156.53

Bancolombia
Sucursal Virtual Negocios

Acero Y Concreto Ltda - Nit: 811026401
Martes, 21 de julio de 2026, 9:19:15 a.m.

Número del registro
49

Fecha de aplicación
15 Jul 2026

Nombre del destinatario
Jose Ricardo Marti

Identificación destinatario
18261918

Producto destino
279 - 565763 - 48

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.966.697,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia
Sucursal Virtual Negocios

Acero Y Concreto Ltda - Nit: 811026401
Lunes, 03 de agosto de 2026, 9:54:13 a.m.

Número del registro
51

Fecha de aplicación
30 Jul 2026

Nombre del destinatario
Jose Ricardo Marti

Identificación destinatario
18261918

Producto destino
279 - 565763 - 48

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.245.826,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia
Sucursal Virtual Negocios

Acero Y Concreto Ltda - Nit: 811026401
Martes, 21 de julio de 2026, 9:19:41 a.m.

Número del registro
50

Fecha de aplicación
15 Jul 2026

Nombre del destinatario
Michael Alexis Lon

Identificación destinatario
1128427485

Producto destino
644 - 0158 - 23

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.966.697,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia
Sucursal Virtual Negocios

Acero Y Concreto Ltda - Nit: 811026401
Lunes, 03 de agosto de 2026, 9:54:36 a.m.

Número del registro
52

Fecha de aplicación
30 Jul 2026

Nombre del destinatario
Michael Alexis Lon

Identificación destinatario
1128427485

Producto destino
644 - 0158 - 23

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.245.826,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia
Sucursal Virtual Negocios

Acero Y Concreto Ltda - Nit: 811026401
Martes, 21 de julio de 2026, 9:18:38 a.m.

Número del registro
47

Fecha de aplicación
15 Jul 2026

Nombre del destinatario
Jessica Lorena Sal

Identificación destinatario
1035390338

Producto destino
185 - 822 - 17

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Nu

Valor
COP $ 2.922.400,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia
Sucursal Virtual Negocios

Acero Y Concreto Ltda - Nit: 811026401
Lunes, 03 de agosto de 2026, 9:53:19 a.m.

Número del registro
49

Fecha de aplicación
30 Jul 2026

Nombre del destinatario
Jessica Lorena Sal

Identificación destinatario
1035390338

Producto destino
185 - 822 - 17

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Nu

Valor
COP $ 2.301.529,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia
Sucursal Virtual Negocios

Acero Y Concreto Ltda - Nit: 811026401
Martes, 21 de julio de 2026, 9:15:27 a.m.

Número del registro
24

Fecha de aplicación
15 Jul 2026

Nombre del destinatario
Maria Catalina Mar

Identificación destinatario
32106185

Producto destino
103 - 222119 - 35

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.965.790,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.249.156.53

Bancolombia
Sucursal Virtual Negocios

Acero Y Concreto Ltda - Nit: 811026401
Lunes, 03 de agosto de 2026, 9:48:01 a.m.

Número del registro
26

Fecha de aplicación
30 Jul 2026

Nombre del destinatario
Maria Catalina Mar

Identificación destinatario
32106185

Producto destino
103 - 222119 - 35

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.344.919,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.249.156.53

Bancolombia
Sucursal Virtual Negocios

Acero Y Concreto Ltda - Nit: 811026401
Martes, 21 de julio de 2026, 9:18:24 a.m.

Número del registro
46

Fecha de aplicación
15 Jul 2026

Nombre del destinatario
Lilibeth Barrios R

Identificación destinatario
1069492217

Producto destino
236 - 552427 - 24

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.966.697,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia
Sucursal Virtual Negocios

Acero Y Concreto Ltda - Nit: 811026401
Lunes, 03 de agosto de 2026, 9:52:49 a.m.

Número del registro
48

Fecha de aplicación
30 Jul 2026

Nombre del destinatario
Lilibeth Barrios R

Identificación destinatario
1069492217

Producto destino
236 - 552427 - 24

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.245.826,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia
Sucursal Virtual Negocios

Acero Y Concreto Ltda - Nit: 811026401
Martes, 21 de julio de 2026, 9:24:29 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
16 Jul 2026

Nombre del destinatario
Sirly Vanessa Nequ

Identificación destinatario
1017215422

Producto destino
322 - 31162 - 15

Tipo de producto
Dep.electronico

Banco
Nequi

Valor
COP $ 2.966.697,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia
Sucursal Virtual Negocios

Acero Y Concreto Ltda - Nit: 811026401
Jueves, 30 de julio de 2026, 7:46:15 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
29 Jul 2026

Nombre del destinatario
Sirly Vanessa Nequ

Identificación destinatario
1017215422

Producto destino
322 - 31162 - 15

Tipo de producto
Dep.electronico

Banco
Nequi

Valor
COP $ 2.245.826,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO RIO
CM 005 2025
NIT 901984505-8

Servicio de Transporte de personal (Incluye costos de Conductor, mantenimiento y demás gastos de sostenimiento del Vehículo)

Consorcio Rio CM 005 de 2025 NIT 901.840.768-1

CONTRATO CM 323 DE 2025 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA INTERVENCIÓN Y EJECUCION DE OBRAS HIDRÁULICAS EN PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RÍO ABURRÁ MEDELLÍN"

PERIODO DEL 1/07/2026 AL 31/07/2026

No.	PLACA	CLASE DE VEHÍCULO	MODELO	MATRÍCULA	COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. PÓLIZA SOAT	VIGENCIA SOAT	CONDUCTOR	CÉDULA	dias	VALOR
1	**TDF268**	TAXI	2008	10001907457	AXA Colpatria	3493128200	2025/12/29 al 2026/12/28	Jorge Ivan Chalarca Acevedo	98560242	30	$ 7.000.000,00
VALOR TRANSPORTE ACTA NO 10											$ 7.000.000,00

FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025

Medellín, Agosto 06 de 2026

CUENTA DE COBRO NO 11

EL CONSOCIO RIO CM 005 DE 2025 NIT 901.840.768-1

DEBE A

JORGE IVAN CHALARCA ACEVEDO CC 98.560.242 DE ENVIGADO

LA SUMA DE


SIETE MILLONES CIEN MIL PESOS M.L $ 7.100.000

POR CONCEPTO DE:

Gastos en Transporte de personal (Vehículo placas TDF268 Hyundai) para el contrato 323 de 2025 “Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Ambiental Y Contable A La Intervención Y Ejecución De Obras Hidráulicas En Puntos Críticos Identificados En El Canal Del Río Aburrá Medellín", durante el periodo de 01 al 31 de Julio de 2026.

Favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia 00711345299.

Atentamente



JORGE IVAN CHALARCA ACEVEDO

CC 98.560.242 DE ENVIGADO

Celular 3013638647

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 98.560.242
CHALARCA ACEVEDO

APELLIDOS
JORGE IVAN


NOMBRES

Jorge Ivan Chalarca A

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-MAR-1972
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

30-NOV-1990 ENVIGADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0112100-00035941-M-0098560242-20080731 0001678633A 1 2320000199

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No. 98560242

Libertad y Orden

NOMBRE
JORGE IVAN CHALARCA ACEVEDO

FECHA DE NACIMIENTO
06-03-1972

SANGRE-RH
O+

FECHA DE EXPEDICION
26-07-2024

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR
CONDUCIR CON LENTES

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
STRIA TTEyTTO ENVIGADO



República de Colombia

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS.	26-07-2034	PARTICULAR
C1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS.	26-07-2027	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03007758176

Servicios Integrales 60947.2.0-27 02/24

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10001907457

PLACA: TSF268	MARCA: HYUNDAI	LÍNEA: ATOS PRIME GL	MODELO: 2008
CILINDRADA CC: 1.000	COLOR: AMARILLO		SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: AUTOMOVIL	TIPO CARROCERÍA: SEDAN	COMBUSTIBLE: GASOLINA	CAPACIDAD Kg/PSJ: 4
NÚMERO DE MOTOR: G4HC7M266953		REG: N VIN: ******	
NÚMERO DE SERIE: MALAB51GP8M211569	REG: N	NÚMERO DE CHASIS: MALAB51GP8M211569	REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): CHALARCA ACEVEDO JORGE IVAN

IDENTIFICACIÓN: C.C. 98560242

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE: ******	POTENCIA HP: 0	
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 00610698	I/E: E	FECHA IMPORT.: 29/11/2007	PUERTAS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: *******			
FECHA MATRÍCULA: 22/12/2007	FECHA EXP. LIC. TTO.: 24/05/2011	FECHA VENCIMIENTO: ******	

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA DE TTOYTTE MEDELLIN



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 182688847

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CDA ENVISUR		
NIT:	900166571	No. de Certificado de Acreditación:	10-OIN-007-001
Fecha de expedición:	2025/07/22	Fecha de vencimiento:	2026/07/22

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	TSF268	CLASE:	AUTOMOVIL
MARCA:	HYUNDAI	MODELO:	2008
SERVICIO:	Público	COMBUSTIBLE:	GASOLINA
CILINDRAJE:	1000	NRO. MOTOR:	G4HC7M266953
NRO. CHASIS:	MALAB51GP8M211569	VIN:	
LÍNEA:	ATOS PRIME GL		
COLOR:	AMARILLO		
NOMBRE PROPIETARIO:	JORGE I. CHALARCA A.		

FIRMA DEL RESPONSABLE

CLAUDIA ASTRID OSORIO VILLA

ASEGURADORA

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

seguros mundial®
tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2024	12	28	2024	12	29	2025	12	28

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
89827146 - 600009335	TSF268	AUTOS DE NEGOCIO ALQUILER ENSEÑANZA	PUBLICO	1000	2008

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
4	HYUNDAI	SEDAN
LÍNEA VEHÍCULO	ATOSPRIMEGL	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
G4HC7M266953	MALAB51GP8M211569	NA	0,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
JORGE IVAN CHALARCA ACEVEDO	3013638647	CC	98560242	MEDELLIN

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	470	13158	89827146	5001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
71	$ 206.700	$ 107.400	$ 2.100

TOTAL A PAGAR

$ 316.200

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Ter-cero



Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos
- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data
Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/legal. Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos
[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en [1]

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.28 10:59:06 -05:00

TARJETA DE CONTROL

Vigilado SuperTransporte

20260606-9856**



APELLIDOS Y NOMBRES: CHALARCA ACEVEDO JORGE IVAN
TIPO: A
EPS: SURA COMPANIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD S.A
ARL: SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A
LICENCIA: 9856**
CAT: C1
RH: O+
VENCIMIENTO: 25/07/2027
NUMERO SS:
EMPRESA: TAX COOPEBOMBAS
SITIO DE CONTROL: CALLE 59 51D 41
EDAD - SEXO: 54-MASCULINO
VENCIMIENTO TC: 01/07/2026

PLACA	SOAT	F. VENCE SOAT	RTM	F. VENCE RTM	COMUNICACIÓN	N. INTERNO
TSF268	3493128200	28/12/2026	182688847	2026/07/22	NINGUNO	12791

Por consenso firmado por los alcaldes del Área Metropolitana desde abril de 1991, las tarifas que se cobren por el servicio público individual de pasajeros en vehículos taxi, son unificadas en todos los municipios del Valle del Aburrá, teniendo como base las tarifas que mediante decreto hayan sido fijadas en el municipio de Medellín.

"LOS CONDUCTORES DEBEN PORTAR LA TARJETA DE CONTROL EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL VEHÍCULO": DECRETO Nº 172 DE 2001, Y EN CONCORDANCIA CON LA RESOLUCION 071 DE 2013.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES TAX
COOPEBOMBAS | Nit. 890.905.730-2
Calle 59 N 51D-41 | Tel: 6045124243 |
Medellín - Antioquia
www.coopebombas.com | info@coopebombas.com

VALORES BÁSICOS 2026

CONCEPTO	VALOR
BANDERAZO	$5.900
CARRERA MINIMA	$8.300
HORA SERVICIO	$35.800
OCHENTA Y DOS METROS DE RECORRIDO	$200
SESENTA SEGUNDOS	$300
VALOR AEROPUERTO JMC DESDE COPACABANA	$132.000
VALOR AEROPUERTO JMC DESDE ENVIGADO	$132.000
VALOR AEROPUERTO JMC DESDE ITAGUI	$144.000
VALOR AEROPUERTO JMC DESDE LA ESTRELLA	$158.000
VALOR AEROPUERTO JMC DESDE MEDELLIN	$132.000
VALOR AEROPUERTO JMC DESDE SABANETA	$135.000

AUTORIZADO HASTA

01/07/2026

SELLO: 43988*** A LAS 08:24:26
2.0.0

COOPEBOMBAS

Escaneando este código QR conoce la información del conductor

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

ARTICULO 2.2.1.3.8.12 DECRETO 1079 26 DE MAYO DE 2015

DIEGO FABIAN LOMBANA RIVERA
DIRECTOR JURÍDICO

Sr. Conductor la vigencia de esta tarjeta va sujeta a la fecha de pago de la seguridad social.



SECRETARIA DE TRANSPORTES Y TRÁNSITO MEDELLIN(ANT)



TARJETA No 405068

PLACA TSF268

TARJETA DE OPERACIÓN

VEHICULO

CLASE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	MARCA	MODELO
AUTOMOVIL	SEDAN	HYUNDAI	2008

TIPO DE COMBUSTIBLE	Nº MOTOR	NIVEL DE SERVICIO
GASOLINA	G4HC7M266953	ORDINARIO

EMPRESA

RAZON SOCIAL EMPRESA	Nº INTERNO
TAX COOPEBOMBAS	NI: 12791

SEDE	RADIO ACCION
STRIA DE TTOyT	MUNICIPAL

ZONA OPERACION	CAPACIDAD SENTADOS	CAPACIDAD DE PIE
MEDELLIN	4	0

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
27/04/2026	23/05/2026	23/05/2027

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-12, 02:57:59 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 86922763

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8904099458

PAGADO 10/08/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JORGE IVAN CHALARCA ACEVEDO		
Documento	CC98560242	**Dirección**	CR 82A #30 - 27 CASA SEGUNDO PISO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3888385
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 98560242	JORGE IVAN CHALARCA ACEVEDO	57	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 575.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 575.300	$ 0	$ 575.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comisión de Topografía para localización, trazado y replanteo con equipo de precisión con estación total, 1 topógrafo, 2 cadeneros, equipo de comision de topografia,1obrero; incluye demarcación, pintura línea de trazado, memorias de cálculo, copia de carteras, también transporte, archivos digitales, salarios, prestaciones. (10 dias por mes)

Consorcio Rio CM 005 de 2025 NIT 901.840.768-1

CONSORCIO RIO
CM 005 2025
NIT 901984505-8

CONTRATO CM 323 DE 2025 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA INTERVENCIÓN Y EJECUCION DE OBRAS HIDRÁULICAS EN PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RÍO ABURRÁ MEDELLÍN"

PERIODO DEL 1/07/2026 AL 31/07/2026

No.	FECHA	NOMBRE	CEDULA	CARGO	Empresa	planilla SS
1	**31/07/2026**	José Otoniel Arenas Campuzano	18400903	Topografo	Camilo Andres Angel Saldarriaga	86570692 del 03/08/2026
2	**31/07/2026**	Juan Daniel German Serpa	**1067942251**	Cadenero 1	Camilo Andres Angel Saldarriaga	86570692 del 03/08/2026
3	**31/07/2026**	Norman Alexis Castaño Rave	**71741049**	Cadenero 2	Camilo Andres Angel Saldarriaga	86570692 del 03/08/2026
4	**31/07/2026**	Santiago Cavadia Baragan	**1193119439**	Obrero	Construcciones Inversiones Asociativas	86561386 del 03/08/2026
	Equipo	Nivel Automático marca TOPCON Modelo AT-B4 Serie N22842			Certificado 2387 del 28/08/2025	
		Estación Total Marca SUNWAY Modelo ATS-120A Serie H227388			Certificado 2387 del 28/08/2025	

		Actividad realizada	valor día	cantidad	valor
1	1/06/2026	La García Bello: Seguimiento a las actividades de excavación ejecutadas en el frente de la Quebrada La García, verificando las condiciones geométricas del tramo intervenido y direccionador número 2 y efectuando control de alineamientos y niveles	$ 756.915	1	$ 756.915
2	2/06/2026	La Aguacatala - Poblado (LA 4 SUR): topográfico al proceso de excavación de la llave en el tramo correspondiente al K0+470	$ 756.915	1	$ 756.915
3	3/06/2026	La Aguacatala - Poblado (LA 4 SUR) seguimiento a la localización de puntos de línea y niveles requeridos para la excavación y posterior vaciado de la llave en el muro del costado derecho del río	$ 756.915	1	$ 756.915
4	4/06/2026	La García Bello: Se realizó acompañamiento a las actividades topográficas correspondientes al Direccionador No. 2, verificando puntos de referencia, línea de llave, niveles de excavación y cotas del concreto ejecutado	$ 756.915	1	$ 756.915
5	5/06/2026	La Aguacatala - Poblado (LA 4 SUR) Se efectuó seguimiento al control topográfico desarrollado durante la excavación de la llave en el costado derecho del río,(tramo del metro) verificando línea de borde y niveles del tramo ejecutado	$ 756.915	1	$ 756.915
6	10/06/2026	La Aguacatala - Poblado (LA 4 SUR) chequeo de línea de formaleta, niveles de excavación y puntos de control utilizados para el vaciado en km0+471.	$ 756.915	1	$ 756.915
7	11/06/2026	La Aguacatala - Poblado (LA 4 SUR) seguimiento a los controles topográficos sobre línea de formaleta, verticalidades y niveles de vaciado del muro (tramo del metro).Se realiza control a los niveles y la línea de formaleta para vaciado de llave anti socavación en k0+464 al k0+475	$ 756.915	1	$ 756.915

Comisión de Topografía para localización, trazado y replanteo con equipo de precisión con estación total, 1 topógrafo, 2 cadeneros, equipo de comision de topografia,1obrero; incluye demarcación, pintura línea de trazado, memorias de cálculo, copia de carteras, también transporte, archivos digitales, salarios, prestaciones. (10 dias por mes)

CONSORCIO RIO
CM 005 2025
NIT 901984505-8

Consorcio Rio CM 005 de 2025 NIT 901.840.768-1

CONTRATO CM 323 DE 2025 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA INTERVENCIÓN Y EJECUCION DE OBRAS HIDRÁULICAS EN PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RÍO ABURRÁ MEDELLÍN"

PERIODO DEL 1/07/2026 AL 31/07/2026

No.	FECHA	NOMBRE	CEDULA	CARGO	Empresa	planilla SS
8	12/06/2026	La Aguacatala - Poblado (LA 4 SUR) Se realizó revisión de los puntos utilizados para el control de niveles requeridos en la instalación del puente peatonal y chequeo de niveles de vaciado entre K0+460 y K0+478		$ 756.915	1	$ 756.915
9	16/06/2026	La Aguacatala - Poblado (LA 4 SUR) Se realizó control topográfico a las excavaciones del tramo K0+373, verificando línea de excavación, niveles de vaciado para llave anti socavación costado izquierdo del rio		$ 756.915	1	$ 756.915
10	17/06/2026	La Aguacatala - Poblado (LA 4 SUR) Se realizó control topográfico a las excavaciones del tramo K0+373, verificando línea de excavación, niveles de vaciado para llave anti socavación costado izquierdo del rio		$ 756.915	1	$ 756.915
11	18/06/2026	La Aguacatala - Poblado (LA 4 SUR) Se realizó control a las excavaciones desarrolladas alrededor del K0+380, costado derecho del rio para la llave antisocavación, verificando líneas, niveles y puntos topográficos utilizados por el contratista		$ 756.915	1	$ 756.915
12	19/06/2026	La Aguacatala - Poblado (LA 4 SUR) verificando línea de excavación, niveles y puntos topográficos del tramo frente al metro k0+040. Verificación de la línea y niveles para llave anti socavación costado izquierdo k0+380		$ 756.915	1	$ 756.915
13	30/06/2026	La García Bello: Se realizó seguimiento a las actividades topográficas ejecutadas en el frente de la Quebrada La García, verificando poligonal, desde el campamento hasta la abscisa 33+820 donde ira la traviesa,		$ 756.915	1	$ 756.915
	TOTAL COMISION DE TOPOGRAFÍA				**13,00**	**$ 9.839.895**

FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025

Nombre De Topografía.	José Otoniel Arenas Campuzano Cc.18.400.903 - Tecnólogo En Topografía.		
Licencia Profesional.	01-11654	**Resolución:**	02-1655 DEL 29/06/2006.
onformada	Topógrafo	**18400903**	José Otoniel Arenas Campuzano
	Cadenero 1	**1067942251**	Juan Daniel German Serpa
	Cadenero 2	**1128449344**	Norman Alexis Castaño Rave
	Obrero	**1039461306**	Santiago Cavadia Baragan
Equipo	Nivel Automático marca TOPCON Modelo AT-B4 Serie N22842		
	Estación Total Marca SUNWAY Modelo ATS-120A Serie H227388		

REGISTRO DE ACTIVIDADES TOPOGRÁFICAS – DEL 1 AL 31 DE JULIO 2026

1. **01 de julio de 2026 – Proyecto La García**

   Se realizó acompañamiento y verificación a las actividades topográficas ejecutadas en el sector del DR #2, revisando los puntos localizados y su correspondencia con el levantamiento topográfico comprendido aproximadamente entre las abscisas K133+720 y K137+920. Se efectuó control de la información tomada sobre elementos existentes en el sector, incluyendo placa, box culvert y lámina de río, verificando la correcta referencia de los puntos utilizados durante el levantamiento.



2. **02 de julio de 2026 – Proyecto La Aguacatala**

   Se efectuó seguimiento a los levantamientos topográficos realizados sobre el material acopiado para los accesos ubicados aproximadamente en las abscisas K0+204 y K0+462, verificando los puntos tomados para su representación y control. Adicionalmente, se revisó la localización correspondiente a la traviesa #5, margen izquierda, incluyendo los niveles de excavación y vaciado. También se verificó la

CARRERA 43ª # 1 ASUR -29 EDIFICIO COLMENA OFICINA 802 MEDELLIN COLOMBIA
interriomedellinamva2025@gmail.com

marcación de abscisas desde la K0+500 hasta la K0+520, comprobando su ubicación respecto a las referencias existentes en obra.



3. **03 de julio de 2026 – Proyecto La Aguacatala**


Se realizó seguimiento y control a la marcación de abscisas ejecutada por el contratista, verificando las referencias comprendidas entre la K0+480 y la K0+760, dispuestas cada 20 metros sobre el muro llave, así como las correspondientes al cerramiento entre la K0+140 y la K0+460. Durante la jornada se verificó igualmente la condición presentada en la traviesa #5, margen derecha, donde no fue posible materializar los puntos previstos debido a la profundidad del río en dicho tramo.



CARRERA 43ª # 1 ASUR -29 EDIFICIO COLMENA OFICINA 802 MEDELLIN COLOMBIA
interriomedellinamva2025@gmail.com

4. **04 de julio de 2026 – Proyecto La Auactala**

Se efectuó revisión de la localización topográfica correspondiente a la línea de traviesa numero 6, verificando los respectivos niveles establecidos para excavación y vaciado. Se realizó control de la alineación y de las referencias empleadas para garantizar la correcta ejecución de las actividades constructivas.

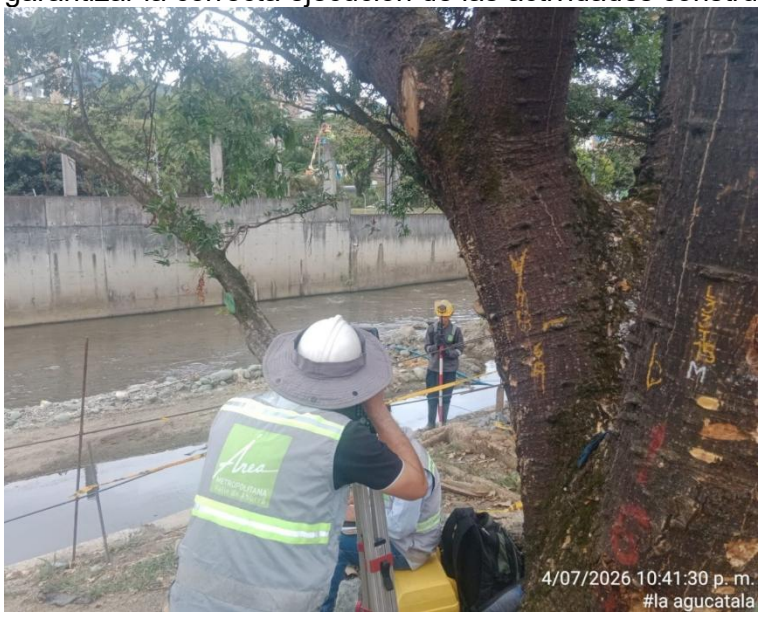

5. **14 de julio de 2026 – Proyecto La 4 Sur**

Se realizó seguimiento a la localización de los puntos de control correspondientes al contradique en la abscisa aproximada K0+0 verificando sus niveles de excavación. y las referencias de línea utilizadas para la ejecución de la estructura.



6. **15 de julio de 2026 – Proyecto La 4 Sur / La Aguacatala**

CARRERA 43ª # 1 ASUR -29 EDIFICIO COLMENA OFICINA 802 MEDELLIN COLOMBIA
interriomedellinamva2025@gmail.com

Se efectuó control a los puntos de línea y niveles de vaciado y excavación correspondientes a la llave ubicada aproximadamente en la K0+575. Posteriormente, en el frente de La Aguacatala, se verificaron los puntos topográficos empleados para el control de excavación y vaciado de las estructuras ejecutadas en el sector, incluyendo el seguimiento a las referencias de línea y niveles establecidas en campo.



7. **16 de julio de 2026 – Proyecto La García**

Se realizó verificación de los puntos de línea y niveles correspondientes a la llave, revisando las referencias ubicadas aproximadamente entre las abscisas K134+270 y K134+310. Igualmente, se efectuó seguimiento a los puntos topográficos utilizados para el control de la excavación, comprobando su correspondencia con la geometría prevista para la estructura.



CARRERA 43ª # 1 ASUR -29 EDIFICIO COLMENA OFICINA 802 MEDELLIN COLOMBIA
interriomedellinamva2025@gmail.com

8. **17 de julio de 2026 – Proyecto La agucatala**

Se efectuó acompañamiento al levantamiento topográfico realizado sobre el muro existente en el costado izquierdo de la quebrada, verificando las mediciones tomadas desde el inicio del muro hasta la traviesa #6. Se revisaron las referencias y la longitud obtenida en campo, con el propósito de mantener control sobre la geometría y condiciones existentes del sector.



9. **18 de julio de 2026 – Proyecto La Agucatala**

Se realizó control topográfico a las actividades de excavación correspondientes a la continuación de construcción de la traviesa número 6, verificando la línea y los niveles establecidos para su ejecución. Se efectuó seguimiento a la marcación de los puntos necesarios para comprobar su posición y nivel respecto a las referencias del proyecto.



CARRERA 43ª # 1 ASUR -29 EDIFICIO COLMENA OFICINA 802 MEDELLIN COLOMBIA
interriomedellinamva2025@gmail.com

10. 21 de julio de 2026 – Proyecto La García

Se efectuó revisión de la localización de los puntos de línea correspondientes a la formaleta de la llave en la K34+270, verificando las referencias utilizadas para su posicionamiento y el control de la información topográfica necesaria para la correcta ubicación de la estructura.



11. 22 de julio de 2026 – Proyecto La 4 Sur


Se realizó seguimiento a la localización de puntos correspondientes al eje de la traviesa ubicada aproximadamente en la K0+496, verificando las referencias utilizadas para su implantación. En conjunto con la comisión topográfica del contratista se efectuó chequeo de los niveles de la llave aproximadamente entre las abscisas K0+530 y K0+560, comprobando su correspondencia con las condiciones requeridas para la ejecución de la obra.



CARRERA 43ª # 1 ASUR -29 EDIFICIO COLMENA OFICINA 802 MEDELLIN COLOMBIA
interriomedellinamva2025@gmail.com

12. 23 de julio de 2026 – Proyecto La 4 Sur

Se efectuó seguimiento al control topográfico realizado en el sector de la K0+560, verificando los puntos correspondientes a la estructura y las referencias de la poligonal establecida para el control de obra. Se revisaron los puntos de línea y niveles requeridos para la llave, así como las referencias utilizadas para el seguimiento de las actividades constructivas.

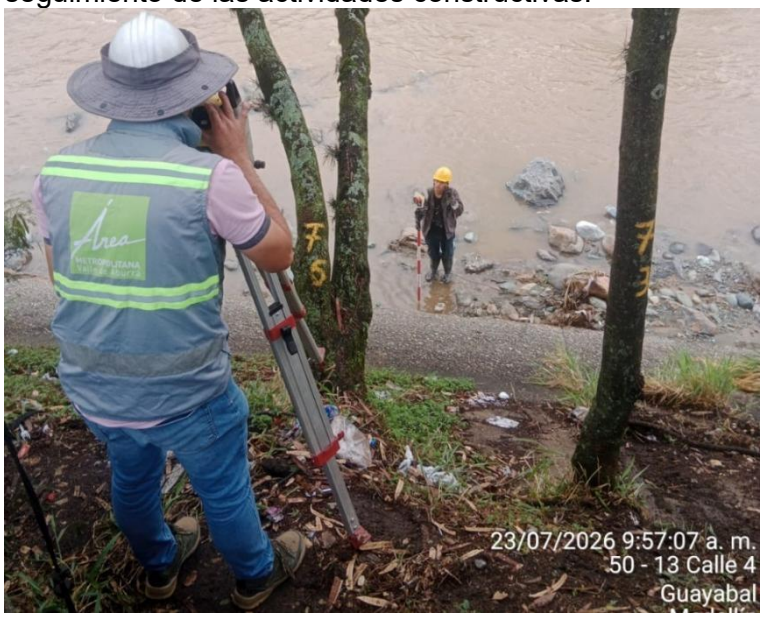


13. 24 de julio de 2026 – Proyecto La 4 Sur

Se realizó verificación de los puntos de línea y niveles correspondientes a la llave ubicada aproximadamente en la K0+575, efectuando control de las referencias establecidas para el proceso de vaciado. Adicionalmente, se revisaron los puntos utilizados para el control de excavación de la misma estructura, comprobando alineamiento y niveles antes de la continuidad de las actividades constructivas.



CARRERA 43ª # 1 ASUR -29 EDIFICIO COLMENA OFICINA 802 MEDELLIN COLOMBIA
interriomedellinamva2025@gmail.com

JOSE OTONIEL ARENAS CAMPUZANO.

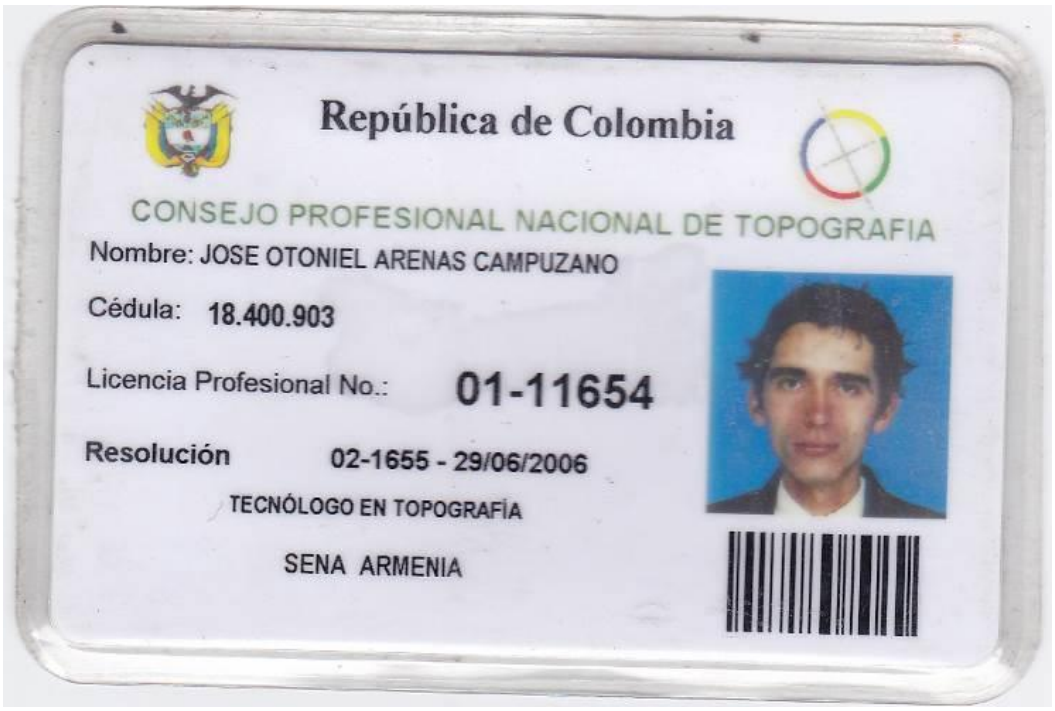

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA

Nombre: JOSE OTONIEL ARENAS CAMPUZANO

Cédula: 18.400.903

Licencia Profesional No.: 01-11654

Resolución 02-1655 - 29/06/2006

TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA

SENA ARMENIA



Esta tarjeta forma parte integral de la Licencia Profesional
Junto con la Resolucion Motivada y el Certificado de Vigencia

la documentacion integral acredita al titular para ejercer la profesion de TOPOGRAFO en la Republica de Colombia de acuerdo a la Ley 70 de 1979 y el Decreto Reglamentario 690 de 1981

LUIS OCTAVIO MOLANO SANCHEZ
PRESIDENTE

OMAR FRANCISCO PATINO SILVA
SECRETARIO (E)

Para cualquier informacion comunicarse con el Consejo Profesional Nacional de Topografia.Email:info@cpnt.org.calle 33 No 7-27 Of 502 Tel 2881490

República de Colombia
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA
Ley 70 / 79

CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 593382/2025

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

HACE CONSTAR

Que el(la) Señor(a) **JOSE OTONIEL ARENAS CAMPUZANO** , identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 18400903** , se encuentra inscrito(a) en el Registro Único de Topógrafos RUTOPO del CPNT como **TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA** de la Institución de Educación Superior **SENA** , bajo la Licencia Profesional **No. 01-11654** con fecha de expedición del **29 de Junio de 2006.**

Que el(la) Señor(a) **JOSE OTONIEL ARENAS CAMPUZANO**, tiene vigente su Licencia Profesional No. **01-11654** y a la fecha **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** , que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, D.C. a los **19 días del mes de Noviembre de 2025.**

LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO
Director Ejecutivo

***Firma del profesional**

*La firma del profesional es requerida para comprobar la anuencia de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el certificado.

Notas 1- El anterior certificado no suple la Licencia Profesional para ejercer un cargo.
2- La validez del documento se puede verificar en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.
3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3 de la Ley 962 de 2005.

N°. Certificado: 2387
Fecha: 28/08/2025

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Servicio Tecnico NOVA S.A.S
NIT. 901163978-5

DATOS DEL CLIENTE			
Nombre	**JOSE OTONIEL ARENAS**	Nit/ C.C	**18400903**
Dirección	**CRA 63 A # 77-20**	Ciudad	**BELLO**
Telefono	**3176514911**	Fecha de Expiración	**23/09/2025**

DATOS DEL EQUIPO			
Equipo	**ESTACION TOTAL**	Marca	**SUNWAY**
Modelo	**ATS-120A**	N° Serial	**H227388**
Aumentos	**30x**	Precisión	**2"**

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4, estipulada por el fabricante a continuación se describen los ajustes realizados al equipo

Inspección Mecánica

Partes	A	R	M	CP	N/A
Base Nivelante			X		
Frenos - paso lento Hz y Vt					X
Teclados y contactos					X
Eje Hz y Vt					X
Sistema de enfoque					X
Verticalidad					X
Niveles tubulares y esférico	X				

Inspección Electrónica

Partes	A	R	M	CP	N/A
Distanciómetro					X
Nonios Hz y Vt					X
Puntero laser					X
Compensador Electrónico					X
Plomada Láser / óptica					X
Sensores Hz y Vt					X

(**A**) Ajuste (**R**) Reparación (**M**) Mantenimiento (**CP**) Cambio de piezas (**N/A**) No aplica

AJUSTE ANGULAR Y DISTANCIA

Patrón	Fase 1	Fase 2	Residuo	Tolerancia	Cierre	Error
Vertical	90.0000	270.0006	0.0006	(+ / -) 0.0002	270.0000	0.0000
Horizontal	0.0000	180.0009	0.0009	(+ / -) 0.0002	180.0000	0.0000
Distancia	5.5290	5.5290	0.0000	(+ / -) 0.000	5.5290	0.0000

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el fabricante

Observaciones:
El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.
El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo

Nova NIT. 901163978

HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
Técnico Laboratorio.

CERTIFICADO DEL COLIMADOR	Servicio Tecnico NOVA S.A.S NIT. 901163978-5

SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S			
FECHA DE INSPECCION:	**23/07/2025**		
PROXIMA INSPECCION:	**22/01/2026**		
EMPRESA:	SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S	**NIT :**	901163978-5
DIRECCION :	CL 45E # 76-24 - VELODROMO	**CIUDAD:**	MEDELLIN-ANTIOQUIA
TELEFONO :	5017426	**PROXIMO CONTROL**	22/01/2026
INSTRUMENTO :	COLIMADOR	**MARCA**	SOUTH
MODELO :	W420-3	**SERIE**	S/N
ANGULO DE GRADUACION	10"2mm	**GRADUACION MINIMA**	20"

inspección sistemas mecanicos y óptimos	ajuste	lubricación	reparación	repuesto	limpieza	función aceptable
niveles tubulares y esféricos	x					
tubo superior	x					
tubo intermedio	x					
tubo inferior	x					

SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S			
inspeccion de cierres angulares de cada eje	**lectura inicial**	**errores encontrados**	**lecturas después de ajuste**
Angulo vertical tubo superior	60°00´12"	00°00´12"	00°00´00"
Angulo vertical tubo intermedio	90°00´15"	00°00´15"	00°00´00"
Angulo vertical tubo inferior	119°59´50"	00°00´10"	00°00´00"
Angulo horizontal tubo superior	00°00´07"	00°00´07"	00°00´00"
Angulo horizontal tubo intermedio	00°00´00"	00°00´00"	00°00´00"
Angulo horizontal tubo inferior	00°00´12"	00°00´12"	00°00´00"

CERTIFICADO EQUIPOS PATRONES	Servicio Tecnico NOVA S.A.S NIT. 901163978-5

SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO. CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S			
FECHA DE INSPECCION:		**23/07/2025**	
PROXIMA INSPECCION:		**22/01/2026**	
EMPRESA:	SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S	**NIT :**	901163978-5
DIRECCION :	CL 45E # 76-24 - VELODROMO	**CIUDAD:**	MEDELLIN-
TELEFONO :	5017426	**PROXIMO CONTROL**	22/01/2026
INSTRUMENTO :	ESSTACION TOTAL	**MARCA**	LEICA
MODELO :	TC 1101	**SERIE**	754687
ANGULO DE GRADUACION	1"	**GRADUACION MINIMA**	(2mm+2ppm*D)m.s.e

inspección opto mecanica	corrección	ajuste	lubricacion	reparacion	repuestos	limpieza	función aceptable
Base nivelante			x				
Niveles tubulares y esféricos		x					x
Verticalidad							x
óptica general (lentes y prisma)							x
Eje vertical y horizontal							x
Frenos y movimientos tangenciales							x

Inspección sistema de medida angular y verificacion según prueba de campo procedimiento N.	corrección	ajuste	lubricación	reparación	repuestos	limpieza	función aceptable
compensador automático							
compensador electrónico		x					
colimación vertical		x					
colimación horizontal		x					

Posición 1 (vertical)	90°	Grados	00´	Minutos	00"
Posición 2 (vertical)	270°	Grados	00´	Minutos	05"
Error detectado	00°	Grados	00´	Minutos	08"
Posición 1 (horizontal)	00°	Grados	00´	Minutos	00"
Posición 2 (horizontal)	180°	Grados	00´	Minutos	10"
Error detectado	00°	Grados	00´	Minutos	10"

INSTRUMENTO	NIVEL AUTOMATICO	**MARCA**	WILD HEERBRUGG
MODELO	N2	**SERIE**	N2-110807
AUMENTOS	26X	**PRECISIÓN EN DISTANCIA**	.+/-0.8mm*2kmde nivelación

Inspección de centro de diferencia nivel según prueba de campo procedimiento	**corrección**	**ajuste**	**lubricación**	**reparación**	**repuestos**	**limpieza**	**función aceptable**
sistema pendular automatico							x

A1	1 254	MM	B2	1 425
A2	1 246	MM	B1	1 375
A1-A2		MM	B1-B2	

Error detectado	**0.000**



HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
Técnico Laboratorio.

@areametropol

Seguimiento Técnico No.37
Contrato LP297 de 2025

Intervención y ejecución de obras hidráulicas en puntos críticos identificafados en el canal del Río Aburrá Medellín

Dirección Operativa de proyectos - Dirección Gestión de Riesgo
Supervisor John Jairo de Jesús Vargas Roldan
Agosto 02 de 2026

GENERALIDADES - Contractual

	Contrato de Obra
Número Del Contrato:	LP 297 DE 2025
Objeto:	Intervención Y Ejecución De Obras Hidráulicas En Puntos Críticos Identificados En El Canal Del Río Aburrá Medellín.”
Contratista:	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS CA - Coningecon SAS - 900.247.365-9 75% - Área De Infraestructura SAS - 900.815.726-1 25%
Fecha Inicio Del Contrato:	18/09/2025
Plazo Inicial:	Quince (15) meses
Fecha De Terminación Inicial:	18/12/2026
Ampliaciones A La Fecha:	N.A.
Suspensiones A La Fecha	N/A.
Plazo Actual:	Quince (15) meses
Fecha De Terminación Actual:	18/12/2026
Valor Inicial:	$29.996.502.708 Con AU 28.30% equivalentes a 21.072,36 SMLMV2025
Adiciones A La Fecha:	Adición No. 1 al Contrato, específicamente a los programas reembolsables por un valor de ($687.997.288,0), reflejados en: implementación Social $37.461.632, Implementación Plan de Manejo Ambiental $128.282.059 Implementación Plan de Manejo de Tránsito $403.092.032 Implementación SST $119.161.565. Lo anterior, debido a que los recursos iniciales son insuficientes para dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de obra **Total Adiciones: 1**
Valor Actual:	$30.684.499.996 incluido AU de 28.30% equivalentes a 21.465,30 SMLMV2025
Valor Y Porcentaje De Anticipo:	($ 5.999.300.542) Equivalentes al 20% del valor del contrato.
MODIFICACIÓN No. 1	Modificar el Presupuesto de la Obra con la Aprobación de ítems de obra extra del OE01 al OE12 y cantidades adicionales por un valor de Diez Mil Trecientos Ochenta Y Un Millones Setecientos Setenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta Y Nueve Pesos M/L ($10.381.775.469) incluido AU del 28.3%, distribuidos así: Obra extra por un valor de ($5.105.404.030). Cantidades Adicionales por un Valor de ($5.276.371.439,00) Con Redistribución de Recursos para el pago de Obra Extra Nueva y cantidades Adicionales por Diez Mil Trecientos Ochenta Y Un Millones Setecientos Setenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta Y Nueve Pesos M/L ($10.381.775.469) incluido AU del 28.3%.

GENERALIDADES - Contractual

	Contrato de Interventoría
Número Del Contrato:	CM 323 de 2025
Objeto:	Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Ambiental Y Contable A La Intervención Y Ejecución De Obras Hidráulicas En Puntos Críticos Identificados En El Canal Del Río Aburrá Medellín.
Contratista:	Consorcio Rio CM 005 de 2025 - Construcciones E Inversiones Asociativas S.A.S 800.217.663-8 50% - Camilo Andrés Ángel Saldarriaga 98.546.133 50%
Fecha Inicio Del Contrato:	11/09/2025
Plazo Inicial:	Dieciséis (16) meses
Fecha De Terminación Inicial:	31/12/2026
Ampliaciones A La Fecha:	TOTAL, AMPLIACIONES: 0
Suspensiones A La Fecha	TOTAL, SUSPENSIONES:
Plazo Actual:	Dieciséis (16) meses
Fecha De Terminación Actual:	31/12/2025
Valor Inicial:	($2.793.219.593,00) incluido IVA equivalentes a 1.962,22 SMMLV
Adiciones A La Fecha:	TOTAL, ADICIONES: 0.
Valor Actual:	($2.793.219.593,00) incluido IVA equivalentes a 1.962,22 SMMLV
Valor Y Porcentaje De Anticipo:	N/A
Otro Si	

GENERALIDADES – Programado - Ejecutado

Plazo
- Días Ejecutados 318
- 70,20%

Financiero
- Programado 61,58%
- Ejecutado 53,46%

Físico
- Programado 61%
- Ejecutado 52%

Valor Obra Civil Ejecutada	$12.085.339.197,00
AU 28,30%	$3.420.150.992,00
Inversión Social	$10.570.000,00
Inversión Ambiental	$111.878.120,00
Implementación PMT	$184.128.068,00
Inversión SG-SST	$85.715.000,00
Costo Pólizas	$138.930.897,00
Total Ejecución 31/07/2026	**$16.036.712.274,00**


Seguimiento a Reprogramación de obra V6 del 24/07/2026, Inclusión valor adición Planes complementarios

GENERALIDADES – Alcance Metas Físicas

Objetivo	Und	La García - Bello			Poblado Aguacatala			Ayurá Aguacatala			Pérgolas Envigado			Total Cantidad		
		Esti	Eje	%	Esti	Eje	%	Esti	Eje	%	Esti	Eje	%	Esti	Eje	%
Llave antisocavación	m	130,00	60,00	46,15%	730,00	534,20	73,18%	500,00	271,09	54,22%	21,00		0,00%	1.381,00	865,29	62,66%
Reconformación de talud Lleno	m	130,00		0,00%	730,00	497,00	68,08%	55,00	18	32,73%	21,00			936,00	515,00	55,02%
Reparación de placas	m	10,00	9,45	94,50%	180,00	117,00	65,00%				450,00		0,00%	640,00	126,45	19,76%
Construcción de placas	m	130,00		0,00%	590,00	335,00	56,78%							720,00	335,00	46,53%
Traviesas:	m	93,00		0,00%	147,00	18,00	12,24%	147,00	35,29	24,01%	21,00		0,00%	408,00	53,29	13,06%
Contradique	m				24,00	12	50,00%							24,00	12,00	50,00%
Direccionador	m	24,60	24,60	100,00%										24,60	24,60	100,00%
Enrocado pozo aquietamiento	m2	3400,00	0,00	0,00%	952,00	150,00	15,76%	952,00		0,00%	136,00		0,00%	5.440,00	150,00	2,76%
Colocación de Geoestera	m	130,00		0,00%										130,00	0,00	0,00%
Recinte muros	m							705,00	283,42	40,20%				705,00	283,42	40,20%
Anclajes pasivos muros	m							8560,00	5052	59,02%				8.560,00	5.052,00	59,02%
Construcción de Muro	m							70,00	18	25,71%				70,00	18,00	25,71%
Muro - llave zapata Pérgolas	m										30,00		0,00%	30,00	0,00	0,00%
Recinte de muro pérgolas	m										197,00		0,00%	197,00	0,00	0,00%
Filtro francés	m										197,00		0,00%	197,00	0,00	0,00%
Avance promedio meta física				30,08%			48,72%			33,70%			0,00%			31,65%

AGUACATALA POBLADO Sector La 4 Sur

Inversión - Actividades

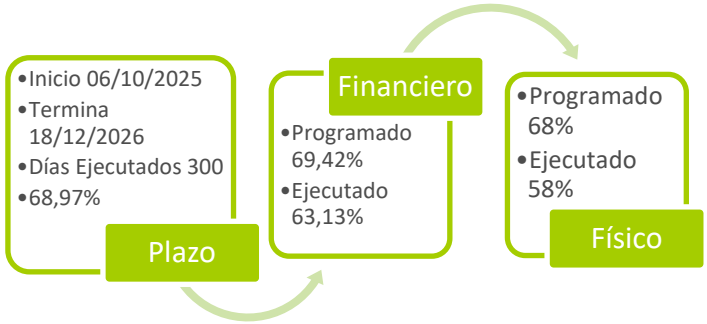

Avance Mensual		Valor Programado	%	Valor Ejecutado	%
Acta 1	Sept Oct 2025	$302.129.723,00	2,66%	$84.515.666,00	0,74%
Acta 2	Nov 2025	$426.708.264,00	3,76%	$1.447.437.233,00	12,75%
Acta 3	Dic 2025	$330.239.424,00	2,91%	$585.509.756,00	5,16%
Acta 4	Ene 2026	$619.939.792,00	5,46%	$221.830.235,00	1,95%
Acta 5	Feb 2026	$839.070.209,00	7,39%	$465.209.572,00	4,10%
Acta 6	Mar 2026	$1.097.790.844,00	9,67%	$428.987.206,00	3,78%
Acta 7	Abr 2026	$961.819.236,00	8,47%	$906.907.305,00	7,99%
Acta 8	May 2026	$1.214.865.680,00	10,70%	$1.222.603.806,00	10,77%
Acta 9	Jun 2026	$911.597.033,00	8,03%	$881.148.782,00	7,76%
Acta 10	Jul 2026	$1.177.252.836,00	10,37%	$926.835.872,90	8,16%
Acta 11	Ago 2026	$960.072.729,00	8,46%		0,00%
Acta 12	Sept 2026	$993.802.423,00	8,75%		0,00%
Acta 13	Oct 2026	$814.428.242,00	7,17%		0,00%
Acta 14	Nov 2026	$619.941.052,00	5,46%		0,00%
Acta 15	Dic 2026	$84.167.996,00	0,74%		0,00%
Total Aguacatala Poblado		**$11.353.825.483,00**	**100,00%**	**$7.170.985.433,90**	**63,16%**

Frente De Obra	Tipo Intervención	Cantidad	Inversión Acumulada
Aguacatala Poblado Sector Puente de la 4 Sur	ACTIVIDADES PRELIMINARES Topografía	55,50 día	$40.656.081,00
	Campamentos	150,96 m2	$48.764.871,00
	Cerramiento Rocería	889,50 m	$31.939.046,00
	Acceso frente de obra	4 Mes	$13.342.020,00
	ADECUACIÓN Carreteable, Excavación	986,72 m3	$26.154.986,00
	Suministro base no procesada	248,60 m3	$37.460.038,00
	CARRETEABLE Rio Item 9.1 Roca >1m	411,85 m3	$171.452.743,00
	PLACAS CONCRETO Demolición	526,66 m3	$36.943.092,00
	Acero de refuerzo	67.452,18 kg	$ 556.008.320,00
	Concreto	506,49 m3	$605.390.782,00
	Oídos	70,20 un	$1.350.929,00
	LLAVE ANTISOCAVACIÓN Excavación	3.793,29 m3	$100.548.739,00
	Llenos y geotextil	5274,67 m3	$800.775.636,00
	Concretos	1.403,48 m3	$1.039.373.781,00
	TRAVIESAS Excavaciones	112,80 m3	$2.989.990,00
	Acero Refuerzo	119,28 Kg	$ 983.225,00
	Concreto Ciclópeo	39,72 m3	$29.415.400,00
	CONTRADIQUE Excavación	137,50 m3	$3.644.713,00
	Acero Refuerzo	151,49 Kg	$1.248.732,00
	Concreto Ciclópeo	20,78 m3	$15.389.024,00
	MANEJO DE AGUAS. Geomembrana	683,80 m3	$5.540.148,00
	Jumbobags	717,00 un	$149.527.548,00
	Plataforma De Apoyo Ítem11.4	332,00 m	$322.916.148,00
	Ataguía Ítem 9.1 Roca >1m	1228,90 m3	$511.589.843,00
	Puente desmotable	1 un	$16.568.836,00
	POZO DE AQUIETAMIENTO Item 9.1 Roca >1m	1999,73 m3	$832.485.597,00
	Redistribución Sedimentos Excavaciones	756,00 m3	$11.345.292,00
	Fragmentos Demoliciones En El Lecho Del Rio	446,66 m3	$8.378.447,00
	Poda de Arboles	21 un	$6.345.761,00
	Tala de Arboles	58 un	$29.492.638,00
	Costo Directo Frente		$5.458.022.406,00
	Costo con AU 28,3 % y Complementarios		**$7.170.985.433,90**

AGUACATALA POBLADO Sector La 4 Sur



AGUACATALA POBLADO Sector La 4 Sur

Construcción de Ataguía	Plataforma de acceso K0+130 K0+230	Ataguía K0+300 Suministro de Roca >1 m	Traslado de Jumbobags para Confromaion Traviesa	
Reparación de Placas	Se realiza demolición de Placas K0+137 a K0+575	Figuración refuerzo K0+137 a K0+575	Instalación Tubería PVC Lloraderos	Vaciado Concreto 31MPa K0+137 a la K00+575
Llaves Antisocavación	Excavación y formaleta K0+599	Vaciado de Concreto ciclópeo K0+599	Instalación de geotextil K0+560,60 K0+568,40	Conformación de lleno con Material Granular A38
Construcción de Traviesa	Excavación y formaleta para traviesa S9b S20	Vaciado Traviesa S9B (1/3 Long)	Vaciado Traviesa S20 (1/3)	

AGUACATALA POBLADO Sector La 4 Sur Costado Oriental

Construcción de Ataguía	Plataforma de acceso K0+000	Ataguía K0+000 Suministro de Roca >1 m	Traslado de Jumbobags para conformación de Ataguía
Reparación de Placas	Se realiza demolición de Placas K0+000 al K0+076	Figuración de Refuerzo Placas	Vaciado Concreto 31 Mpa Placas inclinadas 72 m
Llaves Antisocavación	Excavación mecánica y formaleta K0+018 a K0+078	Vaciado de Concreto ciclópeo K0+018 a K0+078	Instalación Geotextil y material Lleno detrás llave antisocavación
Construcción de contradique	Excavación mecánica K0+024	Formaleta y pasadores en acero	Vaciado Concreto ciclópeo 31MPA 2/3 longitud

AGUACATALA POBLADO Sector La 4 Sur







Chequeo topográfico para nivel de excavación de llave K00+568,40 hasta K00+599,60

Se realizó instalación de formaleta y vaciado de concreto ciclópeo llave antisocavación K00+568,40 hasta K00+599,60

AGUACATALA POBLADO Sector La 4 Sur







Instalación de geotextil, conformación y lleno con material INV A-38, instalación de acero corrugado y barra lisa, instalación de cinta PVC, instalación de tubería para lloraderos y vaciado de concreto premezclado para placas desde abscisa K00+551,90 a la K00+575,90.

AGUACATALA POBLADO Sector La 4 Sur








Se realizó el chequeo topográfico para la verificación de los niveles de excavación y del alineamiento de la formaleta correspondiente al contradique 51C. Asimismo, se efectuaron las actividades de excavación e instalación de la formaleta, de acuerdo con las especificaciones establecidas.

AYURA - AGUACATALA Sector Puente De La 12 Sur

Inversión - Actividades

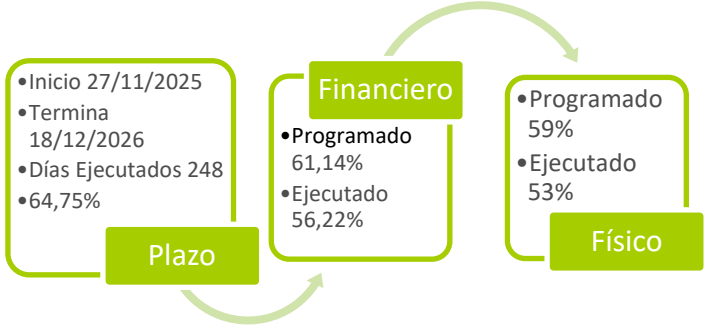


Avance Mensual		Valor Programado	%	Valor Ejecutado	%
Acta 1	Sept Oct 2025	$10.731.770,00	0,09%		0,00%
Acta 2	Nov 2025	$12.878.234,00	0,11%	$68.433.906,00	0,60%
Acta 3	Dic 2025	$39.004.420,00	0,34%	$43.337.914,00	0,38%
Acta 4	Ene 2026	$482.884.413,00	4,20%	$29.688.786,00	0,26%
Acta 5	Feb 2026	$903.012.070,00	7,86%	$424.769.486,00	3,70%
Acta 6	Mar 2026	$1.088.303.722,00	9,47%	$429.430.969,00	3,74%
Acta 7	Abr 2026	$983.611.103,00	8,56%	$2.288.828.885,00	19,92%
Acta 8	May 2026	$1.289.409.599,00	11,22%	$1.166.455.373,00	10,15%
Acta 9	Jun 2026	$950.798.207,00	8,28%	$775.720.408,00	6,75%
Acta 10	Jul 2026	$1.262.447.770,00	10,99%	$1.231.333.988,22	10,72%
Acta 11	Ago 2026	$1.043.230.945,00	9,08%		0,00%
Acta 12	Sept 2026	$1.090.660.662,00	9,49%		0,00%
Acta 13	Oct 2026	$1.028.292.782,00	8,95%		0,00%
Acta 14	Nov 2026	$987.870.096,00	8,60%		0,00%
Acta 15	Dic 2026	$314.586.782,00	2,74%		0,00%
Total Ayurá Aguacatala		**$11.487.722.575,00**	**100,00%**	**$6.457.999.715,22**	**56,22%**

Frente De Obra	Tipo Intervención	Cantidad	Inversión Acumulada
Ayurá – Aguacatala Sector Puente 12 Sur	ACTIVIDADES PRELIMINARES Topografía	25 días	$18.313.550,00
	Campamentos	204,43 m2	$55.772.519,00
	Cerramientos	757,90 m	$26.120.581,00
	Punto de Acceso	4 mes	$13.342.020,00
	CARRETEABLE AL RIO base No tratada	144,06 m3	21.292.356,00
	Roca Ítem 9.1 Roca >1m	102,38 m3	$42.620.692,00
	MANEJO DE AGUAS Excavaciones	468,91 m3	$12.429.398,00
	Geomembrana	3767,50 m2	$30.524.285,00
	Jumbobags	1385 un	$288.687.990,00
	Plataforma carreteable	382,30 m	$371.839.891,00
	Ataguía Ítem 9.1 Roca >1m	1562,73 m3	$650.562.938,00
	RECINTE MURO Acero	32.545,11 kg	$268.434.202,00
	Concretos	228,54 m3	$273.166.320,00
	Oídos OE12 y 5,3	74,26 m	$22.471.329,00
	Muro y Fundación Demoliciones	35,03 m3	$2.457.215,00
	Acero de refuerzo	3868,30 Kg	$31.886.397,00
	Concreto	27,24 m3	$32.559.073,00
	Traviesas Excavaciones	766,08 m3	$20.306.484,00
	Acero Pasadores	231,80 Kg	$1,910.727,00
	Concreto Ciclópeo 31 MPa	132,34 m3	$98.006.902,00
	Llaves antisocavación Excavación	2631,09 m3	$69.742.306,00
	Concreto Ciclópeo	676,53 m3	$501.017.147,00
	MICROPILOTES Anclajes	5052,00 m	$1.943.408.413,00
	Perforaciones 4”	3377,00 cm	$32.081.500,00
	Redistribución de sedimentos Excavación	2468,44 m3	$37.043.879,00
	Demolición	35,03 m3	$657.093,00
	PODA ARBOLES	63 Un	$20.878.009,00
	TALA ÁRBOLES	73 un	$47.695.007,00
	Costo Directo		$4.935.723.340,00
	Costo obra con AU 28,3 % y Complementarios		**$6.457.999.715,22**

AYURA - AGUACATALA Sector Puente De La 12 Sur

Obras Preliminares	Construcción de campamentos Provisionales cerramiento	Actividades de Poda Y Tala	Excavación y conformación de carreteable K0+530 K0+470	Conformación de carreteable K0+200 K0+612
Construcción de Ataguía	Suministro de Roca >1m K0+620 K0+470 a K0+500 K0+520 a K0+624 K0+260 a K0+215	Llenado e Instalación de Jumbobags abscisa K0+470 a K0+550 K0+260 a K0+215	Instalación de Jumbobags En costado Muro Metro	Reparación ataguías K0+700 y K0+400
Anclajes Pasivos	Levantamiento Topográfico	Extracción de Núcleos En muro abscisas K0+450 y K0+420.	Perforación y llenado Lechada abscisas k0+530 K0+525 k0+350 K0+330 K0+200	Instalación de platina y tuerca y anticorrosivo K0+530 al K0+480
Recubrimiento Muro	Instalación de refuerzo K0+590 K0+601	Formaleta y perforación para lloraderos	Vaciado de Concreto 31 Mpa K0+556 K0+578 K0+601 K0+612	Vaciado de Concreto 31 Mpa K0+220-K0+249

AYURA - AGUACATALA Sector Puente De La 12 Sur

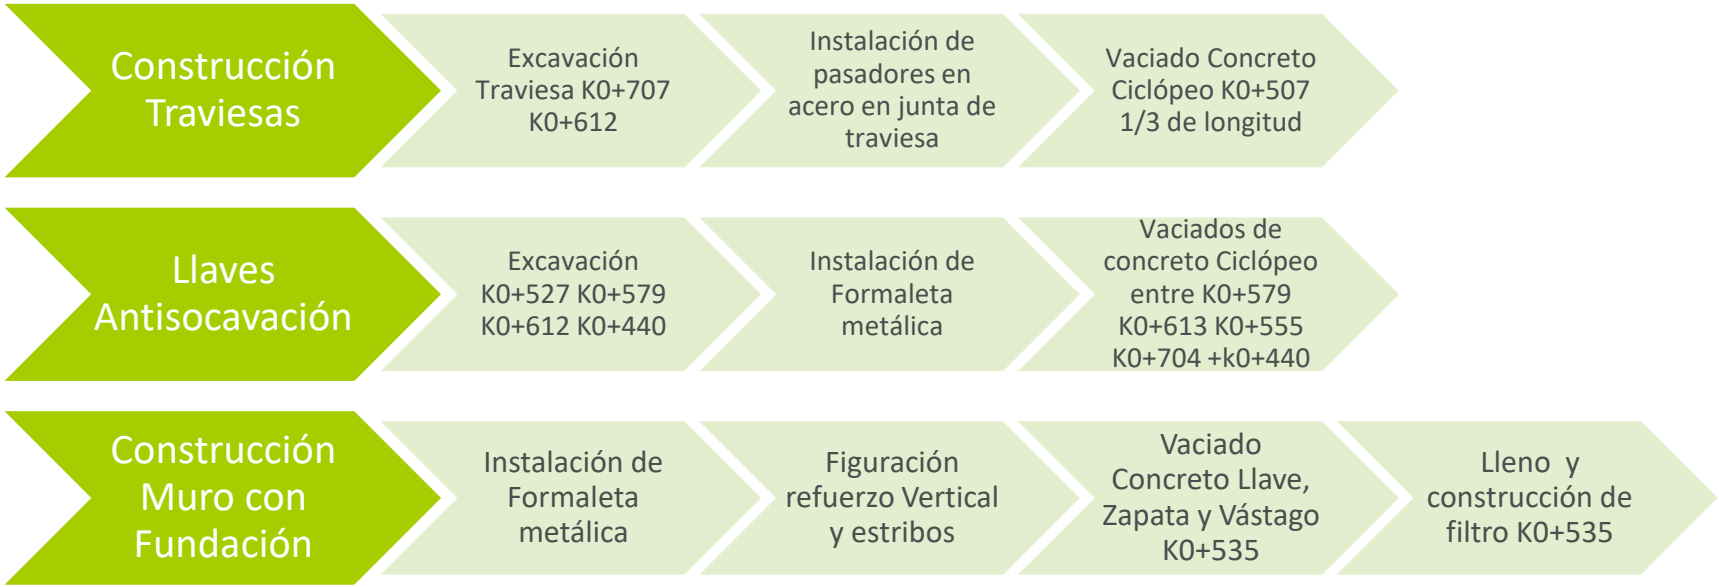

AYURÁ - AGUACATALA



Construcción de anclajes en el talud 0+270



Perforación para construcción de anclajes en el talud 0+290



Se traslado maquinaria hacia 0+180 par continuar con perforaciones para anclajes..

AYURÁ - AGUACATALA







Se realiza la instalación de acero de refuerzo para la construcción de recintes para muro existente, encofrado y vaciado por medio de tubería de descarga, se labora entre 0+220-0+249.

AYURÁ - AGUACATALA



Excavaciones para construcción de llaves anti socavación 0+434



Encofrado previo a los vaciados de concreto, 0+440-0+446



Se realizan vaciados de concreto para la construcción de llaves, 0+428 y 0+446

AYURÁ - AGUACATALA







0+´535 construcción de lleno compactado y filtro para muro, se realizan pruebas de densidad para las capas aplicadas, esta pendiente el lleno sobre nivel me muro.

AYURÁ - AGUACATALA








K0+707 se realiza nuevo intento de construcción de la traviesa #7, el contratista realiza retiro de la formaleta que estaba atrapada.

Se retiran equipos y se reprogramara la construcción de la traviesa#7 para la siguiente semana.

LA GARCÍA – BELLO


Inversión - Actividades

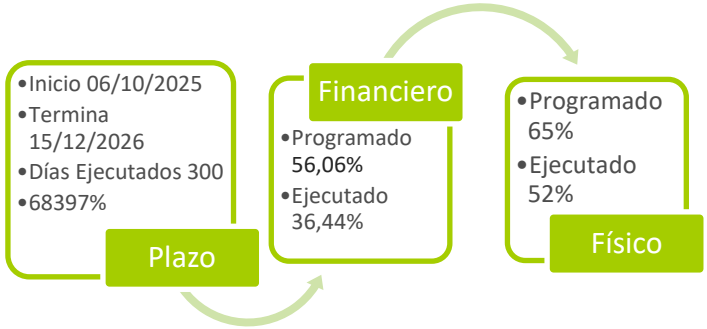

Avance Mensual		Valor Programado	%	Valor Ejecutado	%
Acta 1	Sept Oct 2025	$71.154.845,00	1,14%	$65.209.087,00	1,04%
Acta 2	Nov 2025	$146.241.620,00	2,34%	$169.180.137,00	2,70%
Acta 3	Dic 2025	$174.588.438,00	2,79%	$313.297.295,00	5,00%
Acta 4	Ene 2026	$249.412.054,00	3,98%	$470.505.703,00	7,52%
Acta 5	Feb 2026	$235.208.737,00	3,76%	$224.080.583,00	3,58%
Acta 6	Mar 2026	$283.178.540,00	4,52%	$166.034.760,00	2,65%
Acta 7	Abr 2026	$438.701.841,00	7,01%	$255.624.445,00	4,08%
Acta 8	May 2026	$665.136.874,00	10,62%	$275.477.295,00	4,40%
Acta 9	Jun 2026	$511.561.122,00	8,17%	$175.897.365,00	2,81%
Acta 10	Jul 2026	$732.886.294,00	11,71%	$165.917.998,21	2,65%
Acta 11	Ago 2026	$720.244.458,00	11,50%		0,00%
Acta 12	Sept 2026	$757.287.641,00	12,10%		0,00%
Acta 13	Oct 2026	$810.550.797,00	12,95%		0,00%
Acta 14	Nov 2026	$384.715.634,00	6,15%		0,00%
Acta 15	Dic 2026	$79.662.595,00	1,27%		0,00%
Total La García - Bello		**$6.260.531.490,00**	**100,00%**	**$2.281.224.668,21**	**36,44%**

FRENTE DE OBRA	TIPO INTERVENCION	Cantidad	VALOR INVERSIÓN ACUMULADA
La García Bello	ACTIVIDADES PRELIMINARES Topografía	28,75 días	$21.060.583,00
	Campamentos	104,04 m2	$29.891.928,00
	Cerramientos	859,50 m	$29.574.537,00
	Rocería	5310,99 m2	$7.435.386,00
	CARRETEABLE PARA ACCESO AL RIO Excavaciones	580,25 m3	$15.380.687,00
	Base no procesada	529,13 m3	$78.206.474,00
	MANEJO DE AGUAS. Excavación	143,96 m3	$3.815.948,00
	Geomembrana	1781,30 m2	$14.432.092,00
	Jumbobags	984,00 un	$201.054.526,00
	Plataforma de acceso	433,30 m3	$421.444.479,00
	Ataguía Ítem 9.1 Roca >1m	999,20 m3	$415.965.962,00
	DIRECCIONADOR Demolición	12,10 m3	$848.767,00
	Excavación	580,89 m3	$15.397,652,00
	Acero pasadores	154,07 Kg	$1.269.999,00
	Concretos 31 MPa	318,03 m3	$235.523.159,00
	Construcción Placas Inclinadas Acero	103,58 Kg	$853.810,00
	Llave antisocavación Excavaciones	531,14 m3	$14.078.928,00
	Acero Refuerzo	3761.42 Kg	$31.005.385,00
	Concreto 31 MPa	52,76 m3	$63.062.289,00
	Redistribución De Sedimentos Excavaciones	1815,46 m3	$27.244.609,00
	Fragmentos De Demoliciones En El Lecho Del Rio	50,74 m3	$951.781,00
	ADECUACIÓN Taludes Jumbobags	44,00 un	$2.311.144,00
	Acero	68,59 Kg	$5.103.514,00
	Concretos 31 MPa	34,63 m3	$41.392.097,00
	Poda de Arboles	24 un	$5.757.574,00
	Tala de Arboles	24 un	$10.396.664,00
	Costo Directo		$1.687.957.135,00
	Costo obra con AU 28,3 % y Complementarios		**$2.281.224.668,21**

LA GARCÍA - BELLO

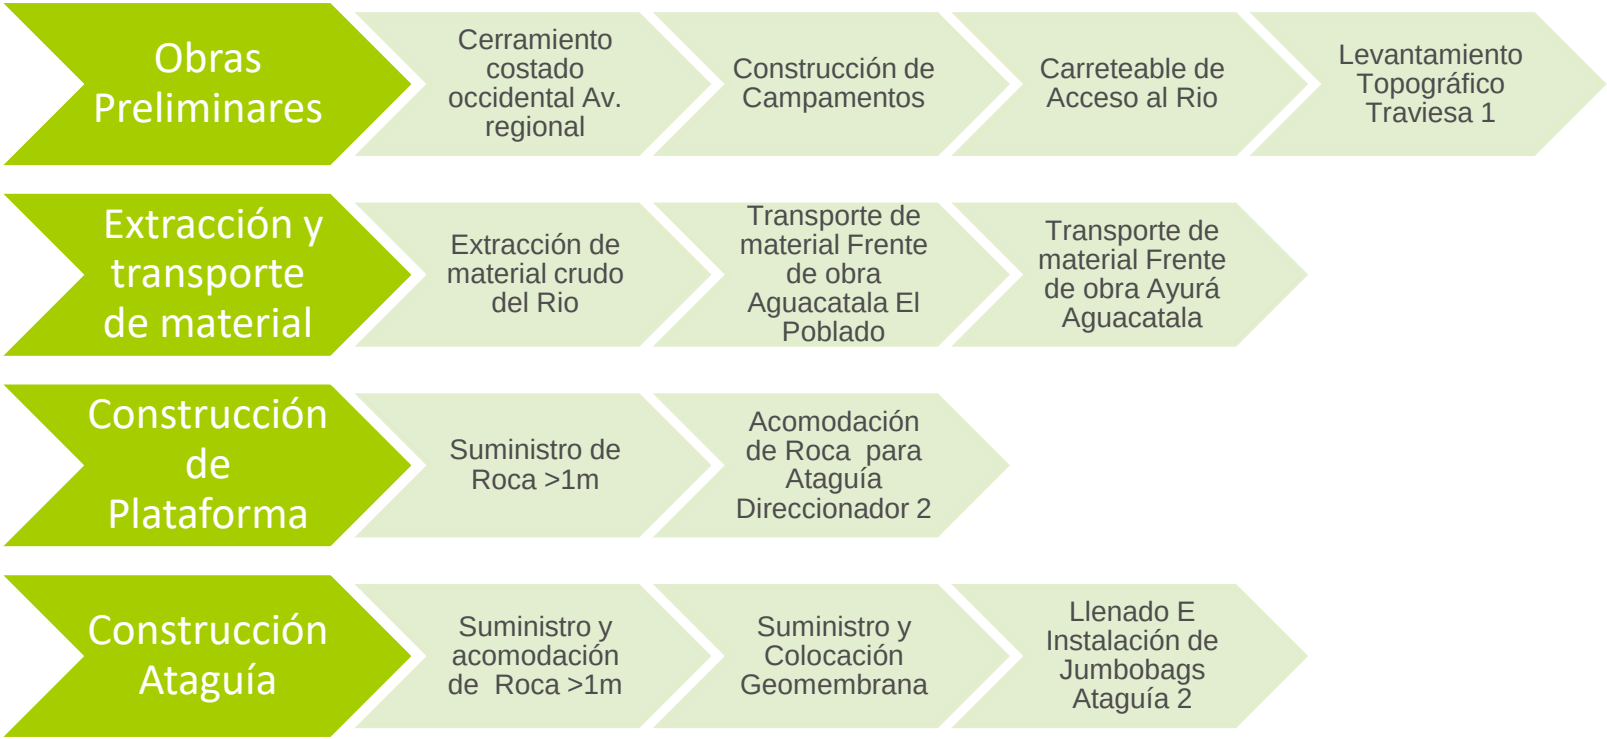

LA GARCÍA - BELLO

Construcción Direccionador	Localización y Replanteo	Excavación Mecánica Direccionador 2	Realce en concreto Direccionador 1	Vaciado Concreto Ciclópeo 31MPa Direccionador 2
Llave Antisocavación	Demolición placa y llave existente Direccionador 1	Excavación mecánica	Figuración Refuerzo Llave Antisocavación 34+281 34+287	Concreto 31MPa Llave Antisocavación 34+281 34+287
Construcción Placas Inclinadas	Lleno y geotextil Conformación soporte placas km 34+223 y 34+250	Figuración e instalación de refuerzo	Vaciado Concreto Placa Direccionador 1	
Protección Taludes	Instalación de Jumbobags	Vaciado de concreto Recubrimiento		

LA GARCÍA BELLO

CONSTRUCCION LLAVE ANTISOCAVACIÓN



Colocación de hiladeros y cotas de nivel de la llave anti socavación



Excavación para la llave anti socavación k34+275 K34+281



Colocación de acero para la llave anti socavación km 34+281 34+287

LA GARCÍA BELLO



Vaciado de concreto para la llave anti socavación km 34+281 34+287




Colocación de material de río para lleno entre los km 34+223 y 34+250



Retiro de bolsacretos existentes en el talud entre los km 34+223 y 34+239

PERGOLAS - ENVIGADO


Inversión - Actividades

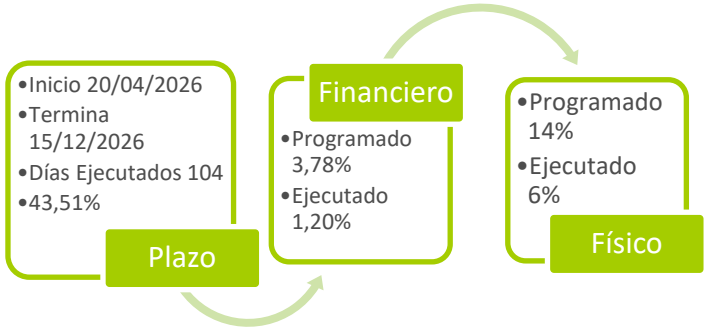

Avance Mensual		Valor Programado	%	Valor Ejecutado	%
Acta 1	Sept Oct 2025	$6.966.488,00	0,44%		0,00%
Acta 2	Nov 2025	$3.548.965,00	0,22%	$9.113.866,00	0,58%
Acta 3	Dic 2025	$0,00	0,00%		0,00%
Acta 4	Ene 2026	$0,00	0,00%		0,00%
Acta 5	Feb 2026	$0,00	0,00%		0,00%
Acta 6	Mar 2026	$932.262,00	0,06%		0,00%
Acta 7	Abr 2026	$8.485.400,00	0,54%	$8.456.542,00	0,53%
Acta 8	May 2026	$12.831.240,00	0,81%	$1.372.211,00	0,09%
Acta 9	Jun 2026	$11.664.751,00	0,74%		0,00%
Acta 10	Jul 2026	$15.397.472,00	0,97%		0,00%
Acta 11	Ago 2026	$202.283.364,00	12,78%		0,00%
Acta 12	Sept 2026	$399.719.606,00	25,26%		0,00%
Acta 13	Oct 2026	$446.663.805,00	28,23%		0,00%
Acta 14	Nov 2026	$330.054.192,00	20,86%		0,00%
Acta 15	Dic 2026	$143.872.903,00	9,09%		0,00%
Total Pérgolas Envigado		**$1.582.420.448,00**	**100,00%**	**$18.942.619,00**	**1,20%**

Frente De Obra	Tipo Intervención	Cantidad	Inversión Acumulada
Pérgolas Envigado	ACTIVIDADES PRELIMINARES Topografía	2 día	$1.465.084,00
	Campamentos		
	Cerramientos		
	Rocería	1550,88 m2	$2.171.232,00
	CARRETEABLE PARA ACCESO AL RIO Excavaciones		
	Base no procesada		
	MANEJO DE AGUAS. Geomembrana		
	Jumbobags		
	Plataforma de acceso		
	Ataguía Ítem 9.1 Roca >1m		
	DIRECCIONADOR No 1 Demolición		
	Excavación		
	Concretos 31 MPa		
	Construcción Placas Inclinadas Acero		
	PODA Y TALA ÁRBOLES		
	Costo Directo		$3.636.316,00
	Costo obra con AU 28,3 % y Complementarios		$18.942.619,43

PERGOLAS - ENVIGADO

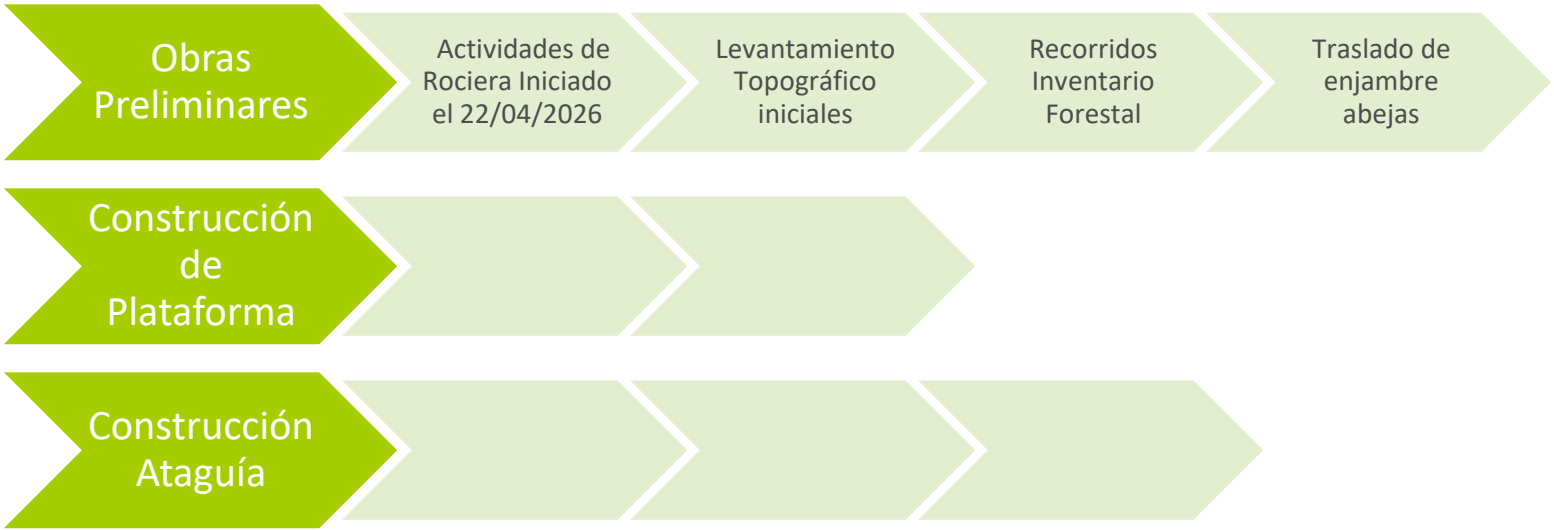

PERGOLAS ENVIGADO

VISITA PARA IDENTIFICAR ACTIVIDADES A EJECUTAR.







Fue realizada una visita técnica de campo conjunta, entre la entidad contratante (AMVA), diseñadores (Universidad Nacional), Contratista e Interventoría, con la finalidad de realizar una evaluación que permitiera aclarar las actividades prioritarias a ser desarrolladas.

GESTIÓN AMBIENTAL: Aguacatala - Poblado









- El 28 de julio, se hace recorrido con la supervisión forestal del AMVA, con el fin de definir la intervención de los individuos arbóreos localizados al borde o sobre las placas que se van a demoler.
- Se reporta a la supervisión forestal, mediante email, sobre la caída de los individuos arbóreos, debido a la inestabilidad con la que quedan al hacer la demolición de las placas.
- El contratista reporta caída de árbol ID 69 Leucaena y ID 70 Leucaena
- Acompañamiento durante la demolición de placas.
- Acompañamiento durante las actividades de instalación de cerramiento en tramo faltante
- Se realizaron jornadas de orden y aseo general en la obra
- Acompañamiento durante las actividades de vaciado de placas y llave antisocavación, se adecuan sistemas para manejo adecuado de los residuos y el agua proveniente del lavado de la canoa de la mixer.
- Acompañamiento durante la implementación del PMT en los vaciados
- Acompañamiento durante las actividades de acopio adecuado de residuos de madera y residuos peligrosos
- Seguimiento a los programas ambientales definidos en el cumplimiento del PMA
- Seguimiento al acopio y disposición adecuada de residuos solidos.
- Seguimiento al acopio adecuado de sustancias químicas
- Seguimiento al acopio de cemento en los frentes de obra
- Seguimiento a la adecuación de senderos peatonales

GESTIÓN AMBIENTAL: Ayurá - Aguacatala









- Se le solicitó al contratista dar continuidad a las actividades de obra, para recuperación de la perdida de banca en el Km 0+530, instalación de filtro y lleno
- Acompañamiento durante las actividades de perforación desde el río para estabilización de muro, verificando protección y cuidado de individuos arbóreos.
- El 28 de julio, se hace recorrido con la supervisión forestal del área, con el fin de definir las intervenciones arbóreas en el muro K0+235-K0+250 aproximadamente.
- El supervisor forestal del AMVA evidencia las intervenciones arbóreas realizada por EPM a los árboles existentes dentro del área de intervención del proyecto en el frente de obra Ayurá - Aguacatala (entre las abscisas K0+000 hasta K0+700
- El 29 de julio se hace recorrido con la supervisión y los diseñadores, durante este recorrido, también se evidencia personal de EPM haciendo intervenciones arbóreas al interior del cerramiento de nuestra área de intervención.
- Seguimiento a la maquinaria y vehículos utilizados en obra
- Seguimiento a las actividades de orden y aseo, realizadas y atendidas por el contratista.
- Acompañamiento durante la protección de individuos arbóreos
- Verificación y acompañamiento durante las actividades de limpieza de baños móviles
- Se hace seguimiento al control de residuos de lechada, provenientes de la maquina de inyección.
- Seguimiento al suministro de agua, para realizar actividades de obra
- Se hace seguimiento a la protección de individuos arbóreos
- Seguimiento al aseo de baños móviles
- Seguimiento a la implementación del PMT
- Seguimiento a los programas ambientales definidos en el cumplimiento del PMA
- Seguimiento al acopio adecuado de residuos reciclables y residuos ordinarios.

GESTIÓN AMBIENTAL: La García - Bello










- El 28 de julio se hace recorrido con el forestal del AMVA para definir la zona para realizar y complementar el inventario forestal y las posibles intervenciones arbóreas necesarias para el desarrollo y apertura de este nuevo frente de obra.
- Se notifica nuevamente al supervisor forestal sobre los incendios ocasionados por personal en condición de calle, lo cual ya había sido notificado vía mail.
- Seguimiento al manejo de las aguas residuales provenientes del lavado de la canoa de mixer
- Seguimiento a las actividades de orden y aseo
- Acompañamiento durante las actividades de obra, construcción de ataguía y adecuaciones para construcción de traviesa N°2
- Seguimiento al transporte adecuado de material pétreo, con vehículos carpados
- Seguimiento a la maquinaria y vehículos utilizados en obra
- Seguimiento al acopio de sustancias químicas
- Seguimiento al acopio adecuado de los materiales de obra y materiales pétreos, señalización y demarcación de áreas de acopio.
- Seguimiento a la implementación del PMT y el uso de personal controladores viales
- Seguimiento a los programas ambientales definidos en el cumplimiento del PMA
- Seguimiento al cargue de material de pétreo para reutilización en Ayurá – Aguacatala y Aguacatala - Poblado

GESTIÓN AMBIENTAL: Pérgolas - Envigado

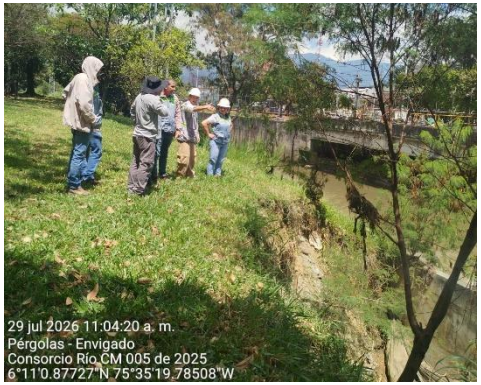



- El 29 de julio se hace recorrido con la supervisión técnica de la obra, con el fin de definir actividades puntuales y dar comienzo a las actividades de obra
- Durante este recorrido, se socializa desde el componente ambiental las posibles zonas identificadas para el ingreso y salida de vehículos, la ubicación de campamentos y almacén de herramienta menor, identificar los sitios adecuados para el acopio de materiales pétreos.
- Se reporta a la supervisión sobre el informe de la Bióloga, realizado previo al inicio de las actividades de obra.
- Se socializa a la supervisión y al contratista, las posibles intervenciones arbóreas necesarias en el sitio.

GESTIÓN SOCIAL: Aguacatala - Poblado









- Se hace apertura de buzón de PQRS, no se encuentra ninguna PQRS diligenciada.
- Socialización en el punto informativo instalado en el puente de la 4 sur a la comunidad aledaña del frente de trabajo.
- Recorridos de obra desde el componente social, orientados a verificar las condiciones en campo y brindar atención a la comunidad cuando se requiera.
- Se verifica actualización de números de contacto de protocolo de emergencias sociales.
- Se reciben hojas de vida a través de la pieza instalada en las carteleras de los puntos de información.

GESTIÓN SOCIAL: Ayurá- Aguacatala









- Se hace apertura de buzón de PQRS, no se encuentra ninguna PQRS diligenciada.
- Recorridos de obra desde el componente social, orientados a verificar las condiciones en campo y brindar atención a la comunidad cuando se requiera.
- Verificación de publicación de protocolo del plan de emergencia y los números de contacto de las autoridades competentes.
- Socialización a la comunidad desde punto informativo del frente de trabajo.
- Se reporta daño en valla informativa por fuertes lluvias, la estructura sufrió graves daños.

GESTIÓN SOCIAL – La García - Bello









- Apertura de buzón de sugerencias, no se encuentran PQRS diligenciadas. Se verifica que la cartelera está actualizada.
- Recorridos de obra desde el componente social, para verificar las condiciones en campo y brindar atención a la comunidad.
- Verificación de protocolo de emergencias sociales publicado en el campamento del frente de trabajo.
- Se reciben hojas de vida a través de la pieza instalada en las carteleras de los puntos de información.
- Socialización a la comunidad desde punto informativo del frente de trabajo.
- Se reporta pasacalles caído a un costado de la vía, se solicita la reinstalación del mismo.

GESTIÓN SST - Aguacatala - Poblado









- Recorrido de seguimiento a las condiciones de seguridad en el frente de obra.
- Verificación en campo de los permisos de trabajo por parte de la Interventoría.
- Inspección de los elementos del puente provisional, verificando el estado y las condiciones de la guaya utilizada para las maniobras de izaje, con el fin de confirmar que se encontrara en condiciones adecuadas para su uso seguro.

GESTIÓN SST – Ayurá- Aguacatala









- Inducción y divulgación de las medidas de seguridad para el desarrollo de las actividades.
- Instalación de señalización preventiva en el andamio peatonal del frente de obra.
- Acompañamiento del área SST de la Interventoría durante el vaciado de concreto.
- Se evidenció la delimitación del frente de obra con cinta de peligro y una mejora en las condiciones de orden y aseo del área de trabajo.

GESTIÓN SST - La García - Bello









- Inspección del punto de almacenamiento de sustancias químicas, verificando la señalización, el orden y las condiciones de seguridad del área.
- Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo al nuevo subcontratista.
- Suministro de dotación y elementos de protección personal.
- Instalación de señalización preventiva en el frente de obra.

Área
METROPOLITANA
Valle de Aburrá

@areametropol
