INFORME MENSUAL DE OBRA No. 16

CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

Cuyo objeto es: "REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA - 4 CENTRO SUR.

PERIODO

30 DE ABRIL DE 2026 AL 29 DE MAYO DE 2026




CONTRATISTA
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
NIT. 901.898.342-6

INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVIAL IP
NIT. 901.898.791-1

VERSIÓN 0

JUNIO 2026

CONTROL DE REVISIONES

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
ELABORÓ	Leidy Vanessa Martínez Monroy	Residente de Obra		05/06/2026
REVISÓ	María Virginia Rocha Gracia	Director de obra		05/06/2026
REVISÓ INTERVENTORÍA	John Fredy Torres Duque	Residente de Interventoría		
APROBÓ INTERVENTORÍA	Miguel Geovanny Torres Burgos	Director de Interventoría		
Observaciones:				

MODIFICACIONES		
FECHA	**VERSIÓN**	**DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN**

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 8
2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 9
3 PERIODO DE REPORTE 10
4 GARANTÍAS CONTRACTUALES 10
5 ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO 10
5.1 Descripción y alcance del contrato 10
5.2 Hoja de vida del contrato 11
5.3 Seguimiento al programa de obra 12
5.3.1 Seguimiento ADICIÓN 1 14
6 ASPECTOS TÉCNICOS, MODIFICACIONES SURGIDAS, PROBLEMAS Y SOLUCIONES APROBADAS 14
6.1 Asignación 14
6.1.1 Relación de ID´s asignados 14
6.1.2 Relación de ID´s asignados en zonas diferentes: 19
6.2 Implementación 20
6.2.1 Relación de Obras ejecutadas 20
6.2.2 Registro mensual del estado general del tiempo 20
6.2.3 Relación de avance de obra por ítem 22
6.2.4 Relación de suministros por ítem 25
6.2.5 ID´s con garantías menores o iguales a seis (6) meses 25
6.2.6 Acta de recibo parcial de obra 25
6.2.7 Copia de planillas de obra 25
6.2.8 Bitácora 26
6.3 Actividades realizadas en el corredor o corredores asignados 26
6.4 Entrega de elementos de señalización implementada 26
6.5 Entrega de la señalización retirada y entregada al almacén 26
6.6 Modificaciones. Problemas y soluciones presentadas durante el periodo 26
7 ACCIONES REALIZADAS SOBRE PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES EN LA ZONA DE INFLUENCIA 28
8 REGISTRO FOTOGRÁFICO POR ID 31

9 GESTIÓN, AVANCE Y PARTICULARIDADES SOBRE LOS PMT´S 40
9.1 Trámite de PMT´s 41
9.2 Implementación de PMT´s 48
10 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD 49
10.1 Condiciones Contractuales 49
10.2 Normas aplicables 49
10.3 Cumplimiento de Indicadores 51
10.4 Recursos 52
10.4.1 Compras y contratación de servicios 52
10.4.2 Personal Mínimo requerido 52
10.4.3 Compras y contratación de servicios 53
10.5 Control de salidas no conformes 53
10.5.1 Atención de solicitudes por garantías de las actividades ejecutadas 53
10.6 Plan de Inspección y Ensayos 55
11 COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 57
11.1 Cumplimiento del protocolo de manejo de residuos 57
11.2 Recursos utilizados por el contrato de obra 57
11.2.1 Personal técnico 57
11.2.2 Personal operativo 58
11.3 Planillas de pago de salarios y personal vinculado 62
11.4 Planillas de pago de parafiscales y demás aportes legales 62
11.4.1 Equipos utilizados 62
12 COMPONENTE SOCIAL 62
12.1 Vinculación de población vulnerable 63
12.2 Vinculación de población de mujeres 63
13 PAGO DE PROVEEDORES 63
14 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS 64
14.1 Comités de seguimiento 64
14.2 Estado de las pólizas del contrato 64
15 ESTADO PRESUPUESTAL 65
15.1 Presupuesto ejecutado 65

15.2 Relación de ID's asignados y ejecutados en otras Zonas 70
15.3 Relación de actas de pago y balance financiero 71
16 CUMPLIMIENTO A FACTORES DE SELECCIÓN 72
16.1 Factor de calidad – Programa de Gerencia de Proyectos 72
16.2 Factor de calidad – Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra 72
17 COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 73
18 ANEXOS 75

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información general del contrato de obra 9
Tabla 2. Relación de Garantías Contrato 3650-2024 10
Tabla 3. Seguimiento Mensual Programación vs Ejecución – MES 16 12
Tabla 4. Seguimiento Acumulado Programación vs Ejecución – MES 16 12
Tabla 5. Programación ADICIÓN 1 14
Tabla 6. Seguimiento Acumulado Programación vs Ejecución – ADICIÓN 1 14
Tabla 7. Relación de ID´s asignados 14
Tabla 8. Relación de ID´s asignados en zonas diferentes – MES 16 19
Tabla 9. Relación Obras ejecutadas – MES 16 20
Tabla 10. Relación de Lluvias del Periodo 21
Tabla 11. Relación Obra por Ítem 22
Tabla 13. Relación de Gestiones y Consultas con otras Entidades – MES 16 28
Tabla 14. Registro fotográfico por ID 31
Tabla 16. Relación PMT tramitados 41
Tabla 16. Registro fotográfico por ID 48
Tabla 17. Normas aplicables 49
Tabla 18. Seguimiento a Indicadores 51
Tabla 19 Personal Mínimo 52
Tabla 20 Informes de solicitud de atención Garantías – MES 16 53
Tabla 21 Plan de Atención de Garantías – MES 16 54
Tabla 22 Informes de Atención de Garantías – MES 16 55
Tabla 23 Seguimiento Plan de Inspección y Ensayos 55
Tabla 24. Personal técnico 58
Tabla 25. Cuadrilla señalización horizontal #1 58
Tabla 26. Cuadrilla señalización horizontal #2 59

Tabla 27. Cuadrilla señalización horizontal #3 59
Tabla 28. Cuadrilla señalización horizontal #4 59
Tabla 29. Cuadrilla emergencias horizontal y vertical 60
Tabla 30. Cuadrilla Señalización Vertical #1 60
Tabla 31. Cuadrilla Señalización Vertical #2 60
Tabla 32. Cuadrilla Señalización Vertical #3 61
Tabla 33. Personal de apoyo en obra 61
Tabla 34. Equipo mínimo 62
Tabla 35 Listado Personal Sujetos Especial Protección 63
Tabla 36 Listado Mujeres Mano de Obra No Calificada – MONC 63
Tabla 37. Actas de Comité Técnico de Seguimiento 64
Tabla 38. Estado de las pólizas del contrato 64
Tabla 39 Ejecución durante el MES 16 65
Tabla 40. Ejecución total Acumulada a MES 16 65
Tabla 41 Asignación de ID's en Zonas diferentes a la adjudicada – MES 16 70
Tabla 42. Balance Financiero – MES 16 71

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización del proyecto 11

LISTA DE GRAFICAS

Gráfica 1 Seguimiento Programación vs Ejecución Acumulada - MES 16 13
Gráfica 2 Seguimiento Programación vs Ejecución Acumulada – ADICIÓN 1 **¡Error! Marcador no definido.**

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 01. Contractuales

ANEXO 02. Hoja de Vida

ANEXO 03. Cronograma

ANEXO 04. Acta de recibo parcial

ANEXO 05. Copias planillas de obra

ANEXO 06. Bitácora

ANEXO 07. Acta recibo señalización implementada

ANEXO 08. Soporte entrega señales retiradas

ANEXO 09. Certificados de Calidad y Ensayos

ANEXO 10. Componente SISO-AMBIENTAL

ANEXO 11. Componente SOCIAL

ANEXO 12. Certificación proveedores

ANEXO 13. Comités de Seguimiento

ANEXO 14. Soporte de cumplimiento a factores de selección

ANEXO 15. Tramites y Consultas con otras entidades

ANEXO 16. Correspondencia enviada y recibida

1 INTRODUCCIÓN

La Secretaría Distrital de Movilidad, como cabeza de sector, a través de las diferentes Subsecretarías, pero principalmente, a través de la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad, con la Dirección de Ingeniería de Tránsito y la Subdirección de Señalización, es la Entidad encargada de realizar acciones coordinadas de análisis integral regional que permita una visión de planeación a largo plazo sobre los subsistemas de señalización vial, con el fin de garantizar proyectos eficientes, seguros y costo-eficientes, de manera articulada y actualizada de acuerdo con el Manual de Señalización Vial, el Plan de Desarrollo Distrital vigente durante la ejecución del contrato derivado de este proceso de selección, el Plan Maestro de Movilidad, entre otros vigentes en el desarrollo del contrato.

Para el cumplimiento de los fines misionales que la caracteriza, la Secretaría Distrital de Movilidad, requiere adelantar las labores de planeamiento, coordinación y control de la operación de la señalización de los diferentes segmentos viales del Distrito Capital, estableciendo planes y programas estratégicos que de manera continua, conduzcan a la elaboración y/o actualización de estudios y diseños de señalización y seguridad vial, es así que la Secretaría cuenta con un equipo técnico que esté actualizando oportunamente los diseños de señalización de la ciudad de acuerdo con los cambios que se van presentando en la operación y condiciones de uso de las vías, para posteriormente materializarlos mediante la implementación de todos los elementos y dispositivos de señalización y seguridad vial.

Producto del proceso de selección de licitación pública No. SDM-LP-95-2024, suscribió con el CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ Nit.901.898.342-6 el Contrato de Obra No. 2024-3650 cuyo objeto es: **“REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” ZONA - 4 CENTRO SUR.**

2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, se relaciona la información general del contrato de obra, el cual a la fecha mantiene las condiciones contractuales iniciales.

Tabla 1. Información general del contrato de obra

ZONA 4 – CENTRO SUR	
CONTRATO No.	2024-3650
OBJETO	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” ZONA - 4 CENTRO SUR
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
CONTRATISTA	**CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	MAURO ANDRÉS GONZÁLEZ CANTOR
NIT	901.898.342-6
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVIAL IP
SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA	LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO
PLAZO INICIAL	TREINTA Y CUATRO (34) MESES
FECHA DE INICIO	30/01/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	29/11/2027
FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN	17/12/2025
VALOR INICIAL	$ 18.771.473.428
VALOR ADICIÓN 1	$ 1.482.594.138
VALOR TOTAL	$ 20.254.067.566
INTERVENTORÍA	
CONTRATO No.	2024-3665
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO INTERVIAL IP**
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Fuente: Elaboración propia

3 PERIODO DE REPORTE

El presente informe corresponde al **MES 16**, periodo: del **30 de abril de 2026 al 29 de mayo de 2026**.

4 GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona las pólizas del contrato; se adjunta copias de las pólizas (Ver Anexo 1).

Tabla 2. Relación de Garantías Contrato 3650-2024

ASEGURADO: CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ						
ASEGURADORA	**AMPAROS**	**PÓLIZA No.**	**%**	**VIGENCIA**		**SUMA ASEGURADA**
				DESDE	**HASTA**	**VALOR**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL	96-40-101069047	5%	30/01/2025	30/11/2027	$ 1.012.703.378,30
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO	96-44-101194633	30%	30/01/2025	31/05/2028	$ 6.076.220.269,80
	PRESTACIONES SOCIALES		20%	30/01/2025	30/11/2030	$ 4.050.813.513,20
	CALIDAD DEL SERVICIO		30%	30/11/2027	31/05/2028	$ 6.076.220.269,80
	ESTABILIDAD DE LA OBRA		30%	30/11/2027	30/11/2032	$ 6.076.220.269,80

Fuente: Elaboración propia

5 ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

5.1 Descripción y alcance del contrato

Suministrar e implementar elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C., en espacios que se encuentren a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad y estén definidos en las áreas de influencia de los diseños integrales de señalización aprobados y que requieran de señalización para la regulación, prevención e información a los usuarios del sistema de movilidad.

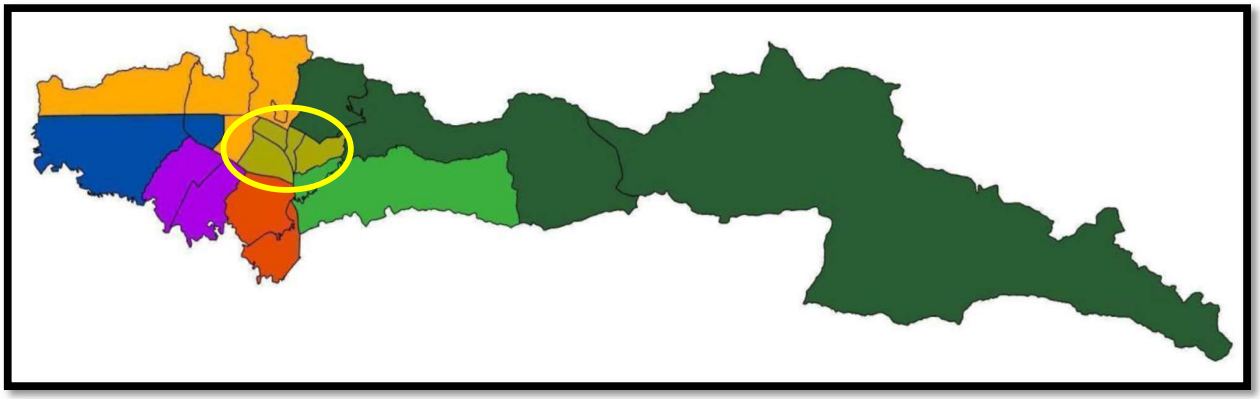
Teniendo en cuenta las características de los trabajos a ejecutar y los requisitos para la autorización de planes de manejo de tránsito, las actividades de implementación de señalización serán realizadas mayormente en horario nocturno a fin de minimizar los impactos y efectos que se pudiesen causar al normal funcionamiento del sistema de movilidad en la ciudad; sin embargo, esto no implica que no se pueda implementar señalización en horario diurno ya sea en días ordinarios o festivos, en caso de requerirse y si las condiciones y necesidades así lo ameriten.

Son parte de las actividades contractuales, las de señalización de las áreas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular constitutivos del Espacio Público Asociado a la Infraestructura de transporte, con la inclusión de proyectos de ciudad tales como: carriles preferenciales, carriles de alta ocupación vehicular, medidas de gestión, urbanismo táctico (barrios vitales, proyectos especiales peatonales, andenes emergentes y conexiones peatonales), zonas de parqueo pago, micro movilidad, zonas amarillas, zonas de cargue y descargue, ciclorrutas y todos los demás proyectos de ciudad que surjan desde la Administración Distrital con el propósito del fortalecimiento del sistema de señalización para la movilidad y seguridad vial en la ciudad de Bogotá.

El lote asignado al Contrato de Obra No. 2024-3650 es la Zona No. 4, en la cual se incluyen las siguientes localidades:

- Antonio Nariño
- Los Mártires
- Puente Aranda
- Rafael Uribe Uribe

Ilustración 1. Localización del proyecto



Fuente: Elaboración propia

5.2 Hoja de vida del contrato

Para el periodo del presente informe **MES 16**, se diligenció la "HOJA DE VIDA" del contrato, en formato Excel. La cual incluye aspectos tales como registro y control de los ID entregados para ejecución, la fecha de entrega, el identificador del diseño, la prioridad de implementación, el nombre de los colegios o equipamientos beneficiados, el consolidado de las obras ejecutadas, la cuenta y los valores en los cuales se cobró la implementación y demás datos relevantes de los mismos. **Ver ANEXO 02. Hoja de vida la hoja de vida del contrato.**

5.3 Seguimiento al programa de obra

Para el periodo del presente informe **MES 16**, se presenta a continuación el estado de avance físico y financiero, con corte al 29 de mayo de 2026.

Tabla 3. Seguimiento Mensual Programación vs Ejecución – MES 16

Valor Inicial	**$ 18.771.473.428,00**
Valor Adición No. 1 al Contrato	**$ 1.482.594.138,00**
Valor Total del Contrato	**$ 20.254.067.566,00**
Valor por ejecutar	**$ 8.963.594.227,00**

Mes	Desde	Hasta	Valor programado Mensual	Valor Facturado Mensual	Valor Ejecutado Mensual
1	30/01/2025	28/02/2025	$ 566.898.498	$ 290.221.563,00	$ 652.718.723,00
2	1/03/2025	29/03/2025	$ 1.126.288.406	$ 837.103.559,00	$ 708.580.871,00
3	30/03/2025	29/04/2025	$ 938.573.671	$ 888.310.648,00	$ 1.139.515.697,00
4	30/04/2025	29/05/2025	$ 750.858.937	$ 1.350.488.536,00	$ 865.309.012,00
5	30/05/2025	29/06/2025	$ 750.858.937	$ 538.740.073,00	$ 538.740.073,65
6	30/06/2025	29/07/2025	$ 750.858.937	$ 971.384.742,00	$ 971.384.744,35
7	30/07/2025	29/08/2025	$ 518.092.667	$ 614.871.584,00	$ 614.871.584,00
8	30/08/2025	29/09/2025	$ 518.092.667	$ 740.908.112,00	$ 842.921.160,00
9	30/09/2025	29/10/2025	$ 518.092.667	$ 411.291.916,00	$ 570.622.151,00
10	30/10/2025	29/11/2025	$ 518.092.667	$ 949.719.930,00	$ 855.974.282,00
11	30/11/2025	29/12/2025	$ 518.092.667	$ 696.826.957,00	$ 529.229.322,00
12	30/12/2025	29/01/2026	$ 1.111.130.322	$ 714.713.568,00	$ 840.839.492,00
13	30/01/2025	28/02/2026	$ 601.314.007	$ 630.299.852,00	$ 593.112.881,00
14	1/03/2026	29/03/2026	$ 559.012.265	$ 804.662.145,00	$ 827.799.896,00
15	30/03/2026	29/04/2026	$ 577.240.926	$ 216.238.276,00	$ 122.504.300,00
16	30/04/2026	29/05/2026	$ 577.240.926	$ 634.691.878,00	$ 725.077.921,00
			$10.323.498.238	**$10.655.781.461**	**$10.674.124.189**

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Seguimiento Acumulado Programación vs Ejecución – MES 16

Mes	Valor programado Acumulado	Valor facturado Acumulado	Valor ejecutado Acumulado
1	$ 566.898.497,53	$ 290.221.563,00	$ 652.718.723,00
2	$ 1.693.186.903,21	$ 1.127.325.122,00	$ 1.361.299.594,00
3	$ 2.631.760.574,61	$ 2.015.635.770,00	$ 2.500.815.291,00
4	$ 3.382.619.511,73	$ 3.366.124.306,00	$ 3.366.124.303,00

Mes	Valor programado Acumulado	Valor facturado Acumulado	Valor ejecutado Acumulado
5	$ 4.133.478.448,85	$ 3.904.864.379,00	$ 3.904.864.376,65
6	$ 4.884.337.385,97	$ 4.876.249.121,00	$ 4.876.249.121,00
7	$ 5.402.430.052,58	$ 5.491.120.705,00	$ 5.491.120.705,00
8	$ 5.920.522.719,19	$ 6.232.028.817,00	$ 6.334.041.865,00
9	$ 6.438.615.385,80	$ 6.643.320.733,00	$ 6.904.664.016,00
10	$ 6.956.708.052,42	$ 7.593.040.663,00	$ 7.760.638.298,00
11	$ 7.474.800.719,03	$ 8.289.867.620,00	$ 8.289.867.620,00
12	$ 8.585.931.040,84	$ 9.004.581.188,00	$ 9.130.707.112,00
13	**$ 9.187.245.047,66**	$ 9.634.881.040,00	$ 9.723.819.993,00
14	**$ 9.746.257.312,49**	$ 10.439.543.185,00	$ 10.551.619.889,00
15	**$ 10.323.498.238,12**	$ 10.655.781.461,00	$ 10.674.124.189,00
16	**$ 10.900.739.163,75**	$ 11.290.473.339,00	$ 11.399.202.110,00
	53,82%	**55,74%**	**56,28%**

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 1 Seguimiento Programación vs Ejecución Acumulada - MES 16



Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente se adjunta en el **ANEXO 03. Cronograma,** los cronogramas por ID, programación semanal y programación de atención de garantías del presente periodo

5.3.1 Seguimiento ADICIÓN 1

Según lo reportado el MES 15, se culminó la ejecución de la ADICIÓN No. 1 con los tres (3) ID's asignados, para un total ejecutado de **$ 1.482.594.138,00**:

Tabla 5. Programación ADICIÓN 1

No	ID	Presupuesto Inicial
1	EX_15_349_826_10 Sector "RESTREPO"	$ 595.153.221,00
2	EX_14_084_1249_11_V3 Sector "SANTA ISABEL"	$ 672.486.273,00
3	EX_16_047_1556_10_V11 Sector "ALQUERÍA"	$ 214.954.644,00
TOTAL		**$ 1.482.594.138,00**

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Seguimiento Acumulado Programación vs Ejecución – ADICIÓN 1

MES	ID	% PROGRAMADO	Valor PROGRAMADO	Valor EJECUTADO
1	Enero 2026	40%	$ 593.037.655,20	$ 605.428.163,50
2	Febrero 2026	25%	$ 370.648.534,50	$ 333.196.519,00
3	Marzo 2026	35%	$ 518.907.948,30	$ 543.969.455,07
TOTAL		**100%**	**$ 1.482.594.138,00**	**$ 1.482.594.138,00**

Fuente: Elaboración propia

6 ASPECTOS TÉCNICOS, MODIFICACIONES SURGIDAS, PROBLEMAS Y SOLUCIONES APROBADAS

6.1 Asignación

6.1.1 Relación de ID´s asignados

A la fecha del presente informe **MES 16**, se han asignado los siguientes ID´s para inspección e implementación.

Tabla 7. Relación de ID´s asignados

ORDEN DE IMPLEMENTACIÓN MODELO DIT	ID Diseño	Localidad
0	MV_AC26_643_24_V0	14 - Los Mártires

ORDEN DE IMPLEMENTACIÓN MODELO DIT	ID Diseño	Localidad
0	MV_AUTO_SUR_643_24_V0	15 - Antonio Nariño
0	MV_AV_NQS_1073_24	16 - Puente Aranda
1	EX_18_002_1445_14	18 - Rafael Uribe Uribe
2	MV_16_181_1249_11	16 - Puente Aranda
3	EX_15_95_1867_12	15 - Antonio Nariño
4	EX_14_104_1881_12	14 - Los Mártires
5	EX_14_084_1249_11	14 - Los Mártires
6	MV_14_015	14 - Los Mártires
7	EX_15_349_826_10	15 - Antonio Nariño
8	EX_16_047_1556_10	16 - Puente Aranda
9	EX_16_194_1881_12 (Suspendido)	16 - Puente Aranda
10	EX_15_93_1867_12 (Suspendido)	15 - Antonio Nariño
11	EX_14_097_1881_12 (Suspendido)	14 - Los Mártires
12	EX_16_208_1881_12	16 - Puente Aranda
13	EX_14_096_1881_12 (Suspendido)	14 - Los Mártires
14	EX_14_001_2487_21 (Suspendido)	14 - Los mártires
15	EX_16_198_1881_12	16 - Puente Aranda
16	EX_15_032_1561_10	15 - Antonio Nariño
17	PMT EMERGENCIA 001 (SDM-202461204171712)	18 - Rafael Uribe Uribe
18	PMT EMERGENCIA 002 (DI 21453 - SDQS 158932025)	18 - Rafael Uribe Uribe
19	SUMINISTRO #1	N.A.
20	SH_SV_ZPP_2470_2021_ CLINICA_MEDERI_V0	14 - Los Mártires
21	CP_20243650_001 (EX_16_004_716_24)	16 - Puente Aranda
22	CP_20243650_002 (MV_14_089_1249_11_V13)	14 - Los Mártires
23	CP_20243650_003 (EX_14_096_1881_12_V7)	14 - Los Mártires
24	CP_20243650_004 (EX_14_106_1881_12_V7)	14 - Los Mártires
25	CP_20243650_005 (EX_14_098_1881_12) Y (MV_16_181_1249_11)	14 - Los Mártires
26	SH_SV_ZPP_2470_2021_OUTLET_AMERICAS_ V1	16 - Puente Aranda
27	CP_20243650_006 (EX_16_046_1556_10_V7)	16 - Puente Aranda
28	EX_18_235_937_09_V9	18 - Rafael Uribe Uribe
29	PMT DE EMERGENCIA 003 Evento SIRE 5446502	18 - Rafael Uribe Uribe

ORDEN DE IMPLEMENTACIÓN MODELO DIT	ID Diseño	Localidad
30	CP_20243650_007 (EX_14_106_1881_12_V7)	14 - Los Mártires
31	MV_09_024_1249_11	16 - Puente Aranda
32	MV_AC_13_872_24_T1	16 - Puente Aranda 14 - Los Mártires
33	CP_20243650_008 (MV_15_016_1561_10_V10)	15 - Antonio Nariño
34	CP_20243650_009 (EX_15_349_826_10_V8)	15 - Antonio Nariño
35	CP_20243650_010 (EX_18_165_1867_12_V5)	18 - Rafael Uribe Uribe
36	CP_20243650_011 (MV_14_015_V17)	18 - Rafael Uribe Uribe
37	CP_20243650_012 (MV_AV_NQS_1073_24, MV_16_169_1249_11, EX_14_084_1249_11, EX_16_180_1249_11, EX_16_045_1556_10)	16 - Puente Aranda 14 - Los Mártires
38	CP_20243650_013 (MV_AV_NQS_1073_24)	16 - Puente Aranda
39	PMT DE EMERGENCIA 004 – DI No. 21789	18 - Rafael Uribe Uribe
40	CP_20243650_014 (EX_14_104_1881_12_V6)	14 - Los Mártires
41	PMT DE EMERGENCIA 005 SDM-202561201722862	18 - Rafael Uribe Uribe
42	MV_AV_NQS_1073_24 CICLORRUTA	Multilocalidad
43	SUMINISTRO # 2	NA
44	SH_SV_CTO_1279_2017_V1 (URBANISMO TÁCTICO)	02 - Chapinero
45	SUMINISTRO # 3	NA
46	MV_16_116_1747_10 CICLORUTA (TV 42)	16 – Puente Aranda
47	CP_20243650_015 (EX_16_178_1249_11)	16 – Puente Aranda
48	SUMINISTRO # 4	NA
49	CP_20243650_016 (MV_AV_NQS_1073_24)	14 - Los Mártires
50	CP_20243650_017 (MV_AV_NQS_1073_24)	14 - Los Mártires
51	CP_20243650_018 (MV_AUTO_SUR_643_24)	15 – Antonio Nariño
52	CP_20243650_019 (MV_08_251_1244_11)	16 – Puente Aranda
53	CP_20243650_020 (MV_AV_NQS_1073_24)	14 – Los Mártires
54	CP_20243650_021 (MV_18_032_1747_10)	14 – Los Mártires
55	PMT DE EMERGENCIA 006 BARRIO SAN MARTIN	18 - Rafael Uribe Uribe
56	CP_20243650_022 (EX_18_354_1561_10_V7)	18 - Rafael Uribe Uribe
57	CP_20243650_023 KR 30 CON CALLE 45	Teusaquillo
58	PMT DE EMERGENCIA 007 SDM-202561201966602	18 - Rafael Uribe Uribe

ORDEN DE IMPLEMENTACIÓN MODELO DIT	ID Diseño	Localidad
59	CP_20243650_024 (EX_18_165_1867_12_V3)	18 - Rafael Uribe Uribe
60	PMT EMERGENCIA 008 2024ER20997_IDIGER	18 - Rafael Uribe Uribe
61	CP_20243650_025 (MV_AV_NQS_1073_24) KR 30 CON CL 53	Teusaquillo
62	CP_20243650_026 (MV_15_016_1561_10_V11 EX_15_422_826_10_V12) CL 22 S CON KR 18	15 – Antonio Nariño 18 – Rafael Uribe Uribe
63	CP_20243650_027 (EX_16_209_1881_12_V3) CL 37 S CON KR 52C	16 – Puente Aranda
64	CP_20243650_028 EX_18_165_1867_12_V5	18 - Rafael Uribe Uribe
65	EX_02_033_1556_10	02 - Chapinero
66	SH_SV_ZPP_2470_2021_PARDO_RUBIO_V1	02 - Chapinero
67	SH_SV_ZPP_CTO_2470_2021_PABLO VI_V1	13 - Teusaquillo
68	EX_02_356_946_10_V11	02 - Chapinero
69	EX_02_356_946_10_V12	02 - Chapinero
70	SH_SV_ZPP_2470 _2021_ATLANTIS_V0	02 - Chapinero
71	CP_20243650_029 (EX_16_170_1249_11_V5, MV_AV_AMERICAS_716_24_V1)	16 - Puente Aranda
72	EX_18_358_826_10_V2	18 - Rafael Uribe Uribe
73	SUMINISTRO # 5	NA
74	CP_20243650_030 (MV_AV_AMERICAS_716_24_V1)	16 - Puente Aranda
75	MV_16_174_1249_11_V12	16 - Puente Aranda
76	CP_20243650_031 (CPS_941_EM_19_111_V27)	18 - Rafael Uribe Uribe
77	CP_20243650_032 (SH_SV_AK10_CL31SUR_CL7_V6)	15 - Antonio Nariño
78	CP_20243650_033 (EX_18_039_1561_10_V7, CPS_941_EM_19_111_V28)	18 - Rafael Uribe Uribe
79	MV_14_089_1249_11	14 - Mártires
80	EX_02_240_575_11_V10R5_UT	02 - Chapinero
81	EX_16_006_716_24 (EL JAZMÍN)	16 - Puente Aranda
82	MV_16_116_1747_10	16 - Puente Aranda
83	EX_16_004_716_24 (PRIMAVERA)	16 - Puente Aranda
84	MV_16_169_1249_11	14 - Mártires 16 - Puente Aranda

ORDEN DE IMPLEMENTACIÓN MODELO DIT	ID Diseño	Localidad
85	EX_16_006_1249_11	16 - Puente Aranda
86	EX_16_198_1881_12 (PONDEROSA)	16 - Puente Aranda
87	SUMINISTRO # 6	NA
88	SUMINISTRO # 7	NA
89	CP_20243650_035 (AV NQS - AC 3) MV_AV_NQS_1073_24_V4)	14 - Los Mártires
90	SUMINISTRO # 8	NA
91	CP_20243650_036 (EX_14_104_1881_12)	13 - Teusaquillo
92	PMT DE EMERGENCIA 009	18 - Rafael Uribe Uribe
93	SH_SV_ZPP_2470_2021_SDM_CL_13_V0	16 - Puente Aranda
94	CP_20243650_037	18 - Rafael Uribe Uribe
95	EX_16_047_1556_10_V11	16 - Puente Aranda
96	CP_20243650_038	18 - Rafael Uribe Uribe
97	CP_20243650_039	18 - Rafael Uribe Uribe
98	CP_20243650_040	16 - Puente Aranda
99	CP_20243650_041 (EX_16_469_947_10_V10 MV_16_181_1249_11_V7)	16 - Puente Aranda
100	CP_20243650_042	18 - Rafael Uribe Uribe
101	CP_20243650_043 (EX_15_96_1867_12)	15 - Antonio Nariño
102	CP_20243650_044	18 - Rafael Uribe Uribe
103	CP_20243650_045	18 - Rafael Uribe Uribe
104	SUMINISTRO # 9	NA
(**) 105	MV_16_174_1249_11	16 - Puente Aranda
106	CP_20243650_046	16 - Puente Aranda
107	SUMINISTRO #10	NA
108	SH_SV_ZPP_2470_2021_CENTROMAYOR_V0	15 - Antonio Nariño
109	CP_20243650_047 (EX_15_422_826_10_V14)	15 - Antonio Nariño
110	EX_16_208_1881_12	16 - Puente Aranda
111	CP_20243650_048	18 - Rafael Uribe Uribe
112	PMT EMERGENCIA 5467899	18 - Rafael Uribe Uribe
(*) 113	MV_AV_1_MAYO_1073_24_V1	15 - Antonio Nariño 18 - Rafael Uribe Uribe
(*) 114	EX_15_032_1561_10	15 - Antonio Nariño
115	CP_20243650_049 (15_2228) (MV_14_015)	15 - Antonio Nariño
116	CP_20243650_050 (14_2232) (MV_14_089_1249_11)	14 - Los Mártires
117	CP_20243650_051 (14_2231) (EX_14_098_1881_12)	14 - Los Mártires

ORDEN DE IMPLEMENTACIÓN MODELO DIT	ID Diseño	Localidad
(*) 118	MV_02_190_1556_10_V5 (Deprimido Calle 94)	02 - Chapinero

Notas: Al cierre del presente periodo se tienen:

Tres (3) ID´s asignados para inspección y cuantificación no viabilizados para intervención (*).

Un (1) ID's No viabilizado para Implementación (**)

Cinco (5) ID´s asignados al inicio, suspendidos por la Entidad (Suspendido).

Fuente: Elaboración propia

6.1.2 Relación de ID´s asignados en zonas diferentes:

A la fecha del presente informe **MES 16**, la entidad ha realizado la asignación de ID´s para implementación en otras zonas, así:

Tabla 8. Relación de ID´s asignados en zonas diferentes – MES 16

No.	ID	DIRECCIÓN	ZONA	CONTRATISTA
1	MV_AV_NQS_1073_24 CICLORUTA NQS	CICLORUTA DE LA NQS DESDE LA AV AMÉRICAS HASTA LA AC 63	ZONA 1	CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTÁ GYP 2024
		CICLORUTA DE LA NQS DESDE LA AC 63 HASTA CALLE 93	ZONA 2	UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURAS
2	SH_SV_CTO_1279_2017_V1 URBANISMO TÁCTICO	KR 7A ENTRE CL 88 Y AC 92	ZONA 1	CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTÁ GYP 2024
3	SH_SV_ZPP_2470_2021_ PARDO_RUBIO_V1	CL 65 ENTRE KR 1A Y KR 5, DE LA KR 4 ENTRE CL 65 Y CL 68 DE LA CL 65 BIS ENTRE KR 4 Y KR 4A	ZONA 1	CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTÁ GYP 2024
4	SH_SV_ZPP_CTO_2470_2021_ PABLO VI_V1	CL 57B ENTRE LA KR 54 Y AK 50, EN LA KR 53 ENTRE LA AC 53 Y CL 57B Y EN LA KR 54 ENTRE CL 57B Y CL 59	ZONA 1	CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTÁ GYP 2024
5	EX_02_356_946_10_V12 (Comercial papelera)	DE LA CL 90 ENTRE KR 15 Y KR 19A, DE LA KR 18 ENTRE CL 90 Y CL 92 DE LA CL 93B ENTRE KR 17 Y KR 19, DE LA CL 95 ENTRE KR 15 Y KR 16	ZONA 1	CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTÁ GYP 2024
6	SH_SV_ZPP_2470_2021_ ATLANTIS_V0	CL 81 ENTRE KR 11 Y KR 13A, CL 80 ENTRE KR 14 Y KR 13A, CL 80 ENTRE KR 13 Y KR 13A, 80 ENTRE KR 13 Y KR 12A, CL 80 ENTRE KR 12 Y KR 12A Y CL 80 ENTRE KR 12 Y KR 11	ZONA 1	CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTÁ GYP 2024
7	EX_02_240_575_11_V10R5_UT (Liceo Frances)	CARRERA 7A ENTRE AC 92 Y CL 88	ZONA 1	CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTÁ GYP 2024

Fuente: Elaboración propia

En cumplimiento del procedimiento establecido en el **ANEXO TÉCNICO**, se suscribieron las respectivas actas **(Ver Anexo 1).**

6.2 Implementación

6.2.1 Relación de Obras ejecutadas

Para el periodo del presente informe **MES 16**, se adelantaron trabajos de implementación de señalización vial en los siguientes puntos:

Tabla 9. Relación Obras ejecutadas – MES 16

No.	ID Diseño	Tipo de Implementación	Localidad	UPZ	Dirección
1	SH_SV_ZPP_2470_2021_CENTROMAYOR_V0	Vertical y Horizontal	15 - Antonio Nariño	38 - Restrepo	CL 38A SUR ENTRE TV 35 Y KR 34
2	EX_16_208_1881_12	Vertical y Horizontal	16 - Puente Aranda	43 - San Rafael	AC 6 Y AV KR 50 ENTRE TV 49 Y TRANSVERSAL 42
3	PMT EMERGENCIA 5467899	Vertical	18 - Rafael Uribe Uribe	29 - Rafael Uribe	KR 11D ENTRE CL 49I SUR Y CL 49H SUR
4	Compromiso Prioritario CP_20243650_049 (15_2228) (MV_14_015)	Vertical	15 - Antonio Nariño	38 - Restrepo	CL 17 SUR CON AV KR 27
5	Compromiso Prioritario CP_20243650_050 (14_2232) (MV_14_089_1249_11)	Vertical	14 - Los Mártires	102 - La Sabana	AC CL 19 ENTRE KR 22 Y KR 19
6	Compromiso Prioritario CP_20243650_051 (14_2231) (EX_14_098_1881_12)	Vertical	14 - Los Mártires	37 - Santa Isabel	AV CL 6 CON KR 27

Fuente: Elaboración propia

6.2.2 Registro mensual del estado general del tiempo

Para el periodo del presente informe **MES 16**, se presentaron trece (13) jornadas de lluvia que afectaron las jornadas de implementación, así:

Tabla 10. Relación de Lluvias del Periodo

No.	MES 15	HORA INICIO LUVIAS		ACTIVIDAD EN DESARROLLO	SE AFECTAN LABORES EN	OBSERVACIONES
	FECHA	(Diurno /		(HORIZONTAL	(ID #)	
	(DD/MM/AA)	Nocturno)		y/o VERTICAL)		
4	3/05/2026	D	-	-	-	-
		N	9:30 p. m.	Horizontal	SH_SV_ZPP_2470_2021 Centro Mayor CP008 garantías MV 14 015 C11 AK 27 GARANTÍAS CP_034 Mederi	Se cancelan actividades por lluvia
6	5/05/2026	D	-	-	-	-
		N	12:45 a. m.	Horizontal	SH_SV_ZPP_2470_2021 Centro Mayor	Se cancelan actividades por lluvia
12	11/05/2026	D	-	-	-	-
		N	7:38 p. m.	Horizontal	EX_16_208_1881_12 San Rafael SH_SV_ZPP_2470_2021 Centro Mayor	Se cancelan actividades por lluvia
19	18/05/2026	D	3:28 p. m.	Horizontal	EX_16_208_1881_12-San Rafael	Se suspenden actividades por lluvia
		N	11:24 p. m.	Horizontal	EX_16_208_1881_12 San Rafael	Se cancelan actividades por lluvia
22	21/05/2026	D	2:09 p. m.	Vertical	EX_16_208_1881_12 San Rafael	Se suspenden actividades por lluvia
		N	9:57 p. m.	Horizontal	EX_16_208_1881_12 San Rafael	Se cancelan actividades por lluvia
23	22/05/2026	D	-	-	-	-
		N	11:08 p. m.	Horizontal	EX_16_208_1881_12 San Rafael	Se cancelan actividades por lluvia
24	23/05/2026	D	-	-	-	-
		N	12:13 a. m.	Horizontal	EX_16_208_1881_12 San Rafael	Se cancelan actividades por lluvia
26	25/05/2026	D	-	-	-	-
		N	10:37 p. m.	Horizontal	EX_16_208_1881_12 San Rafael	Se cancelan actividades por lluvia
27	26/05/2026	D	-	-	-	-
		N	10:29 p. m.	Horizontal	EX_16_208_1881_12 San Rafael SH_SV_ZPP_2470_2021 Centro Mayor	Se cancelan actividades por lluvia
28	27/05/2026	D	-	-	-	-
		N	4:00 a. m.	Horizontal	SH_SV_ZPP_2470_2021 Centro Mayor	Se cancela instalación de tachas por alto grado de humedad en la superficie
30	29/05/2026	D	11:40	Vertical	EX_16_208_1881_12 San Rafael	Se suspenden actividades por lluvia
		N	-	-	-	-

TOTAL, DÍAS DE LLUVIA (DIURNA)	**3**	**10.00%**
TOTAL, DÍAS DE LLUVIA (NOCTURNA)	**10**	**33.33%**
TOTAL, DÍAS DE LLUVIA (DIURNA Y NOCTURNA)	**13**	**43.33%**

Fuente: Elaboración propia

6.2.3 Relación de avance de obra por ítem

Para el periodo del presente informe **MES 16**, a continuación, se presenta el consolidado de cantidades de obra ejecutadas por cada uno de los ítems presentados en la propuesta económica.

Tabla 11. Relación Obra por Ítem

UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
M2	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	2,40	$512.022,00	$ 1.228.852,80
UN	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	6,00	$162.865,00	$ 977.190,00
UN	Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	22,00	$225.357,00	$ 4.957.854,00
UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	33,00	$386.359,00	$ 12.749.847,00
UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	25,00	$611.621,00	$ 15.290.525,00
UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	7,00	$772.481,00	$ 5.407.367,00
M2	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI - ST (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	4,44	$538.886,00	$ 2.393.731,61
UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 ó SP-46A, material reflectivo Tipo XI amarillo / verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.	1,00	$409.733,00	$ 409.733,00

UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
UN	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	22,00	$218.674,00	$ 4.810.828,00
UN	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	28,00	$ 61.383,00	$ 1.718.724,00
UN	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	83,00	$ 32.917,00	$ 2.732.111,00
UN	Reubicación de señales verticales (incluye señales sencillas y Dúplex)	1,00	$ 72.829,00	$ 72.829,00
M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	6.972,55	$ 2.474,00	$ 17.250.088,70
M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	146,15	$ 3.216,00	$ 470.018,40
M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	575,95	$ 3.404,00	$ 1.960.533,80
M2	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	3.446,08	$ 17.394,00	$ 59.941.040,73
M	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744	6.972,55	$ 8.198,00	$ 57.160.964,90
M	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	146,15	$ 14.500,00	$ 2.119.175,00
M	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	575,95	$ 15.827,00	$ 9.115.560,65
M2	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	39,43	$ 73.626,00	$ 2.903.073,18
M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	1.076,81	$125.001,00	$ 134.602.439,31
M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	907,60	$129.512,00	$ 117.545.674,00

UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos tácticos u otras intervenciones tácticas urbanas) sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas	32,66	$131.396,00	$ 4.291.761,27
UN	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	1.145,00	$ 10.571,00	$ 12.103.795,00
UN	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	8.953,00	$ 15.933,00	$ 142.648.149,00
UN	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	161,00	$113.349,00	$ 18.249.189,00
UN	Suministro y anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2"(Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud, dimensiones: altura máxima de 15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	11,00	$258.685,00	$ 2.845.535,00
UN	Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivo blanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	50,00	$ 71.333,00	$ 3.566.650,00
M2	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epóxica	105,74	$450.289,00	$ 47.611.307,42
UN	Retiro de tachones, hito o resaltos portátiles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	118,00	$ 8.755,00	$ 1.033.090,00
UN	Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	7,00	$ 3.928,00	$ 27.496,00
TOTAL, OBRA				**$725.077.921,00**

Fuente: Elaboración propia

6.2.4 Relación de suministros por ítem

Para el periodo del presente informe **MES 16**, no se entregaron elementos por Suministro.

6.2.5 ID´s con garantías menores o iguales a seis (6) meses

Para el periodo comprendido en el presente informe, y en relación con las planillas de obra implementadas o como resultado de la inspección, a continuación, se relacionan los ID´s en los cuales se encontraron garantías iguales o menores a seis (6) meses. Ver **ANEXO 05. Planillas de obra.**

1). SH_SV_ZPP_2470_2021_CENTROMAYOR_V0
CL 38A SUR ENTRE TV 35 Y KR 34

Con base en la inspección realizada, y de acuerdo con los criterios establecidos para la determinación de garantías, se definió que las marcas implementadas en este tramo cuentan con una garantía de seis (6) meses, considerando los siguientes parámetros:

TPD: ALTO
CONTAMINACIÓN: ALTA
ESTADO DEL PAVIMENTO: REGULAR
AFECTACIÓN: MEDIA

Las marcas correspondientes a este periodo de garantía consisten en achurados (ACH), estoperoles metálicos con espigo (EP), pasos peatonales (PP), pictograma prohibido parquear (PPP), zonas escolares (PZE), flechas de reducción de carril derecho (RCD), flechas de reducción de carril izquierdo (RCI), resaltos parabólicos (RE), pictograma de texto “MOTO” (PTEXT), las tachas reflectivas (TR, implementadas en el sector anteriormente mencionado, con fecha de implementación entre el 07 de mayo y del 29 de mayo de 2026.

6.2.6 Acta de recibo parcial de obra

Para el periodo del presente informe **MES 16**, se presenta en el **ANEXO 04. Acta de Recibo Parcial de Obra No. 16.**

6.2.7 Copia de planillas de obra

Para el periodo del presente informe **MES 16**, se incluyen las planillas de obra debidamente revisadas y avaladas. **Ver ANEXO 05. Planillas de obra**.

6.2.8 Bitácora

Para el periodo del presente informe **MES 16**, se registran las actividades de implementación en vertical y horizontal, la cual se adjunta en el **ANEXO 06. Bitácora.**

6.3 Actividades realizadas en el corredor o corredores asignados

Para el periodo del presente informe **MES 16**, no se adelantaron actividades de implementación en corredores viales.

6.4 Entrega de elementos de señalización implementada

Para el periodo comprendido del presente informe **MES 16**, se adjunta el Acta de Recibo a Satisfacción de la señalización implementada, la cual se relaciona en el **ANEXO 07. Acta recibo señalización implementada.**

6.5 Entrega de la señalización retirada y entregada al almacén

Para el periodo comprendido del presente informe **MES 16**, no se realizaron actividades de entrega de señalización retirada a los patios de la SDM.

6.6 Modificaciones. Problemas y soluciones presentadas durante el periodo

Para el periodo del presente informe **MES 16**, se indican a continuación las situaciones:

a) Aplicación ANS
Una vez recibidos los informes de presunto incumplimiento y/o aplicación de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), se llevó a cabo la respectiva audiencia, en la cual el contratista presentó los argumentos y soportes correspondientes en respuesta a los aspectos señalados por la interventoría. Como resultado de dicha actuación, la interventoría emitió la comunicación C.INTIP-SMOV-3665-CGE-414-2026 del 15 de mayo de 2026, en la que concluyó lo siguiente: “En consecuencia, la interventoría deja constancia de que no se aplicarán descuentos ni por concepto de cuadrillas ni por los eventos asociados a la atención de requerimientos de garantías a las marcas viales implementadas. No obstante, por parte de esta interventoría se continuará verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales conforme al anexo técnico, la programación aprobada, los informes mensuales, los soportes de personal, las órdenes de servicio y los diseños asignados.” En virtud de lo anterior, se dio por concluido el procedimiento relacionado con el presunto incumplimiento y la eventual aplicación de descuentos por concepto de ANS, sin que se determinara la imposición de deducciones al contratista.

b) Falta de asignación de obra para cumplimiento PAC MES 16

El 06 de mayo de 2026, mediante comunicación CE-3650-Z4-393, se informó de manera escrita la situación expuesta reiteradamente en los diferentes comités de obra: la falta de asignación de zonas de intervención requeridas para la ejecución del contrato.

En dicha comunicación se indicó que, a la fecha de su emisión (06/05/2026), únicamente se contaba con un (1) ID pendiente por ejecutar, por valor de $84.427.604,60.

Asimismo, se relacionaron los ID asignados que no contaban con aval para su intervención, correspondientes a MV_16_174_1249_11_V12, por valor de $581.004.528,00, y EX_16_208_1881_12, por valor de **$ 733.534.106,70.**

Finalmente, se informó que, a menos de veintitrés (23) días del cierre del mes 16, no se contaba con obra asignada que permitiera cumplir con el PAC programado para junio de 2026, cuyo valor ascendía a **$ 534.986.992,00.**

c) Solicitud Concepto Modificación Contractual

El 25 de mayo de 2026, mediante comunicación CE-3650-Z4-424, se solicitó concepto para la modificación del Contrato de Obra No. 2024-3650, proponiendo incrementar el porcentaje límite de intervención en zonas diferentes a la adjudicada, pasando del seis por ciento (6%) al quince por ciento (15%).

La solicitud se fundamentó en la necesidad de contar con una capacidad operativa y de respuesta adecuada para la implementación inmediata de ID's en sectores distintos a los inicialmente asignados, permitiendo atender situaciones excepcionales, sobrevinientes o prioritarias que requirieran intervención inmediata en diferentes zonas de la ciudad.

Lo anterior tuvo como finalidad garantizar la correcta ejecución del contrato, asegurar la continuidad en la prestación del servicio y la atención del interés general, así como viabilizar la intervención en distintos sectores de la ciudad cuando las condiciones operativas y contractuales así lo demandaran, garantizando el cumplimiento de los aspectos técnicos, operativos y económicos que inciden en el desarrollo del contrato.

d) Programación de actividades de Obra

El 22 de mayo de 2026 se recibió la comunicación C.INTIP-SMOV-3665-CGE-421-2026, mediante la cual la interventoría impartió lineamientos para la programación y ejecución de actividades durante los fines de semana, relacionados con la remisión anticipada de la programación de obra, la coordinación para la implementación de PMT y el acompañamiento técnico y profesional durante la ejecución de las actividades.

En atención a lo anterior, mediante comunicación CE-3650-Z4-423 del 25 de mayo de 2026, el contratista informó la adopción de los lineamientos acordados en mesa de trabajo realizada el 22 de mayo de 2026, precisando el procedimiento para la remisión de la programación de actividades y la coordinación operativa de los frentes de trabajo. Así mismo, realizó las aclaraciones correspondientes respecto a las condiciones operativas para el inicio de actividades y ratificó la disponibilidad del personal técnico y profesional requerido para la atención de los aspectos técnicos y la toma de decisiones en campo, de acuerdo con la estructura contractual establecida.

e) Conducto regular Manejo de Comunicaciones

Mediante comunicación C.INTIP-SMOV-3665-CGE-401-2026 se recibió llamado de atención por omisión el conducto regular en trámite comunicaciones de solicitudes y consultas.

Se solicitó precisa cuál(es) comunicación(es) o actuación(es) originaron el llamado de atención referido; con el fin de atender de manera eficiente su requerimiento y emitir la correspondiente

respuesta frente a la solicitud de: *"(...) Confirmar por escrito, en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles, las acciones que implementará para corregir esta situación y garantizar el cumplimiento de los protocolos de comunicación (...)".*
f) Implementación PMT
Mediante comunicación C. INTIP-SMOV-3665-CGE-420-2026 "Llamado de atención, no cumplimiento de implementación del PMT" jornada diurna 18 de mayo de 2026. De manera particular, se había contemplado la opción de programación de actividades de horizontal en horario diurno; lo cual a partir del pasado miércoles 20 de mayo de 2026, únicamente será implementado en situaciones excepcionales debidamente informadas s la interventoría para su respectivo seguimiento. Adicional no siendo posible "presencia del residente técnico de obra presente durante la ejecución de las actividades de implementación" dadas las demás funciones de responsabilidad de dicho profesional. El Residente de Obra es el responsable del cumplimiento de sus funciones y su gestión de seguimiento se realiza con el apoyo de personal (inspectores) que realizan acompañamiento de las cuadrillas en las actividades programadas, por lo que en la programación se incluirá adicional al número de contacto del residente de cada Jornada el número telefónico del personal de apoyo.
g) Novedades actividades de otros contratos en sectores intervenidos
Mediante comunicación CE-3650-Z4-397 se remite novedad de actividades de rehabilitación vial en las medidas de implementación de señalización vial del ID: EX_16_047_1556_10 – Solicitud apoyo interinstitucional para restablecimiento de señalización implementada.
h) Ajustes de diseño por inexistencia Instituciones Educativas
En el periodo se realizo notificación en 2 ID's sobre la necesidad de ajustes a los diseños de los ID´s: EX_16_208_1881_12_V3 y EX_15_032_1561_10_V8 , por inexistencia de Instituciones educativas, lo que afecta de manera directa el valor de los presupuestos iniciales presentados.

7 ACCIONES REALIZADAS SOBRE PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES EN LA ZONA DE INFLUENCIA

Para el periodo comprendido en el presente informe **MES 16**, se reportan actividades en proyectos de otras entidades en la zona de Influencia. Así:

Tabla 12. Relación de Gestiones y Consultas con otras Entidades – MES 16

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO	FECHA RADICADO	No. RADICADO	RESPUESTA	FECHA RESPUESTA
CE-3650-Z4-403	11/05/2026	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	Consulta intervenciones programadas por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, en la malla vial local con obras de mantenimiento y/o rehabilitación en la LOCALDIAD DE ANTONIO NARIÑO – ID: EX_15_032_1561_10_V8	11/05/2026	1202652600742140	PEND	PEND

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO	FECHA RADICADO	No. RADICADO	RESPUESTA	FECHA RESPUESTA
CE-3650-Z4-404	11/05/2026	ALCALDIA LOCAL ANTONIO NARIÑO	Consulta intervenciones programadas por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, en la malla vial local con obras de mantenimiento y/o rehabilitación en la LOCALDIAD DE ANTONIO NARIÑO – ID: EX_15_032_1561_10_V8	27/05/2026	20266610454762	PEND	PEND
CE-3650-Z4-427	27/05/2026	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	Consulta intervenciones programadas por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, en la malla vial local con obras de mantenimiento y/o rehabilitación – ID: EX_16_194_1881_12_V2	27/05/2026	202652600846392 202652600853422	PEND	PEND
CE-3650-Z4-428	27/05/2026	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	Consulta intervenciones programadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB, en la malla vial local con obras de mantenimiento y/o rehabilitación – ID: EX_16_194_1881_12_V2	27/05/2026	Correo Electrónico	PEND	PEND
CE-3650-Z4-429	27/05/2026	ALCALDIA LOCAL PUENTE ARANDA	Consulta intervenciones programadas por Alcaldía Local de Puente Aranda, en la malla vial local con obras de mantenimiento y/o rehabilitación – ID: EX_16_194_1881_12_V2	27/05/2026	20266610051762	PEND	PEND
CE-3650-Z4-430	27/05/2026	SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT	Consulta intervenciones programadas por la Secretaria Distrital del Hábitat, en la malla vial local con obras de mantenimiento y/o rehabilitación – ID: EX_16_194_1881_12_V2	27/05/2026	1-2026-28887	PEND	PEND
CE-3650-Z4-431	27/05/2026	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	Consulta intervenciones programadas por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, en la malla vial local con obras de mantenimiento y/o rehabilitación – ID: EX_15_93_1867_12_V2	27/05/2026	202652600846762 202652600854322	PEND	PEND
CE-3650-Z4-432	27/05/2026	ALCALDIA LOCAL ANTONIO NARIÑO	Consulta intervenciones programadas por la Alcaldía Local de Antonio Nariño, en la malla vial local con obras de mantenimiento y/o rehabilitación – ID: EX_15_93_1867_12_V2	27/05/2026	20264211852132	PEND	PEND

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO	FECHA RADICADO	No. RADICADO	RESPUESTA	FECHA RESPUESTA
CE-3650-Z4-433	27/05/2026	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	Consulta intervenciones programadas por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, en la malla vial local con obras de mantenimiento y/o rehabilitación – ID: EX_14_097_1881_12_V3	27/05/2026	202652600847022 202652600852472	PEND	PEND
CE-3650-Z4-434	27/05/2026	CONSORCIO INTERVIAL IP	Solicitud gestión de consulta intervenciones programadas por la Secretaria Dis-trital de Movilidad (SDM), en la malla vial local – ID: EX_14_097_1881_12_V3	27/05/2026	202661201979512	PEND	PEND
CE-3650-Z4-435	27/05/2026	ALCALDIA LOCAL LOS MARTIRES	Consulta intervenciones programadas por la Alcaldía Local de Mártires, en la malla vial local con obras de mantenimiento y/o rehabilitación – ID: EX_14_097_1881_12_V3	27/05/2026	20264211852512	PEND	PEND
CE-3650-Z4-436	27/05/2026	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	Consulta intervenciones programadas por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, en la malla vial local con obras de mantenimiento y/o rehabilitación – ID: EX_14_096_1881_12_V6	27/05/2026	202652600847972 202652600854552	PEND	PEND
CE-3650-Z4-437	27/05/2026	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	Consulta intervenciones programadas por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, en la malla vial local con obras de mantenimiento y/o rehabilitación – ID: EX_14_096_1881_12_V6	28/05/2026	202652600861782	PEND	PEND
CE-3650-Z4-438	27/05/2026	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	Consulta intervenciones programadas por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, en la malla vial local con obras de mantenimiento y/o rehabilitación – ID: EX_14_096_1881_12_V6	28/05/2026	202652600861892	PEND	PEND
CE-3650-Z4-439	27/05/2026	ALCALDIA LOCAL LOS MARTIRES	Consulta intervenciones programadas por la Alcaldía Local de Mártires, en la malla vial local con obras de mantenimiento y/o rehabilitación – ID: EX_14_096_1881_12_V6 .	27/05/2026	20264211853282	PEND	PEND

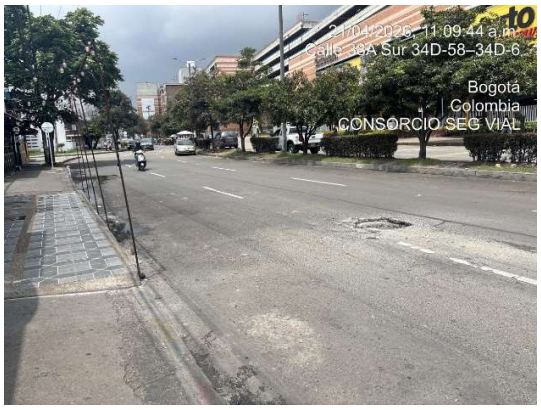
CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO	FECHA RADICADO	No. RADICADO	RESPUESTA	FECHA RESPUESTA
CE-3650-ZA-440	27/05/2026	CONSORCIO INTERVIAL IP	Solicitud gestión de consulta intervenciones programadas por El Terminal Transporte – Estacionamiento en Vía, en la malla vial local – ID: EX_14_096_1881_12_V6	27/05/2026	202661201990592	PEND	PEND

Fuente: Elaboración propia

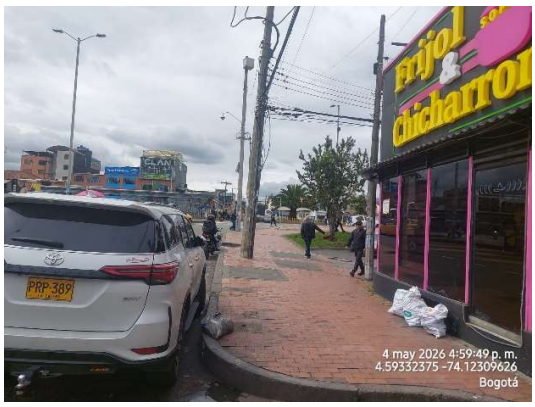
8 REGISTRO FOTOGRÁFICO POR ID

Para el periodo del presente informe **MES 16**, a continuación, se presenta el registro fotográfico general por ID implementado.

Tabla 13. Registro fotográfico por ID

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
SH_SV_ZPP_2470_2021_CENTROMAYOR_V0	
ANTES	**DESPUÉS**
	
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
SH_SV_ZPP_2470_2021_CENTROMAYOR_V0	
ANTES	**DESPUÉS**
	
	
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
SH_SV_ZPP_2470_2021_CENTROMAYOR_V0	
ANTES	**DESPUÉS**
	
	
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
SH_SV_ZPP_2470_2021_CENTROMAYOR_V0	
ANTES	**DESPUÉS**
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
EX_16_208_1881_12	
ANTES	**DESPUÉS**
	
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
EX_16_208_1881_12	
ANTES	**DESPUÉS**
	
	
	

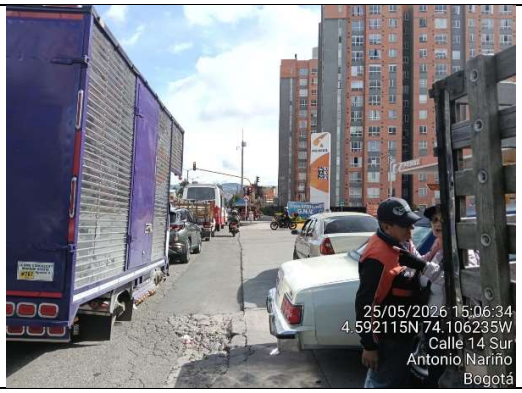
REGISTRO FOTOGRÁFICO	
EX_16_208_1881_12	
ANTES	**DESPUÉS**
	
	
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
EX_16_208_1881_12	
ANTES	**DESPUÉS**
	
	
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
EX_16_208_1881_12	
ANTES	**DESPUÉS**
	
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
PMT EMERGENCIA 5467899	
ANTES	**DESPUÉS**
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
PMT EMERGENCIA 5467899	
ANTES	**DESPUÉS**
	
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
CP_20243650_049 (15_2228) (MV_14_015)	
ANTES	**DESPUÉS**
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
CP_20243650_050 (14_2232) **(MV_14_089_1249_11)**	
ANTES	**DESPUÉS**
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
CP_20243650_051 (14_2231) **(EX_14_098_1881_12)**	
ANTES	**DESPUÉS**
	

9 GESTIÓN, AVANCE Y PARTICULARIDADES SOBRE LOS PMT´S

Para el periodo del presente informe **MES 16**, se encuentra vigente el PMT GENERAL, aprobado por la SDM mediante la comunicación **SPMT- 202531216501681** del 10 de diciembre de 2025, mediante el cual se deroga el oficio **SPMT- 202531202439021** del 12 de marzo de 2025 y el oficio **SPMT- 202531210264931** del 29 de agosto de 2025.

VIGENCIA DESDE EL 10 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 03 DE DICIEMBRE DE 2026.

9.1 Trámite de PMT´s

En atención a lo establecido para la elaboración y presentación del PMT se toman los CIV (Código de identificación vial) de la herramienta suministrada por la SDM (VISOR), y se utilizan las tipologías aprobadas por la Entidad para cada caso de intervención a realizar; ya sea sobre vías de la malla vial local, intermedia o arterial, de tal forma que apliquen las tipologías aprobadas.

Para el periodo del presente informe **MES 16** (30 de abril a 29 de mayo de 2026) desde el contrato 2024-3650 se gestionaron los PMT necesarios para avanzar en la ejecución de obra de acuerdo con los diseños asignados para implementación. En el siguiente cuadro se evidencia la gestión realizada y aprobaciones obtenidas en este periodo, se incluye la gestión realizada con metodología mediante PMT tipo aprobados previamente por la Entidad y los PMT solicitados por emergencia.

Tabla 146. Relación PMT tramitados

ID	TIPO PMT (EMERGENCIA O NORMAL)	Fecha Solicitud a SDM	COI APROBACIÓN	Fecha de Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación
PMT MASIVO	PMT GENERAL MASIVO	3-feb-2025	RAD SDM SPMT 202531200475331	5-feb-2025	5-feb-2025	29-ene-2026
MV_AC26_643_24_V0	EMERGENCIA	6-feb-2025	EMERGENCIA	10-feb-2025	10-feb-2025	24-feb-2025
MV_AUTO_SUR_643_24_V0	EMERGENCIA	6-feb-2025	EMERGENCIA	10-feb-2025	10-feb-2025	24-feb-2025
MV_AV_NQS_1073_24	EMERGENCIA	6-feb-2025	EMERGENCIA	10-feb-2025	10-feb-2025	24-feb-2025
EX_18_002_1445_14	EMERGENCIA	15-feb-2025	EMERGENCIA	18-feb-2025	17-feb-2025	4 marzo, 2025
MV_AC26_643_24_V0	EMERGENCIA	18-feb-2025	EMERGENCIA	20-feb-2025	26-feb-2025	12-mar-2025
MV_AUTO_SUR_643_24_V0	EMERGENCIA	18-feb-2025	EMERGENCIA	20-feb-2025	26-feb-2025	12-mar-2025
MV_AV_NQS_1073_24	EMERGENCIA	18-feb-2025	EMERGENCIA	20-feb-2025	26-feb-2025	12-mar-2025
EX_18_002_1445_14	EMERGENCIA	28-feb-2025	EMERGENCIA	4-mar-2025	4-mar-2025	17 marzo-2025
PMT MASIVO (RETROALIMENTACIÓN)	PMT GENERAL MASIVO	6-mar-2025	MASIVO	12 marzo, 2025	12 marzo, 2025	12 marzo, 2026
MV_AC26_643_24_V0	NORMAL	6-mar-2025	coi_11_ 2025_03_13	13 marzo, 2025	18-mar-2025	1-may-2025
MV_AUTO_SUR_643_24_V0	NORMAL	17-mar-2025	coi_12_ 2025_03_20	20-mar-2025	21-mar-2025	1-may-2025
MV_AV_NQS_1073_24	NORMAL	6-mar-2025	coi_11_ 2025_03_13	13 marzo, 2025	18-mar-2025	1-may-2025
EX_18_002_1445_14	NORMAL	6-mar-2025	coi_11_ 2025_03_13	13 marzo, 2025	18-mar-2025	25-abr-2025
MV_16_181_1249_11_V6	NORMAL	13-mar-2025	coi_12_ 2025_03_20	20-mar-2025	24-mar-2025	22-may-2025

ID	TIPO PMT (EMERGENCIA O NORMAL)	Fecha Solicitud a SDM	COI APROBACIÓN	Fecha de Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación
CP_20243650_002 (MV_14_089_1249_11_V13) detección electrónica	NORMAL	27-mar-2025	coi_14_ 2025_04_03	3-abr-2025	4-abr-2025	1-may-2025
CP_20243650_003 (EX_14_096_1881_12_V7) detección electrónica	NORMAL	27-mar-2025	coi_14_ 2025_04_03	3-abr-2025	4-abr-2025	1-may-2025
CP_20243650_004 (EX_14_106_1881_12_V7) detección electrónica	NORMAL	27-mar-2025	coi_14_ 2025_04_03	3-abr-2025	4-abr-2025	1-may-2025
CP_20243650_005 (EX_14_098_1881_12) Y (MV_16_181_1249_11) detección electrónica	NORMAL	27-mar-2025	coi_14_ 2025_04_03	3-abr-2025	4-abr-2025	1-may-2025
ZPP OUTLET LAS AMÉRICAS	NORMAL	27-mar-2025	coi_14_ 2025_04_03	3-abr-2025	9-abr-2025	9-may-2025
SH_SV_ZPP_2470_2021_CLINIC A_MEDERI_V0	NORMAL	27-mar-2025	coi_14_ 2025_04_03	3-abr-2025	4-abr-2025	1-may-2025
CP_20243650_006 (EX_16_046_1556_10_V7) Calle 27B Sur entre Carrera 39 y 39B	NORMAL	10-abr-2025	coi_16_ 2025_04_16	16-abr-2025	17-abr-2025	12-jun-2025
CP_20243650_007 (EX_14_106_1881_12_V7) CL14 ENTRE KR19 Y KR22	NORMAL	10-abr-2025	coi_16_ 2025_04_16	16-abr-2025	17-abr-2025	16-jun-2025
EX_15_95_1867_12 CL23SUR KR29A KR27 ANTONIO NARIÑO	NORMAL	10-abr-2025	coi_16_ 2025_04_16	16-abr-2025	17-abr-2025	12-jun-2025
EX_18_002_1445_14	NORMAL	10-abr-2025	coi_16_ 2025_04_16	16-abr-2025	18-abr-2025	29-may-2025
CP 12 AC 3 entre CR 26A y CR 32B	NORMAL	16-abr-2025	COI_18_ 2025_04_30	30-abr-2025	1-may-2025	19-jun-2025
CP 12 CP CL 2C entre CR 29 y NQS	NORMAL	16-abr-2025	COI_18_ 2025_04_30	30-abr-2025	1-may-2025	29-may-2025
CP 12 CP CL 4BIS entre CR 30A y NQS	NORMAL	16-abr-2025	COI_17_ 2025_04_24	24-abr-2025	25-abr-2025	19-jun-2025
CP 12 CP CL 2B entre CR 30A y NQS	NORMAL	16-abr-2025	COI_17_ 2025_04_24	24-abr-2025	25-abr-2025	19-jun-2025
CL21SUR KR26 A LA KR27	NORMAL	16-abr-2025	COI_17_ 2025_04_24	24-abr-2025	25-abr-2025	19-jun-2025
CP 009 KR26 CL22SUR A LA CL19SUR	NORMAL	16-abr-2025	COI_17_ 2025_04_24	24-abr-2025	25-abr-2025	19-jun-2025
CL19SUR ENTRE KR26 Y KR27	NORMAL	16-abr-2025	COI_17_ 2025_04_24	24-abr-2025	25-abr-2025	19-jun-2025
CP 010 KR26A ENTRE CL24SUR KR27	NORMAL	16-abr-2025	COI_17_ 2025_04_24	24-abr-2025	25-abr-2025	19-jun-2025
EX_18_235_937_09_V9	NORMAL	24-abr-2025	COI_18_ 2025_04_30	30-abr-2025	2-may-2025	26-jun-2025
ZPP OUTLET LAS AMÉRICAS	NORMAL	24-abr-2025	COI_18_ 2025_04_30	30-abr-2025	1-may-2025	26-jun-2025
SH_SV_ZPP_2470_2021_CLINIC A_MEDERI_V0	NORMAL	24-abr-2025	COI_18_ 2025_04_30	30-abr-2025	2-may-2025	29-may-2025
CP 13 MV_AV_NQS_1073_24	NORMAL	24-abr-2025	COI_18_ 2025_04_30	30-abr-2025	2-may-2025	12-jun-2025

ID	TIPO PMT (EMERGENCIA O NORMAL)	Fecha Solicitud a SDM	COI APROBACIÓN	Fecha de Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación
AV 1 DE MAYO ENTRE KR29B Y KR24D	NORMAL	16-abr-2025	COI_17_ 2025_04_24	24-abr-2025	25-abr-2025	19-jun-2025
AV KR 27 ENTRE CL29SUR A CL23SUR	EMERGENCIA	18-abr-2025	COI EMERGENCIAS	22-abr-2025	22-abr-2025	2-may-2025
CALLE 13 ENTRE AV. CARACAS Y KR 50	NORMAL	8-may-2025	COI_20_ 2025_05_15	15-may-2025	16-may-2025	10-jul-2025
CARRERA 27 ENTRE 17SUR Y 23 SUR	NORMAL	8-may-2025	COI_20_ 2025_05_15	15-may-2025	16-may-2025	10-jul-2025
CARRERA 27 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 22	NORMAL	8-may-2025	COI_20_ 2025_05_15	15-may-2025	16-may-2025	10-jul-2025
AUTO SUR CON CARRERA 50 PUENTE	EMERGENCIA	9-may-2025	EMERGENCIA	13-may-2025	13-may-2025	23-may-2025
MV_16_181_1249_11_V6	NORMAL	15-may-2025	COI_21_ 2025_05_22	22-may-2025	23-may-2025	17-jul-2025
CALLE 19 ENTRE AV CARACAS Y CARRERA 32	NORMAL	22 mayo, 2025	COI_22_ 2025_05_29	29 mayo, 2025	30 mayo, 2025	24 julio, 2025
AUTO SUR CON CARRERA 50 PUENTE	NORMAL	22 mayo, 2025	COI_22_ 2025_05_29	29 mayo, 2025	30 mayo, 2025	24 julio, 2025
EX_18_002_1445_14 marruecos	NORMAL	29-may-2025	COI_23_ 2025_06_05	5 junio, 2025	6 junio, 2025	28 agosto, 2025
ciclorruta y calzadas NQS MV_AV_NQS_1073_24	NORMAL	29 mayo, 2025	COI_23_ 2025_06_05	5 junio, 2025	6 junio, 2025	31 julio, 2025
CP_20243650_006 (EX_16_046_1556_10_V7) Calle 27B Sur entre Carrera 39 y 39B	NORMAL	5 junio, 2025	COI_24_ 2025_06_12	13 junio, 2025	13 junio, 2025	7 agosto, 2025
EX_15_95_1867_12	NORMAL	5-jun-2025	COI_24_ 2025_06_12	13 junio, 2025	13 junio, 2025	7 agosto, 2025
CALLE 26 ENTRE KR19B Y KR27A	NORMAL	12-jun-2025	COI_25_ 2025_06_19	19 junio, 2025	20 junio, 2025	14 agosto, 2025
CP_20243650_007 (EX_14_106_1881_12_V7) CL14 ENTRE KR19 Y KR22	NORMAL	12-jun-2025	COI_18_ 2025_04_30	30-abr-2025	13-jun-2025	7-ago-2025
AV. NQS ENTRE CL 1F Y CL 92 CICLORRUTA	NORMAL	19-jun-2025	COI_26_ 2025_06_26	26 junio, 2025	27-jun-2025	21-ago-2025
URBANISMO TÁCTICO KR 7A ENTRE CL 88 Y CL92	NORMAL	19-jun-2025	COI_26_ 2025_06_26	26 junio, 2025	27-jun-2025	21-ago-2025
EX_18_235_937_09_V9	NORMAL	19-jun-2025	COI_26_ 2025_06_26	26 junio, 2025	27-jun-2025	21-ago-2025
KR32 ENTRE CL12 Y AV13 EX_16_178_1249_11_V7	NORMAL	3-jul-2025	COI_28_ 2025_07_10	10-jul-2025	11-jul-2025	9-ago-2025
AC CALLE 13 ENTRE AV CARACAS Y KR 39 CALZADAS VEHICULARES	NORMAL	10-jul-2025	COI_29_ 2025_07_17	17-jul-2025	18-jul-2025	11-sept-2025
CL 41BSUR ENTRE KR20A Y KR22 CP 22 Ex-18-354-1561-10	NORMAL	10-jul-2025	COI_29_ 2025_07_17	17-jul-2025	18-jul-2025	11-sept-2025
KR 37 15 METROS AL SUR DE LA AC 13	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	18-sept-2025
KR 46 15 METROS AL SUR DE LA AC 13	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	18-sept-2025
KR 33 20 METROS 15 METROS AL SUR DE LA AC 13	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	4-sept-2025
KR 34 20 METROS 15 METROS AL SUR DE LA AC 13	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	4-sept-2025

ID	TIPO PMT (EMERGENCIA O NORMAL)	Fecha Solicitud a SDM	COI APROBACIÓN	Fecha de Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación
KR 35 20 METROS 15 METROS AL SUR DE LA AC 13	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	4-sept-2025
KR 38 20 METROS AL NORTE DE LA AC 13	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	4-sept-2025
KR 42B 20 METROS AL SUR DE LA AC 13	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	4-sept-2025
KR 44 20 METROS AL SUR DE LA AC 13	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	4-sept-2025
KR 45 20 METROS AL NORTE DE LA AC 13	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	4-sept-2025
AUTO SUR DESDE KR 50 HASTA AK 68 CALZADAS Y CICLORRUTA	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	18-sept-2025
AC CALLE 13 ENTRE AK30 Y KR 39 CICLORRUTA	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	18-sept-2025
AC 13 3NTRE KR 39 Y KR 47 CALZADAS Y CICLORRUTA	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	18-sept-2025
KR 21 ENTRE CL 40ASUR Y CL 42SUR CP 22 Ex-18-354-1561-10	NORMAL	17-jul-2025	COI_30_ 2025_07_24	24-may-2025	25-jul-2025	11-sept-2025
NQS MV_AV_NQS_1073_24 (AC6 A LA CL1F CALZADA OCCIDENTAL	NORMAL	24-jul-2025	COI_31_ 2025_07_31	31-jul-2025	1-ago-2025	4-sept-2025
NQS MV_AV_NQS_1073_24 CALZADA ORIENTAL (AC24 A LA CL1F)	NORMAL	24-jul-2025	COI_31_ 2025_07_31	31-jul-2025	1-ago-2025	4-sept-2025
KR 34 20 METROS 20 METROS AL NORTE DE LA AC 13	NORMAL	24-jul-2025	COI_31_ 2025_07_31	31-jul-2025	1-ago-2025	4-sept-2025
KR 35 20 METROS 15 METROS AL NORTE DE LA AC 13	NORMAL	24-jul-2025	COI_31_ 2025_07_31	31-jul-2025	1-ago-2025	4-sept-2025
KR 36 20 METROS 15 METROS AL NORTE DE LA AC 13	NORMAL	24-jul-2025	COI_31_ 2025_07_31	31-jul-2025	1-ago-2025	4-sept-2025
KR 39 (TV42) - 20 METROS AL SUR DE LA AC 13	NORMAL	31-jul-2025	COI_32_ 2025_08_08	8-ago-2025	8-ago-2025	18-sept-2025
KR 39 - 20 METROS AL NORTE DE LA AC 13	NORMAL	31-jul-2025	COI_32_ 2025_08_08	8-ago-2025	8-ago-2025	18-sept-2025
KR 36 20 METROS AL SUR DE LA AC 13	NORMAL	31-jul-2025	COI_32_ 2025_08_08	8-ago-2025	8-ago-2025	18-sept-2025
KR 26B ENTRE CL 31 SUR - CL30SUR	NORMAL	31-jul-2025	COI_32_ 2025_08_08	8-ago-2025	8-ago-2025	2-oct-2025
KR32 ENTRE CL12 Y AV13 EX_16_178_1249_11_V7	NORMAL	31-jul-2025	COI_32_ 2025_08_08	8-ago-2025	8-ago-2025	2-oct-2025
NQS MV_AV_NQS_1073_24 CALZADA OCCIDENTAL (AC24 A LA CL1F)	NORMAL	31-jul-2025	COI_32_ 2025_08_08	8-ago-2025	8-ago-2025	25-sept-2025
PMT EMERGENCIA AV 1 DE MAYO X 18	EMERGENCIA	20-ago-2025	COI EMERGENCIAS	20-ago-2025	20-ago-2025	3-sept-2025
PMT EMERGENCIA CL 37SUR X KR52C	EMERGENCIA	19-ago-2025	COI EMERGENCIAS	19-ago-2025	19-ago-2025	2-sept-2025
AC 13 ENTRE AK CARACAS Y KR 30 CICLORRUTA	NORMAL	21-ago-2025	COI_35_ 2025_08_28	29-ago-2025	29-ago-2025	23-oct-2025

ID	TIPO PMT (EMERGENCIA O NORMAL)	Fecha Solicitud a SDM	COI APROBACIÓN	Fecha de Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación
"AC CALLE 13 ENTRE AV CARACAS Y KR 39 CALZADAS VEHICULARES"	NORMAL	21-ago-2025	COI_36_ 2025_09_04	4-sep-2025	5-sep-2025	30-oct-2025
SH_SV_ZPP_2470 _2021_ATLANTIS_V0	NORMAL	28-ago-2025	COI_36_ 2025_09_04	4-sep-2025	5-sep-2025	30-oct-2025
EX_02_356_946_10_V12, Comercial Papelera Área de implementación 2	NORMAL	28-ago-2025	COI_36_ 2025_09_04	4-sep-2025	5-sep-2025	30-oct-2025
SH_SV_ZPP_2470_2021_PARDO _RUBIO_V1	NORMAL	28-ago-2025	COI_36_ 2025_09_04	4-sep-2025	5-sep-2025	30-oct-2025
Av. Américas entre carreras 66A y 67A	NORMAL	28-ago-2025	COI_36_ 2025_09_04	4-sep-2025	5-sep-2025	30-oct-2025
Calle 4G entre carreras 66A y 67A	NORMAL	28-ago-2025	COI_36_ 2025_09_04	4-sep-2025	5-sep-2025	30-oct-2025
EX_18_385_826_10	NORMAL	4-sep-2025	COI_37_ 2025_09_11	11-sep-2025	12-sep-2025	6-nov-2025
EX_15_95_1867_12	NORMAL	11-sept-2025	COI_38_ 2025_09_18	18-sep-2025	19-sep-2025	13-nov-2025
INTERSECCIONES CALLE 13 KR27, KR32, KR24	NORMAL	11-sept-2025	COI_38_ 2025_09_18	18-sep-2025	19-sep-2025	13-nov-2025
ZPP SH_SV_ZPP_CTO_2470_2021_PA BLO VI_V1	NORMAL	11-sept-2025	COI_38_ 2025_09_18_AD_ 1	18-sept-2025	22-sept-2025	13-nov-2025
EX_18_002_1445_14	NORMAL	18-sept-2025	COI_39_ 2025_09_25	25-sept-2025	26-sept-2025	20-nov-2025
SH_SV_ZPP_2470_2021_CLINIC A_MEDERI_V0	NORMAL	18-sept-2025	COI_39_ 2025_09_25	25-sept-2025	26-sept-2025	20-nov-2025
MV_16_181_1249_11_V6	NORMAL	18-sept-2025	COI_39_ 2025_09_25	25-sept-2025	26-sept-2025	20-nov-2025
MV_16_174_1249_11_V12	NORMAL	18-sept-2025	COI_39_ 2025_09_25	25-sept-2025	26-sept-2025	20-nov-2025
MV_16_116_1747_10 CICLORUTA (TV 42)	NORMAL	18-sept-2025	COI_39_ 2025_09_25	25-sept-2025	26-sept-2025	20-nov-2025
AV. AMÉRIAS X KR 60 RETIRO DE TACHONES E HITOS	NORMAL	25-sept-2025	COI_40_ 2025_10_02	2-oct-2025	3-oct-2025	10-oct-2025
CICLORRUTA CALLE 13 ENTRE NQS Y CARRERA 43	NORMAL	25-sept-2025	COI_40_ 2025_10_02	2-oct-2025	3-oct-2025	27-nov-2025
BORDILLOS CALLE 13 ENTRE KR 33Y KR43	NORMAL	03-sept-2025	COI_41_ 2025_10_09	9 octubre, 2025	10 octubre, 2025	4 diciembre, 2025
EX_15_095_1867_12 (ANTONIO NARIÑO)	NORMAL	16-oct-2025	COI_43_ 2025_10_23	24-oct-2025	24-oct-2025	18-dic-2025
CP_20253650_032KR 10 ENTRE 13SUR Y 17SUR	NORMAL	16-oct-2025	COI_43_ 2025_10_23	24-oct-2025	24-oct-2025	18-dic-2025
CP_20243650_033 (EX_18_039_1561_10_V7, CPS_941_EM_19_111_V28)	EMERGENCIA	23-oct-2025	COI EMERGENCIAS	25-oct-2025	24-oct-2025	08-nov-2025
EX_15_095_1867_12 (ANTONIO NARIÑO)	NORMAL	23-oct-2025	COI_44_ 2025_10_30	30-oct-2025	31-oct-2025	11-dic-2025
EX_18_358_826_10	NORMAL	30-oct-2025	COI_45_ 2025_11_06	07-nov-2025	07-nov-2025	15-ene-2026
MV_14_015 (DESDE LA TV 33 HASTA LA CL 17B S)	NORMAL	30-oct-2025	COI_45_ 2025_11_06	07-nov-2025	07-nov-2025	15-ene-2026

ID	TIPO PMT (EMERGENCIA O NORMAL)	Fecha Solicitud a SDM	COI APROBACIÓN	Fecha de Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación
CP_20243650_034 (EX_14_096_1881_12_V7)	NORMAL	13-nov-2025	COI_47_ 2025_11_20	20-nov-2025	21-nov-2025	1-ene-2026
KR 7A ENTRE CL 89 Y CL 92	NORMAL	13-nov-2025	COI_47_ 2025_11_20	20-nov-2025	28-nov-2025	27-ene-2026
EX_16_004_716_24_V2	NORMAL	13-nov-2025	COI_47_ 2025_11_20	20-nov-2025	28-nov-2025	27-ene-2026
EX_16_198_1881_12_V2	NORMAL	13-nov-2025	COI_47_ 2025_11_20	20-nov-2025	28-nov-2025	27-ene-2026
EX_16_006_716_24 _V2	NORMAL	13-nov-2025	COI_47_ 2025_11_20	20-nov-2025	28-nov-2025	27-ene-2026
MV_16_116_1747_10_V20	NORMAL	13-nov-2025	COI_47_ 2025_11_20	20-nov-2025	28-nov-2025	27-ene-2026
CP_20243650_036 (KR 19B ENTRE CL 24 Y AC 26 CALZADA OCCIDENTAL / SENTIDO NORTE – SUR)	EMERGENCIA	22-dic-2025	COI_52_ 2025_12_26	22-dic-2025	22-dic-2025	31-dic-2025
EX_15_349_826_10_V7	NORMAL	18-dic-2025	COI_52_ 2025_12_26	26-dic-2025	27-dic-2025	19-feb-2026
EX_14_084_1249_11_V3	NORMAL	23-dic-2025	COI_01_ 2026_01_02	02-ene-2026	03-ene-2026	23-feb-2026
EX_14_084_1249_11_V3(KR29B ENTRE CL1H Y CL2B; KR 29C ENTRE AC8SUR Y CL 1D))	NORMAL	8-ene-2026	COI_03_ 2026_01_15	15-ene-2026	16-ene-2026	12-mar-2026
EX_02_240_575_11_V10R5_UT	EMERGENCIA	23-ene-2026	COI EMERGENCIAS	23-ene-2026	23-ene-2026	06-feb-2026
EX_14_084_1249_11_V3 (KR29B ENTRE AC8SUR Y CL1G)	NORMAL	22-ene-2026	COI_04_ 2026_01_22	22-ene-2026	23-ene-2026	19-mar-2026
EX_02_240_575_11_V10R5_UT	NORMAL	22-ene-2026	COI_04_ 2026_01_22	22-ene-2026	23-ene-2026	19-mar-2026
MV_AC26_643_24_V0	NORMAL	22-ene-2026	COI_05_ 2026_01_29	29-ene-2026	30-ene-2026	12-mar-2026
MV_AC_13_872_24_T1	NORMAL	22-ene-2026	COI_05_ 2026_01_29	29-ene-2026	30-ene-2026	12-mar-2026
MV_AUTO_SUR_643_24_V0	NORMAL	22-ene-2026	COI_05_ 2026_01_29	29-ene-2026	30-ene-2026	12-mar-2026
CP_20243650_037 (EX_18_010_1445_14_V3)	NORMAL	22-ene-2026	COI_05_ 2026_01_29	29-ene-2026	30-ene-2026	12-mar-2026
EX_18_150_1244_11_V8 - CP18	NORMAL	29-ene-2026	COI_06_ 2026_02_05	5-feb-2026	6-feb-2026	2-abril-2026
EX_16_198_1881_12_V2 PONDEROSA	NORMAL	29-ene-2026	COI_06_ 2026_02_05	5-feb-2026	6-feb-2026	9-abril-2026
EX 16 047 1556 10	NORMAL	29-ene-2026	COI_06_ 2026_02_05	5-feb-2026	6-feb-2026	7-mayo-2026
EX_15_349_826_10_V7	NORMAL	5-feb-2026	COI_07_ 2026_02_12	12-feb-2026	13-feb-2026	9-abr-2026
EX_14_084_1249_11_V3	NORMAL	5-feb-2026	COI_07_ 2026_02_12	12-feb-2026	27-feb-2026	9-abr-2026
SH_SV_ZPP_2470_2021_SDM_CL_13_V0	NORMAL	5-feb-2026	COI_07_ 2026_02_12	12-feb-2026	19-feb-2026	2-abr-2026
EX_18_354_1561_10_C7 CP22	NORMAL	5-feb-2026	COI_07_ 2026_02_12	12-feb-2026	13-feb-2026	9-abr-2026
AC 6 - MV_16_181_1249_11_V6	NORMAL	5-feb-2026	COI_07_ 2026_02_12	12-feb-2026	13-feb-2026	16-abr-2026

ID	TIPO PMT (EMERGENCIA O NORMAL)	Fecha Solicitud a SDM	COI APROBACIÓN	Fecha de Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación
AV NQS ENTRE CL 1F Y AV AMÉRICAS	NORMAL	12-feb-2026	COI_08_ 2026_02_19	19-feb-2026	20-feb-2026	19-mar-2026
AC 13 ENTRE AV CARACAS Y KR33	NORMAL	12-feb-2026	COI_08_ 2026_02_19	19-feb-2026	20-feb-2026	19-mar-2026
ZPP OUTLET LAS AMÉRICAS	NORMAL	26-feb-2026	COI_10_ 2026_03_05	5-mar-2026	6-mar-2026	30-abr-2026
SH_SV_ZPP_2470 _2021_ATLANTIS_V0	NORMAL	26-feb-2026	COI_10_ 2026_03_05	5-mar-2026	13-mar-2026	7-may-2026
CP 12 AC 3 entre CR 26A y CR 32B	NORMAL	26-feb-2026	COI_10_ 2026_03_05	5-mar-2026	6-mar-2026	30-abr-2026
EX_18_002_1445_10	NORMAL	26-feb-2026	COI_10_ 2026_03_05	5-mar-2026	6-mar-2026	16-abr-2026
AC 13 3NTRE KR 39 Y KR 47 CICLORRUTA	NORMAL	5-mar-2026	COI_11_ 2026_03_12	12-mar-2026	13-mar-2026	9-abr-2026
EX_18_358_826_10	NORMAL	12-mar-2026	COI_12_ 2026_03_19	19-mar-2026	20-mar-2026	30-abr-2026
CP_20243650_041	NORMAL	12-mar-2026	COI_12_ 2026_03_19	19-mar-2026	20-mar-2026	30-abr-2026
CP_20243650_042	NORMAL	12-mar-2026	COI_12_ 2026_03_19	19-mar-2026	20-mar-2026	30-abr-2026
CP_20243650_043	NORMAL	12-mar-2026	COI_12_ 2026_03_19	19-mar-2026	20-mar-2026	30-abr-2026
CP_20243650_044	NORMAL	12-mar-2026	COI_12_ 2026_03_19	19-mar-2026	20-mar-2026	30-abr-2026
CP_20243650_045	NORMAL	12-mar-2026	COI_12_ 2026_03_19	19-mar-2026	20-mar-2026	30-abr-2026
EX_18_002_1445_14 (MARRUECOS) - CIV 18004850	NORMAL	20-mar-2026	COI_13_ 2026_03_26	26-mar-2026	27-mar-2026	21-may-2026
EX_18_002_1445_14 (MARRUECOS) - CIV 18004674	NORMAL	20-mar-2026	COI_13_ 2026_03_26	26-mar-2026	27-mar-2026	21-may-2026
MV_AC_13_872_24_T1_C9 CICLORRUTA CL 13 ENTRE KR15 Y KR27	NORMAL	20-mar-2026	COI_13_ 2026_03_26	26-mar-2026	27-mar-2026	21-may-2026
AV_NQS_1073_24_Ciclorruta	NORMAL	20-mar-2026	COI_13_ 2026_03_26	26-mar-2026	27-mar-2026	21-may-2026
EX_18_358_826_10 - CIV 18000024	NORMAL	20-mar-2026	COI_13_ 2026_03_26	26-mar-2026	27-mar-2026	21-may-2026
EX_18_358_826_10 - CIV 18000012 TV 34C DG 40A SUR DG 41 SUR	NORMAL	20-mar-2026	COI_13_ 2026_03_26	26-mar-2026	27-mar-2026	21-may-2026
GARANTÍAS KR41 CL1G Y CL2D	NORMAL	09-abr-2026	COI_16_ 2026_04_16	16-abr-2026	17-abr-2026	14-may-2026
GARANTÍAS EX_15_095 KR29A; KR29 y CL26SUR	NORMAL	09-abr-2026	COI_16_ 2026_04_16	16-abr-2026	17-abr-2026	11-may-2026
CP_20243650_047	EMERGENCIA	20-abr-2026	COI EMERGENCIAS	23-abr-2026	23-abr-2026	7-may-2026
SH_SV_ZPP_2470_2021_CENTROMAYOR_V0	EMERGENCIA	20-abr-2026	COI EMERGENCIAS	23-abr-2026	26-abr-2026	11-may-2026
EX_16_208_1881_12_V3	NORMAL	30-abr-2026	COI_19_ 2026_05_07 COI_21_ 2026_05_21	7-may-2026	8-may-2026	25-jun-2026
MV_AV_1_MAYO_1073_24_V1	NORMAL	21-may-2026	COI_22_ 2026_05_28	28-may-2026	29-may-2026	27-ago-2026

ID	TIPO PMT (EMERGENCIA O NORMAL)	Fecha Solicitud a SDM	COI APROBACIÓN	Fecha de Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación
CICLORRUTA NQS DESDE LA AC92 A LA CL 1F	NORMAL	21-may-2026	COI_22_ 2026_05_28	28-may-2026	29-may-2026	23-jul-2026
EX_15_032_1561_10	NORMAL	21-may-2026	COI_22_ 2026_05_28	28-may-2026	29-may-2026	23-jul-2026

Fuente: Elaboración propia

9.2 Implementación de PMT´s

Tabla 15. Registro fotográfico por ID

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
IMPLEMENTACIÓN PMT	
	
	

10 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD

Para el periodo del presente informe **MES 16**, se indica a continuación el seguimiento al cumplimiento del Plan de Calidad, así:

10.1 Condiciones Contractuales

PLIEGOS DE CONDICIONES	**SDM-LP-95-2024** ➢ ESTUDIO PREVIO ➢ ANEXO TÉCNICO ➢ APÉNDICE C - TIPS DE FOTOGRAFÍA y VIDEO ➢ APÉNDICE D ESPECIFICACIONES DE DIBUJO ➢ APÉNDICE E. INSTRUCTIVO USUARIO ARANDA ➢ APÉNDICE F- MATRIZ DE GARANTÍAS
CONTRATO DE OBRA	**2024-3650**

10.2 Normas aplicables

Tabla 16. Normas aplicables

NORMA	DESCRIPCIÓN
Resolución 20243040045005 del 17/09/2024	Manual de señalización vial de Colombia. Dispositivos uniformes en la infraestructura vial para la regulación del tránsito y la seguridad vial.
ISO 8501-1:2007	Grados de oxidación y de preparación de sustratos de acero no pintados y de sustratos de acero después de estar totalmente decapados de revestimientos anteriores
ISO 8501-2:2001	Grados de preparación de sustratos de acero previamente pintados, después de la eliminación localizada de revestimientos anteriores
ISO 8501-3:2007	Clases de preparación de soldaduras, esquinas y otras zonas con imperfecciones de superficie
ISO 8501-4:2006	Condiciones iniciales de la superficie, grados de preparación de superficie y grados de flash rust de las preparadas por chorro de agua a alta presión (high-pressure water jetting)
NTC 1360	Pinturas para demarcación de pavimentos. especificaciones
NTC 2072	Materiales para demarcación de pavimentos, microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos
NTC 4139	Accesibilidad al medio físico, símbolo gráfico, características generales
NTC 4279	Accesibilidad de las personas al medio físico, edificios, espacios urbanos, vías de circulación peatonales horizontales
NTC 4611	Información geográfica Metadato geográfico
NTC 4739	Láminas retrorreflectivas para el control de tránsito.
NTC 4695	Accesibilidad de las personas al medio físico, señalización para tránsito peatonal en el espacio público urbano
NTC 4741	Especificaciones técnicas para señalización de vías férreas
NTC 4744-1	Aplicación de materiales para la demarcación de pavimentos. Parte1. Materiales de demarcación
NTC 4744-2	Aplicación de materiales para la demarcación de pavimentos. Parte 2. Equipos
NTC 4744-3	Aplicación de materiales para la demarcación de pavimentos. Parte 3. Retrorreflectividad en la demarcación horizontal en pavimentos.
NTC 4744-4	Aplicación de materiales para la demarcación de pavimentos. Parte 4. Control de aplicación
NTC 4745	Marcadores retro reflectantes elevados para pavimento, no removibles de tipo duración extendida (Tachas)

NORMA	DESCRIPCIÓN
NTC 4774	Accesibilidad de las personas al medio físico, espacios urbanos y rurales, cruces peatonales a nivel, elevados o puentes peatonales y pasos subterráneos.
NTC 4904	Accesibilidad de las personas al medio físico, estacionamientos accesibles.
NTC 5351	Accesibilidad de las personas al medio físico, paraderos accesibles para transporte público colectivo y masivo de pasajeros.
NTC 5734	Método de ensayo para determinar el tiempo de secado (no pick-up) de las pinturas para demarcación de pavimentos.
NTC 5807	Material retroreflectivo para la demarcación de vehículos de carga.
NTC 5867	Materiales para la demarcación de pavimentos termoplástico retrorreflectivo blanco y amarillo (forma sólida).
NTC 5868	Materiales para demarcación de pavimentos. Laminado elastoplástico (cintas preformadas) para señalización. Requisitos y métodos de ensayo
GTC 208	Guía para la selección de ensayos para la pintura de demarcación de pavimentos (2011)
Norma AASHTO M219-08	Especificaciones de pinturas termoplásticas.
NTC 3320 2008	Recubrimientos de zinc (Galvanizado por inmersión en caliente) en productos de hierro y acero
ASTM A123 / A123M	Especificación estándar para recubrimientos de zinc (Galvanizados por inmersión en caliente) en productos de hierro y acero
NTC 2076, Norma homologada de la Norma Internacional Americana ASTM A-153	Recubrimiento de zinc por inmersión en caliente para elementos de hierro y acero
ASTM A153 / A153M	Especificación estándar para el recubrimiento de zinc (inmersión en caliente) de hierro y acero y el hardware
NSR-10	Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente
NTC 4526, Norma homologada de la Norma Internacional Americana ASTM A500	Tubería estructural de acero al carbono formada en frío, con y sin costura, redonda y de otras formas
NTC1920, Norma homologada de la Norma Internacional Americana ASTM A36/A36M-00	Acero estructural al carbono
NTC 811	Método de ensayo para determinar la adhesión mediante el ensayo de cinta adhesiva
NTC 1052	Pinturas, barnices y materias primas para pintura y barnices. Muestreo
ASTM A 325	Pernos estructurales de acero, tratados térmicamente, con resistencia mínima a la tensión de 825 o 725 MPa
NTC 4029 Norma homologada de la Norma Internacional Americana ASTM A325M	Elementos de fijación. Pernos estructurales de alta resistencia destinados a juntas de acero estructurales-sistema métrico; tratados térmicamente con resistencia ultima mínima de 835/735 Psi
NTC 4028 Norma homologada de la Norma Internacional Americana ASTM A490M	Elementos de fijación. Pernos de acero de alta resistencia, clase 10.9 y 10.9.3 para juntas de acero estructurales-sistema métrico; tratados térmicamente (calor) con resistencia ultima mínima de 1050 MPa
NTC 4035 Norma homologada de la Norma Internacional Americana ASTM A194/A194M	Especificación para tuercas de acero al carbono y aleado ASTM A385/A385M establece las buenas prácticas para obtener recubrimientos de zinc por inmersión en caliente
ASTM A767 / A767M	Especificación estándar para barras de acero con recubrimiento de zinc (galvanizado) para refuerzo de concreto
ASTM A385/A385M	Establece las buenas prácticas para obtener recubrimientos de zinc por inmersión en caliente

NORMA	DESCRIPCIÓN
NTC 3981	Medición del espesor de recubrimientos por los métodos de inducción electromagnética o corrientes inducidas
NTC 2057	Metalurgia. Código para calificar el procedimiento para soldar y la habilidad del soldador
NTC 1645	Elementos de fijación. Tuercas cuadradas y hexagonales. Serie inglesa
NTC 2358	Elementos de fijación. Tuercas hexagonales de acero con especificaciones de torque remanente. Propiedades mecánicas y de funcionamiento
ISO 8501-1:2007	Preparación de sustratos de acero antes de la aplicación de pinturas y productos relacionados. Evaluación visual de la limpieza de la superficie. Parte 1: grados de oxidación y grados de preparación de sustratos de acero sin recubrimiento y de sustratos de acero después de la eliminación general de recubrimientos anteriores.
NTC 1102	Pinturas y productos afines, adelgazadores (Thinner)
ISO 4618:2015 (ISO 4618:2014)	Pinturas y barnices. Términos y definiciones
ISO 12944, NTC 6189	Corrosión de metales y aleaciones. Directrices para la selección de métodos de protección contra la corrosión atmosférica
ASTM D 4541	Método de prueba estándar para la resistencia al desprendimiento de recubrimientos usando probadores de adhesión portátiles
ASTM D 4060	Método de prueba estándar para la resistencia a la abrasión de recubrimientos orgánicos por el Taber Abraser
AWS A5.23	Especificación para electrodos y fundentes de acero de baja aleación para soldadura por arco sumergido
Resolución SDM 145243 de 2023	Por la cual se adopta el manual de supervisión e interventoría de la Secretaría Distrital de Movilidad - versión 3.0.
Norma NTC ISO 9001: 2015	Sistema de gestión de la calidad.
Norma NTC ISO 14001: 2015	Sistema de gestión Ambiental
Norma NTC-OHSAS 18001: 2007	Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional
Guía de Georreferenciación	Especificaciones de dibujo para entrega de planos de señalización
Planes de Manejo de Tránsito	Esquemas Secretaría Distrital de Movilidad

Fuente: Elaboración propia

10.3 Cumplimiento de Indicadores

Para el periodo del presente informe **MES 16**, se muestra a continuación el seguimiento a indicadores según su periodicidad, así:

Tabla 17. Seguimiento a Indicadores

INDICADOR	ÍNDICE	RESPONSABLE	FRECUENCIA	METAS
NO CONFORMIDADES Que el número de no conformidades del producto sea menor o igual al fijado en la meta.	Cero (0)	Director de Obra	Mensual	≤ 5
	Tres (3)	Director de Obra	Mensual	**CUMPLIDA**

INDICADOR	ÍNDICE	RESPONSABLE	FRECUENCIA	METAS
CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN Ejecutar el avance de obra de acuerdo al Cronograma de Obra aprobado.	100%	Director de Obra	Mensual	95% - 100%
	100%	Director de Obra	Mensual	**CUMPLIDA**
RESPUESTA A SOLICITUDES Atención y respuesta oportuna a peticiones, requerimientos, quejas y reclamos.	100%	Director de Obra	Mensual	95% - 100%
	75%	Director de Obra	Mensual	**INCUMPLIDA**
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES Cumplir con la calidad de servicios y productos finales.	100%	Director de Obra	Mensual	95% - 100%
	100%	Director de Obra	Mensual	**CUMPLIDA**

Fuente: Elaboración propia

10.4 Recursos

10.4.1 Compras y contratación de servicios

El CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ, garantiza la disponibilidad de los recursos (humanos, físicos, financieros, tecnológicos), para este proyecto específico a desarrollar y teniendo en cuenta los requisitos del cliente y las especificaciones técnicas establecidas.

10.4.2 Personal Mínimo requerido

Para el cumplimiento del objeto contractual se trabajó con el siguiente personal mínimo requerido:

Tabla 18 Personal Mínimo

No.	CARGO	CANTIDAD	DEDICACIÓN
1	Director de obra	1	70%
2	Especialista en Tránsito	1	50%
3	Ingeniero Residente de obra Diurno	1	100%
4	Ingeniero Residente de obra Nocturno	1	100%
5	Trabajador social	1	50%
6	Profesional siso ambiental	1	50%
7	Georreferenciador	1	100%
8	Conductor Diurno	1	100%
9	Conductor Nocturno	1	100%
10	Secretaria	1	100%

Fuente: Elaboración propia

10.4.3 Compras y contratación de servicios

Las compras de materiales, elementos y/o servicios requeridos para la ejecución de las actividades, se realizaron según lo establecido en el Procedimiento de Gestión de Compras.
En la Orden de Compra quedaron establecidos los materiales que requieran condiciones explícitas de cumplimiento de calidad como resultados de laboratorio o manuales de funcionamiento, contemplados en el contrato.

10.5 Control de salidas no conformes

El tratamiento de las salidas no conformes se realiza de acuerdo con el Procedimiento de salidas no conformes mediante el cual se realiza la identificación, control, tratamiento, análisis y acciones de mejora posteriores.

En particular contractualmente está establecido en el **ANEXO TÉCNICO**, el procedimiento de atención de solicitudes por garantía, de lo cual durante el presente periodo **MES 16**, se indican en el siguiente numeral.

10.5.1 Atención de solicitudes por garantías de las actividades ejecutadas

Para el periodo del presente informe **MES 16**, se recibió mediante los siguientes comunicados, los informes de garantías, correspondientes a los ID's nombrados:

Tabla 19 Informes de solicitud de atención Garantías – MES 16

COMUNICACIÓN	FECHA	INFORME DE GARANTÍAS	FECHAS DE VISITA
C.INTIP-SMOV-3665-CGE-387-2026	04 mayo 2026	Traslado radicado No. 202631105273521, REQUERIMIENTO POR GARANTÍAS DEL ID MV_14_015.	05 abril 2026
C.INTIP-SMOV-3665-CGE-389-2026	04 mayo 2026	Traslado radicado No. 202631104814471, REQUERIMIENTO POR GARANTÍAS DEL ID EX_16_006_716_24.	08 abril 2026
C.INTIP-SMOV-3665-CGE-400-2026	08 mayo 2026	Traslado radicado No. 202631105712241, RESPUESTA AL RADICADO 202661201478442.	30 abril 2026
C.INTIPSMOV-3665-CGE-405-2026	12 mayo 2026	Alcance a la comunicación C. INTIP-SMOV-3665-CGE-389-2026. REQUERIMIENTO POR GARANTÍAS DEL ID EX_16_006_716_24".	08 abril 2026
C.INTIP-SMOV-3665-CGE-409-2026	13 mayo 2026	Traslado radicado No. 202631105778891 del 07 de mayo de 2026, Requerimiento por garantías del ID MV_AUTO_SUR_643_24.	01 mayo 2026
C.INTIP-SMOV-3665-CGE-410-2026	14 mayo 2026	INFORME DE GARANTÍAS No 43 (MV_AV_NQS_1073_24_CICLORUTA)	14 abril 2026

COMUNICACIÓN	FECHA	INFORME DE GARANTÍAS	FECHAS DE VISITA
C.INTIP-SMOV-3665-CGE-411-2026	14 mayo 2026	INFORME DE GARANTÍAS No 44. SH_SV_ZPP_2470_2021_PARDO_RUBIO_C9 INFORME DE GARANTÍAS No 45 (EX_18_002_1445_14)	16 abril 2026
C.INTIP-SMOV-3665-CGE-419-2026	21 mayo 2026	INFORME DE GARANTÍAS No 46. MV_AC26_643_24_V0 INFORME DE GARANTIAS No 47 SH_SV_ZPP_2470_2021_ATLANTIS	13 abril 2026 16 abril 2026
C.INTIP-SMOV-3665-CGE-427-2026	28 mayo 2026	INFORME DE GARANTÍAS No 48. SH_SV_ZPP_2470_2021_CLINICA_MEDERI_V0	26 mayo 2026

Fuente: Elaboración propia

Tabla 20 Plan de Atención de Garantías – MES 16

COMUNICACIÓN	FECHA	DISEÑO	LOCALIDAD
CE-3650-Z4-391	5/05/2026	Traslado radicado No. 202631105273521, REQUERIMIENTO POR GARANTÍAS DEL ID MV_14_015.	15- Antonio Nariño
CE-3650-Z4-407	14/05/2026	Traslado requerimiento por garantías SS 202631105712241 ID: MV_AC_13_872_24	16 – Puente Aranda
CE-3650-Z4-411	20/05/2026	Traslado requerimiento por garantías SS 202631104814471 y SS 202631105778851 ID: EX_16_004_716_24	16 – Puente Aranda
CE-3650-Z4-415	21/05/2026	Traslado radicado No 202631105778891 del 07 de mayo de 2026, Requerimiento por garantías del ID MV_AUTO_SUR_643_24"	16 – Puente Aranda
CE-3650-Z4-416	21/05/2026	INFORME DE GARANTÍAS No 44 ID: SH_SV_ZPP_2470_2021_PARDO_RUBIO_C9.	2 – Chapinero
CE-3650-Z4-418	21/05/2026	INFORME DE GARANTÍAS No 45 ID: EX_18_002_1445_14.	18 – Rafael Uribe Uribe
CE-3650-Z4-421	21/05/2026	INFORME DE GARANTÍAS No 43 ID: MV_AV_NQS_1073_24_CICLORUTA.	2 - Barrios Unidos
CE-3650-Z4-425	26/05/2026	INFORME DE GARANTÍAS No 46 ID: MV_AC26_643_24_V0.	14 - Los Mártires
CE-3650-Z4-426	26/05/2026	INFORME DE GARANTÍAS No 47 ID: SH_SV_ZPP_2470_2021_ATLANTIS	2 – Chapinero
CE-3650-Z4-444	29/05/2026	Notificación negación PMT ID: MV_AUTO_SUR_643_24 – Reprogramación atención de Garantías	16 – Puente Aranda
CE-3650-Z4-445	29/05/2026	Notificación PMT aprobación Parcial ID: SH_SV_ZPP_2470_2021_PARDO RUBIO (1 CIV) – Reprogramación atención de Garantías	2 – Chapinero

Fuente: Elaboración propia

Se remitió el plan de atención de garantías, estableciendo un tiempo aproximado de atención entre tres (3) y cinco (5) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la aprobación del PMT correspondiente para cada ID.

Tabla 21 Informes de Atención de Garantías – MES 16

COMUNICACIÓN	FECHA	DISEÑO
CE-3650-Z4-388	04/05/2026	INFORME DE GARANTÍAS No. 42 (EX_14_096_1881_12_C10 CP034).
CE-3650-Z4-389	5/05/2026	INFORME ATENCIÓN DE GARANTÍAS No. 41 ID MV_15_016_1561_10_C7 - CP 008.
CE-3650-Z4-392	5/05/2026	INFORME ATENCIÓN DE GARANTÍAS No. 40 ID MV_14_015_C11 (AK27).
CE-3650-Z4-394	6/05/2026	INFORME ATENCIÓN DE GARANTÍAS ID MV_14_015.
CE-3650-Z4-410	19/05/2026	INFORME ATENCIÓN DE GARANTÍAS ID MV_AC_13_872_24.
CE-3650-Z4-412	21/05/2026	Respuesta comunicación C. INTIP-SMOV-3665-CGE-389-2026 y C. INTIP-SMOV-3665CGE-405-2026 - Traslado requerimiento por garantías SS 202631104814471 y SS 202631105778851 ID: EX_16_004_716_24.

Fuente: Elaboración propia

10.6 Plan de Inspección y Ensayos

Para el periodo del presente informe **MES 16**, a continuación, el seguimiento al PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS:

Tabla 22 Seguimiento Plan de Inspección y Ensayos

Material	Ensayo o Inspección	Norma / Ensayo	Frecuencia Contratista	Responsable	Equipo	Registro	MES 6
Microesferas y Antideslizante	Ensayo de gradación para microesfera y granos antideslizantes.	Manual de señalización 2024 NTC 2072 NTC 4744 INV-E-700.	Por lote	Residente Técnico	Ficha Técnica	Ficha Técnica Certificado de Calidad	CUMPLE Ver ANEXO 9
Pintura en frio	Espesor de pintura en seco: 4 lecturas por lámina	NTC 4744	De acuerdo con la norma NTC 4744, el muestreo para las marcas viales será mínimo cada 240 m2. (por cada color y tipo de pintura aplicada)	Residente Técnico	Equipo de Medición de espesores	Registro de medición	CUMPLE Ver ANEXO 9
	Espesor de pintura en húmedo	NTC 4744			Galga de Espesores	Registro de medición	CUMPLE Ver ANEXO 9

Material	Ensayo o Inspección	Norma / Ensayo	Frecuencia Contratista	Responsable	Equipo	Registro	MES 6
	Verificación de sólidos por volumen	NA	Por lote	Residente Técnico	Ficha Técnica	Ficha Técnica Certificado de Calidad	CUMPLE Ver ANEXO 9
	Densidad o peso por galón	NTC 567	Por Lote	Residente Técnico	Ficha Técnica	Ficha Técnica Certificado de Calidad	CUMPLE Ver ANEXO 9
Demarcación	Retroreflectividad	NTC 4744-3	A las líneas y marcas con pintura o termoplástico, una vez aplicadas, se les debe medir la retrorreflectividad. La toma de datos se debe realizar por cada 500 m en 3 sitios sobre cada línea (en una longitud máxima de 3 m)	Residente Técnico	Equipo de retro reflexión horizontal	Registro de Medición de reflectividad señalización horizontal.	CUMPLE Ver ANEXO 9
Tachas	Ensayo de compresión para tachas	NTC 4745	Por lote	Residente Técnico	Ficha Técnica	Ficha Técnica Certificado de Calidad	CUMPLE Ver ANEXO 9
Tachas	Ensayo de flexión para tachas	NTC 4745	Por lote	Residente Técnico	Ficha Técnica	Ficha Técnica Certificado de Calidad	CUMPLE Ver ANEXO 9
Equipos	Confiabilidad de instrumentos de medición	NA	DE ACUERDO AL FABRICANTE DE CADA EQUIPO	Residente técnico y/o ingeniero auxiliar	NA	Certificado de calibración (Vigente)	CUMPLE Ver ANEXO 9
Lámina calibre 16 (Tableros)	Verificación de calibre y espesor de los tableros	NA	Al momento de la entrega en taller previo al corte	Personal de planta de fabricación	Equipo de medición	Certificado de Calidad	CUMPLE Ver ANEXO 9
Tubo galvanizado (Pedestales)	Verificación de calibre y espesor tubo galvanizado	NA	Al momento de la entrega en taller previo al corte y ensamble de pedestales	Personal de planta de fabricación	Equipo de medición	Certificado de Calidad	CUMPLE Ver ANEXO 9

Material	Ensayo o Inspección	Norma / Ensayo	Frecuencia Contratista	Responsable	Equipo	Registro	MES 6
Papel Retroreflectivo	Retrorreflexión mediante equipo de retrorreflexión vertical	NTC 4739	Verificación en planta por lote de señales fabricadas	Supervisor de producción	Retro Reflectometro	Certificado de calidad material reflectivo Tipo XI Medición de reflectividad señalización vertical.	CUMPLE Ver ANEXO 9
Película Antigrafiti	Inspección de calidad del material y homogeneidad en la instalación del Antigrafiti sobre los tableros de las señales verticales	NA	Por cada lote de señales fabricadas	Supervisor de producción	NA	Certificado de calidad película Antigrafiti	CUMPLE Ver ANEXO 9

Fuente: Elaboración propia

11 COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el periodo del presente informe **MES 16**, los documentos relacionados en el presente capítulo se adjuntan en el **ANEXO 10**. Componente de seguridad y salud en el trabajo.

11.1 Cumplimiento del protocolo de manejo de residuos

Para el periodo del presente informe **MES 16**, se dio cumplimiento al PROTOCOLO DE MANEJO DE RESIDUOS presentado por parte del CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ, posterior a la firma del Acta de Inicio. Actualmente se ha realizado una entrega para disposición de RESPEL a través de dispositor autorizado los demás residuos se encuentran en punto de acopio temporal para posterior disposición. **Ver ANEXO 10. Componente de seguridad y salud en el trabajo.**

11.2 Recursos utilizados por el contrato de obra

11.2.1 Personal técnico

Para el periodo del presente informe **MES 16**, se contó con el siguiente personal técnico, el cual cumplió con los tiempos establecidos de dedicación, se evidencia la participación de dicho personal en las planillas de pagos parafiscales.

Tabla 23. Personal técnico

CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN
Director del proyecto	María Virginia Rocha Gracia	70%
Residente diurno	Leidy Vanessa Martínez Monroy	100%
Residente nocturno	Mauricio Fernando Laverde Acosta	100%
Especialista	Julián Andrés Charry Ariza	50%
Profesional SISO-AMBIENTAL	Luisa Fernanda Herazo Castellanos	50%
Profesional social	Johanna Urbina Herrera	50%
Georreferenciador	Sebastián Poloche Guevara	100%
PERSONAL OPERATIVO		
Conductor Diurno	Andrey David Olaya Torres	
Conductor Nocturno	Jeane Osmara García Gaitán	
Secretaria	Martha Nubia Rocha Arévalo	

Fuente: Elaboración propia

11.2.2 Personal operativo

Para el periodo del presente informe **MES 16**, se adelantaron labores de implementación con cincuenta y nueve (59) personas en los siguientes grupos:

- **CUADRILLA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL # 1**

Tabla 24. Cuadrilla señalización horizontal #1

#	NOMBRE	CEDULA	EPS	ARL	AFP
1	WILSON FALLA MONROY	79.579.623	NUEVA EPS	AXA COLPATRIA	PROTECCIÓN
2	DEIVER MANUEL ARRIETA LÓPEZ	1.069.504.142	FAMISANAR	AXA COLPATRIA	COLPENSIONES
3	BEATRIZ DEL MAR BOYACÁ CASANOVA	1.007.407.654	COMPENSAR	AXA COLPATRIA	PORVENIR
4	HERNANDO CARRILLO RUIZ	80.252.227	SANITAS	AXA COLPATRIA	PORVENIR
5	EFERSON SÁNCHEZ ARTUNDUAGA	1.023.038.551	COMPENSAR	AXA COLPATRIA	PORVENIR
6	SANDRO DAVID ARIAS SÁNCHEZ	1.010.002.341	CAPITAL SALUD	AXA COLPATRIA	PORVENIR
7	NIKOLE IVANNA CASTAÑEDA AVILES	1.014.297.719	FAMISANAR	AXA COLPATRIA	PROTECCIÓN

Fuente: Elaboración propia

➢ CUADRILLA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL # 2

Tabla 25. Cuadrilla señalización horizontal #2

#	NOMBRE	CEDULA	EPS	ARL	AFP
1	JHONDEIKER MOISÉS MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ	6.793.287	FAMISANAR	AXA COLPATRIA	PORVENIR
2	ALEJANDRO ANTONIO MAVAREZ BUSTAMANTE	5.699.844	FAMISANAR	AXA COLPATRIA	PROTECCION
3	LUIS CARLOS GÓMEZ REYES	1.140.915.709	FAMISANAR	AXA COLPATRIA	PORVENIR
4	MANUEL SNEIDER RODRÍGUEZ RUÍZ	1.020.479.452	NUEVA EPS	AXA COLPATRIA	PROTECCION
5	GONZALO ALBERTO ZONATI PÉREZ	641.967	SANITAS	AXA COLPATRIA	PROTECCIÓN
6	ENRIQUE JUNIOR GARCÍA CEBALLOS	1.034.309.527	SANITAS	AXA COLPATRIA	PROTECCIÓN
7	ELVIS ANTONIO ZONATI PÉREZ	6.114.040	FAMISANAR	AXA COLPATRIA	PORVENIR

Fuente: Elaboración propia

➢ CUADRILLA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL # 3

Tabla 26. Cuadrilla señalización horizontal #3

#	NOMBRE	CEDULA	EPS	ARL	AFP
1	OSCAR JOSÉ GONZÁLEZ VARELA	7.452.670	SANITAS	AXA COLPATRIA	COLPENSIONES
2	MERWIN DIXON DE LA ROSA GONZÁLEZ	1.127.669.903	SANITAS	AXA COLPATRIA	PORVENIR
3	JONATHAN DAVID ARIZA CASTILLO	1.099.542.335	NUEVA EPS	AXA COLPATRIA	PORVENIR
4	JOAN EDUARDO CAPERA PALLARES	1.000.789.896	COMPENSAR	AXA COLPATRIA	PORVENIR
5	EDGAR ANDREY BECERRA CALDERÓN	7.444.771	SANITAS	AXA COLPATRIA	COLPENSIONES
6	JAVIER ANTONIO LÓPEZ RAMÍREZ	1.070.812.987	SURA	AXA COLPATRIA	PORVENIR
7	JEFERSON EDUARDO CRISTANCHO CORTÉS	1.007.297.546	COMPENSAR	AXA COLPATRIA	COLFONDOS

Fuente: Elaboración propia

➢ CUADRILLA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL # 4

Tabla 27. Cuadrilla señalización horizontal #4

#	NOMBRE	CEDULA	EPS	ARL	AFP
1	MARISOL FRANCO MONTENEGRO	1.033.752.600	FAMISANAR	AXA COLPATRIA	PORVENIR
2	LESLIE VANESA LEAL QUIMBAYO	1.105.688.310	FAMISANAR	AXA COLPATRIA	COLPENSIONES
3	MARÍA FERNANDA PORTELA GARCÍA	1.105.691.768	SANITAS	AXA COLPATRIA	PORVENIR
4	CARLOS MARIO SAN MARTIN AYALA	92.229.398	SALUD TOTAL	AXA COLPATRIA	PORVENIR
5	JHON JAIRO SÁNCHEZ	14.321.058	CAPITAL SALUD	AXA COLPATRIA	COLPENSIONES

#	NOMBRE	CEDULA	EPS	ARL	AFP
6	HUGO JAVIER BEJARANO	3.032.947	SALUD TOTAL	AXA COLPATRIA	PROTECCIÓN
7	JAIR LUNA ROJAS	93.398.181	SALUD TOTAL	AXA COLPATRIA	COLFONDOS
8	CRISTIAN CAMILO MORA RUIZ	1.015.431.170	SANITAS	AXA COLPATRIA	PORVENIR

Fuente: Elaboración propia

➢ CUADRILLA EMERGENCIAS HORIZONTAL Y VERTICAL

Tabla 28. Cuadrilla emergencias horizontal y vertical

#	NOMBRE	CEDULA	EPS	ARL	AFP
1	JAIRO LUIS CANTILLO SOTTO	19.706.376	SALUD TOTAL	AXA COLPATRIA	PORVENIR
2	CLÍMACO SOGAMOSO CACAIS	1.005.728.389	COMPENSAR	AXA COLPATRIA	PORVENIR
3	KEYNER SARMIENTO HERNÁNDEZ	1.151.202.490	SANITAS	AXA COLPATRIA	PORVENIR
4	BRAYAN RICARDO BLANCO RUEDA	1.000.002.903	SALUD TOTAL	AXA COLPATRIA	PORVENIR
5	LEONEL NARVÁEZ ARIZA	1.080.183.297	FAMISANAR	AXA COLPATRIA	PORVENIR
6	RAFAEL URREGO ROJAS	1.015.456.461	COMPENSAR	AXA COLPATRIA	PORVENIR
7	CAROL JINETH PEÑA GALÁN	1.022.972.446	CAPITAL SALUD	AXA COLPATRIA	PORVENIR
8	OMAR LEONARDO AYALA AYALA	79.690.137	SALUD TOTAL	AXA COLPATRIA	PROTECCIÓN

Fuente: Elaboración propia

➢ CUADRILLA SEÑALIZACIÓN VERTICAL # 1

Tabla 29. Cuadrilla Señalización Vertical #1

#	NOMBRE	CEDULA	EPS	ARL	AFP
1	MARLON ENRIQUE AMADO AMAYA	1.014.195.961	SANITAS	AXA COLPATRIA	COLPENSIONES
2	JAVIER FIGUEROA AGUIRRE	79.631.834	SALUD TOTAL	AXA COLPATRIA	PORVENIR
3	ISIDRO ANTONIO URIBE	1.148.684.792	NUEVA EPS	AXA COLPATRIA	COLPENSIONES
4	LUIS DAVID PEDROZA SARA	1.052.733.727	NUEVA EPS	AXA COLPATRIA	PORVENIR

Fuente: Elaboración propia

➢ CUADRILLA SEÑALIZACIÓN VERTICAL # 2

Tabla 30. Cuadrilla Señalización Vertical #2

#	NOMBRE	CEDULA	EPS	ARL	AFP
1	ANDRES DAVID ROMERO VELOZA	1.014.240.763	CAPITAL SALUD	AXA COLPATRIA	PORVENIR
2	JUAN PABLO GARCÍA PRIETO	1.105.672.049	SALUD TOTAL	AXA COLPATRIA	PORVENIR

#	NOMBRE	CEDULA	EPS	ARL	AFP
3	FABIAN ESNEIDER MEJÍA VEGA	1.005.449.697	NUEVA EPS	AXA COLPATRIA	PORVENIR
4	MAIKOL ANDRES ZULETA SALGADO	1.233.897.608	NUEVA EPS	AXA COLPATRIA	PORVENIR

Fuente: Elaboración propia

- **CUADRILLA SEÑALIZACIÓN VERTICAL # 3**

Tabla 31. Cuadrilla Señalización Vertical #3

#	NOMBRE	CEDULA	EPS	ARL	AFP
1	GREGORY JUNIOR NAVA PACHECO	5.607.114	SANITAS	AXA COLPATRIA	PORVENIR
2	RICARDO ROCHA RAMÍREZ	88.203.506	COMPENSAR	AXA COLPATRIA	COLPENSIONES
3	LINDON CHESMAN MIRANDA PÉREZ	80.190.949	CAPITAL SALUD	AXA COLPATRIA	PORVENIR
4	EDINSON JESÚS ACOSTA SALAZAR	1.065.124.612	SALUD TOTAL	AXA COLPATRIA	PORVENIR

Fuente: Elaboración propia.

- **PERSONAL DE APOYO EN OBRA**

Tabla 32. Personal de apoyo en obra

#	NOMBRE	CEDULA	EPS	ARL	AFP
1	GONZALO JONATHAN NARANJO PÉREZ	80.203.203	FAMISANAR	AXA COLPATRIA	PROTECCIÓN
2	CARLOS ALBERTO QUIROGA ROMERO	79.789.284	SANITAS	AXA COLPATRIA	COLFONDOS
3	SANTIAGO SERNA LUNA	1.005.700.038	NUEVA EPS	AXA COLPATRIA	PROTECCIÓN
4	HARÉN LIBIA GARCÍA CASTAÑEDA	1127962808	SANITAS	AXA COLPATRIA	COLPENSIONES
5	FERLEY MARTÍNEZ ORTIZ	80,800,259	SANITAS	AXA COLPATRIA	PORVENIR
6	SERGIO ROLANDO ZABALA BUENHOMBRE	1.000.135.947	COMPENSAR	AXA COLPATRIA	PORVENIR
7	BRIAN GIOVANNY FLÓREZ CORTES	1.019.099.083	SALUD TOTAL	AXA COLPATRIA	PORVENIR
8	CATHERINE CORTÉS GUZMÁN	1.020.794.877	COMPENSAR	AXA COLPATRIA	PORVENIR
9	HEYDER CUMACO VEGA	6.803.804	SANITAS	AXA COLPATRIA	PROTECCIÓN
10	GONZALO ENRIQUE ZONATI GARCÍA	1.018.506.268	SANITAS	AXA COLPATRIA	PORVENIR

Fuente: Elaboración propia

Cumpliendo así con las obligaciones contractuales en cuanto al personal ofrecido en la propuesta para la adjudicación del contrato 2024-3650. El personal perteneciente a los grupos antes mencionados cuenta con las herramientas, uniformes, overoles y demás elementos de trabajo como consta en el informe de **SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SG-SST).**

11.3 Planillas de pago de salarios y personal vinculado

Se hace entrega de copia de las planillas de pago de salarios y personal vinculado. **(VER ANEX0 10).**

11.4 Planillas de pago de parafiscales y demás aportes legales

Se hace entrega de copia de los aportes de seguridad social (pagos de SALUD, PENSIÓN, ARP y aportes Parafiscales) del personal. **(VER ANEX0 10).**

11.4.1 Equipos utilizados

Para la ejecución del contrato se han utilizado los equipos relacionados a continuación:

Tabla 33. Equipo mínimo

Ítem	Equipo mínimo	Cantidad
1	Vehículo autopropulsado y/o montado para aplicación de pintura liquida que tenga incorporado el equipo delineador, el cual deberá poseer, como mínimo, dos (2) boquillas para la aplicación de pintura y otras dos (2) para la aplicación de microesfera tipo drop - on o sembrado, NTC 4744-2 numeral 5,2	1
2	Vehículo autopropulsado para aplicación de resina termoplástica que tenga incorporado el equipo delineador, el cual deberá poseer, como mínimo, dos (2) boquillas para la aplicación de resina por extrusión o pulverización o spray y dos (2) dispensadores o boquillas para la aplicación de microesfera tipo drop - on o sembrado a presión, incluye caldera. NTC 4744-2 numeral 5,2.	N.A.
3	Vehículo autopropulsado y/o montado para aplicación de plástico en frio por el método de spray, el cual deberá poseer, como mínimo, cuatro (4) boquillas para la aplicación de pintura y otras dos (2) para la aplicación de microesfera tipo drop - on o sembrado de acuerdo con la NTC 4744-2 numeral 5,2	1
4	Maquina manual para pintura liquida NTC 4744-2 numeral 5,1	3
5	Maquina manual para aplicación de termoplástico, incluye caldera. NTC 4744-2 numeral 5,1	1
6	Maquina manual para aplicación de plástico en frio por el método Spray. NTC 4744-2 numeral 5,1	1

Fuente: Elaboración propia.

12 COMPONENTE SOCIAL

Para el periodo del presente informe **MES 16**, el componente de Gestión Social realizó visita a varios puntos en los que se implementarán medidas de pacificación, reductores de velocidad tipo resaltos portátiles, resaltos tipo cojín, bandas alertadoras y estoperoles, con el fin de socializar y gestionar el diligenciamiento de actas de aceptación, reunir evidencias fotográficas requeridas.

El informe y soportes de las gestiones adelantadas se adjuntan en el **ANEXO 11. Componente social.**

12.1 Vinculación de población vulnerable

A continuación, se indica el listado del personal "Sujetos Especial Protección" con el que se da cumplimiento a la obligación de garantizar el 5% de la provisión de bienes o servicios por parte de sujetos de especial protección constitucional. Así:

Tabla 34 Listado Personal Sujetos Especial Protección

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CONDICIÓN	PERSONAL
MAURICIO FERNANDO LAVERDE ACOSTA	79.293.119	RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO	ADULTO MAYOR	EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO
LUISA FERNANDA HERAZO CASTELLANOS	52.763.794	PROFESIONAL SISO-AMBIENTAL	DISCAPACIDAD	EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO
MARTHA NUBIA ROCHA ARÉVALO	20.422.785	SECRETARIA	CERTIFICADO DISCAPACIDAD	EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO
HUGO JAVIER BEJARANO	3.032.947	AUXILIAR DE TRAFICO	ADULTO MAYOR	MONC

Fuente: Elaboración propia

Los soportes se adjuntan y se adjuntan en el **ANEXO 11. Componente social.**

12.2 Vinculación de población de mujeres

A continuación, se indica el listado de las mujeres vinculadas al contrato en **MANO DE OBRA NO CALIFICADA** y que debe corresponder al 5%. Así:

Tabla 35 Listado Mujeres Mano de Obra No Calificada – MONC

No.	NOMBRE	CEDULA
1	BEATRIZ DEL MAR BOYACÁ CASANOVA	1.007.407.654
2	NIKOLE IVANNA CASTAÑEDA AVILÉS	1.014.297.719
3	MARISOL FRANCO MONTENEGRO	1.033.752.600
4	LESLIE VANESA LEAL QUIMBAYO	1.105.688.310
5	CAROL JINETH PEÑA GALÁN	1.022.972.446
6	MARÍA FERNANDA PORTELA GARCÍA	1.105.691.768
7	HARÉN LIBIA GARCÍA CASTAÑEDA	1.127.962.808
8	CATHERINE CORTÉS GUZMÁN	1.020.794.877

Fuente: Elaboración propia

13 PAGO DE PROVEEDORES

Para el periodo del presente informe **MES 16**, el **CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ** emite Certificación por el representante legal en el que se encuentre al día en pago de proveedores, se relaciona en el **ANEXO 12. Certificación de proveedores.**

14 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS

14.1 Comités de seguimiento

Para el periodo del presente informe **MES 16**, se han realizado comités de seguimiento semanal, de los cuales se tiene las siguientes actas:

Tabla 36. Actas de Comité Técnico de Seguimiento

No.	Fecha	Descripción
1	06/05/2026	Comité de Seguimiento No. 66
2	13/05/2026	Comité de Seguimiento No. 67
3	20/05/2026	Comité de Seguimiento No. 68
4	27/05/2026	Comité de Seguimiento No. 69

Fuente: Elaboración propia

A la fecha de cierre del presente informe se tienen cuatro (4) actas suscritas. Ver. **ANEXO 13. Comités de seguimiento.**

14.2 Estado de las pólizas del contrato

Para el periodo del presente informe **MES 16**, las pólizas se encuentran actualizadas a la fecha de suscripción del ACTA DE INICIO, debidamente cargadas en SECOP II, a continuación, estado actual:

Tabla 37. Estado de las pólizas del contrato

ASEGURADO: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD						
ASEGURADORA	**AMPAROS**	**PÓLIZA No.**	**%**	**VIGENCIA**		**SUMA ASEGURADA**
				DESDE	**HASTA**	**VALOR**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL	96-40-101069047 **ANEXO 4**	5%	30/01/2025	30/11/2027	$1.012.703.378,30
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO	96-44-101194633 **ANEXO 9**	30%	30/01/2025	31/05/2028	$6.076.220.269,80
	PRESTACIONES SOCIALES		20%	30/01/2025	30/11/2030	$4.050.813.513,20
	CALIDAD DEL SERVICIO		30%	30/11/2027	31/05/2028	$6.076.220.269,80
	ESTABILIDAD DE LA OBRA		30%	30/11/2027	30/11/2032	$6.076.220.269,80

Fuente: Elaboración propia

15 ESTADO PRESUPUESTAL

15.1 Presupuesto ejecutado

Durante el periodo del presente informe **MES 16** se ejecutó lo representado en la siguiente tabla tanto en componente vertical como horizontal:

Tabla 38 Ejecución durante el MES 16

ID's	HORIZONTAL	VERTICAL	TOTAL
SH_SV_ZPP_2470_2021_ CENTROMAYOR_V0	$ 110.126.418,54	$ 12.059.571,77	$ 122.185.990,31
EX_16_208_1881_12	$ 562.201.910,46	$ 36.722.836,44	$ 598.924.746,90
PMT DE EMERGENCIA	-	$ 2.833.620,40	$ 2.833.620,40
Compromiso Prioritario CP_20243650_049 (15_2228) (MV_14_015)	-	$ 377.854,60	$ 377.854,60
Compromiso Prioritario CP_20243650_050 (14_2232) (MV_14_089_1249_11)	-	$ 377.854,60	$ 377.854,60
Compromiso Prioritario CP_20243650_051 (14_2231) (EX_14_098_1881_12)	-	$ 377.854,60	$ 377.854,60
			$ 725.077.921,00

Fuente: Elaboración propia

A la fecha de corte del presente periodo **MES 16**, se tiene un valor ejecutado total de **$11.399.202.110,00** que corresponde al **56.28%** del valor total del contrato, discriminado en los siguientes ID's:

Tabla 39. Ejecución total Acumulada a MES 16

Nº	ID	VALOR EJECUTADO	CUENTA
1	MV_AC26_643_24_V0	$ 117.413.227,00	1
2	MV_AUTO_SUR_643_24_V0	$ 427.464.287,86	2
	PUENTE AUTO SUR	$ 38.436.576,80	4
3	MV_AV_NQS_1073_24	$ 409.639.271,69	2
	MV_AV_NQS_1073_24	$ 788.847.437,96	3
	MV_AV_NQS_1073_24	$ 235.694.118,38	4
	MV_AV_NQS_1073_24	$ 52.010.494,88	5
	PUENTE NQS-CALLE 13	$ 23.623.860,00	5
4	EX_18_002_1445_14	$ 28.930.152,44	3
	EX_18_002_1445_14	$ 258.806.467,08	4
	EX_18_002_1445_14	$ 156.092.974,62	5

Nº	ID	VALOR EJECUTADO	CUENTA
5	MV_16_181_1249_11	$ 466.640.387,23	4
	MV_16_181_1249_11	$ 81.091.623,78	5
6	EX_15_95_1867_12	$ 47.430.358,01	4
7	PMT EMERGENCIA 001 (SDM-202461204171712)	$ 485.071,00	1
8	PMT EMERGENCIA 002 (DI 21453 - SDQS 158932025)	$ 31.115.881,00	1
9	SUMINISTRO #1	$ 140.633.214,00	1
10	SH_SV_ZPP_2470_2021_ CLINICA_MEDERI_V0	$ 6.972.558,63	3
	SH_SV_ZPP_2470_2021_ CLINICA_MEDERI_V0	$ 65.307.425,79	4
11	CP_20243650_001 (EX_16_004_716_24)	$ 574.166,89	1
12	CP_20243650_002 (MV_14_089_1249_11_V13)	$ 11.178.770,50	3
13	CP_20243650_003 (EX_14_096_1881_12_V7)	$ 4.507.811,40	3
14	CP_20243650_004 (EX_14_106_1881_12_V7)	$ 6.393.955,00	3
15	INTERSECCIÓN CALLE 19 CON KR 27	$ 43.660.279,50	5
16	CP_20243650_005 (EX_14_098_1881_12) Y (MV_16_181_1249_11)	$ 16.260.367,60	3
17	KR 27 CON CALLE 6	$ 57.314.300,84	4
18	SH_SV_ZPP_2470_2021_OUTLET_AMERICAS_ V1	$ 100.479.200,54	4
	SH_SV_ZPP_2470_2021_OUTLET_AMERICAS_ V1	$ 4.389.445,00	5
19	CP_20243650_006 (EX_16_046_1556_10_V7)	$ 3.873.627,00	4
	CP_20243650_006 (EX_16_046_1556_10_V7)	$ 9.724.368,90	5
20	EX_18_235_937_09_V9	$ 3.833.893,00	4
	EX_18_235_937_09_V9	$ 28.524.368,50	5
21	PMT DE EMERGENCIA Evento SIRE 5446502	$ 1.091.872,40	3
22	CP_20243650_007 (EX_14_106_1881_12_V7)	$ 5.508.261,76	4
	CP_20243650_007 (EX_14_106_1881_12_V7)	$ 19.715.368,60	5
23	CP_20243650_008 (MV_15_016_1561_10_V10)	$ 8.342.094,80	3
	CP_20243650_008 (MV_15_016_1561_10_V10)	$ 3.682.481,60	4
24	CP_20243650_009 (EX_15_349_826_10_V8)	$ 1.414.607,70	3
25	CP_20243650_010 (EX_18_165_1867_12_V5)	$ 471.535,90	3
26	CP_20243650_011 (MV_14_015_V17)	$ 6.534.518,80	3
	CP_20243650_011 (MV_14_015_V17)	$ 3.682.481,60	4
27	INTERSECCIÓN AV. PRIMERA DE MAYO CON KR 27	$ 36.492.785,55	4

Nº	ID	VALOR EJECUTADO	CUENTA
28	CP_20243650_012 (MV_AV_NQS_1073_24, MV_16_169_1249_11, EX_14_084_1249_11, EX_16_180_1249_11, EX_16_045_1556_10)	$ 7.364.963,20	3
	CP_20243650_012 (MV_AV_NQS_1073_24, MV_16_169_1249_11, EX_14_084_1249_11, EX_16_180_1249_11, EX_16_045_1556_10)	$ 15.615.595,10	4
29	CP_20243650_013 (MV_AV_NQS_1073_24)	$ 6.660.914,70	4
30	PMT DE EMERGENCIA – DI No. 21789	$ 1.029.662,40	4
31	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561201722862	$ 1.778.202,40	5
32	SUMINISTRO #2	$ 116.605.207,72	5
33	SUMINISTRO #3	$ 1.523.879,60	5
34	EX_14_104_1881_12	$ 79.415.857	6
35	MV_09_024_1249_11	$ 19.606.935	6
36	MV_AC_13_872_24_T1 (KR 33-KR 47)	$ 436.128.897,00	6
37	MV_AV_NQS_1073_24 CICLORUTA NQS	$ 237.819.879,00	6
38	EX_02_240_575_11_V10 URBANISMO TACTICO	$ 122.515.544,74	6
39	CP_20243650_015 (EX_16_178_1249_11)	$ 27.369.886,00	6
40	SUMINISTRO #4 (REMISIÓN 7)	$ 2.217.520,00	6
41	SUMINISTRO #4 (REMISIÓN 8)	$ 34.249.578,00	6
42	CP_20243650_016 (MV_AV_NQS_1073_24)	$ 505.927,92	6
43	CP_20243650_017 (MV_AV_NQS_1073_24)	$ 505.927,92	6
44	CP_20243650_018 (MV_AUTO_SUR_643_24)	$ 505.927,92	6
45	CP_20243650_019 (MV_08_251_1244_11)	$ 1.011.855,84	6
46	CP_20243650_020 (MV_AV_NQS_1073_24)	$ 1.011.855,84	6
47	CP_20243650_021 (MV_18_032_1747_10)	$ 505.927,92	6
48	PMT DE EMERGENCIA 006 BARRIO SAN MARTIN	$ 2.744.956,40	6
49	CP_20243650_022 (EX_18_354_1561_10_V7)	$ 4.145.458,00	6
50	PMT DE EMERGENCIA 007 SDM-202561201966602	$ 748.540,00	6
51	CP_20243650_024 (EX_18_165_1867_12_V3)	$ 374.270,00	6
52	CP_20243650_023 MV_AV_NQS_1073_24_V4	$ 5.014.861,96	7
53	CP_20243650_025 (MV_AV_NQS_1073_24)	$ 2.191.082,00	7
54	CP_20243650_022 (EX_18_354_1561_10_V7)	$ 45.651.895,40	7

Nº	ID	VALOR EJECUTADO	CUENTA
55	PMT EMERGENCIA 008 2024ER20997_IDIGER	$ 2.013.884,00	7
56	CP_20243650_024 (EX_18_165_1867_12_V3)	$ 202.000,00	7
57	MV_AC_13_872_24_T1	$ 494.624.009,16	7
58	CP_20243650_026 (MV_15_016_1561_10_V11 EX_15_422_826_10_V12)	$ 32.751.873,82	7
59	CP_20243650_027 (EX_16_209_1881_12_V3)	$ 22.539.900,22	7
60	CP_20243650_028 EX_18_165_1867_12_V5	$ 6.530.074,42	7
61	CP_20243650_029 (EX_16_170_1249_11_V5, MV_AV_AMERICAS_716_24_V1)	$ 3.352.003,22	7
62	MV_AC_13_872_24_T1	$ 550.476.414,77	8
63	EX_02_356_946_10_V12	$ 12.681.659,67	8
64	SH_SV_ZPP_2470 _2021_ATLANTIS_V0	$ 10.376.720,81	8
65	SH_SV_ZPP_CTO_2470_2021_PABLO VI_V1	$ 3.333.217,00	8
66	CP_20243650_031 (CPS_941_EM_19_111_V27)	$ 485.874,00	8
67	CP_20243650_029 (EX_16_170_1249_11_V5, MV_AV_AMERICAS_716_24_V1)	$ 8.173.954,06	8
68	SUMINISTRO # 5	$ 87.513.200,00	8
69	MV_16_174_1249_11_V12	$ 67.867.071,84	8
70	MV_AC_13_872_24_T1 (KR 33-KR 14)	$ 154.137.784,28	9
71	ZPP SH_SV_ZPP_2470_2021_PARDO_RUBIO_V1	$ 148.085.805,32	9
72	ZPP SH_SV_ZPP_CTO_2470_2021_PABLO VI_V1, Pablo VI	$ 42.143.604,00	9
73	ZPP SH_SV_ZPP_2470 _2021_ATLANTIS_V0	$ 56.167.294,00	9
74	CP_20243650_030 (MV_AV_AMERICAS_716_24_V1)	$ 766.471,00	9
75	CP_20243650_033 (EX_18_039_1561_10_V7, CPS_941_EM_19_111_V28)	$ 9.990.957,00	9
76	EX_18_358_826_10_V2	$ 508.185.131,09	10
77	EX_15_95_1867_12	$ 393.244.502,76	10
78	MV_14_015 (ENTRE CL 17B SUR Y CL 32 SUR)	$ 186.770.793,11	10
79	CP_20243650_034	$ 5.690.451,58	10
80	SUMINISTRO #6	$ 1.109.141,20	10
81	SUMINISTRO #7	$ 1.364.201,00	10
82	SUMINISTRO #8	$ 20.953.345,00	10
83	EX_16_004_716_24 (PRIMAVERA)	$ 205.666.717,21	11

Nº	ID	VALOR EJECUTADO	CUENTA
84	CP_20243650_035 (AV NQS - AC 3) MV_AV_NQS_1073_24_V4)	$ 2.304.342,80	11
85	MV_14_015 (ENTRE CL 17B SUR Y CL 32 SUR)	$ 36.128.302,34	11
86	EX_16_006_1249_11 (CL 1C)	$ 10.387.728,98	11
87	EX_02_240_575_11_V10R5_UT (LICEO FRANCES)	$ 52.849.618,74	11
88	EX_16_006_716_24 (EL JAZMÍN)	$ 109.744.006,23	11
89	EX_16_198_1881_12 (PONDEROSA)	$ 42.643.682,70	11
90	EX_18_358_826_10_V2	$ (2.183.075,90)	11
91	PMT DE EMERGENCIA 009	$ 4.118.649,60	11
92	CP_20243650_036 (EX_14_104_1881_12)	$ 45.935.029,00	11
93	EX_16_006_716_24 (EL JAZMÍN)	$ 45.590.846,93	12
94	EX_16_198_1881_12 (PONDEROSA)	$ 5.563.273,00	12
95	EX_02_240_575_11_V10R5_UT	$ 184.257.208,34	12
96	EX_15_349_826_10	$ 214.768.677,59	12
97	EX_14_084_1249_11	$ 390.659.485,90	12
98	EX_02_240_575_11_V10R5_UT	$ 19.619.114,80	13
99	EX_14_084_1249_11	$ 102.100.730,14	13
100	EX_15_349_826_10	$ 231.095.789,29	13
101	EX_16_198_1881_12 (PONDEROSA)	$ 27.852.500,85	13
102	SH_SV_ZPP_2470_2021_SDM_CL_13_V0	$ 38.694.229,75	13
103	CP_20243650_037 (EX_18_005_1445_14_V3 EX_18_010_1445_14_V4)	$ 2.689.438,36	13
104	EX_16_047_1556_10_V11	$ 166.326.478,22	13
105	CP_20243650_038 (EX_18_010_1445_14_V5 MV_18_031_1561_10_V13)	$ 3.591.640,86	13
106	CP_20243650_039	$ 1.175.875,60	13
107	EX_14_084_1249_11	$ 93.476.730,00	14
108	EX_16_198_1881_12 (PONDEROSA)	$ 4.762.909,00	14
109	SH_SV_ZPP_2470_2021_SDM_CL_13_V0	$ 3.759.206,00	14
110	CP_20243650_037 (EX_18_005_1445_14_V3 EX_18_010_1445_14_V4)	$ 37.325.305,00	14
111	EX_16_047_1556_10_V11	$ 580.388.824,00	14
112	CP_20243650_040 (MV_AV_AMERICAS_716_24_V3)	$ 26.466.740,00	14
113	CP_20243650_043 (EX_15_96_1867_12)	$ 1.217.760,00	14

Nº	ID	VALOR EJECUTADO	CUENTA
114	SUMINISTROS No. 9	$ 80.402.422,00	14
115	EX_16_047_1556_10_V11	$ 31.054.232,81	15
116	CP_20243650_044	$ 25.690.190,32	15
117	CP_20243650_045	$ 3.037.043,32	15
118	CP_20243650_046	$ 19.108.443,50	15
119	SUMINISTRO No.10	$ 7.025.952,00	15
120	CP_20243650_047	$ 36.270.252,64	15
121	CP_20243650_048	$ 318.185,28	15
122	SH_SV_ZPP_2470_2021_CENTROMAYOR_V0	$ 122.185.990,31	16
123	EX_16_208_1881_12	$ 598.924.746,90	16
124	PMT DE EMERGENCIA	$ 2.833.620,40	16
125	CP_20243650_049 (15_2228) (MV_14_015)	$ 377.854,60	16
126	CP_20243650_050 (14_2232) (MV_14_089_1249_11)	$ 377.854,60	16
127	CP_20243650_051 (14_2231) (EX_14_098_1881_12)	$ 377.854,60	16
TOTAL, EJECUTADO AL 29 DE MAYO DE 2026		**$11.399.202.110,00**	

Fuente: Elaboración propia

15.2 Relación de ID's asignados y ejecutados en otras Zonas

De manera particular y en atención a lo establecido en el Anexos Técnico, la entidad podrá asignar implementación inmediata de ID's en zonas diferentes a la adjudicada al contratista precisando que el valor de las obras de implementación en una zona diferente a la adjudicada no podrá superar el 6% del presupuesto oficial.

Teniendo en cuenta el valor de recursos de la **ADICIÓN 1** (suscrita el 17 de diciembre de 2025) por valor de **$ 1.482.594.138,00**, para un Total de **$ 20.254.067.566,00**, el 6% es de **$ 1.215.244.054,00.**

A la fecha y cumplido el debido procedimiento y suscripción de actas de asignación en otras zonas, se han ejecutado los siguientes ID's en Zonas diferentes a la adjudicada:

Tabla 40 Asignación de ID's en Zonas diferentes a la adjudicada – MES 16

No.	ID	DIRECCIÓN	ZONA	CONTRATISTA	VALOR FACTURADO
1	MV_AV_NQS_1073_24	CICLORUTA DE LA NQS DESDE CL 1F HASTA CALLE 93	ZONA 1	CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTÁ GYP 2024	$ 237.819.879,00
	CICLORUTA NQS		ZONA 2	UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURAS	

No.	ID	DIRECCIÓN	ZONA	CONTRATISTA	VALOR FACTURADO
2	SH_SV_CTO_1279_2017 _V1 URBANISMO TÁCTICO	KR 7A ENTRE CL 88 Y AC 92	ZONA 1	CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTÁ GYP 2024	$ 122.515.544,74
3	CP_20243650_023 (KR 30 CON CALLE 45)	NQS CON AC 45	ZONA 1	CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTÁ GYP 2024	$ 5.014.861,96
4	CP_20243650_025 (MV_AV_NQS_1073_24)	NQS CON CL 53	ZONA 1	CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTÁ GYP 2024	$ 2.191.082,00
5	SH_SV_ZPP_2470_2021_ PARDO_RUBIO_V1	CL 65 ENTRE KR 1A Y KR 5, DE LA KR 4 ENTRE CL 65 Y CL 68 DE LA CL 65 BIS ENTRE KR 4 Y KR 4A	ZONA 1	CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTÁ GYP 2024	$ 148.085.805,32
6	SH_SV_ZPP_CTO_2470_ 2021_PABLO VI_V1	CL 57B ENTRE LA KR 54 Y AK 50, EN LA KR 53 ENTRE LA AC 53 Y CL 57B Y EN LA KR 54 ENTRE CL 57B Y CL 59	ZONA 1	CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTÁ GYP 2024	$ 45.476.821,00
7	EX_02_356_946_10_V12 (Comercial papelera)	DE LA CL 90 ENTRE KR 15 Y KR 19A, DE LA KR 18 ENTRE CL 90 Y CL 92 DE LA CL 93B ENTRE KR 17 Y KR 19, DE LA CL 95 ENTRE KR 15 Y KR 16	ZONA 1	CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTÁ GYP 2024	$ 12.681.659,67
8	SH_SV_ZPP_2470 _2021_ATLANTIS_V0	CL 81 ENTRE KR 11 Y KR 13A, CL 80 ENTRE KR 14 Y KR 13A, CL 80 ENTRE KR 13 Y KR 13A, 80 ENTRE KR 13 Y KR 12A, CL 80 ENTRE KR 12 Y KR 12A Y CL 80 ENTRE KR 12 Y KR 11	ZONA 1	CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTÁ GYP 2024	$ 66.544.014,81
9	EX_02_240_575_11_V10 R5_UT (LICEO FRANCES)	CARRERA 7A ENTRE AC 92 Y CL 88	ZONA 1	CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTÁ GYP 2024	$ 256.725.941,89
				TOTAL	**$ 897.055.610,39**
				PORCENTAJE	**4,43%**

Fuente: Elaboración propia

Las actas respectivas se encuentran adjuntas en el **Anexo 01. Contractuales – Carpeta 04. Actas Asignación otras zonas.**

15.3 Relación de actas de pago y balance financiero

Para el periodo del presente informe **MES 15**, a continuación, se presenta el balance financiero a la fecha con el valor proyectado del **ACTA DE COBRO No. 16.**

Tabla 41. Balance Financiero – MES 16

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO 2024-3650		
No.	**Descripción**	**Valor**
1	Valor Inicial del Contrato	$ 18.771.473.428,00

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO 2024-3650			
No.	**Descripción**	**Valor**	
2	Valor Adición No. 1 al Contrato (Indicar todas las adiciones)	$	1.482.594.138,00
3	Valor Total del Contrato	$	20.254.067.566,00
4	Valor pagado	$	10.122.992.387,00
5	Valor a cancelar	$	602.957.284,00
6	Retención por Garantía 5% o saldo a favor del contratista (Si aplica)	$	564.523.668,00
7	Saldo a Favor de la Entidad	$	9.528.117.895,00
10	Valor por pagar al contratista **ACTA MES 16**	**$**	**602.957.284,00**

Fuente: Elaboración propia

16 CUMPLIMIENTO A FACTORES DE SELECCIÓN

El CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ, en cumplimiento de los factores con los cuales se obtuvo un puntaje adicional en la oferta, dio cumplimiento así:

16.1 Factor de calidad – Programa de Gerencia de Proyectos

Posterior a la suscripción del Acta de Inicio, se presentó el PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS en los términos establecidos. **Ver ANEXO 1. Soporte de cumplimiento a factores de selección.**

16.2 Factor de calidad – Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra

Posterior a la suscripción del Acta de Inicio, se presentó el Certificado de disponibilidad en los términos establecidos. **Ver ANEXO 15. Soporte de cumplimiento a factores de selección.**

ESPACIO EN BLANCO

17 COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Desde la fecha de inicio (30 de enero de 2025) se establece que los corredores viales asignados solo podrán ser intervenidos dentro de los límites de las localidades asignadas (Antonio Nariño; Mártires; Rafael Uribe Uribe y Puente Aranda).

- Desde la fecha de inicio (30 de enero de 2025) por instrucciones de la Entidad Contratante de cada pago mensual se realizó la afectación presupuestal del 70% con cargo al RP 2024, hasta agotar recursos, lo cual se cumplió en el periodo correspondiente al **MES 6.**

- En el periodo del **MES 15** se agotaron los recursos y se finalizó la afectación presupuestal con cargo al **RP 2025 (ADICIÓN 1)**.

- El comité semanal de seguimiento No. 56 del 25 de marzo de 2026, se indicó por parte de la Entidad que se asignará obra requerida para dar cumplimiento a las metas mínimas mensuales de ejecución durante los restantes meses del año 2026. Lo cual a la fecha se encuentra sin gestionar.

- Según lo establecido contractualmente en la Cláusula 8 (forma de pago), las actividades de georreferenciación de obra del presente periodo **MES 16**, que no se encuentran aprobadas, serán objeto de pago en el siguiente periodo previo aval de la interventoría.

- La entidad procedió a asignar ID's en zonas diferentes a la adjudicada al contratista, a la fecha se han asignado seis (6) ID's que ya se encuentra implementados en su totalidad para un total ejecutado de **$ $889.849.666,43** que equivalen al **4.39%** del presupuesto asignado.

- A lo largo del MES 16 se ha solicitado asignación de obra a fin de mitigar este impacto negativo en los porcentajes y metas de ejecución contractual, por la desasignación de los corredores viales correspondientes a la TV 53, la AC 3 y la AK 50.

- A la fecha de corte del presente periodo **MES 16**, se tiene un valor facturado total de **$11.290.473.399,00** que corresponde al **55.74%** del valor total del contrato.

- Durante el periodo del **MES 16**, se informó en todos los comités semanales de seguimiento por parte del contratista y la interventoría, que no se cuenta con suficiente asignación de obra para dar cumplimiento al PAC, por lo que es necesario y prioritario que la Entidad contratante generé las asignaciones requeridas teniendo en cuenta los tiempos requeridos para el desarrollo de las diferentes actividades previas a la implementación desde la asignación hasta la aprobación de PMT para inicio de obra.

- Al cierre del presente periodo **MES 16**, en asignaciones se tiene las siguientes novedades:

    - Tres (3) ID´s asignados para inspección y cuantificación no viabilizados para intervención.
    - Un (1) ID's No viabilizado para Implementación.
    - Cinco (5) ID´s asignados al inicio, suspendidos por la Entidad.

- Se requirió actualización de diseño por identificación de Instituciones Educativas que ya no se encuentran en funcionamiento, dicho requerimiento fue atendido de manera oportuna por la Entidad, de estos ajustes se genera un impacto directo sobre el presupuesto inicial presentado.

- La no viabilidad para implementación del ID: MV_16_174_1249_11_V13 (AC 50), impacta de manera negativa la asignación de obra requerida para cumplimiento del PAC, ya que este corredor se había asignado y ya se habían adelantado todas las gestiones previas como inspección conjunta, cuantificación, tramite y aprobación de PMT; únicamente estaba pendiente aval de implementación y gestión de liberación de reservas por parte de IDU.

- La posibilidad de asignación de obra en otras zonas diferentes a la ZONA 4, se limita por lo establecido en el ANEXO TÉCNICO del 6%, que a corte del presente periodo ha sido ejecutado en un 4,43% ($ 897.055.610,39), con un saldo disponible por ejecutar si es requerido por la entidad de $ 318.185.443,96.

ESPACIO EN BLANCO

18 ANEXOS

ANEXO 01. Contractuales

ANEXO 02. Hoja de Vida

ANEXO 03. Cronograma

ANEXO 04. Acta de recibo parcial

ANEXO 05. Copias planillas de obra

ANEXO 06. Bitácora

ANEXO 07. Acta recibo señalización implementada

ANEXO 08. Soporte entrega señales retiradas

ANEXO 09. Certificados de Calidad y Ensayos

ANEXO 10. Componente SISO-AMBIENTAL

ANEXO 11. Componente SOCIAL

ANEXO 12. Certificación proveedores

ANEXO 13. Comités de Seguimiento

ANEXO 14. Soporte de cumplimiento a factores de selección

ANEXO 15. Tramites y Consultas con otras entidades
