HOJA DE RUTA

NOMBRE: GERMAN ENRIQUE GARCIA DIAZ – REPRESENTANTE LEGAL DE INGSUELOS S.A.S - CONTRATO DE CONSULTORIA No. 20250013

FECHA			OFICINA DE ORIGEN	DESTINO	OBJETO	OBSERVACIONES	RECIBIDO	HORA
DÍA	MES	AÑO						
	09	2026	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROTURA LENTA CRL-40, CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024–2027."			

INGSUELOS
INGENIERÍA GEOTÉCNICA

INFORME ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA

Periodo del 22 - diciembre - 2025 al 26 - julio - 2026

DESCRIPCIÓN BREVE

Interventoría técnica, administrativa y financiera del Contrato de Suministro No. 20250022, correspondiente al seguimiento y control de la producción y suministro de MDC-19 y emulsión asfáltica CRL-40 en el municipio de Florencia, Caquetá.

INGSUELOS S.A.S.
Contratista

Fecha Elaboración: julio 2026

Alcaldía de Florencia

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 20250013

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROTURA LENTA CRL-40, CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024–2027.

INFORME ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 1
PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 26 DE JULIO DE 2026

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Yeison Alexander Borda Pérez	Efraín Fuentes	German Enrique García Diaz	Daniel Andrés Agudelo Tovar
Cargo:	Cargo:	Cargo:	Cargo:
Residente de Interventoría	Director de Interventoría	Representante Legal	Supervisor de Proyecto
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: julio de 2026	Fecha: julio de 2026	Fecha: julio de 2026	Fecha: julio de 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 4
2. OBJETIVOS 5
2.1. Objetivo general 5
2.2. Objetivos específicos 5
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
3.1. Características técnicas 6
3.2. Población beneficiada 7
3.3. Alcance técnico 7
3.4. Localización del proyecto 8
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 9
4.1. Contrato de Suministro No. 20250022 9
4.2. Contrato de Consultoría – Interventoría No. 20250013 12
4.3. Marco normativo y contractual 14
5. ESTADO DE LAS OBRAS DEL ÁREA TÉCNICA 15
5.1. Control de calidad 22
5.2. Registro fotográfico 23
5.3. Control del clima en obra 23
6. AVANCE Y ESTADO GESTIÓN FINANCIERA 24
7. DETALLE PRESUPUESTAL DEL AVANCE DE INTERVENTORIA, DE ACUERDO AL CONTRATO 25
8. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y MAQUINARIA DEL PROYECTO 27
8.1. Personal profesional de la interventoría 27
8.2. Personal profesional del contratista de obra 28
9. AVANCE Y ESTADO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 29
9.1. Comités y reuniones realizados 29
9.2. Relación de correspondencia 29
10. CONCLUSIONES 29

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Alcance técnico contractual del Contrato de Suministro No. 20250022 7
Tabla 2 Información General del Contrato de Suministro No. 20250022 10
Tabla 3 Póliza de Seguro de Cumplimiento – No. 21-44-101487888 11
Tabla 4 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual – No. 21-40-101267662 11
Tabla 5 Información General del Contrato de Consultoria No. 20250013 13
Tabla 6 Póliza Seguro de Cumplimiento - No. CHU-100065191 – Anexo 1 14
Tabla 7 Póliza Seguro de Cumplimiento - No. CHU-100065191 – Anexo 2 14
Tabla 8 Póliza Seguro de Cumplimiento - No. CHU-100065191 – Anexo 3 14
Tabla 9 Información del avance del proyecto 16
Tabla 10 Descripción de los tramos intervenidos 19
Tabla 11 Estado financiero del Contrato de Suministro No. 20250022. 24
Tabla 12 Estado financiero del Contrato de Consultoría No. 20250013 24
Tabla 13 Presupuesto de la Interventoría 25
Tabla 14 Personal profesional empleado en la Interventoría 28
Tabla 15 Personal y maquinaria profesional empleado por el contratista 28

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización del Proyecto 8
Ilustración 2 Detalle general del proyecto a desarrollar 17

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Avance Financiero del Contrato de Suministro 26

1. INTRODUCCION

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Consultoría No. 20250013, cuyo objeto corresponde a la interventoría técnica, administrativa y financiera del Contrato de Suministro No. 20250022, se presenta el presente informe como soporte del Acta Parcial de Interventoría, en el cual se consolidan las actividades de seguimiento, control y verificación desarrolladas durante el período objeto de evaluación.

El presente informe tiene como finalidad evidenciar el estado de ejecución del contrato, así como verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, mediante el seguimiento permanente a las actividades relacionadas con el suministro de Mezcla Densa en Caliente MDC-19 y Emulsión Asfáltica Catiónica de Rotura Lenta CRL-40, la revisión de la calidad de los materiales suministrados, el control de las cantidades ejecutadas y la validación de los aspectos técnicos, administrativos y financieros que respaldan el avance contractual.

Durante el período evaluado, la interventoría efectuó el acompañamiento y control a las actividades desarrolladas en el marco de la ejecución del contrato, verificando que estas se realizaran de conformidad con las especificaciones técnicas aplicables, la normativa vigente, las disposiciones contractuales y los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Asimismo, se realizó el seguimiento a la programación, la ejecución de los suministros, el control documental y la revisión de los soportes requeridos para la aprobación del avance parcial.

En este contexto, el presente informe consolida los resultados del seguimiento efectuado, integrando el análisis técnico, administrativo y financiero de las actividades ejecutadas, así como las novedades presentadas durante el periodo, constituyéndose en el soporte para la suscripción del Acta Parcial de Interventoría y la verificación del cumplimiento de las metas asociadas al mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial urbana del municipio de Florencia, en concordancia con la línea estratégica de Infraestructura y Movilidad del Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027 "Hagamos Grande a Florencia".

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Presentar de forma clara y comprensible el seguimiento realizado por la interventoría durante el periodo evaluado, con el fin de verificar que el Contrato de Suministro No. 20250022 se esté ejecutando de acuerdo con lo establecido, que los materiales suministrados cumplan con la calidad requerida y que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada, transparente y eficiente, contribuyendo al mejoramiento de la infraestructura vial del municipio de Florencia.

2.2. Objetivos específicos

• Comprobar que los materiales suministrados (Mezcla Densa en Caliente MDC-19 y Emulsión Asfáltica CRL-40) cumplan con las especificaciones técnicas exigidas, garantizando su calidad y adecuado desempeño en las actividades de mantenimiento vial.

• Hacer seguimiento al desarrollo del contrato de suministro, verificando que las entregas se realicen conforme a las cantidades, tiempos y condiciones acordadas.

• Revisar el cumplimiento de las obligaciones administrativas del contrato, asegurando que la documentación, las pólizas y los requisitos legales se mantengan al día durante la ejecución contractual.

• Controlar el manejo financiero del contrato, validando que los valores facturados correspondan a los suministros efectivamente entregados y a los precios pactados.

• Detectar a tiempo posibles dificultades, riesgos o incumplimientos, y dejar las observaciones y recomendaciones necesarias para corregirlos oportunamente.

• Informar de manera permanente a la entidad contratante sobre el estado del contrato, facilitando la toma de decisiones y el control institucional.

• Evidenciar el aporte del contrato al cumplimiento de las metas del Programa de Infraestructura Vial Urbana y Rural y del Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027, orientado al mejoramiento de la movilidad y la calidad de vida de los habitantes de Florencia, Caquetá.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1. Características técnicas

El proyecto contempla la ejecución de actividades orientadas al mantenimiento y mejoramiento de la red vial urbana del municipio de Florencia, Caquetá, mediante la implementación de una solución técnica basada en la colocación de Mezcla Densa en Caliente (MDC-19), previa aplicación de Emulsión Asfáltica Catiónica de Rotura Lenta CRL-40 como riego de adherencia, con el propósito de rehabilitar la capa de rodadura, corregir las deficiencias funcionales superficiales del pavimento, prolongar su vida útil y mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial.

Para el desarrollo de estas actividades, el proyecto integra componentes técnicos, logísticos y operativos a través de la ejecución de los siguientes contratos:

- Contrato de Suministro No. 20250022, cuyo objeto corresponde al suministro de Mezcla Densa en Caliente (MDC-19), Emulsión Asfáltica Catiónica de Rotura Lenta CRL-40 y el alquiler temporal de maquinaria pesada (fresadora, finisher, vibrocompactadores neumático y de doble rodillo, y marmita con remolque), destinados al fortalecimiento de las actividades de mantenimiento y mejoramiento de la red vial urbana del municipio de Florencia, Caquetá.
- Contrato de Consultoría No. 20250013, cuyo objeto consiste en la interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato de suministro, garantizando el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas, financieras y contractuales establecidas.

La estrategia implementada permite optimizar la utilización de los recursos públicos mediante la articulación de los suministros, la disponibilidad de maquinaria especializada, el personal técnico y operativo de la Administración Municipal y el acompañamiento permanente de la interventoría. Esta última desarrolla actividades de seguimiento y control durante todas las etapas del proceso, verificando la calidad de los materiales suministrados, las condiciones de producción, transporte, colocación y compactación de la mezcla asfáltica, así como el cumplimiento de las especificaciones técnicas del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), las

obligaciones contractuales y la normativa vigente.

3.2. Población beneficiada

El proyecto beneficia de manera directa a una población estimada de 159.541 habitantes del municipio de Florencia, mediante el mejoramiento de la infraestructura vial urbana, contribuyendo al fortalecimiento de la movilidad, la seguridad vial y la conectividad entre los diferentes sectores de la ciudad. Asimismo, las intervenciones permiten optimizar las condiciones de transitabilidad, reducir los costos de operación vehicular y mejorar la calidad de vida de la comunidad, al disponer de vías más funcionales, seguras y eficientes.

3.3. Alcance técnico

El alcance del Contrato de Suministro No. 20250022 comprende el suministro de materiales asfálticos y el alquiler temporal de maquinaria especializada para la ejecución de actividades de mantenimiento y mejoramiento de la red vial urbana del municipio de Florencia, de acuerdo con las siguientes cantidades contractuales:

Tabla 1 Alcance técnico contractual del Contrato de Suministro No. 20250022

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
LT1	**SUMINISTRO**		
1.0	Mezcla Densa en Caliente (MDC-19)	m^3	9.395,00
2.0	Emulsión Asfáltica Catiónica de Rotura Lenta CRL-40	gal	11.482,00
LT 2	**ALQUILER DE MAQUINARIA**		
3.0	Finisher	hora	1,200.00
4.0	Vibrocompactador neumático	hora	1,200.00
5.0	Vibrocompactador doble rodillo	hora	1,200.00
6.0	Marmita con remolque	hora	1,200.00
7.0	Fresadora	mes	10.00

Por su parte, el Contrato de Consultoría No. 20250013 tiene como alcance realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de suministro del Lote 1, mediante la ejecución de actividades de seguimiento, control, verificación y validación del cumplimiento

de las condiciones técnicas, administrativas, financieras y contractuales, asegurando la correcta ejecución del objeto contractual y el adecuado uso de los recursos públicos.

3.4. Localización del proyecto

El proyecto se desarrolla en el municipio de Florencia, capital del departamento del Caquetá, ubicado en el piedemonte de la cordillera Oriental colombiana, a orillas del río Hacha, constituyéndose como un importante corredor de conexión entre la región Andina y la Amazonia colombiana. El municipio se localiza aproximadamente entre las coordenadas 1°36' de latitud norte y 75°36' de longitud oeste, a una altitud promedio de 242 m s. n. m.

Florencia limita al norte con el departamento del Huila y el municipio de La Montañita; al oriente con el municipio de La Montañita; al sur con los municipios de Milán y Morelia; y al occidente con el municipio de Belén de los Andaquíes y el departamento del Huila.



Ilustración 1 Localización del Proyecto

Las actividades objeto del contrato se ejecutan en diferentes sectores de la malla vial urbana del municipio, sobre calles, carreras y tramos previamente priorizados por la Secretaría de Obras Públicas, de acuerdo con las necesidades de mantenimiento y mejoramiento vial identificadas

por la Administración Municipal. La ubicación especifica de cada intervención se define conforme a la programación técnica y a los requerimientos emitidos por la entidad contratante durante la ejecución del contrato.

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

El presente informe corresponde al seguimiento y control ejercido en el marco del Contrato de Consultoría No. 20250013, cuyo objeto es la Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera al Contrato de Suministro No. 20250022, celebrado por el Municipio de Florencia – Caquetá, con el fin de garantizar la correcta ejecución del suministro de Mezcla Densa en Caliente MDC-19 y Emulsión Asfáltica Catiónica de Rotura Lenta CRL-40, destinados al mantenimiento y mejoramiento vial del área urbana del municipio.

El contrato de suministro se enmarca dentro del proyecto denominado "Implementación del Programa de Infraestructura Vial Urbana y Rural del Municipio de Florencia", el cual se encuentra alineado con las metas estratégicas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027 "Hagamos Grande a Florencia", orientadas a mejorar la movilidad urbana, optimizar la conectividad vial y garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad en la malla vial del municipio.

4.1. Contrato de Suministro No. 20250022

El Contrato de Suministro No. 20250022 tiene como objeto el suministro oportuno, continuo y conforme a especificaciones técnicas de Mezcla Densa en Caliente MDC-19 y Emulsión Asfáltica Catiónica CRL-40, materiales esenciales para la ejecución de actividades de mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial urbana del municipio de Florencia.

El suministro se realiza previo requerimiento de la entidad contratante, de acuerdo con la programación definida por el Municipio y bajo la coordinación y control permanente de la interventoría, garantizando la trazabilidad de las entregas, el control de cantidades, la verificación de temperaturas, la calidad del material y su adecuada destinación final.

El contrato tiene un plazo de ejecución de diez (10) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2026, y cuenta con una apropiación presupuestal que garantiza la disponibilidad de los recursos necesarios para su ejecución.

El valor estimado del proceso contractual asciende a la suma de DOCE MIL TRESCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS ($12.301.925.904,00 M/CTE), incluidos impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, conforme a lo establecido en los estudios previos y en el contrato suscrito.

El contratista del suministro está obligado a permitir y facilitar las labores de supervisión e interventoría, implementar los formatos de control de entrega, atender las observaciones técnicas y administrativas formuladas, y garantizar que los materiales suministrados cumplan con las especificaciones técnicas del INVIAS, particularmente en lo relacionado con granulometría, contenido de asfalto, temperatura de producción, transporte y entrega.

Tabla 2 Información General del Contrato de Suministro No. 20250022

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE FLORENCIA
NIT CONTRATANTE:	800.095.728-2
CONTRATISTA:	JB CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S
NIT:	901.248.941-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JEFFERSON BURGOS ABRIL
NUMERO DE IDENTIFICACION:	C.C. 1.053.343.771 de Chiquinquirá, Boyacá
CONTRATO NUMERO:	20250022
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE (MDC-19) Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, ASÍ COMO EL ALQUILER TEMPORAL DE MAQUINARIA PESADA —FRESADORA, FINISHER, VIBROCOMPACTADORES NEUMÁTICO Y DOBLE RODILLO, Y MARMITA CON REMOLQUE—, CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024–2027.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOCE MIL TRESCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS ($12.301.925.904,00) M/CTE, INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).
PLAZO DE EJECUCION:	DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007) Y LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
ACTA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA FINALIZACION INICIAL:	18 DE OCTUBRE DE 2026
ACTA DE SUSPENSIÓN 01:	20 DE MAYO DE 2026
ACTA DE REINICIO 01:	3 DE JUNIO DE 2026
FECHA FINALIZACION ACTUAL:	01 DE NOVIEMBRE DE 2026

Tabla 3 Póliza de Seguro de Cumplimiento – No. 21-44-101487888

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento de Contrato	13/12/2025 hasta 15/04/2027	$ 1.845.288.885,60
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	13/12/2025 hasta 15/04/2027	$ 4.920.770.361,60
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	13/12/2025 hasta 15/10/2029	$ 615.096.295,20
Calidad del Servicio	13/12/2025 hasta 15/04/2027	$ 1.845.288.885,60
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	13/12/2025 hasta 15/04/2027	$ 1.845.288.885,60

Tabla 4 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual – No. 21-40-101267662

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Predios, Labores y Operaciones	13/12/2025 hasta 15/10/2026	$ 284.700.000,00
Contratistas y Subcontratistas	13/12/2025 hasta 15/10/2026	$ 284.700.000,00
Vehiculos Propios y No Propios	13/12/2025 hasta 15/10/2026	$ 284.700.000,00

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Responsabilidad Civil Patronal	13/12/2025 hasta 15/10/2026	$ 284.700.000,00
Daño Emergente y Lucro Cesante	13/12/2025 hasta 15/10/2026	$ 284.700.000,00
Prejuicios Extrapatrimoniales	13/12/2025 hasta 15/10/2026	$ 284.700.000,00

4.2. Contrato de Consultoría – Interventoría No. 20250013

El Contrato de Consultoria No. 20250013 tiene como objeto la prestación de los servicios profesionales para ejercer la interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de suministro, asegurando la correcta ejecución del mismo y la adecuada utilización de los recursos públicos.

La interventoría es ejecutada por la firma INGSUELOS S.A.S., quien actúa con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, y tiene la responsabilidad de realizar el seguimiento integral al contrato de suministro, desde la etapa de producción de los materiales hasta su entrega y utilización por parte de la administración municipal.

El valor del contrato de interventoría asciende a la suma de SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS ($718.058.615,00 M/CTE), incluidos IVA, impuestos y descuentos de ley, y cuenta con un plazo de ejecución equivalente al del contrato de suministro, sin exceder el 31 de diciembre de 2026.

Dentro de las obligaciones de la interventoría se encuentra la verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas del material suministrado, la revisión y validación de los ensayos de laboratorio, el control administrativo y documental del contrato, la revisión y aprobación de las cuentas para pago, y la emisión de conceptos técnicos, administrativos y financieros que respalden las decisiones de la entidad contratante.

Tabla 5 Información General del Contrato de Consultoria No. 20250013

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE FLORENCIA
NIT CONTRATANTE:	800.095.728-2
CONTRATISTA:	INGSUELOS S.A.S
NIT:	900.648.551-3
REPRESENTANTE LEGAL:	GERMAN ENRIQUE GARCIA DIAZ
NUMERO DE IDENTIFICACION:	C.C. 9.178.817 de San Jacinto
CONTRATO NUMERO:	20250013
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROTURA LENTA CRL-40, CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024–2027.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS ($718.058.615,00) MCTE. INCLUIDOS IVA, TODOS LOS IMPUESTOS Y DESCUENTOS DE LEY.
PLAZO DE EJECUCION:	DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007) Y LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
ACTA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA FINALIZACION INICIAL:	18 DE OCTUBRE DE 2026
ACTA DE SUSPENSIÓN 01:	20 DE MAYO DE 2026
ACTA DE REINICIO 01:	3 DE JUNIO DE 2026
FECHA FINALIZACION ACTUAL:	01 DE NOVIEMBRE DE 2026

Tabla 6 Póliza Seguro de Cumplimiento - No. CHU-100065191 – Anexo 1

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento de Contrato	17/12/2025 hasta 18/04/2027	$ 143.611.723,00
Calidad del Servicio	17/12/2025 hasta 18/10/2028	$ 71.805.861,50
Prestaciones Sociales	17/12/2025 hasta 18/10/2029	$ 143.611.723,00

Tabla 7 Póliza Seguro de Cumplimiento - No. CHU-100065191 – Anexo 2

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento de Contrato	22/12/2025 hasta 23/04/2027	$ 143.611.723,00
Calidad del Servicio	22/12/2025 hasta 23/10/2028	$ 71.805.861,50
Prestaciones Sociales	22/12/2025 hasta 23/10/2029	$ 143.611.723,00

Tabla 8 Póliza Seguro de Cumplimiento - No. CHU-100065191 – Anexo 3

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento de Contrato	20/05/2026 hasta 07/05/2027	$ 143.611.723,00
Calidad del Servicio	20/05/2026 hasta 07/11/2028	$ 71.805.861,50
Prestaciones Sociales	20/05/2026 hasta 07/11/2029	$ 143.611.723,00

4.3. Marco normativo y contractual

Durante el período comprendido entre el 22 de diciembre de 2025 y el 26 de julio de 2026, los contratos de suministro e interventoría se desarrollaron conforme a la programación establecida,

ejecutándose las actividades de seguimiento, control y suministro previstas hasta la expedición de la respectiva Acta de Suspensión, suscrita el 20 de mayo de 2026 para ambos contratos. Esta medida administrativa dispuso la interrupción temporal de la ejecución contractual, de acuerdo con las circunstancias que dieron lugar a la suspensión y en cumplimiento de la normativa aplicable.

En consecuencia, la principal novedad contractual registrada durante el período objeto del presente informe corresponde a la suscripción de las Actas de Suspensión de los contratos de suministro e interventoría. No obstante, durante el período evaluado no se presentaron prórrogas ni actos de terminación contractual.

El Contrato de Suministro No. 20250022 y el Contrato de Consultoría No. 20250013 se rigen por las disposiciones de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, así como por las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) aplicables a la producción, control de calidad, suministro y aceptación de Mezcla Densa en Caliente (MDC-19) y Emulsión Asfáltica Catiónica de Rotura Lenta (CRL-40).

En desarrollo de estas disposiciones, la interventoría ejerció el seguimiento técnico, administrativo y financiero durante el período evaluado, garantizando la trazabilidad de la información contractual, la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista, la adecuada coordinación con la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Florencia y el cumplimiento de los principios que rigen la contratación estatal, incluyendo el acompañamiento a las actuaciones administrativas que dieron lugar a la suspensión temporal de los contratos.

5. ESTADO DE LAS OBRAS DEL ÁREA TÉCNICA

El Contrato de Suministro No. 20250022, cuyo objeto corresponde al "SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE (MDC-19) Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, ASÍ COMO EL ALQUILER TEMPORAL DE MAQUINARIA PESADA —FRESADORA, FINISHER, VIBROCOMPACTADORES NEUMÁTICO Y DE DOBLE RODILLO, Y MARMITA CON REMOLQUE—, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETÁ", presentó durante el período comprendido entre el 22 de diciembre de 2025 y el 26 de julio de 2026 un avance de ejecución acorde con las actividades efectivamente desarrolladas y verificadas por la interventoría.

Tabla 9 Información del avance del proyecto

DESCRIPCIÓN	PERIODO EVALUADO
VALOR DEL LOTE 1	$ 10.440.361.304,00
VALOR DEL LOTE 2	$ 1,861,564,600.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO	$ 12.301.925.904,00
VALOR TOTAL DE ANTICIPO	$ 4,920,770,361.60
PORCENTAJE (%) DE ANTICIPO	40,00 %
VALOR TOTAL MENSUAL PROGRAMADO ACUMULADO A JULIO 2026 DEL LOTE 1	$ 6.995.042.073,68
PORCENTAJE (%) PROGRAMADO ACUMULADO A JULIO 2026 DEL LOTE 1	67,00 %
VALOR TOTAL MENSUAL EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2026 DEL LOTE 1	$ 2.750.461.818,61
PORCENTAJE (%) EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2026 DEL LOTE 1	26,34%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 7.689.899.485,39
PORCENTAJE (%) PENDIENTE POR EJECUTAR	73,66%

DETALLE DEL PROYECTO

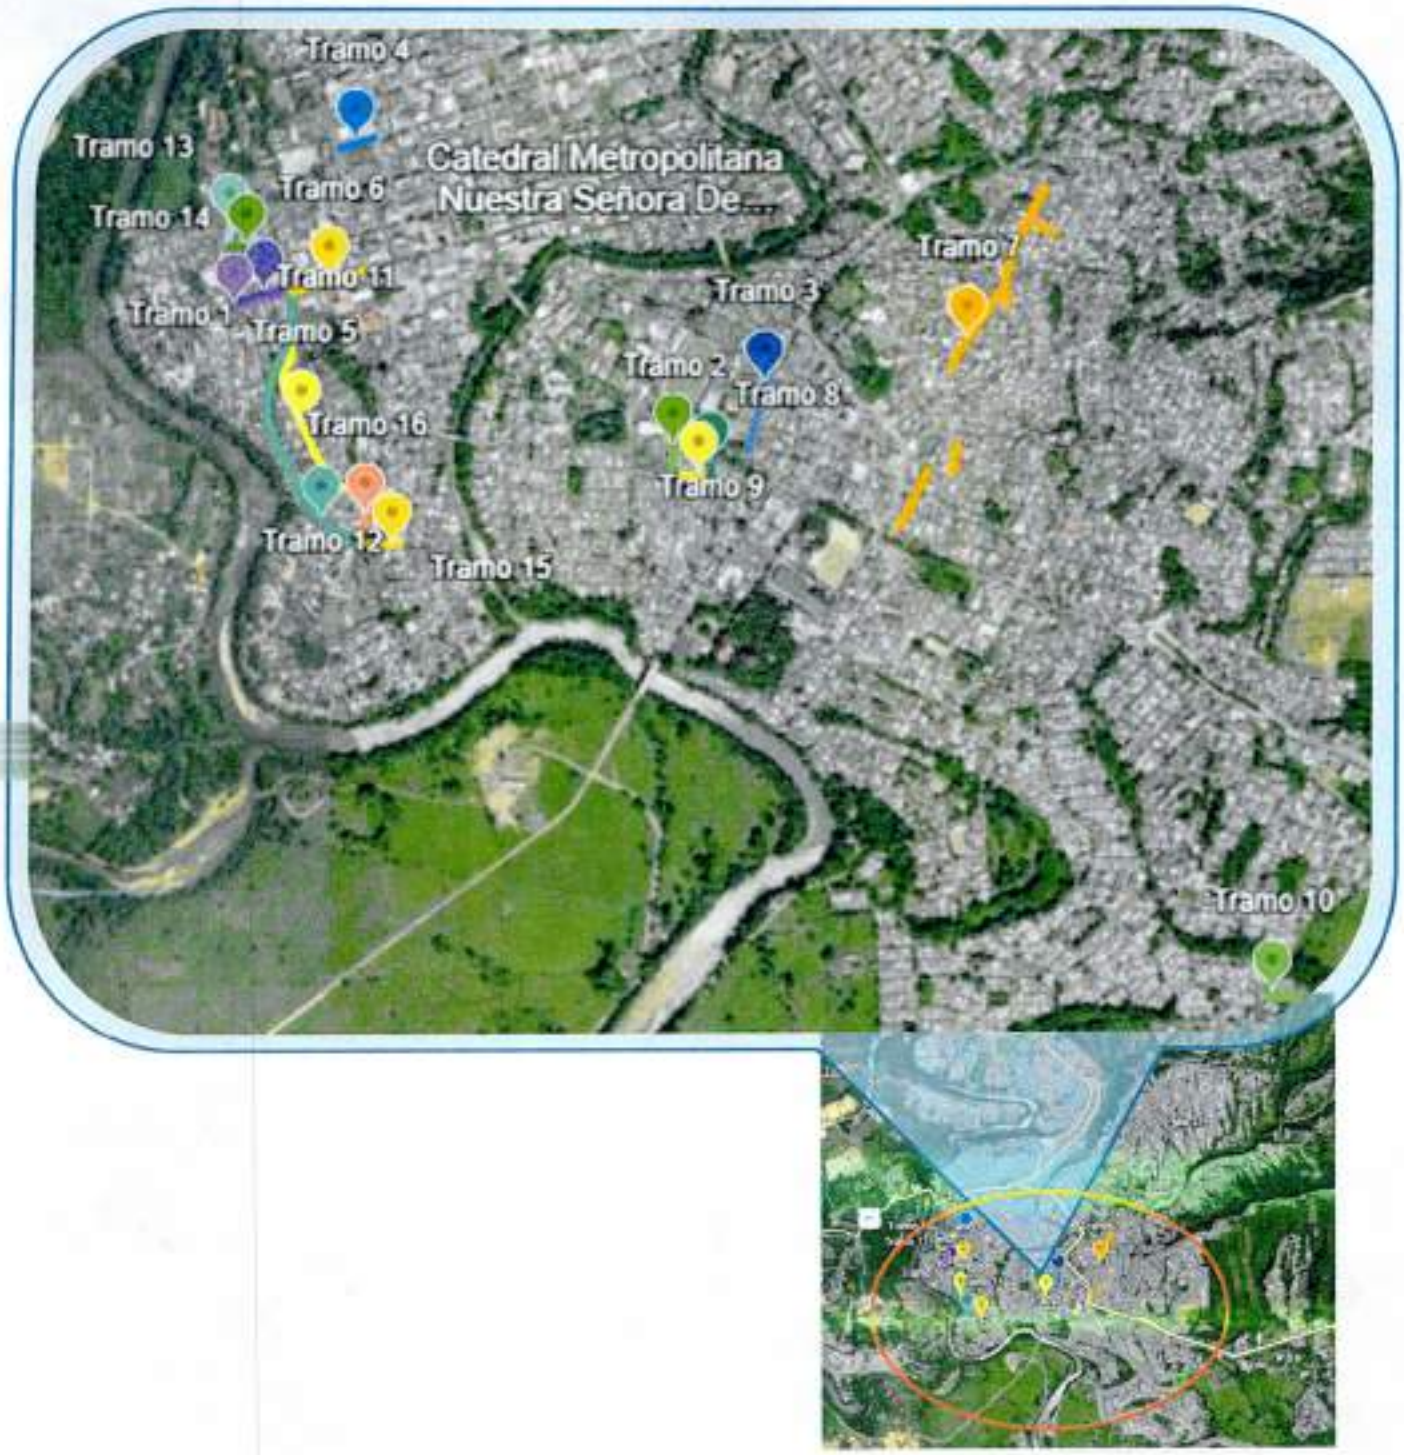


Ilustración 2 Detalle general del proyecto a desarrollar

Con corte al 26 de julio de 2026, el Contrato de Suministro No. 20250022 presenta un avance físico ejecutado acumulado del 26,34 %, equivalente a $2.750.461.818,61, frente a un avance programado acumulado del 67,00 %, correspondiente a $6.995.042.073,68, de acuerdo con el cronograma de ejecución contractual aprobado para el Lote 1.

Lo anterior evidencia una diferencia negativa de 40,66 puntos porcentuales entre el avance programado y el avance ejecutado al cierre del período evaluado, reflejando una ejecución inferior a la prevista en el cronograma contractual vigente.

Durante el período comprendido entre el 22 de diciembre de 2025 y el 26 de julio de 2026, la interventoría realizó el seguimiento técnico, administrativo y financiero al desarrollo del contrato, verificando las actividades ejecutadas por el contratista relacionadas con el suministro de Mezcla Densa en Caliente (MDC-19), Emulsión Asfáltica Catiónica de Rotura Lenta (CRL-40) y la disponibilidad de los equipos y maquinaria requeridos para la atención de los diferentes tramos priorizados por la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Florencia.

Al cierre del período objeto del presente informe, el contrato registra un saldo pendiente por ejecutar de $7.689.899.485,39, equivalente al 73,66 % del valor correspondiente al Lote 1. Es importante señalar que el 20 de mayo de 2026 se suscribió el Acta de Suspensión del Contrato de Suministro No. 20250022, situación que afectó la continuidad de las actividades programadas y tuvo incidencia en el comportamiento del avance contractual.

De igual manera, se precisa que el contrato cuenta con un valor total de $12.301.925.904,00, correspondiente a la sumatoria de los valores asignados para el Lote 1 ($10.440.361.304,00) y el Lote 2 ($1.861.564.600,00), así como un anticipo desembolsado por valor de $4.920.770.361,60, equivalente al 40 % del valor contractual establecido.

A continuación, se presenta el detalle de la ejecución acumulada del contrato y de las actividades verificadas por la interventoría durante el período evaluado:

Tabla 10 Descripción de los tramos intervenidos

TRAMO	RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN
1. La Vega – Tramo de prueba (Calle 14 entre carreras 16 y 19 derecha)	Se ejecutaron actividades de escarificación, conformación, limpieza, imprimación y colocación de la mezcla asfáltica MDC-19 con su respectiva compactación. Como novedad, fue necesario profundizar la intervención para ajustar niveles con andenes y accesos vehiculares, además de atender la reparación de una acometida de acueducto que ocasionó una suspensión temporal de las actividades.
2. Gold Gym – Calle 8A entre carreras 12 y 13	Se realizaron actividades de conformación de la rasante, imprimación e instalación de la mezcla MDC-19. Adicionalmente, fue necesario ejecutar ajustes de nivel y construir cunetas para mejorar el drenaje superficial, generando tiempos adicionales de ejecución.
3. Cristalina T1 – Calle 7 entre carreras 11 y 8A	Se ejecutó la preparación de la vía, imprimación y pavimentación con MDC-19. Durante la intervención se presentaron afectaciones en una acometida de acueducto y posteriormente una falla en una tubería de alcantarillado que requirió su reposición y la restitución del pavimento antes de habilitar nuevamente el tramo.
4. Galería – Calle 17 entre carreras 14 y 13	Se adelantó el fresado y la preparación de la vía para la posterior pavimentación. Durante la ejecución se presentaron múltiples interferencias con redes de servicios públicos, incluyendo la red principal de energía, acometidas de acueducto y una caja de inspección, lo que obligó a suspender temporalmente las actividades hasta la ejecución de las reparaciones correspondientes.
5. El Lennin – Carrera 16A y Diagonal 11E entre carreras 15 y 16	Se ejecutó la imprimación y la instalación de la mezcla MDC-19 una vez finalizadas las actividades de preparación del terreno. Durante la ejecución fue necesaria la reposición de redes de alcantarillado, reparación de acometidas de acueducto y energía, construcción de un sumidero, demolición de rampas y retiro de bordillos, generando una afectación importante en la programación inicial.
6. Miganni – Calle 14 entre carreras 16 y 14 (costado	Se ejecutó parcialmente la pavimentación con mezcla MDC-19; sin embargo, la intervención quedó inconclusa debido a una falla mecánica

TRAMO	RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN
izquierdo)	en la planta de asfalto. Adicionalmente, fue necesaria la reposición de un tramo de la red de alcantarillado por parte de SERVAF antes de continuar con la pavimentación.
7. Malvinas	Se realizaron actividades de fresado, preparación del terreno, imprimación y colocación de la mezcla asfáltica. La intervención requirió la reparación de acometidas de acueducto y energía, ajustes de cajas de inspección y cámaras de telecomunicaciones, demolición de rampas y construcción de cunetas para garantizar el adecuado drenaje superficial y la recuperación del espacio público.
8. Calle Oscura – Calle 4B Sur y Carrera 15A	Se dio continuidad a la intervención mediante la aplicación de imprimación y la instalación de la mezcla MDC-19 por etapas, garantizando el control de la transitabilidad debido al alto flujo vehicular y a las condiciones geométricas del corredor. Durante la ejecución se atendieron interferencias con redes de servicios públicos y se efectuaron los ajustes urbanísticos requeridos.
9. Empanadas de Colores – Carrera 13 entre calles 8 y 8A	Se ejecutó el fresado de la carpeta existente, seguido de la imprimación y la colocación de la mezcla MDC-19 con su correspondiente compactación, cumpliendo las especificaciones técnicas establecidas para la rehabilitación del pavimento.
10. Hamburguesería El Negro – Calle 8 entre carreras 12 y 13	Se realizaron actividades de fresado, preparación del terreno e instalación de la mezcla asfáltica. Como actividad complementaria, fue necesaria la demolición de rampas de acceso para restablecer la geometría de la vía y mejorar el drenaje superficial del sector.
11. La Vega (Carril izquierdo) – Calle 14 entre carreras 16 y 19	Se ejecutaron labores de escarificación, conformación, imprimación y colocación de la mezcla MDC-19. Durante la preparación del tramo fue necesaria la reposición de un segmento de la red de alcantarillado por parte de SERVAF, situación que ocasionó la reprogramación temporal de las actividades para garantizar la estabilidad de la estructura de pavimento.
12. Carrera 16 D Calle 14	Se realizó el fresado de la carpeta asfáltica, previo retiro de rampas,

TRAMO	RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN
Cementerio (Colegio Juan Bautista Migaani)	bordillos y estructuras temporales que interferían con la intervención. El material fresado fue cargado y transportado en volquetas, mientras se verificó la profundidad del corte y la regularidad de la superficie, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las condiciones adecuadas para la posterior pavimentación, sin presentarse novedades que afectaran el normal desarrollo de las actividades.
13. Carrera 17 entre Calles 15 y 16 (Inicio de Cabalgatas)	Se realizó el fresado de la carpeta asfáltica, previo retiro de rampas, bordillos y estructuras temporales tipo carpas que interferían con la intervención. Estas actividades permitieron restituir la sección transversal de la vía, mejorar la conducción de las aguas superficiales y preparar la superficie para la posterior pavimentación. El material fresado fue cargado y transportado en volquetas, mientras se verificó la profundidad del corte y la regularidad de la superficie, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas. No se presentaron novedades o dificultades que afectaran el normal desarrollo de las actividades.
14. Calle 15 entre Carreras 17 y 16 - Pita - Academia Nacional de Sistemas	Se ejecutaron actividades de fresado de la carpeta asfáltica mediante el uso de una máquina fresadora, garantizando la remoción uniforme de la capa de rodadura conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Previamente, se realizaron labores de replanteo, demolición y retiro de rampas, bordillos y estructuras temporales tipo carpas para facilitar la intervención y restituir la sección transversal de la vía. El material fresado fue recolectado, cargado y transportado en volquetas de la Secretaría de Obras Públicas, mientras se efectuaron controles de calidad para verificar la profundidad del fresado, la regularidad de la superficie y el cumplimiento de los parámetros geométricos. Estas actividades permitieron optimizar las condiciones para la posterior aplicación de la imprimación y la mezcla asfáltica, además de mejorar la conducción de las aguas superficiales, sin presentarse novedades o dificultades que afectaran el normal desarrollo de la obra.
15. Calle 11C y Carrera 14ª	Se ejecutaron labores de fresado de la carpeta asfáltica, incluyendo el

TRAMO	RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN
entre Carrera 15 – Calle 11H (Cementerio al enrutador del colegio)	retiro de rampas y bordillos, el cargue y transporte del material fresado y los controles de calidad requeridos para garantizar las condiciones adecuadas para la posterior pavimentación. Como novedades del tramo, se realizó la reposición de aproximadamente 20 m de red de alcantarillado, la reparación de tapas de inspección y la atención de acometidas de acueducto y energía. Asimismo, se identificaron puntos con nacederos de agua para la construcción de un sumidero y se demolieron rampas y un tramo de bordillo para mejorar el drenaje y recuperar la sección vial.

5.1. Control de calidad

De conformidad con las obligaciones establecidas en el Contrato de Consultoría No. 20250013, cuyo objeto corresponde a la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROTURA LENTA CRL-40, CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024–2027.", la interventoría ejerció el seguimiento, control y verificación permanente de las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el 22 de diciembre de 2025 y el 26 de julio de 2026, garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas, financieras y contractuales establecidas.

En desarrollo de dichas obligaciones, se efectuó el control a las actividades relacionadas con el suministro de Mezcla Densa en Caliente (MDC-19), Emulsión Asfáltica Catiónica de Rotura Lenta (CRL-40) y la disponibilidad de la maquinaria especializada requerida para las intervenciones, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), la calidad de los materiales suministrados, las condiciones de

producción, transporte, colocación y compactación de la mezcla asfáltica, así como la correcta ejecución de las actividades en cada uno de los tramos intervenidos.

De igual manera, la interventoría ordenó y verificó la ejecución de los ensayos y controles de calidad necesarios para validar el cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales, revisó la documentación de soporte correspondiente y realizó el seguimiento a las novedades presentadas durante la ejecución de las intervenciones, dejando constancia de las observaciones, recomendaciones y acciones correctivas implementadas cuando fue necesario. **Para constatar lo anterior, se puede consultar los informes de laboratorio de calidad anexos al presente documento, así como los informes mensuales de seguimiento técnico, donde se amplía el detalle de las actividades ejecutadas y los controles realizados.**

Los resultados del seguimiento técnico efectuado durante el periodo evaluado se presentan en el desarrollo del presente informe, donde se consolidan las actividades ejecutadas, el estado de avance del contrato, los controles de calidad realizados y las principales novedades registradas en cada uno de los tramos intervenidos, constituyendo el soporte técnico para la suscripción del Acta Parcial de Interventoría.

5.2. Registro fotográfico

Estos títulos de control, se podrán detallar en los informes mensuales presentados en el contrato desde el mes 1 al mes 6.

5.3. Control del clima en obra

Estos títulos de control, se podrán detallar en los informes mensuales presentados en el contrato desde el mes 1 al mes 6.

6. AVANCE Y ESTADO GESTIÓN FINANCIERA

A continuación, se presenta el avance financiero del contrato de suministro e interventoria, aclarando que el contrato de suministro cuenta con un anticipo desembolsado del 40% a la fecha de elaboración del presente informe, sin pagos parciales; para el contrato de interventoria a la fecha no aplica desembolso de anticipo, resumido en las siguientes tablas:

Tabla 11 Estado físico y financiero del Contrato de Suministro No. 20250022.

DESCRIPCIÓN	PERIODO EVALUADO
VALOR DEL LOTE 1	$ 10.440.361.304,00
VALOR DEL LOTE 2	$ 1,861,564,600.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO	$ 12.301.925.904,00
VALOR TOTAL DE ANTICIPO DESEMBOLSADO	$ 4,920,770,361.60
PORCENTAJE (%) DE ANTICIPO	40%
VALOR TOTAL MENSUAL PROGRAMADO ACUMULADO A JULIO 2026 DEL LOTE 1	$ 6.995.042.073,68
PORCENTAJE (%) PROGRAMADO ACUMULADO A JULIO 2026 DEL LOTE 1	67,00 %
VALOR TOTAL MENSUAL EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2026 DEL LOTE 1	$ 2.750.461.818,61
PORCENTAJE (%) EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2026 DEL LOTE 1	26,34%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 7.689.899.485,39
PORCENTAJE (%) PENDIENTE POR EJECUTAR	73,66%

Tabla 12 Estado físico y financiero del Contrato de Consultoria No. 20250013.

DESCRIPCIÓN	PERIODO EVALUADO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$718.058.615,00
VALOR TOTAL MENSUAL EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2026	$ 189.136.639,19
PORCENTAJE (%) EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2026	26,34%
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	$ 0,00
PORCENTAJE (%) TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	0%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 528.889.605,75
PORCENTAJE (%) PENDIENTE POR EJECUTAR	73,66%

7. DETALLE PRESUPUESTAL DEL AVANCE DE INTERVENTORIA, DE ACUERDO AL CONTRATO

Tabla 13 Presupuesto de la Interventoria

PRESUPUESTO DE LA INTERVENTORÍA								
1	PERSONAL							
No	CONCEPTO	A SUELDO MES BÁSICO	B CANT.	C % DE DEDICACIÓN	D F.M.	E VALOR MES (A * B * C * D)	F Nº DE MESES	G TOTAL PARCIAL (E * F)
1.1	PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN							
1.1.1	Director de Interventoria	$ 6.000.000,00	1	15%	170%	$ 1.530.000,00	10,00	15.300.000,00
1.1.2	Especialista en Geotecnia	$ 6.000.000,00	1	20%	170%	$ 2.040.000,00	10,00	20.400.000,00
1.1.3	Ingeniero residente	$ 2.800.000,00	1	100%	203%	$ 5.684.000,00	10,00	56.840.000,00
1.1.4	Auxiliar de Laboratorio de suelos	$ 1.800.000,00	1	50%	203%	$ 1.827.000,00	10,00	18.270.000,00
1.2	PERSONAL DE APOYO							
1.2.2	Contador	$ 2.700.000,00	1	15%	203%	$ 822.150,00	10,00	8.221.500,00
1.2.3	Secretaria	$ 1.700.000,00	1	15%	203%	$ 517.650,00	10,00	5.176.500,00
						SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL		124.208.000,00
2	OTROS COSTOS DIRECTOS							
2.1	OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
2.1.1	Arriendo Oficina	Mes	1	10		$ 795.763,91		$ 7.957.639,09
2.1.2	Servicio de energía	Mes	1	10		$ 210.000,00		$ 2.100.000,00
2.1.3	Servicio de agua	Mes	1	10		$ 180.000,00		$ 1.800.000,00
2.1.4	Servicio de internet	Mes	1	10		$ 180.000,00		$ 1.800.000,00
2.1.5	Etapa 1 para VERIFICACIÓN DEL DISEÑO	unid	1	1		$ 64.238.265,00		$ 64.238.265,00
2.1.6	Etapa 2 para CONTROL DE CALIDAD	Lote	1	23,5		$ 14.563.142,50		$ 342.233.848,75
2.1.7	Papelería, copias e impresiones	Mes	1	10		$ 1.080.000,00		$ 10.800.000,00
						SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS		430.929.752,84

3	COSTOS LEGALIZACIÓN				
No	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	VALOR COSTOS DIRECTOS AFECTADO POR EL PORCENTAJE	VALOR TOTAL
3.1	Seguros y Pólizas	Porcentaje	1,00%	$ 6.034.106,01	6.034.106,00
3.2	Estampilla Pro-desarrollo	Porcentaje	0,50%	$ 3.017.053,00	3.017.053,00
3.3	Estampilla pro-cultura	Porcentaje	1,50%	$ 9.051.159,01	9.051.159,00
3.4	Estampilla pro-adulto mayor	Porcentaje	3,00%	$ 18.102.318,03	18.102.318,00
3.5	Cont fondo de seguridad	Porcentaje	0,00%	$ -	-
3.6	Pro-deporte	Porcentaje	2,00%	$ 12.068.212,01	12.068.212,00
	Total		8%		
				SUBTOTAL COSTOS DE LEGALIZACIÓN	48.272.848,00
				RESUMEN GENERAL	
				COSTO TOTAL (1 + 2 + 3)	603.410.600,84
				IVA (19%)	114.648.014,00
				VALOR TOTAL OFERTA	718.058.615,00

Por lo anterior, el presente documento corresponde al periodo comprendido entre el 22 de diciembre de 2025 y el 26 de julio de 2026.



Gráfico 1 Avance Físico del Contrato de Suministro

De conformidad con lo establecido en la Cláusula Octava del Contrato de Consultoría No. 20250013, la presente solicitud de cobro se soporta en el avance físico y financiero ejecutado durante el periodo evaluado. En ese sentido, teniendo en cuenta que el presupuesto total del contrato de interventoría asciende a la suma de SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($718.058.615,00), el valor a cobrar corresponde Acta Parcial No. 1, por valor de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. ($182.271.610,45) equivalente al 25.38%

8. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y MAQUINARIA DEL PROYECTO

8.1. Personal profesional de la interventoría

En el marco de la interventoría al contrato de suministro, se verifica que el personal profesional y operativo vinculado a las actividades de producción, cargue, transporte, descarga y manejo de los materiales suministrados cumpla con las disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo.

La interventoría constata que dicho personal cuente con los elementos de protección personal (EPP) exigidos según el tipo de actividad desarrollada, conforme a la normatividad aplicable. Asimismo, cuando las actividades lo requieren, se verifica que el personal haya recibido y aprobado la capacitación correspondiente para trabajos especiales, tales como manejo de maquinaria y equipos, con el fin de prevenir riesgos y garantizar condiciones seguras durante la ejecución del suministro.

De igual manera, se revisa que los permisos de trabajo y autorizaciones necesarias se encuentren debidamente expedidos por el responsable designado por el contratista, y que las actividades asociadas al suministro se desarrollen conforme a los procedimientos establecidos, sin afectar la seguridad del personal ni la correcta ejecución del contrato.

Tabla 14 Personal profesional empleado en la Interventoria

CONTRATISTA	PERSONAL	CANTIDAD	DIAS LABORADOS	DEDICACIÓN
INGSUELOS S.A.S	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	217	15%
	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	217	20%
	INGENIERO RESIDENTE	1	217	100%
	AUXILIAR DE LABORATORIO DE SUELOS	1	217	50%
	CONTADOR PÚBLICO	1	217	15%
	SECRETARÍA	1	217	15%

8.2. Personal profesional del contratista de obra

El contrato de suministro requiere la vinculación previa de personal profesional, técnico, operativo y administrativo debidamente calificado, indispensable para la correcta producción, suministro y aplicación de la mezcla asfáltica, así como para la operación y control de los procesos asociados al contrato.

La interventoría verifica que el contratista cuente con operadores de equipos, laboratoristas, personal técnico y de apoyo con la formación y experiencia acordes a las actividades a desarrollar, cuya contratación debe efectuarse antes del inicio de las labores, con el fin de garantizar la continuidad del suministro y el cumplimiento del cronograma o plan de trabajo.

Así mismo, se constata que el personal vinculado se encuentre debidamente afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral y cuente con los elementos de protección personal requeridos según la naturaleza de sus funciones.

Tabla 15 Personal y maquinaria profesional empleado por el contratista

CONTRATISTA	PERSONAL/MAQUINARIA	CANTIDAD
JB CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIA	MAQUINISTAS	5
	FRESADORA	1
	FINISHER	1

9. VANCE Y ESTADO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

9.1. Comités y reuniones realizados

Se adelantan comités de avance y seguimiento al contrato objeto de la interventoría, con el acompañamiento del supervisor designado por la Secretaría de Obras Públicas del Municipio y el contratista encargado del suministro. Para mayor detalle, se recomienda revisar las actas de comité, las cuales reposan en los informes correspondientes del mes 1 al mes 7.

9.2. Relación de correspondencia

Estos controles podrán consultarse y verificarse con mayor detalle en los informes mensuales presentados dentro del desarrollo del contrato, correspondientes desde el mes 1 al mes 7.

10. CONCLUSIONES

Cualquier información adicional podrá ser consultada en los informes mensuales presentados por el contratista del suministro y esta firma interventora, con el fin de ampliar o validar la información requerida.

La Interventoría solicita el trámite y pago del Acta Parcial No. 1, por valor de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. ($182.271.610,45), equivalente al 25,38 % del valor total del Contrato de Consultoría No. 20250013, de acuerdo con los soportes documentales presentados y revisados.

Se precisa que el avance físico y financiero acumulado corresponde al 26,34 %, equivalente a $189.136.639,19; sin embargo, el valor objeto de la presente cuenta de cobro corresponde a $182.271.610,45, conforme a los valores debidamente acreditados y soportados para el periodo objeto de cobro, en cumplimiento de la Cláusula Octava del Contrato de Consultoría No. 20250013.






Aplicación de emulsión asfáltica CRL-40





Extendido de mezcla asfáltica MDC-19

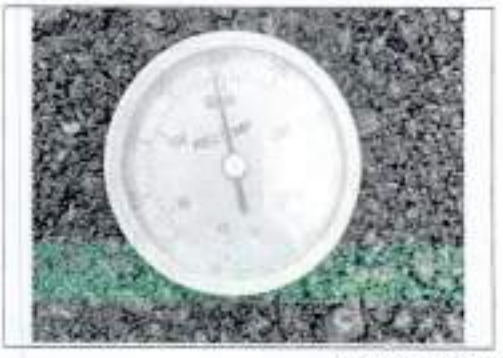



Compactación de la mezcla asfáltica

TRAMO 1 LA VEGA CALLE 14 ENTRE CARRERA 16 Y 19 - DERECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO POR TRAMO	INGSUELOS
ANEXO A		REV. 0





Extendido de mezcla asfáltica MDC-19





Compactación de la mezcla asfáltica

TRAMO 2 GOLD GYM CALLE 8A ENTRE CARRERA 12 Y 13	REGISTRO FOTOGRÀFICO POR TRAMO	INGSUELOS
ANEXO A		REV. 0





Aplicación de emulsión asfáltica CRL-40





Extendido de mezcla asfáltica MDC-19





Compactación de la mezcla asfáltica

TRAMO 3 CRISTALINA CALLE 7 ENTRE CARRERA 11 Y 8H - CALLE 7 ENTRE CRA 11 Y 9	REGISTRO FOTOGRÀFICO POR TRAMO	INGSUELOS
ANEXO A		REV. 0





Aplicación de emulsión asfáltica CRL-40





Extendido de mezcla asfáltica MDC-19





Compactación de la mezcla asfáltica

TRAMO 4 GALERIA CALLE 17 ENTRE CARRERA 14 Y 13	REGISTRO FOTOGRÁFICO POR TRAMO	INGSUELOS
ANEXO A		REV. 0






Aplicación de emulsión asfáltica CRL-40





Extendido de mezcla asfáltica MDC-19

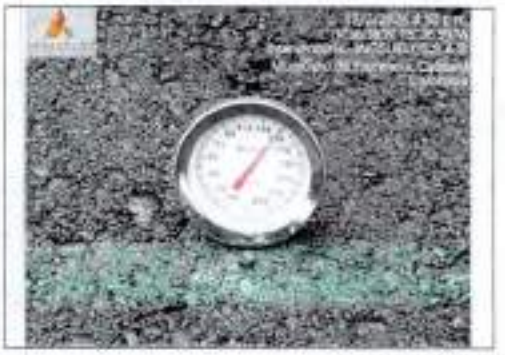



Compactación de la mezcla asfáltica

TRAMO 5 LENIN CARRERA 16A Y DIAGONAL 116 ENTRE CARRERAS 15 Y 16	REGISTRO FOTOGRÁFICO POR TRAMO	INGSUELOS
ANEXO A		REV. 0





Aplicación de emulsión asfáltica CRL-40





Extendido de mezcla asfáltica MDC-19





Compactación de la mezcla asfáltica

TRAMO 6 MIGANNI CALLE 14 ENTRE CARRERA 16 Y 14 IZQUIERDA	REGISTRO FOTOGRÁFICO POR TRAMO	INGSUELOS
ANEXO A		REV. 0





Aplicación de emulsión asfáltica CRL-40





Extendido de mezcla asfáltica MDC-19





Compactación de la mezcla asfáltica

TRAMO 7 SECTOR MALVINAS CALLE 3A ENTRE TRANSVERSAL 6 Y CARRERA 4 CARRERA 4B ENTRE CALLE 2E Y 3A CALLE 4 ENTRE CARRERA 9 Y 7A CALLE 4A ENTRE CARRERA 11 Y 9	REGISTRO FOTOGRÁFICO POR TRAMO	INGSUELOS
ANEXO A		REV. 0





Aplicación de emulsión asfáltica CRL-40





Extendido de mezcla asfáltica MDC-19





Compactación de la mezcla asfáltica

TRAMO 8 EMPANADA DE COLORES CARRERA 13 ENTRE CALLE 8 Y 8A	REGISTRO FOTOGRÁFICO POR TRAMO	INGSUELOS
ANEXO A		REV. 0





Aplicación de emulsión asfáltica CRL-40





Extendido de mezcla asfáltica MDC-19





Compactación de la mezcla asfáltica

TRAMO 9 HAMBURGUESERÍA EL NEGRO CALLE 8 ENTRE CARRERA 12 Y 13	REGISTRO FOTOGRÁFICO POR TRAMO	INGSUELOS
ANEXO A		REV. 0





Aplicación de emulsión asfáltica CRL-40





Extendido de mezcla asfáltica MDC-19





Compactación de la mezcla asfáltica

TRAMO 10 CALLE OSCURA CALLE 4B SUR ENTRE CALLE 2A Y CARRERA 15A CARRERA 15A ENTRE CALLE 4B SUR Y CALLE 5 SUR	REGISTRO FOTOGRÁFICO POR TRAMO	INGSUELOS
ANEXO A		REV. 0





Aplicación de emulsión asfáltica CRL-40





Extendido de mezcla asfáltica MDC-19





Compactación de la mezcla asfáltica

TRAMO 11 LA VEGA CALLE 14 ENTRE CARRERA 16 Y 19 - IZQUIERDA	REGISTRO FOTOGRÁFICO POR TRAMO	INGSUELOS
ANEXO A		REV. 0





Aplicación de emulsión asfáltica CRL-40





Extendido de mezcla asfáltica MDC-19





Compactación de la mezcla asfáltica

TRAMO 12 AV. GAITAN CARRERA 16 D CALLE 14 CEMENTERIO (COLEGIO JUAN BAUTISTA MIGAANI)	REGISTRO FOTOGRÁFICO POR TRAMO	INGSUELOS
ANEXO A		REV. 0





Aplicación de emulsión asfáltica CRL-40





Extendido de mezcla asfáltica MDC-19





Compactación de la mezcla asfáltica

TRAMO 12 AV. GAITAN CARRERA 16 D CALLE 14 CEMENTERIO (COLEGIO JUAN BAUTISTA MIGAANI)	REGISTRO FOTOGRÁFICO POR TRAMO	INGSUELOS
ANEXO A		REV. 0





Aplicación de emulsión asfáltica CRL-40





Extendido de mezcla asfáltica MDC-19





Compactación de la mezcla asfáltica

TRAMO 13 CABALGATAS CARRERA 17 ENTRE CALLES 15 Y 16 (INICIO DE CABALGATAS)	REGISTRO FOTOGRÁFICO POR TRAMO	INGSUELOS
ANEXO A		REV. 0





Aplicación de emulsión asfáltica CRL-40





Extendido de mezcla asfáltica MDC-19





Compactación de la mezcla asfáltica

TRAMO 14 HOME SHAKE CALLE 15 ENTRE CARRERAS 17 Y 16 - PITA - ACADEMIA NACIONAL DE SISTEMAS	REGISTRO FOTOGRÁFICO POR TRAMO	INGSUELOS
ANEXO A		REV. 0





Aplicación de emulsión asfáltica CRL-40





Extendido de mezcla asfáltica MDC-19





Compactación de la mezcla asfáltica

TRAMO 15 CEMENTERIO CALLE 11C Y CARRERA 14ª ENTRE CARRERA 15 – CALLE 11H (CEMENTERIO AL ENRUTADOR DEL COLEGIO)	REGISTRO FOTOGRÁFICO POR TRAMO	INGSUELOS
ANEXO A		REV. 0

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL 40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL DEL AREA URBANA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF Nº:	
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA Nº:	
LOCALIZACIÓN:	TRAMO LA VEGA (CALLE 14 ENTRE CARRERA 18 Y 19) - DERECHA	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFALTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	23 de diciembre de 2025

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra cilro	Observaciones
1	OZD 460	8,54	9:50 a. m.	148 ºC	10:10 a. m.	140 ºC	no	
2	OZD 449	9,58	10:15 a. m.	152 ºC	10:50 a. m.	140 ºC	si	
3	SME 167	13,78	10:40 p. m.	151 ºC	11:00 a. m.	140 ºC	no	
4	OZD 448	8,5						
TOTAL MEZCLA MDC-19		42,4						

Los resultados mostrados en este informe, hacen referencia únicamente a la muestra entregada. Este ensayo se efectuó en apego a la norma establecida vigente y bajo el control de Calidad de INGSUELOS. Se prohíbe la reproducción total o parcial sin autorización del Jefe de Laboratorio.

JAVIER ANDRES AGREDA GOMEZ
EJECUTO / RESIO

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-1E CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL DEL AREA URBANA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF Nº:	
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA Nº	
LOCALIZACION:	TRAMO GOLO OVM (CALLE 8A ENTRE CARRERA 12 Y 13)	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFALTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	5 de enero de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra obtenida	Observaciones
1	CUY 337	23,9		148 ºC		142 ºC	SI	
2	WHW 943	9,0		152 ºC		146 ºC	NO	NO LLEGO CON SU CAPACIDAD VOLUMETRICA COMPLETA
3	SRS 044	13,79		151 ºC		148 ºC	SI	
TOTAL MEZCLA MDC-19		46,69						

Los ensayos marcados en este informe, fueron realizados a su muestra entregada. Este informe se efectuara segun la norma establecida vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproduccion total o parcial sin autorizacion de este Laboratorio

Javier Agreda

JAVIER ANDRES AGREDA GOMEZ
EJECUTO / REVISO

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOVIAL DEL AREA URBANADEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF Nº:	
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA Nº:	
LOCALIZACIÓN:	TRAMO 1 CRISTALINA (CONCRETO ENTRE CARRERA 17 Y 5A)	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFALTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	9 de enero de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra sitio	Observaciones
1	OJV 881	7,31		150 ºC	13:20	142 ºC	SI	
2	OZD 404	5,47		155 ºC	13:50	146 ºC	NO	
3	WHW 949	14,58		150 ºC	14:04	145 ºC	SI	
4	PRZ 771	25,5		150 ºC	14:50	140 ºC	NO	SOBRO 2 M3 APROX
5	OZD 450	9,54		150 ºC	15:10	140 ºC	NO	
6	OZD 404	4		150 ºC	15:50	140 ºC	NO	SOLO LLEGARON 4 M3
TOTAL MEZCLA MDC-19		64,8						

Los resultados mostrados en este informe hacen referencia únicamente a la muestra ensayada. Este informe no debe ser usado parcialmente sin la previa autorización escrita y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproducción total o parcial sin autorización del Jefe del Laboratorio

JAVIER ANDRES AGREDA GOMEZ
DIRECTOR / REVISO

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-1C CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL DEL AREA URBANA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF N°:	RE32681-26
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA N°:	
LOCALIZACIÓN:	TRAMO CALDERA (CALLE 17 ENTRE CARRERA 14 Y 12)	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	28 de enero de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra si/no	Observaciones
1	OJY 981	7,31		155 °C		146 °C	SI	
2	OJY 980	7,36		152 °C		144 °C	NO	
3	OZD 450	9,54		150 °C		144 °C	NO	
4	OZD 404	5,47		153 °C		146 °C	SI	
5	OJY 981	7,31		151 °C		142 °C	NO	
6	OJY 980	7,36		150 °C		143 °C	NO	
7	OZD 450	9,54		153 °C		146 °C	SI	
8	OZD 404	5,47		151 °C		145 °C	NO	
9	PRZ 771	9		150 °C		144 °C	NO	NO LLEGO CON SU CAPACIDAD COMPLETA
TOTAL MEZCLA MDC 19		68,36						

Los resultados mostrados en este informe hacen referencia únicamente a la muestra entregada. Estos ensayos se efectuaron según la norma solicitada vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproducción total o parcial por autorización del Jefe de Laboratorio.

Javier Agreda

JAVIER ANDRES AGREDA GOMEZ
EJECUTO / REVISO

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL 40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOVIAL DEL AREA URBANADEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF N°:	
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA N°:	
LOCALIZACIÓN:	TRAMO LENIN (CRA 19A Y DIAGONAL 11E ENTRE CRAS 15 Y 16)	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFALTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	18 de febrero de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra sitio	Observaciones
1	SME 168	12,9	3:16 p. m.	150 °C	3:34 p. m.	140 °C	SI	
2	SME 167	13,78	3:54 p. m.	152 °C	4:02 p. m.	140 °C	NO	
3	OZD 448	9,5	4:02 p. m.	155 °C	4:24 p. m.	140 °C	SI	LA PLANTA SACO MUESTRA
4	OZD 449	9,58	4:24 p. m.	149 °C	4:48 p. m.	138 °C	NO	
5	OZD 450	9,54	4:48 p. m.	150 °C	5:09 p. m.	145 °C	SI	
6	OJY 980	7,38	5:09 p. m.	160 °C	5:28 p. m.	155 °C	NO	
7	OJY 981	7,31	5:28 p. m.	152 °C	5:42 p. m.	140 °C	SI	
8	OZD 404	5,47	5:42 p. m.	158 °C	6:19 p. m.	145 °C	NO	
9	SME 168	12,9	6:19 p. m.	163 °C	6:39 p. m.	158 °C	SI	
TOTAL MEZCLA MDC-19		88,34						

Los resultados mostrados en este informe, serán relativos únicamente a la muestra ensayada. Este informe se efectuará según la norma establecida vigente y sin el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohíbe la reproducción total o parcial sin autorización del jefe del Laboratorio

Javier Agreda

JAVIER ANDRES AGREDA GOMEZ

EJECUTO Y REVISO

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL DEL AREA URBANA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF Nº:	
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA Nº:	
LOCALIZACIÓN:	TRAMO LEVEL (CRA 18A Y DIAGONAL 17E ENTRE CRAS 15 Y 16)	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFALTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	17 de febrero de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra sitio	Observaciones
1	SME 188	12,9	3:30 p.m.	160 °C	4:21 p.m.	156 °C	SI	
TOTAL MEZCLA MDC-19		12,9						

Los resultados mostrados en este informe hacen referencia únicamente a la muestra ensayada. Estos ensayos se efectuaron según la norma establecida vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproducción total o parcial sin autorización del Jefe del Laboratorio.

Javier Agreda

JAVIER ANDRES AGREDA GOMEZ
CIRCUITO PREVISO

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOVIAL DEL AREA URBANADEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF N°:	
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA N°:	
LOCALIZACIÓN:	TRAMO LENIN (CRA 16A Y DIAGONAL 11E ENTRE CRAS 15 Y 16)	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFALTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	20 de febrero de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra sino	Observaciones
1	OZD 448	9,5	8:29 a. m.	160 °C	8:36 a. m.	150 °C	SI	TOMA DE MUESTRA PRODUCCION DE LA MAÑANA
2	OZD 404	5,47	8:36 a. m.	160 °C	8:51 a. m.	150 °C	NO	
3	OIY 980	7,36	8:51 a. m.	160 °C	9:13 a. m.	150 °C	NO	
4	OZD 450	9,54	9:13 a. m.	162 °C	9:45 a. m.	155 °C	NO	
5	SME 167	13,78	9:45 a. m.	158 °C	10:03 a. m.	150 °C	NO	
6	SME 168	8	10:03 a. m.	153 °C	1:16 p. m.	135 °C	NO	NO LLEGO CON TODA SU CAPACIDAD, SOLO 2/3
7	OZD 448	9,5	1:16 p. m.	160 °C	1:29 p. m.	145 °C	NO	
8	OZD 404	5,47	1:29 p. m.	158 °C	1:44 p. m.	135 °C	NO	
9	OIY 980	7,36	1:44 p. m.	155 °C	2:01 p. m.	121 °C	NO	
10	OZD 450	9,54	2:01 p. m.	160 °C	2:18 p. m.	135 °C	NO	
11	OIY 981	7,31	2:18 p. m.	154 °C	2:36 p. m.	134 °C	SI	TOMA DE MUESTRA PRODUCCION DE LA TARDE
12	ISJ 824	8,82	2:36 p. m.	151 °C	3:33 p. m.	130 °C	NO	PENDIENTE POR CUBICAR
13	SME 167	13,78	3:33 p. m.	153 °C	3:46 p. m.	140 °C	NO	
14	SME 168	12,9	3:46 p. m.	150 °C	3:56 p. m.	142 °C	NO	
15	OZD 404	5,47	3:56 p. m.	155 °C	4:04 p. m.	146 °C	NO	
16	OIY 980	7,36	4:04 p. m.	150 °C	4:41 p. m.	150 °C	NO	NO SE EMPLEO TODO EL VOLUMEN, SE LLEVO AL TRAMO "CALLE 17 ENTRE CARRERA 14 Y 15"
17	OZD 448	9,5	4:41 p. m.	155 °C	5:14 p. m.	150 °C	NO	SE LLEVO AL TRAMO"CALLE 14 ENTRE CARRERA 16 Y 19"
18	OZD 450	9,54	5:14 p. m.	150 °C	5:30 p. m.	150 °C	NO	SE LLEVO AL TRAMO "CALLE 17 ENTRE CARRERA 14 Y 15", EL SOBRANTE SE LLEVO PARA TRAMO "CALLE 14
19	OIY 981	7,31	5:30 p. m.	154 °C	5:54 p. m.	180 °C	SI	SE LLEVO AL TRAMO"CALLE 14 ENTRE CARRERA 16 Y 19", LLEGO CON SATURACION DE ASFALTO
TOTAL MEZCLA MDC-19		166,61						

Los resultados reportados en este informe hacen referencia únicamente a la muestra enviada. Este informe no se efectuará en seguir a menos establecida vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohíbe la reproducción total o parcial sin autorización del Jefe de Laboratorio.

Javier Agreda

JAVIER ANDRES AGREDA GOMEZ
EJECUTO / REVISO

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL DEL AREA URBANA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF N°:	
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA N°:	
LOCALIZACION:	SECTOR MALVINAS	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFALTICA MDC-19	FECHA PRODUCCION MEZCLA:	24 de febrero de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra si/no	Observaciones
1	OZD 448	9,5	2:58 p. m.	150 °C	3:14 p. m.	170 °C	SI	
2	OIY 980	7,36	3:14 p. m.	160 °C	3:36 p. m.	150 °C	NO	
3	OZD 448	9,58	3:36 p. m.	150 °C	3:52 p. m.	148 °C	SI	
4	OZD 450	9,54	3:52 p. m.	150 °C	4:12 p. m.	142 °C	NO	
TOTAL MEZCLA MDC-19		35,98						

Los resultados mostrados en esta oficina, hacen referencia únicamente a la muestra suministrada. Este ensayo se efectuará según la norma establecida vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproducción total o parcial sin autorización del Jefe de Laboratorio

Javier Agreda

JAVIER ANDRES AGREDA GOMEZ

EJECUTO / REVISO

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSIÓN ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-4C CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL DEL AREA URBANA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF N°:	
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA N°:	
LOCALIZACION:	SECTOR MALVINAS	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFALTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	26 de febrero de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra sirvo	Observaciones
1	OJY 980	7,38	3:25 p. m.	168 ºC	3:45 p. m.	165 ºC	SI	
2	OZD 448	9,5	3:45 p. m.	145 ºC	9:55 p. m.	145 ºC	NO	
3	OZD 404	5,47	3:55 p. m.	120 ºC	4:16 p. m.	120 ºC	SI	
4	OZD 449	9,58	4:16 p. m.	160 ºC	4:31 p. m.	160 ºC	NO	
5	OZD 450	9,54	4:31 p. m.	130 ºC	5:02 p. m.	130 ºC	SI	
6	SME 167	13,78	5:02 p. m.	120 ºC	5:29 p. m.	130 ºC	NO	
7	SME 168	12,9	5:29 p. m.	160 ºC	5:41 p. m.	160 ºC	SI	
8	OJY 980	5	5:41 p. m.	143 ºC	6:00 p. m.	143 ºC	NO	SOLO LLEGARON 5 M3
TOTAL MEZCLA MDC-19		75,15						

Los resultados reportados en este informe hacen referencia únicamente a la muestra entregada. Este informe se elaboró en seguir la norma establecida vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproducción total o parcial sin autorización del Jefe de Laboratorio

Javier Agreda

JAVIER ANDRES AGREDA GOMEZ

EJECUTO / REVISO

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL DEL AREA URBANA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF N°:	
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA N°:	
LOCALIZACIÓN:	SECTOR MALVINAS	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFALTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	27 de febrero de 2025

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra si/no	Observaciones
1	SME 168	12,9	8:58 a. m.	160 °C	9:24 a. m.	140 °C	SI	
2	OZD 448	9,5	9:24 a. m.	159 °C	9:38 a. m.	150 °C	NO	
3	OJY 980	7,36	9:36 a. m.	150 °C	9:56 a. m.	145 °C	SI	
4	OZD 449	9,58	9:56 a. m.	153 °C	10:14 a. m.	150 °C	NO	
5	OZD 450	9,54	10:14 a. m.	155 °C	10:25 a. m.	155 °C	SI	
6	OZD 404	5,47	10:25 a. m.	148 °C	10:55 a. m.	150 °C	NO	
7	SME 167	13,78	10:55 a. m.	140 °C	11:17 a. m.	148 °C	SI	
8	OZD 448	9,5	11:17 a. m.	140150 °C	11:42 a. m.	140 °C	NO	
9	SME 168	12,9	11:42 a. m.	153 °C	11:56 a. m.	140 °C	SI	
10	OJY 980	7,36	11:56 a. m.	153 °C	12:19 p. m.	150 °C	NO	
11	OZD 449	9,58	12:19 p. m.	155 °C	12:55 p. m.	140 °C	SI	
12	OZD 450	9,54	12:55 p. m.	150 °C	12:52 p. m.	140 °C	NO	
13	OZD 404	5,47	12:53 p. m.	150 °C	2:40 p. m.	140 °C	SI	
14	SME 167	13,78	2:40 p. m.	148 °C	3:02 p. m.	140 °C	NO	
15	OJY 980	7,36	3:02 p. m.	150 °C	3:12 p. m.	145 °C	SI	
16	OZD 448	9,5	3:12 p. m.	145 °C	3:35 p. m.	140 °C	NO	
17	OZD 449	9,58	3:35 p. m.	150 °C	3:54 p. m.	140 °C	SI	
18	OZD 450	9,54	3:54 p. m.	150 °C	4:16 p. m.	140 °C	NO	
TOTAL MEZCLA MDC-19		172,24						

Los resultados mostrados en este informe, hacen referencia únicamente a la muestra entregada. Este ensayo se efectuó según la norma establecida vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproducción total o parcial sin autorización del Jefe de Laboratorio

Javier Agreda

JAVIER ANDRES AGREDA GOMEZ

EJECUTO / REVISO

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSIÓN ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL DEL AREA URBANA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF Nº:	
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA Nº:	
LOCALIZACIÓN:	SECTOR SALVIANO	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFALTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	28 de febrero de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra si/no	Observaciones
1	OIB 448	9,5	9:16 a. m.	160 ºC	9:30 a. m.	160 ºC	SI	
2	OIY 930						SI	NO LLEGO CON SU CAPACIDAD VOLUMETRICA TOTAL SE RECHAZA - NO CUMPLE CON EL % DE ASFALTO
TOTAL MEZCLA MDC-19		9,5						

Los resultados mostrados en este informe hacen referencia únicamente a la muestra analizada. Este informe no deberá ser reproducido salvo la forma establecida dentro del Plan de Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproducción total o parcial sin autorización del Jefe de Laboratorio.

JAVIER ANDRES AGREDA GOMEZ
EJECUTO Y REVISO

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL DEL AREA URBANA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	**REF N°:**	
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	**MUESTRA N°:**	
LOCALIZACION:	SECTOR MALVINAS	**PROFUNDIDAD (m):**	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFALTICA MDC-19	**FECHA PRODUCCION MEZCLA:**	2 de mayo de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen (m3)	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra si/no	Observaciones
1	OZD 448	9,5	4:40 p. m.	170 °C	5:02 p. m.	160 °C	SI	Temperatura de extendido 140 °C
2	OZD 449	9,58	5:01 p. m.	160 °C	5:19 p. m.	150 °C	NO	Temperatura de extendido 140 °C
3	OIY 980	7,36	5:19 p. m.	170 °C	5:35 p. m.	150 °C	SI	Temperatura de extendido 140 °C
4	OZD 450	4	5:35 p. m.	155 °C	5:55 p. m.	155 °C	NO	NO LLEGO CON SU CAPACIDAD VOLUMETRICA COMPLETA
TOTAL MEZCLA MDC-19		**30,44**						

Los resultados mostrados en este informe hacen referencia únicamente a la muestra ensayada. Este ensayo se efectuaron según la norma establecida vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproducción total o parcial sin autorización del jefe de Laboratorio.

Javier Agreda

JAVIER ANDRES AGREDA GOMEZ
EJECUTO Y REVISO

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL DEL AREA URBANA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF Nº:	
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA Nº:	
LOCALIZACIÓN:	SECTOR MALVINAS	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFALTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	13 de marzo de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra xlms	Observaciones
1	OZD 449	9,58	4:22 p. m.	170 °C	4:38 p. m.	155 °C	NO	Temperatura de extendido 140 °C
2	OZD 450	9,54	4:38 p. m.	173 °C	5:03 p. m.	155 °C	NO	Temperatura de extendido 140 °C
3	OZD 448	9,5	5:03 p. m.	175 °C	5:19 p. m.	155 °C	SI	Temperatura de extendido 140 °C
4	OJY 980	7,36	5:19 p. m.	170 °C	5:25 p. m.	150 °C	SI	Temperatura de extendido 140 °C
5	SME 168	3	5:25 p. m.	167 °C	5:56 p. m.	150 °C	NO	SOLO LLEGO CON 3 M3 DE MATERIAL
TOTAL MEZCLA MDC-19		38,98						

Los resultados mostrados en este informe hacen referencia unicamente a la muestra enviada. Este informe se elaborara segun la norma establecida vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproduccion total o parcial sin autorizacion del jefe de Laboratorio.

Javier Agreda

JAVIER ANDRES AGREDA GOMEZ

EJECUTO / REVISO

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL DEL AREA URBANA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027.	REF Nº:	
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA Nº:	
LOCALIZACIÓN:	SECTOR MALVINAS	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFALTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	14 de marzo de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra sirve	Observaciones
1	OJY 980	7,36	12:07 p. m.	155 °C	12:18 p. m.	160 °C	SI	No llego carpada. Temperatura de extendido 140 °C
2	OJY 981	7,31	12:18 p. m.	175 °C	12:46 p. m.	150 °C	NO	No llego carpada. Temperatura de extendido 140 °C
3	OZD 449	9,58	12:46 p. m.	165 °C	1:08 p. m.	150 °C	SI	No llego carpada. Temperatura de extendido 140 °C
4	OZD 450	9,54	1:08 p. m.	160 °C	1:34 p. m.	160 °C	NO	No llego carpada. Temperatura de extendido 140 °C
5	SME 166	12,9	1:34 p. m.	165 °C	1:53 p. m.	140 °C	SI	No llego carpada. Temperatura de extendido 140 °C
6	OJY 980	7,36	1:53 p. m.	162 °C	2:10 a. m.	150 °C	NO	No llego carpada. Temperatura de extendido 140 °C
7	OJY 981	7,31	2:10 a. m.	160 °C	2:52 p. m.	160 °C	SI	No llego carpada. Temperatura de extendido 140 °C
8	SRS 044	13,78	2:52 p. m.	160 °C	3:23 p. m.	150 °C	NO	No llego carpada. Temperatura de extendido 140 °C
TOTAL MEZCLA MDC-19		73,15						

Los resultados mostrados en este informe, hacen referencia únicamente a la muestra ensayada. Estos ensayos se efectuaron según la norma establecida vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproducción total o parcial sin autorización del Jefe de Laboratorio.

Javier Agreda

JAVIER ANDRES AGREDA GOMEZ
EJECUTO / REVISO

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL DEL AREA URBANA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF N°:	
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA N°:	
LOCALIZACIÓN:	SECTOR MALVINAS	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFALTICA MDC-19	FECHA PRODUCCION MEZCLA:	19 de marzo de 2025

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra sitio	Observaciones
1	OZD 448	9.5	6:01 p. m.	150 °C	7:00 p. m.	150 °C	SI	No llego carpada. Temperatura de extendido 140 °C
2	OZD 450	9.54	6:45 p. m.	150 °C	6:35 p. m.	145 °C	NO	No llego carpada. Temperatura de extendido 140 °C
TOTAL MEZCLA MDC-19		19.04						

Los resultados mostrados en este informe hacen referencia únicamente a la muestra ensayada. Estos ensayos se efectuaron según la norma establecida vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproducción total o parcial sin autorización del Jefe de Laboratorio.

Javier Agreda

JAVIER ANDRES AGREDA GOMEZ

EJECUTO / REVISO

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOVIAL DEL AREA URBANADEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF Nº:	
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA Nº:	
LOCALIZACIÓN:	SECTOR MALVINAS - CALLE OSCURA	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFALTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	20 de marzo de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra sino	Observaciones
1	OZD 448	9,5	10:30 a. m.	165 ºC	10:53 a. m.	145 ºC	SI	Temperatura de extendido 140 °C
2	OZD 449	9,58	10:23 a. m.	155 ºC	11:00 a. m.	135 ºC	NO	Temperatura de extendido 140 °C
3	OZD 450	9,54	10:52 a. m.	153 ºC	11:11 a. m.	157 ºC	SI	Temperatura de extendido 140 °C
4	OIY 980	7,36	11:11 a. m.	166 ºC	11:23 a. m.	145 ºC	NO	Temperatura de extendido 140 °C
5	OIY 981	7,31	11:23 a. m.	150 ºC	11:44 a. m.	147 ºC	SI	Temperatura de extendido 140 °C
6	DIW 844	13,97	11:44 a. m.	150 ºC	12:04 p. m.	150 ºC	NO	Temperatura de extendido 140 °C
7	SME 168	12,9	12:04 p. m.	161 ºC	12:48 p. m.	150 ºC	SI	Temperatura de extendido 140 °C
8	OZD 448	9,5	12:48 p. m.	150 ºC	2:54 p. m.	145 ºC	NO	Temperatura de extendido 140 °C
9	OZD 450	9,54	2:54 p. m.	155 ºC	3:15 p. m.	140 ºC	SI	Temperatura de extendido 140 °C
10	OZD 449	9,58	3:15 p. m.	150 ºC	3:41 p. m.	150 ºC	NO	Temperatura de extendido 140 °C
11	OIY 980	7,36	3:41 p. m.	150 ºC	3:54 p. m.	145 ºC	SI	Se enviaron al tramo de Calle Oscura. Temperatura de extendido 140 °C
12	OIY 981	7,31	3:54 p. m.	140 ºC	4:14 p. m.	140 ºC	NO	Se enviaron al tramo de Calle Oscura. Temperatura de extendido 140 °C
13	DIW 844	13,97	4:14 p. m.	150 ºC	4:35 p. m.	145 ºC	SI	Se enviaron al tramo de Calle Oscura. Temperatura de extendido 140 °C
14	SME 168	12,9	4:35 p. m.	155 ºC	6:08 p. m.	150 ºC	NO	Se enviaron al tramo de Calle Oscura. Temperatura de extendido 140 °C
15	OZD 448	9,5	6:08 p. m.	167 ºC	6:34 p. m.	160 ºC	SI	Se enviaron al tramo de Calle Oscura. Temperatura de extendido 140 °C
16	WHW 845	14,58	6:34 p. m.	160 ºC	7:04 p. m.	150 ºC	NO	Se enviaron al tramo de Calle Oscura. Temperatura de extendido 140 °C
17	SRS 044	13,79	7:04 p. m.	153 ºC	7:33 p. m.	140 ºC	SI	Se enviaron al tramo de Calle Oscura. Temperatura de extendido 140 °C
18	OZD 450	9,54	7:33 p. m.	150 ºC	7:50 p. m.	140 ºC	NO	Se enviaron al tramo de Calle Oscura. Temperatura de extendido 140 °C
TOTAL MEZCLA MDC-19		187,78						

Los resultados mostrados en este informe hacen referencia únicamente a la muestra enviada. Este informe se entregará según se nos ha solicitado vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohíbe la reproducción total o parcial sin autorización del Jefe de Laboratorio.

Javier Agreda

JAVIER ANDRES AGREDA GOMEZ
EJECUTO PREVIO

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSIÓN ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOVIAL DEL AREA URBANADEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF N°:	R6G2501-26
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA N°:	
LOCALIZACIÓN:	TRAMO 2 CRISTALINA - TRAMO 2 Y 3 GOLD GYM	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	28 de marzo de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra s/no	Observaciones
1	SRS 044	13,79	1:07 p. m.	145 °C	1:48 p. m.	140 °C	SI	Temperatura de extendido 140 °C
2	WHW 943	14,58	1:08 p. m.	147 °C	1:48 p. m.	140 °C	NO	Temperatura de extendido 140 °C
3	OIY 980	7,36	1:48 p. m.	150 °C	2:04 p. m.	140 °C	NO	Temperatura de extendido 140 °C
4	OZD 449	9,58	2:04 p. m.	145 °C	2:25 p. m.	150 °C	SI	Temperatura de extendido 140 °C
5	OZD 450	9,54	2:25 p. m.	147 °C	3:02 p. m.	145 °C	NO	Temperatura de extendido 140 °C
6	OZD 448	9,5	3:02 p. m.	145 °C	3:26 p. m.	135 °C	NO	Temperatura de extendido 140 °C
7	OIW 844	13,97	3:26 p. m.	145 °C	4:04 p. m.	140 °C	SI	Temperatura de extendido 140 °C
8	SWE 167	13,78	4:04 p. m.	145 °C	4:21 p. m.	140 °C	NO	Temperatura de extendido 140 °C
9	WHW 943	14,58	4:21 p. m.	145 °C	4:51 p. m.	140 °C	NO	Temperatura de extendido 140 °C
10	SRS 044	13,79	4:51 p. m.	150 °C	5:11 p. m.	145 °C	SI	Temperatura de extendido 140 °C
11	OIY 980	7,36	5:11 p. m.	150 °C	5:34 p. m.	150 °C	NO	Temperatura de extendido 140 °C
12	OZD 449	9,58	5:34 p. m.	150 °C	5:54 p. m.	145 °C	NO	Temperatura de extendido 140 °C
13	OZD 450	9,54	5:54 p. m.	150 °C	6:11 p. m.	150 °C	SI	Temperatura de extendido 140 °C
14	OZD 448	9,5	6:11 p. m.	150 °C	6:43 p. m.	150 °C	NO	Temperatura de extendido 140 °C
15	OIW 844	13,97	6:43 p. m.	150 °C	7:00 p. m.	150 °C	NO	Temperatura de extendido 140 °C
TOTAL MEZCLA MDC-19		170,42						

Los resultados mostrados en este informe, hacen referencia unicamente a la muestra ensayada. Estos ensayos se efectuaron segun la norma establecida vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproducción total o parcial sin autorización del Jefe de Laboratorio.

Javier Agreda

EJECUTO / REVISO

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSIÓN ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOVIAL DEL AREA URBANADEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF N°:	REG2501-28
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA N°:	
LOCALIZACIÓN:	TRAMO CALLE OSCURA	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFALTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	30 de marzo de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra si/no	Observaciones
1	OIY 980	7,36	11:25 a. m.	156 ºC	11:47 a. m.	150 ºC	SI	Temperatura de extendido 140 °C
2	OZD 450	9,54	11:47 a. m.	160 ºC	12:12 p. m.	150 ºC	NO	Temperatura de extendido 140 °C
3	OZD 448	9,5	12:12 p. m.	160 ºC	12:35 p. m.	150 ºC	NO	Temperatura de extendido 140 °C
4	OZD 449	9,58	12:35 p. m.	155 ºC	1:34 p. m.	145 ºC	SI	Temperatura de extendido 140 °C
5	DIW 844	13,97	1:34 p. m.	150 ºC	1:54 p. m.	150 ºC	NO	Temperatura de extendido 140 °C
6	SME 167	13,78	1:54 p. m.	150 ºC	2:12 p. m.	145 ºC	NO	Mal carpada y no llego enrasada. Temperatura de extendido 140 °C
TOTAL MEZCLA MDC-19		63,73						

Los resultados recolectados en este informe, hacen referencia únicamente a la muestra ensayada. Estos ensayos se efectuaron segun la norma establecida vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproducción total o parcial sin autorización del Jefe de Laboratorio

Javier Agredo

EJECUTO / REVISÓ

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOVIAL DEL AREA URBANADEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF Nº:	RE02501-26
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA Nº:	
LOCALIZACIÓN:	TRAMO CALLE OSCURA	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	31 de marzo de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra sitio	Observaciones
1	OZD 450	9,54	4:40 p. m.	160 ºC	4:58 p. m.	150 ºC	SI	Temperatura de extendido 140 °C
2	OZD 449	9,58	5:07 p. m.	150 ºC	5:07 p. m.	150 ºC	NO	Temperatura de extendido 140 °C
TOTAL MEZCLA MDC-19		19,12						

Los resultados mostrados en este informe, hacen referencia unicamente a la muestra ensayada. Estos ensayos se efectuaron segun la norma establecida vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproducción total o parcial sin autorización del Jefe de Laboratorio.

Javier Acosta

EJECUTO / REVISO

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOVIAL DEL AREA URBANADEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF N°:	RE02501-26
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA N°:	
LOCALIZACIÓN:	TRAMO LA VEGA - IZQUIERDA	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFALTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	11 de abril de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra si/no	Observaciones
1	OIY 980	7,36	8:40 a. m.	160 ºC	9:10 a. m.	155 ºC	SI	Temperatura de extendido 140 °C
TOTAL MEZCLA MDC-19		7,36						

Los resultados mostrados en este informe, hacen referencia únicamente a la muestra ensayada. Este ensayo se efectuarón según la norma establecida vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproducción total o parcial sin autorización del Jefe de Laboratorio.

Javier Agreda

EJECUTO / REVISÓ

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOVIAL DEL AREA URBANADEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF Nº:	REG2501-26
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA Nº:	
LOCALIZACIÓN:	TRAMO LA VEGA - IZQUIERDA	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFALTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	28 de abril de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra sitio	Observaciones
1	OZD 404	5,47	6:59 a. m.	140 ºC	7:29 a. m.	136 ºC	SI	Temperatura de extendido 130 °C
2	OIY 981	7,31	10:22 a. m.	160 ºC	10:44 a. m.	160 ºC	NO	Temperatura de extendido 140 °C
3	OZD 450	7,44	11:27 a. m.	155 ºC	11:53 a. m.	150 ºC	NO	No salio con toda su capacidad volumetrica, (2,1 m3 menos). Temperatura de extendido 140 °C
TOTAL MEZCLA MDC-19		20,22						

Los resultados mostrados en este informe, tienen referencia unicamente a la muestra ensayada. Estos ensayos se efectuaron segun la norma establecida vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproducción total o parcial sin autorización del Jefe de Laboratorio.

Javier Agreda

EJECUTO / REVISO

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL 40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOVIAL DEL AREA URBANADEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF N°:	REG2501-26
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA N°:	
LOCALIZACIÓN:	TRAMO LA VEGA - IZQUIERDA Y TRAMO MIGANNI	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFALTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	29 de abril de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra si/no	Observaciones
1	OJY 981	7,31	9:49 a. m.	160 °C	10:14 a. m.	160 °C	SI	Temperatura de extendido 140 °C
2	OZD 448	9,5	10:16 a. m.	150 °C	10:39 a. m.	150 °C	NO	Temperatura de extendido 140 °C
3	OJY 980	7,36	10:29 a. m.	145 °C	10:50 a. m.	150 °C	SI	Temperatura de extendido 140 °C
4	OZD 404	5,47	10:44 a. m.	160 °C	11:10 a. m.	150 °C	NO	Temperatura de extendido 140 °C
5	DIW 844	13,97	11:15 a. m.	145 °C	11:40 a. m.	140 °C	SI	Temperatura de extendido 135 °C
TOTAL MEZCLA MDC-19		43,61						

Los resultados mostrados en este informe, hacen referencia únicamente a la muestra ensayada. Estos ensayos se efectuaron segun la norma establecida vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproducción total o parcial sin autorización del Jefe de Laboratorio.

Javier Acevedo

EJECUTO / REVISO

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOVIAL DEL AREA URBANADEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF Nº:	REG2501.28
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA Nº:	
LOCALIZACIÓN:	TRAMO AV. GAITAN " CRA 16D ENTRE CALLE 14 - CEMENTERIO"	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFALTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	10 de junio de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra sitio	Observaciones
1	OZD 448	9,5	4:10 p. m.	155 °C	4:40 p. m.	155 °C	SI	Temperatura de extendido 140 °C
2	OIY 981	7,31	4:50 p. m.	165 °C	5:14 p. m.	160 °C	NO	Temperatura de extendido 150 °C
3	OJY 980	7,36	5:20 p. m.	175 °C	5:51 p. m.	170 °C	NO	Temperatura de extendido 155 °C
4	DIW 844	6,5	6:35 p. m.	160 °C	7:05 p. m.	160 °C	SI	La planta sufrio un daño, razon por la cual la volqueta no salio con toda su capacidad de carga. Temperatura de extendido 150 °C
TOTAL MEZCLA MDC-19		30,67						

Los resultados mostrados en este informe, hacen referencia unicamente a la muestra ensayada. Estos ensayos se efectuaron segun la norma establecida vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproduccion total o parcial sin autorizacion del Jefe de Laboratorio.

Jamer Agreda

EJECUTO / REVISÓ

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOVIAL DEL AREA URBANADEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF N°:	REG2501-28
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA N°:	
LOCALIZACIÓN:	TRAMO AV. GAITAN " CRA 16D ENTRE CALLE 14 - CEMENTERIO"	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFALTICA (MDC-19)	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	12 de junio de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra si/no	Observaciones
1	WHW 943	14,58	1:20 p. m.	175 °C	1:55 p. m.	170 °C	SI	Temperatura de extendido 150 °C
2	OZD 450	9,54	2:15 p. m.	165 °C	2:50 p. m.	160 °C	NO	Temperatura de extendido 140 °C
3	OZD 449	9,58	3:00 p. m.	165 °C	3:24 p. m.	160 °C	SI	Temperatura de extendido 140 °C
4	OZD 448	9,5	3:50 p. m.	165 °C	4:10 p. m.	160 °C	NO	Temperatura de extendido 150 °C
5	OZD 450	9,54	4:40 p. m.	160 °C	5:25 p. m.	150 °C	SI	Temperatura de extendido 150 °C
6	SME 167	13,78	5:51 p. m.	150 °C	6:30 p. m.	150 °C	NO	Temperatura de extendido 140 °C
TOTAL MEZCLA MDC-19		66,52						

Los resultados reportados en este informe, tienen referencia únicamente a la muestra ensayada. Estos ensayos se efectuaron según la norma establecida vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproducción total o parcial sin autorización del Jefe de Laboratorio.

Javier Agreda

EJECUTO / REVISO

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOVIAL DEL AREA URBANADEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF N°:	REG2561-26
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA N°:	
LOCALIZACIÓN:	TRAMO AV. GAITAN " CRA 160 ENTRE CALLE 14 - CEMENTERIO"	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	15 de junio de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra si/no	Observaciones
1	OZD 450	9,54	11:25 a. m.	160 °C	11:50 a. m.	160 °C	SI	Temperatura de extendido 140 °C
2	OZD 448	4,5	12:22 p. m.	155 °C	1:00 p. m.	150 °C	NO	La planta sufrio un daño, razon por la cual la volqueta no salio con toda su capacidad de carga. Temperatura de extendido 140 °C
TOTAL MEZCLA MDC-19		14,04						

Los resultados mostrados en este informe hacen referencia unicamente a la muestra ensayada. Estos ensayos se efectuaron segun la norma establecida vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproducción total o parcial sin autorización del Jefe de Laboratorio.

Javier Agreda

EJECUTO / REVISÓ

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOVIAL DEL AREA URBANADEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF N°:	REG0501-26
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA N°:	
LOCALIZACIÓN:	TRAMO AV. GAITAN " CRA 16D ENTRE CALLE 14 - CEMENTERIO"	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFALTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	17 de junio de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra si/no	Observaciones
1	WHW 943	14,58	3:30 p. m.	165 °C	4:10 p. m.	150 °C	SI	Temperatura de extendido 150 °C
2	SRS 044	13,79	4:10 p. m.	170 °C	4:30 p. m.	160 °C	NO	Temperatura de extendido 150 °C
3	OZD 449	9,58	4:55 p. m.	176 °C	5:22 p. m.	170 °C	SI	Temperatura de extendido 145 °C
4	OZD 450	9,54	5:40 p. m.	167 °C	6:05 p. m.	160 °C	NO	Temperatura de extendido 150 °C
5	SME 167	13,78	7:00 p. m.	170 °C	7:30 p. m.	165 °C	SI	Temperatura de extendido 150 °C
6	OZD 404	5,47	7:25 p. m.	175 °C	7:50 p. m.	170 °C	NO	Temperatura de extendido 150 °C
7	OZD 448	9,5	8:16 p. m.	170 °C	8:43 p. m.	160 °C	SI	Temperatura de extendido 145 °C
8	OZD 449	9,58	9:05 p. m.	165 °C	9:30 p. m.	150 °C	NO	Temperatura de extendido 140 °C
TOTAL MEZCLA MDC-19		85,82						

Los resultados mostrados en este informe hacen referencia únicamente a la muestra ensayada. Estos ensayos se efectuaron según la norma establecida vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproducción total o parcial sin autorización del Jefe de Laboratorio.

Javier Agreda

EJECUTO / REVISÓ

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOVIAL DEL AREA URBANADEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF Nº:	RS22501-26
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA Nº:	
LOCALIZACIÓN:	TRAMO AV. GAITAN " CRA 16D ENTRE CALLE 14 - CEMENTERIO"	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	18 de junio de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra si/no	Observaciones
1	OIW 844	13,97	12:25 p. m.	166 ºC	12:49 p. m.	165 ºC	SI	Temperatura de extendido 140 °C
2	SNE 167	13,78	12:30 p. m.	170 ºC	12:55 p. m.	165 ºC	NO	Temperatura de extendido 150 °C
3	OZD 449	9,58	1:21 p. m.	155 ºC	1:43 p. m.	150 ºC	SI	Temperatura de extendido 150 °C
4	OZD 450	9,54	2:05 p. m.	170 ºC	5:16 p. m.	170 ºC	NO	Temperatura de extendido 150 °C
5	OZD 448	3,7	5:20 p. m.	175 ºC	5:52 p. m.	130 ºC	SI	Temperatura de extendido 120 °C
TOTAL MEZCLA MDC-19		50,17						

Los resultados mostrados en este informe, hacen referencia únicamente a la muestra ensayada. Estos ensayos se efectuaron según la norma establecida vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohíbe la reproducción total o parcial sin autorización del Jefe de Laboratorio.

Javier Agredo

EJECUTO / REVISÓ

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOVIAL DEL AREA URBANADEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF N°:	REG0641-26
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA N°:	
LOCALIZACIÓN:	TRAMO AV. GAITAN " CRA 16D ENTRE CALLE 14 - CEMENTERIO"	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFALTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	19 de junio de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volquetta	Temperatura de llegada °C	Muestra s/no	Observaciones
1	OIW 844	13,97	4:30 p. m.	170 °C	5:44 p. m.	170 °C	SI	Temperatura de extendido 150 °C
2	SME 167	13,78	4:30 p. m.	170 °C	5:50 p. m.	170 °C	NO	Temperatura de extendido 150 °C
3	OZD 450	9,54	5:20 p. m.	160 °C	5:44 p. m.	160 °C	SI	Temperatura de extendido 145 °C
4	OZD 449	9,58	6:00 p. m.	167 °C	6:20 p. m.	165 °C	NO	Temperatura de extendido 150 °C
5	OZD 404	5,47	6:23 p. m.	160 °C	6:55 p. m.	160 °C	SI	Temperatura de extendido 150 °C
6	OZD 448	9,5	7:10 p. m.	170 °C	7:40 p. m.	165 °C	NO	Temperatura de extendido 150 °C
7	OJY 961	7,31	7:15 p. m.	170 °C	7:30 p. m.	168 °C	SI	Temperatura de extendido 150 °C
8	OIW 844	13,97	8:52 p. m.	160 °C	9:20 p. m.	160 °C	NO	Temperatura de extendido 150 °C
9	OZD 450	9,54	9:36 p. m.	150 °C	9:58 p. m.	150 °C	SI	Temperatura de extendido 150 °C
10	OZD 404	5,47	10:07 p. m.	165 °C	10:17 p. m.	160 °C	NO	Temperatura de extendido 150 °C
11	SME 167	13,78	11:13 p. m.	157 °C	11:35 p. m.	150 °C	SI	Temperatura de extendido 150 °C
12	OZD 449	9,58	11:56 p. m.	160 °C	12:20 a. m.	155 °C	NO	Temperatura de extendido 150 °C
13	OZD 448	7	12:09 a. m.	175 °C	12:49 a. m.	170 °C	SI	Temperatura de extendido 150 °C
TOTAL MEZCLA MDC-19		128,49						

Los resultados mostrados en este informe, hacen referencia únicamente a la muestra ensayada. Estos ensayos se efectuaron según la norma establecida vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproducción total o parcial del documento sin autorización del Jefe de Laboratorio

Javier Agreda

EJECUTO / REVISÓ

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSIÓN ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOVIAL DEL ÁREA URBANADEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF Nº:	REG3501-26
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA Nº:	
LOCALIZACIÓN:	TRAMO AV. CAITAN " CRA 16D ENTRE CALLE 14 - CEMENTERIO"	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFALTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	20 de junio de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra si/no	Observaciones
1	OZD 448	9,5	12:40 p. m.	170 ºC	1:10 p. m.	165 ºC	SI	Temperatura de extendido 140 °C
2	DIW 844	13,97	1:09 p. m.	163 ºC	1:29 p. m.	160 ºC	NO	Temperatura de extendido 150 °C
3	SME 167	13,78	2:09 p. m.	167 ºC	2:30 p. m.	160 ºC	SI	Temperatura de extendido 150 °C
4	OZD 449	9,58	2:54 p. m.	160 ºC	3:25 p. m.	160 ºC	NO	Temperatura de extendido 150 °C
5	OIY 980	7,36	3:19 p. m.	162 ºC	3:50 p. m.	155 ºC	SI	Temperatura de extendido 120 °C
TOTAL MEZCLA MDC-19		54,19						

Los resultados mostrados en este informe, hacen referencia únicamente a la muestra ensayada. Estos ensayos se efectuaron según la norma establecida vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproducción total o parcial sin autorización del Jefe de Laboratorio.

Javier Agreda

EJECUTO REVISÓ

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOVIAL DEL AREA URBANA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF N°:	RE02501-26
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA N°:	
LOCALIZACIÓN:	TRAMO MIGANNI	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFALTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	25 de junio de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra si/no	Observaciones
1	OZD 404	5,47	11:50 a. m.	155 °C	12:16 p. m.	150 °C	SI	Temperatura de extendido 150 °C
2	OZD 450	9,54	1:23 p. m.	175 °C	1:50 p. m.	1690 °C	NO	Temperatura de extendido 160 °C
3	OZD 449	9,58	3:09 p. m.	165 °C	3:30 p. m.	160 °C	NO	Temperatura de extendido 150 °C
TOTAL MEZCLA MDC-19		24,59						

Los resultados registrados en este informe, hacen referencia únicamente a la muestra ensayada. Estos ensayos se ejecutaron según la norma establecida vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproducción total o parcial sin autorización del Jefe de Laboratorio.

Javier Agreda

EJECUTÓ / REVISÓ

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOVIAL DEL AREA URBANADEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF N°:	REG2501-28
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA N°:	
LOCALIZACION:	TRAMO CABALGATAS - MIGANNI	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFALTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	26 de junio de 2025

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volquota	Temperatura de llegada °C	Muestra s/no	Observaciones
1	DIW 844	13,97	9:20 a. m.	175 °C	10:08 a. m.	165 °C	SI	Temperatura de extendido 150 °C
2	OZD 448	9,5	10:32 a. m.	165 °C	11:03 a. m.	160 °C	NO	Temperatura de extendido 150 °C
3	OZD 404	5,47	11:00 a. m.	165 °C	12:00 p. m.	160 °C	SI	Temperatura de extendido 150 °C
4	OZD 450	9,54	11:52 a. m.	160 °C	12:30 p. m.	160 °C	NO	Temperatura de extendido 150 °C
5	DIW 841	13,97	1:16 p. m.	155 °C	1:35 p. m.	160 °C	SI	Temperatura de extendido 150 °C
6	OZD 449	9,58	2:06 p. m.	160 °C	2:42 p. m.	160 °C	NO	Temperatura de extendido 150 °C
7	OZD 448	4,75	3:10 p. m.	165 °C	3:40 p. m.	160 °C	SI	Temperatura de extendido 150 °C
TOTAL MEZCLA MDC-19		66,78						

Los resultados mostrados en este informe, hacen referencia unicamente a la muestra ensayada. Estos ensayos se efectuaron segun la norma establecida vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproducción total o parcial sin autorización del Jefe de Laboratorio

Javier Agreda

EJECUTO / REVISÓ

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOVIAL DEL AREA URBANADEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF Nº:	RE02501-26
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA Nº:	
LOCALIZACIÓN:	TRAMO MIGANNI - LA VEGA	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFALTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	30 de junio de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra sitio	Observaciones
1	OJY 980	5,6	12:23 p. m.	163 ºC	9:05 p. m.	140 ºC	SI	Se suspende produccion por daño en un rodamiento de la planta. - Se extiende de forma manual el material, ya que no hizo presencia ningun operador por parte del contratista. - Temperatura de extendido 140 °C
TOTAL MEZCLA MDC-19		5,6						

Los resultados mostrados en este informe, hacen referencia unicamente a la muestra ensayada. Estos ensayos se efectuaron segun la norma establecida vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproducción total o parcial sin autorización del Jefe de Laboratorio.

Javier Acreda

EJECUTO / REVISÓ

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSIÓN ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOVIAL DEL AREA URBANADEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF N°:	RE02581-26
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA N°:	
LOCALIZACIÓN:	TRAMO MIGANNI - TRAMO LA VEGA (IZQUIERDA)	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFALTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	1 de julio de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra s/no	Observaciones
1	DIW 844	13,97	1:40 p. m.	167 °C	2:15 p. m.	170 °C	NO	Se extendio en el tramo miganni. Temperatura de extendido 160 °C
2	DJY 981	7,31	2:30 p. m.	160 °C	3:00 p. m.	150 °C	SI	Se extendio en el bocacalle. Temperatura de extendido 145 °C
3	DJY 980	7,36	3:16 p. m.	160 °C	3:45 p. m.	160 °C	NO	Se extendio en el tramo de la vega, costado izquierdo. Temperatura de extendido 150 °C
4	OZD 448	9,5	4:16 p. m.	165 °C	4:30 p. m.	160 °C	SI	Se extendio en el tramo de la vega, costado izquierdo. Temperatura de extendido 150 °C
5	SME 167	13,78	5:40 p. m.	160 °C	7:10 p. m.	150 °C	NO	Se extendio en el tramo de la vega, costado izquierdo. Temperatura de extendido 140 °C
TOTAL MEZCLA MDC-19		51,92						

Los resultados mostrados en este informe, hacen referencia unicamente a la muestra ensayada. Estos ensayos se efectuaron segun la norma establecida vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproduccion total o parcial sin autorizacion del Jefe de Laboratorio.

Javier Agreda

EJECUTO / REVISO

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOVIAL DEL AREA URBANADEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF N°:	REG2501-20
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA N°:	
LOCALIZACIÓN:	TRAMO MIGANNI - TRAMO LA VEGA (IZQUIERDA)	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFALTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	6 de julio de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra sitio	Observaciones
1	DIW 844	13,97	1:14 p. m.	162 °C	1:45 p. m.	160 °C	NO	Se extendio en el tramo de la vega, costado izquierdo. Temperatura de extendido 130 °C
2	SME 167	13,78	2:40 p. m.	155 °C	3:27 p. m.	150 °C	SI	Se extendio en el tramo miganni. Temperatura de extendido 135 °C
3	OIY 980	7,36	3:25 p. m.	152 °C	4:00 p. m.	150 °C	NO	Se extendio en el tramo miganni. Temperatura de extendido 125 °C
4	OZO 404	5,47	4:04 p. m.	155 °C	4:42 p. m.	150 °C	SI	Se extendio en el tramo miganni. Temperatura de extendido 135 °C
TOTAL MEZCLA MDC-19		40,58						

Los resultados reportados en este informe, hacen referencia únicamente a la muestra ensayada. Estos ensayos se efectuaron segun la norma establecida vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproducción total o parcial sin autorización del Jefe de Laboratorio.

Javier Agreda

EJECUTO / REVISO

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSIÓN ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOVIAL DEL AREA URBANADEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF N°:	REG2501-26
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA N°:	
LOCALIZACIÓN:	TRAMO HOME SHAKE (CLL 15 ENTRE CRAS 17 y 18)	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA	14 de julio de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra si/no	Observaciones
1	OZD 404	5,47	11:21 a. m.	168 °C	11:48 a. m.	150 °C	NO	Temperatura de extendido 140 °C
2	OJY 981	7,31	11:54 a. m.	166 °C	12:46 p. m.	140 °C	SI	Temperatura de extendido 140 °C
3	OIW 844	13,97	12:44 p. m.	160 °C	5:00 p. m.	150 °C	NO	Se suspende producción por lluvia. Temperatura de extendido 140 °C
4	SME 167	13,78	4:53 p. m.	175 °C	5:32 p. m.	160 °C	SI	Se reinicia la producción, mejoro las condiciones climaticas. Temperatura de extendido 140 °C
5	OZD 448	9,5	5:30 p. m.	171 °C	6:00 p. m.	160 °C	NO	Temperatura de extendido 140 °C
6	OZD 449	9,58	6:01 p. m.	155 °C	6:24 p. m.	152 °C	SI	Temperatura de extendido 150 °C
7	OZD 450	9,54	6:34 p. m.	156 °C	6:50 p. m.	153 °C	NO	Temperatura de extendido 150 °C
8	OZD 404	5,47	6:54 p. m.	153 °C	7:13 p. m.	154 °C	SI	Temperatura de extendido 150 °C
9	OJY 981	7,31	7:23 p. m.	155 °C	7:54 p. m.	155 °C	NO	Temperatura de extendido 150 °C
10	OIW 844	13,97	8:19 p. m.	161 °C	8:36 p. m.	156 °C	SI	Temperatura de extendido 150 °C
11	SME 167	13,78	9:16 p. m.	170 °C	10:00 p. m.	160 °C	NO	Temperatura de extendido 150 °C
12	OZD 448	7,8	10:14 p. m.	155 °C	10:30 a. m.	150 °C	SI	Temperatura de extendido 150 °C
TOTAL MEZCLA MDC-19		117,48						

Los resultados mostrados en este informe, tienen referencia unicamente a la muestra ensayada. Estos ensayos se efectuaron segun la norma establecida vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproducción total o parcial sin autorización del Jefe de Laboratorio.

Javier Agreda

EJECUTO / REVISÓ

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOVIAL DEL AREA URBANADEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF N°:	RIG2501-26
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA N°:	
LOCALIZACIÓN:	TRAMO CLL 15 ENTRE CRAS 17 y 16 - TRAMO CRA 16D ENTRE CLL 14 - CEMENTERIO	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	15 de julio de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra si/no	Observaciones
1	OJY 981	7,31	4:14 p. m.	168 °C	11:48 a. m.	150 °C	NO	Se extendio en el tramo Calle 15 entre Carreras 17 y 16. Temperatura de extendido 150 °C
2	OJY 980	7,36	4:55 p. m.	166 °C	12:46 p. m.	140 °C	SI	Se extendio en el tramo Calle 15 entre Carreras 17 y 16. Temperatura de extendido 150 °C
3	OZD 449	9,58	8:30 p. m.	160 °C	10:00 p. m.	150 °C	NO	La pavimentadora (finisher) fue trasladada al siguiente tramo de intervención; sin embargo, al intentar reiniciar su operación presentó una falla de encendido, lo que ocasionó un retraso en el inicio de las actividades. Una vez superado el inconveniente, las condiciones de lluvia impidieron la colocación de la mezcla asfáltica. En consecuencia, las volquetas cargadas permanecieron bajo cubierta para conservar la temperatura del material, programándose el inicio de la instalación para el 16 de julio de 2026. La temperatura de extendido registrada fue de 140 °C.
4	OIW 844	13,97	9:30 p. m.	175 °C	10:00 p. m.	155 °C	SI	
5	OZD 448	9,5	10:19 p. m.	171 °C		155 °C	NO	
6	OJY 980	2,5	10:20 p. m.	155 °C				
								La volqueta de placas OJY980 no fue cargada a su capacidad total debido a que la planta de producción agotó la disponibilidad de cemento asfáltico, alcanzando únicamente la producción de aproximadamente 2,5 m³ de mezcla. Como consecuencia, el material no conservó la temperatura mínima requerida para su colocación, por lo que no fue posible instalarlo y se produjo la pérdida de dicho volumen.
TOTAL MEZCLA MDC-19		50,22						

Los resultados mostrados en este informe, hacen referencia unicamente a la muestra ensayada. Estos ensayos se efectuaron según la norma establecida vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproducción total o parcial sin autorización del Jefe de Laboratorio.

Javier Agreda

EJECUTO / REVISO

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOVIAL DEL AREA URBANADEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF N°:	REG2501-39
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA N°:	
LOCALIZACIÓN:	TRAMO CRA 18D ENTRE CLL 14 - CEMENTERIO	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFALTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	17 de julio de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra si/no	Observaciones
1	OZD 449	5,8	3:24 p. m.	175 °C	3:55 p. m.	170 °C	SI	La producción de mezcla asfáltica fue suspendida debido a las condiciones de lluvia presentadas en la planta. En razón al bajo volumen producido, el especialista responsable del tramo determinó no realizar su colocación en el frente de trabajo inicialmente programado. En su lugar, la mezcla fue trasladada al sector de la Glorieta del Terminal, donde fue utilizada en labores de repancheo, optimizando el aprovechamiento del material disponible.
TOTAL MEZCLA MDC-19		5,8						

Los resultados mostrados en este informe, hacen referencia unicamente a la muestra ensayada. Estos ensayos se efectuaron segun la norma establecida vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproduccion total o parcial sin autorizacion del Jefe de Laboratorio.

Javier Agreda

EJECUTO / REVISO

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSIÓN ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOVIAL DEL AREA URBANADEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF N°:	REG2501-39
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA N°:	
LOCALIZACIÓN:	BOCACALLE CEMENTERIO	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	20 de julio de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra si/no	Observaciones
1	OJY 981	7,31	12:41 p. m.	164 °C	1:14 p. m.	160 °C	SI	Temperatura de extendido 150 °C
2	OJY 980	7,36	1:01 p. m.	150 °C	1:24 p. m.	150 °C	NO	Temperatura de extendido 150 °C
3	OZD 450	9,54	1:35 p. m.	165 °C	1:58 p. m.	160 °C	SI	Temperatura de extendido 150 °C
4	OZD 404	5,47	1:50 p. m.	156 °C	2:26 p. m.	160 °C	NO	Temperatura de extendido 150 °C
5	OZD 448	9,5	2:25 p. m.	155 °C	2:50 p. m.	155 °C	SI	Temperatura de extendido 150 °C
6	OZD 449	9,58	2:56 p. m.	153 °C	3:24 p. m.	150 °C	NO	Temperatura de extendido 150 °C
7	OJY 981	7,31	3:18 p. m.	155 °C	3:48 p. m.	155 °C	SI	Temperatura de extendido 150 °C
								La producción de mezcla asfáltica fue suspendida debido al agotamiento del **fuel oil** (combustible de la planta), lo que impidió continuar con el proceso de fabricación hasta restablecer el suministro del combustible necesario para la operación.
TOTAL MEZCLA MDC-19		**56,07**						

Los resultados mostrados en este informe, hacen referencia únicamente a la muestra ensayada. Estos ensayos se efectuaron según la norma establecida vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproducción total o parcial sin autorización del Jefe de Laboratorio.

Javier Agreda

EJECUTO / REVISÓ

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOVIAL DEL AREA URBANADEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF N°:	RE03561-26
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA N°:	
LOCALIZACIÓN:	TRAMO CALLE 11C Y CARRERA 14ª ENTRE CARRERA 15 – CALLE 11H	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	21 de julio de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra si/no	Observaciones
1	OIY 980	7,36	5:55 p. m.	157 °C	6:13 p. m.	160 °C	SI	Temperatura de extendido 140 °C
2	OZD 448	9,5	6:23 p. m.	160 °C	6:53 p. m.	150 °C	NO	Temperatura de extendido 150 °C
3	OZD 450	9,54	7:00 p. m.	170 °C	7:30 p. m.	160 °C	SI	Temperatura de extendido 150 °C
4	OZD 404	5,47	7:10 p. m.	160 °C	7:43 p. m.	160 °C	NO	Temperatura de extendido 140 °C
5	OZD 449	9,58	7:41 p. m.	160 °C	8:00 p. m.	155 °C	SI	Temperatura de extendido 150 °C
6	OIY 981	7,31	8:03 p. m.	160 °C	8:30 p. m.	150 °C	NO	Temperatura de extendido 150 °C
7	OIY 980	2	8:10 p. m.	153 °C	8:40 p. m.	155 °C	SI	Temperatura de extendido 145 °C
TOTAL MEZCLA MDC-19		50,76						

Los resultados mostrados en este informe, tienen referencia unicamente a la muestra ensayada. Este ensayo se efectuaron segun la norma establecida vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproduccion total o parcial sin autorizacion del Jefe de Laboratorio.

Jaimer Agreda Y.

EJECUTO / REVISO

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOVIAL DEL AREA URBANADEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF N°:	REG2501-26
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA N°:	
LOCALIZACIÓN:	Carrera 15 Desde Calle 11c y Diagonal 11a (Bajada al Cementerio)	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	24 de julio de 2026

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra si/no	Observaciones
1	OZD 404	5,47	10:25 a. m.	157 °C	10:25 a. m.	160 °C	SI	Se aplico en el tramo del cementerio. Temperatura de extendido 150 °C
2	OJY 981	7,31	11:10 a. m.	160 °C	11:10 a. m.	150 °C	NO	Se aplico en el tramo del cementerio. Temperatura de extendido 140 °C
3	OZD 450	9,54	11:44 a. m.	170 °C	11:44 a. m.	160 °C	SI	Temperatura de extendido 150 °C
4	OZD 448	9,5	12:20 p. m.	160 °C	12:20 p. m.	160 °C	NO	Temperatura de extendido 150 °C
5	OZD 449	6,65	12:46 p. m.	160 °C	12:46 p. m.	155 °C	SI	Se aplico en el tramo del cementerio. Temperatura de extendido 150 °C
TOTAL MEZCLA MDC-19		38,47						

Los resultados mostrados en este informe, hacen referencia unicamente a la muestra ensayada. Estos ensayos se efectuaron segun la norma establecida vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproduccion total o parcial sin autorizacion del Jefe de Laboratorio.

EJECUTO / REVISÓ

INGSUELOS

CONTROL DE VOLQUETAS DE MEZCLAS ASFALTICA EN PLANTA

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CRL-40 CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOVIAL DEL AREA URBANA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	REF N°:	REG2501-28
SOLICITADO POR:	MUNICIPIO DE FLORENCIA	MUESTRA N°:	
LOCALIZACIÓN:	Carrera 15 entre Calle 11C y Diagonal 11E (Bajada al Cementerio)	PROFUNDIDAD (m):	NO APLICA
DESC. MATERIAL:	MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19	FECHA PRODUCCIÓN MEZCLA:	25 de julio de 2025

Numero de viaje	Placas de volquetas	Volumen m3	Hora de salida	Temperatura de salida °C	Hora de llegada de volqueta	Temperatura de llegada °C	Muestra slino	Observaciones
1	OIY 981	7,31	4:05 p. m.	150 °C	4:41 p. m.	160 °C	SI	Temperatura de extendido 150 °C
2	OIY 980	7,36	4:23 p. m.	170 °C	4:50 p. m.	160 °C	NO	Temperatura de extendido 140 °C
3	OZD 449	9,58	4:51 p. m.	155 °C	5:30 p. m.	165 °C	SI	Temperatura de extendido 150 °C. Sobraron aproximadamente 5 m3 que se aplicaron en el tramo del
4	OZD 448	9,5	5:24 p. m.	160 °C	6:06 p. m.	160 °C	NO	Se aplico en el tramo del cementerio. Temperatura de extendido 150 °C
5	OZD 450	5,9	5:50 p. m.	170 °C	6:15 p. m.	170 °C	SI	Durante la ejecución de las actividades de pevimentación, la finisher presentó una falla mecánica que imposibilitó continuar con la extensión de la mezcla asfáltica programada. En consecuencia, el material producido en esta volqueta, no pudo ser colocado en el frente de trabajo previsto, por lo que los metros cúbicos de mezcla asfáltica serán destinados a labores de repercheo.
TOTAL MEZCLA MDC-19	39,65							

Los resultados mostrados en este informe, hacen referencia únicamente a la muestra ensayada. Estos ensayos se efectuaron segun la norma establecida vigente y bajo el Control de Calidad de INGSUELOS. Se prohibe la reproduccion total o parcial sin autorizacion del Jefe de Laboratorio.

EJECUTO / REVISO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

1. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 141141810071

(415)7707212489984(8020) 000014114181007 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900648551	3	Impuestos y Aduanas de Florencia 28	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: INGSUELOS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Caquetá 18	Florencia 001

41. Dirección principal: CL 11 A 11 A 144 BRR JUAN XXIII

42. Correo electrónico: contabilidad@ingsuelos.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3126432174	6084350588

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7112	2013 08 23	4923	2024 02 05	7210	7120		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 14 42 48 52 55

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficianos Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. OPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2024-11-05 / 04:14:46PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 de 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

964. Nombre: GARCIA DIAZ GERMAN ENRIQUE

965. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141141810071

(415)7707212489984(8020) 000014114181007 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 6 4 8 5 5 1	3	Impuestos y Aduanas de Florencia	2 8	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficios	1

Constitución, Registro y Ultima Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 1 3 0 8 2 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 3 0 8 2 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 0 8 5 3 7 5	
78. Departamento	1 8	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 3 0 8 2 3	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 5 1 2 3 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141141810071

(415)7707212469984(8020) 000014114181007 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 6 4 8 5 5 1	3	Impuestos y Aduanas de Florencia	2 8	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 0 7 3 0		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	9 1 7 8 8 1 7		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GARCIA	DIAZ	GERMAN	ENRIQUE
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141141810071

(415)7707212489984(8020) 000014114181007 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		16. Buzón electrónico
9 0 0 6 4 8 5 5 1	3	Impuestos y Aduanas de Florencia	2 8	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento	

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento	

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 3 8 8 6 4 3 4		2 2 7 2 3 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ACOSTA	MONROY	YISEL	ANDREA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento	
2 0 2 0 0 4 3 0	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ACTA No. 02 DE INICIO

En las instalaciones de la secretaria de Obras Públicas del Municipio de Florencia, se reunieron, por un lado, en representación del Municipio de Florencia:

SUPERVISOR:	EDWIN STIVEN BORRERO LONDOÑO
TIPO Y No. IDENTIFICACIÓN	C.C. 1.010.246.841de Bogotà D.C.
CARGO	Asesor de Infraestructura

Y por el otro:

CONTRATISTA:	INGSUELOS S.A.S
TIPO Y No. IDENTIFICACION	NIT: 900.648.551-3
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GERMAN ENRIQUE GARCIA DIAZ
IDENTIFICACIÓN RL No.	C.C. 9.178.817 de San Jacinto

Con el fin de impartir orden de inicio al siguiente contrato:

TIPO	**CONTRATO DE CONSULTORIA**
No.	**20250013**
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROTURA LENTA CRL-40, CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024–2027.
FECHA DE CELEBRACIÓN	17 de diciembre del 2025
PLAZO:	El plazo de ejecución del objeto del contrato es de DIEZ (10) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución (articulo 23 de la Ley 1150 de 2007) y la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2026.
VALOR:	El valor del presente contrato asciende a la suma de SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS ($718.058.615,00) MCTE. Incluidos IVA, todos los impuestos y descuentos de ley.

Una vez verificado el cumplimiento de los siguientes requisitos para su ejecución:

No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025002913 del 19 de diciembre de 2025
FECHA APROBACIÓN GARANTÍAS:	19/12/2025
PAGO EST. PRO-DESARROLLO:	2025002673 BANCO DE OCCIDENTE VALOR POR $3.017.000 FECHA: 18/12/2025
SEGURIDAD SOCIAL:	Salud: SANITAS - EPS-S EMSSANAR Pensiones: PORVENIR ARL: POSITIVA Aporte Parafiscales: COMFACA

Asi las cosas, se da inicio al Contrato de consultoria número 20250017, el dia veintidós (22) del mes de diciembre del año 2025 y se establece como fecha de terminación el dia 22 de octubre de 2026.

Dada en la ciudad de Florencia, Departamento del Caquetá, a los veintidós (22) del mes de diciembre del año 2025.

Para constancia de lo anterior, firman por quién en ella intervienen.

Nombre: **EDWIN STIVEN BORRERO LONDOÑO**	Nombre: **INGSUELOS S.A.S**
Cargo: Asesor de infraestructura	RL: GERMAN ENRIQUE GARCIA DIAZ
Supervisor	Contratista

Proyectó	Mayra Alejandra Hernández Silva	Cargo	Auxiliar Administrativo	

ACTA No. 5 ACLARATORIA AL ACTA No. 02 DE INICIO

El suscrito supervisor deja constancia que una vez firmada el acta de inicio del Contrato de Consultoría No. 20250013, se presenta una inconsistencia en el número del contrato, por ende, se procede a aclarar la información, ya que en el acta no. 02 de inicio, el numero de contrato figura como el 20250017, mientras que el verdadero número de contrato al cual se le da inicio es el 20250013.

ACTA No. 02 DE INICIO

En las instalaciones de la secretaría de obras públicas, se reunieron, por un lado, en representación del Municipio de Florencia:

SUPERVISOR	DANIEL ANDRÉS AGUDELO TOVAR
TIPO Y No. IDENTIFICACIÓN	C.C. 1.007.761.231 de Ibagué, Tolima
CARGO	Asesor De Infraestructura

Y por el otro:

CONTRATISTA:	INGSUELOS SAS
TIPO Y No. IDENTIFICACION	NIT: 900.648.551-3
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GERMAN ENRIQUE GARCIA DIAZ
IDENTIFICACIÓN RL No.	C.C. 9.176.817 De San Jacinto

RL= Representante Legal; NA= No Aplica.

Con el fin de corregir el acta no. 2 de inicio del contrato:

TIPO	**CONTRATO DE CONSULTORÍA**
No.	**20250013**
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROTURA LENTA CRL40, CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 20242027
FECHA DE CELEBRACIÓN	17 de diciembre de 2025
PLAZO:	El plazo de ejecución del objeto del contrato es de DIEZ (10) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de

	ejecución (artículo 23 de la Ley 1150 de 2007) y la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre del 2026
VALOR:	El valor del presente contrato asciende a la suma de SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS ($718.058.615,00) MCTE. Incluidos IVA, todos los impuestos y descuentos de ley

Una vez verificado el cumplimiento de los siguientes requisitos para su ejecución:

No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025002913 del 19 de diciembre de 2025
FECHA APROBACIÓN GARANTÍAS:	19/12/2025
PAGO EST. PRO-DESARROLLO:	2025002673 BANCO DE OCCIDENTE VALOR POR $3.017.000 FECHA: 18/12/2025
SEGURIDAD SOCIAL:	Salud: SANITAS- EPS-S EMSSANAR Pensiones: PORVENIR ARL: POSITIVA Aporte Parafiscales: COMFACA

Por tal motivo, el texto corregido quedaría de la siguiente manera:

Así las cosas, se da inicio al **CONTRATO DE CONSULTORIA** número 20250013 el día veintidós (22) del mes de diciembre del año 2025 y se establece como fecha de terminación el 22 de octubre de 2026.

Dada en la ciudad de Florencia, Departamento del Caquetá, a los siete (07) días del mes de septiembre del año 2026.

Para constancia de lo anterior, firman por quién en ella intervienen.

Nombre: DANIEL ANDRÉS AGUDELO TOVAR	~~Nombre: INGSUELOS SAS~~
Cargo: Asesor de Infraestructura	RL: GERMAN ENRIQUE GARCIA DIAZ
Supervisor	Contratista

Proyectó	Yenny Paola Sánchez López	Cargo	Contratista	

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Florencia, Caquetá 27 de Julio de 2026

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORENCIA
E. S. M.

Ref. **PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

Asunto: **Contrato de Consultoría No. 20250013, cuyo objeto corresponde a "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 19 Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROTURA LENTA CRL-40, CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024–2027"**

El suscrito contador público, bajo la gravedad de juramento, hace constar que la empresa **ING SUELOS S.A.S.**, identificada con nit No. 900.648.551 – 3 , ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones a los sistemas de salud, arl, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, y en cumplimiento a la ley 1819 de 2016 que exonera a los aportantes del pago de parafiscales (SENA e ICBF) durante los seis meses anteriores a la fecha de la entrega de esta, encontrándose a **PAZ y SALVO** por estos conceptos.

La presente se expide a solicitud del interesado siendo los veintisiete (27) días del mes de Julio del año 2026.

Atentamente,

YISEL ANDREA ACOSTA MONROY
C.C. 1.083.886.434 de Pitalito
T.P. 227.235-T

Calle 1 No. 11-10 Este Barrio Paraiso Celular 3138174274
E-mail: andreacosta43@gmail.com
Pitalito Huila

Powered by CamScanner


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

227235-T

YISEL ANDREA
ACOSTA MONROY
C.C. 1063886434
RES. INSCRIPCION 297 DEL 31/03/2017
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

231488

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

246811


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.083.886.434
ACOSTA MONROY

APELLIDOS

YISEL ANDREA

NOMBRES

YISEL ANDREA ACOSTA

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 13-JUN-1990
PITALITO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

24-JUN-2008 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

A-1906100-02267015-F-1063886434-20101124 00249 7294A 1 3008714

Calle 1 No. 11-10 Este Barrio Paraíso Celular 3138174274 E-mail: andreacostam43@gmail.com
Pitalito Huila

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

1 8 A 2 C B C D B 1 6 A B B E 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico **YISEL ANDREA ACOSTA MONROY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1083886434 de PITALITO (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 227235-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado

Calle 1 No. 11-10 Este Barrio Paraiso Celular 3138174274 E-mail: andreacostam43@gmail.com
Pitalito Huila

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

FD1F9A4D8C2DDC7D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico **YISEL ANDREA ACOSTA MONROY** identificado con CEDULA DE CIUDADANÍA No 1083666434 de PITALITO (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 227235-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Marzo de 2026 con Vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Calle 1 No. 11-10 Este Barrio Paraíso Celular 3138174274 E-mail: andreacostam43@gmail.com
Pitalito Huila

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO.	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUBSEDE	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		CRÉDITO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERESES MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº APORTANTES	REF. DE PAGO (PRE	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	3	[illegible]	4	3	POSITIVA - 14-23	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUNICIPIO	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-06	[illegible]	E	[illegible]	TODOS LOS CENTROS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
IP AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
10.621.192	10.621.192	10.621.192	10.621.192	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				7	1.699.700	0	48.600	0	1.748.300
PORVENIR	230301	800224808	8	5	1.232.700	0	35.200	0	1.267.900
PROTECCION	230201	800229739	0	2	467.000	0	13.400	0	480.400
EPS(Administradoras: 4)				7	425.100	0	12.400	0	437.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	163.500	0	4.700	0	168.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	116.800	0	3.400	0	120.200
EPS-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	1	70.100	0	2.100	0	72.200
ALIANSALUD EPS	EPS001	830113831	0	1	74.700	0	2.200	0	76.900
ARP(Administradoras: 1)				7	476.500	0	13.700	0	490.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	7	476.500	0	13.700	0	490.200
CCF (Administradoras: 1)				7	425.100	0	12.200	0	437.300
COMFACA	CCF13	891180047	2	7	425.100	0	12.200	0	437.300
Gran Total					3.026.400	0	86.900	0	3.113.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	APL	F. PRESENTACIÓN	AUT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUNICIPIO	DIRECCIÓN		TELEFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERESES MORA	ESTADO RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
N° APORTANTES	VIER. DE PAGO (PSE)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO.	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUNICIPIO	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXONERADO PARAFISCALES
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MIXTA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (FIN)	FECHA ESTE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
13.305.430	13.305.430	13.305.430	13.305.430	[illegible]

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				7	2.129.200	0	29.100	0	2.158.300
PORVENIR	23030	800224808	8	5	1.668.800	0	21.400	0	1.690.200
PROTECCION	23020	800229739	0	2	560.400	0	7.700	0	568.100
EPS(Administradoras: 4)				7	532.600	0	7.100	0	540.100
ALIANSALUD EPS	EPS001	830113831	0	1	112.000	0	1.600	0	113.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	210.000	0	3.000	0	213.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	140.000	0	2.000	0	142.000
EPS S.E.MASSANAR	ESSC18	901021565	8	1	70.100	0	1.000	0	71.100
ARP(Administradoras: 1)				7	588.200	0	8.100	0	596.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	7	588.200	0	8.100	0	596.300
CCF(Administradoras: 1)				7	502.600	0	7.200	0	509.900
COMFACA	CCF12	891180047	2	7	502.600	0	7.200	0	509.900
Gran Total					3.752.600	0	52.000	0	3.804.600

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO.	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	1	[illegible]	R	[illegible]	[illegible]	DIRECTA	7112	[illegible]
MUNICIPIO	DIRECCIÓN		TELEFONO		EMAIL			ESTADO DE PARAFISCALES
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	E	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES																		DIAS				PENSIÓN					SALUD				CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN				
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD SALARIO																																														
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																																														
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																																														
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																																														
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																																														
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																																														
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																																														
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																																														

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUN DEP	DIRECCION		TELEFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
13.305.430	13.305.430	13.305.430	13.305.430	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				7	2.129.200	0	148.400	0	2.277.600
PROTECCION	[illegible]	[illegible]	0	2	560.400	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PORVENIR	[illegible]	[illegible]	8	5	1.568.800	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
EPS(Administradoras: 4)				7	532.600	0	37.200	0	569.800
ALIANSALUD EPS	[illegible]	[illegible]	0	1	112.000	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
EPS S EMSANAR	[illegible]	[illegible]	8	1	70.500	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NUEVA E.P.S. S.A.	[illegible]	[illegible]	2	3	210.900	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SANITAS	[illegible]	[illegible]	6	2	140.200	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ARP(Administradoras: 1)				7	588.200	0	41.000	0	629.200
POSITIVA	[illegible]	[illegible]	6	7	588.200	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CCF(Administradoras: 1)				7	532.600	0	37.100	0	569.700
COMFACA	[illegible]	[illegible]	2	7	532.600	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Gran Total					3.782.600	0	263.700	0	4.046.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NUM.OF/P	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº APLIADOS	REF. DE PAGO (PAY)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							

EMPLEADO					NOVEDADES																						DIAS				PENSIÓN					SALUD				CCF			RIESGOS			TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN					
Nº	ID	EMPLEADO	SALARIO	INCAPACIDAD EG SALARIO	[illegible]																																																					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																																																					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																																																					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																																																					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																																																					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																																																					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																																																					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																																																					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																																																					

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELEFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							

TOTALES IBC				
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				8	2.166.600	0	199.400	0	2.366.000
PROTECCION	230201	800229739	0	2	580.400	0	51.600	0	632.000
PORVENIR	230301	900336004	8	6	1.586.200	0	147.800	0	1.734.000
EPS(Administradoras: 4)				8	542.000	0	50.100	0	592.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	830119064	3	3	210.300	0	19.400	0	229.700
EPS S EMSSANAR	ESS018	901021565	8	1	70.100	0	6.500	0	76.600
ALIANSALUD EPS	EPS001	830113831	0	1	112.000	0	10.400	0	122.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	149.600	0	13.800	0	163.400
AFP(Administradoras: 1)				8	604.000	0	55.700	0	660.200
POSITIVA	16-23	860011153	6	8	604.000	0	55.700	0	660.200
DCF(Administradoras: 1)				5	542.000	0	49.900	0	591.900
COMFACA	CCF13	891180047	2	5	542.000	0	49.900	0	591.900
Gran Total					3.855.100	0	355.100	0	4.210.200

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUCURSAL	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO.	TIPO DE EMPRESA
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	POSITIVA 14-23	UNICA	[redacted]	[redacted]
SUCURSAL		DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[redacted]	[redacted]	[redacted]	E	[redacted]	TODOS LOS CENTROS	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (FIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[redacted]	[redacted]	[redacted]	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
13.305.430	13.305.430	13.305.430	13.305.430	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				7	2.129.200	0	0	0	2.129.200
PROTECCION	23A01	800229739	0	2	560.400	0	0	0	560.400
HORIZONTE	23D01	800224808	8	5	1.568.800	0	0	0	1.568.800
EPS(Administradoras: 4)				7	532.600	0	0	0	532.600
EPS SI CMSSANAR	ESSC18	8918210105	8	1	70.100	0	0	0	70.100
ALIANSALUD EPS	EPS081	830113831	0	1	112.000	0	0	0	112.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	140.200	0	0	0	140.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	800156264	2	3	210.300	0	0	0	210.300
ARP(Administradoras: 1)				7	588.200	0	0	0	588.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	7	588.200	0	0	0	588.200
CCF(Administradoras: 1)				7	532.600	0	0	0	532.600
COMFACA	CCF13	890199047	2	7	532.600	0	0	0	532.600
Gran Total					3.782.600	0	0	0	3.782.600

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	DIGRAD	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[redacted]	1	[redacted]	R	0	FUERTE - 14.35	UNICA	1141	Jurídica
NUMSUCEP	DIRECCIÓN		TELEFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
N+1	[redacted]		[redacted]		[redacted]			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	50182224	E	2025-12-10	1 [redacted]	11 [redacted]	11 [redacted]	1.445.600	10.800	BANCOLOMBIA
Nº APLWEB	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
0	50182224	2025-12-10	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																											DIAS				PENSIÓN					SALUD				CCF			RIESGOS		TARIFA	PRAPE	SENA	ICBF	ESAP	MEN					
N.	ID	NOMBRES	SALARIO	VR DEVENGADO MES SALARIO	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SPV	DNO	SLU	IGA	LMP	VACO	VACD	VACC	DIAS	APFI	APFT	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	ADMINISTRADORA	IBC	Cot	TARIFA	AUSENTISMO	ADMINISTRADORA	IBC	Cot	TARIFA	AUSENTISMO	ADMINISTRADORA	IBC	Cot	TARIFA	IBC	Cot	Cot	Tarifa CCF	Apor. Tarifa CCF	Aapr	Diferencia Aportes Mes Anterior	Valor total Aportes																		

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUN.DEP.	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO LEY PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO EPRE	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
6.490.348	6.490.348	6.490.348	6.490.348	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				8	1.038.800	0	18.200	0	1.057.000
PROTECCION	23020	800229739	0	2	168.200	0	3.000	0	171.300
PORVENIR	23030	800250888	8	6	870.600	0	15.200	0	885.800
EPS(Administradoras: 4)				8	260.100	0	4.600	0	264.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	800156264	2	0	63.300	0	1.100	0	64.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	91.200	0	1.600	0	92.800
ALIANSALUD EPS	EPS001	830113831	0	1	33.000	0	600	0	34.200
EPS S.E.MEDIMÁS	EPS018	901021565	8	7	72.600	0	1.300	0	73.900
ARP(Administradoras: 1)				8	350.700	0	6.100	0	356.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	8	350.700	0	6.100	0	356.800
CCF(Administradoras: 1)				8	260.100	0	4.600	0	264.700
COMFENCA	CCF13	890900947	2	8	260.100	0	4.600	0	264.700
Gran Total					1.909.700	0	33.500	0	1.943.200

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[redacted]	4	[redacted]	1	1	POSITIVA - 14-23	EMCA	1110	Mixta
REPRESENTANTE	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			CUENTA DE PARAFISCALES
[redacted]	CL 13A 101A 144		3126431314		[redacted]			5

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-07	[redacted]	E	[redacted]	TODOS LOS CENTROS	NORTE	TODOS	2.629.300	19.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PSE)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	[redacted]	2026-07-14	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES																						DÍAS				PENSIÓN					SALUD				CCF			RIESGOS		TARIFA	PVPMT	SENA	ICBF	ESAP	MEN			Total		
N	ID	EMPLEADO	SALARIO																																																	
1	[redacted]	[redacted]	1.750.905	1																								30	30	30	30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	30	[redacted]	[redacted]	30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2	[redacted]	[redacted]	1.750.905	1	1																							30	30	30	30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	30	[redacted]	[redacted]	30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3	[redacted]	[redacted]	1.750.905	1																								30	30	30	30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	30	[redacted]	[redacted]	30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4	[redacted]	[redacted]	1.750.905	1																								30	30	30	30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	30	[redacted]	[redacted]	30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5	[redacted]	[redacted]	1.750.905	1	1																							30	30	30	30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	30	[redacted]	[redacted]	30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
6	[redacted]	[redacted]	1.750.905	1																								30	30	30	30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	30	[redacted]	[redacted]	30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
7	[redacted]	[redacted]	1.750.905	1																								30	30	30	30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	30	[redacted]	[redacted]	30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PARAFISCALES	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUNICIPIO	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PSE)	FECHA CORTE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
12.768.583	12.768.583	12.768.583	12.768.583	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				7	2.043.300	0	10.500	0	2.053.800
PORVENIR	230301	800138188	8	5	1.501.680	0	7.700	0	1.509.380
PROTECCION	230301	800229739	0	2	541.780	0	2.800	0	544.580
EPS(Administradoras: 4)				7	511.100	0	2.800	0	513.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	200.900	0	1.100	0	202.000
EPS S.SANITAS	EPS016	800251440	6	1	70.100	0	400	0	70.500
COMFAMILIAR EPS	EPS001	830113831	0	1	804.600	0	600	0	805.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	135.500	0	700	0	136.200
ARP(Administradoras: 1)				7	565.900	0	2.900	0	568.800
POSITIVA	5120	860011153	6	7	565.900	0	2.900	0	568.800
CCF(Administradoras: 1)				7	511.100	0	2.700	0	513.800
COMFACA	CCF13	891190047	2	7	511.100	0	2.700	0	513.800
Gran Total					3.631.400	0	18.900	0	3.650.300
